

CARGO

MEMORANDUM N° 3107-2019-FONDEPES/DIGENIPAA

A : Dra. CARMINA CARRERA AMAYA
Jefa de la Oficina General de Administración

ASUNTO : VALORIZACION DE OBRA N°25
Obra: Mejoramiento de los servicios del DPA Cabo Blanco distrito de El Alto – Talara.
Contrato: N°10-2017-FONDEPES/OGA
Contratista: P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.

FONDEPES
OFIC. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
19 JUN 2019
DOCUMENTO RECIBIDO
HORA: 10:04 FIRMA: [Firma]

REFERENCIA : a) Informe N° 61-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/FFR
b) Carta CSL.170801.ED.693.19

FECHA : Lima, 18 JUN 2019

Tengo a bien dirigirme a su despacho, para remitir adjunto al presente, la Valorización N°25 de la obra del asunto, correspondiente a los trabajos efectuados al mes de mayo del 2019, por la empresa PSV CONSTRUCTORES S.A., la misma que ha sido revisada por la empresa supervisora Cesel S.A. de obra.

Con la conformidad del coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola de FONDEPES, mediante Informe N° 61-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/FFR, el cual hago mío, se solicita se sirva disponer a quien corresponda, se efectúe el trámite para efectuar el pago de la indicada valorización, aclarando que en lo que respecta a deducciones y otras penalidades se efectuarán en la liquidación de obra.

Atentamente,



ING. JUAN MANUEL ALPISTE CARO
Director (e) General de Inversión
Pesquero Artesanal y Acuícola

Frank F.

CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por la presente que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola al suscribir la presente acta, da su conformidad para realizar el Pago por el concepto de VALORIZACION N°25 por la suma de **S/ 0.00 (CERO CON 00/100 SOLES), incluido IGV**, a favor de P.S.V CONSTRUCTORES S.A., encargado de la ejecución de la Obra “Mejoramiento de los Servicios del DPA Cabo Blanco, distrito de El Alto – Talara”, según contrato N° 010-2017-FONDEPES.



Lima, junio 2019



ING. JUAN MANUEL ALPISTE CARO
DIRECTOR (e) GENERAL DE INVERSION PESQUERA
ARTESANAL ACUICOLA



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



04909626

Usuario: usuario_digenipaa3

Fecha: 18/06/2019

Hora: 12:23



CARGO 00333-2019-FONDEPES/MML

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA
Asunto: CSL-170801-ED-693-19
REMITE VALORIZACION N° 25 DE OBRA MES DE MAYO 2019 REF: DPA CABO BLANCO


Referencia:

Fecha: 18/06/2019

Observación: SE DERIVA EL PRESENTE INFORME N°61-FONDEPES-DIGENIPAA-AOEM-FFR PARA CONTINUAR TRAMITE CORRESPONDIENTE DEL DPA CABO BLANCO, VALORIZACION 25 DE MAYO. CONTRATO 10-2017. CONTRATISTA PSV CONSTRUCTORES COORDINADOR ING. FRANK FLORES

Atentamente,

MORGAN LEON MAGALI






INFORME N° 061 – 2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/FFR

A : ING. JUAN MANUEL ALPISTE CARO.
Director (e) General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

ASUNTO : VALORIZACION DE OBRA N°25
Obra: Mejoramiento de los servicios del DPA Cabo Blanco,
Distrito de El Alto – Talara.
Contrato: 10-2017-FONDEPES/OGA.

REFERENCIA : Carta CSL.170801.ED.693.19

FECHA : Lima, 17 de junio del 2019



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, mediante los cuales el supervisor de obra, CESEL S.A. hace llegar la valorización N°25 de la obra del asunto, correspondiente a los trabajos efectuados en el mes de mayo del 2019, la misma que ha sido elaborada conjuntamente con el Contratista PSV CONSTRUCTORES S.A. y luego de revisada y corregida por ellos.

Luego de efectuar la revisión de los cálculos, los mismos que fueron elaborados por el Supervisor de obra, se obtuvo como resultado lo siguiente:

CABO BLANCO

A. VALORIZACION N° 25 (contractual)		0.00
Obras de mar	0.00	
Estructuras en tierra	0.00	
Arquitectura	0.00	
Instalaciones sanitarias	0.00	
Instalaciones eléctricas	0.00	
Equipamiento inmobiliario	0.00	
Impacto ambiental	0.00	
B. GASTOS GENERALES Y UTILIDADES		0.00
Gastos generales (10.00%)	0.00	
Utilidades (10.00%)	0.00	
C. AMORTIZACIONES		0.00
Adelanto Directo 10.00%	0.00	
Adelanto de Materiales 15.00%	0.00	
Adelanto de Materiales 15.00%	0.00	
D. REAJUSTES		0.00
Total de reajustes (*)	0.00	
E. SUB TOTAL VALORIZACIÓN N° 25		0.00
Total Valorización (A+B-C+D)		
I.G.V. (18%)		0.00
F. TOTAL A FACTURAR VALORIZACIÓN N° 25		0.00

SON: CERO CON 00/100 SOLES.





ANALISIS

A continuación, se adjunta un cuadro donde se incluyen los datos más representativos de la obra y las fechas en que se entregó la documentación, demostrando el cumplimiento de los TDR.

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>DETALLE</u>
1	Nombre de la obra	Mejoramiento de los servicios del DPA Cabo Blanco, Distrito de El Alto-Talara
2	Contrato de Obra	: N° 10-2017-FONDEPES/OGA
3	Presupuesto Contratado	: S/. 17'624,136.92
4	Sistema	: Precios Unitarios
5	Contratista	: PSV CONSTRUCTORES S.A.
6	Plazo Contractual	: 300 días calendario
7	Fecha de Entrega de Terreno	: 25 de Abril del 2017
8	Inicio del Plazo Contractual	: 26 de Abril del 2017
9	Fin del Plazo Programado	: 19 de Febrero del 2018
10	Ampliacion de Plazo N°01	: 34 días calendario
11	Ampliacion de Plazo N°02	: Denegado
12	Ampliacion de Plazo N°03	: Denegado
13	Ampliacion de Plazo N°04	: 19 días calendario
14	Ampliacion de Plazo N°05	: 05 días calendario
15	Ampliacion de Plazo N°06	: 56 días calendario
16	Ampliacion de Plazo N°07	: 41 días calendario
17	Ampliacion de Plazo N°08	: Denegado
18	Ampliacion de Plazo N°09	: Denegado
19	Ampliacion de Plazo N°10	: 09 días calendario
20	Ampliacion de Plazo N°11	: 45 días calendario
21	Ampliacion de Plazo N°12	: 41 días calendario
22	Ampliacion de Plazo N°13	: 30 días calendario
23	Ampliacion de Plazo N°14	: 34 días calendario
24	Ampliacion de Plazo N°15	: Denegado
25	Ampliacion de Plazo N°16	: 35 días calendario
26	Ampliacion de Plazo N°17	: 05 días calendario
27	Ampliacion de Plazo N°18	: 30 días calendario
28	Ampliacion de Plazo N°19	: 11 días calendario
29	Ampliacion de Plazo N°20	: 30 días calendario
30	Ampliacion de Plazo N°21	: Denegado
31	Nueva fecha culminación de plazo	: 18 de mayo del 2019
32	Fecha de entrega de Valorización N° 25 por Contratista	: 05 de junio del 2019
33	Fecha de entrega de Informe Mensual por Contratista	: 05 de junio del 2019
34	Fecha de entrega de Valorización N° 25 por supervisión	: 05 de junio del 2019

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El suscrito, al haberse comprobado que el contratista ha cumplido con entregar lo indicado en los términos de referencia y en los plazos previstos, considera procedente el pago de la valorización N° 25 por tal razón se recomienda continuar con el respectivo trámite de pago, aclarando que en lo que respecta a deducciones por cualquier concepto y otras penalidades se efectuarán en la liquidación de obra.


Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,



Ing. Frank Flores Rubina
CIP N°182074

El Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento que suscribe, hace suyo en todas sus partes el presente documento



ING. JULIO RIOS SOUSA
Coordinador (e) del Área de Obras,
Equipamiento y Mantenimiento

CESEL INGENIEROS

CERTIFICADO EN: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Lima, 05 de junio del 2019

CSL.170801.ED.694.19

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Av. Petit Thouars N° 115 - Cercado de Lima

Lima.-

Atención : **Ing. Luis Alberto Barbieri Quino**
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

Asunto : **Informe Mensual del contratista – MAYO 2019**


Referencia : Contrato N° 14-2017- FONDEPES/OGA Supervisión de la Ejecución de la Obra:
"Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero pesquero artesanal Cabo Blanco, Distrito de El Alto", Provincia de Talara, Región de Piura.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo y conforme a nuestras obligaciones contractuales relacionado al proyecto de la referencia, alcanzamos el Informe de Mensual del Contratista, correspondiente al mes de MAYO de 2019, en original y copia.

Agradeciendo la atención a la presente, nos despedimos.

Atentamente,



Ing. Yesil Silva Espinoza
Jefe de Supervisión
CESEL S.A.

YARROYO/yas

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	
	
2887028	
N° DOC	00005470-2015
CLAVE	1570
USUARIO	usuario_alog69
FECHA Y HORA	06/06/2019 13:03:11
TELEFONO	2087700
www.fondepes.gob.pe	

Av. José Gálvez Barronechea 646
San Isidro - Lima 27 - Perú
Telf: (51-1) 705-5000
Fax: (51-1) 705-5050
cesel@cesel.com.pe
www.cesel.com.pe



Fecha: 05/06/19

MEMORÁNDUM INTERNO N° 235 -201 -FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM

Asunto

Memorandum Interno 4017-2019 Digenipaa

Referencia :

Registro :

Indicación	Destino

Observaciones: Ing. Frank Flores

Atentamente

[Signature]
11/06/2019



Indicaciones:

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 01. Autorizado/Aprobado | 02. Calificar/Evaluar | 03. Informe | 04. Proyectar resolución |
| 05. Atención/Tramitación | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular |
| 09. Ayuda memoria | 10. Coordinar | 11. Opinión/Recomendación | 12. Consolidar |
| 13. Aclarar redacción | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta | 16. Visación |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo | 19. Ampliar | 20. Seguimiento |



Fecha: 05/06/19

MEMORÁNDUM INTERNO N° 4217 - 201 - FONDEPES/ DIGENIPAA

Asunto : CSL. 170801. ED. 694.19

Referencia : _____ Registro : 3470

Destino	Indicación	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	05 JUN 2019
OCI		OGAJ	
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	Aee
Observaciones: _____			

Atentamente



Indicaciones:

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 01. Autorizado/Aprobado | 02. Calificar/Evaluar | 03. Informe | 04. Proyectar |
| 05. Atención/Tramitación | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular |
| 09. Ayuda memoria | 10. Coordinar | 11. Opinión/Recomendación | 12. Consolar |
| 13. Aclarar redacción | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta | 16. Visación |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo | 19. Ampliar | 20. Seguimiento |

CESEL INGENIEROS

CERTIFICADO EN: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Lima, 05 de junio del 2019


CSL.170801.ED.694.19

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Av. Petit Thouars N° 115 - Cercado de Lima

Lima.-



Atención : **Ing. Luis Alberto Barbieri Quino**
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola

Asunto : **Informe Mensual del contratista – MAYO 2019**

Referencia : Contrato N° 14-2017- FONDEPES/OGA Supervisión de la Ejecución de la Obra:
**“Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero pesquero artesanal
Cabo Blanco, Distrito de El Alto”,** Provincia de Talara, Región de Piura.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo y conforme a nuestras obligaciones contractuales relacionado al proyecto de la referencia, alcanzamos el Informe de Mensual del Contratista, correspondiente al mes de MAYO de 2019, en original y copia.

Agradeciendo la atención a la presente, nos despedimos.

Atentamente,



Ing. Yesil Silva Espinoza
Jefe de Supervisión
CESEL S.A.

YARROYO/yas

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	
	
2887028	
N° DOC:	00005470-2018
CLAVE:	1570
USUARIO:	usuario_alog69
FECHA Y HORA:	05/06/2019 13:03:11
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	

Av. José Gálvez Barrenechea 646
San Isidro - Lima 27 - Perú
Telf: (51-1) 705-5000
Fax: (51-1) 705-5050
cesel@cesel.com.pe
www.cesel.com.pe



Cabo Blanco, 31 de mayo de 2019

PSV -396-DPA CB-2019

Señores : Cesel Ingenieros
Atención : Ing. Yesil Silva Espinoza.
Proyecto : "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero
Pesquero Artesanal en la Localidad de Cabo Blanco,
Distrito de el Alto, Provincia de Talara, Región de
Piura".
Asunto : informe mensual


De nuestra consideración:

Hacemos entrega del informe mensual del correspondiente al mes de mayo del 2019.

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente

**Residente de Obra
Ing. Luis Portalino Segundo
PSV CONSTRUCTORES S.A.**





PERU

Ministerio
de la Producción

SEMPRE


PSV 001


INFORME MENSUAL DE LA CONTRATISTA

MES DE MAYO 2019

PROYECTO:

● **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL DE CABO BLANCO, EN LA
LOCALIDAD DE CABO BLANCO,
PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA".**

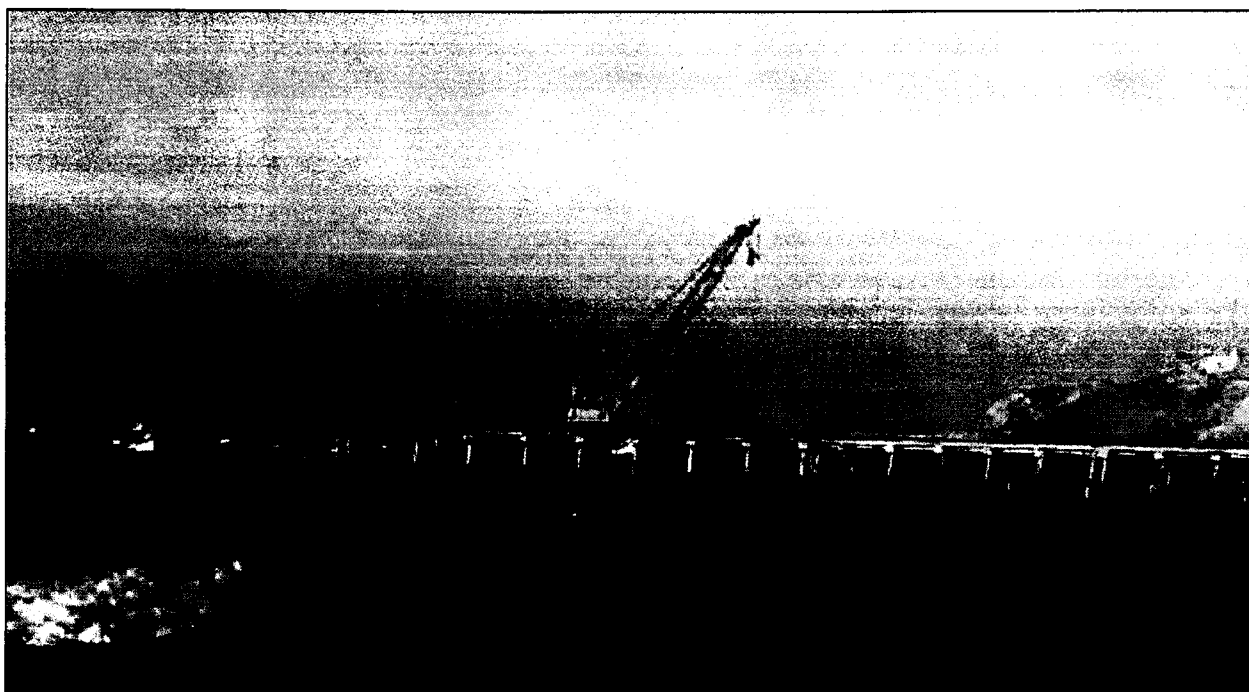



YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 79973





PERU

Ministerio de la Producción

CONDENSA

PSV 002

TABLA DE CONTENIDO

- 1. GENERALIDADES 3
 - 1.1. ANTECEDENTES 3
 - 1.2. NOMBRE DE LA OBRA: 3
 - 1.3. UBICACIÓN 3
 - 2.3 DATOS GENERALES DE LA OBRA: 4
- 2. CONTROL DE AVANCES 5
- 3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA VALORIZACIÓN. 5
- 4. CRONOGRAMA DE AVANCE. 6
- 5. CONTROL DE CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES..... 7
- 6. PERSONAL..... 7
- 7. HISTORIAL DE CONSULTAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA..... 8
- 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... 11
- 9. ANEXOS. 13
- ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA 14

TABLA DE TABLAS

- TABLA 1.RESUMEN DE VALORIZACIÓN PRESUPUESTO PRINCIPAL..... 5
- TABLA 2. RESUMEN DE VALORIZACIÓN DEL ADICIONAL N° 8..... 5


 YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973





PERU

Ministerio
de la Producción

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

PSV⁰⁰³

1. GENERALIDADES

1.1. ANTECEDENTES

El Desembarcadero Pesquero de Cabo Blanco fue construido el año 1993 por el Ministerio de Pesquería, hoy Ministerio de Producción, iniciando sus operaciones el 10 de Octubre del mismo año para dar facilidad a la comunidad pesquera artesanal, dotándola de una infraestructura adecuada para la realización de las actividades propias de la pesquería artesanal.

Con el correr de los años la infraestructura pesquera fue colapsando tanto en su tamaño como en el funcionamiento y rendimiento de sus instalaciones ocasionando dificultades operativas de la actividad pesquera artesanal, situación que ha sido ocasionada principalmente por la mala ubicación del muelle en una zona de rompiente en donde las olas, en tiempo de bravesas, sobrepasan el nivel de cabezo poniendo en peligro tanto a la infraestructura como a la vida humana.


Esta situación negativa se ha visto agravada en la medida que el Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) Cabo Blanco no ha sido construido para las normas sanitarias de la actividad pesquera vigente y tampoco ha tenido una adecuación desde que esta norma entró en vigencia en enero del año 2002.

La situación viene creando restricciones no solo en el área de desembarque sino también en las áreas de servicio principalmente en el lavado y eviscerado, en junto a los altos volúmenes de desembarque de las diversas especies, rebasa el dimensionamiento inicial de las instalaciones incrementando aún más los aspectos negativos el hecho de no contar con un emisor submarino.

1.2 NOMBRE DE LA OBRA: "Mejoramiento de los Servicios de Desembarcadero Pesquero Artesanal Cabo Blanco, Distrito del Alto Talara" – Región de Piura.

1.3 UBICACIÓN:

- ✓ Región : Piura
- ✓ Departamento : Piura
- ✓ Provincia : Talara
- ✓ Distrito : Del Alto
- ✓ Localidad : Caleta de Cabo Blanco
- ✓ Coordenadas UTM : NORTE 9'530,099 - ESTE 473, 817


SECRETARÍA DE ASISTENCIA TÉCNICA
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
Lima, 10 de Agosto del 2007

Para llegar al lugar, se puede acceder primero al distrito de El Alto en dirección Noreste por la carretera Panamericana Norte viniendo de Piura- Tala- El Alto,




PERU

Ministerio de la Producción

FONDEPES

PSV 004

altura del Km. 1,135.50 hacia el distrito El Alto y luego mediante una vía de acceso asfaltada en buen estado de conservación y pendiente de aproximadamente 5km. Ubicada aproximadamente a 600m. al sur del actual DPA Cabo Blanco.

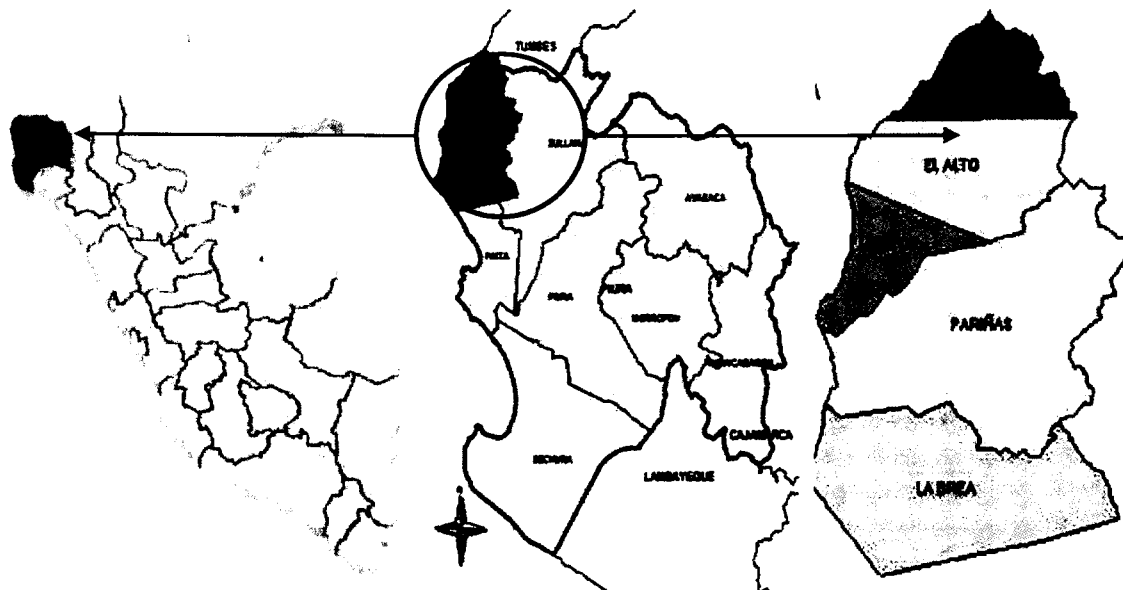


DEPARTAMENTO DE PIURA

PROVINCIA DE TALARA

DISTRITO de EL ALTO

2.3 DATOS GENERALES DE LA OBRA:

- ✓ **Cliente** : FONDEPES
- ✓ **Contratista** : PSV CONSTRUCTORES SA
- ✓ **Supervisión** : CESEL S.A.
- ✓ **Monto de ejecución** : S/. 17'624,136.92 (Inc. IGV).
- ✓ **Modalidad de Contrato** : Precios unitarios
- ✓ **Tipo** : Adjudicación Simplificada N°001-2017.
- ✓ **Plazo de Ejecución** : 300 días calendarios.
- ✓ **Inicio de Obra** : 26 de abril del 2017
- ✓ **Forma de Pago** : Valorizaciones mensuales por avance de obra
- ✓ **Adelanto** : 10% del Monto del Contrato.
- ✓ **Firma de contrato** : 30 de Abril del 2017.
- ✓ **Entrega de Terreno** : 25 de Abril del 2017.
- ✓ **Fecha de inicio de obra** : 26 de Abril del 2017.
- ✓ **Fecha de fin de obra** : 18 de abril del 2019
- ✓ **Coordinador de obra** : Ing. Frank Flores Rubina.


 YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79972

PROYECTO:
CLIENTE:
LUGAR:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"
FONDEPES
PIURA - TALARA - EL ALTO

RESIDENTE PSV.:
FECHA:

Luis Portolino Segundo
31.05.2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO		VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
		CANT	P.U. S/.	PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.	CANT	SUB TOTAL S/.	CANT	SUB TOTAL S/.	CANT	SUB TOTAL S/.
01	INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION				741,384.3		44,893.64		44,893.64		696,490.68
02	SUB ESTACION				16,100.65		6,918.93		6,918.93		9,181,714.1
03	GRUPO ELECTROGENO				43,751.4		16,292.09		16,292.09		27,459,332.8
TOTAL COSTO DIRECTO					801,236.40		68,104.66		68,104.67		733,131.73
GASTOS GENERALES				10%	80,123.64		6,810.47		6,810.47	10%	73,313.17
UTILIDAD				10%	80,123.64		6,810.47		6,810.47	10%	73,313.17
SUB.TOTAL				18%	961,483.68		81,725.60		81,725.61	18%	879,758.07
IGV.					173,067.06		14,710.61		14,710.61		158,356.45
TOTAL ESTADO DE PAGO					1,134,550.7		96,436.2		96,436.2		1,038,114.52



PSV CONSTRUCTORES SA
LUIS PORTALINO SEGUNDO

CEBEL
JEFE DE SUPERVISIÓN



PROYECTO:
CLIENTE:
LUGAR:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"
FONDEPES
PIURA - TALARA - EL ALTO

RESIDENTE PSV.:
FECHA:

Luis Portalino Segundo
31.05.2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO		VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
		CANT	P.U. S/.	SUB TOTAL S/.	CANT	SUB TOTAL S/.	CANT	SUB TOTAL S/.	CANT	SUB TOTAL S/.	CANT
01	ESTRUCTURAS DE MAR	1.00	3147998.11	3147998.11		2,270,129.1	0.00	2,270,129.1		877,869	
02	ESTRUCTURAS EN TIERRA	1.00	3,644,015.32	3,644,015.32		2,750,816.26	0.00	2,750,816.3		893,199	
03	ARQUITECTURA	1.00	1,200,063.96	1,200,063.96		249,193.75	0.00	249,193.7		950,870	
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	44,954.91	44,954.91		3,218.37	0.00	3,218.4		41,737	
05	INSTALACIONES SANITARIAS	1.00	550,193.40	550,193.4		237,356.60	0.00	237,356.6		312,837	
06	EQUIPAMIENTO	1.00	915,312.15	915,312.15		503,928.53	0.00	503,928.5		411,384	
07	IMPACTO AMBIENTAL	1.00	125,157.80	125,157.8		122,718.80	0.00	122,718.8		2,439	
TOTAL COSTO DIRECTO				9,627,695.65		6,137,361.46	0.00	6,137,361.46		3,490,334.19	
GASTOS GENERALES				10%	962,769.57	10%	613,736.15	10%	613,736.15	10%	349,033.42
UTILIDAD				10%	962,769.57	10%	613,736.15	10%	613,736.15	10%	349,033.42
SUB.TOTAL				11,553,234.79		7,364,833.76	0.00	7,364,833.76		4,188,401.03	
IGV				18%	2,079,582.26	18%	1,325,670.08	18%	1,325,670.08	18%	753,912.19
TOTAL ESTADO DE PAGO				13,632,817.1		8,690,503.8	0.00	8,690,503.8		4,942,313.22	



PSV CONSTRUCTORES SA
LUIS PORTALINO SEGUNDO

CESEL
YESIL SILVA ESPINOZA





PERU

Ministerio
de la Producción

MIDEM

PSV 008

4. CRONOGRAMA DE AVANCE.

En el mes de abril la valorización de obra dio como avances acumulados lo siguiente:

Montos Programados: Porcentaje Avance (%):

Acumulado mayo 2019: S/. 14'130,625.32 (CD) 100%

Monto prog mayo 2019: S/ 4'791,417.30 (CD) 33.91%

Montos Ejecutados Real: Porcentaje Avance (%)


Acumulado mayo 2019: S/. 8'742,302.48 (CD) 62.62%

Monto mayo 2019 : S/.0 (CD) 0.0%

Presupuesto principal	Costo directo			% de avance
	Presupuesto	Monto valorizado	Monto por valorizar	
Obras en mar	1,728,062.21	2,257,846.20	-529,783.99	71%
Estructuras en tierra	3,797,403.79	2,589,313.24	1,208,090.55	
Arquitectura	1,200,063.96	249,193.74	950,870.22	
Instalaciones Electricas	44,954.91	3,218.40	41,736.51	
Instalaciones Sanitarias	550,193.40	237,356.60	312,836.80	
Equipamiento	915,312.15	503,928.50	411,383.65	
Impacto ambiental	125,157.80	122,718.80	2,439.00	
MMN° 1	36,930.07	36,930.07	-	100%
Adicional N° 1	1,594,671.93	1,285,231.02	309,440.91	81%
Adicional N° 2	224,310.27	168,408.57	55,901.70	75%
Adicional N° 3	51,714.84	51,714.84	-	100%
Adicional N° 4	801,236.40	68,104.66	733,131.73	8%
Adicional N° 5	1,780,350.25	760,132.83	1,020,217.42	43%
Adicional N° 6	291,964.00	-	291,964.00	0%
Adicional N° 7	1,007,407.59	407,537.58	599,870.00	40%
Adicional N° 8	32,993.00	671.43	32,321.57	2%
Adicional N° 9	97,732.41	-	97,732.41	0%
Monto del contrato CD	14,186,484.72	8,742,306.48	5,538,152.49	


 YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973



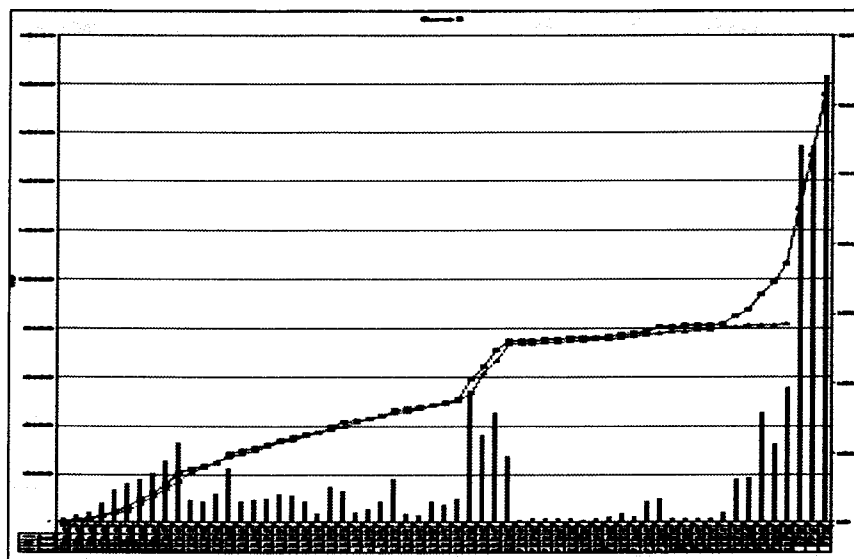

Curva s

COMENTARIOS

El proyecto Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal, presento un porcentaje de avance real acumulado de 61.62 % respecto al presupuesto general, Este es un porcentaje desfavorable respecto al programado acumulado 100%.

5. CONTROL DE CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES.

Durante el mes de abril no ingresó material a la obra.

6. PERSONAL

Tabla 3. Personal indirecto PSV.

NRO	APELLIDOS Y NOMBRES	ESPECIALIDAD
1	LUIS PORTALINO SEGUNDO	RESIDENTE
2	AGUIRRE ARRIETA ANA JULIA	ING. ASISTENTE
3	ESPINOZA MENDOZA OLMER CARLITOS	ING. ASISTENTE
4	FONTALVO TORRES JORDAN	ING. PRODUCCIÓN
5	GOMEZ Y PANAQUE MICHAEL JONATAN	ENC. DE ALMACEN



 YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973



sem 17	20,548.00	20,548.00	52,741.23
sem 18	52,635.00	73,183.00	105,482.46
sem 19	45,213.00	118,396.00	158,223.69
sem 20	25,631.00	144,027.00	210,964.92
sem 21	73,203.52	217,230.52	263,706.15
sem 22	102,703.20	319,933.72	316,447.38
sem 23	215,635.00	535,568.72	537,640.64
sem 24	159,875.00	695,443.72	758,478.99
sem 25	345,632.00	1,041,075.72	984,741.17
sem 26	215,392.53	1,256,468.25	1,215,987.63
sem 27	196,564.07	1,453,032.32	1,452,742.72
sem 28	125,354.00	1,578,386.32	1,586,086.42
sem 29	253,645.00	1,832,031.32	1,777,821.82
sem 30	85,625.00	1,917,656.32	1,910,064.57
sem 31	56,601.36	1,974,257.68	1,975,261.93
sem 32	56,325.00	2,030,582.68	2,098,219.63
sem 33	62,689.00	2,093,271.68	2,221,685.34
sem 34	125,365.00	2,218,636.68	2,348,348.31
sem 35	182,199.30	2,400,835.98	2,400,303.97
sem 36	25,365.00	2,426,200.98	2,500,597.29
sem 37	85,625.00	2,511,825.98	2,600,890.62
sem 38	90,240.00	2,602,065.98	2,701,183.94
sem 39	198,687.15	2,800,753.13	2,801,477.26
sem 40	52,365.00	2,853,118.13	2,922,890.76
sem 41	23,546.00	2,876,664.13	3,015,209.24
sem 42	125,369.00	3,002,033.13	3,108,851.81
sem 43	185,039.97	3,187,073.10	3,176,347.40
sem 44	21,563.00	3,208,636.10	3,235,217.42
sem 45	85,365.00	3,294,001.10	3,313,912.89
sem 46	56,254.00	3,350,255.10	3,397,519.57
sem 47	85,625.00	3,435,880.10	3,461,024.60
sem 48	92,455.64	3,528,335.74	3,518,000.88
sem 49	456,859.00	3,985,194.74	3,768,850.88
sem 50	259,854.00	4,244,848.74	4,314,745.88
sem 51	425,362.00	4,670,210.74	4,667,601.88
sem 52	503,117.56	5,173,328.30	5,143,792.49
sem 01	10,856.00	5,184,184.30	5,153,610.14
sem 02	23,545.00	5,207,729.30	5,163,427.79
sem 03	5,632.00	5,213,361.30	5,179,136.04
sem 04	5,486.00	5,218,847.30	5,198,771.34
sem 05	33,131.37	5,251,978.67	5,222,363.18
sem 06	15,236.00	5,267,214.67	5,239,379.46
sem 07	9,186.28	5,276,400.95	5,263,013.19
sem 08	25,364.00	5,301,764.95	5,289,482.96
sem 09	42,194.67	5,343,959.62	5,316,898.09
sem 10	12,356.00	5,356,315.62	5,337,738.45
sem 11	12,563.00	5,368,878.62	5,368,998.98
sem 12	86254	5,455,132.62	5,401,099.88
sem 13	96783.92	5,551,916.54	5,505,301.67
sem 14	5,215.00	5,557,131.54	5,517,317.39
sem 15	15,689.00	5,572,820.54	5,547,356.71
sem 16	52365	5,625,185.54	5,577,396.02
sem 17	46,706.15	5,671,891.69	5,625,458.93
sem 18	2,153.00	5,674,044.69	5,631,964.28
sem 19	25,694.00	5,699,738.69	5,651,480.35
sem 20	5846	5,705,584.69	5,664,491.06
sem 21	4,650.00	5,710,234.69	5,703,523.19
sem 22	41,840.43	5,751,875.12	5,755,566.04
sem 23	23,654.00	5,775,529.12	5,957,318.18
sem 24	84562	5,860,091.12	6,058,194.25
sem 25	95426	5,955,517.12	6,159,070.32
sem 26	401565.96	6,357,083.08	6360822.459
sem 27	3254	6,360,337.08	6368345.784
sem 28	5642	6,365,979.08	6390915.759
sem 29	18569	6,384,548.08	6428532.384
sem 30	36,521.74	6,421,069.82	6436055.709
sem 31	54,563.00	6,475,632.82	6536155.199
sem 32	95,235.00	6,570,867.82	6626254.689
sem 33	25,684.00	6,596,551.82	6716354.179
sem 34	125,635.00	6,722,186.82	6796453.669
sem 35	253434.79	6,975,621.61	6,871,553.16
sem 36	2,563.00	6,978,184.61	6971301.946
sem 37	56,256.00	7,034,440.61	7071050.734
sem 38	61,254.00	7,095,694.61	7170799.521

Curva S

010

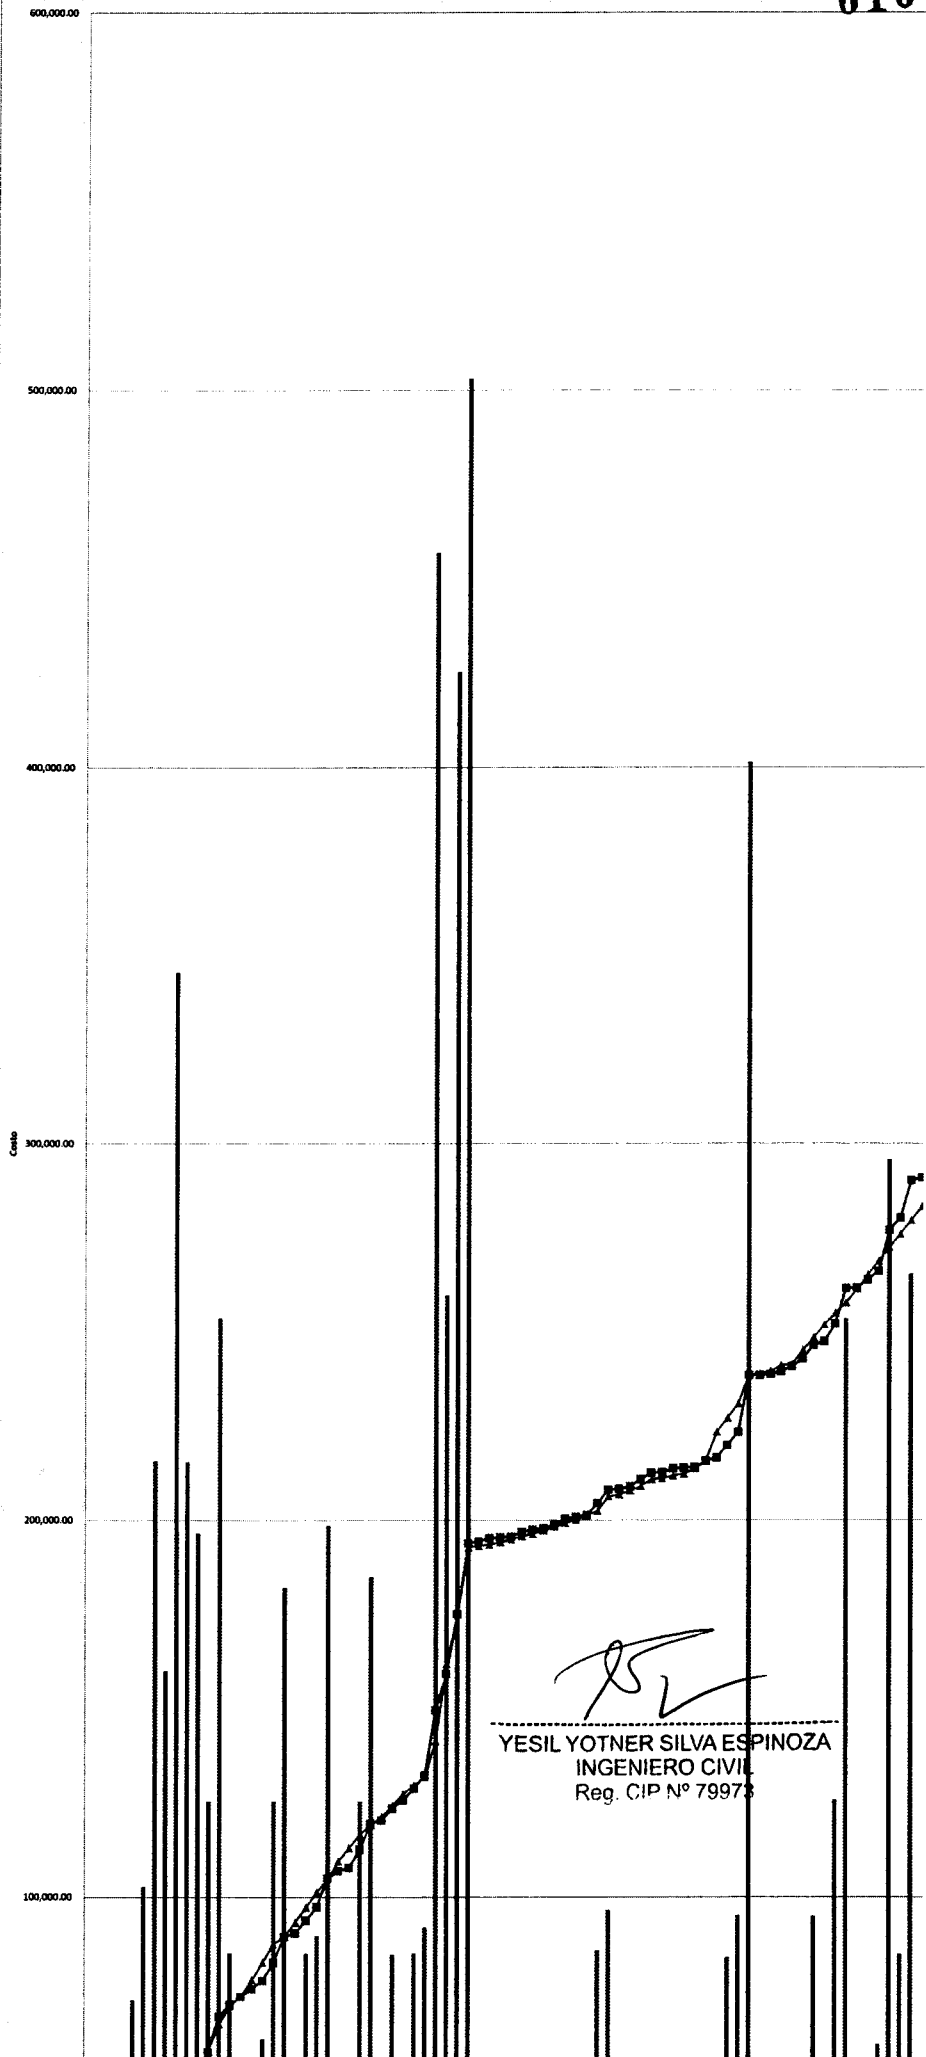

7. HISTORIAL DE CONSULTAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Consultas efectuadas por el contratista, buscando respuesta a las diferentes situaciones e incompatibilidades encontradas en el EXPEDIENTE TÉCNICO durante la ejecución del proyecto DPA Cabo Blanco, estos son eventos que han causado retrasos en la ejecución en las partidas programadas.


REIS PRESENTADOS				
Consulta N°	Asunto	Fecha de consulta	Estado/fecha de respuesta	Días transcurridos
RFI N° 1	Distribución de muros voladizos y desfase de cerco perimétrico para cambio en plano estructural E-02, alargando 1m hacia abajo	20.07.2017	Respondido 07/08/2017 con carta CSL.170801.ED.058.17	18 días
RFI N° 2	Incongruencias en dimensiones del tanque elevado en los planos E-16, IS17	25.09.2017 - carta PSV-73-DPA CB.2017	Respondido 14/11/2017 con carta CSL. 170801.ED.132.17	50 días
RFI N° 3	Falta de detalle de columnetas en planos de cimentaciones	25.09.2017 - carta PSV-73-DPA CB.2017	Respondido 14/11/2017 con carta CSL. 170801.ED.132.17	46 días
N° 4	Se solicita aclaración sobre el corte 3-3 del plano E-04 de zona de desinfección.	29.09.2017 - Carta PSV 79-DPA CB.2017	Respondido 14/11/2017 CSL. 170801.ED.132.17	46 días
RFI N° 5	Falta de detalle de columnas en plano E-04 (talleres)	29.09.2017 - carta PSV 78-DPA CB 2017	Respondido 14/11/2017 CSL. 170801.ED.132.17	46 días
RFI N° 6	Falta de detalle de vigas y columnas en plano E-16	18.10.2017- carta PSV 91-DPA CB 2017	Respondido 14/11/2017 CSL. 170801.ED.132.17	27 días
RFI N° 7	Falta de detalle de cisterna con capacidad 10 m3	23.10.2017-carta PSV -95-DPA CB-2017	Respondido 13/11/2017 CSL.170801.ED.148.17	21 días


 YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973






RFI N° 8	Desfase en planos de aligerados de zona de desinfección	27.10.2017 - carta PSV-97-DPA CB-2017	Respondido 28.10.2017	1 día
RFI N° 9	Se hace entrega de observaciones encontradas en el Expediente de instalaciones eléctricas	27.10.2017 - carta PSV-98 DPA CB-2017	No respondido/ Expediente baja tensión	-
RFI N° 10	incompatibilidades encontradas en cerco perimétrico - muro de contención	06.12.2017 - carta PSV-122-DPA CB - 2017	Respondido 12/01/2018 con carta CSL.170801.ED.168.18	37 días
RFI N° 11	Falta de detalles estructurales en la rampa peatonal	06.12.2017 - carta PSV-122-DPA CB - 2017	Respondido 06/01/2018 con carta CSL.170801.ED.163.18	31 días
RFI N° 12	incompatibilidades en aligerados primer nivel y segundo nivel zona de frio	06.12.2017 - carta PSV-122-DPA CB - 2017	Respondido 20/12/2017 con carta CSL.170801.ED.155.17	14 días
RFI N° 13	falta de detalles de cimentación de casetas de vigilancias	09.12.2017 - carta PSV-DPA CB -2017	Respondido 12/01/2018 con carta CSL.170801.ED.167.18	34 días
RFI N° 14	incompatibilidades de losa aligerada en tareas previas	15.12.2017 - carta PSV-125-DPA CB- 2017	Respondido 30/12/2017 con carta CSL.170801.ED.157A.17	15 días
RFI N° 15	Ubicación de subestación de media tensión, cuarto de tableros y grupo electrógeno	15.12.2017 - carta PSV-126-DPA CB- 2017	No respondido /depende Expediente baja tensión	reformulación de baja y media tensión
RFI N° 16	Salidas adicionales necesarios para alumbrado, luces de emergencia y detección de alarmas contra incendios	15.12.2017 - carta PSV-126-DPA CB- 2017	No respondido /depende Expediente baja tensión	
RFI N° 17	Replanteo de red de desagüe industrial de zona de frio	02.01.2018 - carta PSV-134-DPA CB- 2018	Respondido 06/03/18 con carta CSL.170801.ED.254.18	63 días
RFI N° 18	Nivel de desplante cerco perimétrico	05.02.2018 - carta PSV-163-DPA CB- 2018	Respondido 14.02.2018-carta 170801. ED.217.18	9 días
RFI N° 19	falta de aclaración planos de aligerados administración	03.03.2018 - carta PSV-185-DPA CB- 2018	Respondido 05.03.2018 - carta CSL 170801.ED.252.18	2 días


 YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973





RFI N° 20	Falta de detalles de columnas en áreas sociales	15.03.2018- carta PSV-200-DPA CB-2018	Respondido 19.03.2018 - carta CSL.170801.ED.274.18	16 días
RFI N° 21	Cambios sugeridos en el emisor submarino	21.03.2018 - cata PSV-202-DPA CB-2018	Respondido 07.04.2018 -carta CSL.170801.ED.289.18	17 días
RFI N° 22	Definición del lado sur del enrocado	21.04.2018-carta PSV 216-DPA CB-2018	Respondido el 09.05.2018 - carta CSL.170801.ED.320.18	18 días
RFI N° 23	Incompatibilidades en plano de estructuras y falta de detalle de dinteles para soporte de los muros de tabiquería.	09.05.2018 - carta PSV 226-DPA CB-2018	Respondido el 10.05.2018 - carta CSL.170801.ED.321.18	1 día
RFI N° 24	Falta de detalles en zona de talleres	09.05.2018 Carta PSV 229-DPA CB 2018	Respondido el 10.05.2018- carta CSL.170801.ED.322.18	1 día
RFI N° 25	incompatibilidades barandas muelle	21.05.2018- carta PSV 234-DPA CB 2018	No respondido	-
RFI N° 26	Falta de detalles de pinturas de los ambientes	24.05.2018-carta PSV 235 DPA CB 2018	Respondido el 28.05.2018- carta CSL.170801.ED.338.18	4 días
RFI N° 27	Incompatibilidades encontradas en el plano de estructura de la caseta de fuerza		Respondido el 14.09.2018- carta CSL.170801.ED.459.18	3 días
RFI N° 28	Falta de detalles en las barandas de caseta de fuerza y zona de desinfección	23-08-2018 – Carta PSV-284-DPA CB-2018	Respondido el 11.10.2018- Carta CSL-170801.ED.495.18	49 días
RFI N° 29	Incompatibilidades planos Arquitectura, estructuras y Sanitarias Tanque Elevado	15/09/2018-Carta PSV 297-DPA CB-2018	Respondido el 27.11.2018 – Carta CLS.170801.ED.543.18	73 días
RFI N° 30	falta de detalles en barandas zona de frio	17/12/2018-Carta PSV 336-DPA CB-2018	Respondido el 15.01.2019 – Carta CLS.170801.ED.590.19	29


 VICTOR S. LVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 N° 10000 19973





PERU

Ministerio
de Transportes e
Infraestructura

MINTRE

PSV¹⁴

RFI N° 31	Cobertura metálica zona de tierra	18/12/2018-Carta PSV 338-DPA CB-2018	Respondido el 21.02.2019 – Carta CLS.170801.ED.638.19	65
RFI N° 33	Propuesta de adecuación de cables N2XOH	17/01/2019-Carta PSV 348-DPA CB-2018	Respondido el 01.02.2019 – Carta CLS.170801.ED.611.19	15
RFI N° 34	Detalle de viga de amarre para dintel zona de frio eje c-9/10 2do piso	22/01/2019-Carta PSV 350-DPA CB-2018	Respondido el 23.01.2019 – Carta CLS.170801.ED.598.19	1
RFI N° 35	Cambio de dimensiones en la caseta de bombeo	31/01/2019-Carta PSV 356-DPA CB-2018	Respondido el 08.02.2019– Carta CLS.170801.ED.618.19	8
RFI N° 36	patio de zona tierra y pasillo	04/02/2019 Carta PSV 363-DPA CB-2018	Respondido el 08/02/2019 – Carta CLS.170801.ED.620.19	4
RFI N° 37	propuesta muro de contención muelle	11/02/2019 Carta PSV 369-DPA CB-2018	Respondido el 07/03/2019 – Carta CLS.170801.ED.652.19	24
RFI N° 38	Instalaciones sanitarias/ planos - especificaciones técnicas	11/02/2019 Carta PSV 371-DPA CB-2018	Respondido el 07/03/2019 – Carta CLS.170801.ED.652.19	24

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

En el mes de abril la valorización de obra dio como avances acumulados lo siguiente:


 YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973



Montos Programados:

Porcentaje Avance (%):

Acumulado mayo 2019: S/. 14'130,625.32 (CD) 100%

Monto prog mayo 2019: S/ 4'791,417.30 (CD) 33.91%


Montos Ejecutados Real:

Porcentaje Avance (%)

Acumulado mayo 2019: S/. 8'742,302.48 (CD) 62.62%

Monto mayo 2019 : S/.0 (CD) 0.0%

El proyecto Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal, presento un porcentaje de avance real acumulado de 61.62 % respecto al presupuesto general, Este es un porcentaje desfavorable respecto al programado acumulado 100% .



YOTNER SILVA SPINOZA
INGENIERO CIVIL
REG. CO. N° 20973




PERU

Ministerio
de la Producción

SECRETARÍA
NACIONAL DE
DEFENSA INDUSTRIAL

 **PSV** 016

9. ANEXOS.



FELIX POTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
RUC: 010 N° 10973

ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA



YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 79973

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO 641 (10.05.19) CEECEL S-A
 ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACION DE PUZO PARCIAL N° 21
 SE COMUNICA AL CONTRATISTA QUE CON CARTA CSL 170801.ED.G99.19
 ESTA SUPERVISION HA DADO OPINION A LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE
 PUZO N° 21 POR 30 DIAS CALENDARIOS, SOLICITADO POR PSV,
 DONDE RECOMIENDA QUE DEBE RECORDARSE IMPROCEDENTE POR
 NO CUMPLIR CON LAS FORMULAS DESEÑADAS EN EL DATIVO
 170 DE PLCE.

ASIENTO 642 (10.05.19)
 ASUNTO: FORMULAS POLINOMICAS

SE LE INFORMA A LA SUPERVISION DE OBRA QUE NOS ENCONTRAMOS ELABORANDO
 LOS AJUSTES DE LOS ADICIONALES, POR LO QUE SOLICITAMOS LAS FORMULAS
 POLINOMICAS DEL ADICIONAL N° 1 Y ADICIONAL N° 2 O LA CONFIRMACION
 PARA EL USO DE LAS FORMULAS POLINOMICAS DEL PRESUPUESTO INICIAL EN EL
 CASO DE:

ADICIONAL N° 1: POLINOMICA DE OBRAS PORTUARIAS

ADICIONAL N° 2: POLINOMICA OBRAS EN TIERRA

POLINOMICA ARQUITECTURA

POLINOMICO INSTALACIONES SANITARIA

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



64

019

FECHA:

MODALIDAD:

OBRA:

PROYECTO:

PROGRAMA:

ENTIDAD EJECUTORA:

ASIENTO 643 (18.05.19) CESEL S.A.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO A LA CARTA N° 120-2019-FONDEPES/OGA
SE COMUNICÓ AL CONTRATISTA QUE CON CARTA CSL.170801.EO.691.19
LA SUPERVISIÓN HA INFORMADO A LA ENTIDAD SOBRE EL
INCUMPLIMIENTO DE LA CARTA N° 120-2019-FONDEPES/OGA
Y RECOMIENDA A FONDEPES APLICAR EL ARTÍCULO 136
DEL RLCE, DONDE SE INDICA: "SI VENIDO EL PLAZO EL
INCUMPLIMIENTO CONTINUA, LA PARTE PERJUDICADA PUEDE
RESOLVER EL CONTRATO (-...)"

YESIL YÖTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 79973

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CESEL INGENIEROS

CERTIFICADO EN: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Lima, 05 de junio del 2019

CSL.170801.ED.694.19

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Av. Petit Thouars N° 115 - Cercado de Lima

Lima.-

Atención : **Ing. Luis Alberto Barbieri Quino**
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

Asunto : **Informe Mensual del contratista – MAYO 2019**

Referencia : Contrato N° 14-2017- FONDEPES/OGA Supervisión de la Ejecución de la Obra:
**"Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero pesquero artesanal
Cabo Blanco, Distrito de El Alto",** Provincia de Talara, Región de Piura.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo y conforme a nuestras obligaciones contractuales relacionado al proyecto de la referencia, alcanzamos el Informe de Mensual del Contratista, correspondiente al mes de MAYO de 2019, en original y copia.

Agradeciendo la atención a la presente, nos despedimos.

Atentamente,



Ing. Yesil Silva Espinoza
Jefe de Supervisión
CESEL S.A.

YARROYO/yas

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	
	
2887028	
N° DOC	00005470-2018
CLAVE	1570
USUARIO	usuario_mlog68
FECHA Y HORA	06/06/2019 13:03:11
TELEFONO	2087700
www.fondepes.gob.pe	

Av. José Gálvez Barranca 646
San Isidro - Lima 27 - Perú
Telf: (51-1) 705-5000
Fax: (51-1) 705-5050
cesel@cesel.com.pe
www.cesel.com.pe

CESEL INGENIEROS

CERTIFICADO EN: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Lima, 05 de junio del 2019


CSL.170801.ED.693.19

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Av. Petit Thouars N° 115 - Cercado de Lima

Lima.-



Atención : **Ing. Luis Alberto Barbieri Quino**
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola

Asunto : **Valorización N°25 de obra – mes de MAYO 2019**

Referencia : Contrato N° 14-2017- FONDEPES/OGA Supervisión de la Ejecución de la Obra:
“Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero pesquero artesanal Cabo Blanco, Distrito de El Alto”, Provincia de Talara, Región de Piura.

De mi consideración:

Es grato dirigirnos a usted, para saludarlo y conforme a nuestras obligaciones contractuales relacionado al proyecto de la referencia, alcanzamos la **Valorización N°25 de obra** correspondiente al mes de MAYO de 2019, en original y dos copias.

Agradeciendo la atención a la presente, nos despedimos.

Atentamente,

Ing. Yesil Silva Espinoza
Jefe de Supervisión
CESEL S.A.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	
	
2887070	
N° DOC:	00005479-2018
CLAVE:	9703
USUARIO:	usuario_alog69
FECHA Y HORA:	06/06/2019 14:41:39
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	

YARROYO/yas

Av. José Gálvez Barrenechea 646
San Isidro - Lima 27 - Perú
Telf: (51-1) 705-5000
Fax: (51-1) 705-5050
cesel@cesel.com.pe
www.cesel.com.pe



Fecha: 05/06/19

MEMORÁNDUM INTERNO N° 2343-201 -FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM

Asunto :

Memorandum Interno 4201-2019 01 guipa

Referencia :

Registro :

Indicación	Destino
	Ig. Frank
	Flora
Observaciones:	

Atentamente

11/06/2019



Indicaciones:

- 01. Autorizado/Aprobado
- 02. Calificar/Evaluar
- 03. Informe
- 04. Proyectar resolución
- 05. Atención/Tramitación
- 06. Conocimiento y fines
- 07. Notificar al interesado
- 08. Reformular
- 09. Ayuda memoria
- 10. Coordinar
- 11. Opinión/Recomendación
- 12. Consolidar
- 13. Aclarar redacción
- 14. Implementar/Ejecutar
- 15. Preparar respuesta
- 16. Visación
- 17. Agregar a sus antecedentes
- 18. Archivo
- 19. Ampliar
- 20. Seguimiento



Fecha: 05/06/19

MEMORÁNDUM INTERNO N° 4221-201-FONDEPES/ DIGENIPAA

Asunto : CSL 170801-ED.693.19


Referencia : _____ Registro : 5479

Destino	Indicación	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	05 JUN 2019
SG		OGA	
OCI		OGAJ	09/12
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	AOE/
Observaciones: _____			



Indicaciones

- 01. Autorizado/Aprobado
- 02. Calificar/Evaluar
- 03. Informe
- 04. Proyectar
- 05. Atención/Tramitación
- 06. Conocimiento y fines
- 07. Notificar al interesado
- 08. Reformular
- 09. Ayuda memoria
- 10. Coordinar
- 11. Opinión/Recomendación
- 12. Consolar
- 13. Aclarar redacción
- 14. Implementar/Ejecutar
- 15. Preparar respuesta
- 16. Visación
- 17. Agregar a sus antecedentes
- 18. Archivo
- 19. Ampliar
- 20. Seguimiento

	HOJA DE TRANSMISION DE DOCUMENTOS	Número : 025
		Especialidad: Supervisión de Obra
Proyecto: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CABO BLANCO, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA"		
Grupo o Sector: Puertos		

Para:	Ing. Luis Alberto Barbieri Quino
De:	Ing. Yesil Silva Espinoza
Fecha:	31/05/2019

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Planos | <input type="checkbox"/> | Especificaciones Técnicas |
| <input type="checkbox"/> | Criterios de Diseño | <input type="checkbox"/> | Memoria de Cálculos |
| <input type="checkbox"/> | Listado de Cantidad de Materiales | <input type="checkbox"/> | Hojas de Metrados |
| <input type="checkbox"/> | Planillas | <input type="checkbox"/> | Memoria Descriptiva |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Valorizaciones | <input type="checkbox"/> | Resultados de Pruebas de Campo |
| <input type="checkbox"/> | Informes | <input type="checkbox"/> | Otros |


Un juego (1) de los siguientes documentos es transmitido para:

- Revisión
 Aprobación
 Construcción
 Como Construido
 Conocimiento

Item	Código de Documento	Revisión	Título de Documento
1	CSL.170801.ED-VA.25	0	Valorización N° 25 MES DE MAYO 2019
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



 YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973

	INFORME DE VALORIZACIÓN CSL-170801-ED-VL-25	Código del Proyecto: 170801
		Revisión: 0
		Páginas: 7
		Especialidad: Supervisión de Obra


Proyecto:

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO
 BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO"

Título: INFORME DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 25 – MAYO 2019

CONTROL DE REVISIONES

Rev.	Fecha	Elaborado		Revisado		Verificado		Descripción del Cambio
		Iniciales	Firma	Iniciales	Firma	Iniciales	Firma	
0	31/05/2019	YAS		YSE		YSE		Emitido para Presentación



 YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973

VALORIZACIÓN DE OBRA N° 25 – MAYO 2019

INDICE

1.	OBJETO	2
2.	DESCRIPCION DE LA OBRA	2
3.	DATOS GENERALES DE LA OBRA	3
4.	ANTECEDENTES	4
5.	AVANCE FINANCIERO MENSUAL DE LA OBRA.....	8
6.	CONCLUSIONES.....	20
7.	RECOMENDACIONES	22





YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 79973

1. OBJETO

El presente informe tiene por objeto presentar la Valorización de Avance de Obra N° 25 correspondiente al mes de MAYO de 2019, ejecutados por PSV constructores.

Se aclara que la presente obra DPA CABO BLANCO continua suspendida de sus trabajos desde el 25.03.19 hasta la fecha.

2. DESCRIPCION DE LA OBRA

El proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN DE PIURA, diseñado para desembarcar y procesar en condiciones adecuadas los productos hidrobiológicos de la pesca artesanal, de adecuado a la normatividad.

COMPONENTE DE ARQUITECTURA Y COMPONENTE DE ESTRUCTURAS EN TIERRA.

ZONA 01: EMBARQUE Y DESEMBARQUE

De dominio de los pescadores, ubicada tangencialmente a la zona de Tareas Previas, involucra desde el ingreso al D.P.A., vía de circulación, 1 muelles marginal de 59.00ml y muelle espigón de 20.00ml de longitud, transporte de la producción hidrobiológica en el patio de maniobra considerando solo el embarque en camiones frigoríficos y estacionamiento temporal de los carros frigoríficos.

ZONA 02: TAREAS PREVIAS Y DESPACHO

De dominio exclusivo de los Procesadores Primarios, operarios de hielo y peones de lavado de cajas, con control sanitaria, higiénico y administrativo, ubicado en la parte central de la plataforma del D.P.A., colindante a la zona de embarque y desembarque.

El acceso a esta zona es restringido por medidas sanitarias normadas en el D.S.040-2001-PE y complementadas por el Reglamento Nacional de Edificaciones según la NORMA A.010 y la NORMA A.060.

ZONA 03: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

La zona de servicios complementarios según las actividades específicas, van desde un dominio común, dominio restringido y dominio exclusivo, consecuentemente el acceso a estos dependerá del grado de dominio específico.

Su ubicación dependerá de la complementariedad de las zonas 01 y 02, por lo que se distribuye en diferentes zonas del D.P.A.

OBRAS PORTUARIAS

Desarrollar un estudio técnico en el actual desembarcadero, en su posición actual, desplazando el cabezo hacia el norte y profundizado el muelle hacia el mar, hasta alejarse de la rompiente, para un horizonte de los siguientes 20 años.

Un área en tierra para el manipuleo, almacenamiento y comercialización de los productos hidrobiológicos.

Un área en el mar para el desembarco, recepción de los productos de pesca en el mar y la atención de los servicios para las embarcaciones pesqueras



YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 79973

3. DATOS GENERALES DE LA OBRA

✓ Cliente	: FONDEPES
✓ Contratista	: PSV CONSTRUCTORES SA
✓ Representante legal	: Mario Peña Fuentes
✓ Contrato de obra N°	: 010-2017-FONDEPES/OGA
✓ Fecha de contrato ejecutor	: S/ 27.02.2017
✓ Monto Contractual ejecutor	: S/ 17'624,136.92 (Inc. IGV).
✓ Supervisión	: CESEL S.A.
✓ Contrato de Supervisión	: 014-2017-FONDEPES/OGA
✓ Fecha de contrato supervisor	: 29.03.2017
✓ Monto contractual supervisor	: S/ 761,535.06
✓ Modalidad de Contrato	: Precios unitarios
✓ Tipo	: Adjudicación Simplificada N°001-2017.
✓ Plazo de Ejecución	: 300 días calendario
✓ Monto de adelanto directo (Inc.IGV)	: 1'762,413.69
✓ Monto de adelanto de Materiales (inc.IGV)	: 1'762,413.69
✓ Fecha de entrega de terrero	: 25.04.2017
✓ Inicio de plazo contractual	: 26.04.2017
✓ Fin de plazo contractual	: 18.02.2018
✓ Ampliación de plazo N°01 2017-FONDEPES/SG)	: 34 días calendarios (Aprob. RSG N°129-
✓ Ampliación de plazo N°02 N°050-2017-FONDEPES/SG)	: 41 días calendarios (Denegada. RSG
✓ Ampliación de plazo N°03 N°051-2018-FONDEPES/SG)	: 74 días calendarios (Denegada. RSG
✓ Ampliación de plazo N°04 2018-FONDEPES/SG)	: 19 días calendarios (Aprob. RSG N°064-
✓ Ampliación de plazo N°05 2018-FONDEPES/SG)	: 05 días calendarios (Aprob. RSG N°073-
✓ Ampliación de plazo N°06 2018-FONDEPES/SG)	: 56 días calendarios (Aprob. RSG N°085-
✓ Ampliación de plazo N°07 2018-FONDEPES/SG)	: 41 días calendarios (Aprob. RSG N°121-
✓ Ampliación de plazo N°08 N°-2018-FONDEPES/SG)	: 35 días calendarios (DENEGADA. RSG
✓ Ampliación de plazo N°09 2018-FONDEPES/SG)	: 74 días calendarios (Aprob. RSG N°133-
✓ Ampliación de plazo N°10 2018-FONDEPES/SG)	: 09 días calendarios (Aprob. RSG N°144-
✓ Ampliación de plazo N°11 2018-FONDEPES/SG)	: 45 días calendarios (Aprob. RSG N°153-
✓ Ampliación de plazo N°12 2018-FONDEPES/SG)	: 41 días calendarios (Aprob. RSG N°166-
✓ Ampliación de plazo N°13 2018-FONDEPES/SG)	: 30 días calendarios (Aprob. RSG N°182-
✓ Ampliación de plazo N°14 2018-FONDEPES/SG)	: 34 días calendarios (Aprob. RSG N°213-
✓ Ampliación de plazo N°15 N°002-2019-FONDEPES/SG)	: 41 días calendarios (DENEGADA RSG



✓ Ampliación de plazo N°16 2019-FONDEPES/SG)	: 35 días calendarios (Aprob. RSG N°014-
✓ Ampliación de plazo N°17 2019-FONDEPES/GG)	: 05 días calendarios (Aprob. RSG N°031-
✓ Ampliación de plazo N°18 2019-FONDEPES/GG)	: 30 días calendarios (Aprob. RSG N°041-
✓ Ampliación de plazo N°19 2019-FONDEPES/GG)	: 11 días calendarios (Aprob. RSG N°050-
✓ Ampliación de plazo N°20 2019-FONDEPES/GG)	: 30 días calendarios (Aprob. RSG N°073-
✓ Ampliación de plazo N°21 N°091-2019-FONDEPES/GG)	: 30 días calendarios (Denegada. RSG
✓ Forma de Pago obra	: Valorizaciones mensuales por avance de
✓ Adelanto en efectivo	: 10% del Monto del Contrato.
✓ Adelanto por materiales	: 20% del Monto del Contrato.
✓ Entrega de Terreno	: 25 de abril del 2017.
✓ Inicio de Obra	: 26 de abril del 2017
✓ Fecha de inicio de obra	: 26 de abril del 2017.
✓ Fecha de fin de obra	: 18 de Abril del 2019
✓ Coordinador de obra	: Ing. Frank Flores Rubina
✓ Residente de obra	: Ing. Luis Portalino Segundo
✓ Jefe de supervisión	: Ing. Yesil Silva Espinoza

4. ANTECEDENTES

- Con fecha 30 de marzo del 2017, se firma el contrato de Ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DEL ALTO TALARA", entre Ministerio de Pesquería, hoy Ministerio de Producción y el CONTRATISTA PSV por el monto total ascendente a la suma de S/. 17'624,136.92, incluido el IGV.
- Con fecha 29/03/2017, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°001-2017-FONDEPES DERIVADA DE LA CP N°002-2016-FONDEPES- SEGUNDA CONVOCATORIA, para la Contratación del Servicio de Consultoría de SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO TALARA", código SNIP 95832, a CESEL S.A.
- El 18 de Abril del 2017 se hizo entrega al Contratista, el adelanto directo N° 01 correspondiente al 10% del monto del contrato, cuya suma asciende a S/. 1'762,413.69 (un millón setecientos sesenta y dos mil cuatrocientos trece con 69/100) incluido el IGV.
- El 27 de Octubre del 2017, con Resolución Jefatural N°076-2017-FONDEPES/J se aprobó el Expediente Técnico de Prestación **Adicional N°01 por el monto de S/.2'258,055.45 Inc. IGV** y el Deducitivo Vinculante N°01 por S/.2'457,647.95 Inc. IGV, disminuyendo el presupuesto contractual en S/. 199,592.50 Inc. IGV, lo que representa el -1.13% del presupuesto contratado. Por lo que, el **presupuesto contractual queda en S/.15'166,488.97 nuevos soles Inc. IGV**.
- El 04 de Diciembre del 2017, con Resolución de Secretaría General N° 129-2017-FONDEPES/SG se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 solicitada por P.S.V.



Constructores por 34 días calendario, estableciéndose como fecha final del plazo de ejecución de obra el 24 de marzo de 2018.

- f) Con fecha 06 de abril de 2018, FONDEPES comunica la aprobación parcial de la Ampliación de Plazo N° 04 (parcial) solicitada por P.S.V. Constructores S.A. por 19 días calendario, mediante Carta N°100-2018-FONDEPES/SG y la Resolución de Secretaria General N° 064-2018-FONDEPES/SG, estableciéndose en consecuencia como fecha final del plazo de ejecución de obra el 12 de abril de 2018.
- g) Con fecha 17 de abril de 2018, FONDEPES comunica la aprobación del Expediente Técnico de Prestación **Adicional N° 02**, mediante Resolución Jefatural N° 040-2018-FONDEPES/J. El monto del adicional 2 es S/. 317,623.35 (Inc. IGV) y el deductivo 2 es S/. 234,654.61 (Inc. IGV), cuya incidencia es del 0.47%. Por lo que, el **presupuesto contractual queda en S/.14'931,834.35 nuevos soles Inc. IGV.**
- h) Con fecha 03 de mayo de 2018, FONDEPES comunica la aprobación en parte de la Ampliación de Plazo N° 05 (parcial) solicitada por P.S.V. Constructores S.A. por 05 días calendario, mediante Carta N°124-2018-FONDEPES/SG y la Resolución de Secretaria General N° 073-2018-FONDEPES/SG, estableciéndose en consecuencia como fecha final del plazo de ejecución de obra el 17 de abril de 2018.
- i) Con fecha 23 de mayo de 2018, FONDEPES comunica la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 06 solicitada por P.S.V. Constructores S.A. por 56 días calendario, mediante Carta N°162-2018-FONDEPES/SG y la Resolución de Secretaria General N° 085-2018-FONDEPES/SG, estableciéndose en consecuencia como fecha final del plazo de ejecución de obra el 12 de junio de 2018.
- j) Con fecha del 03.07.18 mediante Carta N° 229 FONDEPES - RESOLUCIÓN 121 – 2018-FONDEPES/SG, FONDEPES aprueba la ampliación de plazo N°7, con 41 días calendario.
- k) Con fecha del 01.07.18 mediante Carta N° 256-2018-FONDEPES-SG- Aprueba Exp. Tec. Prestación Adicional de Obra N°03, con Resolución Jefatural N°084-2018-FONDEPES/J.
- l) Con fecha del 22.08.18 mediante Carta N°287-2018- FONDEPES-SG Aprobar Exp. Téc. Prestación Adicional de obra N°04, con Resolución Jefatural N°097-2018-FONDEPES/J.
- m) Con fecha del 23.08.18 mediante Carta N° 2901-2018-FONDEPES-SG, FONDEPES aprueba la ampliación de plazo N°11 con 45 días calendarios.
- n) AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 13, Resolución de Secretaria General N°182-2018-FONDEPES/SG Carta N°370 - 2018- FONDEPES/SG, aprobaron 30 días para CESEL "CABEZO Y PLATAFORMA BAJA"
- o) AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 14, Resolución de Secretaria General N°213-2018-FONDEPES/SG, Carta N°433 - 2018- FONDEPES/SG aprobaron 34 días para CESEL "MEDIA TENSIÓN"
- p) AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 16, Resolución de Secretaria General N°014-2019-



FONDEPES/GG, Carta N°034- 2019- FONDEPES/SG aprobaron 35 días para
 CESEL "SISTEMA DE DEFENSA DE LA PLATAFORMA BAJA Y EL CABEZO"

Se presenta un cuadro del estado de los adicionales, deductivos y ampliaciones de plazo.


AMPLIACIONES	RESOLUCION	CARTA DE LA ENTIDAD	DÍAS OTORGADOS	ASUNTO	FECHA FINAL
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01	Resolución de Secretaria General N°129-2017- FONDEPES/SG	Carta N°197 - 2017- FONDEPES/SG	aprobaron 34 días	"CAMBIO DE TRAZO Y OPTIMIZACIÓN DE PILOTES"	04.12.2017
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02	Resolución de Secretaria General N°050-2018- FONDEPES/SG		DENEGADA		26.03.2018
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03	Resolución de Secretaria General N°051-2018- FONDEPES/SG		DENEGADA		27.03.2018
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04	Resolución de Secretaria General N°064-2018- FONDEPES/SG	Carta N°100 - 2018- FONDEPES/SG	aprobaron 19 días	"CAMBIO DE DETALLE DE CIMENTACIÓN DE TANQUE ELEVADO"	06.04.2018
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05	Resolución de Secretaria General N°073-2018- FONDEPES/SG	Carta N°124 - 2018- FONDEPES/SG	aprobaron 05 días	"CAMBIO DE DETALLE DE CIMENTACIÓN DE TANQUE ELEVADO "	03.05.2018
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06	Resolución de Secretaria General N°085-2018- FONDEPES/SG	Carta N°162 - 2018- FONDEPES/SG	aprobaron 56 días	"CAMBIO EN ZONA DE TALLERES Y PLANTA DE TRATAMIENTO"	23.05.2018
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 07	Resolución de Secretaria General N°121-2018- FONDEPES/SG	Carta N°229 - 2018- FONDEPES/SG	aprobaron 41 días	"CAMBIO DE DETALLE DE CIMENTACIÓN DE TANQUE ELEVADO "	02.07.2018
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 08	Resolución de Secretaria General N°123-2018- FONDEPES/SG		DENEGADA		03.07.2018
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 09	Resolución de Secretaria General N°133-2018- FONDEPES/SG		DENEGADA		18.07.2018
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 10	Resolución de Secretaria General N°144-2018- FONDEPES/SG		DENEGADA		07.08.2018
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 11	Resolución de Secretaria General N°153-2018- FONDEPES/SG	Carta N°290 - 2018- FONDEPES/SG	aprobaron 45 días	"TANQUE ELEVADO"	23.08.2018

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
DISTRITO DEL ALTO TALARA"

009

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 12	Resolución de Secretaria General N°166-2018-FONDEPES/SG	Carta N°328 - 2018-FONDEPES/SG	aprobaron 41 días	"BAJA TENSION"	21.09.2018
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 13	Resolución de Secretaria General N°182-2018-FONDEPES/SG	Carta N°370 - 2018-FONDEPES/SG	aprobaron 30 días	"CABEZO Y PLATAFORMA BAJA"	24.10.2018
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 14	Resolución de Secretaria General N°213-2018-FONDEPES/SG	Carta N°433 - 2018-FONDEPES/SG	aprobaron 34 días	"MEDIA TENSIÓN"	29.11.2018
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 15	Resolución de Secretaria General N°002-2019-FONDEPES/SG		DENEGADA		07.01.2019
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 16	Resolución de Secretaria General N°014-2016-FONDEPES/GG	Carta N°034 - 2019-FONDEPES/SG	aprobaron 35 días	"SISTEMA DE DEFENSA"	22.01.19
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 17	Resolución de Secretaria General N°031-2016-FONDEPES/GG	Carta N°075 - 2019-FONDEPES/GG	aprobaron 05 días	"DEMORA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ADECUACIÓN"	14.02.19
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 18	Resolución de Secretaria General N°041-2019-FONDEPES/GG	Carta N°098 - 2019-FONDEPES/GG	aprobaron 30 días	"EJECUCIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO ADECUACIÓN"	08.02.19
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 19	Resolución de Secretaria General N°050-2019-FONDEPES/GG	Carta N°132 - 2019-FONDEPES/GG	aprobaron 11 días	"DEMORA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ESTRUCTURA METALICA DE OBRA DE TIERRA"	19.03.19
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 20	Resolución de Secretaria General N°073-2019-FONDEPES/GG	Carta N°163 - 2019-FONDEPES/GG	aprobaron 30 días	"EJECUCIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO ESTRUCTURA METALICA DE OBRA DE TIERRA"	18.04.19
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 21	Resolución de Secretaria General N°091-2019-FONDEPES/GG	Carta N°212 - 2019-FONDEPES/GG	DENEGADA		24.05.19




 YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Req. CIP N° 79973

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
DISTRITO DEL ALTO TALARA"

010

5. AVANCE FINANCIERO MENSUAL DE LA OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO				VALORIZACIÓN 1		VALORIZACIÓN 2		VALORIZACIÓN 3		
		CANT	P.U.	PARCIAL	SUB TOTAL	VAL MAY 2017		VAL JUN 2017		VAL JUL 2017		
						CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
01	ESTRUCTURAS DE MAR	1.00	3,147,998.11	3147998.11	3147998.11		118,608.79		339,631.32		503,928.42	
02	ESTRUCTURAS EN TIERRA	1.00	3,644,015.32	3644015.32	3644015.32		179,834.81		755,495.24		0.00	
03	ARQUITECTURA	1.00	1,200,063.96	1200063.96	1200063.96		0.00		0.00		0.00	
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	44,954.91	44954.91	44954.91		0.00		0.00		0.00	
05	INSTALACIONES SANITARIAS	1.00	550,193.40	550193.4	550193.4		0.00		0.00		0.00	
06	EQUIPAMIENTO	1.00	915,312.15	915312.15	915312.15		0.00		0.00		0.00	
07	IMPACTO AMBIENTAL	1.00	125,157.80	125157.8	125157.8		18,003.78		41,168.78		18,590.78	
TOTAL COSTO DIRECTO					9,627,695.65		316,447.38		1,136,295.34		522,519.20	
GASTOS GENERALES					10%	962,769.57	10%	31,644.74	10%	113,629.53	10%	52,251.92
UTILIDAD					10%	962,769.57	10%	31,644.74	10%	113,629.53	10%	52,251.92
SUB.TOTAL					11,553,234.79		379,736.86		1,363,554.40		627,023.04	
IGV.					18%	2,079,582.26	18%	68,352.63	18%	245,439.79	18%	112,864.15
TOTAL ESTADO DE PAGO					13,632,817.05		448,089.49		1,608,994.19		739,887.19	

ACUMULADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO				VALORIZACIÓN 4		VALORIZACIÓN 5		VALORIZACIÓN 6		
		CANT	P.U.	PARCIAL	SUB TOTAL	VAL AGO 2017		VAL SET 2017		VAL OCT 2017		
						CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
01	ESTRUCTURAS DE MAR	1.00	3,147,998.11	3147998.11	3147998.11		380,021.76		129,828.68		130,903.84	
02	ESTRUCTURAS EN TIERRA	1.00	3,644,015.32	3644015.32	3644015.32		40,052.39		265,073.83		218,748.81	
03	ARQUITECTURA	1.00	1,200,063.96	1200063.96	1200063.96		0.00		0.00		18,453.84	
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	44,954.91	44954.91	44954.91		0.00		0.00		0.00	
05	INSTALACIONES SANITARIAS	1.00	550,193.40	550193.4	550193.4		0.00		0.00		0.00	
06	EQUIPAMIENTO	1.00	915,312.15	915312.15	915312.15		0.00		0.00		0.00	
07	IMPACTO AMBIENTAL	1.00	125,157.80	125157.8	125157.8		4,990.78		6,270.78		6,740.78	
TOTAL COSTO DIRECTO					9,627,695.65		425,064.93		401,173.29		374,847.27	
GASTOS GENERALES					10%	962,769.57	10%	42,506.49	10%	40,117.33	10%	37,484.73
UTILIDAD					10%	962,769.57	10%	42,506.49	10%	40,117.33	10%	37,484.73
SUB.TOTAL					11,553,234.79		510,077.91		481,079.95		449,816.73	
IGV.					18%	2,079,582.26	18%	91,814.02	18%	86,653.43	18%	80,967.01
TOTAL ESTADO DE PAGO					13,632,817.05		601,891.93		568,061.38		530,783.74	

ACUMULADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO				VALORIZACIÓN 7		VALORIZACIÓN 8		VALORIZACIÓN 9		
		CANT	P.U.	PARCIAL	SUB TOTAL	VAL NOV 2017		VAL DIC 2017		VAL ENE 2018		
						CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
01	ESTRUCTURAS DE MAR	1.00	3,147,998.11	3147998.11	3147998.11		27,778.59		539,935.02		8,781.94	
02	ESTRUCTURAS EN TIERRA	1.00	3,644,015.32	3644015.32	3644015.32		100,564.81		342,316.16		0.00	
03	ARQUITECTURA	1.00	1,200,063.96	1200063.96	1200063.96		1,271.27		95,480.09		0.00	
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	44,954.91	44954.91	44954.91		0.00		16,702.25		0.00	
05	INSTALACIONES SANITARIAS	1.00	550,193.40	550193.4	550193.4		0.00		32,104.30		0.00	
06	EQUIPAMIENTO	1.00	915,312.15	915312.15	915312.15		0.00		0.00		0.00	
07	IMPACTO AMBIENTAL	1.00	125,157.80	125157.8	125157.8		2,056.78		7,624.78		4,240.78	
TOTAL COSTO DIRECTO					9,627,695.65		131,671.45		1,034,162.60		13,022.72	
GASTOS GENERALES					10%	962,769.57	10%	13,167.15	10%	103,416.26	10%	1,302.27
UTILIDAD					10%	962,769.57	10%	13,167.15	10%	103,416.26	10%	1,302.27
SUB.TOTAL					11,553,234.79		158,005.75		1,240,995.12		15,627.26	
IGV.					18%	2,079,582.26	18%	28,441.04	18%	223,379.12	18%	2,812.91
TOTAL ESTADO DE PAGO					13,632,817.05		186,446.79		1,464,374.24		18,440.17	

ACUMULADO



011

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
DISTRITO DEL ALTO TALARA"

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO				VAL FEB 2018		VAL MAR 2018		VAL ABRIL 2018		
		CANT	P.U. S/.	PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.	CANT	SUB TOTAL S/.	CANT	SUB TOTAL S/.	CANT	SUB TOTAL S/.	
01	ESTRUCTURAS DE MAR	1.00	3,147,998.11	3147998.11	3147998.11		14,059.10		-13,516.16		-7,841.60	
02	ESTRUCTURAS EN TIERRA	1.00	3,644,015.32	3644015.32	3644015.32		-15,730.75		19,507.68		7,841.34	
03	ARQUITECTURA	1.00	1,200,063.96	1200063.96	1200063.96		12,625.60		0.00		29,045.43	
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	44,954.91	44954.91	44954.91		0.00		0.00		0.00	
05	INSTALACIONES SANITARIAS	1.00	550,193.40	550193.4	550193.4		0.00		0.00		0.00	
06	EQUIPAMIENTO	1.00	915,312.15	915312.15	915312.15		0.00		0.00		0.00	
07	IMPACTO AMBIENTAL	1.00	125,157.80	125157.8	125157.8		9,446.78		3,584.00		0.00	
TOTAL COSTO DIRECTO					9,627,695.65		20,400.73		9,575.52		29,045.17	
GASTOS GENERALES					10%	962,769.57	10%	2,040.07	10%	957.55	10%	2,904.52
UTILIDAD					10%	962,769.57	10%	2,040.07	10%	957.55	10%	2,904.52
SUB.TOTAL					11,553,234.79		24,480.87		11,490.62		34,854.21	
IGV.					18%	2,079,582.26	18%	4,406.56	18%	2,068.31	18%	6,273.76
TOTAL ESTADO DE PAGO					13,632,817.05		28,887.43		13,558.93		41,127.97	

ACUMULADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO				VAL MAY 2018		VAL JUN 2018		VAL JUL 2018		
		CANT	P.U. S/.	PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.	CANT	SUB TOTAL S/.	CANT	SUB TOTAL S/.	CANT	SUB TOTAL S/.	
01	ESTRUCTURAS DE MAR	1.00	3,147,998.11	3147998.11	3147998.11		0.00		0.00		0.00	
02	ESTRUCTURAS EN TIERRA	1.00	3,644,015.32	3644015.32	3644015.32		2,693.63		333,189.32		292.11	
03	ARQUITECTURA	1.00	1,200,063.96	1200063.96	1200063.96		2,759.32		7,939.50		5,803.59	
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	44,954.91	44954.91	44954.91		0.00		0.00		0.00	
05	INSTALACIONES SANITARIAS	1.00	550,193.40	550193.4	550193.4		0.00		0.00		39,649.40	
06	EQUIPAMIENTO	1.00	915,312.15	915312.15	915312.15		0.00		201,571.41		0.00	
07	IMPACTO AMBIENTAL	1.00	125,157.80	125157.8	125157.8		0.00		0.00		0.00	
TOTAL COSTO DIRECTO					9,627,695.65		5,452.95		542,700.23		45,745.10	
GASTOS GENERALES					10%	962,769.57	10%	545.30	10%	54,270.02	10%	4,574.51
UTILIDAD					10%	962,769.57	10%	545.30	10%	54,270.02	10%	4,574.51
SUB.TOTAL					11,553,234.79		6,543.55		651,240.27		54,894.12	
IGV.					18%	2,079,582.26	18%	1,177.84	18%	117,223.25	18%	9,880.94
TOTAL ESTADO DE PAGO					13,632,817.05		7,721.39		768,463.52		64,775.06	

ACUMULADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO				VAL AGO 2018		VAL SET 2018		VAL OCT 2018		
		CANT	P.U. S/.	PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.	CANT	SUB TOTAL S/.	CANT	SUB TOTAL S/.	CANT	SUB TOTAL S/.	
01	ESTRUCTURAS DE MAR	1.00	3,147,998.11	3147998.11	3147998.11		44,787.39		0.00		18,291.48	
02	ESTRUCTURAS EN TIERRA	1.00	3,644,015.32	3644015.32	3644015.32		57,661.15		38,415.49		4,332.61	
03	ARQUITECTURA	1.00	1,200,063.96	1200063.96	1200063.96		34,259.17		21,449.58		0.00	
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	44,954.91	44954.91	44954.91		0.00		0.00		0.00	
05	INSTALACIONES SANITARIAS	1.00	550,193.40	550193.4	550193.4		88,749.34		55,879.74		9,577.58	
06	EQUIPAMIENTO	1.00	915,312.15	915312.15	915312.15		302,357.11		0.00		0.00	
07	IMPACTO AMBIENTAL	1.00	125,157.80	125157.8	125157.8		0.00		0.00		0.00	
TOTAL COSTO DIRECTO					9,627,695.65		527,814.16		115,744.81		32,201.67	
GASTOS GENERALES					10%	962,769.57	10%	52,781.42	10%	11,574.48	10%	3,220.17
UTILIDAD					10%	962,769.57	10%	52,781.42	10%	11,574.48	10%	3,220.17
SUB.TOTAL					11,553,234.79		633,377.00		138,893.77		38,642.01	
IGV.					18%	2,079,582.26	18%	114,007.86	18%	25,000.88	18%	6,955.56
TOTAL ESTADO DE PAGO					13,632,817.05		747,384.86		163,894.65		45,597.57	

ACUMULADO



SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
DISTRITO DEL ALTO TALARA"

012


ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO				VALORIZACIÓN 19		VALORIZACIÓN 20		VALORIZACIÓN 21		
		CANT	P.U. S/.	PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.	VAL NOV 2018		VAL DIC 2018		VAL ENE 2019		
						CANT	SUB TOTAL S/.	CANT	SUB TOTAL S/.	CANT	SUB TOTAL S/.	
01	ESTRUCTURAS DE MAR	1.00	3,147,998.11	3147998.11	3147998.11				0.00		86,313.74	
02	ESTRUCTURAS EN TIERRA	1.00	3,644,015.32	3644015.32	3644015.32			31,319.33	139,212.71		24,089.99	
03	ARQUITECTURA	1.00	1,200,063.96	1200063.96	1200063.96			0.00	0.00		0.00	
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	44,954.91	44954.91	44954.91			0.00	0.00		-13,545.68	
05	INSTALACIONES SANITARIAS	1.00	550,193.40	550193.4	550193.4			0.00	0.00		6,447.60	
06	EQUIPAMIENTO	1.00	915,312.15	915312.15	915312.15			0.00	0.00		0.00	
07	IMPACTO AMBIENTAL	1.00	125,157.80	125157.8	125157.8			0.00	0.00		0.00	
TOTAL COSTO DIRECTO					9,627,695.65			51,305.27	139,212.71		103,305.65	
GASTOS GENERALES					10%	962,769.57	10%	5,130.53	10%	13,921.27	10%	10,330.57
UTILIDAD					10%	962,769.57	10%	5,130.53	10%	13,921.27	10%	10,330.57
SUB.TOTAL						11,553,234.79		61,566.33	167,055.25		123,966.79	
IGV.					18%	2,079,582.26	18%	11,081.94	18%	30,069.95	18%	22,314.02
TOTAL ESTADO DE PAGO						13,632,817.05		72,648.27	197,125.20		146,280.81	
ACUMULADO												

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO				VALORIZACIÓN 22		VALORIZACIÓN 23		VALORIZACIÓN 24		
		CANT	P.U. S/.	PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.	VAL FEBR 2019		VAL MAR 2019		VAL ABRIL 2019		
						CANT	SUB TOTAL S/.	CANT	SUB TOTAL S/.	CANT	SUB TOTAL S/.	
01	ESTRUCTURAS DE MAR	1.00	3,147,998.11	3147998.11	3147998.11						0.00	
02	ESTRUCTURAS EN TIERRA	1.00	3,644,015.32	3644015.32	3644015.32						0.00	
03	ARQUITECTURA	1.00	1,200,063.96	1200063.96	1200063.96			17,402.57	2,703.64		0.00	
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	44,954.91	44954.91	44954.91			61.80	0.00		0.00	
05	INSTALACIONES SANITARIAS	1.00	550,193.40	550193.4	550193.4			4,948.63	0.00		0.00	
06	EQUIPAMIENTO	1.00	915,312.15	915312.15	915312.15			0.00	0.00		0.00	
07	IMPACTO AMBIENTAL	1.00	125,157.80	125157.8	125157.8			0.00	0.00		0.00	
TOTAL COSTO DIRECTO					9,627,695.65			28,717.18	28,285.20		0.00	
GASTOS GENERALES					10%	962,769.57	10%	2,871.72	10%	2,828.52	10%	0.00
UTILIDAD					10%	962,769.57	10%	2,871.72	10%	2,828.52	10%	0.00
SUB.TOTAL						11,553,234.79		34,460.62	33,942.24		0.00	
IGV.					18%	2,079,582.26	18%	6,202.91	18%	6,109.60	18%	0.00
TOTAL ESTADO DE PAGO						13,632,817.05		40,663.53	40,051.84		0.00	
ACUMULADO												



[Signature]
YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973

VALORIZACIONES DE OBRA

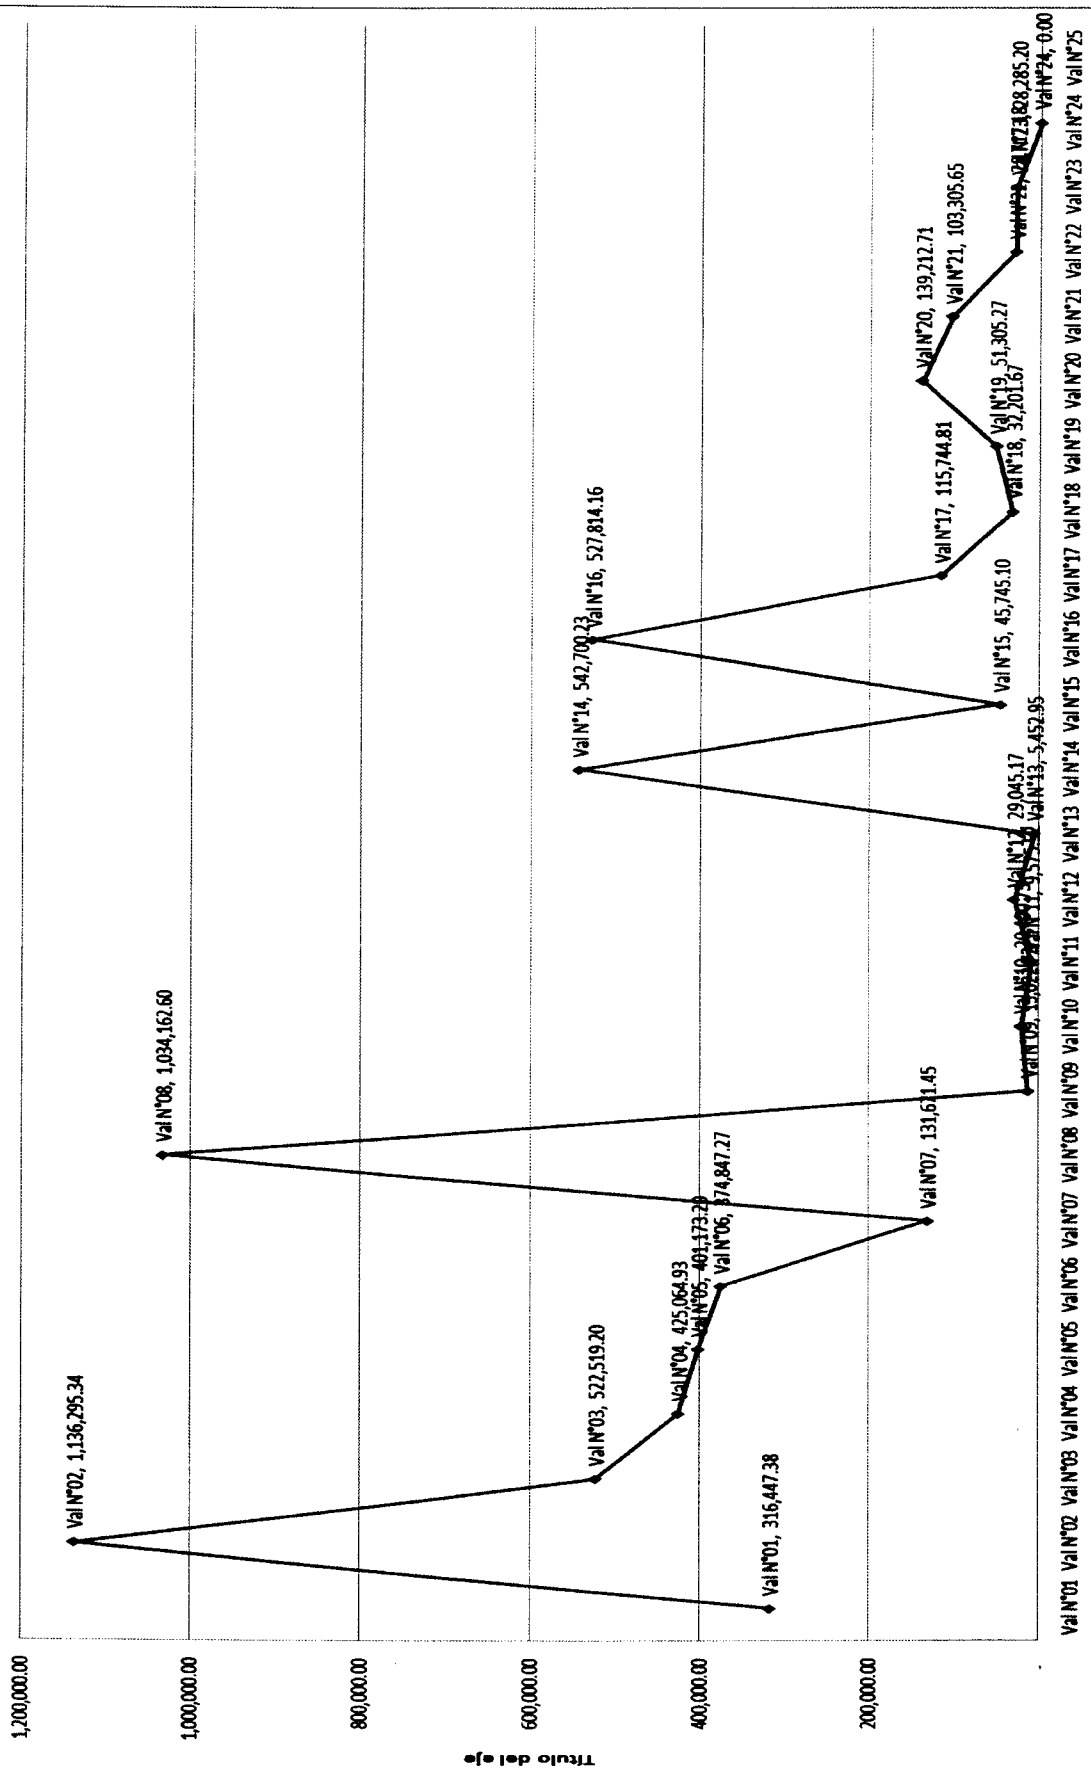

**SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
DISTRITO DEL ALTO TALARA"**

014

MONTOS PROGRAMADOS DEL CRONOGRAMA ACTUALIZADO A LA AMPLIACION DE PLAZO 19 Y 20- MAYO 2019

Esta supervisión debe acotar que los porcentajes de avance proyectado se han tomado en cuenta del cronograma de ampliación de plazo 19.
La entidad aprobó el conograma y calendarios con la ampliación de plazo 19 con carta 448-2019-FONDEPES/DIGENIPAA
La entidad se encuentra en proceso de aprobación el cronograma incluyendo la ampliación de plazo 20
Y para los % de incidencia la Aprob. Del AD 09 D.V. 08
Se debe acotar que aún se encuentra a la espera de la corrección de AD 05 DV 05

		PORCENTAJES
Programado Acumulado hasta ABRIL 2019	20,008,965.45 (Inc. IGV.)	100%
Programado en ABRIL 2019	6,784,646.89 (Inc. IGV.)	33.91%

1._ MONTOS REALES EJECUTADOS DEL MES DE MAYO DEL 2019- Valorización contractual 25 sin afectación por AMORTIZACIONES

	CONTRACTUAL	PORCENTAJES
Acumulado hasta MAYO 2019	8,398,906.38 (Inc. IGV.)	60.64%
Ejecutado en MAYO 2019	0.00 (Inc. IGV.)	0.00%

2._ MONTOS REALES EJECUTADOS ANTERIORES AL MES DE MAYO DEL 2019- Valorización 10 del adicional 01 sin afectación por AMORTIZACIONES

	ADICIONAL 1	PORCENTAJES

3._ MONTOS REALES EJECUTADOS ANTERIORES AL MES DE MAYO DEL 2019- Valorización 04 del adicional 02 sin afectación por AMORTIZACIONES

	ADICIONAL 2	PORCENTAJES

4._ MONTOS REALES EJECUTADOS ANTERIORES AL MES DE MAYO DEL 2019- Valorización 01 del adicional 03 sin afectación por AMORTIZACIONES

	ADICIONAL 3	PORCENTAJES

5._ MONTOS REALES EJECUTADOS AL MES DE MAYO DEL 2019- Valorización 02 del Adicional 04 sin afectación por AMORTIZACIONES

	ADICIONAL 4	PORCENTAJES

6._ MONTOS REALES EJECUTADOS ANTERIORES AL MES DE MAYO DEL 2019- Valorización 07 del adicional 05 sin afectación por AMORTIZACIONES

	ADICIONAL 5	PORCENTAJES
Acumulado antes del mes de MAYO del 2019	1,076,348.05 (Inc. IGV.)	33.70%
Ejecutado en MAYO del 2019	0.00 (Inc. IGV.)	0.31%

7._ MONTOS REALES EJECUTADOS DEL MES DE MAYO DEL 2019- Adicional 06 sin afectación por AMORTIZACIONES

	ADICIONAL 6	PORCENTAJES

8._ MONTOS REALES EJECUTADOS ANTERIORES AL MES DE MAYO DEL 2019- Valorización 2 del Adicional 07 sin afectación por AMORTIZACIONES

	ADICIONAL 7	PORCENTAJES
Acumulado antes del mes de MAYO del 2019	577,073.22 (Inc. IGV.)	40.45%
Ejecutado antes del mes de MAYO del 2019	0.00 (Inc. IGV.)	26.29%

9._ MONTOS REALES EJECUTADOS AL MES DE ABRIL DEL 2019- Adicional 07 sin afectación por AMORTIZACIONES

	ADICIONAL 8	PORCENTAJES

10._ MONTOS REALES EJECUTADOS POR CONTRACTUALES MAYO (VAL25) sin afectación por AMORTIZACIONES

		PORCENTAJES
Ejecutados en MAYO del 2019	0.0 (Inc. IGV.)	0.00%

11._ MONTOS ACUMULADOS REALES EJECUTADOS POR CONTRACTUAL MAYO (VAL 25) + VAL 10 AD 01+ VAL 05 AD 02+ VAL 01 AD 03+VAL 02 AD 04+ VAL 07 AD 05 + VAL 02 AD 07 + VAL 01 AD 8+ MM1 sin afectación por AMORTIZACIONES y tomando en cuenta la aprobación del AD 9

		PORCENTAJES
Ejecutados ACUMULADOS en MAYO 2019	12,338,911.71 (Inc. IGV.)	61.67%




SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
DISTRITO DEL ALTO TALARA"

015

Se han corregido error material del mes de febrero en los porcentajes acumulados

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (CD)	PRESP ACUMULADO (CD)	% DE AVANCE
ESTRUCTURAS DE MAR	3,147,998.11	2,257,846.22	71.73%
ESTRUCTURAS EN TIERRA	3,644,015.32	2,557,168.79	70.17%
ARQUITECTURA	1,200,063.96	249,193.75	20.76%
INSTALACIONES ELECTRICAS	44,954.91	3,218.37	7.16%
INSTALACIONES SANITARIAS	550,193.40	237,356.60	43.14%
EQUIPAMIENTO	915,312.15	503,928.53	55.05%
IMPACTO AMBIENTAL	125,157.80	122,718.80	98.05%
TOTAL	9,627,695.65	5,931,431.05	

VALORIZACIÓN 25-MAYO 2019

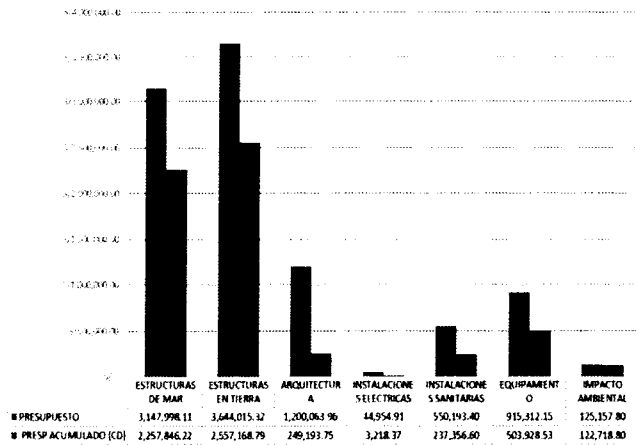

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (CD)	PRESP ACUMULADO (CD)	% DE AVANCE
ESTRUCTURAS DE MAR	1,594,671.93	1,278,443.35	80%
ESTRUCTURAS EN TIERRA			
ARQUITECTURA			
INSTALACIONES ELECTRICAS			
INSTALACIONES SANITARIAS			
EQUIPAMIENTO			
IMPACTO AMBIENTAL			
TOTAL	1,594,671.93	1,278,443.35	

ADIC 2 CAMBIO DE ZONA DE TALLERES Y PLANTA DE TRATAMIENTO. ABRIL 27.04.18

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (CD)	PRESP ACUMULADO (CD)	% DE AVANCE
ESTRUCTURAS DE MAR			
ESTRUCTURAS EN TIERRA	75,075.38	52,464.67	70%
ARQUITECTURA	5,594.32		0%
INSTALACIONES ELECTRICAS	25,151.75		0%
INSTALACIONES SANITARIAS	118,488.82	115,943.90	98%
EQUIPAMIENTO			
IMPACTO AMBIENTAL			
TOTAL	224,310.27	168,408.57	



SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
DISTRITO DEL ALTO TALARA"


016

ADIC 4 BAJA TENSION, APRIL 2019-18			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (CD)	PRESUP ACUMULADO (CD)	% DE AVANCE
ESTRUCTURAS DE MAR			
ESTRUCTURAS EN TIERRA	51,714.84	51,714.84	100%
ARQUITECTURA	-		
INSTALACIONES ELECTRICAS	-		
INSTALACIONES SANITARIAS	-	-	
EQUIPAMIENTO			
IMPACTO AMBIENTAL			
TOTAL	51,714.84	51,714.84	

VAL 7 ADIC 4 CABLEO Y PLATAFORMA BAJA, APRIL 2019-18			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (CD)	PRESUP ACUMULADO (CD)	% DE AVANCE
ESTRUCTURAS DE MAR			
ESTRUCTURAS EN TIERRA			
ARQUITECTURA			
INSTALACIONES ELECTRICAS	801,236.40	68,104.66	8.50%
INSTALACIONES SANITARIAS			
EQUIPAMIENTO			
IMPACTO AMBIENTAL			
TOTAL	801,236.40	68,104.66	

VAL 7 ADIC 4 CABLEO Y PLATAFORMA BAJA, APRIL 2019-18			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (CD)	PRESUP ACUMULADO (CD)	% DE AVANCE
ESTRUCTURAS DE MAR	1,780,350.25	760,132.83	43%
ESTRUCTURAS EN TIERRA			
ARQUITECTURA			
INSTALACIONES ELECTRICAS			
INSTALACIONES SANITARIAS			
EQUIPAMIENTO			
IMPACTO AMBIENTAL			
TOTAL	1,780,350.25	760,132.83	




 YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
DISTRITO DEL ALTO TALARA"


017

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (CD)	PRESP ACUMULADO (CD)	% DE AVANCE
ESTRUCTURAS DE MAR			
ESTRUCTURAS EN TIERRA			
ARQUITECTURA			
INSTALACIONES ELECTRICAS	291,983.88	-	0%
INSTALACIONES SANITARIAS			
EQUIPAMIENTO			
IMPACTO AMBIENTAL			
TOTAL	291,983.88	-	

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (CD)	PRESP ACUMULADO (CD)	% DE AVANCE
ESTRUCTURAS DE MAR	1,007,407.59	407,537.58	40.45%
ESTRUCTURAS EN TIERRA	-	-	
ARQUITECTURA	-	-	
INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-	
INSTALACIONES SANITARIAS	-	-	
EQUIPAMIENTO	-	-	
IMPACTO AMBIENTAL	-	-	
TOTAL	1,007,407.59	407,537.58	

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (CD)	PRESP ACUMULADO (CD)	% DE AVANCE
ESTRUCTURAS DE MAR	-	-	0%
ESTRUCTURAS EN TIERRA	6,710.53	671.43	10%
ARQUITECTURA	9,321.16	-	0%
INSTALACIONES ELECTRICAS	963.14	-	0%
INSTALACIONES SANITARIAS	15,997.75	-	0%
EQUIPAMIENTO	-	-	0%
IMPACTO AMBIENTAL	-	-	0%
TOTAL	32,992.58	671.43	







 YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973


ADIC 9 . COBERTURA MET DE TIERRA APRB 06.02.19			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (CD)	PRESP ACUMULADO (CD)	% DE AVANCE
ESTRUCTURAS DE MAR			0%
ESTRUCTURAS EN TIERRA	97,732.41		0%
ARQUITECTURA			0%
INSTALACIONES ELECTRICAS			0%
INSTALACIONES SANITARIAS			0%
EQUIPAMIENTO			0%
IMPACTO AMBIENTAL			0%
TOTAL	97,732.41		

Item	Descripción	% Avance Ejecutado
1	OBRAS PORTUARIAS (CONTRACTUAL + AD 1 + AD5 +AD7)	62%
2	ESTRUCTURA EN TIERRA (CONTRACTUAL + AD2 + AD3+AD8 + AD09)	69%
3	ARQUITECTURA (CONTRACTUAL + AD2+ AD8)	21%
4	INSTALACIONES ELECTRICAS (CONTRACTUAL + AD4 +AD 6+ AD8)	6%
5	INSTALACIONES SANITARIAS (CONTRACTUAL +AD2+ AD8)	52%
6	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO (CONTRACTUAL)	55%
7	IMPACTO AMBIENTAL (CONTRACTUAL)	98%

Cabe resaltar que aún existe un adicional5 y deductivo5 a espera de su corrección y con ello posiblemente mejore el porcentaje actual.

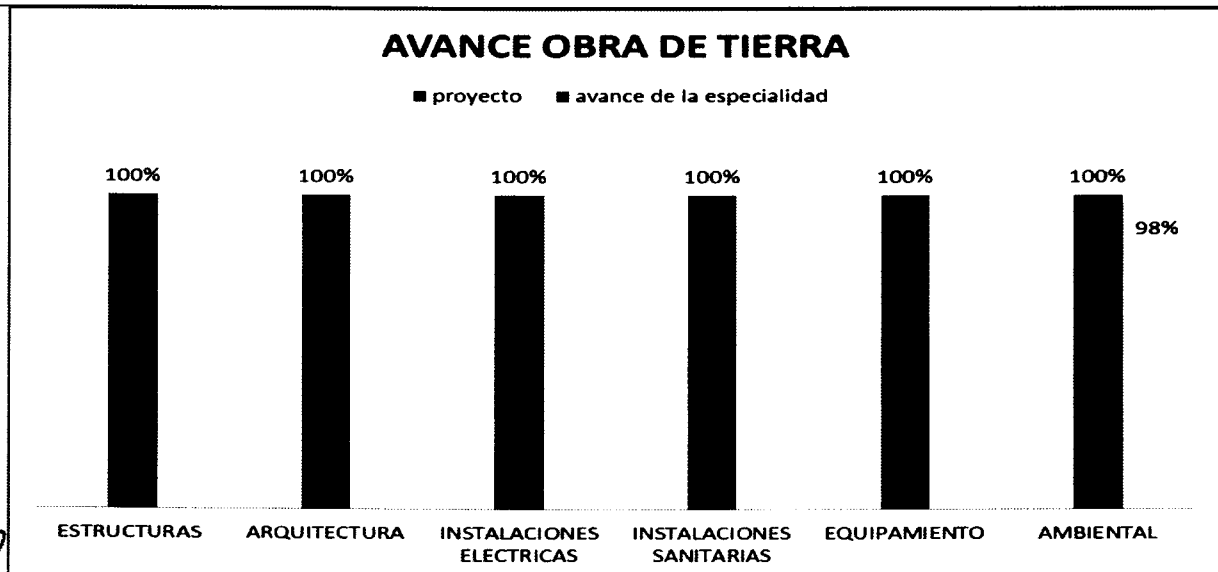


 YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973

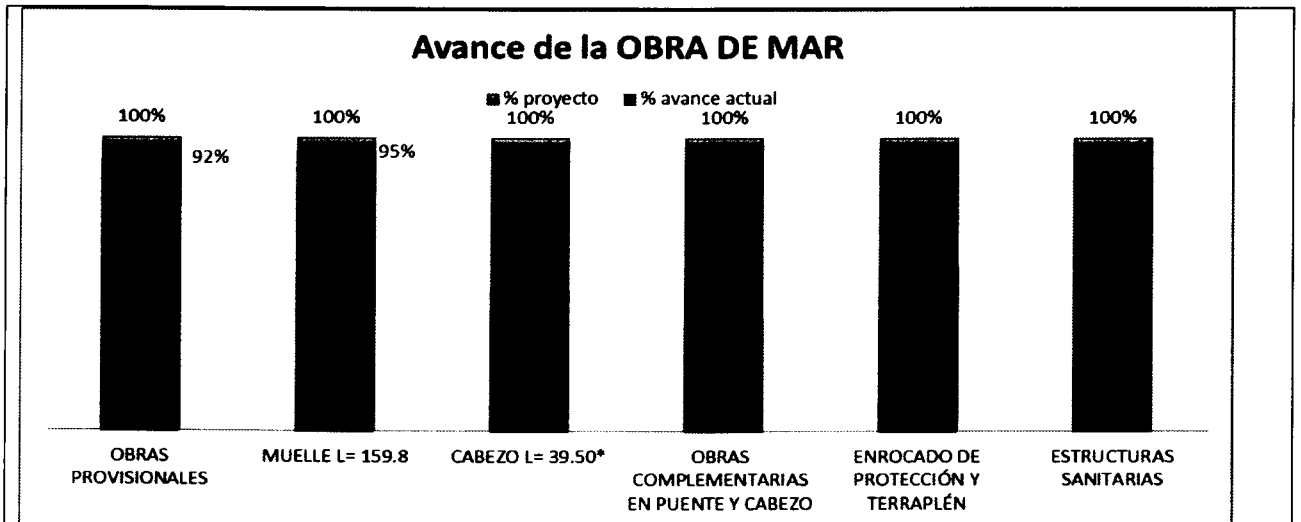


Aún nos encontramos a la espera de la solución al AD05 DV05 para solucionar el % de avance del CABEZO.


	FALTA POR PAGAR (COSTO DIRECTO)	EJECUTADO (COSTO DIRECTO)	FALTA POR EJECUTAR (COSTO DIRECTO)
EXP. CONTRAC	3,696,264.60	62%	38%
AD1	316,228.58	80%	20%
AD2	55,901.70	75%	25%
AD3	733,131.73	100%	0%
AD4	733,131.73	8%	92%
AD5	1,020,217.42	43%	57%
AD6	291,983.88	0%	100%
AD7	599,870.01	40%	60%
AD8	32,321.15	2%	98%
AD 09	97,732.41	0%	100%
	7,576,713.22		

NOTA: Se debe acotar que existen errores materiales que deberán ser atendidos en la liquidación de obra





 YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973

EJECUTADO VS FALTA DE EJECUTAR

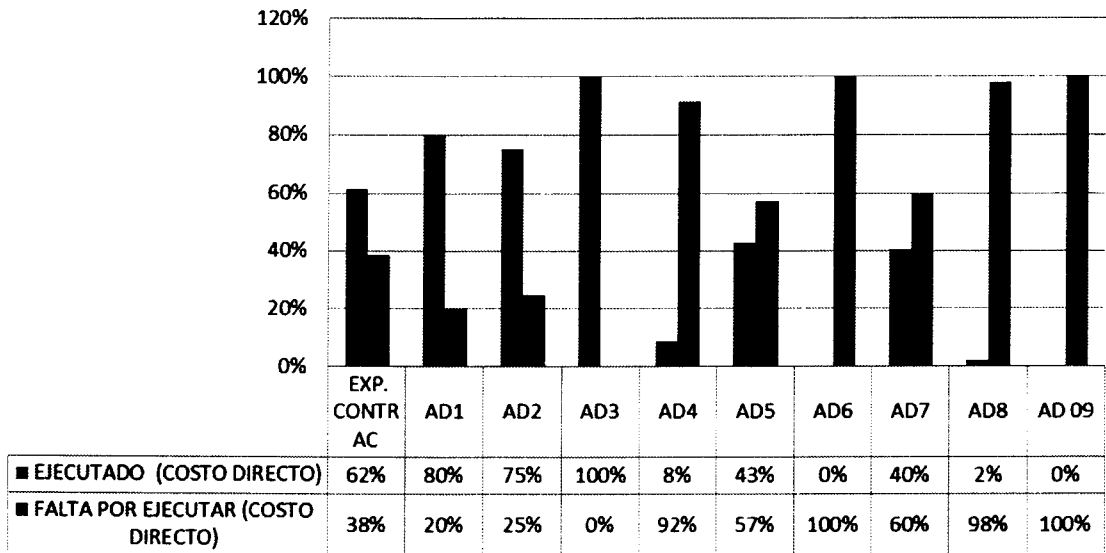

Avance ejecutado en los 8 últimos meses

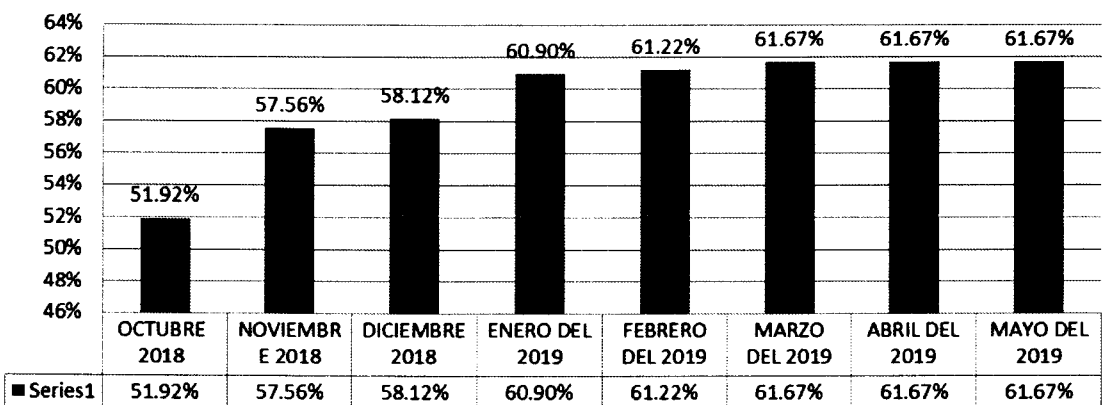

Situación de la Obra:

El avance logrado por el contratista hasta el mes de MAYO fue de:

61.67% - 100.00% = -38.33 % < 0.0%, lo cual indica que la obra se encuentra atrasada respecto al Calendario valorizado con la Ampliación de plazo 20 (existe una solicitud de AP 21 que fue DENEGADA por la Entidad), considerando el Adicional de Obra N°01, 02, 03, 04, 05,06, 07, 08 y 09; y el Deductivo vinculante N°01,02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08.

Se deja acotado que ya se aprobó la ampliación de plazo 18, el 06.03.19, se aprobó la ampliación de plazo 19 el 26.03.19 y se aprobó la ampliación de plazo 20 el 22.04.19

El rendimiento (desempeño) del contratista durante el mes de MAYO fue de:

61.67% - 100.00% = -38.33% < 80.0%, por lo que se debe aplicar lo dispuesto en el Artículo 173° del Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, por "Demora injustificada en la ejecución de la obra".



SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
DISTRITO DEL ALTO TALARA"

Para la presente valorización de obra, se ha tomado en consideración el presupuesto de obra ofertado por el contratista con precios base a Agosto 2016 y el Calendario de avance de obra valorizado actualizado por Ampliación de Plazo N°17 (existe un cronograma con AP 19 se encuentran APROBADO por la Entidad), descontando el Deductivo vinculante N°01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08; e incluyendo el Adicional de Obra N°01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09 y los mayores metrados 1; actualizado a la fecha real de inicio de obra, el 26 de Abril del 2016. Con ello se ha realizado la curva S y la comparación de avance de obra real vs avance programado.

El porcentaje de avance real solo en el mes de **MAYO¹ de 2019 es de 0%**, con lo cual se tiene un avance acumulado de **61.67%** respecto al monto total de ejecución de obra. Siendo el porcentaje de avance acumulado programado de **100%**.

Como parte de las funciones generales de la supervisión de obra y acorde a nuestros compromisos contractuales, mediante el presente informe se indica que el contratista aún no cuenta con la totalidad de actualizaciones de sus cartas fianzas y póliza CAR.

Así también esta supervisión ha puesto en manifiesto al coordinador de obra de la Entidad sobre la falta de pago de que contratista mantiene con sus trabajadores y proveedores y que viene siendo causa de reclamos y problemas sociales con la actual comunidad aledaña al DPA CABO BLANCO.

Indicar que esta Supervisión ha informado oportunamente la aplicación de las **penalizaciones** previstas en el contrato, por el incumplimiento reiterativo del contratista, mediante cartas de Estado actual de OBRA


Esta supervisión cautela que la obra se ejecuten dentro de los plazos contractuales e informa a la Entidad que el contratista tiene ATRASOS INJUSTIFICADOS, y ha manifestado a la ENTIDAD poner las medidas establecidas en la LEY e incluyendo intervención económica, de acuerdo a las cláusulas de contrato.

La Supervisión mediante carta CSL.170801.ED.685.19, solicita a la Entidad la solución y directivas respecto a las inexactitudes del A.D. N°05 y D.V. N°05 para la regularización correcta del presupuesto, valorizaciones y cronogramas de obra actualizados y acelerados.

Esta supervisión se encuentra en constante asistencia y participación con los funcionarios de la Entidad para informar sobre el estado actual de la obra, así viene informando que la obra se encuentra paralizada desde el 25.03.19 hasta la fecha de emitido el presente documento por tanto no se han registrado trabajos.

Se comunica a la Entidad que con carta CSL.170801.ED.690.19 esta Supervisión ha dado opinión a la solicitud de ampliación de plazo N°21 por 30 días calendarios solicitado por PSV donde recomienda que debe declararse improcedente por no cumplir con la formalidades señaladas en el artículo 170 del RLCE.





 YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973

¹ Se han corregido los porcentajes acumulados de febrero del 2019 debido a un error material.

Con carta CSL.170801.ED.691.19 la Supervisión ha informado a la Entidad sobre el incumplimiento de la carta N°120-2019-FONDEPES/OGA y recomienda a FONDEPES aplicar el artículo 136 del RLCE, donde indica: "Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato (...)".

Esta Supervisión deja acotado que se vienen generando errores materiales o acumulativos en las valorizaciones debido a los deductivos aprobados en los expedientes técnicos aprobados por la Entidad y que debieran ser absueltos en la liquidación de obra.

Se informa a la Entidad FONDEPES que la Supervisión CESEL se encuentra a la **espera de su comunicación y decisión de resolver el contrato de ejecución de obra, en vista al incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales del contratista PSV.**

Siendo el monto a facturar por la Valorización de Obra N°25 del mes de MAYO del 2019:

I.- COSTO DIRECTO CONTRACTUAL : S/. 9,627,695.65

II.- VALORIZACION DEL MES DE MAYO 2019

TOTAL COSTO DIRECTO		S/.	-
GASTOS GENERALES	10.000%	S/.	-
UTILIDADES	10.000%	S/.	-
PARCIAL DE VALORIZACION		S/.	-
AMORTIZACION DE ADELANTO EN EFECTIVO	10.000%	S/.	-
AMORTIZACIÓN DE ADELANTO POR MATERIALES N° 1	15.000%	S/.	-
AMORTIZACIÓN DE ADELANTO POR MATERIALES N° 2	15.000%	S/.	-
SUB TOTAL VALORIZACION		S/.	-
IGV	18.0000%	S/.	-
TOTAL VALORIZACION		S/.	-

SON: CERO CON 00/100

III.- PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZACION 0.00%

6. CONCLUSIONES

- ✓ La ejecución de la obra, se encuentra atrasada respecto a lo programado en el Calendario de avance de obra valorizado actualizado por Ampliación de Plazo N°19 y 20 (Existe una AP 21 que fue DENEGADA por la Entidad), descontando el Deductivo vinculante N°01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 e incluyendo los Adicionales de Obra N°01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09 y los mayores metrados 01, actualizado a la fecha real de inicio de obra, el 26 de Abril del 2016, debido a que los trabajos completados a la fecha (MAYO 2019) es menor al programado ACUMULADO, y cuyo índice de desempeño es: **61.67% - 100.00% = -38.33% < 80.0%**, por lo que corresponde aplicar el Artículo 173° o 174° del Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, por "Demora injustificada en la ejecución de la obra".
- ✓ La obra DPA CABO BLANCO se encuentra paralizada desde el 25.03.19.
- ✓ Se adjunta cuadro resumen y especialidades de la valorización elaborada por CESEL



SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,
 DISTRITO DEL ALTO TALARA"



CESEL		VALORIZACION N° 25		FONDEPES <small>Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero</small>		Versión	1				
				Fecha	29-08-12						
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DEL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION CUENTE: FONDEPES RESIDENTE PSV.: Luis Portalino Segundo LUGAR: PIURA - TALARA - EL ALTO FECHA: 31/05/2019											
ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO		VAL. ANTERIORES		VAL. ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
		CANT	P.U.	PARCIAL	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL
		Si.	Si.	Si.	Si.	Si.	Si.	Si.	Si.	Si.	Si.
01	ESTRUCTURAS DE MAR	1.00	3,147,998.11	3147998.11	3147998.11		2,257,846.22	0.00	2,257,846.22		890,152
02	ESTRUCTURAS EN TIERRA	1.00	3,644,015.32	3644015.32	3644015.32		2,557,168.79	0.00	2,557,168.79		1,086,847
03	ARQUITECTURA	1.00	1,200,063.96	1200063.96	1200063.96		249,193.75	0.00	249,193.75		950,870
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	44,954.91	44954.91	44954.91		3,218.37	0.00	3,218.37		41,737
05	INSTALACIONES SANITARIAS	1.00	550,193.40	550193.4	550193.4		237,356.60	0.00	237,356.60		312,837
06	EQUIPAMIENTO	1.00	915,312.15	915312.15	915312.15		503,978.53	0.00	503,978.53		411,384
07	IMPACTO AMBIENTAL	1.00	125,157.80	125157.8	125157.8		122,718.80	0.00	122,718.80		2,439
TOTAL COSTO DIRECTO				9,627,695.65	9,627,695.65		5,931,431.05	0.00	5,931,431.05		3,696,264.60
GASTOS GENERALES				10%	962,769.57	10%	593,143.11	10%	593,143.11	10%	369,626.46
UTILIDAD				10%	962,769.57	10%	593,143.11	10%	593,143.11	10%	369,626.46
SUB.TOTAL					11,553,234.79		7,117,717.27	0.00	7,117,717.27		4,435,517.52
IGV.				18%	2,079,582.26	18%	1,281,189.11	18%	1,281,189.11	18%	798,393.15
TOTAL ESTADO DE PAGO					13,632,817.05		8,398,906.38	0.00	8,398,906.38		5,233,910.67

.....
 CESEL
 JEFE DE SUPERVISION

.....
 YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Req. CIP N° 79973

CESEL

VALORIZACION N° 25

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Versión: 1
Fecha: 29-08-12

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA"

CLIENTE: FONDEPES

LUGAR: PIURA - TALARÁ - EL ALTO

POLINOMI: 01

RESIDENTE PSV.: Luis Portallino Segundo
FECHA: 31/05/2019

Item	Descripción	VAL ANTERIORES			VAL ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		Unidad	Metrado	Precio	Metrado	Precio	Parcial	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL
01	OBRAS PORTUARIAS												
01.01	OBRAS PROVISIONALES												
01.01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS - OBRAS PORTUARIAS	GLB	1.00	75,000.00	0.95	71,250.00	0.00	0.95	71,250.00	0.00	0.05	3,750.00	
01.01.02	TRANSPORTE DE MATERIALES	est	1.00	65,000.00	0.98	63,700.00	0.00	0.98	63,700.00	0.00	0.02	1,300.00	
01.01.03	TRAZO Y REPLANTADO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	mes	10.00	2,587.83	10.00	25,878.30	0.00	10.00	25,878.30	0.00	-	0.00	
01.01.04	AGUA PARA LA OBRA	mes	10.00	509.25	10.00	5,092.50	0.00	10.00	5,092.50	0.00	-	0.00	
01.01.05	ENERGIA PARA LA OBRA	mes	10.00	1,065.35	10.00	10,653.50	0.00	10.00	10,653.50	0.00	-	0.00	
01.01.06	CARTEL DE OBRA	und	1.00	1,779.66	1.00	1,779.66	0.00	1.00	1,779.66	0.00	-	0.00	
01.01.07	LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	mes	10.00	1,810.41	10.00	18,104.10	0.00	10.00	18,104.10	0.00	-	0.00	
01.01.08	INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL PARA EJECUCION Y SUPERVISION (OFICINAS, ALMACENES, CONEDORES, CASETAS, ETC.)	m²	250.00	163.89	250.00	40,972.50	0.00	250.00	40,972.50	0.00	-	0.00	
01.01.09	SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL E IMPLEMENTACION DE PROTECCION	GLB	1.00	28,091.02	1.00	28,091.02	0.00	1.00	28,091.02	0.00	-	0.00	
01.01.10	LOSAS PARA PREFABRICADOS	m²	250.00	127.28	31,820.00	127.28	0.00	250.00	31,820.00	0.00	-	0.00	
01.01.11	PRUEBA DE CARGA	und	4.00	18,996.65	75,986.60	18,996.65	0.00	4.00	75,986.60	0.00	-	0.00	
01.01.12	DEMOLICION DE LOSAS Y VIGAS (PUENTE Y CABEZO)	m³	172.10	375.42	64,609.78	172.10	0.00	172.10	64,609.78	0.00	-	0.00	
01.01.13	EXTRACCION DE PILOTES	und	100.00	1,110.33	111,033.00	66.00	0.00	66.00	73,281.78	0.00	-	0.00	
01.01.14	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m³	360.12	24.97	8,992.15	360.12	0.00	360.12	8,992.15	0.00	-	0.00	
01.02	MUELLE L=159.80 M												
01.02.01	FABRICACION DE PILOTES DE CONCRETO												
01.02.01.01	CONCRETO EN PILOTES f'c=350 kg/cm²	m³	264.50	638.78	168,957.31	264.50	0.00	264.50	168,957.31	0.00	-	0.00	
01.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	1,587.00	41.07	65,178.09	1,587.00	0.00	1,587.00	65,178.09	0.00	-	0.00	
01.02.01.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm²	kg	131,674.81	4.08	537,233.22	131,674.81	0.00	131,674.81	537,233.22	0.00	-	0.00	
01.02.02	FABRICACION DE VIGAS TRANSVERSALES												
01.02.02.01	CONCRETO EN VIGAS TRANSVERSALES f'c=280 kg/cm²	m³	6.30	529.06	3,333.08	6.30	0.00	6.30	3,333.08	0.00	-	0.00	
01.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	48.00	41.07	1,971.36	48.00	0.00	48.00	1,971.36	0.00	-	0.00	
01.02.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm²	kg	4,912.00	4.08	20,040.96	4,912.00	0.00	4,912.00	20,040.96	0.00	-	0.00	
01.02.03	FABRICACION DE LOSAS NERVIADAS EN MUELLE												
01.02.03.01	CONCRETO EN LOSAS f'c=280 kg/cm²	m³	114.00	499.58	56,952.12	114.00	0.00	114.00	56,952.12	0.00	-	0.00	
01.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	653.00	41.07	26,818.71	653.00	0.00	653.00	26,818.71	0.00	-	0.00	
01.02.03.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm²	kg	33,726.00	4.08	137,602.08	33,726.00	0.00	33,726.00	137,602.08	0.00	-	0.00	
01.02.04	NUCLEOS LLENADOS IN SITU												
01.02.04.01	CONCRETO EN NUCLEO f'c=280 kg/cm²	m³	0.00	529.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	
01.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	0.00	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	
01.02.04.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm²	kg	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	
01.02.05	JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES												
01.02.05.01	CONCRETO EN VIGA MANDIL f'c=280 kg/cm²	m³	0.00	529.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	
01.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	0.00	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	
01.02.05.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm²	kg	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	
01.02.06	SARDINEL LLENADO IN SITU												
01.02.06.01	CONCRETO EN SARDINEL f'c=380 kg/cm²	m³	0.00	529.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	
01.02.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	0.00	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	
01.02.06.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm²	kg	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	

YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 79973

CESEL

VALORIZACION N° 25

FONDEPES
Fondo Nacional de Inversión y Fomento Pesquero

Versión: 1
Fecha: 29-08-12

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA"

LUGAR: PIURA - TALARÁ - EL ALTO


CLIENTE: FONDEPES

RESIDENTE PSV.: Luis Portallino Segundo

POLINOMI: 01

FECHA: 31/05/2019

Código	Descripción	Unidad	TOTAL PRESUPUESTO			VAL ANTERIORES			VAL ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
01.02.07	LOSAS VACIADAS IN SITU				0.00			0.00		0.00			0.00		0.00		0.00
01.02.07.01	CONCRETO EN LOSAS Fc=280 kg/cm2	m³	0.00	529.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.06	0.00	0.00	0.00	0.00	529.06	0.00	0.00
01.02.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	0.00	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	41.07	0.00	0.00	0.00
01.02.07.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	kg	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
01.03	CABEZO L=39.50M				1,260,272.50			572,096.90		572,096.90			572,096.90		688,175.60		0.00
01.03.01	FABRICACION DE PILOTES DE CONCRETO				778,848.08			510,188.92		510,188.92			510,188.92		268,659.16		0.00
01.03.01.01	CONCRETO EN PILOTES Fc=350 kg/cm2	m³	269.80	638.78	172,342.84	220.38	140,771.14	220.38	140,771.14	140,771.14	49.43	49.43	140,771.14	49.43	31,717.70		0.00
01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	2,158.40	41.07	88,645.49	1,440.00	59,140.80	1,440.00	59,140.80	718.40	29,504.69	718.40	29,504.69		29,504.69		0.00
01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	kg	126,926.41	4.08	517,859.75	76,048.28	310,276.98	76,048.28	310,276.98	4.08	50,878.13	4.08	50,878.13	50,878.13	207,981.77		0.00
01.03.02	FABRICACION DE VIGAS TRANSVERSALES				71,831.73			0.00		0.00			0.00		71,831.73		0.00
01.03.02.01	CONCRETO EN VIGAS TRANSVERSALES Fc=280 kg/cm2	m³	38.70	529.06	20,474.62	0.00	0.00	0.00	0.00	529.06	0.00	0.00	0.00	38.70	20,474.62		0.00
01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	288.87	41.07	11,863.89	0.00	0.00	0.00	41.07	41.07	0.00	0.00	288.87	11,863.89		0.00	0.00
01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	kg	9,679.71	4.08	39,493.22	0.00	0.00	0.00	4.08	4.08	0.00	0.00	9,679.71	39,493.22		0.00	0.00
01.03.03	FABRICACION DE LOSAS NERVADAS EN CABEZO				143,156.63			0.00		0.00			0.00		143,156.63		0.00
01.03.03.01	CONCRETO EN LOSAS Fc=280 kg/cm2	m³	94.57	499.58	47,245.28	0.00	0.00	0.00	499.58	499.58	0.00	0.00	94.57	47,245.28		0.00	0.00
01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	484.52	41.07	19,899.24	0.00	0.00	0.00	41.07	41.07	0.00	0.00	484.52	19,899.24		0.00	0.00
01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	kg	18,630.42	4.08	76,012.11	0.00	0.00	0.00	4.08	4.08	0.00	0.00	18,630.42	76,012.11		0.00	0.00
01.03.04	NUCLEOS LLENADOS IN SITU				31,684.07			0.00		0.00			0.00		31,684.07		0.00
01.03.04.01	CONCRETO EN NUCLEOS Fc=280 kg/cm2	m³	30.62	529.06	16,199.82	0.00	0.00	0.00	529.06	529.06	0.00	0.00	30.62	16,199.82		0.00	0.00
01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	67.56	41.07	2,774.69	0.00	0.00	0.00	41.07	41.07	0.00	0.00	67.56	2,774.69		0.00	0.00
01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	kg	3,117.54	4.08	12,719.56	0.00	0.00	0.00	4.08	4.08	0.00	0.00	3,117.54	12,719.56		0.00	0.00
01.03.05	UNIDAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES				25,462.95			0.00		0.00			0.00		25,462.95		0.00
01.03.05.01	CONCRETO EN VIGA MANDIL Fc=280 kg/cm2	m³	26.45	529.06	13,993.64	0.00	0.00	0.00	529.06	529.06	0.00	0.00	26.45	13,993.64		0.00	0.00
01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	99.95	41.07	4,104.95	0.00	0.00	0.00	41.07	41.07	0.00	0.00	99.95	4,104.95		0.00	0.00
01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	kg	1,804.99	4.08	7,364.36	0.00	0.00	0.00	4.08	4.08	0.00	0.00	1,804.99	7,364.36		0.00	0.00
01.03.06	LOSAS VACIADAS IN SITU				72,183.98			0.00		0.00			0.00		72,183.98		0.00
01.03.06.01	CONCRETO EN LOSAS Fc=280 kg/cm2	m³	63.20	529.06	33,436.59	0.00	0.00	0.00	529.06	529.06	0.00	0.00	63.20	33,436.59		0.00	0.00
01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	19.20	41.07	788.54	0.00	0.00	0.00	41.07	41.07	0.00	0.00	19.20	788.54		0.00	0.00
01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	kg	9,303.64	4.08	37,958.85	0.00	0.00	0.00	4.08	4.08	0.00	0.00	9,303.64	37,958.85		0.00	0.00
01.03.07	MANOBRAS DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS EN PUENTES				49,231.58			49,231.58		49,231.58			49,231.58		0.00		0.00
01.03.07.01	TRANSPORTE DE PILOTE	und	2.00	315.36	630.72	2.00	630.72	2.00	315.36	630.72	2.00	630.72	2.00	630.72		0.00	0.00
01.03.07.02	TRANSPORTE DE VIGAS TRANSVERSALES	und	1.00	212.17	212.17	1.00	212.17	1.00	212.17	212.17	1.00	212.17	1.00	212.17		0.00	0.00
01.03.07.03	TRANSPORTE DE LOSAS NERVADAS	und	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
01.03.07.04	PUNTA PARA PILOTE	und	141.00	294.80	41,566.80	141.00	41,566.80	141.00	294.80	41,566.80	141.00	41,566.80	141.00	41,566.80		0.00	0.00
01.03.07.05	HINCADO DE PILOTE (INCL. MOV. Y POSIC. PLANTILLA)	und	2.00	2,531.56	5,063.12	2.00	5,063.12	2.00	2,531.56	5,063.12	2.00	5,063.12	2.00	5,063.12		0.00	0.00
01.03.07.06	DESCABEZADO DE PILOTAJE	und	2.00	72.42	144.84	2.00	144.84	2.00	72.42	144.84	2.00	144.84	2.00	144.84		0.00	0.00
01.03.07.07	COLOCACION DE VIGA TRANSVERSAL	und	1.00	1,613.93	1,613.93	1.00	1,613.93	1.00	1,613.93	1,613.93	1.00	1,613.93	1.00	1,613.93		0.00	0.00
01.03.07.08	COLOCACION DE LOSA NERVADA	und	0.00	807.47	0.00	0.00	0.00	0.00	807.47	807.47	0.00	0.00	0.00	807.47		0.00	0.00


YESIL YONER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 N° 79973

01.OBRAS PORTUARIAS

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"

CLIENTE: FONDEPES
LUGAR: PIURA - TALARA - EL ALTO
POLINDOM: 01

RESIDENTE PSV.: Luis Pontalino Segundo
FECHA: 31/05/2019

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL PRESUPUESTO	VAL ANTERIORES	VAL ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR VALORIZAR
01.03.06.01	MANIOBRA DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS EN CABEZO		87,863.48	12,676.40	0.00	12,676.40	75,187.08
01.03.06.01	TRANSPORTE DE PILOTE	und	315.36	0.00	315.36	0.00	64.00
01.03.06.02	TRANSPORTE DE VIGAS TRANSVERSALES	und	8.00	0.00	212.17	0.00	20,183.04
01.03.06.03	TRANSPORTE DE VIGAS PREFABRICADAS	und	29.00	0.00	212.17	0.00	8.00
01.03.06.04	PUNTA PARA PILOTE	und	294.80	43.00	294.80	0.00	1,697.36
01.03.06.05	HINCADO DE PILOTE (INCL. MOV. Y POSIC. PLANTILLA)	und	0.00	0.00	2,531.56	0.00	6,152.93
01.03.06.06	DESCARBAZO DE PILOTAJE	und	64.00	0.00	72.42	0.00	21.00
01.03.06.07	COLOCACION DE VIGA TRANSVERSAL	und	8.00	0.00	1,613.93	0.00	6,190.80
01.03.06.08	COLOCACION DE LOSA NERVADA	und	29.00	0.00	807.47	0.00	0.00
01.04	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE Y CABEZO		57,620.14	10,745.00	0.00	10,745.00	46,875.14
01.04.01	SUMA Y COLOC. SARDINELES DE MADERA 8"x8" 57TACOS DE 8"x8"x2"	m	111.51	0.00	111.51	0.00	9,634.46
01.04.02	SUMIN. COLOCACION DE BITAS METALICAS 30RBT	und	10.00	0.00	483.81	0.00	10.00
01.04.03	FABRICACION DE PILOTES METALICOS H.PARANTES DE DEFENSE	m	0.00	0.00	356.94	0.00	0.00
01.04.04	FABRICACION DE VIGAS METALICAS (LARGUEROS DE DEFENSA)	m	0.00	0.00	356.94	0.00	0.00
01.04.05	SUMA Y COLOC. DE BLOCS DE JEBE HUECO DE 6" 6" EN VIGA	BLK	0.00	0.00	176.62	0.00	0.00
01.04.06	HINCADO DE PARANTES METALICOS SECCION H.8"x8"x6mm. INCL. TRANSP.	und	0.00	0.00	901.59	0.00	0.00
01.04.07	MONTAJE VIGAS H16"x6" LONG. C/PARANTES. INCL. TRANSP.	m	0.00	0.00	131.73	0.00	0.00
01.04.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSAS TIPO D	m	0.00	0.00	526.95	0.00	0.00
01.04.09	BARANDAS DE TUBERIA DE ACERO. EN PUENTE Y ESCALINATAS DE EMBARCADERO	m	214.80	0.00	150.85	0.00	0.00
01.04.10	PINTURA DE PARANTES Y VIGAS LONGITUDINALES EN DEFENSAS	m²	350.00	350.00	30.70	350.00	32,402.58
01.05.01	EXTRACCION DE ROCA EN TERRAPIEN EXISTENTE	m³	580.00	0.00	27.04	0.00	0.00
01.05.02	CORTE MASIVO EN TALUD Y UÑA	m³	1,160.10	0.00	7.58	0.00	0.00
01.05.03	COLOCACION DE ROCA FILTRO > A 50 KG EN TALUD Y UÑA	m³	672.30	609.00	106.17	609.00	7,841.60
01.05.04	ENROCAO DE PROTECCION ACOMODADO ROCA DE 30" 40"	m³	1,141.20	62,068.51	88.72	62,068.51	4,177.34
01.05.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m³	1,392.12	609.00	30.06	609.00	27,506.46
01.06	ESTRUCTURAS SANITARIAS		10,056.14	18,306.54	0.00	18,306.54	39,178.75
01.06.01	CONCRETO EN MUROS f=280 kg/cm²	m³	6.85	0.00	518.96	0.00	10,056.14
01.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO	m²	67.93	0.00	41.07	0.00	3,554.88
01.06.03	ACERO DE REFUERZO f=4200 kg/cm²	kg	909.65	0.00	4.08	0.00	2,789.89
COSTO DIRECTO			3,147,998.11	2,257,846.22	4.08	2,257,846.22	890,151.89
GASTOS GENERALES			10%	10%	10%	10%	10%
UTILIDAD			10%	10%	10%	10%	10%
SUB.TOTAL			3,777,597.73	2,709,415.46	18%	2,709,415.46	1,068,182.27
IGV.			679,967.59	487,694.78	18%	487,694.78	192,272.81
TOTAL ESTADO DE PAGO			4,457,565.32	3,197,110.24	0.00	3,197,110.24	1,260,455.08

CESEL
JEFE DE SUPERVISION

YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 79973

CEBEL VALORIZACION N° 25

FONDEPES

Versión 1
Fecha 29-08-12

03.ARQUITECTURA

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA"

CUENTE: FONDEPES

LUGAR: PIURA - TALARÁ - EL ALTO

POLINOMII 03

RESIDENTE PSV.: Luis Portalino Segundo

FECHA: 31/05/2019

Item	Descripción	TOTAL PRESUPUESTO		VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR		
		Unidad	Metrado	Parcial	Si.	Metrado	Parcial	Si.	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL
03	ARQUITECTURA				1,200,063.96				249,193.75			950,870.22
03.01	MUROS Y TABICOS DE ALBAÑERIA				150,610.61				90,272.85			60,337.76
03.01.01	MURO DE LADRILLO KING KONG E=0.15m	m2	1,399.01	64.96	90,879.69	715.58	46,483.82	64.96	715.58	46,483.82	683.43	44,395.87
03.01.02	MURO DE LADRILLO KING KONG E=0.25m	m2	574.02	103.38	59,342.19	423.57	43,789.03	103.38	423.57	43,789.03	150.45	15,553.16
03.01.03	MURO DE LADRILLO KING KONG E=0.10m	m2	7.20	53.99	388.73	0.00	0.00	53.99	0.00	0.00	7.20	388.73
03.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				270,363.21				85,685.29			184,677.92
03.02.01	TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CEMENTO-ARENA MEZCLA 1:5	m2	2,458.00	34.03	83,545.74	694.73	33,641.53	34.03	694.73	33,641.53	1,763.27	60,004.15
03.02.02	TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CEMENTO-ARENA MEZCLA 1:5	m2	3,348.90	42.51	142,361.74	794.89	33,790.60	42.51	794.89	33,790.60	2,554.01	108,571.14
03.02.03	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES	m2	249.66	42.27	10,553.13	239.50	10,123.67	42.27	239.50	10,123.67	10.16	429.46
03.02.04	TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5	m2	253.78	31.65	8,032.14	266.95	8,449.03	31.65	266.95	8,449.03	-13.17	-416.69
03.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO = 15 CM	m	1,554.31	16.58	25,770.46	583.86	9,680.40	16.58	583.86	9,680.40	970.45	16,090.06
03.03	CIELOSASOS				59,297.40				30,507.83			28,789.58
03.03.01	CIELOSASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m2	1,501.20	39.50	59,297.40	772.35	30,507.83	39.50	772.35	30,507.83	728.85	28,789.58
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS				151,173.22				22,273.42			128,899.81
03.04.01	FALSO PISO DE COGRETTO E=2"	m2	1,059.80	26.91	28,519.22	208.68	5,615.58	26.91	208.68	5,615.58	851.12	22,903.64
03.04.02	CONTRAPOSO DE 25mm	m2	434.35	24.77	10,558.95	208.68	5,165.00	24.77	208.68	5,165.00	225.67	5,589.85
03.04.03	PISO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE	m2	1,734.76	47.74	82,817.44	92.60	4,420.72	47.74	92.60	4,420.72	1,642.16	78,396.72
03.04.04	PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO	m2	287.73	60.89	17,519.88	116.08	7,068.11	60.89	116.08	7,068.11	171.65	10,451.77
03.04.05	PISO DE VINILO DE ALTO TRANSITO	m2	81.82	70.45	5,764.22	70.45	0.00	70.45	0.00	0.00	81.82	5,764.22
03.04.06	VEREDA	m2	110.04	52.65	5,793.61	0.00	0.00	52.65	0.00	0.00	110.04	5,793.61
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				21,605.54				0.00			21,605.54
03.05.01	ZOCALO DE CERAMICO COLOR 0.40 X 0.40M	m2	222.24	58.31	12,958.81	0.00	0.00	58.31	0.00	0.00	222.24	12,958.81
03.05.02	CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.10M	m	64.60	18.91	1,221.59	0.00	0.00	18.91	0.00	0.00	64.60	1,221.59
03.05.03	CONTRAZOCALO DE CEMENTO DISEÑO SANITARIO H=0.10M	m	469.23	12.49	5,860.68	0.00	0.00	12.49	0.00	0.00	469.23	5,860.68
03.05.04	CONTRAZOCALO DE CEDRO DE E=1", H=0.10M	m	71.60	21.85	1,564.46	0.00	0.00	21.85	0.00	0.00	71.60	1,564.46
03.06	COBERTURAS				47,552.85				20,454.37			27,098.48
03.06.01	CUBIERTA LADRILLO PASTELERO 24x24 ASENTADO C/MEZCLA 1:5 2.5CM, JUNTA 1:5 1.5CM	m2	1,003.86	47.37	47,552.85	431.80	20,454.37	47.37	431.80	20,454.37	572.06	27,098.48
03.07	CARPINTERIA DE MADERA				65,026.21				0.00			65,026.21
03.07.01	PUERTA APANELADA DE MADERA, CON MARCO DE MAD. CEDRO 1.17"x6"	m2	59.28	735.40	43,594.51	0.00	0.00	735.40	0.00	0.00	59.28	43,594.51
03.07.02	PUERTA CONTRAPIRADA E=45MM, TRIPLY LUPANA 6MM. CON MARCO DE MAD. CEDRO 1.17"x6"	m2	12.24	531.49	6,505.44	0.00	0.00	531.49	0.00	0.00	12.24	6,505.44
03.07.03	TABIQUE DE MELAMINE PARA BAÑOS Y VESTIDORES, E=15MM	m2	61.74	241.76	14,926.26	0.00	0.00	241.76	0.00	0.00	61.74	14,926.26
03.08	CARPINTERIA METALICA				184,392.81				0.00			184,392.81
03.08.01	PUERTA DE ALTO IMPACTO BARRA ANTIPANICO	m2	4.32	1,060.50	4,581.36	0.00	0.00	1,060.50	0.00	0.00	4.32	4,581.36
03.08.02	PUERTA DE ALTO IMPACTO, TIPO VAIVEN	m2	21.60	942.35	20,554.76	0.00	0.00	942.35	0.00	0.00	21.60	20,554.76
03.08.03	PUERTA METALICA, TUBO GALVANIZADO 2", MALLA GALVANIZADA N°8	m2	64.43	254.24	16,380.69	0.00	0.00	254.24	0.00	0.00	64.43	16,380.69
03.08.04	CERCO METALICO, TUBO GALVANIZADO 2", MALLA GALVANIZADA N°8	m2	14.88	322.03	4,791.81	0.00	0.00	322.03	0.00	0.00	14.88	4,791.81
03.08.05	PUERTA METALICA VEHICULAR, TUBO GALVANIZADO REFORZADO	m2	24.00	338.98	8,135.52	0.00	0.00	338.98	0.00	0.00	24.00	8,135.52
03.08.06	PUERTA SECCIONABLE PS 2.60X3.00	und	6.00	7,244.16	43,464.96	0.00	0.00	7,244.16	0.00	0.00	6.00	43,464.96
03.08.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRIGO RETRACTIL BARANDA DE TUBO FERRO GALVANIZADO PASAMAÑO 1.1/2" - PARANTE 1"x1M	und	5.00	6,816.33	34,081.65	0.00	0.00	6,816.33	0.00	0.00	5.00	34,081.65
03.08.08	BARANDA DE FERRO DE 2.1/2"	m	147.63	138.76	20,485.14	0.00	0.00	138.76	0.00	0.00	147.63	20,485.14
03.08.09	BARANDA DE FERRO DE 2.1/2"	m	319.00	100.68	32,116.92	0.00	0.00	100.68	0.00	0.00	319.00	32,116.92
03.09	CARPINTERIA DE ALUMINIO				81,900.41				0.00			81,900.41
03.09.01	VENTANA DE ALUMINIO, C/VIDRIO TEMPADO	m2	209.88	195.67	41,067.22	0.00	0.00	195.67	0.00	0.00	209.88	41,067.22
03.09.02	VENTANA DE ALUMINIO, CON MALLA MOSQUITERA	m2	108.98	132.83	14,475.81	0.00	0.00	132.83	0.00	0.00	108.98	14,475.81

YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 79973

CESEL		VALORIZACION N° 25	CONDEPEPES
		Version	1
		Fecha	29-08-12

04. INSTALACIONES ELECTRICAS

PROYECT "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESMARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA"

LUGAR: FONDEPES

CLIENTE: PIURA - TALARÁ - EL ALTO

POLINOM 04

RESIDENTE PSV: Luis Portallino Segundo
FECHA: 31/05/2019

Item	Descripción	TOTAL PRESUPUESTO		VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR			
		Unidad	Metro	Precio	Parcial	Metro	Precio	Metro	Precio	Metro	Precio	CANT	Sub TOTAL
04 INSTALACIONES ELECTRICAS													
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				49,056.67			3,218.37				3,218.37	45,838.30
04.01.01	TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GIB	1.00	2,581.12	2,581.12	0.50	1,290.56	1,290.56	0.50	1,290.56	0.50	1,290.56	1,290.56
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				3,574.27			767.06				767.06	2,807.21
04.02.01	EXCAVACION DE ZANIAS DE 0.50X0.60M PARA INSTALACION DE DUCTOS	m	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.02	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANIA	m	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	115.56	30.93	3,574.27	24.80	767.06	30.93	24.80	767.06	90.76	2,807.21	0.00
04.03	SALIDAS DE ILUMINACION				207.68			0.00				0.00	207.68
04.03.01	SALIDA PARA LUMINARIA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)	plo	0.00	103.84	0.00	0.00	0.00	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.03.02	SALIDA PARA LUMINARIA DE PARED (CENTRO DE LUZ)	plo	2.00	103.84	207.68	0.00	0.00	103.84	0.00	0.00	2.00	207.68	0.00
04.04	SALIDA DE INTERRUPTOR				0.00			0.00				0.00	0.00
04.04.01	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	und	0.00	107.88	0.00	0.00	0.00	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.04.02	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	und	0.00	107.80	0.00	0.00	0.00	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.04.03	INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE	und	0.00	136.11	0.00	0.00	0.00	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.04.04	INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CONMUTACION	und	0.00	156.11	0.00	0.00	0.00	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.05	SALIDA PARA TOMACORRIENTE				0.00			0.00				0.00	0.00
04.05.01	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H=40 SMT	plo	0.00	101.98	0.00	0.00	0.00	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.05.02	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H=1.20 SMT	plo	0.00	101.98	0.00	0.00	0.00	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.05.03	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H=2.20 SMT	plo	0.00	101.98	0.00	0.00	0.00	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.05.04	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA A PRUEBA DE AGUA H=40 SMT	plo	0.00	101.98	0.00	0.00	0.00	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.05.05	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA EN TECHO	plo	0.00	101.98	0.00	0.00	0.00	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.06	SALIDAS DE FUERZA				0.00			0.00				0.00	0.00
04.06.01	SALIDA SENSOR DE NIVEL DE AGUA	plo	0.00	91.73	0.00	0.00	0.00	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.06.02	SALIDA DE FUERZA TRIFASICA	plo	0.00	78.87	0.00	0.00	0.00	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.06.03	SALIDA DE FUERZA MONOFASICA	plo	0.00	70.87	0.00	0.00	0.00	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.07	SALIDA DE DATA Y TELEFONIA				0.00			0.00				0.00	0.00
04.07.01	SALIDA PARA TELEFONIA	plo	0.00	72.17	0.00	0.00	0.00	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.07.02	SALIDA PARA RED DE COMPUTO	plo	0.00	72.17	0.00	0.00	0.00	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.08	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO				0.00			0.00				0.00	0.00
04.08.01	SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO	plo	0.00	1,162.14	0.00	0.00	0.00	1,162.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.08.02	SALIDA PARA SENSOR DE HUMO	plo	0.00	71.03	0.00	0.00	0.00	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.09	TUBERIAS DE PVC				22,822.00			1,160.75				1,160.75	21,661.25
04.09.01	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA D=25MM	m	87.34	13.29	1,160.75	87.34	1,160.75	13.29	87.34	1,160.75	0.00	0.00	0.00
04.09.02	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA D=35MM	m	1,230.36	15.67	19,279.74	0.00	0.00	15.67	0.00	0.00	1,230.36	19,279.74	0.00
04.09.03	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA D=50MM	m	331.43	18.12	2,381.51	0.00	0.00	18.12	0.00	0.00	331.43	2,381.51	0.00
04.09.04	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA D=100MM	m	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.10	CABLES Y CONDUCTORES				0.00			0.00				0.00	0.00
04.10.01	CABLE NH-90, 2-1x4mm ² +1x16mm ² (T) 450/750V	m	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.10.02	CABLE NH-90, 2-1x6mm ² +1x6mm ² (T) 450/750V	m	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.10.03	CABLE NH-90, 2-1x10mm ² +1x10mm ² (T) 450/750V	m	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.10.04	CABLE NH-90, 3-1x4mm ² +1x16mm ² (T) 450/750V	m	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.10.05	CABLE NH-90, 3-1x6mm ² +1x6mm ² (T) 450/750V	m	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.10.06	CABLE NH-90, 3-1x16mm ² +1x16mm ² (T) 450/750V	m	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.10.07	CABLE NZXOH, 4-1x185 mm ² , 0.6/1kV	m	0.00	93.29	0.00	0.00	0.00	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.10.08	CABLE NZXOH, 4-1x50 mm ² , 0.6/1kV	m	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.10.09	CABLE NZXOH, 4-1x16 mm ² , 0.6/1kV	m	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.10.10	CABLE NZXOH, 4-1x10 mm ² , 0.6/1kV	m	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 79973

CESEL		VALORIZACION N° 25		FONDERES		Version	Fecha
04. INSTALACIONES ELECTRICAS						Luis Portallino Segundo	31/05/2019
PROYECT "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA"						RESIDENTE PSV:	
CLIENTE: FONDEPES						FECHA:	31/05/2019
LUGAR: PIURA - TALARÁ - EL ALTO							
PUNIONOM 04							
Item	TOTAL PRESUPUESTO	VAL ANTERIORES	VAL ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR VALORIZAR		
04.10.11	CABLE N2XOH, 4.1x6 mm2, 0.6/1kV	0.00	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00
04.11	TABLEROS INTERRUPTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.11.01	TABlero GENERAL INICIAL TG	0.00	2,337.60	0.00	2,337.60	0.00	0.00
04.11.02	TABlero DE DISTRIBUCION TD-01	0.00	1,547.60	0.00	1,547.60	0.00	0.00
04.11.03	TABlero DE DISTRIBUCION TD-02	0.00	1,261.07	0.00	1,261.07	0.00	0.00
04.11.04	TABlero DE DISTRIBUCION TD-03	0.00	1,345.73	0.00	1,345.73	0.00	0.00
04.11.05	TABlero DE DISTRIBUCION TD-04	0.00	1,362.16	0.00	1,362.16	0.00	0.00
04.11.06	TABlero DE DISTRIBUCION TD-05	0.00	1,573.05	0.00	1,573.05	0.00	0.00
04.11.07	TABlero DE DISTRIBUCION TF-01	0.00	1,336.74	0.00	1,336.74	0.00	0.00
04.11.08	TABlero DE DISTRIBUCION TF-02	0.00	1,085.39	0.00	1,085.39	0.00	0.00
04.11.09	TABlero DE DISTRIBUCION TE-03	0.00	862.33	0.00	862.33	0.00	0.00
04.11.10	TABlero DE DISTRIBUCION TI-01	0.00	936.12	0.00	936.12	0.00	0.00
04.11.11	TABlero DE DISTRIBUCION TH-02	0.00	853.01	0.00	853.01	0.00	0.00
04.11.12	TABlero DE DISTRIBUCION STD-01	0.00	1,034.74	0.00	1,034.74	0.00	0.00
04.11.13	TABlero DE DISTRIBUCION STD-02	0.00	831.72	0.00	831.72	0.00	0.00
04.11.14	TABlero DE DISTRIBUCION STD-03	0.00	1,034.74	0.00	1,034.74	0.00	0.00
04.11.15	TABlero DE DISTRIBUCION STD-04	0.00	1,203.40	0.00	1,203.40	0.00	0.00
04.11.16	TABlero DE DISTRIBUCION STD-05	0.00	1,170.66	0.00	1,170.66	0.00	0.00
04.11.17	TABlero DE DISTRIBUCION STD-06	0.00	1,034.74	0.00	1,034.74	0.00	0.00
04.11.18	TABlero DE DISTRIBUCION STD-07	0.00	1,261.07	0.00	1,261.07	0.00	0.00
04.11.19	TABlero DE EMERGENCIA	0.00	1,685.66	0.00	1,685.66	0.00	0.00
04.12	PUESTA EN MARCHA	0.00	1,525.42	0.00	1,525.42	0.00	1,525.42
04.12.01	PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA	0.00	1,394.30	0.00	1,394.30	0.00	0.00
04.12.02	PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA	0.00	520.74	0.00	520.74	0.00	0.00
04.12.03	CAPACITACION TECNICA EN USO Y MANTENIMIENTO	2.00	762.71	0.00	762.71	0.00	2.00
04.12.04	POZO DE PUESTA A TIERRA	0.00	664.40	0.00	664.40	0.00	0.00
04.12.05	CONDUCTOR DE CU DESNUDO 25MM2	320.00	9.83	0.00	9.83	0.00	320.00
04.14	CAJAS	0.00	867.54	0.00	867.54	0.00	0.00
04.14.01	CAJA DE PASE CUADRADA DE 100X100X55 MM	0.00	31.86	0.00	31.86	0.00	0.00
04.14.02	CAJA DE PASE CUADRADA DE 100X100X100 MM	0.00	32.91	0.00	32.91	0.00	0.00
04.14.03	CAJA DE PASE CUADRADA DE 350X350X150 MM	0.00	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00
04.14.04	CAJA DE PASE HERMETICA CON TAPA Y EMPAQUETADURA 150X150X100 MM	19.00	45.66	0.00	45.66	0.00	19.00
04.15	ALUMBRADO EXTERIOR	0.00	14,333.04	0.00	14,333.04	0.00	14,333.04
04.15.01	POSTE METALICO DE F'G' E 8MM LONG.	17.00	843.12	0.00	843.12	0.00	17.00
04.15.02	PASTORAL C.A.C PARA LUMINARIA	0.00	155.74	0.00	155.74	0.00	0.00
04.15.03	LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO DE 150 W INCL. EQUIPO	0.00	145.13	0.00	145.13	0.00	0.00
04.15	EQUIPOS DE ILUMINACION	0.00	579.28	0.00	579.28	0.00	0.00
04.16.01	ARTEFACTO REFLECTOR 1x250W	0.00	85.91	0.00	85.91	0.00	0.00
04.16.02	ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2x36W	0.00	135.19	0.00	135.19	0.00	0.00
04.16.03	ARTEFACTO FLUORESCENTE LINEAL 2x36W	0.00	107.23	0.00	107.23	0.00	0.00
04.16.04	ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2x18W	0.00	103.62	0.00	103.62	0.00	0.00
04.16.05	ARTEFACTO TIPO BRAQUET 1x32W	0.00	204.60	0.00	204.60	0.00	0.00
04.16.06	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPACTA C/BATERIA INCORPORADA	0.00	134.57	0.00	134.57	0.00	0.00
04.17	GRUPO ELECTROGENO 150KVA (INCLUYE TANQUE DE COMBUSTIBLE)	0.00	77,110.17	0.00	77,110.17	0.00	0.00
04.17.01	GRUPO ELECTROGENO DE 80 KVA, 380/220V 60Hz INC/INSTALACION	0.00	14,006.85	0.00	14,006.85	0.00	0.00
04.17.02	TABlero DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO DIRECTO		44,954.91	3,218.37	0.00	3,218.37	0.00	48,173.28
GASTOS GENERALES		4,495.49	10%	321.84	10%	321.84	4,817.17
UTILIDAD		4,495.49	10%	321.84	10%	321.84	5,314.50
SUB.TOTAL		53,945.89		3,862.05		3,862.05	57,807.94
IGV		9,710.26	18%	695.17	18%	695.17	67,518.10
TOTAL ESTADO DE PAGO		63,656.15		4,557.22		4,557.22	68,213.37

ESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 70073

CESEL
JEFE DE SUPERVISION

CEBEL VALORIZACION N° 25

FONDEPES

05. INSTALACIONES SANITARIAS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBAICADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA"

CLIENTE: FONDEPES

LUGAR: TALARÁ - TALARÁ - EL ALTO

POULHOMIC 05

RESIDENTE PSV.: Luis Portelino Segundo

FECHA: 31/05/2019

Version 1

Fecha 28-08-12

Item	Descripción	TOTAL PRESUPUESTO		VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR			
		Unidad	Metrado	Precio	Parcial	Metrado	Parcial	Precio	Parcial	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL
05.01.01.01	RED DE AGUA POTABLE				561,082.08								
05.01.01.01	RED DE AGUA POTABLE				39,353.21								
05.01.01.01	SAIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP Ø 1/2"	pto	64.00	5,683.20	64.00	5,683.20	64.00	5,683.20	64.00	5,683.20	64.00	5,683.20	323,725.49
05.01.01.02	SAIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP Ø 3/4"	pto	6.00	98.72	2.00	197.44	2.00	197.44	2.00	197.44	2.00	197.44	28,814.89
05.01.02.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 3/4"	und	12.00	50.21	602.52	2.00	100.42	2.00	100.42	2.00	100.42	2.00	100.42
05.01.02.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2"	und	2.00	48.93	97.86	1.00	48.93	1.00	48.93	1.00	48.93	1.00	48.93
05.01.02.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1"	und	2.00	68.59	137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.01.02.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 2"	und	1.00	199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.01.03.01	TUBERIAS	m	100.35	12.91	5,274.68	100.35	1,295.52	12.91	1,295.52	100.35	1,295.52	100.35	1,295.52
05.01.03.02	SUM./INST. T./PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 1/2" C-5	m	114.16	15.59	1,779.75	114.16	1,779.75	15.59	1,779.75	114.16	1,779.75	114.16	1,779.75
05.01.03.03	SUM./INST. T./PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 3/4" C-5	m	25.60	21.30	545.28	24.90	530.37	21.30	530.37	24.90	530.37	0.70	14.91
05.01.03.04	SUM./INST. T./PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 1 1/2" C-5	m	10.80	16.86	182.09	0.00	0.00	16.86	16.86	10.80	182.09	0.00	0.00
05.01.03.05	SUM./INST. T./PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 2" C-5	m	69.11	21.30	1,472.04	0.00	0.00	21.30	1,472.04	69.11	1,472.04	0.00	0.00
05.01.04.01	NICHO Y TAPA DE PVC PARA VALVULA EN PARED	und	17.00	253.58	4,310.86	0.00	0.00	353.58	4,310.86	17.00	4,310.86	17.00	4,310.86
05.01.04.02	SISTEMA DE CLOACACION	und	1.00	1,688.57	1,688.57	0.00	0.00	1,688.57	1,688.57	1.00	1,688.57	1.00	1,688.57
05.01.05.01	PRUEBA HIDRAULICA	m	368.02	3.77	1,387.44	239.41	902.58	3.77	902.58	239.41	902.58	128.61	484.86
05.01.06.01	EQUIPO DE BOMBEO CISTERNA ZONA DE FRIO	und	1.00	4,679.56	0.00	0.00	0.00	4,679.56	4,679.56	1.00	4,679.56	1.00	4,679.56
05.01.06.02	ACCESORIOS PARA BOMBA	und	1.00	1,130.25	0.00	0.00	0.00	1,130.25	1,130.25	1.00	1,130.25	1.00	1,130.25
05.01.07.01	SUM. E INST. DE TUBERIA FERRO GALVANIZADO STANDARD Ø2"	m	38.45	45.35	1,743.71	0.00	0.00	45.35	1,743.71	38.45	1,743.71	38.45	1,743.71
05.01.07.02	SUM. E INST. DE TUBERIA FERRO GALVANIZADO STANDARD Ø4"	m	21.19	129.61	2,746.44	0.00	0.00	129.61	2,746.44	21.19	2,746.44	21.19	2,746.44
05.01.08.01	CAMARA DE BOMBEO, CUARTO DE BOMBAS	und	1.00	7,451.82	0.00	0.00	0.00	7,451.82	7,451.82	1.00	7,451.82	1.00	7,451.82
05.01.09.01	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA SALADA	und	1.00	1,627.24	48,110.50	0.00	0.00	1,627.24	48,110.50	1.00	48,110.50	1.00	48,110.50
05.02.01.01	EQUIPO DE BOMBEO A CISTERNA	und	1.00	11,431.40	11,431.40	0.00	0.00	11,431.40	11,431.40	1.00	11,431.40	1.00	11,431.40
05.02.01.02	EQUIPO DE BOMBEO AGUA SALADA A TANQUE ELEVADO	und	1.00	7,872.80	7,872.80	0.00	0.00	7,872.80	7,872.80	1.00	7,872.80	1.00	7,872.80
05.02.02.01	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE CLOACACION - DESINFECCION	und	1.00	1,627.24	1,627.24	0.00	0.00	1,627.24	1,627.24	1.00	1,627.24	1.00	1,627.24
05.02.02.02	ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLOACACION - DESINFECCION	und	1.00	1,627.24	1,627.24	0.00	0.00	1,627.24	1,627.24	1.00	1,627.24	1.00	1,627.24
05.02.04.01	SUM. E INST. DE TUBERIA FERRO GALVANIZADO STANDARD Ø2"	m	38.45	45.35	1,743.71	0.00	0.00	45.35	1,743.71	38.45	1,743.71	38.45	1,743.71
05.02.04.02	SUM. E INST. DE TUBERIA FERRO GALVANIZADO STANDARD Ø4"	m	21.19	129.61	2,746.44	0.00	0.00	129.61	2,746.44	21.19	2,746.44	21.19	2,746.44
05.02.05.01	RED DE DISTRIBUCION	m	159.33	15.59	2,483.95	70.00	1,091.30	15.59	1,091.30	70.00	1,091.30	89.33	1,392.65
05.02.05.02	SUM./INST. T./PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 3" C-5	m	50.00	21.30	1,065.00	0.00	0.00	21.30	1,065.00	50.00	1,065.00	50.00	1,065.00
05.02.05.03	SUM./INST. T./PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 2 1/2" C-10 IMPULSION	m	82.60	21.91	1,809.77	0.00	0.00	21.91	1,809.77	82.60	1,809.77	82.60	1,809.77
05.02.05.04	SUM./INST. T./PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 2 1/2" C-10 IMPULSION-MUELLE	m	161.79	23.47	3,797.21	0.00	0.00	23.47	3,797.21	161.79	3,797.21	161.79	3,797.21
05.02.05.05	SUM./INST. T./PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 3/4" C-5 COLGADA	m	26.40	32.31	853.98	0.00	0.00	32.31	853.98	26.40	853.98	26.40	853.98
05.02.05.06	SUM./INST. T./PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 2" C-5 COLGADA	m	24.40	38.02	927.69	0.00	0.00	38.02	927.69	24.40	927.69	24.40	927.69
05.02.05.07	SUM./INST. T./PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 3" C-5 COLGADA	m	22.30	45.95	1,024.69	0.00	0.00	45.95	1,024.69	22.30	1,024.69	22.30	1,024.69
05.02.05.08	SAIDA DE AGUA DE MAX				7,863.53								7,863.53


YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 79973

05. INSTALACIONES SANITARIAS
 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA"
 CLIENTE: FONDOPES Luis Portulano Segundo
 LUGAR: TALARÁ - EL ALTO FECHA: 31/05/2019
 POLINOMIO: '05

ITEM	UNIDAD	TOTAL PRESUPUESTO	VAL ANTERIORES	VAL ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR VALORIZAR
05.02.06.01	PRO	24.00	156.16	0.00	156.16	24.00
05.02.06.02	PRO	4.00	206.95	0.00	206.95	4.00
05.02.06.03	UND	24.00	1,494.72	0.00	1,494.72	24.00
05.02.06.04	UND	4.00	154.61	0.00	154.61	4.00
05.02.06.05	UND	9.00	129.77	0.00	129.77	9.00
05.02.07.01	UND	2.00	50.21	0.00	50.21	2.00
05.02.07.02	UND	2.00	195.48	0.00	195.48	2.00
05.02.07.03	UND	1.00	418.81	0.00	418.81	1.00
05.02.08.01	UND	1.00	253.58	0.00	253.58	1.00
05.02.08.02	UND	4.00	233.38	0.00	233.38	4.00
05.03.01.01	M	100.20	36.04	100.20	100.20	0.00
05.03.01.02	M	100.20	1.81	100.20	100.20	0.00
05.03.01.03	M	100.20	6.92	100.20	100.20	0.00
05.03.01.04	M	100.20	15.53	100.20	100.20	0.00
05.03.02.01	PRO	40.00	55.61	40.00	40.00	0.00
05.03.02.02	PRO	16.00	62.37	16.00	16.00	0.00
05.03.02.03	PRO	8.00	69.51	8.00	8.00	0.00
05.03.02.04	PRO	16.00	87.80	16.00	16.00	0.00
05.03.03.01	M	180.23	18.75	180.23	180.23	0.00
05.03.03.02	M	74.96	22.13	74.96	74.96	0.00
05.03.03.03	M	83.30	34.44	83.30	83.30	0.00
05.03.04.01	PRO	17.00	57.06	17.00	17.00	0.00
05.03.04.02	PRO	15.00	18.20	15.00	15.00	0.00
05.03.05.01	UND	9.00	43.02	9.00	9.00	0.00
05.03.05.02	UND	4.00	53.42	4.00	4.00	0.00
05.03.06.01	UND	11.00	407.38	11.00	11.00	0.00
05.03.07.01	UND	2.00	2,235.58	2.00	2.00	0.00
05.03.08.01	M	270.49	3.33	270.49	270.49	0.00
05.04.01.01	M	188.23	36.04	188.23	188.23	0.00
05.04.01.02	M	188.23	1.81	188.23	188.23	0.00
05.04.01.03	M	188.23	6.92	188.23	188.23	0.00
05.04.01.04	M	188.23	15.53	188.23	188.23	0.00
05.04.02.01	M	109.19	34.44	109.19	109.19	0.00
05.04.02.02	M	63.59	22.13	63.59	63.59	0.00
05.04.02.03	M	97.80	31.19	97.80	97.80	0.00
05.04.02.04	M	221.45	135.50	221.45	221.45	0.00
05.04.02.05	M	180.00	23.47	180.00	180.00	0.00
05.04.03.01	ACCESORIOS	34.82	37.49	34.82	34.82	0.00
05.04.03.02	ACCESORIOS	24.00	407.38	24.00	24.00	0.00

YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973


FONDEPES		VALORIZACION N° 25		Versión		Fecha	
05. INSTALACIONES SANITARIAS		RESIDENTE PSV:		Luis Portallino Segundo		31/05/2013	
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGIÓN PIURA"		FECHA:					
LUGAR: FONDEPES							
PIURA - TALARÁ - EL ALTO							
POLIOMIC 05							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO		VAL ANTERIORES	VAL ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR VALORIZAR
		und	13.00				
05.04.03.02	SUMIDORES DE 4" CON TRAMPA P. DE PVC	und	83.26	0.00	83.26	0.00	1,082.38
05.04.03.03	SUMIDORES DE 4" CON TRAMPA P. DE F"O	und	15.00	0.00	90.26	0.00	1,353.90
05.04.04.01	CAMARA DE BOMBEO. CUARTO DE BOMBAS	und	10,622.12	0.00	0.00	0.00	30,152.12
05.04.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	und	2,774.51	0.00	7,774.51	0.00	7,774.51
05.04.04.01	ACCESORIOS PARA BOMBAS SUMERGIBLES	und	1,257.36	0.00	1,257.36	0.00	1,257.36
05.04.04.03	ACCESORIOS PARA CASETA BOMBEO	und	1,130.25	0.00	1,130.25	0.00	1,130.25
05.04.04.03	CANALETAS	und	47,586.41	0.00	0.00	0.00	47,586.41
05.04.05.01	CONCRETO F' C=210KG/M2 EN CANALETAS	m3	418.30	0.00	418.30	0.00	10,675.02
05.04.05.02	ENCOFRADO DE CANALETAS	m2	182.58	0.00	55.85	0.00	10,197.09
05.04.05.03	COCACION DE REJILLA EN CANALETA DE FIBRA DE VIDRO	m2	102.44	0.00	260.78	0.00	182.58
05.05.01	EMISOR SUBMARINO AFLUENTES	m2	278,746.63	0.00	260.78	0.00	26,714.30
05.05.01.01	TRAMPA DE SOLIDOS	und	709.07	0.00	709.07	0.00	88,020.55
05.05.01.01	ACCESORIOS TRAMPA DE SOLIDOS	und	709.07	0.00	709.07	0.00	709.07
05.05.02	TRAMPA DE GRASAS	und	709.07	0.00	709.07	0.00	709.07
05.05.02.01	ACCESORIOS PARA TRAMPA DE GRASAS	und	709.07	0.00	709.07	0.00	709.07
05.05.03	TANQUE ASEPTICO	und	1,214.99	0.00	1,214.99	0.00	1,214.99
05.05.03.01	ACCESORIOS PARA TANQUE ASEPTICO	und	1,214.99	0.00	1,214.99	0.00	1,214.99
05.05.04	CAMARA DE REUNION	m2	2.76	0.00	455.76	0.00	1,257.90
05.05.04.01	PUERTA METAL LAC 1/16" C/ MARCO 2"x2"x1/4" Y REFUERZOS	und	1,257.90	0.00	0.00	0.00	44,152.08
05.05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA P=7.00 HP	und	24,660.50	0.00	24,660.50	0.00	24,660.50
05.05.05.01	CONSTRUCCION DE CASETA DE EMISOR	GLB	19,491.53	0.00	19,491.53	0.00	19,491.53
05.05.06	SUMINISTRO DE TUBERIAS	m	35.56	0.00	43,625.36	0.00	16,620.84
05.05.06.01	SUMINISTRO TUBERIA USA HOPE PECC-100 Dext.160 MM(6") PN-10	m	35.56	0.00	39,649.40	0.00	0.00
05.05.06.02	PARA USO DE DIFUSOR	m	58.80	0.00	58.80	0.00	2,940.00
05.05.06.03	FLOTACION	GLB	12,686.85	0.00	12,686.85	0.00	12,686.85
05.05.06.04	ACCESORIOS DE TUBERIA HOPE	GLB	4,969.95	0.00	4,969.95	0.00	993.99
05.05.06.05	LASTRE DE CONCRETO DE 50 KG. APROX. TIPO 1 SEPARACION 1.70 ML C/U	und	172.23	0.00	172.23	0.00	0.00
05.05.06.06	LASTRE DE CONCRETO DE 50 KG. APROX. TIPO 1 SEPARACION 1.70 ML C/U (DIFUSOR)	und	172.23	0.00	172.23	0.00	0.00
05.05.07	TERMOFUSION	und	28,481.81	0.00	0.00	0.00	2,848.18
05.05.07.01	SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS DE 160 MM PN-10 Y LINEAS AUXILIARES	GLB	28,481.81	0.00	28,481.81	0.00	2,848.18
05.05.08.01	ULTRASONIDO - CONTROL DE CALIDAD	GLB	12,711.86	0.00	10,169.49	0.00	2,542.37
05.05.08.01	INSPECCION ULTRASONICA DE JUNTA	GLB	12,711.86	0.00	12,711.86	0.00	0.00
05.05.09	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO	GLB	12,711.86	0.00	11,297.60	0.00	1,414.26
05.05.09.01	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO DE LINEA	GLB	12,711.86	0.00	11,297.60	0.00	1,414.26
05.05.09.02	TRUBACION PRIMEROS METROS DE TUBERIA CON CONCRETO CICLOPEO	m3	104,850.00	0.00	104,850.00	0.00	0.00
05.05.09.03	PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA EMISOR SUBMARINO	m3	805.95	0.00	805.95	0.00	0.00
05.05.09.03	PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA EMISOR SUBMARINO	GLB	17,966.10	0.00	17,966.10	0.00	0.00
05.06	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	und	38,740.67	0.00	6,734.06	0.00	32,006.61
05.06.01	APARATOS SANITARIOS	pza	11,568.72	0.00	4,704.64	0.00	6,864.08
05.06.01.01	INODORO COLOR BLANCO CON ASIENTO	pza	8,637.60	0.00	539.85	0.00	8,100.00
05.06.01.02	URINARIO	pza	3,666.39	0.00	3,666.39	0.00	1,465.56
05.06.02	LAVATORIOS	pza	22,171.95	0.00	2,028.40	0.00	25,142.35
05.06.02.01	LAVATORIO DE PARED	pza	202.94	0.00	2,028.40	0.00	25,142.35
05.06.02.02	LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE	pza	342.57	0.00	342.57	0.00	2,712.85
05.06.02.03	DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MECLACIADORA	und	5,140.76	0.00	5,140.76	0.00	3,140.76
05.06.02.04	GRIFERIA PARA LAVADEROS	und	214.07	0.00	214.07	0.00	4,067.33
05.06.02.05	PAPELERA C/ EJE ADHESIVO C/ SILICONA BLANCO	und	155.07	0.00	155.07	0.00	2,481.12
05.06.02.06	TOLLERO DE BARRA	und	180.35	0.00	180.35	0.00	1,262.45
05.06.02.07	MANILUVIOS / GRIFO	und	513.65	0.00	513.65	0.00	9,245.70
COSTO DIRECTO			560,843.40		237,356.60		323,486.80
GASTOS GENERALES			55,019.34	10%	23,735.66	10%	32,283.64
UTILIDAD			55,019.34	10%	23,735.66	10%	31,283.68
SUB-TOTAL			660,882.08		284,827.92		376,054.16
ISV			118,841.78	18%	51,269.04	18%	67,572.74
TOTAL ESTADO DE PAGO			779,723.86		336,096.96		443,626.90


YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Red. CIP N° 79973

CEBEL
 JEFE DE SUPERVISION

CESEL		VALORIZACION N° 25		Version	1										
FONDEPES		FONDEPES		Fecha	29-08-12										
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA"															
CLIENTE: FONDEPES															
LUGAR: PIURA - TALARÁ - EL ALTO															
POLINOMIO '06															
RESIDENTE PSV.: Luis Portalino Segundo															
FECHA: 31/05/2019															
Item	Descripción	Unidad	Metrado	Precio	Parcial	VAL ANTERIORES	Metrado	Precio	Parcial	VAL ACTUAL	Metrado	Precio	Parcial	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR VALORIZAR
				SI.	SI.			SI.	SI.			SI.	SI.	CANT.	SUB TOTAL
06.01	EQUIPAMIENTO			915,312.15		503,928.53		0.00	0.00	503,928.53		0.00	0.00	411,383.63	
06.01	SUMINISTRO DE CAMARA FRIGORIFICA DE 5 TM 0°C	GLB	1.00	86,470.83		86,470.83		86,470.83	0.00	86,470.83		86,470.83	0.00	0.25	21,617.71
06.02	SUMINISTRO DE CAMARA FRIGORIFICA DE 10 TM 0°C	GLB	1.00	92,917.64		92,917.64		92,917.64	0.00	92,917.64		92,917.64	0.00	0.25	23,229.41
06.03	SUMINISTRO DE PRODUCTOR DE HIELO EN BLOQUE/DE 10 TN/DIA	GLB	1.00	440,773.25		440,773.25		440,773.25	0.00	440,773.25		440,773.25	0.00	0.25	110,193.31
06.04	SUMINISTRO DE ENFRIADOR DE AGUA +15°C	GLB	1.00	51,742.98		51,742.98		51,742.98	0.00	51,742.98		51,742.98	0.00	0.25	12,935.75
06.05	EQUIPAMIENTO DE TAREAS PREVIAS	GLB	1.00	83,050.82		83,050.82		83,050.82	0.00	83,050.82		83,050.82	0.00	1.00	83,050.82
06.06	ACCESORIOS PARA TRANSPORTE Y ESTIBA	GLB	1.00	71,119.33		71,119.33		71,119.33	0.00	71,119.33		71,119.33	0.00	1.00	71,119.33
06.07	ACCESORIOS PARA PERSONAL OPERATIVO	GLB	1.00	10,974.58		10,974.58		10,974.58	0.00	10,974.58		10,974.58	0.00	1.00	10,974.58
06.08	MOBILIARIO VARIOS	GLB	1.00	32,754.25		32,754.25		32,754.25	0.00	32,754.25		32,754.25	0.00	1.00	32,754.25
06.09	EQUIPO MONITOREO Y SEGURIDAD	GLB	1.00	45,508.47		45,508.47		45,508.47	0.00	45,508.47		45,508.47	0.00	1.00	45,508.47
	COSTO DIRECTO			915,312.15		503,928.53		0.00	0.00	503,928.53		0.00	0.00	411,383.63	
	GASTOS GENERALES			10%	91,531.22	10%	50,392.85	10%	0.00	10%	50,392.85	10%	0.00	10%	41,138.36
	UTILIDAD			10%	91,531.22	10%	50,392.85	10%	0.00	10%	50,392.85	10%	0.00	10%	41,138.36
	SUB-TOTAL			1,098,374.59		604,714.23		604,714.23	0.00	604,714.23		604,714.23	0.00	499,660.35	
	IGV.			18%	197,707.43	18%	108,848.56	18%	0.00	18%	108,848.56	18%	0.00	18%	88,858.86
	TOTAL ESTADO DE PAGO			1,296,082.02		713,562.79		713,562.79	0.00	713,562.79		713,562.79	0.00	582,519.21	
														55.06%	

CESEL
JEFE DE SUPERVISIÓN


YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 79973

CESEL VALORIZACION N° 25 **FONDEPES** Versión 1.00
Fondo Nacional de Desarrollo Ambiental Fecha 41150.00

07. IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA"

CLIENTE: FONDEPES RESIDENTE PSV.: Luis Portallino Segundo

LUGAR: PIURA - TALARÁ - EL ALTO FECHA: 43616.00

POLINOMICA 07

Item	Descripción	TOTAL PRESUPUESTO		VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
		Unidad	Metrado	Precio	Parcial	Metrado	Precio	Parcial	CANT	SUB TOTAL	CANT
07	MEDIO AMBIENTE										
07.01	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EFLUENTES										
07.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR DE BASURA	und	25.00	220.00	5,500.00	25.00	220.00	0.00	44,740.00	25.00	5,500.00
07.01.02	AREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL	GLB	1.00	1,200.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1.00	1,200.00
07.01.03	CILINDROS METALICOS PARA ALMACENAMIENTO DE AFLUENTES INDUSTRIALES	und	10.00	420.00	4,200.00	10.00	420.00	0.00	4,200.00	10.00	4,200.00
07.01.04	ALQUILER BAÑOS QUIMICOS	mes	10.00	2,368.00	23,680.00	10.00	2,368.00	0.00	23,680.00	10.00	23,680.00
07.01.05	TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS	VIE	20.00	508.00	10,160.00	20.00	508.00	0.00	10,160.00	20.00	10,160.00
07.02	SEÑALIZACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD										
07.02.01	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	50.00	40.00	2,000.00	50.00	40.00	0.00	2,000.00	50.00	2,000.00
07.02.02	SEÑALIZACION PERMANENTE	und	40.00	75.00	3,000.00	40.00	75.00	0.00	3,000.00	40.00	3,000.00
07.03	CAPACITACION EN TEMAS AMBIENTALES Y SEGURIDAD										
07.03.01	CHARLA DE SEGURIDAD EN OBRA PARA PERSONAL	est	10.00	200.00	2,000.00	10.00	200.00	0.00	2,000.00	10.00	2,000.00
07.03.02	CHARLA SOBRE TEMAS AMBIENTALES - PESCADORES	est	3.00	750.00	2,250.00	3.00	750.00	0.00	2,250.00	3.00	2,250.00
07.04	MITIGACION DE IMPACTOS SOCIALES										
07.04.01	CONTINGENCIA Y ACCESOS PARA PESCADORES A MUELLE PROVISIONAL DURANTE OBRA	GLB	1.00	50,000.00	50,000.00	1.00	50,000.00	0.00	50,000.00	1.00	50,000.00
07.05	MITIGACION DE IMPACTOS EN MEDIO AMBIENTE										
07.05.01	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL CALIDAD AIRE, AGUA RUIDO	GLB	1.00	8,790.00	8,790.00	1.00	8,790.00	0.00	8,790.00	1.00	8,790.00
07.05.02	MEDIDAS MITIGACION EMISION DE POLVO	GLB	1.00	2,033.90	2,033.90	1.00	2,033.90	0.00	2,033.90	1.00	2,033.90
07.05.03	MEDIDAS MITIGACION EMISION DE RUIDOS	GLB	1.00	2,500.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	2,500.00	1.00	2,500.00
07.05.04	MEDIDAS MITIGACION CONTAMINACION DE AGUA	GLB	1.00	2,033.90	2,033.90	1.00	2,033.90	0.00	2,033.90	1.00	2,033.90
07.06	PROGRAMACION DE CONTINGENCIAS										
07.06.01	PRIMEROS AUXILIOS	GLB	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1.00	1,500.00
07.06.02	CONTRA INCENDIO	GLB	1.00	1,600.00	1,600.00	1.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1.00	1,600.00
07.07	PROGRAMACION DE CIERRE DE OBRA										
07.07.01	DESMONTE DE ESTRUCTURAS TEMPORALES	GLB	1.00	2,710.00	2,710.00	0.10	2,710.00	0.00	2,710.00	0.10	2,710.00
COSTO DIRECTO					125,157.80		122,718.80	0.00	122,718.80		2,439.00
GASTOS GENERALES											
UTILIDAD											
SUB.TOTAL					125,157.80		122,718.80	0.00	122,718.80		2,439.00
IGV.											
TOTAL ESTADO DE PAGO					177,223.44		173,769.82	0.00	173,769.82		3,453.62

YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79072

CESEL
 JEFE DE SUPERVISIÓN

7. RECOMENDACIONES.


Se recomienda a Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES):

- ✓ Pagar la factura del Contratista con el monto de: S/. 0.00 (CERO CON 0/100)
- ✓ La Entidad debe tomar en cuenta que las misma debe quedar **supeditada hasta la presentación de actualización / renovación de la Poliza C.A.R. y cartas fianzas renovación de carta fianza de FIEL CUMPLIMIENTO.**
- ✓ Se recomienda a la Entidad hacer entrega de la Corrección al AD 05 D.V.05, de esa manera actualizar los cronogramas y calendarios de obra así como los porcentajes de avance del mismo adicional.
- ✓ Con carta CSL.170801.ED.691.19 la Supervisión ha informado a la Entidad sobre el incumplimiento de la carta N°120-2019-FONDEPES/OGA y recomienda a FONDEPES aplicar el artículo 136 del RLCE, donde indica: "Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato (...)".

Atentamente.

Ing. Yesil Silva Espinoza
JEFE DE SUPERVISIÓN
CESEL SA





YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 79973

ANEXO 01

Valorización N° 25 – MAYO 2019
Presentada por el PSV





YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 79973



Cabo Blanco, 31 de mayo de 2019

PSV -395-DPA CB-2019

Señores : Cesel Ingenieros
 Atención : Ing. Yesil Silva Espinoza.
 Proyecto : "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero
 Pesquero Artesanal en la Localidad de Cabo Blanco,
 Distrito de el Alto, Provincia de Talara, Región de
 Piura".
 Asunto : Entrega de valorizaciones

De nuestra consideración:


Hacemos entrega de las valorizaciones de obra correspondientes al mes de mayo.

- Valorización N° 25 del presupuesto principal
- Valorización N° 3 del adicional N° 4 " Baja tensión"

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente

Residente de Obra
Ing. Luis Portalino Segundo
PSV CONSTRUCTORES S.A.



Av. El Pinar 180 OF. 1103 1104 Centro Empresarial Torre el Pinar, Chacarilla El Estanque – Surco - Lima – Perú. Teléf.

51 01 3721145 51 01 3723065

E-mail: obras@psv.com.pe, Página Web: www.psv.com.pe

YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973



RESUMEN GENERAL
VALORIZACION N° 25
AL 31.05.2019



PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"


UBICACIÓN : PIURA - TALARA - EL ALTO
CLIENTE : FONDEPES
CONTRATISTA : PSV CONSTRUCTORES SA
FECHA : 31.05.2019

I.- COSTO DIRECTO CONTRACTUAL :		SI.	9,627,696.65
II.- VALORIZACION			
TOTAL COSTO DIRECTO		SI.	-
GASTOS GENERALES	10.0000%	SI.	-
UTILIDADES	10.0000%	SI.	-
PARCIAL DE VALORIZACION		SI.	-
AMORTIZACION DE ADELANTO EN EFECTIVO	10.000%	SI.	-
AMORTIZACIÓN DE ADELANTO POR MATERIALES N° 1	15.000%	SI.	-
AMORTIZACIÓN DE ADELANTO POR MATERIALES N° 2	15.000%	SI.	-
SUB TOTAL VALORIZACION			-
IGV	18.0000%	SI.	-
TOTAL VALORIZACION		SI.	-

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 08/100 SOLES

III.- PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZACION	0.00%
IV.- PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	63.75%

YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 79973



PSV

CESEL

VALORIZACION 25

FONDEPES

Versión: 1
Fecha: 29-08-12

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA"

CLIENTE: FONDEPES

LUGAR: PIURA - TALARÁ - EL ALTO

RESIDENTE PSV.: Luis Portalino Segundo

FECHA: 31.05.2019


CESEL

YESIL SILVA ESPINOZA

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO			VAL. ANTERIORES			VAL. ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		CANT	P.U.	PARCIAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL
01	ESTRUCTURAS DE MAR	1.00	3,147,998.11	3147998.11		2,270,129.1	0.00		2,270,129.1		2,270,129.1		877,869		877,869	
02	ESTRUCTURAS EN TIERRA	1.00	3,644,015.32	3644015.32		2,750,816.26	0.00		2,750,816.3		2,750,816.3		893,199		893,199	
03	ARQUITECTURA	1.00	1,200,063.96	1200063.96		249,193.75	0.00		249,193.7		249,193.7		950,870		950,870	
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	44,954.91	44954.91		3,218.37	0.00		3,218.4		3,218.4		41,737		41,737	
05	INSTALACIONES SANITARIAS	1.00	550,193.40	550193.4		237,356.60	0.00		237,356.6		237,356.6		312,837		312,837	
06	EQUIPAMIENTO	1.00	915,312.15	915312.15		503,928.53	0.00		503,928.5		503,928.5		411,384		411,384	
07	IMPACTO AMBIENTAL	1.00	125,157.80	125157.8		122,718.80	0.00		122,718.8		122,718.8		2,439		2,439	
TOTAL COSTO DIRECTO				9,627,695.65		6,137,361.46	0.00		6,137,361.46		6,137,361.46		3,490,334.19		3,490,334.19	
GASTOS GENERALES				962,769.57		613,736.15	10%		613,736.15		613,736.15		349,033.42		349,033.42	
UTILIDAD				962,769.57		613,736.15	10%		613,736.15		613,736.15		349,033.42		349,033.42	
SUB-TOTAL				11,553,234.79		7,364,833.76	0.00		7,364,833.76		7,364,833.76		4,188,401.03		4,188,401.03	
IGV				2,079,582.26		1,325,670.08	18%		1,325,670.08		1,325,670.08		753,912.19		753,912.19	
TOTAL ESTADO DE PAGO				13,632,817.1		8,690,503.8	0.00		8,690,503.8		8,690,503.8		4,942,313.22		4,942,313.22	


PSV CONSTRUCTORES SA

LUIS PORTALINO SEGUNDO



CESEL


YESIL SILVA ESPINOZA




YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 79973

01. RESUMEN OBRAS PORTUARIAS				
PROYECTO:		"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"		
CLIENTE:		FONDEPES		
LUGAR:		PIURA - TALARA - EL ALTO		
POLINOMICA:		'01		
Item	Descripción	TOTAL PRESUPUESTO		VAL ACT
		Unidad	Metrado	Metrado
01	OBRAS PORTUARIAS			
01.01	OBRAS PROVISIONALES			
01.01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS - OBRAS PORTUARIAS	GLB	1.00	
01.01.02	TRANSPORTE DE MATERIALES	est	1.00	
01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	mes	10.00	
01.01.04	AGUA PARA LA OBRA	mes	10.00	
01.01.05	ENERGIA PARA LA OBRA	mes	10.00	
01.01.06	CARTEL DE OBRA	und	1.00	
01.01.07	LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	mes	10.00	
01.01.08	INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL PARA EJECUCION Y SUPERVISION (OFICINAS, ALMACENES, COMEDORES, CASITAS, ETC)	m ²	250.00	
01.01.09	SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL E IMPLEMENTACION DE PROTECCION	GLB	1.00	
01.01.10	LOSAS PARA PREFABRICADOS	m ²	250.00	
01.01.11	PRUEBA DE CARGA	und	4.00	
01.01.12	DEMOLICION DE LOSAS Y VIGAS(PUENTE Y CABEZO)	m ³	172.10	
01.01.13	EXTRACCION DE PILOTES	und	100.00	
01.01.14	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m ³	360.12	
01.02	MUELLE L=159.80 M			
01.02.01	FABRICACION DE PILOTES DE CONCRETO			
01.02.01.01	CONCRETO EN PILOTES f'c=350 kg/cm ²	m ³	510.32	
01.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	4,082.56	
01.02.01.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm ²	kg	185,027.69	
01.02.02	FABRICACION DE VIGAS TRANSVERSALES			
01.02.02.01	CONCRETO EN VIGAS TRANSVERSALES f'c=280 kg/cm ²	m ³	107.23	
01.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	814.10	
01.02.02.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm ²	kg	27,475.68	
01.02.03	FABRICACION DE LOSAS NERVADAS EN MUELLE			
01.02.03.01	CONCRETO EN LOSAS f'c=280 kg/cm ²	m ³	159.18	
01.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	932.08	
01.02.03.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm ²	kg	40,469.69	
01.02.04	NUCLEOS LLENADOS IN SITU			
01.02.04.01	CONCRETO EN NUCLEO f'c=280 kg/cm ²	m ³	127.81	
01.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	249.30	
01.02.04.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm ²	kg	13,807.58	
01.02.05	JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES			
01.02.05.01	CONCRETO EN VIGA MANDIL f'c=280 kg/cm ²	m ³	34.39	
01.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	57.43	
01.02.05.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm ²	kg	1,345.34	
01.02.06	SARDINEL LLENADO IN SITU			
01.02.06.01	CONCRETO EN SARDINEL f'c=280 kg/cm ²	m ³	14.40	
01.02.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	128.00	
01.02.06.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm ²	kg	3,240.13	
01.02.07	LOSAS VACIADAS IN SITU			
01.02.07.01	CONCRETO EN LOSAS f'c=280 kg/cm ²	m ³	134.40	
01.02.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	67.84	
01.02.07.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm ²	kg	17,527.23	
01.03	CABEZO L=39.50M			
01.03.01	FABRICACION DE PILOTES DE CONCRETO			
01.03.01.01	CONCRETO EN PILOTES f'c=350 kg/cm ²	m ³	269.80	
01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	2,158.40	
01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm ²	kg	126,926.41	
01.03.02	FABRICACION DE VIGAS TRANSVERSALES			
01.03.02.01	CONCRETO EN VIGAS TRANSVERSALES f'c=280 kg/cm ²	m ³	38.70	
01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	288.87	
01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm ²	kg	9,679.71	
01.03.03	FABRICACION DE LOSAS NERVADAS EN CABEZO			
01.03.03.01	CONCRETO EN LOSAS f'c=280 kg/cm ²	m ³	94.57	
01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	484.52	
01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm ²	kg	18,630.42	
01.03.04	NUCLEOS LLENADOS IN SITU			
01.03.04.01	CONCRETO EN NUCLEOS f'c=280 kg/cm ²	m ³	30.64	

YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. C.O.P. N° 10002

01. RESUMEN OBRAS PORTUARIAS				
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA"			
CLIENTE:	FONDEPES			
LUGAR:	PIURA - TALARÁ - EL ALTO			
POLINOMICA:	'01			
		TOTAL PRESUPUESTO		VAL ACT
01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	67.56	
01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	3,117.54	
01.03.05	JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES			
01.03.05.01	CONCRETO EN VIGA MANDIL f'c=280 kg/cm2	m ³	26.45	
01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	99.95	
01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	1,804.99	
01.03.06	LOSAS VACIADAS IN SITU			
01.03.06.01	CONCRETO EN LOSAS f'c=280 kg/cm2	m ³	63.20	
01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	19.20	
01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	9,303.64	
01.03.07	MANIOBRA DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS EN PUENTES			
01.03.07.01	TRANSPORTE DE PILOTE	und	141.00	
01.03.07.02	TRANSPORTE DE VIGAS TRANSVERSALES	und	34.00	
01.03.07.03	TRANSPORTE DE VIGAS PREFABRICADAS	und	59.00	
01.03.07.04	PUNTA PARA PILOTE	und	141.00	
01.03.07.05	HINCADO DE PILOTE (INCL.MOV. Y POSIC.PLANTILLA)	und	141.00	
01.03.07.06	DESCABEZADO DE PILOTAJE	und	141.00	
01.03.07.07	COLOCACION DE VIGA TRANSVERSAL	und	34.00	
01.03.07.08	COLOCACION DE LOSA NERVADA	und	59.00	
01.03.08	MANIOBRA DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS EN CABEZO			
01.03.08.01	TRANSPORTE DE PILOTE	und	64.00	
01.03.08.02	TRANSPORTE DE VIGAS TRANSVERSALES	und	8.00	
01.03.08.03	TRANSPORTE DE VIGAS PREFABRICADAS	und	29.00	
01.03.08.04	PUNTA PARA PILOTE	und	64.00	
01.03.08.05	HINCADO DE PILOTE (INCL. MOV. Y POSIC. PLANTILLA)	und	64.00	
01.03.08.06	DESCABEZADO DE PILOTAJE	und	64.00	
01.03.08.07	COLOCACION DE VIGA TRANSVERSAL	und	8.00	
01.03.08.08	COLOCACION DE LOSA NERVADA	und	29.00	
01.04	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE Y CABEZO			
01.04.01	SUM. Y COLOC. SARDINELES DE MADERA 8"x 8" S/TACOS DE 8"x 8"x2"	m	86.40	
01.04.02	SUMIN. COLOCACION DE BITAS METALICAS 30BRT	und	10.00	
01.04.03	FABRICACION DE PILOTES METALICOS H.PARANTES DE DEFENSE	m	544.78	
01.04.04	FABRICACION DE VIGAS METALICAS (LARGUEROS DE DEFENSA)	m	158.00	
01.04.05	SUM. Y COLOC. DE BLOCKS DE JEBE HUECO DE 6"x 6" EN VIGA	BLK	56.00	
01.04.06	HINCADO DE PARANTES METALICOS SECCION H 8"x 8"X6mm, INCL.TRANSP.	und	56.00	
01.04.07	MONTAJE VIGAS H(6"x 6"), LONG. C/PARANTES, INCL.TRANSP.	m	154.00	
01.04.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSAS TIPO D	m	159.50	
01.04.09	BARANDAS DE TUBERIA DE ACERO, EN PUENTE Y ESCALINATAS DE EMBARCADERO	m	214.80	
01.04.10	PINTURA DE PARANTES Y VIGAS LONGITUDINALES EN DEFENSAS	m ²	350.00	
01.05	ENROCADO DE PROTECCION Y TERRAPLEN			
01.05.01	EXTRACCION DE ROCA EN TERRAPLEN EXISTENTE	m ²	580.00	
01.05.02	CORTE MASIVO EN TALUD Y UÑA	m ³	1,160.10	
01.05.03	COLOCACION DE ROCA FILTRO > A 50 KG EN TALUD Y UÑA	m ³	672.30	
01.05.04	ENROCADO DE PROTECCION ACOMODADO ROCA DE 30"-40"	m ³	1,141.20	
01.05.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m ³	1,392.12	
01.06	ESTRUCTURAS SANITARIAS			
01.06.01	CONCRETO EN MUROS f'c=280 kg/cm2	m ³	6.85	
01.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	67.93	
01.06.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	909.65	
COSTO DIRECTO				
GASTOS GENERALES				
UTILIDAD				
SUB.TOTAL				
IGV.				
TOTAL ESTADO DE PAGO				
 PSV CONSTRUCTORES SA LUIS PORTALINO SEGUNDO				


 YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973



VALORIZACIÓN 25

Versión 1
Fecha 29-08-12

01. OBRAS PORTUARIAS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA"

CLIENTE: FONDEPES

LUGAR: PIURA - TALARÁ - EL ALTO

POLINOMICA: '01

RESIDENTE PSV.:

FECHA:

Luis Portalino Segundo
31.05.2019

Item	Descripción	TOTAL PRESUPUESTO			VAL ANTERIORES			VAL ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR				
		Unidad	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	Unidad	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL
01.01.01	OBRAS PORTUARIAS				3,147,998.11													
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES				563,013.16													
01.01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS - OBRAS PORTUARIAS	GLB	1.00	75,000.00														
01.01.02	TRANSPORTE DE MATERIALES	est	1.00	65,000.00														
01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	mes	10.00	2,587.83														
01.01.04	AGUA PARA LA OBRA	mes	10.00	509.25														
01.01.05	ENERGÍA PARA LA OBRA	mes	10.00	1,065.35														
01.01.06	CARTEL DE OBRA	und	1.00	1,779.66														
01.01.07	LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	mes	10.00	1,810.41														
01.01.08	INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL PARA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN (OFICINAS, ALMACENES, COMEDORES, CASITAS, ETC)	m²	250.00	163.89														
01.01.09	SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN	GLB	1.00	28,091.02														
01.01.10	LOSAS PARA PREFABRICADOS	m²	250.00	127.28														
01.01.11	PRUEBA DE CARGA	und	4.00	18,996.65														
01.01.12	DEMOLICIÓN DE LOSAS Y VIGAS (PUENTE Y CABEZO)	m²	172.10	375.42														
01.01.13	EXTRACCIÓN DE PILOTES	und	100.00	1,110.33														
01.01.14	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m³	360.12	24.97														
01.02.01	MUJELLE L=159.80 M				1,018,086.93													
01.02.01	FABRICACIÓN DE PILOTES DE CONCRETO				771,368.62													
01.02.01.01	CONCRETO EN PILOTES f'c=350 kg/cm2	m³	264.50	638.78														
01.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	1,587.00	41.07														
01.02.01.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	131,674.81	4.08														
01.02.02	FABRICACIÓN DE VIGAS TRANSVERSALES				25,345.40													
01.02.02.01	CONCRETO EN VIGAS TRANSVERSALES f'c=280 kg/cm2	m³	6.30	529.06														
01.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	48.00	41.07														
01.02.02.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	4,912.00	4.08														
01.02.03	FABRICACIÓN DE LOSAS NERVADAS EN MUJELLE				221,372.91													
01.02.03.01	CONCRETO EN LOSAS f'c=280 kg/cm2	m³	114.00	499.58														
01.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	653.00	41.07														
01.02.03.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	33,776.00	4.08														
01.02.04	NUCLEOS LLENADOS IN SITU				0.00													
01.02.04.01	CONCRETO EN NUCLEO f'c=280 kg/cm2	m³	0.00	529.06														
01.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	0.00	41.07														
01.02.04.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	0.00	4.08														
01.02.05.01	CONCRETO EN VIGA MANDIL f'c=280 kg/cm2	m³	0.00	529.06														
01.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	0.00	41.07														
01.02.05.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	0.00	4.08														
01.02.06	SARDINEL LLENADO IN SITU				0.00													
01.02.06.01	CONCRETO EN SARDINEL f'c=280 kg/cm2	m³	0.00	529.06														
01.02.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	0.00	41.07														
01.02.06.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	0.00	4.08														

YESILYOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 R.O. Nº 79973



VALORIZACIÓN 25

Versión
Fecha

29-08-12

01. OBRAS PORTUARIAS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGIÓN PIURA"

CLIENTE: FONDEPES

RESIDENTE PSV.:

Luis Portalino Segundo

LUGAR: PIURA - TALARÁ - EL ALTO

FECHA:

31.05.2019

POLINOMICA: '01

			TOTAL PRESUPUESTO	VAL ANTERIORES	VAL ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR VALORIZAR
01.02.07	LOSAS VACIADAS IN SITU		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.07.01	CONCRETO EN LOSAS f'c=280 kg/cm2	m³	529.06	0.00	529.06	0.00	0.00
01.02.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	41.07	0.00	41.07	0.00	0.00
01.02.07.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00
01.03	CABEZO L=39.50M		1,260,272.50	572,096.50	0.00	572,096.50	688,175.60
01.03.01	FABRICACION DE PILOTES DE CONCRETO		778,848.08	510,188.92	0.00	510,188.92	268,659.16
01.03.01.01	CONCRETO EN PILOTES f'c=350 kg/cm2	m³	172,342.84	220.38	638.78	220.38	140,771.14
01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	88,645.49	1,440.00	41.07	1,440.00	31,571.70
01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	517,859.75	310,276.98	4.08	76,048.28	29,504.69
01.03.02	FABRICACION DE VIGAS TRANSVERSALES		71,831.73	0.00	0.00	0.00	207,582.77
01.03.02.01	CONCRETO EN VIGAS TRANSVERSALES f'c=280 kg/cm2	m³	38.70	0.00	529.06	0.00	38.70
01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	288.87	0.00	41.07	0.00	20,474.62
01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	9,679.71	0.00	4.08	0.00	288.87
01.03.03	FABRICACION DE LOSAS NERVADAS EN CABEZO		143,156.63	0.00	0.00	0.00	9,679.71
01.03.03.01	CONCRETO EN LOSAS f'c=280 kg/cm2	m³	94.57	0.00	499.58	0.00	0.00
01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	484.52	0.00	41.07	0.00	94.57
01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	18,630.42	0.00	4.08	0.00	484.52
01.03.04	NUCLEOS LLENADOS IN SITU		31,694.07	0.00	0.00	0.00	18,630.42
01.03.04.01	CONCRETO EN NUCLEOS f'c=280 kg/cm2	m³	30.62	0.00	529.06	0.00	30.62
01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	67.56	0.00	41.07	0.00	67.56
01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	3,117.54	0.00	4.08	0.00	2,774.69
01.03.05	JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES		25,462.95	0.00	0.00	0.00	3,117.54
01.03.05.01	CONCRETO EN VIGA MANDIL f'c=280 kg/cm2	m³	26.45	0.00	529.06	0.00	26.45
01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	99.95	0.00	41.07	0.00	99.95
01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	1,804.99	0.00	4.08	0.00	1,804.99
01.03.06	LOSAS VACIADAS IN SITU		72,183.98	0.00	0.00	0.00	72,183.98
01.03.06.01	CONCRETO EN LOSAS f'c=280 kg/cm2	m³	63.20	0.00	529.06	0.00	63.20
01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	19.20	0.00	41.07	0.00	19.20
01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2	kg	9,303.64	0.00	4.08	0.00	9,303.64
01.03.07	MANIOBRA DE COLOCACION E HINGADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS EN PUENTES		49,231.58	49,231.58	0.00	49,231.58	0.00
01.03.07.01	TRANSPORTE DE PILOTE	und	2.00	2.00	315.36	2.00	2.00
01.03.07.02	TRANSPORTE DE VIGAS TRANSVERSALES	und	1.00	1.00	212.17	1.00	1.00
01.03.07.03	TRANSPORTE DE LOSAS NERVADAS	und	0.00	0.00	212.17	0.00	0.00
01.03.07.04	PIUNTA PARA PILOTE	und	141.00	141.00	294.80	141.00	141.00
01.03.07.05	HINGADO DE PILOTE (INCL.MOV. Y POSIC.PIANTILLA)	und	2.00	2.00	5,063.12	2.00	2.00
01.03.07.06	DESCABEZO DE PILOTAJE	und	1.00	1.00	72.42	1.00	1.00
01.03.07.07	COLOCACION DE VIGA TRANSVERSAL	und	1.00	1.00	1,613.93	1.00	1.00
01.03.07.08	COLOCACION DE LOSA NERVADA	und	0.00	0.00	807.47	0.00	0.00

01. OBRAS PORTUARIAS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGIÓN PIURA"

CLIENTE: FONDEPES

LUGAR: PIURA - TALARÁ - EL ALTO

POLINOMICA: '01

RESIDENTE PSV.:

FECHA:

Luis Portalino Segundo
31.05.2019


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL PRESUPUESTO	VAL ANTERIORES	VAL ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR VALORIZAR
01.03.08	MANOBRAS DE COLOCACION E HINGADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS EN CABEZO			12,676.40	0.00	12,676.40	75,187.08
01.03.08.01	TRANSPORTE DE PILOTE	und	64.00	0.00	315.36	0.00	64.00
01.03.08.02	TRANSPORTE DE VIGAS TRANSVERSALES	und	8.00	0.00	212.17	0.00	8.00
01.03.08.03	TRANSPORTE DE VIGAS PREFABRICADAS	und	29.00	0.00	212.17	0.00	29.00
01.03.08.04	PUNTA PARA PILOTE	und	64.00	43.00	294.80	43.00	21.00
01.03.08.05	HINGADO DE PILOTE (INCL. MOV. Y POSIC. PLANTILLA)	und	0.00	0.00	2,531.56	0.00	0.00
01.03.08.06	DESCABEZADO DE PILOTAJE	und	64.00	0.00	72.42	0.00	64.00
01.03.08.07	COLOCACION DE VIGA TRANSVERSAL	und	8.00	0.00	1,613.93	0.00	8.00
01.03.08.08	COLOCACION DE LOSA NERVADA	und	29.00	0.00	807.47	0.00	29.00
01.04	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE Y CABEZO			10,745.00	0.00	10,745.00	46,875.14
01.04.01	SUMA Y COLOC. SARDINELES DE MADERA 8"x 8" - S/TACOS DE 8"x 8"x 2"	m	86.40	0.00	111.51	0.00	86.40
01.04.02	SUMIN. COLOCACION DE BITAS METALICAS 30BRT	und	10.00	0.00	483.81	0.00	10.00
01.04.03	FABRICACION DE PILOTES METALICOS H/PARANTES DE DEFENSA	m	0.00	0.00	356.94	0.00	0.00
01.04.04	FABRICACION DE VIGAS METALICAS (LARGUEROS DE DEFENSA)	m	0.00	0.00	356.94	0.00	0.00
01.04.05	SUMI. Y COLOC. DE BLOCKS DE JEBE HUECO DE 8"x 8" EN VIGA	BLK	0.00	0.00	176.62	0.00	0.00
01.04.06	HINGADO DE PARANTES METALICOS SECCION H 8"x 8"x 6mm; INCL. TRANSP.	und	0.00	0.00	901.59	0.00	0.00
01.04.07	MONTAJE VIGAS HIG"x 6" LONG. C/PARANTES, INCL. TRANSP.	m	0.00	0.00	131.73	0.00	0.00
01.04.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSAS TIPO D	m	0.00	0.00	526.95	0.00	0.00
01.04.09	BARRANDAS DE TUBERIA DE ACERO, EN PUENTE Y ESCALINATAS DE EMBARCADERO	m	214.80	0.00	32,402.58	0.00	214.80
01.04.10	PINTURA DE PARANTES Y VIGAS LONGITUDINALES EN DEFENSAS	m²	350.00	350.00	10,745.00	350.00	0.00
01.05	ENROCADO DE PROTECCION Y TERRAPLEN			144,547.10	0.00	144,547.10	94,402.14
01.05.01	EXTRACCION DE ROCA EN TERRAPLEN EXISTENTE	m³	580.00	580.00	15,683.20	580.00	0.00
01.05.02	CORTE MASIVO EN TALUD Y UÑA	m³	1,160.10	609.00	4,616.22	609.00	551.10
01.05.03	COLOCACION DE ROCA FILTRO > 50 KG EN TALUD Y UÑA	m³	672.30	413.23	43,872.63	413.23	27,505.46
01.05.04	ENROCADO DE PROTECCION ACOMODADO ROCA DE 30"-40"	m³	1,141.20	699.60	62,068.51	699.60	39,178.25
01.05.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m³	1,392.12	609.00	18,306.54	609.00	23,540.59
01.06	ESTRUCTURAS SANITARIAS			10,056.14	0.00	10,056.14	3,554.88
01.06.01	CONCRETO EN MUROS Tc=280 kg/cm2	m³	6.85	0.00	518.96	0.00	6.85
01.06.02	ENCOPRADO Y DESECOFRADO	m²	67.93	0.00	41.07	0.00	67.93
01.06.03	ACERO DE REFUERZO fy=200 kg/cm2	kg	909.65	0.00	3,711.37	0.00	909.65
COSTO DIRECTO			3,147,998.11	2,270,129.15	2,270,129.14	0.00	877,868.97
GASTOS GENERALES			314,799.81	10%	227,012.91	10%	87,786.90
UTILIDAD			314,799.81	10%	227,012.91	10%	87,786.90
SUB-TOTAL			3,777,597.73		2,724,154.97		1,053,442.77
IGV			679,967.59	18%	490,347.89	18%	189,619.70
TOTAL ESTADO DE PAGO			4,457,565.32		3,214,502.86		1,243,062.47

PSV CONSTRUCTORES SA
LUIS PORTALINO SEGUNDO

CESEL
YESIL SILVA ESPINOZA

YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Doc. CIP N° 70973

02. RESUMEN OBRAS TIERRA				
PROYECTO:		"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"		
CLIENTE:		FONDEPES		
LUGAR:		PIURA - TALARA - EL ALTO		
POLINOMICA:		'02		
Item	Descripción	TOTAL PRESUPUESTO		VAL ACT
		Unidad	Metrado	Metrado
02 ESTRUCTURAS EN TIERRA				
02.01 DEMOLICIONES				
02.01.01	DEMOLICION DE ZAPATAS , CIMIENTOS COLUMNAS Y MUROS	m ³	206.44	
02.01.02	DEMOLICION DE VIGAS Y TECHOS	m ³	71.65	
02.01.03	DEMOLICION DE PISOS, RAMPAS Y VEREDAS	m ²	2,320.00	
02.01.04	DESMONTAJE TECHO LIVIANO	m ²	485.00	
02.01.05	DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO EXISTENTE	m	182.00	
02.01.06	DEMOLICION TANQUE ELEVADO Y CISTERNA	GLB	1.00	
02.01.07	DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS	und	15.00	
02.01.08	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	und	6.00	
02.01.09	DESMONTAJE DE BARANDAS EN ZONA DE MUELLE Y CABEZO	m	190.00	
02.01.10	DESMONTAJE VIGAS DE MADERA, BITAS Y PESCANES	und	11.00	
02.01.11	DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO EN ZONA DE FRIO	und	4.00	
02.01.12	DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS	und	6.00	
02.01.13	DESMONTAJE DE TINAS DE CONCRETO EN TAREAS PREVIAS	und	4.00	
02.01.14	DEMOLICION DE CUNETAS DE MAMPOSTERIA	m ²	13.50	
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.02.01	CORTE MASIVO Y ELIMINACION DE MATERIAL CON MAQUINARIAS	m ³	7,313.23	
02.02.02	CONFORMACION DE TERRAPLEN	m ³	11,731.91	
02.02.03	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION	m ³	1,457.80	
02.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m ³	829.83	
02.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m ³	1,279.79	
02.02.06	AFIRMADO PARA FALSO PISO Y PASILLOS	m ²	1,980.00	
02.02.07	AFIRMADO PARA PATIO DE MANIOBRAS Y PASILLOS	m ²	1,250.00	
02.02.08	NIVELACION INTERIOR APISONADO PARA FALSO PISO, PATIO Y VEREDAS	m ²	3,230.00	
02.03 CONCRETO SIMPLE				
03.03.01	CONCRETO CICLOPEO FC= 100 KG/CM ² + 30% PG (6" MAX)	m ³	94.08	
03.03.02	CONCRETO FC= 175 KG/CM ² +30% PG (6" MAX)	m ³	90.48	
02.04 CONCRETO ARMADO				
02.04.01 SOBRECIMIENOS REFORZADOS				
02.04.01.01	CONCRETO FC=280 KG/CM ² - CIMENTACIONES	m ³	111.88	
02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMENTACIONES	m ²	1,670.74	
02.04.01.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	kg	9,047.75	
02.04.02 ZAPATAS				
02.04.02.01	CONCRETO FC=280 KG/CM ² - CIMENTACIONES	m ³	133.20	
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMENTACIONES	m ²	276.23	
02.04.02.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	kg	3,731.97	
02.04.03 VIGA DE CIMENTACION				
02.04.03.01	CONCRETO FC=280 KG/CM ² - CIMENTACIONES	m ³	154.34	
02.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMENTACIONES	m ²	445.05	
02.04.03.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	kg	17,140.27	
02.04.04 COLUMNAS Y PLACAS				
02.04.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM ² - COLUMNAS, PLACAS Y MUROS	m ³	206.86	
02.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS, PLACAS Y MUROS	m ²	2,149.98	
02.04.04.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	kg	28,160.03	
02.04.05 VIGAS				
02.04.05.01	CONCRETO FC=280 KG/CM ² - VIGAS	m ³	163.52	
02.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS	m ²	1,131.95	
02.04.05.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	kg	26,671.54	
02.04.06 LOSA ALIGERADA				
02.04.06.01	CONCRETO FC=210 KG/CM ² - LOSA ALIGERADA	m ³	151.47	
02.04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS	m ²	1,500.27	
02.04.06.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	kg	8,211.06	
02.04.06.04	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM - LOSA ALIGERADA	und	5,906.00	
02.04.06.05	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 20X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO	und	7,331.00	
02.04.07 LOSA MACIZA				
02.04.07.01	CONCRETO FC=280 KG/CM ² LOSAS MACIZAS	m ³	8.63	
02.04.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS	m ²	48.31	
02.04.07.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	kg	892.88	
02.04.08 ESCALERAS				
02.04.08.01	CONCRETO FC=210 KG/CM ² - ESCALERAS Y RAMPAS	m ³	9.98	
02.04.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	50.10	
02.04.08.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	kg	811.95	
02.04.09 PISOS Y VEREDAS ARMADOS				


 YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973

02. RESUMEN OBRAS TIERRA


PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"

CLIENTE: FONDEPES

LUGAR: PIURA - TALARA - EL ALTO

POLINOMICA: '02

		TOTAL PRESUPUESTO	VAL ACT
02.04.09.01	CONCRETO FC=280 KG/CM ² - LOSAS MACIZAS	m ³	297.00
02.04.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS	m ²	51.45
02.04.09.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	kg	19,602.00
02.05 PATIO DE MANIOBRAS			
02.05.01	CONCRETO FC=280 KG/CM ² - LOSA VEHICULAR	m ³	297.60
02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS	m ²	151.56
02.05.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	kg	16,368.00
02.05.04	JUNTA DE SELLO ELASTOMERICO e=2cm.	m	930.00
02.06 RAMPAS GRADERIAS Y VARIOS			
02.06.01	CONCRETO FC=280 KG/CM ² - ESTRUCTURAS MENORES	m ³	12.66
02.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	1.64
02.06.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	kg	1,038.51
02.07 MUROS DE CONTENION			
02.07.01	CONCRETO FC=280 KG/CM ² - ESTRUCTURAS MENORES	m ³	34.21
02.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	232.78
02.07.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	m ³	1,392.99
02.08 CERCO PERIMETRICO			
02.08.01 CIMIENTO CORRIDO			
02.08.01.01	CONCRETO FC= 175 KG/CM ² +30% PG (6"MAX)	m ³	70.20
02.08.02 SOBRECIMIETOS			
02.08.02.01	CONCRETO FC=210 KG/CM ²	m ³	10.80
02.08.03 COLUMNAS			
02.08.03.01	CONCRETO FC=280 KG/CM ² . COLUMNAS	m ³	8.10
02.08.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS	m ²	108.00
02.08.03.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	kg	1,585.68
02.08.04 VIGAS			
02.08.04.01	CONCRETO FC=280 KG/CM ² - VIGAS	m ³	4.05
02.08.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS	m ²	54.00
02.08.04.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	kg	859.82
02.09 ESTRUCTURAS SANITARIAS			
02.09.01 TANQUE ELEVADO Y CISTERNAS			
02.09.01.01	CONCRETO FC=280 KG/CM ² - ESTRUCTURAS MENORES	m ³	99.71
02.09.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	297.20
02.09.01.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	kg	11,658.30
02.09.01.04	JUNTAS WATER STOP 6"	m	19.00
02.09.02 TANQUE SEPTICO			
02.09.02.01	CONCRETO FC=280 KG/CM ² - ESTRUCTURAS MENORES	m ³	25.16
02.09.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	93.56
02.09.02.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	kg	1,557.54
02.09.02.04	JUNTAS WATER STOP 6"	m	23.30
02.09.03 CAMARA DE GRASAS			
02.09.03.01	CONCRETO FC=280 KG/CM ² - ESTRUCTURAS MENORES	m ³	4.17
02.09.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	21.17
02.09.03.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	kg	276.43
02.09.03.04	JUNTAS WATER STOP 6"	m	10.70
02.09.04 CAMARA DE REJAS			
02.09.04.01	CONCRETO FC=280 KG/CM ² - ESTRUCTURAS MENORES	m ³	2.24
02.09.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	23.02
02.09.04.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	kg	141.00
02.09.04.04	JUNTAS WATER STOP 6"	m	8.10
02.09.05 CASETA DE BOMBEO - EMISOR			
02.09.05.01	CONCRETO FC=280 KG/CM ² - ESTRUCTURAS MENORES	m ³	12.56
02.09.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	59.57
02.09.05.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	kg	666.28
02.10 ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA			
02.10.01	ESTRUCTURA METALICA EN MUELLE	und	7.00
02.10.02	ESTRUCTURA METALICA EN TIERRA	und	7.00
02.10.03	POLICARBONATO COLOR BLANCO, E=8MM(INC ACCESORIOS, PROVISION Y COLOCACION)	m ²	644.00
COSTO DIRECTO			
GASTOS GENERALES			
UTILIDAD			
SUB.TOTAL			
IGV.			
TOTAL ESTADO DE PAGO			


 YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973



PSV CONSTRUCTORES SA
 LUIS PORTALINO SEGUNDO



VALORIZACIÓN 25



Versión 1
Fecha 29-08-12

Luis Portallino Segundo
31.05.2019

RESIDENTE PSV:
FECHA:

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA"

CLIENTE: FONDEPES
LUGAR: PIURA - TALARÁ - EL ALTO
POLINOMICA: 02

Item	Descripción	TOTAL PRESUPUESTO		VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR			
		Unidad	Metrado	Precio	Parcial	Unidad	Metrado	Precio	Parcial	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL
02.01	ESTRUCTURAS EN TIERRA												
02.01.01	DEMOLICIONES												
02.01.01	DEMOLICION DE ZAPATAS, CIMIENTOS COLUMNAS Y MUROS	m³	206.44	239.10	3,644,015.32	2,750,816.3	0.00	0.00	2,750,816.3	0.00	0.00	893,199.06	
02.01.02	DEMOLICION DE VIGAS Y TECHOS	m³	71.65	210.81	144,343.28	143,037.80	0.00	0.00	143,037.80	0.00	0.00	1,305.49	
02.01.03	DEMOLICION DE PISOS, RAMPAS Y VEREDAS	m²	2,320.00	21.88	49,359.80	48,054.32	239.10	0.00	200.98	48,054.32	5.46	0.00	1,305.49
02.01.04	DEMONTAJE TECHO LIVIANO	m²	485.00	5.71	15,104.54	15,104.54	210.81	0.00	71.65	15,104.54	0.00	0.00	0.00
02.01.05	DEMONTAJE DE CERCO PERIMETRICO EXISTENTE	m	182.00	79.33	50,761.60	50,761.60	21.88	0.00	2,320.00	50,761.60	0.00	0.00	0.00
02.01.06	DEMONTAJE DE TANQUE ELEVADO Y GISTERNA	GLB	1.00	6,857.74	485.00	2,769.35	5.71	0.00	485.00	2,769.35	0.00	0.00	0.00
02.01.07	DEMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS	und	15.00	308.25	14,438.06	14,438.06	79.33	0.00	182.00	14,438.06	0.00	0.00	0.00
02.01.08	DEMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	und	6.00	49.32	6,857.74	6,857.74	20.55	0.00	1.00	6,857.74	0.00	0.00	0.00
02.01.09	DEMONTAJE DE BARANDAS EN ZONA DE MUELLE Y CABEZO	m	190.00	2.84	308.25	308.25	20.55	0.00	15.00	308.25	0.00	0.00	0.00
02.01.10	DEMONTAJE VIGAS DE MADERA, BITAS Y PESCANTES	und	4.00	565.86	539.60	539.60	2.84	0.00	6.00	539.60	0.00	0.00	0.00
02.01.11	DEMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS	und	6.00	30.77	11.00	26.43	11.00	0.00	190.00	539.60	0.00	0.00	0.00
02.01.12	DEMONTAJE DE TINAS DE CONCRETO EN TAREAS PREVIAS	und	4.00	214.95	2,263.44	2,263.44	565.86	0.00	4.00	2,263.44	0.00	0.00	0.00
02.01.13	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m³	13.50	22.95	184.62	184.62	30.77	0.00	6.00	184.62	0.00	0.00	0.00
02.01.14	CORTE MASIVO Y ELIMINACION DE MATERIAL CON MAQUINARIAS	m³	7,313.23	30.06	859.80	859.80	214.95	0.00	4.00	859.80	0.00	0.00	0.00
02.02.01	CONFORMACION DE TERRAPLEN	m³	11,731.91	71.62	309.83	309.83	22.95	0.00	13.50	309.83	0.00	0.00	0.00
02.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION	m³	1,455.05	15.31	1,119,432.90	1,119,432.90	0.00	0.00	0.00	1,119,432.90	0.00	0.00	124,157.45
02.02.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m³	802.02	16.78	217,414.18	217,414.18	30.06	0.00	7,232.67	217,414.18	80.56	0.00	2,421.51
02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m³	1,279.79	24.97	837,465.55	837,465.55	71.62	0.00	11,693.18	837,465.55	38.73	0.00	2,773.84
02.02.05	AFIRMADO PARA PATIO DE MANIOBRAS Y PASILLOS	m²	1,980.00	29.91	16,066.89	16,066.89	15.31	0.00	0.00	1,049.44	0.00	0.00	6,209.93
02.02.06	AFIRMADO PARA PATIO DE MANIOBRAS Y PASILLOS	m²	1,250.00	24.92	8,477.26	8,477.26	16.78	0.00	505.20	8,477.26	296.82	0.00	4,980.64
02.02.07	NIVELACION INTERIOR APISONADO PARA FALSO PISO, PATIO Y VEREDAS	m²	3,230.00	7.88	31,956.36	31,956.36	24.97	0.00	1,279.79	31,956.36	0.00	0.00	0.00
02.03.01	CONCRETO SIMPLE	m³	94.08	277.36	1,679.15	1,679.15	7.88	0.00	0.00	213.09	1,679.15	0.00	0.00
02.03.02	CONCRETO CICLOPE FC=100 KG/CM² + 30% PG (6" MAX)	m³	90.48	444.61	50,539.58	50,539.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.03.03	CONCRETO FC=175 KG/CM² + 30% PG (6" MAX)	m³	90.48	444.61	26,094.03	26,094.03	277.36	0.00	94.08	26,094.03	0.00	0.00	0.00
02.04.01	SOBRECIMENTOS REFORZADOS	m³	99.92	613.86	54.98	1,067,101.09	0.00	0.00	0.00	1,067,101.09	0.00	0.00	579,155.18
02.04.02	ENCORADO Y DESENCORADO - CIMENTACIONES	m³	1,571.79	51.90	134,152.01	134,152.01	613.86	0.00	0.00	134,152.01	0.00	0.00	42,183.28
02.04.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM²	kg	8,191.79	4.08	43,783.75	43,783.75	51.90	0.00	71.33	43,783.75	28.59	0.00	17,553.14
02.04.04	ZAPATAS	m³	133.20	653.98	56,945.76	56,945.76	444.61	0.00	1,097.22	56,945.76	474.57	0.00	24,630.14
02.04.05	CONCRETO FC=280 KG/CM² - CIMENTACIONES	m³	273.36	51.90	33,422.50	33,422.50	4.08	0.00	8,191.79	33,422.50	0.00	0.00	0.00
02.04.06	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM²	kg	2,758.12	4.08	93,631.46	93,631.46	0.00	0.00	0.00	24,445.55	35.50	0.00	15,782.77
02.04.07	VIGA DE CIMENTACION	m³	154.34	653.98	126,609.66	126,609.66	0.00	0.00	0.00	1,067,101.09	0.00	0.00	579,155.18
02.04.08	CONCRETO FC=280 KG/CM² - CIMENTACIONES	m³	445.05	51.90	74,827.08	74,827.08	653.98	0.00	0.00	93,631.46	0.00	0.00	18,919.19
02.04.09	ENCORADO Y DESENCORADO - CIMENTACIONES	m³	17,140.27	4.08	111,253.13	111,253.13	51.90	0.00	145.50	111,253.13	127.86	0.00	6,636.12
02.04.10	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM²	kg	17,140.27	4.08	126,609.66	126,609.66	0.00	0.00	0.00	11,253.11	0.00	0.00	0.02
02.04.11	COLUMNAS Y PLACAS	m³	206.86	719.65	148,866.80	148,866.80	653.98	0.00	90.89	126,609.66	0.00	0.00	67,356.02
02.04.12	CONCRETO FC=210 KG/CM² - COLUMNAS, PLACAS Y MUROS	m³	214.98	45.83	111,052.23	111,052.23	51.90	0.00	145.50	111,052.23	18.78	0.00	12,283.05
02.04.13	ENCORADO Y DESENCORADO - COLUMNAS, PLACAS Y MUROS	m³	28,160.03	4.08	84,031.28	84,031.28	4.08	0.00	2,758.12	84,031.28	316.44	0.00	14,502.31
02.04.14	VIGAS	m³	163.52	679.62	103,176.03	103,176.03	0.00	0.00	0.00	103,176.03	2,871.79	0.00	67,108.49
02.04.15	CONCRETO FC=280 KG/CM² - VIGAS	m³	131.95	48.63	206,559.00	206,559.00	679.62	0.00	0.00	206,559.00	0.00	0.00	67,108.49
02.04.16	ENCORADO Y DESENCORADO - VIGAS	m³	26,345.42	4.08	85,040.03	85,040.03	48.63	0.00	125.13	85,040.03	38.39	0.00	26,091.43
02.04.17	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM²	kg	26,345.42	4.08	43,253.55	43,253.55	0.00	0.00	889.44	43,253.55	242.51	0.00	11,793.17
02.04.18	LOSA ALIGERADA	m³	143.77	608.73	161,659.74	161,659.74	608.73	0.00	19,182.70	161,659.74	7,162.72	0.00	29,223.89
02.04.19	CONCRETO FC=210 KG/CM² - LOSA ALIGERADA	m³	143.77	608.73	64,860.27	64,860.27	106.55	0.00	106.55	64,860.27	37.22	0.00	22,656.84

YESILY OTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
79973

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGIÓN PIURA"

CLIENTE: FONDEPES

LUGAR: PIURA - TALARÁ - EL ALTO

POLINOMICA: 02

RESIDENTE PSV.:

FECHA:

Luis Portallino Segundo
31.05.2019

Código	Descripción	TOTAL PRESUPUESTO		VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR
		m ²	kg	m ³	kg		m ²	kg	
02.04.06.02	ENCORADO Y DESENCORADO - LOSAS	1,500.27	44.95	67,437.14	980.69	44.95	0.00	980.69	519.58
02.04.06.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	8,211.06	4.08	33,501.12	6,600.67	4.08	0.00	6,600.67	1,610.39
02.04.06.04	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM - LOSA ALIGERADA	5,906.00	2.67	15,769.02	6,018.02	2.67	0.00	6,018.02	-299.08
02.04.06.05	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 20X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO	7,331.00	4.22	30,936.82	2,303.00	4.22	0.00	2,303.00	5,028.00
02.04.07	LOSA MACIZA	11,239.56	0.00	11,239.56	0.00	0.00	0.00	0.00	11,239.56
02.04.07.01	CONCRETO FC=280 KG/CM ² - LOSAS MACIZAS	8.63	628.63	5,425.08	0.00	628.63	0.00	0.00	8.63
02.04.07.02	ENCORADO Y DESENCORADO - LOSAS	48.31	44.95	2,171.53	0.00	44.95	0.00	0.00	48.31
02.04.07.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	892.88	4.08	3,642.95	0.00	4.08	0.00	0.00	892.88
02.04.08	ESCALERAS	12,051.15	0.00	12,051.15	4,392.33	0.00	0.00	4,392.33	7,658.79
02.04.08.01	CONCRETO FC=210 KG/CM ² - ESCALERAS Y RAMPAS	9.98	585.08	5,839.10	3.30	585.08	0.00	3.30	9.98
02.04.08.02	ENCORADO Y DESENCORADO	50.10	57.87	2,899.29	21.82	57.87	0.00	21.82	50.10
02.04.08.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	811.95	4.08	3,312.76	293.55	4.08	0.00	293.55	811.95
02.04.09	PISOS Y VEREDAS ARMADOS	268,991.95	0.00	268,991.95	41,837.35	0.00	0.00	41,837.35	227,154.60
02.04.09.01	CONCRETO FC=280 KG/CM ² - LOSAS MACIZAS	297.00	628.63	186,703.11	60.18	628.63	0.00	60.18	297.00
02.04.09.02	ENCORADO Y DESENCORADO - LOSAS	51.45	44.95	2,312.68	32.96	44.95	0.00	32.96	51.45
02.04.09.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	19,602.00	4.08	79,976.16	618.32	4.08	0.00	618.32	19,602.00
02.05	PATIO DE MANIOBRAS	297.60	516.00	153,561.60	267.84	516.00	0.00	267.84	297.60
02.05.01	ENCORADO Y DESENCORADO - LOSA VEHICULAR	151.56	44.95	6,812.62	136.40	44.95	0.00	136.40	151.56
02.05.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	16,368.00	4.08	66,781.44	14,731.20	4.08	0.00	14,731.20	16,368.00
02.05.04	JUNTA DE SELLO ELASTOMERICO e=2cm.	930.00	19.09	17,533.70	837.00	19.09	0.00	837.00	930.00
02.06	RAMPAS GRADERIAS Y VARIOS	11,957.91	0.00	11,957.91	2,44,908.36	0.00	0.00	2,44,908.36	8,252.99
02.06.01	CONCRETO FC=280 KG/CM ² - ESTRUCTURAS MENORES	12.66	602.36	7,625.88	3.86	602.36	0.00	3.86	12.66
02.06.02	ENCORADO Y DESENCORADO	1.64	57.87	94.91	1.64	57.87	0.00	1.64	1.64
02.06.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	1,038.51	4.08	4,237.12	174.63	4.08	0.00	174.63	1,038.51
02.07	MUROS DE CONTENCIÓN	34.21	602.36	39,761.12	29,421.35	0.00	0.00	29,421.35	10,339.77
02.07.01	CONCRETO FC=280 KG/CM ² - ESTRUCTURAS MENORES	34.21	602.36	20,606.74	25.51	602.36	0.00	25.51	34.21
02.07.02	ENCORADO Y DESENCORADO	232.78	57.87	13,470.98	144.69	57.87	0.00	144.69	232.78
02.07.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	1,392.99	4.08	5,683.40	1,392.99	4.08	0.00	1,392.99	1,392.99
02.08	CERCO PERIMETRICO	59,991.23	0.00	59,991.23	37,965.33	0.00	0.00	37,965.33	22,025.91
02.08.01	CIMIENTO CORRIDO	28,410.58	0.00	28,410.58	28,410.58	0.00	0.00	28,410.58	0.00
02.08.01.01	CONCRETO FC=175 KG/CM ² +30% PG (S'MAX)	63.90	444.61	28,410.58	63.90	444.61	0.00	63.90	63.90
02.08.02	SOBRACIMENTOS	5,445.72	0.00	5,445.72	1,533.44	0.00	0.00	1,533.44	3,912.28
02.08.02.01	CONCRETO FC=210 KG/CM ²	9.83	553.99	5,445.72	2.77	553.99	0.00	2.77	9.83
02.08.03	COLUMNAS	17,248.38	0.00	17,248.38	5,365.47	0.00	0.00	5,365.47	11,882.92
02.08.03.01	CONCRETO FC=280 KG/CM ² - COLUMNAS	8.10	719.65	5,829.17	2.12	719.65	0.00	2.12	8.10
02.08.03.02	ENCORADO Y DESENCORADO - COLUMNAS	108.00	45.83	4,949.64	39.12	45.83	0.00	39.12	108.00
02.08.03.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	1,585.68	4.08	6,469.57	501.70	4.08	0.00	501.70	1,585.68
02.08.04	VIGAS	8,886.55	0.00	8,886.55	2,655.84	0.00	0.00	2,655.84	6,230.71
02.08.04.01	CONCRETO FC=280 KG/CM ² - VIGAS	4.05	679.62	2,752.46	1.31	679.62	0.00	1.31	4.05
02.08.04.02	ENCORADO Y DESENCORADO - VIGAS	54.00	48.63	2,626.02	26.47	48.63	0.00	26.47	54.00
02.08.04.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	859.82	4.08	3,508.07	117.23	4.08	0.00	117.23	859.82
02.09	ESTRUCTURAS SANITARIAS	163,111.08	0.00	163,111.08	79,767.26	0.00	0.00	79,767.26	83,343.81
02.09.01	TANQUE ELEVADO Y CISTERNAS	112,823.59	0.00	112,823.59	50,676.50	0.00	0.00	50,676.50	62,147.09
02.09.01.01	CONCRETO FC=280 KG/CM ² - ESTRUCTURAS MENORES	84.31	602.36	50,784.22	30.89	602.36	0.00	30.89	84.31
02.09.01.02	ENCORADO Y DESENCORADO	286.10	57.87	16,556.60	240.48	57.87	0.00	240.48	286.10
02.09.01.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	10,980.70	4.08	44,801.24	4,354.59	4.08	0.00	4,354.59	17,766.71
02.09.01.04	JUNTAS WATER STOP 6"	19.00	35.87	681.53	10.80	35.87	0.00	10.80	19.00
02.09.02	TANQUE SEPTICO	27,760.23	0.00	27,760.23	19,208.80	0.00	0.00	19,208.80	8,551.43
02.09.02.01	CONCRETO FC=280 KG/CM ² - ESTRUCTURAS MENORES	25.16	602.36	15,155.38	16.16	602.36	0.00	16.16	25.16
02.09.02.02	ENCORADO Y DESENCORADO	93.56	57.87	5,414.32	79.59	57.87	0.00	79.59	93.56
02.09.02.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM ²	1,557.54	4.08	6,354.76	1,193.33	4.08	0.00	1,193.33	1,557.54
02.09.02.04	JUNTAS WATER STOP 6"	23.30	35.87	835.77	0.00	35.87	0.00	0.00	23.30

YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CP 1973

PSV		CEBEL		VALORIZACIÓN 25		FONDEPES		Versión			
02. OBRAS TIERRA								Fecha			
PROYECTO:		"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"		RESIDENTE PSV.:		Luis Portalino Segundo		31.05.2019			
CLIENTE:		FONDEPES		FECHA:							
LUGAR:		PIURA - TALARA - EL ALTO									
POLINOMICA:		02									
		TOTAL PRESUPUESTO		VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
02.09.03	CAMARA DE GRASAS	5,248.59		3,574.46	0.00	0.00	3,574.46	1,674.13			
02.09.03.01	CONCRETO FC=280 KG/CM² - ESTRUCTURAS MENORES	2,511.84	4.17	2.58	0.00	602.36	1,551.68	960.16	2.58	1,551.68	1.59
02.09.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	1,225.11	21.17	1,189.81	0.00	57.87	20.56	35.30	20.56	1,189.81	0.61
02.09.03.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM²	1,127.83	276.43	204.16	0.00	4.08	832.97	294.86	204.16	832.97	72.27
02.09.03.04	JUNTAS WATER STOP 6"	383.81	10.70	0.00	0.00	35.87	0.00	383.81	0.00	0.00	10.70
02.09.04	CAMARA DE REJAS	3,547.29		0.00	0.00	0.00	0.00	3,547.29	0.00	0.00	
02.09.04.01	CONCRETO FC=280 KG/CM² - ESTRUCTURAS MENORES	1,349.29	2.24	0.00	0.00	602.36	0.00	1,349.29	0.00	0.00	2.24
02.09.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	1,332.17	23.02	0.00	0.00	57.87	0.00	1,332.17	0.00	0.00	23.02
02.09.04.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM²	575.28	141.00	0.00	0.00	4.08	0.00	575.28	0.00	0.00	141.00
02.09.04.04	JUNTAS WATER STOP 6"	290.55	8.10	0.00	0.00	35.87	0.00	290.55	0.00	0.00	8.10
02.09.05	CASITA DE BOMBEO - EMISOR	13,731.38		6,307.50	0.00	0.00	6,307.50	7,423.87	0.00	6,307.50	
02.09.05.01	CONCRETO FC=280 KG/CM² - ESTRUCTURAS MENORES	7,565.64	12.56	4.36	0.00	602.36	2,626.29	4,939.35	4.36	2,626.29	8.20
02.09.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	3,447.32	59.57	36.06	0.00	57.87	2,086.79	1,360.52	36.06	2,086.79	23.51
02.09.05.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=42000 KG/CM²	2,718.42	666.28	390.79	0.00	4.08	1,594.42	1,124.00	390.79	1,594.42	275.49
02.10	ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA	23,772.36		0.00	0.00	0.00	0.00	23,772.36	0.00	0.00	
02.10.01	ESTRUCTURA METALICA EN MUJELLE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,638.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.10.02	ESTRUCTURA METALICA EN TIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,533.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.10.03	POLICARBONATO COLOR BLANCO, E=8MM(INC. ACCESORIOS, PROVISION Y COLOCACION)	23,772.36	135.54	0.00	0.00	175.39	0.00	23,772.36	0.00	0.00	135.54
COSTO DIRECTO		3,644,015.32		2,750,816.26	0.00	175.39	2,750,816.27	893,199.06			
GASTOS GENERALES		364,401.53	10%	275,081.63	10%	0.00	275,081.63	89,319.91	10%	275,081.63	10%
UTILIDAD		364,401.53	10%	275,081.63	10%	0.00	275,081.63	89,319.91	10%	275,081.63	10%
SUB.TOTAL		4,372,818.38		3,300,979.52	0.00	0.00	3,300,979.53	1,071,838.88			
IGV.		787,107.31	18%	594,176.31	18%	0.00	594,176.32	192,931.00	18%	594,176.32	18%
TOTAL ESTADO DE PAGO		5,159,925.69		3,895,155.83	0.00	0.00	3,895,155.85	1,264,769.88			



PSV CONSTRUCTORES SA
LUIS PORTALINO SEGUNDO

CEBEL
YESIL SILVA ESPINOZA

YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 79973

03. RESUMEN ARQUITECTURA


PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"

CLIENTE: FONDEPES

LUGAR: PIURA - TALARA - EL ALTO

POLINOMIK '03

Item	Descripción	TOTAL PRESUPUESTO		VAL ACT
		Unidad	Metrado	Metrado
03	ARQUITECTURA			
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA			
03.01.01	MURO DE LADRILLO KING KONG E=0.15m	m2	1,404.60	
03.01.02	MURO DE LADRILLO KING KONG E=0.25m	m2	574.02	
03.01.03	MURO DE LADRILLO KING KONG E=0.10m	m2	7.20	
03.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS			
03.02.01	TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CEMENTO-ARENA MEZCLA 1:5	m2	2,458.00	
03.02.02	TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CEMETO-ARENA MEZCLA 1:5	m2	3,380.72	
03.02.03	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES	m2	262.17	
03.02.04	TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5	m2	253.78	
03.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO = 15 CM	m	1,563.43	
03.03	CIELORRASOS			
03.03.01	CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m2	1,501.20	
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS			
03.04.01	FALSO PISO DE COCRETO E=2"	m2	1,059.80	
03.04.02	CONTRAPISO DE 25mm	m2	441.40	
03.04.03	PISO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE	m2	1,734.76	
03.04.04	PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO	m2	294.78	
03.04.05	PISO DE VINILICO DE ALTO TRANSITO	m2	81.82	
03.04.06	VEREDA	m2	110.04	
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS			
03.05.01	ZOCALO DE CERAMICO COLOR 0.40 X 0.40M	m2	226.02	
03.05.02	CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.10M	m	64.60	
03.05.03	CONTRAZOCALO DE CEMENTO DISEÑO SANITARIO H=0.10M	m	469.23	
03.05.04	CONTRAZOCALO DE CEDRO DE E=1", H=0.10M	m	71.60	
03.06	COBERTURAS			
03.06.01	CUBIERTA LADRILLO PASTELERO 24x24 ASENTADO C/MEZCLA 1:5 2.5CM, JUNTA 1:5 1.5CM	m2	1,003.86	
03.07	CARPINTERIA DE MADERA			
03.07.01	PUERTA APANELADA DE MADERA, CON MARCO DE MAD. CEDRO 1 1/2"X6"	m2	61.44	
03.07.02	PUERTA CONTRAPLACADA E=45MM, TRIPLAY LUPANA 6MM. CON MARCO DE MAD. CEDRO 1 1/2"X4"	m2	12.24	
03.07.03	TABIQUE DE MELAMINE PARA BAÑOS Y VESTIDORES, E=15MM	m2	61.74	
03.08	CARPINTERIA METALICA			
03.08.01	PUERTA DE ALTO IMPACTO BARRA ANTIPANICO	m2	15.84	
03.08.02	PUERTA DE ALTO IMPACTO, TIPO VAIVEN	m2	36.72	
03.08.03	PUERTA METALICA, TUBO GALVANIZADO 2", MALLA GALVANIZADA N°8	m2	99.42	
03.08.04	CERCO METALICO, TUBO GALVANIZADO 2", MALLA GALVANIZADA N°8	m2	14.88	
03.08.05	PUERTA METALICA VEHICULAR, TUBO GALVANIZADO REFORZADO	m2	24.00	
03.08.06	PUERTA SECCIONABLE PS 2.60X3.00	und	6.00	
03.08.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRIGO RETRACTIL	und	5.00	
03.08.08	BARANDA DE TUBO FIERRO GALVANIZADO PASAMANO 1 1/2" - PARANTE 1"X1M	m	147.63	
03.08.09	BARANDA DE FIERRO DE 2 1/2"	m	319.00	
03.09	CARPINTERIA DE ALUMINIO			
03.09.01	VENTANA DE ALUMINO, C/VIDRIO TEMPLADO	m2	220.97	
03.09.02	VENTANA DE ALUMINO, CON MALLA MOSQUITERA	m2	108.98	


 YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973

03. RESUMEN ARQUITECTURA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"

CLIENTE: FONDEPES

LUGAR: PIURA - TALARA - EL ALTO

POLINOMIO: 03

		TOTAL PRESUPUESTO		VAL ACT
03.09.03	PUERTA ENROLLABLE DE ALUMINIO	m2	19.20	
03.10	CERRAJERIA			
03.10.01	CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA CON TIRADOR	und	24.00	
03.10.02	CERRADURA DE PERILLA PARA PUERTAS INTERIORES	und	5.00	
03.10.03	BISAGRA CAPUCHINA DE 3"	pza	131.00	
03.11	PINTURA			
03.11.01	PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES CON EPOXICO	m2	1,657.18	
03.11.02	PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES CON LATEX	m2	800.82	
03.11.03	PINTURA EN PISOS CON EPOXICO	m2	803.17	
03.11.04	PINTURA EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES CON LATEX	m2	3,380.72	
03.11.05	PINTURA EN CIELO RASO CON EPOXICO	m2	859.94	
03.11.06	PINTURA EN CIELO RASO CON PINTURA LATEX	m2	669.38	
03.12	OTROS			
03.12.01	CORTINA DE TRASLAPE DE PVC (PROVISION Y COLOCACION)	m2	35.04	
03.12.02	PROTECCION DE JEBE DE BORDE DE PLATAFORMA	m	18.35	

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDAD


SUB.TOTAL

IGV.

TOTAL ESTADO DE PAGO



PSV CONSTRUCTORES SA
LUIS PORTALINO SEGUNDO


YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 79973

CEBEL		VALORIZACIÓN 25		FONDEPES		Version	1					
IPSU		VALORIZACIÓN 25		FONDEPES		Fecha	29-08-12					
03.ARQUITECTURA		VALORIZACIÓN 25		FONDEPES		Luis Portallino Segundo						
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"		VALORIZACIÓN 25		FONDEPES		31.05.2019						
CLIENTE: FONDEPES		VALORIZACIÓN 25		FONDEPES		RESIDENTE PSV:						
LUGAR: PIURA - TALARA - EL ALTO		VALORIZACIÓN 25		FONDEPES		FECHA:						
POLINOMIK'03		VALORIZACIÓN 25		FONDEPES		31.05.2019						
Item	Descripción	TOTAL PRESUPUESTO		VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR		
		Unidad	Metrado	Precio	Parcial	Si.	Metrado	Precio	Parcial	Si.	CANT	SUB TOTAL
03.01	ARQUITECTURA											
03.01.01	MUROS Y TABICAJES DE ALBAÑILERIA	m2	1,399.01	64.96	1,200,063.96	249,193.75	0.00	0.00	249,193.75	0.00	950,870.22	60,337.76
03.01.02	MURO DE LADRILLO KING KONG E=0.15m	m2	574.02	103.38	59,342.19	715.58	64.96	64.96	46,483.82	715.58	683.43	44,395.87
03.01.03	MURO DE LADRILLO KING KONG E=0.25m	m2	7.20	53.99	388.73	423.57	103.38	103.38	43,789.03	423.57	150.45	15,553.16
03.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS											
03.02.01	TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CEMENTO-ARENA MEZCLA 1:5	m2	2,458.00	34.03	83,645.74	694.73	34.03	34.03	23,641.59	694.73	1,763.27	60,004.15
03.02.02	TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CEMENTO-ARENA MEZCLA 1:5	m2	3,348.90	42.51	142,361.74	794.89	42.51	42.51	33,790.60	794.89	2,554.01	108,571.14
03.02.03	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES	m2	249.66	42.27	10,553.13	239.50	42.27	42.27	10,123.67	239.50	10.16	429.46
03.02.04	TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5	m2	253.78	31.65	8,032.14	266.95	31.65	31.65	8,449.03	266.95	-13.17	-416.89
03.03	VESTIDOURA DE DERRAMES ANCHO = 15 CM	m	1,554.31	16.58	25,770.46	583.86	16.58	16.58	9,680.40	583.86	970.45	16,090.06
03.03.01	CIELORASOS											
03.03.02	CIELORASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m2	1,501.20	39.50	59,297.40	772.35	39.50	39.50	30,507.83	772.35	728.85	28,789.58
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS											
03.04.01	FALSO PISO DE CONCRETO E=2"	m2	1,059.80	26.91	28,519.22	208.68	26.91	26.91	5,615.58	208.68	851.12	22,903.64
03.04.02	CONTRAPISO DE 25mm	m2	434.35	24.71	10,758.85	208.68	24.71	24.71	5,169.00	208.68	225.67	5,589.85
03.04.03	PISO DE CEMENTO PUJUDO CON IMPERMEABILIZANTE	m2	1,734.76	47.74	82,817.44	92.60	47.74	47.74	4,420.72	92.60	1,642.16	78,396.72
03.04.04	PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO	m2	287.73	60.89	17,519.88	116.08	60.89	60.89	7,068.11	116.08	171.65	10,451.77
03.04.05	PISO DE VINILICO DE ALTO TRANSITO	m2	81.82	70.45	5,764.22	0.00	70.45	70.45	0.00	0.00	81.82	5,764.22
03.04.06	VEREDA	m2	110.04	52.65	5,793.61	0.00	52.65	52.65	0.00	0.00	110.04	5,793.61
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS											
03.05.01	ZOCALO DE CERAMICO COLOR 0.40 X 0.40M	m2	222.24	58.31	12,958.81	0.00	58.31	58.31	0.00	0.00	222.24	12,958.81
03.05.02	CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.10M	m	64.60	18.91	1,221.59	0.00	18.91	18.91	0.00	0.00	64.60	1,221.59
03.05.03	CONTRAZOCALO DE CEMENTO DISEÑO SANITARIO H=0.10M	m	469.23	12.49	5,860.68	0.00	12.49	12.49	0.00	0.00	469.23	5,860.68
03.05.04	CONTRAZOCALO DE CEDRO DE E=1", H=0.10M	m	71.60	21.85	1,564.46	0.00	21.85	21.85	0.00	0.00	71.60	1,564.46
03.06	COBERTURAS											
03.06.01	CUBIERTA LADRILLO PASTELERO 24x24 ASENTADO C/MEZCLA 1:5 2.5CM,	m2	1,003.86	47.37	47,552.85	431.80	47.37	47.37	20,454.37	431.80	572.06	27,098.48
03.07	CARPINTERIA DE MADERA											
03.07.01	PUERTA APANELADA DE MADERA, CON MARCO DE MAD. CEDRO 1 1/2"x6"	m2	59.28	735.40	43,594.51	0.00	735.40	735.40	0.00	0.00	59.28	43,594.51
03.07.02	MAD. CEDRO 1 1/2"x4"	m2	12.24	531.49	6,505.44	0.00	531.49	531.49	0.00	0.00	12.24	6,505.44
03.07.03	PUERTA CONTRAPLACADA E=45MM, TRIPLAY LUPANA GMM, CON MARCO DE MAD. CEDRO 1 1/2"x4"	m2	61.74	241.76	14,926.26	0.00	241.76	241.76	0.00	0.00	61.74	14,926.26
03.08	CARPINTERIA METALICA											
03.08.01	PUERTA DE ALTO IMPACTO BARRA ANTI PANICO	m2	4.32	1,060.50	4,581.36	0.00	1,060.50	1,060.50	0.00	0.00	4.32	4,581.36
03.08.02	PUERTA DE ALTO IMPACTO, TIPO VAIVEN	m2	21.60	942.35	20,354.76	0.00	942.35	942.35	0.00	0.00	21.60	20,354.76
03.08.03	PUERTA METALICA, TUBO GALVANIZADO 2", MALLA GALVANIZADA N°8	m2	64.43	254.24	16,380.69	0.00	254.24	254.24	0.00	0.00	64.43	16,380.69
03.08.04	CERCO METALICO, TUBO GALVANIZADO 2", MALLA GALVANIZADA N°8	m2	14.88	322.03	4,791.81	0.00	322.03	322.03	0.00	0.00	14.88	4,791.81
03.08.05	PUERTA METALICA VEHICULAR, TUBO GALVANIZADO REFORZADO	m2	24.00	338.98	8,135.52	0.00	338.98	338.98	0.00	0.00	24.00	8,135.52
03.08.06	PUERTA SECCIONABLE PS 2.60X3.00	und	6.00	7,244.16	43,464.96	0.00	7,244.16	7,244.16	0.00	0.00	6.00	43,464.96
03.08.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRIGO RETRACTIL	und	5.00	6,816.33	34,081.65	0.00	6,816.33	6,816.33	0.00	0.00	5.00	34,081.65
03.08.08	BARANDA DE TUBO FIERRO GALVANIZADO PASAMANO 1 1/2" - PARANTE 1" X1M	m	147.63	138.76	20,485.14	0.00	138.76	138.76	0.00	0.00	147.63	20,485.14
03.08.09	BARANDA DE FIERRO DE 2 1/2"	m	319.00	100.68	32,116.92	0.00	100.68	100.68	0.00	0.00	319.00	32,116.92
03.09	CARPINTERIA DE ALUMINIO											
03.09.01	VENTANA DE ALUMINIO, C/VIDRIO TEMPERADO	m2	209.88	195.67	41,067.22	0.00	195.67	195.67	0.00	0.00	209.88	41,067.22
03.09.02	VENTANA DE ALUMINIO, CON MALLA MOSQUETERA	m2	108.98	132.83	14,475.81	0.00	132.83	132.83	0.00	0.00	108.98	14,475.81

INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 79973


PSV		CESEL		VALORIZACIÓN 25		FONDEPES		1
								29-08-12
								Fecha
								1
								29-08-12
								Fecha
								1
								29-08-12
								Fecha
03. ARQUITECTURA								
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGIÓN PIURA"								
CLIENTE: FONDEPES								
LUGAR: PIURA - TALARÁ - EL ALTO								
POLINOMIO '03								
RESIDENTE PSV.: Luis Portalino Segundo								
FECHA: 31.05.2019								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL PRESUPUESTO	VAL ANTERIORES	VAL ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR VALORIZAR	
03.09.03	PUERTA ENROLLABLE DE ALUMINIO	m2	19.20	0.00	1,341.53	0.00	19.20	25,757.38
03.10	CERRAJERIA		4,609.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609.38
03.10.01	CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA CON TIRADOR	und	18.00	0.00	103.25	0.00	18.00	1,858.50
03.10.02	CERRADURA DE PERILLA PARA PUERTAS INTERIORES	und	4.00	0.00	87.12	0.00	4.00	348.48
03.10.03	BISAGRA CAPUCHINA DE 3"	pza	104.00	0.00	23.10	0.00	104.00	2,402.40
03.11	PINTURA		158,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00	158,045.98
03.11.01	PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES CON EPOXICO	m2	1,657.18	0.00	28.64	0.00	1,657.18	47,461.64
03.11.02	PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES CON LATEX	m2	800.82	0.00	13.87	0.00	800.82	11,107.37
03.11.03	PINTURA EN PISOS CON EPOXICO	m2	803.17	0.00	22.83	0.00	803.17	18,336.37
03.11.04	PINTURA EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES CON LATEX	m2	3,348.90	0.00	15.36	0.00	3,348.90	51,439.10
03.11.05	PINTURA EN CIELO RASO CON EPOXICO	m2	859.94	0.00	21.88	0.00	859.94	18,815.49
03.11.06	PINTURA EN CIELO RASO CON PINTURA LATEX	m2	653.03	0.00	16.67	0.00	653.03	10,886.01
03.12	OTROS		6,086.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6,086.34
03.12.01	CORTINA DE TRASLAPE DE PVC (PROVISION Y COLOCACION)	m2	35.04	0.00	91.52	0.00	35.04	3,206.86
03.12.02	PROTECCION DE JEBE DE BORDE DE PLATAFORMA	m	18.35	0.00	156.92	0.00	18.35	2,879.48
COSTO DIRECTO			1,200,063.96	249,193.75	0.00	249,193.75	0.00	950,870.22
GASTOS GENERALES			120,006.40	10%	120,006.40	10%	24,919.37	24,919.37
UTILIDAD			120,006.40	10%	120,006.40	10%	24,919.37	24,919.37
SUB-TOTAL			1,440,076.76		1,440,076.76		299,032.49	299,032.49
IGV.			259,213.82	18%	259,213.82	18%	53,825.85	53,825.85
TOTAL ESTADO DE PAGO			1,699,290.58		1,699,290.58		352,858.34	352,858.34

PSV CONSTRUCTORES SA
LUIS PORTALINO SEGUINDO

CESEL
YESIL SILVA ESPINOZA

YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 79973

04. RESUMEN INSTALACIONES ELECTRICAS				
PROYECTO:		"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"		
CLIENTE:		FONDEPES		
LUGAR:		PIURA - TALARA - EL ALTO		
POLINOMICA		'04		
Item	Descripción	TOTAL PRESUPUESTO		VAL ACT
		Unidad	Metrado	Metrado
04	INSTALACIONES ELECTRICAS			
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES			
04.01.01	TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GLB	1.00	
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
04.02.01	ESCAVACION DE ZANJAS DE 0.50X0.60M PARA INSTALACION DE DUCTOS	m	1,165.00	
04.02.02	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m	1,049.00	
04.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	116.56	
04.03	SALIDAS DE ILUMINACION			
04.03.01	SALIDA PARA LUMINARIA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)	pto	146.00	
04.03.02	SALIDA PARA LUMINARIA DE PARED (CENTRO DE LUZ)	pto	2.00	
04.04	SALIDA DE INTERRUPTOR			
04.04.01	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	und	42.00	
04.04.02	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	und	2.00	
04.04.03	INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE	und	4.00	
04.04.04	INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CONMUTACION	und	2.00	
04.05	SALIDA PARA TOMACORRIENTE			
04.05.01	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H=.40 SNPT	pto	62.00	
04.05.02	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H=1.20 SNPT	pto	2.00	
04.05.03	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H=2.20 SNPT	pto	11.00	
04.05.04	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA A PRUEBA DE AGUA H=.40 SNPT	pto	16.00	
04.05.05	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA EN TECHO	pto	1.00	
04.06	SALIDAS DE FUERZA			
04.06.01	SALIDA SENSOR DE NIVEL DE AGUA	pto	2.00	
04.06.02	SALIDA DE FUERZA TRIFASICA	pto	16.00	
04.06.03	SALIDA DE FUERZA MONOFASICA	pto	16.00	
04.07	SALIDA DE DATA Y TELEFONIA			
04.07.01	SALIDA PARA TELEFONIA	pto	5.00	
04.07.02	SALIDA PARA RED DE COMPUTO	pto	5.00	
04.08	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO			
04.08.01	SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO	pto	5.00	
04.08.02	SALIDA PARA SENSOR DE HUMO	pto	19.00	
04.09	TUBERIAS DE PVC			
04.09.01	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=25MM	m	213.34	
04.09.02	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=35MM	m	1,230.36	
04.09.03	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=50MM	m	131.43	
04.09.04	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=100MM	m	30.00	
04.10	CABLES Y CONDUCTORES			
04.10.01	CABLE NH-90, 2-1x4mm2+1x4mm2(T) 450/750V	m	41.96	
04.10.02	CABLE NH-90, 2-1x6mm2+1x6mm2(T) 450/750V	m	247.98	
04.10.03	CABLE NH-90, 2-1x10mm2+1x10mm2(T) 450/750V	m	255.01	
04.10.04	CABLE NH-90, 3-1x4mm2+1x4mm2(T) 450/750V	m	89.61	
04.10.05	CABLE NH-90, 3-1x6mm2+1x6mm2(T) 450/750V	m	68.67	
04.10.06	CABLE NH-90, 3-1x16mm2+1x16mm2(T) 450/750V	m	25.10	
04.10.07	CABLE N2XOH, 4-1x185 mm2, 0.6/1kV	m	30.00	
04.10.08	CABLE N2XOH, 4-1x50 mm2, 0.6/1kV	m	133.83	
04.10.09	CABLE N2XOH, 4-1x16 mm2, 0.6/1kV	m	389.32	
04.10.10	CABLE N2XOH, 4-1x10 mm2, 0.6/1kV	m	152.42	


 YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973

04. RESUMEN INSTALACIONES ELECTRICAS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"
CLIENTE: FONDEPES
LUGAR: PIURA - TALARA - EL ALTO
POLINOMICA '04

		TOTAL PRESUPUESTO		VAL ACT
04.10.11	CABLE N2XOH, 4-1x6 mm2, 0.6/1kV	m	206.83	
04.11	TABLEROS INTERRUPTORES			
04.11.01	TABLERO GENERAL INICIAL TG	und	1.00	
04.11.02	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-01	und	1.00	
04.11.03	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-02	und	1.00	
04.11.04	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-03	und	1.00	
04.11.05	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-04	und	1.00	
04.11.06	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-05	und	1.00	
04.11.07	TABLERO DE DISTRIBUCION TF-01	und	1.00	
04.11.08	TABLERO DE DISTRIBUCION TF-02	und	1.00	
04.11.09	TABLERO DE DISTRIBUCION TF-03	und	1.00	
04.11.10	TABLERO DE DISTRIBUCION TI-01	und	1.00	
04.11.11	TABLERO DE DISTRIBUCION TI-02	und	1.00	
04.11.12	TABLERO DE DISTRIBUCION STD-01	und	1.00	
04.11.13	TABLERO DE DISTRIBUCION STD-02	und	1.00	
04.11.14	TABLERO DE DISTRIBUCION STD-03	und	1.00	
04.11.15	TABLERO DE DISTRIBUCION STD-04	und	1.00	
04.11.16	TABLERO DE DISTRIBUCION STD-05	und	1.00	
04.11.17	TABLERO DE DISTRIBUCION STD-06	und	1.00	
04.11.18	TABLERO DE DISTRIBUCION STD-07	und	1.00	
04.11.19	TABLERO DE EMERGENCIA	und	1.00	
04.12	PUESTA EN MARCHA			
04.12.01	PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA	und	18.00	
04.12.02	PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA	und	2.00	
04.12.03	CAPACITACION TECNICA EN USO Y MANTENIMIENTO	und	2.00	
04.13	PUESTA A TIERRA			
04.12.01	POZO DE PUESTA A TIERRA	und	6.00	
04.12.02	CONDUCTOR DE CU DESNUDO 25MM2	m	320.00	
04.14	CAJAS			
04.14.01	CAJA DE PASE CUADRADA DE 100X100X55 MM	und	34.00	
04.14.02	CAJA DE PASE CUADRADA DE 100X100X100 MM	und	5.00	
04.14.03	CAJA DE PASE CUADRADA DE 350X350X150 MM	und	14.00	
04.14.04	CAJA DE PASE HERMETICA CON TAPA Y EMPAQUETADURA 150X150X100 MM	und	19.00	
04.15	ALUMBRADO EXTERIOR			
04.15.01	POSTE METALICO DE F" G" E 8MM LONG.	und	19.00	
04.15.02	PASTORAL C.A.C. PARA LUMINARIA	und	12.00	
04.15.03	LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO DE 150 W INCL. EQUIPO	und	12.00	
04.16	EQUIPOS DE ILUMINACION			
04.16.01	ARTEFACTO REFLECTOR 1x250W	und	41.00	
04.16.02	ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2x36W	und	35.00	
04.16.03	ARTEFACTO FLUORESCENTE LINEAL 2x36W	und	62.00	
04.16.04	ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2x18W	und	19.00	
04.16.05	ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR HERMETICO 22W	und	30.00	
04.16.06	ARTEFACTO TIPO BRAQUET 1x32W	und	2.00	
04.16.07	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPACTA C/BATERIA INCORPORADA	und	11.00	
04.17	GRUPO ELECTROGENO 150KVA (INCLUYE TANQUE DE COMBUSTIBLE)			
04.17.01	GRUPO ELECTROGENO DE 80 KVA, 380/220V 60Hz INC/ INSTALACION	und	1.00	
04.17.02	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO	und	1.00	

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

SUB.TOTAL

IGV.

TOTAL ESTADO DE PAGO

[Firma]
 YESID YOTKEN SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973

[Firma]

PSV CONSTRUCTORES SA
 LUIS PORTALINO SEGUNDO

PSV **CESEL** **FONDEPES**

VALORIZACIÓN 25

Versión 1
Fecha 29-08-12

04. INSTALACIONES ELECTRICAS


PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESMARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA"

CLIENTE: FONDEPES
LUGAR: PIURA - TALARÁ - EL ALTO
POLINOMICA: 04

RESIDENTE PSV: Luis Pontalino Segundo
FECHA: 31.05.2019

Item	Descripción	TOTAL PRESUPUESTO		VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR		
		Unidad	Metrado	PreCIO	Parcial	Sub	Parcial	Metrado	PreCIO	Sub	Parcial	CANT
04.01	INSTALACIONES ELECTRICAS			44,954.91		3,218.37		3,218.37				41,736.54
04.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES			2,581.12		2,581.12		2,581.12				2,581.12
04.01.01	TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GLB	1.00	2,581.12		2,581.12		2,581.12				2,581.12
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			3,574.27		767.06		767.06				2,807.21
04.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.50X0.60M PARA INSTALACION DE DUCTOS	m	0.00	12.27		12.27		12.27				0.00
04.02.02	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m	0.00	15.98		15.98		15.98				0.00
04.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	115.56	30.93		30.93		30.93				0.00
04.03	SALIDAS DE ILUMINACION			207.68		0.00		0.00				207.68
04.03.01	SALIDA PARA LUMINARIA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)	pio	0.00	103.84		103.84		103.84				0.00
04.03.02	SALIDA PARA LUMINARIA DE PARED (CENTRO DE LUZ)	pio	2.00	103.84		207.68		207.68				0.00
04.04	SALIDA DE INTERRUPTOR			0.00		0.00		0.00				0.00
04.04.01	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	und	0.00	107.88		107.88		107.88				0.00
04.04.02	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	und	0.00	107.80		107.80		107.80				0.00
04.04.03	INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE	und	0.00	126.11		126.11		126.11				0.00
04.04.04	INTERRUPTOR UNIPOLAR DE COMUTACION	und	0.00	156.11		156.11		156.11				0.00
04.05	SALIDA PARA TOMACORRIENTE			0.00		0.00		0.00				0.00
04.05.01	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H=40 SNPT	pio	0.00	101.98		101.98		101.98				0.00
04.05.02	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H=1.20 SNPT	pio	0.00	101.98		101.98		101.98				0.00
04.05.03	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H=2.20 SNPT	pio	0.00	101.98		101.98		101.98				0.00
04.05.04	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA A PRUEBA DE AGUA H=40 SNPT	pio	0.00	101.98		101.98		101.98				0.00
04.05.05	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA EN TECHO	pio	0.00	101.98		101.98		101.98				0.00
04.06	SALIDAS DE FUERZA			0.00		0.00		0.00				0.00
04.06.01	SALIDA SENSOR DE NIVEL DE AGUA	pio	0.00	91.73		91.73		91.73				0.00
04.06.02	SALIDA DE FUERZA TRIFASICA	pio	0.00	78.87		78.87		78.87				0.00
04.06.03	SALIDA DE FUERZA MONOFASICA	pio	0.00	70.87		70.87		70.87				0.00
04.07	SALIDA DE DATA Y TELEFONIA			0.00		0.00		0.00				0.00
04.07.01	SALIDA PARA TELEFONIA	pio	0.00	72.17		72.17		72.17				0.00
04.07.02	SALIDA PARA RED DE COMPUTO	pio	0.00	72.17		72.17		72.17				0.00
04.08	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO			0.00		0.00		0.00				0.00
04.08.01	SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO	pio	0.00	1,162.14		1,162.14		1,162.14				0.00
04.08.02	SALIDA PARA SENSOR DE HUMO	pio	0.00	71.03		71.03		71.03				0.00
04.09	TUBERIAS DE PVC			22,822.00		1,160.75		1,160.75				21,661.25
04.09.01	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=25MM	m	87.34	13.29		1,160.75		1,160.75				0.00
04.09.02	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=35MM	m	1,230.36	15.67		19,279.74		15.67				1,230.36
04.09.03	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=50MM	m	131.43	18.12		2,381.51		18.12				1,314.43
04.09.04	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=100MM	m	0.00	35.01		0.00		35.01				0.00
04.10	CABLES Y CONDUCTORES			0.00		0.00		0.00				0.00
04.10.01	CABLE NH-90, 2-1x16mm2+1x4mm2(T) 450/750V	m	0.00	7.49		0.00		7.49				0.00
04.10.02	CABLE NH-90, 2-1x6mm2+1x6mm2(T) 450/750V	m	0.00	12.95		0.00		12.95				0.00
04.10.03	CABLE NH-90, 2-1x10mm2+1x10mm2(T) 450/750V	m	0.00	18.39		0.00		18.39				0.00
04.10.04	CABLE NH-90, 3-1x16mm2+1x6mm2(T) 450/750V	m	0.00	7.27		0.00		7.27				0.00
04.10.05	CABLE NH-90, 3-1x16mm2+1x6mm2(T) 450/750V	m	0.00	13.29		0.00		13.29				0.00
04.10.06	CABLE NH-90, 3-1x16mm2+1x6mm2(T) 450/750V	m	0.00	26.73		0.00		26.73				0.00
04.10.07	CABLE NIXOH, 4-1x185 mm2, 0.6/1kV	m	0.00	93.29		0.00		93.29				0.00
04.10.08	CABLE NIXOH, 4-1x150 mm2, 0.6/1kV	m	0.00	31.31		0.00		31.31				0.00
04.10.09	CABLE NIXOH, 4-1x115 mm2, 0.6/1kV	m	0.00	16.61		0.00		16.61				0.00
04.10.10	CABLE NIXOH, 4-1x110 mm2, 0.6/1kV	m	0.00	13.44		0.00		13.44				0.00


YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP Nº 700...



VALORIZACIÓN 25



Versión 1
Fecha 29-08-12

04. INSTALACIONES ELECTRICAS

PROYECTO: *MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA*
 FONDEPES
 CLIENTE: PIURA - TALARÁ - EL ALTO
 LUGAR: PIURA - TALARÁ - EL ALTO
 POLIOMICA: 04
 RESIDENTE PSV: Luis Portalino Segundo
 FECHA: 31.05.2019

ITEM	DESCRIPCION	M	TOTAL PRESUPUESTO	VAL ANTERIORES	VAL ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO POR VALORIZAR
04.10.11	CABLE N2XOH, 4-1x6 mm2, 0.6/1kV	m	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00
04.11	TABLEROS INTERRUPTORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.11.01	TABLERO GENERAL INICIAL 1G	und	2,337.60	0.00	2,337.60	0.00	0.00
04.11.02	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-01	und	1,547.60	0.00	1,547.60	0.00	0.00
04.11.03	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-02	und	1,261.07	0.00	1,261.07	0.00	0.00
04.11.04	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-03	und	1,345.73	0.00	1,345.73	0.00	0.00
04.11.05	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-04	und	1,362.16	0.00	1,362.16	0.00	0.00
04.11.06	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-05	und	1,573.05	0.00	1,573.05	0.00	0.00
04.11.07	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-01	und	1,336.74	0.00	1,336.74	0.00	0.00
04.11.08	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-02	und	1,085.39	0.00	1,085.39	0.00	0.00
04.11.09	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-03	und	862.33	0.00	862.33	0.00	0.00
04.11.10	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-04	und	936.12	0.00	936.12	0.00	0.00
04.11.11	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-05	und	853.01	0.00	853.01	0.00	0.00
04.11.12	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-01	und	2,034.74	0.00	2,034.74	0.00	0.00
04.11.13	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-02	und	831.72	0.00	831.72	0.00	0.00
04.11.14	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-03	und	1,034.74	0.00	1,034.74	0.00	0.00
04.11.15	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-04	und	1,203.40	0.00	1,203.40	0.00	0.00
04.11.16	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-05	und	1,170.66	0.00	1,170.66	0.00	0.00
04.11.17	TABLERO DE DISTRIBUCION STD-06	und	2,034.74	0.00	2,034.74	0.00	0.00
04.11.18	TABLERO DE DISTRIBUCION STD-07	und	1,261.07	0.00	1,261.07	0.00	0.00
04.11.19	TABLERO DE EMERGENCIA	und	1,685.66	0.00	1,685.66	0.00	0.00
04.12	PUERTA EN MARCHA		1,525.42	0.00	1,525.42	0.00	1,525.42
04.12.01	PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA	und	1,334.30	0.00	1,334.30	0.00	0.00
04.12.02	PUERTA EN SERVICIO DEL SISTEMA	und	520.74	0.00	520.74	0.00	0.00
04.12.03	CAPACITACION TECNICA EN USO Y MANTENIMIENTO	und	762.71	0.00	762.71	0.00	0.00
04.13	PUERTA A TIERRA		3,145.60	0.00	3,145.60	0.00	3,145.60
04.13.01	PUERTO DE PUERTA A TIERRA	und	664.40	0.00	664.40	0.00	0.00
04.13.02	CONDUCTOR DE CU DESNUDO 25MM2	m	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00
04.14	CAJAS		867.54	0.00	867.54	0.00	867.54
04.14.01	CAJA DE PASE CUADRADA DE 100X100X55 MM	und	31.86	0.00	31.86	0.00	0.00
04.14.02	CAJA DE PASE CUADRADA DE 100X100X100 MM	und	37.91	0.00	37.91	0.00	0.00
04.14.03	CAJA DE PASE CUADRADA DE 350X350X150 MM	und	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00
04.14.04	CAJA DE PASE HERMETICA CON TAPA Y EMPAQUETADURA 150X150X100 MM	und	45.66	0.00	45.66	0.00	0.00
04.15	ALUMBRADO EXTERIOR		14,333.04	0.00	14,333.04	0.00	14,333.04
04.15.01	POSTE METALICO DE PG E BMM LONG.	und	843.12	0.00	843.12	0.00	0.00
04.15.02	PASTORAL C.A.C. PARA LUMINARIA	und	155.74	0.00	155.74	0.00	0.00
04.15.03	LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO DE 150 W INCL. EQUIPO	und	145.13	0.00	145.13	0.00	0.00
04.16	EQUIPOS DE LUMINACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.16.01	ARTEFACTO REFLECTOR 1x250W	und	579.28	0.00	579.28	0.00	0.00
04.16.02	ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2x36W	und	85.91	0.00	85.91	0.00	0.00
04.16.03	ARTEFACTO FLUORESCENTE LINEAL 2x36W	und	135.19	0.00	135.19	0.00	0.00
04.16.04	ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2x18W	und	107.23	0.00	107.23	0.00	0.00
04.16.05	ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR HERMETICO 22W	und	103.62	0.00	103.62	0.00	0.00
04.16.06	ARTEFACTO TIPO BRAQUET 1x32W	und	204.60	0.00	204.60	0.00	0.00
04.16.07	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPACTA C/BATERIA INCORPORADA	und	134.57	0.00	134.57	0.00	0.00
04.17	GRUPO ELECTROGENO 150KVA (INCLUYE TANQUE DE COMBUSTIBLE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.17.01	GRUPO ELECTROGENO DE 80 KVA, 380/220V 60HZ INC/INSTALACION	und	77,110.17	0.00	77,110.17	0.00	0.00
04.17.02	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO	und	14,006.85	0.00	14,006.85	0.00	0.00
COSTO DIRECTO			44,954.91	3,218.37	3,218.37	0.00	41,736.54
GASTOS GENERALES			10%	4,495.49	321.84	10%	321.84
UTILIDAD			10%	4,495.49	321.84	10%	321.84
SUB.TOTAL			53,945.89	3,862.05	3,862.05	0.00	50,083.94
IGV			18%	9,710.26	695.17	18%	9,015.09
TOTAL ESTADO DE PAGO			63,656.15	4,557.22	4,557.22	0.00	59,098.93

PSV CONSTRUCTORES SA
 LUIS PORTALINO SEGUNDO

CEBEL
 YESIL SILVA ESPINOZA

YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973

05. RESUMEN INSTALACIONES SANITARIAS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"

CLIENTE: FONDEPES

LUGAR: PIURA - TALARA - EL ALTO

POLINOMIC '05


Item	Descripción	TOTAL PRESUPUESTO		VAL ACT
		Unidad	Metrado	Metrado
05	INSTALACIONES SANITARIAS			
05.01	RED DE AGUA POTABLE			
05.01.01	SALIDAS			
05.01.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP Ø 1/2"	pto	64.00	
05.01.01.02	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP Ø 3/4"	pto	6.00	
05.01.02	VALVULAS			
05.01.02.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 3/4"	und	12.00	
05.01.02.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2"	und	2.00	
05.01.02.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1"	und	2.00	
05.01.02.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 2"	und	1.00	
05.01.03	TUBERIAS			
05.01.03.01	SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 1/2" C-5	m	100.35	
05.01.03.02	SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 3/4" C-5	m	114.16	
05.01.03.03	SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 1" C-5	m	25.60	
05.01.03.04	SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 1 1/2" C-5	m	10.80	
05.01.03.05	SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 2" C-5	m	69.11	
05.01.04	VARIOS			
05.01.04.01	NICHO Y TAPA DE PVC PARA VALVULA EN PARED	und	17.00	
05.01.04.02	SISTEMA DE CLORACION	und	1.00	
05.01.05	PRUEBA HIDRAULICA			
05.01.05.01	PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA DE AGUA FRIA	m	368.02	
05.01.06	EQUIPO DE BOMBEO CISTERNA ZONA DE FRIO			
05.01.06.01	ADQUISICION/INST. ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES 1HP	und	1.00	
05.01.06.02	ACCESORIOS PARA BOMBA	und	1.00	
05.01.07	LINEA DE IMPULSION			
05.01.07.01	SUM. E INST. DE TUBERIA FIERRO GALVANIZADO STANDARD Ø2"	m	38.45	
05.01.07.02	SUM. E INST. DE TUBERIA FIERRO GALVANIZADO STANDARD Ø4"	m	21.19	
05.01.08	CAMARA DE BOMBEO, CUARTO DE BOMBAS			
05.01.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POT=1.50HP	und	1.00	
05.01.09	SISTEMA DE TRATAMIENTO CLORACION - DESINFECCION			
05.01.09.01	ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLORACION - DESINFECCION	und	1.00	
05.02	REDES DE AGUA SALADA			
05.02.01	EQUIPO DE BOMBEO A CISTERNA			
05.02.01.01	ADQUISICION E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS POT=3HP	und	1.00	
05.02.02	EQUIPO DE BOMBEO AGUA SALADA A TANQUE ELEVADO			
05.02.02.01	ADQUISICION E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS POT=2.0 HP	und	1.00	
05.02.03	SISTEMA DE TRATAMIENTO CLORACION - DESINFECCION			
05.02.03.01	ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLORACION - DESINFECCION	und	1.00	
05.02.04	LINEA DE IMPULSION TE			
05.02.04.01	SUM. E INST. DE TUBERIA FIERRO GALVANIZADO STANDARD Ø2"	m	38.45	
05.02.04.02	SUM. E INST. DE TUBERIA FIERRO GALVANIZADO STANDARD Ø4"	m	21.19	
05.02.05	RED DE DISTRIBUCION			
05.02.05.01	SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 3/4" C-5	m	360.73	
05.02.05.02	SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 2" C-5	m	50.00	
05.02.05.03	SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 3" C-5	m	23.33	
05.02.05.04	SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 2 1/2" C-10 IMPULSION	m	82.60	
05.02.05.05	SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB HDPE D= 2 1/2" C-10 IMPULSION-MUELLE	m	161.79	
05.02.05.06	SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 3/4" C-5 COLGADA	m	26.40	
05.02.05.07	SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 2" C-5 COLGADA	m	24.40	
05.02.05.08	SUM./INST. T /PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 3" C-5 COLGADA	m	22.30	
05.02.06	SALIDA DE AGUA DE MAR			
05.02.06.01	SALIDA DE AGUA MAR CON TUBERIA DE PVC-SAP Ø 3/4"	pto	24.00	
05.02.06.02	SALIDA DE AGUA MAR CON TUBERIA DE PVC-SAP Ø 2"	pto	4.00	
05.02.06.03	MANGUERA COLGANTE EN TAREAS PREVIAS 3/4"	und	24.00	
05.02.06.04	MANGUERA COLGANTE EN TAREAS PREVIAS 2"	und	4.00	
05.02.06.05	LLAVE GRIFO DE RIEGO DE 3/4"	und	15.00	
05.02.07	VALVULAS			
05.02.07.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 3/4"	und	2.00	
05.02.07.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	und	2.00	
05.02.07.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3"	und	1.00	
05.02.08	VARIOS			



YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 70072

05. RESUMEN INSTALACIONES SANITARIAS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"
CLIENTE: FONDEPES
LUGAR: PIURA - TALARA - EL ALTO
POLINOMIC '05

		TOTAL PRESUPUESTO	VAL ACT
05.02.08.01	NICHO Y TAPA DE PVC PARA VALVULA EN PARED	und	1.00
05.02.08.02	NICHO Y TAPA DE PVC PARA VALVULA EN PISO	und	4.00
05.03	RED DE DESAGUE DOMESTICO		
05.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
05.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA	m	100.20
05.03.01.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	m	100.20
05.03.01.03	PREPARACION DE CAMA DE APOYO (E=10CM)	m	100.20
05.03.01.04	RELLENO COMPACTADO CON PL VIBRADOR/ MANUAL E/T .N	m	100.20
05.03.02	SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION		
05.03.02.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2"	pto	40.00
05.03.02.02	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4"	pto	16.00
05.03.02.03	SALIDA DE VENTILACION PVC SAL D=2"	pto	10.00
05.03.02.04	SALIDA DE BAJDA DE LLUVIA PVC SAL D=3"	pto	16.00
05.03.03	TUBERIAS		
05.03.03.01	INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2"	m	180.23
05.03.03.02	INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4"	m	74.96
05.03.03.03	INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 6"	m	83.30
05.03.04	SUMIDERO		
05.03.04.01	SUMIDEROS DE 2"	pza	17.00
05.03.04.02	SOMBRERO PARA VENTILACION DE PVC DE 2"	und	17.00
05.03.05	REGISTROS		
05.03.05.01	REGISTRO DE BRONCE DE 2"	und	12.00
05.03.05.02	REGISTRO DE BRONCE DE 4"	und	4.00
05.03.06	CAJA DE REGISTRO		
05.03.06.01	CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24"	und	11.00
05.03.07	BUZONES DE INSPECCION		
05.03.07.01	CONSTRUCCION DE BUZON H=1.50 ML	und	2.00
05.03.08	PRUEBA HIDRAULICA		
05.03.08.01	PRUEBA HIDRAULICA PARA DESAGUE	m	338.49
05.04	RED DE DESAGUE CANALETAS		
05.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
05.04.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA	m	188.23
05.04.01.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	m	188.23
05.04.01.03	PREPARACION DE CAMA DE APOYO (E=10CM)	m	188.23
05.04.01.04	RELLENO COMPACTADO CON PL VIBRADOR/ MANUAL E/T .N	m	188.23
05.04.02	TUBERIAS		
05.04.02.01	INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 6"	m	109.29
05.04.02.02	INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4"	m	78.94
05.04.02.03	INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2"	m	6.94
05.04.02.04	INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 4" LINEA IMPULSION MUELLE	m	97.80
05.04.02.05	SUM/INST TUBERIA F" G" 4" COLGADA MUELLE	m	221.45
05.04.02.06	INSTALACION DE TUBERIA HDPE D=2 1/2" C-10 IMPULSION MUELLE	m	180.00
05.04.02.07	INSTALACION DE TUBERIA HDPE D=4" - COLGADA AL CABEZO	m	34.82
05.04.03	ACCESORIOS		
05.04.03.01	CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24"	und	25.00
05.04.03.02	SUMIDEROS DE 4" CON TRAMPA P DE PVC	und	13.00
05.04.03.03	SUMIDEROS DE 4" CON TRAMPA P DE F" G"	und	16.00
05.04.04	CAMARA DE BOMBEO, CUARTO DE BOMBAS		
05.04.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	und	1.00
05.04.04.02	ACCESORIOS PARA BOMBAS SUMERGIBLES	und	1.00
05.04.04.03	ACCESORIOS PARA CASETA BOMBEO	und	1.00
05.04.05	CANALETAS		
05.04.05.01	CONCRETO F" C=210KG/CM2 EN CANALETAS	m3	26.50
05.04.05.02	ENCOFRADO DE CANALETAS	m2	192.38
05.04.05.03	COLOCACION DE REJILLA EN CANALETA DE FIBRA DE VIDRIO	m2	104.40
05.05	EMISOR SUBMARINO AFLUENTES		
05.05.01	TRAMPA DE SOLIDOS		
05.05.01.01	ACCESORIOS TRAMPA DE SOLIDOS	und	1.00
05.05.02	TRAMPA DE GRASAS		
05.05.02.01	ACCESORIOS PARA TRAMPA DE GRASAS	und	1.00
05.05.03	TANQUE ASEPTICO		
05.05.03.01	ACCESORIOS PARA TANQUE ASEPTICO	und	1.00
05.05.04	CAMARA DE REUNION		
05.05.04.01	PUERTA METAL LAC 1/16" C/ MARCO 2"x2"x1/4" Y REFUERZOS	m2	2.76
05.05.05	EQUIPO DE BOMBEO		
05.05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA P=7.00 HP	und	1.00
05.05.05.02	CONSTRUCCION DE CASETA DE EMISOR	GLB	1.00
05.05.06	SUMINISTRO DE TUBERIAS		
05.05.06.01	SUMINISTRO TUBERIA LISA HDPE PECC-100 Dext 160 MM(6") PN-10	m	1,115.00


 INGENIERO CIVIL
 Reg. DE N.º 10973

05. RESUMEN INSTALACIONES SANITARIAS				
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"				
CLIENTE: FONDEPES				
LUGAR: PIURA - TALARA - EL ALTO				
POLINOMICO: '05				
		TOTAL PRESUPUESTO		VAL ACT
05.05.06.02	SUMINISTRO TUBERIA LISA HDPE PECC-100 Dext 160 MM(6") PN-10 C/ PERFORACIONES PARA USO DE DIFUSOR	m	50.00	
05.05.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA AUXILIAR DE PECC 90 MM PARA MANIOBRAS DE FLOTACION	GLB	1.00	
05.05.06.04	SUMINISTRO ACCESORIOS DE TUBERIA HDPE	GLB	1.00	
05.05.06.05	LASTRE DE CONCRETO DE 50 KG. APROX. TIPO 1 SEPARACION 1.70 ML C/U	und	656.00	
05.05.06.06	LASTRE DE CONCRETO DE 50 KG. APROX. TIPO 1 SEPARACION 1.70 ML C/U (DIFUSOR)	und	22.00	
05.05.07	TERMOFUSION			
05.05.07.01	SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS DE 160 MM PN-10 Y LINEAS AUXILIARES	GLB	1.00	
05.05.08	ULTRASONIDO - CONTROL DE CALIDAD			
05.05.08.01	INSPECCION ULTRASONICA DE JUNTA	GLB	1.00	
05.05.09	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO			
05.05.09.01	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO DE LINEA	GLB	1.00	
05.05.09.02	FIJACION PRIMEROS METROS DE TUBERIA CON CONCRETO CICLOPEO	m3	8.00	
05.05.09.03	PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA EMISOR SUBMARINO	GLB	1.00	
05.06	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS			
05.06.01	APARATOS SANITARIOS			
05.05.01.01	INODORO COLOR BLANCO CON ASIENTO	pza	16.00	
05.05.01.02	URINARIO	pza	8.00	
05.06.02	LAVATORIOS			
05.06.02.01	LAVATORIO DE PARED	pza	21.00	
05.06.02.02	LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE	pza	5.00	
05.06.02.03	DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA	pza	7.00	
05.06.02.04	GRIFERIA PARA LAVADEROS	und	21.00	
05.06.02.05	PAPELERA C/ EJE ADHESIVO C/ SILICONA BLANCO	und	16.00	
05.06.02.06	TOALLERO DE BARRA	und	7.00	
05.06.02.07	MANILUVIOS / GRIFO	und	24.00	
COSTO DIRECTO				
GASTOS GENERALES				
UTILIDAD				
SUB.TOTAL				
IGV.				
TOTAL ESTADO DE PAGO				
 PSV CONSTRUCTORES SA LUIS PORTALINO SEGUNDO				
 YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 79973				

05. INSTALACIONES SANITARIAS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA"

CLIENTE: FONDEPES
LUGAR: PIURA - TALARÁ - EL ALTO
POLINOMIO: 05

RESIDENTE PSV.: Luis Portalino Segundo
FECHA: 31.05.2019

Item	Descripción	TOTAL PRESUPUESTO		VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		BALDO POR VALORIZAR	
		Unidad	Metrado	Precio	Parcial	Metrado	Precio	Parcial	CANT	SUB TOTAL	CANT
05. INSTALACIONES SANITARIAS											
05.01.01.01	RED DE AGUA POTABLE			561,082.08		237,356.60		0.00	237,356.60		323,725.49
05.01.01	SALIDAS			39,353.21		10,538.21		0.00	10,538.21		28,814.89
05.01.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP Ø 1/2"	PIP	64.00	88.80	5,683.20	64.00	88.80	0.00	5,683.20	0.00	394.88
05.01.01.02	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP Ø 3/4"	PIP	6.00	98.72	592.32	2.00	98.72	0.00	592.32	0.00	394.88
05.01.02	VALVULAS			1,037.01		148.35		0.00	148.35		887.66
05.01.02.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 3/4"	UND	12.00	50.21	602.52	2.00	100.42	0.00	602.52	0.00	502.10
05.01.02.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2"	UND	2.00	48.93	97.86	0.00	48.93	0.00	97.86	0.00	48.93
05.01.02.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1"	UND	2.00	68.59	137.18	0.00	68.59	0.00	137.18	0.00	137.18
05.01.02.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 2"	UND	1.00	199.45	199.45	0.00	199.45	0.00	199.45	0.00	199.45
05.01.03	TUBERIAS			5,274.68		3,605.64		0.00	3,605.64		1,669.04
05.01.03.01	SUMA/INST. T/PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 1/2" C-5	M	100.35	12.91	1,295.52	100.35	1,295.52	0.00	1,295.52	0.00	0.00
05.01.03.02	SUMA/INST. T/PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 3/4" C-5	M	114.16	15.59	1,779.75	114.16	1,779.75	0.00	1,779.75	0.00	0.00
05.01.03.03	SUMA/INST. T/PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 1" C-5	M	25.60	21.30	545.28	24.90	530.37	0.00	530.37	0.00	0.00
05.01.03.04	SUMA/INST. T/PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 1 1/2" C-5	M	10.80	16.86	182.09	0.00	0.00	0.00	182.09	0.00	182.09
05.01.03.05	SUMA/INST. T/PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 2" C-5	M	69.11	21.30	1,472.04	0.00	0.00	0.00	1,472.04	0.00	1,472.04
05.01.04	MUCHO Y TAPA DE PVC PARA VALVULAS EN PARED	UND	17.00	253.58	4,310.86	0.00	253.58	0.00	4,310.86	0.00	4,310.86
05.01.04.02	SISTEMA DE CLORACION	UND	1.00	1,688.57	1,688.57	0.00	1,688.57	0.00	1,688.57	0.00	1,688.57
05.01.05	PRUEBA HIDRAULICA			1,387.44		902.58		0.00	902.58		484.86
05.01.05.01	PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA DE AGUA FRIA	M	368.02	3.77	1,387.44	239.41	902.58	0.00	902.58	128.61	484.86
05.01.06	EQUIPO DE BOMBEO SISTEMA ZONA DE FRIO			5,809.81		0.00		0.00	0.00		5,809.81
05.01.06.01	ADQUISICION/INST. ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES 1HP	UND	1.00	4,679.56	4,679.56	0.00	4,679.56	0.00	4,679.56	0.00	4,679.56
05.01.06.02	ACCESORIOS PARA BOMBA	UND	1.00	1,130.25	1,130.25	0.00	1,130.25	0.00	1,130.25	0.00	1,130.25
05.01.07	LINEA DE IMPULSION			4,490.15		0.00		0.00	0.00		4,490.15
05.01.07.01	SUMA E INST. DE TUBERIA FERRO GALVANIZADO STANDARD Ø2"	M	38.45	45.35	1,743.71	0.00	45.35	0.00	1,743.71	0.00	1,743.71
05.01.07.02	SUMA E INST. DE TUBERIA FERRO GALVANIZADO STANDARD Ø4"	M	21.19	129.61	2,746.44	0.00	129.61	0.00	2,746.44	0.00	2,746.44
05.01.08	CAMARA DE BOMBEO, CUARTO DE BOMBAS			7,451.82		0.00		0.00	0.00		7,451.82
05.01.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POT=1.50HP	UND	1.00	7,451.82	7,451.82	0.00	7,451.82	0.00	7,451.82	0.00	7,451.82
05.01.09	SISTEMA DE TRATAMIENTO CLORACION - DESINFECCION			1,627.24		0.00		0.00	0.00		1,627.24
05.01.09.01	ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLORACION - DESINFECCION	UND	1.00	1,627.24	1,627.24	0.00	1,627.24	0.00	1,627.24	0.00	1,627.24
05.02	REDES DE AGUA SALADA			48,110.50		1,091.30		0.00	1,091.30		47,019.20
05.02.01	EQUIPO DE BOMBEO A CISTERNA			11,431.40		0.00		0.00	0.00		11,431.40
05.02.01.01	ADQUISICION E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS POT=3HP	UND	1.00	11,431.40	11,431.40	0.00	11,431.40	0.00	11,431.40	0.00	11,431.40
05.02.02	EQUIPO DE BOMBEO AGUA SALADA A TANQUE ELEVADO			7,872.80		0.00		0.00	0.00		7,872.80
05.02.02.01	ADQUISICION E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS POT=2.0 HP	UND	1.00	7,872.80	7,872.80	0.00	7,872.80	0.00	7,872.80	0.00	7,872.80
05.02.03	SISTEMA DE TRATAMIENTO CLORACION - DESINFECCION			1,627.24		0.00		0.00	0.00		1,627.24
05.02.03.01	ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLORACION - DESINFECCION	UND	1.00	1,627.24	1,627.24	0.00	1,627.24	0.00	1,627.24	0.00	1,627.24
05.02.04	LINEA DE IMPULSION TE			4,490.15		0.00		0.00	0.00		4,490.15
05.02.04.01	SUMA E INST. DE TUBERIA FERRO GALVANIZADO STANDARD Ø2"	M	38.45	45.35	1,743.71	0.00	45.35	0.00	1,743.71	0.00	1,743.71
05.02.04.02	SUMA E INST. DE TUBERIA FERRO GALVANIZADO STANDARD Ø4"	M	21.19	129.61	2,746.44	0.00	129.61	0.00	2,746.44	0.00	2,746.44
05.02.05	RED DE DISTRIBUCION			12,649.29		1,091.30		0.00	1,091.30		11,557.99
05.02.05.01	SUMA/INST. T/PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 3/4" C-5	M	159.33	15.59	2,483.95	70.00	1,091.30	0.00	2,483.95	89.33	1,392.62
05.02.05.02	SUMA/INST. T/PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 2" C-5	M	50.00	21.30	1,065.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00
05.02.05.03	SUMA/INST. T/PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 3" C-5	M	23.33	29.49	688.00	0.00	29.49	0.00	688.00	0.00	688.00
05.02.05.04	SUMA/INST. T/PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 2 1/2" C-10 IMPULSION	M	82.60	21.91	1,809.77	0.00	21.91	0.00	1,809.77	0.00	1,809.77
05.02.05.05	SUMA/INST. T/PRUEBA IDRA/TUB HOPE D= 2 1/2" C-10 IMPULSION-MUELLE	M	161.79	23.47	3,797.21	0.00	23.47	0.00	3,797.21	0.00	3,797.21
05.02.05.06	SUMA/INST. T/PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 3/4" C-5 COLGADA	M	26.40	32.31	852.98	0.00	32.31	0.00	852.98	0.00	852.98
05.02.05.07	SUMA/INST. T/PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 2" C-5 COLGADA	M	24.40	38.02	927.68	0.00	38.02	0.00	927.68	0.00	927.68
05.02.05.08	SUMA/INST. T/PRUEBA IDRA/TUB PVC D= 3" C-5 COLGADA	M	22.30	45.95	1,024.69	0.00	45.95	0.00	1,024.69	0.00	1,024.69
05.02.06	SALIDA DE AGUA DE MAR			7,861.53		0.00		0.00	0.00		7,861.53

RESERVA YUTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL



VALORIZACIÓN 25



Versión
Fecha

05. INSTALACIONES SANITARIAS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGIÓN PIURA"

CLIENTE: FONDEPES

LUGAR: PIURA - TALARÁ - EL ALTO

POLINOMI C 05

RESIDENTE PSV:

FECHA:

Luis Portalino Segundo

31.05.2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL	VAL ANTERIORES	VAL ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	BALDO POR VALORIZAR
05.02.06.01	SAUDA DE AGUA MAR CON TUBERIA DE PVC-SAP Ø 3/4"	pico	24.00	0.00	156.36	0.00	24.00
05.02.06.02	SAUDA DE AGUA MAR CON TUBERIA DE PVC-SAP Ø 2"	pico	4.00	0.00	206.95	0.00	4.00
05.02.06.03	MANGUERA COJGANTE EN TAREAS PREVIAS 3/4"	und	24.00	0.00	62.28	0.00	24.00
05.02.06.04	MANGUERA COJGANTE EN TAREAS PREVIAS 2"	und	4.00	0.00	154.61	0.00	4.00
05.02.06.05	LAVE GRIFO DE RIEGO DE 3/4"	und	9.00	0.00	129.77	0.00	9.00
05.02.07	VALVULAS						
05.02.07.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 3/4"	und	2.00	0.00	50.21	0.00	2.00
05.02.07.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	und	2.00	0.00	195.48	0.00	2.00
05.02.07.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3"	und	1.00	0.00	418.81	0.00	1.00
05.02.08	VARIOS						
05.02.08.01	NICHO Y TAPA DE PVC PARA VALVULA EN PARED	und	1.00	0.00	253.58	0.00	1.00
05.02.08.02	NICHO Y TAPA DE PVC PARA VALVULA EN PISO	und	4.00	0.00	253.58	0.00	4.00
05.03	RED DE DESAGUE DOMESTICO						
05.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES						
05.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA	m	100.20	0.00	36.04	0.00	100.20
05.03.01.02	RELINE Y NIVELACION DE ZANJA	m	100.20	0.00	181.36	0.00	100.20
05.03.01.03	PREPARACION DE CANA DE APOYO (E=10CM)	m	100.20	0.00	693.38	0.00	100.20
05.03.01.04	RELLENO COMPACTADO CON PL VIBRADOR/ MANUAL E/T. N	m	100.20	0.00	15.53	0.00	100.20
05.03.02	SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION						
05.03.02.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2"	pico	40.00	0.00	55.61	0.00	40.00
05.03.02.02	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4"	pico	16.00	0.00	62.57	0.00	16.00
05.03.02.03	SALIDA DE VENTILACION PVC SAL D=2"	pico	8.00	0.00	556.08	0.00	8.00
05.03.02.04	SALIDA DE BAÑDA DE LUBRIFICACION PVC SAL D=3"	pico	16.00	0.00	87.80	0.00	16.00
05.03.03	TUBERIAS						
05.03.03.01	INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2"	m	180.23	0.00	379.31	0.00	180.23
05.03.03.02	INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4"	m	74.96	0.00	159.86	0.00	74.96
05.03.03.03	INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 6"	m	83.30	0.00	34.44	0.00	83.30
05.03.04	SUMIDERO						
05.03.04.01	SUMIDERO DE 2"	pico	17.00	0.00	57.06	0.00	17.00
05.03.04.02	SOMBRERO PARA VENTILACION DE PVC DE 2"	und	15.00	0.00	18.20	0.00	15.00
05.03.05	REGISTROS						
05.03.05.01	REGISTRO DE BRONCE DE 2"	und	9.00	0.00	43.02	0.00	9.00
05.03.05.02	REGISTRO DE BRONCE DE 4"	und	4.00	0.00	53.42	0.00	4.00
05.03.06	CAJA DE REGISTRO						
05.03.06.01	CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24"	und	11.00	0.00	407.38	0.00	11.00
05.03.07	BUZONES DE INSPECCION						
05.03.07.01	CONSTRUCCION DE BUZON H=1.50 ML	und	2.00	0.00	2.235.58	0.00	2.00
05.03.08	PRUEBA HIDRAULICA						
05.03.08.01	PRUEBA HIDRAULICA PARA DESAGUE	m	270.49	0.00	3.53	0.00	270.49
05.04	RED DE DESAGUE CANALETAS						
05.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES						
05.04.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA	m	188.23	0.00	36.04	0.00	188.23
05.04.01.02	RELINE Y NIVELACION DE ZANJA	m	188.23	0.00	181.36	0.00	188.23
05.04.01.03	PREPARACION DE CANA DE APOYO (E=10CM)	m	188.23	0.00	340.70	0.00	188.23
05.04.01.04	RELLENO COMPACTADO CON PL VIBRADOR/ MANUAL E/T. N	m	188.23	0.00	15.53	0.00	188.23
05.04.02	TUBERIAS						
05.04.02.01	INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 6"	m	109.29	0.00	34.44	0.00	109.29
05.04.02.02	INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4"	m	65.59	0.00	211.3	0.00	65.59
05.04.02.03	INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2"	m	6.94	0.00	130.13	0.00	6.94
05.04.02.04	INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 4" LINEA IMPULSION MUELLE	m	97.80	0.00	31.19	0.00	97.80
05.04.02.05	SUM/INST TUBERIA F 6" 4" COLEGADA MUELLE	m	21.45	0.00	135.50	0.00	21.45
05.04.03.01	INSTALACION DE TUBERIA HOPE D=2 1/2" C-10 IMPULSION MUELLE	m	180.00	0.00	23.47	0.00	180.00
05.04.03.02	INSTALACION DE TUBERIA HOPE D=4" - COLEGADA AL CABEZO	m	34.82	0.00	37.49	0.00	34.82
05.04.03.03	CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24"	und	24.00	0.00	407.38	0.00	24.00

YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 ROL CIP N° 79973



VALORIZACIÓN 25



Versión 1
Fecha 29-08-12

05. INSTALACIONES SANITARIAS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGIÓN PIURA"

RESIDENTE PSV:
FECHA:

Luis Portalino Segundo
31.05.2019

CLIENTE: FONDEPES
LUGAR: PIURA - TALARÁ - EL ALTO
POLINOMIC_05

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO		VAL ANTERIORES		VAL ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		BALDO POR VALORIZAR		
		UND	VAL	UND	VAL	UND	VAL	UND	VAL	UND	VAL	
05.04.03.02	SUMIDOROS DE 4" CON TRAMPA P DE PVC	und	13.00	83.26	1,082.38	0.00	0.00	83.26	0.00	0.00	13.00	1,082.38
05.04.03.03	SUMIDOROS DE 4" CON TRAMPA P DE F" G"	und	15.00	90.26	1,353.90	0.00	0.00	90.26	0.00	0.00	15.00	1,353.90
05.04.04.01	CAMARA DE BOMBEO CUARTO DE BOMBAS	und	1.00	7,774.51	10,162.12	0.00	0.00	7,774.51	0.00	0.00	1.00	10,162.12
05.04.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	und	1.00	7,774.51	7,774.51	0.00	0.00	7,774.51	0.00	0.00	1.00	7,774.51
05.04.04.02	ACCESORIOS PARA BOMBAS SUMERGIBLES	und	1.00	1,257.36	1,257.36	0.00	0.00	1,257.36	0.00	0.00	1.00	1,257.36
05.04.04.03	ACCESORIOS PARA CASETA BOMBEO	und	1.00	1,130.25	1,130.25	0.00	0.00	1,130.25	0.00	0.00	1.00	1,130.25
05.04.05.01	CONCRETO F' C=210KG/CM2 EN CANALETAS	m3	25.52	418.30	10,675.02	0.00	0.00	418.30	0.00	0.00	25.52	10,675.02
05.04.05.02	ENCORADO DE CANALETAS	m2	382.58	55.85	10,197.09	0.00	0.00	55.85	0.00	0.00	382.58	10,197.09
05.04.05.03	COLOCACION DE REJILLA EN CANALETA DE FIBRA DE VIDRIO	m2	102.44	260.78	26,714.30	0.00	0.00	260.78	0.00	0.00	102.44	26,714.30
05.05.01.01	TRAMPA DE SOLIDOS	und	1.00	709.07	278,746.63	0.00	0.00	709.07	0.00	0.00	1.00	278,746.63
05.05.01.01	ACCESORIOS TRAMPA DE SOLIDOS	und	1.00	709.07	709.07	0.00	0.00	709.07	0.00	0.00	1.00	709.07
05.05.02.01	TRAMPA DE GRASAS	und	1.00	709.07	709.07	0.00	0.00	709.07	0.00	0.00	1.00	709.07
05.05.02.01	ACCESORIOS PARA TRAMPA DE GRASAS	und	1.00	709.07	709.07	0.00	0.00	709.07	0.00	0.00	1.00	709.07
05.05.03.01	TANQUE ASEPTICO	und	1.00	1,214.99	1,214.99	0.00	0.00	1,214.99	0.00	0.00	1.00	1,214.99
05.05.03.01	ACCESORIOS PARA TANQUE ASEPTICO	und	1.00	1,214.99	1,214.99	0.00	0.00	1,214.99	0.00	0.00	1.00	1,214.99
05.05.04.01	CAMARA DE REDUCCION	und	2.76	455.76	1,257.90	0.00	0.00	455.76	0.00	0.00	2.76	1,257.90
05.05.04.01	PUERTA METAL LAC 7/16" C/ MARCO 2"x2"x1/4" Y REFUERZOS	m2	1.00	24,660.50	44,152.03	0.00	0.00	24,660.50	0.00	0.00	1.00	44,152.03
05.05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA P=7.00 HP	und	1.00	19,491.53	19,491.53	0.00	0.00	19,491.53	0.00	0.00	1.00	19,491.53
05.05.05.02	CONSTRUCCION DE CASETA DE EMISOR	GLB	1.00	60,246.20	60,246.20	0.00	0.00	60,246.20	0.00	0.00	1.00	60,246.20
05.05.06.01	SUMINISTRO DE TUBERIAS	m	1,115.00	35.56	39,649.40	1,115.00	0.00	35.56	0.00	0.00	1,115.00	39,649.40
05.05.06.01	SUMINISTRO TUBERIA LISA HDPE PECC:100 Dext 160 MM(6") PN-10	m	50.00	58.80	2,940.00	0.00	0.00	58.80	0.00	0.00	50.00	2,940.00
05.05.06.02	SUMINISTRO TUBERIA LISA HDPE PECC:100 Dext 160 MM(6") PN-10/C PERFORACIONES	GLB	1.00	12,686.85	12,686.85	0.00	0.00	12,686.85	0.00	0.00	1.00	12,686.85
05.05.06.03	FLOTACION	GLB	1.00	4,969.95	4,969.95	0.80	3,975.96	4,969.95	0.00	0.80	3,975.96	9,945.91
05.05.06.04	SUMINISTRO ACCESORIOS DE TUBERIA HDPE	und	0.00	172.23	172.23	0.00	0.00	172.23	0.00	0.00	0.00	172.23
05.05.06.05	LASTRE DE CONCRETO DE 50 KG. APROX. TIPO 1 SEPARACION 1.70 ML C/U	und	0.00	172.23	172.23	0.00	0.00	172.23	0.00	0.00	0.00	172.23
05.05.06.06	LASTRE DE CONCRETO DE 50 KG. APROX. TIPO 1 SEPARACION 1.70 ML C/U (DIFUSOR)	und	0.00	172.23	172.23	0.00	0.00	172.23	0.00	0.00	0.00	172.23
05.05.07.01	SERVICIO DE TEMPOSUION DE TUBERIAS DE 160 MM PN-10 Y LINEAS AUXILIARES	GLB	1.00	28,481.81	28,481.81	0.90	25,633.63	28,481.81	0.00	0.90	25,633.63	54,115.44
05.05.08.01	ULTRASONIDO - CONTROL DE CALIDAD	GLB	1.00	12,711.86	12,711.86	0.80	10,169.49	12,711.86	0.00	0.80	10,169.49	22,881.35
05.05.08.01	INSPECCION ULTRASONICA DE JUNTA	GLB	1.00	12,711.86	12,711.86	0.80	10,169.49	12,711.86	0.00	0.80	10,169.49	22,881.35
05.05.09.01	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO	GLB	1.00	104,850.00	104,850.00	1.00	104,850.00	104,850.00	0.00	1.00	104,850.00	209,700.00
05.05.09.02	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO DE LINEA	m3	8.00	805.95	6,447.60	8.00	6,447.60	805.95	0.00	8.00	6,447.60	12,895.20
05.05.09.03	PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA EMISOR SUBMARINO	GLB	1.00	17,966.10	17,966.10	0.00	0.00	17,966.10	0.00	0.00	1.00	17,966.10
05.06.01.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	pza	16.00	539.85	8,637.60	6.00	3,239.10	539.85	0.00	6.00	3,239.10	11,876.70
05.06.01.01	INDOORO COLOR BLANCO CON ASIEN TO	pza	8.00	366.39	2,931.12	4.00	1,465.56	366.39	0.00	4.00	1,465.56	4,401.68
05.06.02.01	LAVATORIO	pza	21.00	202.94	4,261.74	10.00	2,029.40	202.94	0.00	10.00	2,029.40	6,291.14
05.06.02.02	LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE	pza	5.00	542.57	2,712.85	0.00	0.00	542.57	0.00	0.00	5.00	2,712.85
05.06.02.03	DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA	und	7.00	448.68	3,140.76	0.00	0.00	448.68	0.00	0.00	7.00	3,140.76
05.06.02.04	GRIFERIA PARA LAVADEROS	und	19.00	214.07	4,067.33	0.00	0.00	214.07	0.00	0.00	19.00	4,067.33
05.06.02.05	PAPELERA C/ EJE ADHESIVO C/ SILICONA BLANCO	und	16.00	155.07	2,481.12	0.00	0.00	155.07	0.00	0.00	16.00	2,481.12
05.06.02.06	TOALLERO DE BARRA	und	7.00	180.35	1,262.45	0.00	0.00	180.35	0.00	0.00	7.00	1,262.45
05.06.02.07	MANILLOS/ GRIFO	und	18.00	513.65	9,245.70	0.00	0.00	513.65	0.00	0.00	18.00	9,245.70
COSTO DIRECTO				550,193.40	550,193.40			550,193.40				550,193.40
GASTOS GENERALES			10%	55,019.34	55,019.34	10%	55,019.34	55,019.34	0.00	10%	55,019.34	605,212.74
UTILIDAD			10%	55,019.34	55,019.34	10%	55,019.34	55,019.34	0.00	10%	55,019.34	660,232.08
SUB-TOTAL				660,232.08	660,232.08			660,232.08				660,232.08
IGV.			18%	118,841.78	118,841.78	18%	118,841.78	118,841.78	0.01	18%	118,841.78	779,073.86
TOTAL ESTADO DE PAGO				779,073.86	779,073.86			779,073.86	0.01			779,073.86



YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 700

CEBEL
YESIL SILVA ESPINOZA

06. RESUMEN EQUIPAMIENTO

065

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"
CLIENTE: FONDEPES
LUGAR: PIURA - TALARA - EL ALTO
POLINOMIC '06

Item	Descripción	TOTAL PRESUPUESTO		VAL ACT
		Unidad	Metrado	Metrado
06	EQUIPAMIENTO			
06.01	SUMINISTRO DE CAMARA FRIGORIFICA DE 5 TM 0°C	GLB	1.00	
06.02	SUMINISTRO DE CAMARA FRIGORIFICA DE 10 TM 0°C	GLB	1.00	
06.03	SUMINISTRO DE PRODUCTOR DE HIELO EN BLOQUES DE 10 TN/DIA	GLB	1.00	
06.04	SUMINISTRO DE ENFRIADOR DE AGUA +15°C	GLB	1.00	
06.05	EQUIPAMIENTO DE TAREAS PREVIAS	GLB	1.00	
06.06	ACCESORIOS PARA TRANSPORTE Y ESTIBA	GLB	1.00	
06.07	ACCESORIOS PARA PERSONAL OPERATIVO	GLB	1.00	
06.08	MOBILIARIO VARIOS	GLB	1.00	
06.09	EQUIPOS MONITOREO Y SEGURIDAD	GLB	1.00	

COSTO DIRECTO
 GASTOS GENERALES
 UTILIDAD
SUB.TOTAL
 IGV.
TOTAL ESTADO DE PAGO



PSV CONSTRUCTORES SA
 LUIS PORTALINO SEGUNDO



YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973

CESEL

VALORIZACIÓN 25

Versión 1
Fecha 29-08-12


06. EQUIPAMIENTO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"


CLIENTE: FONDEPES
LUGAR: PIURA - TALARA - EL ALTO
POLINOMIC 06

RESIDENTE PSV.: Luis Portalino Segundo
FECHA: 31.05.2019

Item	Descripción	TOTAL PRESUPUESTO			VAL ANTERIORES			VAL ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		Unidad	Metrado	Precio	Parcial	Si.	Si.	Metrado	Precio	Parcial	CANT	SUB TOTAL	S/.	CANT	SUB TOTAL	S/.
06	EQUIPAMIENTO					915,312.15				503,928.53		0.00			411,383.63	
06.01	SUMINISTRO DE CAMARA FRIGORIFICA DE 5 TM 0°C	GLB	1.00	86,470.83		86,470.83				86,470.83		0.00			21,617.71	
06.03	SUMINISTRO DE CAMARA FRIGORIFICA DE 10 TM 0°C	GLB	1.00	92,917.64		92,917.64				92,917.64		0.00			23,229.41	
06.03	SUMINISTRO DE PRODUCTOR DE HIELO EN BLOQUE DE 10 TN/DIA	GLB	1.00	440,773.25		440,773.25				440,773.25		0.00			110,193.31	
06.04	SUMINISTRO DE ENFRIADOR DE AGUA +15°C	GLB	1.00	51,742.98		51,742.98				51,742.98		0.00			12,935.75	
06.05	EQUIPAMIENTO DE TAREAS PREVIAS	GLB	1.00	83,050.82		83,050.82				83,050.82		0.00			83,050.82	
06.06	ACCESORIOS PARA TRANSPORTE Y ESTIBA	GLB	1.00	71,119.33		71,119.33				71,119.33		0.00			71,119.33	
06.07	ACCESORIOS PARA PERSONAL OPERATIVO	GLB	1.00	10,974.58		10,974.58				10,974.58		0.00			10,974.58	
06.08	MOBILIARIO VARIOS	GLB	1.00	32,754.25		32,754.25				32,754.25		0.00			32,754.25	
06.09	EQUIPOS MONITOREO Y SEGURIDAD	GLB	1.00	45,508.47		45,508.47				45,508.47		0.00			45,508.47	
COSTO DIRECTO						915,312.15				503,928.53		0.00			411,383.63	
GASTOS GENERALES																
UTILIDAD				10%		91,531.22		10%		50,392.85		0.00			41,138.36	
SUB-TOTAL				10%		91,531.22		10%		50,392.85		0.00			41,138.36	
IGV.				18%		1,098,374.59		18%		604,714.23		0.00			493,660.35	
TOTAL ESTADO DE PAGO						1,296,082.02				713,562.79		0.00			582,519.21	


 PSV CONSTRUCTORES SA
 LUIS PORTALINO SEGUNDO

.....
 CESEL
 YESIL SILVA ESPINOZA


 YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973


07. IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"
CLIENTE: FONDEPES
LUGAR: PIURA - TALARA - EL ALTO
POLINOMICA 07

Item	Descripción	TOTAL PRESUPUESTO		VAL ACT
		Unidad	Metrado	Metrado
07	MEDIO AMBIENTE			
07.01	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EFLUENTES			
07.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR DE BASURA	und	25.00	
07.01.02	AREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL	GLB	1.00	
07.01.03	CILINDROS METALICOS PARA ALMACENAMIENTO DE AFLUENTES INDUSTRIALES	und	10.00	
07.01.04	ALQUILER BAÑOS QUIMICOS	mes	10.00	
07.01.05	TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS	VJE	20.00	
07.02	SEÑALIZACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD			
07.02.01	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	50.00	
07.02.02	SEÑALIZACION PERMANENTE	und	40.00	
07.03	CAPACITACION EN TEMAS AMBIENTALES Y SEGURIDAD			
07.03.01	CHARLA DE SEGURIDAD EN OBRA PARA PERSONAL	est	10.00	
07.03.02	CHARLA SOBRE TEMAS AMBIENTALES - PESCADORES	est	3.00	
07.04	MITIGACION DE IMPACTOS SOCIALES			
07.04.01	CONTINGENCIA Y ACCESOS PARA PESCADORES A MUELLE PROVISIONAL DURANTE OBRA	GLB	1.00	
07.05	MITIGACION DE IMPACTOS EN MEDIO AMBIENTE			
07.05.01	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL CALIDAD AIRE, AGUA RUIDO	GLB	1.00	
07.05.02	MEDIDAS MITIGACION EMISION DE POLVO	GLB	1.00	
07.05.03	MEDIDAS MITIGACION EMISION DE RUIDOS	GLB	1.00	
07.05.04	MEDIDAS MITIGACION CONTAMINACION DE AGUA	GLB	1.00	
07.06	PROGRAMACION DE CONTINGENCIAS			
07.06.01	PRIMEROS AUXILIOS	GLB	1.00	
07.06.02	CONTRA INCENDIO	GLB	1.00	
07.07	PROGRAMACION DE CIERRE DE OBRA			
07.07.01	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS TEMPORALES	GLB	1.00	
COSTO DIRECTO				
GASTOS GENERALES				
UTILIDAD				
SUB.TOTAL				
IGV.				
TOTAL ESTADO DE PAGO				



PSV CONSTRUCTORES SA
 LUIS PORTALINO SEGUNDO


 YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 79973



VALORIZACIÓN 25

Versión
Fecha1
29-08-12

07. IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"

CLIENTE: FONDEPES

LUGAR: PIURA - TALARA - EL ALTO

POLINOMICA 07

RESIDENTE PSV: Luis Portalino Segundo


FECHA: 31.05.2019

Item	Descripción	TOTAL PRESUPUESTO			VAL ANTERIORES			VAL ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		Unidad	Metrado	Precio	Parcial	Metrado	Precio	Parcial	Metrado	Precio	Parcial	CANT	SUB TOTAL	CANT	SUB TOTAL	CANT
07	MEDIO AMBIENTE				125,157.80			122,718.80			0.00	122,718.80				2,439.00
07.01	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EFUENTES				44,740.00			44,740.00			0.00	44,740.00				0.00
07.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR DE BASURA	und	25.00	220.00	5,500.00	25.00	5,500.00	5,500.00	220.00	0.00	25.00	5,500.00				0.00
07.01.02	AREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL	GLB	1.00	1,200.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1.00	1,200.00				0.00
07.01.03	CILINDROS METALICOS PARA ALMACENAMIENTO DE AFLUENTES INDUSTRIALES	und	10.00	420.00	4,200.00	10.00	4,200.00	4,200.00	420.00	0.00	10.00	4,200.00				0.00
07.01.04	ALQUILER BAÑOS QUIMICOS	mes	10.00	2,368.00	23,680.00	10.00	23,680.00	23,680.00	2,368.00	0.00	10.00	23,680.00				0.00
07.01.05	TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS	V/E	20.00	508.00	10,160.00	20.00	10,160.00	10,160.00	508.00	0.00	20.00	10,160.00				0.00
07.02	SEÑALIZACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD				5,000.00			5,000.00			0.00	5,000.00				0.00
07.02.01	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	50.00	40.00	2,000.00	50.00	2,000.00	2,000.00	40.00	0.00	50.00	2,000.00				0.00
07.02.02	SEÑALIZACION PERMANENTE	und	40.00	75.00	3,000.00	40.00	3,000.00	3,000.00	75.00	0.00	40.00	3,000.00				0.00
07.03	CAPACITACION EN TEMAS AMBIENTALES Y SEGURIDAD				4,250.00			4,250.00			0.00	4,250.00				0.00
07.03.01	CHARLA DE SEGURIDAD EN OBRA PARA PERSONAL	est	10.00	200.00	2,000.00	10.00	2,000.00	2,000.00	200.00	0.00	10.00	2,000.00				0.00
07.03.02	CHARLA SOBRE TEMAS AMBIENTALES - PESCADORES	est	3.00	750.00	2,250.00	3.00	2,250.00	2,250.00	750.00	0.00	3.00	2,250.00				0.00
07.04	MITIGACION DE IMPACTOS SOCIALES				50,000.00			50,000.00			0.00	50,000.00				0.00
07.04.01	CONTINGENCIA Y ACCESOS PARA PESCADORES A MUELLE PROVISIONAL DURANTE OBRA	GLB	1.00	50,000.00	50,000.00	1.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1.00	50,000.00				0.00
07.05	MITIGACION DE IMPACTOS EN MEDIO AMBIENTE				15,357.80			15,357.80			0.00	15,357.80				0.00
07.05.01	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL CALIDAD AIRE, AGUA RUIDO	GLB	1.00	8,790.00	8,790.00	1.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00	0.00	1.00	8,790.00				0.00
07.05.02	MEDIDAS MITIGACION EMISION DE POLVO	GLB	1.00	2,033.90	2,033.90	1.00	2,033.90	2,033.90	2,033.90	0.00	1.00	2,033.90				0.00
07.05.03	MEDIDAS MITIGACION EMISION DE RUIDOS	GLB	1.00	2,500.00	2,500.00	1.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00				0.00
07.05.04	MEDIDAS MITIGACION CONTAMINACION DE AGUA	GLB	1.00	2,033.90	2,033.90	1.00	2,033.90	2,033.90	2,033.90	0.00	1.00	2,033.90				0.00
07.06	PROGRAMACION DE CONTINGENCIAS				3,100.00			3,100.00			0.00	3,100.00				0.00
07.06.01	PRIMERS AUXILIOS	GLB	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00				0.00
07.06.02	CONTRA INCENDIO	GLB	1.00	1,600.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1.00	1,600.00				0.00
07.07	PROGRAMACION DE CIERRE DE OBRA				2,710.00			2,710.00			0.00	2,710.00				0.00
07.07.01	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS TEMPORALES	GLB	1.00	2,710.00	2,710.00	0.10	271.00	271.00	2,710.00	0.00	0.10	271.00			0.90	2,439.00
COSTO DIRECTO					125,157.80			122,718.80			0.00	122,718.80				2,439.00
GASTOS GENERALES					10%	12,515.78	10%	12,271.88	10%	0.00	10%	12,271.88			10%	243.90
UTILIDAD					10%	12,515.78	10%	12,271.88	10%	0.00	10%	12,271.88			10%	243.90
SUB-TOTAL					150,189.36			147,262.56			0.00	147,262.56				2,926.80
IGV.					18%	27,034.08	18%	26,507.26	18%	0.00	18%	26,507.26			18%	526.82
TOTAL ESTADO DE PAGO					177,223.44			173,769.82			0.00	173,769.82				3,453.62

PSV CONSTRUCTORES SA
LUIS PORTALINO SEGUNDOCESEL
YESIL SILVA ESPINOZAYESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL

Curva S

Item	Y. PLANEACION	Y. EJECUCION
Item 17	20,548.00	52,741.23
Item 18	52,635.00	73,183.00
Item 19	45,213.00	118,396.00
Item 20	25,631.00	144,027.00
Item 21	73,203.52	217,230.52
Item 22	102,703.20	319,933.72
Item 23	215,635.00	535,568.72
Item 24	159,875.00	695,443.72
Item 25	345,632.00	1,041,075.72
Item 26	215,382.53	1,256,468.25
Item 27	186,564.07	1,453,032.32
Item 28	125,354.00	1,578,386.32
Item 29	253,645.00	1,832,031.32
Item 30	85,625.00	1,917,656.32
Item 31	56,601.36	1,974,257.68
Item 32	56,325.00	2,030,582.68
Item 33	62,689.00	2,093,271.68
Item 34	125,365.00	2,218,636.68
Item 35	182,189.30	2,400,835.98
Item 36	25,365.00	2,426,200.98
Item 37	85,625.00	2,511,825.98
Item 38	90,240.00	2,602,065.98
Item 39	188,687.15	2,800,753.13
Item 40	52,365.00	2,853,118.13
Item 41	23,546.00	2,876,664.13
Item 42	125,369.00	3,002,033.13
Item 43	185,039.97	3,187,073.10
Item 44	21,563.00	3,208,636.10
Item 45	85,365.00	3,294,001.10
Item 46	56,254.00	3,350,255.10
Item 47	85,625.00	3,435,880.10
Item 48	92,455.64	3,528,335.74
Item 49	456,859.00	3,985,194.74
Item 50	259,654.00	4,244,848.74
Item 51	425,362.00	4,670,210.74
Item 52	503,117.56	5,173,328.30
Item 01	10,856.00	5,184,184.30
Item 02	23,545.00	5,207,729.30
Item 03	5,632.00	5,213,361.30
Item 04	5,496.00	5,218,847.30
Item 05	33,131.37	5,251,978.67
Item 06	15,236.00	5,267,214.67
Item 07	9,186.28	5,276,400.95
Item 08	25,364.00	5,301,764.95
Item 09	42,194.67	5,343,959.62
Item 10	12,366.00	5,356,315.62
Item 11	12,563.00	5,368,878.62
Item 12	86254	5,455,132.62

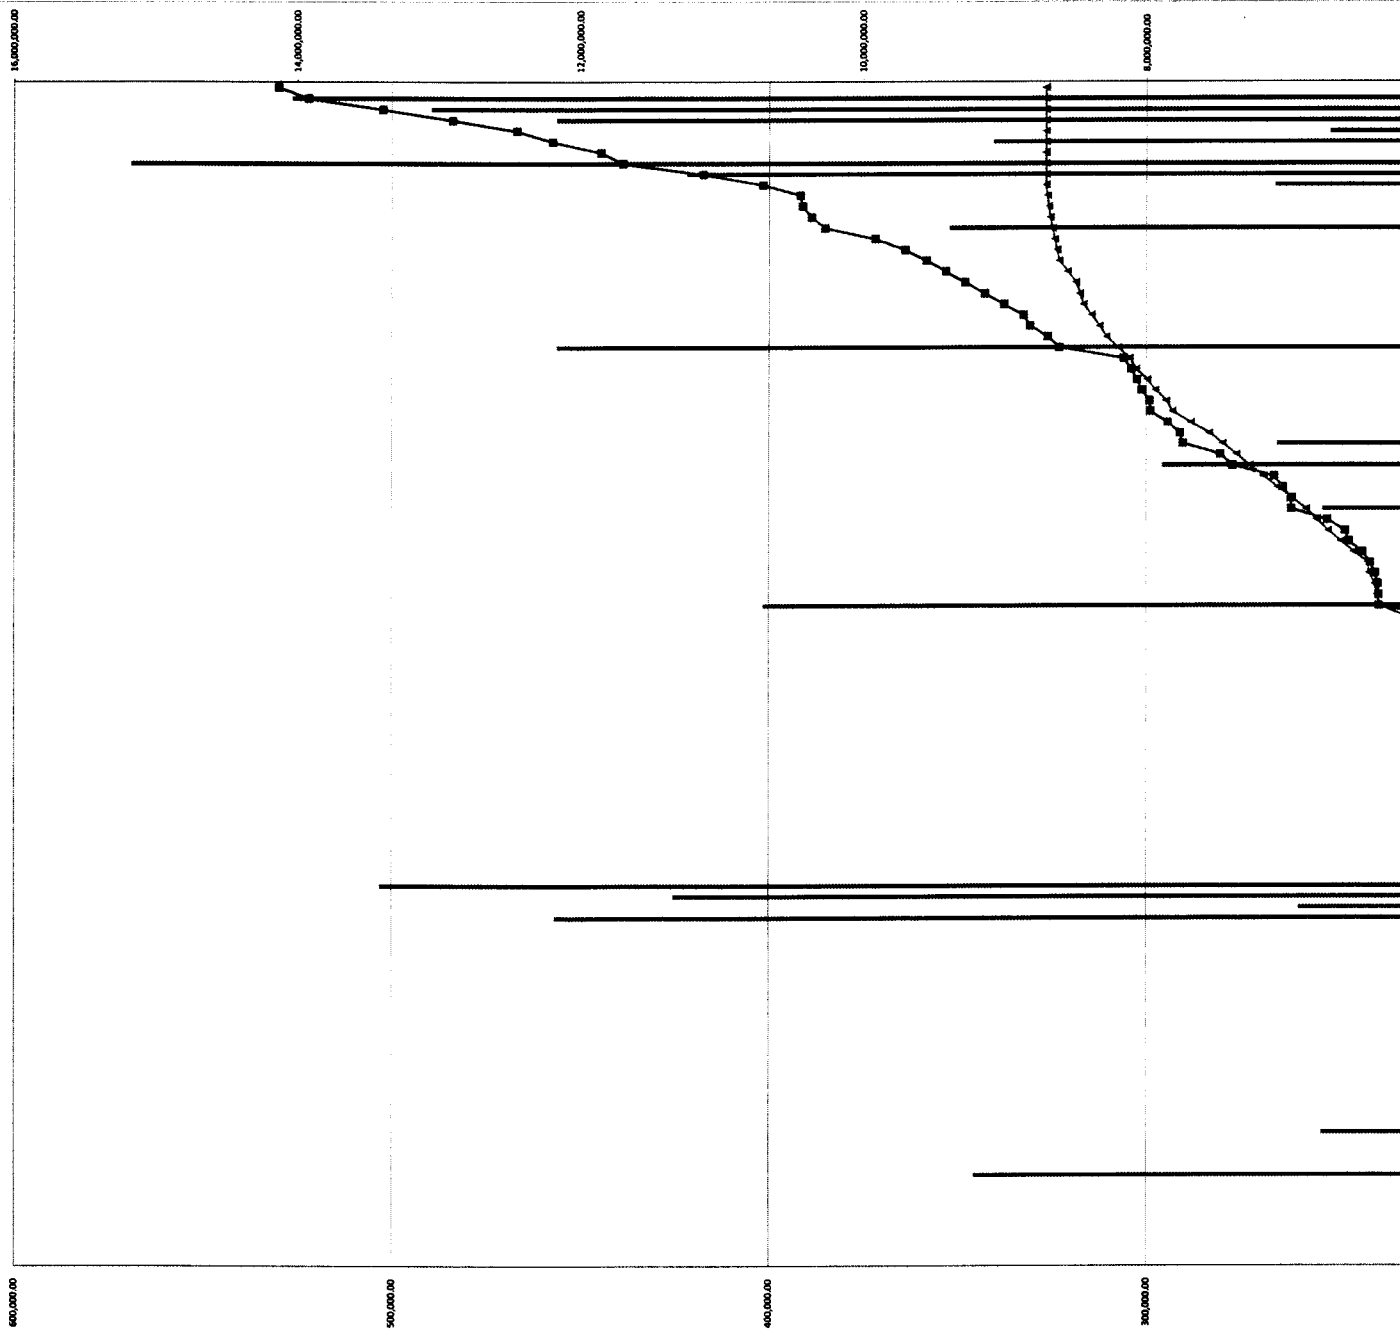

YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
R.C. CIP N° 70073

000894973088

San Borja, 22 de Mayo de 2019

Señores
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Presente.-

De nuestra consideración:

A solicitud y/o por cuenta de nuestro cliente:
P S V CONSTRUCTORES S.A.

Otorgamos a favor de ustedes, fianza solidaria, irrevocable, incondicional y sin beneficio de excusión para garantizar a P S V CONSTRUCTORES S.A.***
*****, hasta por el importe de:
S/798,055.44 (SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO Y 44/100 SOLES) por un plazo que vencerá el 20/08/2019.

A FIN DE GARANTIZAR: LA OBLIGACIÓN DE HACER CONSISTENTE EN EJECUTAR EL: ADELANTO DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA".*****

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder, por ningún caso y en ningún concepto, el importe indicado y su realización será automática, por el solo mérito de su requerimiento de pago, y/o la indicación o su solo dicho de que la obligación garantizada ha sido incumplida, siempre que sea efectuado dentro de su vigencia desde el 22/05/2019 con vencimiento al 20/08/2019 y hasta las 12:00 pm del decimoquinto día calendario posterior a su vencimiento necesariamente por conducto notarial, en la dirección abajo indicada, señalando obligatoriamente el monto a pagar. De no señalarse dicho monto, se entenderá que el requerimiento es por la suma total afianzada. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe antes señalado, se entenderá que Ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aún cuando el plazo de vencimiento y/o de ejecución de esta fianza no hubiese vencido.

En caso de ejecutarse la presente Carta Fianza, el pago será efectuado mediante cheque de gerencia a la orden del beneficiario. El Banco emitirá el cheque de gerencia, contra la devolución del original de la presente Carta Fianza, quedando dicho cheque de gerencia a disposición del beneficiario en el domicilio abajo indicado.

En el supuesto de requerirse su prórroga, será facultad y no obligación del banco conceder tal prórroga. Si se requiere alternativamente su prórroga o pago, la prórroga que acepte el banco lo liberará de atender el pago.

De haberse otorgado la presente fianza a favor de más de un beneficiario, facultados a ejecutar indistintamente, los términos del requerimiento de pago o prórroga recibido en primer lugar de uno de los beneficiarios, primarán sobre los posteriores que dirijan los demás beneficiarios y que tengan distinto alcance o condición.

La presente fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario en cuyo favor se haya expedido, salvo que la cesión de la acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada al banco y éste haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestando fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente fianza no surtirá ningún efecto, si la acreencia garantizada resultase ser un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del sistema financiero nacional, o un banco o financiera del exterior.

Agradeciéndole tomar nota de las condiciones que tiene la presente carta fianza y de sus términos, les saludamos.

NOTA: LA PRESENTE CARTA FIANZA ANULA/SUSTITUYE NUESTRA ANTERIOR EMITIDA EL 27.02.2019 POR S/832,104.87 CON VENCIMIENTO 22.05.2019 VALORADO 125608.

Atentamente,
BANCO PICHINCHA

Av. Aviación N° 2405 Edificio San Sebastián, piso 12 - San Borja- Lima

BANCO PICHINCHA
GISELLA LILIANA GUTIÉRREZ TORERO

BANCO PICHINCHA
PAZ TRELLES

Reg. Cif. N° 79973

Para confirmar la emisión de esta Carta Fianza, puede ingresar a la "Consulta de Carta Fianza" de la página del banco (<http://aplicacionespichincha.com.pe/WebCartaFianza/>) o comunicarse con el equipo de Servicios para Empresas al teléfono 612-2003 anexos 5637 / 5650 / 5654 / 3793 / 5664 o al buzón serviciosparapresas@pichincha.pe

000887360378

San Borja, 29 de Marzo de 2019

Señores
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Presente.-

De nuestra consideración:

A solicitud y/o por cuenta de nuestro cliente:
P S V CONSTRUCTORES S.A.

Otorgamos a favor de ustedes, fianza solidaria, irrevocable, incondicional y sin beneficio de excusión para garantizar a P S V CONSTRUCTORES S.A. ***** hasta por el importe de: S/866,119.69 (OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE Y 69/100 SOLES) por un plazo que vencerá el 26 de Junio de 2019.

A fin de garantizar: LA OBLIGACIÓN DE HACER CONSISTENTE EN EJECUTAR EL: ADELANTO DIRECTO DE LA EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA".*****

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder, por ningún caso y en ningún concepto, el importe indicado y su realización será automática, por el solo mérito de su requerimiento de pago, y/o la indicación o su solo dicho de que la obligación garantizada ha sido incumplida, siempre que sea efectuado dentro de su vigencia desde el 28/03/2019 con vencimiento al 26/06/2019 y hasta las 12:00 pm del decimoquinto día calendario posterior a su vencimiento necesariamente por conducto notarial, en la dirección abajo indicada, señalando obligatoriamente el monto a pagar. De no señalarse dicho monto, se entenderá que el requerimiento es por la suma total afianzada. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe antes señalado, se entenderá que Ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aún cuando el plazo de vencimiento y/o de ejecución de esta fianza no hubiese vencido.

En caso de ejecutarse la presente Carta Fianza, el pago será efectuado mediante cheque de gerencia a la orden del beneficiario. El Banco emitirá el cheque de gerencia, contra la devolución del original de la presente Carta Fianza, quedando dicho cheque de gerencia a disposición del beneficiario en el domicilio abajo indicado.

En el supuesto de requerirse su prórroga, será facultad y no obligación del banco conceder tal prórroga. Si se requiere alternativamente su prórroga o pago, la prórroga que acepte el banco lo liberará de atender el pago.

De haberse otorgado la presente fianza a favor de más de un beneficiario, facultados a ejecutar indistintamente, los términos del requerimiento de pago o prórroga recibido en primer lugar de uno de los beneficiarios, primarán sobre los posteriores que dirijan los demás beneficiarios y que tengan distinto alcance o condición.

La presente fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario en cuyo favor se haya expedido, salvo que la cesión de la acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada al banco y éste haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestando fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente fianza no surtirá ningún efecto, si la acreencia garantizada resultase ser un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del sistema financiero nacional, o un banco o financiera del exterior.

Agradeciéndole tomar nota de las condiciones que tiene la presente carta fianza y de sus términos, les saludamos.

LA VIGENCIA DE LA CARTA FIANZA ESTARA SUJETA A QUE EL CHEQUE PRODUCTO DEL DESEMBOLSO DEBE SER GIRADO A NOMBRE DE BANCO PICHINCHA / P S V CONSTRUCTORES S.A.

NOTA: LA PRESENTE CARTA FIANZA ANULA/SUSTITUYE NUESTRA ANTERIOR EMITIDA EL 28.12.2018 POR S/873,497.75 CON VENCIMIENTO 28.03.2019 VALORADO 124263.

Atentamente,
BANCO PICHINCHA
Av. Aviación N° 2405 Edificio San Sebastián, Piso 12 - San Borja, Lima

[Handwritten signatures and stamps]

"Para confirmar la emisión de esta Carta Fianza, por favor ingresar a la "Consulta de Carta Fianza" de la página del banco (<http://aplicacionespichincha.com.pe/WebGta/Fianza/>) o comunicarse con el equipo de Servicios para Empresas al teléfono 512-2063 anexos 5637 / 5656 / 5654 / 3793 / 5664 o al [correo electrónico: serviciospaempresas@pichincha.pe](mailto:serviciospaempresas@pichincha.pe)"

000873641360

San Borja, 06 de Mayo de 2019

Señores
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Presente. -

De nuestra consideración:

A solicitud y/o por cuenta de nuestro cliente:
P S V CONSTRUCTORES S.A.

Otorgamos a favor de ustedes, fianza solidaria, irrevocable, incondicional y sin beneficio de excusión para garantizar a P S V CONSTRUCTORES S.A. ***** hasta por el importe de: S/1,762,413.69 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE Y 69/100 SOLES), por un plazo que vencerá 30 de Julio de 2019.

A fin de garantizar: EL FIEL CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA".*****

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder, por ningún caso y en ningún concepto, el importe indicado y su realización será automática, por el solo mérito de su requerimiento de pago, y/o la indicación o su solo dicho de que la obligación garantizada ha sido incumplida, siempre que sea efectuado dentro de su vigencia desde el 01/05/2019, con vencimiento al 30/07/2019 y hasta las 12:00 pm del decimoquinto día calendario posterior a su vencimiento necesariamente por conducto notarial, en la dirección abajo indicada, señalando obligatoriamente el monto a pagar. De no señalarse dicho monto, se entenderá que el requerimiento es por la suma total afianzada. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe antes señalado, se entenderá que Ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aún cuando el plazo de vencimiento y/o de ejecución de esta fianza no hubiese vencido.

En caso de ejecutarse la presente Carta Fianza, el pago será efectuado mediante cheque de gerencia a la orden del beneficiario. El Banco emitirá el cheque de gerencia contra la devolución del original de la presente Carta Fianza y pondrá a su disposición en el domicilio abajo indicado.

En el supuesto de requerirse su prórroga, será facultad y no obligación del banco conceder tal prórroga. Si se requiere alternativamente su prórroga o pago, la prórroga que acepte el banco lo liberará de atender el pago.

De haberse otorgado la presente fianza a favor de más de un beneficiario, facultados a ejecutar indistintamente, los términos del requerimiento de pago o prórroga recibido en primer lugar de uno de los beneficiarios, primarán sobre los posteriores que dirijan los demás beneficiarios y que tengan distinto alcance o condición.

La presente fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario en cuyo favor se haya expedido, salvo que la cesión de la acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada al banco y éste haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestando fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente fianza no surtirá ningún efecto, si la acreencia garantizada resultase ser un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del sistema financiero nacional, o un banco o financiera del exterior.


Agradeciéndole tomar nota de las condiciones que tiene la presente carta fianza y de sus términos, les saludamos.


NOTA: LA PRESENTE CARTA FIANZA ES RENOVACION DE NUESTRA ANTERIOR EMITIDA EL 31.01.2019 POR S/1,762,413.69 CON VENCIMIENTO 01.05.2019. VALORADO 124788.

Atentamente,
BANCO PICHINCHA
Av. Aviación N° 2405 Edificio San Sebastián, Piso 12 - San Borja - Lima

Para confirmar la emisión de este valor, favor de acercarse a la "Consulta de Carta Fianza" de la página del banco (<http://aplicacionespichincha.com.pe/WebFianza>) o comunicarse con el equipo de Servicios al Cliente al teléfono 012-2062 anexos 5637 / 5638 / 5639 / 5640 o al buzón servicios@pichincha.pe


BANCO PICHINCHA
GISELLA LILIANA GUTIÉRREZ TORERO


BANCO PICHINCHA


YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 79973

001095202390

San Borja, 15 de Mayo de 2019

Señores
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Presente.-

De nuestra consideración:

A solicitud y/o por cuenta de nuestro cliente:
PSV CONSTRUCTORES S.A.

Otorgamos a favor de ustedes, fianza solidaria, irrevocable, indivisible, incondicional y sin beneficio de excusión para garantizar a PSV CONSTRUCTORES S.A., hasta por el importe de: S/41,342.09 (CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 09/100 SOLES)***** por un plazo que vencerá el 16 de Agosto de 2019.

A fin de garantizar: EL FIEL CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO DISTRITO DEL ALTO, PROVINCIA DE TALARA REGION PIURA."*****

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder, por ningún caso y en ningún concepto, el importe indicado y su realización será automática, por el solo mérito de su requerimiento de pago, y/o la indicación o su solo dicho de que la obligación garantizada ha sido incumplida, siempre que sea efectuado dentro de su vigencia desde el 18/05/2019, con vencimiento al 16/08/2019 y hasta las 12:00 pm del decimoquinto día calendario posterior a su vencimiento necesariamente por conducto notarial, en la dirección abajo indicada, señalando obligatoriamente el monto a pagar. De no señalarse dicho monto, se entenderá que el requerimiento es por la suma total afianzada. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe antes señalado, se entenderá que Ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aún cuando el plazo de vencimiento y/o de ejecución de esta fianza no hubiese vencido.

En caso de ejecutarse la presente Carta Fianza, el pago será efectuado mediante cheque de gerencia a la orden del beneficiario. El Banco emitirá el cheque de gerencia, contra la devolución del original de la presente Carta Fianza, quedando dicho cheque de gerencia a disposición del beneficiario en el domicilio abajo indicado.

En el supuesto de requerirse su prórroga, será facultad y no obligación del banco conceder tal prórroga. Si se requiere alternativamente su prórroga o pago, la prórroga que acepte el banco lo liberará de atender el pago.

De haberse otorgado la presente fianza a favor de más de un beneficiario, facultados a ejecutarla indistintamente, los términos del requerimiento de pago o prórroga recibido en primer lugar de uno de los beneficiarios, primarán sobre los posteriores que dirijan los demás beneficiarios y que tengan distinto alcance o condición. En el requerimiento de pago deberá indicarse necesariamente a nombre de cuál de los beneficiarios debe emitirse el cheque de gerencia respectivo, de no señalarse el nombre del beneficiario, el cheque de gerencia se emitirá a nombre del beneficiario que realizó el requerimiento.


La presente fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario en cuyo favor se haya expedido, salvo que la cesión de la acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada al banco y éste haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestando fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente fianza no surtirá ningún efecto, si la acreencia garantizada resultase ser un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del sistema financiero nacional, o un banco o financiera del exterior.

Agradeciéndole tomar nota de las condiciones que tiene la presente carta fianza y de sus términos, les saludamos.

NOTA: LA PRESENTE CARTA FIANZA ES RENOVACION DE NUESTRA ANTERIOR EMITIDA EL 19.02.2019 POR S/ 41,342.09 CON VENCIMIENTO 18.05.2019. VALORADO 125464

Atentamente,
BANCO PICHINCHA

Av. Aviación N° 2405 Edificio San Sebastián, piso 12 - San Borja - Lima


YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 79973

Para confirmar la emisión de esta Carta Fianza, puede ingresar a la "Consulta de Carta Fianza" de la página del banco (<http://aplicacionespichincha.com.pe/WebCartaFianza/>) o comunicarse con el equipo de Servicios para Empresas al teléfono 612-2900 anexos 5637 / 5650 / 5654 / 3793 / 5664 o al buzón serviciospa@pichincha.pe

001111164258

San Borja, 06 de Mayo de 2019

Señores
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Presente. -

De nuestra consideración:

A solicitud y/o por cuenta de nuestro cliente:
P S V CONSTRUCTORES SA

Otorgamos a favor de ustedes, fianza solidaria, irrevocable, indivisible, incondicional y sin beneficio de excusión para garantizar a P S V CONSTRUCTORES SA, hasta por el importe de: S/76,162.09 (SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS Y 09/100 SOLES)***** por un plazo que vencerá el 30 de Julio de 2019.

A fin de garantizar: EL FIEL CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO DISTRITO DEL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA".*****

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder, por ningún caso y en ningún concepto, el importe indicado y su realización será automática, por el solo mérito de su requerimiento de pago, y/o la indicación o su solo dicho de que la obligación garantizada ha sido incumplida, siempre que sea efectuado dentro de su vigencia desde el 01/05/2019, con vencimiento al 30/07/2019 y hasta las 12:00 pm del decimoquinto día calendario posterior a su vencimiento necesariamente por conducto notarial, en la dirección abajo indicada, señalando obligatoriamente el monto a pagar. De no señalarse dicho monto, se entenderá que el requerimiento es por la suma total afianzada. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe antes señalado, se entenderá que Ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aún cuando el plazo de vencimiento y/o de ejecución de esta fianza no hubiese vencido.

En caso de ejecutarse la presente Carta Fianza, el pago será efectuado mediante cheque de gerencia a la orden del beneficiario. El Banco emitirá el cheque de gerencia, contra la devolución del original de la presente Carta Fianza, quedando dicho cheque de gerencia a disposición del beneficiario en el domicilio abajo indicado.

En el supuesto de requerirse su prórroga, será facultad y no obligación del banco conceder tal prórroga. Si se requiere alternativamente su prórroga o pago, la prórroga que acepte el banco lo liberará de atender el pago.

De haberse otorgado la presente fianza a favor de más de un beneficiario, facultados a ejecutarla indistintamente, los términos del requerimiento de pago o prórroga recibido en primer lugar de uno de los beneficiarios, primarán sobre los posteriores que dirijan los demás beneficiarios y que tengan distinto alcance o condición. En el requerimiento de pago deberá indicarse necesariamente a nombre de cuál de los beneficiarios debe emitirse el cheque de gerencia respectivo, de no señalarse el nombre del beneficiario, el cheque de gerencia se emitirá a nombre del beneficiario que realizó el requerimiento.

La presente fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario en cuyo favor se haya expedido, salvo que la cesión de la acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada al banco y éste haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestando fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente fianza no surtirá ningún efecto, si la acreencia garantizada resultase ser un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del sistema financiero nacional, o un banco o financiera del exterior.


Agradeciéndole tomar nota de las condiciones que tiene la presente carta fianza y de sus términos, les saludamos.

NOTA: LA PRESENTE CARTA FIANZA ES RENOVACION DE NUESTRA ANTERIOR EMITIDA EL 31.01.2019 POR S/76,162.09 CON VENCIMIENTO 01.05.2019. VALORADO 124799

Atentamente,
BANCO PICHINCHA

Av. Aviación N° 2405 Edificio San Sebastián, piso 12 - San Borja- Lima


BANCO PICHINCHA


YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 79973

Para confirmar la emisión de esta Carta Fianza, puede ingresar a la "Consulta de Carta Fianza" de la página del banco: <http://aplicacionespichincha.com.pe/WebCartaFianza>, o comunicarse con el equipo de Servicios para Empresas al teléfono 615-2001 anexos 5637 / 5650 / 5656 / 3755 / 3664 o al buzón serviciosparaempresas@pichincha.pe

San Isidro, 25 de Julio del 2018

CONSTANCIA N° 00061849

Señores:

PSV CONSTRUCTORES S.A.


Presente.-

Ref.: SEGURO DE VIDA EN GRUPO OBLIGATORIO PARA TRABAJADORES RENOVABLE ANUALMENTE

Estimados Señores:

Por la presente, dejamos constancia que los siguientes trabajadores pertenecientes a la empresa PSV CONSTRUCTORES S.A. ,se encuentran amparados bajo las coberturas correspondientes a la póliza de Vida Ley N° 50253 por la vigencia 01 de Junio del 2018 al 31 de Mayo del 2019

No.	Apellidos y Nombres	D.N.I.	Inicio Cobertura
01	ALVA CUETO LUIS FERNANDO	06232631	01/06/2018
02	AMAYA MEDINA FREDDY EDER	42039361	01/06/2018
03	ARIAS CAPPELLETTI ALDO ALFREDO	09931447	01/06/2018
04	BELTRAN GORDILLO JOHNNY FREDY	04644583	01/06/2018
05	BORDA CHAUCA MARCO ANTONIO	25490887	01/06/2018
06	CALDERON COLCHADO ENRIQUE MANUEL	09515372	01/06/2018
07	ESPICHAN AVILES JORGE JULIO	10323344	01/06/2018
08	LARA LLACAS JULIO RICARDO	41897444	01/06/2018
09	LITANO PAZ PABLO	03473251	01/06/2018
10	LOPEZ MASLUCAN JENNY	09438680	01/06/2018
11	MONDALGO QUISPE ERNESTO MANUEL	06122385	01/06/2018
12	MONTALVO CARO RICARDO JESUS	09697282	01/06/2018
13	MONTES PAJUELO ELVIRA	41044113	01/06/2018
14	PEÑA FUENTES MARIO	06109501	01/06/2018
15	PORTALINO SEGUNDO LUIS ALBERTO	06908284	01/06/2018
16	QUISPE CAMACHO JULIO CESAR	09934624	01/06/2018
17	ROMAN HURTADO JORGE LUIS	41392290	01/06/2018
18	TENORIO CALDERON MANUEL FRANCISCO	09636741	01/06/2018
19	VEGA SEGURA JUAN JESUS	06589525	01/06/2018



YESIL YOTNER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 79973


Sin otro particular, quedamos de ustedes

Atentamente,



ANGEL ARMIÑO HIDALGO
GERENTE

Liquidación de prima: 8267740



YAINER SILVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 79973
