



PERÚ

Ministerio de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de lucha contra la corrupción e impunidad"

MEMORANDO N° 3144 -2019-FONDEPES/DIGENIPAA

CERO

A : **ABG. CARMINA CARRERA AMAYA**
Jefa de la Oficina General de Administración

Asunto : **Valorización de obra N°09 del adicional N°03 (mayo 2019)**
Obra: "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia de Nazca, Región Ica".

Referencia : a) **CONTRATO N°028-2017-FONDEPES**
b) **INFORME N°156-2019/FONDEPES/DIGENIPAA/OAEM/EAVA**
c) **Carta N°106-2019-CMM**

Fecha : Lima, 20 JUN 2019

Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de hacer de su conocimiento el informe de valorización de obra N°09 – mayo 2019 correspondiente al adicional de obra N°03 de la obra "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia de Nazca, Región Ica", y en el cual se señala que es igual a Cero (0).

Por lo cual se traslada una copia del sustento para su conocimiento y el control de las valorizaciones tramitadas en cada periodo, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Atentamente,



FONDEPES

.....
Julio Aurelio Rios Sousa
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal y Acuicola

FONDEPES
OFIC. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
20 JUN 2019
DOCUMENTO RECIBIDO
HORA: 4:30 FIRMA: [Signature]

Edgard V



PERU

Ministerio
de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de lucha contra la corrupción e impunidad"

CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por el presente documento, que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, al suscribir la presente; da su conformidad para realizar el pago por concepto de **Valorización de Obra N°09 – mayo del 2019 – del adicional de obra N°03**, por la suma de **S/ 0.00 (cero 00/100 Soles) Incluido IGV.** a favor del Contratista **P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.**, encargado de la Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA"**, según **CONTRATO N°028-2017-FONDEPES.**

Lima,



FONDEPES

.....
Julio Aurelio Rios Sousa
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



04911487

Usuario: usuario_digenipaa3

Fecha: 20/06/2019

Hora: 16:08



CARGO 00352-2019-FONDEPES/MML

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

Asunto: VALORIZACIÓN N°09 DEL ADICIONAL DE OBRA N°03 (MAYO 2019)
OBRA: ?MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA?.


Referencia:

Fecha: 20/06/2019

Observación: SE DERIVA EL PRESENTE INFORME N° 156-2019-FONDEPES-DIGENIPAA-AOEM-EAVA PARA CONTINUAR TRAMITE CORRESPONDIENTE DEL DPA SAN JUAN DE MARCONA POR LA VALORIZACION 9 DEL ADICIONAL 3 DE MAYO 2019. CONTRATO 28-2017. CONTRATISTA PSV CONSTRUCTORES COORDINADOR ARQ. EDGAR VARGAS

Atentamente,

MORGAN LEON MAGALI






PERÚ

Ministerio de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de lucha contra la corrupción e impunidad"

INFORME N°156-2019/FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/EAVA



A : **ING. JULIO AURELIO RÍOS SOUSA**
Director General de Inversión Pesquero Artesanal y Acuicola

Asunto : **Valorización N°09 del adicional de obra N°03 (mayo 2019)**
Obra: "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia de Nazca, Región Ica".

Referencia : a) Memorando Interno N°2487-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM
b) Memorando Interno N°4264-2019-FONDEPES/DIGENIPAA
c) Carta N°106-2019-CMM

Fecha : Lima, 18 junio del 2019

Por medio del presente, me dirijo a usted para saludarlo y manifestarle que, según la carta de la referencia c), el **CONSORCIO MESONES MURO** encargado de la Supervisión de Obra: "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia de Nazca, Región Ica"; manifiesta que el contratista de obra **P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.** no realiza ningún trabajo relacionado al adicional de obra N°03; Al respecto, debo manifestar lo siguiente:

I. INFORMACION GENERAL DE LA OBRA:

Obra : "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, Región Ica"

Licitación : Licitación Pública N° 002-2017-FONDEPES

Área Geográfica : 2

Ubicación : Distrito de Marcona, Provincia de Nazca, Región Ica

Sistema de Contratación : Precios Unitarios

Monto referencial : S/. 8'871,166.29

Monto contratado : S/. 8'871,166.29 con IGV
S/. 7'517,93.53 sin IGV

Monto vigente : S/. 8'871,166.29 con IGV

Adelanto directo : S/. 887,116.63 con IGV

Plazo de ejecución de la obra : 240 días calendario

Contratista principal : P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.

Representante legal Contratista : Ing. Mario Peña Fuentes

Residente de obra : Ing. Jorge Julio Espichan Avilés

Rep. Legal de Supervisión : Ing. Juan Esteban Zapata Zuloeta

Supervisor de obra : Ing. Luis Alberto Ávila Morales

Contrato : CONTRATO N° 028-2017-FONDEPES

Entrega de Adelanto Directo : S/ 887,116.63 (Inc. IGV), Fecha: 27-set-2017

Entrega de Adelanto de : S/ 1'714,233.30 (Inc. IGV), Fecha: 03-nov-2017

Materiales

Fecha de Contrato : 15-Set-17

Entrega de Terreno : 29-Set-17

Inicio Contractual de Obra : 30-Set-17

Inicio real de Obra : 30-Set-17

Nueva fecha de final de obra 01 de julio del 2019

Adicional de Obra N°01 : DENEGADO

Adicional de Obra N°02 : DENEGADO



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de lucha contra la corrupción e impunidad"

Mayores Metrados N°01	:	APROBADO
Mayores Metrados N°02	:	APROBADO
ADICIONAL de Obra N°03	:	APROBADO
ADICIONAL de Obra N°04	:	DENEGADO
ADICIONAL de Obra N°05	:	APROBADO
ADICIONAL de Obra N°08	:	DENEGADO

II. ANTECEDENTES:

- 2.1. Mediante Informe Técnico N°037-2014-PRODUCE/OGPP-OPI-JVALDIVIA-JBUSTINZA de fecha 25 de marzo del 2014, La OPI Produce declara viable el Proyecto, procediéndose a la inscripción con Código SNIP N° 278545, por un monto de inversión de S/. 8'760,843.98 (Ocho Millones Setecientos Sesenta Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 98/100 soles) y un periodo de ejecución de 12 meses.
- 2.2. Mediante Memorando N°815-2017-FONDEPES/DIGENIPAA del 29 de mayo del 2017, se aprueba la actualización del expediente técnico para la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia De Nazca, Región Ica"; con Código SNIP N° 278545; por un monto total de S/ 8'871,166.29 (Ocho Millones Ochocientos Setenta y Un Mil Ciento Sesenta y Seis con 29/100 Soles) y un plazo de 240 (Doscientos Cuarenta) días calendario.
- 2.3. Con fecha 01 de setiembre del 2015, se firma el Contrato N°027-2015-FONDEPES, con el CONSORCIO MESONES MURO para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia De Nazca, Región Ica", bajo el sistema de Suma Alzada; por un monto total de S/ 318,661.60 (Trescientos Dieciocho Mil Seiscientos Sesenta y Uno con 60/100 Soles) y por un plazo total de 285 días calendario, plazo que incluye la liquidación de obra.
- 2.4. Con fecha 15 de setiembre del 2017, se firma el Contrato N°028-2017-FONDEPES, con la empresa P.S.V. CONSTRUCTORES S.A. para la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia De Nazca, Región Ica", bajo el sistema de Precios Unitarios; por un monto total de S/ 8'871,166.29 (Ocho Millones Ochocientos Setenta y Un Mil Ciento Sesenta y Seis con 29/100 Soles) y un plazo total de 240 (Doscientos Cuarenta) días calendario.

2.1 Con Referencia a Ampliaciones de Plazo y Vencimiento de Contrato Vigente:

DOCUMENTO	DIAS	CONDICIÓN	NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN
Ampliación de plazo N°01-RSG-69-2018-FONDEPES/SG, 24.abr.2018	6	consentida	2 - jun - 2018
Ampliación de plazo N°02-RSG-69-2018-FONDEPES/SG, 24.abr.2018	62	denegada	2 - jun - 2018
3 Ampliación de plazo N°03-RSG-149-2018-FONDEPES/SG, 13.ago.2018	23	aprobada	2 - set - 2018
4 Ampliación de plazo N°04-RSG-162-2018-FONDEPES/SG, 14.set.2018	35	denegada	2 - set - 2018
5 Ampliación de plazo N°05-RSG-164-2018-FONDEPES/SG, 20.set.2018	23	aprobada	25 - set - 2018



PERÚ

Ministerio
de la Producción**FONDEPES**
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de lucha contra la corrupción e impunidad"

N°	DOCUMENTO	DÍAS	CONDICIÓN	NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN
6	Ampliación de plazo N°06-RSG-169-2018-FONDEPES/SG, 25.set.2018	64	denegada	25 - set - 2018
7	Ampliación de plazo N°07-RSG-175-2018-FONDEPES/SG, 10.oct.2018	31	aprobada	26 - oct - 2018
8	Ampliación de plazo N°08-RSG-200-2018-FONDEPES/SG, 09.nov.2018	31	aprobada	26 - nov - 2018
9	Ampliación de plazo N°09-RGG-223-2018-FONDEPES/GG, 06.dic.2018	31	aprobada	27 - dic - 2018
10	Ampliación de plazo N°10-RGG-234-2018-FONDEPES/GG, 31.dic.2018	31	aprobada	27 - ene - 2019
11	Ampliación de plazo N°11-RGG-021-2019-FONDEPES/GG, 04.feb.2019	31	aprobada	27 - feb - 2019
12	Ampliación de plazo N°12-RGG-043-2019-FONDEPES/GG, 11.mar.2019	31	aprobada	30 - mar - 2019
13	Ampliación de plazo N°13-RGG-066-2019-FONDEPES/GG, 08.abr.2019	31	aprobada	30 - abr - 2019
14	Ampliación de plazo N°14-RGG-067-2019-FONDEPES/GG, 09.abr.2019	45	denegada	30 - abr - 2019
15	Ampliación de plazo N°15-RGG-089-2019-FONDEPES/GG, 15.may.2019	31	aprobada	30 - may - 2019
16	Ampliación de plazo N°16-RGG-109-2019-FONDEPES/GG, 12.jun.2019	31	aprobada	01 - jul - 2019

III. ASPECTOS LEGALES:

3.1. La Cláusula Cuarta: Del Pago; se indica lo siguiente:

"LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de valorización mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. (...)"

3.2. En las bases integradas, numeral 2.7 Valorizaciones, se indica lo siguiente:


"El periodo de valorización será mensual. De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del Artículo 166° del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo".

3.3. Asimismo, en las bases integradas, numeral 3.14 Valorizaciones, Presentaciones de Informes y Pago, se indica lo siguiente:

"(...) Los metrados de obra ejecutados, se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor y presentados al FONDEPES dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o el supervisor no se presentan para la valorización conjunta con el contratista, éste la efectúa. El inspector o supervisor debe revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.

El contratista está obligado a presentar para la aprobación de la supervisión y remisión al FONDEPES, informes mensuales de avance de Obra y otros informes que el supervisor y la entidad solicite, los cuales se presentarán como máximo el quinto (5to) día hábil de cada mes junto con la valorización mensual de avance de obra correspondiente (...)"

3.4. El reglamento de la ley de contrataciones menciona en su Artículo 166.- Valorizaciones y metrados





Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de lucha contra la corrupción e impunidad"

166.1. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista.


166.2. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

3.5. Valorización N°09 – Mes de mayo 2019:

- 3.5.1. Con carta N°205-2019/PSV-CMM, de fecha 31 de mayo del 2019, el residente de obra emite su informe de valorización correspondiente al mes de mayo del 2019 – adicional de obra N°03
- 3.5.2. Con informe de supervisión N°008-2019/JACHR/JS, de fecha 01 de junio del 2019, el Jefe de Supervisión de la obra Ing° José Alexander Chancafe Reyes, concluye que la valorización N°09 tiene un avance físico ejecutado de 0.00 % correspondiente al mes de mayo del 2019, por lo tanto, la obra cuenta con 79.67 % de avance físico acumulado
- 3.5.3. Con Carta N°106–2019-CMM, de fecha 06 de junio del 2019, el representante legal del CONSORCIO MESONES MURO remite a la Entidad lo manifestado por el supervisor de obra.

IV. ANÁLISIS:

- 4.1 Con Carta N°106–2019-CMM, de fecha 06 de junio del 2019, el representante legal del CONSORCIO MESONES MURO remite a la ENTIDAD el informe de valorización N°09 correspondiente al mes de mayo del 2019 del adicional de obra N°03.
- 4.2 La supervisión manifiesta que, *La entidad debe de agilizar el trámite del nuevo adicional correspondiente a obras de mar (puente y vigas perimetrales del cabezo antiguo y nuevo) para que continúen la ejecución de las partidas del adicional de obra N°03.*
- 4.3 Curva S de Avance Físico de la Obra (AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO):

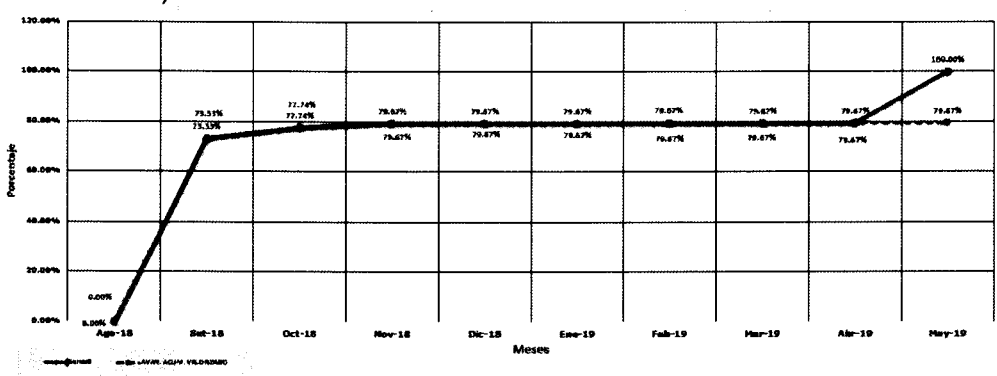

	Agos-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dic-18	Ene-19	Feb-19	Mar-19	Abr-19	May-19	TOTAL
TOTAL PROGRAMADO S	0.00	288,881.70	17,358.94	7,613.88	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	88,888.20	393,821.83
AVAN. MESON. PROGRAM	0.00%	73.33%	4.48%	1.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.88%
AVAN. ACUM. PROGRAM	0.00	288,881.70	306,238.64	313,851.73	313,851.73	313,851.73	313,851.73	313,852.73	313,854.73	313,856.83	
AVAN. ACUM. PROGRAM	0.00%	73.33%	77.74%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	99.68%	
TOTAL VALORIZADO S	0.00	288,881.70	17,358.94	7,613.88	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	393,821.83
AVANCE MESONAL VAL	0.00%	73.33%	4.48%	1.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.88%
AVAN. ACUM. VALORIZ	0.00	288,881.70	306,238.64	313,851.73	313,851.73	313,851.73	313,851.73	313,852.73	313,854.73	313,851.73	
AVAN. ACUM. VALORIZ	0.00%	73.33%	77.74%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	





PERÚ

Ministerio
de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de lucha contra la corrupción e impunidad"


- 4.4. Con fecha 13 de junio del 2019, se realizó una visita al DPA San Juan de Marcona en la cual se pudo evidenciar que el contratista de obra P.S.V. CONSTRUCTORES S.A. no cuenta con personal en obra y a la fecha se encuentra paralizada por lo tanto se puede advertir que, **el contratista de obra no cuenta con la capacidad logística y operativa por lo tanto, viene incumpliendo injustificadamente con sus obligaciones contractuales, generando a su vez que no se cumpla con lo establecido en los cronogramas vigentes y demás consideraciones que son parte del contrato de ejecución de obra.**

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 5.1. Las causas de atraso en la ejecución de la obra son entera responsabilidad del contratista de obra por lo cual el jefe de FONDEPES tiene conocimiento sobre dichos incumplimientos.
- 5.2. Según valorización correspondiente al mes de mayo del 2019 se cuenta con un avance de 0.00% y un acumulado real de 79.67% contra un avance acumulado programado de 100.00% del adicional de obra N°03; con respecto al calendario actualizado de obra, aprobado por la Ampliación de Plazo N°16
- 5.3. Se recomienda derivar el presente informe a la Oficina General de Administración – OGA para su conocimiento y el control de las valorizaciones tramitadas en cada periodo, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Es cuanto tengo que informar a Ud. para los fines que estime convenientes.

Atentamente;


Edgard Alvaro Vargas Aguilar
DNI N° 40698128

Con la conformidad del Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento; pase el presente informe y los antecedentes, a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola; para su atención y trámite correspondiente.

ING. JULIO AURELIO RÍOS SOUSA

Coordinador (e) del Área de Obras,
Equipamiento y Mantenimiento

Fecha: 13/06/19

MEMORÁNDUM INTERNO N° 2487-2019 -FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM

Asunto : Memo Interno N° 4264-2019-DIGENIPAA

Referencia : _____ Registro : 5533

Indicación	Destino
<p><i>Dr.º Edgard Vargas</i></p> <p>Observaciones: <u>Atender trámite de Valorización</u> <u>N° 09 de Adicional N° 03</u></p>	


Atentamente

Edgard V.
18/06/2019
9:33 hrs



Indicaciones:

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 01. Autorizado/Aprobado | 02. Calificar/Evaluar | 03. Informe | 04. Resolver |
| 05. Atención/Tramitación | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular |
| 09. Ayuda memoria | 10. Coordinar | 11. Opinión/Recomendación | 12. Consolidar |
| 13. Aclarar redacción | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta | 16. Visación |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo | 19. Ampliar | 20. Seguimiento |





Fecha: 06/06/19

MEMORÁNDUM INTERNO N° 4264 - 201 - FONDEPES/ DIGENIPAA

Asunto : Carta N° 106-2019-CMM


Referencia : _____ Registro : 5533

Destino	Indicación	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">FONDEPES AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO</p> <p align="center">06 JUN. 2019</p> <p align="center">RECIBIDO</p> <p>Registro.....Hora..... 2:33</p> </div>
OCI		OGAJ	
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	<u>Doct.</u>
Observaciones: _____			




Indicaciones:

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 01. Autorizado/Aprobado | 02. Calificar/Evaluar | 03. Informe | 04. Proyectar |
| 05. Atención/Tramitación | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular |
| 09. Ayuda memoria | 10. Coordinar | 11. Opinión/Recomendación | 12. Consoliar |
| 13. Aclarar redacción | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta | 16. Visación |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo | 19. Ampliar | 20. Seguimiento |



CONSORCIO MESONES MURO
Calle 5, Mz V lote 11, Residencial Puertas del Sol - Chiclayo
TELEFONOS: #949611859 / 949611859



"Año de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad en el Perú"

Lima, 06 de junio del 2019

CARTA N° 106-2019-CMM

Señor:
DIGENIPAA
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES
Av. Petit Thouars N° 115, Cercado de Lima

Atención
Arq. Edgard Vargas Agullar
Coordinador de Obra
Presente.-



Asunto : Presento Valorización N°09 del Adicional de Obra N° 03 (Mes de Mayo 2019)

Referencia : Contrato N° 027-2015-FONDEPES
Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, Región Ica"

De mi Especial consideración:

Quien suscribe, **Juan Esteban Zapata Zuloeta**, identificado con DNI N° **41349923**, representante legal del **Consortio Mesones Muro**, con RUC N° **20600617614**, me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente, asimismo presentarle la Valorización N° 09 del Adicional de Obra N° 03 con el informe N° 008-2019/JACHR/JS, correspondiente al periodo de mayo del 2019, materia del contrato de la referencia.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle mi muestra de consideración y estima personal.

Atentamente



CONSORCIO MESONES MURO
Ing. Juan Esteban Zapata Zuloeta
REPRESENTANTE LEGAL
Cel.: 949611859
estebanzuloeta@hotmail.com

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

	
2887617	
N° DOC:	00005533-2019
CLAVE:	8200
USUARIO:	usuario_alog69
FECHA Y HORA:	06/06/2019 12:36:18
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	


Adjunto informe N° 008-2019/JACHR/JS

estebanzuloeta@hotmail.com

/

jezz82_@hotmail.com

Informe de Supervisión del Adicional de Obra N° 03

 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Jose Alexander Chanco Reyes

Jose Alexander Chanco Reyes
INGENIERO CIVIL C.P. 9476-0

CONSORCIO MESONES MURO
Calle 5, Mz V, lote 11, Residencial Puertas del Sol - Chiclayo
TELEFONOS: #949611859 / 949611859



INFORME DE SUPERVISIÓN N° 008-2019/JACHR/JS

VALORIZACIÓN N° 09 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 03
(MES DE MAYO DEL 2019)


A : Juan Esteban Zapata Zuloeta – Representante Legal Consorcio Mesones Muro
DE : Ing. José Alexander Chancafe Reyes – Jefe de Supervisión
ASUNTO : Informe Mensual de Supervisión
FECHA : Marcona, 01 de junio del 2019

1. GENERALIDADES

- 1.1. Entidad contratante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES
- 1.2. Modalidad : Contrata
- 1.3. Obra : "Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, Región Ica"
- 1.4. Jefe de Supervisión : José Alexander Chancafe Reyes
- 1.5. Residente de obra : Jorge Julio Espichan Aviles

2. DATOS GENERALES

- 2.1. Contratista de la Obra : P.S.V. CONSTRUCTORES S.A
- 2.2. Contrato de Obra N° : 028-2017-FONDEPES
- 2.3. Fecha de contrato ejecutor : 15/09/2017
- 2.4. Monto de Contrato ejecutor : S/. 8'871,166.29, incluido I.G.V.
- 2.5. Plazo de Ejecución : 240 días calendarios
- 2.6. Empresa Supervisora : CONSORCIO MESONES MURO
- 2.7. Contrato de Supervisión N° : 027-2015-FONDEPES
- 2.8. Fecha de contrato supervisor : 01/09/2015
- 2.9. Monto de Contrato supervisor : S/. 318,661.60, incluido I.G.V.
- 2.10. Plazo de Supervisión : 285 días calendarios
- 2.11. Monto del Adelanto Directo al Contratista : S/. 887,116.63 (con IGV)
- 2.12. Fecha de pago del Adelanto Directo : 27/09/2017
- 2.13. Monto del Adel. de Materiales al Contratista : S/. 1'774,233.30 (con IGV)

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

José Alexander Chancafe Reyes
 INGENIERO CIVIL - CIP. 94760

CONSORCIO MESONES MURO
Calle 5, Mz V, lote 11, Residencial Puertas del Sol - Chiclayo
TELEFONOS: #949611859 / 949611859



2.14.	Fecha de pago del Adelanto de Materiales	: 24/11/2017
2.15.	Fecha de entrega de terreno	: 29/09/2017
2.16.	Fecha de inicio de ejecución de obra	: 30/09/2017
2.17.	Fecha de término Contractual	: 27/05/2018
2.18.	Nueva Fecha de término	: 31/05/2019

3. SITUACIÓN DE LA OBRA

3.1 ASPECTO TÉCNICO

3.1.1 Situación de la Obra respecto al Adicional N° 03:

a. Resumen del Trabajo Efectuado:

No se realizó ningún trabajo correspondiente al Adicional N° 03 en el mes de mayo del 2019.

3.1.2 Avance de Obra

a.	Avance ejecutado en el Mes	0.00 %
b.	Avance Ejecutado Acumulado al Mes	79.67 %

3.1.3 Plan de Trabajo

- Desde inicios del mes de mayo del 2019, se está trabajando con el cronograma actualizado solicitado por la Entidad.

3.1.4 Desarrollo de la Obra

a. Aspectos Críticos

Este mes no se ha registrado ningún aspecto crítico.

b. Problemas Presentados

Este mes no se ha registrado ningún problema.


3.1.5 Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- El avance ejecutado mensual de la Valorización del Adicional de Obra N° 03 para el mes de Mayo del 2019 es de **0.00 %**.
- El avance ejecutado acumulado mensual de la Valorización del Adicional de obra N° 03 es de **79.67 %**
- Este adicional fue aprobado con Resolución Jefatural N° 099-2018-FONDEPES/J.

Recomendaciones

- La Supervisión recomienda a la Entidad agilizar el trámite del nuevo Adicional correspondiente a obras de mar (Puente y vigas perimetrales del cabezo antiguo y nuevo) para que continúen la ejecución de las partidas del Adicional de Obra N° 03.

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

 Jose Alexander Chancafe Reyes
 INGENIERO CIVIL. CIP. 94760

CONSORCIO MESONES MURO
Calle 5, Mz V, lote 11, Residencial Puertas del Sol - Chiclayo
TELEFONOS: #949611859 / 949611859



3.2 ASPECTO ECONÓMICO DE LA OBRA


Número de valorizaciones tramitadas	:	9
Monto a Pagar (Incluido IGV)	:	S/. 0.00

3.3 ASPECTO ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA

- Ingeniero Residente:	
- Nombre	: Ing. Jorge Julio Espichan Aviles
- Registro CIP N°	: 119009
- DNI	: 10323344
- N° de Maestros de obra contratados al presente mes	: 01
- N° de Operarios contratados al presente mes	: 02
- N° de Oficiales contratados al presente mes	: 01
- N° de Obreros contratados al presente mes	: 01

4.0 DOCUMENTOS ANEXOS

- ✓ Valorización del Adicional de Obra
- ✓ Curva de Avance
- ✓ Resolución Jefatural


 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
José Alexander Chancafe Reyes
 INGENIERO CIVIL - CIP 9476

José Alexander Chancafe Reyes
 Supervisor


VALORIZACIÓN N° 09 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 03

MES DE MAYO DEL 2019


PROYECTO: Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia Nazca, Región Ica
UBICACIÓN: Marcona - Nazca - Ica.
CLIENTE: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - Fondopes.
FECHA: viernes, 31 de mayo de 2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Sub Total S/.	Valorización anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Saldo a Valorizar	
						Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.
01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE C*A REEMPLAZO DE MATERIAL				23,105.30								
01.01.01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO	m³	20.00	16.15	323.00	20.00	323.00	20.00	323.00	20.00	323.00	20.00	323.00
01.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRA				22,782.30								
01.02.01	Excavación	m³	108.22	35.05	3,793.11	108.22	3,793.11	108.22	3,793.11	108.22	3,793.11	108.22	3,793.11
01.02.02	Acarreo Interno, material procedente de excavación y demolición	m³	179.51	11.00	1,974.61	179.51	1,974.61	179.51	1,974.61	179.51	1,974.61	179.51	1,974.61
01.02.03	Eliminación de material excedente c/máquina	m³	179.51	20.47	3,674.57	179.51	3,674.57	179.51	3,674.57	179.51	3,674.57	179.51	3,674.57
01.02.04	Relleno compactado con material de préstamo	m³	128.22	104.04	13,340.01	128.22	13,340.01	128.22	13,340.01	128.22	13,340.01	128.22	13,340.01
02	REPARACIÓN DE LOSA DE MUELLE				170,068.91								16,069.67
02.01	OBRAS PRELIMINARES				45,335.16								45,335.16
02.01.01	Picado de losa de concreto para retiro de armadura dañada y para colocación	m²	739.08	58.99	43,598.33	739.08	43,598.33	739.08	43,598.33	739.08	43,598.33	739.08	43,598.33
02.01.02	Acarreo interno, material procedente del picado de losa y del colocado de J	m³	55.19	11.00	607.09	55.19	607.09	55.19	607.09	55.19	607.09	55.19	607.09
02.01.03	Eliminación de material excedente c/máquina	m³	55.19	20.47	1,129.74	55.19	1,129.74	55.19	1,129.74	55.19	1,129.74	55.19	1,129.74
02.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				124,723.75								16,069.67
02.02.01	Encofrado y Desencofrado de friso de losa de muelle	m²	19.82	68.82	1,364.01	19.82	1,364.01	19.82	1,364.01	19.82	1,364.01	19.82	1,364.01
02.02.02	Retiro de armadura deteriorada a reemplazar	m.	7,074.21	5.38	38,059.25	7,074.21	38,059.25	7,074.21	38,059.25	7,074.21	38,059.25	7,074.21	38,059.25
02.02.03	Reemplazo de Acero de Refuerzo f=4,200 Kg/cm²	Kg.	14,012.96	4.16	58,293.91	12,221.07	50,839.65	12,221.07	50,839.65	12,221.07	50,839.65	1,791.89	7,454.26
02.02.04	Piso de Concreto f=280 Kg./cm²	m³	37.54	528.87	19,853.78	27.18	14,374.69	27.18	14,374.69	27.18	14,374.69	10.36	5,479.09
02.02.05	Tapajunta Superior Detalle C	m.	12.00	335.54	4,026.48	12.00	4,026.48	12.00	4,026.48	12.00	4,026.48	12.00	4,026.48
02.02.06	Junta Inferior Detalle J	m.	4.00	258.86	1,035.44	4.00	1,035.44	4.00	1,035.44	4.00	1,035.44	4.00	1,035.44
02.02.07	Junta con relleno elástico h=1/2"	m.	96.00	21.78	2,090.88	96.00	2,090.88	96.00	2,090.88	96.00	2,090.88	96.00	2,090.88
03	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA				1,868.13								
03.01	Desmontaje de Estructura Metálica en Cabezo Antiguo	Und.	33.00	56.61	1,868.13	33.00	1,868.13	33.00	1,868.13	33.00	1,868.13	33.00	1,868.13
04	RETIRO DE ROCA EN CERCO PERIMETRICO EJE A-9 TRAMO ENROCADO ANTIGUO				33,404.81								
04.01	MOVIMIENTO DE TIERRA				33,404.81								
04.01.01	Excavación	m³	36.94	95.05	3,511.08	36.94	3,511.08	36.94	3,511.08	36.94	3,511.08	36.94	3,511.08
04.01.02	Retiro de rocas del enrocado de protección	m³	68.60	111.97	7,681.14	68.60	7,681.14	68.60	7,681.14	68.60	7,681.14	68.60	7,681.14
04.01.03	Relleno compactado con material propio	m³	184.70	40.79	7,533.91	184.70	7,533.91	184.70	7,533.91	184.70	7,533.91	184.70	7,533.91
04.01.04	Extracción de Roca con maquinaria	m³	30.00	27.50	825.00	30.00	825.00	30.00	825.00	30.00	825.00	30.00	825.00
04.01.05	Carguío y Transporte de roca de cantera-obra Dmin=0.80 m.	m³	30.00	31.69	950.70	30.00	950.70	30.00	950.70	30.00	950.70	30.00	950.70
04.01.06	Reconformación de enrocado existente	m.	35.18	429.77	15,119.31	35.18	15,119.31	35.18	15,119.31	35.18	15,119.31	35.18	15,119.31
05	REPARACIÓN PLATAFORMA BAJA EXISTENTE LADO DERECHO				45,540.64								
05.01	OBRAS PRELIMINARES				5,369.28								
05.01.01	Desmontaje de vigas longitudinales	Und.	6.00	332.09	1,992.54	6.00	1,992.54	6.00	1,992.54	6.00	1,992.54	6.00	1,992.54
05.01.02	Demolición de cabezales y escaleras	m³	10.96	225.88	2,480.16	10.96	2,480.16	10.96	2,480.16	10.96	2,480.16	10.96	2,480.16
05.01.03	Acarreo interno, material procedente del desmontaje y demolición	m³	28.49	11.00	313.39	28.49	313.39	28.49	313.39	28.49	313.39	28.49	313.39
05.01.04	Eliminación de material excedente c/máquina	m³	28.49	20.47	583.19	28.49	583.19	28.49	583.19	28.49	583.19	28.49	583.19
05.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				40,171.36								
05.02.01	CABEZALES PREFABRICADOS				6,727.17								
05.02.01.01	Concreto f=350 Kg/cm² para cabezal prefabricado	m³	4.15	510.23	2,117.45	4.15	2,117.45	4.15	2,117.45	4.15	2,117.45	4.15	2,117.45
05.02.01.02	Encofrado y desencofrado normal para cabezal prefabricado	m²	22.51	72.44	1,630.62	22.51	1,630.62	22.51	1,630.62	22.51	1,630.62	22.51	1,630.62
05.02.01.03	Cabezal prefabricado acero f=4,200 Kg/cm²	Kg.	716.13	4.16	2,979.10	716.13	2,979.10	716.13	2,979.10	716.13	2,979.10	716.13	2,979.10

00034


 COLECCIÓN DE INGENIEROS DEL PERÚ
 José Alejandro Chumacero Reyes
 Mestrero, Perú, 2019

Resumen de Valorización Ejecutor del Adicional de Obra

 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Jose Alexander Chancose Reye

Jose Alexander Chancose Reye
INGENIERO CIVIL CIP 9476

RESUMEN GENERAL
VALORIZACIÓN N° 09 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 03
MES DE MAYO DEL 2019

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.
CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
FECHA: viernes, 31 de mayo de 2019


I.- MONTO PRESUPUESTO CONTRACTUAL SIN IG V :	SI.	333,829.35
II.- VALORIZACIÓN	SI.	0.00
COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES + UTILIDAD	SI.	0.00
DEDUCTIVO	SI.	0.00
SUB TOTAL		0.00
VALORIZACIÓN:	SI.	0.00
IGV 18 %:		0.00
TOTAL (Incl. IGV):	SI.	0.00

IV.- PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL


Porcentaje de avance de la presente valorización: 0.00%
 Porcentaje de avance acumulado: 79.67%

Son: Cero con 00/100 Soles incluido IGV.

Nota: Cualquier error u omisión en la presente valorización se realizará en la liquidación de la ejecución de la obra.


 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Jose Alexander Chancafe Revu
 INGENIERO CIVIL N° 9476


Curva de avance de Obra: avance programado vs ejecutado

 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PER.
[Handwritten Signature]

Jose Alexander Chancafe Reve
INGENIERO CIVIL - CIP. 94760


VALORIZACIÓN N° 09 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 03 CURVA DE AVANCE DE OBRA (HASTA MAYO DEL 2019)

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA
CONTRATISTA: P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.
SUPERVISIÓN: CONSORCIO MESONES MURO
FECHA: MARCONA, MAYO DEL 2019

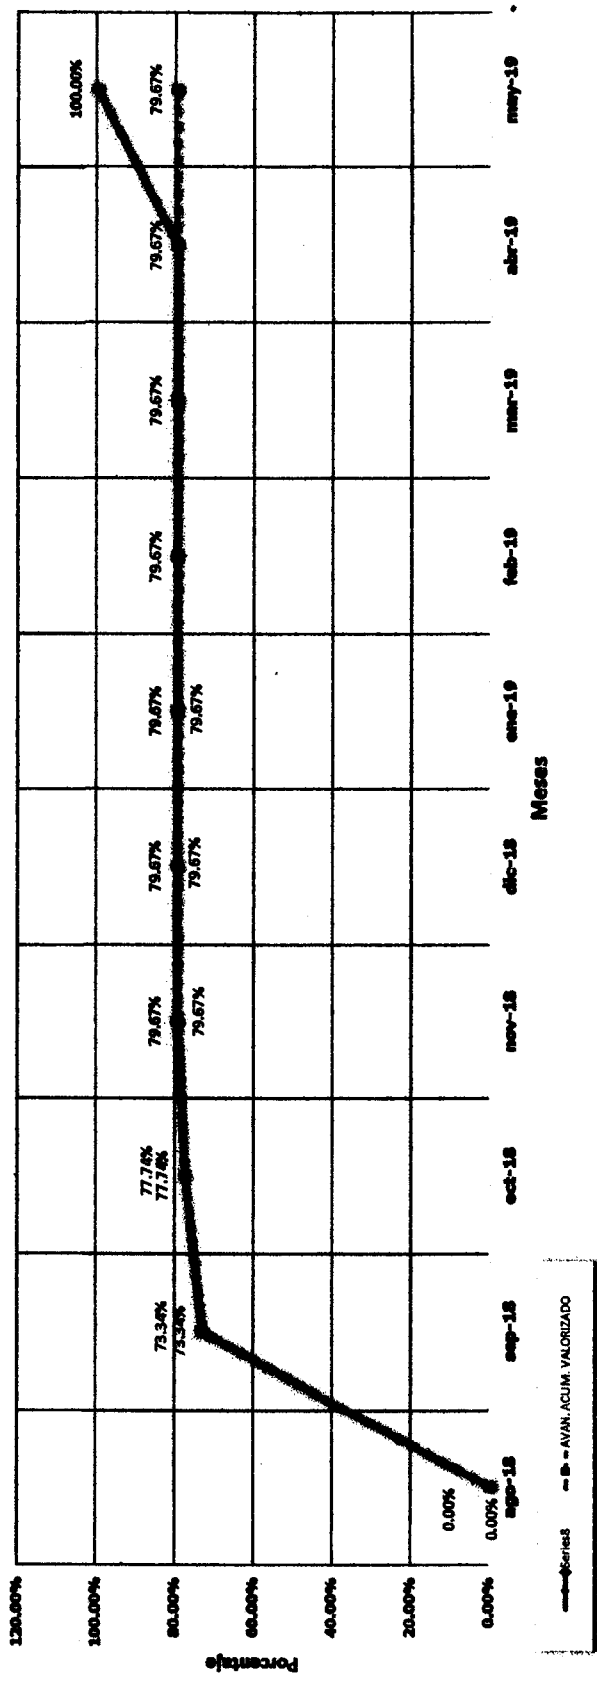


	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	TOTAL
TOTAL PROGRAMADO SIGV	0.00	288,881.70	17,356.94	7,613.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,066.90	383,918.63
AVAN. MENS. PROGRAMADO	0.00%	73.34%	4.41%	1.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.33%	
AVAN. ACUM. PROGRAMADO	0.00	288,881.70	306,238.64	313,851.73	313,851.73	313,851.73	313,851.73	313,851.73	313,851.73	383,918.63	
AVAN. ACUM. PROGRAMADO	0.00%	73.34%	77.74%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	100.00%	
TOTAL VALORIZADO SIGV	0.00	288,881.70	17,356.94	7,613.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,918.63
AVANCE MENSUAL VALORIZ	0.00%	73.34%	4.41%	1.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
AVAN. ACUM. VALORIZADO	0.00	288,881.70	306,238.64	313,851.73	313,851.73	313,851.73	313,851.73	313,851.73	313,851.73	313,851.73	
AVAN. ACUM. VALORIZADO	0.00%	73.34%	77.74%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	

COMENTARIO: EN LO QUE RESPECTA AL ADICIONAL DURANTE EL MES DE MAYO - 2019 NO SE REALIZÓ NINGÚN TRABAJO, SE MANTUVO EN 79.67% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO REALMENTE EJECUTADO DEJANDO UN SALDO DE 20.33%.


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Jose Alexander Hancock Reyes
 INGENIERO CIVIL N° 94760

Resolución Jefatural N° 099

 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
[Handwritten Signature]
Jose Alexander Chancay Rey
INGENIERO CIVIL - CIP. 9476

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES



RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 099-2018-FONDEPES/J

Lima, 28 AGO 2018



VISTOS: El Memorando n.º 392-2018-FONDEPES/OGPP (en adelante la OGPP), el Memorando n.º 2647-2018-FONDEPES/DIGENIPAA y el Informe n.º 089-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/OAMC, ambos de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (en adelante la Digenipaa), así como el Informe n.º 656-2018-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica (en adelante la OGAJ); y

CONSIDERANDO:

Que, el 15 de setiembre de 2017 el Fondepes y la empresa P.S.V. Constructores S.A. (en adelante el Contratista), suscribieron el Contrato n.º 028-2017-FONDEPES para la contratación de la ejecución de la obra «Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, región Ica» (en adelante la Obra) con código SNIP n.º 278545, por el monto de S/ 8 871 166,29 (Ocho millones ochocientos setenta y un mil ciento sesenta y seis con 29/100 Soles) incluido IGV, bajo el sistema de contratación a precios unitarios y con un plazo de ejecución de 240 días calendario;

Que, el acto administrativo puede fundamentarse en informes de emisión previa que obren en el expediente correspondiente, a condición de su puntual identificación y su integración en el acto administrativo que motivan. Sobre el particular, en el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo n.º 006-2017-JUS, se establece lo siguiente:

«Artículo 6.- Motivación del acto administrativo

(...)

6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. (...);

Que, conforme a la normativa indicada sobre el contenido motivacional, constituyen fundamentos de la presente Resolución: el Memorando n.º 392-2018-FONDEPES/OGPP, el Memorando n.º 2647-2018-FONDEPES/DIGENIPAA y el Informe n.º 089-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/OAMC, así como el Informe n.º 656-2018-FONDEPES/OGAJ, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución en calidad de anexos;

Que, por los fundamentos técnicos y normativos expuestos de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo n.º 350-2015-EF, y en ejercicio de las funciones establecidas por el literal «s» del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones del Fondepes, aprobado por Resolución Ministerial n.º 346-2012-PRODUCE, corresponde expedir la Resolución Jefatural



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Jose Alexander Chocafe Rey
INGENIERO
9476

mediante la cual se rectifique el porcentaje de incidencia acumulado de los Mayores Metrados n.º 02, y se apruebe la Prestación Adicional de Obra n.º 03 y el Presupuesto Deductivo Vinculado n.º 01;

Con los visados de la Secretaría General, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola y de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Rectificar el error aritmético identificado en el artículo 1º de la Resolución Jefatural n.º 075-2018-FONDEPES/J del 4 de julio de 2018, en el extremo referido al porcentaje de incidencia acumulado consignado en la autorización para el pago de los Mayores Metrados n.º 02, conforme a lo señalado en el Informe n.º 089-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/OAMC, debiendo quedar redactado de la siguiente manera:

Dice:


«Autorizar el pago de Mayores Metrados n.º 02 correspondiente al Contrato n.º 028-2017-FONDEPES, suscrito para la contratación de la ejecución de la obra «Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, región Ica», por el monto de S/ 221 682,74 (doscientos veintiún mil seiscientos ochenta y dos con 74/100 soles), con una incidencia que representa el 2.50% del monto del contrato original y un porcentaje de incidencia acumulado de 3.62% del monto del contrato original, (...)».

Debe decir:

«Autorizar el pago de Mayores Metrados n.º 02 correspondiente al Contrato n.º 028-2017-FONDEPES, suscrito para la contratación de la ejecución de la obra «Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, región Ica», por el monto de S/ 221 682,74 (doscientos veintiún mil seiscientos ochenta y dos con 74/100 soles), con una incidencia que representa el 2.50% del monto del contrato original y un porcentaje de incidencia acumulado de 3.56% del monto del contrato original, (...)».

Artículo 2º.- Aprobar el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra n.º 03 del Contrato n.º 028-2017-FONDEPES suscrito para la contratación de la ejecución de la obra «Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, región Ica», por el monto de S/ 393 918,63 (Trescientos noventa y tres mil novecientos dieciocho con 63/100 Soles) incluido IGV, y del correspondiente Presupuesto Deductivo Vinculado n.º 01 cuyo monto asciende a S/ 9 602,72 (Nueve mil seiscientos dos con 72/100 Soles) incluido IGV, siendo que el resultado de la sustracción aritmética determina un incremento del monto del contrato original de S/ 384 315,91 (Trescientos ochenta y cuatro mil trescientos quince con 91/100 Soles) incluido IGV, lo que representa un porcentaje de incidencia individual de 4.33% del contrato original y un nivel de incidencia acumulado de 7.89% del monto del contrato original correspondiente a la obra en mención; siendo el nuevo monto contractual de S/ 9 571 268,62 (Nueve millones quinientos setenta y un mil doscientos sesenta y ocho con 62/100 Soles) incluido IGV, de acuerdo con los fundamentos contenidos en el Memorando n.º 392-2018-FONDEPES/OGPP, el Memorando n.º 2647-2018-FONDEPES/DIGENIPAA y el Informe n.º 089-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/OAMC, así como el Informe n.º 656-2018-FONDEPES/OGAJ, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución en calidad de anexos.

Artículo 3º.- Autorizar la ejecución del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra n.º 03 y del Presupuesto Deductivo Vinculado n.º 01, aprobados en el artículo 2º de la presente Resolución, debiendo el Contratista, P.S.V. Constructores S.A., ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento como requisito para los pagos que correspondan a la prestación adicional, de corresponder, de conformidad con lo establecido en el numeral 175.14 del artículo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.º 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo n.º 056-2017-EF.



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES



RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 099-2018-FONDEPES/J

Lima, 28 AGO 2018



Artículo 4°.- Notificar la presente Resolución y sus anexos al Contratista P.S.V. Constructores S.A. y a la Supervisión Consorcio Mesones Muro; remitiéndose copias a la Oficina General de Administración y a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, para que ambas, de manera coordinada, ejecuten las acciones que permitan la suscripción de la respectiva adenda del Contrato n.° 028-2017-FONDEPES.



Artículo 5°.- Disponer que en el acto de notificación de la presente Resolución y sus anexos al Contratista P.S.V. Constructores S.A., se le haga entrega del expediente técnico aprobado en el artículo 2° de la presente Resolución.



Artículo 6°.- Disponer que la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, bajo responsabilidad funcional, en el plazo de 30 días calendario posteriores a la emisión de la presente, emita un informe respecto de la existencia de responsabilidades por las presuntas deficiencias en la formulación y/o aprobación del expediente técnico de la obra «Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, región Ica», para que conjuntamente con los antecedentes, sea remitido a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario del Fondepes. En el supuesto que se determine la responsabilidad del proyectista que elaboró el mencionado expediente técnico, corresponderá a la Digenipaa determinar la existencia del daño o perjuicio generado al Fondepes, así como su cuantificación monetaria, debiendo comunicarse dicha situación a la Procuraduría Pública del Fondepes para que adopte las acciones correspondientes.

Artículo 7°.- Disponer que la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, comunique a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones la ejecución de la Prestación Adicional de Obra n.° 03 y el Presupuesto Deductivo Vinculado n.° 01.

Artículo 8°.- Disponer que la presente Resolución se publique en el portal institucional de la Entidad.

Regístrese y comuníquese.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

DR. MORGAN NICCOLO QUERO GAINÉ
JEFE

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Jose Alexander Chancafe Rey
INGENIERO CIVIL - CIP. 94760

Carta N° 205-2019/PSV-CMM

San Juan de Marcona, 31 de Mayo del 2019.

Señores:

CONSORCIO MESONES MURO

Atención:

Ing. José Alexander Chancafe Reyes

Supervisor de Obra

Asunto : Informe de la Valorización N° 09 del Adicional de Obra N° 03


Referencia: Obra: "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia de Nazca, Región Ica".

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted para hacerle llegar un saludo cordial y al mismo tiempo hacerle llegar el Informe de la Valorización N° 09 del Adicional de Obra N° 03, de la Obra de la referencia, para su conocimiento.

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente,

 PSV CONSTRUCTORES S.A.

Ing. JORGE ESPICHAN AVILES
RESIDENTE DE OBRA

RECIBIDO: 31/05/19

HORA: 2:46 PM



HENRY PARDO

1967



INFORME N° 066-2019/PSV-CMM

A : Ing. José Alexnader Chancafe Reyes
Supervisor de Obra - Consorcio Mesones Muro

DE : Ing. Jorge Espichán Avilés
Residente de Obra - PSV Constructores S.A.

ASUNTO : Informe de Valorización N° 09 del Adicional de Obra N° 03.

FECHA : 31 de Mayo del 2019.

REFERENCIA : Obra: "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia Nazca, Región Ica".

**MAYO 2019**

 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
José Alexnader Chancafe Reyes
Ing. José Alexnader Chancafe Reyes
INGENIERO CIVIL - CIP. 94760

 PSV CONSTRUCTORES S.A.
Jorge Espichán Avilés
Ing. JORGE ESPICHAN AVILES
RESIDENTE DE OBRA

1960

11



1960
11

CONTENIDO

- 1.- OBJETIVOS
- 2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA
- 3.- DATOS DE OBRA
- 4.- DATOS GENERALES
- 5.- COMENTARIOS RESPECTO AL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

ANEXOS

- ANEXO N° 01: VALORIZACIÓN N° 09 DEL ADICIONAL N° 03
- ANEXO N° 02: CURVA DE AVANCE DE OBRA
- ANEXO N° 03: RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 099-2018-FONDEPES/J
- ANEXO N° 04: ADENDA N° 01
- ANEXO N° 05: CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Jose Alexander Chancafe Reyes
INGENIERO CIVIL - CIP. 94760



PSV CONSTRUCTORES S.A.

Jorge Espichan Aviles
Ing. JORGE ESPICHAN AVILES
RESIDENTE DE OBRA

1.- OBJETIVOS

1.1.- OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Debido a la exigencia demandada por el mercado internacional y acorde a las Normas Sanitarias Vigentes, es necesario contar con la Infraestructura Pesquera adecuada a dichas exigencias.

1.2.- OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones en la prestación de servicio del Desembarcadero Pesquero Artesanal San Juan de Marcona, a través del mejoramiento de su infraestructura de mar y tierra adecuada a la Norma Sanitaria 040, así como la implementación necesaria de equipos y desarrollo de talleres de capacitación con la finalidad de satisfacer la demanda actual.

2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El DPA San Juan de Marcona se encuentra ubicada en la costa sur del Perú, en la Localidad de San Juan de Marcona.

Distrito: Marcona.

Provincia: Nazca.

Región: Ica.



Foto N° 01: Ubicación del Distrito de Marcona.

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Jose Alexander Chancafe Reyes
INGENIERO CIVIL - CIP. 94760



PSV CONSTRUCTORES S.A.

Jorge Espichan Aviles
ING. JORGE ESPICHAN AVILES
RESIDENTE DE OBRA



Foto N° 02: Ubicación del DPA San Juan de Marcona.

3.- DATOS DE OBRA

Entidad contratante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 Modalidad : Licitación Pública N° 002-2017-FONDEPES
 Obra : "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia de Nazca, Región Ica"
 Jefe de Supervisión : José Alexnader Chancafe Reyes
 Residente de Obra : Jorge Julio Espichán Avilés

4.- DATOS GENERALES

Contratista de la Obra	: P.S.V. Constructores S.A.
Contrato de Obra N°	: 028-2017-FONDEPES
Fecha de Contrato Ejecutor	: 15/09/2017
Monto de Contrato Ejecutor	: S/. 8'871,166.29, incl. I.G.V.
Monto por Mayor Metrado N° 01	: S/. 99,350.22 incl. I.G.V.
Monto por Mayor Metrado N° 02	: S/. 221,682.74 incl. I.G.V.
Monto por Adicional de Obra N° 03	: S/. 393,918.63 incl. I.G.V.
Monto por Deductivo N° 01	: S/. 9,602.72 incl. I.G.V.
Monto por Adicional de Obra N° 05	: S/. 35,557.80 incl. I.G.V.
Monto por Deductivo N° 02	: S/. 3,610.39 incl. I.G.V.


 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
 José Alexander Chancafe Reyes
 INGENIERO CIVIL - CIP. 94760


 PSV CONSTRUCTORES S.A.


ing. JORGE ESPICHAN AVILES
 RESIDENTE DE OBRA

00000
10000



0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

Plazo de Ejecución Contractual	:	240 días calendarios
Ampliación de Plazo N° 01	:	06 días calendarios.
Suspensión de Plazo de Ejecución de la Obra	:	62 días calendarios.
Suspensión de Plazo de Ejecución de la Obra	:	07 días calendarios.
Ampliación de Plazo N° 03	:	23 días calendarios.
Ampliación de Plazo N° 05	:	23 días calendarios.
Ampliación de Plazo N° 07	:	31 días calendarios.
Ampliación de Plazo N° 08	:	31 días calendarios.
Ampliación de Plazo N° 09	:	31 días calendarios
Ampliación de Plazo N° 10	:	31 días calendarios
Ampliación de Plazo N° 11	:	31 días calendarios
Ampliación de Plazo N° 12	:	31 días calendarios
Ampliación de Plazo N° 13	:	31 días calendarios
Ampliación de Plazo N° 15	:	31 días calendarios
Ampliación de Plazo N° 16	:	31 días calendarios
(en trámite)		
Empresa Supervisora	:	Consortio Mesones Muro
Monto del Adelanto Directo al Contratista	:	S/. 887,116.63 incluido I.G.V.
Monto del Adelanto por Materiales al Contratista	:	S/. 1'774,233.30 incluido I.G.V.
Fecha de Pago del Adelanto Directo	:	27/09/2017
Fecha de Pago del Adelanto por Materiales	:	24/11/2017
Fecha de Entrega de Terreno	:	29/09/2017
Fecha de Inicio de Ejecución de Obra	:	30/09/2017
Fecha de Término Contractual	:	27/05/2018
Fecha de Término por Ampliación de Plazo N° 01	:	02/06/2018
Fecha de Término por Suspensión de Plazo de Ejecución de la Obra	:	03/08/2018
Fecha de Término por Suspensión de Plazo de Ejecución de la Obra	:	10/08/2018
Fecha de Término por Ampliación de Plazo N° 03	:	02/09/2018
Fecha de Término por Ampliación de Plazo N° 05	:	25/09/2018
Fecha de Término por Ampliación de Plazo N° 07	:	26/10/2018
Fecha de Término por Ampliación de Plazo N° 08	:	26/11/2018
Fecha de Término por Ampliación de Plazo N° 09	:	27/12/2018
Fecha de Término por Ampliación de Plazo N° 10	:	27/01/2019
Fecha de Término por Ampliación de Plazo N° 11	:	27/02/2019
Fecha de Término por Ampliación de Plazo N° 12	:	30/03/2019
Fecha de Término por Ampliación de Plazo N° 13	:	30/04/2019
Fecha de Término por Ampliación de Plazo N° 15	:	31/05/2019
Fecha de Término por Ampliación de Plazo N° 16	:	01/07/2019
(en trámite)		


 COLECCIÓN INGENIEROS DEL PERU
 Jose Alexander Chancafe Reyes
 INGENIERO CIVIL - CIP. 94760



PSV CONSTRUCTORES S.A.

Ing. JORGE ESPINOZ AVILES
 RESIDENTE DE OBRA

1150



1150

5.- COMENTARIOS RESPECTO AL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

- Siguiendo las recomendaciones planteadas del Ingeniero especialista de FONDEPES mediante los Informes N° 113-2018-FONDEPES/EBC y N° 136-2018-FONDEPES/IJMV, con respecto al estado actual del muelle, indica que la viga perimetral del puente es necesario el cambio total y la losa del mismo puente presenta agrietamientos en la parte inferior, se requiere la pronta intervención; es necesario una prestación adicional de obra vinculado a un deductivo, en el cabezo antiguo las vigas perimetrales presentan una pérdida de peralte considerable con el acero longitudinal inferior expuesto, la pérdida de la sección es severa, se requiere un reforzamiento perimetral de toda la viga; En el cabezo nuevo los elementos estructurales no presentan daño considerable; por lo tanto los trabajos indicados en el expediente técnico original no será necesario su ejecución, salvo en lugares puntuales de la viga longitudinal y de los pedestales en donde se muestra rotura de concreto y exposición de acero.
- Mediante asiento N° 644 de fecha 23/11/2018 se solicitó una prestación adicional para la reparación del muelle en virtud a las recomendaciones del Ingeniero Especialista de FONDEPES.
- Mediante asiento N° 731 de fecha 09/01/2019 reiteramos nuestra solicitud de una prestación Adicional de Obra para la reparación del muelle según las recomendaciones del Ingeniero Especialista de FONDEPES.
- Hasta la fecha se espera que se apruebe una prestación adicional y/o autorice de manera formal la ejecución de las actividades mencionadas en los ítems anteriores; mientras no se tenga la aprobación y/o autorización para la ejecución de las actividades mencionadas ítem anteriores, no se podrá continuar con la ejecución de las partidas contractuales considerada en el subpresupuesto: **Obras de Mar y El Adicional de Obra N° 03**. Existen partidas que se han visto directamente afectada, como la partida *14.03 Sistema de Defensa* cuya incidencia porcentual correspondiente a esta partida es de 3.68%, y que hasta la fecha no se ha podido valorizar. Y por último existe la partida contractual: *14.07.05 colocación de aditivo masilla epoxica submarina* que tampoco, ya que esta podría ser deductivo según las recomendaciones del especialista de FONDEPES y tiene una incidencia porcentual de 1.52%. Por lo tanto, el porcentaje de incidencia de las partidas de **Obras de Mar** es de **6.20%** sin valorizar.
- El avance de la presente valorización es de 0.00%, el avance acumulado que se tiene hasta la fecha es de 79.67%.


 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Jose Alexander Chancafe Rey
 INGENIERO CIVIL - CIP. 94766



 PSV CONSTRUCTORES S.A.
Jorge Espinoza Aviles
 ING. JORGE ESPINOZA AVILES
 RESIDENTE DE OBRA

1970



1970

**ANEXO N° 01:
VALORIZACIÓN N° 09 DEL
ADICIONAL N° 03**

 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
[Signature]
Jose Alexander Chancake Reyes
INGENIERO CIVIL - C.I.B. 01720

 PSV CONSTRUCTORES S.A.

[Signature]
Ing. JORGE ESPICHAN AVILES
RESIDENTE DE OBRA

51000

1992



RESUMEN GENERAL
VALORIZACIÓN N° 09 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 03
Mayo 2019

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.
CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
FECHA: viernes, 31 de Mayo de 2019

I.- MONTO PRESUPUESTO CONTRACTUAL SIN IGV :	S/.	333,829.35
II.- VALORIZACIÓN	S/.	0.00
COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES + UTILIDAD	S/.	0.00
DEDUCTIVO	S/.	0.00
SUB TOTAL	S/.	0.00
VALORIZACIÓN:	S/.	0.00
IGV 18 %:	S/.	0.00
TOTAL (Incl. IGV):	S/.	0.00

IV.- PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL

Porcentaje de avance de la presente valorización: **0.00%**
 Porcentaje de avance acumulado: **79.67%**

Son: Cero con 00/100 Soles incluido IGV.

Nota: Cualquier error u omisión en la presente valorización se realizará en la liquidación de la ejecución de la obra.


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Jose Alexander Chancafe Reyes
 INGENIERO CIVIL - CIP 94760


PSV CONSTRUCTORES S.A.

Jorge Espichan Aviles
 Ing. JORGE ESPICCHAN AVILES
 RESIDENTE DE OBRA

100






VALORIZACIÓN N° 09 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 03

Mayo 2019

PROYECTO: Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia Nazca, Región Ica
 UBICACIÓN: Marcona - Nazca - Ica.
 CLIENTE: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - Fondopes.
 FECHA: viernes, 31 de Mayo de 2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$.	Sub Total \$.	Valorización anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Saldo a Valorizar	
						Metrado	Parcial \$.	Metrado	Parcial \$.	Metrado	Parcial \$.	Metrado	Parcial \$.
01	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE C.A., REEMPLAZO DE MATERIAL				23,105.30								
01.01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO				323.00								
01.01.01	Demolición de Estructura de Concreto Armado	m³	20.00	16.15	323.00	20.00	323.00	-	-	23,105.30	323.00	-	-
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRA				22,782.30								
01.02.01	Excavación	m³	108.22	35.06	3,793.11	108.22	3,793.11	-	-	22,782.30	3,793.11	-	-
01.02.02	Acarreo interno, material procedente de excavación y demolición	m³	179.51	11.00	1,974.61	179.51	1,974.61	-	-	3,793.11	1,974.61	-	-
01.02.03	Eliminación de material excedente c/máquina	m³	179.51	20.47	3,674.57	179.51	3,674.57	-	-	3,793.11	3,674.57	-	-
01.02.04	Relleno compactado con material de préstamo	m³	128.22	104.04	13,340.01	128.22	13,340.01	-	-	13,340.01	13,340.01	-	-
02	REPARACIÓN DE LOSA DE MUELLE				170,058.91								
02.01	OBRAS PRELIMINARES				45,335.16								
02.01.01	Picado de losa de concreto para retiro de armadura dañada y para colocac	m²	739.08	58.96	43,598.33	739.08	43,598.33	-	-	153,999.24	43,598.33	-	-
02.01.02	Acarreo interno, material procedente del picado de losa y del colocado de J	m³	55.19	11.00	607.09	55.19	607.09	-	-	45,335.16	607.09	-	-
02.01.03	Eliminación de material excedente c/máquina	m³	55.19	20.47	1,129.74	55.19	1,129.74	-	-	43,598.33	1,129.74	-	-
02.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				124,723.75								
02.02.01	Encofrado y Desencofrado de fiso de losa de muelle	m²	19.82	98.82	1,958.01	19.82	1,958.01	-	-	108,664.08	1,958.01	-	-
02.02.02	Retiro de armadura deteriorada a reemplazar	m	7.074.21	5.36	38,059.26	7.074.21	38,059.26	-	-	1,958.01	38,059.26	-	-
02.02.03	Reemplazo de Acero de Refuerzo fy=4,200 Kg/cm²	Kg	14,012.96	4.16	58,293.91	12,221.07	50,839.65	1,791.89	7,454.26	38,059.26	50,839.65	1,791.89	7,454.26
02.02.04	Piso de Concreto f'c=280 Kg/cm²	m²	37.54	528.87	19,853.78	27.16	14,374.99	10.36	5,478.79	12,221.07	14,374.99	10.36	5,478.79
02.02.05	Tejuntina Superior Detalle C	m	12.00	335.54	4,026.48	12.00	4,026.48	-	-	14,374.99	4,026.48	-	-
02.02.06	Junta Inferior Detalle J	m	4.00	258.86	1,035.44	4.00	1,035.44	-	-	4,026.48	1,035.44	-	-
02.02.07	Junta con relleno elastico h=1/2"	m	96.00	21.76	2,090.88	96.00	2,090.88	-	-	1,035.44	2,090.88	-	-
03	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA				1,868.13								
03.01	Desmontaje de Estructura Metálica en Cabezal Antiguo	Und.	33.00	56.61	1,868.13	33.00	1,868.13	-	-	1,868.13	1,868.13	-	-
04	RETIRO DE ROCA EN CERCO PERIMETRICO EJE A-9 TRAMO ENROCADO ANTIGUO				33,404.81								
04.01	MOVIMIENTO DE TIERRA				33,404.81								
04.01.01	Excavación	m³	36.94	35.06	1,294.75	36.94	1,294.75	-	-	33,404.81	1,294.75	-	-
04.01.02	Retiro de rocas del encofrado de protección	m³	68.60	111.97	7,681.14	68.60	7,681.14	-	-	33,404.81	7,681.14	-	-
04.01.03	Relleno compactado con material propio	m³	184.70	40.79	7,533.91	184.70	7,533.91	-	-	1,294.75	7,533.91	-	-
04.01.04	Extracción de Roca con maquinaria	m³	30.00	27.50	825.00	30.00	825.00	-	-	7,533.91	825.00	-	-
04.01.05	Carguío y Transporte de roca de cantera-obra Dmin=0.80 m.	m³	30.00	31.69	950.70	30.00	950.70	-	-	825.00	950.70	-	-
04.01.06	Reconformación de encofrado existente	m	35.18	429.77	15,119.31	35.18	15,119.31	-	-	950.70	15,119.31	-	-
05	REPARACIÓN PLATAFORMA BAJA EXISTENTE LADO DERECHO				45,540.64								
05.01	OBRAS PRELIMINARES				5,369.26								
05.01.01	Desmontaje de vigas longitudinales	Und.	6.00	332.09	1,992.54	6.00	1,992.54	-	-	11,177.53	1,992.54	-	-
05.01.02	Demolición de cabezales y escaleras	m³	10.86	225.86	2,450.16	10.86	2,450.16	-	-	2,405.43	2,450.16	-	-
05.01.03	Acarreo interno, material procedente del desmontaje y demolición	m³	28.49	11.00	313.99	13.12	144.32	10.96	2,480.16	1,992.54	1,992.54	10.96	2,480.16
05.01.04	Eliminación de material excedente c/máquina	m³	28.49	20.47	583.19	13.12	268.57	13.12	144.32	144.32	144.32	13.12	15.37
05.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				40,171.36								
05.02.01	CABEZALES PREFABRICADOS				6,727.17								
05.02.01.01	Concreto f'c=350 Kg/cm² para cabezal prefabricado	m³	4.15	510.23	2,117.45	4.15	2,117.45	-	-	11,177.53	2,117.45	-	-
05.02.01.02	Encofrado y desencofrado normal para cabezal prefabricado	m²	22.51	72.44	1,630.62	22.51	1,630.62	-	-	2,405.43	1,630.62	-	-
05.02.01.03	Cabezal prefabricado acero fy=4,200 Kg/cm²	Kg	716.13	4.16	2,979.10	716.13	2,979.10	-	-	1,992.54	2,979.10	-	-
05.02.02	VIGA Y NUCLEO PREFABRICADO				10,238.97								
05.02.02.01	Concreto f'c=350 Kg/cm² para viga longitudinal prefabricado	m³	4.16	622.09	2,589.69	2.79	1,739.63	1.37	852.06	8,772.10	1,739.63	1.37	852.06
05.02.02.02	Encofrado y desencofrado normal para viga longitudinal prefabricado	m²	42.04	70.16	2,948.53	33.28	2,334.92	6.76	614.61	1,739.63	2,334.92	6.76	614.61
05.02.02.03	Viga longitudinal prefabricado acero fy=4,200 Kg/cm²	Kg	1,130.18	4.16	4,701.55	1,130.18	4,701.55	-	-	2,334.92	4,701.55	-	-
05.02.03	ESCALERA PREFABRICADO				2,531.27								

PSV CONSULTORES S.A.
 Ing. JORGE ESPICHA AVILES
 RESIDENTE DE OBRA



05.02.03.01	Concreto f'c=350 Kg/cm ² para escalera prefabricado	m ³	528.81	1,326.81	-	-	-	2.51	1,326.81																																																	
05.02.03.02	Escalera prefabricado, encofrado y desencofrado	m ²	86.25	902.32	-	-	-	10.11	902.32																																																	
05.02.03.03	Escalera prefabricado, acero fy=4,200 Kg/cm ²	Kg.	4.16	302.14	-	-	-	72.63	302.14																																																	
05.02.04.01	TRANSPORTE Y COLOCACION DE ELEMENTOS PREFABRICADOS	Und.	320.60	5,626.00	-	-	-	11.00	5,626.00																																																	
05.02.04.02	Transporte de elementos prefabricados	Und.	1,568.85	17,147.35	-	-	-	11.00	17,147.35																																																	
09	PEDESTALES PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA			8,211.01					8,211.01																																																	
09.01	MOVIMIENTO DE TIERRA			423.10					423.10																																																	
09.01.01	Excavación para construcción de pedestales en zapatas existentes.	m ³	35.05	141.25	-	-	-	4.03	141.25																																																	
09.01.02	Acabado interno, material procedente de la excavación	m ³	11.00	51.04	-	-	-	4.64	51.04																																																	
09.01.03	Eliminación de material excedente c/riñón	m ³	20.47	94.98	-	-	-	4.64	94.98																																																	
09.01.04	Relleno compactado con material propio	m ³	40.79	135.83	-	-	-	3.33	135.83																																																	
09.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO			7,787.91					7,787.91																																																	
09.02.01	Anclaje de barras corrugadas 95/8"	Und.	39.33	2,202.48	-	-	-	56.00	2,202.48																																																	
09.02.02	Concreto f'c=315 Kg/cm ² para pedestales	m ³	588.57	1,212.45	-	-	-	2.06	1,212.45																																																	
09.02.03	Encofrado y desencofrado normal para pedestales	m ²	56.33	1,924.69	-	-	-	33.00	1,924.69																																																	
09.02.04	Pedestales, acero fy=4,200 Kg/cm ²	Kg.	505.26	2,101.66	-	-	-	308.82	2,101.66																																																	
09.02.05	Colocación de Aditivo para concreto nuevo - antiguo	m ³	26.45	54.49	-	-	-	2.06	54.49																																																	
09.02.06	Junta de dilatación con tecnopor e=1"	m.	6.84	291.72	-	-	-	33.00	291.72																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>COSTO DIRECTO</td> <td>S/.</td> <td>282,188.80</td> <td>224,831.80</td> <td>0.00</td> <td>224,831.80</td> <td>57,356.99</td> </tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES</td> <td>S/.</td> <td>34,709.22</td> <td>27,654.31</td> <td>0.00</td> <td>27,654.31</td> <td>7,054.91</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD</td> <td>S/.</td> <td>16,831.33</td> <td>13,489.91</td> <td>0.00</td> <td>13,489.91</td> <td>3,441.42</td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL PRESUPUESTO</td> <td>S/.</td> <td>333,829.35</td> <td>265,976.02</td> <td>0.00</td> <td>265,976.02</td> <td>67,853.32</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACIÓN</td> <td>S/.</td> <td>333,829.35</td> <td>265,976.02</td> <td>0.00</td> <td>265,976.02</td> <td>67,853.32</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PRESUPUESTO (sin IGV)</td> <td>S/.</td> <td>333,829.35</td> <td>265,976.02</td> <td>0.00</td> <td>265,976.02</td> <td>67,853.32</td> </tr> <tr> <td>AVANCE DE SUPRESUPUESTO (%)</td> <td></td> <td>100.00%</td> <td>79.67%</td> <td>0.00%</td> <td>79.67%</td> <td>20.33%</td> </tr> </table>										COSTO DIRECTO	S/.	282,188.80	224,831.80	0.00	224,831.80	57,356.99	GASTOS GENERALES	S/.	34,709.22	27,654.31	0.00	27,654.31	7,054.91	UTILIDAD	S/.	16,831.33	13,489.91	0.00	13,489.91	3,441.42	SUB-TOTAL PRESUPUESTO	S/.	333,829.35	265,976.02	0.00	265,976.02	67,853.32	AMORTIZACIÓN	S/.	333,829.35	265,976.02	0.00	265,976.02	67,853.32	TOTAL PRESUPUESTO (sin IGV)	S/.	333,829.35	265,976.02	0.00	265,976.02	67,853.32	AVANCE DE SUPRESUPUESTO (%)		100.00%	79.67%	0.00%	79.67%	20.33%
COSTO DIRECTO	S/.	282,188.80	224,831.80	0.00	224,831.80	57,356.99																																																				
GASTOS GENERALES	S/.	34,709.22	27,654.31	0.00	27,654.31	7,054.91																																																				
UTILIDAD	S/.	16,831.33	13,489.91	0.00	13,489.91	3,441.42																																																				
SUB-TOTAL PRESUPUESTO	S/.	333,829.35	265,976.02	0.00	265,976.02	67,853.32																																																				
AMORTIZACIÓN	S/.	333,829.35	265,976.02	0.00	265,976.02	67,853.32																																																				
TOTAL PRESUPUESTO (sin IGV)	S/.	333,829.35	265,976.02	0.00	265,976.02	67,853.32																																																				
AVANCE DE SUPRESUPUESTO (%)		100.00%	79.67%	0.00%	79.67%	20.33%																																																				

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
José Alexander Chamcafe Reyes
 INGENIERO CIVIL - CIP 94761

PSV CONSTRUCTORES S.A.
 Ing. JORGE ESPICHAN AVILES
 PRESIDENTE DE OBRA

1000



**ANEXO N° 02:
CURVA DE AVANCE OBRA**

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
[Signature]

Jose Alexander Chocafe Rev
INGENIERO CIVIL - CIP. 947

 PSV CONSTRUCTORES S.A.
[Signature]

Ing. JORGE ESPICHAN AVILES
RESIDENTE DE OBRA



**VALORIZACION N° 09
CURVA DE AVANCE DEL ADICIONAL DE OBRA N° 03**

OBRA:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA

UBICACIÓN


MARCONA - NAZCA - ICA

CONTRATISTA:


P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.

SUPERVISIÓN :

CONSORCIO MESONES MURO

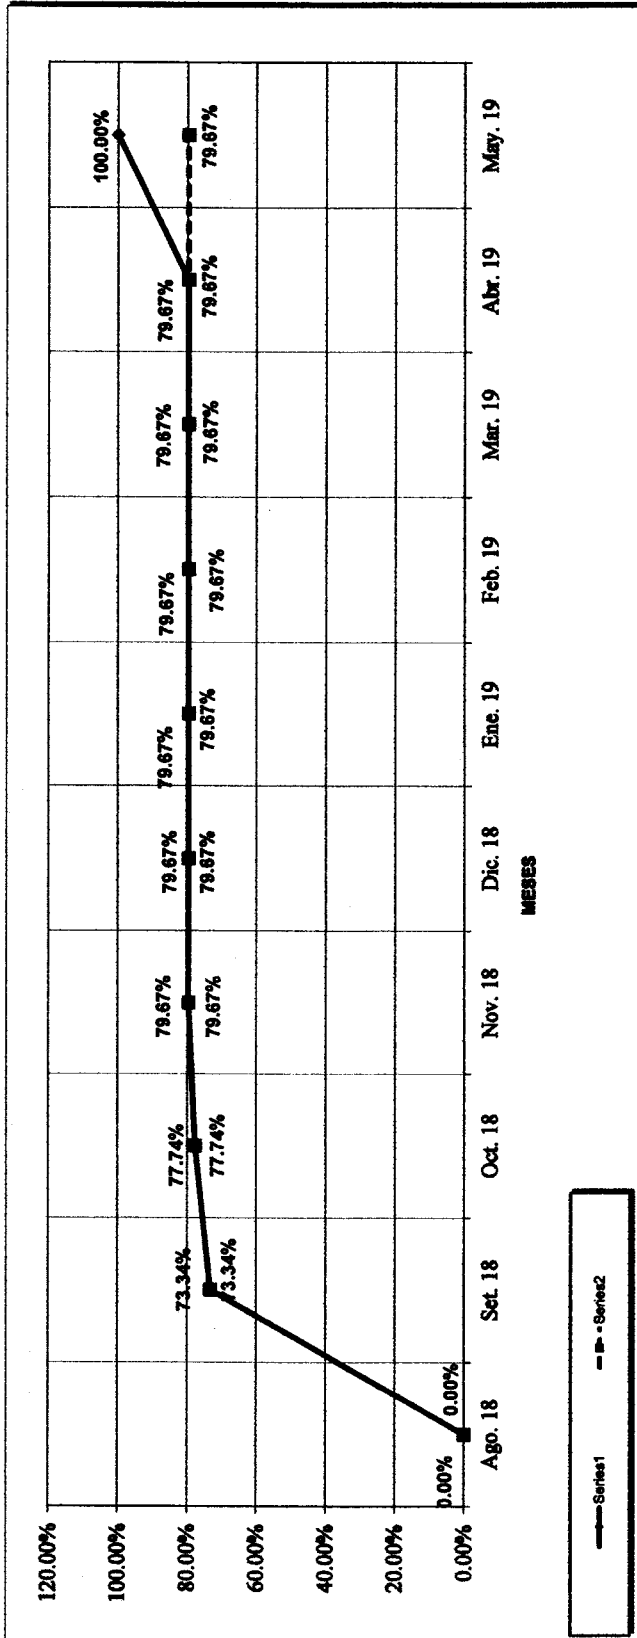

	Val. N° 01 Ago 18	Val. N° 02 Oct 18	Val. N° 03 Nov 18	Val. N° 04 Dic 18	Val. N° 05 Ene 19	Val. N° 06 Feb 19	Val. N° 07 Mar 19	Val. N° 08 Abr 19	Val. N° 09 May 19	TOTAL
TOTAL PROGRAMADO SIGV	0.00	14,709.27	6,451.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,853.31	333,829.35
AVAN. MENS. PROGRAMADO	0.00%	4.41%	1.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.33%
AVAN. ACUM. PROGRAMADO	0.00	259,524.27	265,976.04	265,976.04	265,976.04	265,976.04	265,976.04	265,976.04	333,829.35	
AVAN. ACUM. PROGRAMADO	0.00%	77.74%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	100.00%	
TOTAL VALORIZADO SIGV	0.00	14,709.27	6,451.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,976.04
AVANCE MENSUAL VALORIZ.	0.00%	4.41%	1.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVAN. ACUM. VALORIZADO	0.00	259,524.27	265,976.04	265,976.04	265,976.04	265,976.04	265,976.04	265,976.04	265,976.04	
AVANCE ACUM. VALORIZADO	0.00%	77.74%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	79.67%	



PSV CONSTRUCTORES S.A.

Ing. JORGE ESPICHAN AVILES
RESIDENTE DE OBRA

1



**ANEXO N° 03:
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 099-2018-FONDEPES/J**

 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Jose Alexander Chancafe Reyes


Jose Alexander Chancafe Reyes
INGENIERO CIVIL N° 94760

 PSV CONSTRUCTORES S.A.

Jorge Espichan Aviles

Ing. JORGE ESPICCHAN AVILES
RESIDENTE DE OBRA

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES



RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 099-2018-FONDEPES/J

Lima, 28 AGO 2018



VISTOS: El Memorando n.º 392-2018-FONDEPES/OGPP (en adelante la OGPP), el Memorando n.º 2647-2018-FONDEPES/DIGENIPAA y el Informe n.º 089-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/OAMC, ambos de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (en adelante la Digenipaa), así como el Informe n.º 656-2018-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica (en adelante la OGAJ); y

CONSIDERANDO:

Que, el 15 de setiembre de 2017 el Fondepes y la empresa P.S.V. Constructores S.A. (en adelante el Contratista), suscribieron el Contrato n.º 028-2017-FONDEPES para la contratación de la ejecución de la obra «Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, región Ica» (en adelante la Obra) con código SNIP n.º 278545, por el monto de S/ 8 871 166,29 (Ocho millones ochocientos setenta y un mil ciento sesenta y seis con 29/100 Soles) incluido IGV, bajo el sistema de contratación a precios unitarios y con un plazo de ejecución de 240 días calendario;

Que, el acto administrativo puede fundamentarse en informes de emisión previa que obren en el expediente correspondiente, a condición de su puntual identificación y su integración en el acto administrativo que motivan. Sobre el particular, en el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo n.º 006-2017-JUS, se establece lo siguiente:

«Artículo 6.- Motivación del acto administrativo

(...)
6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. (...);

Que, conforme a la normativa indicada sobre el contenido motivacional, constituyen fundamentos de la presente Resolución: el Memorando n.º 392-2018-FONDEPES/OGPP, el Memorando n.º 2647-2018-FONDEPES/DIGENIPAA y el Informe n.º 089-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/OAMC, así como el Informe n.º 656-2018-FONDEPES/OGAJ, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución en calidad de anexos;

Que, por los fundamentos técnicos y normativos expuestos de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo n.º 350-2015-EF, y en ejercicio de las funciones establecidas por el literal «s» del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones del Fondepes, aprobado por Resolución Ministerial n.º 346-2012-PRODUCE, corresponde expedir la Resolución Jefatural

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
José Alexander Chancafe Reyes
INGENIERO CIVIL - CIP. 94760 -1-

PSV CONSTRUCTORES S.A.
Jorge Espichan Aviles
Ing. JORGE ESPICHA AVILES
RESIDENTE DE OBRA

mediante la cual se rectifique el porcentaje de incidencia acumulado de los Mayores Metrados n.º 02, y se apruebe la Prestación Adicional de Obra n.º 03 y el Presupuesto Deductivo Vinculado n.º 01;

Con los visados de la Secretaría General, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola y de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Rectificar el error aritmético identificado en el artículo 1º de la Resolución Jefatural n.º 075-2018-FONDEPES/J del 4 de julio de 2018, en el extremo referido al porcentaje de incidencia acumulado consignado en la autorización para el pago de los Mayores Metrados n.º 02, conforme a lo señalado en el Informe n.º 089-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/OAMC, debiendo quedar redactado de la siguiente manera:

Dice:

«Autorizar el pago de Mayores Metrados n.º 02 correspondiente al Contrato n.º 028-2017-FONDEPES, suscrito para la contratación de la ejecución de la obra «Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, región Ica», por el monto de S/ 221 682,74 (doscientos veintinueve mil seiscientos ochenta y dos con 74/100 soles), con una incidencia que representa el 2.50% del monto del contrato original y un porcentaje de incidencia acumulado de 3.52% del monto del contrato original, (...)».


Debe decir:

«Autorizar el pago de Mayores Metrados n.º 02 correspondiente al Contrato n.º 028-2017-FONDEPES, suscrito para la contratación de la ejecución de la obra «Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, región Ica», por el monto de S/ 221 682,74 (doscientos veintinueve mil seiscientos ochenta y dos con 74/100 soles), con una incidencia que representa el 2.50% del monto del contrato original y un porcentaje de incidencia acumulado de 3.56% del monto del contrato original, (...)».

Artículo 2º.- Aprobar el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra n.º 03 del Contrato n.º 028-2017-FONDEPES suscrito para la contratación de la ejecución de la obra «Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, región Ica», por el monto de S/ 393 918,63 (Trescientos noventa y tres mil novecientos dieciocho con 63/100 Soles) incluido IGV, y del correspondiente Presupuesto Deductivo Vinculado n.º 01 cuyo monto asciende a S/ 9 602,72 (Nueve mil seiscientos dos con 72/100 Soles) incluido IGV, siendo que el resultado de la sustracción aritmética determina un incremento del monto del contrato original de S/ 384 315,91 (Trescientos ochenta y cuatro mil trescientos quince con 91/100 Soles) incluido IGV, lo que representa un porcentaje de incidencia individual de 4.33% del contrato original y un nivel de incidencia acumulado de 7.89% del monto del contrato original correspondiente a la obra en mención; siendo el nuevo monto contractual de S/ 9 571 268,62 (Nueve millones quinientos setenta y un mil doscientos sesenta y ocho con 62/100 Soles) incluido IGV, de acuerdo con los fundamentos contenidos en el Memorando n.º 392-2018-FONDEPES/OGPP, el Memorando n.º 2647-2018-FONDEPES/DIGENIPAA y el Informe n.º 089-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/OAMC, así como el Informe n.º 656-2018-FONDEPES/OGAJ, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución en calidad de anexos.

Artículo 3º.- Autorizar la ejecución del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra n.º 03 y del Presupuesto Deductivo Vinculado n.º 01, aprobados en el artículo 2º de la presente Resolución, debiendo el Contratista, P.S.V. Constructores S.A., ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento como requisito para los pagos que correspondan a la prestación adicional, de corresponder, de conformidad con lo establecido en el numeral 175.14 del artículo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.º 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo n.º 056-2017-EF.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES



RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 099-2018-FONDEPES/J

Lima, 28 AGO 2018



F. FERNÁNDEZ

Artículo 4°.- Notificar la presente Resolución y sus anexos al Contratista P.S.V. Constructores S.A. y a la Supervisión Consorcio Mesones Muro; remitiéndose copias a la Oficina General de Administración y a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, para que ambas, de manera coordinada, ejecuten las acciones que permitan la suscripción de la respectiva adenda del Contrato n.° 028-2017-FONDEPES.



LABQ

Artículo 5°.- Disponer que en el acto de notificación de la presente Resolución y sus anexos al Contratista P.S.V. Constructores S.A., se le haga entrega del expediente técnico aprobado en el artículo 2° de la presente Resolución.



K. ESPINOZA

Artículo 6°.- Disponer que la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, bajo responsabilidad funcional, en el plazo de 30 días calendario posteriores a la emisión de la presente, emita un informe respecto de la existencia de responsabilidades por las presuntas deficiencias en la formulación y/o aprobación del expediente técnico de la obra «Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, región Ica», para que conjuntamente con los antecedentes, sea remitido a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario del Fondepes. En el supuesto que se determine la responsabilidad del proyectista que elaboró el mencionado expediente técnico, corresponderá a la Digenipaa determinar la existencia del daño o perjuicio generado al Fondepes, así como su cuantificación monetaria, debiendo comunicarse dicha situación a la Procuraduría Pública del Fondepes para que adopte las acciones correspondientes.



M. SUPANTA

Artículo 7°.- Disponer que la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, comunique a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones la ejecución de la Prestación Adicional de Obra n.° 03 y el Presupuesto Deductivo Vinculado n.° 01.

Artículo 8°.- Disponer que la presente Resolución se publique en el portal institucional de la Entidad.

Regístrese y comuníquese.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES


DR. MORGAN NICCOLO QUERO GAINÉ
JEFE

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Jose Alexander Chancafe Rey
INGENIERO CIVIL - CIP. 94761


PSV CONSTRUCTORES S.A.

Ing. JORGE ESPICHAN AVILES
RESIDENTE DE OBRA

**ANEXO N° 04:
ADENDA N° 01**

 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Jose Alexander Chancafe Reyes

Jose Alexander Chancafe Reyes
INGENIERO CIVIL - CIP. 94760

 PSV CONSTRUCTORES S.A.
Jorge Espinoza Aviles

Ing. JORGE ESPINOZA AVILES
RESIDENTE DE OBRA



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

Adenda n.º 01 al Contrato n.º 028-2017-Fondepes

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA"

Licitación Pública n.º 002-2017-Fondepes – Primera Convocatoria

Conste por el presente documento la Adenda n.º 01 al Contrato n.º 028-2017-Fondepes, que celebran de una parte:

El FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES con RUC. n.º 20137921601, con domicilio legal en Av. Petit Thouars n.º 115, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el Jefe de la Oficina General de Administración, la señora **TERESA ZENAIDA QUIROZ SILVA**, identificada con D.N.I. N.º 09405576, designada mediante Resolución Jefatural n.º 103-2018-FONDEPES/J de fecha 29 de agosto de 2018 y con las facultades conferidas en materia de contrataciones mediante Resolución Jefatural n.º 069-2016-FONDEPES/J de fecha 17 de febrero de 2016, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y de la otra parte,

La empresa P.S.V. **CONSTRUCTORES S.A.**, con RUC N.º 20112182021, con domicilio legal en Av. El Pinar N.º 180 interior 104 Urbanización Chacarilla del Estanque en el Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, inscrita en la Partida N.º 00378496, del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, debidamente representado por su Gerente General, el señor **MARIO PEÑA FUENTES** identificado con DNI. N.º 06109501, según Poder Inscrito en el Asiento N.º B00003 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**.

LA ENTIDAD y **EL CONTRATISTA** a quienes en forma conjunta se les denominará **LAS PARTES**, acuerdan en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1. Con fecha 15 de setiembre de 2017, **LAS PARTES** suscribieron el Contrato n.º 028-2017-Fondepes para el "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, región Ica", por el monto de S/ 8 871 166.29 (ocho millones ochocientos setenta y un mil ciento sesenta y seis con 29/100 Soles), con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) días calendario.
- 1.2. Mediante Resolución Jefatural n.º 091-2017-Fondepes/J de fecha 30 de noviembre de 2017, se autorizó el pago por mayores metrados n.º 01 al Contrato n.º 028-2017-Fondepes para el "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, región Ica", por el monto de S/ 94 103.68 (noventa y cuatro mil ciento tres con



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

68/100 Soles), con una incidencia que representa el 1.06% del monto de contrato original.

[Handwritten signature]

- 1.3. Mediante Resolución Jefatural n.º 061-2018-Fondepes/J de fecha 07 de junio de 2018, se denegó la Prestación Adicional de Obra N° 02 del Contrato n.º 028-2017-Fondepes para el "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, región Ica".
- 1.4. Mediante Resolución Jefatural n.º 075-2018-Fondepes/J de fecha 04 de Julio de 2018, se autorizó el pago por mayores metrados n.º 02 al Contrato n.º 028-2017-Fondepes para el "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, región Ica", por el monto de S/. 221,682.74 (doscientos veintiún mil seiscientos ochenta y dos mil con 74/100 Soles), con una incidencia que representa el 3.62% del monto de contrato original.
- 1.5. Mediante Resolución Jefatural n.º 99-2018-Fondepes/J de fecha 28 de agosto de 2018, se aprobó el Expediente Técnico de la Prestación Adicional n.º 03 del Contrato n.º 028-2017-Fondepes, "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, región Ica", por el monto de S/. 393,918.63 (trescientos noventa y tres mil novecientos dieciocho con 63/100 Soles) incluido IGV y su correspondiente presupuesto deductivo vinculado n.º 01 ascendente a la suma de S/. 9,602.72 (nueve mil seiscientos dos con 72/100 Soles) incluido IGV, siendo el resultado de la sustracción aritmética la determinación de una disminución por el monto de, S/. 384,315.91 (trescientos ochenta y cuatro mil trescientos quince con 91/100 Soles) que representa un porcentaje de incidencia individual del 4.33% del presupuesto contratado, y, habiéndose generado un porcentaje de incidencia acumulado del 7.89% del monto del contrato original; cuyo nuevo monto contractual asciende a la suma de S/. 9'571,268.62 (nueve millones quinientos setenta y un mil doscientos sesenta y ocho con 62/100 Soles) incluido IGV.
- 1.6. Mediante Resolución de Secretaria General n.º 069-2018-FONDEPES/SG de fecha 24 de abril de 2018, se denegó la ampliación de plazo n.º 02.
- 1.7. Mediante Resolución de Secretaria General n.º 149-2018-FONDEPES/SG de fecha 13 de agosto de 2018, se aprobó la ampliación de plazo n.º 03 solicitada por EL CONTRATISTA, por el plazo de 23 días calendario, en consecuencia, teniendo como nueva fecha de ejecución de obra hasta el 02 de setiembre de 2018.
- 1.8. Mediante Resolución de Secretaria General n.º 162-2018-FONDEPES/SG de fecha 14 de septiembre de 2018, se denegó la ampliación de plazo n.º 04 solicitada por EL CONTRATISTA.
- 1.9. Mediante Resolución de Secretaria General n.º 164-2018-FONDEPES/SG de fecha 20 de septiembre de 2018, se aprobó la ampliación de plazo n.º 05 solicitada por EL CONTRATISTA, por el plazo de 23 días calendario, en consecuencia, teniendo como nueva fecha de ejecución de obra hasta el 25 de setiembre de 2018.
- 1.10. Mediante Resolución de Secretaria General n.º 169-2018-FONDEPES/SG de fecha 25 de septiembre de 2018, se denegó la ampliación de plazo n.º 06 solicitada por EL CONTRATISTA.



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
[Signature]
Jose Alexander Chancay Reyes
INGENIERO CIVIL - C.I.P. 94760

ing. JORGE ESPICHAN AVILES
RESIDENTE DE OBRA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

El objeto de la presente Adenda n.º 01 es formalizar el acto ejecutado y debidamente aprobado en su oportunidad dentro del marco de la etapa de ejecución contractual, que se detalla a continuación:

- 2.1. La modificación de la Cláusula Tercera del Contrato n.º 028-2017-FONDEPES, como consecuencia de la aprobación de la prestación Adicional n.º 03 aprobada mediante Resolución Jefatural n.º 99-2018-FONDEPES/J de fecha 28 de agosto del 2018 y la autorización de pagos de Mayores Metrados N.º 01 y 02, aprobadas mediante Resoluciones Jefaturales n.º 091-2017- Fondepes/J de fecha 30 de noviembre de 2017 y 75-2018-Fondepes/J de fecha 04 de Julio de 2018, la cual quedara redactada en los siguientes términos:

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 9'571,268.62 (nueve millones quinientos setenta y un mil doscientos sesenta y ocho con 62/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente; así como, cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de obra materia del presente contrato.

- 2.2. La modificación de la Cláusula Quinta, del contrato n.º 028-2017-FONDEPES, como consecuencia de las ampliaciones del plazo 03 y 05 aprobadas a favor del EL CONTRATISTA, mediante Resoluciones de Secretaria General N.º 149 y 164-2018 Fondepes/SG, de fechas 13 de agosto y 20 de setiembre de 2018, respectivamente, de acuerdo a los señalado en el siguiente cuadro:

CONTRATO n.º 028-2017-FONDEPES				
Resolución de Secretaria General	Fecha de emisión	Ampliación de Plazo n.º	Días Ampliados Autorizados	Nueva Fecha de Culminación del plazo contractual
Contrato n.º 028-12017	Suscripción 15SET2017 por 240 DC		Inicio de la parte contractual 30SET2017	27MAY2018
149-2018-Fondepes/SG	13AGO2018	03	23 dc	02SET2018
164-2018-Fondepes/SG	20SET 2018	05	23 dc	25SET2018
Total de días calendario aprobados			286 DC	

Cláusula que quedará redactada en los siguientes términos

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN

El plazo El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria es de doscientos ochenta y seis (286) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las bases. de ejecución de la obra es de:

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

Todos los demás términos del Contrato n.º 028-2017-FONDEPES quedan subsistentes en todo cuanto no es modificado en forma expresa por la presente adenda que le es parte.

En señal de conformidad LAS PARTES suscriben la presente Adenda en triplicado, en la ciudad de Lima a los veintisiete (27) días del mes de setiembre de 2018.




FONDEPES
[Signature]
C.P.C. TERESA QUIROZ SILVA
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
"LA ENTIDAD"

[Signature]
"EL CONTRATISTA"


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
[Signature]
Jose Alexander Chancafe Reyes
INGENIERO CIVIL - CIP. 94760

PSV CONSTRUCTORES S.A.
[Signature]
Ing. JORGE ESPICHAN AVILES
RESPONSABLE DE OBRA

**ANEXO N° 05:
CARTA FIANZA DE FIEL
CUMPLIMIENTO**

 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Jose Alexander Chacofe Reyes

Jose Alexander Chacofe Reyes
INGENIERO CIVIL - CIP. 94760

 PSV CONSTRUCTORES S.A.
Jorge Espichan Aviles

Ing. JORGE ESPICHAN AVILES
RESIDENTE DE OBRA

La Positiva
Seguros

CARTA FIANZA N° 30024125-01
FIEL CUMPLIMIENTO

0140678

LIMA, 04 de marzo de 2019

Señores:
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
RUC 20137921601
Av. Petit Thouars Nro. 115 - Cercado de Lima.
Presente.-

De nuestra consideración:

Por la presente, constituimos fianza para nuestro cliente PSV CONSTRUCTORES S.A., hasta por la suma de S/38,431.59 (TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 59/100 SOLES), siendo esta solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, y de realización automática a solo requerimiento de ustedes, para garantizar EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°3 (Según Resolución Jefatural N°099-2018-FONDEPES/J del 28.08.2018) del contrato derivado de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2017-FONDEPES PRIMERA CONVOCATORIA - CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBÁRCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA". Código SNIP N° 278545.

Esta fianza tiene una vigencia de 185 días calendario, contados a partir del 10/03/2019 hasta las 12:00 hrs. del 10/09/2019, fecha de su vencimiento, pudiendo ser renovada a solicitud de la parte interesada y previa confirmación por escrito; quedando entendido que esta garantía no podrá exceder en ningún caso por ningún concepto la cantidad de S/38,431.59.

Es expresamente entendido, que cualquier solicitud de ejecución respecto a esta garantía, se realizará en estricta observancia de lo establecido en Código Civil y Código Procesal Civil, debiendo precisar que la misma deberá ser notificada notarialmente a nuestra Oficina ubicada en la Esquina de Javier Prado Este y Francisco Masías 370, Distrito de San Isidro - Lima, a la atención del Departamento de Cauciones.


Todas nuestras obligaciones con respecto a esta fianza cesarán pasado de décimo quinto día calendario posterior a la fecha de vencimiento de nuestra garantía, conforme lo dispone el artículo 1898° del Código Civil vigente.

Cualquier controversia respecto a esta fianza se someterá exclusivamente a los jueces y tribunales de la ciudad de Lima, Perú.

Esta carta fianza renueva y sustituye para todos sus efectos a la carta fianza N° 30024125.

Atentamente,


GONZALO VALDEZ CARRILLO
GERENTE DE ÁREA


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
José Alexander Chancay Reyes
INGENIERO CIVIL - CIP. 9476F


JUAN MANUEL PEÑA HENDERSON
GERENTE GENERAL

 PSV CONSTRUCTORES S.A.
Ing. JORGE ESPICHAN AVILES
RESPONSABLE DE OBRA



Con Certificación ISO 9001:2008 en nuestros
Procesos de Gestión para la Comercialización.

La Positiva Seguros y Reaseguros
Eq. Javier Prado Este y Francisco Masías Nro. 370, San Isidro, Lima - Perú
Telf.: (511) 211-0000 Fax: (511) 211-0011

Oficinas: Callao - Cusco - Chiclayo - Chimbote - Huaran - Ica - Iquitos - Piura - Pucallpa - Puno - Tarma - Trujillo
