



PERÚ

Ministerio
de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de lucha contra la corrupción y la impunidad"

MEMORANDO N° 3069 -2019-FONDEPES/DIGENIPAA

CARGO

A : **ABG. CARMINA CARRERA AMAYA**
Jefa de la Oficina General de Administración

Asunto : **Valorización de obra N°09 del adicional N°05 (junio 2019)**
Obra: "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia de Nazca, Región Ica".

Referencia : a) **CONTRATO N°028-2017-FONDEPES**
b) **INFORME N°182-2019/FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/EAVA**
c) **Carta N°116-2019-CMM**

Fecha : Lima, **12 JUL 2019**

Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de hacer de su conocimiento el informe de valorización de obra N°09 – junio 2019 correspondiente al adicional de obra N°05 de la obra "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia de Nazca, Región Ica", y en el cual se señala que la valorización es de S/. 0.00 (Cero CON 00/100 soles).

Por lo cual se traslada una copia del sustento para su conocimiento y el control de las valorizaciones tramitadas en cada periodo, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Atentamente:

FONDEPES
OFIC. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
12 JUL 2019
DOCUMENTO RECIBIDO
HORA: 5:09, FIRMA:

AREA DE OBRAS,
EQUIPAMIENTO Y
MANTENIMIENTO
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES - CARGO

FONDEPES
.....
Julio Aurelio Rios Sousa
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal y Acuicola

EL PERÚ PRIMERO

Edgard V



PERÚ

Ministerio
de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de lucha contra la corrupción y la impunidad"

CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por el presente documento, que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, al suscribir la presente; da su conformidad para realizar el pago por concepto de **Valorización de Obra N°08 – junio del 2019 – del adicional de obra N°05**, por la suma de **S/ 0.00 (cero con 00/100 Soles) Incluido IGV.** a favor del Contratista **P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.**, encargado de la Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA"**, según **CONTRATO N°028-2017-FONDEPES.**

Lima,



FONDEPES

.....
Julio Aurelio Rios Sousa
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola



PERU Ministerio de la Producción



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



04924143

Usuario: usuario_digenipaa3

Fecha: 12/07/2019

Hora: 15:15



CARGO 00382-2019-FONDEPES/MML

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

Asunto: VALORIZACIÓN N°09 DEL ADICIONAL DE OBRA N°05 (JUNIO 2019)
OBRA: ?MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA?.

Referencia:

Fecha: 12/07/2019

Observación: SE DERIVA EL PRESENTE INFORME N°182-2019-FONDEPES-DIGENIPAA-AOEM-EAVA PARA CONTINUAR TRAMITE CORRESPONDIENTE DEL DPA SAN JUAN DE MARCONA POR LA VALORIZACIÓN 09 ADICIONAL 5 DE JUNIO 2019. CONTRATO 28-2017. CONTRATISTA PSV CONSTRUCTORES SAC
COORDINADOR ARQ. EDGAR VARGAS

Atentamente,

MORGAN LEON MAGALI

12 JUL. 2019
4:30



PERÚ

Ministerio
de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de lucha contra la corrupción y la impunidad"

INFORME N°182-2019/FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/EAVA

A : ING. JULIO AURELIO RÍOS SOUSA
Director General de Inversión Pesquero Artesanal y Acuícola

Asunto : Valorización N°09 del adicional de obra N°05 (junio 2019)
Obra: "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia de Nazca, Región Ica".

Referencia : a) Memorando Interno N°2867-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM
b) Memorando Interno N°5160-2019-FONDEPES/DIGENIPAA
c) Carta N°116-2019-CMM

Fecha : Lima, 10 de julio del 2019

12 JUL 2019
4.20

Por medio del presente, me dirijo a usted para saludarlo y manifestarle que, según la carta de la referencia c), el **CONSORCIO MESONES MURO** encargado de la Supervisión de Obra: "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, Región Ica"; remite la valorización del **adicional de obra N°05**; Al respecto, debo de manifestar lo siguiente:

I. INFORMACION GENERAL DE LA OBRA:

Obra : "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, Región Ica"

Licitación : Licitación Pública N° 002-2017-FONDEPES

Área Geográfica : 2

Ubicación : Distrito de Marcona, Provincia de Nazca, Región Ica

Sistema de Contratación : Precios Unitarios

Monto referencial : S/. 8'871,166.29

Monto contratado : S/. 8'871,166.29 con IGV
S/. 7'517,93.53 sin IGV

Monto vigente : S/. 8'871,166.29 con IGV

Adelanto directo : S/. 887,116.63 con IGV

Plazo de ejecución de la obra : 240 días calendario

Contratista principal : P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.

Representante legal Contratista : Ing. Mario Peña Fuentes

Residente de obra : Ing. Jorge Julio Espichan Avilés

Rep. Legal de Supervisión : Ing. Juan Esteban Zapata Zuloeta

Supervisor de obra : Ing. Luis Alberto Ávila Morales

Contrato : CONTRATO N° 028-2017-FONDEPES

Entrega de Adelanto Directo : S/ 887,116.63 (Inc. IGV), Fecha: 27-set-2017

Entrega de Adelanto de : S/ 1'714,233.30 (Inc. IGV), Fecha: 03-nov-2017

Materiales

Fecha de Contrato : 15-Set-17

Entrega de Terreno : 29-Set-17

Inicio Contractual de Obra : 30-Set-17

Inicio real de Obra : 30-Set-17

Nueva fecha de final de obra : 27 de febrero del 2019

Adicional de Obra N°01 : DENEGADO

Adicional de Obra N°02 : DENEGADO

o





Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de lucha contra la corrupción y la impunidad"

- Mayores Metrados N°01 : APROBADO
- Mayores Metrados N°02 : APROBADO
- Adicional de Obra N°03 : APROBADO
- Adicional de Obra N°04 : DENEGADO
- Adicional de Obra N°05 : APROBADO
- Adicional de Obra N°08 : DENEGADO

II. ANTECEDENTES:

- 2.1. Mediante Informe Técnico N°037-2014-PRODUCE/OGPP-OPI-JVALDIVIA-JBUSTINZA de fecha 25 de marzo del 2014, La OPI Produce declara viable el Proyecto, procediéndose a la inscripción con Código SNIP N° 278545, por un monto de inversión de S/. 8'760,843.98 (Ocho Millones Setecientos Sesenta Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 98/100 soles) y un periodo de ejecución de 12 meses.
- 2.2. Mediante Memorando N°815-2017-FONDEPES/DIGENIPAA del 29 de mayo del 2017, se aprueba la actualización del expediente técnico para la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia De Nazca, Región Ica"; con Código SNIP N° 278545; por un monto total de S/ 8'871,166.29 (Ocho Millones Ochocientos Setenta y Un Mil Ciento Sesenta y Seis con 29/100 Soles) y un plazo de 240 (Doscientos Cuarenta) días calendario.
- 2.3. Con fecha 01 de setiembre del 2015, se firma el Contrato N°027-2015-FONDEPES, con el CONSORCIO MESONES MURO para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia De Nazca, Región Ica", bajo el sistema de Suma Alzada; por un monto total de S/ 318,661.60 (Trescientos Dieciocho Mil Seiscientos Sesenta y Uno con 60/100 Soles) y por un plazo total de 285 días calendario, plazo que incluye la liquidación de obra.
- 2.4. Con fecha 15 de setiembre del 2017, se firma el Contrato N°028-2017-FONDEPES, con la empresa P.S.V. CONSTRUCTORES S.A. para la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia De Nazca, Región Ica", bajo el sistema de Precios Unitarios; por un monto total de S/ 8'871,166.29 (Ocho Millones Ochocientos Setenta y Un Mil Ciento Sesenta y Seis con 29/100 Soles) y un plazo total de 240 (Doscientos Cuarenta) días calendario.

2.1 Con Referencia a Ampliaciones de Plazo y Vencimiento de Contrato Vigente:

N°	Ampliación de plazo	Días	Estado	Vencimiento
1	Ampliación de plazo N°01-RSG-69-2018-FONDEPES/SG, 24.abr.2018	6	consentida	2 - jun - 2018
2	Ampliación de plazo N°02-RSG-69-2018-FONDEPES/SG, 24.abr.2018	62	denegada	2 - jun - 2018
3	Ampliación de plazo N°03-RSG-149-2018-FONDEPES/SG, 13.ago.2018	23	aprobada	2 - set - 2018
4	Ampliación de plazo N°04-RSG-162-2018-FONDEPES/SG, 14.set.2018	35	denegada	2 - set - 2018
5	Ampliación de plazo N°05-RSG-164-2018-FONDEPES/SG, 20.set.2018	23	aprobada	25 - set - 2018



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de lucha contra la corrupción y la impunidad"

N°	DOCUMENTO	DÍAS	CONDICIÓN	NUEVA FECHA DE CLIMINACIÓN
6	Ampliación de plazo N°06-RSG-169-2018-FONDEPES/SG, 25.set.2018	64	denegada	25 – set - 2018
7	Ampliación de plazo N°07-RSG-175-2018-FONDEPES/SG, 10.oct.2018	31	aprobada	26 – oct - 2018
8	Ampliación de plazo N°08-RSG-200-2018-FONDEPES/SG, 09.nov.2018	31	aprobada	26 – nov - 2018
9	Ampliación de plazo N°09-RGG-223-2018-FONDEPES/GG, 06.dic.2018	31	aprobada	27 – dic - 2018
10	Ampliación de plazo N°10-RGG-234-2018-FONDEPES/GG, 31.dic.2018	31	aprobada	27 – ene - 2019
11	Ampliación de plazo N°11-RGG-021-2019-FONDEPES/GG, 04.feb.2019	31	aprobada	27 – feb - 2019
12	Ampliación de plazo N°12-RGG-043-2019-FONDEPES/GG, 11.mar.2019	31	aprobada	30 – mar - 2019
13	Ampliación de plazo N°13-RGG-066-2019-FONDEPES/GG, 08.abr.2019	31	aprobada	30 – abr - 2019
14	Ampliación de plazo N°14-RGG-067-2019-FONDEPES/GG, 09.abr.2019	45	denegada	30 – abr - 2019
15	Ampliación de plazo N°15-RGG-089-2019-FONDEPES/GG, 15.may.2019	31	aprobada	30 – may - 2019
16	Ampliación de plazo N°16-RGG-109-2019-FONDEPES/GG, 12.jun.2019	31	aprobada	01 – jul - 2019

III. ASPECTOS LEGALES:**3.1. La Cláusula Cuarta: Del Pago;** se indica lo siguiente:

"LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de valorización mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. (...)"

3.2. En las bases integradas, numeral 2.7 Valorizaciones, se indica lo siguiente:

"El periodo de valorización será mensual. De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del Artículo 166° del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo".

3.3. Asimismo, en las bases integradas, numeral 3.14 Valorizaciones, Presentaciones de Informes y Pago, se indica lo siguiente:

"(...) Los metrados de obra ejecutados, se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor y presentados al FONDEPES dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o el supervisor no se presentan para la valorización conjunta con el contratista, éste la efectúa. El inspector o supervisor debe revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.

El contratista está obligado a presentar para la aprobación de la supervisión y remisión al FONDEPES, informes mensuales de avance de Obra y otros informes que el supervisor y la entidad solicite, los cuales se presentarán como máximo el quinto (5to) día hábil de cada mes junto con la valorización mensual de avance de obra correspondiente (...)"

3.4. El reglamento de la ley de contrataciones menciona en su Artículo 166.- Valorizaciones y metrados



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de lucha contra la corrupción y la impunidad"

166.1. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

166.2. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

3.5. Valorización N°09 – Mes de junio 2019:

3.5.1. Con informe de supervisión N°015-2019/JACHR/JS, de fecha 02 de julio del 2019, el Jefe de Supervisión de la obra Ing° José Alexander Chancafe Reyes, concluye que la valorización N°09 tiene un avance físico ejecutado de 0.00% correspondiente al mes de junio del 2019, por lo tanto, el adicional de obra N°05 cuenta con 0.00 % de avance físico acumulado existiendo un atraso de 88.83% respecto al programado del 100%.


3.5.2. Con Carta N°116–2019-CMM, de fecha 05 de julio del 2019, el representante legal del CONSORCIO MESONES MURO remite a la Entidad lo manifestado por el supervisor de obra.

IV. ANÁLISIS:

4.1 Con Carta N°116–2019-CMM, de fecha 05 de julio del 2019, la Entidad recepciona del CONSORCIO MESONES MURO el informe de valorización N°09 correspondiente al mes de junio del 2019 del adicional de obra N°05

4.2 El supervisor informa que el adicional de obra n°05 cuenta con un atraso de 88.83% con respecto al avance acumulado.

4.3 Curva S de Avance Físico de la Obra (AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO):

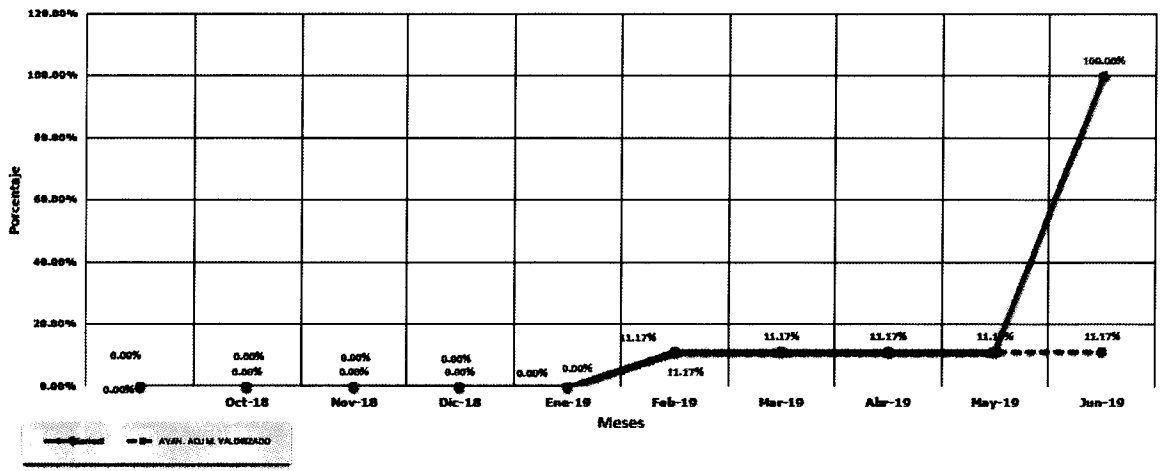

	Oct-18	Nov-18	Dic-18	Ene-19	Feb-19	Mar-19	Abr-19	May-19	Jun-19	TOTAL
TOTAL PROGRAMADO S	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972.14	0.00	0.00	0.00	31,585.88	35,557.88
AVAN. MENS. PROGRAMAS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVAN. ACUM. PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972.14	3,972.14	3,972.14	3,972.14	35,557.88	
AVAN. ACUM. PROGRAMAS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.17%	11.17%	11.17%	11.17%	100.00%	
TOTAL VALORIZADO SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972.14	0.00	0.00	0.00	0.00	35,557.88
AVANCE MENSUAL VAL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVAN. ACUM. VALORIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972.14	3,972.14	3,972.14	3,972.14	3,972.14	
AVAN. ACUM. VALORIZ	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.17%	11.17%	11.17%	11.17%	11.17%	



PERÚ

Ministerio
de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de lucha contra la corrupción y la impunidad"


- 4.4 Con Carta N°239-2019-FONDEPES/OGA, de fecha 19 de junio del 2019, la Entidad a través de la Oficina General de Administración remite la comunicación notarial resolviendo el Contrato N°028-2017-FONDEPES – ejecución de obra - al contratista de obra P.S.V. Constructores S.A. por lo cual a los días 24 y 25 de junio se llevó a cabo la constatación física en inventario de obra.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 5.1. Las causas de atraso en la ejecución de la obra son entera responsabilidad del contratista de obra por lo cual el jefe de FONDEPES tiene conocimiento sobre dichos incumplimientos.
- 5.2. Según valorización correspondiente al mes de junio del 2019, el supervisor informa que; tiene un avance acumulado real de 0.00% contra un avance acumulado programado de 100.00% del adicional de obra N°05; con respecto al calendario actualizado de obra, aprobado por la Ampliación de Plazo N°16
- 5.3. Se recomienda derivar el presente informe a la Oficina General de Administración – OGA para su conocimiento y el control de las valorizaciones tramitadas en cada periodo, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.


Es cuanto tengo que informar a Ud. para los fines que estime convenientes.

Atentamente;



Edgard Alvaro Vargas Aguilar
DNI N° 40698128

Con la conformidad del Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento; pase el presente informe y los antecedentes, a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola; para su atención y trámite correspondiente.



ING. JULIO AURELIO RÍOS SOUSA
Coordinador (e) del Área de Obras,
Equipamiento y Mantenimiento



PERÚ

Ministerio de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Fecha:

09/07/19

MEMORÁNDUM INTERNO N° 2867-2019 -FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM

Asunto :

Memo Interno 5160-2019 *sigmpao*

Referencia :

Registro :


Indicación	Destino

Observaciones:

Ing. Edward Vargas
Evaluar y tramitar Valoración N° 09
del Adicional OS
DPA - SAN JUAN DE MAYLONA

Atentamente

Edward V.
9/7/19
15:16/19



Indicaciones:

- 01. Autorizado/Aprobado
- 02. Calificar/Evaluar
- 03. Informe
- 04. Proyectar resolución
- 05. Atención/Tramitación
- 06. Conocimiento y fines
- 07. Notificar al interesado
- 08. Reformular
- 09. Ayuda memoria
- 10. Coordinar
- 11. Opinión/Recomendación
- 12. Consolidar
- 13. Aclarar redacción
- 14. Implementar/Ejecutar
- 15. Preparar respuesta
- 16. Visación
- 17. Agregar a sus antecedentes
- 18. Archivo
- 19. Ampliar
- 20. Seguimiento



Fecha: 05/07/19

MEMORÁNDUM INTERNO N° 5160 - 201 - FONDEPES/ DIGENIPAA

Asunto :

Carta L° 116-2019 - CHM

Referencia :

Registro :

6612

Destino	Indicación	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	05 JUL 2019
OCI		OGAJ	04-45
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	AOEH
Observaciones: _____			

Atentamente



Indicaciones

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 01. Autorizar/No aprobado | 02. Calificar/Evaluar | 03. Informe | 04. Proyectar |
| 05. Atención/Tramitación | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular |
| 09. Ayuda memoria | 10. Coordinar | 11. Opinión/Recomendación | 12. Consoliar |
| 13. Aclarar redacción | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta | 16. Visación |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo | 19. Ampliar | 20. Seguimiento |

CONSORCIO MESONES MURO
Calle 5, Mz V lote 11, Residencial Puertas del Sol - Chiclayo
TELEFONOS: #949611859 / 949611859




"Año de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad en el Perú"

Lima, 05 de julio del 2019

CARTA N° 116-2019-CMM

Señor:
DIGENIPAA
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES
Av. Petit Thouars N° 115, Cercado de Lima

Atención
Arq. Edgard Vargas Aguilar
Coordinador de Obra
Presente.-



Asunto : Presento Valorización N°09 del Adicional de Obra N° 05 (mes de junio 2019)

Referencia : Contrato N° 028-2017-FONDEPES
Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, Región Ica"

De mi Especial consideración:

Quien suscribe, **Juan Esteban Zapata Zuloeta**, identificado con DNI N° **41349923**, representante legal del **Consortio Mesones Muro**, con **RUC N° 20600617614**, me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente, asimismo presentarle la Valorización N° 09 del Adicional de Obra N° 05 con el informe N° 015-2019/JACHR/JS, correspondiente al periodo de junio del 2019, materia del contrato de la referencia.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle mi muestra de consideración y estima personal.

Atentamente



CONSORCIO MESONES MURO
Ing. Juan Esteban Zapata Zuloeta
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO MESONES MURO
Ing. Juan Esteban Zapata Zuloeta
REPRESENTANTE LEGAL
Cel.: 949611859
estebanzuloeta@hotmail.com

Adjunto informe N° 015-2019/JACHR/JS

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO


	
2903036	
N° DOC:	00006612-2019
CLAVE:	8783
USUARIO:	usuario_alog69
FECHA Y HORA:	05/07/2019 16:31:48
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	

estebanzuloeta@hotmail.com

/ jezz82_@hotmail.com

000002

Informe de Supervisión del Adicional de Obra N° 05


.....
José Alexander Chancafe Reyes
CIP N° 94760
Supervisor de Obra



INFORME DE SUPERVISIÓN N° 015-2019/JACHR/JS

VALORIZACIÓN N° 09 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 05
(MES DE JUNIO DEL 2019)

600003

A : Juan Esteban Zapata Zuloeta – Representante Legal Consorcio Mesones Muro
DE : Ing. José Alexander Chancafe Reyes – Jefe de Supervisión
ASUNTO : Informe Mensual de Supervisión
FECHA : Marcona, 02 de julio del 2019


1. GENERALIDADES

- 1.1. Entidad contratante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES
1.2. Modalidad : Contrata
1.3. Obra : “Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, Región Ica”
1.4. Jefe de Supervisión : José Alexander Chancafe Reyes
1.5. Residente de obra : Jorge Julio Espichan Aviles

2. DATOS GENERALES

- 2.1. Contratista de la Obra : P.S.V. CONSTRUCTORES S.A
2.2. Contrato de Obra N° : 028-2017-FONDEPES
2.3. Fecha de contrato ejecutor : 15/09/2017
2.4. Monto de Contrato ejecutor : S/. 8'871,166.29, incluido I.G.V.
2.5. Plazo de Ejecución : 240 días calendarios
2.6. Empresa Supervisora : CONSORCIO MESONES MURO
2.7. Contrato de Supervisión N° : 027-2015-FONDEPES
2.8. Fecha de contrato supervisor : 01/09/2015
2.9. Monto de Contrato supervisor : S/. 318,661.60, incluido I.G.V.
2.10. Plazo de Supervisión : 285 días calendarios
2.11. Monto del Adelanto Directo al Contratista : S/. 887,116.63 (con IGV)
2.12. Fecha de pago del Adelanto Directo : 27/09/2017
2.13. Monto del Adel. de Materiales al Contratista : S/. 1'774,233.30 (con IGV)

.....
José Alexander Chancafe Reyes
CIP N° 94760
Supervisor de Obra



2.14.	Fecha de pago del Adelanto de Materiales	: 24/11/2017
2.15.	Fecha de entrega de terreno	: 29/09/2017
2.16.	Fecha de inicio de ejecución de obra	: 30/09/2017
2.17.	Fecha de término Contractual	: 27/05/2018
2.18.	Nueva Fecha de término	: 01/07/2019

000004

3. SITUACIÓN DE LA OBRA

3.1 ASPECTO TÉCNICO

3.1.1 Situación de la Obra respecto al Adicional N° 05:

a. Resumen del Trabajo Efectuado:

No se realizó ningún trabajo correspondiente al Adicional N° 05 en el mes de junio del 2019.

3.1.2 Avance de Obra

a. Avance ejecutado en el Mes	0.00 %
b. Avance Ejecutado Acumulado al Mes	11.17 %

3.1.3 Plan de Trabajo

- Desde inicios del mes de junio del 2019, se está trabajando con el cronograma actualizado solicitado por la Entidad.

3.1.4 Desarrollo de la Obra

a. Aspectos Críticos

Este mes no se ha registrado ningún aspecto crítico.


b. Problemas Presentados

Este mes no se ha registrado ningún problema.

3.1.5 Conclusiones

Conclusiones

- El avance ejecutado mensual de la Valorización del Adicional de Obra N° 05 para el mes de Junio del 2019 es de **0.00 %**.
- El avance ejecutado acumulado mensual de la Valorización del Adicional de obra N° 05 es de **11.17 %**
- Este adicional fue aprobado con Resolución Jefatural N° 123-2018-FONDEPES/J.


.....
José Alexander Chancafe Reyes
CIP N° 94760
Supervisor de Obra

CONSORCIO MESONES MURO
Calle 5, Mz.V, lote 11, Residencial Puertas del Sol- Chiclayo,
TELEFONOS: #949611859/ 949611859



3.2 ASPECTO ECONÓMICO DE LA OBRA

Número de valorizaciones tramitadas : 9
Monto a Pagar (Incluido IGV) : S/. 0.00


600005

3.3 ASPECTO ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA


- Ingeniero Residente:
- Nombre : Ing. Jorge Julio Espichan Aviles
- Registro CIP N° : 119009
- DNI : 10323344
- N° de Maestros de obra contratados al presente mes : 00
- N° de Operarios contratados al presente mes : 00
- N° de Oficiales contratados al presente mes : 00
- N° de Obreros contratados al presente mes : 00

4.0 DOCUMENTOS ANEXOS

- ✓ Valorización del Adicional de Obra
- ✓ Curva de Avance
- ✓ Resolución Jefatural



José Alexander Chancafe Reyes
Jefe de Supervisión


.....
José Alexander Chancafe Reyes
CIP N° 94760
Supervisor de Obra

000006

Valorización Mensual de Ejecución del Adicional de Obra

.....
José Alexander Chancafe Reyes
CIP N° 94760
Supervisor de Obra

VALORIZACION N° 09 DEL ADICIONAL N° 05

Junio 2019

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.

UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.

CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.

FECHA: Junio del 2019

ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Sub Total S/.	Valorización anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Saldo a Valorizar	
						Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.
01	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				25,472.30		2,845.49		-		2,845.49		22,626.82
01.01	Junta de dilatación Tipo Ja	m.	406.36	39.29	15,965.88	47.47	1,865.10		-	47.47	1,865.10	358.89	14,100.79
01.02	Junta de dilatación Tipo Jc	m.	163.50	38.16	6,239.16	4.23	161.42		-	4.23	161.42	159.27	6,077.74
01.03	Junta de dilatación Tipo Jd	m.	31.29	15.91	497.82	2.65	42.16		-	2.65	42.16	28.64	455.66
01.04	Junta de dilatación Tipo Jd'	m.	171.27	16.17	2,769.44	48.04	776.81		-	48.04	776.81	123.23	1,992.63
	COSTO DIRECTO			S/.	25,472.30		2,845.49		0.00		2,845.49		22,626.82
	GASTOS GENERALES		12.30%	S/.	3,133.09		350.00		0.00		350.00		2,783.10
	UTILIDAD		6.00%	S/.	1,528.34		170.73		0.00		170.73		1,357.61
	SUB-TOTAL PRESUPUESTO			S/.	30,133.73		3,366.22		0.00		3,366.22		26,767.53
	AMORTIZACIÓN			S/.									
	TOTAL PRESUPUESTO (sin IGV)			S/.	30,133.73		3,366.22		0.00		3,366.22		26,767.53
					100.00%		11.17%		0.00%		11.17%		88.83%

.....
 José Alexander Charcafe Reyes
 DIP N° 94760
 Supervisor de Obra

000007

000008

Resumen de Valorización Ejecutor del Adicional de Obra

.....
José Alexander Chancafe Reyes
CIP N° 94760
Supervisor de Obra

RESUMEN GENERAL
VALORIZACION N° 09 DEL ADICIONAL N° 05
Junio 2019

000009

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.
CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
FECHA: Junio del 2019

I.- MONTO PRESUPUESTO CONTRACTUAL SIN IGV :	SI.	30,133.73
II.- VALORIZACIÓN	SI.	0.00
COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES + UTILIDAD	SI.	0.00
DEDUCTIVO	SI.	0.00
SUB TOTAL		0.00
VALORIZACIÓN:	SI.	0.00
IGV 18 %:		0.00
TOTAL (Incl. IGV):	SI.	0.00

IV.- PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL

Porcentaje de avance de la presente valorización: 0.00%
Porcentaje de avance acumulado: 11.17%

Son: Tres mil novecientos setenta y dos con 14/100 Soles incluido IGV.

Nota: Cualquier error u omisión en la presente valorización se realizará en la liquidación de la ejecución de la obra.

.....
José Alexander Chancafe Reyes
CID N° 94760
Supervisor de Obra

000010

Curva de avance de Obra: avance programado vs ejecutado

.....
José Alexander Chancafe Reyes
CIP N° 94760
Supervisor de Obra


VALORIZACIÓN N° 09 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 05
CURVA DE AVANCE DE OBRA
(HASTA JUNIO DEL 2019)

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA

CONTRATISTA: P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.

SUPERVISIÓN: CONSORCIO MESONES MURO

FECHA: MARCONA, JUNIO DEL 2019

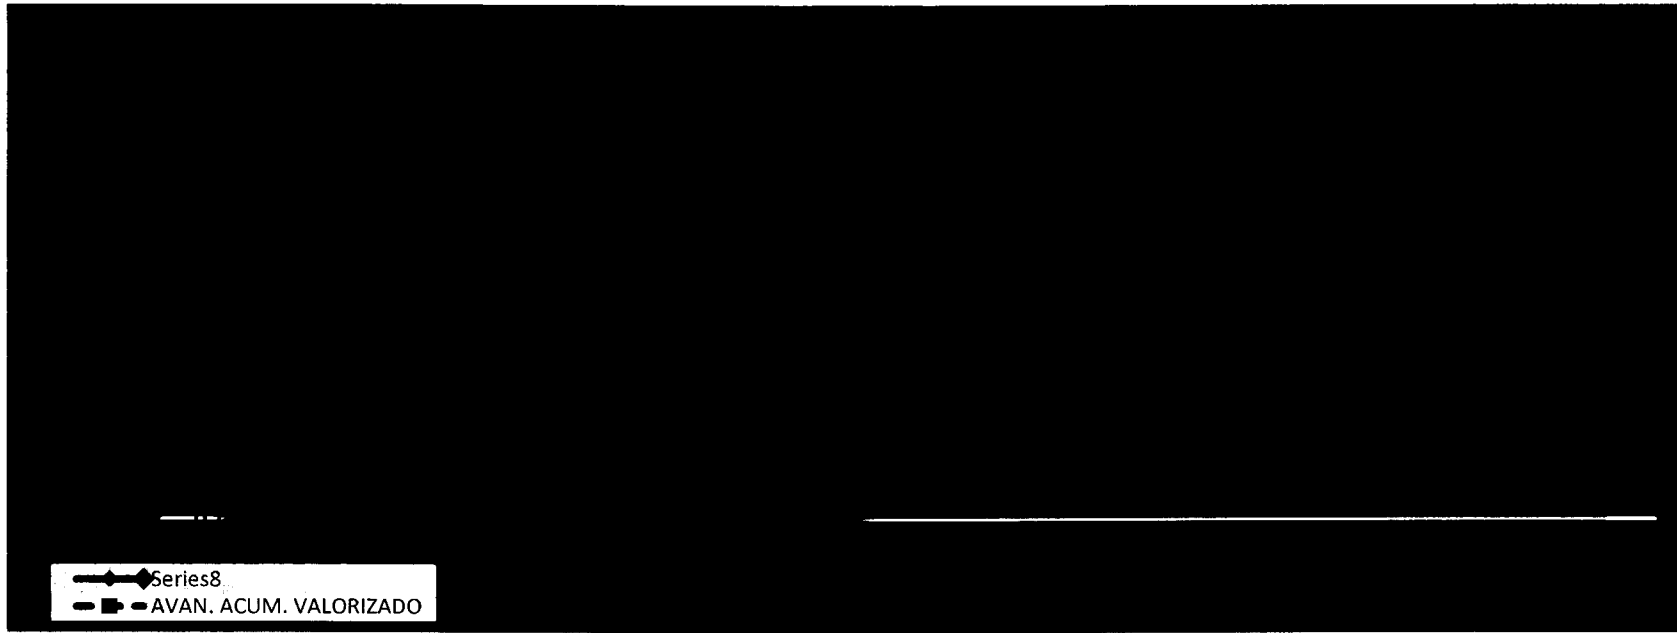

		oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	TOTAL
TOTAL PROGRAMADO SIGV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972.14	0.00	0.00	0.00	31,585.66	35,557.80
AVAN. MENS. PROGRAMADO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.17%	0.00%	0.00%	0.00%	88.83%	
AVAN. ACUM. PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972.14	3,972.14	3,972.14	3,972.14	35,557.80	
AVAN. ACUM. PROGRAMADO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.17%	11.17%	11.17%	11.17%	100.00%	
TOTAL PROGRAMADO SIGV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972.14	0.00	0.00	0.00	0.00	35,557.80
AVAN. MENS. PROGRAMADO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
AVAN. ACUM. PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972.14	3,972.14	3,972.14	3,972.14	3,972.14	
AVAN. ACUM. PROGRAMADO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.17%	11.17%	11.17%	11.17%	11.17%	


COMENTARIO: EN LO QUE RESPECTA AL ADICIONAL DURANTE EL MES DE JUNIO - 2019 NO SE REALIZO NINGÚN TRABAJO, SE MANTUVO EN 11.17 % DE AVANCE FISICO ACUMULADO REALMENTE EJECUTADO DEJANDO UN SALDO DE 88.83 %.

.....
 José Alexander Chancave Reyes
 CIP N° 94760
 Supervisor de Obra

60001

000012

Resolución Jefatural N° 123


.....
José Alexander Chancafe Reyes
CIP N° 94760
Supervisor de Obra



RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 123-2018-FONDEPES/J

Lima, 10 OCT 2018

VISTOS: El Memorando n.º 482-2018-FONDEPES/OGPP de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (en adelante la OGPP), el Memorando n.º 3226-2018-FONDEPES/DIGENIPAA y el Informe n.º 116-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/OEM/oamc, ambos de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola (en adelante la Digenipaa), así como el Informe n.º 761-2018-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica (en adelante la OGAJ); y

CONSIDERANDO:

Que, el 15 de setiembre de 2017 el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (en adelante el Fondopes) y la empresa P.S.V. Constructores S.A. (en adelante el Contratista), suscribieron el Contrato n.º 028-2017-FONDEPES para la contratación de la ejecución de la obra «Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, región Ica» (en adelante la Obra) con código SNIP n.º 278545, por el monto de S/ 8 871 166,29 (Ocho millones ochocientos setenta y un mil ciento sesenta y seis con 29/100 Soles) incluido IGV, bajo el sistema de contratación a precios unitarios y con un plazo de ejecución de 240 días calendario;

Que, el acto administrativo puede fundamentarse en informes de emisión previa que obren en el expediente correspondiente, a condición de su puntual identificación y su integración en el acto administrativo que motivan. Sobre el particular, en el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo n.º 006-2017-JUS, se establece lo siguiente:

«Artículo 6.- Motivación del acto administrativo

(...)

6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. (...);

Que, conforme a la normativa indicada sobre el contenido motivacional, constituyen fundamentos de la presente Resolución: el Memorando n.º 482-2018-FONDEPES/OGPP, el Memorando n.º 3226-2018-FONDEPES/DIGENIPAA y el Informe n.º 116-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/OEM/oamc, así como el Informe n.º 761-2018-FONDEPES/OGAJ, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución en calidad de anexos;

Que, por los fundamentos técnicos y normativos expuestos de conformidad con la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo n.º 1341, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo n.º 350-2015-EF, modificado mediante el Decreto Supremo n.º 056-2017-EF, y en ejercicio de las funciones establecidas por el literal «s» del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones del Fondopes, aprobado por Resolución Ministerial n.º 346-2012-PRODUCE, corresponde expedir la Resolución Jefatural mediante la cual se apruebe la Prestación Adicional de Obra n.º 05 y el Presupuesto Deductivo Vinculado n.º 02;

Con los visados de la Secretaría General, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola y de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra n.° 05 del Contrato n.° 028-2017-FONDEPES suscrito para la contratación de la ejecución de la obra «Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, región Ica», por el monto de S/ 35 557,80 (Treinta y cinco mil quinientos cincuenta y siete con 80/100 Soles) incluido IGV, y del correspondiente Presupuesto Deductivo Vinculado n.° 02 cuyo monto asciende a S/ 3 610,39 (Tres mil seiscientos diez con 39/100 Soles) incluido IGV, siendo que el resultado de la sustracción aritmética determina un incremento del monto del contrato original de S/ 31 947,41 (Treinta y un mil novecientos cuarenta y siete con 41/100 Soles) incluido IGV, lo que representa un porcentaje de incidencia individual de 0.36% del contrato original y un nivel de incidencia acumulado de 8.25% del monto del contrato original correspondiente a la obra en mención; siendo el nuevo monto contractual de S/ 9 603 216,03 (Nueve millones seiscientos tres mil doscientos dieciséis con 03/100 Soles) incluido IGV, de acuerdo con los fundamentos contenidos en el Memorando n.° 482-2018-FONDEPES/OGPP, el Memorando n.° 3226-2018-FONDEPES/DIGENIPAA y el Informe n.° 116-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/oamc, así como el Informe n.° 761-2018-FONDEPES/OGAJ, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución en calidad de anexos.

Artículo 2°.- Autorizar la ejecución del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra n.° 05 y del Presupuesto Deductivo Vinculado n.° 02, aprobados en el artículo 1° de la presente Resolución, debiendo el Contratista P.S.V. Constructores S.A., ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento como requisito para los pagos que correspondan a la prestación adicional, de corresponder, de conformidad con lo establecido en el numeral 175.14 del artículo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo n.° 056-2017-EF.

Artículo 3°.- Notificar la presente Resolución y sus anexos al Contratista P.S.V. Constructores S.A. y a la Supervisión Consorcio Mesones Muro; remitiéndose copias a la Oficina General de Administración y a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, para que ambas, de manera coordinada, ejecuten las acciones que permitan la suscripción de la respectiva adenda del Contrato n.° 028-2017-FONDEPES.


Artículo 4°.- Disponer que en el acto de notificación de la presente Resolución y sus anexos al Contratista P.S.V. Constructores S.A., se le haga entrega del expediente técnico aprobado en el artículo 1° de la presente Resolución.


Artículo 5°.- Disponer que la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, bajo responsabilidad funcional, en el plazo de 30 días calendario posteriores a la emisión de la presente, emita un informe respecto de la existencia de responsabilidades por las presuntas deficiencias en la formulación y/o aprobación del expediente técnico de la obra «Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, región Ica», para que conjuntamente con los antecedentes, sea remitido a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario del Fondepes. En el supuesto que se determine la responsabilidad del proyectista que elaboró el mencionado expediente técnico, corresponderá a la Digenipaa determinar la existencia del daño o perjuicio generado al Fondepes, así como su cuantificación monetaria, debiendo comunicarse dicha situación a la Procuraduría Pública del Fondepes para que adopte las acciones correspondientes.

Artículo 6°.- Disponer que la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, comunique a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones la ejecución de la Prestación Adicional de Obra n.° 05 y el Presupuesto Deductivo Vinculado n.° 02.

Artículo 7°.- Disponer que la presente Resolución se publique en el portal institucional de la Entidad.

Regístrese y comuníquese.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

 DR. MORGAN NICCOLO QUERO GAIME
 JEFE


 José Alexander Chancafe Reyes
 OIP N° 94760
 Supervisor de Obra

