



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la Impunidad"

MEMORANDUM N° 4426 -2019-FONDEPES/DIGENIPAA

CARGO

A : **SRA. GISSELA ZAPATA FLORES**
Coordinadora de Logística.

ASUNTO : **VALORIZACIÓN DE OBRA N° 20**
Obra : "Mejoramiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal de la Localidad de Acaculpo, Distrito Zorritos, Provincia de Contralmirante, Región Tumbes."
Ubicación : Zorritos - Contraalmirante - Tumbes
Proceso : Licitación Pública N°005-2017-FONDEPES
Contrato : 054-2017-FONDEPES
Contratista : CONSORCIO ZORRITOS


REFERENCIA : CST.175501.ED.286.19

FECHA : Lima, **22 AGO 2019**

Tengo a bien dirigirme a usted, para remitir adjunto al presente la Valorización N° 20 de la obra señalada en el asunto, correspondiente a los trabajos efectuados al 31 de Julio del 2019 por la empresa CONSORCIO ZORRITOS la misma que ha sido revisada por el Supervisor de obra, el CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES.

Con la conformidad del Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola de FONDEPES, mediante INFORME N° 066-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/CCC, el cual hago mío en toda su extensión, se solicita se sirva disponer a quien corresponda, efectúe el trámite de pago de la indicada valorización, aclarando que en lo que respecta a deducciones por cualquier tipo de penalidades se efectuarán en la liquidación del contrato.

Atentamente,



FONDEPES
Julio Aurelio Ríos Sousa
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola

10:26
23.08.19

JARS/Hugo

FONDEPES
GERENCIA GENERAL
23 AGO 2019
N° Registro: Hora: 10:26



CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por la presente que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola al suscribir la presente acta, da su conformidad para realizar el Pago por el concepto de la VALORIZACION N° 20 por la suma de S/.259,525.11 (Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Veinticinco con 11/100 Soles) a favor de la empresa CONSORCIO ZORRITOS encargado de la ejecución de la Obra "Mejoramiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal de la Localidad de Acaculpo, Distrito Zorritos, Provincia de Contralmirante, Región Tumbes.", según contrato N°054-2017-FONDEPES.




FONDEPES

.....
Julio Aurelio Ros Sousa
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal y Acuícola



INFORME N° 066-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/CCC



A : **ING. JULIO AURELIO RIOS SOUSA**
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

ASUNTO : **VALORIZACIÓN DE OBRA N° 20**
Obra : "Mejoramiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal de la Localidad de Acapulco, Distrito Zorritos, Provincia de Contralmirante, Región Tumbes."
Ubicación : Zorritos - Contraalmirante - Tumbes
Proceso : Licitación Pública N°005-2017-FONDEPES
Contrato : 054-2017-FONDEPES
Contratista : CONSORCIO ZORRITOS

REFERENCIA : CST.175501.ED.286.19
CST.175501.ED.288.19
CZOA 064-2019/ACAPULCO


FECHA : Lima, 21 de agosto del 2019

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual la supervisión CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES de la Obra denominada "Mejoramiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal de la Localidad de Acapulco, Distrito Zorritos, Provincia de Contralmirante, Región Tumbes." hace llegar la aprobación de la Valorización N°20 de la obra indicada en el asunto, correspondiente a los trabajos efectuados al 31 de Julio del 2019 la misma que fue elaborada con el referente de la valorización del Contratista CONSORCIO ZORRITOS.

Luego de efectuar la revisión de los cálculos, los mismos que fueron elaborados por el supervisor de obra y el contratista se obtuvo como resultado lo siguiente:

A. VALORIZACION N°20 CONTRACTUAL		SI.	188,007.49
Estructuras			98,650.27
Arquitectura			37,570.71
Instalaciones Sanitarias			-
Instalaciones Eléctricas			-
Obras de mar			51,786.51
B. GASTOS GENERALES Y UTILIDADES		SI.	33,841.35
Gastos Generales	17.90%		33,653.34
Utilidades	0.1%		188.01
C. AMORTIZACIONES		SI.	16,464.08
Adelanto Directo			16,464.08
Adelanto Materiales N°01			-
Adelanto Materiales N°02			-
D. REAJUSTES		SI.	14,551.77
Total de reajustes (*)			14,551.77
E. SUB TOTAL VALORIZACION		SI.	219,936.53
Total Valorizado (A+B-C+D)			
I.G.V. (18%)			39,588.58
F. TOTAL A FACTURAR VALORIZACION N°20		SI.	259,525.11

Son: Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Veinticinco con 11/100 Soles





ANALISIS

A continuación, se adjunta un cuadro donde se incluyen los datos mas representativos de la obra y las fechas en que se entrego la documentación, demostrando el cumplimiento de los TDR:

ITEM DESCRIPCIÓN

1	Nombre de la Obra	"Mejoramiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal de la Localidad de Acapulco, Distrito Zorritos, Provincia de
2	Código Snip	293107
3	Contrato de Obra	054-2017-FONDEPES
4	Presupuesto Contratado	S/15,226,434.46
5	Sistema	Precios Unitarios
6	Contratista	CONSORCIO ZORRITOS
7	Residente de Obra	ING. Edgar Fernando Regalado Oblitas
8	Supervisión	CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
9	Supervisor de Obra	ING. Ruben Bossus Tonitatti
10	Plazo Contractual	300 d.c.
11	Fecha de Entrega de Terreno	15 de Diciembre de 2017
12	Inicio del Plazo Contractual	28 de Diciembre de 2017
13	Fin de Plazo Programado	23 de Octubre de 2018
14	Ampliación de plazo N°01	25 días calendario
15	Ampliación de plazo N°02	27 días calendario
16	Ampliación de plazo N°03	32 días calendario
17	Ampliación de plazo N°04	74 días calendario
18	Ampliación de plazo N°05	28 días calendario
19	Ampliación de plazo N°06	64 días calendario
20	Ampliación de plazo N°07	65 días calendario
21	Nueva fecha de termino	3 de setiembre de 2019
22	Fecha de entrega de Valorización N° 20 por Contratista	2 de Agosto de 2019
23	Fecha de entrega del Informe mensual N° 20 por Contratista	5 de Agosto de 2019
24	Fecha de entrega de Valorización N° 20 por Supervisión	5 de Agosto de 2019
25	Porcentaje de Avance de Obra	62.95%

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN


Al haberse comprobado que el contratista ha cumplido con entregar lo indicado en los términos que indica la referencia y en los plazos previstos, teniendo como base la aprobación de la Supervisión, se considera procedente el pago de la Valorización N°20, por tal razón se recomienda continuar con el respectivo trámite de pago, aclarando que en lo que respecta a deducciones por cualquier concepto y otras penalidades se efectuarán en la liquidación de obra.

Es todo lo que cumpla en informar a usted,

Atentamente,


ARQ. CARLOS CASTRO CEVALLOS
CAP N° 11571

La Coordinadora del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento, que suscribe, hace suyo en todas sus partes el presente documento.


ING. JULIO AURELIO RIOS SOUSA
Coordinador (e) del Área de
Obras, Equipamiento y
Mantenimiento



PERÚ Ministerio de la Producción



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



04944886

Usuario: prui
Fecha: 22/08/2019
Hora: 14:45




CARGO 02622-2019-FONDEPES/AOEM

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA
 Asunto: REMITE VALORIZACION N 20 MES DE JULIO REF: DPA ACAPULCO
 Referencia: INFORME 00066-2019-FONDEPES/CCC
 Fecha: 22/08/2019
 Observación: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A LOGISTICA



AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Lima, 05 de agosto del 2019

CST.175501. ED 286.19

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Av. Petit Thouars N° 115 - Cercado de Lima

Lima.-

Atención : **Ing. Juan Aurelio Ríos Sousa**
 Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

Asunto : **Valorización de Obra N° 20- Julio 2019**

Referencia : Contrato N° 051-2017-FONDEPES Supervisión de la Ejecución de la Obra:
**"Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal
 Acaulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar, Región
 Tumbes"**

De mi consideración:

Es grato dirigimos a usted, para saludarlo y conforme a nuestras obligaciones contractuales relacionado al proyecto de la referencia, alcanzamos el Informe de Valorización de Obra N° 20 correspondiente al mes de julio de 2019, en original, dos copias y CD.

Agradeciendo la atención a la presente, nos despedimos.

Atentamente,



Rubén Bossus Toniatti
 Jefe de Supervisión
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
 PESQUERO

 2917585	
N° DOC:	00007638-2018
CLAVE:	6260
USUARIO:	usuario_alog69
FECHA Y HORA:	05/08/2019 17:45:16
TELEFONO:	2087700
www.fondepes.gob.pe	

Av. José Gálvez Barrenechea 646
 San Isidro - Lima 27 - Perú
 Telf: (51-1) 705-5000
 Fax: (51-1) 705-5050
 cesel@cesel.com.pe
 www.cesel.com.pe

Lima, 05 de agosto del 2019

CST.175501. ED 286.19

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Av. Petit Thouars N° 115 - Cercado de Lima

Lima.-

Atención : **Ing. Juan Aurelio Ríos Sousa**
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

Asunto : **Valorización de Obra N° 20- Julio 2019**

Referencia : Contrato N° 051-2017-FONDEPES Supervisión de la Ejecución de la Obra:
**"Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal
Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar, Región
Tumbes"**

De mi consideración:

Es grato dirigimos a usted, para saludarlo y conforme a nuestras obligaciones contractuales relacionado al proyecto de la referencia, alcanzamos el Informe de Valorización de Obra N° 20 correspondiente al mes de julio de 2019, en original, dos copias y CD.

Agradeciendo la atención a la presente, nos despedimos.

Atentamente,



Rubén Bossus Toniatti
Jefe de Supervisión
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

Proyecto: Supervisión de Obra, "Mejoramiento de los Servicios del DPA ACAPULCO"

Grupo o Sector: Edificaciones

Para:	Ing. Julio Aurelio Ríos Sousa
De:	Ing. Rubén Bossus Toniatti
Fecha:	05/08/2019

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Planos | <input type="checkbox"/> | Especificaciones Técnicas |
| <input type="checkbox"/> | Criterios de Diseño | <input type="checkbox"/> | Memoria de Cálculos |
| <input type="checkbox"/> | Listado de Cantidad de Materiales | <input type="checkbox"/> | Hojas de Metrados |
| <input type="checkbox"/> | Planillas | <input type="checkbox"/> | Memoria Descriptiva |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Valorizaciones | <input type="checkbox"/> | Resultados de Pruebas de Campo |
| <input type="checkbox"/> | Informes | <input type="checkbox"/> | Otros |

Un juego (1) de los siguientes documentos es transmitido para:

-
- Revisión
-
- Aprobación
-
- Construcción
-
- Como Construido
-
- Conocimiento

Ítem	Código de Documento	Revisión	Título de Documento
1	CST-175501-ED-VL 20	0	Valorización de Obra N° 20 – JULIO 2019
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES"



INFORME DE VALORIZACION
CST-175501-ED-VL-20

Código del Proyecto: 175501
Revisión: 0
Páginas:
Especialidad:
Supervisión de Obra

Proyecto:

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ACAPULCO, DISTRITO DEL ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR REGION TUMBES"

Título: INFORME DE VALORIZACION N°20 - JULIO 2019

CONTROL DE REVISIONES

Rev.	Fecha	Elaborado		Revisado		Verificado		Descripción del Cambio
		Iniciales	Firma	Iniciales	Firma	Iniciales	Firma	
	05.08.2019	YAS		RBT		RBT		Emitido para Presentación



VALORIZACIÓN DE OBRA N° 20 – JULIO 2019

INDICE

1.	OBJETO.....	4
2.	DESCRIPCION DE LA OBRA	4
3.	DATOS GENERALES DE LA OBRA.....	5
4.	ANTECEDENTES	6
5.	AVANCE FINANCIERO MENSUAL DE LA OBRA	7
6.	CONCLUSIONES.....	9
7.	RECOMENDACIONES.....	7



SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES"

1. OBJETO

El presente informe tiene por objeto presentar la Valorización de Avance de Obra N° 20 correspondiente al mes de julio del 2019, ejecutado por el CONSORCIO ZORRITOS, en donde se muestran los metrados de avance de obra de cada una de las partidas valorizadas en el presente periodo. Asimismo, de verificar la información presentada por el Contratista.

2. DESCRIPCION DE LA OBRA

El proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES", diseñado para desembarcar y procesar en condiciones adecuadas los productos hidrobiológicos de la pesca artesanal, de acuerdo a la normatividad sanitaria vigente, sin generar impactos negativos al medio ambiente.

Infraestructura en Tierra

Construcción de área de Tareas Previas (lavado, eviscerado y fileteado), Área de Frío que incluye Cuarto de Máquinas en el tercer nivel, Área de Desinfección para el personal que opera en zona de Tareas Previas, Área Administrativa que incluye servicios complementarios para los usuarios así el depósito de aparejos de pesca (redes), almacén temporal de residuos peligrosos, y maestranza, Patio de Maniobras, Patio de Redes, Grupo Electrónico y Sub Estación Eléctrica.

Estructura sismorresistente compuesto por una construcción de muros estructurales, pórticos de concreto armado, muros portantes de albañilería y placas de concreto armado, muros de ladrillos tarrajeados, techo de losa aligerada.

Instalaciones Sanitarias de agua potable y agua salada, así como el tratamiento de residuos de procedencia industrial y humano.

Instalaciones eléctricas de baja tensión.

Equipamiento y Mobiliario

Implementación de Equipamiento para Área de Tareas Previas.

Implementación de Equipamiento para Área de Frío.

Adquisición de Equipos y Mobiliario Complementarios.

Infraestructura en mar

El mejoramiento del muelle tipo espigón, desde el Puente hasta el Cabezo, mediante la demolición de la plataforma y vigas de Puente de Muelle, salvo en el tramo del eje 9 al eje 11, que ha sido recientemente reparado. La demolición de plataformas y vigas. La reparación de 32 pilotes en la zona del Puente y de 21 en la del Cabezo, considerando la construcción de nuevas vigas cabezales y longitudinales en dichas zonas además de la colocación de concreto con aditivo clase 280 kg/cm² y recubrimiento con epóxico para el pegado de concreto nuevo con antiguo, considerándose concreto con aditivo impermeabilizante clase 350 kg/cm².

La intervención de la Infraestructura en mar considera también la construcción de una losa de Puente y Cabezo de Muelle de 280 k/cm² con aditivo impermeabilizante y aditivo de fibras de ultra finas. La estructura de vigas y fondo de losas serán recubiertas con masilla epóxica para



SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES"

asegurar la durabilidad de las mismas protegiéndolas de la corrosión del ataque del medio marino agresivo.

Como obras complementarias a la súper estructura se está considerando la rehabilitación de una Plataforma Baja en el Cabezo que consiste en el mantenimiento con pintura de la baranda, el retiro de las defensas existentes en mal estado y el reemplazo por defensas nuevas en el Cabezo del Muelle distribuidas de la siguiente manera; 53,60 mts del lado derecho (norte) y 65,70 izquierdo (sur) que consiste en el reemplazo del perfil tipo riel, los mismos que serán empotrados mediante hincado a una profundidad de 3 mts y anclados a la viga longitudinal, para luego colocar un sistema de defensas de jebe tipo D.

Se colocará un sardinel de seguridad, a ambos lados del Cabezo del Muelle constituido por elementos de madera tratada de 12"x12"x 15'.

Se reemplazarán 20 unidades de bitas tipo cornamuza para el amarre de las embarcaciones.

3. DATOS GENERALES DE LA OBRA

Contrato de obra N°	: 054-2017-FONDEPES
✓ Fecha de suscripción	: 12 de diciembre de 2017
✓ Cliente	: FONDEPES
✓ Contratista	: CONSORCIO ZORRITOS
✓ Monto de ejecución	: S/. 15'226,434.46 (Inc. IGV).
✓ Prestación Adicional N°01	: S/. 60,286.17 (Inc. IGV).
✓ Prestación Adicional N°02	: S/. 791,226.26 (Inc. IGV).
✓ Prestación Adicional N°03	: S/. 2'410,777.62 (Inc. IGV).
✓ Prestación Adicional N°04	: S/. 207,840.85 (Inc. IGV).
✓ Prestación Adicional N°05	: S/. 50,332.63 (Inc. IGV).
✓ Deductivo N°1	: S/. 68,611.90 (Inc. IGV).
✓ Deductivo N°2	: S/. 1'856,458.64 (Inc. IGV).
✓ Deductivo N°3	: S/. 266,270.78 (Inc. IGV).
✓ Deductivo N°4	: S/. 164,176.63 (Inc. IGV).
✓ Mayores Metrados N°1	: S/. 17,665.54 (Inc. IGV).
✓ Mayores Metrados N°2	: S/. 614,514.61 (Inc. IGV).
✓ Mayores Metrados N°3	: S/. 185,493.96 (Inc. IGV).
✓ Modalidad de Contrato	: Precios unitarios.
✓ Tipo	: Licitación Pública N° 005-2017-FONDEPES.
✓ Supervisión	: CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
✓ Contrato de Supervisión	: N°: 051-2017-FONDEPES
✓ Fecha de Suscripción	: 29 de noviembre de 2,017
✓ Monto Contrato Supervisión	: S/. 1'479,071
✓ Plazo de Ejecución	: 300 días calendarios.
✓ Monto de Adelanto	: S/ 443,721.30
✓ Forma de Pago	: Valorizaciones mensuales por avance de obra.
✓ Entrega de Terreno	: 15 de diciembre del 2017.
✓ Fecha de inicio de obra	: 28 de diciembre del 2017.
✓ Fecha de fin de obra	: 23 de octubre del 2018.
✓ Ampliación de Plazo N°01	: 25 días calendarios Resolución de secretaría general N°070-2018-FONDEPES/SG (25/04/2018)
✓ Ampliación de Plazo N°02	: 27 días calendarios Resolución de secretaría general N°086-2018-FONDEPES/SG (24/05/2018)



SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES"

5. AVANCE FINANCIERO MENSUAL DE LA OBRA:

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO SIN IGV	VALORIZACION MENSUAL		VALORIZACION ACUMULADA		SALDO	
		AVANCE %	MONTO SIN IGV	AVANCE %	MONTO SIN IGV	AVANCE %	MONTO SIN IGV
01 ESTRUCTURAS	S/. 5,099,026.93	2.28%	116,407.32	81.64%	4,162,769.90	18.36%	936,257.03
02 ARQUITECTURA	S/. 2,414,033.62	1.84%	44,333.44	40.07%	967,205.53	59.93%	1,446,828.09
03 INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 1,115,459.39	0.00%	0.00	0.00%	-0.01	100.00%	1,115,459.40
04 INSTALACIONES ELECTRICAS	S/. 457,810.65	0.00%	0.00	10.41%	47,644.17	89.59%	410,166.48
05 OBRAS DE MAR	S/. 2,429,956.28	2.51%	61,108.09	53.16%	1,291,813.71	46.84%	1,138,142.57
06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	S/. 1,387,471.14	0.00%	0.00	56.27%	780,768.24	43.73%	606,702.90
	S/. 12,903,758.01	1.72%	221,848.85	56.19%	7,250,201.54	43.81%	5,653,556.47
REAJUSTES Y REINTEGROS DEDUCIDOS (S)							
01 ESTRUCTURAS			7,932.00		235,382.46		
02 ARQUITECTURA			2,305.31		51,625.64		
03 INSTALACIONES SANITARIAS			0.00		68.77		
04 INSTALACIONES ELECTRICAS			0.00		2,725.33		
05 OBRAS DE MAR			4,314.46		256,268.30		
06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO			0.00		41,934.18		
TOTAL DE REINTEGROS			14,551.77		588,004.68		
VALORIZACION BRUTA (VB = V + S)			236,400.62		7,838,206.22		
AMORTIZACIONES DE ADELANTOS (D)							
AMORTIZACION DE ADELANTO EN EFECTIVO							
01 ESTRUCTURAS	378,414.29	2.28%	8,638.94	81.64%	308,931.81	18.36%	69,482.48
02 ARQUITECTURA	179,152.78	1.84%	3,290.12	40.07%	71,779.26	59.93%	107,373.52
03 INSTALACIONES SANITARIAS	82,781.63	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	82,781.63
04 INSTALACIONES ELECTRICAS	33,975.52	0.00%	0.00	0.00%	2,922.76	91.40%	31,052.76
05 OBRAS DE MAR	180,334.44	2.51%	4,535.02	53.16%	95,869.43	46.84%	84,465.01
06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	102,968.45	0.00%	0.00	0.00%	51,734.99	49.76%	51,233.46
	957,627.11	1.72%	16,464.08	55.47%	531,238.24	44.53%	426,388.87
AMORTIZACION DE 1ER ADELANTO DE MATERIALES							
01 ESTRUCTURAS	593,220.34	0.00%	0.00	100.00%	593,220.34	0.00%	0.00
02 ARQUITECTURA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
03 INSTALACIONES SANITARIAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
04 INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
05 OBRAS DE MAR	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
	593,220.34	0.00%	0.00	100.00%	593,220.34	0.00%	0.00
AMORTIZACION DE 2DO ADELANTO DE MATERIALES							
01 ESTRUCTURAS	250,847.46	0.00%	0.00	100.00%	250,847.46	0.00%	0.00
02 ARQUITECTURA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
03 INSTALACIONES SANITARIAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
04 INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
05 OBRAS DE MAR	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
	250,847.46	0.00%	0.00	100.00%	250,847.46	0.00%	0.00
TOTAL AMORTIZACIONES (D)			16,464.08		1,375,306.05		426,388.87
VALORIZACION NETA (VN = VB - D)			219,936.54		6,462,900.17		
I.G.V. 18 %			39,588.58		1,163,322.03		
Monto a cancelar al Contratista (VN+IGV)			S/. 259,525.12		7,626,222.20		



SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES"

- ✓ Ampliación de Plazo N°03 : 32 días calendarios Resolución de Gerencia General N°212-2018-FONDEPES/GG (29/11/2018)
- ✓ Ampliación de Plazo N°04 : 74 días calendarios Resolución de Gerencia General N°006-2019-FONDEPES/GG (11/01/2019)
- ✓ Ampliación de Plazo N°05 : 28 días calendarios Resolución de Gerencia General N°070-2019-FONDEPES/GG (12/04/2019)
- ✓ Ampliación de Plazo N°06 : 64 días calendarios Resolución de Gerencia General N°095-2019-FONDEPES/GG (29/05/2019)
- ✓ Días de Ampliación Plazo : 250 días calendario
- ✓ Fecha culminación de plazo : 30 de junio de 2019
- ✓ Coordinador de obra : Ing. José María Chipana Mercado.

4. ANTECEDENTES

a) Con fecha 12 de diciembre del 2017, se firma el contrato de Ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES", entre el Ministerio de Pesquería, hoy Ministerio de Producción y el CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS por el monto total ascendente a la suma de S/. 15'226,434.46, incluido el IGV.

b) Con fecha 06 de Noviembre del 2017, el Comité de Selección adjudicó la Buena Pro de la LICITACION PÚBLICA N°005-2017-FONDEPES - PRIMERA CONVOCATORIA, para la Contratación de la Ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES", Código SNIP N° 293107.

- c) Plazo de Ejecución contractual : 300 días calendarios.
- ✓ Inicio de Obra : 28 de diciembre del 2,017
 - ✓ Adelanto directo : 7.42% del Monto del Contrato.
 - ✓ Adelanto para materiales : 4.60% del Monto del Contrato.
 - ✓ Entrega de Terreno : 15 de diciembre del 2,017
 - ✓ Fecha de inicio de obra : 28 de diciembre del 2,017.
 - ✓ Ampliación de Plazo N° 01 : 25 días calendarios.
 - ✓ Ampliación de Plazo N° 02 : 27 días calendarios.
 - ✓ Ampliación de Plazo N° 03 : 32 días calendarios.
 - ✓ Ampliación de Plazo N° 04 : 74 días calendarios.
 - ✓ Ampliación de Plazo N° 05 : 28 días calendarios.
 - ✓ Ampliación de Plazo N° 06 : 64 días calendarios.
 - ✓ Fecha de fin de obra : 30 de junio del 2,019.

d) El 27 de diciembre del 2,017 se hizo entrega al Contratista, el Adelanto Directo correspondiente al 7.42% del monto del contrato, cuya suma asciende a S/. 1'130,000.00 (un millón ciento treinta mil con 00/100 soles) incluido el IGV.

e) El 28 de abril del 2,018 se hizo entrega al Contratista, el Adelanto para Materiales correspondiente al 4.60% del monto del contrato, cuya suma asciende a S/. 700,000.00 (setecientos mil con 00/100 soles) incluido el IGV.



SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES"

▪ **VALORIZACIÓN N° 20 JULIO 2019 - VALORIZACIÓN METRADOS CONTRATO**

A) Valorización N° 20 JULIO 2019	: S/. 161,706.95
a.1) Monto Valorización N° 20 – Estructuras	: S/. 19,655.71
a.2) Monto Valorización N° 20 – Arquitectura	: S/. 68,910.30
a.3) Monto Valorización N° 20 – Instalaciones Sanitarias	: S/ 0.00
a.4) Monto Valorización N° 20 – Instalaciones Eléctricas	: S/ 0.00
a.5) Monto Valorización N° 20 – Obras de Mar	: S/ 48,473.78
a.6) Monto Valorización N° 20 – Equipamiento y Mobiliario	: S/ 0.00
IGV (18%)	<u>: S/ 24,667.16</u>
Monto Total – Metrados Contractual (Inc. IGV)	: S/ 204,163.73

B) VALORIZACIÓN N°08 - ADICIONAL N°03

Valorización N° 08 – Adicional N°03	: S/. 25,743.02
Inst. Eléctricas Adicional N°03 – Val N°8	: S/. 5,811.11
Inst. Sanitarias Adicional N°03 – Val N°8	: S/. 16,005.01
IGV (18%)	<u>: S/. 3,926.90</u>
Monto Val N°8 – Adicional N°03	: S/. 25,743.02

C) VALORIZACIÓN N°02 - ADICIONAL N°04

Valorización N° 02 – Adicional N°04	: S/. 30,337.48
Monto Adicional N°04 – Val N°2	: S/. 25,709.73
IGV (18%)	<u>: S/. 4,627.75</u>
Monto Val N°2 – Adicional N°04	: S/. 30,337.48

D) Valorización N° 04 – Adicional N°05

Valorización N° 04 – Adicional N°05	: S/. 5,827.70
Monto Adicional N°05 – Val N°4	: S/. 4,938.73
IGV (18%)	<u>: S/. 888.97</u>
Monto Val N°4 – Adicional N°05	: S/. 5,827.70



▪ **VALORIZACIÓN JULIO 2019 - VALORIZACIÓN ACUMULADA**

E) Valorización Acumulada – JULIO 2019	: S/ 8'555,237.81
d.1) Monto Valorización N° 20 – Estructuras	: S/ 4'162,769.90
d.2) Monto Valorización N° 20 – Arquitectura	: S/ 967,205.53
d.3) Monto Valorización N° 20 – Instalaciones Sanitarias	: S/ 0.00
d.4) Monto Valorización N° 20 – Instalaciones Eléctricas	: S/ 47,644.17
d.5) Monto Valorización N° 20 – Obras de Mar	: S/ 1'291,813.71
d.6) Monto Valorización N° 20 – Equipamiento y Mobiliario	: S/ 780,768.24
IGV (18%)	: S/ <u>1,305,036.28</u>
Monto Total Acumulado (Inc. IGV)	: S/ 8'555,237.81

Situación de la Obra

El rendimiento (desempeño) del contratista acumulado al mes de junio 2019 fue de: 62.95% -100.00% = -37.05% < **80%**, por lo que la obra se encuentra **ATRASADA** respecto al Calendario de Avance de Obra Valorizado CAVO actualizado, por lo que se debe aplicar lo dispuesto en el Artículo 173° del Reglamento de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado, por "Demora injustificada en la ejecución de la obra".

Para la presente valorización de obra, se ha tomado en consideración el presupuesto de obra ofertado por el contratista con precios base a julio 2017.

Se ha realizado la Curva "S" y la comparación de avance de obra real VS avance programado con el cronograma de avance de obra valorizado (CAOV), actualizado correspondiente a la ampliación de plazo N° 06 (por 64 días calendarios).

El porcentaje de avance real en julio 2,019 es de **1.88 %**, con lo cual se tiene un avance acumulado de **62.95 %** respecto al monto total de ejecución de obra. Siendo el porcentaje de avance acumulado programado de **100.00 %**.

6. CONCLUSIONES

- Al haberse aprobado la Ampliación de Plazo Parcial N° 06 se ha realizado la Curva "S" y la comparación de avance de obra real VS avance programado con el cronograma de avance de obra valorizado (CAOV), actualizado correspondiente a la ampliación de plazo N° 06 (por 64 días calendarios), se concluye que la obra se encuentra atrasada.
- El desempeño del contratista acumulado al mes de julio 2019 fue de **62.95%** contra el **100.00%** del avance programado acumulado hasta este mes según el Cronograma de Avance de Obra Valorizado actualizado, representando el **62.95 < 80%**, **concluyendo que la obra se encuentra ATRASADA.**
- Luego de revisar y verificar los metrados de avance de obra presentados por el Contratista, y considerando los cálculos obtenidos por la Supervisión, se obtiene la valorización de obra N° 20 correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio del 2,019.



SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES"

- El monto a cancelar al Contratista Consorcio Zorritos correspondiente al mes de Junio 2019 es de **S/. 259,525.12 (Doscientos cincuenta y nueve mil quinientos veinticinco con con 12/100 soles)** incluye valorización del mes, reintegros y amortizaciones.
- Se adjunta la Curva "S" del Cronograma de Avance de Obra Valorizado actualizado (Anexo 01).
- Se adjunta la valorización presentada por el Contratista (Anexo 02).

7. RECOMENDACIONES.

- Se recomienda al Contratista (CONSORCIO ZORRITOS)
 - Tomar las previsiones del caso para ejecutar la obra dentro de los plazos establecidos en su Cronograma de Avance de Obra Valorizado Actualizado y no incurrir en retraso que conlleve a la resolución del contrato o intervención económica de la obra.
- Se recomienda Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES)
 - Aplicar lo dispuesto en el Artículo 173° del Reglamento de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado, por "Demora injustificada en la ejecución de la obra" que indica deberá presentar dentro de los siete (7) días siguientes un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.

Atentamente



Ing. Rubén Bossus Toniatti
Jefe de Supervisión
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES



ANEXO 01


Curva "S"¹ Cronograma de Avance de Obra Valorizado



está haciendo corrección de curva S en el mes de julio

140

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
 ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES"

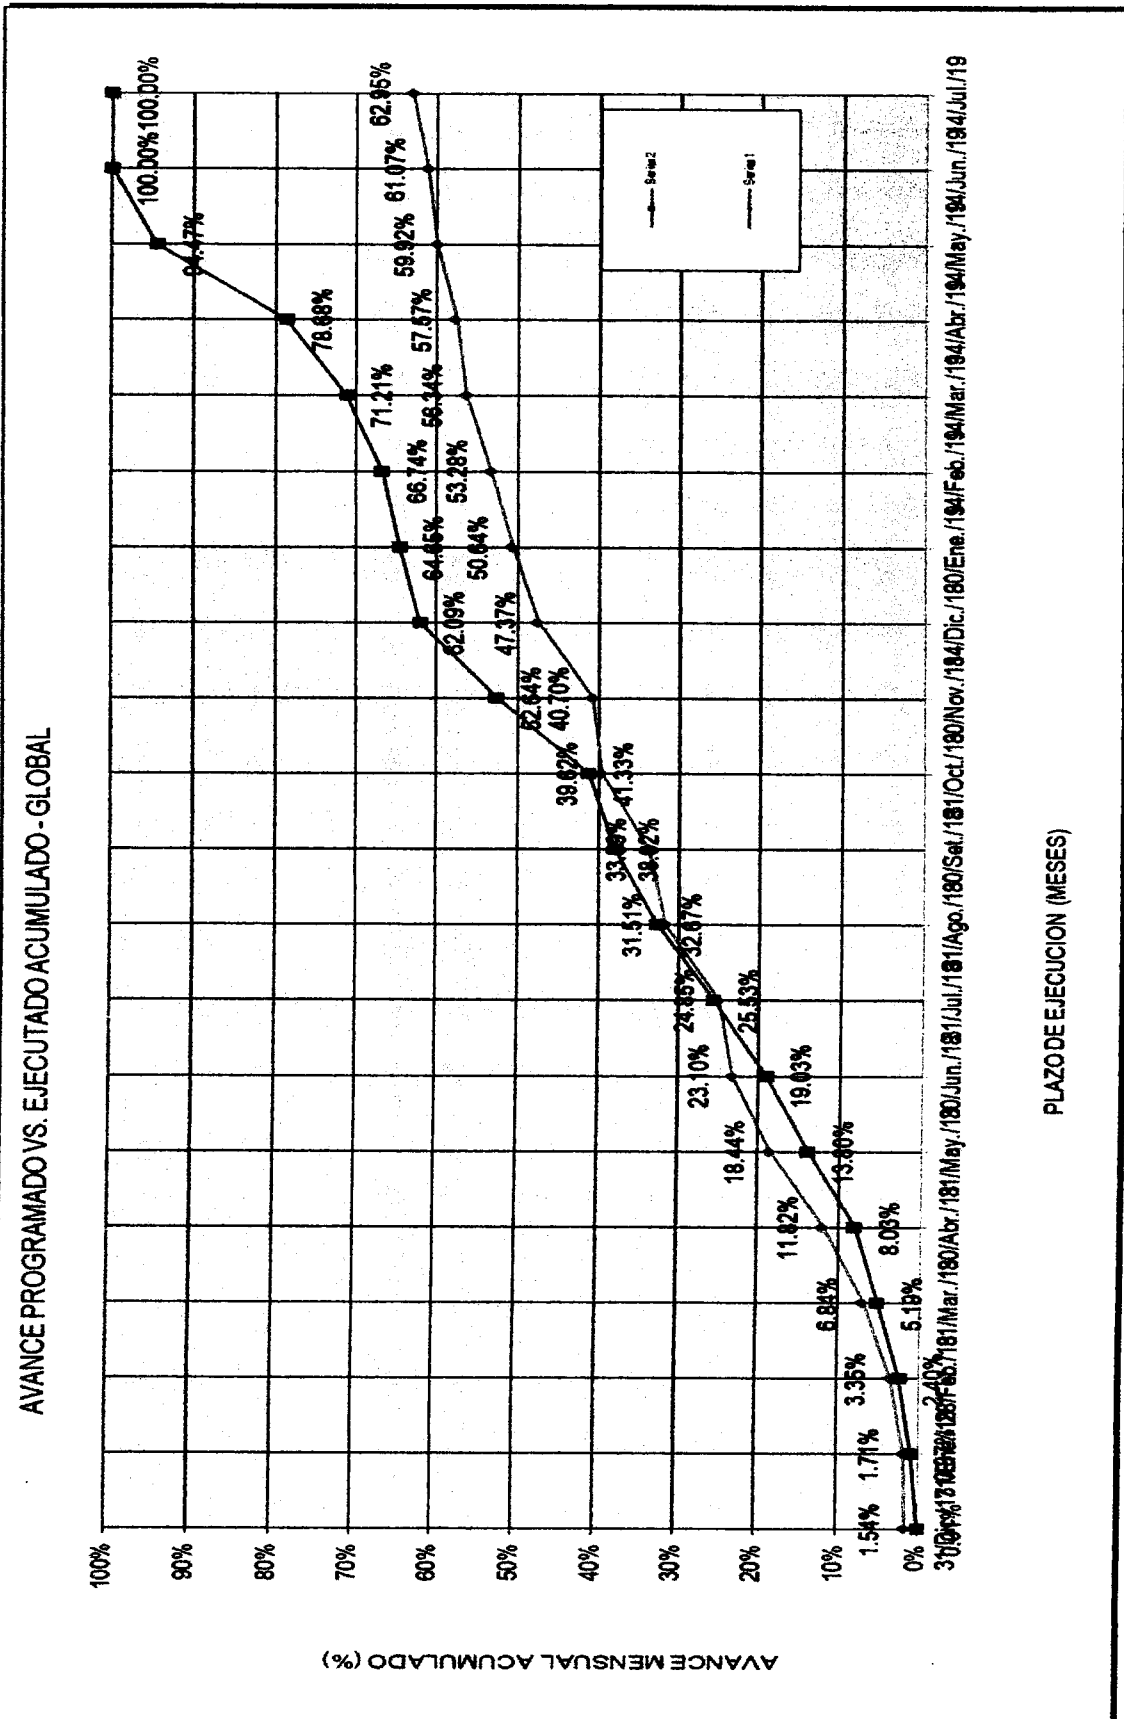

ANEXO 02

Valorización N° 20 – Julio 2019





Acapulco 02 agosto 2019

CZOA 060-2019/ACAPULCO

Señores

CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES.

Acapulco, Dist. Zorritos, Prov. Contralmirante Villar, Región Tumbes

Presente.-

ATN.: ING. RUBÉN O. BOSSÚS TONIATTI

Jefe de Supervisión – DPA Acapulco

REF.: Mejoramiento de los servicios del desembarcadero
pesquero artesanal en la localidad de Acapulco,
distrito de Zorritos Provincia Contralmirante Villar,
Región Tumbes.

AST.: Adjunto Valorización N° 20, de julio 2019.

Estimados Señores,


Por intermedio de la presente nos dirigimos a Uds. a fin de adjuntar al presente documento, nuestra Valorización de Obra N° 20 del mes de julio 2019, correspondiente a la obra en referencia, en original y tres (3) copias, para vuestra revisión, visto y trámite de pago correspondientes.


Documentos que adjuntamos:

- Valorización N° 20 del mes de julio 2019, original y tres (3) copias.
- CD conteniendo archivo digital de la Valorización N° 20.

Sin otro particular, quedamos de ustedes;

Atentamente,


CONSORCIO ZORRITOS
HERNANDO REGALADO OBLITAS
Responsable de DPA


RECIBIDO
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
FECHA: 02/08/19 HORA: 2:00 p.m.


137

CONTRATO DE OBRA N° 054 – 2017 - FONDEPES

EJECUCION DE LA OBRA

**“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA
LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE
ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE
VILLAR, REGIÓN TUMBES**

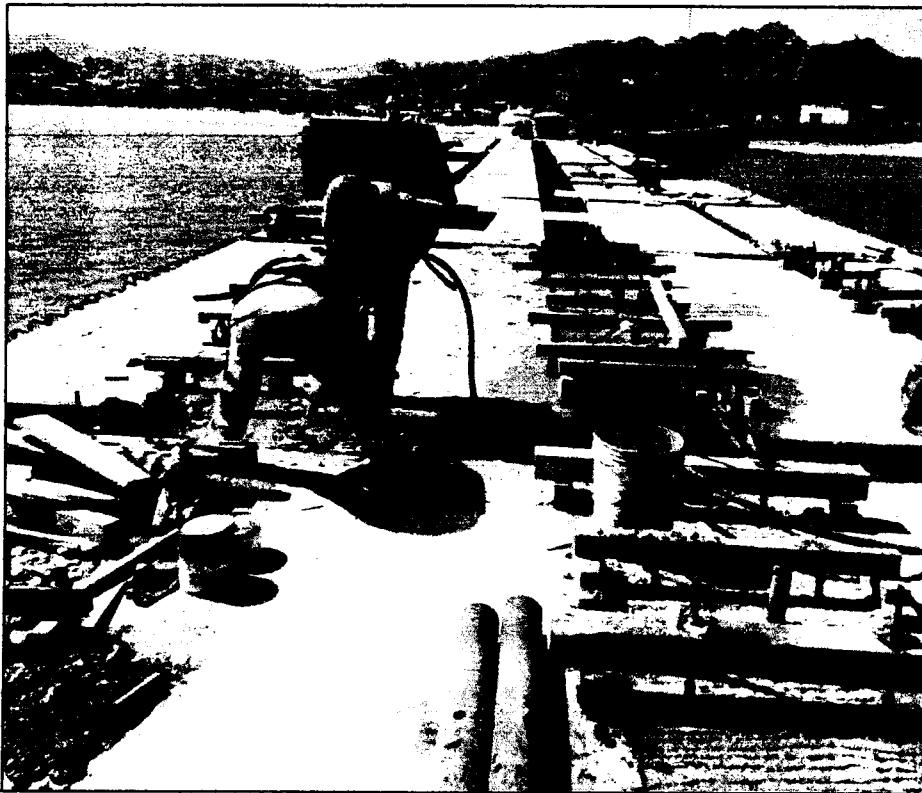

**VALORIZACIÓN
MENSUAL N°20
JULIO 2019**

CONTRATISTA



**CONSORCIO
ZORRITOS**

CONSORCIO ZORRITOS
Edgar Fernando Regalado Obillata
EDGAR FERNANDO REGALADO OBILLATA
Ing. Agrónomo, U.T. 3117

SUPERVISOR

**CONSORCIO SUPERVISOR
TUMBES**

Ruben Rossier Tomatti
ING. RUBEN ROSSIER TOMATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION


RESUMEN DE VALORIZACIÓN




CONSOLIDADO DE VALORIZACION
VALORIZACION DE OBRA N° 20
JULIO - 2019

LICITACION	: LP-SM-5-2017-FONDEPES-1	FECHA DE INICIO DE OBRA	: 28/12/2017
OBRA	: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA DE ACAPULCO	VALORIZACION N°	: 20
PROPIETARIO	: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)	FECHA PRESUPUESTO	: 31/06/2017
CONTRATISTA	: CONSORCIO ZORRITOS	P. REFERENCIAL S.I.G.V	: S/ 12,903,758.02
UBICACION	: ACAPULCO, ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES	P. CONTRATO S.I.G.V.	: S/ 12,903,758.02

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO		VALORIZACION MENSUAL		VALORIZACION ACUMULADA		SALDO	
	SIN IGV	%	MONTO SIN IGV	AVANCE %	MONTO SIN IGV	AVANCE %	MONTO SIN IGV	%
01 ESTRUCTURAS	S/ 5,099,026.93	2.28%	116,407.32	2.28%	4,162,769.90	18.36%	936,257.03	
02 ARQUITECTURA	S/ 2,414,033.62	1.84%	44,333.44	1.84%	967,205.53	59.93%	1,446,828.09	
03 INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 1,115,459.39	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	1,115,459.39	
04 INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 457,810.65	0.00%	0.00	0.00%	47,644.17	89.59%	410,166.48	
05 OBRAS DE MAR	S/ 2,429,958.28	2.51%	61,108.09	2.51%	1,291,813.71	46.84%	1,138,142.57	
06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	S/ 1,387,471.14	0.00%	0.00	0.00%	780,768.24	43.73%	606,702.90	
	S/ 12,903,758.01	1.72%	221,848.85	1.72%	7,250,201.55	43.81%	5,653,556.46	
REAJUSTES Y REINTEGROS DEDUCIDOS (\$)								
01 ESTRUCTURAS			7,932.00		235,382.46			
02 ARQUITECTURA			2,306.31		51,625.64			
03 INSTALACIONES SANITARIAS			0.00		68.77			
04 INSTALACIONES ELECTRICAS			0.00		2,725.33			
05 OBRAS DE MAR			4,314.46		256,268.30			
06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO			0.00		41,934.18			
TOTAL DE REINTEGROS			14,551.77		588,004.68			
VALORIZACION BRUTA (VB = V + S)			236,400.62		7,838,206.23			
AMORTIZACIONES DE ADELANTOS (D)								
AMORTIZACION DE ADELANTO EN EFECTIVO								
01 ESTRUCTURAS	378,414.29	2.28%	8,638.94	2.28%	308,931.81	18.36%	69,482.48	
02 ARQUITECTURA	179,152.78	1.84%	3,290.12	1.84%	71,779.26	59.93%	107,373.52	
03 INSTALACIONES SANITARIAS	82,781.63	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	82,781.63	
04 INSTALACIONES ELECTRICAS	33,975.52	0.00%	0.00	0.00%	2,922.76	91.40%	31,052.76	
05 OBRAS DE MAR	180,334.44	2.51%	4,535.02	2.51%	95,869.43	46.84%	84,465.01	
06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	102,968.45	0.00%	0.00	0.00%	51,734.99	49.76%	51,233.46	
	957,627.11	1.72%	16,464.08	1.72%	531,236.24	44.53%	426,388.87	
AMORTIZACION DE 1ER ADELANTO DE MATERIALES								
01 ESTRUCTURAS	593,220.34	0.00%	0.00	0.00%	593,220.34	0.00%	0.00	
02 ARQUITECTURA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
03 INSTALACIONES SANITARIAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
04 INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
05 OBRAS DE MAR	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
	593,220.34	0.00%	0.00	0.00%	593,220.34	0.00%	0.00	
AMORTIZACION DE 2DO ADELANTO DE MATERIALES								
01 ESTRUCTURAS	250,847.46	0.00%	0.00	0.00%	250,847.46	0.00%	0.00	
02 ARQUITECTURA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
03 INSTALACIONES SANITARIAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
04 INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
05 OBRAS DE MAR	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
	250,847.46	0.00%	0.00	0.00%	250,847.46	0.00%	0.00	
TOTAL AMORTIZACIONES (D)			16,464.08		1,375,308.05		426,388.87	
VALORIZACION NETA (VN = VB - D)			219,936.54		6,462,898.18			
I.G.V. 18 %			39,588.58		1,163,322.03			
Monto a cancelar al Contratista (VN+IGV)			S/ 259,525.12		7,626,220.21			


ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION


CONSORCIO ZORRITOS

ING. FERNANDO REGALADO OBITAS
 Ing Residente de Obra


VALORIZACION N° 20

LICITACION	: LP-34-05-2017-FONDEPES-1	FECHA DE INICIO DE OBRA	: 28-dic-17
OBRA	: REHABILITACIÓN DPA DE ACAPULCO	VALORIZACION N°	: 20
PROPIETARIO	: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)	FECHA PRESUPUESTO	: 30-jun-17
CONTRATISTA	: CONSORCIO ZORRITOS	P. REFERENCIAL S/LG.V	: S/ 12,903,758.02
UBICACIÓN	: LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES	P. CONTRATO S/LG.V.	: S/ 12,903,758.02

RESUMEN - PRESUPUESTO PRINCIPAL

Item	Descripción	Presupuestado	Val. Acum. Anterior		Val. Actual		Val. Acumulada		Saldo por Valorizar	
			parcial S/.	%	parcial S/.	%	parcial S/.	%	parcial S/.	%
001	ESTRUCTURA	4,321,209.27	3,373,413.50	78.07%	98,650.27	2.28%	3,472,063.77	80.35%	849,145.50	19.65%
002	ARQUITECTURA	2,045,791.20	626,236.66	30.61%	37,570.71	1.84%	663,807.37	32.45%	1,381,983.83	67.55%
003	INSTALACIONES SANITARIAS	945,304.57	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	945,304.57	100.00%
004	INSTALACIONES ELECTRICAS	387,975.12	40,376.41	10.41%	0.00	0.00%	40,376.41	10.41%	347,598.71	89.59%
005	OBRAS EN MAR	2,059,284.99	1,011,099.02	49.10%	51,786.51	2.51%	1,062,885.53	51.61%	996,399.46	48.39%
006	EQUIPO Y MOBILIARIO	1,175,823.00	590,775.00	50.24%	0.00	0.00%	590,775.00	50.24%	585,048.00	49.76%
	COSTO DIRECTO	10,935,388.15	5,641,900.59		188,007.49		5,829,908.08		5,105,480.07	
	GASTOS GENERALES 17.90%	1,957,434.48	1,009,900.23		33,653.34		1,043,553.57		913,880.91	
	UTILIDAD 0.10%	10,935.39	5,641.90		188.01		5,829.91		5,105.48	
	SUB TOTAL	12,903,758.02	6,657,442.72		221,848.84		6,879,291.56		6,024,466.46	
	IGV 18.00%	2,322,676.44	1,198,339.69		39,932.79		1,238,272.48		1,084,403.96	
	TOTAL	15,226,434.46	7,855,782.41		261,781.63		8,117,564.04		7,108,870.42	
	AVANCE 100.00%		51.59%		1.72%		53.31%		46.69%	


CONSORCIO ZORRITOS
 INGENIEROS DE PROFESION
 REG. PROF. N° 11411
 C. P. ZORRITOS, TUMBES


ING. RUBEN BOSSI SOTOMAYOR
 SUPERVISOR TUMBES


VALORIZACION N° 20


AJUSTACION : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
 OBRA : REHABILITACIÓN DPA DE ACAPULCO
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACIÓN : LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIENTE VILLAR-TUMBES

FECHA DE INICIO DE OBRA : 28-dic-17
 VALORIZACION N° : 20
 FECHA PRESUPUESTO : 30-jun-17
 P. REFERENCIAL (L.S.V) : \$/ 12,903,758.02
 P. CONTRATO (L.S.V) : \$/ 12,903,758.02

RESUMEN - PRESUPUESTO PRINCIPAL

Item	Descripción	Presupuestado	VAL 01		VAL 02		VAL 03		VAL 04		VAL 05		VAL 06		VAL 07		VAL 08		VAL 09		VAL 10	
			parcial \$/.	%	parcial \$/.	%	parcial \$/.	%	parcial \$/.	%	parcial \$/.	%	parcial \$/.	%	parcial \$/.	%	parcial \$/.	%	parcial \$/.	%	parcial \$/.	%
001	ESTRUCTURA	4,321,209.27	14,355.70	3.27%	20,029.59	0.46%	196,505.87	4.55%	390,591.24	8.81%	451,107.70	10.49%	562,361.15	13.01%	454,908.85	10.53%	128,988.76	2.98%	85,054.65	1.97%	208,890.58	4.83%
002	ARQUITECTURA	2,045,791.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	34,684.85	0.82%	11,948.75	0.58%	36,291.90	1.77%	50,951.88	2.49%	21,443.88	1.05%	38,717.31	1.89%
003	INSTALACIONES SANITARIAS	945,304.57	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,673.60	0.28%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5,809.28	0.61%
004	INSTALACIONES ELECTRICAS	387,975.12	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.30	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	22,952.51	5.92%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,495.20	0.90%
005	OBRAS EN MAR	2,050,284.99	4,420.73	2.16%	0.00	0.00%	6,594.27	0.32%	49,888.68	2.42%	146,101.14	7.09%	173,760.21	8.44%	84,096.48	4.08%	36,966.51	1.80%	124,679.08	6.05%	0.00	0.00%
006	EQUIPO Y MOBILIARIO	1,175,823.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.80	0.00%	590,775.00	50.24%	0.00	0.00%
COSTO DIRECTO		10,935,388.15	19,776.43		20,029.59		203,100.14		430,480.12		615,893.69		773,654.32		175,297.23		216,885.67		821,952.61		256,912.36	
GASTOS GENERALES 17.90%		1,957,434.48	36,148.98		3,585.30		36,354.93		77,055.94		110,244.97		138,451.23		101,978.21		18,822.71		147,129.52		45,987.31	
UTILIDAD 0.10%		10,935.39	190.78		20.03		208.10		430.48		615.89		773.69		175.29		216.89		821.95		256.91	
SUB TOTAL		12,903,758.02	228,116.19		23,634.92		239,658.17		507,966.54		726,754.56		912,958.94		678,850.74		255,926.27		969,904.07		303,156.59	
IGV 18.00%		2,322,676.44	41,520.91		4,254.28		43,138.47		91,433.98		130,815.82		164,332.61		122,193.13		46,086.73		174,587.73		54,568.19	
TOTAL		15,226,434.46	269,637.10		27,889.20		282,796.64		599,400.52		857,570.38		1,077,291.55		801,043.87		302,013.00		1,144,491.80		357,724.78	
AVANCE 100.00%			1.74%		0.18%		1.86%		3.94%		5.63%		7.08%		5.26%		1.98%		7.52%		2.35%	


 ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 OFICINA DE SUPERVISIÓN


CONSORCIO ZORRITOS

 OSCAR FERNANDO REGALADO OBATAS
 Ing. Registrado de OMA


VALORIZACION N° 20

LICITACION	LP-5M-05-2017-FONDEPES-1	FECHA DE INICIO DE OBRA	18-dic-17
OBRA	REHABILITACION DPA DE ACAPULCO	VALORIZACION N°	20
PROPIETARIO	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)	FECHA PRESUPUESTO	30-Jun-17
CONTRATISTA	CONSORCIO ZORRITOS	P. REFERENCIAL S/I & V	S/ 12,903,758.02
UBICACION	LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIANTE VILLAR-TUMBES	P. CONTRATO S/I & V	S/ 12,903,758.02

RESUMEN - PRESUPUESTO PRINCIPAL

VAL 11		VAL 12		VAL 13		VAL 14		VAL 15		VAL 16		VAL 17		VAL 18		VAL 19		VAL 20		Va. Acumulada		Saldo por Valorizar	
parcial S/.	%	parcial S/.	%	parcial S/.	%	parcial S/.	%	parcial S/.	%	parcial S/.	%	parcial S/.	%	parcial S/.	%	parcial S/.	%	parcial S/.	%	parcial S/.	%	parcial S/.	%
162,923.63	3.77%	97,020.21	2.25%	343,394.74	7.95%	67,752.69	1.57%	55,707.34	1.29%	29,259.78	0.68%	10,716.15	0.25%	13,915.32	0.32%	16,657.38	0.39%	98,650.27	2.28%	3,527,721.10	81.64%	793,438.17	18.36%
71,624.86	3.50%	0.00	0.00%	59,228.96	2.90%	99,029.99	4.84%	355,858.33	7.62%	92,423.87	4.52%	16,594.41	0.81%	52,900.04	2.59%	58,398.56	2.85%	37,570.71	1.84%	819,548.71	40.07%	1,226,125.49	59.93%
7,673.19	0.81%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-16,156.07	-1.71%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	945,304.57	100.00%
6,927.98	1.79%	7,000.72	1.80%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	40,375.41	10.41%	347,598.71	89.59%
54,852.50	2.66%	0.00	0.00%	24,650.44	1.20%	7,739.98	0.38%	31,871.85	1.55%	43,775.98	2.13%	71,525.58	3.47%	95,987.92	4.66%	41,079.47	1.95%	51,786.51	2.51%	1,094,757.39	53.16%	964,527.80	66.84%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	70,893.00	6.03%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	661,668.00	56.27%	514,155.00	43.73%
304,002.16		104,020.93		427,274.20		174,522.06		314,330.52		165,459.83		98,836.14		146,627.20		116,135.41		188,007.49		6,144,219.41		4,791,149.54	
54,416.39		18,619.75		76,482.08		31,239.45		56,265.16		29,617.27		17,693.67		26,246.27		20,788.24		33,653.34		1,099,819.72		857,615.76	
304.00		104.02		427.27		31.24		314.33		165.46		98.84		146.63		116.14		188.71		6,000.96		4,934.43	
358,722.55		122,744.70		504,183.57		205,792.75		370,910.02		195,242.36		114,626.65		173,020.10		137,099.78		221,848.34		7,250,023.28		5,653,699.74	
64,570.06		22,094.05		90,753.04		37,042.69		66,763.80		35,143.52		20,982.80		31,143.62		24,667.16		39,932.79		1,305,013.49		1,017,665.95	
423,292.61		144,838.75		594,936.57		242,835.44		437,673.82		230,385.39		137,615.46		204,163.73		161,708.95		261,781.54		8,555,063.77		6,671,365.69	
2.78%		0.95%		3.91%		1.59%		2.87%		1.51%		0.90%		1.34%		1.06%		1.72%		56.19%		43.81%	


ING RUBEN POSISTONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISOR

CONSORCIO ZORRITOS

GAB. FERNANDO REGALADO OBITAS
 JEFE RESPONSABLE DE OBRA

VALORIZACIÓN N° 20 DEL PRESUPUESTO ESTRUCTURAS



VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS

LICITACION LP-SM-05-2017-FOUDEPES-1
 OBRA REHABILITACION DPA DE ACAPULCO
 FORMULA 01 ESTRUCTURAS
 PROPIETARIO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACION LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLALBA-TLUMBES

FECHA DE INICIO DE OBRA 28-dic-17
 VALORIZACION N° 20
 FECHA PRESUPUESTO 30-jun-17
 P. REFERENCIAL S.R.L.V Si: 12.903.758.02
 P. CONTRATO S.R.L.V Si: 12.903.758.02

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UNE	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR			VARIACION ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			BALDO CONTRACTUAL		
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%
01.05	GOBIERNO DE TIERRAS																
01.05.01	EXCAVACION DE ESTRUCTURAS PARA CIMENTACION	m³	3,135.25	36.05	110,942.31	2,077.34	72829.16	65.66	741.73	25,969.48	23.44	2,819.07	98,911.85	89.09	345.85	12114.36	10.82
01.05.02	CORTE MASIVO DE TERRENO A MAQUINA	m³	2,157.86	7.85	16,977.13	2,167.95	16737.13	100.00		0.00		2,167.95	16,737.13	100.00	0.00	0	0
01.05.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m³	2,362.49	49.41	118,730.85	2,362.49	118,730.85	100.00		0.00		2,362.49	118,730.85	100.00	0.00	0	0
01.05.04	ACARRIO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m³	5,253.11	14.2	78,074.16	5,253.11	78,074.16	100.00		0.00		5,253.11	78,074.16	100.00	0.00	0	0
01.05.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CAMAQUINA	m³	3,089.50	24.87	96,777.20	3,089.50	96,777.20	99.82		0.00		3,089.50	96,777.20	99.82	7.16	178.07	0.16
01.05.06	AFIRMADO H=0.15 M. EN INTERIORES	m²	732.69	22.87	40,372.77	732.69	40,372.77	100.00		0.00		732.69	40,372.77	100.00	0.00	0	0
01.05.07	AFIRMADO H=0.30	m²	2,630.82	24.76	64,968.30	2,630.82	64,968.30	100.00		0.00		2,630.82	64,968.30	100.00	0.00	0	0
01.06	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE																
01.06.01	SOLADOS																
01.06.01.01	SOLADO CONCRETO f=100 kg/cm² H=4"	m²	438.20	31.89	15,767.86	438.20	15,767.86	100.00		0.00		438.20	15,767.86	100.00	0.00	0	0
01.06.02	CIMENTOS CICLOPEOS																
01.06.02.01	CONCRETO f=140 kg/cm² + 30% PIEDRA GRANDE CIMENTOS CORRIDOS	m³	1,000.82	275.87	275,866.38	1,000.82	275,866.38	100.00		0.00		1,000.82	275,866.38	100.00	0.00	0	0
01.06.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTOS	m²	12.54	41.72	522.36	12.54	522.36	100.00		0.00		12.54	522.36	100.00	0.00	0	0
01.06.03	SOBRECIMIENTO CICLOPEO																
01.06.03.01	CONCRETO f=140 kg/cm² + 25% PIEDRA MEDIANA PARA	m³	2.83	336.81	952.37	2.83	952.37	100.00		0.00		2.83	952.37	100.00	0.00	0	0
01.06.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO	m²	9.71	46.99	456.27	9.71	456.27	100.00		0.00		9.71	456.27	100.00	0.00	0	0
01.07	OBRAS DE CONCRETO ARMADO																
01.07.01	ZAPATAS																
01.07.01.01	ZAPATA CONCRETO f=315 kg/cm²	m³	438.20	572.09	250,944.16	438.20	250,944.16	100.00		0.00		438.20	250,944.16	100.00	0.00	0	0
01.07.01.02	ZAPATA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m²	1,000.82	62.42	62,420.54	1,000.82	62,420.54	100.00		0.00		1,000.82	62,420.54	100.00	0.00	0	0
01.07.01.03	ZAPATA ACERO fy=4200 kg/cm²	kg	34,979.87	4.18	146,212.36	34,979.87	146,212.36	100.00		0.00		34,979.87	146,212.36	100.00	0.00	0	0
01.07.02	SOBRECIMIENTO																
01.07.02.01	SOBRECIMIENTO ARMADO CONCRETO f=315 kg/cm²	m³	132.23	618.85	81,846.36	132.23	81,846.36	100.00		0.00		132.23	81,846.36	100.00	0.00	0	0
01.07.02.02	SOBRECIMIENTO ARMADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m²	1,138.78	44.85	51,078.33	1,138.78	51,078.33	100.00		0.00		1,138.78	51,078.33	100.00	0.00	0	0
01.07.02.03	SOBRECIMIENTO ARMADO ACERO fy=4200 kg/cm²	kg	23,307.48	4.18	97,428.27	23,307.48	97,428.27	100.00		0.00		23,307.48	97,428.27	100.00	0.00	0	0
01.07.03	COLUMNAS																
01.07.03.01	COLUMNA CONCRETO f=315 kg/cm²	m³	338.44	625.58	211,741.37	338.44	211,741.37	100.00		0.00		338.44	211,741.37	100.00	0.00	0	0
01.07.03.02	COLUMNA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m²	1,330.53	58.95	178,626.58	1,330.53	178,626.58	100.00		0.00		1,330.53	178,626.58	100.00	0.00	0	0
01.07.03.03	COLUMNA ACERO fy=4200 kg/cm²	kg	85,135.97	4.18	357,572.45	85,135.97	357,572.45	100.00		0.00		85,135.97	357,572.45	100.00	0.00	0	0
01.07.04	VGAS DE CIMENTACION																
01.07.04.01	VGAS DE CIMENTACION CONCRETO f=315 kg/cm²	m³	30.4	577.27	17,539.12	30.4	17,539.12	100.00		0.00		30.4	17,539.12	100.00	0.00	0	0
01.07.04.02	VGAS DE CIMENTACION ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m²	392.76	42.65	16,769.30	392.76	16,769.30	100.00		0.00		392.76	16,769.30	100.00	0.00	0	0
01.07.04.03	VGAS DE CIMENTACION ACERO fy=4200 kg/cm²	kg	8,300.29	4.18	34,495.15	8,300.29	34,495.15	100.00		0.00		8,300.29	34,495.15	100.00	0.00	0	0
01.07.05	VGAS																
01.07.05.01	VGAS CONCRETO f=210 kg/cm²	m³	27.36	822.37	22,500.19	27.36	22,500.19	100.00		0.00		27.36	22,500.19	100.00	0.00	0	0
01.07.05.02	VGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m²	1,304.27	57.6	75,205.85	1,304.27	75,205.85	100.00		0.00		1,304.27	75,205.85	100.00	0.00	0	0
01.07.05.03	VGAS ACERO fy=4200 kg/cm²	kg	38,387.47	4.18	160,459.54	38,387.47	160,459.54	100.00		0.00		38,387.47	160,459.54	100.00	0.00	0	0
01.07.06	MUROS DE CONTENCIÓN PLACAS Y MUROS CORTA FUEGOS																
01.07.06.01	MURO DE CONCRETO f=315 kg/cm²	m³	68.81	633.27	43,595.17	68.81	43,595.17	100.00		0.00		68.81	43,595.17	100.00	0.00	0	0
01.07.06.02	MURO DE CONCRETO f=300 kg/cm²	m³	39.25	682.93	26,802.00	39.25	26,802.00	100.00		0.00		39.25	26,802.00	100.00	0.00	0	0
01.07.06.03	MURO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m²	301.56	66.9	20,175.04	301.56	20,175.04	100.00		0.00		301.56	20,175.04	100.00	0.00	0	0
01.07.06.04	MURO ACERO fy=4200 kg/cm²	kg	11,482.54	4.18	47,796.82	11,482.54	47,796.82	100.00		0.00		11,482.54	47,796.82	100.00	0.00	0	0
01.07.07	LOSAS ALIGERADAS																
01.07.07.01	LOSA ALIGERADA CONCRETO f=210 kg/cm²	m³	139.47	473.01	65,973.70	139.47	65,973.70	100.00		0.00		139.47	65,973.70	100.00	0.00	0	0
01.07.07.02	LOSA ALIGERADA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m²	1,927.71	45.54	87,800.85	1,927.71	87,800.85	100.00		0.00		1,927.71	87,800.85	100.00	0.00	0	0
01.07.07.03	LOSA ALIGERADA ACERO fy=4200 kg/cm²	kg	8,389.72	4.18	34,780.83	8,389.72	34,780.83	100.00		0.00		8,389.72	34,780.83	100.00	0.00	0	0
01.07.07.04	LOSA ALIGERADA LADRILLO HUECO 15x30x30	m³	13,295.82	3.27	43,477.34	13,295.82	43,477.34	100.00		0.00		13,295.82	43,477.34	100.00	0.00	0	0

**VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS**

LICITACION : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
OBRA : REHABILITACION IPA DE ACAPULCO
FORMULA : 01 ESTRUCTURAS
PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
UBICACION : LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIANTE VILLAR-TUMBES

FECHA DE INICIO DE OBRA : 28-dic-17
VALORIZACION N° : 20
FECHA PRESUPUESTO : 30-jun-17
P. REFERENCIAL S.I.G.V : S/ 12,903,756.02
P. CONTRATO S.I.G.V. : S/ 12,903,756.02

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UNO	PRESUPUESTO CONTRACTADO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			SALDO CONTRACTUAL		
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%
01	ESTRUCTURAS																
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES																
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES																
01.01.01.01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	4,762.54	17	81,483.24	4,762.54	8143.54	100.00		0.00		4,762.54	81,483.24	100.00	0.00		0
01.01.01.02	ALMACEN, OFICINA Y CASITA DE GUARDIANA	m2	80.30	82.54	6,628.22	80.00	6,603.20	100.00		0.00		80.30	6,603.20	100.00	0.00		0
01.01.01.03	CARTEL DE OBRA 2.40 x 3.00 m	m2	1.00	1,445.66	1,445.66	1.00	1,445.66	100.00		0.00		1.00	1,445.66	100.00	0.00		0
01.01.01.04	CERCO DE MALLA BASHELL CON MADERA ROLLIZO	m	251.42	15.66	3,934.72	251.42	3,934.72	100.00		0.00		251.42	3,934.72	100.00	0.00		0
01.01.01.05	BAÑOS QUIMICOS PARA EL PERSONAL	m3	10.00	175	1,750.00	10.00	1,750.00	100.00		0.00		10.00	1,750.00	100.00	0.00		0
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES																
01.01.02.01	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	m3	10.00	800	8,000.00	10.00	8,000.00	100.00		0.00		10.00	8,000.00	100.00	0.00		0
01.01.02.02	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	m3	10.00	1,000	10,000.00	10.00	10,000.00	100.00		0.00		10.00	10,000.00	100.00	0.00		0
01.01.02.03	TANQUE ALMACENAMIENTO PROVISIONAL DE AGUA PARA LA OBRA	m3	2.00	1,629.22	3,258.44	2.00	3,258.44	100.00		0.00		2.00	3,258.44	100.00	0.00		0
01.01.03	MOVILIZACION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS																
01.01.03.01	TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	gr	1.00	1,300	13,000.00	0.95	12,350.00	95.00		0.00		0.95	12,350.00	95.00	0.05	650	5.00
01.01.03.02	FLETE TERRESTRE	gr	1.00	97,300	97,300.00	0.98	96,675.00	97.50		0.00		0.98	96,675.00	97.50	0.03	2,432.5	2.50
01.02	SEGURIDAD Y SALUD																
01.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE	j	1.00	11,350	11,350.00	0.96	10,820.00	95.00		0.30		0.96	10,820.00	95.00	0.10	1,135	10.00
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	j	1.00	1,330	1,330.00	0.96	1,150.00	90.00		0.30		0.96	1,150.00	90.00	0.10	133	10.00
01.02.03	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	j	1.00	12,067	12,067.00	0.96	10,860.00	90.00		0.30		0.96	10,860.00	90.00	0.10	1,207	10.00
01.02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	j	1.00	1,310	1,310.00	1.00	1,310.00	100.00		0.30		1.00	1,310.00	100.00	0.00		0
01.02.05	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	j	1.00	2,100	2,100.00	0.95	1,995.00	95.00		0.30		0.95	1,995.00	95.00	0.05	105	5.00
01.03	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																
01.03.01	RIEGO DEL AREA DE TRABAJO	m2	4,762.54	2.00	9,525.08	4,762.54	9,525.08	100.00		0.30		4,762.54	9,525.08	100.00	0.00		0
01.03.02	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	m2	4,762.54	0.7	3,333.78	4,762.54	3,333.78	100.00		0.30		4,762.54	3,333.78	100.00	0.00		0
01.03.03	PLAN DE CONTINGENCIA	u	1.00	5,000	5,000.00	0.90	4,500.00	90.00		0.05		0.90	4,500.00	90.00	0.10	500	10.00
01.03.04	PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	u	1.00	5,000	5,000.00	0.90	4,500.00	90.00		0.05		0.90	4,500.00	90.00	0.10	500	10.00
01.03.05	PLAN DE CIERRE Y ABANDONO	u	1.00	3,500	3,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	1.00	3,500	100.00
01.03.06	MEDIDAS DE CONCIENTIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL	u	1.00	2,450	2,450.00	1.00	2,450.00	100.00		0.00		1.00	2,450.00	100.00	0.00		0
01.03.07	CARTEL DE MANEJO AMBIENTAL DE 1.00 X 0.50m	u	8.00	153	1,224.00	8.00	1,224.00	100.00		0.00		8.00	1,224.00	100.00	0.00		0
01.03.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR DE BASURA	u	10.00	300	3,000.00	10.00	3,000.00	100.00		0.00		10.00	3,000.00	100.00	0.00		0
01.04	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO																
01.04.01	DEMOLICION DE CEMENTO Y SOBRECIMENTOS	m3	272.85	125.55	34,298.32	272.85	34,298.32	100.00		0.00		272.85	34,298.32	100.00	0.00		0
01.04.02	DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA INC. COLUMNAS Y VIGAS	m3	353.10	14.29	5,045.80	353.10	5,045.80	100.00		0.00		353.10	5,045.80	100.00	0.00		0
01.04.03	DEMOLICION DE TECHOS DE CONCRETO	m3	122.49	14.29	1,750.38	122.49	1,750.38	100.00		0.00		122.49	1,750.38	100.00	0.00		0
01.04.04	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m2	303.05	7.57	2,294.09	303.05	2,294.09	100.00		0.00		303.05	2,294.09	100.00	0.00		0
01.04.05	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	m	12.00	52.44	629.28	12.00	629.28	100.00		0.00		12.00	629.28	100.00	0.00		0
01.04.06	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA	m2	80.81	26.08	2,107.41	80.81	2,107.41	100.00		0.00		80.81	2,107.41	100.00	0.00		0
01.04.07	DESMONTAJE DE VENTANAS	m2	20.72	23.21	480.91	20.72	480.91	100.00		0.00		20.72	480.91	100.00	0.00		0
01.04.08	RETIRO DE POSTES DE ALUMBRADO	j	10.00	154.26	1,542.60	10.00	1,542.60	100.00		0.00		10.00	1,542.60	100.00	0.00		0
01.04.09	RETIRO DE SUBSTACION ELECTRICA	j	1.00	1,196	1,196.00	1.00	1,196.00	100.00		0.00		1.00	1,196.00	100.00	0.00		0
01.04.10	RETIRO DE EQUIPAMIENTO DE FRIO	gr	1.00	359.15	359.15	1.00	359.15	100.00		0.00		1.00	359.15	100.00	0.00		0

CONSORCIO ZORRITOS
 CONSORCIO ZORRITOS S.R.L.
 ROLANDO GALLO COBITAR
 GERENTE DE OBRA

RODOLFO BOSSUIS TERRATI
 GERENTE SUPERVISOR TRABAJO
 SUPERVISOR

VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS

UBICACION: LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
OBRA: REHABILITACION SPA DE ACAPULCO
FORMULA: 01 ESTRUCTURAS
PROPIETARIO: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONTRATISTA: CONSORCIO ZORRITOS
UBICACION: LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIANTE VILLAR-TUMBES

FECHA DE INICIO DE OBRA: 28-dic-17
VALORIZACION N°: 20
FECHA PRESUPUESTO: 30-jun-17
P. REFERENCIAL B.I.G.V.: S/ 12,903,758.02
P. CONTRATO S.I.G.V.: S/ 12,903,758.02

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UNID	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			SALDO CONTRACTUAL		
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%
01.07.00	ESCALERAS																
01.07.08.01	ESCALERAS, CONCRETO f _c =210 kg/cm ²	m ³	4.86	533.26	2,591.64	4.86	2591.64	100.00		0.00		4.86	2,591.64	100.00	0.00		0
01.07.08.02	ESCALERAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m ²	36.02	58.95	2,123.36	28.93	1587.67	74.77		0.00		28.93	1,587.67	74.77	9.38	535.71	25.23
01.07.08.03	ESCALERAS, ACERO f _y =4200 kg/cm ²	kg	253.32	4.18	1,184.26	253.32	1184.26	100.00		0.00		253.32	1,184.26	100.00	0.00		0
01.07.00	LOSAS MACIZAS																
01.07.08.01	LOSAS MACIZAS CONCRETO f _c =210 kg/cm ²	m ³	80.18	501.84	40,227.48	80.18	40226.51	100.00		0.00		80.18	40,226.51	100.00	0.00	0.98	0.00
01.07.08.02	LOSAS MACIZAS CONCRETO f _c =350 kg/cm ²	m ³	24.08	595.52	14,346.08	24.08	14346.08	100.00		0.00		24.08	14,346.08	100.00	0.00		0
01.07.08.03	LOSAS MACIZAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m ²	548.78	52.61	28,823.93	548.78	28823.93	100.00		0.00		548.78	28,823.93	100.00	0.00		0
01.07.08.04	LOSAS MACIZAS, ACERO DE REFUERZO f _y =4200 kg/cm ²	kg	13,480.75	4.18	56,265.94	12,845.45	53883.96	95.43		0.00		12,845.45	53,883.99	95.43	635.30	2571.94	4.57
01.07.10	LOSAS SOBRE EL PISO																
01.07.10.01	LOSA DE CONCRETO f _c =315 kg/cm ²	m ³	194.26	522.74	85,885.27	65.93	34886.98	40.75		0.00		65.93	34,886.98	40.75	57.33	50878.28	59.25
01.07.10.02	LOSA DE CONCRETO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m ²	546.87	42.95	23,488.07	24.92	1070.31	4.56		0.00		24.92	1,070.31	4.56	521.95	22417.75	95.44
01.07.10.03	LOSA DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO f _y =4200 kg/cm ²	kg	21,326.08	4.18	130,955.55	7,167.77	29981.28	22.88		0.00		7,167.77	29,981.28	22.88	24,161.31	100884.28	77.12
01.07.10.04	JUNTA DE DILATACION CON TECNOPORT E+1"	m	838.75	5.58	4,683.45	236.21	1329.98	28.52	115.20	646.51	13.73	354.41	1,970.51	42.25	464.34	2652.94	57.75
01.08	JUNTAS																
01.08.01	JUNTAS DE EXPANSION	m	748.85	8.91	6,681.15	0.00	0	0.00		0.00		0.00			748.85	6581.19	100.00
01.08.02	JUNTAS DE CONTRACCION	m	817.49	9.84	8,044.10	670.36	6568.34	82.00		0.00		670.36	6,568.34	82.00	147.13	1447.76	18.00
01.08.03	JUNTAS DE DILATACION	m	678.75	28.07	24,086.51	0.00	0	0.00		0.00		0.00			678.75	24886.51	100.00
01.09	PAVIMENTO DE ALTA RESISTENCIA																
01.09.01	LOSA DE CONCRETO f _c =315 kg/cm ² CON DRAMIX	m ³	380.12	726.1	283,286.13	0.00	0	0.00		0.00		0.00			380.12	283286.13	100.00
01.09.02	LOSA DE CONCRETO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m ²	153.04	42.95	6,573.07	0.00	0	0.00		0.00		0.00			153.04	6573.07	100.00
01.10	ESTRUCTURA METALICA EN ZONA DE RECEPCION DE ALIMENTOS																
01.10.01	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	kg	5,186.34	10.6	54,127.20	0.00	0	0.00		0.00		0.00			5,186.34	54127.2	100.00
01.10.02	PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE ARMADO	m ²	104.78	29.05	3,043.28	0.00	0	0.00		0.00		0.00			104.78	3043.28	100.00
01.11	OTROS																
01.11.01	JUNTAS FRIAS CON WATER STOP	m	54.10	15.54	840.71	54.10	840.71	100.00		0.00		54.10	840.71	100.00	0.00		0
01.11.02	ESCALERA VERTICAL PASOS DE FIERRO LIBO DE 1" HASTA 1 1/2" (3M)	pza	3.00	976.62	2,929.86	0.00	0	0.00		0.00		0.00			3.00	2929.86	100.00
01.11.03	INSERTOS EN CONCRETO PRISIONERO NELSON H4L 1/2"x125MM Y L2X2	m	201.90	34.27	6,919.11	0.00	0	0.00		0.00		0.00			201.90	6919.11	100.00
01.11.04	ANCLAJE POST INSTALADO CON prof. de 120mm tipo HT-4" 200-A - HT-V-F	pza	80.00	86.63	7,170.40	0.00	0	0.00		0.00		0.00			80.00	7170.4	100.00
COSTO DIRECTO					4,321,208.27		3,429,120.62			96,650.27			3,527,771.08			793,436.20	
GASTOS GENERALES			%	17.90%	773,498.48		613,912.62			17,658.40			631,471.02			142,025.44	
UTILIDAD			%	0.10%	4,321.21		3,429.13			98.66			3,527.78			793.43	
SUB-TOTAL					5,099,026.93		4,046,362.58			115,407.32			4,162,769.90			836,257.03	
IGV				18.00	917,824.85		728,345.25			20,953.32			746,298.58			168,526.27	
TOTAL					6,016,851.78		4,774,707.84			137,360.64			4,912,068.48			1,004,783.30	
AVANCE			%		100%		79.38%			2.28%			81.64%			18.38%	

ALLEN BOSCHONIATTI
 JEFE SUPERVISOR TUMBES
 DE SUPERVISOR

CONSORCIO ZORRITOS
 CONSORCIO ZORRITOS
 CONSORCIO ZORRITOS

VALORIZACIÓN N° 20 DEL PRESUPUESTO ARQUITECTURA



VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 02 : ARQUITECTURA

LICITACION: LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
 OBRA: REHABILITACIÓN ZPA DE ACAPULCO
 FORMULA: 02 ARQUITECTURA
 PROPIETARIO: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA: CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACIÓN: LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMARANTE VILLAR TUMBES

FECHA DE INICIO DE OBRA: 28-dic-17
 VALORIZACION N°: 20
 FECHA PRESUPUESTO: 30-jun-17
 P. REFERENCIAL S.I.B.V.: S/ 12.903.758.02
 P. CONTRATO S.I.B.V.: S/ 12.903.758.02

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UMD	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			BALDO CONTRACTUAL		
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%
02.08.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON NUCLEO DE POLIESTIRENO	u	8.00	5294.03	42,352.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	42,352.24	100.00
02.08.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON NUCLEO DE POLIESTIRENO	u	2.00	5694.03	1,388.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,388.08	100.00
02.08.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON NUCLEO DE POLIESTIRENO	u	5.00	6294.03	31,470.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	31,470.15	100.00
02.08.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA INGRESO PEATONAL PM - 05	u	1.00	3742.83	3,742.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,742.83	100.00
02.08.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON NUCLEO DE POLIESTIRENO	u	1.00	7494.03	7,494.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,494.03	100.00
02.08.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA INGRESO VEHICULAR PM - 07	u	1.00	13667.24	13,667.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13,667.24	100.00
02.08.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA PRINCIPAL DE ACCESO AL	u	1.00	8667.24	8,667.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,667.24	100.00
02.08.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA SECUNDARIA DE ACCESO AL MUELLE PM -	u	1.00	5667.24	5,667.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,667.24	100.00
02.08.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA VAIVEN ALTO IMPACTO 1.80 x 2.40 (INC	u	8.00	10000	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	80,000.00	100.00
02.08.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DOBLE DE ALTO IMPACTO .80 x 2.20 (INC	u	8.00	11400	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	91,200.00	100.00
02.08.11	BARANDA DE ACERO INOXIDABLE (Ver planos de detalles)	m	13.50	219.96	2,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	2,969.48	100.00
02.08.12	PASAMANO DE ACERO INOXIDABLE (Ver planos de detalles)	m	70.00	108.93	7,625.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	7,625.10	100.00
02.08.13	TAPA METÁLICA CON PLANCHA DE FIERRO EN CISTERNA, INC. TIRADOR, CANDADO Y	u	2.00	380.36	720.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	720.72	100.00
02.09	CARPINTERIA DE ALUMINIO, VIDRIOS, CRISTALES Y BISILARES																
02.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SECCIONABLE 2.70 x 3.15 m	u	9.00	5618.15	50,563.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	50,563.35	100.00
02.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ENROLLABLE 1.80 x 1.80 m	u	1.00	2572.27	2,572.27	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,572.27	100.00
02.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ENROLLABLE 1.95 x 1.95 m	u	3.00	2822.27	20,978.16	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	20,978.16	100.00
02.09.04	VENTANA DE ALUMINIO SEMIPESADO DE COLOR NATURAL CON VIDRIO INCOLORO	m2	252.13	218	54,964.34	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.13	54,964.34	100.00
02.09.05	MALLA RASHEL EN MARCO DE ALUMINIO SEMIPESADO	m2	158.25	118.07	18,684.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.25	18,684.58	100.00
02.09.06	MAMPARA CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRO TEMPLADO DE 10mm	m2	4.32	353.8	1,528.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	1,528.42	100.00
02.09.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO EMPOTRADO EN PARED (n=3mm)	m2	30.24	157.77	5,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.24	5,073.36	100.00
02.10	CERRAJERIA																
02.10.01	CERRADURA DOS GOLPES CON TIRADOR EN PUERTA MACHIMBRADA	u	1.00	75.84	1,061.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,061.76	100.00
02.10.02	CERRADURA DE PERILLA EN PUERTAS MACHIMBRADA	u	1.00	57.94	637.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	637.34	100.00
02.10.03	BIENAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" x 3 1/2"	u	69.00	22.08	1,523.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	1,523.52	100.00
02.11	PINTURA																
02.11.01	PINTURA EN MUROS EXTERIORES Y CERCO PERIMETRICO CON LÁTEX	m2	2,073.27	13.15	27,263.50	208.89	2,744.27	10.07	82.07	1,079.19	3.96	290.76	3,823.46	14.02	1,782.51	23,440.04	85.98
02.11.02	PINTURA EN MUROS INTERIORES CON LÁTEX	m2	867.10	11.15	10,002.67	183.31	2,343.82	20.43	179.06	1,998.78	9.26	362.39	4,040.86	40.40	534.71	5,981.98	59.60
02.11.03	PINTURA ENCOLUMNAS CON LÁTEX	m2	576.28	11.15	6,425.52	96.94	1,360.85	18.82	64.72	721.65	11.23	181.66	1,802.51	28.06	414.62	4,623.01	71.95
02.11.04	PINTURA ENVIGAS CON LÁTEX	m2	902.21	12.15	10,981.85	63.88	778.12	7.09	5.56	67.58	0.52	69.44	843.70	7.70	832.77	10,118.16	92.30
02.11.05	PINTURA ENDERRAMES CON LÁTEX	m2	77.46	11.15	863.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.46	863.88	100.00
02.11.06	PINTURA ENCIERRABOS CON LÁTEX	m2	542.46	13.15	7,264.85	193.31	2,542.00	34.89	19.76	289.84	3.58	213.07	2,801.84	38.57	339.39	4,463.01	61.43
02.11.07	PINTURA EN MUROS INTERIORES CON EPÓXICO	m2	2,942.04	16.95	48,342.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,852.04	48,342.08	100.00
02.11.08	PINTURA ENCOLUMNAS CON EPÓXICO	m2	702.62	16.95	11,909.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.62	11,909.41	100.00
02.11.09	PINTURA ENVIGAS CON EPÓXICO	m2	1,033.71	19.96	20,663.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.71	20,663.86	100.00
02.11.10	PINTURA ENDERRAMES CON EPÓXICO	m2	204.57	16.95	3,469.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.57	3,469.16	100.00
02.11.11	PINTURA EN CIERRABOS CON EPÓXICO	m2	1,367.27	20.15	27,550.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.27	27,550.49	100.00
02.11.12	RECUB. CAJITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CISTERNA	m2	137.88	58.31	8,036.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.88	8,036.78	100.00
02.12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																
02.12.01	INODORO BLANCO D.LOSA 1m3 INC -T BAIG INC ACCESORIOS	u	21.00	218	4,578.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	4,578.00	100.00
02.12.02	URINARIO DE LOZA DE PICO BLANCO (INC. ACCESORIOS)	u	10.00	135	1,350.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,350.00	100.00
02.12.03	OVALIN PARA EMPOTRAR (INC. ACCESORIOS)	u	28.00	80	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	2,240.00	100.00
02.12.04	LAVATORIO CON PEDESTAL (INC. ACCESORIOS)	psu	1.00	85	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	85.00	100.00
02.12.05	GRIFERIA CROMADA CON TEMPORIZADOR AL MUEBLE (INC. ACCESORIOS)	u	29.00	186	5,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	5,366.00	100.00
02.12.06	LLAVE DE PISO TIPO ESFERICA DE FIERRO GALVANIZADO	u	16.00	50	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	800.00	100.00

VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 02 : ARQUITECTURA

LICITACION LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
OBRA REHABILITACION CPA DE ACAPULCO
FORMULA 02 ARQUITECTURA
PROPIETARIO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS
UBICACION LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIANTE VILLAR-TUMBES

FECHA DE INICIO DE OBRA 28-06-17
VALORIZACION N° 20
FECHA PRESUPUESTO 30-jun-17
P. REFERENCIAL B.M.G.V SI 12.903.758.02
P. CONTRATO B.M.G.V SI 12.903.758.02

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			SALDO CONTRACTUAL		
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%
02.12.07	DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE (INC. ACCESORIOS)	u	1.00	125	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	875.00	100.00
02.12.08	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE 190x110x95mm para 01 litro de jabon liquido	u	17.00	50	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	860.00	100.00	
02.12.09	JABONERA DE LOZA COLOR BLANCO	u	7.00	15	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	105.00	100.00		
02.12.10	GANCHO DOBLE DE LOZA BLANCA	u	7.00	20	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	140.00	100.00		
02.12.11	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	u	8.00	95	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	760.00	100.00		
02.12.12	BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 1" PARA DUCHA (INC. CORTINA PARA DUCHA)	u	7.00	83.07	581.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	581.49	100.00		
02.12.13	DISPENSADOR T OALLA PALANCA COMPACTO PLASTICO BLANCO	u	8.00	180	1.280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1.280.00	100.00		
02.13	OTROS																
02.13.01	CORTINA DETRASLAPE DE PVC (PROVISION Y COLOCACION)	m2	25.92	362.37	9.392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.92	9.392.83	100.00		
02.13.02	PROTECCION DE BORDE DE PLATAFORMA	u	9.00	214.77	1.932.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1.932.93	100.00		
02.13.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRIGO RETRACTIL 3.30 x 3.40 x 8.80m	u	2.00	400.36	38.009.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	38.009.81	100.00		
02.13.04	COLOCACION DE REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN CANALETA	m	153.25	220.77	35.157.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.25	35.157.82	100.00		
02.13.05	COLOCACION DE REJILLA DE ACERO GALVANIZADO EN CANALETA	m	64.55	131.84	8.510.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.55	8.510.27	100.00		
02.13.06	TAPAJUNTA DE ALUMINIO 2"	m	47.40	21.06	998.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.40	998.24	100.00		
02.13.07	BRUÑAS SEGUN DETALLE	m	255.00	5.29	1.303.95	255.00	1.303.95	100.00	0.00	0.00	255.00	1.303.95	100.00	0.00	0.00	0.00	
02.13.08	COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	pza	58.00	73.12	4.240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	4.240.96	100.00		
02.13.09	COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	pza	64.00	45.71	2.925.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	2.925.44	100.00		
02.13.10	SECADOR DE MANOS ELECTRICO	u	2.00	720.07	1.440.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.440.14	100.00		
02.13.11	GANCHO PARA MULETAS SSHH DISCAPACITADOS	u	2.00	40.7	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	81.40	100.00		
02.13.12	BARRAS DE SOPORTO PARA SSHH DISCAPACITADOS	u	6.00	156.06	936.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	936.36	100.00		
02.13.13	SISTEMA DE CIERRE PARA PUERTA EN SSHH DISCAPACITADOS	u	2.00	279.81	559.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	559.62	100.00		
02.13.14	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 01 POSA CON ESCURRIDOR	u	1.00	481.18	481.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	481.18	100.00		
02.13.15	VENTANA PARA SUBESTACION ELECTRICA - VAT-05 - 1.45x0.90m	u	3.00	452.08	1.356.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.356.24	100.00		
02.13.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA EN GRUPO ELECTROGENO PM	u	1.00	3108.66	3.108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.108.66	100.00		
02.13.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA EN GRUPO ELECTROGENO PM	u	1.00	1819.24	1.819.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.819.24	100.00		
02.13.18	GRIFERIA DE BRONCE TIPO OJELLO DE GANZO AL MUEBLE (INC. ACCESORIOS)	u	1.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	110.00	100.00		
02.13.19	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VIA DE INGRESO	m	280.00	9.92	2.777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	2.777.80	100.00		
02.13.20	SEÑALIZACION VERTICAL EN VIA DE INGRESO	u	6.00	280.26	4.484.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.484.16	100.00		
02.13.21	PINTURA AMARILLA DE TRAFICO EN SEÑALES DE SEGURIDAD	m	70.00	0.48	1.781.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	1.781.80	100.00		
02.13.22	SEÑALÉTICA	u	341.00	8.21	2.799.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	2.799.81	100.00		
COSTO DIRECTO					2,045,791.20		782,096.00		37,570.71		819,665.71		1,187,408.22				
GASTOS GENERALES			%	17.90	366,196.63		139,996.01		8,725.16		148,720.17		219,476.48				
UTILIDAD			%	3.10	2,045.79		782.08		37.57		819.65		1,226.14				
SUB TOTAL					2,414,033.62		922,872.09		44,333.44		967,205.53		1,448,628.09				
IGV			%	13.00	434,826.05		196,118.98		7,980.02		174,088.98		280,429.06				
TOTAL					2,848,859.67		1,038,990.06		52,313.46		1,141,302.52		1,707,257.15				
AVANCE					100%		38.23%		1.84%		40.07%		58.93%				

CONSORCIO ZORRITOS
ING. FERNANDO REGALADO OBLITAS
Responsable de Obra

ING. SEREN COBUSTONIATTI
RESPONSABLE DE PREVISION TUMBES

**VALORIZACIÓN N° 20 DEL PRESUPUESTO INSTALACIONES
SANITARIAS**



**VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 03 : INSTALACIONES SANITARIAS**

LICITACION : LP-SM-03-2017-FONDEPES-
 OBRA : REHABILITACION DPA DE ACAPULLCO
 FORMULA : 031. SANITARIAS
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACION : LOCALIDAD DE ACAPULLCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES

FECHA DE INICIO DE OBRA : 28-dic-17
 VALORIZACION N° : 20
 FECHA PRESUPUESTO : 30-jun-17
 P. REFERENCIAL S.I.G.V : S/ 12,903,758.02
 P. CONTRATO S.I.G.V. : S/ 12,903,758.02

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			BALDO CONTRACTUAL		
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%
03	INSTALACIONES SANITARIAS																
03.01	SISTEMA DE AGUA FRIA																
03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES																
03.01.01.01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS / ML	m	642.97	1.1	707.27	0.00	0.00	0.00									
03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
03.01.02.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA	m	642.97	10.17	6,538.00	0.00	0.00	0.00									
03.01.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA / TUBERIA	m	642.97	2.13	1,369.53	0.00	0.00	0.00									
03.01.02.03	CAMA DE APOYO E=0.10m	m	642.97	5.87	4,417.20	0.00	0.00	0.00									
03.01.02.04	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m	642.97	7	4,500.79	0.00	0.00	0.00									
03.01.03	SALIDAS DE AGUA FRIA																
03.01.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP Ø 1/2"	plc	84.00	72.53	6,092.52	0.00	0.00	0.00									
03.01.03.02	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP Ø 3/4"	plc	7.00	88.5	479.50	0.00	0.00	0.00									
03.01.04	REJ DE DISTRIBUCION																
03.01.04.01	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRA./TUB PVC Ø 1/2" C-10	m	226.30	7.84	1,774.19	0.00	0.00	0.00									
03.01.04.02	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRA./TUB PVC Ø 3/4" C-10	m	215.30	8.31	1,789.14	0.00	0.00	0.00									
03.01.04.03	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRA./TUB PVC Ø 1" C-10	m	119.80	12.04	1,442.39	0.00	0.00	0.00									
03.01.04.04	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRA./TUB PVC Ø 1 1/4" C-10	m	5.20	13.56	70.51	0.00	0.00	0.00									
03.01.04.05	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRA./TUB PVC Ø 1 1/2" C-10	m	2.30	13.56	31.19	0.00	0.00	0.00									
03.01.04.06	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRA./TUB PVC Ø 2" C-10	m	35.80	15.09	540.22	0.00	0.00	0.00									
03.01.04.07	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRA./TUB PVC Ø 2 1/2" C-10	m	2.47	18.55	398.27	0.00	0.00	0.00									
03.01.05	REJ DE ALIMENTACION																
03.01.05.01	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRA./TUB PVC Ø-10 2 1/2" (MEDIDOR-OBTERNA N°1)	m	16.80	12.36	207.65	0.00	0.00	0.00									
03.01.06	ACCESORIOS																
03.01.06.01	TEE PVC-SAP 1/2"	U	23.00	10.88	245.64	0.00	0.00	0.00									
03.01.06.02	TEE PVC-SAP 3/4"	U	38.00	14.43	562.77	0.00	0.00	0.00									
03.01.06.03	TEE PVC-SAP 1"	U	21.00	17.43	366.03	0.00	0.00	0.00									
03.01.06.04	TEE PVC-SAP 2"	U	6.00	22.43	134.58	0.00	0.00	0.00									
03.01.06.05	TEE PVC-SAP 2 1/2"	U	6.00	19.43	116.58	0.00	0.00	0.00									
03.01.06.06	CODO PVC-SAP 1/2"	U	122.00	10.43	1,272.46	0.00	0.00	0.00									
03.01.06.07	CODO PVC-SAP 3/4"	U	33.00	11.43	377.19	0.00	0.00	0.00									
03.01.06.08	CODO PVC-SAP 1"	U	12.00	11.43	137.16	0.00	0.00	0.00									
03.01.06.09	CODO PVC-SAP 2"	U	1.00	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00									
03.01.06.10	REDUCCION PVC SAP 3/4" - 1/2"	U	58.00	17.43	1,012.94	0.00	0.00	0.00									
03.01.06.11	REDUCCION PVC SAP 1" - 3/4"	U	15.00	14.43	215.45	0.00	0.00	0.00									
03.01.06.12	REDUCCION PVC SAP 1" - 1/2"	U	9.00	17.43	156.87	0.00	0.00	0.00									
03.01.06.13	REDUCCION PVC SAP 1 1/2" - 1"	U	4.00	17.43	69.72	0.00	0.00	0.00									
03.01.06.14	REDUCCION PVC SAP 2" - 1/2"	U	1.00	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00									
03.01.06.15	REDUCCION PVC SAP 2" - 3/4"	U	4.00	19.43	77.72	0.00	0.00	0.00									
03.01.06.16	REDUCCION PVC SAP 2" - 1"	U	3.00	16.43	49.29	0.00	0.00	0.00									
03.01.06.17	REDUCCION PVC SAP 2 1/2" - 1 1/2"	U	5.00	19.43	115.58	0.00	0.00	0.00									
03.01.06.18	REDUCCION PVC SAP 2 1/2" - 2"	U	2.00	19.43	38.86	0.00	0.00	0.00									
03.01.07	VALVULAS																
03.01.07.01	VALVULA COMPUERTA 1/2" CON U"U"	U	22.00	99.43	2,187.46	0.00	0.00	0.00									
03.01.07.02	VALVULA COMPUERTA 3/4" CON U"U"	U	24.00	108.45	2,603.76	0.00	0.00	0.00									
03.01.07.03	VALVULA COMPUERTA 1" CON U"U"	U	7.00	129.59	907.13	0.00	0.00	0.00									
03.01.07.04	VALVULA COMPUERTA 1 1/2" CON U"U"	U	2.00	182.29	324.58	0.00	0.00	0.00									

121

**VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 03 : INSTALACIONES SANITARIAS**

LICITACION : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
OBRA : REHABILITACION DPA DE ACAPULCO
FORMULA : 031. SANITARIAS
PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
UBICACION : LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRAL MIRANTE VILLAR-TUMBES

FECHA DE INICIO DE OBRA : 26-dic-17
VALORIZACION N° : 20
FECHA PRESUPUESTO : 30-jun-17
P. REFERENCIAL SI G.V : \$/ 12,903,758.02
P. CONTRATO SI G.V. : \$/ 12,903,758.02

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UNIC	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			BALDO CONTRACTUAL		
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%
03	INSTALACIONES SANITARIAS																
03.02.02.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA	m	111.01	11.68	1,286.63	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	111.81	1,286.60	100.00
03.02.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA Y TUBERIA	m	111.01	2.13	236.45	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	111.81	236.45	100.00
03.02.02.03	CAMA DE APOYO E=0.10m	m	111.01	6.87	762.64	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	111.81	762.64	100.00
03.02.02.04	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m	111.01	7	777.07	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	111.81	777.07	100.00
03.02.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CAMAQUINA	m ³	7.22	24.87	179.58	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	7.22	179.58	100.00
03.02.03.01	SALIDA DE DESAGUE	pto	19.00	59.32	1,127.08	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	19.00	1,127.08	100.00
03.02.03.02	SALIDA DE VENTILACION DE 2"	pto	3.00	51.23	153.68	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	3.00	153.68	100.00
03.02.04.01	SUM E INST DE TUBERIA PVC-SAL 2"	m	5.90	11.19	66.02	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	5.90	66.02	100.00
03.02.04.02	SUM E INST DE TUBERIA PVC-SAL 3"	m	100.13	13.04	1,305.73	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	100.13	1,305.73	100.00
03.02.04.03	SUM E INST DE TUBERIA PVC-SAL 6"	m	36.34	20.37	740.25	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	36.34	740.25	100.00
03.02.04.04	SUM E INST DE TUBERIA PVC-SAL 2" VENT LACION	m	16.55	11.19	185.19	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	16.55	185.19	100.00
03.02.04.05	TUBERIA PVC 3" - C-10 (IMPULSION ENTERRADA)	m	185.20	20.86	3,863.27	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	185.20	3,863.27	100.00
03.02.04.06	TUBERIA PVC SAL 6" C-10 EMISOR	m	9.80	24.04	235.59	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	9.80	235.59	100.00
03.02.05.01	ACCESORIOS																
03.02.05.02	YEE PVC-SAP CON REDUCCION 6"x4"	u	2.00	36.86	73.72	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	2.00	73.72	100.00
03.02.05.03	TRAMPA 1" PVC-SAP 2"	u	3.00	31.85	95.58	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	3.00	95.58	100.00
03.02.05.04	TRAMPA 1" PVC-SAP 3"	u	29.00	34.86	1,010.94	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	29.00	1,010.94	100.00
03.02.05.05	TRAMPA 1" PVC-SAP 6"	u	2.00	36.86	77.72	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	2.00	77.72	100.00
03.02.05.06	YEE PVC-SAP 2"	u	2.00	24.88	49.72	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	2.00	49.72	100.00
03.02.05.07	YEE PVC-SAP 3"	u	17.00	29.86	490.62	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	17.00	490.62	100.00
03.02.05.08	YEE PVC-SAP CON REDUCCION 3"x2"	u	1.00	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	1.00	29.86	100.00
03.02.05.09	TEE SANITARIA PVC SAP 2"	u	1.00	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	1.00	26.32	100.00
03.02.05.10	TEE SANITARIA PVC SAP 3"	u	9.00	29.57	266.13	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	9.00	266.13	100.00
03.02.05.11	TEE CON REDUCCION SIMPLE 4"x3"	u	4.00	34.86	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	4.00	139.44	100.00	
03.02.05.12	TEE CON REDUCCION SIMPLE 3"x2"	u	2.00	30.86	61.72	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	2.00	61.72	100.00
03.02.05.13	SUMIDERO DE BRONCE 3"	u	29.00	33.86	981.94	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	29.00	981.94	100.00
03.02.05.14	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2"	u	1.00	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	1.00	27.86	100.00
03.02.05.15	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 3"	u	9.00	31.85	286.74	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	9.00	286.74	100.00
03.02.05.16	SUMIDERO DE BRONCE 2"	u	3.00	28.86	86.58	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	3.00	86.58	100.00
03.02.05.17	CODO 45° SANITARIA PVC-SAL 3"	u	4.00	31.86	127.44	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	4.00	127.44	100.00
03.02.05.18	CODO 45° SANITARIA PVC-SAL 6"	u	2.00	36.86	73.72	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	2.00	73.72	100.00
03.02.05.19	CODO 45° SANITARIA PVC-SAL 2"	u	14.00	26.86	376.04	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	14.00	376.04	100.00
03.02.05.20	CODO 90° SANITARIA PVC-SAL 2"	u	8.00	28.86	230.88	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	8.00	230.88	100.00
03.02.05.21	CODO 45° SANITARIA HOPE 3"	u	10.00	31.85	318.50	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	10.00	318.50	100.00
03.02.05.22	CODO 45° SANITARIA HOPE 4"	u	3.00	36.86	110.58	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	3.00	110.58	100.00
03.02.05.23	YEE HOPE 4"	u	12.00	34.86	418.32	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	12.00	418.32	100.00
03.02.05.24	TAPON HOPE 4"	u	4.00	36.86	147.44	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	4.00	147.44	100.00
03.02.05.25	SUMIDERO DE BRONCE 4"	u	9.00	36.86	331.74	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	9.00	331.74	100.00
03.02.05.26	SOMBRIERO DE VENTILACION 2"	u	3.00	24.86	74.58	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	3.00	74.58	100.00
03.02.06.01	CAMARA DE INSPECCION																
03.02.06.02	CAJA DE REGISTRO DE 12" x 24" CON TAPA DE CONCRETO	u	8.00	231.03	1,848.24	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	8.00	1,848.24	100.00
03.02.06.03	CAJA DE REGISTRO DE 24" x 24" CON TAPA DE CONCRETO	u	5.00	280.56	1,402.80	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	5.00	1,402.80	100.00
03.02.06.04	TRAMPA DE SOLIDOS	u	2.00	1,311.49	2,622.98	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	2.00	2,622.98	100.00
03.02.07.01	BOMBILOS DE BOMBEO																
03.02.07.02	ACC)	pto	1.00	5,921.55	5,921.55	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	1.00	5,921.55	100.00
03.02.07.03	VALVULAS Y ACC.)	pto	1.00	6,030.47	6,030.47	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	1.00	6,030.47	100.00
03.02.07.04	ACC)	pto	1.00	2,888.88	2,888.88	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	1.00	2,888.88	100.00

CONSORCIO ZORRITOS
 ERNANDEZ REGALADO ORLITA
 RESPONSABLE DE OBRA

RUBEN JOSE SOTO GONZALEZ
 JEFE SUPERVISOR DE OBRA

VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 03 : INSTALACIONES SANITARIAS

LICITACION : LP-SM-06-2017-FONDEPES-1
OBRA : REHABILITACION DPA DE ACAPULCO
FORMULA : 031 SANITARIAS
PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
UBICACION : LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES

FECHA DE INICIO DE OBRA : 26-dic-17
VALORIZACION N° : 20
FECHA PRESUPUESTO : 30-jun-17
P. REFERENCIAL M.G.V : S/ 12.903.758 02
P. CONTRATO BILG.V : S/ 12.903.758 02

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			BALDO CONTRACTUAL		
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%
03.06.07.04	INSTALACIONES SANITARIAS																
03.06.01	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	gp	1.00	33,902.38	33,902.38	0.00	0.00	0.00							1.00	33,902.38	100.00
03.06.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES																
03.06.01.01	TRAZO Y REPLANTEO (TUBERIAS Y/O CANALETAS)	m	307.72	1.30	400.04	0.00	0.00	0.00							307.72	400.04	100.00
03.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
03.06.02.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA	m	248.11	11.68	2,897.92	0.00	0.00	0.00							248.11	2,897.92	100.00
03.06.02.02	EXCAVACION DE ZANJA PICANALETA	m	59.61	6.37	375.72	0.00	0.00	0.00							59.61	375.72	100.00
03.06.02.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA Y TUBERIA	m	248.11	2.13	526.47	0.00	0.00	0.00							248.11	526.47	100.00
03.06.02.04	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PICANALETA	m	59.61	2.13	126.97	0.00	0.00	0.00							59.61	126.97	100.00
03.06.02.05	CAMA DE APOYO E=0.10m	m	248.11	6.87	1,704.52	0.00	0.00	0.00							248.11	1,704.52	100.00
03.06.02.06	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m	248.11	7.00	1,736.77	0.00	0.00	0.00							248.11	1,736.77	100.00
03.06.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIMAQUINA	m3	44.52	24.87	1,107.21	0.00	0.00	0.00							44.52	1,107.21	100.00
03.06.03	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS, CANALETAS Y MONTANTE PLUVIAL																
03.06.03.01	REFUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXICA ANTICORROSIVA S=0.3r x 1.30m	m	161.34	54.86	8,851.64	0.00	0.00	0.00							161.34	8,851.64	100.00
03.06.03.02	REFORZADO) DE 0.30m ANCHO	m	27.08	158.86	4,298.75	0.00	0.00	0.00							27.08	4,298.75	100.00
03.06.03.03	0.30m	m	32.56	76.80	2,499.84	0.00	0.00	0.00							32.56	2,499.84	100.00
03.06.03.04	SUM. E INST. DE MONTANTE PLUVIAL PVC-SAP 4"	m	17.66	23.31	411.42	0.00	0.00	0.00							17.66	411.42	100.00
03.06.03.05	SUM. E INST. DE MONTANTE PLUVIAL PVC-SAP 6"	m	62.45	32.21	2,011.51	0.00	0.00	0.00							62.45	2,011.51	100.00
03.06.03.06	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 6"	m	106.42	32.21	3,427.79	0.00	0.00	0.00							106.42	3,427.79	100.00
03.06.03.07	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 8"	m	88.34	40.18	3,547.73	0.00	0.00	0.00							88.34	3,547.73	100.00
03.06.03.08	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 10"	m	45.32	46.46	2,105.57	0.00	0.00	0.00							45.32	2,105.57	100.00
03.06.04	CAMARA DE INSPECCION PLUVIALES																
03.06.04.01	CAJA DE REGISTRO PLUVIAL DE 0.80m x 0.80m CON TAPA DE CONCRETO	u	3.00	217.22	651.66	0.00	0.00	0.00							3.00	651.66	100.00
03.06.04.02	CAJA DE REGISTRO PLUVIAL DE 0.80m x 0.80m CON TAPA DE CONCRETO	u	0.00	217.22	2,172.20	0.00	0.00	0.00							0.00	2,172.20	100.00
03.06.04.03	CAJA DE REGISTRO PLUVIAL DE 1.00m x 1.00m CON TAPA DE CONCRETO	u	4.00	277.22	1,108.88	0.00	0.00	0.00							4.00	1,108.88	100.00
03.06.05	ESTRUCTURA DISIPADORA DE ENERGIA																
03.06.05.01	ESTRUCTURA DISIPADORA DE ENERGIA (PIEDRA EMBOQUILLADA)	u	3.00	346.87	1,040.61	0.00	0.00	0.00							3.00	1,040.61	100.00
03.06.06	ACCESORIOS																
03.06.06.01	CODO PVC 45° x 4" PMONTANTE PLUVIAL	u	8.00	29.18	233.44	0.00	0.00	0.00							8.00	233.44	100.00
03.06.06.02	CODO PVC 90° x 4" PMONTANTE PLUVIAL	u	8.00	28.18	225.44	0.00	0.00	0.00							8.00	225.44	100.00
03.06.06.03	CODO PVC 45° x 6" PMONTANTE PLUVIAL	u	22.00	32.23	709.06	0.00	0.00	0.00							22.00	709.06	100.00
03.06.06.04	CODO PVC 90° x 6" PMONTANTE PLUVIAL	u	22.00	32.23	709.06	0.00	0.00	0.00							22.00	709.06	100.00
03.06.06.05	DISP. ENERGIA	u	1.00	990.68	990.68	0.00	0.00	0.00							1.00	990.68	100.00
03.06.06.06	DISP. ENERGIA	u	1.00	840.68	840.68	0.00	0.00	0.00							1.00	840.68	100.00
03.06.06.07	PIEST. DISP. ENERGIA	u	1.00	1,540.68	1,540.68	0.00	0.00	0.00							1.00	1,540.68	100.00
03.06.06.08	ABRAZADERAS DE FIJACION PARA TUBERIAS MONTANTES (DN-4) CEDULA-40	u	5.00	162.41	812.05	0.00	0.00	0.00							5.00	812.05	100.00
03.06.06.09	ABRAZADERAS DE FIJACION PARA TUBERIAS MONTANTES (DN-6) CEDULA-40	u	52.00	21.24	1,104.48	0.00	0.00	0.00							52.00	1,104.48	100.00
03.06.06.10	CAJA DE VALVULAS 0.30x0.50m, H=0.30m	u	2.00	243.54	487.08	0.00	0.00	0.00							2.00	487.08	100.00
03.06.06.11	VALVULA DE PASO 6"	u	2.00	1,037.41	2,074.82	0.00	0.00	0.00							2.00	2,074.82	100.00
03.06.06.12	REGISTRO ROSCADO 4" EN FERRO	u	2.00	36.71	73.42	0.00	0.00	0.00							2.00	73.42	100.00
03.07	CONSORCIO ZORRITOS																
03.07.01	TRABAJOS PRELIMINARES																
03.07.01.01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS	m	1,450.00	1.10	1,595.00	0.00	0.00	0.00							1,450.00	1,595.00	100.00
03.07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
03.07.02.01	ACOMODO DE ENROSCADO DE PROTECCION	m3	15.00	36.50	547.50	0.00	0.00	0.00							15.00	547.50	100.00
03.07.03	SUBMINISTRO DE TUBERIA																
03.07.03.01	SUM. E INST. DE TUBERIA USA HDPE PECC-100 Dint. 180mm (6") PN-10	m	1,400.00	29.32	41,048.00	0.00	0.00	0.00							1,400.00	41,048.00	100.00
03.07.03.02	PARA USO DE DIFUSOR	m	90.00	27.93	2,513.70	0.00	0.00	0.00							90.00	2,513.70	100.00
03.07.03.03	SUBMINIST. E INST. DE LINEA AUXILIAR DE 90mm PARA MANIOBRA DE FLOTACION	m	1,400.00	14.86	20,799.00	0.00	0.00	0.00							1,400.00	20,799.00	100.00
03.07.03.04	ACCESORIOS SUBMINISTRO DE TUBERIAS HDPE	u	1.00	1,798.72	1,798.72	0.00	0.00	0.00							1.00	1,798.72	100.00


**VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 03 : INSTALACIONES SANITARIAS**

LICITACION: LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
OBRA: REHABILITACION D.F.A DE ACAPULCO
FORMULA: 03 I SANITARIAS
PROPIETARIO: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONTRATISTA: CONSORCIO ZORRITOS
UBICACION: LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS CON TALLERANTE VILLAR-TUMBES

FECHA DE INICIO DE OBRA: 26-dic-17
VALORIZACION N°: 20
FECHA PRESUPUESTO: 30-jun-17
P. REFERENCIAL S.R.G.V.: Sv 12.903.758 02
P. CONTRATO S.R.L.V.: Sv 12.903.758 02

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			BALDO CONTRACTUAL		
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%
03	INSTALACIONES SANITARIAS																
03.07.03.05	LASTRE DE CONCRETO TIPO A SEPARACION DE 1.70 CU	u	824.X	388.01	304,064.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.00	304,064.24	100.00
03.07.04	TERMOFUSION																
03.07.04.01	SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS DE 160 mm PN-10	u	1.X	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	100.00
03.07.04.02	AUXILIARES DE FLOTACION	u	1.X	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,500.00	100.00
03.07.05	ULTRASONIDO - CONTROL DE CALIDAD																
03.07.05.01	INSPECCION ULTRASONICA DE JUNTA	u	1.X	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	100.00
03.07.06	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO																
03.07.06.01	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO DE LINEA	m	1,450.X	83.39	120,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	120,915.50	100.00
03.07.06.02	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO DE LASTRE DE CONCRETO TIPO A	u	824.X	75.22	61,981.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.00	61,981.28	100.00
03.07.06.03	FLUACION PRIMEROS METROS DE TUBERIA CON CONCRETO CICLOPEO	m3	4.X	263.28	3,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	3,995.92	100.00
03.07.06.04	PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA EMISOR SUBMARINO	u	1.X	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	100.00
	COSTO DIRECTO				945,304.57		0.00			0.00		0.00		0.00		945,304.57	
	GASTOS GENERALES	%	17.00		160,209.52		0.00			0.00		0.00		0.00		160,209.52	
	UTILIDAD	%	0.00		945.30		0.00			0.00		0.00		0.00		945.30	
	SUB TOTAL				1,115,459.39		0.00			0.00		0.00		0.00		1,115,459.39	
	IGV	%	18.00		200,782.89		0.00			0.00		0.00		0.00		200,782.89	
	TOTAL				1,316,242.08		0.00			0.00		0.00		0.00		1,316,242.08	
	AVANCE	%			100%		0.00%			0.00%		0.00%		0.00%		100.00%	

CONSORCIO ZORRITOS
 Ing. Fernando M. Galardo Obilitas
 Gerente General de Obra


ING. RUBEN BOSSIS TONIATTI
 Gerente Supervisor T.M.
 Gerente de Supervision

**VALORIZACIÓN N° 20 DEL PRESUPUESTO INSTALACIONES
ELECTRICAS**



VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS

LICITACION LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
OBRA REHABILITACION DPA DE ACAPULCO
FORMULA 04 : ELECTRICAS
PROPIETARIO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONALPES)
CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS
UBICACION LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIENTE VILLAR-TUMBES

FECHA DE INICIO DE OBRA 29-dic-17
VALORIZACION N° 20
FECHA PREL PUESTO 30-jun-17
P. REFERENCIAL M.G.V. \$/ 12,903,758.02
P. CONTRATO M.G.V. \$/ 12,903,758.02

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND	PRE SUPUESTO CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			BALDO CONTRACTUAL		
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%
04	INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION																
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES																
04.01.01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS / M	m	363.21	1.10	399.53	30.00	33.00	8.30	0.00	0.00	30.00	33.00	8.35	329.21	382.13	91.65	
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
04.02.01	EXCAV. DE ZANJA DE 0.50x0.80m. PARA INSTALACION DE DUCTOS	m	363.21	11.88	4,302.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.21	4,195.57	100.00	
04.02.02	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m	363.21	7.00	2,542.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.21	2,514.47	100.00	
04.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMAQUINA	m3	80.52	24.87	2,261.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.52	2,251.23	100.00	
04.03	SALIDAS DE ILUMINACION																
04.03.01	SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)	pto	285.00	95.50	25,307.50	30.00	12,415.00	49.28	0.00	0.00	130.00	12,415.00	49.08	135.00	12,892.50	50.94	
04.03.02	SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) C/CONDUIT	u	15.00	107.50	1,612.50	15.00	1,612.50	83.33	0.00	0.00	15.00	1,612.50	83.33	3.00	322.50	18.87	
04.03.03	SALIDA PARA BRAQUETE (PARED)	pto	32.00	85.50	2,768.00	10.25	866.63	32.03	0.00	0.00	10.25	869.63	32.03	21.75	1,881.38	67.87	
04.04	INTERRUPTORES																
04.04.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pto	45.00	120.03	5,401.35	25.00	3,000.75	55.58	0.00	0.00	25.00	3,000.75	55.58	20.00	2,400.80	44.44	
04.04.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pto	3.00	129.82	389.46	9.00	1,168.38	100.00	0.00	0.00	9.00	1,168.38	100.00	0.00	0.00	0.00	
04.04.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE	pto	4.00	125.32	501.28	2.00	250.64	50.00	0.00	0.00	2.00	250.64	50.00	2.00	250.64	50.00	
04.04.04	INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CONMUTACION SIMPLE	pto	40.00	133.12	5,324.80	22.85	3,169.85	57.37	0.00	0.00	22.85	3,169.85	57.37	17.05	2,354.95	42.83	
04.04.05	INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CONMUTACION SIMPLE CON TUBERIA	pto	4.00	138.12	552.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	552.48	100.00	
04.04.06	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE	pto	3.00	164.86	494.58	1.00	164.86	33.33	0.00	0.00	1.00	164.86	33.33	2.00	329.72	66.87	
04.04.07	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 4 MAS	pto	1.00	107.06	107.06	0.85	89.59	83.70	0.00	0.00	0.85	89.59	83.70	0.35	37.47	35.00	
04.05	TOMACORRIENTES																
04.05.01	SALIDA DE TOMACORRIENTES BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA	pto	87.00	113.84	9,803.08	37.50	4,261.50	56.67	0.00	0.00	37.50	4,261.50	56.67	29.50	3,352.38	44.03	
04.05.02	SALIDA DE TOMACORRIENTES BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA	pto	10.00	118.18	1,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,181.80	100.00	
04.05.03	SALIDA DE TOMACORRIENTES BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA	pto	44.00	121.56	5,348.64	25.75	3,130.17	58.52	0.00	0.00	25.75	3,130.17	58.52	18.25	2,218.47	41.48	
04.05.04	SALIDA DE TOMACORRIENTES BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA A	pto	35.00	113.84	3,979.40	13.10	1,488.88	37.43	0.00	0.00	13.10	1,488.88	37.43	21.90	2,488.72	62.57	
04.05.05	SALIDA DE TOMACORRIENTES BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA A	pto	10.00	118.18	1,181.80	5.00	590.90	50.00	0.00	0.00	5.00	590.90	50.00	5.00	590.90	50.00	
04.05.06	SALIDA DE TOMACORRIENTES BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA	pto	2.00	96.84	193.68	2.00	193.68	100.00	0.00	0.00	2.00	193.68	100.00	0.00	0.00	0.00	
04.05.07	SALIDA DE TOMACORRIENTES BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA	pto	8.00	96.84	774.72	7.00	669.48	87.50	0.00	0.00	7.00	669.48	87.50	1.00	95.24	12.50	
04.06	SALIDAS ESPECIALES																
04.06.01	SALIDA PARA LAVADORA	pto	1.00	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	124.84	100.00	
04.06.02	SALIDA PARA BECADORA	pto	1.00	124.84	124.84	0.50	62.32	50.00	0.00	0.00	0.50	62.32	50.00	0.50	62.32	50.00	
04.06.03	SALIDA PARA THERMA	pto	3.00	124.84	374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	374.52	100.00	
04.06.04	SALIDA PARA BECADORA DE MANOS	pto	2.00	94.64	189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	189.28	100.00	
04.07	SALIDA DE FUERZA																
04.07.01	SALIDA DE PUERTA SECCIONABLE 220V. MONOFASICO	pto	8.00	102.71	821.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	821.68	100.00	
04.07.02	SALIDA DE FUERZA 380V. TRIFASICA TIPO A1	pto	9.00	163.48	1,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1,471.32	100.00	
04.07.03	SALIDA DE FUERZA 380V. TRIFASICA TIPO A2	pto	8.00	154.88	1,239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1,239.04	100.00	
04.07.04	SALIDA DE FUERZA 380V. TRIFASICA TIPO B	pto	1.00	354.01	354.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	354.01	100.00	
04.07.05	SALIDA DE FUERZA 380V. TRIFASICA TOMA INDUSTRIAL 3x18A + T	pto	1.00	247.99	247.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	247.99	100.00	
04.07.06	SALIDA DE FUERZA 380V. TRIFASICA TOMA INDUSTRIAL 3x25A + T	pto	1.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	218.00	100.00	
04.08	SALIDA PARA COMUNICACIONES																
04.08.01	SALIDA MULTIPLE VOZ Y DATA	pto	11.00	21.45	235.95	7.00	850.15	63.64	0.00	0.00	7.00	850.15	63.64	4.00	485.80	36.36	
04.08.02	SALIDA PARA CAMARA	pto	8.00	82.45	659.60	1.00	82.45	12.50	0.00	0.00	1.00	82.45	12.50	7.00	577.15	87.50	
04.08.03	SALIDA PARA PARLANTE	pto	5.00	82.45	412.25	2.00	164.90	40.00	0.00	0.00	2.00	164.90	40.00	3.00	247.35	60.00	

CONSORCIO ZORRITOS
ING. FERNANDO GALADO OBLITA
Ing. Responsable de Obra

ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

VALORACION DE OBRA N° 20
FORMULA 04: INSTALACIONES ELECTRICAS

UBICACION: UPM-05-2017-03083-1
OBRA: REHABILITACION CFA DE ACAPULCO
FORMULA: 04:1 ELECTRICAS
PROPIETARIO: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONTRATISTA: CONSORCIO ZORRITOS
UBICACION: LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRATAMIENTO M. U.A.Z. TURBES

FECHA DE HAGO DE OBRA: VALORACION N°
FECHA MENSAJEMENTO: P. REFORMA AL B.G.V.
30-Abr-17
S/ 12 903 756 02

S/ 12 903 756 02

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UNID	PRELIMINAR			PRESUPUESTO CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			BALDO CONTRACTUAL	
			PRECIO	METRADO	%	TOTAL	METRADO	%	NETRADO	%	METRADO	%	NETRADO	%	METRADO	%	NETRADO		%
04.09.01	SAUDAS PARA DETECTORES DE HUIDA	m	68.95	26.00	37.90	1,721.25	98.15	68.95	33.33	0.00	0.00	25.00	1,721.25	98.15	68.95	33.33	2.00	1,000.00	100.00
04.09.02	SAUDAS PARA SHRENAS	m	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.10.01	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=25mm	m	888.00	13.35	1.50	1,028.74	9.88	1,028.74	9.88	0.00	0.00	1,028.74	9.88	1,028.74	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
04.10.02	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=40mm	m	1,726.82	85.30	5.20	9,026.82	85.30	9,026.82	85.30	0.00	0.00	9,026.82	85.30	9,026.82	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
04.10.03	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=40mm	m	1,022.60	52.20	5.20	5,302.60	52.20	5,302.60	52.20	0.00	0.00	5,302.60	52.20	5,302.60	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
04.10.04	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=50mm	m	27.32	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.10.05	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=100mm	m	30.27	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.11.01	CABLE NEXON 3-1x18mm ² (F) - 1x18mm (N) - 1x18mm (T), 0.8.15W	m	396.87	12.36	4,754.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.11.02	CABLE NEXON 3-1x18mm ² (F) - 1x18mm (N) - 1x18mm (T), 0.8.15W	m	427.65	20.50	8,868.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.11.03	CABLE NEXON 1x18mm ² (F) - 1x18mm (N) - 1x18mm (T), 0.8.15W	m	36.25	0.20	1,308.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.11.04	CABLE NEXON 3-1x18mm ² (F) - 1x18mm (N) - 1x18mm (T), 0.8.15W	m	15.55	0.20	443.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.11.05	CABLE NEXON 1x18mm ² (F) - 1x18mm (N) - 1x18mm (T), 0.8.15W	m	37.34	0.20	1,308.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.11.06	CABLE NEXON 1x18mm ² (F) - 1x18mm (N) - 1x18mm (T), 0.8.15W	m	362.55	13.42	5,317.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.11.07	CABLE NEXON 3-1x18mm ² (F) - 1x18mm (N) - 1x18mm (T), 0.8.15W	m	280.00	16.46	4,259.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.11.08	CABLE NEXON 3-1x18mm ² (F) - 1x18mm (N) - 1x18mm (T), 0.8.15W	m	22.90	0.20	804.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.12.01	BLOQUE DE CONCRETO (1.0x1.2x0.70m (ELECTRICAS)	m	412.26	14.22	5,836.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.12.02	BLOQUE DE CONCRETO (0.6x0.8x0.6m (COMUNICACIONES)	m	412.26	2.00	2,824.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.12.03	DUCTO DE CONCRETO DE 2 VAS	m	70.57	1.00	3,862.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.12.04	DUCTO DE CONCRETO DE 4 VAS	m	65.57	1.00	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.13.01	TABLEROS DE DISTRIBUCION	m	15,338.55	1.00	15,338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.13.02	TABLEROS DE DISTRIBUCION TA-01	m	1,526.55	1.00	1,526.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.13.03	TABLEROS DE DISTRIBUCION TA-02	m	1,794.55	1.00	1,794.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.13.04	TABLEROS DE DISTRIBUCION TA-03	m	4,418.55	1.00	4,418.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.13.05	TABLEROS DE DISTRIBUCION TA-04	m	5,898.55	1.00	5,898.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.13.06	TABLEROS DE DISTRIBUCION TA-05	m	1,526.55	1.00	1,526.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.13.07	TABLEROS DE DISTRIBUCION TA-06	m	2,988.55	1.00	2,988.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.13.08	TABLEROS DE DISTRIBUCION TA-07	m	2,988.55	1.00	2,988.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.13.09	TABLEROS DE DISTRIBUCION TA-08	m	2,316.55	1.00	2,316.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.13.10	TABLEROS DE DISTRIBUCION TA-09	m	2,298.55	1.00	2,298.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.13.11	TABLEROS DE DISTRIBUCION TA-10	m	2,298.55	1.00	2,298.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.13.12	TABLEROS DE DISTRIBUCION TA-11	m	1,508.55	1.00	1,508.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.13.13	TABLEROS DE DISTRIBUCION TA-12	m	1,446.55	1.00	1,446.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.13.14	TABLEROS DE DISTRIBUCION TA-13	m	1,446.55	1.00	1,446.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.13.15	TABLEROS DE DISTRIBUCION TA-14	m	1,778.55	1.00	1,778.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.13.16	TABLEROS DE DISTRIBUCION TA-15	m	1,836.55	1.00	1,836.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.13.17	TABLEROS DE DISTRIBUCION TA-16	m	2,636.55	1.00	2,636.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.13.18	TABLEROS DE DISTRIBUCION TA-18	m	2,636.55	1.00	2,636.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. ERNANDO EGAMADO OBLITAS
RESPONSABLE DE OBRAS

ING. RUBEN ROSSIGNOL MATA
COORDINADOR SUPERVISOR TECNICO



VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS

LICITACION: LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
 OBRA: REHABILITACION DPA DE ACAPULCO
 FORMULA: 041 ELECTRICAS
 PROPIETARIO: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA: CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACION: LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES

FECHA DE INICIO DE OBRA: 28-dic-17
 VALORIZACION N°: 20
 FECHA PRESUPUESTO: 30-jun-17
 P. REFERENCIAL M.G.V.: \$/ 12,903,758.02
 P. CONTRATO M.G.V.: \$/ 12,903,758.02

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			BALDO CONTRACTUAL		
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%
04.14	PUESTA A TIERRA																
04.14.01	POZO DE PUESTA A TIERRA	u	3.00	937.40	2,812.20	1.40	1,312.38	46.97		0.00	0.00	1.40	1,312.38	46.97	1.60	1,499.84	53.33
04.14.02	CONDUCTOR DE CU 1x35mm2 DESNUDO	m	15.93	13.62	216.97	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.93	216.97	100.00
04.14.03	CONDUCTOR DE CU 1x10mm2 NH-80	m	6.00	10.62	63.72	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	63.72	100.00
04.15	CAJAS																
04.15.01	CAJA DE PASE CUADRADA DE 150x150x100mm	u	5.00	38.89	194.45	8.00	319.12	160.00		0.00	0.00	8.00	319.12	160.00	-3.00	-119.67	-60.00
04.15.02	CAJA DE PASE CUADRADA DE 300x300x150mm	u	1.00	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	47.94	100.00
04.15.03	CAJA DE PASE CUADRADA DE 300x300x100mm	u	1.00	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	44.94	100.00
04.15.04	CAJA DE PASE CUADRADA DE 100x100x50mm	u	19.00	31.44	597.36	8.00	188.64	31.58		0.00	0.00	8.00	188.64	31.58	13.00	408.72	68.42
04.15.05	CAJA DE PASE CUADRADA DE 150x150x75mm	u	12.00	37.94	455.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	455.28	100.00
04.15.06	CAJA DE PASE OCTOGONAL DE 100x40mm	u	5.00	32.94	164.70	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	164.70	100.00
04.16	ALUMBRADO EXTERIOR																
04.16.01	POSTE DE CONCRETO DE 11 METROS	u	17.00	1,157.26	19,673.42	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	19,673.42	100.00
04.16.02	PASTORAL DE CONCRETO SIMPLE	u	15.00	61.19	917.85	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	917.85	100.00
04.16.03	PASTORAL DE CONCRETO DOBLE	u	2.00	61.19	122.38	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	122.38	100.00
04.16.04	LUMINARIA VAPOR DE SODIO 150W	u	17.00	269.81	4,586.77	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	4,586.77	100.00
04.16.05	POSTE DE ACERO GALVANIZADO 8 METROS	u	17.00	961.60	16,175.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	16,175.50	100.00
04.16.06	PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO	u	17.00	208.42	3,543.14	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	3,543.14	100.00
04.16.07	LUMINARIA VAPOR DE SODIO 70W	u	17.00	51.32	872.44	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	872.44	100.00
04.16.08	MURETE DE CONCRETO	u	17.00	442.42	7,521.14	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	7,521.14	100.00
04.16.09	REFLECTOR DE VAPOR DE SODIO 150W	u	1.00	257.13	257.13	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	257.13	100.00
04.17	EQUIPOS DE ILUMINACION																
04.17.01	EQUIPO FLUORESCENTE HERMETICO 2x36 W IP65	u	234.00	94.24	22,052.18	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	22,052.18	100.00
04.17.02	EQUIPO FLUORESCENTE HERMETICO 2x18 W IP65	u	81.00	79.24	6,418.44	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	6,418.44	100.00
04.17.03	LUZ DE EMERGENCIA LED	u	44.00	28.06	5,546.64	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	5,546.64	100.00
04.18	EQUIPOS PARA SUMINISTRO																
04.18.01	GRUPO ELECTROGENO 380 VOLTIOS - 80KW	u	1.00	36,387.64	36,387.64	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	36,387.64	100.00
04.18.02	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO 125AMP 35KA-380 VOLTIOS	u	1.00	6,049.29	6,049.29	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,049.29	100.00
04.18.03	BANCO DE CONDENSADORES 90 KVAR - 380 VOLTIOS	u	1.00	20,311.49	20,311.49	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20,311.49	100.00
04.18.04	UPS MONOFASICO 3000 VA 220/220 VOLTIOS	u	1.00	3,049.29	3,049.29	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,049.29	100.00
04.19	PRUEBA FINALES																
04.19.01	PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO	u	1.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	100.00
COSTO DIRECTO					387,875.12		40,378.41			0.00		40,378.41		347,506.73			
GASTOS GENERALES			%	17.90	69,447.55		7,227.38			0.00		7,227.38		62,220.17			
UTILIDAD			%	0.10	387.88		40.38			0.00		40.38		347.60			
SUB TOTAL					457,810.65		47,644.17			0.00		47,644.17		410,166.50			
IOV				18.00	82,405.92		8,575.95			0.00		8,575.95		73,829.97			
TOTAL					540,216.57		56,220.12			0.00		56,220.12		483,996.47			
AVANCE					100.00%		10.41%			0.00%		10.41%		89.59%			

CONSORCIO ZORRITOS
 ING. FERNANDO REGALADO OBITAS
 Residente de Obra

ING. ALBERTO BOSSUTO MATTI
 SUPERVISOR TUMBES
 CENTRO DE SUPERVISIÓN

VALORIZACIÓN N° 20 DEL PRESUPUESTO OBRAS DE MAR



VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 05 : OBRAS DE MAR

LICITACION : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
OBRA : REHABILITACION DPA DE ACAPULCO
FORMULA : 05 OBRAS DE MAR
PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
UBICACION : LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES

FECHA DE INICIO DE OBRA : 28-dic-17
VALORIZACION N° : 20
FECHA PRESUPUESTO : 30-jun-17
P. REFERENCIAL B.I.G.V : SI 12,903,758.02
P. CONTRATO B.I.G.V. : SI 12,903,758.02

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UNC	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			SALDO CONTRACTUAL		
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%
05	OBRAS DE MAR																
05.01	OBRAS PRELIMINARES																
05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN OBRAS DE MAR	m2	1,200.48	3.90	4,681.79	1,200.48	4,681.79	100.00									
05.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	pb	1.00	16,000.00	16,000.00	0.50	8,000.00	50.00									
05.01.03	PROVISION DE PLATAFORMA MOVIL PARA ESCOMBROS	u	1.00	8,000.00	8,000.00	1.00	8,000.00	100.00									
05.01.04	DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO	m3	242.38	125.56	30,430.81	151.04	18,963.54	82.32									
05.01.05	DEMOLICION DE CABEZALES DE CONCRETO	m3	21.76	176.34	3,902.44	21.76	3,902.44	100.00									
05.01.06	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO (LOSAS)	m3	208.53	125.56	26,208.49	208.53	26,208.49	100.00									
05.01.07	DESMONTAJE DE SARDINELES DE MADERA	m	71.25	2.33	166.01	71.25	166.01	100.00									
05.01.08	DESMONTAJE DE BARRANDAS DE MADERA	m	196.00	2.33	456.68	196.00	456.68	100.00									
05.01.09	DESMONTAJE DE BITAS	u	10.00	26.22	262.20	10.00	262.20	100.00									
05.01.10	DESMONTAJE DE SISTEMA DE DEFENSA DE MUELLE CON RIEL METALICO Y	m	119.78	135.14	16,187.07	119.78	16,187.07	100.00									
05.01.11	DESMONTAJE DE PESCANTE	u	1.00	213.80	213.80	1.00	213.80	100.00									
05.01.12	DESMONTAJE DE POSTES DE ALUMBRADO	u	7.00	156.48	1,095.36	7.00	1,095.36	100.00									
05.01.13	DESMONTAJE DE ELECTROBOMBAS	u	2.00	36.93	77.86	2.00	77.86	100.00									
05.01.14	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO (CASETA DE	m3	1.25	156.93	196.18	1.25	196.18	100.00									
05.01.15	ACARRIO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES	m3	712.36	30.00	35,916.00	589.70	29,485.23	82.73									
05.01.16	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUO MANUAL Y VOLQUETE 15 M3	m3	712.36	24.87	17,716.88	589.70	14,865.96	82.73									
05.02	SISTEMA DE DEFENSA																
05.02.01	ESTRUCTURA METALICA PARA DEFENSA EN MUELLE SUMINISTRO DE RIEL 80	m	1,808.80	116.80	211,257.84	872.00	78,489.60	37.15									
05.02.02	ANCLAJE DE ESTRUCTURA METALICA RIEL EN CONCRETO	u	94.00	70.76	6,651.44	0.00	0.00	0.00									
05.02.03	ESTRUCTURA METALICA PARA DEFENSA EN MUELLE (MANO DE OBRA)	kg	54,284.00	3.48	188,898.72	0.00	0.00	0.00									
05.02.04	SISTEMA DE DEFENSA REPOSICION DE JEBE TIPO D NUEVOS	u	25.00	713.80	17,840.00	0.00	0.00	0.00									
05.02.05	SISTEMA DE DEFENSA REPOSICION DE JEBE TIPO D EXISTENTE	u	89.00	713.80	63,528.40	0.00	0.00	0.00									
05.02.06	BITAS TIPO B-I GALVANIZADAS	u	18.00	331.37	5,964.86	0.00	0.00	0.00									
05.02.07	SARDINEL DE MADERA DE 12"x12"x15"	u	22.00	964.86	21,326.92	0.00	0.00	0.00									
05.02.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PESCANTE CAP. W-500 KG	u	2.00	2,741.78	5,483.56	0.00	0.00	0.00									
05.02.09	PINTURA EPOXICA EN CARPINTERIA METALICA EN PLATAFORMA BAJA, INC	m2	54.00	29.05	1,568.70	0.00	0.00	0.00									
05.02.10	BARRANDAS DE TUBERIAS DE ACERO EN PUENTE DE MUELLE, INC ARMADO Y	m	232.50	216.13	50,260.23	0.00	0.00	0.00									
05.02.11	COLOCACION E HINCADO PARA DEFENSA DE RIEL 80 LBS/YARDA	u	48.00	788.96	37,980.00	0.00	0.00	0.00									
05.02.12	FABRICACION Y MONTAJE DE ESCALERA METALICA TIPO GATO	u	2.00	398.92	797.84	0.00	0.00	0.00									
05.03	PILOTAJE																
05.03.01	LIMPIEZA Y COLOCACION DE ACITIVO TRANSFORMADOR DE OXIDO	m2	224.00	13.35	2,980.40	0.00	0.00	0.00									
05.03.02	PICADO DE ZONA DAÑADA EN P. LOTES	m2	133.00	38.42	5,109.86	0.00	0.00	0.00									
05.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REPARACION DE PILOTES	m2	179.07	11.05	19,886.72	0.00	0.00	0.00									
05.03.04	COLOCADO DE FIBRAS DE CARBONO EN PILOTES	m2	14.00	47.63	6,668.20	0.00	0.00	0.00									
05.03.05	COLOCACION DE ADITIVO PARA CONCRETO VIEJO - NUEVO EN PILOTES	m2	133.00	26.45	3,517.85	0.00	0.00	0.00									
05.03.06	CONCRETO FC=315 KGCM2 CON IMPERMEABILIZANTE EN REPARACION DE	m3	15.22	733.85	11,169.36	0.00	0.00	0.00									
05.04	CABEZAL PREFABRICADA																
05.04.01	CABEZAL PREFABRICADA, CONCRETO FC=280 KGCM2	m3	96.49	662.86	63,944.58	96.20	63,744.58	97.87									
05.04.02	CABEZAL PREFABRICADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	510.30	73.11	37,308.03	510.30	37,308.04	100.00									
05.04.03	CABEZAL PREFABRICADO, ACEFO PY=4200 KGCM2	kg	20,897.48	4.18	87,351.47	20,897.48	87,351.47	100.00									
05.04.04	TRANSPORTE DE CABEZAL PREFABRICADO	u	33.00	328.60	10,843.80	30.00	9,858.00	90.91									
05.04.05	COLOCACION DE CABEZAL PREFABRICADO	u	33.00	1,598.85	52,782.06	30.00	47,965.00	90.91	2.00	3,197.70	6.06	32.00	10,515.20	96.97	1.00	1,598.85	3.03

VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 06 : OBRAS DE MAR

LICITACION LP-SM-06-2017-FONDEPES-1
 OBRA REHABILITACION DPA DE ACAPULCO
 FORMULA 06 OBRAS DE MAR
 PROPIETARIO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACION LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE Y LLAR-TUMBES

FECHA DE INICIO DE OBRA 28-dic-17
 VALORIZACION N° 20
 FECHA PRESUPUESTO 30-jun-17
 P. REFERENCIAL M.G.V Sr 12,903,758.02
 P. CONTRATO M.G.V Sr 12,903,758.02

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			BALDO CONTRACTUAL		
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%
06.04	LOSAS PREFABRICADAS EN MUELLE Y PUENTE																
05.05.01	LOSAS PREFABRICADA, CONCRETO FC=280 KG/CM2 C/ IMPERMEABILIZANTE	m3	204.92	662.96	135,792.29	204.92	135,792.30	100.00		0.00	0.00	204.92	135,792.30	100.00	0.00	0.00	0.00
05.05.02	LOSAS PREFABRICADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	1,865.51	73.11	121,334.34	1,562.87	114,261.72	94.40		0.00	0.00	1,562.87	114,261.72	94.40	92.84	6,772.62	5.60
05.05.03	LOSAS PREFABRICADAS, ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2	kg	48,660.96	4.16	203,402.81	48,660.96	203,402.81	100.00		0.00	0.00	48,660.96	203,402.81	100.00	0.00	0.00	0.00
05.05.04	TRANSPORTE Y COLOCADO DE LOSA PREFABRICADA	u	82.00	166.80	13,841.60	72.00	12,153.60	87.90	10.00	1,688.00	12.20	82.00	13,841.60	100.00	0.00	0.00	0.00
05.05.05	COLOCACION DE ADITIVO MASILLA EPOXICA SUBMARINA	m2	1,574.80	80.69	127,070.61	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574.80	127,070.61	100.00
06.04	OBRAS DE CONCRETO (IN SITU)																
05.06.01	VIGAS Y NUCLEOS FC=280 KG/CM2 C/ IMPERMEABILIZANTE	m3	246.57	662.96	163,392.08	102.03	67,609.22	41.38	35.13	23,279.25	14.25	137.16	90,888.47	56.63	109.41	72,503.82	44.37
05.06.02	VIGAS Y NUCLEO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO IN SITU	m2	1,217.66	73.11	88,223.12	302.05	22,082.56	24.81	71.30	5,212.74	5.98	373.35	27,295.30	30.66	844.31	61,727.81	69.34
05.06.03	VIGA Y NUCLEO, ACERO FY=4200 KG/CM2	kg	26,282.55	4.16	109,332.66	7,246.76	30,291.48	27.56	4,248.80	17,751.62	16.15	11,493.56	48,043.10	43.71	14,798.99	61,859.78	56.29
05.06.04	PSO DE CONCRETO FC=280 KG/CM2 C/ IMPERMEABILIZANTE	m3	58.37	599.83	35,112.08	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.37	35,012.08	100.00
COSTO DIRECTO					2,059,284.99		1,042,970.87			51,786.51			1,094,757.38			964,527.84	
GASTOS GENERALES			%	17.90	368,612.01		186,691.79			9,269.79			196,961.57			172,650.45	
UTILIDAD			%	0.10	2,059.28		1,042.97			51.79			1,094.76			964.53	
SUB TOTAL					2,429,956.28		1,230,705.63			61,108.09			1,291,813.71			1,138,142.62	
IGV			%	18.00	437,392.13		221,527.01			10,999.46			232,526.47			204,865.67	
TOTAL					2,867,348.41		1,452,232.64			72,107.55			1,524,340.18			1,343,008.29	
AVANCE					100%		50.65%			2.51%			53.16%			46.84%	

CONSORCIO ZORRITOS
 EDGAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Ing. Residente de Obras

ING. RUBEN BOSSUS TOXATI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMPES
 JEFE DE SUPERVISION

**VALORIZACIÓN N° 20 DEL PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO**



VALORIZACION DE OBRA N° 20
 FORMULA 06 : EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

LCGTACION LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
 OBRA REHABILITACION DPA DE ACAPULCO
 FORMULA 06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
 PROPIETARIO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACION LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBEE

FECHA DE INICIO DE OBRA 26-dc-17
 VALORIZACION N° 20
 FECHA PREBUJETO 30-jun-17
 P. REFERENCIAL B.G.V S/ 12.903.758 02
 P. CONTRATO B.G.V S/ 12.903.758 02

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			BALDO CONTRACTUAL		
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%
6	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO																
6.01	UNIDAD FRIGORIFICA																
06.01.01	SUMINISTRO, MORTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CAMARA FRIGORIFICA DE 5TM (INC)	pb	1.00	85.500.00	85.500.00	0.84	71.820.00	84.00				0.84	71.820.00	84.00	0.16	13.680.00	16.00
06.01.02	SUMINISTRO, MORTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CAMARA FRIGORIFICA DE 10TM (INC)	pb	1.00	06.572.00	06.572.00	0.84	89.520.48	84.00				0.84	89.520.48	84.00	0.16	17.051.52	16.00
06.01.03	SUMINISTRO, MORTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE PRODUCTOR DE HIELO DE 1CTM (INC)	pb	1.00	537.508.00	537.508.00	0.84	451.508.72	84.00				0.84	451.508.72	84.00	0.16	86.001.28	16.00
06.01.04	SUMINISTRO, MORTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ENFRADOR DE HIELO (INC TRANSPORTA)	pb	1.00	58.120.00	58.120.00	0.84	48.820.80	84.00				0.84	48.820.80	84.00	0.16	9.299.20	16.00
6.02	EQUIPAMIENTO EN AREA DE TANGAS PREVIAS																
06.02.01	TINAS DE LAVADO DE ACERO INOXIDABLE DE 3MS	u	8.00	6.500.00	52.000.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	8.00	52.000.00	100.00
06.02.02	MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 06 PERS	u	8.00	5.569.00	44.064.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	8.00	44.064.00	100.00
06.02.03	CARRETIILLAS HIDRAULICAS CARGA 2500KG	u	12.00	6.300.00	72.000.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	12.00	72.000.00	100.00
7	MOBILIARIO																
7.01	ACCESORIOS PARA TRANSPORTE Y ESTIBA																
07.01.01	DEPOSITO DE RESIDUOS	J	7.00	385.30	2.695.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	7.00	2.695.00	100.00
07.01.02	CONTENEDOR DE POLIETILENO DE 1000 LITROS	J	3.00	520.30	4.580.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	3.00	4.580.00	100.00
07.01.03	CONTENEDOR DE POLIETILENO ROOANTE DE 300 LITROS	J	6.00	720.30	4.320.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	6.00	4.320.00	100.00
07.01.04	CAJA DE PLASTICO CAP 40 KG (INC. SUM. COL.)	J	100.00	40.30	4.000.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	100.00	4.000.00	100.00
07.01.05	DINO (INC. SUM. COL.)	u	8.00	950.00	7.720.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	8.00	7.720.00	100.00
07.01.06	BALANZA PLATAFORMA (ELECTRONICA) CAP. 1000 KG	u	1.00	13.800.30	13.800.30	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	1.00	13.800.00	100.00
07.01.07	BALANZA DE PIE (ELECTRONICA) CAP. 200 KG	u	8.00	993.00	7.724.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	8.00	7.704.00	100.00
07.01.08	CARRETAS DE ACERO INOXIDABLE CARGA 1 TN	u	10.00	4.730.00	47.500.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	10.00	47.500.00	100.00
07.01.09	CARRETILLA HIDRAULICA CON ELEVADOR DE 1.5TN	u	2.00	6.000.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	2.00	12.000.00	100.00
07.01.10	PARHUELA DE PLASTICO 1200 KG (INC. SUM. COL.)	u	20.00	250.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	20.00	5.000.00	100.00
7.02	ACCESORIOS PARA PERSONAL OPERATIVO																
07.02.01	ROPA DE TRABAJO OPERARIOS	per	50.00	157.00	7.850.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	50.00	7.850.00	100.00
07.02.02	BANCAS DE MADERA DE 1.8X0.40m	per	4.00	280.00	1.200.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	4.00	1.200.00	100.00
07.02.03	ESTANTES PARA VESTIARIOS (SUM. COL. ACC.)	ri	15.00	800.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	15.00	12.000.00	100.00
7.03	MOBILIARIO VARIOS																
07.03.01	SILLA FLJA	J	10.00	141.00	1.410.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	10.00	1.410.00	100.00
07.03.02	MESAS MELAMINE 200X100	mes	1.00	1.100.00	1.100.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	1.00	1.100.00	100.00
07.03.03	ARMARIO 180 X 40	J	3.00	675.00	2.025.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	3.00	2.025.00	100.00
07.03.04	MESA DE PLASTICO CUJO 4 BILAS	me	10.00	250.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	10.00	2.500.00	100.00
07.03.05	SILLON MECANICO CIBRAZO	u	3.00	369.00	1.080.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	3.00	1.080.00	100.00
07.03.06	ESCRITORIO EN L (1.5x0.70)	u	3.00	369.00	1.080.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	3.00	1.080.00	100.00
07.03.07	ARCHIVADOR 4 GAVETAS	u	3.00	850.00	2.550.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	3.00	2.550.00	100.00
07.03.08	ARCHIVADOR 4 GAVETAS	u	4.00	640.00	2.560.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	4.00	2.560.00	100.00
07.03.09	BAHQUETA DE 4 CUERPOS	u	20.00	280.00	5.600.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	20.00	5.600.00	100.00
07.03.10	COCHINA SEMIINDUSTRIAL A GAS	u	1.00	3.800.00	3.800.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	1.00	3.800.00	100.00
07.03.10	REFRIGERADORA DOS PUERTA	u	1.00	1.200.00	1.200.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	1.00	1.200.00	100.00
7.04	EQUIPOS INFORMATICOS																
07.04.01	COMPUTADORAS (INC. ACCESORIOS E INST.)	J	3.00	3.580.00	10.880.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	3.00	10.880.00	100.00
07.04.01	PANTALLA EKRAH	J	1.00	1.430.00	1.430.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	1.00	1.430.00	100.00
07.04.01	PROYECTOR	J	1.00	2.850.00	2.850.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	1.00	2.850.00	100.00
07.04.01	IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL (CON ESCANER)	J	1.00	1.850.00	1.850.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	1.00	1.850.00	100.00
07.04.01	TELEVISOR 40"	J	1.00	2.890.00	2.890.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	1.00	2.890.00	100.00

IMP. RUBEN BOSSUS PONIATTO
 CONSORCIO SUPERVISOR
 DE SUPERVISOR

CONSORCIO ZORRITOS
 CONSORCIO SUPERVISOR
 DE SUPERVISOR


**VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 06 : EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO**

LICITACION LP-3M-05-2017-FONDEPES-1
OBRA REHABILITACIÓN OPA DE ACAPULCO
FORMULA 06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
PROPIETARIO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS
UBICACIÓN LOCALIDAD DE ACAPULCO, ZORRITOS-CENTRAL MARANTE VILLAR, TUMBES

FECHA DE INICIO DE OBRA 28-dic-17
VALORIZACION N° 20
FECHA PRESUPUESTO 30-jun-17
P. REFERENCIAL SI.G.V S/ 12,903,758.02
P. CONTRATO SI.G.V. S/ 12,903,758.02

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UNO	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			BALDO CONTRACTUAL			
			METRADO	PRECIO	TOTAL	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	
07.04.01	MODULO PARA TV	L	1.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	285.00	100.00
7.06	EQUIPOS INFORMATICOS Y DE SEGURIDAD																	
07.05.01	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	L	1.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1.00	6,000.00	100.00
07.05.02	CAMARA DE SEGURIDAD	L	8.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	8.00	40,000.00	100.00
07.05.03	JOYSTICK	L	1.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1.00	2,000.00	100.00
	COSTO DIRECTO				1,175,823.00		661,968.00			0.00		661,968.00		514,155.00				
	GASTOS GENERALES	%	17.90		210,472.32		118,438.57			0.00		118,438.57		92,033.75				
	UTILIDAD	%	0.10		1,175.82		661.67			0.00		661.67		514.16				
	SUB TOTAL				1,387,471.14		780,768.24			0.00		780,768.24		606,702.91				
	IGV	%	18.00		249,744.61		140,538.29			0.00		140,538.28		109,206.52				
	TOTAL				1,637,215.95		921,306.52			0.00		921,306.52		715,909.43				
	AVANCE				100.00		56.27			0.00		56.27		43.73				

CONSORCIO ZORRITOS
 CARLOS FERNANDO REGALADO ORTIZ
 Ing. Residente en Obras


ING. RUBEN BOSSUS TONATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TEMES
 Ing. de Supervisión

CALCULO DEL MONTO BRUTO VALORIZADO



CALCULO DEL MONTO BRUTO VALORIZADO
VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 05 : OBRAS EN MAR

LICITACION : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
 OBRA : REHABILITACIÓN DPA DE ACAPULCO
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACIÓN : LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITO

FECHA DE INICIO DE OBRA : 28-dic-17
 VALORIZACION N° : 20
 FECHA PRESUPUESTO : 30-jun-17
 P. REFERENCIAL S.I.G.V : S/ 2,429,956.28
 P. CONTRATO S.I.G.V. : S/ 2,429,956.28

FORMULA	DESCRIPCION	VAL-10	VAL-11	VAL-12	VAL-13	VAL-14	VAL-15	VAL-16	VAL-17	VAL-18	VAL-19	VAL-20	ACUMULADO
05	OBRAS EN MAR	-	84,725.85	-	28,087.57	9,133.18	37,608.78	51,855.66	84,400.19	113,242.15	48,475.78	61,108.09	1,291,813.74
MONTO BRUTO VALORIZADO ACUMULADO		792,378.39	887,184.34	847,104.34	886,191.91	896,321.09	932,933.87	884,888.83	1,068,988.72	1,182,231.87	1,230,786.65	1,291,813.74	1,291,813.74
		0.00%	2.88%	0.00%	1.20%	0.16%	1.55%	2.13%	3.47%	4.86%	1.39%	2.51%	
		32.81%	35.27%	36.27%	36.47%	36.65%	38.39%	40.52%	43.99%	48.65%	50.35%	53.18%	

CALCULO DEL MONTO BRUTO VALORIZADO
VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 06 : EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

LICITACION : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
 OBRA : REHABILITACIÓN DPA DE ACAPULCO
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACIÓN : LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITO

FECHA DE INICIO DE OBRA : 28-dic-17
 VALORIZACION N° : 20
 FECHA PRESUPUESTO : 30-jun-17
 P. REFERENCIAL S.I.G.V : S/ 1,387,471.14
 P. CONTRATO S.I.G.V. : S/ 1,387,471.14

FORMULA	DESCRIPCION	VAL-10	VAL-11	VAL-12	VAL-13	VAL-14	VAL-15	VAL-16	VAL-17	VAL-18	VAL-19	VAL-20	ACUMULADO
06	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	-	-	-	-	-	83,653.74	-	-	-	-	-	780,788.25
MONTO BRUTO VALORIZADO ACUMULADO		887,114.51	887,114.51	887,114.51	887,114.51	887,114.51	780,788.25	780,788.25	780,788.25	780,788.25	780,788.25	780,788.25	780,788.25
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
			50.24%	50.24%	50.24%	50.24%	58.27%	58.27%	58.27%	58.27%	58.27%	58.27%	

CONSORCIO ZORRITOS
 GERENTE GENERAL
 ING. FERNANDO REGALADO OBLITAS
 (A. Representante de Obra)

ING. RUBEN BOSCH TONJAT
 CONSORCIO SUPERVISOR TONJAT
 JEFE DE SUPERVISIÓN

CALCULO DEL MONTO BRUTO VALORIZADO
VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 03 : INSTALACION SANITARIA

LICITACION : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
 OBRA : REHABILITACION DPA DE ACAPULCO
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACION : LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITO

FECHA DE INICIO DE OBRA : 28-dic-17
 VALORIZACION N° : 20
 FECHA PRESUPUESTO : 30-jun-17
 P. REFERENCIAL S.I.G.V : S/ 1.115.459 39
 P. CONTRATO S.I.G.V. : S/ 1.115.459 39

FORMULA	DESCRIPCION	VAL-10	VAL-11	VAL-12	VAL-13	VAL-14	VAL-15	VAL-16	VAL-17	VAL-18	VAL-19	VAL-20	ACUMULADO
03	INSTALACIONES SANITARIAS	8.854,95	9.054,38	-	-	-	-	-	-	(19.064,17)	-	-	(0,0)
MONTO BRUTO VALORIZADO ACUMULADO		10.009,79	19.064,16	19.064,16	19.064,16	19.064,16	19.064,16	19.064,16	19.064,16	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,01)
		0,61%	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,71%	0,00%	0,00%	0,00%
		0,90%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

CALCULO DEL MONTO BRUTO VALORIZADO
VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 04 : INSTALACION ELECTRICA

LICITACION : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
 OBRA : REHABILITACION DPA DE ACAPULCO
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACION : LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITO

FECHA DE INICIO DE OBRA : 28-dic-17
 VALORIZACION N° : 20
 FECHA PRESUPUESTO : 30-jun-17
 P. REFERENCIAL S.I.G.V : S/ 457.810 85
 P. CONTRATO S.I.G.V. : S/ 457.810 85

FORMULA	DESCRIPCION	VAL-10	VAL-11	VAL-12	VAL-13	VAL-14	VAL-15	VAL-16	VAL-17	VAL-18	VAL-19	VAL-20	ACUMULADO
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	4.124,33	8.175,02	8.260,85	-	-	-	-	-	-	-	-	47.644,17
MONTO BRUTO VALORIZADO ACUMULADO		31.208,30	39.383,31	47.644,17	47.644,17	47.644,17	47.644,17	47.644,17	47.644,17	47.644,17	47.644,17	47.644,17	47.644,17
		0,90%	1,79%	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		8,82%	8,80%	10,41%	13,41%	10,41%	10,41%	10,41%	10,41%	10,41%	10,41%	10,41%	10,41%

CONSORCIO ZORRITOS

ING. FERNANDO GALADO OBITAS
 PRESIDENTE DE OMI

ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
 GERENTE SUPERVISOR TUM
 CENTRO DE SUPERVISION

CALCULO DEL MONTO BRUTO VALORIZADO
VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 01 : ESTRUCTURA

LICITACION : LP-9M-05-2017-FONDEPES-1
 OBRA : REHABILITACIÓN DPA DE ACAPULCO
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACIÓN : LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS

FECHA DE INICIO DE OBRA : 28-dic-17
 VALORIZACION N° : 20
 FECHA PRESUPUESTO : 31/08/2017
 P. REFERENCIAL S.I.G.V : S/ 5,090,026.93
 P. CONTRATO S.I.G.V. : S/ 5,090,026.93

FORMULA	DESCRIPCION	VAL-10	VAL-11	VAL-12	VAL-13	VAL-14	VAL-15	VAL-16	VAL-17	VAL-18	VAL-19	VAL-20	ACUMULADO
01	ESTRUCTURA	248,490.88	192,249.88	114,483.85	405,205.79	79,948.17	65,734.66	34,526.54	12,845.08	16,420.08	19,855.71	116,407.32	4,209,526.74
MONTO BRUTO VALORIZADO ACUMULADO		3,152,248.68	3,344,498.68	3,458,983.41	3,864,189.20	3,944,137.37	4,009,872.03	4,044,388.67	4,067,043.63	4,073,463.71	4,083,119.42	4,209,526.74	4,209,526.74
		4.83%	3.77%	2.25%	7.95%	1.57%	1.29%	0.68%	0.25%	0.32%	0.39%	2.28%	
		61.82%	65.59%	67.84%	75.78%	77.35%	78.64%	79.32%	79.57%	79.89%	80.27%	82.56%	

CALCULO DEL MONTO BRUTO VALORIZADO
VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 02 : ARQUITECTURA

LICITACION : LP-9M-05-2017-FONDEPES-1
 OBRA : REHABILITACIÓN DPA DE ACAPULCO
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACIÓN : LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS

FECHA DE INICIO DE OBRA : 28-dic-17
 VALORIZACION N° : 20
 FECHA PRESUPUESTO : 30-jun-17
 P. REFERENCIAL S.I.G.V : S/ 2,414,033.62
 P. CONTRATO S.I.G.V. : S/ 2,414,033.62

FORMULA	DESCRIPCION	VAL-10	VAL-11	VAL-12	VAL-13	VAL-14	VAL-15	VAL-16	VAL-17	VAL-18	VAL-19	VAL-20	ACUMULADO
02	ARQUITECTURA	45,686.43	84,517.33	-	69,890.20	116,854.68	183,812.83	109,060.16	18,581.40	62,422.05	68,910.30	44,333.44	967,205.52
MONTO BRUTO VALORIZADO ACUMULADO		297,723.14	292,240.47	292,240.47	362,130.67	478,985.35	662,898.18	771,958.34	791,539.74	853,961.79	922,872.08	967,205.52	967,205.52
		1.89%	3.50%	0.00%	2.90%	4.84%	7.62%	4.52%	0.81%	2.59%	2.85%	1.84%	
		8.09%	12.11%	12.11%	15.00%	19.84%	27.46%	31.96%	32.79%	35.37%	38.23%	40.07%	

CONSORCIO ZORRITOS
 FERNANDO GALADO ORTIZ
 Responsable de OMA

ING. RUBEN BOSSUSTONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMSO
 AREA DE SUPERVISION

**CONTROL DE VALORIZACIONES EJECUTADAS VS
PROGRAMADAS**



ENTIDAD: FONDEPES
 OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES
 UBICACIÓN: LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR
 CONTRATO: N° 054 -2017 - FONDEPES
 CONTRATISTA: CONSORCIO ZORRITOS
 SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

MONTO CONTRATO B/: 18,228,434.48 Incl/IGV
 MONTO CONTRATO S/: 12,903,768.02 Sin/IGV

CONTROL DE VALORIZACIONES EJECUTADAS VS. PROGRAMADAS

MES	VALORIZACION		PROGRAMADO			EJECUTADO			% EJE./ PROG.
			AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	
	N°	N° Dias							
dic-17	N° 01	4	1,484.15	1,484.15	0.01%	225,118.18	225,118.18	1.54%	15168.07%
ene-18	N° 02	31	125,865.85	127,349.99	0.87%	23,834.92	248,751.10	1.71%	195.33%
feb-18	N° 03	28	222,250.43	349,600.42	2.40%	239,656.17	488,409.27	3.35%	139.71%
mar-18	N° 04	31	407,178.29	756,778.71	5.19%	507,966.26	996,375.53	6.84%	131.86%
abr-18	N° 05	30	414,214.98	1,170,993.68	8.03%	726,734.55	1,723,130.06	11.82%	147.15%
may-18	N° 06	31	840,825.11	2,011,818.78	13.80%	984,107.92	2,687,238.00	16.44%	133.57%
jun-18	N° 07	30	761,791.45	2,773,610.23	19.03%	678,850.73	3,366,088.73	23.10%	121.36%
jul-18	N° 08	31	946,499.83	3,720,110.15	25.53%	255,926.28	3,622,015.01	24.85%	97.36%
ago-18	N° 09	31	1,040,814.80	4,760,924.95	32.87%	969,904.07	4,591,919.08	31.51%	96.45%
sep-18	N° 10	30	780,250.34	5,541,175.29	38.02%	303,156.59	4,895,075.67	33.59%	88.34%
oct-18	N° 11	31	482,330.39	6,023,505.68	41.33%	879,497.63	5,774,573.30	38.62%	95.87%
nov-18	N° 12	30	1,648,764.45	7,672,270.13	52.84%	157,045.35	5,931,618.65	40.70%	77.31%
dic-18	N° 13	14	1,376,308.93	9,048,579.06	62.09%	971,640.37	6,903,259.02	47.37%	76.29%
ene-19	N° 14	30	372,886.12	9,421,465.19	64.65%	476,516.93	7,379,775.95	50.64%	78.33%
feb-19	N° 15	28	304,566.75	9,726,031.94	66.74%	384,777.39	7,764,553.34	53.28%	79.83%
mar-19	N° 16	31	652,018.62	10,378,050.56	71.21%	445,638.18	8,210,191.52	56.34%	79.11%
abr-19	N° 17	30	1,067,900.17	11,445,950.73	78.66%	180,401.54	8,390,593.06	57.57%	73.16%
may-19	N° 18	31	2,301,846.36	13,747,797.08	94.47%	341,497.60	8,732,090.66	59.92%	63.42%
jun-19	N° 19	30	805,986.80	14,553,783.88	100.00%	167,487.75	8,899,578.41	61.07%	61.07%
jul-19	N° 20	31	0.00	14,553,783.88	100.00%	274,313.68	9,173,892.09	62.95%	62.95%
563			14,573,783.88			9,173,892.09			

NOTA: En la presente valorizacion se realizo la correccion de la curva S, debido al adicional N°05 (Adicional de Concreto Simple), los cuales estos momentos no fueron considerados en las anteriores valorizaciones


CONSORCIO ZORRITOS
 FERNANDO REGALADO OBLITAS
 INGENIERO EN OBRAS

ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISOR



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO - GLOBAL

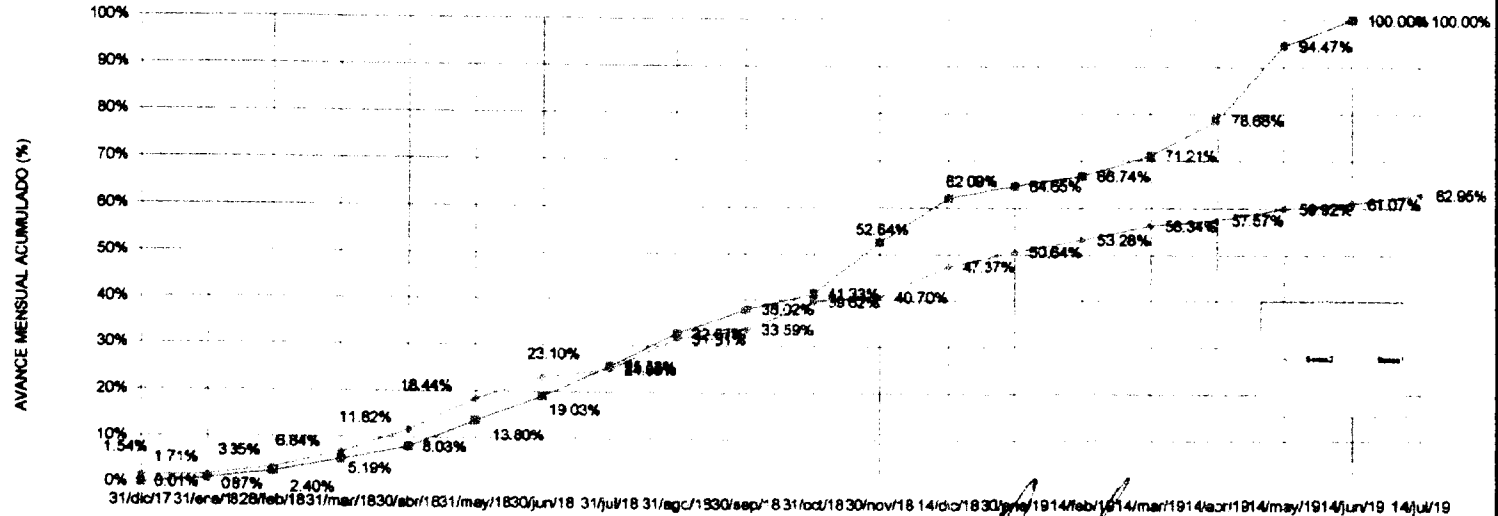

DISTRITO ZORRITOS
ING. FERNANDO REGALADO OBILIAS
 Responsable de Obra

PLAZO DE EJECUCION (MESES)

ING. ROSEN BOGUSZONIATI
 JEFE DE SUPERVISOR TUMES


PROGRAMADO

N° de Días	MES	MONTO (S/)		PORCENTAJES	
		PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
0					
4	dic-17	1,484.15	1,484.15	0.01%	0.01%
31	ene-18	125,865.85	127,349.99	0.86%	0.87%
28	feb-18	222,250.43	349,600.42	1.53%	2.40%
31	mar-18	407,178.29	756,778.71	2.79%	5.19%
30	abr-18	414,214.98	1,170,993.68	2.84%	8.03%
31	may-18	840,825.11	2,011,818.78	5.77%	13.80%
30	jun-18	781,791.45	2,773,610.23	5.23%	19.03%
31	jul-18	946,499.93	3,720,110.15	6.49%	25.53%
31	ago-18	1,040,814.80	4,760,924.95	7.14%	32.67%
30	sep-18	780,250.34	5,541,175.29	5.35%	38.02%
31	oct-18	482,330.39	6,023,505.68	3.31%	41.33%
30	nov-18	1,648,764.45	7,672,270.13	11.31%	52.64%
14	dic-18	1,376,308.93	9,048,579.06	9.44%	62.09%
30	ene-19	372,888.12	9,421,465.19	2.56%	64.65%
28	feb-19	304,568.75	9,726,033.94	2.09%	66.74%
31	mar-19	652,018.82	10,378,052.76	4.47%	71.21%
30	abr-19	1,087,900.17	11,465,952.93	7.48%	78.68%
31	may-19	2,301,846.36	13,767,799.29	15.79%	94.47%
30	jun-19	805,986.80	14,573,786.09	5.53%	100.00%
31	jul-19	0.00	14,573,786.09	0.00%	100.00%
563	TOTAL	14,573,783.86		100.00%	

EJECUTADO

MES	MONTO (S/)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
dic-17	225,116.18	225,116.18	1.54%	1.54%
ene-18	23,834.82	248,951.00	0.18%	1.71%
feb-18	239,658.17	488,609.17	1.64%	3.35%
mar-18	507,966.26	996,575.43	3.49%	6.84%
abr-18	726,754.55	1,723,330.00	4.99%	11.82%
may-18	964,107.92	2,687,437.92	6.82%	18.44%
jun-18	678,650.73	3,366,088.65	4.66%	23.10%
jul-18	255,926.28	3,622,014.93	1.78%	24.85%
ago-18	989,904.07	4,611,919.00	6.66%	31.51%
sep-18	303,156.58	4,915,075.58	2.06%	33.59%
oct-18	879,487.83	5,794,563.41	6.03%	39.62%
nov-18	157,045.35	5,931,608.76	1.09%	40.70%
dic-18	971,640.37	6,903,249.13	6.57%	47.37%
ene-19	476,516.93	7,379,766.06	3.27%	50.64%
feb-19	384,777.39	7,764,543.45	2.54%	53.28%
mar-19	445,638.18	8,210,181.63	3.06%	56.34%
abr-19	180,401.54	8,390,583.17	1.24%	57.57%
may-19	341,487.60	8,732,070.77	2.34%	59.92%
jun-19	167,487.75	8,899,558.52	1.15%	61.07%
jul-19	274,313.88	9,173,872.40	1.89%	62.95%
TOTAL	9,173,872.40		62.95%	

**: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA
CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES**

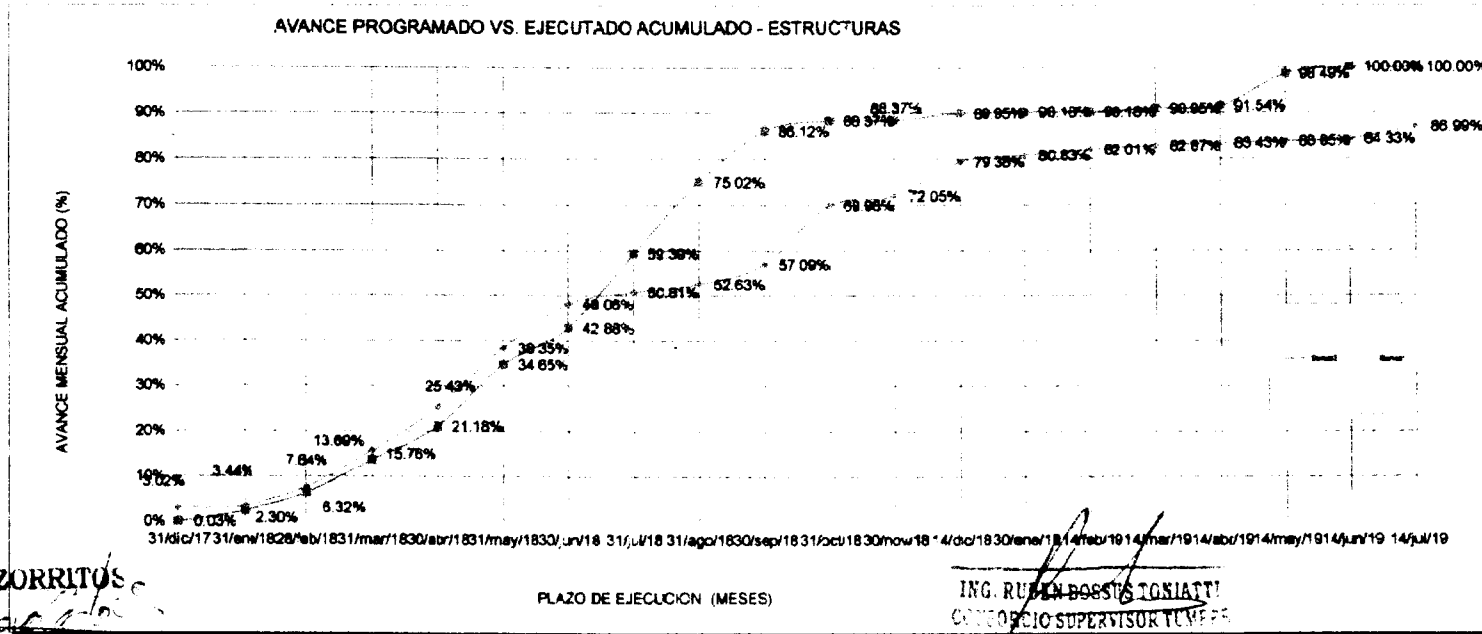

CONSORCIO ZORRITOS
[Signature]
ING. FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Ing Residente de ODI


ING. RUBÉN BOSSIS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISIÓN

Nº de Días	MES	PROGRAMADO		PORCENTAJES	
		MONTOS (S/iv IQV)		PARCIAL	
		PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	%	ACUMUL. %
4	dic-17	1,484.15	1,484.15	0.03%	0.03%
31	ene-18	125,865.85	127,349.99	2.26%	2.30%
28	feb-18	222,250.43	349,600.42	4.02%	6.32%
31	mar-18	407,178.29	756,778.71	7.36%	13.69%
30	abr-18	414,214.96	1,170,993.68	7.45%	21.18%
31	may-18	744,896.37	1,915,890.05	13.47%	34.65%
30	jun-18	455,046.05	2,370,936.10	8.23%	42.88%
31	jul-18	913,163.45	3,284,099.55	16.51%	59.39%
31	ago-18	864,346.18	4,148,445.73	15.82%	75.02%
30	sep-18	813,536.48	4,961,982.21	11.10%	86.12%
31	oct-18	124,762.25	4,886,744.47	2.26%	88.37%
30	nov-18	0.00	4,886,744.47	0.00%	88.37%
14	dic-18	86,931.70	4,973,676.16	1.57%	89.95%
30	ene-19	13,099.83	4,986,775.99	0.24%	90.18%
28	feb-19	0.00	4,986,775.99	0.00%	90.18%
31	mar-19	42,854.77	5,029,630.76	0.77%	90.95%
30	abr-19	32,584.00	5,062,214.76	0.56%	91.54%
31	may-19	383,941.54	5,446,156.30	6.94%	98.49%
30	jun-19	83,629.84	5,529,786.14	1.51%	100.00%
31	jul-19	0.00	5,529,786.14	0.00%	100.00%
563	TOTAL	5,529,786.14		100.00%	

MES	EJECUTADO		PORCENTAJES	
	MONTOS (S/iv IQV)		PARCIAL	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	%	ACUMUL. %
dic-17	166,799.73	166,799.73	3.02%	3.02%
ene-18	23,534.82	190,334.55	0.43%	3.44%
feb-18	231,876.83	422,211.38	4.19%	7.64%
mar-18	449,097.66	871,309.04	8.12%	15.76%
abr-18	534,667.09	1,406,076.33	9.57%	25.43%
may-18	714,735.13	2,120,811.46	12.93%	38.35%
jun-18	536,722.44	2,657,533.90	9.71%	48.06%
jul-18	152,132.55	2,809,666.45	2.75%	50.81%
ago-18	100,364.48	2,910,030.93	1.82%	52.63%
sep-18	248,490.66	3,158,521.59	4.48%	57.06%
oct-18	713,024.97	3,871,546.56	12.86%	69.96%
nov-18	114,433.85	3,986,080.41	2.07%	72.05%
dic-18	405,235.79	4,391,316.20	7.33%	79.38%
ene-19	76,948.17	4,468,264.37	1.45%	80.83%
feb-19	65,734.65	4,534,009.02	1.19%	82.01%
mar-19	47,117.82	4,581,126.84	0.95%	82.87%
abr-19	30,914.83	4,612,041.67	0.56%	83.43%
may-19	23,254.20	4,635,295.87	0.42%	83.86%
jun-19	26,630.59	4,661,926.46	0.48%	84.33%
jul-19	147,056.03	4,808,982.49	2.96%	86.99%
TOTAL	4,810,022.72		86.99%	

**: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA
CONTRALMIERANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES**

AVANCE PROGRAMADO VS. EJECUTADO ACUMULADO - ARQUITECTURA

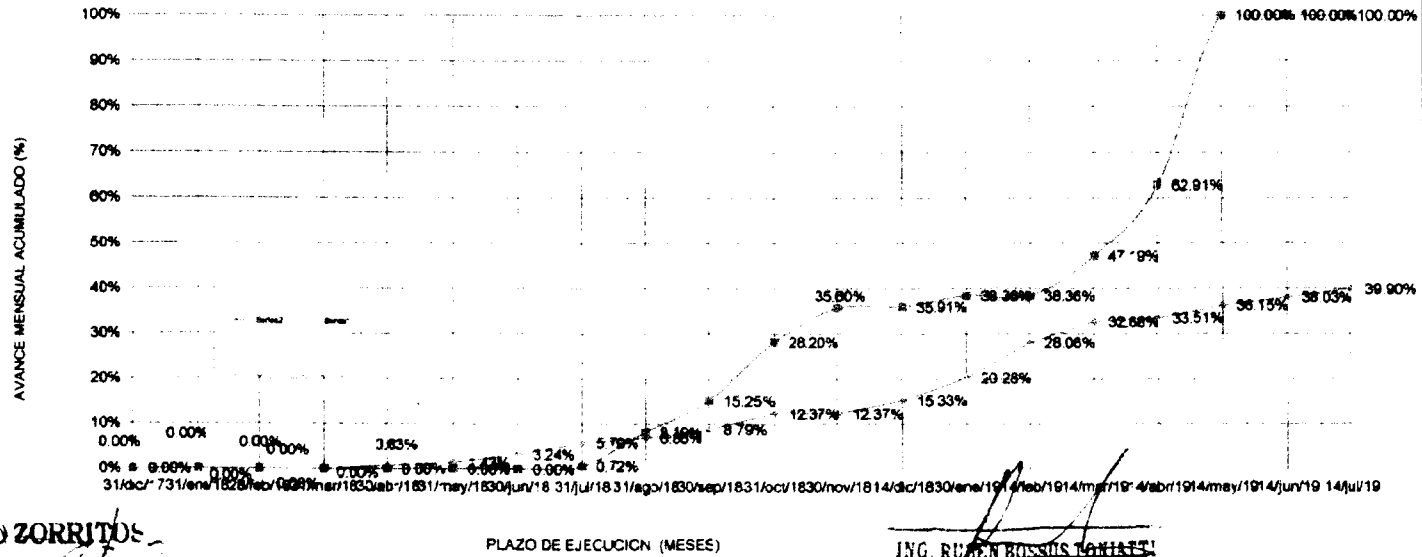

CONSORCIO ZORRITOS

ING. FERNANDO REGALADO OBLITA

PLAZO DE EJECUCION (MESES)


ING. RUBEN BOSSUIS LOHATTI

PLAZO DE SUPERVISIÓN EJECUTADO

Nº de Días	MES	MONTOS (S/ en MIV)		PORCENTAJES	
		PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
		S/.	S/.	%	%
0	dic-17	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4	ene-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	feb-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
28	mar-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	abr-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30	may-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	jun-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30	jul-18	17,077.81	17,077.81	0.72%	0.72%
31	ago-18	176,468.82	193,546.63	7.47%	8.19%
30	sep-18	166,713.85	360,260.48	7.06%	15.25%
31	oct-18	305,775.55	666,036.03	12.94%	28.20%
30	nov-18	174,830.44	840,866.47	7.40%	35.60%
14	dic-18	7,293.83	848,160.30	0.31%	35.91%
30	ene-19	59,108.04	907,268.34	2.46%	38.38%
28	feb-19	0.00	907,268.34	0.00%	38.38%
31	mar-19	208,412.97	1,115,681.31	8.82%	47.19%
30	abr-19	371,468.81	1,487,150.12	15.73%	62.91%
31	may-19	878,083.55	2,365,233.67	37.09%	100.00%
30	jun-19	0.00	2,365,233.67	0.00%	100.00%
31	jul-19	0.00	2,365,233.67	0.00%	100.00%
583	TOTAL	2,362,230.88		100.00%	

MES	MONTOS (S/ en MIV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
	S/.	S/.	%	%
dic-17	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ene-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
feb-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
mar-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
abr-18	19,888.12	19,888.12	0.83%	0.83%
may-18	14,097.17	33,985.29	0.80%	1.43%
jun-18	42,824.44	76,809.73	1.81%	3.24%
jul-18	60,123.22	136,932.95	2.56%	5.79%
ago-18	25,303.77	162,236.71	1.07%	6.86%
sep-18	45,888.43	208,125.14	1.93%	8.79%
oct-18	84,517.33	292,742.47	3.58%	12.37%
nov-18	0.00	292,742.47	0.00%	12.37%
dic-18	89,890.20	382,632.67	2.96%	15.33%
ene-19	116,854.68	499,487.35	4.95%	20.28%
feb-19	183,912.83	683,400.18	7.79%	28.06%
mar-19	108,060.18	791,460.36	4.62%	32.68%
abr-19	19,581.40	811,041.76	0.83%	33.51%
may-19	82,422.05	893,463.81	2.84%	36.35%
jun-19	44,333.44	937,797.25	1.88%	38.03%
jul-19	44,333.44	982,130.69	1.88%	39.90%
TOTAL	942,628.87		39.90%	

: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES

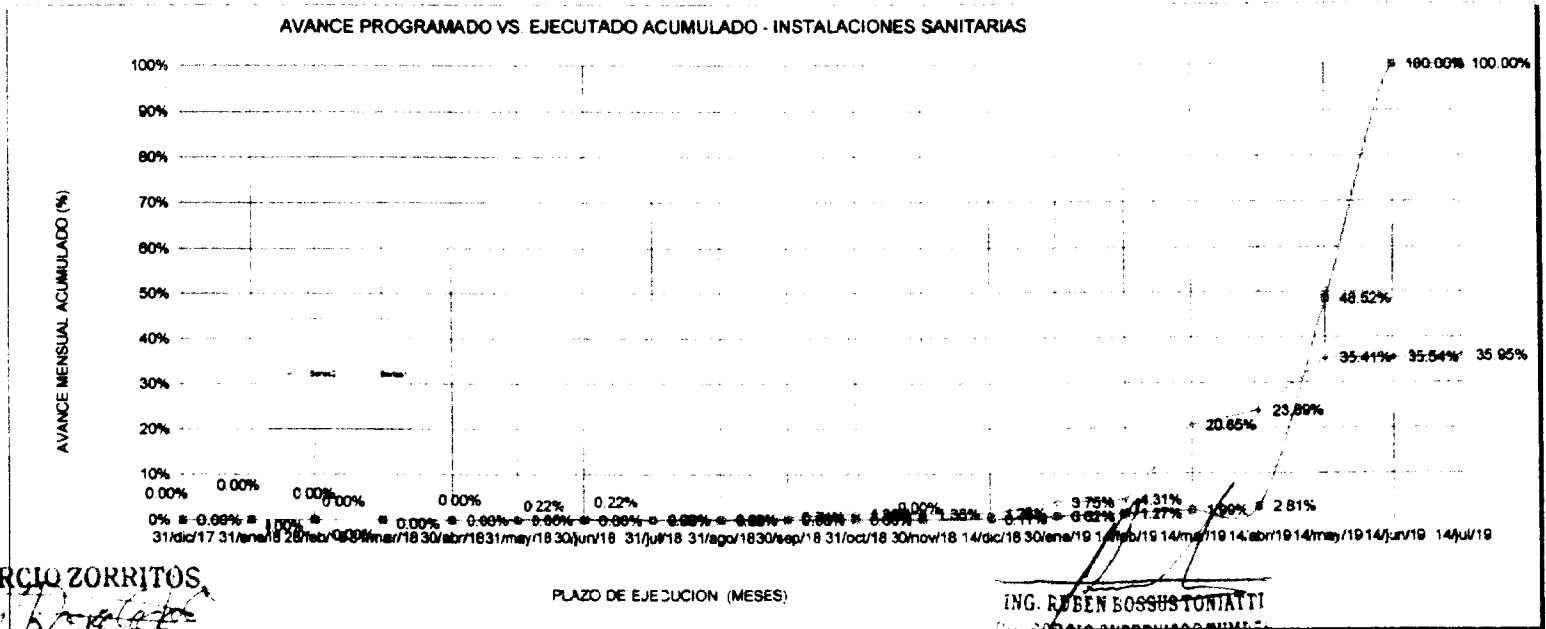

CONSORCIO ZORRITOS
[Signature]
ING. FERNANDO REGALADO OBITAS
 Gerente de Obra

ING. RUBEN BOSSUSTONIATTI
 Gerente Supervisor Tumbes
 Jefe de Supervisión

PROGRAMADO


N° de Días	MES	MONTOS (BIM IGV)		PORCENTAJES	
		PARCIAL \$.	ACUMUL. \$.	PARCIAL %	ACUMUL. %
0	dic-17	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4	ene-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	ene-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
28	feb-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	mar-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30	abr-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	may-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30	jun-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	jul-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	ago-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30	sep-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	oct-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30	nov-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
14	dic-18	1,491.08	1,491.08	0.11%	0.11%
30	ene-19	7,213.02	8,704.10	0.61%	0.82%
28	feb-19	9,087.98	17,792.08	0.85%	1.27%
31	mar-19	10,081.70	27,853.78	0.72%	1.99%
30	abr-19	11,567.61	39,421.39	0.82%	2.81%
31	may-19	641,270.93	680,692.32	45.71%	48.52%
30	jun-19	722,358.98	1,403,049.27	51.45%	100.00%
31	jul-19	0.00	1,403,049.27	0.00%	100.00%
563	TOTAL	1,403,049.27		100.00%	

EJECUTADO

MES	MONTOS (BIM IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL \$.	ACUMUL. \$.	PARCIAL %	ACUMUL. %
dic-17	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ene-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
feb-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
mar-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
abr-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
may-18	3,154.85	3,154.85	0.22%	0.22%
jun-18	0.00	3,154.85	0.00%	0.22%
jul-18	0.00	3,154.85	0.00%	0.22%
ago-18	0.00	3,154.85	0.00%	0.22%
sep-18	6,854.95	10,009.79	0.49%	0.71%
oct-18	9,054.38	19,064.18	0.65%	1.36%
nov-18	0.00	19,064.18	0.00%	1.36%
dic-18	0.00	19,064.18	0.00%	1.36%
ene-19	33,569.13	52,633.29	2.33%	3.75%
feb-19	7,886.98	60,520.27	0.59%	4.31%
mar-19	229,192.36	269,712.63	16.34%	20.66%
abr-19	45,505.12	335,217.65	3.24%	23.89%
may-19	161,633.37	496,851.02	11.52%	35.41%
jun-19	1,777.50	498,628.52	0.13%	35.54%
jul-19	5,811.11	504,439.63	0.41%	35.95%
TOTAL	504,439.63		35.95%	

**: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA
CONTRAL MIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES**

AVANCE PROGRAMADO VS. EJECUTADO ACUMULADO - INSTALACIONES ELECTRICAS

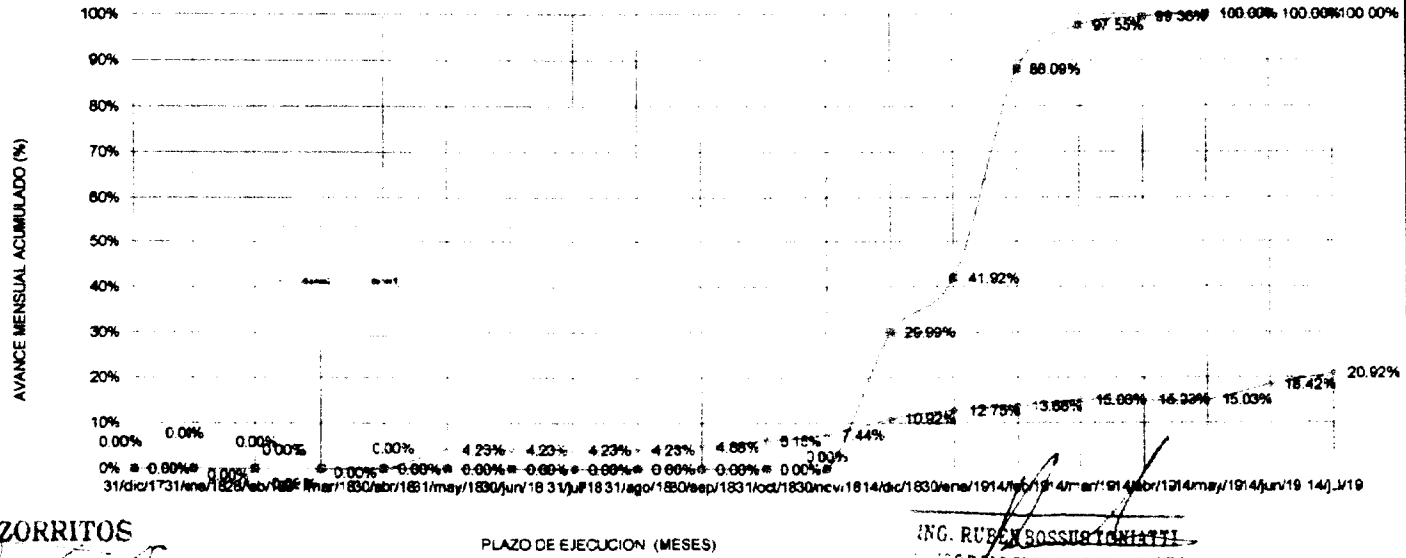


CONSORCIO ZORRITOS
[Handwritten signature]
ING. ERNAN K. REGALADO OBITAS
 Responsable de Obra

ING. RUBEN BOSSIO TONATTI
 COORDINADOR SUPERVISOR TUMBES

N° de Días	MES	MONTOS (\$/M IGV)		PORCENTAJES	
		PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
		SI.	SI.	%	%
0		0.00	0.00	0.00%	0.00%
4	dic-17	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	ene-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
28	feb-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	mar-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30	abr-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	may-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30	jun-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	jul-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	ago-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30	sep-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	oct-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30	nov-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
14	dic-18	191,961.82	191,961.82	29.92%	29.92%
30	ene-19	76,263.74	268,225.56	11.82%	41.74%
28	feb-19	295,478.77	563,704.33	46.77%	88.51%
31	mar-19	60,538.89	624,243.22	9.46%	97.97%
30	abr-19	11,578.40	635,821.62	1.81%	99.78%
31	may-19	4,127.13	639,948.75	0.64%	100.42%
30	jun-19	0.00	639,948.75	0.00%	100.42%
31	jul-19	0.00	639,948.75	0.00%	100.42%
563	TOTAL	639,978.75		100.00%	

MES	MONTOS (\$/M IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
	SI.	SI.	%	%
dic-17	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ene-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
feb-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
mar-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
abr-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
may-18	27,083.96	27,083.96	4.23%	4.23%
jun-18	0.00	27,083.96	0.00%	4.23%
jul-18	0.00	27,083.96	0.00%	4.23%
ago-18	0.00	27,083.96	0.00%	4.23%
sep-18	4,124.33	31,208.30	0.64%	4.88%
oct-18	8,175.02	39,383.31	1.28%	6.15%
nov-18	8,266.85	47,644.17	1.29%	7.44%
dic-18	22,288.71	69,912.98	3.48%	10.92%
ene-19	11,059.13	80,972.11	1.82%	12.75%
feb-19	5,990.49	86,962.60	0.93%	13.88%
mar-19	6,612.18	93,574.78	1.35%	15.03%
abr-19	0.00	93,574.78	0.00%	15.03%
may-19	0.00	93,574.78	0.00%	15.03%
jun-19	21,895.58	115,470.36	3.39%	18.42%
jul-19	16,005.01	131,475.37	2.50%	20.92%
TOTAL	133,875.27		20.92%	

: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES

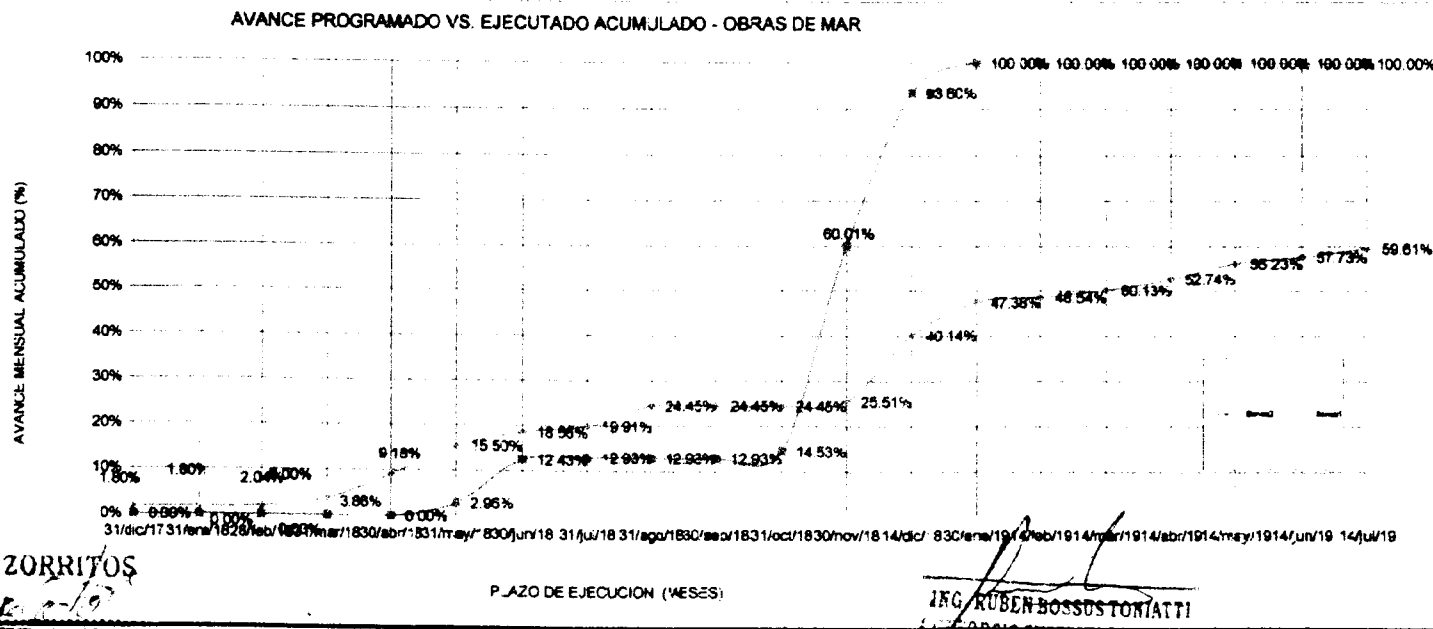

CONSORCIO ZORRITOS
 Ing. Fernando Regalado Obitas
 Gerente de Obra


ING. RUBEN BOSSO TORTATI
 Gerente Supervisor de Obra

PROGRAMADO

Nº de Días	MES	MONTOS (S/iv IGV)		PORCENTAJES	
		PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
0					
4	dic-17	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31	ene-18	0,00	0,00	0,00%	0,00%
28	feb-18	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31	mar-18	0,00	0,00	0,00%	0,00%
30	abr-18	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31	may-18	95.928.74	95.928.74	2.96%	2.96%
30	jun-18	306.745.39	402.574.12	9.47%	12.43%
31	jul-18	16.258.87	418.832.99	0.50%	12.93%
31	ago-18	0,00	418.832.99	0,00%	12.93%
30	sep-18	0,00	418.832.99	0,00%	12.93%
31	oct-18	51.792.58	470.725.57	1.60%	14.53%
30	nov-18	1.473.934.02	1.944.569.59	45.48%	60.01%
14	dic-18	1.088.630.69	3.033.200.28	33.59%	93.60%
30	ene-19	207.468.37	3.240.758.64	6.40%	100.00%
28	feb-19	0,00	3.240.758.64	0,00%	100.00%
31	mar-19	0,00	3.240.758.64	0,00%	100.00%
30	abr-19	0,00	3.240.758.64	0,00%	100.00%
31	may-19	0,00	3.240.758.64	0,00%	100.00%
30	jun-19	0,00	3.240.758.64	0,00%	100.00%
31	jul-19	0,00	3.240.758.64	0,00%	100.00%
583	TOTAL	3.240.758.64		100.00%	

MES	MONTOS (S/iv IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
dic-17	58.316.46	58.316.46	1.80%	1.80%
ene-18	0,00	58.316.46	0,00%	1.80%
feb-18	7.781.23	66.097.69	0.24%	2.04%
mar-18	58.868.88	124.966.57	1.82%	3.86%
abr-18	172.399.34	297.365.91	5.32%	9.18%
may-18	205.036.81	502.402.72	6.33%	15.50%
jun-18	99.233.85	601.636.57	3.06%	18.56%
jul-18	43.820.51	645.457.08	1.36%	19.91%
ago-18	147.121.32	792.578.40	4.54%	24.45%
sep-18	0,00	792.578.40	0,00%	24.45%
oct-18	0,00	792.578.40	0,00%	24.45%
nov-18	34.300.65	826.879.05	1.06%	25.51%
dic-18	474.275.67	1.301.154.72	14.63%	40.14%
ene-19	234.475.82	1.535.630.54	7.24%	47.38%
feb-19	37.608.78	1.573.239.32	1.16%	48.54%
mar-19	51.855.66	1.625.094.98	1.59%	50.13%
abr-19	84.400.19	1.709.495.17	2.50%	52.74%
may-19	113.242.15	1.822.737.32	3.49%	55.23%
jun-19	48.473.78	1.871.211.10	1.50%	57.73%
jul-19	61.108.09	1.932.319.19	1.89%	59.61%
TOTAL	1.931.919.19		59.61%	

**: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA
CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES**

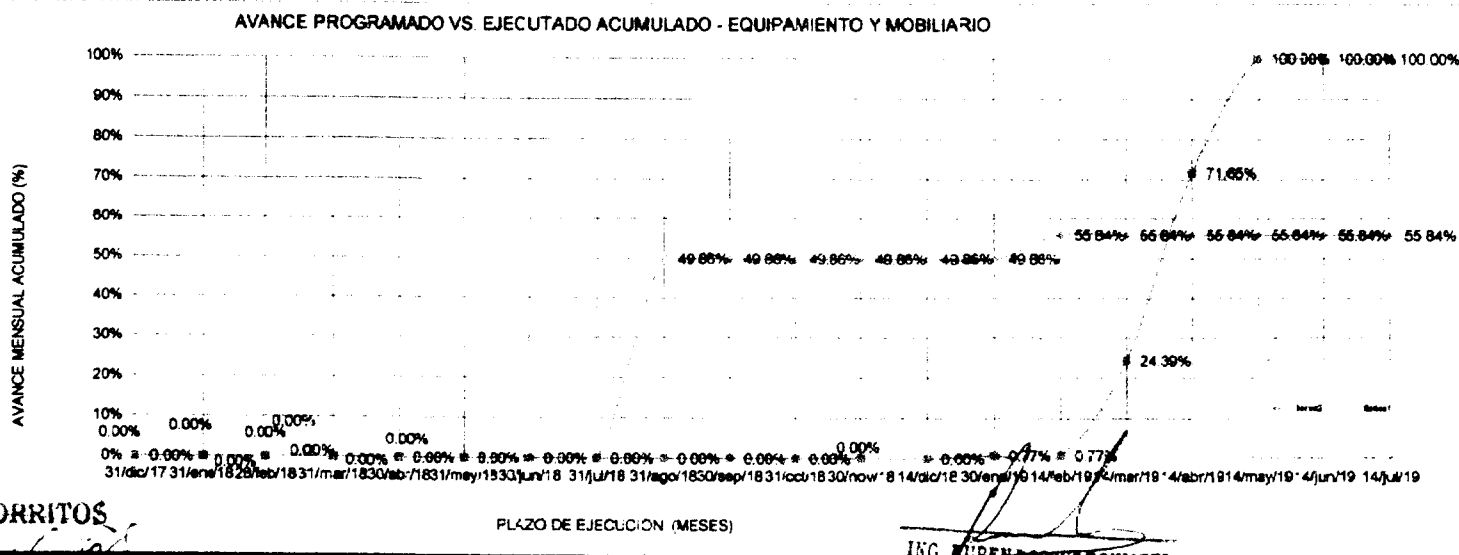


CONSORCIO ZORRITOS
[Signature]
ING. ERNANDO REGALADO OBILITAS
 INGENIERO EN SISTEMAS DE OBRAS

ING. RUBEN BOSSIS TOMATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISIÓN EJECUTADO

Nº de Días	MES	MONTOS (Sin IGV)		PORCENTAJES	
		PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
		S/.	S/.	%	%
0					
4	dic-17	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	ene-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
28	feb-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	mar-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30	abr-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	may-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30	jun-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	jul-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	ago-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30	sep-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	oct-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30	nov-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
14	dic-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30	ene-19	10,705.31	10,705.31	0.77%	0.77%
28	feb-19	0.00	10,705.31	0.00%	0.77%
31	mar-19	330,350.28	341,055.59	23.83%	24.39%
30	abr-19	660,700.64	1,001,756.13	47.26%	71.65%
31	may-19	396,420.33	1,398,176.46	28.36%	100.00%
30	jun-19	0.00	1,398,176.46	0.00%	100.00%
31	jul-19	0.00	1,398,176.46	0.00%	100.00%
583	TOTAL	1,398,176.46		100.00%	

MES	MONTOS (Sin IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
	S/.	S/.	%	%
dic-17	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ene-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
feb-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
mar-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
abr-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
may-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
jun-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
jul-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ago-18	697,114.51	697,114.51	49.86%	49.86%
sep-18	0.00	697,114.51	0.00%	49.86%
oct-18	0.00	697,114.51	0.00%	49.86%
nov-18	0.00	697,114.51	0.00%	49.86%
dic-18	0.00	697,114.51	0.00%	49.86%
ene-19	0.00	697,114.51	0.00%	49.86%
feb-19	83,653.74	780,768.25	5.28%	55.84%
mar-19	0.00	780,768.25	0.00%	55.84%
abr-19	0.00	780,768.25	0.00%	55.84%
may-19	0.00	780,768.25	0.00%	55.84%
jun-19	0.00	780,768.25	0.00%	55.84%
jul-19	0.00	780,768.25	0.00%	55.84%
TOTAL	780,768.25		55.84%	

REINTEGROS Y REAJUSTES DEDUCIDOS



CUADRO DE REINTEGROS Y REAJUSTES DEDUCIDOS

VALORIZACION DE OBRA N° 20

FORMULA 01 : ESTRUCTURA

LICITACION	: LP-SM-05-2017-FONDEPES-1	FECHA DE INICIO DE OBRA :	28-dic-17
OBRA	: REHABILITACION DPA DE ACAPULCO	FECHA PRESUPUESTO :	30-jun-17
PROPIETARIO	: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)	P. REFERENCIAL B.I.G.V. :	B/ 12,903,756.02
CONTRATISTA	: CONSORCIO ZORRITOS	P. CONTRATO B.I.G.V. :	B/ 12,903,756.02
UBICACION	: LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES	VALORIZACION N° :	20

CALCULO DE REINTEGROS DE VALORIZACIÓN ANTES DEL ANTERIOR

FORMULA POLINOMICA	PRESENTE VALORIZACION			Kr	K(ini)		REAJUSTES DE REINTEGROS R=(Kr-Kant)*V	DEDUCCION DE ADELANTO EN EFECTIVO	DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	REAJUSTE DE REINTEGROS NETOS	
ESTRUCTURA	17	abr-19	12 845.06	K - marzo	1.070	Kini	1.070	885.15	46.97	0.00	838.18
TOTALES			12 845.06					885.15	46.97	0.00	838.18

CALCULO DE REINTEGROS DE VALORIZACIÓN ANTES DEL ANTERIOR

FORMULA POLINOMICA	PRESENTE VALORIZACION			Kr	K(ini)		REAJUSTES DE REINTEGROS R=(Kr-Kant)*V	DEDUCCION DE ADELANTO EN EFECTIVO	DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	REAJUSTE DE REINTEGROS NETOS	
ESTRUCTURA	18	may-19	18 420.06	K - abril	1.070	Kini	1.070	1 149.41	60.99	0.00	1 088.42
TOTALES			18 420.06					1 149.41	60.99	0.00	1 088.42

CALCULO DE REINTEGROS DE VALORIZACIÓN ANTERIOR

FORMULA POLINOMICA	PRESENTE VALORIZACION			Kr	K(ini)		REAJUSTES DE REINTEGROS R=(Kr-Kant)*V	DEDUCCION DE ADELANTO EN EFECTIVO	DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	REAJUSTE DE REINTEGROS NETOS	
ESTRUCTURA	19	jun-19	19 655.71	K - mayo	1.074	Kini	1.074	1 454.52	78.73	0.00	1 375.79
TOTALES			19 655.71					1 454.52	78.73	0.00	1 375.79


CALCULO DE REINTEGROS PRESENTE VALORIZACION


FORMULA POLINOMICA	PRESENTE VALORIZACION			Kr	K(ini)		REAJUSTES DE REINTEGROS R=(Kr-Kant)*V	DEDUCCION DE ADELANTO EN EFECTIVO	DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	REAJUSTE DE REINTEGROS NETOS	
ESTRUCTURA	20	jul-19	116 407.32	K - junio	1.072	Kini	1.072	8 381.33	449.33	0.00	7 932.00
TOTALES			116 407.32					8 381.33	449.33	0.00	7 932.00

TOTAL REINTEGROS

RESUMEN:

TOTAL REINTEGROS	FORMULAS	01 ESTRUCTURA	17 475.97
-------------------------	-----------------	----------------------	------------------


CONSORCIO ZORRITOS
 Ing. ARNANDO REGALADO OBITAS
 Residente en Obra


ING. RUBEN ROSAS TOMIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

CUADRO DE REINTEGROS Y REAJUSTES

VALORIZACION DE OBRA N° 20

FORMULA 02 : ARQUITECTURA

LICITACION	: LP-SM-05-2017-FONDEPES-1	FECHA DE INICIO DE OBRA :	28-dic-17
OBRA	: REHABILITACION DPA DE ACAPULCO	FECHA PRESUPUESTO :	30-jun-17
PROPIETARIO	: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)	P. REFERENCIAL B/I.G.V. :	8/ 12 903.758 02
CONTRATISTA	: CONSORCIO ZORRITOS	P. CONTRATO B/I.G.V. :	8/ 12 903.758 02
UBICACIÓN	: LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRA-MIRANTE VILLAR-TUMBES	VALORIZACION N° :	20

CALCULO DE REINTEGROS DE VALORIZACIÓN ANTES DEL ANTERIOR

FORMULA POLINOMICA	PRESENTE VALORIZACION			Kr	K(ini)			REAJUSTES DE REINTEGROS R=(Kr-Kant)*V	DEDUCCION DE ADELANTO EN EFECTIVO	DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	REAJUSTE DE REINTEGROS NETOS
ARQUITECTURA	17	abr-19	19 581.40	K - marzo 1.053	Kini	1.053		1 037.81	55.89	0.00	981.92
TOTALES			19 581.40					1 037.81	55.89	0.00	981.92

CALCULO DE REINTEGROS DE VALORIZACIÓN ANTES DEL ANTERIOR

FORMULA POLINOMICA	PRESENTE VALORIZACION			Kr	K(ini)			REAJUSTES DE REINTEGROS R=(Kr-Kant)*V	DEDUCCION DE ADELANTO EN EFECTIVO	DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	REAJUSTE DE REINTEGROS NETOS
ARQUITECTURA	18	may-19	62 422.05	K - abril 1.051	Kini	1.051		3 183.52	189.04	0.00	3 014.48
TOTALES			62 422.05					3 183.52	189.04	0.00	3 014.48

CALCULO DE REINTEGROS DE VALORIZACIÓN ANTERIOR


FORMULA POLINOMICA	PRESENTE VALORIZACION			Kr	K(ini)			REAJUSTES DE REINTEGROS R=(Kr-Kant)*V	DEDUCCION DE ADELANTO EN EFECTIVO	DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	REAJUSTE DE REINTEGROS NETOS
ARQUITECTURA	19	jun-19	68 910.30	K - mayo 1.055	Kini	1.055		3 790.07	206.78	0.00	3 583.29
TOTALES			68 910.30					3 790.07	206.78	0.00	3 583.29


CALCULO DE REINTEGROS PRESENTE VALORIZACION

FORMULA POLINOMICA	PRESENTE VALORIZACION			Kr	K(ini)			REAJUSTES DE REINTEGROS R=(Kr-Kant)*V	DEDUCCION DE ADELANTO EN EFECTIVO	DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	REAJUSTE DE REINTEGROS NETOS
ARQUITECTURA	20	jul-19	44 333.44	K - junio 1.055	Kini	1.055		2 438.34	133.03	0.00	2 305.31
TOTALES			44 333.44					2 438.34	133.03	0.00	2 305.31

TOTAL REINTEGROS

RESUMEN :	TOTAL REINTEGROS	CONSORCIO ZORRITOS	02 ARQUITECTURA	24 088.20
------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	------------------


CONSORCIO ZORRITOS
 FERNANDO BECALADO OBLITAS
 Residente de Obra


ING. RUBEN BOSSUSTONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISOR

060

**CUADRO DE REINTEGROS Y REAJUSTES
VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 03 : INSTALACIONES SANITARIAS**

LICITACION	: LP-SM-05-2017-FONDEPES-1	FECHA DE INICIO DE OBRA :	28-dic-17
OBRA	: REHABILITACION DPA DE ACAPULCO	FECHA PREBUJESTO :	30-mar-17
PROPIETARIO	: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)	P. REFERENCIAL B/L.G.V :	8/ 0.00
CONTRATISTA	: CONSORCIO ZORRITOS	P. CONTRATO B/L.G.V. :	8/ 12,903,758.02
UBICACION	: LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES	VALORIZACION N° :	20

CALCULO DE REINTEGROS DE VALORIZACION ANTES DEL ANTERIOR

FORMULA POLINOMICA	PRESENTE VALORIZACION			Kr	K(ini)		REAJUSTES DE REINTEGROS $R=(Kr-Kant)*V$	DEDUCCION DE ADELANTO EN EFECTIVO	DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	REAJUSTE DE REINTEGROS NETOS
INSTALACIONES SANITARIAS	17	abr-19	0.00	K - marzo 1.059	Kini	1.059	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00

CALCULO DE REINTEGROS DE VALORIZACION ANTES DEL ANTERIOR

FORMULA POLINOMICA	PRESENTE VALORIZACION			Kr	K(ini)		REAJUSTES DE REINTEGROS $R=(Kr-Kant)*V$	DEDUCCION DE ADELANTO EN EFECTIVO	DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	REAJUSTE DE REINTEGROS NETOS
INSTALACIONES SANITARIAS	18	may-19	-19 084.17	K - abril 1.058	Kini	1.058	-1 087.59	0.00	0.00	-1 087.59
TOTALES			-19 084.17				-1 087.59	0.00	0.00	-1 087.59

CALCULO DE REINTEGROS DE VALORIZACION ANTERIOR

FORMULA POLINOMICA	PRESENTE VALORIZACION			Kr	K(ini)		REAJUSTES DE REINTEGROS $R=(Kr-Kant)*V$	DEDUCCION DE ADELANTO EN EFECTIVO	DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	REAJUSTE DE REINTEGROS NETOS
INSTALACIONES SANITARIAS	19	jun-19	0.00	K - mayo 1.058	Kini	1.058	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00

CALCULO DE REINTEGROS PRESENTE VALORIZACION

FORMULA POLINOMICA	PRESENTE VALORIZACION			Kr	K(ini)		REAJUSTES DE REINTEGROS $R=(Kr-Kant)*V$	DEDUCCION DE ADELANTO EN EFECTIVO	DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	REAJUSTE DE REINTEGROS NETOS
INSTALACIONES SANITARIAS	20	jul-19	0.00	K - junio 1.058	Kini	1.058	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL REINTEGROS

RESUMEN:	TOTAL REINTEGROS	CONSORCIO ZORRITOS	03 INSTALACIONES SANITARIAS	-1 087.59
-----------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------------	------------------

ING. FERNANDO REGALADO OBLITAS
K. Zorritos de Obra

ING. RUBEN BESSUS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
UNID. DE SUPERVISION

CUADRO DE REINTEGROS Y REAJUSTES
VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS

LICITACION	: LP-SM-05-2017-FONDEPES-1	FECHA DE INICIO DE OBRA :	26-dic-17
OBRA	: REHABILITACIÓN DPA DE ACAPULCO	FECHA PRESUPUESTO :	30-jun-17
PROPIETARIO	: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)	P. REFERENCIAL B.L.G.V. :	SI 0.00
CONTRATISTA	: CONSORCIO ZORRITOS	P. CONTRATO B.L.G.V. :	SI 12,903,758.02
UBICACIÓN	: LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES	VALORIZACION N° :	20

CALCULO DE REINTEGROS DE VALORIZACIÓN ANTES DEL ANTERIOR

FORMULA POLINOMICA	PRESENTE VALORIZACION			Kr	K(ini)			REAJUSTES DE REINTEGROS $R=(Kr-Kant)*V$	DEDUCCION DE ADELANTO EN EFECTIVO	DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	REAJUSTE DE REINTEGROS NETOS
INSTALACIONES ELECTRICAS	17	abr-19	0.00	K - marzo	1.057	Kini	1.057	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES			0.00					0.00	0.00	0.00	0.00

CALCULO DE REINTEGROS DE VALORIZACIÓN ANTES DEL ANTERIOR

FORMULA POLINOMICA	PRESENTE VALORIZACION			Kr	K(ini)			REAJUSTES DE REINTEGROS $R=(Kr-Kant)*V$	DEDUCCION DE ADELANTO EN EFECTIVO	DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	REAJUSTE DE REINTEGROS NETOS
INSTALACIONES ELECTRICAS	18	may-19	0.00	K - abril	1.053	Kini	1.053	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES			0.00					0.00	0.00	0.00	0.00

CALCULO DE REINTEGROS DE VALORIZACIÓN ANTERIOR

FORMULA POLINOMICA	PRESENTE VALORIZACION			Kr	K(ini)			REAJUSTES DE REINTEGROS $R=(Kr-Kant)*V$	DEDUCCION DE ADELANTO EN EFECTIVO	DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	REAJUSTE DE REINTEGROS NETOS
INSTALACIONES ELECTRICAS	19	jun-19	0.00	K - mayo	1.056	Kini	1.056	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES			0.00					0.00	0.00	0.00	0.00

CALCULO DE REINTEGROS PRESENTE VALORIZACION

FORMULA POLINOMICA	PRESENTE VALORIZACION			Kr	K(ini)			REAJUSTES DE REINTEGROS $R=(Kr-Kant)*V$	DEDUCCION DE ADELANTO EN EFECTIVO	DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	REAJUSTE DE REINTEGROS NETOS
INSTALACIONES ELECTRICAS	20	jul-19	0.00	K - junio	1.053	Kini	1.053	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES			0.00					0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL REINTEGROS

RESUMEN:

TOTAL REINTEGROS	FORMULAS	04 INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00
------------------	----------	-----------------------------	------

CONSORCIO ZORRITOS

ING. FERNANDO DE SALAS OBLITAS
 Responsable de O.M.

ING. RUBEN BOSCHS TORIATI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

CUADRO DE REINTEGROS Y REAJUSTES
VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 05 : OBRAS EN MAR

LICITACION	: LP-SM-05-2017-FONDEPES-1	FECHA DE INICIO DE OBRA :	28-dic-17
OBRA	: REHABILITACIÓN DPA DE ACAPULCC	FECHA PRESUPUESTO :	30-jun-17
PROPIETARIO	: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)	P. REFERENCIAL S/I.G.V. :	S/ 12.903,758.02
CONTRATISTA	: CONSORCIO ZORRITOS	P. CONTRATO S/I.G.V. :	S/ 12.903,758.02
UBICACIÓN	: LOCALIDAD DE ACAPULCC-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES	VALORIZACION N° :	20

CALCULO DE REINTEGROS DE VALORIZACIÓN ANTES DEL ANTERIOR

FORMULA POLINOMICA	PRESENTE VALORIZACION			Kr	K(fin)	REAJUSTES DE REINTEGROS R=(Kr-Kant)*V	DEDUCCION DE ADELANTO EN EFECTIVO	DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	REAJUSTE DE REINTEGROS NETOS
OBRAS EN MAR	17	abr-19	84 400.19	K - marzo 1.073	Kini 1.073	6 181.21	280.55	0.00	5 880.66
TOTALES			84 400.19			6 181.21	280.55	0.00	5 880.66

CALCULO DE REINTEGROS DE VALORIZACIÓN ANTES DEL ANTERIOR

FORMULA POLINOMICA	PRESENTE VALORIZACION			Kr	K(fin)	REAJUSTES DE REINTEGROS R=(Kr-Kant)*V	DEDUCCION DE ADELANTO EN EFECTIVO	DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	REAJUSTE DE REINTEGROS NETOS
OBRAS EN MAR	18	may-19	113 242.15	K - abril 1.070	Kini 1.070	7 926.95	0.00	0.00	7 926.95
TOTALES			113 242.15			7 926.95	0.00	0.00	7 926.95

CALCULO DE REINTEGROS DE VALORIZACIÓN ANTERIOR

FORMULA POLINOMICA	PRESENTE VALORIZACION			Kr	K(fin)	REAJUSTES DE REINTEGROS R=(Kr-Kant)*V	DEDUCCION DE ADELANTO EN EFECTIVO	DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	REAJUSTE DE REINTEGROS NETOS
OBRAS EN MAR	19	jun-19	61 108.09	K - mayo 1.075	Kini 1.075	3 635.53	168.13	0.00	3 467.40
TOTALES			61 108.09			3 635.53	168.13	0.00	3 467.40

CALCULO DE REINTEGROS PRESENTE VALORIZACION

FORMULA POLINOMICA	PRESENTE VALORIZACION			Kr	K(fin)	REAJUSTES DE REINTEGROS R=(Kr-Kant)*V	DEDUCCION DE ADELANTO EN EFECTIVO	DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	REAJUSTE DE REINTEGROS NETOS
OBRAS EN MAR	20	jul-19	61 108.09	K - junio 1.074	Kini 1.074	4 522.00	207.54	0.00	4 314.46
TOTALES			61 108.09			4 522.00	207.54	0.00	4 314.46

TOTAL REINTEGROS

RESUMEN :

TOTAL REINTEGROS	CONSORCIO ZORRITOS	05 OBRAS EN MAR	31 301.84
-------------------------	---------------------------	------------------------	------------------

CONSORCIO ZORRITOS
ING. FERNANDO REGALADO OBILTA
 Residente de Obra

ING. RUBEN BOSSUSTONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISIÓN

**CUADRO DE REINTEGROS Y REAJUSTES
VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 06 : EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO**

LICITACION	LP-SM-05-2017-FONDEPES-1	FECHA DE INICIO DE OBRA :	28-dic-17
OBRA	REHABILITACION DPA DE ACAPULCO	FECHA PREBUPUESTO :	30-jun-17
PROPIETARIO	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)	P. REFERENCIAL S.M.G.V. :	S/ 0.00
CONTRATISTA	CONSORCIO ZORRITOS	P. CONTRATO S.M.G.V. :	S/ 2,908,758.02
UBICACION	LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES	VALORIZACION N° :	20

CALCULO DE REINTEGROS DE VALORIZACION ANTES DEL ANTERIOR

FORMULA POLINOMICA	PRESENTE VALORIZACION			Kr	K(ini)	REAJUSTES DE REINTEGROS $R=(Kr-Kant)*V$	DEDUCCION DE ADELANTO EN EFECTIVO	DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	REAJUSTE DE REINTEGROS NETOS	
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	17	abr-19	0.00	K - marzo	1.047	Kini	1.047	0.00	0.00	0.00
TOTALES			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00

CALCULO DE REINTEGROS DE VALORIZACION ANTES DEL ANTERIOR

FORMULA POLINOMICA	PRESENTE VALORIZACION			Kr	K(ini)	REAJUSTES DE REINTEGROS $R=(Kr-Kant)*V$	DEDUCCION DE ADELANTO EN EFECTIVO	DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	REAJUSTE DE REINTEGROS NETOS	
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	18	may-19	0.00	K - abril	1.049	Kini	1.049	0.00	0.00	0.00
TOTALES			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00

CALCULO DE REINTEGROS DE VALORIZACION ANTERIOR

FORMULA POLINOMICA	PRESENTE VALORIZACION			Kr	K(ini)	REAJUSTES DE REINTEGROS $R=(Kr-Kant)*V$	DEDUCCION DE ADELANTO EN EFECTIVO	DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	REAJUSTE DE REINTEGROS NETOS	
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	19	jun-19	0.00	K - mayo	1.055	Kini	1.055	0.00	0.00	0.00
TOTALES			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00

CALCULO DE REINTEGROS PRESENTE VALORIZACION

FORMULA POLINOMICA	PRESENTE VALORIZACION			Kr	K(ini)	REAJUSTES DE REINTEGROS $R=(Kr-Kant)*V$	DEDUCCION DE ADELANTO EN EFECTIVO	DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	REAJUSTE DE REINTEGROS NETOS	
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	20	jul-19	0.00	K - junio	1.054	Kini	1.054	0.00	0.00	0.00
TOTALES			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL REINTEGROS

RESUMEN :


TOTAL REINTEGROS	FORMULAS	DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	14 930.22
------------------	----------	------------------------------	-----------

CONSORCIO ZORRITOS

FERNANDO REGALADO OBIILLAS
 Representante de Obra

ING. ROBERTO BOSSUS CONTATI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

REAJUSTE PROGRAMADO VS REAJUSTE EIECTUADO



CUADRO DE COMPARACION ENTRE EL REAJUSTE PROGRAMADO VS REAJUSTE EJECUTADO

VALORIZACION DE OBRA N° 20

FORMULA 01 : ESTRUCTURA

LICITACION LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
OBRA REHABILITACION DPA DE ACAPULCO
PROPIETARIO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS
UBICACION ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES

FECHA DE INICIO DE OBRA 28-dic-17
FECHA PRESUPUESTO 30-jun-17
P. REFERENCIAL S.M.G.V \$/ 12,633,758.02
P. CONTRATO S.M.G.V. \$/ 12,633,758.02
VALORIZACION N° 20

MES	PROGRAMADO					EJECUTADO					% AVANCE VS PROGRAMADO (3)/(1)	% AVANCE VS PROG. ACUM. (4)/(2)	+ ADELANTADA - ATRASADA		
	VAL No	VALORIZACION PROGRAMADA	VALORIZACION PROGRAMADA ACUMULADA	K	REAJUSTE	VAL No	VALORIZACION EJECUTADA	VALORIZACION EJECUTADA ACUMULADA	K	REAJUSTE				REAJUSTE ACUMULADO	REAJUSTE RECONOCIDO
DICIEMBRE 2017	01	1,484.15	1,484.15	1.018	28.20	01	186,799.73	186,799.73	1.019	3,169.19	3,169.19	3,169.19	11238.78%	11238.78%	ADELANTADA
ENERO 2018	02	125,866.85	127,349.99	1.020	2,517.32	02	23,634.82	190,434.55	1.020	472.70	3,641.89	472.70	18.78%	149.54%	ADELANTADA
FEBRERO 2018	03	222,250.43	349,600.42	1.044	9,779.02	03	231,876.93	422,311.58	1.044	10,202.58	13,344.47	10,202.58	104.33%	120.80%	ADELANTADA
MARZO 2018	04	407,178.29	756,778.71	1.045	18,323.02	04	449,097.66	871,409.24	1.045	20,209.36	34,563.86	20,209.36	110.30%	115.15%	ADELANTADA
ABRIL 2018	05	414,214.98	1,170,993.68	1.043	17,811.24	05	534,657.09	1,408,076.33	1.043	22,960.98	57,344.54	22,960.98	129.08%	120.08%	ADELANTADA
MAYO 2018	06	744,898.37	1,915,890.05	1.047	35,010.13	06	663,586.78	2,369,662.49	1.047	31,188.55	96,233.09	31,188.55	89.08%	108.03%	ADELANTADA
JUNIO 2018	07	455,046.05	2,370,936.10	1.048	21,842.21	07	536,792.44	2,906,454.63	1.048	25,768.04	113,999.13	25,768.04	17.96%	109.93%	ADELANTADA
JULIO 2018	08	913,163.45	3,284,099.55	1.050	45,658.17	08	152,182.55	2,758,637.48	1.050	7,909.13	121,508.26	7,909.13	16.87%	84.00%	ATRASADA
AGOSTO 2018	09	864,346.18	4,148,445.73	1.082	53,589.46	09	100,364.48	2,859,001.96	1.082	6,222.80	127,830.86	6,222.80	11.61%	68.92%	ATRASADA
SEPTIEMBRE 2018	10	613,536.48	4,761,982.21	1.088	40,493.41	10	246,490.88	3,105,492.84	1.088	16,268.40	144,099.26	16,268.40	40.18%	65.21%	ATRASADA
OCTUBRE 2018	11	124,782.25	4,886,744.47	1.087	8,359.07	11	192,249.88	3,297,742.72	1.087	12,980.74	156,980.00	12,980.74	154.09%	67.48%	ATRASADA
NOVIEMBRE 2018	12	-	4,886,744.47	1.071	-	12	114,483.85	3,412,226.57	1.071	8,128.36	165,108.35	8,128.36	-	69.83%	ATRASADA
DICIEMBRE 2018	13	66,931.70	4,973,676.16	1.071	6,172.15	13	405,205.76	3,817,432.36	1.071	28,769.61	193,877.95	28,769.61	466.12%	76.75%	ATRASADA
ENERO 2019	14	13,099.63	4,986,775.79	1.070	918.97	14	79,946.17	3,897,380.53	1.070	5,596.37	199,474.33	5,596.37	610.31%	78.15%	ATRASADA
FEBRERO 2019	15	-	4,986,775.79	1.070	-	15	65,734.66	3,963,115.19	1.070	4,801.43	204,075.75	4,801.43	-	79.47%	ATRASADA
MARZO 2019	16	42,654.77	5,029,430.56	1.069	2,943.16	16	34,526.54	3,997,641.73	1.069	2,382.33	206,458.09	2,382.33	80.94%	79.48%	ATRASADA
ABRIL 2019	17	32,584.00	5,062,014.56	1.070	2,280.88	17	12,645.06	4,010,286.79	1.070	885.15	207,343.24	885.15	38.81%	79.22%	ATRASADA
MAYO 2019	18	383,941.54	5,445,956.10	1.070	26,875.91	18	16,420.06	4,026,706.87	1.070	1,499.41	208,492.66	1,499.41	0.00%	73.94%	ATRASADA
JUNIO 2019	19	83,629.84	5,529,585.94	1.074	6,188.61	19	19,655.71	4,046,362.58	1.074	1,454.52	209,947.17	1,454.52	0.00%	73.18%	ATRASADA
JULIO 2019	20	-	5,529,585.94	1.072	-	20	116,407.32	4,162,769.90	1.072	8,381.33	218,328.50	8,381.32	0.00%	75.28%	ATRASADA

CONSORCIO ZORRITOS
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 ING. FERNANDO REGALADO OBITAS
 JEFE DE SUPERVISION

ING. RUBEN BOSE JUS TONHATT
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

CUADRO DE COMPARACION ENTRE EL REAJUSTE PROGRAMADO VS REAJUSTE EJECUTADO

VALORIZACION DE OBRA N° 20

FORMULA 02 : ARQUITECTURA

LICITACION : LP-SM-06-2017-FONDEPES-1
OBRA : REHABILITACION DPA DE ACAPULCO
PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
UBICACION : ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILAR-TUMBES

FECHA DE INICIO DE OBRA : 28-dic-17
FECHA PRESUPUESTO : 30-jun-17
P. REFERENCIAL S.I.G.V : S/ 12,903,758.02
P. CONTRATO S.I.G.V. : S/ 12,903,758.02
VALORIZACION N° : 20

MES	PROGRAMADO						EJECUTADO						% AVANCE VS PROGRAMADO (3)/(1)	% AVANCE VS PROG. ACUM. (4)/(2)	+ ADELANTADA - ATRASADA	
	VAL No	VALORIZACION PROGRAMADA	VALORIZACION PROGRAMADA ACUMULADA	K	REAJUSTE	REAJUSTE PROGRAMADO ACUMULADO	VAL No	VALORIZACION EJECUTADA	VALORIZACION EJECUTADA ACUMULADA	K	REAJUSTE	REAJUSTE EJECUTADO ACUMULADO				REAJUSTE RECONOCIDO
	(1)	(2)				(3)	(4)									
ABRIL 2018	05	-	-	1.025	-	-	05	19,888.12	19,888.12	1.025	492.20	492.20	492.20	988811.95%	1988811.95%	ADELANTADA
MAYO 2018	06	-	-	1.028	-	-	06	14,097.17	33,785.29	1.028	394.72	886.92	394.72	409718.74%	3378528.69%	ADELANTADA
JUNIO 2018	07	-	-	1.031	-	-	07	42,824.44	78,609.73	1.031	1,327.56	2,214.48	1,327.56	428244.00%	7860972.69%	ADELANTADA
JULIO 2018	08	17,077.61	17,077.61	1.034	580.64	580.64	08	60,123.22	138,732.95	1.034	2,044.19	4,258.67	2,044.19	362.06%	800.86%	ADELANTADA
AGOSTO 2018	09	178,468.62	195,462.23	1.046	8,117.56	8,898.20	09	25,303.77	162,036.71	1.046	1,163.97	5,422.64	8,117.56	14.34%	83.72%	ATRASADA
SEPTIEMBRE 2018	10	166,713.85	366,260.08	1.046	7,668.84	16,367.04	10	45,686.43	207,723.14	1.046	2,101.58	7,524.22	2,101.58	27.40%	57.66%	ATRASADA
OCTUBRE 2018	11	305,775.55	666,035.63	1.049	14,983.00	31,350.04	11	84,517.33	292,240.47	1.049	4,141.35	11,565.57	4,141.35	27.64%	43.88%	ATRASADA
NOVIEMBRE 2018	12	174,830.44	840,866.07	1.053	9,286.01	40,636.05	12	-	292,240.47	1.053	-	11,565.57	-	0.00%	34.75%	ATRASADA
DICIEMBRE 2018	13	7,293.63	848,159.69	1.054	393.96	41,009.91	13	69,890.20	362,130.67	1.054	3,774.07	15,439.64	3,774.07	958.24%	42.70%	ATRASADA
ENERO 2019	14	58,108.04	906,265.74	1.052	3,021.51	44,031.42	14	118,854.88	478,985.35	1.052	6,076.44	21,516.08	6,076.44	201.11%	52.85%	ATRASADA
FEBRERO 2019	15	-	906,265.74	1.052	-	44,031.42	15	183,912.83	662,898.18	1.052	9,563.47	31,079.55	9,563.47	8(DIVID)	73.15%	ATRASADA
MARZO 2019	16	208,412.97	1,114,678.70	1.052	10,837.47	54,868.89	16	109,060.16	771,958.34	1.052	5,671.13	36,750.68	5,671.13	52.33%	69.25%	ATRASADA
ABRIL 2019	17	371,468.61	1,486,147.31	1.053	19,687.84	74,556.73	17	19,581.40	791,539.74	1.053	1,037.81	37,788.49	1,037.81	5.27%	53.26%	ATRASADA
MAYO 2019	18	878,083.55	2,362,230.86	1.051	44,680.26	119,236.99	18	62,422.05	853,961.79	1.051	3,183.52	40,672.01	3,183.52	0.00%	36.15%	ATRASADA
JUNIO 2019	19	-	2,362,230.86	1.055	-	119,236.99	19	68,910.30	922,872.08	1.055	3,790.07	44,762.08	3,790.07	0.00%	36.07%	ATRASADA
JULIO 2019	20	-	2,362,230.86	1.055	-	119,236.99	20	44,333.44	967,205.52	1.055	2,438.34	47,200.42	2,438.34	0.00%	40.94%	ATRASADA

CONSORCIO ZORRITOS

ING. FERNANDO REGALADO OBITAS
 Jefe de Obra

ING. RUBEN BOSSUSTONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

CUADRO DE COMPARACION ENTRE EL REAJUSTE PROGRAMADO VS REAJUSTE EJECUTADO

VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 03 : INSTALACIONES SANITARIAS

LICITACION : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1

OBRA : REHABILITACION DPA DE ACAPULCO

PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS

UBICACION : ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES

FECHA DE INICIO DE OBRA : 28-dic-17

FECHA PRESUPUESTO : 30-jun-17

P. REFERENCIAL S.I.G.V : S/ 12,903,758 02

P. CONTRATO S.I.G.V. : S/ 12,903,758 02

VALORIZACION N° : 20

MES	PROGRAMADO						EJECUTADO						% AVANCE VS PROGRAMADO (3)(1)	% AVANCE VS PROG. ACUM. (4)(2)	+ ADELANTADA - ATRASADA	
	VAL No	VALORIZACION PROGRAMADA	VALORIZACION PROGRAMADA ACUMULADA	K	REAJUSTE	REAJUSTE PROGRAMADO ACUMULADO	VAL No	VALORIZACION EJECUTADA	VALORIZACION EJECUTADA ACUMULADA	K	REAJUSTE	REAJUSTE EJECUTADO ACUMULADO				REAJUSTE RECONOCIDO
	(1)	(2)				(3)	(4)									
MAYO 2018	06	-	-	1.045	-	-	06	3,154.85	3,154.85	1.045	141.97	141.97	141.97	315484 57%	315484 57%	ADELANTADA
JUNIO 2018	07	-	-	1.047	-	-	07	-	3,154.85	1.047	-	141.97	-	0.00%	315484 57%	ADELANTADA
JULIO 2018	08	-	-	1.049	-	-	08	-	3,154.85	1.049	-	141.97	-	0.00%	315484 57%	ADELANTADA
AGOSTO 2018	09	-	-	1.061	-	-	09	-	3,154.85	1.061	-	141.97	-	0.00%	315484 57%	ADELANTADA
SEPTIEMBRE 2018	10	-	-	1.065	-	-	10	6,854.95	10,009.79	1.065	445.57	587.54	-	686494 93%	1000979 50%	ADELANTADA
OCTUBRE 2018	11	-	-	1.067	-	-	11	9,054.36	19,064.16	1.067	606.64	1,194.18	-	905436 46%	1906415 96%	ADELANTADA
NOVIEMBRE 2018	12	-	-	1.070	-	-	12	-	19,064.16	1.070	-	1,194.18	-	0.00%	1906415 96%	ADELANTADA
DICIEMBRE 2018	13	1,491.06	1491.06	1.068	101.39	101.39	13	-	19,064.16	1.068	-	1,194.18	-	0.00%	1278 55%	ADELANTADA
ENERO 2019	14	7,213.02	8704.10	1.063	454.42	555.81	14	-	19,064.16	1.063	-	1,194.18	-	0.00%	219.03%	ADELANTADA
FEBRERO 2019	15	9,087.98	17792.08	1.063	572.54	1,128.35	15	-	19,064.16	1.063	-	1,194.18	-	0.00%	107 15%	ADELANTADA
MARZO 2019	16	10,061.70	27853.78	1.059	593.64	1,721.99	16	-	19,064.16	1.059	-	1,194.18	-	0.00%	68 44%	ATRASADA
ABRIL 2019	17	11,567.61	39421.39	1.059	682.46	2,404.48	17	-	19,064.16	1.059	-	1,194.18	-	0.00%	48 36%	ATRASADA
MAYO 2019	18	641,270.93	680662.32	1.056	36,911.17	38,315.66	18	(19,064.17)	(0.01)	1.056	(1,067.59)	126.59	(1,067.59)	0.00%	0.00%	ATRASADA
JUNIO 2019	19	722,366.96	1,403,049.27	1.056	41,896.70	80,212.36	19	-	(0.01)	1.056	-	126.59	-	0.00%	0.00%	ATRASADA
JULIO 2019	20	-	1,403,049.27	1.058	-	80,212.36	20	-	(0.01)	1.058	-	126.59	-	0.00%	0.00%	ATRASADA

CONSORCIO ZORRITOS
[Signature]
ING. FERNANDO REGALADO OBITAS
Gerente de Obra

[Signature]
ING. RUBEN BOSSUS TONTATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

CUADRO DE COMPARACION ENTRE EL REAJUSTE PROGRAMADO VS REAJUSTE EJECUTADO

VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS

LICITACION	LP-SM-05-2017-FONDEPES-1	FECHA DE INICIO DE OBRA	28-dic-17
OBRA	REHABILITACION DPA DE ACAPULCO	FECHA PRESUPUESTO	30-jun-17
PROPIETARIO	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)	P. REFERENCIAL S.I.G.V	S/ 12,903,758.02
CONTRATISTA	CONSORCIO ZORRITOS	P. CONTRATO S.I.G.V.	S/ 12,903,758.02
UBICACION	ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILAR-TUMBES	VALORIZACION N°	20

MES	PROGRAMADO					EJECUTADO						% AVANCE VS PROGRAMADO (3)(1)	% AVANCE VS PROG. ACUM. (4)(2)	+ ADELANTADA - ATRASADA		
	VAL No	VALORIZACION PROGRAMADA	VALORIZACION PROGRAMADA ACUMULADA	K	REAJUSTE	REAJUSTE PROGRAMADO ACUMULADO	VAL No	VALORIZACION EJECUTADA	VALORIZACION EJECUTADA ACUMULADA	K	REAJUSTE				REAJUSTE EJECUTADO ACUMULADO	REAJUSTE RECONOCIDO
	(1)	(2)				(3)	(4)									
MAYO 2018	06	-	-	1.047	-	-	06	27,083.98	27,083.98	1.047	1,272.95	1,272.95	1,272.95	2708398 00%	2708398 00%	ADELANTADA
JUNIO 2018	07	-	-	1.050	-	-	07	-	27,083.98	1.050	-	1,272.95	-	0.00%	2708398 00%	ADELANTADA
JULIO 2018	08	-	-	1.053	-	-	08	-	27,083.98	1.053	-	1,272.95	-	0.00%	2708398 00%	ADELANTADA
AGOSTO 2018	09	-	-	1.062	-	-	09	-	27,083.98	1.062	-	1,272.95	-	0.00%	2708398 00%	ADELANTADA
SEPTIEMBRE 2018	10	-	-	1.065	-	-	10	4,124.33	31,208.29	1.065	268.08	1,541.03	-	412433 32%	3120829 32%	ADELANTADA
OCTUBRE 2018	11	-	-	1.069	-	-	11	8,175.02	39,383.31	1.069	564.08	2,105.11	-	817501 60%	3938330 92%	ADELANTADA
NOVIEMBRE 2018	12	-	-	1.075	-	-	12	8,260.85	47,644.16	1.075	619.56	2,724.67	-	826085 47%	4764416 39%	ADELANTADA
DICIEMBRE 2018	13	191,981.82	191,981.82	1.073	14,013.21	14,013.21	13	-	47,644.16	1.073	-	2,724.67	-	0.00%	24.82%	ATRASADA
ENERO 2019	14	76,293.74	268,255.56	1.067	5,111.68	19,124.89	14	-	47,644.16	1.067	-	2,724.67	-	0.00%	17.76%	ATRASADA
FEBRERO 2019	15	295,478.77	563,734.33	1.067	19,797.08	38,921.97	15	-	47,644.16	1.067	-	2,724.67	-	0.00%	8.45%	ATRASADA
MARZO 2019	16	60,538.89	624,273.22	1.058	3,511.26	42,433.23	16	-	47,644.16	1.058	-	2,724.67	-	0.00%	7.63%	ATRASADA
ABRIL 2019	17	11,579.40	635,852.62	1.057	660.03	43,093.26	17	-	47,644.16	1.057	-	2,724.67	-	0.00%	7.49%	ATRASADA
MAYO 2019	18	4,127.13	639,979.75	1.053	218.74	43,312.00	18	-	47,644.16	1.053	-	2,724.67	-	0.00%	7.44%	ATRASADA
JUNIO 2019	19	-	639,979.75	1.056	-	43,312.00	19	-	47,644.16	1.056	-	2,724.67	-	0.00%	7.44%	ATRASADA
JULIO 2019	20	-	639,979.75	1.053	-	43,312.00	20	-	47,644.16	1.053	-	2,724.67	-	0.00%	7.44%	ATRASADA

CONSORCIO ZORRITOS

ING. FERNANDO REGALADO BLITAS
Residente de Obra

ING. RUBEN BOSSUSTONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
Jefe de Supervision

CUADRO DE COMPARACION ENTRE EL REAJUSTE PROGRAMADO VS REAJUSTE EJECUTADO

VALORIZACION DE OBRA N° 20

FORMULA 05 : OBRAS EN MAR

LICITACION
OBRA
PROPIETARIO
CONTRATISTA
UBICACIÓN

LP-SM-06-2017-FONDEPES-1
REHABILITACIÓN DPA DE ACAPULCO
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONSORCIO ZORRITOS
ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILIAR-TUMBES

FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA PRESUPUESTO
P. REFERENCIAL S.I.G.V
P. CONTRATO S.I.G.V.
VALORIZACION N°

28-dic-17
30-jun-17
S/ 12,903,758 02
S/ 12,903,758 02
20

MES	PROGRAMADO					EJECUTADO					% AVANCE VS PROGRAMADO (3)(1)	% AVANCE VS PROG. ACUM. (4)(2)	• ADELANTADA - ATRASADA		
	VAL No	VALORIZACION PROGRAMADA (1)	VALORIZACION PROGRAMADA ACUMULADA (2)	K	REAJUSTE	VAL No	VALORIZACION EJECUTADA (3)	VALORIZACION EJECUTADA ACUMULADA (4)	K	REAJUSTE				REAJUSTE EJECUTADO ACUMULADO	REAJUSTE RECONOCIDO
DIEMBRE 2017	01	-	-	1.027	-	01	58,316.45	58,316.45	1.027	1,574.54	1,574.54	1,574.54	5831645.00%	5831645.00%	ADELANTADA
ENERO 2018	02	-	-	1.030	-	02	-	58,316.45	1.030	-	1,574.54	-	0.00%	5831645.00%	ADELANTADA
FEBRERO 2018	03	-	-	1.049	-	03	7,781.23	66,097.68	1.049	381.28	1,955.82	381.28	778123.00%	6609768.00%	ADELANTADA
MARZO 2018	04	-	-	1.052	-	04	58,868.88	124,966.56	1.052	3,061.18	5,017.00	3,061.18	588688.00%	12496656.00%	ADELANTADA
ABRIL 2018	05	-	-	1.051	-	05	172,369.34	297,365.90	1.051	8,792.37	13,809.37	8,792.37	17236934.00%	29736590.00%	ADELANTADA
MAYO 2018	06	95,928.74	95,928.74	1.056	5,372.01	06	205,036.81	502,402.71	1.056	11,482.06	25,261.43	11,482.06	213.74%	523.72%	ADELANTADA
JUNIO 2018	07	306,745.39	402,674.12	1.058	17,751.23	07	96,233.85	631,636.56	1.058	5,755.56	31,046.99	5,755.56	32.35%	149.41%	ADELANTADA
JULIO 2018	08	16,258.87	418,932.99	1.080	975.53	08	43,620.51	645,257.07	1.060	2,517.23	33,864.22	975.53	268.29%	154.02%	ADELANTADA
AGOSTO 2018	09	-	418,932.99	1.073	-	09	147,121.32	732,378.39	1.073	10,739.88	44,404.08	-	14712132.00%	189.14%	ADELANTADA
SEPTIEMBRE 2018	10	-	418,932.99	1.077	-	10	-	732,378.39	1.077	-	44,404.08	-	0.00%	189.14%	ADELANTADA
OCTUBRE 2018	11	51,792.58	470,725.57	1.080	4,143.41	11	64,725.95	857,104.34	1.080	5,178.08	49,582.16	4,143.41	124.97%	182.08%	ADELANTADA
NOVIEMBRE 2018	12	1,473,934.02	1,944,659.59	1.085	125,264.39	12	-	857,104.34	1.085	-	49,582.16	-	0.00%	44.07%	ATRASADA
ENERO 2019	13	1,088,630.69	3,033,290.28	1.084	91,444.88	13	29,087.57	896,191.91	1.084	2,443.38	52,025.52	2,443.38	2.67%	29.22%	ATRASADA
FEBRERO 2019	14	207,468.37	3,240,758.64	1.080	16,567.47	14	9,133.18	895,325.09	1.080	730.65	52,756.17	730.65	4.40%	27.63%	ATRASADA
MARZO 2019	15	-	3,240,758.64	1.080	-	15	37,608.78	932,933.87	1.080	3,008.70	55,764.87	3,008.70	3760878.00%	28.79%	ATRASADA
ABRIL 2019	16	-	3,240,758.64	1.074	-	16	51,655.66	984,589.53	1.074	3,822.52	59,587.39	3,822.52	5165566.00%	30.38%	ATRASADA
MAYO 2019	17	-	3,240,758.64	1.073	-	17	84,400.19	1,068,989.72	1.073	6,161.21	65,748.60	6,161.21	8440019.00%	32.99%	ATRASADA
JUNIO 2019	18	-	3,240,758.64	1.070	-	18	113,242.15	1,182,231.87	1.070	7,928.96	73,675.55	7,928.96	11324215.00%	36.48%	ATRASADA
JULIO 2019	19	-	3,240,758.64	1.075	-	19	48,473.78	1,230,705.65	1.075	3,635.63	77,311.08	3,635.63	4847378.00%	37.98%	ATRASADA
	20	-	3,240,758.64	1.074	-	20	61,108.09	1,291,813.74	1.074	4,522.00	81,833.08	4,522.00	6110809.00%	39.86%	ATRASADA

CONSORCIO ZORRITOS
[Firma]
ING. FERNANDO LEGALADO OBITAS
Responsable de Obra

[Firma]
ING. RUBEN BOSSE TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

CUADRO DE COMPARACION ENTRE EL REAJUSTE PROGRAMADO VS REAJUSTE EJECUTADO

VALORIZACION DE OBRA N° 20

FORMULA 06 : EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

LICITACION LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
OBRA REHABILITACION DPA DE ACAPULCO
PROPIETARIO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS
UBICACION ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILAR-TUMBES

FECHA DE INICIO DE OBRA 28-dic-17
FECHA PRESUPUESTO 30-jun-17
P. REFERENCIAL S.I.G.V \$/ 12,903,758 02
P. CONTRATO S.I.G.V. \$/ 12,903,758 02
VALORIZACION N° 20

MES	PROGRAMADO						EJECUTADO						% AVANCE VS PROGRAMADO (3)(1)	% AVANCE VS PROG. ACUM. (4)(2)	+ADELANTADA - ATRASADA	
	VAL No	VALORIZACION PROGRAMADA	VALORIZACION PROGRAMADA ACUMULADA	K	REAJUSTE	REAJUSTE PROGRAMADO ACUMULADO	VAL No	VALORIZACION EJECUTADA	VALORIZACION EJECUTADA ACUMULADA	K	REAJUSTE	REAJUSTE EJECUTADO ACUMULADO				REAJUSTE RECONOCIDO
	(1)	(2)				(3)	(4)									
AGOSTO 2018	09	-	-	1.032	-	-	09	897,114.51	897,114.51	1.032	22,307.66	22,307.66	22,307.66	69711450.51%	69711450.51%	ADELANTADA
SEPTIEMBRE 2018	10	-	-	1.038	-	-	10	-	897,114.51	1.038	-	22,307.66	-	0.00%	69711450.51%	ADELANTADA
OCTUBRE 2018	11	-	-	1.042	-	-	11	-	897,114.51	1.042	-	22,307.66	-	0.00%	69711450.51%	ADELANTADA
NOVIEMBRE 2018	12	-	-	1.049	-	-	12	-	897,114.51	1.049	-	22,307.66	-	0.00%	69711450.51%	ADELANTADA
DICIEMBRE 2018	13	-	-	1.051	-	-	13	-	897,114.51	1.051	-	22,307.66	-	0.00%	69711450.51%	ADELANTADA
ENERO 2019	14	10,705.31	10,705.31	1.047	503.15	503.15	14	-	897,114.51	1.047	-	22,307.66	503.15	0.00%	8511.86%	ADELANTADA
FEBRERO 2019	15	-	10,705.31	1.047	-	503.15	15	83,653.74	780,768.25	1.047	3,931.73	26,239.39	-	8365374.30%	7293.28%	ADELANTADA
MARZO 2019	16	330,360.28	341,055.59	1.048	15,196.11	15,899.26	16	-	780,768.25	1.048	-	26,239.39	15,196.11	0.00%	228.93%	ADELANTADA
ABRIL 2019	17	860,700.54	1,001,756.13	1.047	31,052.93	46,752.19	17	-	780,768.25	1.047	-	26,239.39	-	0.00%	77.94%	ATRASADA
MAYO 2019	18	398,420.33	1,398,176.46	1.049	19,424.80	66,176.79	18	-	780,768.25	1.049	-	26,239.39	-	0.00%	55.84%	ATRASADA
JUNIO 2019	19	-	1,398,176.46	1.055	-	66,176.79	19	-	780,768.25	1.055	-	26,239.39	-	0.00%	55.84%	ATRASADA
JULIO 2019	20	-	1,398,176.46	1.054	-	66,176.79	20	-	780,768.25	1.054	-	26,239.39	-	0.00%	55.84%	ATRASADA

CONSORCIO ZORRITOS

[Handwritten Signature]
EDGAR FERNANDO REGALADO OBITAS
 AL REPRESENTANTE DEL CNR

[Handwritten Signature]
ING. RUBEN BOSSUSTONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

DEDUCCIONES DEL ADELANTO EFECTIVO



CALCULO DE DEDUCCIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO
VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 01 : ESTRUCTURA

LICITACION	LP-5M-05-2017-FONDEPES-1	FECHA DE INICIO DE OBRA	28-dic-17
OBRA	REHABILITACION DPA DE ACAPULCO	FECHA PRESUPUESTO	30-jun-17
PROPIETARIO	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)	P. REFERENCIAL S.B.G.V.	S/ 12,903,756.02
CONTRATISTA	CONSORCIO ZORRITOS	P. CONTRATO S.B.G.V.	S/ 12,903,756.02
UBICACION	LOCALIDAD DE ACAPULCO ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES	VALORIZACION N°	20

A/C = 0.074

D = A/C * V * (K/Ka - 1)

DESCRIPCION	VALORIZACIONES		K	Ka	DEDUCCIONES	
	No.	MONTO			A Cuenta	Regularizacion
ESTRUCTURA	01 - DICIEMBRE 2017	188 799.73	1.019	1.019	0.00	0.00
	02 - ENERO 2018	23 834.92	1.020		62.00	60.88
	03 - FEBRERO 2018	231 878.93	1.044		16.89	405.20
	04 - MARZO 2018	449 087.66	1.045		817.99	850.39
	05 - ABRIL 2018	534 667.09	1.043		1 012.42	- 77.87
	06 - MAYO 2018	863 598.16	1.047		1 159.88	241.85
	07 - JUNIO 2018	536 782.44	1.048		1 094.64	39.09
	08 - JULIO 2018	152 182.55	1.050		321.42	22.16
	09 - AGOSTO 2018	100 364.48	1.062		226.59	87.72
	10 - SEPTIEMBRE 2018	246 490.88	1.066		771.93	71.80
	11 - OCTUBRE 2018	192 249.88	1.067		658.07	14.00
	12 - NOVIEMBRE 2018	114 483.85	1.071		400.21	33.35
	13 - DICIEMBRE 2018	405 206.79	1.071		1 416.52	118.04
	14 - ENERO 2019	70 948.17	1.070		302.77	- 5.82
	15 - FEBRERO 2019	65 734.86	1.070		244.16	0.00
	16 - MARZO 2019	116 407.32	1.099		423.89	0.00
	17 - ABRIL 2019	12 645.06	1.070		46.97	0.00
	18 - MAYO 2019	16 420.06	1.070		60.99	0.00
	19 - JUNIO 2019	19 656.71	1.074		78.73	0.00
	20 - JULIO 2019	116 407.32	1.072		449.33	
SUB-TOTAL		4 244 650.66				448.33

CALCULO DE DEDUCCIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO
VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 02 : ARQUITECTURA

LICITACION	LP-5M-05-2017-FONDEPES-1	FECHA DE INICIO DE OBRA	28-dic-17
OBRA	REHABILITACION DPA DE ACAPULCO	FECHA PRESUPUESTO	30-jun-17
PROPIETARIO	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)	P. REFERENCIAL S.B.G.V.	S/ 12,903,756.02
CONTRATISTA	CONSORCIO ZORRITOS	P. CONTRATO S.B.G.V.	S/ 12,903,756.02
UBICACION	LOCALIDAD DE ACAPULCO ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES	VALORIZACION N°	20

A/C = 0.074

D = A/C * V * (K/Ka - 1)

DESCRIPCION	VALORIZACIONES		K	Ka	DEDUCCIONES	
	No.	MONTO			A Cuenta	Regularizacion
ARQUITECTURA	01 - DICIEMBRE 2017	0.00	1.017	1.014	0.00	0.00
	02 - ENERO 2018	0.00	1.016		0.00	0.00
	03 - FEBRERO 2018	0.00	1.026		0.00	0.00
	04 - MARZO 2018	0.00	1.025		0.00	0.00
	05 - ABRIL 2018	19 689.12	1.025		6.80	28.86
	06 - MAYO 2018	14 087.17	1.028		26.83	5.15
	07 - JUNIO 2018	42 824.44	1.031		97.16	6.27
	08 - JULIO 2018	60 123.22	1.034		145.21	- 57.20
	09 - AGOSTO 2018	25 303.77	1.048		84.82	- 5.54
	10 - SEPTIEMBRE 2018	45 686.43	1.046		107.00	0.00
	11 - OCTUBRE 2018	84 517.33	1.049		187.94	18.56
	12 - NOVIEMBRE 2018	0.00	1.053		0.00	0.00
	13 - DICIEMBRE 2018	89 890.20	1.054		179.03	26.68
	14 - ENERO 2019	116 854.68	1.062		342.10	- 17.11
	15 - FEBRERO 2019	183 912.63	1.062		511.49	0.00
	16 - MARZO 2019	109 080.16	1.062		303.31	0.00
	17 - ABRIL 2019	19 581.40	1.053		55.89	0.00
	18 - MAYO 2019	62 422.05	1.061		169.04	0.00
	19 - JUNIO 2019	66 910.30	1.055		206.78	0.00
	20 - JULIO 2019	44 333.44	1.055		133.03	
SUB-TOTAL		967 205.52				133.03

CONSORCIO ZORRITOS
ING. FERNANDO REGALADO ORLITA
 Residente de Obra

ING. RUBEN BOSSOSTONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

CALCULO DE DEDUCCIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO
VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 03 : INSTALACIONES SANITARIAS

LICITACION : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
 OBRA : REHABILITACION DPA DE ACAPULCO
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACION : LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS CONTRALMIANTE VILLAR-TUMBES
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 28-dic-17
 FECHA PRESUPUESTO : 30-jun-17
 P. REFERENCIAL B.L.G.V : S/ 12,903,758.02
 P. CONTRATO B.L.G.V. : S/ 12,903,758.02
 VALORIZACION N° : 20

AC = 0.074

D = AC * V * (K/Ka - 1)

DESCRIPCION	VALORIZACIONES		K	Ka	DEDUCCIONES	
	No.	MONTO			A Cuenta	Regularizacion
INSTALACIONES SANITARIAS	01 - DICIEMBRE 2017	0.00	1.027		0.00	0.00
	02 - ENERO 2018	0.00	1.028		0.00	0.00
	03 - FEBRERO 2018	0.00	1.034		0.00	0.00
	04 - MARZO 2018	0.00	1.040		0.00	0.00
	05 - ABRIL 2018	0.00	1.040		0.00	0.00
	06 - MAYO 2018	3 154.85	1.045		3.68	1.14
	07 - JUNIO 2018	0.00	1.047		0.00	0.00
	08 - JULIO 2018	0.00	1.049		0.00	0.00
	09 - AGOSTO 2018	0.00	1.061		0.00	0.00
	10 - SEPTIEMBRE 2018	0.00	1.063		0.00	0.00
	11 - OCTUBRE 2018	9 054.36	1.067	1.024	26.90	1.32
	12 - NOVIEMBRE 2018	0.00	1.070		0.00	0.00
	13 - DICIEMBRE 2018	0.00	1.068		0.00	0.00
	14 - ENERO 2019	0.00	1.063		0.00	0.00
	15 - FEBRERO 2019	0.00	1.063		0.00	0.00
	16 - MARZO 2019	0.00	1.056		0.00	0.00
	17 - ABRIL 2019	0.00	1.059		0.00	0.00
	18 - MAYO 2019	-19 064.17	1.058		-44.21	0.00
	19 - JUNIO 2019	0.00	1.058		0.00	0.00
	20 - JULIO 2019	0.00	1.068		0.00	0.00
	SUB-TOTAL	-8 904.66				0.00

CALCULO DE DEDUCCIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO
VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS

LICITACION : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
 OBRA : REHABILITACION DPA DE ACAPULCO
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACION : LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIANTE VILLAR-TUMBES
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 28-dic-17
 FECHA PRESUPUESTO : 30-jun-17
 P. REFERENCIAL B.L.G.V : S/ 12,903,758.02
 P. CONTRATO B.L.G.V. : S/ 12,903,758.02
 VALORIZACION N° : 20

AC = 0.074

D = AC * V * (K/Ka - 1)

DESCRIPCION	VALORIZACIONES		K	Ka	DEDUCCIONES	
	No.	MONTO			A Cuenta	Regularizacion
INSTALACIONES ELECTRICAS	01 - DICIEMBRE 2017	0.00	1.030		0.00	0.00
	02 - ENERO 2018	0.00	1.028		0.00	0.00
	03 - FEBRERO 2018	0.00	1.036		0.00	0.00
	04 - MARZO 2018	0.00	1.042		0.00	0.00
	05 - ABRIL 2018	0.00	1.040		0.00	0.00
	06 - MAYO 2018	27 083.96	1.047		31.41	11.73
	07 - JUNIO 2018	0.00	1.050		0.00	0.00
	08 - JULIO 2018	0.00	1.053		0.00	0.00
	09 - AGOSTO 2018	0.00	1.062		0.00	0.00
	10 - SEPTIEMBRE 2018	0.00	1.065		0.00	0.00
	11 - OCTUBRE 2018	8 175.02	1.069	1.025	26.86	-0.82
	12 - NOVIEMBRE 2018	8 260.65	1.075		26.32	3.56
	13 - DICIEMBRE 2018	0.00	1.073		0.00	0.00
	14 - ENERO 2019	0.00	1.067		0.00	0.00
	15 - FEBRERO 2019	0.00	1.067		0.00	0.00
	16 - MARZO 2019	0.00	1.066		0.00	0.00
	17 - ABRIL 2019	0.00	1.057		0.00	0.00
	18 - MAYO 2019	0.00	1.053		0.00	0.00
	19 - JUNIO 2019	0.00	1.066		0.00	0.00
	20 - JULIO 2019	0.00	1.053		0.00	0.00
	SUB-TOTAL	43 519.83				0.00

CONSORCIO ZORRITOS

OGAR FERNANDO REGALADO OBITAS
 Jefe de Supervision

ING. ROSEN BOSSIS TONHATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

CALCULO DE DEDUCCIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO
VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 06 : OBRAS EN MAR

LICITACION	LP-SM-05-2017-FONDEPES-1	FECHA DE INICIO DE OBRA	28-dic-17
OBRA	REHABILITACION DPA DE ACAPULCO	FECHA PRESUPUESTO	30-jun-17
PROPIETARIO	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)	P. REFERENCIAL S.B.G.V.	S/ 12,903,758.02
CONTRATISTA	CONSORCIO ZORRITOS	P. CONTRATO S.B.G.V.	S/ 12,903,758.02
UBICACION	LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIANTE VILLAR-TUMBES	VALORIZACION N°	20

A/C = 0.074

D = A/C * V * (K/Ka - 1)

DESCRIPCION	VALORIZACIONES		K	Ka	DEDUCCIONES	
	No.	MONTO			A Cuenta	Regularizacion
OBRAS DE MAR	01 - DICIEMBRE 2017	58 318.45	1.027	1.027	22.17	- 22.17
	02 - ENERO 2018	0.00	1.030		22.17	- 22.17
	03 - FEBRERO 2018	7 781.23	1.049		11.90	0.47
	04 - MARZO 2018	58 888.88	1.052		71.40	106.35
	05 - ABRIL 2018	172 399.34	1.051		270.81	- 12.32
	06 - MAYO 2018	205 038.81	1.058		307.55	151.78
	07 - JUNIO 2018	98 233.85	1.058		207.95	14.35
	08 - JULIO 2018	43 820.51	1.060		91.41	12.81
	09 - AGOSTO 2018	147 121.32	1.073		350.83	- 350.83
	10 - SEPTIEMBRE 2018	0.00	1.077		350.83	- 350.83
	11 - OCTUBRE 2018	64 725.96	1.080		350.83	- 102.94
	12 - NOVIEMBRE 2018	0.00	1.085		0.00	0.00
	13 - DICIEMBRE 2018	29 087.57	1.084		111.40	8.41
	14 - ENERO 2019	9 133.18	1.080		37.62	0.00
	15 - FEBRERO 2019	37 800.70	1.080		144.04	0.00
	16 - MARZO 2019	51 655.88	1.074		175.44	0.00
	17 - ABRIL 2019	84 400.19	1.073		280.55	0.00
	18 - MAYO 2019	113 242.15	1.070		351.87	- 351.87
	19 - JUNIO 2019	48 473.78	1.075		168.13	0.00
	20 - JULIO 2019	61 108.09	1.074		207.54	
SUB-TOTAL		1291 813.74				207.54

CALCULO DE DEDUCCIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO
VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 06 : EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

LICITACION	LP-SM-05-2017-FONDEPES-1	FECHA DE INICIO DE OBRA	28 dic 17
OBRA	REHABILITACION DPA DE ACAPULCO	FECHA PRESUPUESTO	30-jun-17
PROPIETARIO	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)	P. REFERENCIAL S.B.G.V.	S/ 12,903,758.02
CONTRATISTA	CONSORCIO ZORRITOS	P. CONTRATO S.B.G.V.	S/ 12,903,758.02
UBICACION	LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIANTE VILLAR-TUMBES	VALORIZACION N°	20

A/C = 0.074

D = A/C * V * (K/Ka - 1)

DESCRIPCION	VALORIZACIONES		K	Ka	DEDUCCIONES	
	No.	MONTO			A Cuenta	Regularizacion
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	01 - DICIEMBRE 2017	0.00	1.001	1.004	0.00	0.00
	02 - ENERO 2018	0.00	1.004		0.00	0.00
	03 - FEBRERO 2018	0.00	1.000		0.00	0.00
	04 - MARZO 2018	0.00	1.008		0.00	0.00
	05 - ABRIL 2018	0.00	1.010		0.00	0.00
	06 - MAYO 2018	0.00	1.017		0.00	0.00
	07 - JUNIO 2018	0.00	1.018		0.00	0.00
	08 - JULIO 2018	0.00	1.021		0.00	0.00
	09 - AGOSTO 2018	782 378.39	1.032		0.00	1 639.97
	10 - SEPTIEMBRE 2018	0.00	1.000		0.00	0.00
	11 - OCTUBRE 2018	0.00	1.042		0.00	0.00
	12 - NOVIEMBRE 2018	0.00	1.049		0.00	0.00
	13 - DICIEMBRE 2018	0.00	1.051		0.00	0.00
	14 - ENERO 2019	0.00	1.047		0.00	0.00
	15 - FEBRERO 2019	83 663.74	1.047		265.89	0.00
	16 - MARZO 2019	0.00	1.048		0.00	0.00
	17 - ABRIL 2019	0.00	1.047		0.00	0.00
	18 - MAYO 2019	0.00	1.049		0.00	0.00
	19 - JUNIO 2019	0.00	1.055		0.00	0.00
	20 - JULIO 2019	0.00	1.054		0.00	0.00
SUB-TOTAL		878 032.13				0.00

CONSORCIO ZORRITOS

EDGAR FERNANDO REGALADO OBITAS
 Jefe de Supervision

ING. RUBEN BOSSUSTONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

AMORTIZACIONES DEL ADELANTO EFECTIVO



CALCULO DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO

VALORIZACION DE OBRA N° 20

FORMULA 01 : ESTRUCTURA

LICITACION : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1 OBRA : REHABILITACIÓN DPA DE ACAPULCO PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS UBICACIÓN : ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES ESTRUCTURA : SI 5,099,026.83 ADELANTO EN EFECTIVO : SI 378,414.29 PORCENTAJE INICIAL 7.42%	FECHA DE INICIO DE OBRA : 28-dic-17 FECHA PRESUPUESTO : 30-jun-17 P. REFERENCIAL S.M.G.V : SI 12,903,758.02 P. CONTRATO S.M.G.V. : SI 12,903,758.02 VALORIZACION N° : 20
--	--

Nro.	MES	DESCRIPCION SIN IGV			AMORTIZACION SIN IGV			
		VALORIZACIÓN	AMORTIZACION	%	ACUMULADA	%	SALDO	%
VAL 01	DICIEMBRE 2017	188,799.73	12,378.72	3.27	12,378.72	3.27	306,035.57	98.73
VAL 02	ENERO 2018	23,634.92	1,754.02	0.46	14,132.73	3.73	364,281.06	98.27
VAL 03	FEBRERO 2018	231,876.93	17,208.29	4.56	31,341.03	8.28	347,073.26	91.72
VAL 04	MARZO 2018	449,097.86	33,328.90	8.81	64,669.93	17.09	313,744.36	82.91
VAL 05	ABRIL 2018	534,887.09	39,879.27	10.49	104,349.20	27.58	274,065.09	72.42
VAL 06	MAYO 2018	663,586.16	49,246.75	13.01	153,595.95	40.58	224,818.34	59.41
VAL 07	JUNIO 2018	536,792.44	39,837.00	10.53	193,432.96	51.12	184,981.34	48.88
VAL 08	JULIO 2018	152,182.55	11,293.93	2.98	204,726.88	54.10	173,687.41	45.90
VAL 09	AGOSTO 2018	100,364.48	7,448.35	1.97	212,175.23	66.07	166,239.06	43.93
VAL 10	SEPTIEMBRE 2018	246,490.88	18,292.84	4.83	230,468.07	60.00	147,946.22	39.10
VAL 11	OCTUBRE 2018	192,249.88	14,267.45	3.77	244,735.51	64.67	133,678.78	35.33
VAL 12	NOVIEMBRE 2018	114,483.86	8,496.19	2.25	253,231.71	66.92	125,182.58	33.08
VAL 13	DICIEMBRE 2018	405,206.79	30,071.55	7.95	283,303.26	74.87	95,111.03	25.13
VAL 14	ENERO 2019	79,948.17	5,833.20	1.57	289,236.46	76.43	89,177.83	23.57
VAL 15	FEBRERO 2019	65,734.86	4,878.37	1.29	294,114.83	77.72	84,299.46	22.28
VAL 16	MARZO 2019	34,526.54	2,582.32	0.68	296,677.15	78.40	81,737.14	21.60
VAL 17	ABRIL 2019	12,545.05	938.43	0.25	297,615.58	78.65	80,798.71	21.35
VAL 18	MAYO 2019	16,420.06	1,218.58	0.32	298,834.16	78.97	79,580.13	21.03
VAL 19	JUNIO 2019	19,655.71	1,458.71	0.39	300,292.87	79.36	78,121.42	20.64
VAL 20	JULIO 2019	116,407.32	8,638.94	2.28	308,931.81	81.64	60,482.48	18.36
TOTAL		4,162,769.90	308,931.81	81.64	308,931.81	81.64	60,482.48	18.36

AMORTIZACION MENSUAL SI. 8,638.94

CALCULO DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO

VALORIZACION DE OBRA N° 20

FORMULA 02 : ARQUITECTURA

LICITACION : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1 OBRA : REHABILITACIÓN DPA DE ACAPULCO PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS UBICACIÓN : ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES ARQUITECTURA : SI 2,414,033.82 ADELANTO EN EFECTIVO : SI 179,152.78 PORCENTAJE INICIAL 7.42%	FECHA DE INICIO DE OBRA : 28-dic-17 FECHA PRESUPUESTO : 30-jun-17 P. REFERENCIAL S.M.G.V : SI 12,903,758.02 P. CONTRATO S.M.G.V. : SI 12,903,758.02 VALORIZACION N° : 20
--	--

Nro.	MES	DESCRIPCION SIN IGV			AMORTIZACION SIN IGV			
		VALORIZACIÓN	AMORTIZACION	%	ACUMULADA	%	SALDO	%
VAL 05	ABRIL 2018	19,688.12	1,461.12	0.82	1,461.12	0.82	177,691.86	99.18
VAL 06	MAYO 2018	14,097.17	1,046.19	0.58	2,507.31	1.40	178,645.47	98.60
VAL 07	JUN 2018	42,824.44	3,178.13	1.77	5,685.44	3.17	173,467.34	96.83
VAL 08	JUL 2018	60,123.22	4,461.93	2.49	10,147.37	5.66	169,005.41	94.34
VAL 09	AGO 2018	25,303.77	1,877.87	1.05	12,025.24	6.71	167,127.54	93.29
VAL 10	SEPTIEMBRE 2018	45,688.43	3,300.53	1.89	15,415.77	8.60	163,737.01	91.40
VAL 11	OCTUBRE 2018	84,517.33	6,272.29	3.50	21,688.06	12.11	167,464.73	87.80
VAL 12	NOVIEMBRE 2018	-	-	-	21,688.06	12.11	157,464.73	87.89
VAL 13	DICIEMBRE 2018	69,890.20	5,188.78	2.90	26,876.82	15.00	152,277.96	85.00
VAL 14	ENERO 2019	118,854.68	8,672.14	4.84	35,548.96	19.84	143,605.82	80.16
VAL 15	FEBRERO 2019	183,912.83	13,848.73	7.62	49,397.69	27.46	129,957.09	72.54
VAL 16	MARZO 2019	109,080.16	8,093.89	4.52	57,291.58	31.98	121,863.40	68.02
VAL 17	ABRIL 2019	19,581.40	1,453.20	0.81	58,744.77	32.79	120,410.21	67.21
VAL 18	MAYO 2019	62,422.05	4,632.53	2.59	63,377.30	35.37	115,777.68	64.63
VAL 19	JUNIO 2019	68,910.30	5,114.04	2.85	68,491.34	38.23	110,663.64	61.77
VAL 20	JULIO 2019	44,333.44	3,290.12	1.84	71,779.26	40.07	107,373.52	59.93
TOTAL		967,206.52	71,779.26	40.07	71,779.26	40.07	107,373.52	59.93

AMORTIZACION MENSUAL SI. 3,290.12

CONSORCIO ZORRITOS

 FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Responsable de Obra

ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBE
 JEFE DE SUPERVISION

CALCULO DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO

CALCULO DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO
VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 03 : INSTALACIONES SANITARIAS

LICITACION : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
 OBRA : REHABILITACION DPA DE ACAPULCO
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACION : ACAPULCO ZORRITOS CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 28-dic-17
 FECHA PRESUPUESTO : 30-jun-17
 P. REFERENCIAL B.I.G.V : S/ 12,903,758.02
 P. CONTRATO B.I.G.V. : S/ 12,903,758.02
 VALORIZACION N° : 20

INSTALACIONES SANITARIAS : S/. 1,115,459.39
 ADELANTO EN EFECTIVO : S/. 82,781.63
 PORCENTAJE INICIAL : 7.42%

Nro.	MES	DESCRIPCION SIN IGV			AMORTIZACION SIN IGV			
		VALORIZACION	AMORTIZACION	%	ACUMULADA	%	SALDO	%
VAL 06	MAYO 2018	3,154.85	234.13	0.28	234.13	0.28	82,547.50	99.72
VAL 07	JUN 2018	-	-	-	234.13	0.28	82,547.50	99.72
VAL 08	JUL 2018	-	-	-	234.13	0.28	82,547.50	99.72
VAL 09	AGO 2018	-	-	-	234.13	0.28	82,547.50	99.72
VAL 10	SET 2018	6,854.95	508.73	0.61	742.86	0.80	82,038.77	99.10
VAL 11	OCT 2018	9,054.36	671.95	0.81	1,414.81	1.71	81,366.82	98.29
VAL 12	NOVIEMBRE 2018	-	-	-	1,414.81	1.71	81,366.82	98.29
VAL 13	DICIEMBRE 2018	-	-	-	1,414.81	1.71	81,366.82	98.29
VAL 14	ENERO 2019	-	-	-	1,414.81	1.71	81,366.82	98.29
VAL 15	FEBRERO 2019	-	-	-	1,414.81	1.71	81,366.82	98.29
VAL 16	MARZO 2019	-	-	-	1,414.81	1.71	81,366.82	98.29
VAL 17	ABRIL 2019	-	-	-	1,414.81	1.71	81,366.82	98.29
VAL 18	MAYO 2019	(19,084.17)	(1,414.81)	(1.71)	(0.00)	(0.00)	82,781.63	100.00
VAL 19	JUNIO 2019	-	-	-	(0.00)	(0.00)	82,781.63	100.00
VAL 20	JULIO 2019	-	-	-	(0.00)	(0.00)	82,781.63	100.00
TOTAL		(0.01)	(0.00)	0.00	(0.00)	(0.00)	82,781.63	100.00

AMORTIZACION MENSUAL : S/ -

CALCULO DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO
VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS


LICITACION : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
 OBRA : REHABILITACION DPA DE ACAPULCO
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACION : ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 28-dic-17
 FECHA PRESUPUESTO : 30-jun-17
 P. REFERENCIAL B.I.G.V : S/ 12,903,758.02
 P. CONTRATO B.I.G.V. : S/ 12,903,758.02
 VALORIZACION N° : 20

INSTALACIONES ELECTRICAS : S/. 457,810.85
 ADELANTO EN EFECTIVO : S/. 33,975.52
 PORCENTAJE INICIAL : 7.42%

Nro.	MES	DESCRIPCION SIN IGV			AMORTIZACION SIN IGV			
		VALORIZACION	AMORTIZACION	%	ACUMULADA	%	SALDO	%
VAL 06	MAYO 2018	27,083.96	2,009.98	5.92	2,009.98	5.92	31,965.54	94.06
VAL 07	JUN 2018	-	-	-	2,009.98	5.92	31,965.54	94.06
VAL 08	JUL 2018	-	-	-	2,009.98	5.92	31,965.54	94.06
VAL 09	AGO 2018	-	-	-	2,009.98	5.92	31,965.54	94.06
VAL 10	SET 2018	4,124.33	308.08	0.90	2,318.06	6.82	31,658.46	93.18
VAL 11	OCT 2018	8,175.02	606.69	1.79	2,922.76	8.60	31,052.76	91.40
VAL 12	NOVIEMBRE 2018	-	-	-	2,922.76	8.60	31,052.76	91.40
VAL 13	DICIEMBRE 2018	-	-	-	2,922.76	8.60	31,052.76	91.40
VAL 14	ENERO 2019	-	-	-	2,922.76	8.60	31,052.76	91.40
VAL 15	FEBRERO 2019	-	-	-	2,922.76	8.60	31,052.76	91.40
VAL 16	MARZO 2019	-	-	-	2,922.76	8.60	31,052.76	91.40
VAL 17	ABRIL 2019	-	-	-	2,922.76	8.60	31,052.76	91.40
VAL 18	MAYO 2019	-	-	-	2,922.76	8.60	31,052.76	91.40
VAL 19	JUNIO 2019	-	-	-	2,922.76	8.60	31,052.76	91.40
VAL 20	JULIO 2019	-	-	-	2,922.76	8.60	31,052.76	91.40
TOTAL		39,383.31	2,922.76	8.60	2,922.76	8.60	31,052.76	91.40

AMORTIZACION MENSUAL : S/ -

CONSORCIO ZORRITOS
 EDGAR FERNANDEZ REGALADO ORBITAS
 Ing. Responsable de Obra


 ING. RUBEN BOSSUS TONATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

CALCULO DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO
VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 05 : OBRAS EN MAR

LICITACION : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
 OBRA : REHABILITACION DPA DE ACAPULCO
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACION : ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 28-dic-17
 FECHA PRESUPUESTO : 30-jun-17
 P. REFERENCIAL S.M.G.V : S/ 12,903,758.02
 P. CONTRATO S.M.G.V. : S/ 12,903,758.02
 VALORIZACION N° : 20

OBRAS EN MAR : S/. 2,429,956.28
 ADELANTO EN EFECTIVO : S/. 180,334.44

PORCENTAJE INICIAL 7.42%

Nro.	MES	DESCRIPCION SIN IGV			AMORTIZACION SIN IGV			
		VALORIZACION	AMORTIZACION	%	ACUMULADA	%	BALDO	%
VAL 01	DICIEMBRE 2017	58,316.45	4,327.84	2.40	4,327.84	2.40	176,008.60	97.60
VAL 02	ENERO 2018	-	-	-	4,327.84	2.40	176,008.60	97.60
VAL 03	FEBRERO 2018	7,781.23	577.47	0.32	4,905.31	2.72	175,429.13	97.28
VAL 04	MARZO 2018	58,868.88	4,368.84	2.42	9,274.15	5.14	171,060.29	94.86
VAL 05	ABRIL 2018	172,399.34	12,794.28	7.09	22,068.43	12.24	158,266.01	87.76
VAL 06	MAYO 2018	205,036.81	16,216.41	9.44	37,284.83	20.68	142,069.61	78.32
VAL 07	JUN 2018	99,233.85	7,364.46	4.08	44,649.29	24.76	135,685.16	75.24
VAL 08	JUL 2018	43,620.51	3,237.21	1.80	47,886.49	26.55	132,447.96	73.45
VAL 09	AGO 2018	147,121.32	10,918.32	6.05	58,804.81	32.61	121,529.63	67.39
VAL 10	SET 2018	-	-	-	58,804.81	32.61	121,529.63	67.39
VAL 11	OCT 2018	64,725.95	4,803.51	2.66	63,608.32	35.27	116,726.12	64.73
VAL 12	NOVIEMBRE 2018	-	-	-	63,608.32	35.27	116,726.12	64.73
VAL 13	DICIEMBRE 2018	29,087.57	2,158.68	1.20	65,767.00	36.47	114,567.44	63.53
VAL 14	ENERO 2019	9,133.18	677.80	0.38	66,444.80	36.85	113,889.64	63.15
VAL 15	FEBRERO 2019	37,608.78	2,791.06	1.55	69,235.86	38.39	111,098.58	61.61
VAL 16	MARZO 2019	51,656.66	3,833.52	2.13	73,069.38	40.52	107,265.06	59.48
VAL 17	ABRIL 2019	84,400.19	6,263.59	3.47	79,332.96	43.99	101,001.46	56.01
VAL 18	MAYO 2019	113,242.16	8,404.04	4.68	87,737.02	48.65	92,567.42	51.35
VAL 19	JUNIO 2019	48,473.78	3,597.39	1.99	91,334.41	50.65	89,000.03	49.35
VAL 20	JULIO 2019	61,108.09	4,535.02	2.51	95,869.43	53.16	84,465.01	48.84
TOTAL		1,291,613.74	85,669.43	53.16	95,869.43	53.16	84,465.01	48.84

AMORTIZACION MENSUAL S/. 4,634.02

CALCULO DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO
VALORIZACION DE OBRA N° 20
FORMULA 06 : EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

LICITACION : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
 OBRA : REHABILITACION DPA DE ACAPULCO
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS
 UBICACION : ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 28-dic-17
 FECHA PRESUPUESTO : 30-jun-17
 P. REFERENCIAL S.M.G.V : S/ 12,903,758.02
 P. CONTRATO S.M.G.V. : S/ 12,903,758.02
 VALORIZACION N° : 20

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO : S/. 1,387,471.14
 ADELANTO EN EFECTIVO : S/. 102,968.45

PORCENTAJE INICIAL 7.42%

Nro.	MES	DESCRIPCION SIN IGV			AMORTIZACION SIN IGV			
		VALORIZACION	AMORTIZACION	%	ACUMULADA	%	BALDO	%
VAL 01	DICIEMBRE 2017	-	-	-	-	-	102,968.45	100.00
VAL 02	ENERO 2018	-	-	-	-	-	102,968.45	100.00
VAL 03	FEBRERO 2018	-	-	-	-	-	102,968.45	100.00
VAL 04	MARZO 2018	-	-	-	-	-	102,968.45	100.00
VAL 05	ABRIL 2018	-	-	-	-	-	102,968.45	100.00
VAL 06	MAYO 2018	-	-	-	-	-	102,968.45	100.00
VAL 07	JUN 2018	-	-	-	-	-	102,968.45	100.00
VAL 08	JUL 2018	-	-	-	-	-	102,968.45	100.00
VAL 09	AGO 2018	697,114.51	51,734.99	50.24	51,734.99	50.24	51,233.46	49.76
VAL 10	SET 2018	-	-	-	51,734.99	50.24	51,233.46	49.76
VAL 11	OCT 2018	-	-	-	51,734.99	50.24	51,233.46	49.76
VAL 12	NOVIEMBRE 2018	-	-	-	51,734.99	50.24	51,233.46	49.76
VAL 13	DICIEMBRE 2018	-	-	-	51,734.99	50.24	51,233.46	49.76
VAL 14	ENERO 2019	-	-	-	51,734.99	50.24	51,233.46	49.76
VAL 15	FEBRERO 2019	-	-	-	51,734.99	50.24	51,233.46	49.76
VAL 16	MARZO 2019	-	-	-	51,734.99	50.24	51,233.46	49.76
VAL 17	ABRIL 2019	-	-	-	51,734.99	50.24	51,233.46	49.76
VAL 18	MAYO 2019	-	-	-	51,734.99	50.24	51,233.46	49.76
VAL 19	JUNIO 2019	-	-	-	51,734.99	50.24	51,233.46	49.76
VAL 20	JULIO 2019	-	-	-	51,734.99	50.24	51,233.46	49.76
TOTAL		697,114.51	51,734.99	50.24	51,734.99	50.24	51,233.46	49.76

AMORTIZACION MENSUAL S/.

CONSORCIO ZORRITOS
 INGENIERO FERNANDO REGALADO OBLITAS
 INGENIERO EN OBRAS DE OBRA

CALCULO DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO EN EFECTIVO
 ING. ROBERTO BOSSUS TOMATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

FORMULA POLINOMICA



LICITACION LP-SM-05-2017-FONDEPE3-1
OBRA REHABILITACIÓN DPA DE ACAPULCO
PROPIETARIO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS
UBICACIÓN LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES

**CALCULO DEL FACTOR DE REAJUSTE: Val N°20
 AL MES DE JULIO 2019**

FORMULA POLINOMICA No 01: ESTRUCTURA

Fecha Presupuesto Base: Junio 2017

MON.	SIMB.	IND.	DESCRIPCION	COEF.	%	I ₀ Jun-2017	DICIEMBRE 2017		ABRIL 2019		MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019	
							I _r Nov-2017	K _r	I _r Mar-2019	K _r	I _r Abr-2019	K _r	I _r May-2019	K _r	I _r Jun-2019	K _r
1	M	47	MANO DE OBRA	0.205	100.000%	563.25	580.90	0.211	600.40	0.219	600.40	0.219	600.40	0.219	600.40	0.219
2	CA	5	AGREGADO 3RUESO	0.201	28.866%	446.64	449.82	0.057	450.46	0.057	450.57	0.057	449.57	0.057	448.47	0.057
		23	CEMENTO PORTLAND TIPO V		73.134%	418.10	418.10	0.144	439.25	0.152	439.25	0.152	439.25	0.152	439.25	0.152
3	MDF	30	DÓLAR	0.083	37.349%	466.08	465.87	0.025	486.86	0.027	489.59	0.027	496.36	0.027	496.36	0.027
		32	FLETE TERRESTRE		21.687%	467.18	468.00	0.015	471.42	0.015	471.42	0.015	471.42	0.015	472.50	0.015
		43	MADERA NACIONAL PIENCOFRADO		40.964%	711.13	722.52	0.043	752.12	0.045	757.99	0.045	760.14	0.046	756.63	0.045
4	AP	2	ACERO DE CONSTRUCCIÓN LISO	0.170	82.353%	463.66	482.69	0.169	550.36	0.193	550.39	0.193	555.05	0.194	553.89	0.194
		51	PERFIL DE ACERO LIVIANO		7.647%	267.89	311.33	0.009	317.79	0.009	299.42	0.009	298.89	0.009	297.29	0.009
5	MM	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	0.060	25.532%	367.13	363.07	0.018	368.51	0.018	369.76	0.018	371.18	0.018	370.90	0.018
		49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO		74.468%	294.92	292.27	0.042	308.64	0.044	309.08	0.044	312.35	0.045	311.91	0.044
6	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS	0.281	100.000%	440.79	441.61	0.282	456.16	0.291	457.08	0.291	457.75	0.292	457.36	0.292
EN EL MONOMIO 5, EL IU 49 CON 38.238% SE ESTÁ INCREMENTANDO A 74.468% PARA OBTEN							K ₁ =	1.0150	K ₁ =	1.070	K ₁ =	1.070	K ₁ =	1.074	K ₁ =	1.072

FORMULA POLINOMICA No 02: ARQUITECTURA

Fecha Presupuesto Base: Junio 2017

MON.	SIMB.	IND.	DESCRIPCION	COEF.	%	I ₀ Jun-2017	DICIEMBRE 2017		ABRIL 2019		MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019	
							I _r Nov-2017	K _r	I _r Mar-2019	K _r	I _r Abr-2019	K _r	I _r May-2019	K _r	I _r Jun-2019	K _r
1	M	47	MANO DE OBRA	0.295	100.000%	563.25	580.90	0.305	600.40	0.316	600.40	0.316	600.40	0.316	600.40	0.316
2	CP	54	PINTURA LA TEX	0.063	28.571%	405.60	405.60	0.018	450.77	0.020	449.85	0.020	450.05	0.020	449.90	0.020
		23	CEMENTO PORTLAND TIPO V		71.429%	418.10	418.10	0.045	439.25	0.048	439.25	0.048	439.25	0.048	439.25	0.048
3	AP	5	AGREGADO 3RUESO	0.104	88.462%	446.64	449.82	0.097	450.46	0.097	450.57	0.097	449.57	0.097	448.47	0.097
		51	PERFIL DE ACERO LIVIANO		11.538%	267.89	311.33	0.009	317.79	0.009	299.42	0.008	298.89	0.008	297.29	0.008
4	DP	30	DÓLAR	0.194	82.474%	466.08	465.87	0.160	486.86	0.167	489.59	0.168	496.36	0.171	496.36	0.171
		56	PLANCHA DE ACERO LAC		17.526%	461.08	493.55	0.036	565.19	0.041	540.10	0.039	533.64	0.039	532.72	0.039
5	MM	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	0.060	71.687%	367.13	363.07	0.034	368.51	0.034	369.76	0.034	371.18	0.034	370.90	0.034
		43	MADERA NACIONAL PIENCOFRADO		28.333%	711.13	722.52	0.028	752.12	0.028	757.99	0.028	760.14	0.028	756.63	0.028
6	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS	0.283	100.000%	440.79	441.61	0.284	456.16	0.293	457.08	0.293	457.75	0.294	457.36	0.294
							K ₂ =	1.014	K ₂ =	1.063	K ₂ =	1.051	K ₂ =	1.0550	K ₂ =	1.0580

CONSORCIO ZORRITOS
 Ing. Fernando Regalado Oblitas
 Jefe de Supervisión

ING. RUBEN BOSSUS LOBATO
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISIÓN

LICITACION LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
OBRA REHABILITACIÓN DPA DE ACAPULCO
PROPIETARIO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS
UBICACIÓN LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES

CALCULO DEL FACTOR DE REAJUSTE: Val N°20
AL MES DE JULIO 2019

FORMULA POLINOMICA NO 03: INSTALACIONES SANITARIAS

Fecha Presupuesto Base: Junio 2017

MON.	SIMB.	IND.	DESCRIPCION	COEF.	%	I ₀ Jun-2017	DICIEMBRE 2017		ABRIL 2019		MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019	
							Ir Nov-2017	Kr	Ir Mar-2019	Kr	Ir Abr-2019	Kr	Ir May-2019	Kr	Ir Jun-2019	Kr
1	M	47	MANO DE OBRA	0.256	100.000%	563.25	580.90	0.264	600.40	0.273	600.40	0.273	600.40	0.273	600.40	0.273
2	PTT	51	PERFIL DE ACERO LIVIANO	0.144	51.389%	287.89	311.33	0.061	317.79	0.062	299.42	0.058	298.89	0.058	297.29	0.058
		71	TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO		16.667%	648.78	643.43	0.041	656.12	0.042	656.12	0.042	661.69	0.042	660.29	0.042
		82	TUBERIA HDPE		31.944%	417.89	425.95	0.052	431.72	0.052	431.72	0.052	431.72	0.052	431.72	0.052
3	ACM	43	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO	0.079	13.924%	711.33	722.52	0.016	752.12	0.017	757.99	0.017	760.14	0.017	756.63	0.017
		2	ACERO DE CONSTRUCCIÓN LISO		70.886%	483.66	482.69	0.055	550.39	0.063	550.39	0.063	555.05	0.063	553.89	0.063
		23	CEMENTO PORTLAND TIPO V		15.190%	418.10	418.10	0.010	439.25	0.011	439.25	0.011	439.25	0.011	439.25	0.011
4	T	72	TUBERIA DE PVC PARA AGUA	0.140	100.000%	417.89	425.95	0.143	432.33	0.145	432.33	0.145	433.94	0.145	435.99	0.146
5	DMA	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	0.079	45.395%	367.13	363.07	0.031	366.51	0.031	369.76	0.032	371.16	0.032	370.90	0.032
		30	DOLAR(GENERAL PODERADO)		48.026%	496.08	465.87	0.042	486.86	0.044	489.59	0.044	496.36	0.045	496.36	0.045
		5	AGREGADO GRUESO		6.579%	446.64	449.82	0.006	450.26	0.006	450.57	0.006	449.57	0.006	448.47	0.006
6	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS	0.302	100.00%	440.79	441.61	0.303	456.18	0.313	457.08	0.313	457.75	0.314	457.36	0.313
							K ₁ =	1.024	K ₂ =	1.059	K ₃ =	1.056	K ₄ =	1.058	K ₅ =	1.058

EN EL MONOMIO 2, EL IU 82 SE ESTÁ CONSIDERANDO COMO IU 72
 EN EL MONOMIO 5 CON COEFICIENTE (0.152) SE HA REDUCIDO A 0.079, PARA OBTENER 1.000

CONSORCIO ZORRITOS

 OSCAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Jefe de Supervisión de Obra

ING. RUBEN BOSSUS TONATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISIÓN

LICITACION LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
OBRA REHABILITACIÓN DPA DE ACAPULCO
PROPIETARIO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS
UBICACIÓN LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRAL MIRANTE VILLAR-TUMBES

CALCULO DEL FACTOR DE REAJUSTE: Val N°20
AL MES DE JULIO 2019

FORMULA POLINOMICA No 04: INSTALACION ELECTRICA

Fecha Presupuesto Base: Junio 2017

MON.	SIMB.	IND.	DESCRIPCION	COEF.	%	Io Jun-2017	DICIEMBRE 2017		ABRIL 2019		MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019	
							Ir Nov-2017	Kr	Ir Mar-2019	Kr	Ir Abr-2019	Kr	Ir May-2019	Kr	Ir Jun-2019	Kr
1	M	47	MANO DE OBRA	0.192	100.000%	583.25	580.90	0.198	600.40	0.205	600.40	0.205	600.40	0.205	600.40	0.205
2	TP	62	POSTE DE CONCRETO	0.086	28.744%	458.55	461.57	0.025	466.69	0.025	468.11	0.025	468.94	0.025	468.41	0.025
		74	TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD(SAP)		73.258%	417.89	425.95	0.063	431.72	0.063	431.72	0.063	431.72	0.063	431.72	0.063
3	AA	11	ARTEFACTO DE ALUMBRADO EXTERIOR	0.133	24.812%	235.01	233.49	0.026	253.48	0.028	253.83	0.028	255.42	0.028	254.87	0.028
		12	ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR		75.188%	318.90	317.93	0.107	321.72	0.108	321.72	0.108	323.47	0.109	316.88	0.106
4	DM	30	DÓLAR(GENERAL PONDERADO)	0.185	84.324%	486.08	465.87	0.165	486.86	0.173	489.59	0.174	496.36	0.178	496.36	0.176
		49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO		15.676%	294.92	292.27	0.019	308.64	0.020	309.08	0.020	312.35	0.021	311.91	0.021
5	PT	51	PERFIL DE ACERO LIVANO	0.111	80.180%	267.89	311.33	0.108	317.79	0.110	299.42	0.104	298.89	0.103	297.29	0.103
		65	TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO		19.820%	214.57	233.92	0.020	257.55	0.022	258.23	0.022	259.77	0.022	259.06	0.022
6	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS	0.293	100.00%	440.79	441.61	0.294	456.16	0.303	467.08	0.304	457.75	0.304	457.36	0.304
							K_d =	1.025	K_d =	1.057	K_d =	1.053	K_d =	1.058	K_d =	1.053

CONSORCIO ZORRITOS

 FERNANDO GALDO CORTÉS
 INGENIERO EN OBRAS

ING RUBEN BOSSUS TONIATTI
 SERVICIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISIÓN


LICITACION LP-SM-C5-2017-FONDEPES-I
OBRA REHABILITACIÓN DPA DE ACAPULCO
PROPIETARIO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEFES)
CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS
UBICACIÓN LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CENTRAL MARANTE VILLAR-TUMBE3


**CALCULO DEL FACTOR DE REAJUSTE: Val N°20
 AL MES DE JULIO 2019**

FORMULA POLINOMICA No 03: OBRAS DE MAR

Fecha Presupuesto Base: Junio 2017

MON.	SIMB.	IND.	DESCRIPCION	COEF.	%	Ic Jun-2017	DICIEMBRE 2017		ABRIL 2019		MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019	
							Ir Nov-2017	Kr	Ir Mar-2019	Kr	Ir Abr-2019	Kr	Ir May-2019	Kr	Ir Jun-2019	Kr
1	M	47	MANO DE OBRA	0.223	100.00%	563.25	580.90	0.230	600.40	0.238	600.40	0.238	600.40	0.238	600.40	0.238
2	CA	5	AGREGADO GRUESO	0.093	24.73%	448.64	449.82	0.024	450.46	0.024	450.57	0.024	449.57	0.024	448.47	0.024
		23	CEMENTO PORTLAND TIPO V		75.27%	418.10	418.10	0.069	439.25	0.072	439.25	0.072	439.25	0.072	439.25	0.072
3	CA	2	ACERO DE CONSTRUCCIÓN LISO	0.204	60.29%	463.66	482.59	0.154	550.39	0.175	550.39	0.175	555.05	0.177	553.89	0.177
		51	PERFIL DE ACERO LIVIANO		39.71%	267.66	311.33	0.065	317.79	0.067	299.42	0.063	298.69	0.063	297.29	0.062
4	AP	43	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO	0.107	27.10%	711.33	722.52	0.039	752.12	0.041	757.99	0.041	760.14	0.041	756.63	0.041
		30	DÓLAR		72.90%	466.08	465.87	0.068	486.86	0.071	489.59	0.072	496.36	0.073	496.36	0.073
5	MM	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	0.092	52.17%	367.13	383.07	0.052	388.51	0.053	389.76	0.053	371.16	0.054	370.90	0.054
		49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO		47.83%	294.92	292.27	0.039	308.64	0.041	309.08	0.041	312.35	0.041	311.91	0.041
6	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS	0.281	100.00%	440.79	441.61	0.282	456.16	0.291	457.08	0.291	457.75	0.292	457.36	0.292
							K₆ =	1.022	K₄ =	1.073	K₅ =	1.070	K₆ =	1.075	K₇ =	1.074


CONSORCIO ZORRITOS
ING. FERNANDO REGALADO OBITAS
 Jefe de Supervisión de OMS


ING. RUBEN BOSSUSTONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION


LICITACION LP-SM-05-2017-FONDEPES-1
OBRA REHABILITACIÓN DPA DE ACAPULCO
PROPIETARIO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS
UBICACIÓN LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRA MIRANTE VILLAR-TUMBES


**CALCULO DEL FACTOR DE REAJUSTE: Val N°20
 AL MES DE JULIO 2019**

FORMULA POLINOMICA No 06: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Fecha Presupuesto Base: Junio 2017

MON.	SIMB.	IND	DESCRIPCION	COEF.	%	I ₀ Jun-2017	DICIEMBRE 2017		ABRIL 2019		MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019	
							I _r Nov-2017	K _r	I _r Mar-2019	K _r	I _r Abr-2019	K _r	I _r May-2019	K _r	I _r Jun-2019	K _r
1	D	47	MANO DE OBRA	0.201	100.00%	563.25	580.90	0.207	600.40	0.214	600.40	0.214	600.40	0.214	600.40	0.214
2	MM	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	0.537	100.00%	294.82	292.27	0.532	308.64	0.562	309.08	0.563	312.35	0.569	311.91	0.568
3	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS	0.262	100.00%	440.79	441.61	0.262	456.16	0.271	457.08	0.272	457.75	0.272	457.36	0.272
							K₀=	1.001	K₀=	1.047	K₀=	1.049	K₀=	1.055	K₀=	1.054


CONSORCIO ZORRITOS
 Edgardo Fernando Regalado Obatas
 Ing. Residente de Obras


ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION


METRADOS EJECUTADOS




RESUMEN DE METRADOS DE ESTRUCTURAS



CONSORCIO ZORRITOS		FORMULA 01 : ESTRUCTURAS					
ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UMD	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO	ACUMULADO	MAYOR O
			CONTRATADO	VAL - 19	VAL - 20		MEJOR
			METRADO	METRADO	METRADO	METRADO	METRADO
01	ESTRUCTURAS						
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES						
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES						
01.01.01.01	TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	4,762.54			4,762.54	0.00
01.01.01.02	ALMACÉN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANA	m2	80.00			80.00	0.00
01.01.01.03	CARTEL DE OBRA 2.40 x 3.60 m	pre	1.00			1.00	0.00
01.01.01.04	CRINCO DE MALLA RASHELL CON MADERA ROLLIZO	m	251.47			251.47	0.00
01.01.01.05	BANOS QUIMICOS PARA EL PERSONAL	mes	10.00			10.00	0.00
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES						
01.01.02.01	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	mes	10.00			10.00	0.00
01.01.02.02	AGUIJA PARA LA CONSTRUCCION	mes	10.00			10.00	0.00
01.01.02.03	TANQUE ALMACENAMIENTO PROVISIONAL DE AGUA PARA LA OBRA	u	2.00			2.00	0.00
01.01.03	MOVILIZACION DE EQUIPOS,						
01.01.03.01	TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	gib	1.00			1.00	0.00
01.01.03.02	FLETE TERRESTRE	gib	1.00			1.00	0.00
01.02	SEGURIDAD Y SALUD						
01.02.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PLAN DE	u	1.00			0.95	0.05
01.02.02	IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN COLECTIVA	u	1.00			0.95	0.05
01.02.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	u	1.00			0.95	0.05
01.02.04	IMPLEMENTACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	u	1.00			1.00	0.00
01.02.05	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	u	1.00			1.00	0.00
01.03	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL						
01.03.01	RIEGO DEL AREA DE TRABAJO	m2	4,762.54			4,762.54	0.00
01.03.02	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	m2	4,762.54			4,762.54	0.00
01.03.03	PLAN DE CONTINGENCIA	u	1.00			0.95	0.05
01.03.04	PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	u	1.00			0.95	0.05
01.03.05	PLAN DE CIERRE Y ABANDONO	u	1.00			0.00	1.00
01.03.06	MEDIDAS DE CONCIENTIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	u	1.00			1.00	0.00
01.03.07	CARTEL DE MANEJO AMBIENTAL DE 1.00 X 0.50m.	u	8.00			8.00	0.00
01.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE BASURA	u	10.00			10.00	0.00
01.04	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE						
01.04.01	DEMOLICION DE CIMIENTO Y SOBRECIMENTOS	m3	272.85			272.85	0.00
01.04.02	DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA, INC. COLUMNAS Y VIGAS	m3	353.10			353.10	0.00
01.04.03	DEMOLICION DE TECHOS DE CONCRETO	m3	122.49			122.49	0.00
01.04.04	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m2	303.05			303.05	0.00
01.04.05	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	u	12.00			12.00	0.00
01.04.06	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA	m2	60.81			60.81	0.00
01.04.07	DESMONTAJE DE VENTANAS	m2	20.72			20.72	0.00
01.04.08	RETIRO DE POSTES DE ALUMBRADO	u	10.00			10.00	0.00
01.04.09	RETIRO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	u	1.00			1.00	0.00
01.04.10	RETIRO DE EQUIPAMIENTO DE FRIO	gib	1.00			1.00	0.00
01.05	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
01.05.01	EXCAVACION DE ESTRUCTURAS PARA CIMENTACION	m3	3,165.25		741.78	2,819.63	345.64
01.05.02	CORTE MASIVO DE TERRENO A MAQUINA	m3	2,187.86			4,083.87	1,896.01
01.05.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	2,362.49			3,792.26	1,429.77
01.05.04	ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	5,353.11			7,727.72	2,374.61
01.05.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m3	3,888.50			3,881.35	7.15
01.05.06	AFIRMADO H=0.15 M. EN INTERIORES	m2	1,762.89		151.53	1,762.69	0.00
01.05.07	AFIRMADO H=0.30	m2	2,600.82	663.81		438.88	1,498.13
01.06	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
01.06.01	SOLADOS						
01.06.01.01	SOLADO CONCRETO Fc= 100 kg/cm2 H=4"	m2	498.20		66.95	760.74	237.46
01.06.02	CIMENTOS CICLOPEOS						
01.06.02.01	CONCRETO Fc=140 kg/cm2 + 30% PIEDRA GRANDE CIMENTOS CORRIDOS	m3	1,000.82			1,047.90	47.08
01.06.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTOS	m2	12.94			50.71	37.77
01.06.03	SOBRECIMIENTO CICLOPEO						
01.06.03.01	CONCRETO Fc=140 kg/cm2 + 30% PIEDRA MAYORAMA PARA SOBRECIMENTOS	m3	7.23			7.23	0.00
01.06.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO	m2	9.71			13.83	4.12


 ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMAP
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS

 ING. FERNANDO REGALADO OBITAS
 JEFE DE OBRA

FORMULA 01 : ESTRUCTURAS

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UNO	PRESUPUESTO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACUMULADO		MAYOR O MENOR	
			CONTRATADO	NETEADO	VAL. 19	NETEADO	VAL. 20	NETEADO	NETEADO	NETEADO	NETEADO	
01.07.01	ORNAS DE CONCRETO ARMADO	m3	498.20						508.42		77.22	
01.07.01.01	ZAPATAS, CONCRETO Fc=315 kg/cm ²	m ²	1,000.82					22.86	703.80		297.02	
01.07.01.02	ZAPATAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	kg	34,978.97					41,491.17			6,512.20	
01.07.01.04	ZAPATAS, ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg						8.20			0.00	
01.07.02	SORBECONCRETO	m ³	133.23					133.23			0.00	
01.07.02.01	SORBECHIMENTO ARMADO, CONCRETO Fc=315 kg/cm ²	m ²	1,158.76					1,109.02			49.74	
01.07.02.03	SORBECHIMENTO ARMADO, ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	23,307.48					1,807.92			287.37	
01.07.03	COLUMNAS	kg						22.88			0.00	
01.07.03.01	COLUMNAS, CONCRETO Fc=315 kg/cm ²	m ³	339.44					319.12			20.32	
01.07.03.02	COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m ²	3,003.53					2,929.01			104.52	
01.07.03.03	COLUMNAS, ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	98,130.97					7,263.58			12,867.29	
01.07.04	VIGAS DE CIMENTACION	m ³	90.14					86.68			3.46	
01.07.04.01	VIGAS DE CIMENTACION, CONCRETO Fc=315 kg/cm ²	m ³	1,804.27					576.92			1,227.35	
01.07.04.02	VIGAS DE CIMENTACION, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m ²	392.78					10,673.95			10,281.17	
01.07.04.03	VIGAS DE CIMENTACION, ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	4,001.29								0.00	
01.07.05	VIGAS	m ³	271.39					289.09			2.30	
01.07.05.01	VIGAS, CONCRETO Fc=210 kg/cm ²	m ³	1,804.27					2,382.67			578.40	
01.07.05.02	VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m ²	36,081.47					30,082.47			8,019.00	
01.07.05.03	VIGAS, ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg						76.09			0.00	
01.07.06	MUROS DE CONTENCION PLACAS Y MUROS CONTRA RUSOS	m ³	66.81					29.40			37.41	
01.07.06.01	MURIO DE CONCRETO Fc=315 kg/cm ²	m ³	39.25					1,063.48			1,024.23	
01.07.06.02	MURIO DE CONCRETO Fc=350 kg/cm ²	m ³	831.56					27,880.04			27,048.48	
01.07.06.03	MURIO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m ²	16,492.54								0.00	
01.07.06.04	MURIO, ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg									0.00	
01.07.07	LOSAS ALBERGADAS	m ³	139.47					130.62			8.85	
01.07.07.01	LOSA ALBERGADA, CONCRETO Fc=210 kg/cm ²	m ³	1,622.71					1,501.29			121.42	
01.07.07.02	LOSA ALBERGADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m ²	8,309.72					11,758.25			3,448.52	
01.07.07.03	LOSA ALBERGADA, LADRILLO HUECO 15X20X30	u	10,206.80					13,661.25			3,454.45	
01.07.08	ESCALERAS	m ³	4.86					22.14			17.28	
01.07.08.01	ESCALERAS, CONCRETO Fc=210 kg/cm ²	m ³	36.07					125.14			89.07	
01.07.08.02	ESCALERAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m ²	283.32					1,907.60			1,624.28	
01.07.08.03	ESCALERAS, ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg									0.00	
01.07.09	LOSAS MAJAZAS	m ³	80.16					115.16			35.00	
01.07.09.01	LOSAS MAJAZAS CONCRETO Fc=210 kg/cm ²	m ³	24.09					36.08			11.99	
01.07.09.02	LOSAS MAJAZAS CONCRETO Fc=350 kg/cm ²	m ³	549.78					888.62			338.84	
01.07.09.03	LOSAS MAJAZAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m ²	13,460.79					12,845.44			615.35	
01.07.09.04	LOSAS MAJAZAS, ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm ²	kg									0.00	
01.07.10	LOSAS SOBRE EL PISO	m ³	164.26					66.95			97.31	
01.07.10.01	LOSA DE CONCRETO Fc=315 kg/cm ²	m ³	546.87					24.92			521.95	
01.07.10.02	LOSA UN CONCRETO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m ²	31,329.08					7,187.77			24,141.31	
01.07.10.03	LOSA DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm ²	kg	828.75					354.41			474.34	
01.07.10.04	JUNTA DE DILATACION CON TERCERON E=1"	m			39.81			115.20			75.39	
01.08	JUNTAS	m						0.00			0.00	
01.08.01	JUNTAS DE EXPANSION	m	749.85					670.36			79.49	
01.08.02	JUNTAS DE CONTRACCION	m	817.49					147.13			670.36	
01.08.03	JUNTAS DE DILATACION	m	878.75					0.00			878.75	
01.09	PAVIMENTO DE ALTA RESISTENCIA	m ³	490.12					0.00			490.12	
01.09.01	LOSA DE CONCRETO Fc=315 kg/cm ² CON DRAPAJE	m ³	133.04					0.00			133.04	
01.09.02	LOSA DE CONCRETO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m ²	5,106.34					0.00			5,106.34	
01.10	ESTRUCTURA METALICA EN ZONA DE BANCOS DE ALBERGADOS	kg	104.76					0.00			104.76	
01.10.01	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	m ²									0.00	
01.10.02	PINTURA PROXICA EN ESTRUCTURA METALICA, INCLUTE ARMADO	m ²									0.00	
01.11	OTROS	m	44.10					45.90			0.79	
01.11.01	ESCALERA VERTICAL, PASOS DE PISO 1/2" (38M)	pas	3.00					3.00			0.00	
01.11.02	INSERTOS EN CONCRETO: PISO ENO WELSON H4, 1/2"X1/2"X3/4" Y L2X2	m	201.90					0.00			201.90	
01.11.04	ANCLAJE POST INSTALADO CON grad. de 120mm tipo HT-40 Z04 + HT-V4	pas	80.00					0.00			80.00	

ING. RUBEN BOSSTONIAITI
SERVICIO SUPERVISOR TERCER
NIVEL DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS
ING. FERNANDO REGALADO OBULIAS
SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS


Análisis de precios unitarios


Presupuesto		BOMBEO DE AGUA PARA TRABAJOS DE CIMENTACION EN PTAR						Costo unitario directo por : día	332.69
Subpresupuesto									
Partida	Gib/día	MO.	EQ.	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$f.	Parcial \$f.	
		Mazo de Obra							
147010002	OPERARIO			hh		4.0000	20.07	80.28	
		Equipos						80.28	
337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%mo		3.0000	80.28	2.41	
	MOTOBOMBA			hm		20.0000	12.50	250.00	
								252.41	

Presupuesto		EXCAVACION, LIMPIEZA, NIVELACION DE TERRENO Y ELIMINACION DE LODO Y FANGO						Costo unitario directo por : Gb	1,044.73
Subpresupuesto									
Partida	Gib/día	MO.	EQ.	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$f.	Parcial \$f.	
		Mazo de Obra							
147010001	CAPATAZ			hh		1.0000	22.03	22.03	
147010004	PEON			hh		8.0000	14.81	118.48	
		Equipos						140.51	
337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%mo		3.0000	140.51	4.22	
348040021	RETROEXCAVADORA SILLANTAS 58HP 1YD3			hm		4.0000	160.00	640.00	
348040027	CAMION VOLQUETE 6X4 330HP 10M3			hm		2.0000	130.00	260.00	
								984.22	


Presupuesto		DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO h=0.50m						Costo unitario directo por : m2	144.04
Subpresupuesto									
Partida	m2/día	MO. 5.0000	EQ. 5.0000	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$f.	Parcial \$f.	
		Mazo de Obra							
147010001	CAPATAZ			hh	0.1000	0.1600	22.03	3.52	
147010002	OPERARIO			hh	2.0000	3.2000	20.07	64.22	
147010004	PEON			hh	2.0000	3.2000	14.81	47.39	
		Equipos						115.14	
337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%mo		3.0000	115.14	3.45	
348060003	MARTILLO NEUMATICO DE 24KG			hm	3.0000	4.8000	5.30	25.44	
								28.89	


Presupuesto		CORTE, PERFILADO NIVELACION Y ELIMINACION DE LA SUBRAZANTE EN PATIO DE MANIOBRAS						Costo unitario directo por : Gb	2,710.79
Subpresupuesto									
Partida	Gib/día	MO.	EQ.	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$f.	Parcial \$f.	
		Mazo de Obra							
147010001	CAPATAZ			hh		2.0000	22.03	44.06	
147000032	TOPOGRAFO			hh		2.0000	20.07	40.14	
147010004	PEON			hh		16.0000	14.81	236.96	
		Equipos						321.16	
337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%mo		3.0000	321.16	9.63	
337540001	MIRAS Y JALONES			hm		2.0000	5.00	10.00	
348080027	ESTACION TOTAL			hm		2.0000	26.00	60.00	
348040021	RETROEXCAVADORA SILLANTAS 58HP 1YD3			hm		8.0000	180.00	1,280.00	
348040027	CAMION VOLQUETE 6X4 330HP 10M3			hm		8.0000	130.00	1,040.00	
								2,388.83	


ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBA
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS

ING. FERNANDO REGALADO OBITAS
 Responsable de Obra

U1	ESTRUCTURAS									
Item	Descripción	Und	Cant.	Factor	L(m)	B(m)	H(m)	Area (m2)	Parcial	Metrado
01.06	MOVIMIENTO DE TIERRAS									
01.06.01	EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA CIMENTACIÓN	m3								2819.61
	DPA-ACAPULCO									2064.67
	Valorizaciones anteriores	m3	1.00						2064.67	
	ADMINISTRACION									15.16
	Sub Estacion Electrica	m3	1.00		4.40	1.00	1.35		8.91	
		m3	1.00		4.48	1.00	0.95		4.25	
	DESINFECCION									
	Mesas de concreto	m3	8.00		1.95	0.90	1.00		14.04	14.04
	VEREDA 1									19.08
	Costado del edificio de frio	m3	1.00				0.20	74.17	14.83	
	Costado del edificio de Tareas previas	m3	1.00				0.20	21.25	4.25	
	FRIO									33.65
	EQUIPOS DE FRIO (CAMARA FRIGORIFICA (H=0.15m)	m3	1.00				0.50	67.29	33.65	
	TRABAJOS VARIOS									675.02
	ZAPATAS									
	Z-1	m3	1.00	16.34	2.15	1.10	0.60		23.19	
	Z-2	m3	2.00	16.34	1.85	1.10	0.60		39.90	
	Z-3	m3	3.00	16.34	1.80	1.50	0.60		79.41	
	CIMENTOS CORRIDOS									
	CONCRETO									
	Eje 1	m3	1.00	7.87	6.25	0.60	0.80		23.60	
	Eje 2	m3	1.00	7.87	3.33	0.60	0.80		12.55	
	Eje A	m3	1.00	7.87	5.25	0.60	0.80		19.82	
	Eje C	m3	1.00	7.87	5.25	0.60	0.80		19.82	
	ENCOFRADO									
	Eje 1	m3	2.00	1.17	6.25		0.80		11.73	
	Eje 2	m3	2.00	1.17	3.33		0.80		6.24	
	Eje A	m3	2.00	1.17	5.25		0.80		9.85	
	Eje C	m3	2.00	1.17	5.25		0.80		9.85	
	BOMBEO DE AGUA						Dias			
	PTAR	m3	1.00	9.49			30.00		284.75	
	LIMPIEZA Y ELIMINACION DE FANGO Y LODO									
		m3	1.00	29.81					29.81	
	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO						Area (m2)			
		m3	1.00	4.11			6.61		27.14	
	CORTE, PERFLADO, NIVELACION Y ELIMINACION EN PATIO DE MANOBRAS									
		m3	1.00	77.34					77.34	


ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS

ING. HERNANDO REGALADO OBLITAS
 JEFE RESPONSABLE DE OBRA

Metrado Acumulado Actual	2819.61
Metrado Acumulado Anterior	2077.83
Metrado Actual	741.78

Item	Descripción	Unid	Cant.	L(m)	B(m)	H(m)	Area (m2)	Parcial	Metrado
01	ESTRUCTURAS								
1.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
01.05.06	AFIRMADO H=0.15 M. EN INTERIORES	m2							1833.60
	ADMINISTRACION								246.20
	MAESTRANZA	m2	1.00				30.95	30.95	
	ALMACEN TEMPORAL	m2	1.00				14.62	14.62	
	DEPOSITO DE APAREJOS	m2	1.00				12.75	12.75	
	COCINA	m2	1.00				5.04	5.04	
	COCINA	m2	1.00				11.52	11.52	
	COMEDOR	m2	1.00				56.88	56.88	
	SSH VAR	m2	1.00				11.02	11.02	
	SSH MUJ	m2	1.00				11.55	11.55	
	SSH DISC	m2	1.00				6.46	6.46	
	TESORERIA	m2	1.00				12.75	12.75	
	ADMINISTRACION	m2	1.00				12.75	12.75	
	SALA DE REUNIONES	m2	1.00				25.13	25.13	
	SUBESTACION	m2	1.00				28.83	28.83	
	C2	m2	1.00				0.13	0.13	
	CASETA DE VIGILANCIA	m2	1.00				5.83	5.83	
	FRIO								340.24
	GRUPO ELECTROGENO	m2	1.00				23.60	23.60	
	ZONA DE FRIO	m2	1.00				258.90	258.90	
	C5	m2	-2.00				0.20	-0.40	
	C4	m2	-3.00				0.20	-0.60	
	C2	m2	2.00				0.15	-0.30	
	LAVADO DE CAJAS	m2	1.00				59.04	59.04	
	DESINFECCION								283.82
	Deposito de carretas	m2	1.00				60.98	60.98	
	Zona de desinfeccion	m2	1.00				113.96	113.96	
	deposito	m2	1.00				4.10	4.10	
	control de calidad	m2	1.00				9.97	9.97	
	cuarto de limpieza	m2	1.00				3.02	3.02	
	entrega de indumentaria	m2	1.00				5.66	5.66	
	deposito temporal	m2	1.00				20.75	20.75	
	ducha varones	m2	1.00				15.53	15.53	
	ducha mujeres	m2	1.00				15.51	15.51	
	baño de mujeres	m2	1.00				15.29	15.29	
	baño de varones	m2	1.00				19.03	19.03	
	TAREAS PREVIAS								431.16
	Tareas previas	m2	1.00				431.16	431.16	
	ADMINISTRACION								149.27
	VEREDA 3 (H=0.15)	m2	1.00	1.00	04.45			64.45	
		m2	1.00	1.00	84.20			84.20	
	E-F/13	m2	1.00	2.20	0.25	0.70		0.39	
	D-E/13	m2	1.00	0.80	0.25	0.70		0.14	
	12/C-D	m2	1.00	0.90	0.15	0.70		0.09	
	ADMINISTRACION								149.27
	VEREDA 3 (H=0.10)	m2	1.00	1.00	64.45			64.45	
		m2	1.00	1.00	84.20			84.20	
	E-F/13	m2	1.00	2.20	0.25	0.70		0.39	
	D-E/13	m2	1.00	0.80	0.25	0.70		0.14	
	12/C-D	m2	1.00	0.90	0.15	0.70		0.09	
	ADMINISTRACION								11.20
	Sub Estacion Electrica								
		m2	1.00	4.60	1.00			4.60	
		m2	1.00	6.60	1.00			6.60	
	FRIO								67.25

ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS
 ING. FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Residente de Obra

EQUIPOS DE FRIO (CAMARA FRIGORIFICA (H=0.15m))	m ²	1.00				67.29	67.29	
VEREDA								21.25
VEREDA 1 (costado de administracion (H=0.15m))	m ²	1.00				21.25	21.25	
TABLAS PUEBLOS								28.08
MESAS DE CONCRETO (Eje B - 4/12) (H=0.15m)	m ²	8.00				1.76	14.04	
MESAS DE CONCRETO (Eje B - 4/12) (H=0.15m-0.30m)	m ²	8.00				1.76	14.04	
PTAR								108.42
CAMARA DE BOMBEO (H=0.15m)	m ²	1.00				4.91	4.91	
CAMARA DE BOMBEO (H=0.30m)	m ²	1.00				4.91	4.91	
CAMARA DE ECUALIZACION (H=0.15m)	m ²	1.00				4.91	4.91	
CAMARA DE ECUALIZACION (H=0.30m)	m ²	1.00				4.91	4.91	
BASE SEDIMENTADOR (H=0.15m)	m ²	1.00		4.30	2.80		12.04	
BASE SEDIMENTADOR (H=0.30m)	m ²	1.00		4.30	2.80		12.04	
CAJA DE LUDOS (H=0.15m)	m ²	1.00		2.50	1.80		4.50	
CAJA DE LUDOS (H=0.30m)	m ²	1.00		2.50	1.80		4.50	
ZAPAVIAS								2.37
4.1 (H=0.15m)	m ²	1.00		7.15	1.10		2.37	
7.1 (H=0.30m)	m ²	1.00		2.15	1.10		2.37	
4.2 (H=0.15m)	m ²	2.00		1.85	1.10		4.07	
7.2 (H=0.30m)	m ²	2.00		1.85	1.10		4.07	
7.3 (H=0.15m)	m ²	3.00		1.80	1.50		8.10	
7.3 (H=0.30m)	m ²	3.00		1.80	1.50		8.10	
SOBRECIMENTO								1.88
Eje 1 / Eje A-B (H=0.15m)	m ²	1.00		4.13	0.60		1.88	
Eje 1 / Eje A-B (H=0.30m)	m ²	1.00		4.13	0.60		1.88	
Eje 1 / Eje B-C (H=0.15m)	m ²	1.00		3.13	0.60		1.88	
Eje 1 / Eje B-C (H=0.30m)	m ²	1.00		3.13	0.60		1.88	
Eje 2 / Eje A-B (H=0.15m)	m ²	1.00		0.40	0.50		0.74	
Eje 2 / Eje A-B (H=0.30m)	m ²	1.00		0.40	0.50		0.74	
Eje 2 / Eje B-C (H=0.15m)	m ²	1.00		2.93	0.60		1.76	
Eje 2 / Eje B-C (H=0.30m)	m ²	1.00		2.93	0.60		1.76	
Eje 2 / Eje B-C (H=0.15m)	m ²	1.00		2.93	0.60		1.76	
Eje 2 / Eje B-C (H=0.30m)	m ²	1.00		2.93	0.60		1.76	
Eje C / Eje 1-2 (H=0.15m)	m ²	1.00		5.23	0.60		3.14	
Eje C / Eje 1-2 (H=0.30m)	m ²	1.00		5.23	0.60		3.14	
Eje A / Eje 1-2 (H=0.15m)	m ²	1.00		5.23	0.60		3.14	
Eje A / Eje 1-2 (H=0.30m)	m ²	1.00		5.23	0.60		3.14	

Metrodo Acumulado Actual	1833.60
Metrodo Acumulado Anterior	1611.18
Metrodo Actual	181.53

Metrodo Contractual Topo	1782.89
Mayor Metrodo	70.91


[Signature]
ING. RUBEN BOSSIS TONIATTI
 GERENTE GENERAL
 GERENTE DE SUPERVISION

[Signature]
CONSORCIO ZORRITOS
 GERENTE GENERAL
 GERENTE DE SUPERVISION

CONSORCIO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS: PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES"

Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	H(m)	Area (m2)	Parcial	Metrado
01	ESTRUCTURAS								
1.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
01.05.01	AFIRMADO H=0.30	m2							1102.60
	VEREDA 1	m2	1.00				74.17	74.17	
	PATIO DE MANIOBRAS								
	RAMPA	m2	1.00				440.02	440.02	
	PLANO	m2	1.00			Porcentaje(25%)	508.50	149.63	
	PATIO DE MANIOBRAS								
	PLANO	m2	1.00			Porcentaje(75%)	508.50	448.88	
	SE LE DESCUENTA 10m2 EN LA ZONA DEL RODALUPIO AL INGRESO DEL PTAR	m2	1.00				10.00	-10.00	


Metrado Acumulado Actual	1102.60
Metrado Acumulado Anterior	663.81
Metrado Actual	438.88



 ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 COPE DE SUPERVISOR

CONSORCIO ZORRITOS
 EDGAR FERNANDO NEGALDO OBILTA
 10/07/2013

01	ESTRUCTURAS								
Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Parcial	Metrado
01.07	OBRAS DE CONCRETO ARMADO								
01.07.01	ZAPATAS								703.80
01.07.01.02	ZAPATAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2							
	DPA-ACAPULCO								204.85
	Valorizaciones N°04	m2	1.00					204.05	
	DPA-ACAPULCO								193.45
	Valorizaciones N°06	m2	1.00					193.45	
	DPA-ACAPULCO								157.81
	Valorizaciones N°07	m2	1.00					157.81	
	DPA-ACAPULCO								104.51
	Valorizaciones N°09	m2	1.00					104.51	
	DPA-ACAPULCO								4.00
	Valorizaciones N°10	m2	1.00					4.00	
	DPA-ACAPULCO								11.32
	Valorizaciones N°12	m2	1.00					11.32	
	DPA-ACAPULCO								5.80
	Valorizaciones N°15	m2	1.00					5.80	
	PTAR								22.86
	ZAPATAS								
	Z-1	m2	1.00	4.30		0.60		2.58	
	Z-1	m2	1.00	2.20		0.60		1.32	
	Z-2	m2	2.00	3.70		0.60		4.44	
	Z-2	m2	2.00	2.20		0.60		2.64	
	Z-3	m2	3.00	3.60		0.60		6.48	
	Z-3	m2	3.00	3		0.60		5.40	

Metrado Acumulado Actual	703.80
Metrado Acumulado Anterior	680.94
Metrado Actual	22.86


ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISOR

CONSORCIO ZORRITOS

ING. FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Responsable de Obra

CONSORCIO ZORRITOS

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS - PROVINCIA DE CONTRALMIERANTE VILLAR, REGION TUMBES"

OL	ESTRUCTURAS	Unid	Cont.	l(m)	l(m)	M(m)	Area (m2)	Perdid	Metrado
01.06	DESCRIPCION								
01.06.01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE								
01.06.01.01	SOLADOS	m2							288.74
	SOLADO CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 H=4"								
	OPERA ACAPULCO								188.88
	VALORIZACIONES ANTERIORES	m2	1.00						188.88
	ADMINISTRACION								18.16
	Sub Fleccion Electrica	m2	1.00	6.60	1.00	1.35		8.91	
		m2	1.00	4.48	1.00	0.92		4.25	
	TABERNAS PREVIAS								24.88
	MESAS DE CONCRETO (Ep B. 4/12)	m2	8.00				1.76	14.04	
	PTAR								82.91
	CAMARA DE BOMBEO	m2	1.00				4.91	4.91	
	CAMARA DE FILTRAZION	m2	1.00				4.91	4.91	
	BASE SEDIMENTADOR	m2	1.00	4.80	2.80			17.04	
	CAJA DE Lodos	m2	1.00	2.50	1.80			4.50	
	ZAPATA								
	Z-1	m2	1.00	2.15	1.30			2.37	
	Z-2	m2	2.00	1.85	1.10			4.07	
	Z-3	m2	3.00	1.80	1.50			8.10	
	SOBRECRIMIENTO								
	Ep 1/ Ep A-B (H=0.15m)	m2	1.00	3.13	0.80			1.88	
	Ep 1/ Ep B-C (H=0.15m)	m2	1.00	3.13	0.80			1.88	
	Ep 2/ Ep A-B (H=0.15m)	m2	1.00	0.40	0.60			0.24	
	Ep 2/ Ep B-C (H=0.15m)	m2	1.00	2.88	0.80			1.76	
	Ep C/ Ep 1-2 (H=0.15m)	m2	1.00	5.23	0.60			3.14	
	Ep A/ Ep 1-2 (H=0.15m)	m2	1.00	3.24	0.60			3.14	

Metrado Acumulado Actual	288.74
Metrado Acumulado Anterior	188.78
Metrado Actual	88.96


ING. JEBEN BOSSUTONI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMES
TAPP DE SUPERVISION


CONSORCIO ZORRITOS
FINANCIADO POR
REPRESENTANTE DE OMR

Item	Descripción	Und	Cont.	L(m)	B(m)	h(m)	Area (m2)	Parcial	Metrado
01	ESTRUCTURAS								
01.87	OBRAS DE CONCRETO ARMADO								
01.87.82	SOBRECIMIENTO								
01.07.02.01	SOBRECIMIENTO ARMADO, CONCRETO $f_c=315 \text{ kg/cm}^2$	m3							137.13
	DPA-ACAPULCO								35.01
	Valorizaciones N°04	m3	1.00					35.01	
	DPA-ACAPULCO								45.20
	Valorizaciones N°06	m3	1.00					45.20	
	DPA-ACAPULCO								4.06
	Valorizaciones N°07	m3	1.00					4.06	
	DPA-ACAPULCO								18.32
	Valorizaciones N°09	m3	1.00					18.32	
	DPA-ACAPULCO								6.40
	Valorizaciones N°10	m3	1.00					6.40	
	DPA-ACAPULCO								14.87
	Valorizaciones N°11	m3	1.00					14.87	
	DPA-ACAPULCO								1.17
	Valorizaciones N°12	m3	1.00					1.17	
	TAREAS PREVIAS								12.09
	Mesas (maciza)	m3	8.00	1.95	0.90	0.60		8.42	
	Mesas (hueca)	m3	8.00	1.95	0.90	0.40		5.62	
	Hueca	m3	8.00	1.95	0.50	0.25		1.95	

Metrado Acumulado Actual	137.13
Metrado Acumulado Anterior	125.03
Metrado Actual	8.20

Metrado Contractual Tope	133.23
Mayor Metrado	3.90


 ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION


CONSORCIO ZORRITOS

 ING. FERNANDO REGALADO OBLITAS
 JEFE DE SUPERVISION

Item	Descripción	Und	Cant.	L(m)	B(m)	H(m)	Area (m2)	Parcial	Metrado
01	ESTRUCTURAS								
01.07	OBRAS DE CONCRETO ARMADO								
01.07.02	SOBRECIMIENTO								
01.07.02.02	SOBRECIMIENTO ARMADO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2							1100.02
	DPA-ACAPULCO								295.85
	Valorizaciones N°04	m2	1.00					295.85	
	DPA-ACAPULCO								373.43
	Valorizaciones N°06	m2	1.00					373.43	
	DPA-ACAPULCO								32.47
	Valorizaciones N°07	m2	1.00					32.47	
	DPA-ACAPULCO								109.42
	Valorizaciones N°09	m2	1.00					109.42	
	DPA-ACAPULCO								44.23
	Valorizaciones N°10	m2	1.00					44.23	
	DPA-ACAPULCO								192.04
	Valorizaciones N°11	m2	1.00					192.04	
	DPA-ACAPULCO								12.38
	Valorizaciones N°12	m2	1.00					12.38	
	TAREAS PREVIAS								48.80
	Mesas (maciza)	m2	8.00	3.90		0.60		18.72	
	Mesas (hueca)	m2	8.00	3.90		0.40		12.48	
	Hueca interior(Laterales)	m2	8.00	4.90		0.25		9.80	
	Hueca interior (Techo)	m2	8.00	1.95	0.50			7.80	

Metrado Acumulado Actual	1109.02
Metrado Acumulado Anterior	1000.22
Metrado Actual	48.80

ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION


CONSORCIO ZORRITOS
ING. FERNANDO REGALADO DELTAS
JEFE DE OFICINA




MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS: PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES*

Item	Descripción	Forma(cm)	Cant Elementos	Diam. (Pulg)	N° de piezas por elemento	Long por Pieza	Long. Total (m)	LONGITUD POR DIAMETRO						
								1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	1	
01	ESTRUCTURAS													
01.07	OBRAS DE CONCRETO ARMADO													
01.07.02	SOBRECIMIENTO													
01.07.02.03	SOBRECIMIENTO ARMADO, ACERO fy=4200 kg/cm ²													
	TAREAS PREVIAS													
	LOSA MACIZA (Longitudinales) superior		8.00	5/8	6.00	2.85	136.80				136.80			
	LOSA MACIZA (Longitudinales) inferior		8.00	5/8	6.00	2.85	136.80				136.80			
	LOSA MACIZA (Transversal) inferior		8.00	5/8	13.00	1.80	187.20				187.20			
	LOSA MACIZA (Transversal) superior		8.00	5/8	13.00	1.80	187.20				187.20			
	LOSA HUECA (Longitudinales) interior		8.00	1/2	3.00	2.20	52.80			52.80				
	LOSA HUECA (Longitudinales) exterior		8.00	1/2	6.00	2.20	105.60			105.60				
	LOSA HUECA (Longitudinales) superior		8.00	1/2	5.00	2.20	88.00			88.00				
	LOSA HUECA (Transversales) interior		8.00	1/2	13.00	1.30	135.20			135.20				
	LOSA HUECA (Transversales) exterior		8.00	1/2	13.00	3.60	374.40			374.40				

	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
Long (m)	-	-	756.00	648.00	-
Según ET	0.25	0.58	1.02	1.60	2.40
Peso (kg)	-	-	771.12	1,036.80	-


ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS

FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Responsable de Obra

Metro Acumulado Actual	23020.11
Metro Acumulado Anterior	21212.19
Metro Actual	1807.92

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UNID	CANT	Largo	Ancho	Alto	Area	Volumen	liberado Parcial
01.07.03.01	DESTRUCTIVAS OMAS DE CONCRETO ARMADO COLUMNAS	m3							318.14
	COLUMNAS CONCRETO FC=315 kg/cm2	m3							
	ADMINISTRACION								21.72
	1er Nivel								
	CE 13 C2	m3	3.00	0.50	0.25	2.70	1.01		
	CE 12 C2	m3	3.00	0.50	0.25	2.70	1.00		
	CE 11 C2	m3	1.00	0.50	0.25	3.15	0.80		
	CE 11, CE 10 C1	m3	5.00	0.70	0.25	3.15	2.78		
	CE 9 C1	m3	4.00	0.70	0.25	3.15	2.71		
	CE 9 C2	m3	1.00	0.50	0.25	3.80	0.48		
	CE 8 C1	m3	1.00	0.70	0.25	3.15	0.55		
	CE 8 C2	m3	1.00	0.50	0.25	3.15	0.99		
	CE 7 C2	m3	3.00	0.40	0.25	2.15	1.28		
	CE 7 C1	m3	1.00	0.50	0.25	3.80	0.48		
	CE 6 C2	m3	2.00	0.50	0.25	3.15	0.79		
	CE 6 C1	m3	1.00	0.50	0.25	2.80	0.48		
	CE 5 C2	m3	4.00	0.50	0.25	3.15	0.79		
	CE 5 C1	m3	1.00	0.50	0.25	3.80	0.48		
	CE 4 C2	m3	2.00	0.50	0.25	3.15	0.79		
	CE 4 C1	m3	1.00	0.50	0.25	3.80	0.48		
	CE 3 C2	m3	2.00	0.50	0.25	3.15	0.79		
	CE 3 C1	m3	1.00	0.50	0.25	3.80	0.48		
	CE 2 C2	m3	3.00	0.50	0.25	3.15	0.88		
	CE 2 C1	m3	1.00	0.50	0.25	3.80	0.48		
	CE 1 C2	m3	1.00	0.50	0.25	3.15	1.18		
	CE 1 C1	m3	2.00	0.50	0.25	4.15	0.79		
	CE 1 C2	m3	1.00	0.50	0.25	3.80	0.48		
	CE 1 C1	m3	4.00	0.50	0.25	3.15	1.58		
	METRADOS VALORIZACION MTR	m3	1.00					21.51	21.51
	METRADOS VALORIZACION MTR	m3	1.00						16.53
	MTR	m3	1.00	0.80	0.25	1.45	0.79		8.23
	1er tramo	m3	1.00	0.80	0.20	2.80	0.67		
	Zaballero	m3	1.00	0.70	0.30	4.65	0.98		
	CE EH G CON ERE 2	m3	1.00	0.70	0.30	4.65	0.98		
	CE EH H CON ERE 2	m3	1.00	0.70	0.30	4.65	0.98		
	CE ERE I CON ERE 2	m3	1.00	0.70	0.30	4.65	0.98		
	CE	m3	1.00	0.74	0.25	6.10	0.86		
	CE ERE A CON ERE 3	m3	1.00	0.60	0.25	6.95	1.04		
	CE ERE B CON ERE 3	m3	1.00	0.60	0.25	7.90	0.70		
	CE ERE D CON ERE 3	m3	1.00	0.60	0.25	4.65	0.70		
	CE ERE G CON ERE 3	m3	1.00	0.60	0.25	4.65	0.70		
	CE ERE I CON ERE 3	m3	1.00	0.60	0.25	4.65	0.70		
	TAREAS PREVIAS								25.77
	1er tramo	m3	1.00	1.70	0.35	7.35	0.95		
	C1	m3	16.00	0.20	0.25	2.35	7.07		
	C4	m3	1.00	1.15	0.25	2.25	0.65		
	C5	m3	1.00	1.20	0.25	2.25	0.68		
	C6	m3	3.00	0.90	0.25	2.25	1.52		
	C7	m3	3.00	0.60	0.25	2.25	1.35		
	C8	m3	7.00	0.78	0.25	2.25	12.29		
	C9	m3	1.00	0.57	0.25	2.25	1.28		
	DESARROLLO								2.88
	1er tramo	m3	4.00	0.50	0.25	2.85	1.43		
	C1	m3	1.00	0.85	0.25	2.85	0.61		
	DESARROLLO								2.71
	1er tramo	m3	4.00	0.50	0.25	2.85	1.43		
	C1	m3	1.00	0.85	0.25	2.85	0.61		
	CE A'	m3	4.00	0.50	0.25	1.35	0.68		
	TAREAS PREVIAS								11.42

CONSORCIO ZORRITOS

ING. RUBEN BOBUSTONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

ING. FERNANDO REGALADO ORTIZ
COORDINADOR

FRIO								6.75
C2/EJE 3 A'	m3	1.00	0.60	0.25	1.75	0.26		
	m3	1.00	0.60	0.25	3.40	0.51		
C2/EJE 3 - B	m3	1.00	0.60	0.25	1.75	0.26		
	m3	1.00	0.60	0.25	3.40	0.51		
C7 (PLANTA TECHO INCLINADO TRAMO 2-2)	m3	1.00	0.80	0.25	4.12	0.82		
	m3	1.00	0.80	0.25	3.00	0.60		
C2/EJE 3-D	m3	1.00	0.60	0.25	3.40	0.51		
C9/EJE 3/D-E	m3	1.00	0.30	0.25	3.40	0.26		
C2/EJE A-2	m3	1.00	0.60	0.25	3.70	0.56		
	m3	1.00	0.60	0.25	1.75	0.26		
C1/EJE A-1	m3	1.00	0.80	0.25	4.11	0.82		
	m3	1.00	0.80	0.25	1.75	0.35		
C2/EJE F/2-3	m3	1.00	0.60	0.25	3.40	0.51		
CR/FF 2	m3	1.00		0.14	3.70	0.52		
DESINFECCION								0.21
CA1/EJE 1-13	m3	1.00	0.25	0.25	1.05	0.07		
CA1/EJE 1-14	m3	1.00	0.25	0.25	0.60	0.04		
CA1/EJE 1-11	m3	1.00	0.25	0.25	1.05	0.07		
CA1/EJE 1-14	m3	1.00	0.25	0.25	0.60	0.04		
TAREAS PREVIAS								11.20
C1	m3	8.00	0.90	0.35	2.78	7.01		
C3	m3	8.00	0.20	1.00	7.62	4.19		
TAREAS PREVIAS								23.95
EJE B/3' 12								
C1	m3	2.00	0.90	0.55	7.78	1.79		
EJE D - E/3' 12								
C3	m3	8.00	0.20	1.00	2.30	3.88		
EJE E-4								
C7	m3	1.00	0.65	0.20	2.52	0.33		
	m3	1.00	0.60	0.30	7.57	0.45		
EJE E/3' 4								
C2	m3	1.00	1.20	0.35	0.80	0.34		
C7	m3	1.00	1.00	0.60	0.80	0.48		
C7	m3	1.00	1.20	0.35	7.10	0.88		
	m3	1.00	0.40	0.55	2.10	0.22		
EJE E/5-11								
CA	m3	7.00	1.00	0.78	0.15	1.91		
FF F-12								
C9	m3	1.00	1.00	0.57	0.35	0.20		
EJE 3								
C6	m3	3.00	0.25	0.90	7.65	1.79		
EJE E/5-11								
CB	m3	7.00	0.85	0.15	2.10	4.27		
	m3	7.00	0.35	0.95	2.10	4.89		
EJE E 12								
C4	m3	1.00	1.20	0.35	2.10	0.88		
	m3	1.00	0.35	0.50	2.10	0.22		
EJE 12								
CA	m3	1.00	1.15	0.25	7.65	0.78		
C5	m3	1.00	1.20	0.25	2.65	0.80		
DESINFECCION								14.75
C (250 X 250)	m3	1.00	0.25	0.25	1.90	0.12		
EJE 12' -C								
C1	m3	1.00	0.25	0.40	1.20	0.28		
EJE 12' -D								
C1	m3	1.00	0.25	0.50	1.90	0.24		
EJE 12' -E								
C1	m3	1.00	0.25	0.50	1.50	0.19		
EJE C/12-13								
C1	m3	1.00	0.25	0.50	1.50	0.19		
EJE D/12-13								
C1	m3	1.00	0.25	0.50	1.50	0.19		
EJE A - B/14								
CA 1	m3	2.00	2.75	0.30	0.25	0.41		
EJE B - C/14								
CA 1	m3	1.00	1.75	0.30	0.25	0.13		
	m3	1.00	2.75	0.30	0.25	0.21		
EJE C - D/14								
CA 1	m3	1.00	1.75	0.30	0.25	0.13		
	m3	3.00	2.75	0.30	0.25	0.62		
EJE D - E/14								
CA 1	m3	2.00	2.75	0.30	0.25	0.41		
EJE E - F/14								

ING. RUBEN BOSSUTONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS
 ING. FERNANDO REGALADO OBITAS
 JEFE DE SUPERVISION

CA 1	m3	1.00	1.75	0.30	0.25	0.13	
	m3	1.00	2.75	0.30	0.25	0.21	
EJE F - F' / 14							
CA6	m3	1.00	2.75	0.43	0.25	0.29	
CA1	m3	2.00	2.75	0.30	0.25	0.41	
EJE F' - G' / 14							
CA1	m3	2.00	2.75	0.30	0.25	0.41	
	m3	1.00	1.75	0.30	0.25	0.13	
CA6	m3	1.00	2.75	0.43	0.25	0.29	
EJE G - H / 14							
CA1	m3	1.00	2.75	0.30	0.25	0.21	
	m3	1.00	1.75	0.30	0.25	0.13	
EJE H - I / 14							
CA1	m3	2.00	1.75	0.30	0.25	0.26	
	m3	1.00	2.75	0.43	0.25	0.29	
EJE I - J / 14							
C	m3	6.00	2.75	0.20	0.15	0.30	
EJE B - C / 13'							
CA3	m3	1.00	3.45	0.40	0.15	0.21	
CA1	m3	1.00	3.45	0.30	0.25	0.16	
EJE C - D / 13'							
CA2	m3	2.00	3.45	0.30	0.15	0.31	
EJE D - E / 13'							
CA2	m3	4.00	3.45	0.30	0.15	0.62	
CA4	m3	1.00	3.45	0.70	0.15	0.26	
CA5	m3	1.00	3.45	0.50	0.15	0.25	
CA8	m3	1.00	3.45	0.58	0.15	0.30	
EJE F - G / 13'							
CA2	m3	10.00	3.45	0.30	0.15	1.55	
CA7	m3	3.00	3.45	0.25	0.25	0.45	
EJE G - I / 13'							
CA2	m3	9.00	3.45	0.30	0.15	1.40	
EJE I - J / 13'							
C	m3	6.00	2.35	0.20	0.15	0.60	
EJE H - I / 13							
CA1	m3	2.00	3.35	0.25	0.25	0.42	
CA1	m3	1.00	2.30	0.25	0.25	0.13	
EJE G - H / 13							
CA1	m3	1.00	3.35	0.25	0.25	0.21	
CA1	m3	1.00	2.30	0.25	0.25	0.13	
EJE F - G / 13							
CA1	m3	2.00	3.35	0.25	0.25	0.42	
CA1	m3	1.00	2.30	0.25	0.25	0.13	
EJE F - F' / 13							
CA1	m3	2.00	3.35	0.25	0.25	0.42	
FRMO							
NIVEL 1							16.95
1/A - I'	m3	2.00	2.75	0.25	0.25	0.34	
CA 1							
1/M - I	m3	2.00	2.20	0.25	0.25	0.28	
CA 1							
1/G - H	m3	1.00	2.20	0.25	0.25	0.14	
CA 1	m3	1.00	1.15	0.25	0.25	0.07	
1/F - G	m3	1.00	2.20	0.25	0.25	0.14	
CA 1	m3	1.00	1.15	0.25	0.25	0.07	
1/E - F	m3	1.00	2.20	0.25	0.25	0.14	
CA 1	m3	1.00	1.15	0.25	0.25	0.07	
1/D - E	m3	1.00	2.20	0.25	0.25	0.14	
CA 1	m3	1.00	1.15	0.25	0.25	0.07	
1/C - D	m3	1.00	2.20	0.25	0.25	0.14	
CA 1	m3	1.00	1.15	0.25	0.25	0.07	
1/B - C	m3	2.00	2.20	0.25	0.25	0.28	
CA 1							
2/B - C	m3	2.00	2.20	0.25	0.25	0.28	
CA 1							
2/A - I'	m3	2.00	2.90	0.25	0.25	0.36	
CA 1							
1' / 1 - 2	m3	3.00	2.75	0.25	0.25	0.52	
CA 1	m3	2.00	1.20	0.25	0.25	0.15	
CA1							
3/A - B	m3	1.00	2.20	0.25	0.25	0.14	
CA 1							
3/C - D	m3	2.00	2.20	0.25	0.25	0.28	
CA 1							
3/D - E	m3	4.00	2.20	0.25	0.25	0.55	
CA 1							
3/E - F	m3	3.00	2.20	0.25	0.25	0.41	
CA 1							
3/F - G	m3	2.00	2.20	0.25	0.25	0.28	
CA 1							
3/G - H	m3	2.00	2.20	0.25	0.25	0.28	

ING. RUBEN ROSSUS-TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
TPO DE SUPERVISOR

CONSORCIO ZORRITOS
Ing. Fernando Regalado Oblitas
residente en Obis

CA 1	m3	1.00	4.50	0.25	0.30		
3/H 1	m3	2.00	2.20	0.25	0.25	0.78	
CA 1							
I/1-2	m3	2.00	2.75	0.25	0.25	0.34	
CA 1	m3	2.00	2.20	0.25	0.25	0.78	
CA1							
A/1-3	m3	5.00	1.20	0.25	0.25	0.38	
CA 1							
C/3	m3	5.00	1.15	0.15	0.25	0.22	
CA1							
2do NIVEL							
I/1-2	m3	4.00	3.40	0.25	0.25	0.85	
CA 1							
I/2-3	m3	2.00	3.50	0.25	0.25	0.44	
CA 1							
I/1-2	m3	2.00	1.00	0.75	0.75	0.13	
LA 1	m3	1.00	3.40	0.15	0.25	0.13	
	m3	1.00	3.40	0.25	0.25	0.21	
	m3	2.00	0.90	0.25	0.25	0.11	
CA1							
I/2-3	m3	2.00	3.50	0.25	0.25	0.44	
CA 1							
H-4/1	m3	1.00	3.40	0.25	0.25	0.21	
CA 1	m3	1.00	1.00	0.25	0.25	0.06	
H-4/2	m3	2.00	1.15	0.25	0.15	0.09	
CA 1							
G-H/1	m3	2.00	1.15	0.25	0.15	0.09	
CA 1							
G-H/2-3	m3	1.00	3.50	0.25	0.25	0.22	
CA 1	m3	1.00	1.00	0.25	0.25	0.06	
F-G/2	m3	2.00	1.15	0.25	0.15	0.09	
CA 1							
G/2-3	m3	4.00	1.15	0.15	0.25	0.17	
CA 1							
F-G/2-3	m3	2.00	1.15	0.25	0.15	0.09	
CA 1	m3	2.00	1.15	0.25	0.25	0.14	
	m3	2.00	3.50	0.25	0.15	0.26	
F-F/2	m3	2.00	1.15	0.25	0.15	0.09	
CA 1							
F-F/2-1	m3	2.00	1.15	0.75	0.25	0.14	
CA 1							
F-F/3	m3	1.00	3.50	0.25	0.25	0.22	
CA 1	m3	1.00	1.15	0.25	0.25	0.07	
D-E/2	m3	2.00	1.15	0.25	0.15	0.09	
CA 1							
D-E/3	m3	4.00	3.50	0.25	0.25	0.22	
CA 1	m3	1.00	3.50	0.25	0.25	0.22	
C-D/2	m3	2.00	1.15	0.25	0.15	0.09	
CA 1							
C-D/3	m3	1.00	3.50	0.25	0.25	0.22	
CA 1	m3	1.00	1.15	0.25	0.25	0.07	
B-C/2	m3	2.00	1.15	0.25	0.15	0.09	
CA 1							
B-C/3	m3	2.00	3.50	0.25	0.25	0.44	
CA 1							
B/1-3	m3	9.00	3.50	0.25	0.25	1.97	
CA 1	m3	1.00	3.50	0.40	0.25	0.35	
G-H/1	m3	1.00	2.40	0.25	0.25	0.15	
CA1	m3	1.00	2.40	0.25	0.15	0.09	
	m3	2.00	3.30	0.25	0.15	0.25	
F-G/1	m3	1.00	2.40	0.25	0.25	0.15	
CA1	m3	1.00	2.40	0.25	0.15	0.09	
	m3	2.00	3.30	0.25	0.15	0.25	
E-F/1	m3	1.00	2.40	0.25	0.25	0.15	
CA1	m3	1.00	2.40	0.25	0.15	0.09	
	m3	2.00	3.30	0.25	0.15	0.25	
TAREAS PREVIAS							4.73
B/3	m3	10.00	1.50	0.25	0.90	4.73	
C1							
TAREAS PREVIAS							6.41
B/3							
C1	m3	10.00	1.50	0.25	0.90	4.73	
CA1	m3	18.00	1.50	0.25	0.25	1.69	
TAREAS PREVIAS							4.13
Columnetas MEZAMINE							

ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBO
 AREA DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS
 ING. FERNANDO REGALADO OBILITAS
 Presidente de Obra

Eje 3/4 CA1	m3	2.00	2.70	0.75	0.25	0.34		
	m3	1.00	0.75	0.25	0.25	0.05		
	m3	2.00	0.60	0.25	0.25	0.08		
Eje 4/5 CA1	m3	2.00	2.70	0.25	0.25	0.34		
	m3	1.00	0.75	0.25	0.25	0.05		
	m3	2.00	0.60	0.25	0.25	0.08		
Eje 5/6 CA1	m3	2.00	2.70	0.25	0.25	0.34		
	m3	1.00	0.75	0.25	0.25	0.05		
	m3	2.00	0.60	0.25	0.25	0.08		
Eje 6/7 CA1	m3	2.00	2.70	0.25	0.25	0.34		
	m3	1.00	0.75	0.25	0.25	0.05		
	m3	2.00	0.60	0.25	0.25	0.08		
Eje 7/8 CA1	m3	2.00	2.70	0.25	0.25	0.34		
	m3	1.00	0.75	0.25	0.25	0.05		
	m3	2.00	0.60	0.25	0.25	0.08		
Eje 8/9 CA1	m3	2.00	2.70	0.25	0.25	0.34		
	m3	1.00	0.75	0.25	0.25	0.05		
	m3	2.00	0.60	0.25	0.25	0.08		
Eje 9/10 CA1	m3	2.00	2.70	0.25	0.25	0.34		
	m3	1.00	0.75	0.25	0.25	0.05		
	m3	2.00	0.60	0.25	0.25	0.08		
Eje 10/11 CA1	m3	2.00	2.70	0.25	0.25	0.34		
	m3	1.00	0.75	0.25	0.25	0.05		
	m3	2.00	0.60	0.25	0.25	0.08		
Eje 11/12 CA1	m3	2.00	2.70	0.25	0.25	0.34		
	m3	1.00	0.75	0.25	0.25	0.05		
	m3	2.00	0.60	0.25	0.25	0.08		
PORTON DE INGRESO							1.13	
Columna	m3	2.00	0.50	0.25	4.50	1.13		
TAREAS PREVIAS							2.14	
Primer Nivel								
Eje 12 C/D CA1	m3	1.00	0.25	0.25	0.90	0.06		
Eje 3 - B/C CA1	m3	2.00	0.25	0.25	2.10	0.26		
Eje 3 C/D CA1	m3	2.00	0.25	0.25	2.10	0.26		
Segundo Nivel								
Eje 12 - B/C CA1	m3	2.00	0.25	0.25	2.10	0.26		
Eje 12 C/D CA1	m3	2.00	0.25	0.25	2.10	0.26		
Eje 12 - D/E CA1	m3	2.00	0.25	0.25	2.10	0.26		
Eje 3 - B/C CA1	m3	2.00	0.25	0.25	2.10	0.26		
Eje 3 - C/D CA1	m3	2.00	0.25	0.25	2.10	0.26		
Eje 3 - D/E CA1	m3	2.00	0.25	0.25	2.10	0.26		
FRIO							2.50	
Eje 1/3 - B/C CA1	m3	8.00	0.25	0.25	5.00	2.50		
FRIO							2.45	
Eje 1/3 - A CA1	m3	8.00	0.25	0.25	4.90	2.45		
DESINFECCION							0.62	
Eje C/D - 12/13 CA1	m3	3.00	0.25	0.75	3.32	0.62		
				Area (m2)	Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	
PTAR								
COLUMNAS								
C-1	m3	6.00		0.40	0.25	3.30	1.98	
C-2	m3	2.00		0.25	0.25	2.90	0.36	
CAMARA DE BOMBEO								
Muro de camara de bombeo	m3	1.00	1.77			2.90	5.12	
CAMARA DE ECUALIZACION DE BOMBEO BOMBEO								
Muro de camara de bombeo	m3	1.00	1.77			2.75	4.86	
CAJA DE LODOS								
Muro de caja de lodos	m3	1.00	1.20			1.50	1.80	
SEDIMENTADOR								
Muro de sedimentador	m3	1.00	0.97			1.05	1.02	
SOBRECIMIENTO								
Eje 1	m3	1.00		9.20	0.15	1.20	1.66	
Eje 2	m3	1.00		9.20	0.15	1.20	1.66	
Eje A	m3	1.00		3.75	0.15	1.20	0.68	
Eje C	m3	1.00		3.75	0.15	1.20	0.68	

CONSORCIO ZORRITOS
 2022
 FRANKO REGALADO OBLITA
 Representante de OHS

Metrodo Acumulado Actual	319.14
Metrodo Acumulado Anterior	296.26
Metrodo Actual	22.88

ING. EDEN BOSSUS TORIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISOR

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UND	CANT	Largo	Ancho	Alto	Area/ Volumen	Metrado Parcial
01	ESTRUCTURAS							
01.07	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							
01.07.03.02	COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL							2929.01
	ADMINISTRACION							754.48
	1er nivel							
	EJE 13 C2	m2	3.00	1.50		2.70	12.15	
	EJE 12 C2	m2	1.00	1.50		2.70	13.05	
	EJE 11 C2	m2	1.00	1.50		3.15	4.73	
	EJE 11, EJE 10 C1	m2	4.00	1.50		5.15	29.93	
	EJE 9 C1	m2	4.00	1.50		3.15	23.94	
	EJE 9 C2	m2	1.00	1.50		3.80	5.70	
	EJE 8 C1	m2	1.00	1.50		3.15	5.99	
	EJE 8 C2	m2	1.00	1.50		3.15	4.73	
	EJE 8 C2	m2	1.00	1.50		3.80	5.70	
	EJE 7 C2	m2	3.00	1.50		3.15	14.18	
	EJE 7 C2	m2	1.00	1.50		3.80	5.70	
	EJE 6 C2	m2	2.00	1.50		3.15	9.45	
	EJE 6 C2	m2	1.00	1.50		3.80	5.70	
	EJE 5 C2	m2	2.00	1.50		3.15	9.45	
	EJE 5 C2	m2	1.00	1.50		3.80	5.70	
	EJE 4 C2	m2	2.00	1.50		3.15	9.45	
	EJE 4 C2	m2	1.00	1.50		3.80	5.70	
	EJE 3' C2	m2	2.00	1.50		3.15	9.45	
	EJE 3' C2	m2	1.00	1.50		3.80	5.70	
	EJE 2 C2	m2	3.00	1.50		3.15	14.18	
	EJE 2 C2	m2	1.00	1.50		3.80	5.70	
	EJE 2' C2	m2	3.00	1.50		3.15	14.18	
	EJE 1' C2	m2	2.00	1.50		3.15	9.45	
	EJE 1' C2	m2	1.00	1.50		3.80	5.70	
	EJE 1 C2	m2	4.00	1.50		3.15	18.90	
	METRADOS VALORIZACION N°06	m2	1.00				237.66	237.66
	METRADOS VALORIZACION N°07	m2	1.00				162.71	162.71
	FRIO							145.18
	1er tramo							
	C1	m2	1.00	2.10		1.45	3.05	
	C3	m2	1.00	2.20		2.80	6.16	
	2do tramo							
	C7	m2	1.00	2.02		6.10	12.32	
	C2 EJE A' CON EJE 2	m2	1.00	1.70		6.95	11.82	
	C2 EJE B CON EJE 2	m2	1.00	1.70		2.30	3.91	
	C4 EJE C CON EJE 2	m2	1.00	2.00		2.30	4.60	
	C5 EJE D CON EJE 2	m2	2.00	1.80		4.65	16.74	
	C4 EJE F CON EJE 2	m2	1.00	2.00		4.65	9.30	
	C4 EJE G CON EJE 2	m2	1.00	2.00		4.65	9.30	
	C4 EJE H CON EJE 2	m2	1.00	2.00		4.65	9.30	
	C4 EJE I CON EJE 2	m2	1.00	2.00		4.65	9.30	
	C8	m2	1.00	1.63		6.10	9.94	
	C2 EJE A' CON EJE 3	m2	1.00	1.70		6.95	11.82	
	C2 EJE B CON EJE 3	m2	1.00	1.70		2.30	3.91	
	C2 EJE D CON EJE 3	m2	1.00	1.70		4.65	7.91	
	C2 EJE G CON EJE 2'	m2	1.00	1.70		4.65	7.91	
	C2 EJE I CON EJE 1'	m2	1.00	1.70		4.65	7.91	
	TAREAS PREVIAS							177.88
	1er tramo							
	C2	m2	1.00	3.10		2.25	6.98	
	C3	m2	16.00	1.60		2.25	57.60	
	C4	m2	1.00	2.80		2.25	6.30	
	C5	m2	1.00	2.90		2.25	6.53	
	C6	m2	3.00	2.30		2.25	15.53	
	C7	m2	1.00	3.70		2.25	8.33	
	C8	m2	7.00	4.30		2.25	67.73	
	C9	m2	1.00	3.60		2.25	8.10	
	DESINFECCION							23.37
	1er tramo							
	C1	m2	4.00	1.50		2.85	17.10	
	C2	m2	1.00	2.20		2.85	6.27	

[Signature]
ING. RUBEN BOBOS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS
[Signature]
ING. FERNANDO REGALADO OBLITA
 Residente de Obra

TAREAS PREVIAS								15.25
C3 /EJE 6-9	m2	3.00	PERIMETRO	1.57	3.00	7.71		
C3 /EJE 8 Y EJE 10	m2	2.00	PERIMETRO	1.57	2.40	7.54		
DESINFECCION								3.75
C1/ EJE F 13'	m2	1.00	0.25	0.50	2.50	3.75		
FRIO								7.14
C4/ ENTRE 2 Y 3 - EJE G	m2	1.00	0.25	0.70	3.76	7.14		
FRIO								79.65
C2 /EJE 3 - A	m2	2.00		0.25	1.75	0.88		
	m2	2.00		0.60	1.20	1.44		
	m2	2.00		0.60	3.40	4.08		
	m2	2.00		0.75	3.40	1.70		
C2 /EJE 3 -B								
	m2	2.00		0.25	1.20	0.60		
	m2	2.00		0.80	1.75	2.10		
	m2	2.00		0.60	3.40	4.08		
				0.25	3.40	0.00		
C2 / EJE 3 -D								
	m2	2.00		0.60	3.70	4.44		
	m2	2.00		0.25	3.70	1.85		
C3 / EJE 3 / D-E								
	m2	2.00		0.30	3.40	2.04		
	m2	2.00		0.25	3.40	1.70		
C2 /EJE A- 2								
	m2	4.00		0.60	3.70	8.88		
	m2	4.00		0.25	3.70	3.70		
C1 /EJE A- 1								
	m2	4.00		0.25	3.90	3.90		
	m2	4.00		0.80	3.90	12.48		
C2 / EJE F / 2-3								
	m2	2.00		0.60	3.40	4.08		
	m2	2.00		0.25	3.40	1.70		
C7 (PLANTA TECHO INCLINADO TRAMO 2-2)								
	m2	4.00		0.80	3.00	9.60		
	m2	4.00		0.25	3.00	3.00		
C 8 (TRAMO 2-2)								
	m2	2.00		0.75	1.70	1.85		
	m2	2.00		0.75	3.70	5.55		
DESINFECCION								3.30
CA1 / EJE I' - 13'	m2	4.00		0.25	1.05	1.05		
CA1 / EJE I' - 14	m2	4.00		0.25	1.05	1.05		
CA1/ EJE I - 13	m2	4.00		0.25	0.60	0.60		
CA1 / EJE I - 14	m2	4.00		0.25	0.60	0.60		
TAREAS PREVIAS								88.52
C1	m2	16.00		0.35	2.78	15.57		
	m2	16.00		0.90	2.78	40.08		
C3	m2	8.00		1.57	2.30	32.92		
TAREAS PREVIAS								158.62
EJE B / 3' - 12								
C1	m2	4.00		0.35	2.78	3.89		
	m2	4.00		0.90	2.78	11.01		
EJE D - E / 3' - 12								
C3	m2	8.00		1.57	2.30	28.90		
EJE E - 4								
C7	m2	1.00		0.20	2.52	0.50		
	m2	1.00		0.30	2.52	0.76		
	m2	1.00		0.65	2.52	1.64		
	m2	1.00		0.60	2.52	1.51		
EJE E / 3' - 4								
C2	m2	1.00		3.10	0.80	2.48		
C7	m2	1.00		3.70	0.80	2.96		
C7	m2	2.00		0.35	2.10	1.47		
	m2	2.00		0.35	2.10	1.47		
	m2	2.00		1.20	2.10	5.04		
	m2	2.00		0.30	2.10	1.26		
EJE E / 5-11								
C8	m2	7.00		4.30	0.35	10.54		
EJE E - 12								

ING. RUBEN BOSSUS TONATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS
 FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Asistente de Obra

C9	m2	1.00			3.60	0.35		1.26	
EE 3	m2	6.00			0.90	2.65		14.31	
C6	m2	6.00			0.25	0.25		0.38	
C2	m2	6.00						0.00	
EE E/5 11	m2	14.00			0.85	2.10		24.89	
	m2	21.00			0.35	2.10		15.64	
	m2	2.00			0.95	2.10		13.97	
	m2	14.00			0.80	2.10		8.87	
EE E/12	m2	1.00			0.60	2.10		1.26	
C9	m2	1.00			1.60	4.10		2.94	
	m2	1.00			0.85	2.10		1.79	
	m2	2.00			0.35	2.10		1.47	
DESCRIPCION									
C (750 X 750)	m2	4.00			0.25	1.90		1.90	154.13
EE 12 -C	m2	2.00			0.50	2.20		7.20	
C3	m2	2.00			0.25	2.20		1.10	
EE 12 -D	m2	2.00			0.50	1.90		1.90	
C3	m2	2.00			0.75	1.90		0.95	
EE 12 -E	m2	2.00			0.30	1.50		1.50	
C1	m2	2.00			0.25	1.50		0.75	
EE C/12 -13	m2	2.00			0.50	1.50		1.50	
C1	m2	2.00			0.25	1.50		0.75	
EE D/12 -13	m2	2.00			0.50	1.50		0.75	
C1	m2	2.00			0.25	1.50		0.75	
EE A - N/14	m2	4.00			2.75			3.30	
CA1	m2	2.00			1.75	0.30		1.05	
EE B - C/14	m2	2.00			2.75			3.30	
CA1	m2	2.00			1.75	0.30		1.05	
EE C - D/14	m2	2.00			1.75	0.30		1.05	
CA1	m2	2.00			2.75			3.30	
EE E - F/14	m2	2.00			1.75	0.30		1.05	
LA1	m2	2.00			2.75			1.65	
EE F - F/14	m2	2.00			2.75			2.34	
CA6	m2	4.00			2.75	0.30		1.90	
EE F - G/14	m2	4.00			1.75	0.30		3.30	
CA1	m2	4.00			2.75			3.30	
CA6	m2	2.00			1.75	0.30		1.05	
DE G - H/14	m2	2.00			2.75			7.34	
CA1	m2	2.00			1.75	0.30		1.65	
EE H - I/14	m2	4.00			1.75	0.30		2.10	
CA1	m2	2.00			2.75	0.43		2.34	
EE I - I/14	m2	12.00			2.75	0.20		6.60	
C	m2	2.00			3.45	0.40		2.70	
EE B - C/13	m2	2.00			3.45	0.30		4.83	
CA1	m2	2.00			3.45	0.30		7.07	
EE C - D/13	m2	4.00			3.45	0.30		4.14	
EE D - F/13	m2	8.00			3.45	0.30		8.28	
CA4	m2	2.00			3.45	0.70		4.83	
CA5	m2	2.00			3.45	0.50		3.45	
CA8	m2	2.00			3.45	0.58		3.97	
EE F - G/13	m2	20.00			3.45	0.30		20.70	
CA7	m2	6.50			3.45	0.25		5.18	
EE G - V/13	m2	18.00			3.45	0.30		18.63	
CA2	m2	122.00			3.35	0.20		6.04	
EE - V/13	m2								

ING. RUBEN SOSA TONALATI
 SERVICIO SUPERVISOR TUBES
 EN SUPERVISION

SERGIO BORRITOS
 FERNANDO MEGALDO OBILITAS
 RESIDENTE DE OBRAS

CA1											
G H/2 3	m2	2,00	3,50		0,25				1,75		
CA1	m2	2,00	1,00		0,25				0,50		
F-G/7	m2	4,00	1,15		0,25				1,15		
CA1	m2	4,00	1,15		0,25				1,15		
G/2-3	m2	8,00	1,15		0,25				2,30		
CA1	m2	4,00	1,15		0,25				1,15		
F-G/2 3	m2	4,00	1,15		0,25				1,15		
CA1	m2	4,00	1,15		0,25				1,15		
F-G/7	m2	4,00	1,15		0,25				1,15		
CA1	m2	4,00	1,15		0,25				1,15		
E-F/2 3	m2	4,00	1,15		0,25				1,15		
CA1	m2	2,00	3,50		0,25				1,75		
E-F/3	m2	2,00	1,15		0,75				0,58		
CA1	m2	4,00	1,15		0,25				1,15		
D-F/7	m2	4,00	1,15		0,25				1,15		
CA1	m2	8,00	3,50		0,35				7,00		
D-E/3	m2	2,00	3,50		0,40				2,80		
CA1	m2	2,00	3,50		0,25				1,75		
G-D/7	m2	4,00	1,15		0,25				1,15		
CA1	m2	2,00	3,50		0,25				1,75		
C-D/3	m2	2,00	1,15		0,75				0,58		
CA1	m2	4,00	1,15		0,25				1,15		
B-C/2	m2	4,00	1,15		0,25				1,15		
CA1	m2	4,00	3,50		0,25				3,50		
B-C/3	m2	4,00	1,15		0,25				1,15		
CA1	m2	18,00	3,50		0,75				15,75		
B/1 3	m2	2,00	3,50		0,40				2,80		
CA1	m2	2,00	2,40		0,25				1,20		
G-H/1	m2	2,00	7,40		0,25				1,20		
CA1	m2	2,00	7,40		0,25				1,20		
	m2	4,00	1,10		0,25				3,30		
F-G/1	m2	2,00	2,40		0,25				1,20		
CA1	m2	2,00	2,40		0,25				1,20		
	m2	4,00	3,30		0,25				3,30		
E-F/1	m2	2,00	2,40		0,25				1,20		
CA1	m2	7,00	7,40		0,75				7,40		
	m2	4,00	3,30		0,25				3,30		
TAREAS PREVIAS									37,30		
B/3	m2	20,00	1,50		0,35				10,50		
C1	m2	20,00	1,50		0,30				27,00		
TAREAS PREVIAS									38,35		
DESINFECCION											
E-E/12	m2	2,00	5,00		0,40				4,00		
CA3	m2	6,00	4,55		0,75				6,55		
E-E-F/12	m2										
CA1	m2										
TAREAS PREVIAS									52,00		
B/3	m2	20,00	1,50		0,35				10,50		
C1	m2	20,00	1,50		0,30				27,00		
CA1	m2	36,00	1,30		0,25				13,50		
TAREAS PREVIAS									51,00		
Ep 3/3 CA1	m2	2,00	2,00		0,75				2,70		
	m2	1,00	2,00		0,25				0,30		
	m2	2,00	2,00		0,25				0,60		
	m2	2,00	2,00		0,25				2,70		
	m2	1,00	2,00		0,25				0,30		
	m2	2,00	2,00		0,25				0,60		
Ep 5/6 CA1	m2	2,00	2,00		0,25				2,70		
	m2	1,00	2,00		0,25				0,30		
	m2	2,00	2,00		0,25				0,60		
Ep 6/7 CA1	m2	2,00	2,00		0,25				2,70		
	m2	1,00	2,00		0,25				0,30		
	m2	2,00	2,00		0,25				0,60		
Ep 7/8 CA1	m2	2,00	2,00		0,25				2,70		
	m2	1,00	2,00		0,25				0,30		
	m2	2,00	2,00		0,25				0,60		

ING. RUBEN BOSSETT TORRATI
 CONSULTOR SUPERVISOR TUMBES
 RESPONSABLE SUPERVISOR

CONSORCIO AZORRITOS
 ING. FERNANDO GALDOOBLETA
 RESPONSABLE SUPERVISOR

CONSORCIO ZORRITOS			"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE YLLAR, REGION TUMBES"													
Ben	Descripción	Forma (cm)	Cant Elementos	Dim (Pulg)	N° de piezas por elemento	Long por Pieza	Long Total (m)	LONGITUD POR DIAMETRO								
								1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	1			
01	ESTRUCTURAS															
01.07	OBRAS DE CONCRETO ARMADO															
01.07.03	COLUMNAS															
01.07.0303	COLUMNAS, ACERO fy=4200 kg/cm2															
	FRIO															
	Eje 1/3 - A CA1		8.00	1/2	4.00	4.95	156.40					156.40				
			8.00	3/8	35.00	1.14	319.20		319.20							
	DESINFECTACION															
	Eje C/D - 2/13 CA1		3.00	1/2	4.00	4.95	58.40					58.40				
			3.00	3/8	35.00	1.14	119.70		119.70							
	COLUMNAS															
	C-1		6.00	3/8	6.00	5.10	183.60					183.60				
	C-1		6.00	3/8	32.00	1.45	277.44		277.44							
	C-2		2.00	5/8	4.00	4.05	32.40					32.40				
	C-2		2.00	3/8	16.00	1.14	59.07		59.07							
	CAMARA DE BOMBEO															
	Refuerzo vertical (malla interior)		1.00	1/2	33.00	3.71	23.06					23.06				
	Refuerzo vertical (malla exterior)		1.00	1/2	38.00	3.71	141.74					141.74				
	Refuerzo horizontal (malla interior)		1.00	3/8	17.00	6.93	117.89		117.89							
	Refuerzo horizontal (malla exterior)		1.00	3/8	17.00	8.00	136.05		136.05							
	CAMARA DE ECUALIZACION DE BOMBEO															
	Refuerzo vertical (malla interior)		1.00	1/2	36.00	3.58	136.24					136.04				
	Refuerzo vertical (malla exterior)		1.00	1/2	36.00	3.58	136.24					136.04				
	Refuerzo horizontal (malla interior)		1.00	3/8	16.00	6.93	110.95		110.95							
	Refuerzo horizontal (malla exterior)		1.00	3/8	16.00	8.00	128.04		128.04							
	SEDIMENTADOR															
	Refuerzo vertical		1.00	3/8	69.00	1.65	113.85		113.85							
	Refuerzo horizontal		1.00	3/8	6.00	14.20	85.20		85.20							
	CAJA DE Lodos															
	Refuerzo vertical		1.00	3/8	40.00	1.95	78.00		78.00							
	Refuerzo horizontal		1.00	3/8	8.00	8.39	67.10		67.10							
	SOBRECIMIENTO															
	Eje 1		1.00	1/2	46.00	2.35	108.16					108.16				
	Eje 2		1.00	1/2	46.00	2.35	108.16					108.16				
	Eje A		1.00	1/2	19.00	2.36	44.84					44.84				
	Eje C		1.00	1/2	19.00	2.36	44.84					44.84				

CONSORCIO ZORRITOS
 FERNANDEZ REGALADO OBLITAS
 Responsable de Obra

Long (m)
 Segun E
 Prop (kg)

	3/8	1/2"	5/8	3/4"	1"
-	1,524.40	1,067.50	2,000.00	-	-
C.23	0.56	1.32	1.80	2.40	4.00
-	935.24	1,082.74	345.80	-	-

Metrado Acumulado Actual	76278.88
Metrado Acumulado Anterior	73878.10
Metrado Actual	2400.78

ING RUBEN BOSCH TOBIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

035

Item	Descripción	Unid	Cant.	L(m)	B(m)	H(m)	Area (m2)	Parcial	Metrado
01	ESTRUCTURAS								
01.07	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
01.07.10	LOSAS SOBRE EL PISO								
01.07.10.04	JUNTA DE DILATACIÓN CON TECNOPORT E=1"	m							264.41
	FRIJO								109.49
	PISO								
	LOSAS DEL EJE 1-3								
	A'-1	m	1.00	118.20					118.20
	B'-1	m	4.00	20.80					83.20
	VEREDA 1								99.81
	Vereda 1	m	1.00	39.81					99.81
	TAREAS PREVIAS					N° Veces			115.20
	MESAS DE CONCRETO (H=1.20m)	m	16.00	0.90		8.00			115.20

CONSORCIO ZORRITOS
[Firma]
 ING. DE VIALI ALVARADO OBITAS
 SUPERVISOR DE OBRA

Metrado Acumulado Actual	364.41
Metrado Acumulado Anterior	239.21
Metrado Actual	115.20

[Firma]
 ING. RUBEN BOSSUSTONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

RESUMEN DE METRADOS ARQUITECTURA



ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UNO	PRELIMINARIO	DECUPTADO	DECUPTADO	DECUPTADO	ACUMULADO	MAYOR O MENOR
			CONTRATADO	VAL. 19	VAL. 20	NETO	NETO	
02.11.05	PINTURA EN DERIVADOS CON LATEX	m2	77.46				0.00	77.46
02.11.06	PINTURA EN OXI DERIVADO CON LATEX	m2	552.46				213.07	339.39
02.11.07	PINTURA EN MARIOS INTERIORES CON EPÓXICO	m2	2.852.04	193.31			0.00	2.852.04
02.11.08	PINTURA EN COLUMNAS CON	m2	702.67				0.00	702.67
02.11.09	PINTURA EN MANGAS CON EPÓXICO	m2	1.033.71				0.00	1.033.71
02.11.10	PINTURA EN DERIVADOS CON	m2	204.67				0.00	204.67
02.11.11	PINTURA EN OXI DERIVADO CON PINTURA	m2	1.867.27				0.00	1.867.27
02.11.12	RECELA CUANTO IMPERMEABILIZANTE PARA CORTINA	m2	131.88				0.00	131.88
02.12	APLICACIONES QUÍMICAS Y							
02.12.01	IMPREGNACION EN ACETILATO DE SODIO 1% PARA MANTENIMIENTO	u	33.00				0.00	33.00
02.12.02	REPARACION DE LOZA DE PISO EN ANCHO (INC. MANUTENCIÓN)	u	10.00				0.00	10.00
02.12.03	REPARACION DE LOZA DE PISO EN ANCHO (INC. MANUTENCIÓN)	u	28.00				0.00	28.00
02.12.04	REPARACION DE LOZA DE PISO EN ANCHO (INC. MANUTENCIÓN)	u	1.00				0.00	1.00
02.12.05	REPARACION DE LOZA DE PISO EN ANCHO (INC. MANUTENCIÓN)	u	29.00				0.00	29.00
02.12.06	REPARACION DE LOZA DE PISO EN ANCHO (INC. MANUTENCIÓN)	u	16.00				0.00	16.00
02.12.07	REPARACION DE LOZA DE PISO EN ANCHO (INC. MANUTENCIÓN)	u	7.00				0.00	7.00
02.12.08	REPARACION DE LOZA DE PISO EN ANCHO (INC. MANUTENCIÓN)	u	17.00				0.00	17.00
02.12.09	REPARACION DE LOZA DE PISO EN ANCHO (INC. MANUTENCIÓN)	u	7.00				0.00	7.00
02.12.10	REPARACION DE LOZA DE PISO EN ANCHO (INC. MANUTENCIÓN)	u	7.00				0.00	7.00
02.12.11	REPARACION DE LOZA DE PISO EN ANCHO (INC. MANUTENCIÓN)	u	7.00				0.00	7.00
02.12.12	REPARACION DE LOZA DE PISO EN ANCHO (INC. MANUTENCIÓN)	u	7.00				0.00	7.00
02.12.13	REPARACION DE LOZA DE PISO EN ANCHO (INC. MANUTENCIÓN)	u	8.00				0.00	8.00
02.13	OTROS							
02.13.01	CONTINUA DE TRABAJO DE MANUTENCIÓN Y COLOCACION	m2	23.92				0.00	23.92
02.13.02	PROTECCION DE BORDE DE PLATIFORMA	m2	9.00				0.00	9.00
02.13.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCO RETRACTIL 3.30 x 3.40 x 0.60m	m	9.00				0.00	9.00
02.13.04	COLOCACION DE REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN CAJUELA	m	159.25				0.00	159.25
02.13.05	COLOCACION DE REJILLA DE ACERO GALVANIZADO EN CAJUELA	m	64.35				0.00	64.35
02.13.06	TRAPALANTA DE ALUMINO 7"	m	47.40				0.00	47.40
02.13.07	BORNAS SEGUN DETALLE	m	255.00				0.00	255.00
02.13.08	TRAPALANTA DE ALUMINO 7"	m	47.40				0.00	47.40
02.13.09	TRAPALANTA DE ALUMINO 7"	m	255.00				0.00	255.00
02.13.10	RELOCACION DE ACESORIOS SANITARIOS	m2	58.00				0.00	58.00
02.13.11	RELOCACION DE ACESORIOS SANITARIOS	m2	64.00				0.00	64.00
02.13.12	RELOCACION DE ACESORIOS SANITARIOS	m2	2.00				0.00	2.00
02.13.13	RELOCACION DE ACESORIOS SANITARIOS	m2	7.00				0.00	7.00
02.13.14	RELOCACION DE ACESORIOS SANITARIOS	m2	6.00				0.00	6.00
02.13.15	RELOCACION DE ACESORIOS SANITARIOS	m2	2.00				0.00	2.00
02.13.16	RELOCACION DE ACESORIOS SANITARIOS	m2	6.00				0.00	6.00
02.13.17	RELOCACION DE ACESORIOS SANITARIOS	m2	1.00				0.00	1.00
02.13.18	RELOCACION DE ACESORIOS SANITARIOS	m2	1.00				0.00	1.00
02.13.19	RELOCACION DE ACESORIOS SANITARIOS	m2	280.00				0.00	280.00
02.13.20	RELOCACION DE ACESORIOS SANITARIOS	m2	16.00				0.00	16.00
02.13.21	RELOCACION DE ACESORIOS SANITARIOS	m2	170.00				0.00	170.00
02.13.22	RELOCACION DE ACESORIOS SANITARIOS	m2	341.00				0.00	341.00

ING. RUBEN BOSCH TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TECNICO
JEFE DE SUPERVISION


CONSORCIO ZORRITOS
ING. FERNANDO GALVAO ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION


Item	Descripción	UND	CANT	Largo	Ancho	Alto	Area/ Volumen	Metrado Parcial
02	ARQUITECTURA							
02.01	MUROS Y TABICADOS DE ALBAÑILERIA							
02.01.01	MURO DE LADRILLO TIPO IV DE CABEZA	m2						1350.87
	ADMINISTRACION							148.11
	1er nivel							
	EJE 1	m2	1.00	7.10		3.15	22.37	
	EJE 3'	m2	1.00	3.75		3.15	11.81	
	EJE 5	m2	1.00	3.75		3.15	11.81	
	EJE 7	m2	1.00	5.90		3.15	18.70	
	FIF 9	m2	1.00	5.80		3.15	18.27	
	EJE 11	m2	1.00	5.06		3.80	19.19	
	FIF 12	m2	1.00	4.80		3.15	15.17	
	EJE J DE 13 A 11	m2	1.00	7.05		1.00	7.05	
	EJE K DE 12 A 11	m2	1.00	4.14		1.80	11.47	
	EJE K DE 13 A 12		1.00	3.90		3.80	14.82	
	METRADOS VALORIZACION N°06							79.26
		m2	1.00				79.26	
	METRADOS VALORIZACION N°07							104.29
		m2	1.00				104.29	
	ADMINISTRACION							188.73
	1er nivel							
	EJE K, 2 A 1	m2	1.00	4.50		3.15	14.18	
	EJE K, 12 A 11	m2	1.00	3.15		3.15	9.97	
	2do nivel							
	EJE I, 11 A 10	m2	1.00	2.71		2.40	6.55	
	EJE J, 10 A 9	m2	1.00	3.20		2.40	7.68	
	VAT-35	m2	1.00	2.00		1.40	-2.80	
	EJE I, 11 A M	m2	1.00	2.15		2.80	5.59	
	EJE M, 11 A 10	m2	1.00	3.20		2.95	9.44	
	EJE M, 10 A 9	m2	1.00	3.20		2.95	9.44	
	EJE O, L A M	m2	1.00	3.95		2.60	9.07	
	FIF I, R A 9	m2	1.00	3.40		1.90	11.22	
	VAT 36	m2	-2.00	0.75		0.75	-1.14	
	EJE L, 7 A 8	m2	1.00	2.90		3.30	9.57	
	VAT-36	m2	-2.00	0.75		0.75	-1.13	
	EJE L, 6 A 7	m2	1.00	3.40		3.30	11.27	
	VAT-35	m2	-1.00	2.00		1.50	-3.00	
	EJE L, 5 A 6	m2	1.00	3.15		3.30	10.40	
	VAT-35	m2	-1.00	2.00		1.50	-3.00	
	EJE L, 4 A 5	m2	1.00	3.00		1.40	9.90	
	VAT-35	m2	-1.00	2.00		1.50	-3.00	
	FIF L, 3 A 4	m2	1.00	2.70		1.40	8.91	
	VAT 34	m2	-1.00	1.50		1.50	-2.25	
	EJE L, 2' A 3	m2	1.00	1.50		3.30	4.95	
	EJE L, 2' A 2'	m2	1.00	1.75		3.30	5.78	
	VAT-34	m2	-1.00	1.50		1.50	-2.25	
	EJE L, 1 A 2	m2	1.00	2.75		3.30	9.08	
	VAT-35	m2	1.00	2.00		1.50	-3.00	
	EJE K, 6 A 6	m2	1.00	2.15		2.75	5.91	
	EJE K, 4 A 5	m2	1.00	2.90		2.75	7.98	
	EJE K, 3 A 4	m2	1.00	1.60		2.75	4.40	
	EJE K, 2 A 3	m2	1.00	1.75		2.75	4.81	
	EJE K, 1 A 2	m2	1.00	2.75		2.75	7.56	
	EJE 3, K A L	m2	1.00	3.75		3.35	12.56	
	EJE 5, K A L	m2	1.00	3.75		3.35	12.56	
	EJE 1', J A J'	m2	1.00	1.50		3.35	5.03	
	PM-05	m2	-1.00	1.50		2.40	-3.60	
	PARAPERO DE 6 A 9	m2	1.00	10.20		0.90	9.18	
	ADMINISTRACION							29.57
	2DO NIVEL							
	EJE J ENTRE EJE 7 Y 8	m2	1.00	5.75		2.98	11.18	
	EJE 9 ENTRE EJE K Y L	m2	1.00	AREA TRIAN	0.66		0.66	
	EJE 9 ENTRE EJE J Y K	m2	1.00	3.35		2.83	3.82	
	EJE 9 ENTRE EJE J Y K	m2	1.00	AREA TRIAN	0.17		0.17	

ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS
 INGENIERO EN OBRAS DE CONCRETO
 COMPONENTE DE OBRA

H - U/14	m2	1.00	4.60	2.45	11.77
	m2	-1.00	0.90	0.90	-0.81
	m2	-1.00	2.70	0.90	-2.43
E / 13' - 14	m2	1.00	1.50	3.15	4.73
	m2	1.00	0.65	3.15	2.05
FRIO					67.51
EJE C - D/1	m2	1.00	3.90	1.40	5.46
EJE D - E/1	m2	1.00	3.90	1.40	5.46
EJE I 1/1	m2	1.00	3.96	2.90	11.48
EJE I /1 - 2	m2	1.00	1.40	2.70	3.78
	m2	1.00	4.45	2.70	6.62
	m2	1.00	0.80	2.70	7.16
FIF 1/1-2	m2	1.00	5.20	2.25	11.70
	m2	-4.00	0.90	0.90	3.24
EJE 1/2 - 3	m2	1.00	1.30	3.90	4.79
EJE 1/2 - 3	m2	1.00	1.90	1.90	4.29
EJE 3 1'	m2	1.00	2.85	3.30	9.41
	m2	1.00	1.85	3.30	6.11
TAREAS PREVIAS					3.13
EJE 3 - 4/E	m2	1.00	1.25	2.90	3.13
ADMINISTRACION					7.14
EJE 11/1 K	m2	1.00	4.52	3.30	8.75
	m2	-1.00	1.50	1.00	-3.00
FIF R/1 K	m2	1.00	0.20	1.70	0.24
EJE 8 / K-L	m2	1.00	0.65	0.90	0.59
FIF 9 / K-L	m2	1.00	0.65	0.90	0.59
DESINFECCION					42.48
C/12-17'	m2	1.00	1.13	0.90	1.02
D-F/13	m2	1.00	0.80	5.00	4.00
	m2	1.00	1.70	3.00	
E-F/13	m2	1.00	1.70	5.00	6.50
F-F/13	m2	1.00	4.85	1.90	4.48
	m2	1.00	1.45	0.75	1.09
F-G/13	m2	1.00	3.55	1.50	5.05
	m2	-1.00	1.45	0.75	-1.09
	m2	-1.00	0.75	0.75	-0.56
G-H/13	m2	1.00	3.50	1.50	5.25
	m2	-1.00	2.70	0.75	2.03
H-I/13	m2	1.00	2.50	1.50	3.75
	m2	-1.00	0.75	0.75	0.56
F/14-13'	m2	1.00	4.40	0.75	3.30
E/13'-14	m2	1.00	4.40	0.75	5.30
Segundo nivel					
C U/13	m2	1.00	4.00	1.40	6.00
D-F/14	m2	1.00	3.00	0.85	2.55
F-F/13	m2	1.00	1.70	0.45	0.77
PRIO					20.43
A-B/3	m2	1.00	2.10	0.70	1.47
A-B/1	m2	1.00	2.45	0.70	1.72
B-C/1	m2	1.00	1.45	2.20	3.19
G-H/1	m2	1.00	0.75	2.40	1.87
F-G/1	m2	1.00	0.75	2.40	1.82
D-E/1	m2	1.00	0.75	2.40	1.82
C-D/1	m2	1.00	0.75	2.40	1.82
F G/2 3	m2	1.00	5.00	1.15	6.76
TAREAS PREVIAS					196.29
Segundo nivel					
3 - 4/B	m2	1.00	2.90	1.50	4.35
4-5/B	m2	1.00	3.30	1.50	4.95
5-6/B	m2	1.00	3.30	1.50	4.95
6-7/B	m2	1.00	3.30	1.50	4.95
7-8/B	m2	1.00	3.30	1.50	4.95
8-9/B	m2	1.00	3.30	1.50	4.95
9-10/B	m2	1.00	3.30	1.50	4.95
10-11/B	m2	1.00	3.30	1.50	4.95
11-12/B	m2	1.00	3.30	1.50	4.95
MEZANINE					
B-C/3-4	m2	1.00	2.93	1.15	3.37
B-C/4-5	m2	1.00	3.15	1.15	3.62
B-C/5-6	m2	1.00	3.15	1.15	3.62
B-C/6-7	m2	1.00	3.15	1.15	3.62
B-C/7-8	m2	1.00	3.15	1.15	3.62
B-C/8-9	m2	1.00	3.15	1.15	3.62
B-C/9-10	m2	1.00	3.15	1.15	3.62


 ING. RUBEN BOSSUSTONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 TYPE OF SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS

 ING. FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Presidente de Obra

B-C/10-11	m2	1.00	3.15	1.15					4.64	
B-C/11-12	m2	1.00	3.15	1.15					3.62	
B/3-4	m2	1.00	2.90	1.00					6.70	
VAT/23	m2	1.00	1.95	1.95	1.95				3.80	
B/4-5	m2	1.00	3.30	3.00					9.90	
VAT/23	m2	1.00	1.95	1.95	1.95				3.80	
B/5-6	m2	1.00	3.30	4.00	9.90				9.90	
VAT/23	m2	1.00	1.95	1.95	3.80				9.90	
B/6-7	m2	1.00	1.80	1.00	9.90				9.90	
VAT/23	m2	1.00	1.95	1.95	3.80				9.90	
B/7-8	m2	1.00	3.90	3.00					9.90	
VAT/23	m2	1.00	1.95	1.95	4.80				9.90	
B/8-9	m2	1.00	1.90	1.00	9.90				9.90	
VAT/23	m2	1.00	1.95	1.95	3.80				9.90	
B/9-10	m2	1.00	4.30	4.00	9.90				9.90	
VAT/23	m2	1.00	1.95	1.95	3.80				9.90	
VAT/23	m2	1.00	1.95	1.95	3.80				9.90	
B/10-11	m2	1.00	1.90	1.95	3.80				9.90	
VAT/23	m2	1.00	1.95	1.95	3.80				9.90	
B/11-12	m2	1.00	2.95	3.00					8.85	
VAT/23	m2	1.00	1.95	1.95	3.80				9.90	
VAT/23	m2	1.00	1.95	1.95	3.80				9.90	
VAT/23	m2	1.00	1.95	1.95	3.80				9.90	
L/1-40	m2	2.00	4.00	4.50					8.35	
L/2/0-E	m1	1.00	3.75	3.20						
S/7/0-C	m2	1.00	7.45	2.65						
S/7/0-U	m2	1.00	1.80	2.20					19.80	
S/7/0-E	m2	1.00	1.80	2.20					1.95	
S/7/0-D	m2	1.00	7.45	4.20					18.59	
S/7/0-M	m2	1.00	3.90	3.20					6.48	
PRMO										
S/N/1	m1	2.00	2.40	2.20					99.14	
MEZANINE										
C-D/3	m2	1.00	4.20	2.20					9.24	
U E/1	m2	1.00	7.00	3.20					4.61	
E-F/2	m2	1.80	1.80	1.95					1.95	
VAT/36	m2	1.00	4.20	2.20					8.03	
Segundo nivel										
B-C/3	m2	1.00	1.80	3.50					6.90	
C-D/3	m2	1.00	4.20	3.50					14.70	
VAT/30	m2	1.00	4.80	7.40					4.72	
D-L/3	m2	1.00	7.80	8.50					7.20	
E-F/3	m2	1.00	1.80	1.90					6.40	
VAT/34	m2	1.00	4.10	2.20					2.92	
Z/A-B	m2	1.00	2.45	4.40					4.40	
PASADURA	m2	1.00	4.20	1.15					14.11	
S/H	m2	1.00	4.40	1.30					5.41	
DESCRIPCION										
C/12-13	m2	1.00	1.30	0.80					1.71	
	m2	1.00	1.55	0.60					0.93	
TARJAS PNEUMAS										
Primer nivel										
S/7/0-E	m2	1.00	7.45	7.40					17.88	
Segundo nivel										
S/7/0-E	m2	1.00	7.45	7.30					16.63	
ADMINISTRACION										
Primer nivel										
Derretido vigilancia										
E.L. 1/2										
NON ENCIMA DE LA MAYORIA	m2	1.00	0.85	2.90					2.42	
	m2	1.00	1.80	0.60					1.06	
DESCRIPCION										
Deposito temporal										
	m2	1.00	1.45	1.2					1.74	
TARJAS PNEUMAS										
Primer nivel										
S/12-CD	m2	1.00	2.10	0.20					1.89	
Segundo nivel										
S/12-A/C	m2	1.00	3.75	2.40					8.00	
S/12-CD	m2	1.00	3.00	2.40					7.20	
S/12-D/E	m2	1.00	3.75	2.40					9.00	


CONSORCIO ZORRITOS
 ROLAN FERNANDEZ RECALADO OBLITAS
 Responsable de Obra

ING. RUBEN BOGOSERO BATAI
 CONSORCIO SUPERVISOR TRV
 JEFE DE SUPERVISION

	FRIO						22.54
	Primer Nivel						
	Eje 2 - B/C	m2	1.00	1.65	1.80	2.97	
	TARIMA						
	Eje 2 - A/B	m2	1.00	2.45	5.00	12.25	
	Eje 2/3 - A/B	m2	1.00	0.50	5.00	2.50	
	Segundo nivel						
	Eje 8 - 1/2	m2	2.00	1.80	0.90	3.24	
	Tarimas (mesas)	m2	7.00	0.75	0.90	1.58	
	PORTON DE INGRESO						
	Ingreso	m2	1.00	1.10	3.15	3.47	
	FRIO						9.63
	Escalera fachada exterior	m2	1.00			9.63	
	DESINFECCION						12.76
	Deposito temporal de residuos hidraulicos	m2	1.00	1.70	4.00	8.80	
		m2	1.00	1.44	2.40	3.86	
	ADMINISTRACION						4.74
	Cuarto de vigilancia	m2	1.00	0.85	2.40	2.04	
		m2	1.00			2.70	
	FRIO						1.74
	MEZAMINE Eje 3 / Eje B-C	m2	1.00	0.60	2.9	1.74	
	TAREAS PREVIAS						1.74
	MEZAMINE Eje A / Eje B-L	m2	1.00	0.60	2.9	1.74	
	DESINFECCION						6.21
	LIBRERIA TEMPORAL DE RESIDUOS	m2	1.00	4.70	2.2	8.80	
	VAT 14	m2	1.00	1.43	11.75	1.89	

CONSORCIO ZORRITOS
 Ing. Hernando Regalado Obispo
 Gerente de Obra

Metrado Acumulado Actual	1350.87
Metrado Acumulado Anterior	1346.47
Metrado Actual	10.39


ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TOMOR
 JEFE DE SUPERVISOR

Item	Descripción	UND	CANT	Largo	Ancho	Alto	Area/ Volumen	Metrado Parcial
02	ARQUITECTURA							
02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA							
02.01.02	MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5	m2						684.86
	CERCO PERIMETRICO							
	EJE M ENTRE 3 Y 9		7.00	3.00	2.60		54.60	54.60
	ADMINISTRACION							
	ESCALERA		1.00	9.15		0.80	8.74	10.64
			1.00	2.40		1.00	2.40	
	DESINFECCION							97.87
NIVEL								
	H-1/13'	M2	1.00	3.00	3.15		9.45	
			1.00	0.85	1.20		1.02	
			1.00	1.35	3.15		4.25	
			1.00	0.75	3.15		2.36	
			1.00	0.85	0.90		0.77	
	G-H/13'	M2	1.00	3.4	3.15		10.71	
			1.00	1.35	3.15		4.25	
	I-G/13'	M2	1.00	2.4	3.15		7.56	
			1.00	0.85	1.05		1.74	
			1.00	2.4	3.15		7.56	
	K-1/13'	M2	1.00	1.2	0.85		1.02	
	L-1/13'	M2	1.00	1.8	3.15		5.67	
			1.00	0.9	0.85		0.77	
			1.00	3.4	3.15		10.71	
	C-D/13'	M2	1.00	2.95	0.85		3.36	
	B-C/12'-13'	M2	1.00	4.35	0.85		3.70	
	F-F'/13	M2	1.00	1.80	3.07		5.53	
			-1.00	1.45	0.75		-1.09	
	F'-G/13	M2	1.00	2.60	2.70		5.72	
			-1.00	1.45	0.75		-1.09	
			-1.00	0.75	0.75		-0.56	
	G-H/13	M2	1.00	3.25	2.20		7.15	
			-1.00	2.70	0.75		-2.03	
	H-1/13	M2	1.00	2.25	2.20		4.95	
		M2	-1.00	0.75	0.75		-0.56	
	TAREAS PREVIAS							30.80
	EJE 3'-4ft		1.00	1.25	2.50		3.13	
	FRIJO							
	EJE 2/M-1	M2	1.00	2.38	1.10		2.62	
	EJE 2/G-H	M2	1.00	3.90	1.10		4.29	
	EJE 2/I-G	M2	1.00	2.63	1.10		2.89	
		M2	1.00	1.65	1.10		1.82	
	EJE 2/E-F	M2	1.00	2.10	1.10		2.31	
		M2	1.00	1.90	1.10		2.09	
	EJE 2/D-E	M2	1.00	3.75	1.10		4.13	
	EJE 2/C-D	M2	1.00	3.90	1.10		4.29	
	EJE 2/C-D	M2	1.00	2.95	1.10		3.25	
	DESINFECCION							72.24
NIVEL								
	B-C/13-14	M2	1.00	5.35	2.40		12.84	
	13'/C-D			4.50	2.40		10.80	
	D-F/13'			2.20	0.75		5.40	
	F-G/13'-14		7.00	0.90	0.75		1.35	
			6.00	1.80	2.50		27.00	
			12.00	0.45	2.50		13.50	
	G-V/13'-14		2.00	0.90	0.75		1.35	
	FRIJO							120.00
MESANINE	C/1-3		1.00	5.10	1.10		5.61	
			1.00	2.05	1.10		2.26	
2DOMIVEL	B-C/2		1.00	3.46	1.10		3.80	
	I/1/2		1.00	3.93	3.30		12.97	
			-1.00	1.05	2.40		-2.52	
	G-H/1		1.00	3.15	3.40		10.71	
			1.00	1.15	3.40		3.91	

ING. RUBEN BOSSUSTOWATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS
ING. FERNANDO GALADO ORTIZ
RESIDENTE DE OBRAS

	F-G/1		1.00	4.60	3.40		15.64		
	E-F/1		1.00	4.27	3.40		14.52		
	D-E/1		1.00	4.27	3.40		14.52		
	C-D/1		1.00	4.27	3.40		14.52		
	B-C/1		1.00	2.45	3.40		8.33		
	G/2-3		2.00	1.15	1.80		4.14		
	F/2-3		1.00	2.15	1.15		2.47		
	E/2-3		1.00	1.45	3.50		5.08		
			2.00	1.80	1.15		4.14		
	TAREAS PREVIAS							87.75	
NIVEL	2								
	3-4/B		2.00	2.90		1.50	8.70		
	4-5/B		2.00	3.30		1.50	9.90		
	5-6/B		2.00	3.40		1.50	9.90		
	6-7/B		2.00	3.30		1.50	9.90		
	7-8/B		2.00	3.50		1.50	9.90		
	8-9/B		2.00	3.30		1.50	9.90		
	9-10/B		2.00	3.30		1.50	9.90		
	10-11/B		2.00	3.30		1.50	9.90		
	11-12/B		2.00	3.25		1.50	9.75		
	DESINFECCION							102.82	
NIVEL	2								
	13/C-D		1.00	4.05		1.90	7.70		
	13/D-E		1.00	3.00		1.20	3.60		
	13/E-F		1.00	1.72		0.80	1.38		
	C/12-13		1.00	1.90		0.70	0.91		
			1.00	1.55		0.70	1.09		
NIVEL	1								
	6-F/13		1.00	2.85		4.50	12.83		
	VAT-14		-1.00	1.45		0.75	-1.09		
	F-6/13		1.00	3.35		4.50	15.08		
	VAT-13		-1.00	0.75		0.75	-0.56		
	VAT-14		-1.00	1.45		0.75	-1.09		
	G-4/13		1.00	3.50		4.50	15.75		
	VAT-15		1.00	2.70		0.75	-2.03		
	H-4/13		1.00	2.50		4.50	11.75		
	VAT-13		-1.00	0.75		0.75	0.56		
	OSMOSIS								
	H-7/14		1.00	4.75		3.90	14.03		
			1.00	1.20		0.90	-1.08		
	F-3/14		1.00	2.25		3.30	7.43		
			-1.00	1.20		0.90	-1.08		
	I-7/13		1.00	4.25		2.30	14.03		
			1.00	1.20		0.90	-1.08		
	F-7/13		1.00	2.25		3.30	7.43		
			1.00	1.20		0.90	-1.08		
	DESINFECCION							10.19	
	Mantuvio (1era elevacion)	m2	1.00	4.85		2.10	10.19		
	FRIO							65.50	
	Tarima								
	Eje 1/2 - A/B	m2	1.00	1.00		5.00	15.00		
	Eje 1/2 - A/B	m2	1.00	2.95		5.00	14.75		
	Eje 2/3 - A/B	m2	1.00	2.25		5.00	11.25		
	Segundo nivel								
	Eje 1-1"	m2	1.00	4.90		5.00	24.50		
	DESINFECCION							14.07	
	Mantuvio (2da elevacion)	m2	1.00	4.85		2.10	14.07		
	PORTON DE INGRESO							6.61	
	ENCIMA DE VIGA DE PORTON DE INGRESO	m2	1.00	5.75		1.15	6.61		
	PTAR							14.44	
	Eje C / 1-2	m2	1.00	3.75		3.85	14.44		
	FRIO							2.21	
	TEATINA	m2	1.00	2.00	Lados	Area (m2)	2.21		
						1.11			

CONSORCIO ZORRITOS

FERNANDO REGALADO OBILTA
 Responsable de Obra

Metrado Acumulado Actual	684.80
Metrado Acumulado Anterior	681.80
Metrado Actual	23.20

ING. RUBEN BOSSIS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

Item	Descripción	UNID	CANT	Largo	Ancho	Alto	Area	Volumen	Metros Parcial
02	ARQUITECTURA								
02.02	RENOVIOS, ENLUCIDOS Y MOLURAS								
02.02.05	TABARILLO EN MUDOS INTERIORES COM	m2							7998.48
	DESINTECCION								499.95
	EE A/13'-14	m2	1.00	3.90		3.90	14.82		
	EE M/13'-13'	m2	1.00	1.80		4.30	7.74		
	EE A/12'-13	m2	1.00	1.80		1.80	-2.43		
	EE M/12'-13	m2	1.00	0.96		4.20	4.08		
	EE B-C/12'-13'	m2	2.00	3.10		4.40	27.72		
	EE B-C/12'	m2	2.00	5.35		4.40	67.08		
	EE B-C/12'	m2	2.00	1.51		3.80	11.48		
	EE 13/C-D	m2	2.00	4.55		1.80	34.38		
	EE D/13'-14	m2	7.00	3.90		1.80	25.04		
	EE D/13'	m2	2.00	4.00		1.80	30.40		
	EE L/13'-14	m2	2.00	1.80		3.90	14.82		
	EE L/13'	m2	2.00	0.62		3.90	4.94		
	EE F/13'-14	m2	2.00	1.40		3.90	29.54		
	EE F/13'	m2	2.00	3.00		1.80	22.80		
	EE F/13'	m2	2.00	3.00		3.80	22.80		
	EE G/13'-14	m2	2.00	3.90		3.90	29.54		
	EE H/13'-14	m2	2.00	2.75		3.80	17.10		
	EE H/13'-14	m2	1.00	3.90		3.80	14.97		
	EE I/A/A B	m2	1.00	2.10		3.90	6.95		
	EE I/A/B-C	m2	1.00	3.90		3.90	11.25		
	EE I/A/C-D	m2	1.00	2.70		2.43	7.43		
	VAT 1/A	m2	1.00	4.85		3.40	16.01		
	VAT 1/B	m2	1.00	1.45		0.90	-1.11		
	EE I/A/D-E	m2	1.00	4.75		2.40	12.20		
	VAT 1/D	m2	1.00	4.75		2.40	12.20		
	VAT 1/E	m2	1.00	1.45		0.90	-1.11		
	EE I/A/F-G	m2	1.00	3.90		3.90	12.87		
	VAT 1/G	m2	1.00	1.45		0.90	-1.31		
	VAT 1/H	m2	1.00	1.45		0.90	-1.31		
	EE I/A/G-H	m2	1.00	0.90		0.81	-1.31		
	VAT 1/H	m2	1.00	2.70		2.40	12.20		
	VAT 1/I	m2	1.00	2.70		2.40	12.20		
	VAT 1/J	m2	1.00	2.70		2.40	12.20		
	VAT 1/K	m2	1.00	2.70		2.40	12.20		
	VAT 1/L	m2	1.00	2.70		2.40	12.20		
	VAT 1/M	m2	1.00	2.70		2.40	12.20		
	VAT 1/N	m2	1.00	2.70		2.40	12.20		
	VAT 1/O	m2	1.00	2.70		2.40	12.20		
	VAT 1/P	m2	1.00	2.70		2.40	12.20		
	VAT 1/Q	m2	1.00	2.70		2.40	12.20		
	VAT 1/R	m2	1.00	2.70		2.40	12.20		
	VAT 1/S	m2	1.00	2.70		2.40	12.20		
	VAT 1/T	m2	1.00	2.70		2.40	12.20		
	VAT 1/U	m2	1.00	2.70		2.40	12.20		
	VAT 1/V	m2	1.00	2.70		2.40	12.20		
	VAT 1/W	m2	1.00	2.70		2.40	12.20		
	VAT 1/X	m2	1.00	2.70		2.40	12.20		
	VAT 1/Y	m2	1.00	2.70		2.40	12.20		
	VAT 1/Z	m2	1.00	2.70		2.40	12.20		
	DESINTECCION								443.30
	D-E/13'	m2	2.00	4.00		4.40	48.20		
	E/13'-14	m2	1.00	0.80		2.40	-2.16		
	E/13'-14	m2	2.00	1.95		4.40	17.16		
	E/13'	m2	1.00	1.75		4.08	8.68		
	E/13'	m2	2.00	1.70		4.40	28.16		
	E/13'	m2	1.00	0.80		2.40	-2.16		
	F-G/13'	m2	1.00	1.90		1.60	18.04		
	F/13'-14	m2	2.00	0.90		2.40	4.32		
	F/13'-14	m2	2.00	4.40		4.40	38.72		
	F/13'	m2	1.00	0.90		2.40	-2.16		
	F/13'	m2	1.00	3.85		4.90	16.94		
	F/13'	m2	6.00	0.60		2.70	9.72		
	F/13'	m2	18.00	0.45		2.70	21.87		
	F/13'	m2	4.00	1.80		2.70	19.44		
	F/13'	m2	4.00	0.60		2.70	6.48		
	F/13'	m2	6.00	0.90		2.70	14.58		
	F/13'	m2	32.00	0.15		2.70	4.86		
	G-/13'-14	m2	2.00	9.10		4.40	80.08		
	G-/13'-14	m2	4.00	1.60		2.40	-11.52		
	G-/13'-14	m2	4.00	3.45		4.40	30.36		
	G-/13'-14	m2	4.00	0.90		3.90	8.64		
	G-/13'-14	m2	1.00	4.25		0.80	14.08		
	G-/13'-14	m2	1.00	1.70		0.80	1.08		
	G-/13'-14	m2	1.00	2.25		3.90	7.43		
	G-/13'-14	m2	1.00	1.20		0.90	1.08		
	G-/13'-14	m2	1.00	4.25		3.90	14.08		

ING. RUBEN DOBOS TOMATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

FRANCISCO ZORRITOS
FRANCISCO GALIMBOBITA
JEFE DE SUPERVISION

Escalera	m ²	1.00			5.34			5.34
Fondo de escalera N°01 (subida a 2do nivel)	m ²	1.00	5.25	1.45				7.61
FRENTE								
Fondo de escalera N°01 (subida a 2do nivel)	m ²	1.00	4.11	1.45				5.95
Fondo de escalera N°03 (subida a mezzanine)	m ²	1.00	4.95	1.45				7.77
Fondo de escalera N°04 (subida a 2do nivel)	m ²	1.00	70.81	1.45				15.13
Eje A'/Eje 1-Eje 3	m ²	1.00	0.10		2.40			19.44
VAT-39	m ²	3.00	1.80		0.90			4.80
Eje C'/Eje 1-Eje 2 (unido de cajas)	m ²	1.00	5.10		4.40			17.74
Eje C'/Eje 1-Eje 2 (zona de tiro)	m ²	1.00	5.10		3.45			17.80
Brazos (unido de cajas)								
Eje 7'/Eje 8' C	m ²	1.00	5.55		2.40			12.84
Eje 3'/Eje 8' C	m ²	1.00	8.90		9.00			20.10
Ferriera	m ²	1.00						5.99
PAL 01	m ²	1.00	1.80		5.99			11.95
Mezzanine								
Eje 8'/Eje 1-3	m ²	1.00	9.60		2.40			23.04
VAT-38	m ²	1.80	1.20		0.75			4.05
VAT-19	m ²	3.00	1.80		0.75			4.05
VAT-26	m ²	1.00	0.90		1.80			1.80
Eje C'/Eje 1-3	m ²	1.00	7.35		2.40			18.84
Eje 1'/Eje 8' C	m ²	1.00	4.45		2.40			8.28
Segundo nivel								
Eje 1' Eje 2'/Eje 8' H	m ²	1.00	27.48		0.90			24.73
	m ²	1.00	0.85		4.77			2.19
	m ²	4.00	1.14		1.37			15.31
	m ²	1.00	1.36		3.37			4.99
Eje 2'/Eje 8' H	m ²	1.00	3.45		0.90			3.11
Eje 2'/Eje 8' E	m ²	1.00	3.45		1.90			5.18
Eje 2'/Eje C-Eje D	m ²	1.00	4.40		0.90			3.96
Eje 7'/Eje D-Eje D	m ²	1.00	4.40		1.90			6.90
Eje 2'/Eje D-Eje E	m ²	1.00	4.35		0.90			4.34
Eje 2'/Eje D-Eje F	m ²	1.00	2.45		0.90			2.21
Eje 2'/Eje E-Eje F	m ²	1.00	2.45		1.50			4.86
Eje 2'/Eje F-Eje G	m ²	1.00	2.98		0.90			2.68
Eje 2'/Eje F-Eje H	m ²	1.00	2.98		1.50			4.46
Eje 2'/Eje G-Eje H	m ²	1.00	4.40		0.90			3.96
Eje 2'/Eje G-Eje I	m ²	1.00	4.40		1.50			6.60
Eje 2'/Eje H-Eje I	m ²	1.00	3.88		0.90			3.48
Eje 2'/Eje H-Eje J	m ²	1.00	3.88		1.50			5.81
TABLAS								
Eje 9'/Eje 1-Eje 2	m ²	1.00	1.40		3.45			4.89
VAT-25	m ²	1.00	0.90		1.80			1.82
Eje C'/Eje 1-Eje 2	m ²	1.00	1.40		3.45			4.81
VAT-26	m ²	1.00	0.90		1.80			1.82
Eje D'/Eje 1-Eje 2	m ²	1.00	1.40		3.45			4.83
VAT-26	m ²	1.00	0.90		1.80			1.82
Eje E'/Eje 1-Eje 2	m ²	1.00	1.40		3.45			4.83
VAT-26	m ²	1.00	0.90		1.80			1.82
Eje F'/Eje 1-Eje 2	m ²	1.00	1.40		3.45			4.83
VAT-26	m ²	1.00	0.90		1.80			1.82
Eje G'/Eje 1-Eje 2	m ²	1.00	0.90		3.45			4.83
VAT-26	m ²	1.00	0.90		1.80			1.82
Eje H'/Eje 1-Eje 2	m ²	1.00	1.40		3.45			4.83
VAT-26	m ²	1.00	0.90		1.80			1.82
TABLAS PREVIAS								
Eje 12'/ Eje 8'-Eje F	m ²	1.00	12.85		2.40			33.41
Eje 3' / Eje 8'-Eje F	m ²	1.00	9.25		5.00			46.25
Mezzanine								
Eje 3-Eje 12' / Eje 8'-Eje C	m ²	1.00	3.28		1.05			3.44
	m ²	7.00	3.15		1.05			23.15

ANEXO N° 2

ING. RUBEN ROGERS TORRIATI
CONSORCIO SUPERVISOR TORRES
PER LA SUPERVISION

ING. RUBEN ROGERS TORRIATI
CONSORCIO SUPERVISOR TORRES
PER LA SUPERVISION

		m2	1.00	2.93	1.05		3.07	
DESINFECCION								
Eje 12-Eje13 / Eje D-Eje F (Entrega de indumentaria)		m2	1.00	4.10	5.20		21.32	66.33
		m2	1.00	2.30	5.00		11.50	
Eje H-EjeI / Eje 13-Eje 14 (Pasillo)		m2	2.00	1.80	1.25		4.50	
Eje F / Eje 13-Eje 14 (Pasillo)		m2	2.00	1.80	1.25		4.50	
Deposito temporal de residuos hidrob.								
Eje 12 / Eje D-Eje F		m2	2.00	1.75		5.00	17.60	
		m2	2.00	1.44		2.40	6.91	
TAREAS PREVIAS								
Columnas circulares (Eje B-C)		m2	8.00	1.57		4.60	57.81	139.28
Columnas circulares (Eje D-F)		m2	8.00	1.57		5.40	67.86	
Mezamina Eje B / Eje 3-4		m2	9.00	1.40		0.40	11.88	
MEZAMINE Eje 3 / Eje B-C		m2	1.00	0.60		2.9	1.74	
DESINFECCION								
Eje 12-Eje13 / Eje D (Entrega de indumentaria)		m2	1.00	4.65	5.20		24.19	132.77
Control de calidad		m2	1.00	14.00	5.40		75.40	
VAT-37		m2	1.00	2.10	1.50		-3.15	
Colocacion de indumentaria (manifiesto)		m2	1.00	5.85		4.50	26.11	
RAMPA (Eje B/Eje 13-14)		m2	1.00	2.45		4.00	9.80	
FRIO								
MEZAMINE Eje 3 / Eje B-C		m2	1.00	0.60		2.9	1.74	87.30
Tarima								
Eje 1/2 - A/B		m2	1.00	3.00		5.00	15.00	
Eje 1/2 - A/B		m2	1.00	2.95		5.00	14.75	
Eje 2/3 - A/B		m2	1.00	2.25		5.00	11.25	
						Area (m2)		
Escalera (Subida a mezzanine de Frio) (Eje 3/ Eje C-D)		m2	2.00			5.85	11.69	
		m2	1.00	4.85		0.25	1.21	
Escalera (Subida interior Frio) (Eje 3/ Eje C-D)		m2	2.00			9.74	19.48	
		m2	1.00	9.76		0.25	2.44	
Escalera (Subida exterior Frio) (Eje 3/ Eje C-D)		m2	1.00			9.74	9.74	

CONSORCIO ZORRITOS

[Firma]

Metrado Acumulado Actual	2388.48
Metrado Acumulado Anterior	2039.12
Metrado Actual	369.36

ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
JEFE DE SUPERVISION

Item	Descripción	UND	CANT	Largo	Ancho	Alto	Area/ Volumen	Metrado Parcial
02	ARQUITECTURA							
02.04	PISOS, PAVIMENTOS Y ACABADOS							
02.04.01	ACABADO DE CEMENTO PULIDO ANTIDSLIZANT CON IMPERMEABILIZANTE EN PISOS 6-2" DE CONCRETO 1:5	m2						527.93
	OSMOSIS							
		m2	1.00	6.30	2.40		15.12	
	ADMINISTRACION							
	2do Nivel					Area (m2)		
	Pasillo de administracion	m2	1.00			51.14	51.14	
	DESINFECCION					Area (m2)		
	Pasadizo de desinfeccion	m2	1.00			70.64	70.64	
	TARIFAS PISUVIAS					Area (m2)		
	Mezamiento	m2	1.00			58.05	58.05	
	FRIO							
	2do Nivel							
	Cuarto de maquinas	m2	1.00			149.37	149.37	
	Deposito	m2	1.00			12.51	12.51	
	2do Nivel					Area (m2)		
	Tarimas (Mes-n)	m2	5.00			3.03	15.15	
		m2	1.00			4.47	4.47	
	DESINFECCION					Area (m2)		
	CUSTODIO DE PERTENENCIA	m2	1.00			5.76	5.76	
	LAVADO DE BOTAS Y MANOS	m2	1.00			22.24	22.24	
	DEPOSITO DE CARRETAS	m2	1.00			51.73	51.73	
	RAMPA	m2	1.00			14.70	14.70	
	ADMINISTRACION							
	SURTIAMIN HIECTRICA	m2	1.00	29.14			29.14	
	CANAleta ELECTRICA	m2	1.00	3.56			3.56	
	CANAleta ELECTRICA	m2	1.00	3.99			3.99	
	DESINFECCION					Area (m2)		
	CONTROL DE CALIDAD	m2	1.00			9.27	9.27	
	ENTREGA DE INDIUMENTARIA	m2	1.00			7.25	7.25	
	DEPOSITO TEMPORAL	m2	1.00			20.75	20.75	

CONSORCIO ZORRITOS
[Firma]
ING. FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Residente de Obra

Metrado Acumulado Actual	527.93
Metrado Acumulado Anterior	489.98
Metrado Actual	57.95

[Firma]
ING. RUBEN BOSSUSTONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

Item	Descripción	UND	CANT	Largo	Ancho	Alto	Area/ Volumen	Metrado Parcial
02	ARQUITECTURA							
02.04	PISOS, PAVIMENTOS Y ACABADOS							
02.04.10	PISO DE PORCELANATO 0.60 x 0.60m ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO	m2						64.54
	DESINFECCION				Area (m2)	Porcentaje (85%)		42.44
	SS.HH Varones	m2	1.00		19.18	0.85	16.26	
	SS.HH Mujeres	m2	1.00		15.28	0.85	12.98	
	Ducha varones	m2	1.00		15.53	0.85	13.20	
	ADMINISTRACION							22.10
	Tesoreria (DICAPI)	m2	1.00		13.00	0.85	11.05	
	Administracion (GREMIO PESCADORES)	m2	1.00		13.00	0.85	11.05	

CONSORCIO ZORRITOS
[Signature]
ING. FERNANDO REGALADO OBLAS
 INGENIERO EN OBRAS

Metrado Acumulado Actual	64.54
Metrado Acumulado Anterior	0.00
Metrado Actual	64.54

[Signature]
ING. RUBEN BOSSUSTONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

**CONSORCIO
ZORRITOS**

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESMARCADENO PESQUERO ARTESANAL
EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIIRANTE
VILLAR, REGION TUMBES*

Item	Descripcion	UNID	CANT	Largo	Ancho	Alto	Area/ Volumen	Medrado Parcial
02	ARQUITECTURA							
02.04	PHOS, PAVIMENTOS Y ACABADOS							
02.04.13	ACABADO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE EN MANTILLONES, LAVADO DE BORTAS, LAVADEROS	m2						8.91
	DESMARCCION							8.91
	Mantilloneo	m2	1.00	1 m		1.00	1.00	1.00
	Interior	m2	1.00	4.65		0.50	2.33	2.33
	Exterior	m2	1.00	4.55		0.60	2.73	2.73

CONSORCIO ZORRITOS
Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante
Villar, Region Tumbes
Ing. Oscar Orellana
Director General
ING. ROBERTO ORELLANA OBLI
Director General
No. Expediente 71. Dbra

ING. ROBERTO BOSCHI TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

Medrado Acumulado Actual	8.91
Medrado Acumulado Anterior	0.00
Medrado Actual	8.91

Item	Descripción	UNID	CANT	1 argp	Ancho	Alto	Area Volumen	Metrodo Parcial
02	ARQUITECTURA							
02.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS							
02.05.01	ZOCALOS DE POKELAMATO RECTO FRAMBUE FOR ONR O 6030 60m	m ²						111.88

PROYECTO ZORRITOS
DISTRITO DE ZORRITOS
DEPARTAMENTO DE ACAPULCO
PROVINCIA DE CONTRALMIANTE VILLAR
REGION TUMBES

Metrodo Acumulado Actual 111.88
Metrodo Acumulado Anterior 0.00
Metrodo Actual 111.88

ING. ROBERT BOSCHS FORNIATTI
COORDINADOR SUPERVISOR TUMBES
INFR. DE SUPERVISION

Item	Descripción	UNID	CANT	Largo	Ancho	Alto	Area	Volu	Materiales
02	ARQUITECTURA								
02.11	PINTURA								
02.11.01	PINTURA EN MUEBLOS EXTERIORES Y CIERRO PERIMETRICO CON LATEX	m ²							78.89
	ANAGRAMACION								
	EP 1/EP 11 (EXTERIOR)	m ²	1.00	30.25			2.95	115.79	414.38
		m ²	1.00	0.75			2.95	-0.74	
		m ²	10.00	0.20			2.95	-5.90	
		m ²	4.00	0.50			2.95	5.90	
	EP 17/EP 7 (EXTERIOR)	m ²	1.00	23.00			2.95	67.85	
		m ²	10.00	0.20			2.95	-3.90	
	EP 9/EP 9 (P)	m ²	1.00				1.01	13.67	
		m ²	1.00	0.50			0.9	0.81	
	EP 4/EP 3 (P)	m ²	1.00	21.33			1.48	340.53	
		m ²	4.00	0.50			7.45	-22.35	
	VAT 10	m ²	4.00	0.75			1.50	-2.25	
	VAT 09	m ²	7.00	2.80			7.80	4.80	
	VAT 08	m ²	1.00	7.80			0.90	3.24	
	VAT 35	m ²	3.00	7.00			1.50	9.00	
	VAT 34	m ²	1.00	1.50			1.50	-2.25	
	EP 4/EP 11 (P)	m ²	1.00	3.80			3.8	11.42	
	VAT 05	m ²	1.00	7.00			0.9	-2.43	
	VAT 01	m ²	1.00	0.80			0.9	-0.81	
	EP 17/EP 1 (P)	m ²	1.00	7.25			3.55	35.74	
		m ²	2.00	0.50			3.15	-5.13	
	VAT 34	m ²	1.00	1.50			1.5	2.25	
	VAT 35	m ²	1.00	2.00			1.5	-3.00	
	EP 12/EP 1 (P)	m ²	1.00	3.75			3.90	12.30	
		m ²	1.00	1.60			0.90	-1.26	
	EP 9/EP 15	m ²	1.00	13.94			4.90	47.74	
	VAT 02	m ²	4.00	0.90			0.90	-3.24	
	EP 2 EP 3/EP 4 (P)	m ²	1.00	6.65			2.45	24.27	
		m ²	1.00	0.50			3.65	-1.83	
	EP 3/EP 4 (P)	m ²	1.00	4.75			2.35	12.80	
	RECONSTRUCCION								
	EP 14/EP 1 (P)	m ²	1.00	44.50			3.10	138.20	487.33
		m ²	10.00	0.25			2.10	-7.75	
		m ²	1.00	0.85			1.10	3.64	
		m ²	1.00	0.50			4.10	-1.25	
		m ²	1.00	0.40			4.10	-1.24	
	VAT 01	m ²	1.00	0.90			0.90	-4.05	
	VAT 05	m ²	5.00	1.45			0.90	6.55	
	VAT 05	m ²	3.00	2.70			0.90	-7.29	
	RECONSTRUCCION								
	EP 4/EP 14 (P)	m ²	1.00				43.02	43.02	60.13
	EP 13/EP 14 (P)	m ²	1.00	3.90			3.57	13.93	
	EP 13 EP 14/EP 15 EP 17	m ²	1.00	5.50			2.57	22.22	
	VAT 12	m ²	1.00	1.80			1.80	-2.34	
	OTR INMUEBLES	m ²	1.00	2.00			3.90	7.90	
	LABORAL PUNTAS								
	EP 8/EP 3 (P)	m ²	9.00	3.30			1.50	44.55	66.24
	EP 8/EP 3 (P)	m ²	9.00	3.30			0.40	11.88	
	RENO								
	EP 3/EP 8 (P)	m ²	1.00				43.41	43.41	58.83
	VAT 12	m ²	1.00	2.40			1.50	-3.60	

CONSORCIO ZORRITOS
 Ing. Roberto Tomiatti
 Gerente General
 Calle Fernando de Alencastro Obitias
 Zorrotritos de Oaxaca

DEBIDO A QUE SOLO SE REALIZA EL IMPRIMANTE DE LE
 CONSIDERARA UN % AL METRADO EJECUTADO DEL 40%

Materiales Acumulados Actual	728.80
Materiales Acumulados Anterior	531.72
Materiales Actual	298.17
Materiales Acumulados Actual (40%)	291.52
Materiales Acumulados Anterior (40%)	212.69
Materiales Actual (40%)	123.27

ING. ROBERTO TOMIATTI
 GERENTE GENERAL
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 AREA DE SUPERVISION

Item	Descripción	UNO	CANT	Largo	Ancho	Alto	Area Volumen	Metrado Perimet
02	ARQUITECTURA							
02.11.02	PINTURA							665.58
	PINTURA EN Muros INTERIORES CON LATEX	m2						
	ADMINISTRACION							464.26
	PRIMER NIVEL							
	INSTRUMENTOS ADAPTADOS DE PESCA	m2	1.00	14.30			14.30	
	VAT-01	m2	1.00	1.60			1.60	5.86
	PAA-01	m2	1.00	0.90			0.90	0.81
	PAA-01	m2	1.00	1.00			1.00	2.40
	MAESTRANZA	m2	1.00	16.00			16.00	52.00
	VAT-03	m2	1.00	0.50			0.50	-1.05
	PAA-05	m2	1.00	0.90			0.90	-0.81
	PAA-05	m2	1.00	1.00			1.00	2.40
	RESIDUOS NO PELIGROSOS/RESIDUOS PELIGROSOS	m3	1.00	14.44			14.44	48.26
	VAT-08	m2	1.00	0.25			0.25	-0.81
	PAA-08	m2	1.00	2.70			2.70	-2.40
	PAA-08	m2	1.00	1.00			1.00	-2.40
	TSORRERIA	m2	1.00	14.90			14.90	52.20
	PAA-01	m2	1.00	1.20			1.20	-2.88
	VAT-01	m2	1.00	0.90			0.90	-0.81
	VAT-08	m2	1.00	2.90			2.90	8.01
	ADMINISTRACION (GRENIO PESCADORES)	m2	1.00	14.90			14.90	52.20
	PAA-01	m2	1.00	0.50			0.50	1.85
	PAA-01	m2	1.00	1.20			1.20	-2.88
	VAT-01	m2	1.00	0.90			0.90	0.81
	VAT-08	m2	1.00	2.90			2.90	8.01
	SALA DE REUNIONES (GRENIO PESCADORES)	m2	1.00	25.13			25.13	91.21
	PAA-04	m2	1.00	2.40			2.40	-8.76
	VAT-01	m2	1.00	1.20			1.20	-2.88
	VAT-08	m2	1.00	0.90			0.90	-1.62
	VAT-08	m2	1.00	2.90			2.90	8.01
	SCHIVANDONES	m2	1.00	12.20			12.20	22.84
	VAT-10	m2	1.00	0.75			0.75	-0.56
	55 HH MANTENES	m2	1.00	13.00			13.00	21.08
	VAT-11	m2	2.00	0.75			1.50	-3.15
	55 HH DISCAPACITADOS	m2	1.00	9.20			9.20	15.04
	VAT-01	m2	1.00	0.90			0.90	-0.81
	SEGUNDO NIVEL							
	SALA DE REUNIONES (OPPA)	m2	1.00	21.50			21.50	72.09
	PAA-04	m2	1.00	5.06			5.06	-16.92
	VAT-04	m2	1.00	1.20			1.20	-2.88
	VAT-04	m2	1.00	1.50			1.50	-2.25
	VAT-04	m2	1.00	2.00			2.00	-8.00
	ADMINISTRACION (OPPA)	m2	1.00	20.90			20.90	70.02
	PAA-03	m2	1.00	2.20			2.20	-7.27
	VAT-04	m2	1.00	1.20			1.20	-2.88
	VAT-05	m2	1.00	1.50			1.50	-2.25
	VAT-05	m2	1.00	2.00			2.00	-8.00
	DESMARRACADERO							447.26
	PAA-03	m2	1.00	1.50			1.50	5.36
	Ep 13 Ep 14 Ep D Ep C	m2	1.00	4.55			4.55	16.32
	Ep 13 Ep 14 Ep C Ep D	m2	1.00	6.00			6.00	21.43
	Ep 13 Ep 14 Ep D Ep F	m2	2.00	0.90			1.80	4.32
	PAA-01	m2	1.00	6.00			6.00	21.43
	Ep 13 Ep 14 Ep F Ep G	m2	1.00	4.00			4.00	14.29
	Ep 13 Ep 14 Ep G Ep H	m2	1.00	4.70			4.70	17.52
	PAA-12	m2	1.00	2.40			2.40	-7.40
	Ep 13 Ep F Ep G	m2	1.00	6.20			6.20	23.11
	VAT-13	m2	1.00	0.75			0.75	-0.54
	VAT-14	m2	1.00	0.75			0.75	-1.09
	Ep 13 Ep G Ep I	m2	1.00	6.00			6.00	22.37
	VAT-13	m2	1.00	0.75			0.75	-0.56
	VAT-15	m2	1.00	0.75			0.75	-2.00

ING. ROBERTO TORALTI
CONSEJO SUPERVISOR TUMES
PRESIDENTE DE OTRA

SS.HH VARONES	m2	1.00	18.60	1.75	23.25		
VAT-01	m2	1.00	0.90	0.90	-0.81		
VAT-06	m2	1.00	0.90	2.70	-2.43		
SS.HH MUJERES	m2	1.00	15.90	1.25	19.88		
VAT-06	m2	1.00	0.90	2.70	-2.43		
DUCIA MUJERES	m2	1.00	30.30	1.25	37.88		
VAT-01	m2	1.00	0.90	0.90	-0.81		
VAT-06	m2	1.00	0.90	1.45	-1.31		
DUCIA VARONES	m2	1.00	30.30	1.25	37.88		
VAT-01	m2	1.00	0.90	0.90	-0.81		
VAT-06	m2	1.00	0.90	1.45	-1.31		
LAVANDERIAS BOTAS Y MAQUIN	m2	1.00	27.50	3.90	44.13		
VAT-01	m2	2.00	0.90	0.90	-1.62		
PAT-01	m2	1.00	0.90	1.45	-1.41		
CUSTOMER DE PINTARRINCHA	m2	1.00	17.78	1.40	21.6		
PAT-01	m2	1.00	0.90	2.40	-2.01		
DEPERCU DE FABRITAS	m2	1.00	27.14	3.60	11.02		
VAT-06	m2	2.00	0.90	1.45	-2.61		
VAT-06	m2	1.00	2.70	0.90	-2.43		

VERIFICADO A QUE SOLO SE REALIZA EL IMPRIMANTE SE LE CONSIDERARÁ UN 4% AL METRADO EJECUTADO DEL 40%

Metrado Acumulado Actual	906.96
Metrado Acumulado Anterior	498.28
Metrado Actual	407.70
Metrado Acumulado Actual (40%)	362.78
Metrado Acumulado Anterior (40%)	199.31
Metrado Actual (40%)	173.08

CONSORCIO ZORRITOS
 FRMAYOR GALAPAGOS
 Dependiente de Omas

ING. RUBEN ROBERTO TORIANT
 CONSORCIO SUPERVISOR TIEBIA
 TEPF DE SUPERVISORIA

Item	Descripción	UNO	CANT	Largo	Ancho	Alto	Area	Volumen	Material
02	ARQUITECTURA								
02.11	PINTURA								
02.11.03	PINTURA EN COLUMNAS CON LATER	m ²							494.15
	ADMINISTRACION PROMER NIVEL Eje 1/Eje 11 (EXTENSION)	m ²	1.00	0.25			7.86	0.74	
		m ²	10.00	0.30			7.86	5.90	
		m ²	4.00	0.30			7.86	5.90	
	Fpe 1/Fpe 2-eje 9 (EXTENSION)	m ²	10.00	0.20			2.95	5.90	
	Epe U/Eje 3-Fpe 9	m ²	6.00	0.20			7.86	77.35	
	Epe U/Eje 1-Eje 3	m ²	1.00	0.50			3.55	5.23	
	Fpe 2 Fpe 3/Fpe K-Fpe M	m ²	1.00	0.30			4.00	1.90	
	Ce1/Ce2 (1'-2' NIVEL)	m ²	1.00	1.30			0.7	10.05	
	Viga	m ²	1.00	0.25			0.45	0.11	
	Eje 1/Eje 3 (1'-2' NIVEL)	m ²	1.00	1.50			6.7	10.05	
	Viga	m ²	1.00	0.15			0.45	0.11	
	Eje 1/Eje 4 (1'-2' NIVEL)	m ²	1.00	1.50			6.7	10.05	
	Viga	m ²	1.00	0.25			0.45	0.11	
	Eje 1/Eje 5 (1'-2' NIVEL)	m ²	1.00	1.80			0.75	10.05	
	Viga	m ²	1.00	0.25			0.45	0.11	
	Ce1/Ce2 (1'-2' NIVEL)	m ²	1.00	1.50			0.60	10.05	
	Viga	m ²	1.00	0.25			0.45	0.11	
	Eje 1/Eje 2 (1'-2' NIVEL)	m ²	1.00	1.50			0.67	10.05	
	Viga	m ²	1.00	0.25			0.45	0.11	
	Eje 1/Eje 3 (1'-2' NIVEL)	m ²	1.00	1.50			0.67	10.05	
	Viga	m ²	1.00	0.25			0.45	0.11	
	Fpe 1/Fpe 10 (1'-2' NIVEL)	m ²	1.00	1.50			6.7	10.05	
	Viga	m ²	1.00	0.25			0.45	0.11	
	Lme K/Lme 2	m ²	1.00	0.50			6.7	3.95	
	Viga	m ²	1.00	0.25			0.45	0.11	
	Eje K/Eje 23	m ²	1.00	0.50			6.7	3.95	
	Viga	m ²	1.00	0.25			0.45	0.11	
	Eje K/Eje 3	m ²	1.00	0.75			6.7	3.95	
	Viga	m ²	1.00	0.50			6.7	3.95	
	Eje K/Eje 4	m ²	1.00	0.75			6.7	3.95	
	Viga	m ²	1.00	0.40			6.7	4.09	
	Eje K/Eje 5	m ²	1.00	0.25			6.7	4.09	
	Viga	m ²	1.00	0.50			6.7	3.35	
	Eje K/Eje 6	m ²	1.00	0.25			6.7	0.15	
	Viga	m ²	1.00	0.50			6.7	3.35	
	Eje K/Eje 7	m ²	1.00	0.25			6.7	0.11	
	Viga	m ²	1.00	0.25			6.7	3.95	
	DEPOSITO DE APAREJOS DE PESCA	m ²	1.00	1.60			3.85	5.68	
	MAESTRANZA	m ²	1.00	0.90			3.90	1.65	
	RESERVIOS NO PELIGROSOS/RESERVIOS PELIGROSOS	m ²	1.00	0.25			3.90	0.83	
	ADMINISTRACION (GERENIO PESCADORES)	m ²	1.00	0.50			3.85	1.83	
	SALA DE REUNIONES (GERENIO PESCADORES)	m ²	1.00	2.90			3.85	8.76	
	SUBESTACION ELECTRICA	m ²	1.00	5.68			3.85	20.71	
	SEGUNDO NIVEL								
	SALA DE REUNIONES (DPA)	m ²	1.00	5.05			3.85	16.97	
	ADMINISTRACION (DPA)	m ²	1.00	2.20			3.95	7.97	
	DESINFECCION								
	EXTENSION (C1)	m ²	10.00	0.25			3.10	7.75	
	EXTENSION (C2)	m ²	1.00	0.25			3.10	2.64	
	FILTACION (C3)	m ²	1.00	0.50			3.10	1.55	
	EXTENSION (C4)	m ²	1.00	0.40			3.10	1.24	
	EXTENSION (C5)	m ²	5.00	0.50			0.90	4.05	
	DESINFECCION								
	PASADISO INTERIOR (C1)	m ²	3.00	0.25			5.33	4.00	
	PASADISO INTERIOR (C2)	m ²	2.00	0.40			4.00	5.80	
	PASADISO INTERIOR (C3)	m ²	2.00	0.85			5.33	9.06	
	PASADISO INTERIOR (C4)	m ²	3.00	1.75			5.33	27.90	

INGENIERO SUPERVISOR TUMES
CONSORCIO ZORRITOS


INGENIERO SUPERVISOR TUMES
CONSORCIO ZORRITOS

	DEPOSITO DE CARRETAS	m2	1.00	4.10		4.00	16.40	
	TAREAS PREVIAS							
	Eje B/Eje 3-Eje 12	m2	10.00	0.35		1.50	5.25	96.37
	Eje D-F/Eje 3-Eje 12	m2	8.00	3.35		3.40	91.12	

*DEBIDO A QUE SOLO SE REALIZA EL INPRIMANTE SF I F
CONSIDERARA UN % AL METRADO EJECUTADO DEL 40%

Metrado Acumulado Actual	404.18
Metrado Acumulado Anterior	242.34
Metrado Actual	161.81

Metrado Acumulado Actual (40%)	161.68
Metrado Acumulado Anterior (40%)	96.94
Metrado Actual (40%)	64.72

CONSORCIO ZORRITOS

 FERNANDO GALADOBLITAZ
 Residente de Obra


 ING. RUBEN BOSSUSTONIATT
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 INC. RUBEN BOSSIOS TONIAITI
 JEFE DE SUPERVISION


FRANCISCO GALADO ORTIZ
 ASISTENTE DE O.M.E.
 SUPERVISOR GENERAL

CONSIDERARA UN % AL METRADO EJECUTADO DEL 40%
 PERDIDO A QUE SOLO SE REALIZA EL IMPRIMANTE SE LE

173.00	Metrado Acumulado Actual
152.70	Metrado Acumulado Anterior
13.01	Metrado Actual
88.44	Metrado Acumulado Actual (40%)
43.88	Metrado Acumulado Anterior (40%)
4.86	Metrado Actual (40%)

Item	Descripción	UNID	CANT	Largo	Ancho	Año	Area/ Volumen	Metrado Parcial
02	ARQUITECTURA							
02.11	PINTURA							
02.11.04	PINTURA EN VIGAS CON LATEX	m2						173.00
	PRIMERA NIVEL							
	Ep-1/Ep-1.2 Ep-6 (VM 101)	m2	18.10	1.00	1.40		25.34	
	Ep-1 K / Ep-2 Ep-6 (VCH-1)	m2	12.35	1.81	0.46		5.96	
	VB-101	m2	1.15	1.00	0.70		0.81	
	EXTENSION							
	Ep M / Ep-1.11 (Interior)	m2	19.25	1.00	0.25		4.81	
	Ep M / Ep-1.11 (Interior)	m2	1.00	1.00	0.25		0.25	
	SEGUNDO NIVEL							
	Ep-1 / Ep-1.2 Ep-11 (VB 202)	m2	38.35	1.00	0.75		28.76	
	Ep-2 / Ep-1.11 (VB-202)	m2	7.60	1.00	0.75		5.70	
	Ep-3 / Ep-1.11 (VM 202)	m2	7.80	1.00	0.75		5.85	
	Ep-4 / Ep-1.11 (VM-202)	m2	7.60	1.00	0.75		5.70	
	Ep-5 / Ep-1.11 (VB 202)	m2	7.60	1.00	0.75		5.70	
	Ep-6 / Ep-1.11 (VB 202)	m2	7.60	1.00	0.75		5.70	
	Ep-7 / Ep-1.11 (VB 202)	m2	28.80	1.00	0.75		21.60	
	Ep-8 / Ep-1.11 (VM-202)	m2	7.50	1.00	0.75		5.62	
	Ep-9 / Ep-1.11 (VM-202)	m2	11.25	1.00	0.75		8.44	
	Ep-10 / Ep-1.11 (VM-202)	m2	44.00	1.00	0.45		19.80	
	TABLA PERFORADA							
	Ep-14 / Ep-14 (VS)	m2	20.07					18.87
	TABLA PERFORADA							
	Ep-8 / Ep-3.12 (V 201)	m2	7.30	1.00	0.75		5.48	
	Ep-0.5 / Ep-3.12 (V-202)	m2	2.70	1.00	0.75		2.03	

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESMARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIERANTE VILLAR, REGION TUMBES



Item	Descripción	Unid	CANT	Longo	Ancho	Alto	Area/ Volumen	Materiales Parcial
02	ARQUITECTURA							
02.11	PINTURA							
02.11.06	PINTURA EN CEMENTOSO CON LITIX	m ²						522.67
	ADMINISTRACION							864.47
	PRIMERA MESA	m ²	1.00				12.75	11.75
	DEPOSITO DE AVANZOS DE PESCA	m ²	1.00				16.00	16.00
	MAESTRANZA	m ²	1.00				14.83	14.83
	RESIDUOS NO PELIGROSOS/RESIDUOS PELIGROSOS	m ²	1.00				12.75	12.75
	TESORERIA	m ²	1.00				12.75	12.75
	ADMINISTRACION (GERENCIA PESCADORES)	m ²	1.00				25.13	25.13
	SALA DE REUNIONES (GERENCIA PESCADORES)	m ²	1.00				11.55	11.55
	SS.HH MUJERES	m ²	1.00				14.78	14.78
	SS.HH VARONES	m ²	1.00				14.80	14.80
	SS.HH DISCAPACITADOS	m ²	1.00				14.80	14.80
	PALANQUILLO	m ¹	1.00				4.71	4.71
	VIGAS	m ³	1.00				2.06	1.06
	SUBESTACION ELECTRICA	m ²	1.00				28.83	28.83
		m ²	1.00				0.13	0.13
	FONDO DE ESCALERA	m ²	1.00				16.47	16.47
	SEGURIDAD NIVEL							
	SALA DE REUNIONES (OPAI)	m ²	1.00				26.25	26.25
	ADMINISTRACION (OPAI)	m ²	1.00				25.14	25.14
	UBI	m ²	1.00				75.34	75.34
	SS.HH MUJERES	m ²	1.00				11.94	11.50
	SS.HH VARONES	m ²	1.00				14.78	14.78
	SS.HH DISCAPACITADOS	m ²	1.00				6.46	6.46
	PASADISO	m ²	1.00				106.45	106.45
	VIGAS	m ²	1.00				6.31	6.31
	TAMBAJAS PAVAS							
	EP D-7 / EP 3-12	m ²	16.00				3.74	0.84
								49.40

DEBIDO A QUE SOLO SE REALIZA EL IMPRIMANTE SE LE CONSIDERARA UN % AL METRADO EJECUTADO DEL 40%

Metrado Acumulado Actual	532.67
Metrado Acumulado Anterior	421.27
Metrado Actual	49.40
Metrado Acumulado Actual (40%)	213.07
Metrado Acumulado Anterior (40%)	168.51
Metrado Actual (40%)	19.76

[Firma]
FRANCISCO ZORRITOS
 AGENTE DE OBRAS

[Firma]
ING. RUBEN BOSQUE TONIATTI
 COORDINADOR SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

RESUMEN DE METRADOS DE OBRAS DE MAR




ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UNID	PRESUPUESTO		EROTADO		EROTADO		ACUMULADO		MAYOR O MENOR
			CONTRATADO	NETADO	VAL. 19	NETADO	VAL. 20	NETADO	NETADO		
05.01.01	OBRAS DE MAR										
05.01.02	OBRAS PRELIMINARES	m2	1,200.46						1,200.46	0.00	0.00
05.01.03	TRABAJO PRELIMINAR EN OBRAS DE MAR	kg	1.00					0.50	0.50	0.50	0.50
05.01.04	MONTEO Y DESMONTAJE DE EQUIPO	u	1.00					1.00	1.00	1.00	1.00
05.01.05	PROVISION DE MATERIAL PARA EXCAVACIONES	m3	242.98					191.04	191.04	91.34	91.34
05.01.06	PROVISION DE MATERIAL EXISTENTE	m3	21.76					21.76	21.76	0.00	0.00
05.01.07	DEMOICION DE CIMENTOS DE CONCRETO	m3	209.33					209.33	209.33	0.00	0.00
05.01.08	DEMOICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO (0.60M)	m3	17.35					17.35	17.35	0.00	0.00
05.01.09	DEMOICION DE CIMENTOS DE CONCRETO	m3	192.00					192.00	192.00	0.00	0.00
05.01.10	DEMOICION DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO	m	10.00					10.00	10.00	0.00	0.00
05.01.11	DEMOICION DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO	m	119.78					119.78	119.78	0.00	0.00
05.01.12	DEMOICION DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO	u	1.00					1.00	1.00	0.00	0.00
05.01.13	DEMOICION DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO	u	7.00					7.00	7.00	0.00	0.00
05.01.14	DEMOICION DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO	u	2.00					2.00	2.00	0.00	0.00
05.01.15	DEMOICION DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO	m3	1.25					1.25	1.25	0.00	0.00
05.01.16	DEMOICION DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO	m3	172.38					172.38	172.38	122.67	122.67
05.01.17	DEMOICION DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO	m3	172.38					172.38	172.38	172.67	172.67
05.01.18	DEMOICION DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO	m3	140.00					140.00	140.00	192.67	192.67
05.02.01	ESTRUCTURAS METALICAS PARA BARRERAS EN MANTENIMIENTO	m	1,989.80					672.00	1,317.80	1,126.80	1,126.80
05.02.02	ESTRUCTURAS METALICAS PARA BARRERAS EN MANTENIMIENTO	u	94.00					0.00	94.00	64.00	64.00
05.02.03	ESTRUCTURAS METALICAS PARA BARRERAS EN MANTENIMIENTO	kg	14,981.00					0.00	14,981.00	54,264.00	54,264.00
05.02.04	ESTRUCTURAS METALICAS PARA BARRERAS EN MANTENIMIENTO	u	36.00					0.00	36.00	25.00	25.00
05.02.05	ESTRUCTURAS METALICAS PARA BARRERAS EN MANTENIMIENTO	u	48.00					0.00	48.00	69.00	69.00
05.02.06	ESTRUCTURAS METALICAS PARA BARRERAS EN MANTENIMIENTO	u	18.00					0.00	18.00	18.00	18.00
05.02.07	ESTRUCTURAS METALICAS PARA BARRERAS EN MANTENIMIENTO	u	22.00					0.00	22.00	22.00	22.00
05.02.08	ESTRUCTURAS METALICAS PARA BARRERAS EN MANTENIMIENTO	m2	7.00					0.00	7.00	2.00	2.00
05.02.09	ESTRUCTURAS METALICAS PARA BARRERAS EN MANTENIMIENTO	m	54.00					0.00	54.00	54.00	54.00
05.02.10	ESTRUCTURAS METALICAS PARA BARRERAS EN MANTENIMIENTO	m	228.60					0.00	228.60	232.50	232.50
05.02.11	ESTRUCTURAS METALICAS PARA BARRERAS EN MANTENIMIENTO	u	48.00					0.00	48.00	48.00	48.00
05.02.12	ESTRUCTURAS METALICAS PARA BARRERAS EN MANTENIMIENTO	u	2.00					0.00	2.00	2.00	2.00
05.03.01	LIMPIEZA Y COLOCACION DE ADHESIVO TRANSFORMADOR DE ONDAS	m2	294.00					0.00	294.00	224.00	224.00
05.03.02	LIMPIEZA Y COLOCACION DE ADHESIVO TRANSFORMADOR DE ONDAS	m2	131.00					0.00	131.00	133.00	133.00
05.03.03	LIMPIEZA Y COLOCACION DE ADHESIVO TRANSFORMADOR DE ONDAS	m2	179.07					0.00	179.07	179.07	179.07
05.03.04	LIMPIEZA Y COLOCACION DE ADHESIVO TRANSFORMADOR DE ONDAS	m2	14.00					0.00	14.00	14.00	14.00
05.03.05	LIMPIEZA Y COLOCACION DE ADHESIVO TRANSFORMADOR DE ONDAS	m2	13.00					0.00	13.00	131.00	131.00
05.03.06	LIMPIEZA Y COLOCACION DE ADHESIVO TRANSFORMADOR DE ONDAS	m3	15.22					0.00	15.22	16.22	16.22
05.04.01	CABEZAL PREARMADO CONCRETO FC-280 KGM/KG	m3	88.46					88.70	88.70	7.30	7.30
05.04.02	CABEZAL PREARMADO CONCRETO FC-280 KGM/KG	m2	510.31					510.30	510.30	0.00	0.00
05.04.03	CABEZAL PREARMADO CONCRETO FC-280 KGM/KG	kg	20,847.46					20,847.46	20,847.46	0.00	0.00
05.04.04	CABEZAL PREARMADO CONCRETO FC-280 KGM/KG	u	31.00					32.00	32.00	1.00	1.00
05.04.05	CABEZAL PREARMADO CONCRETO FC-280 KGM/KG	u	31.00					32.00	32.00	1.00	1.00
05.04.06	CABEZAL PREARMADO CONCRETO FC-280 KGM/KG	m3	204.28					214.82	214.82	0.00	0.00
05.04.07	CABEZAL PREARMADO CONCRETO FC-280 KGM/KG	m2	1,622.51					1,742.87	1,742.87	92.84	92.84
05.04.08	CABEZAL PREARMADO CONCRETO FC-280 KGM/KG	kg	49,860.98					48,860.98	48,860.98	0.00	0.00
05.04.09	CABEZAL PREARMADO CONCRETO FC-280 KGM/KG	u	82.00					82.00	82.00	0.00	0.00
05.04.10	CABEZAL PREARMADO CONCRETO FC-280 KGM/KG	m2	1,574.80					0.00	1,574.80	1,574.80	1,574.80
05.05.01	OBRAS DE CONCRETO EN OTROS	m3	246.57					134.33	134.33	112.25	112.25
05.05.02	OBRAS DE CONCRETO EN OTROS	m2	1,217.86					529.89	529.89	687.77	687.77
05.05.03	OBRAS DE CONCRETO EN OTROS	kg	28,220.56					2,489.64	2,489.64	23,823.91	23,823.91
05.05.04	OBRAS DE CONCRETO EN OTROS	m3	58.37					58.37	58.37	58.37	58.37


ING. RUBEN BOSQUE TONIATI
 CONSORCIO SUPERVISOR TURK
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS
 MANUEL REGALADO OBITA
 Jefe de Obra

Item	Descripción	Und	N° de tramos	Cant.	L(m)	Ø(m)	h(m)	Metrado	Metrado Parcial
05	OBRAS DE MAR								
05.04	CABEZAL PREFABRICADA								
05.04.04	TRANSPORTE DE CABEZAL PREFABRICADO	Und							32.00
	PUNTE								
	Transporte de vigas cabeceras								
	Eje	Und	1.00	18.00				18.00	
	PUNTE								
	Transporte de vigas cabeceras								
	Eje	Und	1.00	2.00				2.00	
	CABEZO								
	Transporte de vigas cabeceras								
	Eje 22-25	Und	1.00	3.00				3.00	
	PUNTE								
	Transporte de vigas cabeceras								
	Eje 30-31	Und	1.00	3.00				3.00	
	CABEZO								
	Transporte de vigas cabeceras								
	Eje 25-31	Und	1.00	7.00				7.00	
	CABEZO								
	Transporte de vigas cabeceras								
	Eje 32-33	Und	1.00	2.00				2.00	


ERMANUO REGALADO OBILTA
 PRESIDENTE DEL CONSORCIO

Metrado Acumulado Actual	32.00
Metrado Acumulado Anterior	30.00
Metrado Actual	2.00


ING. RUBEN BOSSUS TONIATT
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

OS	OBRAS DE MAR								
Item	Descripción	Und	N° de tramos	Cont.	L(m)	Ø(m)	h(m)	Metrado	Metrado Parcial
05.04	CABEZAL PREFABRICADA								
05.04.05	COLOCACION DE CABEZAL PREFABRICADO	Und							32.00
	PUENTE								
	Transporte de vigas cabezales								
	Eje	Und	1.00	8.00				8.00	
	PUENTE								
	Transporte de vigas cabezales								
	Eje	Und	1.00	10.00				10.00	
	CABEZO								
	Transporte de vigas cabezales								
	Eje 22-24	Und	1.00	3.00				4.00	
	PUENTE								
	Transporte de vigas cabezales								
	Eje 20-21	Und	1.00	2.00				2.00	
	CABEZO								
	Transporte de vigas cabezales								
	Eje 25-31	Und	1.00	7.00				7.00	
	CABEZO								
	Transporte de vigas cabezales								
	Eje 32-37	Und	1.00	2.00				2.00	

CONSORCIO ZORRITOS
 FERNANDO REGALADO OBLITA
 Responsable de Obra

Metrado Acumulado Actual	32.00
Metrado Acumulado Anterior	30.00
Metrado Actual	2.00

ING. RUBÉN BOSSUS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISIÓN

ID	OBRAS DE MAR									
Item	Descripción	Und	N° de tramos	Cont.	L(m)	B(m)	H(m)	Metrado	Metrado Parcial	
05.05	CABEZAL PREFABRICADA									
05.05.04	TRANSPORTE Y COLOCADO DE LOSA PREFABRICADA	Und							82.00	
	PUENTE									
	Transporte de vigas cabezales									
	Eje	Und	1.00	8.00					8.00	
	PUENTE									
	Transporte de vigas cabezales									
	Eje	Und	1.00	8.00					8.00	
	PUENTE									
	Transporte de vigas cabezales									
	Eje 10-19	Und	1.00	16.00					16.00	
	CABEZO									
	Transporte de losas									
	Eje 23-24	Und	1.00	8.00					8.00	
	Eje 24-25	Und	1.00	2.00					2.00	
	PUENTE									
	Transporte de losas									
	Eje 20-21	Und	1.00	2.00					2.00	
	CABEZO									
	Transporte de losas									
	Eje 24-25	Und	1.00	2.00					2.00	
	Eje 25-31	Und	1.00	24.00					24.00	
	Eje 21-22	Und	1.00	2.00					2.00	
	CABEZO									
	Transporte de losas									
	Eje 31-32	Und	1.00	2.00					2.00	
	Eje 32-33	Und	1.00	8.00					8.00	

CONSORCIO ZORRITOS
 FERNANDO GALADUOBILA
 Responsable de Obra

Metrado Acumulado Actual	82.00
Metrado Acumulado Anterior	72.00
Metrado Actual	10.00

ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

Item	Descripción	Unid	N° de Bienes	Cant.	Um	B(m)	M(m)	Metro	Metro
5.26	OBRA DE CONCRETO (EN SITIO)								
05.06.01	VOLOS Y NUCLEOS FC-280 KG/CMT U/ AMPLIFICADIZANTE	m ³							194.33
	PLANTE								
	EE 04/11/31								
	MATERIALES	m ³	19.00	2.00	5.40	0.35	0.60	43.09	
	CENTRAL	m ³	19.00	1.00	5.40	0.35	0.80	28.73	
	MANTA TRANSACCION	m ²	22.00	1 m	4.80	0.35	0.40	21.17	
	ENCOLA DE TACOSTE FRENTE								
	LOSA EN SITIO								
	FE 21/22	m ²	1.00	1.00			0.35	1.91	
	MAYORIE								
	Calculo (Presupuesto)								
	De 1 a	m ³	8.00	2.00	0.50	0.45	0.20	0.72	
	De 10 21	m ³	22.00	2.00	0.30	0.30	0.50	1.00	
	CANALIZACION								
	Calculo (Presupuesto)								
	De 1 a	m ⁴	4.00	1.00	0.50	0.45	0.45	1.32	
	De 10 21	m ⁴	4.00	1.00	0.30	0.30	0.50	0.64	
	CANALIZACION								
	Calculo (Presupuesto)								
	De 1 a	m ⁴	8.00	3.00	0.50	0.45	0.45	2.44	
	De 10 21	m ⁴	8.00	3.00	0.30	0.30	0.50	1.00	
	CANALIZACION								
	LOSA CENTRAL								
	De 1 a	m ⁴	8.00	1.00	1.45	0.80	0.35	14.41	
	De 10 21	m ⁴	8.00	7.00	5.45	0.35	0.75	30.60	
	JUNTA TRANSACCION								
	De 1 a	m ⁴	4.00	1.00	4.80	0.35	0.35	6.64	
	De 10 21	m ⁴	4.00	1.00	4.80	0.35	0.35	6.64	
	DANOS INTERVENIDOS								
	De 1 a	m ⁴	1.00	7.00	1.40	1.30	1.00	3.36	

ASOCIADO ZORRITOS
 HERNANDEZ GALDO
 Representante de Obra

ALIBEN BOBROS TONIAITI
 ASOCIADO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

Metro Acumulado Actual	194.33
Metro Acumulado Anterior	182.83
Metro Actual	32.50

CONSORCIO ZORRITOS "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS. PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES"									
OS	OBRAS DE MAR								
Item	Descripción	Und	N° de tramos	Cant.	L(m)	B(m)	H(m)	Metrado	Metrado Parcial
5.08	OBRAS DE CONCRETO (IN SITU)								
05.06.02	VIGAS Y NUCLEO, ENCOFRADO Y DESMOLDADO IN SITU	m ²							529.89
	PUENTE								
	EJE 0-0/11-21								
	JUNTAS LONGITUDINALES								
	LATERALES	m ²	19.00	7.00	5.40	0.95		194.94	
	CENTRAL	m ²	19.00	1.00	5.40	0.80		82.08	
	JUNTA TRANSVERSAL								
	ENCIMA DE LA VIGA DEL PUENTE	m ²	21.00	2.00	0.60		0.95	8.82	
	EJE 0 LATERAL								
		m ²	1.00	1.00	4.80		0.35	1.68	
		m ²	1.00	2.00	0.60		0.35	0.42	
	EJE 8 LATERAL								
		m ²	1.00	1.00	4.80		0.35	1.68	
		m ²	1.00	2.00	0.60		0.35	0.42	
	EJE 11 LATERAL								
		m ²	1.00	1.00	4.80		0.35	1.68	
		m ²	1.00	2.00	0.60		0.35	0.42	
	LOSA IN SITU								
	EJE 21-22								
	LATERALES	m ²	1.00	1.00	1.94		0.35	0.68	
		m ²	1.00	1.00	0.41		0.35	0.14	
		m ²	1.00	1.00	4.80		0.35	1.68	
		m ²	1.00	1.00	5.04	Arma (m ²)	0.95	1.78	
	Fondo	m ²	1.00	1.00		5.64		5.64	
	CAREZO								
	LOSA CENTRAL Eje 25-33	m ²	8.00	7.00	5.10	0.35		79.56	
	JUNTA TRANSVERSAL Eje 25-33	m ²	8.00	1.00	5.10	0.80		32.64	
	LOSAS LATERALES								
		m ²	8.00	2.00	14.20	0.35		79.52	
		m ²	8.00	7.00	13.70	0.35		76.72	
	DADOS INTERMEDIOS								
		m ²	1.00	7.00	5.20	1.00		10.40	

CONSORCIO ZORRITOS
 FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Responsable de Obra

Metrado Acumulado Actual	529.89
Metrado Acumulado Anterior	302.08
Metrado Actual	227.84

ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS		"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DISEMBARCADERO PESQUERO ARTERNAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES"													
Item	Descripción	Forma(cm)	Dim. (Pulg)	Cant Elementos	Long por Pieza	N° de piezas por elemento	Traslado (m)	Long Total (m)	LONG TUD POR DIAMETRO						
									1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	1"	
01.07.06	MUELLE														
01.07.06.04	PUENTE, ACERO Gy=4200 kg/cm2														
	MUELLE PUENTE														
	NIVEL														
	JUNTA LONGITUDINAL														
	EJE 0-9	CENTRAL													
		Superior	3/4"	9.00	3.80	3.80		102.80							102.80
			3/4"	1.00	61.80	4.80		247.20							247.20
		Inferior	3/4"	9.00	3.80	3.80		105.30							105.30
			3/4"	1.00	61.80	4.80		247.20							247.20
	EJE 11-21	CENTRAL													
		Superior	3/4"	10.00	3.80	3.80		114.00							114.00
			3/4"	1.00	87.80	4.80		271.20							271.20
		Inferior	3/4"	10.00	3.80	3.80		117.00							117.00
			3/4"	1.00	87.80	4.80		271.20							271.20
	JUNTA LONGITUDINAL														
	EJE 0-9	LATERAL													
		Superior	3/4"	8.00	3.80	2.80		88.40							88.40
			3/4"	1.00	81.80	3.80		185.40							185.40
		Inferior	3/4"	1.00	81.80	3.80		185.40							185.40
			3/4"	8.00	3.00	2.80		54.00							54.00
	EJE 11-21	LATERAL													
		Superior	3/4"	10.00	3.80	2.00		78.00							78.00
			3/4"	1.00	87.80	3.80		203.40							203.40
		Inferior	3/4"	1.00	87.80	3.00		203.40							203.40
			3/4"	1.00	3.00	2.00		60.00							60.00
	JUNTA TRANSVERSAL														
	EJE 0-9	LATERAL													
		Superior	3/4"	11.00	4.50	4.00		188.00							188.00
	EJE 11-21	LATERAL													
		Superior	3/4"	11.00	4.50	4.00		188.00							188.00
	LOSA IN SITU														
	EJE 21-22														
			5/8"	1.00	1.48	50.20		72.80							72.80
			5/8"	1.00	1.05	48.20		50.40							50.40
			5/8"	1.00	5.87	4.00		20.20							20.20
			5/8"	1.00	4.77	2.00		8.54							8.54
			5/8"	1.00	4.87	2.00		8.14							8.14
			5/8"	1.00	2.84	2.00		5.88							5.88
			5/8"	1.00	2.20	2.00		4.80							4.80
			5/8"	1.00	1.88	2.00		3.98							3.98
			5/8"	1.00	1.87	2.00		2.14							2.14
			5/8"	1.00	5.22	2.00		10.84							10.84
			3/8"	1.00	1.80	11.00		19.80							19.80
	CAREZO														
	SUPERIOR CENTRAL		3/4"	7.20	8.00	8.00		504.00							504.00
			3/4"	8.20	3.80	5.00		175.50							175.50
	INFERIOR CENTRAL		3/4"	7.20	8.00	8.00		504.00							504.00
			3/4"	8.20	3.80	5.00		175.50							175.50
	TRANSVERSAL		3/4"	10.00	8.00	4.00		380.00							380.00
	ALTA 33		3/4"	1.00	2.45	5.00		12.25							12.25
	BADOS		1/2"	2.00	5.90	5.00		58.00							58.00
			1/2"	2.00	1.00	18.80		32.00							32.00

ING. RUBEN BOBOS DIAZ
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

DETALLE DE ACERO SUPERIOR Y SUPERIOR EN PUENTE EN PLANO N° 018-82

CONSORCIO ZORRITOS
 MANO REGALADO OBERTA
 Jefe de Obra

1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
-	9.80	80.00	187.50	4,820.86	-
0.25	0.58	1.00	1.80	2.40	4.00
-	1.48	81.80	508.00	11,090.28	-

001



Se recepción
Solo copia

Acaj

CZOA 064-2019/ACAPULCO

Señores

CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES.

Acapulco, Dist. Zorritos, Prov. Contralmirante Villar, Región Tumbes

Presente. -

ATN.: ING. RUBÉN O. BOSSÚS TONIATTI
Jefe de Supervisión – DPA Acapulco

REF.: Mejoramiento de los servicios del desembarcadero
pesquero artesanal en la localidad de Acapulco,
distrito de Zorritos Provincia Contralmirante Villar,
Región Tumbes.

AST.: Adjuntamos Informe Mensual de julio 2019.

Estimados Señores,

Por intermedio de la presente nos dirigimos a Uds. a fin de adjuntar nuestro Informe Mensual del mes de julio 2019, correspondiente a la obra en referencia, en original y tres (3) copias.

Documentos que adjuntamos:

- Informe Mensual del mes de julio 2019, en original y tres (3) copias.
- CD conteniendo archivo digital del Informe del Mes de julio 2019.

Sin otro particular, quedamos de ustedes

Atentamente,

CONSORCIO ZORRITOS
Fernando Regalado Obispo
FERNANDO REGALADO OBISPO
Jefe de Supervisión

RECIBIDO
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
FECHA: 07/08/19 HORA: 12:30 P.M.
[Firma]

CONTRATO DE OBRA N° 054 – 2017 - FONDEPES

EJECUCION DE LA OBRA

**“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA
LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE
ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE
VILLAR, REGIÓN TUMBES**



**INFORME MENSUAL N° 20
JULIO 2019
PARTE A**

CONTRATISTA



**CONSORCIO
ZORRITOS**

[Handwritten signature]
CONSORCIO ZORRITOS
REGISTRADO EN EL REGISTRO DE EMPRESAS
Y PERSONAS DE OBTENIDA

SUPERVISOR

**CONSORCIO SUPERVISOR
TUMBES**



CONTENIDO

1. GENERALIDADES
2. ESTADO DE LA OBRA
3. FICHA TÉCNICA
4. ANEXOS
5. CONTROL DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
6. GRAFICO DE CURVA "S" AVANCE PROGRAMADO Vs. AVANCE EJECUTADO
7. SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD
8. FOTOGRAFIAS QUE MUESTRAN EL AVANCE DE LA OBRA
9. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
10. COPIAS DE CARTAS FIANZAS
11. PLANILLA, PDT, SEGUROS, POLIZAS SCTR Y OTROS SEGÚN CONTRATO
12. ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA
13. ANOTACIONES DEL CUADERNO DE VISITAS
14. ARCHIVO DIGITAL DE LA VALORIZACIÓN

CONSORCIO ZORRITOS
[Firma manuscrita]
INGENIERO FERNANDO RECALADO OBITAS
Ingeniero de Obra



1 GENERALIDADES

EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES, fue creado mediante el Decreto Supremo N° 010-92-PE a través del Art° de la Ley General de Pesca aprobada por el Decreto Ley N° 25977. Desde su fecha de creación, es un Organismo Público sujeto a las normas aplicables a las Empresas del Estado, bajo ámbito del CONAFI. Actualmente pertenece al Ministerio de la producción.

FONDEPES tiene como objetivo elevar el nivel de Ingresos y mejorar las condiciones de vida del pescador artesanal en el ámbito de su jurisdicción a través de la ejecución de obras y/o proyectos de infraestructura productiva, económica y social con participación de la población y en el marco de Programas Integrales de Desarrollo. En ese sentido, el FONDEPES como Institución Nacional Promotora del Desarrollo Pesquero a través de las actividades de construcción de Desembarcadero Pesquero Artesanal y la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, como ente normativo de la Pesca Artesanal Nacional, coadyuvan esfuerzos para encontrar una solución a la problemática identificada con la participación de diversas instituciones y gobiernos.

El Desarrollo del Expediente Técnico para la Construcción del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Acapulco responde a la necesidad de mejorar las condiciones físicas de los servicios, mediante la creación de una infraestructura en tierra y mar acorde con los lineamientos planteados en la Norma Sanitaria para actividades Pesqueras Artesanales y Acuícolas del D.S. N° 040 2001 – PE, generando valor agregado al producto hidrológico por cumplir con los estándares de calidad internacionales.

1.1 Antecedentes

El Desembarcadero Pesquero Artesanal de Acapulco contaba con una infraestructura en tierra que no había sido construida bajo los Criterios Normativos Sanitarios establecidos en la Norma Sanitaria para actividades Pesqueras Artesanales y Acuícolas D.S. N° 040 – 2001 – PE, debiendo ser demolida en su totalidad, tal como lo indica el PIP. El cerco perimétrico existente, era del tipo prefabricado de concreto, modelo "poste Tipo UNI", el cual se encontraba deteriorado. Contaba con un muelle con sistemas de defensas y rompeolas, que por el mal uso y la falta de mantenimiento deberán ser reemplazadas, así como también para los casos de los elementos arquitectónicos como: pescante, defensas, sardineles de madera, bitas de amarre, barandas metálicas, postes, etc. Dicho DPA cuenta con una vía de acceso de 6.00 metros de ancho y estaba constituida por material de préstamo afirmado. Asimismo, es necesario la intervención para la rehabilitación del enrocado existente. La intervención para la rehabilitación del enrocado existente, no está dentro del alcance del presente contrato.

1.2 Nombre de la Obra

**"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMARCADERO PESQUERO ARTESANAL
EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA
CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES".**

CONSORCIO ZORRITOS

[Firma manuscrita]

ING. RESERVADO DE OBRA

Ing. Reservado de Obra



1.3 Ubicación


El Desembarcadero Pesquero Artesanal de Acapulco, se encuentra ubicado en el KM. 1,233 de la Carretera Panamericana Norte.

Localidad de Acapulco.

Distrito de Zorritos.

Provincia de Contralmirante Villa.


Región Tumbes.

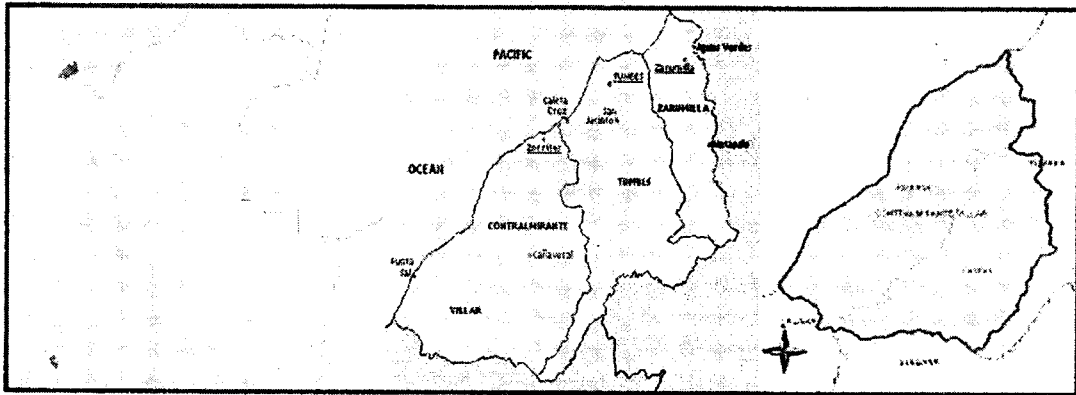

CONSORCIO ZORRITOS
[Handwritten Signature]
D. GARCÍA FERNANDO REGALADO OBITAS
[Handwritten Initials]

1.4 Datos Generales de la obra

Ciente	: FONDEPES
Número del Contrato	: N° 054 – 2017 – FONDEPES
Sistema de Contratación	: Precios Unitarios
Tipo	: LP-SM-5-2017-FONDEPES-1
Contratista	: CONSORCIO ZORRITOS
Supervisión	: Consorcio Supervisor Tumbes
Monto del Valor Referencial	: S/. 15'226,434.46 incluido IGV
Monto del Contrato	: S/. 15'226,434.46 incluido IGV
Plazo de ejecución de la Obra	: 300 días Calendario
Fecha de Firma del Contrato	: 12 de Diciembre del 2017.
Fecha de entrega de terreno	: 14 de Diciembre del 2017.
Fecha de inicio de Plazo contractual	: 28 de Diciembre del 2017.
Fecha de Término de obra	: 23 de Octubre del 2018.
Fecha de Término de Obra con A.P.P. N° 01	: 17 de Noviembre del 2018.
Fecha de Término de Obra con A.P.P. N° 02	: 14 de Diciembre del 2018.
Fecha de Término de Obra con A.P.P. N° 03	: 15 de Enero del 2019.
Fecha de Término de Obra con A.P.P. N° 04	: 30 de Marzo del 2019.
Fecha de Término de Obra con A.P.P. N° 05	: 27 de Abril del 2019.
Fecha de Término de Obra con A.P.P. N°06	:30 de Junio 2019.
Fecha de Término de Obra con S.A.P. N° 07	: En trámite
Forma de Pago	: Valorizaciones Mensuales
Adelanto para Materiales N° 01	: 7.42 % del Monto del Contrato
Adelanto para Materiales N° 02	: 1.94 % del Monto del Contrato
Representante Legal	: Sr. Roberto Alvarado Loyola
Residente de Obra	: Ing. Edgar Fernando Regalado Oblitas
Fecha del Adelanto Directo	: 27 de Diciembre del 2017
Monto del Adelanto Directo	: S/. 1' 130,000.00 incluido IGV
Fecha del 2do Adelanto para Materiales	: 22 de Agosto del 2018
Monto del 2do Adelanto para Materiales	: S/. 296,000.00 incluido IGV

CONSORCIO ZORRITOS

EDGAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
Residente de Obra

Ampliación de Plazo Parcial N° 01	: 25 días calendario
Fecha de Aprobación de la A.P.P. N° 01 (Resolución de Secretaría General N° 070-2018-FONDEPES)	: 25 de Abril 2018
Ampliación de Plazo Parcial N° 02	: 27 días calendario
Fecha de Aprobación de la A.P.P. N° 02 (Resolución de Secretaría General N° 086-2018-FONDEPES)	: 24 de Mayo 2018
Ampliación de Plazo Parcial N° 03	: 32 días calendario
Fecha de Aprobación de la A.P.P. N° 03 (Resolución de Gerencia General N° 212-2018-FONDEPES)	: 29 de Noviembre 2018
Ampliación de Plazo Parcial N° 04	: 74 días calendario
Fecha de Aprobación de la A.P.P. N° 04 (Resolución de Gerencia General N° 006-2019-FONDEPES)	: 11 de Enero 2019
Ampliación de Plazo Parcial N° 05	: 28 días calendario
Fecha de Aprobación de la A.P.P. N° 05 (Resolución de Gerencia General N° 070-2019-FONDEPES)	: 12 de Abril 2019
Ampliación de Plazo Parcial N° 06	: 64 días calendario
Fecha de Aprobación de la A.P.P. N° 06 (Resolución de Gerencia General N° 095-2019-FONDEPES/GG)	: 22 de Mayo 2019

2 ESTADO DE LA OBRA

2.1 CONTROL DE AVANCE DE OBRA

ESTRUCTURAS

2.1.1 Movimiento de tierras (01.05)

2.1.1.1 Excavación de estructura para cimentación (01.05.01)

Excavaciones en las estructuras para los cimientos del PTAR, se realizó el corte con maquinaria hasta llegar a los niveles del fondo de cimentación, bajo el nivel freático, controlados por topografía en obra.



CONSORCIO ZORRITOS
[Handwritten signature]
DGOB. FERNANDO REGALADO OBITAS
Jefe Responsable de Obra

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 20 – JULIO 2019



2.1.1.2 Afirmado H=0.15 (01.05.06)


Relleno con afirmado en los pisos de equipos de frio, se realizó la colocación del afirmado por debajo de los pisos donde irán la colocación de los equipos de frio en el edificio de Frio en el cual irán colocado en dos capas de 0.15m, y realizando las pruebas de compactación en ambas capas de colocación de afirmado.



Colocación y compactación de afirmado en los pisos de los equipos de frio – Edificio de Frio

2.1.1.3 Afirmado H=0.30 (01.05.07)

Relleno con afirmado en el patio de maniobras, se realizó la colocación del afirmado en el patio de maniobras colocando en dos capas de 0.15m, y realizando las pruebas de compactación en ambas capas de colocación de afirmado.

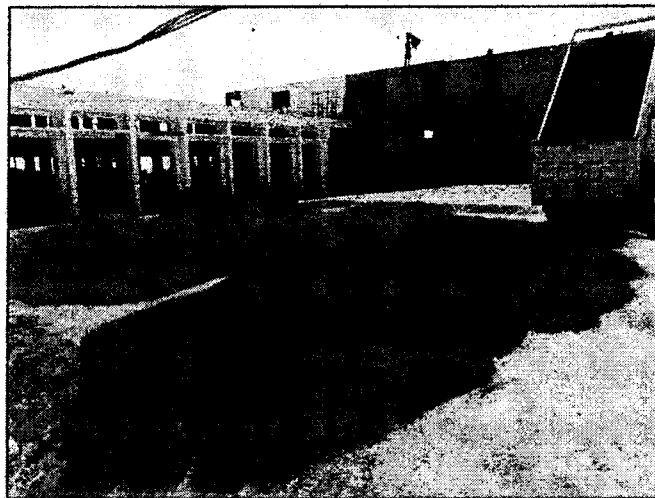


Colocación de afirmado para el Patio de Maniobras

CONSORCIO ZORRITOS
Edgar Galado Obrita
EDGAR FERNANDEZ GALADO OBLITA
Ing. Responsable de Obra

2.1.1.4 Zapatas, concreto $f_c=315\text{kg/cm}^2$ (01.07.01)**2.1.1.5 Zapatas, encofrado y desencofrado normal (01.07.01.02)****2.1.1.6 Zapatas, acero $f_y=4200\text{kg/cm}^2$**

La construcción de las zapatas (C°, E°, A°) corresponden a los trabajos en el PTAR. Se ha comenzado con el enmallado de los refuerzos de acero tal y como se indican en los planos respetando los recubrimientos, para seguir con el encofrado de las zapatas, con las dimensiones indicadas en los planos, para culminar con el vaciado de concreto según la resistencia que indicada en las especificaciones

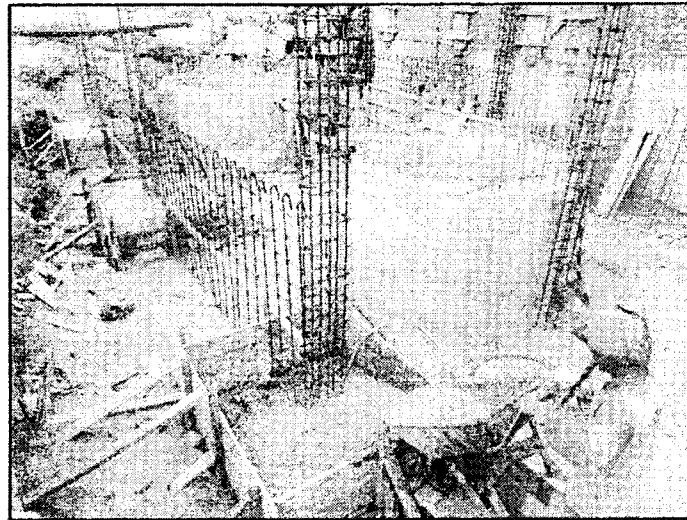

Vacado de las zapatas del PTAR

2.1.1.7 Sobrecimiento armado, concreto $f_c=315\text{kg/cm}^2$ (01.07.02.01)**2.1.1.8 Sobrecimiento armado, encofrado y desencofrado (01.07.02.02)****2.1.1.9 Sobrecimiento armado, acero $F_y=420\text{kg/cm}^2$ (01.07.01.03)**

La construcción de las mesas (C°, E°, A°) corresponden a los trabajos de las mesas de Tareas previas, cuya altura fue modificada por la Entidad. Se procede a al armado del enmallado de los refuerzos de acero tal y como se indican en los planos respetando los recubrimientos, a continuación se procede al encofrado de las mesas, respetando las dimensiones indicadas, según la modificación efectuada, por los funcionarios de Fondepes, a los planos del proyecto inicial, para, finalmente, culminar con el vaciado de concreto según la resistencia que indique en las especificaciones

CONSORCIO ZORRITOS
[Handwritten Signature]
EDGAR FERNANDEZ GRACIANO OBINA
de Residente de Obra




Vaceado de las mesas de concreto

2.1.1.10 Columnas, concreto $f_c=315\text{kg/cm}^2$ (01.07.03.01)

2.1.1.11 Columnas, encofrado y desencofrado (01.07.03.02)

2.1.1.12 Columnas, Acero $F_y=4200\text{kg/cm}^2$ (01.07.03.03)

La construcción de las columnas (C°, E°, A°) corresponden a los trabajos de las columnas en el PTAR, así como las columnetas construidas en los diferentes edificios dentro del DPA. Dichos trabajos se inician con el enmallado de los refuerzos de acero, sobre el solado previo, tal y como se indican en los planos, respetando los recubrimientos, a continuación, se procede con el encofrado de las columnas, en concordancia con las dimensiones indicadas en los planos, para culminar con el vaceado de concreto según la resistencia que indique en las especificaciones, y el posterior desencofrado de los elementos.

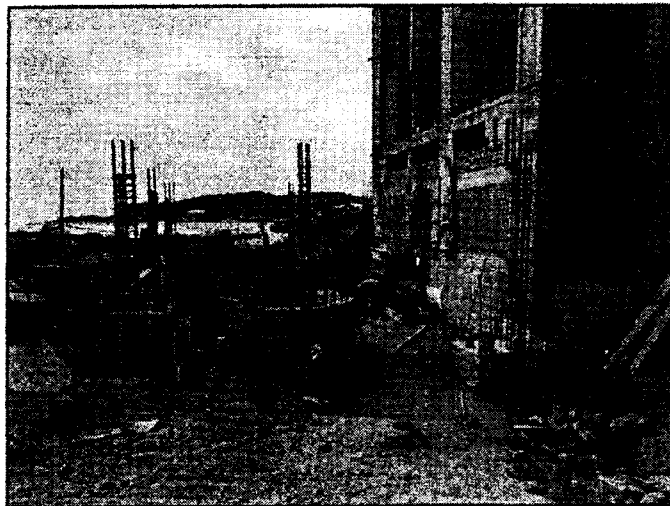

CONSORCIO ZORRITOS
[Signature]
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS
ING. ROBERTO DE OÑA



02 ARQUITECTURA


02.01 Muros y tabiques de albañilería

02.01.01 Muro de ladrillo tipo IV de cabeza

02.01.02 Muro de ladrillo tipo IV de sogá

Antes de comenzar el asentado de ladrillo se dieron las especificaciones técnicas para el mortero será del tipo PI y estará constituido por cemento, arena y agua en una proporción de una parte de cemento por cuatro de arena, con agua suficiente para darle la trabajabilidad necesaria sin que la mezcla segregue, y que no se aplaste con el peso de las hiladas superiores. El mortero debe ser trabajable, retentivo y fluido para ser adhesivo. La trabajabilidad del mortero debe conservarse durante el proceso de asentado.

Así mismo el ladrillo Serán del tipo IV de arcilla hecho a máquina que cumplan con la norma E-70 de albañilería. Los ladrillos serán de tierra arcillosa seleccionada, arena y agua debidamente dosificadas y mezcladas para luego pasar por los procesos de moldeado, secado y cocido al fuego.

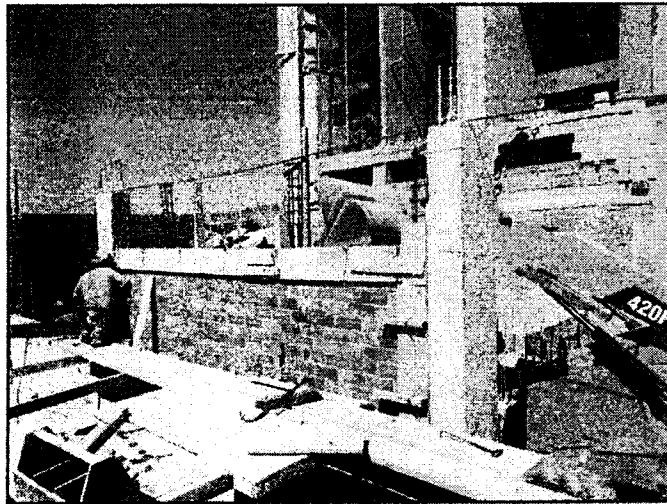

Colocación de ladrillo tipo IV sogá en muros del PTAR

02.02 Revoques, enlucidos y molduras

02.02.01 Tarrajeo en muros exteriores y cerco perimétrico

02.02.06 Tarrajeo en muros interiores con impermeabilizante

02.02.08 Tarrajeo de vigas con impermeabilizante

Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero, pero aplicada en dos etapas. En la primera llamada "pañeteo" se proyecta simplemente el mortero sobre el paramento, ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa para obtener una superficie plana y acabada. Se dejará la superficie lista para aplicar la pintura. Previamente a la ejecución de los pañeteos o tarrajeos, deberán instalarse las redes, cajas para interruptores, toma corrientes, pasos y tableros; las válvulas, los insertos para sostener tuberías y equipos especiales y cualquier otro elemento que deba quedar empotrada en la albañilería.


CONSORCIO ZORRITOS
[Firma]
ING. FERNANDO REGALADO BUSTAS
UNO Representante de OIRP



Los encuentros de muros, deben ser en ángulo perfectamente perfilados; las aristas de los derrames expuestos a impactos serán convenientemente boleados; los encuentros de muros con el cielo raso terminarán en ángulo recto, salvo que en planos se indique lo contrario.



Tarrajeo en columnas circulares en Tareas Previas

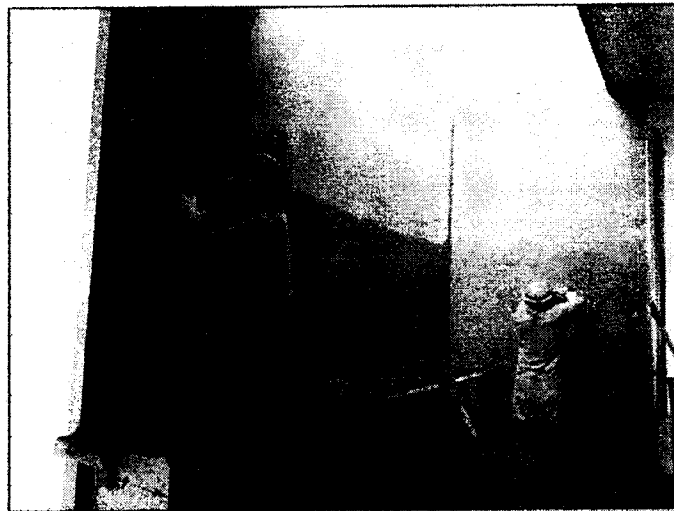

Tarrajeo en muros interiores de Desinfección, maniluvios

02.04 Pisos, pavimentos y acabados

02.04.01 Acabado de cemento pulido antideslizante con Impermeabilizante en pisos e=2" de concreto 1:5

Comprende todos aquellos ambientes que como nivel de piso terminado tiene este tipo de acabado, que consistirá en una sola capa de concreto, el cual se ira vaciando en las áreas indicadas y con una regla se ira controlando los acabados a un mismo nivel, niveles dejado por el topógrafo de obra, así como también se ira puliendo con cemento todo el ambiente del piso, Previamente a la ejecución se realizara una limpieza al área, sacando




las rebabas en los pisos, para después mojar todo el ambiente donde se realizará el vaceado.



Vaceado del cemento pulido en Control de calidad-Desinfección

02.04.10 Piso de porcelanato 0.60x0.60m antideslizante alto trafico

Comprende todos aquellos ambientes en el que el plano indique como piso terminado la colocación del enchape con porcelanato, que consistirá en la colocación del pegamento en conjunto con el porcelanato en todos los ambientes idnicados en los planos, para finalmente colocar la fragua.

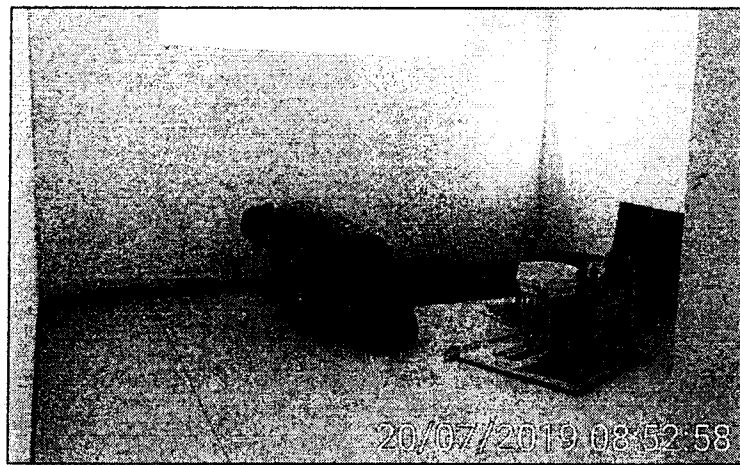

Colocación del porcelanato en los baños de Desinfección

- 02.11.01 Pintura en muros exteriores y cerco perimétrico**
- 02.11.02 Pintura en muros interiores**
- 02.11.03 Pintura en columnas**
- 02.11.04 Pintura en vigas**
- 02.11.06 Pintura en cielo razo**

CONSORCIO ZORRITOS
[Signature]
 D. GALFERRANDO REGALADO OBITAS
 Jefe Responsable de Obra




**CONSORCIO
ZORRITOS**


**OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMPARCADERO PESQUERO ARTESANAL
EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE
VILLAR, REGIÓN TUMBES"**

Comprende en la colocación de la pintura en latex, previamente aplicando el imprimante (base) a los muros, columnas, vigas, derrames y cielo raso, de las estructuras de los edificios del DPA.

Se realizará, en primer lugar, el lijado a toda la superficie para quitar todas la asperezas y rugosidades que se encuentren en dichas zonas, posteriormente se continuará con la colocación del imprimante a todas las superficies que hayan sido lijadas y hayan sido aprobadas por la supervisión. Se colocará el imprimante en dos manos de pintura para tapar todos los poros que existen en las diferentes partes de los elementos que conforman la estructura. Posteriormente se colocará el sellador después del imprimante, para finalizar con la colocación de la pintura en latex en todas las zonas donde indique el expediente técnico del proyecto.

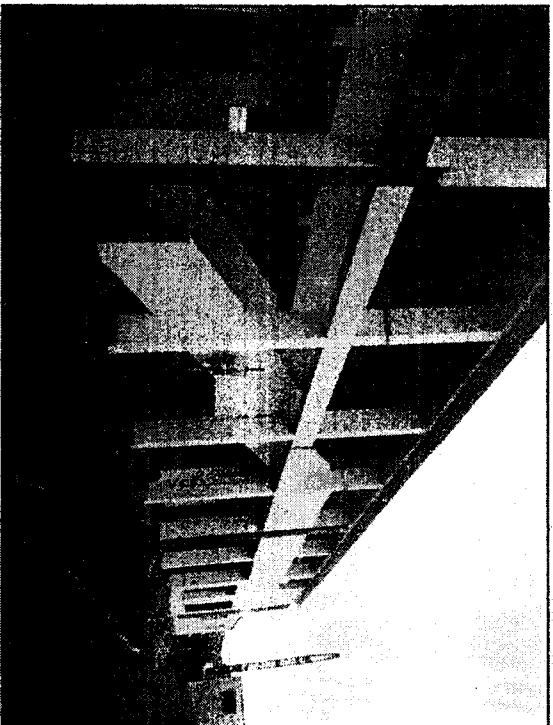

Pintura en exteriores del edificio de Administración

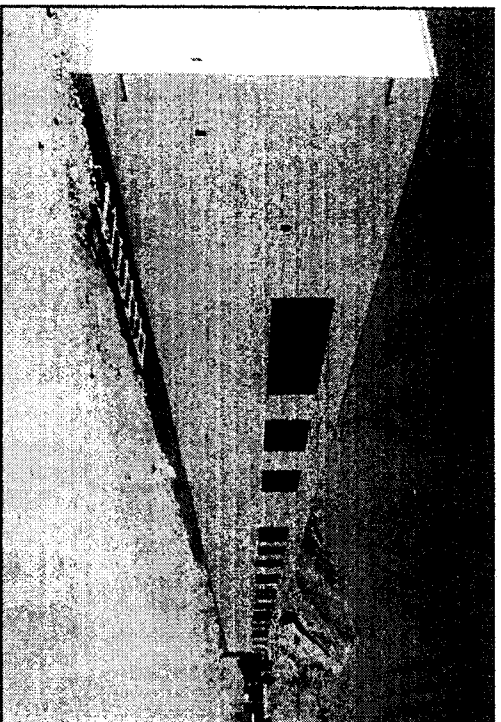

Pintura en exteriores del edificio de Desinfección

CONSORCIO ZORRITOS

[Handwritten signature]
Responsible for the work


05 OBRAS DE MAR.

05.04.04 Transporte de cabezal prefabricado

05.04.05 Colocación de cabezal prefabricado

05.05.04 Transporte y colocado de losa prefabricada

La colocación y el montaje de prefabricado se realizó después de haber retirado todo el material demolido, correspondiente a los elementos de la estructura en mal estado de conservación, esta colocación o montaje, se realiza mediante una grúa y maniobristas que logran poner en su lugar definitivo al elemento prefabricado, las losas prefabricadas se colocaran después de haberse colocado la viga y el cual le servirá como apoyo a la losa.

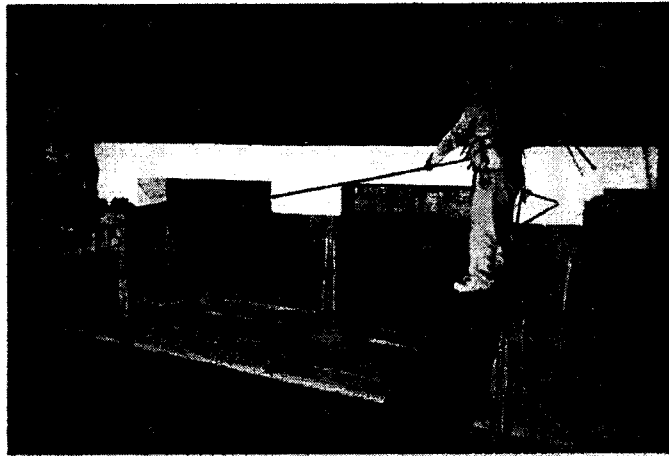

Transporte y montaje de las vigas y losas prefabricadas en el cabezo del nuevo muelle



Transporte y montaje de las losas prefabricadas y losas prefabricadas en el cabezo del nuevo muelle




05 OBRAS DE CONCRETO IN SITU

05.06.01 Vigas y núcleos $f'c=280 \text{ kg/cm}^2$ c/ impermeabilizante

05.04.05 Vigas y núcleo, encofrado y desencofrado in situ

05.05.04 Vigas y núcleo, acero $f'y=4200 \text{ kg/cm}^2$

El vaciado de los núcleos, se realizó en el cabezo del muelle. Para ejecutar dichos trabajos, previamente ha sido necesario la colocación o montaje de los prefabricados (vigas transversales y losas) en sus emplazamientos finales, para posteriormente comenzar a la colocación de la armadura de refuerzo y seguidamente la colocación de los encofrados colgantes, que soporten el concreto en los núcleos y finalmente se procede a ejecutar el vaciado del concreto in situ en el cabezo del muelle.

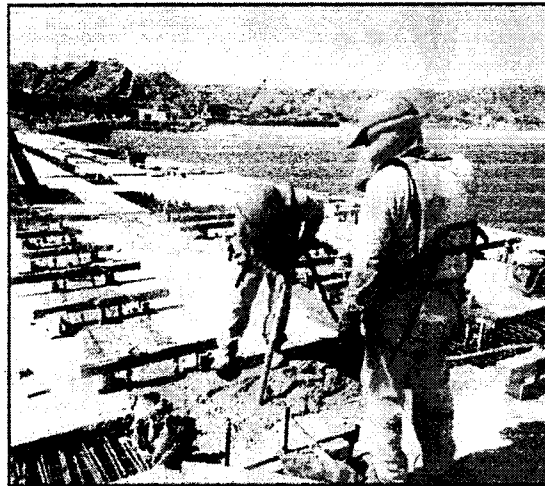

Vaceados in situ en los núcleos del cabezo del muelle



Colocación de la armadura de refuerzo y el encofrado en los núcleos del cabezo del muelle

CONSORCIO ZORRITOS
[Signature]
ING. FERNANDO J. MADRUGAL
D.C. Responsable de Obra

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS

2.1.3 Situación de la Obra

Las modificaciones al Área del PTAR y OSMOSIS INVERSA, han sido incluidas en la prestación Adicional N° 04 (Estructuras, Arquitectura complementarias), mediante resolución del 12 de diciembre 2018. La partida de falso piso, (estructuras y arquitecturas complementarias), de las Zonas de Administración y Desinfección, fueron incluidas en el adicional N°05, mediante Resolución 041 del 12 de marzo 2019.


Con respecto del PTAR, (Adicional N° 03 y Adicional N° 04), la Entidad responde nuestra consulta de los niveles de excavación de las cámaras mediante Carta N° 616-2019-Fondepes/Digenipaa del 27 de Junio 2019, adjuntando los planos concordados de los niveles del fondo de la Cámara de Bombeo de la línea de impulsión submarina, considerando el plano ER-48 (Adicional N° 04), concordado con dicha nueva profundidad; que es a partir de dicha entrega que ha sido posible programar y luego ejecutar las obras del PTAR, que actualmente nos encontramos ejecutando.

Por otro lado, continúa sin atender, por parte de la Entidad, las siguientes consultas:

Modificación de los pisos de los pasadizos y patio interior, en Administración, por veredas en vez de la losa armada considerada en el proyecto inicial, para cuya base específica, en vez de Afirmado de 0.15 en interiores del proyecto inicial, una capa de Afirmado de 0.30m en interiores y veredas, partida que no existe en nuestro presupuesto.

Se ha modificado, mediante los planos adjuntos en el Adicional de Obra N° 04, los espesores de los afirmados interiores, de 0.15 a 0.30m, de las zonas de Tareas Previas y de Frío, veredas interiores de Administración, por lo que aún estamos a la espera de que la Entidad proceda según lo señalado en el Art 34 de la Ley y 175 del Reglamento, respecto del AFIRMADO DE 0.30M EN INTERIORES, por tratarse de modificaciones al expediente inicial. Al respecto, debemos precisar que actualmente dichas zonas de Tareas Previas ya cuentan con la capa de AFIRMADO 0.15 EN INTERIORES, según lo indicado por el proyecto inicial y en el Área de Frío contamos con los rellenos con material propio a nivel de subrasante, considerando el nivel de 0.15m para el afirmado inicialmente especificado

La Entidad también ha considerado el cambio del tipo de pavimento de las áreas de Patio de Redes, Pasaje Exterior y Recepción de productos hidrobiológicos, de pavimento de concreto con drámix a pavimento de concreto armado, así como la disposición y los tipos de juntas de dichos pavimentos, según lo comunicado con Informe N° 130 y ratificado mediante Carta N° 228 del 22 de Febrero 2019, en consecuencia, toda vez que se ha evidenciado la necesidad de dichas modificaciones, corresponde a la Entidad proceder conforme lo señalado en el Artículo 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y del Artículo N° 174 de su Reglamento.

CONSORCIO ZORRITOS

ING. FERNANDO REALADO OBLITAS
del Ramo de O.M.

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 20 – JULIO 2019

Del emisor submarino, aún están pendientes las obras de protección en la zona de playa. Conforme lo manifestamos en nuestro Asiento N° 608, referida a la Carta 449-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, del 27 de abril 2019. También consideramos oportuno mencionar que aún se encuentra pendiente de aprobación, para hacer posible la ejecución de los trabajos de desenrocado, enrocado, excavación, funda de HDPE, relleno compactado, etc, que la Entidad cumpla con lo estipulado en el Artículo 34 de la Ley y Artículo 175 del reglamento, considerando que la necesidad de su ejecución ha quedado evidenciada por la modificación realizada por Fondepes, en el tramo del emisor bajo el enrocado.

También en dicho asiento, referida a la carta en mención, señalamos que, si bien mediante dicha Carta N° 449-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, proceden a la modificación del difusor del emisor, sin adjuntar detalle ni información al respecto, lo cual hemos solicitado nos hagan llegar.

Existen otras consultas como el referido a la ubicación de la puerta en la zona de Tareas Previas, las canaletas de aguas lluvia de la zona de Tareas previas, y otras.

A continuación resumimos las consultas pendiente de atender a la fecha:

- Modificación de los pisos de los pasajes y patio del interior de Administración, la misma que consiste en reemplazar la losa de concreto armado por el piso tipo 1 (Vereda), incluye también el cambio del afirmado de 0.15m por otro de 0.30m, en interiores, siendo que la partida de AFIRMADO DE 0.30M EN INTERIORES Y VEREDAS no existe en nuestro expediente, constituye una nueva partida. Modificaciones que han sido determinadas por la misma Entidad.
- Modificación de los afirmados de las losas de Tareas Previas y de Frío; también se han reemplazado los afirmados de 0.15m por otros de 0.30m. Como ya lo hemos indicado antes, dicha partida de AFIMADO DE H=0.30M EN INTERIORES Y VEREDAS no existe. Para el caso de Tareas Previas, además debe considerarse que en ya cuenta con el afirmado de 15 compactado y con el 40% de las instalaciones a nivel del dicho afirmado, ejecutadas.
- Modificación de los pavimentos y de las juntas, de los Patios de Redes, Pasadizo exterior y de Desembarque de productos hidrobiológicos, cambiando de concreto de alta resistencia a concreto armado, por lo tanto, corresponde el deductivo de la partida de concreto con drámix y el adicional de las partidas involucradas en dicho cambio.
- No se entregan los detalles de sardineles en patio de maniobras, ni la compatibilización, en dicho patio, entre el sardinel y la uña modificada de la vereda.

CONSORCIO ZORRITOS
[Firma manuscrita]
ING. FERNANDO GALADO OBLITAS
Responsable de Obra

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 20 – JULIO 2019

- Reiteramos, con respecto a la Carta N° 712-2019-FONDEPES/DIGENIPA, referidos al plano EC-01 y las juntas, favor analizar las observaciones que antes hemos vertido en nuestro Informe CZOAN°047-2019/ACAPULCO.

Entre los trabajos realizados, tenemos los siguientes:

En el edificio de Administración en la subestación, dormitorio de vigilancia y baño de vigilancia se realizó el vaceado del falso piso, además se comenzó con la colocación de porcelanato en los ambientes de tesorería y administración en conjunto con su contrazocalo cerámico.

En el Área de Desinfección se realizó el vaceado de los falso piso así como los tarrajes de los muros interiores en la zona de maniluvios, además del cemento pulido en el lavadero del maniluvio, Por otro lado se comenzó con la colocación del porcelanato, y los zocalos en los baños de mujeres y hombres así como en las duchas, además se continua con la colocación de imprimante en los ambientes interiores así como en las zonas externas al edificio.

En el área de Tareas Previas se culminó con el tarrajeo de las columnas circulares y los muros interiores y se inició con la colocación del imprimante (base) en la fachada del lado Oeste.

En el área de frio se comenzó con el tarrajeo en los muros levantados en los deflectores, así como se relleno una capa de 15cm de afirmado en el interior de frio en los ambientes donde iran la colocación de los equipos de frio.


En las especialidades de Instalaciones Eléctricas se realizaron los ductos de concreto, así como la colocación de la tubería de eléctricas que conectan los ductos eléctricos con los pases a los tableros eléctricos.

En la especialidad de Instalaciones Sanitarias, se realizó la colocación de tuberías de 6" de diámetro (montantes) para el drenaje pluvial en los diferentes puntos que indica en el proyecto, así como las tuberías que conectan las bajadas de los drenajes a los buzones de drenaje.

En los trabajos del PTAR, se continúa con la construcción en conjunto las columnas, columnetas (C°, E°, A°), el levantamiento de los muros de sogá. Así mismo se realizó el relleno con material propio debajo de los pisos a los niveles indicados en el plano, en dicho trabajo ha sido necesario el empleo de una retroexcavadora, de manera continua.

En el área correspondiente a Obras de Mar, se continuó con la colocación de los prefabricados (losas y vigas) en el nuevo muelle, para seguir con los trabajos de los vaceados in situ en el cabezo del muelle. Posteriormente se continuó con los vaceados de las losas longitudinales y transversales del nuevo muelle.

Reiteramos la necesidad de que la Entidad cumpla con el debido proceso, para las partidas de los pisos, afirmado interior de 0.30, juntas de patios, concreto armados, etc.


CONSORCIO ZORRITOS
OSCAR FERNANDO AGUADO OBITAS
Instituto Registral y Catastral

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 20 -- JULIO 2019

Con fecha 10 de Julio 2019, hemos presentado nuestro expediente de Solicitud de Ampliación N° 07, referida a las modificaciones de los pisos del DPA, la cual, a la fecha, se encuentra dentro del periodo de revisión de la Entidad.

2.1.4 Control del Avance de Obra

Avance Físico de Obra por Formulas Polinómicas: Presupuesto Contractual

Según el Presupuesto y Cronograma de Obra, contempla seis (06) Sub Presupuestos (Fórmulas Polinómicas) Contractuales, cuyo estado situacional y avance al Mes de Julio del 2019, se detalla a continuación:


N°	Descripción	% Avance Prog		% Avance Real.	
		del mes	Acum.	del mes	Acum.
	Etapa de Ejecución de Obra	0.00 %	100.00 %	1.88%	62.95 %
1	FORMULA N° 01: ESTRUCTURAS	0.00%	100.00 %	2.66 %	86.99 %
2	FORMULA N° 02: ARQUITECTURA	0.00 %	100.00 %	1.88 %	40.94 %
3	FORMULA N° 03: INSTALACIONES SANITARIAS	0.00 %	100.00 %	0.41 %	35.95 %
4	FORMULA N° 04: INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00%	100.00 %	2.50%	20.92%
5	FORMULA N° 05: OBRAS EN MAR	0.00 %	100.00 %	1.89%	59.61 %
6	FORMULA N° 06: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	0.00 %	100.00 %	0.00 %	55.84 %

2.1.5 Situación Actual de Avance de Obra

Presupuesto Contractual

Como se puede observar en el cuadro, la Obra se encuentra **ATRASADA**, sin embargo, las causas no son atribuibles al contratista, conforme lo explicamos en el ítem 2.2.3 del presente informe.

PERIODO	PERIODO MENSUAL	AVANCE PROGRAMADO		AVANCE EJECUTADO	
		AVANCE PROGRAMADO MENSUAL	AVANCE ACUMULADO MENSUAL	AVANCE EJECUTADO MENSUAL	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
Julio	01-07-19 al 31-07-19	0.00%	100.00%	1.88%	62.95%


CONSORCIO ZORRITOS
 EDGARDO FERNANDO URTEGALADO OBLITAS
 Ing. Residente de Obra

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 20 – JULIO 2019

2.1.6 Plan de Trabajo

Para el mes de Agosto, en el área de Desinfección se culminará con la colocación de imprimante(base) en los ambientes internos faltantes así como en las zonas externas, además se culminará con la colocación del enchape de porcelanatos en todas las áreas donde indica el proyecto tanto como en los pisos y en los zócalos, se realizará el vaceado de la canaleta que se encuentra en el ambiente de residuos hidrobiológicos en conjunto con el falso piso, y posteriormente se realizara el vaceado del piso pulido, a continuación se continuará con los trabajos de la carpintería metálica, la carpintería de madera y estructuras metálicas.

En el área de Tareas previas, continuamos a la espera de que la Entidad culmine con el debido proceso respecto de los cambios que viene realizando en los pisos y afirmados interiores, a fin de proseguir con los trabajos de los pisos de concreto armado; ya que actualmente dicha área ya cuenta con el afirmado de 0.15m y con un avance ejecutado del 40% de las instalaciones. Se continuara con el tarrajeo exterior en la zona Este, además se continuará con la colocación del imprimante en los muros interiores y posteriormente con la colocación de la carpintería metálica.


En los trabajos en el área de Frío también nos encontramos a la espera de que la Entidad culmine con el debido proceso de los cambios que viene realizando en los pisos; continuaremos con la construcción de los pisos en las cámaras de frio, además se culminara con el tarrajeo en las zonas exteriores, también se comenzará con la colocación de afirmado en todo el piso tal y como indica en los planos para continuar con el vaceado de los pisos armados, luego de que la Entidad apruebe los cambios mediante el adicional correspondientes.

En el área de Administración, estamos programando el vaceado de las veredas así como la continuación de los enchapes de porcelanato en los pisos y lel enchape de los zócalos en las zonas donde se indique en los planos, también se realizará el acabado de cemento pulido en los ambientes de cuartos, caseta y baño de vigilancia, así como en la subestación. Procederemos a la colocación de la carpintería metálica y la carpintería de madera.

En el patio de redes se comenzará con la excavación para la colocación del biodigestor en conjunto con su caja de lodos y su cámara de bombeo, tal como indican as especificaciones técnicas.

En el cerco perimétrico se programa continuar con los trabajos, en la zona comprendida entre Administración y el patio de desembarque de productos hidrobiológicos, respetando las dimensiones de los cimientos, sobrecimientos y alturas de los muros y las columnas, tal y como indiquen los planos y las especificaciones técnicas.

Para el presente mes, también se está considerando realizar los trabajos de las instalaciones eléctricas, colocación de tuberías, así como las instalaciones sanitarias red de canaletas en todo el patio de maniobras, para continuar con el vaceado con dramix en todo el Patio de Maniobras. Señalamos que desde el punto de vista de


CONSORCIO ZORRITOS
SEGA VERININOTUCALADOORLITAS
Iny Resolvente de Odra

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 20 – JULIO 2019

proceso constructivo, el hecho de no contar con los pisos armados de tareas previas y de frío, constituye una restricción para la ejecución de las partidas en mención

Para los trabajos de Obras de Mar, se continuará con los vaceados in situ de las juntas longitudinales y transversales del cabezo, y se dará inicio a los hincados de los rieles metálicos para las defensas del muelle.

Para el cumplimiento de las partidas proyectadas para el mes de Agosto, se contará con el siguiente personal:

Cuadrilla de albañiles 10 trabajadores

Cuadrilla de fierro 06 trabajadores

Cuadrilla de carpinteros 04 trabajadores

Cuadrilla de vaciado de concreto y apoyo en general 15 trabajadores.

Cuadrilla de instalaciones sanitarias y eléctricas 03 trabajadores

Cuadrilla de vaciado de pavimentos 10 trabajadores

Con respecto a los materiales de más incidencia, la programación semanal de cemento se tiene planificado la llegada de 800 bolsas de cemento semanal, hasta que se defina, por parte de la entidad, los cambios en los pisos. Los agregados son atendidos a obra he ingresan a diariamente sin inconvenientes.


Se cuenta a disposición de la obra de una retro excavadora permanente para atender las necesidades tales como la planta de concreto, acarreo de los materiales y rellenos con material propio.

Los montajes se ejecutan con una grúa Link Belt, sobre camión, de 35 Tn, con castillo o pluma de celosía de 21 metros de longitud.

Entre la documentación relevante, mencionamos la siguiente:

En el mes de Junio, con carta CZ – 023-2018/ACAPULCO se presentó a la Entidad, el estado situacional del Acta de Acuerdos suscrita el 24/05/2018, por funcionarios y especialistas de la Entidad, la Supervisión y el Contratista; mediante la cual, Fondepes se compromete a responder las consultas no absueltas y que permanecen pendientes, en proceso de entrega de la aprobación y la autorizaciones del Expediente Técnico y ejecución, respectivamente, ya que se viene causando atrasos en la programación de obra, además se viene registrando en Cuaderno de Obra cada actividad y partida afectada.

Mediante Carta CST.175501.084.18 el Supervisor informa que Fondepes aprueba el Calendario de Obra Actualizado, Cronograma PERT – CPM y demás documentos de control de obra conforme a la Ampliación de plazo N° 02. Fondepes mediante carta N° 638 2018-fondepes-DIGENIPAA con fecha 11-06-2018 informa a la supervisión.



CONSORCIO ZORRITOS
DISTRITO DE ZORRITOS
PROVINCIA CONTRALMIRANTE
REGION TUMBES

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 20 – JULIO 2019

Mediante Carta N° 752-2018-FONDEPES/DIGENIPAA, del 16 de Julio, la Entidad nos hace llegar los Informes N° 025, 020, 043 y 070, e indican, con ello, dar respuesta a las observaciones generadas en la ejecución de la obra.

Mediante Carta CZ 28-2018/ACAPULCO, informamos, en resumen, que el Informe N° 25 no responde a las consultas solicitadas; mediante el Informe N° 20 consideran nuevos tableros y considera malla de puesta a tierra y solicitamos ratificar o rectificar la potencia del grupo electrógeno; mediante el Informe N° 043, nos indican detalles de canaletas exteriores y mediante el Informe N° 070 nos hacen llegar el Plano EC-01/01 ESTRUCTURA SUB ESTACION: DETALLES DE CANALETA.

Mediante Carta N° 779-2018-FONDEPES/DIGENIPAA, del 24 de Julio, la Entidad nos hace llegar los Informes y planos conteniendo la nueva disposición de las cisternas y la separación y detalle de la cimentación del área de Desinfección, de la cisterna.

Mediante Carta N° 831-2018-FONDEPES/DIGENIPAA, del 06 de Agosto, la Entidad nos hace llegar documento en el cual indica los pendientes de respuesta, las HIEE y IISS se encuentran en proceso de desarrollo la elaboración de las modificaciones; Sobre la reparación de pilotes el especialista estructural presento una propuesta sobre la dimensión del en camisetado y el acero de refuerzo, sin embargo quedó pendiente el replanteo del detalle del acero de refuerzo y la actualización del nuevo procedimiento (encamisetado) de reforzamiento de los pilotes existentes.


Mediante Carta CZOA 083-2018/ACAPULCO, del 10 de Agosto 2018, adjuntamos nuestro RFI N° 029-CZOA, solicitando plano de detalle de la estructura de la Planta de Tratamiento.

Mediante Carta CZOA 089-2018/ACAPULCO, del 07 de Setiembre 2018, adjuntamos nuestro RFI N° 030-CZOA, solicitando, tener a bien, definir los pisos con sus cortes de detalle correspondientes, referidos a la obra del DPA Acapulco.

Mediante Carta CZOA 092-2018/ACAPULCO, del 15 de Setiembre 2018, adjuntamos nuestro Informe N° 005-CZO-ACAP/IE/REMT, conteniendo observaciones y recomendaciones al expediente que contiene modificaciones de la especialidad de IISS, recibida adjunto a Carta N° 937-2018-FONDEPES/DIGENIPAA e Informe N° 072-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AEP/YDVN.

Mediante Resolución Jefatural N° 130-2018-FONDEPES/J, de fecha 25 de octubre 2018, la Entidad aprueba el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 02, referido al nuevo procedimiento de reparación de pilotes, así como el Deductivo vinculante N° 01.

Mediante Resolución Jefatural N° 151-2018-FONDEPES/J, de fecha 5 de diciembre 2018, la Entidad aprueba el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 03, referido a las instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, así como el Deductivo vinculante de Obra N° 02.


CONSORCIO ZORRITOS
Rafael Aguilar
Ingeniero Civil
Ingeniero de Obras

Mediante Resolución de Secretaría General N° 212-2018-FONDEPES/GG, la Entidad aprueba el calendario de obra valorizado actualizado con la Ampliación de Plazo N° 03.

Mediante Resolución de Gerencia General N°006-2019-FONDEPES/GG de fecha 11 de enero 2019, la Entidad aprueba nuestra solicitud de Ampliación de Plazo N°04, por 74 días calendario, cuya nueva fecha de término de obra es el 30 de marzo 2019.

Con Carta N°115-119-FONDEPES/DIGENIPAA, del 29 de Enero 2019, la Entidad aprueba los calendarios vigentes de obra, actualizados a la Ampliación N° 04.

Con Carta N° 1184-2018-FONDEPES/DIGENIPAA de octubre 2018, la Entidad adjunta el Informe 130, considerando cambios en los pisos y en los pavimentos de las áreas de Patio de Redes, Pasaje Exterior y de Recepción de Productos Hidrobiológicos.

Ante consulta de nuestro Consorcio, la Entidad, mediante Carta N° 228-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, del 22 de febrero 2019, ratifica los cambios de los pavimentos antes señalados, por lo cual queda evidenciada la necesidad de un adicional de obra y en consecuencia deberá proceder conforme a lo contemplado en el Artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 175 de su Reglamento.

Con Carta CZ 008-2019/ACAPULCO, del 25 de febrero 2019, hemos reiterado a la Entidad, nuestra consulta y requerimiento de los detalles de los pisos, que inicialmente solicitamos con Carta CZO 089-2018/ACAPULCO del 07 de Setiembre 2019.


Mediante Carta CZ 009-2019/ACAPULCO, del 26 de febrero 2019, complementamos nuestra carta antes mencionada, adjuntando una ayuda memoria que mencionamos adjuntar en el numeral 4 de la mencionada Carta CZ 008-2019/ACAPULCO.

Mediante Carta CZ-017-2019/ACAPULCO, del 22 de marzo 2019, presentamos consultas y observaciones a la Prestación Adicional 05, aprobada mediante resolución N° 041-2019-FONDEPES/J del 12/03/19, y reiteramos la necesidad del cumplimiento del debido proceso, estipulado en el Art 34 d la Ley y el Art 175, para las modificaciones planteadas en dicho documento

Mediante Carta CZ 018-2019/ACAPULCO, del 26 de marzo 2019, adjuntamos a la Supervisión de Obra, nuestro expediente que sustenta y cuantifica nuestra solicitud de Ampliación de Plazo N° 05, relacionado a la Prestación Adicional N° 05.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 070-2019-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 12 de abril 2019, la Entidad aprueba la Ampliación de Plazo N° 05 por 28 días calendario, con nueva fecha de término de obra el 27 de abril 2019.

Mediante Asiento N° 601 del 23 de abril 2019, hemos solicitado ampliación de plazo de obra N° 06 (parcial), referido a los cambios que la Entidad ha considerado realizar, en los planos señalados en el Adicional de Obra N° 05, referido los pisos y pavimentos.


CONSORCIO ZORRITOS
SIGAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
114 Responsable de Obra

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 20 - JULIO 2019

Mediante Resolución de Gerencia General N° 095-2019-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 29 de Mayo 2019, la Entidad aprueba la Ampliación de Plazo N° 06 por 64 días calendario, con nueva fecha de término de obra el 30 de junio 2019.

Con fecha 10 de Julio 2019, presentamos a la supervisión de obra, nuestro expediente de solicitud de ampliación parcial N° 07, referida a las modificaciones en los pisos del primer nivel del DPA Acapulco; dicho documento, a la fecha, se encuentra en proceso de evaluación por parte de la Entidad.

2.1.7 Síntesis General y Descripción del Estado Actual de la Obra

La ejecución de la obra contractual actualmente tiene un porcentaje de avance acumulado real de 62.95 % versus un avance acumulado programado de 100.00 %, por lo tanto, la obra se encuentra **ATRASADA**. Es decir el monto de la valorización acumulada ejecutada es el 62.95 % del monto de la valorización programada acumulada, sin embargo, las causales no son atribuibles al contratista.

2.1.8 Resultados de la Inspección y Control de Calidad del trabajo realizado por el Contratista

Control de calidad de materiales de construcción:

Control de Calidad del agua

El agua que se viene utilizando en obra es el agua potable de la red pública. La norma ITINTEC 339,088 considera para el amasado y/o curado de concretos y morteros, el agua cuyas propiedades y contenido en sustancias disueltas estén comprendidas dentro de los límites siguientes:

El contenido máximo de materia expresada en oxígeno consumido, será de 3 mg/1 (3 ppm).


El contenido de residuo sólido no será mayor de 5g/1 5000 ppm.

El PH estará comprendido entre 5,5 y 8.

El contenido de sulfatos, expresado en ion SO4 será menor de (600 ppm).

El contenido de cloruros, expresados en ion C1 menor de 1g/1 (1000 ppm).

El contenido opcional de carbonatos y bicarbonatos alcalinos (alcalinidad total) expresada en Na HCO2 será menor de 1 g/1 (1000 ppm).


CONSORCIO ZORRITOS S.A.
OSCAR FERNÁNDEZ
Su Representante de Obra

DESCRIPCION	DATOS OBTENIDOS	REQUISITOS	DETERMINACIÓN
Ph a 25 °C	5.53	Medida Directa	Aceptable
Cloruros (ppm)	N.D.	NTP 339.076	Aceptable
Sulfatos (ppm)	107	NTP 339.074	Aceptable
Álcalis Na ₂ O + 6,658K ₂ O (ppm)	26	ASTM C114	Aceptable
Sólidos totales (ppm)	305	ASTM C 1603	Aceptable

Control de Calidad del Acero.

El acero que se está utilizando en obra es proveniente de Aceros Arequipa planta Pisco, las barras de construcción están fabricadas bajo las norma ASTM A615 Grado 60 y los ensayos aplicados bajo la norma ASTM E415 / ASTM E8 y distribuidas por Ferretería San Antonio SRL.

Se muestra en el cuadro la composición química y las propiedades mecánicas de las barras ensayadas.


Control de Calidad del Concreto

La resistencia del concreto es comprobada periódicamente, Con ese fin se toman testigos cilíndricos de acuerdo a la Norma ASTM C 31 ó ITINTEC 339.033 en la cantidad mínima de dos testigos por cada 30 m³ de concreto colocado, pero no menos de dos testigos por día para cada clase de concreto.

La "prueba" consiste en romper dos testigos de la misma edad y clase de acuerdo a lo indicado en las Normas ASTM C-31, C-39, C-172 ó ITINTEC 339.034 Y 339.036. Se llama resultado de la "prueba" al promedio de los dos valores.

El resultado de la "prueba" se considera satisfactorio si el promedio de tres resultados consecutivos cualesquiera es igual o mayor que el f'c requerido y cuando ningún resultado individual está 35 Kg/cm² por debajo del f'c requerido.

Se lleva un registro de cada par de testigos fabricado en el que constará su número correlativo, la fecha de elaboración, la clase de concreto, el lugar específico de uso, la


CONSORCIO ZORRITOS
 HERNANDO REGALADO OBLITAS
 Ing. Responsable de Obra

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 20 – JULIO 2019



edad al momento del ensayo, la resistencia de cada testigo y el resultado de la "prueba".

Los ensayos son efectuados por dos laboratorios independientes de la organización de nosotros y aprobado por el Supervisor.

Se adjunta resultados obtenidos por los dos laboratorios independientes.


Control de Calidad de las uniones soldadas de la tubería HDPE de 6"

Se ha cumplido con entregar a la supervisión de obra los resultados, satisfactorios de los ensayos realizados a las tuberías de HDPE, (51 informes UT TOFD de la unión soldada y los ensayos de doblez y tracción), adjunto a Carta N 041-2019/ACAPULCO.

CONSORCIO ZORRITOS
Edgar Fernando Regalado Obujas
EDGAR FERNANDO REGALADO OBUJAS
ING. RESPONSABLE DE OBRAS

**ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
DEL MES DE JULIO
ENSAYOS DE ROTURA DE PROBETAS**

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 20 – JULIO 2019

CONSORCIO ZORRITOS

EDGAR FERNANDO RECALADO OBLITAS
"Ing. Removido de Aft"

2.1.9 Maquinaria y Equipos utilizados en el mes de Julio


En el mes de Julio se ha realizado trabajos en los cuales se han utilizado los siguientes equipos.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE OBRA DPA-ACAPULCO				
1	Camión Grúa 30 Ton	Link Belt	30 Ton	1
2	Compresora 240 PCM	Atlas Copco	240 PCM	
3	Soldadora Eléctrica	Solandina	TRC 300	
4	Motosoldadora	Denyo	280	1
5	Kit con filtros y salida		Acero inoxidable con 5 salidas	1
6	Manguera de alta presión		100 m	2
7	Manguera de baja presión		300PCI resistencia	5
8	Reguladores de aire	Acualum		5
9	Winche eléctrico	Siemens	5HP	2
10	GENERADOR	BONELLY	9 KW	1
11	MARTILLOS ELECTRICOS	BOSH	17000 WATS	3
12	Mezclador tipo trompo	Honda	X270 9p3	2
13	Equipo Oxicorte	GCE	Caña, manguera, oxígeno y gas	2
14	OXIGENO	INDUSTRIAL	10 KG	2
15	EXTINTORES	PQS	6KG	4
16	EXTINTORES	CO2	6KG	2
17	ESTACIÓN TOTAL	LEICA PLUS TS056		1
18	RETROEXCAVADORA	420E-CAT	420F	1
19	Retroexcavadora	CAT	416TM	1
20	TROZADORA	DEWALL		2
21	AMOLADORA	DEWALL		2
22	CAMIONETA	TOYOTA	A6I-861	1

2.1.10 Conclusiones y Recomendaciones

En el presente mes, la obra se encuentra en condición de **ATRASADA**; considerando el Calendario vigente a la ampliación de plazo N° 06; sin embargo la Contratista ha solicitado una nueva ampliación de plazo por la modificación en los pisos, cuyo expediente de sustentación se realizado dentro de los plazos de ley.

El atraso se explica por la demora sufrida en la aprobación de los expedientes conteniendo las modificaciones planteadas por la Entidad al expediente inicialmente contratado, hechos que han afectado y afectan el cronograma de avance de obra vigente, y en consecuencia constituyen el sustento de nuestras ampliaciones de plazo y mayores gastos generales, en los casos que corresponden.


CONSORCIO ZORRITOS
ING. FERNANDO REGALADO OBLIAS
 Responsable de Obra

La Entidad ha considerado el cambio del tipo de los pisos de los pasadizos y patio interior de la zona de Administración de los Pavimento y juntas de las Áreas de Patio de Redes, Pasaje exterior y Desembarque de Productos Hidrobiológicos, de concreto con Dramix a Concreto Armado; aún estamos a la espera de la aprobación del Adicional correspondiente. También se encuentra pendiente suministrarnos, los detalles de las obras de anclaje en la zona de la playa del emisor submarino, así como del adicional correspondiente a los cambios realizados en la zona del enrocado de dicho emisor.

Al término de la Valorización N° 20 – Julio 2019, se realizaron los siguientes avances:

Monto Ejecutado Real

Acumulado Julio 2010	S/. 9'173,982.09	(no inc. IGV)	62.95 %
Monto Julio 2020	S/. 274,313.68	(no inc. IGV)	1.88 %

Monto Ejecutado Programado


Acumulado Julio 2019	S/. 14'573,779.79	(no inc. IGV)	100.00%
Monto Julio 2019	S/. 0.00	(no inc. IGV)	0.00%

2.2 ASPECTOS ECONÓMICOS**2.2.3 Numero de Valorizaciones Tramitadas**

Hasta antes de la presente valorización, se han tramitado diecinueve (19) valorizaciones del Presupuesto Contractual Principal (sin contar la presente valorización), cuatro (05) Valorizaciones de Gastos Generales, correspondientes a las Ampliaciones de Plazo N° 01, 02, 03, 05 y 06, tres (03) valorizaciones de mayores metrados (una por mayores metrados de demolición, otra por Movimiento de tierras, concreto simple, cimentaciones y muros y, un tercer mayor metrado por reparación de pilotes); también hemos presentado catorce (14) valorizaciones, correspondientes a la Valorizaciones de los Adicionales N°01, N°02, N°03, N°04 y del N°05, es decir que en total hemos presentado al mes de junio, 37 valorizaciones y al mes de julio hemos presentado un total de 41 valorizaciones de las cuales se encuentran en trámite de pago, 4 de ellas (Valorización N°20 del Contrato principal, Valorización N°07 del Adicional N° 03, Valorización N°03 del Adicional N°05 y Val N°02 del Adicional N° 04).

2.2.4 Número de Valorizaciones pagadas

A la fecha de elaboración del presente informe, la Entidad ha hecho efectivo el pago de 19 valorizaciones del contrato principal de obra, así como de 14 valorizaciones de nuestros Adicionales N° 01, 02, 03, 04 y 05; de las tres valorizaciones de mayores metrados, así como cinco valorizaciones de Gastos Generales, antes presentadas.


FERNANDO REGALADO OBITAS
Jefe Residente de Obra



CONSORCIO ZORRITOS

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESMARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMPRANTE VILLAR, REGION TUMBES"

2.2.5 Monto Valorizado en el mes

CONSOLIDADO DE VALORIZACION VALORIZACION DE OBRA N° 20 JULIO - 2019

LECTACION : U-SM-S-2017-CONDERS-1
 OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA DE ACAPULCO VALORIZACION N° : 20 / 2017
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) FECHA PRESUPUESTO : 31/08/2017
 CONTRALIBRA : CONSORCIO ZORRITOS P. REFERENCIAL S.M.G.V. : 6/ 12,803,758.02 S.M. ISV
 UBICACION : ACAPULCO, ZORRITOS, CONTRALMPRANTE VILLAR - TUMBES P. CONTRATATO S.M.G.V. : 6/ 12,803,758.02 S.M. ISV

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO		VALORIZACION MENSUAL		VALORIZACION ACUMULADA		SALDO	
	SM ISV	%	MONTO S.M. ISV	AVANCE %	MONTO S.M. ISV	AVANCE %	MONTO S.M. ISV	
REALISTES Y REINTEGROS DEDUCIDOS (S)								
"01 ESTRUCTURAS	S/. 5,099,026.83	2.28%	116,407.32	81.64%	4,162,769.90	18.36%	936,257.03	
"02 ARQUITECTURA	S/. 2,414,033.62	1.94%	44,333.44	40.07%	967,205.63	59.93%	1,446,828.09	
"03 INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 1,115,459.39	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	1,115,459.39	
"04 INSTALACIONES ELECTRICAS	S/. 457,810.65	0.00%	0.00	10.41%	47,644.17	89.59%	410,166.48	
"05 OBRAS DE MAR	S/. 2,429,956.28	2.51%	61,108.09	53.16%	1,291,813.71	46.84%	1,138,142.57	
"06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	S/. 1,387,471.14	0.00%	0.00	56.27%	780,769.24	43.73%	606,702.90	
TOTAL DE REINTEGROS	S/. 12,903,758.01	1.72%	221,848.85	56.19%	7,250,201.55	43.81%	5,653,556.46	
VALORIZACION BRUTA (VB = V + S)								
			14,551.77		588,004.68			
			236,400.62		7,838,206.23			
AMORTIZACIONES DE ADELANTOS (D)								
AMORTIZACION DE ADELANTO EN EFECTIVO								
"01 ESTRUCTURAS	378,414.29	2.28%	8,638.94	81.64%	308,931.81	18.36%	69,482.48	
"02 ARQUITECTURA	179,152.78	1.84%	3,290.12	40.07%	71,779.26	59.93%	107,373.52	
"03 INSTALACIONES SANITARIAS	82,761.63	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	82,761.63	
"04 INSTALACIONES ELECTRICAS	33,975.52	0.00%	0.00	0.00%	2,922.76	91.40%	31,052.76	
"05 OBRAS DE MAR	180,334.44	2.51%	4,535.02	53.16%	95,669.43	46.84%	84,665.01	
"06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	102,988.45	0.00%	0.00	0.00%	51,724.99	49.76%	51,263.46	
TOTAL DE ADELANTOS	957,627.11	1.72%	16,464.08	55.47%	531,238.24	44.53%	426,388.87	
AMORTIZACION DE 2DO ADELANTO DE MATERIALES								
"01 ESTRUCTURAS	593,220.34	0.00%	0.00	100.00%	593,220.34	0.00%	0.00	
"02 ARQUITECTURA	290,847.46	0.00%	0.00	100.00%	290,847.46	0.00%	0.00	
"03 INSTALACIONES SANITARIAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
"04 INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
"05 OBRAS DE MAR	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
"06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
TOTAL AMORTIZACIONES (D)	290,847.46	0.00%	0.00	100.00%	290,847.46	0.00%	0.00	
VALORIZACION NETA (VN = VB - D)								
			16,464.08		1,315,306.05		426,388.87	
			219,936.54		6,462,990.18			
			39,598.59		1,163,322.03			
			S/. 259,525.17		7,829,222.21			

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 20 - JULIO 2019

CONSORCIO ZORRITOS
 Gerente General
 Gerente Administrativo y Financiero
 Gerente de Mantenimiento y O.M.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL


Según cuadro mostrado, la valorización N° 20 del Mes de Julio del 2019, comprendido entre el 01/07/2019 y 30/07/2019, el monto a facturar es la suma de S/. 259,525.12 soles (Doscientos cincuenta y nueve mil quinientos veinticinco con 12/100 soles).

**2.2.5.1 Amortización de los Adelantos
ADELANTO DIRECTO**

S/. 1'130,000.00 incluido IGV

VALORIZACION	MONTO VALORIZADO INC IGV	MONTO AMORTIZADO	ACUMULADO AMORTIZADO	SALDO A AMORTIZAR
01	S/. 265,637.09	S/. 19,713.74	S/. 19,713.74	S/ 1'110,286.26
02	S/. 27,889.21	S/. 2,069.74	S/. 21,783.48	S/ 1'108,216.52
03	S/. 282,796.63	S/. 20,987.20	S/. 42,770.68	S/ 1'087,229.32
04	S/. 599,400.52	S/. 44,483.34	S/. 87,254.01	S/ 1,042,745.99
05	S/. 857,570.37	S/. 63,642.90	S/. 150,896.92	S/. 979,103.08
06	S/. 1'077,291.56	S/. 79,949.08	S/. 230,846.00	S/. 899,154.00
07	S/. 801,043.87	S/. 59,447.90	S/. 290,293.90	S/. 839,706.09
08	S/. 301,993.01	S/. 22,411.82	S/. 312,705.72	S/. 817,294.27
09	S/. 1'144,486.80	S/. 84,935.84	S/. 397,641.57	S/. 732,358.43
10	S/. 357,724.78	S/. 26,547.85	S/. 424,189.42	S/. 705,810.59
11	S/. 423,292.60	S/. 31,414.00	S/. 455,603.42	S/. 674,396.58
12	S/. 144,838.75	S/. 10,749.00	S/. 466,352.42	S/. 663,647.58
13	S/. 594,936.60	S/. 44,152.00	S/. 510,504.42	S/. 619,495.58
14	S/. 243,004.52	S/. 18,034.00	S/. 528,538.42	S/. 601,461.58
15	S/. 437,673.82	S/. 32,481.00	S/. 561,019.42	S/. 568,980.58
16	S/. 230,385.98	S/. 14,489.53	S/. 575,508.95	S/. 554,491.05
17	S/. 137,619.45	S/. 10,213.16	S/. 585,722.11	S/. 544,277.89
18	S/. 201,947.59	S/. 15,151.60	S/. 600,873.71	S/. 529,126.29
19	S/. 159,649.43	S/. 10,170.14	S/. 611,043.85	S/. 518,956.15
20	S/. 259,525.12	S/. 16,464.08	S/. 627,507.93	S/. 502,492.07

Se observa que hasta la valorización N° 20 correspondiente del mes de Julio del 2019 se amortizó un monto acumulado de S/. 627,507.93 quedando un saldo por amortizar de S/. 502,492.07 (inc. IGV).


CONSORCIO ZORRITOS
 OSCAR FERNANDO PALADINO
 Jefe Administrativo de Obra

2.2.5.2 Amortización de los Adelantos para Materiales
ADELANTO PARA MATERIALES N°01

S/. 700.00 incluido IGV

VALORIZACION	MONTO VALORIZADO INC IGV	MONTO AMORTIZADO	ACUMULADO AMORTIZADO	SALDO A AMORTIZAR
05	S/. 857,570.369	S/. 244,878.60	S/. 244,878.60	S/. 455,121.40
06	S/. 1'077,291.56	S/. 303,923.80	S/. 548,802.40	S/. 151,197.61
07	S/. 801,043.86	S/. 151,197.61	S/. 700,000.00	S/. 0.00


Se observa que hasta la valorización N° 07 correspondiente del mes de Junio del 2018 se amortizó la suma S/. 700,000.00, en conclusión se ha amortizado la totalidad del Adelanto de materiales N°01.

ADELANTO PARA MATERIALES N° 02

S/. 296,000.00 incluido IGV

VALORIZACION	MONTO VALORIZADO INC IGV	MONTO AMORTIZADO	ACUMULADO AMORTIZADO	SALDO A AMORTIZAR
09	S/. 1,144,486.81	S/. 39,639.93	S/. 39,639.93	S/. 256,360.07
10	S/. 357,724.78	S/. 97,353.97	S/. 136,993.90	S/. 159,006.10
11	S/. 423,292.60	S/. 75,930.96	S/. 212,924.86	S/. 83,075.14
12	S/. 144,838.75	S/. 45,216.51	S/. 258,141.37	S/. 37,858.63
13	S/. 801,043.86	S/. 37,858.64	S/. 296,000.00	S/. 0.00

Se observa que hasta la valorización N° 13 correspondiente del mes de Diciembre del 2018 se amortizó la suma S/. 296.000.00, en conclusión se ha amortizado la totalidad del Adelanto de materiales N°02.


CONSORCIO ZORRITOS
 OSCAR FERNANDO REGALADO OBDÍAS
 Jefe Responsable de OBRAS



3 FICHA TÉCNICA





OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"

3.1 DE LA OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA		
PROCESO SELECCIÓN	: LP-SM-5-2017-FONDEPES-1	
OBRA	: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES	
UBICACIÓN	: LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR.	
PROPIETARIO	: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)	
CONTRATISTA	: CONSORCIO ZORRITOS	
RUC	: 20652648835	
PLAZO DE OBRA	: 300 DIAS CALENDARIOS	
AMPLIACION DE PLAZO N° 01	: 25 DIAS CALENDARIOS	
AMPLIACION DE PLAZO N° 02	: 27 DIAS CALENDARIOS	
AMPLIACION DE PLAZO N° 03	: 32 DIAS CALENDARIOS	
AMPLIACION DE PLAZO N° 04	: 74 DIAS CALENDARIOS	
AMPLIACION DE PLAZO N° 05	: 28 DIAS CALENDARIOS	
AMPLIACION DE PLAZO N° 06	: 64 DIAS CALENDARIOS	
LICITACION PUBLICA	: LP-SM-5-2017-FONDEPES-1	
MONTO REFERENCIAL EXP.	0.00	
MONTO REFERENCIAL EJEC.	15,226,434.46	
FECHA PRESUP.BASE	30/06/2017	
MONTO CONTRATADO EXP.	0.00	
MONTO CONTRATADO EJEC.	15,226,434.46	
FACTOR RELACION	1.000000	
ADELANTO DIRECTO	1,130,000.00	
FECHA PAGO AD.DIRECTO	27/12/2017	
1ER ADELANTO MATERIALES	700,000.00	
FECHA PAGO AD.MATERIALES	23/04/2018	
2DO ADELANTO MATERIALES	296,000.00	
FECHA PAGO AD.MATERIALES	22/08/2018	


SUBTOTAL	IGV	TOTAL
0.00	0.00	0.00
12,903,758.02	2,322,676.44	15,226,434.46

857,627.12	172,372.88	1,130,000.00
------------	------------	--------------

588,235.29	111,764.71	700,000.00
------------	------------	------------

250,847.46	45,152.54	296,000.00
------------	-----------	------------


Nro. VALORIZACION	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
AL MES DE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
AÑO	DEL 2017	DEL 2018	DEL 2018	DEL 2018	DEL 2018	DEL 2018	DEL 2018	DEL 2018	DEL 2018	DEL 2018	2018	DEL 2018	DEL 2018	DEL 2019	DEL 2019	DEL 2019	DEL 2019	DEL 2019	DEL 2019	DEL 2019



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 20 – JULIO 2019

3.2 DEL CONTRATISTA**Del Contratista.**

Cliente	: FONDEPES
Número del Contrato	: N° 054 – 2017 – FONDEPES
Sistema de Contratación	: Precios Unitarios
Tipo	: LP-SM-5-2017-FONDEPES-1
Contratista	: CONSORCIO ZORRITOS
Supervisión	: Consorcio Supervisor Tumbes
Monto del Valor Referencial	: S/. 15'226,434.46 incluido IGV
Monto del Contrato	: S/. 15'226,434.46 incluido IGV
Plazo de ejecución de la Obra	: 300 días Calendario
Fecha de Firma del Contrato	: 12 de Diciembre del 2017.
Fecha de entrega de terreno	: 14 de Diciembre del 2017.
Fecha de inicio de Plazo contractual	: 28 de Diciembre del 2017.
Fecha de Término de obra	: 23 de Octubre del 2018.
Fecha de Término de Obra con A.P.P. N° 01	: 17 de Noviembre del 2018.
Fecha de Término de Obra con A.P.P. N° 02	: 14 de Diciembre del 2018.
Fecha de Término de Obra con A.P.P. N° 03	: 15 de Enero del 2019.
Fecha de Término de Obra con A.P.P. N° 04	: 30 de Marzo del 2019.
Fecha de Término de Obra con A.P.P. N° 05	: 27 de Abril del 2019.
Fecha de Término de Obra con A.P.P. N° 06	: 30 de Junio 2019.
Fecha de Término de Obra con S.A.P. N° 07	: En trámite
Forma de Pago	: Valorizaciones Mensuales
Adelanto para Materiales N° 01	: 7.42 % del Monto del Contrato
Adelanto para Materiales N° 02	: 1.94 % del Monto del Contrato
Representante Legal	: Sr. Roberto Alvarado Loyola
Residente de Obra	: Ing. Edgar Fernando Regalado Oblitas
Fecha del Adelanto Directo	: 27 de Diciembre del 2017
Monto del Adelanto Directo	: S/. 1' 130,000.00 incluido IGV
Fecha del 2do Adelanto para Materiales	: 22 de Agosto del 2018
Monto del 2do Adelanto para Materiales	: S/. 296,000.00 incluido IGV


CONSORCIO ZORRITOS
EDGAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
Residente de Obra

Ampliación de Plazo Parcial N° 01	: 25 días calendario
Fecha de Aprobación de la A.P.P. N° 01 (Resolución de Secretaría General N° 070-2018-FONDEPES)	: 25 de Abril 2018
Ampliación de Plazo Parcial N° 02	: 27 días calendario
Fecha de Aprobación de la A.P.P. N° 02 (Resolución de Secretaría General N° 086-2018-FONDEPES)	: 24 de Mayo 2018
Ampliación de Plazo Parcial N° 03	: 32 días calendario
Fecha de Aprobación de la A.P.P. N° 03 (Resolución de Gerencia General N° 212-2018-FONDEPES)	: 29 de Noviembre 2018
Ampliación de Plazo Parcial N° 04	: 74 días calendario
Fecha de Aprobación de la A.P.P. N° 04 (Resolución de Gerencia General N° 006-2019-FONDEPES)	: 11 de Enero 2019
Ampliación de Plazo Parcial N° 05	: 28 días calendario
Fecha de Aprobación de la A.P.P. N° 05 (Resolución de Gerencia General N° 070-2019-FONDEPES)	: 12 de Abril 2019
Ampliación de Plazo Parcial N° 06	: 64 días calendario
Fecha de Aprobación de la A.P.P. N° 06 (Resolución de Gerencia General N° 095-2019-FONDEPES/GG)	: 22 de Mayo 2019




**CONSORCIO
ZORRITOS**


**OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMPARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA
CONTRALMIIRANTE VILLAR, REGION TUMBES"**

4 ANEXOS

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 20 – JULIO 2019



4.1 INDICES UNIFICADOS



De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; y, estando a las funciones establecidas en los literales e) y t) del artículo 16 de la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao -ATU, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2019-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar, a partir de la fecha, a la señora CARMEN ELVIRA VICENTE DELIOT, en el cargo de Jefa de la Unidad de Tesorería de la Oficina de Administración de la Gerencia General de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao - ATU.

Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, al señor CARLOS ALBERTO BASILIO ESTACIO, en el cargo

de Jefe de la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Gerencia General de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao - ATU.

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la señora CARMEN ELVIRA VICENTE DELIOT, al señor CARLOS ALBERTO BASILIO ESTACIO y a la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, para los fines pertinentes.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUMBERTO VALENZUELA GOMEZ
 Presidente Ejecutivo
 Autoridad de Transporte Urbano para
 Lima y Callao - ATU

1789935-1

Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de junio de 2019

**RESOLUCIÓN JEFATURAL
 N° 215-2019-INEI**

Lima, 15 de julio de 2019

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e

Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe N° 02-06-2019/DTIE, referido a los Índices Unificados de Precios para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de Junio de 2019 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y;


Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Índices Unificados de Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Junio de 2019, que se indican en el cuadro siguiente:

ÁREAS GEOGRÁFICAS													
Cód.	1	2	3	4	5	6	Cód.	1	2	3	4	5	6
01	965,05	965,05	965,05	965,05	965,05	965,05	02	553,89	553,89	553,89	553,89	553,89	553,89
03	533,28	533,28	533,28	533,28	533,28	533,28	04	563,48	955,55	1052,82	595,43	374,92	753,41
05	448,47	218,02	425,37	604,38	(*)	628,02	06	935,25	935,25	935,25	935,25	935,25	935,25
07	674,83	674,83	674,83	674,83	674,83	674,83	08	882,25	882,25	882,25	882,25	882,25	882,25
09	279,39	279,39	279,39	279,39	279,39	279,39	10	426,08	426,08	426,08	426,08	426,08	426,08
11	254,87	254,87	254,87	254,87	254,87	254,87	12	316,88	316,88	316,88	316,88	316,88	316,88
13	1792,19	1792,19	1792,19	1792,19	1792,19	1792,19	14	282,90	282,90	282,90	282,90	282,90	282,90
17	622,54	678,08	697,04	840,18	771,58	882,30	16	354,83	354,83	354,83	354,83	354,83	354,83
18	771,94	771,94	771,94	771,94	771,94	771,94	18	326,96	326,96	326,96	326,96	326,96	326,96
21	471,42	423,68	449,56	438,28	449,56	418,57	20	2185,03	2185,03	2185,03	2185,03	2185,03	2185,03
23	439,25	439,25	439,25	439,25	439,25	439,25	22	367,30	367,30	367,30	367,30	367,30	367,30
27	472,07	472,07	472,07	472,07	472,07	472,07	24	238,54	238,54	238,54	238,54	238,54	238,54
31	382,07	382,07	382,07	382,07	382,07	382,07	26	384,27	384,27	384,27	384,27	384,27	384,27
33	861,18	861,18	861,18	861,18	861,18	861,18	28	586,03	586,03	586,03	575,53	586,03	586,03
37	315,11	315,11	315,11	315,11	315,11	315,11	30	496,36	496,36	496,36	496,36	496,36	496,36
39	457,36	457,36	457,36	457,36	457,36	457,36	32	472,50	472,50	472,50	472,50	472,50	472,50
41	436,10	436,10	436,10	436,10	436,10	436,10	34	514,73	514,73	514,73	514,73	514,73	514,73
43	758,63	698,04	932,43	654,70	1168,30	903,33	38	438,08	906,22	870,76	571,53	(*)	643,59
45	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	40	397,51	459,69	450,27	354,94	272,89	331,41
47	600,40	600,40	600,40	600,40	600,40	600,40	42	287,48	287,48	287,48	287,48	287,48	287,48
49	311,91	311,91	311,91	311,91	311,91	311,91	44	389,03	389,03	389,03	389,03	389,03	389,03
51	297,29	297,29	297,29	297,29	297,29	297,29	46	446,58	446,58	446,58	446,58	446,58	446,58
53	838,47	838,47	838,47	838,47	838,47	838,47	48	370,90	370,90	370,90	370,90	370,90	370,90
55	500,03	500,03	500,03	500,03	500,03	500,03	50	656,57	656,57	656,57	656,57	656,57	656,57



Cód.	1	2	3	4	5	6	Cód.	1	2	3	4	5	6
57	384,97	384,97	384,97	384,97	384,97	384,97	52	318,36	318,36	318,36	318,36	318,36	318,36
59	212,21	212,21	212,21	212,21	212,21	212,21	54	449,90	449,90	449,90	449,90	449,90	449,90
61	230,12	230,12	230,12	230,12	230,12	230,12	56	532,72	532,72	532,72	532,72	532,72	532,72
65	259,06	259,06	259,06	259,06	259,06	259,06	60	295,99	295,99	295,99	295,99	295,99	295,99
69	389,45	327,82	428,87	489,52	289,39	451,51	62	468,41	468,41	468,41	468,41	468,41	468,41
71	660,29	660,29	660,29	660,29	660,29	660,29	64	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21
73	550,85	550,85	550,85	550,85	550,85	550,85	66	719,11	719,11	719,11	719,11	719,11	719,11
77	337,11	337,11	337,11	337,11	337,11	337,11	68	261,39	261,39	261,39	261,39	261,39	261,39
							70	218,25	218,25	218,25	218,25	218,25	218,25
							72	435,99	435,99	435,99	435,99	435,99	435,99
							76	497,44	497,44	497,44	497,44	497,44	497,44
							80	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

(*) Sin Producción

Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 201-2019-INEI.

Artículo 2.- Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1, comprende a los siguientes departamentos:

Área 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín

Área 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica

Área 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali

Área 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna

Área 5 : Loreto

Área 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3.- Los Índices Unificados de Precios, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fletes.

Regístrese y comuníquese.

JOSE GARCIA ZANABRIA
Jefe (e)

1789835-1

Factores de Reajuste aplicables a obras de edificación correspondiente a las seis Áreas Geográficas para Obras del Sector Privado, producidas en el mes de junio de 2019

**RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 216-2019-INEI**

Lima, 15 de julio de 2019

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, para uso del Sector Privado de la Construcción, deben elaborarse los Factores de Reajuste correspondientes a las obras de Edificación de las seis (6) Áreas Geográficas del país, aplicables a las obras en

actual ejecución, siempre que sus contratos no estipulen modalidad distinta de reajuste;

Que, para tal efecto, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe N° 02-06-2019/DTIE, referido a los Factores de Reajuste para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al período del 1 al 30 de Junio de 2019 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural pertinente, así como disponer su publicación en el diario oficial El Peruano; y,


Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Factores de Reajuste que debe aplicarse a las obras de edificación, correspondiente a las seis (6) Áreas Geográficas para las Obras del Sector Privado, derivados de la variación de precios de todos los elementos que intervienen en el costo de dichas obras, producidas en el período del 1 al 30 de Junio de 2019, según se detalla en el cuadro siguiente:

ÁREAS GEOGRÁFICAS No.	OBRAS DE EDIFICACIÓN											
	Edificación de 1 y 2 Pisos			Edificación de 1 y 2 Pisos			Edificación de 3 y 4 Pisos			Edificación de 3 y 4 Pisos		
	(Terminada)			(Casco Vestido)			(Terminada)			(Casco Vestido)		
	M.O.	Resto Elem.	Total	M.O.	Resto Elem.	Total	M.O.	Resto Elem.	Total	M.O.	Resto Elem.	Total
1	1,0000	0,9992	0,9992	1,0000	0,9991	0,9991	1,0000	0,9989	0,9989	1,0000	0,9991	0,9991
2	1,0000	1,0004	1,0004	1,0000	0,9999	0,9999	1,0000	0,9994	0,9994	1,0000	0,9997	0,9997
3	1,0000	0,9991	0,9991	1,0000	0,9990	0,9990	1,0000	0,9988	0,9988	1,0000	0,9990	0,9990
4	1,0000	0,9987	0,9987	1,0000	0,9985	0,9985	1,0000	0,9986	0,9986	1,0000	0,9986	0,9986
5	1,0000	0,9996	0,9996	1,0000	0,9996	0,9996	1,0000	0,9995	0,9995	1,0000	0,9996	0,9996
6	1,0000	0,9999	0,9999	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9994	0,9994	1,0000	0,9998	0,9998






**CONSORCIO
ZORRITOS**

**OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA
CONTRALMIIRANTE VILLAR, REGION TUMBES"**

4.2 COPIA DEL CONTRATO

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 20 - JULIO 2019



415



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CONTRATO N° 054-2017-FONDEPES

LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2017-FONDEPES PRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCIÓN DE OBRAS (POR PAQUETE): "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"

CONSORCIO ZORRITOS ROBERTO C. ALVARADO LOYOLA

Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS (POR PAQUETE): "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES", correspondiente a la Licitación Pública N° 005-2017-FONDEPES – Primera Convocatoria, que celebran de una parte:



- EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES con R.U.C. N° 20137921601, con domicilio legal en Av. Petit Thouars N° 115, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el Jefe de la Oficina General de Administración, el señor JAVIER EDUARDO CHANG SERRANO, identificado con D.N.I. N° 07209780; designado mediante Resolución Jefatural N° 044-2017-FONDEPES/J de fecha 26 de mayo de 2017 y con las facultades conferidas en materia de contrataciones mediante Resolución Jefatural N° 069-2016-FONDEPES/J de fecha 17 de febrero de 2016, a quien en adelante se le denominará LA ENTIDAD; y de la otra parte,

- EL CONSORCIO ZORRITOS con R.U.C. N° 20602648835, conformado por las empresas:

• PCD S.A.C. con R.U.C. N° 20403160190, inscrita en la Partida Electrónica N° 11094076 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Maynas, con domicilio legal en Calle San Román N° 557 Urbanización San Román, distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto, debidamente representada por su Gerente General, el señor ROBERTO CARLOS ALVARADO LOYOLA identificado con D.N.I. N° 32988748, según Poder inscrito en el Asiento N° B00008.

• ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C. con R.U.C. N° 20489517320, inscrita en la Partida Electrónica N° 11052777 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Huánuco, con domicilio legal en Jr. Vizcaya N° 187 Urbanización Javier Prado, distrito de San Luis, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, el

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





CONSORCIO ZORRITOS
ROBERTO C. ALVARADO LOYOLA
REPRESENTANTE LEGAL

señor LUIS ENRIQUE GUARNIZO VERDE identificado con D.N.I. N° 07627014, según Poder inscrito en el Asiento N° C0001.

- CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. con R.U.C. N° 20268887785, inscrita en la Partida Electrónica N° 70008479 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Callao, con domicilio legal en Av. Los Dominicos N° A-2 Int. 11 Urbanización Inresa, distrito de Callao, provincia constitucional de Callao, debidamente representada por su Apoderado, el señor REYNALDO SERNA ARBIETO identificado con D.N.I. N° 25516644, según Poder inscrito en el Asiento N° B00004.

El CONSORCIO ZORRITOS con domicilio común en Calle Los Olivos N° 248 Urbanización Los Rosales, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su representante legal común, el señor ROBERTO CARLOS ALVARADO LOYOLA identificado con D.N.I. N° 32988748, de conformidad con la Cláusula Tercera de la Minuta de Consorcio Temporal de fecha 14 de noviembre de 2017, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA.



P. MEDINA

LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA a quienes en forma conjunta se les denominará LAS PARTES, acuerdan en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 06 de noviembre de 2017, el Comité de Selección adjudicó la buena pro de la Licitación Pública N° 005-2017-FONDEPES - Primera Convocatoria, para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS (POR PAQUETE): "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES", al CONSORCIO ZORRITOS, conformado por las empresas PCD S.A.C., ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C. y CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., cuyos detalles e importes constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente documento tiene por objeto la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS (POR PAQUETE): "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES", bajo el sistema de contratación de precios unitarios.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 15'226,434.46 (Quince millones doscientos veintiséis mil cuatrocientos treinta y cuatro con 46/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros,

[Handwritten signature]





transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente; así como, cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de obra materia del presente contrato.

CONSORCIO ZORRITOS

SECRETARÍA LEGAL

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de **valorización mensual** conforme a lo previsto en el numeral 3.14 del Capítulo III "Requerimiento" de la Sección Específica de las Bases Integradas. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el marco de lo dispuesto en el artículo 26 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD a efectuar los pagos correspondientes a las valorizaciones del presente contrato mediante depósito en Cuenta Bancaria a favor del Consorcio Zorritos con R.U.C. N° 20602648835, para cuyo efecto ha proporcionado su Código de Cuenta Interbancaria del **BBVA BANCO CONTINENTAL**:

CCI - CUENTA EN SOLES	0011-0910-0100168917-71
-----------------------	-------------------------

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra es de:

SUB ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PLAZO DE EJECUCIÓN
II	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"	Trescientos (300) días calendario.

El mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.7.1 del Capítulo III "Requerimiento" de la Sección Específica de las Bases Integradas.


CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para LAS PARTES.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

[Handwritten signature]





CONSORCIO KORRITOS

ROBERTO C. ALVARADO LOYOLA REPRESENTANTE LEGAL

- De fiel cumplimiento del contrato: por el monto de S/. 809,000.00 (Ochocientos nueve mil con 00/100 Soles), a través de la Carta Fianza N° 8907-0 emitida por el BANCO GNB PERU S.A.
- De fiel cumplimiento del contrato: por el monto de S/. 713,644.00 (Setecientos trece mil seiscientos cuarenta y cuatro con 00/100 Soles), a través de la Carta Fianza N°781680 (D193-01813669) emitida por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ - BCP.

Ambos montos en su conjunto son equivalentes al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, las mismas que deben mantenerse vigentes hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: SEGUROS

EL CONTRATISTA, deberá presentar las pólizas que se detallan a continuación, en la fecha de inicio de ejecución de la obra:



1. POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO Y MONTAJE (CAR):

- o Básica: por el monto del contrato.
- o Terremoto: por el monto del contrato de obra.
- o Avenida, lluvia e inundación, por el monto del contrato de obra
- o Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del contrato de obra.
- o Daños materiales, daños personales, remoción de escombros, por el 5% del monto del contrato.
- o Huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, terrorismo por el 20% del monto del contrato de obra.

VIGENCIA:

La póliza de Seguro Todo Riesgo y Montaje (CAR) con una vigencia desde la fecha de inicio de obra hasta que la liquidación de la obra quede consentida.

2. SEGURO DE VIDA LEY

Póliza de Accidentes Personales: por muerte o invalidez permanente por el 2.5% del monto de la obra por cada obrero. Deberá especificar que se considerarán como terceras personas al personal de la Entidad que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecución de obra.

VIGENCIA:

La póliza de Seguro Vida Ley, tendrá vigencia desde la fecha de inicio de ejecución hasta la recepción de la obra.

3. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Póliza de Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos, conforme a lo dispuesto por el D.L. N° 688 y D.L. N° 25897.

Handwritten signature





CONS. TORRITOS

ROBERTO C. ALVAREDO LOYOLA
INGENIERO EN LEGAL

VIGENCIA:

La póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, tendrá vigencia desde la fecha de inicio de ejecución hasta la recepción de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará adelanto directo hasta por el diez por ciento 10% del monto del contrato original.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisiciones de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de diez (10) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los adelantos dentro de los plazos indicados, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza y el comprobante del pago respectivo.

No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA


Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución contractual,

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





CONSORCIO ZORRITOS
 ROBERTO C. ALVARADO LOYOLA
 REPRESENTANTE LEGAL

según las disposiciones previstas en la Directiva "Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras:

Por la naturaleza de la intervención, los riesgos previsible que han tomado en cuenta en la elaboración del expediente técnico y que pueden ocurrir durante la ejecución de las obras, son los siguientes: (ver anexos del expediente técnico)

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"

Anexo N° 03									
Formulario para asignar los riesgos									
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		3. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO					
N° 001/2017		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS - TUMBES		PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS					
3.1 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
3.1.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.1.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.1.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
			Evitar el riesgo	Reducir el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
1	Ampliación de Plazo por defectos o incapacidad de respuesta de servicios	Alto		X			La Entidad debe recibir oportunamente la ejecución del proyecto	X	
2	Seguimiento y Control de Ejecución de la Obra	Moderada		X			La Entidad debe realizar inspecciones periódicas con fines de evaluación y seguimiento del cumplimiento del Contrato	X	
3	Demora en la Entrega de Materiales y Equipos	Baja			X		Ajustar los tiempos para dar continuidad al proyecto	X	X
4	Atribución del Presupuesto por Adicionales de Obra	Moderada			X		Mantener control y seguimiento de la Obra	X	



CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de **EL CONTRATISTA** es de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.


CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =	0.10 x Monto
	F x Plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días.





Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: OTRAS PENALIDADES

LA ENTIDAD, conforme al artículo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará a **EL CONTRATISTA** las siguientes penalidades:


CONSORCIO ZORRITOS
 ROBERTO C. ALVARADO LOYOLA
 REPRESENTANTE LEGAL



[Handwritten signature]

PENALIDADES			
Nº	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por FONDEPES.	Uno por cinco mil (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor
2	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad.	Uno por cinco mil, (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor
3	RESIDENTE DE OBRA Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra.	Uno por cinco mil (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor
4	CUADERNO DE OBRA Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor
5	PÉRDIDA DEL CUADERNO DE OBRA Si EL CONTRATISTA o su personal pierde el cuaderno de obra.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor
6	EQUIPO MINIMO Cuando el contratista emplea equipos o maquinarias en obra no autorizadas previamente por el supervisor o cuando los equipos y maquinarias no cumplen con lo mínimo requerido en los presentes Términos de Referencia o cuando no presenta los equipos declarados en su propuesta técnica.	Dos por mil (2/1000) del monto del sub ítem por cada equipo que no cumpla con lo exigido en los RDR	Según informe del Supervisor
7	MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE OBRA En caso culmine la relación contractual entre EL CONTRATISTA y el personal ofertado y LA ENTIDAD no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor

[Handwritten signature]





CONSORCIO ZORRITOS

ROBERTO ALVARADO LOYOLA REPRESENTANTE LEGAL

8	POLIZA CONTRA TODO RIESGO - CAR De no presentar el contratista los comprobantes que acrediten la cancelación del citado seguro dentro de los 10 días al inicio de la obra se le aplicara la penalidad que se señala.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor
9	PERSONAL PROPUESTO En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	1 UIT	Según informe del Supervisor.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

La aplicación de las penalidades no exime de responsabilidad a **EL CONTRATISTA** por los daños generados a **LA ENTIDAD** o a terceros.



CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de **LAS PARTES** puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de **LAS PARTES**, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de **LAS PARTES** del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.




CLÁUSULA VIGÉSIMA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer

Handwritten initials





CONSEJO ZORRITOS
ROBERTO C. ALVARADO LOYOLA
REPRESENTANTE LEGAL

actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

De acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Ley, las controversias que surjan entre **LAS PARTES** sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de **LAS PARTES**. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.



LAS PARTES acuerdan que todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante arbitraje institucional bajo la organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo a su Reglamento.

Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es menor o igual a 30 (treinta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de su presentación, el Tribunal Arbitral estará compuesto por árbitro único.

Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es mayor a 30 (treinta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de su presentación, el Tribunal Arbitral estará compuesto por tres árbitros.

[Handwritten signature]

Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es indeterminable, el Tribunal Arbitral estará compuesto por tres árbitros.




LAS PARTES acuerdan que las actuaciones arbitrales se realizaran en los plazos establecidos, sin que el Tribunal Arbitral tenga facultad alguna para ampliarlos o modificarlos, no siendo posible que el Tribunal Arbitral haga uso de la facultad contenida en el numeral 4 del artículo 34 del Decreto Legislativo N° 1071.

El Laudo Arbitral emitido obligará a **LAS PARTES** y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutará como una sentencia.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de **LAS PARTES** puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

[Handwritten signature]





CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

LAS PARTES declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

- **DOMICILIO DE LA ENTIDAD:** Av. Petit Thouars N° 115, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.
- **DOMICILIO DEL CONTRATISTA:** Calle Los Olivos N° 248 Urbanización Los Rosales, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima.



Otros datos:

- Teléfonos: 01-3997603
- Correo Electrónico: info@pcd.com.pe

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de LAS PARTES debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases Integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, LAS PARTES lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2017.

FONDEPES

[Handwritten signature]

.....
C.P.S. JAVIER CHANG SERRANO
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

.....
"LA ENTIDAD"


CONSORCIO ZORRITOS

[Handwritten signature]


.....
ROBERTO C. ALVARADO LOYOLA
 REPRESENTANTE LEGAL

.....
"EL CONTRATISTA"

[Handwritten initials]



4.3 CERTIFICADOS DE HABILIDAD DE LOS PROFESIONALES





LEY N° 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



N° - A - 0047029

Certificado de Habilidad

2019070598

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): REGALADO OBLITAS. EDGAR FERNANDO

Adscrito al Consejo Departamental de: DEPARTAMENTAL DE LIMA

Con Registro de Matrícula del CIP N°: 062719 Fecha de Incorporación: 2000-05-26
ING. CIVIL

Especialidad: _____

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL., en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	VARIOS / OTROS
ENTIDAD O PROPIETARIO	VARIOS
LUGAR	VARIOS

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA		
DÍA	MES	AÑO
31	10	2019

SAN ISIDRO, 04 de JULIO del 20 19

VÁLIDO SOLO ORIGINAL




TOLEDO Turno Tarde 16:52:23

Carlos Fernando Herrera Descalzi
Ing. Carlos Fernando Herrera Descalzi
Decano Nacional
del Colegio de Ingenieros del Perú



Consejo Departamental
del Colegio de Ingenieros del Perú

Jose Roberto Correa Guarniz
ING. CIP. JOSÉ ROBERTO CORREA GUARNIZ
DIRECTOR DE SECRETARÍA DEL CDL - CIP



NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS



**CONSORCIO
ZORRITOS**

**OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DISEMARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA
CONTRALMIHRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"**

5 CONTROL DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 20 - JULIO 2019






**CONSORCIO
ZORRITOS**

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA
CONTRALMIIRANTE VILLAR, REGION TUMBES"


5.1 CORRESPONDIENTE A LAS VALORIZACIONES DEL PRESUPUESTO CONTRACTUAL

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 20 - JULIO 2019



Cuadro de Control de los pagos realizados al Contratista.

VALORIZACION N° 20										
LICITACION : LP-SM-05-2017-FONDEPES-1			FECHA DE INICIO DE OBRA :		28-dic-17					
OBRA : REHABILITACIÓN DPA DE ACAPULCO			VALORIZACION N° :		20					
PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)			FECHA PRESUPUESTO :		30-jun-17					
CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS			P. REFERENCIAL S/I.G.V :		S/ 12,903,758.02					
UBICACIÓN : LOCALIDAD DE ACAPULCO-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES			P. CONTRATO S/I.G.V. :		S/ 12,903,758.02					
RESUMEN - PRESUPUESTO PRINCIPAL										
Item	Descripción	Presupuestado	Val. Acum. Anterior		Val. Actual		Val. Acumulada		Saldo por Valorizar	
			parcial S/.	%	parcial S/.	%	parcial S/.	%	parcial S/.	%
001	ESTRUCTURA	4,321,209.27	3,373,413.50	78.07%	98,650.27	2.28%	3,472,063.77	80.35%	849,145.50	19.65%
002	ARQUITECTURA	2,045,791.20	626,236.66	30.61%	37,570.71	1.84%	663,807.37	32.45%	1,381,983.83	67.55%
003	INSTALACIONES SANITARIAS	945,304.57	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	945,304.57	100.00%
004	INSTALACIONES ELECTRICAS	387,975.12	40,376.41	10.41%	0.00	0.00%	40,376.41	10.41%	347,598.71	89.59%
005	OBRAS EN MAR	2,059,284.99	1,011,099.02	49.10%	51,786.51	2.51%	1,062,885.53	51.61%	996,399.46	48.39%
006	EQUIPO Y MOBILIARIO	1,175,823.00	590,775.00	50.24%	0.00	0.00%	590,775.00	50.24%	585,048.00	49.76%
	COSTO DIRECTO	10,935,388.15	5,641,900.59		188,007.49		5,829,908.08		5,105,480.07	
	GASTOS GENERALES 17.90%	1,957,434.48	1,009,900.23		33,653.34		1,043,553.57		913,880.91	
	UTILIDAD 0.10%	10,935.39	5,641.90		188.01		5,829.91		5,105.48	
	SUB TOTAL	12,903,758.02	6,657,442.72		221,848.84		6,879,291.56		6,024,466.46	
	IGV 18.00%	2,322,676.44	1,198,339.69		39,932.79		1,238,272.48		1,084,403.96	
	TOTAL	15,226,434.46	7,855,782.41		261,781.63		8,117,564.04		7,108,870.42	
	AVANCE 100.00%		51.59%		1.72%		53.31%		46.69%	





**CONSORCIO
ZORRITOS**


**OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMARCADERO
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO
DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN
TUMBES"**


**6 GRAFICO DE CURVA "S" AVANCE PROGRAMADO Vs.
AVANCE EJECUTADO**

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 20 – JULIO 2019




"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"

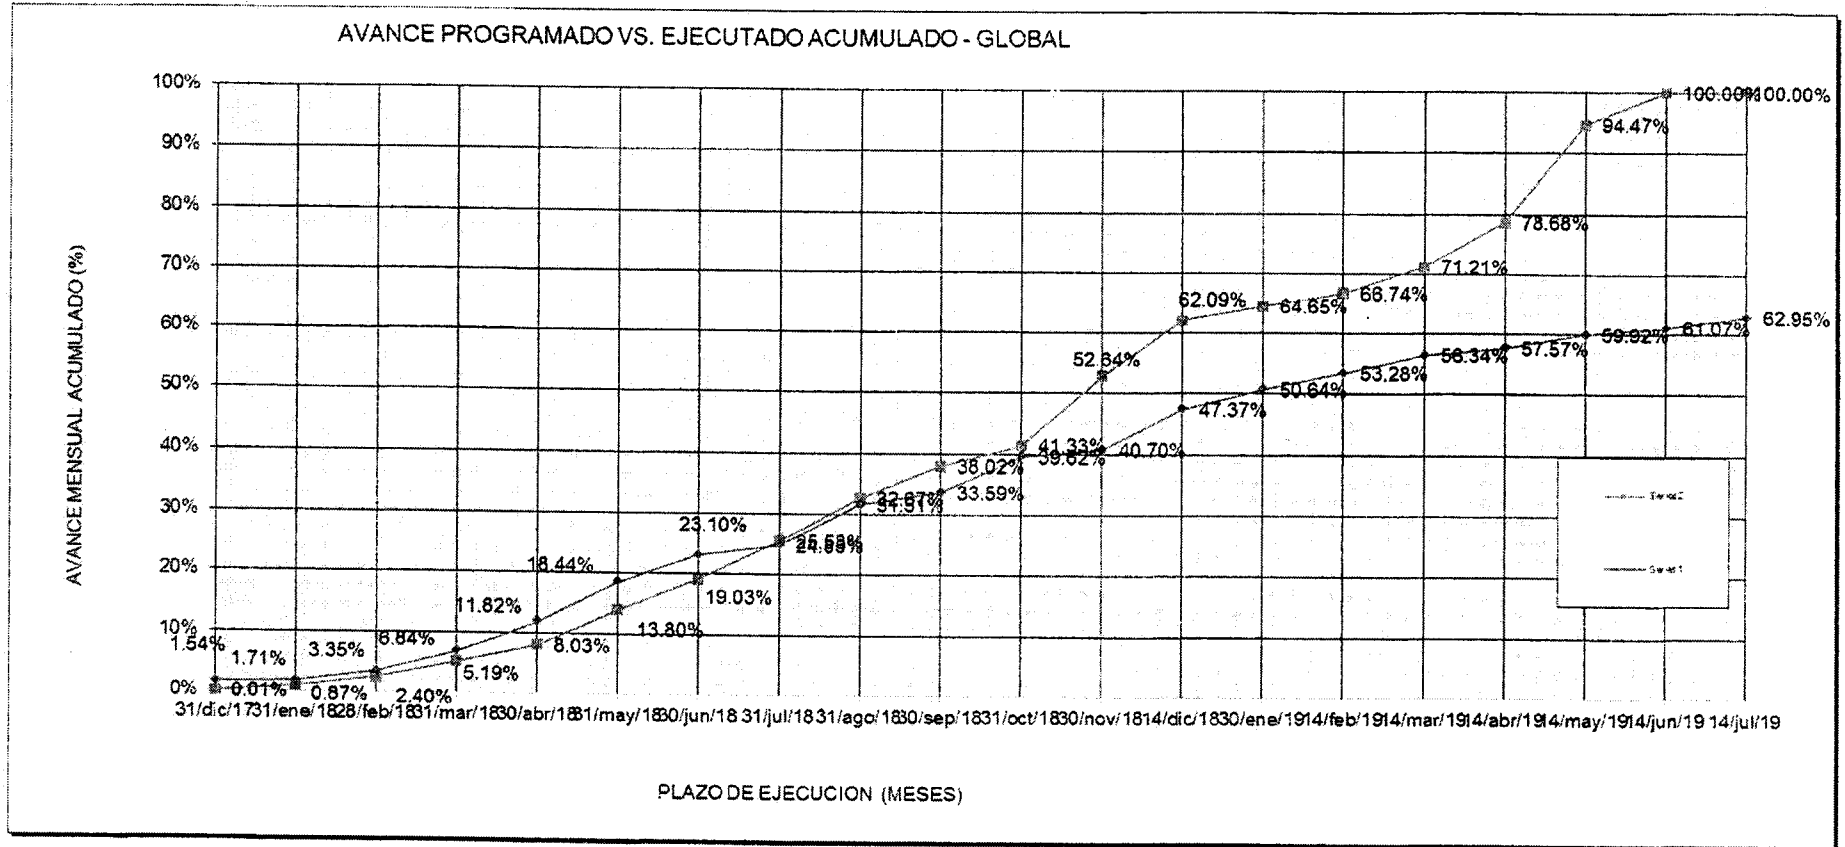



CONSORCIO ZORRITOS
 FERNANDO LEGADO
 Responsable de ODT


"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"

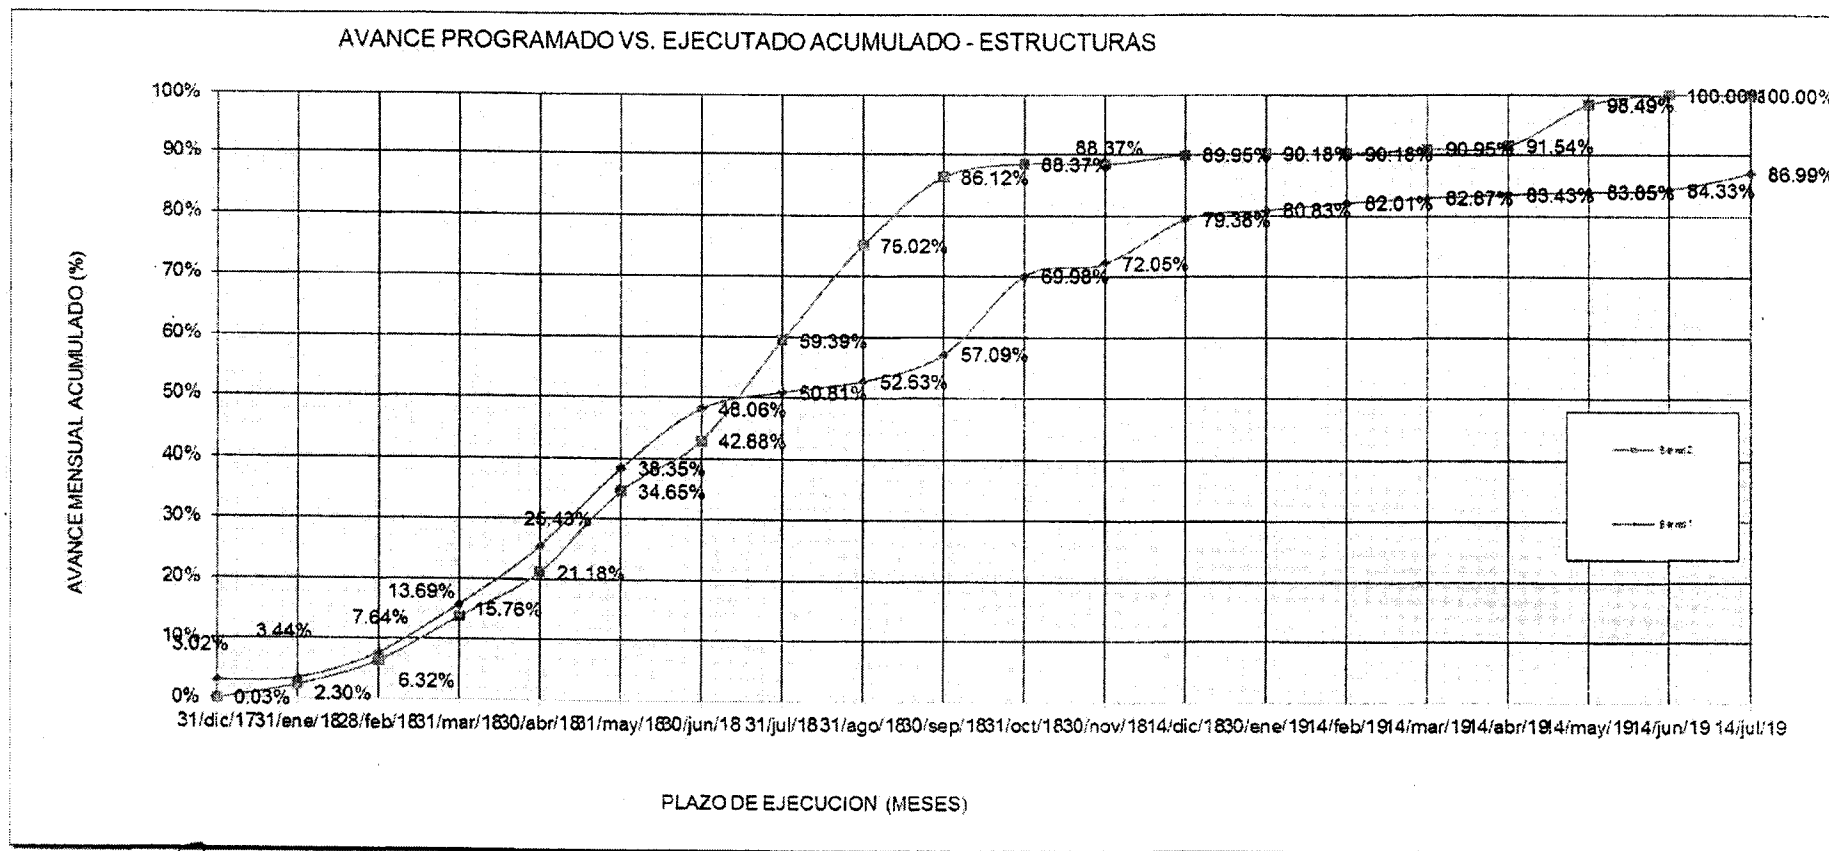


CONSORCIO ZORRITOS
Fernando Regalado Obitas
FERNANDO REGALADO OBITAS
 Residente de Obra

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"

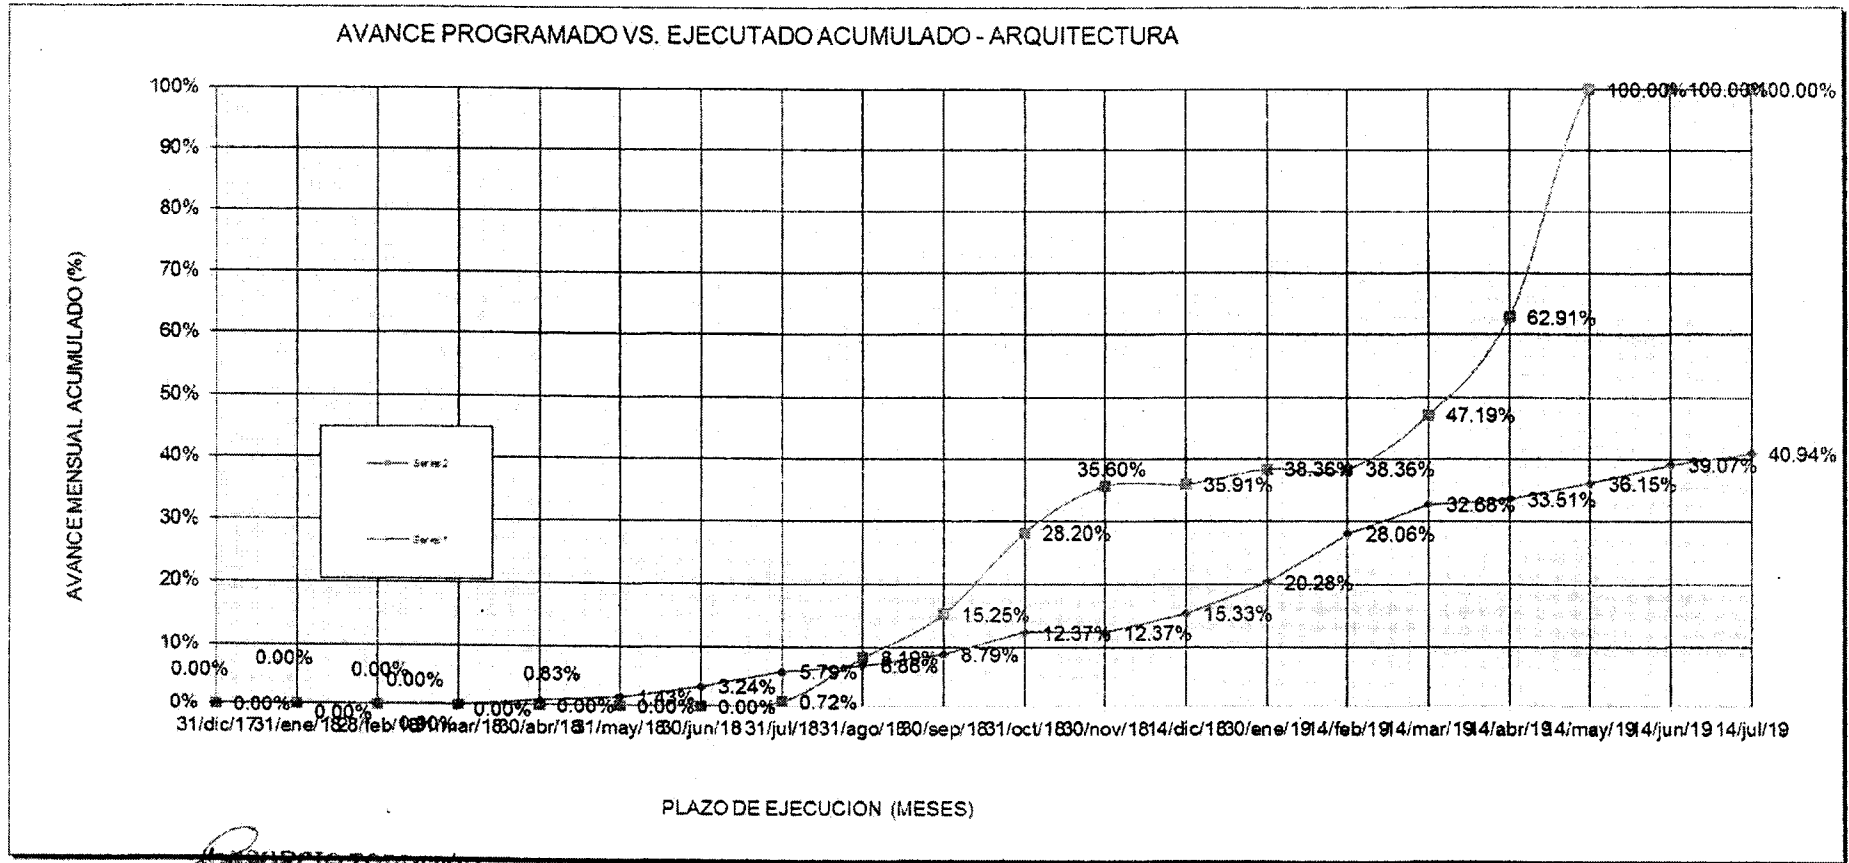


CONSORCIO ZORRITOS

 FERNANDO REGALADO OBLITAS
 Responsable de Obra

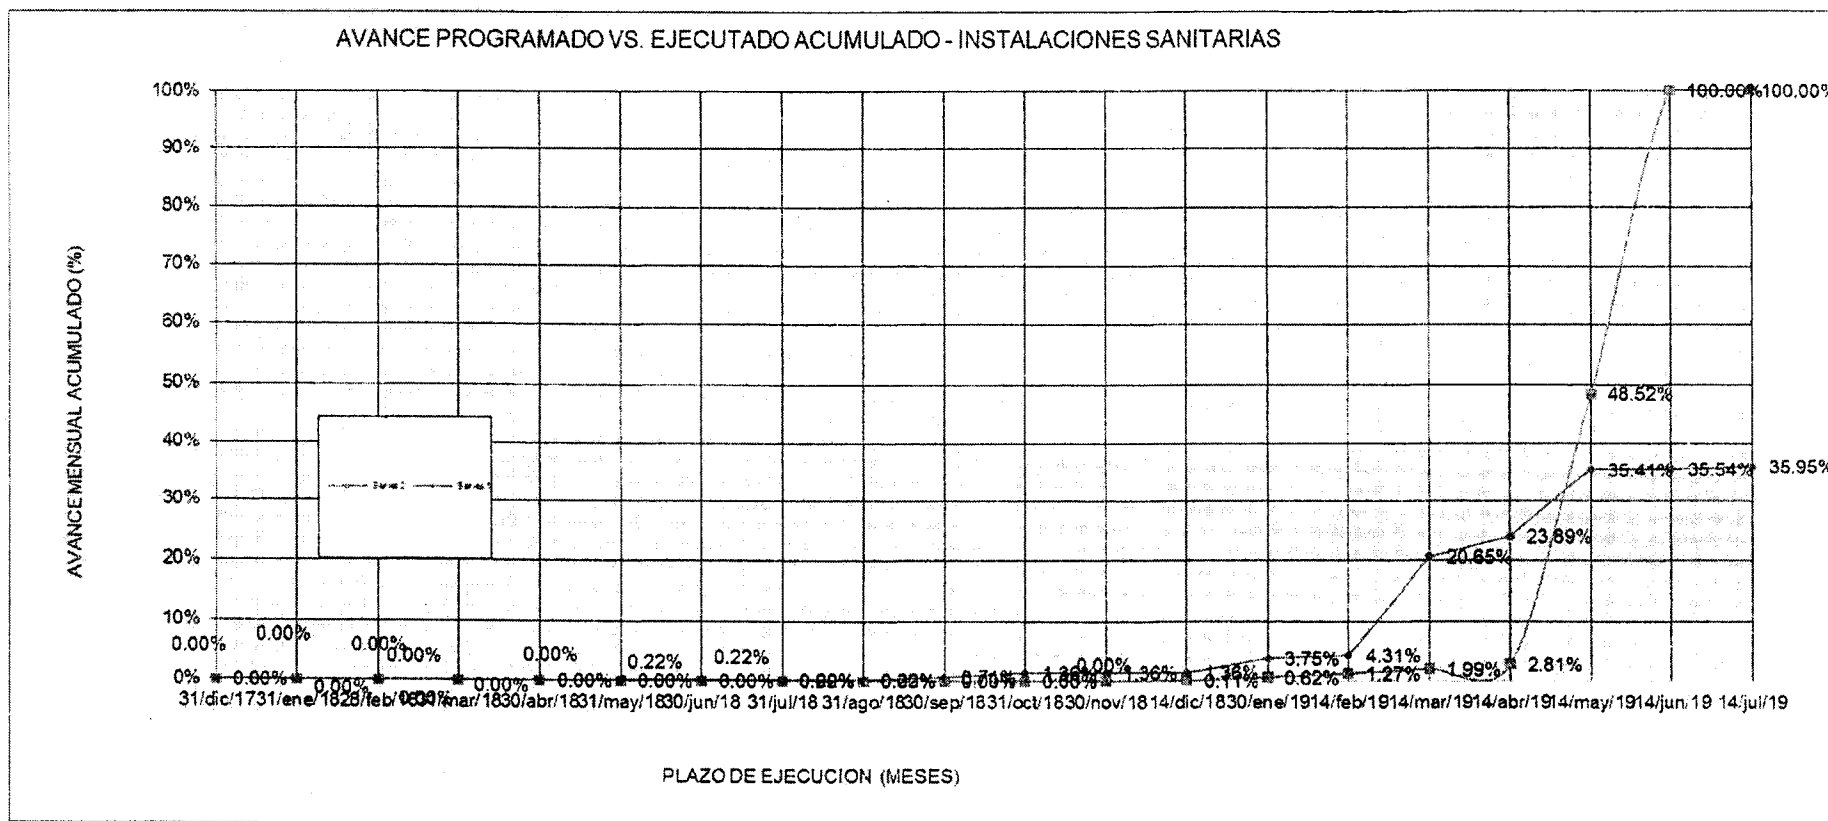"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"




CONSORCIO ZORRITOS
[Signature]
ING. FERNANDO REGALADO OBLITA
 Residente de Obra

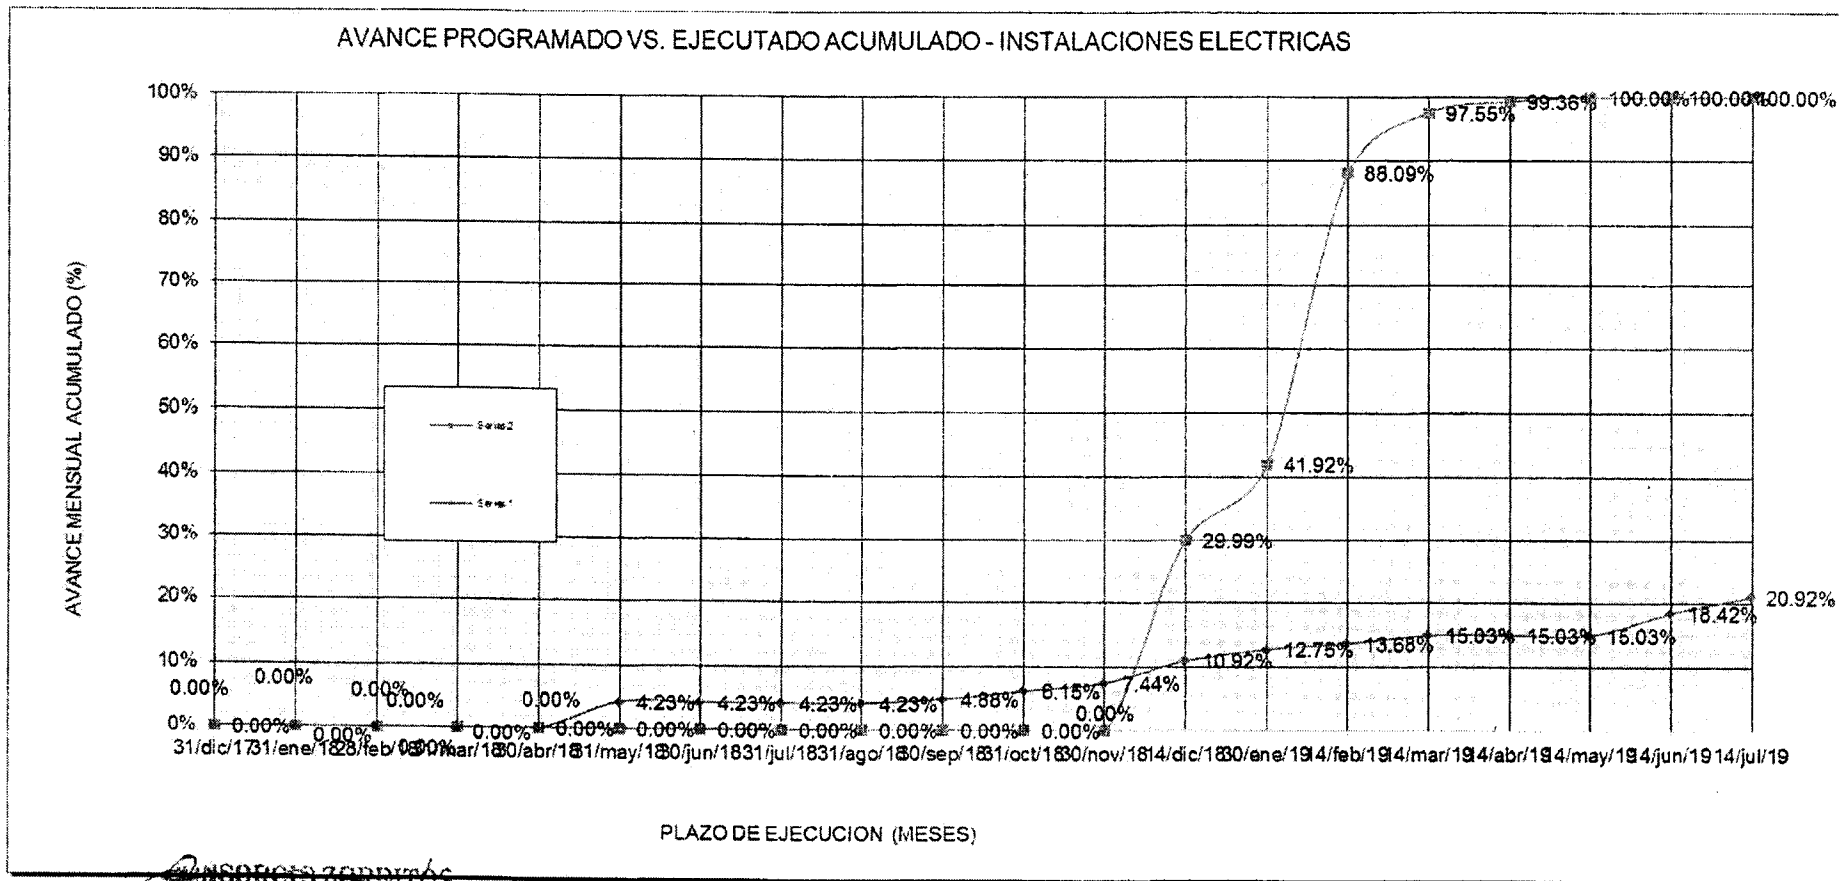"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"




CONSORCIO ZORRITOS
[Signature]
 FERNANDO REGALADO BLITAS
 Ing. Responsable de Obra

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"

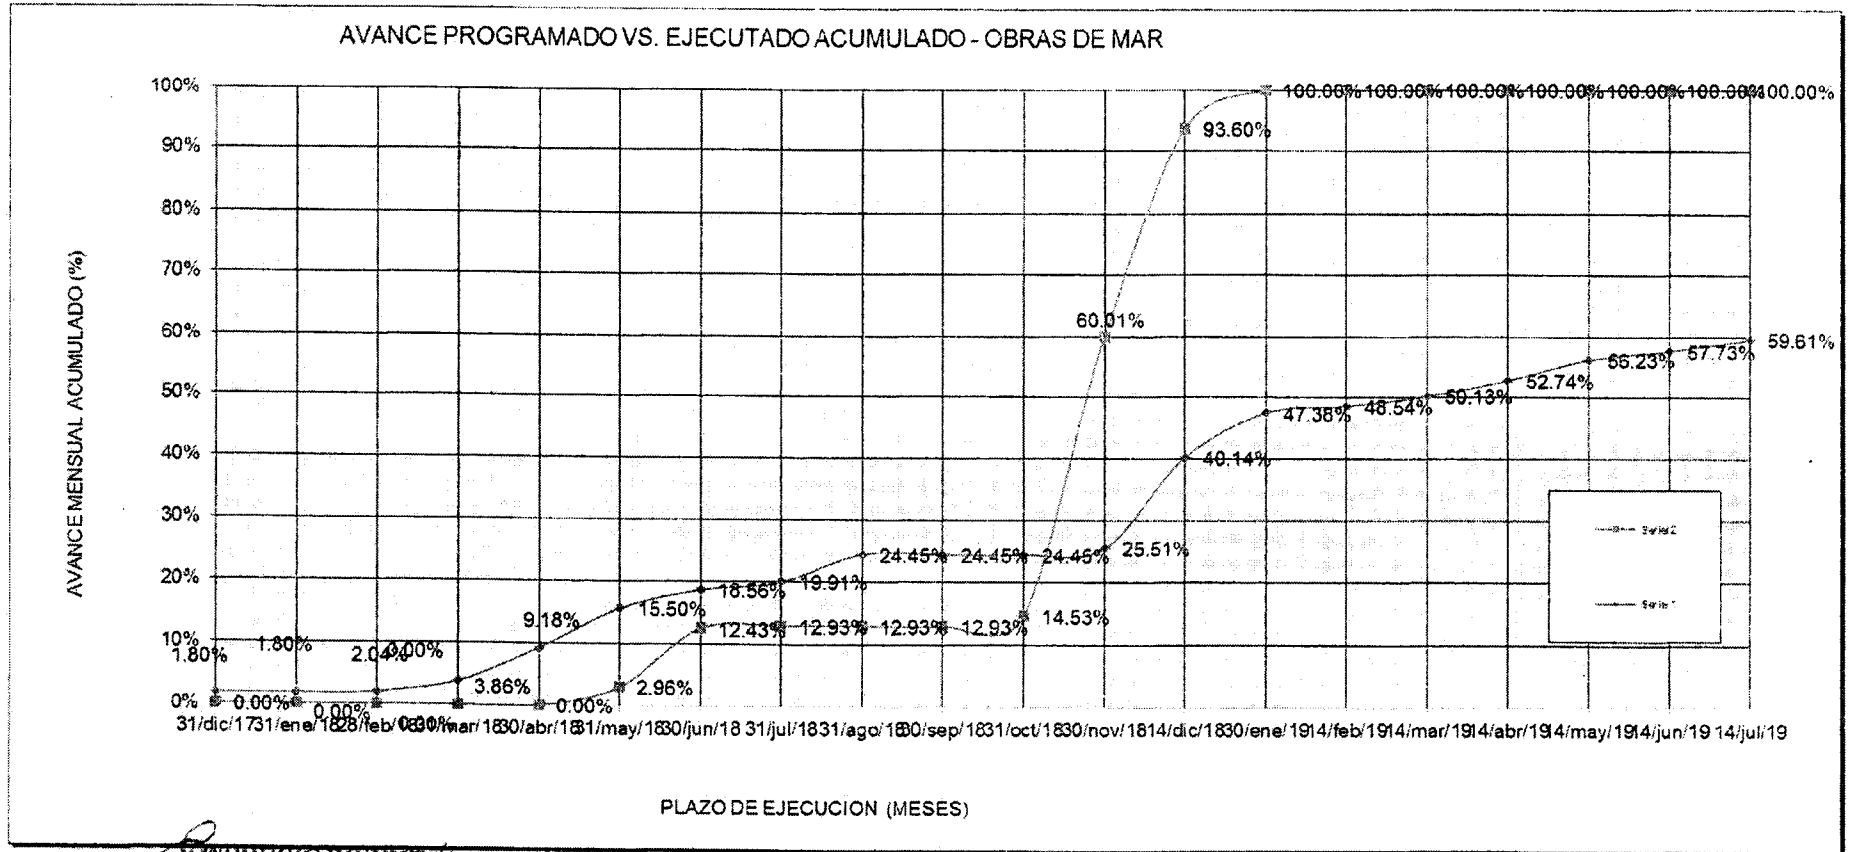

CONSORCIO ZORRITOS
[Firma]
 ING. FERNANDO REGALADO OBILITA
 Residente de Obra


"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"

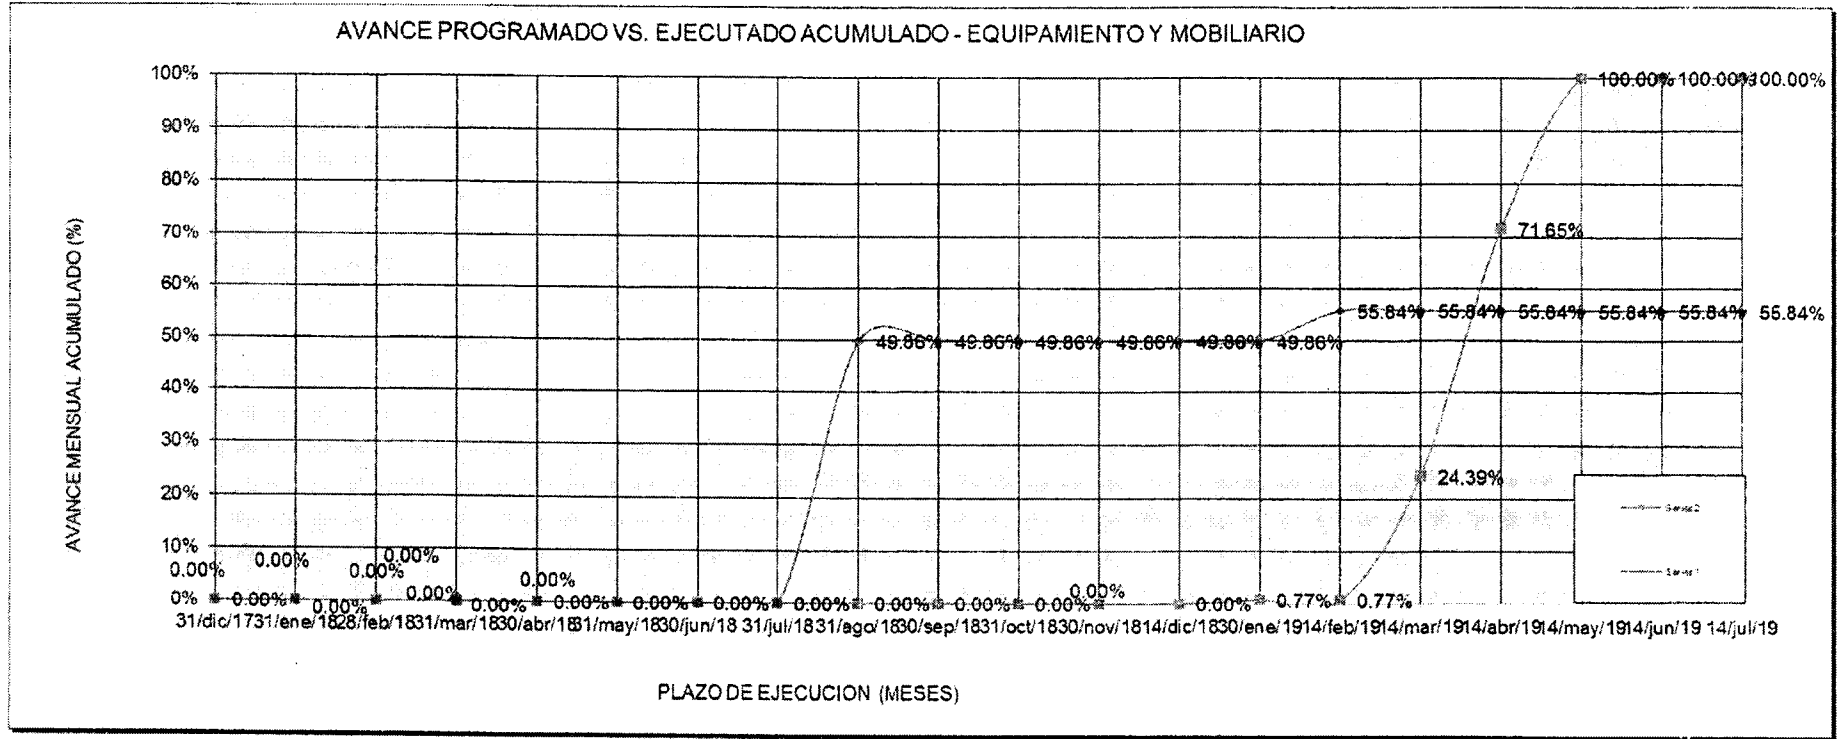


CONSORCIO ZORRITOS
[Signature]
 GERENTE GENERAL
 UGAR ERNANDEZ GALINDO
 UGAR ERNANDEZ GALINDO
 UGAR ERNANDEZ GALINDO



7 SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD





LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
SUELO MÁS BIEN.

JR. CALLE DE N. 206 - EL SALVADOR - TUMBES
2-222010 - TEL. 02243321 - RPAI 902291021 - Tumbes

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Tumbes, Julio del 2019

CARTA N° 431- 2019/SUELO MAS-LAB.

SEÑOR:
CONSORCIO ZORRITOS
Ciudad.-

ASUNTO : ENSAYOS DE LABORATORIO

REF : OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS,
PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR REGION TUMBES "

De nuestra consideración:

Por la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente y a la vez alcanzo a su digno despacho los trabajos convenientes de la obra de la referencia:


02 ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO


Le reitero Ud., mi salud y estima,

Atentamente,

Suelo Más Bien.


GENERAL MANAGER
GENERAL





LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
SERIO MASTERTI

BOULEVARD N° 218 - EL MILAGRO - TUMBES
TEL: 050900 - CRI: 979945891 - RUT: 68927 - Tumbes

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESMARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPUICO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIERANTE VILLAR REGION TUMBES"
SOLICITANTE: CONSORCIO ZORRITOS
FECHA : 24/07/2019

DENSIDAD IN SITU

CAPA: SUB BASE

Lugar	CAMARA FRIGORIFICA DE 5TN	
	P1	P2
01 - Punto	3715	3710
02 - Peso del Material Neto	6500	6500
03 - Peso de la Arena + Frasco	2608	2611
04 - Peso de la Arena que Queda en el Embudo	1495	1495
05 - Peso de la Arena en el Huleco	2397	2394
07 - Densidad de la Arena	1.45	1.45
08 - Volumen del Huleco	1653	1651
09 - Peso de la Grava Peso al Aire	800	815
10 - Volumen de la Grava Desplazada	307	312
11 - Peso Neto del Suelo	2915	2895
12 - Volumen del Suelo	1346	1338
13 - Densidad Humedad	2.16	2.15
14 - % de la Humedad Contendida	6.3	6.5
15 - Densidad Seca	2.03	2.02
16 - Densidad Determinada en Curva	2.10	2.10
17 - Porcentaje de Compactación	96.6	98.2
18 - Fomentale de Compactación Especifica		
19 - Espesor Compactado		


CONTROL DE HUMEDAD

Recipients N°	01	02
01 - Suelo Humedo + Recipiente (gr.)	67.9	66.4
02 - Suelo Seco + Recipiente (gr.)	65.2	63.7
03 - Peso de Agua (gr.)	2.7	2.7
04 - Peso de Recipiente (gr.)	22.2	22.2
05 - Suelo Seco (gr.)	43.0	41.5
06 - % de Humedad	6.3	6.5

OBSERVACION: Afirmado Granular
DMAx: 2.10gr/cm3



SERIO MASTERTI
ING. SUPERIOR DE INGENIERIA EN GEOTECNIA
CIP 138913



LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
SUELO MAS ELIRI

JR. CALLE DE N. 218 - EL MILAGRO - TUMBES
252900 - TEL. 07945321 - 1894 - 688277 - Tumbes



OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR REGION TUMBES"
SOLICITANTE: CONSORCIO ZORRITOS

DENSIDAD EN IN SITU
SUB BASE

p1



p2



SUELO MAS ELIRI
ING. CONSTRUCTOR
CONTRALMIRANTE VILLAR
N.º 135513



LABORATORIO DE SUELOS Y CONCEPTO
SUELO MÁS LIMPIO

AV. CONSOLIDADA N° 208 - EL MILAGRO - TUMBES
52-022090 - TEL. 072645821 - RPN 052010581 - Tumbes

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Tumbes, julio del 2019

CARTA N° 421-2019/SUELO MAS LIMPIO

SEÑOR:
CONSORCIO ZORRITOS
Ciudad,

ASUNTO : ENSAYOS DE LABORATORIO

REF : ORRA, "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA
CONTRALMIIRANTE VILLAR REGION TUMBES"

De nuestra consideración:

Por la presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez alenczo a su digno despacho
los trabajos convenientes de la obra de la referencia.

02 ENSAYOS DE ROTURAS DE PROBETAS

Le reitero Ud., mi saludo y estima.

Atentamente,

MS
Suelo Más Limpio

MS
Manuel Noriega Guerrero
GERENTE GENERAL





LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
SUELO MÁS E.I.R.L.

JR. CAJUELA N° 212 - EL MILAGRO - TUMBES
TEL: 922000 - CEL: 972045321 - RPM: 0688277 - Tumbes


OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS,
PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR REGION TUMBES"
SOLICITANTE: CONSORCIO ZORRITOS
FECHA : 18/07/2019

ENSAYO A LA COMPRESION

N°	ESTRUCTURA	FECHA DE VACIADO	FECHA DE ROTURA	EDAD EN DIAS	CARGA EN KN	CARGA EN KILOS	AREA (cm²)	RESISTENCIA (KG/ cm²)	%	DISEÑO	OBSERVACIONES
01	FRENTE I AREA MUELLE ELEMENTO - CAJUELA	11-07-2019	18-07-2019	07	169	17233	78.54	219	78	280	Los Testigos fueron traídos por el solicitante, observaron los ensayos el Contratista de la obra, y jefe del Laboratorio
02	FRENTE I AREA MUELLE ELEMENTO - CAJUELA	11-07-2019	18-07-2019	07	181	18456	78.54	235	83	280	
											EDAD PORCENTAJE
											(DIAS) %
											7 55 - 70
											14 75 - 85
											21 85 - 95
											28 100-Mas


NOTA: - Se deja constancia que el laboratorio SUELO MÁS no ha participado en la elaboración de los testigos de concreto.
- Los Ensayos de Roturas se han realizado con Máquina Calibrada (Certificado N° LF - 149- 2019)

1KN = 101.972 Kg.



SUELO MAS E.I.R.L.
Ing. CIVIL FERNANDO RENATO VARGAS MORAN
DIP. 136833

386






LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
SUELOS MÁS ELRL

IR CAJILLER N° 248 - EL ALFACRO - TUMBES
TEL: 029004 - CEL: 929169921 - RPN: 92916991 - Tumbes

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR REGION TUMBES"
SOLICITANTE: CONSORCIO ZORRITOS

ENSAYO A LA COMPRESION

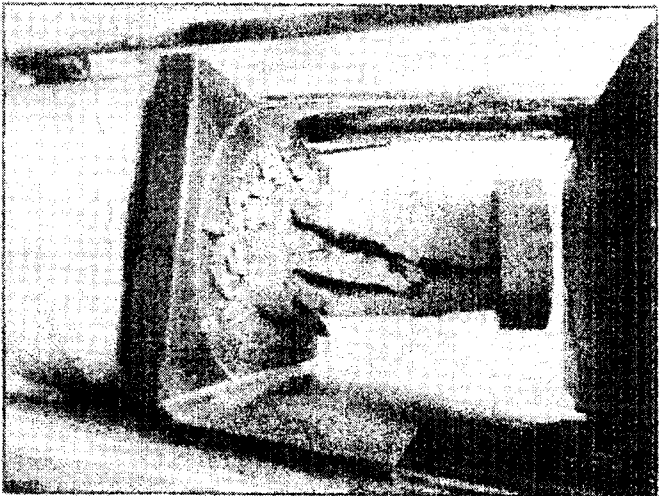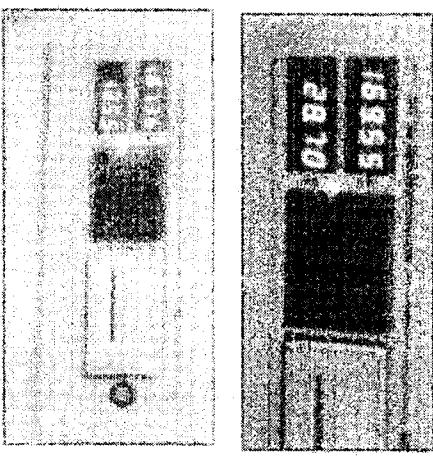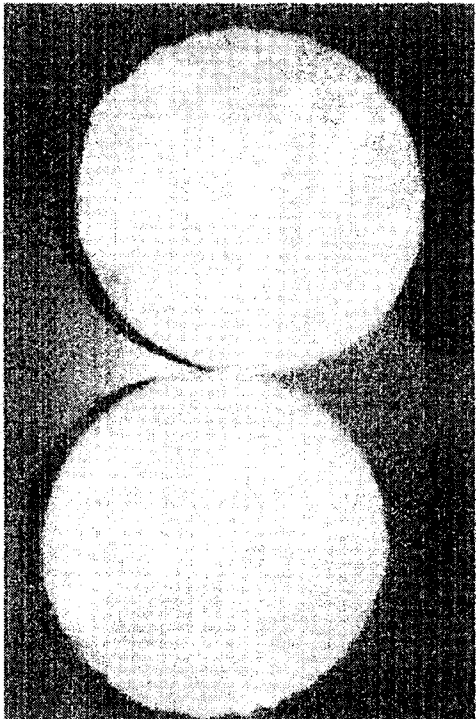

SUELO MAS ELRL
ING. GONZALO VARGAS ROSAS
C.R. 13623

CONSORCIO ZORRITOS INC.
Villanueva
Villanueva
REGISTRO: INDIOS CARRERA-AMALGAMACION N° 0241892



LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
SUELO MÁS E.I.R.L.

JR. CALLEDENES N° 218 - EL MILAGRO - TUMBES
☎ 529000 CFI - 972915321 - RPM 972915321 - Tumbes

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Tumbes, julio del 2019

CARTA N° 393-2019/SUELO MAS-LAB.

SEÑOR:
CONSORCIO ZORRITOS
Ciudad.-

ASUNTO : ENSAYOS DE LABORATORIO

REF : OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA
CONTRALMIRANTE VILLAR REGION TUMBES"

De nuestra consideración:

Por la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente y a la vez alcanzo a su digno despacho los trabajos convenientes de la obra de la referencia.

- 02 ENSAYO DE ROTURAS DE PROBETAS

Le reitero Ud., mi saludo y estima.

Atentamente,

Suelo Más E.I.R.L.
[Firma]
Miguel Ángel Córdova
Gerente General






OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESMBARCO DE PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS,
 PROVINCIA CONTRALMIIRANTE VILLAR REGION TUMBES"
 SOLICITANTE: CONSORCIO ZORRITOS
 FECHA : 08/07/2019

ENSAYO A LA COMPRESION


N°	ESTRUCTURA	FECHA DE VACIADO	FECHA DE ROTURA	EDAD EN DIAS	CARGA EN KN	CARGA EN KILOS	AREA (cm ²)	RESISTENCIA (KG/ cm ²)	%	DISEÑO	OBSERVACIONES
01	FRONTE 4 AREA FRIOS ELEMENTO - FALSO CEMENTO EJES 1	01-07-2019	08-07-2019	07	135	13766	176.71	78	78	100	Los Testigos fueron traídos por el Solicitante, Contralista de la obra y jefe del laboratorio
02	FRONTE 4 AREA FRIOS ELEMENTO - FALSO CEMENTO EJES A	01-07-2019	08-07-2019	07	133	13562	176.71	76	76	100	
EDAD PORCENTAJE (DIAS) 100 - MAS 28 85 - 85 21 75 - 85 14 55 - 70 7 %											


NOTA: - Se deja constancia que el laboratorio **SUELO MAS** no ha participado en la elaboración de los testigos de concreto. Los Ensayos de Roturas se han realizado con Máquina Calibrada (Certificado N° LF - 149 - 2019)

1KN = 101.972 KG.



SUELO MAS E.I.R.L.
 ROL. CALIFICADO DE SUELOS Y CONCRETO
 O.M. 138833







LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
SUELOS MAS E.I.R.L.


JR. CALLE DUEÑEN 2166 - EL VILLAGIO DE TUMBES
CALLE 1011 - 07090091 - R.M.V. 07090091 - Tumbes

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA
LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIERANTE VILLAR
REGION TUMBES"
SOLICITANTE: CONSORCIO ZORRITOS

ENSAYO A LA COMPRESION

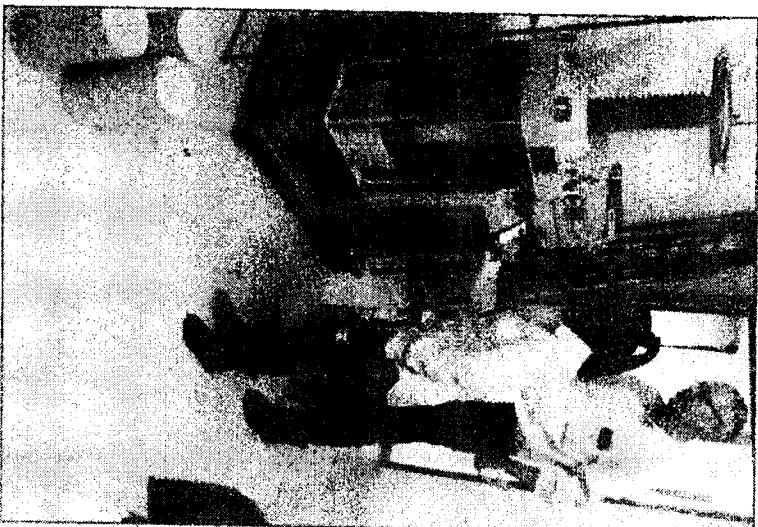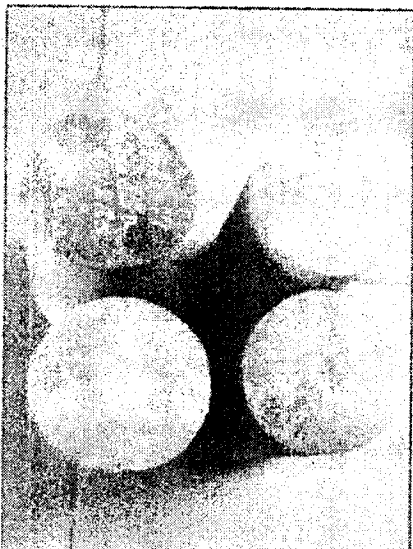

REGISTRO PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL N.º 221280
CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
Vobº



SUELOS MAS E.I.R.L.
ING. CAROL PARRILLO PARRILLO VARGAS MORALES
CIP: 138833



LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
SUELO MÁS FIRME

AV. CANTILLAS N° 1001 - J. A. PESQUERO, TUMBES
TEL: 052400 - 011 - 57251001 - 8041407221001 - Tumbes

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Tumbes, Julio del 2019

CARTA N° 395-2019/SUELO MAS-FIRM

SEÑOR:
CONSORCIO ZORRITOS
Ciudad:

ASUNTO : ENSAYOS DE LABORATORIO

**REF : OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESBARCACADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA
CONTRAL MIRANTE VILLAR REGION TUMBES"**

De nuestra consideración:

Por la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente y a la vez alcanzo a su digno despacho los trabajos convenientes de la obra de la referencia.

03 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO


Le reitero Ud., mi saludo y estima.

Atentamente,

Suelo MAS FIRME

MARCELO NORIEGA GUERRERO
CONDOMINIO GENERAL





LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
SUELO MAS E.I.R.L.

JR CALLE DEL N. 241 - EL MILAGRO, TUMBES
52960 - TEL. 97445791 - 974458277 - Tumbes.

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRAMIRANTE VILLAR REGION TUMBES"
SOLICITANTE: CONSORCIO ZORRITOS
FECHA : 10/07/2019

DENSIDAD IN SITU

CAPA: BASE

Lugar:	PATIO DE MANIOBRAS		
	P1	P2	P3
01 - Punto			
02 - Peso del Material Neto	3844	3853	3850
03 - Peso de la Arena + Frasco	6500	6500	6500
04 - Peso de la Arena que Queda	2615	2618	2614
05 - Peso de la Arena en el Embudo	1495	1495	1495
06 - Peso de la Arena en el Huevo	2390	2387	2391
07 - Densidad de la Arena	1.45	1.45	1.45
08 - Volumen del Huevo	1648	1646	1648
09 - Peso de la Grava Peso al Aire	895	885	892
10 - Volumen de la Grava Desplazada	344	340	343
11 - Peso Neto del Suelo	2919	2968	2958
12 - Volumen del Suelo	1304	1306	1305
13 - Densidad Humedad	2.26	2.27	2.26
14 - % de la Humedad Contendida	7.5	7.7	7.3
15 - Densidad Seca	2.10	2.10	2.10
16 - Densidad Determinada en Curva	2.10	2.10	2.10
17 - Porcentaje de Compactación	100	100	100
18 - Porcentaje de Compactación Especifica			
19 - Espesor Compactado			

CONTROL DE HUMEDAD

Recipiente N°	01	02	03
01 - Suelo Humedo + Recipiente (gr.)	66.6	65.5	64.7
02 - Suelo Seco + Recipiente (gr.)	63.5	62.4	61.8
03 - Peso de Agua (gr.)	3.1	3.1	2.9
04 - Peso de Recipiente (gr.)	22.2	22.2	22.2
05 - Suelo Seco (gr.)	41.3	40.2	39.6
06 - % de Humedad	7.5	7.7	7.3


OBSERVACION: Afirmado Granular

OMAX: 2.10gr/cm3



SUELO MAS E.I.R.L.
ING. CIVIL ROBERTO RIVERO VARGAS MABAY
C.I.P. 118833

REGISTRO INDEFINIDO DE IDENTIFICACION N° 021238



LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
SUELO MAS E.I.R.L.

IN CALLE N. 218 - EL SALVARO - TUMBES
25 22490 - TEL. 97243921 - 404 488227 - Tumbes

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ANTEANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPUICO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIHRANTE VILLAR REGION TUMBES

SOLICITANTE: CONSORCIO ZORRITOS

DENSIDAD EN IN SITU
BASE



P1



P2




P3



REGISTRO NACIONAL DE NEGOCIACIONES N° 021238



SUELO MAS E.I.R.L.
ING. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ROSAS
C.M. 138523



LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
SUELO MAS E.I.R.L.

JR. CAJALILLA N° 218 - EL MILAGRO - TUMBES
☎ 052920 - 011 972915921 - RPA N° 972915921 - Tumbes

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Tumbes, julio del 2019

CARTA N° 380- 2019/SUELO MAS-LAB.

SEÑOR:
CONSORCIO ZORRITOS
Ciudad.

ASUNTO : ENSAYOS DE LABORATORIO

REF : OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPIJICO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA
CENTRAL MIRANTE VILLAR REGION TUMBES"

De nuestra consideración:

Por la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente y a la vez alcanzo a su digno despacho los trabajos convenientes de la obra de la referencia.

DE ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO


Le reitero Ud., mi saludo y estima.

Atentamente,

Suelo MAS E.I.R.L.

M
Manuel Noriega Guerrero
GERENTE GENERAL





LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
SUELO MAS E.I.R.L.

RE CALLE N° 298 - 10. MICHIGUERO - TUMBES
TEL: 0729152931 - RPN: 6498277 - Tumbes

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIERANTE VILLAN REGION TUMBES"
SOLICITANTE: CONSORCIO ZORRITOS
FECHA : 05/07/2019

DENSIDAD IN SITU


CAPA: BASE

Lugar:	PATIO DE MANOSERAS		
	P1	P2	P3
01 - Punto			
02 - Peso del Material Neto	3841	3845	3840
03 - Peso de la Arena + Frasco	6500	6500	6500
04 - Peso de la Arena que Queda	2610	2611	2613
05 - Peso de la Arena en el Frasco	1495	1495	1495
06 - Peso de la Arena en el Hueco	2395	2394	2392
07 - Densidad de la Arena	1.45	1.45	1.45
08 - Volumen del Hueco	1651	1651	1649
09 - Peso de la Grava Peso al Aire	840	860	855
10 - Volumen de la Grava Desplazada	323	330	329
11 - Peso Neto del Suelo	3001	2985	2985
12 - Volumen del Suelo	1328	1321	1320
13 - Densidad Humedad	2.26	2.26	2.26
14 - % de la Humedad Contendida	7.2	7.3	7.2
15 - Densidad Seca	2.10	2.10	2.10
16 - Densidad Determinada en Curva	2.10	2.10	2.10
17 - Porcentaje de Compactación	100	100	100
18 - Porcentaje de Compactación Especifica			
19 - Espesor Compactado			

CONTROL DE HUMEDAD

Recipiente N°	01	02	03
01 - Suelo Humedo + Recipiente (gr)	65.3	64.7	65.3
02 - Suelo Seco + Recipiente (gr)	62.4	61.8	62.4
03 - Peso de Agua (gr)	2.9	2.9	2.9
04 - Peso de Recipiente (gr)	22.2	22.2	22.2
05 - Suelo Seco (gr)	40.2	39.6	40.2
06 - % de Humedad	7.2	7.3	7.2

OBSERVACION: Afirmado Granular
DMAX: 2.10gr/cm3



SUELO MAS E.I.R.L.
Ing. Cesar Eduardo SANCHEZ SANCHEZ
CIP 199933



LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
SUELO MAS E.I.R.L.

JR. CALVIDE N. 218 - EL MILAGRO - LIMA 5
D. 528866 - TEL. 011 7911291 - RPA 089977 - Punteo

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIERANTE VILLAR REGION TUMBES"
SOLICITANTE: CONSORCIO ZORRITOS

DENSIDAD EN IN SITU

BASE

P1



P2



P3






SUELO MAS E.I.R.L.

Mg. CONFESIONADO DE PERITOS ANGELES NICOLA
C.M. 128233

376

RESOLUCION INDI. 0001 RES. 2005 N. 021200





LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
SUELO MÁSTER SRL

IR CAHUPUE N. 243 - EL MILAGRO - TUMBES
Tel: 095000 - Cel: 979915991 - RPA: 0688977 - Tumbes

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR REGION TUMBES"
SOLICITANTE: CONSORCIO ZORRITOS
FECHA : 05/07/2019

DENSIDAD IN SITU

CAPA: SUB BASE


Lugar:	PATIO DE MANOSBRAS		
	P1	P2	P3
01 - Punto			
02 - Peso del Material Neto	3839	3849	3852
03 - Peso de la Arena + Frasco	6500	6500	6500
04 - Peso de la Arena que Queda	2614	2616	2612
05 - Peso de la Arena en el Embudo	1495	1495	1495
06 - Peso de la Arena en el Huero	2391	2389	2393
07 - Densidad de la Arena	1.45	1.45	1.45
08 - Volumen del Huero	1648	1647	1650
09 - Peso de la Grava Peso al Aire	901	880	900
10 - Volumen de la Grava Desplazada	346	338	346
11 - Peso Neto del Suelo	2938	2969	2952
12 - Volumen del Suelo	1302	1309	1304
13 - Densidad Humedad	2.26	2.26	2.26
14 - % de la Humedad Contendida	7.0	7.3	7.4
15 - Densidad Seca	2.10	2.10	2.10
16 - Densidad Determinada en Curva	2.10	2.10	2.10
17 - Porcentaje de Compactación	100	100	100
18 - Porcentaje de Compactación Especifica			
19 - Espesor Compactado			

CONTROL DE HUMEDAD

Recipiente N°	01	02	03
01 - Suelo Humedo + Recipiente (gr.)	66.2	64.7	62.7
02 - Suelo Seco + Recipiente (gr.)	63.3	61.8	59.9
03 - Peso de Agua (gr.)	2.9	2.9	2.8
04 - Peso de Recipiente (gr.)	22.2	22.2	22.2
05 - Suelo Seco (gr.)	41.1	39.6	37.7
06 - % de Humedad	7.0	7.3	7.4

OBSERVACION: Afirmada Granular
DMAx: 2.10gr/cm3

REGISTRO: INDCOEP/REG/MED/001/2019



SUELO MÁSTER SRL
ING. CONSTRUCTORAL NERUENDO VÁSQUEZ ROSAS
CIP 136633



LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
SUELO MAS EL R.L.

JR CALLE DON N. 210 - EL AMIAGRO - TUMBES
2022000 - TEL: 0729 62921 - 6041 - 66927 - Tumbes

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIIRANTE VILLAR REGION TUMBES"
SOLICITANTE: CONSORCIO ZORRITOS

DENSIDAD EN IN SITU
SUB BASE


P1



P2



P3



REGISTRO GUB. CONTRALMIIRANTE N° 021286




SUELO MAS EL R.L.
ING. DANIEL RAMIRO HERNANDEZ MORALES
D.P. 128833

REGISTRO DE PROBETAS

"Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Acapulco, distrito de Zorritos, Provincia Constitucional Vilar, Región Tumbes"

ITEM	FECHA	FRENTE	N° DE PROTOCOLO -ÁREA	ELEMENTO	EJES	# PROBETAS	RESISTENCIA PROYECTO kg/cm ²	FECHA 7 DIAS	RES. 7 DIAS alcanzada kg/cm ²				FECHA 14 DIAS	RES. 14 DIAS alcanzada kg/cm ²				CEMENTO - TIPO
									CST	CZ	CST	CZ		% ALCANZADO	CST	CZ	CST	
GRUPO 05	11/07/2019	FRENTE I	NRHLL	CANCHA			280	10/07/2019			0.00%	0.00%	08/08/2019			0.00%	0.00%	V
GRUPO 05	11/07/2019	FRENTE I	HRD	COLUMNETAS VIGETAS			215	10/07/2019			0.00%	0.00%	08/08/2019			0.00%	0.00%	V

CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES



379




REGISTRO DE PROBETAS

"Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Acapico, distrito de Zorritos, Provincia Constitucional de Yllar, Región Tumbes".

ITEM	FECHA	FRENTE	N° DE PROTOCOLO - AREA	ELEMENTO	EJES	# PROBETAS	RESISTENCIA PROYECTO kg/cm2	FECHA 7 DIAS	RES. 7 DIAS alcanzada kg/cm2		% ALCANZADO		FECHA 28 DIAS	RES. 14 DIAS alcanzada kg/cm2		% ALCANZADO		CEMENTO TIPO
									EST	CZ	EST	CZ		EST	CZ	EST	CZ	
GRUPO 05	11/07/2019	FRENTE I	MUEDE	GRUELA			280	08/07/2019			0.00%	0.00%	08/08/2019			0.00%	0.00%	V
																		V

CONSORCIO ZORRITOS



372



LABORATORIO RESISTENCIAS Y CONTROL
SITIO MASTAB
 CALLE EN LA COMUNIDAD DE MASTAB, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA
 DE TUMBES, REGION TUMBES

"LADO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

Tumbes, Julio del 2019

CARTA N° 374- 2019/SITIO MASTAB.

**SEÑOR:
 MARIANO ZORRITOS
 CHURBE**

ASUNTO : ENSAYOS DE LABORATORIO

**REF : ORNA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMARCADERO PESQUERO
 ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA
 CONTRALMIANTE VILAR REGION TUMBES"**

De nuestra consideración:

con la presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez akarzo a su digno despacho
 los trabajos comprometidos de la obra de la referenda:


07 ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO


le refero Ud., mi saludo y estima.

Atentamente,

Sitio MASTAB.

Manoel Martínez Guerrero
 Gerente General





LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
SUELO MAS ETRL

JR CALLE DE N. 208 - EL MILAGRO, TUMBES
SUSANA - TEL: 029210211 - FAX: 0292111000 - E-mail:

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESMARCADERO PENUEBO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAWILCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTIA/ARRIARANTE VILLAR REGION TUMBES"
SOLICITANTE: CONSORCIO ZORRITOS
IFCMA : 24/06/2019

DENSIDAD IN SITU

CAPA: SEGUNDA CAPA DE BASE	Lugar:	PUNTO DE MUESTREO			
		P1	P2	P3	P4
01 - Punto		3840	3846	3855	3846
02 - Peso del Material Hedo		6500	6500	6500	6500
03 - Peso de la Arena + Fango		2110	2612	2615	2619
04 - Peso de la Arena que queda		1495	1495	1495	1495
05 - Peso de la Arena en el Embudo		2395	2498	2390	2392
06 - Peso de la Arena en el Huevo		145	145	145	145
07 - Densidad de la Arena		1652	1650	1648	1649
08 - Volumen del Huevo		900	905	890	895
09 - Peso de la arena Peso al Aire		346	348	342	346
10 - Volumen de la Grava Desplazada		2840	2942	2965	2969
11 - Peso Neto del Suelo		1306	1302	1306	1313
12 - Volumen del Suelo		225	225	225	226
13 - Densidad Humedad		74	74	74	72
14 - % de la Humedad Contendida		2.10	2.10	2.10	2.10
15 - Densidad Seca		2.10	2.10	2.10	2.10
16 - Densidad Determinada en Curva		100	100	100	100
17 - Porcentaje de Compactación					
18 - Porcentaje de Compactación Especifica					
19 - Espesor Compactado					


CONTROL DE HUMEDAD

Recipiente N°	U1	02	03	04
01 - Suelo Humedo + Recipiente (gr)	66.2	62.7	66.6	65.8
02 - Suelo Seco + Recipiente (gr)	63.3	59.9	64.5	62.4
03 - Peso de Agua (gr)	2.9	2.8	3.1	2.9
04 - Peso de Recipiente (gr)	22.2	22.2	22.2	22.2
05 - Suelo seco (gr)	41.1	37.7	41.3	40.2
06 - % de Humedad	7.0	7.4	7.5	7.2

OBSERVACION: Atenuada Granujin
OMAK 210gr/anz



SUELO MAS ETRL
ING. CARLOS ALBERTO MORALES VILLAR
CIP 19663



LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
SITIO MASERIL

JR. CAHUELO N.º 49 - EL MILAGRO - IQUIQUE
220000 - TEL. 02123421 - RPA 168077 - 3 Huecos

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIENTE VII IAR REGION IUBATES"
SOLICITANTE: CONSORCIO ZORRITOS

DENSIDAD EN IN SITU




P1




P2



REESTAL. HERRERA. CALIFICACION N° 02128



SUPLENTE
ING. CARLOS ANDRÉS HERRERA HERRERA
CIP: 128531



LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
SUELO MAS E.I.R.L.

BO. CAJULIPE N° 413 - EL AILAGRO - TUMBES
TEL: 522000 - CEL: 972715321 - RPM: 9089277 - Tumbes

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR REGION TUMBES"


SOLICITANTE: CONSORCIO ZORRITOS

DENSIDAD EN IN SITU


P3



P4



REGISTRO: INDIPOPI RESOLUCION N° 0222081



LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
SUELO MAS E.I.R.L.

JR. CAJAFIDE N° 918 - EL MILANCO - TUMBES
S/ Oficina - TEL. 072943921 - RPAI 668977 - Tumbes

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESMARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULLCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIANANTE VILLAR REGION TUMBES"
SOLICITANTE: CONSORCIO ZORRITOS
FECHA : 01/07/2019

DENSIDAD IN SITU

CAPA: SUB BASE


Lugar:	PATIO DE MANIOBRAS		
	P1	P2	P3
01 - Punto			
02 - Peso del Material Mido	3843	3847	3845
03 - Peso de la Arena + Frasca	6500	6500	6500
04 - Peso de la Arena que Queda	2608	2613	2611
05 - Peso de la Arena en el Embudo	1495	1495	1495
06 - Peso de la Arena en el Huerto	2397	2392	2394
07 - Densidad de la Arena	145	145	145
08 - Volumen del Huerto	1653	1649	1651
09 - Peso de la Grava Pesn al Aire	895	907	870
	344	349	334
10 - Volumen de la Grava Desplazada	2948	2940	2975
11 - Peso Neto del Suelo	1309	1300	1317
12 - Volumen del Suelo	2.25	2.26	2.25
13 - Densidad Humedad	7.0	7.5	7.1
14 - % de la Humedad Contendida	2.10	2.10	2.10
15 - Densidad Seca	2.10	2.10	2.10
16 - Densidad Determinada en Curva	2.10	2.10	2.10
17 - Porcentaje de Compactación	100	100	100
18 - Porcentaje de Compactación Especifica			
19 - Espesor Compactado			

CONTROL DE HUMEDAD


Recipiente N°	01	02	03
01 - Suelo Húmedo + Recipiente (gr.)	66.2	66.6	65.8
02 - Suelo Seco + Recipiente (gr.)	63.3	63.5	62.9
03 - Peso de Agua (gr.)	2.9	3.1	2.9
04 - Peso de Recipiente (gr.)	22.2	22.2	22.2
05 - Suelo Seco (gr.)	41.1	41.3	40.7
06 - % de Humedad	7.0	7.5	7.1

DMAX: 2.10gr/cm3

Observación: Afirmado Granular



SUELO MAS E.I.R.L.
Dra. CARMEN ANTONIO VILLAR
C.M. 12833



LABORATORIO DE SIEMOS Y CONCRETO
SIEMO MAS EIRE

JR. CALITIDE N° 218 - EL MIL AGRO - TUMES
26 07000 - DEL 97 246321 - 8179 - 609977 - Tumbes

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBAZADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIHRANTE VILLAR REGION TUMBES"
SOLICITANTE: CONSORCIO ZORRITOS

DENSIDAD EN IN SITU

p1



p2



p3



366



REGISTRO NACIONAL DE CONTRATOS N° 021730



SIEMO MAS EIRE
AV. FAH FERNANDEZ REAYTO N° 1034
CIP 130031



LABORATORIO DE SEILOS Y CONCRETO
SEILO MAS F.L.R.L.

IR. CUMBES N° 244 - EL MILAGRO - EL NIÑO
C/22000 - C/11.9800001 - RIM 902915501 - Tumbes

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Tumbes, Julio del 2019

CARTA N° 431 - 2019/SSEIO MAS-LAB.

SEÑOR:
CONSORCIO ZORRITOS
Ciudad.-

ASUNTO : ENSAYOS DE LABORATORIO

REF : OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS,
PROVINCIA CONTRALMIKANTE VILLAR REGION TUMBES "

De nuestra consideración:

Por la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente y a la vez alcanzo a su digno despacho los trabajos convenientes de la obra de la referencia.


- 02 ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO


Le reitero Ud., mi saludo y estima.

Atentamente,

Sesio MAS F.L.R.L.


Rafael Ortega Guerrero
GERENTE GENERAL





LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
SUELO MASTELRI

18 CALLE DE S. 218 - EL MIBAGERO - TUMBES
2092900 - TEL. 072943391 - 4091 688977 - Tumbes

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIPIANTE VILLAR REGION TUMBES"
SOLICITANTE: CONSORCIO ZORRITOS
FECHA : 24/07/2019

DENSIDAD IN SITU


CAPA: SUB BASE

Lugar:	CAMARA FRIGORIFICA DE STN	
	P1	P2
01.- Punto	3715	3710
02.- Peso del Material Neto	6500	6500
03.- Peso de la Arena + Frasco	2608	2611
04.- Peso de la Arena que Queda	1495	1485
05.- Peso de la Arena en el Embudo	2397	2394
06.- Peso de la Arena en el Huero	1.45	1.45
07.- Densidad de la Arena	1653	1651
08.- Volumen del Huero	800	815
09.- Peso de la Grava Peso al Aire	307	313
10.- Volumen de la Grava Desplazada	2915	2895
11.- Peso Neto del Suelo	1346	1338
12.- Volumen del Suelo	2.16	2.15
13.- Densidad Humedad	6.3	6.5
14.- % de la Humedad Contendida	2.03	2.02
15.- Densidad Seca	2.10	2.10
16.- Densidad Determinada en Curva	96.6	96.2
17.- Porcentaje de Compactación		
18.- Porcentaje de Compactación Especifica		
19.- Espesor Compactado		


CONTROL DE HUMEDAD

Reciente N°	01	02
01.- Suelo Humedo + Reciente (gr.)	67.9	66.4
02.- Suelo Seco + Reciente (gr.)	65.2	63.7
03.- Peso de Agua (gr.)	2.7	2.7
04.- Peso de Reciente (gr.)	22.2	22.2
05.- Suelo Seco (gr.)	43.0	41.5
06.- % de Humedad	6.3	6.5

OBSERVACION: Afirmado Granular
DMAx: 2.10gr/cm3



SUELO MASTELRI
ING. COLLEMANO VARGAS ESPINOZA
CIE. 728613



LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
SUELO MAS ELIPI

PL. CALLEDE N 206 - EL ANILAGRO - TUMBES
TEL. 020690 - CEL. 992945971 - IPN# 4588977 - Tumbes

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIERANTE VILLAR REGION TUMBES"


SOLICITANTE: CONSORCIO ZORRITOS

DENSIDAD EN IN SITU
SUB BASE

p1



p2




SUELO MAS ELIPI
LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
PL. CALLEDE N 206 - EL ANILAGRO - TUMBES



PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD





REGISTRO		CONTROL DE CALIDAD		PROYECTO DE IMPRIMANTE PINTURA BASE		REVISOR	
Nº REGISTRO: 01		FECHA: 01/07/2019		SECCION: DESINFECCION		Nº COMISARIO: 01	
<p>1. DATOS GENERALES</p> <p>* MARCA DE PINTURA: LEON UX</p> <p>* EQUIPO USADO: ROPILO</p> <p>* COLOR DE PINTURA: BLANCO</p> <p>* MARCHA DE CAPAS: 02</p>				<p>2. PARTES CONTROLADAS</p> <p>* LA HOJA DE PINTURA DEL PRODUCTO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA REQUERIDA</p> <p>* LA PINTURA SE HA PREPARADO, DILUIDA Y APLICADA EN CONFORMIDAD A SU HOJA TECNICA</p> <p>* LA BASE ESTA DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION</p> <p>* LA PINTURA CUMPLE CON LA ESPECIFICACION</p> <p>* EL MANEJO FINAL DE ACABADO ES ACEPTABLE</p> <p>* CUMPLE CON LA ESPECIFICACION</p>			
<p>3. DESCRIPCION DEL TRABAJO</p> <p>IMPRESION PINTURA-BASE EN MUROS</p>		<p>CONTROL EXPERIMENTAL</p> <p>EXAMEN ACABADO FOND</p>		<p>DESINFECCION / REDUCCION</p>		<p>LABORATORIO</p>	
<p>LA HOJA DE PINTURA DEL PRODUCTO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA REQUERIDA</p>		<p>EXAMEN ACABADO FOND</p>		<p>DESINFECCION / REDUCCION</p>		<p>LABORATORIO</p>	
<p>LA PINTURA SE HA PREPARADO, DILUIDA Y APLICADA EN CONFORMIDAD A SU HOJA TECNICA</p>		<p>EXAMEN ACABADO FOND</p>		<p>DESINFECCION / REDUCCION</p>		<p>LABORATORIO</p>	
<p>LA BASE ESTA DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION</p>		<p>EXAMEN ACABADO FOND</p>		<p>DESINFECCION / REDUCCION</p>		<p>LABORATORIO</p>	
<p>LA PINTURA CUMPLE CON LA ESPECIFICACION</p>		<p>EXAMEN ACABADO FOND</p>		<p>DESINFECCION / REDUCCION</p>		<p>LABORATORIO</p>	
<p>EL MANEJO FINAL DE ACABADO ES ACEPTABLE</p>		<p>EXAMEN ACABADO FOND</p>		<p>DESINFECCION / REDUCCION</p>		<p>LABORATORIO</p>	
<p>CUMPLE CON LA ESPECIFICACION</p>		<p>EXAMEN ACABADO FOND</p>		<p>DESINFECCION / REDUCCION</p>		<p>LABORATORIO</p>	
<p>* CUMPLE CON LA ESPECIFICACION</p>		<p>EXAMEN ACABADO FOND</p>		<p>DESINFECCION / REDUCCION</p>		<p>LABORATORIO</p>	
<p>* LA HOJA DE PINTURA DEL PRODUCTO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA REQUERIDA</p>		<p>EXAMEN ACABADO FOND</p>		<p>DESINFECCION / REDUCCION</p>		<p>LABORATORIO</p>	
<p>LA PINTURA SE HA PREPARADO, DILUIDA Y APLICADA EN CONFORMIDAD A SU HOJA TECNICA</p>		<p>EXAMEN ACABADO FOND</p>		<p>DESINFECCION / REDUCCION</p>		<p>LABORATORIO</p>	
<p>LA BASE ESTA DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION</p>		<p>EXAMEN ACABADO FOND</p>		<p>DESINFECCION / REDUCCION</p>		<p>LABORATORIO</p>	
<p>LA PINTURA CUMPLE CON LA ESPECIFICACION</p>		<p>EXAMEN ACABADO FOND</p>		<p>DESINFECCION / REDUCCION</p>		<p>LABORATORIO</p>	
<p>EL MANEJO FINAL DE ACABADO ES ACEPTABLE</p>		<p>EXAMEN ACABADO FOND</p>		<p>DESINFECCION / REDUCCION</p>		<p>LABORATORIO</p>	
<p>CUMPLE CON LA ESPECIFICACION</p>		<p>EXAMEN ACABADO FOND</p>		<p>DESINFECCION / REDUCCION</p>		<p>LABORATORIO</p>	
<p>* CUMPLE CON LA ESPECIFICACION</p>		<p>EXAMEN ACABADO FOND</p>		<p>DESINFECCION / REDUCCION</p>		<p>LABORATORIO</p>	

COMANDO
ZARATE

REGISTRO
CONTROL DE CONTROL
PROTÓTIPO DE IMPRESANTE PINTURA-BASE

C. 255-E-PC-03-FI
0
Res: 01/07/19
Fecha: 01/07/19
Págs: 124

NUMER DEL PROYECTO: 2019-08-03
CANTIDAD: 01
FECHA: 01/07/2019
PLANOS DEL: PRELIMINAR
SECCION: ADMINISTRACION NIVEL A T

DESCRIPCION DEL TRABAJO: IMPRESANTE PINTURA-BASE EN MUROS

1. DATOS GENERALES
* MATERIA DE TERMINA: COMPLEX
* EQUIPO USADO: HODILO
* COLOR DE PINTURA: BLANCO
* NÚMERO DE CAPAS: 02

1. LA FORMA TECNICA DEL PROYECTO CUMPLE CON LA PERFECTACION TECNICA REQUERIDA
(Código: SI (X) NO ())
2. LA OBJETIVO DE LA IMPRESANTE, ENTUBA Y AMPLIADA FIN CONCORDANCIA A SU REDA TECNICA
(Código: SI (X) NO ())
3. LA BACA FUE EN SU MOMENTO CON LA ESPECIFICACION
(Código: SI (X) NO ())
* FORTALECIMIENTO DE AFERADO ES ACEPTABLE
(Código: SI (X) NO ())

2. PARTES CONTROLADAS:

DESCRIPCION / PUNTO	CONTROL SUPERFICIAL			COMENTARIO / OBSERVACION
	LESTURA	AFERADO	TOMO	
MCCORRADA	X	X	X	MUROS ENTUBIDOS NIVEL A
PREPARADO Y PUNTO				MUROS EXTERIORES NIVEL C

LEYENDA: C / CONFORME N / N / NO CONFORME N / NI / NO APLICA


ELABORADO POR: [Firma] REVISADO POR: [Firma] APROBADO POR: [Firma]

FECHA: 01/07/2019


Nombre del Elaborador: [Nombre] Nombre del Revisor: [Nombre] Nombre del Aprobador: [Nombre]

Código del Elaborador: [Código] Código del Revisor: [Código] Código del Aprobador: [Código]








Angeli

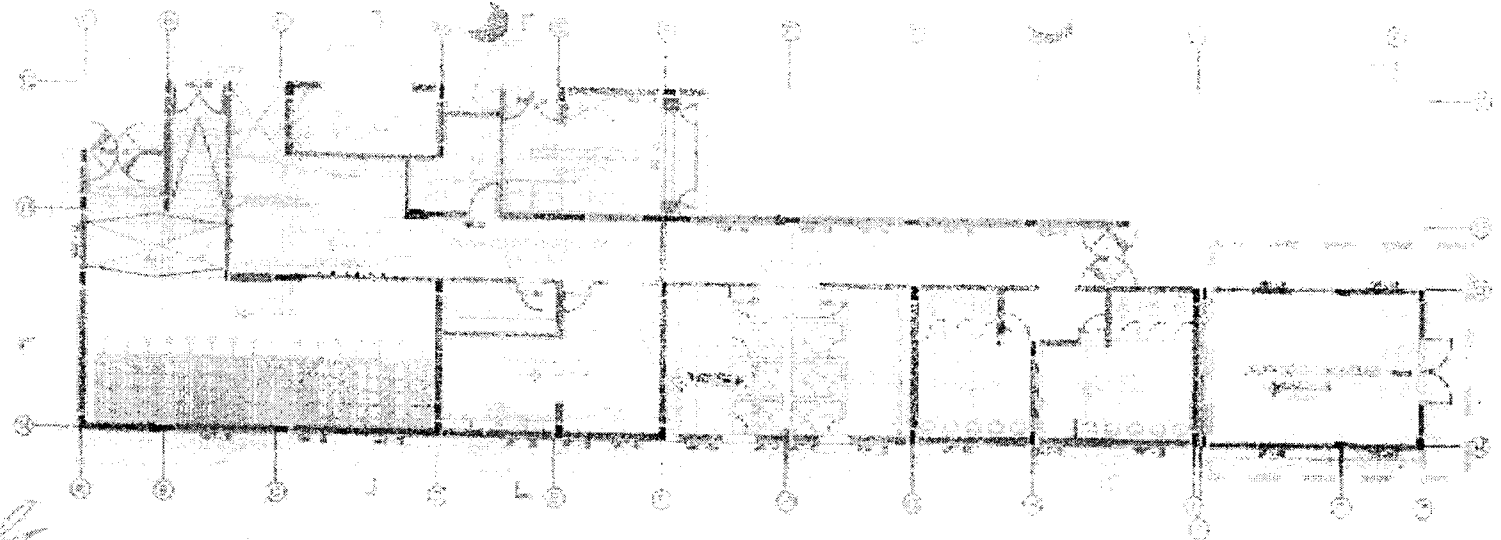


CONSORZIO EDILIZIO
VIA PRINCIPALE ADDOBBIAS
Assistenti di Obra

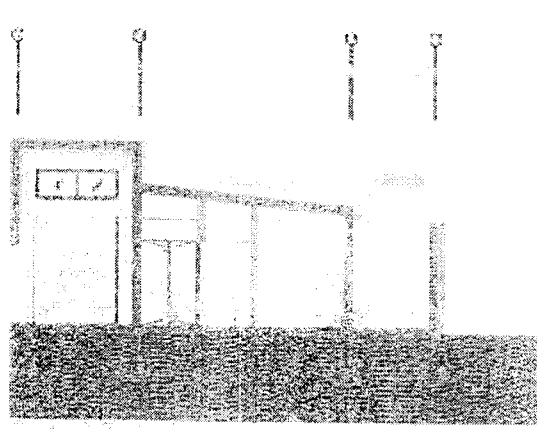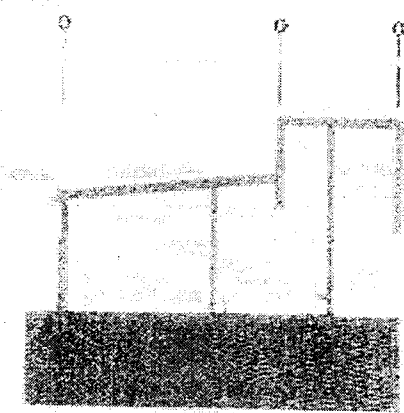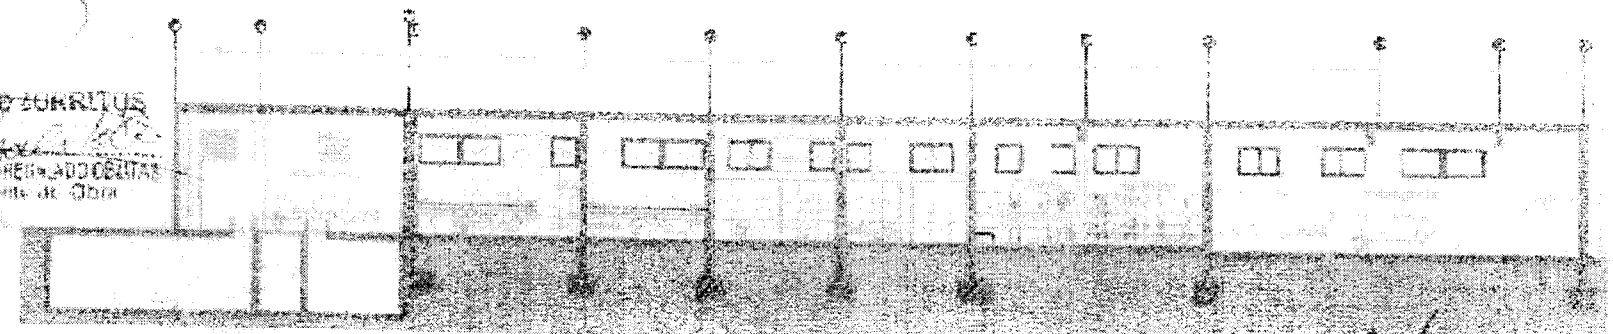

IN SCALA DI 1/50
DEL 1903
CANTIERE DI OBRA



359



[Handwritten signature]

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2011
[Handwritten signature]
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2011
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2011

[Handwritten signature]
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2011
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2011
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2011

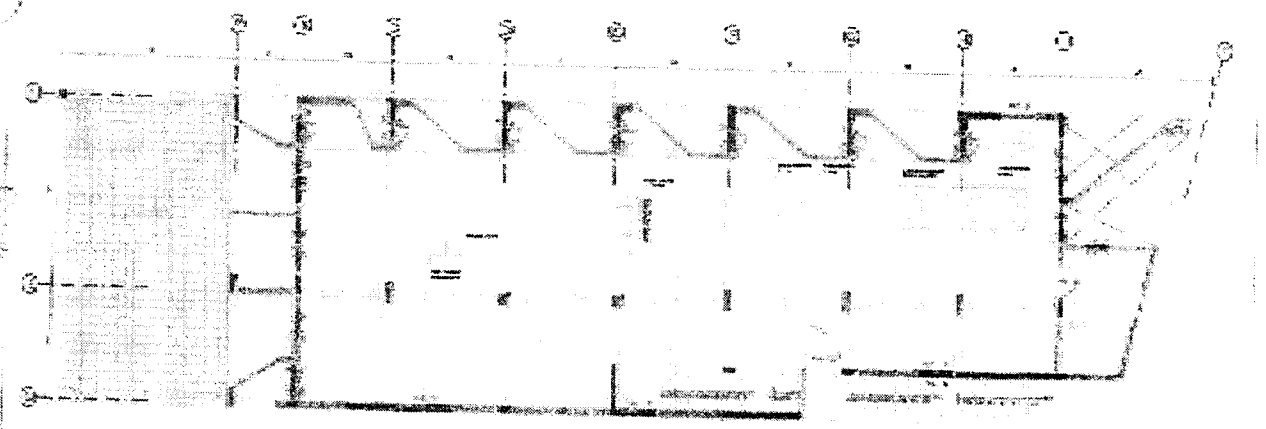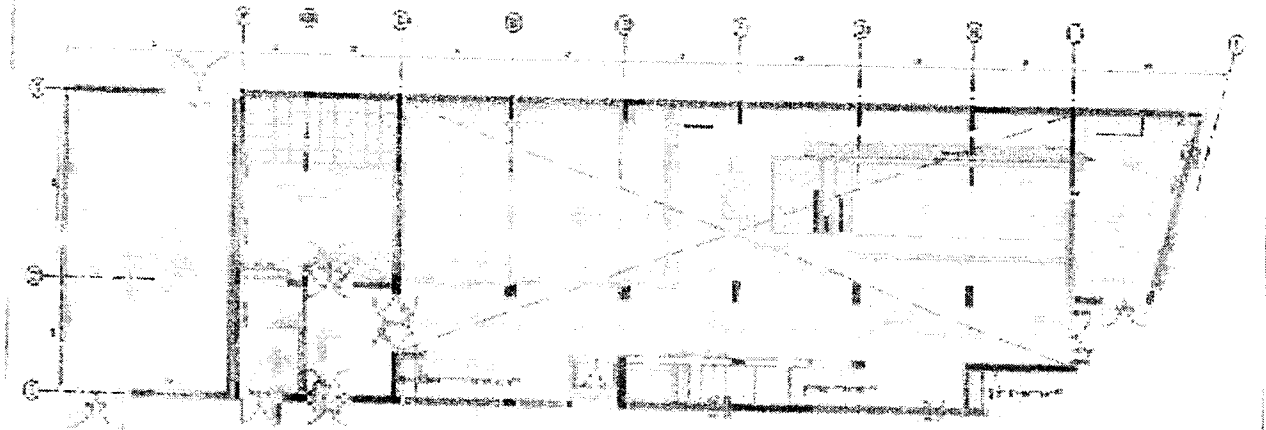

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL LITORAL**
 CLIENTE: **INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL LITORAL**
 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: **IMPRIMANTE PINTURA BASE EN MUEBOS**

1. DATOS GENERALES
 * MARCA DE CONTROL: **COMPOS**
 * TIPO DE MUESTRA: **RECEPCIÓN**
 * COLOR DE PINTURA: **BLANCO**
 * NÚMERO DE LATA: **31**

* LA LATA DEBE A SER HOMOGÉNEO CON LA MUESTRA ENTREGADA
 * LA PINTURA SE HA ENTREGADO JUNTA Y ADECUADA EN CONCORDANCIA A LA ORDEN DE ENCOMIENDA
 * LA OXIDE ESTÁ EN ADECUADO CON LA FRENTECACION
 * LA UNIFORMIDAD DE LA MUESTRA EN EL TRABAJO

2. PARTES CONTROLADAS:


DESCRIPCIÓN / ESTADO	CONTROL SUPERFICIAL			COMENTARIOS / OBSERVACIONES
	ESTRUC.	ACABADO	TONO	
PAINTS: PAINTS	X	X	X	COLUMNAS: 4-5; 5-6; 6-7; 7-8; 8-9 9-10; 10-11; 11-12 VIGAS: 4-5; 5-6; 6-7; 7-8; 8-9 9-10; 10-11; 11-12 CHORO PAÑO: 4-5; 5-6; 6-7; 7-8; 8-9 9-10; 10-11; 11-12
PAINTS: PAINTS	X	X	X	
TARDO: PLATA	X	X	X	



REVISADO POR: *[Firma]*

APROBADO POR: *[Firma]*

REVISADO POR: *[Firma]*

APROBADO POR: *[Firma]*





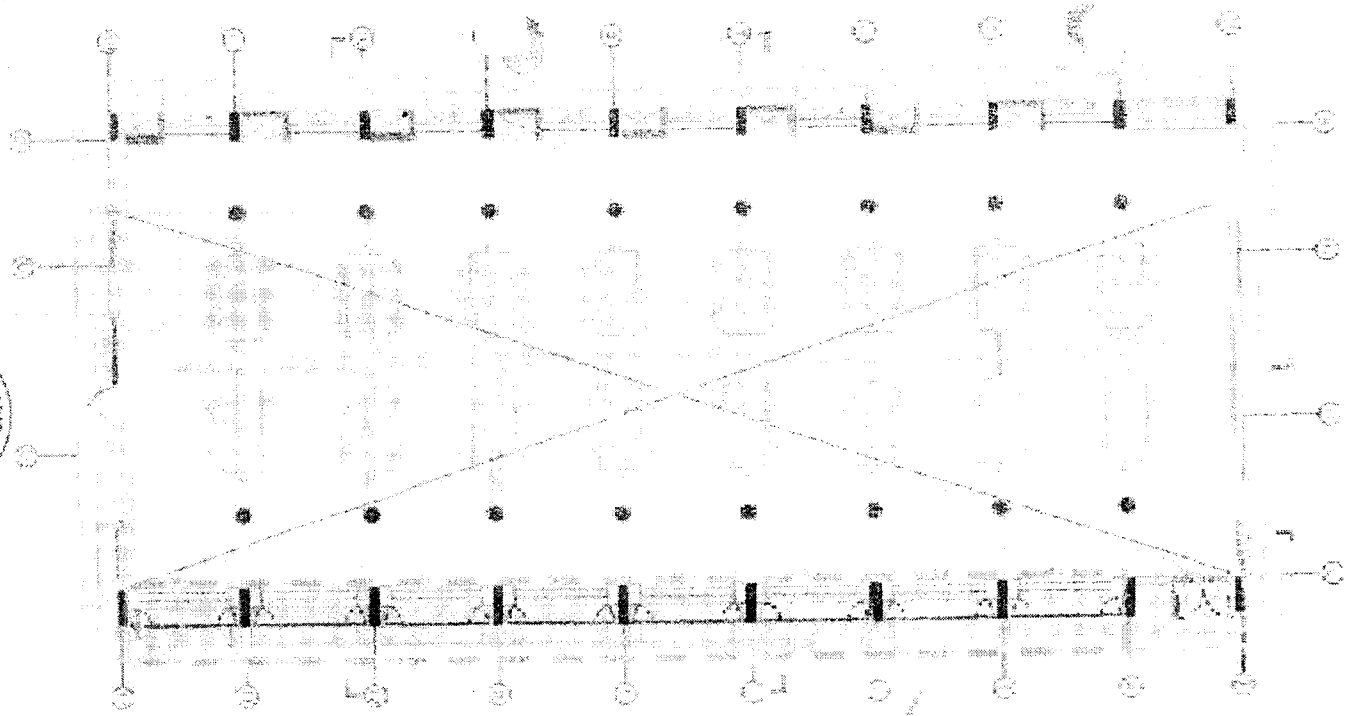


Eng. J. J. ...

CONSELHO PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CIVIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
C.R.E.C. Nº 001/1964

CONSELHO PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CIVIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
C.R.E.C. Nº 001/1964

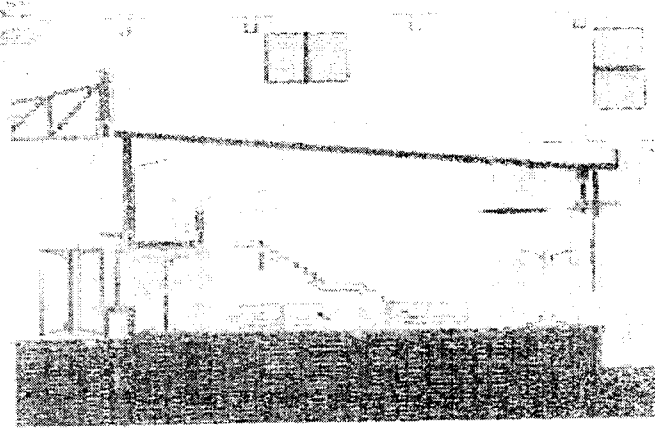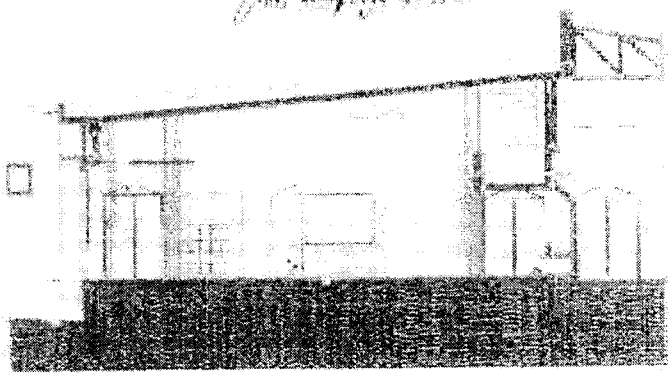



REGISTRO CONTROL DE CALIDAD | **REGISTRO DE CONTROL DE ALFARERÍA**

MEMORIA DEL PROYECTO
 PLANO REF.: AN 17 | **1:300 1/1** | FOLIO: 17 DE 17 | FECHA: 02-03-2019 | DIRECTOR DEL PROYECTO: [Nombre]

ELEMENTO: MURO DE FABRICACIÓN | **FECHA DEL DOCUMENTO:** 02/07/2019

REVISIONES DE REFERENCIA:

Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	02/07/2018	Solicitudes de Asiento Terminado
2	02/07/2019	Asentamiento
3	02/07/2019	Adjuntos de Asiento
4	02/07/2018	Aprobación de Estudios de Asiento E1 del proyecto C-
5	02/07/2019	Asiento de Asentamiento Finalizado
6	02/07/2019	Asiento con sistema de limpieza robotizada
7	02/07/2019	Asentamiento para el sistema de limpieza robotizada

Lista de Verificación Previa al Asentamiento (Ver Plano de Detalle)

FECHA	CONTRATISTA	FECHA	SUPERVISOR
02/07/2018	V	02/07/2018	
02/07/2019	V		
02/07/2019	V		
02/07/2019	V		
02/07/2019	V		
02/07/2019	V		
02/07/2019	V		
02/07/2019	V		
02/07/2019	V		
02/07/2019	V		
02/07/2019	V		

Lista de Verificación Posterior al Asentamiento

FECHA	CONTRATISTA	FECHA	SUPERVISOR
02/07/2019	V	02/07/2019	
02/07/2019	V		
02/07/2019	V		
02/07/2019	V		
02/07/2019	V		
02/07/2019	V		

Lista de Verificación Posterior al Vaciado

FECHA	CONTRATISTA	FECHA	SUPERVISOR
02/07/2019	N/A		
02/07/2019	N/A		
02/07/2019	N/A		

REVISIÓN CALIDAD:

VERIFICACIÓN POSTERIOR AL VACIADO

FECHA	CONTRATISTA	FECHA	SUPERVISOR
02/07/2019	N/A		
02/07/2019	N/A		
02/07/2019	N/A		

VERIFICACIÓN POSTERIOR AL VACIADO


FECHA	CONTRATISTA	FECHA	SUPERVISOR
02/07/2019	N/A		
02/07/2019	N/A		
02/07/2019	N/A		

COMENTARIOS:

REVISADO POR: [Firma] | REVISADO POR: [Firma]


02/07/2019 | 02/07/2019

Nombre: [Nombre] | Nombre: [Nombre]





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
WASHINGTON, D.C. 20540

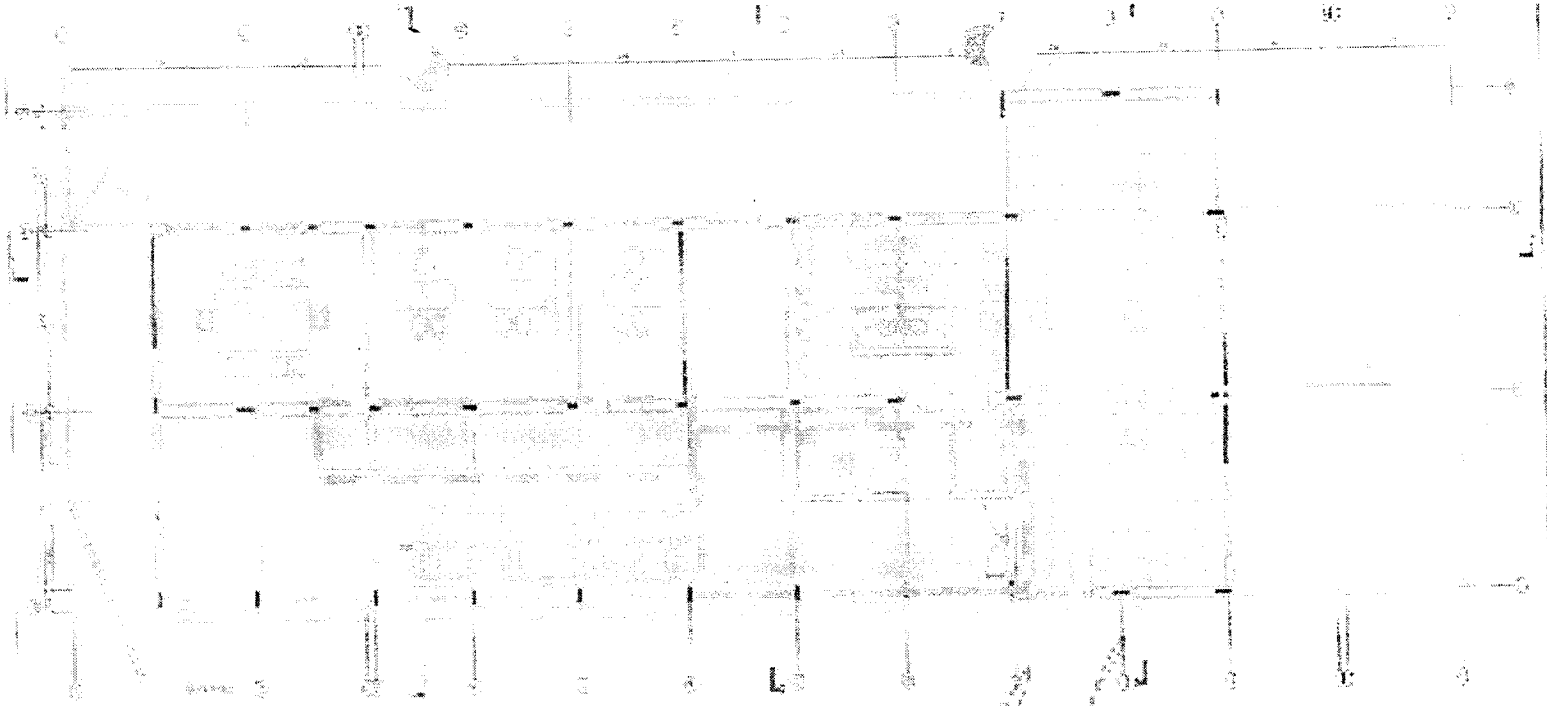


[Handwritten signature]
NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
WASHINGTON, D.C. 20540

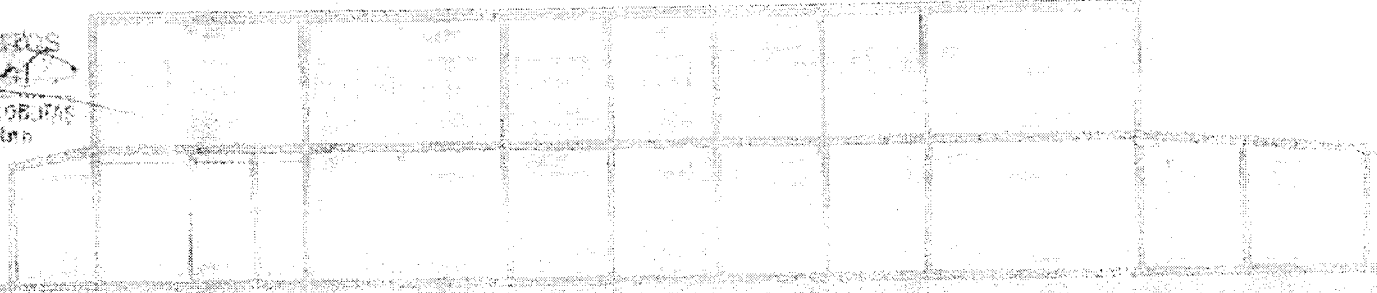



[Handwritten signature]

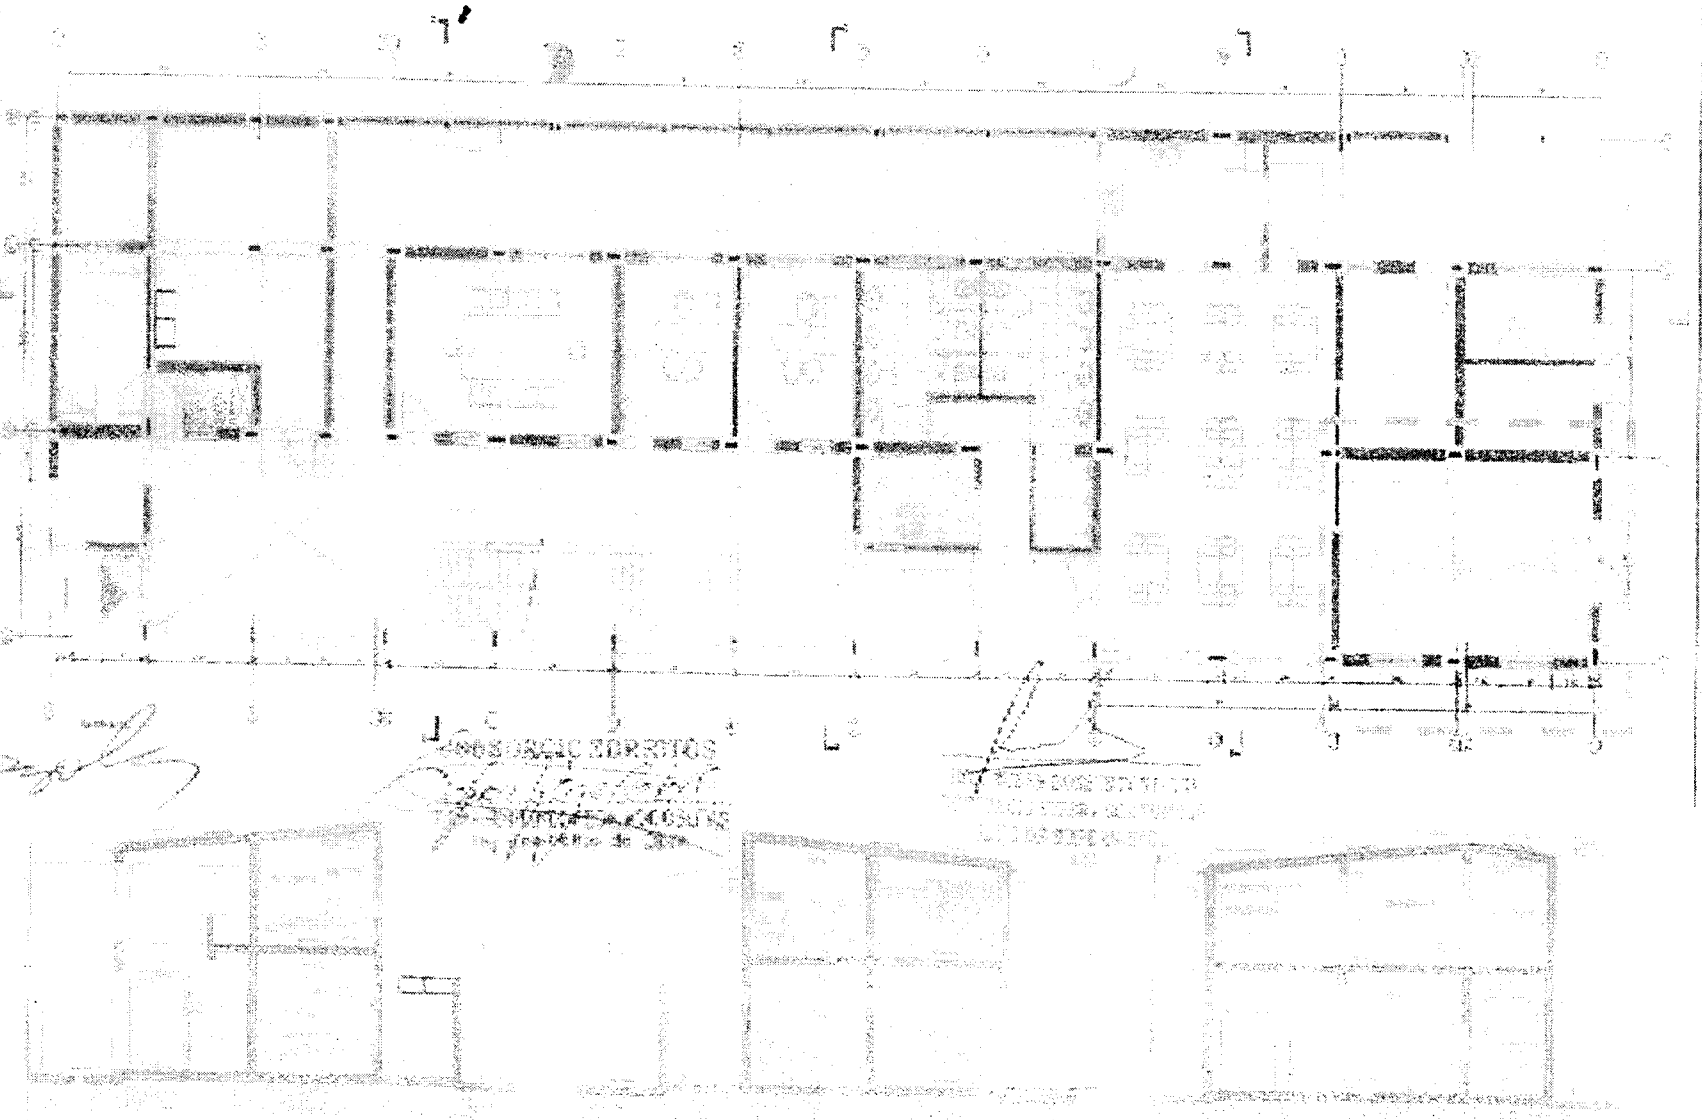

LABORATORY BUILDING
10000
10000
10000

LABORATORY BUILDING
10000
10000
10000

PLANIFICACION
ZOBIRTON

RÉGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
PROTODIARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE BASE

CHILE
Santiago

CASE 97-01-01
0
02/02/78
1 lit.

NOMBRE DEL REGISTRO:
CLIENTE:
PLANO: R/P/

DESCRIPCION DEL OBJETO:

NO CONTROLADO,
SEGUN
SICRECI

11/07/78
ADMINISTRACION PREVI

IMPLEMENTACION EN MUROS

1. DATOS GENERALES
* MATERIAL PINTURA: COLOR
* EQUIPOS: BANCOS ROJOS

* COLOR DE PINTURA: BLANCO
* EQUIPO DE CALIDAD: 97

- * LA MODA TIENE QUE SER PROPIA, TIENEN QUE LA IMPLEMENTACION DE LA A REENTRENDA
- (longitud en () NO ()
- * LA VENTURA DE LA PINTURA, DEBIDA Y ADECUADA EN CONFORMIDAD A VENTURA INTERNA
- (cantidad en () NO ()
- * LA MODA DE LA PINTURA (CANTIDAD DE PINTURA)
- (cantidad en () NO ()
- * LA MODA DE LA PINTURA (CANTIDAD DE PINTURA)
- (cantidad en () NO ()
- * LA MODA DE LA PINTURA (CANTIDAD DE PINTURA)
- (cantidad en () NO ()

2. PARTES CONTROLADAS:

INDICACION / DESCRIPCION	LIMITE SUPERICIAL			CONTRAFOTOS / CONTRAFOTOS:
	ENTRADA	ACABADO	ISBRO	
ADMINISTRACION CONTROL	X	X	X	MUROS PINTURADOS NIVEL I
ADMINISTRACION CONTROL	X	X	X	CANTONAMIENTOS NIVEL I


LEYENDA: C/ CONFORME M/ NO CONFORME N/A/ NO APLICABLE



LABORANTE:	PLANO: R/P/	ADJUDICADO:	REVISOR:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Caja 1 (calentador)
Instrucciones: Verificar que el equipo esté correctamente instalado y funcionando.




Señal de No Controlado:
Señal de No Controlado:
Señal de No Controlado:

Señal de No Controlado:
Señal de No Controlado:
Señal de No Controlado:



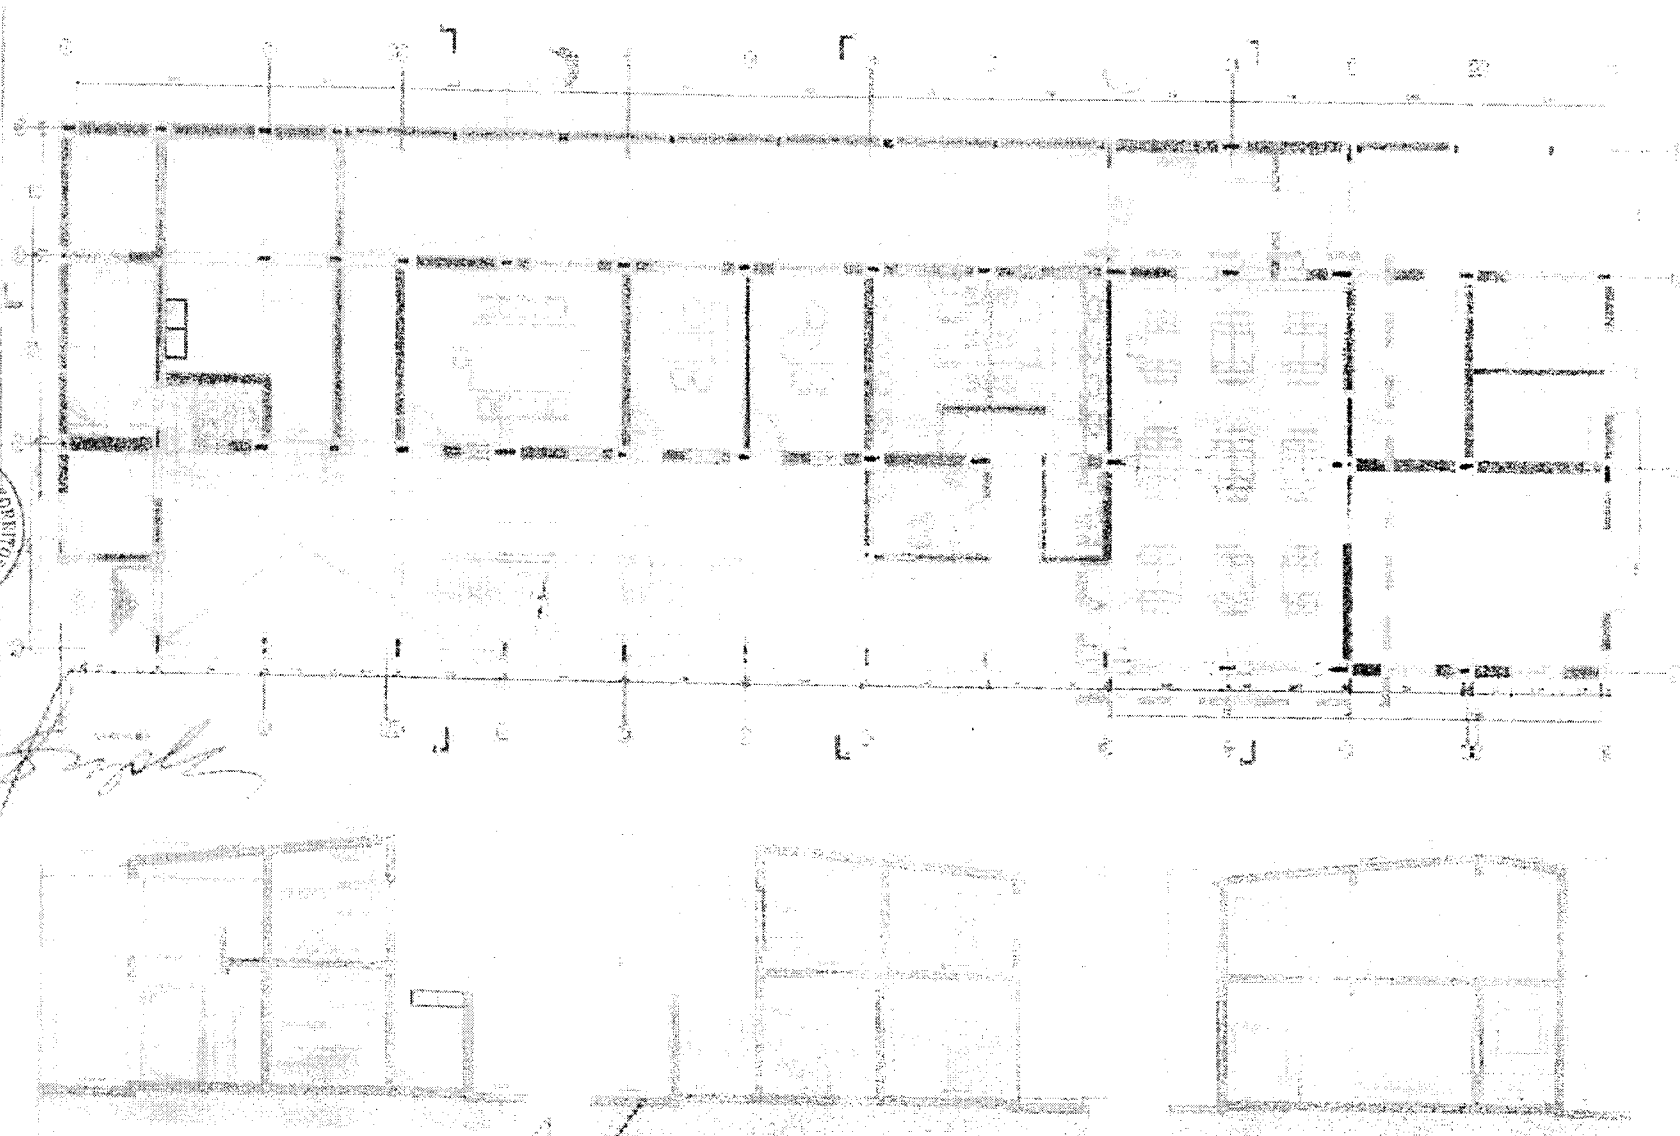

Handwritten signature or initials.

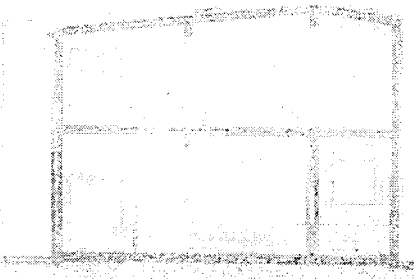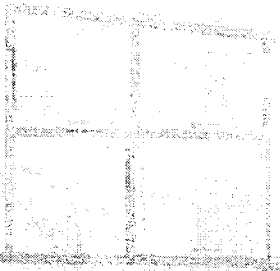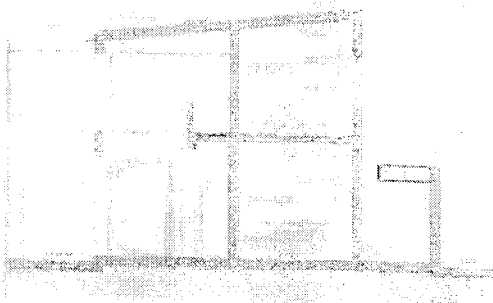

Handwritten signature and text.

Handwritten signature and text.



**REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD**

C2-56C-PC-03-F1

Rev: 1

INSPECCIÓN DE TARRAJEOS Y DERRAMES

FECHA: 02-07-2019

Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: REMEDIACIÓN DE MANTAROS		HP CORRELATIVO:
CLIENTE: CONCRETOS	CÓDIGO: C2-56C-PC-03-F1	FECHA: 02-07-2019
PLANO REF: AR-35	ÁREA: TAREAS PREVIAS	
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: TARRAJEO DE COLUMNAS CIRCULARES EJE: B*7 : B*8		


Verificaciones Generales:

Limpieza

Rugosidad

Humedades



Ambiente	Alisamiento de juntas			Verticalidad de juntas			Horizontalidad de juntas			Contrazo de c. cemento pulido			Escuadrado de c. raso - raso tipo Med. a. Corta			Verticalidad de derrame			Contrazo de sanitaria			Direcciones de juntas			Ciclo-uso			
	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	
NIVEL 2: EJE (B*) : B*7 B*8 : NIVEL 2	V			V			V																					



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRM: Nombre: Freddy González Acea FECHA: 02-07-2019	FIRM: Nombre: Edger Fagundes Galtes FECHA: 02-07-2019	FIRM: Nombre: Roger Ezequiel Toranzo FECHA: 02-07-2019

350


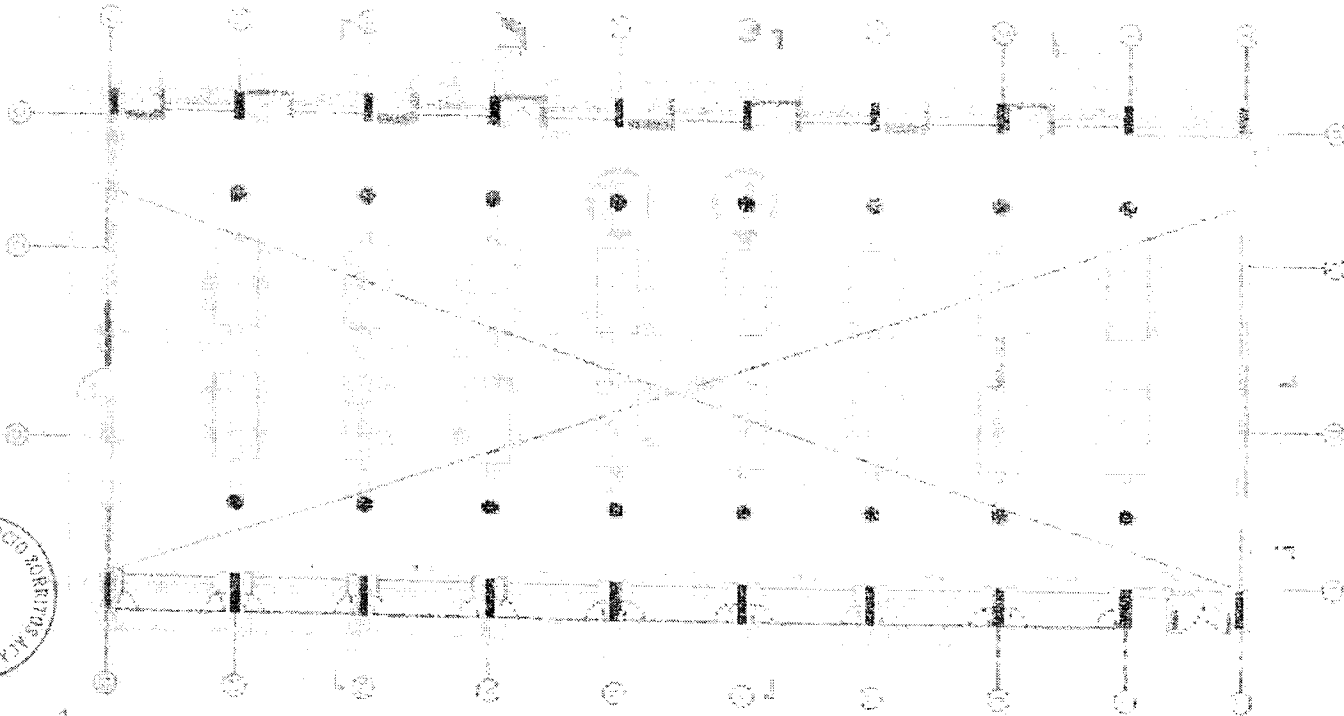






Handwritten signature or initials.


ESTRUCTURA
DE
CUBIERTA
DE
CONCRETO
ARMADO
DE
ACERVO
DE
LA
PASADIZA
DE
LA
CIUDADELA


ESTRUCTURA
DE
CUBIERTA
DE
CONCRETO
ARMADO
DE
ACERVO
DE
LA
PASADIZA
DE
LA
CIUDADELA

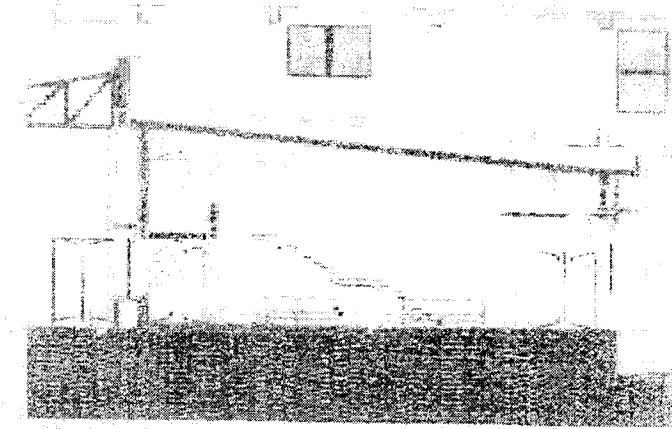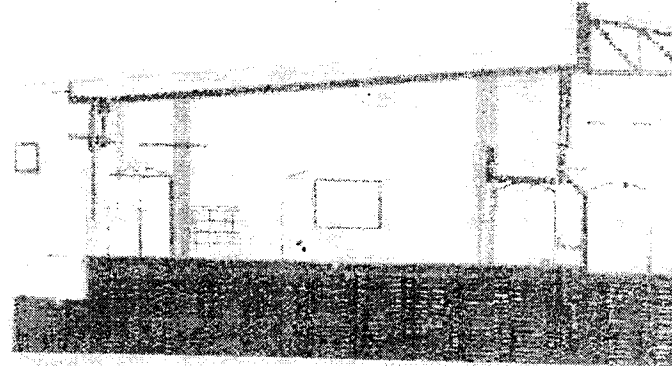Handwritten signature
ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE CONCRETO ARMADO DE ACERVO DE LA PASADIZA DE LA CIUDADELA




	REGISTRO															CL-20K MC-03-F1																
	CONTROL DE CALIDAD															Rev: 1																
INSPECCIÓN DE TARRAJEOS Y DERRAMES															FECHA: 02-07-2019																	
NOMBRE DEL PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE ALMACÉN															Nº CORRELATIVO:																	
CLASIFICACIÓN: PUNTO DE															FECHA: 02-07-2019																	
PLANO REF.: AR-LS															CDD: ELS						C2-SGC-UT-4-D						URLA: TAREAS PREVIAS					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: TARRAJEO DE MURO-PARAPETO- EJE : B* : NIVEL 2 : FRAMO : 3-4 : 4-5 : 5-6																																
Verificaciones Generales:																																
Limpieza <input checked="" type="checkbox"/>					Rigidez <input checked="" type="checkbox"/>										Humedad <input checked="" type="checkbox"/>																	
<small> CUALQUIER TIPO DE ANOTACIÓN DEBERÁ SER HECHA EN ESTE ESPACIO PARA LAS REVISIONES. </small>																																
Ambiente		Alineamiento de muros			Verticalidad de muros			Uniformidad de juntas			Continuidad c./ cemento pulido			Encuentro de los rasos-muro tipo Media Caña			Verticalidad de ferrame			Contracabo secundario			Dimensiones de vacas			Colorado						
		C	MC	obs. Lev.	C	MC	obs. Lev.	C	MC	obs. Lev.	C	MC	obs. Lev.	C	MC	obs. Lev.	C	MC	obs. Lev.	C	MC	obs. Lev.	C	MC	obs. Lev.	C	MC	obs. Lev.				
NIVEL 2 : EJE (B*) : MEZZANINE		Y			Y			Y																								
OBSERVACIONES:																																
ELABORADO POR:										REVISADO POR:										APROBADO POR:												
Firma: 										Firma: 										Firma: 												
Nombre: Freddy González López										Nombre: Ing. Eder Regalado Ojeda										Nombre: Ing. Ruben Bossus Toriatti												
Fecha: 27-05-2019										Fecha: 27-05-2019										Fecha: 27-05-2019												



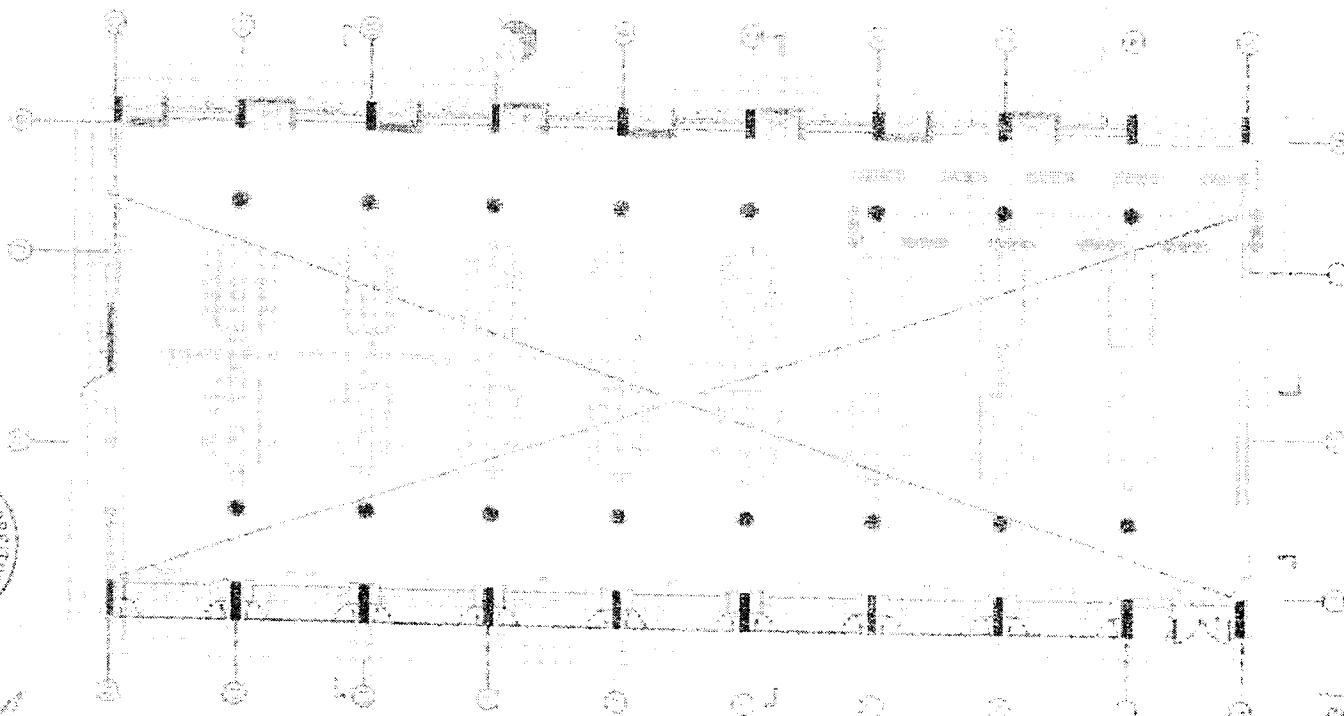



1. 1:100
 2. 1:100
 3. 1:100
 4. 1:100
 5. 1:100
 6. 1:100
 7. 1:100
 8. 1:100
 9. 1:100
 10. 1:100
 11. 1:100
 12. 1:100
 13. 1:100
 14. 1:100
 15. 1:100
 16. 1:100
 17. 1:100
 18. 1:100
 19. 1:100
 20. 1:100
 21. 1:100
 22. 1:100
 23. 1:100
 24. 1:100
 25. 1:100
 26. 1:100
 27. 1:100
 28. 1:100
 29. 1:100
 30. 1:100
 31. 1:100
 32. 1:100
 33. 1:100
 34. 1:100
 35. 1:100
 36. 1:100
 37. 1:100
 38. 1:100
 39. 1:100
 40. 1:100
 41. 1:100
 42. 1:100
 43. 1:100
 44. 1:100
 45. 1:100
 46. 1:100
 47. 1:100
 48. 1:100
 49. 1:100
 50. 1:100
 51. 1:100
 52. 1:100
 53. 1:100
 54. 1:100
 55. 1:100
 56. 1:100
 57. 1:100
 58. 1:100
 59. 1:100
 60. 1:100
 61. 1:100
 62. 1:100
 63. 1:100
 64. 1:100
 65. 1:100
 66. 1:100
 67. 1:100
 68. 1:100
 69. 1:100
 70. 1:100
 71. 1:100
 72. 1:100
 73. 1:100
 74. 1:100
 75. 1:100
 76. 1:100
 77. 1:100
 78. 1:100
 79. 1:100
 80. 1:100
 81. 1:100
 82. 1:100
 83. 1:100
 84. 1:100
 85. 1:100
 86. 1:100
 87. 1:100
 88. 1:100
 89. 1:100
 90. 1:100
 91. 1:100
 92. 1:100
 93. 1:100
 94. 1:100
 95. 1:100
 96. 1:100
 97. 1:100
 98. 1:100
 99. 1:100
 100. 1:100



[Handwritten signature]

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՐԱԿՏՈՒՄԻ ԿԵՆՏՐԱԼԻ
 ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՐԱԿՏՈՒՄ
 ՄԱՍԻՍԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՐԱԿՏՈՒՄ
 ՄԱՍԻՍԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՐԱԿՏՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՐԱԿՏՈՒՄԻ ԿԵՆՏՐԱԼԻ
 ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՐԱԿՏՈՒՄ

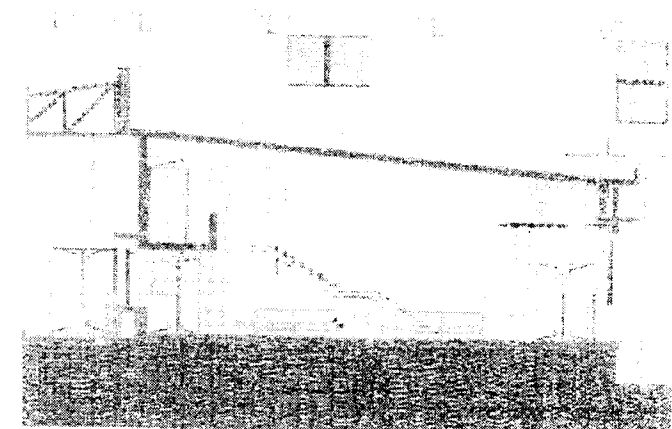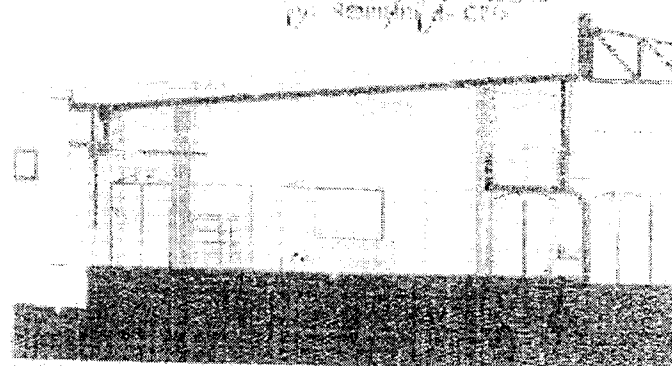



**REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
REPORTE DE RELLENO**

CA. SCSL 02-01
Revisión: 01
Fecha: 02/07/2019
Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION CON MANIOBRAS
CLIENTE: COMAFOR
PLANO REF.: AR-01
DESCRIPCION DEL TRABAJO: COMPACTACION CON AFILADA EN PATIO DE MANIOBRAS TRAMO 7º A 1º IRA CAVA DE 15 CM

FECHA INICIO: 02/07/2019

TIPO DE RELLENO:

Relleno Baseo
 Conturbante
 Relleno Baseo No Compactado
 Relleno Baseo Compactado
 Relleno Baseo Compactado

SECTOR: PATIO MANIOBRAS O TORRE

FECHA INICIO: 02/07/2019

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Revisión de planos y especificaciones	X			
2	Autorización de Relleno (A)	X			
3	Medición de Trabajo Seguro (ATS)	X			
4	Verificación Topográfica	X			
5	Preparación de área de relleno	X			
6	Relleno con material propio	X			
7	Relleno con material de préstamo		X		
8	Ya Compactación según especificaciones		X		
9	Confirmando de capas de relleno (trayecto)	X			

COMENTARIO: EL RELLENO (AFILADA) SE HIZO DE ACORDO CON LAS ESPECIFICACIONES.

(*) Autorizado por el Cliente o/o la Superintendencia

UNIDAD DE CONTROL

CAPA N°	ESPESON (m)	NIVEL INFERIOR (m)	NIVEL SUPERIOR (m)	FIRMA TOPOGRAFIA	FECHA	%COMPACT.	FIRMA CONTROL COMPACTAC.	OBSERVAC/COMENTARIOS
1	0.15	2.49	2.84		02/07/2019	100		

SI **NO**


REVISIONES:


REVISIONES	FECHA	DESCRIPCION

MANEJO DE DOCUMENTOS:


REVISADO POR: REVISADO POR
APROBADO POR: APROBADO POR
REVISADO POR: REVISADO POR
APROBADO POR: APROBADO POR

FECHA: 02/07/2019





Handwritten signature
CURITIBA, 20 DE JUNHO DE 2014
CMAU

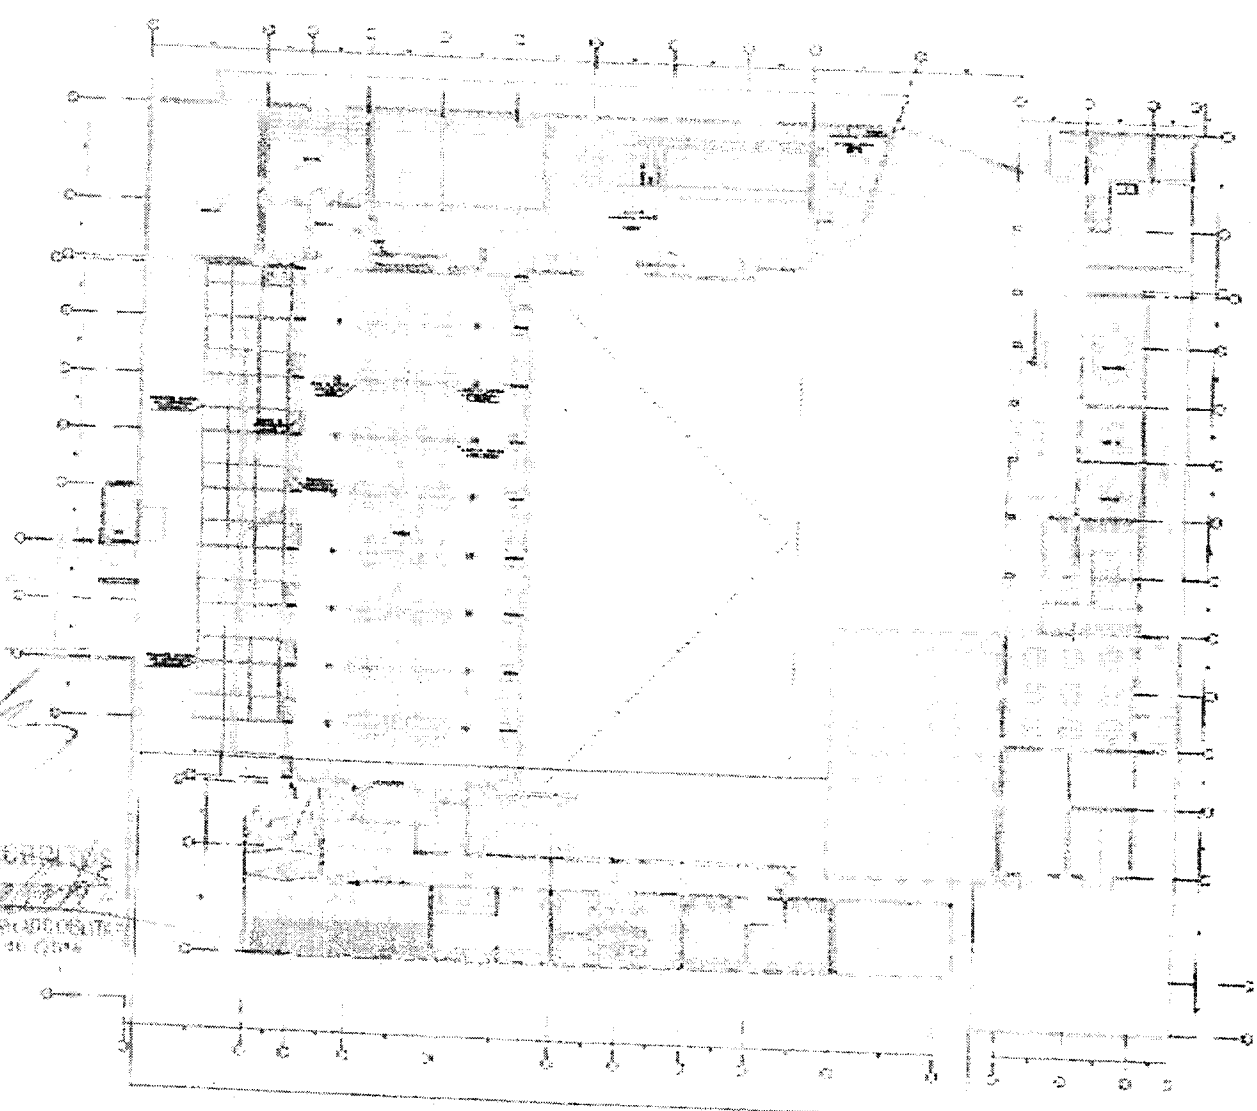

Handwritten signature
CURITIBA, 20 DE JUNHO DE 2014
CMAU

AR-01



REGISTRO
 JUNIOR DE CALIDAD
 REPORTE DE RELLENO

02.SOL.PE.04-PT
 Revision: 01
 Fecha: 03/07/19
 Pagina: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: **RECONSTRUCCION DE LA MANICERAS**
 CLIENTE: **AR-01**
 PLANI USI: **FRONTE**
 UN. Y DIRECCION DEL TRABAJO: **COMPAÑIA CON ALMACEN EN CALI DE LA MANICERAS TRAMO 107 2DA CAPA DE 1R PISO**
 N° CORRELATIVO: **07/07/2018**
 SECCION: **02111 MANIO AREA O TORRE**
 TIPO DE RELLENO: **COMPACTACION**

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	P.A.	RESERVACIONES
1	Revisión de planos y especificaciones	X			
2	Anticipo de Kallion (*)	X			
3	Medida de trabajo según (ATS)	X			
4	Verificación Topográfica	X			
5	Preparación de zona de refuerzo	X			
6	Revisión con material de préstamo	X			
7	Revisión con material de préstamo	X			
8	Verificación según especificaciones	X			
9	Conformación de campo de trabajo (concreto)	X			

(*) Anticipo para el Frase y/o la Superficie
 DATOS DE CAMPO:

CAPA N°	EPAISUR (m)	NIVEL INFERIOR (m)	NIVEL SUPERIOR R (m)	FIRMA TOPOGRAFIA	FECHA	%COMPACT.	FIRMA CONTROL COMPACT.	OBSERVAC/COMENTARIO
1	0.25	2.54	3.09		03/07/2018	100		

PLANO ANUNTO: **NT** **RT** **RU**
 OBSERVACIONES:

LABORADO POR: *[Signature]*


REVISADO POR: *[Signature]*


APROBADO POR: *[Signature]*

FECHA: 03/07/2018


OTRO: *[Signature]*

OTRO: *[Signature]*





[Handwritten signature]

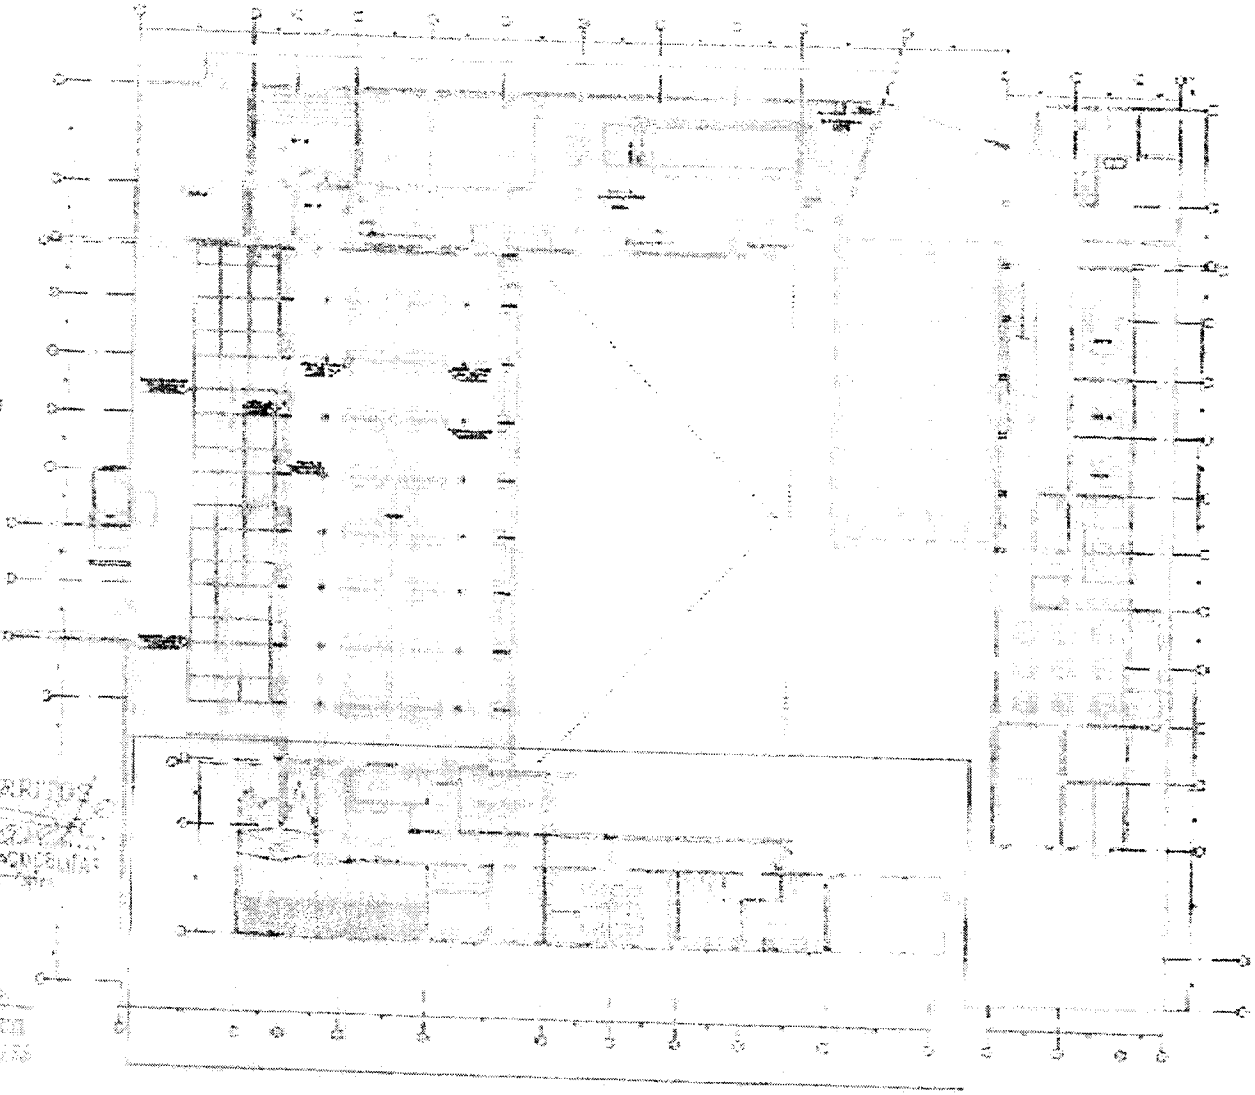

PROPOSTA Nº 12345
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
15 DE ABRIL DE 2014

[Handwritten signature]

PROPOSTA Nº 12345
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
15 DE ABRIL DE 2014

AR-01



REGISTRO CONTROL DE CALIDAD

TRANSPORTE DE LOSAS PREFABRICADAS

FECHA REGISTRO: _____

HOY: _____

FECHA: _____

PÁGINA: _____

NOMBRE DEL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DEL CPA DE AYACUCHO

CI PRYTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO Y PROYECTOS COMUNITARIOS

PLANO REF.: 04-03 **IRAMU** 29-30 **SECTOR:** CAJAZO **Nº CORRELATIVO:** 00000000

FECHA: _____

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: IZAD Y TRANSPORTE DE LOSAS PREFABRICADAS DESDE PATIO DE FABRICACIÓN HASTA EL CAJAZO

UNIFICACIÓN DEL ELEMENTO PREFABRICADO: _____

CALCULO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Verificación de las condiciones físicas del ambiente de trabajo (*)	X			
2	Verificación general de los elementos de trabajo (*)	X			
3	Verificación de la prisa de 30 seg. en buen estado (*)	X			
4	Se verifica ante durante los trabajos se utilizan manillares y reglas	X			
5	Ajustación de trazo del elemento a fabricarse (*)	X			
6	Medida de trabajo según (ATS)	X			

(*) Anotar con un el signo en la suscripción

DATOS DE CAMPO:

PATIO DE FABRICACION (X)


03/07/2018

04 UNID

- Zona de trabajo en buenas condiciones.
- Estado de uso del elemento prefabricado.
- Cantidad de losas prefabricadas.


PROGRAMA SI NO

ASISTENTE: _____

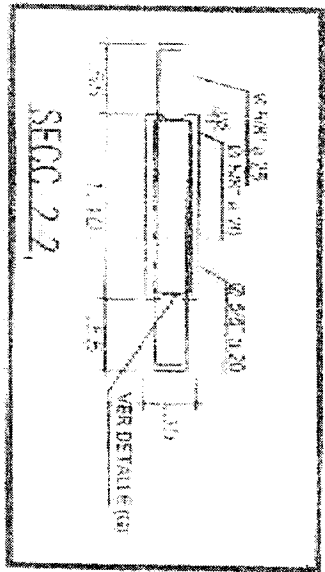

LOSA SECC 2-2

VISTA DEL ELEMENTO PREFABRICADO

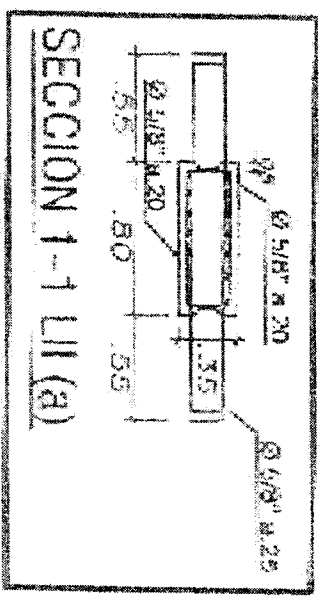



LOSA SECC 1-1

VISTA DEL ELEMENTO PREFABRICADO

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Nombre: ERINDY GONZALEZ LOPEZ	Nombre: ENIGAR REGALADO CRISTIAS
Fecha: 03/07/2018	Fecha: 03/07/2018
Cargo: INIC. ASISTENTE	Cargo: INIC. SUPERVISOR
Nombre: RUBEN WALTER TALAVERA	Nombre: RUBEN WALTER TALAVERA
Fecha: 03/07/2018	Fecha: 03/07/2018






FECHA: 10/06/2019	FECHA: 10/06/2019	FECHA: 10/06/2019
NOMBRE: EDUARDO KHALIL GUZMAN	NOMBRE: EDUARDO KHALIL GUZMAN	NOMBRE: EDUARDO KHALIL GUZMAN
CARGO: INGENIERO	CARGO: INGENIERO	CARGO: INGENIERO
FIRMA: [Signature]	FIRMA: [Signature]	FIRMA: [Signature]
ALFABADO POR: [Signature]	ALFABADO POR: [Signature]	ALFABADO POR: [Signature]

OBSERVACIONES

VISTA EN PLANTA DEL MONTAJE DE LA LOSA

DIRECCION A MAR
DIRECCION A LA COSTA

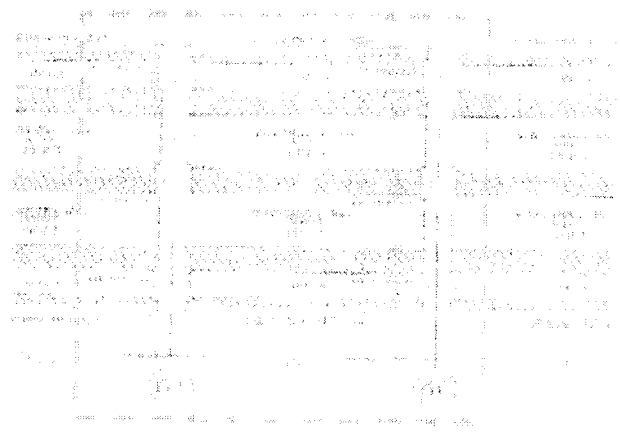

- Esquema - Adjunto

Se indica de nuevo en la parte correspondiente los de montaje del elemento prefabricado en las mismas condiciones.

DATOS DE CAMBIO


ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	OTRAS OBSERVACIONES
1	Revisión de planos y especificaciones	X		
2	Verificación de la posición total del elemento prefabricado	X		
3	Verificación de la posición del elemento prefabricado (1)	X		
4	Análisis de la carga propia (ATS)	X		

VERIFICACION DEL ELEMENTO PREFABRICADO

DESCRIPCION DEL TRABAJO: VERIFICACION DE LOSAS PREFABRICADAS EN EL CASERIO

PLANO REF: OM-03	TRAMO: 2B-20	SECTOR: CASERIO
CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL - FONDIR	FECHA: 08/07/2019	Nº CORRECTIVO: 1
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DRA DE ACARICCO	MONTAJE DE LOSAS PREFABRICADAS	
REGISTRO	CONTROL DE CALIDAD	VERIFICACION
FECHA: 08/07/19	FECHA: 08/07/19	FECHA: 08/07/19





Handwritten signature

~~AGENCIA ZONAL DE
SERVICIOS EDUCATIVOS
DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ~~

Handwritten initials

ING. RUBEN BORGES OJEDA
COORDINADOR GENERAL DE
SERVICIOS EDUCATIVOS



PODERE DEL PROYECTO: **PROYECTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES**
 TIEMPO: **AR 17** PROYECTO: **C/SOL1 A/A 1** DE COLECTIVO: **03-07-2019**
 DIRECCION DEL TRABAJO: **MUNICIPIO DE BOCA DE UCA, CUE 2-3-1, TRAMO A, B (DEFINICION)** REGION: **MIOS**

Empleado: **MURO DE TABURETA** Cargo de Trabajo: **Fecha del Asesorio: 03/07/2019**

Para Asesada por: **Edgar** **Manojo**
 Coordinador de Evaluacion: **Manojo** **Manojo**

Lista de Verificacion	Fecha	Contratista	Fecha	Supervision
Verificacion de Fases Terminada	03/07/2019	V		
Ejecucion de Obras Definida	03/07/2019	V		
Asesoramiento	03/07/2019	V		
Revisión de datos	03/07/2019	V		
Atendidos de personas con el Proyecto De	03/07/2019	V		
Disculpa por las cosas		N/A		
Alguna de Asesorio Definida	03/07/2019	V		
Más con trabajo de limpieza realizada		N/A		
Los trabajos para verificado de desarrollo donde los trabajos anteriores no se definieron con concepto, liquidación, pagados.		N/A		
Atendidos para el desarrollo	03/07/2019	V		

SUPERVISOR CALIDAD: **Fecha:**

Lista de Verificacion	Fecha	Contratista	Fecha	Supervision
Verificacion: <input checked="" type="checkbox"/> Verdadero <input checked="" type="checkbox"/> Falso <input checked="" type="checkbox"/> Ambos	03/07/2019	V		
Superficie Ejecutada de la Abundancia Limpia	03/07/2019	V		
Revisión de datos	03/07/2019	V		
Atendidos de personas con el Proyecto De	03/07/2019	V		
Atendidos de Control o Evaluación	03/07/2019	V		


Lecciones Aprendidas: **Atendidos**
 Acero Aluminio Hierro Otros
 Trabajo de los materiales a ser utilizados con cemento líquido
 Materiales de limpieza realizados
 Control de registro de datos a ser


SUPERVISOR CALIDAD: **Fecha:**

Fecha	Contratista	Fecha	Supervision
03/07/2019	N/A		
03/07/2019	N/A		
03/07/2019	N/A		

Revisión de la Fase Aceptación
 Revisión de la Fase Aceptación
 Revisión de los materiales Terminados
 Comentarios:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Firma: <i>[Signature]</i> Nombre: Edgar Regalado Obiano	Firma: <i>[Signature]</i> Nombre: Edgar Regalado Obiano	Firma: <i>[Signature]</i> Nombre: Ruben Enrique Tenison







[Handwritten signature]

EDSON ZORRITOS

[Handwritten signature]
ENGENHEIRO MECÂNICO
C.R. Nº 12.345

[Handwritten signature]
ENGENHEIRO MECÂNICO
C.R. Nº 12.345

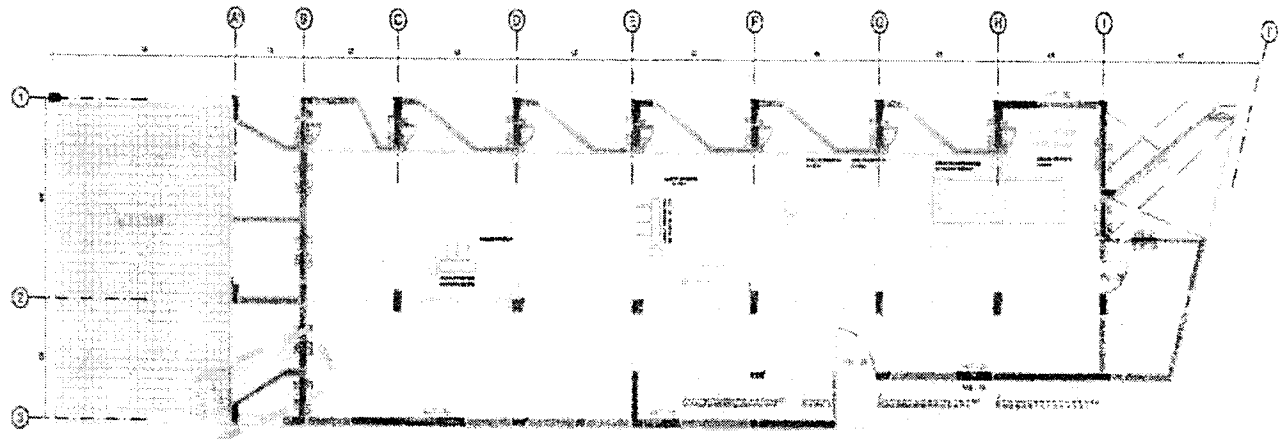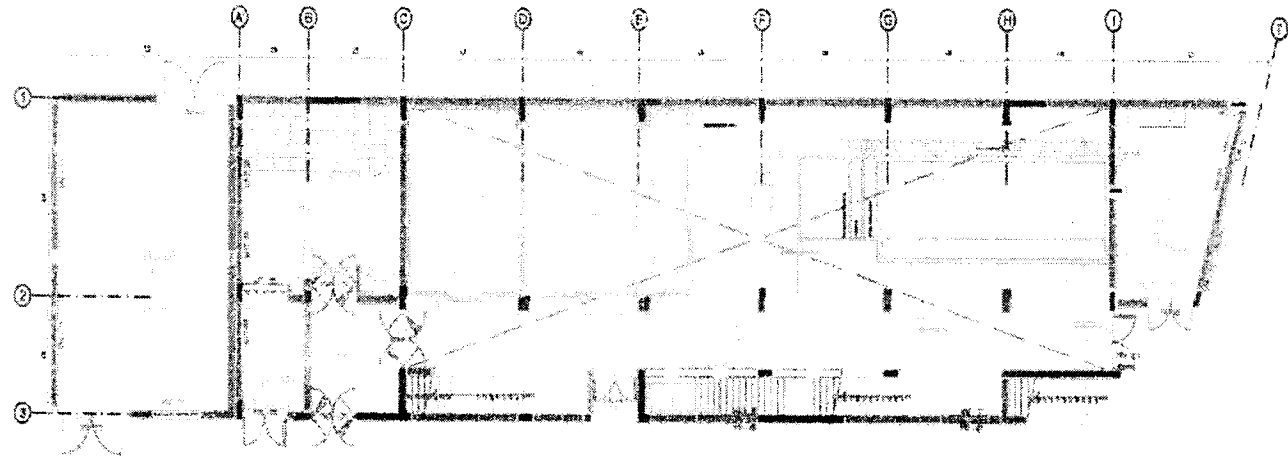

HOMBRE DEL PROYECTO: JORNALERO EN CAPAS
CLIENTE: FUERZAS ARMADAS PERUANAS
PLANO REF.: AR 14 **RENFE:** NIVEL 1
DESCRIPCION DEL TRABAJO: IMPRIMANTE PINTURA BASE EN Muros y CIelo RASO

1. DATOS GENERALES
 * MATILCA DE PINTURA F109HIX
 * CONTROLINSAO REBILDO
 * CONTROL DE PINTURA BLANCO
 * NÚMERO DE CAPAS: 02


* LA BOYA TECNICA DEL PROYECTO CUMPLE CON LA INSTRUCCION DE LA BOYA RECORDADA
 (Cumple SI (X) NO ())
 * LA PINTURA SI HA PUNTEADO, OLVIDADA Y APLICADA EN CONCORDANCIA A SU BOYA RECORDADA
 (Cumple SI (X) NO ())
 * LA BASE ESTA DE ACUERDO CON LA IDENTIFICACION
 (Cumple SI (X) NO ())
 * CANTIDAD FINAL DE ACABADOS ACEPTABLE
 (Cumple SI (X) NO ())

2. PARTES CONTROLADAS:

DESCRIPCION / EQUIPCIO	CONTROL SUBSTANCIAL			COMENTARIOS / OBSERVACIONES
	TEXTURA	ACABADO	FORMA	
IMPREGNACION	X	X	X	Muros en Pasadizo, tres Palmas Caballeros
DESINFECCION	X	X	X	Cielo Raso - tres Palmas y Caballeros

1. PINTADA: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APILTA



ELABORADOR	REVISOR	APROBADO	RECEPCIONADO
[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
Carolina Medina Llanos Ingeniero Civil en Construcción	Sergio Jorge Acuña Escobar Ingeniero Civil en Construcción	Carlos Vera Andino Ingeniero Superior Agrícola - Zootecnia	Carlos Ing. Doroteo Andino Ingeniero Superior Agrícola - Zootecnia



J. S. ROBERTSON ARCHITECTS
1000 BROADWAY
NEW YORK, N. Y.

Handwritten notes:
1. TRIMMED AT ALL INTERSECTIONS
2. SEE SECTION 10-11

Handwritten signature: J. S. Robertson

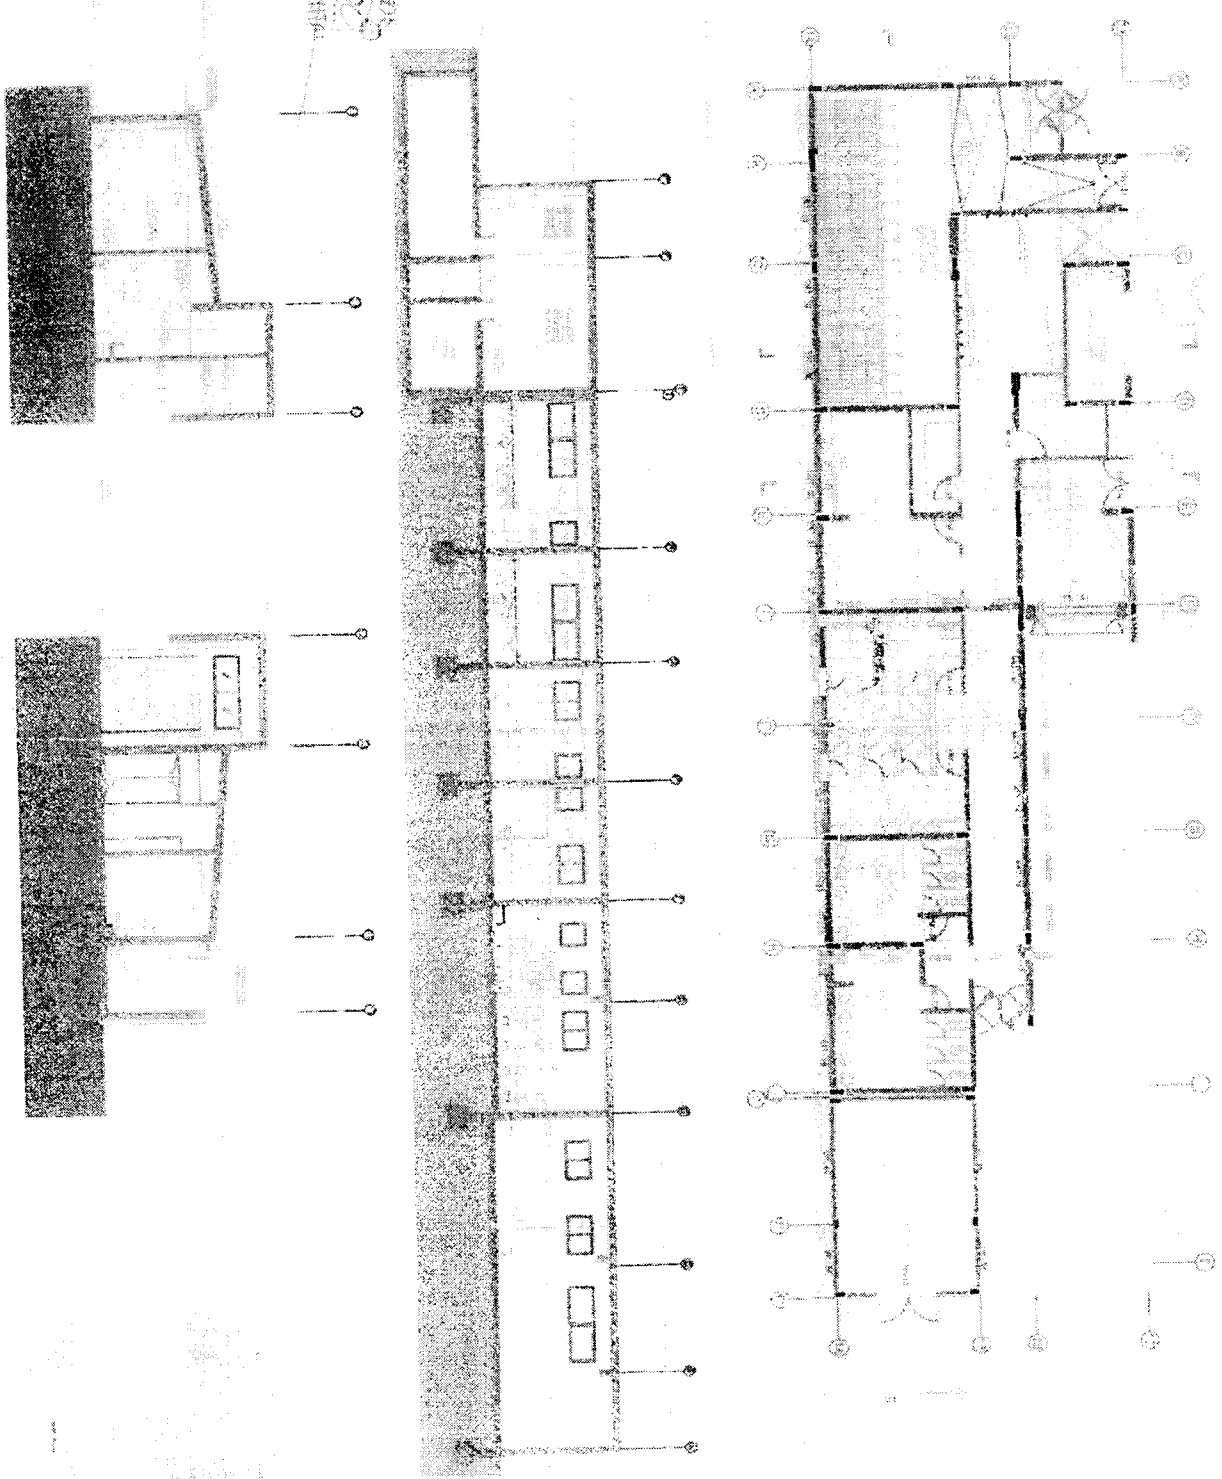

REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD

INSPECCION DE TARRAJEOS Y DERRAMES

MEMBRE DEL PROYECTO: **PROYECTO DE ALARGUE**

CLIENTE: **FOCALTES**

PLANO REF: **AR-10**

DESCRIPCION DEL TRABAJO: **TARRAJEO DE COLUMNAS CIRCULARES: EJE: B*4 : B*4 : B*3 (PARCIAL) : B*5 : B*9 : B*10 (PARCIAL)**

FECHA: **03-07-2019**

AREA: **TAREAS P REVZAS**

Nº CORRELATIVO: **1**

Rev: **1**

FECHA: **03-07-2019**

Pagina: **1 de 1**

CZ-SSC-PE-03-FI

Verificaciones Generales:

	Limpieza		Rugosidad		Humedad	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Entorno	C	obs. Lev.	C	obs. Lev.	C	obs. Lev.
Verticalidad de columnas	C	obs. Lev.	C	obs. Lev.	C	obs. Lev.
Uniformidad de columnas	C	obs. Lev.	C	obs. Lev.	C	obs. Lev.
Contrazocalo / cemento pulido	C	obs. Lev.	C	obs. Lev.	C	obs. Lev.
Entorno como resaca tipo Rodillo	C	obs. Lev.	C	obs. Lev.	C	obs. Lev.
Verticalidad de derrame	C	obs. Lev.	C	obs. Lev.	C	obs. Lev.
Contrazocalo sanitario	C	obs. Lev.	C	obs. Lev.	C	obs. Lev.
Dimensiones de vanos	C	obs. Lev.	C	obs. Lev.	C	obs. Lev.
Cierre	C	obs. Lev.	C	obs. Lev.	C	obs. Lev.

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: *[Firma]*

REVISADO POR: *[Firma]*

APROBADO POR: *[Firma]*

Nombre: **Freddy González López**


Nombre: **Edgar Raga Soto Obres**



Nombre: **Alfonso Sueskus Tonieto**

FECHA: **03-07-2019**

FECHA: **03-07-2019**

FECHA: **03-07-2019**





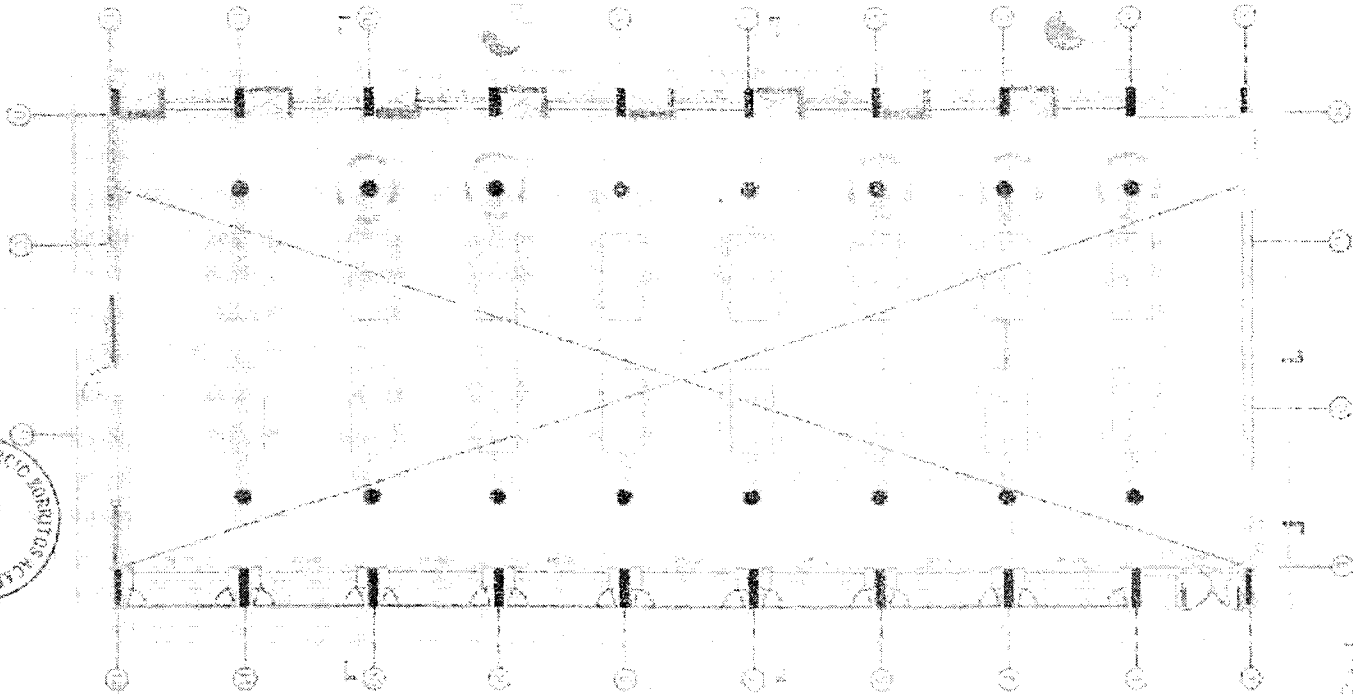

[Handwritten signature]

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
[Handwritten signature]
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten signature]
 DIRECTOR DE SERVICIOS TÉCNICOS
 DE OBRAS PÚBLICAS
 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

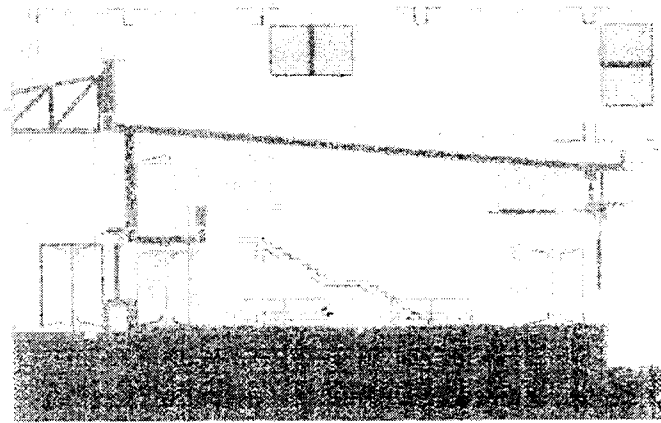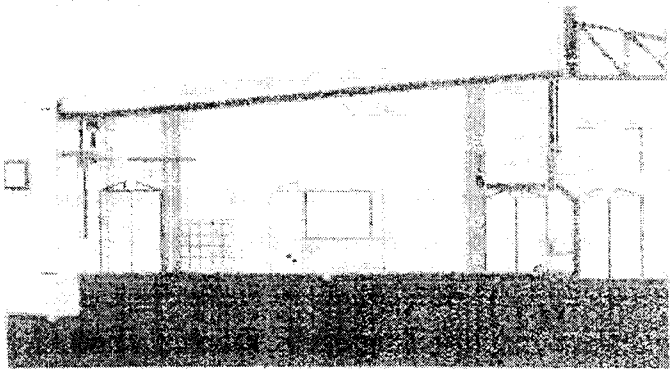



REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
PROTOCOLO DE VERIFICACION DE TRABAJOS DE DEMOLICION

CS SOC.PC.01.01
Revision: 1
Fecha: 14/07/2019
Escala: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: DPA ACAPULCO
CLIENTE: FOMERPE
PLANO DEL: UM-02
MANZANA:
SECTOR:
N° CORRELATIVO: 1
FECHA: 04/07/2019
LUGAR:
PISO:

Orculisten

Mueble

Direccion
 San. Int.
 Etc
 Inyecciones
 Trazos
Otras: TRAZO 30 N1

OBSERVACIONES:

INDICACION DE USOS DE CONCRETO ARMADO CATEGORIA TRAZO 30 N1

Sociedades
 Ventas
 Otros

Elemento a protegerse a verificar
(detalle especificar)

Referencia (Plano nº)

Seguridad

- Seguridad: alto, bajo, medio, guante
- Señalización: zona de trabajo delimitada con cinta amarilla
- Señalización: area de construcción delimitada con cinta roja
- Otros: medida de seguridad
otras: taperoo, arandales

Verificación realizada

Observaciones

NOTA:

Cantidad de Hojas Anexas:

ELABORADO POR:	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15


16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

CRISTÓBAL ZORRITOS

[Handwritten signature]
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Intendencia de Ciego

46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60



[Handwritten signature]
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Intendencia de Ciego de Avila

331	Intendencia de Ciego de Avila	

331

01-02



REGISTRO

CONTROL DE CALIDAD

PROTOCOLO DE IMPRIMANTE PINTURA BASE

No. 7366/PC-01-13
 Rev: 0
 Fecha: 09/07/18
 Págs: 1 de 3

NOMBRE DEL PROYECTO: Normalización de la pintura
CLIENTE: Rosillos
PLANO REF.: 1
FEENTE: Invt 1
FECHA: 09/07/2019
SECTOR: DESINFECTIÓ

DESCRIPCION DEL TRABAJO: IMPRIMANTE PINTURA-BASE EN MUROS

- 1. DATOS GENERALES**
- MARCA DE PINTURA: EGOMUX
 - EQUIPO USADO: RODILLO

- COLOR DE PINTURA: IN AFRO
- NUMERO DE CAMAS: 02

- LA HOJA TECNICA DEL PRODUCTO TIENE QUE SER LA CERTIFICADA EN SU BUENA REGULADA
- EL PRODUCTO SI TIENE QUE SER ()
- LA PINTURA SE HA PREPARADO, DILUYDA Y APLICADA EN FORMA ORIGINAL A SU HOJA TECNICA
- Siempre SI (X) NO ()
- LA BASE ESTÁ EN ACUERDO CON LA FÓRMULA DE LA HOJA TECNICA
- Siempre SI (X) NO ()
- TEMPERATURA DEL PRODUCTO EN MOMENTO DE APLICAR
- Siempre SI (X) NO ()

2. PARTES CONTROLADAS:

DESCRIPCION / MUESTRA	CONTROL CORREGIDA			COMENTARIOS / OBSERVACIONES
	TIFFINA	ACERADO	TUBO	
DESINFECTIÓ	X	X	X	MURON LAVADO DE CARIETAS CIELO RASO LAVADO DE CARIETAS


TERMINA: SI CONFORME NO, NO CONFORME N/A, NO APLICA



Habilitado: FIRMADO POR: Asesoría: Supervisado:

Ing. César A. González Ing. César A. González Ing. Daniel Álvarez Ing. Daniel Álvarez

Ing. César A. González Ing. César A. González Ing. Daniel Álvarez Ing. Daniel Álvarez




09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019 09/07/2019



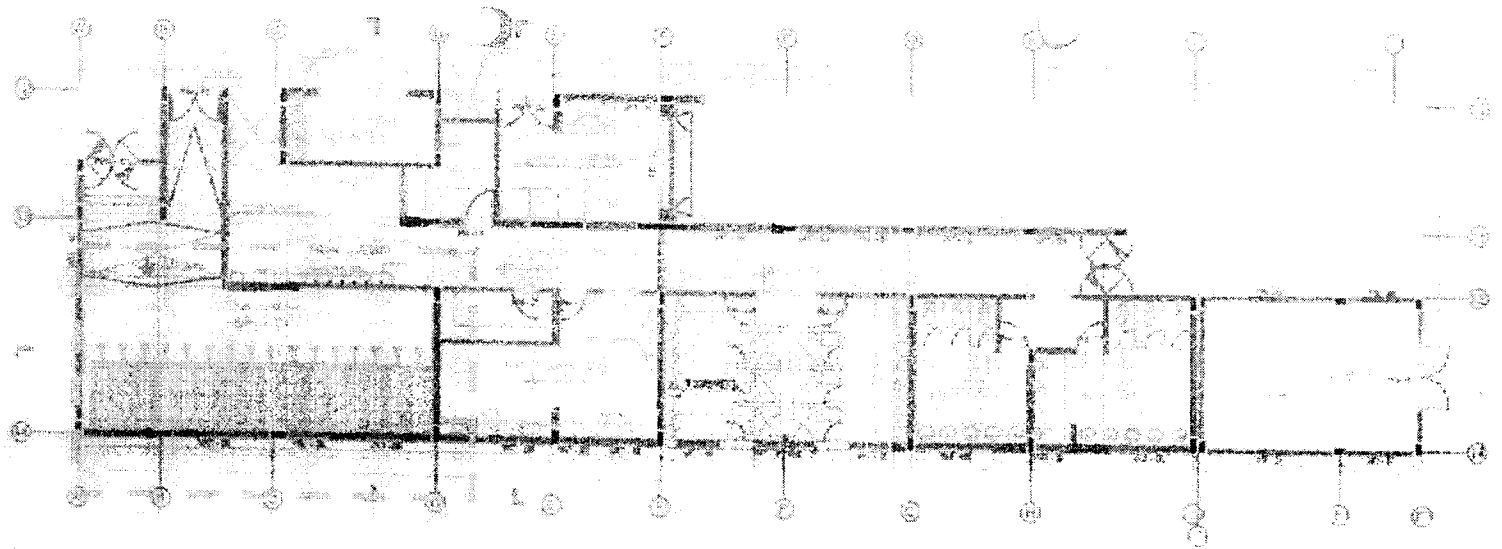

Handwritten signature

SEÑOR J. TORRITOS
Handwritten signature
CALLE DE LOS BOQUEJONES
LIMA - PERU

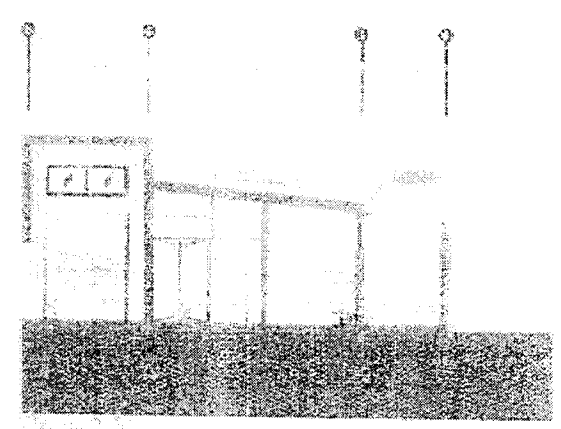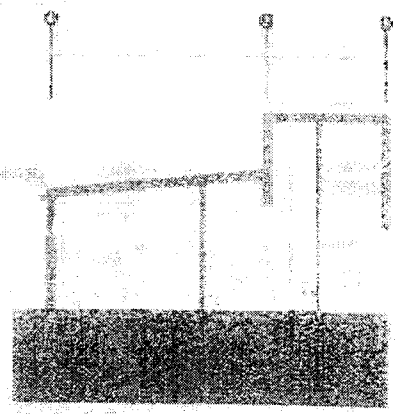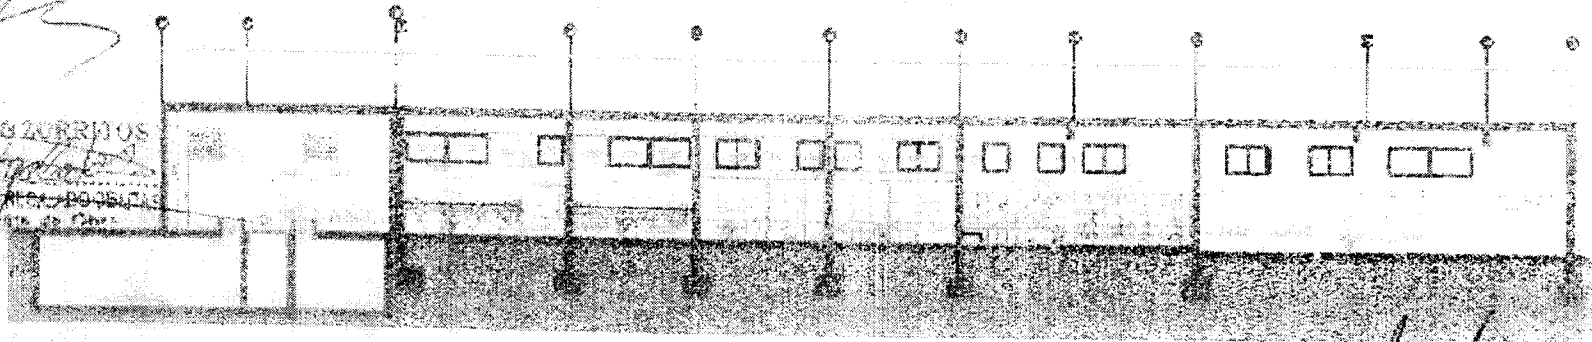

Handwritten signature
NO QUEDA BASTA SOLA
ALGUNO SIN UN VOUCHER
DE LA SUPERINTENDENCIA

323



REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
INSPECCIÓN DE TARRAJOS Y DERRAMES

CZ-SGC-PC-03-F1
Rev: 1
FECHA: 04-07-2019
Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: RESERVUO DE AGUAS
CLIENTE: GOBIERNO

Nº CORRELATIVO: FECHA: 04-07-2019

PLANO REF: AR-15

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: TARRAJOS DE COLUMNAS CIRCULARES EJE S-1 B*5 B*10

COMPLEMENTO: B*11

ÁREA: TAREAS PREVIAS

TARRAJOS DE COLUMNAS CIRCULARES EJE: D-1 : D-4 : D-8 : D-11

Verificaciones Generales:

Limpieza

Regeneración

Humedad

Ambiente	Alfombrado de COLUMNAS		Verdad de COLUMNAS		Uniformidad de COLUMNAS		Contraste c/ cemento pulido		Existencia de raso-cimbr tipo Mader-Caja		Verticalidad de derrames		Contraste sanitario		Distorsiones de ramos		Cilindrismo				
	SI	NO	obs. Lev.	obs. M*	SI	NO	obs. Lev.	obs. Lev.	SI	NO	obs. Lev.	SI	NO	obs. Lev.	SI	NO	obs. Lev.	SI	NO	obs. Lev.	
TAREAS PREVIAS EJE S*	Y				Y																
TAREAS PREVIAS EJE D*	Y				Y																

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: *[Firma]* REVISADO POR: *[Firma]* APROBADO POR: *[Firma]*

FECHA: 04-07-2019

Nombre: F. Sady González López



Fecha: 04-07-2019

Nombre: Ing. Roger Riquelme Chicas

Fecha: 04-07-2019

Nombre: Ing. Ruben Bossas Tomich



Fecha: 04-07-2019

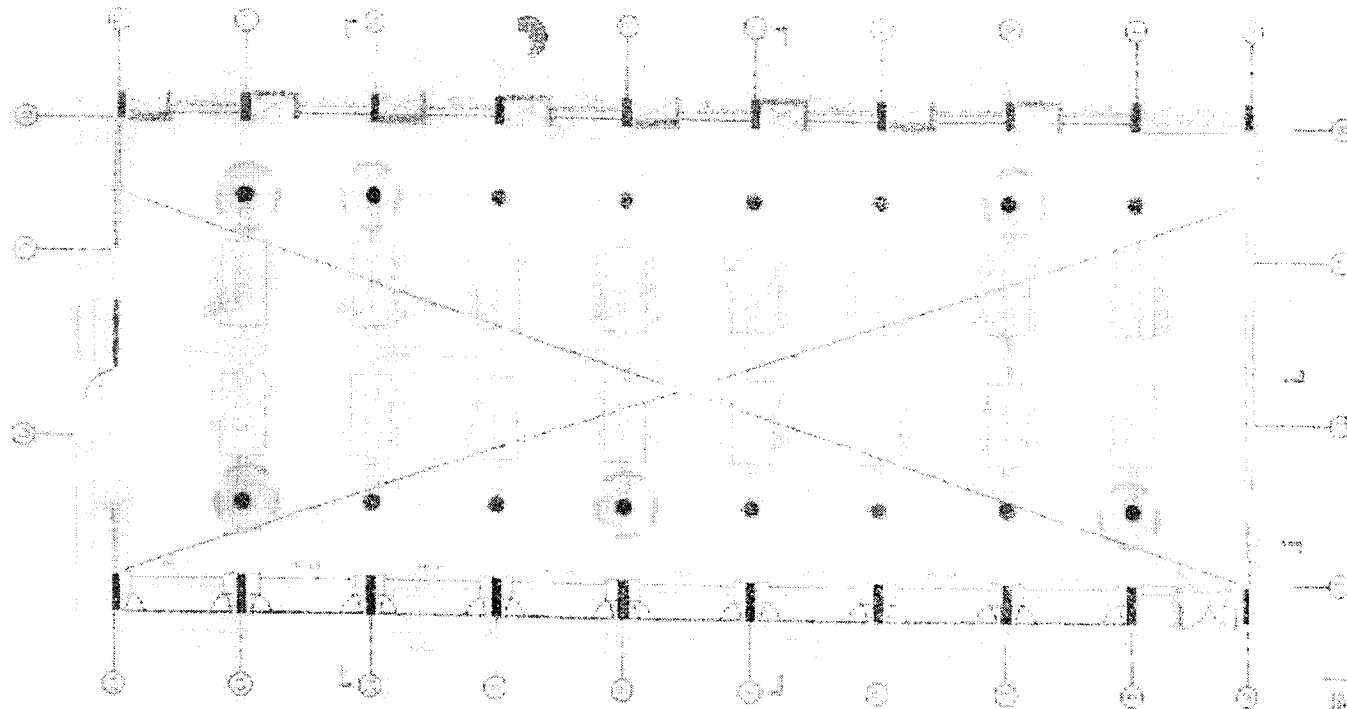

ING. ALEXANDRE DOS SANTOS
PROFESSOR DE PROJETOS DE ARQUITETURA
LISTA DE ALTERAÇÕES

Handwritten signature

CONSELHO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Handwritten signature
PROFESSOR DE PROJETOS DE ARQUITETURA
LISTA DE ALTERAÇÕES

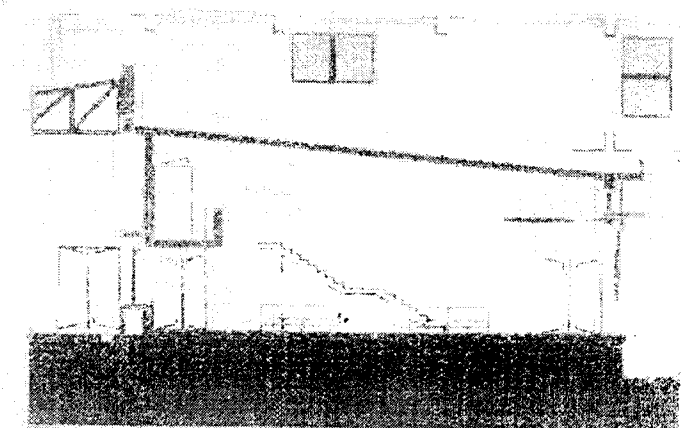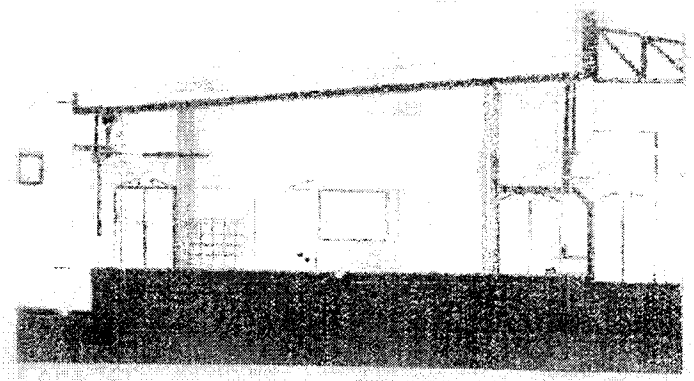



REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
INSPECCIÓN DE TARRAJOS Y DERIVADOS

CZ-SECC-DC-01-FI

Rev:

1

FECHA: 04-07-2019

Página:

1 de 1

Nº CORRELATIVO:

FECHA: 04-07-2019

ÁREA: FIOS (2DO NIVEL)

NOMBRE DEL PROYECTO: PLAN DE MANEJO DEL RÍO TARRAJOS
CLIENTE: FONDECOS
PLANO REF: AB-17
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: TARRAJOS DE MURD-PLACA EJE: Dº : TRAMO 3-3º : NIVEL 1

Verificaciones Generales:

Limpieza V

Augustadad V

Humedad V



Ambiente

FRIO: 2DO NIVEL, EJE: Dº : TRAMO 3-3º

Observaciones	Alineamiento de muro-pisa		Verticalidad de muro-pisa		Uniformidad de muro-pisa		Contratado c/ convenio público		Entrada ciego tipo Media Cebra		Verticalidad de derrame		Cortamiento sanitario		Dimensiones de Varios		Cilindricidad		
	S	NC	S	NC	S	NC	S	NC	S	NC	S	NC	S	NC	S	NC	S	NC	

Observaciones:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre: Freddy Soteras Lopez
FECHA: 04-07-2019

Nombre: Ing. Edgar Recalado Ojeda
FECHA: 04-07-2019

Nombre: Ing. Ruben Sosa Torales
FECHA: 04-07-2019






Fig. 1

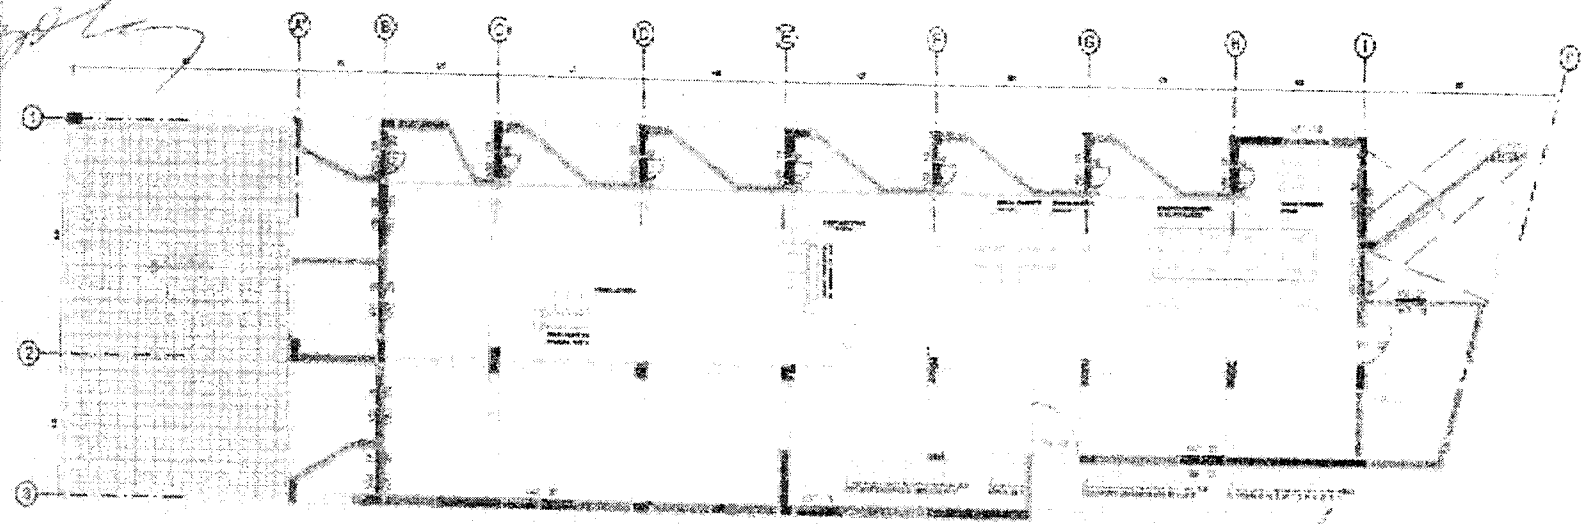

Architectural signature
Architectural title
Date: 26/08/50

Supervisor signature
COMANDO SUPERVIZIONE
UFFICIO DI SUPERVISIONE

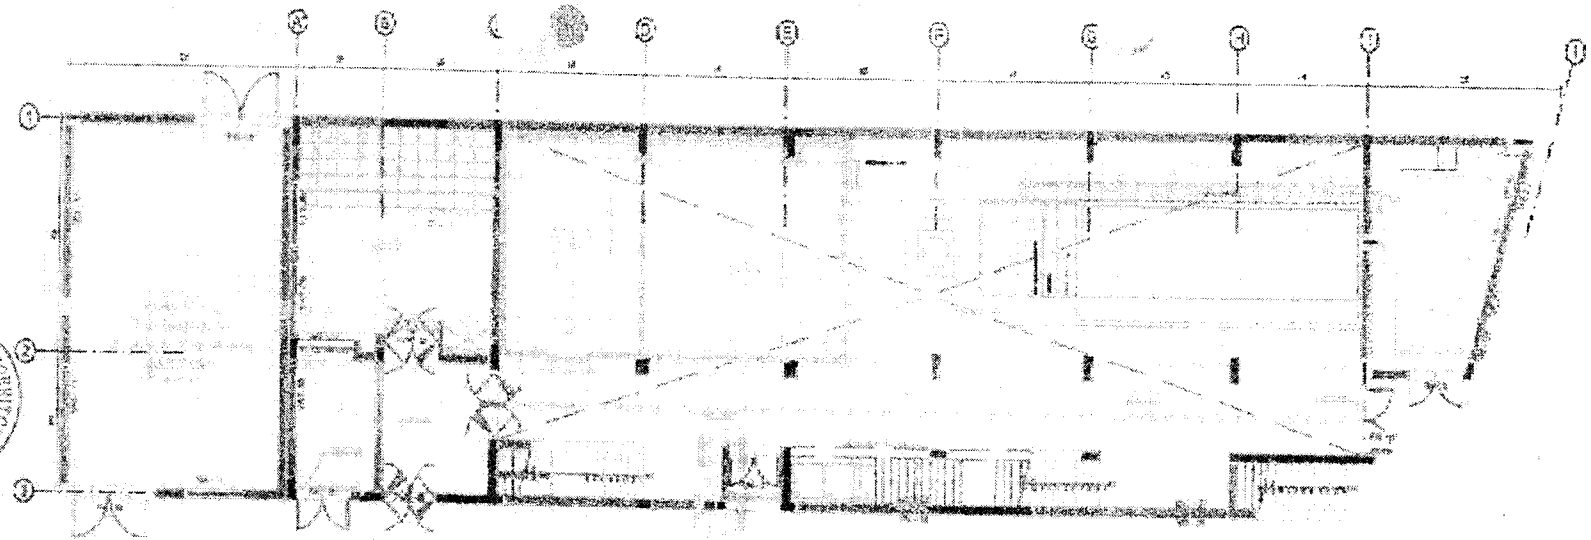

REGISTRO
CONSORCIO ZAMBITOS
PROTOCOLO DE VERIFICACION DE TRABAJOS DE REPLICACION

CZ-RSC-19-01-01
Revisión: 1
Fecha: 05/07/2019
Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: OPA ACAPULCO
CLIENTE: FONDOS
PLANO REF.: OM-02
MANZANA:
FRONTE: FRENTE
SECTOR: HUETLE
PIEDRA: PIEDRA
FECHA: 05/07/2019
Nº CORRELATIVO: 1

Ubicación del lote:
 Urbanización
 Barrio
 P.O.
 Nivelación
 Drenaje
 Otro: PASO 31.32

PRESENCIAS:
 DIGNIFICADO DE VICARIO DE FRENTE: ARMANDO CARRIZO MANZO S.A.S

Presencias:
 Señales
 Otros

Elementos a Entender a verificación (Identificar y señalar):

Referencia (Plano N°):

- Requeridos:
- V. Seguridad: (C) Señales, bander, letreros, guanteros
 - V. Señalización áreas de trabajo delimitada con cinta amarilla
 - V. Señalización, áreas de exclusión del tránsito con conos rojos
 - V. Otros: molle de seguridad
- Elementos, espacios suministrados:





Verificación realizada:

Observaciones:

NOTA: Cantidad de Hojas Anexas: _____

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> Cargo: <i>[Cargo]</i> Fecha: 05/07/2019	Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> Cargo: <i>[Cargo]</i> Fecha: 05/07/2019	Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> Cargo: <i>[Cargo]</i> Fecha: 05/07/2019




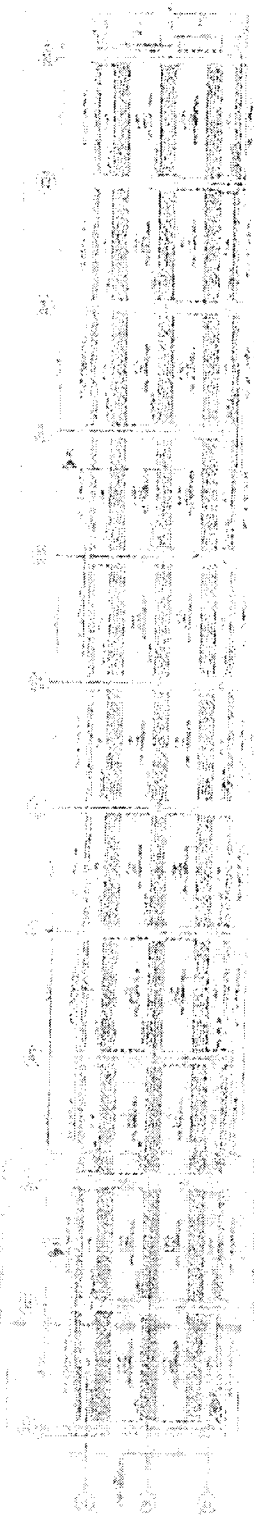

CM-02

[Handwritten signature]





REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
TRANSPORTE DE CABEZAL PREFABRICADO

1.7.56C.PC.01.D1
Revisión: 1
Fecha: 05/07/19
Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL CPA DE ACAPULCO

CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEFES

Nº CORRELATIVO: 05/07/19

PLANO REF.: OM-03 EJE 31 SECTOR: CABEZO

FECHA INICIO: 05/07/19

RESUMIEN DEL TRABAJO: 17AJE Y TRANSPORTE DE VIGA CABEZAL DE CONCRETO PREFABRICADO HASTA EL CABEZO

UBICACION DEL ELEMENTO PREFABRICADO:

PUENTE CABEZO


ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Verificación de las condiciones mínimas del elemento prefabricado (*)	X			
2	Verificación optima de los elementos de izaje (*)	X			
3	Verificación de la guía de izaje en buen estado (*)	X			
4	Se verificó que durante los trabajos se utilizó maniobristas y rigido	X			
5	Autorización de izaje del elemento prefabricado (*)	X			
6	Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	X			

(*) Acreditado por el Cliente y/o la Universidad

DATOS DE CAMPO:

Toma de muestra en Buzón de Aduanas
Fecha de izaje del elemento prefabricado
PARTO DE FABRICACION
05/07/19

ESQUEMA
ADJUNTO: SI NO

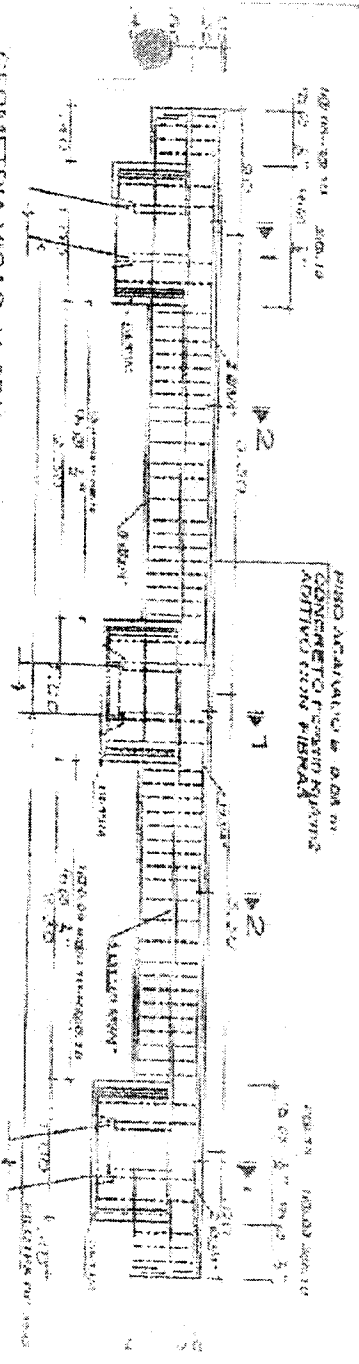

GEOMETRIA VIGAS Y CZAL - 01 (CABEZO DE MUJER)

VISTA DEL ELEMENTO PREFABRICADO

OBSERVACIONES

LABORADO POR: [Signature]

REVISADO POR: [Signature]


APROBADO POR: [Signature]

Nombre: FREDY GONZALEZ LOPEZ
Cargo: ING. RESIDENTE
Fecha: 05/07/19

Nombre: EDGAR REGALADO ORTIZ
Cargo: ING. SUPERVISOR
Fecha: 05/07/2019

Nombre: RUBEN ROSSALD FIGUEROA
Cargo: [Blank]
Fecha: 05/07/2019





REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD

MONTAJE DE CABEZAL PREFABRICADOS

C2. SEC. REG. 01 D1
Revisión: 1
Fecha: 05/07/19
Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DPA DE ACAPULCO
CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO - FONDOPES
PLANO REF.: OM-03 EYE 31 SECTOR: CABEZAL
N° CORRELATIVO: 05/07/19


DESCRIPCION DEL TRABAJO: MONTAJE DE VIGA-CABEZAL PREFABRICADA DE CONCRETO ARMADO EN EL EJE 30 DEL VAPAZO
UBICACION DEL ELEMENTO O PREFABRICADO: FUENTE CANTO

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Revisión de planos y especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	Verificación topográfica de la cota y de la posición final del elemento prefabricado	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	Autorización de Montaje del elemento prefabricado (*)	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	<input checked="" type="checkbox"/>			

Elaborado por el cliente y/o la supervisión
En: 05 DE CAMPO:

Elementos de cota en buenas condiciones
 Zona de montaje del elemento prefabricado en buenas condiciones
 Daño controlado (200 kg/cm^2 en la super (Viga-Columna))

ESQUEMA ADJUNTO: SI NO

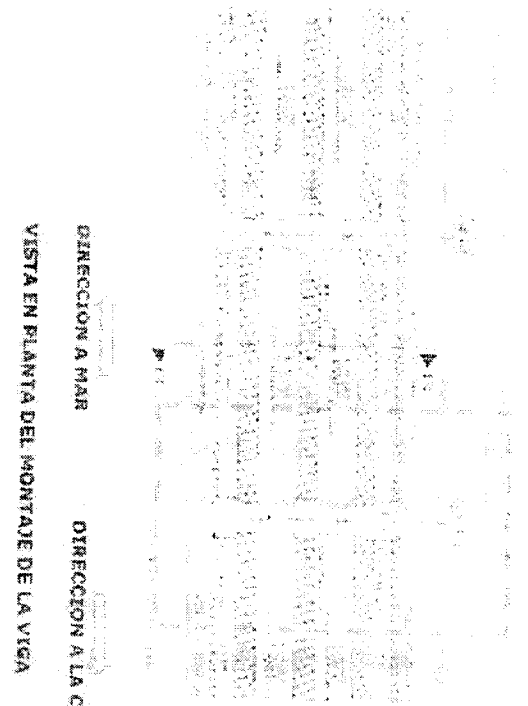

OBSERVACIONES:
VISTA EN PLANTA DEL MONTAJE DE LA VIGA


ELABORADO POR: *[Signature]* **REVISADO POR:** *[Signature]* **APROBADO POR:** *[Signature]*

Nombre: *[Signature]* **Nombre:** *[Signature]* **Nombre:** *[Signature]*

Cargo: INGENIERO RESIDENTE **Cargo:** INGENIERO RESIDENTE **Cargo:** INGENIERO SUPERVISOR

Apellido: FERRER GONZALEZ LOPEZ **Apellido:** ESCOBAR REGALADO ORTIZ **Apellido:** RUBEN BOSCHUS TOMIATTI

05/07/19 **05/07/2019** **05/07/2019**





**REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD**

CZ.SGC.PC.03-F1


INSPECCIÓN DE TARRAJEOS Y DERRAMES

Rev: 1
FECHA: 05-07-2019
Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: REFORZAMIENTO DPA ACAPILCO N° CORRELATIVO:
 CLIENTE: FONDEFON FECHA: 05-07-2019
 PLANO REF.: AA-15 Cód. FIS: CZ-SGC-LT-A-D AREA: TAREAS PREVIAS
 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: TARRAJEO DE COLUMNAS CIRCULARES EJE: D°1: D°5: D°6: D°7: D°9: D°10

Verificaciones Generales:



Limpieza Rugosidad Humedad



Ambiente	Alisamiento de COLUMNAS			Verificación de COLUMNAS			Uniformidad de COLUMNAS			Contrazocalo c/ cemento pulido			Encuentro cielo raso-muro tipo Módulo Caña			Verificación de drenaje			Contrazocalo sanitario			Dimensiones de vanos			Cisternas			
	C	NC	Obs. Lev.	C	NC	Obs. Lev.	C	NC	Obs. Lev.	C	NC	Obs. Lev.	C	NC	Obs. Lev.	C	NC	Obs. Lev.	C	NC	Obs. Lev.	C	NC	Obs. Lev.	C	NC	Obs. Lev.	
TAREAS PREVIAS EJE D°1	V			V			V																					


OBSERVACIONES:



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Freddy González López FECHA: 05-07-2019	Nombre: Ing. Edgar Regalado Obías FECHA: 05-07-2019	Nombre: Ing. Ruben Scussus Toniari FECHA: 05-07-2019

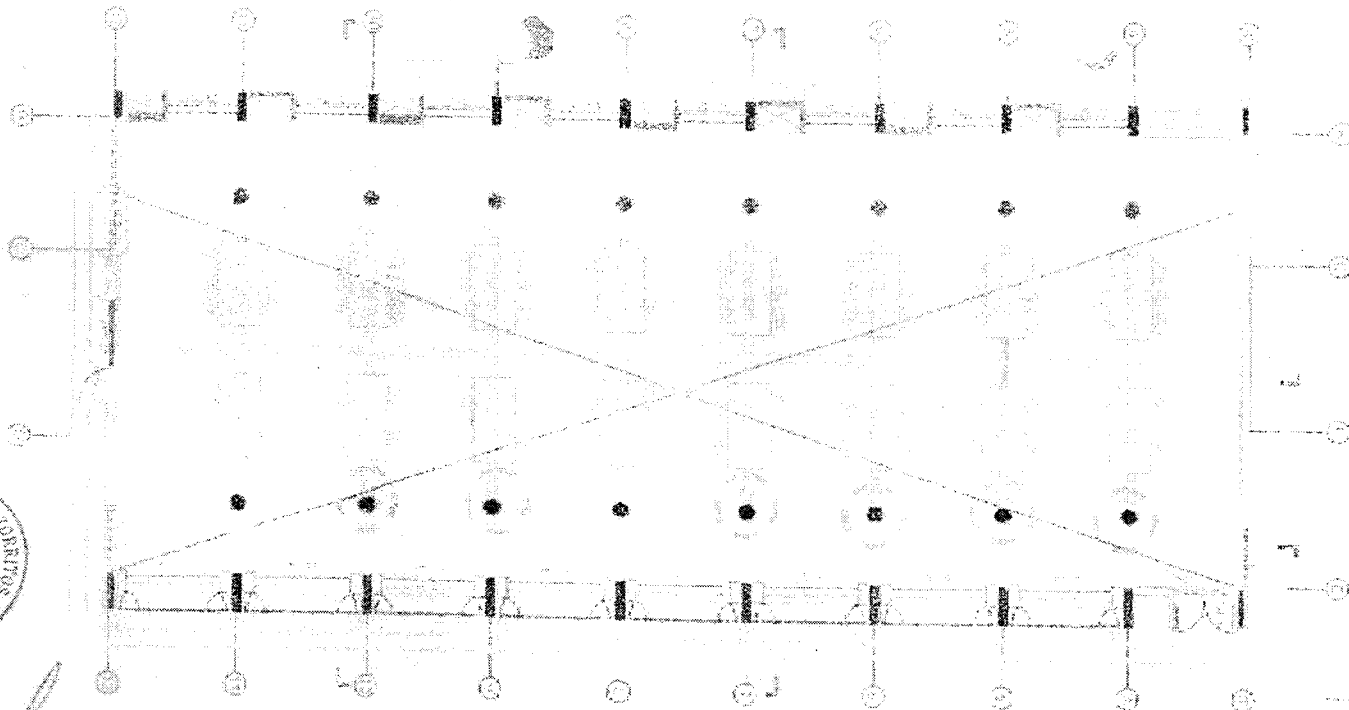

Handwritten signature

NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
Charles J. ...
 CHIEF OF DIVISION


 CHIEF OF DIVISION
 NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

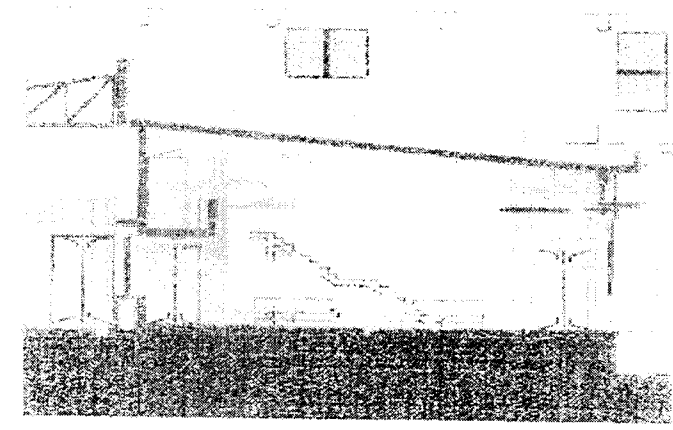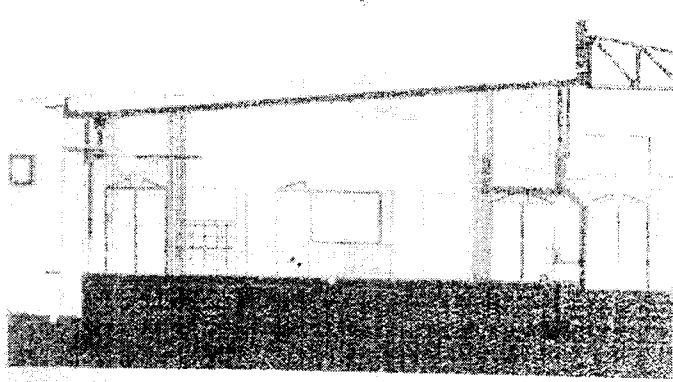



REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD

CZ.SGC.PC.03-F1

INSPECCIÓN DE TARRAJEOS Y DERRAMES

Rev: 1
FECHA: 05-07-2019
Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO
CLIENTE: FONDOPES
PLANO REF.: AR-17
CÓD. P.E.: CZ-SGC-PC-03-F1
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: TARRAJEO DE MURO: EJE 3: TRAMO D-E: NIVEL 1

Nº CORRELATIVO:

FECHA: 05-07-2019

AREA: FRIOS (2DO NIVEL)

Verificaciones Generales:

Limpieza

V

Rugosidad

V

Humedad




V



Ambiente	Alineamiento de MURO			Verticalidad de MURO			Uniformidad de MURO			Alineamiento de vigas			Verticalidad de vigas			Uniformidad de vigas			Contrazocalo sanitario			Dimensiones de vanos			Cieloraso			
	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	
FRIOS: MURO EJE 3: TRAMO D-E: NIVEL 1	V			V			V																					

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: Freddy González López FECHA: 05-07-2019	REVISADO POR: Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: Ing. Eogar Regalado Chifas FECHA: 05-07-2019	APROBADO POR: Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: Ing. Ruben Bossus Torral FECHA: 05-07-2019
--	--	--

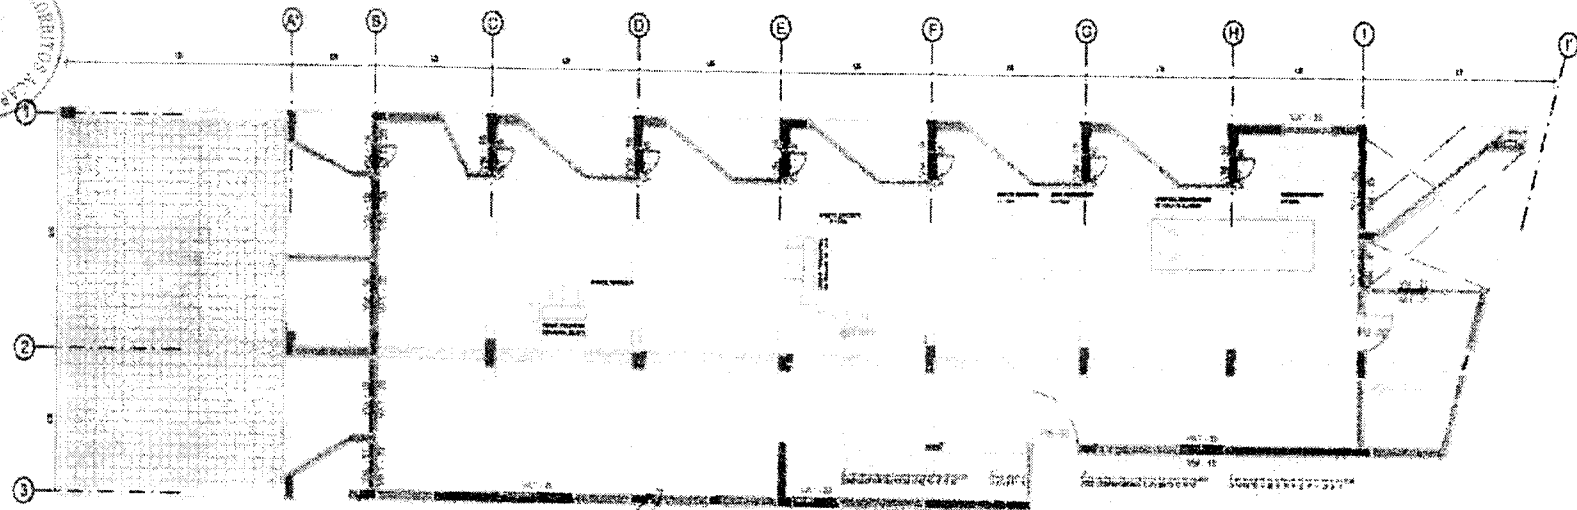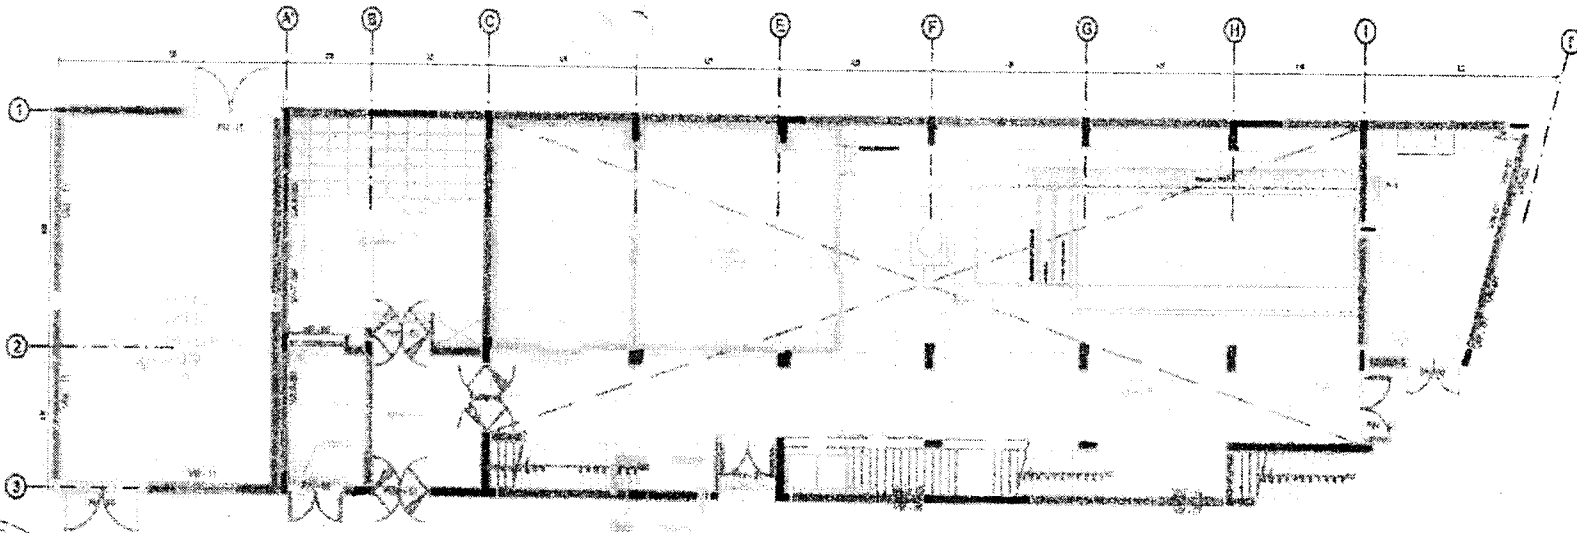

[Handwritten signature]

CONSEJO AZORRILLOS
[Handwritten signature]
 COMISARIO GENERAL DE OBRAS
 y Resguardo de Obras

ING. RUBEN BASSIS TORIATI
 COMISIONADO SUPERVISOR TUBERIAS
 AREA DE SUPERVISION

317



**CONSORCIO
ZORRITOS**

**REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD**

CZ.SGC.PC.03-F1

Revisión: 01

Fecha: 06/07/19

Página: 1 de 1

REPORT DE EXCAVACION

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO

N° CORRELATIVO:

CLIENTE: FONDEPES

PRETE: IAREAS PREVIAS

FECHA INICIO:

AREA O TORRE:

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

EXCAVACION PARA MESAS PARA RECIBIR PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS

TIPO DE EXCAVACION:

TRAMO: 9-10 : 10-11 : 11-12

Excavación
Masiva

Excavación Localizada

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Revisión de planos y especificaciones	X			
2	Autorización de Excavación (*)	X			
3	Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	X			
4	Verificación Topográfica	X			
5	Ubicación de Taberfuerdas (**)	X			
6	Perifoneo de Límites	X			
7	Sobreexcavación		X		
8	Compactación de banco de excavación (1)			X	
9	Conformidad de niveles	X			

(*) Autorizada por el Cliente y/o la Supervisión

(**) La excavación en zona de taberfuerdas debe realizarse en forma manual y de acuerdo a los planos de DUEE exist.


DATOS DE CAMPO:


- Nivel de Terreno (Previo a Excav.): 4.10
- Nivel final de Excavación (Según planos): 3.05
- Nivel final de Excavación (Según campo): 3.05
- % Compact. Fondo de Excav. (1):
- % Compact. Espac. (95%):

ADJUNTO: PLANO Y ESQUEMA SI NO


OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Cargo: CALIDAD	Cargo: ING. RESIDENTE	Cargo: ING. RESIDENTE	Cargo: ING. SUPERVISOR	Cargo: ING. SUPERVISOR	Cargo: ING. SUPERVISOR
Nombre: FREDY GONZALEZ LOPEZ	Nombre: EDGAR RECALADO OBLITAS	Nombre: EDGAR RECALADO OBLITAS	Nombre: RUBEN BOSQUE TORIVANTI	Nombre: RUBEN BOSQUE TORIVANTI	Nombre: RUBEN BOSQUE TORIVANTI
Fecha: 06/07/2019	Fecha: 06/07/2019	Fecha: 06/07/2019	Fecha: 06/07/2019	Fecha: 06/07/2019	Fecha: 06/07/2019




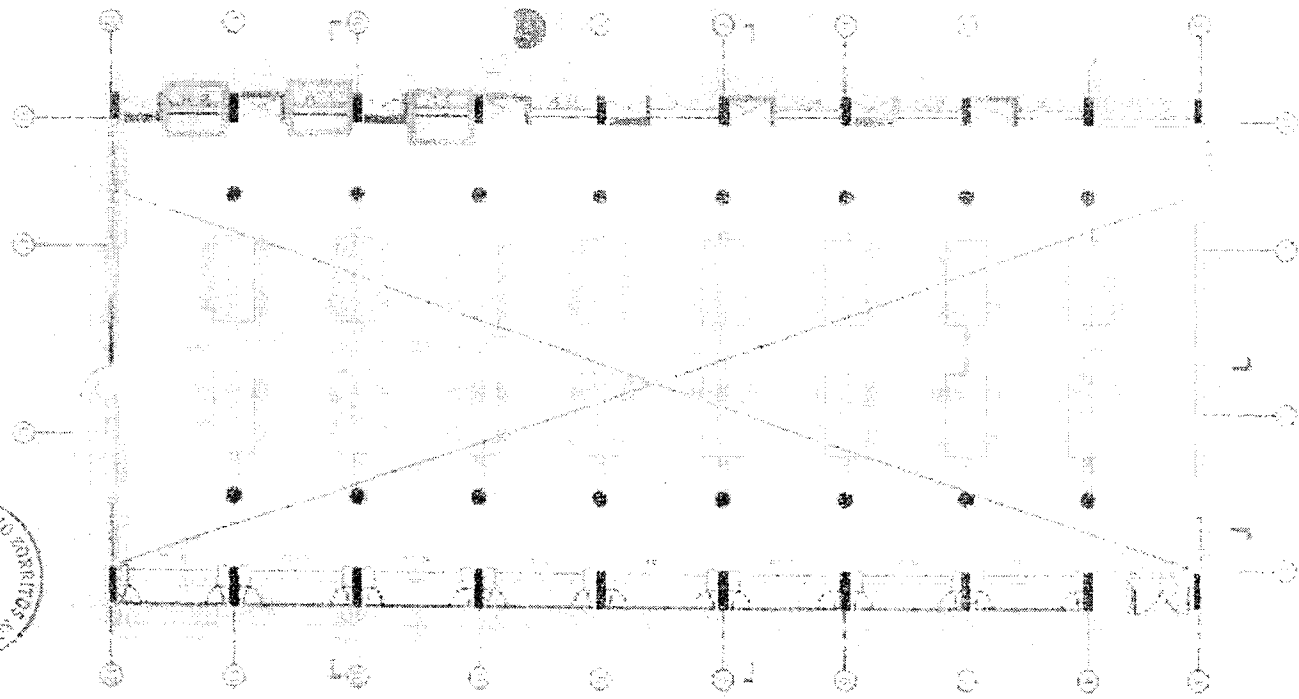


1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100



Arquitecto

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
[Signature]
 OFICINA GENERAL DE PROYECTOS
 DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

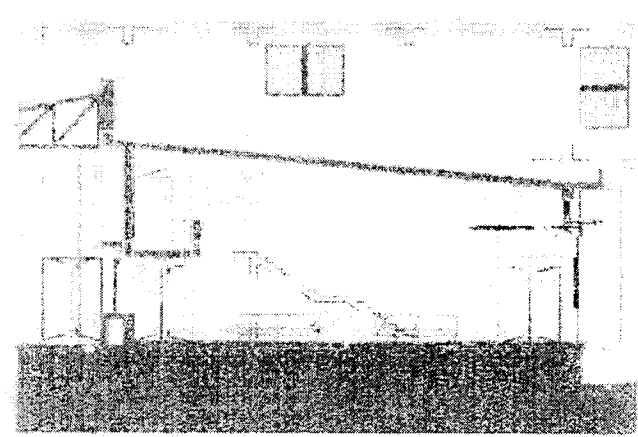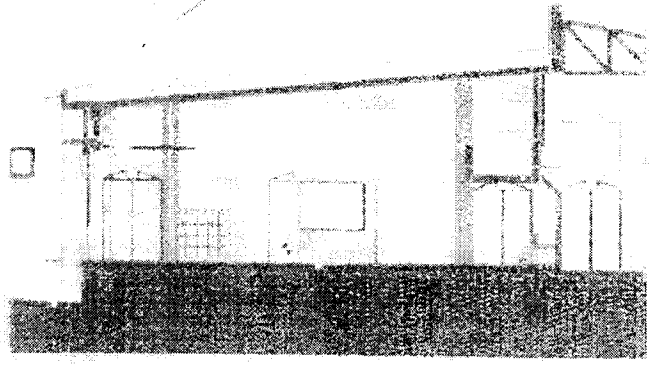

OFICINA GENERAL DE PROYECTOS
 DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

315



CONSORCIO
ZARZAITON

REGISTRO

CONTROL DE CALIDAD

CZ.SOC.PC.03-F1

Revisión: 01

Fecha: 06/07/19

Página: 1 de 1

REPORTE DE EXCAVACION

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO

CLIENTE: FONDEPES

PLANO REF.: AR-01

FRENTE: VEREDAS

SECTOR:

AREA O TORRE:

Nº CORRELATIVO:
FECHA INICIO:

DESCRIPCION DEL TRABAJO: EXCAVACION PARA VEREDA EN DESINFECCION

TIPO DE EXCAVACION:

Excavación Masiva

Excavación Localizada

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Revisión de planos y especificaciones	X			
2	Autorización de Excavación (*)	X			
3	Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	X			
4	Verificación Topográfica	X			
5	Ubicación de Interferencias (**)	X			
6	Perfilado de taludes	X			
7	Sober excavación		X		
8	Compactación de fondo de excavación (1)			X	
9	Condormidad de niveles	X			

(*) Autorizado por el Cliente y/o la Supervisión

(**) La excavación en zona de Interferencias debe realizarse en forma manual y de acuerdo a los Planos de Sober-corte.

DATOS DE CAMPO:



- Nivel de terreno (Breve a Excav.): 4.00
- Nivel final de Paravación (Según planos): 3.55
- Nivel final de Excavación (Según campo): 3.05
- % Compact. Fondo de Excav. (1):
- (% Compact. Espec. = 95%)

- PLANO Y ESQUEMA SI NO

OBSERVACIONES

ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Cargo: CALIDAD	Cargo: ING. RESPONSABLE	Cargo: ING. SUPERVISOR	Cargo: ING. SUPERVISOR	Cargo: ING. SUPERVISOR	Cargo: ING. SUPERVISOR
Nombre: RILDEY GONZALEZ LOPEZ	Nombre: EDGAR RIGALADO OBLITAS	Nombre: RUBEN ROSALES TOMALTI	Nombre: RUBEN ROSALES TOMALTI	Nombre: RUBEN ROSALES TOMALTI	Nombre: RUBEN ROSALES TOMALTI
Fecha: 06/07/2019	Fecha: 06/07/2019	Fecha: 06/07/2019	Fecha: 06/07/2019	Fecha: 06/07/2019	Fecha: 06/07/2019




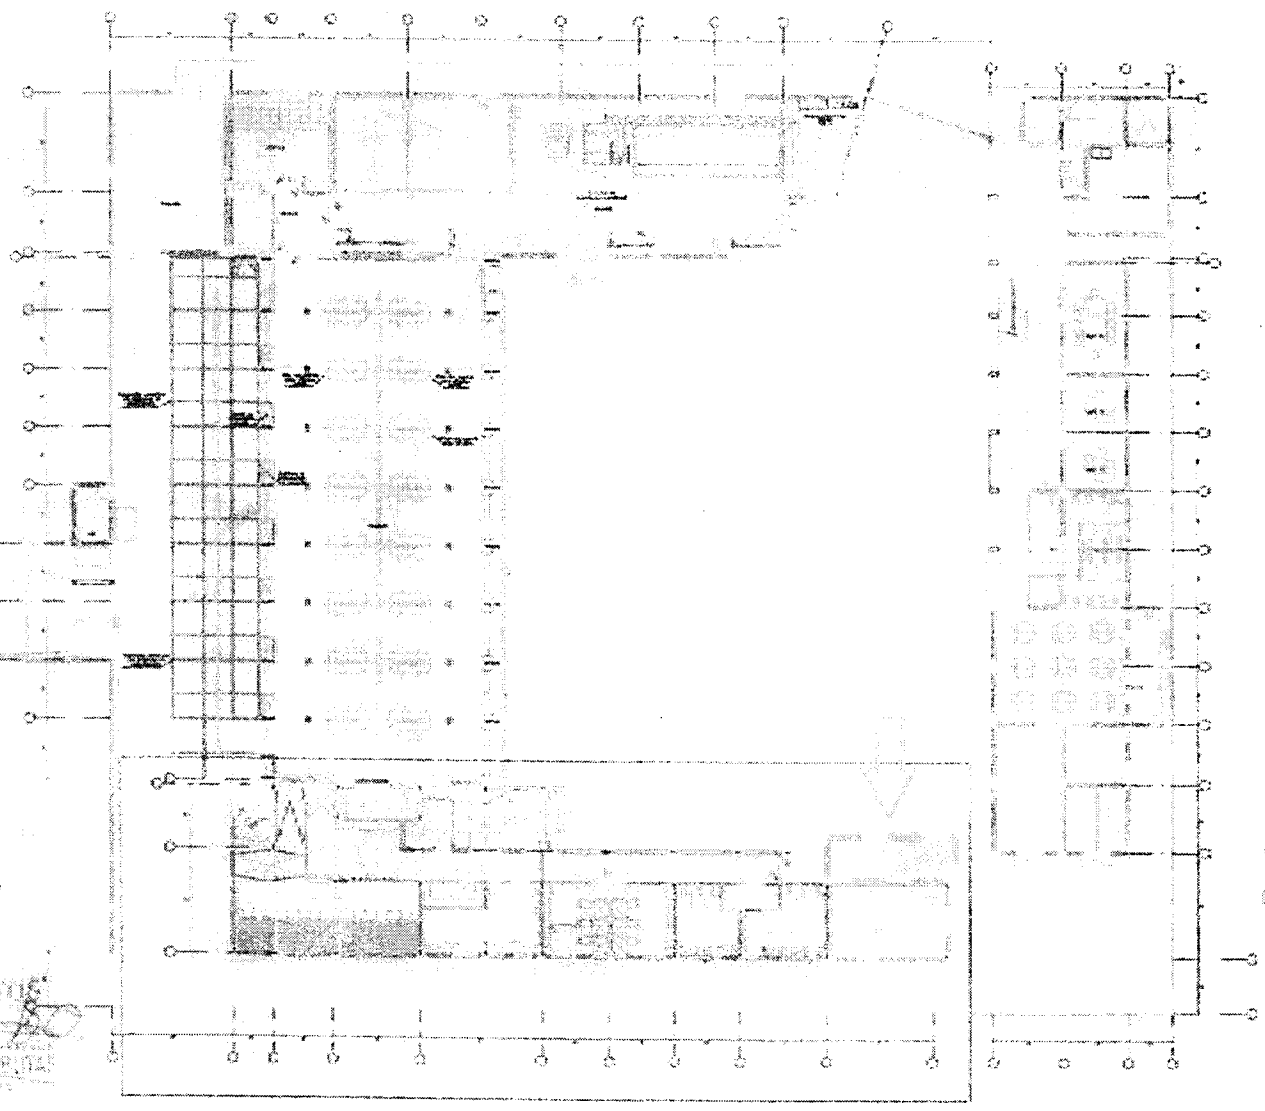

Handwritten signature
CONSEJO DE ASESORES NAVALES
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
 CARRERA 130 No. 100-100, Bogotá, D.C.

Handwritten signature
 ING. RODRIGO GONZALEZ
 COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA
 GETE BOGOTÁ, COLOMBIA

AR-01



REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
TRANSPORTE DE LOSAS PREFABRICADAS

CL-SEC-FAB-01-01
Revisión: 1
Fecha: 06/07/2019
Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: MUPAJAMIENTO INTEGRAL DEL DPA DE ACAPULCO

CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDOPES

Nº CORRELATIVO: 06/07/2019

PLANO REF.: OM 03

TRAMO: 30-31

SECTOR: CABEZO

FECHA: 06/07/2019

DESCRIPCION DEL TRABAJO: IZAJE Y TRANSPORTE DE LOSA(S) PREFABRICADAS DESDE PABLO DE FABRICACION HASTA EL CABEZO

UBICACION DEL ELEMENTO PREFABRICADO: PUNTE LAJEZO

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Verificación de las condiciones operativas del elemento prefabricado (*)	X			
2	Verificación operativa de los elementos de laje (*)	X			
3	Verificación de la grúa de 50 ton. en buen estado (*)	X			
4	Se verifica que durante los trabajos se utilizó manómetros y riggers	X			
5	Autorización de saje del elemento prefabricado (*)	X			
6	Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	X			


(*) Se usó por el Cliente vía la Cooperativa

DATOS DE CAMPO:


RATIO DE FABRICACION (X)
06/07/2019
04 UNID

- Zona de arroyo en buenas condiciones;
- Estado de saje del elemento prefabricado
- Condición de fogos prefabricados

- ESQUEMA ADJUNTO: SI NO

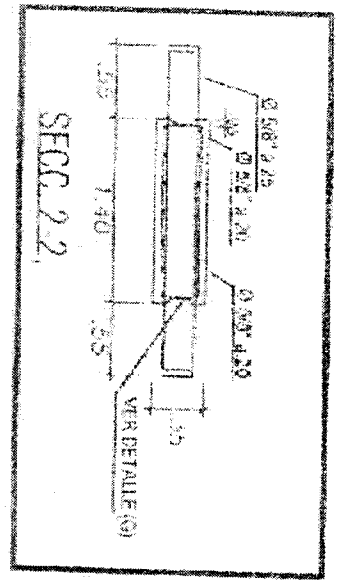

LOSA SECC 2.2
VISTA DEL ELEMENTO PREFABRICADO

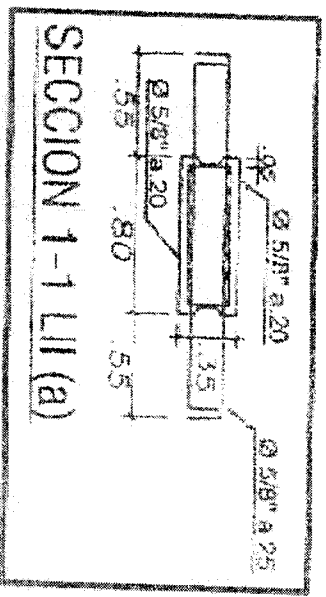

LOSA SECC 1.1
VISTA DEL ELEMENTO PREFABRICADO

OBSERVACIONES

Elaborado por: Nombre: <i>[Signature]</i>	Revisado por: Nombre: <i>[Signature]</i>	Aprobado por: Nombre: <i>[Signature]</i>
Cargo: ING. RESIDENTE	Cargo: ING. RESIDENTE	Cargo: ING. SUPERVISOR
Nombre: ERICSON GARCERAN LOPEZ	Nombre: ERICSON GARCERAN LOPEZ	Nombre: RUBEN DESSIS TORRETTI
06/07/2019	06/07/2019	06/07/2019





**REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
MONTAJE DE LOSAS PREFABRICADAS**

CZ-SEG/PL-01-01
Revisión: 1
Fecha: 06/07/19
Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DVA DE ACAPULCO
CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RUSTICO - FONDEROS
PLANO REF.: OM-03
TRAMO: 30-31
SECTOR: CABEZO

DESCRIPCION DEL TRABAJO: COLOCACION DE LOSAS PREFABRICADAS EN EL CABEZO

UNIFICACION DEL ELEMENTO PREFABRICADO
FUENTE CABEZO

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Revisión de planos y especificaciones.	X			
2	Verificación Topográfica de la obra y de la posición final del elemento prefabricado	X			
3	Autorización de Montaje del elemento prefabricado (*) Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	X			

(*) autorizada por el cliente y/o la Supervisión


DATOS DE CAMPO:
 - Elementos de obra en buenas condiciones
 - Zona de montaje del elemento prefabricado en buenas condiciones
 - ESQUEMA SI NO
 - ADJUNTO

DIRECCION A MAR DIRECCION A LA COSTA

VISTA EN PLANTA DEL MONTAJE DE LA LOSA

OBSERVACIONES

ELABORADO POR: Fecha: <i>06/07/2019</i>	REVISADO POR: Fecha: <i>06/07/2019</i>	APROBADO POR: Fecha: <i>06/07/2019</i>
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Nombre: FREDY GONZALEZ LOPEZ	Nombre: JUAN ESPINOSA	Nombre: DRG. SUPERVISOR
Fecha: 06/07/2019	Fecha: 06/07/2019	Nombre: RUBEN GONZALEZ TOMALTE
Nombre: FISCAL DE CALIDAD ORITAS		
Fecha: 06/07/2019		



FECHA: 06-07-2019 NOMBRE: Ing. Edgar Escobar Obitas	FECHA: 06-07-2019 NOMBRE: Ing. Ruben Daros Trasti
ELABORADO POR: [Signature]	ELABORADO POR: [Signature]
REVISADO POR: [Signature]	REVISADO POR: [Signature]

OBSERVACIONES:											
NO	Obs	NO	Obs	NO	Obs	NO	Obs	NO	Obs	NO	Obs

AMBIENTE		DESTINACION	
Verificación de humedad	Verificación de temperatura	Verificación de humedad	Verificación de temperatura
Verificación de humedad	Verificación de temperatura	Verificación de humedad	Verificación de temperatura
Verificación de humedad	Verificación de temperatura	Verificación de humedad	Verificación de temperatura

Verificaciónes Generales:

Limpieza Regeneración Humedad

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: TARRAJOS DE MURU-PLACA EJE 13 : NIVEL 1 : TRAMO D-7

PLANO REF: AR-14

FECHA: 06-07-2019

CLIENTE: GOBIERNO DE CALDAS


NOMBRE DEL PROYECTO: INSPECCIÓN DE TARRAJOS Y DEKRAMES

REGISTRO CONTROL DE CALIDAD

REG. 1

FECHA: 06-07-2019





Página: 1 de 1





Angeli

COMUNE DI VIGEVANO
Angeli
CANTIERE

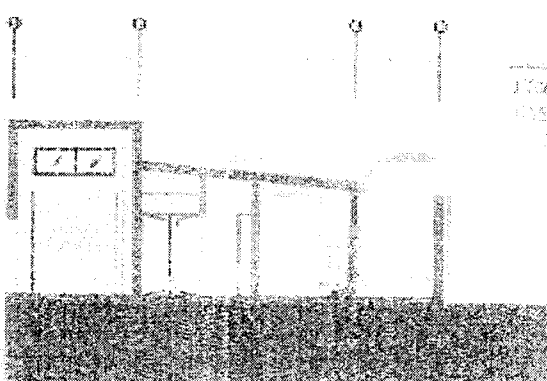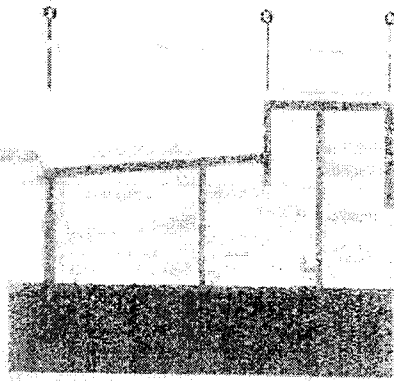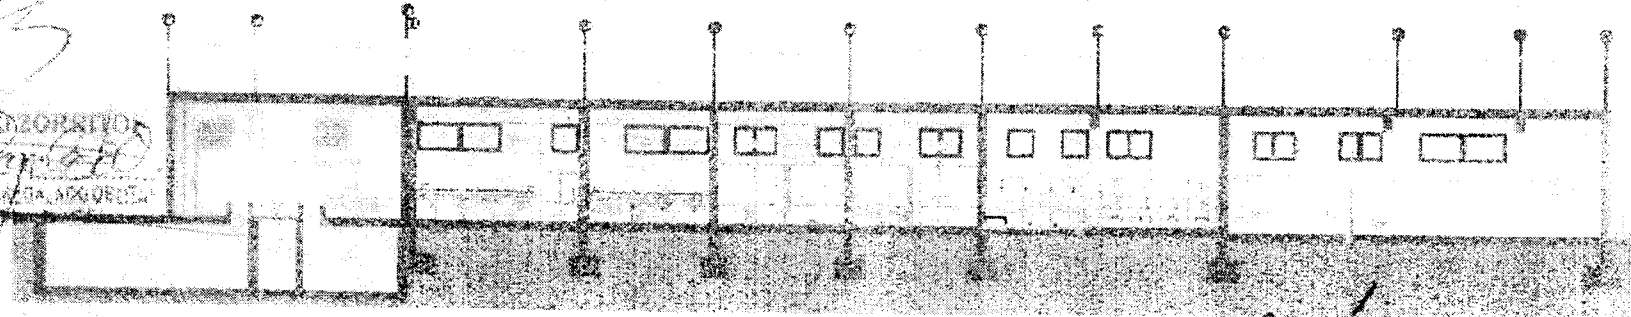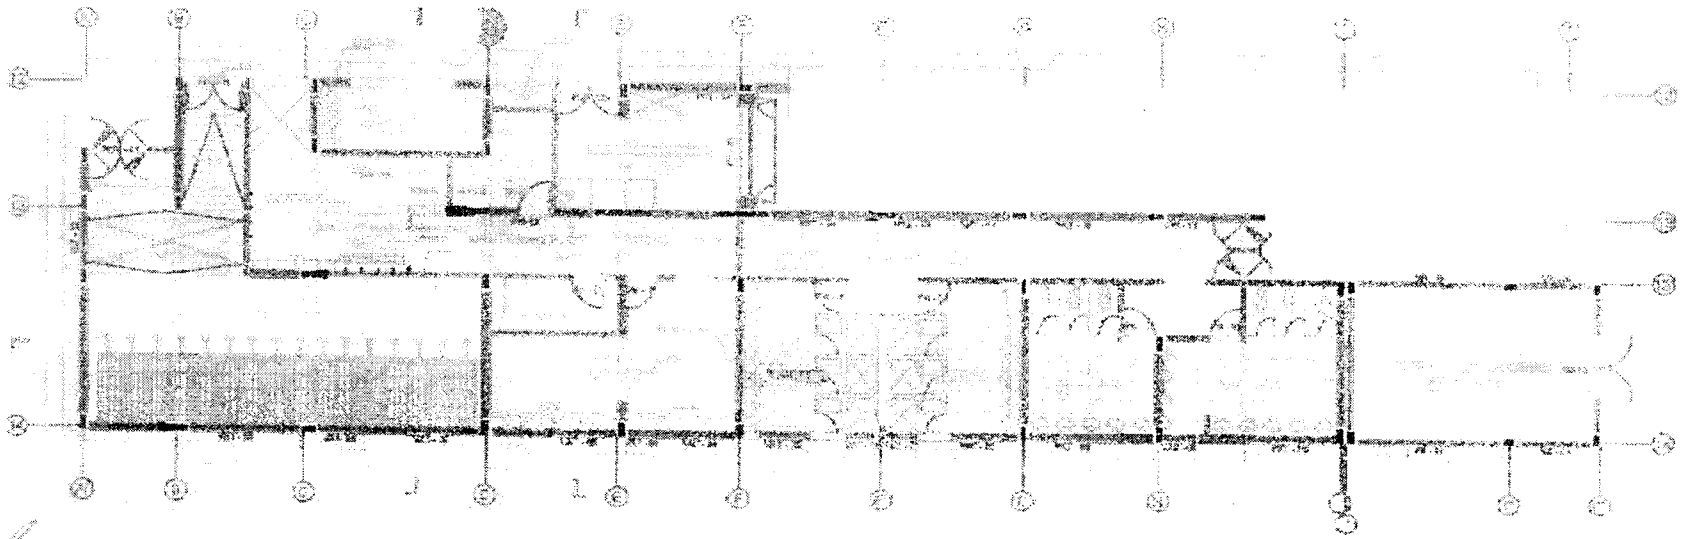

Angeli
UFFICIO TECNICO
CANTIERE



REGISTRO
 CONTROL DE CALIDAD
 PROTOCOLO DE VENTILACION DE FARMACOS DE REMOLCIOS

FT SGR 07 01 01

Revisión: 1

Fecha: 08/07/2019

Página: 1 de 1

CLIENTE: FONDERPE
 Nº DEPARTAMENTO: 3
 PLANO REF.: OM-02
 FECHA: 08/07/2019
 MARZANA: TORRE: 1º PISO.

Dominio: I+D+i

Ubicación: Manila

X Ubicación
 Dirección
 P/B
 Nivel
 Torre
 X Otro: TORRE 1º PISO

OBSERVACIONES:

PRESENCIA DE VIBRACIONES EN EL PISO DE ARRIBA DE LA TORRE

SENSACIONES
 VIBRACIONES
 OTRO

Elementos a evaluar y verificar
 (Detalle específico)

Referencia (Plano N°)

Seguridad

- X Seguridad: Estructuras, fachadas, juntas
- X Seguridad: Instalación de sistemas de protección contra incendios
- X Seguridad: Instalación de sistemas de protección contra robos
- X Seguridad: Instalación de sistemas de protección contra inundaciones


Verificación realizada


Observaciones

NOTA:





Cantidad de Hojas Anexas: 1

ELABORADO POR: [Firma] ELABORADO POR: [Firma]
 REVISADO POR: [Firma] APROBADO POR: [Firma]
 Nombre: David Ochoa Nombre: David Ochoa
 Cargo: Responsable de Área Cargo: Responsable de Área
 Fecha: 08/07/2019 Fecha: 08/07/2019





[Handwritten signature]

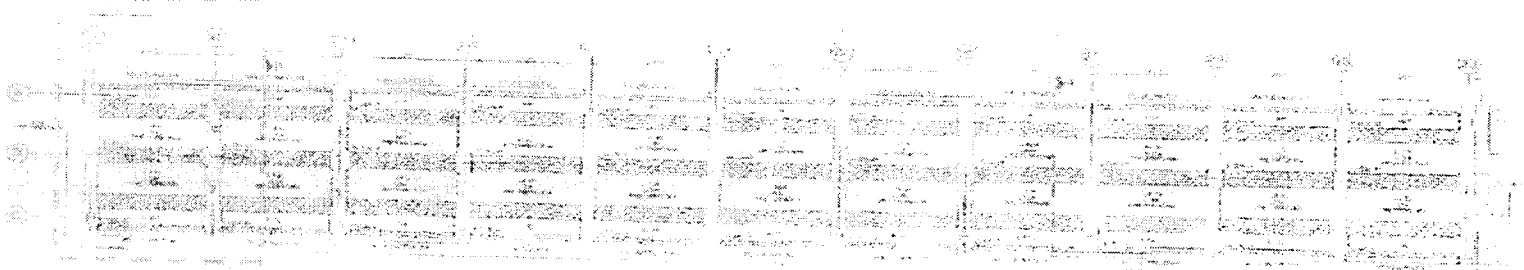

[Handwritten signature]
KONSTRUKTION

[Handwritten signature]
KONSTRUKTION

CH-02



REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD

CZ.SRC.PC.03-F1

Rev: 1
FECHA: 08-07-2019
Página: 1 de 1

INSPECCIÓN DE TARRAJEOS Y DERRAMES

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DRA ACAPULCO N° CORRELATIVO:

CLIENTE: FONDEPES FECHA: 08-07-2019

PLANO REF.: AR-14 COD. PLS: CZ-950-LP-A-D AREA: DESINFECCIÓN


DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: TARRAJEO DE MURO DOBLE ALTURA EJE 13 : TRAMO B-C-D : TARRAJEO CIELO RASO AREA: 13*-12 : C-D (CONTROL DE CALIDAD)

Verificaciones Generales:

Limpieza

Rugosidad


Humedad




Ambiente	Alineamiento de muros			Verticalidad de muros			Uniformidad de muros			Contrazocalo c/ cemento pulido			Encastre cielo raso-muro tipo Medio Caba			Verticalidad de derrames			Contrazocalo sanitario			Dimensiones de vanos			Cieloraso			
	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	
	DESINFECCION NIVEL 1 / EJE (12) : TRAMO (E-F)	V			V			V																				
AREA: 13*-12 : B-D CONTROL DE CALIDAD																											V	V

OBSERVACIONES:




ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Firma: Nombre: Freddy González López FECHA: 08-07-2019	Firma: Nombre: Ing. Edgar Sagalaco Cobles FECHA: 08-07-2019	Firma: Nombre: Ing. Rubén Benavente FECHA: 08-07-2019



[Handwritten signature]

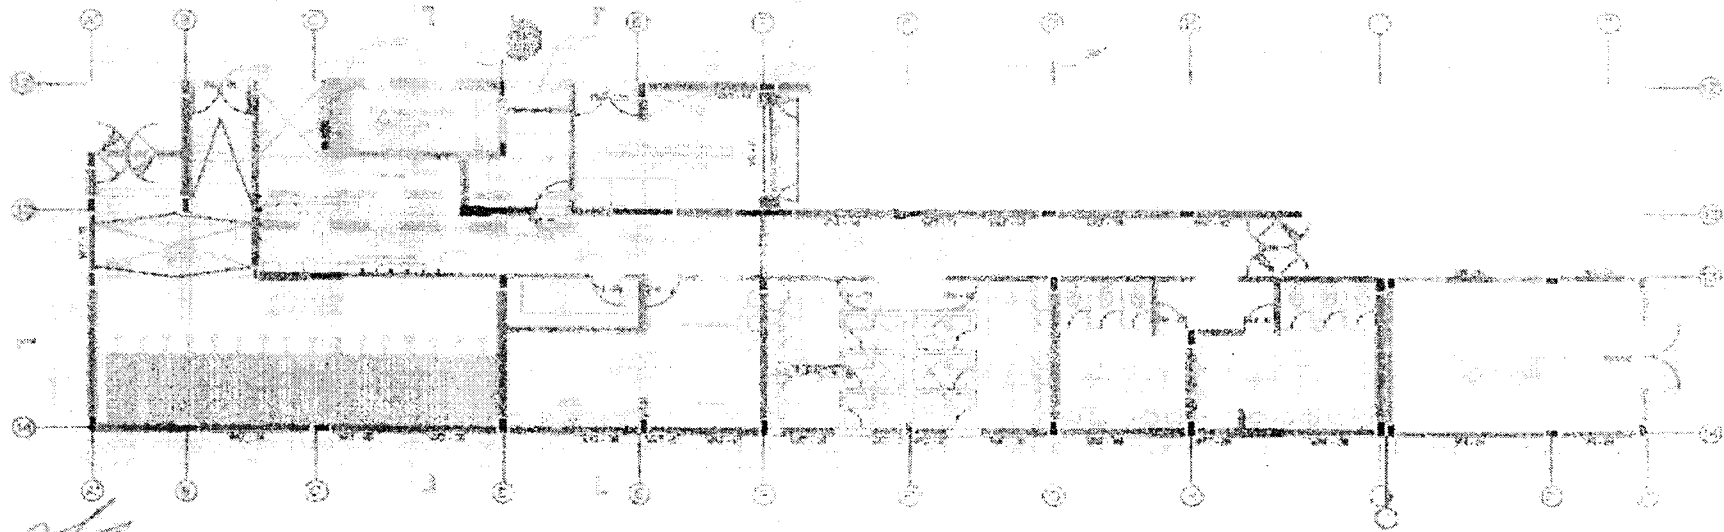

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵ

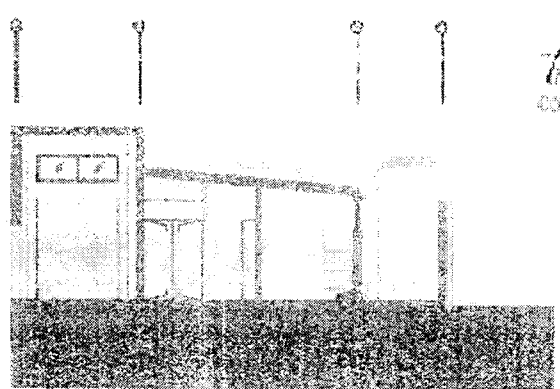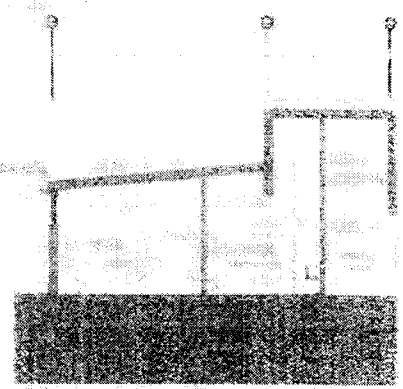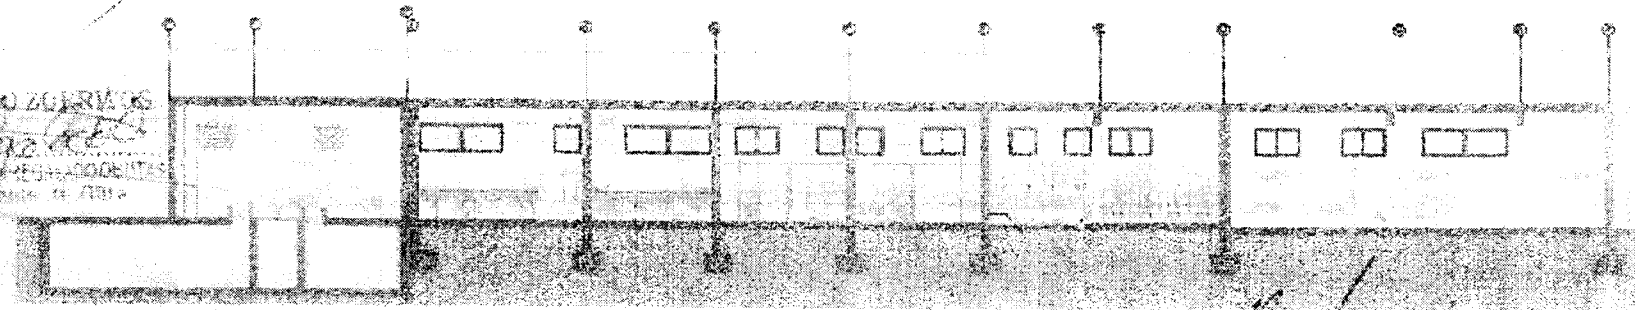

[Handwritten signature]
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵ



CONSORCIO ZORRITOS

REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
LIBERACION DE VACADO DE CONCRETO

MEMORAMIENTO DPA ACAPULCO

FONTEPEA

07-007-LIC/018

CLIENTE:
ALAMO REF: AR-01

Cód. PLS:

CONCRETO

PROCESO MAQUERA CANAL EJECUTORA INC. ENTRENADO Y DESMOLDADO

Nº CORRELATIVO: 09/07/2019
FECHA: 09/07/2019
SECTOR: PTAR

REV: 1.00
FECHA: 09/07/2019
FOLIOS: 1 de 1

DESCRIPCION DEL TRABAJO: CONCRETO PROCESO MAQUERA CANAL EJECUTORA INC. ENTRENADO Y DESMOLDADO

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	REGISTRACION
1	Inspección de armadura (vista y en estructura) (verificar cantidad)	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	Inspección de armadura (1 + 50% 10% 50% 20% 20%)	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	Protección de armadura (dependiendo de la zona)	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	Verificación de espesor (transversal y desarrollo)			<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Verificación de condiciones de trabajo (temperatura y humedad)	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	Verificación de condiciones de humedad (dependiendo de la zona)	<input checked="" type="checkbox"/>			
7	Verificación de condiciones de humedad (dependiendo de la zona)	<input checked="" type="checkbox"/>			
8	Verificación de condiciones de humedad (dependiendo de la zona)	<input checked="" type="checkbox"/>			
9	Verificación de condiciones de humedad (dependiendo de la zona)	<input checked="" type="checkbox"/>			
10	Otros			<input checked="" type="checkbox"/>	
NOTAS:					


PREPARAR Y RE AEROS:
Fecha de inspección: _____

CHECK LIST DE VERIFICACION DE ENCORNADOS

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	REGISTRACION
1	Verificar en el sitio y en el plano	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	Observación de disponibilidad y calidad (transversal)	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	Observación de posición y altura (transversal) (dependiendo de la zona)	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	Verificación de posición y altura (transversal) (dependiendo de la zona)	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Verificación de posición y altura (transversal) (dependiendo de la zona)	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	Verificación de posición y altura (transversal) (dependiendo de la zona)	<input checked="" type="checkbox"/>			
7	Verificación de posición y altura (transversal) (dependiendo de la zona)	<input checked="" type="checkbox"/>			
8	Verificación de posición y altura (transversal) (dependiendo de la zona)	<input checked="" type="checkbox"/>			
9	Verificación de posición y altura (transversal) (dependiendo de la zona)	<input checked="" type="checkbox"/>			
10	Otros			<input checked="" type="checkbox"/>	
NOTAS:					

RESPONSABLE DE PROCESO:
Fecha de inspección: _____
Firma: _____

INSTITUCION EJECUTORA
CONSORCIO ZORRITOS
AREA DE SUPERVISION





REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
LIBERACION DE VACADO DE CONCRETO

CI 502.00.03.01
II
Fecha: 09/07/2019
Páginas: 1 de 2

ÁREA / SECTOR: **CONTRATOS DE OBRAS** / **CONTRATOS DE OBRAS**
ESTRUCTURA / ELEMENTO: **ALUMBRADO** / **ALUMBRADO**
PROYECTO: **MEJORAMIENTO DPA ACQUISO**
RESISTENCIA (MPa): **AS REQUERIDA** / **5"-6"** / **TIPO CEMENTO:** **V** / **VOLUMEN:** **PLANO DE REF.:** **ASR-01**

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Impulso de la columna	V			
2	Inspección, retiro de fondo y nivel de concreto	V			
3	Plm y distribución	V			
4	Verificación de la armadura según plano de ref.	V			
5	Verificación del espesor de la columna	V			
6	Revisión de los planos	V			
7	Verificación de la calidad del concreto	V			
8	Verificación de los planos	V			
9	Verificación de la armadura y distribución	V			
10	Verificación de la calidad del concreto	V			
11	Verificación de la calidad del concreto	V			

VACADO Y MUESTREO DEL CONCRETO


GRUPO	DESCRIPCION	SECCIONES	GRUPOS	NO. DE MUESTRAS	HORA DE MUESTREO	TIPO DE MUESTREO	NO. DE MUESTRAS	TIPO DE MUESTREO	NO. DE MUESTRAS	TIPO DE MUESTREO	NO. DE MUESTRAS
315	CANALIZACION			13:00	10:40	20m	5m				6

ELABORADO POR: [Firma] **REVISADO POR:** [Firma] **APROBADO POR:** [Firma]

FECHA: 09/07/2019 **FECHA:** 09/07/2019 **FECHA:** 09/07/2019

PROYECTO: Mejoramiento DPA ACQUISO **PLANO DE REF.:** ASR-01






PTAR

[Handwritten signature]

CONSORCIO ZONAS DE
[Handwritten signature]
CARRERA 10, SAN JUAN, P.R.
TEL. 754-1111

[Handwritten signature]
ING. PEDRO AUGUSTO GARCIA
CONSORCIO ZONAS DE
CARRERA 10, SAN JUAN, P.R.

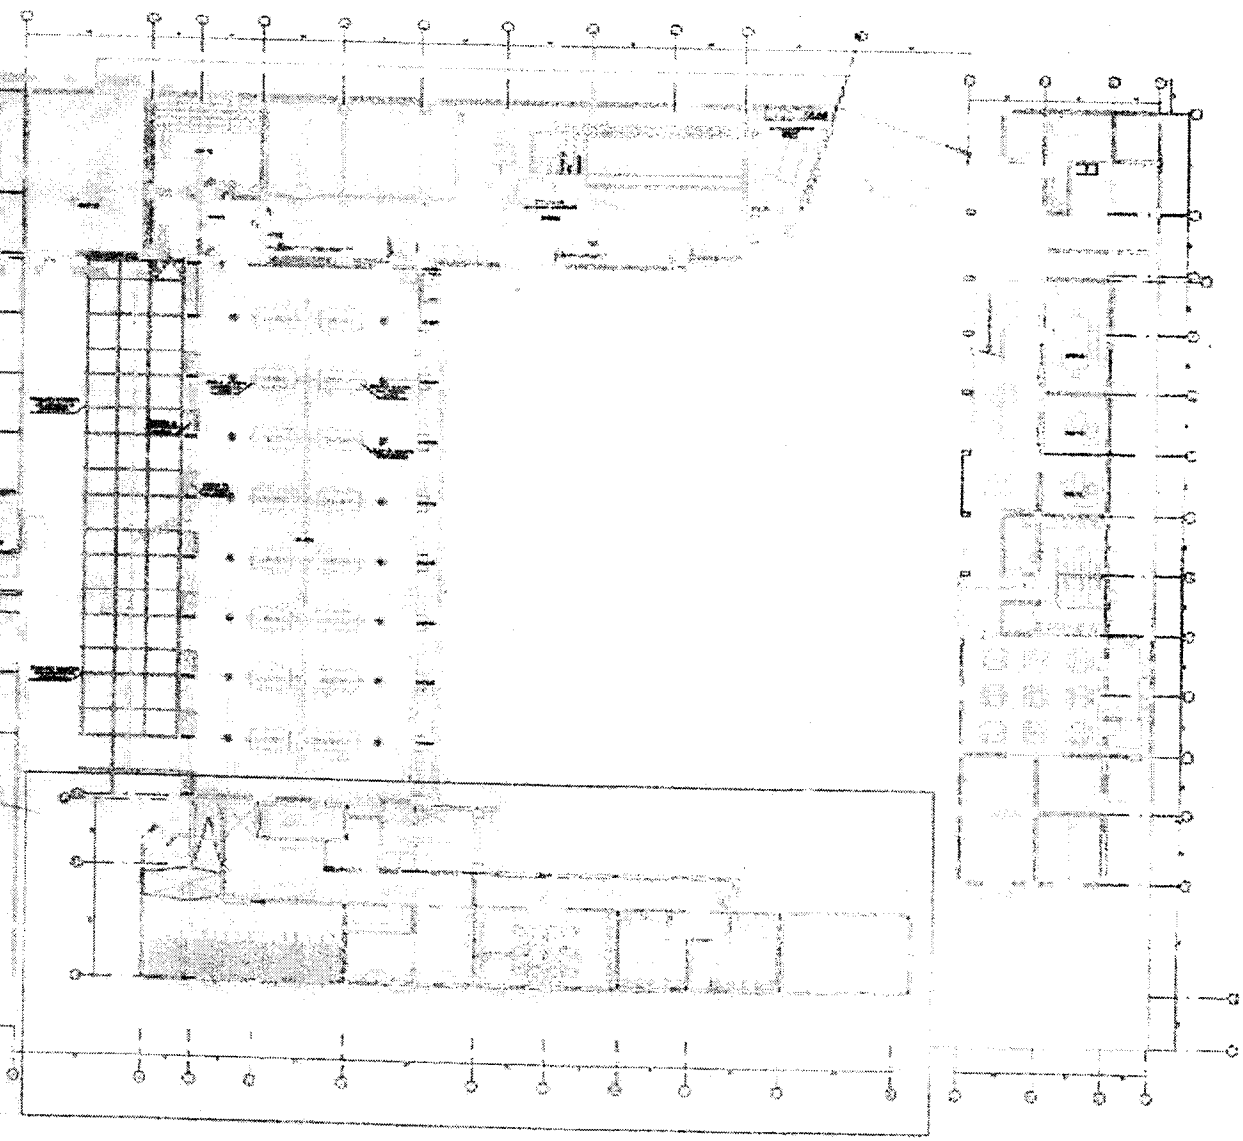

NOMBRE DEL PROYECTO: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA N° 100145
 CLASIFICACION: 7560/LA/AF
 PLANO REFERENCIAL: ACENTADO DIBUJO DE CARBEA DE B. TRAMO : 2.3. NIVEL : 2 DEFECTOR
 DEPARTAMENTO DEL TRABAJO: BAÑO DE TABIQUERIA
 FECHA DEL REGISTRO: 09/07/2019
 AREA ASIGNADA (m2): 09/07/2019
 ESTADO: Revisión
 DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Conservación

Lista de Verificación Previa al Asentado (Ver Plano de Detalles)	FECHA	CONTRATISTA	FECHA	SUPERVISION
Sobrecimiento de Lintel Perforado	09/07/2019	V		
Escalera de Juntas Cortadas	09/07/2019	V		
Almohadado	09/07/2019	V		
Rebaje de Juntas	09/07/2019	V		
Acumulación de Resaca cuando El del Proyecto Es	09/07/2019	V		
Corte de Instalación	09/07/2019	N/A		
Almohadado Asentado Dócil	09/07/2019	V		
El no tener de limpieza adecuada		N/A		
El no tener para control de alacenas desde las juntas verticales no		N/A		
de limpieza con respecto lujada horizontal		N/A		
Asentado para el Asentado	09/07/2019	V		

Fecha:

SUPERVISOR CALIDAD:

Lista de Verificación Previa al Asentado

Verificación	V	N/A	V	Fecha Asentado	FECHA	CONTRATISTA	FECHA	SUPERVISION
Superficie Expositiva de la Albañilería Limpia	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	09/07/2019	09/07/2019	V		
Perforo de Juntas	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	09/07/2019	09/07/2019	V		
Asentado de Rebaje cuando El del Proyecto Es	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	09/07/2019	09/07/2019	V		
Junta de Control o Exposición	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	09/07/2019	09/07/2019	V		
Elementos Embudos Acabados	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	09/07/2019	09/07/2019	V		
Acero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Longitud de Alacena a ser levantado con respecto lujada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Presencia de limpieza adecuada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Corte de Mortero del Acero al 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					


Fecha:


SUPERVISOR CALIDAD:

Verificación Previa al Asentado

Verificación	FECHA	CONTRATISTA	FECHA	SUPERVISION
Rebaje de Juntas Acabadas	N/A			
Rebaje de las superficies levantado	N/A			
Consolidados	N/A			

ELABORADO POR: [Firma] REVISADO POR: [Firma] APROBADO POR: [Firma]
 Nombre: Ing. Freddy González López
 Nombre: Ing. Elyer Regalado Obispo
 Nombre: Ing. Rubén Portales Domínguez





NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL URA DE ACARIJO

CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL FONDEPES

PLANO REF.: OM-03 **EJE:** 32 **SECTOR:** CAREZO **FECHA:** 09/07/19

DESCRIPCION DEL TRABAJO: MONTAJE DE VIGA-CABEZAL PREFABRICADA DE CONCRETO ARMADO EN EL TIF 30 DEL CARIZO

UBICACION DEL ELEMENTO PREFABRICADO

URBENIL **CAREZO**

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Revisión de planos y especificaciones	X			
2	Verificación Topográfica de la ruta y de la posición final del elemento prefabricado	X			
3	Autorización de Montaje del elemento prefabricado (*)	X			
4	Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	X			

Elaborado por el Cliente y/o la Supervisión


- LUGAR DE CAMPO:**
- Elementos de izaje en buenas condiciones
 - Zona de montaje del elemento prefabricado en buenas condiciones
 - De uso concreto (C=250 kg/cm² en la Unión (Viga pluma)

- ESQUEMA ADJUNTO: SI NO

DIRECCION A MAR **DIRECCION A LA COSTA**
VISTA EN PLANTA DEL MONTAJE DE LA VIGA

OBSERVACIONES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:
Nombre: FREDY GONZALEZ LOPEZ Fecha: 09/07/2019 Firma: <i>[Firma]</i>	Nombre: EDGAR REGALADO OBLITAS Fecha: 09/07/2019 Firma: <i>[Firma]</i>
CARGO: ING. RESIDENTE	CARGO: ING. SUPERVISOR
Nombre: FREDY GONZALEZ LOPEZ	Nombre: EDGAR REGALADO OBLITAS
Fecha: 09/07/2019	Fecha: 09/07/2019





CONSORCIO ZORRITOS

REGISTRO CONTROL DE CALIDAD

TRANSPORTE DE CABEZAL PREFABRICADO

CZ.SGC.PC.01-01

Revisión: 1

Fecha: 09/07/19

Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL OVA DE ACAPULCO

CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

PLANO REF.: OM-03 EJE 32 SECTOR: CABEZO

Nº CORRELATIVO:

FECHA INICIO: 09/07/19

DESCRIPCION DEL TRABAJO: IZAJE Y TRANSPORTE DE VIGA CABEZAL DE CONCRETO PREFABRICADO HASTA EL CABEZO

UBICACION DEL ELEMENTO PREFABRICADO:

PUENTE

CABEZO

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Verificación de las condiciones óptimas del elemento prefabricado (*)	X			
2	Verificación óptima de los elementos de izaje (*)	X			
3	Verificación de la grúa de 20 ton. en buen estado (*)	X			
4	Se verificó que durante los trabajos se utilizó manibristas y rigger	X			
5	Autorización de izaje del elemento prefabricado (*)	X			
6	Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	X			

(*) Autorizado por el Cliente y/o la Supervisión

DATOS DE CAMPO:

- Zona de acopio en buenas condiciones:

PATIO DE FABRICACION


- Fecha de izaje del elemento prefabricado:

09/07/19

ESQUENA ADJUNTO:

SI

NO

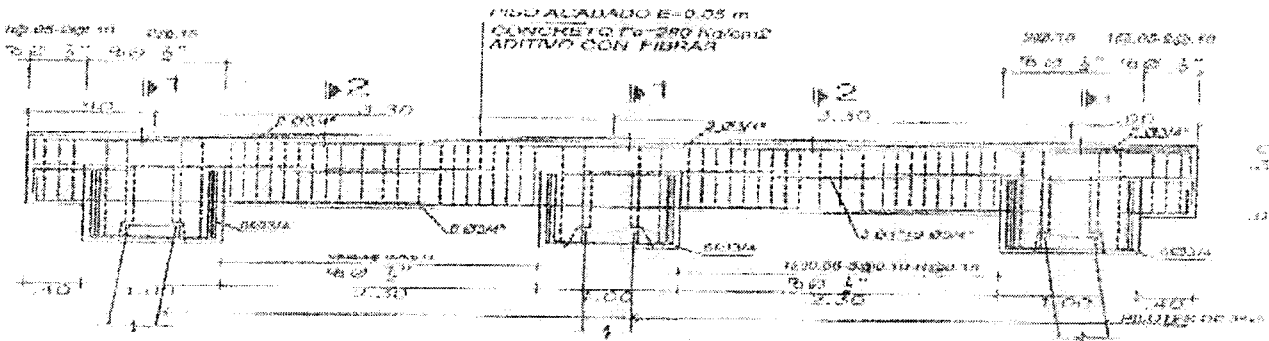


GEOMETRIA VIGAS: V-CZAL. 01 (CABEZO DE MUJITE)

VISTA DEL ELEMENTO PREFABRICADO

OBSERVACIONES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO (*) POR:
Firma: Nombre: FREDDY GONZALEZ LOPEZ Fecha: 09/07/2019	Firma: Cargo: ING. RESIDENTE Nombre: EDGAR RECALADO ORISTAS Fecha: 09/07/2019	Firma: Cargo: ING. SUPERVISOR Nombre: HUBLEN BOGGUIS TOMATTI Fecha: 09/07/2019





**REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD**

CZ.SGC.PC.03-01

INSPECCIÓN DE TARRAJEOS Y DERRAMES


NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL ACAPULCO Rev: 1
 CLIENTE: FONOSIPES N° CORRELATIVO:
 PLANO REF: AR-14 FECHA: 09-07-2019
 CÓD. PLS: CZ-SGC-LI-A-3 ÁREA: DESINFECCIÓN
 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: TARRAJEO MURO DOBLE ALTURA EJE: 12 : TRANO C-D : CONTROL DE CALIDAD : MURO EXTERNO : EJE : 12* : TRANO : A-B Página: 1 de 1

Verificaciones Generales:

Limpieza

Rugosidad


Humedad



Ambiente	Alineamiento de muros			Verticalidad de muros			Uniformidad de muros			Contrazocalo c/ concreto pulido			Encuentro cielo raso-muro tipo Hacia Cielo			Verticalidad de derrame			Contrazocalo sanitario			Dimensiones de vanos			Cieloraso			
	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	
DESINFECCION NIVEL 2 - EJE (12) : TRANO (C-D)	V			V			V																					
DESINFECCION MURO EXTERNO : EJE 12* : TRANO A-B	V			V			V																					

OBSERVACIONES:


ELABORADO POR: Firma: Nombre: Freddy González López Fecha: 09-07-2019	REVISADO POR: Firma: Nombre: Ing. Edgar Rodríguez Obitas Fecha: 09-07-2019	APROBADO POR: Firma: Nombre: Ing. Ricardo Rodríguez Obitas Fecha: 09-07-2019
--	---	---




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Carlo Cottarelli
PRESIDENTE
1958



Carlo Cottarelli

C. RUZZO BOSSI - TORIATTO
INGEGNERE SUPERINTENDENTE
OPERE PUBBLICHE


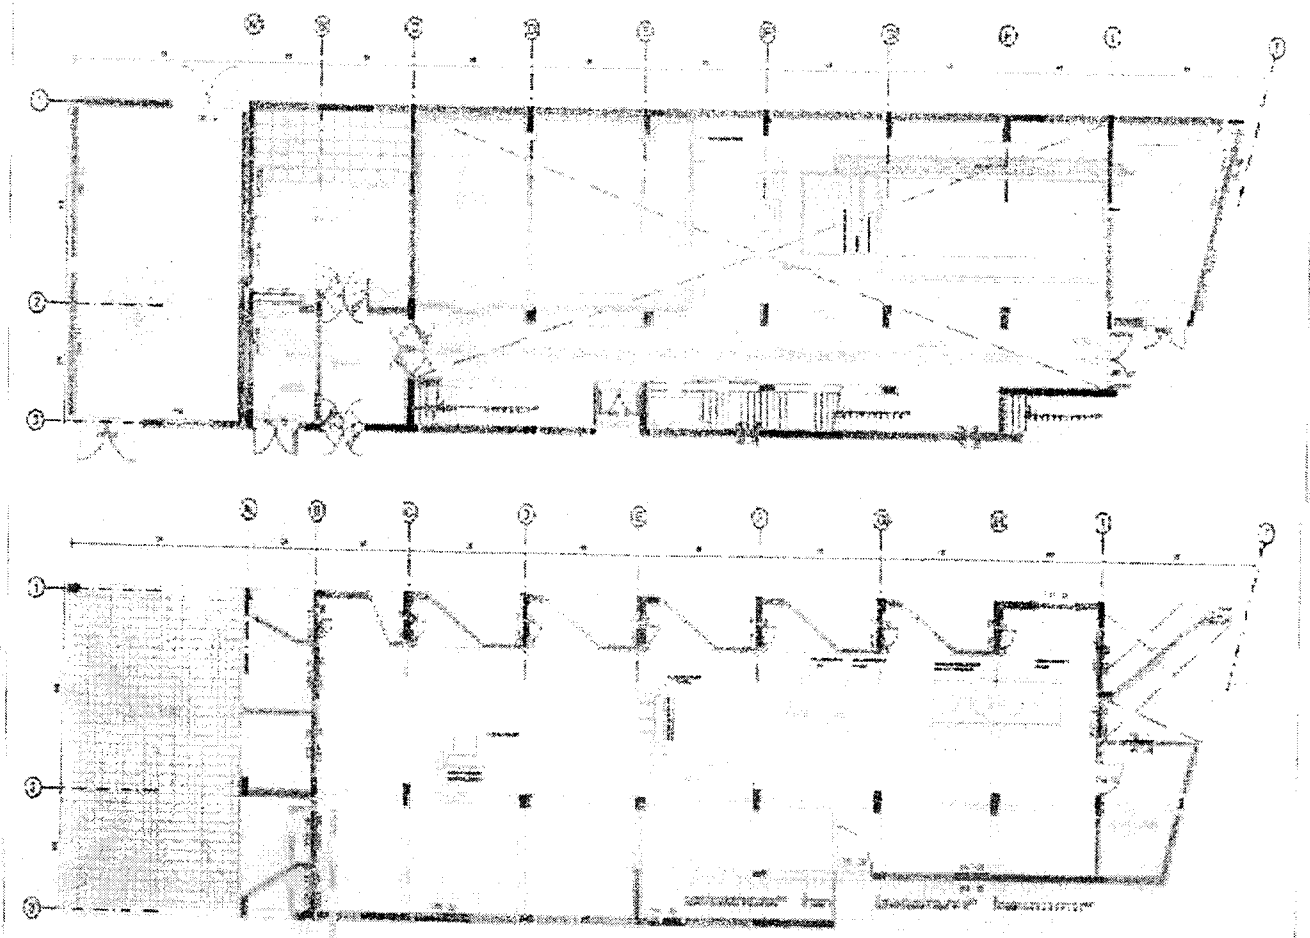




Handwritten signature

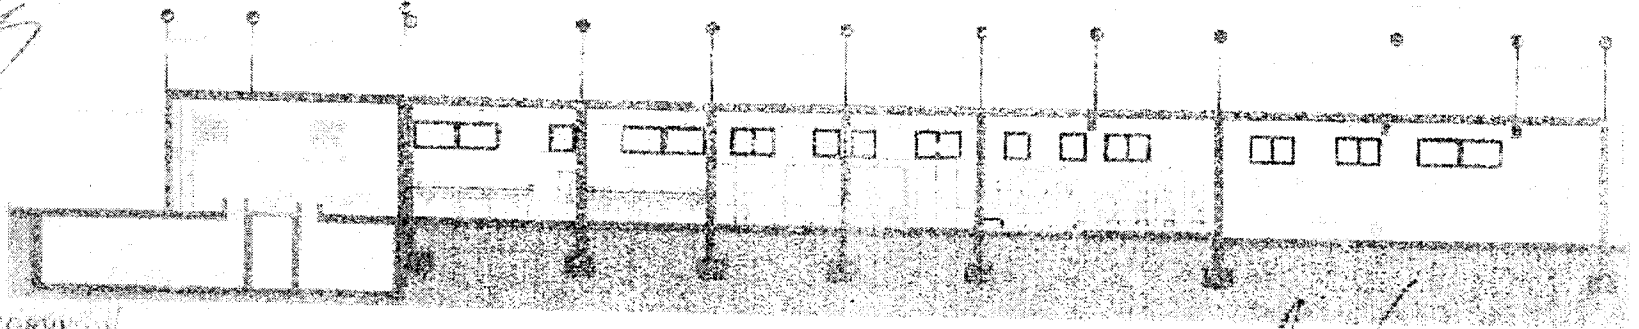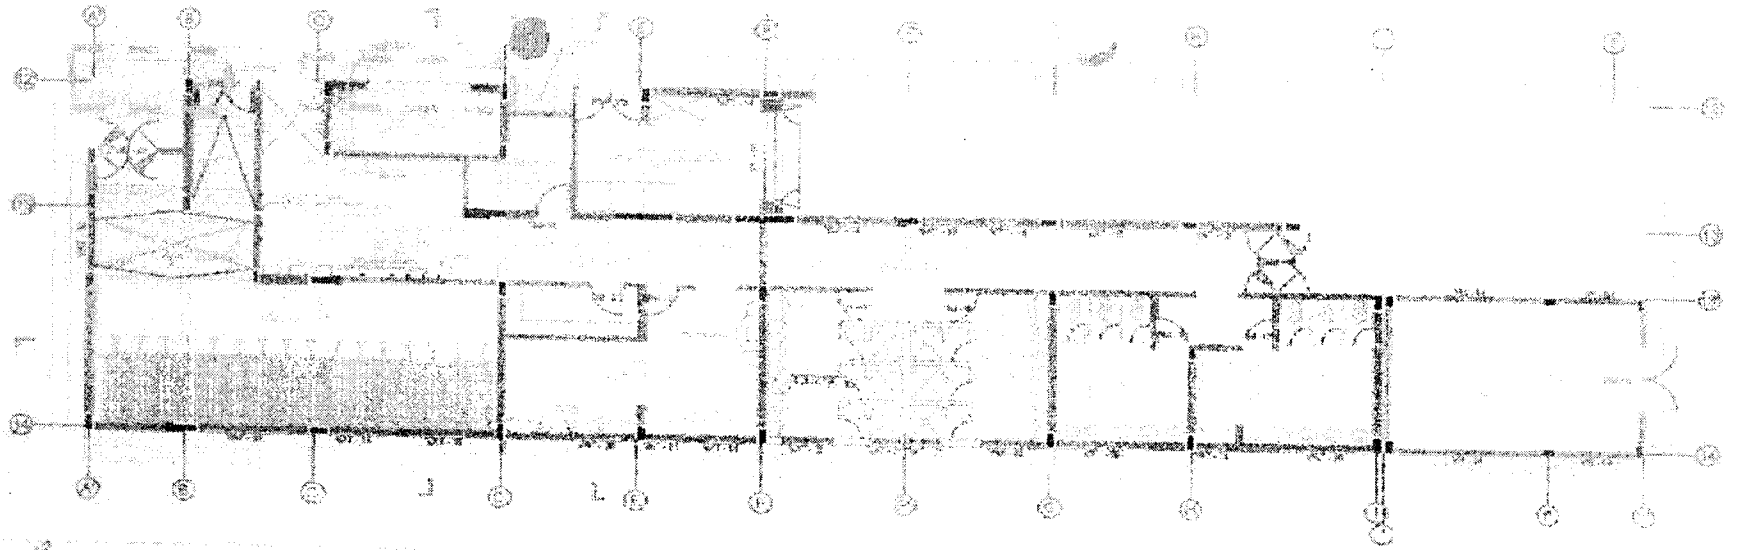

INSURICIZOVANJE
Handwritten signature
POSREDOVANJE
BEOGRAD, 1980

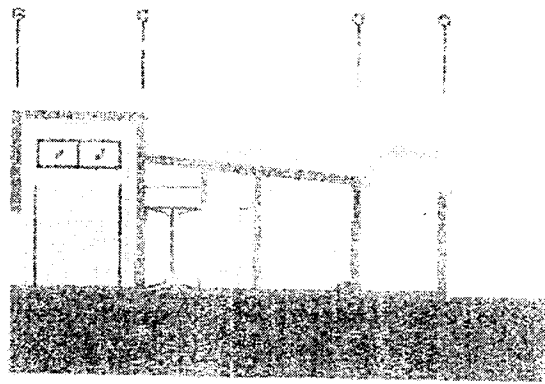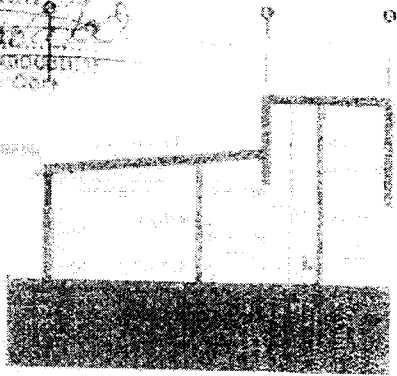

Handwritten signature
POSREDOVANJE
BEOGRAD, 1980



**REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
LIBERACION DE VOLUMEN DE CONCRETO**

CHILE Nº: 09-11
Fecha: 12/03/2018
Página: 1 de 1

ADQUIRE DEL PROYECTO: RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA **N° CONSULTIVO:** _____
CLIENTE: CONCRETO EN CONCRETAS MEZCLADOR E.I.R.L. STAND 1.3 **FECHA:** 10/03/2018
PLANO DE: AB-13 **NO. PLG:** FONDECYT **SECTOR:** PUROS
DESCRIPCION DEL TRABAJO: CONCRETO EN CONCRETAS MEZCLADOR E.I.R.L. STAND 1.3

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES		SI	NO	N/A	RESERVACION
1	Control de temperatura (verificar si la temperatura ambiente es superior)	✓			
2	Control de humedad (si $W_{1,100} \geq 5\%$, $W_{1,200} \geq 4\%$)	✓			
3	Control de humedad (si $W_{1,100} \geq 5\%$, $W_{1,200} \geq 4\%$)	✓			
4	Medición de la temperatura y humedad (temperatura $\geq 5^\circ C$)	✓			
5	Control de la humedad (si $W_{1,100} \geq 5\%$, $W_{1,200} \geq 4\%$)	✓			
6	Control de la humedad (si $W_{1,100} \geq 5\%$, $W_{1,200} \geq 4\%$)	✓			
7	Control de la humedad (si $W_{1,100} \geq 5\%$, $W_{1,200} \geq 4\%$)	✓			
8	Control de la humedad (si $W_{1,100} \geq 5\%$, $W_{1,200} \geq 4\%$)	✓			
9	Control de la humedad (si $W_{1,100} \geq 5\%$, $W_{1,200} \geq 4\%$)	✓			
10	Control de la humedad (si $W_{1,100} \geq 5\%$, $W_{1,200} \geq 4\%$)	✓			
11	Control de la humedad (si $W_{1,100} \geq 5\%$, $W_{1,200} \geq 4\%$)			N/A	
12	Control de la humedad (si $W_{1,100} \geq 5\%$, $W_{1,200} \geq 4\%$)			N/A	

NOTA:

RESPONSABLE DE OBRAS: _____ **TIPO:** _____
Fecha de Inspección: _____

TIPO DE ENCUBRIDOR: HECHO EN VERIFICACION DE ENTUBACION


Estado de Inspección: Realizado Pendiente Otro Reservado

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	RESERVACION
1	Verificación de la temperatura (si $W_{1,100} \geq 5\%$, $W_{1,200} \geq 4\%$)	✓			
2	Verificación de la humedad (si $W_{1,100} \geq 5\%$, $W_{1,200} \geq 4\%$)	✓			
3	Verificación de la humedad (si $W_{1,100} \geq 5\%$, $W_{1,200} \geq 4\%$)	✓			
4	Verificación de la humedad (si $W_{1,100} \geq 5\%$, $W_{1,200} \geq 4\%$)	✓			
5	Verificación de la humedad (si $W_{1,100} \geq 5\%$, $W_{1,200} \geq 4\%$)	✓			
6	Verificación de la humedad (si $W_{1,100} \geq 5\%$, $W_{1,200} \geq 4\%$)	✓			
7	Verificación de la humedad (si $W_{1,100} \geq 5\%$, $W_{1,200} \geq 4\%$)	✓			
8	Verificación de la humedad (si $W_{1,100} \geq 5\%$, $W_{1,200} \geq 4\%$)	✓			
9	Verificación de la humedad (si $W_{1,100} \geq 5\%$, $W_{1,200} \geq 4\%$)	✓			
10	Verificación de la humedad (si $W_{1,100} \geq 5\%$, $W_{1,200} \geq 4\%$)			N/A	
11	Verificación de la humedad (si $W_{1,100} \geq 5\%$, $W_{1,200} \geq 4\%$)			N/A	
12	Verificación de la humedad (si $W_{1,100} \geq 5\%$, $W_{1,200} \geq 4\%$)	✓			



NOTA:

RESPONSABLE DE ENCUBRIDOR: _____ **Fecha de Inspección:** _____

CONSEJO DE ADMINISTRACION
VoBo
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA
VERIFICACION DE ENTUBACION
TIPO DE VERIFICACION



Handwritten signature or initials

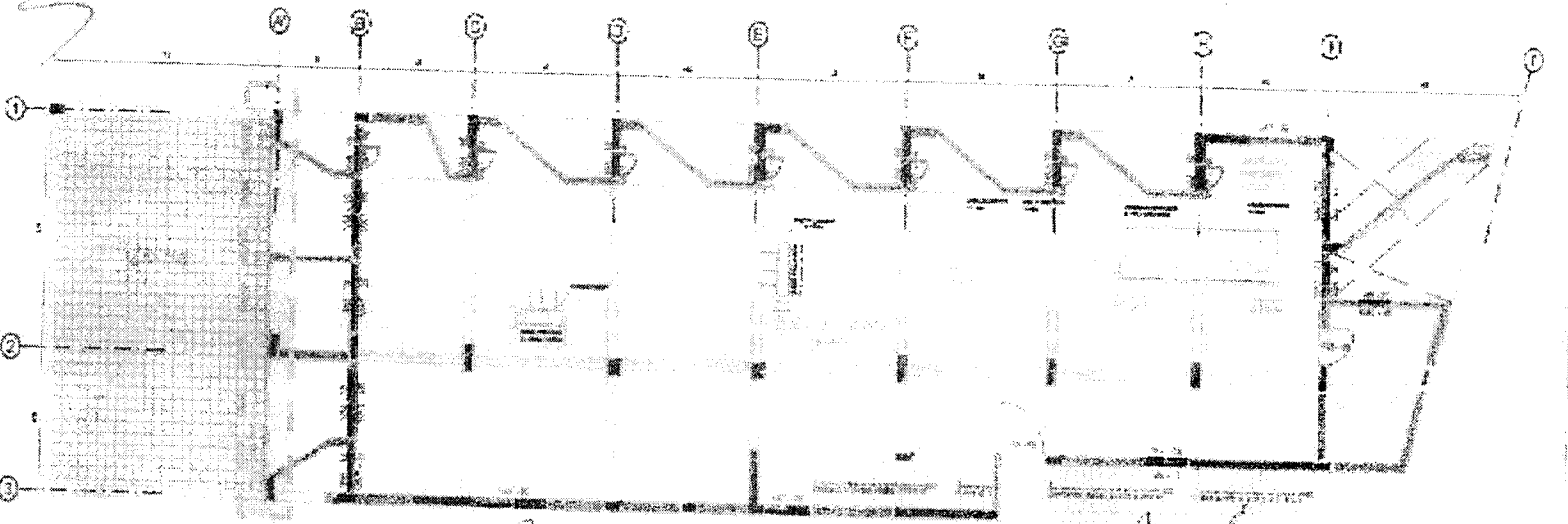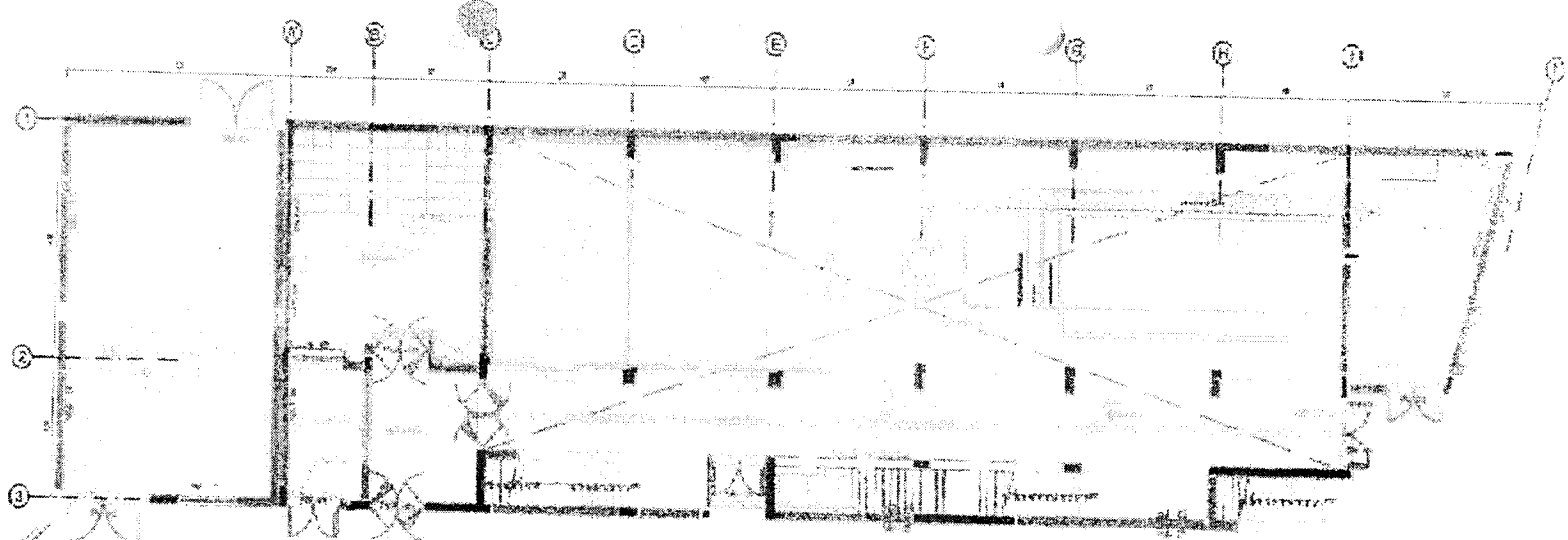

STATIONER
Handwritten signature
STATIONER
Washington, D.C.

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D.C.



REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
TRANSPORTE DE LOSAS PREFABRICADAS

CZ SSC.PR.01.01
Revisión: 1
Fecha: 10/07/2019
Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: MEDICAMENTO INTEGRAL DEL DIA DE ACABADO
CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDOPES
PLANO REF.: OM-03
TRAMO: 31-32
SECTOR: CABEZO
FECHA: 10/07/2019
NO CORRELATIVO:

DESCRIPCION DEL TRABAJO: LAJE Y TRANSPORTE DE LOSAS PREFABRICADAS DE SUE PATIO DE FABRICACION HASTA EL CANTON
UBICACION DEL ELEMENTO PREFABRICADO:
FUENTE: CANTON

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Verificación de las condiciones ambientales del elemento prefabricado (*)	X			
2	Verificación ambiental de los elementos de laje (*)	X			
3	Verificación de la grúa de 20 ton. en buen estado (*)	X			
4	Se verifica que durante los trabajos se utilice maquinaria y equipo	X			
5	Autorización de trazo del elemento prefabricado (*)	X			
	Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	X			


(*) Autorizado por el Cliente y/o la supervisión.

DATOS DE CAMPO:


- Zona de acople en buenas condiciones.
- Fecha de inicio del elemento prefabricado
- Cantidad de lasas prefabricadas

PLANO DE FABRICACION (X)
10/07/2019
DEL LIND

ESQUEMA ADJUNTO: SI NO

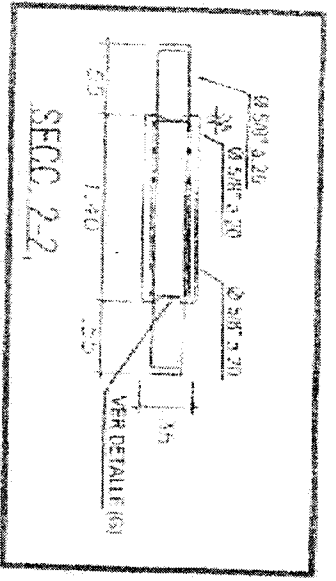


LOSA SECC 2-2
VISTA DEL ELEMENTO PREFABRICADO

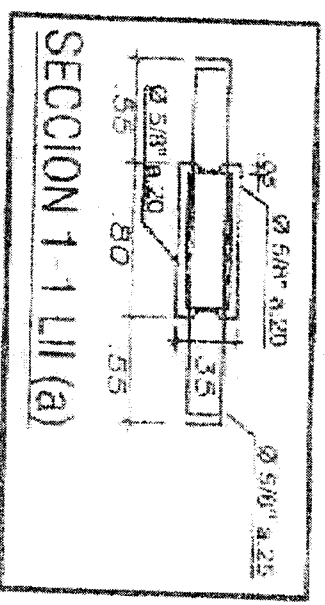

LOSA SECC 1-1
VISTA DEL ELEMENTO PREFABRICADO

OBSERVACIONES



LABORADO POR: *[Signature]* APROBADO POR: *[Signature]*

REVISOR: FREDY SORVALUZ LOPEZ
CARGO: INGENIERO EN CONSTRUCCION
FECHA: 10/07/2019
DISEÑADOR: FREDY SORVALUZ LOPEZ
CARGO: INGENIERO EN CONSTRUCCION
FECHA: 10/07/2019



REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
MONTAJE DE LOSAS PREFABRICADAS

CZ SCC-PC-01-01
Revisión: 1
Fecha: 10/07/19
Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: REFORZAMIENTO INTEGRAL DEL DPA DE AGRUPULO
CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDFONPE
PLANO REF.: 0M-03 TAMAÑO: 31-32 SECTOR: CABEZÓ
DESCRIPCION DEL ELEMENTO: COLOCACION DE LOSAS(S) PREFABRICADAS EN EL CABEZÓ

UBICACION DEL ELEMENTO PREFABRICADO

PUEBLO: CAJUPZO:


ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Revisión de planos y especificaciones	X			
2	Verificación topográfica de la cota y de la posición final del elemento prefabricado	X			
3	Autorización de montaje del elemento prefabricado (?) Análisis de riesgo seguro (ARS)	X			

(*) Autorizado por el Director en la Preparación.

DATOS DE CAMPO:

- Elementos de uso en buenas condiciones
- Zona de montaje del elemento prefabricado en buenas condiciones


- SQUEENA ADJUNTO: SI NO

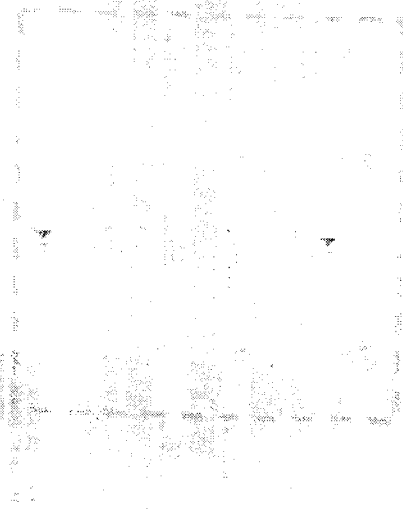

DIRECCION A MAR DIRECCION A LA COSTA
VISTA EN PLANTA DEL MONTAJE DE LA LOSA

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: Fecha: 10/07/2019	REVISADO POR: Fecha: 10/07/2019	APROBADO POR: Fecha: 10/07/2019
Nombre: FREDY GONZALEZ LOPEZ Cargo: ING. INGENIERO EN OBRAS CIVILES	Nombre: JUAN RICARDO ORTIZ Cargo: ING. INGENIERO EN OBRAS CIVILES	Nombre: ROBERTO RODRIGUEZ Cargo: INGENIERO EN OBRAS CIVILES





REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD

CZ.SGC.PC.03-FA

Rev: 1

INSPECCIÓN DE TARRAJEOS Y DERRAMES

FECHA: 10-07-2019

Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DE ACAPULCO

CLIENTE: FONDOPUS

PLANO REF.: AR-14

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: TARRAJEO DE MURO EJE 13* : TRAMO: C-D (LAVATORIO DE MANOS); MURO EJE : D* : TRAMO: 12-13* : MURO : EJE 12* : TRAMO C-D
TARRAJEO MURO : EJE : C : TRAMO 12-12* ; MURO EXTERNO EJE : B : TRAMO 12-13

Nº CORRELATIVO:

FECHA : 10-07-2019

COD. PLS: CO-SEC-LT-A-D


AREA: DESINFECCION

Verificaciones Generales:

Limpieza

Rugosidad

Humedad



Ambiente	Alisamiento de muros			Verticalidad de muros			Uniformidad de muros			Contrazocalo c/ cemento pulido			Encusado de muros tipo Media Caña			Verticalidad de derrame			Contrazocalo sanitario			Dimensiones de vanos			Cieluras					
	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.			
	DESINFECCION : EJE 13* : TRAMO C-D	V			V			V																						
DESINFECCION : EJE D* : TRAMO 12-13*	V			V			V																							
DESINFECCION : EJE 12* : TRAMO C-D	V			V			V																							
DESINFECCION : EJE : C : TRAMO 12-12*	V			V			V																							
DESINFECCION : EJE : B : TRAMO 12-13	V			V			V																							

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Freddy González López	Nombre: Ing. Edgar Regalado Obiles	Nombre: Ing. Rubén Bossus Fontana
FECHA : 10-07-2019	FECHA : 13-07-2019	FECHA : 10-07-2019



REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
PROTOCOLO DE VERIFICACION DE TRABAJOS DE DEMOLICION

CS SAC P.C. 01-01
Documento: 1
Fecha: 11/07/2019
Folios: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: DPA AEROPUERTO
CLIENTE: FOMDESUR
PLANO REF.: OM-02
HANZAMA
N° CORRELATIVO: 1
FECHA: 11/07/2019
FUENTE: DPA AEROPUERTO
TORRE:
SECTOR: MIBIFIF
PISO:

Demolicion
 Libre de todo
 Muro de
 LSA
 Muro de
 Muro de
 Otro: 33

Observaciones:
DEMOLICION DE TIJAS DE CONCRETO ARMADO 4.40X20.00 CM. 33

Sin datos
 Verificar
 Echar

Planimetria e Estructuras a verificar
(Incluir especifico)

Referencia (Plano N°)

Seguridad

- Vigilancia: 00% - 0000, bochas, toallas, graneros
- Señalización: 00% de trabajo de concreto con sillas amarilla
- Señal de mano: 00% de señalización de tránsito con cinta roja
- Otros: 00% de señalización

Verificación realizada



Observaciones

NOTA:



CONTINUA EN HOJAS ANEXAS:

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Nombre: ELABORADO POR	Nombre: REVISADO POR	Nombre: APROBADO POR
Fecha: 11/07/2019	Fecha: 11/07/2019	Fecha: 11/07/2019




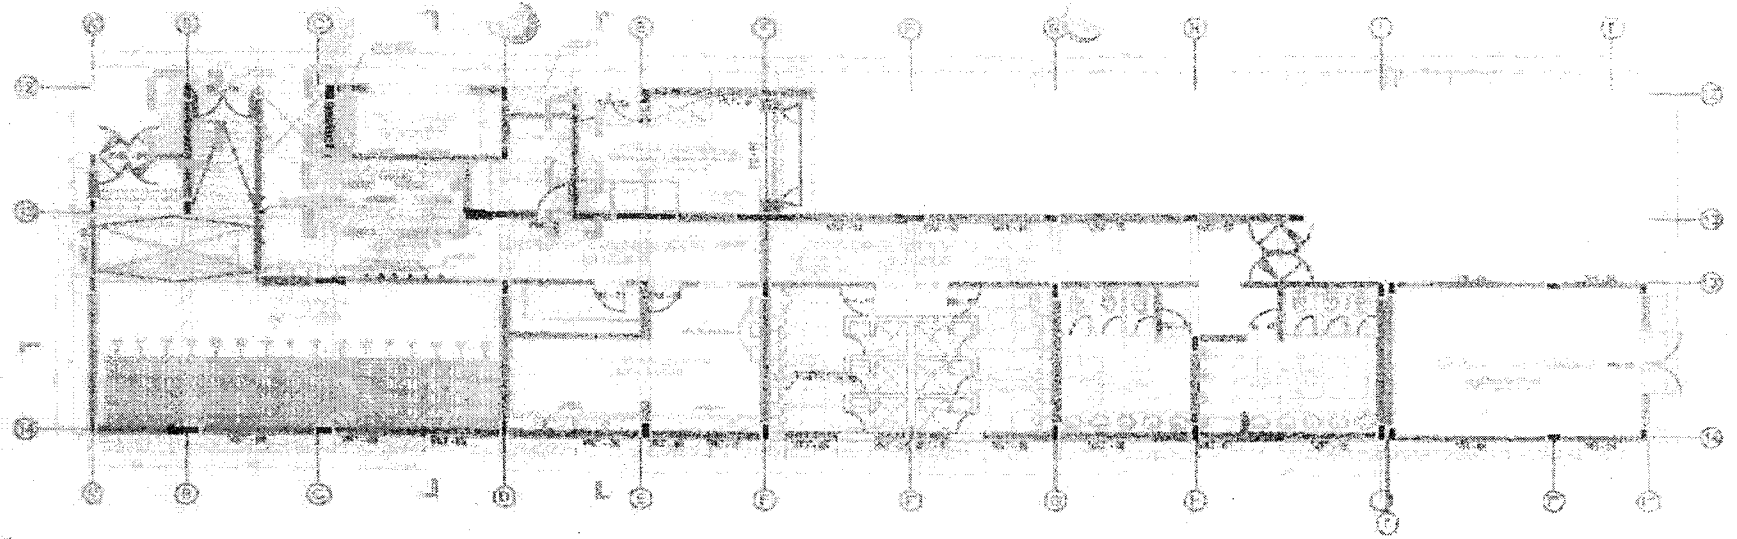

Handwritten signature

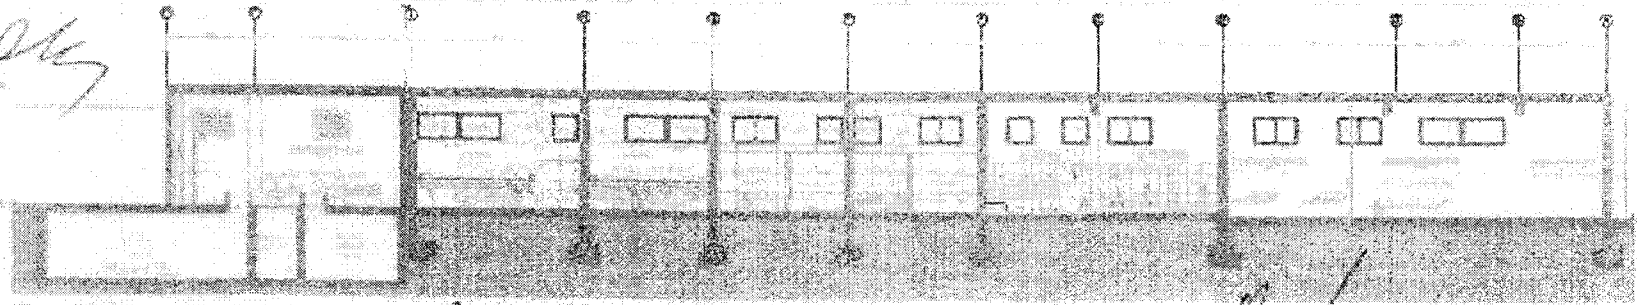

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿՆՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ
2014 թ. 10.08

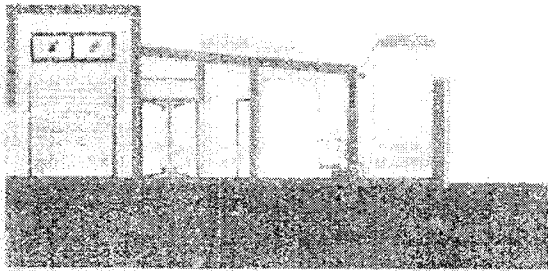

Handwritten signature
Վ. ԲԱՐՍԵՆԵՏՅԱՆԻ
ՎԵՐՈՒՄԻՆՈՒԹՅԱՆ
ՍԵՐՎԻՍ



REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
TRANSPORTE DE CABEZAL PREFABRICADO

L. 5667 PC-01-01
Revisión: 1
Fecha: 11/07/19
Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: MEDRAMIENTO INTEGRAL DEL DPA DE ACAPULCO

CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDIRS

N° CORRELATIVO:

PLANO REF.: OM-03 EJE 33 SECTOR: CABEZO

FECHA INICIO: 11/07/19

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: LAJE Y TRANSPORTE DE VIGA CABEZAL DE CONCRETO PREFABRICADO HASTA EL CABEZO

UBICACIÓN DEL ELEMENTO PREFABRICADO:

PUENTE CABEZO


ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Verificación de las condiciones óptimas del elemento prefabricado (*)	X			
2	Verificación optima de los elementos de laje (*)	X			
3	Verificación de la grúa de 30 ton. en buen estado (*)	X			
4	Se verifica que durante los trabajos se utilice metodología y regges	X			
5	Verificación de todo el elemento prefabricado (*)	X			
-	Análisis de Foliado Seguro (AFS)	X			

(*) Aprobado por el Comité y/o la Supervisión

DATOS DE CAMPO:

- Zona de recepción en buenas condiciones:
- Fecha de laje del elemento prefabricado:

Lugar de fabricación:
LIVONIA

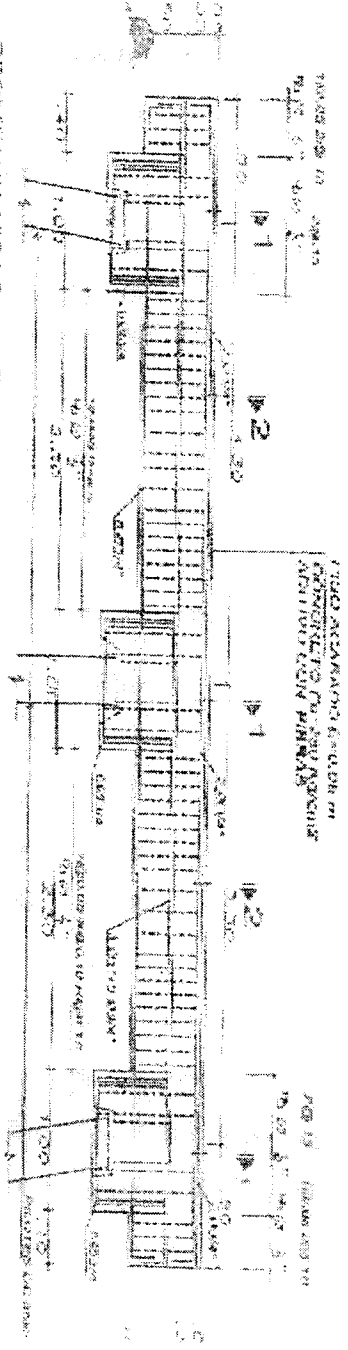

GEOMETRÍA VIGAS Y LAJE 01 (CABEZO DE MUELLE)

VISTA DEL ELEMENTO PREFABRICADO

OBSERVACIONES:

PLANIFICADO POR:

Firma:

REVISADO POR:

Firma:

APROBADO POR:

Firma:


Nombre: EDGAR GONZALEZ GONZALEZ



Cargo: ING. RESIDENTE

Nombre: RUBEN ROSSIGNOL RONALDI

Cargo: INGENIERO SUPERVISOR



[Handwritten signature]

Item	Description	Quantity	Unit	Value	Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

PRESIDENTE DA COMISSÃO

2017

 COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

 Nº 01/2017

 0M-02

SUPERVISOR



REGISTRO

CONTROL DE CALIDAD

MONTAJE DE CABEZAL PREFABRICADOS

CZ.98C/PC.01-01

Revisión: 1

Fecha: 11/07/19

Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DPA DE ACAPULCO

Nº CORRELATIVO: 13/07/19

CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDOPES

FECHA: 13/07/19

PLANO REF.: OM-03

EJE: 31

SECTOR: CABEZO

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: MONTAJE DE VIGA-CARPAJA PREFABRICADA DE CONCRETO ARMADO EN EL LUGAR DEL CABEZO

UBICACIÓN DEL ELEMENTO PREFABRICADO:

PUENTE CABEZO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI		NO		N.A.	OBSERVACIONES
		SI	NO	SI	NO		
1	Revisión de planos y especificaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Verificación topográfica de la cota y de la posición final del elemento prefabricado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Autorización de montaje del elemento prefabricado (*)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		


Elaborado por el Cliente y/o la Supervisión

LUGAR DE MONTAJE:

- Clientes de pago en buenas condiciones
 - Zona de montaje del elemento prefabricado en buenas condiciones
 - Se usó concreto de 2600 kg/m³ en la unión (viga pilote)
- A A A

- ESQUEMA ADJUNTO:

SI NO



DIRECCION A MAR DIRECCION A LA COSTA

VISTA EN PLANTA DEL MONTAJE DE LA VIGA

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:


APROBADO POR:

Nombre: *[Signature]* **Nombre:** *[Signature]* **Nombre:** *[Signature]*

Cargo: INGA RESISTENTE **Cargo:** INGA RESISTENTE **Cargo:** INGA RESISTENTE

Nombre: RAFAEL GONZALEZ LOPEZ **Nombre:** EDGAR REINALDO GUELLAS **Nombre:** RUBEN RODRIGUEZ TORALBA

Fecha: 11/07/2019 **Fecha:** 11/07/2019 **Fecha:** 11/07/2019





REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD

CZ-96C-PC-03-F1

Rev: 1

INSPECCIÓN DE TARRAJEOS Y DERRAMES

FECHA: 11-07-2019

Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO

CLIENTE: FUNDICIS Nº CORRELATIVO:

PLANO REF: AR-17 CÓD. FLS: CZ-96C-LT-AJD FECHA: 11-07-2019


DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: TARRAJEO DE MURO (PARAPETO): INTERIOR ESCALERA 3 JEDE 3º; TRAMO: C-D ÁREA: PRIOS

Verificaciones Generales:

Limpieza V

Rigidez V

Humedad V



Ambiente	Alineamiento de MURO			Verticalidad de MURO			Uniformidad de MURO			Alineamiento de vigas			Verticalidad de vigas			Uniformidad de vigas			Costrucción sanitaria			Dimensiones de vanos			Cieloraso					
	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.			
	PRIOS - PARAPETO ESCALERA 3	V			V			V																						

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Freddy González López	Nombre: Ing. Edgar Rogado Obitas	Nombre: Ing. Roger Basso Tomáfo
Fecha: 10-07-2019	Fecha: 10-07-2019	Fecha: 10-07-2019

NOMBRE DEL PROYECTO: **MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS CUADRES**
 PLANO RES: **AP-17** COD. PIE: **CE-SIGC UDC/OM**
 DESCRIPCION DEL TRABAJO: **CONCRETO EN CALAMBERTOS (NIVEL RESERVADE LIRANCO E.C.)**

Nº COMPLEMENTOS:
 FIRMA: **12/07/2019**
 SECTOR: **PAIS**

CHECK LIST DE VERIFICACION DE FASES ACTOS DE ABASTA


ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Revisión de especificaciones (Verificar si la especificación concuerda)	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	Revisión de planos (Verificar si concuerdan con el plano)	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	Revisión de especificaciones (Verificar si concuerdan con el plano)	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	Verificación de especificaciones (Verificar si concuerdan con el plano)	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Verificación de especificaciones (Verificar si concuerdan con el plano)	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	Verificación de especificaciones (Verificar si concuerdan con el plano)	<input checked="" type="checkbox"/>			
7	Verificación de especificaciones (Verificar si concuerdan con el plano)			<input checked="" type="checkbox"/>	
8	Verificación de especificaciones (Verificar si concuerdan con el plano)			<input checked="" type="checkbox"/>	
9	Verificación de especificaciones (Verificar si concuerdan con el plano)			<input checked="" type="checkbox"/>	
10	Verificación de especificaciones (Verificar si concuerdan con el plano)			<input checked="" type="checkbox"/>	
11	Otras				

RABONABLE DE ACERO: _____
 Fecha de Inspección: _____ (Firma)

CHECK LIST DE VERIFICACION DE ENCOFRADO

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Verificación de especificaciones (Verificar si concuerdan con el plano)	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	Verificación de especificaciones (Verificar si concuerdan con el plano)	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	Verificación de especificaciones (Verificar si concuerdan con el plano)	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	Verificación de especificaciones (Verificar si concuerdan con el plano)	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Verificación de especificaciones (Verificar si concuerdan con el plano)	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	Verificación de especificaciones (Verificar si concuerdan con el plano)	<input checked="" type="checkbox"/>			
7	Verificación de especificaciones (Verificar si concuerdan con el plano)			<input checked="" type="checkbox"/>	
8	Verificación de especificaciones (Verificar si concuerdan con el plano)			<input checked="" type="checkbox"/>	
9	Verificación de especificaciones (Verificar si concuerdan con el plano)			<input checked="" type="checkbox"/>	
10	Verificación de especificaciones (Verificar si concuerdan con el plano)			<input checked="" type="checkbox"/>	
11	Otras				

RESPONSABLE DE ENCOFRADO:
 Fecha de Inspección:





Firma:

CONSORCIO ZORRILLOS

INGENIERO EN ROSSIS TORALDI
 INGENIERO EN ROSSIS TORALDI
 RESPONSABLE DE SUPERVISION

Handwritten signature

CONSORZIO SUPERVISOR
Handwritten signature
SOCIETA' PER AZIENDA REGALADO ORO
Consorzio di C.M.

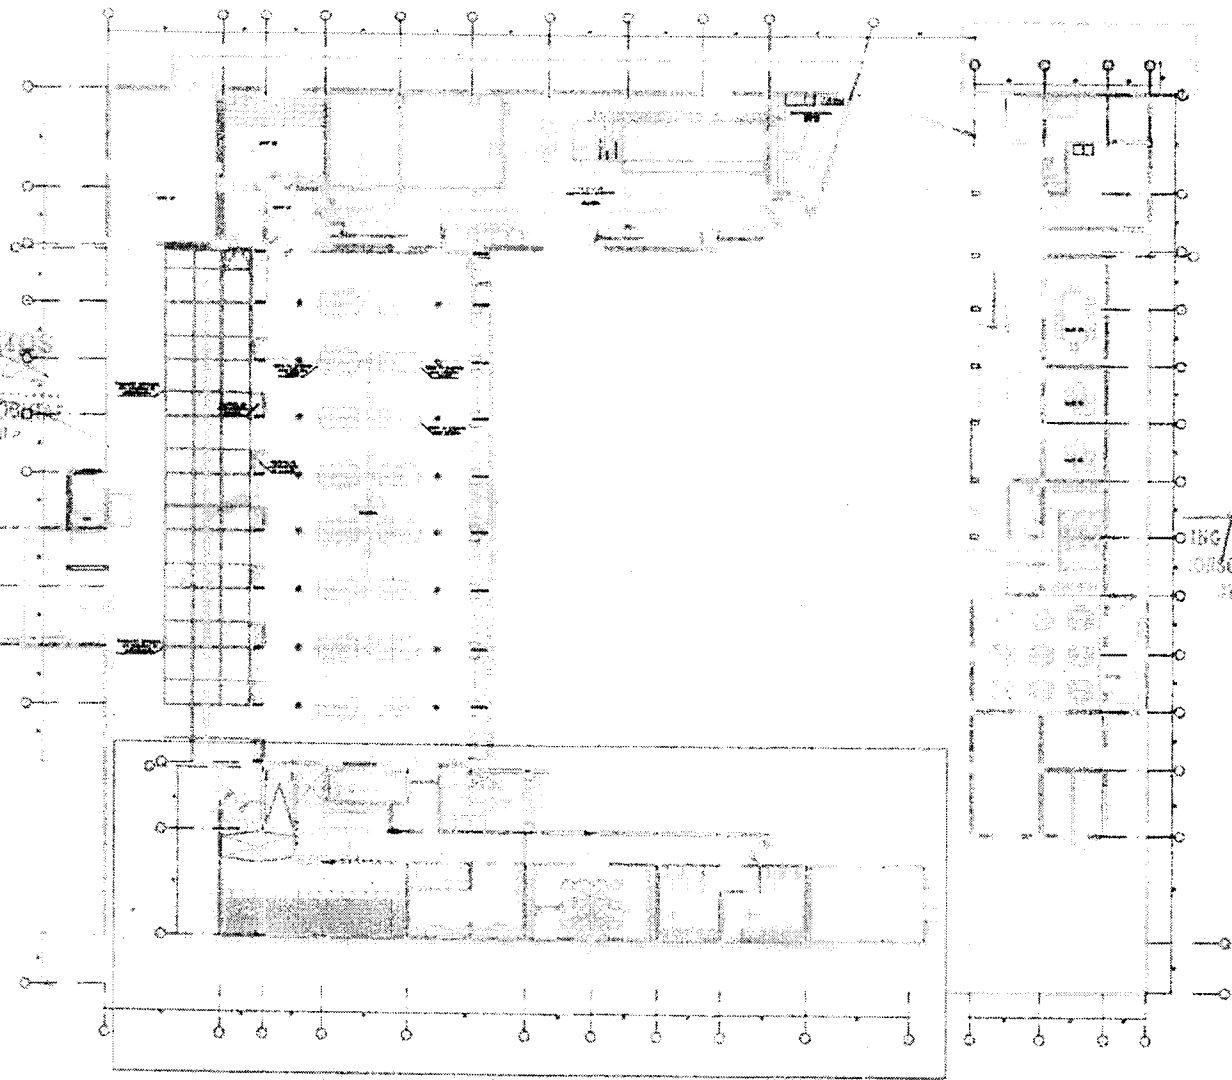

Handwritten signature
ING. ROBERTO BUSTONATI
CONSORZIO SUPERVISOR TORINO
AREA DI SUPERVISIONE

AR-01



CONSORCIO ZORRITOS

REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
REPORTE DE RELLENO

C2.SGC.PC.02-F1
Revisión: 01
Fecha: 12/07/19
Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LA ACAPULCO

Nº CORRELATIVO:

CLIENTE:

HONDURAS

FECHA INICIO:

12/07/2019

PLANO REF.:

AR-01

FRENTE:

SECTOR: FRIOS

AREA O TORRE:

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

Compactación con afirmado en VEREDA EXTERIOR - FJE J @ M (ADMINISTRACION)

TIPO DE RELLENO:

Relleno Masivo
Controlado

Relleno Masivo
No Controlado

Relleno Localiz.
Controlado

Relleno Localiz.
No Controlado

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Revisión de planos y especificaciones	V			
2	Autorización de Relleno (*)	V			
3	Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	V			
4	Verificación Topográfica	V			
5	Preparación de área de relleno	V			
6	Relleno con material propio		V		
7	Relleno con material de préstamo	V			
8	% Compactación según especificaciones	V			
9	Conformidad de Capas de relleno (niveles)	V			Cantera: EL RUBIO (ANTES DEL PEAJE DE CANOAS)

(*) Autorizado por el Cliente y/o la Supervisión

DATOS DE CAMPO:

CAPA Nº	ESPESOR (m)	NIVEL (m)	FIRMA TOPOGRAFIA	FECHA	%COMPACT.	FIRMA CONTROL COMPACTAC.	OBSERVAC./C ANTERA
1	0.15	3.89		12/07/2019			


PLANO ADJUNTO:



SI

NO

OBSERVACIONES

ELABORADO POR:	SEÑALADO POR:	APROBADO	SUPERVISOR
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Cargo: Control de Calidad	Cargo: Ing. Campo	Cargo: Ing. Residente	Cargo: Supervisor
Nombre: Freddy Gonzalez Lopez	Nombre:	Nombre: Edgar Evangelista Ojeda	Nombre: Ruben Sasso Toranzo
Fecha: 12/07/2019	Fecha:	Fecha: 12/07/2019	Fecha: 12/07/2019



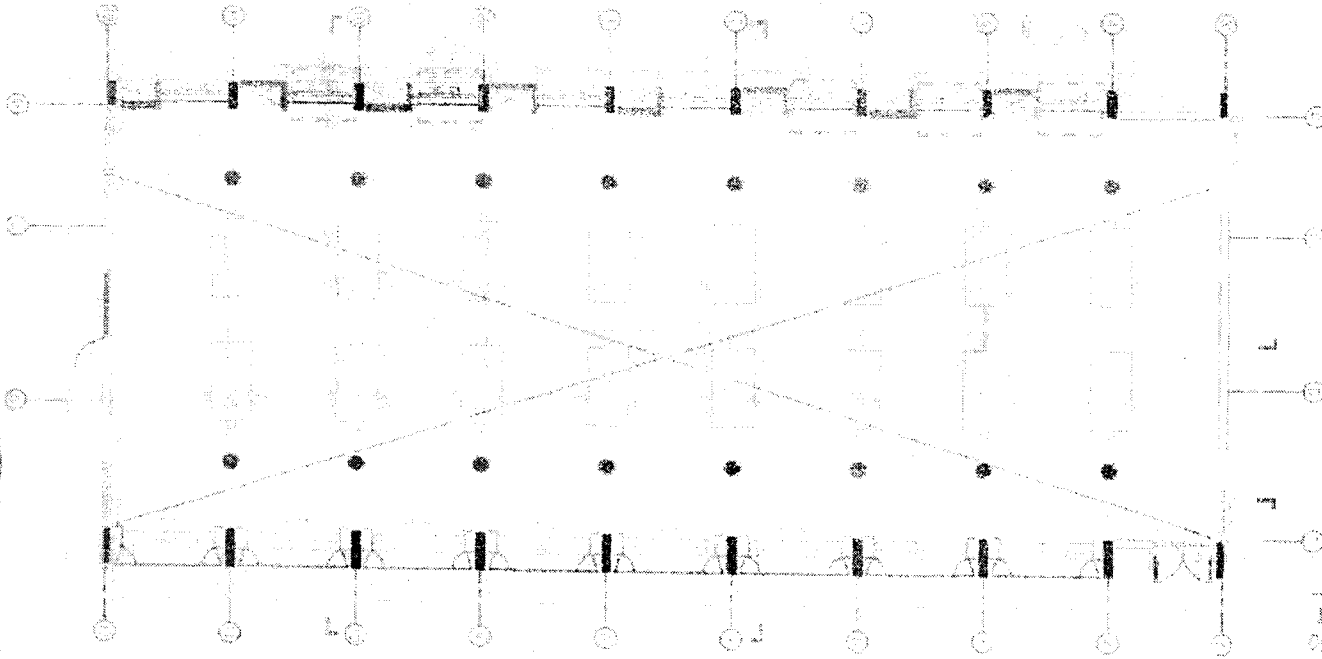



Signature

EDGAR FERNANDEZ REGALADO
ING. RESIDENTE EN CIVIL

CONSORCIO ZORRITOS

Signature
ING. RUBEN ROSSUS TOKINTI
CONSORCIO SUPERVISOR TURERO
JEFE DE SUPERVISOR

CONSORCIO ZORRITOS
EDGAR FERNANDEZ REGALADO
ING. RESIDENTE EN CIVIL

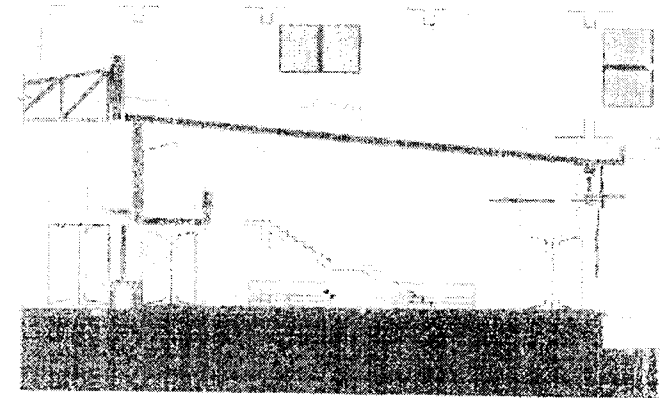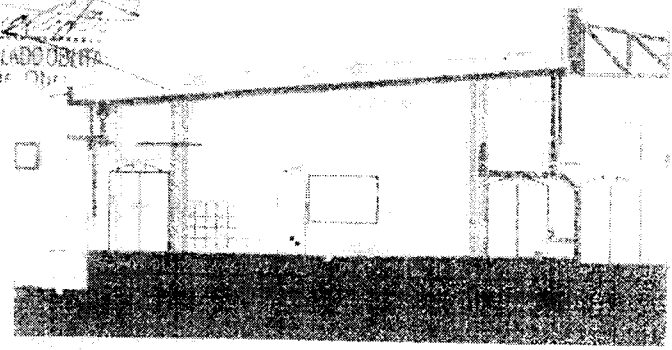



CONSORCIO ZARZITOS

REGISTRO CONTROL DE CALIDAD
REPORTE DE RELLENO

CZ-SGC-PC-02-F1
Revisión: 01
Fecha: 12/07/19
Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE FONDRES

CLIENTE: FONDRES

PLANO REF.: AR-01 FRENTE: SECTOR: FRIOS

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Compactación con afirmado PARA MESAS PARA PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS : EJE: 8

TIPO DE RELLENO: TRAMO : 4-5 : 5-6 : 6-7 : 9-10 : 10-11

Relleno Plano Controlado Relleno Masivo No Controlado Relleno Localiz. Controlado Relleno localiz. No Controlado

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	M.A.	OBSERVACIONES
1	Revisión de planos y especificaciones	V			
2	Autorización de Relleno (%)	V			
3	Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	V			
4	Verificación Topográfica	V			
5	Preparación de área de relleno	V			
6	Relleno con material propio		V		
8	% Compactación según especificaciones	V			
9	Compatibilidad de capas de relleno (niveles)	V			Cantera: EL RUBIO (ANTES DEL PASE DE CANOAS)

(*) Autorizada por el Cliente y/o la Supervisión


DATOS DE CAMPO:


CAVA Nº	ESPESOR (m)	NIVEL (m)	FIRMA TOPOGRAFIA	FECHA	%COMPACT.	FIRMA CONTROL COMPACTAC.	OBSERVAC./C ANTERA
1	0.15	3.30		12/07/2019			
2	0.15	3.45		12/07/2019			

- PLANO ADJUNTO: SI NO

OBSERVACIONES


ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO:	SUPERVISOR:
Fecha: <i>[Firma]</i>	Fecha: <i>[Firma]</i>	Fecha: <i>[Firma]</i>	Fecha: <i>[Firma]</i>
Cargo: Control de Calidad	Cargo: Ing. Campo	Cargo: Ing. Residente	Cargo: Supervisor
Nombre y Apellido González López	Nombre: <i>[Firma]</i>	Nombre y Apellido Obillos	Nombre y Apellido Espinoso Torado
Fecha: 12/07/2019	Fecha: 12/07/2019	Fecha: 12/07/2019	Fecha: 12/07/2019



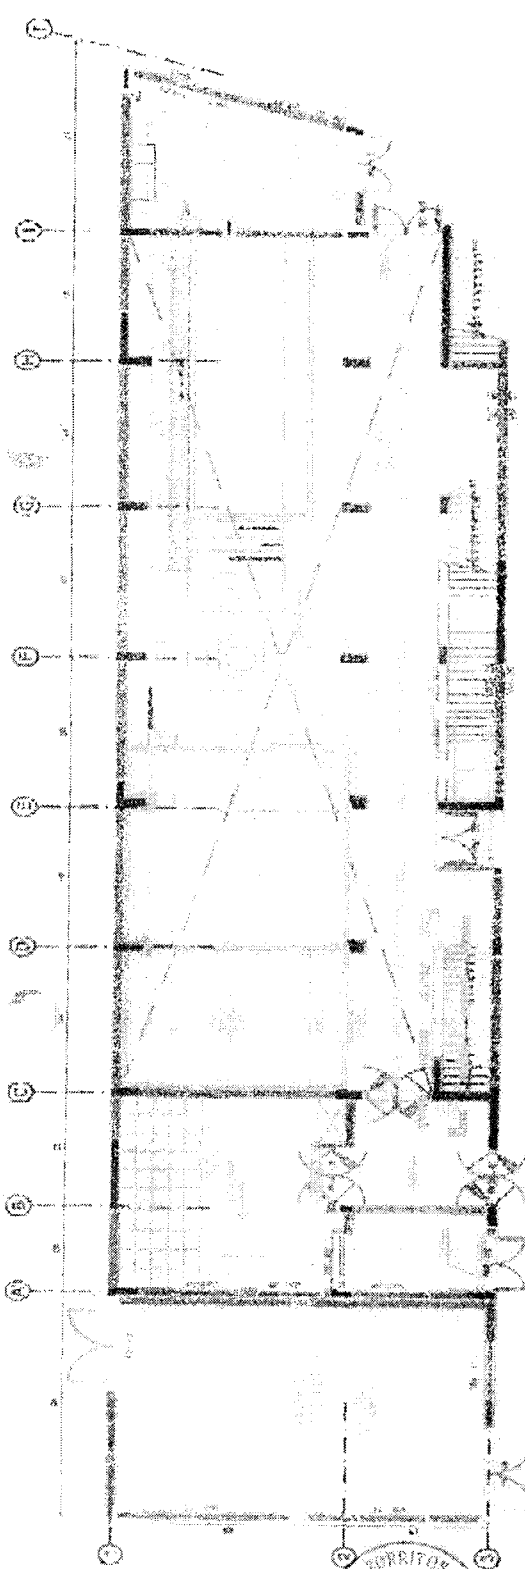

INGENIERIA DE ZORRITOS S.C. DE C.V.
 VºBº
 Calle Residencial 2001

Handwritten signature

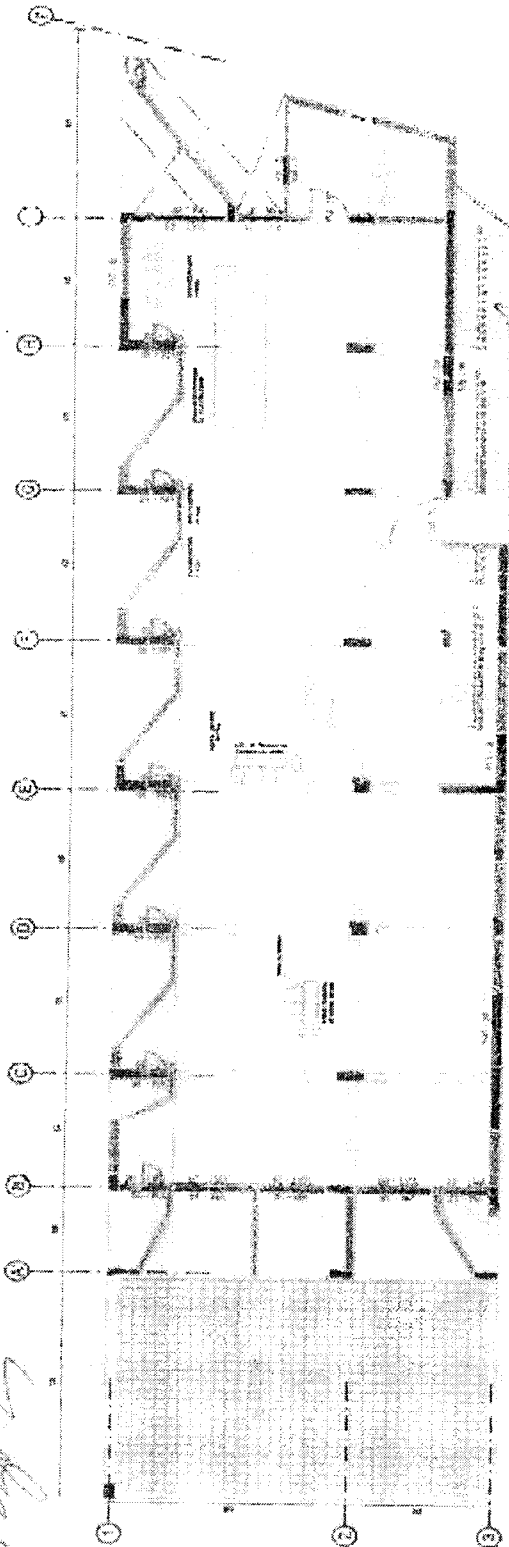

ING. JUAN BOSCH TORALDO
 COMERCIO SUPERMERCENTRAL
 1978 DE CUBA-1910

INGENIERIA DE ZORRITOS S.C. DE C.V.
 Calle Residencial 2001



REGISTRO

CONTROL DE CALIDAD

TRANSPORTE DE LOSAS PREFABRICADAS

C2.562.PC.01.011

Revisión: 1

Fecha: 13/07/2019
Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO LOCAL DEL DCA DE ACAPULCO

CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RÚRICO - FONDERES

Nº CORRELATIVO:

FECHA: 13/07/2019

PLANO REF.: OM-03

TRAMO: 32-33

SECTOR: CABEZO

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: LEVANTAMIENTO Y MANEJO DE LOSAS PREFABRICADAS DESDE PATIO DE FABRICACION HASTA EL CABEZO

UBICACION DEL ELEMENTO PREFABRICADO:

FUENTE

CABEZO

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Verificación de las condiciones, opciones del elemento prefabricado (*)	X			
2	Verificación de la optimización de los elementos de carga (*)	X			
3	Verificación de la gran de 30 ton, en buen estado (*)	X			
4	Se verifica que durante los trabajos se utilicen machetistas y ríper	X			
5	Atención de riesgo del elemento prefabricado (*)	X			
6	Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	X			

DATOS DE CAMPO:

- Zona de acople en buenas condiciones
- Fecha de viaje del elemento prefabricado
- Cantidad de veces prefabricadas

PATIO DE FABRICACION (X)

13/07/2019


04 UNO

ESQUEMA


NO

OBSERVACIONES


LOSA SECC 2-2 VISTA DEL ELEMENTO PREFABRICADO

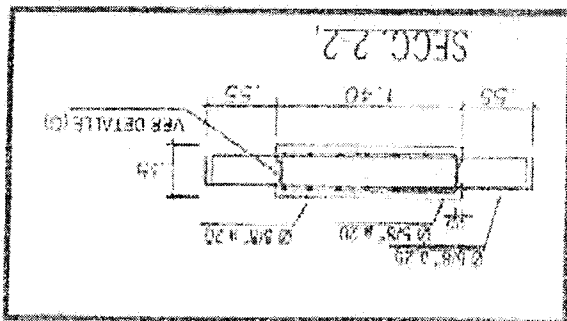



LOSA SECC 1-1 VISTA DEL ELEMENTO PREFABRICADO

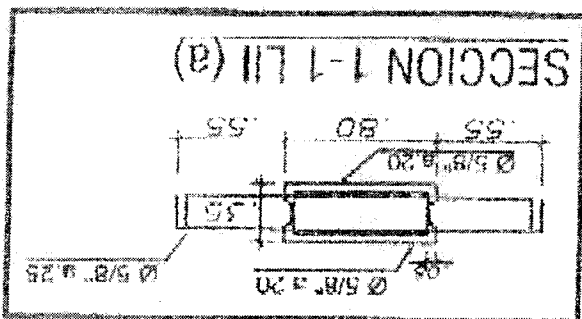


ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
Nombre: HEDER BOSCH TONATTO	Cargo: ING. SUPERVISOR	Nombre: EDGAR REGALADO ORTIZ	Cargo: ING. RESIDENTE	Nombre: [Firma]	Cargo: [Firma]
Fecha: 13/07/2019	Fecha: 13/07/2019	Fecha: 13/07/2019	Fecha: 13/07/2019	Fecha: 13/07/2019	Fecha: 13/07/2019



277

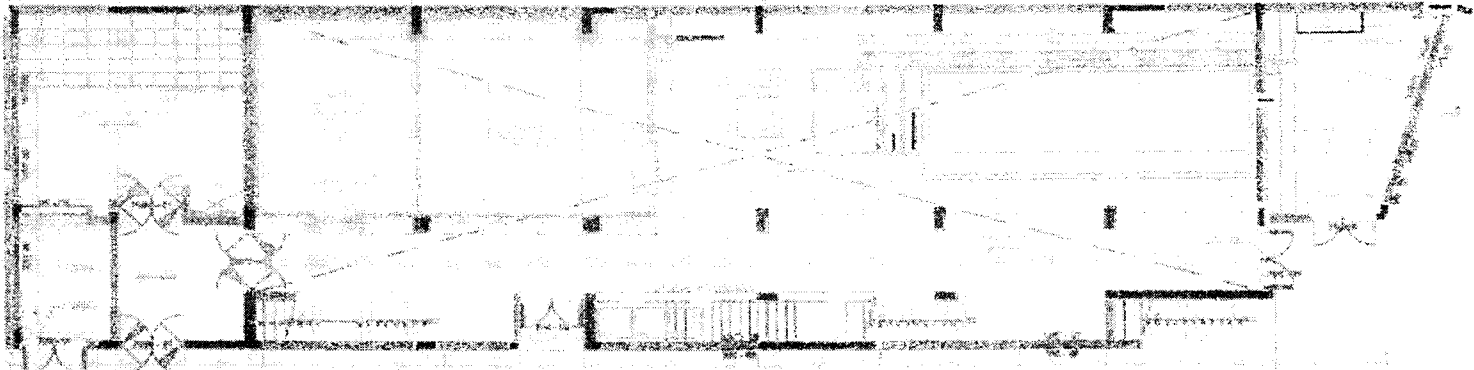

Handwritten signature
 ARCHITECTS
 100 N. BROAD ST.
 PHILADELPHIA, PA.

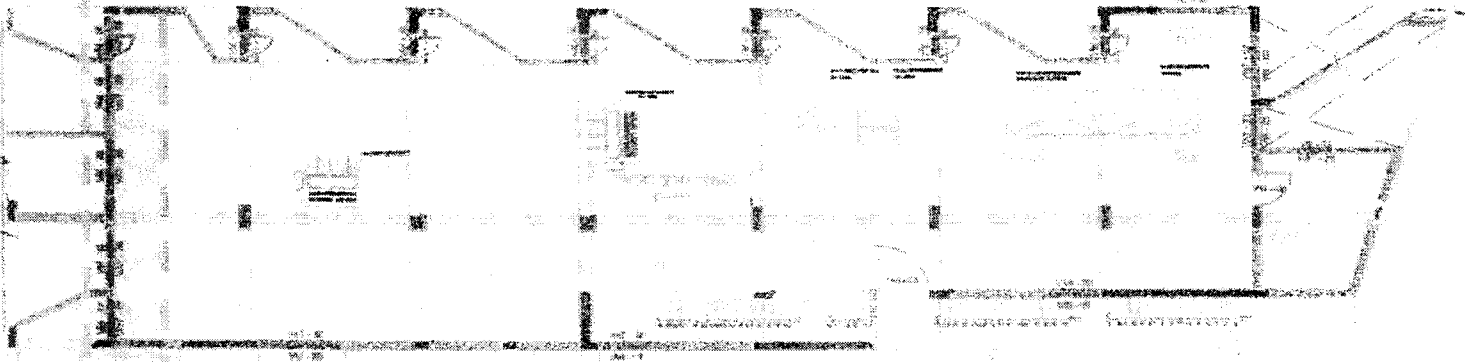

THE ROBERT ROSS FOUNDRY
 CONSOLIDATED SUPERVISOR TOWER
 1275 DE SUPERVISOR

276

LIBERACION DE VACIADO DE CONCRETO

MEJORAMIENTO EPA ACAPULCO

Rev: 27/07/2010
Fecha: 27/07/2010

AREA / SECCION:	CONCRETO DE COLUMNAS E VIGAS DE 20 Y 25 CM DE ESPESURAS	FECHA:	17/07/2010
ESTRUCTURA / ETIENRGO:	318 KCM/2	PLANO DE REF.:	AB-17
DEASTRUCTON (O-C):	SI/NO	TIPO CONCRETO:	N
		VOLUMEN:	

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	CHECK LIST DE LIBERACION DE ESTRUCTURAS		OBSERVACION
		SI	NO	
1	Unidades de L. en estructura	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	Especificaciones, valores de fondo y nivel de concreto	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	ECS y Dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	Verificación del esp. de la estructura con respecto a EBS	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	Verificación del esp. de cada sección estruct. det.	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	Reborn BBS			N/A
7	Las especificaciones de EBS y dimension, liberación			N/A
8	Los EMBALAJES, bolsas y pesos para EMBALAJES			N/A
9	Los pesos de los agreg. distribuidores, EMBALAJES			N/A
10	Las mediciones de EMBALAJES (mediciones)			N/A
11	Partes de las especificaciones de EBS y dimension			N/A
12	Verificación del esp. de cada sección estruct. det.	<input checked="" type="checkbox"/>		
13	Verificación del esp. de cada sección estruct. det.	<input checked="" type="checkbox"/>		
14	Verificación del esp. de cada sección estruct. det.	<input checked="" type="checkbox"/>		

VACIADO Y MUESTREO DEL CONCRETO

Grupo	Código	Estructura	Esp. (cm)	Muestreo	Esp. (cm)		Muestreo	Muestreo	Muestreo
					10	20			
215		Columnas	30	1	30	30	30	30	30

GOBERNADORES

ELABORADO POR:	PROYECTO:	REVISADO POR:	FECHA:	APROBADO POR:
<i>[Signature]</i>	Mejoramiento de agua potable	<i>[Signature]</i>	17/07/2010	<i>[Signature]</i>





**REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
MONTAJE DE LOSAS PREFABRICADAS**

CSJSC/PC-01-01

Revisión: 1

Fecha: 12/07/19

Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DDA DE ACAPULCO

Nº CORRELATIVO:

CLIENTE:

TORRE NACIONAL DE DESARROLLO ROLANDO - COMERCES

FECHA:

12/07/2019

PLANO N.º:

OM-03

TAMPO:

31-23

SECTOR:

CAREZO

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

COLOCACION DE LOSAS PREFABRICADAS EN EL CAREZO.

UBICACIÓN DEL ELEMENTO PREFABRICADO

NOMBRE:

CAREZO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A.	OBSERVACIONES
1	Revisión de planos y especificaciones.	X			
2	Verificación topográfica de la cota y de la geometría final del elemento prefabricado.	X			
3	Aprobación de montaje del elemento prefabricado (*)	X			
	Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	X			

(*) Autorizado por el Chefe y/o la Supervisión

DATOS DE CAMPO:

- Elemento no está en buenas condiciones

Zona de montaje del elemento prefabricado en buenas condiciones

- ESQUEMA

SI


NO

ADJUNTO:

DIRECCION AL MAR DIRECCION A LA COSTA
VISTA EN PLANTA DEL MONTAJE DE LA LOSA

OBSERVACIONES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO (*) POR:
Firma: Nombre: EDGAR REVUABCO OBILLIAS Cargo: ING. PRESIDENTE Fecha: 12/07/2019	Firma: Nombre: RUBEN ROSCOSU TOMATTI Cargo: M.S. SUPERVISOR Fecha: 12/07/2019	Firma: Nombre: RUBEN ROSCOSU TOMATTI Cargo: M.S. SUPERVISOR Fecha: 12/07/2019





REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD

CZ.SGC.MC.03-F1

Rev: 1
FECHA: 12-07-2019
Pagina: 1 de 1


INSPECCIÓN DE TARRAJEOS Y DERRAMES

NOMBRE DEL PROYECTO: REGRANIENTO SPA - CAJALICO
 CLIENTE: POASOPES
 PLANO REF: AR-17
 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: TARRAJEO DE COLUMNA EJES F1ª - DOBLE ALTURA

Nº CORRELATIVO:
 FECHA: 12-07-2019
 ÁREA: FRIOS (2DO NIVEL)

Verificaciones Generales:

Limpieza Rugosidad Humedad



Ambiente	Almacenamiento de columnas			Verticalidad de columnas			Cabeza nivel de columnas			Almacenamiento de vigas			Verticalidad de vigas			Uniformidad de vigas			Contrazocalo sanitario			Dimensiones de vigas			Cieloraso			
	C	NC	Obs. Lev.	C	NC	Obs. Lev.	C	NC	Obs. Lev.	C	NC	Obs. Lev.	C	NC	Obs. Lev.	C	NC	Obs. Lev.	C	NC	Obs. Lev.	C	NC	Obs. Lev.	C	NC	Obs. Lev.	
FRIOS 2DO NIVEL (F3ª)	V			V																								

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: *[Firma]*
 REVISADO POR: *[Firma]*
 APROBADO POR: *[Firma]*

Nombre: Freddy Gonzalez Lopez
 Fecha: 04-04-2019

Nombre: Ing. Eder Regalado Del Gas
 Fecha: 04-04-2019

Nombre: Ing. Ruler Bossus Tonati
 Fecha: 04-04-2019

273



**REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD**

CZ-SGC-PC-03-F1


Págs: 1
FECHA: 12-07-2019

INSPECCIÓN DE TARRAJEOS Y DERRAMES

HOMBRE DEL PROYECTO: REFORMA DE LA CAMPESINA
 CLIENTE: FONOPRES
 N° CORRELATIVO:
 FECHA: 12-07-2019
 PLANO REF.: AA-14
 CÓD. PLS.: CZ-SGC-LT-A-D
 AREA: DESINFECCION
 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: TARRAJEO DE MURO-PLACA EJE 12° : TRAMO C-C'

Verificaciones Generales:

Limpieza Rugosidad Humedad





Ambiente	Alineamiento de muro-placa			Verticalidad de muro-placa			Uniformidad de muro-placa			Centrosecalo y cemento pulido			Encuentro con rasera tipo Media Caña			Verticalidad de derrame			Alineamiento de VIGAS			Verticalidad de VIGAS			Uniformidad de VIGAS			
	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	
MURO-PLACA EJE 12° : TRAMO (C-C')	V			V			V																					


OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: Firma:	REVISADO POR: Firma:	APROBADO POR: Firma:
Nombre: Freddy González López FECHA: 12-07-2019	Nombre: Ing. Edgar Regalado Obiras FECHA: 12-07-2019	Nombre: Ing. Rubén Bossus Tortato FECHA: 12-07-2019


272

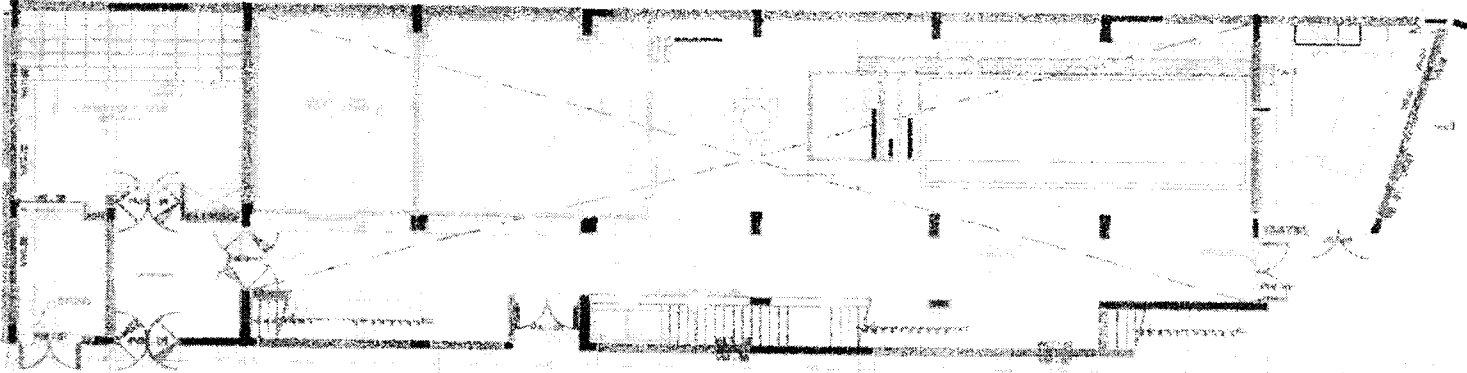

Handwritten signature

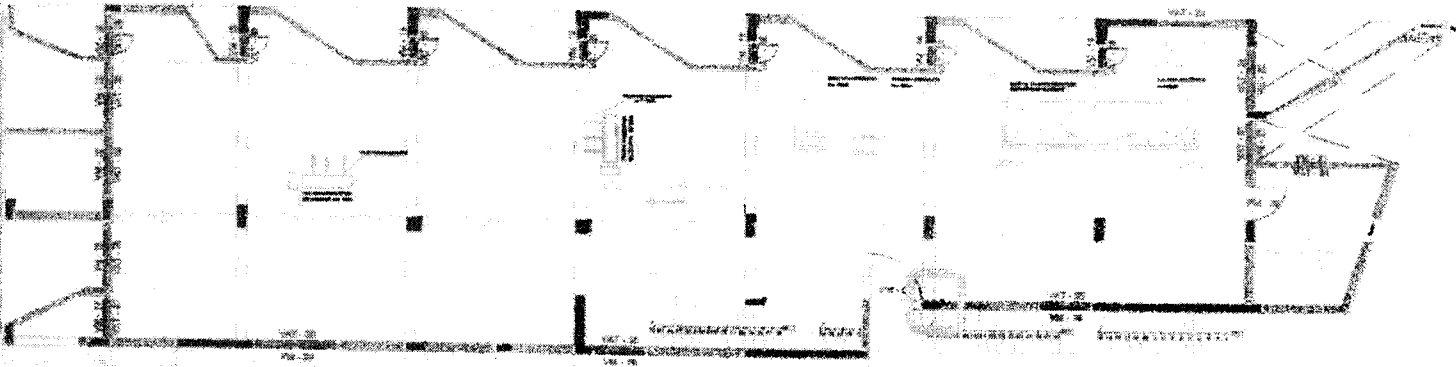

24/01/1970
 ING. ARDEN ROSSI STONATI
 CONCORDIA SUPERVISOR TECNICO
 1970


 ING. ARDEN ROSSI STONATI
 CONCORDIA SUPERVISOR TECNICO
 1970

271



REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD

CZ.SGZ.PC.03-F1

Rev: 1
FECHA: 12-07-2019
Página: 1 de 1

INSPECCIÓN DE TARRAJEOS Y DERRAMES

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DRA ACAPULCO

CLIENTE: FONDOS

Nº CORRELATIVO:

PLANO REF: AR-15 COB PLS: CE-SGD-LT-A-D

FECHA: 12-07-2019

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: TARRAJEO DE MURO EJE 12 : NIVEL 1 : TRAMO C-D : TARRAJEO DE COLUMNA EJE 12B : NIVEL 1


AREA: TAREAS PREVIAS

Verificaciones Generales:

Limpieza

Rugosidad

Humedad




Ambiente	Alineamiento de muro			Verticalidad de muro			Uniformidad de muros			Contratación c/ cemento pulido			Encuentro de muros tipo Media Caña			Verticalidad de derrame			Alineamiento de COLUMNA			Verticalidad de COLUMNA			Uniformidad de COLUMNA			
	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	
CONTROL DE CALIDAD: EJE 12 : NIVEL 1: TRAMO C-D	V			V			V																					
ACCESO DESDE FRIOS EJE 12 B : NIVEL 1																			V			V				V		





OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Freddy González López	Nombre: Eger Regado Cortes	Nombre: Ing. Rubén Borjas Tomán
FECHA: 12-07-2019	FECHA: 12-07-2019	FECHA: 12-07-2019

270



Boyle

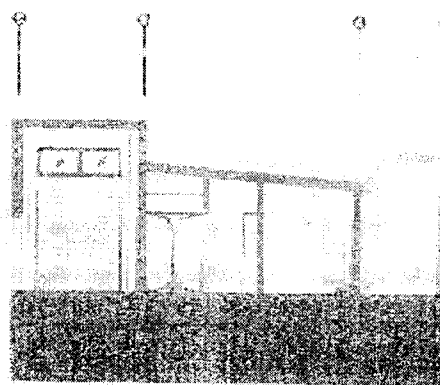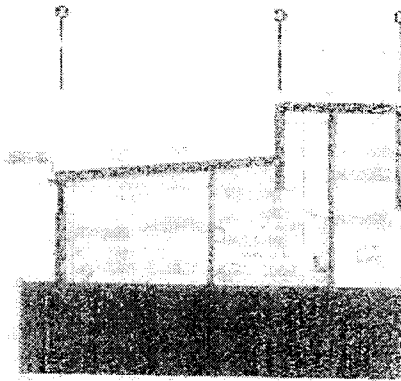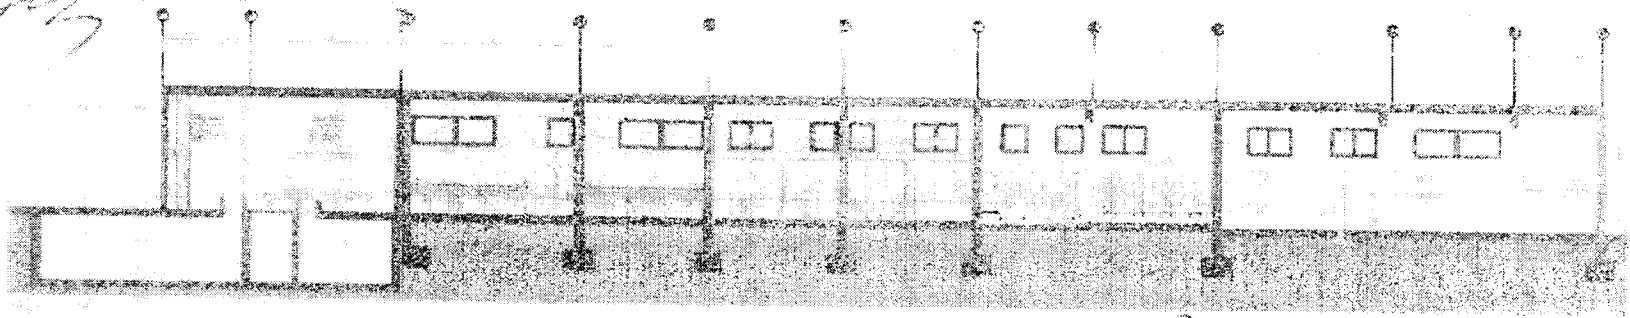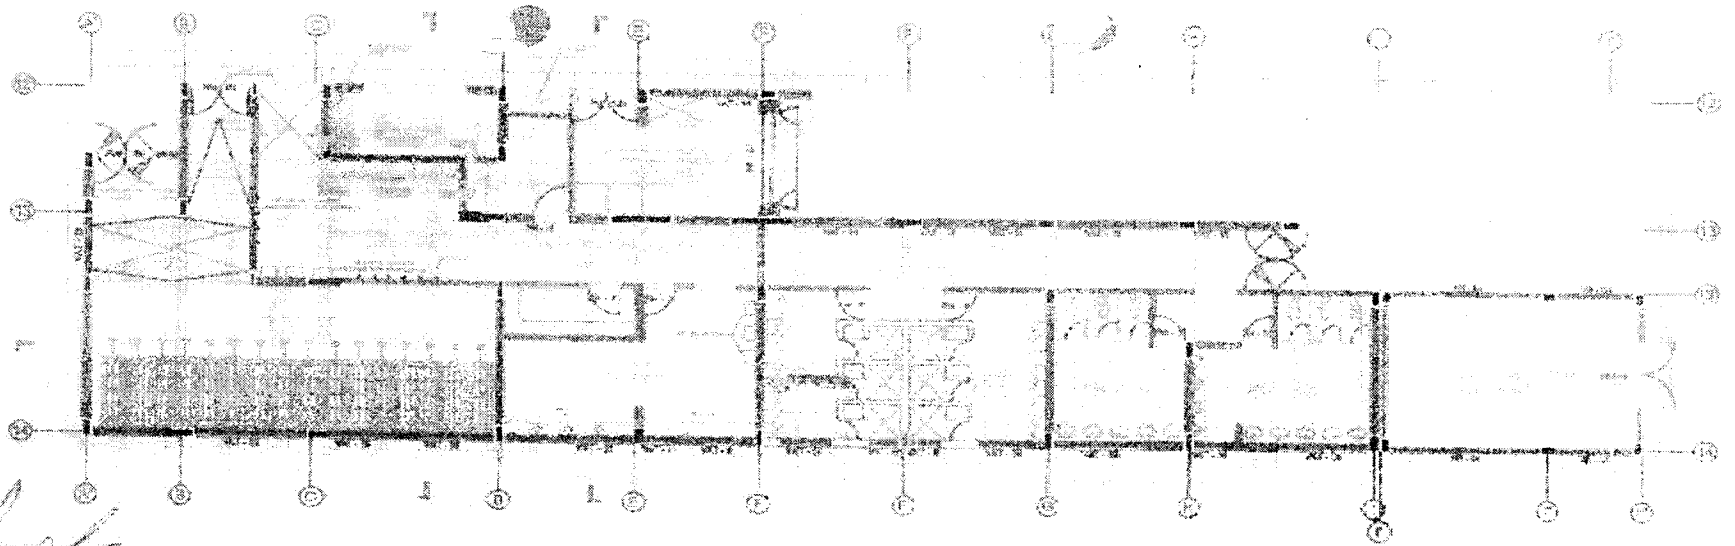

DEPARTMENT OF CORRECTIONS

John J. ...
SUPERVISOR

ING. SUPERVISOR
SUPERVISOR
SUPERVISOR



REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD

CZ.SGC.PC.03-F1

Rev: 1
FECHA: 13-07-2019

INSPECCIÓN DE TARRAJEOS Y DERRAMES


Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DRA ACAPULCO
 CLIENTE: FONADEPES
 PLANO REF: AR-17
 COD. PLS: CZ-SGC-LT-4.0
 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: TARRAJEO DE MURO PARAPETO ESCALERA EJE 3 : TRAMO H-1-1ª : COLUMNA EJE (2F: 2ªF) NIVEL 2

Nº CORRELATIVO:
 FECHA: 13-07-2019
 AREA: FRIOS (2DO NIVEL)

Verificaciones Generales:



Limpieza Rugosidad Humedad



Ambiente	Alineamiento de muros y columnas			Verticalidad de muros y columnas			Uniformidad de muros y columnas			Contrazocalo c/ cemento pulido			Encuentro cielo raso-muro tipo Media Caja			Verticalidad de derrame			Contrazocalo sanitario			Dimensiones de vanos			Cieloraso			
	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	
MURO DE ESCALERA-PARAPETO- EJE 3 : TRAMO H-1-1ª	V			V			V																					
COLUMNA NIVEL 2 : 2ªF	V			V			V																					


OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Firma: Nombre: Freddy Gonzalez Lopez FECHA: 13-07-2019	Firma: Nombre: Ing. Edgar Regalado Obites FECHA: 13-07-2019	Firma: Nombre: Ing. Ruben Boesus Toriati FECHA: 13-07-2019

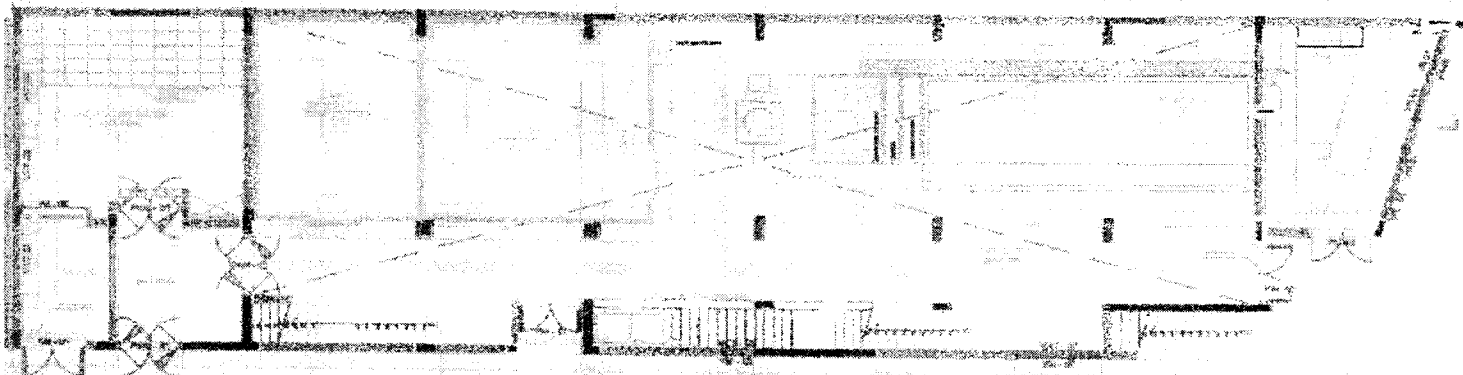

Handwritten signature

INGENIERO ZORRITOS
Handwritten signature
 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS ARGENTINAS
 BUENOS AIRES

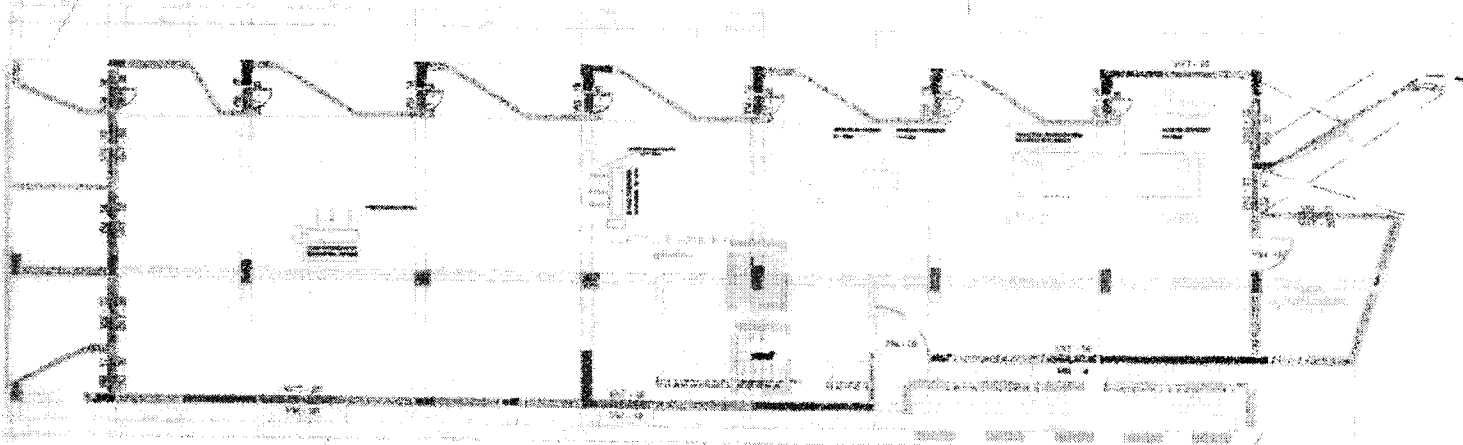

ING. ZORRITOS
 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS ARGENTINAS
 BUENOS AIRES

267



MEMORAMIENTO DPA ACAPULCO
 AREA / SECTOR: MEMORAMIENTO DPA ACAPULCO
 ESTRUCTURA / ELEMENTO: FALSO CEMENTO, CONCRETO Fc=200 kg/cm² 25% p.m (PARA ZARATAS) PLANO DE REF.: E-46
 RESISTENCIA (f'c): 18 MCMEN 15% PM SUMO: ... TIPO CEMENTO: V VOLUMEN:

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	CHECK LIST DE LIBERACION DE ESTRUCTURAS		OBSERVACION
		SI	NO	
1	Limpieza de la estructura			N/A
2	Topografía, cotas de fondo y nivel de concreto	V		N/A
3	Ejes y dimensiones	V		N/A
4	Verificación de la armadura según check list			N/A
5	Verificación del encofrado según check list	V		
6	Junta frías			N/A
7	HSS, tendido de cables de agua y desagüe, ubicación de puentes de caliza y pases para tuberías.			N/A
8	HES: todos los pines (interruptores, tomacorrientes, TV, teléfono e intercomunicadores)			N/A
9	Pernos de Anclaje y embudidos			N/A
10	Verificación del Procedimiento de seguridad de acuerdo al estándar	V		
11	Otros:			

VACIADO Y MUESTREO DEL CONCRETO


Nº	Tempo	Resaca	As Caida	Hor de Caida	Hora Inicio	Hora Término	T (°C)	Gravim	Vol Concreto	Carga Horizontal	Seg. Horizontal	Nº Puntos
	00:25:30	FALSO CEMENTO (ZARATAS EJE 2-A, B, C)			10:17	12:31	28	-				

COMENTARIOS

ELABORADO POR: *[Signature]* REVISADO POR: *[Signature]* APROBADO POR: *[Signature]*

Nombre: Freddy González López Nombre: Ing Edgar Regalado Obitas Nombre: Rubén Borsari Terribiti

Fecha: 13/07/2019 Fecha: 13/07/2019 Fecha: 13/07/2019





**REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
LIBERACION DE VACIADO DE CONCRETO**

CZ.SGC.PC.03-F1
Rev: _____
Fecha: _____
Página: _____ de _____

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO
CLIENTE: FONDEPES
PLANO REF.: E-46 **CÓD. PLS.:** CZ-SGC-LUC/0M
DESCRIPCION DEL TRABAJO: FALSO CIMIENTO, CONCRETO Fc=100 KG/CM2 +25% P.M (PARA ZAPATAS. EJE 2)

Nº CORRELATIVO: _____
FECHA: 13/07/2019
SECTOR: PTAR

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE COLOCACION DE ARMADURA

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpieza de armadura (Verificar si la armadura presenta corrosión)			N/A	
2	Diámetro Especificado: (f = 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" plg)			N/A	
3	Colocación de Armadura (Tolerancia ± 0 a 1 cm)			N/A	
4	Verificación de Estribos (cantidad y espaciamento)			N/A	
5	Verificación de Longitudes de Traslape (Tolerancia ± 0 a 1 cm)			N/A	
6	Colocación de separadores (metálicos / doble malla)			N/A	
7	Conformidad de recubrimiento (dados de concreto en Losas / ruedas de plástico en muros)			N/A	
8	Verificación de doblado según especificación (Gancho Estandar: 90-190)			N/A	
9	Soldadura de la armadura según Norma ANSI/AWS D1.4-92			N/A	

REponsable de Acero: _____ **Firma:** _____
Fecha de Inspección: _____




CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE ENCOFRADOS



TIPO DE ENCOFRADO
Madera Metálico Otros Especifique: _____
Nombre de Desmoldante: _____

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Verificación de trazo y niveles	✓			
2	Colocación de desmoldante / sellador (madera)	✓			
3	Limpieza de paneles y accesorios (planchas metálicas / netes de madera)	✓			
4	Conformidad de dimensiones (modulación) y accesorios (ensamblados, cuñas, etc.)	✓			
5	Verificación de niveles, verticalidad y horizontalidad de encofrado	✓			
6	Conformidad de recubrimientos (dados de concreto y/o separadores de plástico)			N/A	
7	Verificación de Contraflechas (de acuerdo a planos)			N/A	
8	Verificación de ochavas y/o biselas			N/A	
9	Verificación de insertos y embebidos			N/A	
10	Verificación de hermeticidad de encofrado (colocación de yeso en aristas)	✓			
11	Otros				

NOTA: _____


RESPONSABLE DE ENCOFRADO: _____ **Firma:** _____
Fecha de Inspección: _____



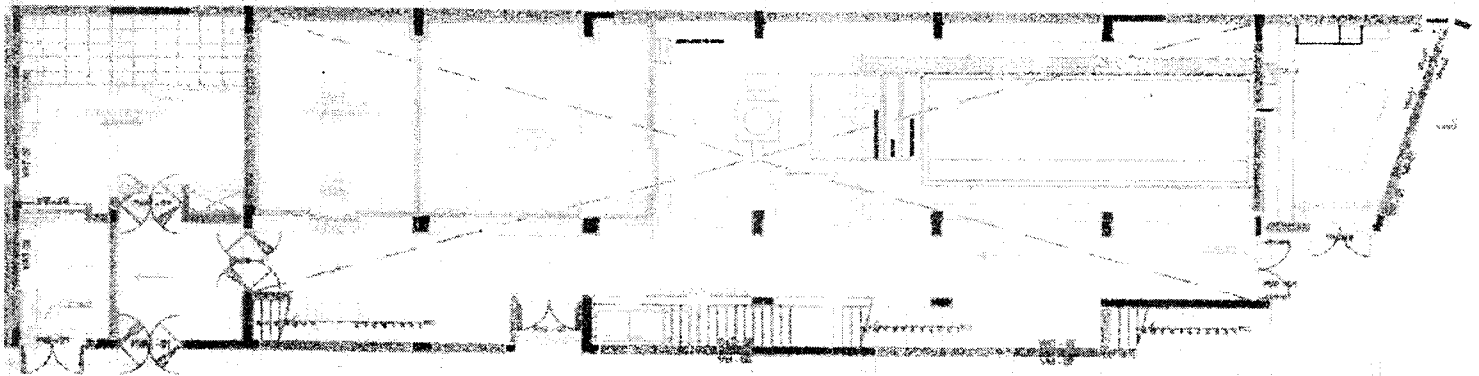
ING. ROBERTO BOSSA TORIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
AREA DE SUPERVISOR



[Handwritten signature]

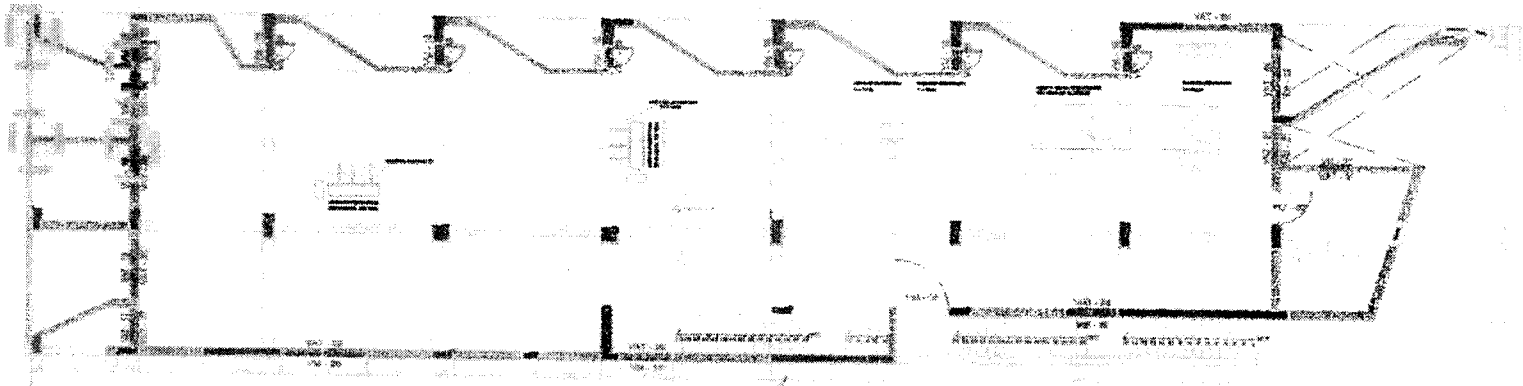COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS



COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS

264

AREA / SECTOR: MEDIANTE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL
 ESTRUCTURA / ELEMENTO: CONCRETO EN COLUMNAS - NIVEL 2, DETECTORES DE A3, A6, A7, B3, C1, D1
 RESISTENCIA (FC): 315 KG/CM2 SUPP: 5^o-6^o TIPO CEMENTO: V VOLUMEN:
 FECHA: 13/07/2019 PLANO DE REG: AR-17

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	CHECK LIST DE LIBERACION DE ESTRUCTURAS			OBSERVACION
		SI	NO	N/A	
1	limpieza de la estructura	V			
2	espiguable, cimas de hierro y juntas de concreto	V			
3	Ejes y dimensiones	V			
4	Verificación de la armadura según check list	V			
5	Verificación del encofrado según check list	V			
6	humar fierro			N/A	
7	HCS: remando de codos de acero y chequeo, ubicación de puntos de salida y jassa para tuberías.			N/A	
8	HFE: todos los puntos (intersecciones, torneros ranuras, IV, Edificios e intersecciones idóneas)			N/A	
9	Pernos de Anclaje y combadidos			N/A	
10	Verificación del Proyectivo de seguridad del acedero al estaciona	V			
11	(otros)				


VACIADO Y MUESTREO DEL CONCRETO

Quem	Etiqueta	Estado	Refrigeración	Envase	Temperatura (°C)	Quem	Volumen	Grado de Madurez	Resistencia (MPa)
315	CONCRETO			0-10	12.50	200	5 ^o		6

COMENTARIOS

LABORADO POR: *[Firma]* REVISADO POR: *[Firma]* APROBADO POR: *[Firma]*

Fecha: 13/07/2019 Fecha: 13/07/2019 Fecha: 13/07/2019



NOMBRE DEL PROYECTO:

CLIENTE:

PLANO REF: AR-17

COD. PLS:

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

CONCRETO EN COLUMNETAS - NIVEL 2: REFLECTORES DEB. A 2. B3 : 0'3 : B2

CHECK LIST DE VERIFICACION DE COLOCACION DE ARMADURA

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Longitud de armadura (Verificar si la armadura cumple con el ancho)	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	Distancia Espaciado: ($L = 3d^2, 12d, 9d^2, 7d^2$ (m))	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	Cobertura de Armadura (Distancia a 0 a 1 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	Verificación de Estirido (anchura y espaciado)	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Verificación de Longitudes de Tramos (Tolerancia ± 0 a 1 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	Colocación de separadores (transversales / sobre rejilla)			<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Continuidad de recubrimiento (estado de concreto en juntas / juntas de abstracción en fresco)	<input checked="" type="checkbox"/>			
8	Verificación de altura de según especificación (Código de barras: 90 180)	<input checked="" type="checkbox"/>			
9	Substrato de la armadura según Norma AHS/AVS 01 4 92			<input checked="" type="checkbox"/>	
10	Otros				

NOTA:

RESPONSABLE DE ACERO:

Firma:

Fecha de Inspección:

CHECK LIST DE VERIFICACION DE ENCOFRADOS



ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Verificación de Uñas y moldes	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	Coligación de geometría / soldador (anchura)	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	Alargado de juntas, y accesorios (quantos, refuerzos, juntas de medida)	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	Continuidad de superficies (producción y acciones (almacenamiento, curado, etc.))	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Verificación de juntas, soldaduras y horizontales por estratificación	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	Continuidad de encoframientos (estado de concreto y/o separadores de láminas)	<input checked="" type="checkbox"/>			
7	Verificación de Contrachape (de acuerdo a normas)			<input checked="" type="checkbox"/>	
8	Verificación de refuerzos por listones			<input checked="" type="checkbox"/>	
9	Verificación de juntas y encofrados	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
10	Verificación de homogeneidad de curado (comparación de agua en ensayos)	<input checked="" type="checkbox"/>			
11	Otros				



NOTA:

RESPONSABLE DE ENCOFRADO:

Firma:



Fecha de Inspección:




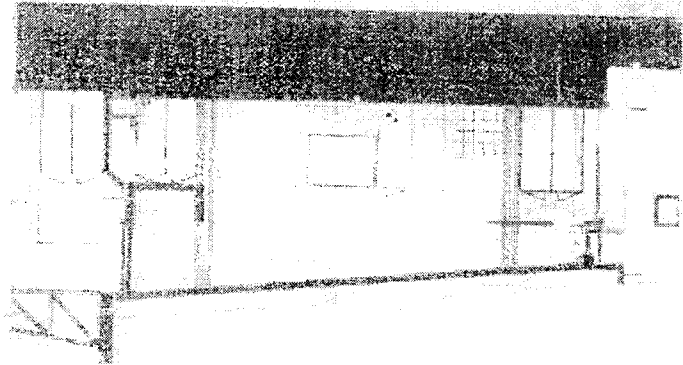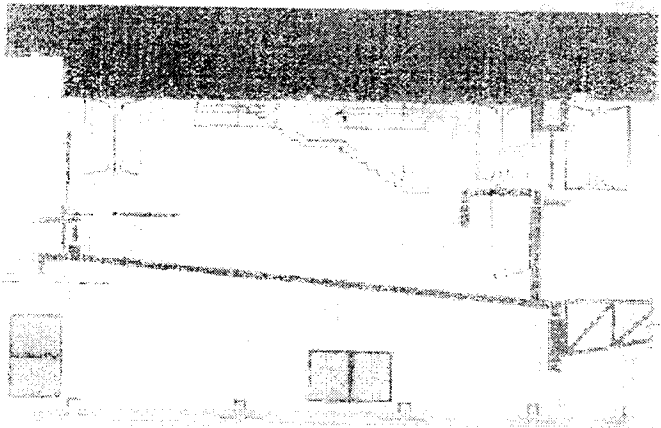 JIM. HUBER BOSSUS TOMATTI
 COORDINADOR SUPERVISOR TURBES
 JEFE DE SUPERVISION



MR. ROBERT W. ...
CONSULTING ENGINEER

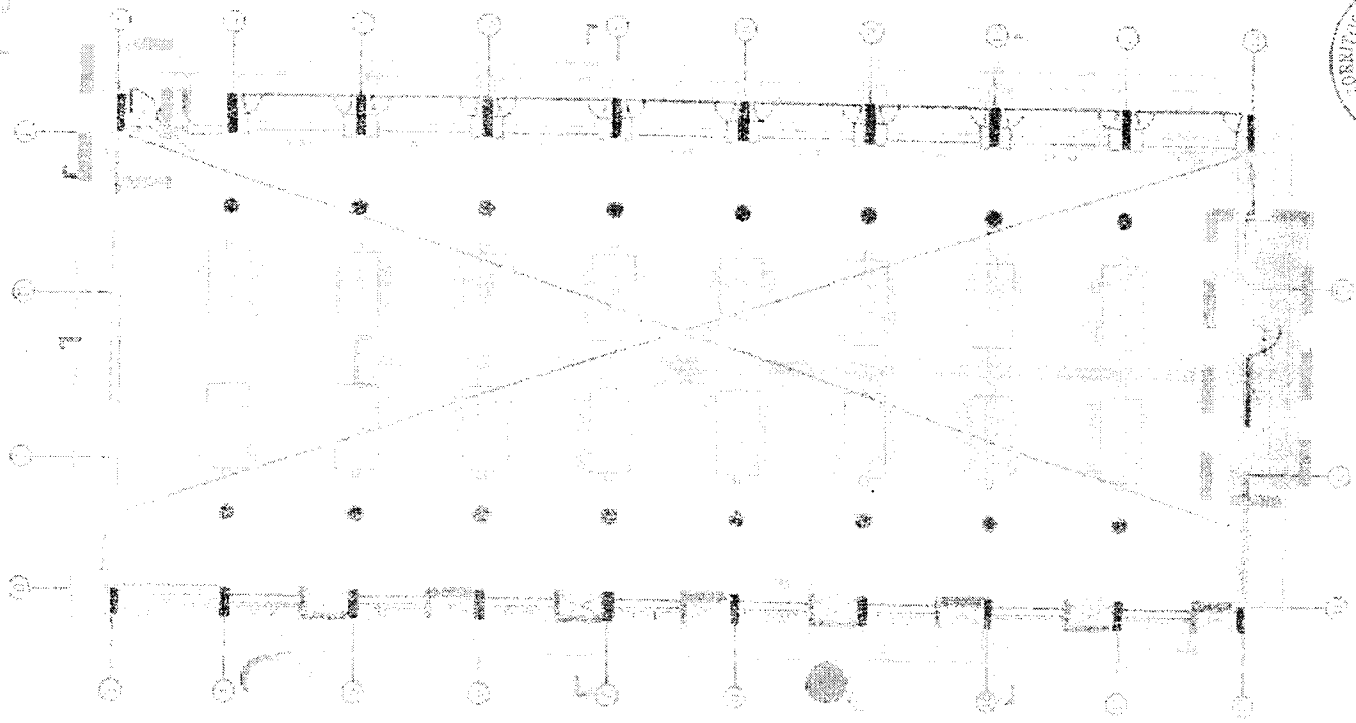
Handwritten notes and signatures in the center of the page.





[Handwritten signature]

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 C/O. *[Handwritten name]*
 MANAGERIA EJECUTIVA
 Asesoría en Pesca

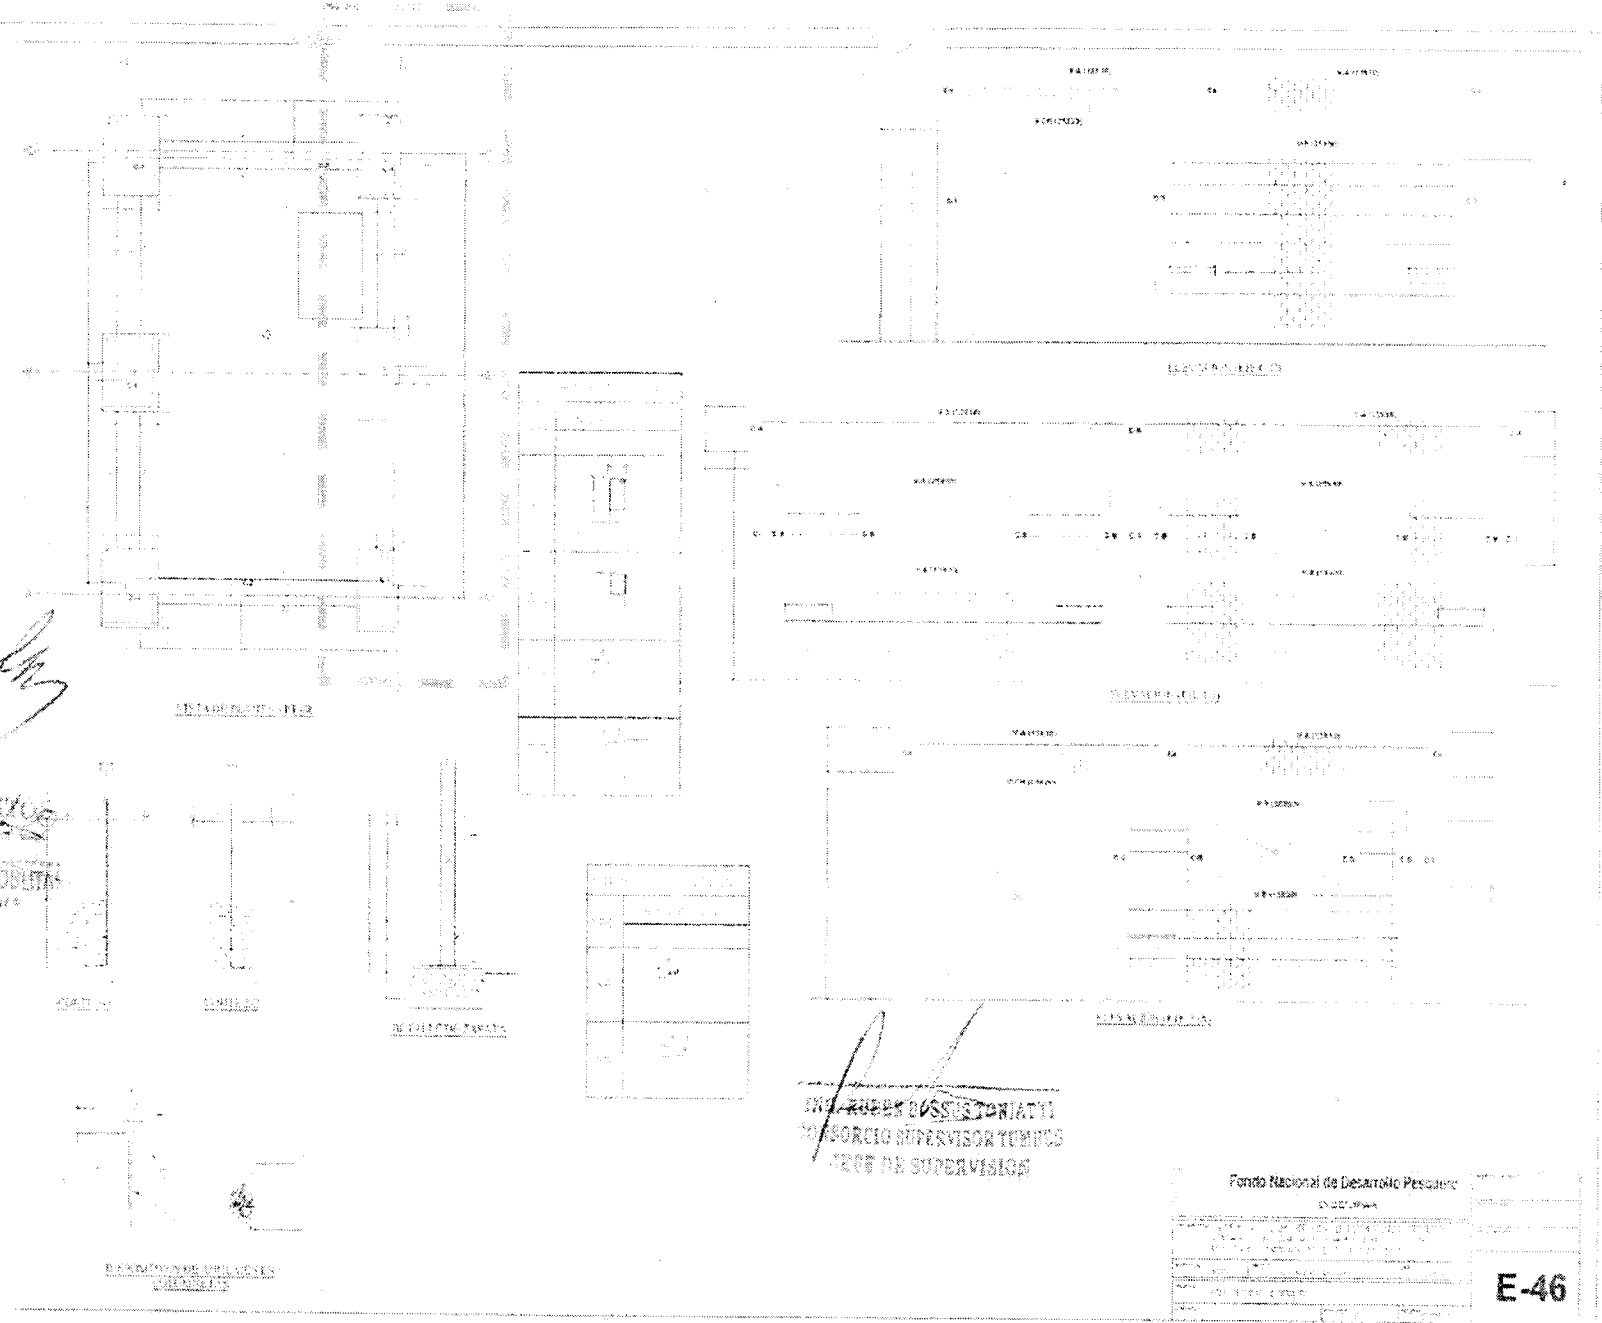

NO. 1	...
NO. 2	...
NO. 3	...
NO. 4	...
NO. 5	...

[Handwritten Signature]
 ING. ROBERTO SASSI TORIATI
 INGENIERO SUPERVISOR TECNICO
 AREA DE SUPERVISOR

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

SECRETARIA

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO
 DEPARTAMENTO DE MANEJO PESQUERO

E-46



REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD

TRANSPORTE DE LOSAS PREFABRICADAS

Clasificación: 1
Revisión: 1
Fecha: 15/07/2019
Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DIA DE ACAPULCO

CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDOPES

PLANO REF.: OM-03 **TAMANO:** 32-33 **SECTOR:** CABEZO **Nº CORRELATIVO:** **FECHA:** 15/07/2019

UBICACION DEL ELEMENTO PREFABRICADO: IZAJE Y TRANSPORTE DE LOSAS(S) PREFABRICADAS DESDE PATIO DE FABRICACION HASTA EL CABEZO

PUENTE CABEZO

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Verificación de las condiciones óptimas del elemento prefabricado (*)	X			
2	Verificación rigidez de los rellenos de izaje (*)	X			
3	Verificación de la grúa de 30 ton. en buen estado (*)	X			
4	Se verifica que durante los trabajos se utiliza ascensoritas y rayos	X			
5	Autorización de izaje del elemento prefabricado (*)	X			
Seg. Análisis de Trabajo Seguro (ATS)					
		X			


(*) Realizada por el Cliente y/o la Supervisión

DATOS DE CAMPO:


- Zona de acopio en buenas condiciones
- Fecha de izaje del elemento prefabricado
- Cantidad de losas prefabricadas

PATIO DE FABRICACION (X)
15/07/2019
04 END

ESQUEMA SI NO
ADJUNTO:

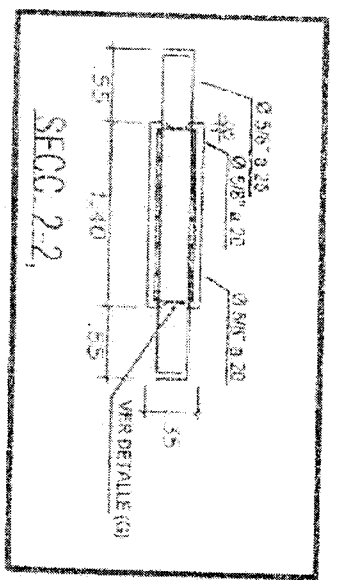

LOSA SECC 2-2
VISTA DEL ELEMENTO PREFABRICADO

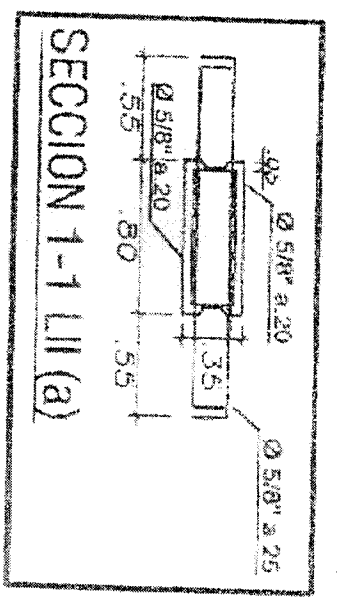

LOSA SECC 1-1
VISTA DEL ELEMENTO PREFABRICADO

OBSERVACIONES



ELABORADO POR: *[Signature]* **APROBADO POR:** *[Signature]*

Nombre: FREDY GONZALEZ GONZ **Cargo:** ING. RESIDENTE

Nombre: EDGAR ECALADO ORTIZ **Cargo:** ING. SUPERVISOR

Fecha: 15/07/2019 **Fecha:** 15/07/2019



REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD

MONTAJE DE LOSAS PREFABRICADAS

Revisión: 1
Fecha: 15/07/19
Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PSA DE ACAPULCO
CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PEQUEÑO - FONDEPE
PLANO REF.: OM-03 **TRAMO:** 32-33 **SECTOR:** CABEZO **Nº CORRELATIVO:** 15/07/2019

DESCRIPCION DEL TRABAJO: COLOCACION DE LOSAS) PREFABRICADAS EN EL CABEZO.

UBICACION DEL ELEMENTO PREFABRICADO
FUENTE CABEZO

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Revisión de planos y especificaciones	X			
2	Verificación topográfica de la cota y de la posición final del elemento prefabricado	X			
3	Autorización de montaje del elemento prefabricado (*)	X			
4	Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	X			

(*) autorizado por el Cliente Vía la Supervisión

DATOS DE CAMPO:

- Elementos de trazo en buenos condiciones **Y**
- Zona de montaje del elemento prefabricado en buenas condiciones **Y**


- ESQUEMA ADJUNTO: SI X NO

DIRECCION A MAR DIRECCION A LA COSTA

VISTA EN PLANTA DEL MONTAJE DE LA LOSA

OBSERVACIONES

ELABORADO POR: Nombre: <i>[Firma]</i>	REVISADO POR: Nombre: <i>[Firma]</i>	APROBADO POR: Nombre: <i>[Firma]</i>
Cargo: INCH. RESIDENTE	Cargo: INCH. RESIDENTE	Cargo: INCH. SUPERVISOR
Nombre: RODRIGUEZ SOLIZALEZ LOPEZ Fecha: 15/07/2019	Nombre: RODRIGUEZ SOLIZALEZ LOPEZ Fecha: 15/07/2019	Nombre: RUBEN MOSSAUS TOMIATTI Fecha: 15/07/2019





REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD

CZ.SGC.PC.03-F3

Rev: 1
FECHA: 15-07-2019
Página: 1 de 1

INSPECCIÓN DE TARRAJEOS Y DERRAMES

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DPA A CAPILADO
CLIENTE: SONDOPES
PLANO REF.: AR-15 CDD. FLS: CZ-SGC-LT-A-D
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: TARRAJEO DE COLUMNA EJE 3º : NIVEL I

Nº CORRELATIVO:
FECHA: 15-07-2019
AREA: TAREAS PREVIAS

Verificaciones Generales:

Limpieza V

Regosidad V

Humedad V


VERIFICACIONES DE ELEMENTOS AL TIPO DE MATERIAL EN LOS PUNOS DE EMPLEO DE LOS MATERIALES EN LOS PUNOS DE EMPLEO

Ambiente

	Alineamiento de COLUMNA			Verticalidad de COLUMNA			Uniformidad de COLUMNA			Contrazocalo c/ cemento pulido			Encuentro cielo raso-muro tipo Media Caña			Verticalidad de derrame			Contrazocalo sanitario			Dimensiones de vanos			Cialoroso			
	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	
ACCESO TAREAS PREVIAS DESDE FRIGOS EJE 3º NIVEL I	V			V			V																					

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Freddy González López FECHA: 15-07-2019	Nombre: Ing. Edgar Regalado Obitas FECHA: 15-07-2019	Nombre: Ing. Ruben Boscus Toniso FECHA: 15-07-2019



257



**CONSORCIO
ZORRITOS**

**REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD**

INSTALACION DE CERAMICOS Y PORCELANATOS

CZ/SGC/PC/03-F1

Revisión: 01

Fecha: 15/07/2019

Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO:

RENOVIAMIENTO DE LA CALLE

HONDURES

Nº CORRELATIVO:

Fecha: 15/07/2019

SECURE: DESINFECCION

PLANOS DE REFERENCIA: AR-14

DESCRIPCION DEL TRABAJO: PISO DE PORCELANADO 600 X 600 ANTIDESLEZANTE DE ALTO TRAFICO


ALBIENTE: 55 HIJ VARONES : 55 HIJ DAMAS : DUCHAS VARONES



CHECK LIST DE VERIFICACION

ITEM	DESCRIPCION DEL TRABAJO	ESTADO	
		S	NO
1	ABRIL GENERAL DEL SECTOR DE TRABAJO	V	NA
2	VERIFICACION NIVELACION DE PISO	V	
3	TRAZADOS	V	
4	TIPO Y CALIDAD DE LOS MATERIALES	V	
5	PREPARACION DE ANEJO	V	
6	ORUGACION DE PORCELANATO	V	
7	VERIFICACION DE TRAZADO		
8	OTROS		

COMENTARIOS:



ELABORADO POR: Fecha: Control Calidad Nombre: Freddy Contreras	APROBADO: Fecha: 3 Ing Residente Nombre: ENOAB RECALADO GARCIA	SUPERVISION: Fecha: Ing Supervision Nombre: RUBEN ENRIQUE TORALTI
---	---	--



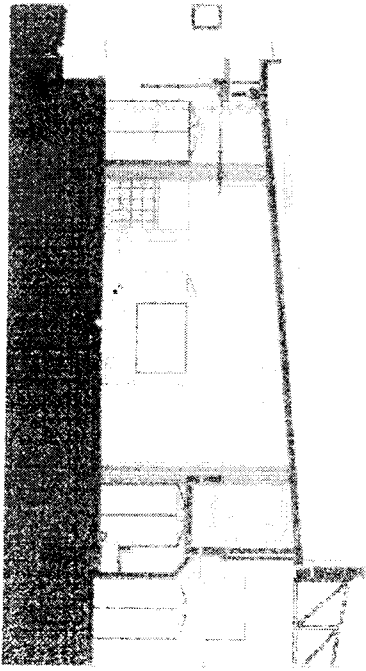

Handwritten signature

Handwritten signature and notes

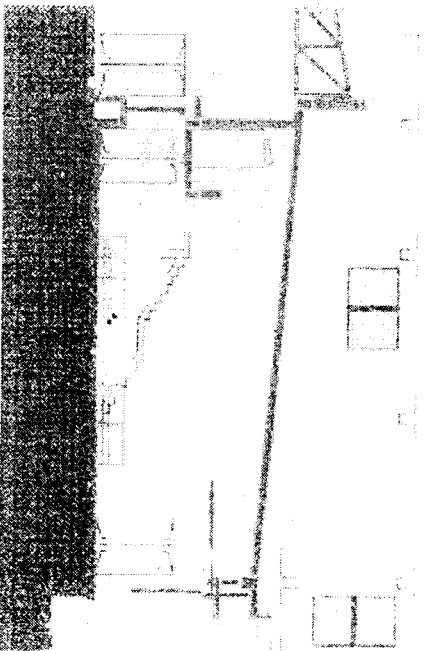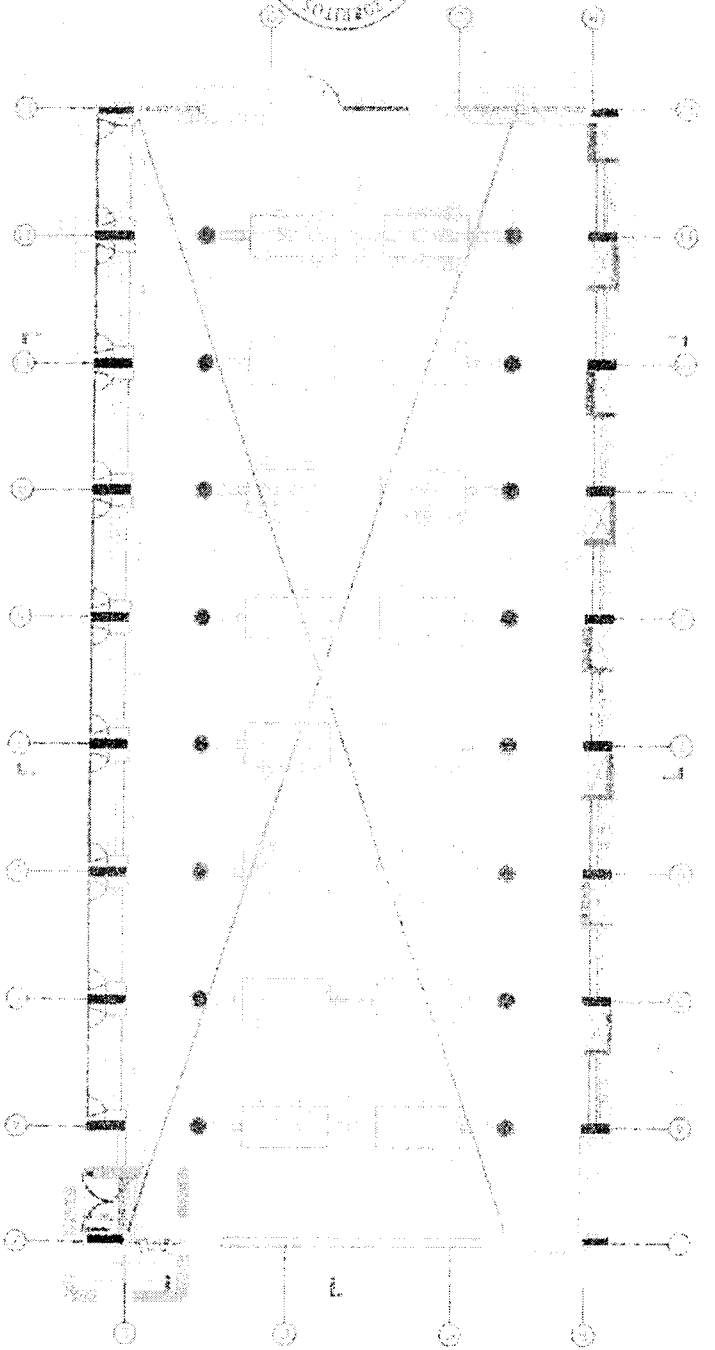

Vertical text: 'SENA SA' and other illegible text.



REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD

CZ.SGC.PC.03-P1

INSPECCIÓN DE TARRAJEOS Y DERRAMES

Rev: 1

FECHA: 16-07-2019

Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: REFORZAMIENTO DPA ACAPULCO

Nº CORRELATIVO:

CLIENTE: FONDEFES

FECHA: 16-07-2019

PLANO REF: AR-14 COD. PLS

AREA: DESINFECCION

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: DERRAME EN VENTANAS TRAMO: G @ H

Verificaciones Generales:

Limpieza


Rugosidad

Humedad

EN AMBIENTES DE ALTO RIESGO EN LAS OPERACIONES DE TRABAJO DE LOS SPAS SE DEBE PROCEDER AL DESINFECCIONADO

Ambiente	Alineamiento de muros			Verticalidad de muros			Uniformidad de muros			Contrazocalo c/ cemento pulido			Encuentro cielo raso-muro tipo Media Jaha			Verticalidad de derrame			Alineamiento de VIGAS			Verticalidad de VIGAS			Uniformidad de VIGAS			
	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	
PASADISO DESINFECCION																												

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Firma:

Firma:

Firma:

Nombre: Freddy González López

Nombre: Ing. Edgar Fegaleado Goltas

Nombre: Ing. Ruben Bossus Toniatti

FECHA: 16-07-2019

FECHA: 16-07-2019

FECHA: 16-07-2019

PLANTA EJECUTIVA DE LA VIGILANCIA
FRENTE ADMINISTRATIVO

BANDO DE
VIGILANCIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
IN. ASESORAMIENTO
SERVICIO DE ASESORIA
Y SUPERVISIÓN

[Handwritten signature]
IN. ASESORAMIENTO
SERVICIO DE ASESORIA
Y SUPERVISIÓN



IS-05



**CONSORCIO
TORRETTOS**

REGISTRO

CONTROL DE CALIDAD

REPORTE DE EXCAVACION

CL-SGC.P.C.03-F1

Revisión: 01

Fecha: 16/07/19

Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO

CLIENTE: FONDEPES

Nº CORRELATIVO:

PLANO REF.: PRENTE: PATIO MANIOBRA SECTOR:

FECHA INICIO:

AREA O TORRE:

DESCRIPCION DEL TRABAJO: EXCAVACION PARA TUBERIA AGUAS PLUVIALES DESINFECTACION @ TAREAS PREVIAS

TIPO DE EXCAVACION:

Excavación Masiva

Excavación Localizada

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Revisión de planos y especificaciones	X			
2	Autorización de Excavación (*)	X			
3	Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	X			
4	Verificación Topográfica	X			
5	Ubicación de Interferencias (**)	X			
6	Perfilado de taludes	X			
7	Superexcavación		X		
8	Compactación del fondo de excavación (3)		X		
9	Conformidad de niveles	X			

(*) Autorizado por el Cliente y/o la Supervisión

(**) La excavación en zona de interferencias debe realizarse en forma manual y de acuerdo a los Planos As Built exist.

DATOS DE CAMPO:

- Nivel de terreno (Precio a Ercov.): 1.22

- Nivel final de Excavación (Según planos): 3.01 2.85 2.67

- Nivel final de Excavación (Según campo): 4.03 2.85 2.67

- % Compact. Fondo de Excav. (3):

(% Compact. Espec. = 95%)

1.22

3.01

2.85

1.22

2.85

2.67

1.57

PLANO Y ESQUEMA SI NO

ADJUNTI:

OBSERVACIONES


LAS EXCAVACIONES PARA LAS TUBERIAS DE DIFINALE SON VARIABLES DE ACUERDO A LA PENDIENTE DE LAS TUBERIAS POR TAL MOTIVO LAS COTAS DE EXCAVACION VARIAN POR CADA TRAMO EXCAVADO.
SE ESTA CONSIDERANDO LA COTA DE LLEGADA DESDE LA MONTANTE HASTA LA COTA DE SALIDA (BUZON)
UBICADO EN EL DRENAL DEL PATIO DE MANIOBRAS.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:


APROBADO POR:

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Cargo: CAUBADO Nombre: FREDY GONZALEZ LOPEZ Fecha: 16/07/2019	Cargo: ING. RESIDENTE Nombre: EDGAR REGALADO OBLITAS Fecha: 16/07/2019	Cargo: ING. SUPERVISOR Nombre: RUBEN BOSQUE TORIANTTI Fecha: 16/07/2019





AR-01

INSTRUMENTAL DE
CONCORDIA SUPERVISORIAL
DE LA DE SUPERVISORIAL

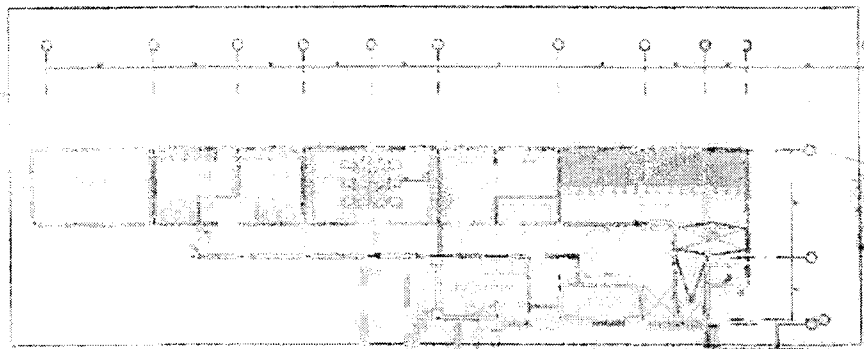

INSTRUMENTAL DE
 CONCORDIA SUPERVISORIAL
 DE LA DE SUPERVISORIAL
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

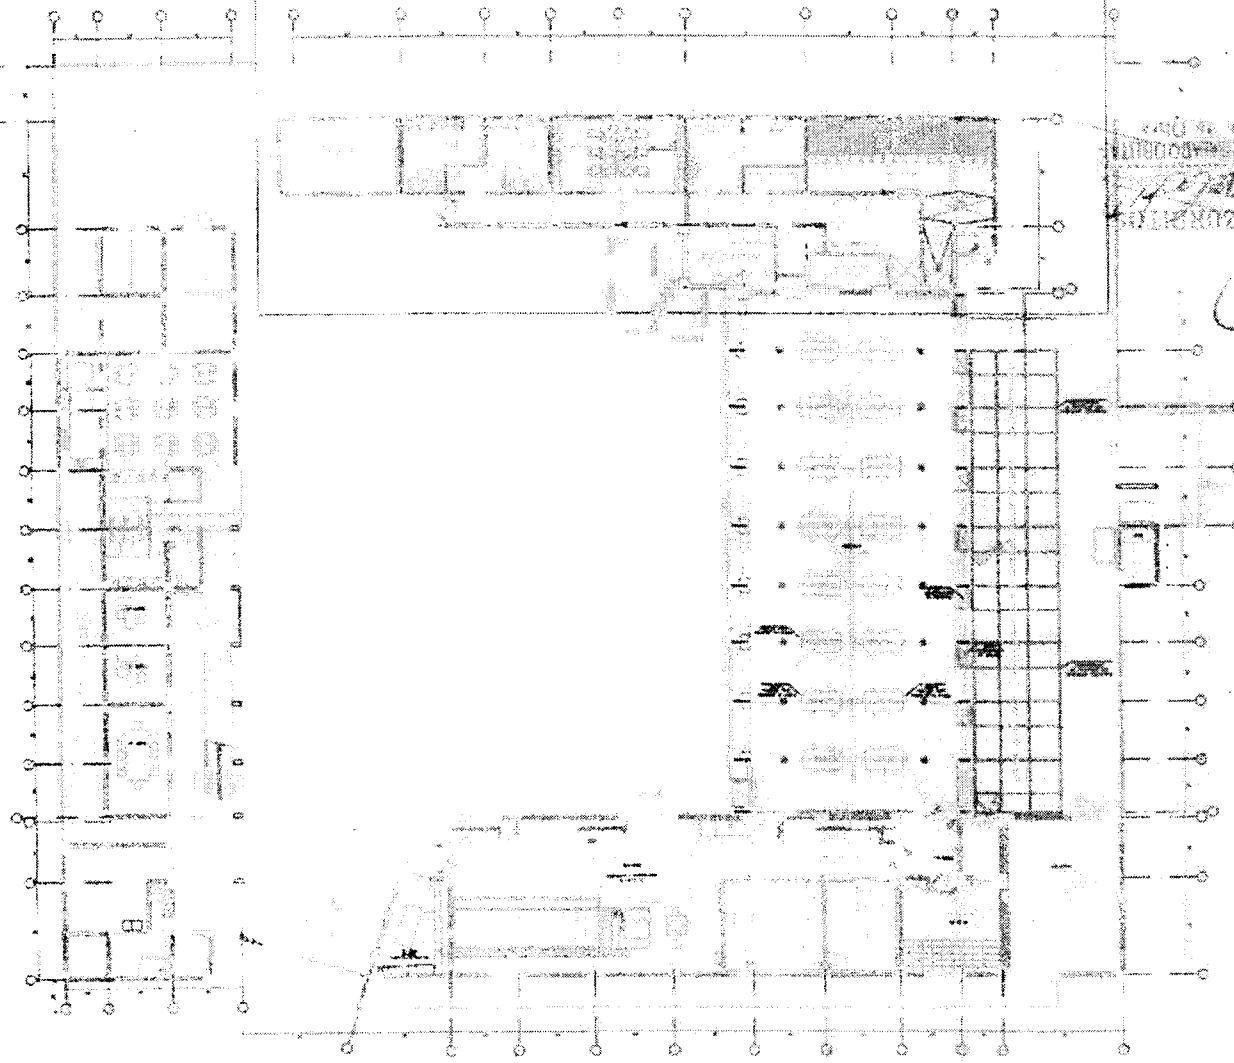



REGISTRO CONTROL DE CALIDAD PRUEBA HIDRAULICA

CZAG-PC-02-11
Revisión: 01
Fecha: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: HEDERAMENTO EN AEROSOL
CLIENTE: COMESTRES
PLANOS DE REFERENCIA: TS-05 (Adicional 03)

Nº CORRELATIVO:

FECHA: 17/07/2019
SECTOR:

PRUEBA HIDRAULICA EN BAÑO DE VIGILANCIA (AGUA FRIA & CALIENTE)

AREA: ADMINISTRACION

1. PARAMETROS DE LA PRUEBA:

PRESION DE MUESTRA: 150 PSI
MECININ: 01.30 Minut

MEDIO DE PRUEBA:


Bomba de Manu Valde Hidraulico

2. PARAMETROS DE CONTROL:


DES	TIPO	VALOR	UNIDAD	PRESENCIA	TIPO DE PRUEBA	FECHA	TIEMPO	OBSERVACIONES
Baño vigilante	17"	PROC C 10	4.50	0	FRIO	17-07	16:28	FRIO & CALIENTE

Indicador

PRESION INICIAL

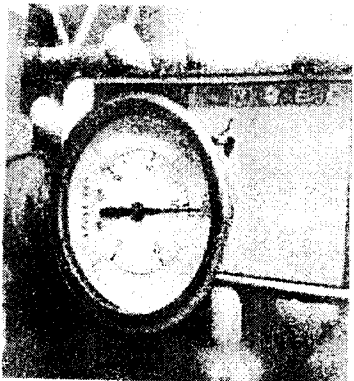

PRESION FINAL

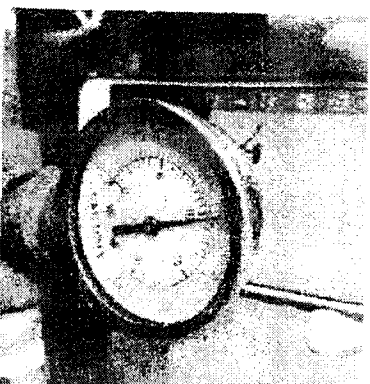

1. FALDOS EMPLEADOS:

SI:

NO:

2. VARIACION DE NIVEL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA:

SI:

NO:

3. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

SI:

NO:


4. ESQUEMA ADMINISTRATIVO:



SI:

NO:

Prueba Incorrecta:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO:	SUPERVISOR:
Fecha Correcta: <input checked="" type="checkbox"/> Fecha Incorrecta: <input type="checkbox"/>	Fecha Correcta: <input checked="" type="checkbox"/> Fecha Incorrecta: <input type="checkbox"/>	Fecha Correcta: <input checked="" type="checkbox"/> Fecha Incorrecta: <input type="checkbox"/>	Fecha Correcta: <input checked="" type="checkbox"/> Fecha Incorrecta: <input type="checkbox"/>
Cargo: Control Calidad Nombre: Tadeo Gonzalez Fecha: 17/07/2019	Cargo: Ing. Asistente de Operación Nombre: Daniel Oros Ayala Fecha: 17/07/2019	Cargo: Ing. Responsable Nombre: Edgar Hernandez Fecha: 17/07/2019	Cargo: Ing. Supervisor Nombre: Nelson Bernal Fecha: 17/07/2019





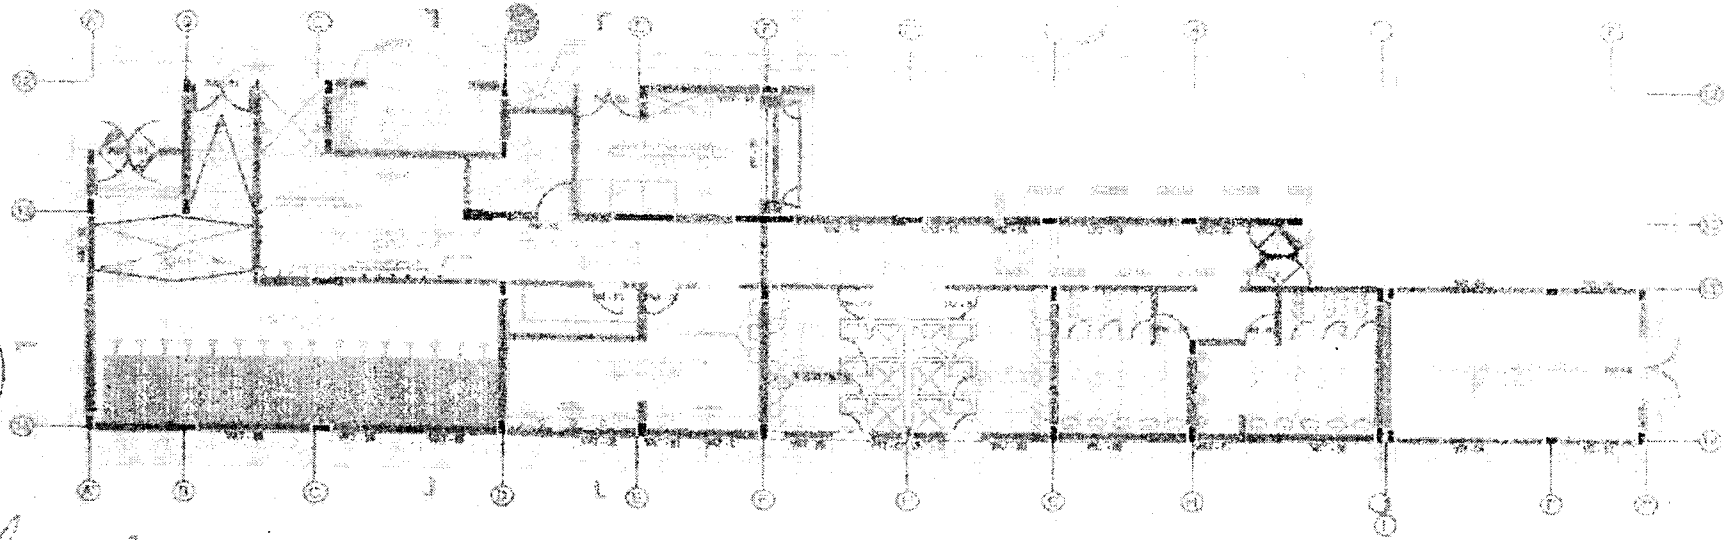

Angelo



PROGETTO ARCHITETTICO
1900
ING. GIULIO GONZALETTI
Via ...

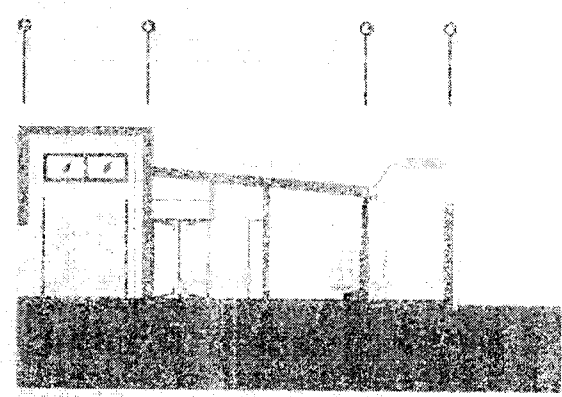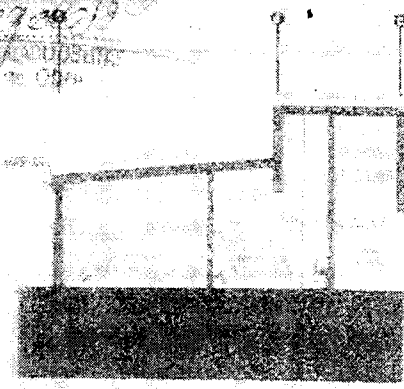

ING. GIULIO GONZALETTI
CONSIGLIO SUPERVISOR TUNISI
RUDE DE SUPERVISION



REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

CZ SSC.PC.21-F1
Revisión: 01
Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: MEDICAMENTO DPA ACAPULCO

CLIENTE: FONDOS

Nº CORRELATIVO: 17/07/2019

PLANOS DE REFERENCIA: IS-11 (ADICIONAL DE OBRA III)

FECHA: 17/07/2019
SECTOR: FRENTE


AREA: DRENAJE

1. PARAMETROS DE LA PRUEBA:

PRESSION DE PRUEBA:	MEDIO AMBIENTE	MEDIO DE PRUEBA:	AGUA
REGIMEN:	2 HORAS		

1. PARAMETROS DE CONTROL:

UBICACION	DIRECCION	MATERIAL	CONEXION (m)	1º DE ACCESORIOS	INICIO HORA	TERMINO HORA	FECHA	OBSERVACIONES
A-B	1"	PVC	7.00		13:30	17/07/19	15:30	17/07/19

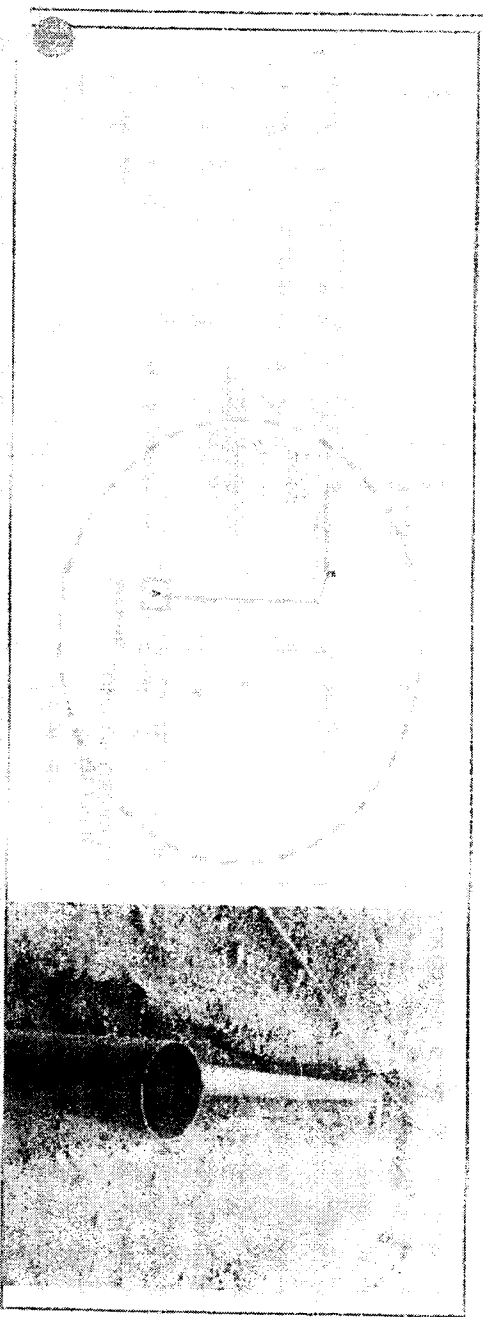

FUGA EN LOS EMPALMES:	SI	NO:	N/A
SATISFACCION DE NIVEL DE LOS ELEMENTOS DE OBRERA:	SI	NO:	V
PENDIENTES CONCRETAS:	SI	NO:	V

3. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

Prueba Correcta: V

Prueba Incorrecta:

ELABORADO POR: Firma: <i>[Signature]</i>	REVISADO POR: Firma: <i>[Signature]</i>	APROBADO: Firma: <i>[Signature]</i>	SUPERVISOR: Firma: <i>[Signature]</i>
<p>Carpet Control Calidad</p> <p>Control de Obra</p> <p>Fecha: 17/07/2019</p>	<p>Carpet Control Calidad</p> <p>Control de Obra</p> <p>Fecha: 17/07/2019</p>	<p>Carpet Control Calidad</p> <p>Control de Obra</p> <p>Fecha: 17/07/2019</p>	<p>Carpet Control Calidad</p> <p>Control de Obra</p> <p>Fecha: 17/07/2019</p>





REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
INSPECCION DE VALORO DE CONSTRUCCION

FORMA: 1 (A)
Escala: 1:1
Fecha: 17/07/2019

CLIENTE:
CONSORCIO ZONARIOS

PROYECTO:
MEDIANTE DPA ACERCA DE
FONDERES

FECHA:
17/07/2019

CLIENTE:
CONSORCIO ZONARIOS

CON PLIEGOS

CON PLIEGOS

FECHA:
17/07/2019

ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DEL TRABAJADOR

CON PLIEGOS

CON PLIEGOS

FECHA:
17/07/2019

ADMINISTRACION


ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Inspección de la obra (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
2	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
3	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
4	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
5	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
6	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
7	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
8	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
9	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
10	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
2	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
3	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
4	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
5	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
6	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
7	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
8	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
9	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
10	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
2	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
3	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
4	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
5	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
6	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
7	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
8	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
9	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	
10	Verificar el tipo de suelo (verificar si se encuentran los planos)			N/A	

RESPONSABLE DE EJECUCION:
Fecha de Inspección:

RESPONSABLE DE CONTROL:
Fecha de Inspección:



ING. ROBERTO ESCOBAR GONZALEZ
CONSORCIO ZONARIOS S DE RL
AREA DE SUPERVISION

ING. ROBERTO ESCOBAR GONZALEZ
CONSORCIO ZONARIOS S DE RL
AREA DE SUPERVISION

CONSEJO
MAYOR

CONTROL DE CALIDAD
LIBERACION DE SACADO DE CONCRETO

BOV: 02 SOL R.03 51
FECHA: 07/07/2015
PÁGINA: 1 de 1

AREA / SECTOR: **DEPARTAMENTO DIA ACOMULADO**

FECHA DE ELABORACION: **FALSO PISO** AREA DE: **DOMINIO VIGILANCIA SUB ESTACION**

FECHA: **07/07/2015**

REVISIONES (00): **LIBERACION** TIPO DE EVENTO: **V** VALOR EN: **PLANO DE ETC.** ANO: **12**


ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OPERACION
1	Inspección de la estructura	V			
2	Inspección de la forma de trabajo y estado de concreto	V			
3	Medición y liberación	V			
4	Verificación de la liberación de concreto			N/A	
5	Verificación de los datos de liberación de concreto	V			
6	Inspección de la liberación de concreto			N/A	
7	Inspección de la liberación de concreto			N/A	
8	Inspección de la liberación de concreto			N/A	
9	Inspección de la liberación de concreto			N/A	
10	Inspección de la liberación de concreto	V			
11	Inspección de la liberación de concreto				


VACIADO Y MUESTREO DEL CONCRETO

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OPERACION
1	Inspección de la liberación de concreto				
2	Inspección de la liberación de concreto				
3	Inspección de la liberación de concreto				
4	Inspección de la liberación de concreto				
5	Inspección de la liberación de concreto				
6	Inspección de la liberación de concreto				
7	Inspección de la liberación de concreto				
8	Inspección de la liberación de concreto				
9	Inspección de la liberación de concreto				
10	Inspección de la liberación de concreto				
11	Inspección de la liberación de concreto				

ELABORADO POR: *[Signature]* **REVISADO POR:** *[Signature]* **APROBADO POR:** *[Signature]*

FECHA: 07/07/2015 **FECHA:** 07/07/2015 **FECHA:** 07/07/2015



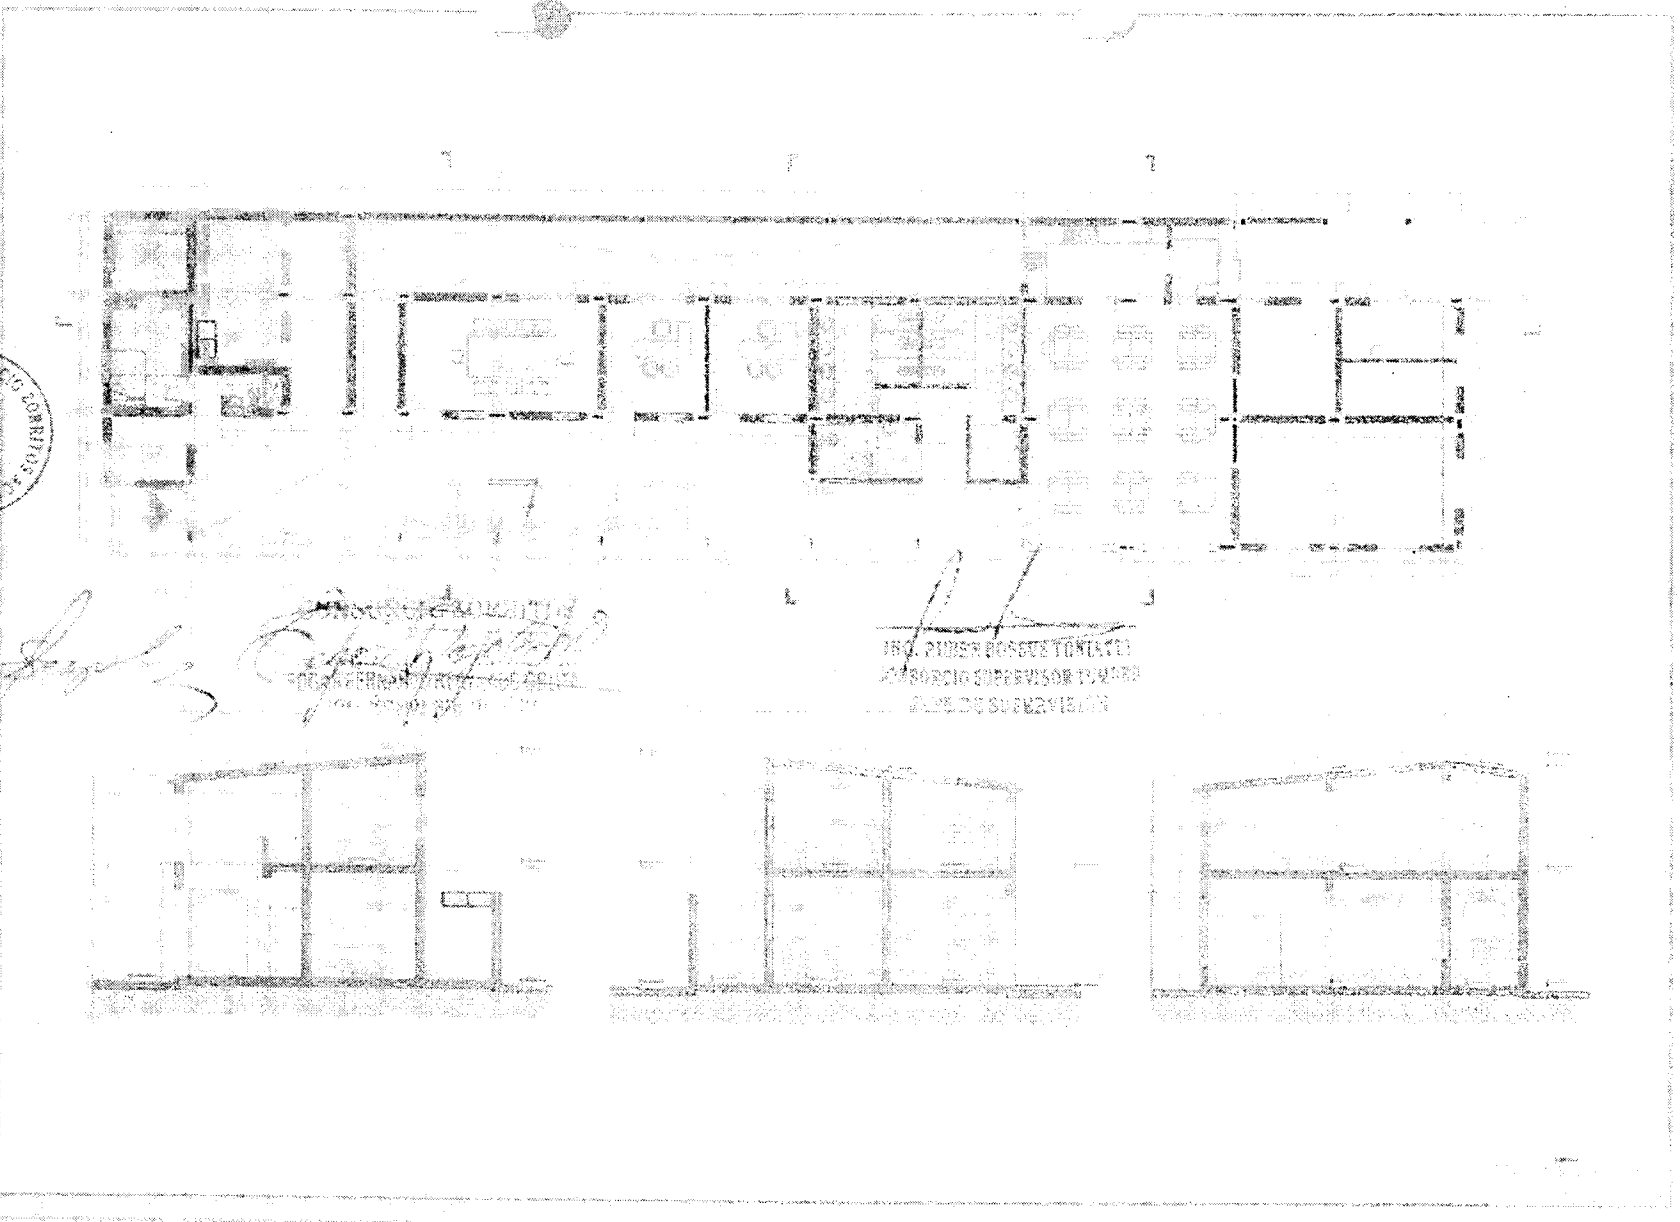


VERDE
 1920

[Handwritten signature]

INGENIERO EN ARQUITECTURA
 INGENIERO EN ELECTRICIDAD
 INGENIERO EN MECANICA

ING. FIDEL ROSQUE TOMACCI
 GEORCIO SUPERVISOR TWARD
 SUPERVISOR

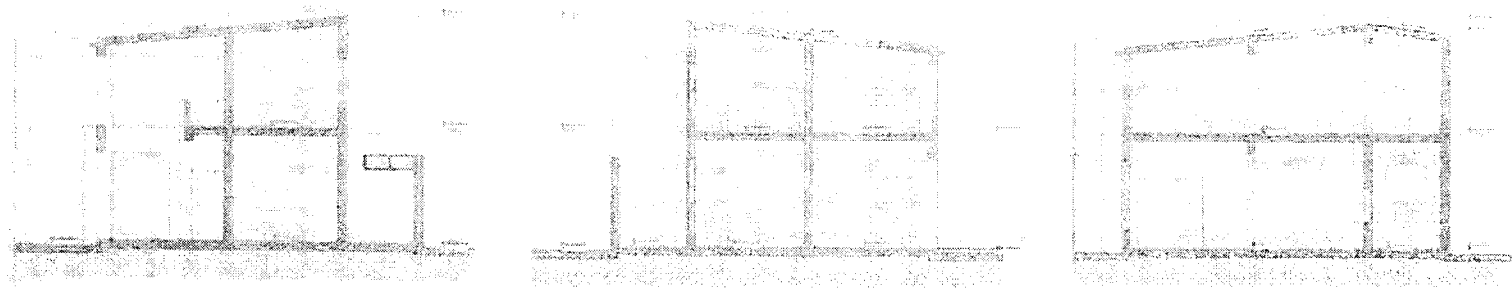



**CONSORCIO
ZORRITOS**

CONTROL DE CALIDAD
LIBERACION DE SACOS DE CONCRETO

FORMA: 1/00/2019
PÁGINA: 1 de 1

CLIENTE: **SESA** Cód. PLS: **07-000-0006** Nº OPERATIVO: **1/00/2019**

PLANO REF.: **SE-1A** PLAN PLD: **AREA DE CONTROL DE CALIDAD - K : ENTREGA DE LIBERABILIDAD** SECCION: **RESERVA**

DESCRIPCION DEL TRABAJO: **FORJADOS**

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	¿CUMPLE CON VERIFICACION DE CALIDAD?		OBSERVACION
		SI	NO	
1	Verificar la cantidad (medida) de la muestra presentada (cantidad)			N/A
2	Identificar (con el cliente) el tipo de muestra (cantidad)			N/A
3	Calificación de Amovible (Presencia o No Presencia)			N/A
4	Verificación de tamaño (cantidad y etiquetado)			N/A
5	Verificación de longitud de cables (Presencia o No Presencia)			N/A
6	Etiquetado de separación (medida / sobre medida)			N/A
7	Verificación de etiquetado (cantidad de unidades por saco) (cantidad de unidades)	<input checked="" type="checkbox"/>		N/A
8	Verificación de cantidad (cantidad etiquetada) (cantidad etiquetada)			N/A
9	Verificación de cantidad (cantidad etiquetada) (cantidad etiquetada)			N/A
10	Verificación de cantidad (cantidad etiquetada) (cantidad etiquetada)			N/A

NOTA:

SE FIRMÓ EN: **BOGOTÁ** FECHA: **10/01/2019**

FECHA DE INSPECCION: **10/01/2019** FECHA DE VERIFICACION DE CALIDAD:

ITEM	TIPO DE ENTREGA		DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	OBSERVACION
	Medida	Medida				
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verificación de cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verificación de etiquetado (cantidad)	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verificación de cantidad y etiquetado (cantidad etiquetada)	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verificación de etiquetado (cantidad) y etiquetado (cantidad)	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verificación de cantidad, etiquetado y longitud de cables	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verificación de etiquetado (cantidad)	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verificación de etiquetado (cantidad)			N/A
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verificación de etiquetado (cantidad)			N/A
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verificación de etiquetado (cantidad)	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verificación de etiquetado (cantidad)	<input checked="" type="checkbox"/>		
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verificación de etiquetado (cantidad)	<input checked="" type="checkbox"/>		

NOTA:

SE FIRMÓ EN: **BOGOTÁ** FECHA: **10/01/2019**

CONSORCIO ZORRITOS S.A.S.

ING. NEREA BARRON TORRES
COORDINADORA SUPERVISORA DE OBRAS
AREA DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO ZORRITOS S.A.S.
BOGOTÁ

AREA / SECTOR: **EDIFICACIONES**

PROYECTO: **PROYECTO DE OBRA DEL PLAN DE ZONIFICACION DEL PISO AREA DE CONTROL DE CALIDAD E INFLUENCIA**

FECHA: **17/03/2010**

PAGINA: **AR 14**

REVISIONADO POR:

SEÑOR:

TIPO CEMENTO:

VALORES:

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
------	----------------------------	----	----	-----	-------------


1	ORDENAR EN LA OBRA	SI			
2	REVISAR PLANOS Y PLANOS DE EJECUCION	SI			
3	OTRAS REVISIONES	SI			
4	REVISAR PLANOS DE EJECUCION DE LA OBRA	SI			
5	REVISAR PLANOS DE EJECUCION DE LA OBRA	SI			
6	REVISAR PLANOS DE EJECUCION DE LA OBRA	SI			
7	REVISAR PLANOS DE EJECUCION DE LA OBRA	SI			
8	REVISAR PLANOS DE EJECUCION DE LA OBRA	SI			
9	REVISAR PLANOS DE EJECUCION DE LA OBRA	SI			
10	REVISAR PLANOS DE EJECUCION DE LA OBRA	SI			
11	REVISAR PLANOS DE EJECUCION DE LA OBRA	SI			
12	REVISAR PLANOS DE EJECUCION DE LA OBRA	SI			


VACIADO Y MUESTREO DEL CONCRETO

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	REVISAR PLANOS DE EJECUCION DE LA OBRA	SI			
2	REVISAR PLANOS DE EJECUCION DE LA OBRA	SI			
3	REVISAR PLANOS DE EJECUCION DE LA OBRA	SI			
4	REVISAR PLANOS DE EJECUCION DE LA OBRA	SI			
5	REVISAR PLANOS DE EJECUCION DE LA OBRA	SI			
6	REVISAR PLANOS DE EJECUCION DE LA OBRA	SI			
7	REVISAR PLANOS DE EJECUCION DE LA OBRA	SI			
8	REVISAR PLANOS DE EJECUCION DE LA OBRA	SI			
9	REVISAR PLANOS DE EJECUCION DE LA OBRA	SI			
10	REVISAR PLANOS DE EJECUCION DE LA OBRA	SI			
11	REVISAR PLANOS DE EJECUCION DE LA OBRA	SI			
12	REVISAR PLANOS DE EJECUCION DE LA OBRA	SI			





ELABORADO POR: [Firma] APROBADO POR: [Firma]

Revisor: [Firma]	Revisor: [Firma]
Fecha: 17/03/2010	Fecha: 17/03/2010





CONSEJO DE EDUCACION
[Signature]
CONSEJO DE EDUCACION
REPUBLICA DE CHILE

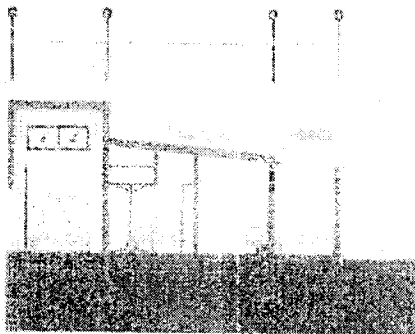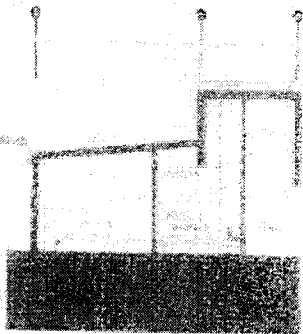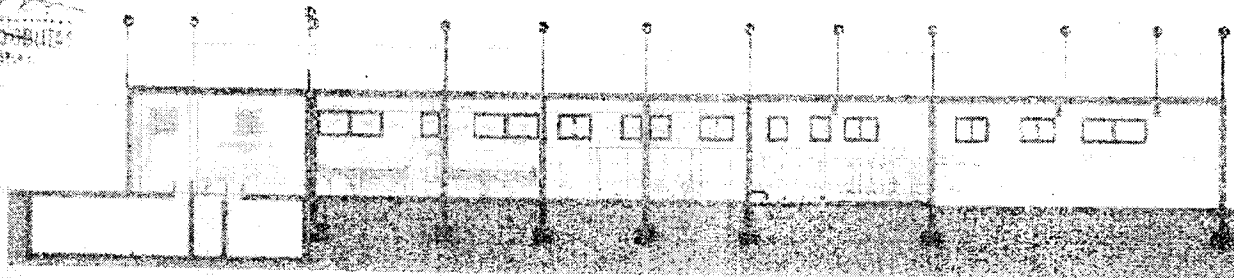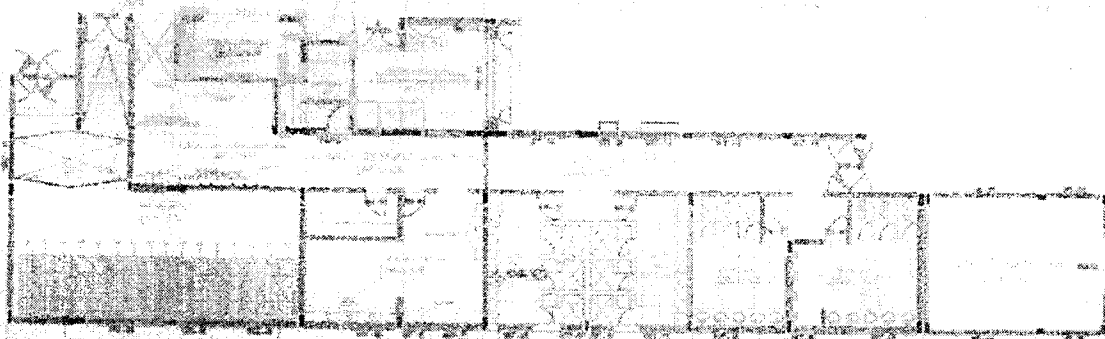

[Signature]
ING. RUBEN BOSCH TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMSES
SUPERVISOR DE SUPERVISION



REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
LIBERACION DE VACIADO DE CONCRETO

C2-566-PC-03-01
1

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO
CLIENTE: FONDIFES
PLANO SEF: E-48
MOD. PLS:
DESCRIPCION DEL TALLADO: CONCRETO EN ZAPATAS EJE 1 POR 235 NG/CM2
FONDERES: C2-566-LIC/COM
Nº CORRELATIVO: 12/007/2019
FECHA: 12/007/2019
SECTOR: PTAR

Rev: _____
Fecha: _____
Folios: _____
EJ: 1

CHECK LIST DE VERIFICACION DE COLOCACION DE ARMADURA


ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Longitud de zapatas (verificar si la armadura presenta curvatura)	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	Diámetro especificado: (1 - 2.3", 1.2", 5/8", 3/4", etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	Cobertura de Armadura (Interencia ± 0 a 1 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	Verificación de Estribos (cantidad y espaciamiento)			N/A	
5	Verificación de Longitudes de Paddock (Espaciamiento ± 0 a 1 cm)			N/A	
6	Cobertura de zapatas (verificar si la armadura presenta curvatura)			N/A	
7	Completitud de recubrimiento (fajas de concreto en losas / muros de plataba en muros)	<input checked="" type="checkbox"/>			
8	Verificación de calidad según especificación (según Especific. no 100)	<input checked="" type="checkbox"/>			
9	Verificación de la armadura según Norma Abstractos D14			N/A	
10					
11	Otras				

RESPONSABLE DE ACHERO: _____
Fecha de Inspección: _____
DPA DE ENCOTRADO: _____

Forma: _____
CHECK LIST DE VERIFICACION DE ENCOTRADO

Empleo: Maestro Otero Especificar: _____

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Verificación de base y moldes	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	Separación de revoque/ ladrillo (concreto)	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	Revoque de muros y secciones (muebles metálicos / moldes de muros)	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	Completitud de dimensiones (condición) y accesorios (alambres, cuñas, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Rección de niveles, verticalidad y horizontalidad de concreto	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	Completitud de recubrimientos (fajas de concreto y/o separadores de plataba)	<input checked="" type="checkbox"/>			
7	Verificación de coberturas (de acuerdo a plataba)			N/A	
8	Verificación de estribos y/o bisulas			N/A	
9	Verificación de insertos y empalmes	<input checked="" type="checkbox"/>			
10	Verificación de horizontalidad de concreto (colocación de yeso en aristas)	<input checked="" type="checkbox"/>			
11	Otras				



RESPONSABLE DE ENCOTRADO: _____
Fecha: _____

ING. ARMANDO ZORRITOS
COORDINADOR GENERAL
DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION TORRES
DIRECCION DE SUPERVISION



**REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
LIBERACION DE VACIADO DE CONCRETO**

Rev: CA.SGC.PC.03.F1
Fecha: 1/07/2019
Pagina: 2 de 2

AREA / SECTOR:	CONCRETO EN ZAPOTAPAN DE EL ESTERCO	MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO	FECHA:	1/07/2019			
RESISTENCIA (FC):	315 kg/cm ²	SLUMP:	5"-6"	TIPO CEMENTO:	V	VOLUMEN:	PLANO DE REF: 1-96

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	CHECK LIST DE LIBERACION DE ESTRUCTURAS	COMENTARIOS
		SI	NO
1	Limpieza de la estructura	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
2	Topografía, curvas de fondo y nivel de concreto	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Ejes y dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Verificación de la armadura según check list	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Verificar orden del encofrado según check list	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Juntes limpias		N/A
7	LISTA: limpieza de resaca de agua y drenaje, aplicación de PUNTO de salida y acceso para liberación de agua		N/A
8	LISTA: todos los puntos (intersecciones, tornacuerpos, IV, bofederos e hidráulicos/canalones)		N/A
9	Perforas de Anclaje y arboladuras		N/A
10	Verificación del Presentamiento de seguridad de acuerdo al sitio	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	Otros		


VACIADO Y HUESTRIO DEL CONCRETO

ITEM	ESPESES	ARMADURA	FORMA DEBIDA	HUMIDEDAD	TIPO DE BATA	TIPO DE BATA	T (FC)	SLUMP	NO CUBRIDA	TIPO DE BATA	TIPO DE BATA	TIPO DE BATA
1	315	ZAPOTAPAN DE EL ESTERCO		8:30	12:31	28	6					4


ORIENTARIOS

ELABORADO POR:	<i>[Signature]</i>	REVISADO POR:	<i>[Signature]</i>
Nombre: <i>[Name]</i>	Nombre: <i>[Name]</i>	Nombre: <i>[Name]</i>	Nombre: <i>[Name]</i>
Fecha: 1/07/2019	Fecha: 1/07/2019	Fecha: 1/07/2019	Fecha: 1/07/2019



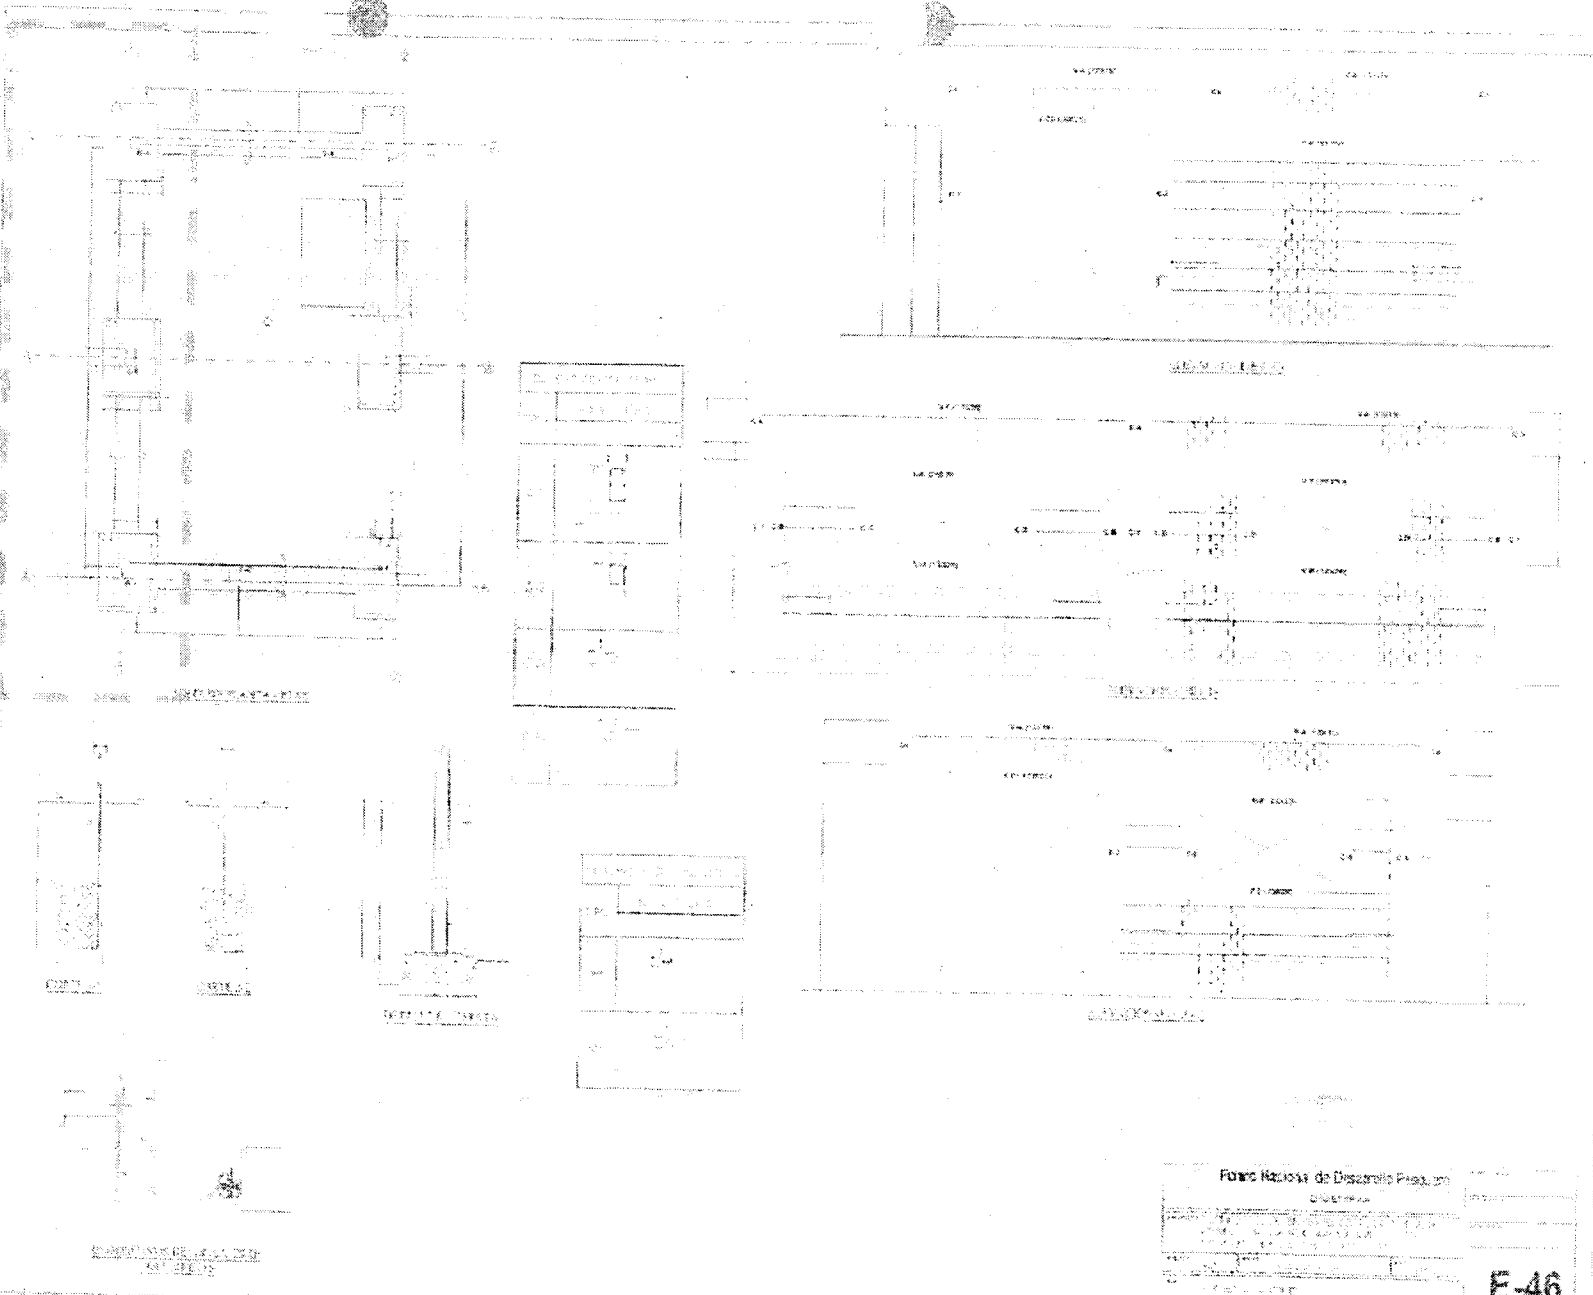

Handwritten initials/signature at top left.



Handwritten signature and text:
 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS

Handwritten signature and text:
 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS

239

Formulario de Registro del Expediente

Formo Naciona de Desarrollo Profesional

NOMBRE		FECHA	
CATEGORIA		CARGO	
SALA		SUBSALA	
GROC		SALA DE	
AREA		CATEGORIA	

E-46



REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD

CZ-SSC-PC-03-F1


Rev: 1
FECHA: 17-07-2019
Página: 1 de 1

INSPECCIÓN DE TARRAJEOS Y DERRAMES

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO
 CLIENTE: FONDERES
 Nº CORRELATIVO: FECHA: 17-07-2019
 PLANO REF: AR-14 COD. PS: CZ-SSC-IT-A.0 AREA: DESINFECCION
 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: TARRAJEO DE VIGA DOBLE ALTURA EJE 13 - TRAMO H-I*

Verificaciones Generales:


Limpieza V Rugosidad V Humedad V



Ambiente	Alineamiento de muros			Verticalidad de muros			Uniformidad de muros			Contrazocalo c/ cemento pulido			Encuentro cielo rosa-muro tipo Media Caña			Verticalidad de derrame			Alineamiento de VIGAS			Verticalidad de VIGAS			Uniformidad de VIGAS		
	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.
ACCESO A DESINFECCIÓN EJE 13 TRAMO (H-I*)																V			V			V					





OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Freddy González López	Nombre: Ing. Edgar Regalado Oplitas	Nombre: Ing. Ruben Bossels Toriati
FECHA: 17-07-2019	FECHA: 17-07-2019	FECHA: 17-07-2019



Ing. G. Rossi

Ing. G. Rossi
ARCHITETTO
VIA ...

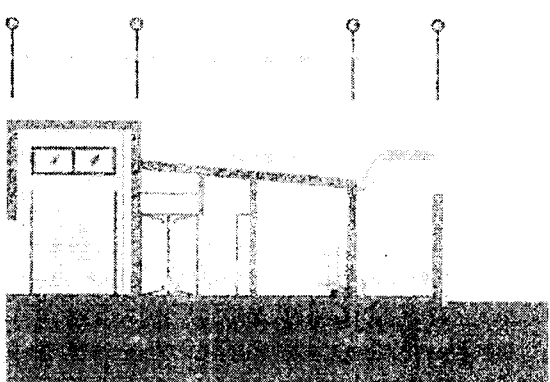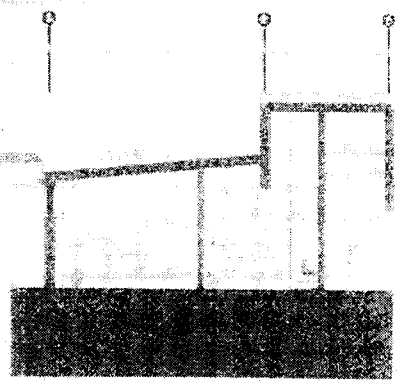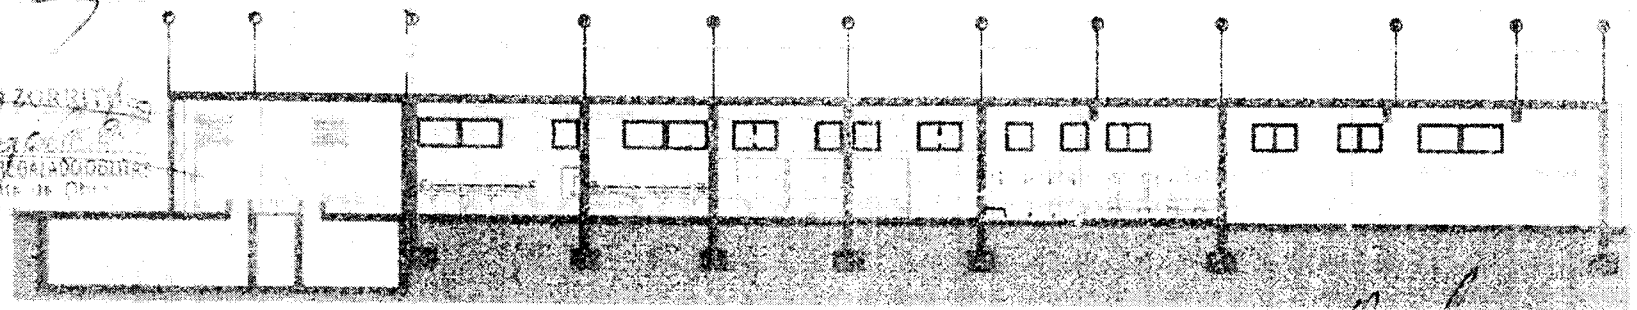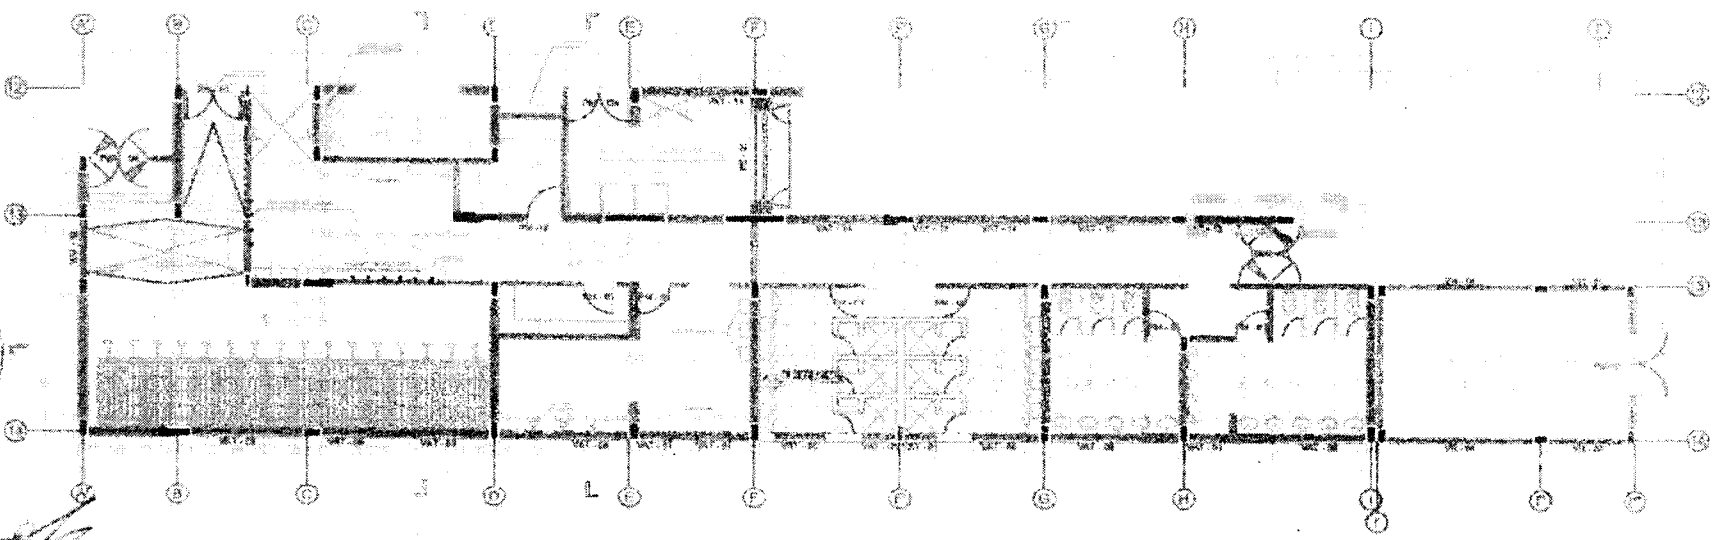

Ing. G. Rossi
ING. GIULIO ROSSI ARCHITETTO
UFFICIO SUPERVISOR TORELLI
CORSO DE' SOVERISIO

Faint, illegible text at the bottom right of the page.



REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD

CZ.SGC.PC.03-F1

Rev: 1
FECHA: 17-07-2019
Página: 1 de 1

INSPECCIÓN DE TARRAJEOS Y DERRAMES

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO OPA ACAPULCO		Nº CORRELATIVO:
CLIENTE: CONDEFES		FECHA: 17-07-2019
PLANO REF.: AR-16	COD. PLS.: CZ-SGC-LTA-D	AREA: TAREAS PREVIAS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: TARRAJEO DE VIGA-PLANAS EJE : B : NIVEL MEZZANINE : TRAMO: 5-6 : 6-7 : 7-8: 8-9: 9-10

Verificaciones Generales:


Limpieza V Rugosidad V Humedad V

LOS RESULTADOS DE LAS VERIFICACIONES DEBEN SER REGISTRADOS EN EL FORMULARIO DE CONTROL DE CALIDAD Y EN EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

Ambiente	Alineamiento de VIGA PLANA			Verticalidad de VIGA PLANA			Uniformidad de VIGA PLANA			Contrazocalo c/ cemento pulido			Encuentro cielo raso-muro tipo Media Caña			Verticalidad de derrame			Contrazocalo sanitario			Dimensiones de vanos			Cieloraso			
	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	
MEZZANINE : EJE : B : NIVEL 2	V			V			V																					

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Freddy González López	Nombre: Ing. Edgar Regalado Obitas	Nombre: Ing. Ruben Bossus Toriata
FECHA: 17-07-2019	FECHA: 17-07-2019	FECHA: 17-07-2019






Handwritten signature


ING. RUDEN BOSSE TORIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBAH
10 DE AGOSTO DE 2014

Handwritten signature

ING. RUDEN BOSSE TORIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBAH
AREA DE SUPERVISOR

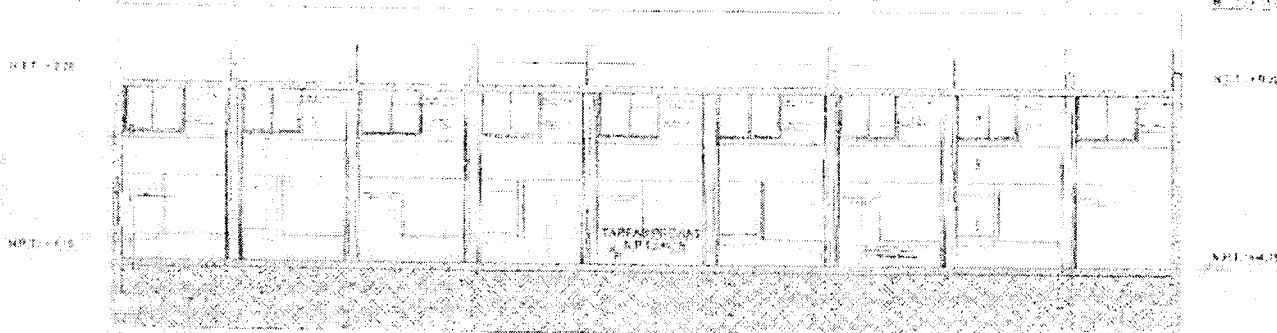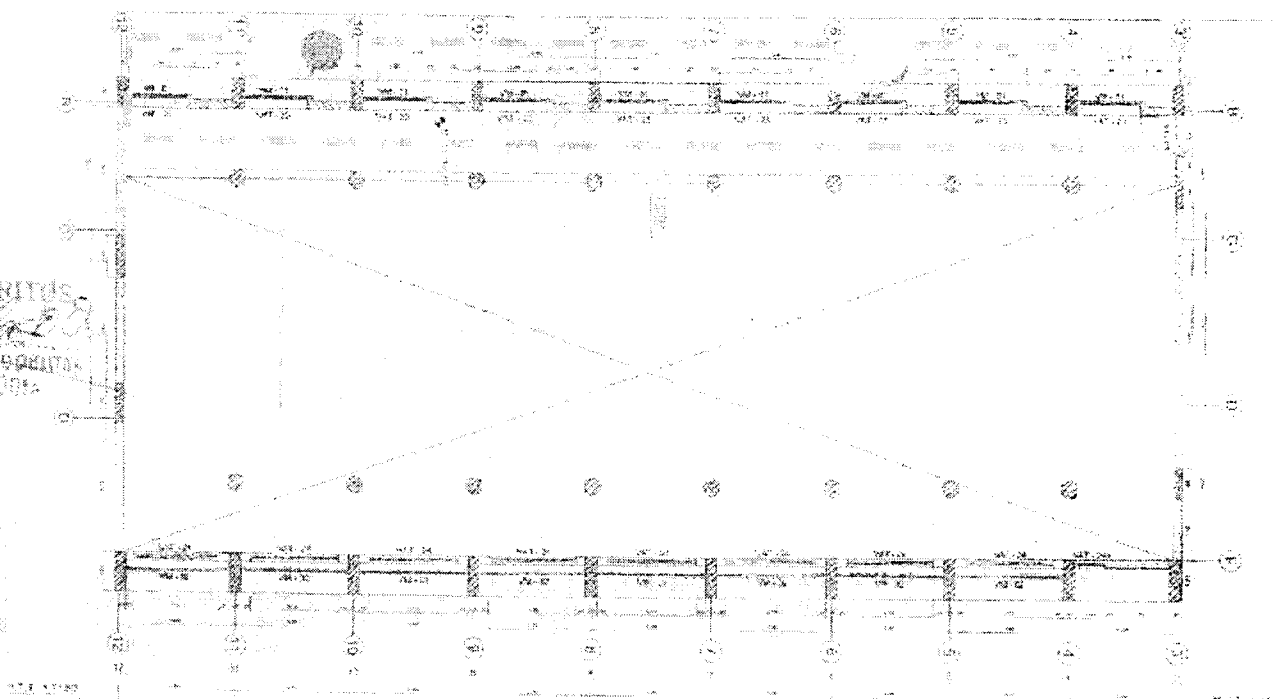


Corte 3-3

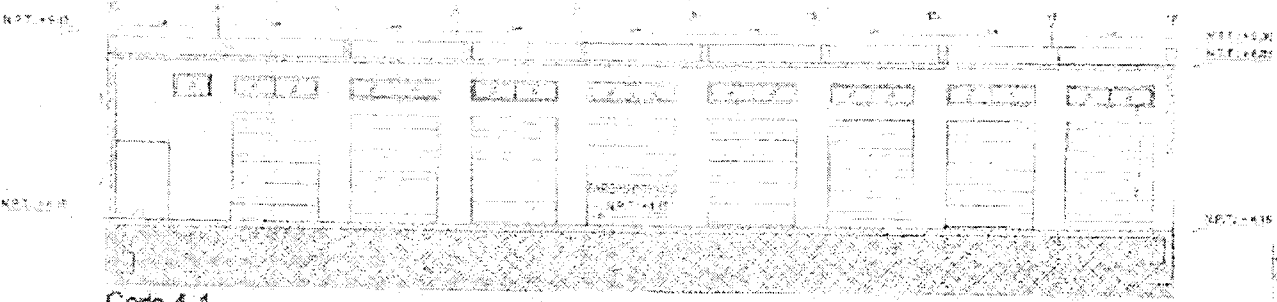

Corte 4-4

235

Firma Profesional de Ingeniería Civil	
[Firma]	
[Sello]	
[Fecha]	



**REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA HIDRAULICA**

C2.56C-PC-03-F1
 Revision: 01
 Fecha:
 Pagina: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: **REDESAGUAMIENTO DEL AREA DE LA**
 CLIENTE: **COMUNIDAD**
 PLANOS DE REFERENCIA: **IS-02 (Adicional 03)**

Nº CORRELATIVO:
1707/2019

PRUEBA HIDRAULICA EN: PATIO DE MANIOBRAS


AREA: **PATIO MANIOBRAS**

1. PARAMETROS DE LA PRUEBA:


Presión de prueba: **130 PSI** Medio de prueba: **Agua** Material de prueba: **Acero**

2. PARAMETROS DE CONTROL:

USUARIO	NUMERO DE IDENTIFICACION	MATERIAL	CONTRUCCION	Nº DE ASOCIACION	SEÑAL	FECHA	OPORTUNIDAD
EE5	172	PC-10	2875	0	11:26	17:30	17:30
PATIO MANIOBRAS							AGUA POTABLE

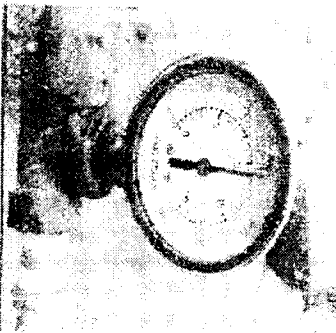

PRESION INICIAL



PRESION FINAL

3. EN LOS RESULTADOS:

VARIACION DE NIVEL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA:	SI	NO	SI	NO
HERMETICIDAD CONTORNES	SI	NO	SI	NO


3. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

4. ESQUEMA ADJUNTO:

SI NO

<p>ELABORADOR:</p> <p>Nombre Completo: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Cargo: Ing. Carlos Alberto Rodríguez</p> <p>Fecha: 17/07/2019</p>	<p>REVISADO POR:</p> <p>Nombre: Ing. Carlos Alberto Rodríguez</p> <p>Cargo: Ing. Responsable de la Prueba</p> <p>Fecha: 17/07/2019</p>
<p>APROBADO:</p> <p>Nombre: Ing. Carlos Alberto Rodríguez</p> <p>Cargo: Ing. Responsable de la Prueba</p> <p>Fecha: 17/07/2019</p>	<p>REGISTRADO:</p> <p>Nombre: Ing. Carlos Alberto Rodríguez</p> <p>Cargo: Ing. Responsable de la Prueba</p> <p>Fecha: 17/07/2019</p>





**CONSORCIO
ZORRITOS**

**REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
REPORTE DE RELLENO**

C2.SGC.PC.02.F1

Revisión: 01
Fecha: 17/07/19
Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE

Nº CORRELATIVO:

CLIENTE:

COMDEPES

FECHA INICIO:

17/07/2019

PLANO REF.:

AR-15

FRENTE:

SECTOR: TAREAS PREVIAS

AREA O TORRE:

DESCRIPCION DEL TRABAJO: **Compactación con afirmado para mesas para productos hidrobiológicos : EJE B
: TRAMO : 7-8 : 11-12**

TIPO DE RELLENO:

Relleno Masivo Controlado

Relleno Masivo No Controlado

Relleno Localiz Controlado

Relleno Localiz No Controlado

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Revisión de planos y especificaciones				
2	Autorización de Relleno (*)				
3	Análisis de Trabajo Seguro (ATS)				
4	Verificación Topográfica				
5	Preparación de área de relleno				
6	Relleno con material propio				
7	Relleno con material de préstamo				
8	% Compactación según especificaciones				Castora: EL RUBIO (ANTES del BEAJE DE CARHUAS)
9	Conformidad de capas de relleno (niveles)				% Según Especific:

(*) Autorizado por el Cliente y/o la Supervisión

DATOS DE CAMPO:


CAPA Nº	ESPOSOR (m)	NIVEL (m)	FIRMA TOPOGRAFIA	FECHA	% COMPACT.	FIRMA CONTROL COMPACTAC.	OBSERVAC./C ANTERA
1	0.15	3.30		17/07/2019			
2	0.15	3.45		17/07/2019			

- PLANO ADJUNTO: SI NO

OBSERVACIONES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO:	SUPERVISOR:
Cargo: Control de Calidad	Cargo: Ing. Campo	Cargo: Ing. Residente	Cargo: Supervisión
Nombre: Freddy Bonifacio Lopez	Nombre: JORGE	Nombre: Edgar Regalado Chilas	Nombre: Ruben Bossas Tomath
Fecha: 17/07/2019	Fecha: 17/07/2019	Fecha: 17/07/2019	Fecha: 17/07/2019





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERU
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERU

[Handwritten signature]
ING. RUBEN BOSCH TORREALBA
BOASERVICIO SUPERVISOR TECNICO
SECTO DE SUPERVISION

IS-02

232



ROYAUME DES COMORES
CONTRAT DE QUALITE
LIVRAISON DE VARIANTS DE CONCRETE

FORMULAIRE N° 1
Date: 18/07/2019
Page: 1

MINISTRE DU PROJET: **REPUBLIQUE DE L'UNION COMORE** N° CONSULTATION: **18/07/2019**

CLIENT: **AN 2** Code site: **CH-SON-LUCIEN** SECTEUR: **ADMINISTRATION**

DESCRIPTION DU TRAVAIL: **CONTRAT DE QUALITE - REALISATION DES VARIANTES DE CONCRETE VISANT LA SURVEILLANCE SUR L'ETAT DE L'ETRIER**

TYPE	DESCRIPTION DE L'ACTIVITE	CHECK LIST DE VERIFICATION DE LA QUALITE DE L'ANNUAIRE		OBSERVATION
		BT	NO	
1	Qualite de l'acier (Valeur de la norme de l'acier)		N/A	
2	Qualite de l'acier (Valeur de la norme de l'acier)		N/A	
3	Qualite de l'acier (Valeur de la norme de l'acier)		N/A	
4	Qualite de l'acier (Valeur de la norme de l'acier)		N/A	
5	Qualite de l'acier (Valeur de la norme de l'acier)		N/A	
6	Qualite de l'acier (Valeur de la norme de l'acier)		N/A	
7	Qualite de l'acier (Valeur de la norme de l'acier)		N/A	
8	Qualite de l'acier (Valeur de la norme de l'acier)		N/A	
9	Qualite de l'acier (Valeur de la norme de l'acier)		N/A	
10	Qualite de l'acier (Valeur de la norme de l'acier)		N/A	

RESPONSABLE DE L'ACTIVITE: **Philippe**

DATE DE L'INSPECTION: **18/07/2019**


TITRE DE L'ACTIVITE: **CONTRAT DE QUALITE - REALISATION DES VARIANTES DE CONCRETE**

ITEM	DESCRIPTION DE L'ACTIVITE	CHECK LIST DE VERIFICATION DE LA QUALITE		OBSERVATION
		BT	NO	
1	Qualite de l'acier (Valeur de la norme de l'acier)		N/A	
2	Qualite de l'acier (Valeur de la norme de l'acier)		N/A	
3	Qualite de l'acier (Valeur de la norme de l'acier)		N/A	
4	Qualite de l'acier (Valeur de la norme de l'acier)		N/A	
5	Qualite de l'acier (Valeur de la norme de l'acier)		N/A	
6	Qualite de l'acier (Valeur de la norme de l'acier)		N/A	
7	Qualite de l'acier (Valeur de la norme de l'acier)		N/A	
8	Qualite de l'acier (Valeur de la norme de l'acier)		N/A	
9	Qualite de l'acier (Valeur de la norme de l'acier)		N/A	
10	Qualite de l'acier (Valeur de la norme de l'acier)		N/A	

RESPONSABLE DE L'ACTIVITE: **Philippe**

DATE DE L'INSPECTION: **18/07/2019**

TITRE DE L'ACTIVITE: **CONTRAT DE QUALITE - REALISATION DES VARIANTES DE CONCRETE**



MINISTRE DU PROJET
ROYAUME DES COMORES
ADMINISTRATION

UBICACION: PASADINO
PROYECTO: PASADINO
CLIENTE: GOBIERNO DE PASADINO
DISEÑO: INGENIERIA CIVIL
EJECUCION: INGENIERIA CIVIL
CANTON: PASADINO
MUNICIPIO: PASADINO
INDICACION: PASADINO

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	CI	II	NO	TIPO DE LIBERACION DE ESTRUCTURAS	OPREVISION
1	Definición de la estructura				N/A	
2	Definición de la estructura de fondo y forma de la estructura				N/A	
3	Definición de la estructura de fondo y forma de la estructura				N/A	
4	Definición de la estructura de fondo y forma de la estructura				N/A	
5	Definición de la estructura de fondo y forma de la estructura				N/A	
6	Definición de la estructura de fondo y forma de la estructura				N/A	
7	Definición de la estructura de fondo y forma de la estructura				N/A	
8	Definición de la estructura de fondo y forma de la estructura				N/A	
9	Definición de la estructura de fondo y forma de la estructura				N/A	
10	Definición de la estructura de fondo y forma de la estructura				N/A	
11	Definición de la estructura de fondo y forma de la estructura				N/A	
12	Definición de la estructura de fondo y forma de la estructura				N/A	


VACIADO Y RESECO DE CONCRETO



COMENTARIOS	FECHA	LIBERACION	NO. DE VACIADO	NO. DE RESECO	FECHA DE VACIADO	FECHA DE RESECO	LIBERACION	RESECO	FECHA DE VACIADO	FECHA DE RESECO	LIBERACION	RESECO
			10-11	12-13	25							
			08-12	12-13	26							

El liberado por: *[Signature]* El liberado por: *[Signature]*

Nombre: *[Name]* Nombre: *[Name]*


Apellido: *[Surname]* Apellido: *[Surname]*



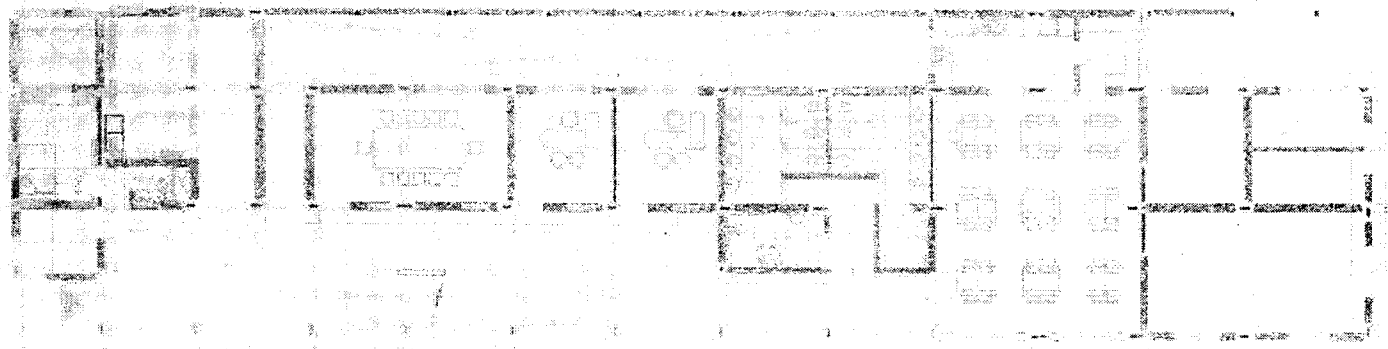


Handwritten signature or initials.

Handwritten text:
APPROVED
DATE: 10/10/50
FOR THE ARCHITECT
BY: [Signature]

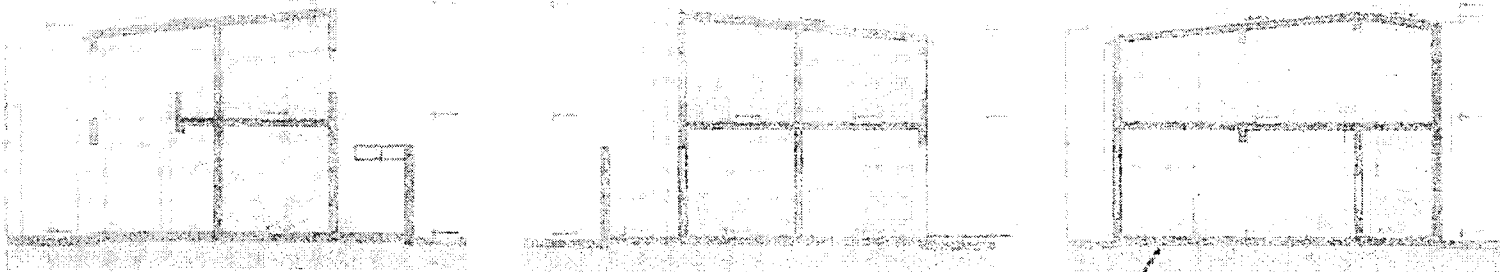

Handwritten signature:
ARCHITECT
STATE OF CALIFORNIA
DIVISION OF ARCHITECTURE

ING. ROBERTO TORRES TORRES
GERENCIA SUPERVISOR TORRES
AREA DE SUPERVISIAO



CONSORCIO ZORRITOS
CONTROL DE CALIDAD
LIBERACION DE VOUCHER DE CONCRETO

NOMBRE DEL PROYECTO: SECTORAMIENTO DVA ACAPULCO
CLIENTE: LONDERNES

PLANO REF: 20-12
FOU. PLS: E2-SQC-LONDERNES

DESCRIPCION DEL TRABAJO: CONTROL DE CALIDAD DE LA ENTREGA DE CONCRETO A LA ENTRADA DE INDUSTRIA

FECHA: 18/07/2019

REVISOR: [Signature]
FECHA: [Date]

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Verificación de la entrega de concreto a la planta de producción			N/A	
2	Verificación de la entrega de concreto a la planta de producción			N/A	
3	Verificación de la entrega de concreto a la planta de producción			N/A	
4	Verificación de la entrega de concreto a la planta de producción			N/A	
5	Verificación de la entrega de concreto a la planta de producción			N/A	
6	Verificación de la entrega de concreto a la planta de producción			N/A	
7	Verificación de la entrega de concreto a la planta de producción			N/A	
8	Verificación de la entrega de concreto a la planta de producción			N/A	
9	Verificación de la entrega de concreto a la planta de producción			N/A	
10	Verificación de la entrega de concreto a la planta de producción			N/A	
11	Verificación de la entrega de concreto a la planta de producción			N/A	
12	Verificación de la entrega de concreto a la planta de producción			N/A	

REVISOR DE ENTREGA: [Signature]
FECHA: [Date]




RESPONSABLE DE ENTREGA: [Signature]
FECHA: [Date]


AREA / SECTOR: MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO
FECHA: 10/07/2019
ESTRUCTURA / ELEMENTO: CONTRABESO DE ESPESOR 2" MEZCLA 1:3:3 (Grav. H); CONTROL DE CALIDAD & ENTREGA DE INDMENTARIA
PLANO DE REF.: AR-14
RESISTENCIA (F'c): --- **SLUMP:** --- **TIPO CEMENTO:** V **VOLUMEN:** ---


CHECK LIST DE LIBERACION DE ESTRUCTURAS					
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpeza de la estructura	✓			
2	Topografía, cuba, dx, fondo y nivel de concreto	✓			
3	Ejes y Dimensiones	✓			
4	Verificación de la armadura según check list			N/A	
5	Verificación del encofrado según check list	✓			
6	Junta fría			N/A	
7	ISE: control de todos los ejes y detalles, liberación de puntos de calidad y pasajes para tuberías			N/A	
8	ISE: todos los puntos (interruptores, terminaciones, TV, telefonía, etc. consumos) correctos			N/A	
9	Permisos de tráfico y ambientales			N/A	
10	Verificación del Procedimiento de seguridad de acuerdo al estándar	✓			
11	Cierre				

VACIADO Y MUESTREO DEL CONCRETO												
Cast	Vol (m ³)	Etiqueta	Hora Inicio	Hora Cierre	Hora Inicio	Hora Cierre	T (°C)	Slump	Vit. Adosado	Grage. Plastico	Grage. Masica	TP. Puntos
---	---	CONTRABESO CONTROL CALIDAD			8:40	12:15	29	--				---
---	---	CONTRABESO ENTREGA INDMENTARIA			9:40	12:15	29	--				---



COMENTARIOS

ELABORADO POR: Firma:  Nombre: Freddy Lozano López Fecha: 10/07/2019	REVISADO POR: Firma:  Nombre: Ing. Edgar Rosales Fecha: 10/07/2019	APROBADO POR: Firma:  Nombre: Juan Carlos Tamayo Fecha: 10/07/2019
---	---	--






Handwritten signature

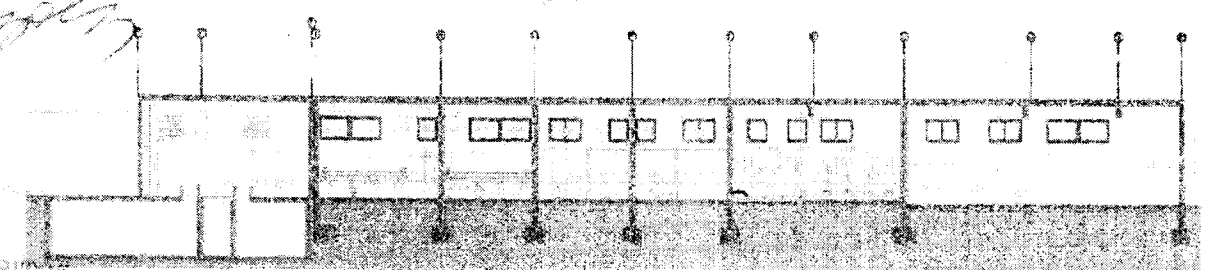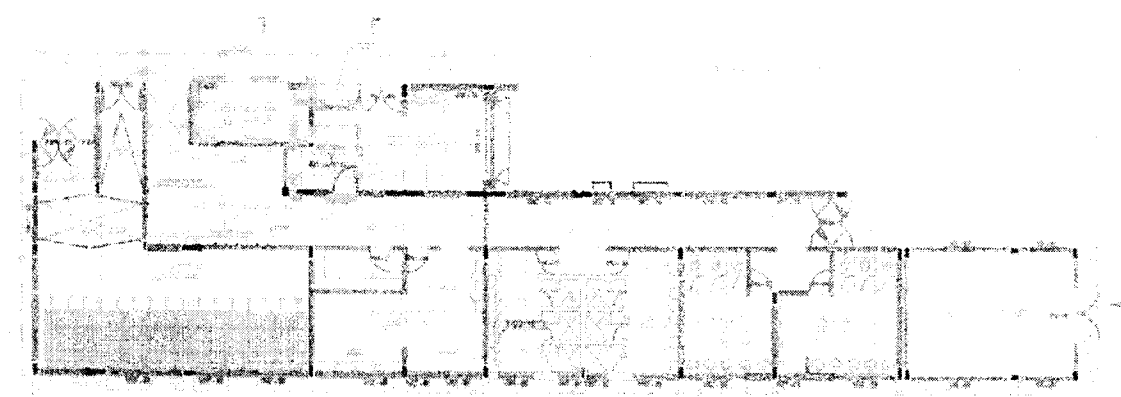

ASURSA ZORRITZE
Handwritten signature
SHERMAN ENGINEERING
1000 Peachtree St. N.E.
Atlanta, GA 30309

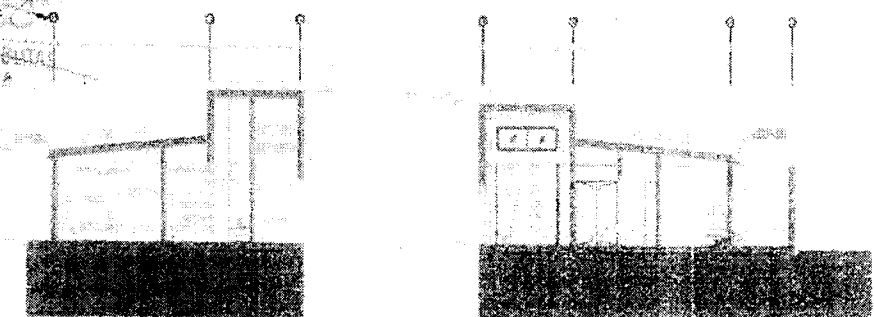

Handwritten signature
NO. AUBEN BOSSUS TONIATTI
GEORGIA SUPERVISOR YUMEN
FREE LIT SUPERVISION

NO. AUBEN BOSSUS TONIATTI
GEORGIA SUPERVISOR YUMEN
FREE LIT SUPERVISION



CONCRETO
CONTROL DE CALIDAD
LIBERACION DE VACADO DE CONCRETO

REGISTRO
CZ.SCC.PC.03-F1
1

NOBRE DEL PROYECTO: MEMORIAMIENTO PARA ACAPULCO
CLIENTE: FONDEPES
PLANO HPS: E-45
COD. PLS: CZ.SCC.LIUCION
N° CONSERVATIVO: 18/07/2019
FECHA: PTAR
SECTOR: PTAR

DESCRIPCION DEL TRABAJO: CONCRETO FC=180 KG/CM2 Y 20% PERLA GRANDE CEMENTO CORRIDO (EJE C TRAMO 1-2)


ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	CHECK LIST DE VERIFICACION DE COLOCACION DE ARMADURA		OBSERVACION
		SI	NO	
1	Limpieza de armadura (Verificar si la armadura presenta corrosión)			N/A
2	Barriete especificado (1 a 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 9/8")			N/A
3	Colocación de Armadura (Espaciamiento a 0 a 1 cm)			N/A
4	Verificación de Espados (Cantidad y espaciamiento)			N/A
5	Verificación de los espados de Trabajo (Colocados a 0 a 1 cm)			N/A
6	Colocación de separadores (espáticos / doble pulja)			N/A
7	Comprobación de perpendicularidad (Cada 4m de concreto mínimo / medidos de plataba en muro)			N/A
8	Verificación de desbaste (Avión con aspiración / Gancho separador 90-180)			N/A
9	Soldadura de la armadura según Norma ABR/AVS D14-93			N/A

SI PENSABLE DE ACERO:
Fecha de Inspección: _____ Firma: _____

TIPO DE ENCOFRADO: _____
CHECK LIST DE VERIFICACION DE ENCOFRADOS
Madera Asflico Otros Esqueleto

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Verificación de tallas y moles	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	Colocación de flechamientos / sellado (puertas)	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	Inspección de juntas y accesorios (juntas metálicas / reses de goma)	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	Medida de diámetros (verticalidad) y accesos (cebadores, conos, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Verificación de nivel, verticalidad y horizontalidad de encofrado	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	Comprobación de ensamblamientos (dadas de concreto y/o separadores de plataba)				N/A
7	Verificación de contraherbas (de acuerdo a planos)				N/A
8	Verificación de ocleros y/o bisas				N/A
9	Verificación de insertos y amebidos				N/A
10	Verificación de impermeabilidad de vacados (calibración de veas en aristas)	<input checked="" type="checkbox"/>			
11	Otros				

RESPONSABLE DE ENCOFRADO: _____
Fecha de Inspección: _____
Firma: _____



ING. ROBERTO GARCIA
CONSEJO REGULADOR TUBOS
DE CONCRETO

2225

MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO
CONCRETO POR 110 kg/cm³ 30% PIEDRA GRANUL. CEMENTO COMBINO (EJE
C TRAZO 12)

AREA / SECTOR:
ESTRUCTURA / ELEMENTO:
RESISTENCIA (MPa): 300 kg/cm² SIUMH

FECHA: 18/07/2019
PLANO DE REF: E-45

TIPO CEMENTO: V

VOL. UNID:

SI

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	VERIFICACION DE LIBERACION DE ESTRUCTURAS	NO	SI	Observacion
1	Limpieza de la estructura	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Tirador de cables de fondo y nivel de concreto	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Tips y diferenciaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Verificación de la armadura según chicle IMI	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Verificación del encofrado según chicle IMI	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Junta de juntas		N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Tests Terminate de roces de zona y descarga, utilización de puntos de salida y juntas para juntas. Detectar todos los puntos (interrupción, discontinuidad, TV, ruptura e interconectores)		N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	Pruebas de Anclaje y embudo		N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	Verificación del cumplimiento del SUDMUSE M Acuerdo al SUDMUSE		N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	


VACIADO Y MUESTREO DEL CONCRETO

Fecha	Hora	Temperatura Ambiente	Temperatura de Cemento	Temperatura de Agua	Temperatura de Piedra	Temperatura de Muestra	Comentarios	Notas	Observaciones
18/07/19	14:00	17.00	28						

LABORADO POR: *[Signature]* REVISADO POR: *[Signature]* APROBADO POR: *[Signature]*

Nombre: Ruben Lopez Tomati Fecha: 18/07/2019

Nombre: Ind Edgar Rosales Rojas Fecha: 18/07/2019





**CONSORCIO
ZORRITOS**

REGISTRO

CONTROL DE CALIDAD

CZ-SGC-PC-03-F1

Revisión: 01

Fecha: 18/07/19

Página: 1 de 1

REPORTE DE EXCAVACION

NOMBRE DEL PROYECTO: MEMORAMIENTO DPA ACAPULCO

Nº CORRELATIVO:

CLIENTE: FONDEPES

PLANO REF.: AR-01 FRETE: PATIO MANIOBRA SECTOR:

FECHA INICIO:

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60m X 0.60m PARA INSTALACION DE DUCTOS
(TRAZO DESDE ADMINISTRACION HASTA DESTINACION)

AREA O TORRE:

TIPO DE EXCAVACION:

Excavación
Masiva

Excavación
Localizada

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Revisión de planos y especificaciones	X			
2	Autorización de Excavación (*)	X			
3	Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	X			
4	Verificación Topografía	X			
5	Ubicación de Interferencias (**)	X			
6	Perfilado de taludes	X			
7	Sobrexcautación		X		
8	Compactación de fondo de excavación (1)		X		
9	Conformidad de niveles	X			

(*) Autorizado por el Cliente y/o la Supervisión

(**) La excavación en zona de interferencias debe realizarse en forma manual y de acuerdo a los planos As Built exist.

DATOS DE CAMPO:

- Nivel de terreno (Frente a Excav.): 3.54
- Nivel final de Excavación (Según planos): 3.00
- Nivel final de Excavación (Según campo): 3.00
- % Compact. Fondo de Excav. (1): 3.0
- (% Compact. Espec. = 95%) 3.0

PLANO Y ESQUEMA SI NO

OBSERVACIONES

Observation lines for recording field notes.

ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
Nombre: FREDDY GONZALEZ LOPEZ	Cargo: ING. RESIDENTE	Nombre: EDGAR REGALADO OBILIAS	Cargo: ING. SUPERVISOR	Nombre: RUBEN BOSUSS TOMIATTI	Cargo: ING. SUPERVISOR
Fecha: 18/07/2019	Fecha: 18/07/2019	Fecha: 18/07/2019	Fecha: 18/07/2019	Fecha: 18/07/2019	Fecha: 18/07/2019





**CONSORCIO
ZORRITOS**

**REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD**

INSTALACION DE CERAMICOS Y PORCELANATOS

CZ.SGC.PC.03-F1

Revision: 01

Fecha: 18/07/2019

Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO

CLIENTE:

FONDEDES

PLANOS DE REFERENCIA:

AR-14

Nº CORRELATIVO:

Fecha: 18/07/2019

SECTOR: DESTINACION

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

ZONAL DE PORCELANO REPLICADO DE CUERPO 60 X 60cm

AMBIENTE: SS.IH VARONES : SS.IH DAMAS : DUCHA VARONES

CHECK LIST DE VERIFICACION

ITEM	DESCRIPCION DEL TRABAJO	ESTADO	
		SI	NO
1	ASFO GENERAL DEL SECTOR DE TRABAJO	V	
2	VERIFICACION REVELACION DE MURO	V	
3	TRAZADOS	V	
4	TIPO Y CALIDAD DE LOS MATERIALES	V	
5	PREPARACION DE ASFALTO	V	
6	DEGRACIONES PORREBASTO	V	
7	VERIFICACION DE HORIZONTALIDAD		
8	OTROS		

COMENTARIOS:

ELABORADO POR:

Forma

Control Calidad
Nombre: Freddy Gonzalez
18/07/2019

APROBADO


Forma

Ing. Residente
Nombre: ENOAR REGALADO OSUNA
18/07/2019

SUPERVISION

Forma

Ing. Supervisor
Nombre: RUBEN DOS SANTOS TORALTA
18/07/2019





CONSORCIO ZORRITOS

REGISTRO

CONTROL DE CALIDAD

C2.SGC.PC.03-F1

Revisión: 01

Fecha: 18/07/19

Página: 1 de 1

REPORTE DE EXCAVACION

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO

Nº CORRELATIVO:

CLIENTE: FONDEPES

FRONTE: PATIO MANIOBRA

FECHA INICIO:

PLANO REF.: AR-01

SECTOR:

AREA O TORRE:

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

EXCAVACION DE ZANJA P/CANAL
(TRAZO EN TAREAS: PREVIAS CANALETA DE DRENAJE)

TIPO DE EXCAVACION:

Excavación Masiva


Excavación Localizada

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Revisión de planos y especificaciones	X			
2	Autorización de Excavación (*)	X			
3	Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	X			
4	Verificación Topográfica	X			
5	Utilización de Interferencias (**)	X			
6	Perfilado de taludes	X			
7	Sobrexcaación		X		
8	Comparación de fondo de excavación (**)		X		
9	Conformidad de niveles	X			

(*) Autorizado por el Cliente y/o la Supervisión

(**) La excavación en zona de Interferencias debe realizarse en forma manual y de acuerdo a los Planos As Duilt exist.

DATOS DE CAMPO:




- Nivel de terreno (Previo a Excav.): 2.8
- Nivel final de Excavación (Según planos): 2.4 2.55
- Nivel final de Excavación (Según campo): 2.4 2.55
- % Compact. Fondo de Excav. (A):  2.41
- % Compact. Espec. = 95%

- PLANO Y ESQUEMA SI NO

ADJUNTO:

OBSERVACIONES




Las cotas que están en la parte superior tales como 2.80 son cotas del terreno en campo
De acuerdo a la pendiente de 0.5 % tendíamos una inclinación hasta llegar a la cota +2.41
(esas cotas se está considerando el solado)




ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
Firma: 		Firma: 		Firma: 	
Cargo: CALIDAD	Cargo: ING. RESIDENTE	Cargo: ING. SUPERVISOR			
Nombre: FREDDY GONZALEZ LOPEZ	Nombre: EDGAR REGALADO OBIILLAS	Nombre: RUBEN BOSSUS TOMIATTI			
Fecha: 18/07/2019	Fecha: 18/07/2019	Fecha: 18/07/2019			

Handwritten signature

CONSORCIO MARRIQUEN
MANAGERIAL DE OBRAS
DE OBRAS DE OBRAS

ING. RUBEN GONZALEZ TONIATI
CONSORCIO SUPERVISOR JUCES
JEFE DE SUPERVISION

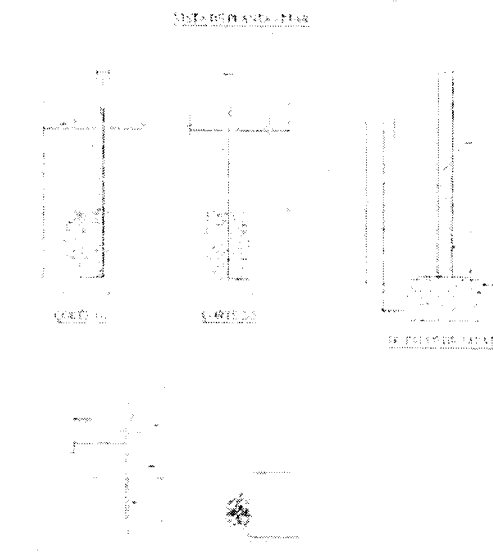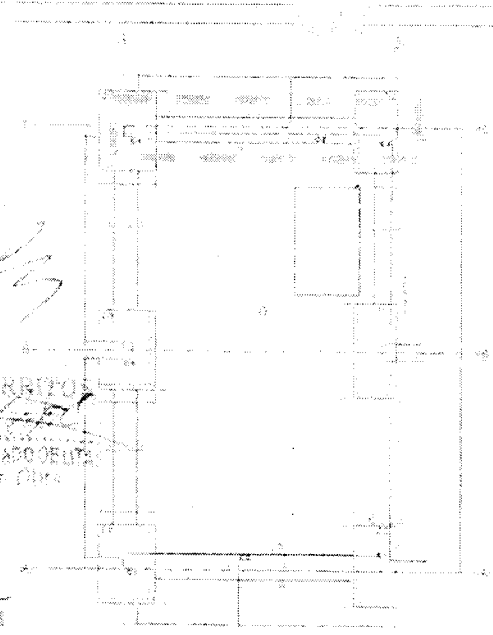

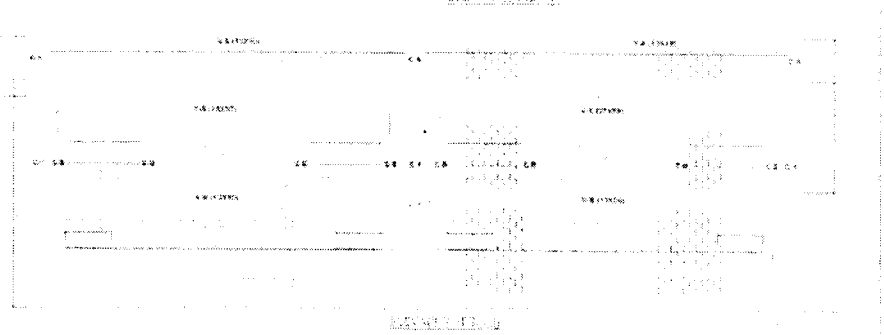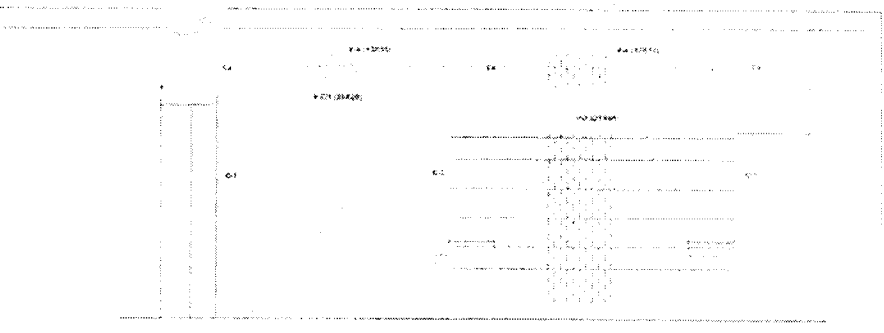

CONDICIONES DE OBRAS

Fondo Nacional de Desarrollo Pasquero	

E-46

220



REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
LIBRACION DE VACIADO DE CONCRETO

NAV: C7.55C/2003-F1
Fecha: 16/07/2019
Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: MEDICAMENTO DSA ACAPULCO
CLIENTE: FONDEPES
PLANO REF: OM 02 COD. PLS:
DESCRIPCION DEL TRABAJO: VIGAS Y NUCLEOS PCC-280 KG/CM2 C/IMPRESM/ARTIZANTE

CHECK LIST DE VERIFICACION DE COLOCACION DE ARMADURA

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Uniones de armadura (verificar si la armadura presenta curvatura)	✓			
2	Distanciamiento (F=3/8", 1/2", 5/8", 3/4" etc.)	✓			
3	Colocacion de Armadura (Tolerancia ± 0 a 1 cm)	✓			
4	Verificacion de Estructura (cantidad y separamiento)	✓			
5	Verificacion de longitudes de Traspape (Tolerancia ± 0 a 1 cm)	✓			
6	Colocacion de separadores (metalicos / sobre mailla)	✓			
7	Conformidad de recubrimiento (datos de concreto en lices / uniones de pasera en nudos)	✓			
8	Verificacion de diámetro según especificación (según estándar 20-1991)	✓			
9	Calidad de la armadura según norma ANSI/AISC E1.4. 20			N/A	
NOTA:					

RESPONSABLE DE ACERO: _____
Fecha de Inspección: _____ Firma: _____

TIPO DE ENCORRADO: _____ CHECK LIST DE VERIFICACION DE ENCORRADOS

Armadura Malla Otros Especificar: _____

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Verificacion de trazo y niveles	✓			
2	Colocacion de separadores / calador (rodaja)	✓			
3	Limpeza de pasadas y recosidos (bandas metálicas / pas de madera)	✓			
4	Conformidad de dimensiones (profundidad) y accesorios (alambres, cables, etc.)	✓			
5	Verificacion de niveles, verticalidad y horizontalidad de encofrado	✓			
6	Comprobación de recubrimientos (datos de concreto y/o separadores de plásticos)	✓			
7	Verificacion de conformación (de acuerdo a planos)	✓			
8	Verificacion de ordenes y/o biselas	✓			
9	Verificacion de insertos y encofrados			N/A	
10	Verificacion de horizontalidad de encofrado (colocacion de pasas en uniones)	✓			
11	Otros				

OTRA:

RESPONSABLE DE ENCORRADO: _____

IMPRESM/ARTIZANTE



REGISTRO CONTROL DE CALIDAD
LIBERACION DE VACIADO DE CONCRETO

CZ-56G-PC-03-F1
Rev: 0
Fecha: 18/07/2019
Pagina: 2 de 2

AREA / SECTOR:	MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO	FECHA:	18/07/2019
ESTRUCTURA / ELEMENTO:	VIGAS Y NUDOSOS F-280 K/G/C/M2	PLANO DE REF:	GM-02
RESISTENCIA (FC):	280 KG/CM2	VOLUMEN:	
	SUMP:	TIP. CEMENTO:	V


ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	CHECK LIST DE LIBERACION DE ESTRUCTURAS		OBSERVACION
		SI	NO	
1	Limpieza de la estructura	✓		
2	Topografía, cotas de fondo y nivel de concreto	✓		
3	Ejes y dimensiones	✓		
4	Verificación de la armadura según check list	✓		
5	Verificación del encofrado según check list	✓		
6	Juntas frías	✓		
7	HSS: tendido de redes de agua y desagüe, ubicación de puntos de salida y pasas para tuberías.			N/A
8	ITEE: todos los puntos (interruptores, tomacorrientes, TV, telefonía e internet/comunicados)	✓		N/A
9	Pernos de Anclaje y embelidas			N/A
10	Verificación del Prodecimiento de seguridad de acuerdo al estándar	✓		
11	Otros			

VACIADO Y MUESTREO DEL CONCRETO

Altura	Temperatura	Horas de Inicio	Horas de Final	hora inicio	hora término	T (°C)	W/C	W/C Control	W/C Control	W/C Control	W/C Control	W/C Control	W/C Control	W/C Control	W/C Control	W/C Control	W/C Control	W/C Control
280	VIGAS Y NUDOSOS F-280 K/G/C/M2			15:25	18:15	28	6"											4

COMENTARIOS

ELABORADO POR:	FECHA:	REVISADO POR:	FECHA:	APROBADO POR:	FECHA:
	18/07/2019		18/07/2019		18/07/2019



Lima, 05 de agosto del 2,019

CST.175501. ED.286.19

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Av. Petit Thouars N° 115 - Cercado de Lima

Lima.-

Atención : **Ing. Julio Aurelio Ríos Sousa**
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

Asunto : **Informe Mensual Contratista Consorcio Zorritos - mayo**


Referencia : Contrato N° 051-2017-FONDEPES Supervisión de la Ejecución de la Obra:
"Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar, Región Tumbes"

De mi consideración:

Es grato dirigimos a usted, para saludarlo y conforme a nuestras obligaciones contractuales relacionado al proyecto de la referencia, alcanzamos el Informe mensual del contratista, correspondiente al mes de julio de 2,019, en original, dos copias y CD.

Agradeciendo la atención a la presente, nos despedimos.

Atentamente,



Rubén Bossus Toniatti
Jefe de Supervisión
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

	
2917461	
N° DOC:	00007619-2019
CLAVE:	4990
USUARIO:	usuario_alog69
FECHA Y HORA:	05/08/2019 16:30:34
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	

 	HOJA DE TRANSMISION DE DOCUMENTOS	Número: 018
		Especialidad: Supervisión de Obra
Proyecto: Supervisión de Obra, "Mejoramiento de los Servicios del DPA ACAPULCO"		
Grupo o Sector: Edificaciones		

Para:	Ing. Julio Aurelio Ríos Sousa
De:	Ing. Rubén Bossus Toniatti
Fecha:	05/07/2019

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Planos | <input type="checkbox"/> | Especificaciones Técnicas |
| <input type="checkbox"/> | Criterios de Diseño | <input type="checkbox"/> | Memoria de Cálculos |
| <input type="checkbox"/> | Listado de Cantidad de Materiales | <input type="checkbox"/> | Hojas de Metrados |
| <input type="checkbox"/> | Planillas | <input type="checkbox"/> | Memoria Descriptiva |
| <input type="checkbox"/> | Valorizaciones | <input type="checkbox"/> | Resultados de Pruebas de Campo |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Informes | <input type="checkbox"/> | Otros |

Un juego (1) de los siguientes documentos es transmitido para:

- Revisión
 Aprobación
 Construcción
 Como Construido
 Conocimiento

Item	Código de Documento	Revisión	Título de Documento
1	CST-175501-IMC.20	0	Informe mensual contratista Consorcio zorritos - julio 2019
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



**INFORME MENSUAL DEL
CONTRATISTA**
CST-175501-IMC-18

Código del Proyecto: 175501
 Revisión: 0
 Páginas:
 Especialidad:
 Supervisión de Obra

Proyecto:
**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
 “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ACAPULCO,
 DISTRITO DEL ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR REGION TUMBES”**

Título: INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO ZORRITOS N° 20 – JULIO 2,019

CONTROL DE REVISIONES

Rev.	Fecha	Elaborado		Revisado		Verificado		Descripción del Cambio
		Iniciales	Firma	Iniciales	Firma	Iniciales	Firma	
	05.08.2019	CZ		RBT		RBT		emitido para Presentación



Acapulco 04 agosto 2019

CZOA 064-2019/ACAPULCO

Señores

CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES.

Acapulco, Dist. Zorritos, Prov. Contralmirante Villar, Región Tumbes

Presente. -

ATN.: ING. RUBÉN O. BOSSÚS TONIATTI
Jefe de Supervisión – DPA Acapulco

REF.: Mejoramiento de los servicios del desembarcadero
pesquero artesanal en la localidad de Acapulco,
distrito de Zorritos Provincia Contralmirante Villar,
Región Tumbes.

AST.: Adjuntamos Informe Mensual de julio 2019.

Estimados Señores,


Por intermedio de la presente nos dirigimos a Uds. a fin de adjuntar nuestro Informe Mensual del mes de julio 2019, correspondiente a la obra en referencia, en original y tres (3) copias.


Documentos que adjuntamos:

- Informe Mensual del mes de julio 2019, en original y tres (3) copias.
- CD conteniendo archivo digital del Informe del Mes de julio 2019.

Sin otro particular, quedamos de ustedes

Atentamente,


CONSORCIO ZORRITOS
Hernando Regalado Oblitas
Residente de Obra

RECIBIDO
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
FECHA: 04/08/19 HORA: 12:30 P.M.


CONTRATO DE OBRA N° 054 – 2017 - FONDEPES

EJECUCION DE LA OBRA

**“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA
LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE
ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE
VILLAR, REGIÓN TUMBES**



**INFORME MENSUAL N° 20
JULIO 2019
PARTE B**

CONTRATISTA




**CONSORCIO
ZORRITOS**

SUPERVISOR

**CONSORCIO SUPERVISOR
TUMBES**

Edgar Fernando Negalado Oblitas
CONSORCIO ZORRITOS
EDGAR FERNANDO NEGALADO OBLITAS
Ing Residente de Obra

Suplen




CONSORCIO ZORRITOS
FERNANDO REGALADO OBLITAS
Residente de Obra

ING. RUBEN BOSSUSTIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMPEZ
JEFE DE SUPERVISION

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

OM-02

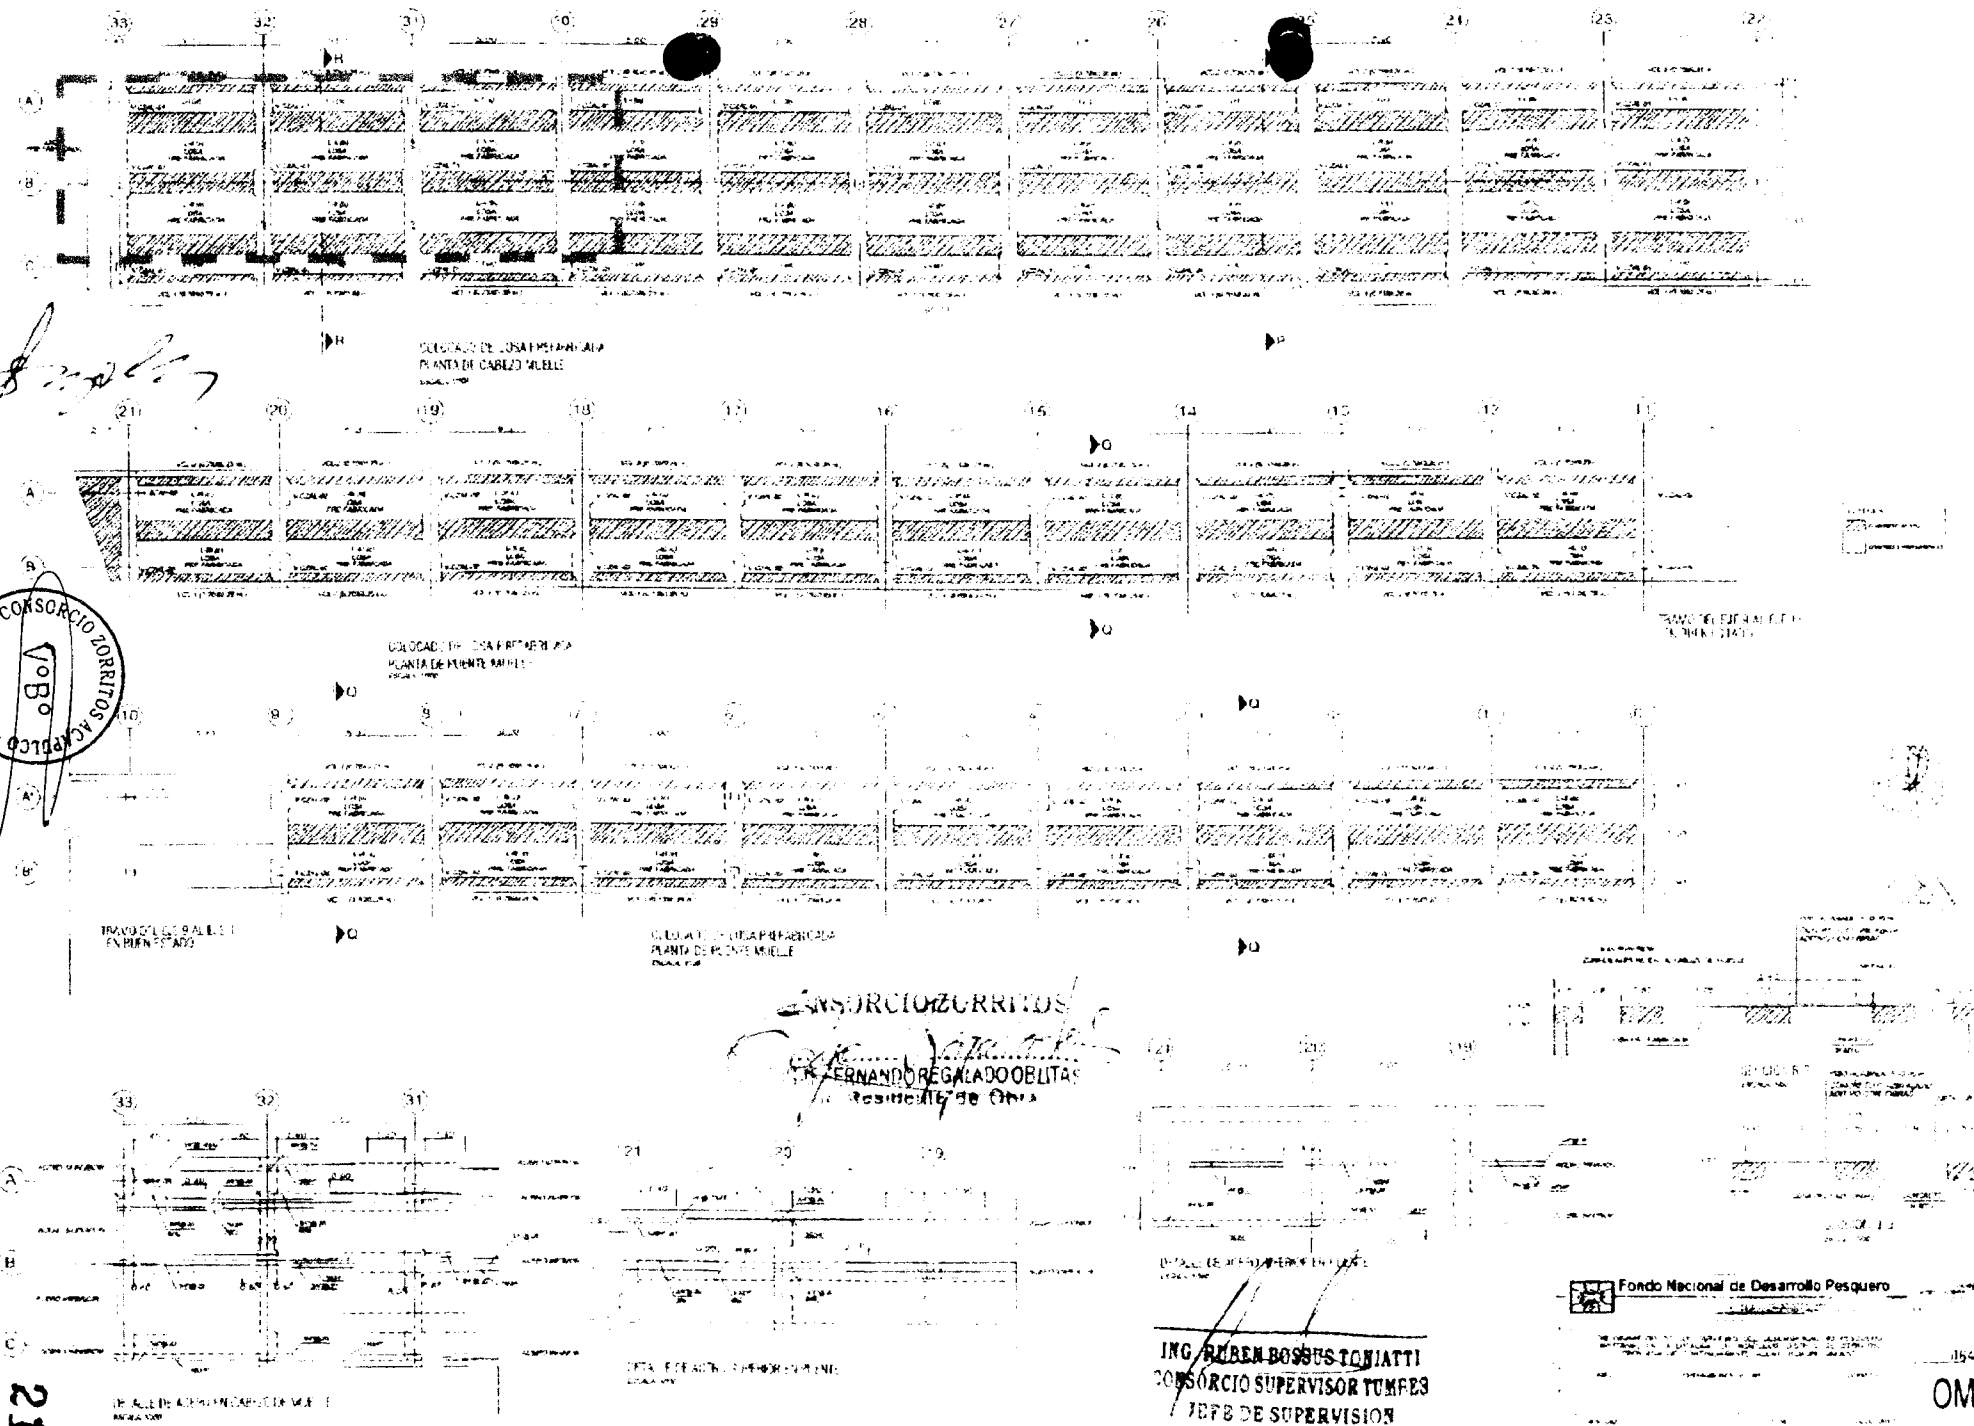

217

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO
FONDEPES

N° CORRELATIVO:

FECHA: 19/07/2019

CLIENTE:

FONDEPES

SECTOR:

FRIOS

PLANO REF:

AR-17

CÓD. PLS:

CS-SOC-LUC/OM

CONCRETO EN COLUMNETAS NIVEL 2 EJE B1 : B1* : B2*

SECTOR:

FRIOS

CHECK LIST DE VERIFICACION DE COLOCACION DE ARMADURA

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpieza de armadura (Verificar si la armadura presenta corrosión)	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	Distintos especificado: (1'-3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1kg)	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	Colocación de Armadura (Tolerancia ± 0.01 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	Verificación de Faltas (cantidad y espesamiento)	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Verificación de longitudes de Traspaso (Traspaso 1.0 a 1 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	Calcular de separadones (módulo / doble malla)			N/A	
7	Comprobación de recubrimiento (datos de concreto en losas / ruidos de plástico en muros)	<input checked="" type="checkbox"/>			
8	Verificación de dobleado según especificación (ancho y altura: 90-180)	<input checked="" type="checkbox"/>			
9	Soldadura de la armadura según Norma ANGLAWS D1493			N/A	
10	Otros:				

NOTA:

RESPONSABLE DE ACERO:

Firma:

Fecha de Inspección:

CHECK LIST DE VERIFICACION DE ENCOFRADOS


ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION	TIPO DE ENCOFRADO		
						Madera <input checked="" type="checkbox"/>	Herdita <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
1	Verificación de tiraz y niveles	<input checked="" type="checkbox"/>						
2	Colocación de desmoldante / sellador (madera)	<input checked="" type="checkbox"/>						
3	Limpieza de juntas y accesorios (planchas, tirafundo / pasavientos, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>						
4	Conformidad de dimensiones (movilización) y accesorios (alimbreros, cuñas, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>						
5	Verificación de niveles, verticalidad y horizontalidad de encofrado	<input checked="" type="checkbox"/>						
6	Conformidad de recubrimientos (datos de concreto y/o separadores de plástico)	<input checked="" type="checkbox"/>						
7	Verificación de Contralibras (de acuerdo a planeo)			N/A				
8	Verificación de oclavos y/o bisetes			N/A				
9	Verificación de insertos y embaldos	<input checked="" type="checkbox"/>						
10	Verificación de hermeticidad de encofrado (colocación de yeso en aristas)	<input checked="" type="checkbox"/>						
11	Otros:							

NOTA:

RESPONSABLE DE ENCOFRADO:

Firma:

Fecha de Inspección:



ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMAP
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS
ING. ERNESTO MORALES RODRIGUEZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRAS



**CONSORCIO
ZORRILLOS**

**REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
LIBERACION DE VACIADO DE CONCRETO**

CZ.SGC.PC.03-F1

Rev: 0

Fecha:

Página: 2 de 2

AREA / SECTOR:	MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO	FECHA:	19/07/2019
ESTRUCTURA / ELEMENTO:	CONCRETO EN COLUMNETAS - NIVEL 2 : EJE: B1 : B1* : B2*	PLANO DE REF.:	AR-17
RESISTENCIA (Fc):	315 KG/CM2	SLUMP:	5"-6"
		TIPO CEMENTO:	V
		VOLUMEN:	

CHECK LIST DE LIBERACION DE ESTRUCTURAS


ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpeza de la estructura	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	Topografía, cotas de fondo y nivel de concreto	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	Ejes y dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	Verificación de la armadura según check list	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Verificación del encofrado según check list	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	Juntas frías			N/A	
7	IISS: tendido de redes de agua y desagüe, ubicación de puntos de salida y peses para tuberías.			N/A	
8	IIEE: todos los puntos (Interruptores, tomacorrientes, TV, teléfono e intercomunicadores)			N/A	
9	Pernos de Anclaje y embebidos			N/A	
10	Verificación del Procedimiento de seguridad de acuerdo al estándar	<input checked="" type="checkbox"/>			
11	Otros.				



VACIADO Y MUESTREO DEL CONCRETO

Gua N°	Fc kg/cm2	Estructura	Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Termino T (°C)	Slump	Vol Colocado	Codigo Probetas	Hora Muestra	N° Probetas
	315	COLUMNETAS (FRIO -NIVEL 2)			9:30	11:50	28	6"			6"


COMENTARIOS

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Freddy González López	Nombre: Ing Edgar Regalado Dóñez	Nombre: Ruben Bossus Toniatti
Fecha: 19/07/2019	Fecha: 19/07/2019	Fecha: 19/07/2019



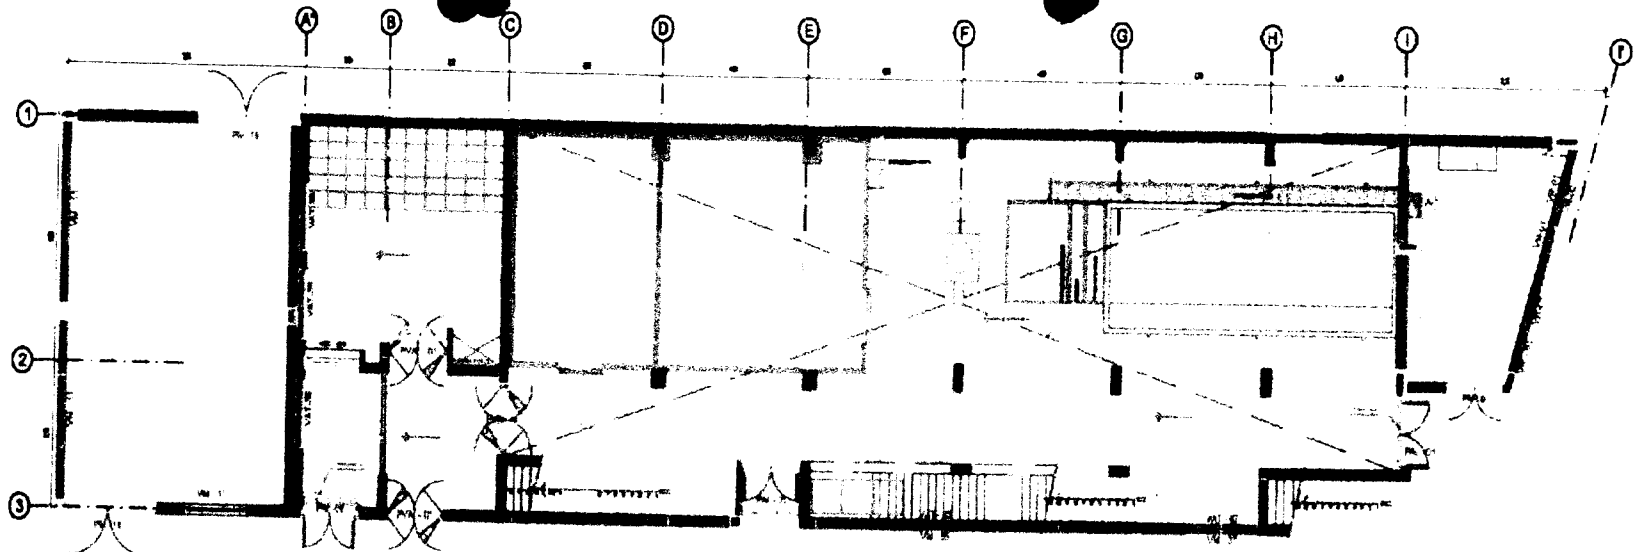

[Handwritten signature]

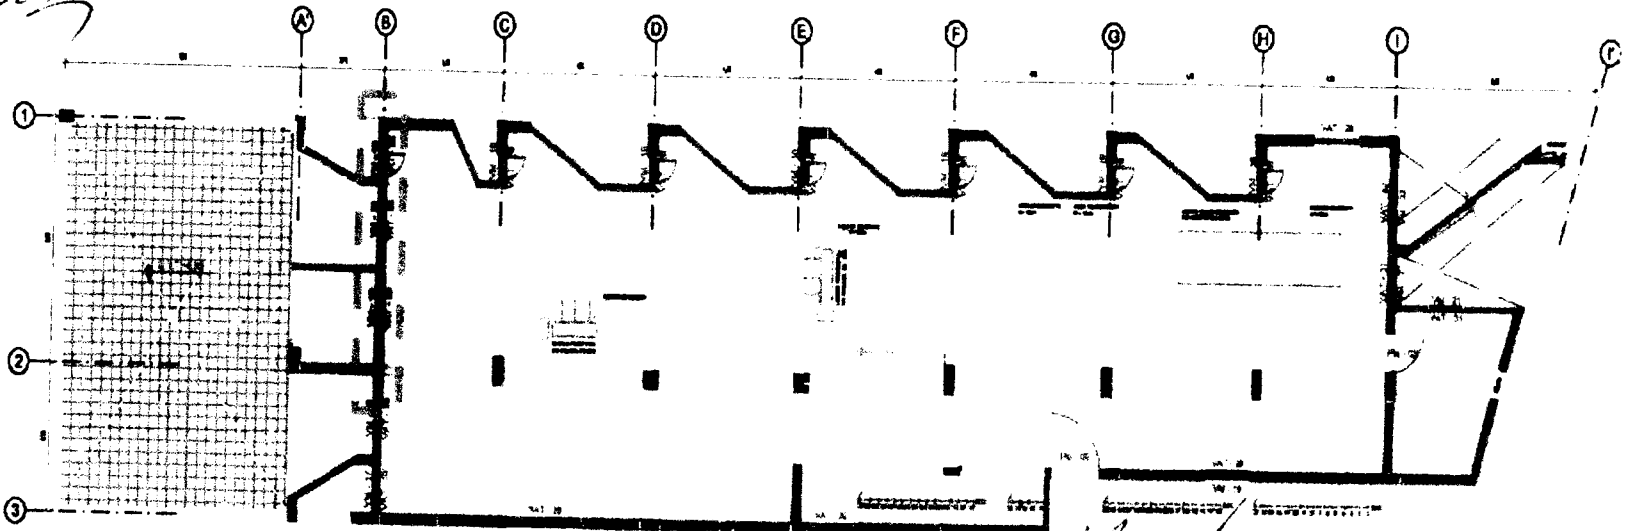

CONSORCIO ZORRITOS
Calle 122, 312
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS
CANTÓN DE GUÍA

ING. RUBEN BOSSUSTONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO
CLIENTE: FONDEPES
PLANO REF.: E-46 **CÓD. PLS:** CZ-SGC-LUC/OM
DESCRIPCION DEL TRABAJO: CONCRETO Fc= 140 KG/CM2 + 30% PIEDRA GRANDE CIMIENTO CORRIDO (EJE 1 : TRAMO C-B)

N° CORRELATIV
FECHA: 19/07/2019
SECTOR: PTAR

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE COLOCACION DE ARMADURA

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpieza de armadura (Verificar si la armadura presenta corrosión)			N/A	
2	Diámetro Especificado: (f =3/8", 1/2", 5/8", 3/4" plg.)			N/A	
3	Coloración de Armadura (Tolerancia ± 0 a 1 cm)			N/A	
4	Verificación de Estribos (cantidad y espaciamento)			N/A	
5	Verificación de Longitudes de Traslape (Tolerancia + 0 a 1 cm)			N/A	
6	Colocación de separadores (metálicos / doble malla)			N/A	
7	Conformidad de recubrimiento (dados de concreto en losas / ruedas de plástico en muros)			N/A	
8	Verificación de doblado según especificación (Gancho Estandar: 90-180)			N/A	
9	Soldadura de la armadura según Norma ANSI/AWS D1.4-92			N/A	
10	Otros				

RESPONSABLE DE ACERO: _____
Fecha de Inspección: _____

Firma: _____


CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE ENCOFRADOS

TIPO DE ENCOFRADO
Madera Metallo Otros Especifica: _____
Nombre de Desmoldante: _____

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Verificación de trazo y niveles	✓			
2	Colocación de desmoldante / sellador (madera)	✓			
3	Limpieza de paneles y accesorios (planchas metálicas / yesos de madera)	✓			
4	Conformidad de dimensiones (modulación) y accesorios (cabezales, cuñas, etc.)	✓			
5	Verificación de niveles, verticalidad y horizontalidad de encofrado	✓			
6	Conformidad de recubrimientos (dados de concreto y/o separadores de plástico)			N/A	
7	Verificación de Contraflechas (de acuerdo a planos)			N/A	
8	Verificación de ochavos y/o biseles			N/A	
9	Verificación de insertos y embebidos			N/A	
10	Verificación de hermeticidad de encofrado (colocación de yeso en aristas)	✓			
11	Otros				

RESPONSABLE DE ENCOFRADO: _____
Fecha de Inspección: _____

Firma: _____



ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS
ING. FERNANDO REGALADO OBLITAS

AREA / SECTOR:	MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO	FECHA:	19/07/2019
ESTRUCTURA / ELEMENTO:	CONCRETO Fc= 140 KG/CM2 + 30% PIEDRA GRANDE CEMENTO CORRIDO (EJE 1 : TRAMO C-B)	PLANO DE REF.:	E-46
RESISTENCIA (fc):	140 + 30% PG	TIPO CEMENTO:	V
		VOLUMEN:	


ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	CHECK LIST DE LIBERACION DE ESTRUCTURAS				OBSERVACION
		SI	NO			
1	Limpieza de la estructura					
2	Topografía, cotas de fondo y nivel de concreto	V				
3	Ejes y dimensiones:	V				
4	Verificación de la armadura según check list				N/A	
5	Verificación del encofrado según check list	V				
6	Junta Frías				N/A	
7	IISS: tendón de redes de agua y desague; ubicación de puentes de salida y bases para tuberías.				N/A	
8	ITL: todos los puntos (Inferiores, tomacorrientes, TV, teléfono e internet/comunicadores)				N/A	
9	Pernos de Anclaje y embudidos				N/A	
10	Verificación del Procedimiento de seguridad de acuerdo al estándar.	V				
11	Otros:					

VACIADO Y MUESTREO DEL CONCRETO

Tipo de Muestra	Estructura	Hora Salida	Hora Ingreso	Hora Inicio	Hora Término	T (°C)	Slump	VOLUMEN	
								Vol Colado	Código Puntos
140 + 30% PG	CIMENTO CORRIDO EJE 1 TRAMO C-B			13:00	17:15	28			

COMENTARIOS

ELABORADO POR:	Firma:	REVISADO POR:	Firma:	APROBADO POR:	Firma:
Nombre: Freddy Gonzalez Lopez	[Firma]	Nombre: Ing Edgar Regalado Obledo	[Firma]	Nombre: Ruben Bossus Tomiatti	[Firma]
Cha: 19/07/2019	Fecha: 19/07/2019	Fecha: 19/07/2019	Fecha: 19/07/2019	Fecha: 19/07/2019	



MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO

FONDEPES

N° CORRELATIVO:

FECHA: 19/07/2019

CLIENTE:

E-46

COD. PLS: CZ-5GC-LUC/DM

SECTOR:

PTAR

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

CONCRETO EN ZAPATAS: EJE 2 FCB-315 KG/CM2

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE COLOCACION DE ARMADURA			OBSERVACION
		SI	NO	N/A	
1	Limpieza de armadura (Verificar si la armadura presenta corrosión)	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	Diámetro Especificado: (f = 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" plg.)	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	Colocación de Armadura (Tolerancia ± 0 a 1 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	Verificación de Estribos (cantidad y espaciamiento)			N/A	
5	Verificación de Longitud de traspaso (Tolerancia ± 0 a 1 cm)			N/A	
6	Colocación de separadores (metálicos / doble malla)			N/A	
7	Conformidad de recubrimiento (datos de concreto en losas / ruedas de plástico en muros)	<input checked="" type="checkbox"/>			
8	Verificación de doblado según especificación (Gancho Estándar: 90°-180°)	<input checked="" type="checkbox"/>			
9	Soldadura de la armadura según Norma ANSI/AWS D1.4			N/A	
10	Otros				

NOTA:

RESPONSABLE DE ACERO:

Firma:

Fecha de Inspección:

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE ENCOFRADOS

TIPO DE ENCOFRADO

Madera

Metalico

Otros

Especifique:

Nombre de Desmoldante

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Verificación de trazo y niveles	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	Colocación de desmoldante / sellador (madera)	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	Limpieza de paneles y accesorios (planchas metálicas / otros de madera)	<input checked="" type="checkbox"/>		N/A	
4	Conformidad de dimensiones (modulación) y accesorios (alineadores, cuñas, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Verificación de niveles, verticalidad y horizontalidad de encofrado	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	Conformidad de recubrimientos (datos de concreto y/o separadores de plástico)	<input checked="" type="checkbox"/>			
7	Verificación de continuidades (de acuerdo a planos)			N/A	
8	Verificación de oclavos y/o biseltes			N/A	
9	Verificación de insertos y embaldos	<input checked="" type="checkbox"/>			
10	Verificación de hermeticidad de encofrado (colocación de vaso en aristas)	<input checked="" type="checkbox"/>			
11	Otros				

NOTA:

RESPONSABLE DE ENCOFRADO:

Firma:

CONSORCIO ZORRITOS

Fecha de Inspección:



ING. ROBERTO BOSCH CONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TOMBES
JEFE DE SUPERVISION

MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO

CONCRETO EN ZAPATAS: EJE 2 Fca315 KG/CM2

FECHA: 19/07/2019
PLANO DE REF.: E-46

AREA / SECTOR:
ESTRUCTURA / ELEMENTO:
RESISTENCIA (f'c): 315 KG/CM2
SLUMP: 5"-6"
TIPO CEMENTO: V
VOLUMEN:

CHECK LIST DE LIBERACION DE ESTRUCTURAS

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpieza de la estructura	V			
2	Topografía, cotas de fondo y nivel de concreto	V			
3	Ejes y dimensiones	V			
4	Verificación de la armadura según check list	V			
5	Verificación del encofrado según check list	V			
6	Juntas frías			N/A	
7	TISS, tenidor de redes de agua y desagüe, utilización de puntos de salida y gases para tuberías, llaves, todos los puntos (interruptores, tomacorrientes, TV, teléfonos e internet/comunicadores)			N/A	
8	TV, teléfono e internet/comunicadores			N/A	
9	Pernos de Anclaje y embebidos			N/A	
10	Verificación del Procedimiento de seguridad de acuerdo al estándar	V			
11	Otros				

VACIADO Y MUESTREO DEL CONCRETO


N°	Region	Estructura	Horario Liberación	Horario Muestreo	hora inicio	hora término	T (°C)	Slump	Vol. Cargado	Código Fichas	hora Muestreo	N° Probas
315		ZAPATAS EJE 2 A B C			10:54	15:36	28	6				4


COMENTARIOS

ELABORADO POR: Freddy González López
Freddy González López
Fecha: 19/07/2019

REVISADO POR: Ing. Edgar Rodríguez Ojitas
Edgar Rodríguez Ojitas
Fecha: 19/07/2019

APROBADO POR: Rubén Bossus Tomatti
Rubén Bossus Tomatti
Fecha: 19/07/2019




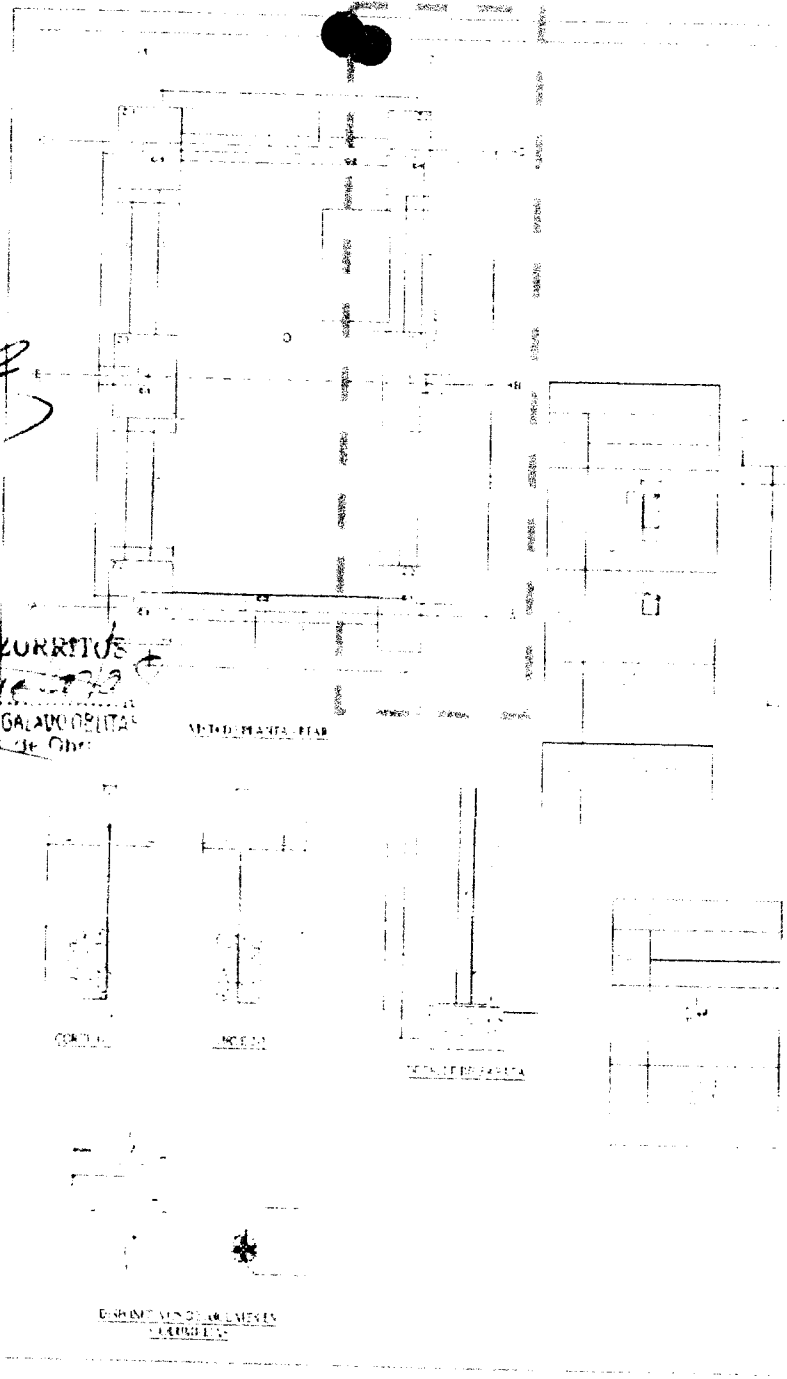

Boletín

CONSORCIO ZORRITOS A.C.
 Vº Bo
 CONSORCIO ZORRITOS A.C.
 LIB. RESERVAS

CONSORCIO ZORRITOS
 C/ ERNANDO REGALADO BUSTA
 P.O. BOX 124

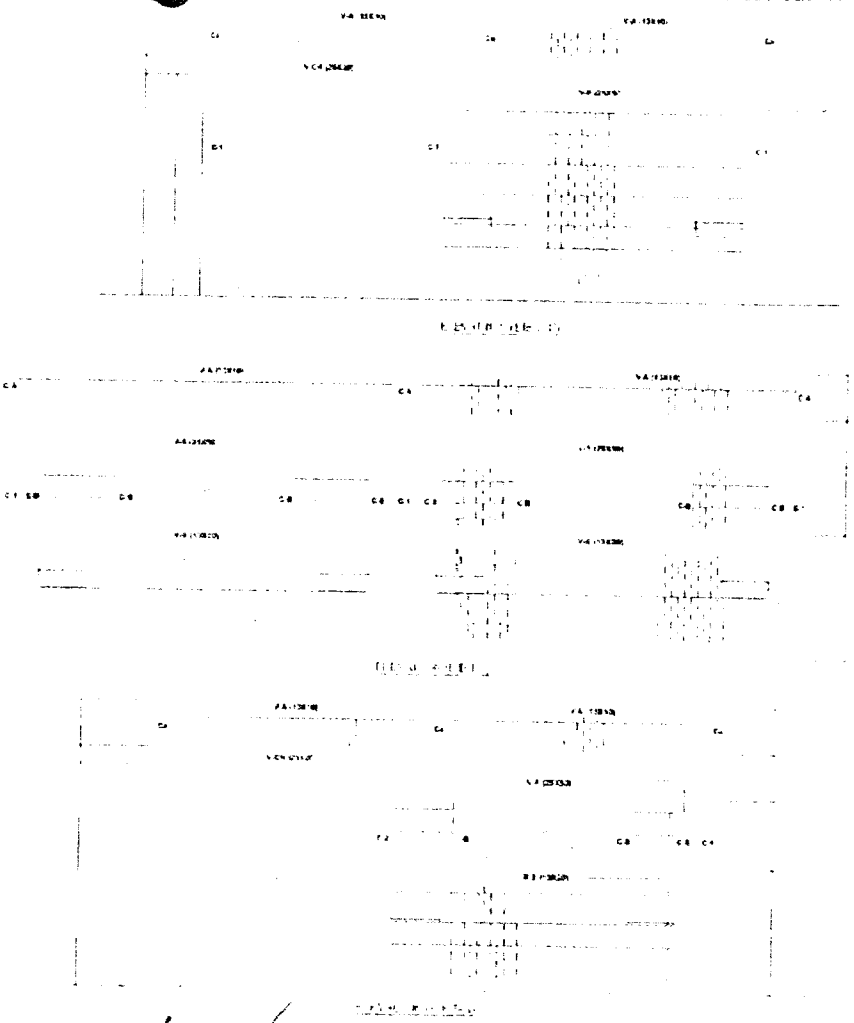

R. B.
ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
 FONDOPESCA
 Oficina de Supervisión
 Proyecto de Infraestructura para la Acuicultura
 Construcción de Infraestructura para la Acuicultura en Tumbes

REGISTRO DE CONTROL DE ALBAÑILERÍA

Rev: _____
 Fecha: _____
 Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: MEMBRAMIENTOS DE LA ALBAÑILERÍA
CLIENTE: ZORRITOS
PLANO REF.: AR-04 **CÓD. PLS.:** CZ.SGC.LA/A.F **N° CORRELATIVO:** _____
FECHA: 19-07-2019 **SECTOR:** FRIOS
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: ASENTADO LADRILLO DE SOGA : TEATINA NIVEL : 3

Elemento: MURO DE TABIQUERIA **Código de Tabique:** _____
Fecha del Registro: _____ **Fecha del Asentado:** 19/07/2019
Area Asentada (m2): _____
Etapa: _____
Documentos de Referencia: _____ **Revisión:** _____ **Observaciones:** _____

Lista de Verificación Previa al Asentado (Ver Plano de Detalle)	FECHA	CONTRATISTA	FECHA	SUPERVISION
Sobrecimiento de Muro Terminado	19/07/2019	V		
Espesor de Juntas Definido	19/07/2019	V		
Alineamiento	19/07/2019	V		
Refuerzo de Juntas	19/07/2019	V		
Armadura de Refuerzo cumple E I del proyecto D=	19/07/2019	V		
Duwells Instalados		N/A		
Altura de Asentado Definida	19/07/2019	V		
Losas con huecos de limpieza habilitadas		N/A		
Losas Metalicos para vaciado de alveolos donde las hiladas inferiores no se rellenan con concreto liquido habilitado		N/A		
Autorizado para el Asentado	19/07/2019	V		

SUPERVISOR CALIDAD: _____ **Fecha:** _____

Lista de Verificación Posterior al Asentado	FECHA	CONTRATISTA	FECHA	SUPERVISION
Variación <input checked="" type="checkbox"/> Vertical <input checked="" type="checkbox"/> Nivel <input checked="" type="checkbox"/> Juntas asentado	19/07/2019	V		
Superficie Expuesta de la Albañilería Limpia	19/07/2019	V		
Refuerzo de Juntas	19/07/2019	V		
Armadura de Refuerzo cumple ET del proyecto D=	19/07/2019	V		
Juntas de Control o Expansión	19/07/2019	V		

Acero Mecanicos Sanitarios Electricos
 Limpieza de alveolos a ser llenados con concreto liquido
 Huecos de limpieza clausurados
 Corte de Mortero de Juntas al ras

SUPERVISOR CALIDAD: _____ **Fecha:** _____



Lista de Verificación Posterior al Vaciado	FECHA	CONTRATISTA	FECHA	SUPERVISION
Metodo de Curado Apropriado		N/A		
Accesorios de Fijación Colocados		N/A		
Resane de las superficies Terminado		N/A		

Comentarios: _____

ELABORADO POR: Firma:	REVISADO POR: Firma:	APROBADO POR: Firma:
Nombre: Freddy Gonzalez Lopez	Nombre: Ing. Edgar Regalado Oblitas	Nombre: Ing. Ruben Bossus Toniatti



Boyle

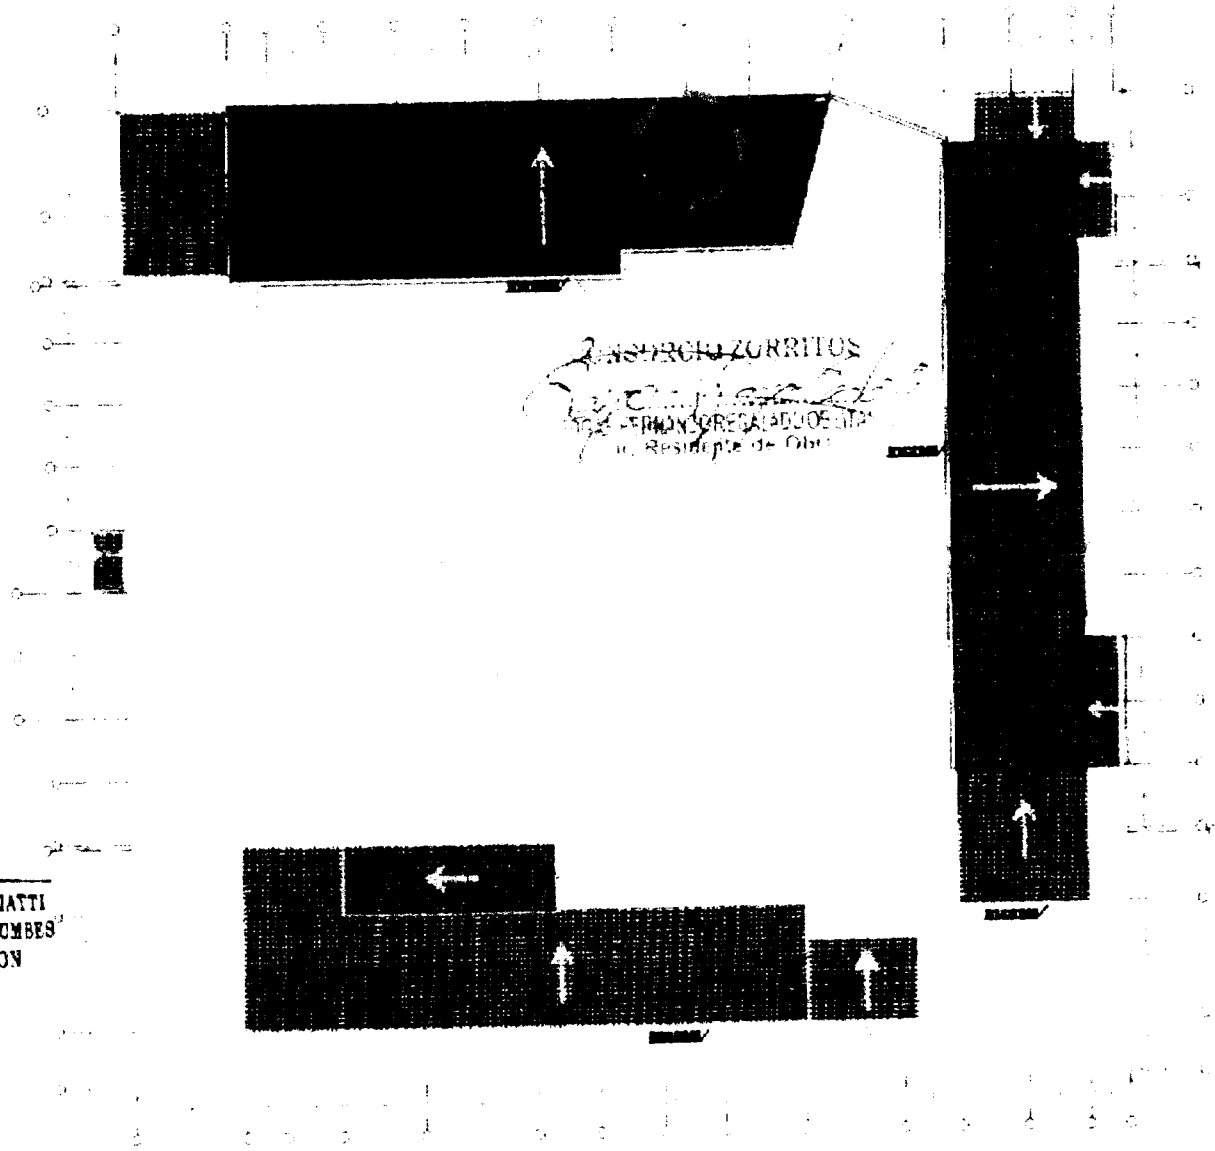

CONSORCIO ZORRITOS
[Signature]
ING. FERNANDEZ GARCIA
Ing. Residencia de Obra

[Signature]
ING. RUBEN BOSSUTOMIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
AREA DE SUPERVISION




REGISTRO		CZ.SGC.PC.03-F1
CONTROL DE CALIDAD		Rev: 1
INSPECCIÓN DE TARRAJEOS Y DERRAMES		FECHA: 19-07-2019
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE ACAPULCO	Nº CORRELATIVO:
CLIENTE:	FONDEFPS	FECHA: 19-07-2019
PLANO REF:	AR-16	COD. PLS: CZ-SGC-LTA-D
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:	TARRAJEO DE MURO EJE 3' : tramo : B-C*	AREA: TAREAS PREVIAS

Verificaciones Generales:

Limpieza V
 Rugosidad V
 Humedad V




Ambiente

	Contrazocalo c/ cemento pulido			Encuentro cielo raso-muro tipo Media Caña			Verticalidad de derrame			Contrazocalo sanitario			Dimensiones de vanos			Cieloraso		
	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.
ACCESO A LA MEZZANINE	V			V			V											

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Freddy González López	Nombre: Ing. Edger Regalado Obías	Nombre: Ing. Ruben Bossus Torvatt
FECHA: 19-07-2019	FECHA: 19-07-2019	FECHA: 19-07-2019

205

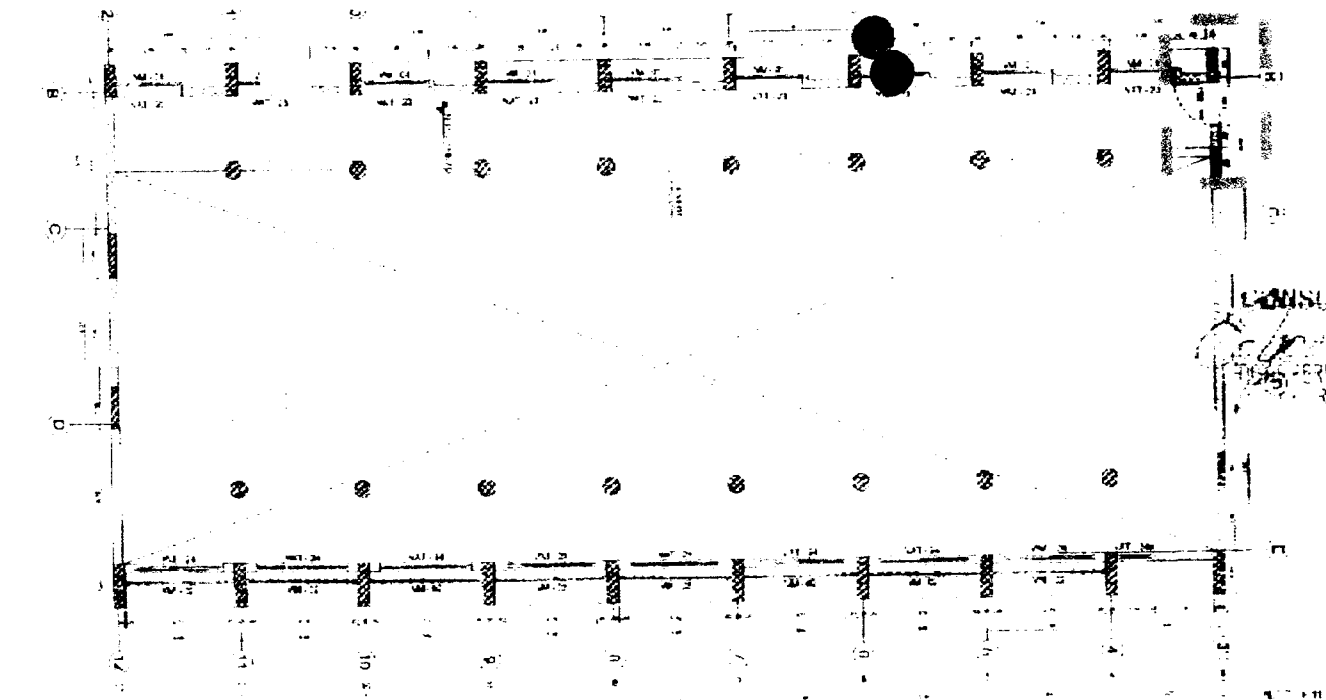

CONSORCIO ZORRITOS
 INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 S.A.S. - BOGOTÁ - COLOMBIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ING. RUBEN BOSSUSTONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR YUMBE
 JEFE DE SUPERVISION

N.T. + 11.50

N.T. + 9.25

N.P. + 4.75

N.P. + 5.40


N.P. + 4.15

Core 3-3

Corte 4-4

TABLA DE CERRAMINOS
 N.P. + 4.5

TABLA DE CERRAMINOS
 N.P. + 4.5



204

Por de Indic al de Desarrollo Proyecto	137
Fecha de Emisión	
Fecha de Actualización	
Elaborado por	
Revisado por	
Aprobado por	

A-16

NOMBRE DEL PROYECTO: ZORRITOS

CLIENTE: E-46

PLANO REF.: E-46

DESCRIPCION DEL TABLADO: CONCRETO Fc = 140 KG/CM2 + 30% PIEDRA GRANDE CEMENTO CORRIDO (EJE C : TRAMO 1-1°)

COD. PLS: C2-SGC-LUC/OM

N° CORRELATI: PTAR

FECHA: 20/07/2019

SECTOR: PTAR

Rev:

Fecha:

Página: 1 de 1

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE COLOCACION DE ARMADURA

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpieza de armadura (Verificar si la armadura presenta corrosión)			N/A	
2	Diámetro Especificado: (+ 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" (plu))			N/A	
3	Colocación de Armadura (Tolerancia ± 0.2 cm)			N/A	
4	Verificación de Fibras (cantidad y espaciamiento)			N/A	
5	Verificación de Longitudes de Traspase (Tolerancia L n x 1 cm)			N/A	
6	Colocación de separadores (metales / doble malla)			N/A	
7	Conformidad de recubrimiento (datos de concreto en L035 / Tuedas de plástico en Muros)			N/A	
8	Verificación de doblado según especificación (Ganchu Estándar: 90 10u)			N/A	
9	Calidad de la armadura según Norma ANSI, AWS D1.4-92			N/A	
10				N/A	

RESPONSABLE DE ACERO: _____
 Fecha de Inspección: _____
 Firma: _____

IPO DE ENCOFRADO

Madera Metalico Otros
 Nombre de Desmoldante: _____
 Fspacificque: _____

CHECK LIST DE VERIFICACION DE ENCOFRADOS

EM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Verificación de trazo y niveles			N/A	
2	Coloración de desmoldante / sellador (madera)			N/A	
3	Longitud de juntas y accesorios (planchas metálicas / ... de madera)			N/A	
4	Comunidad de dimensiones (modulación) y accesorios (adhesivos, cuñas, etc.)			N/A	
5	Verificación de niveles, verticalidad y horizontalidad de encofrado			N/A	
6	Conformidad de recubrimientos (datos de concreto y/o separadores de plástico)			N/A	
7	Verificación de Contraflechas (de acuerdo a planos)			N/A	
8	Verificación de ocharos y/o biselados			N/A	
9	Verificación de insertos y embobidos			N/A	
10	Verificación de hermeticidad de encofrado (colocación de yeso en aristas)			N/A	
11	Otros			N/A	

CONSORCIO ZORRITOS

CONSABLE DE ENCOFRADO: _____
 Fecha de Inspección: _____
 Firma: _____

ING. RAUL BOSCHETTI FORIATTI
 CONSEJO SUPERVISOR FEDERAL
 AREA DE SUPERVISION

203

AREA / SECTOR: MEJORAMIENTO DPA ACAPILCO
 ESTRUCTURA / ELEMENTO: CONCRETO Fc= 140 KG/CM² + 30% PIEDRA GRANDE CIMENTO CORRIDO (EJE C; TRAMO 1-1*)
 RESISTENCIA (F'c): 140+30% PG SLUMP: ... TIPO CEMENTO: V VOLUMEN:
 FECHA: 20/07/2019
 PLANO DE REF.: E-46

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	CHECK LIST DE LIBERACION DE ESTRUCTURAS				OBSERVACION
		SI	NO	T (°C)	U	
1	Limpieza de la estructura					
2	Topografía, cribas de fondo y nivel de concreto	V		N/A		
3	Ejes y dimensiones	V		N/A		
4	Verificación de la armadura según check list			N/A		
5	Verificación del vinculado según check list	V		N/A		
6	Juntas tras			N/A		
7	1155: estudio de riegos de agua y drenaje, publicación de plan de salida y gases para tuberías, 1158: todos los puntos (interruptores, fontanerías, TV, teléfono e intercomunicadores)			N/A		
8	Pernos de Anclaje y embudidos			N/A		
9	Verificación del Procedimiento de seguridad de acuerdo al estándar	V		N/A		
10						
11	Otros					


VALUADO Y MUESTREO DEL CONCRETO

Frecuencia	Superficie	1er. Suido	Hora Inicial	Hora Final	Hora Total	T (°C)	U	Vit. Oxígeno	Carbón Púdicos	1157: Muestreo	V. Frecuencia
140+30% PG	CIMIENTO CORRIDO EJE C; TRAMO 1-1*		09:15	12:00	2h						
MONTAJES											


ELABORADO POR: [Firma] REVISADO POR: [Firma] APROBADO POR: [Firma]
 Dte: Freddy González López Nombre: Ing Edgar Regalado Obillas
 a: 20/07/2019 Fecha: 20/07/2019



Handwritten signature



CONSORCIO ZORRITOS
ING. FERNANDO REYES AGUIAR
Ing. Residente de Chile

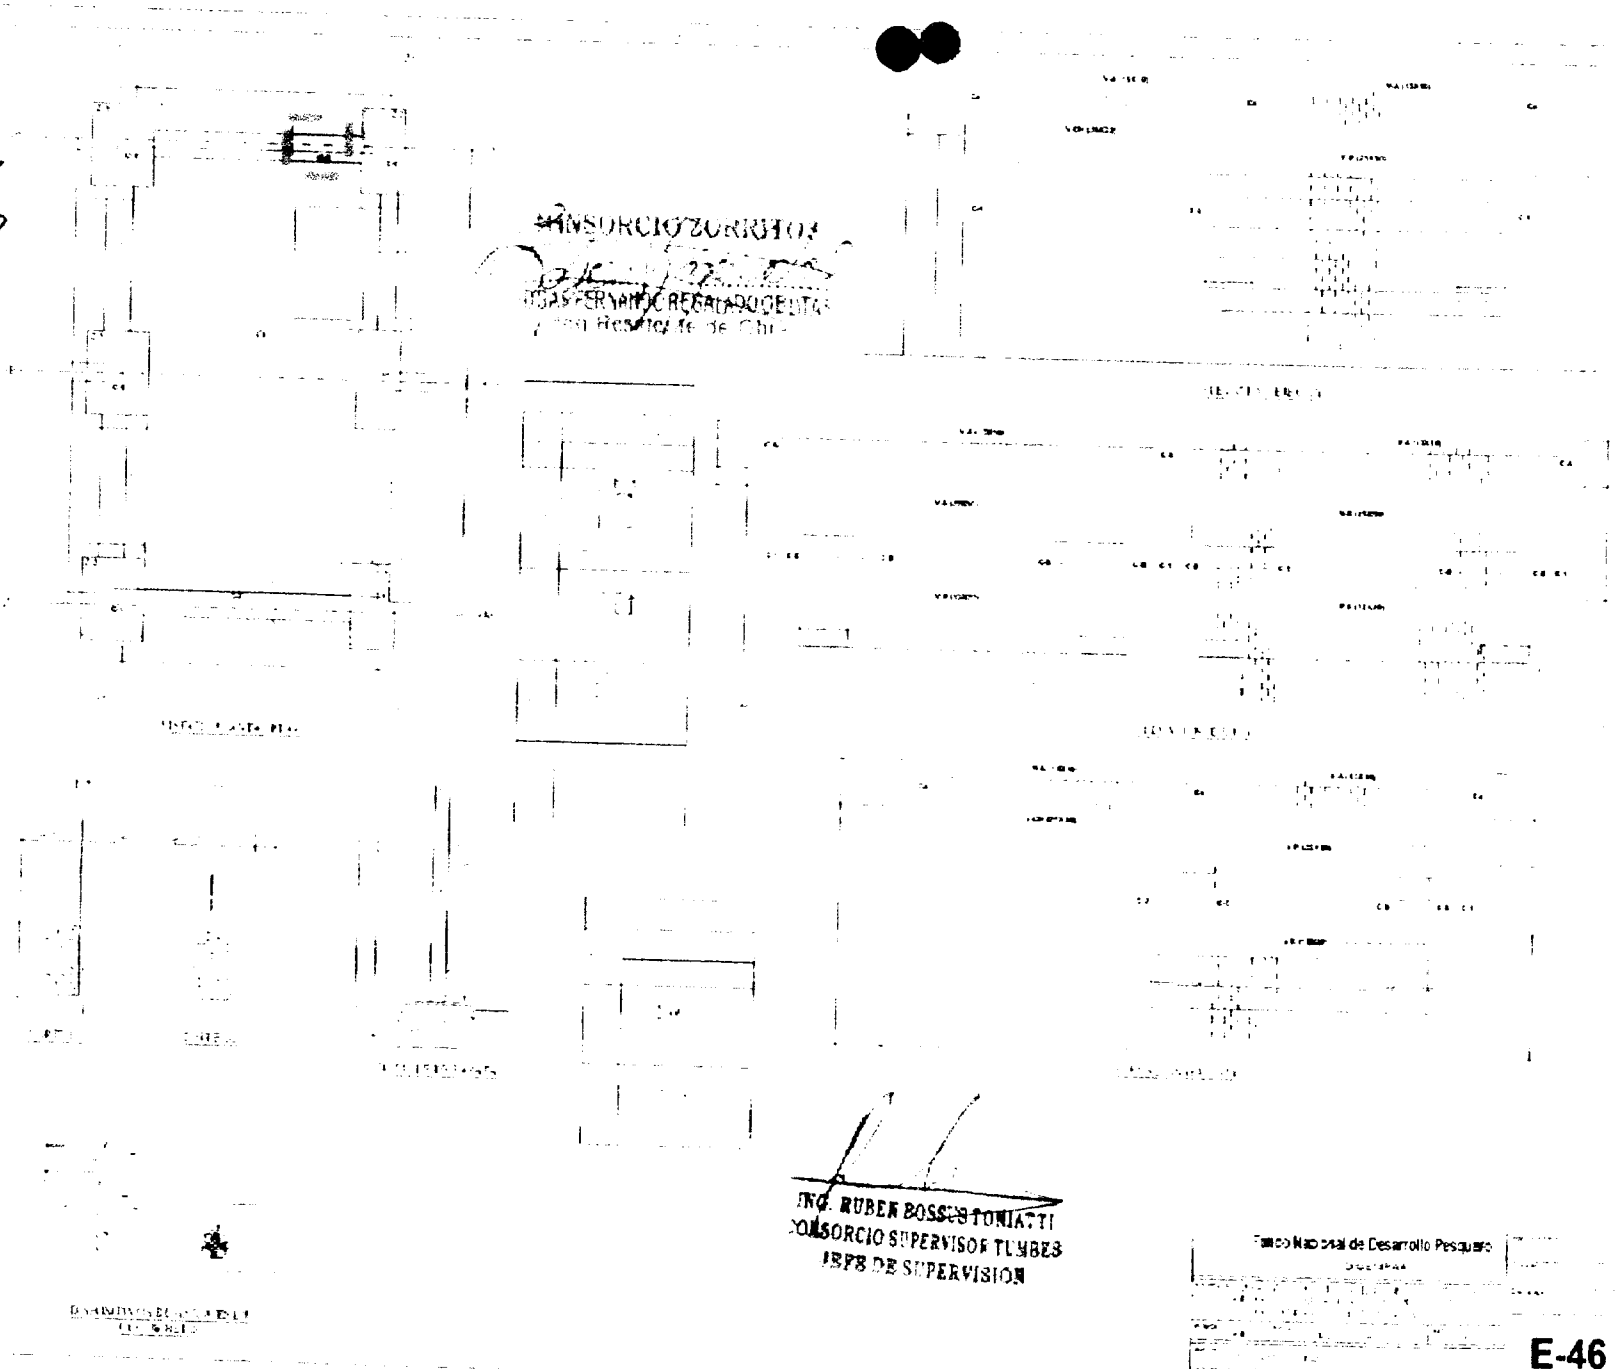

Handwritten signature
ING. RUBEN BOSCH TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
ISFB DE SUPERVISION

Formulario del Banco Nacional de Desarrollo Pesquero
E-46



NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO
CLIENTE: FONDEPES
PLANO REF.: OM-02 **CÓD. PLS.:** CZ-SGC-LUC/OM
DESCRIPCION DEL TRABAJO: VIGAS Y NUCLEOS Fc=280 KG/CM2 C/IMPERMEABILIZANTE

N° CORRELATIVO:
FECHA: 20/07/2019
SECTOR: MUELLE -CABEZO-

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE COLOCACION DE ARMADURA

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpieza de armadura (Verificar si la armadura presenta corrosión)	✓			
2	Diámetro Especificado: (f = 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" plg.)	✓			
3	Colocación de Armadura (Tolerancia ± 0 a 1 cm)	✓			
4	Verificación de Estribos (cantidad y espaciamento)	✓			
5	Verificación de Longitudes de Traslape (Tolerancia ± 0 a 1 cm)	✓			
6	Colocación de separadores (metálicos / doble malla)	✓			
7	Conformidad de recubrimiento (dados de concreto en Losas / ruedas de plástico en muros)	✓			
8	Verificación de doblado según especificación (Gancho Estandar: 90-180)	✓			
9	Soldadura de la armadura según Norma ANSI/AWS D1.4-92			N/A	
10	75				

REponsable de ACERO: _____ **Firma:** _____
Fecha de Inspección: _____


CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE ENCOFRADOS

TIPO DE ENCOFRADO
Madera Metálico Otros Especifique: _____
Nombre de Desmoldante: _____

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Verificación de trazo y niveles	✓			
2	Colocación de desmoldante / sellador (madera)	✓			
3	Limpieza de paneles y accesorios (planchas metálicas / es de madera)	✓			
4	Conformidad de dimensiones (modulación) y accesorios (lineadores, cuñas, etc.)	✓			
5	Verificación de niveles, verticalidad y horizontalidad de encofrado	✓			
6	Conformidad de recubrimientos (dados de concreto y/o separadores de plástico)	✓			
7	Verificación de Contraflechas (de acuerdo a planos)	✓			
8	Verificación de ochavos y/o biseles	✓			
9	Verificación de insertos y embebidos			N/A	
10	Verificación de hermeticidad de encofrado (colocación de yeso en aristas)	✓			
11	Otros				

NOTA:

REponsable de ENCOFRADO: _____ **Firma:** _____
Fecha de Inspección: _____



CONSORCIO ZORRITOS
ING. RUBEN BOSSUS TORIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

AREA / SECTOR: MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO
ESTRUCTURA / ELEMENTO: VIGAS Y NUCLEOS $f_c=280 \text{ KG/CM}^2$ C/IMPERMEABILIZANTE
FECHA: 20/07/2019
PLANO DE REF.: OM-02
RESISTENCIA (Fc): 280 KG/CM2 **SLUMP:** 5"-6" **TIPO CEMENTO:** V **VOLUMEN:**

CHECK LIST DE LIBERACION DE ESTRUCTURAS


ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpiaza de la estructura	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	Topografía, cota de fondo y nivel de concreto	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	Esbozo y dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	Verificación de la armadura según check list	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Verificación del encofrado según check list	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	Juntas frias	<input checked="" type="checkbox"/>			
7	PLAN: tendido de redes de agua y desagüe, ubicación de puntos de salida y pasos para tuberías			N/A	
8	PLAN: todos los puntos (interruptores, tomacorrientes, TV, teléfono e intercomunicadores)	<input checked="" type="checkbox"/>			
9	Pernos de Anclaje y embutidos			N/A	
10	Verificación del Procedimiento de seguridad de acuerdo al estándar	<input checked="" type="checkbox"/>			
11	Otros				

VACTADO Y MUESTREO DEL CONCRETO

Nº	Resistencia	Estructura	Fecha Inicio	Hora Inicio	Hora Fin	Hora Termino	T (°C)	Slump	Vol. Colocados	Calidad Problemas	Hora Muestreo	Nº Probetas
	280	VIGAS Y NUCLEOS $f_c=280 \text{ KG/CM}^2$ RAMO 29-30			12:40	18:40	28	6"				4

COMENTARIOS

ELABORADO POR: Firma: <i>Freddy González López</i> Nombre: Freddy González López Fecha: 20/07/2019	REVISADO POR: Firma: <i>Edgar Kogelato Obillas</i> Nombre: Ing. Edgar Kogelato Obillas Fecha: 20/07/2019	APROBADO POR: Firma: <i>Ruben Bossus Tonlati</i> Nombre: Ruben Bossus Tonlati Fecha: 20/07/2019
--	--	---





**CONSORCIO
ZORRITOS**

**REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD**

INSTALACION DE CERAMICOS Y PORCELANATOS

CZ.SGC.PC.03-F1

Revisión: 01

Fecha: 20/07/2019

Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO

CLIENTE: FONDFES

N° CORRELATIVO:

Fecha: 20/07/2019

PLANOS DE REFERENCIA: AR-12

SECTOR: ADMINISTRACION

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: PISO DE PORCELANO 0.60 X 0.60 m ANTIDESISLIZANTE DE ALTO TRAFICO

AMBIENTE: TESORERIA : ADMINISTRACION GRFMTO DE PESCADORES

CHECK LIST DE VERIFICACION

ITEM	DESCRIPCION DEL TRABAJO	ESTADO		
		C	NC	NA
1	ASEO GENERAL DEL SECTOR DE TRABAJO	V		
2	VERIFICACION NIVELACION DE PISO	V		
3	TRAZADOS	V		
4	TIPO Y CALIDAD DE LOS MATERIALES	V		
5	PREPARACION DE AHESIVO	V		
6	COLOCACION DE PORCELANATO	V		
7	VERIFICACION DE FRAGUADO			
8	OTROS			

COMENTARIOS:

ELABORADO POR:

Firma

Control Calidad
Nombre: Freddy Gonzalez L

APROBADO

Firma


Ing. Residente
Nombre: EDGAR REGALADO OBLITAS

SUPERVISION

Firma

Ing. Supervision
Nombre: RUBEN BOSSUS TONIATTI





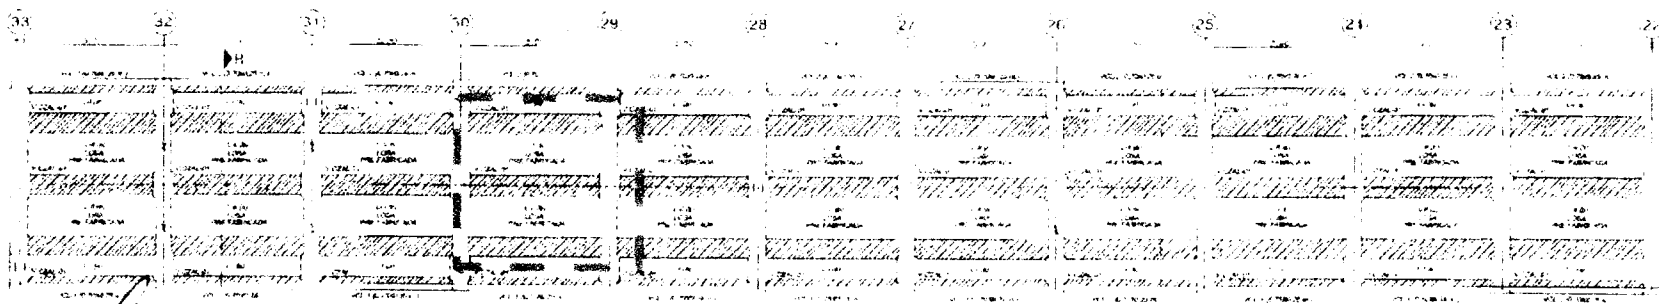



[Handwritten signature]

CONSORCIO ZORRITOS
 CONSERVANDO REGALADO OBITO
 Jefe de Supervision

CONSORCIO ZORRITOS
 VOTO
 Ing. Responde

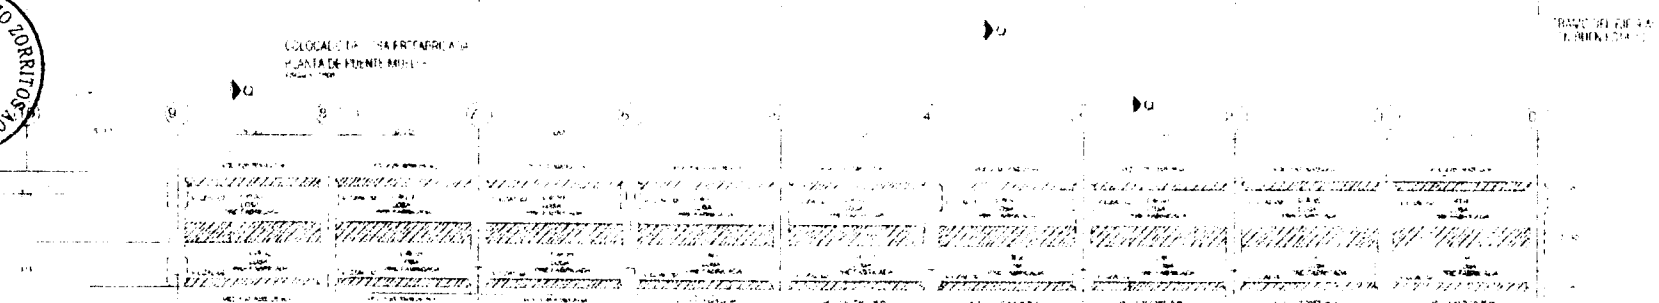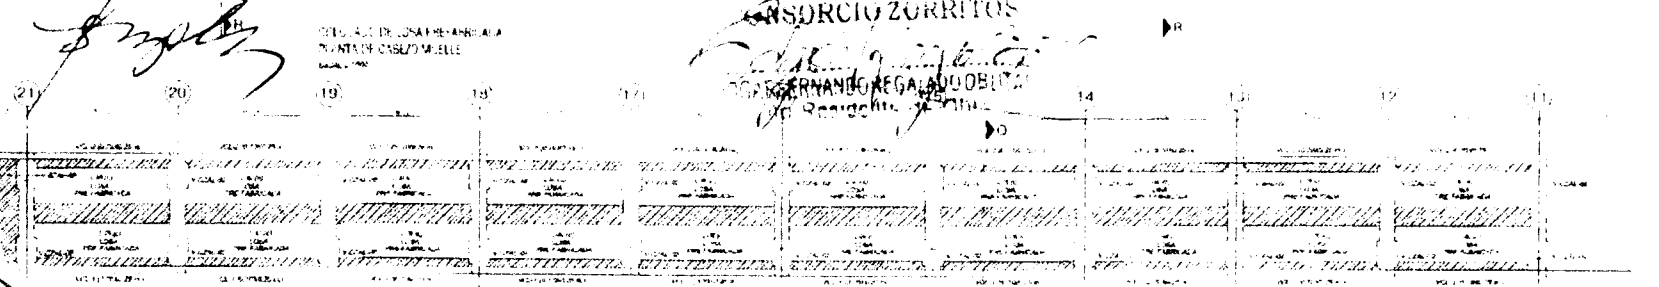

[Handwritten signature]
 ING. RUBEN BOSSUS PONTATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION



197

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

OM-02

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO
CLIENTE: FONDEPES
PLANO REF.: E-46 **CÓD. PLS.:** CZ-SGC-LUC/OM
DESCRIPCION DEL TRABAJO: CONCRETO Fc=140 KG/CM2 + 26% PIEDRA MEDIANA SOBRECIMIENTO : EJE 1 : TRAMO : A : B : C

N° CORRELATIVO:
FECHA: 23/07/2019
SECTOR: PTAR

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE COLOCACION DE ARMADURA

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpieza de armadura (Verificar si la armadura presenta corrosión)	✓			
2	Diámetro especificado: (f = 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" plg.)	✓			
3	Colocación de Armadura (Tolerancia ± 0 a 1 cm)	✓			
4	Verificación de Estribos (cantidad y espaciamiento)			N/A	
5	Verificación de Longitudes de Traslape (tolerancia ± 0 a 1 cm)	✓			
6	Colocación de separadores (metálicos / doble malla)			N/A	
7	Conformidad de recubrimiento (dados de concreto en Losos / ruedas de plástico en muros)	✓			
8	Verificación de Doblado según especificación (Gancho Estándar 90 180)	✓			
9	Soldadura de la armadura según Norma ANEL/AWS D1.4-97			N/A	
10	OTROS:				

RESPONSABLE DE ACERO: _____
 Fecha de Inspección: _____

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE ENCOFRADOS

TIPO DE ENCOFRADO
 Madera Metálico Otros Especifique: _____
 Nombre de Desmoldante: _____

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Verificación de trezo y niveles	✓			
2	Colocación de desmoldante / sellador (madera)	✓			
3	Verificación de paneles y accesorios (planchas metálicas / alfileres de madera)	✓			
4	Verificación de medidas de dimensiones (modulación) y accesorios (jores, cuñas, etc.)	✓			
5	Verificación de niveles, verticalidad y horizontalidad de encofrado	✓			
6	Conformidad de recubrimientos (dados de concreto y/o separadores de plástico)	✓			
7	Verificación de Contraflechas (De acuerdo a planos)			N/A	
8	Verificación de ochavos y/o biseles			N/A	
9	Verificación de insertos y embebidos	✓			
10	Verificación de hermeticidad de encofrado (colocación de yeso en aristas)	✓			
11	Otros				

RESPONSABLE DE ENCOFRADO: _____
 Fecha de Inspección: _____

CONSORCIO ZORRITOS
 Ing. Fernando Regalado Obulias
 Jefe de Obra



ING. RUBEN BOSSUS TOMATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION



CONSORCIO ZORRITOS

REGISTRO CONTROL DE CALIDAD
REPORTE DE RELLENO

CZ.SGC.PC.02-F1

Revisión: 01
Fecha: 23/07/19
Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DRA ACAPILCO
CLIENTE: FONDEPES
PLANO REF.: E-46
FRENTE: _____
SECTOR: PTAR
AREA O TORRE: _____

N° CORRELATIVO: _____
FECHA INICIO: 23/07/2019

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Compactacion con afirmado en AREA SEDIMENTADOR

TIPO DE RELLENO:

Relleno Masivo Controlado

Relleno Masivo No Controlado

Relleno Localiz. Controlado

Relleno localiz. No Controlado

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Revisión de planos y especificaciones	X			Cantera: EL RUBIO (ANTES del PEAJE DE CANOAS) % Según Especific.:
2	Autorización de Relleno (*)	X			
3	Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	X			
4	Verificación Topográfica	X			
	Preparación de área de relleno	X			
	Relleno con material propio		X		
	Relleno con material de préstamo	X			
8	% Compactación según especificaciones		X		
9	Conformidad de capas de relleno (niveles)	X			

(*) Autorizado por el Cliente y/o la Supervisión

DATOS DE CAMPO:





CAPA N°	ESPESOR (m)	NIVEL INFERIOR (m)	NIVEL SUPERIO R (m)	FIRMA TOPOGRAFIA	FECHA	%COMPACT.	FIRMA CONTROL COMPACTAC.	OBSERVAC./C ANTERA
1	15	2.40	2.55		23/07/2019			
2	15	2.25	2.40		23/07/2019			

- PLANO ADJUNTO: SI NO

OBSERVACIONES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO	SUPERVISION
Firma:	Firma: _____	Firma:	Firma:
Cargo: Control de Calidad	Cargo: Ing. Campo	Cargo: Ing. Residente	Cargo: Supervision
Nombre: Freddy Gonzalez Lopez	Nombre: _____	Nombre: Edgar Regalado Obitas	Nombre: Ruben Bossus Tomatti
Fecha: 23/07/2019	Fecha: 23/07/2019	Fecha: 23/07/2019	Fecha: 23/07/2019



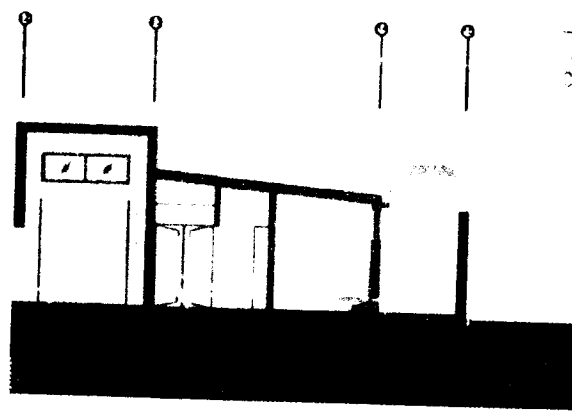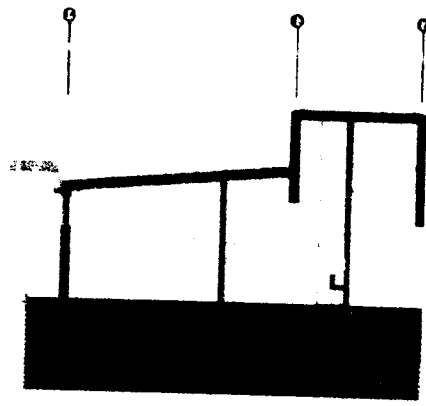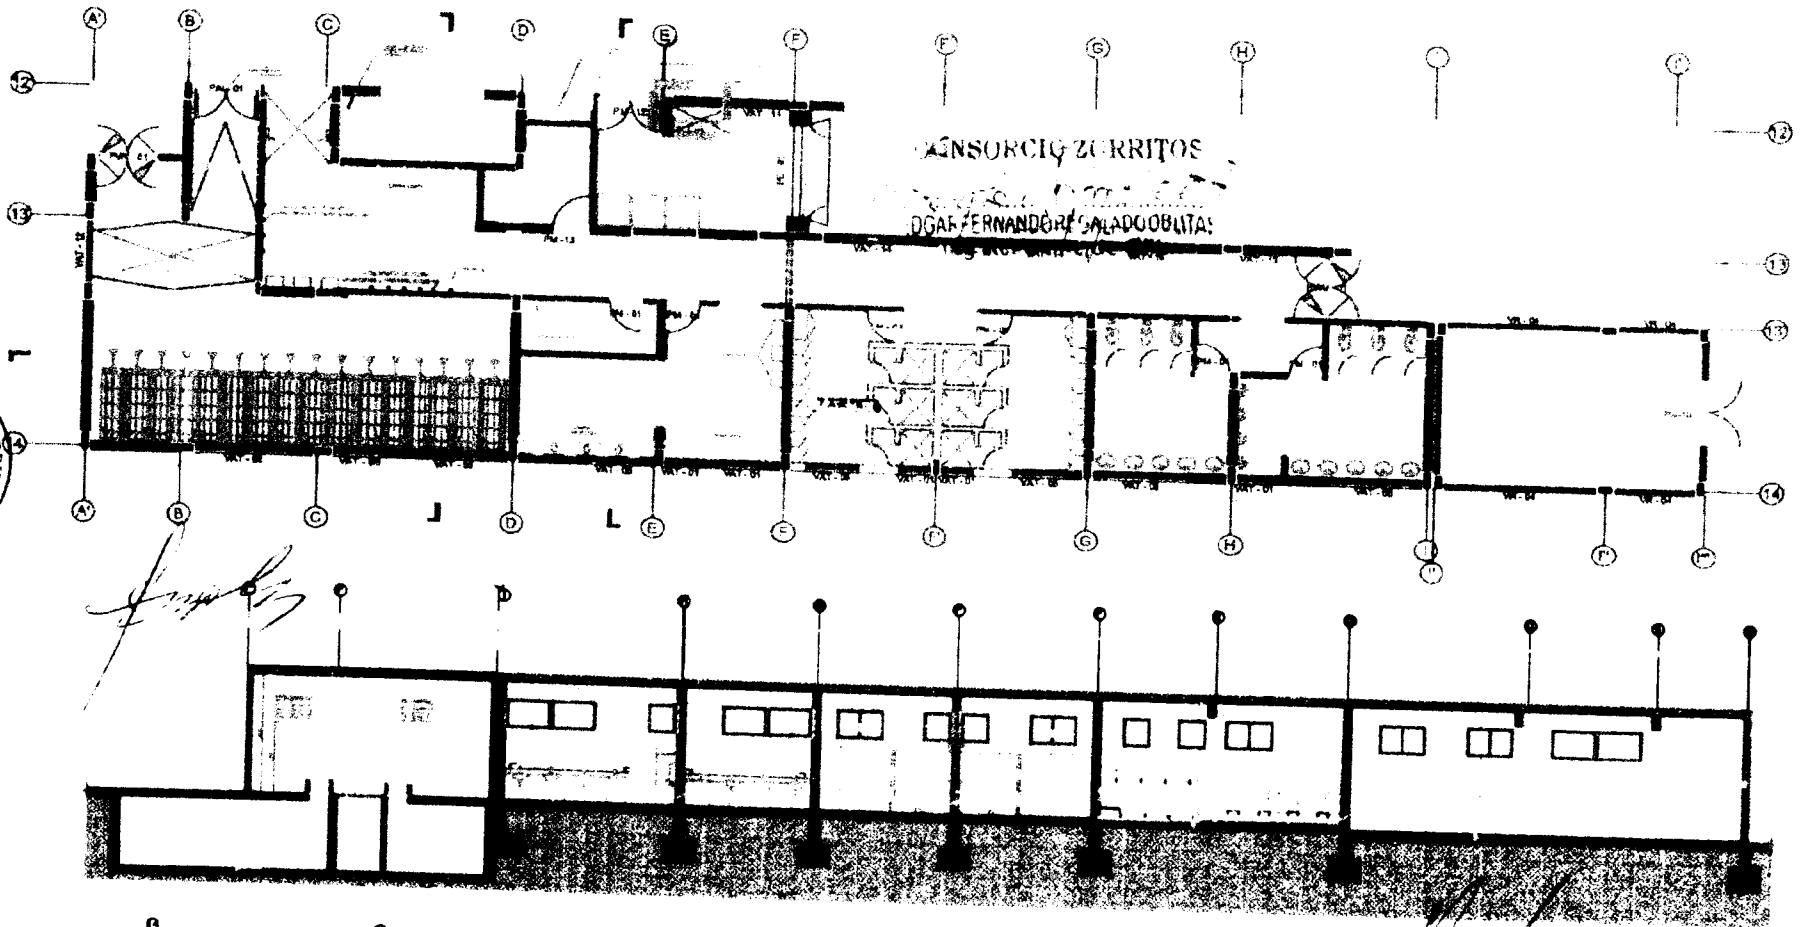

ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

EA / SECTOR: **MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO** FECHA: **23/07/2019**

FRUCTURA / ELEMENTO: **CONCRETO EN COLUMNETAS & VIGETAS EJE 3 ENTRE FIES B C** PLANO DE REF.: **E 46**

SISTENCTA (F_c): **315 KG/CM²** SLUMP: **5"-6"** TIPO CEMENTO: **V** VOLUMEN:

CHECK LIST DE LIBERACION DE ESTRUCTURAS


EM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
	Limpieza de la estructura	✓			
	Topografía, cotas de fondo y nivel de concreto	✓			
	Ejes y dimensiones	✓			
	Verificación de la armadura según check list	✓			
	Verificación del encofrado según check list	✓			
	Jointas frías			N/A	
	HISS: tendido de redes de agua y desague, ubicación de puntos de salida y pasos para tuberías			N/A	
	HIEE: todos los puntos (interruptores, tomacorrientes, TV, teléfono e intercomunicadores)			N/A	
	Pernos de Anclaje y embebidos			N/A	
	Verificación del Procedimiento de seguridad de acuerdo al estándar	✓			
	Otros				

VACIADO Y MUESTREO DEL CONCRETO


CUB.	Fructura	Estructura	Hora Senda	Hora Regata	Hora Inicio	Hora Fin	T (°C)	Slump	Vol. Colocada	Codigo Proyecto	Huella Muestra	Nº Probetas
	315 KG/CM ²	SOBRECIMIENTO EJE 1 TRAMO A/B/C			09:10	11:35	28	A				

COMENTARIOS

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Freddy González López	Nombre: Ing. Edgar Regalado Obitas	Nombre: Ruben Bossus Toniatti
Fecha: 23/07/2019	Fecha: 23/07/2019	Fecha: 23/07/2019



Handwritten signature



Vertical text on the left side of the document, possibly a list of items or a table header.

CONSORCIO ZURRITOS
Handwritten signature
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FISCALÍA
SECRETARÍA DE HERRAMIENTAS FINANCIERAS

Handwritten signature
SR RUBEN BOGGS DONATI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
INTE DE SUPERVISION

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
DIRECCION

E-46

NOMBRE DEL PROYECTO: **CLIENTE:** **PLANO REF:** AR-14 **CÓD. PLS:** CZ.SGC.LA/A.F **N° CORRELATIVO:** **FECHA:** 23-07-2019 **SECTOR:** DESINFECCION
DESCRIPCION DEL TRABAJO: ASENTADO LADRILLO DE CABEZA EJE 12: TRAMO: E*-F

Elemento	MURO DE TABIQUERIA	Código de Tabique	
Fecha del Registro		Fecha del Asentado	23/07/2019
Area Asentada (m2)			
Etapa:			
Documentos de Referencia		Revisión	Observaciones

Lista de Verificación Previa al Asentado (Ver Plano de Detalle)

	FECHA	CONTRATISTA	FECHA	SUPERVISION
Sobrecimiento de Muro Terminado	23/07/2019	V		
Espesor de Juntas Definido	23/07/2019	V		
Alineamiento	23/07/2019	V		
Refuerzo de Juntas	23/07/2019	V		
Armadura de Refuerzo cumple ET del proyecto D=	23/07/2019	V		
Dowells Instalados		N/A		
Altura de Asentado Definida	23/07/2019	V		
Uñas con huecos de limpieza habilitadas		N/A		
Lijas Metálicas para vaciado de alveolos donde las hiladas inferiores no se rellenan con concreto líquido habilitado		N/A		
Autorizado para el Asentado	23/07/2019	V		

SUPERVISOR CALIDAD: Fecha:

Lista de Verificación Posterior al Asentado

Variación: <input checked="" type="checkbox"/> Vertical <input checked="" type="checkbox"/> Nivel <input checked="" type="checkbox"/> Juntas asentado	FECHA	CONTRATISTA	FECHA	SUPERVISION
Superficie Expuesta de la Albañilería Limpia	23/07/2019	V		
Refuerzo de Juntas	23/07/2019	V		
Armadura de Refuerzo cumple ET del proyecto D=	23/07/2019	V		
Junta de Control o Expansión	23/07/2019	V		
Elementos Embebidos Anclajes		V		

Acero Mecánicos Sanitarios Electricos

Limpieza de alveolos a ser llenados con concreto líquido
 Huecos de limpieza clausurados
 Corte de Mortero de Juntas al ras

SUPERVISOR CALIDAD: Fecha:


Lista de Verificación Posterior al Vaciado

	FECHA	CONTRATISTA	FECHA	SUPERVISION
Metodo de Curado Apropriado		N/A		
Accesorios de Fijación Colocados		N/A		
Resane de las superficies Terminado		N/A		


Comentarios:

ELABORADO POR: Firma:	REVISADO POR: Firma:	APROBADO POR: Firma:
Nombre: Freddy Guizalez Lopez	Nombre: Ing. Edgar Regalado Obitas	Nombre: Ing. Ruben Bossus Toniatti





Amely

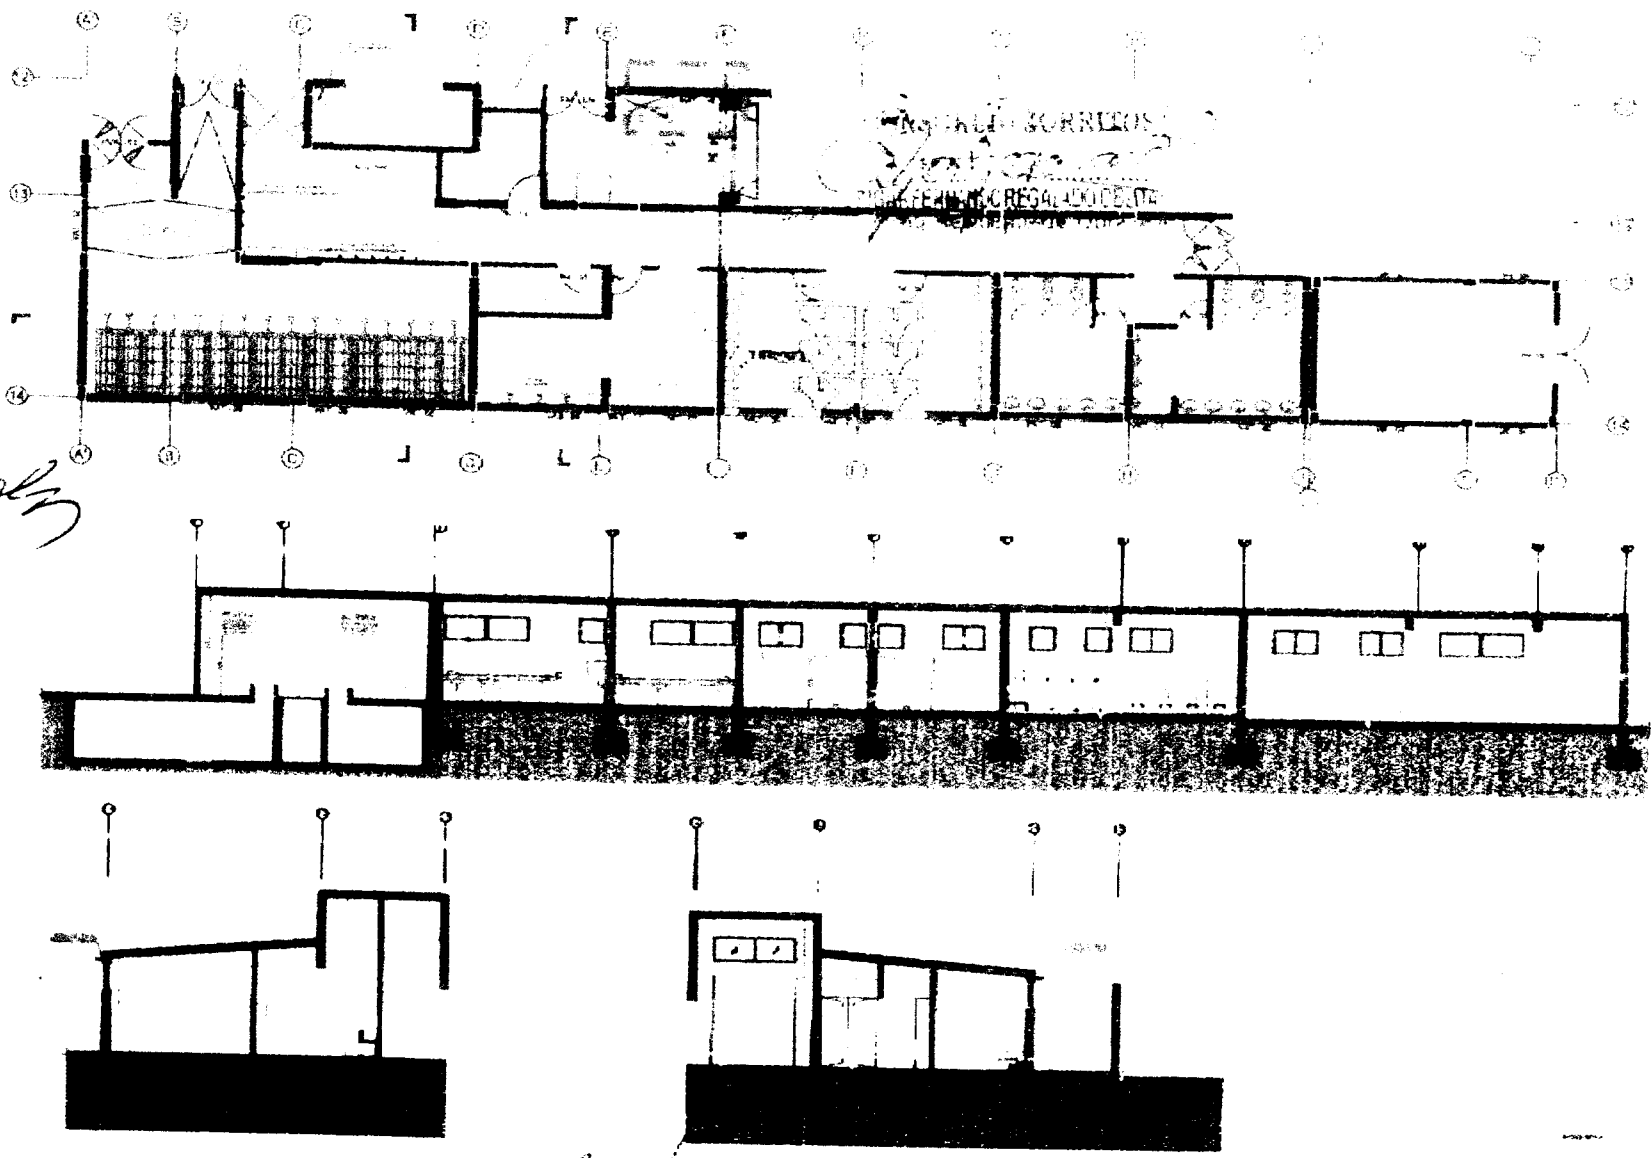

Asociación ZORRITOS
CALLE 100 REGALAKO BETA

ING. ROSEN BOSCH PONTE
CONSORCIO SUPERVISOR TIEBZA
VERE DE SUPERVISION



CONSORCIO ZORRITOS

REGISTRO CONTROL DE CALIDAD
REPORTE DE RELLENO

CZ.SGC.PC.02-F1

Revisión: 01
Fecha: 24/07/19
Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DPA ACAPILCO
CLIENTE: FONDEPES
PLANO REF.: AR-01
FRENTE: DUCTO DE 2 VIAS
SECTOR: PATIO MANIO AREA O TORRE
N° CORRELATIVO:
FECHA INICIO: 24/07/2019

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Compactacion con afirmado en DUCTO EN PATIO DE MANIOBRAS (DESDE FRIOS HASTA DESINFECCION)

TIPO DE RELLENO:

Relleno Masivo Controlado Relleno Masivo No Controlado Relleno Localiz. Controlado Relleno localiz. No Controlado

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Revisión de planos y especificaciones	X			Cantera: EL RUBIO (ANTES del PEAJE DE CANOAS)
2	Autorización de Relleno (*)	X			
3	Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	X			
4	Verificación Topográfica	X			
5	Preparación de área de relleno	X			
6	Relleno con material propio		X		
7	Relleno con material de préstamo	X			
8	% Compactación según especificaciones		X		
9	Conformidad de capas de relleno (niveles)	X			

(*) Autorizado por el Cliente y/o la Supervisión


DATOS DE CAMPO:

CAPA N°	ESPESOR (m)	NIVEL INFERIOR (m)	NIVEL SUPERIOR (m)	FIRMA TOPOGRAFIA	FECHA	%COMPACT.	FIRMA CONTROL COMPACTAC.	OBSERVAC./C ANTERA
1	0.15	3.69	3.84		24/07/2019			
2	0.15	3.54	3.69					

- PLANO ADJUNTO: SI NO

OBSERVACIONES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO	SUPERVISION
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Cargo: Control de Calidad	Cargo: Ing. Carrizo	Cargo: Ing. Residente	Cargo: Supervisor
Nombre: Freddy Gonzalez Lopez	Nombre:	Nombre: Edgar Regalado Oblitas	Nombre: Ruben Bossi
Fecha: 24/07/2019	Fecha: 24/07/2019	Fecha: 24/07/2019	Fecha: 24/07/2019



ING. RUBEN BOSSI TONIATTI
COORDINADOR SUPERVISOR TUMBES
PERU DE SUPERVISION

NOMBRE DEL PROYECTO: CLIENTE:

MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO
FONDEPES

N° CORRELATIVO:

PLANO REF.: AR-15

CÓD. PLS:

C7-SGC-LUC/COM

FECHA:

24/07/2019

SECTOR:

TAREAS PREVIAS

CONCRETO EN SOBRECIMENTO - TAREAS PREVIAS - MESAS DESTIMARQUE PRODUCTOS HIDROFUGANTES

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE COLOCACION DE ARMADURA		OBSERVACION
		SI	NO	
1	Limpieza de armadura (Verificar si la armadura presenta herrumbre)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
2	Dimensión Espesor de (T + 0.8" - 1.5" - 0.8" - 3.4" - 0.1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
3	Colocación de Armadura (Tolerancia + 9 a 1 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
4	Verificación de Solidos (cantidad y espaciamiento)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
5	Verificar espesor de los bordes de las Trazas (Tolerancia ± 0 a 1 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
6	Verificación de la colocación de la Armadura (Cada 1.0 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
7	Conformidad de recubrimiento (Rector de concreto sin losas / recubrimiento de concreto en juntas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
8	Verificación de diámetros según especificación (estribo 90-180)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
9	Soldadura de la armadura según Norma ANSI/AWS D1.4 92	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
10	Otros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A

NOTA:

RESPONSABLE DE ACERO:
Fecha de Inspección:

Firma:


CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE ENCOFRADOS

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	TIPO DE ENCOFRADO		OBSERVACION
		Hidráulico	Módulo	
1	Verificación de Usos y fines	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
2	Colocación de la armadura / soldadura (medida)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
3	Limpieza de bordes y juntas (juntas nuevas / juntas de módulo)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
4	Conformidad de dimensiones (verticalidad) y alineación (alineación, cubas, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
5	Verificación de niveles, verticalidad y horizontalidad de curvatura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
6	Conformidad de recubrimientos (debe de vaciarse y/o separadores de plásticos)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
7	Verificación de Contrachapas (de acuerdo a platas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
8	Verificación de Ocharos y/o bases	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
9	Verificación de insertos y intermedios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
10	Verificación de horizontalidad de encofrado (colocación de yeso en juntas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
11	Otros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A

NOTA:

RESPONSABLE DE ENCOFRADO:
Fecha de Inspección:

Firma:



ING. JESSE BOBOS TOMIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TORRES
JEFE DE SUPERVISION

AREA / SECTOR: MEJORAMIENTO DDA ACAPULCO
ESTRUCTURA / PLEMENTO: CONCRETO EN SOBRECIMENTOS TAREAS PREVIAS: MFSAS USHERBARQUE
RESISTENCIA (MPa): 315 No/CM2 SLUMP: 5"-6" TIPO CEMENTO: V VOLUMEN:
FECHA: 24/07/2019
PLANO DE REF.: AR-15


ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	CHECK LIST DE LIBERACION DE ESTRUCTURAS	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpieza de la estructura		<input checked="" type="checkbox"/>			
2	Topografía, cota de fondo y nivel de currim		<input checked="" type="checkbox"/>			
3	Tipos y dimensiones:		<input checked="" type="checkbox"/>			
4	Verificación de la armadura según lista de		<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Verificación del encofrado según check list		<input checked="" type="checkbox"/>			
6	Juntas flexas		<input checked="" type="checkbox"/>			
7	LISTA DE PUNTO DE CONTROL DE LA UNIDAD DE UN PUNTO DE SALIDA Y ACCESO PARA TUBERIA (V Teléfono e Intercomunicadores)		<input checked="" type="checkbox"/>			
8	Pernos de anclaje y embeladoras		<input checked="" type="checkbox"/>			
9	Pernos de anclaje y embeladoras				N/A	
10	Verificación del procedimiento de seguridad de recorda al asfaltar		<input checked="" type="checkbox"/>			
11	Otros				N/A	




VACIADO Y MUESTREO DEL CONCRETO

Que N°	León	Espeque	Hora inicio	Hora final	T (°C)	Slump	Via de acceso	Control de obra	Verificación	N° Problemas
315			15:07	17:30	28	6				6
SUDCIMENTOS (MFSAS) TRAMO 9-10 : 10-11										
COMENTARIOS										

ELABORADO POR: [Firma] REVISADO POR: [Firma] APROBADO POR: [Firma]


Nombre: Freddy Gonzalez Lopez Fecha: 24/07/2019
Nombre: Jairo Pizar Ramirez Ojeda Fecha: 24/07/2019
Nombre: Nilsen Darias Turiditi Fecha: 24/07/2019



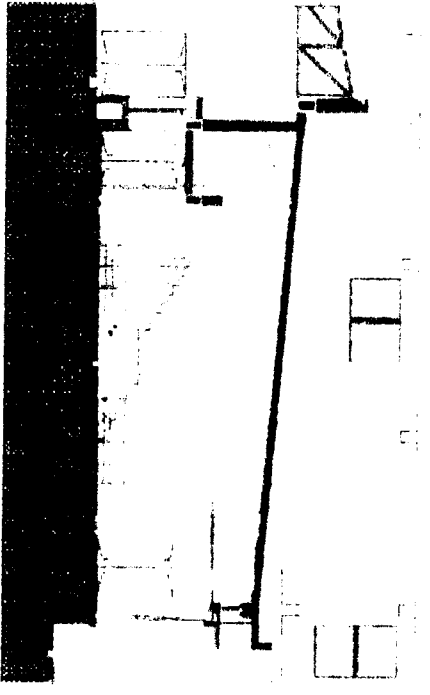

Handwritten signature

ANUARIO ZORRITOS
2011
SERVICIO REGISTRO DE PROPIEDADES
MUNICIPALIDAD DE OTEPE

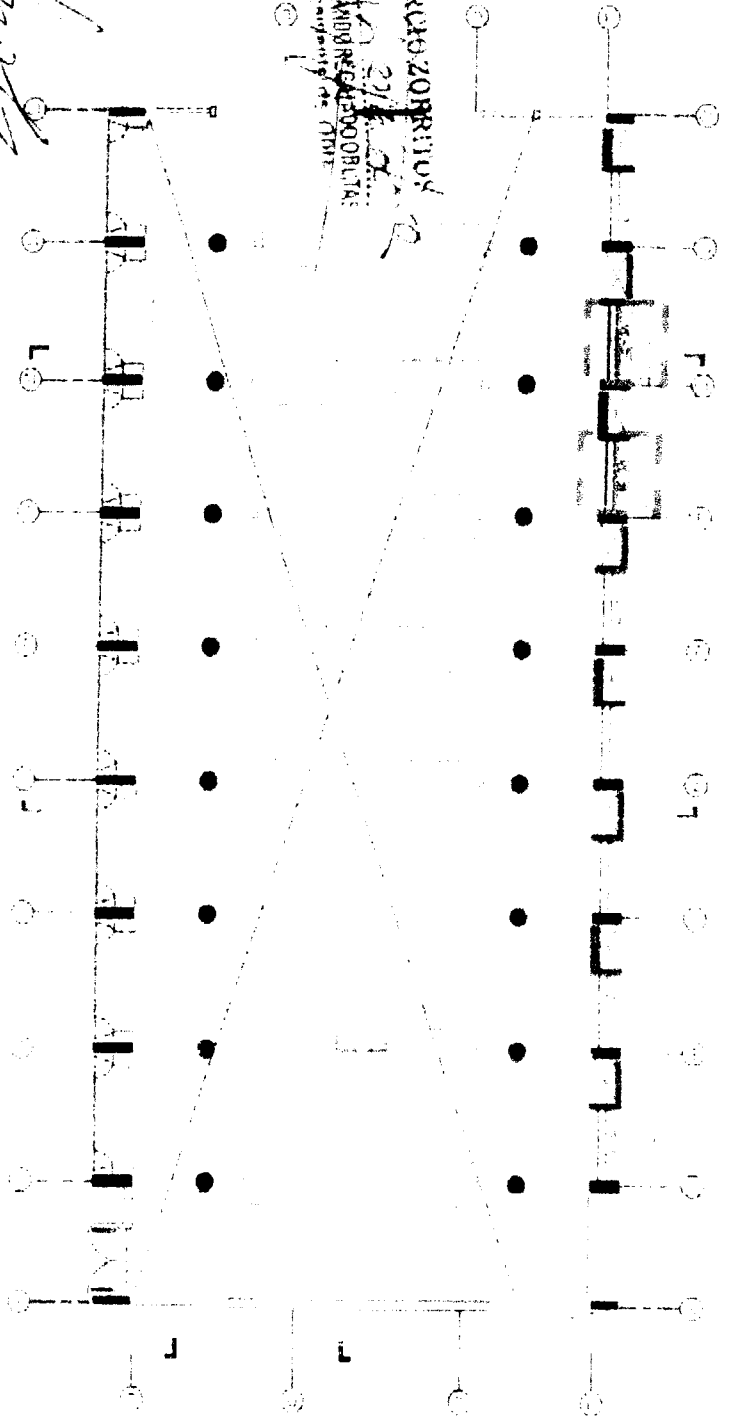

Handwritten signature
ING. ROBERTO BOSCH TONALATI
COORDINADOR SUPERVISOR TONALATI
SEPT DE SUPERVISOR

NOMBRE DEL PROYECTO: MEDORAMIENTO DPA ACAPULCO

CLIENTE: FONDEPES

PLANO REF.: OM-02

CD. PLS: CZ-SGC-LUC/OM

DESCRIPCION DEL TRABAJO: VIGAS Y NUCLEOS Fe-280 KG/CM2 C/IMPERMEABILIZANTE

Nº CORRELATIVO: FECAI

FECHA: 24/07/2019

SECTOR: MUELLE -CABEZO-

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE COLOCACION DE ARMADURA			OBSERVACION
		SI	NO	N/A	
1	Limpieza de armadura (Verificar si la armadura presenta corrosión)	✓			
2	Diámetro Especificado (f = 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" pig.)	✓			
3	Colocacion de Armadura (tolerancia ± 0 a 1 cm)	✓			
4	Verificacion de F-ribos (cantidad y espacamiento)	✓			
5	Verificacion de Longitudes de Traslape (Tolerancia ± 0 a 1 cm)	✓			
6	Colocacion de separadores (metálicos / doble malla)	✓			
7	Conformidad de recubrimiento (datos de muestra en Casas, juntas de edificio en muros)	✓			
8	Verificacin de doblado segun especificación (Gancho estándar: 90° 180°)	✓			
9	Soldadura de la armadura segun Norma ANSI/AWS D1.4 92			N/A	
10					
11					

NOTA: _____

RESPONSABLE DE ACERO: _____ Firma: _____

Fecha de Inspección: _____

TIPO DE ENCOFRADO

Madera Metálica Otros Especificar: _____

Nombre de suministrante: _____

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE ENCOFRADOS

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Verificación de trazo y niveles	✓			
2	Colocación de desmoldante / sellador (madera)	✓			
3	Presencia de daños y accesorios (planchas metálicas / juntas de madera)	✓			
4	Compatibilidad de dimensiones (modulación) y arcosellos (almeadores, cuñas, etc.)	✓			
5	Verificación de niveles, verticalidad y horizontalidad de encofrado	✓			
6	Conformidad de recubrimientos (datos de concreto y/o separadores de plástico)	✓			
7	Verificación de Contraflechas (de acuerdo a planos)	✓			
8	Verificación de oclavos y/o biseles	✓			
9	Verificación de insertos y embebidos			N/A	
10	Verificación de hermeticidad de encofrado (colocación de yeso sin aristas)	✓			
11	Otros				

OTI: _____

CONSEJO ZORRITOS


INSURGENCIO ZORRITOS

Voto: _____

Firma: _____

ING. RUBEN BOGART TORALTA
INSURGENCIO SUPERVISOR TORALTA
JEFE DE SUPERVISION



185

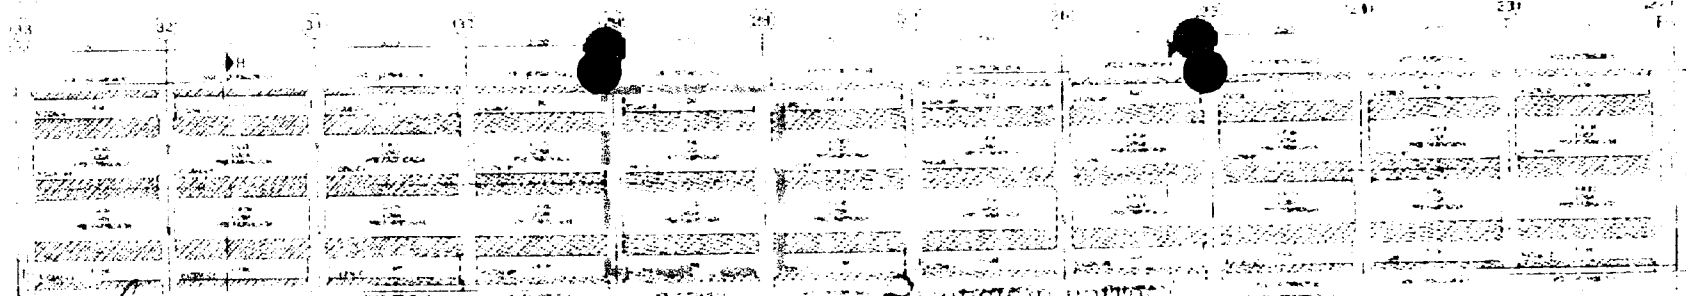


Handwritten signature

CONSEJO DE LA CIUDAD DE
TAMAYO, GUERRERO

INSPECTOR GENERAL
SERVICIO TECNICO
ESTADO DE GUERRERO



SECRETARIA DE AGRICULTURA
Y REROS

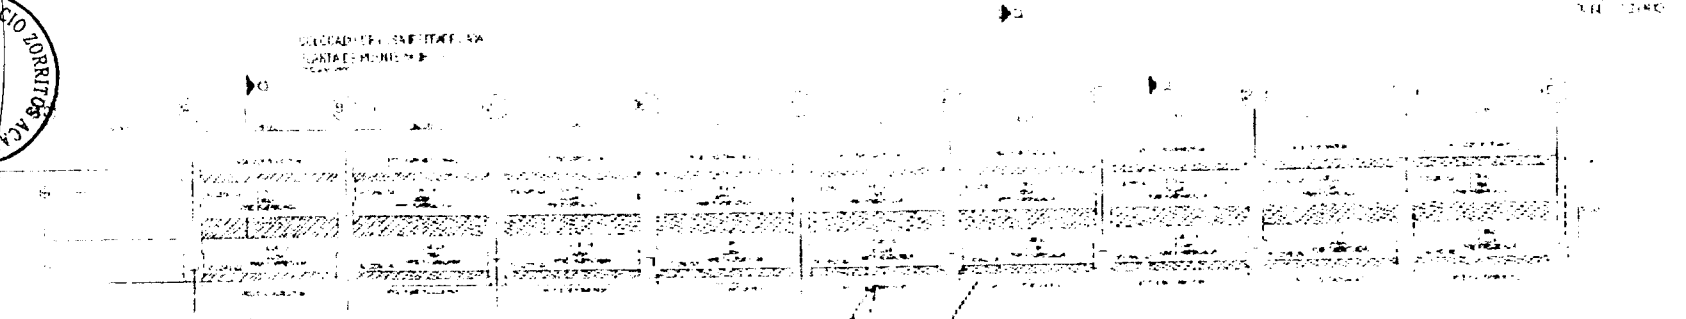

TRAYECTORIA DE
LA CARRETERA

SECCION DE
CATASTRO

ING. RUBEN BOSSA TORIATI
COMISARIO SUPERVISOR TITULAR
JEFE DE SUPERVISION



183

PLANTA DE LA CARRETERA

SECRETARIA DE AGRICULTURA
Y REROS

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

OM-02

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO
 CLIENTE: FONDEPES
 Nº CORRELATIVO:
 PLANO REF.: AR-15 Cód. PLE: CZ-SGC LUC/OM FECHA: 25/07/2019
 DESCRIPCION DEL TRABAJO: CONCRETO EN SOBRECIMENTO TAREAS PREVIAS: MEGAS DESPMBARQUE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS
 LUGAR: TAREAS PREVIAS

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE COLOCACION DE ARMADURA					
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpieza de armadura (Verificar si la armadura presenta corrosión)	✓			
2	Diámetro Especificado (f = 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" pig)	✓			
3	Colocación de Armadura (Tolerancia ± 0 a 1 cm)	✓			
4	Verificación de Estribos (cantidad y espaciamiento)			N/A	
5	Verificación de Longitudes de Traspase (Tolerancia ± 0 a 1 cm)	✓			
6	Colocación de separadores (metálicos / doble malla)			N/A	
7	Conformidad de recubrimiento (dados de concreto en Losas / ruedas de plástico en muros)	✓			
8	Verificación de doblado según especificación (Gancho Estándar: 90-180)	✓			
9	Medidura de la armadura según Norma ANSI/AWS (11.4.92)			N/A	
10	Otros				

NOTA:

REPOSABLE DE ACERO:

Firma:

Fecha de Inspección:

TIPO DE ENCOFRADO

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE ENCOFRADOS

Madera Metalico Otros Especifique:
 Nombre de Desmoldante:

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Verificación de trazo y niveles	✓			
2	Colocación de desmoldante / sellador (madera)	✓			
3	Limpieza de paneles y accesorios (planchas metálicas / juntas de madera)	✓			
4	Conformidad de dimensiones (maxilación) y accesorios (alineadores, cuñas, etc.)	✓			
5	Verificación de niveles, verticalidad y horizontalidad de encofrado	✓			
6	Conformidad de recubrimientos (dados de concreto y/o separadores de plástico)	✓			
7	Verificación de Contraluchas (de acuerdo a planas)			N/A	
8	Verificación de ochavos y/o bridas			N/A	
9	Verificación de insertos y embebidos			N/A	
10	Verificación de hermeticidad de encofrado (colocación de yeso en aristas)	✓			
11	Otros				

NOTA:

REPOSABLE DE ENCOFRADO:

Firma:

Fecha de Inspección:

CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
 VOB
 Ing. Ref. *[Signature]*

CONSORCIO ZORRITOS
[Signature]
 FERNANDO REBALADO OBLITA
 PRESIDENTE DE OBRAS

RUBEN BOSSUS TORIATTI
 COORDINADOR SUPERVISOR TUMBES
 FFF DE SUPERVISION

AREA / SECTOR: MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO
ESTRUCTURA / ELEMENTO: CONCRETO EN SOBRECIMIENTO - TAREAS PRIVIAS - MISAS DESEMBARQUE
RESISTENCIA (FC): 315 KG/CM2 SLUMP: 5"-6" TIPO CEMENTO: V VOLUMEN:

FECHA: 25/07/2010
PLANO DE REF.: AR-15

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	CHECK LIST DE LIBERACION DE ESTRUCTURAS	OBSERVACION
		SI NO	
1	Limpieza de la estructura	V	
2	Topografía, cotas de fondo y nivel de concreto	V	
3	Ejes y dimensiones	V	
4	Verificación de la armadura según check list	V	
5	Verificación del anclaje según check list	V	
6	Inspección de juntas de agua y desagüe, ubicación de juntas de salida y juntas para lubricantes	V	
7	Verificación de la ubicación de juntas de agua y desagüe, ubicación de juntas de salida y juntas para lubricantes	V	
8	Verificación de la ubicación de juntas de agua y desagüe, ubicación de juntas de salida y juntas para lubricantes	V	
9	Verificación de la ubicación de juntas de agua y desagüe, ubicación de juntas de salida y juntas para lubricantes	V	
10	Verificación del procedimiento de seguridad de trabajo en el sitio	V	
11	Otros		

VACIADO Y MUESTREO DEL CONCRETO


Slab	Spigot	Embedment	Form Work	Reinforcement	Test	Moisture Content (%)	Slump	Vol. Sampling	Comp. Results	Test Method	Frequency
315					9.30	12.10	28	6			6
SOBRECIMIENTO (MISAS) (MISAS 5.6-5.7-7.8)											


COMENTARIOS

ELABORADO POR: [Firma] REVISADO POR: [Firma] APROBADO POR: [Firma]

Nombre: Freddy Parvizi López Número: Ing. Edgar Regalado Urbina Nombre: Rubén Jossens Torralba


Fecha: 25/07/2010 Fecha: 25/07/2010 Fecha: 25/07/2010




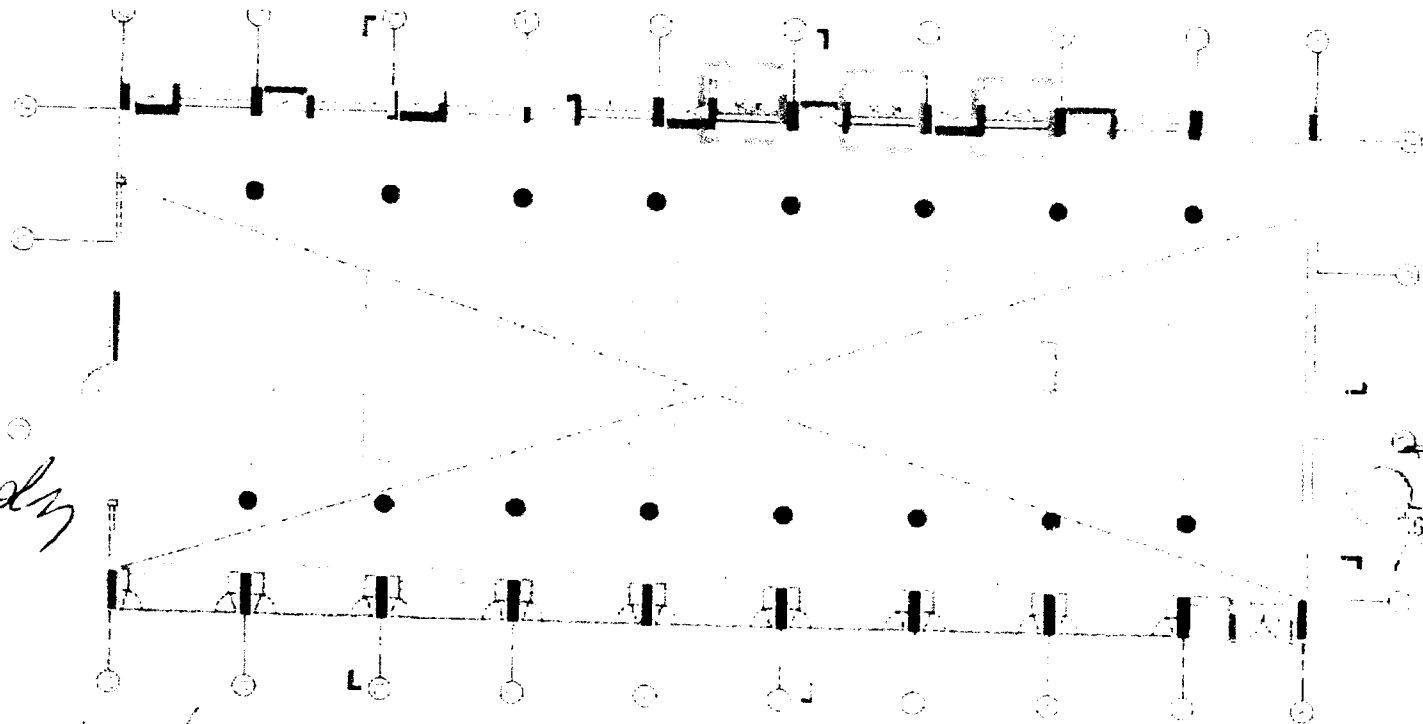


Andrés

CONSORCIO ZORRITOS
 BOGOTÁ
 CAROLINA FERNÁNDEZ REGALADO
 RESIDENTE



[Signature]
 ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

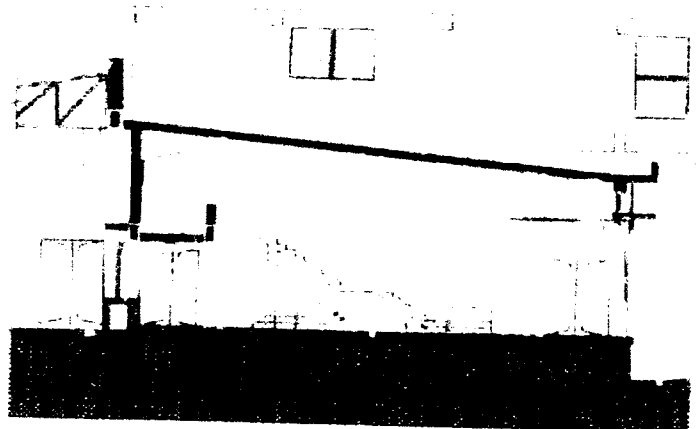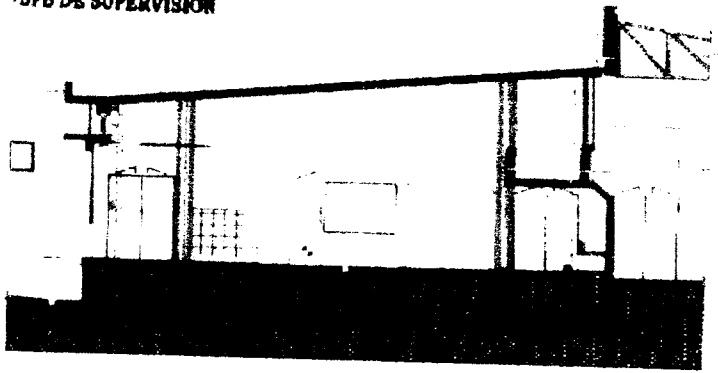



REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD

CZ-SGC.PC.03-F1

Rev: 1

INSPECCIÓN DE TARRAJEOS Y DERRAMES

FECHA: 25-07-2019

Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DVA ACAPULCO
 CLIENTE: FORD-RES
 PLANO REF.: AR-17 CÓD. FLS.: CZ-SGC-IT-4.0
 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: TARRAJEO DE MURO (DEFLECTORES): NIVEL 2 & 3 : EJE 3 : 2"

Verificaciones Generales:

Limpieza

V

Rugosidad

V

Humedad



V




Ambiente	Deflectores						Columnetas						Contrazocalo sanitario			Dimensiones de vanos			Cieloraso			
	NC	obs. Lev.	NC	obs. Lev.	NC	obs. Lev.	NC	obs. Lev.	NC	obs. Lev.	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	C	NC	obs. Lev.	
DEFLECTORES	V		V		V																	
COLUMNETAS									V		V		V									

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Freddy González López	Nombre: Ing. Edgar Regalado Obitas	Nombre: Ing. Ruben Bossus Tonati
FECHA: 25-07-2019	FECHA: 25-07-2019	FECHA: 25-07-2019

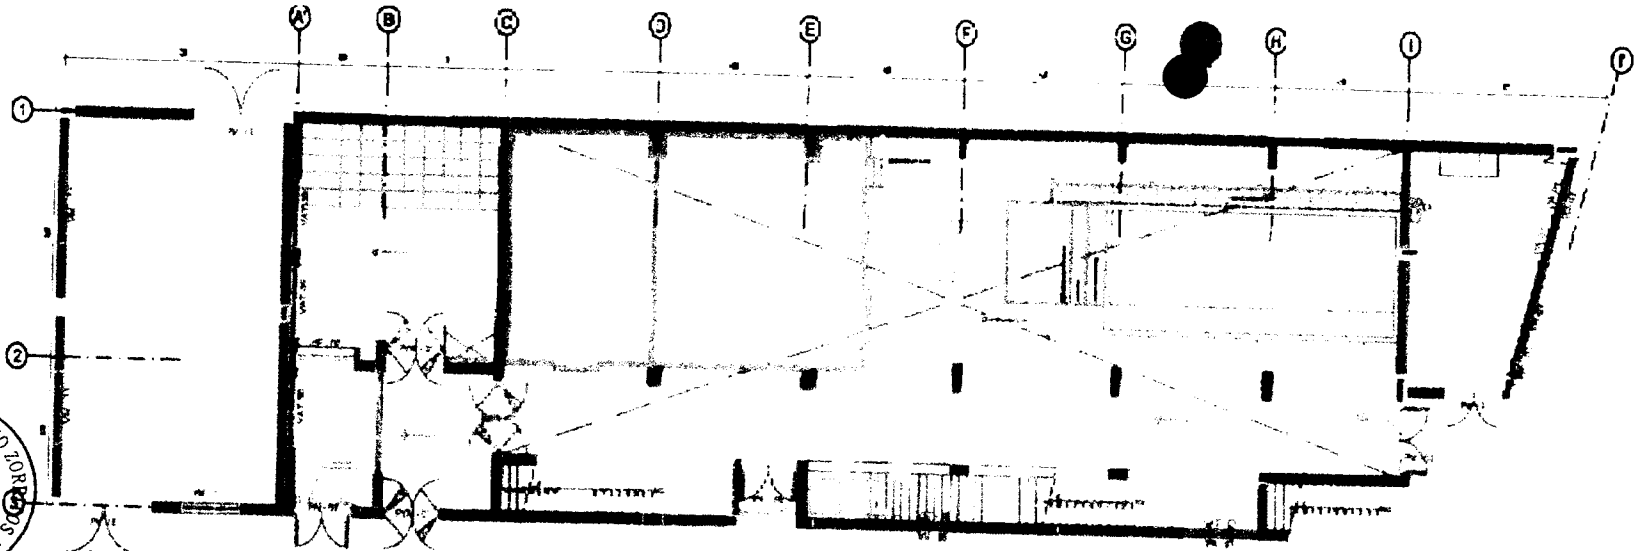

Ing. J. J. J.

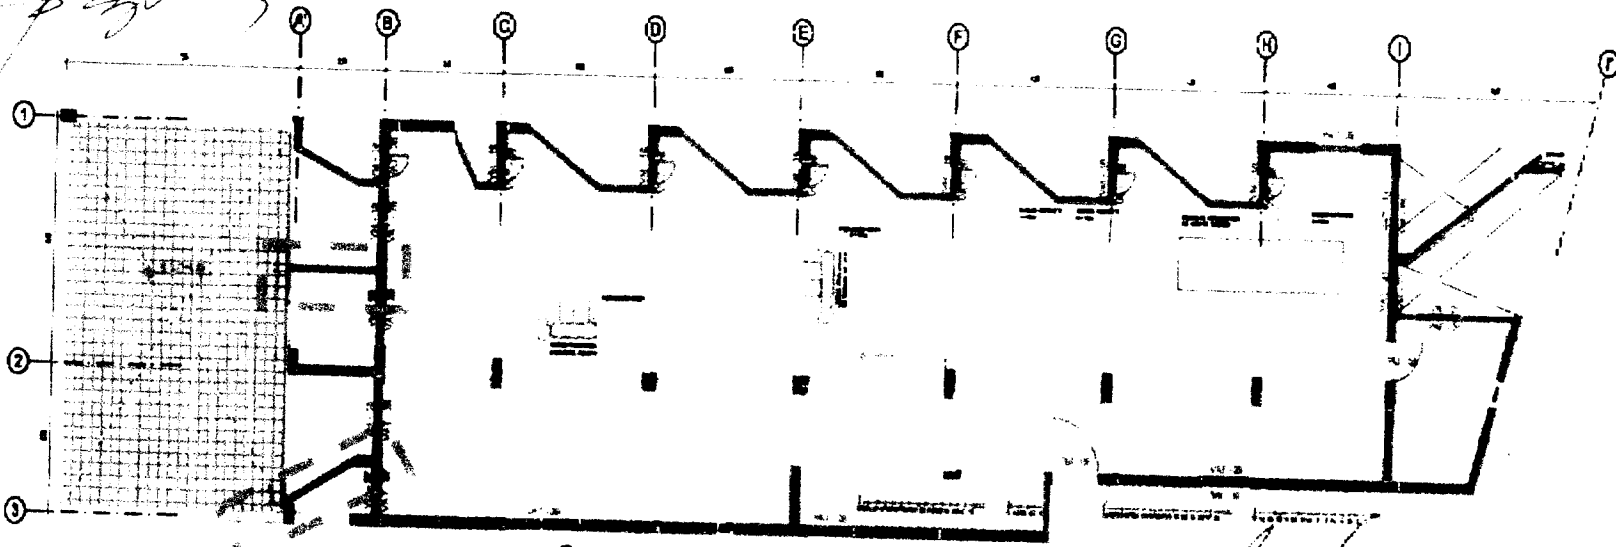

CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

[Signature]
ING. RUBEN BOSSUS TORIATTI
JEFE DE SUPERVISION

ING. RUBEN BOSSUS TORIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION



**CONSORCIO
ZORRITOS**

**REGISTRO
CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD**

CZ.SGC.PC.21-F1
Revisión: 01
Fecha:
Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DRA ACAPULCO

CLIENTE:

FONDEPES

N° CORRELATIVO:

PLANOS DE REFERENCIA:

FECHA: 26/07/2019

IS-11 (ADICIONAL DE OBRA III)

SECTOR : FRIO

AREA: VEREDA DE FRIO
HASTA TAREAS
PREVIAS

1. PARAMETROS DE LA PRUEBA:

REGIMEN DE PRUEBA:

MEDIO AMBIENTE
2 HORAS


MEDIO DE PRUEBA:

AGUA

2. PARAMETROS DE CONTROL:

UBICACION EJES	DIAMETRO TUBERIA	MATERIAL	TONGITUD (m)	N° DE ACCESORIOS	HORA INICIO FECHA	HORA TERMINO FECHA	OBSERVACIONES
A-B	6"	PVC	9.85		10:05 26/07/19	12:15 26/07/19	

Plano N°:

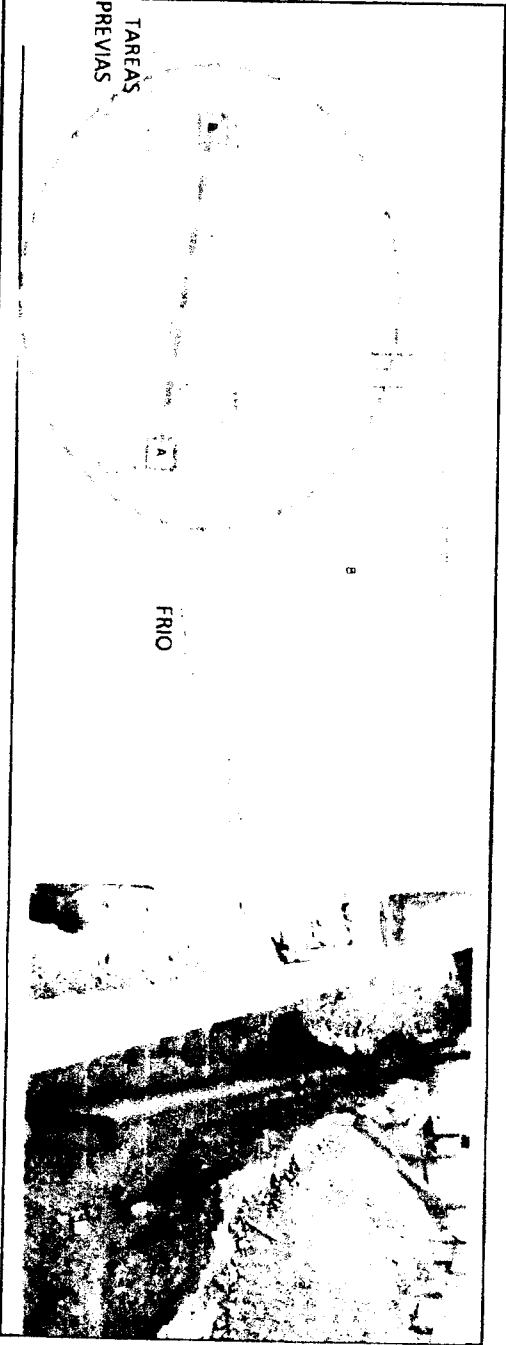

TAREAS
PREVIAS

FRIO

FUGA EN LOS EMPALMES:

SI:

NO:

N/A

VARIACION DE NIVEL DE LOS ELEMENTOS DE
PRUEBA:

SI:

NO:

V

PENDIENTES CONFORMES

SI:

NO:


V

3. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

Prueba Correcta: V

Prueba Incorrecta:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO:	SUPERVISOR:
Firma: Cargo: Control Calidad Nombre: Freddy Contreras Lopez Fecha: 26/07/2019	Firma: Cargo: Ing Asistente de Residente Nombre: David Crocos Fecha: 26/07/2019	Firma: Cargo: Ing Residente Nombre: Edgar Regalado Oñilas Fecha: 26/07/2019	Firma: Cargo: Ing Supervisor Nombre: Ruben Dossus Toral Fecha: 26/07/2019



NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO
CLIENTE: FONDEPES
PLANO REF.: AR-17 **CÓD. PLS.:** CZ-SGC-LUC/OM
DESCRIPCION DEL TRABAJO: CONCRETO EN VIGETAS : NIVEL 2 : EJE 3 : TRAMO F* G

N° CORRELATIVO:
FECHA: 26/07/2019
SECTOR: FRIJOS

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE COLOCACION DE ARMADURA					
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpieza de armadura (Verificar si la armadura presenta corrosión)	✓			
2	Diámetro Especificado (f - 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" pl.)	✓			
3	Colocación de Armadura (tolerancia ± 0 a 1 cm)	✓			
4	Verificación de Tallas (cantidad y espaciamento)	✓			
5	Verificación de Longitudes de Traslape (tolerancia ± 0 a 1 cm)	✓			
6	Colocación de separadores (metálicos - doble malla)			N/A	
7	Conformidad de recubrimiento (dados de concreto u/ Losas / ruedas de plástico en muros)	✓			
8	Verificación de doblado según especificación (Gancho Estandar 90 180)	✓			
9	Soldadura de la armadura según Norma ANSI/AWS D1.4-92			N/A	
10	Otros				

NOTA:

REPOSABLE DE ACERO: _____ **Firma:** _____
Fecha de Inspección: _____


TIPO DE ENCOFRADO

Madera Metálico Otros Especifique: _____
Nombre de Desmoldante: _____

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE ENCOFRADOS					
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Verificación de trazo y niveles	✓			
2	Colocación de desmoldante / sellador (madera)	✓			
3	Limpieza de paneles y accesorios (planchas metálicas / paneles de madera)	✓			
4	Conformidad de dimensiones (modulación) y accesorios (alineadores, cuñas, etc.)	✓			
5	Verificación de niveles, verticalidad y horizontalidad de encofrado	✓			
6	Conformidad de recubrimientos (dados de concreto y/o separadores de plástico)	✓			
7	Verificación de Contraflechas (de acuerdo a planos)			N/A	
8	Verificación de ochavos y/o biseles			N/A	
9	Verificación de insertos y embebidos	✓			
10	Verificación de hermeticidad de encofrado (colocación de yeso en aristas)	✓			
11	Otros				



NOTA:

REPOSABLE DE ENCOFRADO: _____ **Firma:** _____
Fecha de Inspección: _____




ING. RUBEN BOSCH TONIATT
CONSORCIO SUPERVISOR TUMES
JEFE DE SUPERVISIO

CONSORCIO ZORRITOS
ING. FERNANDO REGALADO BLITAS
Jefe Responsable de Obra

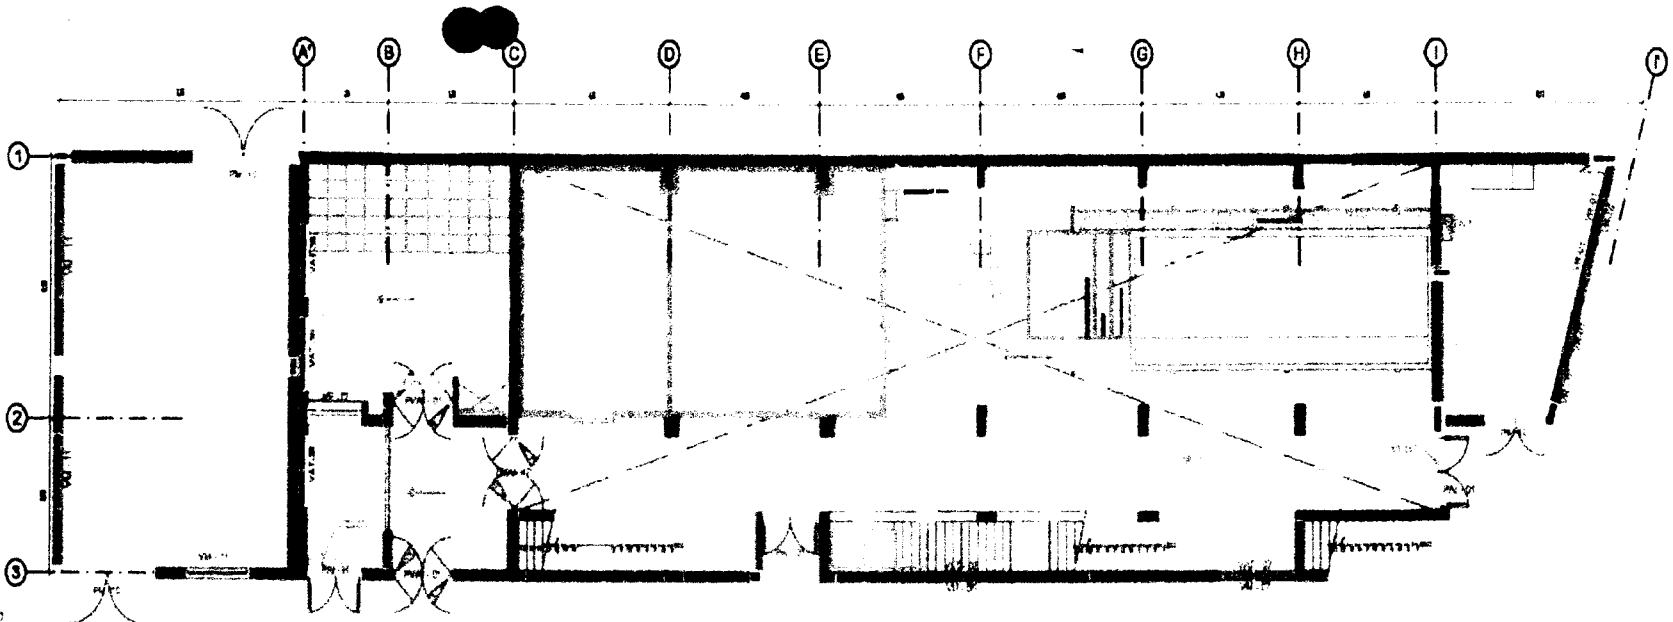

Handwritten signature

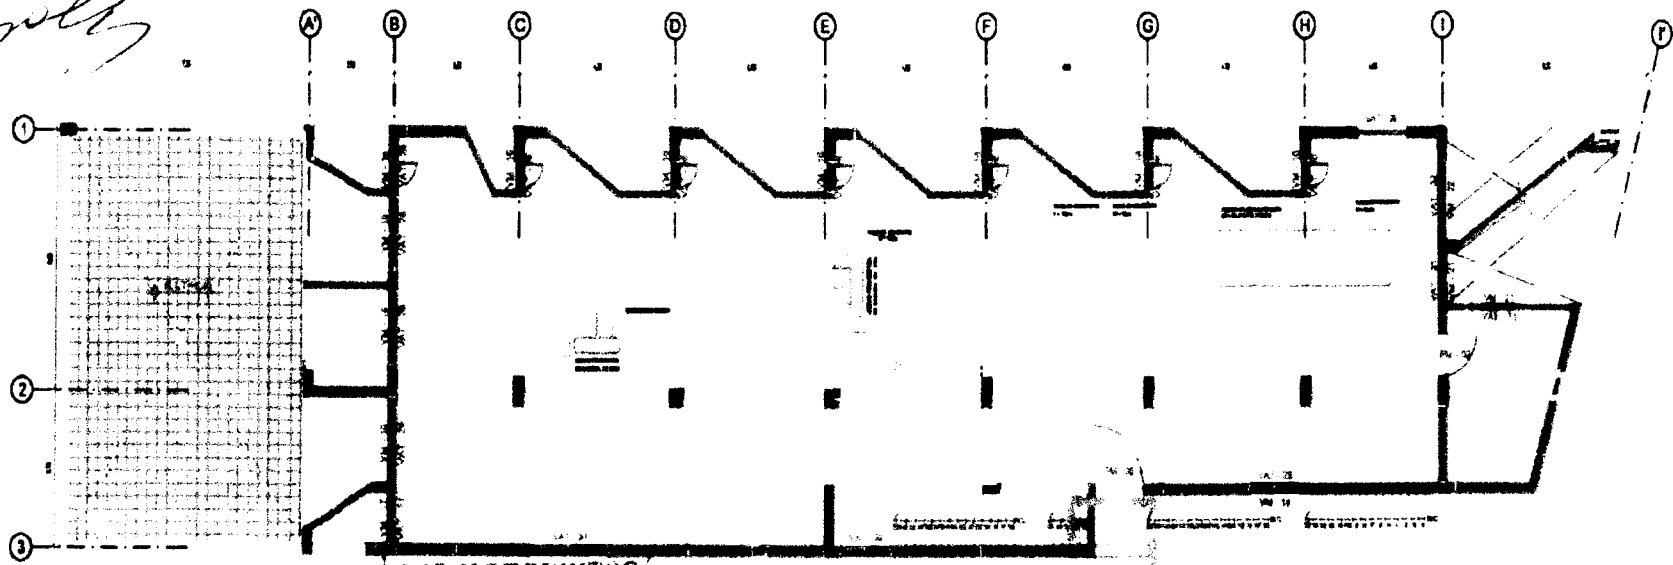

ING RUBEN BOSSUSTONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS

ING CAR FERNANDO REGALADO OBITA
JEFE DE PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO N° CORRELATIVO:
 CLIENTE: FONDEPES FECHA: 26/07/2019
 PLANO REF.: AR-15 CÓD. PLS: CZ-SGC-LUC/OM SECTOR: TAREAS PREVIAS
 DESCRIPCION DEL TRABAJO: CONCRETO EN SOBRECIMIENTO : TAREAS PREVIAS : MESAS DESEMBARQUE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE COLOCACION DE ARMADURA					
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpieza de armadura (Verificar si la armadura presenta corrosión)	✓			
2	Diámetro especificado. (f = 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" plg)	✓			
3	Colocación de Armadura (Tolerancia + 0 a 1 cm)	✓			
4	Verificación de Estribos (Cantidad y espaciamento)			N/A	
5	Verificación de longitudes de Traslape (Tolerancia ± 0 a 1 cm)	✓			
6	Colocación de separadores (metálicos / doble malla)			N/A	
7	Conformidad de recubrimiento (dados de concreto en Umax / ruedas de plástico en muros)	✓			
8	Verificación de doblado según especificación (Ganchos Estandar 90 180)	✓			
9	Soldadura de la armadura según Norma ANSI/AWS D1.1 92			N/A	
10	Otros				

NOTA:

REPOSABLE DE ACERO: Firma:
 Fecha de Inspección:

TIPO DE ENCOFRADO
 Madera Metálico Otros Especifique _____
 Nombre de Desmoldante _____


CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE ENCOFRADOS					
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Verificación de trazo y niveles	✓			
2	Colocación de desmoldante / sellador (madera)	✓			
3	Limpieza de paneles y accesorios (planchas metálicas / paneles de madera)	✓			
4	Conformidad de dimensiones (modulación) y accesorios (alineadores, cuñas, etc.)	✓			
5	Verificación de niveles, verticalidad y horizontalidad de encofrado	✓			
6	Conformidad de recubrimientos (dados de concreto y/o separadores de plástico)	✓			
7	Verificación de Contraflechas (de acuerdo a planos)			N/A	
8	Verificación de ochavos y/o biseles			N/A	
9	Verificación de insertos y embebidos			N/A	
10	Verificación de hermeticidad de encofrado (colocación de yeso en aristas)	✓			
11	Otros				

NOTA:

REPOSABLE DE ENCOFRADO: Firma:
 Fecha de Inspección:

CONSORCIO ZORRITOS

ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMEE
 TERE DE SUPERVISOR



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMEE
 TERE DE SUPERVISOR

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO
CLIENTE: FONDEPES
PLANO REF.: OM-02 **CÓD. PLS:** CZ-SGC-LUC/OM
DESCRIPCION DEL TRABAJO: VIGAS Y NUCLEOS Fc=280 KG/CM2 C/IMPERMEABILIZANTE

N° CORRELATIVO:
FECHA: 26/07/2019
SECTOR: MUELLE -CABEZO-

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE COLOCACION DE ARMADURA

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpieza de armadura (Verificar si la armadura presenta corrosión)	✓			
2	Diámetro Especificado: (f = 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" plg.)	✓			
3	Colocación de Armadura (Tolerancia ± 0 a 1 cm)	✓			
4	Verificación de Estribos (cantidad y espaciamento)	✓			
5	Verificación de Longitudes de Traslape (Tolerancia ± 0 a 1 cm)	✓			
6	Colocación de separadores (metálicos / doble malla)	✓			
7	Conformidad de recubrimiento (dados de concreto en Losas / ruedas de plástico en muros)	✓			
8	Verificación de doblado según especificación (Gancho Estandar: 90-180)	✓			
9	Soldadura de la armadura según Norma ANSI/AWS D1.4-92			N/A	
10	s				

NOT

REPOSABLE DE ACERO: _____ **Firma:** _____
Fecha de Inspección: _____

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE ENCOFRADOS

TIPO DE ENCOFRADO
Madera Metálico Otros Especifique: _____
Nombre de Desmoldante _____

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Verificación de trazo y niveles	✓			
2	Colocación de desmoldante / sellador (madera)	✓			
3	Verificación de paneles y accesorios (planchas metálicas / las de madera)	✓			
4	Conformidad de dimensiones (modulación) y accesorios (soportes, cuñas, etc.)	✓			
5	Verificación de niveles, verticalidad y horizontalidad de encofrado	✓			
6	Conformidad de recubrimientos (dados de concreto y/o separadores de plástico)	✓			
7	Verificación de Contraflechas (de acuerdo a planos)	✓			
8	Verificación de ochavos y/o biselés	✓			
9	Verificación de insertos y embebidos			N/A	
10	Verificación de hermeticidad de encofrado (colocación de yeso en aristas)	✓			
11	Otros				



NOTA:

REPOSABLE DE ENCOFRADO: _____ **Firma:** _____
Fecha de Inspección: _____



CONSORCIO ZORRITOS
ING. FERNANDO REGALADO OBLITAS
Jefe Responsable de Obra



ING. ROBERTO BOSSUS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TIEMPO
JEFE DE SUPERVISIÓN

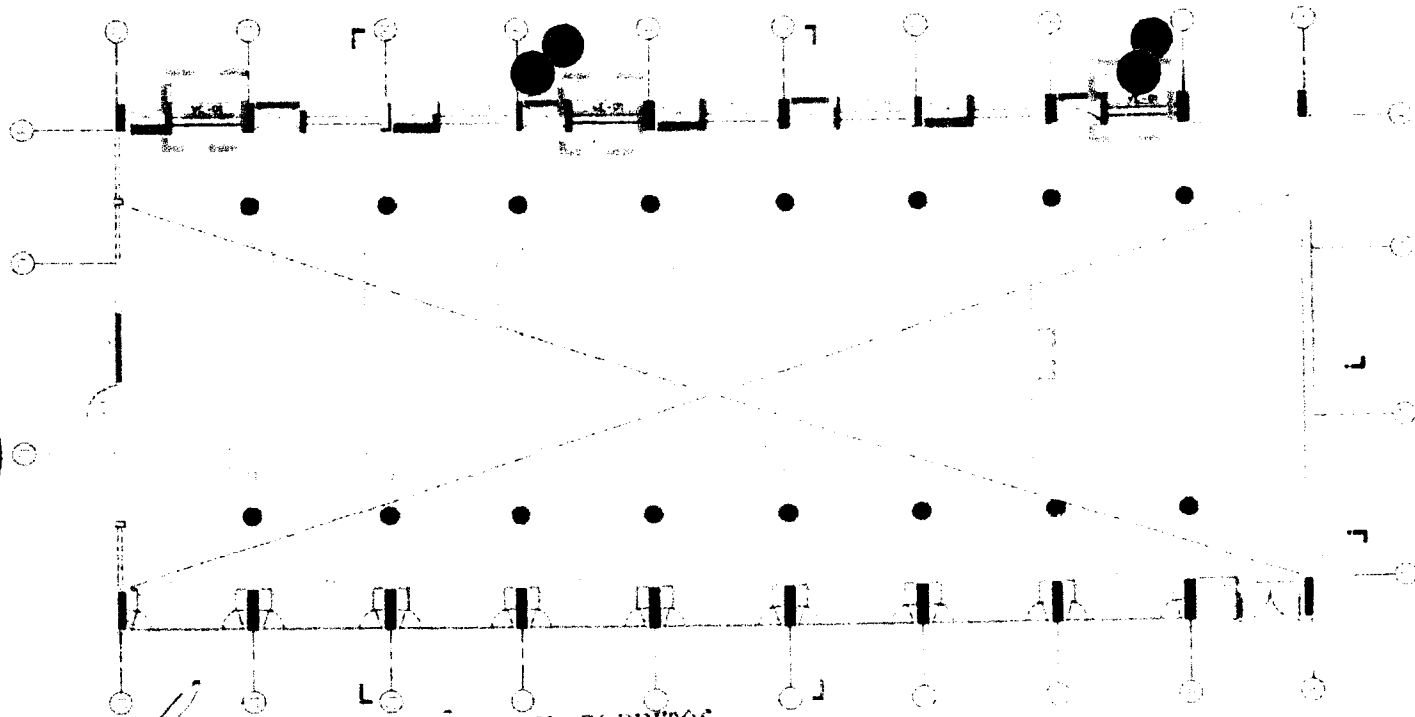

[Handwritten signature]

CONSORCIO ZORRITOS
ING. FERNANDO REGALADO OBILTA
Ing. Residente de Obra

ING. RUBEN BOSSUTONI ATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

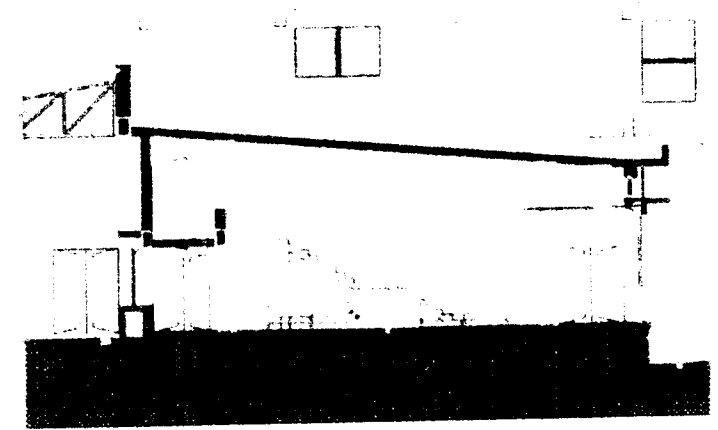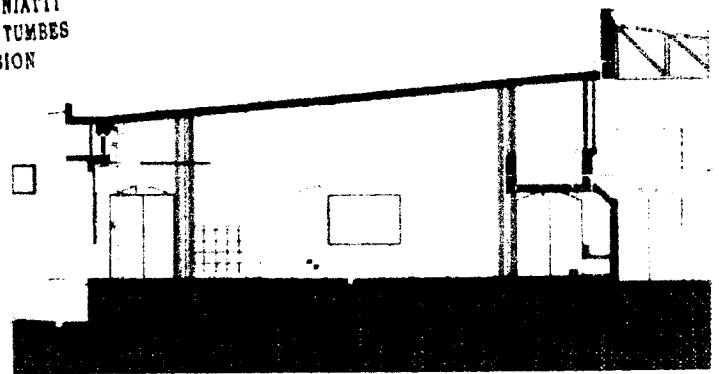

AREA / SECTOR:	MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO		FECHA:	26/07/2019
ESTRUCTURA / ELEMENTO:	VIGAS Y NUCLEOS Fc=280 KG/CM2 C/IMPERMEABILIZANTE		PLANO DE REF.:	OM-02
RESISTENCIA (Fc):	280 KG/CM2	SLUMP:	5"-6"	TIPO CEMENTO: V
			VOLUMEN:	

CHECK LIST DE LIBERACION DE ESTRUCTURAS

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpieza de la estructura	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	Topografía, cotas de fondo y nivel de concreto	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	Ejes y dimensiones	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	Verificación de la armadura según check list	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Verificación del encofrado según check list	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	Juntas frías	<input checked="" type="checkbox"/>			
7	IIGS: tendido de redes de agua y desagüe, ubicación de puntos de salida y pasos para tuberías.			N/A	
8	IIEE: todos los puntos (interruptores, tomacorrientes, TV, teléfono e intercomunicadores)	<input checked="" type="checkbox"/>			
9	Pernos de Anclaje y embebidos			N/A	
10	Verificación del Procedimiento de seguridad de acuerdo al estándar	<input checked="" type="checkbox"/>			
11	Otros.				

VACIADO Y MUESTREO DEL CONCRETO

Region	Estructura	Hora Saca	Hora Regado	Hora Inicio	Hora Termino	T (°C)	Slump	Vol. Colocado	Desago Propetas	Hora Muestra	N° Probetas
ZBU	VIGAS Y NUCLEOS Fc=280 KG/CM2 TRAMO CENTRAL: 25-26-27			10:00	14:40	28	6"				4

COMENTARIOS

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
na:	Firma:	Firma:
Nombre: Freddy González López	Nombre: Ing Edgar Regalado Oblitas	Nombre: Ruben Bossus Toniatti
Fecha: 26/07/2019	Fecha: 26/07/2019	Fecha: 26/07/2019



NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO
CLIENTE: FONDEPES
PLANO REF.: AR-14 **CÓD. PLS.:** CZ-SGC-LUC/OM
DESCRIPCION DEL TRABAJO: CONCRETO EN COLUMNETAS : NIVEL 1 . EJE : E12

N° CORRELATIVO: _____
FECHA: 27/07/2019
SECTOR: DESINFECCION

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE COLOCACION DE ARMADURA

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpieza de armadura (Verificar si la armadura presenta corrosión)	✓			
2	Diámetro especificado. (f = 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" plg)	✓			
3	Colocación de Armadura (Tolerancia + 0 a 1 cm)	✓			
4	Verificación de Estribos (cantidad y espaciamiento)	✓			
5	Verificación de Longitudes de Traslape (Tolerancia ± 0 a 1 cm)	✓			
6	Colocación de separadores (metálicos : doble malla)			N/A	
7	Conformidad de recubrimiento (dados de concreto en Losas : mallas de plástico en muros)	✓			
8	Verificación de doblado según especificación (Gancho Estándar 90-180)	✓			
9	Soldadura de la armadura según Norma ANSI/AWS D1.4-97			N/A	
10	Otros				

NOTA:

RESPONSABLE DE ACERO: _____ **Firma:** _____
Fecha de Inspección: _____


CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE ENCOFRADOS

TIPO DE ENCOFRADO
Madera Metálico Otros Especifique: _____
Nombre de Desmoldante: _____

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Verificación de trazo y niveles	✓			
2	Colocación de desmoldante / sellador (madera)	✓			
3	Limpieza de paneles y accesorios (planchas metálicas / paneles de madera)	✓			
4	Conformidad de dimensiones (modulación) y accesorios (alineadores, cuñas, etc.)	✓			
5	Verificación de niveles, verticalidad y horizontalidad de encofrado	✓			
6	Conformidad de recubrimientos (dados de concreto y/o separadores de plástico)	✓			
7	Verificación de Contraflechas (de acuerdo a planos)			N/A	
8	Verificación de ochavos y/o biselos			N/A	
9	Verificación de insertos y embebidos	✓			
10	Verificación de hermeticidad de encofrado (colocación de yeso en aristas)	✓			
11	Otros				

NOTA:


RESPONSABLE DE ENCOFRADO: _____ **Firma:** _____
Fecha de Inspección: _____



[Handwritten signature]

ING. RUBEN BOSSUSTONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBEE
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS
ING. FERNANDO REGALADO ORTIZ
ING. RESIDENTE DE OBRAS

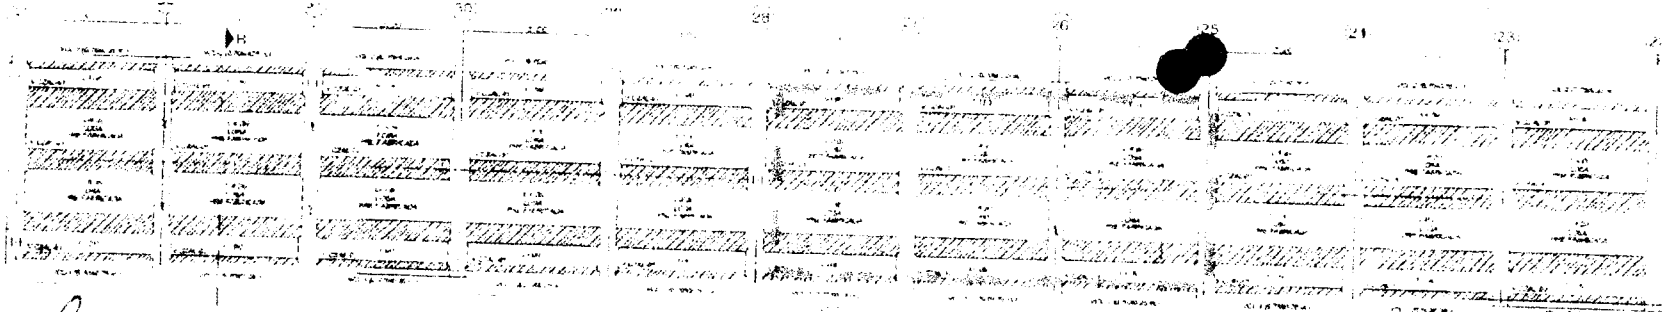

[Handwritten signature]

CONSORCIO DE USARIAS PARA LA PLANTA DE CABLEADO

CONSORCIO ZORRITOS




CONDOMINIO DE LA ENTABLADA
 C/ta. DE FARMACIA
ERINANDA J. GALADO ORTIZ
 Representante de ONSA

CONDOMINIO DE LA ENTABLADA
 C/ta. DE FARMACIA

CONDOMINIO DE LA ENTABLADA
 C/ta. DE FARMACIA



[Handwritten signature]
ING. RUBEN BOSSUSTONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

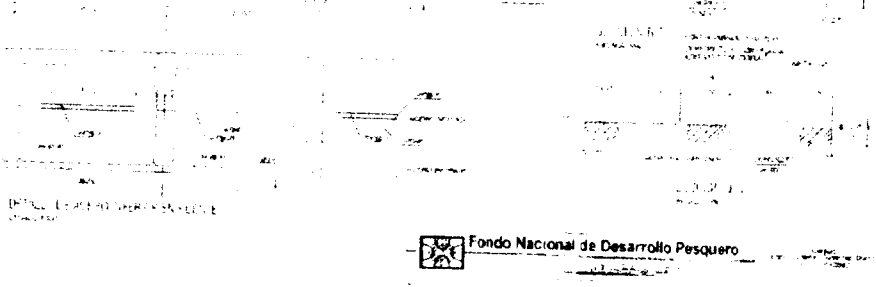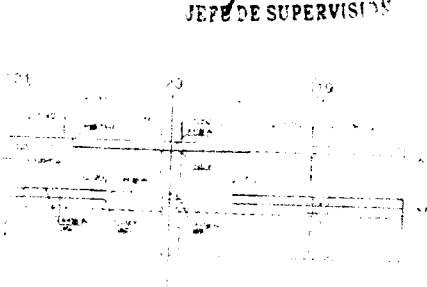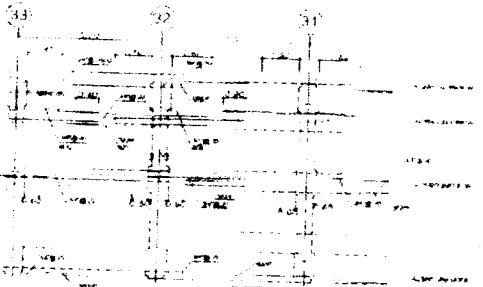

167

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

INSTITUTO VENEZOLANO DEL SEGURO SOCIAL

AREA / SECTOR:	MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO		FECHA:	27/07/2019
ESTRUCTURA / ELEMENTO:	CONCRETO EN COLUMNETAS & VIGETAS EJE 3 ENTRE EJES B-C		PLANO DE REF.:	AR-14
RESISTENCIA (Fc):	315 KG/CM2	SLUMP:	5"-6"	TIPO CEMENTO: V
		VOLUMEN:		




CHECK LIST DE LIBERACION DE ESTRUCTURAS


ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpieza de la estructura	✓			
2	Topografía, cotas de fondo y nivel de concreto	✓			
3	Ejes y dimensiones	✓			
4	Verificación de la armadura según check list	✓			
5	Verificación del encofrado según check list	✓			
6	Juntas hías				
7	IISS: tendido de redes de agua y desague, ubicación de puntos de salida y pasas para tuberías			N/A	
8	IIFF: todos los puntos (interruptores, tomacorrientes, TV, telefono e intercomunicadores)			N/A	
9	Pernos de Anclaje y embebidos			N/A	
10	Verificación del Procedimiento de seguridad de acuerdo al estándar	✓			
11	Otros				

VACIADO Y MUESTREO DEL CONCRETO

Que N°	Cemento	Estructura	hora salida	hora llegada	hora inicio	hora término	T (°C)	Slump	Vol. colocado	Carga Pruebas	hora muestra	N° Pruebas
315					10:30	11:50	10°	5"				

COMENTARIOS


ELABORADO POR: Firma: 	REVISADO POR: Firma: 	APROBADO POR: Firma: 
Nombre: Freddy Gonzalez Lopez	Nombre: Ing Edgar Regalado Obillos	Nombre: Ruben Bossus Toniatti
Fecha: 27/07/2019	Fecha: 27/07/2019	Fecha: 27/07/2019





[Handwritten signature]

CONSORCIO ZORRITOS
UNIDAD DE TRABAJO
1978

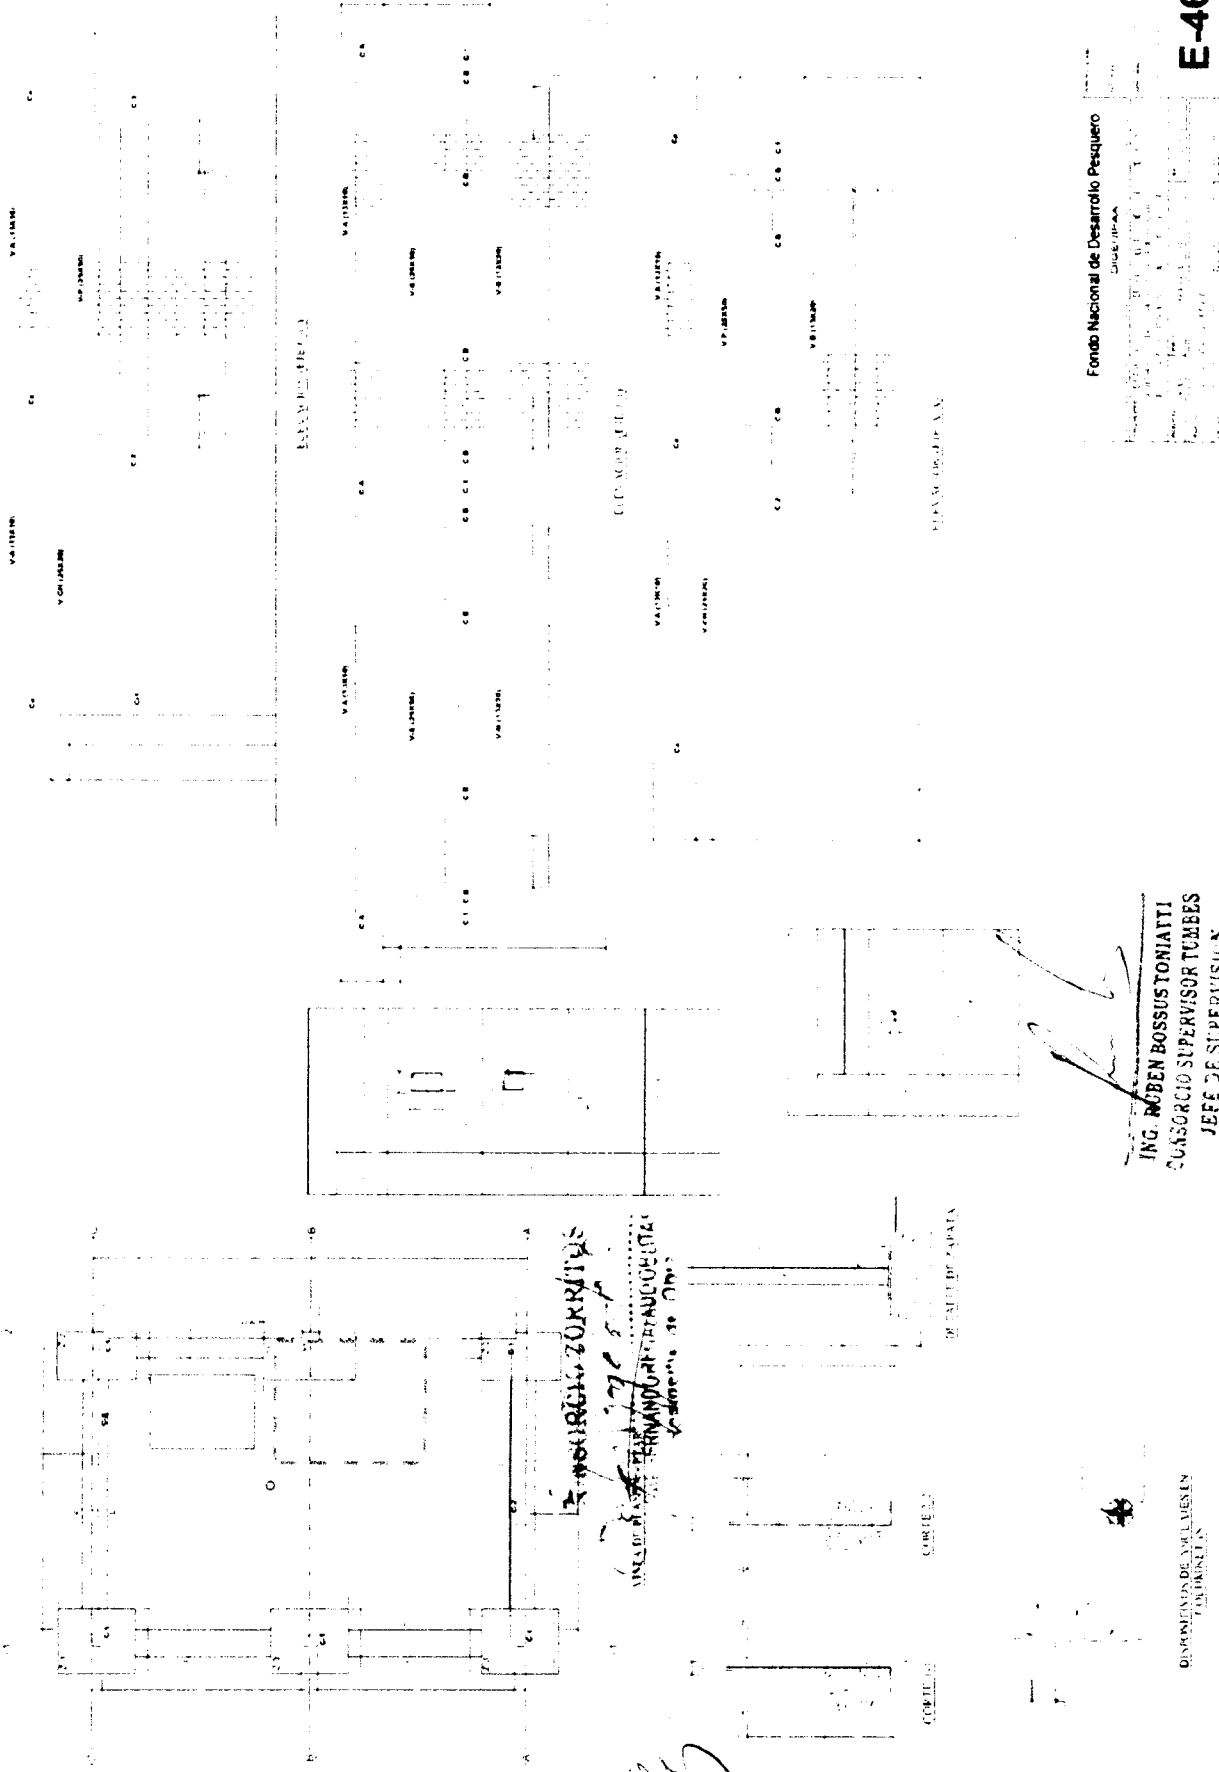

[Handwritten signature]
ING. ROSEN BOSSUS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

DIRECCION DE OBRAS
TUMBE

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

E-46

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO FONDEPES
 CLIENTE: E-46 COD. PLS: CZ-SGCC-LUC/OM
 DESCRIPCION DEL TRABAJO: CONCRETO EN SEDIMENTADOR Fc=315 KG/CM2
 No CORRELATIVO: 27/07/2019
 SECTOR: PTAR

CHECK LIST DE VERIFICACION DE COLOCACION DE ARMADURA

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpieza de armadura (Verificar si la armadura presenta corrosión)	V			
2	Diámetro Especificado: (f = 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" pig.)	V			
3	Colocación de Armadura (Tolerancia ± 0 a 1 cm)	V			
4	Verificación de Estribos (cantidad y espaciamiento)			N/A	
5	Verificación de Longitudes de Traslape (Tolerancia + 0 a 1 cm)	V			
6	Colocación de separadores (metálicos / doble malia)			N/A	
7	Conformidad de recubrimiento (datos de concreto en Losas / ruedas de plástico en muros)	V			
8	Verificación de doblado según especificación (Gancho Estándar: 90-180)	V			
9	Soldadura de la armadura según Norma ANSI/AWS D1.4 92			N/A	
10	5				

NOTA

RESPONSABLE DE ACERO: _____ Firma: _____
 Fecha de Inspección: _____


TIPO DE ENCOFRADO CHECK LIST DE VERIFICACION DE ENCOFRADOS

Madera Metálico Otros Especifique: _____
 Nombre de Desmoldante _____

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Verificación de trazo y niveles	V			
2	Colocación de desmoldante / sellador (madera)	V			
3	Completitud de paneles y accesorios (planchas metálicas / biseladores de madera)	V			
4	Completitud de dimensiones (modulación) y accesorios (amortiguadores, cunas, etc.)	V			
5	Verificación de niveles, verticalidad y horizontalidad de encofrado	V			
6	Conformidad de recubrimientos (datos de concreto y/o separadores de plástico)	V			
7	Verificación de Contraflechas (de acuerdo a planos)			N/A	
8	Verificación de ochavos y/o biselados			N/A	
9	Verificación de insertos y embudidos	V			
10	Verificación de hermeticidad de encofrado (colocación de yeso en aristas)	V			
11	Otros				

OTA:

RESPONSABLE DE ENCOFRADO: _____ Firma: _____
 Fecha de Inspección: _____



CONSORCIO ZORRITOS
 ING. RUBEN BOSSES TORTIAT
 CONSORCIO SUPERVISOR TUBOS
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 INGENIERO EN SALUD OCUPACIONAL


Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

INC/RUBEN BOSSA TOMATI
OFICIO SUPERVISOR TUMBES
DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS

CONSORCIO ZORRITOS
ERMANDO RECALZABERTAS
SECRETARÍA DE OCEANÍA

[Handwritten signature]



NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO
CLIENTE: FONDEPES
PLANO REF.: E-46 **CÓD. PLS.:** CZ-SGC-LUC/OM
DESCRIPCION DEL TRABAJO: CONCRETO EN SEDIMENTADOR Fc=315 KG/CM2
N° CORRELATIVO:
FECHA: 27/07/2019
SECTOR: PTAR

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE COLOCACION DE ARMADURA

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpieza de armadura (Verificar si la armadura presenta corrosión)	✓			
2	Diámetro Especificado: (f = 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" plg.)	✓			
3	Colocación de Armadura (Tolerancia ± 0 a 1 cm)	✓			
4	Verificación de Estribos (cantidad y espaciamento)			N/A	
5	Verificación de Longitudes de Traslape (Tolerancia ± 0 a 1 cm)	✓			
6	Colocación de separadores (metálicos / doble malla)			N/A	
7	Conformidad de recubrimiento (dados de concreto en Losas / ruedas de plástico en muros)	✓			
8	Verificación de doblado según especificación (Gancho Estandar: 90-180)	✓			
9	Soldadura de la armadura según Norma ANSI/AWS D1.4-92			N/A	
10	Otros				



RESPONSABLE DE ACERO: _____ **Firma:** _____
Fecha de Inspección: _____

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE ENCOFRADOS

Madera Metálico Otros Especifique: _____
 Nombre de Desmoldante: _____

EM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Verificación de trazo y niveles	✓			
2	Colocación de desmoldante / sellador (madera)	✓			
3	Verificación de limpieza de paneles y accesorios (planchas metálicas / sellos de madera)	✓			
4	Conformidad de dimensiones (modulación) y accesorios (clavos, cuñas, etc.)	✓			
5	Verificación de niveles, verticalidad y horizontalidad de encofrado	✓			
6	Conformidad de recubrimientos (dados de concreto y/o separadores de plástico)	✓			
7	Verificación de Contraflechas (de acuerdo a planos)			N/A	
8	Verificación de ochavos y/o biseles			N/A	
9	Verificación de Insertos y embebidos	✓			
10	Verificación de hermeticidad de encofrado (colocación de yeso en aristas)	✓			
11	Otros				

RESPONSABLE DE ENCOFRADO: _____ **Firma:** _____
Fecha de Inspección: _____



ING. RUBEN BOSSA TORREALBA
JEFE DE SUPERVISION
CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO

AREA / SECTOR:	MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO	FECHA:	27/07/2019
ESTRUCTURA / ELEMENTO:	CONCRETO EN SEDIMENTADOR $f_c=315 \text{ KG/CM}^2$	PLANO DE REF.:	E-46
RESISTENCIA (fc):	315 KG/CM ²	SLUMP:	5"-6"
		TIPO CEMENTO:	V
		VOLUMEN:	




CHECK LIST DE LIBERACION DE ESTRUCTURAS

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpieza de la estructura	✓			
2	Topografía, cotas de fondo y nivel de concreto	✓			
3	Ejes y dimensiones	✓			
4	Verificación de la armadura según check list	✓			
5	Verificación del encofrado según check list	✓			
6	Juntas frías				
7	IISS: tendido de redes de agua y desagüe, ubicación de puntos de salida y pases para tuberías.	✓		N/A	
8	IIEE: todos los puntos (interruptores, tomacorrientes, TV, telefono e intercomunicadores)			N/A	
9	Pernos de Anclaje y embebidos			N/A	
10	Verificación del Procedimiento de seguridad de acuerdo al estándar	✓			
11	Otros.				

VACIADO Y MUESTREO DEL CONCRETO


f_c (kg/cm ²)	Estructura	Hora Salida	Hora Ingreso	Hora Inicio	Hora Término	T (°C)	Slump	Vol. Concreto	Código Proyecto	Hora Muestra	N° Probetas
315	SEDIMENTADOR PTAR			11:10	14:35	30	6				6


COMENTARIOS

ELABORADO POR: 
 REVISADO POR: 
 APROBADO POR: 

bre: Freddy González López Nombre: Ing Edgar Regalado Obitas Nombre: Ruben Bossus Toniatti

a: 27/07/2019 Fecha: 27/07/2019 Fecha: 27/07/2019






[Handwritten signature]

CONSORCIO ZORRITOS

FERNANDO REGALADO OBITAS

Presidente de COTAP


[Handwritten signature]
ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

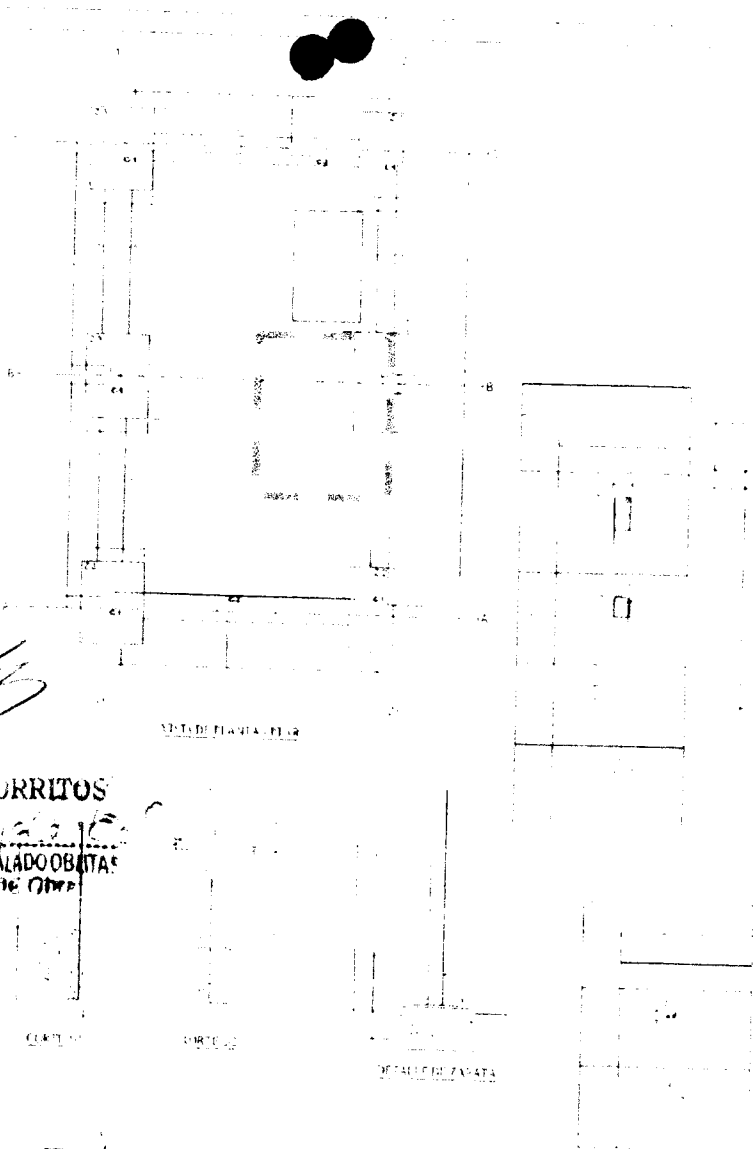

VISTA DE PLANTA PLAZA

DETALLE CALZADA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COTACACHI



Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

UNEP/FAO

E-46

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO
CLIENTE: FONDEPES
PLANO REF.: AR-15
CÓD. PLS.: CZ-SGC-LUC/OM
DESCRIPCION DEL TRABAJO: CONCRETO EN SOBRECIMIENTO - TAREAS PREVIAS - MESAS DESEMBARQUE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS

N° CORRELATIVO:
FECHA: 30/07/2019
SECTOR: TAREAS PREVIAS

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE COLOCACION DE ARMADURA					
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpieza de armadura (Verificar si la armadura presenta corrosión)	✓			
2	Diámetro Especificado (1" - 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" DI.)	✓			
3	Colocación de Armadura (Tolerancia ± 0 a 1 cm)	✓			
4	Verificación de espaciamiento (horizontal y espaciamento)			N/A	
5	Verificación de Longitudes de Traslape (Tolerancia ± 0 a 1 (III))	✓			
6	Colocación de separadores (metálicos / doble malla)			N/A	
7	Conformidad de recubrimiento (dados de concreto en losas / ruedas de plástico en muros)	✓			
8	Verificación de doblado según especificación (gancho estándar 90-180)	✓			
9	Soldadura de la armadura según Norma ANSI/AWS D1.4-92			N/A	
10	Otros				

NOTA:

RESPONSABLE DE ACERO: _____ **Firma:** _____
Fecha de Inspección: _____


TIPO DE ENCOFRADO

Madera: Metálico: Otros: Especifique: _____
Nombre de Desmoldante: _____

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE ENCOFRADOS					
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Verificación de trazo y niveles	✓			
2	Colocación de desmoldante / sellador (madera)	✓			
3	Limpieza de paneles y accesorios (planchas metálicas / paneles de madera)	✓			
4	Conformidad de dimensiones (modulación) y accesorios (alineadores, cuñas, etc.)	✓			
5	Verificación de niveles, verticalidad y horizontalidad de encofrado	✓			
6	Conformidad de recubrimientos (dados de concreto y/o separadores de plástico)	✓			
7	Verificación de Contraflechas (de acuerdo a planos)			N/A	
8	Verificación de ochavos y/o biselés			N/A	
9	Verificación de insertos y embebidos			N/A	
10	Verificación de hermeticidad de encofrado (colocación de yeso en aristas)	✓			
11	Otros				

NOTA:

RESPONSABLE DE ENCOFRADO: _____ **Firma:** _____
Fecha de Inspección: _____



ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS
ING. FERNANDO REGALADO OBILIAS
Residente de Obra

AREA / SECTOR:	MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO	FECHA:	30/07/2019
ESTRUCTURA / ELEMENTO:	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO : TAREAS PREVIAS : MESAS DESEMBARQUE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS	PLANO DE REF.:	AR-15
RESISTENCIA (Fc):	315 KG/CM2	SLUMP:	5"-6"
		TIPO CEMENTO:	V
		VOLUMEN:	

CHECK LIST DE LIBERACION DE ESTRUCTURAS					
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpieza de la estructura	✓			
2	Topografía, cotas de fondo y nivel de concreto	✓			
3	Ejes y dimensiones	✓			
4	Verificación de la armadura según check list	✓			
5	Verificación del encofrado según check list	✓			
6	Juntas frías			N/A	
7	ITSS: tendido de redes de agua y desagüe, ubicación de puntos de salida y pasos para tuberías.	✓			
8	ITFF: todos los puntos (Interruptores, tomacorrientes, TV, teléfono e intercomunicadores).			N/A	
9	Pernos de Anclaje y embebidos			N/A	
10	Verificación del Procedimiento de seguridad de acuerdo al estándar	✓			
11	Otros				



VACIADO Y MUESTREO DEL CONCRETO

Casa N°	Figura	Estructura	Hora Salida	Hora llegada	Hora Inicio	Hora Término	T (°C)	Slump	Vol. Colocado	Coeficiente Probable	Hora Muestra	N° Probetas
	315	SOBRECIMIENTO (MESAS) PARTE SUPERIOR			13:18	14:58	30	6				6
	TRAMO	4-5 6-7 8-9 10-11 11-12										

COMENTARIOS



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Freddy González López	Nombre: Ing Edgar Regalado Obitas	Nombre: Rubén Bossus Toniatti
Fecha: 30/07/2019	Fecha: 30/07/2019	Fecha: 30/07/2019



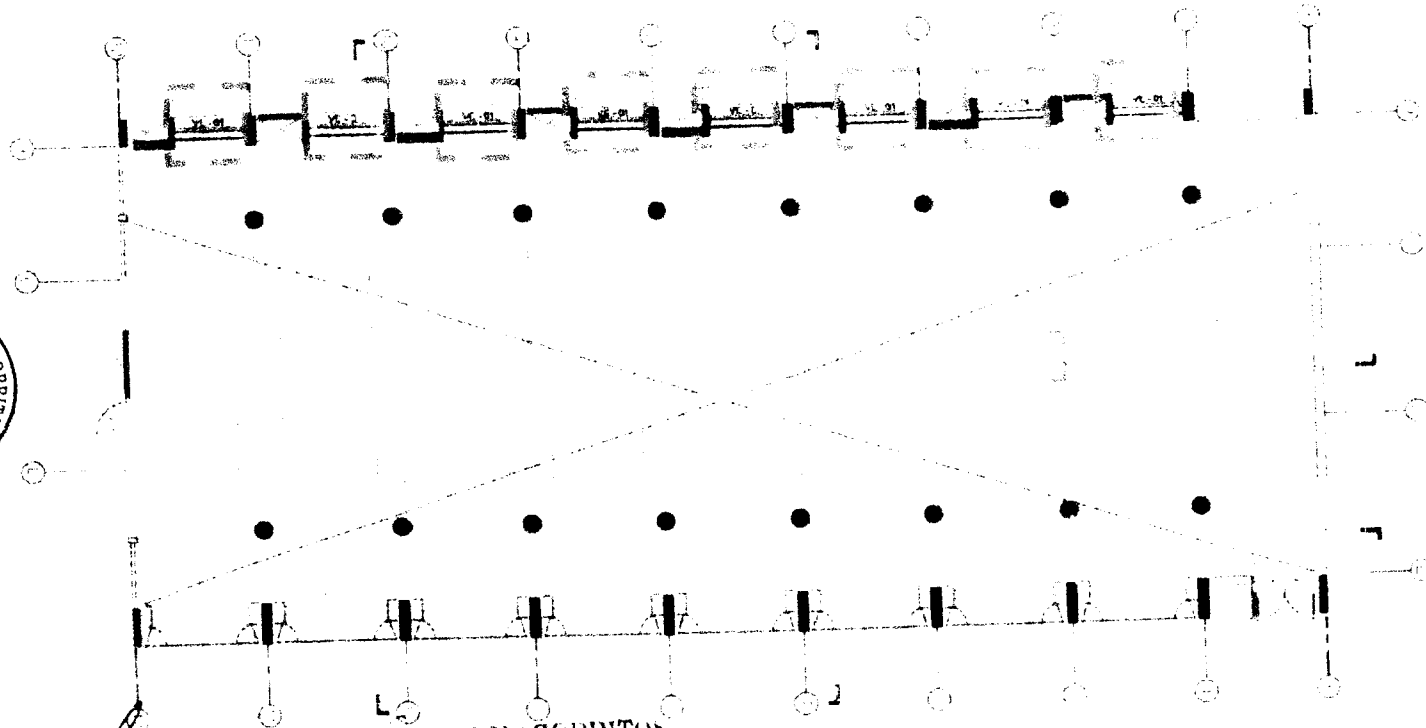

Ampliar


CONSORCIO ZORRITOS
Caracas
Ing. FERNANDO REGALADO OBITA
Residente de Obra

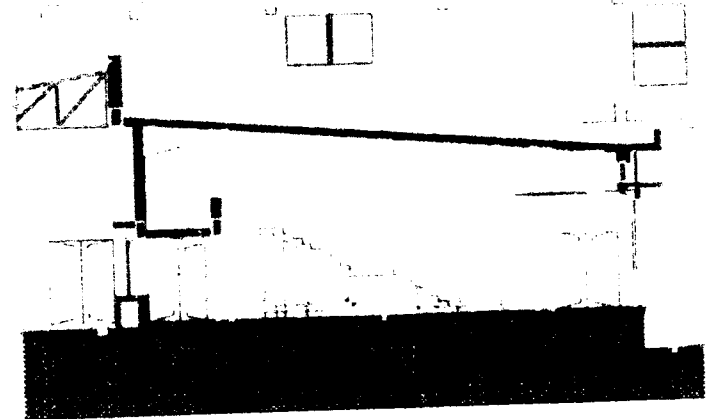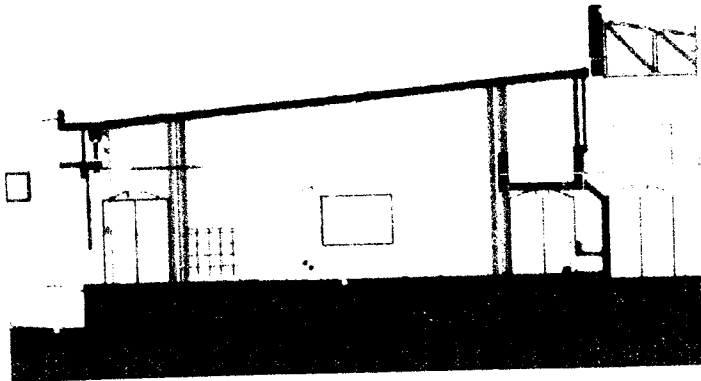


Ruben Bossus Toniatti
INGENIERO SUPERVISOR TUMBES
OFICINA DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS ACAPOLCO
 Ing. Respons.
 VOB


[Handwritten signature]

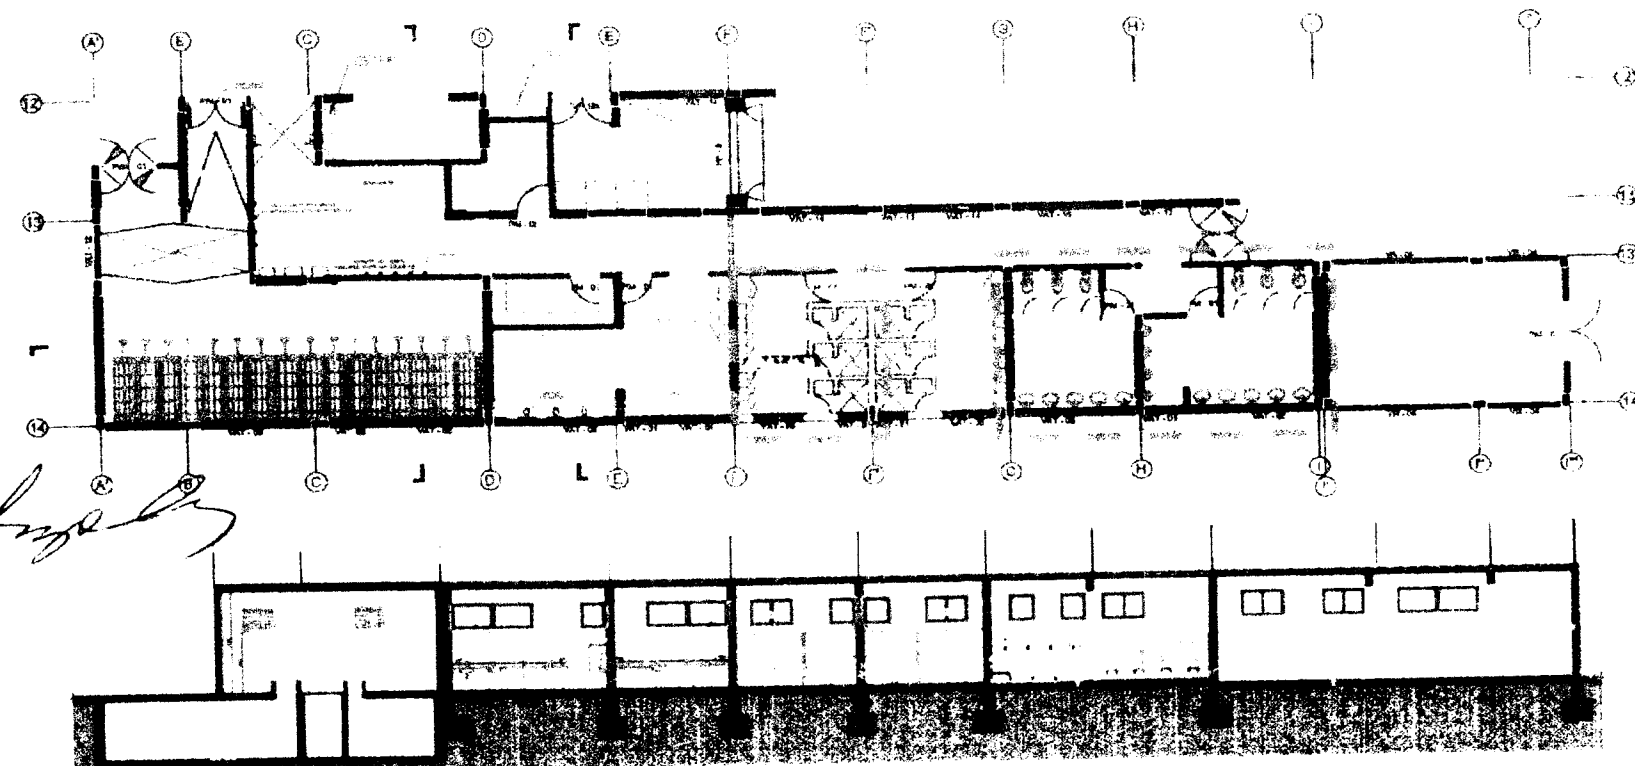


CONSORCIO ZORRITOS
 FERNANDO REGALADO OBATA
 Director de Obra

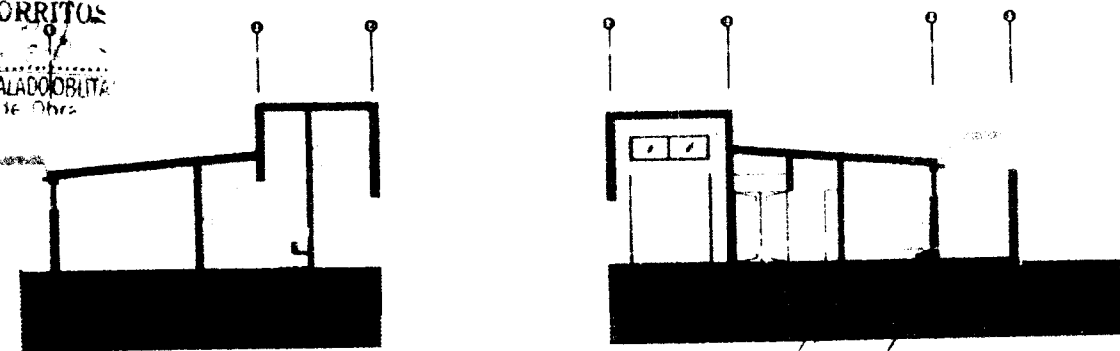



ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION





Handwritten signature

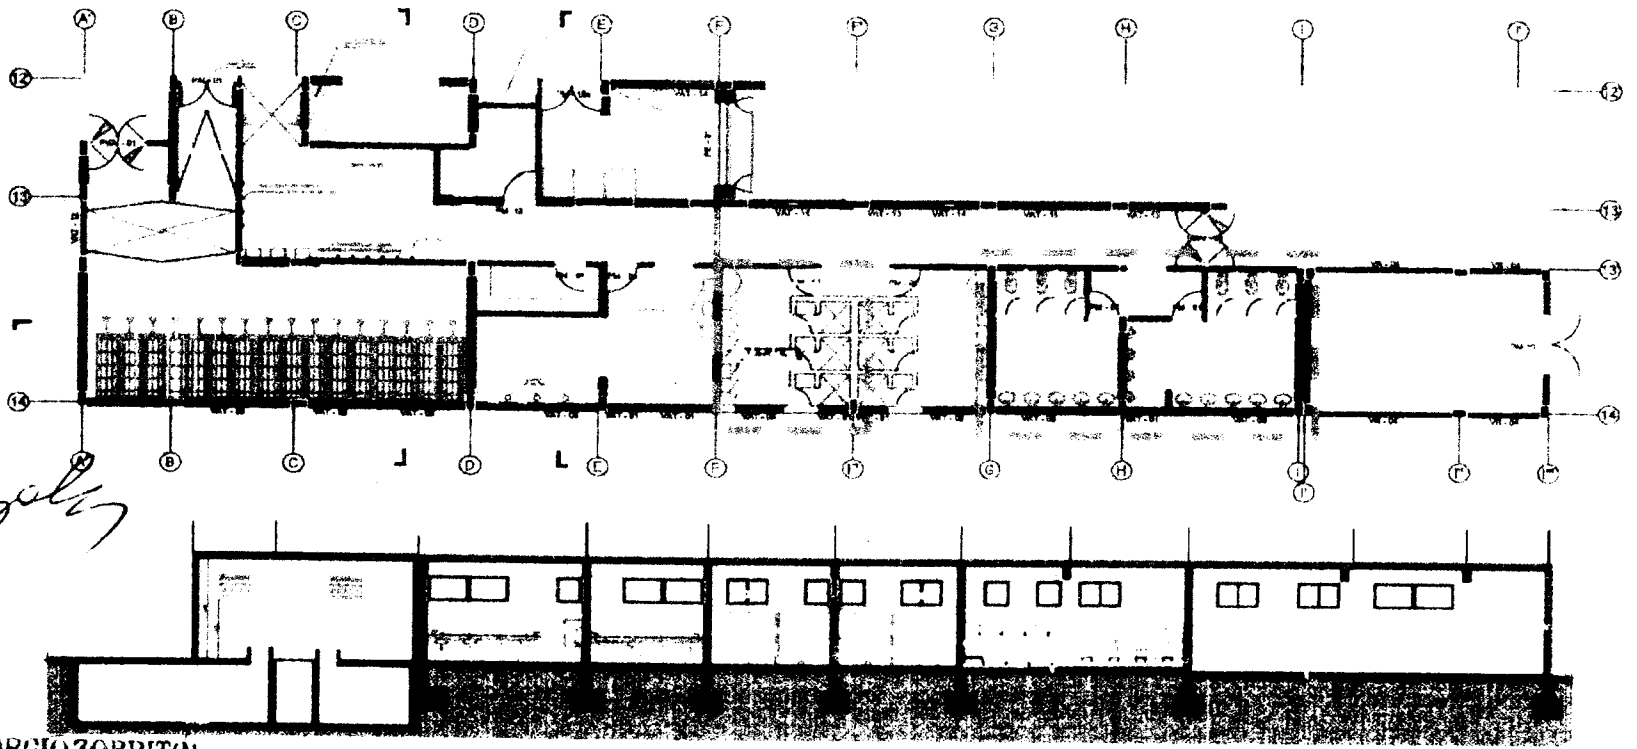

CONSORCIO ZORRITOS
FRNANDO REGALADO OBILTA
Ingeniero de Obra

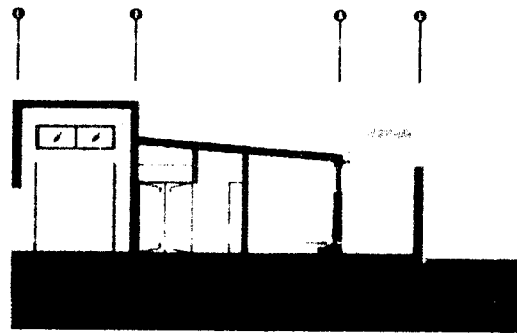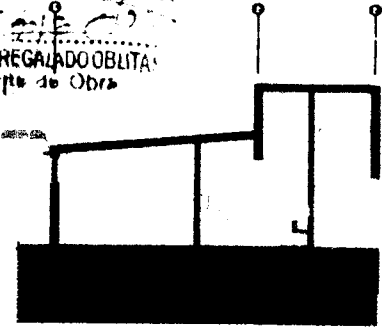




Handwritten signature
ING. RUBEN BOSSONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

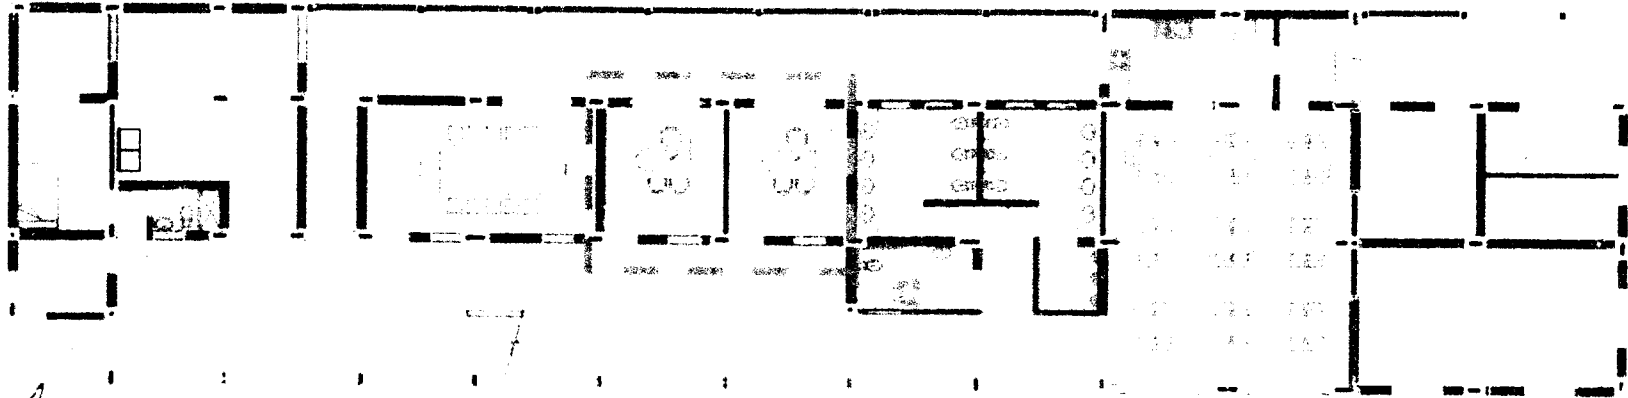



[Handwritten signature]

CONSORCIO ZORRITOS

[Handwritten signature]
ING. FERNANDO REGALADO OBITA
Reservista de Oficio

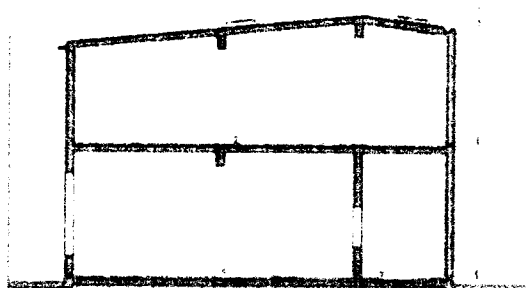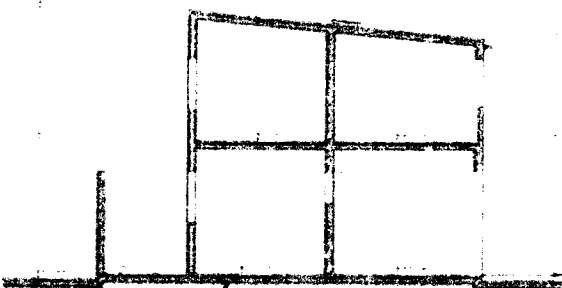
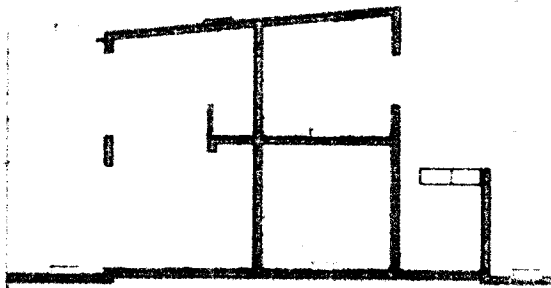


[Handwritten signature]
ING. RUBEN BOSSUSTONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

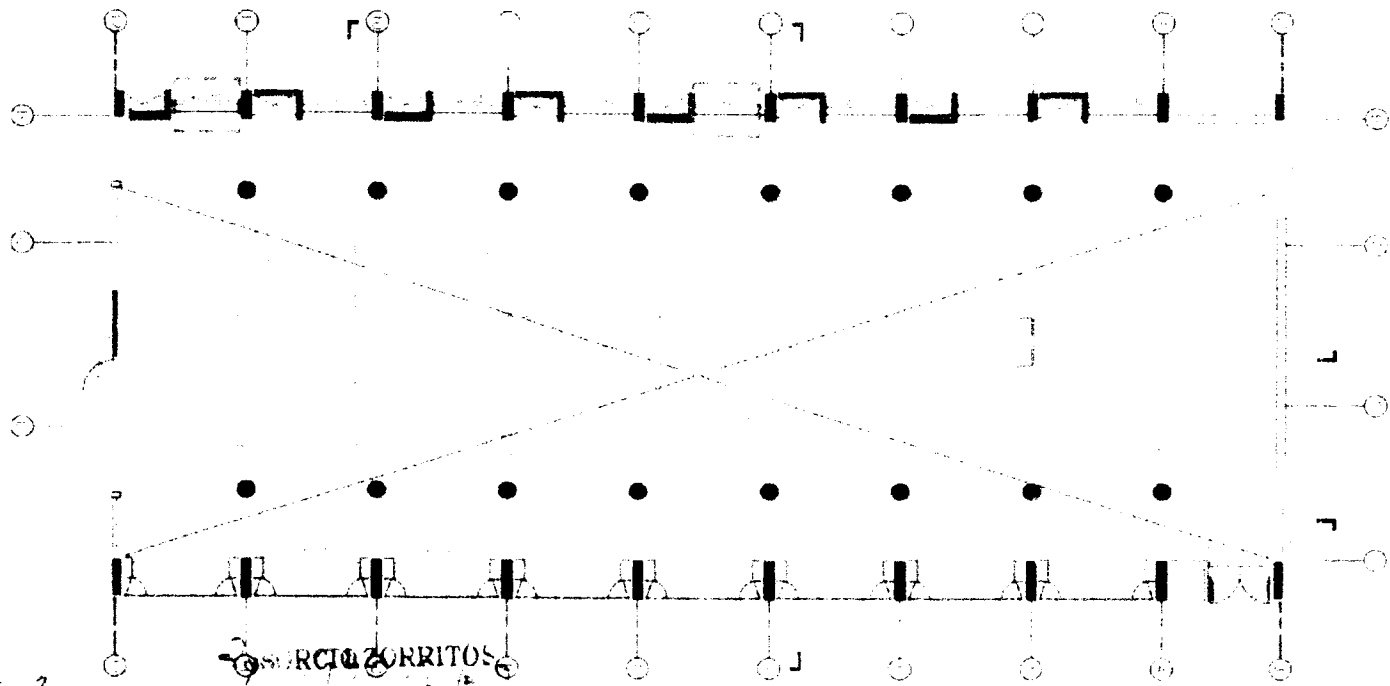


CONSORCIO ZORRITOS
 HERNANDEZ REGALADO OBATA
 Gerente de Obras

Supley
 ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

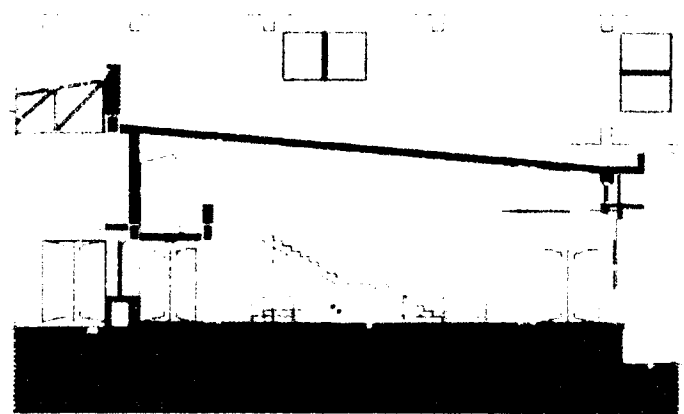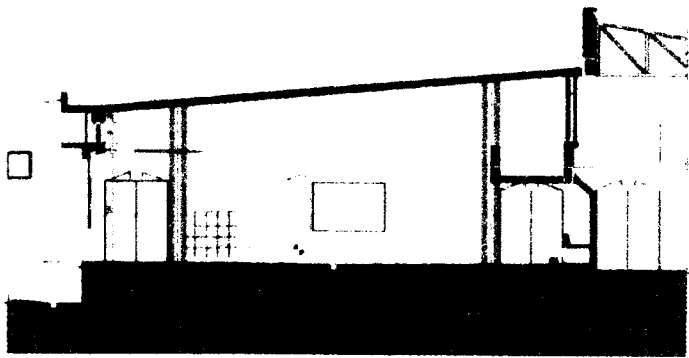


Rh



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

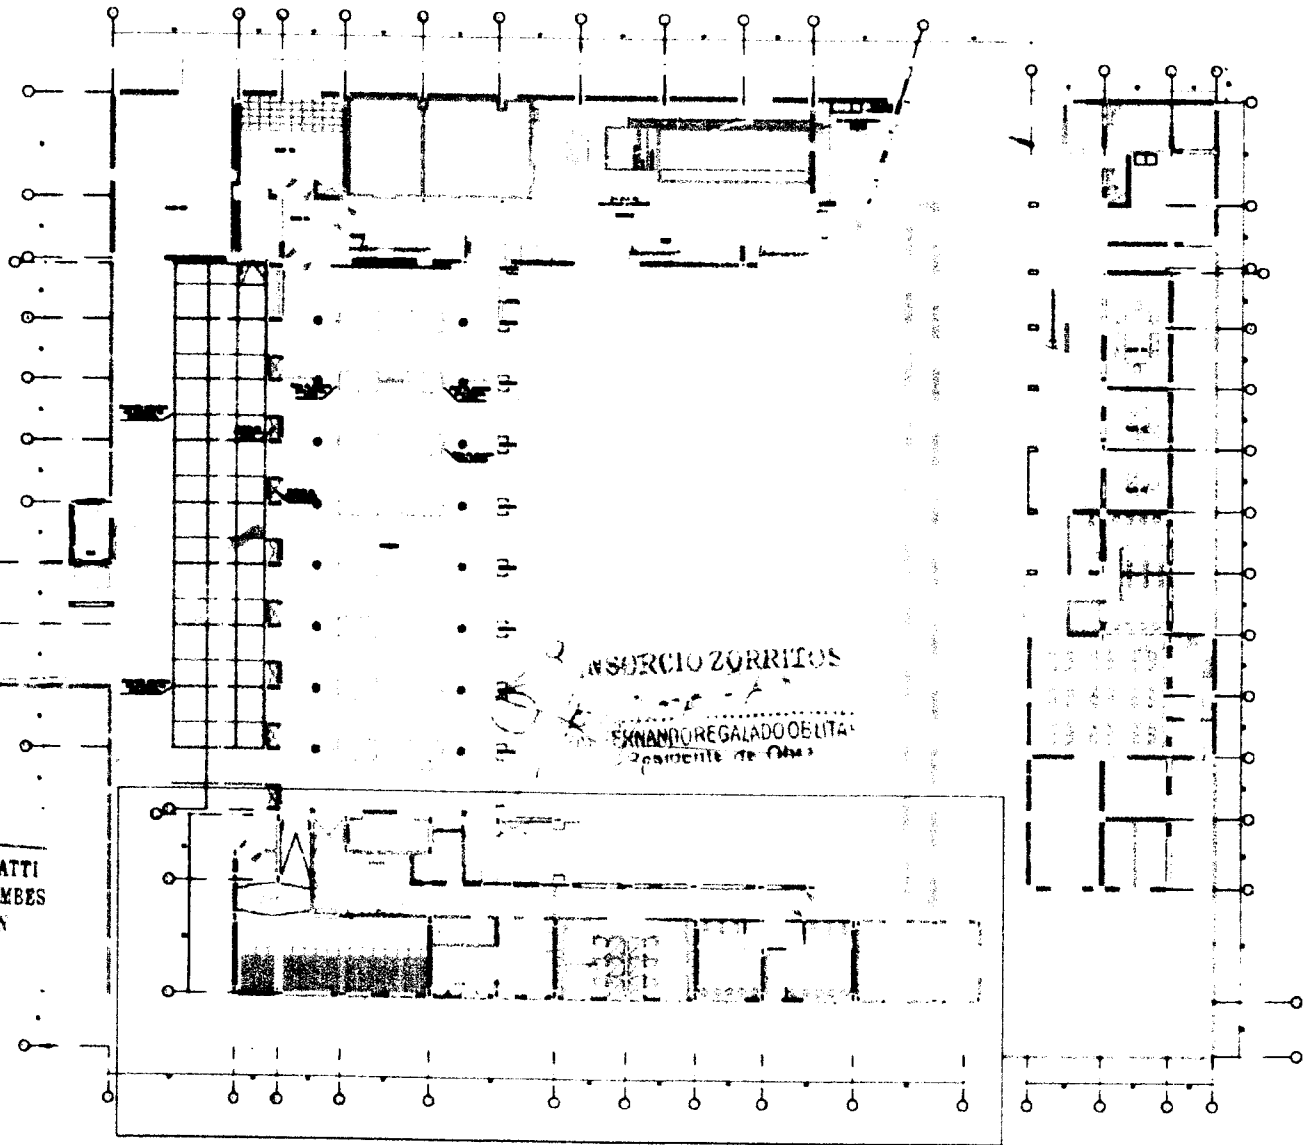

CONSORCIO ZORRITOS
EXNANDO REGALADO OBELTA
Residente de Obras

AR-01

AREA / SECTOR:	MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO	FECHA:	31/07/2019
ESTRUCTURA / ELEMENTO:	CONCRETO EN COLUMNAS S: EJE 1 : EJES 2 : Fc=315 KG/CM2	PLANO DE REF.:	E-46
RESISTENCIA (Fc):	315 KG/CM2	SLUMP:	5"-6"
		TIPO CEMENTO:	V
		VOLUMEN:	




CHECK LIST DE LIBERACION DE ESTRUCTURAS


ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpieza de la estructura	✓			
2	Topografía, cotas de fondo y nivel de concreto	✓			
3	Ejes y dimensiones	✓			
4	Verificación de la armadura según check list	✓			
5	Verificación del encofrado según check list	✓			
6	Juntas frías			N/A	
7	IISS: tendido de redes de agua y desagüe, ubicación de puntos de salida y pases para tuberías.			N/A	
8	IIEE: todos los puntos (interruptores, tomacorrientes, TV, teléfono e intercomunicadores)	✓			
9	Pernos de Anclaje y embebidos			N/A	
10	Verificación del Procedimiento de seguridad de acuerdo al estándar	✓			
11	Otros:				


VACIADO Y MUESTREO DEL CONCRETO

Nº	Fc (kg/cm²)	Estructura	Hora Salida	Hora Regalo	Hora Inicio	Hora Término	T (°C)	Slump	vel. Colocada	Código Probetas	Hora Muestra	Nº Probetas
	315	COLUMNAS EJE 1 EJE 2			16:10	17:30	28	6				6

COMENTARIOS

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Nombre: Freddy González López	Nombre: Ing Edgar Regalado Oblitas	Nombre: Ruben Bossus Toniatti
Fecha: 31/07/2019	Fecha: 31/07/2019	Fecha: 31/07/2019






[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ING. RUBEN BOSSUS TONATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS
[Handwritten signature]
ING. FERNANDO REGALADO OBLITAS
Residencia 14. 0011

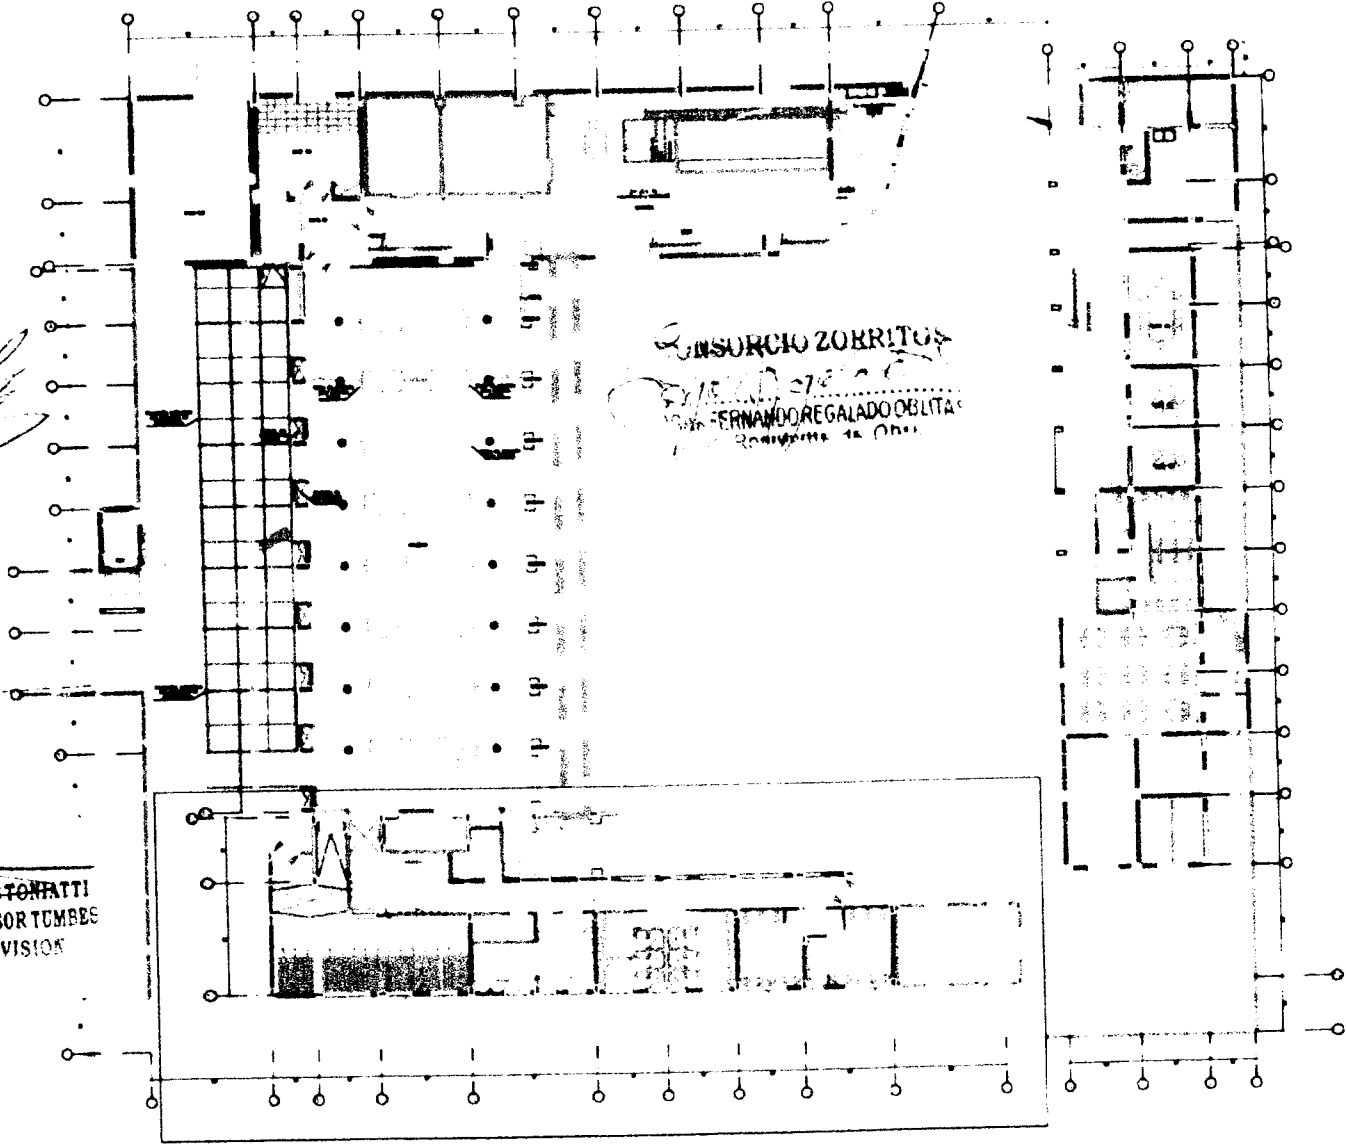

AR-01

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DPA ACAPULCO **N° CORRELATIVO:**
CLIENTE: FONDEPES **FECHA:** 31/07/2019
PLANO REF.: E-46 **CÓD. PLS:** CZ-SGC-LUC/OM **SECTOR:** PTAR

DESCRIPCION DEL TRABAJO: CONCRETO EN COLUMNAS S: EJE 1 : EJES 2 : Fc=315 KG/CM2

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE COLOCACION DE ARMADURA

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Limpieza de armadura (Verificar si la armadura presenta corrosión)	✓			
2	Diámetro Especificado: (f = 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" plg.)	✓			
3	Colocación de Armadura (Tolerancia + 0 a 1 cm)	✓			
4	Verificación de Estribos (cantidad y espaciamento)	✓			
5	Verificación de Longitudes de Traslape (Tolerancia ± 0 a 1 cm)	✓			
6	Colocación de separadores (metálicos / doble malla)			N/A	
7	Conformidad de recubrimiento (dados de concreto en Losas / ruedas de plástico en muros)	✓			
8	Verificación de doblado según especificación (Gancho Estandar: 90-180)	✓			
9	Soldadura de la armadura según Norma ANSI/AWS D1.4 92			N/A	
10					

NOTA:

RESPONSABLE DE ACERO: _____ **Firma:** _____
Fecha de Inspección: _____


CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE ENCOFRADOS

TIPO DE ENCOFRADO
Madera Metálico Otros Especifique: _____
Nombre de Desmoldante: _____

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Verificación de trazo y niveles	✓			
2	Colocación de desmoldante / sellador (madera)	✓			
3	Verificación de ajuste de paneles y accesorios (planchas metálicas / juntas de madera)	✓			
4	Conformidad de dimensiones (modulación) y accesorios (cuerdas, cuñas, etc.)	✓			
5	Verificación de niveles, verticalidad y horizontalidad de encofrado	✓			
6	Conformidad de recubrimientos (dados de concreto y/o separadores de plástico)	✓			
7	Verificación de Contraflechas (de acuerdo a planos)			N/A	
8	Verificación de ochavos y/o biseles			N/A	
9	Verificación de insertos y embebidos	✓			
10	Verificación de hermeticidad de encofrado (colocación de yeso en aristas)	✓			
11	Otros				

NOTA:


RESPONSABLE DE ENCOFRADO: _____ **Firma:** _____
Fecha de Inspección: _____



[Handwritten signature]

CONSORCIO ZORRITOS
ING. FERNANDO REGALADO OB. I.T.A.
Ing. Residente

ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION




[Handwritten signature]

CONSORCIO ZORRITOS


HERNANDO REGALADO OBLITA
Presidente de Obra

[Handwritten signature]

RUBEN BOSSUS TONIATTI
SUPERVISOR TCMBS
SUPERVISION

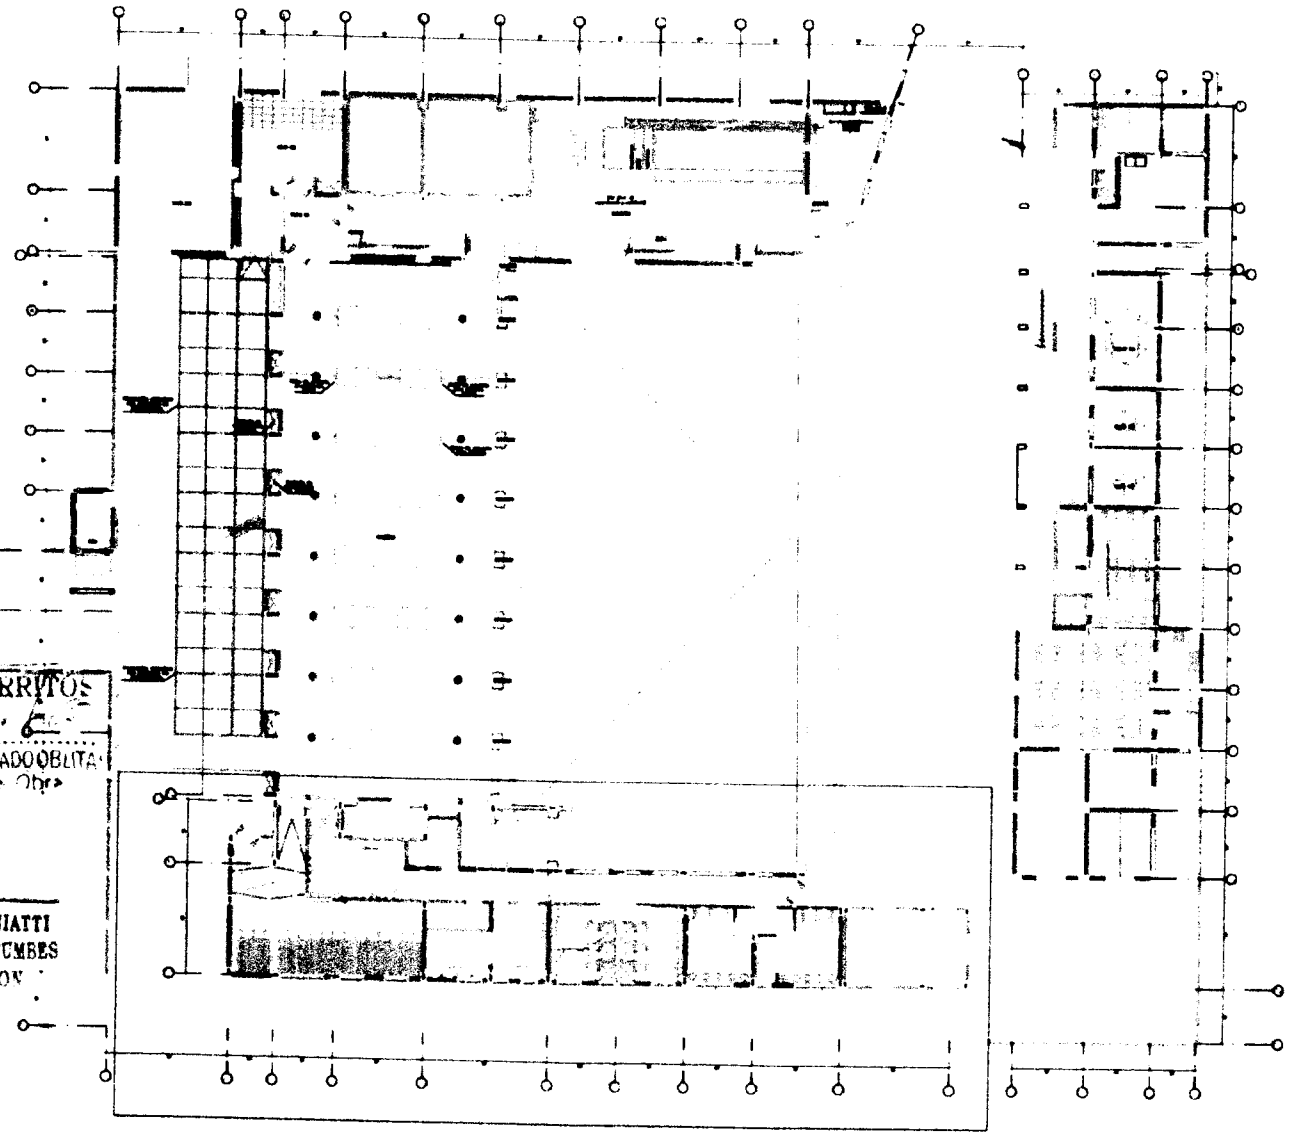

AR-01





[Handwritten signature]

CONSORCIO ZORRITOS

FERNANDO REGALADO OBITAS

[Handwritten signature]
ING. RUBEN BOSSUS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

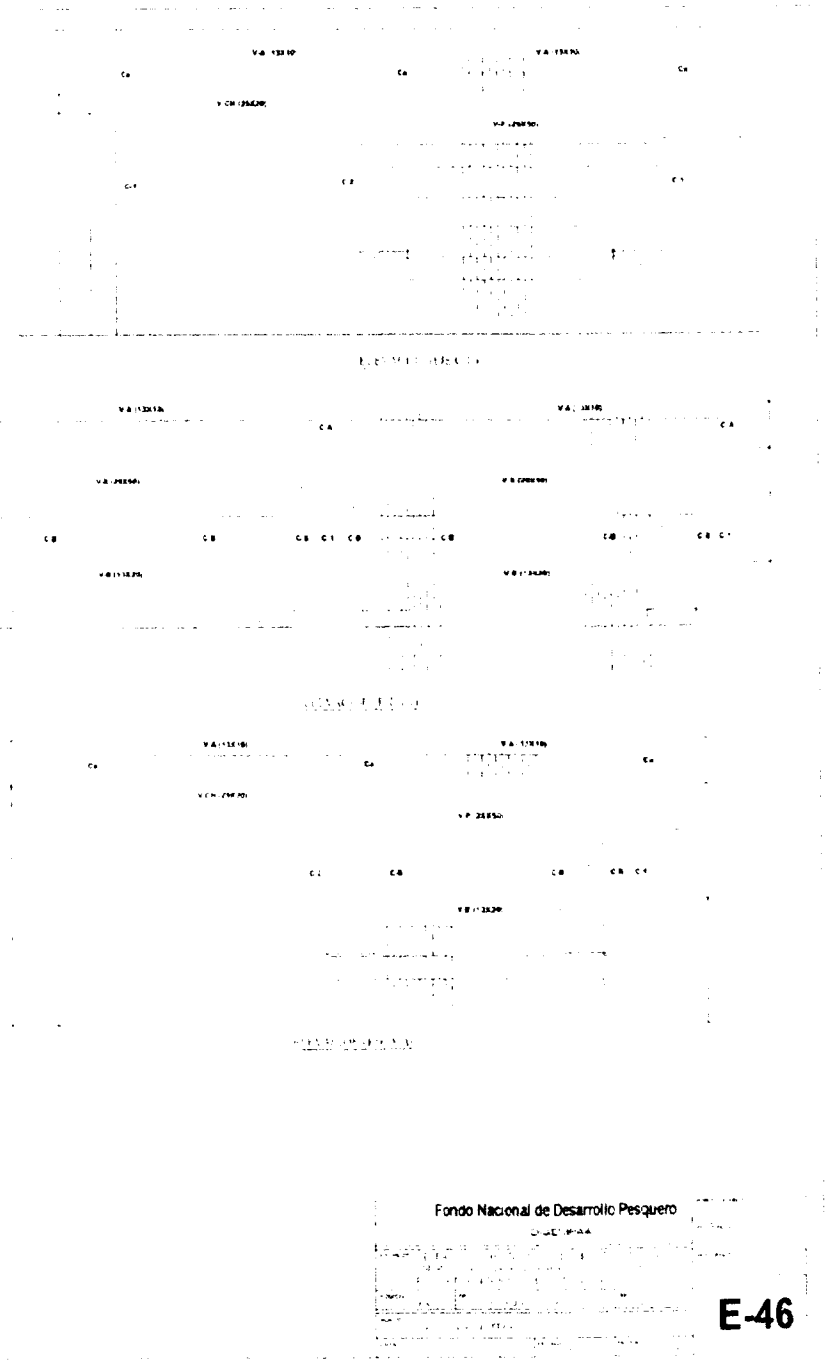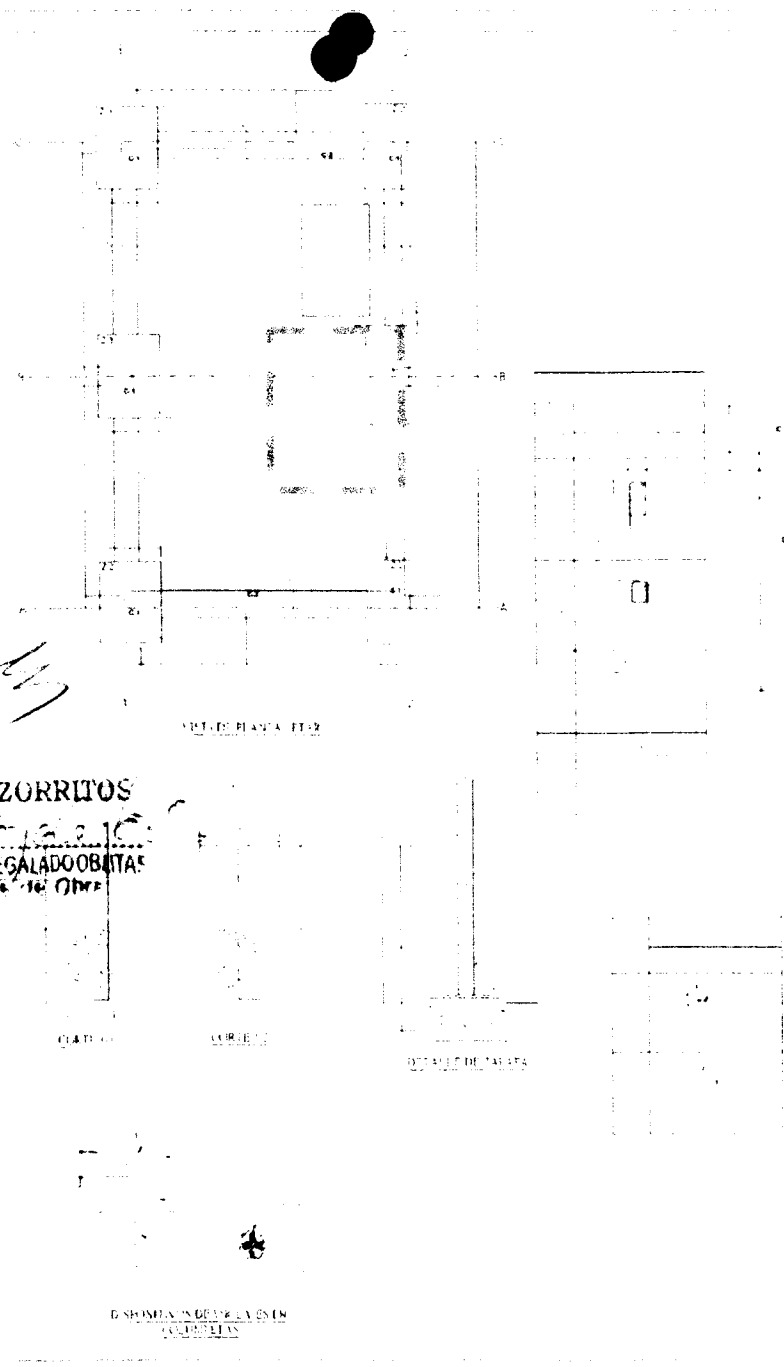

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

E-46



8 FOTOGRAFÍAS QUE MUESTRAN EL AVANCE DE LA OBRA



PANEL FOTOGRAFICO




Colocación y compactación de afirmado en los pisos de los equipos de frio – Edificio de Frio



Colocación y compactación de afirmado en los pisos de los equipos de frio – Edificio de Frio



Colocación de afirmado para el Patio de Maniobras

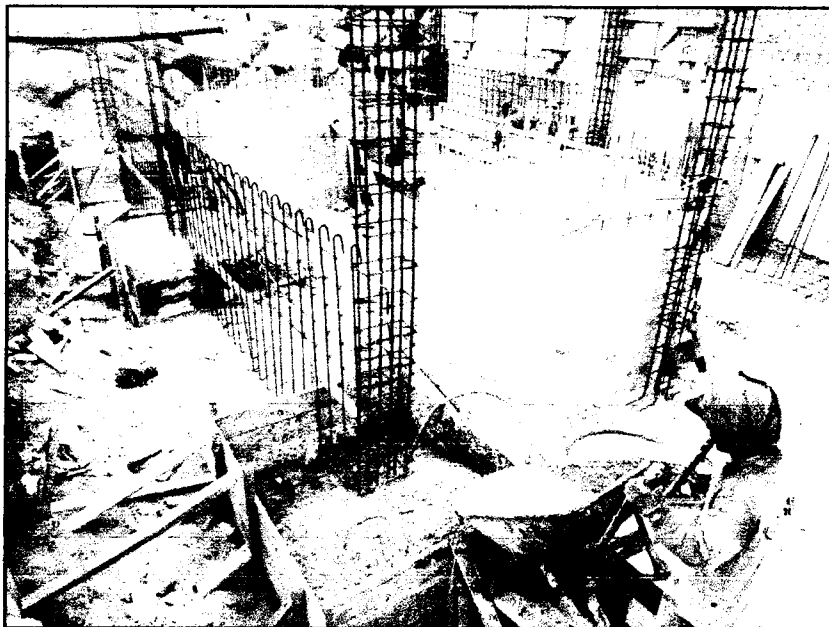

Vaceado de las zapatas del PTAR



Vaceado de las mesas de concreto




Armadura de refuerzo de las columnas del PTAR



Colocación de ladrillo tipo IV saga en muros del PTAR



Tarrajeo en columnas circulares en Tareas Previas

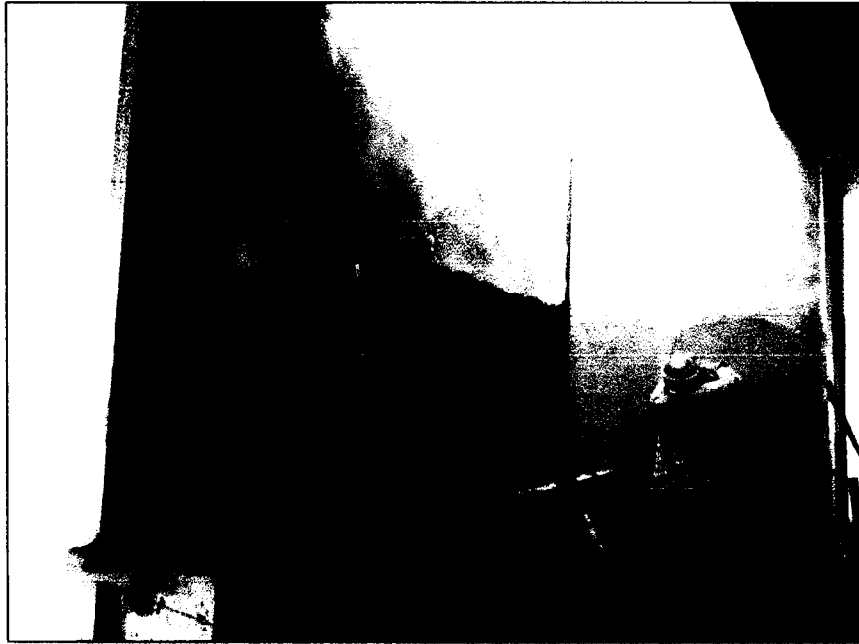


Tarrajeo en muros interiores de Desinfección, maniluvios




Vaceado del cemento pulido en Control de calidad-Desinfección



Colocación del porcelanato en los baños de Desinfección

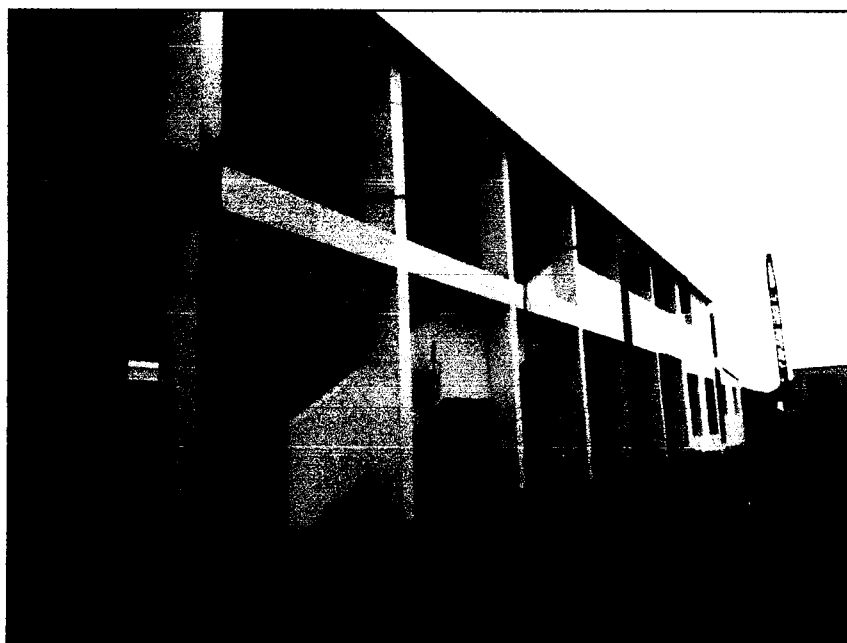


Pintura en exteriores del edificio de Administración

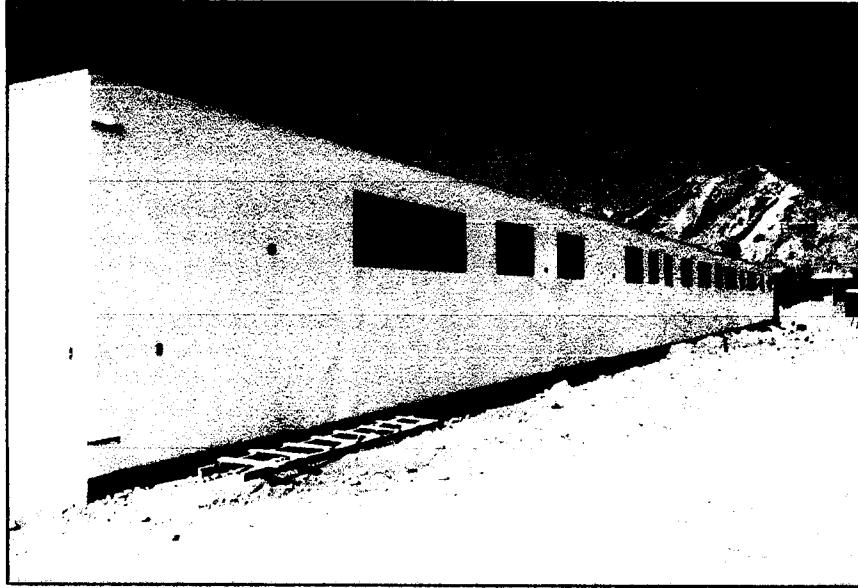


Pintura en exteriores del edificio de Desinfección



Transporte y montaje de las vigas y losas prefabricadas en el cabezo del nuevo muelle



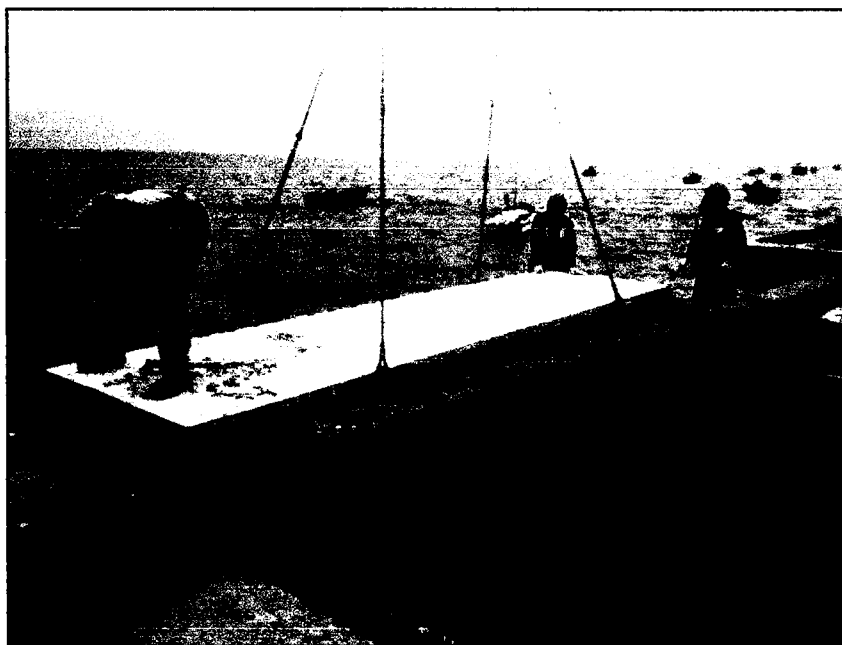

Transporte y montaje de las losas prefabricadas y losas prefabricadas en el cabezo del nuevo muelle



Vaceados in situ en los núcleos del cabezo del muelle




**CONSORCIO
ZORRITOS**

**OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN
LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR,
REGIÓN TUMBES"**



Colocación de la armadura de refuerzo y el encofrado en los núcleos del cabezo del muelle



INFORME MENSUAL DE OBRA N° 20 – JULIO 2019



9 INFORME MENSUAL DE LOS ESPECIALISTAS



INFORME MENSUAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS MES DE JULIO 2019

**Ing. Romel Elí Menacho Torre
Especialista en Instalaciones Eléctricas**

CONSORCIO ZORRITOS



ROMEL ELÍ MENACHO TORRE
Especialista en Instalaciones Eléctricas



INDICE

- 1.0 NOMBRE DE LA OBRA
 - 1.1 DESCRIPCION DE LA OBRA
 - 1.2 ANTECEDENTES
- 2.0 AVANCE FÍSICO.
- 3.0 RECOMENDACIONES

CONSORCIO ZORRITOS



ROMEL ELI MENACHO TORRE
Especialista en Instalaciones Eléctricas



1.0 NOMBRE DE LA OBRA

El presente documento es el informe correspondiente a las instalaciones eléctricas en baja tensión del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE C. VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES".

1.1 DESCRIPCION DE OBRA.

La ejecución de obra comprende las instalaciones eléctricas de interiores y exteriores para el local del DPA ACAPULCO. Esto es, redes de alimentación al Tablero General y Tableros de Distribución, alimentación para las salidas de fuerza para electrobombas, alimentación para salidas de fuerza para Sistema de Frio. Además, se contempla las instalaciones de los circuitos de iluminación interior y exterior, tomacorrientes. Pozos de puesta a tierra. Grupo Electrónico de Emergencia. Banco de Condensadores.

Los trabajos comprendidos en el Expediente Inicial, en Resumen, son los siguientes:

1. Grupo Electrónico 60 KW – 380 Voltios + N para cargas de emergencia.
2. Tablero de Transferencia automático
3. Banco de condensadores 50 KVAR
4. Circuitos de alumbrado interior
5. Circuitos de alumbrado exterior
6. Suministro e instalación de artefactos de alumbrado
7. Circuitos de tomacorrientes
8. Salidas eléctricas a cargas de frio o congelamiento según detalles en planos
9. Salidas eléctricas a cargas de bombeo según detalle en planos
10. Sistema de puesta a tierra.
11. Comunicaciones y Seguridad a nivel de ductos y cajas
12. Pruebas eléctricas.

CONSORCIO ZORRITOS


ROMEL ELI MENACHO TORRE
Especialista en Instalaciones Eléctricas


Dichos trabajos, requieren de manera previa a la ejecución, proceder a cotizar, encargo de fabricación, de los insumos, equipos, herramientas, accesorios, pruebas, etc; actividades que ocupan un periodo que deberá considerarse antes de la ejecución propiamente, y que ha sido considerada en el Cronograma de Obra.

1.2 ANTECEDENTES.

1.2.1 La fecha de inicio de Obra del DPA ACAPULCO se dio el 28/12/2017, fecha en la que se procedió a revisar el Expediente Técnico de la Especialidad cuyas observaciones y recomendaciones se envió por:

- INFORME N°001-CZO-ACAP/IE/REMT de fecha 02/01/2018, al Consorcio para el trámite correspondiente a la Entidad.

- INFORME N°003-CZO-ACAP/IE/REMT de fecha 07/02/2018, RFI N°001 Bombas en Muelle, al Consorcio para el trámite correspondiente a la Entidad.



- INFORME N° 007-CZO-ACAP/IE/ REMT de fecha 19/02/2018, RFI N°002 a RFI N°006, Consorcio para el trámite correspondiente a la Entidad.

1.2.2 En fecha 11/05/2018 se recibe carta N° 529 2018 FONDEPES/DIGENIPAA, respondiendo a las consultas de RFI N° 11 Y 12 generados por el INFORME N° 007-CZO-ACAP/IE/ REMT, concerniente a reubicación de entrada del cable alimentador a subestación y cambio de sección de alimentadores Terna 1 y 2 a tablero de transferencia automática.

1.2.3 En fecha 24/05/2018 reunidos en obra del DPA ACAPULCO-ZORRITOS, funcionarios y Especialistas de la Entidad, Supervisión y Consorcio Zorritos, con el fin de agilizar y resolver todas las observaciones, recomendaciones que se enviaron por RFIS e informes.

Se firmó un acta de compromiso, a fin de atender las observaciones, modificaciones, la falta de concordancias entre las especialidades y consultas pendientes de atender del DPA ACAPULCO.

Como resultado de lo tratado, para las instalaciones eléctricas de Baja Tensión, se estableció una lista de compromisos por parte de la Entidad, las cuales resumimos a continuación:

- 1.- Entrega de Información de construcción de Sub Estación convencional - Acapulco, referencia carta CST.175501.ED.020.18 (RFI-03)
Revisada de Carta N°427-2018-FONDEPES DIGENIPAA

Compromiso:

La Entidad entrega la última modificación en plano EC-01 Estructura de Subestación. Detalle de canaletas, mediante carta CST.175501.146.18.

- 2.- Observaciones e incompatibilidades de Instalaciones eléctricas, referencia carta CST.175501.ED.020.18 (RFI-05)

CONSORCIO ZORRITOS


ROMEL ELI MENACHO TORRE
Especialista en Instalaciones Eléctricas

Compromiso:

La Entidad entrega la última modificación en planos IE-01.1 Diagramas Unifilares, de fecha octubre-2018, mediante carta CST.175501.146.18, el compromiso.

- 4.- Incompatibilidad de Instalaciones Eléctricas, referencia carta CST 175501.ED.062.18 (RFI-14)

Compromiso:

La Entidad entrega la última modificación en planos IE-01.1, IE-01.2, IE-01.3, Diagramas Unifilares, y IE-02.1 Alimentadores, primera planta, de fecha octubre-2018, mediante carta CST.175501.146.18.

- 5.- Consideraciones y Evaluaciones en Instalaciones eléctricas, referencia carta CST.175501.Ed.064.18 (rfi-16)

Compromiso:

La Entidad entrega la última modificación en planos IE-01.1, IE-01.2 Diagramas Unifilares de fecha octubre-2018, mediante carta CST.175501.146.18.



131

- 6.- Se Acordó cambio de Salida C- 9 (TA-7). salida de campana extractora dejar a 1.8m.Y confirmar con el proyectista.
- 7.- Evaluar el cambio de ITM y sección del cable en máquina de soldar en circuito C-10 de TA-7. Contemplar lo mismo para el resto de Equipos en área de maestranza.
- 8 - Evaluar el tipo de caja del sistema de voz y data; debiendo ser cuadrada con tapa gang.
- 9.- De acuerdo a lo coordinado en reunión se determinó retirar las bombas sumergibles de drenaje N°1 en el muelle previa coordinación del especialista Sanitario.
- 10.- Evaluar el cable de circuito de alumbrado exterior en muelle teniendo en cuenta la caída de tensión ya que la distancia desde el tablero a última luminaria supera los 300m.

Compromiso:

Los Items 6, 7, 8, 9 y 10, la Entidad, mediante la entrega del Expediente del Adicional N° 03 (IIEE, IISS) en los planos IE-01.1, IE-01.2, IE-01.3 Diagramas Unifilares, IE-02.1, IE-02.2 Alimentadores primera y alimentadores segunda planta y muelle, de fecha octubre-2018, mediante carta CST.175501.146.18, se encuentra atendido.

2.0 AVANCE FISICO

El Avance físico del programa vigente de obra considera inicio de las instalaciones eléctricas en fecha 30/04/2018.

En el presente mes se ejecutaron las siguientes partidas:

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01 Trazo y Replanteo.

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01 Excavación de zanja de 0.60m x 0.60m para instalación de ductos.

01.02.03 Relleno y compactado de zanja 0.60x0.60m.

01.02.05 Eliminación de material excedente de zanja 0.60 x 0.60m c/máquina.

01.10 TUBERÍA PVC Y CONDUIT

01.10.01 tubería PVC-SAP eléctrica de \varnothing 25 mm.

01.10.02 tubería PVC-SAP eléctrica de \varnothing 35 mm.

01.12 DUCTOS DE CONCRETO

01.12.01 Buzón de concreto de 0.60 x 0.60 x 0.70m.

01.12.03 Banco ducto de concreto de 2 vías.

01.15 CAJAS DE PASE

01.15.04 Caja de pase cuadrada metálica pesada de 100x100x50mm.

La partida **01.13** TABLEROS E INTERRUPTORES, se está a la espera de entrega de estos, puesto que se realizó el requerimiento con anterioridad.

CONSORCIO ZORRITOS
ROMEL ELI MENACHO TORRE
Especialista en Instalaciones Eléctricas

3.0 RECOMENDACIONES.

- Solicitamos a la Entidad agilizar los trabajos del SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE MEDIA TENSIÓN DEL DPA ACAPULCO, a fin que el nuevo Calendario de Obra, de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión coincida con la finalización de los Trabajos inicialmente mencionados.
- A la fecha de este informe la Entidad no hace entrega de los nuevos cambios en referencia a los últimos planos Recibidos del Proyecto: "EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA COMPLEMENTARIA: TECHADO CON COBERTURA LIVIANA DEL CABEZO DEL MUELLE EN EL DPA ACAPULCO-LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES, por lo que solicitamos a la vez entreguen los planos de la especialidad instalaciones eléctricas debidamente compatibilizado con las demás especialidades, que además incluyan los detalles de los alimentadores eléctricos para la zona del cabezo del muelle. Toda vez que no se encuentra información de la especialidad.

Atentamente,

CONSORCIO ZORRITOS





ROMEL ELI MENACHO TORRE
Especialista en Instalaciones Eléctricas

Ing. Romel Eli, Menacho Torre
CIP N°: 66866



INFORME DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL




**“INFORME EJECUTIVO DE GESTION DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO,
DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE ACAPULCO”**



ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)


CONSORCIO ZORRITOS
Ricardo Eugenio Misaelman Cachi
ING. ESPECIALISTA EN SSOMA



indice

1. DATOS DEL PROYECTO	3
1.1. Ubicación	3
1.2. Gráfico de ubicación de la localidad de Acapulco	3
2.OBJETIVOS	4
2.1 Los objetivos del presente informe son:.....	4
2.2 ORGANIGRAMA DE LA OBRA DPA- ACAPULCO	6
2.3 Capacitación en seguridad y Salud Ocupacional.....	7
2.4 Programa de inducción de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente	7
2.5. Cursos de capacitación específica o entrenamiento de la tarea para puestos clave.	7
2.6. Programa de charlas de seguridad.....	8
3. CHARLA DE SEGURIDAD DE 10 MINUTOS.....	8
4. PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD	14
5. INSPECCIONES RUTINARIAS (I.R.)	14
6. INSPECCIONES PLANEADAS (I.P.).....	15
7. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE SALUD EN EL TRABAJO	15
7.1 Examen médico ocupacional antes del ingreso a la obra.....	15
8. PRESENCIA DE BOTIQUÍN EN OBRA	15
9. PROGRAMA DE DOTACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.....	16
10. CUADRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL MES DE JULIO 2019	17
11. PROGRAMAS DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA	20
11.1 Identificación de peligros y evaluación de riesgos en la obra.....	20
12. SEÑALIZACIÓN, ALMACENES Y ZONAS DE TRABAJO	20
13. PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS	21
13.1 Señalización de rutas de evacuación	21
14. PLAN DE SISTEMAS Y DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	21
14.1 Recarga y mantenimiento de extintores instalados en oficinas, almacenes, muelle y vehículos de transporte.....	21
15.REGLAMENTOS Y POLITICAS DE SEGURIDAD	22
16.COMPROMISO DE ACATAMIENTO	22
17.1 La motivación.....	22
17.2 La promoción	23
17.3 Difusión.....	23
17.4 Colocar afiches de seguridad.....	23
18. INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES E INCIDENTES	23
19. PROGRAMA DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN LA TAREA (AST).....	23

20. CUADRO RESUMEN DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS DE LOS TRABAJADORES DPA-ACAPULCO 2019	24
20.1 Cuadro de horas –hombre del de julio 2019	24
20.2 Unidades de accidentabilidad.....	29
21. PARAMETROS INDICADORES DE SEGURIDAD:	29
21.1 Cuadros estadísticos del mes de julio 2019, con los parámetros de accidentabilidad.....	30
21.2 Cuadro estadístico de los meses de ejecución de obra	31
21.3 Lista de trabajadores de la obra DPA-Acapulco	33
21.4 Cuadro estadístico indicando el número de trabajadores del mes de julio 2019	37
21.5 Cuadro estadístico indicando el número de horas –hombre trabajadas del mes de julio 2019	37
21.6 cuadro estadístico indicando horas capacitadas.....	38
21.7 Cuadro estadístico indicando el número de accidentes del mes de julio 2019.....	38
21.8 Cuadro estadístico indicando el índice de capacitación mes de julio 2019.....	39
21.9 Cuadro estadístico indicando el número de días perdidos por accidentes mes de julio 2019 ...	39
21.10 Cuadro estadístico indicando el Índice de frecuencia del mes de julio 2019.....	40
21.11 Cuadro estadístico indicando el índice de gravedad.....	40
22.12 El índice de accidentabilidad de julio 2019.....	41
23. RELACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS EN OBRA –DPA- ACAPULCO	41
CONCLUSIONES	42
ANEXOS	43

CONSORCIO ZORRITOS
 Ricardo Eugenio Misakhaman Cachi
 ING. ESPECIALISTA EN SSOMA

CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
 VEB
 * Ing. Residente


1. DATOS DEL PROYECTO

Los datos producidos durante el ciclo de vida de un Proyecto constituyen un valioso recurso en cuya producción se ha realizado una costosa inversión de tiempo y dinero.

1.1. Ubicación

El proyecto "Mejoramiento de los servicios de Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Acapulco, distrito de Zorritos, provincia Contralmirante Villar, región Tumbes", se encuentra ubicado en el Norte del Perú a una distancia de 42 Km al sur de la ciudad de Tumbes, con una pintoresca caleta de pescadores que cuenta con hermosa y amplia playa, bastante rica en especies marinas como calamar, langostinos, etc. La localidad de Acapulco se encuentra en latitud $03^{\circ}44'37''S$, y longitud $80^{\circ}46'40''W$ y Zona Horaria UT-5:00; pertenece al distrito de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, en el Departamento de Tumbes

1.2. Gráfico de ubicación de la localidad de Acapulco

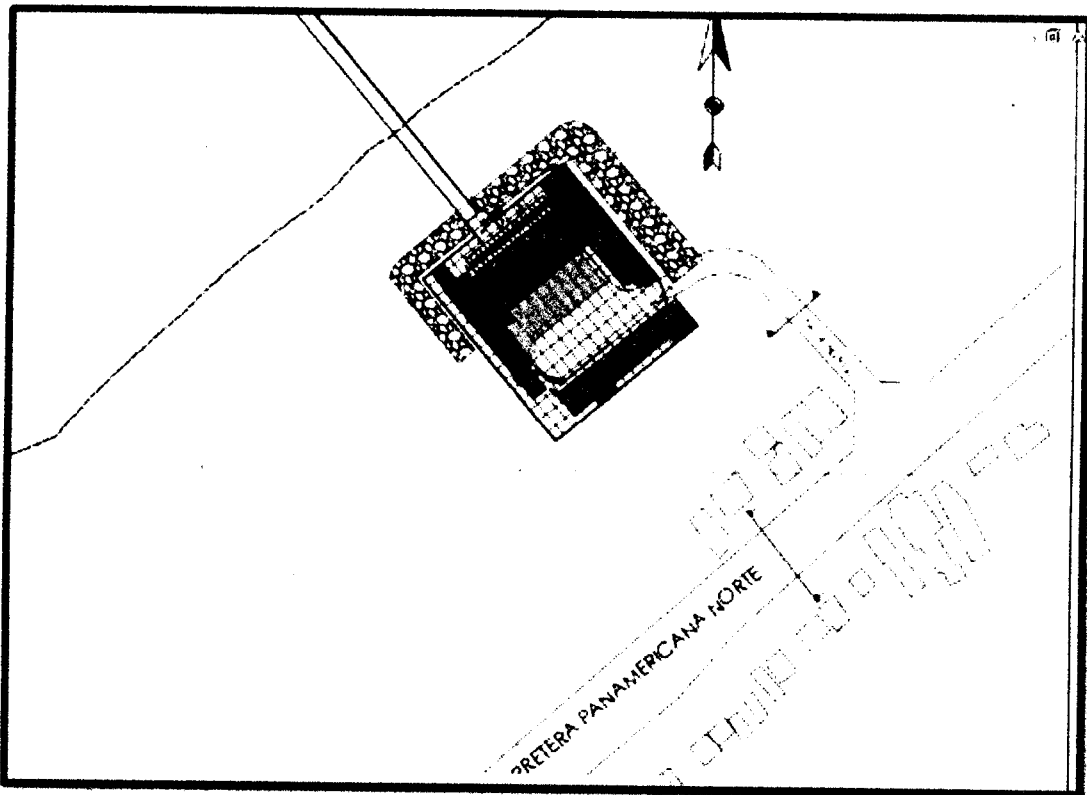

1.3. Introducción

El Consorcio Zorritos, en estricto cumplimiento de la Normatividad Nacional e Internacional vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, utiliza todas las herramientas de gestión a fin de que las actividades desarrolladas en el proyecto cumplan con los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; El propósito, en ese contexto, es garantizar la salud, la integridad física y el bienestar de todos sus trabajadores.

El Gerente del Proyecto, en coordinación con el Residente de obra, el Especialista de Seguridad Laboral y Salud Ocupacional y de SSOMA en la obra lideran las acciones preventivas e inducen a la Línea de Mando a implementar, organizar, dirigir y controlar las actividades de prevención de riesgos en las actividades del proyecto.

Consorcio Zorritos, en mérito a su dedicada labor en prevención de riesgos, ha logrado reducir las condiciones y acciones sub estándares en los trabajos que ejecuta el personal en la obra. Dicho resultado de un trabajo en equipo de todos los que laboran en la Empresa.

En el presente informe incluimos el sustento y las evidencias de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrolladas por Consorcio Zorritos correspondiente al mes de julio del 2019; según lo indicado en el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente elaborado para la obra.

2.OBJETIVOS


2.1 Los objetivos del presente informe son:

Controlar la seguridad, coordinando con la supervisión
Evaluar las actividades de riesgo a fin de dar seguridad a la obra
Mantener una información constante del sistema de gestión de Seguridad y salud en la obra.

CONSORCIO ZORRITOS
Ricardo Eugenio M. Bahamón Cach
ING. ESPECIALISTA EN SSOMA

Procurar la capacitación del personal a fin de desarrollar y mantener una fuerza de trabajo entrenada y comprometida con la política, objetivos y metas de SSOMA de Construcción y Administración.

El presente informe es un documento dirigido a todas aquellas personas comprometidas cuyas funciones tengan competencia con la Seguridad Laboral y Salud Ocupacional, este documento expresa la realidad laboral en la que se enmarca la obra, así como también señala las recomendaciones a seguir para mejorar en aspectos diversos relacionados a la Ley 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" y su Reglamento aprobado por D. S 005-2012-TR , Norma Técnica de Edificación G-050 Seguridad Durante la Construcción, Modificatoria Ley Nro. 30222 entre otras legislaciones vigentes que contribuyen a desarrollar proyectos como este de manera eficaz y segura.




CONSORCIO ZORRITOS
Ricardo Eugenio Misahuayan Cachi
ING. ESPECIALISTA EN SSOMA



2.2 ORGANIGRAMA DE LA OBRA DPA- ACAPULCO

ORGANIGRAMA DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES.

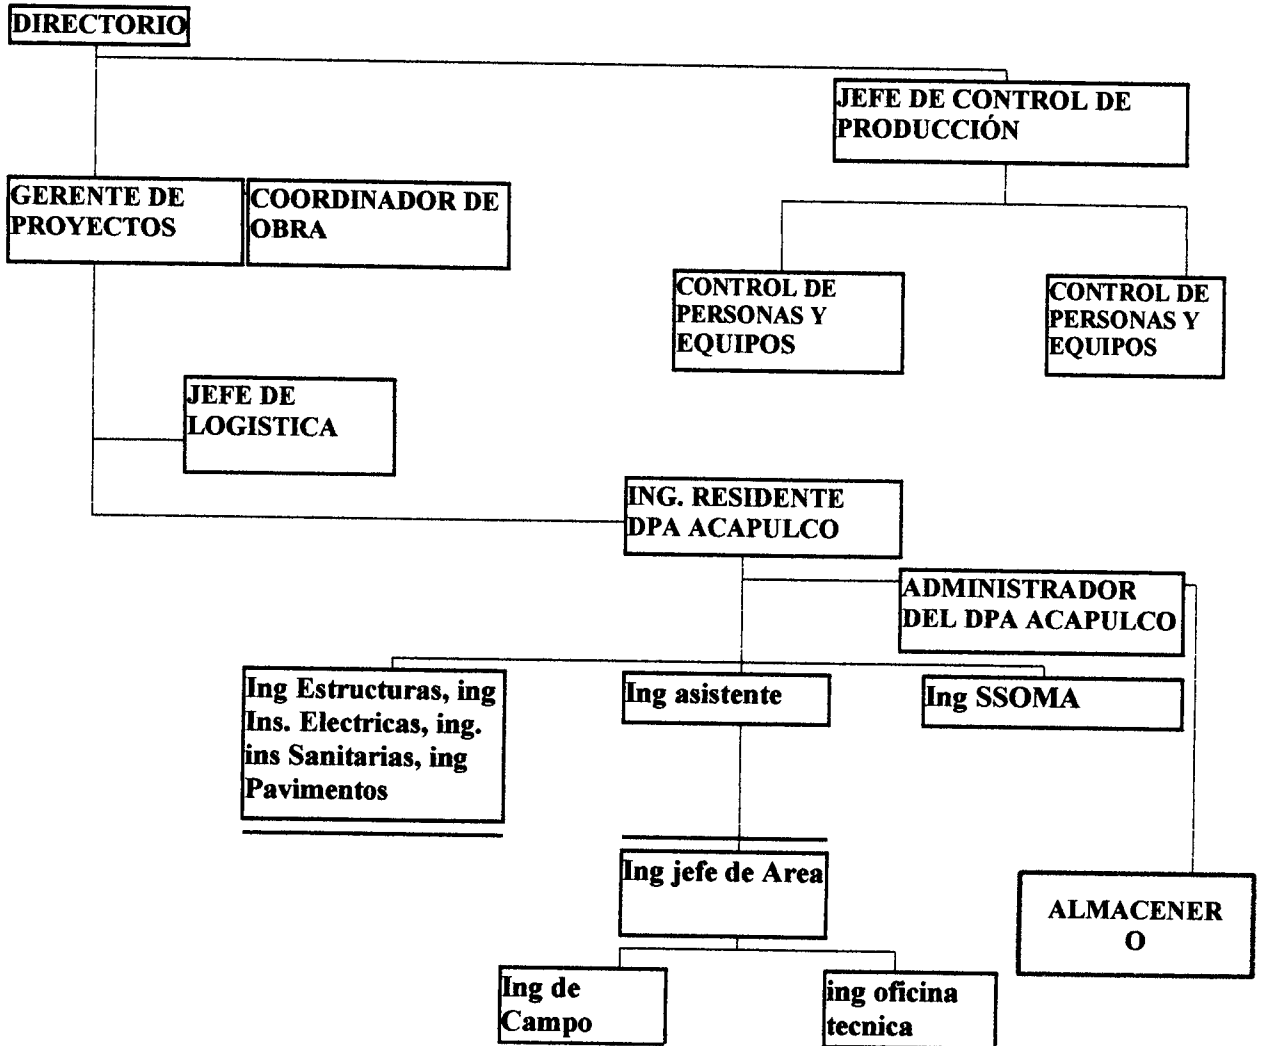

CONSORCIO ZORRITOS
 Ricardo Eugenio Biguaman Cach
 ING. ESPECIALISTA EN SSOMA

CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
 V.B.
 Ing. Residente

Durante el mes de julio 2019, se desarrolló el sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional teniendo en consideración la correcta implementación del Sistema de Gestión que se viene desarrollando en base a la planificación, control y evaluación que aplica el Consorcio, conforme la ley 29783, su Reglamento D.S 005-2012TR y Norma técnica de Edificación G-050 Seguridad, que durante la construcción exigen:

Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Plan de Contingencia y de Respuestas ante emergencias.

Matriz de Identificación de Peligro Evaluación y Control de Riesgos (IPERC)

Matriz de aspectos e impactos ambientales

Mapa de Riesgos.

Mapa de señalización

Formatos diversos en obra (ATS, Permisos, Inspecciones, amonestaciones, asistencias, entrega de Epp's, incidentes accidentes, chek-list, etc.).

2.3 Capacitación en seguridad y Salud Ocupacional.

Es la actividad de transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud.

2.4 Programa de inducción de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente

Los cursos de Inducción tienen una duración de 2 horas/ trabajador

En el mes de julio no se dictó la charla de inducción por que ingresaron nuevos trabajadores.

2.5. Cursos de capacitación específica o entrenamiento de la tarea para puestos clave.

Los cursos de capacitación técnica o específica son los se refieren específicamente a un asunto particular con conocimiento o manejo de algún procedimiento, herramienta, equipo, y proceso definido.

Durante el mes de julio, han participado, dictando capacitaciones a los trabajadores, el SSOMA Ricardo Misahuamán Cachi en el llenado de los ATS en trabajos en altura; cuyos periodos de duración; cada una de dichas capacitaciones, han sido de 1/2 hora de duración, en las cuales se han tratado temas relacionados con las partidas de encofrado, uso de energía eléctrica, tales como los vaciados de concretos, trabajos de mar limpieza de acero, encofrado.

2.6. Programa de charlas de seguridad

El presente programa de capacitación está orientado a contribuir a la gestión estratégica de la prevención del riesgo y, a su vez, constituye una herramienta de orientación y acompañamiento, dirigido a los trabajadores del DPA- Acapulco. Es un instrumento importante, que contiene las metodologías y estrategias de capacitación, dirigidas a obtener, como resultado, trabajadores sensibilizados, dispuestos a aportar con responsabilidad el autocuidado, para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales.

3. CHARLA DE SEGURIDAD DE 10 MINUTOS.

Durante el presente período de julio, período al cual comprende el presente informe, hemos desarrollado charlas diarias de 10 minutos, con todo el personal de obra del Consorcio, así como al personal perteneciente a las empresas colaboradoras o proveedores; el objetivo es impartir, ya sea conocimiento sobre la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional o, brindar instrucciones respecto de la prevención de riesgos, en sus respectivas áreas de trabajo y/o, la forma correcta de comportamiento en el trabajo; fortaleciendo también de los valores espirituales; vale mencionar que el desarrollo de las charlas se realiza con participación activa de los trabajadores por lo que se ha implementado una rutina diaria, que consiste en lo siguiente:

CONSORCIO ZORRITOS
Ricardo Eugenio Misahuamán Cachi
ING. ESPECIALISTA EN SSOMA

- Hacer la oración: Con la finalidad de fortalecer los valores espirituales.
- Ejercicios de respiración y estiramiento corporal: que permiten mejorar la oxigenación y el relajamiento muscular, entre cuyos beneficios señalamos los siguientes:
 - Aumenta el rango articular.
 - Aumenta la flexibilidad de los músculos.
 - Disminuye la cantidad de ácido láctico en los músculos.
 - Evita las lesiones deportivas más comunes.
 - Mejora la coordinación de músculos agonistas-antagonistas.
 - Previene el endurecimiento muscular después del ejercicio.
 - Reduce la tensión muscular y disminuye la tensión del músculo de la entropiema
 - Ayuda a las facilitaciones de los movimientos.



CONSORCIO ZORRITOS
Ricardo Eugenio Miso
ING. ESPECIALISTA EN SSOMA




CONSORCIO ZORRITOS A.C. ACAPULCO
V. O. B.
Residente

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
JULIO 2019
OBRA:
"Mejoramiento de los servicios de Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Acapulco, distrito de Zorritos, provincia Contralmirante Villas, región Tumbes"
EJECUTA:
Consortio Zorritos
SUPERVISA
Consortio Tumbes


Item	Dia/mes/año	CAPACITACION	TEMA	CAPACITADOR	Asistentes	Tiempo (min)	horas/hombre
1	1/07/2019						
2	2/07/2019	Diaria	Los cuasi accidentes en obra	Ing SSOMA	35	10	6
3	3/07/2019						0
4	4/07/2019	Diaria	Campaña de limpieza	Ing SSOMA	45	10	8
5	5/07/2019	Diaria	Los Avisos tienen un significado	Ing SSOMA	39	10	7
6	6/07/2019	Diaria	La seguridad es cosa personal	Ing. SSOMA	38	10	6
							0
8	8/07/2019	Diario	Trabajar en equipo evita accidentes	Ing. SSOMA	34	10	6
9	9/07/2019	Diario	Las bromas pesadas son peligrosas	Ing. SSOMA	38	10	6
10	10/07/2019	Diaria	Los colores hablan por solos	Ing. SSOMA	35	10	6
11	11/07/2019	Diaria	Riesgos electricos en obra	Ing. SSOMA	36	10	6
12	12/07/2019	Diaria	Riesgos electricos en obra	Ing. SSOMA	36	10	6
13	13/07/2019	Diaria	Uso adecuado de los ames en una obra de construcciones civil	Ing. SSOMA	37	10	6
							0
15	15/07/2019	Diaria	Peligros y riesgos en obra	Ing. SSOMA	31	10	5
16	16/07/2019	Diaria	Por que un trabajador se accidenta	Ing. SSOMA	33	10	6
17	17/07/2019						0

CONSORCIO ZORRITOS
 Ricardo Eugenio Montalvan Cachi
 Ing. Especialista en SSOMA



Ricardo Eugenio Maturana Cachi
 INCC ESPECIALISTA EN SSOMA
 CONSORCIO ZORRITOS

18	18/07/2019						0
19	19/07/2019	Diana	La vida es un sueño	Ing SSOMA	38	10	6
20	20/07/2019						0
							0
22	22/07/2019	No trabajaron					
23	23/07/2019	Diario	Prueba del alcoholimetro	Ing. SSOMA	34	10	6
24	24/07/2019						0
25	25/07/2019	Diario	Exceso de confianza	Ing. SSOMA	38	10	6
26	26/07/2019	Diario	Por que cambiamos las charlas todos los diaz	Ing. SSOMA	39	10	7
27	27/07/2019	Diario	Por que selebramos el 28 de julio en el Perú	Ing SSOMA	36	10	6
							0
29	29/07/2019	Diana	Reglamento interno de seguridad salud en el trabajo	Ing SSOMA	39	10	7
30	30/07/2019	Diana	Los 5 sentidos en una obra	Ing SSOMA	38	10	6
31	31/07/2019	Diana	Cuales son las deberes y derechos de un trabajador.	Ing SSOMA	37	10	6



Como se puede apreciar en el cuadro anterior, durante el mes julio se dictaron 123 horas/hombre de capacitación de charlas de 10 minutos, no se dio una capacitación de inducción trabajadores nuevos, se dio 108 hora/hombre de reinducción, 1.5 horas/hombre en amonestaciones de 3 trabajadores, por cometer una infracción.

La charla de 10 minutos se realiza en forma diaria, al inicio de la jornada laboral diaria de 07:30 a 7:40 horas, en el lugar de trabajo y, está a cargo, ya sea, de los trabajadores, Jefe de grupo, Maestro de obra o Jefe de SSOMA. Actualmente, para impartir las charlas, hemos procedido a agrupar a los trabajadores, de acuerdo a las actividades que realizarán en la jornada diaria, es decir de acuerdo a los frentes de trabajo existentes en obra; de esta manera nos permite orientar las charlas, en función a sus características propias o particulares de cada zona de trabajo.



CONSORCIO ZORRITOS

Ricardo Eugenio Misahuaman Cachi
ING. ESPECIALISTA EN SSOMA



CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
VºBº
Ing. Residente

RESUMEN: CAPACITACIÓN DEL MES DE JULIO 2019

Las capacitaciones es una importante opción de entrenamiento que en la medida las empresas pueden utilizar para enfrentar con éxito las exigencias operativas del negocio.

Rector Eugenio Alarcón Cuch
 INO ESPECIALISTA EN SSOMA
 CONSORCIO ZORRITOS

C+H4+B43:54+B43:54							
1	1/07/2019	Reinducción	De EPP's y ATS	Ing SSOMA	20	30	10
2	3/07/2019	Reinducción	ley 29783 de Seguridad Salud Ocupacional	Ing SSOMA	42	30	21
3	17/07/2019	Reinducción	La Seguridad cuesta	Ing SSOMA	37	30	19
4	18/07/2019	Reinducción	Campaña de limpieza en obra	Ing SSOMA	38	30	19
5	20/07/2019	Reinducción	Metodo de Heimlich	Ing SSOMA	37	30	19
6	24/07/2019	Reinducción	Prctica del RPC	Ing. SSOMA	39	30	20
						180	108
TOTAL = SUB TOTAL 1 +SUB TOTAL 2							231
INDICE DE CAPACITACIÓN							6

4. PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

La inspección de seguridad, es uno de los mejores instrumentos disponibles para descubrir los problemas y evaluar sus riesgos, antes que ocurran los accidentes y otras pérdidas

4. 1 Inspecciones de Seguridad, Salud en el Trabajo

Se viene desarrollando las inspecciones de Seguridad en obra, así como también el correcto y seguro desarrollo de las actividades.

Dichas Inspecciones son:

Inspección del estado de los Equipos de Protección personal

Señalización de sus Áreas de Trabajo.

Identificación de los Riesgos y Peligros inherentes a la obra.

Rutas de Evacuación.

Carteles preventivos.

Procedimientos Seguros de Trabajo.

Supervisión constante de las actividades del personal en obra.

5. INSPECCIONES RUTINARIAS (I.R.)

Se realizaron inspecciones rutinarias y planeadas en la obra, por parte del Jefe SSOMA, ingenieros de campo, Almacenero y personal colaborador, evidenciándose ciertos problemas de actos inseguros en la obra. Todas las inspecciones realizadas en el mes, se plasman en el Anexo, así como también adjuntamos Panel Fotográfico sobre las mismas.



CONSORCIO ZORRITOS
Ricardo Eugenio Mispanáman Cachi
ING. ESPECIALISTA EN SSOMA



6. INSPECCIONES PLANEADAS (I.P.)

Durante el mes de julio, se realizó una inspección Planificada, dando cumplimiento al cronograma de las inspecciones de seguridad planeadas, la cual se realizó con la presencia del Ingeniero Especialista SSOMA de la Supervisión de Obra y la prevencionista.

7. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE SALUD EN EL TRABAJO

El programa ha sido elaborado para que sirva de guía en lo que se refiere a la gestión de Seguridad de la empresa, es decir, los pasos que deben ser dados por la empresa para mantener la Seguridad y la Salud Laboral.

7.1 Examen médico ocupacional antes del ingreso a la obra.


En su momento se están realizando los trámites para los exámenes médicos ocupacionales de los últimos trabajadores a manera de estar cumpliendo con uno de los requisitos básicos para que el personal pueda ingresar a trabajar, los mismos que se encuentran en proceso de entrega de parte de la Institución de Salud Certificada, y es específicamente para personal administrativo y obreros del consorcio.

8. PRESENCIA DE BOTIQUÍN EN OBRA

Dicho requerimiento fue realizado tomando en consideración lo que la Norma Técnica de Edificación G-050, Seguridad durante la construcción, nos exige, la cual cuenta con lo siguiente:

- 02 Paquetes de guantes quirúrgicos
- 01 frascos de yodo povidona 120 ml. solución antiséptico
- 01 frasco de agua oxigenada, mediano 120 ml
- 01 frasco de alcohol mediano 250 ml.
- 05 paquetes de gasas esterilizadas de 10 cm. x 10 cm.

CONSORCIO ZORRITOS
Ricardo Eugenio Misahuaman Cachi
ING. ESPECIALISTA EN SSOMA



08 paquetes de apósitos

01 rollo de esparadrapo 5 cm. x 4.5 mts.

02 rollo de venda elástica de 3 pulg. x 5 yardas

02 rollo de venda elástica de 4 pulg. x 5 yardas

01 paquete de algodón x 100 gr.

01 venda triangular

10 paletas baja lengua (para entablillado de dedos)

01 frasco de solución de cloruro de sodio al 9/1000 x 1 ft. (para lavado de heridas)

02 paquetes de gasa tipo jelonet (para quemaduras)

02 frascos de colirio de 10 ml.

01 tijera punta roma

El botiquín se encuentra implementado y se mantendrá implementado de acuerdo a la magnitud y el tipo de obra, así como a la posibilidad de auxilio externo tomando en consideración su cercanía a centros de asistencia médica hospitalaria.

9. PROGRAMA DE DOTACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El stock de los equipos de protección personal, se ubica en el almacén; desde cuyo lugar se entregan, los EPPs, cada vez que estos se encuentren deteriorados y/o que ingresen trabajadores nuevos. Las listas de entrega de equipos de protección personal se encuentran en los archivos del almacén, cuya copia se adjunta en el presente informe.

CONSORCIO ZORRITOS


Ricardo Eugenio Misahuaman Cachi
ING. ESPECIALISTA EN SSOMA



**10. CUADRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
DEL MES DE JULIO 2019**

CONSORCIO ZORRITOS		OBRA: ACAPULCO		N° 001					
CONSOLIDADO DIARIO DE SALIDAS AL ALMACEN									
OB		SALIDAS OBRAS DE TIERRA CONSORCIO						FECHA: JULIO	
TEM	FECHA	OMPROB.	SALID					Precio	ONDICIO
		CLASE	N°	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	U.M	CANT.	Unitario	
	02/07/2019	VSOT	009	ALZAMORA	GUANTES DE BADANA	PAR	1	8.50	8.50
					POLO MANGA LARGA	UND	2	10.00	20.00
					PANTALON DE OBRERO	UND	1	26.00	26.00
	04/07/2019	VSOT	019	ALZAMORA	GUANTES DE BADANA	PAR	1	8.50	8.50
					ZAPATOS ADMINISTRATIVOS	PAR	1	52.00	52.00
		VSOT	023	GONZALES Y ALZAMORA	GUANTES DE BADANA	PAR	1	8.50	8.50
					ZAPATOS ADMINISTRATIVOS	PAR	1	52.00	52.00
					CORTAVIENTO	UND	1	7.50	7.50
	06/07/2019	VSOT	028	VIGILANTE DE OBRA	ZAPATOS ADMINISTRATIVOS	PAR	1	52.00	52.00

					CASCO DE OBRERO	UND	1	5.50	5.50
	09/07/2019	VSOT	041	RICARDO	MALLA DE SEGURIDAD	ROLLO	1	36.00	36.00
					CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA	ROLLO	1	26.00	26.00
	12/07/2019	VSOT	058	ALZAMORA	TAPON DE OIDO	UND	1	1.50	1.50
					CORTAVIENTO	UND	1	7.50	7.50
					POLO MANGA LARGA	UND	1		0.00
	16/07/2019	VSOT	075		RESPIRADORES DE GAS MEDIA CARA	UND	1	60.00	60.00
					GUANTES DE BADANA	PAR	1	8.50	8.50
	17/07/2019	VSOT	081	ALZAMORA	PANTALON DE OBRERO	UND	1		0.00
					LENTE CLAROS 3M	UND	1		0.00
					CINTAS DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO	UND	2		0.00
	18/07/2019	VSOT	088	RICARDO	CINTAS DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO	UND	2		0.00
					POLO MANGA LARGA	UND	1		0.00
					MALLA RASCHELL COLOR VERDE	MTS	20		0.00
					GUANTES MULTIFLEX	PAR	1		0.00
					TAPON DE OIDO	UND	2		0.00
					CORTAVIENTO	UND	1		0.00
					GUANTE DE BADANA	PAR			0.00
	23/07/2019	VSOT	108		GUANTES DE BADANA	PAR	1		0.00
					PANTALON DE OBRERO	UND	1		0.00
					CORTAVIENTO	UND	1		0.00
					GUANTES MULTIFLEX	PAR	1	4.50	4.50


CONSORCIO ZORRITOS
 Ricardo Eugenio Misaelman Cachi
 ING. ESPECIALISTA EN S.SOMA

Salidas de EPP's para Montage- obras de mar

CONSORCIO ZORRITOS		OBRA: ACAPULCO		N° 001						
CONSOLIDADO DIARIO DE SALIDAS AL ALMACEN										
OB		SALIDAS OBRAS DE MAR -MONTAJE						FECHA: JULIO		
TEM	FECHA	IMPROB. SALI	CLASE	N°	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	U.M	CANT.	Precio Unitario	ONDICIO
						LENTES OSCURO 3 M	UND	8	7.50	60.00
						TAPON DE OIDO	UND	5	1.50	7.50
						GUANTES MULTIFLEX	PAR	5	4.50	22.50
						GUANTES BADANA	PAR	6	8.50	51.00
		VSOT	011		ALFREDO VASQU	CASCÓ DE OBRERO	UND	1	11.50	11.50
	04/07/2019	VSOT	020		ALFREDO VASQU	POLO MANGA LARGA	UND	1	10.00	10.00
						PANTALON DE OBRERO	UND	1	26.00	26.00
						GUANTE DE BADANA	PAR	1	7.50	7.50
	05/07/2019	VSOT	024		ALFREDO VASQU	LENTES OSCURO 3 M	UND	2	7.50	15.00
	09/07/2019	VSOT	038		ALFREDO VASQU	GUANTE DE BADANA	PAR	2	8.50	17.00

						POLO MANGA LARGA	UND	1	10.00	10.00
						LENTES OSCURO 3 M	UND	1	7.50	7.50
	11/07/2019	VSOT	049		ALFREDO VASQU	POLO MANGA LARGA	UND	1	10.00	10.00
						ZAPATO ADMINISTRATIVO	PAR	4	52.00	208.00
						LENTES OSCURO 3 M	UND	1	7.50	7.50
		VSOT	054		ALFREDO VASQU	GUANTE DE BADANA	PAR	2	8.50	17.00
						GUANTE MULTIFLEX	PAR	1	4.50	4.50
						GUANTE DE BADANA	PAR	1	8.50	8.50
						GUANTES DE BADANA	PAR	1	8.50	8.50
		VSOT	087		ALFREDO VASQU	TRAJE TYBETK	UND	2	7.50	15.00
						GUANTES MULTIFLEX	PAR	2	4.50	9.00
						LENTES CLAROS 3 M	UND	1	7.50	7.50
						ZAPATO ADMINISTRATIVO	PAR	1	52.00	52.00
						GUANTES MULTIFLEX	PAR	1	4.50	4.50
	24/07/2019	VSOT	109		ALFREDO VASQU	GUANTES DE BADANA	PAR	1	8.50	8.50
						GUANTES MULTIFLEX	PAR	2	4.50	9.00
	25/07/2019	VSOT	120		ALFREDO VASQU	GUANTES DE BADANA	PAR	1	8.50	8.50

CONSORCIO ZORRITOS
 Ricardo Eugenio Misakuaman Cachi
 ING. ESPECIALISTA EN SSOMA




Salidas de EPP's para Montage- obras de Tierra Ing. JULIO TORIBIO SOLIS

ITEM		FECHA	COMPROB.SALIDA		CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UM	CANT.	Precio Unitario	CONDICION
			CLASE	N°						
1		04/07/2019	VSOT	021	NORABUENA	PETROLEO	GL	25	12.84	321.00
2		08/07/2019	VSOT	034	NORABUENA	REFRIGERANTE	GL	1	13.00	13.00
3		10/07/2019	VSOT	044	NORABUENA	PETROLEO	GL	24	12.84	308.16
4		12/07/2019	VSOT	057	NORABUENA	PETROLEO	GL	16.5	12.84	211.86
5		13/07/2019	VSOT	063	NORABUENA	GRASA ROJA 150 GM	UND	1	12.00	12.00

ITEM		FECHA	COMPROB.SALIDA		CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UM	CANT.	Precio Unitario	CONDICION
			CLASE	N°						
		05/07/2019	VSOT	026	ELVIS INGA	GUANTES DE BADANA	PAR	2	8.50	17.00
						CORTAVIENTOS	UND	2	7.50	15.00
						LENTES OSCURO 3M	UND	1	7.50	7.50
		11/07/2019	VSOT	052	ELVIS INGA	POLO MANGA LARGA	UND	1	10.00	10.00
						POLO MANGA LARGA	UND	2	10.00	20.00
						POLO MANGA LARGA	UND	1	10.00	10.00


CONSORCIO ZORRITOS
 Ricardo Eugenio ~~Residente~~ Cachi
 ESPECIALISTA EN SSOMA


CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
 VOB
 Ing. Residente

 CONSORCIO ZORRITOS	OBRA: ACAPULCO	N°	<input style="width: 90%;" type="text" value="001"/>						
CONSOLIDADO DIARIO DE SALIDAS AL ALMACEN									
OBRA:	<input style="width: 95%;" type="text" value="SALIDAS OBRAS DE TIERRA electrico-sanitario"/>	FECHA:	<input style="width: 95%;" type="text" value="JULIO"/>						
ITEM	FECHA	COMPROB. SALIDA		CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	U.M	CANT.	Precio Unitario	ONDISIO
		CLASE	N°						
1	01/07/2019	VSOT	003	LELIS CRUZ	POLO MANGA LARGA	UND	1	10.00	10.00
2	23/07/2019	VSOT	104	LELIS CRUZ	ZAPATO ADMINISTRATIVOS	PAR	1	52.00	52.00
3					GUANTES MULTIFLEX	PAR	1	4.50	4.50
4	25/07/2019	VSOT	123	LELIS CRUZ	GUANTES MULTIFLEX	PAR	1	4.50	4.50

11. PROGRAMAS DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA

La capacitación continua es un elemento fundamental para dar apoyo a todo programa orientado a fortalecer el sentido de compromiso del personal, cambiar actitudes y construir un lenguaje común para lograr un cambio de cultura en seguridad y salud ocupacional y, así, identificar y evaluar los riesgos durante las actividades en una obra.

11.1 Identificación de peligros y evaluación de riesgos en la obra.

Se realizó la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de forma constante por medio del llenado de los respectivos AST, al inicio de cada actividad diaria. Durante el mes de julio 2019, tuvimos 3 incidentes leves, sin días perdidos como se muestra en el informe mensual de SSO y MA.

12. SEÑALIZACIÓN, ALMACENES Y ZONAS DE TRABAJO

La señalización de la obra se realiza continuamente, con el personal de apoyo de un (01) ayudante. Con fines de mejoramiento continuo, se ha procedido a la publicación de la Matriz del IPER, de La Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, así como también se está

CONSORCIO ZORRITOS

Ricardo Eugenio Misahuaman Cachi
ING. ESPECIALISTA EN SSO/MA

mejorando el acceso peatonal para obra, se implementaron, en este mes, 30 letreros, (de peligro, de prevención, de información y de prohibición).

El almacén de obra se encuentra acondicionado dentro de un Container metálico, de manera que los equipos y materiales estén debidamente ubicados y mejor administrados para tener mayor control de estos.

13. PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS

La preparación para emergencias, nos permitirá estar listo para cualquier momento en que ocurra una catástrofe que puede presentarse en cualquier período de ejecución de obra, ya sea estando dentro de ella o en cualquier otro sitio; pero que en lugar de dejarte vencer por esa incertidumbre y vivir atemorizada, lo mejor es estar preparado para dicha eventualidad.

13.1 Señalización de rutas de evacuación

La señalización de las rutas de evacuación lo realizan el Jefe de SSOMA, conjuntamente con el ayudante y los jefes de grupo o capataces, los cuales son encargados de mantenerlas libres para la evacuación del personal en caso de emergencias.

14. PLAN DE SISTEMAS Y DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

El plan de sistemas y equipos contra incendios es un conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad normal de cada grupo y, su finalidad es la de permitir el funcionamiento del sistema de protección ante la eventualidad de que este se presente.

14.1 Recarga y mantenimiento de extintores instalados en oficinas, almacenes, muelle y vehículos de transporte.

Se tiene en obra 6 extintor de Polvo químico Seco de 6 Kg. y 2 extintor de CO₂, los cuales se distribuyen de la siguiente manera.

CONSORCIO ZORRITOS
Ricardo Eugenio Misahuaman Cachi
ESPECIALISTA EN SSOMA

- 1.-En Oficina-----01 unidad.
- 2.-En obra-----01 unidad.
- 3.- Muelle-----01 unidad
- 4.- Almacén-----01 unidad
- 5.- Ferretería----- 01 unidad
- 6.- Vigilancia-----01 unidad

Los 6 extintores en Obra, se encuentran en perfectas condiciones, cuyas vigencias cubren hasta el 2019.

15. REGLAMENTOS Y POLITICAS DE SEGURIDAD

Durante el mes de julio 2019, no se ha realizado, capacitación en base al Reglamento Interno de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente, del Consorcio Zorritos; debido que no ingresaron trabajadores nuevos

16. COMPROMISO DE ACATAMIENTO

En el Compromiso de Acatamiento, que se encuentra adjunto al Programa de Inducción Seguridad y Salud en el Trabajo, los trabajadores declaran haber recibido la Cartilla de Prevención de Riesgos Laborales, Cartilla Didáctica de Medio Ambiente, Cartilla de Conducta y el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, las mismas que les han sido oportunamente entregadas.

7. MOTIVACIÓN, PROMOCIÓN, DE DIFUSIÓN DE LA SEGURIDAD

17.1 La motivación

Es el conjunto de estímulos que mueven a las personas a realizar determinadas acciones y persistir en ellas, para su culminación. La motivación se encuentra profundamente relacionada con la voluntad, así como con el interés que se muestra, una persona o individuo, hacia una tarea o actividad.



CONSORCIO ZORRITOS
Ing. Misaelman Cachi
ESPECIALISTA EN SSOMA



17.2 La promoción

Se debe a la sensibilización mediante la comunicación a los trabajadores día a día en forma constante con las charlas de capacitación.

17.3 Difusión

En seguridad se realiza la difusión, mediante carteles, indicaciones verbales y señalizaciones.

17.4 Colocar afiches de seguridad.

En todo el perímetro de la obra, a partir del mes de julio, se ha ilustrado mediante letreros que promocionen y difundan buenas prácticas de seguridad durante las actividades, detalle que aún se seguirá realizando según como vaya avanzando la obra, tal como se evidencia en el Panel Fotográfico.

18. INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES E INCIDENTES

La finalidad de la investigación de accidentes de trabajo, es descubrir todos los factores que intervienen en la génesis de los mal llamados "accidentes", buscando causas y no culpables. El objetivo de la investigación debe ser neutralizar el riesgo desde su fuente u origen, evitando asumir sus consecuencias como inevitables, de acuerdo al siguiente procedimiento: R.1. Aviso y reporte de accidentes e Incidentes.

R.2. Investigación de accidente.

R.3 Índices (Frecuencia, Severidad, Accidentabilidad).

19. PROGRAMA DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN LA TAREA (AST)


Los AST son realizados, antes de empezar cada una de las actividades que se generan en obra, en forma diaria, por los trabajadores.

Durante el mes de julio 2019, se llenaron los siguientes registros:

114 Registros de AST.

21 Registros de control de asistencia de 10 minutos.

7 Registros de tronadora




- 44 Registros de andamios
- 11 Registro de Recomendaciones por función
- 11 Registro de inducción trabajador nuevo
- 14 Registro de izaje
- 95 Trabajos en altura
- 14 Chek.list de vehiculo
- 44 Registro de Arnes
- 7 Registro de oxicorte
- 2 Registro Taladro

20. CUADRO RESUMEN DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS DE LOS TRABAJADORES DPA- ACAPULCO 2019

RELACION DE TRABAJADORES POR CATEGORIA DEL CONSORCIO ZORRITOS DE LA OBRA DPA-ACAPULCO							
CAPATAS	OPERARIOS	OFICIALES	PEONES	SUB-TOTAL			
0	37	5	30	72			
PERSONAL TECNICO CONSORCIO ZORRITOS							
RESIDENTE	ASISTENTE	ING SSOMA	AREA TECNICA	ING ELECTRICISTA	TOPOGRAFO	ADMINISTRA	SUB-TOTAL
1	1	1	1	1	1	1	7
PERSONAL TECNICO CONSORCIO ZORRITOS							
ADMINIST	ING DE CALIDAD	PREVENCIÓN	ALMACENERO	VIGILANTES	SUB-TOTAL		
1	1	0	1	4	7		

Durante el mes de julio 2019 aumento el número de trabajadores en la obra DPA-ACAPULCO, con respecto del mes de junio 2019, porque se reorganizo la obra, **son 72 obreros, 7 téc. Administrativos principales, 7 técnicos de apoyo**

20.1 Cuadro de horas –hombre del de julio 2019


CONSORCIO ZORRITOS
 Ingeniero Misahuatán Cachi
 ESPECIALISTA EN SSOMA



CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
 VOB
 Ing. Residente

PRODUCCIÓN
 No. Misión y Cuchi
 VILLALBA ROSA

No	TRABAJADOR	CATEGORIA																			DIAS	TOTAL DE HORAS									
			1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20			22	23	24	25	26	27	29	30	31
1	ALAYO SAMAN EMLIO	PEON	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	24	192
2	ALEMAN CARLIN EGO	PEON	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	23	184
3	ALZAMARA NOEL YONI	PEON	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	21	168
4	ANCAJIMA PEREZ LUIS	OP	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	22	176
5	AQUINO MOLERO ALEX	OFICIAL	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	32
6	BRUNO IPANAQUE JOSÉ ANGEL	OP	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	24	192
7	BRUNO IPANAQUE JOSÉ JUAN	PEON	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	25	200
8	CARMEN NORIEGA CESAR	OFICIAL	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	23	184
9	CHAPONAN ACOSTA BALTAZAR	OP	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	24	192
10	GENNEL ZAPATA JOSE	OP	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	24	192
11	GUERRA LEON RUSSINI	PEON	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	25	200
12	HEREDIA ESPINOZA ELVIS	OFICIAL	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	22	176
13	HERRERA RIO FRIO	PEON	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	25	200
14	MIR RAMIREZ FRANCISCO	PEON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	NILUPU ROMERO ALDO	OP	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	23	184

CONSORCIO ZORRITOS
 V. B. O.
 102

16	NORA BUENA PERES JOSÉ	OP	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	23	184
17	PANTA PRADO MANUEL	OP	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	25	200
18	PAUCAR ABAD HIM	OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	25	200	
19	PASO AMAYA ANGEL	PEON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	RAMOS RAMOS JAVIER	PEON	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	20	160
21	RUGEL TORRES EDGAR	PEON	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	24	192	
22	SABA QUEVEDO FRANCO	PEON	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	25	200
23	SALDARRIAGA DE LA CRUZ	OP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	SOLORSANO LOZANO ENRIQUE	OP	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	17	136
25	TIBURCIO CUSTODIO CRISTIAN	PEON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	YACLA GENEL CARLOS	PEON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ZAPATA AVILA JUAN	OFICIAL	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	25	200
28	GONSALES HUAMAN JOEL NELSON	PEON	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	23	184
29	JAVO MOROCHO VICTOR	PEON	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	25	200
30	LAMA RUMICHE LUIS	PEON	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	22	176		


Consorcio Zorritos
 Gerente Administrativo
 CACHA
 CALISTO SSSOMA

CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
 V. O. B.
 Ing. Presidente

31	RAMIREZ VALLES TERCERO	PEON	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	200
32	BASTA CALLA JORGE	MAESTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	DAVILA NUÑEZ JOEL	OP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	MOCHOA OBANDO GEISER	OP	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	200
35	PAREDES PERALTA PEDRO	OP	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
36	BEDOYA RIOS ANDRES	OP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	LEONARDO COLMENARES ROJAS	PEON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	TREJO GUERRA LUIS	OP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	200
49	BLANCO CAMPELO JEISON	PEON	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	192
50	HUMA JUAREZ ALEXIS	PEON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	25	200
51	CHACOA MURILLO HUMAN	PEON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	208
52	HUMA SILVA HUMBERTO	PEON	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	22	176
53	GARCIA TENAZOA DANIEL	OP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	25	200
54	ZOLORZANO LOZANO ENRIQUE	OP	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	COLMENARES ROJAS LEONARDO	PEON	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ACUÑA HUAMAN ROBERTTO	OP	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	24
57	JOSÉ MIGUEL BLANCO	PEON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MURILLO MEGIA JORGE	OP	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
60	CRUZ DIAZ LEUIS	OP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
61	VILCHEZ REYEZ JORGE	OP	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	32
62	JARDO LEON FLORES QUISPE	OP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	REYES ANYARACHE JOHAN	OP	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	32
64	VILCHEZ SOSA LUIS	OP	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	32

CONSORCIO ZORRITOS
 Mando Buzonero Acapulco Cacchi
 ING. ESPECIALISTA EN SPMR

65	VILCHEZ REYEZ ERICK	OP	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	24
66	MEDINA CARRILLO GILMER	OP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	20	160
67	ALVARADO RIOS JOSE	OP	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	19	152
68	BASTARDO YOEL ISAI	PEON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	23	184
69	FLORES QUISPE JOSÉ	OP	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	32
70	BLANCO CAMPELO JOSÉ MIGUEL	PEON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	24	192
71	VELASQUEZ REYES JOSÉ	PEON	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
72	DELGADO MANUEL VICTOR	PEON	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
73	RODRIGUEZ VEGA NELSON	PEON	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
74	GARCIA CASI MIRO GUIDO	OP	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	20	160
75	CRUZ DIAS LELIS	OP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	26	208
76	CABANILLAS CUEVA JHONY	OP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	26	208
77																															




20.2 Unidades de accidentabilidad

Durante el mes de julio 2019 podemos notar, según lo que arroja nuestra matriz de Accidentabilidad, que nos mantenemos con un (03) Incidente, cero accidentes (0) así como también con la charla de 10 minutos hay 123 horas-hombre, 108 horas-hombre de capacitaciones en reinducción, 8160 horas-hombres trabajados en campo, con 7 trabajadores administrativos principales 1512 horas-hombre, 7 técnicos de apoyo por parte de los técnicos administrativos con 1512 horas- hombre, dando un total de 11415 horas - hombre trabajadas.

21. PARAMETROS INDICADORES DE SEGURIDAD:

PROYECTO		MEJORAMIENTO DEL DPA ACAPULCO	
FRENTE DE TRABAJO:		OBRAS EN TIERRA Y MAR	
ITEM	DESCRIPCION	REPORTE	Unidad
1	Días trabajados sin accidents	27	Días
2	Total de accidentes sin tiempo perdido(accidentes	0	Unidad
3	Total, de accidentes con tiempo perdido(accidentes)	0	Unidad
4	Total, de días perdidos para accidentes incapacitantes-	0	Días
5	Total, de accidentes fatales reportados	0	Unidad
6	Record horas trabajadas durante el mes sin accidentes incapacitantes	11415	H-H
7	Total de Accidentes de tránsito	0	Unidad


CONSORCIO ZORRITOS
 Ricardo Eugenio Mishuaman Cachi
 ING. ESPECIALISTA EN SSOMA



8	Total de kilómetros recorridos con accidentes	0	Km
9	Total de accidentes con daño material	0	Unidad
10	Total de derrames	0	Unidad
11	Total de enfermedades ocupacional	0	Unidad
12	Total de incidentes de riesgo leve	3	unidad

21.1 Cuadros estadísticos del mes de julio 2019, con los parámetros de accidentabilidad

Según el cuadro estadístico durante el mes de julio, nos muestra lo siguiente

Durante el mes de julio 2019, no ha ocurrido ningún accidente con días perdidos en todos los trabajadores.


Índice de frecuencia: $IF = N^{\circ} \text{ Accidentes} \times 200000 / h-h \text{ trabajadas}$
 $IF = 0 \times 200000 / 11415 = 0$, nos indica que por cada 200000 horas trabajadas hay un índice de cero accidentes. En este caso.

El índice de gravedad: $IG = N^{\circ} \text{ días perdidos} \times 200000 / h-h \text{ trabajadas}$

$$IG = 0 \times 200000 / 11415 = 0$$

El índice de seguridad indica por cada 200000 horas hay cero días perdidos en este caso, porque no hay accidente.

El índice de accidentabilidad $IA = IF \times IG / 200 = 0 \times 0 / 200 = 0$; Nos indica cuando tengamos 200000 horas no habrá trabajadores en riesgo en el trabajo. Porque está controlado.



CONSORCIO ZORRITOS
 Centro de Asesoría y Gestión
 ASISTENTE EN SSOMA



CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
 V. B.
 ISS. Residente

El índice de capacitación = $231/36 = 6$ nos indica que cada trabajador recibió 6 horas de capacitación durante el mes de julio

21.2 Cuadro estadístico de los meses de ejecución de obra

MESES DEL AÑO 2018	Numero Trabajadores	Horas Trabajadas		Horas Capacitadas		Accidentes		Días Perdidos		Indice de Frecuencia		Indice de Capacitacion		Indice de Gravedad		Indice de Accidentabili dad	Indice de accidentabili dad acumulado
		Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año		
ENERO	13	2,472	2,472	45	45	0	0	0	0	0	0.00	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	33	6,336	8,808	218	263	1	1	0	0	31.57	22.71	3.44	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	46	9,936	18744	255.8	519	0	1	0	0	0	10.67	5.56	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	36	6,144	24888	190	709	0	1	0	0	0	8.00	4.80	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	69	11320	36208	358	883	0	1	0	0	0	5.5	5.2	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	71	12308	48516	442	1325	1	2	25	25	16	8.2	6	26.82	406	103.00	32.00	4.2
JULIO	48	5936	54452	158	1483	0	2	0	25	0	7.3	3	29.82	0	91.80	0.00	3.35
AGOSTO	83	12526	66978	313.5	1797	0	2	0	25	0	5.9	5.9	35.72	0	74.65	0.00	2.2
SETIEMBRE	65	11424	78402	266	2063	0	2	0	25	0	5	4	39.72	0	63.77	0.00	1.2
OCTUBRE	60	16008	94410	299.50	2363	0	2	0	25	0.00	4.20	5.00	44.72	0.00	52.90	0.00	1.1
NOVIEMBRE	31	2904	97314	122	2485	0	2	0	25	0	4.11	3.9	48.65	0	51.00	0.00	1
DICIEMBRE	42	11528	108842	228.00	2713	0	2	0	25	0.00	3.67	5.00	53.65	0.00	45.90	0.00	0.82

AÑO FISCAL 2018

El historial del año 2018 muestra que se ha controlado los índices de accidentabilidad acercándose a valor cero, dando como resultado que se ha podido controlar los riesgos en la obra DPA-Acapulco

CONSORCIO ZORRITOS
 Ricardo Eugenio Rodríguez Ocaña
 INE. ESPECIALISTA EN SIGMA

096
 CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
 Voto
 Participante

AÑO FISCAL 2019


MESES DEL AÑO 2019	Numero Trabajadores	Horas Trabajadas		Horas Capacitadas		Accidentes		Dias Perdidos		Indice de Frecuencia		Indice de Capacitacion		Indice de Gravedad		Indice de Accidentabilidad	Indice de accidentabilidad acumulado
		Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año		
02	12288	12288	431.5	431.5	0	0	0	0	0	0	7	7.00	0	0.00	0.00	0	
01	12484	24752	245	676.5	0	0	0	0	0	0	5	12.00	0	0.00	0.00	0	
03	9648	34400	218	894.5	0	0	0	0	0	0	26	14.6	0	0.00	0.00	0	
04	7844	43344	204	1068.5	0	0	0	0	0	0	3	18	0	0.00	0.00	0	
05	7214	48558	228	1327.5	0	0	0	0	0	0	8	26	0	0.00	0.00	0	
06	9882	59410	194	1521.5	0	0	0	0	0	0	6	32	0	0	0	0	
72	11415	70834	231	1752.5	0	0	0	0	0	0	6	38	0	0.00	0.00	0	

Durante el mes de julio 2019 hubo 72 trabajadores mayor cantidad del mes de junio 2019

Durante el mes de julio 2019 hubo 11415 horas hombre trabajadas

Durante el mes de julio hubo cero accidentes.

Los parámetros de los índices de accidentabilidad fueron cero por que no hubo accidentes ni días perdidos.




21.3 Lista de trabajadores de la obra DPA-Acapulco

 CONSORCIO ZORRITOS		
No	TRABAJADOR	CATEGORIA
1	ALAYO SAMAN EMILIO	PEON
2	ALEMAN CARLIN EGO	PEON
3	ALZAMARA NOEL YONI	PEON
4	ANCAJIMA PEREZ LUIS	OP
5	AQUINO MOLERO ALEX	OFICIAL
6	BRUNO IPANAQUE JOSÉ ANGEL	OP
7	BRUNO IPANAQUE JOSÉ JUAN	PEON
8	CARMEN NORIEGA CESAR	OFICIAL
9	CHAPOÑAN ACOSTA BALTAZAR	OP
10	GENNEL ZAPATA JOSE	OP
11	GUERRA LEON RUSSINI	PEON
12	HEREDIA ESPINOZA ELVIS	OFICIAL
13	HERRERA RIO FRIO	PEON
14	MIR RAMIREZ FRANCISCO	PEON
15	NILUPU ROMERO ALDO	OP
16	NORA BUENA PERES JOSÉ	OP

17	PANTA PRADO MANUEL	OP
18	PAUCAR ABAD HIMI	OFICIAL
19	PASO AMAYA ANGEL	PEON
20	RAMOS RAMOS JAVIER	PEON
21	RUGEL TORRES EDGAR	PEON
22	SABA QUEVEDO FRANCO	PEON
23	SALDARRIAGA DE LA CRUZ	OP
24	SOLORSANO LOZANO ENRRIQUE	OP
25	TIBURCIO CUSTODIO CRISTIAN	PEON
26	YACILA GENEL CARLOS	PEON
27	ZAPATA AVILA JUAN	OFICIAL
28	GONSALES HUAMAN JOEL NELSON	PEON
29	JAVO MOROCHO VICTOR	PEON
30	LAMA RUMICHE LUIS	PEON
31	RAMIREZ VALLES TERCERO	PEON
32	BASTA CALLA JORGE	MAESTRO
33	DAVILA NUÑEZ JOEL	OP
34	MOCHOA OBANDO GEISER	OP
35	PAREDES PERALTA PEDRO	OP
36	BEDOYA RIOS ANDRES	OP


CONSORCIO ZORRITOS
 Ricardo Eugenio Misahuaman Cachi
 ING. ESPECIALISTA EN SSOMA




37	SANCHEZ QUIROS JOSE	OP
38	CRUZ CHICHAY CESAR	OP
39	BERMEO CARRANZA AVELINO	OP
40	BEDOYA RIOS ANDRES	OP
42	ACUÑA MESA RICARDO	OP
44	MONTUFON CHICOMA	OP
45	NIETO EVANGELISTA CARLOS	OP
46	ROBERTO ACUÑA HUAMAN	PEON
47	LEONARDO COLMENARES ROJAS	PEON
48	TREJO GUERRA LUIS	OP
49	BLANCO CAMPELO JEISON	PEON
50	HUIMA JUAREZ ALEXIS	PEON
51	CHACOA MURILLO HUIMAN	PEON
52	HUIMA SILVA HUMBERTO	PEON
53	GARCIA TENAZOA DANIEL	OP
54	ZOLORZANO LOZANO ENRRIQUE	OP
55	COLMENARES ROJAS LEONARDO	PEON
56	ACUÑA HUAMAN ROBERTTO	OP
57	JOSÉ MIGUEL BLANCO	PEON
58	MURILLO MEGIA JORGE	OP


CONSORCIO ZORRITOS
 Ricardo Eugenio Misadaman Cachi
 ESPECIALISTA EN SSOMA




59	CRUZ DIAZ LELIS	OP
60	VILCHEZ REYEZ JORGE	OP
61	ARDO LEON FLORES QUISPE	OP
62	REYES ANYARACHE JOHAN	OP
63	VILCHEZ SOSA LUIS	OP
64	VILCHEZ REYEZ ERICK	OP
65	MEDINA CARRILLO GILMER	OP
66	ALVARADO RIOS JOSE	OP
67	BASTARDO YOEL ISAI	PEON
68	FLORES QUISPE JOSÉ	OP
69	BLANCO CAMPELO JOSÉ MIGUEL	PEON
70	VELASQUEZ REYES JOSÉ	PEON
71	DELGADO MANUEL VICTOR	PEON
72	RODRIGUEZ VEGA NELSON	PEON
73	GARCIA CASI MIRO GUIDO	OP
74	CRUZ DIAS LELIS	OP
75	CABANILLAS CUEVA JHONY	OP


CONSORCIO ZORRITOS
 Ricardo Eugenio Misakayman Cochi
 ESPECIALISTA EN SSOMA




21.4 Cuadro estadístico indicando el número de trabajadores del mes de julio 2019

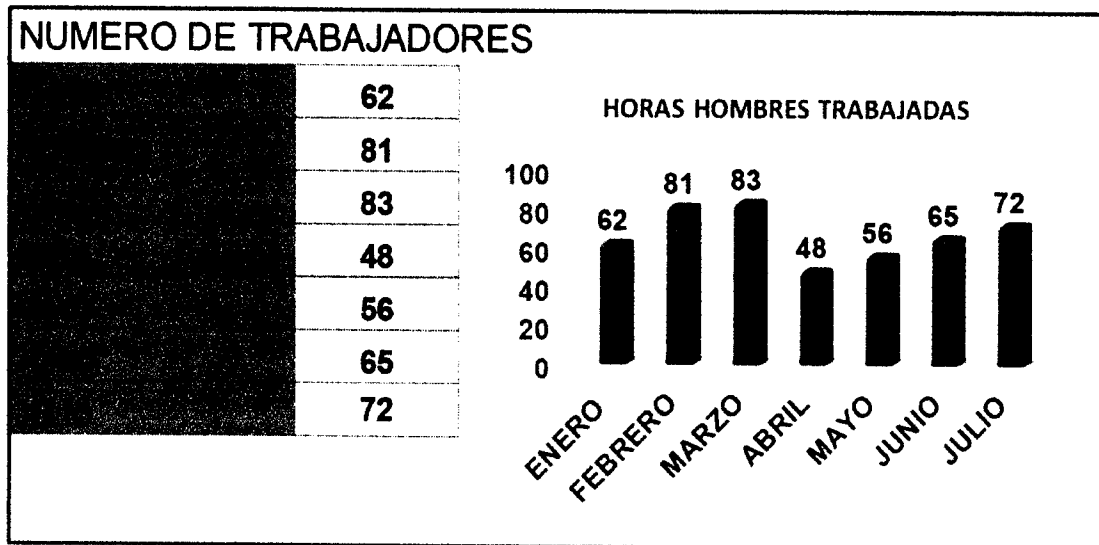

El cuadro estadístico nos muestra que durante el mes de julio 2019 ha aumentado el número de trabajadores. Debido que se reorganizó los frentes de mar y obras de tierra.

21.5 Cuadro estadístico indicando el número de horas –hombre trabajadas del mes de julio 2019

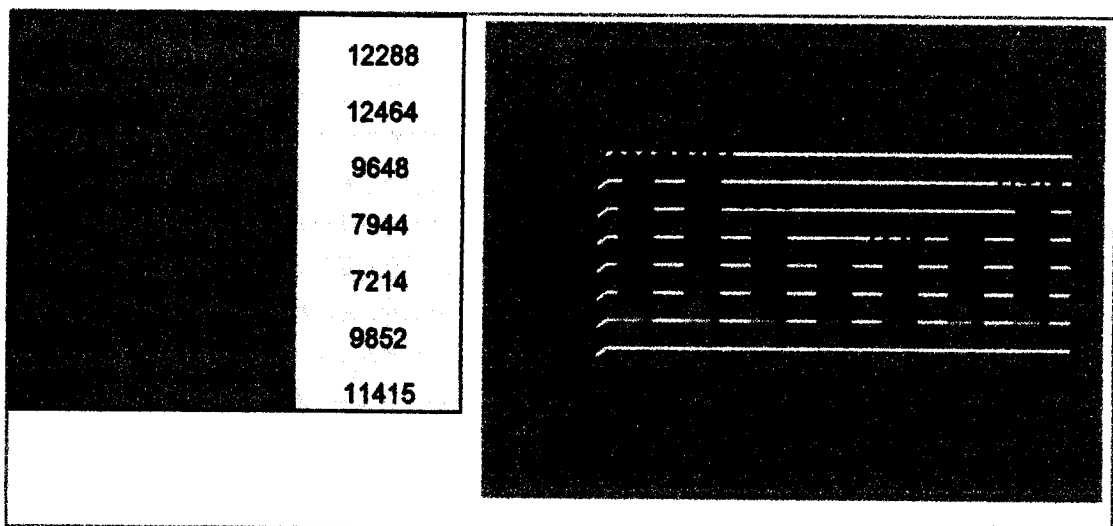


Según el cuadro estadístico, nos muestra que durante el mes de julio 2019 ha habido un aumento de horas hombre-trabajadas en comparación a mayo 2019 por que el mes hubo reorganización de los trabajadores.

CONSORCIO ZORRITOS
Eugenio Misayáman Cachi
ESPECIALISTA EN SSOMA


CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
VºBº
Ing. Presidente

21.6 cuadro estadístico indicando horas capacitadas

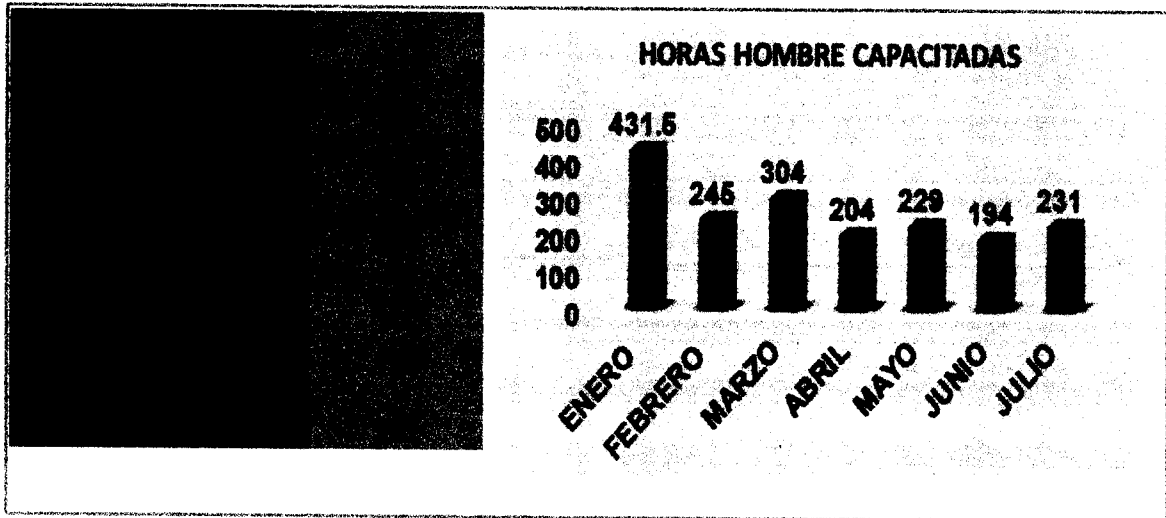



Según el cuadro estadístico nos indica que en el mes de julio 2019 ha aumentado el número de horas capacitadas con respecto al mes de junio 2019, debido a que hubo reorganización de la obra


21.7 Cuadro estadístico indicando el número de accidentes del mes de julio 2019




El Cuadro estadístico nos indica que durante el mes de julio 2019 el número de accidente fue cero.


CONSORCIO ZORRITOS
 Alejandro Eugenio Mijanguez Cuñi
 INGENIERO ESPECIALISTA EN SOCOMA


 CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
 V°B°
 Ing. Residente

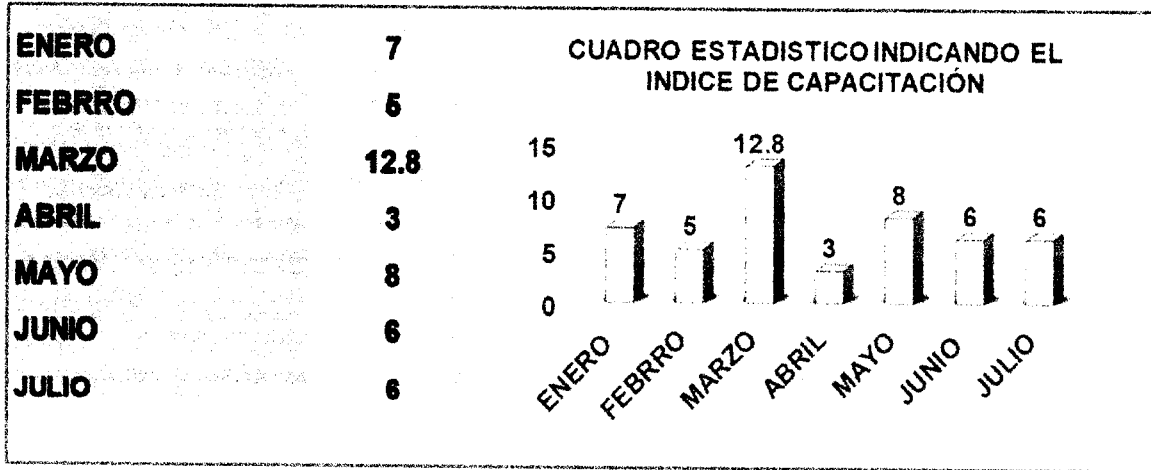21.8 Cuadro estadístico indicando el índice de capacitación mes de julio 2019


Según se puede apreciar el cuadro estadístico, indica que durante el mes de julio se dio a cada trabajador 6 horas de capacitación, igual al mes de junio

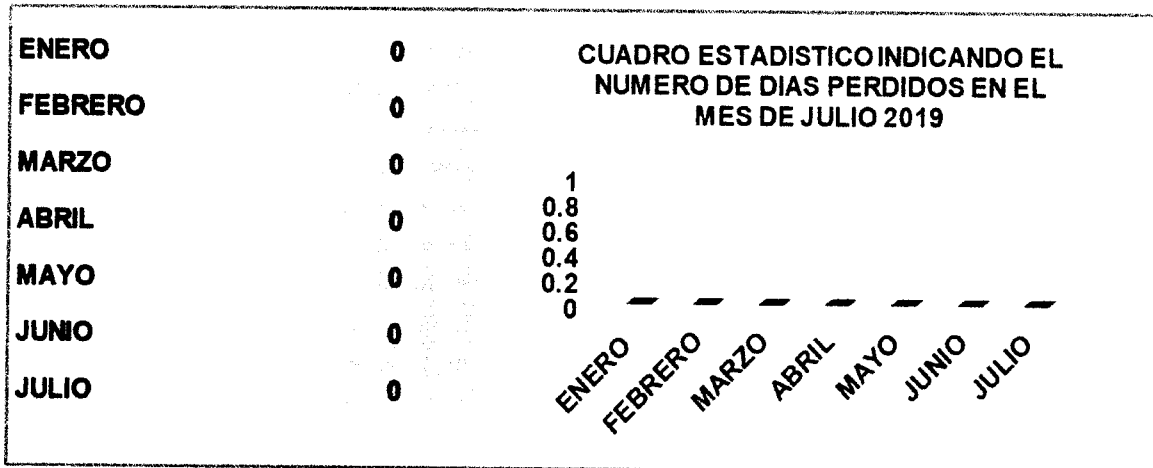
21.9 Cuadro estadístico indicando el número de días perdidos por accidentes mes de julio 2019


Según el cuadro estadístico indica que durante el mes de julio no hubo días perdidos por accidentes

CONSORCIO ZORRITOS
 Gerente General
 Calle 10 de Agosto s/n Cachi
 Tumbaco, Loja - Ecuador
 TEL: 078 252 1000 FAX: 078 252 1001
 WWW.CONSORCIOZORRITOS.COM


CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
 VºBº
 Ing. Residente

21.10 Cuadro estadístico indicando el índice de frecuencia del mes de julio 2019.

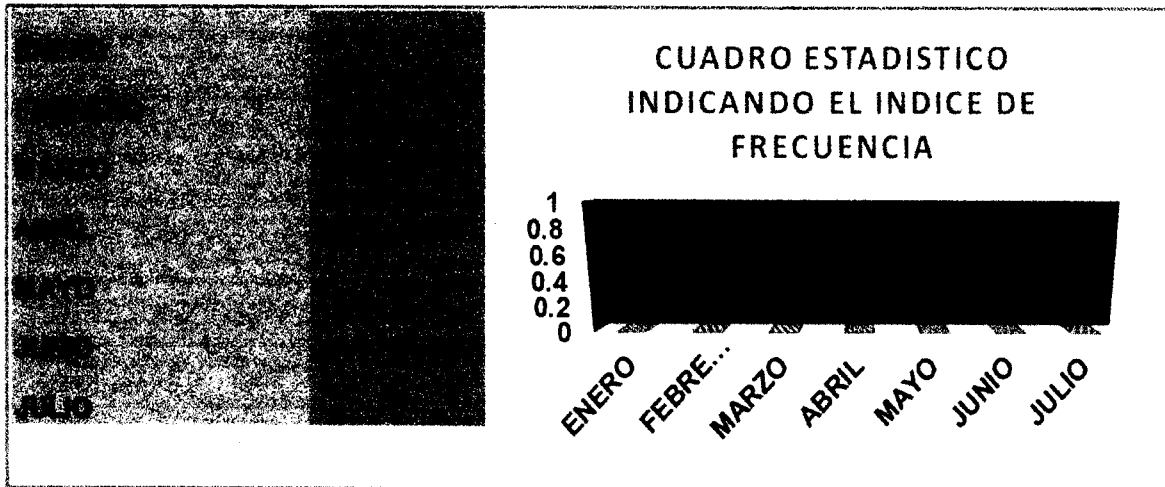

21.11 Cuadro estadístico indicando el índice de gravedad.


ENERO	0
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0

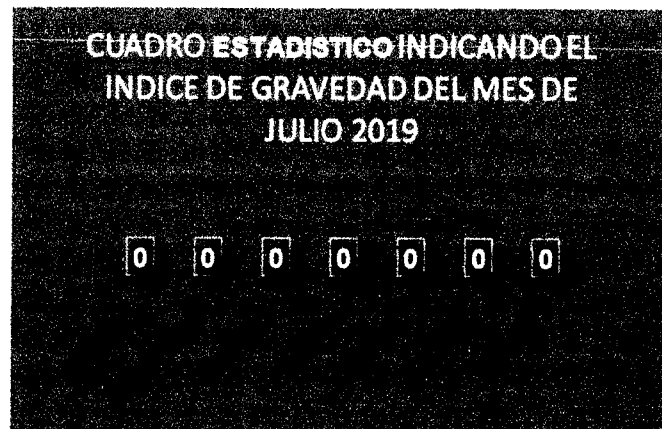

Según el cuadro estadístico indica que el índice de gravedad es cero porque no hubo días perdidos por accidentes

CONSORCIO ZORRITOS
Ingeniero Misahuaman Cach
ESPECIALISTA EN SSOMA

CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
VºBº
Ing. Residente

22.12 El índice de accidentabilidad de julio 2019

**CUADRO ESTADISTICO INDICANDO EL
INDICE DE ACCIDENTABILIDAD DEL MES
DE JULIO 2019**

Según el cuadro estadístico indica que el índice de accidentabilidad es cero porque no hubo accidentes tampoco días perdidos por accidentes.

**23. RELACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS EN OBRA -DPA-
ACAPULCO**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS EN OBRA DPA-ACAPULCO				
ITEM	EQUIPO Y MAQUINARIA	MARCA	PLACA/POTENCIA/MAT	CANTIDAD
1	GENERADOR	BONELLY	9 KW	1
2	MARTILLOS ELECTRICOS	BOSH	17000 WATS	3
3	OXIGENO	INDUSTRIAL	10 KG	2
4	EXTINTORES	PQS	6KG	4
5	EXTINTORES	CO2	6KG	2
6	ESTACIÓN TOTAL	LEICA PLUS TS056		1
7	TROZADORA	DEWALL		2
8	AMOLADORA	DEWALL		2
9	WINCHE			2


CONSORCIO ZORRITOS
 Ricardo Eugenio Misahuaman Cañali
 ESPECIALISTA EN SSO/MA


CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
 VºBº
 Ing. Presidente

MAQUINARIA PESADA			
ITEM	EQUIPO	PLACA	CAPACIDAD
1	CARGADOR FRONTAL	CAT-312F	
2	VOQUETE - VOLVO	ATW-832	15 M³
3	VOLQUE - IVECO	D3X-720	15 M³
5	1 TANKE DE OXIGENO INDUSTRIAL , UN VALON DE CH₄,		
6	GRUA	HC-78B-4	30 TM

CONCLUSIONES

Durante el mes de julio 2019 en el desarrollo de las actividades no se produjeron accidentes graves; hubieron 3 incidentes, sin días perdidos.

En la medida que el personal de obra se ha ido incorporando en el transcurrir de la ejecución de la obra, los trabajos realizados son de mayor riesgo, requiriendo el fortalecimiento el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la Obra.

Con el continuo entrenamiento de la capacitación los trabajadores a mejorado del llenado de los ASTs, enfermedades ocupacionales, uso de EPP's correctamente y haber seleccionado a los trabajadores con más experiencia en cada una de las operaciones, ya que ha contribuido a la mejor identificación de los peligros potenciales asociados al trabajo que se realiza y de este modo, colaborar con la capacitación de sus respectivos compañeros de trabajo.

Es importante mencionar que existe un trabajo coordinado con el personal de SSOMA del Consorcio Supervisor Tumbes, a fin de cumplir con los lineamientos y las políticas de seguridad en Obra.

Los trabajadores, durante el mes de julio 2019, tuvieron mayor control para prevenir accidentes durante el desarrollo de las labores.

Los parámetros de los índices de frecuencia, gravedad y accidentabilidad son cero, debido a que no hubo accidentes y días perdidos.

Durante los trabajos de obras de mar se está realizando con mucha seguridad por personal técnico calificado, los trabajos demolición de vigas, encofrado, vaciado en situ de concreto.



 CONSORCIO ZORRITOS
 Ing. Misaelman Cacha
 ESPECIALISTA EN SSOMA

Los trabajos de tarrajeo en las zonas de altura de la zona de frio, desinfección se realizan usando andamios y arnés cumpliendo las especificaciones técnicas de las normas de seguridad.

Se realizaron los trabajos en plataforma del muelle, tales como el encofrado, habilitando estructura de acero y finalmente procediendo al vaciado de concreto, en dichas tareas tampoco se presentaron accidentes, debido a que trabajaron con bastante prevención en seguridad.

Durante los trabajos en PTAR se realizan demolición, encofrados, vaciados de concreto, asentado de ladrillos en muros, colocación de estructuras del acero de refuerzo, etc, provistos, los trabajadores, de sus EPP's completos.

ANEXOS



CONSORCIO ZORRITOS
Ricardo Eugenio Misakman Cachi
ESPECIALISTA EN SSOMA



CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
Ing. Presidente

ANEXO 1. PANEL FOTOGRAFICO

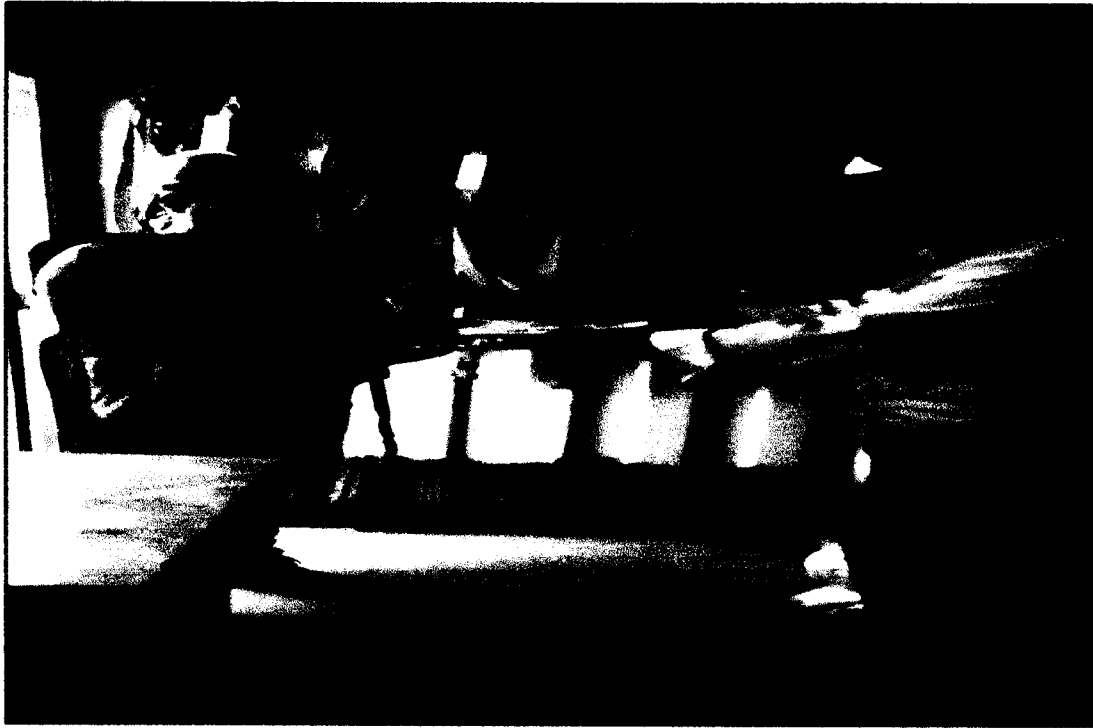


Imagen N°1: A la vista de la imagen se aprecia al trabajador recibiendo sus EPP's,



Imagen N°2: A la vista de la imagen se aprecia a los trabajadores usando correctamente sus EPP's, y andamios al realizar sus trabajos de tarrageo en la zonas previas

CONSORCIO ZORRITOS
Ricardo Eugenio Misamocan Cachi
ING. ESPECIALISTA EN ESOMA






Imagen N°3. Se observa en la imagen realizando trabajos de compactación en el patio de maniobras



Imagen N°4 Se observa, en la imagen, ejecución de trabajos de encofrado en el área de PTAR

CONSORCIO ZORRITOS
.....
Ricardo Eugenio Misakaman Cachi
.....
ESPECIALISTA EN SSOMA





Imagen N° 5 . Se observa en la imagen a los trabajadores preparando, con la mezcladora, concreto y cuentan con la protección de sus EPP's completos.



Imagen n°6 Se observa en la imagen que, se están realizando trabajos de vaciado de concreto dentro de las formas de los encofrados de madera de cámara de bombeo,

CONSORCIO ZORRITOS
Eugenio Misahuaman Cachi
SPECIALISTA EN SSOMA

CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
VºBº
ING. Presidente



Imagen N° 7: La imagen muestra que los trabajadores están realizando vaciado de concreto en la cámara de eculización de bombeo, contando con sus EPP's completos.



Imagen N°8 La imagen muestra que los trabajadores han desencofrado donde se instalaran las cámaras de bombeo y eculización

CONSORCIO ZORRITOS
Ricardo Eugenio Misahuaman Cachi
ESPECIALISTA EN SSOMA

CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
VºBº
C. de Reservas S. de C.

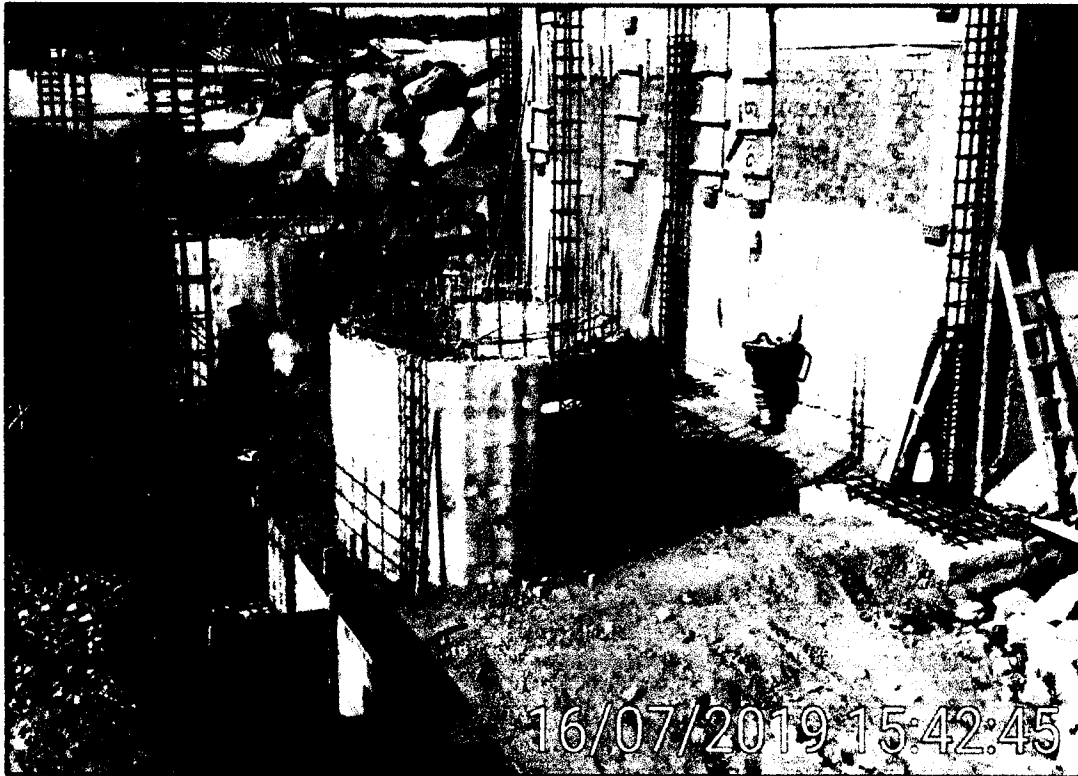


Imagen N°9 La imagen muestra que los trabajos de colocación de acero para las diferentes estructuras del PTAR, como zapatas, sobrecimientos armados, columnas etc. También se aprecian las cámara de bombeo del emisor y cámara de eculización y bombeo.



Imagen N°10 La imagen muestra que los trabajadores están recibiendo una capacitación de diez (10) minutos y que cuentan con sus EPP's completos

[Handwritten signature]
 Gerente Administrativo
 CALLES EN SUMA

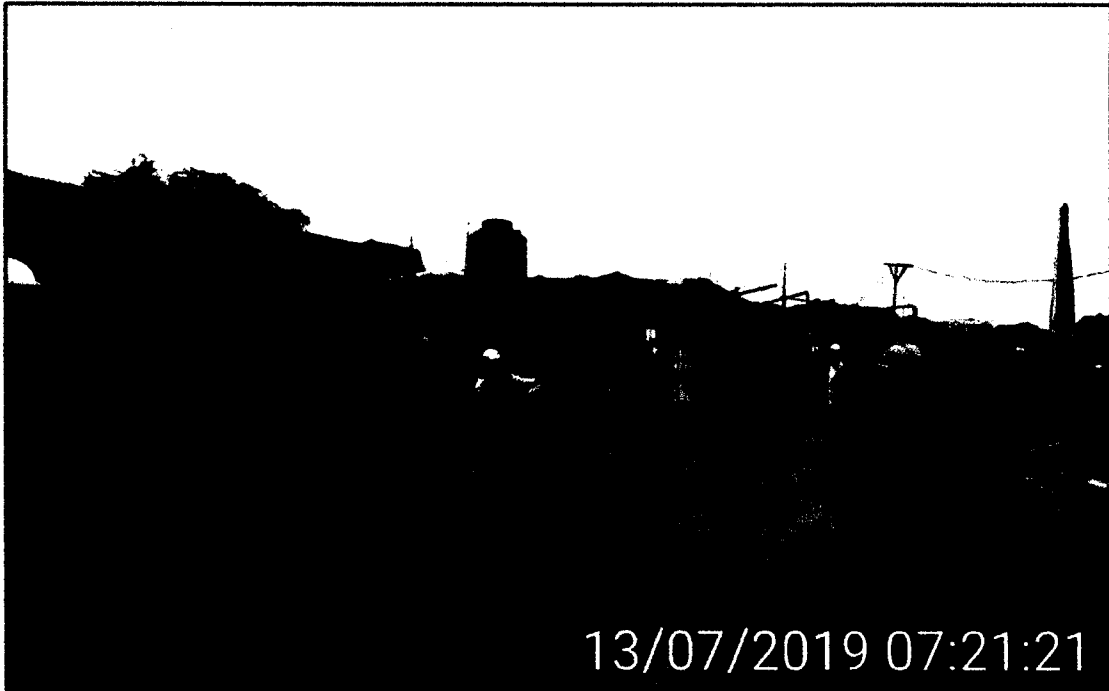


Imagen N°11 La imagen muestra que los trabajadores están recibiendo una capacitación de 30 minutos, con sus EPP's completos, en el tema de " Uso de los arnés al hacer trabajos en altura



Imagen N°12 La imagen muestra que los trabajadores están realizando ejercicios de calentamiento antes del inicio de sus labores.



CONSORCIO ZORRITOS
Eugenio M. Schumann, Cofundador
ESPECIALISTA EN DPA



Imagen N°13 La imagen muestra de la visita de la ministra de producción Rocio Barrios y su comitiva en la visita que realizaran a nuestra obra del DPA-Acapulco.

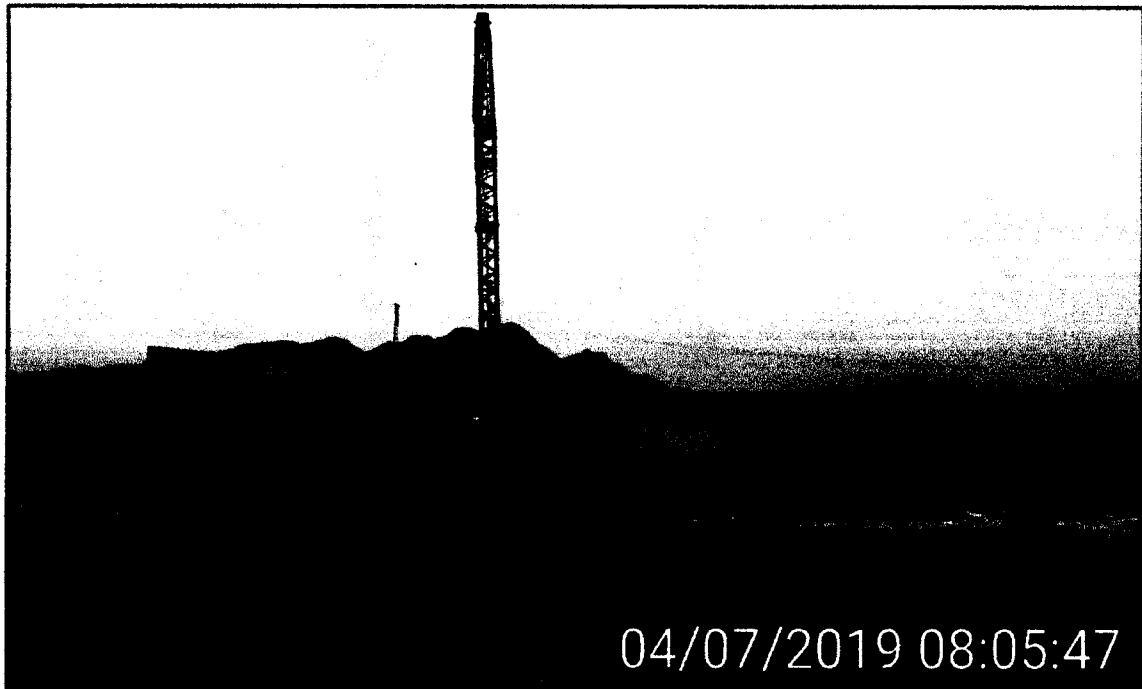


Imagen N°14. La imagen muestra que los trabajadores de obras de mar, están haciendo trabajos de IZAJE Y TRANSPORTE de las losas prefabricadas, con apoyo de la grúa y la dirección de un vigía, como medida de seguridad y en cumplimiento a las normas G050 de construcción Civil.

[Handwritten signature]
CIC
Ing. Residencia * Cont.
Cecilia María Cachi
CALISTO MESSOMA

[Circular stamp]
CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
V°B°
Ing. Residencia * Cont.



Imagen N°15 La imagen muestra los trabajadores de obra de mar están haciendo trabajos de vaciado de concreto en el cabezo del muelle con sus EPP's. completos con apoyo de la grúa.



Imagen N°16 La imagen muestra la ejecución de los trabajos de ISAJE, a fin de retirar los materiales provenientes del desmontaje y montaje, y dar inicio a los trabajos de encofrado para el vaciado de concreto in situ.

CONSORCIO ZORRITOS
Ing. MESAQUAMAN CASHI
ESPECIALISTA EN SEDMA


CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
V°B°
Ing. Presidente



Imagen N°17 La imagen muestra que los trabajadores de obra de mar están haciendo trabajos de encofrado para hacer el vaciado de concreto IN SITU.



Imagen N°18: La imagen muestra que la obra está señalizada cumpliendo con las normas y leyes de seguridad ocupacional


CONSORCIO ZORRITOS
Calle Misakpam Cachi
MAGISTER EN SIGMA


CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
VºBº



Imagen N°19 La imagen muestra que la obra está señalizada y rotulada cumpliendo con las normas y leyes de seguridad ocupacional

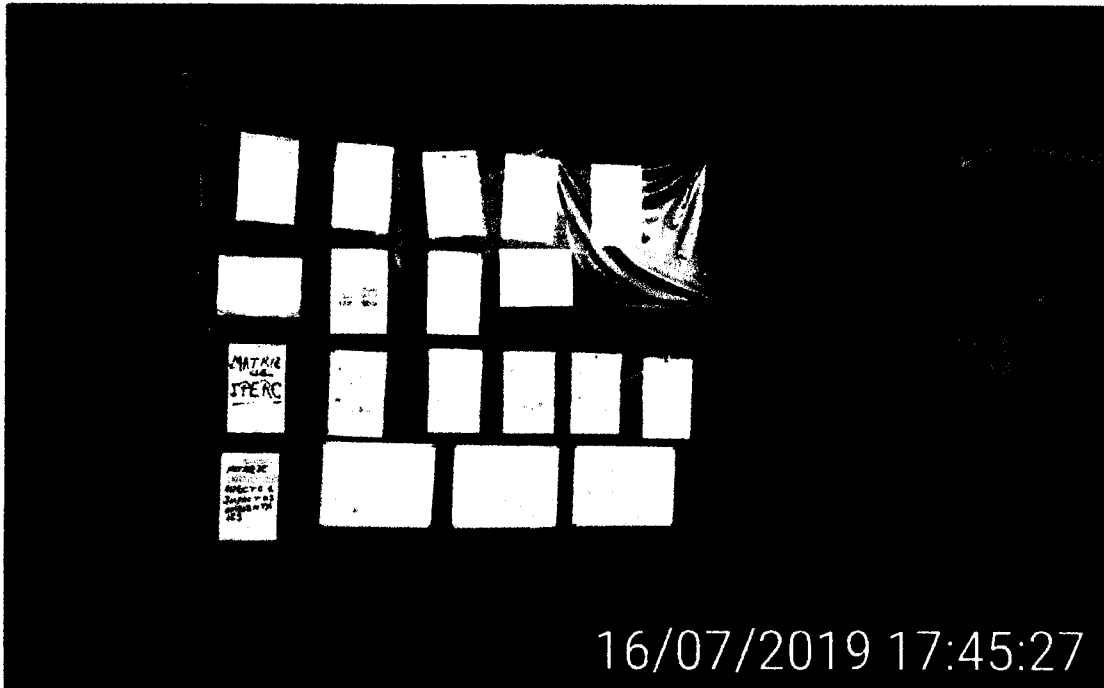



Imagen N°20 La imagen muestra el periódico mural con las actividades que se desarrollan en obra DPA-Acapulco

CONSORCIO ZORRITOS
 Ricardo Bujanda
 Ing. ESPECIALISTA EN DPA

CONSORCIO ZORRITOS A.C.
 VºBº
 Ing. Residente

SCTR DE LOS TRABAJADORES DE LA OBRA DPA-ACAPULCO
Pacífico Salud EPS


San Isidro, 27 de Junio del 2019

CONSTANCIA N° 3225325

 Señores
CONSORCIO ZORRITOS
 Presente.-

 Ref.: **SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD**

Estimados Señores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha incluido en la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SALUD correspondiente al: CONTRATO N° 001 - 86091 para el periodo 01 de Julio del 2019 al 31 de Julio del 2019 para la siguiente relación de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra:


N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. DOCUMENTO	INICIO DE COBERTURA
000001	ACUÑA HUAMAN ROBERTO ERASMO	10696203	01 de Julio del 2019
000002	ACUÑA MEZA RICARDO	15845539	01 de Julio del 2019
000003	ALAYO SAMAN EMILIO	18043248	01 de Julio del 2019
000004	ALEMAN CARLIN EGO RAMIRO	44252920	01 de Julio del 2019
000005	ALVARADO RIOS JOSE FRANCISCO	00214000	01 de Julio del 2019
000006	ALZAMORA NOEL JONY IVAN	44556999	01 de Julio del 2019
000007	ANCAJIMA PEREZ LUIS ANTONIO	32981640	01 de Julio del 2019
000008	ANCAJIMA PEREZ RICHARD MIGUEL	41251291	01 de Julio del 2019
000009	AQUINO MOLERO ALEX	45836818	01 de Julio del 2019
000010	BASTARDO JOEL ISAI	19774953	01 de Julio del 2019
000011	BERMEO CARRANZA AVELINO	03378617	01 de Julio del 2019
000012	BLANCO CAMPELO JEISON MIGUEL	25322298	01 de Julio del 2019
000013	BRUNO IPANAQUE JOSE ANGEL	41475704	01 de Julio del 2019
000014	BRUNO IPANAQUE JOSE JUAN	80667305	01 de Julio del 2019
000015	CABANILLAS CUEVA JHONNY	43930854	01 de Julio del 2019
000016	CARMEN NORIEGA CESAR AUGUSTO	03878215	01 de Julio del 2019
000017	CHACOA MORILLO WILLIAM JESUS	18728128	01 de Julio del 2019
000018	CHAPONAN ACOSTA BALTAZAR ORLANDO	42558149	01 de Julio del 2019
000019	COLMENARES ROJAS LEONARDO ALEXANDI	15387831	01 de Julio del 2019
000020	CRUZ CHINCHAY CESAR	44460440	01 de Julio del 2019
000021	CRUZ DIAZ LELIS	44758029	01 de Julio del 2019

Membreto Empresa


Pacífico Salud EPS


Por Representada

w



CONSORCIO ZORRITOS
 Ingeniero Micaela...
 ESPECIALISTA EN SSOMA



Pacífico Salud EPS


000022	CRUZ HERRERA FERNANDO	07872169	01 de Julio del 2019
000023	CUEVA LECCA FANOR	32818015	01 de Julio del 2019
000024	DAVILA NUÑEZ JOEL JULIO	00118058	01 de Julio del 2019
000025	FLORES QUISPE JOSE LEONARDO	48393586	01 de Julio del 2019
000026	GARCIA CASIMIRO GUIDO SORIANO	06856767	01 de Julio del 2019
000027	GARCIA TENAZOA DANIEL ANGEL	40977908	01 de Julio del 2019
000028	GENNELL ZAPATA JOSE LUIS	46743815	01 de Julio del 2019
000029	GONZALEZ HUAMAN NELSON JOEL	47965361	01 de Julio del 2019
000030	GONZALEZ LOPEZ FREDDY	0779448386	01 de Julio del 2019
000031	GUERRA LEON RUCINE	00328223	01 de Julio del 2019
000032	GUZMAN ARAUJO CARLOS AGUSTIN	32932807	01 de Julio del 2019
000033	HEREDIA ESPINOZA ELVIS JHONATHAN	44910712	01 de Julio del 2019
000034	HERRERA RIOFRIO PEDRO PABLO	48526383	01 de Julio del 2019
000035	HUAMANI VEGA ADOLFO MOISES	70333271	01 de Julio del 2019
000036	HUIMA JUAREZ ALEXIS EDUARDO	76424600	01 de Julio del 2019
000037	HUIMA SILVA HUMBERTO	17542880	01 de Julio del 2019
000038	INGA JAIME ELVIS MANUEL	48392098	01 de Julio del 2019
000039	JABO MOROCHO VICTOR JHONATHAN	47229851	01 de Julio del 2019
000040	JAICO PEREZ FREDDY MANUEL	44392769	01 de Julio del 2019
000041	LAMA RUMICHE LUIS GUSTAVO	77347145	01 de Julio del 2019
000042	MACHOA OBANDO GEISER	40375160	01 de Julio del 2019
000043	MEDINA CARRILLO GILMER JOEL	44262566	01 de Julio del 2019
000044	MISAHUAMAN CACHI RICARDO EUGENIO	17875280	01 de Julio del 2019
000045	MORILLO MEJIA JORGE	26578562	01 de Julio del 2019
000046	NILUPU ROMERO ALDO PAUL	41351282	01 de Julio del 2019
000047	NORABUENA PEREZ JOSE ENRRIQUE	32854162	01 de Julio del 2019
000048	ORCON AVILES GREGORIO DAVID	44879927	01 de Julio del 2019
000049	PANTA PRADO MANUEL	00252465	01 de Julio del 2019
000050	PAREDES PERALTA PEDRO ANDRI	47781454	01 de Julio del 2019
000051	PAUCAR ABAD JIMMY ALEXANDER	03684682	01 de Julio del 2019
000052	PAZO AMAYA ANGEL	00328717	01 de Julio del 2019
000053	PLASENCIA JIMENEZ OMAR JAVIER	46831291	01 de Julio del 2019
000054	RAMIREZ VALLES TERCERO ALBERTO	00908439	01 de Julio del 2019
000055	RAMOS OLIVOS CHRISTIAN DENIS	46780840	01 de Julio del 2019
000056	RAMOS RAMOS JAVIER	43475603	01 de Julio del 2019
000057	REGALADO OBLITAS EDGAR FERNANDO	09074975	01 de Julio del 2019


Primo Personal


Participa EPS

Pacífico Salud

W

CONSORCIO ZORRITOS
 Ingeniero Misahumani Cachi
 ESPECIALISTA EN SOMA




Pacífico Salud EPS


000058	REYES CUNYARACHE LENISS JOHAN	72531447	01 de Julio del 2019
000059	RUGEL TORRES EDWARD WLADIMIR	46416300	01 de Julio del 2019
000060	SABA QUEVEDO FRANCO DANILO	47755375	01 de Julio del 2019
000061	SEVILLANO DIAZ VICTOR MANUEL	32839513	01 de Julio del 2019
000062	SIANCAS ESPINOZA GERMAN	02647108	01 de Julio del 2019
000063	SOLORZANO LOZANO ENRIQUE ZACARIAS	80556706	01 de Julio del 2019
000064	TISNADO PILCO ALEXIS YAMIL	43257851	01 de Julio del 2019
000065	TORIBIO SOLIS JULIO CESAR	09927767	01 de Julio del 2019
000066	VASQUEZ PEREZ ALFREDO NEMESIO	32920384	01 de Julio del 2019
000067	VILCHEZ REYES ERICK EDISON	75084450	01 de Julio del 2019
000068	VILCHEZ REYES JORGE JOSSEP	48251226	01 de Julio del 2019
000069	VILCHEZ SOSA JORGE LUIS	05642084	01 de Julio del 2019
000070	YERBASANTA CARHUAYANO JESUS MAURO	80280846	01 de Julio del 2019
000071	ZAPATA AVILA JUAN CARLOS	47139252	01 de Julio del 2019

Sin otro particular, quedamos de ustedes

Atentamente,




**CARLOS SILES
GERENTE
SCTR
PACIFICO SALUD**




01/07/2019

01/07/2019


01/07/2019




FORMATO DE CHECK-LIK DE VEHICULOS

 CONSORCIO ZORRITOS		CHECK LIST DE EQUIPO DE CORTADO		Versión 01 15 de Julio de 2011	
OBRA DPA ACAPULCO		EMPRESA CONSORCIO ZORRITOS		FECHA 06/07/19	
TRABAJO A REALIZAR CORTA		N° DE SERIE DEL EQUIPO		HORA 2:30-5:00 P.	
		APRUEBA		RECHAZA	
BOTELLAS		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		OBSERVACIONES	
1. Cuchillas sujetadas y bajo control		<input checked="" type="checkbox"/>			
2. Válvula de salida		<input checked="" type="checkbox"/>			
3. Manómetros		<input checked="" type="checkbox"/>			
4. Arresbujas		<input checked="" type="checkbox"/>			
CABLE Y MANGUERA		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		OBSERVACIONES	
1. Línea de corte		<input checked="" type="checkbox"/>			
2. Mangueras		<input checked="" type="checkbox"/>			
3. Acoples		<input checked="" type="checkbox"/>			
4. Abrazaderas		<input checked="" type="checkbox"/>			
5. Anclajes		<input checked="" type="checkbox"/>			
6. Chispa		<input checked="" type="checkbox"/>			
7. Línea boquilla		<input checked="" type="checkbox"/>			
EPIE O ESPECIARIOS		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		OBSERVACIONES	
1. Manillo de cuero		<input checked="" type="checkbox"/>			
2. Guantes de soldador		<input checked="" type="checkbox"/>			
2. Escarpines		<input checked="" type="checkbox"/>			
2. Lentes para oxígeno		<input checked="" type="checkbox"/>			
3. Respirador		<input checked="" type="checkbox"/>			
Sección para SSO/MA					
Instrucciones / Recomendaciones:					
FIRMA DE APROBACIÓN PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES			V° B°		
Copataz / Líder de Grupo: Nombre: <i>[Firma]</i> Firma: <i>[Firma]</i>		Ing. Residente / Ing. de Grupo: Nombre: <i>[Firma]</i> Firma: <i>[Firma]</i>		Director / Líder de Proyecto: Nombre: <i>[Firma]</i> Firma: <i>[Firma]</i>	
					

[Handwritten signature]



FORMATO DE IZAJE

CONSORCIO ZORRITOS		PERMISO DE IZAJE		COMPARTAMENTO		CANTON	
				VERIFICADO		DI	
				FACILITADO		MI	
CONSORCIO ZORRITOS							
Muelle							
10-07-2019	7:30 am	10-07-2019	6:00 pm				
IZAJES, FUNDACIONES, RECTIFICACIONES							
LIM - 241 - 32712							
				21			
				5.000			
				200			
				100			
VALOR TOTAL DE LA CARGA (CARGAS)				5300			
				12			
				11.000			
VALOR TOTAL DEL PERMISO DE IZAJE (CARGAS + FONDOS)				85	85		
Firma del Registrante							
David Oscar Pulido		10-07-2019					
Firma del Supervisor							
Enrique S. Lizano / 0720		10-07-2019					

CONSORCIO ZORRITOS
 Ricardo Eugenio Mijanguez Cachi
 ESPECIALISTA EN SOMA






[Handwritten Signature]


CONSORCIO ZORRITOS
 EDUARDO FERRAZ
 Ing. Residente de Obra

CONSORCIO ZORRITOS
 Ricardo Eugenio Mijanguez Cachi
 ESPECIALISTA EN SOMA

CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
 VOB
 Ing. Residente

FORMATO DE TRABAJOS EN ALTURA

CONSORCIO ZORRITOS		FORMATO			Código de Documento: 001		
		LISTA DE VERIFICACION DE TRONZADORA			Versión: 01		
					Fecha: 06/01/2018		
					Página: 1 de 1		
DEPARTAMENTO: <u>Tambo - Peis</u>		LUGAR: <u>Barra de Flores</u>					
AREA: <u>Puerto</u>		ACTIVIDAD: <u>Habilitación de Puerto</u>					
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO ZORRITOS</u>		FECHA DE INSPECCION: <u>13-01-2019</u>					
OBRA: <u>D.P.A. Acapulco</u>							
<input type="checkbox"/> EQUIPO NUEVO <input type="checkbox"/> PRE USO (INYECCION)		<input checked="" type="checkbox"/> EQUIPO BUO <input type="checkbox"/> USO DURANTE LA ACTIVIDAD					
OPERADOR							
IMAGEN CORPORATIVA	BUENO	MALO	NO TIENE	OBSERVACIONES			
POLO	/	/	/				
PANTALLON	/	/	/				
IMPLEMENTOS DE PROTECCION			BUENO			MALO	NO TIENE
CASCOS	/	/	/				
BARRILERA CON BARRIQUEJO	/	/	/				
TABLETA DE PROTECCION FACIAL	/	/	/				
MASCARILLA PARA POLVO	/	/	/				
GUANTES DE CUERO/CANA LARGA	/	/	/				
GUANTES DE TELA	/	/	/				
ESCARPINES DE CUERO	/	/	/				
PROTECCION AUDITIVA (BOB)	/	/	/				
CALZADO DE SEGURIDAD (PUNTERA REFORZADA)	/	/	/				
EQUIPO							
PROTECCIONES MECANICAS	BUENO	MALO	NO TIENE	OBSERVACIONES			
UNDA DE TRONZAR	/	/	/				
INTERRUPTOR DE SOBRECORRIENTE (DESCONECCION)	/	/	/				
AMPOLLAJUNA	/	/	/				
GUIA DE CORTE	/	/	/				
PLACA BASE	/	/	/				
PERNOS DE AVANTE DE DISCO	/	/	/				
GUARDIA Fija DE DISCO	/	/	/				
GUARDIA MOVIL DE DISCO	/	/	/				
CONJUNTO DE EQUIPO Y CABLE	/	/	/				
CABLE DE ALIMENTACION	/	/	/				
ENCHUFES	/	/	/				
EMPUJADORA DE TRANSPORTES	/	/	/				
PROTECCION CONTRA CHISPAS	/	/	/				
BLOQUEO DE CONEXION	/	/	/				
LLAVE HEXAGONAL	/	/	/				
TORNILLOS MARIPOSA	/	/	/				
EXPULSOR DE VIRUTAS	/	/	/				
TOPES	/	/	/				
 OPERADOR DE TRONZADORA		 INSPECTOR		 CONSORCIO ZORRITOS Ricardo Enrique Misahyaman Cachi INGENIERO EN SEGURIDAD			
Queda absolutamente prohibida cualquier modificación del presente documento sin la autorización previa y expresa del Coordinador del SCS.							



FORMATO DE USO DE ARNES

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					CONTROL DE ASISTENCIA	
OBJETIVO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMPEÑO DEL PESQUERO ACAPULCO EN LA LOCALIDAD DE ZORRITOS DISTRITO DE CANAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS					FECHA: 12/07/2019	
PROVINCIA CONTAMINANTE VALPARAISO SECCION TUMBES					LUGAR: ZORRITOS	
DATOS DEL EMPLEADOR						
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	COMUNIDAD	ACT. SOCIAL ECONOMICA	N.º DE PARTICIPANTES		
CONSORCIO ZORRITOS	CONCEPCIÓN	LOS RIOS DE LOS RIOS DE LOS RIOS	COMERCIAL	37		
INCLUSIÓN	PRESENCIA	TIPO DE EVENTO (MARCAR CON X)		OBSERVACIONES		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FAMILIAR DE EMERGENCIA <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OBRERA DE ROTE FORJADO <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
TEMAS TRATADOS: Uso adecuado de los Arnes en una obra de construcción civil.						
FECHA	HORA DE INICIO		TIEMPO DE DURACIÓN		NÚMERO DE PARTICIPANTES	
12 Julio 2019	7:30 am		7:40 am		37	
				NOMBRE DEL EJECUTOR: Ricardo Montero		
				FIRMA DEL EJECUTOR: <i>[Firma]</i>		
Nº	APELLIDOS Y NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	DNI	CARGO	EMPRESA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Altamira Noel Tony	44586899		C2	<i>[Firma]</i>	
2	Alayo Samson Emilio	18413794	AY	C2	<i>[Firma]</i>	
3	Jaha Marcelo victor	4727985	AY	C2	<i>[Firma]</i>	
4	Ramos Ramos Javier	1171125003	AY	C2	<i>[Firma]</i>	
5	Pauca Abad Jimmy	03664682	OP	C2	<i>[Firma]</i>	
6	Buenc Sponague Angel	41475204	OP	C2	<i>[Firma]</i>	
7	Buenc Sponague Juan	8016720	SOP	C2	<i>[Firma]</i>	
8	Chapenon Acosta Baltazar	412558419	OP	C2	<i>[Firma]</i>	
9	Medina Espinoza elus	44910712	OP	C2	<i>[Firma]</i>	
10	Sala Quevedo franco	4935523	OP	11	<i>[Firma]</i>	
11	Papato Anita Juan	47129251	AY	C2	<i>[Firma]</i>	
12	Rugel Torres Edward	46416300	AY	C2	<i>[Firma]</i>	
13	Panta Prado Manuel	08252465	OP	C2	<i>[Firma]</i>	
14	Guerra Leon Lucine	05378723	OP	C2	<i>[Firma]</i>	
15	Gonzales Herman juel	47965361	AY	C2	<i>[Firma]</i>	
16	Herrera Rigorio Pedro	48716383		C1	<i>[Firma]</i>	
17	Lama Pumiche Luis	7347145	AY	C2	<i>[Firma]</i>	
18	Machoa Obando Griser	4037460	OP	C2	<i>[Firma]</i>	
19	Ramires Valles Tercera	00706670	OP	C5	<i>[Firma]</i>	
20	Bermeo Corraza Avelino	03778617	OP	C2	<i>[Firma]</i>	
21	Cruz Minchey Cesar	44460190	OP	C2	<i>[Firma]</i>	
22	Bastardo Joel Isai	14724853			<i>[Firma]</i>	
RESPONSABLE DEL REGISTRO						
Nombre: Ricardo Montero				Fecha: 12 Julio 2019		
Cargo: SSOMA				Firma: <i>[Firma]</i>		

CONSORCIO ZORRITOS
[Firma]
 ING. ESPERANZA

CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
 VºBº
 Ing. Residente

FORMATO DE RECOMENDACIONES EN EL TRABAJO

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
CONTROL DE ASISTENCIA						
MEJORA DEL SERVICIO DE LOS SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE RESCUEO PROFESIONAL EN LA LOCALIDAD DE CANCHU, DISTRITO DE CANCHU DE PORTA S.A. PROMOCIÓN CONTRA LA MIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES.						
DATOS DEL EMPLEADOR						
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC	COMPLEJO		ACTIVIDAD ECONÓMICA	N.º DE REG. PROFES.	
CONSORCIO ZORRITOS	20000000000000000000	LOS OLIVOS 253 574 5000 1 MP		CONST. CAR.	337	
INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/>	TIPO DE EVENTO (MARCAR CON X)		CAPACITACIÓN	<input type="checkbox"/>	
ENTRENAMIENTO	<input type="checkbox"/>	SARU ACRO DE EMERGENCIA		PRÁCTICA	<input type="checkbox"/>	
TEMAS TRATADOS	USO ADECUADO DE LOS ARMOS DENTRO DE UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL.		CHARLA DE INICIO DE JORNADA	<input checked="" type="checkbox"/>		
FECHA	13 Julio 2019		NÚMERO DE PARTICIPANTES: 37			
HORA DE INICIO	7:30 am.		NOMBRE DEL EXPOSITOR: Ricardo Misabuan Cachi			
TIEMPO DE DURACIÓN	2:40 am.		FIRMA DEL EXPOSITOR: [Firma]			
NRG.	APELLIDOS Y NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	DNI	CARGO	EMERGENCIA	FIRMA	RESERVACIONES
1	Huina Silva Humberto		OPERA	OP	[Firma]	
2	Huina Juarez Alexis	7677800	OP	OP	[Firma]	
3	Blanca Campelo Jensen	25377298	PROV	OP	[Firma]	
4	Blanca Campelo Jose	2737299	PROV	OP	[Firma]	
5	Garcia Tenazco Daniel	4017708	OP	OP	[Firma]	
6	Chauca Murillo William	1677548	OPERA	OP	[Firma]	
7	Norabuena Perez Tose	2285062	OP	OP	[Firma]	
8	Milpu Romero Aldo	41351486	OP	OP	[Firma]	
9	Carriena Noriega Cesar	0387715	OP	OP	[Firma]	
10	Arcajuna Perez Luis	32901640	OP	OP	[Firma]	
11	Garcia Zapata Jose	46747815	OP	OP	[Firma]	
12	Garcia Casimiro Guido	06852702	OP	OP	[Firma]	
13	Aleman Carlin Ego	7725290	OP	OP	[Firma]	
14	Parados Peralta Pedro	77271554	OP	OP	[Firma]	
15	Salazarza Iozano Enrique	80556706	OP	OP	[Firma]	
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
RESPONSABLE DEL REGISTRO						
Nombre: Ricardo Misabuan Cachi			Fecha: 13 Julio 2019			
Cargo: SSOA			Firma: [Firma]			

CONSORCIO ZORRITOS
Ricardo Eugenio Misabuan Cachi
ESPECIALISTA EN SSOA

CONSORCIO ZORRITOS A.C.A.P. 1970
V. 05
Ing. Residente

FORMATO DE TRABAJOS EN ALTURA

CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO

ESTE PERMISO SE PUEDE UTILIZAR PARA TRABAJOS EN ALTURA, TRABAJOS EN CALIENTE E HAYO DE OBRAS

DECLARACION DE CONOCIMIENTO

Trabajos a realizarse: **Recepción de agua ZONA FRIO y COLEMANCHES**

Fecha: **17/07/2019**

Horario: **7:30 AM - 5:00 PM**

Trabajadores Autorizados:

Nombre	Cargo	Firma
Antonio Joris	OP	<i>[Firma]</i>
RUCINE BUENALBA	OP	<i>[Firma]</i>

Trabajos en Altura

- Trabajos en Altura
- Espacios Confinados
- Temperaturas Extremas
- Trabajos nocturnos
- Espacios muy largos
- Trabajos con esdiferencia de altura considerable
- Esmeraldas
- Trabajos en presencia de gases
- Trabajos en presencia de ruido
- Otros

Trabajos en Caliente

- Caídas y voladuras
- Contactos eléctricos
- Adhesión respiración de soldadura
- Quemaduras, incendio o riesgo de incendio
- Electrocución
- Adhesión al modo de operación de maquinaria
- Cortes
- Golpes
- Españoles, riesgo de descomposición, truenos, ventales, etc.
- Otros

Equipo de Protección Personal

Equipo de Protección Personal	Usado	Equipo de Protección Personal	Usado	Equipo de Protección Personal	Usado
Casaca protectora	<input checked="" type="checkbox"/>	Guantes para corte	<input type="checkbox"/>	Casaca para agua	<input type="checkbox"/>
Capacete de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Respirador para polvo	<input type="checkbox"/>	Cableos seguros	<input type="checkbox"/>
Cableos contra caídas	<input checked="" type="checkbox"/>	Respirador para gases	<input type="checkbox"/>	Sistema de puentes de trabajo	<input type="checkbox"/>
Explotación de cables	<input checked="" type="checkbox"/>	Respirador para pintura	<input type="checkbox"/>	Escarpines	<input type="checkbox"/>
Guardas articulares	<input checked="" type="checkbox"/>	Casco para estar	<input type="checkbox"/>	Cableos de Cuero Chrome	<input type="checkbox"/>
Almohadilla de la espalda	<input checked="" type="checkbox"/>	Botas Dielco Caucho	<input type="checkbox"/>	Trípodes de trabajo con altura	<input type="checkbox"/>
Botas con amortiguación	<input checked="" type="checkbox"/>	Embague	<input type="checkbox"/>	Estelón	<input type="checkbox"/>

Áreas de Seguridad

Áreas de Seguridad	Si/No	Áreas de Seguridad	Si/No
Regeneradores y exhalados	<input type="checkbox"/>	Áreas cercadas seguras	<input type="checkbox"/>
Equipos contra incendio adecuado	<input type="checkbox"/>	Vehículo para maniobras	<input type="checkbox"/>
Quemadores y soldaduras	<input type="checkbox"/>	Chanta y Protección Colectiva	<input type="checkbox"/>
Se resguarda los herramientas	<input type="checkbox"/>	Buen estado de los EPPs	<input type="checkbox"/>
		Se resguarda los SDS	<input type="checkbox"/>

Registro de Seguridad

Supervisor de Seguridad: **[Firma]**

Supervisor de Obra: **[Firma]**

Supervisor de Trabajo: **[Firma]**

CONSORCIO ZORRITOS



Reserva de Seguridad y Salud en el Trabajo

SECRETARÍA DE PREVENCIÓN

[Firma manuscrita]






CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
Ing. Residente



FORMATO DE ARNES

 CONSORCIO ZORRITOS	INSPECCIÓN DE ARNÉS			Código SSOMA-FI-30									
	DPTO. DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE			Versión: 00 Pág. 01 de 01									
OBRA	EMPRESA	FECHA	HORA										
DPA ACAPULCO	CONSORCIO ZORRITOS	22/07/19	7:30 AM										
TRABAJO A REALIZAR	Nº DE SERIE DEL EQUIPO												
CAJERADO DE COLUMNAS Y VIGAS													
			BUENO	MALO									
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
ELEMENTOS DEL ARNÉS DE SEGURIDAD													
													
1. HEBILO 2. ANILLO SECUNDARIO DE UNIÓN DEL ANTEPAQUETE AL HEBILO 3. ELEMENTO DE ENLACE 4. TIRANTE 5. BANDA QUE SUJETA EL ANILLO DE UNIÓN 6. BANDA DE UNIÓN 7. ELEMENTO DE UNIÓN DE LA BANDA QUE SUJETA EL ANILLO DE UNIÓN													
8. LINEAD DE VIDA 9. ANILLO DE UNIÓN DE LA BANDA QUE SUJETA EL ANILLO DE UNIÓN													
Nº	CÓDIGO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	ELEMENTOS DEL ARNÉS							OBSERVACIONES			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Rosa Luz Torres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	C 7 29	Rocío Guerra Leon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Sección para SSOMA

Instrucciones / Recomendaciones:

FIRMA DE APROBACIÓN PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES		Vº Bº
Capataz / Líder de Grupo: Nombre:  Firma: 	Ing. Residente / Ing. De Campo: Nombre:  Firma: 	Preventivista de Riesgos: Nombre: CONSORCIO ZORRITOS Firma: 



CONSORCIO ZORRITOS

FORMATO DE EQUIPO DE OXICORTE

DPA ACAPULCO

CONSORCIO ZORRITOS

Tipo de Documento: **FORMATO** Código: **SBOMA-F1-48** Fecha: **04/12/19** Revisión: **00**

Proyecto: **DPA ACAPULCO** Hora: **7:30 AM**

Nombre de la tarea: **EXCEPCIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS**

Personal ejecutante: **MADELLA, SANSAY, WINCHA**

Fecha: **12/07/2019**

Ubicación exacta: **ZONA FOCO TALADRO**

CASCO, GUANES, LENES

PCLEDA, PANIALEN, ZAPALOS

ENCINE GUERRA LECAL


MANUELA PANTA PRADO

Actividad	Requisitos	Equipos/Plantas	Medios de Protección de Salud
Inspección del AREA de trabajo	ALAMBRES, CLAVOS PIEDRAS, MADERAS	CHUSPONES, CAJONES TROPEZONES, CAJAS	CORDONADO Y LIMPIEZA EL AREA de trabajo
Inspección de HERRAMIENTAS	MADELLA, SANSAY BARRETELLA, WINCHA TALADRO.	CHUSPONES, CORTES TRENCHADORAS	uso de HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN BUNDA ESTADO.
suceptado de COLUMNAS Y VIGAS	habilitación de MATERIALES Y ACARDEP, ANCHOS ESCALERA	LUMBALGIAS, CAJAS de ATERRIZAJE, DESBALANCE ATOPROPRIACIONES.	uso de los EPP ADECUADOS uso de ARMES
CORDON y LIMPIEZA	MADERAS, LAMERAS	CAJAS, TROPEZONES	CORDON y LIMPIEZA

Trabajos Calleles Espacio Confines Trabajos en Alturas Excavaciones Izaje Otros Ninguno

ANÁLISIS DE RIESGO

Riesgo = Probabilidad de Amenaza x Magnitud de Daño



CONSORCIO ZORRITOS

EDGAR TELLO

EDGAR TELLO

FIRMA DEL JEFE DE OROUOCAPATAS


FIRMA DEL CAMPO SUPERVISOR RESPONSABLE

ENCINE GUERRA LECAL


Nombre del jefe de grupo directo de la tarea

CONSORCIO ZORRITOS

Manuela Panta Prado











Pg 6A



063


FORMATO DE ANDAMIOS

CONSORCIO ZORRITOS		INSPECCIÓN DE ANDAMIOS		Código SSOMA 01-27	
DPTO. DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE				Version: 010	
Pág. 01 de 01					
OBRA		ÁREA O UBICACIÓN			
DPA ACAPULCO		EMPRESA		FECHA	
HORA: 7:31		N° DE ANDAMIO: 2		11/07/2019	
PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO					
N°	NOMBRE	FIRMA			
1	Roberto Torres				
2	Daniel Guzmán Lecu				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
ELEMENTOS BÁSICOS					
Lasetas	<input type="checkbox"/>	Escaleras			
Cuerpos	<input type="checkbox"/>	Escaleras			
Cintas en las uniones	<input type="checkbox"/>	Rodapiés			
Protección en las juntas	<input type="checkbox"/>				
El ideal es instalarlos por completo <input type="checkbox"/>					
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL					
Casco	<input type="checkbox"/>	Manchos de protección			
Cable de vida	<input type="checkbox"/>	Indumentaria de Trabajo			
		Cable de Seguridad			
		Protección Ambiental			
N°	SI	NO	NA		
1. Cuenta con indicadores de rutas de circulación para el personal?	/				
2. Cuenta con indicadores de rutas de circulación para vehículos?	/				
3. Se han instalado letreros, señales, y barreras para prevención de accidentes?	/				
4. Se ha realizado una inspección visual garantizando que no hay peligros potenciales?	/				
5. El área donde está instalado el andamio está limpia?	/				
6. Área de trabajo cuenta con un extintor?	/				
7. Línea de vida externa compuesta por Cable de Acero de 1/2"	/				
8. Línea de vida externa compuesta por soga de 5/8"	/				
9. Estabilizadores asegurados en 02 puntos con grapas	/				
10. Cuentan con armostrés cada 02 cuerpos en ambos lados?	/				
11. Cuentan con aseguramiento con tuercas entre cuerpos en las 4 patas?	/				
12. Cuentan con atornillamiento entre cuerpos en ambos lados?	/				
13. Tiene las crucetas en buen estado y el seguro de las crucetas se encuentran en buena condición?	/				
14. El aseguramiento de crucetas se realiza con pines / jampas?	/				
15. El andamio está armado sobre una superficie firme y nivelada?	/				
16. El área inferior del andamio está restringido?	/				
17. Escaleras de acceso en buen estado?	/				
18. La superficie del andamio se encuentra limpio?	/				
19. El área del andamio se encuentra señalizada y acordonado con cinta amarilla?	/				
20. La línea vertical tiene bloqueador anti onda?	/				
21. El andamio cuenta con rodapiés en buen estado y en todos los cuerpos?	/				
FIRMA DE APROBACIÓN PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES			V° B°		
Capataz / Líder de Grupo: Nombre:  Firma: 	Ing. Residente / Ing. De Campo: Nombre:  Firma: 	Prevencionista de Riesgos: Nombre:  Firma: 	CONSORCIO ZORRITOS Ricardo Eugenio Misahuamán Cachi INS. Residente		



CONSORCIO ZORRITOS
 Ricardo Eugenio Misahuamán Cachi
 ESPECIALISTA EN SSOMA


CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
 INS. Residente

INFORME DE MEDIO AMBIENTE



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long tail extending downwards and to the left.



A circular official stamp with a handwritten signature over it. The stamp contains the text: "CONSORCIO ZORRITOS A.C. PUBLICO" around the top edge, "Ing. Resendiz" around the bottom edge, and "Vob" in the center.

060

**“INFORME DE MEDIO AMBIENTE DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL DE ACAPULCO”**



PERÍODO : DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

ENTIDAD : ... FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO (FONDEPES).

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES

CONTRATISTA : CONSORCIO ZORRITOS

CONSORCIO ZORRITOS
Ricardo Eugenio Misahuaman Cachi
ING. ESPECIALISTA EN SSOMA





INDICE

1 INTRODUCCIÓN	1
1.1 Objetivos del informe	1
1.2 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN OBRA	2
1.3 ACTIVIDADES REALIZADAS:	3
2 PANEL FOTOGRÁFICO	4

CONSORCIO ZORRITOS

Ricardo Eugenio Misahyaman Cachi
ING. ESPECIALISTA EN SSOMA

CONSORCIO ZORRITOS A.C. SUCP
Vob°

ING. Residente



1 INTRODUCCIÓN

A continuación, desarrollamos el Informe Mensual, correspondiente al mes de julio 2019, de la Especialidad Ambiental del Proyecto Mejoramiento de los servicios del DPA-Acapulco.

La obra del DPA de Acapulco cuenta con dos zonas diferenciadas, por su ubicación, una correspondiente a Obras de Mar y la otra a Obras en tierra.

Las obras en la zona de mar, se encuentra en su fase de ejecución con los trabajos de demolición, corte, habilitado, armadura de acero y vaciado de concreto INSITU.


En la zona de obras en tierra se realizaron trabajos de tarrajeo, instalación de tuberías de agua, electricidad en las zonas previas, tarrajeo, encofrados, colocación de andamios, asentamiento de ladrillo en la zona de frio, instalación de tuberías de agua y desagüe, vaciado de concreto en pisos de la zona desinfección, relleno y compactación en las veredas y zonas internas y pasadizos del área de administración, relleno y compactación en el patio de maniobras, en la Zona de PTAR se hacen los trabajos de amarre de acero, encofrado, vaciado de concreto, armadura de estructura de acero, donde se instalaran las cámaras de bombeo y eculización

1.1 Objetivos del informe

- Plasmar lo realizado en obra, durante los trabajos de supervisión de los condicionales ambientales establecidos y de lo previsto en el Programa de Vigilancia Ambiental.
- Indicar las soluciones aportadas, en relación a los problemas planteados durante el seguimiento ambiental de las obras.
- Reseñar las incidencias ambientales registradas, así como los resultados de su seguimiento.
- No contaminar el agua del mar con derrames de hidrocarburos para conservar la biodiversidad marítima.

CONSORCIO ZORRITOS

Ricardo Eugenio Misahuacan Cachi
ANP ESPECIALISTA EN SSOMA



057

1.2 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN OBRA

A continuación, desarrollamos el procedimiento seguido para el ingreso de los nuevos trabajadores a la obra:

Todos los trabajadores seleccionados, al momento de su ingreso, han recibido la inducción general sobre las políticas de la empresa en los temas de Seguridad y Medio Ambiente y han firmado la carta de compromiso de respeto a dichos estándares y recibieron su Reglamento interno de la obra.

a) Además, diariamente los trabajadores recibirán la charla de seguridad de 5 minutos antes de empezar las labores.

b) El equipo de seguridad a utilizarse:

- Ropa de seguridad de 01 piezas
- (camisa y pantalón).
- Calzado de seguridad con punta de acero
- Lentes de seguridad
- Cascos para protección de la cabeza
- Guantes protectores para manos
- Chalecos de salvavidas de seguridad
- Respiradores para polvo
- Tapones de oído
- Barbiquejo
- Aro salvavidas
- Chaleco salvavidas
- Buzo

c) Se realiza la limpieza y disposición de los residuos generados en las áreas de intervención, usando bolsas de plásticos de color negro.

CONSORCIO ZORRITOS
Ricardo Eugenio Misol Amán Cact.
ESPECIALISTA EN SSOMA



056

1.3 ACTIVIDADES REALIZADAS:

En consideración al "Impacto Ambiental", Subpartida 01.03.01 "Mitigación Ambiental" es una herramienta de medida y control del Proyecto para control de la calidad de los diferentes factores ambientales afectados. Asimismo, se permitirá garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas contenidas en el Plan de Manejo Socio Ambiental, a fin de lograr la conservación de los recursos naturales y el ambiente, durante la ejecución del Proyecto, de acuerdo a lo especificado en el Plan de Manejo Socio Ambiental.

Se han considerado las siguientes actividades:

Control de emisiones y derrames, con bandeja de plástico
Control de material particulado, usando la malla Raschel


Asimismo, durante el mes de julio se ejecutaron las siguientes actividades:

En el mes de julio 2019 se realizó la capacitación de inducción de la Política de Gestión Integrada.

Se realizó capacitación a los trabajadores de la obra DPA – ACAPULCO, se muestra con las evidencias de fotografía por el ing. SSOMA del Consorcio Zorritos.

Se realizó una capacitación de orden y limpieza dentro de obra, a los trabajadores de la Obra DPA, posteriormente se realizó una limpieza de toda la obra con el apoyo de todos los trabajadores 2 veces por semana.

Se realizó una capacitación a los trabajadores en medio ambiente con los temas:


CONSORCIO ZORRITOS
Ricardo Eugenio Misakaman Cach
ING. ESPECIALISTA EN SSOMA



055

Primeros auxilios al sufrir accidentes dentro de obra, por las enfermeras de la posta del Centro Poblado Acapulco.

Contaminación ambiental.

Campaña de limpieza de toda de toda la obra DPA- Acapulco.

Se realizó la limpieza de los baños químicos 2 veces por semana.

Señalización con carteles de motivación Ambiental.

Se realizó mitigación del polvo regando con agua.

2 PANEL FOTOGRÁFICO



Imagen N°1: En la imagen se aprecia a los trabajadores de la empresa que da servicio de alquiler de baños químicos, realizando limpieza de los mismos.


CONSORCIO ZORRITOS
Ricardo Eugenio M...
ESPECIALISTA EN SSOMA



054



Imagen N° 2 : A la vista de la imagen se aprecia al trabajador realizando la limpieza del baño químico con sus EPP's completos.



Imagen N° 3 : A la vista de la imagen se aprecia a los trabajadores recibiendo una capacitación de CLASIFICACIÓN de los residuos sólidos en la obra DPA-Acapulco.

CONSORCIO ZORRITOS
Richard Eugenio Misuramán Cacho
ESPECIALISTA EN SSOMA



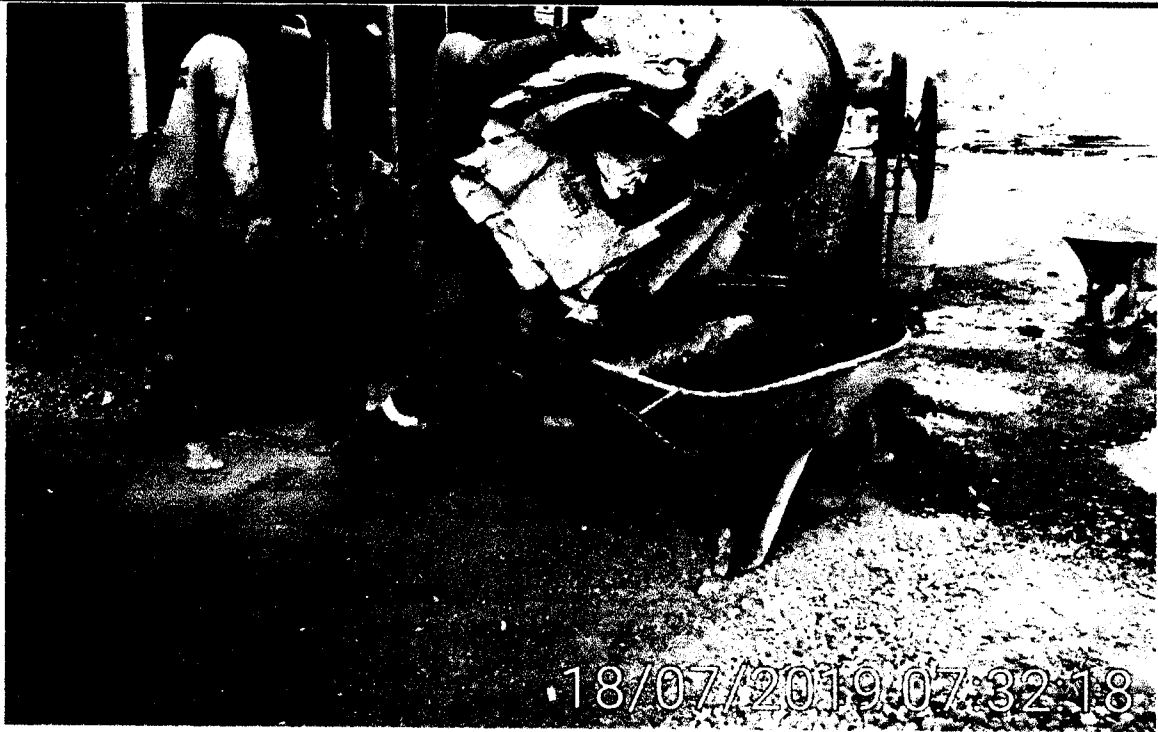


Imagen N°4: A la vista de la imagen se aprecia que el trabajador está retirando los residuos sólidos de la obra al lugar donde se hará la clasificación en los tachos de residuos.



Imagen N°6: A la vista de la imagen se aprecia que el área de los residuos sólidos está señalizada y rotulada de acuerdo a la G050 de construcción Civil.

CONSORCIO ZORRITOS
Eugenio Misopkaman Cach
ESPECIALISTA EN SSOMA


CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
VºBº
Ing. Residente



Imagen N°7: En la imagen se aprecia que en las áreas ingreso de los vehículos a obra se hace mitigación de la polvareda de acuerdo a la G050 de construcción Civil y cuida dar el medio ambiente.



Imagen N°8: A la vista de la imagen se aprecia a un trabajador en el 2do piso. del área de la sección de frío realizando una limpieza total.


CONSORCIO ZORRITOS
ING. RESIDENTE


CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
VºBº
ING. RESIDENTE



Imagen N°9: A la vista de la imagen se aprecia que el botiquín cuenta con los medicamentos básicos de acuerdo a la Norma G050 de Construcción Civil

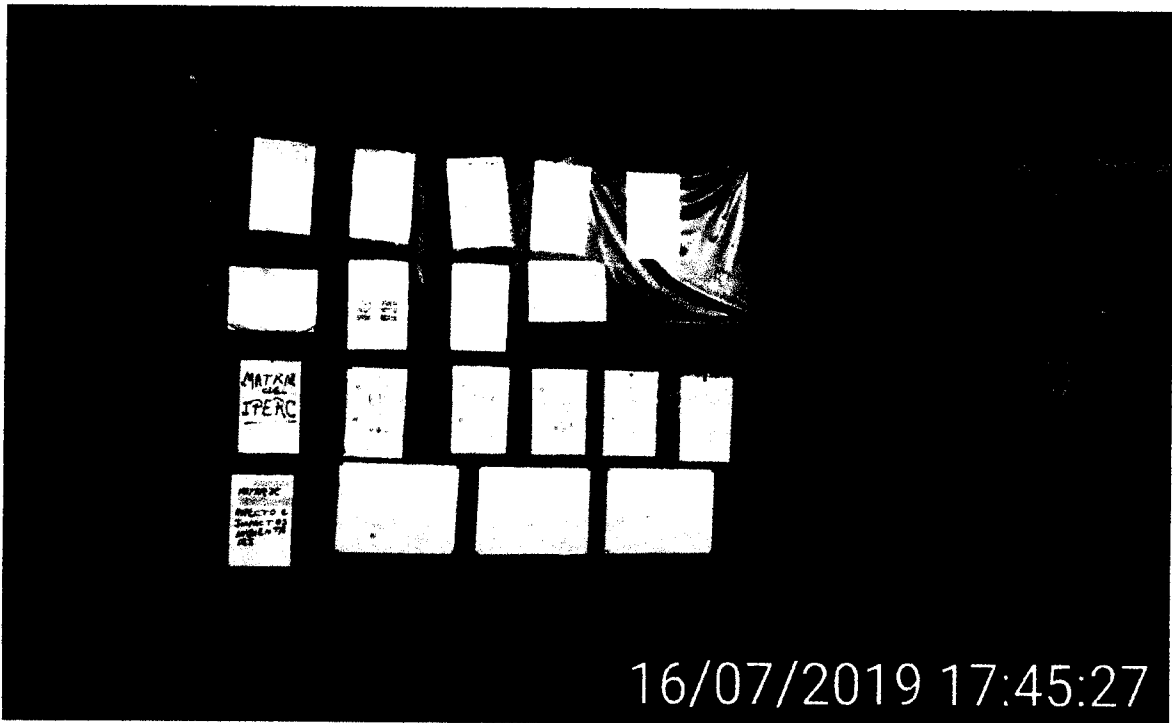


Imagen N°10: En la vista se aprecia al periódico mural donde se muestra el RISSST, Plano de señalización, la Matriz de Riesgos, La matriz de aspectos e impactos ambientales

CONSORCIO ZORRITOS
 Ricardo Eugenio Misabalan Cach
 ESPECIALISTA EN SSOMA

CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
 Vºgº
 Ing. Residente



Imagen N°11: Se observa en la imagen que el SSOMA Ing Ricardo Misahuamán está realizando una capacitación del Método RPC Básico a los trabajadores del consorcio Zorritos en la obra DPA-Acapulco

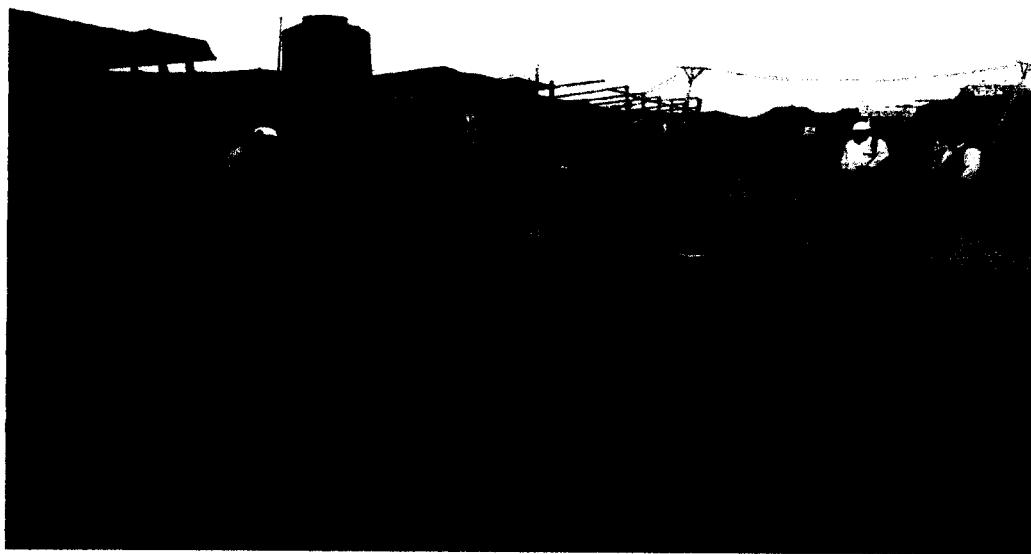


Imagen N°12: Se observa en la imagen que el SSOMA Ing Ricardo Misahuamán está indicando al trabajador de hacer la forma correcta la práctica del RPC mostrando a los trabajadores

CONSORCIO ZORRITOS
 Ricardo Eugenio Misahuamán Cast
 ESPECIALISTA EN SSOMA

CONSORCIO ZORRITOS ACAPULCO
 VºBº
 Ing. Residencia





10 COPIAS DE CARTAS FIANZAS

CARTA FIANZA No. 8907-4

Lima, 26 de julio de 2019

SEÑORES
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
Presente

Carta Fianza No 8907-3
Monto Original
S/ 809,000.00 (OCHOCIENTOS NUEVE MIL CON 00/100 SOLES)
Fecha de vencimiento original: 04 de agosto de 2019
Afianzado:
CONSORCIO ZORRITOS INTEGRADO POR ASPHALT TECHNOLOGIES SAC, PCD
SAC Y CVJ CONTRATISTAS GENERALES S R L
Muy señores nuestros


La presente carta fianza queda extendida hasta: 04 de noviembre de 2019

Los demás términos y condiciones se mantienen vigentes

S/809,000.00

BANCO GNB PERU S.A.


Jenny Tiravanti Ibarra
Administración
Banco GNB Peru


Patricia Arellano Aspilaga
Negocios Internacionales
Banco GNB Peru S.A

CARTA FIANZA No. 9392-3

Lima, 26 de julio de 2019


SEÑORES:
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
Presente


Carta Fianza No 9392-2
Monto Original:
S/ 713,644.00 (SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
CON 00/100 SOLES)
Fecha de vencimiento original: 03 de agosto de 2019
Afianzado:
CONSORCIO ZORRITOS INTEGRADO POR ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C., PCD
SAC Y CVJ CONTRATISTAS GENERALES SRL
Muy señores nuestros:

La presente carta fianza queda extendida hasta: 03 de noviembre de 2019


Los demás términos y condiciones se mantienen vigentes.

BANCO GNB PERU S.A.


Jenny Travençolo
Administración
Banco GNB Perú


Luciana Paredes Aspillaga
Negocios Internacionales
Banco GNB Perú S.A.

S/ 713,644.00%

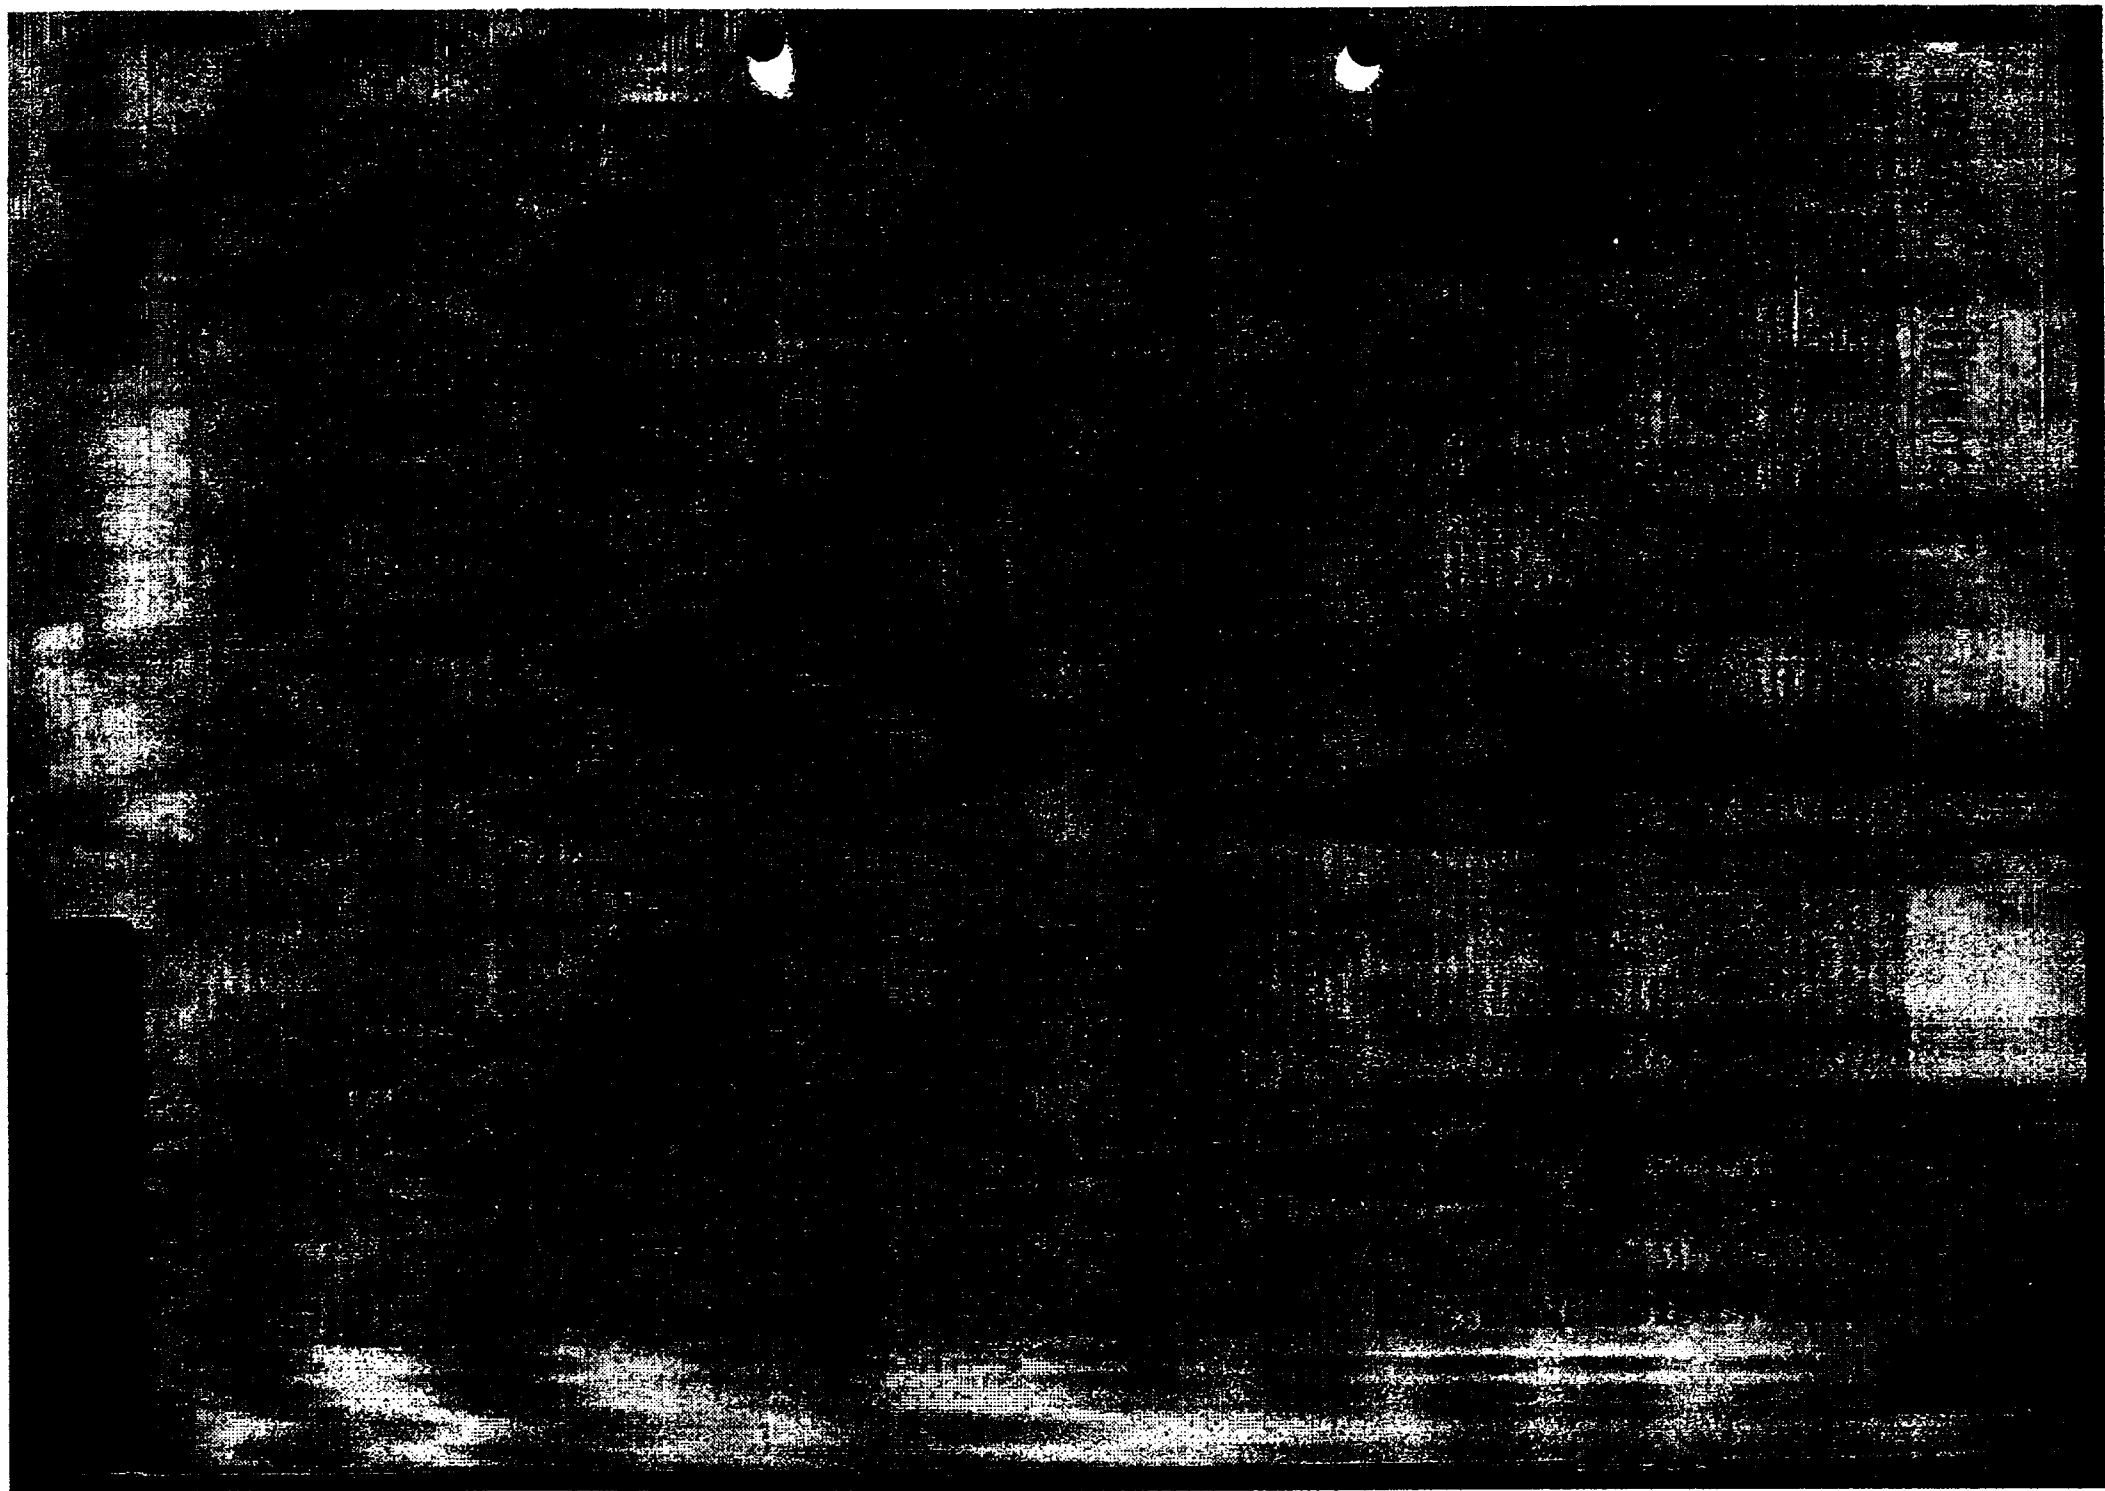

CARTA FIANZA No.9982-2

Lima, 01 de abril de 2019

Señores:
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
Presente.-

De nuestra consideración:

Por la presente nos constituimos en factores de los señores
CONSORCIO ZORRITOS INTEGRADO POR ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C. PCD SAC Y CVI
CONTRALISTAS GENERALES SRL

Hasta por la cantidad de
S/ 713,644.00 (SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100
SOLES)

A fin de garantizar:
GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA LICITACION N° 0005-2017-FONDEPES: MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DEL DESMARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO,
DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES.

La fianza que otorgamos tiene el carácter de provisoria, irrevocable, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusión, de realización automática y a solo requerimiento del beneficiario, estará vigente desde el día 03 de abril de 2019, y vencerá indistintamente el día 03 de agosto de 2019 a las 16:00 horas.

De requerirse la prórroga de esta Carta Fianza, será facultad y no obligación de nuestro banco, conceder tal prórroga.

La presente fianza podrá hacerse efectiva únicamente hasta por el monto arriba indicado en nuestra oficina principal sito en Jr. Carabaya N° 891, Cercado de Lima, por el solo hecho de su solicitud enviada vía notarial, la misma que deberá contener su solo requerimiento de pago y/o su indicación de que se ha producido el incumplimiento de la obligación garantizada por parte de nuestro afianzado. Asimismo, se deberá indicar obligatoriamente el monto a pagar. De no señalarse dicho monto, se entenderá que el requerimiento es por la suma total. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe, se entenderá que ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aún cuando el plazo de vencimiento y/o de ejecución de esta fianza no hubieren vencido.

El pago de cualquier suma bajo esta fianza será realizado mediante la entrega de cheque de garantía emitido a la orden del beneficiario, a la persona que se indique en la continuación mencionada en el párrafo anterior. El respectivo cheque de garantía se pondrá a su disposición en nuestro domicilio previamente indicado, debiendo para ello devolvernos el ejemplar original de la presente carta fianza así como el de todas sus prórrogas y/o modificaciones, de ser el caso.


Queda expresamente establecido que esta Carta Fianza no podrá ser utilizada como respaldo en operaciones de préstamos de dinero comprendidas en la prohibición que consagra el Artículo 217°, inciso 5, de la Ley No. 28702, Ley General del Sistema Financiero.


Toda obligación del banco con respecto a esta garantía cesará dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la practicada fecha de vencimiento, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 159° del Código Civil. Si el requerimiento de pago se produce en dicho período de 15 días, éste deberá ser efectuado de acuerdo a las disposiciones de la norma antes citada.

La presente fianza se rige por las leyes de la República del Perú. Cualquier controversia respecto a la misma se someterá exclusivamente a los jueces y tribunales de la ciudad de Cercado de Lima, Perú.

Atentamente,

BANCO GNB PERU S.A.


Jenny Travençolo
Administradora
Banco GNB Perú


Melissa Paredes Aspilaga
Negocios Internacionales
Banco GNB Perú S.A.

044

CARTA FIANZA No. 8907-3

Lima, 06 de Marzo de 2019



Señores:
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
Presente.-

De nuestra consideración:

Por la presente nos constituimos en fiadores de los señores
CONSORCIO ZORRITOS INTEGRADO POR ASPHALT TECHNOLOGIES SAC, PCD SAC Y CVJ
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.Hasta por la cantidad de
S/ 809,000.00 (OCHOCIENTOS NUEVE MIL CON 00/100 SOLES)A fin de garantizar:
GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA N° 0005-2017-FONDEPES:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA
LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR,
REGION TUMBES.La fianza que otorgamos tiene el carácter de solidaria, irrevocable, incondicional, indivisible, sin beneficio de
excusión, de realización automática y a solo requerimiento del beneficiario, estará vigente desde el día 07 de
Marzo de 2019, y vencerá indefectiblemente el día 04 de Agosto de 2019 a las 18:00 horas.De requerirse la prórroga de esta Carta Fianza, será facultad y no obligación de nuestro banco, conceder tal
prórroga.La presente fianza podrá hacerse efectiva únicamente hasta por el monto arriba indicado en nuestra oficina
principal sito en Jr. Carabaya N° 891, Cercado de Lima, por el solo mérito de su solicitud enviada vía notarial, la
misma que deberá contener su solo requerimiento de pago y/o su indicación de que se ha producido el
incumplimiento de la obligación garantizada por parte de nuestro afianzado. Asimismo, se deberá indicar
obligatoriamente el monto a pagar. De no señalarse dicho monto, se entenderá que el requerimiento es por la
suma total. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe, se entenderá que ustedes renuncian a todo
pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aún cuando el plazo de vencimiento y/o de
ejecución de esta fianza no hubieren vencido.El pago de cualquier suma bajo esta fianza será realizado mediante la entrega de cheque de gerencia emitido a
la orden del beneficiario, a la persona que se indique en la comunicación mencionada en el párrafo anterior. El
respectivo cheque de gerencia se pondrá a su disposición en nuestro domicilio previamente indicado, debiendo
para ello devolvernos el ejemplar original de la presente carta fianza así como el de todas sus prórrogas y/o
modificaciones, de ser el caso.Cualquier cesión de los derechos que adquiere el beneficiario en virtud de la presente fianza deberá ser previa y
expresamente aceptada por escrito por nuestro banco. Caso contrario, dicha cesión carecerá de efecto alguno
con respecto a nosotros.Queda expresamente establecido que esta Carta Fianza no podrá ser utilizada como respaldo en operaciones
de préstamos de dinero comprendidas en la prohibición que consagra el Artículo 217°, Inciso 5, de la Ley No.
26702, Ley General del Sistema Financiero.Toda obligación del banco con respecto a esta garantía cesará dentro de los quince (15) días calendario
siguientes a la precitada fecha de vencimiento, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1898° del Código
Civil. Si el requerimiento de pago se produjera en dicho período de 15 días, éste deberá ser efectuado de
acuerdo a las disposiciones de la norma antes citada.La presente fianza se rige por las leyes de la República del Perú. Cualquier controversia respecto a la misma se
someterá exclusivamente a los jueces y tribunales de la ciudad de Cercado de Lima, Perú.

Atentamente,

BANCO GNB PERU S.A.

Jenny Tiravanti Ibarra
Administración
Banco GNB Perú
Melissa Parades Aspilaga
Negocios Internacionales
Banco GNB Perú S.A.

11 PLANILLA, PDT, SEGUROS, POLIZAS SCTR Y OTROS SEGÚN CONTRATO



**11.1 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – SALUD Y
PENSIÓN**

San Isidro, 31 de Julio del 2019

CONSTANCIA N° 3251734

Señores
CONSORCIO ZORRITOS
 Presente.-

Ref.: **SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – SALUD Y PENSION**

Estimados Señores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha incluido la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Agosto del 2019 al 31 de Agosto del 2019 correspondiente a:

CONTRATO N° **86091** en SALUD y,
POLIZA N° **62059890** en PENSION

para la siguiente relación de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. DOCUMENTO	INICIO DE COBERTURA
000001	ACUÑA HUAMAN ROBERTO ERASMO	10696203	01 de Agosto del 2019
000002	ACUÑA MEZA RICARDO	15845539	01 de Agosto del 2019
000003	ALAYO SAMAN EMILIO	18043248	01 de Agosto del 2019
000004	ALEMAN CARLIN EGO RAMIRO	44252920	01 de Agosto del 2019
000005	ALVARADO RIOS JOSE FRANCISCO	00214000	01 de Agosto del 2019
000006	ALZAMORA NOEL JONY IVAN	44556999	01 de Agosto del 2019
000007	ANCAJIMA PEREZ LUIS ANTONIO	32981640	01 de Agosto del 2019
000008	ANCAJIMA PEREZ RICHARD MIGUEL	41251291	01 de Agosto del 2019
000009	BASTARDO JOEL ISAI	19774953	01 de Agosto del 2019
000010	BERMEO CARRANZA AVELINO	03378617	01 de Agosto del 2019
000011	BLANCO CAMPELO JEISON MIGUEL	25322298	01 de Agosto del 2019
000012	BLANCO CAMPELO JOSE MIGUEL	22352959	01 de Agosto del 2019
000013	BRUNO IPANAQUE JOSE ANGEL	41475704	01 de Agosto del 2019
000014	BRUNO IPANAQUE JOSE JUAN	80667305	01 de Agosto del 2019
000015	CABANILLAS CUEVA JHONNY	43930854	01 de Agosto del 2019
000016	CARMEN NORIEGA CESAR AUGUSTO	03878215	01 de Agosto del 2019
000017	CHACOA MORILLO WILLIAM JESUS	18728128	01 de Agosto del 2019

000018	CHAPOÑAN ACOSTA BALTAZAR ORLANDO	42558149	01 de Agosto del 2019
000019	COLMENARES ROJAS LEONARDO ALEXANDI	15387831	01 de Agosto del 2019
000020	CRUZ CHINCHAY CESAR	44460440	01 de Agosto del 2019
000021	CRUZ DIAZ LELIS	44758029	01 de Agosto del 2019
000022	CRUZ HERRERA FERNANDO	07872169	01 de Agosto del 2019
000023	DAVILA NUÑEZ JOEL JULIO	00118058	01 de Agosto del 2019
000024	FLORES QUISPE JOSE LEONARDO	48393586	01 de Agosto del 2019
000025	GARCIA TENAZOA DANIEL ANGEL	40977908	01 de Agosto del 2019
000026	GENNELL ZAPATA JOSE LUIS	46743815	01 de Agosto del 2019
000027	GONZALEZ HUAMAN NELSON JOEL	47965361	01 de Agosto del 2019
000028	GONZALEZ LOPEZ FREDDY	0779448386	01 de Agosto del 2019
000029	GUERRA LEON RUCINE	00328223	01 de Agosto del 2019
000030	HEREDIA ESPINOZA ELVIS JHONATHAN	44910712	01 de Agosto del 2019
000031	HERRERA RIOFRIO PEDRO PABLO	48526383	01 de Agosto del 2019
000032	HUAMANI VEGA ADOLFO MOISES	70333271	01 de Agosto del 2019
000033	HUIMA JUAREZ ALEXIS EDUARDO	76424600	01 de Agosto del 2019
000034	HUIMA SILVA HUMBERTO	17542880	01 de Agosto del 2019
000035	INGA JAIME ELVIS MANUEL	48392098	01 de Agosto del 2019
000036	JABO MOROCHO VICTOR JHONATHAN	47229851	01 de Agosto del 2019
000037	LAMA RUMICHE LUIS GUSTAVO	77347145	01 de Agosto del 2019
000038	MACHOA OBANDO GEISER	40375160	01 de Agosto del 2019
000039	MEDINA CARRILLO GILMER JOEL	44262566	01 de Agosto del 2019
000040	MISAHUAMAN CACHI RICARDO EUGENIO	17875280	01 de Agosto del 2019
000041	NILUPU ROMERO ALDO PAUL	41351282	01 de Agosto del 2019
000042	NORABUENA PEREZ JOSE ENRRIQUE	32854162	01 de Agosto del 2019
000043	ORCON AVILES GREGORIO DAVID	44879927	01 de Agosto del 2019
000044	PANTA PRADO MANUEL	00252465	01 de Agosto del 2019
000045	PAREDES PERALTA PEDRO ANDRI	47781454	01 de Agosto del 2019
000046	PAUCAR ABAD JIMMY ALEXANDER	03684682	01 de Agosto del 2019
000047	PAZO AMAYA ANGEL	00328717	01 de Agosto del 2019
000048	RAMIREZ VALLES TERCERO ALBERTO	00908439	01 de Agosto del 2019
000049	RAMOS OLIVOS CHRISTIAN DENIS	46780840	01 de Agosto del 2019
000050	RAMOS RAMOS JAVIER	43475603	01 de Agosto del 2019
000051	REGALADO OBLITAS EDGAR FERNANDO	09074975	01 de Agosto del 2019
000052	REYES CUNYARACHE LENISS JOHAN	72531447	01 de Agosto del 2019

000053	RUGEL TORRES EDWARD WLADIMIR	46416300	01 de Agosto del 2019
000054	SABA QUEVEDO FRANCO DANILO	47755375	01 de Agosto del 2019
000055	SEVILLANO DIAZ VICTOR MANUEL	32839513	01 de Agosto del 2019
000056	SIANCAS ESPINOZA GERMAN	02647108	01 de Agosto del 2019
000057	SOLORZANO LOZANO ENRIQUE ZACARIAS	80556706	01 de Agosto del 2019
000058	TISNADO PILCO ALEXIS YAMIL	43257851	01 de Agosto del 2019
000059	TORIBIO SOLIS JULIO CESAR	09927767	01 de Agosto del 2019
000060	VASQUEZ PEREZ ALFREDO NEMESIO	32920364	01 de Agosto del 2019
000061	VILCHEZ REYES ERICK EDISON	75084450	01 de Agosto del 2019
000062	VILCHEZ REYES JORGE JOSSEP	48251226	01 de Agosto del 2019
000063	VILCHEZ SOSA JORGE LUIS	05642084	01 de Agosto del 2019
000064	YERBASANTA CARHUAYANO JESUS MAURO	80280846	01 de Agosto del 2019
000065	ZAPATA AVILA JUAN CARLOS	47139252	01 de Agosto del 2019

Sin otro particular , quedamos de ustedes

Atentamente,

CARLOS SILES
GERENTE

ANGEL ARMIÑO HIDALGO
GERENTE



12 ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

Nº 06





FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de los Servicios del DPA
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: Fondecpes

Asiento N° 702 de LA SUPERVISIÓN - 30/06/2019.

LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DEJA CONSTANCIA QUE EL DÍA DE HOY VENCIO EL PLAZO CONTRACTUAL VIGENTE CON LA ÚLTIMA AMPLIACIÓN DE PLAZO (N° 06) OTORGADA POR LA ENTIDAD CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 095-2019-FONDECPS/EG Y QUE MEDIANTE EL ASIENTO N° 693 DEL CONTRATISTA, SOLICITO EL 27 DE JUNIO DE 2019 LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR MODIFICACIONES EN LOS PISOS DEL PRIMER NIVEL Y PAVIMENTOS, ESTANDO LA SUPERVISIÓN DE OBRAS A LA ESPERA DEL SUSTENTO DE LA MISMA PARA SER EVALUADA Y EMITIR INFORME DE OPINIÓN A LA ENTIDAD.

LA SUPERVISIÓN DE OBRAS INVOKA UNA VEZ MAS AL CONTRATISTA PARA QUE TOMA LOS MEDIDOS NECESARIOS PARA CONTAR CON EL PERSONAL REQUERIDO Y LOS INSUMOS NECESARIOS PARA TENER UN AVANCE DE OBRA MEJOR QUE EL OBTENIDO EN EL MES DE JUNIO Y PUEDA CONCLUIR LA OBRA DENTRO DE LOS PLAZOS COMPROMETIDOS.


ING. ALBERTO DOMINGOS TORIATI
CONSORCIO SUPERVISORIOS
JEFE DE SUPERVISIÓN


CONSORCIO ZORBITOS

CONTRATISTA
JEFE DE OBRA


Asiento N° 703, del Contratista

01/07/2019

Dejamos constancia que en la fecha de hoy 01/07/19 hemos

INSPECTOR

CONSORCIO ZORBITOS

CONTRATISTA
JEFE DE OBRA


ING. ALBERTO DOMINGOS TORIATI
CONSORCIO SUPERVISORIOS
SUPERVISOR

Grafiosa

CUADERNO DE OBRA

n° 06



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de los servicios de agua potable
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: Fundpes.

→ VIENEN...

Remitido a la Entidad, nuestra carta CZ-051-2019/ACAPULCO, mediante la cual, en respuesta a la carta N° 730-2019-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 27/06/19, precisamos que los detalles que nos remitieron junto al documento en mención, corresponden a los detalles de un pescaute de $W = 4000 \text{ kg}$, en vez de remitirnos los detalles del pescaute de $W = 500 \text{ kg}$, que hemos solicitado; motivo por el cual, dicha consulta del pescaute de 500 kg permanece sin resolverse.

ING. RUBEN BOBBIO TOSIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISOR

CONSORCIO ZORRITOS
OSCAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
JEFE REPRESENTANTE DE OBRA

Ciudad N° 704, del Contratista 02/07/2019
Dejamos constancia que adjunto a nuestra carta CZCA 048-2019/ACAPULCO, de fecha 30/06/19, entregamos a la supervisión de obra nuestro expediente de valoración de Costo General, por la ampliación de plazo N° 06 por revisión y trámite de pago correspondientes.

ING. RUBEN BOBBIO TOSIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISOR


CONSORCIO ZORRITOS
OSCAR FERNANDO REGALADO OBLITAS
JEFE REPRESENTANTE DE OBRA

INSPECTOR

Grafiresa

CUADERNO DE OBRA

Nº 06



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de las servicios de
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: Fondepas

Cuando Nº 705, del Contratista 02/07/2019

Dejando constancia que al día de ayer 01/07/19
hecho entregado a la supervisión de obra los
medios recientemente ejecutados en el mes de junio
2019, para revisión y trámite de pago correspondiente,
de acuerdo al siguiente detalle:

- Con carta Nº 049-2019/AEPULCO, Valorización Principal de obra Nº 19.
- Con carta Nº 050-2019/AEPULCO, Valorización Nº 07 del edicendo Nº 03.
- Con carta Nº 051-2019/AEPULCO, Valorización Nº 01 del edicendo Nº 04.

Expedientes presentados en original, tres copias y en formato archivo digital, por cada uno de ellos.

CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS
JEFE DE OBRA

Cuando Nº 706 del Contratista 02/07/2019

Con respecto de lo señalado por la supervisión de obra en el último párrafo del cuando Nº 702 del 30/06/2019, reiteramos lo manifestado en el cuando Nº 701 del 29/06/2019, en todos sus extremos,

INSPECTOR

CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION


→ VAN...

CONSORCIO ZORRITOS
JEFE DE OBRA

Grafiresa

CUADERNO DE OBRA


Nº 06




FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de las servidumbres del DPA de Zorritos
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: Fondapes


→ VIGENCIA . . .


Así mismo reiteramos nuestra invocación para que la supervisión de obra interponga sus buenos oficios ante la Entidad, para que atienda a la brevedad posible las consultas pendientes, con el fin de evitar se siga afectando a la obra y a nuestro consorcio.


ING. RUBEN BOBOS TONIATTO
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION


CONSORCIO ZORRITOS
EDGAR FERNANDO SALAS OOBLITAZ
JEFE RESERVISTA DE OBRA


Asiento Nº 707, del Cuadro de Obra. 03/07/2019
Dejamos constancia que con fecha de ayer 02/07/19 adjunto a nuestra carta C70A-052-2019/PCARULCO, entregamos a la Supervisión de Obras, el original, tres copias y CD conteniendo el archivo digital, nuestro expediente de Informe Mensual del mes de junio 2019.



ING. RUBEN BOBOS TONIATTO
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION


CONSORCIO ZORRITOS
EDGAR FERNANDO SALAS OOBLITAZ
JEFE RESERVISTA DE OBRA

ASIENTO N° 707. DE LA SUPERVISIÓN - 03/07/2019
LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DEJA CONSTANCIA QUE EL DIA DE AYER

INSPECTOR



CONSORCIO ZORRITOS
EDGAR FERNANDO SALAS OOBLITAZ
JEFE RESERVISTA DE OBRA


ING. RUBEN BOBOS TONIATTO
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

Grafirasa

CUADERNO DE OBRA

Nº 06



FECHA:

MODALIDAD:

OBRA: Mejoramiento de las Aterrizajes del MPA Cepi. P. 1999

PROYECTO:

PROGRAMA:

ENTIDAD EJECUTORA: F. m. d. o. p. e. g.

HA ENTREGADO A FONDOPES LA CARTA CSTA. 115501.265.19 CON EL INFORME DE OPINIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE PLASTIFICACION ADICIONAL POR MODIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS, OBRAS DE CONCRETO ARMADO, PAVIMENTO DE ALTO RESISTENCIA, LOSA DE CONCRETO ESTOPOZADO = 315 kg/cm² y JUNTAS EN PATIO DE REDES, PASAJE EXTERNO Y PATIO DE DESCARGAS PRODUCTOS HIDROLOGICOS, DE ACUERDO ALA AUTORIZACION EFECTUADA EN EL ASIENTO Nº 698 DEL CUADERNO DE OBRAS.

DR. ENRIQUE ZORBITOS
CONSEJO SUPERVISOR TUBILES
JEFE DE SUPERVISION

ENRIQUE ZORBITOS
CONSEJO SUPERVISOR TUBILES
JEFE DE SUPERVISION DE OBRAS


ASIENTO Nº 709 - De la SUPERVISION DE OBRA - 04/02/2019.
LA SUPERVISION DE OBRA DEJA CONSTANCIA QUE EL DIA DE ~~AYER~~ SE REINICIARON LAS LABORES EN LAS OBRAS DE MAQUINARIA CON EL INGRESO DE LOS TAMA BAJADORES QUE VIVEN DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES DE DICHAS OBRAS Y QUE MANTENIENDO UNA PLANIFICACION POR FALTA DE PAGO EN SUS REMUNERACIONES DESDE EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019, SITUACION QUE FUE AUTORIZADA EN LOS ASIENTOS EN CUADERNO DE OBRA Nº 682, 686, 689 Y 699. DEJO CONSTANCIA TAMBIEN DE ESTA PLASTIFICACION DE LEGISLACION AFECTANDO EL AVANCE DE LAS OBRAS DE MANERA QUE CONTINUAN ATRASADAS Y LO PERMITE CONTINUAR AUN CON EL VACIADO

CONSEJO SUPERVISOR TUBILES
CONSEJO SUPERVISOR TUBILES
JEFE DE SUPERVISION

CONSEJO SUPERVISOR TUBILES
CONSEJO SUPERVISOR TUBILES
JEFE DE SUPERVISION
Prof. *[Firma]*

CUADERNO DE OBRA

nº 06



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de las bodegas de la DPA
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: Fundepes

De las losas in situ del Cabezo del Muelle, restándose
asimismo todas las actividades posteriores como lo son
el piso de la losa del puente y muelle y el sistema de
defensa fundamentalmente.

EL TOTAL DE TRABAJADORES QUE LABORAN EL DIA DE HOY
E OBRAS ES DE 45 OBREROS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE
FORMA

OBRAS DE MAR

01 OPERADOR DE GRUA

06 OPERARIOS DE MOLICION CABEZO DE MUELLE

02 OFICIALES Y 01 AYUDANTE EN PREFABRICADOR

OBRAS EN TIERRA

01 OPERARIO Y 03 AYUDANTES EN PATIO DE MANIOBRAS (AFIRMADO)

02 AYUDANTES EN EL CAUCCO EDIFICIO DE FRÍO

01 OPERARIO Y 01 AYUDANTE EN TALLER EDIFICIO DE FRÍO,

01 OPERARIO Y 01 AYUDANTE EN FRAGUA DE LA DALLA PASTELERA
EN TERCER DE TAREAS PLUVIALES

05 OPERARIOS PINTORES Y 02 AYUDANTES EN ADMINISTRACIÓN
Y DE INSPECCION Y ENTENDE TAREAS PLUVIALES

02 OPERARIOS Y 02 AYUDANTE EN MONTANTES DE DRENAJE
PLUVIAL EN ADMINISTRACIÓN Y TAREAS PLUVIALES

02 OPERARIO PIEDRERO, 02 OPERARIOS CARPINTEROS, 01 CARPATER
Y 07 AYUDANTES EN P.T.A.R.

INSPECTOR


CONDOMINIO ZORRITOS
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
1195 BARRIO DE LOS ZORRITOS

ROBERTO ROBERTO TORRES
SUBJELO SUPERVISOR TUMBES
TAREAS DE SUPERVISIÓN

Grafirasa

CUADERNO DE OBRA

Nº 06





FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de las servicios del DPA
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: Fondepes

Asiento Nº 709. De la Supervisión - 05/07/2019

LA SUPERVISIÓN DE OBRAS INFORMA QUE EL DÍA DE HOY HA ENTREGADO A FONDEPES LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS,

- CARTA EST. 175.501.266.19 CON INFORME DE VALORIZACIÓN Nº 01 DE PRESTACIÓN ADICIONAL Nº 04
- CARTA CST. 175.501.267.19 CON INFORME DE VALORIZACIÓN Nº 07 DE PRESTACIÓN ADICIONAL Nº 03
- CARTA CST. 175501.268.19 CON INFORME DE VALORITACION MENSUAL DE OBRAS Nº 18 - JUNIO 2019
- CARTA EST. 175501.269.19 CON INFORME MENSUAL DE LA SUPERVISIÓN
- CARTA CST. 175501.270.19 CON INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA
- CARTA CST. 175501.271.19 CON VALORACION DE MAYORES GASTOS GENERALES POR APLICACION PLAZO PARCIAL PRESTACION ADICIONAL Nº 06



ING. ESTEBAN BOGOS TORRES
CONDOMINIO JURADO TORRES
JEFE DE SUPERVISOR



CONDOMINIO TORRES
CONDOMINIO JURADO TORRES
ING. RESPONSABLE DE OBRAS

Asiento Nº 710. DE LA SUPERVISIÓN - 06/07/2019.

LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEJA CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO LA CARTA C20A 053-2019/A COPULA CON EL LISTADO DE MATERIALES REGENTEMENTE INGRESADOS A OBRA NUESTRA CARTA CST. 175501.244.18 ENTREGADA AL CONTRATISTA SE REFERIA A LA ENTREGA DEL CALENDARIO DE ADQUISICIÓN

INSPECTOR



CONDOMINIO TORRES
CONDOMINIO JURADO TORRES
ING. RESPONSABLE DE OBRAS


CONDOMINIO TORRES
CONDOMINIO JURADO TORRES
ING. RESPONSABLE DE OBRAS

Grafirasa

CUADERNO DE OBRA

Nº 06



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de las servicias del DPA de Yaguajay
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: Fundepes

VIENE

De MATERIALES, NECESARIO CONOCER POR CUANTO SIN EL SE
DESCONOCER SI LOS MATERIALES FALTANTES COMO POR EJEMPLO
TUBOS Y TABLEROS ELÉCTRICOS ENTRE OTROS LLEGARON O POR
TUMAMENTE A OBRA PARA PODER CUMPLIR CON EL CALENDARIO
PRESENTADO POR EL CONTRATISTA PARA LA CULMINA
CIÓN DE LAS OBRAS, POR LO QUE REITERAMOS UNA VEZ
MÁS LA NECESIDAD DE TENER DICHO CALENDARIO EN
DONDE SE CONSIGUE LA LLEGADA DE LOS INSUMOS FALTANTES
QUE SE ESPERA PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE LOS FRENTES
DE OBRAS ABIERTOS COMO ES EL CASO DEL ACABADO
CON POR COLONAR EN PISOS Y MUROS, Y LOS INSERTOS
PARA SISTEMA DE DEFENSA QUE DEBEN IR EMBEBIDOS
EN EL CONCRETO DEL CABEZO DEL MUELLE PRÓXIMO
A EMBESAR Y DE ESTA FORMA NO SEGUIR RETRASANDO EL
DESARROLLO DE LAS OBRAS

ING. RUBÉN BOGGIO TOMATTI
CONSEJO SUPERIOR TÉCNICO
SUPERVISOR

EDIER P. GONZÁLEZ
ING. EN INGENIERÍA CIVIL
SUPERVISOR DE OBRA

Decreto Nº 711 del Constituyente 08/07/2019
Dejamos constancia que con fecha 05/07/2019, entregamos
a la supervisión de obra nuestra carta C 70A-054-

INSPECTOR


EDIER P. GONZÁLEZ
ING. EN INGENIERÍA CIVIL
SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBÉN BOGGIO TOMATTI
CONSEJO SUPERIOR TÉCNICO
SUPERVISOR

Grafirosa

CUADERNO DE OBRA

Nº 06



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de las servidumbres del DPA
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: Forclapes.

→ VIENEN...

2019/AEA PULCO, en respuesta a la solicitud del Plan de Trabajo realizado por la supervisión de Obra, manifestándole que "... hasta la fecha no es posible hacerle llegar el Plan de Trabajo Solicitado, toda vez que, a pesar del plazo transcurrido, la Entidad no cumple con atender las observaciones pendientes y, en consecuencia, continúa operando el plazo y el término de obra y, por tal razón, no es posible establecer un Plan de Trabajo como el solicitado, al no tener fecha cierta de término de obra, así como debido a la imposibilidad de programar los trabajos de los partidos que por la razón expuesta, ya pueden ejecutarse...".

GEORCIO ZORRITOS
Georcio Zorritos
INGENIERO EN OBRAS
CIVIL

Asiento N° 712, El Controlista 10/07/2019
Asunto: Reiteramos consulta de piso y pavimentos de DPA Acapulco.

Nuevamente debemos insistir en nuestra solicitud para que la supervisión interponga sus buenos
→ VAN...

INSPECTOR


GEORCIO ZORRITOS
Georcio Zorritos
INGENIERO EN OBRAS
CIVIL

SUPERVISOR

Grafinsa

CUADERNO DE OBRA

nº 06



FECHA: _____

MODALIDAD: _____

OBRA: Mejoramiento de los servicios del DPA Coopulca

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: Fonlepes


→ VIVENA...


oficios ante la Entidad, con el fin de que, en atención a nuestro consejo No 261 de 07/09/18 referida a los pisos del DPA Coopulca y a los portidos comprometidos con los cambios que los veredes realizando, entre los cuales menciono a continuación los siguientes:

- Modificación de los puntos de los patios de redes, porojos externos y desemborques de productos microbiológicos.
- A fin de los observaciones que heeun recibido a la compatibilización del Plano EE-01, indicando los puntos de los cuolatos del Plano 15-11
- Asimismo recibiendo de la Entidad, los detalle solicitudes de los bordenales ubicados en el patio de manabres y los patios veredes circundantes.
- Se han modificado los afijados y los interiores del edificio administrativo de manabres a veredes
- También se han modificado los afijados especificados de los ambientes de Torres Bravas y de Frío, siendo que no existe la portada de

→ VAN.

INSPECTOR



INSTRUMENTOS DE TRABAJO
COMUNIDAD DE TRABAJO


ING. ARDEN DOMINGUEZ TORRES
COMUNIDAD DE TRABAJO
JEFE DE SUPERVISIÓN

Grafirasa

CUADERNO DE OBRA

nº 06




FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de los servicios del OPA
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: Fundapes


→ VIGEN ...

ARMADO $H=0.30$ m PARA INTERIORES, de modo de reemplazar la partida inicial 01.05.06 ARMADO $H=0.15$ m EN INTERIORES, según la modificación.


- En los pesos de Patín de Rodas, pasaje exterior y de drenaderos de pederchas hidrobiológicas, se ha certificado también la especificación de la partida genérica de "CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA (CONMIX)", por la partida genérica de CONCRETO ARMADO.


- A la fecha no hemos recibido los detalles, solicitudes, de los pesos en los espesores de los mismos cascos, respectivamente acabeles. Por ello, es importante que la Entidad proceda con los adicionales y deducciones, relacionados con las modificaciones requeridas, en concordancia con lo establecido en el Artículo 34 de la Ley y Artículo 175 de su Reglamento, con el fin de lo antes posible la ejecución de los mismos.


INSTRUMENTO DE SERVICIO
SECRETARÍA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO REGIONAL PIURA


SERVICIO TORBITOS
GOBIERNO REGIONAL PIURA
Ingeniería Civil

INSPECTOR


SECRETARÍA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO REGIONAL PIURA


SECRETARÍA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO REGIONAL PIURA

Grafirasa

CUADERNO DE OBRA

Nº 06



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de los servicios de C.D.P.A. de
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: F. de Lorez

Asiento Nº 713. De la supervisión. 10/07/2019.

Respecto de la anotación efectuada por el contratista en el Asiento Nº 711, la supervisión de obras manifiesta al respecto que, el plan de trabajo solicitado por diferentes medios (Cuaderno de obra, Actas de reunión, cartas emitidas al contratista) tiene por objeto no solamente saber el tiempo para la ejecución, el mismo que se detalla en los calendarios de obra sino también, lo que es de suma importancia, conocer los recursos con que cuenta o contará el contratista para la ejecución de los trabajos (mano de obra, equipo y materiales) como así también las etapas de ejecución de los trabajos.

El contratista debió haber entregado su plan de trabajo y si este no se ha podido cumplir lo puede justificar con restricciones que por causas ajenas a su voluntad, lo cual tiene todo el derecho a manifestarlo a través de este medio u otro como cartas o actas de reunión de obra.

ING. RUBÉN BOSCUS TORIATTI
CONSEJO DE SUPERVISIÓN TUBOS
SUPERVISOR

CONSTANZA ZORRITOS
INGENIERA EN CALIDAD DE OBRAS
SUPERVISORA DE OBRAS

Asiento Nº 714. De la supervisión. 11/07/2019

La supervisión de obra informa al contratista que

INSPECTOR

CONSTANZA ZORRITOS
INGENIERA EN CALIDAD DE OBRAS
SUPERVISORA DE OBRAS


ING. RUBÉN BOSCUS TORIATTI
CONSEJO DE SUPERVISIÓN TUBOS
SUPERVISOR

Grafirasa

02

CUADERNO DE OBRA

51006



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de las condiciones del DPA de Acapulco
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: Fundepes.

VIENE
CON FECHA 09 DE JULIO DE 2019 HA ENTREGADO A BUJEPER LA COLTA EST. 175501 242.19 SOBRE LA CONSULTA DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS SOBRE LA INSUFICIENCIA DEL PUNTO DE ENTREGA (DESCARGO DE RESIDUOS) DE LA TUBERIA DEL APOCALUVA UBICADO EN EL PATIO DE MANIBANES DEL DPA ACAPULCO.

ASIMISMO DEJA CONSTANCIA QUE EL DIA 07 DE JULIO HA ENTREGADO AL CONTRATISTA LA CARTA EST. 175501. 243.19, CON LA CUAL SE RESPUESTA A LA CARTA EST. 057 2019/ACAPULCO, DANDO CUMPLIMIENTO A LA FICHA TÉCNICA DEL BIODIGESTOR DE 7000 LT, SIEMPRE QUE EL MISMO CUMPLA LA CAPACIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO A FIN DE QUE SEA APLICABLE EN EL DPA ACAPULCO.

GONZALO ZORRILLOS
ENCARGADO DE OBRAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

GONZALO ZORRILLOS
ENCARGADO DE OBRAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ASIENTO N° 715. DE LA SUPERVISIÓN - 11/07/2019.
RESPECTO DE LO ANOTADO POR EL CONTRATISTA EN EL ASIENTO N° 712, LA SUPERVISIÓN DE OBRA MANIFIESTA QUE VIENE LE TENIENDO LAS CONSULTAS QUE SE SEÑALAN EN DICHO ASIENTO ESTANDO A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DE D. PROBABEIN DAR LA RESPUESTA CUI ADICIONAL N° 06

GONZALO ZORRILLOS
ENCARGADO DE OBRAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

GONZALO ZORRILLOS
ENCARGADO DE OBRAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

INSPECTOR

024

Graficosa

CUADERNO DE OBRA

Nº 06



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de los servicios del DPA
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: Fondepes

ASIENTO Nº 716 - De LA SUPERVISIÓN - 12/07/2016

LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DE SA CONTANCIA QUE EL 09/07/2019 HA ENTREGADO AL CONSORCIO ZORRITOS LA CARTA EST. 175501. ED. 274.19 SOBRE LA PENALIDAD A LA QUE ES PASIBLE APLICAR POR PARTE DE LA ENTIDAD POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE GRUPO DE BOTON. QUE OPERA EN LA OBRAS DEL DPA ACAPULCO

REFERIDA A:

- CERTIFICACION DE LA GRUPO
- CERTIFICADO Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
- CONSTITUCION DEL OPERADOR

TODO ESTO EN CONCORDANCIA CON LA CLAUSULA DECIMO SEPTIMA DEL CONTRATO Nº 054-2017-FONDEPES DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADEO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES"

ADIMISMO INFORMA AL CONTRATISTA QUE CON FECHA 09/07/2019 HA ENTREGADO A FONDEPES LA CARTA EST. 175501. ED. 274.19 COMUNICANDO A LA ENTIDAD SOBRE LA PENALIDAD QUE HA INCURRIDO AL NO CUMPLIR CON LA CLAUSULA DECIMO SEPTIMA DEL CONTRATO Nº 054-2017-FONDEPES Y ADJUNTANDO LA CARTA EST. 175501. ED. 274.19

INSPECTOR

CONSORCIO ZORRITOS
[Signature]
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS

[Signature]
ING. ROBERTO TORIATTI
CONSORCIO ZORRITOS
SUPERVISOR

Grafiresa

CUADERNO DE OBRA

n° 06



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de los servicios del DPA 2019
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: Fundapez

Oficio n° 717 del Caballista 12/07/2019
En respecto de la manifestada por la supervisión de obra en el oficio n° 713 del 10/07/2019, nos reiteramos en lo señalado en nuestro oficio n° 711, en toda su extensión, así como en el punto de nuestra Carta CZOA-054-2019/TEMPULCO; así mismo no volveremos a referenciar sobre el asunto, mientras que la Entidad no cumple con atender las consultas pendientes, toda vez que ante no es posible, después lo hecho de finiquito de obra y en consecuencia el uso de los recursos.

HUBER BOGOS TORATTI
CONSEJO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISOR

OSCAR MORALES
CONSEJO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE OBRA

Oficio n° 718 del Caballista 12/07/2019
En el presente oficio, manifestamos nuestra total desacuerdo con lo señalado por la supervisión de obra en el Oficio n° 716 del 12/07/19 toda vez que lo que se utilizó en obra es de 35 Ton, mayor capacidad la requerida el expediente inicial pero necesaria para la ejecución de los trabajos del muelle; así mismo
→ VAN...

OSCAR MORALES
CONSEJO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE OBRA

HUBER BOGOS TORATTI
CONSEJO SUPERVISOR TUMBES
SUPERVISOR


INSPECTOR

022

Grafiresa

CUADERNO DE OBRA

n° 06



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: Mejoramiento de los servicios del DPA de Acapulco


PROYECTO: _____


PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: FONDOPES


→ VIENE EN ...


La guía se encuentra en buen estado de operatividad, habiendo realizado labores en el DPA de Huacho, inmediatamente antes de ingresar al DPA de Acapulco. Por otro lado el operario cuenta con sus calificaciones y CV que lo acreditan como tal. En consecuencia consideramos que no aplica lo invocado por la Supervisión de Obra.


ING. RUBEN DOSSOTONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION


CONSORCIO BORRITOS

CONSORCIO BORRITOS
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

Asiente N° 719 del 13/07/2019, del Controlista a continuación, reiteramos nuestra consulta de los asientos N° 660, 679, 703 del 01/06/19, 15/06/19 y 01/07/19, referidos a nuestra solicitud de los planes de detalle del pescaute de $W = 500 \text{ Kg}$, por lo que invocamos a la Supervisión intervenir sus burocracias ante la Entidad pero que atienda la solicitud.


ING. RUBEN DOSSOTONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO BORRITOS

CONSORCIO BORRITOS
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

INSPECTOR

CONSORCIO BORRITOS

CONSORCIO BORRITOS
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA


ING. RUBEN DOSSOTONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
SUPERVISOR

021

Grafiresa


CUADERNO DE OBRA


Nº 06



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de los servicios del DPA
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: FONDCP


Asiento Nº 720, del Contratista 13/07/2019
Reiteramos nuestra consulta del Asiento Nº 638 del 21/05/2019, referida a la incompatibilidad de los plenos IS-02, IS-15 (Adic 03) en IS-08A (Adic 04) y nuestra solicitud de los plenos a nivel de detalle de las instalaciones eléctricas y sanitarias de la cisterna de Frio.



ING. RUBEN ESCOBAR TORRES
CONSORCIO SUPERVISOR TORRES
JEFE DE SUPERVISIÓN


CONSORCIO TORRITOS
ING. JUAN CARLOS TORRES
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ASIENTO Nº 721 - DE LA SUPERVISIÓN 14-07-2019.
RESPECTO DE LO ANOTADO POR EL CONTRATISTA, LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SE NOTIFICA EN LO INDICADO EN EL ASIENTO Nº 716, POR CUANTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAPACIDAD DE LA GRúa, LA UTILIZACIÓN DE LA MISMO COMO ASÍ TAMBIÉN LA DEL OPERADOR SON REQUERIMIENTOS INDISPENSABLES PARA LA OPERACIÓN DE MICHAS E QUIPOS, LOS MISMOS QUE SON EMITIDOS POR EMPRESAS CERTIFICADORAS RECONOCIDAS Y TIENEN UN PLAZO DE VIGENCIA, LUOGO DEL CUAL DEBEN SER RENOVADOS POR EL PERIODO QUE ESTABLECEN DICHAS CERTIFICADORAS.

INSPECTOR


CONSORCIO TORRITOS
ING. JUAN CARLOS TORRES
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA



ING. RUBEN ESCOBAR TORRES
CONSORCIO SUPERVISOR TORRES
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA
SUPERVISOR

Grafiresa

02

CUADERNO DE OBRA

Nº 06



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de los servicios del DPA
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: FONDOPES

Asiento Nº 722. De la Supervisión - 15/07/2019.

LA SUPERVISIÓN DE OBRAS INFORMA AL CONTRATISTA QUE EL DÍA DE HOY HA ENTREGADO A FONDOPES LA CARTA CST, 175501.277.19 CON EL INFORME DE OPINIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 07 (PARCIAL) P: "CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, DEBIDO A LA DEMORA EN LA ABSOLUCIÓN A LA CONSULTA REFERIDA A INDEFINICIONES Y LAS MODIFICACIONES DE LOS PISOS DEL PRIMER NIVEL Y PAVIMENTOS

RIGOBERTO TONIAZZI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO ZORRILLOS
JUAN CARLOS ZORRILLOS
ING. RESERVADO EN OBRAS

Asiento Nº 723. De la Supervisión - 16/07/2019.

LA SUPERVISIÓN DE OBRAS INFORMA QUE EL DÍA DE HOY HAN LABORADO EN OBRA UN TOTAL DE 38 TRABAJADORES EFECTUANDO LOS LABORES QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN
OBROS EN MAR

01 TRABAJADORES: 01 MAESTRO, 01 OPERARIO DE GUÍA,
03 CARPINTEROS, 01 FIERRO, 02 MANOBRISTAS, 01 SOLDADOR
LOS LABORES QUE CORRESPONDIERON A EFECTUAR
HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACEROS DE REFUERZO EN
COSA CONTINUA, CABEZOS DE MUELLE - TRAMO 32-33

OBROS EN TIERRA

INSPECTOR


CONSORCIO ZORRILLOS
JUAN CARLOS ZORRILLOS
ING. RESERVADO EN OBRAS

RIGOBERTO TONIAZZI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISIÓN
Grafiresa

019

CUADERNO DE OBRA

no 02



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de las Berrucias al DPA C
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: FONDECOP

~~Ayer~~ viene
PARA

02 Trabajadores
01 Maestros, 02 Carpinteros, 01 Electrico, 04 Ayudantes
Siendo las labores ejecutadas habitación y colocación
? tuberías para descarga pluvial

DESINFECCIÓN, TOLEROS PLUVIAS Y ADMINISTRACIÓN

02 Operarios, 03 Operarios, 08 Ayudantes
Las labores ejecutadas consisten en:
- Colocación de pocetas en baños de hombres y
mujeres y bucos de hombres
- Trabajos en viga doble altura de 13, 14 y 15 metros
- Control de ambiente de humedad y temperatura
y control de calidad en desinfección
- Toleros pluviales en subestación eléctrica y bochinos de
vigilancia.

La supervisión fue de monitoreo que no se está observando
en los trabajos que hacen cumplir con los costos
de mano de obra y materiales de la edificación de
mucho de los trabajos, existen de toleros pluviales, como
de patio de descarga de productos hidrológicos,
observando también que en algunos de los trabajos

INSPECTOR _____


SUPERVISOR _____
EJE EJECUTIVO REGIONAL RIVA DE PAZ
CORPORACIÓN REGIONAL RIVA DE PAZ
RTE DE DEPT. DE RIVA DE PAZ
Grafica

CUADERNO DE OBRA

Nº 06



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: Mejoramiento de los servicios del DPA

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: FONDEPEJ

EN COLOCACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS Y BÓVEDAS ES INSUFICIENTE PARA LOS FRONTEROS ABIECTOS EN DESINFECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, CONSIDERANDO QUE ESTO RETARSA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES QUE CONTINUAN CON POSTERIORIDAD COMO ES EL CASO DE COLOCACIÓN DE ARTÍCULOS SANITARIOS Y ELECTRICOS, CARPINTERÍA Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS.

ING. RUBÉN BARRÓS TORIATTI
CONDOMINIO SUPERVISOR TUNABO
CPE DE SUPERVISIÓN

CONDOMINIO SUPERVISOR TUNABO
CPE DE SUPERVISIÓN

ASIENTO N° 724 - De LA SUPERVISIÓN - 16/07/2019.
CON RESPECTO AL ASIENTO N° 720 DEL CONTRATISTA LA SUPERVISIÓN REFERENCIAL A FONDEPEJ LA ABSOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS INDICADAS

ING. RUBÉN BARRÓS TORIATTI
CONDOMINIO SUPERVISOR TUNABO
CPE DE SUPERVISIÓN

CONDOMINIO SUPERVISOR TUNABO
CPE DE SUPERVISIÓN

Asiento N° 725 del Contratista 16/07/2019
Respecto de la presentación de la Deforcación de Obra en el Asiento N° 722 del 15/07/19, manifestamos que adjunto a nuestra Carta CZ-052-2019/AEP PUNCO, hicimos entrega a la Supervisión de Obra, → VAN...

INSPECTOR

CONDOMINIO SUPERVISOR TUNABO
CPE DE SUPERVISIÓN

SUPERVISOR

017

Grafirosa

CUADERNO DE OBRA

nº 06



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: Mejoramiento de los servicios chl. DPA

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: FONDEPE

→ VIENEN...

con fecha 10/07/19 nuestro expediente de solicitudes de cumplimiento de plazo N° 27, parcial, "Por causas no atribuibles al contratista, debido a lo sucesivo la abrogación de la consulta referida a las indisfunciones y las modificaciones de los pisos del primer nivel y parimientos"

ROBERTO BORRERO TORRETTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBOS
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO TORRITOS

CONSORCIO SUPERVISOR TUMBOS
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

Asiento N° 726 del Contralista 18/07/2019
Solicitud a la Supervisión de obra, gestiones ante la Entidad lo entrega de los datos y planos correspondientes referidos a la zona de concreto del área de Torres Pravia, en atención a nuestra consulta del Oficio N° 630 del 18/05/19

ROBERTO BORRERO TORRETTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBOS
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO TORRITOS

CONSORCIO SUPERVISOR TUMBOS
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

Asiento N° 727. De la supervisión. 19/07/2019
(A SUPERVISIÓN DE OBRA DEJA CONSTANCIA QUE EL DIA 18/07/2019 SE HAN HECHO PRESENTES EN EL DESEMBARCADERO

INSPECTOR

CONSORCIO TORRITOS


CONSORCIO SUPERVISOR TUMBOS
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

ROBERTO BORRERO TORRETTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBOS
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Grafirasa

016

CUADERNO DE OBRA

nº 06



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de los servicios del DPT de Capatzen
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

→ VIENEN

PESQUERA ARTESANAL ACAPULCO LA MINISTRA DE LAS PRODUCCIÓN CONSUNTAMENTE CON EL JEFE DE FONDOPES, QUIENES HAN VERIFICADO IN SITU EL ESTADO DE AVANCE DE LOS OBRAS, COMO ASI TAMBIEN LA SITUACION DE LOS TP BASADOS EN LO CONCERNIENTE AL PAGO DE SUS REMUNERACIONES, QUIENES LES HAN HECHO SABER EL ATRASO QUE TIENEN EN EL MISMO, PARA LO CUAL SE ENCUENTRAN ESPERANDO SU CANCELACION PARA EVITAR TENER QUE TOMAR MEDIDAS DE FUERZA ANTE ESTA SITUACION.

ING. ROBERTO GOMEZ TOMATTI
COMANDO SUPERVISOR TUNJA
JEFE DE OPERACIONES

COMANDO SUPERVISOR TUNJA
JEFE DE OPERACIONES

Asiento nº 728 del Cuaderno de Obra 21/07/2019.
Asunto: Consulta referida a las modificaciones planteadas por la Entidad en la zona del cobazo con fecha 25/06/2019. Hemos recibido de la Supervisión de obra, mediante email las cambios considerados por Fondop, en la zona del cobazo del muelle por lo cual solicitamos lo siguiente:
- Planos y detalles a nivel de detalle construcción de los cambios e informacion realizados, debidamente
→ VAN...

INSPECTOR

COMANDO SUPERVISOR TUNJA
JEFE DE OPERACIONES

SUPERVISOR

Grafiresa

015.

CUADERNO DE OBRA

nº 06



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: Mejoramiento de los servicios de DPA

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: FONDEDES

→ VIENEN...

sucriptos.

- solamente hemos recibido los planos digitales A-01 y CV-01, sin embargo en ellos se hacen referencia a los planos A-02, E-01, E-02, E-03, los cuales no se han incluido
- Solicitamos el detalle del circuito eléctrico del muelle, indicando las salidas de energía en un caso sea con el cambio propuesto (ya no consideren los postes, la cimbra en buecos en cubiertas en el inicio del cobizo, nueva estructura de la cobertura).
- Detalle de las instalaciones de la cimbra de buecos de agua de mar.
- Detalles de la cimbra de buecos de puertas, puentes, ventaneros, vidrios, cerrojos, revestimientos de techo y pared, pisos, cobertura del techo.
- Cerciorar el espesor de la losa del techo, si es de 0.15 o de 0.20, ambas opciones se consiguen.
- No hay detalles de los anclajes de los nuevos columnos de la cobertura.

CONSORCIO ZORRITOS
[Signature]
ING. ENGEN. CALADOCILLAS
ING. TECNOL. DE OBRA

INSPECTOR

CONSORCIO ZORRITOS
[Signature]
ING. ENGEN. CALADOCILLAS
ING. TECNOL. DE OBRA

SUPERVISOR


Grafiresa

014


CUADERNO DE OBRA


Nº 07

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de los servicios del DPA Acopulco
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: Fondepes




ASIENTO Nº 729. DE LA SUPERVISIÓN - 22 DE JULIO - 2019.
RESPECTO DE LO ANOTADO POR EL CONTRATISTA EN EL ASIENTO
Nº 728 LA SUPERVISIÓN DE OBRAS MANIFIESTA QUE ELEVARÁ
LAS CONSULTAS EFECTUADAS A FONDEPES PARA QUE DÉ
RESPUESTAS A LAS MISMAS



ING. JUAN BOSCO TORIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO ZORRITOS

ING. JUAN FERNANDO REGALADO OBREGON
JEFE ASISTENTE DE OBRAS


ASIENTO Nº 730 - DE LA SUPERVISIÓN - 22/07/2019.
LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DEJA CONSTANCIA QUE EL DÍA DE HOY
NO SE REALIZARON LABORES EN OBRA DEBIDO A LA PARALIZACIÓN
EFECTUADA POR LOS TRABAJADORES DEL DPA ACOPULCO POR
FALTA DE PAGO EN LA REMUNERACIÓN DE LOS MISMOS, TENIENDO
EN CUENTA EL OPORTUNIDAD EFECTUADA POR EL CONSORCIO ZORRITOS
EL SENTIDO DE ABONARLA SUS HABERES ATRASADOS EL
DÍA 19 DE JULIO DE 2019.


LA SUPERVISIÓN INVOKA AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS PARA
QUE DE SOLUCIÓN A ESTE PROBLEMA QUE CONTINUA AFECTANDO
EL AVANCE EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS


ING. JUAN BOSCO TORIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO ZORRITOS

ING. JUAN FERNANDO REGALADO OBREGON
JEFE ASISTENTE DE OBRAS

INSPECTOR

CONSORCIO ZORRITOS

ING. JUAN FERNANDO REGALADO OBREGON
JEFE ASISTENTE DE OBRAS


ING. JUAN BOSCO TORIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISIÓN

018

Grafirasa

CUADERNO DE OBRA


n° 07




FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de los servicios del DPA
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: Fondapes

Asiento n° 731. De la supervisión, 22/07/2019.

LA SUPERVISIÓN DE OBRAS INFORMA AL CONTRATISTA DE LA ENTREGA A FONDEPES DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CARTA CST. 175.501.278.19 EN DONDE SE ENTREGA EL CUADERNO RESUMEN DE LAS PARALIZACIONES PRODUCIDAS EN OBRAS POR FALTO DE PAGO EN LA REMUNERACIÓN DE LOS TRABAJADORES, DESDE QUE COMENZARON EN EL MES DE JULIO DEL 2019 A LA FECHA, ADJUNTIANDO LAS COPIAS DE LOS ASIENTOS EN EL CUADERNO DE OBRAS, REFERIDOS AL TEMA COMO ASÍ TAMBIÉN COPIAS DE LAS CARTAS CURSADAS POR LA SUPERVISIÓN A LA ENTIDAD, INFORMANDO AL RESPECTO, CARTA CST 175501.279.19, REITERANDO LA SOLICITUD DE RESPUESTA A LA CARTA CST. 175501.192.19 POR INCUMPLIMIENTO ENTRE LOS PLANOS TS-02 e TS-15 DEL ADICIONAL N° 03 Y EL PLANO 15-08A DE LA PLASTACIÓN ADICIONAL N° 04.



INSTRUMENTO DE TRABAJO
CORPORACIÓN SUPERVISOR GENERAL
JEPB DE SUPERVISIÓN



CORPORACIÓN EJECUTORA
ING. [Nombre] de OBRAS

Asiento n° 732, del Contratista 23/07/2019

Con respecto de lo manifestado por la Supervisión en el Asiento n° 731 del 22/07/2019, debemos señalar que los motivos de las paralizaciones, constan en el VPM.

INSPECTOR


CORPORACIÓN SUPERVISOR GENERAL
JEPB DE SUPERVISIÓN


CORPORACIÓN EJECUTORA
ING. [Nombre] de OBRAS


012

Grafirasa

CUADERNO DE OBRA


Nº 07


FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de los servicios de DPA
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: FONDEAES.



→ Veren.

Los asientos del cuaderno de obra, referidos y correspondiente a los eventos según han sucedido.


ING. RUBEN DOMINGO TORRATI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISOR



CONSORCIO ZORRITOS
ING. ERNANDEZ GALADO OBLITAS
JEFE DE OBRA


Oficio N° 733, del Contralista 23/07/2019.
Asunto: Reiteración de consultas sobre el emisor submareno

Dejamos constancia que a la fecha continuamos a la espera de la absolución, por parte de la Entidad, referida a los siguientes aspectos del emisor submareno:

- Solicitud de entrega de los detalles de los obras de protección en zona de playa.
- Solicitud de entrega de los cambios del difusor de dichos emisores
- La modificación realizada en el trazo del emisorado, tanto el enchapado de la línea de 6" en tubo de 8", el desenroscado, la excavación, el rollover compactado, no se encuentran comprendidos dentro de nuestro

INSPECTOR


CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISOR


ING. RUBEN DOMINGO TORRATI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISOR

Grafiosa

01.

CUADERNO DE OBRA


n° 07




FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: Mejoramiento de los servicios del DPA Acapulco
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: FONDEPEI


→ viene...


expediente de obra, en consecuencia para proceder a su ejecución es necesario cumplir con lo establecido en el Artículo 34 de la Ley y el Artículo 175 del Reglamento; dicho procedimiento está a cargo de la Entidad.


 ING. RUBEN BOBUS TOMIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION


 CONSORCIO ZORRITOS
 JEFE DE SUPERVISION DE OBRAS


Asiento n° 734, del Centralista 23/07/2019
 Con respecto a lo señalado por la supervisión de Obra en el Asiento n° 730 del 22/07/2019 manifestamos que el día de hoy continuamos los labores de obra con normalidad en el DPA Acapulco, tanto en obras en tierra, como en obras en mar.



 ING. RUBEN BOBUS TOMIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION


 CONSORCIO ZORRITOS
 JEFE DE SUPERVISION DE OBRAS

Asiento n° 735 de la Supervisión - 24/07/2019
 Con respecto a lo anotado por el contratista en el Asiento n° 733, la supervisión de obra manifiesta que

INSPECTOR


 CONSORCIO ZORRITOS
 JEFE DE SUPERVISION DE OBRAS


 ING. RUBEN BOBUS TOMIATTI
 CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
 JEFE DE SUPERVISION

010

Grafiroza


CUADERNO DE OBRA


Nº 07



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de los servicios del DPA (capa)
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: Fundapes.


HABIENDO EFECTUADO LAS CONSULTAS ACERCA DEL EMISOR SUBMARINO, Y REITERADO LAS MISMAS A TRAVES DE DOCUMENTOS ENVIADOS A LA ENTIDAD, CONTINUA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DE FONDEPES



ING. RUBEN BOBOS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS

DON FERNANDO QUIROZ OCHOA
ING. MESTRE DE TUM

Asiento Nº 736 - DE LA SUPERVISION - 25/07/2019

LA SUPERVISION DE OBRAS SOLICITO AL CONTRATISTA INFORMAR CUANDO TENDRA EN OBRAS LOS INSERTOS COMO PERROS DE ANCLAJE PARA SISTEMA DE DEFENSA, BITAS QUE SE REQUIEREN PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE LOS VACIOS IN SITU DE LOS BORDES LADOS SUR Y NORTE DEL CABEZO DEL DPA ACAPULCA


ING. RUBEN BOBOS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION


CONSORCIO ZORRITOS

DON FERNANDO QUIROZ OCHOA
ING. MESTRE DE TUM


Asiento Nº 737, del Contratista

26/07/2019

En respecto de lo solicitado por la Supervisión de Obras en el Asiento Nº 736 del 25/07/2019, manifestamos que los insertos estarán llegando la próxima semana, es decir con anterioridad a los vaciados de los concretos de los

INSPECTOR

CONSORCIO ZORRITOS

DON FERNANDO QUIROZ OCHOA
ING. MESTRE DE TUM


ING. RUBEN BOBOS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

009

Grafiosa

CUADERNO DE OBRA

nº 07



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de los Servicios del DPA Acapulco
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: Fondepes

→ VIENEN ...

Ustedes in situ, que heces programado, por ello también es importante que a la brevedad posible la Entidad defina y nos entregue los detalles de los pasantes de W=500, que incluyan ejemplares y su disposición en planta. Dichos detalles servirán para cotizar y proceder a la compra de los mismos, incluyendo los ejemplares.

INO RUBEN BOSUS TORIATTI
COMERCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

COMERCIO TORITOS
EDGARDO FERNANDO CALANDOBUTA
JEFE AUXILIAR DE T.M.

ASIENTO N° 738 - DE LA SUPERVISION - 26/07/2019.
LA SUPERVISION DE OBRA DEJA CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY
● EN LABORADO EN OBRA UN TOTAL DE 33 TRABAJADORES SIENDO
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS LAS SIGUIENTES

OBRAS EN MAR

- ENCOFRADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO Y VACIADO
DE LOSA IN SITU - TRAMO 25-28 CABEZO DE MUELLE
05 OPEARIOS, 01 OFICIAL, 01 AYUDANTE

OBRAS EN TIERRA

- P.T.A.R.
ENCOFRADO SEDIMENTADOR 02 OPEARIOS 01 PEON

→ VAN

INSPECTOR

COMERCIO TORITOS
EDGARDO FERNANDO CALANDOBUTA
JEFE AUXILIAR DE T.M.

INO RUBEN BOSUS TORIATTI
COMERCIO SUPERVISOR TUMBES
SUPERVISION

008

Grafiresa

CUADERNO DE OBRA


Nº 07




FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de los servicios de DPA
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: Fondepes

Asiento N° 339. DE LA SUPERVISIÓN - 27/07/2019.

LA SUPERVISIÓN DE OBRAS INFORMA AL CONTRATISTA QUE CON FECHA 23 DE JULIO DE 2019 HA ENTREGADO A FONDEPES LA CARTA CST. 15501.280.19 CON LAS CONSULTAS SOBRE LAS MODIFICACIONES PLANTeadas POR LA ENTIDAD EN LA ZONA DE CABEZOS DE CAUALLA


ING. ROBERTO BOSCUS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISIÓN


CONSORCIO TORRITOS

ING. ROBERTO BOSCUS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISIÓN


Asiento N° 380 del Contratista 29/07/2019

Asunto: Consulta de los niveles o cotos de fondo de la caudalera del patio de manobras, ubicada entre los ejes I-I' y 3x13.

Consultamos sobre los niveles o cotos de fondo de dicha caudalera, toda vez que en acuerdo al proyecto (Adicciones @ 3, Planos 15-11); en la intersección con la tubería de desague de la montante de aguas pluviales de administración, ubicada entre los ejes 10x11, la caudalera tendría coto de fondo + 3.85 y el tubo de desague + 3.47; Es decir 0.38m por encima o debajo de la caudalera. Dicho nivel de fondo definiría los niveles del resto de la caudalera mencionada.

INSPECTOR


ING. ROBERTO BOSCUS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISIÓN


ING. ROBERTO BOSCUS TONIATTI
CONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISIÓN

006

Grafirosa

CUADERNO DE OBRA

71007



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de las Aterrias de DA
PROYECTO: 31007
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: Fundepep

→ vienen.
Cambiando de corte de verde, asfálticos a los pendientes de obra, luego a las curvas las faldas de la carretera en lo justo de ejecución con lo autorizado. Haber de diagnosticar aguas lluvias.

ING. ROSEN BOBES TONIAUTI
CONSEJO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS
ING. [Signature]
JEFE DE SUPERVISION

Asiento N° 781 - de la supervisión. 29/07/2019.
con respecto a la consulta efectuada por el contratista en el Asiento N° 780 del Contratista Judicamos que la canteleta debe tener una de fondo + 3.48 en la intersección con la tubería de desagüe lluvia de la montante ubicada entre los ejes 40 y 41, dando lugar a la tubería de desagüe lluvia una pendiente 1.5% para poder colocar una protección de concreto y a su se encuentre a 10 cm. de base del pavimento del patio de concreto en las en las para mas adelante.

ING. ROSEN BOBES TONIAUTI
CONSEJO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS
ING. [Signature]
JEFE DE SUPERVISION

INSPECTOR

CONSORCIO ZORRITOS
ING. [Signature]
JEFE DE SUPERVISION


ING. ROSEN BOBES TONIAUTI
CONSEJO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

005

Graficera

CUADERNO DE OBRA

71007



HA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: Mejoramiento de las Aterrias de DA
PROYECTO: 31007
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: Fundepep

Asiento N° 782 - de la supervisión - 30/07/2019
a supervisión de obra de la construcción que el día hoy han laborado en obra un total de 24 personas lo que significa un menor número de los Restos de la semana pasada.
Entrega al contratista para que tome las medidas necesarias para mejorar el número de trabajos disponibles en DA a copudos.

ING. ROSEN BOBES TONIAUTI
CONSEJO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS
ING. [Signature]
JEFE DE SUPERVISION

Asiento N° 783, de la canteleta 31/07/2019
sobre: Canteleta pendiente de canteletas de 4:0.10u. a planear 4.255 "Detalle de pisos 5" del proyecto del cual detalle "ambiente tipo 5" aneja específica de 4.255 "Detalle de pisos h=0.10u", sin embargo a partida no se encuentran en el presupuesto las partidas para el fondo de protección de superficies de concreto a la supervisión de las obras pendientes.

ING. ROSEN BOBES TONIAUTI
CONSEJO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ZORRITOS
ING. [Signature]
JEFE DE SUPERVISION

INSPECTOR

CONSORCIO ZORRITOS
ING. [Signature]
JEFE DE SUPERVISION

ING. ROSEN BOBES TONIAUTI
CONSEJO SUPERVISOR TUMBES
JEFE DE SUPERVISION

004

Graficera

13 ANOTACIONES DEL CUADERNO DE VISITAS

El ADELANTE de Visitas

DPA Acahuico

Temas 18 de Julio 2017
En la fecha, entre las 13:15 horas a las 15:30 horas, visitamos nuestra oficina, funcionarios del Ministerio de la Producción (Produce) y del Fondes, Residencia Dichas Cruzillas, los siguientes funcionarios

- Rocio Ingrid Benavides Alvarado
Ministra de Produce.

- Alvaro Perdomo
Jefe de Fondes.

Recomendamos en orden, tanto como también todas estas de parte y requisitos de los del avance de los trabajos

Lunes 22 de Julio 2017.

Entre las 9:15 AM y las 18:30 horas, visitamos nuestra oficina funcionarios de Cruzillas, Recorrimos las obras de la 2ª y 3ª etapa y varias actividades del estado de las consultoras y actividades realizadas en la oficina, los visitantes son:

- Jng. FIBEL Tapuata Suro Alvarado
DNI: 16627206

Jefe de Coordinadores de obra

- ADE. CASTRO CARMEL CARLOS

DNI: 20074912-1 / coordinador de obra

- PDS. ANEXO BUENOS DIAS

DNI: 07971610-9 / coordinador de obra

- SUPERVISOR EN

DNI: 10644041-1.

CONSORCIO ZORRITOS


FERNANDO ZORRILLOS
Director General
and Representing of CHM

ARCHIVO DIGITAL DEL INFORME DEL MES DE JULIO 2019
