



PERÚ

Ministerio de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la Impunidad"

CARGO

MEMORANDUM N° 5411 -2019-FONDEPES/DIGENIPAA

A : **GISSELA ZAPATA FLORES**
Coordinadora del Área de Logística

ASUNTO : **VALORIZACIÓN DE OBRA N°07 DEL ADICIONAL N°10**
Obra : "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque."
Ubicación : San José - Lambayeque - Lambayeque
Proceso : Adjudicación de Menor Cuantía N°038-2014-FONDEPES derivada de la Licitación Pública N°004-2014-FONDEPES/OGA
Contrato : 082-2014-FONDEPES/OGA
Contratista : CONSORCIO SAN JOSE

REFERENCIA : Carta N°182-SUPER-SJOSE-2019

FECHA : Lima, 10 OCT 2019

FONDEPES
AREA LOGISTICA
10 OCT 2019
DOCUMENTO RECIBIDO
Hora: Firma:

Tengo a bien dirigirme a usted, para remitir adjunto al presente la Valorización N°07 de la Prestación Adicional N°10, de la obra señalada en el asunto, el mismo que fuera aprobado mediante Resolución Jefatural N°025-2019-FONDEPES/J de fecha 12.02.19, correspondiente a los trabajos efectuados al 30 de Setiembre del 2019 por la empresa CONSORCIO SAN JOSE la misma que ha sido revisada por el Supervisor de obra, ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA.

Con la conformidad del Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola de FONDEPES, mediante INFORME N° 122-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/FFR, el cual hago mío en toda su extensión, se solicita se sirva disponer a quien corresponda, efectúe el trámite de pago de la indicada valorización, aclarando que en lo que respecta a deducciones por cualquier tipo de penalidades se efectuarán en la liquidación del contrato.

Atentamente,



FONDEPES
.....
Julio Aurelio Ríos Sousa
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola

JARS/Frank F.

EL PERÚ PRIMERO



CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por la presente que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola al suscribir la presente acta, da su conformidad para realizar el Pago por el concepto de la VALORIZACION N° 7 DEL ADICIONAL N°10, por el monto de S/. 11,659.88 (Once Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con 88/100 Soles) a favor de la empresa CONSORCIO SAN JOSE encargado de la ejecución de la Obra "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque.", según contrato N°082-2014-FONDEPES/OGA.

10 OCT 2019




FONDEPES

.....
Julio Aurelio Ríos Sousa
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la Impunidad"

INFORME N° 122-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/FFR



A : **ING. JULIO AURELIO RIOS SOUSA**
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

ASUNTO : **VALORIZACIÓN DE OBRA N°07 DEL ADICIONAL N°10**
Obra : "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque."
Ubicación : San José - Lambayeque - Lambayeque
Proceso : Adjudicación de Menor Cuantía N°038-2014-FONDEPES derivada de la Licitación Pública N°004-2014-FONDEPES/OGA
Contrato : 082-2014-FONDEPES/OGA
Contratista : CONSORCIO SAN JOSE

REFERENCIA : Carta N°182-SUPER-SJOSE-2019

FECHA : Lima,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual, la Supervisión de Obra remite a la Entidad, la Valorización N°07 del Adicional N°10, de la obra indicada en el asunto, el mismo que fuera aprobado mediante la Resolución Jefatural N°025-2019-FONDEPES/J de fecha 12.02.19, correspondiente a los trabajos efectuados al 30 de Setiembre del 2019.

Luego de efectuar la revisión de los cálculos, los mismos que fueron elaborados por el supervisor de obra, se obtuvo como resultado lo siguiente:

A. VALORIZACION N°07 Adicional N°10		S/.	8,500.00
Media Tensión			8,500.00
-			-
B. GASTOS GENERALES Y UTILIDADES		S/.	1,381.25
Gastos Generales	8.25%		701.25
Utilidades	8.00%		680.00
C. AMORTIZACIONES		S/.	0.00
Adelanto Directo			-
Adelanto Materiales N°01			-
Adelanto Materiales N°02			-
D. REAJUSTES		S/.	0.00
Total de reajustes (*)			-
E. SUB TOTAL VALORIZACION		S/.	9,881.25
Total Valorizado (A+B-C+D)			
I.G.V. (18%)			<u>1,778.63</u>
F. TOTAL A FACTURAR VALORIZACION N°07		S/.	11,659.88

Son: Once Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con 88/100 Soles



EL PERÚ PRIMERO



ANALISIS

A continuación, se adjunta un cuadro donde se incluyen los datos mas representativos de la obra y las fechas en que se entrego la documentacion, demostrando el cumplimiento de los TDR:

ITEM DESCRIPCION

1	Nombre de la Obra	"Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región	
2	Contrato de Obra	:082-2014-FONDEPES/OGA	
3	Presupuesto Contratado	:S/32,457,630.22	
4	Sistema	:P. UNITARIOS	
5	Contratista	:CONSORCIO SAN JOSE	
6	Residente de Obra	:Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros	
7	Supervision	:CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA	
8	Supervisor de Obra	:Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza	
9	Plazo Contractual d.c.	:540	
10	Fecha de Entrega de Terreno	:14 de Enero de 2015	
11	Inicio del Plazo Contractual	:15 de Enero de 2015	
12	Ampliaciones de Plazo Total	:1204	
13	Plazo Total de Obra Vigente	:1744	
14	Plazo Vigente de Término	:25 de Octubre de 2019	
15	Adicional N° 01	: S/ 326,464.23	Resolución Jefatural N°280-2015-FONDEPES/J del 04.09.15
16	Adicional N° 02 y Deductivo Vinculante N° 01	: S/ 449,232.12	Resolución Jefatural N°078-2016-FONDEPES/J del 09.03.16
17	Adicional N° 03	: S/ 86,170.63	Resolución Jefatural N°093-2016-FONDEPES/J del 22.03.16
18	Adicional N° 04 y Deductivo Vinculante N° 02	: S/ 579,080.87	Resolución Jefatural N°253-2016-FONDEPES/J del 08.07.16
19	Adicional N° 05 y Deductivo Vinculante N° 03	: S/ 446,667.85	Resolución Jefatural N°355-2016-FONDEPES/J del 29.11.16
20	Adicional N° 06 y Deductivo Vinculante N° 04	: S/ 1,377,727.34	Resolución Jefatural N°370-2016-FONDEPES/J del 29.12.16
21	Adicional N° 07 y Deductivo Vinculante N° 05	: S/ 1,532,420.43	Resolución Jefatural N°025-2018-FONDEPES/J del 06.03.18
22	Adicional N° 08 y Deductivo Vinculante N° 06	: S/ 960,977.20	Resolución Jefatural N°031-2018-FONDEPES/J del 19.03.18
23	Adicional N° 09 y Deductivo Vinculante N° 08	: S/ 787,405.98	Resolución Jefatural N°066-2019-FONDEPES/J del 30.04.19
24	Adicional N° 10	: S/ 429,550.09	Resolución Jefatural N°025-2019-FONDEPES/J del 12.02.19
25	Adicional N° 11 y Deductivo Vinculante N° 09	: S/ 507,464.86	Resolución Jefatural N°001-2019-FONDEPES/J del 03.01.19
26	Adicional N° 12 y Deductivo Vinculante N° 07	: S/ 721,493.57	Resolución Jefatural N°001-2019-FONDEPES/J del 03.01.19
27	Adicional N° 13	: S/ 243,429.89	Resolución Jefatural N°105-2019-FONDEPES/J del 10.07.19
28	Reducciones de Obra N°01 y N°02	: S/ 2,077,106.37	Resolución Secretaría General N°044-2016-FONDEPES/J del 04.04.16
29	Reducciones de Obra N°03, N°04 y N°05	: S/ 1,951,921.72	Resolución Secretaría General N°122-2016-FONDEPES/J del 19.10.16
30	Fecha de entrega de Valorización N°07 del Adicional N°10 por Contratista	: 30 de Setiembre de 2019	
31	Fecha de entrega de Valorización N°07 del Adicional N°10 por Supervisión	: 4 de Octubre de 2019	
32	Porcentaje de Avance de Obra del Adicional N°10	: 99.72%	





El suscrito, al haberse comprobado que el contratista ha cumplido con entregar la presente valorización dentro de los términos que indica la Resolución Jefatural N°025-2019-FONDEPES/J de fecha 12.02.19, mediante el cual fue aprobado la Plazo Vigente de Término, y en los plazos previstos según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, considera procedente continuar con el trámite respectivo, aclarando que en lo que respecta a deducciones por cualquier concepto y otras penalidades se efectuarán en la liquidación de obra.


Es todo lo que cumpla en informar a usted,

Atentamente,



ING. FRANK FLORES RUBINA
Coordinador de Obra

El Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento que suscribe, hace suyo en todas sus partes el presente documento.



ING. LUIS VILCHEZ CHAVARRY
Coordinador del Área de Obras,
Equipamiento y Mantenimiento



PERÚ Ministerio de la Producción



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



04970379

Usuario: **pruiz**
Fecha: **09/10/2019**
Hora: **17:28**




CARGO 03303-2019-FONDEPES/AOEM

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA
Asunto: CARTA 182-SUPER-SJOSE-2019
REMITE VALORIZACIÓN N° 07 DEL ADICIONAL N° 10 MES DE SETIEMBRE 2019 REF: DPA SAN JOSE __ MUY URGENTE N° 059
Referencia: INFORME 00122-2019-FONDEPES/FFR
Fecha: 09/10/2019
Observación: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A ~~LOGISTICA~~



AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO



CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA
INGENIERO CONSULTOR C9175

Lima, 04 de Octubre de 2019

Carta N°182-SUPER-SJOSE-2019

Señores.-

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES

Av. Petit Thouars 115, Cercado de Lima

Atención : **ING. JULIO AURELIO RIOS SOUSA**
DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y
ACUÍCOLA

Asunto : **VALORIZACION N°07 DEL ADICIONAL N°10- MES DE SETIEMBRE 2019**
de la obra: "Construcción de Infraestructura Pesquera para consumo Humano
Directo de San José Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque"


Referencia : **a) CARTA N°0101-2019-CSJ/CO**
b) Contrato N° 013-2016-FONDEPES/OGA.
Contratación del servicio de Consultoría para el saldo de la supervisión de
la obra: "Construcción de Infraestructura Pesquera para consumo Humano
Directo de San José Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque"

De nuestra consideración:

La presente tiene por objeto dirigirme a usted, con la finalidad de presentar los documentos correspondientes a la **VALORIZACION N°07 DEL ADICIONAL N°10- MES DE SETIEMBRE 2019** referido a la ejecución de la obra "**Construcción de infraestructura pesquera para consumo humano directo de San José, distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque Código SNIP N° 65958.**"

La valorización se ha procesado en conformidad con lo establecido en el Artículo 166° del RLCE, por lo que solicitamos a usted tramitar la documentación respectiva para, los fines consiguientes.

Sin otro en particular, quedamos de Ud.


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	
	
2947955	
N° DOC:	00009807-2019
CLAVE:	7040
USUARIO:	dgalindo
FECHA Y HORA:	04/10/2019 16:49:37
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	

Adjunto:

01 original y 02 copias



PERU

Ministerio de la Producción

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

CONCURSO PUBLICO N°0001-2016-FONDEPES

CONTRATO N°013-2016-FONDEPES

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"




VALORIZACION N°07 DE OBRA DEL ADICIONAL N°10 – SETIEMBRE 2019

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE

SUPERVISION: ING. CARLOS H. MENDOZA PICOAGA

SETIEMBRE 2019


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10108595807



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroCONCURSO PÚBLICO N°0001-
2016-FONDEPESCONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

GENERALIDADES


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE
ALVA ESPINOZA



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

CONCURSO PUBLICO N°0001-
2016-FONDEPES

CONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

CONTENIDO

GENERALIDADES

- a) Índice o contenido
- b) Antecedente
- c) Datos generales de la obra

CONTROL DE AVANCE DE OBRA

- a). Descripción
- b) Avance físico de obra
- c) Cronograma de Avance De Obra y comentario específico

CONTROL DE OBRA

- a) Control de Campo
- b) Descripción de las ocurrencias técnicas realizadas en obra
- c) Control de calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos
- d) Pruebas de Calidad de agregados
- e) Diseño de Mezclas para los diferentes tipos de concreto
- f) Pruebas de Compactaciones o densidad de campo
- g) Pruebas hidráulicas en redes de desagüe, redes de agua, pruebas eléctricas, verificación de cumplimiento de especificaciones de electrobombas, limpieza y desinfección de cisternas, correcto funcionamiento de aparatos sanitarios, eléctricos, electrobombas y otros.
- h) Recursos Utilizados durante el mes
- i) Control de Supervisión en la Prevención de Riesgos (seguridad) y Control y supervisión ambiental informe de las actividades de supervisión ambiental realizadas durante el mes

CONTROL ECONOMICO DE OBRA

- a) Control de Valorizaciones
- b) Control de Adicionales de Obra y/o Deductivos
- c) Control de Vigencia de Cartas Fianzas

CAMBIOS Y O MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL

- a) Sustento Técnico y base Legal
- b) Planos y/o Esquemas

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- a) Recomendaciones y Conclusiones de EL SUPERVISOR

PANEL FOTOGRAFICO

COPIA DEL CUADERNO DE OBRA


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

CONCURSO PUBLICO N°001
2016-FONDEPES
CONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

005

b) ANTECEDENTES

El presente Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE "; inscrito en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas con el Código N° 65958; es un proyecto de carácter social porque a través de la nueva infraestructura de este desembarcadero se podrá brindar productos hidrobiológicos de calidad a la población cumpliendo con la Norma Sanitaria D.S. 040-2001-PE, con la finalidad de crear y promover las capacidades y habilidades para coadyuvar al desarrollo sostenido e integral de la actividad pesquera artesanal.

Así mismo, este proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de Política Sectorial del Ministerio de la Producción principalmente dentro de los ejes estratégicos de la actividad pesquera, así como dentro de los planteamientos del Plan de Desarrollo concertado de la Región Lambayeque.

FONDEPES, ha convocado mediante la Modalidad de Concurso al Proceso de CP N° 001-2016-FONDEPES - Consultoría para Saldo de Supervisión, las misma que fue otorgada al Consultor Ing. **Carlos Humberto Mendoza Picoaga**, quien designo a su vez como Jefe de Supervisión al Ing. Miguel Eduardo Carranza Haro.

A requerimiento de la Entidad, solicitaron al Consultor el cambio de Jefe de Supervisión, aprobándose el nombramiento como nuevo Jefe de Supervisión al Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza con CIP 10717, a partir del 07-10-2016

MEMORIA DESCRIPTIVA

NOMBRE DEL PROYECTO


"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"

DATOS GENERALES

Razón Social : Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES.
Domicilio Legal : Av. Petit Thouars N° 115 – 119 Lima
RUC : 20137921601
Teléfono : 7068500

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El D.P.A de San José, El terreno propuesto para la construcción del DPA San José, se encuentra ubicado en la Provincia de Lambayeque, aproximadamente entre las coordenadas geográficas 6° 47' 54" latitud Sur y 79° 59' 30" longitud Oeste, aproximadamente a 600 m. al norte de las actuales instalaciones del Terminal Pesquero Municipal, en un área aproximada de 7,610.00 m²


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717




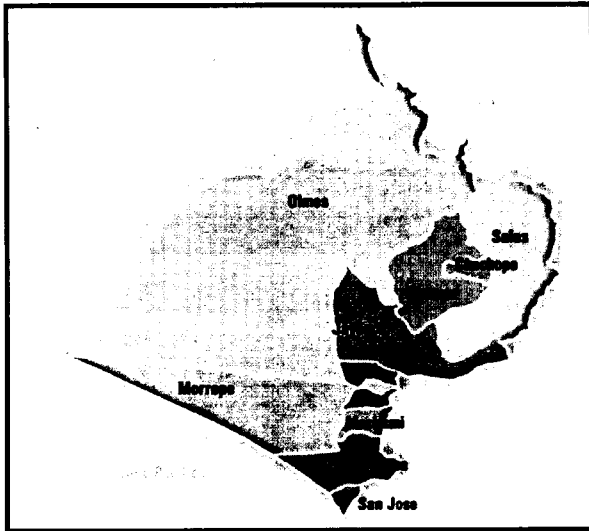
3.1.1 UBICACIÓN POLITICA

Región : Lambayeque
Provincia : Lambayeque
Distrito : San José
Localidad : San José

3.1.2 LIMITES

Por el Norte : con el Distrito de Lambayeque
Por el Sur : con el distrito de Pimentel
Por el Este : con el Distrito de Lambayeque y Chiclayo
Por el Oeste : con el Océano Pacifico

Ilustración 1: Ubicación

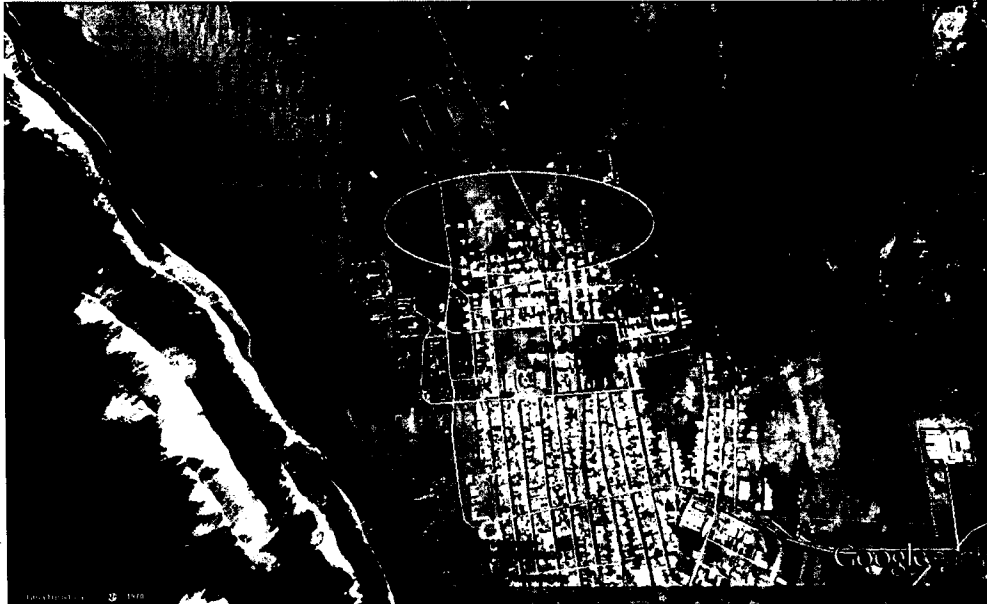


C. Humberto
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807

Isaias
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroCONCURSO PUBLICO N°0001-
2016-FONDEPES
CONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

Elaboración: Equipo Consultor

OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto busca como objetivo "Suficiente acceso a Recursos hidrobiológicos de Calidad que cumplan con la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (DS N° 040-2001-PE) en la Caleta de San José, Santa Rosa y Pimentel"

CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD

ACCESO

Por tierra se accede directamente a través de la carretera Panamericana Norte, a la altura del Km. 765, se toma un desvío de 11 km. de la ciudad de Chiclayo hacia la izquierda con dirección al mar, cuyo recorrido es a través de una vía asfaltada en regular estado de conservación hasta llegar al poblado de San José y de allí se prosigue un corto recorrido de 150 m. hasta llegar al Desembarcadero Pesquero Artesanal de San José.

DE LA TOPOGRAFIA

La topografía del terreno donde se ubicará el DPA San José es plana, presenta ligeras pendientes hacia el mar, siendo el suelo de constitución arenosa.

Para la ejecución de las obras en tierra: "Construcción De Infraestructura Pesquera Para Consumo Humano Directo De San José, Distrito De San José Provincia De Lambayeque, Región Lambayeque", se hace imprescindible construir un terraplén elevado, así como la vía de acceso que empalma con la vía existente en la población de San José.

Carlos Humberto Mendoza Picoaga
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807

Isaias Jorge Alva Espinoza
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA

El clima es uno de los factores ecológicos que más influye sobre el suelo, la flora y la fauna, logrando condicionar en la mayoría de las veces las adaptaciones de estos componentes a su ambiente, así como caracterizar ecológicamente las zonas en función a la temperatura y humedad; incluso influye sobre el tipo de actividades antrópicas se deben realizar en una región. Por ello, estudiar el clima dentro del enclave del proyecto no se fundamenta en la posibilidad de que éste sea afectado directa o indirectamente por la realización o puesta en marcha del mismo, sino sobre el hecho de que el



conocimiento de sus principales características da una idea de los procesos ecológicos que pueden acontecer en la zona.

Según el Mapa Climático del Perú establecido por R. Schroeder (1969), el clima que se encuentra en el área de influencia del proyecto es el CLIMA DE DESIERTO (BW), que corresponde a un clima sin lluvias (por lo regular), salvo en algunos eventos como la presencia del Fenómeno del Niño (el cual trae consigo lluvias que en ocasiones puede producir inundaciones llegando a generar grandes pérdidas económicas). De igual modo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) a través de su Laboratorio de Información Geográfica, describe hasta seis tipos de climas en toda la región Lambayeque, correspondiéndole a la zona del proyecto: Clima árido; deficiente de lluvias todo el año; semicálido y húmedo con codificación: E(d) B'1 H3. (Ver Figura 4.2.)

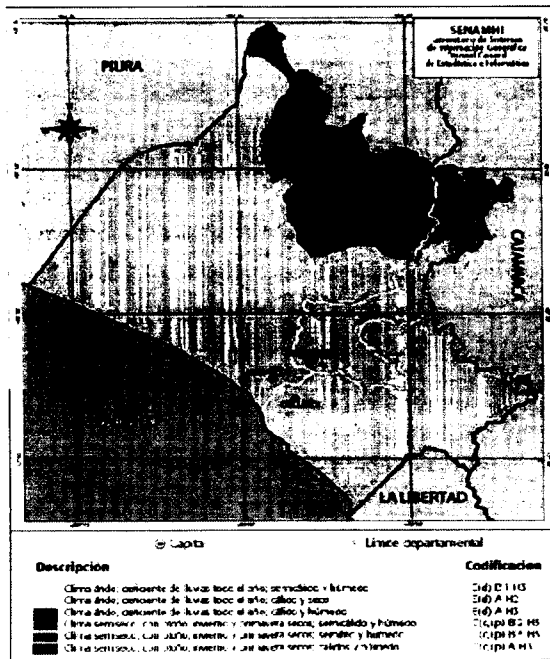


Figura 4.2. Clasificación Climática de la Región Lambayeque, según el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Estas clasificaciones se encuentran acorde a la clasificación ambiental por eco regiones propuesta por A. Brack para el Perú, situando a gran parte de la zona occidental de la Región Lambayeque, en la eco región

DESIERTO COSTERO.

Sismicidad

El área del proyecto, según el Mapa de Zonificación Sísmica propuesto en la Norma de Diseño Sismo resistente E 030 del Reglamento Nacional de Construcciones (1997) y el Mapa de distribución de máximas intensidades sísmicas observadas en el Perú elaborado por el instituto Geofísico del Perú, el Proyecto se encuentra dentro de la zona de sismicidad alta (zona 3) existiendo la posibilidad de que ocurran sismos de intensidades II y IV en la escala de Mercalli Modificada, según Ramírez, (2006).

CH
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807

IS
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

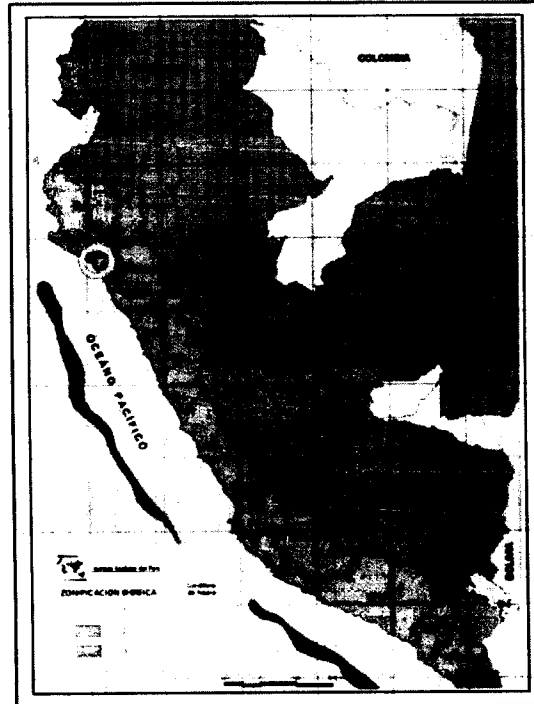


Figura 4.5. Mapa de Zonificación Sísmica de acuerdo a la Norma Técnica de Edificaciones E 030.

Basándose en el Reglamento Nacional de Construcciones vigente, la zonificación correspondiente a la Provincia de Chiclayo, es una zona con sismicidad activa del presente siglo, con sismos superficiales 20 Km asociados con fallamiento superficial.

De acuerdo al mapa de Regionalización Sísmica del Perú mediante intensidades, preparado por el Instituto Geofísico del Perú en 1975, la zona se halla con sismicidad alta (zona 3), donde se puede esperar sismos con intensidades entre IX y más en la escala de Mercalli modificada.

TIEMPO DE EJECUCION


El tiempo para ejecutar la Obra será de 540 (Quinientos cuarenta) días calendarios.


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

PRESUPUESTO DE OBRA

El presupuesto general referencial de obra asciende a S/. 33,332,309.32 (Treinta y tres millones trescientos treinta y dos mil trescientos nueve con 32/100 Nuevos Soles).

OBRAS EN TIERRA-ESTRUCTURAS	3'612,743.16
OBRAS EN TIERRA-ARQUITECTURA	1'120,703.82
OBRAS EN TIERRA-INSTALACIONES ELECTRICAS	561,306.56
OBRAS EN TIERRA-INSTALACIONES SANITARIAS	1'115,124.70
MITIGACION AMBIENTAL	40,810.13
EQUIPAMIENTO	1'442,745.40
OBRAS EN MAR	14'986,247.01


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807



PERU

Ministerio de la Producción

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

CONCURSO PUBLICO N°0001-2016-FONDEPES
CONTRATO N°013-2016-FONDEPES

010

PAVIMENTACION EXTERIOR	493,973.42
INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION	149,611.46
SEGURIDAD Y SALUD	16,500.80
	=====
TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO	
OBRAS CIVILES	23'539,766.46
Gastos generales (10%)	2'353,976.65
Utilidades (10%)	2'353,976.65
=====	
Sub total	28'247,719.76
IGV (18%)	5'084,589.56
=====	
Total de presupuesto	33'332,309.32

PRESUPUESTO CONTRATADO.-

01	<u>SUB-PRESUPUESTO01 ESTRUCTURAS</u>	4,376,782.02
02	<u>SUB-PRESUPUESTO02 ARQUITECTURA</u>	1,302,818.20
03	<u>SUB-PRESUPUESTO03 INSTALACIONES ELECTRICAS</u>	662,518.87
04	<u>SUB-PRESUPUESTO04 INSTALACIONES SANTARIAS</u>	1,260,862.15
05	<u>SUB-PRESUPUESTO05 MITIGACION AMBIENTAL</u>	47,441.78
06	<u>SUB-PRESUPUESTO06 EQUIPAMIENTO</u>	1,677,191.53
07	<u>SUB-PRESUPUESTO07 OBRAS EN MAR</u>	17,421,512.15
08	<u>SUB-PRESUPUESTO08 PAVIMENTACION EXTERIOR</u>	574,244.10
09	<u>SUB-PRESUPUESTO09 INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION</u>	173,923.33
10	<u>SUB-PRESUPUESTO10 SEGURIDAD Y SALUD</u>	19,182.18

TOTAL SIN IGV (S/.)	27,506,486.29
IGV (18%)	4,951,163.930
TOTAL PRESUPUESTO	32,457,630.22

MODALIDAD DE EJECUCION

El proyecto se ejecutara mediante la modalidad de Contrata, A Precios Unitarios



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS BÁSICOS

En los presupuestos, se tendrá en cuenta que la presente memoria descriptiva, se complementan con los planos respectivos y con los metrados básicos en forma tal que las obras deben ser ejecutadas totalmente.

En caso de divergencia de interpretación, los planos tienen prioridad sobre el presupuesto y éstos tienen prioridad sobre las especificaciones y estos tienen prioridad sobre los metrados.

DE LOS TRABAJOS QUE CONSIDERA EL PROYECTO


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807

BLOQUES A EJECUTAR CONSIDERADOS EN EL PROYECTO

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroCONCURSO PUBLICO N°0001-
2016-FONDEPESCONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

La obra es ejecutada por el Consorcio San José, conformada por las empresas constructoras CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL – SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC Y CORPORACION R&S SAC. El proyecto integral en ejecución cuenta con las metas parciales consistentes en:

OBRAS EN TIERRA:

Bloque 1.-

Tanque Elevado Capacidad 36.22 m³
 Agua Salada 21.00 m³
 Agua Potable 15.22 m³
 Cisterna de Agua Salada Cap.48.00 m³
 Cisterna de Agua Potable Cap.33.00 m³
 Cubículo de Limpieza

Bloque 2.-

Guardianía
 Sub Estación Grupo Electrónico
 Depósito de Residuos Peligrosos
 Redes de Almacenes
 Taller de Maestranza
 Cafetería

Bloque 3.-

Vestidores de Hombres
 Vestidores de Mujeres
 Depósito de Residuos
 Depósito de Limpieza
 Servicios Higiénicos Hombres
 Servicios Higiénicos Mujeres
 Lavandería
 Zona de Desinfección


Bloque 4.-

Zona de Tareas Previas

Bloque 5.-

Oficina de Control de Calidad
 Pesaje de Control
 Almacén de Cajas
 Limpieza y Desinfección de Cajas


 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 10717


 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
 RUC: 10106595807

Bloque 6.-

Zona de Frio
 Productor de Hielo en Bloques 20 Tn/día (02 Productores de 10 Tn/día c/u)
 Cámara de Congelación de Hielo
 Cámara de Refrigeración de 10 Tn (02 und)
 Cuarto de Equipos de Refrigeración
 Depósito de Carretas y Cubetas

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO
 MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE
 ALVA ESPINOZA



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

CONCURSO PÚBLICO N°0001/
2016-FONDEPES
CONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

012

Bloque 7.-

Oficina de Sindicato de Pescadores
Secretaría
Administración
Salón de Usos Múltiples
Servicios Higiénicos Públicos Hombres
Servicios Higiénicos Públicos Mujeres

Ingresos.-


Ingreso Principal a Patio de Maniobras
Caseta de Control
Ingreso Secundario a Muelle
Caseta de Control

Instalaciones e Infraestructuras.-

Tanque Séptico Doble
Filtro Biológico
Caseta de Emisor Submarino
Caseta de Bombeo
Pozo Séptico
Trampa de Grasa
Cámara de Rejas
Cisterna de Agua Potable Cap. 20.00 m3
Cercos Perimétricos
Defensa de Protección con Enrocado a Fachada Posterior

OBRAS EN MAR:

Puente de Acceso del Muelle 950.00 MI
02 Plataformas Bajas
Cabezo de Muelle Espigón 50.00 MI.


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

UBICACIÓN, LÍMITES Y ACCESIBILIDAD DE LA ZONA:

El Desembarcadero Pesquero Artesanal San José, se encuentra ubicado en la Caleta San José (área rural), políticamente pertenece a la Región de Lambayeque, Provincia de Lambayeque, Distrito de San José, forma parte de la infraestructura de protección permanente a la capacidad productora de los pescadores de San José.

El Desembarcadero Pesquero Artesanal San José, tiene como límites:

Por el Norte : con el Distrito de Lambayeque
Por el Sur : con el distrito de Pimentel
Por el Este : con el Distrito de Lambayeque y Chiclayo

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE
ALVA ESPINOZA



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

CONCURSO PÚBLICO N°0001
2016-FONDEPES
CONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

013

Por el Oeste : con el Océano Pacífico

El acceso al Desembarcadero Pesquero Artesanal San José directamente a través de la carretera Panamericana Norte, a la altura del Km. 765, se toma un desvío de 11 km. de la ciudad de Chiclayo hacia la izquierda con dirección al mar, cuyo recorrido es a través de una vía asfaltada en regular estado de conservación hasta llegar al poblado de San José y de allí se prosigue un corto recorrido de 150 m. hasta llegar al DPA de San José.

OBJETO

Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera, para promover y desarrollar una infraestructura básica y el equipamiento para el desarrollo de la pesca artesanal. Construcción de un Muelle, desembarcadero y otros tipos de desembarque para el buen funcionamiento del DPA.

Dentro de los Objetivos son los siguientes:

- Construcción de Zona de Embarque y Desembarque
- Construcción de Zona de Procesamiento Primario
- Construcción de Zona de Frío
- Construcción de Zona de Servicios Complementarios
- Construcción de Zona de Vestidores - Personal de Trabajo
- Construcción de Zona de Estacionamientos
- Construcción de Zona de Servicios y Mantenimientos
- Construcción de Zona Administrativa
- Construcción de Obras Complementarias

El proyecto busca como objetivo principal "Suficiente acceso a Recursos Hidrobiológicos de Calidad que cumplan con la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (DS N° 040-2001-PE) en la Caleta de San José, Santa Rosa y Pimentel"

c) DATOS GENERALES DE LA OBRA

Obra: "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, distrito de San José, Provincia de Lambayeque, región de Lambayeque"

Ubicación : San José/Lambayeque/Lambayeque

Contratista : Consorcio San José

Suscripción del Contrato : Contrato N° 082-2014-FONDEPES/OGA

Modalidad de Ejecución : Precios Unitarios


Residente : Ing. Christian Meza Trujillo


Consultora de Supervisión : Carlos Humberto Mendoza Picoaga

Jefe de Supervisión : Ing. Isaiás Jorge Alva Espinoza

Valor referencial : s/. 33'504,650.56 (inc. igv)

Monto contratado : s/. 32'457,630.22 (inc. igv)


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE
ALVA ESPINOZA



PERU

Ministerio
de la Produccion

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

CONCURSO PUBLICO N°0001
2016-FONDEPES
CONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

014

Fecha entrega de terreno	:	14/01/2015
Plazo inicial ejecución obra	:	540 dias calendarios
Fecha de inicio del plazo	:	15/01/2015
Fecha término plazo inicial	:	09/07/2016
Ampliación de plazo N° 01	:	:29 dias calendarios
Nueva fecha término plazo	:	07/08/2016
Ampliación de plazo N° 02	:	31 dias calendarios
Nueva fecha término plazo	:	07/08/2016 - denegada
Ampliación de plazo N° 03	:	47 dias calendarios
Nueva fecha término plazo	:	07/08/2016 - denegada
Ampliación de plazo N° 04	:	32 dias calendarios
Nueva fecha término plazo	:	08/09/2016
Ampliación de plazo N° 05	:	32 dias calendarios
Nueva fecha término plazo	:	09/10/2016
Ampliación de plazo N° 06	:	12 dias calendarios
Nueva fecha término plazo	:	20/10/2016
Ampliación de plazo N° 07	:	44 dias calendarios
Nueva fecha término plazo	:	20/10/2016 - denegada
Ampliación de plazo n° 08	:	74 dias calendarios
Nueva fecha término plazo	:	20/10/2016 – denegada
Ampliación de Plazo N°09	:	32 dias calendarios
Nueva fecha término plazo	:	21/11/2016
Ampliación de Plazo N°10	:	30 Dias Calendario
Nueva Fecha de Término de Plazo:	:	21 de Diciembre del 2016
Ampliación de Plazo N°12	:	8 Dias Calendario
Nueva Fecha de Término de Plazo:	:	06 de Enero del 2017
Ampliación de Plazo N°13	:	48 Dias Calendario
Nueva Fecha de Término de Plazo:	:	23 de Febrero del 2017
Ampliación de Plazo N° 14:	:	11 Dias Calendario
Nueva Fecha de Término de Plazo:	:	06 de Marzo del 2017

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717


MENDOZA PICOGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE
ALVA ESPINOZA




PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroCONCURSO PÚBLICO N°0001-
2016-FONDEPES
CONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

Ampliación de Plazo N° 15:	53 Días Calendario
Nueva Fecha de Término de Plazo:	28 de Abril del 2017
Ampliación de Plazo N° 16:	60 Días Calendario
Nueva Fecha de Término de Plazo:	27 de Junio del 2017
Ampliación de Plazo N° 17:	60 Días Calendario
Nueva Fecha de Término de Plazo:	26 de Julio del 2017
Ampliación de Plazo N° 18:	60 Días Calendario
Nueva Fecha de Término de Plazo:	25 de Octubre del 2017
Ampliación de Plazo N° 19:	60 Días Calendario
Nueva Fecha de Término de Plazo:	24 de Diciembre del 2017
Ampliación de Plazo N° 20:	38 Días Calendario
Nueva Fecha de Término de Plazo:	31 de Enero del 2018
Ampliación de Plazo N° 21:	30 Días Calendario
Nueva Fecha de Término de Plazo:	02 de Marzo del 2018
Ampliación de Plazo N° 22:	15 Días Calendario
Nueva Fecha de Término de Plazo:	17 de Marzo del 2018
Ampliación de Plazo N° 23:	202 Días Calendario
Nueva Fecha de Término de Plazo:	05 de Octubre del 2018
Ampliación de Plazo N° 24::	60 Días Calendario
Nueva Fecha de Término de Plazo:	04 de Diciembre del 2018
Ampliación de Plazo N° 25::	30 Días Calendario
Nueva Fecha de Término de Plazo:	03 de Enero del 2019
Ampliación de Plazo N° 26::	Denegada
Ampliación de Plazo N° 27::	35 Días Calendario
Nueva Fecha de Término de Plazo:	07 de Febrero del 2019
Ampliación de Plazo N°28:	102 Días Calendario
Nueva Fecha de Término de Plazo:	21 de Mayo del 2019
Ampliación de Plazo N°29:	72 Días Calendario
Nueva Fecha de Término de Plazo:	01 de Agosto del 2019


 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 10717


 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
 RUC: 10106595807



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroCONCURSO PUBLICO N°0001-
2016-FONDEPESCONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

Ampliación de Plazo N°30: 20 Días Calendario
 Nueva Fecha de Término de Plazo: 21 de Agosto del 2019
 Ampliación de Plazo N°31: 25 Días Calendario
 Nueva Fecha de Término de Plazo: 15 de Setiembre del 2019
 Ampliación de Plazo N°32: 40 Días Calendario
 Nueva Fecha de Término de Plazo: 25 de Octubre del 2019

DATOS DE EMPRESA CONTRATISTA

RAZON SOCIAL : CONSORCIO SAN JOSE
 REPRESENTANTE LEGAL : ING. EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA
 RESIDENTE DE OBRA : ING. CHRISTIAN MEZA TRUJILLO
 REGISTRO CIP : N° 63105

DATOS SUPERVISOR EXTERNO

RAZON SOCIAL : CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGUA
 JEFE DE SUPERVISIÓN : ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
 REGISTRO CIP : N° 10717

DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO.

A la fecha se han Aprobado **27 AMPLIACIONES DE PLAZO**; las ampliaciones de plazo aprobadas son como sigue:

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 01 por 29 días, según Resolución de Secretaria General N°110-2015-FONDEPES/SG., de fecha 24.07.2015, nuevo plazo de termino 05-08-2016

Denegación de Ampliación de Plazo N° 02 por 31 días, según Resolución Jefatural N°126-2015-FONDEPES/SG, de fecha 03.09.2015.

Denegación de Ampliación de Plazo N° 03 por 47 días, según Resolución Jefatural N°204-2015-FONDEPES/SG. , de fecha 22.12.2015.

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 04 por 32 días, según Resolución Jefatural N°035-2016-FONDEPES/SG., de fecha 21.03.2016.

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 05 por 32 días, según Resolución Jefatural N°061-2016-FONDEPES/SG., de fecha 25.04.2016.

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 06 por 12 días, según Resolución Jefatural N°073-2016-FONDEPES/SG., de fecha 19.05.2016.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807
JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE
ALVA ESPINOZA



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

CONCURSO PUBLICO N°0001-
2016-FONDEPES
CONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

017

Denegación de Ampliación de Plazo N° 07 por 44 días, según Resolución Jefatural N°087-2016-FONDEPES/SG., de fecha 21.06.2016.

Denegación de Ampliación de Plazo N° 08 por 74 días, según Resolución Jefatural N°097-2016-FONDEPES/SG., de fecha 25.07.2016.

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 09 por 32 días, según Resolución de Secretaria General N°120-2016-FONDEPES/SG., de fecha 13.10.2016, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 21-11-2016

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 10 por 30 días, según Resolución de Secretaria General N°132-2016-FONDEPES/SG., de fecha 29.11.2016, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 21-12-2016

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 11 por 08 días, según Resolución de Secretaria General N°147-2016-FONDEPES/SG., de fecha 28.12.2016, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 29-12-2016

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 12 por 08 días, según Resolución de Secretaria General N°002-2017-FONDEPES/SG., de fecha 04.01.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 06-01-2017

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 13 por 48 días, según Resolución de Secretaria General N°006-2017-FONDEPES/SG., de fecha 17.01.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 23-02-2017

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 14 por 11 días, según Resolución de Secretaria General N°021-2017-FONDEPES/SG., de fecha 22.02.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 06-03-2017

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 15 por 53 días, según Resolución de Secretaria General N° 031-2017-FONDEPES/SG., de fecha 26.03.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 28-04-2017

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 16 por 60 días, quedando consentida al no haberse pronunciado la Entidad dentro del plazo establecido en el RLCE, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 27-06-2017


Aprobación de Ampliación de Plazo N° 17 por 60 días, según Resolución de Secretaria General N°062-2017-FONDEPES/SG., de fecha 05.07.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 26-07-2017

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 18 por 60 días, según Resolución de Secretaria General N°094-2017-FONDEPES/SG., de fecha 08.09.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 25-10-2017


Ampliación de Plazo N°19 por 60 días, según Resolución de Secretaria General N°0119-2017-FONDEPES/SG., de fecha 03.11.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 24-12-2017.

Ampliación de Plazo N°20 por 38 días, según Resolución de Secretaria General N°0143-2017-FONDEPES/SG., de fecha 29.12.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 31-01-2018.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE
ALVA ESPINOZA


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807

Ampliación de Plazo N°.21 por 30 días, según Resolución de Secretaria General N°021-2018-FONDEPES/SG., de fecha .12.02.2018, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 02-03-2018.

Ampliación de Plazo N°.22 por 15 días, según Resolución de Secretaria General N°047-2018-FONDEPES/SG., de fecha .15.03.2018, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 17-03-2018.

Ampliación de Plazo N°.23 por 202 días, según Resolución de Secretaria General N°055-2018-FONDEPES/SG., de fecha .02.04.2018, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 05-10-2018.

Ampliación de Plazo N°.24 por 60 días, según Resolución de Secretaria General N°0178-2018-FONDEPES/SG., de fecha .19.10.2018, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 04-12-2018.

Ampliación de Plazo N°.25 por 30 días, según Resolución de Secretaria General N°225-2018-FONDEPES/SG., de fecha 10.12.2018, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 03-01-2019.

Ampliación de Plazo N°.27 por 35 días, según Resolución de Secretaria General N°008-2019-FONDEPES/SG., de fecha 17.01.2018, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 07-01-2019.

Ampliación de Plazo N°.28 por 102 días, según Resolución de Secretaria General N°026-2019-FONDEPES/SG., de fecha 08.02.2019, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 21-05-2019.


Ampliación de Plazo N°.29 por 72 días, según Resolución de Gerencia General N°096-2019-FONDEPES/GG., de fecha 31.05.2019, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 01-08-2019.


Ampliación de Plazo N°.30 por 20 días, según Resolución de Gerencia General N°130-2019-FONDEPES/GG., de fecha 05.08.2019, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 21-08-2019.

Ampliación de Plazo N°.31 por 25 días, según Resolución de Gerencia General N°141-2019-FONDEPES/GG., de fecha 28.08.2019, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 15-09-2019.

Ampliación de Plazo N°.32 por 40 días, según Resolución de Gerencia General N°155-2019-FONDEPES/GG., de fecha 24.09.2019, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 25-10-2019.

DE LA SUPERVISION


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807

Mediante contrato N°.070-2014-FONDEPES/OGA del 19-11-2014 la Entidad suscribe contrato de supervisión con el Consorcio San Francisco.

Con fecha 18-11-2015, La Entidad resuelve el contrato con el Supervisor a quien la Entidad envió previamente la Carta N°. 329-2016-FONDEPES-2015/SG del 16-11-2015 en la que le comunicaba al



contratista de la Supervisión Consorcio SAN FRANCISCO la decisión de resolver el contrato "por el incumplimiento de obligaciones contractuales"

A partir del 19-11-2015 al 31-03-2016 se hace cargo del control de la obra el Ingeniero Víctor Huamán Landa con Registro CIP 60004, en calidad de INSPECTOR.

Se desconoce las formalidades de su contratación, así como la causal de su cese.

A partir del 01-04-2016 al 20-07-2016 se hace cargo del control de la obra el Ingeniero Carlos Sanabria Esquiche con Registro CIP 73363, en calidad de INSPECTOR.

Igualmente se desconoce las formalidades de su contratación, así como la causal de su cese.

Con fecha 19-07-2016 la Entidad suscribe con EL Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga el contrato N°.013-2016-FONDEPES/OGA para la supervisión del "Saldo de la obra Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José"

Inicialmente designa como Jefe de Supervisión al Ingeniero Miguel Carranza Haro con CIP 55000, quien ejerce hasta el 06-10-2016.

Por razones propias de la Entidad, esta, le comunica al Supervisor, el "cambio" del Jefe de Supervisión Ing. Miguel Carranza Haro

El Supervisor propone al Ing. Isaías Jorge Alva Espinoza con Registro CIP 10717.

Mediante Carta N°. 551-2016-FONDEPES/OGA del 06-10-2016, la Entidad "aprueba el cambio de Jefe de Supervisión" (...) designando como nuevo Jefe de Supervisión al Ing. Isaías Jorge Alva Espinoza".


A partir del 07-10-2016, el suscrito inicia las labores de control técnico de la obra hasta el 06 de Marzo del 2017. Fecha en que culmina el plazo de los servicios, teniendo en cuenta que hasta esa fecha se cubrieron los montos permisibles según el Reglamento para la prestación.

Sin embargo, la Entidad ha suscrito un Acta simple con la Supervisión (07-03-2017) en la que "le comunica la suspensión temporal" de los servicios, "hasta la aprobación del adicional 07"-


A partir del mes de Setiembre 2017, la Entidad comunica a la Supervisión la reanudación de los servicios, en base a que se nos concedió Ampliaciones plazo "automáticas" paralelamente a las ampliaciones concedidas al contratista de la obra.

Sin embargo, no se ha tenido en cuenta lo indicado en el Artículo 34.4 de la Ley de Contrataciones del Estado que expresa:

"Asimismo, el Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios según corresponda. En este último supuesto, el monto hasta por el cual se pueden aprobar prestaciones adicionales de supervisión debe ser proporcional al incremento del monto de obra como máximo, no siendo aplicable para este caso el límite establecido en el numeral 34.2 del presente artículo".


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA



MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE
ALVA ESPINOZA

	PERU	Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	CONCURSO PUBLICO N°0001- 2016-FONDEPES CONTRATO N°013-2016- FONDEPES
---	------	--------------------------------	--	---

CONTROL DE AVANCE DE OBRA


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE
ALVA ESPINOZA



CONTROL DE AVANCE DE OBRA

a). Descripción

El proyecto tiene como objetivo el de dar el "Suficiente acceso a Recursos hidrobiológicos de Calidad que cumplan con la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (DS N° 040-2001-PE) en la Caleta de San José, Santa Rosa y Pimentel".

La Entidad Contratante FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO, como resultado del proceso de selección de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES derivada de la Licitación Pública N° 004-2014-FONDEPES, encarga a la Empresa Contratista "CONSORCIO SAN JOSE", mediante Contrato de Ejecución de Obra N° 082-2014-FONDEPES/OGA la ejecución de la Obra "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION DE LAMBAYEQUE", de acuerdo a toda la documentación que conforman el Expediente Técnico contractual.

La entidad aprobó el expediente técnico original el cual a través de sus respectivas deficiencias tuvo lugar a la elaboración de adicionales de obra así como deductivos vinculantes, reducciones como también esto genera la ampliación de plazo respectiva.

Cabe precisar que, la potestad de la Entidad de ordenar la ejecución de prestaciones adicionales responde al reconocimiento de su calidad de garante del interés público en los contratos que celebra con los proveedores, para abastecerse de los bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de las funciones que le ha conferido la ley.

Es importante señalar que por deficiencia del expediente técnico se generara la necesidad de la aprobación de prestaciones adicionales de obra por parte de la Entidad, esto cuando los estudios que lo conforman (estudios de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental, etc.) presenten información incorrecta que no guarde relación con la realidad, precisando que la Entidad es responsable frente al contratista del contenido del expediente técnico en tanto forma parte de las Bases que han sido elaboradas por aquella y de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares, de conformidad con el primer párrafo del artículo 153 del Reglamento

b) Avance físico de obra.

Se anexa el avance físico referente al Adicional N°10.

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807



PERU


Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroCONCURSO PÚBLICO N°0001-
2016-FONDEPES
CONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

c) Cronograma de Avance De Obra y comentario específico

Al mes de Setiembre del 2019, se ha ejecutado un total acumulado de 99.72%, de las partidas ejecutadas del Adicional N° 10, contra un Avance Programado de Obra acumulado del 100.00 %, por lo tanto, el Adicional N° 10 se encuentra atrasado de acuerdo al cronograma, sin embargo, no requiere presentar un cronograma actualizado.

Comunicamos que a la fecha ya se tiene la conformidad de obra por parte de ENSA, además, la entidad no entrega los documentos a ENSA para la firma de contrato respectivo la cual es indispensable para la electrificación del DPA.

Mes de Valorización	Porcentaje Ejecutado Acumulado	Porcentaje Programado
Valorización N° 07	99.72%	100.00 %

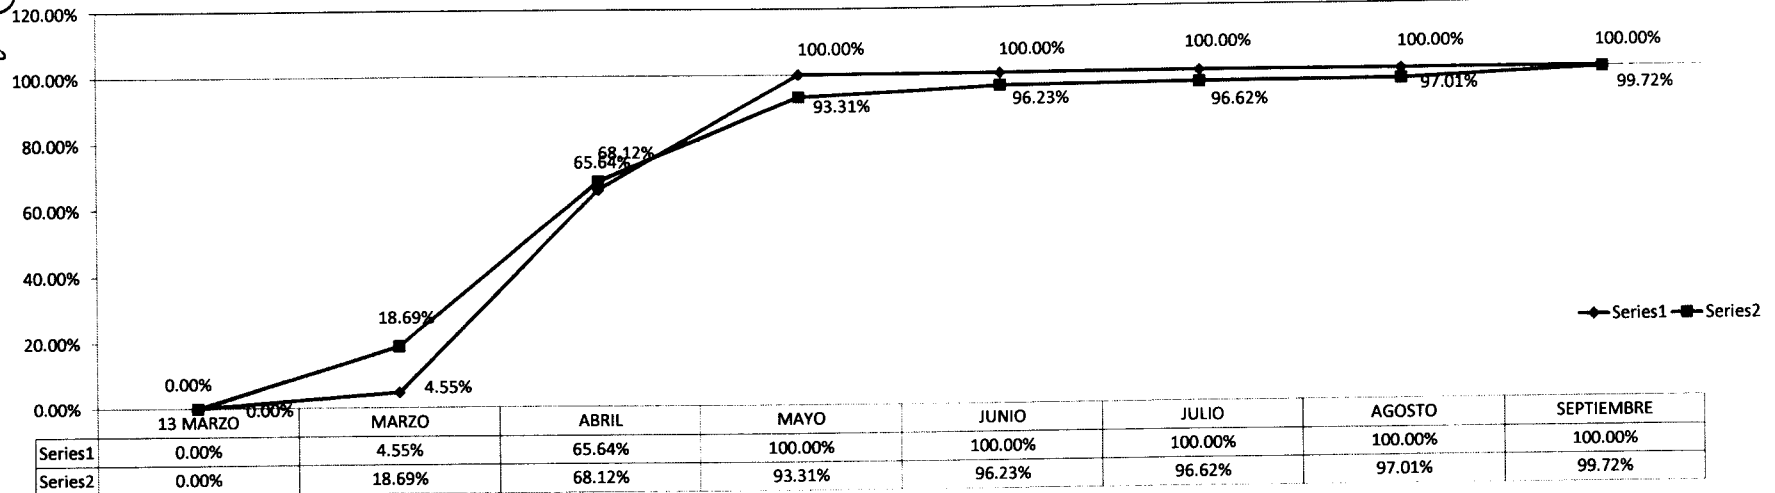

 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
 RUC: 10106595807


 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 10717

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717


MENDOZA HONORIO CALLOS HUAMBERTO
RUC: 1010699907

CONTROL DE AVANCE FISICO DE OBRA - ADICIONAL N° 10



FECHA	AVANCE FISICO PROGRAMADO		% DE AVANCE PROGRAMADO		PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO				BALANCE			
	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE FISICO PROGRAMADO	AVANCE FISICO PROGRAMADO	% DEL MES	% ACUMULADO	AVANCE FISICO DEL MES ACUMULADO (S/.)	AVANCE FISICO DEL MES (EJECUTADO)	AVANCE FISICO DEL MES (ACUMULADO)	DESFASE DE OBRA (%AFAP) %AFAP	CONDICION DE OBRA (%AFAP) > 8%	
13 MARZO					0.00%	0.00%			0.00%	0.00%		
MARZO	13/03/2019	31/03/2019	S/. 16,565.63	S/. 16,565.63	4.55%	4.55%	S/. 68,027.56	S/. 68,027.56	18.69%	18.69%	14.14%	OK
ABRIL	01/04/2019	30/04/2019	S/. 222,386.55	S/. 238,952.18	61.09%	65.64%	S/. 179,957.01	S/. 247,984.57	49.44%	68.12%	2.48%	OK
MAYO	01/05/2019	26/05/2019	S/. 125,073.32	S/. 364,025.50	34.36%	100.00%	S/. 91,703.53	S/. 339,688.10	25.19%	93.31%	-6.69%	OK
JUNIO	01/06/2019	30/06/2019	S/. 0.00	S/. 364,025.50	0.00%	100.00%	S/. 10,624.24	S/. 350,312.34	2.92%	96.23%	-3.77%	OK
JULIO	01/07/2019	31/07/2019	S/. 0.00	S/. 364,025.50	0.00%	100.00%	S/. 1,412.19	S/. 351,724.53	0.39%	96.62%	-3.38%	OK
AGOSTO	01/08/2019	31/08/2019	S/. 0.00	S/. 364,025.50	0.00%	100.00%	S/. 1,412.19	S/. 353,136.72	0.39%	97.01%	-2.99%	OK
SEPTIEMBRE	01/09/2019	15/09/2019	S/. 0.00	S/. 364,025.50	0.00%	100.00%	S/. 9,881.25	S/. 363,017.97	2.71%	99.72%	-0.28%	OK
TOTAL			S/. 364,025.50				S/. 363,017.97					

CONTROL DE OBRA


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE
ALVA ESPINOZA



CONTROL DE OBRA

a) Control de Campo

DEL ADICIONAL N° 10

Se realizaron las siguientes partidas con su respectivo metrado.

VALORIZACIÓN N° 07 - SETIEMBRE 2019 - ADICIONAL DE OBRA N° 10 INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSIÓN			
OBRA	: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"		
ENTIDAD	: FONDEPES		
01	MEDIA TENSIÓN 10-22.9KV		
01.16	PRUEBAS ELECTRICAS Y PRUEBAS DE SERVICIO		
01.16.03	COSTO DE CONEXIÓN Y ENERGIZACIÓN DE LA RED	g/b	0.50

**b) Descripción de las ocurrencias técnicas realizadas en obra
DEL ADICIONAL N° 10**

Las ocurrencias de trámite técnico administrativo se anotaron en el Cuaderno de obra cuyas copias se adjunta al presente Informe

c) Control de calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos

Se anexan a la presente los protocolos de hincados de pilote



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 10717

d) Pruebas de Calidad de agregados.

No se realizó adicionalmente ninguna otra prueba por no ser necesario

e) Diseño de Mezclas para los diferentes tipos de concreto

No se realizó adicionalmente ninguna otra prueba por no ser necesario


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
 RUC: 10106595807

f) Pruebas de Compactaciones o densidad de campo

No se realizó adicionalmente ninguna otra prueba por no ser necesario

g) Pruebas hidráulicas en redes de desagüe, redes de agua, pruebas eléctricas, verificación de cumplimiento de especificaciones de electrobombas, limpieza y desinfección de cisternas, correcto funcionamiento de aparatos sanitarios, eléctricos, electrobombas y otros.

No se realizaron ninguna prueba por no ser necesarios.



h) Recursos Utilizados durante el mes

LISTA DE MAQUINAS Y EQUIPOS QUE SE VIENE UTILIZANDO EN OBRA

GRUA TELESCOPICA GROVE	40 TN
GRUA ORUGA LINK BELT LS 108-B	40 TN
CARGADOR FRONTAL VOLVO L180C	
MINI CARGADOR BOT CAT S250 N°21	
COMPRESORA DE AIRE ATLAS	
ARENADORA	
TROMPO MEZCLADOR DE CONCRETO	
MOTOSOLDADORA MILLER 402D	


PERSONAL TECNICO Y OFICINA

Ing. Residente de Obra	: Ing. Christian Meza Trujillo
Maestro de Obra	: Jorge Luis Díaz Ruiz.

PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR EN OBRA

- 02 maniobristas de muelle
- 03 operadores de máquinas
- 02 soldadores
- 06 peones
- 02 vigilantes turno día
- 02 vigilantes turno noche


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807

Personal Profesional:

01 Gerente de Proyecto	: Ing. Julio César Incio Carrillo
01 Ing. Residente de Obra	: Ing. Christian Meza Trujillo
01 Administrador de Obra	: Ing. Ludwig Benito Retamozo Martínez
01 Asistente de Residente de Obra	: Ing. Richard Javier Tapia Rosazza
01 Especialista en Estructuras	: Ing. Romer Iván Lovon Dávila
01 Esp. en Mecánica de Suelos	: Ing. Fidel Juvenal Ramírez Aguilar
01 Esp. en Seguridad de Obra	: Ing. Eddy Solano Espinoza Escalante
01 Especialista en Sanitarias	: Ing. Chong Tang Julio Tay Wo
01 Esp. en Metrados y Valorizaciones	: Ing. Jhonny Alan Huamán Porles

Personal técnico:

01 Almacenero	: Sr. Luis Saire Quilca
04 Guardianes	: Sr. Santos Hipólito Muñoz Silva
	: Sr. Christian Alex Montalvo Valera



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

CONCURSO PÚBLICO N°0001-
2016-FONDEPES
CONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

027

: Sr. Julio Rubio Flores
: Sr. José Neiro Lozano Carrasco
01 Topógrafo : Sr. Jorge Luis, Díaz Ruiz
01 Asistente de Ingeniería : Sr. Rojer Job Navarro Tello
01 Asistente Contable : Srta. Camani Lobaton María Elena

Personal de la Supervisión

01 Jefe de supervisión : Ing. Isaiás Jorge Alva Espinoza

- i) **Control de Supervisión en la Prevención de Riesgos (seguridad) y Control y supervisión ambiental informe de las actividades de supervisión ambiental realizadas durante el mes**

Se anexa lo correspondiente.

DE LOS ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA

A la fecha se ha emitido las siguientes Resoluciones de Adicionales y Deductivos de Obra

ADICIONALES.-

Aprobación de Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 01 por S/. 326,464.23 nuevos soles, según Resolución Jefatural N°280-2015-FONDEPES/J., de fecha 04.09.2015, por mayor metrado en la Viga Puente (concreto y acero)

Aprobación de Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 02 por S/. 449,323.12 nuevos soles, según Resolución Jefatural N°078-2016-FONDEPES/J, de fecha 09.03.2016, por variación de la dimensión de la roca por otra de menores dimensiones y cambio de especificación,


Aprobación de Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 03 por S/. 86,170.63 nuevos soles, según Resolución Jefatural N°093-2016-FONDEPES/J., de fecha 22.03.2016, por "empalme de la vía de acceso a la plataforma", que origina a su vez un Deductivo vinculante N° .02

Aprobación de Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 04 (S/. 579,080.87 nuevos soles) "por mayores metrados en Tanque elevado, parapetos, cisterna, mayor metrado en capas de afirmado y en obras de mar: Aplicación de epóxico para unión de concreto nuevo con antiguo, así como partida nueva, fabricación de mesas de concreto, además de la aprobación del Deductivo Vinculante N° 02 (S/. 446.29 nuevos soles), "menor metrado de puertas de madera y menor metrado en puertas de madera", ambos fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N°253-2016-FONDEPES/J., de fecha 08.07.2016.

Aprobación de Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 05 (S/. 397,091.44 nuevos soles) por nuevas partidas y mayores metrados de Instalaciones Sanitarias, además de reducciones de obra sanitarias N° .03" la misma que ha sido aprobada mediante Resolución N° .355-2016-FONDEPES/J del 29-11-2016

Aprobación de Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 06 por S/. 1'377,727.34 (inc. IGV) y Deductivo Vinculante N° .04 por S/. 242,094.96 (inc. IGV), mediante Resolución Jefatural N° .370-2016-FONDEPES/J del 29-12-2016, que corresponden a partidas nuevas de " Estructuras, Arquitectura e

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807


JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

CONCURSO PUBLICO N°000
2016-FONDEPES
CONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

028

Instalaciones Eléctricas" así como mayores metrados del presupuesto contratado y Reducciones de obra que constituyen Deductivos vinculantes, según el siguiente detalle:

- Adicional N°.06 : Obras en Tierra : S/.1'091,070.91 (79%) (Ejecutables)
- Partidas Nuevas : S/. 577,067.10
- Mayores Metrados : S/. 514,903.81

- Adicional N°. 06 : Obras en Mar : S/. 285,756.46 (21%) (CONCLUIDA)

Aprobación del Expediente Técnico de Prestación Adicional N°07 por el monto de S/.1'532,420.43 (inc. IGV) y Deductivo Vinculante N°.05 por S/. 620,840.66 (inc. IGV), mediante Resolución Jefatural N°.025-2018-FONDEPES/J del 06-03-2018.

Aprobación del Expediente Técnico de Prestación Adicional N°08 por el monto de S/.960,977.20 (inc. IGV) y Deductivo Vinculante N°.06 por S/. 479,845.97 (inc. IGV), mediante Resolución Jefatural N°.031-2018-FONDEPES/J del 06-03-2018.

Aprobación del Expediente Técnico de Prestación Adicional N°11 por el monto de S/.507,464.86 (inc. IGV) mediante Resolución Jefatural N°.001-2019-FONDEPES/J del 03-01-2019.

Aprobación del Expediente Técnico de Prestación Adicional N°12 por el monto de S/.721,493.57 (inc. IGV) y Deductivo Vinculante N°.09 por S/. 1,085,870.92 (inc. IGV), mediante Resolución Jefatural N°.001-2019-FONDEPES/J del 06-03-2018.

Aprobación del Expediente Técnico de Prestación Adicional N°10 por el monto de S/. 429,550.09 (incl. IGV) y su Deductivo Vinculante N°08 por S/. 186 912,30 (inc. IGV), mediante Resolución Jefatural N°025-2019-FONDEPES/J.

Aprobación del Expediente Técnico de Prestación Adicional N°09 por el monto de S/.787,405.98 (inc. IGV) y Deductivo Vinculante N°.07 por S/.492,348.16 (inc. IGV), mediante Resolución Jefatural N°.066-2019-FONDEPES/J del 02-05-2019.

Aprobación del Expediente Técnico de Prestación Adicional N°13 por el monto de S/.243,429.89 (inc. IGV) mediante Resolución Jefatural N°.105-2019-FONDEPES/J del 10-07-2019.

REDUCCIONES DE OBRA

En el trámite de aprobación de los menores metrados u otras partidas que no se van a ejecutar, se ha considerado el término "Reducciones de Obra", que finalmente resultan "Deductivos de Obra".

La ley y su reglamento siempre hacen mención de "Presupuestos deductivos" que pueden ser vinculantes o no, mas no utiliza el término "Reducción".

En ese sentido se han aprobado y/o se encuentran en vías de aprobación los siguientes:


Aprobación de Expediente Técnico de Reducción N° 01 (S/. 2'065,875.97 nuevos soles) "por menor metrado de pilotes y losas nervadas considerados en el presupuesto de obra". según Resolución Jefatural N°044-2016-FONDEPES/J., de fecha 05.04.2016.


Reducción de obra N° 02 (S/. 11,230.40 nuevos soles) por menor metrado de "mejoramiento de terreno con piedra over en la conformación de la subrasante" según Resolución Jefatural N°044-2016-FONDEPES/J., de fecha 05.04.2016.

Reducción de obra N° 03 que consiste "En la no ejecución de partidas de Estructuras, Arquitectura del presupuesto contractual" por (S/. 418,002.69)

El 19-10-2016 mediante Resolución de Secretaria General N° .122-2016—FONDEPES/SG se aprueba la Reducción de obra N°.03

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595007

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717



Reducción de obra N° 04 que consiste "Reducción de uno de los dos productores de hielo considerado en el presupuesto" por S/.479,845.97

El 19-10-2016 mediante Resolución de Secretaria General N°.122-2016—FONDEPES/SG se aprueba la Reducción de obra N°.04

Reducción de obra N° 05 "barandas de Tubería de acero en puente y escalinatas del embarcadero" por (S/. 1'054,073.06)

El 19-10-2016 mediante Resolución de Secretaria General N°.122-2016—FONDEPES/SG se aprueba la Reducción de obra N°.05

DEDUCTIVOS DE OBRA VINCULANTES.-

Estos Deductivos son resultado de un "comparativo" entre los metrados del presupuesto y los metrados realmente verificados y/o ejecutados.

Deductivo vinculante N°.01 por s/.450,814.30 según Resolución Jefatural N°078-2016-FONDEPES/J. por variación de la dimensión de la roca por otra de menores dimensiones y cambio de especificación,

Deductivo vinculante N°.02 por s/.446.29 según Resolución Jefatural N°253-2016-FONDEPES/J., de fecha 08.07.2016.

Deductivo vinculante N°.03 por S/.152,971.09 según Resolución Jefatural N°355-2016-FONDEPES/J., de fecha 29.11.2016.

Deductivo vinculante N°.04 por S/.242,094.96 según Resolución Jefatural N°370-2016-FONDEPES/J., de fecha 29.12.2016.

Deductivo vinculante N°.05 por S/.620,840.66 según Resolución Jefatural N°025-2018-FONDEPES/J., de fecha 29.12.2016.

PARTIDAS NUEVAS.-

Dentro de los adicionales se ha considerado nuevas partidas que al no tener referencia con las partidas del presupuesto han originado nuevas partidas, nuevas especificaciones técnicas y nuevos precios (pactados) así como nuevas F.P:

COMENTARIOS Y EVALUACION DE LO ACTUADO.-

De lo tramitado y ejecutado a la fecha se ha podido verificar lo siguiente:

Del Inicio de los Trabajos.-

Se tiene entendido que el Expediente Técnico (en base al perfil) tuvo como referencia de ubicación de la infraestructura pesquera, coordenadas diferentes al actual, como consecuencia de la modificación, el inicio del muelle se vio diferido y advertido por el INC de estar el "inicio" dentro de "zona reservada".


Esta situación al parecer se origina cuando se solicitó autorización a la Capitania de Puerto para iniciar los trabajos.

Lo cierto es que la ubicación original de la obra se desplazó 80.00 m. aproximadamente de la ubicación original.


Durante los Trabajos.-

Como se detalla líneas arriba durante el proceso constructivo se ha verificado numerosas deficiencias, tanto en los planos del proyecto, así como mayores y menores metrados que han originado adicionales, deductivos y "reducciones", así como numerosas omisiones que han originado nuevas partidas no consideradas originalmente en el presupuesto de obra.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 1010699607

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE
ALVA ESPINOZA


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717



Sin embargo, algunos presupuestos adicionales reflejan un superposición de especialidades, por ejemplo, (arquitectura + estructuras + otras especialidades), que no permiten una objetivación más precisa de la variación de cada una de las especialidades. Cada adicional ha debido tratarse individualmente respecto a determinada especialidad.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta lo considerado por la ley del reglamento de contrataciones del Estado

Responsabilidad de la Entidad.- *“La Entidad es responsable frente al contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares”*

En lo que respecta al adicional N°.07, este se origina, debido a la constatación de roca en el fondo marino a partir de la progresiva 0+500 al 1+000, que no se puede determinar si es en toda el área del mar a esa profundidad o si es localizado.


De ser en toda el área adyacente, se tendría una omisión de quien elaboro el perfil y luego el expediente técnico, al no haber realizado los trabajos de sondaje o verificaciones batimétricas previas en el trazo del muelle, que hubieran podido identificar la presencia de roca en toda el área.

En cambio de haber efectuado esta verificación (demostrada) de la NO existencia de roca en dicho trazo, el hecho de haber determinado una nueva ubicación, (desplazamiento 80.00 m. más arriba de la ubicación original) habría originado este Adicional que podría atribuirse como caso fortuito.

A fines del mes de Octubre del 2017 un consultor externo inicio trabajos de sondajes en el fondo marino (José Atala).

En el mes de Diciembre del 2017 el Consultor Externo hizo entrega del Estudio de Mecánica de Suelos en el que determino los estratos por debajo del nivel de las aguas marinas hasta una profundidad de de 8-9m. a partir del nivel de la plataforma del muelle, recomendando sin embargo realizar pruebas diamantinas hasta una profundidad mínima de 20.00m. para definir con mayor precisión el tipo de suelo submarino predominante, y se recomendó así mismo realizar previamente una prueba de pilotaje con punta reforzada, lo que permitiría tener una aproximación del comportamiento del equipo de hincado.

El 31-01-2018, se constituyó en obra el Consultor Alberto Martínez Vargas, quien a nombre de Fondepes, realizo las pruebas de perforación diamantina en el tramo 0+500 al 1+000 y de acuerdo a los resultados, se complementaría definir el tipo de cimentación a adoptar en dicho tramo.



MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA
CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN
JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA
DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"
ADICIONAL DE OBRA N° 10**

SEPTIEMBRE – 2019


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807


ISAIÁS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

**CONSORCIO
SAN JOSÉ**

 **FONDEPES**
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

CONSORCIO SAN JOSÉ	INFORME MENSUAL N° 07	SEPTIEMBRE - 2019
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 1 de 14

ÍNDICE

1. DATOS DE LA OBRA.....2

2. INTRODUCCIÓN.....2

3. OBJETIVO2

4. ALCANCE2

5. ORGANIGRAMA3

6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL3

7. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL7

8. ESTADÍSTICAS SST.....12

**9. REPORTE MENSUAL DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE14**

10. CONCLUSIONES15

11. RECOMENDACIONES.....15

12. PANEL FOTOGRÁFICO16

Carlos Humberto
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
 RUC: 10196595807

Jorge Alva Espinoza
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 10717

CONSORCIO SAN JOSÉ	INFORME MENSUAL N° 07	SEPTIEMBRE - 2019
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 2 de 14

033

1. DATOS DE LA OBRA

“Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”.

TIEMPO DE EJECUCIÓN : 75 días calendarios
FECHA DE INICIO : 13 de Marzo del 2019

2. INTRODUCCIÓN

Consortio San José, viene ejecutando la obra: “Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”, en su adicional de obra N°10; para lo cual se espera conseguir la máxima identificación y compromiso por parte de la Dirección y de todos los trabajadores con los principios de Seguridad, Salud en el Trabajo y Conservación del Medio Ambiente, cumpliendo así con el Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente elaborado para la obra.

3. OBJETIVO

Demostrar la gestión del Consorcio San José, referente a Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente en el mes de SEPTIEMBRE del 2019.

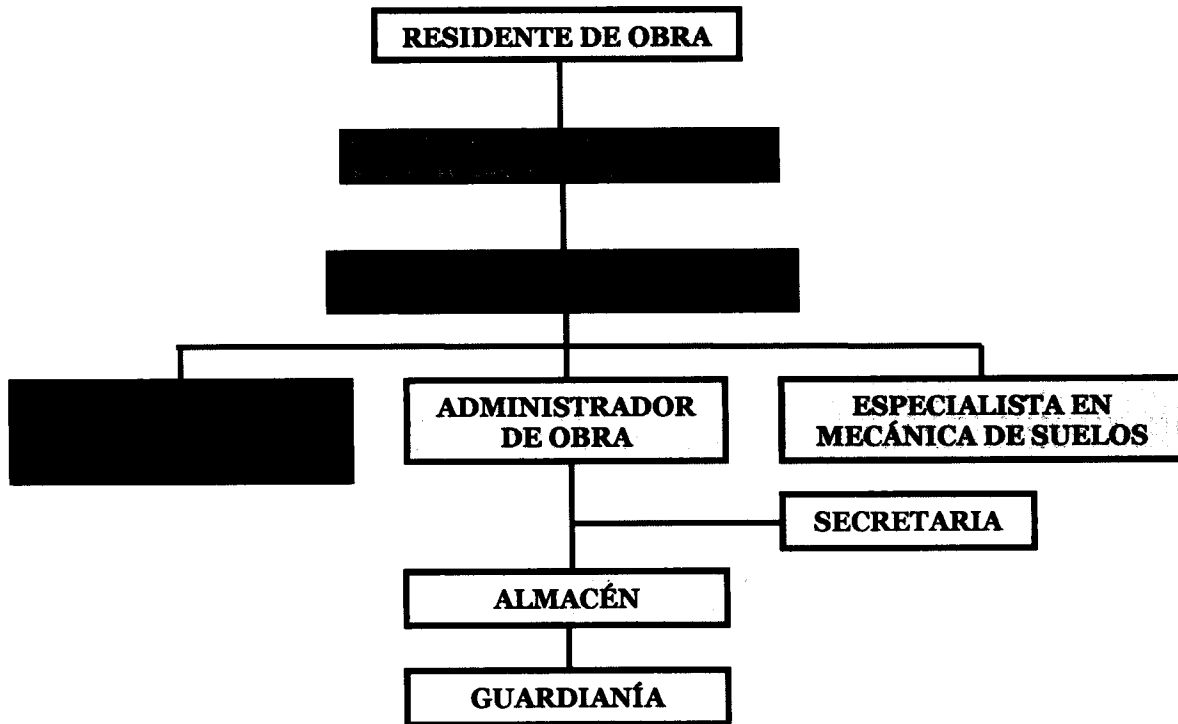
4. ALCANCE

El presente informe plasma todas las actividades realizadas referentes a Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente en la Obra: “Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”.


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
 RUC: 10106595807


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 10717

5. ORGANIGRAMA



6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

6.1. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO SAN JOSÉ	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"																						
	MEDIA TENSIÓN																						
MES	HERRAM. MANUAL		HERRAM. ELECTR.		EXTINTORES		BOTIQUINES		CABLES		EPPs		ARMOS		ALUMBRADOS		VEHICULO		SEÑALIZACION		TOTAL	EFICIENCIA	EFICIENCIA
	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.			
MARZO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	8	100%	100%
ABRIL	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	0	0	0	0	1	2	8	100%	100%
MAYO	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	0	0	0	0	1	3	8	100%	100%
JUNIO	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	0	0	0	0	1	4	8	100%	100%
JULIO	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	100%	100%
AGOSTO	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	0	0	0	0	1	5	8	100%	100%
SEPTIEMBRE	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	100%	100%
TOTAL INSPECCIONES	5		5		5		5		5		5		5		0		0		5		40	40	

MENDOZA PICAGA CARLOS HUMBERTO
 RUC: 10106595307

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 SEPTIEMBRE - 2019
 Reg. CIP N° 10717

035

6.2. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CONSORCIO SAN JOSÉ							
		"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"					
		MEDIA TENSIÓN					
1	02/09/2019	LUNES	0	0	0	0	0
2	03/09/2019	MARTES	0	0	0	0	0
3	04/09/2019	MIÉRCOLES	0	0	0	0	0
4	05/09/2019	JUEVES	0	0	0	0	0
5	06/09/2019	VIERNES	0	0	0	0	0
6	07/09/2019	SÁBADO	0	0	0	0	0
7	09/09/2019	LUNES	0	0	0	0	0
8	10/09/2019	MARTES	0	0	0	0	0
9	11/09/2019	MIÉRCOLES	0	0	0	0	0
10	12/09/2019	JUEVES	0	0	0	0	0
11	13/09/2019	VIERNES	0	0	0	0	0
12	14/09/2019	SÁBADO	0	0	0	0	0
13	16/09/2019	LUNES	0	0	0	0	0
14	17/09/2019	MARTES	0	0	0	0	0
15	18/09/2019	MIÉRCOLES	0	0	0	0	0
16	19/09/2019	JUEVES	0	0	0	0	0
17	20/09/2019	VIERNES	0	0	0	0	0
18	21/09/2019	SÁBADO	0	0	0	0	0
19	23/09/2019	LUNES	0	0	0	0	0
20	24/09/2019	MARTES	0	0	0	0	0
21	25/09/2019	MIÉRCOLES	0	0	0	0	0
22	26/09/2019	JUEVES	0	0	0	0	0
23	27/09/2019	VIERNES	0	0	0	0	0
24	28/09/2019	SÁBADO	0	0	0	0	0
25	30/09/2019	LUNES	0	0	0	0	0
TOTAL			0	0	0	0	0

Carlos Humberto
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
 RUC: 10106595807

Isaias Jorge Alva Espinoza
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 10717

CONSORCIO SAN JOSÉ	INFORME MENSUAL N° 07	SEPTIEMBRE - 2019
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 5 de 14

036

6.3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

6.3.1. INDUCCIÓN


En el presente mes de SEPTIEMBRE no se realizó inducción de personal nuevo, debido a que en el frente de trabajo del adicional N° 10 no se realizó trabajos.

6.3.2. CAPACITACIÓN

En el presente mes SEPTIEMBRE no se realizó capacitación a los trabajadores.


6.3.3. CHARLA 10 MINUTOS

En este mes no se han desarrollado ninguna actividad en lo que corresponde los trabajos del Adicional N° 10. Por lo tanto no se ha registrado ningún tipo de capacitaciones, ni charlas de 10 minutos, teniendo un total de (00) cero horas hombres capacitados; abarcando temas de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente para el personal de campo y técnico, los mismos que se detallaron en el Cronograma Mensual de Reuniones Diarias.


MENDOZA PICCAGA CARLOS HUMBERTO
 RUC: 10106595807


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 10717

CONSORCIO SAN JOSÉ		SEPTIEMBRE						
2019	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"							
MEDIA TENSIÓN								
1	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	02/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
2	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	03/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
3	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	04/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
4	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	05/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
5	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	06/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
6	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	07/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
7	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	09/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
8	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	10/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
9	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	11/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
10	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	12/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
11	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	13/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
12	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	14/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
13	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	16/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
14	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	17/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
15	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	18/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
16	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	19/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
17	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	20/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
18	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	21/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
19	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	23/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
20	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	24/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
21	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	25/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
22	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	26/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
23	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	27/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
24	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	28/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
25	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	30/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
 RUC: 10106595807


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 10717

CONSORCIO SAN JOSÉ	INFORME MENSUAL N° 07	SEPTIEMBRE - 2019
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 7 de 14

038

7. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

No se realizó actividades de trabajo en el mes de SEPTIEMBRE, pero sin embargo el cronograma de Actividades de Plan de Gestión Ambiental sigue vigente.

Para ejecutar estas actividades se vienen aplicando los respectivos documentos, procedimientos y permisos debidamente aprobados, que permitan implementar el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente durante la fase de ejecución de la Obra.

7.1. COMPONENTES AMBIENTALES AFECTADOS PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES


En el presente mes no se produjo ningún tipo de impacto ambiental debido a que en el frente de trabajo del adicional N° 10 no se realizaron trabajos.

7.2. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN LOS COMPONENTES AMBIENTALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE

En el presente mes no se produjo ningún tipo de impacto ambiental debido a que en el frente de trabajo del adicional N° 10 no se realizaron trabajos.

7.3 ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL FRENTE A LOS IMPACTOS GENERADOS

La estrategia de manejo ambiental, garantiza que la ejecución de las acciones y medidas de mitigación propuestas sean lo más objetivas y realistas posibles, a fin de que las posibles alteraciones que puedan producirse en el medio ambiente, encuentren una respuesta y sean minimizadas y/o mitigadas.


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

CONSORCIO SAN JOSÉ	INFORME MENSUAL N° 07	SEPTIEMBRE - 2019
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 8 de 14

Las medidas ambientales de los impactos negativos generados por la ejecución de las actividades de la etapa de construcción de la obra sobre el medio ambiente, son planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, pero hay algunas medidas adicionales propuestas y ejecutadas durante el desarrollo de las actividades, necesarias para controlar, prevenir, evitar y/o compensar los impactos.


7.4. MEDIDAS DE CONTROL FRENTE A LOS IMPACTOS AMBIENTALES

En el presente mes no se han efectuado medidas de control debido a que no se produjo ningún tipo de impacto ambiental en el frente de trabajo.

7.5. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Durante la ejecución de las actividades en la obra, no se han generado residuos sólidos debido a que en el frente de trabajo del adicional N°10 no se realizaron trabajos.

CONSORCIO SAN JOSÉ	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE	
	MEDIA TENSIÓN	
AMARILLO	Materiales metálicos, fierros, etc.	0.0
AZUL	Materiales hechos de papel y cartón.	0.0
BLANCO	Materiales donde su compuesto es de plástico.	0.0
VERDE	Materiales de vidrio, cerámica y porcelanato.	0.0
MARRÓN	Restos de alimentos, madera, jardinería, etc.	0.0
ROJO	Recipientes de sustancias químicas.	0.0


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
 RUC: 10106595807


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 10717

CONSORCIO SAN JOSÉ	INFORME MENSUAL N° 07	SEPTIEMBRE - 2019
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 9 de 14

0-20


7.6 REPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS

7.6.1. REPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

CONSORCIO SAN JOSÉ				
		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE		
		MEDIA TENSION		
Restos de alimentos	Kg.	0.0	21.0	Ninguna
Papel/Cartón	Kg.	0.0	9.3	Ninguna
Bolsas de papel plastificadas (Cemento, etc.)	Kg.	0.0	6.0	Ninguna
Plastico PVC (Botellas, tubos, envases y acrilicos)	Kg.	0.0	10.3	Ninguna
Tecknopor	Kg.	0.0	0.0	Ninguna
Chatarra y cable eléctricos	Kg.	0.0	15.0	Ninguna
Madera	Kg.	0.0	4.0	Ninguna
Residuos de vidrio/ cerámica	Kg.	0.0	0.0	Ninguna
		0.0	65.6	

7.6.2. REPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

CONSORCIO SAN JOSÉ				
		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE		
		MEDIA TENSION		
Recipientes de sustancias quimicas	Kg.	0.0	2.0	Ninguna
		0.0	2.0	


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
 RUC: 10106595807


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 10717

041

8. ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO SAN JOSÉ		"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE DISTRITO DE SAN JOSE. PROVINCIA DE LAMBAYEQUE REGION LAMBAYEQUE"													
		MEDIA TENSIÓN													
Mes	N° trabajadores	N° Accidente mortal	N° Accidente leve	ACCIDENTE INCAPACITANTE						ENFERMEDAD OCUPACIONAL				N° incidentes peligrosos	N° incidentes
				N° Accidente incapacitante	Total horas homaje trabajadas	N° días perdidos	Índice frecuencia	Índice gravedad	Índice accidentalidad	N° enfermedades ocupacionales	N° trabajadores expuestos al agente	Tasa de incidencia	N° trabajadores con cáncer profesional		
MARZO	12	0	0	0	2540.00	0	0.00	0.00	0.00	0	12	0.00	0	0	0
ABRIL	6	0	0	0	1152.00	0	0.00	0.00	0.00	0	6	0.00	0	0	0
MAYO	6	0	0	0	1254.00	0	0.00	0.00	0.00	0	6	0.00	0	0	0
JUNIO	6	0	0	0	1152.00	0	0.00	0.00	0.00	0	6	0.00	0	0	0
JULIO	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0
AGOSTO	20	0	0	0	3880.00	0	0.00	0.00	0.00	0	20	0.00	0	0	0
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0
TOTAL ACUMULADO		0.00	0.00	0.00	9726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INCIDENTE: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que estas sólo requieren cuidados de primeros auxilios.
 INCIDENTE PELIGROSO: Suceso que potencialmente puede causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.
 ACCIDENTE LEVE: Suceso cuya lesión, genera en el accidentado un descanso breve con retorno mínimo al día siguiente a sus labores habituales.
 ACCIDENTE INCAPACITANTE: Suceso cuya lesión, da lugar a descanso, sustracción justificada al trabajo y tratamiento.
 ACCIDENTE MORTAL: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.
 ENFERMEDAD OCUPACIONAL: Es una enfermedad ostraída o cura resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo.

CM
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
 RUC: 10106595807

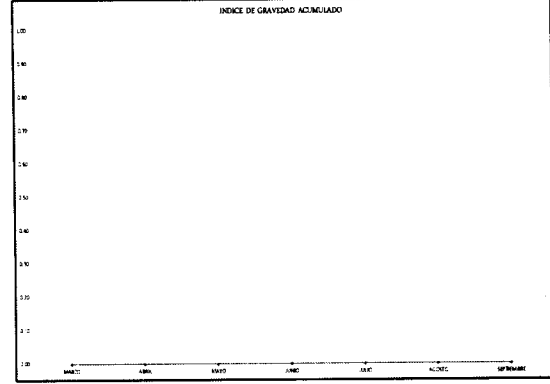
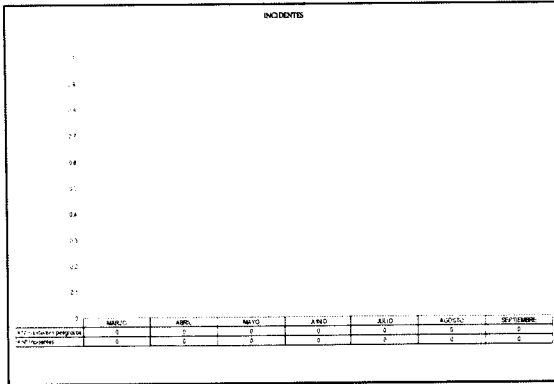
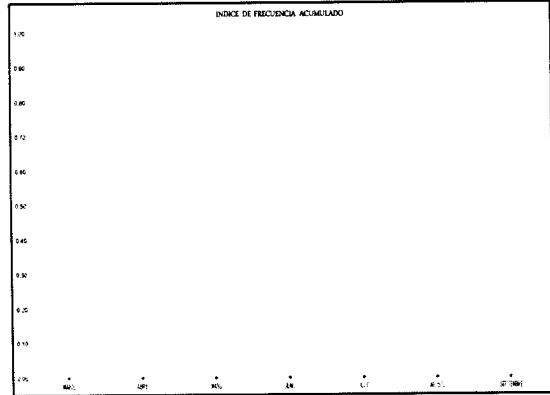
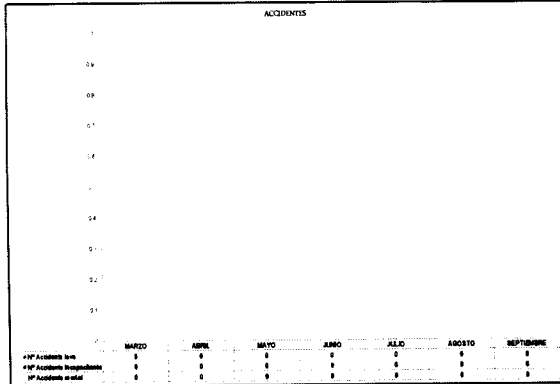
JL
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 10717

**INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD
EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE**

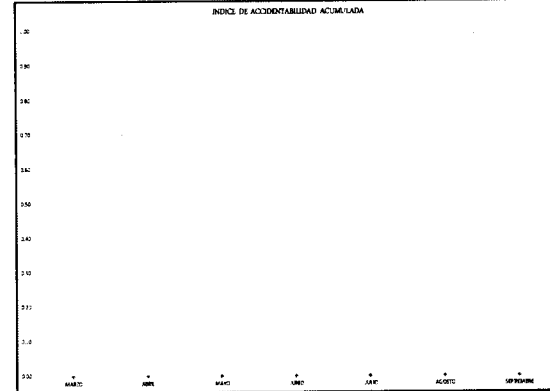
ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Página 11 de 14

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST	Índice Propósito	Índice Medición	Índice de Cumplimiento
	0.00	0.00	0.00



MES	ÍNDICE DE FRECUENCIA	ÍNDICE DE FRECUENCIA ACUMULADA	ÍNDICE DE GRAVEDAD	ÍNDICE DE GRAVEDAD ACUMULADA	ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD	ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD ACUMULADA
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




Carlos Humberto
MENDOZA FIGUEROA CARLOS HUMBERTO
 RUC: 10106595807

Isaias Jorge Alva Espinoza
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 10717

8.1. CÁLCULO ESTADÍSTICO DE ÍNDICE DE FRECUENCIA, ÍNDICE DE SEVERIDAD, ACCIDENTABILIDAD Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES

Para el cálculo del índice de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad se utilizarán las siguientes formulas según la NTE G 050.

Índice de Frecuencia Mensual	IFm	$\frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el mes X } 200000}{\text{Número horas trabajadas en el mes}}$
Índice de Gravedad Mensual	IGm	$\frac{\text{Días perdidos en el mes X } 200000}{\text{Número horas trabajadas en el mes}}$
Índice de Frecuencia Acumulado	IFa	$\frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el año X } 200000}{\text{Horas trabajadas en lo que va del año}}$
Índice de Gravedad Acumulado	IGa	$\frac{\text{Días perdidos en el año X } 200000}{\text{Horas trabajadas en lo que va del año}}$
Índice de Accidentabilidad	IA	$\frac{\text{IFa x IGa}}{200}$


 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
 RUC: 10106595807


 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 10717


CONSORCIO SAN JOSÉ	INFORME MENSUAL N° 07	SEPTIEMBRE - 2019
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 13 de 14

044

9. REPORTE MENSUAL DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

CONSORCIO SAN JOSÉ			
		"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"	
		MEDIA TENSIÓN	
1	Cantidad de Trabajadores	0	Trabajadores
2	Días Trabajados Sin Accidentes Incapacitantes	25	días
3	Total Accidentes Sin Tiempo Perdido (Accidentes Leves)	0	Unidad
4	Total Accidentes Con Tiempo Perdido (Accidentes Graves)	0	Unidad
5	Total Días Perdidos Por Accidentes Incapacitantes	0	días
6	Total Accidentes Fatales Reportados	0	Unidad
7	Record Horas Mensual Sin Accidentes Incapacitantes	0.00	Hrs
8	Record Horas Acumuladas Sin Accidentes Incapacitantes	9978.00	Hrs
9	Total Accidentes de Tránsito	0	Unidad
10	Total Accidentes con Daño Material	0	Unidad
11	Total Incidentes	0	Unidad
12	Total Derrames	0	Unidad
13	Total Enfermedades Ocupacionales Reportada	0	Unidad
Actividades de Mantenimiento y Capacitación			
1	Charlas Diarias	0	Hrs Hombre
2	Capacitaciones	0	Hrs Hombre
3	Inducción Trabajador Nuevo	0	Hrs Hombre
4	Análisis de Trabajo Seguro	0	Unidad
5	Permiso Escrito Para Trabajador de Alto Riesgo	0	Unidad
6	Inspección Pre Operacional de Vehiculos	0	Unidad
7	Inspección Pre Operacional de Minicargador	0	Unidad
8	Selección de Residuos No Peligrosos- Punto Limpio	0.0	Kg.
9	Selección de Residuos Peligrosos- Punto Limpio	0.0	Kg.
10	Eliminación Residuos No Peligrosos Acumulado	65.6	Kg.


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
 RUC: 10106595807


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 10717

CONSORCIO SAN JOSÉ	INFORME MENSUAL N° 07	SEPTIEMBRE - 2019
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 14 de 14

045

10. CONCLUSIONES

- No hubo ninguna actividad en el adicional N° 10, debido a que no se realizaron trabajos en este mes de SEPTIEMBRE.
- Se mantiene instalado el punto de acopio para la segregación de residuos sólidos, mediante cilindros de colores.

11. PANEL FOTOGRÁFICO



Imagen N°01: Suministro Eléctrico

CH
 MENDOZA PICDAGA CARLOS HUMBERTO
 RUC: 10106595807

IS
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 10717

CONSORCIO SAN JOSÉ	INFORME MENSUAL N° 07	SEPTIEMBRE - 2019
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 15 de 14

046




Imagen N°02: Suministro Eléctrico




Imagen N°03: Suministro Eléctrico

Carlos Humberto
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
 RUC: 10106595807

Isaias Jorge Alva Espinoza
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 10717

CONSORCIO SAN JOSÉ	INFORME MENSUAL N° 07	SEPTIEMBRE - 2019
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 16 de 14

047

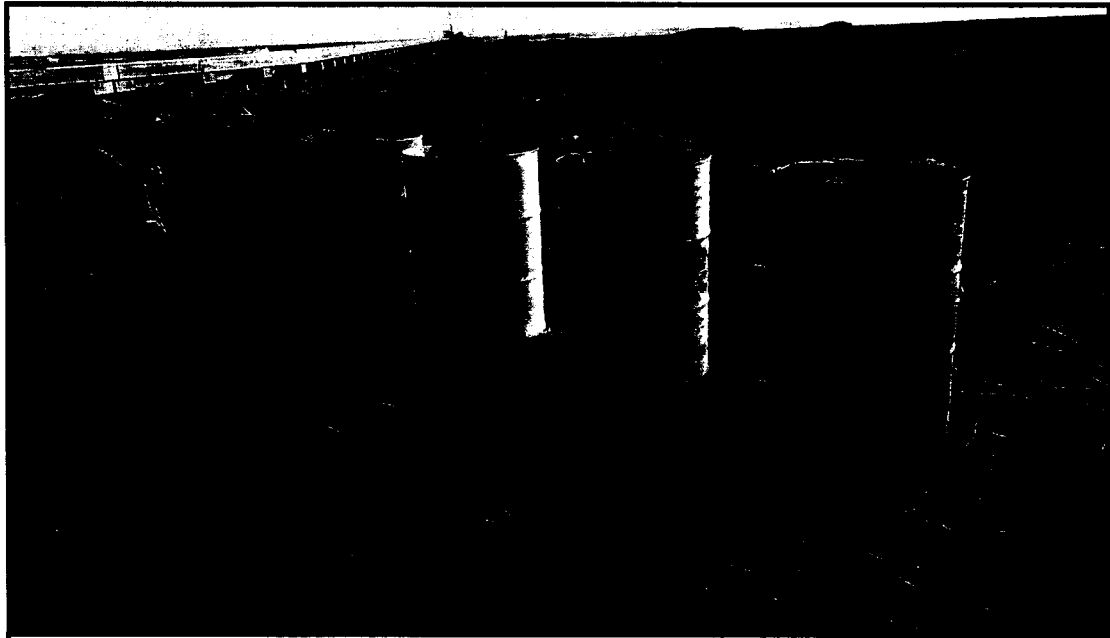


Imagen N°01: Punto de acopio de los residuos sólidos

[Handwritten Signature]
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
 RUC: 10106595807


[Handwritten Signature]
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 10717



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroCONCURSO PÚBLICO N°0001-
2016-FONDEPESCONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

CONTROL ECONÓMICO DE OBRA



MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE
ALVA ESPINOZA

**PERU**Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroCONCURSO PUBLICO N°0001-
2016-FONDEPES
CONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

049

CONTROL ECONOMICO DE OBRA**a) Control de Valorizaciones**

Al mes de Setiembre del 2019, se está tramitando la Valorización N° 07 de los trabajos ejecutados Acumulado de 99.72% del Adicional N°10.

VALORIZ.	Fecha	Valorizado (Sin I.G.V.)
N° 07	Setiembre del 2019	S/. 9,881.25
TOTAL VALORIZADO (SIN IGV)		S/. 9,881.25


REAJUSTE DE LA VALORIZACIÓN

VALORIZ.	Fecha	K Reaj.	Reajuste
N° 07 Adicional N°10	Setiembre del 2019	K = 0.00	S/. 0.00
TOTAL REAJUSTE (SIN IGV)			S/. 0.00

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)


El I.G.V. afectado a la valorización efectuado por el Contratista a la fecha ha sido el siguiente:

VALORIZACIÓN	Fecha	I.G.V. (18%)
N° 07	Setiembre del 2019	S/. 1,778.63
TOTAL I.G.V.		S/. 1,778.63


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807

VALORIZACIÓN TOTAL (INC. REAJUSTES, AMORTIZACIONES E IGV.)

VALORIZACIÓN	Fecha	Valorizado (Inc Reaj., Amortiz. e IGV)
N° 07	Setiembre 2019	S/. 11,659.88
TOTAL		S/. 11,659.88


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroCONCURSO PÚBLICO N°0001-
2016-FONDEPES
CONTRATO N°013-2016-
FONDEPES


050

b) Control de Adicionales de Obra y/o Deductivo

DESCRIPCIÓN	MONTO	PORCENTAJE DE INCIDENCIA	INCIDENCIA ACUMULADA
Monto contratado	32,457,630.22		
Adicional N° 01	326,464.23	1.01%	1.01%
Adicional N° 02	449,232.12	1.38%	
Deductivo Vinculado N° 01	-450,814.30	-1.39%	1.00%
Adicional N° 03	86,170.63	0.27%	1.27%
Adicional N° 04	579,080.87	1.78%	
Deductivo Vinculado N° 02	-446.29	0.00%	3.05%
Adicional N° 05	446,667.85	1.38%	
Deductivo Vinculado N° 03	-152,971.09	-0.47%	3.95%
Adicional N° 06	1,377,727.34	4.24%	
Deductivo Vinculado N° 4	-242,094.96	-0.75%	7.45%
Adicional N° 07	1,532,420.43	4.72%	12.17%
Deductivo Vinculado N° 5	-620,840.66	-1.91%	10.26%
Adicional N° 08	960,977.20	2.96%	13.22%
Deductivo Vinculado N°06			
	-479,845.97	-1.48%	11.74%
Adicional N°11	507,464.86	1.56%	13.30%
Adicional N° 12 y Deductivo Vinculante N°09	-364,377.35	-1.12%	12.18%
Adicional N°10 y Deductivo Vinculante N°08	242,637.79	0.75	12.93%
Adicional N°09 y Deductivo Vinculante N°07	295,057.82	0.91%	13.84%
Adicional N° 13	243,429.89	0.75%	14.59%

b) Control de Vigencia de Cartas Fianzas

Se anexan las respectivas cartas fianzas vigentes



MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

00173346 009 557 7046520773 09

CARTA FIANZA

LIMA - 29 de Noviembre del 2018

Carta Fianza No:

010469195-006

REF: Carta Fianza No. 010469195-005

del 19/12/2014

RENOVACION / MODIFICACION

Con vencimiento: 15/12/2018

Senores:

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PESQUERO-FONDERES.

Por el presente documento, renovamos la fianza de la referencia con carácter de solidaria, irrevocable, incondicional, indivisible, de realización automática y con renuncia expresa al beneficio de excusión, a favor de ustedes.

Garantizando a:

COMERCIO PAN JOSE INTERBAJO PERU S.A.S. BUENA VISTA, PERU, CHAUIN DE TAMBAYESAN, C.I.R.I., ORGANIZACION AGS S.A.S., CORPORACION K & E S.A.S.

Hasta la suma de:

S/ *****29,325.21 (UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO Y 21/100 SOLES)

En respaldo de:

CARANTENA DE PELO CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE EJECUCION DE OBRAS DE LA SUBDIRECCION DE NEGRIN CUARTIA No 039-2014-FONDERES, REGION DE LA LITORAL PERUICA No 001-2014-FONDERES PRIMERA COMUNITARIA-CONCEPCION DE LA INTERCOMERCIALIZADORA PESQUERA PARA COMERCIO HUMANO DIRECTO DE SAN JUAN, DIRECTIVO DE SAN JOSE, PESQUERA DE LAMAYUELOS, REGION LAMBAYEQUE.

Sírvase a tomar nota de que, a solicitud de nuestros garantizados, hemos procedido a:

Prorrogar el plazo de vencimiento hasta el 15 de Diciembre del 2018

Por efecto de este compromiso, el BANCO asume con sus fiados las responsabilidades en que estos llegaran a incurrir siempre que el monto de las mismas no exceda por ningún motivo la suma antes mencionada y que estén estrictamente vinculadas al cumplimiento de lo arriba indicado.

Dejamos claramente establecido que la presente CARTA FIANZA no podrá ser usada para operaciones comprendidas en la prohibición indicada en el inciso 5 del Artículo 217º de la Ley 26702 "Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organiza de la Superintendencia de Banca y Seguros"

Cualquier reclamo en virtud de esta garantía deberá ceñirse a lo estipulado por el Art. 1898 del Código Civil y deberá ser formulado por vía notarial, en el horario de atención al público y en nuestra oficina ubicada en:

IN CARABONERA 507-507 F1916 - LIMA *****

Dejamos claramente expuesto que, si fuera el caso, el Banco podrá a su elección acogerse a la facultad concedida por el Art. 1237 del Código Civil.

En caso de ejecutarse la presente CARTA FIANZA, el pago será efectuado mediante cheque de gerencia emitido a la orden del beneficiario que el Banco pondrá a su disposición en domicilio antes indicado, el mismo que se le entregará contra devolución del original de la presente CARTA FIANZA. Queda establecido que de no señalarse el monto ejecutado, se entenderá que el requerimiento es por la suma total a la que asciende la presente garantía. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe, se entenderá como renuncia a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago aún cuando el plazo de vencimiento y/o ejecución de esta fianza no hubiese vencido.

Atentamente,

ROBERTO VALDIVIA GARCIA
Asistente Social
Procesamiento

Firma y Sello del Funcionario

P. SCOTTABANA PERU

[Firma manuscrita]

Para información sobre la emisión de este Certificado, puede utilizar nuestra página web www.sicfin.pe o consultar a través de la línea telefónica 311 8000 (línea) y 011 15600 (línea fija).

00173346 009 557 7046520773

BBVA Continental

BE CHACARILLA
AV. PRIMAVERA 1050
STGO DE SURCO

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PERSONAL

Ciudad

De nuestra consideración

REF. Carta Financiera No. 001 BOBILA ROQUEZ ARSOLA, PLANZA Y/O REPRESENTADOS POR: CHAVIN DE HUANTAR BIRU CIVIL GLOBAL-SUCURSAL PERU CORPORAION RAE SAC y/o REPRESENTADOS POR: CHAVIN DE HUANTAR BIRU CIVIL GLOBAL-SUCURSAL PERU CORPORAION RAE SAC y/o REPRESENTADOS POR: CHAVIN DE HUANTAR BIRU CIVIL GLOBAL-SUCURSAL PERU CORPORAION RAE SAC

Vencimiento : 07-08-2019 a horas 12 meridiano

S/ 32,647.00 *****

Nos referimos a la Carta Financiera que a esta fecha se encuentra inscrita en el Registro de Comercio de San José, con el N° de inscripción 10244236 y se refiere a la autorización de emisión de un pagaré a favor por: CHAVIN DE HUANTAR BIRU CIVIL GLOBAL-SUCURSAL PERU CORPORAION RAE SAC y/o REPRESENTADOS POR: CHAVIN DE HUANTAR BIRU CIVIL GLOBAL-SUCURSAL PERU CORPORAION RAE SAC y/o REPRESENTADOS POR: CHAVIN DE HUANTAR BIRU CIVIL GLOBAL-SUCURSAL PERU CORPORAION RAE SAC

Al respecto, nos es grato comunicarle, que de acuerdo a la solicitud de depósito (Medida) hemos procedido a: PROMOVERGAR el pago de vencimiento de la emisión de la Carta Financiera al 07-08-2020, a horas 12 meridiano.

Queda entendido que las demás condiciones de esta Cartera Financiera y/o sus modificaciones, quedan vigentes al haberse modificado solo el vencimiento de la emisión.

La solicitud de emisión de esta Carta Financiera, fue realizada en el Registro de Comercio de San José, con el N° de inscripción 10244236 y se refiere a la autorización de emisión de un pagaré a favor por: CHAVIN DE HUANTAR BIRU CIVIL GLOBAL-SUCURSAL PERU CORPORAION RAE SAC y/o REPRESENTADOS POR: CHAVIN DE HUANTAR BIRU CIVIL GLOBAL-SUCURSAL PERU CORPORAION RAE SAC y/o REPRESENTADOS POR: CHAVIN DE HUANTAR BIRU CIVIL GLOBAL-SUCURSAL PERU CORPORAION RAE SAC

★ Símbolo particular de depósito

Carla Lidia Rodríguez
Suj. Crédito de
Banca BBVA Continental



19073102

RUC 20100150204

INGENIERO CIVIL
Fºº CIP Nº 10717

UM011 -05 - Junio 2019

REFERENDO: 1759819073102CLA0982F/133144

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FINANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

BE CHACARILLA
AV. PRIMAVERA 1060
STGO.DE SURCO

CHAVIN DE HUANTAR SRL

Señor/es:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PE

Ciudad

De nuestra consideración:

REF : Carta Fianza No. 0011189900214382-57
OCHOCIENTOS SESENTAY TRES MIL CINCO CIENTOS

Por cuenta de CONSORCIO SAN JOSE conformado por CHAVIN DE HUANTAR SRL CIVIS
GLOBAL-SUCURSAL PERU CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC

Vencimiento : 07-08-2019 a horas 12 meridiano

S/57,863.50

Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 26-07-2019, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a favor de CONSORCIO SAN JOSE conformado por CHAVIN DE HUANTAR SRL CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC

Al respecto, nos es grato comunicarle, que de acuerdo a la solicitud de su(s) Tado(s), hemos procedido a : **PRORROGAR** el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta al 07-08-2020, a horas 12 meridiano.

Queda entendido que las demás condiciones de la presente Carta Fianza seguirán vigentes al haberse modificado solo el vencimiento.

La solicitud de ejecución de la presente Carta Fianza, debe ser presentada en la oficina de CHACARILLA ubicada en Av. República de Panamá 3066, a la ciudad de Lima.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Carta Fianza No. 0011189900214382-57
Sub-Oficina de
Banca Empresas Crédito



INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717
RUC 20100130204

UAQ11 - V5 - Junio 2019

REFERENDO: 1759819073105CLA0360/14:03:24
S/ 57,863.50

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 696-0609



PERU


Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

CONCURSO PÚBLICO N°00013
2016-FONDEPES
CONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

057

CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE
ALVA ESPINOZA



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

CONCURSO PÚBLICO N°0001-
2018-FONDEPES
CONTRATO N°013-2018-
FONDEPES

058

a) **SUSTENTO TECNICO Y BASE LEGAL**

Los informes presentados por esta supervisión están sujetos a la LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO.

Artículo 159.- *Inspector o Supervisor de Obras Durante la ejecución de la obra, debe contarse, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona.*

Artículo 166.- *Valorizaciones y Metrados Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así obtenido se multiplica por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados, mientras que en el caso de las obras bajo el sistema de suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra. Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. El inspector o supervisor debe revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización. El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este párrafo, las Bases deben establecer el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.*

Artículo 170.- *Procedimiento de ampliación de plazo Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista*

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106395807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

CONCURSO PÚBLICO N°0001-
2014-FONDIPEP
CONTINATO N°013-2014-
FONDIPEP

059

Artículo 176.- Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento (15%). Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad, requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República. La determinación del referido porcentaje incluye los montos acumulados de los mayores metrados que no provengan de una variación del expediente técnico, en contratos a precios unitarios. En el caso de adicionales con carácter de emergencia la autorización de la Contraloría General de la República se emite previa al pago. La Contraloría General de la República cuenta con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo Responsabilidad, para emitir su pronunciamiento, el cual debe ser motivado en todos los casos. El referido plazo se computa a partir del día siguiente que la Entidad presenta la documentación sustentadora correspondiente

PRONUNCIAMIENTOS OSCE-RESPECTO A ADICIONALES DE OBRA Y AMPLIACIONES DE PLAZO

OPINIÓN N° 073-2014/DTN



Así, una Entidad puede ordenar al contratista la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando estas no se encuentran previstas en el expediente técnico ni en el contrato original y siempre que su ejecución resulte indispensable y/o necesaria para alcanzar la finalidad del contrato; debiendo, para ello, respetar los límites y condiciones antes señalados, y los procedimientos establecidos en los artículos 207 y 208 del Reglamento, según corresponda.

En este punto, es importante precisar que la potestad de ordenar la ejecución de prestaciones adicionales de obra ha sido conferida a la Entidad en reconocimiento de su calidad de garante del interés público, respondiendo, así, al ejercicio de una prerrogativa especial del Estado.

Adicionalmente, es importante considerar que las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándoles los presupuestos deductivos vinculados, superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad, requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República, la misma que debe emitir su pronunciamiento a través del procedimiento establecido en el tercer párrafo y siguientes del artículo 208 del Reglamento.

OPINIÓN N° 001-2015/DTN

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717



MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106959607

En este punto, es importante precisar que, en caso la Entidad apruebe la ampliación del plazo de ejecución de obra, el contratista está obligado a presentar un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERTCPM correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas por la ampliación de plazo concedida, de conformidad con el sexto párrafo del artículo 201 del Reglamento. Sobre el particular, es importante precisar que este nuevo calendario tiene por finalidad adecuar el programa de ejecución de obra del contratista a la extensión del plazo de ejecución de obra originado por la aprobación de la ampliación del plazo.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE
ALVA ESPINOZA



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero


CONCURSO PÚBLICO N°0001-
2018-FONDEPES
CONTRATO Nº013-2018-
FONDEPES


060

De esta manera, además de detallar el procedimiento de ampliación del plazo, el artículo 201 del Reglamento establece que en caso la Entidad apruebe la ampliación del plazo, el contratista debe presentar un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT CPM correspondiente, considerando, para ello, solo las partidas afectadas por la ampliación del plazo concedida, con la finalidad de adecuar el programa de ejecución de obra al nuevo plazo para la ejecución de la obra.

b) PLANOS Y MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL

- Debido a las incongruencias del expediente técnico elaborado y aprobado por FONDEPES, hubo el desplazamiento de la infraestructura con respecto al terreno.
- En tal sentido, el error de coordenadas de ubicación que genera la alteración nace en la elaboración del Perfil del Proyecto y por ende se arrastra en la elaboración del Expediente Técnico.
- Los planos se vienen modificando de acuerdo a los adicionales de obra, así como deductivos vinculantes o reducciones, los planos totales se presentarán en la liquidación de obra, anexo junto con el contratista.
- No obstante, es bueno indicar que todo Expediente Técnico que licita FONDEPES tiene una revisión por el área responsable de la Entidad en mención para efectos de su aprobación y sin duda que durante el proceso constructivo de obra se ha permitido verificar ausencia de algunas partidas que no se consideraron o surgieron a raíz de las absoluciones de consultas.
- Los adicionales aprobados hasta la fecha son ADICIONAL N° 01, ADICIONAL N° 02, ADICIONAL N° 03, ADICIONAL N° 04, ADICIONAL N° 05, ADICIONAL N° 06, ADICIONAL N°07, ADICIONAL N°08, ADICIONAL N°09, ADICIONAL N°10, ADICIONAL N°11, ADICIONAL N°12 Y ADICIONAL N°13.
- Los adicionales, reducciones y deductivos de obra que han sido aprobados han conllevado a la modificación de la ruta crítica, conllevando a las ampliaciones de plazo respectivamente.
- Los planos se vienen modificando de acuerdo a los adicionales de obra, así como deductivos vinculantes o reducciones, los planos totales se presentarán en la liquidación de obra.


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106995907


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE
ALVA ESPINOZA



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroCONCURSO PÚBLICO N°0001-
2016-FONDEPESCONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE
ALVA ESPINOZA



PERU


Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroCONCURSO PUBLICO N°0001-
2016-FONDEPESCONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Por lo anteriormente expuesto, y considerándose que la Valorización es un pago a cuenta y encontrándose **CONFORME** el monto a Facturar por el Contratista **CONSORCIO SAN JOSE**.

El monto a Facturar por el Contratista es:

Valorización Bruta de la Valorización N°07 del Adicional N°10 SETIEMBRE 2019	S/.	9,881.25
Total Reajuste	S/.	0.00
Amortización por Adelanto Directo	S/.	0.00
Valorización Neta Sin IGV	S/.	9,881.25
IGV (18%)	S/.	1,778.63
Monto Facturable	S/.	11,659.88


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
 RUC: 10106595807



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 10717




PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroCONCURSO PÚBLICO N°0001-
2016-FONDEPESCONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

PANEL FOTOGRÁFICO



MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO
MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE
ALVA ESPINOZA



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

CONCURSO PUBLICO
N°0001-2016-FONDEPES

CONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

064

PANEL FOTOGRÁFICO

Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

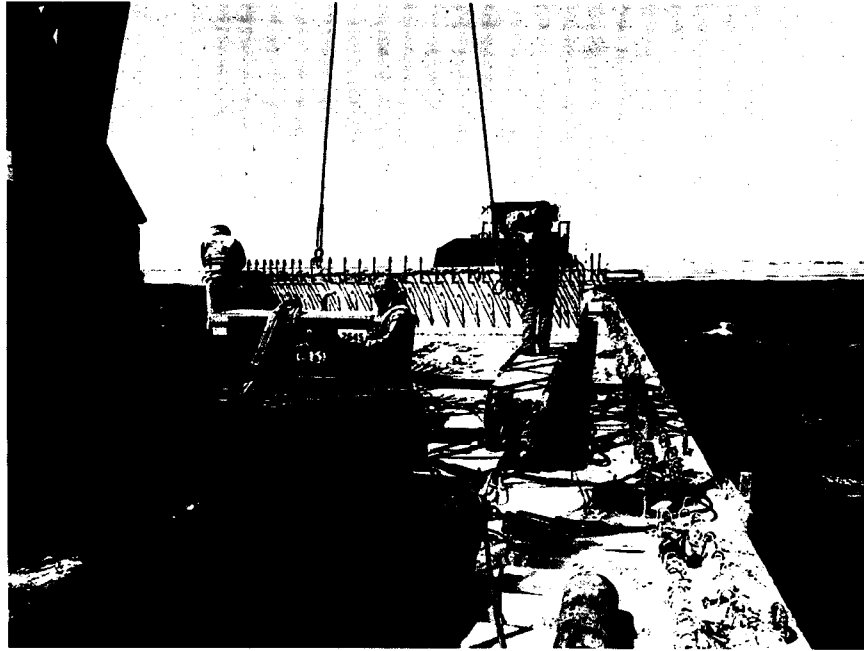



FOTO 01: Encofrado en la zona del cabezo




MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

FOTO 02: Trabajos para el hincado de pilotes en los ejes de la zona del cabezo



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

CONCURSO PÚBLICO
N°0001-2016-FONDEPES
CONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

065

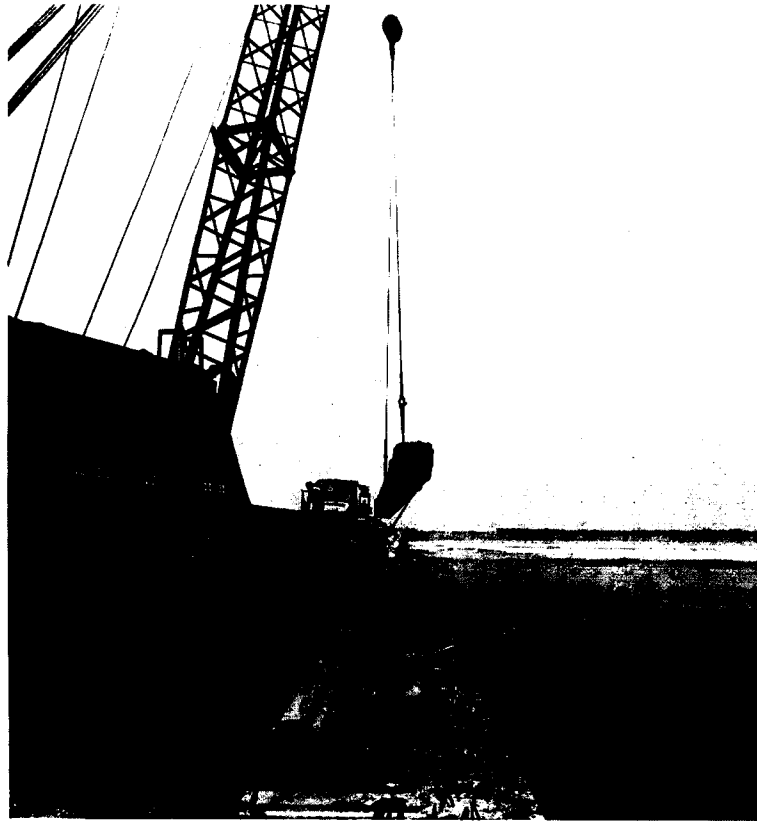
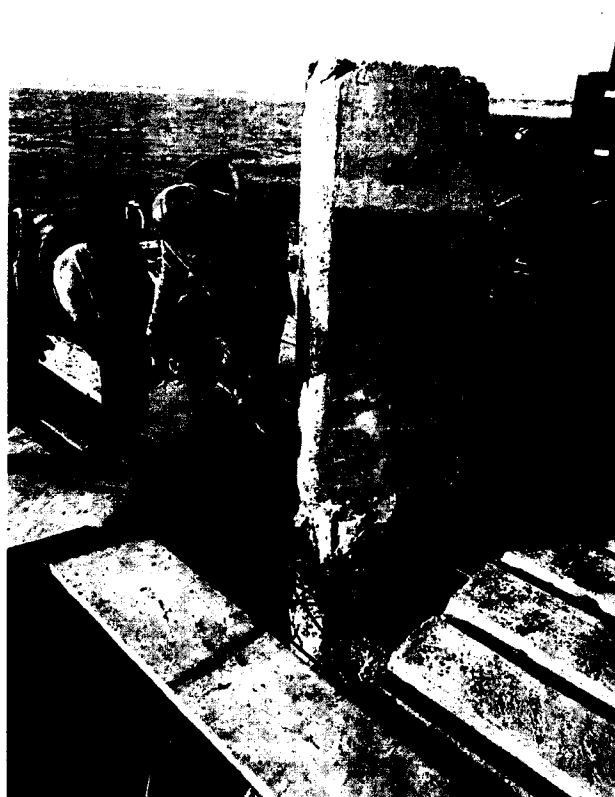


FOTO 03: Traslado de pilotes hacia la zona del cabezo



CH
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807

JL
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

FOTO 04: Trabajos de unión viga-pilote



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

CONCURSO PUBLICO
N°0001-2016-FONDEPES

CONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

066

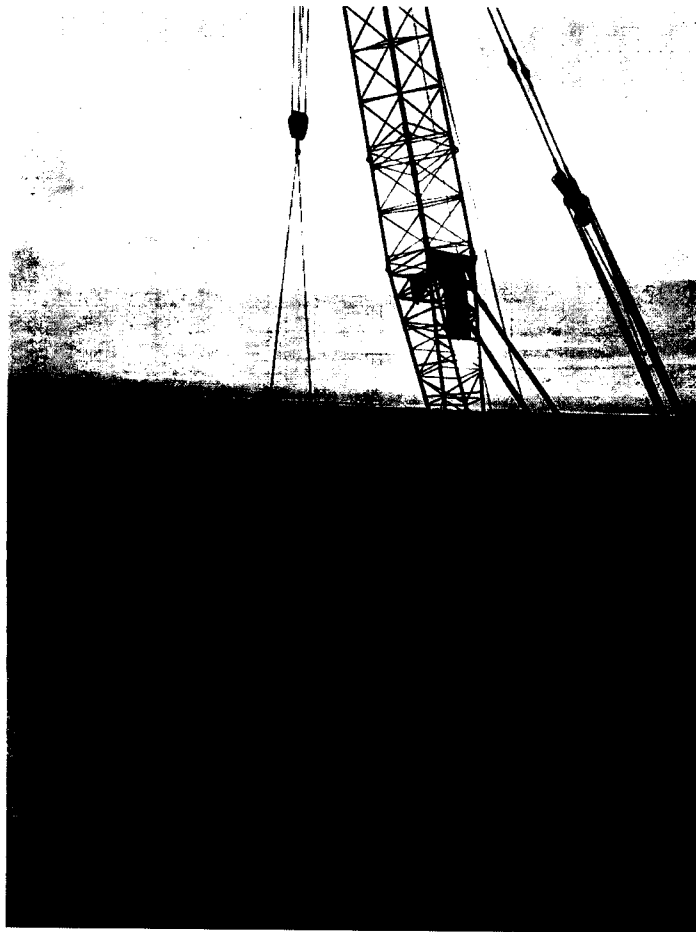



FOTO 05: Traslado de pilotes hacia la zona del muelle tipo cabezo




MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

FOTO 06: Trabajos de hincado de pilotes en los ejes de la zona del cabezo



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

CONCURSO PUBLICO
N°0001-2016-FONDEPES
CONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

067

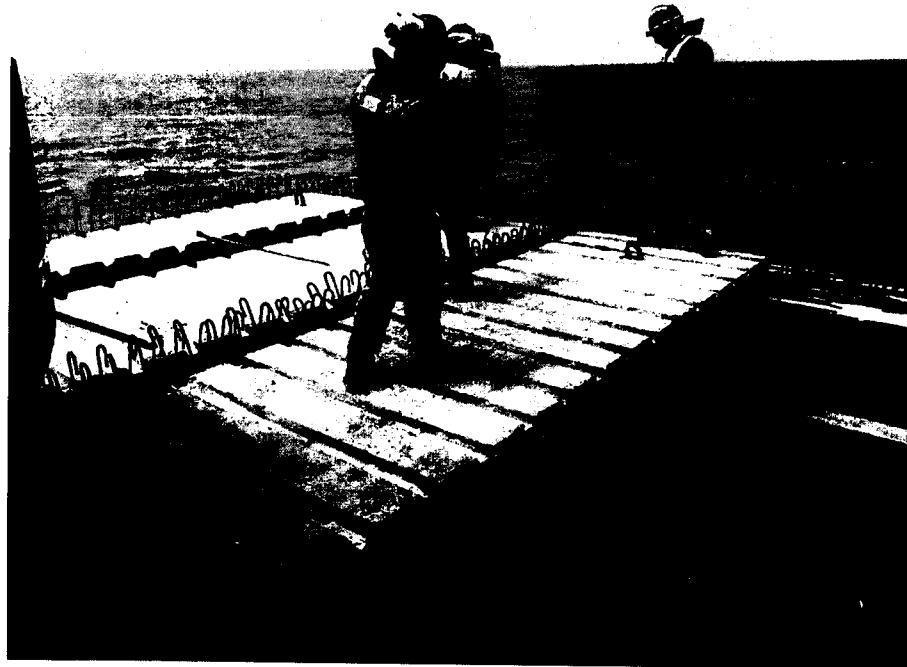


FOTO 07: Colocación de losas nervadas en la zona del cabezo

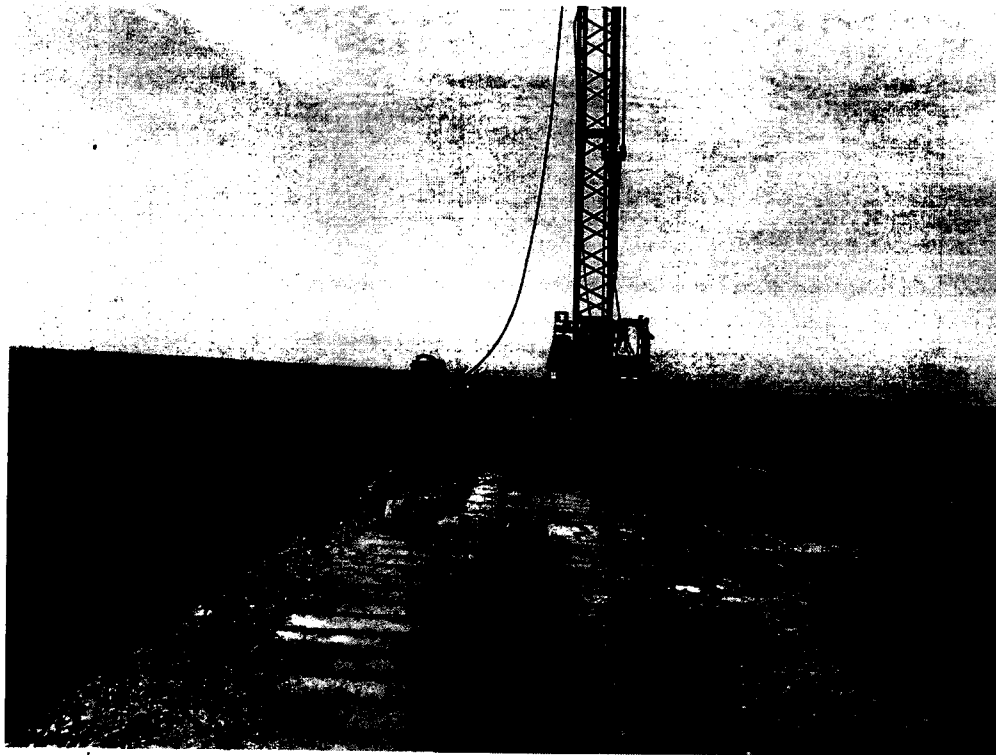


FOTO 08: Trabajos en la zona del cabezo


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717



PERU

Ministerio
de la Producción

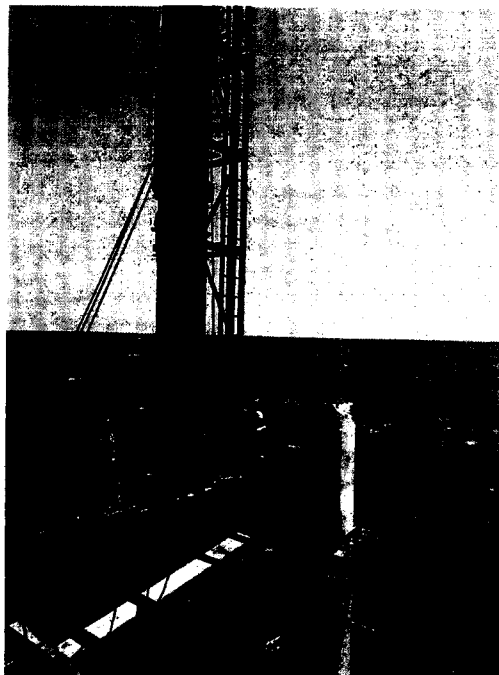
Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

CONCURSO PUBLICO
N°0001-2016-FONDEPES
CONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

068



FOTO 09: Verificación de los trabajos en el traslado de pilotes



ISAIAS JORGE ALVÁ ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807

**FOTO 10: Trabajos de hincado de pilotes verticales en los ejes de la zona del
cabezo**



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

CONCURSO PÚBLICO
N°001-2016-FONDEPES
CONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

11/9




FOTO 11: Encofrado en la zona del cabezo



SAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106593807

FOTO 12: Colocación de losas nervadas en la zona del cabezo



PERU

Ministerio
de la Producción


Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

CONCURSO PÚBLICO
N°0001-2016-FONDEPES
CONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

070



FOTO 13: Colocación de acero



JL
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

CM
MENDOZA MENDOZA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106395897

FOTO 14: Encofrado para la colocación de losas nervadas



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

CONCURSO PUBLICO
N°0001-2016-FONDEPES
CONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

0771

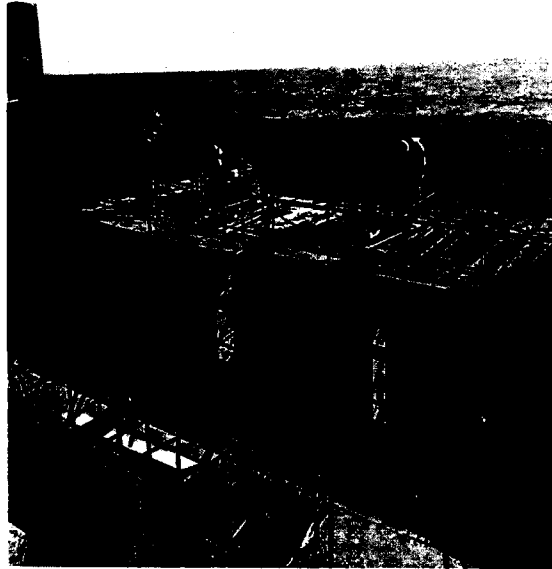


FOTO 15: Encofrado en la zona del cabezo

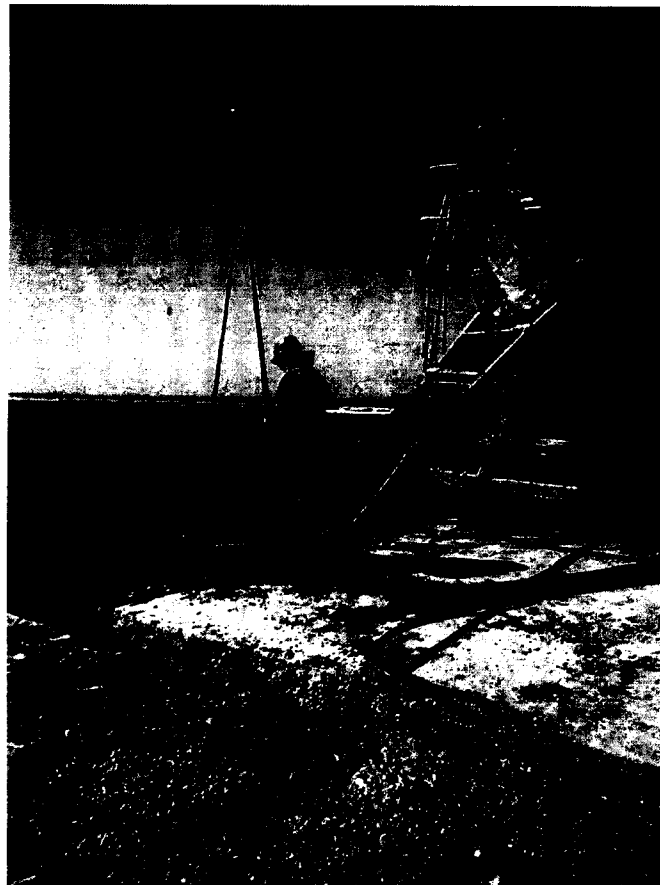



FOTO 16: Vaciado de concreto premezclado


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero


CONCURSO PUBLICO
N°0001-2016-FONDEPES
CONTRATO N°013-2016-
FONDEPES

072




FOTO 17: Trabajos de encofrado en el eje 215-216 zona del cabezo


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807

COPIA DEL CUADERNO DE OBRA


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
RUC: 10106595807


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

CUADERNO DE OBRA

074

Nº 73

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____


PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE".


... VUE ASIENTO 2419 31.08.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

hoy por la entidad nos alcance la aprobación de la consulta referente a la optimización del análisis estructural desde el eje 211 al 220 (zona cabeza) la cual sigue generando atrasos no atribuibles al contratista.


Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

ASIENTO N° 2420 31.08.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se comunica al Supervisor de obra que continuamos imposibilitados de continuar con los trabajos en la zona de mayor censo en las posturas onífticas 07.04.04 Nucleos llenados In-Situ, 07.04.05 Tuntas longitudinales y Transversales, 07.04.06 Lomas cercadas In-Situ motivada por la falta de la aprobación de la consulta del retronamiento en la zona del Cabezo denominado OPTIMIZACIÓN DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL DESDE EL EJE 211 AL 220.



Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

ASIENTO N° 2421 03.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se comunica al Supervisor de obra que a la fecha no se tiene la aprobación de la consulta referente a las plataformas de la (detalle de la estructura) y componentes estructurales).

Solo se recibió por parte de la entidad la Carta N° 019-2019-REDOPES (ordenado adjuntando los Planos Actualizados AM-03 y EM-01 donde nos ordena y confirma la dirección del Cabezo desde el Eje 211 al eje 220 y detallando las conclusiones en nuestro oficio de cuaderno de obra
Ca. Finca...

ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA


Nº 075
74

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE BOQUERA PARA CONSUMO"
PROGRAMA: HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA
ENTIDAD EJECUTORA: DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"

Vitue ASIERTO N° 2421 03.09.2019 DEZ RESIDENTES DE OBRA.

N° 2378 de fecha 01.08.2019, sin embargo a ello comunicamos y reiteramos la consulta respecto a la plataforma baja en esta oportunidad comunicamos que ya fueron suministrados los metrados (Asiento n° 2360 del 30.08.2019) correspondientes al Cabezo, encontrando mayores metrados que probablemente correspondan a los trabajos en la zona denominada plataforma baja que son los siguientes partidas:

07.04.06.01 Concreto en Losas $f_c = 280 \text{ Kg/cm}^2$ y 07.04.06.03 Acero de Refuerzo $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$, estos metrados no concuerdan con las especificaciones técnicas, por lo que se solicita al Supervisor de obra elevar nuestra consulta a la entidad para que nos eleve los planos de la plataforma baja considerando dimensiones, ubicación, cantidad de Aleros y demás detalles constructivos para su ejecución de ser el caso.



Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

Asiento N° 2422

Del Supervisor

03/09/2019

El contratista a través del gerente anterior está solicitando la definición de las cantidades y metrados de "plataforma baja" por cuanto la Entidad a la fecha no hace el entrega de los planos respectivos de este sector.

Una vez que se adjunte los planos oficiales, se pondrá de funcionamiento de FONDEPES, de manera que los funcionarios de las diferentes especialidades y del contratista definan plenamente los metrados, precios unitarios de cada partida y se presente oficialmente.

Los datos de los trabajos, así como las dimensiones y precios

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº 076
75

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUERA PARA CONSUMO
PROYECTO: HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA
PROGRAMA: DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE".
ENTIDAD EJECUTORA: _____

Postes, elevaciones, etc deberán estar definidos plenamente por
antes partes de manera que no exista dudas de caracteres técnicos
que represente demora en ejecución.

En consecuencia FONDERES debe agilizar la entrega de planos pen-
dientes ("plataforma técnica") lo antes posible.

El personal técnico del contratista, dependiente o Entidad gestio-
narán en el sentido de definir los métodos ("mayores y menores")
y finalmente en base a los rendimientos, autorizar el plazo
global de la obra.

Juan A. Ruiz

ASIENTO N° 2423 07.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se comienza al Supervisor de obra que se recibió la Carta N° 897-2019 -
FONDERES/DIRECCIÓN respectu a la abstracción de Consulta referente a los Postes
Metálicos del Muelle y Cabezó donde concluye que será tipo Metálico de
diámetro exterior superior de 3" y de forma cónica donde nos adjunta
una cotización en el referente poste en la característica principal la
cual es un poste cónico octogonal de 9m. galvanizado en caliente, por
lo tanto teniendo abstracción la consulta respecto a los postes metálicos se
solicita la autorización a la Dirección para su ejecución después de tener la
respuesta por parte de la entidad.

Se solicita al Supervisor de obra, la autorización para el limado y
descabezado de Pilotes Verticales en el eje 214, correspondiente a los
pilotes del Cuarto eje del Cabezó. Asimismo, se solicita la autorización
para el traslado, colocación de la Viga Prefabricada y traslado de la unión
viga-pilote en el mismo eje.

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 83105

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº

75

FECHA:

MODALIDAD:

OBRA:

PROYECTO:

PROGRAMA:

ENTIDAD EJECUTORA:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSUMO


HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE PROVINCIA

DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE

Anexo N° 2424 Del Supervisor

07/09/2019

El contratista ha recibido la Carta N° 891-2019-FONDEMS/D dependiente a los portes metálicos del muelle y cabero aborrevando la consulta del contratista la carta que incluye informe técnico del conductor y equipamiento que incluyen que los portes metálicos de Ø sup 3" sencillos, adjustando adecuando su plano de los características que en el 2 indican en concluirse teniendo el contratista los documentos técnico y legales al respecto la supervisión autoriza la continuación de estos trabajos (Portes metálicos en muelle y cabero)


Supervisor

ACUERDO N° 2425

09.09.2019

DEL RESIDENTE DE OBRA.


Se solicita al Supervisor de obra, la autorización para el traslado y abarado de lasos planchadas prefabricadas y vigas suadoras de borde entre los ejes 213 y 214 del cabero.

Se solicita al Supervisor de obra, retirar a la Entidad la obtención de recibos, curules Formada en oficio N° 2378 de fecha 15.08.2019, en donde hacemos referencia a recibir Carta N° 085-2019-CST/los la cual da orden a la Carta de la Entidad N° 815-2019-PASAPAS PASADUNA y en la cual, argumentamos que la Entidad evalúa y nos alcance de mano por una mediantemente expediente la pyme se realizada en la abaración de los nuevos diámetros de la tubería y cambio de calibre de conductos eléctricos por conductos de cableado de los tableros hasta la llegada de las maderas. También en dicha oportunidad de informe que estos trabajos fueron realizados al día de recepción de la referencia Costa (01.08.2019).


ING. INSPECTOR


Christian M. Mezo Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

ING. RESIDENTE


Christian M. Mezo Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

ING. SUPERVISOR


Supervisor

CUADERNO DE OBRA

Nº 078
77

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO

PROGRAMA: HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA

ENTIDAD EJECUTORA: DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE".

Asiento Nº 2426 Del Supervisor 09/09/2019
Se autoriza al contratista la ejecución de los trabajos del asiento anterior efectuándose lo señalado por el contratista en el asiento Nº 2425 referido a la nueva adecuación de los diámetros de la tubería y cambio de calibre de conductores eléctricos deberán ser sujeciados dicha solicitud por parte de la entidad y se ha verificado que estos se encuentran paralizados a partir del 01/09/19. En la fecha indicada se verificó dicha paralización.

ASIENTO Nº 2427 10.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.
Se solicita al Supervisor de obra, la autorización para el lineado y descobrado de Pilotes Inclinados entre los Ejes 213-214, correspondientes a los pilotes del Segundo Núcleo del Coberto.

Christian M. Moza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 63105

ASIENTO Nº 2428 10.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.
Se comunica al Supervisor de obra que hoy se recibió la Carta Nº 912-2019 - FONDES/DISEMINAA desde la Entidad nos adjunta la memoria de Cálculo Estructural para el framo del Eje 201 al 220 y los planos EM-02" y EP-06" donde parte de sus conclusiones señala lo siguiente:
... "Después de realizar el incremento a la Cantidad de Pilotes (16), se puede asegurar la estabilidad lateral en etapa de operación. Ha sido necesario emplear en el modelo un tipo de pilotes de α fuerza inclinados (4:1 V 1:4)

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE
Christian M. Moza Trujillo
INGENIERO CIVIL

ING. SUPERVISOR

Continúa...

CUADERNO DE OBRA

Nº 078


FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO
PROYECTO: HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA
PROGRAMA: DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE".
ENTIDAD EJECUTORA: _____

... Visto ASIENTO Nº 2428 10.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

para mejorar la estabilidad y de esta manera la grua pase sobre paños durante la construcción con seguridad así como la etapa de montaje."


Además se observa en el plano EM-02" el cuadro del resumen e listos de pilotes que señala una altura de alineado de 1.60m.

De toda la documentación recibida por la entidad se concluye que corresponde a la observación de nuestra consulta referente a la falta de perforación de los pilotes entre los ejes 211 al 220 mencionados en los asientos Nº 1730 de fecha 07.05.2018 y reiterado en los asientos Nº 2166 de fecha 04.04.2019 y Nº 2361 de fecha 26.07.2019 queda observada (Cierre de Casca) en la mencionada carta donde se está considerando el refuerzo de los pilotes de seso para los ejes 211 al 220 sin embargo esta observación genera la modificación en la cimentación del Cabezó y del Muro Constructivo.



Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 63105

Visto Nº 2427 Del Superior

Se autoriza al contratista la ejecución de los trabajos del asiento anterior. Asimismo el contratista manifestó que ha recibido la memoria descriptiva del cálculo estructural del tramo ejes 211 al 227, así mismo los detalles de los planos EM-2 EP-06. Agrega además BONDEPES, las mejoras por la grua en cuanto a su estabilidad, cuadro resumen de # de pilotes a utilizar en el reforzamiento en su totalidad. En consecuencia a la fecha la entidad no tiene consulta en este aspecto por tanto la supervisión solicita la emisión de dicha resolución agregando además el plazo que requieren a partir de esa fecha en la que se presentará la solicitud de ampliación de plazo conforme lo indica en el Asiento Nº 2428.



ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 63105


ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº 080
79

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____


ENTIDAD EJECUTORA: _____

"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE".


ASIENTO N° 2480 11.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se comunica al Supervisor de Obra que después de recibido la Carta N° 912-2019-RENDERES/INIGERSONA de fecha 10.09.2019 donde la entidad resolvió con la aprobación de nuestra consulta del Asiento N° 1930 (de fecha 09.05.2018) y rubricado con los asientos N° 2166 (de fecha 04.04.2019) y N° 2361 (de fecha 26.07.2019) respecto a la selección técnica por falta de comprometimiento que debe tener el tramo del Cabezo (Referenciado con Pilotes los ejes 211 al 220) por lo que esta situación genera no poder ejecutar trabajos contractuales, como son los ítems 07.04.04 Núcleos Unidos In-situ, 07.04.05 Juntas Longitudinales y Transversales y la partida 07.04.06 Losas Vaciadas In-situ motivadas por la demora en la ejecución de nuestra consulta, la cual permitiría continuar con las partidas contractuales que debieron ser ejecutadas de acuerdo a la programación allí vigente; así mismo ha modificado la ruta crítica, siendo esta una causal de ampliación de Plazo, por atraso y/o paralización por causas no atribuibles al Contratista según el artículo N° 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Por lo tanto, solicitamos la Ampliación de Plazo N° 32 por 135 días calendario, alcanzando mediante Carta N° 095-2019-CSS/CE el expediente de solicitud de Ampliación de Plazo conforme a los artículos 196, 200 y 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. N° 184-2008-EF y modificado por D.S. N° 138-2012-EF, con lo cual cuantificamos y sustentamos el plazo solicitado debido de hechos ajenos a nuestra voluntad, cuya causal se fundamenta en Atrasos y/o Paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista, solicitando dar el trámite respectivo ante la Entidad. (fin de obra de causal).


Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 83105

ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 83105


ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº 081
80

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO

PROGRAMA: HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA

ENTIDAD EJECUTORA: DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE".

Asiento Nº 2431 Del Supervisor 11/09/2019.

En la fecha el contratista está presentado la solicitud de Ampliación de plazo Nº 32 motivada por la abstracción de su consulta referente a la falta de empotramiento que debe tener el tramo del cabezo, siendo absuelta la consulta mediante el reforzamiento de pilotes entre los ejes 211 al 220. Esta causal está prevista en el artículo 196, 200 y 201 del RLCB por atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al Contratista.

La superación evaluará el contenido de la Carta Nº 95-2019-0571 y emitirá su pronunciamiento después de los plzgo y formalidades indicadas en el RLCB.

[Handwritten signature]

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

[Handwritten signature]

CUADERNO DE OBRA

Nº 082
81

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO

PROGRAMA: HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA

ENTIDAD EJECUTORA: DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE".


ASIENTO N° 2432 14.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se comunica al Supervisor de obra que se recibió por parte de la Entidad la Carta N° 912-2019-FONDEPES/DIGEMIPAA donde nos remiten documentos técnicos necesarios para la ejecución del tramo del muelle tipo cabeza comprendido entre los ejes 211 al 220, los mismos que comprenden la memoria de cálculo estructural, así como los planos EM-02" y EP-06" a efectos de poder continuar con los trabajos en los ejes indicados. Comunicamos que la solución técnica planteada consiste en el reforzamiento adicional de 06 pilotes de concreto de 50x50 cm de sección, comprendidos entre los ejes 211 al 220 lo cual está modificando el proceso constructivo inicial, generándose trabajos adicionales no contemplados en el Expediente Inicial.


Después de la revisión de los documentos a levantados se aplican métodos adicionales indicados en los planos EM-02" y EP-06", lo cual dará origen a un presupuesto adicional.


Por lo tanto, en cumplimiento al Artículo N° 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado comunicamos al Supervisor de obra la necesidad de tramitar la autorización de la ejecución de prestación adicional y que conculque a la entidad nuestra sustituta, donde la entidad deberá de definir si la elaboración del Expediente Técnico de dicha prestación adicional estará a su cargo o de un consultor externo ya que por la naturaleza y complejidad que representa se abstiene de elaborar dicho expediente.

Se solicita al ingeniero Supervisor la evaluación correspondiente y conculque a la entidad la necesidad de elaborar el Expediente Técnico de prestación adicional considerando su complejidad.


Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105


ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA


Nº 833

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONFINAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CONFINAMIENTO
PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA CONFINAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CONFINAMIENTO
PROGRAMA: MINISTERIO DE SAN JOSÉ, LAMBAEQUE, SAN JOSÉ PROVINCIA
ENTIDAD EJECUTORA: DE LAMBAEQUE, REGIÓN LAMBAEQUE

Visita Nº 2433 Del Supervisor 15/09/2019

El supervisor dará asistencia al acuerdo N° 2432 del Residente de Obra donde se ha verificado mediante la memoria de cálculo estructural y los planos EM-02 EP-06" no fueron consultados e. El expediente técnico inicial por lo tanto, estos trabajos que corresponden al mejoramiento de la zona del muelle tipo cobertizo que se encuentra en la obra, un Exp. Técnico de una prestación adicional que de OTRA motivada por la obsolescencia de la consulta, recibido por la entidad a mi presentada con Carta N° 913-2019 - FONDOS/D. En cumplimiento del Art. 207 del R.C.E se comunicará a la Unidad que dirige la elaboración del Expediente Técnico de la prestación adicional, ya que, es necesario la ejecución de dichos adicional para el cumplimiento de la parte del proyecto.



ASIENTO N° 2434 15/09/2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.
Se solicita al Supervisor de Obra, la autorización para el vincado y desvincado de Pilotes verticales en el Eje 215, correspondiente a los Pilotes del Dintel EJE del Cobertizo. Asimismo, se solicita la autorización para el traslado, colocación de la Viga Prefabricada y traslado de la viga Vigas Ashot en el mismo eje. etc.

Christian M. Meza Tujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

ASIENTO N° 2435, Del Supervisor 15/09/2019.
Se autoriza al Contratista el presupuesto o vincado de pilotes verticales a ser liberados en el eje 215 (Quinto eje una del cobertizo). Pasados así mismo al Supervisor y Colegación de la Obra, preafichada a el mismo Exp. Técnico debe mostrar las medidas requeridas en el presupuesto de dicho planes.

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

Christian M. Meza Tujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105


CUADERNO DE OBRA

N° 084
83

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUERA PARA CONSUMO
PROYECTO: HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA
PROGRAMA: DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"
ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 2436 16.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA


Se solicita al Supervisor de obra, la autorización para el traslado y colocación de las losas prefabricadas y vigas Guarderas de fondo entre los ejes 214 y 215 del cabezo.


Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

Asiento N° 2437, Del Supervisor 16/09/2019
Se autoriza al contratista el transporte y colocación de las losas nervadas prefabricadas y vigas guarderas a ser ubicadas en los ejes 214-215 del cabezo. Se hace el conocimiento al Contratista que se dispuso la Carta N° 930-2019-FONDEPES/D. Relacionada a la Reemplazación de plazo N° 31 - Calendario de avance de Obra actualizado aprobado.


ASIENTO N° 2438 18/09/2019 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita al Supervisor de obra, la autorización para el linchado y desahorcado de Pilotes Verticales en el Eje 216, correspondientes a los Pilotes del Sexto Eje del Cabezo. Asimismo, se solicita la autorización para el traslado, colocación de la viga prefabricada y desahorcado de la unión viga-pilote en el mismo eje.


Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

Asiento N° 2439, Del Supervisor 18/09/19
Se autoriza al contratista el transporte e hincado de pilotes a ser ubicados en el eje 216 (Pto. ex zona cabezo). Así mismo se autoriza el transporte y colocación de la viga prefabricada en el mismo eje. El Contratista debe mantener las medidas de seguridad en el transporte de estos elementos.

ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº 085
84

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____


PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO

PROGRAMA: HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA

ENTIDAD EJECUTORA: DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"

ASIENTO N° 2440 19/09/2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.


Se solicita al Director de obra, la autorización para el traslado y colocación de losas prefabricadas y vigas guarderas de borde entre los ejes 215 y 216 del cabezo.


Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 83105

Asiento N° 2441, Del Supervisor 19/09/2019.
Se autoriza al contratista el traslado de colocación de las losas revadas prefabricadas y vigas guarderas a ser ubicadas en los ejes 215-216 del cabezo. El contratista debe mantener las medidas de seguridad a la realización de los trabajos.


ASIENTO N° 2442 20/09/2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se solicita al Director de obra, la autorización para el hincado y descabezado de pilotes inclinados entre los ejes 215-216, correspondiente a los pilotes del tercer núcleo del cabezo.


Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 83105

Asiento N° 2443, Del Supervisor Fece: 20/09/2019
Se autoriza al contratista efectuar el hincado y descabezado de pilotes hincados que se ubican entre los ejes 215-216 correspondiente al tercer núcleo del cabezo. Dicho pilote como parden al Reforzo visto del muelle tipo cabezo entre los ejes 211-200.

ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 83105

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº 8536

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO

PROYECTO: HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA

PROGRAMA: DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE".

ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 2444 20/09/2019 DEL PRESIDENTE DE OBRA.

Se comunica al Supervisor de obra que se ingresó la Carta N° 097-2019-CSJ/CO en atención a la Carta N° 820-2019-FONDEFES/DIRECCIÓN donde comunicamos los siguientes puntos:

- 1.- Como ya se tiene la conformidad por parte de la entidad respecto a la ubicación de la Carretera de Bombeo ubicada en la progresiva 0+757, mi representada procederá a construir la carretera y colocación de electrobombas correspondiente a los trabajos del Adicional N° 05.
- 2.- Se ha verificado la Altura Dinámica Total (ADT) necesaria para el consumo del agua salada desde la carretera de Bombeo (PUGT. 0+757) hasta la ubicación de la cisterna también de agua salada, fundado como consumo en total de 892.73 m. (de encaja ancho de Cálculo)
- 3.- Respecto a las características que deberán tener las electrobombas, se adjunta esta carta las características que deberá tener las bombas para el correcto funcionamiento del abastecimiento del agua salada adjuntando el cálculo sustento.

PROPUESTA DE ELECTROBOMBAS SEGÚN EL MERCADO LOCAL

N° de Equipos	:	02
Costo (C/ps)	:	4.70
Altura Dinámica Total (m) / según curva del fabricante:	:	26.00
Potencia Estimada (hp)	:	5.70
Potencia según curva (hp)	:	4.00

Para este punto, se está solicitando a la entidad aprobar las electrobombas con las características señaladas líneas arriba para su operación ya que cumpliría para el correcto funcionamiento.

- 4.- Referente al sistema de abastecimiento de agua salada, este no cuenta con un sistema de filtrado ni en la Captación ni en la zona de almacenamiento (cisterna) por que no está contemplado en el Expediente Técnico del

Continúa ...

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 83105

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº 8677

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PARA CC. UNO


PROGRAMA: "HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA

ENTIDAD EJECUTORA: "DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE".

Viene Asiento 2444 20/09/2019 del RESIDENTE DE OBRA.

Adicional N° 05 al Expediente Contractual, por lo tanto no es responsabilidad del Contratista poder resolverlo, sin embargo la entidad podría adecuar el sistema de filtrado, después de culminar el trabajo de abastecimiento de agua salada o generar una prestación adicional de otra motivada por la adecuación del sistema de filtrado no contemplados inicialmente.

Por los puntos expuestos se está solicitando a la entidad que revise las electrobombas con las características adjuntas y defina si se va a generar la necesidad de la prestación adicional referente al sistema de filtrado de agua salada.


ING. SUPERVISOR
CIP N° 30103

Asiento N° 2445, Del Supervisor



20/09/2019

Respecto a la anotación en el Asiento N° 2444 del Residente de Obra, señala que su representada mediante Carta N° 097-2019-CSJ/CO ha sustentado mediante cálculos las características necesarias que deberán tener las electrobombas que no será motivo de adicional, además se ha beneficiado también que el sistema de abastecimiento de agua salada no cuenta con sistema de filtrado y su adecuación generaría una prestación adicional ya que modifica el Expediente Técnico inicial.

La entidad tiene que resolver o plantear una adecuación al sistema de filtrado si es que ella justifica su necesidad.

Esta supervisión sugiere que la contratista avance con los trabajos relacionados al sistema de suministro de agua salada como es el abastecimiento de las tuberías de HDPE de 3" y también con la tubería de 1 1/2" para el agua potable ubicada sobre el muelle.

ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE 
CIP N° 30103

ING. SUPERVISOR


FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO
HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA
PROGRAMA: DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE".
ENTIDAD EJECUTORA: _____

Asiento Nº 2446 20/09/2019 DEL RESIDENTE DE OBRA,

Se comunica al Director de obra que se ingresó la Carta Nº 096-2019-CSJ/CS a la entidad en referencia al oficio Nº 1273/22 por parte de la Capitana Puerto Pimentel donde hemos comunicado lo siguiente:

"La entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, senidembres y similares para la ejecución y consultoría de obras, salvo en que las bases se estipule que la franquicia de éstas correrá a cargo del contratista."

En ese contexto siendo responsabilidad de la entidad presentar las licencias, autorizaciones y permisos para la ejecución de la obra, se le remite el oficio 1273/22 a fin de disponer a quien correspondiera, realice coordinaciones necesarias ante la Capitana de Puerto Pimentel, con la finalidad de que se tramite el otorgamiento de Certificado de Registros de empresa relacionadas a la actividad acuática: pesquera clasificadora de naves..


Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 63105

Asiento Nº 2447 Del Superior

20/09/19


Se autoriza al contratista el transporte e hincado de pilotes verticales a ser ubicados en el eje 215 (Quinta zona del Eje Cabayo). Se autoriza a su turno el transporte y colocación de la uiga prefabricada en el mismo eje. El contratista debe mantener las medidas de seguridad en transporte de elementos. En relación al asunto que menciona el contratista, la supervisión expresa lo siguiente:

- Se trata de un asunto administrativo que no involucre al contratista ni a la supervisión.

- La entidad deberá realizar las coordinaciones y gestiones hacia la

VA ASIENTO 2447
a la brecha →

ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 63105

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº 88 089

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO

PROGRAMA: HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA

ENTIDAD EJECUTORA: DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"

ASIENTO N° 2447.

autoridad portuaria con la finalidad de obtener las certificaciones y autorizaciones para la normal ejecución.

ASIENTO N° 2448 25.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se comunica al Supervisor de obra que se recibió la Carta N° 329-2019-FONDEPES/IG donde nos adjunta la Resolución N° 155-2019-FONDEPES/IG estableciendo 90 días más 40 días calendarizados, estableciéndose en consecuencia como fecha final de ejecución de la obra el 25 de octubre del 2019.

También se solicita al Supervisor de obra la autorización para el hincado y descabezado de Pilotes Verticales en el Eje 217, correspondiente a los pilotes del séptimo Eje del Cabezo. Asimismo, se solicita la autorización para el traslado, colocación de la carga prefabricada y vaciado de la culata viga-pilote en el mismo eje.

Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL

Fecha: 25.09.19
CIP N° 62295

Asiento N° 2449 Del Supervisor
Se toma conocimiento de lo indicado en el asientos anteriores por el Contratista. Así mismo se recibe por parte de FONDEPES la Carta N° 328-2019-FONDEPES/D donde se alcanza la Resolución N° 155-2019-FONDEPES/IG aprobando la ampliación de plazo N° 32 por 40 días estableciéndose como fecha final de ejecución de Obra el 25 de Octubre del 2019. Se autoriza el hincado y descabezado de pilotes verticales en el eje 217 (pilotes del séptimo eje del cabezo)

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº 89 090

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA PARA CONEXIÓN

PROGRAMA: HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA

ENTIDAD EJECUTORA: DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"

ASIENTO Nº 2450 26.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se solicita al Supervisor de obra, la autorización para el traslado y colocación de las Nervaduras prefabricadas y Vigas Coranderas de Borde en los ejes 216 y 217 del Cabezo.


Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 83105

Asiento Nº 2451 Del Supervisor Fecha: 26/09/19
Se autoriza la colocación de las nervaduras prefabricadas y vigas coranderas en el eje 216 y 217 del cabezo.


ASIENTO Nº 2452 27.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se solicita al Supervisor de obra, la autorización para el hincado y descabezado de Pilotes Verticales en el Eje 218, correspondiente a las Pilotes del octavo eje del cabezo. Asimismo se solicita la autorización para el traslado, colocación de la viga prefabricada y hincado de la Unión Viga - Pilote en el mismo eje.


Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 83105

Asiento Nº 2453 Del Supervisor Fecha: 27/09/2019
Se autoriza el hincado y descabezado de pilotes verticales en el eje 218 (octavo eje del cabezo). Se autoriza y verifica el hincado de concreto premezclado de la unión viga - pilote en el octavo eje del cabezo.

ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 83105

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

091

N° 90

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____


PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE".

ASIENTO N° 2454 29.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.


Se solicita al Supervisor de Obra, la autorización para el traslado y colocación de losas Nervadas Prefabricadas y Vigas Guarderas de Berdo entre los ejes 217 y 218 del cabezo.


Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 83105

Asiento N° 2455 Del Supervisor Fecha: 29.09.2019
Se autoriza el traslado y colocación de losas nervadas prefabricadas y vigas guarderas en los ejes 217 y 218.


ASIENTO N° 2456 30.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se solicita al Supervisor de Obra, la autorización para el hincado y descabezado de Pilotes Inclinados entre los ejes 217-218, correspondientes a los Pilotes del Cuarto Nucleo del Cabezo.


Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 83105

Asiento N° 2457 Del Supervisor Fecha: 30.09.2019.
Se autoriza el hincado y descabezado de pilotes inclinados entre los ejes 217 - 218 (Cuarto nucleo del cabezo)

ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 83105

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº 91 092

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TUBERÍA PARA CONSUMO

PROGRAMA: HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA

ENTIDAD EJECUTORA: DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE".

ASIENTO Nº 2458 30.07.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se solicita al Supervisor de obra, manifestar a la entidad nuestra preocupación por el retraso en la ejecución de nuestra consulta formulada en el oficio N° 2398 de fecha 16.08.2019 y reiterada en nuestra oficio N° 2425 de fecha 07.07.2019, en donde hacemos referencia a nuestra carta N° 085-2019-CST/CO la cual da atención a la Carta de la Entidad N° 015-2019-REQ/DIR/DIGENAMA y en la cual, esperamos que la entidad evalúe y nos elabore de manera formal mediante expediente la propuesta señalada en la autorización de los nuevos diámetros de la tubería y cambio de calibre de conductores eléctricos preparados desde la salida de los taberos hasta la llegada de los motores del sistema de Agua Sabida. También en dicha oportunidad se informó que estos trabajos fueron paralizados el día de recepción de la referida carta (01.08.2019).

Christian M. Moza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 83183

Oficio Nº 2459 del Supervisor fecha: 30.09.2019
Se informa al Contratista que la presente Supervisión presentó a la entidad el Informe correspondiente referido a la consulta de concurrencia de los plazos correspondientes.
Se coordinará con la entidad para la entrega de manera formal la propuesta respecto a la adecuación de los nuevos diámetros de la tubería y cambio de calibre de conductores eléctricos.

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE
Christian M. Moza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 83183

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº 92 093

FECHA:

MODALIDAD:

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSUMO

PROYECTO:

HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA

PROGRAMA:

DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE.

ENTIDAD EJECUTORA:

ABRIL NO 2460 30.09.2019 DE RESERVA DE OBRA.

Se detallan los métodos cuantitativos con el Suplemento de obra, correspondiente a la laboración Contracto N° 59 - Septiembre 2019, retirados en trámite respectivo ante la autoridad:

SUB RESERVAS 07

07 OBRAS EN M.D.

07.04 Coberto L = 50.00 m.

07.04.04 Mochos levantados 2x.5x5

07.04.04.01 Cuadros en Miedos fl = 280 kg/cu 2 15.80 m³

07.04.04.02 Estructuras y Reservados en Mochos 32.00 m²

07.04.04.03 Acero de Refuerzo fy = 4200 kg/cm² 1050.06 kg.

07.04.05 Juntas longitudinales y Transversales 20.21 m³

07.04.05.01 Cuadros en Viga Anclada fl = 280 kg/cu 2 172.09 m²

07.04.05.02 Estructuras y Reservados en Viga Anclada 5334.13 kg.

07.04.05.03 Acero de Refuerzo fy = 4200 kg/cm² 27.00 m²

07.04.08.01 Transporte de Mochos. 27.00 m²

07.04.08.02 Transporte de Viga Transversal 6.00 m²

07.04.08.03 Transporte de Lora Levada 24.00 m²

07.04.08.06 Reservados de Pilote 27.00 m²

07.04.08.07 Colocación de Viga Transversal 6.00 m²

07.04.08.08 Colocación de Lora Levada. 24.00 m²

Se detallan los métodos cuantitativos con el Suplemento de obra, para la laboración N° 05 -

Septiembre 2019 del Adicional N° 04, retirados en trámite respectivo ante la autoridad:

02 OBRAS EN M.D.

02.01 Malla de Espigas L = 950 m. 1.50 m³

02.01.01 Concreto en Pilotes fl = 950 kg/cm² 28.42 m²

02.01.02 Aplicación de Espigas para culos de Concreto nuevo en servicio 28.42 m²

Carhuay...

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

INGENIERO CIVIL

ING. SUPERVISOR

Christian M. Maza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 03105

Christian M. Maza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 03105

CUADERNO DE OBRA

094

Nº 93

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO

PROGRAMA: HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA

ENTIDAD EJECUTORA: DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"

... Véase ASIENTO 2460 30.07.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se detallan los metros ejecutados con el Supervisor de Obra, correspondiente a la Valorización de obra N° 19 - Septiembre 2019 del Adicional N° 07, solicitando su trámite respectivo ante la entidad.

01 Referenciamiento de Pilote con Red de 20 16/40

01.01 obras en Mar

01.01.01 Maniobra de Colocación e Anclaje de Pilotes, Vigas y Loras Acorte

01.01.01.01 Punta Metálica de Pilote para facilitar lincaje

27.00 cnd.

01.01.01.03 Anclaje de Pilote en Suelo Compacto

27.00 cnd.


Se detallan los metros ejecutados con el Supervisor de Obra, correspondiente a la Valorización de obra N° 07 - Septiembre 2019 del Adicional N° 10, solicitando su trámite respectivo ante la entidad.

01 Media Tensión 10-22.9 KV.

01.16 Pruebas Eléctricas y Pruebas de Servicio

01.16.03 Costo de Conexión y Energización de la Red

01.00 g/b.



Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63103

Asiento N° 2461 Del Supervisor

Fecha: 30/09/2019.

El día de hoy se verifican los metros ejecutados durante el mes de septiembre y se realiza la conciliación de los mismos con el contratista detallados en el Asiento N° 2460.

ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63103

ING. SUPERVISOR

CONSORCIO SAN JOSE

CARTA N°0101 - 2019 - CSJ/CO

San José, 30 de Setiembre del 2019

ATENCIÓN : **MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO**
Ing. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
SUPERVISOR DE OBRA

ASUNTO : **ENTREGA DE VALORIZACIÓN N°07-ADICIONAL N°10**

REFERENCIA : **- CONTRATO N°082-2014-FONDEPES/OGA**
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N°004-2014-FONDEPES-DERIVADA DE
LA LICITACIÓN PÚBLICA N°004-2014-FONDEPES/OGA
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO
HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"

Presente.-

Mediante la presente nos dirigimos a ustedes a fin de saludarlos y a la vez presentar la Valorización N°07 del Adicional N°10 de la Obra: "**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE**", así mismo solicitamos el pago respectivo, para lo cual adjuntamos los siguientes documentos:

- Ficha técnica
- Memoria descriptiva
- Resumen de Valorización N°07 - Adicional N°10
- Valorización N°07 - Adicional N°10
- Curva S
- Planilla de metrados valorizados
- Panel fotográfico
- Contrato de obra (copia)
- Copia de Resolución de Adicional N° 10
- Acta de entrega de terreno (copia)
- Póliza de seguro complementario por trabajo de riesgo y salud
- Constancia de No estar inhabilitado para contratar con el estado
- Constancia de capacidad de libre contratación
- Carta Fianza correspondiente al Adelanto Directo
- Carta de fiel cumplimiento (copia)
- Contrato de consorcio (copia)
- Cuaderno de obra (copia)
- Rentas
- Planillas
- Pago a CONAFOVICER
- Cuaderno de obra (copia)

RECIBIDO

ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
N° 10741

30-09-2019

Son 01 archivador original y 02 archivadores copia cada uno con folios
Agradeciendo la atención que sirvan brindar a la presente quedamos de Uds.

Atentamente,

CONSORCIO SAN JOSE

Emiliano Isaac Trujillo Luna
Representante Legal Común

Av. Alameda del Corregidor N°414/Lima-Lima-La Molina
Teléf.: 349-3170

CONSORCIO SAN JOSÉ

VALORIZACIÓN N° 07 DEL ADICIONAL N° 10

CONSORCIO SAN JOSÉ



**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE
SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"**

LAMBAYEQUE – PERÚ

2019

Ficha

Técnica

FICHA TÉCNICA

1. DATOS GENERALES

022

Obra : "CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA
CONSUMO HUMANO DIRECTO DE
SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE,
REGIÓN LAMBAYEQUE"

Entidad a Convocante : FONDEPES

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Sistema de Contratación : Precios Unitarios

Monto Referencial –Adicional N°10 : S/. 429,550.09 (Inc. IGV)

Monto Aprobado – Adicional N°10 : S/. 429,550.09 (Inc. IGV)

Aprobado con : Resolución Jefatural N°025-2019 –
FONDEPES /J de fecha (14/02/19)

Incidencia Porcentual Acumulada : 12.93%

Fecha de Valor Referencial : Diciembre 2018

Plazo de ejecución del adicional : 75 días calendarios

Contratista Principal : CONSORCIO SAN JOSE

Representante legal : Ing. Emiliano Isaac Trujillo Luna

Licitación : Adjudicación de Menor Cuantía N° 38-
2014-FONDEPES derivada de la Licitación
Pública N° 004-2014-FONDEPES.

Contrato : CONTRATO N° 082-2014-
FONDEPES/OGA

Entrega de terreno : 14 de Enero 2015

Inicio Contractual de obra : 15 de Enero 2015

Inicio Real de obra : 15 de Enero 2015

Ampliación de Plazo Acumulado : 1587 Días calendarios

Nueva Fecha Contractual de obra : 20 de Mayo del 2019

Entrega Adelanto Directo : S/. 6'491,526.04 (INC. IGV) (09 de Enero.
del 2015)

Residente de Obra : Ing. Christian Martín Meza Trujillo CIP. 63105



Supervisor de Obra

: Ing. Isaías Jorge Alva Espinoza CIP. 10717

001

2. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

Durante el desarrollo de los trabajos que contemplan la presente obra se utilizaran los siguientes equipos:

01 Grúa S/ ruedas de 10tn

01 Retroexcavadora

02 Nivel de Ingeniero

02 Mira y Jalones

01 Teodolito

Herramientas manuales varias (lampas, picos, buggies).

2.1 RELACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Durante la ejecución de la obra el personal que laborará es el siguiente:

2.1.1 Personal Profesional:


- | | |
|--------------------------------------|--|
| 01 Gerente de Proyecto | : Ing. Julio César Incio Carrillo |
| 01 Ing. Residente de Obra | : Ing. Christian Martín Meza Trujillo |
| 01 Administrador de Obra | : Ing. Ludwig Benito Retamozo Martínez |
| 01 Asistente de Residente de Obra | : Ing. Richard Javier Tapia Rosazza |
| 01 Especialista en Estructuras | : Ing. Romer Iván Lovon Dávila |
| 01 Esp. en Mecánica de Suelos | : Ing. Fidel Juvenal Ramírez Aguilar |
| 01 Esp. en Seguridad de Obra | : Ing. Eddy Solano Espinoza Escalante |
| 01 Especialista en Sanitarias | : Ing. Chong Tang Julio Tay Wo |
| 01 Esp. en Metrados y Valorizaciones | : Ing. Jhonny Alan Huamán Porlles |

2.1.2 Personal técnico:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 01 Almacenero | : Sr. Rubio Flores, Julio |
| 04 Guardianes | : Sr. Rubio Huarcaya, Julio Cesar |
| | : Sr. José Neiro Lozano Carrasco |
| 01 Topógrafo | : Sr. Solar Huaroto Jerry |
| 01 Asistente Contable | : Srta. Jackeline Milagros Ramos Sosa |



3. DESARROLLO PORCENTUAL DEL AVANCE DE LA OBRA



Christian Martín Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 03193

**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA
CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"**

220

3.1.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LA ZONA:

Región : Lambayeque
 Departamento : Lambayeque
 Provincia : Lambayeque
 Distrito : San José

El Desembarcadero Pesquero Artesanal San José, se encuentra ubicado en la Caleta San José (área rural), políticamente pertenece a la Región de Lambayeque, Provincia de Lambayeque, Distrito de San José, forma parte de la infraestructura de protección permanente a la capacidad productora de los pescadores de San José.



3.1.2 MONTO APROBADO – ADICIONAL N°07

Monto	S/. 1'298,661.38
I.G.V. (18%)	S/. 233,759.05

Total	S/. 1'532,420.43

3.1.3 INICIO DE OBRA

1. Con fecha 24 de diciembre se firmó el CONTRATO N°082-2014-FONDEPES/OGA entre FONDEPES y el CONSORCIO SAN JOSE.
2. El adelanto directo se entregó con fecha 09 de enero del 2015
3. La entidad entrego expediente técnico con CARTA 008-2015-FOPNDEPES/DIGENIPAA de fecha 07 de enero, el cual fue recepcionado el 07 de enero por el CONSORCIO SAN JOSE.
4. La entidad con CARTA 0012-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 8 de enero 2015, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el 09 de enero del 2015, comunicaron la designación de la supervisión del CONSORCIO SAN FRANCISCO, indicando que el Supervisor

Christina María Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 63195

encargado es el Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia, y que iniciaba sus funciones el mismo día con que se emitió la carta, así mismo los datos para comunicación con el supervisor.

5. Con CARTA N° 0014-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 08 de enero, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el día 09 de enero notificaron la designación del representante de FONDEPES para el acto de entrega de terreno.

6. Con CARTA N° 0015-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 08 de enero, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el día 09 de enero, notificaron la entrega de terreno para el miércoles 14 de Enero del 2015, a horas 12:00.

7. El 09 de Enero del 2015 se realiza la recepción del Adelanto Directo.


8. El día 14 de Enero del 2015 se realizó la entrega del terreno, mediante acta entre el Supervisor de Obra, el Ing. Residente, representante de FONDEPES.

9. El 15 de Enero del 2015 se inició el plazo contractual para la obra.

10.-Se recibió por parte de la Entidad la carta N° 281-2019-FONDEPES/GG donde nos adjunta la resolución N° 105-2019-FONDEPES/J aprobando y autorizando la ejecución del expediente técnico de la prestación adicional N° 13 por el monto de S/. 243,429.89 lo que representa un porcentaje individual equivalente a 0.75% del contrato original, habiéndose generado a la fecha un nivel de incidencia acumulado de 14.59% del monto del contrato original.

11.-Se entregó al supervisor de obra la carta N°071-2019-CSJ/CO donde solicitamos la Ampliación de plazo N° 30 correspondiente a la aprobación y ejecución del adicional N° 13 cuantificado en 40 días calendarios derivados de hechos ajenos a nuestra voluntad, cuya causal se fundamenta en la aprobación de la prestación Adicional N°13, aprobada con Resolución Jefatural N°105-2019-FONDEPES/J, y cuyo plazo de ejecución inició el 13/07/2019 solicitando al Jefe de Supervisión dar el trámite respectivo ante la entidad de nuestra solicitud de ampliación de plazo N°30 por 40 días calendarios.

12.- Con carta N° 292-2019-FONDEPES/GG la entidad alcanza la Resolución de Gerencia General N° 130-2019-FONDEPES/GG de fecha 05.08.2019, documento que aprueba nuestra solicitud de ampliación de plazo N° 30 por 20 días calendarios siendo la fecha final de ejecución el 21 de agosto del 2019 por lo que luego se presentara el respectivo calendario actualizado con las partidas involucradas.


Christian Francisco Trejillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63195

13.-Se recibió por parte de la Entidad la carta N° 310-2019-FONDEPES/GG donde nos adjunta la resolución N° 141-2019-FONDEPES/GG aprobando en parte nuestra solicitud de ampliación de plazo N° 31 por el periodo de veinticinco (25) días calendarios, estableciéndose, en consecuencia, como fecha final de la ejecución de obra el 15 de setiembre de 2019 conforme a lo expuesto en el memorando n°4536-2019-FONDEPES/DIGENIPAA , el informe n°102-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/FFR así como el informe n° 319-2019-FONDEPES/OGAJ.

018

14.-Se comunica que se recibió la carta N° 327-20193 – FONDEPES/GG donde nos adjunta la resolución N° 155-2019-FONDEPES/GG resolviendo aprobar solo 40 días calendarios nuestra solicitud de ampliación de plazo N°32 estableciéndose en consecuencia, como fecha final de la ejecución de la obra el 25 de octubre del 2019.

3.1.4 SITUACIÓN ACTUAL:

Al mes de Setiembre del 2019, se ha ejecutado un total acumulado de 99.72%, de las partidas ejecutadas del Adicional N° 10, contra un Avance Programado de Obra acumulado del 100.00 %, por lo tanto el Adicional N° 10 se encuentra atrasado de acuerdo al cronograma, sin embargo no requiere presentar un cronograma actualizado. Comunicamos que a la fecha ya se tiene la conformidad de obra por parte de ENSA, además la entidad no entrega los documentos a ENSA para la firma de contrato respectivo la cual es indispensable para la electrificación del DPA.

Mes de Valorización	Porcentaje Ejecutado Acumulado	Porcentaje Programado
Valorización N° 07	99.72%	100.00 %



El avance mensual detallado es el siguiente:

VALORIZACIÓN N° 07 - SETIEMBRE 2019 - ADICIONAL DE OBRA N° 10 INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSIÓN			
OBRA	: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"		
ENTIDAD	: FONDEPES		
N°	DESCRIPCION	Unid.	Metrado
01	MEDIA TENSIÓN 10-22.9KV		
01.16	PRUEBAS ELECTRICAS Y PRUEBAS DE SERVICIO		
'01.16.03	COSTO DE CONEXIÓN Y ENERGIZACIÓN DE LA RED	glb	0.50

4. **ASPECTOS RELEVANTES DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA**

010

1. Con fecha 24 de diciembre se firmó el CONTRATO N°082-2014-FONDEPES/OGA entre FONDEPES y el CONSORCIO SAN JOSE.
2. El adelanto directo se entregó con fecha 09 de enero del 2015
3. La entidad con CARTA 0012-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 8 de enero 2015, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el 09 de enero del 2015, comunicaron la designación de la supervisión del CONSORCIO SAN FRANCISCO, indicando que el Supervisor encargado es el Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia, y que iniciaba sus funciones el mismo día con que se emitió la carta, así mismo los datos para comunicación con el supervisor.
4. El 09 de Enero del 2015 se realiza la recepción del Adelanto Directo.
5. El 15 de Enero del 2015 se inició el plazo contractual para la obra.
6. Con carta Notarial N°329-2015-FONDEPES/SG la Entidad resuelve contrato a la supervisión CONSORCIO SAN FRANCISCO, por lo que la entidad nombra al Ing Victor Ricardo Huaman Landa como Inspector de obra el cual cumplirá sus funciones a partir del 19 de Noviembre del 2015 para la continuidad de la obra.
7. Con carta N° 070-2016-FONDEPES adjunta la resolución N° 078-2016-donde se resuelve APROBAR el expediente técnico de prestación adicional N° 02 por un monto de S/449,323.12 dándose inicio a su ejecución el día 11/03/2016.
8. Con carta N° 415-2016-FONDEPES/DIGENIPAA la entidad nos solicita que se amortice las valorizaciones N°01 correspondiente al adicional N° 02, Valorización N°01 del adicional N° 04 y que el monto de dicha amortización será considerada en la Valorización contractual siguiente.
9. Con carta N°049-2018-FONDEPES/SG de fecha 06/03/2018 la entidad nos comunica de la Aprobación del Expediente técnico de la Prestación Adicional N°07, adjuntando la Resolución Jefatural N°025-2018-FONDEPES/J de fecha 06 de marzo del 2018, la cual resuelve aprobar el Expediente Técnico de la prestación adicional N°07.
10. Con carta N° 702-2018-FONDEPES/DIGENIPAA la entidad nos alcanza el plano EP-07 y la memoria de cálculo del tramo comprendido entre el eje 104 y 111 con modificación del proceso constructivo que genera un atraso importante en la ejecución.



Christina...
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 07 Adicional de Obra N°10	Setiembre- 2019
		Página: 8 de 12

11. Con carta s/n -2018-FONDEPES/DIGENIPAA la entidad nos alcanza el plano EP-08 y la memoria de cálculo del tramo comprendido entre el eje 112 y 119 con modificación del proceso constructivo que genera un atraso importante en la ejecución.

045

12. Con carta 914 -2018-FONDEPES/DIGENIPAA la entidad nos alcanza el plano EP-09 y la memoria de cálculo del tramo comprendido entre el eje 121 y 128 con modificación del proceso constructivo que genera un atraso importante en la ejecución.

13. Con carta 1098-2018-FONDEPES/DIGENIPAA la entidad nos alcanza el plano EP-10 y la memoria de cálculo del tramo comprendido entre el eje 129 y 135 con modificación del proceso constructivo que genera un atraso importante en la ejecución.

14. Con carta -083-2018- CSJ/CO la contratista presenta al supervisor de obra la solicitud de Ampliación de Plazo parcial N° 25 por 60 días calendarios para que lo trámite ante la entidad dentro de los plazos que estipula el RLCE.

15. Se recibió por parte de la entidad la carta N° 451-2018-FONDEPES/SG donde nos adjuntan la resolución de Secretaria General N° 225-2018-FONDEPES/SG donde nos aprueban parte de nuestra solicitud de ampliación de plazo por 30 días calendarios por causas no atribuibles al contratista siendo la nueva fecha contractual el día 03 de Enero del 2018.


16. Se recibió la carta N° 014-2018-FONDEPES/DIGENIPAA por parte de la entidad donde nos aprueban el calendario actualizado correspondiente a la ampliación de plazo parcial N°25 siendo el nuevo plazo contractual el día 03/01/2019.

17. Se recibió la carta N° 135-2019-FONDEPES/DIGENIPAA por parte de la entidad donde nos aprueban el cambio de Ingeniero Residente de Obra, estableciéndose como el profesional propuesto al Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñones con CIP N° 66335.

18. Se recibió la carta N° 062-2019-FONDEPES/GG por parte de la entidad donde nos adjuntan la resolución de Gerencia General N° 026-2019-FONDEPES/GG el día 08/02/19 donde nos aprueban nuestra solicitud de ampliación de plazo por 102 días calendarios siendo la nueva fecha contractual el día 20 de mayo del 2019.

19. Se recibió por parte de la entidad la Carta N° 071-2019-FONDEPES/GG donde nos adjuntan la resolución N° 025-2019-FONDEPES/J en donde aprueban la prestación adicional N° 10 por el monto de S/. 429,550.09 y deductivo vinculante de S/. 186,912.30.

20. Se recibió por parte de la entidad la Carta N° 316-2019-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 13/03/2019 donde la entidad entregan los documentos necesarios para iniciar la ejecución de la prestación Adicional N° 10 correspondiente al Sistema de Utilización de Media Tensión 10-22.9 Kv para la electrificación del DPA San Jose – Lambayeque.


 Christian ...
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 63105

CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 07 Adicional de Obra N°10	Setiembre- 2019
		Página: 9 de 12

21.- Se recibió la carta N° 179-2019 donde la entidad nos adjunta la resolución N° 066-2019-FONDEPES/J donde la entidad resuelve aprobar y autorizar la ejecución del expediente técnico N° 09 para la ejecución de las barandas metálicas por el monto de S/.787,405.98 (Setecientos ochenta y siete mil cuatrocientos cinco con 98/100 soles) y el deductivo vinculante N° 07 por el monto de S/.492,348.16 (Cuatrocientos noventa y dos mil trescientos cuarenta y ocho con 16/100 soles) señalando además que este adicional será causal de ampliación de plazo.


22.- Con carta N° 223-2019-FONDEPES/GG la entidad aprueba nuestra solicitud de ampliación de plazo N° 29 por 72 días calendarios siendo la fecha final de ejecución el 1ero de Agosto del 2019 por lo que luego se presentara el respectivo calendario actualizado con las partidas involucradas.

23.-Se recibió por parte de la supervisión la carta N° 090-SUPER-SJOSE-2019 donde adjuntan la carta N° 720-2019-FONDEPES/DIGENIPAA donde la entidad aprueba el calendario de avance de obra correspondiente a la ampliación de plazo N°29 siendo el plazo contractual el 1ero de Agosto del 2019.

24.-Se recibió por parte de la Entidad la carta N° 281-2019-FONDEPES/GG donde nos adjunta la resolución N° 105-2019-FONDEPES/J aprobando y autorizando la ejecución del expediente técnico de la prestación adicional N° 13 por el monto de S/. 243,429.89 lo que representa un porcentaje individual equivalente a 0.75% del contrato original, habiéndose generado a la fecha un nivel de incidencia acumulado de 14.59% del monto del contrato original.

25.-Se entregó al supervisor de obra la carta N°071-2019-CSJ/CO donde solicitamos la Ampliación de plazo N° 30 correspondiente a la aprobación y ejecución del adicional N° 13 cuantificado en 40 días calendarios derivados de hechos ajenos a nuestra voluntad, cuya causal se fundamenta en la aprobación de la prestación Adicional N°13, aprobada con Resolución Jefatural N°105-2019-FONDEPES/J, y cuyo plazo de ejecución inició el 13/07/2019 solicitando al Jefe de Supervisión dar el trámite respectivo ante la entidad de nuestra solicitud de ampliación de plazo N°30 por 40 días calendarios.

26.- Con carta N° 292-2019-FONDEPES/GG la entidad alcanza la Resolución de Gerencia General N° 130-2019-FONDEPES/GG que aprueba en parte nuestra solicitud de ampliación de plazo N° 30 por 20 días calendarios siendo la fecha final de ejecución el 21 de agosto del 2019.


 Christiana Diana Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 63195

CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 07 Adicional de Obra N°10	Setiembre- 2019
		Página: 10 de 12

27.-Se recibió por parte de la Entidad la carta N° 310-2019-FONDEPES/GG donde nos adjunta la resolución N° 141-2019-FONDEPES/GG aprobando en parte nuestra solicitud de ampliación de plazo N° 31 por el periodo de veinticinco (25) días calendarios, estableciéndose, en consecuencia, como fecha final de la ejecución de obra el 15 de setiembre de 2019 conforme a lo expuesto en el memorando n°4536-2019-FONDEPES/DIGENIPAA , el informe n°102-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/FFR así como el informe n° 319-2019-FONDEPES/OGAJ.



013

28.-Se comunica que se recibió la carta N° 327-20193 – FONDEPES/GG donde nos adjunta la resolución N° 155-2019-FONDEPES/GG resolviendo aprobar solo 40 días calendarios nuestra solicitud de ampliación de plazo N°32 estableciéndose en consecuencia, como fecha final de la ejecución de la obra el 25 de octubre del 2019.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al mes de Setiembre del 2019, se ha ejecutado un total acumulado del 99.72% del total del presupuesto Adicional N° 10 aprobado con Resolución Jefatural N°025-2019-FONDEPES/J de fecha 14/02/2019 de Febrero del 2019 contra un Avance Programado de Obra del 100.00% Acumulada según su calendario vigente.

Además comunicamos que a la fecha ya se tiene la conformidad por parte de ENSA y la entidad no entrega los documentos a ENSA para la firma de contrato respectivo la cual es indispensable para la electrificación del DPA, sin embargo ya se realizó el pago respectivo por conexión.

Christina Cecilia Trujillo
INGENIERA CIVIL
CIP N° 63195

Memoria

Descriptiva

Valorizada

004
0000

**MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA VALORIZACIÓN N° 07 –
ADICIONAL N°10**

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo el de dar el "Suficiente acceso a Recursos hidrobiológicos de Calidad que cumplan con la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (DS N° 040-2001-PE) en la Caleta de San José, Santa Rosa y Pimentel".

01.16 PRUEBAS ELÉCTRICAS Y PRUEBAS DE SERVICIO
01.16.01 PRUEBAS ELÉCTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO

Descripción:

Esta partida se refiere a las pruebas eléctricas a considerar a la red de media tensión proyectado, antes de la puesta en servicio.

Siendo necesario contar con los siguientes equipos:

- Telurómetro
- Megómetro de 25 kV
- Otros

Todos los equipos de medición considerado para la presente obra, deberá contar con su respectivo certificado de calibración no mayor a 1 años.

Pruebas:

- Prueba de Continuidad y Resistencia Eléctricas.- Para esta prueba se pone en corto circuito las salidas de la red de la sub estación y después se prueba a cada uno de los terminales de la red su continuidad.

Las resistencias eléctricas de las tres fases de la línea no deberán diferir a más de 5% del valor de la resistencia según tabla especificada para el cable de energía

- Prueba de Aislamiento.- Se deberá realizar la medición del aislamiento de la línea de red primaria subterránea y el aislamiento del transformador, utilizando un megometro de 25,000V.

El nivel de aislamiento de la Línea subterránea y el transformador deberá estar de acuerdo a lo especificado en el Código Nacional de Electricidad.

Según la Norma R.D. N° 018-2002-EM/DGE. Los valores mínimos de resistencia de aislamiento que deben obtenerse son los siguientes:

	Condiciones normales	Aérea	Subterránea
• Entre fases		100 Megohmios	50 Megohmios
• Entre fase y tierra		50 Megohmios	20 Megohmios
Condiciones húmedas	Aérea	Subterránea	
• Entre fases		50 Megohmios	50 Megohmios
• Entre fase y tierra		20 Megohmios	20 Megohmios

- Pruebas de Puesta a Tierra.- El contratista efectuará mediciones para verificar que se cumple con los niveles de resistividad adecuados según el CNE.

P MT 25

Cristian Antonio Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 03195

P BT 15

P Med. 05

Se comprobará la resistencia del sistema y si este fuera superior a los 25 Ohmios, se aumentará el número de dispersores hasta lograr un valor menor al indicado.

Para la puesta a tierra del medidor, se establecerá un valor menor a 5 ohmios

- Pruebas de Tensión.- Después de haber realizado las pruebas anteriores se aplicará la tensión nominal a toda la red durante 72 horas consecutivas, y si no se detecta ninguna situación anormal se puede poner en funcionamiento todo el sistema.

Se deberá verificar:


- Encendido de equipos
- Tensión y Secuencia de Fases

- Determinación de la Secuencia de Fases.

El contratista deberá efectuar mediciones para demostrar que la posición relativa de los conductores de cada fase corresponde a lo descrito.

- Protocolos de Pruebas.- Los equipos electromecánicos y electrónicos suministrados por el propietario, deberán contar con los protocolos de pruebas emitidos por el fabricante y asimismo deberán cumplir con las especificaciones técnicas de las normas establecidas por el Concesionario ELECTRONOROESTE SA y otras emitidas por empresas especializadas que emitan certificados de laboratorio como del Servicio Nacional de Metrología INDECOPI.

210



Christina María Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63195

**Resumen de
Valorización
N°07– Adicional
N°10**

**RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N° 07 DEL ADICIONAL N° 10
AL MES DE SETIEMBRE 2019**

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

EXPEDIENTE : ADICIONAL DE OBRA N°10

PROPIETARIO: FONDEPES
 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE
 SUPERVISIÓN: CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA
 ING. RESIDENTE: ING CHRISTIAN MEZA TRUJILLO
 3. SUPERVISOR: ING ISAÍAS JORGE ALVA ESPINOZA
 FECHA PPTO. BASE : DICIEMBRE 2018

MONTO DEL CONTRATO SIN IGV : S/. 364,025.50
 MONTO DEL CONTRATO CON IGV : S/. 429,550.09

CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	VAL. ACUM. ANTERIOR	VAL. ACTUAL	VAL. ACUM. ACTUAL	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
TOTAL CONTRACTUAL SIN IGV	364,025.50					
VALORIZACION CONTRACTUAL		353,136.72	9,881.25	363,017.97	99.72%	0.28%
	Avanc. Fisico	97.01%	2.71%	99.72%		
	Avanc. Program.	100.00%	0.00%	100.00%		
REAJUSTES		-	-	-		
VALORIZACION BRUTA		353,136.72	9,881.25	363,017.97		
AMORTIZACIONES			0.00			
DEL ADELANTO DIRECTO CONTRACTUAL / REF. CARTA N° 415-2016-FONDEPES/DIGENIPAA		13,605.51	-	13,605.51		
VALORIZACION NETA		339,531.21	9,881.25	349,412.46		
I.G.V. (18%)	65,524.59	61,115.62	1,778.63	62,894.25		
TOTALES	429,550.09	400,646.83	11,659.88	412,306.71	99.72%	0.28%

Christian Meza Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 03195

CONSORCIO SAN JOSE**VALORIZACION N°07 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 10 - SETIEMBRE 2019
RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR**

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

ENTIDAD EJECUTORA : FONDEPES

CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE

SUPERVISIÓN : CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA



INGENIERO RESIDENTE : ING CHRISTIAN MEZA TRUJILLO

INGENIERO SUPERVISOR : ING ISAÍAS JORGE ALVA ESPINOZA

MODALIDAD DE EJECUCION : A PRECIOS UNTARIOS

RESUMEN DE VALORIZACIÓN DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019

DESCRIPCION	MONTO S/.
RESUMEN DE SUBTOTALES	
ADICIONAL DE OBRA N°10	9,881.25
SUB-TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL	9,881.25
FACTOR RELACION 1.000	9,881.25
SUB-TOTAL VALORIZACION CONTRACTUAL	S/. 9,881.25
RESUMEN DE REAJUSTES	
(SE HA REAJUSTADO UTILIZANDO LOS INDICES UNIFICADOS PUBLICADO A LA FECHA - AGOSTO 2019)	
ADICIONAL DE OBRA N°10 Kr = 0.000	
REINTEGRO	0.00
DEDUCCIONES:	
- DEDUCCION DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DIRECTO	
DEDUCCION	0.00
VALORIZACION BRUTA (V.B.)	S/. 9,881.25
AMORTIZACIONES	
Amortización Adelantos Directos / REF. CARTA N° 415-2016-FONDEPES/DIGENIPAA	0.00
Amortización de Adelantos de materiales	0.00
TOTAL	0.00
VALORIZACION NETA (V.N.)	S/. 9,881.25
MONTO A FACTURAR Y PAGAR AL CONTRATISTA	
IGV 18%(VN)	1,778.63
TOTAL VN + IGV	S/. 11,659.88

Christian Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63195

Valorización

N°07 –

Adicional N°10

CONSORCIO SAN JOSE

RESUMEN GENERAL DE VALORIZACION N°07 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 10 - SETIEMBRE 2019

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"
ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE
FECHA : SETIEMBRE DEL 2019

	Supervisor Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza Residente Ing. Christian Meza Trujillo	Ubicación Región : LAMBAYEQUE Provincia : LAMBAYEQUE Distrito : SAN JOSE Localidad : SAN JOSE
Fecha-Inicio de Obra : 15-feb-19 Plazo de Ejecución : 213 Días C. Fecha-termino de Obra : 15-sep-19 Modalidad de Ejecución : Precios Unitarios	SEGÚN COSTO DIRECTO Monto Valorizado del Mes : S/. 9,881.25 2.71% Monto Valorizado Acumulado : S/. 363,017.98 99.72% Monto-Saldo por Valorizar : S/. 1,007.50 0.28%	

N°	DESCRIPCION	PARCIAL		ACUMULADO ANTERIOR				AVANCES ACTUAL				ACUMULADO				SALDO	
		S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado
10	ADICIONAL N°10	364,025.50	97.01%		353,136.72	2.71%		9,881.25	99.72%		363,017.97	0.28%					1,007.53
TOTAL SIN IGV (S/.)		364,025.50			353,136.72			9,881.25			363,017.97						1,007.53

ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 63105



2019

VALORIZACION DE OBRA N° 07 - SETIEMBRE 2019 (FORMULA 09 - INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION)

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"
 ENTIDAD : FONDEPES
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE
 FECHA : SETIEMBRE 2019

Monto Base	S/. 429,550.09
Monto Contratado	S/. 429,550.09
Fecha inicio Obra	15-feb-19
Plazo de Ejecución	188 Días C.
Fecha Final Obra	15-sep-19
Mod. de Ejecución	Precios Unitarios

Residente	Ing. Christian Meza Trujillo		
Supervisor	Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza		
SEGÚN COSTO DIRECTO			
Monto Valorizado del Mes	:	S/. 8,500.00	2.71%
Monto Valorizado Acumulado	:	S/. 312,273.52	99.72%
Monto-Saldo por Valorizar	:	S/. 866.68	0.28%

Ubicación	
Región	: LAMBAYEQUE
Provincia	: LAMBAYEQUE
Distrito	: SAN JOSE
Localidad	: SAN JOSE

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCES												
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	ACUMULADO ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO			
						%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	
01	MEDIA TENSION 10-22.9KV																	
01.01	OBRAS PRELIMINARES																	
01.01.01	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	est	1.00	15000	15,000.00	100%	1.00	15000.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	15,000.00	0%	0.00	0.00	
01.02	PUNTO DE DISEÑO																	
01.02.01	ACONDICIONAMIENTO DE PUNTO DE DISEÑO (E-PD)	und	1.00	684.61	684.61	100%	1.00	684.61	0%	0.00	0.00	100%	1.00	684.61	0%	0.00	0.00	
01.03	PUNTO DE PROTECCION HOMOPOLAR (E-PD)																	
01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 13/400/180/375 DE C.A.C Y ACCESORIOS, COMPONENTES Y FERRETERIA ELECTRICA	und	1.00	2039.75	2,039.75	100%	1.00	2039.75	0%	0.00	0.00	100%	1.00	2,039.75	0%	0.00	0.00	
01.03.02	ESTRUCTURA DE SECCIONAMIENTO Y MEDICION (E-PMI) INCLUYE ACCESORIOS, COMPONENTES Y FERRETERIA ELECTRICA	und	1.00	3869.85	3,869.85	100%	1.00	3869.85	0%	0.00	0.00	100%	1.00	3,869.85	0%	0.00	0.00	
01.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONADORES TIPO CUCHILLA 38KV 630A 170 KVBI	und	1.00	1146.61	1,146.61	100%	1.00	1146.61	0%	0.00	0.00	100%	1.00	1,146.61	0%	0.00	0.00	
01.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECONECTOR TRIFASICO 27KV, 630A, 12.5KA, 150KV BILL. INCLUYE TABLERO DE CONTROL	und	1.00	50189.28	50,189.28	100%	1.00	50189.28	0%	0.00	0.00	100%	1.00	50,189.28	0%	0.00	0.00	
01.03.05	SUMINISTRO MONOFASICO PARA TABLERO DE CONTROL DE RECLOSER	und	1.00	866.70	866.70	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	866.70	
01.04	PUNTO DE SECCIONAMIENTO Y MEDICION																	
01.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 13/400/180/375 DE C.A.C Y ACCESORIOS DE C.A.V (E-PMI)	und	1.00	1943.29	1,943.29	100%	1.00	1943.29	0%	0.00	0.00	100%	1.00	1,943.29	0%	0.00	0.00	
01.04.02	ESTRUCTURA DE SECCIONAMIENTO Y MEDICION (E-PMI) INCLUYE COMPONENTES Y FERRETERIA ELECTRICA	und	1.00	2250.14	2,250.14	100%	1.00	2250.14	0%	0.00	0.00	100%	1.00	2,250.14	0%	0.00	0.00	
01.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONADORES TIPO CUT-OUT, 38 KV, 100A, 170 KVBI, INC. EXTENSOR DE LINEA DE FUGA	und	1.00	1923.04	1,923.04	100%	1.00	1923.04	0%	0.00	0.00	100%	1.00	1,923.04	0%	0.00	0.00	
01.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMIX 3X50VA TENSION 3X30VA CORRIENTE 10-22.90 40-0.23KV Dyn5-Yyn6	und	1.00	9679.40	9,679.40	100%	1.00	9679.40	0%	0.00	0.00	100%	1.00	9,679.40	0%	0.00	0.00	
01.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA MULTIFUNCION, INC MURETE CAJA PORTAMEDIDOR Y CABLE	und	1.00	3857.58	3,857.58	100%	1.00	3857.58	0%	0.00	0.00	100%	1.00	3,857.58	0%	0.00	0.00	
01.05	ESTRUCTURA DE PUNTO DE ALINEAMIENTO (E-03)																	
01.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 13/300 DE C.A.C Y ACCESORIOS DE C.A.V (E-03)	und	5.00	2002.81	10,014.05	100%	5.00	10014.05	0%	0.00	0.00	100%	5.00	10,014.05	0%	0.00	0.00	
01.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 15/400 DE C.A.C Y ACCESORIOS DE C.A.V (E-03)	und	2.00	2949.82	5,899.64	100%	2.00	5899.64	0%	0.00	0.00	100%	2.00	5,899.64	0%	0.00	0.00	
01.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE FERRETERIA (E-03)	und	7.00	1148.96	8,042.86	100%	7.00	8042.86	0%	0.00	0.00	100%	7.00	8,042.86	0%	0.00	0.00	
01.06	ESTRUCTURA DE DOBLE ANCLAJE (E-12)																	
01.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 13/400 DE C.A.C Y ACCESORIOS DE C.A.V (E-12)	und	1.00	2011.68	2,011.68	100%	1.00	2011.68	0%	0.00	0.00	100%	1.00	2,011.68	0%	0.00	0.00	
01.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE FERRETERIA (E-12)	und	1.00	967.51	967.51	100%	1.00	967.51	0%	0.00	0.00	100%	1.00	967.51	0%	0.00	0.00	
01.07	ESTRUCTURA DE DOBLE ANCLAJE (E-25)																	
01.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 13/400 DE C.A.C (E-25)	und	1.00	1774.60	1,774.60	100%	1.00	1774.60	0%	0.00	0.00	100%	1.00	1,774.60	0%	0.00	0.00	

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCES						SALDO					
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	ACUMULADO ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO					
						%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.			
01	MEDIA TENSION 10-22.9KV																
01.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE FERRETERIA (E-25)	und	1.00	921.59	921.59	100%	1.00	921.59	0%	0.00	0.00	100%	1.00	921.59	0%	0.00	0.00
01.08	ESTRUCTURA DE FIN DE LINEA CON BAJADA SUBTERRANEA (E-33)																
01.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 13/400 DE C.A.C Y ACCESORIOS DE C.A.V (E-33)	und	2.00	2020.19	4,040.38	100%	2.00	4040.38	0%	0.00	0.00	100%	2.00	4,040.38	0%	0.00	0.00
01.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 15/400 DE C.A.C Y ACCESORIOS DE C.A.V (E-33)	und	1.00	2752.39	2,752.39	100%	1.00	2752.39	0%	0.00	0.00	100%	1.00	2,752.39	0%	0.00	0.00
01.08.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE FERRETERIA (E-33)	und	3.00	841.17	2,523.51	100%	3.00	2523.51	0%	0.00	0.00	100%	3.00	2,523.51	0%	0.00	0.00
01.09	ESTRUCTURA DE ANCLAJE CON DERIVACION (E-39)																
01.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 13/400 DE C.A.C Y ACCESORIOS DE C.A.V (E-39)	und	7.00	2022.39	14,156.73	100%	7.00	14156.73	0%	0.00	0.00	100%	7.00	14,156.73	0%	0.00	0.00
01.09.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 15/400 DE C.A.C Y ACCESORIOS DE C.A.V (E-39)	und	1.00	2752.39	2,752.39	100%	1.00	2752.39	0%	0.00	0.00	100%	1.00	2,752.39	0%	0.00	0.00
01.09.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE FERRETERIA (E-39)	und	8.00	1400.01	11,200.08	100%	8.00	11200.08	0%	0.00	0.00	100%	8.00	11,200.08	0%	0.00	0.00
01.10	SUBESTACION ELECTRICA 400KVA EN 10-22.9/380-220V																
01.10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 13/400/180/375 DE C.A.C Y ACCESORIOS DE C.A.V (E-SAB)	und	1.00	3867.64	3,867.64	100%	1.00	3867.64	0%	0.00	0.00	100%	1.00	3,867.64	0%	0.00	0.00
01.10.02	ARMADO SUB ESTACION AEREA BIPOSTE (E-SAB) 400 KVA INCLUYE ACCESORIOS COMPONENTES Y FERRETERIA ELECTRICA	und	1.00	2934.81	2,934.81	100%	1.00	2934.81	0%	0.00	0.00	100%	1.00	2,934.81	0%	0.00	0.00
01.10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONADORES TIPO CUT-OUT, 38 KV, 100A, 170 KVBL, INC EXTENSOR DE LINEA DE FUGA	und	1.00	1921.84	1,921.84	100%	1.00	1921.84	0%	0.00	0.00	100%	1.00	1,921.84	0%	0.00	0.00
01.10.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 400KVA, 3ø, 10-22.9/0.40-0.23KV Dyn5 Yym6	und	1.00	29493.42	29,493.42	100%	1.00	29493.42	0%	0.00	0.00	100%	1.00	29,493.42	0%	0.00	0.00
01.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL 400KVA/380-220V	und	1.00	2788.03	2,788.03	100%	1.00	2788.03	0%	0.00	0.00	100%	1.00	2,788.03	0%	0.00	0.00
01.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDAS																
01.11.01	EXCAVACION Y RELLENO DE HOYOS (1.00X1.00X2.20M) PARA RETENIDAS	und	13.00	144.74	1,881.62	100%	13.00	1881.62	0%	0.00	0.00	100%	13.00	1,881.62	0%	0.00	0.00
01.11.02	RETENIDA SIMPLE PARA POSTE DE 13m	und	3.00	484.35	1,453.05	100%	3.00	1453.05	0%	0.00	0.00	100%	3.00	1,453.05	0%	0.00	0.00
01.11.03	RETENIDA CONTRAPUNTA PARA POSTE DE 13m	und	8.00	548.5	4,388.00	100%	8.00	4388.00	0%	0.00	0.00	100%	8.00	4,388.00	0%	0.00	0.00
01.11.04	RETENIDA CONTRAPUNTA PARA POSTE DE 15m	und	2.00	548.5	1,097.00	100%	2.00	1097.00	0%	0.00	0.00	100%	2.00	1,097.00	0%	0.00	0.00
01.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS DE PUESTA A TIERRA																
01.12.01	PUESTA A TIERRA PARA MT (TRANSMISION MT)	und	20.00	983.94	19,678.80	100%	20.00	19678.80	0%	0.00	0.00	100%	20.00	19,678.80	0%	0.00	0.00
01.12.02	PUESTA A TIERRA PARA EQUIPOS MT/BT	und	7.00	1211.71	8,481.97	100%	7.00	8481.97	0%	0.00	0.00	100%	7.00	8,481.97	0%	0.00	0.00
01.12.03	PUESTA A TIERRA PARA MEDIDOR ELECTRONICO INC. EXCAVACION E INSTALACION	und	1.00	1259.71	1,259.71	100%	1.00	1259.71	0%	0.00	0.00	100%	1.00	1,259.71	0%	0.00	0.00
01.13	HABILITACION PARA RED SUBTERRANEA																
01.13.01	CORTE ROTURA Y REPARACION DE PISTA DE ASFALTO	m	35.16	89.56	3,148.93	100%	35.16	3148.93	0%	0.00	0.00	100%	35.16	3,148.93	0%	0.00	0.00
01.13.02	EXCAVACION DE ZANJA PARA LINEA SUBTERRANEA (0.80X1.10M)	m	49.27	42.63	2,100.38	100%	49.27	2100.38	0%	0.00	0.00	100%	49.27	2,100.38	0%	0.00	0.00
01.13.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 4 VIAS (INCLUYE SOLADO)	m	48.00	57.63	2,766.24	100%	48.00	2766.24	0%	0.00	0.00	100%	48.00	2,766.24	0%	0.00	0.00
01.13.04	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	m	49.27	24.79	1,221.40	100%	49.27	1221.40	0%	0.00	0.00	100%	49.27	1,221.40	0%	0.00	0.00
01.13.05	BUZON DE CONCRETO (1.00X1.00X1.50 LXAXH) PARA RED DE MEDIA TENSION	und	1.00	1241.5	1,241.50	100%	1.00	1241.50	0%	0.00	0.00	100%	1.00	1,241.50	0%	0.00	0.00
01.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES																
01.14.01	CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO ENGRASADO DE 50 mm2	m	2736.91	5.68	15,545.65	100%	2,736.91	15545.65	0%	0.00	0.00	100%	2736.91	15,545.65	0%	0.00	0.00
01.14.02	CONDUCTOR N25XY 50mm2 18/30KV	m	333.48	49.5	16,507.26	100%	333.48	16507.26	0%	0.00	0.00	100%	333.48	16,507.26	0%	0.00	0.00
01.14.03	TERMINAL TERMOCOCTRIBLA TIPO EXTERIOR P/CONDUCTOR DE 50 mm2-25kv	kt	4.00	598.74	2,394.96	100%	4.00	2394.96	0%	0.00	0.00	100%	4.00	2,394.96	0%	0.00	0.00
01.14.04	CONDUCTOR 300mm N2XOH 0.6/1 KV	m	7.00	622.61	4,358.27	100%	7.00	4358.27	0%	0.00	0.00	100%	7.00	4,358.27	0%	0.00	0.00
01.15	SEÑALIZACIONES																
01.15.01	SEÑALIZACION DE PUESTA A TIERRA	und	28.00	27.96	782.88	100%	28.00	782.88	0%	0.00	0.00	100%	28.00	782.88	0%	0.00	0.00
01.15.02	SEÑALIZACION DE BASE DE POSTE	und	24.00	38.72	929.28	100%	24.00	929.28	0%	0.00	0.00	100%	24.00	929.28	0%	0.00	0.00
01.15.03	SEÑALIZACION DE RIESGO ELECTRICO POR POSTE	und	24.00	28.42	682.08	100%	24.00	682.08	0%	0.00	0.00	100%	24.00	682.08	0%	0.00	0.00
01.16	PRUEBAS ELECTRICAS Y PRUEBAS DE SERVICIO																
01.16.01	PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO	gb	1.00	2429.58	2,429.58	100%	1.00	2429.58	0%	0.00	0.00	100%	1.00	2,429.58	0%	0.00	0.00
01.16.02	ESTUDIO Y PROGRAMACION DE COORDINACION DE PROTECCIONES PARA RELE DE RECLOSER	gb	1.00	5000	5,000.00	100%	1.00	5000.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	5,000.00	0%	0.00	0.00

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCES									SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	ACUMULADO ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			%	Metrado	Valorizado S/.	
						%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.				
01	MEDIA TENSION 10-22.9KV																	
01.16.03	COSTO DE CONEXIÓN Y ENERGIZACION DE LA RED	gb	1.00	8500	8.500.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	8.500.00	100%	1.00	8.500.00	0%	0.00	0.00	
01.16.04	EXPEDIENTE DE REPLANTEO DE OBRA	gb	1.00	2500	2.500.00	100%	1.00	2500.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	2.500.00	0%	0.00	0.00	
01.17	EQUIPOS DE PROTECCION Y MANIOBRAS																	
01.17.01	EQUIPOS DE PROTECCION Y MANIOBRAS	gb	1.00	3278.25	3.278.25	100%	1.00	3278.25	0%	0.00	0.00	100%	1.00	3.278.25	0%	0.00	0.00	
COSTO DIRECTO TOTAL					313,140.21		303,773.52		8,500.00		312,273.52		866.68					
GASTOS GENERALES (8.25 %)					25,834.07		25,061.32		701.25		25,762.57		71.50					
UTILIDAD (8.00 %)					25,051.22		24,301.89		680.00		24,981.89		69.32					
SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO					364,025.50		353,136.73		9,881.25		363,017.98		1,007.50					
I.G.V. (18.0 %)					65,524.59		63,564.61		1,778.63		65,343.24		181.35					
TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO					429,550.09		416,701.34		11,659.88		428,361.22		1,188.85					
VALORIZACION CONTRACTUAL (SIN IG V)					364,025.50		353,136.73		9,881.25		363,017.98		1,007.50					
I.G.V. (18.0 %)					65,524.59		63,564.61		1,778.63		65,343.24		181.35					
VALORIZACION CONTRACTUAL (CON IG V)					429,550.09		416,701.34		11,659.88		428,361.22		1,188.85					

INGENIERO EN ELECTRICIDAD
 ING. CIVIL
 CIP N° 63105

CONSORCIO SAN JOSE

001

AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO - SETIEMBRE 2019

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE
RESIDENTE : ING CHRISTIAN MEZA TRUJILLO
PLAZO CONTR. : 1,705 DIAS CALENDARIO
MODALIDAD : A PRECIOS UNITARIOS

FORMULA:

$$\text{AMORT} = \text{AxVAL/C}$$

DONDE:

AMORT : Amortizacion por el Adelanto en Efectivo
A : Monto del Adelanto Directo Otorgado en Efectivo Sin IGTV
V : Monto de la Valorización Mensual, incluye Factor Relación
C : Monto del Contrato Principal Sin IGTV

SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 32,457,630.22 INC. IGTV
SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 27,506,466.29 SIN IGTV


PORCENTAJE DEL ADELANTO 20.00%

ADELANTO DIRECTO = 6,491,526.04 INC IGTV
ADELANTO DIRECTO = 5,501,293.26 SIN IGTV

No.	FECHA PAGO	ADEL. EFEC. CON IGTV	ADEL. EFEC. SIN IGTV	PORCENTAJE DEL ADELANTO
1	09/01/2015	6,491,526.04	5,501,293.26	20.00%

Valorizacion		Monto Valorizado a	Adel. Otorg. (SIN IGTV) c	Porcentaje del Adelanto d	Amortizacion AxVAL/C e = a x d	Monto por Amortizar f	Saldo a Amortizar g = f - e
Nº	Mes						
VAL N° 1	ENERO	358,268.22	5,501,293.26	20.00%	71,653.64	5,501,293.26	5,429,639.62
VAL N° 2	FEBRERO	555,717.90	5,501,293.26	20.00%	111,143.58	5,501,293.26	5,318,496.04
VAL N° 3	MARZO	593,994.44	5,501,293.26	20.00%	118,798.89	5,501,293.26	5,199,697.15
VAL N° 4	ABRIL	925,177.18	5,501,293.26	20.00%	185,035.44	5,501,293.26	5,014,661.71
VAL N° 5	MAYO	753,732.22	5,501,293.26	20.00%	150,746.44	5,501,293.26	4,863,915.27
VAL N° 6	JUNIO	985,329.63	5,501,293.26	20.00%	197,065.93	5,501,293.26	4,666,849.34
VAL N° 7	JULIO	1,865,453.02	5,501,293.26	20.00%	373,090.60	5,501,293.26	4,293,758.74
VAL N° 8	AGOSTO	1,054,927.09	5,501,293.26	20.00%	210,985.42	5,501,293.26	4,082,773.32
VAL N° 9	SEPTIEMBRE	1,429,170.33	5,501,293.26	20.00%	285,834.07	5,501,293.26	3,796,939.25
VAL N° 10	OCTUBRE	1,285,746.48	5,501,293.26	20.00%	257,149.30	5,501,293.26	3,539,789.95
VAL N° 11	NOVIEMBRE	2,011,031.83	5,501,293.26	20.00%	402,206.37	5,501,293.26	3,137,583.58
VAL N° 12	DICIEMBRE	1,389,920.39	5,501,293.26	20.00%	277,984.08	5,501,293.26	2,859,599.50
VAL N° 13	ENERO	1,517,495.69	5,501,293.26	20.00%	303,499.14	5,501,293.26	2,556,100.36
VAL N° 14	FEBRERO	667,975.68	5,501,293.26	20.00%	133,595.14	5,501,293.26	2,422,505.22
VAL N° 15	MARZO	621,544.65	5,501,293.26	20.00%	124,308.93	5,501,293.26	2,298,196.29
VAL N° 16	ABRIL	240,541.06	5,501,293.26	20.00%	48,108.21	5,501,293.26	2,250,088.08
VAL N° 17	MAYO	67,518.42	5,501,293.26	20.00%	13,503.68	5,501,293.26	2,236,584.40
VAL N° 18	JUNIO	238,908.88	5,501,293.26	20.00%	47,781.78	5,501,293.26	2,188,802.62
VAL N° 19	JULIO	87,581.78	5,501,293.26	20.00%	17,516.36	5,501,293.26	2,171,286.26
VAL N° 20	AGOSTO	26,733.49	5,501,293.26	20.00%	5,346.70	5,501,293.26	2,165,939.56
VAL N° 21	SEPTIEMBRE	54,654.58	5,501,293.26	20.00%	10,930.92	5,501,293.26	2,155,008.64
VAL N°01 - ADICIONAL N°02	ABRIL	380,705.19	5,501,293.26		190,352.60	5,501,293.26	1,964,656.04
VAL N° 01 - ADICIONAL N°04	JULIO	423,756.53	5,501,293.26		211,878.27	5,501,293.26	1,752,777.77
VAL N° 22	OCTUBRE	15,754.74	5,501,293.26	20.00%	3,150.95	5,501,293.26	1,749,626.82
VAL N° 23	NOVIEMBRE	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	1,749,626.82
VAL N° 24	DICIEMBRE	68,223.57	5,501,293.26	20.00%	13,644.71	5,501,293.26	1,735,982.11
VAL N°01 - ADICIONAL N°05	DICIEMBRE	148,551.83	5,501,293.26		74,275.92	5,501,293.26	1,661,706.19
VAL N° 02 - ADICIONAL N°04	ENERO	35,933.20	5,501,293.26		35,933.20	5,501,293.26	1,625,772.99
VAL N° 25	ENERO	106,056.42	5,501,293.26	20.00%	106,056.42	5,501,293.26	1,519,716.57




 Christian Meza Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 63195

CONSORCIO SAN JOSE

200

AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO - SETIEMBRE 2019

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE
RESIDENTE : ING CHRISTIAN MEZA TRUJILLO
PLAZO CONTR. : 1,705 DIAS CALENDARIO
MODALIDAD : A PRECIOS UNITARIOS

FORMULA:

$$\text{AMORT} = A \times \text{VAL}/C$$

DONDE:

AMORT : Amortizacion por el Adelanto en Efectivo
A : Monto del Adelanto Directo Otorgado en Efectivo Sin IGV
V : Monto de la Valorización Mensual, incluye Factor Relación
C : Monto del Contrato Principal Sin IGV

SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 32,457,630.22 INC. IGV
SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 27,506,466.29 SIN IGV


PORCENTAJE DEL ADELANTO 20.00%

ADELANTO DIRECTO = 6,491,526.04 INC IGV
ADELANTO DIRECTO = 5,501,293.26 SIN IGV

No.	FECHA PAGO	ADEL. EFEC. CON IGV	ADEL. EFEC. SIN IGV	PORCENTAJE DEL ADELANTO
1	09/01/2015	6,491,526.04	5,501,293.26	20.00%

Valorizacion		Monto Valorizado	Adel. Otorg. (SIN IGV)	Porcentaje del Adelanto	Amortizacion AxVAL/C	Monto por Amortizar	Saldo a Amortizar
Nº	Mes	a	c	d	e= a x d	f	g= f - e
VAL Nº 01 - ADICIONAL Nº06	ENERO	886,768.10	5,501,293.26		886,768.10	5,501,293.26	632,948.47
VAL Nº 26	FEBRERO	11,543.86	5,501,293.26	20.00%	2,308.77	5,501,293.26	630,639.70
VAL Nº 02 - ADICIONAL Nº06	FEBRERO	17,601.86	5,501,293.26		17,601.86	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 27	MARZO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 28	ABRIL	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 29	MAYO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 30	JUNIO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 31	JULIO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 32	AGOSTO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 33	SEPTIEMBRE	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 34	OCTUBRE	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 35	NOVIEMBRE	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 36	DICIEMBRE	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 37	ENERO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 38	FEBRERO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 01 - ADICIONAL Nº08	MARZO	569,308.78	5,501,293.26	20.00%	113,861.76	5,501,293.26	499,176.08
VAL Nº 39	MARZO	1,487.48	5,501,293.26	20.00%	297.50	5,501,293.26	498,878.58
VAL Nº 01 - ADICIONAL Nº07	MARZO	46,702.28	5,501,293.26	20.00%	9,340.48	5,501,293.26	489,538.12
VAL Nº 02 - ADICIONAL Nº07	ABRIL	12,810.45	5,501,293.26	20.00%	2,562.09	5,501,293.26	486,976.03
VAL Nº 02 - ADICIONAL Nº08	ABRIL	121,994.74	5,501,293.26	20.00%	24,398.95	5,501,293.26	462,577.08
VAL Nº 40	ABRIL	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	462,577.08
VAL Nº 03 - ADICIONAL Nº07	MAYO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	462,577.08
VAL Nº 03 - ADICIONAL Nº08	MAYO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	462,577.08




 Christian Meza Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP Nº 63135

CONSORCIO SAN JOSE

109

AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO - SETIEMBRE 2019

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE
RESIDENTE : ING CHRISTIAN MEZA TRUJILLO
PLAZO CONTR. : 1,705 DIAS CALENDARIO
MODALIDAD : A PRECIOS UNITARIOS

FORMULA:

$$AMORT = A \times VAL / C$$

DONDE:

AMORT : Amortizacion por el Adelanto en Efectivo
A : Monto del Adelanto Directo Otorgado en Efectivo Sin IGV
V : Monto de la Valorización Mensual, incluye Factor Relación
C : Monto del Contrato Principal Sin IGV


SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 32,457,630.22 INC. IGV
SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 27,506,466.29 SIN IGV


PORCENTAJE DEL ADELANTO 20.00%

ADELANTO DIRECTO = 6,491,526.04 INC IGV
ADELANTO DIRECTO = 5,501,293.26 SIN IGV

No.	FECHA PAGO	ADEL. EFEC. CON IGV	ADEL. EFEC. SIN IGV	PORCENTAJE DEL ADELANTO
1	09/01/2015	6,491,526.04	5,501,293.26	20.00%

Valorizacion		Monto Valorizado a	Adel. Otorg. (SIN IGV) c	Porcentaje del Adelanto d	Amortizacion AxVAL/C e = a x d	Monto por Amortizar f	Saldo a Amortizar g = f - e
Nº	Mes						
VAL Nº 41	MAYO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	462,577.08
VAL Nº 42	JUNIO	27,517.58	5,501,293.26	20.00%	5,503.52	5,501,293.26	457,073.56
VAL Nº 04 - ADICIONAL Nº 08	JUNIO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	457,073.56
VAL Nº 04 - ADICIONAL Nº 07	JUNIO	50,282.27	5,501,293.26	20.00%	10,056.45	5,501,293.26	447,017.11
VAL Nº 43	JULIO	15,893.61	5,501,293.26	20.00%	3,178.72	5,501,293.26	443,838.39
VAL Nº 05 - ADICIONAL Nº 08	JULIO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	443,838.39
VAL Nº 05 - ADICIONAL Nº 07	JULIO	41,140.04	5,501,293.26	20.00%	8,228.01	5,501,293.26	435,610.38
VAL Nº 44	AGOSTO	16,519.87	5,501,293.26	20.00%	3,303.97	5,501,293.26	432,306.41
VAL Nº 08 - ADICIONAL Nº 08	AGOSTO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	432,306.41
VAL Nº 08 - ADICIONAL Nº 07	AGOSTO	63,995.61	5,501,293.26	20.00%	12,799.12	5,501,293.26	419,507.29
VAL Nº 07 - ADICIONAL Nº 08	SETIEMBRE	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	419,507.29
VAL Nº 07 - ADICIONAL Nº 07	SETIEMBRE	64,373.77	5,501,293.26	20.00%	12,874.75	5,501,293.26	406,632.54
VAL Nº 45	SETIEMBRE	23,972.12	5,501,293.26	20.00%	4,794.42	5,501,293.26	401,838.12
VAL Nº 08 - ADICIONAL Nº 08	OCTUBRE	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	401,838.12
VAL Nº 08 - ADICIONAL Nº 07	OCTUBRE	46,904.74	5,501,293.26	20.00%	9,380.95	5,501,293.26	392,457.17
VAL Nº 46	OCTUBRE	14,412.14	5,501,293.26	20.00%	2,882.43	5,501,293.26	389,574.74
VAL Nº 09 - ADICIONAL Nº 08	NOVIEMBRE	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	389,574.74
VAL Nº 09 - ADICIONAL Nº 07	NOVIEMBRE	88,597.84	5,501,293.26	20.00%	17,719.57	5,501,293.26	371,855.17




 Christian Meza Trujillo
 ING. EN INGENIERIA CIVIL
 CIP Nº 63105

CONSORCIO SAN JOSE

AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO - SETIEMBRE 2019

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE
RESIDENTE : ING CHRISTIAN MEZA TRUJILLO
PLAZO CONTR. : 1,705 DIAS CALENDARIO
MODALIDAD : A PRECIOS UNITARIOS

FORMULA:

$$AMORT = A \times VAL / C$$

DONDE:

AMORT : Amortizacion por el Adelanto en Efectivo
A : Monto del Adelanto Directo Otorgado en Efectivo Sin IGV
V : Monto de la Valorización Mensual, incluye Factor Relación
C : Monto del Contrato Principal Sin IGV

SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 32,457,630.22 INC. IGV
SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 27,506,466.29 SIN IGV

PORCENTAJE DEL ADELANTO 20.00%

ADELANTO DIRECTO = 6,491,526.04 INC IGV
ADELANTO DIRECTO = 5,501,293.26 SIN IGV

No.	FECHA PAGO	ADEL. EFEC. CON IGV	ADEL. EFEC. SIN IGV	PORCENTAJE DEL ADELANTO
1	09/01/2015	6,491,526.04	5,501,293.26	20.00%

Valorizacion		Monto Valorizado <i>a</i>	Adel. Otorg. (SIN IGV) <i>c</i>	Porcentaje del Adelanto <i>d</i>	Amortizacion AxVAL/C <i>e = a x d</i>	Monto por Amortizar <i>f</i>	Saldo a Amortizar <i>g = f - e</i>
Nº	Mes						
VAL Nº 47	NOVIEMBRE	51,039.97	5,501,293.26	20.00%	10,207.99	5,501,293.26	361,647.18
VAL Nº 10 - ADICIONAL Nº08	DICIEMBRE	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	361,647.18
VAL Nº 10 - ADICIONAL Nº07	DICIEMBRE	88,597.84	5,501,293.26	20.00%	17,719.57	5,501,293.26	343,927.61
VAL Nº 48	DICIEMBRE	35,710.99	5,501,293.26	20.00%	7,142.20	5,501,293.26	336,785.41
VAL Nº 11 - ADICIONAL Nº07	ENERO	104,232.76	5,501,293.26	20.00%	20,846.55	5,501,293.26	315,938.86
VAL Nº 11 - ADICIONAL Nº08	ENERO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	315,938.86
VAL Nº 49	ENERO	164,208.84	5,501,293.26	20.00%	32,841.77	5,501,293.26	283,097.09
VAL Nº 01 - ADICIONAL Nº11	ENERO	327,525.81	5,501,293.26	20.00%	65,505.16	5,501,293.26	217,591.93
VAL Nº 01 - ADICIONAL Nº12	ENERO	219,831.21	5,501,293.26	20.00%	43,966.24	5,501,293.26	173,625.69
VAL Nº 12 - ADICIONAL Nº07	FEBRERO	93,809.48	5,501,293.26	20.00%	18,761.90	5,501,293.26	154,863.79
VAL Nº 12 - ADICIONAL Nº08	FEBRERO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	154,863.79
VAL Nº 50	FEBRERO	103,918.49	5,501,293.26	20.00%	20,783.70	5,501,293.26	134,080.09
VAL Nº 02 - ADICIONAL Nº11	FEBRERO	21,396.82	5,501,293.26	20.00%	4,279.36	5,501,293.26	129,800.73
VAL Nº 02 - ADICIONAL Nº12	FEBRERO	87,768.74	5,501,293.26	20.00%	17,553.75	5,501,293.26	112,246.98
VAL Nº 13 - ADICIONAL Nº07	MARZO	88,597.84	5,501,293.26	20.00%	17,719.57	5,501,293.26	94,527.41
VAL Nº 13 - ADICIONAL Nº08	MARZO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	94,527.41

[Signature]
 CONSORCIO SAN JOSE
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 Christian Meza Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP Nº 63195

CONSORCIO SAN JOSE

107

AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO - SETIEMBRE 2019

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

ENTIDAD : FONDEPES
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE
 RESIDENTE : ING CHRISTIAN MEZA TRUJILLO
 PLAZO CONTR. : 1,705 DIAS CALENDARIO
 MODALIDAD : A PRECIOS UNITARIOS

FORMULA:

$$\text{AMORT} = A \times \text{VAL}/C$$

DONDE:

AMORT : Amortizacion por el Adelanto en Efectivo
 A : Monto del Adelanto Directo Otorgado en Efectivo Sin IGTV
 V : Monto de la Valorización Mensual, incluye Factor Relación
 C : Monto del Contrato Principal Sin IGTV


SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 32,457,630.22 INC. IGTV
 SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 27,506,466.29 SIN IGTV


PORCENTAJE DEL ADELANTO 20.00%

ADELANTO DIRECTO = 6,491,526.04 INC IGTV
 ADELANTO DIRECTO = 5,501,293.26 SIN IGTV

No.	FECHA PAGO	ADEL. EFEC. CON IGTV	ADEL. EFEC. SIN IGTV	PORCENTAJE DEL ADELANTO
1	09/01/2015	6,491,526.04	5,501,293.26	20.00%

Valorizacion		Monto Valorizado	Adel. Otorg. (SIN IGTV)	Porcentaje del Adelanto	Amortizacion AxVAL/C	Monto por Amortizar	Saldo a Amortizar
Nº	Mes	a	c	d	e = a x d	f	g = f - e
VAL Nº 51	MARZO	115,453.77	5,501,293.26	20.00%	23,090.75	5,501,293.26	71,436.66
VAL Nº 03 - ADICIONAL Nº11	MARZO	18,843.20	5,501,293.26	20.00%	3,768.64	5,501,293.26	67,668.02
VAL Nº 03 - ADICIONAL Nº12	MARZO	82,403.72	5,501,293.26	20.00%	16,480.74	5,501,293.26	51,187.28
VAL Nº 01 - ADICIONAL Nº10	MARZO	68,027.56	5,501,293.26	20.00%	13,605.51	5,501,293.26	37,581.77
VAL Nº 14 - ADICIONAL Nº07	ABRIL	109,444.40	5,501,293.26	14.63%	16,015.73	5,501,293.26	21,566.04
VAL Nº 14 - ADICIONAL Nº08	ABRIL	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	21,566.04
VAL Nº 52	ABRIL	60,457.87	5,501,293.26	20.00%	12,091.57	5,501,293.26	9,474.47
VAL Nº 04 - ADICIONAL Nº11	ABRIL	20,547.19	5,501,293.26	20.00%	4,109.44	5,501,293.26	5,365.03
VAL Nº 04 - ADICIONAL Nº12	ABRIL	26,825.17	5,501,293.26	20.00%	5,365.03	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 02 - ADICIONAL Nº10	ABRIL	179,957.01	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 15 - ADICIONAL Nº07	MAYO	72,962.93	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 15 - ADICIONAL Nº08	MAYO	0.00	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 53	MAYO	58,631.21	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 05 - ADICIONAL Nº11	MAYO	15,289.98	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 05 - ADICIONAL Nº12	MAYO	19,089.93	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 03 - ADICIONAL Nº10	MAYO	91,703.53	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 01 - ADICIONAL Nº09	MAYO	200,187.96	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00




 Christian Meza Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP Nº 63105

CONSORCIO SAN JOSE

106

AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO - SETIEMBRE 2019

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

ENTIDAD : FONDEPES
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE
RESIDENTE : ING CHRISTIAN MEZA TRUJILLO
PLAZO CONTR. : 1,705 DIAS CALENDARIO
MODALIDAD : A PRECIOS UNITARIOS

FORMULA:

$$\text{AMORT} = \text{AxVAL/C}$$

DONDE:

AMORT : Amortizacion por el Adelanto en Efectivo
A : Monto del Adelanto Directo Otorgado en Efectivo Sin IG
V : Monto de la Valorización Mensual, incluye Factor Relación
C : Monto del Contrato Principal Sin IG

SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 32,457,630.22 INC. IG
SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 27,506,466.29 SIN IG

PORCENTAJE DEL ADELANTO 20.00%

ADELANTO DIRECTO = 6,491,526.04 INC IG
ADELANTO DIRECTO = 5,501,293.26 SIN IG

No.	FECHA PAGO	ADEL. EFEC. CON IG	ADEL. EFEC. SIN IG	PORCENTAJE DEL ADELANTO
1	09/01/2015	6,491,526.04	5,501,293.26	20.00%

Valorizacion		Monto Valorizado a	Adel. Otorg. (SIN IG) c	Porcentaje del Adelanto d	Amortizacion AxVAL/C e= a x d	Monto por Amortizar f	Saldo a Amortizar g= f - e
Nº	Mes						
VAL Nº 16 - ADICIONAL Nº07	JUNIO	31,269.83	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 16 - ADICIONAL Nº08	JUNIO	0.00	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 54	JUNIO	8,189.47	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 06 - ADICIONAL Nº11	JUNIO	11,076.32	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 06 - ADICIONAL Nº12	JUNIO	15,150.68	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 04 - ADICIONAL Nº10	JUNIO	10,624.24	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 02 - ADICIONAL Nº09	JUNIO	0.00	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 17 - ADICIONAL Nº07	JULIO	13,434.21	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 17 - ADICIONAL Nº08	JULIO	0.00	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 55	JULIO	191,239.14	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 07 - ADICIONAL Nº11	JULIO	2,405.23	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 07 - ADICIONAL Nº12	JULIO	132,838.15	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 05 - ADICIONAL Nº10	JULIO	1,412.19	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 03 - ADICIONAL Nº09	JULIO	202,339.90	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
Christian Meza Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP Nº 63105

AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO - SETIEMBRE 2019

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

ENTIDAD : FONDEPES
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE
 RESIDENTE : ING CHRISTIAN MEZA TRUJILLO
 PLAZO CONTR. : 1,705 DIAS CALENDARIO
 MODALIDAD : A PRECIOS UNITARIOS

FORMULA:

AMORT = AxVAL/C

DONDE:

AMORT : Amortizacion por el Adelanto en Efectivo
 A : Monto del Adelanto Directo Otorgado en Efectivo Sin IG
 V : Monto de la Valorización Mensual, incluye Factor Relación
 C : Monto del Contrato Principal Sin IG

SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 32,457,630.22 INC. IG
 SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 27,506,466.29 SIN IG

PORCENTAJE DEL ADELANTO 20.00%

ADELANTO DIRECTO = 6,491,526.04 INC IG
 ADELANTO DIRECTO = 5,501,293.26 SIN IG

No.	FECHA PAGO	ADEL. EFEC. CON IG	ADEL. EFEC. SIN IG	PORCENTAJE DEL ADELANTO
1	09/01/2015	6,491,526.04	5,501,293.26	20.00%

Christián Meza Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP Nº 63105

Valorización		Monto Valorizado a	Adel. Otorg. (SIN IG)	Porcentaje del Adelanto d	Amortización AxVAL/C e = a x d	Monto por Amortizar f	Saldo a Amortizar g = f - e
Nº	Mes						
VAL Nº 01-ADICIONAL Nº13	JULIO	206,296.52	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 03-ADICIONAL Nº04	JULIO	25,554.71	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 18 -ADICIONAL Nº07	AGOSTO	33,875.64	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 18 -ADICIONAL Nº08	AGOSTO	0.00	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 56	AGOSTO	29,228.61	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 06 -ADICIONAL Nº10	AGOSTO	1,412.19	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 04-ADICIONAL Nº09	AGOSTO	0.00	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 04-ADICIONAL Nº04	AGOSTO	914.24	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 19 -ADICIONAL Nº07	SETIEMBRE	70,357.11	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 19 -ADICIONAL Nº08	SETIEMBRE	0.00	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 57	SETIEMBRE	88,633.59	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 07 -ADICIONAL Nº10	SETIEMBRE	9,881.25	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 05 -ADICIONAL Nº09	SETIEMBRE	0.00	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
VAL Nº 05-ADICIONAL Nº04	SETIEMBRE	2,742.71	5,501,293.26	0.00%	0.00	5,501,293.26	0.00
SUBTOTAL		23,647,571.73		SUB TOTAL	5,501,293.26		
IGV		4,256,562.91		IGV	990,232.79		
		27,904,134.64			6,491,526.05		

AMORTIZACION DEL MES **S/. 0.00**

Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad”.

Artículo 2.- Encargar a la Gerencia General disponer las acciones necesarias para que la presente resolución y su anexo sean publicados en el Diario Oficial El Peruano.

Asimismo, se encarga a la Gerencia General disponer las acciones necesarias para que la presente resolución y su anexo, conjuntamente con el Proyecto Normativo señalado en el artículo precedente, así como su Exposición de Motivos y el Informe N° 00118-GPRC/2019; sean publicados en el Portal Electrónico del OSIPTEL (página web institucional: <http://www.osiptel.gob.pe>).

Artículo 3.- Definir un plazo de quince (15) días calendario, a ser contado a partir del día siguiente de la fecha en que la presente resolución sea publicada en el Diario Oficial El Peruano, para que los interesados puedan presentar sus comentarios respecto del Proyecto Normativo referido en el artículo 1.

Los comentarios serán presentados por escrito, en la oficina principal del OSIPTEL (Calle De La Prosa N° 136, San Borja, Lima). En el caso de remisión de comentarios mediante correo electrónico a la dirección sid@osiptel.gob.pe, se deberá obtener una constancia de acuse de recibo emitida por el OSIPTEL. En todos los casos, los comentarios deben enviarse de acuerdo al formato establecido en el anexo adjunto a la presente resolución.

Artículo 4.- Encargar a la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia del OSIPTEL el acopio, procesamiento y sistematización de los comentarios que se presenten, así como la presentación a la Alta Dirección de sus correspondientes recomendaciones.

Artículo 5.- Aprobar el Régimen de Infracciones y Sanciones del Decreto Supremo N° 007-2019-IN, Reglamento del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad, el cual estará vigente a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, en los siguientes términos:

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL DECRETO SUPREMO N° 007-2019-IN

N°	TIPIFICACIÓN	INFRACCIÓN
1	El concesionario móvil que incumpla con cualquier requerimiento que efectúe el OSIPTEL en la forma y plazo establecido, respecto de la remisión de mensajes de advertencia a los abonados o usuarios, el bloqueo y/o suspensión del servicio de los IMEI de los equipos terminales móviles detectados como alterados.	GRAVE
2	El concesionario móvil que, no cumpla con cualquiera de sus obligaciones establecidas en la Decisión 786 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme al Literal I) del artículo 32 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1338.	GRAVE
3	El concesionario móvil que no realice campañas de difusión de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1338.	LEVE
4	El concesionario móvil que, hasta la implementación del RENTASEG, no remita al OSIPTEL, hasta el décimo día calendario de cada mes, la relación de IMEI y de IMSI o MSISDN vinculados, conforme a la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1338.	GRAVE
5	El concesionario móvil que no informe, de manera mensual, a los abonados sobre las implicancias de tener un equipo terminal móvil con IMEI alterado o que no se encuentre registrado en la Lista Blanca, de acuerdo a la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1338.	LEVE
6	El concesionario móvil que no remita mensajes de advertencia a los abonados o usuarios, y pedidos de información sobre los casos relativos a equipos terminales móviles; conforme al artículo 8.1, literal e), del Decreto Legislativo N° 1338, y al artículo 32, literal i), del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1338.	LEVE

N°	TIPIFICACIÓN	INFRACCIÓN
		La información falsa, incompleta, inexacta o remitida por el concesionario móvil fuera del plazo establecido, en el marco del Decreto Legislativo N° 1338 o su reglamento, será evaluada de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, o la norma que lo modifique o sustituya.

Artículo 6.- Habíltese a la Gerencia General del OSIPTEL para que mediante resolución apruebe el respectivo Instructivo Técnico, cuyas indicaciones serán de observancia obligatoria para el cumplimiento de las Normas Complementarias para la implementación del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL MUENTE SCHWARZ
 Presidente del Consejo Directivo

ANEXO

Formato para la presentación de comentarios

PROYECTO NORMATIVO QUE APRUEBA LAS "NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES PARA LA SEGURIDAD"

Artículo del Proyecto	Comentario
X	
Y	
Z	
(...)	
Comentarios generales	
Otros comentarios	

1806927-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

Aprueban Índices Unificados de Precios de la Construcción para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de agosto de 2019

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 292-2019-INEI

Lima, 16 de setiembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe N° 02-08-2019/DTIE, referido a

Christina Alicia Trujillo
 INDI - INEI CIVIL
 CIP N° 63195

los Índices Unificados de Precios de la Construcción para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de Agosto de 2019 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Índices Unificados de Precios de la Construcción (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Agosto de 2019, que se indican en el cuadro siguiente:

ÁREAS GEOGRÁFICAS													
Cód.	1	2	3	4	5	6	Cód.	1	2	3	4	5	6
01	981,15	981,15	981,15	981,15	981,15	981,15	02	562,55	562,55	562,55	562,55	562,55	562,55
03	541,62	541,62	541,62	541,62	541,62	541,62	04	566,24	957,14	1058,82	594,14	374,92	745,08
05	449,16	215,26	434,38	602,24	(*)	628,62	06	930,35	930,35	930,35	930,35	930,35	930,35
07	673,90	673,90	673,90	673,90	673,90	673,90	08	870,81	870,81	870,81	870,81	870,81	870,81
09	283,76	283,76	283,76	283,76	283,76	283,76	10	431,38	431,38	431,38	431,38	431,38	431,38
11	257,42	257,42	257,42	257,42	257,42	257,42	12	320,05	320,05	320,05	320,05	320,05	320,05
13	1792,19	1792,19	1792,19	1792,19	1792,19	1792,19	14	262,90	262,90	262,90	262,90	262,90	262,90
17	621,71	676,61	705,20	840,21	765,82	882,36	16	354,83	354,83	354,83	354,83	354,83	354,83
19	764,80	764,80	764,80	764,80	764,80	764,80	18	329,32	329,32	329,32	329,32	329,32	329,32
21	471,42	423,68	449,56	438,28	449,56	415,71	20	2185,03	2185,03	2185,03	2185,03	2185,03	2185,03
23	439,25	439,25	439,25	439,25	439,25	439,25	22	367,30	367,30	367,30	367,30	367,30	367,30
27	479,43	479,43	479,43	479,43	479,43	479,43	24	236,65	236,65	236,65	236,65	236,65	236,65
31	383,56	383,56	383,56	383,56	383,56	383,56	26	385,32	385,32	385,32	385,32	385,32	385,32
33	868,10	868,10	868,10	868,10	868,10	868,10	28	595,19	595,19	595,19	582,26	595,19	595,19
37	312,66	312,66	312,66	312,66	312,66	312,66	30	505,07	505,07	505,07	505,07	505,07	505,07
39	458,56	458,56	458,56	458,56	458,56	458,56	32	472,50	472,50	472,50	472,50	472,50	472,50
41	436,63	436,63	436,63	436,63	436,63	436,63	34	523,79	523,79	523,79	523,79	523,79	523,79
43	755,57	702,36	936,28	658,47	1160,36	909,85	38	441,32	961,20	878,58	569,52	(*)	643,85
45	330,45	330,45	330,45	330,45	330,45	330,45	40	397,51	454,20	446,75	352,72	272,89	331,41
47	619,76	619,76	619,76	619,76	619,76	619,76	42	289,73	289,73	289,73	289,73	289,73	289,73
49	317,45	317,45	317,45	317,45	317,45	317,45	44	389,68	389,68	389,68	389,68	389,68	389,68
51	302,11	302,11	302,11	302,11	302,11	302,11	46	449,86	449,86	449,86	449,86	449,86	449,86
53	830,52	830,52	830,52	830,52	830,52	830,52	48	374,19	374,19	374,19	374,19	374,19	374,19
55	515,31	515,31	515,31	515,31	515,31	515,31	50	666,91	666,91	666,91	666,91	666,91	666,91
57	390,98	390,98	390,98	390,98	390,98	390,98	52	321,14	321,14	321,14	321,14	321,14	321,14
59	212,21	212,21	212,21	212,21	212,21	212,21	54	452,20	452,20	452,20	452,20	452,20	452,20
61	233,71	233,71	233,71	233,71	233,71	233,71	56	541,04	541,04	541,04	541,04	541,04	541,04
65	260,83	260,83	260,83	260,83	260,83	260,83	60	295,99	295,99	295,99	295,99	295,99	295,99
69	389,45	327,82	428,87	488,52	269,39	451,51	62	470,86	470,86	470,86	470,86	470,86	470,86
71	660,29	660,29	660,29	660,29	660,29	660,29	64	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21
73	558,01	558,01	558,01	558,01	558,01	558,01	66	726,60	726,60	726,60	726,60	726,60	726,60
77	338,43	338,43	338,43	338,43	338,43	338,43	68	262,29	262,29	262,29	262,29	262,29	262,29
							70	218,25	218,25	218,25	218,25	218,25	218,25
							72	438,75	438,75	438,75	438,75	438,75	438,75
							78	507,97	507,97	507,97	507,97	507,97	507,97
							80	110,44	110,44	110,44	110,44	110,44	110,44

(*) Sin Producción

Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 270-2019-INEI; así como, la modificación del índice modificado de código 47, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 288-2019-INEI.

Artículo 2.- Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1, comprende a los siguientes departamentos:

- Área 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín
- Área 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica
- Área 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali
- Área 4: Arequipa, Moquegua y Tacna
- Área 5: Loreto
- Área 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3.- Los Índices Unificados de Precios de la Construcción, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fletes.

Regístrese y comuníquese.

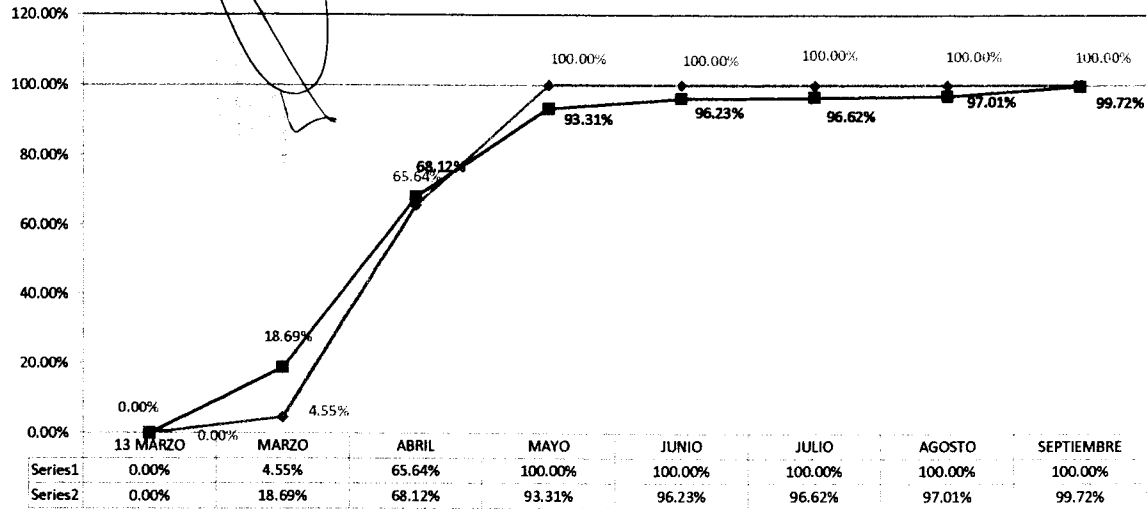
JOSÉ GARCÍA ZANABRIA
Jefe (e)

1808052-1

Christina Alejandra Trujillo
Ingeniero Civil
CIP N° 63195

Curva S

CONTROL DE AVANCE FISICO DE OBRA - GENERAL



MES	FECHA		AVANCE FISICO PROGRAMADO		% DE AVANCE PROGRAMADO		PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO				BALANCE	
	INICIO	FIN	AVANCE FISICO PROGRAMADO	AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO	% DEL MES	% ACUMULADO	AVANCE FISICO DEL MES (EJECUTADO)	AVANCE FISICO DEL MES ACUMULADO (EJECUTADO)	% AVANCE FISICO DEL MES (EJECUTADO)	% AVANCE FISICO DEL MES ACUMULADO (EJECUTADO)	DESFASE DE OBRA (% AFAE - % AFAP)	CONDICION DE OBRA (AFAE/AFAP) > 80%
13 MARZO					0.00%	0.00%			0.00%	0.00%		
MARZO	13/03/2019	31/03/2019	S/. 16,565.63	S/. 16,565.63	4.55%	4.55%	S/. 68,027.56	S/. 68,027.56	18.69%	18.69%	14.14%	OK
ABRIL	01/04/2019	30/04/2019	S/. 222,386.55	S/. 238,952.18	61.09%	65.64%	S/. 179,957.01	S/. 247,984.57	49.44%	68.12%	2.48%	OK
MAYO	01/05/2019	26/05/2019	S/. 125,073.32	S/. 364,025.50	34.36%	100.00%	S/. 91,703.53	S/. 339,688.10	25.19%	93.31%	-6.69%	OK
JUNIO	01/06/2019	30/06/2019	S/. 0.00	S/. 364,025.50	0.00%	100.00%	S/. 10,624.24	S/. 350,312.34	2.92%	96.23%	-3.77%	OK
JULIO	01/07/2019	31/07/2019	S/. 0.00	S/. 364,025.50	0.00%	100.00%	S/. 1,412.19	S/. 351,724.53	0.39%	96.62%	-3.38%	OK
AGOSTO	01/08/2019	31/08/2019	S/. 0.00	S/. 364,025.50	0.00%	100.00%	S/. 1,412.19	S/. 353,136.72	0.39%	97.01%	-2.99%	OK
SEPTIEMBRE	01/09/2019	15/09/2019	S/. 0.00	S/. 364,025.50	0.00%	100.00%	S/. 9,881.25	S/. 363,017.97	2.71%	99.72%	-0.28%	OK
TOTAL			S/. 364,025.50	S/. 364,025.50			S/. 363,017.97					

Control de Avance Físico de Obra
 INICIO: 13 MARZO 2019
 FIN: 15 SEPTIEMBRE 2019

Planilla de metrados valorizados

PLANILLA DE METRADOS - MEDIA TENSION SAN JOSE


Obra : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"

Especialidad: MEDIA TENSION 10-22.9KV

Fecha : al 30/09/19

Item	Elemento				Medidas			Subtotal	TOTAL
	Descripcion	Und	N° Veces	Cantidad Elementos	Longitud	Ancho	Altura		
01	MEDIA TENSION 10-22.9KV								
1.16	PRUEBAS ELECTRICAS Y PRUEBAS DE SERVICIO							0.00	
01.16.03	COSTO DE CONEXIÓN Y ENERGIZACION DE LA RED	glb	1.00	1.00				1.00	1.00

Christian Maza Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 63105



PARTIDAS VALORIZADAS -SETIEMBRE 2019 - VAL N°07

OBRA:

"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO
DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"

FECHA:

al 30/09/19

ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO
01.16	PRUEBAS ELECTRICAS Y PRUEBAS DE SERVICIO		
01.16.01	PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO	glb	
01.16.02	ESTUDIO Y PROGRAMACION DE COORDINACION DE PROTECCIONES PARA RELÉ DE RECLOSER	glb	
01.16.03	COSTO DE CONEXIÓN Y ENERGIZACION DE LA RED	glb	1.0
01.16.04	EXPEDIENTE DE REPLANTEO DE OBRA	glb	



 Christian A. Mota Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 63195

Panel Fotográfico

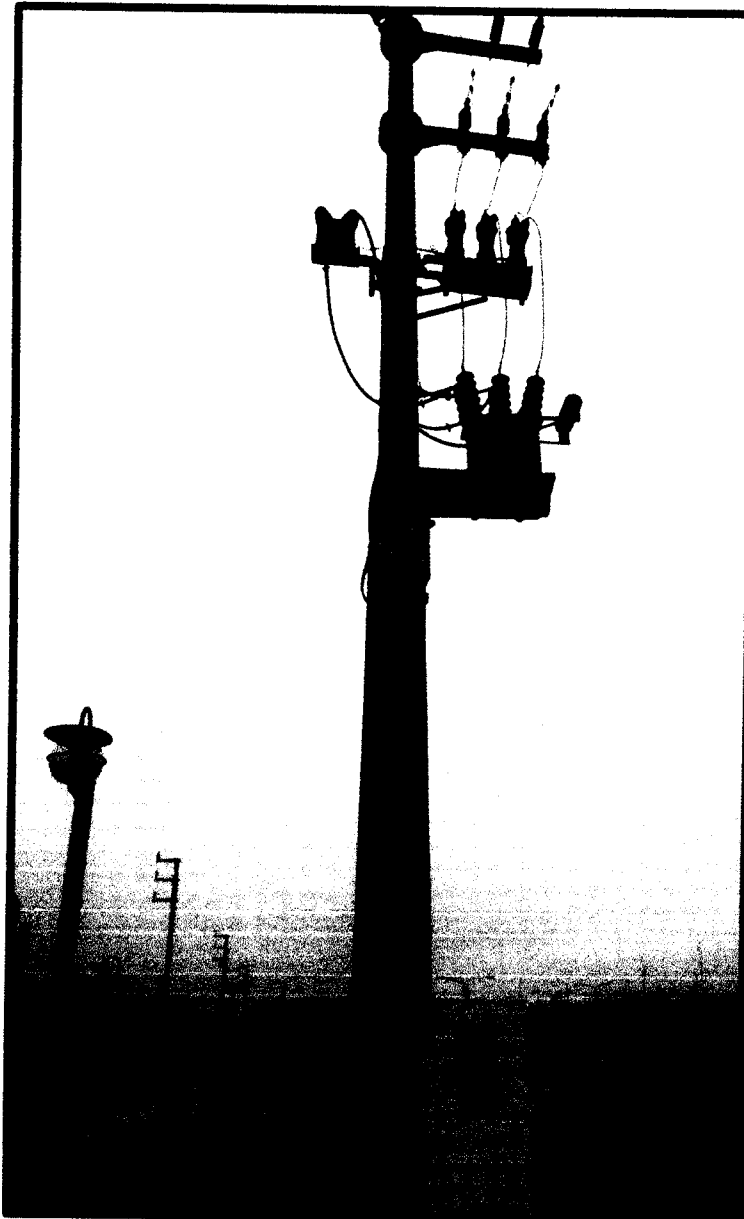
PANEL FOTOGRAFICO – SEPTIEMBRE 2019

100

ADICIONAL N° 10

01.16 PRUEBAS ELECTRICAS Y PRUEBAS DE SERVICIO

01.16.01 PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO



[Handwritten Signature]
Christian R. Inca Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

105



CONSORCIO SAN JOSE

Christian E. Jara Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105



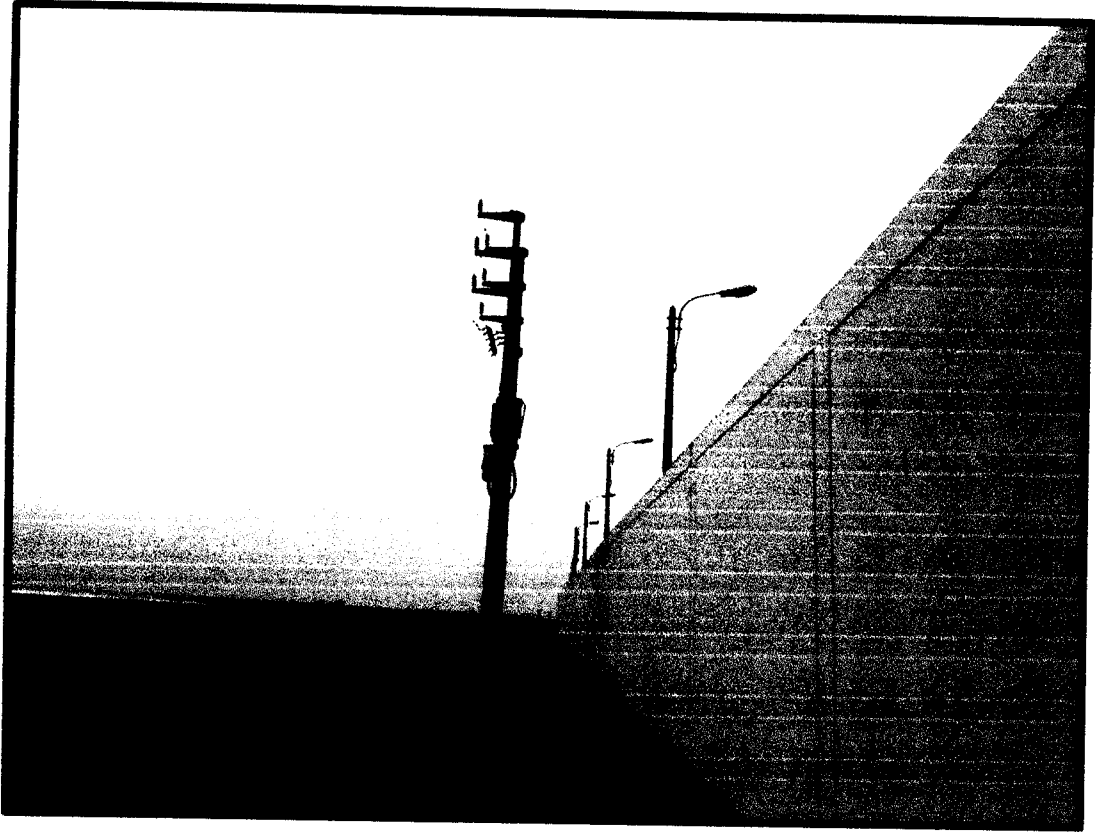
CRISTIAN ALVARO TRUJILLO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 63195

"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"


103



"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

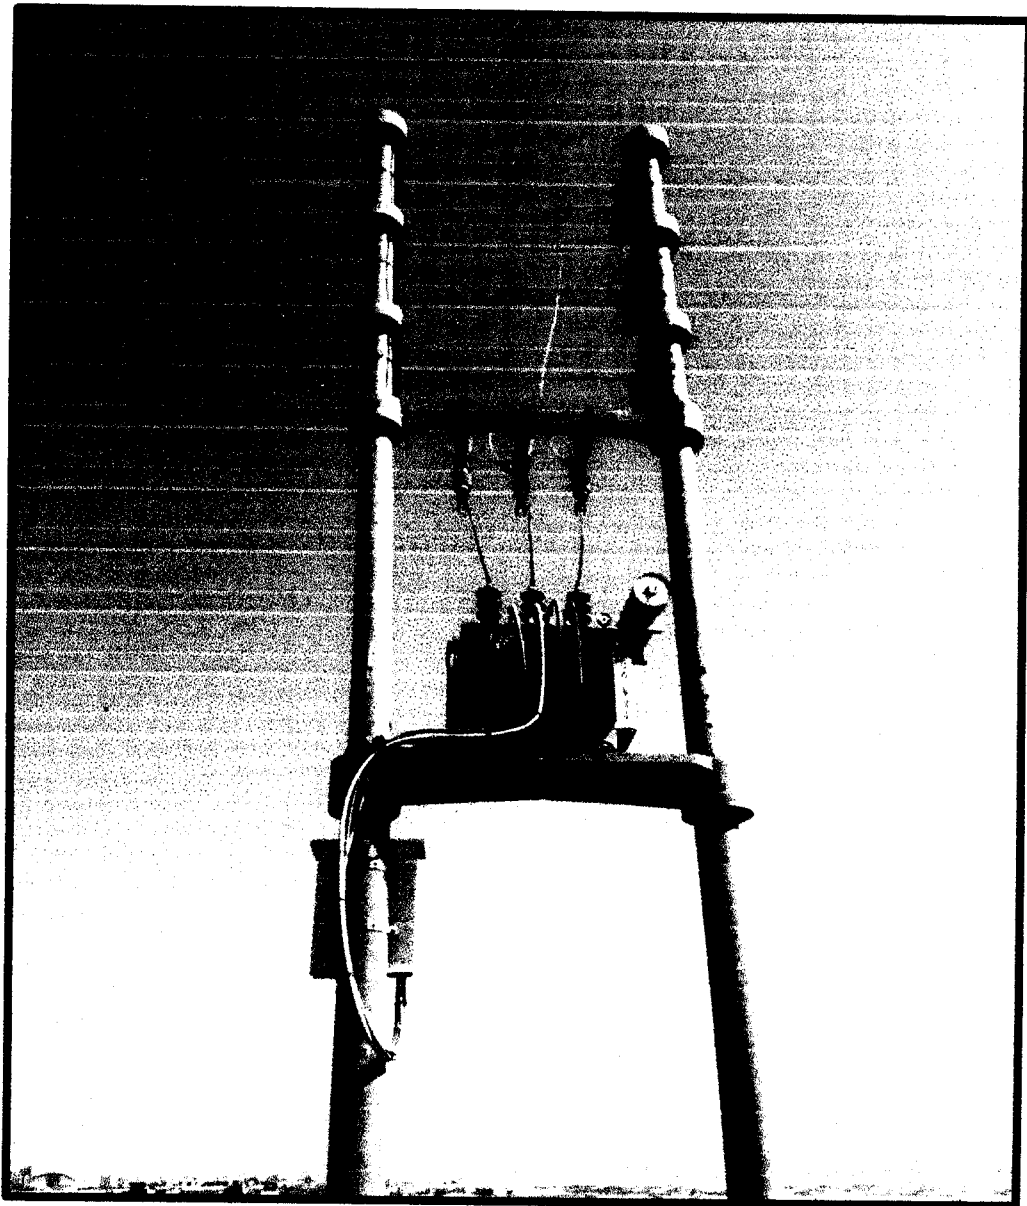


CONSORCIO SAN JOSE


Christo A. Torres Franco
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

182



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Christina Linares Trejillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 63195

**Acta de
entrega de
terreno
(Copia)**

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

OBRA : "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque"

PROCESO DE SELECCIÓN : Adjudicación de Menor Cuantía Nº 38-2014-FONDEPES derivada de la Licitación Publica Nº 004-2014-FONDEPES

UBICACIÓN : Distrito : San José
 Provincia : Lambayeque
 Región : Lambayeque

CONTRATISTA : Consorcio San José

SUPERVISION : Consorcio San Francisco

VALOR REFERENCIAL : S/. 33'504,650.56

MONTO CONTRATADO : S/. 32'457,630.22

PLAZO DE EJECUCION : 540 días calendario

MODALIDAD DE EJECUCION : A PRECIOS UNITARIOS

RESIDENTE DE OBRA : Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros

SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Gonzalo Francisco Caceras Valdivia

COORDINADOR DE OBRA : Ing. Gabino Abelardo López Rolando

Siendo la 13:00 horas del día miércoles 14 de enero del 2015, se reunieron en el lugar de la Obra a efectos de realizar la Entrega de Terreno donde se ejecutara la Obra: "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque", en representación del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES: el Coordinador de Obra Ing. Gabino Abelardo López Rolando con CIP Nº 78834; en representación de la Empresa Contratista CONSORCIO SAN JOSE el Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros con CIP Nº 22858; además en calidad de veedores invitados: el Sr. Macario Fiestas Fiestas Alcalde de la Municipalidad Distrital de San José y representantes de la población de San José.

Luego de reconocer el terreno donde se ejecutara la obra, se verifica que existe acceso libre al mismo para la circulación de vehículos y maquinaria del Contratista; el representante de la Empresa Contratista CONSORCIO SAN JOSE recibe el terreno sin observaciones.

En señal de conformidad los presentes suscriben la presente acta en un original y cuatro (04) copias.



Gabino A. López Rolando
INGENIERO CIVIL
CIP. 78834

Ing. Gabino Abelardo López Rolando
Coordinador de Obra
FONDEPES



CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 22858

Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros
Residente de Obra
CONSORCIO SAN JOSE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE

Macario Fiestas Fiestas
ALCALDE

Sr. Macario Fiestas Fiestas
Alcalde de la Municipalidad Distrital de San José
VEEDOR INVITADO

**Copia de
Resolución
Jefatural N° 025-
2019-
FONDEPES/J**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Lima, 13 FEB. 2019

177

CARTA N° 071-2019-FONDEPES/OGG

Señores
CONSORCIO SAN JOSÉ
Av. Alameda del Corregidor N° 124
La Molina.-

Asunto : Aprobar el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de obra n.° 10, Contrato n.° 082-2014-FONDEPES/OGA, para la Ejecución de la Obra: «Construcción de Infraestructura Pesquera para consumo humano directo de San José, distrito de San José, provincia de Lambayeque, región Lambayeque».

Referencia : Resolución Jefatural n.° 025-2019-FONDEPES/J.

De mi consideración:

Tengo a bien dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente e informarles que adjunto a la presente se les hace llegar la Resolución de la referencia, para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
Karla Elizabeth Espinoza Malate
KARLA ELIZABETH ESPINOZA MALATE
GERENCIA GENERAL

CONSORCIO SAN JOSE

RECIBIDO

Fecha: 14-02-19

Hora: 11:33 AM

Jhonny Herrera Peña
41220279

Se adjunta: Resolución Jefatural n.° 025-2019-FONDEPES/J.
Informe n.° 055-2019-FONDEPES/OGAJ.
Memorando n.° 387-2019-FONDEPES/DIGENIPAA
Informe n.° 010-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AEP/VHRL.
Expediente Técnico del adicional n.° 10, consta de de 558 folios.

c.c.: J / DIGENIPAA / OGAJ / OGA.

KEEM/bpl

204

REPÚBLICA DEL PERÚ



RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 025 -2019-FONDEPES/J

Lima, 12 FEB. 2019

M. QUERO

VISTOS: El Memorando n.º 387-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, el Informe n.º 010-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/VRHL, remitidos por la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y, así como el Informe n.º 055-2019-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el 24 de diciembre de 2014 el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (en adelante el Fondepes) y el Consorcio San José, integrado por las empresas Chavín de Huantar E.I.R.L., Civis Global – Sucursal Perú, Corporación Aris S.A.C. y Corporación R&E S.A.C. (en adelante el Contratista), suscribieron el contrato n.º 032-2014-FONDEPES/OGA, para la contratación de la ejecución de la obra «Construcción de Infraestructura Pesquera para consumo humano directo de San José, distrito de San José, provincia de Lambayeque, región Lambayeque» (en adelante la Obra), por el monto de S/ 32 457 630,22 (Treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil seiscientos treinta y dos con 22/100 soles) incluido IGV, bajo el sistema de contratación a precios unitarios y con un plazo de ejecución inicial de 540 días calendario;

Que, el 19 de julio de 2016, el Fondepes y el señor Carlos Humberto Mendoza Picoaga (en adelante la Supervisión), suscribieron el Contrato n.º 013-2016-FONDEPES, para la contratación del servicio de consultoría de obra para el saldo de supervisión de la Obra, por el monto de S/ 457 060,38 (Cuatrocientos cincuenta y siete mil sesenta con 38/100 soles) incluido IGV, bajo el sistema de suma alzada y un plazo de ejecución de 180 días calendario;

Que, el acto administrativo puede fundamentarse en informes de emisión previa que obran en el expediente correspondiente, a condición de su puntual identificación y su integración en el acto administrativo que motivan. Sobre el particular, el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo n.º 004-2019-JUS, se establece lo siguiente:

«Artículo 6.- Motivación del acto administrativo»

(...)

6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. (...);

Que, conforme a la normativa indicada sobre el contenido motivacional, constituyen fundamentos de la presente Resolución: el Memorando n.º 387-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, el Informe n.º 010-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/VRHL, así como el Informe n.º 055-2019-FONDEPES/OGAJ, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución en calidad de anexos;

Que, por los fundamentos técnicos y normativos expuestos de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con el Decreto Legislativo n.º 1017, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo n.º 184-2008-EF, y en ejercicio de las funciones establecidas por el literal "s" del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones del Fondepes, aprobado por Resolución Ministerial n.º 346-2012-PRODUCE, corresponde expedir la Resolución Jefatural mediante la cual se apruebe la Prestación Adicional de Obra n.º 10 y su Presupuesto Deductivo Vinculado n.º 8;

Con los visados de la Gerencia General, de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus respectivas competencias;

175
103

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra n.° 10 del Contrato n.° 082-2014-FONDEPES/OGA suscrito para la contratación de la ejecución de la obra «Construcción de Infraestructura Pesquera para consumo humano directo de San José, distrito de San José, provincia de Lambayeque, región Lambayeque», por el monto de S/ 429 550,09 (Cuatrocientos veintinueve mil quinientos cincuenta con 09/100 Soles) incluido IGV, y su correspondiente Presupuesto Deductivo Vinculado n.° 8 ascendente a S/ 186 912,30 (Ciento ochenta y seis mil novecientos doce con 30/100 Soles) incluido IGV, siendo que el resultado de la sustracción aritmética determina un incremento del monto del contrato original de S/ 242 637,79 (Doscientos cuarenta y dos mil seiscientos treinta y siete con 79/100 Soles) incluido IGV, lo que representa un porcentaje de incidencia individual equivalente a 0.75% del contrato original, habiéndose generado a la fecha un nivel de incidencia acumulado de 12.93% del monto del contrato original correspondiente a la obra en mención; cuyo nuevo monto contractual asciende a la suma de S/ 36 655 082,92 (Treinta y seis millones seiscientos cincuenta y cinco mil ochenta y dos con 92/100 Soles) incluido IGV, de acuerdo con los fundamentos contenidos en el Memorando n.° 387-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, el Informe n.° 010-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/VRHL, así como el Informe n.° 055-2019-FONDEPES/OGAJ, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución en calidad de anexos.

Artículo 2°.- Autorizar la ejecución del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra n.° 10 y su Presupuesto Deductivo Vinculado n.° 8, aprobado en el artículo 1° de la presente Resolución, debiendo el Contratista, Consorcio San José, ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento, como requisito para los pagos que correspondan a la prestación adicional, de corresponder, de conformidad con lo establecido en el artículo 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n° 184-2008-EF.

Artículo 3°.- Notificar la presente Resolución y sus anexos al Contratista, Consorcio San José, y al Ingeniero Carlos Humberto Mendoza Picoaga; remitiéndose copias a la Oficina General de Administración para que en coordinación con la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola ejecuten las acciones que permitan la suscripción de la respectiva adenda correspondiente al Contrato n.° 082-2017-FONDEPES/OGA.

Artículo 4°.- Disponer que en el acto de notificación de la presente Resolución y sus anexos al Contratista Consorcio San José, se le haga entrega del expediente técnico aprobado en el artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo 5°.- Disponer que la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola, bajo responsabilidad funcional, en el plazo de 30 días calendario, posteriores a la emisión de la presente, emita un informe respecto de la existencia de responsabilidades por las presuntas deficiencias en la formulación y/o aprobación del expediente técnico de la Obra, así como por la demora en la tramitación de la Prestación Adicional de Obra n.° 10 y el Presupuesto Deductivo Vinculado n.° 8, para que conjuntamente con los antecedentes, sea remitido a la Secretaría Técnica de las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario. En el supuesto que se determine la responsabilidad del proyectista que elaboró el mencionado expediente técnico, corresponderá a la Digenipaa determinar la existencia del daño o perjuicio generado al Fondepes, así como su cuantificación monetaria, debiendo comunicarse dicha situación a la Procuraduría Pública para que adopte las acciones correspondientes..

Artículo 6°.- Disponer que la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola, comunique al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones la ejecución de la Prestación Adicional de Obra n.° 10 y su Presupuesto Deductivo Vinculado n.° 8.

Artículo 7°.- Disponer que la presente Resolución se publique en el portal institucional de la Entidad.

Regístrese y comuníquese.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

Morgan Niccolo Quero
DR. MORGAN NICCOLO QUERO GAME
JEFE



**Contrato de
obra
(Copia)**

CONTRATO N° 082-2014-FONDEPES/OGA

EJECUCION DE OBRA "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION DE LAMBAYEQUE"

Conste por el presente documento, el contrato para la **EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION DE LAMBAYEQUE"**, que celebra de una parte el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FONDEPES, en adelante se le denominará "**LA ENTIDAD**", con RUC N° 20137921601, con domicilio legal en avenida Petit Thouars N° 115, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima, representado por su Secretario General, Abog. **FERNANDO ALARCON DIAZ**, identificado con DNI N° 10507977, por delegación de facultades otorgadas mediante Resolución Jefatural N° 115-2013-FONDEPES/J; y de otra parte el **CONSORCIO SAN JOSE**, integrado por:

- a) **CHAVIN DE HUANTAR EIRL**, con RUC N° 20254813720, con domicilio en Av. Próceres de la Independencia 3634, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, quien participa en un porcentaje de 58%.
- b) **CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU**, con RUC N° 20552622171, con domicilio en Calle Pasaje Sucre 164, 2do piso, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, quien participa en un porcentaje de 40%.
- c) **CORPORACION ARIS SAC**, con RUC N° 20523320522, con domicilio en Av. Huarochirí N° 1109 Dpto. 301-Urbanización Mayorazgo, distrito de Ate Vitarte, provincia y departamento de Lima, quien participa en un porcentaje de 1%.
- d) **CORPORACION R&E SAC**, con RUC N° 20516966034, con domicilio en Calle 13 N° 148, Dpto. 201-Urbanización Carabayllo, distrito de Comas, provincia y departamento de Lima, quien participa en un porcentaje de 1%.

Con domicilio común del **CONSORCIO SAN JOSE** en la avenida Alameda del Corregidor N° 414, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, con su Representante Legal Común, Sr. **EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA**, identificado con DNI N° 32385946, en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 21.11.14, el Comité Especial Ad Hoc otorgó la Buena Pro de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 004-2014-FONDEPES para la contratación de la ejecución de la obra "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano directo de San José, distrito de San José, provincia de Lambayeque, Región de Lambayeque", al **CONSORCIO SAN JOSE**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano directo de San José, distrito de San José, provincia de Lambayeque, región de Lambayeque", conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CC
CONSORCIO SAN JOSE
Emiliano Isaac Trujillo Luna
Representante Legal Común





CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 32, 457,630.22 (Treinta y Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Treinta con 22/100 Nuevos soles) incluido IGV, bajo el sistema de contratación de precios unitarios.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, en periodos de valorización mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases Integradas. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución del presente contrato es de 540 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases Integradas.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora¹ y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato²:
- a) S/. 1, 947,458.00, a través de la Carta Fianza N° 0011-0962-9800017155-87,

¹ La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

² En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

CONSORCIO SAN JOSE

Emiliano Isaac Trujillo Luna
Representante Legal Común



F. ALARCÓN



M. RODRIGUEZ



W. POMA



emitida por BBVA CONTINENTAL, cantidad que es equivalente al SEIS por ciento (6%) del monto del contrato original, con una **vigencia desde el 15.12.14 hasta el 10.12.15**, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

b) S/. 1, 298,305.21, a través de la Carta Fianza N° 010469195 000, emitida por SCOTIABANK, cantidad que es equivalente al CUATRO por ciento (4%) del monto del contrato original, con una **vigencia desde el 19.12.14 hasta el 15.12.15**, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO³

LA ENTIDAD otorgará UN ADELANTO DIRECTO por el 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días calendario siguientes A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO⁴, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos,⁵ mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue EL ADELANTO en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

³ Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

⁴ En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

⁵ De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

CONSORCIO SAN JOSE

Emiliano Isaac Trujillo Luna
Representante Legal Común



F. ALARCÓN



M. RODRIGUEZ



W. FOMA



CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS⁶

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el 40% del monto del CONTRATO ORIGINAL⁷, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

La entrega del adelanto para materiales o insumos podrá ser solicitado por el Contratista durante el plazo contractual de la obra y en concordancia con el calendario de adquisición de materiales o insumos.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 07 días calendario, previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 días calendario, anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza emitida en los siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país cuya vigencia mínima será de tres (03) meses renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, conforme el artículo 162 del Reglamento, dicha carta deberá estar dirigida al FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO; y el comprobante de pago correspondiente (FACTURA).

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

⁶ En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

⁷ En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

CONSORCIO SAN JOSE

Emiliano Isaac Trujillo Luna
Representante Legal Común



F. ALARCÓN



M. RODRIGUEZ



W. POMA



CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

OTRAS PENALIDADES:

Permanencia de la Residencia:	
Por día de ausencia injustificada del Residente de obra	300 soles
Permanencia del personal propuesto diferente al Residente de obra:	
Por día de ausencia injustificada previo a ser requerida su presencia en obra por la Entidad o la supervisión	150 soles
Cuaderno de obra:	
Por hora de ausencia de cuaderno de obra (en la obra)	50 soles
Por día de retraso en el llenado del cuaderno de obra	50 soles
Valorización de obra:	
Por día de atraso en la entrega de valorizaciones de obra	200 soles

SORCIO SAN JOSE

Emiliano Isaac Trujillo Luna
Representante Legal Común





CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS⁸

1. Las partes acuerdan que las controversias que surjan sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785 y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley.
2. Las partes acuerdan que todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante arbitraje institucional bajo la organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo a su Reglamento.
 - a.- Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es menor o igual a 30 (treinta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de su presentación, el Tribunal Arbitral estará compuesto por árbitro único.
 - b.- Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es mayor a 30 (treinta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la de su presentación, el Tribunal Arbitral estará compuesto por tres árbitros.
 - c.- Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es indeterminable el Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros.

⁸ De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

CONSORCIO SAN JOSE

Emiliano Isaac Trujillo Luna
Representante Legal Común





3. Las partes acuerdan que las actuaciones arbitrales se realizarán en los plazos establecidos, sin que el Tribunal Arbitral tenga facultad alguna para ampliarlos o modificarlos, no siendo posible que el Tribunal Arbitral haga uso de la facultad contenida en el numeral 4 del artículo 34 del Decreto Legislativo N° 1071.
4. El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutará como una sentencia.
5. Para la interposición de recurso de anulación del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial las partes acuerdan que, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Avenida Petit Thouars N° 115, distrito Lima, provincia y departamento Lima.

DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: Avenida Alameda del Corregidor N° 414, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes, debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases Integradas, las propuestas técnico y económica, y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por cuadruplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los 24 días del mes de diciembre de 2014.



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

FERNANDO ESCOBAR DIAZ
LA ENTIDAD

CONSORCIO SAN JOSE

Emiliano Isaac Trujillo Luna
Representante Legal Común
EL CONTRATISTA

Contrato de consorcio (Copia)



COOPERATIVA ARIS S.A.C.
INSTRUCION
ING. JULIO GONZALEZ MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO

"CONSORCIO SAN JOSE"

QUE CELEBRAN

CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.
CIVIS GLOBAL- SUCURSAL PERU
CORPORACION ARIS S.A.C.
CORPORACION R&E S.A.C.

EL PRESENTE DOCUMENTO
NO HA SIDO REDACTADO
EN ESTA OFICINA.

PERERO CALLE ROXANA
REPRESENTANTE GENERAL

Conste por el presente documento, el **CONTRATO DE CONSORCIO** que celebran las siguientes personas jurídicas empresariales:

- **CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.** con RUC N° 20254813720, con domicilio en Av. Próceres de la Independencia 3634, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima. Debidamente representado por su Representante Legal el Ing. **EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA**, Peruano, identificado con DNI N° 32385946, según poder que obra inscrito en la Partida Electrónica número: 01545353 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao;
- **CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU** con RUC N° 20552622171, debidamente representada por su Representante Legal, **FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ**, Identificado con C.E. N° 000996117, con domicilio en calle PASAJE SUCRE 164, 2º Piso, Distrito de Miraflores Provincia y departamento de Lima, según poderes inscritos la partida N° 13012604, del Registro de Personas Jurídicas de Lima;
- **CORPORACION ARIS S.A.C.** con RUC N° 20523320522, con domicilio en la Av. Huarochiri N° 1109 Dpto. 301 - Urb.

CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.

ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU
FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



- Mayorazgo (tranquera de Mayorazgo), Distrito de Ate Vitarte, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Representante Legal **JULIO CESAR VILAFRANCA MOSQUERA**, peruano, identificada con DNI N° 09753183; según Poder que obra inscrito en la Partida Electrónica Número: 12358699 en el Asiento N° A00001, del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao.
- **CORPORACION R&E S.A.C.** con RUC N° 20516966034, con domicilio en la Calle 13 N° 148, Dpto. 201 (ref. Cruce Av. El Maestro y Av. Metropolitán) - Urb. Carabayllo, Distrito de Comas, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Representante Legal **ROXANA GUERRERO CALLE**, peruana, identificada con DNI N° 09794994; según Poder que obra inscrito en la Partida Electrónica Número: 12052729 en el Asiento N° A00001, del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao.

A quienes en adelante se les denominará de manera conjunta, **LOS CONSORCIADOS**; que celebran el presente contrato bajo las disposiciones contenidas en las cláusulas siguientes:

PRIMERA. - CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL CONSORCIO

LOS CONSORCIADOS están constituidos por personas Jurídicas de derecho privado, constituidas según los diversos regímenes empresariales y/o societarios que la legislación peruana reconoce como vigentes a la firma del presente contrato de consorcio, y las mismas que han decidido formar un consorcio de acuerdo a lo establecido en el artículo 445° y siguientes de la Ley General de Sociedades, con el objeto de prestarse mutua colaboración estando a sus porcentajes, en la licitación y desarrollo de la ejecución, habiendo obtenido la buena "Buena Pro" consentida, de la "ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES-DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 04-2014-FONDEPES- PRIMERA CONVOCATORIA".CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE, por el monto de S/.32'457,630.22 (TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 22/100 NUEVOS SOLES)

De acuerdo a lo establecido por los artículos 438° y 445° de la Ley General de Sociedades, los **CONSORCIADOS** dejan constancia que el **CONTRATO** no genera la creación de una persona jurídica y acuerdan

CH: vjm
 CORPORACION R&E S.A.C.
 GERENTE GENERAL
 GUERRERO CALLE ROXANA
 GERENTE GENERAL
 INGENIERO EMILIANO TRUJILLO LLUNA
 Gerente General
 CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ
 FELIPE CARRASCOSA HERMANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



utilizar como denominación "CONSORCIO SAN JOSE", denominándose en el presente documento únicamente como CONSORCIO.

SEGUNDA.- DOMICILIO LEGAL COMUN DEL CONSORCIO

Los CONSORCIADOS, señalan como su domicilio legal común en la Avenida Alameda del Corregidor N° 414, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima-Perú, que será el domicilio del CONSORCIO.

TERCERA.-PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN E INDIVIDUALIZACION DE OBLIGACIONES

La participación de los CONSORCIADOS, tanto en la ejecución de la obra, aportes y responsabilidades que deberán asumir, será de acuerdo al siguiente detalle:

OBLIGACIONES DE CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L 58.0% <u>-Participar en la Ejecución de la Obra</u> <u>-Participar con apoyo logístico para la Obra</u> <u>-Responsable de elaboración de propuestas técnica y económica y aportación de profesionales a la obra</u>	 	
OBLIGACIONES DE CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU 40.0% <u>-Participar en la Ejecución de la Obra</u> <u>-Participar con apoyo logístico para la Obra.</u> <u>-Responsable de elaboración de propuestas técnica y económica y aportación de profesionales a la obra</u>	 	
OBLIGACIONES DE CORPORACIÓN ARIS S.A.C. 1.00% <u>-Participar en la Ejecución de la Obra</u> <u>-Participar con apoyo logístico para la Obra.</u> <u>-Responsable de elaboración de propuestas técnica y económica y aportación de profesionales a la obra</u>	 	
OBLIGACIONES DE CORPORACIÓN R&E S.A.C. 1.00% <u>-Participar en la Ejecución de la Obra</u> <u>-Participar con apoyo logístico para la Obra.</u> <u>-Responsable de elaboración de propuestas técnica y económica y aportación de profesionales a la obra</u>	 	
TOTAL 100%.		

CORPORACIÓN ARIS S.A.C.
 INGENIERÍA DE CONSTRUCCION
 ING. JULIO C. VILLAFRAZA MOSQUERA
 GERENTE GENERAL
 REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACIÓN R&E S.A.C.
 GUERRO CALLE ROXANA
 GERENTE GENERAL

HUANTAR E.I.R.L.
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA
 Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU
 FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

Se deja establecido que ningún CONSORCIADO podrá CEDER su posición contractual adquirida en el presente contrato a favor de ninguna persona natural o jurídica externa a los miembros del **CONSORCIO**, salvo que el **COMITÉ DE GERENCIA** apruebe dicha cesión. Sin aprobación por parte del **COMITÉ DE GERENCIA** no operará la cesión de posición contractual a externos.

CUARTA.-DURACIÓN

El plazo de duración del presente Contrato y, por ende del **CONSORCIO**, será el necesario para el cumplimiento de su objeto, es decir, aquel lapso requerido para la conclusión de LA OBRA u OBRAS, que se ejecuten como consecuencia de los contratos que se celebren con FONDEPES, y la liquidación debidamente consentida. En este sentido, la vigencia del presente Contrato se extenderá hasta que sea realizada y quede consentida la liquidación final del Contrato de LA OBRA que se celebrará con FONDEPES y, en general, hasta que sean cumplidas todas las obligaciones que hubieran asumido EL **CONSORCIO** para la ejecución de LA OBRA con cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, y hasta que se hayan hecho efectivos todos los créditos o derechos a favor de LOS **CONSORCIADOS**, que provengan del objeto del consorcio **San José**, debiendo interpretarse este plazo de la forma más amplia posible.

En caso de no obtenerse la buena pro de la obra que motiva la constitución del consorcio, el presente contrato quedara resuelto de pleno derecho con dicha situación.

QUINTA.- COMITÉ DE GERENCIA

Los integrantes del consorcio aceptan que el consorcio sea conducido por un Comité de Gerencia el cual se regirá por las siguientes disposiciones:

En el orden interno, el **CONSORCIO** se sujeta a la dirección de un **COMITÉ DE GERENCIA**, compuesto de 5 (cinco) miembros, designados 3 (tres) designados por **CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.**, y 2 (dos) designados por **CIVIL GLOBAL - SUCURSAL PERU**, pudiendo no obstante cada empresa designar un suplente para cada miembro designado. El nombramiento de los miembros del Comité y, en su caso, de sus suplentes, por las Empresas consorciadas tendrá, en principio,

MA
13/11

CONSORCIO ARIS S.A.C.
INGENIERIA Y CONSTRUCCION
ING. JUAN C. VILAFRANCA MOSQUERA
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEYAL

CORPORACION R&E S.A.C.
GUERRERO CALLE ROXANA
GERENTE GENERAL

CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA
Gerente General

CIVIL GLOBAL SUCURSAL PERU
FELIPE CARRASCO SATHIERNANDEZ
REPRESENTANTE LEYAL



carácter indefinido, comunicándose entre ellas la identidad de los designados con anterioridad a la primera reunión de dicho Comité, o, en todo caso, en éste mismo, momento en el cual los concurrentes acreditarán a los demás su nombramiento; no obstante, podrán dichos miembros, o sus suplentes, ser sustituidos por sus respectivas empresas, bastando para ello la previa comunicación a las otras de la identidad del sustituido y de su sustituto antes del inicio de la reunión del Comité en que se haga efectivo el cambio.

Será misión del Comité de Gerencia, la Alta Dirección, Gestión y Gobierno del CONSORCIO.

Entre sus miembros el Comité designará un Presidente quien será Representante Legal Común del Consorcio, que dirigirá las reuniones del mismo, sin voto dirimente. También designará entre sus miembros un Secretario que levantará las actas de las sesiones que se celebren y que certificará con el visto bueno del Presidente. La designación del miembro del Comité de Gerencia que habrá de realizar las funciones de Presidente y Representante Legal Común del Consorcio estará reservada Al Ing. EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA identificado con DNI N° 32385946.

El Comité de Gerencia se reunirá en la forma periódica que por el mismo se acuerde, al menos una vez cada mes, y en las ocasiones extraordinarias que se consideren necesarias mediante la oportuna convocatoria formulada por el Representante Legal Común, mediante comunicación escrita, o fax nominal, o correo electrónico, a cada uno de los miembros del Comité con 5 (cinco) días hábiles de antelación al mismo, acompañando la Orden del Día correspondiente.

Asimismo, se reunirá a petición justificada, formulada por escrito por cualquiera de las Empresas miembro o por el Representante Legal Común, con 15 días calendarios de antelación, incluyendo en la petición el Orden del Día propuesto, en tal supuesto, recibida la solicitud, el Representante Legal Común procederá a la inmediata convocatoria del Comité, previa comunicación a las Empresas miembro del CONSORCIO (con indicación del Orden del Día) con una antelación mínima de 5 días calendarios a la fecha prevista para la celebración.

El Comité de Gerencia se entenderá válidamente constituido con el quórum de los consorciados asistentes llegue equivale al 50% (cincuenta

CORPORACION ARIS S.A.C.
AGENCIARIA Y CONSULTORIAS
ING. JULIO GONZALEZ GARCIA MOSQUERA
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION R.E.E. S.A.C.
CH: JE HUANTAR EL R.L.
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA
Gerente General

ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU
FELIPE CARRASCO SHERMANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

por ciento) mas 1, en la primera convocatoria y, de ser el caso, con los asistentes que concurran en segunda convocatoria. Ante falta de quórum en la primera convocatoria, el cual debe constar en acta; la segunda convocatoria se llevara a cabo al tercer día útil de la primera convocatoria. Toda convocatoria deberá ser por escrito que permita constar su recepción por las Empresas miembro del Consorcio, se entenderán convocados a los representantes cuando se encuentre presente en la sesión del mismo, (titular o suplente) de las empresas consorciadas, en numero suficiente al quórum señalado, excluido el Representante Legal, salvo que este fuese representante en el Comité de alguna de dichas empresas.

El Comité quedará también válidamente constituido, sin necesidad de convocatoria previa, siempre que estén presentes la totalidad de sus miembros y acepten por unanimidad la celebración de la sesión.

De cada reunión o sesión del Comité de Gerencia quedara registrada en Acta, la cual deberá ser aprobada al término de las misma, o bien en la reunión siguiente, debiendo ser firmada por los miembros del Comité participantes.


Los miembros del Comité de Gerencia no percibirán retribución, sueldo, emolumento, dieta u otro concepto de índole similar, análoga o equivalente a cargo del **CONSORCIO**.


SEXTA.- FACULTADES DEL COMITÉ DE GERENCIA


El Comité de Gerencia tendrá todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto del **CONSORCIO**, enumerándose seguidamente, sin carácter limitativo, las siguientes:


- a) Señalar las políticas generales de actuación del **CONSORCIO** en relación con la obra que constituye su objeto, las relaciones con la Administración adjudicataria y los usuarios, y la ejecución de las obras precisas para la construcción y puesta en funcionamiento de la obra.
- b) Aprobar cualquier modificación de los presentes Estatutos para su presentación a las Empresas consorciadas en orden a la formalización de la modificación.




 CORP. RICA ARIS S.A.C.
 REPRESENTANTE LEGAL
 AG. JOY. C. INFRANCA MOSQUERA
 REPRESENTANTE LEGAL



 CORPORACIÓN R&E S.A.C.
 GUERRERO CALLE ROXANA
 GERENTE GENERAL


 CH'VIN C. JANTAR E.I.R.L.
 INDIANAYO TRUJILLO LUNA
 Gerente General


 CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ
 FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


- c) Aclarar las dudas de interpretación de cualquier disposición de estos Estatutos que sea obligatoria para las Empresas miembro.
- d) Proponer los apoderamientos que se consideren necesarios, con indicación de las facultades que convengan.
- e) Aprobar el nombramiento y el cese de todo el personal técnico y administrativo que se juzgue necesario para el cumplimiento del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula siguiente.
- f) Autorizar la sustitución de las oficinas y las condiciones de su utilización, así como la clase y cantidad del espacio, del material y del personal situado en aquellas, en concordancia con las condiciones que imponga el propietario.
- g) Aprobar todos los informes, de la obra objeto del CONSORCIO.
- h) Aprobar y sancionar los programas de ejecución de la obra.
- i) Proponer las modificaciones del contrato de consorcio y sus ampliaciones y reformados, para que el contrato de consorcio sea modificado o ampliado por unanimidad de sus integrantes. Así también aprobar los presupuestos y sus modificatorias de cualquier contrato o subcontrato con proveedores relacionados con la ejecución de la obra.
- j) Evaluar y aprobar la gestión del Representante Legal Común, el balance y cuenta de resultados del CONSORCIO, así mismo aprobar la propuesta de distribución de utilidades.
- k) aprobar los presupuestos de todos los subcontratos, contratos de suministro y prestación de servicios y análogos relacionados con la ejecución de la obra
- l) Aprobar las compras de maquinaria.
- m) Aprobar el reembolso de los gastos realizados por cualquiera de las Empresas miembro, cuando la suma supere los S/5,000.00 cinco mil nuevos soles.
- n) Aprobar los posibles repartos de excedentes de fondos entre las Empresas consorciadas.





 CONSORCIO ARIS S.A.C.
 REPRESENTANTE LEGAL
 ING. JULIO VILLAFRA ROSQUERA
 GERENTE GENERAL
 REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACIÓN R&E S.A.C.

 GUERRERO CALLE ROXANA
 GERENTE GENERAL


 CH'VIN DE HUANTAY E.I.R.L.
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA
 Gerente General


 CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ
 FELIPE CARRASCOSA HERMANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

- o) Establecer un programa de seguros en caso de ser necesario en virtud del contrato de obra.
- p) Estudiar, para su aprobación o no, la formalización de créditos o préstamos con entidades bancarias para atender las necesidades de financiación del **CONSORCIO** así como las garantías a prestar respecto de los mismos.
- q) Aprobar el plan de operaciones y el presupuesto de inversiones y costes de ejecución del contrato, así como las previsiones y peticiones de fondos y garantías.
- r) Aprobar los costes suplidos que pagará el **CONSORCIO** a las Empresas miembro por la prestación del personal, prestación de servicios, ejecución de trabajos, suministros y/o arrendamiento de maquinaria y equipos. (Son los costes que soporta el consorcio por el uso de personas u otras prestaciones de las empresas que lo conforman).
- s) Resolver los litigios que se puedan producir en el control y aceptación de las facturas de suplidos.
- t) Acordar la disolución y liquidación del **CONSORCIO**, aprobando el Balance Final del mismo.
- u) Cualquier otra que le sea atribuida conforme a los presentes Estatutos.

SÉPTIMA.- FORMA DE ADOPTAR ACUERDOS

Los acuerdos se tomarán por unanimidad.

De no lograrse la unanimidad se volverá a reunir el Comité dentro de las cuarentiocho (48) horas siguientes, y si continúa sin lograrse la unanimidad, los acuerdos se tomaran por mayoría simple en la misma sesión.

Finalmente con el objeto de llevar adelante la ejecución del **CONSORCIO** y la buena relación que debe existir entre los **CONSORCIADOS**, las empresas miembro acuerdan que en el caso de las operaciones bancarias y financieras, estas serán ejercidas por un representante designado por **CHAVIN DE HUANTAR EIRL** y otro representante de **CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU**, del tal manera que sea conjunta la delegación de



ING. JULIO ROSQUERA
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
CORPORACIÓN R&E S.A.C.
INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN

ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA
Gerente General
CORPORACIÓN R&E S.A.C.
GUERRERO/CALLE ROXANA
GERENTE GENERAL

ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA
Gerente General
CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.

FELIPE CARRASCOA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU

poderes para este fin, debiendo ser uno de ellos el Representante Legal Común.

OCTAVA.- REPRESENTANTE LEGAL COMÚN: DESIGNACIÓN Y FACULTADES

Los CONSORCIADOS designan como Representante Legal Común del CONSORCIO al Ing. EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA, identificado con DNI. N° 32385946, la cual queda designado y nombrado como tal, y es quien convocará a las juntas descritas en las cláusulas siguientes, y gozará de las demás facultades y atribuciones específicas de representación previstas en la presente cláusula, y que se detallan en los siguientes párrafos:

Precisándose que la designación y nombramiento del REPRESENTANTE LEGAL COMÚN del CONSORCIO, se efectúa por todo el plazo de ejecución y entrega de la obra, incluso hasta la liquidación final y entrega de la obra aunque hubiera expirado el plazo o la prórroga del presente contrato, y con la finalidad que pueda finiquitar todo aquello relacionado con la misma, con su avance, ejecución, liquidación y entrega, aunque no se hubiere acordado la prórroga o la renovación del plazo; asimismo hasta la liquidación del presente consorcio.

A su vez los CONSORCIADOS designan como sus representantes, quienes participaran en las sesiones o reuniones del Comité de Gerencia:

- CIVIS GLOBAL – SUCURSAL PERU, designa a:


(a) FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ, identificado con C.E. N° 000996117, domiciliado en calle GRIMALDO DEL SOLAR 219, MIRAFLORES – LIMA – LIMA, y


(b) JUAN LUIS DIEZ ELORZA, identificado con C.E. N° 001090221, domiciliado en calle GRIMALDO DEL SOLAR 219, MIRAFLORES, LIMA.


- CHAVIN DE HUANTAR EIRL designa a:


(a) EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA, identificado con DNI N° 32385946, domiciliado en Av. Próceres de la independencia N° 3634 San Juan de Lurigancho Lima – Lima;

(b) LUDWIG BENITO RETAMOZO MARTINEZ, identificado con


 CORPORACIÓN RIS S.A.C.
 REPRESENTANTE LEGAL
 ING. JULIO G. VILAFRANCA MOSQUERA
 REPRESENTANTE LEGAL


 CORPORACIÓN RIS S.A.C.
 GUERRERO CALLE ROXANA
 GERENTE GENERAL


 CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA
 Gerente General


 CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU
 FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


DNI N° 41297246, domiciliado en Pasaje José Miguel Ríos 127, distrito de la Victoria, Lima - Lima.


(c) RICHARD JAVIER TAPIA ROSAZZA, identificado DNI N° 32404167, con domicilio en Calle San Agustín 748 - Cercado - Lima.


El Representante Legal Común del CONSORCIO, ejercerá las siguientes facultades:


A) OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES:

1. Representar al **CONSORCIO** ante todo tipo de instituciones publicas o privadas, funcionarios y autoridades judiciales, civiles, municipales, ministerio de trabajo, fiscales, administrativas, constitucionales, tributarias y aduaneras (SUNAT), registros públicos (SUANRP), INDECOPI, Cámaras de comercio, Defensoría del Pueblo, comerciales, de trabajo, judiciales, policiales y militares, con las facultades de presentar toda clase de recursos y reclamaciones, así como desistirse de ellos, junto con las facultades generales de mandato, representación y especiales contenidas en los Artículos 74, 75 y 77 del Código Procesal Civil. Tramitar la obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC) ante la autoridad respectiva, así como la baja del mismo cuando así corresponda.
2. Representar al **CONSORCIO** con amplias facultades para:
 - 2.1. Facultades de Representación en Procesos Judiciales y Procedimientos Administrativos:
 - 2.1.1. Representar al **CONSORCIO** en toda clase de procesos y procedimientos en los que sea parte la sociedad, incluyendo pero sin limitarse a los judiciales, prejudiciales, policiales, fiscales, arbitrales y administrativos, y ante cualquier autoridad pública o privada, en cualquier materia sea civil, comercial, laboral, tributaria, aduanera, penal, constitucional, contencioso administrativa u otra, con las facultades generales y las facultades especiales contenidas en los Artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil requeridos para disponer de derechos sustantivos y en consecuencia interponer, modificar y/o ampliar demandas, denuncias,


 COP. DRAS. J. M. DE LA CRUZ S.A.C.
 INGENIERO EN CONSTRUCCION
 INGENIERO EN CONSTRUCCION
 INGENIERO EN CONSTRUCCION
 REPRESENTANTE LEGAL



 CORPORACION W & S.A.
 GUERRO CALLE ROXANA
 GERENTE GENERAL



 CH/ VIN DE HUANTAB E.I.R.L.
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA
 Gerente General



 CIVIS GLOBAL SUJURSAL PERU
 FELIPE CARRASCOZA HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL




recursos, reclamaciones y quejas, prestar instructiva, preventiva, testimoniales; presentar reconvencciones y contradicciones; deducir excepciones y/o defensas previas y contestarlas; contestar demandas, denuncias y reconvencciones; allanarse y/o reconocer la pretensión; dar reconocimiento personal; dar testimonio como parte o testigo; exhibir, reconocer y desconocer documentos; ofrecer, actuar y solicitar la actuación de toda clase de medios probatorios, pericias y cotejos así como oponerse, impugnar observar y/o tachar los ofrecidos por la parte contraria, documentos y testigos; interponer toda clase de medios impugnatorios y recursos de reposición, apelación, casación y nulidad en todas las instancias; solicitar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta; solicitar inspecciones judiciales; oponerse a la declaración de parte, a la exhibición, pericias e inspecciones judiciales; asistir e intervenir, como representante legal de la sociedad, en toda clase de audiencias, ya sean conciliatorias o de fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio, de pruebas y/o audiencias únicas, especiales y/o complementarias, inspecciones, diligencias y todo tipo de actos procesales, sean éstos de remate, administración de posesión, lanzamiento, embargos y/o saneamiento procesal; solicitar el desglose y entrega de certificados de depósitos judiciales, efectuar, delegados en virtud de una carta rogatoria encomendando acciones a ser adoptadas fuera de la jurisdicción del proceso; efectuar identificaciones; responder a interrogatorios; solicitar y aplicar toda clase de medidas preventivas y cautelares, inclusive innovativas y de no innovar y cualquier medida anticipada dentro y fuera del proceso, ampliarlas y/o modificarlas y/o sustituirlas y/o desistirse de las mismas; ofrecer y/o otorgar contra cautela (inclusive caución juratoria); nombrar órganos de auxilio judicial; prestar declaración de parte o testimonial. Asimismo, estará facultado para intervenir en procesos cualesquiera que afecten los intereses del consorcio, sea como intervención coadyuvante, litisconsorcial, excluyente principal, excluyente de propiedad de derecho preferente, o como sucesor


 J. ARIS S.A.C.
 REPRESENTANTE LEGAL
 S.A.C. JULIO C. VILLALBA MOSQUERA
 GERENTE GENERAL
 REPRESENTANTE LEGAL


 CORPORACIÓN R & S.A.C.
 GUERRERO CALLE ROXANA
 GERENTE GENERAL



 CH. VIN DE SANTAR E.I.R.L.
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA
 Gerente General



 CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ
 FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


procesal; solicitar la intervención de un tercero para asegurar una pretensión futura o a manera de denuncia civil o de llamamiento posesorio.


Adicionalmente podrá, solicitar la acumulación y desacumulación de procesos; retirar consignaciones; ejecutar las sentencias y cobrar las costas y costos procesales; conciliar; transigir judicial o extrajudicialmente, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso; hacer abandono o renuncia de la instancia, solicitar la aclaración, corrección y/o consulta de las resoluciones judiciales; participar en todo tipo de diligencias y actos de remate y subasta, sean judiciales o extrajudiciales, estando facultados para presentar propuestas y pujas para adjudicarse al interior de los mismos bienes muebles o inmuebles, presentar, depositar, consignar, cobrar y retirar oblajes y las sumas de dinero que correspondan al valor de la adjudicación, así como endosar cheques para la adjudicación de los bienes objeto de los mismos, ser adjudicatarios de la buena pro, tomar posesión de bienes, suscribir las actas correspondientes y pagar los honorarios del martillero; solicitar la inhibición y/o plantear la recusación de jueces, fiscales, vocales y/o magistrados en general; y practicar todos los demás actos que fuesen necesarios para la tramitación de los procesos y procedimientos, en general, realizar cualquier gestión que sea necesaria para defender los intereses de la sociedad en los mismos.

2.1.2. Participar e intervenir en procesos arbitrales, nacionales; así como intervenir en cualquier otro mecanismo alternativo de solución de controversias, tales como conciliación, mediación, transacción, entre otros, teniendo para tal efecto las mismas facultades conferidas en el numeral 2.1.1. precedente y quedando facultado además para conciliar judicial y extrajudicialmente, pudiendo disponer de las materias que se traten en las conciliaciones, transigir judicial y extrajudicialmente, presentar solicitudes de conciliación, asistir a las respectivas audiencias y practicar todos los


CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ
FELIPE CARRASCO SATHERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL


CHIRIN DE HUANTAR, E.I.R.L.
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA
Gerente General



CORPORACIÓN R&E S.A.C.
GUERRERO CALLE ROXANA
GERENTE GENERAL



CORPORACIÓN S.A.C.
INGENIERÍA Y CONSTRUCCION
ING. JULIO C. VILLAFRANCA MOSQUERA
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL


demás actos que fueran necesarios, adoptar acuerdos conciliatorios; pudiendo asimismo someter a arbitraje, sea de derecho o de conciencia, las controversias en las que pueda verse involucrada la sociedad, suscribiendo el correspondiente convenio arbitral; designar al árbitro o árbitros y/o institución que hará las funciones de tribunal arbitral, presentar el formulario de sumisión correspondiente y/o pactar las reglas a las que se someterá el proceso correspondiente y/o disponer la ampliación del reglamento que tenga establecido la institución organizadora. Asimismo representar al **CONSORCIO** en procesos de conciliación y/o arbitraje, tanto Judicial como Extrajudicial, pudiendo disponer de los derechos que motiven dichos procedimientos y ante otras Entidades del Estado.-


2.2.- Cualquier otra decisión relevante para el funcionamiento del **CONSORCIO**, entendiéndose que lo referido a las cuentas Bancarias y los actos nombrados precedentemente, se trata de situaciones únicas y exclusivamente solidarias; de otro lado las deudas particulares de cada uno de los asociados sean pasadas presentes y futuras no afectan los recursos del **CONSORCIO** destinados a la ejecución de la presente obra existiendo, Intangibilidad, e inembargabilidad, ante cualquier circunstancia que no sea de caso exclusivo de LA OBRA.

3. Para tal Efecto el Representante Legal, podrá EJERCER, DELEGAR, REVOCAR, RENOVAR, SUSTITUIR Y REASUMIR TOTAL O PARCIALMENTE LAS FACULTADES Y PODERES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CLAÚSULA.
4. Dirigir las operaciones del **CONSORCIO**, siendo necesario, aprobación previa de los presupuestos del Comité de Gerencia, para celebrar contratos o subcontratos y actos comerciales propios del **CONSORCIO**.
5. Usar el sello del **CONSORCIO**, expedir la correspondencia, facsímil, correo electrónico, etc. Así como cuidar que la contabilidad este al día, haciendo las inspecciones del caso.


 C.D. JUAN CARLOS MOSQUERA
 INGENIERO EN CONSTRUCCION
 INGENIERO REPRESENTANTE LEGAL
 INGENIERO REPRESENTANTE LEGAL


CORPORACION INVERSA S.A.C.
 GUERRERO CALLE ROXANA
 GERENTE GENERAL


 OFICINA DE HUANTARCA
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA
 Gerente General


CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU
 FELIPE CARRASCOZA HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



6. Dar cuenta al **CONSORCIO** de la marcha y estado de los negocios, así como de la recaudación, inversión, existencia de fondos que tenga a bien pedirle los **CONSORCIADOS**.
7. Presentar a tiempo oportuno a los **CONSORCIADOS** el estado financiero general y distribución de utilidades al momento de la liquidación y disolución definitiva del **CONSORCIO**.
8. Firmar los correspondientes contratos con la Entidad contratante, derivados del proceso de selección que motiva el presente contrato de consorcio.

CORPORACION ARIS S.A.C.
 REPRESENTANTE LEGAL
 M.G. JULIO VILAFRANCA MOSQUERA
 REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION R&E S.A.C.
 GUERRERO CALLE ROXANA
 GERENTE GENERAL

Los **CONSORCIADOS** acuerdan que las facultades otorgadas al Representante Legal del **CONSORCIO**, podrán ser revocadas en el momento que los **CONSORCIADOS** lo decidan por acuerdo unánime.

Las facultades señaladas del Representante Legal señaladas en la presente clausula, tienen el carácter enumerativo mas no limitativo por cuanto en general el Representante Legal se encuentra facultado para celebrar cuanto acto sea necesario a efectos de ejecutar las acciones que disponga el Comité de Gerencia del presente Consorcio, o cuando así lo exijan la naturaleza de las circunstancias.

CH. DE HUANTAR E.I.R.L.
 M.G. EMILIANO TRUJILLO LUNA
 Gerente General

NOVENA.- OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS:

El manejo económico-financiero del **CONSORCIO** así como la gestión de los pagos y uso de cuentas bancarias será con firmas mancomunadas entre el Sr. **FELIPE CARRASCOSA HERNÁNDEZ**, identificado con C.E. N° 000996117, por **CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ**, y el Sr. **EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA**, identificado con D.N.I. 32385946 de acuerdo con los poderes y atribuciones que se señalan a continuación:

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ
 FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

1. Ordenar y efectuar depósitos a la vista, a plazos, de ahorros o custodia, tanto en moneda nacional como extranjera.
2. Abrir y cerrar cuentas corrientes, ordenar depósitos, solicitar avances, trasferencias, girar con sobregiro en cuentas corrientes bancarias, así como otorgar cancelaciones y recibos en caso de sobregirarse en cuentas corrientes.
3. Retirar, vender, comprar valores.
4. Abrir, depositar, retirar y cancelar cuentas de ahorros.

CORPORACIÓN A.E.S.A.C.
 INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN
 JULIO C. VILAFRANCA MOSQUERA
 GERENTE GENERAL
 REPRESENTANTE LEGAL
 LIMA - P.
 GUERRERO CALLE ROXANA
 GERENTE GENERAL

CH'IN DE HUANCAPICHU S.A.C.
 INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN
 NG. EMILIANO TRUJILLO LUNA
 Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ
 FELIPE CARRASCO HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

5. Girar, endosar, y cobrar cheques, así como cualquier otro documento comprobatorio o de deuda.
6. Aceptar, reaceptar, girar, renovar, endosar, descontar, cobrar, afianzar, preñar, protestar letras de cambio, vales, pagarés, giros, certificados, pólizas, documentos de embarque de almacén, warrant, y cualquier otro documento mercantil, bancario o civil.
7. Descontar adelantos sobre letras de cambio, pagarés, y otros documentos comprobatorios de deuda.
8. Alquilar, operar y cerrar cajas de seguridad.
9. Dar en custodia objetos de valor, documentos o valores,
10. Contratar seguros y endosar pólizas.
11. Solicitar toda clase de créditos directos con o sin garantía prendaria o hipotecaria.
12. Solicitar préstamos hipotecarios y prendarios y en relación con ellos aceptar títulos valores, suscribir instrumentos hipotecarios y prendarios tanto en moneda nacional como extranjera.
13. Otorgar avales, fianzas y otras garantías.
14. Solicitar la emisión, aviso y negociación de cartas de crédito, a la vista o a plazo, de acuerdo con los usos internacionales, tanto en moneda extranjera como nacional.
15. Comprar, vender acciones, bonos, pagarés, certificados de depósito negociables o no negociables, tanto en moneda nacional como extranjera.
16. Ordenar pagos y cobros.
17. Celebrar contratos de compra venta y cualquier acto de enajenación y gravamen de bienes muebles o inmuebles, asimismo podrá celebrar contratos de arrendamiento, de arrendamiento financiero sobre bienes muebles e inmuebles, para lo cual esta facultado para firmar los contratos privados minutas y escrituras públicas que correspondan para tal fin.

18. Otorgar cancelaciones y recibos, cobrar y prestar otorgando y firmando los contratos privados, minutas y escrituras públicas que correspondan.

19. Indistintamente cualquiera de los nombrados podrá Solicitar información respecto del estado y los movimientos de las cuentas que mantenga el **CONSORCIO** con las entidades bancarias que trabaje.

Los **CONSORCIADOS** acuerdan, no obstante lo anterior, que las facultades establecidas en los numerales 2, 4, 5, 6, 10, 14, 16, y 18, de esta cláusula Novena, **PODRAN SER EJERCIDAS INDIVIDUALMENTE** por el Representante Legal Común **hasta por la suma de S/. 5,000.00 (cinco mil nuevos soles).**

Los **CONSORCIADOS** asimismo acuerdan, que la facultad establecida en numeral 19 de esta clausula Novena podrá ser ejercido individualmente por el Sr. **FELIPE CARRASCOSA HERNÁNDEZ** o el Sr. **EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA.**


DÉCIMA.- RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE RESPONSABILIDAD


Cada uno de los **CONSORCIADOS** se obliga a aportar al negocio todos los recursos y garantías necesarias para el desarrollo de la ejecución de la obra objeto del **CONTRATO** y del **CONSORCIO** de acuerdo a su porcentaje de participación establecido en la Cláusula Tercera, asumiendo responsabilidades en la misma proporción, excepto en lo recogido en la Cláusula Décimo Cuarta.


Se fija por las partes un fondo operativo de **TREINTA MIL NUEVOS SOLES**, que será aportado por las empresas **CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ** (40%), y **CHAVIN DE HUANTAR EIRL** (60%) Para hacer frente a los gastos iniciales del **CONSORCIO** en la ejecución de la obra, cada una de las empresas se obliga a ingresar en la cuenta de ahorro que a tal efecto se apertura y en el plazo de quince días contados desde el acuerdo del Comité de Gerencia en que así se le exija, su parte correspondiente en el fondo operativo fijado en el presente artículo.


El **CONSORCIO** se registrá por un sistema de ingresos y gastos.

En todo caso, la política del **CONSORCIO** deberá atender a la autofinanciación a través de los medios habituales (fondo operativo,


CORPORACIÓN ARIS S.A.C.
CONSTRUCCION
ING. JULIO C. VILAFRANCA MOSQUERA
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL


CORPORACIÓN R&E S.
GUERRO CALLE ROXANA
GERENTE GENERAL


CH/ VIN DE HUANTAR EIRL
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA
Gerente General


CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ
FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

LIMA

cobro de los trabajos realizados y de los servicios prestados, y de cualquier otro del **CONSORCIO** sea cual sea su origen).

En el exclusivo supuesto de no ser suficientes los recursos obtenidos según el párrafo precedente, el Comité de Gerencia solicitará el apoyo financiero de las empresas asociadas, siempre de acuerdo a su porcentaje de participación, en los términos previstos en la presente disposición; igual régimen se aplicará con relación a las cartas fianza y las garantías, sea cual sea su naturaleza y fin, que deba aportar el **CONSORCIO**.

Los pagos, transferencias e ingresos del **CONSORCIO** se efectuarán a nombre de la misma, en las cuentas aperturadas en Bancos escogidos de común acuerdo.

Los fondos podrán ser retirados de las cuentas del **CONSORCIO** por cheques, órdenes o transferencias, mediante las firmas conjuntas de las personas autorizadas.

Las remesas de fondos que deban efectuar las Empresas miembro, se harán de forma que se ingresen en las cuentas del **CONSORCIO** dentro del plazo y por las cantidades solicitadas, en cuyo caso, dichas remesas no devengarán interés alguno. Si alguna de las Empresas no efectuase la aportación (de fondos o garantías a que viniera obligada, incurrirá en morosidad y sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 14 de este contrato, deberá abonar mensualmente a aquella de las otras empresas asociadas, que lo hubiera aportado por la morosa y durante el período de demora, un interés anual sobre las cantidades no ingresadas, o sobre el importe de la garantía no aportada, del **20%** (veinte por ciento) la tasa de interés preferencial que esté vigente según las tablas máximas para este tipo de interés que fija el Banco Central de Reserva del Perú, incrementado en **diez puntos** porcentuales, eligiendo la cantidad mayor que resulte de la aplicación de uno u otro tipo de interés.

El Comité de Gerencia, aprobará, a propuesta del Representante Legal Común, una previsión financiera mensual que cubra un período de **4 (cuatro) meses**. Dentro de esta previsión financiera se incluirá la aprobación de las peticiones de fondos a ingresar en las cuentas del **CONSORCIO** por parte de los consorciados. Estas peticiones serán hechas a las Empresas miembro por el Presidente del Comité de

CORPORACIÓN R&E S.A.C.
INSTRUMENTO DE CONSTRUCCIÓN
ING. J. ALVARO GARCÍA MOSQUERA
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACIÓN R&E
C.
GUERRERO CALLE ROXANA
GERENTE GENERAL

ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA
Gerente General

CVIS GLOBAL SUCURSAL PERU
FELIPE CARRASCO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL


Gerencia, con un preaviso mínimo de quince días calendarios. Salvo acuerdo en contrario entre las Empresas miembro, los ingresos de fondos, así como los reembolsos de éstos o de excedentes de tesorería, se harán siempre simultáneamente por las partes en la proporción fijada en la Cláusula Tercera de este contrato.


Para el cálculo de los ingresos que deban efectuar las respectivas empresas, se descontarán las cantidades de que sean acreedores, por facturas de servicios conformadas y vencidas, extinguiendo por compensación su crédito.


Los pagos de las facturas de servicios, una vez conformadas, se efectuarán dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de las mismas, salvo acuerdo distinto en el contrato o subcontrato respectivo. En caso de que la factura contuviera partidas erróneas o improcedentes se abonarán solamente las que sean correctas incorporándose, en su caso, dicha corrección, una vez realizada, a otra factura mensual. La conformidad tendrá lugar dentro de los 15 días siguientes a la fecha de recepción. En el supuesto de que el comité de Gerencia no aprobara por unanimidad los costes suplidos, se tomaran los acuerdos por mayoría simple. De no estar conforme el afectado podrá acudir al arbitraje, y si el laudo arbitral determinase ser conformes los suplidos, éstos devengarán el interés señalado en el párrafo tercero de este artículo, desde los quince días siguientes a la presentación de la factura.


En caso de que durante el período de duración del **CONSORCIO** existan disponibilidades en su tesorería, una vez abonadas a las Empresas miembro las cantidades que se les adeuden por el **CONSORCIO** por servicios, personal, suministros, alquileres, etc., estas disponibilidades deberán ser empleadas para el reembolso de los pagos y adelantos efectuados por las Empresas.

Después del reembolso total de esas sumas, y en caso de excedente de disponibilidad sobre las necesidades de tesorería de las obras, el **CONSORCIO**, mediante acuerdo unánime del Comité de Gerencia, podrá hacer las inversiones financieras que considere oportunas o proceder a su abono a los miembros del **CONSORCIO** como anticipo a cuenta. Las inversiones serán gestionadas por el propio Consorcio con el asesoramiento de las Empresas miembro.


 CORPORACION ARIS S.A.C.
 INGENIERIA Y CONSTRUCCION
 ING. JULIO C. GANGA MOSQUERA
 GERENTE GENERAL
 REPRESENTANTE LEGAL


 CORPORACION R&E S.
 GUERRERO CALLE ROXANA
 GERENTE GENERAL


 E HUANTAR E. R. L.
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA
 Gerente General


 GRUPO GLOBAL SUCURSAL PERU
 FÉLPE CARRASCOZA HERNÁNDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

VO DE: IMA

Las Empresas miembro no emplearán dinero, propiedades o créditos del CONSORCIO con fines distintos al común. Asimismo, las partes no extenderán, aceptarán, endosarán o negociarán letras de cambio, pagarés, cartas-órdenes, cheques u otros efectos de giro y de comercio en nombre del Consorcio o los intereses relacionados con la misma para aliviar las cargas particulares de las Empresas que la integran.

DÉCIMO PRIMERA.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La ejecución de las obras se sujetará a las siguientes reglas:

11.1.-APORTACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.-

La maquinaria o equipo necesario para la ejecución de la obra, será fijado por el Comité de Gerencia. Las Empresas consorciadas podrán aportar su propia maquinaria en régimen de alquiler, o el CONSORCIO adquirirá o arrendará a terceros la que estime precisa.

En el primer caso -*aportación en alquiler por las Empresas consorciadas*- se procurará en la medida de lo posible, que las aportaciones de las Empresas sean proporcionales al porcentaje de participación, salvo que existan circunstancias especiales apreciadas por el Comité de Gerencia.

Además, en estos supuestos de aportación de la maquinaria por las Empresas miembro, será preceptivo:

- a) Inventariar la maquinaria aportada, indicando su precio con expresión de la Empresas propietaria de la máquina.
- b) Fijar el alquiler mensual para cada máquina, según los precios de mercado, que para tal efecto, apruebe el Comité de Gerencia y que se actualizarán el mes de Enero de cada año por acuerdo del Comité de Gerencia.
- c) Facturar dicho alquiler por todo el tiempo que medie desde el día que, previa petición, se produzca la llegada de la máquina a la obra hasta aquél en que la misma quede a disposición del parque originario. En caso de averías con duración igual o superior a 2 (DOS) días, el CONSORCIO no devengará el alquiler de los días que dure la avería.

ING. JORGE A. S.A.C.
CORPORACIÓN RAE S.A.C.
ING. JULIO M. AFRANCA MOSQUERA
GERENTE GENERAL
HEMBEANTE LEGAL

CORPORACIÓN RAE S.A.C.
GUERRERO CALLE ROXANA
GERENTE GENERAL

ING. JIN DI. INTAR E.A.R.L.
ING. MILITANO TRUJILLO LUNA
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ
FELIPE CARRASCOA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

d) La mano de obra de los maquinistas, gastos de mantenimiento, pequeñas reparaciones, piezas de desgaste y las averías derivadas de una mala utilización de la maquinaria, serán a cargo del **CONSORCIO**.
El transporte de la maquinaria será por cuenta del **CONSORCIO**.

Las Empresas que aporten en propiedad máquinas al **CONSORCIO** asesorarán a éste acerca de los repuestos que deban mantener para el debido funcionamiento de las mismas y podrán aportar directamente, a precios no superiores a los de mercado, aquellos repuestos que no sean con cargo al alquiler. Las empresas se harán cargo al final del alquiler, a los precios de entrada en almacén, de aquellos repuestos que previamente hubiesen enviado o que se hubiesen comprado por parte del **CONSORCIO** para las máquinas de su propiedad.

El **CONSORCIO** se compromete a conservar la maquinaria en buen estado, durante el período de su utilización en obra.

Al término de las obras, la maquinaria, equipos, material, etc. propiedad del **CONSORCIO**, serán repartidos entre las empresas signatarias, de común acuerdo y a precios reales y conforme a la Cláusula Décima Octava.

11.2- EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.-

Las prestaciones objeto del **CONTRATO** serán ejecutadas por el **CONSORCIO** en alguna de las siguientes modalidades:

- a) Directamente por el **CONSORCIO**, con personal y medios propios de las Empresas o alquilados, y con el coste que resulte de su ejecución.
- b) Mediante distribución de prestaciones para ser ejecutadas por las Empresas que forman el **CONSORCIO** actuando individualmente con sus medios. En este caso, la Empresa que realice las distintas prestaciones objeto del **CONTRATO** deberá ejecutarlas a un precio fijo unitario que será acordado entre la Empresa ejecutante y el Comité de Gerencia.

Si más de una Empresa mostrara interés en la ejecución de alguna prestación, se adjudicará a la oferta más baja que se realice por las mismas. Estas ofertas se presentarán ante el Comité de Gerencia en sobre cerrado, en lugar y fecha que se indique previamente. La apertura de sobre se realizara en el mismo acto de la presentación y se procederá inmediatamente a su adjudicación por el Comité. En todo caso se

CORPORACIÓN ARIS S.A.C.
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
CALLE VILLAFRANCA MOSQUERA
N.º 100
LIMA
G. VILLAFRANCA MOSQUERA
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACIÓN R&E S.A.
GUERRERO CALLE ROXANA
GERENTE GENERAL

CHAV : HUANTAR E.I.R.L.
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA
Gerente General

CMS GLOBAL SUCURSAL PERÚ
FELIPE CARRASCO SAHERNADEZ
REPRESENTANTE LEGAL



procurará en la medida de lo posible, que las contrataciones de las Empresas sean proporcionales al porcentaje de participación, salvo que existan circunstancias especiales apreciadas por el Comité de Gerencia.

En cualquier caso, los contratos adjudicados a Empresas consorciadas se registrarán por el contrato que sea aprobado previamente a la adjudicación por el Comité de Gerencia.

No podrá realizarse, bajo esta modalidad, prestación alguna que no le haya sido fijado previamente el precio unitario de ejecución. Salvo que fueran sumas menores a diez mil nuevos soles.

c) Mediante cesión de prestaciones objeto del **CONSORCIO**, subcontrato o destajo con terceros, a precios unitarios de ejecución con contrato o pedido formal del **CONSORCIO** al subcontratista o destajista.

La distribución de las prestaciones objeto del **CONSORCIO** a ejecutar, según cada modalidad, los plazos y períodos de ejecución, serán fijados por el Comité de Gerencia.

Las Empresas que forman el **CONSORCIO** tendrán derecho a tanteo frente a terceros, para la ejecución de las prestaciones objeto del **CONSORCIO** que se pretenden destajar o subcontratar, en igualdad de condiciones, técnicas, económicas y financieras.

11.3.- PROCEDIMIENTO DE COMPRAS.-

La determinación del procedimiento de compras será decidida por el Comité de Gerencia en función de las propuestas de cada una de las Empresas consorciadas, recogándose por escrito las determinaciones del sistema por el que se opte, en todo caso el procedimiento por el que se opte será de obligatorio cumplimiento para proceder a la firma de todas las facturas.

DÉCIMO SEGUNDA.- PERSONAL Y OTROS SERVICIOS

El personal del **CONSORCIO** estará constituido por el procedente de las Empresas consorciadas de la misma, así como el contratado directamente por el **CONSORCIO**.

El Comité de Gerencia decidirá sobre la imputación de los gastos que se originen para el **CONSORCIO** por el traslado y estancia del personal de las Empresas miembro, siendo de cuenta de las mismas los devengos por

CORPORACION KRIS S.A.C.
INGENIERIA Y CONSTRUCCION
CALLE VILAFRANCA 1050
S.M. JULIACA
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION R&E S.A.
GUERRERO CALLE ROXANA
GERENTE GENERAL

CH' VII AJUNTARVE IRL
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA
Gerente General

CIVIS GLOBAL SOCIAL PERU
FELIPE CARRASCO SAHERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



el personal propio que corresponda, así como los sueldos, jornales, cargas sociales, etc., del mismo personal.

Para el personal prestado al **CONSORCIO**, que pertenezca a la nómina de las Empresas miembro, se establecerá por el Comité de Gerencia una escala que regule los cargos que han de pasar éstas para cada categoría, escala que no se revisará.

En la medida de lo posible, la aportación de personal por las Empresas consorciadas será proporcional a la participación de cada una, salvo que existieran circunstancias especiales apreciadas por el Comité de Gerencia.

Se cargarán al **CONSORCIO** los costes diarios y los viáticos de los miembros del Comité de Gerencia que indispensablemente giren visitas a la obra.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES FINANCIERAS - BENEFICIOS Y TRAMITACION DE FIANZAS.

Los **CONSORCIADOS** acuerdan que tanto en las utilidades, gastos, costos, como en las pérdidas que arroje o genere el negocio, la participación de los contratantes será en forma siguiente: **CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ 40.00%** (cuarenta por ciento), **CHAVIN DE HUANTAR EIRL 60.00%** (sesenta por ciento).

Las empresas **CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ** y **CHAVIN DE HUANTAR EIRL** otorgarán las garantías y Cartas Fianzas necesarias para la ejecución de la obra en función del porcentaje anteriormente indicado, por lo que es de su responsabilidad las gestiones correspondientes oportunamente, responsabilizándose por la autenticidad de las mismas y de su presentación ante la entidad contratante.

El **CONSORCIO** soportará los gastos y cargas de toda naturaleza ocasionados por la ejecución de los trabajos, incluso los costes de los trabajos previos de elaboración de ofertas, pagos a profesionales y viajes para la presentación de la licitación, así como el coste de los avales provisionales y definitivos, con la sola excepción de los impuestos que graven directa o individualmente a las entidades que la componen.

CORPORACION ARIS S.A.C.
INGENIERIA Y CONSTRUCCION
CA
ING. JULIO ALBERTO ROSQUERA
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL


CORPORACION R&E S.
GUERRERO CALLE ROXANA
GERENTE GENERAL

CHAVIN HUANTAR E.I.R.L.
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU
FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL




Los beneficios serán determinados provisionalmente en el momento en que el Comité lo acuerde, y sólo serán definitivos cuando se haya procedido a la liquidación total del contrato, y de las obligaciones derivadas del mismo, tanto ante la Entidad concedente como ante terceros; hasta entonces toda cantidad que hubiera sido distribuida será considerada anticipo o entrega a cuenta, quedando la Empresa respectiva obligada a las devoluciones a que hubiere lugar.


 CORPACIDARIS S.A.C.
 INGENIERIA Y CONSTRUCCION
 ING. JULIO QUIROZ
 REPRESENTANTE LEGAL

DÉCIMO CUARTA.- RÉGIMEN TRIBUTARIO

Los CONSORCIADOS convienen que, para los efectos tributarios, el CONTRATO deberá tener contabilidad independiente, acordando designar como OPERADOR TRIBUTARIO al propio CONSORCIO SAN JOSE , con RUC pendiente de asignar por la SUNAT tras la presentación del Contrato de Consorcio, en caso de ser adjudicatarios con la Buena Pro, debidamente representado por su Representante Legal el Sr. EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA , para todos los fines que demande la ejecución de LA OBRA contratada, siendo por consiguiente el encargado de llevar la contabilidad y realizar toda la tributación correspondiente de acuerdo a ley. Asimismo, el representante legal tiene la facultad para gestionar y obtener ante la SUNAT el Registro Único de Contribuyente y tramitación de facturas y otros comprobantes autorizados por la SUNAT.



 CORPORACION RBE S
 GUERRERO CALLE ROXANA
 GERENTE GENERAL


DÉCIMO QUINTA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN / CONCURSO DE ACREEDORES DE ALGUNA EMPRESA MIEMBRO DEL CONSORCIO.-

1.-Causas de extinción:

El CONSORCIO podrá extinguirse por las siguientes causas:

- a).- Por la finalización de la obra para la cual fue constituido.
- b).- Por la resolución del contrato de obra objeto del CONSORCIO, o la imposibilidad física o jurídica de la ejecución de la obra que constituye su objeto.
- c).- Por el mutuo acuerdo de las empresas miembro ó por la no obtención de la buena pro materia de la constitución del consorcio.
- d).- Asimismo y a petición de las demás empresas asociadas podrá extinguirse el CONSORCIO, por el incumplimiento por cualquiera de las empresas miembros del CONSORCIO, de las clausulas previstas en este


 ENDE HUANTAR E.I.R.L.
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA
 Gerente General


 CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU
 FELIPE CARRASCOZA HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

contrato de consorcio y particularmente, la falta de aportación de dinero, equipos u otros bienes, garantías, o reembolso de anticipos percibidos a que estuviesen obligadas las empresas, cuando siendo requeridas para ello dejaren de hacerlo.

2.-Concurso de acreedores:

Si cualquiera de las Empresas miembro que conforman el **CONSORCIO** pretendiese declararse en situación de concurso voluntario, concurso ordinario, preventivo, disolución y liquidación, insolvencia o cualquier forma de cesación de pagos, deberá comunicarlo de forma fehaciente e inmediata a las demás Empresas miembro y al propio **CONSORCIO**, en todo caso, con al menos dos meses de antelación, a la presentación de la solicitud.

En tal caso, la Empresa miembro en la que concurren tales presupuestos se compromete a suscribir con el **CONSORCIO** los contratos y/o documentos que sean pertinentes en orden a:

- a) Preservar la estabilidad y viabilidad del **CONSORCIO**.
- b) Preservar el cumplimiento íntegro del **CONTRATO** con el cliente.
- c) Mantener la responsabilidad mancomunada frente al Cliente.
- d) Mantener los derechos y obligaciones entre las Empresas miembro, así como entre éstas y el propio **CONSORCIO**.
- e) Establecer las garantías o compensaciones de créditos y deudas en favor del **CONSORCIO** como consecuencia de la responsabilidad mancomunada a que se refiere la Cláusula 9 del presente contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el **CONSORCIO** se reserva, en todo caso, la facultad de excluir o separar a la Empresa miembro en la que concurren los presupuestos objetivos del concurso, así como el derecho de suscribir con ésta los contratos y/o documentos a que se refiere el párrafo anterior.

En el caso de que frente a cualquiera de las Empresas miembro que conforman el **CONSORCIO** se presentase por cualquier acreedor o persona legitimada, solicitud de Concurso Necesario, dicha Empresa miembro estará obligada:



CORPORACIÓN ARIS S.A.C.
INGENIERÍA
CONSTRUCCION

ING. JULIO GUERRERO CALLE ROSA
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

A.C.

CORPORACIÓN R&A


GUERRERO CALLE ROXANA
GERENTE GENERAL

IN DE HUANTAR EMIRL

ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA
Gerente G. General

CIVIS-GLOBAL SUCURSAL PERÚ

FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



 CORPORACION R&E S.A.C.

 INGENIERIA Y CONSTRUCCION

 ING. JULIO G. VILLAFRANCA MOSQUERA

 REPRESENTANTE LEGAL

- a) A comunicarlo de forma fehaciente y de forma inmediata a las demás Empresas miembro y al **CONSORCIO**, una vez que tenga conocimiento de ello y, en todo caso, desde que haya sido emplazada para el trámite de audiencia.
- b) A suscribir los contratos y documentos a que se refiere el apartado anterior.

Asimismo, el **CONSORCIO** se reserva la facultad de excluir o separar de la misma a la Empresa miembro afectada por la solicitud de Concurso necesario en los mismos términos dispuestos en los párrafos anteriores.

DÉCIMO SEXTA.- EFECTOS DE LA EXTINCIÓN

Cuando el **CONSORCIO** se extinga por las causas indicadas en la letra d) del apartado primero de la Cláusula Décimo quinta, o alguna de las Empresas consorciadas estuviera incurso en dicha causa sin mediar extinción del **CONSORCIO**, la(s) empresa(s) incumplidora(s) perderá(n) el derecho a cualquier posible beneficio, y responderá(n) de la parte proporcional de pérdida que se produjera en el **CONSORCIO**, tanto de la originada hasta el momento en que se produjo el hecho de la exclusión como hasta la total extinción del **CONSORCIO**.

En estos mismos casos, la(s) empresa(s) que hubiera(n) asumido los derechos y obligaciones del **CONSORCIO** hasta el momento de dicha extinción continuará(n) realizando todos los cobros que correspondan al **CONSORCIO** y, solo una vez concluida o resuelta la obra y liquidado el **CONSORCIO**, se abonará a la(s) empresa(s) excluida(s) una cantidad igual a las aportaciones hechas por ésta(s), deducida la parte proporcional de pérdida que le(s) corresponda conforme a lo expuesto más arriba. En el caso de que la pérdida que haya de cargarse a la(s) empresa(s) excluida(s) exceda de su aportación al **CONSORCIO**, la(s) misma(s) deberá(n) abonar en el plazo de 30 días el exceso a la(s) empresa(s) que haya(n) continuado en la ejecución de la obra hasta el final de la misma, que será(n) la(s) única(s) que tendrá(n) derecho a los beneficios, si los hubieren desde el momento en que quede(n) excluida(s) la(s) empresa(s) incumplidora(s).

Asimismo, en tales casos se producirán los siguientes efectos adicionales, de modo automático:

CORPORATION R&E

 GUERRERO CALLE ROXANA

 GERENTE GENERAL

CHAVIN DE. ITAR E.I.R.L.

 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA

 Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU

 FELIPE CARRASCO HERNANDEZ

 REPRESENTANTE LEGAL



a).- La(s) otra(s) empresa(s) podrán excluir a la(s) incursa en causa de extinción de toda participación futura en el **CONSORCIO**, haciéndose cargo de su participación;

b).- Continuar la(s) otra(s) empresa(s) la ejecución de los trabajos sola(s) o con nuevas Empresas a su elección, vinculando sus decisiones a la(s) incumplidora(s);

c).- Devolución inmediata por la(s) incumplidora/as de cualquier fondo por ella(s) retirado del **CONSORCIO** en concepto de anticipo o beneficio provisional;

d).- La Empresa(s) incursa(s) en causa de incumplimiento quedará(n) excluida(s) del Comité de Gerencia, dicho Comité continuará en adelante con los representantes de las empresas que continúen en el consorcio y de ser el caso con de la(s) otra(s) empresa(s) nuevas asociada(s), quedando al tiempo obligada(s) a concurrir al otorgamiento de cuantos documentos públicos o privados resulte menester suscribir para el funcionamiento del **CONSORCIO**, incluido el cese o nombramiento del Representante Legal, aún cuando la toma de decisiones al respecto corresponda en exclusiva a la(s) empresa(s) cumplidora(s);

e).- Los cobros a realizar desde el incumplimiento se realizarán por la(s) empresa(s) no incumplidora(s);

f).- En todo caso la(s) incumplidora(s) seguirá(n) respondiendo solidariamente frente a terceros y a la Propiedad de las obras de todas las obligaciones y responsabilidades derivadas de la ejecución del contrato y de las obras y trabajos de él derivados, y de cualesquiera otras actuaciones del **CONSORCIO**.

Además la(s) empresa(s) en situación de incumplimiento no podrá(n), retirar la maquinaria y elementos que hubiera aportado al común hasta que la(s) otra(s) empresa(s) declare(n) a su discreción no ser ya necesaria su utilización en obra.

No se considerará que incumple la empresa que en el momento de tener que efectuar una aportación, tenga créditos contra el **CONSORCIO** por cuantía superior a la aportación a realizar, y si estos créditos no alcanzaran el total del importe de dicha aportación, se le considera que incumple solamente por la diferencia.

CORPORACION ARIS S.A.C.
INGENIERIA Y CONSTRUCCION
NO. JULIO C. VILLAGRACAL
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION R&E S.A.
GUERRERO CALLE ROXANA
GERENTE GENERAL

CH. JIL HUANTAR BURL
INGENIERO TRUJILLO LUNA
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU
FELIPE CARRASCO SHERMANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



En los demás supuestos de extinción de derechos de un consorciado se procederá en cada caso a la liquidación, una vez cumplidas todas las obligaciones pendientes con terceros o la Propiedad de las obras.

DECIMO SEPTIMA.- LIQUIDACIÓN DEL CONSORCIO

La liquidación se llevará a efecto con propuesta del Comité de Gerencia y, si el CONSORCIO se hubiese disuelto por culpa o incumplimiento de una de las Empresas miembro o estando la misma incurrida en causa de incumplimiento conforme a lo previsto en las clausulas 16 y 17 anteriores, la empresa que hubiese permanecido en la ejecución de la obra, realizará las funciones de liquidación dando en su momento el debido conocimiento a la otra parte para la efectividad de la liquidación.

Corresponde al Comité de Gerencia, durante el período de liquidación las funciones siguientes:

1. Llevar y custodiar los libros y correspondencia del CONSORCIO y velar por la integridad de su patrimonio.
2. Realizar las operaciones comerciales pendientes y las nuevas que sea necesario efectuar para la liquidación del CONSORCIO.
3. Percibir todas las cantidades y créditos pendientes al tiempo de iniciarse la liquidación.
4. Enajenar los bienes adquiridos para el CONSORCIO, de acuerdo con el procedimiento que se establece en el siguiente artículo de estos Estatutos.
5. Pagar a las Empresas miembro del CONSORCIO su cuota de participación en el patrimonio líquido resultante de la liquidación.
6. Ostentar la representación del CONSORCIO para el cumplimiento de las funciones precedentes.

El Comité de Gerencia quedará automáticamente disuelto una vez realizada la liquidación del Consorcio.

DECIMO OCTAVA.- REPARTO DE BIENES

Todos los bienes propiedad del CONSORCIO que figuren inventariados en su Activo al finalizar su empleo bien en las obras o bien en la prestación del servicio objeto del contrato serán repartidos entre las Empresas

CONSORCIO ARIS S.A.C.
ING. J. C. VILLAFRANCA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION R&E S.A.C.
ING. GUERRERO CALLE ROXANA
GERENTE GENERAL

CHIMIN DE INTAREIRA
ING. EMILIANO BARRERO LUNA
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ
FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



miembro o vendidos a terceros, para lo cual se procederá del modo siguiente:

1.-El Presidente comunicará al Comité de Gerencia, y sus miembros a las Empresas respectivas, la relación de los bienes para los que va a finalizar el empleo y que, por lo tanto, ya no serán necesarios para los fines del **CONSORCIO**, y asimismo al valor residual contable por el que figuran en el Balance del **CONSORCIO**. Al recibir cada relación de bienes se convocará una reunión de los representantes que cada Empresa designe, que deberá celebrarse en un plazo no superior a un mes, para tratar y acordar su adjudicación a los socios.

2.-Antes de la reunión, los técnicos de los socios podrán comprobar el estado de los bienes, y la Jefatura de la Obra facilitará todo el historial preciso de su empleo en obra, ya que los bienes se entregarán al adjudicatario en el estado en que se encuentren al finalizar el trabajo en el **CONSORCIO** y sin realizarles reparación o acondicionamiento final alguno.

3.-En la fecha fijada para la reunión del Comité, cada socio entregará ineludiblemente en primer lugar y bajo sobre cerrado, al Secretario nombrado al efecto, un escrito manifestando que desea le sean adjudicados o no los bienes de que se trate, por el valor que especifica. Abiertos los escritos de los socios podrá ocurrir:

- a).-Que haya un solo socio interesado, al cual le será adjudicado el bien por el valor que se ha especificado.
- b).-Que haya más de un socio interesado, en cuyo caso se adjudicará al mejor postor.
- c).-Que no haya ningún socio interesado. En este caso, los bienes serán retenidos por el **CONSORCIO** y se ofrecerán en venta a terceros.

4.-Si transcurridos cuatro meses desde el final de los trabajos del **CONSORCIO** aún quedaran bienes en el mismo que no han sido adjudicados o vendidos, el Presidente formará lotes con estos bienes, con un valor residual similar para cada lote.

Dentro de los dos meses siguientes en una reunión del Comité, se adjudicarán a cada socio por el valor residual y mediante sorteo, lotes de bienes en proporción a su participación en el **CONSORCIO**.

CORPORACION ARIS S.A.C.
GERENTE GENERAL
CONSTRUCCION
JULIO VILLAFRANCA MOSQUERA
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION R&E S.A.C.
GUERRERO CALLE ROXANA
GERENTE GENERAL

CHAVIN HUANTARE I.R.L.
INGENIERO FELIPE LUNA
Gerente General

CIVIL DE AL SUCURSAL PERU
FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

5.- A los socios que resulten adjudicatarios de los bienes, y al retirarlos, les será cargado el valor de adjudicación correspondiente contra su cuenta corriente de resultados, suplidos y aportaciones. Como estas cuentas deberán estar en todo momento equilibradas entre los socios, si fuera preciso para mantener el equilibrio, el adjudicatario deberá realizar la aportación que corresponda.

Cada socio deberá retirar del **CONSORCIO** los bienes a él adjudicados en un plazo no superior a un mes a partir de la adjudicación. Sin embargo, si por conveniencia de la Empresa adjudicataria, se prolongara el plazo de permanencia por encima del citado, se le pasará el cargo correspondiente, si procede, por estadía y el **CONSORCIO** no será responsable de su vigilancia.

Los gastos de traslado de los bienes a su nuevo destino serán a cargo de la Empresa adjudicataria si bien el **CONSORCIO** prestará en lo posible, sin cargo, la asistencia precisa para la carga y acondicionamiento necesarios para el transporte.

6.- Con independencia de la aplicación del procedimiento establecido anteriormente a todos los bienes en general, para aquellas piezas únicas y de gran valor que por ser equipos singulares no permitieran la formación de lotes, si no hay socios interesados en su adjudicación, el Comité de Gerencia, antes de su adquisición por el **CONSORCIO**, acordará el procedimiento para su liquidación en cada caso.

DECIMO NOVENA.- ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN.

Serán de cargo del **REPRESENTANTE LEGAL**, tras la disolución, y sus costos deberán ser aprobados por el Comité de Gerencia, los gastos que se originen respecto a la ubicación y atención del archivo de la documentación del **CONSORCIO**, una vez disuelto, hasta que, de acuerdo con la normativa legal aplicable al efecto, sea posible su destrucción e incluso antes de la citada disolución, en el caso del traslado a una de las Empresas de la documentación o trabajos pendientes por o con motivo del levantamiento de las instalaciones propias del **CONSORCIO**. Tales servicios pueden comprender el personal más idóneo que les atienda.

VIGESIMA.- RÉGIMEN LEGAL

El **CONTRATO** se rige por lo establecido en las cláusulas anteriores y en todo lo no previsto, por el Código Civil.

CONSORCIO SAN JOSE S.A.C.
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

CONSORCIO SAN JOSE S.A.C.
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

HUANTAR E.I.R.L.
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA
Gerente General

CVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ
FELIPE CARRASCOA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

GUERRERO CALLE ROXANA
GERENTE GENERAL

Para todos los puntos regulados o no del presente contrato de consorcio y que tenga que ver con su aplicación y ejecución del acto jurídico emanado del consorcio, se aplicara en forma supletoria lo dispuesto por la Ley general de Sociedades en sus normas sobre contratos asociativos y en especial sobre el consorcio, además de las normas generales contractuales del código civil del Perú.

VIGESIMO PRIMERA.- DOMICILIO DE LAS EMPRESAS DEL CONSORCIO

Para todos los efectos del presente CONTRATO, las partes fijan sus domicilios en los señalados en la parte introductoria de este documento, lugar donde se dirigirá las comunicaciones o notificaciones, sean judiciales o extrajudiciales a que hubiere lugar.

VIGESIMO SEGUNDA.- CONVENIO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL Y/O ARBITRAJE

Cualquier eventual conflicto que sugiera o pudiera surgir como consecuencia de la interpretación y/o ejecución del presente contrato de consorcio, será resuelto mediante Conciliación Extrajudicial de modo optativo, y por Arbitraje, el cual se realizará de conformidad con los reglamentos de conciliación y arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima sometiéndose las partes a sus respectivos estatutos para la conformación del tribunal arbitral así como la conducción del proceso que se genere, a costo del interesado.

VIGESIMO TERCERA.- DE LA SUMISIÓN JUDICIAL.

Para la solución de alguna controversia que deba discutirse en los tribunales del poder judicial, al margen de lo dispuesto en la anterior clausula, los consorciados se someten expresamente a la competencia de los jueces y tribunales del Perú provincia y departamento de Lima, con renuncia expresa a su propio fuero y domicilio, en caso de ser distintos.

VIGESIMO CUARTA.- VALIDEZ DEL CONTRATO POR CLAUSULA NULA.

Si en el presente contrato existe alguna disposición que sea o devenga en inexigible o nula por misterio de la ley, ésta no implicará una afectación de las demás disposiciones.

INSTRUMENTACIÓN
CORPORACIÓN ARIS S.A.C.
GERENTE GENERAL
13 JULIO 2011
CALLE SAN MARCO MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACIÓN R&E S.
GUERRERO CALLE ROXANA
GERENTE GENERAL

DE HUANTAR B.A.R.L.
ROBERTO TRUJILLO LUNA
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ
FELIPE CARRASCOA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

El presente contrato únicamente podrá ser modificado parcial o íntegramente a través del concurso de todos los suscribientes. La solicitud de modificación deberá ser comunicada a LOS CONSORCIADOS por escrito dando un plazo no menor de 8 días hábiles, salvo acuerdo unánime que deba obviarse dicho plazo.

VIGESIMA SEXTA.- DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

De producirse incumplimiento en las obligaciones pactadas en el presente contrato, la parte afectada por dicho incumplimiento podrá resolver el presente contrato, sin que la otra parte pueda exigir alguna compensación.

La comunicación sobre la decisión de resolver el contrato, deberá ser realizada vía carta notarial con cinco (5) días antes de que se produzca la resolución de contrato.

En señal de conformidad, las partes suscriben el contrato en Lima, a los Tres días (03) de Diciembre de 2014.

CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA
Gerente General



EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA
DNI N° 32385946
Representante Legal
CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.

CMS GLOBAL SUCURSAL PERÚ
FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



FELIPE CARRASCOSA HERNÁNDEZ
C.E. 000996117
Representante Legal
CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU

CORPORACION ARIS S.A.C.
INGENIERIA Y CONSTRUCCION
ING. JULIO C. VILLAFRANCA MOSQUERA
GERENTE GENERAL



JULIO CESAR VILLAFRANCA MOSQUERA
DNI N° 09753183
Representante Legal
CORPORACION ARIS S.A.C.

CORPORACION R&E S.A.C.

GUERRERO ROSA Y ROSANA
ROSENE GUERRERO CALLE
DNI N° 09794994
Representante Legal
CORPORACION R&E S.A.C.

CERTIFICACIÓN AL DORSO

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN AL ANVERSO CORRESPONDEN A DON EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 32385946 QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L. SEGUN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA NUMERO 01545353 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA Y A DON FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ IDENTIFICADO CON CARNE DE EXTRANJERIA NUMERO 000996117 QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU SEGUN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA NUMERO 13012604 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. DE LO QUE DOY FE. =====

SE LEGALIZAN LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO. =====
LIMA, 03 DE DICIEMBRE DE 2014. =====

DC

JORGE F. ZULETA GUMET
NOTARIO DE LIMA




CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN AL ANVERSO CORRESPONDEN A DON JULIO CESAR VILLAFRANCA MOSQUERA IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 09753183 QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE CORPORACION ARIS S.A.C. SEGUN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA NUMERO 12358699 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA Y A DOÑA ROXANA GUERRERO CALLE IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 09794994 QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE CORPORACION R&E S.A.C. SEGUN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA NUMERO 12052729 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. DE LO QUE DOY FE. =====

SE LEGALIZAN LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO. =====
LIMA, 04 DE DICIEMBRE DE 2014. =====

DC

JORGE F. ZULETA GUMET
NOTARIO DE LIMA



**Constancia de No
estar inhabilitado
para Contratar
con el Estado**

(Copia)

130



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

del Estado

Trámite Nº. 2014-06129640-LIMA - 19/12/2014 11:23:03

CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Nº 066919 - 2014

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L

NO se encuentra Inhabilitado para contratar con el Estado al 19/12/2014

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

Entidad : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Proceso de Selección : ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA. Nº : 38-2014-FONDEPES

Modalidad : PROCEDIMIENTO CLASICO

Monto : S/ 32,457,630 22

Items : 1

Lima a los diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil catorce

Observaciones :

NINGUNA

**Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:
www.osce.gob.pe**

**La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el
SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)**



131



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Trámite N°. 2014-06126601-LIMA - 18/12/2014 17:28:55

CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

N° 066799 - 2014

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU

NO se encuentra **Inhabilitado** para contratar con el Estado al **18/12/2014**

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

Entidad : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Proceso de Selección : ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA. N° : 38-2014-FONDEPES

Modalidad : PROCEDIMIENTO CLASICO

Monto : S/ 32,457,630.22

Items : 1

Lima a los dieciocho días del mes de Diciembre del dos mil catorce

Observaciones :

NINGUNA

***Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:
www.osce.gob.pe***

***La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el
SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)***



130



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Ministerio
de la Contratación
del Estado

Trámite N°. 2014-06129635-LIMA - 19/12/2014 11:21:43

CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Nº 066915 - 2014

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

CORPORACION ARIS S.A.C.

NO se encuentra **Inhabilitado** para contratar con el Estado al 19/12/2014

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

Entidad : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Proceso de Selección : ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA. Nº : 38-2014-FONDEPES

Modalidad : PROCEDIMIENTO CLASICO

Monto : S/ 32,457,630.22

Items : 1

Lima a los diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil catorce

Observaciones :

NINGUNA

***Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:
www.osce.gob.pe***

***La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el
SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)***





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

Trámite N°. 2014-06129644-LIMA - 19/12/2014 11:24:29

CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

N° 066920 - 2014

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

CORPORACION R&E S.A.C.

NO se encuentra **Inhabilitado** para contratar con el Estado al 19/12/2014

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

Entidad : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Proceso de Selección : ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA. N° : 38-2014-FONDEPES

Modalidad : PROCEDIMIENTO CLASICO

Monto : S/. 32,457,630.22

Items : 1

Lima a los diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil catorce

Observaciones :

NINGUNA

***Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:
www.osce.gob.pe***

***La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el
SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)***



**Constancia de
Capacidad de
libre contratación
(Copia)**



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzasde las Contrataciones
del Estado

Trámite Nº. 2014-06129625-LIMA - 19/12/2014 11:18:36

CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN**Nº 012600 - 2014**

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L, con:

Registro Nro: 08058 **Cap Máx Cont.:** S/. 125,000,000.00
Vigencia: 28/02/2015 **Dec. Record Obra**
Nº: 2014-5986356-LIMA (Fecha: 11/12/2014)

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :

S/. 87,137,000.00

(OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL Y 00/100Nuevos Soles)

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
Proceso de Selección : ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 38-2014-FONDEPES
Modalidad : PROCEDIMIENTO CLASICO
Monto : S/. 32,457,630.22 **Participación:** 58%
Items : 1
Obra : Construccion de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de San Jose, distrito de San Jose, provincia Lambayeque, Region Lamabayeque.

Lima a los diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil catorce

Observaciones :

NINGUNA

Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:
www.osce.gob.pe

La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el
SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)



126



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasOficina General de Contratación
del Estado

Trámite N°. 2014-06126595-LIMA - 18/12/2014 17:25:16

CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN**N° 012580 - 2014**

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU, con:

Registro Nro:	66429	Cap Máx Cont.:	S/. 456,733,000.00
Vigencia:	12/10/2015	Dec. Record Obra N°:	2014-5980148-LIMA (Fecha: 08/12/2014)

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :

S/. 443,051,000.00

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL Y 00/100Nuevos Soles)

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

Entidad:	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		
Proceso de Selección :	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES		
Modalidad :	PROCEDIMIENTO CLASICO		
Monto :	S/. 32,457,630.22	Participación:	40%
Items :	1		
Obra :	Ejecucion de la obra: Construccion de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de San Jose, distrito de San Jose, provincia Lambayeque, Region Lamabayeque.		

Lima a los dieciocho días del mes de Diciembre del dos mil catorce

Observaciones :

NINGUNA

***Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:
www.osce.gob.pe***

***La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el
SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)***





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

del Estado

Trámite N°. 2014-06129619-LIMA - 19/12/2014 11:17:04

CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN**N° 012598 - 2014**

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

CORPORACION ARIS S.A.C., con:

Registro Nro:	22494	Cap Máx Cont.:	S/. 2,125,460.00
Vigencia:	09/08/2015	Dec. Record Obra N°:	2014-5986504-LIMA (Fecha: 11/12/2014)

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :

S/. 997,233.00

(NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES Y 00/100Nuevos Soles)

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

Entidad:	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		
Proceso de Selección :	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES		
Modalidad :	PROCEDIMIENTO CLASICO		
Monto :	S/. 32,457,630.22	Participación:	1%
Items :	1		
Obra :	Construccion de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de San Jose, distrito de San Jose, provincia Lambayeque, Region Lamabayeque.		

Lima a los diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil catorce

Observaciones :

NINGUNA

**Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:
www.osce.gob.pe****La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el
SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)**

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****Organismo
de las Contrataciones
del Estado**

Trámite N°. 2014-06129631-LIMA - 19/12/2014 11:20:09

CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN**N° 012601 - 2014**

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

CORPORACION R&E S.A.C., con:

Registro Nro: 15743 **Cap Máx Cont.:** S/. 2,771,960.00
Vigencia: 08/09/2015 **Dec. Record Obra N°:** 2014-5993087-LIMA (Fecha: 15/12/2014)

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :

S/. 1,518,660.00

(UN MILLON QUINTENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 00/100Nuevos Soles)

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
Proceso de Selección : ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES
Modalidad : PROCEDIMIENTO CLASICO
Monto : S/. 32,457,630.22 **Participación:** 1%
Items : 1
Obra : Construccion de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de San Jose, distrito de San Jose, provincia Lambayeque, Region Lamabayeque.

Lima a los diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil catorce

Observaciones :

NINGUNA

***Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:
www.osce.gob.pe******La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el
SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)***

Carta de fiel Cumplimiento (Copia)

LIMA, 29 de Noviembre del 2018

Carta Fianza No:

010469195-006

REF: Carta Fianza No: 010469195-005 del 19/12/2014
Con vencimiento: 15/12/2018

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES.

Por el presente documento, renovamos la fianza de la referencia con carácter de solidaria, irrevocable, incondicional, indivisible, de realización automática y con renuncia expresa al beneficio de excusión, a favor de ustedes.

Garantizando a:

CONSEJO BAN JOSE INTERBAJO POR: CLUB CLUB SUZUGSA PERU, GRUPO DE INYANAK E.I.R.L., CORPORACION AKIS S.A.C., CORPORACION R & E S.A.C.

Hasta la suma de:

S/ *****298.305,21 UN MILLON DIOCENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO Y 21/100 SOLES

En respaldo de:

CAMANIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS EN LA ADJUDICACION DE MENOR CANTIDAD NO 038-2014-FONDEPES-DEMANDA DE LA INSTITUCION PUBLICA NO 004-2014-FONDEPES PRIMERA CONVOCATORIA-DIVISION DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSEJO BANJO DIRECTO DE SAN JOSE, INTERBAJO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE.

Sírvase a tomar nota de que: a solicitud de nuestros garantizados, hemos procedido a:

Prorrogar el plazo de vencimiento hasta el 15 de Diciembre del 2019

Por efecto de este compromiso, el BANCO asume con sus fiados las responsabilidades en que éstos llegaran a incurrir, siempre que el monto de las mismas no exceda por ningún motivo la suma antes mencionada y que estén estrictamente vinculadas al cumplimiento de lo arriba indicado.

Dejamos claramente establecido que la presente CARTA FIANZA no podrá ser usada para operaciones comprendidas en la prohibición indicada en el inciso 5 del Artículo 217º de la ley 26702 "Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros"

Cualquier reclamo en virtud de esta garantía deberá ceñirse a lo estipulado por el Art. 1898 del Código Civil y deberá ser formulado por vía notarial, en el horario de atención al público y en nuestra oficina ubicada en:

AV. LAMAMBA 543-547 PISOS - LIMA *****

Dejamos claramente expuesto que, si fuera el caso, el Banco podrá a su elección acogerse a la facultad de rescisión por el Art. 1237 del Código Civil.

En caso de ejecutarse la presente CARTA FIANZA, el pago será efectuado mediante cheque de gerencia emitido a la orden del beneficiario que el Banco pondrá a su disposición en domicilio antes indicado, el mismo que se le entregará contra devolución del original de la presente CARTA FIANZA. Queda establecido que de no señalarse el monto ejecutado, se entenderá que el requerimiento es por la suma total a la que asciende la presente garantía. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe, se entenderá como renuncia a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago aún cuando el plazo de vencimiento y/o ejecución de esta fianza no hubiese vencido.

ROBERTO VALDIZANGARFIA
Asistente Senior
Procesamiento

FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO

p. SCOTIABANK PERU

Atentamente,

EL GUEREN CAVALIARI
SIRGEBALLO DE LEPE
SCOTIABANK PERU

* Para información sobre la emisión de esta CARTA FIANZA, puede visitar nuestra página web www.scotiabank.com.pe o consultar a través de Banca telefónica 311-8000 (Lima) y 0-800-116000 (Provincias)

BE CHACARILLA
AV. PRIMAVERA 1050
STGO. DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA

CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE

SANTIAGO DE SURCO 31.07.2019

CARTA FIANZA N° 00110380-980207198-37

VENCE EL 07-08-2020

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración

REF. : Carta Fianza Nro 00110380-980207198-37 por el monto de **S/8,618.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 SOLES)**

Por cuenta de **CONSORCIO SAN JOSE** conformado por **CHAVIN DE HUANTAR EIRL CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU CORPORACION ARIS SAGY CORPORACION R&E SAC**

Vencimiento : **07-08-2019, a horas de 12 meridiano**

Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 10-12-2016 por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de **CONSORCIO SAN JOSE** conformado por: **CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC**.

Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : **PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2020, a horas 12 meridiano.**

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado sólo el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Carla Lozano Torres
Sub Gerente BE
Banco Empress Chacarilla

Atentamente

BANCO CONTINENTAL

P. Doe

Unidad de Trámite de Crédito
CIVIL
CIP 1063105



19073104

RUC 20100130204

REFRENDO: 1759819073104CLA0380H/13:59:06

S/ 8,618.00

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

BE CHACARILLA
AV. PRIMAVERA 1050
STGO.DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE

SANTIAGO DE SURCO 31.07.2019

CARTA FIANZA N. 0011-0962-9800028996-88

VENCE EL 07-08-2020

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0962-9800028996-88 por S/32,647.00 (TREINTAIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC

Vencimiento : 07-08-2019, a horas de 12 meridiano

Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 09-09-2016 por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC.

Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2020, a horas 12 meridiano.

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza se mantienen vigentes al haberse modificado solo el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicada en AV. PRIMAVERA 1050 o 5588 Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro

Sin otro particular, quedamos de Bds.

Carla Lobato Torres
Sub Gerente BE

Banca Empresas Chacarilla

BANCO CONTINENTAL

TRUJILLO
CIP 63105



19073102

RUC 20100130204

REFRENDO: 1759819073102CLA0962F/13.31:44

S/ 32,647.00

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

S/ 32,647.00



BE CHACARILLA
AV. PRIMAVERA 1050
STGO. DE SURCO

CARTA FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA

CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE.

SANTIAGO DE SURCO 13/07/2019

CARTA FIANZA N° 0011-0962-9800017158-87

VENGE EL 07-08-2020

Señor/es:

★ **FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**

Ciudad

De nuestra consideración

REF.: Carta Fianza Nro. 0011-0962-9800017158-87, por S/ 1,947,458.00 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES)

Por cuenta de **CONSORCIO SAN JOSE** conformado por **CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU CORPORATION ARIS SAC Y CORPORATION R&E SAC.**

Vencimiento: 07-08-2019, a horas de 12 meridiano

S/1,947,458.00

Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 16-12-2014, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de **CONSORCIO SAN JOSE** conformado por **CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORATION ARIS SAC Y CORPORATION R&E SAC.**

Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a: **PRORROGAR** el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el **07-08-2020**, a horas 12 meridiano.

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza se mantienen vigentes al haberse modificado solo el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055, San Isidro.

★ Sin otro particular, quedamos de Uds.

Carta Lohana Torres
Sub Gerente BE
Banca Empresas Chacarilla

Atentamente
BANCO CONTINENTAL

[Signature]
ING. J. TRUJILLO
ING. J. TRUJILLO
ING. J. TRUJILLO



19073103

RUC 20100130204

REFRENDO: 1759819073103CLA0962G/13:44:56
S/ 1,947,458.00

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

BE CHACARILLA
AV. PRIMAVERA 1050
STGO.DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE.

SANTIAGO DE SURCO 11.07.2019

CARTA FIANZA N° 0011-0880-9800271322-37

VENDE EL 07-08-2020

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración:

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0880-9800271322-37 por S/57,863.50 (CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 50/100 SOLES)

Por cuenta de CONSORCIO SAN JOSÉ conformado por CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC Y CORPORACION R&E SAC.

Vencimiento : 07-08-2019, a horas de 12 meridiano

S/57,863.50

Nos referimos a la Carta Fianza de la referenciada la cual fue emitida el 25-07-2016, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de CONSORCIO SAN JOSÉ conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC Y CORPORACION R&E SAC.

Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2020, a horas 12 meridiano.

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza se mantienen vigentes al haberse modificado solo el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3056 San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente
BANCO CONTINENTAL

Carta Lizano Torres
Sub Gerente BE
Banco Empress Chacarilla

PRO CIVIL
CIP 63105



RUC 20100130204

REFRENDO: 1759819073105CLA03801/14:03:24
S/ 57,863.50

UA011 - V5 - Junio 2019

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

Póliza de seguro complementario por trabajo de riesgo y salud

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud No. 7021800031751, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/09/2019 hasta el 30/09/2019, con las coberturas de Salud por Trabajo de Riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

ASEGURADO(S)

1 DNI 47158526 CHAPILLIQUEN FIESTAS ANGELICA

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

15/09/2019 05:29:10 pm
PERALTA FONTIS, JOSE



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

Christian Luisa Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD

NÚMERO DE PÓLIZA : 7021800031751

RECIBO : 107447200

CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE
 RUC : 20600000439
 Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,
 Actividad : 500004 - ACONDICIONAMEN. DE EDIFICIOS
 Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia : 01/04/2019 Vencimiento : 01/04/2020
 Inicio de Vigencia Aplicación : 01/09/2019 Vencimiento de Aplicación : 30/09/2019
 Forma de Pago : MENSUAL Último día de Pago : 25/09/2019
 Moneda : SOLES
 Fecha de Emisión : 15/09/2019

IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
TRABAJADORES ALTO RIESGO	1	930.00	0.65	6.05

Prima Neta : 20.00
 Der.Emis. : 0.00
 Interés : 0.00
 IGV : 3.60
Prima Total : 23.60


El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.



[Handwritten Signature]
 Christ...
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 63105



MAPFRE

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TELS. 213-9161 FAX 213-9144

RUC 20517182673
FACTURA ELECTRONICA
F050 - 00013622

FECHA EMISION 16/09/2019

CANCELADO 16/09/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

TIPO DOCUMENTO RUC

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

CONTRATO : 7021800031751

MONEDA : Soles

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	ASESOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2019	30/09/2019		1412-Peralta Fontis Jose Luis	Escardo
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ct Cancelacion Recibo 107447200</i>				
<i>Prima Comercial</i>				20.00
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				3.60
<i>Importe Total</i>				S/ *****23.60
<i>Son . Veintitres Y 60/100 Soles</i>				

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:
EMITIDO POR: INTBBVA 14:34:42

Th7A4tYqmFcuwiVWOB9lxgdB/FU=

*Para consultar sus comprobantes electrónicos, por favor ingresar al portal de consulta:
<https://produccion.fexfacturacion.pe/FEXCONSULTA>*

Christina...
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 63105

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) esta(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Pensiones No. 7011510200116, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/09/2019 hasta el 30/09/2019, con las coberturas de Invalidez, Sobrevivencia y Sepelio según la ley N° 26790 y normas complementarias.

ASEGURADO(S)
1 DNI 47158526 CHAPILLIQUEN FIESTAS ANGELICA

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

15/09/2019 05:32:48 pm
PERALTA FONTIS, JOSE



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

CONSORCIO SAN JOSE
INCEPES CIVIL
CIP N° 63105

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIONES

NÚMERO DE PÓLIZA : 7011510200116

RECIBO : 107447201

CONDICIONES PARTICULARES

Contraente : CONSORCIO SAN JOSE
 RUC : 20600000439
 Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,
 Actividad : 500004 - ACONDICIONAMEN. DE EDIFICIOS
 Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia : 01/02/2019 Vencimiento : 01/02/2020
 Inicio de Vigencia Aplicación : 01/09/2019 Vencimiento de Aplicación : 30/09/2019
 Forma de Pago : MENSUAL Último día de Pago : 25/09/2019
 Moneda : SOLES
 Fecha de Emisión : 15/09/2019

IMPORTE DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
EMPLEADOS ALTO RIESGO	1	930.00	0.65	6.05

Prima Neta : 20.00
 Der.Emis. : 0.60
 Interés : 0.00
 IGV : 3.71
Prima Total : 24.31

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:


Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos. (Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.



CONSORCIO SAN JOSE



Christina Inés Frigoli
 INGE. EN CIVIL
 CIP Nº 63105



MAPFRE

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

RUC 20418896915
FACTURA ELECTRONICA

F050 - 00013135

FECHA EMISION 16/09/2019

CANCELADO 16/09/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

TIPO DOCUMENTO *RUC*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA : 7011510200116

MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2019	30/09/2019		1412-Peralta Fontis Jose Luis	Escardo
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 107447201</i>				
<i>Prima Comercial</i>				20.60
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				3.71
<i>Importe Total</i>				S/ *****24.31
<i>Son : Veinticuatro Y 31/100 Soles</i>				

SIRVA SE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:

GBJ2+ VJMwnL4FeRjXGQAzkyyMLc=

EMITIDO POR: INTBBVA 14.37:31

Para consultar sus comprobantes electrónicos, por favor ingresar al portal de consulta:
<https://produccion.fexfacturacion.pe/FEXCONSULTA>

[Handwritten signature]
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

CONSORCIO SAN JOSE

2019/09/16 16:08:29

Pago de Instituciones


SU OPERACIÓN HA SIDO REALIZADA

Número de Operación	279963-0
Operación	Pago de Instituciones
Usuario(s) que autoriza(n)	VANESSA ZAMUDIO LOARTE
Número de Cuenta de Cargo	0011-0962-0100002931
Nombre de la Entidad	MAPFRE SOLES
DNI/RUC/C. EXTRANJERIA	20600000439
Nombre	CONSORCIO SAN JOSE
Monto a cargar	47.91 SOLES
Monto Cargado	47.91 SOLES
Fecha / hora de 1ra Firma	16/09/2019 - 16:09:04

Detalle de Pagos

CONCEPTO DE PAGO	Fec.Vcmto	Moneda	Importe
T02RE107447201	2019-09-01	SOLES	24.31
T03RE107447200	2019-09-01	SOLES	23.60

Estimado Cliente su operación ha sido efectuada. Por favor tome nota del número de Operación.

Emist. en el Incubio
 INCUBIO CIVIL
 CIP 12 63105

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud No. 7021800031751, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/09/2019 hasta el 30/09/2019, con las coberturas de Salud por Trabajo de Riesgo según la ley N° 25790 y normas complementarias.

ASEGURADO(S)

1 DNI 48300296 ACOSTA GALAN AUGUSTO ALEXANDER

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

12/09/2019 10:26:03 am

SUSAN GONZALES PACHECO



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

INGENIERO CIVIL
CIP N° 63195

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD

NÚMERO DE PÓLIZA : 7021800031751

RECIBO : 107369451

CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE
 RUC : 20600000439
 Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,
 Actividad : 500004 - ACONDICIONAMIEN. DE EDIFICIOS
 Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia	: 01/04/2019	Vencimiento	: 01/04/2020
Inicio de Vigencia Aplicación	: 01/09/2019	Vencimiento de Aplicación	: 30/09/2019
Forma de Pago	: MENSUAL	Último día de Pago	: 22/09/2019
Moneda	: SOLES		
Fecha de Emisión	: 12/09/2019		

IMPORTE DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
TRABAJADORES ALTO RIESGO	1	1000.00	0.65	6.50

Prima Neta :	20.00
Der.Emis. :	0.00
Interés :	0.00
IGV :	3.60
Prima Total :	23.60


El presente documento no constituye un comprobante de pago.


Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos. (Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.




 Cristhina María Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 63105



MAPFRE

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - T.L.F.S. 213-9161 FAX 213-9144

RUC 20517182673
FACTURA ELECTRONICA
F050 - 00013468

FECHA EMISION 14/09/2019

CANCELADO 14/09/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

TIPO DOCUMENTO *RUC*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

CONTRATO : 7021800031751 MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	ASESOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2019	30/09/2019		1412-Peralta Fontis Jose Luis	Escardo
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 107369451</i>				
<i>Prima Comercial</i>				20.00
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				3.60
<i>Importe Total</i>				S/ *****23.60
<i>Son : Veintitres Y 60/100 Soles</i>				

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:

nC9tavineIaZHVEtERIGJjcb7g=

EMITIDO POR: INTBBVA 09:31:34

*Para consultar sus comprobantes electrónicos, por favor ingresar al portal de consulta:
https://produccion.fexfacturacion.pe/FEXCONSULTA*

Cristina Patricia Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 63105

MP/2019/4263153

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) esta(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Pensiones No. 7011510200116, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/09/2019 hasta el 30/09/2019, con las coberturas de Invalidez, Supervivencia y Sepelio según la ley N° 26790 y normas complementarias.

ASEGURADO(S)
1 DNI 48300296 ACOSTA GALAN AUGUSTO ALEXANDER

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

12/09/2019 10:25:54 am
SUSAN GONZALES PACHECO



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

Christina...
INCL. PRO CIVIL
CIP N° 63105

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIONES

NÚMERO DE PÓLIZA : 7011510200116

RECIBO : 107369444

CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE
 RUC : 20600000439
 Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET.
 Actividad : 500004 - ACONDICIONAMEN. DE EDIFICIOS
 Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia : 01/02/2019 Vencimiento : 01/02/2020
 Inicio de Vigencia Aplicación : 01/09/2019 Vencimiento de Aplicación : 30/09/2019
 Forma de Pago : MENSUAL Último día de Pago : 22/09/2019
 Moneda : SOLES
 Fecha de Emisión : 12/09/2019

IMPORTE DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
EMPLEADOS ALTO RIESGO	1	1000.00	0.65	6.50

Prima Neta : 20.00
 Der.Emis. : 0.60
 Interés : 0.00
 IGV : 3.71
Prima Total : 24.31



El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

MAPFRE PERU
 INGE. CIVIL
 CIPN° 63105



MAPFRE

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

RUC 20418896915
FACTURA ELECTRONICA
F050 - 00012990

FECHA EMISION 14/09/2019

CANCELADO 14/09/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

TIPO DOCUMENTO *RUC*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina Iera Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA : 7011510200116

MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2019	30/09/2019		1412-Peralta Fontis Jose Luis	Escardo
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ct Cancelacion Recibo 107369444</i>				
<i>Prima Comercial</i>				
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				20.60
<i>Importe Total</i>				3.71
<i>Son : Veinticuatro Y 31/100 Soles</i>				S/ *****24.31

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:
EMITIDO POR: INTBBVA 09:37:41

nQRS2o5N3WU/dgGLFnth7VFbyD0=

*Para consultar sus comprobantes electrónicos, por favor ingresar al portal de consulta:
<https://produccion.fexfacturacion.pe/FEXCONSULTA>*

INGENIERIA CIVIL
CIPN.º 63195

MP/2019/4263180

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Poliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Pensiones No. 7011510200116, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/09/2019 hasta el 30/09/2019, con las coberturas de Invalidez, Supervivencia y Sepelio según la ley N° 26790 y normas complementarias.

ASEGURADO(S)

- 1 DNI 05364924 ESCOBEDO HUANCHO AMILTON GUILLES
- 2 DNI 44800515 FARRO DE LA CRUZ ALBERTO

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

12/09/2019 10:31:35 am
SUSAN GONZALES PACHECO



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIONES

NÚMERO DE PÓLIZA : 7011510200116

RECIBO : 107369652

CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE
 RUC : 20600000439
 Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,
 Actividad : 500004 - ACONDICIONAMIEN. DE EDIFICIOS
 Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia : 01/02/2019 Vencimiento : 01/02/2020
 Inicio de Vigencia Aplicación : 01/09/2019 Vencimiento de Aplicación : 30/09/2019
 Forma de Pago : MENSUAL Último día de Pago : 22/09/2019
 Moneda : SOLES
 Fecha de Emisión : 12/09/2019

IMPORTE DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
EMPLEADOS ALTO RIESGO	2	2876.00	0.65	18.69

Prima Neta : 20.00
 Der.Emis. : 0.60
 Interés : 0.00
 IGV : 3.71
Prima Total : 24.31



El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos. (Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

MAPFRE SEGUROS TRAFIC
 INCORPORADO CIVIL
 CIP Nº 03105



MAPFRE

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
AV. 26 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

RUC 20418896915
FACTURA ELECTRONICA

F050 - 00012989

FECHA EMISION 14/09/2019

CANCELADO 14/09/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

TIPO DOCUMENTO *RUC*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA : 7011510200116 MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2019	30/09/2019		<i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i>	<i>Escardo</i>
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ct Cancelacion Recibo 107369652</i>				
<i>Prima Comercial</i>				20.60
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				3.71
<i>Importe Total</i>				S/ *****24.31
<i>Son : Veinticuatro Y 31/100 Soles</i>				

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:
EMITIDO POR: INTBBVA 09:36:15

MNGF1htrG11CzN8v0FpQhezvww=

*Para consultar sus comprobantes electrónicos, por favor ingresar al portal de consulta:
<https://produccion.fexfacturacion.pe/FEXCONSULTA>*

[Handwritten signature]
Circ. de Inscripción
INSTRUMENTO CIVIL
CIR. N° 63195

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) esta(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud No. 7021800031751, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/09/2019 hasta el 30/09/2019, con las coberturas de Salud por Trabajo de Riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

ASEGURADO(S)

1 DNI	05364924	ESCOBEDO HUANCHO AMILTON GUILLES
2 DNI	44800515	FARRO DE LA CRUZ ALBERTO

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

12/09/2019 10:31:16 am
SUSAN GONZALES PACHECO



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

Unidad de Riesgos del Trabajo
INCEP - INCES - INCIVIL
CIP N° 63105

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD

NÚMERO DE PÓLIZA : 7021800031751

RECIBO : 107369651

CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE
 RUC : 20600000439
 Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,
 Actividad : 500004 - ACONDICIONAMIEN DE EDIFICIOS
 Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia	: 01/04/2019	Vencimiento	: 01/04/2020
Inicio de Vigencia Aplicación	: 01/09/2019	Vencimiento de Aplicación	: 30/09/2019
Forma de Pago	: MENSUAL	Último día de Pago	: 22/09/2019
Moneda	: SOLES		
Fecha de Emisión	: 12/09/2019		

IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
TRABAJADORES ALTO RIESGO	2	2876.00	0.65	18.69

Prima Neta :	20.00
Der.Emis. :	0.00
Interés :	0.00
IGV :	3.60
Prima Total :	23.60


El presente documento no constituye un comprobante de pago.


Instrucciones de pago:


Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos. (Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.




 Christian ...
 INCEP ...
 CIP N° 63105



CONSORCIO SAN JOSE

2019/09/14 12:19:53

Pago de Instituciones

SU OPERACIÓN HA SIDO REALIZADA

Número de Operación	775005-0
Operación	Pago de Instituciones
Usuario(s) que autoriza(n)	VANESSA ZAMUDIO LOARTE
Número de Cuenta de Cargo	0011-0962-0100002931
Nombre de la Entidad	MAPFRE SOLES
DNI/RUC/C. EXTRANJERIA	20600000439
Nombre	CONSORCIO SAN JOSE
Monto a cargar	95.82 SOLES
Monto Cargado	95.82 SOLES
Fecha / Hora de 1ra Firma	14/09/2019 - 12:20:50

Detalle de Pagos

CONCEPTO DE PAGO	Fec.Vcmto	Moneda	Importe
T03RE107369451	2019-09-01	SOLES	23.60
T02RE107369652	2019-09-01	SOLES	24.31
T02RE107369444	2019-09-01	SOLES	24.31
T03RE107369651	2019-09-01	SOLES	23.60

Estimado Cliente, su operación ha sido efectuada. Por favor, tome nota del Número de Operación

Christ. ...
 INCO ... CIVIL
 CIP N° 63195

MP/2019/4237533



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud No. 7021800031751, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/09/2019 hasta el 30/09/2019, con las coberturas de Salud por Trabajo de Riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

ASEGURADO(S)

1 DNI	46549805	ALVAREZ SOTO JORGE WILTON
2 DNI	62637707	AREVALO VERGARAY JOSE YOWER
3 DNI	46709771	CAMACHO ROJAS CENIN
4 DNI	42589975	CORONEL RAMIREZ JOSE WILSON
5 DNI	44305539	LLONTOP ACOSTA BALTAZAR
6 DNI	41067672	LLONTOP ACOSTA JUAN MANUEL
7 DNI	42344204	LOZANO CARRASCO EVER
8 DNI	44743366	LOZANO CARRASCO JOSE NEIRO
9 DNI	06241422	MUÑOZ CONDORI LEONIDAS VIDAL
10 DNI	44214246	RODAS MORI DANNY GABRIEL
11 DNI	10515950	ROJAS QUISPE ROMULO
12 DNI	10233838	RUBIO FLORES JULIO
13 DNI	47509013	RUBIO HUARCAYA JULIO CESAR
14 DNI	76763583	SANCHEZ GALAN AURORA LISBET
15 DNI	42543130	SOLAR HUAROTO JERRY EDGAR
16 DNI	70803088	TERRONES ALDAMAS LUIS ALBERTO
17 DNI	45790258	TERRONES HERRERA MARCO ANTONIO



Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

31/08/2019 09:13:37 am
CONSORCIO SAN JOSE

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

INSE
CIP N° 63105

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.



SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD

NÚMERO DE PÓLIZA : 7021800031751

RECIBO : 107147372

CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE
RUC : 20600000439
Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,
Actividad : 500004 - ACONDICIONAMEN. DE EDIFICIOS
Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia : 01/04/2019 **Vencimiento** : 01/04/2020
Inicio de Vigencia Aplicación : 01/09/2019 **Vencimiento de Aplicación** : 30/09/2019
Forma de Pago : MENSUAL **Último día de Pago** : 11/09/2019
Moneda : SOLES
Fecha de Emisión : 31/08/2019

IMPORTE DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
TRABAJADORES ALTO RIESGO	17	36117.00	0.65	234.76

Prima Neta : 234.76
Der.Emis. : 0.00
Interés : 0.00
IGV : 42.26

Prima Total : 277.02

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos. (Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

Christiana Patricia Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP Nº 63195



MAPFRE

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF. 213-9161 FAX 213-9144

RUC 20517182673
FACTURA ELECTRONICA

F050 - 00011729

FECHA EMISION 05/09/2019

CANCELADO 05/09/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

TIPO DOCUMENTO *RUC*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

CONTRATO : 7021800031751

MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	ASESOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2019	30/09/2019		1412-Peralta Fontis Jose Luis	Escardo

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Ct Cancelacion Recibo 107147372</i>	
<i>Prima Comercial</i>	234.76
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>	42.26
<i>Importe Total</i>	S/ *****277.02
<i>Son : Doscientos Setenta Y Siete Y 02/100 Soles</i>	

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:

EMITIDO POR: INTBBVA 15:44:14

*Para consultar sus comprobantes electrónicos, por favor ingresar al portal de consulta:
<https://produccion.fexfacturacion.pe/FEXCONSULTA>*

1412-Peralta Fontis Jose Luis
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
CIE 12 63195

MP/2019/4237521



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Pensiones No. 7011510200116, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/09/2019 hasta el 30/09/2019, con las coberturas de Invalidez, Supervivencia y Sepelio según la ley N° 26790 y normas complementarias.

ASEGURADO(S)
1 DNI 41220259 HUAMAN PORLLES JHONNY ALAN

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

31/08/2019 09:06:55 am
, CONSORCIO SAN JOSE



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

Christina María Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63195

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.



SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIONES

NÚMERO DE PÓLIZA : 7011510200116 RECIBO : 107147348

CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE
RUC : 20600000439
Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,
Actividad : 500004 - ACONDICIONAMEN. DE EDIFICIOS
Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia : 01/02/2019 Vencimiento : 01/02/2020
Inicio de Vigencia Aplicación : 01/09/2019 Vencimiento de Aplicación : 30/09/2019
Forma de Pago : MENSUAL Último día de Pago : 11/09/2019
Moneda : SOLES
Fecha de Emisión : 31/08/2019

IMPORTE DE LA DECLARACIÓN

Table with 5 columns: Categoría, Nro.Aseg., Monto Base, Tasa, Prima Resultante. Row 1: EMPLEADOS ALTO RIESGO, 1, 6000.00, 0.65, 39.00

Prima Neta : 39.00
Der.Emis. : 1.17
Interés : 0.00
IGV : 7.23
Prima Total : 47.40

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

Handwritten signature and stamp area on the left.

Handwritten signature and stamp area on the right, including 'INGENIERO CIVIL' and 'CIP 1463105'.



MAPFRE

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TELS. 213-9161 FAX 213-9144

RUC 20418896915
FACTURA ELECTRONICA
F050 - 00011292

FECHA EMISION 05/09/2019

CANCELADO 05/09/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

TIPO DOCUMENTO *RUC*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA : 7011510200116 MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2019	30/09/2019		<i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i>	<i>Escardo</i>
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ct Cancelacion Recibo 107147348</i>				
<i>Prima Comercial</i>				40.17
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				7.23
<i>Importe Total</i>				S/ *****47.40
<i>Son : Cuarenta Y Siete Y 40/100 Soles</i>				

SIRVA SE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:

EMITIDO POR INTBBVA 15:50:52

*Para consultar sus comprobantes electrónicos, por favor ingresar al portal de consulta:
<https://produccion.fexfacturacion.pe/FEXCONSULTA>*

INTBBVA
CIP 1703105

MP/2019/4237539



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud No. 7021800031751, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/09/2019 hasta el 30/09/2019, con las coberturas de Salud por Trabajo de Riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

ASEGURADO(S)

1 DNI 41220259 HUAMAN PORLLES JHONNY ALAN

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

31/08/2019 09:16:31 am
CONSORCIO SAN JOSE



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD

NÚMERO DE PÓLIZA : 7021800031751

RECIBO : 107147383

CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE
 RUC : 20600000439
 Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,
 Actividad : 500004 - ACONDICIONAMIEN. DE EDIFICIOS
 Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia : 01/04/2019 Vencimiento : 01/04/2020
 Inicio de Vigencia Aplicación : 01/09/2019 Vencimiento de Aplicación : 30/09/2019
 Forma de Pago : MENSUAL Último día de Pago : 11/09/2019
 Moneda : SOLES
 Fecha de Emisión : 31/08/2019

IMPORTE DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
TRABAJADORES ALTO RIESGO	1	6000.00	0.65	39.00

Prima Neta : 39.00
 Der.Emis. : 0.00
 Interés : 0.00
 IGV : 7.02
Prima Total : 46.02


El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos. (Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

[Stamp: Oficina Trámites, INDI, CIVIL, CIP 63105]



MAPFRE

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

RUC 20517182673
FACTURA ELECTRONICA

F050 - 00011728

FECHA EMISION 05/09/2019

CANCELADO 05/09/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

TIPO DOCUMENTO RUC

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

CONTRATO : 7021800031751 MONEDA : Soles

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	ASESOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2019	30/09/2019		1412-Peralta Fontis Jose Luis	Escardo
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ct Cancelacion Recibo 107147383</i>				
<i>Prima Comercial</i>				39.00
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				7.02
<i>Importe Total</i>				S/ *****46.02
<i>Son : Cuarenta Y Seis Y 02/100 Soles</i>				

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:

EMITIDO POR: INTBBVA 15:45:21

*Para consultar sus comprobantes electrónicos, por favor ingresar al portal de consulta:
<https://produccion.fexfacturacion.pe/FEXCONSULTA>*

Escardo
CHRISTOPHER ESCARDO TRUJILLO
INGENIERO CIVIL
CIP 1763195

MP/2019/4237518



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Pensiones No. 7011510200116, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/09/2019 hasta el 30/09/2019, con las coberturas de Invalidez, Sobrevivencia y Sepelio según la ley N° 26790 y normas complementarias.

ASEGURADO(S)

1 DNI	46549805	ALVAREZ SOTO JORGE WILTON
2 DNI	62637707	AREVALO VERGARAY JOSE YOWER
3 DNI	46709771	CAMACHO ROJAS CENIN
4 DNI	42589975	CORONEL RAMIREZ JOSE WILSON
5 DNI	44305539	LLONTOP ACOSTA BALTAZAR
6 DNI	41067672	LLONTOP ACOSTA JUAN MANUEL
7 DNI	42344204	LOZANO CARRASCO EVER
8 DNI	44743366	LOZANO CARRASCO JOSE NEIRO
9 DNI	06241422	MUÑOZ CONDORI LEONIDAS VIDAL
10 DNI	44214246	RODAS MORI DANNY GABRIEL
11 DNI	10515950	ROJAS QUISPE ROMULO
12 DNI	10233838	RUBIO FLORES JULIO
13 DNI	47509013	RUBIO HUARCAYA JULIO CESAR
14 DNI	76763583	SANCHEZ GALAN AURORA LISBET
15 DNI	42543130	SOLAR HUAROTO JERRY EDGAR
16 DNI	70803088	TERRONES ALDAMAS LUIS ALBERTO
17 DNI	45790258	TERRONES HERRERA MARCO ANTONIO



Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

31/08/2019 09:04:24 am
CONSORCIO SAN JOSE

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

Christina Patricia Trujillo
Ingeniera Civil
CIP N° 63105

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.



SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIONES

NÚMERO DE PÓLIZA : 7011510200116

RECIBO : 107147341

CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE
RUC : 20600000439
Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,
Actividad : 500004 - ACONDICIONAMEN. DE EDIFICIOS
Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia : 01/02/2019 Vencimiento : 01/02/2020
Inicio de Vigencia Aplicación : 01/09/2019 Vencimiento de Aplicación : 30/09/2019
Forma de Pago : MENSUAL Último día de Pago : 11/09/2019
Moneda : SOLES
Fecha de Emisión : 31/08/2019

IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
EMPLEADOS ALTO RIESGO	17	36117.00	0.65	234.76

Prima Neta : 234.76
Der.Emis. : 7.04
Interés : 0.00
IGV : 43.53

Prima Total : 285.33

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

Christian...
INCL...
CIP...



MAPFRE

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

RUC 20418896915
FACTURA ELECTRONICA

F050 - 00011291

FECHA EMISION 05/09/2019

CANCELADO 05/09/2019

CONTRATANTE : *Consorcio San Jose*

TIPO DOCUMENTO *RUC*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consorcio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA : 7011510200116 MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2019	30/09/2019		<i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i>	<i>Escardo</i>

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Ct Cancelacion Recibo 107147341</i>	
<i>Prima Comercial</i>	<i>241.80</i>
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>	<i>43.53</i>
<i>Importe Total</i>	<i>S/ *****285.33</i>
<i>Son : Doscientos Ochenta Y Cinco Y 33/100 Soles</i>	

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:

EMITIDO POR: INTBBVA 15:52:05

*Para consultar sus comprobantes electrónicos, por favor ingresar al portal de consulta:
<https://produccion.fexfacturacion.pe/FEXCONSULTA>*

Christina Elena Peralta
INGENIERO CIVIL
CIP 1263105

MP/2019/4237547



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud No. 7021800031751, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/09/2019 hasta el 30/09/2019, con las coberturas de Salud por Trabajo de Riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

ASEGURADO(S)

1 DNI	08606885	ESPINOZA ESCALANTE EDDY SOLANO
2 DNI	25760759	INCIO CARRILLO JULIO CESAR
3 DNI	18123353	MEZA TRUJILLO CHRISTIAN MARTIN
4 DNI	41297246	RETAMOZO MARTINEZ LUDWIG BENITO
5 DNI	32404167	TAPIA ROSAZZA RICHARD JAVIER



Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

31/08/2019 09:20:30 am
, CONSORCIO SAN JOSE

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

Christian Meza Trujillo
INGENIERO EN INGENIERIA CIVIL
CIP N° 63105

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD

NÚMERO DE PÓLIZA : 7021800031751

RECIBO : 107147399

CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE
RUC : 20600000439
Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,
Actividad : 500004 - ACONDICIONAMIEN. DE EDIFICIOS
Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia : 01/04/2019 **Vencimiento** : 01/04/2020
Inicio de Vigencia Aplicación : 01/09/2019 **Vencimiento de Aplicación** : 30/09/2019
Forma de Pago : MENSUAL **Último día de Pago** : 11/09/2019
Moneda : SOLES
Fecha de Emisión : 31/08/2019

IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
TRABAJADORES ALTO RIESGO	5	5000.00	0.65	32.50

Prima Neta : 32.50
Der.Emis. : 0.00
Interés : 0.00
IGV : 5.85
Prima Total : 38.35


El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos. (Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

Christina...
 INCE...
 CIP N° 63105



MAPFRE

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF. 213-9161 FAX 213-9144

RUC 20517182673
FACTURA ELECTRONICA
F050 - 00011727

FECHA EMISION 05/09/2019

CANCELADO 05/09/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

TIPO DOCUMENTO RUC

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

CONTRATO : 7021800031751

MONEDA : Soles

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	ASESOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2019	30/09/2019		<i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i>	<i>Escardo</i>

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 107147399</i>	
<i>Prima Comercial</i>	32.50
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>	5.85
<i>Importe Total</i>	S/ *****38.35
<i>Son : Treinta Y Ocho Y 35/100 Soles</i>	

SIRVA SE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:

EMITIDO POR: INTBBVA 15:42:37

*Para consultar sus comprobantes electrónicos, por favor ingresar al portal de consulta:
<https://produccion.fexfacturacion.pe/FEXCONSULTA>*

Christina...
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

MP/2019/4237523



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Pensiones No. 7011510200116, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/09/2019 hasta el 30/09/2019, con las coberturas de Invalidez, Sobrevivencia y Sepelio según la ley N° 26790 y normas complementarias.

ASEGURADO(S)

1 DNI 45612857 RUESTAS BARDALEZ JOHN STEVE

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

31/08/2019 09:09:06 am
, CONSORCIO SAN JOSE



.....
ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.



001

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIONES

NÚMERO DE PÓLIZA : 7011510200116

RECIBO : 107147351

CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE
RUC : 20600000439
Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,
Actividad : 500004 - ACONDICIONAMEN. DE EDIFICIOS
Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia : 01/02/2019 Vencimiento : 01/02/2020
Inicio de Vigencia Aplicación : 01/09/2019 Vencimiento de Aplicación : 30/09/2019
Forma de Pago : MENSUAL Último día de Pago : 11/09/2019
Moneda : SOLES
Fecha de Emisión : 31/08/2019

IMPORTE DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
EMPLEADOS ALTO RIESGO	1	4000.00	0.65	26.00

Prima Neta : 26.00
Der.Emis. : 0.78
Interés : 0.00
IGV : 4.82

Prima Total : 31.60

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

Cristina Patricia Trujillo
INSEGURO CIVIL
CIP 17 63105



MAPFRE

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

RUC 20418896915
FACTURA ELECTRONICA

F050 - 00011290

FECHA EMISION 05/09/2019

CANCELADO 05/09/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

TIPO DOCUMENTO RUC

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA : 7011510200116 MONEDA : Soles

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2019		30/09/2019	1412-Peralta Fontis Jose Luis	Escardo

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Ct Cancelacion Recibo 107147351</i>	
<i>Prima Comercial</i>	26.78
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>	4.82
<i>Importe Total</i>	S/ *****31.60
<i>Son : Treinta Y Un Y 60/100 Soles</i>	

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:
EMITIDO POR: INTBBVA 15:49:03

*Para consultar sus comprobantes electrónicos, por favor ingresar al portal de consulta:
<https://produccion.fexfacturacion.pe/FEXCONSULTA>*

Cristina...
INCENTIVO CIVIL
CIP N° 63105

MP/2019/4237543



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud No. 7021800031751, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/09/2019 hasta el 30/09/2019, con las coberturas de Salud por Trabajo de Riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

ASEGURADO(S)

1 DNI 45612857 RUESTAS BARDALEZ JOHN STEVE

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

31/08/2019 09:18:40 am
, CONSORCIO SAN JOSE



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD

NÚMERO DE PÓLIZA : 7021800031751

RECIBO : 107147391

CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE
RUC : 20600000439
Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,
Actividad : 500004 - ACONDICIONAMIEN. DE EDIFICIOS
Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia : 01/04/2019 **Vencimiento** : 01/04/2020
Inicio de Vigencia Aplicación : 01/09/2019 **Vencimiento de Aplicación** : 30/09/2019
Forma de Pago : MENSUAL **Último día de Pago** : 11/09/2019
Moneda : SOLES
Fecha de Emisión : 31/08/2019

IMPORTE DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
TRABAJADORES ALTO RIESGO	1	4000.00	0.65	26.00

Prima Neta : 26.00
Der.Emis. : 0.00
Interés : 0.00
IGV : 4.68
Prima Total : 30.68


El presente documento no constituye un comprobante de pago.


Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos. (Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.




Christian Estrella Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP 12 63105



MAPFRE

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

RUC 20517182673
FACTURA ELECTRONICA
F050 - 00011726

FECHA EMISION 05/09/2019

CANCELADO 05/09/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

TIPO DOCUMENTO *RUC*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

CONTRATO : 7021800031751

MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO:

DESDE	VIGENCIA	HASTA	ASESOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2019	30/09/2019	1412-Peralta Fontis Jose Luis		<i>Escardo</i>
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ct Cancelacion Recibo 107147391</i>				
<i>Prima Comercial</i>				26.00
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				4.68
<i>Importe Total</i>				S/ *****30.68
<i>Son : Treinta Y 68/100 Soles</i>				

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:

EMITIDO POR: INTBBVA 15:46:30

*Para consultar sus comprobantes electrónicos, por favor ingresar al portal de consulta:
<https://produccion.fexfacturacion.pe/FEXCONSULTA>*

Escardo
REG. MERCANTIL
CIPR 63195

BBVA

CONSORCIO SAN JOSE

Pago de Instituciones

2019/09/05 09:54:03


SU OPERACIÓN HA SIDO REALIZADA

Número de Operación	757709-0
Operación	Pago de Instituciones
Usuario(s) que autoriza(n)	VANESSA ZAMUDIO LOARTE
Número de Cuenta de Cargo	0011-0962-0100002931
Nombre de la Entidad	MAPFRE SOLES
DNI/RUC/C. EXTRANJERIA	20600000439
Nombre	CONSORCIO SAN JOSE
Monto a cargar	756.40 SOLES
Monto Cargado	756.40 SOLES
Fecha / Hora de 1ra Firma	05/09/2019 - 09:55:41

Detalle de Pagos

CONCEPTO DE PAGO	Fec.Vcmta	Moneda	Importe
T03RE107147391	2019-09-01	SOLES	30.68
T02RE107147351	2019-09-01	SOLES	31.60
T03RE107147399	2019-09-01	SOLES	38.35
T02RE107147341	2019-09-01	SOLES	285.33
T03RE107147383	2019-09-01	SOLES	46.02
T02RE107147348	2019-09-01	SOLES	47.40
T03RE107147372	2019-09-01	SOLES	277.02

Estimado Cliente, su operación ha sido efectuada. Por favor, tome nota del Número de Operación.


INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105


INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

MP/2019/4237526



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Pensiones No. 7011510200116, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/09/2019 hasta el 30/09/2019, con las coberturas de Invalidez, Supervivencia y Sepelio según la ley N° 26790 y normas complementarias.

ASEGURADO(S)

1 DNI	08606885	ESPINOZA ESCALANTE EDDY SOLANO
2 DNI	25760759	INCIO CARRILLO JULIO CESAR
3 DNI	18123353	MEZA TRUJILLO CHRISTIAN MARTIN
4 DNI	41297246	RETAMOZO MARTINEZ LUDWIG BENITO
5 DNI	32404167	TAPIA ROSAZZA RICHARD JAVIER



Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

31/08/2019 09:11:16 am
CONSORCIO SAN JOSE

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

CHRISTIAN MEZA TRUJILLO
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.



SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIONES

NÚMERO DE PÓLIZA : 7011510200116

RECIBO : 107147359

CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE
RUC : 20600000439
Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,
Actividad : 500004 - ACONDICIONAMIEN. DE EDIFICIOS
Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia : 01/02/2019 Vencimiento : 01/02/2020
Inicio de Vigencia Aplicación : 01/09/2019 Vencimiento de Aplicación : 30/09/2019
Forma de Pago : MENSUAL Último día de Pago : 11/09/2019
Moneda : SOLES
Fecha de Emisión : 31/08/2019

IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
EMPLEADOS ALTO RIESGO	5	5000.00	0.65	32.50

Prima Neta : 32.50
Der.Emis. : 0.98
Interés : 0.00
IGV : 6.03
Prima Total : 39.51

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos. (Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

Entidad: **Entidad: Entidad Trujillo**
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105



MAPFRE

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLFs. 213-9161 FAX 213-9144

RUC 20418896915
FACTURA ELECTRONICA

F050 - 00011294

FECHA EMISION 05/09/2019

CANCELADO 05/09/2019

CONTRATANTE : *Consorcio San Jose*

TIPO DOCUMENTO RUC

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consorcio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA : 7011510200116

MONEDA : Soles

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2019	30/09/2019		1412-Peralta Fontis Jose Luis	Escardo
CONCEPTO				IMPORTE
Ct Cancelacion Recibo 107147359				
Prima Comercial				
Impuesto Gral. A Las Ventas				33.48
Importe Total				6.03
Son : Treinta Y Nueve Y 51/100 Soles				S/ *****39.51

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:
EMITIDO POR: INTBBVA 15:53:18

Para consultar sus comprobantes electrónicos, por favor ingresar al portal de consulta:
<https://produccion.fexfacturacion.pe/FEXCONSULTA>

[Handwritten Signature]
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 63195

072



CONSORCIO SAN JOSE

2019/09/05 09:56:09

Pago de Instituciones

SU OPERACIÓN HA SIDO REALIZADA

Número de Operación	761879-0
Operación	Pago de Instituciones
Usuario(s) que autoriza(n)	VANESSA ZAMUDIO LOARTE
Número de Cuenta de Cargo	0011-0962-0100002931
Nombre de la Entidad	MAPFRE SOLES
DNI/RUC/C. EXTRANJERIA	20600000439
Nombre	CONSORCIO SAN JOSE
Monto a cargar	39.51 SOLES
Monto Cargado	39.51 SOLES
Fecha / Hora de 1ra Firma	05/09/2019 - 10:02:49

Detalle de Pagos

CONCEPTO DE PAGO	Fec.Vcmto	Moneda	Importe
T02RE107147359	2019-09-01	SOLES	39.51

Estimado Cliente, su operación ha sido efectuada. Por favor, tome nota del Número de Operación.

Cristian...
 INGENIERO CIVIL
 CIP N.º 63105

Rentas

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
 Número de Orden : 923839775
 Fecha de presentación : 13/09/2019

010

Datos de la Declaración:

RUC : 20600000439
 Nombre o Razón Social : CONSORCIO SAN JOSE
 Período : 201908
 Semana : 0
 Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Código	Descripción	Importe	Impuesto
1011	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 114,675	S/. 0
3031	RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 3,475	S/. 0
Total a Pagar		S/. 118,150	S/. 0

Sr. Contribuyente por el pago realizado se generaron Boletas

Usted ha realizado el pago parcial de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Período	Descripción	Importe
201908	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 72,675
201908	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

[Handwritten Signature]
 Cristian Alvaro Inguil
 INGENIERO CIVIL
 CIP Nº 63195

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 1662
Número de Orden : 923839776


000

Datos Generales:

RUC : 20600000439
Nombre o Razón Social : CONSORCIO SAN JOSE
Período : 201908
Tributo : 1011 - IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA
Código de Declaración Jurada Asociada :
Número de Orden de la Declaración Jurada Asociada : 923839775
Importe Pagado : S/. 42,000

Detalle de Pago:

Número de Operación SUNAT : 1012732455
Medio de Pago : Cargo en cuenta de detracciones - cuenta convencional
Banco : Banco de la Nación
Número de Operación : 00000000001012732455
Fecha de Pago : 13/09/2019 16:41:57



Christina A. Torres Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63103


Constancia de Pago

Pago Varios - Formulario 1662

Número de orden : 751757625

008

RUC : 20600000439
Razón social : CONSORCIO SAN JOSE
Periodo : 08/2019
Indicador de pago : 1 Tributo
Tributo : 1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA
Importe pagado : S/. 72,675
Número de operación: 000168595291
Tipo de pago: Pago con cargo en cuenta bancaria
Banco: BBVA BANCO CONTINENTAL
Número de operación 0000000000000004389
Fecha de operación bancaria: 13/09/2019 17:03:57



Christina María Freije
INSCRIPCIÓN CIVIL
CIP 1263195

Identificación de la Transacción:


Número de Formulario : 1662
Número de Orden : 923839823

Datos Generales:

RUC : 20600000439
Nombre o Razón Social : CONSORCIO SAN JOSE
Período : 201908
Tributo : 3031 - RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA. PROPIA
Código de Declaración Jurada Asociada :
Número de Orden de la Declaración Jurada Asociada : 923839775
Importe Pagado : S/. 3,475

Detalle de Pago:

Número de Operación SUNAT : 1012732455
Medio de Pago : Cargo en cuenta de detracciones - cuenta convencional
Banco : Banco de la Nación
Número de Operación : 00000000001012732455
Fecha de Pago : 13/09/2019 16:41:57



Christina María Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP 12 63105

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag 1)
	RUC	2060000439		
	Razón Social	CONSORCIO SAN JOSE		Periodo
	Número de Orden	923839775	Fecha de Presentación	201908 13/09/2019
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

	IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO
Ventas Netas	100	847,008.00	101	152,461.00
Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102	0.00	103	0.00
Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
Exportaciones	Facturadas en el período	106	0.00	
	Embarcadas en el período	127		
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
Total			131	152,461.00

IGV COMPRAS

	IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	145,860.00	108	26,255.00
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
Compras internas no gravadas	120	2,394.00		
Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL			178	26,255.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
OTROS CRÉDITOS			169	
COEFICIENTE	173			

IVAP

	IVAP			
		BASE		TRIBUTO
Ventas Gravadas	340		341	
Otros Créditos IVAP			182	

RENTA

	RENTA			
		BASE		TRIBUTO
Ingresos Netos	301	847,008.00	312	12,705.00
Coefficiente	380	0.0000		
Porcentaje	315	1.50		

Christian...
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 63195

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)	
	RUC	20600000439				
	Razón Social	CONSORCIO SAN JOSE		Período		201908
	Número de Orden	923839775	Fecha de Presentación	13/09/2019		
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles		

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	126,206.00	353		302	12,705.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	11,531.00	351		303	9,230.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	114,675.00	352		304	3,475.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	114,675.00	683		682	3,475.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	114,675.00	344		324	3,475.00
¿Deseo acogerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (SI/No)?						NO

Cristóbal...
 DNI...
 C.P. 63195

Planillas

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN (LABORAL)

Identificación de la Transacción

Número de orden: 780540856-81

003

Datos de la Declaración

RUC: 20600000439
Nombre o Razón Social: CONSORCIO SAN JOSE
Documento: PLANILLA ELECTRÓNICA
Periodo: 08/2019
Rectificatoria: No
Número de trabajadores: 21
Número de pensionistas: 0
P.Serv.Cuarta Categoría: 4
P.Serv.Mod.Formativa: 0
Personal Terceros: 0
Regímenes Especiales: 0

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN


Identificación de la Transacción

Número de orden: 780540856-81

Detalle de Tributos		
Tributos	Deuda	Pago
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	1,501	1,501
ESSALUD +VIDA	85	85
SNP - LEY 19990	2,306	2,306
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	11	11
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	4,840	4,840
Totales	S/. 8,743	S/. 8,743

Detalle de Pago

Banco: NACION
Num.Operación: 00000000000579155504
Fecha de Pago: 2019-09-10 11:42:36



Christian Augusto Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

RUC : 20600000439

Empleador : CONSORCIO SAN JOSE

Periodo : 08/2019

PDT Planilla Electrónica - PLAME

Número de Orden :

Datos del Trabajador						Información declarada					
Documento de identidad		Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sit.	Ingresos		Descuentos	Tributos y aportes del	Neto a pagar	Tributos y Aportes del
Tipo	Número					Devengado	Pagado				
01	46549805	ALVAREZ	SOTO	JORGE WILTON	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,240.31	3,240.31	0.00	348.79	2,891.52	266.72
01	62637707	AREVALO	VERGARAY	JOSE YOWER	ACTIVO O SUBSIDIADO	4,562.45	4,562.45	0.00	492.76	4,069.69	335.10
01	46709771	CAMACHO	ROJAS	CENIN	ACTIVO O SUBSIDIADO	4,624.19	4,624.19	0.00	718.22	3,905.97	319.37
01	42589975	CORONEL	RAMIREZ	JOSE WILSON	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,477.30	2,477.30	0.00	259.05	2,218.25	207.80
01	41220259	HUAMAN	PORLLES	JHONNY ALAN	ACTIVO O SUBSIDIADO	6,150.00	6,150.00	350.00	1,380.04	4,419.96	632.67
01	41067672	LLONTOP	ACOSTA	JUAN MANUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,712.09	3,712.09	0.00	480.55	3,231.54	285.60
01	44305539	LLONTOP	ACOSTA	BALTAZAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,677.95	2,677.95	0.00	287.34	2,390.61	220.96
01	42344204	LOZANO	CARRASCO	EVER	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,730.57	2,730.57	0.00	293.18	2,437.39	205.75
01	44743366	LOZANO	CARRASCO	JOSE NEIRO	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,613.35	2,613.35	0.00	277.15	2,336.20	195.43
01	06241422	MUÑOZ	CONDORI	LEONIDAS VIDAL	ACTIVO O SUBSIDIADO	4,630.52	4,630.52	0.00	491.24	4,139.28	381.71
01	47135242	RAMOS	SOSA	JACKELINE MILAGROS	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,400.00	1,400.00	0.00	161.42	1,238.58	126.00
01	44214246	RODAS	MORI	DANNY GABRIEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	4,382.09	4,382.09	0.00	470.97	3,911.12	320.89
01	10515950	ROJAS	QUISPE	ROMULO	ACTIVO O SUBSIDIADO	4,844.76	4,844.76	0.00	568.51	4,276.25	403.08
01	10233838	RUBIO	FLORES	JULIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,946.78	3,946.78	0.00	45.96	3,900.82	287.50
01	47509013	RUBIO	HUARCAYA	JULIO CESAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,352.59	3,352.59	0.00	341.79	3,010.80	264.89
01	45612857	RUESTAS	BARDALEZ	JOHN STEVE	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,866.67	3,866.67	0.00	956.08	2,910.59	400.78
01	76763583	SANCHEZ	GALAN	AURORA LISBET	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,181.00	1,181.00	0.00	131.25	1,049.75	112.35
01	42543130	SOLAR	HUAROTO	JERRY EDGAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	4,205.87	4,205.87	0.00	482.12	3,723.75	337.24
01	45412780	TASILLA	CHUGNAS	NOIVER	BAJA	2,393.32	2,393.32	0.00	256.51	2,136.81	203.53
01	45790258	TERRONES	HERRERA	MARCO ANTONIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,467.59	1,467.59	0.00	155.52	1,312.07	133.25
01	70803088	TERRONES	ALDAMAS	LUIS ALBERTO	ACTIVO O SUBSIDIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.65
						68,459.40	68,459.40	350.00	8,598.45	59,510.95	5,669.27

INSTITUCION DE TRIBUTOS
 INCENTIVO FISCAL
 CIP Nº 03105

002

RUC : 2060000439

Empleador : CONSORCIO SAN JOSE

Periodo : 08/2019

PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

Datos del Trabajador						Detalle de los Ingresos										TOTAL INGRESOS	
Documento de Identidad		Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sit.	Ingresos		Bonificaciones		Gratificaciones-Aguinaldos		Conceptos Varios		Otros Conceptos		Devengado	Pagado
Tipo	Número					Devengado	Pagado	Devengado	Pagado	Devengado	Pagado	Devengado	Pagado	Devengado	Pagado		
01	46549805	ALVAREZ	SOTO	JORGE WILTON	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,859.81	1,859.81	334.65	334.65	317.43	317.43	318.05	318.05	410.37	410.37	3,240.31	3,240.31
01	62637707	AREVALO	VERGARAY	JOSE YOWER	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,696.21	2,696.21	457.95	457.95	434.37	434.37	431.88	431.88	542.04	542.04	4,562.45	4,562.45
01	46709771	CAMACHO	ROJAS	CENIN	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,841.67	2,841.67	491.10	491.10	439.04	439.04	396.90	396.90	455.48	455.48	4,624.19	4,624.19
01	42589975	CORONEL	RAMIREZ	JOSE WILSON	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,393.29	1,393.29	268.21	268.21	254.39	254.39	269.43	269.43	291.98	291.98	2,477.30	2,477.30
01	41220259	HUAMAN	PORLLES	JHONNY ALAN	ACTIVO O SUBSIDIADO	6,000.00	6,000.00					150.00	150.00			6,150.00	6,150.00
01	41067672	LLONTOP	ACOSTA	JUAN MANUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,165.19	2,165.19	397.55	397.55	355.41	355.41	326.52	326.52	467.42	467.42	3,712.09	3,712.09
01	44305539	LLONTOP	ACOSTA	BALTAZAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,544.00	1,544.00	268.20	268.20	254.39	254.39	267.62	267.62	343.74	343.74	2,677.95	2,677.95
01	42344204	LOZANO	CARRASCO	EVER	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,544.00	1,544.00	268.21	268.21	254.40	254.40	272.12	272.12	391.84	391.84	2,730.57	2,730.57
01	44743366	LOZANO	CARRASCO	JOSE NEIRO	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,429.36	1,429.36	362.85	362.85	344.17	344.17	346.91	346.91	130.06	130.06	2,613.35	2,613.35
01	06241422	MUÑOZ	CONDORI	LEONIDAS VIDAL	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,870.19	2,870.19	440.33	440.33	417.67	417.67	413.61	413.61	488.72	488.72	4,630.52	4,630.52
01	47135242	RAMOS	SOSA	JACKELINE MILAGROS	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,400.00	1,400.00									1,400.00	1,400.00
01	44214246	RODAS	MORI	DANNY GABRIEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,436.19	2,436.19	440.33	440.33	417.67	417.67	427.72	427.72	660.18	660.18	4,382.09	4,382.09
01	10515950	ROJAS	QUISPE	ROMULO	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,836.90	2,836.90	584.63	584.63	522.67	522.67	469.80	469.80	430.76	430.76	4,844.76	4,844.76
01	10233838	RUBIO	FLORES	JULIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,230.54	2,230.54	717.44	717.44	429.14	429.14	402.17	402.17	167.49	167.49	3,946.78	3,946.78
01	47509013	RUBIO	HUARCAYA	JULIO CESAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,017.01	2,017.01	410.19	410.19	389.08	389.08	382.01	382.01	154.30	154.30	3,352.59	3,352.59
01	45612857	RUESTAS	BARDALEZ	JOHN STEVE	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,866.67	3,866.67									3,866.67	3,866.67
01	76763583	SANCHEZ	GALAN	AURORA LISBET	ACTIVO O SUBSIDIADO	593.47	593.47	123.30	123.30	116.94	116.94	130.96	130.96	216.33	216.33	1,181.00	1,181.00
01	42543130	SOLAR	HUAROTO	JERRY EDGAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,436.19	2,436.19	440.33	440.33	417.67	417.67	412.60	412.60	499.08	499.08	4,205.87	4,205.87
01	45412780	TASILLA	CHUGNAS	NOIVER	BAJA	1,324.60	1,324.60	299.43	299.43	284.01	284.01	273.43	273.43	211.85	211.85	2,393.32	2,393.32
01	45790258	TERRONES	HERRERA	MARCO ANTONIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	787.24	787.24	189.32	189.32	179.57	179.57	191.02	191.02	120.44	120.44	1,467.59	1,467.59
01	70803088	TERRONES	ALDAMAS	LUIS ALBERTO	ACTIVO O SUBSIDIADO	0.00	0.00									0.00	0.00
						44,272.53	44,272.53	6,494.02	6,494.02	5,828.02	5,828.02	5,882.75	5,882.75	5,982.08	5,982.08	68,459.40	68,459.40

ANTES DE FIRMA
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 63105

RUC : 2060000439
 Empleador : CONSORCIO SAN JOSE
 Período : 08/2019
 PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

Datos del Trabajador						Base de cálculo, Tributos y Aportes del Trabajador										
Documento de Identidad	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sit.		B.C. ESSALUD	Aporte Seg. Regular	Base ONP D.Ley 19990	Aporte ONP D.Ley 19990	Base S.P.P.	Aportes SPP	Tasa (%)	Base Renta Sta. Categoría	Impuesto a Renta Sta.	Otros emp.	EsSalud +Vida
01	46549805	ALVAREZ	SOTO	JORGE WILTON	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,380.70	214.26			2,380.70	261.87	0.00	2,863.49	0.00	NO	5.00
01	62637707	AREVALO	VERGARAY	JOSE YOWER	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,405.05	306.45	3,405.05	442.66			0.00	4,065.71	0.00	NO	5.00
01	46709771	CAMACHO	ROJAS	CENIN	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,548.61	319.37	3,548.61	461.32			0.00	4,178.37	206.43	NO	5.00
01	42589975	CORONEL	RAMIREZ	JOSE WILSON	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,821.38	163.92			1,821.38	200.36	0.00	2,221.07	0.00	NO	5.00
01	41220259	HUAMAN	PORLLES	JHONNY ALAN	ACTIVO O SUBSIDIADO	6,150.00	553.50			6,150.00	615.00	0.00	13,536.45	670.94	SI	
01	41067672	LLONTOP	ACOSTA	JUAN MANUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,772.67	249.54	2,772.67	360.45			0.00	3,282.47	75.91	NO	5.00
01	44305539	LLONTOP	ACOSTA	BALTAZAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,952.85	175.76			1,952.85	214.84	0.00	2,352.53	0.00	NO	5.00
01	42344204	LOZANO	CARRASCO	EVER	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,000.95	180.09	2,000.95	260.12			0.00	2,400.65	0.00	NO	5.00
01	44743366	LOZANO	CARRASCO	JOSE NEIRO	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,886.31	169.77	1,886.31	245.22			0.00	2,427.04	0.00	NO	5.00
01	06241422	MUÑOZ	CONDORI	LEONIDAS VIDAL	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,530.70	317.76			3,530.70	388.37	0.00	4,165.95	0.00	NO	5.00
01	47135242	RAMOS	SOSA	JACKELINE MILAGROS	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,400.00	126.00			1,400.00	140.00	0.00	1,400.00	0.00	NO	5.00
01	44214246	RODAS	MORI	DANNY GABRIEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,247.06	292.24	3,247.06	422.12			0.00	3,882.31	0.00	NO	5.00
01	10515950	ROJAS	QUISPE	ROMULO	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,670.17	330.32			3,670.17	403.72	0.00	4,419.88	37.05	NO	5.00
01	10233838	RUBIO	FLORES	JULIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,909.36	261.84					0.00	3,564.32	0.00	NO	5.00
01	47509013	RUBIO	HUARCAYA	JULIO CESAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,392.19	215.30			2,392.19	263.15	0.00	3,003.48	0.00	NO	5.00
01	45612857	RUESTAS	BARDALEZ	JOHN STEVE	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,866.67	348.00			3,866.67	386.67	0.00	3,866.67	510.25	NO	5.00
01	76763583	SANCHEZ	GALAN	AURORA LISBET	ACTIVO O SUBSIDIADO	878.08	83.70	878.08	114.15			0.00	1,055.95	0.00	NO	5.00
01	42543130	SOLAR	HUAROTO	JERRY EDGAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,085.96	277.74			3,085.96	339.46	0.00	3,721.21	0.00	NO	5.00
01	45412780	TASILLA	CHUGNAS	NOIVER	BAJA	1,748.83	157.39			1,748.83	192.37	0.00	2,180.80	0.00	NO	5.00
01	45790258	TERRONES	HERRERA	MARCO ANTONIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,075.84	96.83			1,075.84	118.35	0.00	1,357.97	0.00	NO	5.00
01	70803088	TERRONES	ALDAMAS	LUIS ALBERTO	ACTIVO O SUBSIDIADO	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	5.00
						53,723.38	4,839.78	17,738.73	2,306.04	33,075.29	3,524.16	0.00	69,946.32	1,500.58		85.00

5015012512
 INCORPORACION CIVIL
 01/09/2019

000

R04: Trabajadores - Tributos, aportes y conceptos a cargo del trabajador

RUC : 2060000439

Empleador : CONSORCIO SAN JOSE

Periodo : 08/2019

PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

Datos del Trabajador						S.P.P. Aporte Obligatorio	S.P.P. Aporte Voluntario	S.P.P. Comisión	S.P.P. Seguro	S.N.P. D.Ley 19990 (ONP)	Imp. Renta 5ta.categ.	CONAFOVICER	+Vida Seguro Accidentes (ESSALUD)
Documento de Identidad Tipo	Número	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sit.								
01	46549805	ALVAREZ	SOTO	JORGE WILTON	ACTIVO O SUBSIDIADO	238.06	23.81	15.95	32.14		0.00	33.83	5.00
01	62637707	AREVALO	VERGARAY	JOSE YOWER	ACTIVO O SUBSIDIADO					442.66	0.00	45.10	5.00
01	46709771	CAMACHO	ROJAS	CENIN	ACTIVO O SUBSIDIADO					461.32	206.43	45.47	5.00
01	42589975	CORONEL	RAMIREZ	JOSE WILSON	ACTIVO O SUBSIDIADO	182.15	18.21	3.28	24.60		0.00	25.81	5.00
01	41220259	HUAMAN	PORLLES	JHONNY ALAN	ACTIVO O SUBSIDIADO	615.00		11.07	83.03		670.94		
01	41067672	LLONTOP	ACOSTA	JUAN MANUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO					360.45	75.91	39.19	5.00
01	44305539	LLONTOP	ACOSTA	BALTAZAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	195.30	19.54	13.08	26.36		0.00	28.06	5.00
01	42344204	LOZANO	CARRASCO	EVER	ACTIVO O SUBSIDIADO					260.12	0.00	28.06	5.00
01	44743366	LOZANO	CARRASCO	JOSE NEIRO	ACTIVO O SUBSIDIADO					245.22	0.00	26.93	5.00
01	06241422	MUÑOZ	CONDORI	LEONIDAS VIDAL	ACTIVO O SUBSIDIADO	353.07	35.30	6.36	47.66		0.00	43.85	5.00
01	47135242	RAMOS	SOSA	JACKELINE MILAGROS	ACTIVO O SUBSIDIADO	140.00		2.52	18.90		0.00		
01	44214246	RODAS	MORI	DANNY GABRIEL	ACTIVO O SUBSIDIADO					422.12	0.00	43.85	5.00
01	10515950	ROJAS	QUISPE	ROMULO	ACTIVO O SUBSIDIADO	367.02	36.70	24.59	49.55		37.05	48.60	5.00
01	10233838	RUBIO	FLORES	JULIO	ACTIVO O SUBSIDIADO						0.00	40.96	5.00
01	47509013	RUBIO	HUARCAYA	JULIO CESAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	239.22	23.93	4.30	32.29		0.00	37.05	5.00
01	45612857	RUESTAS	BARDALEZ	JOHN STEVE	ACTIVO O SUBSIDIADO	386.67		6.96	52.20		510.25		
01	76763583	SANCHEZ	GALAN	AURORA LISBET	ACTIVO O SUBSIDIADO					114.15	0.00	12.10	5.00
01	42543130	SOLAR	HUAROTO	JERRY EDGAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	308.61	30.85	52.14	41.68		0.00	43.84	5.00
01	45412780	TASILLA	CHUGNAS	NOIVER	BAJA	174.88	17.49	11.72	23.61		0.00	23.81	5.00
01	45790258	TERRONES	HERRERA	MARCO ANTONIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	107.59	10.76	1.94	14.52		0.00	15.71	5.00
01	70803088	TERRONES	ALDAMAS	LUIS ALBERTO	ACTIVO O SUBSIDIADO	0.00		0.00	0.00		0.00		
						3,307.57	216.59	153.91	446.54	2,306.04	1,500.58	582.22	85.00


 CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
 CIP N° 63105





R05: Trabajadores - Tributos, aportes y conceptos a cargo del empleador

RUC : 2060000439

Empleador : CONSORCIO SAN JOSE

Periodo : 08/2019

PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

Datos del Trabajador						Cód. Reg. Salud	ESSALUD Seguro de Salud	E.P.S. SCTR-Salud	S.P.P. Aporte voluntario	COMPAÑIA SCTR Pensión
Documento de Identidad	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sit.	Tipo					
01	46549805	ALVAREZ	SOTO	JORGE WILTON	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	214.26	14.22	23.81	14.43
01	62637707	AREVALO	VERGARAY	JOSE YOWER	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	306.45	14.22		14.43
01	46709771	CAMACHO	ROJAS	CENIN	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	319.37			
01	42589975	CORONEL	RAMIREZ	JOSE WILSON	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	163.92	12.74	18.21	12.93
01	41220259	HUAMAN	PORLLES	JHONNY ALAN	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	553.50	39.00		40.17
01	41067672	LLONTOPI	ACOSTA	JUAN MANUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	249.54	18.02		18.04
01	44305539	LLONTOPI	ACOSTA	BALTAZAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	175.76	12.73	19.54	12.93
01	42344204	LOZANO	CARRASCO	EVER	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	180.09	12.73		12.93
01	44743366	LOZANO	CARRASCO	JOSE NEIRO	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	169.77	12.73		12.93
01	06241422	MUÑOZ	CONDORI	LEONIDAS VIDAL	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	317.76	14.22	35.30	14.43
01	47135242	RAMOS	SOSA	JACKELINE MILAGROS	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	126.00			
01	44214246	RODAS	MORI	DANNY GABRIEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	292.24	14.22		14.43
01	10515950	ROJAS	QUISPE	ROMULO	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	330.32	18.02	36.70	18.04
01	10233838	RUBIO	FLORES	JULIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	261.84	12.72		12.94
01	47509013	RUBIO	HUARCAYA	JULIO CESAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	215.30	12.72	23.93	12.94
01	45612857	RUESTAS	BARDALEZ	JOHN STEVE	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	348.00	26.00		26.78
01	76763583	SANCHEZ	GALAN	AURORA LISBET	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	83.70	14.22		14.43
01	42543130	SOLAR	HUAROTO	JERRY EDGAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	277.74	14.22	30.85	14.43
01	45412780	TASILLA	CHUGNAS	NOIVER	BAJA	00	157.39	14.22	17.49	14.43
01	45790258	TERRONES	HERRERA	MARCO ANTONIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	96.83	12.72	10.76	12.94
01	70803088	TERRONES	ALDAMAS	LUIS ALBERTO	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	0.00	14.22		14.43
							4,839.78	303.89	216.59	309.01


CHASTA...
 INGENIERO CIVIL
 CIP Nº 63105




100

RUC : 2060000439
 Empleador : CONSORCIO SAN JOSE
 Periodo : 08/2019
 PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

Datos del Trabajador						Jornada Laboral			Horas Trabajadas		
Documento de Identidad		Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sit.	Días Laborados	Días Subsidiados	Días No Laborados	Horas ordinarias	Horas sobretiempo	Total horas
01	46549805	ALVAREZ	SOTO	JORGE WILTON	ACTIVO O SUBSIDIADO	24	0	0	152:00	26:00	178:00
01	62637707	AREVALO	VERGARAY	JOSE YOWER	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	0	208:00	35:00	243:00
01	46709771	CAMACHO	ROJAS	CENIN	ACTIVO O SUBSIDIADO	25	0	1	168:00	25:00	193:00
01	42589975	CORONEL	RAMIREZ	JOSE WILSON	ACTIVO O SUBSIDIADO	23	0	1	136:00	23:00	159:00
01	41220259	HUAMAN	PORLLES	JHONNY ALAN	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	0	208:00		208:00
01	41067672	LLONTOPI	ACOSTA	JUAN MANUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	20	0	1	136:00	24:00	160:00
01	44305539	LLONTOPI	ACOSTA	BALTAZAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	21	0	0	136:00	23:00	159:00
01	42344204	LOZANO	CARRASCO	EVER	ACTIVO O SUBSIDIADO	23	0	1	136:00	28:00	164:00
01	44743366	LOZANO	CARRASCO	JOSE NEIRO	ACTIVO O SUBSIDIADO	28		3	184:00	54:20	238:20
01	06241422	MUÑOZ	CONDORI	LEONIDAS VIDAL	ACTIVO O SUBSIDIADO	30	0	1	200:00	32:00	232:00
01	47135242	RAMOS	SOSA	JACKELINE MILAGROS	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	0	208:00		208:00
01	44214246	RODAS	MORI	DANNY GABRIEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	30	0	1	200:00	46:00	246:00
01	10515950	ROJAS	QUISPE	ROMULO	ACTIVO O SUBSIDIADO	30	0	1	200:00	26:00	226:00
01	10233838	RUBIO	FLORES	JULIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	0	208:00	5:00	213:00
01	47509013	RUBIO	HUARCAYA	JULIO CESAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	0	208:00	5:00	213:00
01	45612857	RUESTAS	BARDALEZ	JOHN STEVE	ACTIVO O SUBSIDIADO	30	0	1	200:00		200:00
01	76763583	SANCHEZ	GALAN	AURORA LISBET	ACTIVO O SUBSIDIADO	15	0	16	56:00	16:00	72:00
01	42543130	SOLAR	HUAROTO	JERRY EDGAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	30	0	1	200:00	31:00	231:00
01	45412780	TASILLA	CHUGNAS	NOIVER	BAJA	20	0	1	136:00	16:00	152:00
01	45790258	TERRONES	HERRERA	MARCO ANTONIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	13		5	96:00	43:00	139:00
01	70803088	TERRONES	ALDAMAS	LUIS ALBERTO	ACTIVO O SUBSIDIADO	0	31	0		6:00	6:00
						517	31	34			




 CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
 CIPEN 63195



RUC : 2060000439
 Empleador : CONSORCIO SAN JOSE
 Periodo : 08/2019
 PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

Datos del Trabajador					Motivos de Suspensión de Labores		
Documento de Identidad		Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Código	Descripción	Num. Días
Tipo	Número						
01	46709771	CAMACHO	ROJAS	CENIN	07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	1
01	42589975	CORONEL	RAMIREZ	JOSE WILSON	07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	1
01	41067672	LLONTOP	ACOSTA	JUAN MANUEL	07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	1
01	42344204	LOZANO	CARRASCO	EVER	07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	1
01	44743366	LOZANO	CARRASCO	JOSE NEIRO	07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	3
01	06241422	MUÑOZ	CONDORI	LEONIDAS VIDAL	07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	1
01	44214246	RODAS	MORI	DANNY GABRIEL	07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	1
01	10515950	ROJAS	QUISPE	ROMULO	07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	1
01	45612857	RUESTAS	BARDALEZ	JOHN STEVE	26	S.I. LICENCIA U OTROS MOTIVOS CON GOCE D	1
01	76763583	SANCHEZ	GALAN	AURORA LISBET	07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	16
01	42543130	SOLAR	HUAROTO	JERRY EDGAR	07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	1
01	45412780	TASILLA	CHUGNAS	NOIVER	07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	1
01	45790258	TERRONES	HERRERA	MARCO ANTONIO	07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	5
01	70803088	TERRONES	ALDAMAS	LUIS ALBERTO	21	S.I. INCAP TEMPORAL (SUBSIDIADO)	31



CONSORCIO SAN JOSE
 INGENIERIA CIVIL
 C.P. 11-03195

RUC : 2060000439
 Empleador : CONSORCIO SAN JOSE
 Periodo : 08/2019
 PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

Datos del Prestador de Servicio			Tipo de Comprobante	Número de Serie	Número de Comprobante	Fecha de Emisión	Fecha de Pago	Monto de Comprobante	Ind.Retención Rta	Retención Renta	Retención Pension	Aporte Pensionario
Tipo	Número	Apellidos y Nombres										
06	10610067781	GALAN CHAVEZ ESTEPHANY GRISEL	R.HONORARIO	E001	00000011	31/07/2019	05/08/2019	390.00	NO	0.00		
06	10199256152	GARAY ARTEAGA HILDEBRANDO WILLIAM	R.HONORARIO	E001	00000024	15/08/2019	16/08/2019	700.00	NO	0.00		
06	10775048820	SOTOMAYOR MARTINEZ MARJORIE STEPHANIE	R.HONORARIO	E001	00000028	26/07/2019	01/08/2019	1,870.00	NO	0.00		
06	10324041678	TAPIA ROSAZZA RICHARD JAVIER	R.HONORARIO	E001	00000068	26/08/2019	28/08/2019	141.30	SI	11.30		
								3,101.30		11.30		0.00

RUC: 2060000439
 PLANILLA 08/2019
 CIP: 14-03193

C
C
C

RUC : 2060000439

Empleador : CONSORCIO SAN JOSE

Periodo : 08/2019

PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :


Determinación de deuda		Imp.Extraord. Solidaridad		Sistema Nac. Pensiones D.L.19990		ESSALUD Seguro Regular Trabajadores		ESSALUD Seguro Agrario /Acuic.		Fondo Derechos Sociales Artista		ESSALUD +Vida		Renta Sta.Cat. Retenciones
Base imponible	450		451	17,739	452	53,723	456		453		454	85	455	69,946
Impuesto resultante	410		411	2,306	412	4,840	416		413		414	85	415	1,501
Compensación	600													
Crédito EPS (Ley 26790)					602									
Crédito EPS Per.anterior					612									
Otras deduc.permit.Ley													605	0
Pagos previos	500		501		502		506		503		504		505	
Interés moratorio	700		701		702		706		703		704		705	
Saldo a pagar	710		711	2,306	712	4,840	716		713		714	85	715	1,501
Importe a pagar	800		801	2,306	802	4,840	806		803		804	85	805	1,501

Determinación de deuda		Contrib. Solidaria Asist. Previsional		ESSALUD Seguro Trab. Pesq.		ESSALUD Seguro Regular Pensionistas		ESSALUD S.C.T.R.		Renta 4ta.Cat. Retenciones		Asegura tu Pensión		Aporte al FCJMMS - LEY 29741
Base imponible	457		458		459		460		461	3,101	462		590	
Impuesto resultante	417		418		419		420		421	11	422		591	
Compensación	427													
Crédito EPS (Ley 26790)			408											
Crédito EPS Per.anterior			428											
Otras deduc.permit.Ley														
Pagos previos	507		508		509		510		511		512		592	
Interés moratorio	707		708		740		741		742				593	
Saldo a pagar	717		718		743		744		745	11	747		594	
Importe a pagar	807		808		809		810		811	11	814		595	
IGV							812							

CANTAS
 INGENIERO EN SISTEMAS
 CIVIL
 CIP N° 03105

109

Pago a CONAFOVISER



CONSORCIO SERVICIOS

032

20190910 15:43:42

Consulta de Pagos Masivos

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
000001	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES	10/09/2019	15:42:07	0011-0063-0100002901
Abonos Enviados		Moneda de Cargo	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
		SOLES	INMEDIATA		ABONOS OK
		Importe Inicialmente informado			
		582.00			

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000004374
Fecha y Hora de Ejecución	10/09/2019 - 15:42:07
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	582.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	582.00 - SOLES

Ver contenido de la planilla

Relación de las cuentas de abono

Nro.	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
1	0011401200200690806		CONAROVICER	R	20100816011	582.00			0	ABONO CORRECTO

Detalles de la operación

Los tipos de órdenes válidos para las transferencias interbancarias a crédito son:

- A. Débito
- C. Débito
- F. Débito
- F. Garantía de Débito
- M. Débito de Débito

Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino	
		Días hábiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público
	Hasta las 11:30 a.m.	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil	
	Entre las 11:30 a.m. y las 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil
<p>Christiana Trujillo INGENIERO CIVIL CIP N° 63105</p>	Después de las 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	
	Hasta las 1:45 p.m.	A partir de las 1:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 4:30 p.m. del siguiente día útil
	Después de las 1:45 p.m.	A partir de las 8:15 a.m. del siguiente día útil	



Constancia de Pago

Pago Varios - Formulario 1662

Número de orden : 751756954

050

RUC : 20600000439
Razón social : CONSORCIO SAN JOSE
Periodo : 08/2019
Indicador de pago : 1 Tributo
Tributo : 7031 SENCICO
Importe pagado : S/. 1,694
Número de operación: 000168594779
Tipo de pago: Pago con cargo en cuenta de detracciones
Banco: NACION
Número de operación 00000000000579822477
Fecha de operación bancaria: 13/09/2019 16:55:53



Christina Patricia Trujillo
INGENIERA CIVIL
CIP Nº 03195

Informe de Especialista

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA
CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN
JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA
DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"
ADICIONAL DE OBRA N° 10**

SEPTIEMBRE – 2019




**CONSORCIO
SAN JOSÉ**


FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

CONSORCIO SAN JOSÉ	INFORME MENSUAL N° 07	SEPTIEMBRE - 2019
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 1 de 14

ÍNDICE

1. DATOS DE LA OBRA.....	2
2. INTRODUCCIÓN.....	2
3. OBJETIVO	2
4. ALCANCE	2
5. ORGANIGRAMA	3
6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	3
7. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	7
8. ESTADÍSTICAS SST.....	12
9. REPORTE MENSUAL DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	14
10. CONCLUSIONES	15
11. RECOMENDACIONES.....	15
12. PANEL FOTOGRÁFICO	16





Christiano Espinoza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63195

CONSORCIO SAN JOSÉ	INFORME MENSUAL N° 07	SEPTIEMBRE - 2019
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 2 de 14

1. DATOS DE LA OBRA

“Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”.

TIEMPO DE EJECUCIÓN : 75 días calendarios

FECHA DE INICIO : 13 de Marzo del 2019

2. INTRODUCCIÓN


Consortio San José, viene ejecutando la obra: “Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”, en su adicional de obra N°10; para lo cual se espera conseguir la máxima identificación y compromiso por parte de la Dirección y de todos los trabajadores con los principios de Seguridad, Salud en el Trabajo y Conservación del Medio Ambiente, cumpliendo así con el Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente elaborado para la obra.

3. OBJETIVO

Demostrar la gestión del Consorcio San José, referente a Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente en el mes de SEPTIEMBRE del 2019.

4. ALCANCE

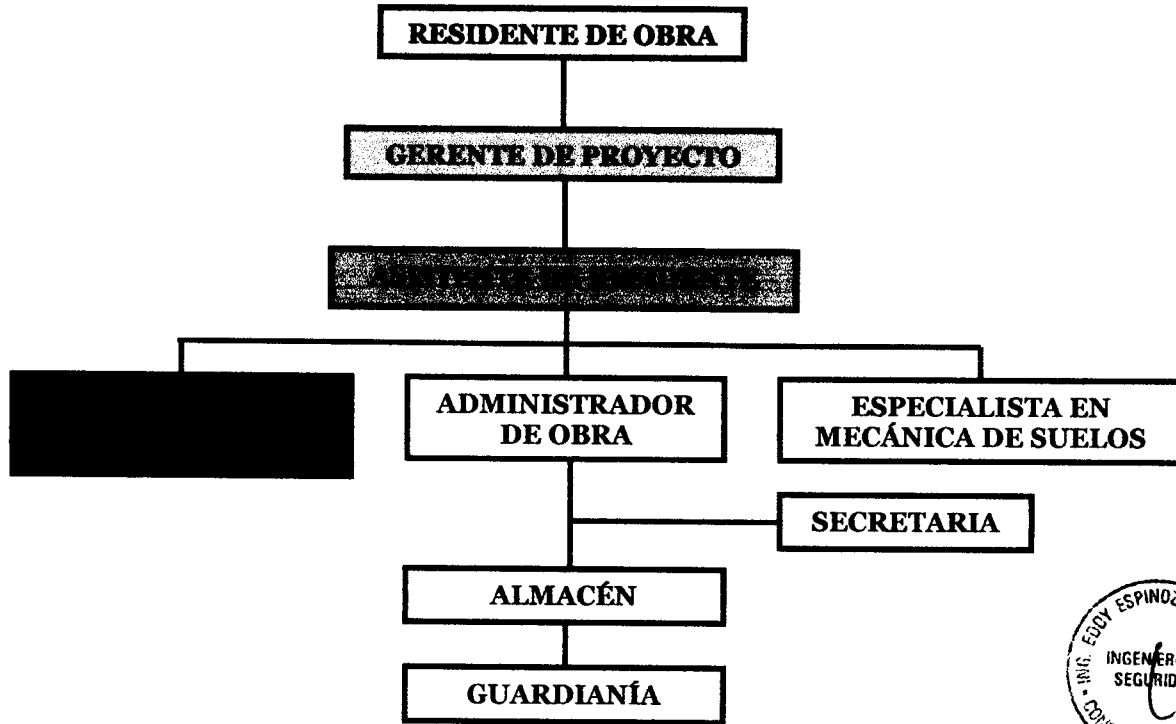
El presente informe plasma todas las actividades realizadas referentes a Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente en la Obra: “Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”.



Christina...
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105



5. ORGANIGRAMA



6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


6.1. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


CONSORCIO SAN JOSÉ		INSPECCIONES DE SEGURIDAD														TOTAL L. MES		EFICIENCIA DE RESPUESTA					
OBRA:		"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"																					
FRETE DE TRABAJO:		MEDIA TENSIÓN																					
MES	HERRAM. MANUAL		HERRAM. ELECTR.		EXTINTORES		BOTIQUINES		CAMILLAS		EPPs		ÁRNES		ANDAMIOS		VEHICULOS		GENERAL-OBRA		TOTAL L. MES	MES	ACUM.
	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.			
MARZO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	8	100%	100%
ABRIL	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	0	0	0	0	1	2	8	100%	100%
MAYO	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	0	0	0	0	1	3	8	100%	100%
JUNIO	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	0	0	0	0	1	4	8	100%	100%
JULIO	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	100%	100%
AGOSTO	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	0	0	0	0	1	5	8	100%	100%
SEPTIEMBRE	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	100%	100%
TOTAL INSPECCIONES	5		5		5		5		5		5		5		0		0		5		40	40	

Christina...
INGENIERO CIVIL
CIP 1163105

6.2. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CONSORCIO SAN JOSÉ			ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO				
OBRA:			"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"				
FRENTE DE TRABAJO:			MEDIA TENSIÓN				
Nº	FECHA	DÍAS	Nº DE TRABAJADORES	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO	INSPECCIÓN DE VEHICULOS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR
1	02/09/2019	LUNES	0	0	0	0	0
2	03/09/2019	MARTES	0	0	0	0	0
3	04/09/2019	MIÉRCOLES	0	0	0	0	0
4	05/09/2019	JUEVES	0	0	0	0	0
5	06/09/2019	VIERNES	0	0	0	0	0
6	07/09/2019	SÁBADO	0	0	0	0	0
7	09/09/2019	LUNES	0	0	0	0	0
8	10/09/2019	MARTES	0	0	0	0	0
9	11/09/2019	MIÉRCOLES	0	0	0	0	0
10	12/09/2019	JUEVES	0	0	0	0	0
11	13/09/2019	VIERNES	0	0	0	0	0
12	14/09/2019	SÁBADO	0	0	0	0	0
13	16/09/2019	LUNES	0	0	0	0	0
14	17/09/2019	MARTES	0	0	0	0	0
15	18/09/2019	MIÉRCOLES	0	0	0	0	0
16	19/09/2019	JUEVES	0	0	0	0	0
17	20/09/2019	VIERNES	0	0	0	0	0
18	21/09/2019	SÁBADO	0	0	0	0	0
19	23/09/2019	LUNES	0	0	0	0	0
20	24/09/2019	MARTES	0	0	0	0	0
21	25/09/2019	MIÉRCOLES	0	0	0	0	0
22	26/09/2019	JUEVES	0	0	0	0	0
23	27/09/2019	VIERNES	0	0	0	0	0
24	28/09/2019	SÁBADO	0	0	0	0	0
25	30/09/2019	LUNES	0	0	0	0	0
TOTAL			0	0	0	0	0




Christian Espinoza Escobar
INGENIERO DE SEGURIDAD
CIP N° 63195



CONSORCIO SAN JOSÉ	INFORME MENSUAL N° 07	SEPTIEMBRE - 2019
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 5 de 14

6.3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

6.3.1. INDUCCIÓN

En el presente mes de SEPTIEMBRE no se realizó inducción de personal nuevo, debido a que en el frente de trabajo del adicional N° 10 no se realizó trabajos.

6.3.2. CAPACITACIÓN

En el presente mes SEPTIEMBRE no se realizó capacitación a los trabajadores.

6.3.3. CHARLA 10 MINUTOS

En este mes no se han desarrollado ninguna actividad en lo que corresponde los trabajos del Adicional N° 10. Por lo tanto no se ha registrado ningún tipo de capacitaciones, ni charlas de 10 minutos, teniendo un total de (00) cero horas hombres capacitados; abarcando temas de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente para el personal de campo y técnico, los mismos que se detallaron en el Cronograma Mensual de Reuniones Diarias.



CONSORCIO SAN JOSÉ	INFORME MENSUAL N° 07		SEPTIEMBRE - 2019
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE		
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE		Página 6 de 14

CONSORCIO SAN JOSÉ		CRONOGRAMA MENSUAL DE REUNIONES DIARIAS						
AÑO:	2019	MES:	SEPTIEMBRE					
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE. DISTRITO DE SAN JOSE. PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"							
FRENTE:	MEDIA TENSIÓN							
N°	TEMA A EXPLICAR	TIPO DE REUNIÓN	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA	N° DE ASISTENTES	DURACIÓN (Min)	TOTAL REC.	HORA
1	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	02/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
2	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	03/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
3	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	04/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
4	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	05/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
5	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	06/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
6	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	07/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
7	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	09/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
8	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	10/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
9	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	11/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
10	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	12/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
11	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	13/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
12	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	14/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
13	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	16/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
14	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	17/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
15	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	18/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
16	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	19/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
17	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	20/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
18	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	21/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
19	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	23/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
20	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	24/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
21	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	25/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
22	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	26/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
23	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	27/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
24	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	28/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
25	-	REUNIÓN DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	30/09/2019	0	10	0	07:00 a.m.
TOTAL							0	

Christiana Inés Torres
 INGENIERA CIVIL
 CIP N° 83195



CONSORCIO SAN JOSÉ	INFORME MENSUAL N° 07	SEPTIEMBRE - 2019
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 7 de 14

7. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

No se realizó actividades de trabajo en el mes de SEPTIEMBRE, pero sin embargo el cronograma de Actividades de Plan de Gestión Ambiental sigue vigente.

Para ejecutar estas actividades se vienen aplicando los respectivos documentos, procedimientos y permisos debidamente aprobados, que permitan implementar el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente durante la fase de ejecución de la Obra.

7.1. COMPONENTES AMBIENTALES AFECTADOS PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

En el presente mes no se produjo ningún tipo de impacto ambiental debido a que en el frente de trabajo del adicional N° 10 no se realizaron trabajos.


7.2. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN LOS COMPONENTES AMBIENTALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE

En el presente mes no se produjo ningún tipo de impacto ambiental debido a que en el frente de trabajo del adicional N° 10 no se realizaron trabajos.

7.3 ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL FRENTE A LOS IMPACTOS GENERADOS

La estrategia de manejo ambiental, garantiza que la ejecución de las acciones y medidas de mitigación propuestas sean lo más objetivas y realistas posibles, a fin de que las posibles alteraciones que puedan producirse en el medio ambiente, encuentren una respuesta y sean minimizadas y/o mitigadas.





Christina...
INGENIERO CIVIL
CIP 12 63105

Las medidas ambientales de los impactos negativos generados por la ejecución de las actividades de la etapa de construcción de la obra sobre el medio ambiente, son planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, pero hay algunas medidas adicionales propuestas y ejecutadas durante el desarrollo de las actividades, necesarias para controlar, prevenir, evitar y/o compensar los impactos.

7.4. MEDIDAS DE CONTROL FRENTE A LOS IMPACTOS AMBIENTALES

En el presente mes no se han efectuado medidas de control debido a que no se produjo ningún tipo de impacto ambiental en el frente de trabajo.

7.5. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Durante la ejecución de las actividades en la obra, no se han generado residuos sólidos debido a que en el frente de trabajo del adicional N°10 no se realizaron trabajos.

CONSORCIO SAN JOSÉ		GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE		
FRENTE DE TRABAJO:	MEDIA TENSIÓN		
COLOR DEL CILINDRO	CARACTERÍSTICAS	TOTAL Kg.	
AMARILLO	Materiales metálicos, fierros, etc.	0.0	
AZUL	Materiales hechos de papel y cartón.	0.0	
BLANCO	Materiales donde su compuesto es de plástico.	0.0	
VERDE	Materiales de vidrio, cerámica y porcelanato.	0.0	
MARRÓN	Restos de alimentos, madera, jardinería, etc.	0.0	
ROJO	Recipientes de sustancias químicas.	0.0	
TOTAL			

Christina...
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105



CONSORCIO SAN JOSÉ	INFORME MENSUAL N° 07	SEPTIEMBRE - 2019
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 9 de 14


7.6 REPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS

7.6.1. REPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

CONSORCIO SAN JOSÉ	REPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS-RESTOS DE CONSTRUCCIÓN			
OBRA:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE			
FRENTE DE TRABAJO:	MEDIA TENSION			
TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	ACUMULADO	OBSERVACIONES
Restos de alimentos	Kg.	0.0	21.0	Ninguna
Papel/Cartón	Kg.	0.0	9.3	Ninguna
Bolsas de papel plastificadas (Cemento, etc.)	Kg.	0.0	6.0	Ninguna
Plastico PVC (Botellas, tubos, envases y acrilicos)	Kg.	0.0	10.3	Ninguna
Tecknopor	Kg.	0.0	0.0	Ninguna
Chatarra y cable eléctricos	Kg.	0.0	15.0	Ninguna
Madera	Kg.	0.0	4.0	Ninguna
Residuos de vidrio/ cerámica	Kg.	0.0	0.0	Ninguna
TOTAL MES		0.0	65.6	

7.6.2. REPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

CONSORCIO SAN JOSÉ	REPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS SÓLIDOS			
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE			
FRENTE DE TRABAJO:	MEDIA TENSION			
TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	ACUMULADO	OBSERVACIONES
Recipientes de sustancias químicas	Kg.	0.0	2.0	Ninguna
TOTAL MES		0.0	2.0	




Christina...
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63195


8. ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO SAN JOSÉ		ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO													
OBRA		"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYQUE REGION LAMBAYQUE"													
FRENTE DE TRABAJO:		MEDIA TENSIÓN													
Mes	N° trabajadores	N° Accidente mortal	N° Accidente leve	ACCIDENTE INCAPACITANTE						ENFERMEDAD OCUPACIONAL				N° Incidentes peligrosos	N° Incidentes
				N° Accidente incapacitante	Total horas hombre trabajadas	N° días perdidos	Indice frecuencia	Indice gravedad	Indice accidentalidad	N° enfermedades ocupacionales	N° trabajadores expuestos al agente	Tasa de incidencia	N° trabajadores con cancer profesional		
MARZO	12	0	0	0	2540.00	0	0.00	0.00	0.00	0	12	0.00	0	0	0
ABRIL	6	0	0	0	1152.00	0	0.00	0.00	0.00	0	6	0.00	0	0	0
MAYO	6	0	0	0	1251.00	0	0.00	0.00	0.00	0	6	0.00	0	0	0
JUNIO	6	0	0	0	1152.00	0	0.00	0.00	0.00	0	6	0.00	0	0	0
JULIO	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0
AGOSTO	20	0	0	0	3800.00	0	0.00	0.00	0.00	0	20	0.00	0	0	0
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0
TOTAL ACUMULADO		0.00	0.00	0.00	9978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INCIDENTE: Suceso ocasionado en el campo del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que estas solo requieren cuidados de primeros auxilios.
 INCIDENTE PELIGROSO: Suceso que potencialmente puede causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.
 ACCIDENTE LEVE: Suceso cuya lesión, genera en el accidentado un descanso breve con retorno mínimo al día siguiente a sus labores habituales.
 ACCIDENTE INCAPACITANTE: Suceso cuya lesión, de lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento.
 ACCIDENTE MORTAL: Suceso cuya lesión produce la muerte del trabajador.
 ENFERMEDAD OCUPACIONAL: Es una enfermedad contracta como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo.

[Handwritten Signature]




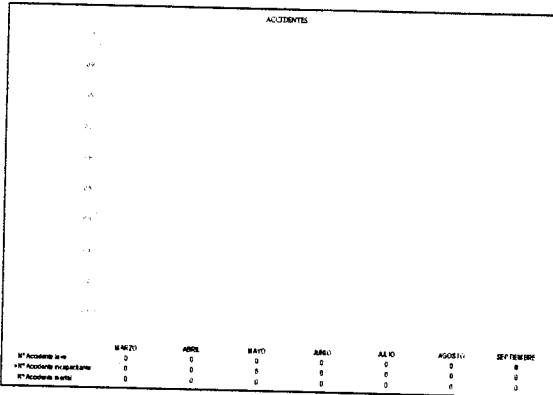

 ING. EDUI ESPINOZA
 INGENIERO DE
 SEGURIDAD


 Inge. Civil
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 63105


**INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD
EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE**

ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE


RESULTADO ESTADÍSTICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST	Índice Promedio	Índice gravedad	Índice accidentabilidad
	0.00	0.00	0.00



MES	INDICE DE FRECUENCIA	INDICE DE FRECUENCIA ACUMULADA	INDICE DE GRAVEDAD	INDICE DE GRAVEDAD ACUMULADA	INDICE DE ACCIDENTABILIDAD	INDICE DE ACCIDENTABILIDAD ACUMULADA
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]
Christina Patricia Trujillo
INGENIERA CIVIL
CIP N° 63105

8.1. CÁLCULO ESTADÍSTICO DE ÍNDICE DE FRECUENCIA, ÍNDICE DE SEVERIDAD, ACCIDENTABILIDAD Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES

Para el cálculo del índice de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad se utilizaran las siguientes formulas según la NTE G 050.

Índice de Frecuencia Mensual	IFm	$\frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el mes X 200000}}{\text{Número horas trabajadas en el mes}}$
Índice de Gravedad Mensual	IGm	$\frac{\text{Días perdidos en el mes X 200000}}{\text{Número horas trabajadas en el mes}}$
Índice de Frecuencia Acumulado	IFa	$\frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el año X 200000}}{\text{Horas trabajadas en lo que va del año}}$
Índice de Gravedad Acumulado	IGa	$\frac{\text{Días perdidos en el año X 200000}}{\text{Horas trabajadas en lo que va del año}}$
Índice de Accidentabilidad	IA	$\frac{\text{IFa x IGa}}{200}$



9. REPORTE MENSUAL DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

CONSORCIO SAN JOSÉ		REPORTE MENSUAL - SEPTIEMBRE 2019	
OBRA:		"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"	
FRENTE DE TRABAJO:		MEDIA TENSIÓN	
ITEM	DESCRIPCIÓN	REPORTE	UNIDAD
1	Cantidad de Trabajadores	0	Trabajadores
2	Dias Trabajados Sin Accidentes Incapacitantes	25	dias
3	Total Accidentes Sin Tiempo Perdido (Accidentes Leves)	0	Unidad
4	Total Accidentes Con Tiempo Perdido (Accidentes Graves)	0	Unidad
5	Total Dias Perdidos Por Accidentes Incapacitantes	0	dias
6	Total Accidentes Fatales Reportados	0	Unidad
7	Record Horas Mensual Sin Accidentes Incapacitantes	0.00	Hrs
8	Record Horas Acumuladas Sin Accidentes Incapacitantes	9978.00	Hrs
9	Total Accidentes de Tránsito	0	Unidad
10	Total Accidentes con Daño Material	0	Unidad
11	Total Incidentes	0	Unidad
12	Total Derrames	0	Unidad
13	Total Enfermedades Ocupacionales Reportada	0	Unidad
ACTIVIDADES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	REPORTE	UNIDAD
1	Charlas Diarias	0	Hrs Hombre
2	Capacitaciones	0	Hrs Hombre
3	Inducción Trabajador Nuevo	0	Hrs Hombre
4	Análisis de Trabajo Seguro	0	Unidad
5	Permiso Escrito Para Trabajador de Alto Riesgo	0	Unidad
6	Inspección Pre Operacional de Vehiculos	0	Unidad
7	Inspección Pre Operacional de Minicargador	0	Unidad
8	Selección de Residuos No Peligrosos- Punto Limpio	0.0	Kg.
9	Selección de Residuos Peligrosos- Punto Limpio	0.0	Kg.
10	Eliminación Residuos No Peligrosos Acumulado	65.6	Kg.

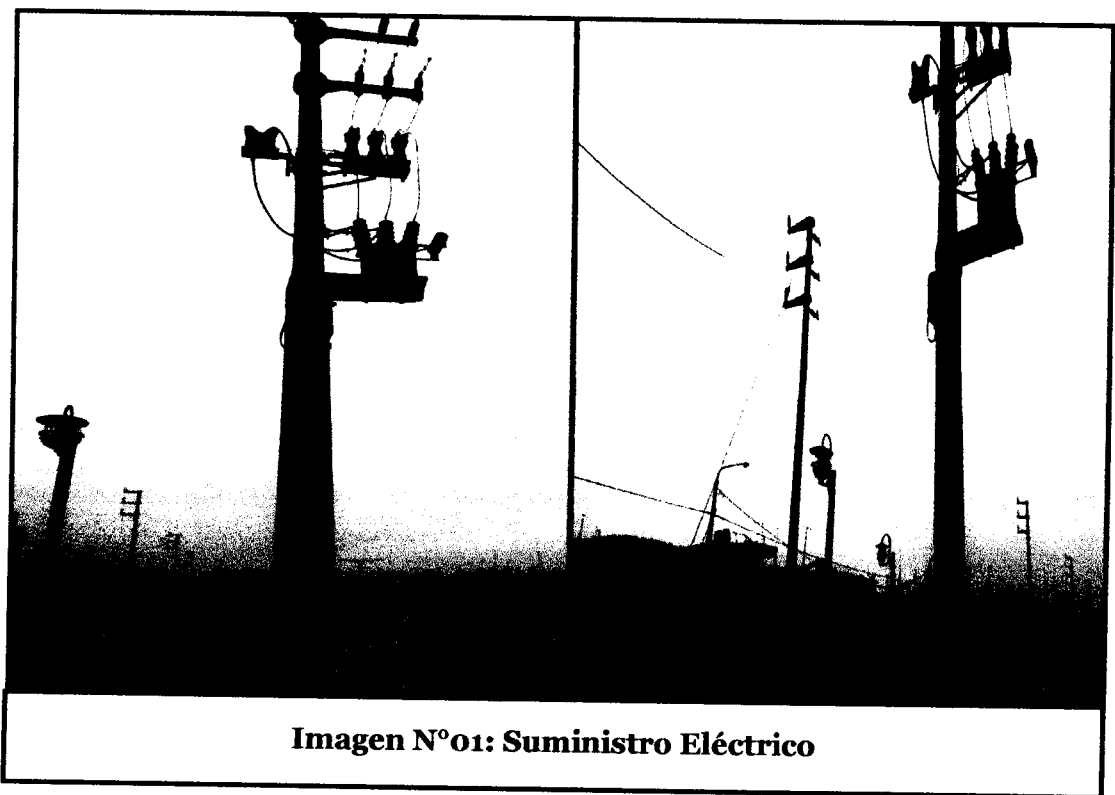


Christian ...
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

10. CONCLUSIONES

- No hubo ninguna actividad en el adicional N° 10, debido a que no se realizaron trabajos en este mes de SEPTIEMBRE.
- Se mantiene instalado el punto de acopio para la segregación de residuos sólidos, mediante cilindros de colores.

11. PANEL FOTOGRÁFICO



[Handwritten signature]

ING. EDDY ESPINOZA ESCALANTE
 INGENIERO DE SEGURIDAD
 CONSORCIO SAN JOSÉ

EDDY ESPINOZA ESCALANTE
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 63195

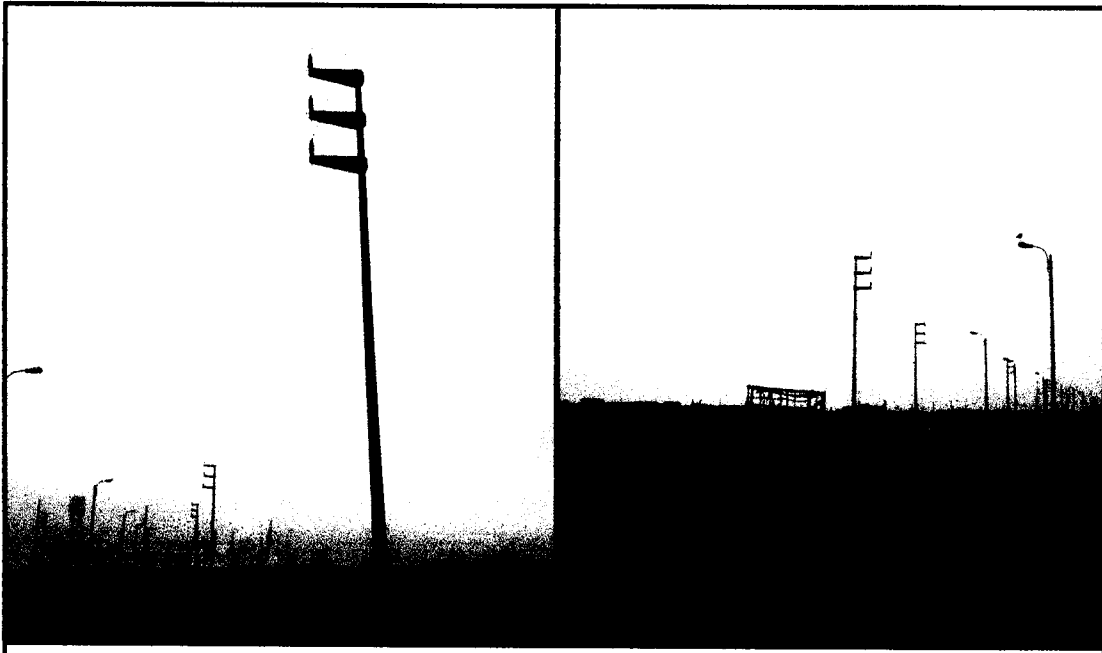


Imagen N°02: Suministro Eléctrico

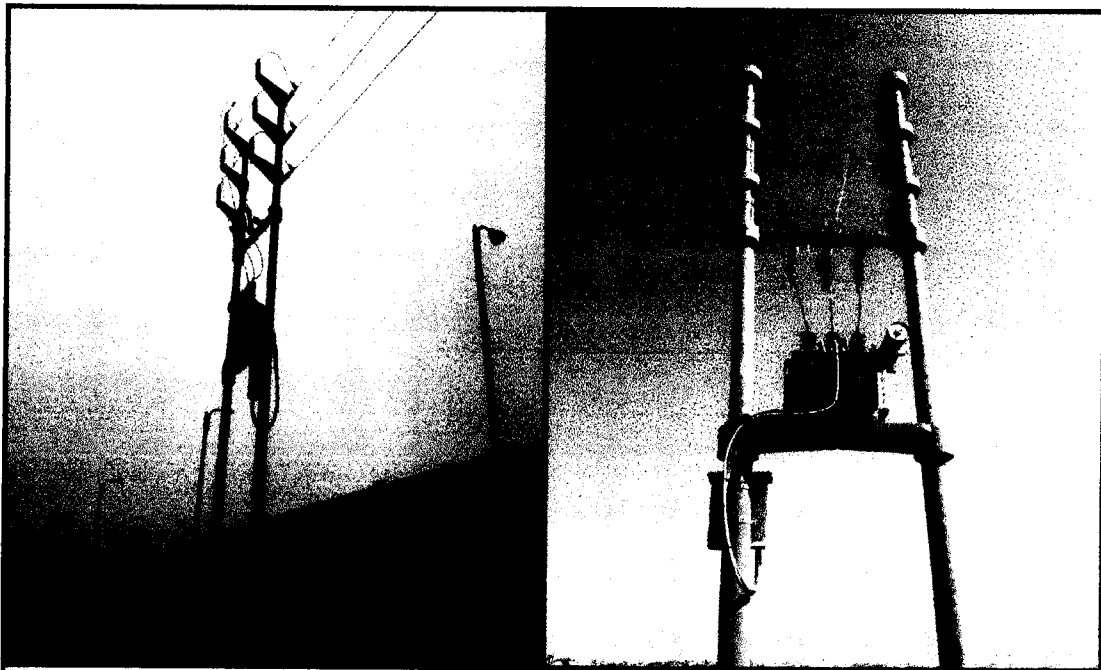


Imagen N°03: Suministro Eléctrico



Christina...
INGENIERO CIVIL
CIP 12 63195




Imagen N°01: Punto de acopio de los residuos sólidos




Christina Espinoza Trejillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63195

Documentos de Conformidad de trabajos


Carrizosa, Juan Trojilla
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105



CONSORCIO
SAN JOSE



RUC: 20600000439

032

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

Lambayeque, 11 de Julio del 2019

030

Carta N° 019-2019

Atención

Sr. Electronorte S.A

Intersección Calle San Martin N°250 y San Jose


Chiclayo - Perú

Presente.

Atención : **Ing. Jorge Alberto Valdivia Cubas**
Jefe del Área de Administración de Proyectos.
Ing. Carlos Tomas Aza Santamaría
Supervisor del Área de Administración de Proyectos

Asunto : Presentación de Expediente Conforme a Obra.

Referencia : Obra: "SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN 10-22.9KV, PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE", DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO, LAMBAYEQUE.



De nuestra especial consideración:

Es grato dirigirme a Ud. Para saludarlo cordialmente y a la vez adjuntarle a la presente el Expediente CONFORME A OBRA del Proyecto: "SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN 10-22.9KV, PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE", DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO, LAMBAYEQUE. Para su revisión y Aprobación

En ese sentido Agradeceremos Revisar y Aprobar, Toda Vez que la obra ha sido concluida y las pruebas han salido satisfactorias, asimismo es de suma urgencia para mi representada contar con el servicio de energía eléctrica.


Sin otro particular y en espera de atención de la presente nos despedimos de Uds.

JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717

Atentamente,

DOMINGUEZ MALO VICTOR FELIPE
ING. MECANICO ELECTRICISTA
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N° 203947

Residente de Obra



NS
07
101

Christian Aza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63195

Av. Alameda del Corregidor 414 la Molina Lima, Cel. 954 539 458 vidmalo@hotmail.com

Comprometidos Con el Medio Ambiente



Chiclayo, 06 AGO 2019

GR-000663 2019

Señorita

Karla Elisabeth Espinoza Malatesta

Gerente General FONDEPES

Presente.-

Asunto : **CONFORMIDAD DE OBRA, SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 10(22,9) kV - 3Ø, PARA ELECTRIFICAR EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN JOSE DE FONDEPES – SAN JOSE.**

Referencia : Carta N° 019 -. 2019

De nuestra consideración:

Por medio de la presente nos dirigimos a usted para hacerle llegar nuestro cordial saludo, y después de evaluar la documentación referente a la obra: **"Sistema de Utilización en Media Tensión 10(22,9) kV - 3Ø, para electrificar el Desembarcadero Pesquero Artesanal San José de FONDEPES"**, comunicarle lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1º Que, la obra "Sistema de Utilización en Media Tensión 10(22,9) kV - 3Ø, para electrificar el Desembarcadero Pesquero Artesanal San José de FONDEPES "- se encuentra ubicada en el distrito de San José provincia y departamento de Lambayeque.

2º Que, la obra "Sistema de Utilización en Media Tensión 10(22,9) kV - 3Ø, para electrificar el Desembarcadero Pesquero Artesanal San José de FONDEPES", se encuentra fuera de la zona de concesión de nuestra empresa.

3º Que estando conforme los expedientes de replanteo de la obra "Sistema de Utilización en Media Tensión 10(22,9) kV - 3Ø, para electrificar el Desembarcadero Pesquero Artesanal San José de FONDEPES ".



4º Que, habiéndose otorgado la conformidad de proyecto N° GR-00093 -2018 el 16 de Febrero del 2018 para el "Sistema de Utilización en Media Tensión 10(22,9) kV - 3Ø, para electrificar el Desembarcadero Pesquero Artesanal San José de FONDEPES", de distrito de San José.

5º Que, habiéndose otorgado la Carta de Inicio de Obra RP- 0149-2019, el 07 de Marzo del 2019 y suscrito el 28 de Mayo 2019, el acta de inspección y pruebas, el **Ing. Víctor Felipe Domínguez Malo CIP N° 203947** residente de obra, el **Ing. Carlos Tomas Aza Santamaría con CIP 56030**, jefe de supervisión del Área de Administración de Proyectos y el **Ing. Arturo Arboleda Gómez con CIP N° 82915**, supervisor de obra en campo.

6º Que, estando conforme los expedientes de replanteo de la obra: "Sistema de Utilización en Media Tensión 10(22,9) kV - 3Ø, para electrificar el Desembarcadero Pesquero Artesanal San José de FONDEPES ", del distrito de San José.

(074) 481210

d. Calle San Martín 250 – Chiclayo - Lambayeque, Perú



JORGE ALVA ESPINOZA INGENIERO CIVIL





Christian Álvarez Turillo INGENIERO CIVIL CIP N° 65195

- 7° Que, habiéndose creado las redes eléctricas, asignándose a la subestación el código EN4347.
- 8° La presente conformidad de obra se otorga de acuerdo al artículo N° 2 del reglamento de la LCE, ya que el cliente opta por la opción tarifaria en el mercado regulado.
- 9° Que, habiéndose alcanzado la Declaración Jurada de no Generar Impacto Ambiental, el Acta de Conformidad de Cumplimiento de Distancias Mínimas de Seguridad, la Carta de Garantía de Suministro de Materiales y Montaje Electromecánico.
- 10° Que, la obra: "Sistema de Utilización en Media Tensión 10(22,9) kV - 3Ø, para electrificar el Desembarcadero pesquero Artesanal San José de FONDEPES ", del distrito de San José, debe cumplir en todo momento con las distancias mínimas de seguridad establecidas en el Código Nacional de Electricidad – Suministro; caso contrario se tomará las medidas correctivas del caso y de ser necesario se procederá al corte del suministro eléctrico de acuerdo a lo establecido en el Artículo 90° inciso c de la Ley de Concesiones Eléctricas.

SE DETERMINA:

Otorgar conformidad a la obra: "**Sistema de Utilización en Media Tensión 10(22,9) kV - 3Ø, para electrificar el Desembarcadero Pesquero Artesanal San José de FONDEPES**", con una máxima demanda de **250,84 KW**, quedando la misma apta para su energización y puesta en servicio, luego que Electronorte S.A haya ejecutado la expansión sustancial de nuestras instalaciones eléctricas, debiendo el propietario de la obra realizar las gestiones comerciales establecidas en la normatividad vigente y aplicable, para lo cual debe coordinar con nuestra Área de Administración de Proyectos y Gerencia Técnica.

Atentamente,


Eduardo Piscocya Salazar
Gerente Regional
SALAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717
Christian M. Sierra Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

t. (074) 481210

d. Calle San Martín 250 – Chiclayo - Lambayeque, Perú



ACTA DE INSPECCION Y PRUEBAS

OBRA : "SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN 10-22.9KV, PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE", DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO, LAMBAYEQUE.

En el lugar de la obra, Distrito San Jose , Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque, a los 28 días del mes de Mayo, del año dos mil diecinueve, se reunieron el **Ing. Victor Felipe Dominguez Malo** CIP N° 203947 Residente de Obra, el **Ing. Carlos Tomas Aza Santamaría** CIP N° 56030, supervisor del Área de Administración de Proyectos y el **Ing. Arturo Arboleda Gómez** CIP N° 82915 Supervisor de campo en cumplimiento al procedimiento establecido en la "Norma de Procedimientos para la Elaboración de Proyectos y Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución y Sistema de Utilización en Media Tensión en Zonas de Concesión de Distribución" de la Dirección General de Electricidad del MEM aprobada según R.D. N° 018-2002-EM/DGE", se procedió a efectuar la Inspección y Pruebas de la Obra: "SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN 10-22.9KV, PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE", DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO, LAMBAYEQUE.

La inspección y pruebas tuvieron los siguientes resultados:


PRUEBAS : CONFORME (ANEXO I)


La custodia de los materiales instalados queda bajo la responsabilidad de los interesados.


Se ha verificado que la infraestructura eléctrica instalada en esta obra, cumplen con las Distancias Mínimas de Seguridad respecto a las edificaciones existentes, de acuerdo a lo que establece el Código Nacional de Electricidad.

SAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717


DOMINGUEZ MALO VICTOR FELIPE
ING. MECANICO ELECTRICISTA
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N° 203947


Arturo Arboleda Gómez
Ing. Mecánico Electricista
C.I.P. 82915


Cristóbal Manuel Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105
www.dietriluz.com.pe


Carlos Tomas Aza Santamaría
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. DEL COLEGIO DE INGENIEROS N° 56030

ANEXO I
ACTA DE INSPECCION Y PRUEBAS

1. OBRA : SISTEMA DE UTILIZACION EN 10-22.9KV, PARA LA ELECTRIFICACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO, LAMBAYEQUE.

2. FECHA : 28/05/2019

3. DIRECCION : Distrito de San Jose

4. LOCALIZACION : DIST : SAN JOSE PROV : SAN JOSE DPTO : LAMBAYEQUE

5. INTERESADOS :

RESIDENTE	SUPERVISORES	PROPIETARIO
Ing. Victor Felipe Dominguez Malo	Ing. Carlos Tomas Aza Santamaria - Ing. Arturo Arboleda Gomez	FONDEPES

6. DATOS TECNICOS

Punto de Alimentación	ESTRUCTURA	TENSION KV	LOCALIDAD	M.D.	N° SE
C-216		10	SAN JOSE	250.84 KW	EN9003

RED PRIMARIA

SUBSTACION TIPO BIPOSTE	POSTES DE CAC 15/500	POSTES DE CAC 15/400	POSTES DE CAC 13/400	POSTES DE CAC 13/300	CONDUCTOR/CABLE		RETENIDA SIMPLE	RETENIDA CONTRAPUNTA	SECCIONADOR FUSIBLE CUT OUT, 38 KV, USO EXTERIOR (unidad)	PUSTA TIERRA (unidad)
					DESCRIPCION	LONGITUD				
1	1	5	11	6	AAAC 50 mm2	851 m	2	11	6	29
					N2XSY 50 mm2	129 m				

TRANSFORMADOR TRIFASICO

MARCA	SERIE	TIPO	AÑO	POTENCIA	FRECUENCIA	RELACION DE TRANSFORMACION	REFRIERACION	CONEXION
RESELEC	2927-04	TTA	2,019	400	60 Hz	10-22,9/0,40 - 0,23 KV	ACEITE	DYN5-Yyn6

TRANSFORMADOR INTEGRADO DE MEDIDA

MARCA	SERIE	TIPO	AÑO	POTENCIA	FRECUENCIA	RELACION DE TRANSFORMACION	REFRIERACION	CONEXION
RESELEC	1174-04	TM-33	2,019	3X50 VA 3X30 VA	60 Hz	10/22,9/220V	ACEITE	ESTRELLA

1-Continuidad **CONFORME**

2-Aislamiento **CONFORME**

CONDUCTOR AEREO AAAC 50mm2		AISLAMIENTO (M Ohm)		
Condiciones (N) o (H)		N	N	N
Entre Fases	RS = 120	RT = 120	ST = 120	
Fases a Tierra	RN = 80	SN = 84	TN = 84	

CONDUCTOR N2XSY 50mm2		AISLAMIENTO (G Ohm)		
Condiciones (N) o (H)		N	N	N
Entre Fases	RS = 20	RT = 8	ST = 10	
Fases a Tierra	RN = 2,8	SN = 2,8	TN = 1,2	

H: condiciones humedas

3- Sistemas de Puestz a Tierra **CONFORME**

ESTRUCTURA	OHMIOS M.T.			
	MT	B.T	M.T.	MEDIDOR
PMI + RECLOSER	2.18	2.08	1.83	2.00
SAB180	8.1	8.00	8.81	

VALORES ACEPTABLES

R.D. N° 018-2002-EM/DGE

N

≥ 100 MΩ

≥ 50 MΩ

VALORES ACEPTABLES

ONE

MT ≤ 25 Ω

8. FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS DEL INTERESADO

9. FIRMAS:

Victor Felipe Dominguez Malo
DOMINGUEZ MALO VICTOR FELIPE
 ING. MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. Colegio de Ingenieros CIP N° 283947

Carlos Tomas Aza Santamaria
Carlos Tomas Aza Santamaria
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. DEL COLEGIO DE INGENIEROS N° 56030

Jorge Alva Espinoza
JORGE ALVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 10717

Arturo Arboleda Gomez
Arturo Arboleda Gómez
 Ing. Mecánico Electricista
 C.I.P. 82918

Christina Aza Trujillo
Christina Aza Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 63105

METRADO DE MATERIALES


"SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN 16-23kV, PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL DISEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE",
 PROPIETARIO : FONDERES
 UBICACIÓN : SAN JOSE - LAMBAYEQUE
 DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO, LAMBAYEQUE.
 FECHA : 28/02/2019

A.- SUMINISTRO DE MATERIALES			
POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO			
1.00	Loza soporte C.A.V. 1.37/50/320	Pza.	1.0
1.01	Loza soporte C.A.V. 1.17/50/320	Pza.	2.0
1.02	Medio palomilla de C.A.V de 1.5/100/275	Pza.	2.0
1.03	Medio palomilla de C.A.V de 1.17/100/275	Pza.	2.0
1.04	Mensura C.A.V de 1.00/215	Pza.	1.0
1.05	Mensura C.A.V de 1.00/245	Pza.	2.0
1.06	Mensura C.A.V de 1.50/215	Pza.	2.0
1.07	Mensura C.A.V de 1.50/245	Pza.	13.0
1.08	Mensura C.A.V de 1.50/250	Pza.	31.0
1.09	Poste de C.A.C de 15/400/225/450	Pza.	10.0
1.10	Poste de C.A.C de 15/400/225/450	Pza.	1.0
1.11	Poste de C.A.C de 13/300/180/375	Pza.	5.0
1.12	Poste de C.A.C de 13/400/180/375	Pza.	5.0
1.13	Duco concreto 4 Vías	Pza.	12.0
		Pza.	35.0
CONDUCTORES			
2.00	Conductor de Aluminio tipo (AAAC) engrasado/cableado de 50 mm ² 7 hilos		
2.01	Cable N2XSy 50mm ² 18/30 KV	m.	2703.7
2.02	Conductor de Cobre desnudo temple blando 35 mm ²	m.	393.9
2.03	Conductor de Cobre desnudo temple duro 35 mm ²	m.	540.0
2.04	Conductor de Cobre desnudo temple duro 35 mm ²	m.	60.0
2.05	Conductor NYJ. 3x 240 mm ² + 1x120 mm ² 1.0KV	m.	61.0
2.06	Cinta serializadora de color rojo para protección del cable N2XSy	m.	100.0
2.07		m.	50.0
ASLADORES Y ACCESORIOS			
3.00	Aslador de Polimérico tipo PIN 36 KV, L=920mm	Pza.	42.0
3.01	Asladores Polimérico de Suspensión y anclaje Clevis-Tongue 35 KV L=1060mm	Pza.	81.0
3.02	Cinta Plana de armar de aluminio para protección de conductor	m.	81.0
3.03	Grapa de anclaje de Al Tipo pistón de 2 pernos para cable de 35-50 mm ²	Pza.	54.0
3.04	Plancha Tipo "J" de Cu para contactor/culter ferretería	Pza.	81.0
3.05	Varilla pretensada de Al para conductor de 50mm ²	Pza.	21.0
3.07	Alambre de Amarré de aluminio de 10 mm ²	m.	83.5
ACCESORIOS DE CONDUCTOR			
4.00	Terminal exterior Termocontráctil 28 Kv, para conductor de 50 mm ²	Kil	9.0
4.01	Conector Cuna tipo Ampac de 50/50 mm ²	Pza.	30.0
4.02	Conector Cuna tipo Ampac de 50/35 mm ²	Pza.	12.0
4.03	Conector Cuna tipo UDC. 35/35 mm ²	Pza.	40.0
4.04			
FERRISTERIA			
5.00	Arandela cuadrada curvada de Aço de 57mm x 57mm x 5mm, hueco de 19 mm Ø	Pza.	12.0
5.01	Arandela cuadrada plana de Aço de 57mm x 57mm x 5mm, hueco de 19 mm Ø	Pza.	138.0
5.02	Arandela cuadrada plana de Aço de 57mm x 57mm x 5mm, hueco de 19 mm Ø	Pza.	90.0
5.03	Fleje de acero inoxidable 19 mm	m	94.0
5.04	Helilla de acero inoxidable para fleje de acero de 19 mm	Pza.	84.0
5.05	Perno de doble armado de Aço en caliente de 16 mm Ø x 500 mm de longitud con 2 anillos de presión y 4 tuercas	Pza.	66.0
5.06	Perno Op Aço forjado por Inmersión en caliente de 19 mm Ø x 254 mm de Long. Con arandela, anillo de presión, tuerca y contratuercas.	Pza.	39.0
5.07	Perno Op Aço forjado por Inmersión en caliente de 19 mm Ø x 304.8 mm de Long. Con arandela, anillo de presión, tuerca y contratuercas	Pza.	9.0
5.08	Tuerca Op Aço. 18mm Ø	Pza.	3.0
5.09			
RETENIDAS			
6.00	PERNO ANGULAR A.C. DE 5/6"x10" CON TUERCA Y ARAND.	Pza.	13.0
7.01.1	Absorbente de arena 2.08 m ³ para entorché	KG	117.0
7.01.2	Asfidoses Polimérico de Suspensión, anclaje Clevis-Tongue 35 KV, L=1060mm	Pza.	13.0
7.01.3	Arandela Cuadrada Aço de 102 mm x 102 mm x 5mm con hueco de 18 mm Ø	Pza.	11.0
7.01.4	Brazo Contratuercas Aço de 50 mm Ø x 1.5 m contratuercas de Aço	Pza.	13.0
7.01.5	Cable de AçoG. 7 h. 10mm.	m	234.0
7.01.6	Carabela guardacable de F.G. 1.6 mm x 2400 mm.	u	13.0
7.01.7	Guardacabo para Retenida A.C.	m	24.0
7.01.8	Grilleto A.C. forjado por Inmersión en caliente de 16 mm x 150 mm de abertura x 200 mm de longitud con pasador	Pza.	26.0
7.01.9	Morzetas Pretensadas de A.C. de 10mm Ø y 60mm de largo.	Pza.	62.0
7.01.10	Varilla de anclaje con guardacabo de A.C. de 16mm Ø x 2.40m de longitud con arandela y tuerca.	Pza.	13.0
7.01.11	Bloque de anclaje C.A.V. 0.5x0.5x0.2 m	u	13.0
7.01.12			
EQUIPO DE PUESTA TIERRA:			
7	Doce de Troquel	Cola	81.0
7.01.1	Conector de Bronce Tipo AB para varilla de 16 mm	Pza.	27.0
7.01.2	Tierra de cultivo	m3	81.0
7.01.1	Electrodo Cooperweld de 16mm Ø x 2.40 m	Pza.	25.0
7.01.2	Electrodo Cobre de 5/8 mm ² x 2.40 m	Pza.	2.0
7.01.4	Cable Fibras circular con lapa	Pza.	27.0
7.01.1	Protector Anillo huro	Pza.	27.0
7.01.2	Bolsa de Bentonita 50 KG	Bolsas	28.0
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE PROTECCION			
8.00	Fusible de explosión tipo K, 20A	Pza.	3.0
8.01	Fusible de explosión tipo K, 25A	Pza.	1.0
8.02	Seccionador Fusible del tipo CUT OUT Polimérico Tipo C para 38 KV, 100 A, 150 KV BIL, 10KA, L.F=940 mm	Pza.	6.0
8.04	Receptor de 27 KV, 630 A, 20KA con labero de control	Pza.	1.0

[Firma]
ALDO VITOCHEDA GONZALEZ
 Ing. Mecánico Electricista
 C.I.P. 22444


[Firma]
DOMINGUEZ MALO VICTOR FELIPE
 ING. MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. Colegio de Ingenieros CIP N° 263482


9.00	TRANSFORMADORES, PROTECCIÓN Y MEDIDA		
9.01	Transformador 400KVA, 3Ø (10-22,9) / 0,40-0,230 KV; ONAN, Dyn5-YNynn6Alt. 1 000 msnm		
9.02	Trafomix (10- 22,9) / 0,220 KV 20-8/5A ONAN, TME-33 Clase de precisión 0,2S, Alt. 1 000 msnm	Pza.	1.0
		Pza.	1.0
10.00	PROTECCIÓN DE ACOMETIDA BAJA TENSIÓN		
10.01	Interruptor Termomagnético Trifásico, 3X630 Amp; 690V		
10.02	Tablero de Distribución 0.8x0.8x0.3	Pza.	1.0
		Pza.	1.0
11.00	SISTEMA DE MEDICIÓN EN MEDIA TENSIÓN		
11.01	Medidor electrónico de 04 hilos, tipo A1RLQ+, para sistema con puerto RS485, tipo multifunciones		
11.02	Caja metálica portamedidor	Pza.	1.0
11.03	Mureta de concreto 0.60x0.2x1.40 incluye base, Sobrebase	Pza.	1.0
11.04	Conductor Cu, Forrado, tipo NPT de sección 4x2,5mm ² para bobinado de tensión	Gbl	1.0
11.05	Conductor Cu, Forrado, tipo NPT de sección 4x4mm ² para bobinado de corriente	m	12.0
		m	12.0
12.00	Otros		
12.01	Soporte de TUBO DE A*G* para soporte de cable N2XSY de 50 mm ²		
12.02	Tubo PVC - SAP de 100 mm (4") Ø x 6 m	Pza.	1.0
12.02	Tubo PVC - SAP de 25 mm (1") Ø x 6 m	u	1.0
12.02	Curva PVC - SAP de 25 mm (1") Ø	u	1.0
12.02	TUBO DE A*G* DE 4"ØX6m DE LARGO	u	4.0
12.02	Sicabum	u	4.0
12.02	Platina para media loza SAB. incluye accesorios	u	2.0
		u	4.0


 Carlos Tomas Aza Santamaria
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. DEL COLEGIO DE INGENIEROS N° 56030


 Arturo Arboleda Gómez
 Ing. Mecánico Electricista
 C.L.R. 82818/


 DOMINGUEZ MALO VICTOR FELIPE
 ING. MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. Colegio de Ingenieros CIP N° 203947


 JUAN JOSÉ ALVA ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 10717


 Christian Alva Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 63105

**Cuaderno
de obra
(Copia)**


CUADERNO DE OBRA

Nº 73

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE" 022
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____


VICUE ASIERTO 2419 31.08.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

hasta que la entidad nos alcance la absolución de la consulta referente a la optimización del análisis estructural desde el eje 211 al 220 (zona cabeza) la cual sigue generando atrasos no atribuibles al contratista.


Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 63105

ASIERTO N° 2420 31.08.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se comunica al Supervisor de obra que continuamos inhabilitados de continuar con los trabajos en la zona de mar como son las partidas on'ltas 09.04.04 Nucleos llenados In-Situ, 07.04.05 Trazos longitudinales y Transversales, 07.04.06 Losas Uscadas In-Situ motivada por la falta de la absolución de la consulta del referendo en la zona del Cabezo denominado OPTIMIZACIÓN DEL ANALISIS ESTRUCTURAL DESDE EL EJE 211 AL 220.



Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 63105

ASIERTO N° 2421 03.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se comunica al Supervisor de obra que a la fecha no se tiene la absolución de la consulta referente a la plataforma baja (detalle de la estructura y componentes estructurales),

solo se recibió por parte de la entidad la Carta N° E/19-2019-REDOPES (ordenado adjuntando los Planos Actualizados AM-03 y EM-01 donde nos ordena y confirma la dirección del Cabezo desde el Eje 211 al eje 220 y detallando las conclusiones en nuestro oficio de cuaderno de obra
Continúa...

ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 63105

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº 74

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA PARA CONSUMO"
PROGRAMA: HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA
ENTIDAD EJECUTORA: DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"

Vista ASIENTO N°: 2421 03.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

N° 2378 de fecha 01.08.2019, sin embargo a ello comunicamos y reiteramos la consulta respecto a la plataforma baja en esta oportunidad comunicamos que ya fueron suministrados los metrados (Asiento N° 2378 del 30.06.2019) correspondientes al Cabezo, encontrando mayores metrados que probablemente correspondan a los trabajos en la zona denominada plataforma baja que son las siguientes partidas:

07.04.06.01 Concreto en Losas $f'c = 280 \text{ Kg/cm}^2$ y 07.04.06.03 Acero de Refuerzo $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$, estos metrados no concuerdan con las especificaciones técnicas, por lo que se solicita al Supervisor de Obra elevar nuestra consulta a la entidad para que nos eleve los planos de la plataforma baja considerando dimensiones, ubicación, cantidad de pilotes y demás detalles constructivos para su ejecución de ser el caso.



Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

Asiento N° 2422 Del Supervisor 03/09/2019
El contratista a través del gerente anterior está solicitando la definición de las cantidades y metrados de "plataforma baja" por cuanto la Entidad a la fecha no hace la entrega de los planos respectivos de este ítem.

Una vez que se adjunte los planos oficiales, se pondrá de funcionamiento de FONDEPES, de manera que los funcionarios de las diferentes especialidades y del contratista definan plenamente los metrados, precios unitarios de cada partida y se fijen oficialmente.

Los detalles de los trabajos, así como las dimensiones y precios

ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105


ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº 75

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO
PROYECTO: HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA
PROGRAMA: DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE".
ENTIDAD EJECUTORA: _____

---//
Postes, elevaciones, etc deberán estar definidos y planificados por ambas partes de manera que no exista dudas de caracteres técnicos que represente demora en ejecución.
En consecuencia FUNDIPES debe agilizar la entrega de planos pendientes ("plataformas bajas") lo antes posible.
El personal técnico del contratista, dependiente o Entidad colaborará en el sentido de definir los métodos ("mayores y menores") y finalmente en hacer a los rendimientos, para agilizar el plazo final de la obra.
Javier J. J.

ASIENTO N° 2423 07.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se comienza al Supervisor de obra que se recibió la Carta N° 897-2019 - FONDIPES/DIGEDIPAMA respecto a la aprobación de consulta referente a los Postes Metálicos del Muelle y Cabezo donde concluye que será tipo Metálico de diámetro exterior superior de 3" y de forma cónica donde nos adjunta una cotización en el referente poste en la característica principal la cual es en poste cónico octogonal de 8m. galvanizado en caliente, por lo tanto teniendo abierta la consulta respecto a los postes metálicos se solicita la autorización a la Dirección para su ejecución después de tener la respuesta por parte de la entidad.

Se solicita al Supervisor de obra, la autorización para el limado y descabezado de pilotes verticales en el eje 214, correspondiente a los pilotes del Cuarto eje del Cabezo. Asimismo, se solicita la autorización para el traslado, ubicación de la Uiga prefabricada y traslado de la unión viga-pilote en el mismo eje.

ING. INSPECTOR
ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105
ING. SUPERVISOR
Javier J. J.

CUADERNO DE OBRA

Nº 76

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____


CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSUMO
HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA

219

DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE.

Mostró N° 242 y Del Supervisor 09/09/2019.


El contratista ha receivados la Carta N° 894-2019-FONOPRES/D dirigida a los
postos metálicos del muelle y calage aborolivos. La consulta del Contratista
La carta que incluye informe técnico del conductor y equipamiento que
concluyen que los postes metálicos de Ø 100 x 3" (seuido, deljustado)
adecuado su plano del las características que en el 2 indican en consecuencia
teniendo el Contratista los documentos técnico y copias al respecto. La autor
Uision autoriza la continuación de estos trabajos (Postos metálicos de muelle y
calage).





ASISTENTE N.º 2425 09.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se solicita al Supervisor de obra, la autorización para el traslado y abarado de
lasos Almacenas Refabricados y Vigas Guarderas de borde en las Casillas 213
y 214 del Calage.

Se solicita al Exponen de obra, retirar a la Entidad la exhibición de recibos, curules
Formulada en oficio N.º 2378 de fecha 15.08.2019, en donde hacemos referencia a nuestra
Carta N.º 085-2019-CST/PO la cual da actuación a la Carta de la Entidad N.º 815-2019-
FONOPRES/LAMBAYEQUE y en la cual, se exponen que la Entidad en la que y nos alance de maner
Por una/ mediante expediente la puzes te recibidas en la abaración de los recibos aliamen
de la tubería y cambio de calibre de conductos eléctricos proyectados desde lasorilla
de los trabajadores hasta la llegada de los motores. También en dicho procedimiento
se informo que estos trabajos fueron realizados al día de recepción de la
referida Carta (01.08.2019).


Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105


Christian M. Meza Trujillo
ING. RESIDENTE


Christian M. Meza Trujillo
ING. SUPERVISOR

ING. INSPECTOR
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

CUADERNO DE OBRA

Nº 77

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____


PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO" 018

PROGRAMA: HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA

ENTIDAD EJECUTORA: "DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE".

Asiento Nº 2426 Del Supervisor 09/09/2019

Se autoriza al contratista la ejecución de los trabajos del asiento anterior Ejecutado lo señalado por el contratista en el asiento Nº 2425 referido a la nueva adecuación de los diámetros de la tubería y cambio de calibre de conductores eléctricos deberán ser sufragados dicha solicitud por parte de la entidad y se ha verificado que estos se encuentran paralizados a partir del 01/09/19. En la fecha indicada se verificó dicha paralización.



ASIENTO Nº 2427 10.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se solicita al Supervisor de obra, la autorización para el lineado y descobrado de Pilotes Inclinados entre los Ejes 213-214, correspondientes a los pilotes del Segundo Núcleo del Cebazo.



Christian M. Moza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 63105


ASIENTO Nº 2428 10.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se comunica al Supervisor de obra que hoy se recibió la Carta Nº 912-2019 - FONDEFES/DIGEMINARA desde la Entidad nos adjunta la memoria de Cálculo Estructural para el framo del Eje 211 al 220 y los planos EM-02" y EP-06" donde parte de sus conclusiones señala lo siguiente:

... "Después de realizar el incremento en la Cantidad de Pilotes (16), se puede asegurar la estabilidad lateral en etapa de operación. Ha sido necesario emplear en el modelo mixto pilotes de α fuerza inclinados (H.V 1.4)

ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE
Christian M. Moza Trujillo
INGENIERO CIVIL


ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº 78


FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: **"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"** 017
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

Viene Asiento N° 2428 10.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

para mejorar la estabilidad y de esta manera la grua pose sobre paños durante la construcción con seguridad así como la etapa de servicio."


Además se observa en el plano EM-02" el cuadro del resumen a otros de pilotes que señala una altura de hincado de 1.60m.

De toda la documentación recibida por la entidad se concluye que corresponde a la observación de nuestra consulta referente a la falta de perforación de los pilotes entre los ejes 211 al 220 mencionados en los asientos N° 1730 de fecha 07.05.2018 y reiterado en los asientos N° 2166 de fecha 04.04.2019 y N° 2361 de fecha 26.07.20 queda observada (Cierre de Casera) en la mancha de corte donde se está considerando el refuerzo de cemento de los pilotes de seis o para los ejes 211 al 220 sin embargo esta observación genera la modificación en la cimentación del Cabezó y del Muro Constructivo.



Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

Asiento N° 2429 Del Superior

Se autoriza al contratista la ejecución de los trabajos del asiento anterior. Asimismo el contratista manifestó que ha recibido la memoria descriptiva del cálculo estructural del tramo ejes 211 al 227, así mismo los detalles de los planos KM-2 y EP-06. Agrega además FONDEPES, las mejoras por la GRUA en cuanto a su estabilidad, cuadro resumen de # de pilotes a utilizar en el reforzamiento en su totalidad. En consecuencia a la fecha la entidad no tiene consulta en este aspecto por tanto la supervisión solicita la emisión de dicha resolución agregando además el plazo que requieren a partir de esa fecha en la que se presentará la solicitud de ampliación de plazo conforme lo indica en el Asiento N° 2428.



ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105


ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA


Nº 79

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA PARA CONSUMO HUMANOS DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE" 010
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____


ASIENTO Nº 2480 11.09.2019 DEL PRESIDENTE DE OBRA.


Se comunica al Supervisor de Obra que después de recibido la Carta Nº 912-2019-RENDERES/DIGERSAP de fecha 10.09.2019 donde la entidad recibió con la distribución de nuestra consulta del Asiento Nº 1930 (de fecha 09.05.2018) y recibido con los asientos Nº 2166 (de fecha 04.04.2019) y Nº 2361 (de fecha 26.07.2019) respecto a la selección técnica por falta de empírico que debe tener el hombre del Cabezo (Referencia con Pilotes los ejes 211 al 220) por lo que esta situación genera no poder ejecutar trabajos contractuales, como son los ítems 07.04.04 Módulos Unidos In-situ, 07.04.05 Juntas Longitudinales y Transversales y la partida 07.04.06 Losas Verticales In-situ motivados por la demora en la ejecución de nuestra consulta, la cual permitiría continuar con las partidas contractuales que debieron ser ejecutadas de acuerdo a la programación actual vigente; así mismo ha modificado la ruta crítica, siendo esta una causal de ampliación de Plazo, por atraso y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista según el artículo Nº 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Por lo tanto, solicitamos la Ampliación de Plazo Nº 32 por 135 días calendario, alegando mediante Carta Nº 095-2019-CSJ/EO el expediente de solicitud de Ampliación de Plazo conforme a los artículos 196, 200 y 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. Nº 184-2008-EF y modificado por D.S. Nº 138-2012-EF, con lo cual sustentamos y sustentamos el plazo solicitado debido de hechos ajenos a nuestra voluntad, cuya causal se fundamenta en Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista, solicitando dar el trámite respectivo ante la Entidad. (fin de obra de causal).


Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 83103

ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 83103


ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº

80

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE". 015

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

Asunto Nº 2431 Del Supervisor 11/09/2019.
En la fecha el contratista está presentado la Oclitud de Ampliación de plazo nº 32 motivada por la abstracción de su consulta referente a la falta de empotramiento que debe tener el tramo del cabezo, siendo absuelta la consulta mediante el reformato de pilotes entre los ejes 211 al 220. Esta causal está prevista en lo artículo 196, 200 y 201 del RLC por atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al Contratista.

La superación evaluará el contenido de la Carta Nº 95-2019-057/P y emitirá su pronunciamiento después de los plazos y formalidades indicados en el RLC.

José A. A.

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

José A. A.
ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº

81

FECHA:

MODALIDAD:

OBRA:

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA PARA CONSUMO

PROGRAMA:

PLANEO DIRECTO DE SAN JOSÉ DE LOS RIOS, SAN JOSÉ PROVINCIA

ENTIDAD EJECUTORA:

DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE.

ASELTO N.º 2432

14.09.2019

DEL RESERVADE DE OBRA.

SE comunica a Supervisor de obra que se recibió por parte de la Entidad la Carta N.º 910-2019-FORADRES/DISEÑADA donde nos remiten documentos técnicos necesarios para la ejecución del tramo del ferrocarril tipo cobre comprendido entre los ejes 211 a/ 220, los mismos que comprenden la memoria de cálculo estructural, así como los planos EM-02" y EP-06" a efectos de poder continuar con los trabajos en los ejes indicados. Comunicamos que la relación técnica planteada consiste en el referencial técnico adicional de los pilotes de concreto de 50x50 cm de sección, comprendidos entre los ejes 211 a/ 220 (a car/est/ modificaciones al proceso constructivo inicial, generándose trabajos adicionales no contemplados en el expediente inicial, generándose trabajos adicionales respecto de la revisión de los documentos a levantados se aplican métodos adicionales indicados en los planos EM-02" y EP-06", la cual debe ir en un presupuesto adicional.

Por lo tanto, en cumplimiento al Artículo N.º 207 del Reglamento de la Ley de Ordenaciones del Estado comunicamos al Supervisor de obra la necesidad de traer la autorización de la ejecución de trabajos adicionales y por consiguiente a la entidad nuestra solicitud, donde la entidad deberá de definir si la elaboración del Expediente Técnico de dicho material adicional estará en cargo o de en consultor externo ya que por la naturaleza y complejidad que representa se asistire de elaborar dicho expediente. Se solicita al ingeniero Supervisor la colaboración correspondiente y concurrir a la entidad la necesidad de elaborar el Expediente Técnico de trabajos adicionales correspondientes su complejidad.

Christian M. Meza Jujiño
INGENIERO CIVIL
CIP N.º 63105

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

Christian M. Meza Jujiño
INGENIERO CIVIL
CIP N.º 63105

CUADERNO DE OBRA

N°

81

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANOS" 013

PROGRAMA: HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE

ENTIDAD EJECUTORA: DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE


ASIENTO N° 2432 14.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se comunica al Supervisor de obra que se recibió por parte de la Entidad la Carta N° 912-2019-FONDEDES/DIGENIPAA donde nos remiten documentos técnicos necesarios para la ejecución del tramo del muelle tipo cabeza comprendido entre los ejes 211 al 220, los mismos que comprenden la memoria de cálculo estructural, así como los planos EM-02" y EP-06" a efectos de poder continuar con los trabajos en los ejes indicados. Comunicamos que la solución técnica planteada consiste en el reforzamiento adicional de 16 pilotes de concreto de 50x50 cm de sección, comprendidos entre los ejes 211 al 220 (a cual este modificando el proceso constructivo inicial, generándose trabajos adicionales no contemplados en el Expediente Inicial.


Después de la revisión de los documentos a los mismos se aprueba métodos adicionales indicados en los planos EM-02" y EP-06", lo cual dará origen a un presupuesto adicional.

Por lo tanto, en cumplimiento al Artículo N° 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado comunicamos al Supervisor de obra la necesidad de tramitar la autorización de la ejecución de prestación adicional y que comunique a la entidad nuestra solicitud, donde la entidad deberá de definir si la elaboración del Expediente Técnico de dicha prestación adicional estará a su cargo o de un consultor externo ya que por la naturaleza y complejidad mi representada se abstiene de elaborar dicho expediente.

Se solicita al ingeniero supervisor la colaboración correspondiente y comunique a la entidad la necesidad de elaborar el Expediente Técnico de prestación adicional considerando su complejidad.


Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105


ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA


Nº 82

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE" 012
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

Asiento Nº 2433, Del Supervisor


14/09/2019

El supervisor dará atención al asiento Nº 2432 del Residente de Obra donde se ha verificado mediante la memoria de Cálculo estructural y los planos EM-02 EP-06" no fueron contemplados en el Expediente Técnico inicial, por lo tanto, estos trabajos que corresponden al reforzamiento de la zona del muelle tipo cabeza genera la necesidad de elaborar un Exp. Técnico de una prestación adicional de Obra motivada por la absolución de la consulta recibida por la entidad a mi representada con Carta Nº 913-2019-FONDEPES/O. En cumplimiento del Art. 207 del RLCE se comunicará a la entidad que defina la elaboración del Expediente Técnico de la prestación adicional, ya que, es necesario la ejecución de dicho adicional para el cumplimiento de la nota del proyecto.



ASIENTO Nº 2434 15/09/2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se solicita al Supervisor de obra, la autorización para el anclado y descabotado de Pilotes Verticales en el Eje 215, correspondiente a los Pilotes del Dicho Eje del Cabezo. Asimismo, se solicita la autorización para el traslado, colocación de la viga prefabricada y vaciado de la unión viga-pilote en el mismo eje.


Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 63105


ASIENTO Nº 2435, Del Supervisor

15/09/2019.

Se autoriza al Contratista el transporte e hincado de pilotes verticales a ser ubicados en el eje 215 (Dicho eje zona del cabezo). Se autoriza así mismo el transporte y colocación de la viga prefabricada en el mismo eje. El Contratista debe implementar las medidas de seguridad en el transporte de dicho elemento.

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE


Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 63105

ING. SUPERVISOR


CUADERNO DE OBRA

Nº 011
83


FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSUMO
PROYECTO: HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA
PROGRAMA: DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE".
ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO Nº 2436 16.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se solicita al Supervisor de obra, la autorización para el traslado y colocación de losas hexadas prefabricadas y vigas Guarderas de Zende entre los ejes 214 y 215 del cabezo.


Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 63105

Asiento Nº 2437, Del Supervisor 16/09/2019
Se autoriza al contratista el transporte y colocación de las losas hexadas prefabricadas y vigas Guarderas al ser ubicadas en los ejes 214-215 del cabezo. Se hace el consentimiento al Contratista que se exceptuó la Carta Nº 930-2019-FONDEPES/D. Relacionado a la Reemplazación de plazo Nº 31 - Calendario de avance de Obra actualizado aprobado.




ASIENTO N. 2438 18/09/2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se solicita al Supervisor de obra, la autorización para el vincado y desvincado de Pilotes Verticales en el Eje 216, correspondiente a los Pilotes del Sexto Eje del Cabezo. Asimismo, se solicita la autorización para el traslado, colocación de la viga prefabricada y vincado de la unión viga-pilote en el mismo eje.


Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 63105

Asiento Nº 2439, Del Supervisor 18/09/19
Se autoriza al contratista el transporte e hincado de pilotes a ser ubicados en el eje 216 (Pto eje zona cabezo). Así mismo se autoriza el transporte y colocación de la viga prefabricada en el mismo eje. El contratista debe mantener las medidas de seguridad en el transporte de estos elementos.

ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 63105


ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

010

Nº 84

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____


PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SEQUERA PARA CONSUMO

PROGRAMA: HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA


ENTIDAD EJECUTORA: DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"

ASIENTO N.º 2440 19/09/2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se solicita al Director de obra, la autorización para el traslado y ubicación de losas revadas prefabricadas y Vigas Guarderas de borde entre los ejes 215 y 216 del Cabezo.



Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N.º 83193

Asiento N.º 2441, Del Supervisor 19/09/2019.
Se autoriza al contratista el traslado de colocación de las losas revadas prefabricadas y vigas guarderas a ser ubicadas en los ejes 215-216 del cabezo. El contratista debe mantener las medidas de seguridad a la realización de los trabajos.




ASIENTO N.º 2442 20/09/2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.


Se solicita al Director de obra, la autorización para el hincado y descabezado de pilotes inclinados entre los ejes 215-216, correspondiente a los pilotes del Tercer Núcleo del Cabezo.


Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N.º 83193

Asiento N.º 2443, Del Supervisor Fecha: 20/09/2019
Se autoriza al contratista efectuar el hincado y descabezado de pilotes hincados que se ubican sobre los ejes 215-216 correspondiente al tercer núcleo del cabezo. Dichos pilotes corresponden al Reforza miento del muelle tipo cabezo entre los ejes 211-220.



ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N.º 83193

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

000

Nº 85

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 2444 20/09/2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se comunica al Supervisor de Obra que se ingresó la Carta N° 097-2019-CSS/CO en atención a la Carta N° 820-2019-FONDES/DIGEMINA donde comunicamos los siguientes puntos:

- 1.- Como ya se tiene la conformidad por parte de la entidad respecto a la ubicación de la Carreta de Bombeo ubicada en la Progresiva 0757, mi representada procederá a construir la carreta y tuberías de electrobombas correspondiente a los trabajos del Adicional N° 05.
- 2.- Se ha certificado la Altura Dinámica Total (ADT) necesaria para el recamdo del agua salada desde la carreta de Bombeo (Prog. 0757) hasta la ubicación de la cisterna también de agua salada, fijando como recamdo en total de 892.73 m. (se anexa cuadro de Cálculo)
- 3.- Respecto a las características que deberán tener las electrobombas, se adjunta esta carta las características que deberá tener las bombas para el correcto funcionamiento del abastecimiento del agua salada adjuntando el cálculo sustento.

PROPUESTA DE ELECTROBOMBAS SEGÚN EL MERCADO LOCAL

N° de Equipos	:	02
Costo (C/ps)	:	4.70
Altura Dinámica Total (m) / según curva del fabricante:	:	26.00
Potencia Estimada (hp)	:	5.70
Potencia según curva (hp)	:	4.00

Para este punto, se está solicitando a la entidad aprobar las electrobombas con las características señaladas líneas arriba para su ejecución ya que cumplirá para el correcto funcionamiento.

- 4.- Referente al sistema de abastecimiento de agua salada, este no cuenta con un sistema de filtrado ni en la Captación ni en la zona de almacenamiento (cisterna) por lo que se está contemplado en el Expediente Técnico del

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 83105

ING. SUPERVISOR

Continúa...

CUADERNO DE OBRA

Nº 86

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: **"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA PARA CC. S. M. O"**

PROGRAMA: **HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROV. S. M. O**

ENTIDAD EJECUTORA: **DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"**

... *Uruce Asiento 2444 20/09/2019 No. 2 RESOLUCIÓN DE OBRA.*

Adicional N.º 05 ni Expediente Contractual, por lo tanto no es responsabilidad del Contratista poder resolverlo, sin embargo la entidad podría adecuar el sistema de filtrado, después de culminar el trabajo de abastecimiento de agua salada o generar una prestación adicional de obra motivada por la adecuación del sistema de filtrado no considerados inicialmente.

Por los puntos expuestos se está solicitando a la entidad apruebe las electrobombas con las características adjuntas y defina si se va a generar la necesidad de la prestación adicional referente al sistema de filtrado de agua salada.

[Signature]
CIP Nº 30105

Asiento Nº 2445, Del Supervisor

20/09/2019

Respecto a la anotación en el Asiento Nº 2444 del Residente de Obra señala que su representada mediante Carta Nº 077-2019-CSJ/CO se sustentado mediante cálculos las características necesarias que deberán tener las electrobombas que no será motivo de adicional, además se ha triplicado también que el sistema de abastecimiento de agua salada no cuenta con sistema de filtrado y su adecuación generaría una prestación adicional ya que modifica el Expediente Técnico inicial.

La entidad tiene que resolver o plantear una adecuación al sistema de filtrado pues que ella triplicó su necesidad.

Esta supervisión sugiere que la Contratista avance con los trabajos relacionados al sistema de suministro de agua salada como es el abastecimiento de las tuberías de HDPE de 3" y también con la tubería de 1 1/2" para el agua potable ubicada sobre el muelle.

[Signature]

[Signature]

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 30105

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

007

Nº

87

FECHA:

MODALIDAD:

OBRA:

CONST

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSUMO

PROYECTO:

HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE PROVINCIA

PROGRAMA:

DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE

ENTIDAD EJECUTORA:

ASIENTO N° 24476

20/09/2019

PER RESIDENCIA DE OBRA,

Se comunique al Supervisor de obra que se ingresó la Carta N° 096-2019-CST/OS

a la entidad en fecha al Oficio N° 1273/22 por parte de la Gerencia de Obras
Pimentel donde hemos comunicado lo siguiente:

"La entidad es responsable de la obtención de los permisos, autorizaciones, permisos,
servidumbre y similares para la ejecución y construcción de obras, salvo en que
las bases se estipule que la provisión de estos corre a cargo del
contratista."

En este contexto siendo responsabilidad de la entidad presentar los permisos,
autorizaciones y permisos para la ejecución de la obra, se le envió el oficio
1273/22 a fin de disponer a quien correspondía, realice las diligencias
necesarias ante la Gerencia de Obras Pimentel, con la finalidad de que
se freyete el otorgamiento de Certificados de Requisitos de empresa
relacionados a la actividad económica: Resqueria clasificadora) de
naves.



Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

Asiento N° 24476 Del Supervisor

20/09/19

Se anexa al contratista el tramite e inicio de labores vestibles
a ser ubicada en el eje 215 (Quinta zona del di Calero). Se
anexa a su turno el expediente y planos de la zona preparada
en el mismo eje. El contratista debe mantener los horarios
de seguridad en todo momento de acuerdo. En relación al asunto que
preocupa al contratista, la supervisión expresa lo siguiente:
- La falta de un asunto administrativo que no involucra al contratista
ni a la supervisión.

- La entidad deberá realizar las coordinaciones y gestiones hacia la

ING. INSPECTOR

ING. PRESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

VA ASIENTO 24476
a la fecha →
ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº 88

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA COMERCIO

PROGRAMA: HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA

ENTIDAD EJECUTORA: DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"

000 VIENE DEL ASIENTO Nº 2447.

autoridad postuana con la finalidad de obtener las certificaciones y autorizaciones para la normal ejecución.

ASIENTO Nº 2448 25.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se comunica al Supervisor de obra que se recibió la Carta N° 327-2019-FONDEPES/16 desde nos adjunta la Resolución N° 155-2019-FONDEPES/66 resolviendo aprobar solo 40 días calculados, estableciéndose en consecuencia como fecha final de ejecución de la obra el 25 de octubre del 2019.

También se solicita al Supervisor de obra la autorización para el hincado y descabezado de Pilotes Verticales en el Eje 217, correspondiente a los pilotes del séptimo Eje del Cabezo. Asimismo se solicita la autorización para el traslado, colocación de la viga prefabricada y vaciado de la cuneta viga-pilote en el mismo eje.

Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

Asiento Nº 2449 Del Supervisor

Fecha: 25.09.19

Se toma conocimiento de lo indicado en el asiendo anterior por el Contratista. Así mismo se recibe por parte de FONDEPES la Carta N° 328-2019-FONDEPES/D donde se alcanza la Resolución N° 155-2019-FONDEPES/66 aprobando la ampliación de plazo N° 32 por 40 días estableciéndose como fecha final de ejecución de Obra el 25 de Octubre del 2019. Se autoriza el hincado y descabezado de pilotes verticales en el eje 217 (pilotes del séptimo eje del cabezo)

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº 005
89


FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA PARA CONEXIÓN
HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE
PROGRAMA: _____
DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE".
ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO Nº 2450 26.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se solicita al Supervisor de obra, la autorización para el traslado y colocación de losas nervadas prefabricadas y vigas cuadradas de Borde entrelas ejes 216 y 217 del Cabezo.



Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 63105

Asiento Nº 2451 Del Supervisor Fecha: 26/09/19
Se autoriza la colocación de losas nervadas prefabricadas y vigas cuadradas en el eje 216 y 217 del Cabezo.




ASIENTO Nº 2452 27.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se solicita al Supervisor de obra, la autorización para el hincado y descabotado de Pilotes Verticales en el Eje 218, correspondiente a las Pilotes del octavo eje del Cabezo. Asimismo se solicita la autorización para el traslado, colocación de la viga prefabricada y hincado de la Unión Viga-Pilote en el mismo eje.


Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 63105

Asiento Nº 2453 Del Supervisor Fecha: 27/09/2019
Se autoriza el hincado y descabotado de pilotes verticales en el eje 218 (Octavo eje del cabezo). Se autoriza y verifica el vaciado de concreto premezclado de la unión viga-pilote en el octavo eje del cabezo.

ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 63105


ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA


004

Nº 90


FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE".
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO Nº 2454 29.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se solicita al Supervisor de obra, la autorización para el traslado y colocación de losas nervadas prefabricadas y Vigas Guarderas de concreto entre los ejes 217 y 218 del cabezo.


Christian M. Azoza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 83105

Orden Nº 2455 Del Supervisor Fecha: 29.09.2019
Se autoriza el traslado y colocación de losas nervadas prefabricadas y vigas guarderas en los ejes 217 y 218.



ASIENTO Nº 2456 30.09.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.


Se solicita al Supervisor de obra, la autorización para el hincado y descabezado de Pilotes inclinados entre los ejes 217-218, correspondientes a los Pilotes del Cuarto Nucleo del Cabezo.


Christian M. Azoza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 83105

Orden Nº 2457 Del Supervisor Fecha: 30.09.2019.
Se autoriza el hincado y descabezado de pilotes inclinados entre los ejes 217-218 (Cuarto nucleos del cabezo)

ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE
Christian M. Azoza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 83105


ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

Nº 91

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROMOTORA PARA CONSUMO

PROGRAMA: HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA

ENTIDAD EJECUTORA: DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE".

ASIENTO N° 2458 30.07.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se solicita al Supervisor de obra, manifestar a la entidad nuestra preocupación por el retraso en la obtención de nuestra consulta formulada en oficio N° 2378 de fecha 16.08.2019 y reiterada en nuestro oficio N° 2425 de fecha 09.07.2019, en donde hacemos referencia a nuestra carta N° 025-2019-CO/CO la cual da atención a la Carta de la Entidad N° 015-2019-FONPES/DIGEMINA y en la cual, esperamos que la entidad evalúe y nos elabore de manera formal mediante expediente la propuesta señalada en la elevación de los nuevos diámetros de la tubería y cambio de calibre de conductores eléctricos proyectados desde la salida de los taberos hasta la llegada de los motores del sistema de Agua Salada. También en dicha oportunidad se informó que estos trabajos fueron paralizados el día de recepción de la referida carta (01.08.2019).



Christian M. Meza Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 83185

Asiento N° 2459 Del Supervisor


Fecha: 30.09.2019

Se informa al Contratista que la presente Supervisión presentó a la entidad el Informe correspondiente referido a la consulta de ocurrencia dentro de los plazos correspondientes.

Se coordinará con la entidad para la entrega de manera formal la propuesta respecto a la adecuación de los nuevos diámetros de la tubería y cambio de calibre de conductores eléctricos.



ING. INSPECTOR


 ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 83185

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

002

Nº 92

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA PARA CONSUMO
 PROYECTO: HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA
 PROGRAMA: DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE".
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 2460 30.07.2019 DE PRESIDENTE DE OBRA -

Se detallan los metros cuadradas con el Supervisor de obra, correspondiente a la Valorización Contractual N° 57 - Septiembre 2019, solicitando su trámite respectivo ante la entidad:

SUB PRESUPUESTO 07

07	OBRAS EX MAR.	
07.04	Cabezo L=50.00m.	
07.04.04	Núcleos llenados In-Situ	
07.04.04.01	Concreto en Núcleos $f_c=280 \text{ Kg/cm}^2$	15.80 m ³
07.04.04.02	Encofrado y Desencofrado en Núcleos	32.00 m ²
07.04.04.03	Acero de Refuerzo $f_y=4200 \text{ Kg/cm}^2$	1050.66 Kg.
07.04.05	Juntas Longitudinales y Transversales	
07.04.05.01	Concreto en Viga Mandil $f_c=280 \text{ Kg/cm}^2$	20.21 m ³
07.04.05.02	Encofrado y Desencofrado en Viga Mandil	172.69 m ²
07.04.05.03	Acero de Refuerzo $f_y=4200 \text{ Kg/cm}^2$	5332.13 Kg.
07.04.08	Maneobra de Colección e Hincado de Pilotes, Vigas y Losas Cabezo	
07.04.08.01	Transporte de Pilote.	27.00 ucd.
07.04.08.02	Transporte de Viga Transversal	6.00 ucd.
07.04.08.03	Transporte de Losa Nervada	24.00 ucd.
07.04.08.06	Descabezado de Pilote	27.00 ucd.
07.04.08.07	Colección de Viga Transversal	6.00 ucd.
07.04.08.08	Colección de Losa Nervada.	24.00 ucd.

Se detallan los metros cuadradas con el Supervisor de obra, para la Valorización N° 65 - Septiembre 2019 del Adicional N° 04, solicitando su trámite respectivo ante la entidad:

02	OBRAS EX MAR.	
02.01	Muelle de Espigon L=950m.	
02.01.01	Concreto en Pilotes $f_c=950 \text{ Kg/cm}^2$	1.50 m ³
02.01.02	Aplicación de Epóxico para unión de Concreto nuevo con antiguo	28.42 m ²

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE
 Christian M. Nieza Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 63105

Christian M. Nieza Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 63105

ING. SUPERVISOR

Continúa...

CUADERNO DE OBRA

001
Nº 93

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO

PROGRAMA: HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA

ENTIDAD EJECUTORA: DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"

... Viene Asiento 2460 30.07.2019 DEL RESIDENTE DE OBRA.

Se detallan los métodos enclavados con el Supervisor de Obra, correspondiente a la Valoración de obra N° 19 - Septiembre 2019 del Adicional N° 07, solicitando su trámite respectivo ante la entidad.

01 Reforzamiento de Pilote con Riel de 20 16/14

01.01 obras en Mar

01.01.01 Plataforma de Colocación e Hincado de Pilotes, (Viga) y Losas Acoste

01.01.01.01 Punta Metálica de Pilote para facilitar lincado 27.00 cnd.

01.01.01.03 Hincado de Pilote en Selo Compacto 27.00 cnd.

Se detallan los métodos enclavados con el Supervisor de Obra, correspondiente a la Valoración de obra N° 07 - Septiembre 2019 del Adicional N° 10, solicitando su trámite respectivo ante la entidad.

01 Medida Tensión 10-22.9 KV.

01.16 Pruebas Eléctricas y Pruebas de Servicio


01.16.03 Costo de Conexión y Energización de la Red 01.00 g16.


Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105


Asiento N° 2461 Del Supervisor

Fecha: 30/09/2019.

El día de hoy se verifica los metros ejecutados durante el mes de septiembre y se realiza la conciliación de los mismos con el contratista detallados en el Asiento N° 2460.



ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE
Christian M. Meza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 63105


ING. SUPERVISOR
