



PERÚ

Ministerio de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

MEMORANDUM N° 6951 - 2019-FONDEPES/DIGENIPAA

CARGO

A : **GISSELA ZAPATA FLORES**
Coordinadora del Área de Logística

ASUNTO : **VALORIZACION QUINCENAL N° 01 MES DE NOVIEMBRE**
Obra: "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: PROYECTO IOARR: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"
Ubicación: Tambo de Mora – Chincha - Ica.
Contratista: SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A Y L S.A.C.

REFERENCIA : a) Contrato N°039-2019-FONDEPES
b) INFORME N°019-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JACR
c) Carta N° 04-2019-AGR/SUP/FONDEPES

FECHA : Lima, **11 8 DIC 2019.**

Es grato dirigirme a usted, para saludarle y manifestarle que, de acuerdo con lo indicado en el documento c) de la referencia, el supervisor de la obra "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: PROYECTO IOARR: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA", Ing. Albert Gonzales Rojas, ha solicitado el pago de la Valorización N°01, correspondiente al Contrato N°039-2019-FONDEPES - Ejecución de obra.

El supervisor presenta como monto final de la Valorización Quincenal N°01 la suma de S/. 31,875.01 (Treinta y Un Mil Ochocientos Setenta y Cinco con 01/100 Soles), con IGV, en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista, mencionándose que los cálculos de los reajustes de las valorizaciones, serán calculados a la etapa de liquidación de la obra.

Asimismo, conforme a lo solicitado y tal como se indica en el documento de la referencia b), el cual hago mío en todos sus extremos, se han cumplido con todos los requisitos establecidos en la Ley N°30225, Ley de Contrataciones y su Reglamento, el contrato, las bases integradas y demás documentos que forman parte integrante del expediente de contratación; por lo que esta Dirección concluye que la ENTIDAD debe proseguir con el trámite del pago de la Valorización Quincenal N°01, correspondiente al mes de Noviembre de 2019.

Atentamente,

ARQ. MIGUEL ANGEL SAAVEDRA TINEO
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (E)

FONDEPES
ÁREA LOGÍSTICA
18 DIC 2019
Hora: 12:49 pm





PERÚ

Ministerio
de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

CONFORMIDAD DE PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN DE OBRA

Conste por el presente documento, que el Director de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, al suscribir la presente, da su conformidad para realizar el pago por concepto de **Valorización Quincenal de Obra N° 01**, correspondiente al mes de **Noviembre del 2019** por la suma de **S/. 31,875.01 (Treinta y Un Mil Ochocientos Setenta y Cinco con 01/100 Soles)** incluido IGV, a favor de **SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A Y L S.A.C.**, encargado de la Ejecución de la Obra: **"CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: PROYECTO IOARR: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"**, según **Contrato N°039-2019-FONDEPES**.

Lima, 18 DIC 2019



ARQ. MIGUEL ANGEL SAAVEDRA TINEO
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (e)



PERÚ

Ministerio de la Producción



FONDEPES

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

18 DIC. 2019

Handwritten signature

INFORME N°019-2019/FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JACR

A : ING. JORGE ROBERTO ÑAHUE SIVIRICHI
Director General de Inversión Pesquero Artesanal y Acuícola

Asunto : VALORIZACION QUINCENAL N° 01 DE OBRA - MES DE NOVIEMBRE 2019
Obra: "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: PROYECTO IOARR:
"REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA,
PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA".

Referencia : a) Contrato N°039-2019-FONDEPES
b) Carta N° 04-2019-AGR/SUP/FONDEPES

Fecha : Lima, 13 de Diciembre del 2019

Tengo el agrado de dirigirme a usted, que con las referencias a), el suscrito ha recibido el documento de la referencia c), respecto a la valorización N° 01 de la obra indicada en el asunto que ejecuta el contratista SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A Y L S.A.C., al respecto informo lo siguiente:

1.0 ANTECEDENTES CONTRACTUALES

1.1 INFORMACIÓN DE LA OBRA:

Obra : "Proyecto IOARR: "Remodelación de Cerco Perimétrico, en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Tambo de Mora, Distrito de Tambo de Mora, Provincia de Chincha, Departamento Ica".

Ubicación :
Localidad : Tambo de Mora
Distrito : Tambo de Mora
Provincia : Chincha
Región : Ica
Entidad contratante : FONDEPES
Financiamiento : FONDEPES
Código de proyecto : 2453643
Modalidad de Ejecución : Contrata
Sistema de Contratación : A suma alzada
Denominación del proceso : A.S. N°045-2019-FONDEPES
Fecha Entrega de Terreno : 27 de Noviembre del 2019
Inicio de plazo de Ejecución : 28 de Noviembre del 2019
Término del plazo de ejecución : 27 de Enero del 2020
Presupuesto Base Ref. : S/. 634,073.80
Monto del Contrato de obra : S/. 570,666.42
Factor de relación : 0.9000
Plazo de Ejecución de obra : 60 días calendarios

1.2 INFORMACION DEL CONTRATISTA

Empresa Contratista : SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A Y L S.A.C.
Representante Legal del contratista : Alfonso Martin Mora Rodriguez
Dirección : Mz. H Lote 05 - Urb. Las Palmeras - Pisco - Pisco - Ica.



Handwritten signature and vertical text: JOSE ANTONIO ZACERES ROJAS, INGENIERO CIVIL, Reg. CIP N° 77799



PERÚ

Ministerio
de la Producción



FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Contrato : Contrato N°039-2019-FONDEPES
Fecha de Contrato de obra : 13 de Noviembre del 2019
Residente de Obra : Ing. Carlos Enrique Quintanilla Martinez
CIP N° 28592.

1.3 INFORMACION DE LA SUPERVISION

Supervisión de Obra : Ing. Albert Gonzales Rojas
CIP 171227
Dirección : Av. Lloque Yupanqui 903 – La Victoria - Chiclayo
Contrato : O/S 2835-2019
Fecha de Contrato de la Supervisión : 22 de Noviembre del 2019
Monto de Contrato de la Supervisión : Año 2019: S/. 11,000.00
Año 2020: S/. 11,000.00
Plazo Supervisión de Obra : 60 días calendarios
Fecha de Inicio de Servicio : 27 de Noviembre del 2019
Fecha de Término del Servicio : 26 de Enero del 2020

2.0 ANTECEDENTES

2.1 Con fecha 13 de Noviembre del 2019, se suscribió el **Contrato N°039-2019-FONDEPES** referente a la Contratación de la Ejecución de Obra con la empresa **SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A Y L S.A.C.**

2.2 Al respecto, la Cláusula Cuarta del Contrato N° 010-2018-FONDEPES, indica lo siguiente:
"LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de valorización mensual conforme a lo previsto en el numeral 3.14 del Capítulo III "Requerimiento" de la Sección específica de las Bases Integradas."

Asimismo, en las bases integradas, numeral 2.7 Valorizaciones, se indica lo siguiente:
"El periodo de valorización será quincena..."

De otro lado, reglamento de la ley de contrataciones menciona en su artículo 166.- Valorizaciones y metrados:


"166.1. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

166.2. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas."

2.3 Con fecha 22 de Noviembre del 2019, se emite la **Orden de Servicio N° 2835-2019** del **Supervisor de Obra**, a nombre del Ing. **Albert Gonzales Rojas**, quien asumirá la representación de la entidad ante el contratista de obra.

2.4 Mediante Carta N°1169-2019-FONDEPES, de fecha 26 de Noviembre de 2019, se notifica la designación del supervisor de obra.




JOSE ANTONIO CACERES ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 77799



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- 2.5 Mediante Carta N° 1168-2019-FONDEPES, de fecha 26 de Noviembre del 2019, se entrega el Expediente Técnico de la Obra mencionada en el numeral 2.1. al supervisor de obra, **Ing. Albert Gonzales Rojas**.
- 2.6 Con fecha 27 de noviembre de 2019, se hace la entrega del terreno al contratista de la obra **SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A Y L S.A.C.**, para la ejecución de la obra.
- 2.7 Asimismo, a través del siguiente cuadro se detallan los antecedentes de pago de valorizaciones de la obra:

N° de valorización	Tipo de pago ¹	Monto	Mes / Año	Fecha de recepción de la Carta	Coordinador de obra
01	Obra	S/. 31,875.01	Nov/2019	04/12/2019	José Antonio Cáceres Rojas

- 2.9. Mediante **Carta N° 04-2019-AGR/SUP/FONDEPES**, de fecha 04 de Diciembre del 2019, el supervisor de obra, **Ing. Albert Gonzales Rojas**, presenta a la entidad la valorización de obra N° 01, el cual es derivado al suscrito a para su trámite correspondiente.

3. BASE LEGAL

- 3.1 Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- 3.2 Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 3.3 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.
- 3.4 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- 3.5 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- 3.6 Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES.

4. ANALISIS.

- 4.1 De la copia de los asientos del cuaderno de obra, adjunto al expediente de valorización, puede verse que mediante el asiento N°10, el Supervisor manifiesta que la Residencia presenta la documentación de fin de mes para el trámite de la Valorización Quincenal 01.
- 4.2 El gráfico de la Curva S de avance físico es de 6.21% del contrato principal.
- 4.3 De la revisión al documento presentado por el supervisor se aprecia que se ha considerado para la presente valorización Instalaciones Provisionales y Trabajos Preliminares, los mismos que reflejan un costo directo de S/31,875.01 (Treinta y Un Mil Ochocientos Setenta y Cinco con 01/100 Soles).

¹ Obra, Adelanto directo o adelanto de materiales, Mayores metrados, Costo directo, Gastos generales, Valorizaciones de adicional de obra.



JOSE ANTONIO CACERES ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 77799



PERÚ


Ministerio
de la Producción



FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

4.4 El supervisor de obra, da su conformidad a la valorización N°01, realizando el cálculo con el siguiente detalle:

 RESUMEN DE VALORIZACION QUINCENAL N° 01 <small>Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero</small>						
DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (MIGV)	VALORIZACION			% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	
ADJUDICACION SIMPLIFICADA O B R A						
: N° 045-2019-FONDEPES						
: DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"						
: EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC						
: ING. ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS						
: 30 de Noviembre de 2019						
A. VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES	84,442.80	0.00	30,014.13	30,014.13	35.54%	54,428.67
ESTRUCTURAS	249,293.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	249,293.94
ARQUITECTURA	141,160.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	141,160.22
OTROS	8,718.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,718.65
TOTAL (A)	483,615.61	0.00	30,014.13	30,014.13		453,601.48
AVANCE FISICO DE OBRA		0.00%	6.21%	6.21%		93.79%
B. REALIZADOS						
OBRAS PROVISIONALES		0.00	0.00	0.00		
ESTRUCTURAS		0.00	0.00	0.00		
ARQUITECTURA		0.00	0.00	0.00		
OTROS		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (B)		0.00	0.00	0.00		
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)						
		0.00	30,014.13	30,014.13		
C. AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	48,361.56	0.00	3,001.41	3,001.41		45,360.15
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL (C)	48,361.56	0.00	3,001.41	3,001.41		45,360.15
D. DEDUCCIONES						
DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR AD		0.00	0.00	0.00		
DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR AM		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (D)		0.00	0.00	0.00		
TOTAL DESCUENTOS (TD=C+D)						
			3,001.41	3,001.41		
VALORIZACION NETA (VN=VB-TD)						
		0.00	27,012.72	27,012.72		
E. RETENCIONES						
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
F. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-D)		0.00	27,012.72	27,012.72		
EN I.G.V. (18%*VN)		0.000	4,862.29	4,862.29		
TOTAL (F)		0.00	31,875.01	31,875.01		
Monto a Facturar (Forma de Llenar la Factura)					NETO = (VN) =	27,012.72
					IGV =	4,862.29
					TOTAL = (NETO + IGV) =	31,875.01
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR (VN+IGV) S/.					31,875.01	



JOSE ANTONIO CAGARES ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 77799



PERÚ

Ministerio
de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

4.5 Por lo tanto, con la conformidad y aprobación del supervisor de obra y de la revisión al expediente de valorización, la cual cuenta con la información técnica, se considera procedente continuar con el trámite de pago de la Valorización Quincenal N°01.

5. PENALIDADES

5.1 El contratista no ha incurrido en penalidad alguna durante el periodo de noviembre de 2019.

6. CONCLUSIONES


- 6.1 El contratista ha presentado la documentación necesaria para el trámite de su valorización.
- 6.2 La supervisión a través de la Carta N° 04-2019-AGR/SUP/FONDEPES, de fecha 04 de Diciembre del 2019, presenta al FONDEPES, la Valorización Quincenal N° 01 de la prestación, correspondiente al mes de noviembre de 2019, por el monto de S/. 31,875.01 (Treinta y Un Mil Ochocientos Setenta y Cinco con 01/100 Soles), la misma que otorga su APROBACION y señala que ha sido formulada y elaborada por su persona.
- 6.3 Dentro del expediente de la valorización se adjunta el resumen de valorización, sustento de metrados de todas las partidas valorizadas y copia de los asientos del cuaderno de obra; por lo que la revisión de la Valorización es PROCEDENTE para su conformidad.

7. RECOMENDACIÓN

- 7.1. Cumplidos los requisitos establecidos en la normativa y la relación contractual vigente, se recomienda que el Director de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola, otorgue la conformidad correspondiente, para que la entidad proceda con el pago de Valorización Quincenal N° 01, correspondiente al mes de Noviembre del 2019, dentro los plazos legales vigentes.
- 7.2. Se sugiere transferir al contratista de obra la suma de S/. 31,875.01 (Treinta y Un Mil Ochocientos Setenta y Cinco con 01/100 Soles).

Es todo cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,



JOSE ANTONIO CACERES ROJAS
DNI N° 10038430


Visto el Informe N°019-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JACR que antecede, el Coordinador de Obras, Equipamiento y Mantenimiento de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola, lo hace suyo, disponiendo su derivación a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola con sus respectivos antecedentes, para su conocimiento y atención correspondientes..

FONDEPES


Ing. Luis A. Vilchez Chavarry
COORDINADOR DE OBRAS EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO

ANEXO 2: LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE VALORIZACIONES DE OBRA


I. INFORMACIÓN DE LA VALORIZACIÓN						
Nombre del proyecto/obra	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: PROYECTO IOARR: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"					
Monto de la valorización	S/	31,875.01	Fecha de presentación	04.12.2019	SITRADO	
Periodo y mes de la valorización	Quincenal Noviembre		N° valorización	01		
II. INFORMACIÓN DEL PROYECTO						
Nombre del proyecto/obra	Obra: "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: PROYECTO IOARR: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA".					
Código	2453643		Provincia	Chincha		
Departamento	Ica		Distrito	Tambo de Mora		
III. REVISIÓN DOCUMENTADA						
DESCRIPCIÓN			REVISIÓN	OBSERVACIONES		
Marque con un (✓) si se cumple con el criterio de revisión o una (X) si se incumple						
1	Adjunta carta de presentación de la valorización correspondiente al mes valorizado		✓			
2	Presenta informe mensual de la valorización correspondiente al mes valorizado		✓			
3	Adjunta grafico de la curva "S" correspondiente al avance acumulado		✓			
4	Presenta copia legible del contrato de Obra		✓			
5	Presenta copia legible del contrato de consorcio		✓			
6	Presenta copia legible del acta de entrega de terreno		✓			
7	Presenta código de cuenta interbancaria (CCI)		x			
8	Presenta cuenta de detracciones		x			
9	Presenta factura correspondiente al monto y mes de la valorización		x			
10	Presenta copia de seguros (SCTR - POLIZA CAR)		✓			
11	presenta ficha ruc del consorcio y/o empresa correspondiente		x			
12	Presenta copia legible y vigente de la carta fianza de acuerdo al monto acordado		✓	 JOSE ANTONIO CACERES ROJAS INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 77799		
13	Presenta control de metrados ejecutados del periodo valorizado		✓			

IV. REVISIÓN DOCUMENTADA			
	DESCRIPCIÓN	REVISIÓN	OBSERVACIONES
Marque con un (✓) si se cumple con el criterio de revisión o una (X) si se incumple			
14	Presenta ficha de identificación de la obra	✓	
15	Presenta calendario valorizado consistente y correspondiente al mes valorizado	✓	
16	Presenta valorización de obra debidamente fundamentada y correspondiente al mes valorizado	✓	
17	Presenta resumen consistente de la valorización mensual	✓	
18	Presenta debidamente fundamentada la aplicación del reajuste autorizado	✓	En la liquidación
19	Resumen de valorizaciones de obras ejecutadas correspondiente al mes valorizado y consistente a los	x	
20	Presenta debidamente fundamentada la aplicación de índices unificados	x	En la liquidación
21	Presenta debidamente fundamentada la aplicación de la fórmula polinómica		En la liquidación
22	Presenta de manera consistente la amortización de adelanto de directo	✓	
23	Presenta de manera consistente la amortización de adelanto de materiales		
24	Presenta grafico de la curva "s" (mensual) debidamente fundamentada y reflejando lo	✓	
25	Presenta recibos de pago de ESSALUD correspondiente al periodo valorizado	x	
26	Presenta recibo de pago CONAFOVICER correspondiente al periodo valorizado	x	
27	Presenta constancia de no adeudo de SENCICO correspondiente al periodo valorizado	x	
28	Presenta copia legible del cuaderno de obra correspondiente al periodo valorizado	x	
29	Presenta panel fotográfico y/o evidencia filmica correspondiente a los trabajos ejecutados y consignados en la valorización	✓	
30	presenta informe mensual de seguridad correspondiente al periodo valorizado	x	
31	presenta protocolos de pruebas correspondientes al periodo valorizado	x	
32	Presenta fichas y/o hojas técnicas de materiales utilizado en el periodo valorizado		 JOSE ANTONIO CACERES ROJAS INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 77799
33	Presenta fichas y/o hojas técnicas de materiales, equipos y mantenimientos utilizado en el periodo valorizado		

34	Aplica el calculo de penalidades al periodo valorizado		No se ha incurrido en penalidades
35	Contrato y/o contratista de la obra se encuentra apercibido		La obra se encuentra en ejecución
36	El proyecto cuenta con certificación presupuestal	✓	
37	El proyecto cuenta con compromiso anual	✓	

V. CONCLUSIONES

DESCRIPCIÓN		ESTADO
		Obra en ejecución
ESPECIALISTA	N° C.I.P.	FIRMA Y SELLO
Ing. Jose Caceres	77799	



JOSE ANTONIO CACERES ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 77799



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



05013130

Usuario: pruiz
Fecha: 18/12/2019
Hora: 08:44




CARGO 04248-2019-FONDEPES/AOEM

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA
Asunto: VALORIZACION N° 01 DE OBRA - MES DE NOVIEMBRE 2019 (2DA. QUINCENA)
OBRA: ?CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: PROYECTO IOARR: ?REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA?.
Referencia: CARGO 00001-2019-FONDEPES/JACR
Fecha: 18/12/2019
Observación:



AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



PERU Ministerio de la Producción



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



05011895

Usuario: usuario_digenipaa47

Fecha: 16/12/2019

Hora: 20:10



CARGO 01203-2019-FONDEPES/DIGENIPAA

A: AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Asunto: VALORIZACION N° 01 DE OBRA - MES DE NOVIEMBRE 2019 (2DA. QUINCENA)
OBRA: ?CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: PROYECTO IOARR: ?REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA?.

Referencia:

Fecha: 16/12/2019

Observación: SE DEVUELVE DOCUMENTO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL DIRECTOR PONER EN LAS CONCLUSIONES SI ES PROCEDENTE OTORGAR LA CONFORMIDAD

Atentamente,



DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA
ARTESANAL Y ACUICOLA





PERU
Ministerio
de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



05011736

Usuario: **pruiz**
Fecha: **16/12/2019**
Hora: **18:14**



CARGO 04230-2019-FONDEPES/AOEM

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

Asunto: VALORIZACION N° 01 DE OBRA - MES DE NOVIEMBRE 2019 (2DA. QUINCENA)
OBRA: ?CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: PROYECTO IOARR: ?REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA?.


Referencia: INFORME 00019-2019-FONDEPES/JACR

Fecha: 16/12/2019

Observación: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A LOGISTICA



AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO



ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
SUPERVISOR DE OBRA

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

Tambo de Mora, 04 de diciembre de 2019

CARTA N°04-2019-AGR/SUP/FONDEPES

Señores:

Dirección General De Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola
DIGENIPAA

Atención: Ing. José A. Cáceres Rojas
Coordinador de obra.

Presente.


ASUNTO : VALORIZACION QUINCENAL N°01 (28/11/19 AL 30/11/19).

REFERENCIA : a) Obra: “REMODELACION DE CERCO PERIMÉTRICO, EN EL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO
DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA”
b) Carta N° 01-2019-CEQM/RL-A&L

Me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que el contratista: **SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC**, mediante el documento **b)** de la referencia, ha presentado a esta supervisión los metrados para la valorización quincenal de obra N° 01 correspondiente a los trabajos ejecutados durante el periodo: 28 de noviembre al 30 de noviembre del 2019, en tal sentido, después de haber realizado su evaluación se alcanza el INFORME DE VALORIZACION QUINCENAL N° 01 – NOVIEMBRE de la supervisión, donde se ha dado conformidad a esta valorización por un monto ascendente a: **S/. 31,875.01 con IGV** (Treinta y Un Mil Ochocientos Setenta y Cinco con 01/100 soles) para seguir con los trámites correspondientes, haciéndose entrega en un (2) originales y dos (1) copia.


Agradeciendo anticipadamente su atención, quedamos de usted.

Atentamente,


ALBERT AMADEO GONZÁLEZ ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 171227

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO

| | |
|---|---------------------|
|  | |
| 2980470 | |
| N° DOC: | 00012100-2018 |
| CLAVE: | 8987 |
| USUARIO: | jruelas |
| FECHA Y HORA: | 04/12/2019 16:48:48 |
| TELEFONO: | 2097700 |
| www.fondepes.gob.pe | |



INFORME DE VALORIZACION QUINCENAL N° 01 – NOVIEMBRE

1. DATOS GENERALES

Proceso de selección : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°045-2019-FONDEPES
 Contrato N° : N° 039-2019-FONDEPES
 Fecha de Contrato : 13 de noviembre del 2019

Obra : "REMODELACION DE CERCO PERIMÉTRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

Ubicación : Tambo de Mora, Chincha, Ica
 Contratista : SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC
 Administrador de contrato : Ing. JOSÉ CÁCERES ROJAS.
 Supervisor : Ing. ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS CIP 171227.
 Residente : Ing. CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ CIP 28592
 Modalidad de Ejecución : Suma Alzada
 Financiamiento : Recursos Ordinarios
 Monto Referencial : S/. 634,073.80
 Monto Contrato : S/. 570,666.42
 Monto de Contrato Vigente : S/. 570,666.42
 Plazo Contractual Original : 60 d.c.
 Fecha de Inicio contractual : 28 de noviembre del 2019
 Fecha Vencimiento Contract.: 26 de enero del 2020
 Ampliación de Plazo total : 0.00 d.c
 Fecha Vencimiento Contr. Vigente: 26 de enero del 2020
 Monto Adelanto Directo : S/. 57,066.64
 Monto Total Adelanto Mater.: el Contratista no ha tramitado.

ANTECEDENTES

a) Información del Proceso de Selección y Contrato

Como consecuencia del proceso de la Adjudicación Simplificada N° 045-2019-FONDEPES convocada para la ejecución de la obra "REMODELACION DE CERCO PERIMÉTRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA", se otorgó la Buena Pro al Contratista SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC, por el monto de su propuesta, ascendente a la suma de S/ 570,666.42 (Quinientos Setenta Mil Seiscientos Sesenta y Seis con 42/100 soles), suscribiéndose el Contrato de Ejecución de Obra N° 039-2019-FONDEPES el 13 de noviembre del 2019, el cual incluye las Bases Integradas.

b) Información de Resoluciones y Adendas suscritas modificando montos del contrato

NINGUNA

c) Documento del Contratista presentando la solicitud de pago de la Valorización

Mediante Carta N° 001-2019-CEQM/RL-A&L del 30/11/2019, el Residente presenta los metrados, para la evaluación. Esta Supervisión mediante asiento de cuaderno de obra N° 10, en forma conjunta con fecha 30/11/2019 verifican los metrados. Esta Supervisión luego de la evaluación y aprobación correspondiente de los metrados realmente ejecutados, ha procesado la Valorización Quincenal N° 01 de la Obra "REMODELACION DE CERCO PERIMÉTRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA", por un monto neto de S/. 31,875.01 C/IGV (Treinta Un Mil Ochocientos Setenta y Cinco con 01/100 soles) que corresponde a los trabajos efectuados del 28 al 30 de noviembre del 2019 para su revisión y trámite administrativo.



ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. 171227

d) Otros que se considere necesario

NINGUNO

ANÁLISIS

a) Del Cumplimiento del procedimiento y plazos indicado en la norma

Al amparo del **Artículo 194° Valorizaciones y Metrados** del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado D.S N°350-2015-EF y modificado mediante D.S. N°344-2018 -EF, el contratista presentó sus metrados para elaborar la valorización quincenal N°01 correspondiente al mes de noviembre del 2019.

b) Del Monto Máximo a Valorizar (Considerando los deductivos aplicados)

Según el avance no hay monto máximo, se ha valorizado de acuerdo a los metrados realmente ejecutados en concordancia con los planos y especificaciones técnicas.

c) De los Metrados ejecutados

Se ha valorizado de acuerdo a los metrados realmente ejecutados en concordancia con los planos y especificaciones técnicas.

d) Del Cálculo de la Valorización, Reajustes, Deducciones y Retenciones

• **Resumen de Valorización Quincenal hasta el 30 de noviembre 2019**

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|
| • Monto Contractual: | S/. 483,615.61 (sin IGV) | | |
| | | <u>S/. sin.IGV</u> | <u>%</u> |
| ○ Acumulado Anterior | | 0.00 | 0.00 |
| ○ Valorización Actual | | 30,014.13 | 6.21 |
| ○ Acumulado Actual | | 30,014.13 | 6.21 |
| ○ Saldo por Valorizar | S/. 453,601.48 | | 93.79 |
| ▪ Reajuste de Obra | | | |
| | | sin IGV | |
| ○ Acumulado Anterior | S/. 0.00 | | |
| ○ Valorización Actual | S/. 0.00 | | |
| ○ Acumulado Actual | S/. 0.00 | | |
| • Deducciones | | | |
| | | Sin IGV | |
| ○ Por Adelanto Directo | | | |
| ▪ Acum.Anterior | S/. 0.00 | | |
| ▪ Actual | S/. 0.00 | | |
| ▪ Acum.Actual | S/. 0.00 | | |
| ○ Por Adelanto Materiales | | | |
| | | Sin IGV | |
| ▪ Acum.Anterior | S/. 0.00 | | |
| ▪ Actual | S/. 0.00 | | |
| ▪ Acum.Actual | S/. 0.00 | | |
| • Amortizaciones | | | |
| | | Sin IGV | |
| ○ Por Adelanto Directo | | | |
| ▪ Acum.Anterior | S/. 0.00 | | |
| ▪ Actual | S/. 3,001.41 | | |
| ▪ Acum.Actual | S/. 3,001.41 | | |
| ○ Por Adelanto Materiales | | | |
| | | Sin IGV | |
| ▪ Acum.Anterior | S/. 0.00 | | |
| ▪ Actual | S/. 0.00 | | |
| ▪ Acum.Actual | S/. 0.00 | | |



ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 171227

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO



VALORIZACIÓN QUINCENAL N° 01

28-11-2019 AL 30-11-2019

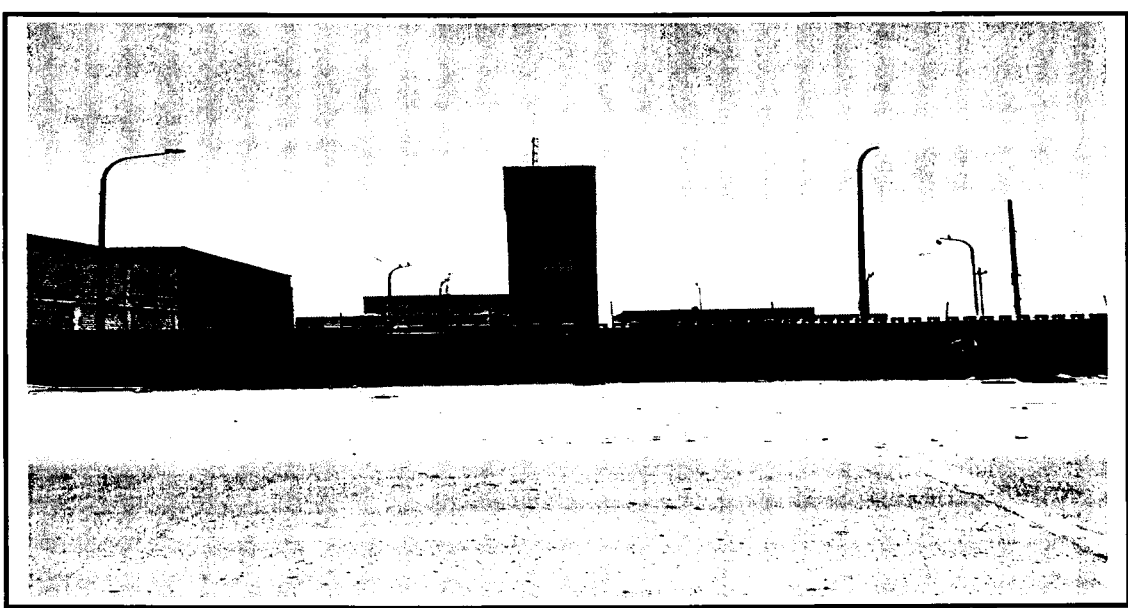

A.S. : N° 045-2019-FONDEPES

EJECUCION DE OBRA: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL

O B R A : DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

CONTRATISTA : EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC

SUPERVISOR : ING. ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS

FECHA : 30 de noviembre de 2019



Alfonso Mora Rodríguez
Gerente General
RUC 20544528026

Albert Amadeo González Rojas
ALBERT AMADEO GONZÁLEZ ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 171227

Carlos Enrique Quintanilla Martínez
CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ
INGENIERO RESIDENTE
Reg. CIP N° 28592

Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"


ICHA

VALORIZACION DE OBRA N° 01 (del 28-11-19 al 30-11-2019)

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1 Obra | EJECUCION DE OBRA: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA" | |
| 2 Ubicación | : TAMBO DE MORA, CHINCHA, ICA | |
| 3 Area Geografica | : 2 | |
| 4 Entidad Contratante | : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES | |
| 5 Contratista | : EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC | |
| 6 Residente | : ING. CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ | |
| 7 Supervision | : ING. ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS | |
| 9 Financiamiento | : Recursos Ordinarios | |
| 10 Adjudicacion Simplificada | : N° 045-2019-FONDEPES | |
| 11 Modalidad de contratación | : A Suma Alzada | |
| 12 Presupuesto base, con IGV | : S/. 634,073.80 | 31-ago-19 |
| 13 Presupuesto base, sin IGV | : S/. 537,350.68 | |
| 14 Factor de Relación (FR) | : 0.900000000000 | |
| 15 Monto del contrato, con IGV | : S/. 570,666.42 | |
| 16 Monto del contrato, sin IGV | : S/. 483,615.61 | |
| 17 Plazo de ejecución según contrato | : 60 D.C. | |
| 18 Prórrogas, días calendario | : | |
| 19 Adicionales de obra con IGV | : S/. 0.00 | |
| 20 Adicionales de obra sin IGV | : S/. 0.00 | |
| 21 Deductivo de obra con IGV | : S/. 0.00 | |
| 22 Deductivo de obra sin IGV | : S/. 0.00 | |
| 23 Fecha de Firma de Contrato de obra | : 13/11/2019 | N° 039-2019-FONDEPES |
| 24 Mayor Gastos Gral. prorroga plazo, c/IGV | : | |
| 25 Mayor Gastos Gral. prorroga plazo, s/IGV | : | |
| 26 Adelanto directo con IGV y fecha de pago | : S/. 57,066.64 | 27-nov-19 |
| 27 Adelanto directo sin IGV y fecha de pago | : S/. 48,361.56 | |
| 28 Adelantos para materiales N° 01, con IGV | : | |
| 29 Adelantos para materiales N° 01, sin IGV | : | |
| 30 Fecha de Entrega de terreno | : 27-nov-19 | |
| 31 Fecha de Inicio de plazo de ejecución | : 28-nov-19 | |
| 32 Término original programado de obra | : 26-ene-20 | |
| 33 Término vigente programado de obra | : 26-ene-20 | |
| 34 Término Real de obra | : 26-ene-20 | |
| 35 Constatación Física | : | |
| 36 Levantamiento de Observaciones | : | |
| 37 Acta de Recepción de Obra | : | |
| 38 Avance Real Acumulado | : 6.21% | |
| 39 Avance Programado Acumulado | : 7.68% | |
| 40 Situación de la obra respecto del avance | : 1.47% | ATRASADA 30 de noviembre de 2019 |


 Sr. **Alfonso Mora Rodríguez**
 Gerente General
 RUC 20544528026


ALBERT AMADEO GONZÁLEZ ROJAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. 171227


CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ
 INGENIERO RESIDENTE
 Reg. CIP N° 28592

Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

2.0 DOCUMENTO VERIFICADO



RESUMEN DE VALORIZACION QUINCENAL N° 01

ADJUDICACION : N° 045-2019-FONDEPES
 SIMPLIFICADA :
 O B R A : TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"
 CONTRATISTA : EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC
 CONSULTOR : ING. ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
 FECHA : 30 de noviembre de 2019

| DESCRIPCION | MONTO CONTRATO (s/IGV) | VALORIZACION | | | % AVANCE ACUMULADO | SALDO POR VALORIZAR |
|---|------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | | |
| A: VALORIZACION CONTRACTUAL | | | | | | |
| OBRAS PROVISIONALES | 84,442.80 | 0.00 | 30,014.13 | 30,014.13 | 35.54% | 54,428.67 |
| ESTRUCTURAS | 249,293.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 249,293.94 |
| ARQUITECTURA | 141,160.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 141,160.22 |
| OTROS | 8,718.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 8,718.65 |
| TOTAL (A) | 483,615.61 | 0.00 | 30,014.13 | 30,014.13 | | 453,601.48 |
| AVANCE FISICO DE OBRA | | 0.00% | 6.21% | 6.21% | | 93.79% |
| B: REAJUSTES | | | | | | |
| OBRAS PROVISIONALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ESTRUCTURAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ARQUITECTURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OTROS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL (B) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| VALORIZACION BRUTA (VB=A+B) | | 0.00 | 30,014.13 | 30,014.13 | | |
| C: AMORTIZACIONES | | | | | | |
| AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO | 48,361.56 | 0.00 | 3,001.41 | 3,001.41 | | 45,360.15 |
| AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| TOTAL (C) | 48,361.56 | 0.00 | 3,001.41 | 3,001.41 | | 45,360.15 |
| D: DEDUCCIONES | | | | | | |
| DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR AD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR AM | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL (D) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL DESCUENTOS (TD=C+D) | | | 3,001.41 | 3,001.41 | | |
| VALORIZACION NETA (VN=VB-TD) | | 0.00 | 27,012.72 | 27,012.72 | | |
| E: RETENCIONES | | | | | | |
| MULTA POR ATRASO DE OBRA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL (E) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| E: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA | | | | | | |
| EN EFECTIVO (VN-D) | | 0.00 | 27,012.72 | 27,012.72 | | |
| EN I.G.V. (18%*VN) | | 0.000 | 4,862.29 | 4,862.29 | | |
| TOTAL (E) | | 0.00 | 31,875.01 | 31,875.01 | | |

Monto a Facturar (Forma de Llenar la Factura)

NETO = (VN) = 27,012.72

IGV = 4,862.29

TOTAL = (NETO + IGV) = 31,875.01

TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR (VN+IGV) SI.

31,875.01

A&L
 Servicio Construcciones A&L SAC
 Alfonso Mora Rodríguez
 Gerente General
 RUC 20544528028

ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. 171227

CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ
 INGENIERO RESIDENTE
 Reg. CIP N° 28592

Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

2.2 RESUMEN VALORIZADO POR ESPECIALIDAD



RESUMEN DE VALORIZACIONES POR ESPECIALIDADES

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 EJECUCION DE OBRA: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINGHA, DEPARTAMENTO ICA"
 CONTRATISTA: EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC
 SUPERVISION: ING. ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
 PRESUPUESTO: SI. 634,073.80
 MONTO CONTRATADO: SI. 570,666.42
 FACTOR DE RELACION: 0.9000

RESUMEN DE VALORIZACIONES POR ESPECIALIDADES N° 01
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 28/11/2019 AL 30/11/2019

| ITEM | DESCRIPCION | MONTO CONTRACTUAL | % AVANCE ANTERIOR | AVANCE ANTERIOR | % AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL | % AVANCE ACTUAL | ACUMULADO | % ACUMULADO | * SALDO POR VALORIZAR | % SALDO POR VALORIZAR |
|------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.00 | OBRAS PROVISIONALES | 84,442.80 | 100.00% | | 0.00% | 30,014.13 | 35.54% | 30,014.13 | 35.54% | 54,428.67 | 64.46% |
| 2.00 | ESTRUCTURAS | 249,293.94 | 100.00% | | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | 249,293.94 | 100.00% |
| 3.00 | ARQUITECTURA | 141,160.22 | 100.00% | | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | 141,160.22 | 100.00% |
| 4.00 | OTROS | 8,718.65 | 100.00% | | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | 8,718.65 | 100.00% |
| | SUB TOTAL * F.R. = | 483,615.61 | 100.00% | | 0.00% | 30,014.13 | 6.21% | 30,014.13 | 6.21% | 453,601.48 | 93.79% |
| | (G.V. (18%)) | 87,050.81 | | | | 5,402.54 | | 5,402.54 | | 81,648.27 | |
| | COSTO TOTAL DE OBRA | 570,666.42 | | | | 35,416.67 | | 35,416.67 | | 535,249.75 | |

A&L Servicio
 Contrataciones A.L.L.SAC
 Alfonso Mora Rodríguez
 Gerente General
 RUC 20544528026

ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. 171227

CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ
 INGENIERO RESIDENTE
 Reg. CIP N° 28592

Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL, TAMBO DE
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

**3. PLANILLA DE
VALORACION N° 01**

Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERMENE...
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL...
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA...
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

**VACACIONES -
PREVISIONALES,
ABAJOS
PREMIANARES,
SEGURIDAD Y SALUD**



PLANILLA DE VALORIZACION OBRAS PROVISIONALES

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 OBRA: EJECUCION DE OBRA: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINGHA, DEPARTAMENTO ICA"
 CONTRATO: EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC
 SUPERVISOR: ING. ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
 PRESUPUESTO SI: 370,866.42

(INC. IGV)

VALORIZACION DE OBRA N° 01 - OBRAS PROVISIONALES

OBRAS PROVISIONALES

NOVIEMBRE - 2019

(Del 28 al 31 de noviembre)

| ITEM. | DESCRIPCION DE PARTIDA | UND. | METRADO | P. UNIT. | PRESUPUESTO BASE | | PRESENTE VALORIZACION | | ACUMULADO ACTUAL | | SALDO POR VALORIZAR | |
|--|--|---------------|---------|-----------|------------------|---|-----------------------|-----|------------------|---------|---------------------|---|
| | | | | | SI. | % | METRADO | SI. | % | METRADO | SI. | % |
| 01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | | | | 75,289.42 | | | | | | | |
| | OBRAS PROVISIONALES | | | | 75,289.42 | | | | | | | |
| 01.01 | INSTALACIONES PROVISIONALES | | | | 1,693.67 | | | | | | | |
| 01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA | und | 1.00 | 1,693.67 | | | | | | | | |
| 01.01.02 | ALMACEN OFICINA Y CASITA DE GUARDIANA | m2 | 42.25 | 146.01 | | | | | | | | |
| 01.01.03 | VESTIDORES PARA PERSONAL OBRERO | m2 | 20.00 | 146.00 | | | | | | | | |
| 01.01.04 | ISSH PROVISIONALES | mes | 2.00 | 700.00 | | | | | | | | |
| 01.01.05 | CERCO PROVISIONAL DE OBRA CON MALLA ARPILLERA | m | 404.48 | 26.23 | | | | | | | | |
| 01.01.06 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA | glb | 1.00 | 10,894.74 | | | | | | | | |
| 01.01.07 | AGUA PARA LA OBRA | mes | 2.00 | 1,143.99 | | | | | | | | |
| 01.01.08 | ENERGIA PARA LA OBRA | mes | 2.00 | 1,381.36 | | | | | | | | |
| 01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | |
| 01.02.01 | LIMPIEZA DEL TERRENO | m2 | 303.36 | 3.72 | | | | | | | | |
| 01.02.02 | TRAZO Y REPIANTEO MAQUINARIA | m2 | 973.96 | 2.63 | | | | | | | | |
| 01.02.03 | TRAZO Y REPIANTEO MAQUINARIA | mes | 2.00 | 1,976.23 | | | | | | | | |
| 01.02.04 | DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO INC. SOBRECIMIENTO | m3 | 4.191 | 192.51 | | | | | | | | |
| 01.02.05 | DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO ARCILLA | m3 | 4.25 | 99.79 | | | | | | | | |
| 01.02.06 | DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE | m3 | 9.05 | 134.75 | | | | | | | | |
| 01.02.07 | CORTE CON EQUIPO DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE | m | 81.46 | 20.53 | | | | | | | | |
| 01.02.08 | DESINSTALACION Y REPOSICION DE ENROCADO | m2 | 4.23 | 96.68 | | | | | | | | |
| 01.02.09 | DESINSTALACION TEMPORAL DE TENDIDO ELECTRICO Y REFLECTORES | glb | 1.00 | 958.66 | | | | | | | | |
| 01.02.10 | REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO | und | 2.00 | 455.68 | | | | | | | | |
| 01.02.11 | REUBICACION DE PUERTAS METALICAS EXISTENTES | und | 3.00 | 383.83 | | | | | | | | |
| 01.02.12 | DESMTAJE DE VENTANA METALICA EXISTENTE | und | 1.00 | 122.48 | | | | | | | | |
| 01.02.13 | REUBICACION DE CAPILLA | und | 1.00 | 161.75 | | | | | | | | |
| 01.03 | EQUIPOS DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | | |
| 01.03.01 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | glb | 1.00 | 4,690.60 | | | | | | | | |
| 01.03.02 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA | glb | 1.00 | 810.00 | | | | | | | | |
| 01.03.03 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | mes | 2.00 | 1,400.30 | | | | | | | | |
| 01.03.04 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 1.00 | 2,500.00 | | | | | | | | |
| 01.03.05 | RECURSOS PARA EMERGENCIAS DURANTE EL TRABAJO | glb | 1.00 | 4,840.68 | | | | | | | | |
| COSTO DIRECTO | | | | | 75,289.42 | | | | | | | |
| GASTOS GENERALES (14.652663089463%) | | | | | 11,028.97 | | | | | | | |
| UTILIDAD (10%) | | | | | 7,526.94 | | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | 93,825.33 | | | | | | | |
| FACTOR DE RELACION (F.R. *) | | 0.9000 | | | 84,442.80 | | | | | | | |
| SUB TOTAL * F.R. = | | | | | 15,195.70 | | | | | | | |
| (I.G.V. (18%)) | | | | | 99,642.50 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 99,642.50 | | | | | | | |

INGENIERO RESIDENTE
 Reg. CIP N° 28592
 CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ

INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. 171227
 ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS

Const. Construcciones A&L SAC
 S.R.L.
 AIFor: 30 Mora Rodriguez
 Gerente General
 RUC 20544428026

Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

VANIZACION - ESTRUCTURAS



FONDEPES
 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
 ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 OBRA: EJECUCION DE OBRA: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"
 CONTRATISTA: EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC
 SUPERVISION: ING. ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
 PRESUPUESTO: S/. 570,866.42 (INC. IGV)

VALORIZACION DE OBRA N° 01 - ESTRUCTURAS

ESTRUCTURAS
 NOVIEMBRE - 2019
 (Del 28 al 31 de noviembre)

| ITEM. | DESCRIPCION DE PARTIDA | UND. | METRADO | P. UNIT. | PRESUPUESTO BASE | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE VALORIZACION | | ACUMULADO ACTUAL | | SALDO POR VALORIZAR | |
|--|---|------|----------|----------|-------------------|---|--------------------|---|-----------------------|---|------------------|---|---------------------|---|
| | | | | | SI | % | METRADO | % | METRADO | % | SI | % | METRADO | % |
| ESTRUCTURAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | ESTRUCTURAS | | | | 222,212.07 | | | | | | | | | |
| 02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | 222,212.07 | | | | | | | | | |
| 02.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS MANUALES PARA CIMENTOS DE MURO DE CONCRETO | m3 | 13.75 | 53.27 | 732.46 | | | | | | | | | |
| 02.01.02 | RELLENO DE ZANJAS MANUALES PARA CIMENTOS DE MURO DE CONCRETO | m3 | 140.37 | 39.95 | 4,951.38 | | | | | | | | | |
| 02.01.03 | ACERQUE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION Y DEMOLICION | m3 | 7.42 | 94.52 | 4,216.03 | | | | | | | | | |
| 02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION Y DEMOLICION | m3 | 630.37 | 26.82 | 19,255.71 | | | | | | | | | |
| 02.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMS-10 km | m3 | 530.34 | 35.02 | 10,050.71 | | | | | | | | | |
| 02.02 | ORILLAS DE CONCRETO SIMPLE | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.01 | SOLADO DE CONCRETO PARA ZAPATAS H=4" | m2 | 76.87 | 33.77 | 2,595.90 | | | | | | | | | |
| 02.02.02 | CAPA NIVELANTE PARA VIGAS DE CONEXION E=2" | m2 | 16.90 | 20.18 | 342.86 | | | | | | | | | |
| 02.02.03 | LOSA DE CONCRETO SIMPLE (c=210 kg/cm ²) | m3 | 9.05 | 395.65 | 3,579.73 | | | | | | | | | |
| 02.03 | CONCRETO ARMADO | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.01 | ZAPATAS | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.01.01 | ZAPATAS CONCRETO (c=210 kg/cm ²) | m3 | 5.05 | 400.26 | 2,021.31 | | | | | | | | | |
| 02.03.01.02 | ZAPATAS ACERO DE REFUERZO | kg | 163.60 | 4.43 | 724.75 | | | | | | | | | |
| 02.03.02 | COLUMNAS | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.02.01 | COLUMNAS CONCRETO (c=210 kg/cm ²) | m3 | 17.57 | 533.06 | 9,259.25 | | | | | | | | | |
| 02.03.02.02 | COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 215.72 | 63.37 | 13,670.18 | | | | | | | | | |
| 02.03.02.03 | COLUMNAS ACERO DE REFUERZO | kg | 1,937.81 | 4.43 | 8,584.94 | | | | | | | | | |
| 02.03.03 | VIGA DE CONEXION | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.03.01 | VIGA DE CONEXION CONCRETO (c=210 kg/cm ²) | m3 | 8.20 | 419.84 | 3,442.89 | | | | | | | | | |
| 02.03.03.02 | VIGA DE CONEXION ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 65.59 | 53.07 | 3,480.86 | | | | | | | | | |
| 02.03.03.03 | VIGA DE CONEXION ACERO DE REFUERZO | kg | 825.23 | 4.43 | 3,655.77 | | | | | | | | | |
| 02.03.04 | MURO DE CONCRETO | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.04.01 | MURO DE CONCRETO (c=210 kg/cm ²) | m3 | 97.31 | 496.22 | 48,287.17 | | | | | | | | | |
| 02.03.04.02 | MURO DE CONCRETO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 497.04 | 57.36 | 28,510.21 | | | | | | | | | |
| 02.03.04.03 | MURO DE CONCRETO ACERO DE REFUERZO | kg | 7,023.85 | 4.43 | 31,114.77 | | | | | | | | | |
| 02.03.05 | VIGA SOLERA | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.05.01 | VIGA SOLERA CONCRETO (c=210 kg/cm ²) | m3 | 9.17 | 428.90 | 3,920.26 | | | | | | | | | |
| 02.03.05.02 | VIGA SOLERA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 60.52 | 63.37 | 3,832.36 | | | | | | | | | |
| 02.03.05.03 | VIGA SOLERA ACERO DE REFUERZO | kg | 1,260.21 | 4.43 | 5,530.22 | | | | | | | | | |
| 02.03.06 | MARGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.06.01 | JUNTAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO | m | 57.00 | 21.55 | 1,228.35 | | | | | | | | | |
| COSTO DIRECTO | | | | | 222,212.07 | | | | | | | | | |
| GASTOS GENERALES (14.652663089463%) | | | | | 32,659.99 | | | | | | | | | |
| UTILIDAD (10%) | | | | | 22,221.21 | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | 278,993.27 | | | | | | | | | |
| FACTOR DE RELACION (F.R.=) | | | | | 0.9000 | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL * F.R. = | | | | | 251,093.94 | | | | | | | | | |
| I.G.V. (18%) | | | | | 44,872.91 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 295,966.85 | | | | | | | | | |

CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ
 INGENIERO RESIDENTE
 Reg. CIP N° 28592

ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. 171227

A&L
 Servicio de Construcción A&L SAC
 Alfonso Mora Rodríguez
 Gerente General
 RUC 2054492026

Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

3.3. ARQUITECTURA - RIZACION



PLANILLA DE VALORIZACIONES DE ARQUITECTURA

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 OBRA: EJECUCION DE OBRA - REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA*
 CONTRATISTA: EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES SAL SAC
 SUPERVISOR: ING. ALBERT AMADO GONZALEZ ROJAS
 PRESUPUESTO: S/ 570,868.42 (INC. IGV)

VALORIZACION DE OBRA N° 01 - ARQUITECTURA

ARQUITECTURA
 NOVIEMBRE - 2019
 (Del 28 al 31 de noviembre)

| ITEM | DESCRIPCION DE PARTIDA | UNID. | METRADO | P. UNIT. | | PRESUPUESTO BASE | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESBITE VALORIZACION | | ACUMULADO ACTUAL | | SALDO POR VALORIZAR | |
|---|--|----------------|----------|----------|-------|-------------------|-------|--------------------|---|-----------------------|---|------------------|---|---------------------|---|
| | | | | S/. | % | S/. | % | METRADO | % | S/. | % | METRADO | % | S/. | % |
| ARQUITECTURA | | | | | | 125,825.38 | | | | | | | | | |
| ARQUITECTURA | | | | | | 125,825.38 | | | | | | | | | |
| 03.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | m ² | 237.02 | 126.49 | 0.00% | 29,980.26 | 0.00% | | | | | | | | |
| 03.01.01 | MURO DE BLOQUE DE CONCRETO 19x19x39 CM | m ² | 84.62 | 126.49 | 0.00% | 11,521.01 | 0.00% | | | | | | | | |
| 03.01.02 | REVOCOS Y REVESTIMIENTOS | m ² | 178.94 | 44.83 | 0.00% | 8,021.88 | 0.00% | | | | | | | | |
| 03.02.01 | TARRAJO IMPERMEABILIZADO DE COLUMNAS | m ² | 153.71 | 55.92 | 0.00% | 8,595.46 | 0.00% | | | | | | | | |
| 03.02.02 | TARRAJO IMPERMEABILIZADO EN MURO DE BLOQUE/ CARA INTERIOR Y EXTERIOR | m ² | 954.04 | 30.56 | 0.00% | 29,155.46 | 0.00% | | | | | | | | |
| 03.02.03 | BRUÑA EN MURO | m | 264.78 | 9.28 | 0.00% | 2,457.16 | 0.00% | | | | | | | | |
| 03.02.04 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | m ² | 74.61 | 19.72 | 0.00% | 1,471.31 | 0.00% | | | | | | | | |
| 03.03.01 | CONTROLADO DE CEMENTO PULIDO | | | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | |
| 03.04 | CARPINTERIA METALICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.04.01 | PUERTA METALICA TIPO 01, ALTURA=2.6 m, ANCHO = 1.15 m, INC. CERRAJERIA Y PINTURA PRINCIPAL Y PEATONAL | und | 1.00 | 1,586.34 | 0.00% | 1,586.34 | 0.00% | | | | | | | | |
| 03.04.02 | PUERTA METALICA TIPO 02, ALTURA = 3.00 m, ANCHO= 5.00 m INC. CERRAJERIA Y PINTURA/ ACCESO VEHICULAR- ESTACIONAMIENTO | und | 1.00 | 5,940.00 | 0.00% | 5,940.00 | 0.00% | | | | | | | | |
| 03.04.03 | PUERTA METALICA TIPO 03 ALTURA = 3.00 m, ANCHO = 3.00 m, PARA INGRESO A MUELLE | und | 1.00 | 4,276.80 | 0.00% | 4,276.80 | 0.00% | | | | | | | | |
| 03.04.04 | VENTANA METALICA ALTURA = 1.21 m, ANCHO 2.88 m (incluye raji de proteccion) | und | 1.00 | 1,118.77 | 0.00% | 1,118.77 | 0.00% | | | | | | | | |
| 03.05 | PINTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.05.01 | PINTURA EN MUROS/ CARA INTERIOR Y EXTERIOR | m ² | 1,028.65 | 15.45 | 0.00% | 15,882.64 | 0.00% | | | | | | | | |
| 03.05.02 | PINTURA EN COLUMNAS Y VIGA SOLERA | m ² | 332.64 | 17.46 | 0.00% | 5,807.89 | 0.00% | | | | | | | | |
| COSTO DIRECTO | | | | | | 125,825.38 | | | | | | | | | |
| GASTOS GENERALES (14.65266306463%) | | | | | | 18,436.77 | | | | | | | | | |
| UTILIDAD (10%) | | | | | | 12,582.54 | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | 156,844.69 | | | | | | | | | |
| FACTOR DE RELACION (F.R.F) | | | | | | 141,160.22 | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL * F.R. | | | | | | 25,408.84 | | | | | | | | | |
| (IGV (18%)) | | | | | | 4,573.59 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 184,960.05 | | | | | | | | | |

A & L
 Servica y Construcciones A.L.S.A.C.
 Alfonso Mora Rodriguez
 Gerente General
 RUC 20544528026

ALBERT AMADO GONZALEZ ROJAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. 171227

CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ
 INGENIERO RESIDENTE
 Reg. CIP N° 28592

Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

VARIACION DE METROS



PLANILLA DE VALORIZACIONES DE OTROS

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 OBRA: EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA
 CONTRATIST/ EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES AAL SAC
 SUPERVISOR ING. ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
 PRESUPUEST: SJ-570.666.42

(INC. ICA)

VALORIZACION DE OBRA N° 01- OTROS

OTROS
 NOVIEMBRE - 2019
 (Del 28 al 31 de noviembre)

| ITEM. | DESCRIPCION DE PARTIDA | UND. | METRADO | P. UNIT. | PRESUPUESTO BASE | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE VALORIZACION | | ACUMULADO ACTUAL | | SALDO POR VALORIZAR | | | |
|------------------------------------|--|------|---------|----------|------------------|-----|--------------------|-----|-----------------------|---------|------------------|---|---------------------|-----|---|--|
| | | | | | SI. | SI. | METRADO | SI. | % | METRADO | SI. | % | METRADO | SI. | % | |
| OTROS | | | | | | | 7,771.51 | | | | | | | | | |
| 04.01 | REINSTALACION DE TENDIDO DE CABLEADO Y REFLECTORES | gdb | 1.00 | 1,166.71 | 7,771.51 | | | | | | | | | | | |
| 04.02 | INTERFERENCIA CON REDES EXISTENTES | gdb | 1.00 | 422.66 | 1,166.71 | | | | | | | | | | | |
| 04.03 | FLETE TERRESTRE DE MATERIALES | gdb | 1.00 | 5,057.77 | 422.66 | | | | | | | | | | | |
| 04.04 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | gdb | 1.00 | 1,124.37 | 5,057.77 | | | | | | | | | | | |
| COSTO DIRECTO | | | | | | | 7,771.51 | | | | | | | | | |
| GASTOS GENERALES (14.65265308463%) | | | | | | | 1,138.73 | | | | | | | | | |
| UTILIDAD (10%) | | | | | | | 777.15 | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | | 9,687.39 | | | | | | | | | |
| FACTOR DE RELACION (F.R. =) | | | | | | | 0.9000 | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL * F.R. = | | | | | | | 8,718.65 | | | | | | | | | |
| I.G.V. (18%) | | | | | | | 1,569.36 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 10,288.01 | | | | | | | | | |

A&I
 Servicio de Construcciones A.I. SAC
 Alfonso Mora Rodriguez
 Gerente General
 RUC 20544528026

Albert Amadeo Gonzalez Rojas
ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. 171227

Carlos Enrique Quintanilla Martinez
CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ
 INGENIERO RESIDENTE
 Reg. CIP N° 28592

Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

4. PLANILLA DE MATERIALES

Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROYECTO
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

**4.1. PLANILLA DE
METRIFICACIONES – OBRAS
PRELIMINARES,
SEGURIDAD Y SALUD**



PLANILLA DE METRADOS - OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 OBRA: EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA*
 CONTRATANTE: EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC
 SUPERVISOR: ING. ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
 PRESUPUESTO N.º 570,688.42 (INC. IGV)

PLANILLA DE METRADOS - OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

| ITEM. | DESCRIPCION DE PARTIDA | UND. | METRADO | P. UNIT. | PRESUPUESTO BASE | | VAL. N.º 01 AL 30 DE NOV. | | VAL. N.º 1 AL 31 DE DIC. | | VAL. N.º 4 AL 15 DE ENE. | | VAL. N.º 01 AL 26 DE ENE. | | VAL. ACUMULADA VALORIZADA | | VAL. CLIENTE | | TOTAL | | % OBRAS EJEC. | |
|--|---|------|---------|-----------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|----|--------------------------|----|---------------------------|----|---------------------------|------------------|--------------|----|-------|----|---------------|----|
| | | | | | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | | SI |
| 02 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | | | | | 75,269.42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | INSTALACIONES PROVISIONALES | | | | | 1,693.67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA | und | 1.00 | 1,693.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.02 | ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIA | m2 | 42.25 | 146.01 | | 6,168.92 | | 33.80 | 4,935.14 | | | | | | | 33.80 | 4,935.14 | | | | 0% | |
| 01.01.03 | VESTIDORES PARA PERSONAL OBRERO | m2 | 20.00 | 146.00 | | 2,920.00 | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| 01.01.04 | SSH PROVISIONALES | m | 2.00 | 700.00 | | 1,400.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0% | |
| 01.01.05 | CERCO PROVISIONAL DE OBRA CON MALLA ARPILLERA | m | 404.48 | 26.23 | | 10,609.51 | | 200.00 | 5,246.00 | | | | | | | 200.00 | 5,246.00 | | | | 48% | |
| 01.01.06 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA | qb | 1.00 | 10,894.74 | | 10,894.74 | | 0.25 | 2,723.69 | | | | | | | 0.25 | 2,723.69 | | | | 25% | |
| 01.01.07 | AGUA PARA LA OBRA | m3 | 2.00 | 1,143.99 | | 2,287.98 | | 0.25 | 266.00 | | | | | | | 0.25 | 266.00 | | | | 13% | |
| 01.01.08 | ENERGIA PARA LA OBRA | m3 | 2.00 | 1,361.36 | | 2,722.72 | | 0.25 | 345.34 | | | | | | | 0.25 | 345.34 | | | | 13% | |
| 01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.02.01 | LIMPIEZA DEL TERRENO | m2 | 303.36 | 3.72 | | 1,128.50 | | 242.69 | 902.80 | | | | | | | 242.69 | 902.80 | | | | 80% | |
| 01.02.02 | LIMPIEZA DE TERRENO CON MAQUINARIA | m2 | 275.95 | 2.63 | | 725.75 | | 220.76 | 580.60 | | | | | | | 220.76 | 580.60 | | | | 80% | |
| 01.02.03 | TRAZO Y REPLANTIO PRELIMINAR DURANTE LA OBRA | m3 | 2.00 | 197.23 | | 3,944.60 | | 0.20 | 395.65 | | | | | | | 0.20 | 395.65 | | | | 10% | |
| 01.02.04 | DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO INC. SOBRECIMIENTO | m3 | 41.91 | 192.51 | | 8,068.09 | | 41.91 | 8,068.46 | | | | | | | 41.91 | 8,068.46 | | | | 100% | |
| 01.02.05 | DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO ARCILLA | m3 | 4.25 | 99.29 | | 421.56 | | 4.25 | 421.56 | | | | | | | 4.25 | 421.56 | | | | 100% | |
| 01.02.06 | DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE | m | 9.05 | 134.75 | | 1,219.49 | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| 01.02.07 | CORTE CON EQUIPO DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE | m | 81.46 | 20.53 | | 1,672.37 | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| 01.02.08 | DESMONTE Y REPOSICION DE ENROCADO | m2 | 4.23 | 96.68 | | 392.04 | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| 01.02.09 | DESINSTALACION TEMPORAL DE TENDIDO ELECTRICO Y REFLECTORES | qb | 1.00 | 956.66 | | 956.66 | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| 01.02.10 | REUBRICACION DE POSTES DE CONCRETO | und | 2.00 | 455.68 | | 911.36 | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| 01.02.11 | DESMONTE DE PUERTAS METALICAS EXISTENTES | und | 3.00 | 363.83 | | 1,151.49 | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| 01.02.12 | DESMONTE DE VENTANA METALICA EXISTENTE | und | 1.00 | 122.48 | | 122.48 | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| 01.02.13 | REUBRICACION DE CAPILLA | und | 1.00 | 161.75 | | 161.75 | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| 01.03 | EQUIPOS DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.03.01 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | qb | 1.00 | 4,690.60 | | 4,690.60 | | 0.20 | 938.12 | | | | | | | 0.20 | 938.12 | | | | 20% | |
| 01.03.02 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA | qb | 1.00 | 810.00 | | 810.00 | | 0.20 | 162.00 | | | | | | | 0.20 | 162.00 | | | | 20% | |
| 01.03.03 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | m3 | 2.00 | 1,400.30 | | 2,800.60 | | 0.20 | 280.06 | | | | | | | 0.20 | 280.06 | | | | 10% | |
| 01.03.04 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | qb | 1.00 | 2,500.00 | | 2,500.00 | | 0.20 | 500.00 | | | | | | | 0.20 | 500.00 | | | | 20% | |
| 01.03.05 | RECURSOS PARA EMERGENCIAS DURANTE EL TRABAJO | qb | 1.00 | 4,640.68 | | 4,640.68 | | 0.20 | 968.14 | | | | | | | 0.20 | 968.14 | | | | 20% | |
| COSTO DIRECTO | | | | | | 75,269.42 | | 26,753.56 | | | | | | | | 26,753.56 | | | | | 35.54% | |
| GASTOS GENERALES (14.6263089463%) | | | | | | 11,026.97 | | 3,920.11 | | | | | | | | 3,920.11 | | | | | | |
| UTILIDAD (10%) | | | | | | 7,526.94 | | 2,675.36 | | | | | | | | 2,675.36 | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | 93,825.33 | | 33,346.03 | | | | | | | | 33,346.03 | | | | | | |
| FACTOR DE RELACION (F.R.#) | | | | | | 84,442.80 | | 30,014.13 | | | | | | | | 30,014.13 | | | | | | |
| SUB TOTAL * F.R.# | | | | | | 15,199.70 | | 30,014.13 | | | | | | | | 30,014.13 | | | | | | |
| I.G.V. (18%) | | | | | | 2,735.95 | | 540.25 | | | | | | | | 540.25 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 112,387.97 | | 46,471.57 | | | | | | | | 46,471.57 | | | | | | |

CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ
 INGENIERO RESIDENTE
 Regl CIP N.º 28592

Alfonso Mora Rodriguez
 Gerente General
 CIP 282026

A&L
 Servicio y Construcciones A&L SAC

ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. 171227

Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

4.2. MANILLA DE MATERIALES - ESTRUCTURAS



PLANILLA DE METRADOS - ESTRUCTURAS

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 OBRA: EJECUCION DE OBRA - REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA*
 CONTRATISTA: EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC
 SUPERVISION: ING. ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
 PRESUPUESTO: SI. 570,886.42 (INC. (GV))

PLANILLA DE METRADOS - ESTRUCTURAS

| ITEM. | DESCRIPCION DE PARTIDA | UND. | METRADO | P. UNIT. | PRESUPUESTO BASE | | VAL. N° 01 AL 30 DE NOV. | | VAL. N° 2 AL 15 DE DIC. | | VAL. N° 3 AL 31 DE DIC. | | VAL. N° 4 AL 15 DE ENE. | | VAL. N° 01 AL 28 DE ENE. | | VAL. ACUMULADA VALORIZADA | | VAL. CLIENTE | | TOTAL | | % OBRAS EJEC. | | | |
|--|---|------|---------|----------|------------------|-------------------|--------------------------|-----|-------------------------|------|-------------------------|-----|-------------------------|-----|--------------------------|------|---------------------------|-----|--------------|-----|-------|------|---------------|-----|-----|--|
| | | | | | S/. | SI. | MET. | S/. | SI. | MET. | S/. | SI. | MET. | S/. | SI. | MET. | S/. | SI. | MET. | S/. | SI. | MET. | | S/. | SI. | |
| ESTRUCTURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | ESTRUCTURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA ZAPATAS HASTA 1.50 M | m3 | 13.75 | 53.27 | 732.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.02 | EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA CIMENTOS DE MURO DE CONCRETO | m3 | 148.47 | 39.95 | 5931.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.03 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO AL 95% | m3 | 77.33 | 54.52 | 4210.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.04 | ACARRIO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION Y DEMOLICION | m3 | 630.87 | 28.56 | 18009.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DNE-10 M | m3 | 330.34 | 35.62 | 11766.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.01 | SOLADO DE CONCRETO PARA ZAPATAS H-4" | m2 | 76.87 | 33.77 | 2595.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.02 | CAPA NIVELANTE PARA VIGAS DE CONEXION E-2" | m2 | 16.99 | 20.18 | 342.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.03 | LOSA DE CONCRETO SIMPLE f'c=210 kg/cm ² | m3 | 9.05 | 395.55 | 3579.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03 | CONCRETO ARMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.01 | ZAPATAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.01.01 | ZAPATAS CONCRETO f'c=210 kg/cm ² | m3 | 5.05 | 400.26 | 2021.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.01.02 | ZAPATAS ACERO DE REFUERZO | kg | 163.90 | 4.43 | 724.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.02 | COLUMNAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.02.01 | COLUMNAS CONCRETO f'c=210 kg/cm ² | m3 | 17.37 | 533.06 | 9259.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.02.02 | COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 215.72 | 63.37 | 13670.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.02.03 | COLUMNAS ACERO DE REFUERZO | kg | 1937.91 | 4.43 | 8584.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.03 | VIGA DE CONEXION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.03.01 | VIGA DE CONEXION CONCRETO f'c=210 kg/cm ² | m3 | 8.20 | 419.84 | 3442.89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.03.02 | VIGA DE CONEXION ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 65.59 | 53.07 | 3480.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.03.03 | VIGA DE CONEXION ACERO DE REFUERZO | kg | 825.23 | 4.43 | 3655.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.04 | MURO DE CONCRETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.04.01 | MURO DE CONCRETO CONCRETO f'c=210 kg/cm ² | m3 | 97.31 | 495.22 | 48287.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.04.02 | MUROS DE CONCRETO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 487.04 | 57.36 | 28150.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.04.03 | MUROS DE CONCRETO ACERO DE REFUERZO | kg | 7023.65 | 4.43 | 31114.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.05 | VIGA SOLERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.05.01 | VIGA SOLERA CONCRETO f'c=210 kg/cm ² | m3 | 9.17 | 428.60 | 3930.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.05.02 | VIGA SOLERA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 93.52 | 63.37 | 5908.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.05.03 | VIGA SOLERA ACERO DE REFUERZO | kg | 1203.21 | 4.43 | 5330.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.06 | VARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.06.01 | JUNTAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO | m | 57.00 | 21.55 | 1228.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO DIRECTO | | | | | | 222,212.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS GENERALES (14.652663089463%) | | | | | | 32,559.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD (10%) | | | | | | 22,221.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | 276,993.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTOR DE RELACION (F.R.)* | | | | | | 0.9000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL * F.R. = | | | | | | 249,293.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (G.V. (18%)) | | | | | | 44,872.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 294,166.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A&L SAC
 Servicio y Construcciones A&L SAC
 Alfonso Mora Rodriguez
 Gerente General
 RUC: 20144526076

ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. 171227

CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ
 INGENIERO RESIDENTE
 Reg. CIP N° 28592

Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

**4.3. PLANILLA DE
MATERIALES -
ARQUITECTURA**



PLANILLA DE METRADOS - ARQUITECTURA

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 OBRA: EJECUCION DE OBRA "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"
 CONTRATISTA: EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC
 SUPERVISION: ING. ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
 PRESUPUESTO: SI. 570,886.42 (INC. IGV)

METRADOS ARQUITECTURA

| ITEM. | DESCRIPCION DE PARTIDA | UND. | METRADO | P. UNIT. | PRESUPUESTO BASE | | VAL. N° 01 AL 30 DE NOV. DE DIC. | VAL. N° 3 AL 31 DE DIC. | VAL. N° 4 AL 15 DE ENE. | VAL. N° 01 AL 26 DE ENE. | VAL. ACUMULADA VALORIZADA | | VAL. CLIENTE | | TOTAL | | % OBRAS EJEJ. | | |
|--|---|----------------|----------|----------|-------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-----|--------------|-----|-------|------|---------------|-----|-----|
| | | | | | SI. | SI. | | | | | MET. | SI. | MET. | SI. | SI. | MET. | | SI. | SI. |
| ARQUITECTURA | | | | | 125,825.38 | | | | | | | | | | | | | | |
| ARQUITECTURA | | | | | 125,825.38 | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | m ² | 237.02 | 126.49 | | 29,980.66 | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01.01 | MURO DE BLOQUE DE CONCRETO 14x19x39 CM | m ² | 84.62 | 136.15 | | 11,521.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01.02 | MURO DE BLOQUE DE CONCRETO 19x19x39 CM | m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | m ² | 176.54 | 44.83 | | 8,021.88 | | | | | | | | | | | | | |
| 03.02.01 | TAPAJEO IMPERMEABILIZADO DE COLUMNAS | m ² | 153.71 | 55.92 | | 8,595.46 | | | | | | | | | | | | | |
| 03.02.02 | TAPAJEO IMPERMEABILIZADO DE VIGA SOLERA EXTERIOR | m ² | 964.04 | 30.56 | | 29,155.46 | | | | | | | | | | | | | |
| 03.02.03 | BRUÑA EN MURO | m | 264.78 | 9.28 | | 2,457.16 | | | | | | | | | | | | | |
| 03.02.04 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | m ² | 74.61 | 19.72 | | 1,471.31 | | | | | | | | | | | | | |
| 03.03 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.04 | CARPINTERIA METALICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.04.01 | PUERTA METALICA TIPO 01, ALTURA=2.5 m, ANCHO = 1.15 m. INC. CERRAJERIA Y PINTURA PRINCIPAL Y PEATONAL | und | 1.00 | 1,586.34 | | 1,586.34 | | | | | | | | | | | | | |
| 03.04.02 | PUERTA METALICA TIPO 02, ALTURA = 3.00 m, ANCHO= 5.00 m INC. CERRAJERIA Y PINTURA/ ACCESO VEHICULAR- ESTACIONAMIENTO (proteccion) | und | 1.00 | 5,940.00 | | 5,940.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 03.04.03 | INGRESO A MUELLE | und | 1.00 | 4,276.80 | | 4,276.80 | | | | | | | | | | | | | |
| 03.04.04 | | und | 1.00 | 1,118.77 | | 1,118.77 | | | | | | | | | | | | | |
| 03.05 | PINTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.05.01 | PINTURA EN MUROS /CARA INTERIOR Y EXTERIOR | m ² | 1,026.65 | 15.45 | | 15,892.64 | | | | | | | | | | | | | |
| 03.05.02 | PINTURA EN COLUMNAS Y VIGA SOLERA | m ² | 332.64 | 17.46 | | 5,807.89 | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO DIRECTO | | | | | 125,825.38 | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS GENERALES (14.652663089463%) | | | | | 18,436.77 | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD (10%) | | | | | 12,582.54 | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | 156,844.69 | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTOR DE RELACION (F.R.+) | | | | | 0.9000 | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL * F.R. = | | | | | 141,160.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| I.C.V. (18%) | | | | | 25,408.84 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 166,569.06 | | | | | | | | | | | | | | |

A&L SAC
 Servicio y Construcciones A&L SAC
 Alfonso Mora Rodríguez
 Gerente General
 CIP 2578026

ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. 171227

CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ
 INGENIERO RESIDENTE
 Reg. CIP N° 28592

Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

4.4. METODOS - OTROS



PLANILLA DE METRADOS - OTROS

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 OBRA: EJECUCION DE OBRA: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"
 CONTRATIST EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC
 SUPERVISION ING. ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
 PRESUPUEST. SI. 370.866.42
 (INC. IGV)

METRADOS OTROS

| ITEM | DESCRIPCION DE PARTIDA | UND. | METRADO | P. UNIT. | PRESUPUESTO BASE | | VAL. N° 01 AL 30 DE NOV. DE DIC. | | VAL. N° 01 AL 15 DE DIC. | | VAL. N° 01 AL 31 DE DIC. | | VAL. N° 01 AL 15 DE ENE. | | VAL. N° 01 AL 28 DE ENE. | | VAL. ACUMULADA VALORIZADA | | VAL. CLIENTE | | TOTAL | | N. OBRAS ESEC. | |
|-------------------------------------|--|------|---------|----------|------------------|----------|----------------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|---------------------------|-----|--------------|-----|-------|-----|----------------|------|
| | | | | | SI. | SI. | MET. | SI. | MET. | SI. | MET. | SI. | MET. | SI. | MET. | SI. | MET. | SI. | MET. | SI. | MET. | SI. | | MET. |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.01 | REINSTALACION DE TENDIDO DE CABLEADO Y REFLECTORES | g/b | 1.00 | 1,166.71 | | 7,771.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.02 | INTERFERENCIA CON REDES EXISTENTES | g/b | 1.00 | 422.66 | | 1,166.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.03 | FLETE TERRESTRE DE MATERIALES | g/b | 1.00 | 5,057.77 | | 5,057.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.04 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | g/b | 1.00 | 1,124.37 | | 1,124.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO DIRECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS GENERALES (14.852863089463%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD (10%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTOR DE RELACION (F.R.=) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL * F.R. = | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.G.V. (18%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A&L
 Servidos y Construcciones A&L SAC
 Alfonso Mora Rodríguez
 Gerente General
 RUC 20544528026

[Signature]
 ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. 171227

[Signature]
 CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ
 INGENIERO RESIDENTE
 Reg. CIP N° 28592

Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

5. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VIGILADO

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

RESUMEN

LICITACIÓN PÚBLICA :

N° 045-2019-FONDEPES

O B R A :

EJECUCIÓN DE OBRA: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"


CONTRATISTA :

EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC


CONSULTOR :

ING. ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS

| ITEM | DESCRIPCION | PARCIAL | VALORIZACION 01 | | VALORIZACION 02 | | VALORIZACION 03 | | VALORIZACION 04 | | VALORIZACION 05 | |
|------|--------------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|
| | | | Del 28 al 30 noviembre | 3 D.C. | Del 01 al 15 diciembre | 15 D.C. | Del 16 al 31 Diciembre} | 16 D.C. | Del 01 al 15 Enero | 15 D.C. | Del 16 al 26 enero | 11 D.C. |
| | OBRA PROVISIONALES | 75,269.43 | 28,030.61 | | 23,557.12 | | 6,946.41 | | 6,512.26 | | 10,223.03 | |
| | ESTRUCTURAS | 222,212.06 | - | 51,617.48 | | 113,712.89 | | 56,881.69 | | 57,706.41 | | - |
| | ARQUITECTURA | 125,825.38 | - | - | | 14,990.33 | | - | | - | | 53,128.64 |
| | OTROS | 7,771.51 | 5,057.77 | - | | - | | - | | - | | 2,713.74 |
| | COSTO DIRECTO | 431,078.38 | 33,088.38 | 75,174.60 | | 135,649.63 | | 121,100.36 | | 121,100.36 | | 66,065.41 |
| | GASTOS GENERALES (14.6526625%) | 63,164.46 | 4,848.33 | 11,015.08 | | 19,876.28 | | 17,744.43 | | 17,744.43 | | 9,680.34 |
| | UTILIDAD (10%) | 43,107.84 | 3,308.84 | 7,517.46 | | 13,564.96 | | 12,110.04 | | 12,110.04 | | 6,606.54 |
| | SUB TOTAL | 537,350.68 | 41,245.55 | 93,707.14 | | 169,090.87 | | 150,954.83 | | 150,954.83 | | 82,352.29 |
| | FACTOR DE RELACION: | 0.90000 | 37,121.00 | 84,336.43 | | 152,181.78 | | 135,859.35 | | 135,859.35 | | 74,117.06 |
| | IGV(18%) | 87,050.82 | 6,681.78 | 15,180.56 | | 27,392.72 | | 24,454.68 | | 24,454.68 | | 13,341.07 |
| | TOTAL COSTO DE OBRA | 570,666.43 | 43,802.78 | 99,516.99 | | 179,524.50 | | 160,314.03 | | 160,314.03 | | 87,458.13 |
| | PARCIAL | | 7.68% | 17.44% | | 31.4% | | 28.09% | | 28.09% | | 15.33% |
| | ACUMULADO | | 7.68% | 25.11% | | 56.58% | | 84.67% | | 84.67% | | 100.00% |


Alfonso Mora Rodriguez
Gerente General
RUC 20544528026


ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 171227


CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ
INGENIERO RESIDENTE
Reg. CIP N° 28592

RESUMEN

LICITACIÓN PÚBLICA

N° 045-2019-FONDEPES

O B R A

EJECUCION DE OBRA: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

CONTRATISTA

EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC

CONSULTOR

ING. ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS


| ITEM | DESCRIPCION | PARCIAL | VALORIZACION 01 | | VALORIZACION 02 | | VALORIZACION 03 | | VALORIZACION 04 | | VALORIZACION 05 | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|--------|------------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| | | | Del 28 al 30 noviembre | 3 D.C. | Del 01 al 15 diciembre | 15 D.C. | Del 16 al 31 Diciembre) | 16 D.C. | Del 01 al 15 Enero | 15 D.C. | Del 16 al 26 enero | 11 D.C. |
| OBRAS PROVISIONALES | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO DIRECTO | 75,269.43 | 28,030.61 | | 23,557.12 | | 6,946.41 | | 6,512.26 | | 10,223.03 | |
| | GASTOS GENERALES (14.6526625%) | 7,526.94 | 2,803.06 | | 2,355.71 | | 694.64 | | 651.23 | | 1,022.30 | |
| | UTILIDAD (10%) | 11,028.98 | 4,107.23 | | 3,451.75 | | 1,017.83 | | 954.22 | | 1,497.95 | |
| | SUB TOTAL | 93,825.35 | 34,940.90 | | 29,364.58 | | 8,658.88 | | 8,117.71 | | 12,743.28 | |
| | FACTOR DE RELACION: | 0.90000 | 31,446.81 | | 26,428.12 | | 7,793.00 | | 7,305.94 | | 11,468.95 | |
| | IGV(18%) | 15,199.71 | 5,660.43 | | 4,757.06 | | 1,402.74 | | 1,315.07 | | 2,064.41 | |
| | TOTAL COSTO DE OBRA | 99,642.52 | 37,107.24 | | 31,185.18 | | 9,195.74 | | 8,621.01 | | 13,533.36 | |
| | PARCIAL | | 37.24% | | 31.30% | | 9.23% | | 8.65% | | 13.58% | |
| | ACUMULADO | | 37.24% | | 68.54% | | 77.77% | | 86.42% | | 100.00% | |



A&L
Servicio y Construcciones A.L.L.SAC
Alfonso Mora Rodríguez
Gerente General
RUC 20544528026



ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 171227



CARLOS ENRIQUE QUINJANILLA MARTINEZ
INGENIERO RESIDENTE
Reg. CIP N° 28592


CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO


RESUMEN

LICITACIÓN PÚBLICA : N° 045-2019-FONDEPES
 O B R A : EJECUCION DE OBRA: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"
 CONTRATISTA : EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC
 CONSULTOR : ING. ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS

| ITEM | DESCRIPCION | PARCIAL | VALORIZACION 01 | VALORIZACION 02 | VALORIZACION 03 | VALORIZACION 04 | VALORIZACION 05 |
|------|--------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | Del 28 al 30 noviembre
3 D.C. | Del 01 al 15 diciembre
15 D.C. | Del 16 al 31 Diciembre
16 D.C. | Del 01 al 15 Enero
15 D.C. | Del 16 al 26 enero
11 D.C. |
| | ESTRUCTURA | | | | | | |
| | COSTO DIRECTO | 222,212.06 | 51,617.48 | 113,712.89 | 56,881.69 | 56,881.69 | - |
| | GASTOS GENERALES (14.6526625%) | 32,559.98 | 7,563.34 | 16,661.97 | 8,334.68 | 8,334.68 | - |
| | UTILIDAD (10%) | 22,221.21 | 11,371.29 | 5,161.75 | 5,688.17 | 5,688.17 | - |
| | SUB TOTAL | 276,993.25 | 64,342.57 | 141,746.15 | 70,904.54 | 70,904.54 | - |
| | FACTOR DE RELACION: | 0.90000 | 57,908.31 | 127,571.54 | 63,814.09 | 63,814.09 | - |
| | IGV(18%) | 44,872.91 | 10,423.50 | 22,962.88 | 11,486.54 | 11,486.54 | - |
| | TOTAL COSTO DE OBRA | 294,166.84 | 68,331.81 | 150,534.42 | 75,300.63 | 75,300.63 | - |
| | PARCIAL | | 0.00% | 51.17% | 25.60% | 25.60% | 0.00% |
| | ACUMULADO | | 23.23% | 74.40% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |


Alfonso Mora Rodriguez
 Gerente General
 RUC 20544528026


ALBERTO AMADEO GONZALEZ ROJAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. 171227


CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ
 INGENIERO RESIDENTE
 Reg. CIP N° 28592

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

RESUMEN

LICITACIÓN PÚBLICA

Nº 045-2019-FONDEPES

O B R A

EJECUCION DE OBRA: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

CONTRATISTA

EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC

CONSULTOR

ING. ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS

| ITEM | DESCRIPCION | PARCIAL | VALORIZACION 01 | VALORIZACION 02 | VALORIZACION 03 | VALORIZACION 04 | VALORIZACION 05 |
|------|--------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | Del 28 al 30 noviembre
3 D.C. | Del 01 al 15 diciembre
15 D.C. | Del 16 al 31 Diciembre
16 D.C. | Del 01 al 15 Enero
15 D.C. | Del 16 al 26 enero
11 D.C. |
| | ARQUITECTURA | | | | | | |
| | COSTO DIRECTO | 125,825.38 | - | - | 14,990.33 | 57,706.41 | 53,128.64 |
| | GASTOS GENERALES (14.6526625%) | 18,436.77 | - | - | 2,196.48 | 8,455.53 | 7,784.76 |
| | UTILIDAD (10%) | 12,582.54 | - | - | 1,499.03 | 5,770.64 | 5,312.86 |
| | SUB TOTAL | 156,844.69 | - | - | 18,685.84 | 71,932.58 | 66,226.26 |
| | FACTOR DE RELACION: | 0.90000 | - | - | 16,817.26 | 64,739.32 | 59,603.63 |
| | IGY(18%) | 141,160.22 | - | - | 3,027.11 | 11,653.08 | 10,728.65 |
| | TOTAL COSTO DE OBRA | 166,569.06 | - | - | 19,844.37 | 76,392.40 | 70,332.28 |
| | PARCIAL | | 0.00% | 0.00% | 11.91% | 45.86% | 47.22% |
| | ACUMULADO | | 0.00% | 0.00% | 11.91% | 57.78% | 100.00% |

RESUMEN

LICITACIÓN PÚBLICA

Nº 045-2019-FONDEPES

O B R A

EJECUCION DE OBRA: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

CONTRATISTA

EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC

CONSULTOR

ING. ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS

| ITEM | DESCRIPCION | PARCIAL | VALORIZACION 01 | VALORIZACION 02 | VALORIZACION 03 | VALORIZACION 04 | VALORIZACION 05 |
|------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | Del 28 al 30 noviembre
3 D.C. | Del 01 al 15 diciembre
15 D.C. | Del 16 al 31 Diciembre
16 D.C. | Del 01 al 15 Enero
15 D.C. | Del 16 al 26 enero
11 D.C. |
| | OTROS | | | | | | |
| | COSTO DIRECTO | 7,771.51 | 5,057.77 | - | - | - | 2,713.74 |
| | GASTOS GENERALES (14.6526625%) | 1,138.73 | 741.10 | - | - | - | 397.64 |
| | UTILIDAD (10%) | 777.15 | 505.78 | - | - | - | 271.37 |
| | SUB TOTAL | 9,687.39 | 5,798.87 | - | - | - | 3,111.38 |
| | FACTOR DE RELACION: | 0.90000 | 8,718.65 | - | - | - | 2,800.24 |
| | IGV(18%) | 1,569.36 | 939.42 | - | - | - | 504.04 |
| | TOTAL COSTO DE OBRA | 10,288.01 | 6,158.40 | - | - | - | 3,304.28 |
| | PARCIAL | | 59.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 32.12% |
| | ACUMULADO | | 59.86% | 59.86% | 59.86% | 59.86% | 91.98% |

A&L
Servicio y Construcciones A&L SAC
Alfonso Mora Rodríguez
Gerente General
RUC 20544528026

ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 171227

CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ
INGENIERO RESIDENTE
Reg. CIP N° 28592

Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

6. CURVA "S"




Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

OBRA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA
CONTRATISTA
ING° RESIDENTE
SUPERVISIÓN

EJECUCION DE OBRA: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"
N° 045-2019-FONDEPES
EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC
ING. CARLOS ROBERTO QUINTANILLA HERNANDEZ
ING. ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS

| | | |
|---|-------|----------|
| ESTADO DE OBRA | 6.21% | ATRASADA |
| VALORIZACION N° 01 (28/11/2019 AL 30/11/2019) | | |

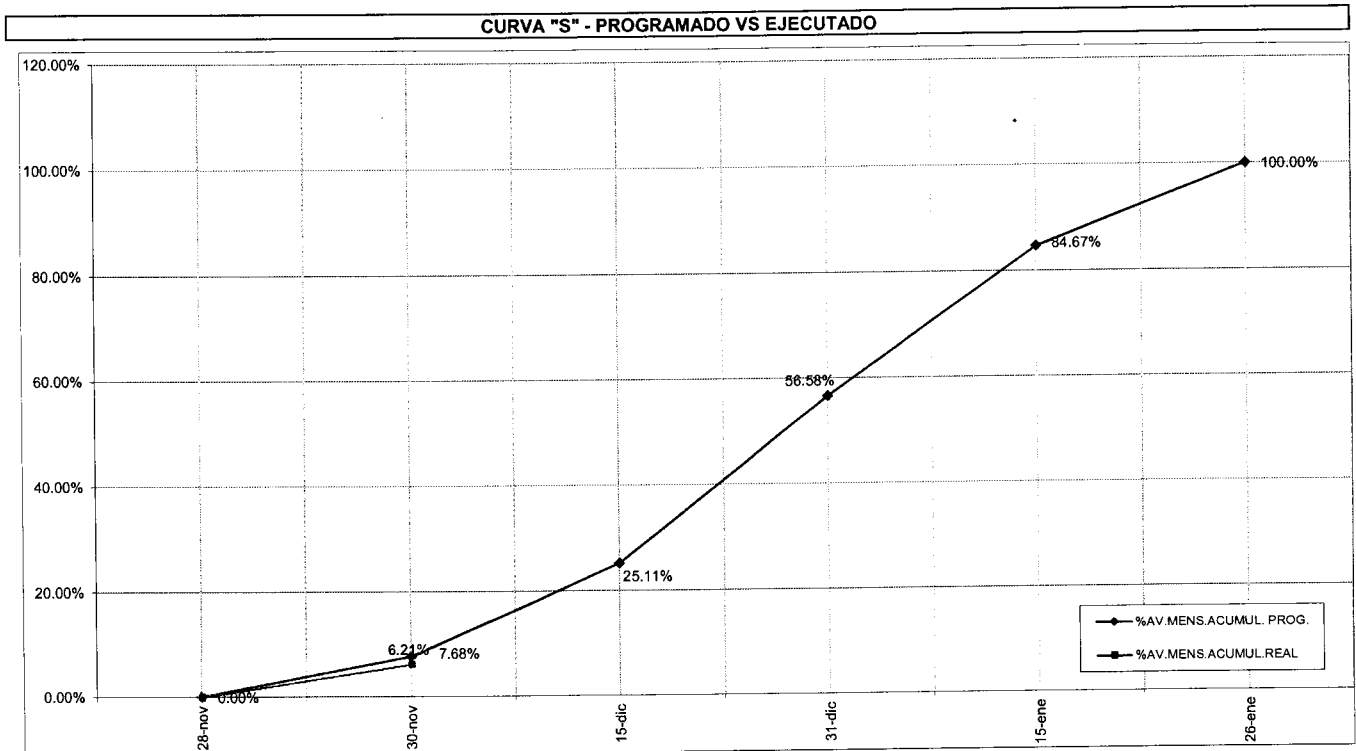

| | 28/11/19 | 30/11/19 | 15/12/19 | 31/12/19 | 15/01/20 | 26/01/20 | | | |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| %AV.MENS.ACUMUL. PROG. | 0.00% | 7.68% | 25.11% | 56.58% | 84.67% | 100.00% | | | |
| %AV.MENS.ACUMUL. REAL | 0.00% | 6.21% | | | | | | | |


A&L
Sercop Construcciones A & L SAC
Alfonso Mora Rodríguez
Gerente General
RUC 20544528026

ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 171227

CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ
INGENIERO RESIDENTE
Reg. CIP N° 28592

Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRO DE
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE TAMBO DE
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

7. CUADRO CONTROL DE AVANCES

| | | |
|--|-------------------------------------|------------|
|  FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero | CUADRO DE CONTROL DE AVANCES | |
| | FECHA BASE DEL PRESUPUESTO | 31/08/2019 |
| MES DE INICIO DE VALORIZACIONES | | 28/11/2019 |

| CONTROL DE VALORIZACION (DATOS SIN IGV) | | | | | | |
|---|------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| VALORIZACION MENSUAL | MES | O.P | E | A | OTROS | TOTAL |
| 1 | 30/11/2019 | 30,014.13 | - | - | - | 30,014.13 |
| 2 | 15/12/2019 | | | | | - |
| 3 | 31/12/2019 | | | | | - |
| 4 | 15/01/2019 | | | | | - |
| 5 | 26/01/2019 | | | | | - |
| ACUMULADO ACTUAL | | 30,014.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,014.13 |
| CONTRATO | | 84,442.80 | 249,293.94 | 141,160.22 | 8,718.65 | 483,615.61 |
| SALDO | | 54,428.67 | 249,293.94 | 141,160.22 | 8,718.65 | 453,601.48 |

| RESUMEN | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------|------------------|------------------|--------|-------------------|---------|
| ESPECIALIDAD | Monto del Contrato sin IGV | Anterior | Mes Actual | Acumulado | % | Saldo | % |
| OBRAS PROVISIONALES | 84,442.80 | 0.00 | 30,014.13 | 30,014.13 | 35.54% | 54,428.67 | 64.46% |
| ESTRUCTURAS | 249,293.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 249,293.94 | 100.00% |
| ARQUITECTURA | 141,160.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 141,160.22 | 100.00% |
| OTROS | 8,718.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 8,718.65 | 100.00% |
| SUB-TOTAL | 483,615.61 | 0.00 | 30,014.13 | 30,014.13 | 6.21% | 453,601.48 | 93.79% |
| IMPUESTO IGV 18% | 87,050.81 | 0.00 | 5,402.54 | 5,402.54 | | 81,648.27 | |
| TOTAL | 570,666.42 | 0.00 | 35,416.67 | 35,416.67 | | 535,249.75 | |


| RESUMEN | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------|-------|
| ESPECIALIDAD | Avance Programado Acumulado Fechado | % | Avance Programado Acumulado Acelerado | % | |
| OBRAS PROVISIONALES | 84,442.81 | 100.00% | | 0.00% | |
| ESTRUCTURAS | 249,293.93 | 100.00% | | 0.00% | |
| ARQUITECTURA | 141,160.22 | 100.00% | | 0.00% | |
| OTROS | 8,718.65 | 100.00% | | 0.00% | |
| SUB-TOTAL | 483,615.61 | 100.00% | | 0.00 | 0.00% |
| IMPUESTO IGV 18% | 87,050.81 | | | 0.00 | |
| TOTAL | 570,666.42 | | | 0.00 | |

| CONTROL DE AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------------|-------|-----------|
| MONTO SIN IGV = | | 48,361.56 | | | |
| VAL | MES | | | SALDO | |
| 1 | 30-nov-19 | S/. | 3,001.41 | S/. | 45,360.15 |
| 2 | 15-dic-19 | S/. | - | S/. | 45,360.15 |
| 3 | 31-dic-19 | S/. | - | S/. | 45,360.15 |
| 4 | 15-ene-19 | S/. | - | S/. | 45,360.15 |
| 5 | 26-ene-19 | S/. | - | S/. | 45,360.15 |
| TOTAL | | S/. | 3,001.41 | | |

| CONTROL DE AMORTIZACION DEL ADELANTO P/MATERIALES | | | | | |
|---|-----------|------------|----------|-------|---|
| MONTO SIN IGV = | | 0.00 | | | |
| VAL | MES | AMORTIZ. | | SALDO | |
| 1 | 30-nov-19 | S/. | - | S/. | - |
| 2 | 15-dic-19 | S/. | - | S/. | - |
| 3 | 31-dic-19 | S/. | - | S/. | - |
| 4 | 15-ene-19 | S/. | - | S/. | - |
| 5 | 26-ene-19 | S/. | - | S/. | - |
| TOTAL | | S/. | - | | |


 Sr. **Alfonso Mora Rodríguez**
 Gerente General
 RUC 20544528026


ALFONSO MORA RODRIGUEZ
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. 171227


CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ
 INGENIERO RESIDENTE
 Reg. CIP N° 28592

Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

8. AMPLIACION DE ADELANTO DIRECTO



AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO

ADJ. SIMPLIFICAD/ N° 045-2019-FONDEPES

O B R A EJECUCION DE OBRA: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

CONTRATISTA EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L SAC
SUPERVISOR ING. ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
FECHA 30/11/2019

MONTO CONT.(s/IGV) = C S/. 483,615.61
ADEL. DIREC. (s/IGV) = A S/. 48,361.56
FECHA ADEL. DIRECTO 27-nov-19

| No. | VALORIZACION | | MONTO DEL ADELANTO A | AMORTIZACION DEL ADELANTO AM=V*A/C | SALDO POR AMORTIZAR S=A-AM |
|--|--------------|-----------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | MES | MONTO V | | | |
| 1 | 30-nov-19 | 30,014.13 | 48,361.56 | 3,001.41 | 45,360.15 |
| 2 | 15-dic-19 | 0.00 | | | |
| 3 | 31-dic-19 | 0.00 | | | |
| 4 | 15-ene-20 | 0.00 | | | |
| 5 | 26-ene-20 | 0.00 | | | |
| TOTAL | | | 30,014.13 | 3,001.41 | |
| AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR | | | 48,361.56 | 0.00 | |
| AMORTIZACION DEL MES | | | | 3,001.41 | |

A&L Construcciones A & L SAC
 Alfonso Mora Rodríguez
 Gerente General
 RUC 20544518026

[Signature]
 ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. 171227

[Signature]
 CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ
 INGENIERO RESIDENTE
 Reg. CIP N° 28592


Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE TAMBORA,
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"


9. CONTROL DE EJECUCION VS PROGRAMADO

CONTROL DE EJECUTADO VS PROGRAMADO

| MES | VALORIZACION PROGRAMADA | | PORCENTAJE (%) | | VALORIZACION EJECUTADA | | | PORCENTAJE (%) | |
|----------------|-------------------------|------------|----------------|-----------|------------------------|----------------|---------|----------------|--|
| | PROGRAMADO | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | REAL | REAL ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | |
| 30/11/2019 | 37,121.00 | 37,121.00 | 7.68% | 7.68% | 30,014.13 | 30,014.13 | 6.21% | 6.21% | |
| 15/12/2019 | 84,336.43 | 121,457.43 | 17.44% | 25.11% | - | - | | | |
| 31/12/2019 | 152,181.78 | 273,639.21 | 31.47% | 56.58% | - | - | | | |
| 15/01/2020 | 135,859.35 | 409,498.56 | 28.09% | 84.67% | - | - | | | |
| 26/01/2020 | 74,117.06 | 483,615.62 | 15.33% | 100.00% | - | - | | | |
| TOTALES | 483,615.62 | | | | 30,014.13 | | | | |

| PERIODO | MONTO REAL EJECUTADO | | MONTO PROGRAMADO | | % AVANCE REAL EJECUTADO | | % AVANCE PROGRAMADO | |
|----------------|----------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO |
| 30/11/2019 | 30,014.13 | 30,014.13 | 37,121.00 | 37,121.00 | 6.21% | 6.21% | 7.68% | 7.68% |
| 15/12/2019 | - | - | - | - | | | | |
| 31/12/2019 | - | - | - | - | | | | |
| 15/01/2020 | - | - | - | - | | | | |
| 26/01/2020 | - | - | - | - | | | | |
| TOTALES | 30,014.13 | | 37,121.00 | | 6.21% | | 7.68% | |


ALBERTO AMADEO GONZÁLEZ ROJAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. 171227
 ALBERTO AMADEO GONZÁLEZ ROJAS


CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTÍNEZ
 INGENIERO RESIDENTE
 Reg. CIP N° 28592


A&F - Construcciones A.B.L.S.A.C.
 Alfonso Mora Rodríguez
 Gerente General
 RUC: 20544528066

Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

10. COMPARATIVO


ANALISIS CON EL CALENDARIO FECHADO

AVANCES MENSUALES

| VALORIZACION A LA FECHA | 31/11/2019 | 15/12/2019 | 31/12/2019 | 15/01/2020 | 26/01/2020 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| EJECUTADO MENSUAL REAL | 6.21% | | | | |
| PROGRAMADO MENSUAL FECHADO | 6.16% | 23.24% | 27.47% | 31.54% | 11.59% |

AVANCES ACUMULADOS

| VALORIZACION A LA FECHA | 31/11/2019 | 15/12/2019 | 31/12/2019 | 15/01/2020 | 26/01/2020 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| EJECUTADO ACUMULADO REAL | 6.21% | | | | |
| PROGRAMADO ACUMULADO FECHADO | 6.16% | 29.40% | 56.87% | 88.41% | 100.00% |

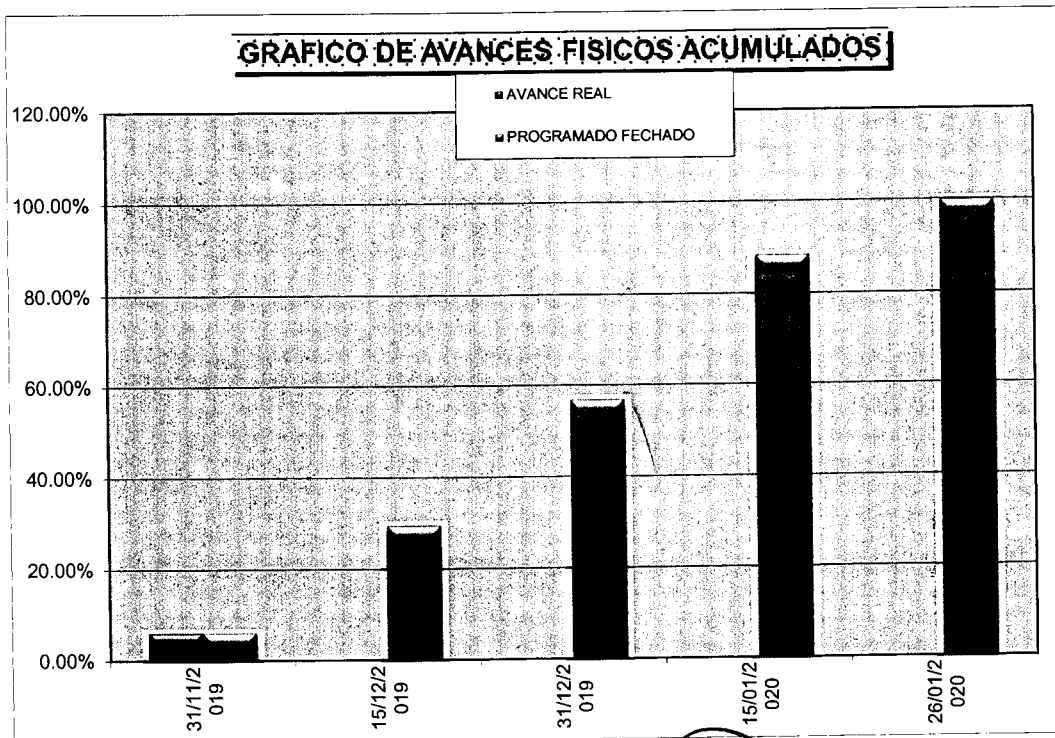

[Signature]
ALBERTO AMADEO GONZALEZ ROJAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. 171227

[Signature]

A&L
 Servicio y Construcciones A & L SAC
Alfonso Mora Rodríguez
 Gerente General
 RUC 20544328026

Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

ANEXOS

SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A & L S.A.C.

MZA. . LOTE. . URB. LAS PALMERAS A UNA CUADRA DE LA BODEGA DE LA
ESQUINA
PISCO - PISCO - ICA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20544528026****E001-51**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **04/12/2019**
Señor(es) : **FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO**
RUC : **20137921601**
Dirección del Cliente : **AV. PETIT THOUARS 115
ESQUINA AV PETIT THOUARS
CON 28 DE JULIO LIMA-LIMA-
LIMA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|--|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | VALORIZACION QUINCENAL NRO 01 DE LA EJECUCION DE LA OBRA REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA | 27012.72 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones
Gratuitas : S/ 0.00

**SON: TREINTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 01/100
SOLES**

| | |
|--------------------|--------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 27,012.72 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 27,012.72 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 4,862.29 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 31,875.01 |

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

A&L
Servicio y Construcciones A & L S.A.C.
Alfonso Mora Rodríguez
Gerente General
RUC 20544528026

CARLOS ENRIQUE QUINTAMILLA MARTINEZ
INGENIERO RESIDENTE
Reg. CIP N° 28592

Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

**1 COPIA DE
CUADRO DE OBRA**



CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:

Contratista:

FECHA



NOTARIA
RAMOS MORON
Javier Alonso Ramos Morón
NOTARIO DE CHINCHA

CERTIFICO: =====
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 112 AL 116
DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049, LEY DEL NOTARIADO, SE
APERTURA EL PRESENTE LIBRO CON LAS SIGUIENTES
REFERENCIAS: =====

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A
& L.S.A.C.** =====

R.U.C. Nº: **20544528026.** =====

DOMICILIO: **URB. LAS PALMERAS MZ. H LOTE 05 - PISCO -
PISCO - ICA.** =====

CERTIFICO LA APERTURA DEL PRIMER LIBRO. =====

OBJETO DEL LIBRO: **CUADERNO DE OBRA: REMODELACION
DE CERCO PERIMETRICO, EN EL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE
TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA,
DEPARTAMENTO ICA.** =====

FOLIOS: **100 CUADRUPLS.** =====

A SOLICITUD DE: **MORA RODRIGUEZ ALFONSO MARTIN.** ===

CERTIFICACION QUE CORRE REGISTRADA CON EL Nº **003230-
2019** DE MI REGISTRO CRONOLOGICO DE CERTIFICACION DE
APERTURA DE LIBROS Y HOJAS SUELTAS, DE LO QUE DOY FE.==

CHINCHA, **27 (VEINTISIETE) DE NOVIEMBRE 2019.** =====



JAVIER ALONSO RAMOS MORON
Av. Víctor Andrés Belaúnde N° 300 Pueblo Nuevo - Chíncha - Ica - tel: (056) 317395
E-mail: informes@notariaramosmoron.com www.notariaramosmoron.com

.....
ING. RESIDENTE

.....
INSPECTOR





CUADERNO DE LA OBRA: **REMEDIACION DEL CERCO PERIMETRICO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO TAMBO DE MORA**

Propietario: **FONDEPES**

Dirección:

Contratista: **SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A & L SAE**

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|
| FECHA | | | | | | | | | | | |
| ASIENTO N° 001 | | | | PO SUPERVISOR | | | | 27/11/19 | | | |

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
 "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

- Obra : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: PROYECTO IOARR: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"
- Contratista : SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A Y L S.A.C.
- Proceso de selección : AS N° 045-2019-FONDEPES
- Contrato de Obra : Contrato N° 039-2019-FONDEPES
- Monto del contrato : S/. 570,666.42 (Quinientos Setenta Mil Seiscientos Sesenta y Seis con 42/100 Soles),
- Sistema de Contratación : A Suma Alzada.
- Plazo de Ejecución : 60 d.c.
- Supervisor de Obra : Ing. Albert Amadeo González Rojas /CIP N° 171227

Siendo las 02:00 p.m. del día 27 de Noviembre del 2019, se reunieron en el lugar de la obra el **Ingeniero José Antonio Cáceres Rojas**, en representación de **FONDEPES**; el Señor **Alfonso Martín Mora Rodríguez**, como representante de la empresa **SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A Y L S.A.C.**; el **Ing. Albert Amadeo González Rojas** con CIP N° 171227, como Supervisor de Obra; designados para participar en la entrega del terreno para la **EJECUCIÓN DE LA OBRA: PROYECTO IOARR: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"**

Luego de efectuar el recorrido y verificar la disponibilidad del lugar, la empresa **SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A Y L S.A.C.** recibe el terreno a satisfacción y plena conformidad, declarando que no existe impedimento alguno para ejecutar la obra. Al término de la diligencia se dio por entregado el terreno en forma parcial y dando fe del acto, firman los participantes el presente documento en 03 originales a los 27 días del mes de Noviembre del año 2,019.

POR EL CONTRATISTA



Alfonso Martín Mora Rodríguez
 Representante **SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A Y L S.A.C**
 DNI N° 43390393

POR LA SUPERVISIÓN

POR FONDEPES



Ing. Albert Amadeo González Rojas
 Supervisor de Obra
 CIP N° 171227



Ing. José A. Cáceres Rojas
 Representante de FONDEPES



CUADERNO DE LA OBRA: REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL DESMORCADO
DESCUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPART. ICA.
Propietario: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Dirección:
Contratista: EMPRESA SERVICIO Y CONTRUCCIONES A RL SAC.

FECHA

ASIENTO N° 03

DE LA SUPERVISION

28/11/19.

A.- EL SUSCRITO ING. CIVIL ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS CON CIP 171227, HA SIDO DESIGNADO POR EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDERES COMO SUPERVISOR DE LA OBRA DEL TITULO "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL DESMORCADO DESCUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA" CON EL FIN DE REALIZAR EL CONTROL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN OBRA, EL CONTROL FINANCIERO, DEL PLAZO, DE LA CANTIDAD Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL QUE EL CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A RL SAC, EJECUTE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y TODA LA DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION, AMBIENTALES, SEGURIDAD Y REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 171227


ASIENTO N° 04

DE LA SUPERVISION

28/11/19

SE TOMA DE CONOCIMIENTO QUE EL DIA 27/11/19 LA ENTIDAD FONDERES HA HECHO EFECTIVO EL PAGO DEL ADELANTO DIRECTO POR EL MONTO DE S/ 57,066.64 EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO CONTRATADO. POR LO QUE CON ESTE EVENTO SE CUMPLEN LAS 5 CONDICIONES INDICADAS EN EL ART. 176 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, POR LO QUE EL PLAZO CONTRACTUAL COMIENZA A REGIR A PARTIR DE DIA SIGUIENTE, ES DECIR SE FIJA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO FECHA DE INICIO, POR UN PLAZO DE 60 DIAS CALENDARIOS, POR LO TANTO LA FECHA DE TERMINO SE FIJA EL DIA 26 DE ENERO DEL 2020.

ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 171227



Propietario: FONDETES

Dirección:

Contratista: EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A RL SAC

FECHA

Asiento N° 05 DE LA RESIDENCIA 29/IV/2019

- Se da inicio a la obra "Remodelación del Cerco Perimetrico en el Desembocadero Puquero Antarcual Tanks de Mora - Prop. Otuncho - Tac"
- Se inician las labores con las instalaciones provisionales, tales como el Almacén, Oficina y Caseta de Guardia.
- Se le solicita la autorización a la Supervisión para la colocación del Cerco Provisional con la malla Arpillera en el área de trabajo.
- Se está gestionando las maquinarias para realizar la demolicion del cerco perimetrico, así como también los muros de ladrillo del cerco

[Handwritten signature]

CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ
INGENIERO RESIDENTE
Reg. CIP N° 28532 28/IV/19

ASIENTO N° 06 DE LA SUPERVISION

1. SE AUTORIZA LA COLOCACION DEL CERCO PROVISIONAL CON MALLA ARPILLERA (TRANS 1)
2. SE VERIFICA LA INST. DE OFICINAS PROVISIONALES
3. SE SOLICITA AL CONTRATISTA ALCANZAR LOS CALENDARIOS DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, DIAGRAMA GANTT Y PROGRAMACION PERT-CPM, CON LA FECHA DE INICIO Y TERMINO CONTRACTUAL.
4. SE SOLICITA AL CONTRATISTA ALCANZAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA, ASÍ COMO LA RELACION DEL EQUIPO MÍNIMO OPERADO.
5. SE SOLICITA AL CONTRATISTA ALCANZAR LA POLIZA DE SEGURO DE TODO PRESGO Y MONTAJE (CAR) Y SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE PRESGO (SCTR).
6. SE SOLICITA ALCANZAR EL DISEÑO DE MEZCLA DEL CONCRETO A UTILIZAR EN OBRA ANTES DE SU USO PARA UN $f'_{c} = 210 \text{ kg/cm}^2$ CON CEMENTO TIPO V, ADEMÁS ALCANZAR LOS ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS (CLORUROS, SULFATOS, ASOCIACION, GRANULOMETRÍA) DE LOS AGREGADOS Y EL AGUA A UTILIZAR.

ING. RESIDENTE

[Handwritten signature]
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 171227

INSPECTOR



CUADERNO DE LA OBRA: REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO TAMBO DE NO

Propietario: FONDEPES

Dirección:

Contratista: EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A & L SPC

FECHA

Asiento N° 07 del Residente 29/11/2019

- Se le comunica a la Supervisión que se le estará alcanzando los calendarios del Avance de Obra Valorizado, Diagrama Gantt y Programación PERT-Red con la fecha de Inicio y Término Contractual.
- Por mismo se está elaborando el Plan de Seguridad y Salud de la obra en mención así como también
- Ya se está realizando el diseño de mezcla del concreto a utilizar de una resistencia física-química de los agregados y el del agua respectivamente.
- Se le solicita a la Supervisión la autorización para iniciar la demolición de los tramos 01, 02, 02A, 03 y 04 de los muros tipo muro de ladrillo arilla y sobrecimiento.

[Handwritten signature]

CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ
INGENIERO RESIDENTE
Reg. CIP N° 28592

Asiento N° 08 DE LA SUPERVISION 29/11/19

1. SE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA DEMOLICION DE LOS TRAMOS 01, 02, 02A, 03 Y 04 DEL CERCO TIPO UNO Y MURO DE TACOMA DE ARILLA.
2. SE HACE ENTREGA AL CONTRATISTA EL MODELO DE CARTEL DE OBRA CON LAS MEDIDAS SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 2.40m X 3.60m.
3. SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA QUE CONTINUE CON EL CERRAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO CON MALLA ARILLERA, PARA PREVENIR ACCIDENTES CON LA POBLACION.
4. SE SOLICITA IMPLEMENTAR LOS SS.HH PORTATILES.

[Handwritten signature]
ALBERTO GONZÁLEZ ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 171227

INSPECTOR

CUADERNO DE LA OBRA: RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO DE TAMBO DE MAMA



Propietario: FONDEPES

Dirección:

Contratista: EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A RL SAC

FECHA

ASIENTO N° 09 DE/ Residente 30/11/2019

- Se continúa con los trabajos de demolición en los Tramos 01, 02, 02A y 03
- Se colocó la malla arpillera, cercando los Tramos 01, 02 y 04
- Se le comunica al Supervisor que ya se manda a elaborar el cartel de la obra de acuerdo al modelo enviado según las especificaciones técnicas
- Se alcanza los metrados correspondiente de la ValORIZACION N° 01
- Se le alcanza a la Supervisión el Calendario de Avance Valenzado Fechado.

On

CARLOS ENRIQUE QUINTANA
INGENIERO RESIDENTE
Reg. CIP N° 28592

ASIENTO N° 10 DEL SUPERVISOR 30/11/19

1. SE VERIFICA QUE CONTINUAN CON TRABAJOS DE DEMOLICION DEL CERCO PERIMETRICO TIPO UMI.
2. SE SOLICITA AL CONTRATISTA COLOCAR SEÑALETICAS DE SEGURIDAD A FIN DE EVITAR ACCIDENTES.
3. SE SOLICITA AL CONTRATISTA CUMPLIMENTAR EL CUADERNO DE LISTAS.
4. SE RECEPCIONA CARTA N° 009-2019-RL/ARL, DONDE ADJUNTA LOS CALENDARIOS DE AVANCE DE OBRA VALORIZADOS (CAOV), DIAGRAMA GANTT, PROGRAMACION PERT-CPM, CURVA "S", ADAPTADOS A LA FECHA DE INICIO DE EJECUCION.
5. EN LA FECHA SE RECEPCIONAN LOS METRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 28/11/19 AL 30/11/19, EN CONJUNTO CON EL RESIDENTE SE HACE LA REVISION Y AJUSTES DE LOS METRADOS, CON LOS CUAVES SE PROCEDERA A ELABORAR LA VALORIZACION QUINCENAL N° 01.

INGENIERO CIVIL
INSPECTOR

ING. RESIDENTE

29
Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO EN
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

11.3. ANEXO PROBANTE DE PRESENCIA DE POLIZA DE SEGUROS

Lima, 2 de Diciembre de 2019

Señor(a)

SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A & L S.A.C.

MZ. H LOTE 05 URB. LAS PALMERAS

PISCO / PISCO / ICA

Presente.-

Póliza : A7002019000521
Vigencia : 28/11/2019 - 26/02/2020
Corredor : DIRECTO

Estimado(a):

Queremos agradecerle la confianza depositada en **AVLA Perú Compañía de Seguros S.A.**, identificada con Registro Único de Contribuyentes No. 20600825187, como su compañía aseguradora y así damos la oportunidad de construir una relación comercial de largo plazo con usted en las operaciones que desarrolle tanto en **Perú** como en **Chile**.

Nuestro compromiso es brindarle un excelente servicio, dándole una respuesta personalizada, eficiente y oportuna, ante cualquier eventualidad o circunstancia que usted tenga. En ese sentido, nos comprometemos a mantener una política de mejora continua en nuestros procesos y productos.

Le sugerimos revisar el detalle de las condiciones de su póliza de seguro para que se familiarice con las coberturas y servicios especiales de la misma.

Le agradeceremos alcanzarnos la carátula de la póliza de seguro y el convenio de pago respectivo, debidamente firmados a nuestras oficinas ubicadas en:

Calle Las Begonias 415, Edificio Torre Begonias, Piso 3 – San Isidro

Nuestra Central de Información y Ventas: (01) 7154400 está a su completa disposición de lunes a viernes (9:00 a 6:00 p.m.) para responder cualquier inquietud sobre su póliza de seguro.

Cordialmente,



Carlos Guillermo Delgado Honda
Gerente de Riesgos Técnicos

CONDICIONES PARTICULARES SEGURO DE TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS

| | |
|------------------|----------------|
| PÓLIZA N° | A7002019000521 |
|------------------|----------------|

AVLA Perú Compañía de Seguros S.A., identificada con Registro Único de Contribuyentes No. 20600825187, asegura los bienes descritos en el sumario, contra los daños o pérdidas causadas directamente por Todo Riesgo para Contratistas, de acuerdo con las Condiciones Generales impresas y a las Condiciones Particulares y mecanografiadas expresadas en la misma, las cuales forman parte integrante de la Póliza de Seguro aquí concedida.

I. Datos del Contratante:

Nombre SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A & L S.A.C.
RUC N° 20544528026
Domicio Legal MZ. H LOTE 05 URB. LAS PALMERAS
PISCO / PISCO / ICA
Teléfono contacto 999927862
Email contacto _____

II. Datos del Asegurado:

Nombre SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A & L S.A.C.
RUC N° 20544528026
Domicilio Legal MZ. H LOTE 05 URB. LAS PALMERAS
PISCO / PISCO / ICA
Teléfono 999927862
Email contacto _____

III. Datos del Corredor (solo si aplica):

Nombre _____
RUC N° _____

IV. Vigencia:

Del 28/11/2019 a las 12:00 horas hasta el 26/02/2020 a las 12:00 (90) días

V. Primas y Forma de Pago:

| | | |
|-----------------------------------|----|-----------------|
| Prima Comercial | | 1,011.90 |
| Intereses | | 0.00 |
| IGV | | 182.14 |
| Prima Comercial + Intereses + IGV | S/ | <u>1,194.04</u> |

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Forma de Pago | <u>Según Convenio de Pago</u> |
| Vencimiento | <u>Según Convenio de Pago</u> |
| Lugar de Pago | <u>Según Convenio de Pago</u> |

VI. Datos del Riesgo:

Ubicación del Riesgo DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA

TAMBO DE MORA / CHINCHA / ICA

Actividad y/o Giro CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

Materia Asegurada REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL
 DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA,
 DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA,
 DEPARTAMENTO ICA

| Cobertura | Sumas Aseguradas | Deducible (1) |
|--|---|--|
| "A" BASICA | S/.570,666.42 | 10.00% del monto indemnizable, min. S/.8,250.00 |
| "B" TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO | S/.570,666.42 | 10.00% del monto indemnizable, min 1.00% del valor de la obra al momento del siniestro o S/.16,500.00, lo que resulte mayor. |
| "C" AVENIDA, INUNDACION, LLUVIA | S/.570,666.42 | 20.00% del monto indemnizable, min. S/.16,500.00 |
| "D" MANTENIMIENTO SIMPLE - 1 MES | S/.570,666.42 | 10.00% del monto indemnizable, min. S/.8,250.00 |
| "E Y F" RESPONSABILIDAD CIVIL INCLUYENDO RC CRUZADA | S/.114,133.28
Límite agregado periodo. | 10.00% del monto indemnizable, min. S/.1,625.00 por reclamante |
| "G" REMOCION DE ESCOMBROS (2) | S/.57,066.64 | Aplica el deducible de la cobertura que la activa. |
| HUELGA, MOTIN, CONMOCION CIVIL, DAÑO MALICIOSO Y TERRORISMO | S/.570,666.42
Límite agregado periodo. | 10.00% del monto indemnizable, min. S/.16,250.00 |
| VIBRACIONES Y DEBILITAMIENTO DE BASES | S/.57,066.64
Límite agregado periodo. | 10.00% del monto indemnizable, min. S/.16,250.00 |
| OTRAS PROPIEDADES ADYACENTES (SUJETO AL ENVÍO DEL LISTADO DE PROPIEDADES ADYACENTES ASEGURADAS POR ESTA COBERTURA) | S/.57,066.64
Límite agregado periodo. | 10.00% del monto indemnizable, min. S/.16,250.00 |

| Cobertura | Sumas Aseguradas | Deducible (1) |
|--|------------------|--|
| GASTOS ADICIONALES POR HORAS EXTRAS, TRABAJO NOCTURNO, TRABAJO EN DIAS FESTIVOS, FLETE EXPRESO | S/.28,533.32 | Aplica el deducible de la cobertura que la activa. |
| FLETE AEREO | S/.28,533.32 | Aplica el deducible de la cobertura que la activa. |

(1) Deducibles para toda y cada pérdida.

(2) La presente cobertura se activará únicamente si el monto del siniestro, correspondiente al daño material, excede a su respectivo deducible

VIII. Endosos:

| N° | CÓDIGO | CLÁUSULA |
|----|--------|--|
| 01 | 100000 | Condiciones Generales de Contratación |
| 02 | 100380 | Cláusula de exclusión del Instituto de Ataque Cibernético. |
| 03 | 210000 | Condiciones Generales CAR. |
| 04 | 210001 | Cláusula de cobertura de pérdidas o daños causados por huelga, motín y conmoción civil. |
| 05 | 210002 | Cláusula de cobertura de responsabilidad civil cruzada (cross liability). |
| 06 | 210005 | Cláusula de condiciones relativas al cronograma de avance de construcción y o montaje. |
| 07 | 210006 | Cláusula de cobertura para gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días feriados y flete expreso. |
| 08 | 210007 | Cláusula de gastos adicionales para flete aéreo. |
| 09 | 210008 | Cláusula de obligaciones relativas a obras sitas en zonas sísmicas. |
| 10 | 210110 | Cláusula de condiciones relativas a medidas de seguridad en caso de precipitación, creciente impetuosa de ríos, arroyos e inundación |
| 11 | 210112 | Cláusula de condiciones especiales para equipos extintores de incendios y protección de incendios en sitios de obras. |
| 12 | 211001 | Cláusula para cubrir pérdidas físicas o daños materiales causados directamente por terrorismo |
| 13 | 210102 | Cláusula de condiciones relativas a cables subterráneos, tuberías y demás instalaciones subterráneas. Deducible: 20% del monto indemnizable, min. S/1,625.00 |
| 14 | 210119 | Cláusula de cobertura de obras civiles existentes y propiedad adyacente |
| 15 | 210120 | Cláusula de cobertura de la vibración, eliminación o del debilitamiento de elementos portantes |

IX. Condiciones Especiales:

- El Cuestionario y Solicitud ó Memoria Descriptiva, Estudio de Suelos y Cálculo Estructural, así como el Cronograma de avance de obra, forman parte integrante de la presente póliza.

- El presente seguro excluye hurto simple y/o desaparición misteriosa responsabilidad civil patronal, accidentes de trabajo, responsabilidad civil consecuencial, contaminación y/o polución del medio ambiente, mantenimiento amplio, riesgo de fabricante, Pruebas para Maquinaria, Equipos y Partes Usadas; Transporte Nacional e Internacional.
- No se cubren los gastos incurridos por las actividades necesarias para restituir el nivel freático en las zonas aledañas al proyecto de construcción, tampoco se cubren los gastos para estabilizar el terreno y/o aumentar el factor de seguridad del proyecto, por situaciones no contempladas en el estudio de suelos.
- El Asegurado se compromete a colocar y mantener avisos adecuados y señales muy visibles advirtiendo sobre la ejecución de las obras, en cantidad suficiente y en todos los lugares que se requieran. Estos avisos y señales deberán ser luminosos durante la noche. Al finalizar los trabajos de la obra los avisos y señales deberán ser retirados.
- El Asegurado deberá levantar un "ACTA DE COLINDANTES" correspondientes antes del inicio de los trabajos de obra. El "ACTA DE COLINDANTES", es el documento que describe el estado de cada uno de los colindantes de la periferia o vecindad directa (límites del predio donde se ejecutará la obra); es el documento que describe el estado de cada uno de los colindantes antes del inicio de la obra, validado con los propietarios de dicha vecindad; para que en caso ocurra alguna afectación a dichos terceros se pueda establecer de manera objetiva/clara cuales fueron los daños por los trabajos ejecutados. Este documento deberá ser recepcionado con cargo firmado por el o los propietarios de dichas edificaciones. El constructor guardará copia del mismo en caso se requiera su revisión. (De preferencia sustentar con fotos)
- Quedan excluidos daños causados por deficiente compactación y/o estabilización del terreno o por la falta de las mismas, asimismo, quedan excluidos daños causados por asentamientos previsibles del terreno (se disponga o no de estudio geotécnico previo) según el sub suelo, los materiales y los métodos de construcción empleados.
- Para efectos indemnizatorios, en caso de riesgos catastróficos, se considerará bajo una misma ocurrencia sólo aquellos eventos o daños comprobadamente relacionados entre sí y que ocurran dentro de un mismo periodo consecutivo de 72 horas.
- Para efectos de esta póliza, se entiende como inmuebles a los edificios que los conforman, comprendiendo toda la construcción, estructura, cimientos y obra civil en general, incluyendo mejoras e instalaciones de agua, desagüe, electricidad, tanques aéreos y subterráneos, sanitarios, puertas, ventanas, rejas, cortinas metálicas, y en general todas las instalaciones fijas y permanentes que forman parte del inmueble en construcción.
- Queda convenido que la cobertura de la póliza CAR de cada proyecto, se sujeta a que el contratista cuente con todos los permisos, licencias y autorizaciones emitidas por las entidades gubernamentales, y/o regionales y/o municipales correspondientes.
- En todo sector perimétrico donde se haya efectuado excavación por debajo del nivel de cimentación de las edificaciones colindantes, se deberá desarrollar un sistema de sostenimiento de forma inmediata (por ejemplo: calzaduras ó muro pantalla)
- No se cubren trabajos con uso de explosivos ni la Responsabilidad Civil (RC) por los daños causados a terceros por su uso, a no ser que haya sido aceptado por la Aseguradora.
- La responsabilidad máxima de la compañía equivale al Valor Declarado, incluyendo los sub-límites que puedan activarse en caso de siniestro y los gastos de ajuste.
- En caso el Asegurado y/o Contratante no cumpla con las garantías y/o subjetividades contempladas en la presente póliza, el Asegurado perderá todo el derecho a indemnización.
- No se cubrirán daños o pérdidas de bienes que sean reconocidos como Patrimonio Cultural y/o Histórico de la Nación y/o de la Humanidad o colinde con algunos de los anteriores, aun cuando estos hayan sido a causa de la ejecución de los trabajos de obra.

- El asegurado deberá cumplir con las "Guías de Buenas Prácticas de Ingeniería", las mismas que consideran: (1) señalización, (2) corte de servicios públicos; y en caso aplique dependiendo del tipo de obra: (3) desvío de tráfico, (4) relación de la obra con la comunidad, (5) movimientos de tierra, (6) disposición de material sobrante, (7) apertura de zanjas, instalación de tuberías y accesorios, (8) implementación de obras de protección geotécnica, (9) limpieza final de la obra y (10) restablecimiento de bienes afectados.
- En la presente póliza, la cobertura de "Robo y/o Asalto" se define como el evento, ocasionado por terceras personas que no tienen ningún vínculo con el Asegurado, en que ocurre un robo con violencia y/o fractura y/o escalamiento del predio asegurado y/o Asalto y/o alguna combinación de los anteriores.
- Se deja indicado que las coberturas de "Responsabilidad Civil", "Vibraciones y Debilitamiento de Bases" y "Otras Propiedades Adyacentes" entrarán en vigencia a partir de la fecha de emisión de la póliza.

X. Cláusula de Garantía:

Queda convenido bajo pena para el ASEGURADO de perder todo derecho a indemnización procedente de la presente Póliza, que este seguro se formaliza en virtud a lo siguiente:

- Cumplimiento de la Norma E. 030 Diseño Sismorresistente (RNE, 2006)
- Cumplimiento de la Norma E. 050 Suelos y Cimentaciones (RNE, 2006)
- Cumplimiento de la Norma G. 050 Seguridad durante la Construcción (RNE, 2006)
- Ejecución / Supervisión de la obra por Ingeniero Civil Colegiado con experiencia en obras similares (mínimo 3 años)

XI. Declaración de Conocimiento:

Las Condiciones Generales de Contratación de Riesgos Generales, las Condiciones Generales del Seguro de Todo Riesgo para Contratistas (CAR), las presentes Condiciones Particulares, las Cláusulas Adicionales, las Condiciones Especiales, los Endosos y Anexos que se adhieran a esta Póliza, forman parte integrante del Contrato de Seguro. Se deja constancia que los documentos antes listados han estado a disposición del Contratante y/o Asegurado.

El Contrato de Seguro se celebra bajo el ámbito de la Ley del Contrato de Seguro - Ley No. 29946 y sus normas reglamentarias, a las cuales las partes se someten con carácter imperativo.

Los medios de comunicación entre las partes son los indicados en la solicitud de seguro.

Emitida en Lima, el 2 de Diciembre de 2019.



COMPAÑIA

CONTRATANTE y/o ASEGURADO

Datos del CONTRATANTE y/o ASEGURADO

| | | | |
|-----------------|--|----------|-----------|
| Nombre | SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A & L S.A.C. | | |
| RUC N° | 20544528026 | | |
| Domicilio Legal | MZ. H LOTE 05 URB. LAS PALMERAS | | |
| Funcionario 1 | _____ | DNI / CE | _____ |
| Funcionario 2 | _____ | DNI / CE | _____ |
| Partida | _____ | Teléfono | 999927862 |
| Corredor | _____ | | |

MP/2019/4423707

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A&L S.A.C.** bajo la Póliza de Pensiones No. 7011900110503 y contrato de Salud No. 7021900128213, con vigencia del 28/11/2019 hasta el 28/12/2019, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.


Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

| | | |
|--------|----------|-------------------------------------|
| 1 DNI | 71081461 | ANGEL HUNBERTO IZQUIERDO BARRANTES |
| 2 DNI | 22245492 | CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ |
| 3 DNI | 70657293 | JESUS ARMANDO LIZARBE CORDOVA |
| 4 DNI | 76847371 | KEVIN ANDAIR MENDIGUETE NAPA |
| 5 DNI | 44793590 | LUIS HERMOGENES PANIAGUA GIL |
| 6 DNI | 42419810 | PAUL DANNY MEZA DE LA CRUZ |
| 7 DNI | 22304550 | PEDRO ANGEL MALDONADO SAENZ |
| 8 DNI | 48001310 | ROLI RAUL IZQUIERDO BARRANTES |
| 9 DNI | 44952625 | TELLO IZQUIERDO BARRANTES |
| 10 DNI | 43778222 | WALTER MENDIGUETE ALMEYDA |
| 11 DNI | 80048219 | WILBER AQUINO AVALOS |

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

30/11/2019 11:44:18 am
HIDALGO CALLE, CRISTHIAN SMITH



.....
ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

1 1.4. COSTA FIANZA

| | |
|---|---|
| CIUDAD Y FECHA DE EMISIÓN
LIMA, 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 | Carta Fianza N°
3002019012493 |
|---|---|

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/02/2020

| BENEFICIARIO | RUC |
|---------------------------------------|-------------|
| FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO | 20137921601 |

DE NUESTRA CONSIDERACIÓN:

A solicitud de **SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A & D S.A.C.**, otorgamos por el presente documento garantía incondicional, indivisible, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática al sólo requerimiento de ustedes como beneficiarios, la cual se hará efectiva por el motivo garantizado de **ADELANTO DIRECTO** correspondiente al siguiente objeto: **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045 - 2019 - FONDEPES - OBRA: "REMDELACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBÓ DE MORA, DISTRITO DE TAMBÓ DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"**..

La presente Carta Fianza tiene una vigencia de 90 días contados a partir de las 00:00 horas del 18/11/2019 hasta las 24:00 horas del 15/02/2020, fecha de su vencimiento, y por la suma de **S/57,066.64 (CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS CON 64/100 SOLES)**, sin que nuestra responsabilidad exceda el importe expresamente señalado.

Su requerimiento, pago y renovación se ajustará a lo establecido por la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas complementarias, modificatorias y las que la reemplacen.

AVLA Perú Compañía de Seguros S.A. quedará liberada de toda responsabilidad si no se exigiera notarialmente el cumplimiento de la obligación en sus oficinas, ubicadas en Calle Las Begonias 415, Edificio Torre Begonias, Piso 3 - San Isidro, dentro del horario de atención al público que tenga establecido en dicha oficina, así como dentro de los quince (15) días calendario siguientes después de su vencimiento, en concordancia con el artículo 1898 del código civil, y señalando obligatoriamente el monto a pagar. El pago será efectuado mediante cheque de gerencia, el cual será entregado solamente contra devolución del original de la presente carta fianza o de su última prórroga, de ser el caso.

La presente fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario en cuyo favor se haya expedido; salvo que la cesión de la acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada a AVLA Perú Compañía de Seguros S.A. y esta última haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestar su fianza a favor del nuevo acreedor.

Este certificado puede comprobarse en www.avla.com/pe/verifica, enviando un mail a comprobaciones@avla.com, o llamando al 51 1 715 4400.

FIRMA AUTORIZADA
Carlos Delgado
Gerente de Seguros Técnicos
AVLA Perú

FIRMA AUTORIZADA
Mario Zapata Del Rosario
Coordinador de Coberturas
AVLA Perú

Resolución SBS N° 2701- 2016

Calle Las Begonias 415, Edificio Torre Begonias, Piso 3 - San Isidro, Lima
www.avla.com

Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

11 COPIA DEL CONTENIDO DE OBRA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CONTRATO N° 039-2019-FONDEPES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 045-2019-FONDEPES
PRIMERA CONVOCATORIA

"CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

Conste por el presente documento, la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA**", que celebra de una parte:


- El **FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES** con RUC N° 20137921601, con domicilio legal en Av. Petit Thouars N° 115, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Jefa de la Oficina General de Administración, la señora **CARMINA CARRERA AMAYA**, identificada con DNI N° 10327662, designada mediante Resolución Jefatural N° 075-2019-FONDEPES/J de fecha 14 de mayo de 2019 y con las facultades conferidas en materia de contrataciones mediante Resolución Jefatural N° 069-2016-FONDEPES/J de fecha 17 de febrero de 2016, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y de la otra parte,
- La **EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A & L S.A.C.**, con RUC N° 20544528026, con domicilio legal en Urbanización Las Palmeras Mz. H Lt. 05, distrito y provincia de Pisco y departamento de Ica, debidamente representado por el señor **MORA RODRIGUEZ ALFONSO MARTIN**, identificado con DNI N° 43390393, según poder inscrito en el Asiento A00001, de la Partida Electrónica N° 12704365 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**.


LA ENTIDAD y **EL CONTRATISTA** a quienes en forma conjunta se les denominará **LAS PARTES**, acuerdan en los términos y condiciones siguientes:


CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 16 de octubre de 2019, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 045-2019-FONDEPES PRIMERA CONVOCATORIA** para la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA**", a la **EMPRESA SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A & L S.A.C.**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO


CARRERA AMAYA




Alfonso Mora Rodriguez
Gerente General
RUC 20544528026
A & L Servicio y Construcciones A & L S.A.C.


G BURGOS



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA**".

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 570,666.42 (Quinientos setenta mil seiscientos sesenta y seis con 42/100 Soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en periodos de valorizaciones quincenales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, **LA ENTIDAD** o **EL CONTRATISTA**, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**, **EL CONTRATISTA** tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el marco de lo dispuesto en el artículo 26° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, **EL CONTRATISTA** autoriza a **LA ENTIDAD** a efectuar los pagos correspondientes a las valorizaciones del presente contrato mediante depósito en Cuenta Bancaria, para cuyo efecto ha proporcionado su Código de Cuenta Interbancaria del **BANCO INTERBANK**:

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| CCI - CUENTA EN SOLES | 003-404-003000840790-17 |
|------------------------------|--------------------------------|

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de sesenta (60) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

[Handwritten signature]
S. CÁMERA



[Handwritten signature]
Alfonso Mora Rodríguez
Gerente General
RUC: 20544528026
Servicio y Contrataciones S.A. S.A.C.



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el postor ganador de la buena pro solicitó la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato:

- De fiel cumplimiento del contrato: **S/ 57,066.64 (Cincuenta y siete mil sesenta y seis con 64/100 Soles)**, a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: SEGUROS

EL CONTRATISTA, deberá presentar las pólizas que se detallan a continuación, en la fecha de inicio de ejecución de la obra:

1. **POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO Y MONTAJE (CAR):**

- Básica: por el monto del contrato.
- Terremoto: por el monto del contrato de obra.
- Avenida, lluvia e inundación, por el monto del contrato de obra
- Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del contrato de obra.
- Daños materiales, daños personales, remoción de escombros, por el 5% del monto del contrato.
- Huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, terrorismo por el 20% del monto del contrato de obra.

VIGENCIA:

La póliza de Seguro Todo Riesgo y Montaje (CAR) tendrá una vigencia desde la fecha de inicio de obra hasta la liquidación consentida de la obra.

2. **SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO**

Póliza de Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos, conforme a lo dispuesto por el D.L. N° 688 y D.L. N° 25897.

VIGENCIA:

La póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, tendrá vigencia desde la fecha de inicio de ejecución hasta la recepción de la obra.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días calendario siguiente a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. **LA ENTIDAD** debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de **EL CONTRATISTA**.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
 "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMO

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por **EL CONTRATISTA**.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que **EL CONTRATISTA** pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, **EL CONTRATISTA** debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo

La primera solicitud de **EL CONTRATISTA** debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlas durante la ejecución contractual, según las disposiciones previstas en la Directiva "Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras":

Por la naturaleza de la intervención, los riesgos previsible que han tomado en cuenta en la elaboración del expediente técnico y que pueden ocurrir durante la ejecución de las obras, son los siguientes: (ver anexos del expediente técnico).

Anexo N° 03
Formulario para asignar los riesgos

| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | | 2. TÍTULO GENERAL DEL PROYECTO | | 3. INFORMACIÓN DEL RIESGO | | 4. EVALUACIÓN DEL RIESGO | | | | 5. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS | |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| 1.1 CÓDIGO DE RIESGO | 1.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 1.3 FRECUENCIA DEL RIESGO | 1.4 IMPACTO DEL RIESGO | 2.1 Nivel del riesgo | 2.2 Nivel del riesgo | 2.3 Acción del riesgo | 2.4 Transferencia del riesgo | 6. ACCIÓN PARA REALIZAR EL PLAN | | 7. EL RIESGO ASIGNADO A | |
| | | | | | | | | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 |
| 1 | ... | ... | ... | | | | | | | X | |
| 2 | ... | ... | ... | | | | | | | X | |
| 3 | ... | ... | ... | | | | | | | X | X |
| 4 | ... | ... | ... | | | | | | | X | |

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Anexo N° 03
Formulario para asignar los riesgos

| | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Nº: | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO |
| | FECHA SINIEM DE CONSULTA AL EXPEDIENTE TECNICO | |

| 3. INFORMACIÓN DEL RIESGO | | | 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------|
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA | | | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN | 4.3 RIESGO ASIGNADO A | |
| | | | Mitigar el riesgo | Evitar el riesgo | Aceptar el riesgo | | Transferir el riesgo | Temas |
| 1 | Asignación de responsabilidades en caso de emergencia | Baja | | X | | | | |
| 2 | Suplemento de personal en Ejecución de la Obra | Mediana | | X | | Se emiten órdenes de trabajo para la asignación de personal | | |
| 3 | Interrupción de la cadena de Infraestructura Dominica | Alta | | | X | Aplicar las directivas para el suministro de insumos | X | X |
| 4 | Elaboración del Presupuesto Adicional de Obra | Mediana | | | X | Ajustar los costos y presupuesto de obra | X | |

Handwritten signature

Stamp: FONDEPES, G. ZAPATA

Stamp: FONDEPES, Oficina de Asesoría Jurídica

Stamp: FONDEPES, Oficina de Asesoría Jurídica

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo en días)

Donde:

- F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta

Stamp: A&C, Alfonso Mira, Gerente General

Stamp: FONDEPES, Oficina General de Asesoría Jurídica


"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de **LA ENTIDAD** no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| OTRAS PENALIDADES | | | |
|-------------------|--|---|---|
| Nº | SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD | FORMA DE CÁLCULO | PROCEDIMIENTO |
| 1 | Quando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | 0.50UIT por día de ausencia del personal de obra | Según informe del inspectory/o Supervisor |
| 2 | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no hay aprobado la sustitución de personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones requeridas. | 5/1000 del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento. | Según informe del inspectory/o Supervisor. |
| 3 | ACCESO AL CUADERNO DE OBRA
Si el contratista o su personal, no permite el acceso a cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias. | 5/1000 del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento. | Según informe del inspector y/o supervisor. |
| 4 | Quando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por FONDEPES. | Uno por cinco mil (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento | Según informe del Supervisor |
| 5 | Quando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad personal. | Uno por cinco mil, (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento | Según informe del Supervisor |
| 6 | Quando el contratista emplea equipos o maquinarias en obra no autorizadas previamente por el supervisor o cuando los equipos y maquinarias no cumplen con lo mínimo requerido en los presentes Términos de Referencia o cuando no presenta los equipos declarados en su propuesta técnica. | Dos por mil (2/1000) del monto del sub ítem por cada equipo que no cumpla con lo exigido en los TDR | Según informe del Supervisor |
| 7 | POLIZA CONTRA TODO RIESGO - CAR
De no presentar el contratista los comprobantes que acrediten la cancelación del citado seguro dentro de los 10 días al inicio de la obra se le aplicara la penalidad que se señala. | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento. | Según informe del Supervisor |

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Alfonso MORA
Gerente General



G RINGOS

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32° y artículo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164° de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165° y 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas,

[Handwritten signature]

[Circular stamp: FONDEPES, G. GAZAFATA]

[Handwritten signature]
Alfonso Mora Roca
Gerente General
RUF 2015-0152810-06

[Circular stamp: FONDEPES, OFICINA GENERAL DE ASISTENCIA JURÍDICA]



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹

Las controversias que surjan entre LAS PARTES durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según acuerdo entre LAS PARTES.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

- **DOMICILIO DE LA ENTIDAD:** Av. Petit Thouars N° 115, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.
- **DOMICILIO DEL CONTRATISTA:** Urbanización Las Palmeras Mz. H Lt. 05, distrito y provincia de Pisco y departamento de Ica.

Asimismo, para efectos de las notificaciones durante la ejecución contractual señala el siguiente correo electrónico: aylconstruccionessac@gmasil.com

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser


¹ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de contratos cuyo monto contractual original sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5000 000,00).

[Handwritten signature]

[Circular stamp: FONDEPES]

[Handwritten signature]
A&L
Servicio Construcciónes SAC
Alfonso W. C. Rodríguez
Gerente General
RUC 2054452773

[Circular stamp: FONDEPES]
G. BURGOS



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

comunicaba la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2019.



FONDEPES
[Handwritten signature]
CARMINA CARRERA AMAYA
JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LA ENTIDAD

[Handwritten signature]
A&L
Servicio y Construcciones A & L SAC
Alfonso Mora Rodríguez
Gerente General
RUC 20544528026
EL CONTRATISTA



Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

1 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

Obra : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: PROYECTO IOARR: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

Contratista : SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A Y L S.A.C.

Proceso de selección : AS N° 045-2019-FONDEPES

Contrato de Obra : Contrato N° 039-2019-FONDEPES

Monto del contrato : S/. 570,666.42 (Quinientos Setenta Mil Seiscientos Sesenta y Seis con 42/100 Soles),

Sistema de Contratación : A Suma Alzada.

Plazo de Ejecución : 60 d.c.

Supervisor de Obra : Ing. Albert Amadeo González Rojas /CIP N° 171227

Siendo las 02:00 p.m. del día 27 de Noviembre del 2019, se reunieron en el lugar de la obra el **Ingeniero José Antonio Cáceres Rojas**, en representación de **FONDEPES**; el Señor **Alfonso Martín Mora Rodríguez**, como representante de la empresa **SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A Y L S.A.C.**; el **Ing. Albert Amadeo González Rojas** con CIP N° 171227, como Supervisor de Obra; designados para participar en la entrega del terreno para la EJECUCIÓN DE LA OBRA: PROYECTO IOARR: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"


Luego de efectuar el recorrido y verificar la disponibilidad del lugar, la empresa **SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A Y L S.A.C.** recibe el terreno a satisfacción y plena conformidad, declarando que no existe impedimento alguno para ejecutar la obra. Al término de la diligencia se dio por entregado el terreno en forma parcial y dando fe del acto, firman los participantes el presente documento en 03 originales a los 27 días del mes de Noviembre del año 2,019.

POR EL CONTRATISTA



Alfonso Martín Mora Rodríguez
Representante **SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A Y L**
S.A.C
DNI N° 43390393

POR LA SUPERVISIÓN



Ing. Albert Amadeo González Rojas
Supervisor de Obra
CIP N° 171227

POR FONDEPES



Ing. José A. Cáceres Rojas
Representante de FONDEPES

Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

**11.7. FASE DE INICIO
DE LA OBRA**

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

ACTA DE INICIO DE OBRA

Obra : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
PROYECTO IOARR: "REMODELACIÓN DE CERCO
PERIMÉTRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO
DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO
ICA"

Contratista : SERVICIO Y CONSTRUCCIONES AYL S.A.C.

Proceso de Selección : AS N° 045-2019-FONDEPES

Contrato de Obra : Contrato N° 039-2019-FONDEPES

Monto del Contrato : S/ 570,666.42 (Quinientos Setenta Mil Seiscientos
Sesenta y Seis con 42/100 Soles)

Sistema de Contratación : A Suma Alzada

Plazo de Ejecución : 60 d.c.

Supervisor de Obra : Ing. Albert Amadeo González Rojas / CIP N° 171227


El día 28 de Noviembre del 2019, se reunieron en el lugar donde se ejecutara la obra de la referencia, las siguientes persona; en representación de la empresa **SERVICIO Y CONSTRUCCIONES AYL S.A.C.**, el **Ingeniero Carlos Enrique Quintanilla Martinez** con CIP N° 28592 como **Residente de Obra** y en representación de **FONDEPES**, el **Ingeniero Albert Amadeo González Rojas** con CIP N° 171227, como **Supervisor de Obra**; con la finalidad de dar inicio a la EJECUCION DE LA OBRA PROYECTO IOARR: "**REMODELACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA**", habiendo tenido la conformidad se inician los trabajos para cumplir con la meta establecida en el plazo contractual y en señal de conformidad firman los representantes la presente acta en 03 originales a los 28 días del mes de Noviembre del año 2,019.

POR FONDEPES



Ing. Albert Amadeo González Rojas
Supervisor de Obra
CIP N° 171227

POR EL CONTRATISTA



Ing. Carlos Enrique Quintanilla Martinez
Residente de Obra
CIP N° 28592

Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE TAMBO DE
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

11 COPIA DE EVALUACION DE RISGOS

Pisco, 30 de Noviembre del 2019

Carta N° 001-2019-CEQM/RL-A&L

Señores : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Atención: ING. ALBERT AMADEO GONZALEZ ROJAS
SUPERVISOR DE OBRA

Asunto : ENTREGA DE METRADOS DEL PERIODO DE 28 AL 30 DE NOVIEMBRE.

Referencia : EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REMODELACIÓN DE CERCO PERIMETRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA".


De mi mayor consideración;

Por medio de la presente nos dirigimos a usted con la finalidad de hacerle entrega de los Metrados que corresponde al periodo de 28 al 30 de Noviembre del 2019 para su verificación y aprobación correspondiente.

Asimismo, le informamos que por acuerdo del representante legal de la empresa SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A & L S.A.C., autorizamos para que en la elaboración de la valorización N° 01 no se efectuó los reajustes y deducciones hasta cuando los índices unificados sean los reales.

Agradeciendo la atención a la presente, nos despedimos de usted.

Atentamente;



CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA
INGENIERO RESIDENTE
E. S. N.º 25112

Recibido 30/11/19.
Albert Gonzalez
Supervisor.


Adjunto:

- Metrados correspondiente al periodo de 28 al 30 de Noviembre.




Proyecto: "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA
CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

PLAN FOTOGRAFICO

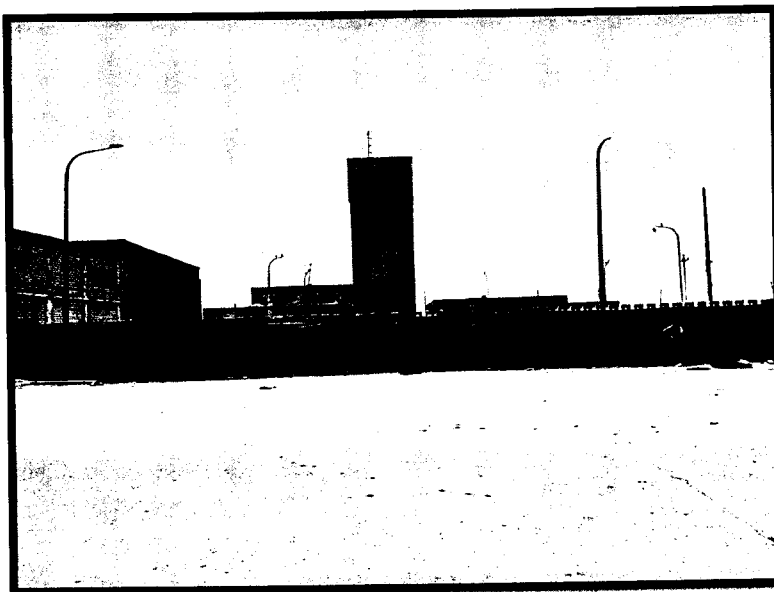

FOTOGRAFIA N°01. Cerco Provisional con Malla Arpillera en el TRAMO 01


A&L
Servicio Construcciones A & L SAC
Alfonso Mora Rodríguez
Gerente General
RUC 20544528026

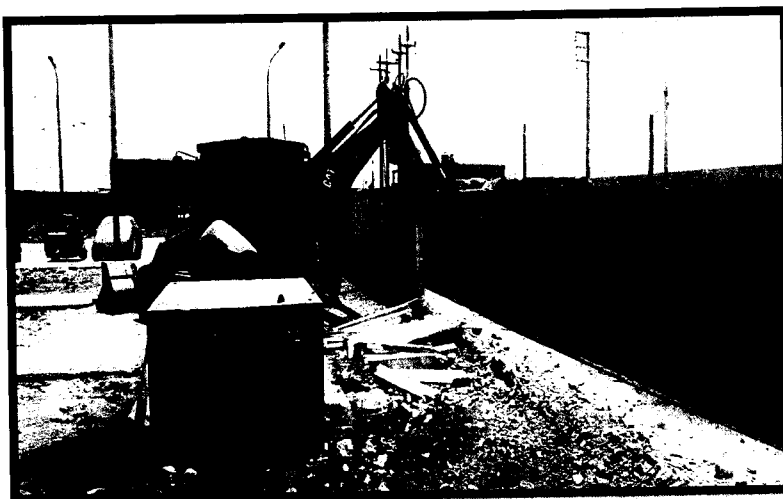

FOTOGRAFIA N°02. Demolición de Cerco Perimétrico

Albert Amadeo González Rojas
ALBERT AMADEO GONZÁLEZ ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 171227

Carlos Enrique Quintanilla Martínez
CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ
INGENIERO RESIDENTE
Reg. CIP N° 28592

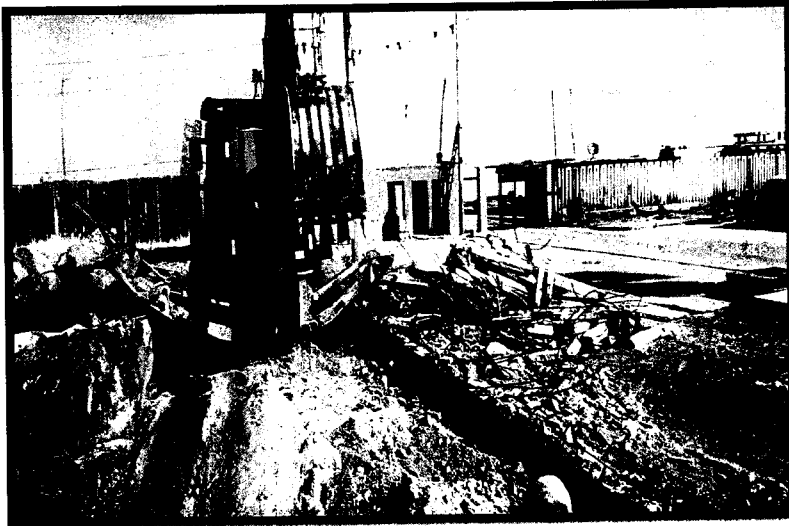

FOTOGRAFIA N°03. Demolicion de sobre cemento en el Tramo 4



FOTOGRAFIA N°04. Demolición de Cerco Perimétrico en el Tramo 4

A&L
Servicio y Construcciones A&L S.A.C.
Alfonso Mora Rodríguez
Gerente General
RUC 20544529026

Albers Amadeo González Rojas
ALBERS AMADEO GONZALEZ ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 171227

Carlos Enrique Quintanilla Martínez
CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ
INGENIERO RESIDENTE
Reg. CIP N° 28592



FOTOGRAFIA N°05. Demolición de Cerco Perimétrico en el Tramo 2



FOTOGRAFIA N°06. Demolición de Cerco Perimétrico en el Tramo 3

A&L
Servicios Construcciones A&L S.A.C.
Alfonso Mora Rodríguez
Gerente General
RUC 20040280249

ALBERTO AMADEO GONZÁLEZ ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 171227

CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ
INGENIERO RESIDENTE
Reg. CIP N° 28592



FOTOGRAFIA N°07. demolición de Cerco Perimétrico en el Tramo 4

A&L
Servicio y Construcciones A & L SAC
Alfonso Mora Rodríguez
Gerente General
RUC 7054422925



FOTOGRAFIA N°08. Demolición de Cerco Perimétrico en el Tramo 2

Albert Amadeo González Rojas
ALBERT AMADEO GONZÁLEZ ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 171227

Carlos Enrique Quintanilla Martínez
CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ
INGENIERO RESIDENTE
Reg. CIP N° 28592



FOTOGRAFIA N°09. Implementación del Oficina en Obra

A & L
Construcciones A & L SAC

Alfonso Mora Rodríguez
Gerente General
RUC 20544824025

[Handwritten Signature]
ALBERT AMADEO GONZÁLEZ ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 171227

[Handwritten Signature]

CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ
INGENIERO RESIDENTE
Reg. CIP N° 28592
