



PERÚ

Ministerio
de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"



MEMORANDO N° 7223 -2019-FONDEPES/DIGENIPAA

A : ABOG. CARMINA CARRERA AMAYA
Jefa de la Oficina General de Administración

Atención : ABOG. GISSELA ZAPATA FLORES
Coordinadora del Área de Logística

Asunto : PAGO DE VALORIZACION N° 01 (Periodo Quincenal del 04/12/2019 al 15/12/2019)
del IOARR "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA
MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA,
CON CODIGO ÚNICO N° 2434305".

Referencia : a) INFORME N° 039-2019/FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/MAGC
b) Memorando Interno N° - 5538-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM
c) Memorando Interno N° 10004-2019-FONDEPES/DIGENIPAA
d) Carta N° 004-2019-RFRG-SUPERVISOR/FONDEPES
e) Carta N° 008-2019/IMELEC/FONDEPES
f) Contrato N° 48-2019-FONDEPES


Fecha : Lima, 24 de diciembre del 2019

Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarla y manifestarle que de acuerdo con lo indicado en el documento a) de la referencia, el cual este despacho hace suyo en toda su extensión, se proceda con el trámite de Pago de la Valorización N° 01 de ejecución de obra correspondiente al Periodo Quincenal del 04/12/2019 al 15/12/2019, del proyecto IOARR "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA, CON CODIGO ÚNICO N° 2434305" en armonía al Contrato N° 48-2019-FONDEPES, por la suma de S/ 34,996.51 Soles (Treinta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Seis con 51/100 Soles), acorde a los procedimientos administrativos regulares que exige dicha circunstancia particular.

Atentamente

FONDEPES

Jorge Roberto Nahue Sivirichi
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola



EL PERÚ PRIMERO



PERÚ

Ministerio
de la Producción



FONDEPES

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

CONFORMIDAD DE PAGO POR
CONCEPTO DE VALORIZACIÓN DE OBRA

Conste por el presente documento, que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, al suscribir la presente; da su conformidad para realizar el pago por concepto de Valorización de Obra N° 01 correspondiente al Periodo Quincenal del 04/12/2019 al 15/12/2019 del proyecto IOARR "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA, CON CODIGO ÚNICO N° 2434305", por la suma de S/ 34,996.51 Soles (Treinta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Seis con 51/100 Soles) que incluye I.G.V., a favor del Contratista IMELEC S.R.L. según CONTRATO N° 048-2019-FONDEPES.

Lima,

24 DIC 2019

FONDEPES

Jorge Roberto Nahue Sivirichi
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola



EL PERÚ PRIMERO



PERÚ

Ministerio
de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

INFORME N° 039-2019/FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/MAGC

RECEBIDO
Hora: 3:41

A : **ING. JORGE ROBERTO ÑAHUE SIVIRICHE**
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

Asunto : PAGO DE VALORIZACION N° 01 (Periodo Quincenal del 04/12/2019 al 15/12/2019) del IOARR "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA, CON CODIGO ÚNICO N° 2434305"

Referencia : a) Memorando Interno N° 5538-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM
b) Memorando Interno N° 10004-2019-DIGENIPAA
c) Carta N° 004-2019-RFRG-SUPERVISOR/FONDEPES
d) CONTRATO 048-2019-FONDEPES

Fecha : Lima, 23 de Diciembre del 2019

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento (a) de la referencia, a través del cual se remite el Informe de Valorización de Obra N° 01 para efectos de conformidad y autorización de pago, correspondiente al primer periodo quincenal de valorización (Del 04/12/2019 al 15/12/2019) del IOARR "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", siendo el mismo el siguiente:

1.0 DATOS GENERALES

1.1 INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra : IOARR "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

Ubicación : Departamento de Tacna - Provincia de Tacna – Distrito De Sama - C.A. Morro Sama

Entidad Contratante : FONDEPES

Financiamiento : Recursos Ordinarios

Código de Proyecto : 2434305

Modalidad de Ejecución : Por Contrata

Sistema de Contratación : A Suma Alzada

Denominación del Proceso : Adjudicación Simplificada N° 038-2019-FONDEPES

Fecha de Entrega del Terreno : 03/12/2019

Inicio de Plazo de Ejecución : 04/12/2019

Termino de Plazo de Ejecución : 02/03/2020

Presupuesto Base Referencial : S/ 885,090.32 Soles

Monto del Contrato De Obra : S/ 796,581.29 Soles

Factor de Relación : 0.90

Plazo de Ejecución de La Obra : 90 Días Calendario

Miguel Angel Gálvez Zaparó
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 69488

EL PERÚ PRIMERO



PERÚ

Ministerio
de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

1.2 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Empresa Contratista : IMELEC S.R.L.
 Representante Legal : Osvaldo Javier Cárdenas Vincha
 Dirección : Calle Alfa León N° 140 Dpto. 101, Urb. Calera de Monterrico
 – Surquillo - Lima
 Fecha De Contrato De Obra : 18/11/2019
 Residente De Obra : Ing. Civil Francisco Ramos Flores - CIP N° 96570

1.3 INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Supervisor De Obra : Ing. Renzo Fernando Romero Guerra – CIP N° 82871
 Dirección : Jirón Deza N° 724 Int. 05 Barrio Azoguini - Puno/Puno/Puno
 Contrato : Orden De Servicio N° 0002878
 Fecha de Contrato de Obra : 28/11/2019
 Monto del Contrato : S/ 33,000.00
 Plazo de Supervisión de Obra : 90 Días Calendario
 Fecha de Inicio del Servicio : 04/12/2019
 Fecha de Término del Servicio : 02/03/2020

2.0 ANTECEDENTES

- 2.1 Con fecha 18/11/2019 se firma el Contrato N° 048-2019-FONDEPES derivado del procedimiento de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2019-FONDEPES de la "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA, CON CODIGO ÚNICO N° 2434305", con la empresa contratista IMELEC S.R.L. por el monto de S/ 796,581.29 Soles (Setecientos noventa y seis mil quinientos ochenta y uno con 29/100 Soles) y un plazo de ejecución contractual de noventa (90) días calendario.
- 2.2 Con fecha 28/11/2019 se emite la Orden de Servicio N° 0002878 del Ingeniero Civil Renzo Fernando Romero Guerra con CIP N° 82871, a efecto de cumplir la función de Supervisor de Obra del IOARR "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA, CON CODIGO ÚNICO N° 2434305", por el monto de S/ 33,000.00 Soles.
- Mediante Carta N° 1180-FONDEPES-DIGENIPAA de fecha 27/11/2019, se hace entrega al Representante Legal de la Empresa Contratista IMELEC S.R.L del Expediente Técnico del IOARR: CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA, CON CODIGO ÚNICO N° 2434305".
- 2.4 Mediante Carta N° 1200-FONDEPES-DIGENIPAA de fecha 29/11/2019, se hace entrega al Ing. Civil Renzo Fernando Romero Guerra del Expediente Técnico del IOARR: CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA, CON CODIGO ÚNICO N° 2434305".

Miguel Angel Gálvez Caparó
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. 68388

EL PERÚ PRIMERO



PERÚ

Ministerio
de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

- 2.5 Mediante Carta N° 1201-FONDEPES-DIGENIPAA de fecha 29/11/2019, se comunica la designación de Supervisor de Obra designado por parte de la Entidad, al Representante Legal de la Empresa Contratista IMELEC S.R.L.
- 2.6 Mediante Carta – IME – 186-2019 de fecha 25/11/2019, el Representante Legal de la Empresa Contratista IMELEC S.R.L. solicita ante la Entidad, el otorgamiento del Adelanto Directo por el monto de S/ 79,658.12 Soles adjuntando la Carta Fianza N° E2894-00-2019 SECRES CESCE, la misma que fue atendida oportunamente por la Entidad en fecha 02/12/2019.
- 2.7 Con fecha 03/12/2019 se efectúa la Entrega de Terreno por parte de la Entidad al Contratista, mediante Acta a través del suscrito como Coordinador de Obra asignado; y en tal sentido en fecha 04/12/2019 se inició el Plazo Contractual de Ejecución de Obra.
- 2.8 Mediante Carta N° 007-2019/IMELEC/FONDEPES de fecha 16/12/2019 el Representante Legal del Contratista IMELEC S.R.L. remite ante el Supervisor, la Valorización N° 01 correspondiente al periodo quincenal del 04/12/2019 al 15/12/2019.
- 2.9 Mediante Carta N° 004-2019-RFRG-SUPERV/FONDEPES de fecha 20/12/2019, el Supervisor Ing. Renzo Fernando Romero Guerra, hace llegar ante la Entidad el Informe de Valorización de Obra N° 01, correspondiente al periodo quincenal del 04/12/2019 al 15/12/2019.
- 2.10 Mediante Carta N° 00-2019/IMELEC/FONDEPES de fecha 16/12/2019 el Representante Legal del Contratista IMELEC S.R.L. remite ante la Entidad, la Factura de Pago correspondiente a la Valorización N° 01 correspondiente al periodo quincenal del 04/12/2019 al 15/12/2019.

3.0 BASE LEGAL

- 3.1 Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- 3.2 Decreto legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 3.3 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.
- 3.4 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
- 3.5 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- 3.6 Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES.
- 3.7 Directiva N° 006-2019-FONDEPES/GG, Directiva para la Recepción, Revisión y Pago de Valorizaciones de Obra en el Marco de la Ley 30225 y su Reglamento del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES.

4.0 ANALISIS

- 4.1 Conforme a la Cláusula Cuarta: Del Pago, contenida en el Contrato N° 048-2019-FONDEPES de Ejecución de Obra, expresa literalmente lo siguiente:

EL PERÚ PRIMERO

Miguel Angel Gálvez
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 69488



PERÚ

Ministerio
de la Producción



FONDEPES

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

“La ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de valorización Quincenal, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases, Asimismo, La ENTIDAD o El CONTRATISTA, según corresponda, se obliga a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendarios, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación”.

4.2 En la Carta N° 004-2019-RFRG-SUPERV/FONDEPES de la Supervisión, el Ing. Renzo Fernando Romero Guerra comunica que la Empresa Contratista IMELEC S.R.L. ha cumplido en presentarle el Informe de Valorización N° 01 (Del 04 al 15/12/2019), y que la misma ha sido revisada y conciliada en campo, pronunciándose en tal sentido que es procedente y que aprueba dicho Informe de Valorización N° 01, para su correspondiente trámite.

4.3 El Resumen de la Valorización N° 01 presentado y aprobado por la respectiva Supervisión de Obra, es el que se muestra en el cuadro a continuación:

RESUMEN DE VALORIZACION N° 01

A) VALORIZACION CONTRACTUAL	S/32,953.40
MONTO FORMULA 01: ESTRUCTURAS	32,953.40
MONTO FORMULA 02: ARQUITECTURA	0.00
MONTO FORMULA 03: INSTALACIONES SANITARIAS	0.00
MONTO FORMULA 04: INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00
B) REAJUSTES (Obra Permanentemente Adelantada)	S/ 0.00
REAJUSTES FORMULA 01: ESTRUCTURAS	0.00
REAJUSTES FORMULA 02: ARQUITECTURA	0.00
REAJUSTES FORMULA 03: INSTALACIONES SANITARIAS	0.00
REAJUSTES FORMULA 04: INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00
C) VALORIZACION NETA (A + B)	S/ 32,953.40
D) DEDUCCIONES DEL REAJUSTE	S/ 0.00
POR AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO	0.00
POR AMORTIZACION POR ADELANTO DE MATERIALES	0.00
E) VALORIZACION NETA (C - D)	S/ 32,953.40
F) AMORTIZACIONES	S/ 3,295.34
POR EL ADELANTO DIRECTO	3,295.34
POR EL ADELANTO DE MATERIALES	0.00
G) MONTO RETENIDO AL CONTRATISTA	S/ 0.00
H) MONTO FACTURABLE SIN I.G.V. (E - F - G)	S/ 29,658.06
I) IMPUESTO I.G.V. (18%)	S/ 5,338.45
J) MONTO FACTURADO POR VALORIZAR (H + I)	S/ 34,996.51

Miguel Angel Galarza Capelo
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 88468

4.4 Como consecuencia del proceso de revisión y análisis de la documentación alcanzada, se verifica que en general la misma se encuentra conformado acorde a las exigencias previstas en las Directivas de la Entidad para tal propósito, tanto en forma como en presentación; respecto del contenido se verifica que la información consignada es compatible entre sí, y por tanto el cálculo numérico de la Valorización N° 01 a pagar por la Entidad se encuentra de acuerdo al informe.

EL PERÚ PRIMERO

**PERÚ**Ministerio
de la Producción**FONDEPES**

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

4.5 El Cálculo del Monto de Valorización N° 01, advierte que se efectuado correcta Amortización del Adelanto Directo Otorgado por la Entidad, sin embargo en relación a los cálculos de los Reajustes y Deducciones correspondientes, se observa que estos no han sido estimados, por lo que se asume que los mismos serán efectuadas en la respectiva etapa de Liquidación contractual.

4.6 Conforme a la Actualización del Calendario de Avance de Obra Valorizado al Inicio de Obra, se tiene programado un Avance Acumulado del 3.63% respecto del Presupuesto Ofertado; sin embargo el Avance Físico Valorizado en el presente Periodo Quincenal (Del 04 al 15/12/2019) es de 4.88%, lo que indica que la condición es de obra permanentemente adelantada, tal y como se detalla en el cuadro a continuación:

CONTROL DE VALORIZACION MENSUAL

DESCRIPCION	Periodo N° 01 (Del 04 al 15 de Dic-2019)	
	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACTUAL
01: ESTRUCTURAS	18,752.03	26,575.32
02: ARQUITECTURA	989.55	0.00
03: INSTALACIONES SANITARIAS	0.00	0.00
04: INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	0.00
COSTO DIRECTO TOTAL	19,741.58	26,575.32
GASTOS GENERALES (19.00%)	3,750.90	5,049.31
UTILIDAD (5.00%)	987.09	1,328.77
SUB TOTAL	24,479.57	32,953.40
I.G.V. (18%)	4,406.33	5,931.61
TOTAL VALORIZACION (S/)	28,885.90	38,885.01
PORCENTAJE DE AVANCE (%)	3.63%	4.88%
CONDICION	OBRA PERMANENTEMENTE ADELANTADA	

4.7 El Control del Avance Físico Ejecutado respecto del Cronograma Valorizado, y la Curva "S" correspondiente, son los que se muestran en los cuadros a continuación:

CRONOGRAMA DE AVANCE PROGRAMADO

DESCRIPCION	MONTO		PORCENTAJE	
	QUINCENAL	ACUMULADO	QUINCENAL	ACUMULADO
Del 04/12/2019 Al 15/12/2019	S/ 28,885.90	S/ 28,885.90	3.63%	3.63%
Del 16/12/2019 Al 31/12/2019	S/ 90,010.81	S/ 118,896.71	11.30%	14.93%
Del 01/01/2020 Al 15/01/2020	S/ 171,835.31	S/ 290,732.02	21.57%	36.50%
Del 16/01/2020 Al 31/01/2020	S/ 193,404.32	S/ 484,136.34	24.28%	60.78%
Del 01/02/2020 Al 15/12/2020	S/ 197,273.79	S/ 681,410.13	24.77%	85.54%
Del 16/02/2020 Al 29/02/2020	S/ 104,392.36	S/ 785,802.49	13.11%	98.65%
Del 01/03/2020 Al 02/03/2020	S/ 10,778.80	S/ 796,581.29	1.35%	100.00%
TOTAL	S/ 796,581.29		100.00%	

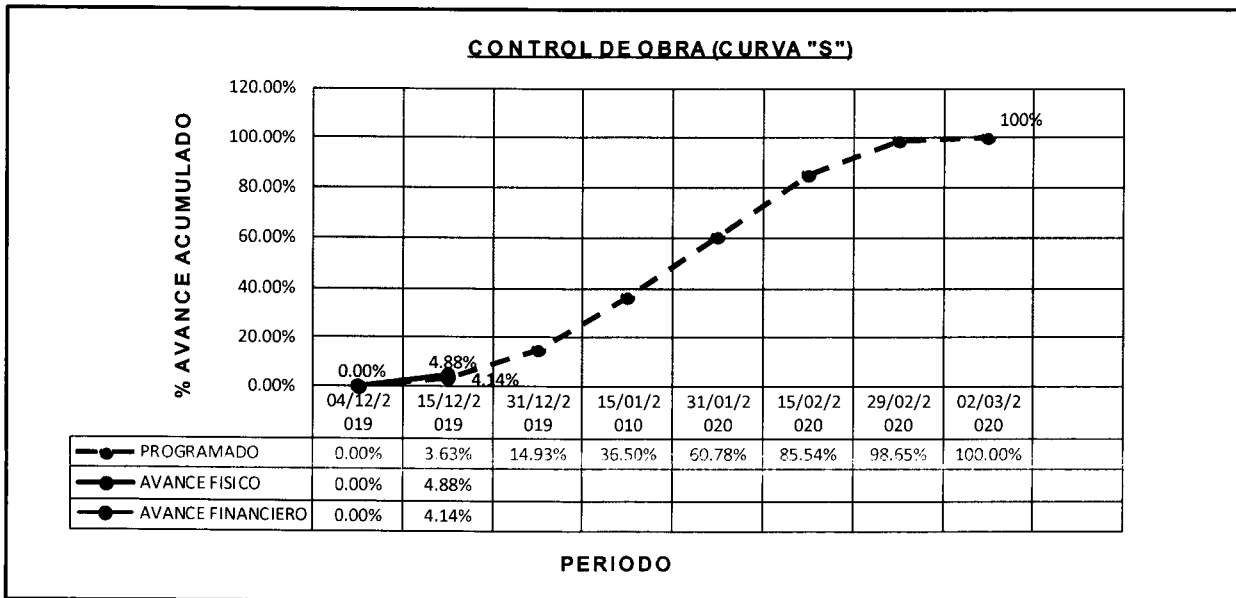
Miguel Ángel García Cepariño
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 69488

EL PERÚ PRIMERO



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
CONTROL DE AVANCE EJECUTADO

Table with 5 columns: DESCRIPCION, MONTO (QUINCENAL, ACUMULADO), and PORCENTAJE (QUINCENAL, ACUMULADO). It shows cumulative progress data from 04/12/2019 to 02/03/2020, with a total amount of S/. 38,885.01 and 4.88% completion.



5.0 PENALIDADES


5.1 Se verifica que el Supervisor de Obra, no ha reportado a la fecha ningún Informe ante la Entidad, que dé cuenta de la ocurrencia de alguna inobservancia que implique penalidad, conforme a lo previsto para el caso en el respectivo Contrato y la documentación que lo contiene.

6.0 CONCLUSIONES

6.1 El Resumen de la Valorización N° 01 alcanzado, refleja un monto por pagar a favor del Contratista de S/ 34,996.51 Soles, calculadas las Amortizaciones correspondientes a la Entrega del Adelanto Directo por parte de la Entidad; sin embargo, se asume que los montos correspondientes a los Reajustes y Deduciones, serán calculados en la etapa de liquidación contractual.

6.2 Conforme a la Valorización Técnica debidamente aprobada por la respectiva Supervisión de Obra, se reporta un Avance Físico Valorizado de S/ 38,885.01 Soles, que representa el 4.88% en relación al Presupuesto Ofertado que es de S/ 796,581.29 Soles; así mismo respecto del Avance Programado Valorizado para el presente periodo quincenal que es de 3.83% y equivalente al monto de S/ 28,885.90, se encuentra bajo la condición de permanente pago adelantado.

Miguel Angel Galvo Cazaró
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 69488





PERÚ

Ministerio
de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero


"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

- 6.3 La documentación contenida en el Informe de Valorización N° 01, se ajusta a las exigencias y lineamientos mínimos señalados por la presente Entidad para tal propósito; así mismo se verifica que la información consignada respecto a los cálculos practicados, es compatible entre sí y concordante con el Informe Técnico del respectivo Supervisor de Obra, quién en representación de la Entidad es el responsable en todos sus extremos para todo efecto técnico, legal y administrativo, respecto de la veracidad de los datos declarados en la misma que se asume son el reflejo real de lo que se advierte en campo, y consecuentemente genera el pago del monto estimado en favor del Contratista, correspondiente a la Obra: IOARR "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA".

7.0 RECOMENDACIONES

- 7.1 Cumplidos los requisitos establecidos en la normativa y la relación contractual vigente, se recomienda que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal (DIGENIPAA), otorgue la conformidad correspondiente, a efecto que la Entidad proceda con el Pago de la Valorización de Obra N° 01, correspondiente al Periodo Quincenal del 04/12/2019 al 15/12/2019, dentro de los plazos legales vigentes para el caso en particular.
- 7.2 Se sugiere que través de las instancias pertinentes de la Entidad, se transfiera al Contratista IMELEC S.R.L., la suma de S/ 34,996.51 Soles (Treinta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Seis con 51/100 Soles), conforme a los procedimientos administrativos regulares que exige dicha circunstancia particular, ajustados a Ley.


Atentamente


Miguel Angel Galvez Ciparó
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 69488

ADJUNTO:

- o DOS (02) EXPEDIENTES DE VALORIZACIÓN N° 01 DE LA OBRA: IOARR "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA".
- o FACTURA ORIGINAL DEL CONTRATISTA IMELEC S.R.L.

El Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES que suscribe, hace suyo el contenido, las conclusiones y recomendaciones del presente informe.

FONDEPES

Ing. Luis A. Vilchez Chavarrí
COORDINADOR DE OBRAS EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO


EL PERÚ PRIMERO

Fecha: 23/12/19

MEMORÁNDUM INTERNO N° 5538201 -FONDEPES/DIGENIPAA/OEM

Asunto : Memo I. 10001-2019 de fondepes

Referencia : _____ Registro : _____

Indicación	Destino
Observaciones: _____	
DR. MIGUEL A. GALVEZ CARDENAS	
23/12/2019 Hora: 10:45 AM	
	

Atentamente



Indicaciones:

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 01. Autorizado/Aprobado | 02. Calificar/Evaluar | 03. Informe | 04. Proyectar resolución |
| 05. Atención/Tramitación | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular |
| 09. Ayuda memoria | 10. Coordinar | 11. Opinión/Recomendación | 12. Consolidar |
| 13. Aclarar redacción | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta | 16. Visación |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo | 19. Ampliar | 20. Seguimiento |



Fecha: 20/12/19

MEMORÁNDUM INTERNO N° 10004 - 2019 - FONDEPES/ DIGENIPAA

Asunto : Carta N° 004 - 2019 - RFRG - SUPERU

Referencia : _____ Registro : 12914

Destino	Indicación	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA 20 DIC. 2019	
OCI		OGAJ	
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	AOEM
Observaciones: _____			



- Indicaciones:**
- 01. Autorizado/Aprobado
 - 02. Calificar/Evaluar
 - 03. Informe
 - 04. Proyectar
 - 05. Atención/Tramitación
 - 06. Conocimiento y fines
 - 07. Notificar al interesado
 - 08. Reformular
 - 09. Ayuda memoria
 - 10. Coordinar
 - 11. Opinión/Recomendación
 - 12. Consoliar
 - 13. Aclarar redacción
 - 14. Implementar/Ejecutar
 - 15. Preparar respuesta
 - 16. Visación
 - 17. Agregar a sus antecedentes
 - 18. Archivo
 - 19. Ampliar
 - 20. Seguimiento



PERÚ Ministerio de la Producción

FONDEPES

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Fecha: 23/10/18

MEMORÁNDUM INTERNO N° 5541-201 -FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM

Asunto: Plomo I. 9992-2018 de fondepes

Referencia: _____ **Registro:** _____

Indicación	Destino
Observaciones: <u>H. Georj Calvez</u>	
<u>OOB</u>	
<u>Recibido 23/12/2019</u>	
<u>Hora: 12:00 PM</u>	

Atentamente



Indicaciones:

- 01. Autorizado/Aprobado
- 02. Calificar/Evaluar
- 03. Informe
- 04. Proyectar resolución
- 05. Atención/Tramitación
- 06. Conocimiento y fines
- 07. Notificar al interesado
- 08. Reformular
- 09. Ayuda memoria
- 10. Coordinar
- 11. Opinión/Recomendación
- 12. Consolidar
- 13. Aclarar redacción
- 14. Implementar/Ejecutar
- 15. Preparar respuesta
- 16. Visación
- 17. Agregar a sus antecedentes
- 18. Archivo
- 19. Ampliar
- 20. Seguimiento



PERÚ

Ministerio de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Fecha: 2012/19

MEMORÁNDUM INTERNO N° 9992 - 2019 - FONDEPES/ DIGENIPAA

Asunto : Carta N° 008 - 2019 / IMELEC / FONDEPES

Referencia : _____ Registro : 12911

Destino	Indicación	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	2-0-016-2019
OCI		OGAJ	18-08
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	DOEM
Observaciones: _____			

Atentamente




Indicaciones:

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 01. Autorizado/Aprobado | 02. Calificar/Evaluar | 03. Informe | 04. Proyectar |
| 05. Atención/Tramitación | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular |
| 09. Ayuda memoria | 10. Coordinar | 11. Opinión/Recomendación | 12. Consoliar |
| 13. Aclarar redacción | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta | 16. Visación |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo | 19. Ampliar | 20. Seguimiento |

ANEXO 2: LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE VALORIZACIONES DE OBRA

I. INFORMACIÓN DE LA VALORIZACIÓN						
Nombre del proyecto/obra	OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"					
Monto de la valorización	S/	796,581.29	Fecha de presentación	20/12/2019	SITRADO	
Periodo y mes de la valorización	Quincenal (Del 10 al 15 de Diciembre 2,019)		N° valorización	01		
II. INFORMACIÓN DEL PROYECTO						
Nombre del proyecto/obra	OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"					
Código	2434305		Provincia	TACNA		
Departamento	TACNA		Distrito	SAMA		
III. REVISIÓN DOCUMENTADA						
DESCRIPCIÓN			REVISIÓN	OBSERVACIONES		
Marque con un (✓) si se cumple con el criterio de revisión o una (X) si se incumple						
1	Adjunta carta de presentación de la valorización correspondiente al mes valorizado		✓			
2	Presenta informe mensual de la valorización correspondiente al mes valorizado		✓			
3	Adjunta grafico de la curva "S" correspondiente al avance acumulado		✓			
4	Presenta copia legible del contrato de Obra		✓			
5	Presenta copia legible del contrato de consorcio		x	Es Empresa única		
6	Presenta copia legible del acta de Entrega de Terreno		✓			
7	Presenta código de cuenta interbancaria (CCI)		✓			
8	Presenta cuenta de detracciones		✓			
9	Presenta factura correspondiente al monto y mes de la valorización		✓			
10	Presenta copia de seguros (SCTR - POLIZA CAR)		✓			
11	presenta ficha ruc del consorcio y/o empresa correspondiente		x	Es Empresa única		
12	Presenta copia legible y vigente de la carta fianza de acuerdo al monto acordado		✓			
13	Presenta control de metrados ejecutados del periodo valorizado		✓			


 Miguel Angel Gálvez Espinoza
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. 69488

IV. REVISIÓN DOCUMENTADA

	DESCRIPCIÓN	REVISIÓN	OBSERVACIONES
Marque con un (✓) si se cumple con el criterio de revisión o una (X) si se incumple			
14	Presenta ficha de identificación de la obra	✓	
15	Presenta calendario valorizado consistente y correspondiente al mes valorizado	✓	
16	Presenta valorización de obra debidamente fundamentada y correspondiente al mes valorizado	✓	
17	Presenta resumen consistente de la valorización mensual	✓	
18	Presenta debidamente fundamentada la aplicación del reajuste autorizado	x	En la liquidación
19	Resumen de valorizaciones de obras ejecutadas correspondiente al mes valorizado y consistente a los requisitos 15, 16 y 17	✓	
20	Presenta debidamente fundamentada la aplicación de índices unificados	x	En la liquidación
21	Presenta debidamente fundamentada la aplicación de la fórmula polinómica	x	En la liquidación
22	Presenta de manera consistente la amortización de adelanto de directo	✓	
23	Presenta de manera consistente la amortización de adelanto de materiales	x	No solicito adelanto de materiales
24	Presenta grafico de la curva "s" (mensual) debidamente fundamentada y reflejando lo valorizado	✓	
25	Presenta recibos de pago de ESSALUD correspondiente al periodo valorizado	x	No corresponde en el presente periodo
26	Presenta recibo de pago CONAFOVICER correspondiente al periodo valorizado	x	No corresponde en el presente periodo
27	Presenta constancia de no adeudo de SENCICO correspondiente al periodo valorizado	x	No corresponde en el presente periodo
28	Presenta copia legible del cuaderno de obra correspondiente al periodo valorizado	✓	
29	Presenta panel fotográfico y/o evidencia filmica correspondiente a los trabajos ejecutados y consignados en la valorización	✓	
30	presenta informe mensual de seguridad correspondiente al periodo valorizado	✓	
31	presenta protocolos de pruebas correspondientes al periodo valorizado	x	No aplica al presente periodo de ejecución
32	Presenta fichas y/o hojas técnicas de materiales utilizado en el periodo valorizado	x	No aplica al presente periodo de ejecución



 Miguel Angel Gálvez Caparó


 INGENIERO CIVIL

 C.I.P. 69488

33	Presenta fichas y/o hojas técnicas de materiales, equipos y mantenimientos utilizados en el periodo valorizado	x	No aplica al presente periodo de ejecución
34	Aplica el cálculo de penalidades al periodo valorizado	x	No se ha incurrido en penalidades
35	Contrato y/o contratista de la obra se encuentra apercibido	x	La obra se encuentra en ejecución
36	El proyecto cuenta con certificación presupuestal	✓	
37	El proyecto cuenta con compromiso anual	✓	

V. CONCLUSIONES

DESCRIPCIÓN	ESTADO	
Conforme a la Valorización Técnica debidamente aprobada por la respectiva Supervisión de Obra, se reporta un Avance Físico Valorizado de S/ 38,885.01 Soles, que representa el 4.88% en relación al Presupuesto Ofertado que es de S/ 796,581.29 Soles; así mismo respecto del Avance Programado Valorizado para el presente periodo quincenal que es de 3.83% y equivalente al monto de S/ 28,885.90, se encuentra bajo la condición de permanentemente adelantada.	Obra en ejecución	
ESPECIALISTA	N° C.I.P.	FIRMA Y SELLO
ING. MIGUEL ANGEL. GÁLVEZ CAPARÓ	69488	


 Miguel Angel Gálvez Caparó
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. 69488



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



05018446

Usuario: pruz
Fecha: 24/12/2019
Hora: 16:09




CARGO 04297-2019-FONDEPES/AOEM

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA
Asunto: CARTA N° 004-2019-RFRG-SUPERVISOR/FONDEPES, PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VALORIZACION DE OBRA N° 01, PERIODO (04/12/2019 AL 15/12/2019) - CONTRATO N° 048-2019-FONDEPES
Referencia: INFORME 00039-2019-FONDEPES/MGC
Fecha: 24/12/2019
Observación:



AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO





PERÚ

Ministerio de la Producción



FONDEPES

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Fecha: 23/12/19


MEMORÁNDUM INTERNO N° 5538-201 -FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM

Asunto :

Hemo I. 10001-2019 de fondepes

Referencia :

Registro :

Indicación	Destino
Observaciones: _____	
<u>DR. MIGUEL A. GÁLVEZ CÁRDENAS</u>	
<u>23/12/2019 Hora: 10:45 AM</u>	
	

Atentamente



Indicaciones:

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 01. Autorizado/Aprobado | 02. Calificar/Evaluar | 03. Informe | 04. Projectar resolución |
| 05. Atención/Tramitación | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular |
| 09. Ayuda memoria | 10. Coordinar | 11. Opinión/Recomendación | 12. Consolidar |
| 13. Aclarar redacción | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta | 16. Visación |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo | 19. Ampliar | 20. Seguimiento |



PERÚ

Ministerio de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Fecha: 20/12/19

MEMORÁNDUM INTERNO N° 10004 - 2019 - FONDEPES/ DIGENIPAA

Asunto : Carta N° 004 - 2019 - RFRG - SUPGRU

Referencia : _____ Registro : 12914

Destino	Indicación	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA 20 DIC. 2019	
OCI		OSAJ Registro	15/10
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	AOEM

Observaciones: _____

Atentamente



Indicaciones:

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 01. Autorizado/Aprobado | 02. Calificar/Evaluar | 03. Informe | 04. Proyectar |
| 05. Atención/Tramitación | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular |
| 09. Ayuda memoria | 10. Coordinar | 11. Opinión/Recomendación | 12. Consoliar |
| 13. Aclarar redacción | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta | 16. Visación |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo | 19. Ampliar | 20. Seguimiento |

Tacna, 18 de diciembre de 2019

CARTA N° 004-2019-RFRG-SUPERV/FONDEPES.


Señor:

Jorge Roberto Ñahue Siviriche

Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola - FONDEPES

Av. Petit thouars N° 115 cercado de Lima

Presente.-



ASUNTO : INFORME DE VALORIZACION DE OBRA N° 01, PERIODO (04/12/2019 AL 15/12/2019)

Referencia : CONTRATO N°048-2019-FONDEPES, "CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA IOARR: CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacerle llegar un cordial saludo, así mismo comunicarle que, habiendo recibido la CARTA N° 007-2019/IMELEC-FONDEPES, el cual contiene **LA VALORIZACION N° 01 (04 al 15/12/2019)**, la misma que fue revisada y conciliada en campo, por lo cual esta supervisión comunica a Ud. **QUE ES PROCEDENTE Y SE APRUEBA DICHA VALORIZACION N° 01**, así mismo manifestar que se adjunta el INFORME DE LA VALORIZACION N° 01 DE LA SUPERVISION, lo cual bajo el análisis realizado determino su procedencia para su trámite de la VALORIZACION N° 01 por parte de esta supervisión, además de que se realiza la presentación de dicha documentación en cumplimiento de la O/S N° 02878, de la contratación de la supervisión.

Sin otro particular, me despido de usted y manifestarle los sentimientos de mi estima personal

Atentamente,

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIR 82871

Supervisor de Obra

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

2991627	
N° DOC:	00012914-0000
CLAVE:	6260
USUARIO:	jruelas
FECHA Y HORA:	20/12/2019 09:16:26
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	


•Se adjunta

- INFORME DE VALORIZACION DE SUPERVISION
- RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA
- CARTA N° 001-2019/IMELEC-FONDEPES
- VALORIZACION DE OBRA
- 1 CARGO MAS 2 ARCHIVADORES EN FOLIOS 243 + CD

Tacna, 19 de diciembre de 2019

CARTA N°008 -2019/IMELEC/FONDEPES

Señor:

Jorge Roberto Ñahue Siviriche**Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola – FONDEPES****Av. Petit Thouars N°115 cercado de Lima****Presente. -****ASUNTO : REMITO FACTURA ORIGINAL CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°01****REFERENCIA : OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA - DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"**
a) CARTA N°007 -2019/IMELEC/FONDEPES


Es grato dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y para adjuntarle la FACTURA ORIGINAL CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°01 para la obra: "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA - DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA".

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle mi muestra de consideración y estima personal.

Atentamente,

IMELEC S.R.L.
[Signature]
OSWALDO ALVARADO VINCIA
GERENTE GENERAL

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO

	
2991604	
N° DOC:	00012911-2019
CLAVE:	0110
USUARIO:	jruelas
FECHA Y HORA:	20/12/2019 09:00:20
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	

Cc/Arch.

- Adj. Factura original
- CARTA N°007 -2019/IMELEC/FONDEPES

IMELEC S.R.L.**IMELEC S.R.L.**MZA. M LOTE. 12 ASOCIACIÓN RAMÓN COPAJA COSTADO DEL
TERMINAL BOLOGNESI

ALTO DE LA ALIANZA - TACNA - TACNA

FACTURA ELECTRÓNICA**RUC: 20119916705****E001-78**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **19/12/2019**
 Señor(es) : **FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**
 RUC : **20137921601**
 Dirección del Cliente : **AV. PETIT THOUARS 115
 ESQUINA AV PETIT THOUARS
 CON 28 DE JULIO LIMA-LIMA-LIMA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA-DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE SAMA, DEPARTAMENTO TACNA, SEGUN CONTRATO NRO 048-2019-FONDEPES.	29658.06

Sub Total Ventas :	S/ 29,658.06
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 29,658.06
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,338.45
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 34,996.51

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
 NOVENTA Y SEIS Y 51/100 SOLES**

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

INFORME DE VALORIZACION N° 1 DE SUPERVISION

(DEL 04/12/2019 AL 15/12/2019)

MES: DICIEMBRE (1) (DEL 04/12/2019 AL 15/12/2019)


GENERALIDADES:

Obra: "CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA IOARR: CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"

Distrito : SAMA LAS YARAS
 Provincia : TACNA
 Departamento : TACNA

I. DATOS GENERALES

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1.1. Contrato de Obra | : N° 048-2019-FONDEPES |
| 1.2. Fecha de Suscripción | : 18/11/2019 |
| 1.3. Contratista de obra | : IMELEC S.R.L. |
| 1.4. Monto Contratado de obra (incluido IGV) | : S/. 796,581.29 |
| 1.5. Supervisor de obra | : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA |
| 1.6. Contrato de supervisión | : Orden de Servicio N° 002878 |
| 1.7. Fecha de Suscripción | : notificado el 01/12/2019 |
| 1.8. Monto del Contrato de Supervisión | : S/. 5,500.00 |
| 1.9. Cantidad: 01 | Unidad de Medida: SERVICIO |
| 1.10. Plazo de ejecución | : 90 días naturales. |
| 1.11. Monto del adelanto (con IGV) | : S/. 79,658.13 |
| 1.12. Fecha | : 02/12/2019 |
| 1.13. Fecha de entrega de terreno | : 03/12/2019 |
| 1.14. Fecha de inicio de Obra | : 04/12/2019 |
| 1.15. Fecha de término contractual | : 02/03/2020 |
| 1.16. Carta fianza de fiel cumplimiento | : C.F. N° 0011-0232-9800060493-68 |
| - Monto | : S/. 79,658.13 |
| - Entidad financiera | : BBVA CONTINENTAL |
| - Vigencia hasta | : 02/04/2020 |
| 1.17. Carta fianza del adelanto en efectivo | : C.F. N° E2894-00-2019 |
| - Monto | : S/. 79,658.12 |
| - Entidad financiera | : SECREX CESCE |
| - Vigencia hasta | : 22/02/2020 |


 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

II. SITUACION DE LA OBRA

2.1. ASPECTOS TECNICOS:

2.1.1. Situación de la obra:

El periodo de la situación de obra corresponde del 04/12/2019 al 15/12/2019, de lo cual en este primer periodo, se realizó la ejecución de lo siguiente:

- trabajos de obras provisionales
- trabajos preliminares
- seguridad y salud
- excavación masiva con maquinaria en terreno suelto; excavación manual de zanjas para sub-zapatatas h=0.50 m terreno suelto
- asimismo se habilito el acero y encofrado para los elementos estructurales que conforman los módulos 1 y 2.

2.1.2. Avance programado vigente : 3.63%

2.1.3. Avance ejecutado en el periodo : 4.88%

2.1.4. Avance programado acumulado en el periodo : 3.63%

2.1.5. Avance ejecutado acumulado en el periodo : 4.88%

2.1.6. Situación actual de avance de Obra :

- Normal
- Retrasado
- **Adelantado, la obra se encuentra adelantado en 1.26% respecto al acumulado.**

2.1.7. Plan de trabajo:

De acuerdo a la directiva de FONDEPES, los controles de campo son realizados en coordinación directa y de manera continua con el contratista y su equipo técnico durante la ejecución de la Obra, considerando los diferentes aspectos necesarios y vinculantes a la calidad de obra que se espera como resultado final, ya sea a través de la verificación y control de los procedimientos de construcción, calidad de los materiales y seguridad de Obra.

2.1.8. Desarrollo de la Obra.

En este primer periodo el desarrollo de la es normal con tendencia de adelantar la ejecución debido a que los materiales que el contratista viene implementando a la obra esto vinculado a la parte administrativa pues se cuenta con el adelanto directo, así mismo se realizó el inicio físico de la obra sin ningún contratiempo ni observación en presencia del coordinador del FONDEPES Ing. Miguel A. Gálvez Caparo, firmándose el acta correspondiente, por lo que a la fecha el desarrollo de la obra es normal.


2.1.9. Condiciones Meteorológicas en el área del Proyecto y otros factores que afecten el desarrollo normal de la obra.

A la fecha del reporte del periodo informado no se tiene ninguna adversidad al respecto.

2.1.10. Resultados de la Inspección y Control de Calidad

La Empresa Contratista hizo la adquisición y colocación de materiales en cancha de manera oportuna, conforme al avance real de la obra según lo indicado en el Exp. Tecnico .

El control de los procedimientos de construcción, se inicia con la verificación del estado, conservación y rendimiento de los Equipos y maquinaria movilizados a la Obra, paralelamente



 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

son controlados los recursos humanos que participarán como Mano de Obra ya sea calificada o No calificada, posteriormente ya en la ejecución de las diferentes partidas se controla el correcto proceso y el rendimiento esperado compatibilizándolos con los establecidos para la zona y evitar así sobre población del personal.

2.1.11. Equipo Mecánico empleado por el contratista

Según las bases

2.1.12. Personal profesional y técnico en obra:

Durante el periodo el contratista empleo a los siguientes profesionales y técnicos: Ingeniero residente de obra, ingeniero asistente del residente, técnico topógrafo, ingeniero especialista en seguridad y asistente del ingeniero de seguridad.

2.1.13. Visitas efectuadas por funcionarios de la DIGENIPAA.


Durante el periodo reportado, solo se tuvo la visita del Ing. Miguel A. Galvez Caparo, Coordinador del Proyecto de FONDEPES.

2.1.14. Organigrama del contratista**2.1.15. Organización del Supervisor y recursos empleados**

Ing. Supervisor según O/S 2878

2.1.16. Información miscelánea:

Control de avance físico programado vs avance físico ejecutado



.....
RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

PERIODO	AVANCE PROGRAMADO			
	SOLES		PORCENTAJE	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
Del 04-Dic-19 al 15-Dic-19	S/. 24,479.57	S/. 24,479.57	3.63%	3.63%
Del 16-Dic-19 al 31-Dic-19	S/. 76,280.35	S/. 100,759.92	11.30%	14.93%
Del 01-Ene-20 al 15-Ene-20	S/. 145,623.14	S/. 246,383.06	21.57%	36.50%
Del 16-Ene-20 al 31-Ene-20	S/. 163,901.97	S/. 410,285.03	24.28%	60.78%
Del 01-Feb-20 al 15-Feb-20	S/. 167,181.18	S/. 577,466.21	24.77%	85.54%
Del 16-Feb-20 al 29-Feb-20	S/. 88,468.10	S/. 665,934.31	13.11%	98.65%
Del 01-Mar-20 al 02-Mar-20	S/. 9,134.58	S/. 675,068.89	1.35%	100.00%

PERIODO	AVANCE EJECUTADO			
	SOLES		PORCENTAJE	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
Del 04-Dic-19 al 15-Dic-19	S/. 32,953.40	S/. 32,953.40	4.88%	4.88%
Del 16-Dic-19 al 31-Dic-19				
Del 01-Ene-20 al 15-Ene-20				
Del 16-Ene-20 al 31-Ene-20				
Del 01-Feb-20 al 15-Feb-20				
Del 16-Feb-20 al 29-Feb-20				
Del 01-Mar-20 al 02-Mar-20				

Control del calendario de adquisiciones de materiales

La Empresa Contratista, está dando cumplimiento a la colocación de los recursos necesarios de acuerdo al avance programado y/o real ejecutado.


Sobre los avances en el presente periodo de trabajo

Según las partidas ejecutadas en la presente obra, el Avance Físico Actual Ejecutado del Período de Trabajo: Del 04/12/2019 al 15/12/2019, es del 4.88% según el Expediente Técnico, Planos y las normas técnicas de control. Le estoy informando a su despacho que la obra de la referencia, se ejecutaron las partidas que se describen en el cuaderno de obra, las mismas que han sido aprobadas por el supervisor de obra las que fueron ejecutadas según las normas de control y especificaciones técnicas del Expediente Técnico aprobado.

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS – VALORIZACIÓN Nº 01

Item	Descripción	Und.	Metrado
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.01	INSTALACIONES PROVISIONALES		
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA	und	1.00
01.01.02	CASETA PARA RESIDENCIA Y SUPERVISION	m2	21.13
01.01.05	CERCO DE OBRA CON TRONCOS DE MADERA Y MALLA ARPILLERA	m	47.70
01.01.06	AGUA PARA LA OBRA	mes	0.40
01.01.09	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	glb	0.20
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA INICIAL Y DURANTE EL PROCESO	mes	0.40
01.03	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
01.03.01	IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	0.50
01.03.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	glb	0.30
01.03.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	0.50
01.03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	0.50
01.03.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	0.13
02	ESTRUCTURAS		
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.01	EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA EN TERRENO SUELTO	m3	660.67
02.01.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SUB-ZAPATAS H=0.50 M TERRENO SUELTO	m3	28.80
02.03	CONCRETO ARMADO		
02.03.01	SOBRECIMENTOS		
02.03.01.03	SOBRECIMIENTO: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2; GRADO 60	kg	262.99
02.03.02	ZAPATAS		
02.03.02.03	ZAPATAS: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2; GRADO 60	kg	413.16
02.03.03	COLUMNAS		
02.03.03.03	COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2; GRADO 60	kg	652.00
02.03.05	VIGA DE CONEXIÓN		
02.03.05.03	VIGA DE CONEXION: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2; GRADO 60	kg	448.87
02.03.07	COLUMNETA		
02.03.07.03	COLUMNETA: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2; GRADO 60	kg	169.73
02.03.09	LOSA DE PATIO CENTRAL		
02.03.09.03	LOSA DE PATIO CENTRAL: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2; GRADO 60	kg	74.58


 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82371

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

2.1.17. Conclusiones y Recomendaciones

- A la fecha se concluye que se tiene una ejecución de obra normal, según las partidas ejecutadas en obra, alcanzando un AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO DE 4.88%, alcanzado un monto **S/. 32,953.40 Sin IGV**, en el Período de Trabajo del **04/12/2019 al 15/12/2019**, teniendo un **AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO LIGERAMENTE SUPERIOR AL PROGRAMADO**.
- La amortización de adelanto directo sería el 10% del monto valorizado, correspondiente a un valor de **S/. 3,295.34. Sin IGV**.
- El Monto a Facturar corresponde a **S/. 29,658.06 sin IGV y S/. 34,996.51 con IGV (MONTO VALORIZADO – AMORTIZACIÓN DE ADELANTO)**.
- Se concluye también que la obra esta **ADELANTADA en un 1.26%** del avance físico programado acumulado.
- De todo lo descrito esta supervisión manifiesta que realizada la revisión de la valorización, es que se determina que es correcta y procedente para su trámite correspondiente, según lo que se indica en el RLCE.
- Se hace necesario recomendar, que el contratista no deje de aprovisionar los materiales necesarios en obra para no generar atrasos en obra, así mismo este deberá respetar los lineamientos establecidos en las directivas, Normas y Reglamentos (RLCE) que regulan la ejecución de obras bajo modalidad por contrata, así mismo respetar el Expediente Técnico en todos sus extremos, preveendo el cumplimiento de la programación de obra establecida.


III. ASPECTOS ECONOMICOS

- 3.1. Numero de valorizaciones tramitadas** : 01
- 3.2. Numero de Valorizaciones pagadas** : 00
- 3.3. Monto valorizado en el periodo** : S/. 38,885.01 (INC. IGV)
- 3.4. Monto pagado acumulado** : ---
- 3.5. Cuadro del estado de las amortizaciones**

VALORIZACION (V)			ADELANTO DIRECTO OTORGADO (AD) (SIN IGV)	MONTO CONTRATADO (C) (SIN IGV)	AMORTIZACION (A)		
Nº	PERIODO	MONTO (SIN IGV)			MENSUAL	ACUMULADA ACTUAL	SALDO POR AMORTIZAR
Val. N° 01	Del 04-Dic-19 al 15-Dic-19	32,953.40	67,506.89	675,068.89	3,295.34	3,295.34	64,211.55
Val. N° 02	Del 16-Dic-19 al 31-Dic-19						
Val. N° 03	Del 01-Ene-20 al 15-Ene-20						
Val. N° 04	Del 16-Ene-20 al 31-Ene-20						
Val. N° 05	Del 01-Feb-20 al 15-Feb-20						
Val. N° 06	Del 16-Feb-20 al 29-Feb-20						
Val. N° 07	Del 01-Mar-20 al 02-Mar-20						
TOTAL		S/. 32,953.40			S/. 3,295.34		

IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS


- 4.1. Ingeniero Residente** : ING. FRANCISCO RAMOS FLORES
- 4.2. N° de operarios contratados en el periodo** : 04
- 4.3. N° de obreros contratados en el periodo** : 17



RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

4.4. N° de jornales acumulados en el periodo : 204
4.5. N° de horas hombre H-H (Presente periodo) : 1360 HH
4.6. N° de horas maquina H-M (Presente periodo) : 56 HM



.....
RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA

(DEL 04/12/2019 AL 15/12/2019)

ASUNTO : VALORIZACION DE OBRA N° 01 (DEL 04/12/2019 AL 15/12/2019)

Obra: "CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA IOARR: CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"

Contrato de Obra : N° 048-2019-FONDEPES

Contratista de obra : IMELEC S.R.L

Supervisor de obra : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

REFERENCIA : CARTA N° 00 -2019/IMELEC-FONDEPES

FECHA : TACNA, 18 de diciembre de 2019.

I. ANTECEDENTES

La Direccion General de Inversion Pesquera Artesanal y Acuicola (DIGENIPAA)- FONDEPES, suscribió el contrato de ejecución de obra N° 048-2019-FONDEPES, con fecha 18/11/2019 con el Contratista IMELEC S.R.L. para la ejecución de la obra "CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA IOARR: CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", con un plazo de ejecución de 90 días calendario y por un monto de S/. 796,581.29 incluido IGV, con precios referidos al mes de diciembre.

NO SE TIENE ADENDAS.


II. ASPECTOS LEGALES

En la clausula CUARTA del contrato se establece el procedimiento para dar tramite de pago de valorizaciones, en la misma clausula dispone que el procedimiento será de acuerdo a lo establecido en el articulo 194, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Articulo 194, señala a su vez que la valorización debe ser ejecutada conjuntamente por el supervisor y el contratista.

Asi mismo la DIGENIPAA dispone que "... para los tramites de pago de valorizaciones, se debe contar con las copias de documentos que acrediten estar al dia en el pago de obligaciones legales tales como: ESSALUD, SENCICO, CONAFOVICER, AFPS, SEGURO COMPLEMENTARIO RIESGOS, asi como copia de las planillas de pago de obreros y empleados y la constancia que acredítela vigencia de las polizas de seguros y cualquier otro requisito que se especifique en el contrato.

Dichos aspectos legales se vienen cumpliendo durante el periodo informado.



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

III. ANALISIS


Datos de la valorización:

Descripción	Soles S/.	Observación
Monto de la etapa de ejecución de obra (sin IGV)	S/. 675,068.89	
Adelanto directo (sin IGV)	S/. 67,506.89	
Adelanto de materiales 01(acero corrugado, alambre N° 16 madera p/encofrado, cemento tipo V o similar), (sin IGV)	S/. 0.0	
Adelanto de materiales 02(maquinaria y equipo importado), (sin IGV)	S/. 0.0	
Monto valorizado en el periodo, (sin IGV)	S/. 32,953.40	
Monto valorizado acumulado, (sin IGV)	S/. 32,953.40	

Se ha revisado el resumen de valorización consignado por el supervisor el cual esta adjunto al Informe mensual, el cual incluye los conceptos que exige el contrato.

La información de sustento presentado por el supervisor es adjuntado al presente, siendo así que dicha valorización esta aprobada por esta supervisión para su tramite correspondiente.

Por tanto, se ha procedido a realizar el cálculo respectivo y se ha determinado que el monto total a considerar en la presente valorización es de **S/. 34,996.51 con IGV (MONTO VALORIZADO - AMORTIZACIÓN DE ADELANTO)**. De acuerdo al siguiente cuadro adjunto:



RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871

RESUMEN DE VALORIZACIONES

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA*
 PROPIETARI: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATIST: INELEC S.R.L.
 RESIDENTE : ING. FRANCISCO RAMOS FLORES
 SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

ITEM	CONCEPTO	PARCIAL OFERTADO	VALORIZACION N° 01	VALORIZACION N° 02	VALORIZACION N° 03	VALORIZACION N° 04	VALORIZACION N° 05	VALORIZACION N° 06	VALORIZACION N° 07	BALDO NO VALORIZADO
V	VALORIZACION N° 01 - DICIEMBRE 2019	575,069.89	32,953.40							542,116.49
R	REAJUSTE DE LAS VALORIZACIONES	0.00	0.00							0.00
	Reajuste de la Valorización N° 01									
Dh	DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE	0.00	0.00							0.00
	Adelanto Directo									
	Deducción del Reajuste por Adelanto Directo de la Val. N° 01									
	Adelanto para Materiales N° 01									
	Deducción del Reajuste por Adelanto para Materiales N° 01 de la Val. N° 01									
V6	VALORIZACION BRUTA	575,069.89	32,953.40							542,116.49
A	AMORTIZACION	57,506.89	3,295.34							54,211.55
	Adelanto Directo									
	Amortización por Adelanto Directo de la Val. N° 01	57,506.89	3,295.34							54,211.55
	Adelanto para Materiales N° 01									
	Amortización por Adelanto para Materiales N° 01 de la Val. N° 01									
J	MONTO FACTURABLE (M+IGV)	607,562.00	29,658.06							577,903.94
JL	TOTAL RETENCION	0.00	0.00							0.00
JLl	MONTO LIQUIDO A PAGAR (I+JL)	607,562.00	29,658.06							577,903.94
IV	IGV TOTAL (16% de I)	109,361.16	5,338.45							104,022.71
V	MONTO A FACTURAR (III+IV)	716,923.16	34,996.51							681,926.65
	SITUACION		PRESENTADA							


 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

Tacna, 16 de diciembre de 2019

CARTA N°007 -2019/IMELEC/FONDEPES

Señor:

ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

Presente. -

ASUNTO : REMITO VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2019 AL 15/12/2019.

REFERENCIA : OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA - DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

Es grato dirigirme a usted a fin de hacerle llegar la VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2019 AL 15/12/2019, dando cumplimiento a la CLÁUSULA CUARTA del CONTRATO N°048-2019-FONDEPES, ejecución de la obra en referencia. Y al Artículo 194 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF).

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle mi muestra de consideración y estima personal.

Atentamente,

IMELEC S.R.L.
OSWALDO J. CARDENAS VINCHA
GERENTE GENERAL

Recepción
16/12/2019
SUPERVISOR

Cc/Arch.
Adj.

a) 02 Files.

PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

VALORIZACION DE OBRA N° 01
DEL 04/12/2019 AL 15/12/2019

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

CONTRATISTA : IMELEC S.R.L.

IMELEC  S.R.L.

SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

 **FONDEPES**
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

SAMA - TACNA

REGION TACNA

PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

INFORME DE LA VALORIZACION

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA,
DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

CONTRATISTA : IMELEC S.R.L.

IMELEC S.R.L.

SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

 **FONDEPES**
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente en Obra
CIP 96570

SAMA - TACNA

REGION TACNA

RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA
Ing. Residente en Obra
CIP 96571

INFORME DE LA VALORIZACION N°01

(DEL 04/12/2019 AL 15/12/2019)

PERIODO: VALORIZACION N°01 (DEL 04/12/2019 AL 15/12/2019)

GENERALIDADES:

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA - DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

Distrito : SAMA LAS YARAS

Provincia : TACNA

Departamento : TACNA

I. DATOS GENERALES

1.1. Contrato de Obra	: N° 048-2019-FONDEPES
1.2. Fecha de Suscripción	: 18/11/2019
1.3. Contratista de obra	: IMELEC S.R.L.
1.4. Monto Contratado de obra (incluido IGV)	: S/. 796,581.29
1.5. Supervisor de obra	: ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA
1.6. Plazo de ejecución	: 90 días naturales.
1.7. Monto del adelanto (con IGV)	: S/. 79,658.13
1.8. Fecha	: 02/12/2019
1.9. Fecha de entrega de terreno	: 03/12/2019
1.10. Fecha de inicio de Obra	: 04/12/2019
1.11. Fecha de término contractual	: 02/03/2020
1.12. Carta fianza de fiel cumplimiento	: C.F. N° 0011-0232-9800060493-68
- Monto	: S/. 79,658.13
- Entidad financiera	: BBVA CONTINENTAL
- Vigencia hasta	: 02/04/2020
1.13. Carta fianza del adelanto en efectivo	: C.F. N° E2894-00-2019
- Monto	: S/. 79,658.12
- Entidad financiera	: SECREX CESCE
- Vigencia hasta	: 22/02/2020

IMELEC S.R.L.

OSVALDO J. CARDENAS VENCHA
GERENTE GENERAL

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS SIENRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871

II. SITUACION DE LA OBRA

2.1. ASPECTOS TECNICOS:

2.1.1. Situación de la obra:

RENZO F. ROMERO SIENRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871

En este primer periodo, se ejecutó los trabajos de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud; excavación masiva con maquinaria en terreno suelto; excavación manual de zanjas para sub-zapatatas h=0.50 m terreno suelto; asimismo se habilito el acero y encofrado para los elementos estructurales que conforman los módulos 1 y 2.

- 2.1.2. **Avance programado vigente** : 3.63%
- 2.1.3. **Avance ejecutado en el periodo** : 4.88%
- 2.1.4. **Avance programado acumulado en el periodo** : 3.63%
- 2.1.5. **Avance ejecutado acumulado en el periodo** : 4.88%
- 2.1.6. **Situación actual de avance de Obra** : Adelantado en 1.26% respecto al acumulado.
- 2.1.7. **Plan de trabajo:**

El Control de campo es realizado de manera continua por el equipo técnico de la contratista durante la ejecución de la Obra, desde los diferentes puntos de vista, ya sea a través de la verificación y control de los procedimientos de construcción, calidad de los materiales y seguridad de Obra.


2.1.8. **Control de Calidad de Materiales.**

La Empresa Contratista hizo la adquisición y colocación de materiales en cancha de manera oportuna, conforme al avance real de la obra.

El control de los procedimientos de construcción, se inicia con la verificación del estado, conservación y rendimiento de los Equipos y maquinaria movilizadas a la Obra, paralelamente son controlados los recursos humanos que participarán como Mano de Obra ya sea calificada o No calificada, posteriormente ya en la ejecución de las diferentes partidas se controla el correcto proceso y el rendimiento esperado compatibilizándolos con los establecidos para la zona y evitar así sobre población del personal.

2.1.9. **Personal profesional y técnico en obra:**

Durante el periodo el contratista empleo a los siguientes profesionales y técnicos: Ingeniero residente de obra, ingeniero asistente del residente, técnico topógrafo, ingeniero especialista en seguridad y asistente del ingeniero de seguridad.

IMELEC S.R.L.

 OSVALDO J. CARDENAS VINCHA
 GERENTE GENERAL

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 96570


FRANCISCO RAMOS FLORES
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 8297

2.1.10. Organigrama del contratista
2.1.11. Información miscelánea:
Control de avance físico programado vs avance físico ejecutado

PERIODO	AVANCE PROGRAMADO			
	SOLES		PORCENTAJE	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
Del 04-Dic-19 al 15-Dic-19	S/. 24,479.57	S/. 24,479.57	3.63%	3.63%
Del 16-Dic-19 al 31-Dic-19	S/. 76,280.35	S/. 100,759.92	11.30%	14.93%
Del 01-Ene-20 al 15-Ene-20	S/. 145,623.14	S/. 246,383.06	21.57%	36.50%
Del 16-Ene-20 al 31-Ene-20	S/. 163,901.97	S/. 410,285.03	24.28%	60.78%
Del 01-Feb-20 al 15-Feb-20	S/. 167,181.18	S/. 577,466.21	24.77%	85.54%
Del 16-Feb-20 al 29-Feb-20	S/. 88,468.10	S/. 665,934.31	13.11%	98.65%
Del 01-Mar-20 al 02-Mar-20	S/. 9,134.58	S/. 675,068.89	1.35%	100.00%

PERIODO	AVANCE EJECUTADO			
	SOLES		PORCENTAJE	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
Del 04-Dic-19 al 15-Dic-19	S/. 32,953.40	S/. 32,953.40	4.88%	4.88%
Del 16-Dic-19 al 31-Dic-19				
Del 01-Ene-20 al 15-Ene-20				
Del 16-Ene-20 al 31-Ene-20				
Del 01-Feb-20 al 15-Feb-20				
Del 16-Feb-20 al 29-Feb-20				
Del 01-Mar-20 al 02-Mar-20				

IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 95578

IMELEC S.R.L.

OSVALDO J. GARDUÑAS MELICHÁ
 GERENTE GENERAL

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 22632

Control del calendario de adquisiciones de materiales

La Empresa Contratista, está dando cumplimiento a la colocación de los recursos necesarios de acuerdo al avance programado y/o real ejecutado.

Sobre los avances en el presente periodo de trabajo

Según las partidas ejecutadas en la presente obra, el Avance Físico Actual Ejecutado del Período de Trabajo: Del 04/12/2019 al 15/12/2019, es del 4.88% según el Expediente Técnico, Planos y las normas técnicas de control. Le estoy informando a su despacho que la obra de la referencia, se ejecutaron las partidas que se describen en el cuaderno de obra, las mismas que han sido aprobadas por el supervisor de obra las que fueron ejecutadas según las normas de control y especificaciones técnicas del Expediente Técnico aprobado.

RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS – VALORIZACIÓN N° 01

Item	Descripción	Und.	Metrado
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.01	INSTALACIONES PROVISIONALES		
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA	und	1.00
01.01.02	CASETA PARA RESIDENCIA Y SUPERVISION	m2	21.13
01.01.05	CERCO DE OBRA CON TRONCOS DE MADERA Y MALLA ARPILLERA	m	47.70
01.01.06	AGUA PARA LA OBRA	mes	0.40
01.01.09	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	glb	0.20
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA INICIAL Y DURANTE EL PROCESO	mes	0.40
01.03	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
01.03.01	IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	0.50
01.03.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	glb	0.30
01.03.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	0.50
01.03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	0.50
01.03.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	0.13
02	ESTRUCTURAS		
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.01	EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA EN TERRENO SUELTO	m3	660.67
02.01.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SUB-ZAPATAS H=0.50 M TERRENO SUELTO	m3	28.80
02.03	CONCRETO ARMADO		
02.03.01	SOBRECIMENTOS		
02.03.01.03	SOBRECIMIENTO: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2; GRADO 60	kg	262.99


 IMELEC S.R.L.

 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 9557

 OSVALDO G. CÁRDENA VILCHA
 GERENTE GENERAL

 ENZO ROMERO
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82876

02.03.02	ZAPATAS		
02.03.02.03	ZAPATAS: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm ² ; GRADO 60	kg	413.16
02.03.03	COLUMNAS		
02.03.03.03	COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm ² ; GRADO 60	kg	652.00
02.03.05	VIGA DE CONEXION		
02.03.05.03	VIGA DE CONEXION: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm ² ; GRADO 60	kg	448.87
02.03.07	COLUMNETA		
02.03.07.03	COLUMNETA: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm ² ; GRADO 60	kg	169.73
02.03.09	LOSA DE PATIO CENTRAL		
02.03.09.03	LOSA DE PATIO CENTRAL: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm ² ; GRADO 60	kg	74.58

2.1.12. Conclusiones y Recomendaciones

- Según las partidas ejecutadas en obra, el monto alcanzado en el presente periodo de informe es de **S/.32,953.40 Sin IG**V, asimismo el porcentaje alcanzado es de **4.88%** en el Período de Trabajo del **04/12/2019 al 15/12/2019**, teniendo un **AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO del 4.88%**.
- La amortización de adelanto directo sería el 10% del monto valorizado, correspondiente a un valor de **S/.3,295.34. Sin IG**V.
- El Monto a Facturar corresponde a **S/. 29,658.06 sin IG**V y **S/. 34,996.51 con IG**V (MONTO VALORIZADO – AMORTIZACIÓN DE ADELANTO).
- Se concluye también que la obra esta **ADELANTADA en un 1.26%** del avance físico programado acumulado.
- Esta Residencia informa a su despacho que la obra de la referencia, se ejecutaron las partidas que acompañan a este informe en el cuaderno de obra y que fueron ejecutadas según las normas de control y especificaciones técnicas del Expediente Técnico aprobado, cumpliendo con informar a la Entidad, los respectivos avances ejecutados.
- Es necesario tomar las acciones anticipadas orientadas a garantizar el avance de obra correspondiente al mes siguiente y cumplir con el porcentaje correspondiente indicado en el Calendario de avance Valorizado de obra N°01.

III. ASPECTOS ECONOMICOS

- 3.1. Numero de valorizaciones tramitadas : 01
- 3.2. Numero de Valorizaciones pagadas : 00
- 3.3. Monto valorizado en el periodo : S/. 38,885.01 (INC. IG)V
- 3.4. Monto pagado acumulado : ---

IMELEC S.R.L.

RESIDENCIA TECNICA
CENTRAL

IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 96570

KENZO P. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82371

3.5. Cuadro del estado de las amortizaciones

VALORIZACION (V)			ADELANTO DIRECTO OTORGADO (AD) (SIN IGV)	MONTO CONTRATADO (C) (SIN IGV)	AMORTIZACION(A)		
N°	PERIODO	MONTO (SIN IGV)			MESES	ACUMULADA ACTUAL	SALDO POR AMORTIZAR
Val N° 01	Del 04-Dic-19 al 15-Dic-19	32.953.40	67.506.89	675.068.89	3.295.34	3.295.34	64.211.55
Val N° 02	Del 16-Dic-19 al 31-Dic-19						
Val N° 03	Del 01-Ene-20 al 15-Ene-20						
Val N° 04	Del 16-Ene-20 al 31-Ene-20						
Val N° 05	Del 01-Feb-20 al 15-Feb-20						
Val N° 06	Del 16-Feb-20 al 29-Feb-20						
Val N° 07	Del 01-Mar-20 al 02-Mar-20						
TOTAL		SI. 32.953.40			SI. 3.295.34		

IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- 4.1. Ingeniero Residente : ING. FRANCISCO RAMOS FLORES
- 4.2. N° de operarios contratados en el periodo : 04
- 4.3. N° de obreros contratados en el periodo : 17
- 4.4. N° de jornales acumulados en el periodo : 204
- 4.5. N° de horas hombre H-H (Presente periodo) : 1360 HH
- 4.6. N° de horas hombre H-M (Presente periodo) : 56 HM



IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 98070

IMELEC S.R.L.

GEORGINA VINCIA
INGENIERA

INGENIERO GUERRA
INGENIERO SUPERIOR DE OBRA
CIP 22871

PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

RESUMEN EJECUTIVO

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA,
DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

CONTRATISTA : IMELEC S.R.L.

IMELEC  S.R.L.

SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

 **FONDEPES**
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

SAMA - TACNA
REGION TACNA

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA - DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

CODIGO SNIP : N° 563273
PROCESO DE SELECCIÓN : ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 038-2019-FONDEPES
 (1° CONVOCATORIA)

UBICACIÓN POLITICA:

PROVINCIA : TACNA
REGION : TACNA
DISTRITO : SAMA LAS YARAS
LOCALIDAD : MORRO SAMA
LUGAR : CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA

UBICACIÓN GEOGRAFICA COORD. GEOGRAFICA

LATITUD : 17°51'54" S
LONGITUD : 70°33'43" O
ALTITUD : 374 m.s.n.m.

VALOR REFERENCIAL : S/. 885,090.32 (INC. IGV)
MONTO CONTRATADO : S/. 796,581.29 (INC. IGV)
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : POR CONTRATA
SISTEMA DE CONTRATACIÓN : A SUMA ALZADA.
EMPRESA CONTRATISTA : EMELEC S.R.L.
REPRESENTANTE LEGAL : ING. OSVALDO JAVIER CARDENAS VINCHA
SUPERVISOR DE OBRA : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA
RESIDENTE DE OBRA : ING. FRANCISCO RAMOS FLORES
FECHA ENTREGA TERRENO : 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.
ADELANTO DIRECTO : S/. 79,658.13 (INC. IGV)
ADELANTO POR MATERIALES : S/. ----
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO : C.F. N° 0011-0232-9800060493-68

Entidad financiera : BBVA CONTINENTAL por S/. 79,658.13 (10.00% Monto Contratado).

Vigencia : Del 04-11-2019 Hasta el 02-04-2020

Renovación N° : A la Fecha no hay Ninguna

GARANTÍA DEL ADELANTO DIRECTO : C.F. N° E2894-00-2019

Monto : S/. 79,658.12

Entidad financiera : SECREX CESCE

Vigencia hasta : 22/02/2020

INICIO CONTRACTUAL DE OBRA : 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 90 DÍAS CALENDARIOS.

FECHA DE TERMINO DE OBRA : 02 DE MARZO DEL 2019.

IMELEC S.R.L.

OSVALDO J. CARDENAS VINCHA
 GERENTE GENERAL

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 96579

RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82371

PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

COPIA DEL CUADERNO DE OBRA

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA,
DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

CONTRATISTA : IMELEC S.R.L.

IMELEC  S.R.L.

SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

 **FONDEPES**
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

SAMA - TACNA
REGION TACNA



NOTARIA DE TACNA
Dra. Rosa María Malaga Cutipé

Notaria de Tacna - Abogada
Mat. C. N. T. N°9
Calle Hipólito Unanue N°336
Telefax: 052 422983
- Tacna -

SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN DE LIBROS

Reg. N°1817-2019.....

Solicitante o representante: OSVALDO JOVIER CARDENAS VERCHA

D.N.I. N° 00441616

Domicilio: Ave. Ramon Copaja Mz M 1812 - Alto de Alinza - Tacna

Ante Ud. Con el debido respeto me presento y digo:

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 112 al 116 del Decreto ley N° 1049 Ley del Notariado me presento a su Despacho para solicitar la legalización

de: cuaderno de obra de la "Construcción de la Ejecución de la

Libro: obra TOARR: Construcción de la Casa Residencial; Centro
de la Municipalidad de Tacna - Departamento de Tacna

Tomo N° Cierre del Tomo.....

de: 100 folios Cuadraples Folios:

Perteneciente a: IMELEC S.R.L.

Domicilio Legal Ave. Ramon Copaja Mz M 1812 - Alto de Alinza - Tacna.
R.U.C. N° 20119916405

Tacna, 26 de Noviembre del 2019



Rosa María Malaga Cutipé
NOTARIA DE TACNA - ABOGADA
MAT. C. N. T. N°9

Firma del Solicitante

D.N.I. N° 00441616



IMELEC S.R.L.

OSVALDO J. CARDENAS VERCHA
GERENTE GENERAL

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____



Dra. Rosa María Málaga Cutipé

NOTARIA DE TACNA

Calle Hipólito Unanue N° 336 Telefax: 052 - 422983

Certificación de Apertura de Libro

LA NOTARIA QUE SUSCRIBE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTS. 112° AL 116° DEL D. LEG N° 1049.


CERTIFICA: LA APERTURA DEL PRESENTE LIBRO (U HOJAS SUELTAS) DENOMINADO: **CUADERNO DE OBRA:**

" **CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA IOARR: CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL; CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA**" TOMO N°: **I (UNO)**, DE: **100 FOLIOS CUADRUPLS**, PERTENECIENTE A **IMELEC S.R.L.**, CON R.U.C. N° **20119916705**. EN CADA FOLIO

ESTAMPO MI SELLO NOTARIAL Y QUEDA REGISTRADO CON EL N° **1812-2019**, DE MI INDICE

CRONOLOGICO. -----

TACNA, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2,019



Rosa María Málaga Cutipé
NOTARIA DE TACNA - ABOGADA



[Signature]
OSVALDO J. CARDENAS VILCHA
GERENTE GENERAL

INSPECTOR

RESIDENTE

SUPERVISOR



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO PARA EJECUCION DE OBRA

PROCESO : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2019-FONDEPES
CONTRATO : N° 048-2019-FONDEPES
OBRA : "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA" CODIGO ÚNICO N° 2434305"
UBICACIÓN : CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA - DISTRITO DE SAMA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
ENTIDAD : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONTRATISTA : EMPRESA IMELEC S.R.L.
PLAZO DE OBRA : 90 DIAS CALENDARIO
MONTO CONTRACTUAL : S/ 796,581.29 (Setecientos Noventa Y Seis Mil Ochenta Y Uno Con 29/100 Soles)

Siendo las 11:00 am horas del día tres (03) de diciembre del 2019, se reunieron en las instalaciones del Centro Acuícola Morro Sama, por una parte en representación del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, el ING. MIGUEL ÁNGEL GÁLVEZ CAPARÓ como Coordinador de Proyecto, y EL ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA como Supervisor de Obra; por la otra parte, el Sr. OSVALDO JAVIER CÁRDENAS VINCHA como representante legal de la Empresa Contratista IMELEC S.R.L., para cumplir con la diligencia de ENTREGA DEL TERRENO para la ejecución de la Obra "CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA - DISTRITO DE SAMA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA".

En tal sentido, luego de efectuar el recorrido y verificar la disponibilidad del lugar, las partes involucradas dejan constancia que se efectúa la correspondiente Entrega de Terreno por parte de FONDEPES al CONTRATISTA "Empresa IMELEC S.R.L" bajo condiciones satisfactorias, declarando que no existe impedimento alguno, para ejecutar físicamente la obra materia de encargo contractual. Siendo las 13:00 pm horas del mismo día, se da por concluida el acto de Entrega de Terreno, firmando los participantes en señal de conformidad al pie del presente documento en cuatro (04) originales.

POR EL CONTRATISTA
Sr. Osvaldo Javier Cárdenas Vincha
Representante Legal
DNI 00441616

IMELEC S.R.L.

OSVALDO J. CÁRDENAS VINCHA
GERENTE GENERAL

POR LA SUPERVISION
Ing. Renzo Fernando Romero Guerra
Supervisor de Obra
DNI-01323069

POR FONDERES
Ing. Miguel Angel Gálvez Caparó
Coordinador de Proyecto
DNI 29553769

ACTA DE INICIO DE OBRA

Siendo las 8.00 am del 04 de Diciembre del 2019, reunidos en el Centro Acuícola Morro Sama, Distrito de Sama Las Yaras, Provincia de Tacna, Región de Tacna ; lugar donde se ejecutara la Obra: "CONSTRUCCION DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA - DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", nos reunimos los siguientes.

POR PARTE DE CONTRATISTA IMELEC S.R.L. (EJECUTOR):

Ing. OSVALDO JAVIER CÁRDENAS VINCHA : Representante Legal
Ing. FRANCISCO RAMOS FLORES : Residente de Obra

POR PARTE DE LA ENTIDAD FONDEPES (SUPERVISOR):

Ing. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA : Supervisor de Obra

Se reunieron con la finalidad de proceder con el ACTO DE INICIO DE OBRA, en cumplimiento de los procedimientos administrativos indicados en la Ley de Contrataciones del Estado para proceder con la Ejecución del CONTRATO N° 048-2019-FONDEPES de la ejecución de la Obra: "CONSTRUCCION DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA - DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA".

Así mismo se verifico que el terreno cuenta con una extensión de superficial conforme con los datos señalados en los Planos de Ubicación del Expediente Técnico Base Aprobado.

De conformidad a lo expuesto se suscribe el presente acta procediendo a las firmas correspondiente por los representantes.

Luego de un reconocimiento e inspección del terreno y en señal de conformidad, firman los presentes.

POR PARTE DE CONTRATISTA IMELEC S.R.L. (EJECUTOR):




Ing. OSVALDO JAVIER CÁRDENAS VINCHA
Representante Legal




Ing. FRANCISCO RAMOS FLORES
Residente de Obra

POR PARTE DE LA ENTIDAD FONDEPES (SUPERVISOR):



Ing. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA
Supervisor de Obra

IMELEC S.R.L.


OSVALDO J. CÁRDENAS VINCHA
GERENTE GENERAL

INSPECTOR

RESIDENTE

SUPERVISOR

Grafiresa



CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 001 DEL CONTRATISTA 04/12/2019

EL DIA DE HOY SE INICIA CON LOS TRABAJOS INDICADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL, EN EL CENTRO AGROICOLA MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA." QUE EJECUTA LA EMPRESA CONSTRUCTORA IMELEC S.R.L.

DE ACUERDO A LA LICITACION ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2019-FONDEPES, DE CONTRATO N° 048-2019-FONDEPES; COMO RESIDENTE DE OBRA ING. FRANCISCO RAMOS FLORES; DE ACUERDO AL ORDEN DE SERVICIO N° 02878 SE NOS COMUNICA A LA EMPRESA ASIGNADO COMO SUPERVISOR DE OBRA AL ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, Y EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO ASCIENDE A S/. 796,581.29.

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 96570

IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS FLORES
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 96570

ASIENTO N° 002 DEL CONTRATISTA 04/12/2019

- EL DIA DE HOY SE INICIA LOS TRABAJOS CON LA CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).

- SE DIO INICIO CON EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL AREA DE INTERVENCION DE LA OBRA.

- SE INICIA CON EL EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA RESIDENCIA Y SUPERVISION, VESTIDORES DAMA PERSONAL OBRERO, SSMT PROVISIONALES.

- AL SUPERVISOR DE OBRA SE COMUNICA QUE EL DIA 05/12/2019 VAN A

IMELEC S.R.L.

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 96570


RE
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA

SUPERVISOR

Grafiresa

OSVALDO VASQUEZ
GERENTE GENERAL

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

SE VIENE DEL ASIENTO N° 002 DEL CONTRATISTA 04/12/2019
SE TIENE PROGRAMADO REALIZAR EL TRAZO Y REPLANTEO, PARA LUEGO
REALIZAR LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, ASÍ COMO SE
SOLICITA LA VERIFICACION Y APROBACION.

[Handwritten signature and scribbles]

ASIENTO N° 003 DEL SUPERVISOR. 04/12/2019

- HECHA LA VERIFICACION EN CAMPO RESPECTO AL TRAZO Y REPLANTEO
ES QUE SE APRUEBA PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS
AL TERMINO DEL TRAZO DEBERA PRESENTARSE LOS INSUMOS Y MAQUINARIA
PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS.

- SE SOLICITA AL CONTRATISTA.

- 1) CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON LO QUE SE INDICA EN EL EXPEDIENTE
TECNICO RESPECTO A LOS MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS ASI
● COMO LA TOTALIDAD DEL MISMO E. T.
- 2) ES NECESARIO QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON EL CONTRATO NO
048-2019-FONDEPES, EN TODOS SUS EXTREMOS AL IGUAL QUE LOS
DOCUMENTOS VINCULANTES QUE CONFORMAN EL MISMO SEGUN R.L.C.E.;
- 3) ASI MISMO SE SOLICITA PRESENTAR LOS SEGUROS NECESARIOS QUE
CONTEMPLA LA LEY PARA LA EJECUCION DE OBRA.
- 4) SE SOLICITA LA ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA CON FECHAS
REALES PARA DAR TRAMITE ANTE LA ENTIDAD (FONDEPES)
- 5) RESPECTO AL PERSONAL CLAVE DEBERA PERMANECER EN OBRA SEGUN

LA SOLICITA: GAUDORA.
IMELEC S.R.L.
[Signature]
OSVALDO CARDENAS VINCHA
GERENTE GENERAL
INSPECTOR

[Signature]
RESIDENTE

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
Grafiresa

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 004 DEL CONTRATISTA 05/12/2019

- EL DIA DE HOY SE INICIA LOS TRABAJOS CON LA CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).

- SE CONTINUA CON EL REPLANTEO DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL AREA DE INTERVENCION DE LA OBRA.

EL DIA DE HOY CONSUNTAMENTE CON EL SUPERVISOR DE OBRA SE VERIFICO EL TRAZO DEL TERRENO PARA ASI INICIAR CON EL CORTE DE MATERIAL DE ACUERDO A LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TECNICO.

- SE CONTINUA CON LA MOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS.

~~IMELEC S.R.L.
FRANCISCO JAMOS FLORES
Ing. Residente~~

~~Supervisor~~

ASIENTO N° 005 DEL SUPERVISOR. 05/12/19.

- SE INDICA AL RESIDENTE DE LA OBRA QUE SE RESPETE EL TRAZO QUE SE DEFINIO EN CAMPO PARA LA INTERVENCION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS. ASI MISMO SE VISUALIZA QUE LAS OBRA PROVISIONALES AUN NO SE INICIAN. POR LO QUE ES NECESARIO DAR INICIO AL MISMO, -SE SOLICITA SE COLOQUE EL CARTEL DE OBRA.

- SE REITERA EL CUMPLIMIENTO DEL ASIENTO N° 003 DE LA SUPERVISION.

- A LA FECHA NO HAY PRONUNCIAMIENTO SOBRE LO REQUERIDO EN LAS CLAUSULAS DE PENALIDADES. DEL CONTRATO.

IMELEC S.R.L.
INSPECTOR
OSVALDO TARRAS VINCIA
GERENTE GENERAL

~~IMELEC S.R.L.
FRANCISCO JAMOS FLORES
Ing. Residente~~
RESIDENTE

SUPERVISOR

Grafirosa

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 006 DEL CONTRATISTA

06/12/2019

- EL DIA DE HOY SE INICIA LOS TRABAJOS CON LA CHARLA DIARIA DE SEGURO Y SALVO EN EL TRABAJO (SST).

- SE INICIA CON LA PARTIDA 02.01.01. EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIAS EN TERRENO SUELTO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO.

• SE CONTINUA CON LAS CONSTRUCCIONES PROVISIONALES TALES COMO CERCO PROVISIONAL, CASETA DE RESIDENCIA, VESTIBULOS Y SST.

ASIENTO N° 007 DEL SUPERVISOR

06/12/2019

- SE VERIFICO EL INICIO DE LAS CONSTRUCCIONES DE LAS OBRAS PROVISIONALES.

• AL RESPECTO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS SE PUEDE VISUALIZAR LA INTERVENCIÓN DE MAQUINARIA PESADA. POR LO QUE VERIFICADO LOS NIVELES DE CORTES ES QUE SE PROCEDERA A LA EXCAVACION O MOVIMIENTOS DE TIERRAS TAL Y COMO SE DETALLA EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

• SE SOLICITA AL CONTRATISTA VERIFICAR LOS PLAZOS PARA LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS EN RELACION AL CONTRATO Y AL REGLAMENTO Y LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. ESTO DE FORMA FISICA PARA SU REVISION Y TRAMITE ANTE LA ENTIDAD.

IMELEC S.R.L.

GERENTE GENERAL

RESIDENTE

SUPERVISOR

Grafiresa

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 008 DEL CONTRATISTA 07/12/2019

- EL DIA DE HOY SE INICIA CON LOS TRABAJOS CON LAS CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALVO EN EL TRABAJO (SST).
- SE CONTINVA CON EL CORTE MASIVO CON MAQUINARIA EN TERRENO DE MATERIAL SUELTO.
- SE CONTINVA CON LAS PARTIDAS DE OBRAS PROVISIONALES TALES COMO CASETA DE GUARDIANA, VESTIDORES Y OTROS.
- SE CONTINVA CON EL CONTROL TOPOGRAFICO VERIFICANDO LOS NIVELES DE ACUERDO AL EXP TECNICO.

RENZO F. PONER
INGENIERO CIVIL
CIP 12500

FRANCISCO RAMOS FLORES
INGENIERO CIVIL
CIP 12500

ASIENTO N° 009 DEL SUPERVISOR 07/12/19.

- RESPECTO A LOS TRABAJOS CON MAQUINARIA ES NECESARIO QUE SE RESPETEN LOS NIVELES DE CORTE PARA LO CUAL SE PIDE AL RESIDENTE QUE EL PLANTILLO DE LOS MISMOS SEAN VISIBLES, ASI TAMBIEN AL RESPECTO DE LA OBRAS PROVISIONALES DEBERA DARLE MAYOR Celeridad PUESTO QUE HAY PERSONAL OBRERO QUE SE DESPERDICIA

* AL CONTRATISTA: SE SOLICITA QUE PREVEA EL TEMAS DE - AUTORIZACIONES, PERMISOS, TEMAS AMBIENTALES (IMPACTOS), RESTOS ARQUEOLOGICOS Y DEMAS LICENCIAS VINCULANTES A LA EJECUCION DE LA OBRA. ESTO BASTA RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA PARA SU CUMPLIMIENTO

IMELEC S.R.L.
INSPECTOR
OSVALDO J. CARDENAS VINCHA
GERENTE GENERAL

FRANCISCO RAMOS FLORES
RESIDENTE

RENZO F. PONER GUERRA
INGENIERO CIVIL
CIP 12500
SUPERVISOR

Grafiresa

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____


ASIENTO N° 10 DEL CONTRATISTA (RESIDENTE) 09/12/2019


EL DIA DE HOY SE INICIA CON LOS TRABAJOS CON LAS CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).

SE CONTINUA CON LAS OBRAS PROVISIONALES - ALMACEN DE OBRA Y OTROS.

EL DIA DE HOY SE REALIZO LA INSTALACION DEL CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA, EN COORDINACION CON LA SUPERVISION DE OBRA.

AL SUPERVISOR DE OBRA, HABIENDO APROBADO EL TRAZO DEFINITIVO SE SOLICITA A LA SUPERVISION LA AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DEL ITEM 02.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SUB-ZAPATAS H=0.40M TERRENO SUELTO (MODULO N° 01 Y 02).


.....
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CP 000000

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
.....
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CP 000000


ASIENTO N° 11 DEL SUPERVISOR. 09/12/2019


HECHA LA VERIFICACION DEL TRAZO PRESENTADO POR LA RESIDENCIA SE AUTORIZA LA EJECUCION DE LA PARTIDA 02.01.02. EL MISMO QUE SERA EJECUTADO SEGUN EL EXP. TEC.

AL CONTRATISTA: SE REITERA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ASIENTOS N° 03 Y 09 DE LA SUPERVISION

ES NECESARIO QUE CUALQUIER DESARROLLO DE LOS TRABAJOS VINGANTE A LA OBRA SEA COMUNICADO A ESTA SUPERVISION A EFECTO DE VALIDARLO ESTO EN CONCORDANCIA CON EL RLCE A CUMPLIR CON LA PARTICIPACION DEL PERSONAL CLAVE EN OBRA

IMELEC S.R.L.
INSPECTOR
OSVALDO CARDENAS VINCHA
GERENTE GENERAL

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
RESIDENTE


SUPERVISOR
Grafresca


CUADERNO DE OBRA




FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 12 DEL RESIDENTE 10/12/2019

- EL DIA DE HOY SE INICIA CON LOS TRABAJOS CON LAS CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).
- EL DIA DE HOY SE DA INICIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SUB-FAPATAS $H=0.40M$ TERRENO SUELTO CON LAS DIMENSIONES Y NIVELES SEGUN EL EXP. TECNICO.
- SE COMUNICA A LA SUPERVISION QUE SE VIENE REALIZANDO LA HABILITACION DEL ACERO PARA LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO TALES COMO ZAPATAS, COLUMNAS, VIGAS, VIGAS DE CONEXION, VIGUETA COLUMNETA Y DINTEL.
- SE COMUNICA A LA SUPERVISION QUE SE VIENE HABILITANDO EL ENCOFRADO PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES.


.....
INGENIERO SUPERVISOR



.....
FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 12579


ASIENTO N° 13 DEL SUPERVISOR.

10/12/19

- RESPECTO A LOS TRABAJOS QUE SE REALIZA EN LA HABILITACION DE ACERO Y ENCOFRADO, SE SOLICITA AL RESIDENTE LA VERIFICACION JUNTO CON ESTA SUPERVISION ADEMAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANOS DE DETALLES, POR LO QUE SE NOS COMUNIQUE CUALQUIER MODIFICACION PARA SU EVALUACION.
- * CONTRATISTAS: SE SOLICITA CRONOGRAMA DE PARTICIPACION DEL PERSONAL CLAVE EN OBRA.

IMELEC S.R.L.
.....
INSPECTOR
OSVALDO Y. CARDENAS WINCHA
GERENTE GENERAL


.....
RESIDENTE


.....
SUPERVISOR
J. Grafiresa

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 16 DEL RESIDENTE

12/12/2019

- EL DIA DE HOY SE INICIA CON LOS TRABAJOS CON LAS CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).

- SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE LA PARTIDA 02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SUB-ZAPATAS H=0.40M TERRENO SUELTO.

- SE COMUNICA AL SUPERVISOR QUE SE CONTINUA CON LA HABILITACION DE ACERO PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y A LA VEZ SE SOLICITA SU VERIFICACION.

- SE CONTINUA CON LA HABILITACION DE ENCOFRADO PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

ASIENTO N° 17 DEL SUPERVISOR

12/12/19

- AL RESPECTO DE LAS CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ESTAS NO DEBERAN DE Prolongarse por mas del tiempo previsto

- SE PUDO VERIFICAR LA EXISTENCIA DE ROCA TRAZADA LA CUAL SE ESTO EXCAVANDO HASTA LLEGAR A LA PROFUNDIDAD ESTABLECIDA.

- SE REITERA PREVER LO DESCRITO EN EL ASIENTO N° 25 DEL SUPERVISOR

IMELEC S.R.L.
INSPECTOR
OSVALDO J. CÁRDENAS VINCHA
GERENTE GENERAL

RESIDENTE

SUPERVISOR

Grafresca

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
UBICACION: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 18 DEL RESIDENTE 13/12/2019

EL DIA DE HOY SE INICIA CON LOS TRABAJOS, CON LAS CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).

SE SOLICITA A LA SUPERVISION LA VERIFICACION Y APROBACION DE LOS NIVELES DE EXCAVACION EN ZAPATAS PARA PROCEDER A LA COLOCACION DEL ENROSCADO DE BARRAS DE 10" Y EL VACIADO DEL SOLADO YA QUE SE TIENE PROGRAMADO REALIZAR EL ENROSCADO EL DIA SABADO 14/12/2019, ASIMISMO EL DIA VIERNES 16/12/2019 SE PROGRAMO EL VACIADO DEL SOLADO EN ZAPATAS. A LA VEZ SE COMUNICA A LA SUPERVISION QUE EL DIA MARTES 17/12/2019 SE TIENE PROGRAMADO LA COLOCACION DEL ACERO EN ZAPATAS AL MISMO TIEMPO EL HIZADO DEL ACERO EN COLUMNAS.

RENZO R. GUERRA
INGENIERO CIVIL
CIP 10000

FRANCISCO R. FLORES
INGENIERO CIVIL
CIP 96570

ASIENTO N° 19 DEL SUPERVISOR. 13/12/19

AL RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL RESIDENTE ES QUE SE VERIFICO LOS NIVELES DE EXCAVACION SEGUN EXP. TECNICO LOS MISMOS QUE CUMPLEN. POR LO QUE SE PUEDE CONTINUAR CON LAS PARTIDAS VINCULANTES A DICHA PARTIDA SEGUN LO PROGRAMADO POR EL RESIDENTE PARA LO CUAL SE RECOMIENDA QUE SE RESPETE EL EXP. TECNICO. EN TODOS SUS EXTREMOS. ASI MISMO SE INDICA QUE YA COMIENCEN CON LA VALORIZACION

IMELEC S.R.L.
INSPECTOR
OSVALDO J. CARDENAS VINCHA
GERENTE GENERAL

IMELEC S.R.L.
FRANCISCO R. FLORES
ING. RESIDENTE
CIP 96570

SUPERVISOR
Grafiresa

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 20 DEL RESIDENTE 14/12/2019

EL DIA DE HOY SE INICIA CON LOS TRABAJOS y CON LAS CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).

SE DESA CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY SE PROCEDE CON LA EJECUCION DE LA PARTIDA MEJORAMIENTO DEL TERRENO CON PIEDRA GRANDE EN LAS ZARZAS.

SE CONTINUA CON LAS TRABAJOS DE HABILITACION DE ACERO Y HABILITACION DE ENCOFRADO PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

.....
RESIDENTE
IMELEC S.R.L.

.....
SUPERVISOR
FRANCISCO RAMOS FLORES
ING. EN INGENIERIA CIVIL
C. 10000

ASIENTO N° 21 DEL SUPERVISOR 19/12/19.

- Respecto a la partida mencionada es necesario verificar los niveles de forma. Rapida para su intervencion.
- Respecto al acero este debera desahullarse segun el exp. tecnico y aspectos necesarios de estructuracion que el residente controle
- Asi mismo tomar en cuenta los asientos N° 03 y 09 de la esfera.

IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS FLORES
ING. EN INGENIERIA CIVIL
C. 10000
RESIDENTE

SUPERVISOR

Grafiresa

IMELEC S.R.L.
OSVALDO CARDENAS VINCHA
GERENTE GENERAL

PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

PLANILLA DE VALORIZACION

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

CONTRATISTA : IMELEC S.R.L.



SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA



IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente en Obra
CIP 96570

SAMA - TACNA
REGION TACNA



VALORIZACION DE OBRA N° 01 - DICIEMBRE 2019


DEL 04 AL 15 DE DICIEMBRE 2019

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL, EN EL CENTRO AGUJOLA MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : IMELEC S.R.L.
 RESIDENTE : ING. FRANCISCO RAMOS FLORES
 SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

MONTO CONTRATADO : S/ 796.581,29 (CON IGV)
 MONTO CONTRATADO : S/ 675.068,89 (SIN IGV)
 FECHA PTO. BASE : JUNIO - 2019

Item	Und	Descripción	ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
			Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%
01		OBRA PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD								
01.01	und	INSTALACIONES PROVISIONALES	34.754,39		9.432,82	27,54%	9.432,82	27,54%	24.821,57	72,46%
01.01.01	und	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA	18.441,89		5.014,17	27,18%	5.014,17	27,18%	13.427,72	72,82%
01.01.02	m2	CASETA PARA RESIDENCIA Y SUPERVISION	4.008,57		818,42	100,00%	818,42	100,00%	0,00	0,00%
01.01.03	m2	VESTIDORES PARA PERSONAL OBRERO	1.888,60		2.003,76	50,01%	2.003,76	50,01%	2.022,81	49,99%
01.01.04	m	SSH PROVISIONALES	1.500,00		3,00	0,20%	3,00	0,20%	1.497,00	100,00%
01.01.05	m	CERCO DE OBRA CON TRONCOS DE MADERA Y MALLA ARPILLERA	2.343,98		1.171,99	50,00%	1.171,99	50,00%	1.171,99	100,00%
01.01.06	m3	AGUA PARA LA OBRA	900,00		120,00	13,33%	120,00	13,33%	780,00	86,67%
01.01.07	m3	ENERGIA PARA LA OBRA	2.100,00		0,40	0,02%	0,40	0,02%	2.099,60	100,00%
01.01.08	m2	CASETA DE GUARDANIA	378,32		600,00	20,00%	600,00	20,00%	2.183,32	100,00%
01.01.09	glb	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	4.500,00		600,00	13,33%	600,00	13,33%	3.900,00	86,67%
01.02	m3	TRABAJOS PRELIMINARES	1.500,00		3.818,85	33,76%	3.818,85	33,76%	7.195,85	66,24%
01.02.01	m3	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA INICIAL Y DURANTE EL PROCESO	1.500,00		600,00	40,00%	600,00	40,00%	900,00	60,00%
01.03	glb	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	11.509,50		800,00	6,95%	800,00	6,95%	10.709,50	93,05%
01.03.01	glb	IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.000,00		1.500,00	50,00%	1.500,00	50,00%	1.500,00	50,00%
01.03.02	glb	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	3.800,50		1.146,15	30,00%	1.146,15	30,00%	2.654,35	70,00%
01.03.03	glb	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	680,00		300,00	44,12%	300,00	44,12%	380,00	55,88%
01.03.04	glb	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	1.419,00		709,50	50,00%	709,50	50,00%	709,50	100,00%
01.03.05	glb	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	1.000,00		100,00	10,00%	100,00	10,00%	900,00	90,00%
01.03.06	glb	RECURSOS PARA EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	1.400,00		1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%	0,00	0,00%
02		ESTRUCTURAS								
02.01	m3	MOVIMIENTO DE TIERRAS	228.593,93		17.142,50	7,50%	17.142,50	7,50%	211.451,43	92,50%
02.01.01	m3	EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA EN TERRENO SUELTO	50.271,92		8.491,22	16,91%	8.491,22	16,91%	41.780,70	83,09%
02.01.02	m3	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SUB-ZAPATAS H=0,50 M TERRENO SUELTO	7.762,87		7.762,87	100,00%	7.762,87	100,00%	0,00	0,00%
02.01.03	m3	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMENTO CORRIDO HASTA 1,00 M TERRENO SUELTO	728,35		728,35	100,00%	728,35	100,00%	0,00	0,00%
02.01.04	m3	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D=1KM	1.056,35		1.056,35	100,00%	1.056,35	100,00%	0,00	0,00%
02.01.05	m3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO NIVELADO Y COMPACTADO	28.159,41		30,39	0,11%	30,39	0,11%	28.129,02	100,00%
02.01.06	m2	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRA GRANDE > 10" H=0,30M	10.520,07		56,42	0,53%	56,42	0,53%	10.463,65	100,00%
02.02		CONCRETO SIMPLE								
02.02.01	m3	CONCRETO EN CIMENTO CORRIDO 1:10-30% P.G.	10.311,13		9.303,63	90,23%	9.303,63	90,23%	1.007,50	100,00%
02.02.02	m3	CONCRETO EN CIMENTO CORRIDO EN CIMENTO CORRIDO	5.948,89		5.948,89	100,00%	5.948,89	100,00%	0,00	0,00%
02.02.03	m3	SUB ZAPATA CON CONCRETO Fc = 175kg/cm² INC. PIEDRA GRANDE > 10" H=0,40m	4.105,54		4.105,54	100,00%	4.105,54	100,00%	0,00	0,00%
02.02.04	m2	FALSO PISO CONCRETO Fc = 140kg/cm² H=4"	9.303,63		317,53	3,41%	317,53	3,41%	8.986,10	100,00%
02.02.05	m2	CONCRETO EN VEREDAS Fc = 175kg/cm² DE H=6" ACABADO FROTACHADO Y BRUJADO	5.154,22		29,51	0,57%	29,51	0,57%	5.124,71	100,00%
02.02.06	m2	CONCRETO EN VEREDAS Fc = 175kg/cm² DE H=6" ACABADO FROTACHADO Y BRUJADO	4.846,91		67,77	1,40%	67,77	1,40%	4.779,14	100,00%
02.02.07	m2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	680,85		38,31	5,63%	38,31	5,63%	642,54	100,00%
02.02.08	m2	SOLADO PARA VIGA DE CIMENTACION CA 1:10 INC. PIEDRA GRANDE 4" H=0,15M	284,39		32,71	11,51%	32,71	11,51%	251,68	100,00%
02.03		CONCRETO ARMADO								
02.03.01	m3	SOBRECIMENTOS	82.655,82		8.651,28	10,47%	8.651,28	10,47%	74.004,54	89,53%
02.03.01.01	m3	SOBRECIMIENTO CONCRETO Fc=140 kg/cm2	13.454,36		1.125,60	8,37%	1.125,60	8,37%	12.328,76	91,63%
02.03.01.02	m2	SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	5.183,13		6.098,88	117,71%	6.098,88	117,71%	0,00	0,00%
02.03.01.03	m2	SOBRECIMIENTO ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2, GRADO 60	41,80		4,28	10,24%	4,28	10,24%	37,52	100,00%
02.03.02	kg	ZAPATAS	2.251,24		30,99	1,38%	30,99	1,38%	2.220,25	100,00%
02.03.02.01	kg	ZAPATAS	22.512,29		1.768,37	7,85%	1.768,37	7,85%	20.743,92	92,15%

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871





VALORIZACION DE OBRA N° 01 - DICIEMBRE 2019
DEL 04 AL 15 DE DICIEMBRE 2019

CÉBIA : *CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL, EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA*
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : IMELEC S.R.L.
 RESIDENTE : ING. FRANCISCO RAMOS FLORES
 SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

MONTO CONTRATADO : SI. 796.381,29 (CON IGV)
 MONTO CONTRATADO : SI. 675.068,89 (SIN IGV)
 FECHA PTO. BASE : JUNIO - 2019

Item	Descripción	Und	Metrado	Precio (\$)	Partida (\$)	ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
						Metrado	SI	%	Metrado	SI	%	Metrado	SI	%	Metrado	SI	%	
02.03.02.01	ZAPATAS: CONCRETO f'e=210 kg/cm2	m3	37,18	343,74	12,780,25													
02.03.02.02	ZAPATAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	92,40	67,05	6,195,42													
02.03.02.03	ZAPATAS: ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2, GRADO 60	kg	828,31	4,28	3,538,61													
02.03.03	COLUMNAS				13,874,23													
02.03.03.01	COLUMNAS: CONCRETO f'e=210 kg/cm2	m3	7,35	471,82	3,487,68													
02.03.03.02	COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	80,22	60,15	4,825,23													
02.03.03.03	COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2, GRADO 60	kg	1,304,00	4,28	5,581,12													
02.03.04	VIGAS				10,606,02													
02.03.04.01	VIGAS: CONCRETO f'e=210 kg/cm2	m3	7,39	371,05	2,742,06													
02.03.04.02	VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	66,88	60,15	4,021,63													
02.03.04.03	VIGAS: ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2, GRADO 60	kg	887,74	4,28	3,842,33													
02.03.05	VIGA DE CONEXION				9,500,67													
02.03.05.01	VIGA DE CONEXION: CONCRETO f'e=210 kg/cm2	m3	7,40	382,64	2,883,54													
02.03.05.02	VIGA DE CONEXION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	59,20	50,25	2,874,80													
02.03.05.03	VIGA DE CONEXION: ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2, GRADO 60	kg	887,74	4,28	3,842,33													
02.03.06	VIGUETA				1,192,46													
02.03.06.01	VIGUETA: CONCRETO f'e=210 kg/cm2	m3	2,66	371,05	986,69													
02.03.06.02	VIGUETA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	35,69	60,15	2,164,60													
02.03.06.03	VIGUETA: ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2, GRADO 60	kg	313,24	4,28	1,340,67													
02.03.07	COLUMNETA				1,983,63													
02.03.07.01	COLUMNETA: CONCRETO f'e=210 kg/cm2	m3	1,93	471,82	910,61													
02.03.07.02	COLUMNETA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	43,56	60,15	2,620,13													
02.03.07.03	COLUMNETA: ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2, GRADO 60	kg	339,48	4,28	1,452,89													
02.03.08	DINTEL				410,91													
02.03.08.01	DINTEL: CONCRETO f'e=210 kg/cm2	m3	0,20	348,58	69,72													
02.03.08.02	DINTEL: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	4,49	60,15	270,07													
02.03.08.03	DINTEL: ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2, GRADO 60	kg	21,28	4,28	91,12													
02.03.09	LOSA DE PATIO CENTRAL				2,574,37													
02.03.09.01	LOSA DE PATIO CENTRAL: CONCRETO f'e=210 kg/cm2	m3	4,64	352,25	1,634,44													
02.03.09.02	LOSA DE PATIO CENTRAL: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	4,50	67,05	301,73													
02.03.09.03	LOSA DE PATIO CENTRAL: ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2, GRADO 60	kg	149,16	4,28	638,40													
02.03.10	SOPORTE DE ENCIMERA				2,26,79													
02.03.10.01	SOPORTE DE ENCIMERA: CONCRETO f'e=210 kg/cm2	m3	0,15	471,82	70,77													
02.03.10.02	SOPORTE DE ENCIMERA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1,54	60,15	92,63													
02.03.10.03	SOPORTE DE ENCIMERA: ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2, GRADO 60	kg	14,81	4,28	63,39													
02.04	ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURA				63,83													
02.04.01	ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE TECHO				42,961,00													
02.04.01.01	TUBERAL METALICO TIPO CERCHA EN ACERO RECTANGULAR LAC TIPO I	und	6,00	1,850,00	11,100,00													
02.04.01.02	TUBERAL METALICO TIPO CERCHA EN ACERO RECTANGULAR LAC TIPO II	und	8,00	950,00	7,600,00													
02.04.01.03	TUBERAL METALICO TIPO CERCHA EN ACERO RECTANGULAR LAC TIPO III	und	4,00	600,00	2,400,00													
02.04.01.04	CORREAS METALICAS DE ACERO RECTANGULAR LAC	m	415,24	25,00	10,381,00													
02.04.01.05	APOYO METALICO TIPO 01 S/DISEÑO	und	16,00	485,00	7,820,00													
02.04.01.06	APOYO METALICO TIPO 02 S/DISEÑO	und	8,00	445,00	3,560,00													
02.04.02	COBERTURA LIVIANA				27,143,79													

IMELEC S.R.L.
 RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 C.P. 202574

VALORIZACION DE OBRA N° 01 - DICIEMBRE 2019

DEL 04 AL 15 DE DICIEMBRE 2019

OBRAS : CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL, EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA.
 PROYECTARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : IMELEC S.R.L.
 RESIDENTE : ING. FRANCISCO RAMOS FLORES
 SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA


MONTO CONTRATADO : S/ 796,981.29 (CON IGV)
 MONTO CONTRATADO : S/ 675,068.89 (SIN IGV)
 FECHA PTO. BASE : JUNIO - 2019

Item	Descripción	Und	Medido	Precio (\$)	Parcial (\$)	ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
						Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%
02.04.02.01	COBERTURA DE ACERO LAMINADO TIPO "T" E= 0.4MM	m2	296.62	88.00	20,170.16							296.62	20,170.16
02.04.02.02	CUMBRERA DE ACERO LAMINADO	m	12.24	35.00	428.40							12.24	428.40
02.04.02.03	LIMATESA DE ACERO LAMINADO	m	52.72	35.00	1,845.20							52.72	1,845.20
03	ARQUITECTURA				187,898.63								187,898.63
03.01	MUROS Y TABIQUE S DE ALBAÑILERIA				42,713.20								42,713.20
03.01.01	MURO DE LADRILLO MECANIZADO KK CABEZA 9x13x24 cm; CA 1.4 E=1.5 cm	m2	121.58	140	17,021.20							121.58	17,021.20
03.01.02	MURO DE LADRILLO MECANIZADO KK SOGA 9x13x24 cm; CA 1.4 E=1.5 cm	m2	189.90	80	15,192.00							189.90	15,192.00
03.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				46,791.27								46,791.27
03.02.01	TARRAJEO RAYADO PRIMARIO	m2	113.15	23.42	2,649.97							113.15	2,649.97
03.02.02	TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN INTERIORES, E=1.5CM CA 1.4	m2	538.16	28.63	14,331.20							538.16	14,331.20
03.02.03	TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN EXTERIORES, E=1.5CM CA 1.4	m2	157.34	31.17	4,904.28							157.34	4,904.28
03.02.04	TARRAJEO ESCARCHADO IMPERMEABILIZADO, E=1.5CM CA 1.4	m2	21.60	36.73	793.37							21.60	793.37
03.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES IMPERMEABILIZADO E= 0.25m	m	134.60	20.3	2,736.44							134.60	2,736.44
03.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES IMPERMEABILIZADO E= 0.15m	m	52.80	16.58	875.85							52.80	875.85
03.03	CIELORRASOS				13,676.80								13,676.80
03.03.01	CIELORRASO SUSPENDIDO EN INTERIORES CON PERFILES DE A.G. Y PLANCHA DE FIBRO-CEMENTO DE 6MM	m2	172.36	60	10,341.60							172.36	10,341.60
03.03.02	CIELORRASO SUSPENDIDO EN ALERO EXTERIOR CON PERFILES DE A.G. Y PLANCHA DE FIBRO-CEMENTO 6MM	m2	76.21	70	5,334.70							76.21	5,334.70
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS				11,779.13								11,779.13
03.04.01	PISOS				11,779.13								11,779.13
03.04.01.01	PISO PORCELANATO GRESS MARMOLIZADO BEIGE MATE 60x60 CM	m2	93.08	58	5,386.64							93.08	5,386.64
03.04.01.02	PISO PORCELANATO GRESS RUSTICO/CONCRETO PLATA OSCURO MATE 60x60 CM	m2	65.88	58	3,809.44							65.88	3,809.44
03.04.01.03	PISO PORCELANATO GRESS RUSTICO/CONCRETO PLOMO OSCURO MATE 60x60 CM	m2	17.52	58	1,016.16							17.52	1,016.16
03.04.01.04	PISO PORCELANATO GRESS TIPO PIEDRA RUGOSO PLOMO OSCURO MATE 60x60 CM	m2	10.08	60	604.80							10.08	604.80
03.04.01.05	PISO PORCELANATO GRESS TIPO PIEDRA RUGOSO MARRON MATE 60x60 CM	m2	10.08	60	604.80							10.08	604.80
03.04.01.06	PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO EN PATIO CENTRAL	m2	10.74	32.15	345.28							10.74	345.28
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				3,178.49								3,178.49
03.05.01	ZOCALOS				3,178.49								3,178.49
03.05.01.01	ZOCALO PORCELANATO GRESS RUSTICO/CONCRETO PLOMO OSCURO MATE 60x60 CM	m2	65.80	51	3,345.60							65.80	3,345.60
03.05.01.02	ZOCALO PIEDRA LAJA NATURAL APAREJO IRREGULAR	m2	26.18	75.5	1,978.59							26.18	1,978.59
03.05.02	CONTRAZOCALOS				1,136.30								1,136.30
03.05.02.01	CONTRAZOCALO PORCELANATO GRESS MARMOLIZADO BEIGE MATE 80x9 CM OSCURO MATE 60x60 CM	m	114.40	19.28	2,203.34							114.40	2,203.34
03.05.02.02	CONTRAZOCALO PORCELANATO GRESS RUSTICO/CONCRETO PLATA OSCURO MATE 60x60 CM	m	62.55	19.28	1,204.71							62.55	1,204.71
03.05.02.03	CONTRAZOCALO PIEDRA LAJA NATURAL APAREJO IRREGULAR H=9 CM	m	38.85	19.28	748.25							38.85	748.25
03.06	CARPINTERIA DE MADERA				43,133.27								43,133.27
03.06.01	PUERTAS				15,309.00								15,309.00
03.06.01.01	PUERTA PZ DE MADERA AGUARU TABLERO REBAJADO SIMODELO INC. MARRON	und	2.00	2500	5,000.00							2	5,000.00
03.06.01.02	PUERTA PZ DE MADERA AGUARU CONTRAPUNZADA SIMODELO INC. MARRON	und	10.00	750	7,500.00							10	7,500.00
03.06.01.03	PUERTA PZ DE MADERA AGUARU CONTRAPUNZADA SIMODELO INC. MARRON	und	4.00	700	2,800.00							4	2,800.00
03.06.02	CLOSET Y REPOSTEROS				24,333.27								24,333.27
03.06.02.01	CLOSET MELAMINE SIMODELO INC. CERRAJERIA Y ACCESORIOS	m2	51.30	350	17,955.00							51.30	17,955.00
03.06.02.02	MUEBLERIA ALTA Y BAJA DE MELAMINE SIMODELO INC. CERRAJERIA Y ACCESORIOS	m	4.40	1,198.88	5,279.47							4.40	5,279.47
03.06.02.03	MESON DE GRANITO GRIS EN COCINA Y SS.HH.	m2	3.87	278.76	1,078.80							3.87	1,078.80

IMELEC S.R.L.
 RUC 20507001000
 Dpto. Tacna
 Calle 10 de Agosto 1000
 Tacna, Perú

IMELEC S.R.L.
 RUC 20507001000
 Dpto. Tacna
 Calle 10 de Agosto 1000
 Tacna, Perú

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CP 82271



VALORIZACION DE OBRA N° 01 - DICIEMBRE 2019 DEL 04 AL 15 DE DICIEMBRE 2019

OBRA : *CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO AGUJOLA MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA*
 PROFESARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : IMELEC S.R.L.
 RESIDENTE : ING. FRANCISCO RAMOS FLORES
 SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

MONTO CONTRATADO : (CON IGTV)
 S/ 796.581,29
 MONTO CONTRATADO : (SIN IGTV)
 S/ 675.068,89
 FECHA PTO. BASE : JUNIO - 2019

Item	Descripción	Und	Metrado	Precio (S/)	Parcial (S/)	ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
						Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%
03.06.03	PERGOLA DECORATIVA				3.500,00							3.500,00	100,00%
03.06.03.01	PERGOLA DE MADERA SEGUN DISEÑO INC. CARTELAS Y CAJUELAS METALICAS DE SUJECION	gls	1,00	3.500,00	3.500,00							3.500,00	100,00%
03.07	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				5.211,30							5.211,30	100,00%
03.07.01	VENTANAS DE ALUMINIO				5.093,08							5.093,08	100,00%
03.07.01.01	VENTANA TIPO V1 S/DISEÑO DE 1 20x1 60 M	und	18,00	228,53	4.131,54							4.131,54	100,00%
03.07.01.02	VENTANA TIPO V2 S/DISEÑO DE 1 00x2 40 M	und	2,00	297,87	595,74							595,74	100,00%
03.07.01.03	VENTANA TIPO V3 S/DISEÑO DE 0 70x0 50 M	und	4,00	91,45	365,80							365,80	100,00%
03.07.02	POSTES METALICOS				638,22							638,22	100,00%
03.07.02.01	POSTE DE ACERO LAC D=4" S/DISEÑO PARA ALUMBRADO EN PATIO CENTRAL	und	2,00	319,11	638,22							638,22	100,00%
03.08	CERRAJERIA				2.140,67							2.140,67	100,00%
03.08.01	BISAGRAS				829,94							829,94	100,00%
03.08.01.01	BISAGRA CAPUCHINAS DE ALUMINIO 4"x4"	und	6,00	19,24	115,44							115,44	100,00%
03.08.01.02	BISAGRA CAPUCHINAS DE ALUMINIO 3"x3"	und	42,00	17	714,00							714,00	100,00%
03.08.02	CERRADURAS				1.301,18							1.301,18	100,00%
03.08.02.01	CERRADURA INTERIOR DE PERILLA TIPO BOLA	und	14,00	78,04	1.092,56							1.092,56	100,00%
03.08.02.02	CERRADURA EXTERIOR DE SOBREPONER DE TRES GOLPES	und	2,00	104,31	208,62							208,62	100,00%
03.09	VIDRIOS CRISTALES O SIMILARES				4.876,94							4.876,94	100,00%
03.09.01	VIDRIO SISTEMA MODUGLAS 6MM INC. ACCESORIOS	m ²	40,76	87,84	3.584,43							3.584,43	100,00%
03.09.02	VIDRIO SISTEMA MODUGLAS 8MM INC. ACCESORIOS	m ²	4,84	116,65	564,59							564,59	100,00%
03.09.03	ESPEJO BORDE BISELADO 0 80x1 35 M	m ²	4,32	177,76	767,92							767,92	100,00%
03.10	PINTURA				21.713,75							21.713,75	100,00%
03.10.01	PASTA MURAL EN INTERIORES INC. BASE IMPRIMANTE	m ²	580,15	27	15.724,05							15.724,05	100,00%
03.10.02	PINTURA LATEX SATINADA EN INTERIORES PRIMERA CALIDAD	m ²	580,15	13	7.281,85							7.281,85	100,00%
03.10.03	PINTURA LATEX MATE EN EXTERIORES PRIMERA CALIDAD	m ²	153,85	15	2.307,75							2.307,75	100,00%
03.11	VARIOS				6.251,47							6.251,47	100,00%
03.11.01	JUNTA CON MORTERO ASFALTICO EN VEREDAS	m	19,20	10,08	193,54							193,54	100,00%
03.11.02	JUNTA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1/2" Y SELLO ELASTOMERICO	m	20,00	25,59	511,80							511,80	100,00%
03.11.03	FLETE TERRESTRE	gls	1,00	5.000,00	5.000,00							5.000,00	100,00%
03.11.04	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	gls	1,00	1.148,07	1.148,07							1.148,07	100,00%
04	INSTALACIONES SANITARIAS				10.738,69							10.738,69	100,00%
04.01	SUBDISTRIBUCION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				5.245,31							5.245,31	100,00%
04.01.01	OVALIN REDONDO DE LOZA VITRIFICADA BLANCO INC. ACCESORIOS	und	4,00	414,51	1.658,04							1.658,04	100,00%
04.01.02	INODORO TIPO ONE PIECE DE LOZA VITRIFICADA BLANCO INC. ACCESORIOS	und	4,00	478,14	1.912,56							1.912,56	100,00%
04.01.03	URINARIO ESTANDAR DE LOZA VITRIFICADA BLANCO INC. ACCESORIOS	und	1,00	338,22	338,22							338,22	100,00%
04.01.04	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA SOLA POZA INC. ACCESORIOS	und	1,00	376,36	376,36							376,36	100,00%
04.01.05	LAVADERO DE ROPA DE GRANITO DE DOBLE POZA INC. ACCESORIOS	und	1,00	328,05	328,05							328,05	100,00%
04.01.06	DUCHA ELECTRICA DE CARBON	und	4,00	158,27	633,08							633,08	100,00%
04.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				1.998,56							1.998,56	100,00%
04.02.01	SAUIDA DE AGUA FRIA	plb	17,00	72,84	1.238,28							1.238,28	100,00%
04.02.02	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC-SAP C10 C/R Ø 3/4"	m	55,87	22,5	1.257,06							1.257,06	100,00%
04.02.03	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP C10 C/R Ø 1/2"	m	43,54	21,14	920,44							920,44	100,00%
04.02.04	CODO PVC-SAP C10 C/R Ø 3/4" x 90°	und	10,00	19,3	193,00							193,00	100,00%
04.02.05	TEE PVC-SAP C10 C/R Ø 3/4" x 90°	und	4,00	10,06	40,24							40,24	100,00%
04.02.06	REDUCCION (BUSHING) PVC-SAP C10 C/R DE 3/4" a 1/2"	und	9,00	8,36	75,24							75,24	100,00%
04.02.07	CODO PVC-SAP C10 C/R Ø 1/2" x 90°	und	36,00	8,02	288,72							288,72	100,00%

IMELEC S.R.L.
 OSVALDO TORO GARDENAS VINCHA
 GERENTE GENERAL

IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 88271

VALORIZACION DE OBRA N° 01 - DICIEMBRE 2019
DEL 04 AL 15 DE DICIEMBRE 2019

CEFA : *CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA*
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : IMELEC S.R.L.
 RESIDENTE : ING. FRANCISCO RAMOS FLORES
 SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA


MONTO CONTRATADO : SI. 796.561,29 (CONIGV)
 MONTO CONTRATADO : SI. 675.068,89 (SINIGV)
 FECHA PTO. BASE : JUNIO - 2019

Item	Descripción	Und.	Medrado	Precio (S/.)	Período (S/.)	ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR		
						Medrado	%	Medrado	%	Medrado	%	Medrado	%	
04.02.08	TEE PVC-SAP C10 C/R Ø 1/2" x 90"	und	8,00	9,21	73,68							8	73,68	100,00%
04.02.09	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 3/4"	und	4,00	71,18	284,72							4	284,72	100,00%
04.02.10	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 1/2"	und	4,00	64,32	257,28							4	257,28	100,00%
04.02.11	CAJA O NICHOS DE MADERA PARA VALVULAS INC. TAPA METALICA	und	3,00	30	90,00							3	90,00	100,00%
04.02.12	PRUEBA HIDROSTATICA Y PUESTA EN SERVICIO	gib	1,00	283,28	283,28							1	283,28	100,00%
04.03	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION				11.332,27								11.332,27	100,00%
04.03.01	SALIDA DE DESAGUE DE 4"	plo	8,00	118,9	951,20							8	951,20	100,00%
04.03.02	SALIDA DE DESAGUE DE 2"	plo	15,00	90,32	1.354,80							15	1.354,80	100,00%
04.03.03	SALIDA VENTILACION DE 2"	plo	4,00	90,32	361,28							4	361,28	100,00%
04.03.04	RED DE DISTRIBUCION DE DESAGUE PVC-SAL 4"	m	19,50	71,33	1.390,94							19,5	1.390,94	100,00%
04.03.05	RED DE DISTRIBUCION DE DESAGUE PVC-SAL 2"	m	27,33	42,15	1.151,96							27,33	1.151,96	100,00%
04.03.06	RED DE VENTILACION PVC-SAL 2"	m	8,30	42,15	348,85							8,3	348,85	100,00%
04.03.07	RED COLECTORA DE DESAGUE PVC-SAL 4"	m	17,52	71,33	1.249,70							17,52	1.249,70	100,00%
04.03.08	CODO PVC-SAL DE 4"x60"	und	5,00	46,4	232,00							5	232,00	100,00%
04.03.09	CODO PVC-SAL DE 4"x45"	und	4,00	45,55	182,20							4	182,20	100,00%
04.03.10	CODO PVC-SAL SANITARIO DE 4" SALIDA LATERAL 2"	und	4,00	48,44	193,76							4	193,76	100,00%
04.03.11	CODO PVC-SAL DE 2"x80"	und	22,00	29,18	641,96							22	641,96	100,00%
04.03.12	CODO PVC-SAL DE 2"x45"	und	7,00	28,93	202,51							7	202,51	100,00%
04.03.13	YEE PVC-SAL DE 4"x2"	und	21,00	38,77	814,17							21	814,17	100,00%
04.03.14	TRAMPA "P" PVC 2"	und	9,00	43,08	387,72							9	387,72	100,00%
04.03.15	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und	5,00	36,06	180,30							5	180,30	100,00%
04.03.16	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"	und	5,00	61,48	307,40							5	307,40	100,00%
04.03.17	SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL 2"	und	4,00	11,23	44,92							4	44,92	100,00%
04.03.18	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 12"x24" INC. TAPA DE CONCRETO ARMADO	und	6,00	172,82	1.036,92							6	1.036,92	100,00%
04.03.19	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	gib	1,00	288,88	288,88							1	288,88	100,00%
04.04	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE				11.876,67								11.876,67	100,00%
04.04.01	TANQUE DOMESTICO DE POLIETILENO DE 2500L	und	1,00	1.116,67	1.116,67							1	1.116,67	100,00%
04.04.02	ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE TANQUE ELEVADO S/DISEÑO	gib	1,00	10.500,00	10.500,00							1	10.500,00	100,00%
04.05	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS				7.604,88								7.604,88	100,00%
04.05.01	SUM. E INST. DE TANQUE SEPTICO DE POLIETILENO (BIOGESTOR)	und	1,00	5.200,00	5.200,00							1	5.200,00	100,00%
04.05.02	RED COLECTORA DE AGUA RESIDUAL PVC-SAL DE 4"	m	10,54	70,84	743,48							10,54	743,48	100,00%
04.05.03	SALIDA PARA EXTRACCION DE LODOS CON TUBERIA PVC-SAL 2"	m	2,00	41,43	82,86							2	82,86	100,00%
04.05.04	CAJA DE CONCRETO DE 24"x24" INC. TAPA DE C/A PARA REPARTIR CAUDALES	und	1,00	252,82	252,82							1	252,82	100,00%
04.05.05	CAJA DE CONCRETO DE 37"x37" INC. TAPA DE C/A PARA EXTRACCION DE LODOS	und	1,00	390	390,00							1	390,00	100,00%
04.05.06	IMPLEMENTACION DE ZANJA DE INFILTRACION S/DISEÑO	gib	1,00	935,71	935,71							1	935,71	100,00%
05	INSTALACIONES ELECTRICAS				57.861,75								57.861,75	100,00%
05.01	SALIDAS DE INSTALACIONES				11.797,04								11.797,04	100,00%
05.01.01	SALIDA CENTRO DE LUZ	plo	58,00	75,87	4.398,66							58	4.398,66	100,00%
05.01.02	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	plo	57,00	110,84	6.317,68							57	6.317,68	100,00%
05.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	plo	20,00	98,84	1.976,80							20	1.976,80	100,00%
05.01.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	plo	2,00	103,21	206,42							2	206,42	100,00%
05.01.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE	plo	4,00	101,52	406,08							4	406,08	100,00%
05.02	CANALIZACIONES CONDUCTOS O TUBERIAS				6.178,14								6.178,14	100,00%
05.02.01	TUBERIA ELECTRICA PVC-SAP Ø=50 MM	m	108,00	13,98	1.489,84							108	1.489,84	100,00%
05.02.02	TUBERIA ELECTRICA PVC-SAP Ø=20 MM	m	960,00	8,92	4.995,20							960	4.995,20	100,00%

IMELEC S.R.L.
 CARRILLO / CALLES VINCENSA
 CARENTA GENERAL

[Handwritten signature and scribbles]

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 C.P. 83371



VALORIZACION DE OBRA N° 01 - DICIEMBRE 2019

DEL 04 AL 15 DE DICIEMBRE 2019

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO AGUÍCOLA MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA.
PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONTRATISTA : IMELEC S.R.L.
RESIDENTE : ING. FRANCISCO RAMOS FLORES
SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

MONTO CONTRATADO: S/ 786.981,29 (CON IGV)
MONTO CONTRATADO: S/ 675.068,89 (SIN IGV)
FECHA PTO. BASE : JUNIO - 2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/)	Parcial (S/)	ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
						Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%
05.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS				16.233,49							16.233,49	100,00%
05.03.01	CABLE 2.5MM2 NH-80	m	1.002,00	7,32	7.334,64							7.334,64	100,00%
05.03.02	CABLE 4MM2 NH-80	m	695,00	7,91	5.497,45							5.497,45	100,00%
05.03.03	CABLE 6MM2 NH-80	m	50,00	9,33	466,50							466,50	100,00%
05.03.04	CABLE 10MM2 NH-80	m	270,00	10,87	2.934,90							2.934,90	100,00%
05.04	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN				1.786,98							1.786,98	100,00%
05.04.01	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EMPOTRABLE (30 POLOS RIEL DIN)	gib	2,00	633,49	1.266,98							1.266,98	100,00%
05.05	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN				3.179,37							3.179,37	100,00%
05.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16A	und	12,00	261	313,20							313,20	100,00%
05.05.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A	und	11,00	261	287,10							287,10	100,00%
05.05.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X20A	und	2,00	80,51	161,02							161,02	100,00%
05.05.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X30A	und	2,00	110,1	220,20							220,20	100,00%
05.05.05	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A	und	20,00	80,42	1.608,40							1.608,40	100,00%
05.05.06	INTERRUPTOR HORARIO CONTACTOR	und	5,00	177,88	889,40							889,40	100,00%
05.06	EQUIPOS DE ILUMINACIÓN				10.974,37							10.974,37	100,00%
05.06.01	LUMINARIA HERMETICA P/ADOSAR LED 1x38W, IP 65, DE 1280X101X101 MM	und	28,00	188,84	5.287,52							5.287,52	100,00%
05.06.02	LUMINARIA LED PARA ADOSAR EN TECHO 20W, ESPECIFICACION	und	28,00	123,26	3.451,28							3.451,28	100,00%
05.06.03	LUMINARIA DECORATIVA LED 1X100W PARA POSTE EXTERIOR DE 4" IP 65	und	2,00	303,42	606,84							606,84	100,00%
05.06.04	LUZ DE EMERGENCIA LED DE 7.5W	und	7,00	98,89	678,93							678,93	100,00%
05.07	CAJAS DE PASE				572,70							572,70	100,00%
05.07.01	CAJA DE PASE DE POLYESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 8x8x4"	und	10,00	52,22	522,20							522,20	100,00%
05.08	PRUEBAS Y OTROS				9.955,07							9.955,07	100,00%
05.08.01	IMPLEMENTACION INTEGRAL DE POZOA TIERRA VERTICAL	gib	1,00	1.560,53	1.560,53							1.560,53	100,00%
05.08.02	BUZONETAS DE C.A. DE 60x60x80 CM INC. TAPA	und	5,00	800	4.000,00							4.000,00	100,00%
05.08.03	PRUEBAS ELECTRICAS SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICADO	und	1,00	1.004,48	1.004,48							1.004,48	100,00%
COSTO DIRECTO DE OBRA					544.410,38							544.410,38	
GASTOS GENERALES					103.437,97							103.437,97	
UTILIDAD					27.220,53							27.220,53	
SUB TOTAL					675.068,89							675.068,89	
IGV					121.512,40							121.512,40	
TOTAL DEL PRESUPUESTO					796.581,29							796.581,29	
					26.576,32							26.576,32	
					5.049,31							5.049,31	
					1.328,77							1.328,77	
					32.853,40							32.853,40	
					5.931,61							5.931,61	
					38.885,01							38.885,01	
					517.635,04							517.635,04	
					98.388,66							98.388,66	
					25.881,75							25.881,75	
					642.116,45							642.116,45	
					115.568,78							115.568,78	
					757.685,23							757.685,23	

IMELEC S.R.L.
 RUC 201010010000000000
 CARRILLO DE LA VENTA 1000
 CORRIENTE GENERAL

IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 ING. RESPONSABLE DE OBRA
 CIP 198271

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 192871

PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

RESUMEN DE VALORIZACION

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

CONTRATISTA : IMELEC S.R.L.

IMELEC  S.R.L.

SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA


 **FONDEPES**
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero


SAMA - TACNA
REGION TACNA


**RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N° 01
PLANILLA DE PAGO**

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL, EN EL CENTRO AGROICOLA MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"
 PROPIETARIO: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) RESIDENTE: ING. FRANCISCO RAMOS FLORES
 CONTRATISTA: IMELEC S.R.L. SUPERVISOR: ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

ITEM	CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR (S/.)	PRESENTE MES (S/.)	ACUMULADO ACTUAL (S/.)
V	VALORIZACIÓN N° 01 - DICIEMBRE 2019		32,953.40	32,953.40
R	REAJUSTE DE LAS VALORIZACIONES		0.00	0.00
	Reajuste de la Valorización N° 01 (R.)			0.00
D _r	DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE		0.00	0.00
	Adelanto Directo			
	Deducción del Reajuste por Adelanto Directo de la Val. N° 01 (D _{AD})			0.00
	Adelanto para Materiales N° 01			
	Deducción del Reajuste por Adelanto para Materiales N° 01 de la Val. N° 01 (D _{AM1})			0.00
V _B	VALORIZACION BRUTA VB = (V + R - D _r)		32,953.40	32,953.40
A	AMORTIZACION		3,295.34	3,295.34
	Adelanto Directo			
	Amortización por Adelanto Directo de la Val. N° 01 (A _{AD})		3,295.34	3,295.34
	Adelanto para Materiales N° 01			
	Amortización por Adelanto para Materiales N° 01 de la Val. N° 01 (A _{AM1})			0.00
I.	MONTO FACTURABLE (sin IGV) VN = (VB - A)		29,658.06	29,658.06
II.	TOTAL RETENCION (TR)		0.00	0.00
III.	MONTO LIQUIDO A PAGAR (I + II) (VN + TR)		29,658.06	29,658.06
IV.	IGV TOTAL (18% de I)		5,338.45	5,338.45
V.	MONTO A FACTURAR (III + IV)		34,996.51	34,996.51
SON TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 51/100 SOLES				
	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	%	4.88%	4.88%


IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 96570


IMELEC S.R.L.
 OSVALDO J. CARDENAS VINCHA
 GERENTE GENERAL


 RENZO ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82671

PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

CONTRATISTA : IMELEC S.R.L.





SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA



IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
D.P. 9877


SAMA - TACNA
REGION TACNA





RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA MORPO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"
 PROPIETARIO: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA: IMELEC S.R.L.
 RESIDENTE: ING. FRANCISCO RAMOS FLORES
 SUPERVISOR: ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

ITEM	CONCEPTO	PARCIAL OFERTADO	VALORIZACION Nº 01	VALORIZACION Nº 02	VALORIZACION Nº 03	VALORIZACION Nº 04	VALORIZACION Nº 05	VALORIZACION Nº 06	VALORIZACION Nº 07	SALDO NO VALORIZADO
V	VALORIZACIÓN Nº 01 - DICIEMBRE 2019	575,068.89	32,953.40							642,115.49
R	REAJUSTE DE LAS VALORIZACIONES	0.00	0.00							0.00
	Reajuste de la Valorización Nº 01 (R.)									
D _r	DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE	0.00	0.00							0.00
	Adelanto Directo									
	Deducción del Reajuste por Adelanto Directo de la Val. Nº 01 (D _{AD})									
	Adelanto para Materiales Nº 01									
	Deducción del Reajuste por Adelanto para Materiales Nº 01 de la Val. Nº 01 (D _{AM1})									
V _B	VALORIZACION BRUTA	575,068.89	32,953.40							642,115.49
A	AMORTIZACION	57,506.89	3,295.34							64,211.55
	Adelanto Directo									
	Amortización por Adelanto Directo de la Val. Nº 01 (A _{AD})	67,506.89	3,295.34							64,211.55
	Adelanto para Materiales Nº 01									
	Amortización por Adelanto para Materiales Nº 01 de la Val. Nº 01 (A _{AM1})									
I	MONTO FACTURABLE (sin IGV)	607,562.00	29,658.06							577,903.94
II	TOTAL RETENCION	0.00	0.00							0.00
III	MONTO LIQUIDO A PAGAR (I + II)	607,562.00	29,658.06							577,903.94
IV	IGV TOTAL (18% de I)	109,361.16	5,338.45							104,022.71
V	MONTO A FACTURAR (III + IV)	716,923.16	34,996.51							681,926.65
	SITUACION		PRESENTADA							


 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CR 82871


 IMELEC S.R.L.
 GERENTE GENERAL


 IMELEC S.R.L.

PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

AMORTIZACIONES

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

CONTRATISTA : IMELEC S.R.L.

IMELEC S.R.L.

SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

 **FONDEPES**
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

~~IMELEC S.R.L.~~

~~ROSENDO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 96570~~

SAMA - TACNA
REGION TACNA

AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA : IMELEC S.R.L.
 RESIDENTE : ING FRANCISCO RAMOS FLORES
 SUPERVISOR : ING RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

FORMULA : $A = \frac{AD}{C} \times V$

C = S/. 796,581.29 (CON IGV)
 AD = S/. 79,658.13 (CON IGV)
 DONDE : A : Amortización del Adelanto Directo AD : Adelanto Directo otorgado
 V : Monto de la Valorización mensual (SIN IGV) C : Monto Contratado
 (SIN IGV)
 10.00% Fecha de Pago : Diciembre-2019

N°	VALORIZACION (V)		ADELANTO DIRECTO OTORGADO (AD) (SIN IGV)	MONTO CONTRATADO (C) (SIN IGV)	AMORTIZACION (A)	
	PERIODO	MONTO (SIN IGV)			MIENSUAL	ACUMULADA ACTUAL
Val. N° 01	Del 04-Dic-19 al 15-Dic-19	32,953.40	67,506.89	675,068.89	3,295.34	64,211.55
Val. N° 02	Del 16-Dic-19 al 31-Dic-19					
Val. N° 03	Del 01-Ene-20 al 15-Ene-20					
Val. N° 04	Del 16-Ene-20 al 31-Ene-20					
Val. N° 05	Del 01-Feb-20 al 15-Feb-20					
Val. N° 06	Del 16-Feb-20 al 29-Feb-20					
Val. N° 07	Del 01-Mar-20 al 02-Mar-20					
TOTAL					S/. 3,295.34	

IMELEC S.R.L.
 OSWALDO Y CARRERA SANCHEZ
 GERENTE GENERAL

TOTAL ACUMULADO ACTUAL DE LA AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO	S/. 3,295.34
TOTAL ACUMULADO ANTERIOR DE LA AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00
AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO DE LA VALORIZACION N° 01	S/. 3,295.34

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 SUPERVISOR DE OBRA

PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

CURVA " S "

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

CONTRATISTA : IMELEC S.R.L.




SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA



(Handwritten signature)
IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 90544

SAMA - TACNA
REGION TACNA

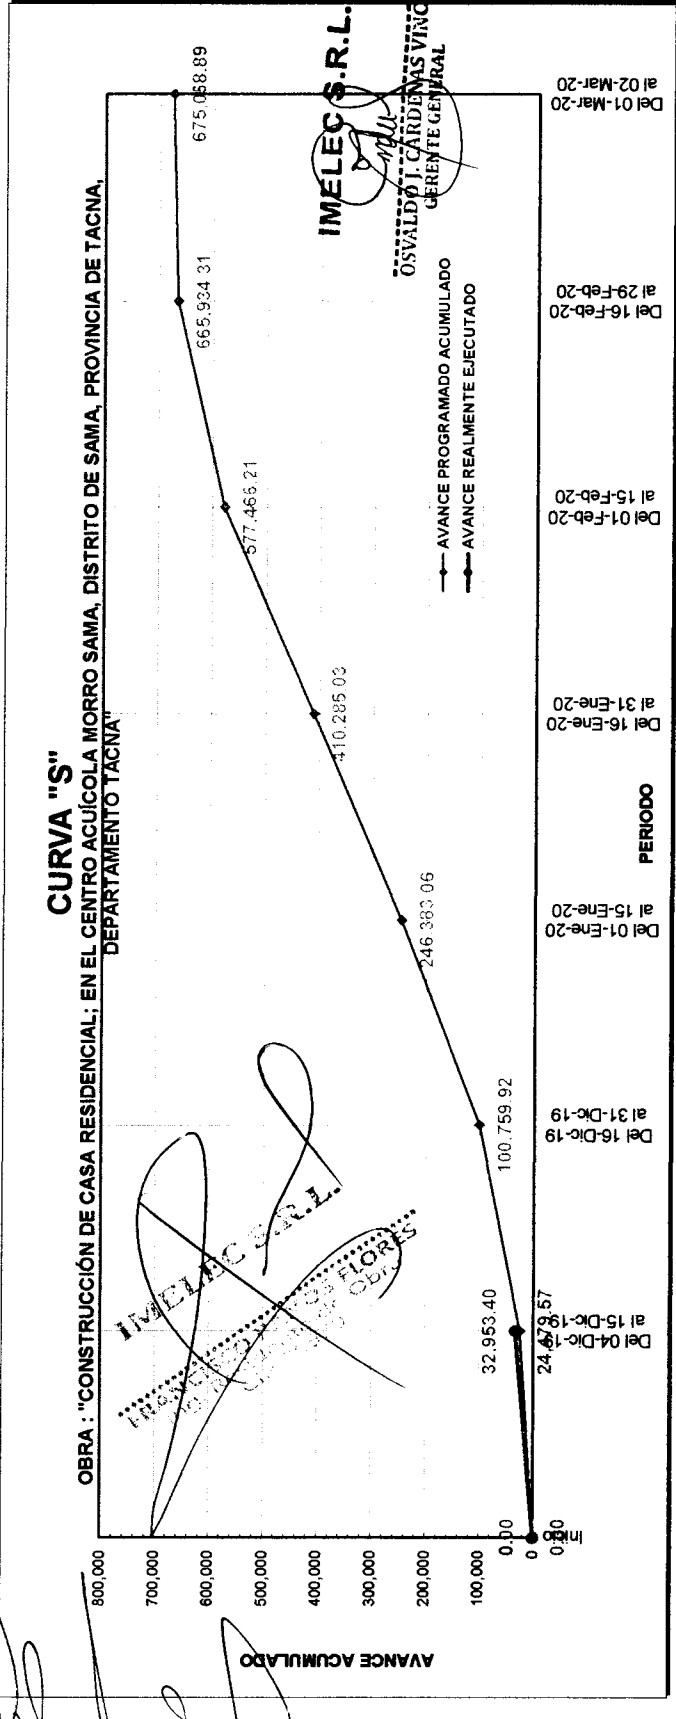
(Handwritten signature)



RESUMEN ESTADO DE AVANCE DE OBRA Y CURVA "S"

PERIODO	VALORIZACIONES DE OBRA PROGRAMADA				VALORIZACIONES DE OBRA REAL EJECUTADAS				SITUACION DE LA OBRA		
	PRIN. ACTUA.		TOTALES (S/.)		PRINCIPAL		TOTALES (S/.)		ESTADO	% RESP. PROG. ACUM.	
	S/.		PARCIAL	ACUM. (A)	PARCIAL	ACUM.	PARCIAL	ACUM. (B)			
*MONTOS A SUB TOTALES (SIN IGV)											
Del 04-Dic-19 al 15-Dic-19	12 Dias	24,479.57	24,479.57	24,479.57	3.63%	32,953.40	32,953.40	32,953.40	4.88%	ADELANTADA	1.26%
Del 16-Dic-19 al 31-Dic-19	16 Dias	76,280.35	100,759.92	100,759.92	11.30%						
Del 01-Ene-20 al 15-Ene-20	15 Dias	145,623.14	246,383.06	246,383.06	21.57%						
Del 16-Ene-20 al 31-Ene-20	16 Dias	163,901.97	410,285.03	410,285.03	24.28%						
Del 01-Feb-20 al 15-Feb-20	15 Dias	167,181.18	577,466.21	577,466.21	24.77%						
Del 16-Feb-20 al 29-Feb-20	14 Dias	88,468.10	665,934.31	665,934.31	13.11%						
Del 01-Mar-20 al 02-Mar-20	2 Dias	9,134.58	675,068.89	675,068.89	1.35%						
90 Dias		675,068.89	675,068.89	100.00%		32,953.40	32,953.40	32,953.40	4.88%		

Diagrama comparativo entre Avance Ejecutado y Programado.



RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS
 CIP. 82571

PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

INFORMACION SUSTENTORIA

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

CONTRATISTA : IMELEC S.R.L.



SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA




IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 20570

SAMA - TACNA
REGION TACNA

RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871


CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO



CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 01 ACTUALIZADO AL INICIO DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
 UBICACIÓN : TACNA - TACNA - SAMÁ
 INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL : 04/12/2019
 TIEMPO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE TERMINO DE OBRA : 02/03/2020

Item	DESCRIPCION	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	Dic-19		Ene-20		Feb-20		Mar-20	
						Del 04/12/2019 al 15/12/2019	Del 16/12/2019 al 31/12/2019	Del 01/01/2020 al 15/01/2020	Del 16/01/2020 al 31/01/2020	Del 01/02/2020 al 15/02/2020	Del 16/02/2020 al 29/02/2020	Del 01/03/2020 al 02/03/2020	
01	OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				34,254.39	16,487.85	4,063.19	3,361.20	3,582.28	3,361.20	3,137.12	258.55	
01.01	INSTALACIONES PROVISIONALES				18,444.89	10,294.26	1,700.16	1,593.50	1,700.16	1,593.50	1,487.64	74.87	
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA	und	1.00	818.42	818.42								
01.01.02	CASETA PARA RESIDENCIA Y SUPERVISION	m2	42.25	94.83	4,008.67								
01.01.03	VESTIDORES PARA PERSONAL OBRERO	m2	20.00	94.83	1,896.60								
01.01.04	SSHH PROVISIONALES	mes	3.00	500	1,500.00	200.44	269.60	252.75	269.60	252.75	235.90	18.96	
01.01.05	CERCO DE OBRA CON TRONCOS DE MADERA Y MALLA ARPILLERA	m	95.40	24.57	2,343.98								
01.01.06	AGUA PARA LA OBRA	mes	3.00	300	900.00	111.01		153.45	163.68	153.45	143.22	11.51	
01.01.07	ENERGIA PARA LA OBRA	mes	3.00	700.00	2,100.00	259.80	381.76	357.90	381.76	357.90	330.04	26.84	
01.01.08	CASETA DE GUARDIANA	m2	4.00	94.83	379.32	50.77	68.16	63.90	68.16	63.90	59.64	4.79	
01.01.09	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	gb	1.00	4,500.00	4,500.00	608.87	816.96	765.90	816.96	765.90	714.84	12.77	
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				1,500.00	501.69	818.24	767.10	818.24	767.10	715.86	108.67	
01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA INICIAL Y DURANTE EL PROCESO	mes	3.00	1,500.00	4,500.00	504.69	818.24	767.10	818.24	767.10	715.86	108.67	
01.03	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				11,309.50	5,988.90	1,544.79	1,600.20	1,066.38	1,000.20	831.52	73.01	
01.03.01	IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gb	1.00	3,000.00	3,000.00	370.81	545.44	511.35	545.44	511.35	477.26	38.35	
01.03.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	gb	1.00	3,600.50	3,600.50	880.00							
01.03.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	gb	1.00	680	680.00								
01.03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gb	1.00	1,419.00	1,419.00	146.44	264.00	247.50	264.00	247.50	231.00	18.56	
01.03.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	gb	1.00	1,000.00	1,000.00	522.09	477.91						
01.03.06	RECURSOS PARA EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	gb	1.00	1,400.00	1,400.00	159.06	257.44	241.35	257.44	241.35	225.26	18.10	
02	ESTRUCTURAS				228,596.93	2,284.18	56,119.75	73,747.48	40,524.00	55,810.87	200.65		
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				50,221.92	2,284.18	36,167.20	11,490.14					
02.01.01	EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA EN TERRENO SUELTO	m3	660.87	11.75	7,762.87	2,284.18	5,498.69						
02.01.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SUB-ZAPATAS H=0.50 M TERRENO SUELTO	m3	29.80	25.28	728.35	718.35							
02.01.03	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTO CORRIDO HASTA 1.00 M TERRENO SUELTO	m3	27.85	37.93	1,056.35								
02.01.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D=1KM	m3	880.79	30.39	26,159.41								
02.01.05	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO NIVELADO Y COMPACTADO	m3	198.48	56.42	10,520.07								
02.01.06	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRA GRANDE > 10" H=0.30M	m2	194.02	20.59	3,984.87								
02.02	CONCRETO SIMPLE				30,314.43			19,652.45					
02.02.01	CONCRETO EN CIMIENTO CORRIDO 1:10:30M.P.G.	m3	30.54	184.79	5,648.89								



IMELEC S.R.L.

OSVALDO Y CAJENAS VINCCHA
GERENTE GENERAL



RENZO F. FROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871



CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 01 ACTUALIZADO AL INICIO DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
UBICACIÓN : TACNA - TACNA - SAMÁ
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL : 04/12/2018
TIEMPO DE EJECUCIÓN : 80 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE TÉRMINO DE OBRA : 02/03/2020

Table with columns: Item, DESCRIPCION, Und., Metrado, Precio \$/., Parcial \$/., Dic-19, Ene-20, Feb-20, Mar-20. It lists construction items like concrete, steel reinforcement, and formwork with their respective quantities and costs over time.



RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82371

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 01 ACTUALIZADO AL INICIO DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
 UBICACIÓN : TACNA - TACNA - SAMÁ
 INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL : 04/12/2019
 TIEMPO DE EJECUCIÓN : 90 DÍAS CALENDARIOS
 FECHA DE TÉRMINO DE OBRA : 02/03/2020

Item	DESCRIPCIÓN	Unid.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	Dic-19		Ene-20		Feb-20		Mar-20
						Del 04/12/2019 al 15/12/2019	Del 16/12/2019 al 31/12/2019	Del 01/01/2020 al 15/01/2020	Del 16/01/2020 al 31/01/2020	Del 01/02/2020 al 15/02/2020	Del 16/02/2020 al 29/02/2020	
02.03.06.03	VIGUETA: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm ² . GRADO 80	kg	313.24	4.28	1,340.67							
02.03.07	COLUMNETA				4,983.03							
02.03.07.01	COLUMNETA: CONCRETO f _c =210 kg/cm ²	m ³	1.83	471.82	910.61			70.56	1,340.67	3,621.55		
02.03.07.02	COLUMNETA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	43.56	60.15	2,620.13					910.61		
02.03.07.03	COLUMNETA: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm ² . GRADO 80	kg	339.46	4.28	1,452.99			70.56	1,291.32	90.81		
02.03.08	DINTEL				430.91					351.18		
02.03.08.01	DINTEL: CONCRETO f _c =210 kg/cm ²	m ³	0.20	348.66	69.72					69.72		
02.03.08.02	DINTEL: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	4.48	60.15	270.07					270.07		
02.03.08.03	DINTEL: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm ² . GRADO 80	kg	21.29	4.28	91.12					79.73		
02.03.09	LOSA DE PATIO CENTRAL				2,574.57					2,574.57		
02.03.09.01	LOSA DE PATIO CENTRAL: CONCRETO f _c =210 kg/cm ²	m ³	4.64	352.25	1,654.44					1,634.44		
02.03.09.02	LOSA DE PATIO CENTRAL: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	4.50	67.05	301.73					301.73		
02.03.09.03	LOSA DE PATIO CENTRAL: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm ² . GRADO 80	kg	149.16	4.28	638.40					638.40		
02.03.10	SOPORTE DE ENCIMERA				776.79					776.79		
02.03.10.01	SOPORTE DE ENCIMERA: CONCRETO f _c =210 kg/cm ²	m ³	0.15	471.82	70.77					70.77		
02.03.10.02	SOPORTE DE ENCIMERA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	1.54	60.15	92.63					92.63		
02.03.10.03	SOPORTE DE ENCIMERA: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm ² . GRADO 80	kg	14.81	4.28	63.39					63.39		
02.04	ESTRUCTURAS DE ALICATA Y COBERTURA				65,301.76					16,883.17		
02.04.01	ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE TECHO				17,901.00					16,883.17		
02.04.01.01	TUERAL METALICO TIPO CERCHA EN ACERO RECTANGULAR LAC TIPO I/SIDISEÑO	und	6.00	1,950.00	11,100.00					5,896.88		
02.04.01.02	TUERAL METALICO TIPO CERCHA EN ACERO RECTANGULAR LAC TIPO II/SIDISEÑO	und	6.00	950.00	7,600.00					7,600.00		
02.04.01.03	TUERAL METALICO TIPO CERCHA EN ACERO RECTANGULAR LAC TIPO III/SIDISEÑO	und	4.00	600.00	2,400.00					2,400.00		
02.04.01.04	CORREAS METALICAS DE ACERO RECTANGULAR LAC	m	415.24	25.00	10,381.00					10,381.00		
02.04.01.05	APOYO METALICO TIPO 01 SIDISEÑO	und	16.00	495.00	7,920.00					7,920.00		
02.04.01.06	APOYO METALICO TIPO 02 SIDISEÑO	und	8.00	445.00	3,560.00					3,560.00		
02.04.02	COBERTURA LAMINADA				22,443.76					22,213.11		
02.04.02.01	COBERTURA DE ACERO LAMINADO TIPO "T" E= 0.4MM	m ²	296.62	68.00	20,170.16					20,170.16		
02.04.02.02	CUMBRERA DE ACERO LAMINADO	m	12.24	35.00	428.40					428.40		
02.04.02.03	LIMATESA DE ACERO LAMINADO	m	52.72	35.00	1,845.20					1,614.55		
03	ARQUITECTURA				182,888.61					27,808.64		
					989.55					34,479.60		
					1,310.47					56,170.01		
										1,614.55		
										56,563.79		
												6,103.57

IMELEC S.R.L.
 OSVALDO GARCÍA VINCIGLIA
 GERENTE GENERAL

[Handwritten signature]

LENZO ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 8297



CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 01 ACTUALIZADO AL INICIO DE OBRA



OBRA : CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACÚICOLA MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
 UBICACIÓN : TACNA - TACNA - SAMÁ
 INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL : 04/12/2019
 TIEMPO DE EJECUCIÓN : 90 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE TÉRMINO DE OBRA : 02/03/2020

Item	DESCRIPCIÓN	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	Dic-19		Ene-20		Feb-20		Mar-20	
						Del 04/12/2019 al 15/12/2019	Del 16/12/2019 al 31/12/2019	Del 01/01/2020 al 15/01/2020	Del 16/01/2020 al 31/01/2020	Del 01/02/2020 al 15/02/2020	Del 16/02/2020 al 29/02/2020	Del 01/03/2020 al 02/03/2020	
01.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAHILERIA				17,211.20								
03.01.01	MURO DE LADRILLO MECANIZADO KK CABEZA 8x13x24 cm; C.A 1.4 E+1.5 cm	m2	121.58	140	17,021.20								
03.01.02	MURO DE LADRILLO MECANIZADO KK SOGA 8x13x24 cm; C.A 1.4 E+1.5 cm	m2	189.90	80	15,192.00								
03.02	REVOCOS Y REVESTIMIENTOS				26,201.22			25,861.56	34.75				
03.02.01	TARRAJEO RAYADO PRIMARIO	m2	113.15	23.42	2,649.97		772.91	1,877.06					
03.02.02	TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN INTERIORES, E+1.5CM C.A 1.4	m2	538.16	26.83	14,331.20			14,331.20					
03.02.03	TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN EXTERIORES, E+1.5CM C.A 1.4	m2	157.34	31.17	4,904.29			4,904.29					
03.02.04	TARRAJEO ESCARCHADO IMPERMEABILIZADO, E+1.5CM C.A 1.4	m2	21.80	38.73	793.37			793.37					
03.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES IMPERMEABILIZADO E+ 0.25m	m	134.80	20.3	2,736.44			2,736.44					
03.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES IMPERMEABILIZADO E+ 0.15m	m	52.80	18.59	975.95			975.95					
03.03	CIELORRASOS				13,676.39								
03.03.01	CIELORRASO SUSPENDIDO EN INTERIORES CON PERFILES DE A' G' Y PLANCHA DE FIBRO-CEMENTO DE 9MM	m2	172.36	80	10,341.60			10,341.60					
03.03.02	CIELORRASO SUSPENDIDO EN ALERO EXTERIOR CON PERFILES DE A' G' Y PLANCHA DE FIBRO-CEMENTO 9MM	m2	76.21	70	5,334.70			5,334.70					
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS				11,779.13								
03.04.01	PISOS				11,779.13								
03.04.01.01	PISO PORCELANATO GRESS MARMOLIZADO BEIGE MATE 60x60 CM	m2	93.08	59	5,398.64			5,398.64					
03.04.01.02	PISO PORCELANATO GRESS RUSTICO CONCRETO PLATA OSCURO MATE 60x60 CM	m2	65.69	58	3,809.44			3,809.44					
03.04.01.03	PISO PORCELANATO GRESS RUSTICO CONCRETO PLOMO OSCURO MATE 60x60 CM	m2	17.52	59	1,016.16			1,016.16					
03.04.01.04	PISO PORCELANATO GRESS TIPO PIEDRA RUGOSO PLOMO OSCURO MATE 60x60 CM	m2	10.08	80	804.80			804.80					
03.04.01.05	PISO PORCELANATO GRESS TIPO PIEDRA RUGOSO MARRON MATE 60x60 CM	m2	10.08	80	804.80			804.80					
03.04.01.06	PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO EN PATIO CENTRAL	m2	10.74	32.15	345.29			345.29					
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				9,128.19								
03.05.01	ZOCALOS				9,128.19								
03.05.01.01	ZOCALO PORCELANATO GRESS RUSTICO CONCRETO PLOMO OSCURO MATE 60x60 CM	m2	65.80	51	3,345.60			3,345.60					
03.05.01.02	ZOCALO PIEDRA LAJA NATURAL APAREJO IRREGULAR	m2	28.18	75.5	1,976.59			1,976.59					
03.05.02	CONTRAZOCALOS				4,196.30								
03.05.02.01	CONTRAZOCALO PORCELANATO GRESS MARMOLIZADO BEIGE MATE 60x6 CM	m	114.40	19.28	2,203.34			2,203.34					
03.05.02.02	CONTRAZOCALO PORCELANATO GRESS RUSTICO CONCRETO PLATA OSCURO MATE 60x6 CM	m	82.55	19.28	1,204.71			1,204.71					
03.05.02.03	CONTRAZOCALO PIEDRA LAJA NATURAL APAREJO IRREGULAR H+9 CM	m	38.95	19.28	748.25			748.25					
03.06	CARPINTERIA DE MADERA				43,113.27								

IMELEC S.R.L.
 OSVALDO...
 GERARDO...

IMELEC S.R.L.
 FRENTE A LA...
 1000...


RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 02071



CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 01 ACTUALIZADO AL INICIO DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
UBICACIÓN : TACNA - TACNA - SAMÁ
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL : 04/12/2019
TIEMPO DE EJECUCIÓN : 90 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE TERMINO DE OBRA : 02/03/2020

Table with columns: Item, DESCRIPCION, Und., Metrado, Precio \$/, Parcial \$/, Dic-19, Ene-20, Feb-20, Mar-20. Includes various construction items like PUERTAS, CERRAJERIA, VENTANAS, and CERRADURAS with their respective quantities and costs.



CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 01 ACTUALIZADO AL INICIO DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
 UBICACIÓN : TACNA - TACNA - SAMÁ
 INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL : 04/12/2019
 TIEMPO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE TERMINO DE OBRA : 02/03/2020

Item	DESCRIPCION	Und.	Medrado	Precio S/.	Parcial S/.	Dic-19		Ene-20		Feb-20		Már-20
						Del 04/12/2019 al 15/12/2019	Del 16/12/2019 al 31/12/2019	Del 01/01/2020 al 15/01/2020	Del 16/01/2020 al 31/01/2020	Del 01/02/2020 al 15/02/2020	Del 16/02/2020 al 29/02/2020	
03.10.02	PINTURA LATEX SATINADA EN INTERIORES PRIMERA CALIDAD	m ²	560.15	13	7,281.95					7,281.95		
03.10.03	PINTURA LATEX MATE EN EXTERIORES PRIMERA CALIDAD	m ²	153.85	15	2,307.75					1,442.34	865.41	
03.11	VARIOS				6,854.41	1,370.147	1,413.49	1,845.06	93.75			1,149.07
03.11.01	JUNTA CON MORTERO ASFALTICO EN VEREDAS	m	19.20	10.08	193.54							
03.11.02	JUNTA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1/2" Y SELLO ELASTOMERICO	m	20.00	25.59	511.80			511.80				
03.11.03	FLETE TERRESTRE	gb	1.00	5,000.00	5,000.00			1,333.47	1,249.95	93.75		
03.11.04	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	gb	1.00	1,149.07	1,149.07							1,149.07
04	INSTALACIONES SANITARIAS				40,798.99							
04.01	SUBREGISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				5,246.31			5,809.74	28,983.75	1,598.80	5,246.31	1,149.07
04.01.01	OVALIN REDONDO DE LOZA VITRIFICADA BLANCO INC. ACCESORIOS	und	4.00	414.51	1,658.04							
04.01.02	INODORO TIPO ONE PICE DE LOZA VITRIFICADA BLANCO INC. ACCESORIOS	und	4.00	478.14	1,912.56							
04.01.03	URINARIO ESTANDAR DE LOZA VITRIFICADA BLANCO INC. ACCESORIOS	und	1.00	338.22	338.22							
04.01.04	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA SOLA POZA INC. ACCESORIOS	und	1.00	376.36	376.36							
04.01.05	LAVADERO DE ROPA DE GRANITO DE DOBLE POZA INC. ACCESORIOS	und	1.00	328.05	328.05							
04.01.06	DUCHA ELECTRICA DE CARBON	und	4.00	158.27	633.08							
04.02	SISTEMAS DE AGUA FRIA				4,992.56			1,452.76	1,540.36			
04.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA	pco	17.00	72.84	1,238.88			771.80	465.08			
04.02.02	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC-SAP C10 C/R Ø 3/4"	m	55.87	22.5	1,257.08			1,178.51	78.57			
04.02.03	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP C10 C/R Ø 1/2"	m	43.54	21.14	920.44			920.44				
04.02.04	CODO PVC-SAP C10 C/R Ø 3/4" x 90°	und	10.00	18.3	183.00					24.13		
04.02.05	TEE PVC-SAP C10 C/R Ø 3/4" x 90°	und	4.00	10.08	40.24					5.03		
04.02.06	REDUCCION (BUSHING) PVC-SAP C10 C/R DE 3/4" a 1/2"	und	9.00	8.36	75.24			65.83	9.41			
04.02.07	CODO PVC-SAP C10 C/R Ø 1/2" x 90°	und	36.00	8.02	288.72			252.63	36.09			
04.02.08	TEE PVC-SAP C10 C/R Ø 1/2" x 90°	und	8.00	9.21	73.68			64.47	9.21			
04.02.09	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 3/4"	und	4.00	71.18	284.72					284.72		
04.02.10	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 1/2"	und	4.00	64.32	257.28					257.28		
04.02.11	CAJA O NICHOS DE MADERA PARA VALVULAS INC. TAPA METALICA	und	3.00	30	90.00					90.00		
04.02.12	PRUEBA HIDROSTATICA Y PUESTA EN SERVICIO	gb	1.00	283.28	283.28							
04.03	SISTEMAS DE DESAGUE Y VENTILACION				11,332.27			2,141.94	8,890.79			
04.03.01	SALIDA DE DESAGUE DE 4"	pco	8.00	118.9	951.20							



CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 01 ACTUALIZADO AL INICIO DE OBRA


OBRA : CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
 UBICACIÓN : TACNA - TACNA - SAMÁ
 INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL : 04/12/2019
 TIEMPO DE EJECUCIÓN : 90 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE TÉRMINO DE OBRA : 02/03/2020

Item	DESCRIPCIÓN	Und.	Medrado	Precio \$/.	Parcial \$/.	Dic-19		Ene-20		Feb-20		Mar-20	
						Del 04/12/2019 al 15/12/2019	Del 16/12/2019 al 31/12/2019	Del 01/01/2020 al 15/01/2020	Del 16/01/2020 al 31/01/2020	Del 01/02/2020 al 15/02/2020	Del 16/02/2020 al 29/02/2020	Del 01/03/2020 al 02/03/2020	
04.03.02	SALIDA DE DESAGUE DE 2"	pob	15.00	90.32	1,354.90								
04.03.03	SALIDA VENTILACION DE 2"	pob	4.00	90.32	361.28								
04.03.04	RED DE DISTRIBUCION DE DESAGUE PVC-SAL 4"	m	19.50	71.33	1,390.94		608.54						
04.03.05	RED DE DISTRIBUCION DE DESAGUE PVC-SAL 2"	m	27.33	42.15	1,151.96								
04.03.06	RED DE VENTILACION PVC-SAL 2"	m	8.30	42.15	349.85								
04.03.07	RED COLECTORA DE DESAGUE PVC-SAL 4"	m	17.52	71.33	1,249.70								
04.03.08	CODO PVC-SAL DE 4"x80"	und	5.00	46.4	232.00		232.00						
04.03.09	CODO PVC-SAL DE 4"x45"	und	4.00	45.55	182.20		182.20						
04.03.10	CODO PVC-SAL SANITARIO DE 4" SALIDA LATERAL 2"	und	4.00	48.44	193.76								
04.03.11	CODO PVC-SAL DE 2"x80"	und	22.00	29.18	641.96		169.54						
04.03.12	CODO PVC-SAL DE 2"x45"	und	7.00	28.93	202.51								
04.03.13	YEE PVC-SAL DE 4x2"	und	21.00	38.77	814.17								
04.03.14	TRAMPA 1º PVC 2"	und	9.00	43.08	387.72								
04.03.15	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und	5.00	36.06	180.30								
04.03.16	REGISTRO DE BRONCE DE 2"	und	5.00	61.48	307.40								
04.03.17	SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL 2"	und	4.00	11.23	44.92								
04.03.18	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 12"x24" INC. TAPA DE CONCRETO ARMADO	und	6.00	172.82	1,036.92								
04.03.19	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	gb	1.00	298.68	298.68								
04.04	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE				11,616.67								
04.04.01	TANQUE DOMESTICO DE POLIETILENO DE 2500 L	und	1.00	11,616.67	11,616.67								
04.04.02	ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE TANQUE ELEVADO S/DISEÑO	gb	1.00	10,500.00	10,500.00								
04.05	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS				7,004.88								
04.05.01	SUM. E INST. DE TANQUE SEPTICO DE POLIETILENO (BIODIGESTOR)	und	1.00	5,200.00	5,200.00								
04.05.02	RED COLECTORA DE AGUA RESIDUAL PVC-SAL DE 4"	m	10.54	70.84	743.49								
04.05.03	SALIDA PARA EXTRACCION DE LODOS CON TUBERIA PVC-SAL 2"	m	2.00	41.43	82.86								
04.05.04	CAJA DE CONCRETO DE 24"x24" INC. TAPA DE C"A PARA REPARTIR CAUDALES	und	1.00	252.82	252.82								
04.05.05	CAJA DE CONCRETO DE 32"x32" INC. TAPA DE C"A PARA EXTRACCION DE LODOS	und	1.00	390	390.00								
04.05.06	IMPLEMENTACION DE ZANJA DE INFILTRACION S/DISEÑO	gb	1.00	935.71	935.71								
05	INSTALACIONES ELECTRICAS				57,861.75								
05.01	SALIDAS DE INSTALACIONES				13,292.04								

IMELEC S.R.L.
 GERENTE GENERAL
 OSVALDO FLORES

IMELEC S.R.L.
 OSVALDO FLORES
 GERENTE GENERAL

OSVALDO FLORES
 INGENIERO SUPERIOR EN ELECTRICIDAD
 C.O. TACNA



CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 01 ACTUALIZADO AL INICIO DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
 UBICACIÓN : TACNA - TACNA - SAMÁ
 INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL : 04/12/2019
 TIEMPO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE TERMINO DE OBRA : 02/03/2020

Item	DESCRIPCION	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	Dic-19		Ene-20		Feb-20		Mar-20	
						Del 04/12/2019 al 15/12/2019	Del 16/12/2019 al 31/12/2019	Del 01/01/2020 al 15/01/2020	Del 16/01/2020 al 31/01/2020	Del 01/02/2020 al 15/02/2020	Del 16/02/2020 al 29/02/2020	Del 01/03/2020 al 02/03/2020	
05.01.01	SALIDA CENTRO DE LUZ	pib	58.00	75.87	4.388.86								
05.01.02	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	pib	57.00	110.84	6.317.88								
05.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pib	20.00	98.64	1.972.80								
05.01.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pib	2.00	103.21	206.42								
05.01.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE	pib	4.00	101.52	406.08								
05.02	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS				5.478.11								
05.02.01	TUBERIA ELECTRICA PVC-SAP D=50 MM	m	106.00	13.98	1.482.84								
05.02.02	TUBERIA ELECTRICA PVC-SAP D=20 MM	m	560.00	8.92	4.995.20								
05.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS				19.733.39								
05.03.01	CABLE 2.5MM2 NH-80	m	1.002.00	7.32	7.334.84								
05.03.02	CABLE 4MM2 NH-80	m	885.00	7.91	5.487.45								
05.03.03	CABLE 6MM2 NH-80	m	50.00	9.33	466.50								
05.03.04	CABLE 10MM2 NH-80	m	270.00	10.87	2.934.90								
05.04	TABLEROS DE DISTRIBUCION				1.266.98								
05.04.01	TABLERO DE DISTRIBUCION EMPOTRABLE (30 POLOS RIELO) N° 1	pb	2.00	633.48	1.266.98								
05.05	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION				3.479.32								
05.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16A	und	12.00	28.1	313.20								
05.05.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A	und	11.00	28.1	287.10								
05.05.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X20A	und	2.00	80.51	161.02								
05.05.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X30A	und	2.00	110.1	220.20								
05.05.05	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A	und	20.00	80.42	1.608.40								
05.05.06	INTERRUPTOR HORARIOCONTACTOR	und	5.00	177.88	889.40								
05.06	EQUIPOS DE ILUMINACION				10.024.31								
05.06.01	LUMINARIA HERMETICA PADOSAR LED 1x36W, IP 65, DE 1280X101X101 MM S/ESPECIFICACION	und	28.00	188.84	5.287.52								
05.06.02	LUMINARIA LED PARA ADOSAR EN TECHO 20W S/ESPECIFICACION	und	28.00	123.28	3.451.28								
05.06.03	LUMINARIA DECORATIVA LED 1x100W PARA POSTE EXTERIOR DE 4" IP 65 S/ESPECIFICACION	und	2.00	303.42	606.84								
05.06.04	LUZ DE EMERGENCIA LED DE 7.5W	und	7.00	96.98	678.93								
05.07	CABLES DE PASE				522.20								
05.07.01	CABLE DE PASE DE POLYESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 8804*	und	10.00	52.22	522.20								
05.08	PRUEBAS Y OTROS				6.565.91								
													5.560.53
													1.004.48

IMELEC S.R.L.
 OSVALDO SANCHEZ VARGAS
 GERENTE GENERAL

IMELEC S.R.L.
 AV. SAN CARLOS DE CHILACAYAN 100
 TACNA - TACNA - PERU
 TEL: 08552 0000



CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 01 ACTUALIZADO AL INICIO DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE SAMA, DEPARTAMENTO TACNA
 UBICACIÓN : TACNA - TACNA - SAMA
 INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL : 04/12/2018
 TIEMPO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE TÉRMINO DE OBRA : 02/03/2020

Item	DESCRIPCION	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	Dic-19		Ene-20		Feb-20		Mar-20	
						Del 04/12/2019 al 15/12/2019	Del 16/12/2019 al 31/12/2019	Del 01/01/2020 al 15/01/2020	Del 16/01/2020 al 31/01/2020	Del 01/02/2020 al 15/02/2020	Del 16/02/2020 al 29/02/2020	Del 01/03/2020 al 02/03/2020	
05.08.01	IMPLEMENTACION INTEGRAL DE POZO A TIERRA VERTICAL	pb	1.00	1,560.53	1,560.53						1,560.53		
05.08.02	BUZONETAS DE C/A DE 60x60x80 CM INC. TAPA	und	5.00	800	4,000.00						4,000.00		
05.08.03	PRUEBAS ELECTRICAS SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICADO	und	1.00	1,004.48	1,004.48								1,004.48
	COSTO DIRECTO				544,410.39	19,741.58	61,516.41	117,438.02	132,179.01	134,823.53	71,345.24		7,386.90
	GASTOS GENERALES			19,000.00%	103,437.97	3,750.90	11,888.12	22,313.22	25,114.01	25,818.47	13,555.80		1,399.65
	UTILIDAD			5,000.00%	27,220.53	987.09	3,075.82	5,871.90	6,608.95	6,741.18	3,587.28		368.33
	SUB TOTAL				675,068.89	24,479.57	76,290.35	145,823.14	163,901.97	167,181.18	88,468.10		9,134.68
	IMPUESTO (IGV18%)				121,512.40	4,406.33	13,730.46	26,212.17	29,502.35	30,092.61	15,924.26		1,844.22
	PRESUPUESTO TOTAL				796,581.29	28,885.90	90,010.81	171,835.31	193,404.32	197,273.79	104,392.36		10,778.80
	TOTAL ACUMULADO				28,885.90	118,898.71	280,732.02	484,136.34	24.28%	24.77%	13.11%		796,581.29
	PORCENTAJE DE AVANCE				3.63%	11.30%	21.57%	24.28%	24.77%	13.11%		1.35%	
	PORCENTAJE ACUMULADO				3.63%	14.93%	36.50%	60.78%	85.54%	88.65%		100.00%	

IMELEC S.R.L.
 TACNA - TACNA - TACNA
 TACNA - TACNA - TACNA

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIR 82671

IMELEC S.R.L.
 TACNA - TACNA - TACNA
 TACNA - TACNA - TACNA

RESUMEN DE METRADOS VALORIZADOS



IM

RESUMEN DE METRADOS VALORIZADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ADJUGA MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
 PROPIETARIO: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA: IMELEC S.R.L.

RESIDENTE: ING. FRANCISCO RAMOS FLORES
 SUPERVISOR: ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

Item	Descripción	Und.	Metrado Contratado	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Saldo
01	OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD						
01.01	INSTALACIONES PROVISIONALES						
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA	und	1.00		1.00	1.00	
01.01.02	CASETA PARA RESIDENCIA Y SUPERVISION	m2	42.25		21.13	21.13	21.12
01.01.03	VESTIDORES PARA PERSONAL OBRERO	m2	20.00				20.00
01.01.04	SSHH PROVISIONALES	mes	3.00				3.00
01.01.05	CERCO DE OBRA CON TRONCOS DE MADERA Y MALLA ARPILLERA	m	95.40		47.70	47.70	47.70
01.01.06	AGUA PARA LA OBRA	mes	3.00		0.40	0.40	2.60
01.01.07	ENERGIA PARA LA OBRA	mes	3.00				3.00
01.01.08	CASETA DE GUARDIANIA	m2	4.00				4.00
01.01.09	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	glb	1.00		0.20	0.20	0.80
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES						
01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA INICIAL Y DURANTE EL PROCESO	mes	3.00		0.40	0.40	2.60
01.03	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
01.03.01	IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00		0.50	0.50	0.50
01.03.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00		0.30	0.30	0.70
01.03.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00		0.50	0.50	0.50
01.03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00		0.50	0.50	0.50
01.03.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00		0.13	0.13	0.87
01.03.06	RECURSOS PARA EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00				1.00
02	ESTRUCTURAS						
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
02.01.01	EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA EN TERRENO SUELTO	m3	660.67		660.67	660.67	
02.01.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SUB-ZAPATAS H=0.50 M TERRENO SUELTO	m3	28.80		28.80	28.80	
02.01.03	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTO CORRIDO HASTA 1.00 M TERRENO SUELTO	m3	27.85				27.85
02.01.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D=1KM	m3	860.79				860.79
02.01.05	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO NIVELADO Y COMPACTADO	m3	186.46				186.46
02.01.06	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRA GRANDE > 10" H=0.30M	m2	194.02				194.02
02.02	CONCRETO SIMPLE						
02.02.01	CONCRETO EN CIMIENTO CORRIDO 1:10+30% P.G.	m3	30.54				30.54
02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTO CORRIDO	m2	125.36				125.36
02.02.03	SUB ZAPATA CON CONCRETO f c =175Kg/cm² INC. PIEDRA GRANDE >10" H=0.40m	m3	29.30				29.30
02.02.04	FALSO PISO CONCRETO f c = 140kg/cm2; H=4"	m2	174.66				174.66
02.02.05	CONCRETO EN VEREDAS f c = 175kg/cm2 DE H=6" ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	71.52				71.52
02.02.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m2	17.25				17.25
02.02.07	SOLADO PARA VIGA DE CIMENTACION C.A 1:10 INC. PIEDRA GRANDE 4" H=0.15M	m2	9.00				9.00
02.03	CONCRETO ARMADO						
02.03.01	SOBRECIMENTOS						
02.03.01.01	SOBRECIMIENTO: CONCRETO f c =140 kg/cm2	m3	14.45				14.45
02.03.01.02	SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	144.15				144.15
02.03.01.03	SOBRECIMIENTO: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2; GRADO 60	kg	525.99		262.99	262.99	263.00
02.03.02	ZAPATAS						
02.03.02.01	ZAPATAS: CONCRETO f c =210 kg/cm2	m3	37.18				37.18
02.03.02.02	ZAPATAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	92.40				92.40
02.03.02.03	ZAPATAS: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2; GRADO 60	kg	826.31		413.16	413.16	413.15
02.03.03	COLUMNAS						
02.03.03.01	COLUMNAS: CONCRETO f c =210 kg/cm2	m3	7.35				7.35
02.03.03.02	COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	80.22				80.22
02.03.03.03	COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2; GRADO 60	kg	1304.00		652.00	652.00	652.00
02.03.04	VIGAS						
02.03.04.01	VIGAS: CONCRETO f c =210 kg/cm2	m3	7.39				7.39
02.03.04.02	VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	66.86				66.86
02.03.04.03	VIGAS: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2; GRADO 60	kg	897.74				897.74
02.03.05	VIGA DE CONEXION						
02.03.05.01	VIGA DE CONEXION: CONCRETO f c =210 kg/cm2	m3	7.40				7.40
02.03.05.02	VIGA DE CONEXION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	59.20				59.20
02.03.05.03	VIGA DE CONEXION: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2; GRADO 60	kg	897.74		448.87	448.87	448.87
02.03.06	VIGUETA						
02.03.06.01	VIGUETA: CONCRETO f c =210 kg/cm2	m3	2.66				2.66
02.03.06.02	VIGUETA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	35.99				35.99
02.03.06.03	VIGUETA: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2; GRADO 60	kg	313.24				313.24
02.03.07	COLUMNETA						
02.03.07.01	COLUMNETA: CONCRETO f c =210 kg/cm2	m3	1.93				1.93
02.03.07.02	COLUMNETA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	43.56				43.56
02.03.07.03	COLUMNETA: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2; GRADO 60	kg	339.46		169.73	169.73	169.73
02.03.08	DINTEL						
02.03.08.01	DINTEL: CONCRETO f c =210 kg/cm2	m3	0.20				0.20
02.03.08.02	DINTEL: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	4.49				4.49
02.03.08.03	DINTEL: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2; GRADO 60	kg	21.29				21.29
02.03.09	LOSA DE PATIO CENTRAL						
02.03.09.01	LOSA DE PATIO CENTRAL: CONCRETO f c =210 kg/cm2	m3	4.64				4.64
02.03.09.02	LOSA DE PATIO CENTRAL: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	4.50				4.50
02.03.09.03	LOSA DE PATIO CENTRAL: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2; GRADO 60	kg	149.16		74.58	74.58	74.58
02.03.10	SOPORTE DE ENCIMERA						
02.03.10.01	SOPORTE DE ENCIMERA: CONCRETO f c =210 kg/cm2	m3	0.15				0.15
02.03.10.02	SOPORTE DE ENCIMERA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.54				1.54
02.03.10.03	SOPORTE DE ENCIMERA: ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2; GRADO 60	kg	14.81				14.81
02.04	ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURA						
02.04.01	ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE TECHO						
02.04.01.01	TIJERAL METALICO TIPO CERCHA EN ACERO RECTANGULAR LAC TIPO I S/DISEÑO	und	6.00				6.00
02.04.01.02	TIJERAL METALICO TIPO CERCHA EN ACERO RECTANGULAR LAC TIPO II S/DISEÑO	und	8.00				8.00
02.04.01.03	TIJERAL METALICO TIPO CERCHA EN ACERO RECTANGULAR LAC TIPO III S/DISEÑO	und	4.00				4.00

IMELEC S.R.L.
 OSVALDO F. CÁRDENAS VINCHA
 GERENTE GENERAL

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 96670



IM

RESUMEN DE METRADOS VALORIZADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL, EN EL CENTRO AGUICOLA MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
PROPIETARIO: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONTRATISTA: IMELEC S.R.L.
RESIDENTE: ING. FRANCISCO RAMOS FLORES
SUPERVISOR: ING. RENZO FERNANDO POMERO GUERRA

Table with columns: Item, Descripción, Und., Metrado Contratado, Acumulado Anterior, Presente Mes, Acumulado Actual, Saldo. Rows include items like CORREAS METALICAS DE ACERO RECTANGULAR LAC, MURO DE LADRILLO MECANIZADO, TARRAJEO IMPERMEABILIZADO, etc.

IMELEC S.R.L.

OSVALDO CARDENAS VILCHA
GERENTE GENERAL

IMELEC S.R.L.

RENZO FERNANDO POMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS
CIP 82871

FRANCISCO RAMOS FLORES
ING. RESIDENTE DE OBRAS
CIP 9000



IM

RESUMEN DE METRADOS VALORIZADOS

OBRA: *CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO AGUICOLA MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA*
 PROPIETARIO: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA: IMELEC S.R.L.

RESIDENTE: ING. FRANCISCO RAMOS FLORES
 SUPERVISOR: ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

Item	Descripción	Und.	Metrado Contratado	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Saldo
01.02	SISTEMA DE AGUA FRIA						
04.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA	pto	17.00				17.00
04.02.02	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC-SAP C10 C/R Ø 3/4"	m	55.87				55.87
04.02.03	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP C10 C/R Ø 1/2"	m	43.54				43.54
04.02.04	CODO PVC-SAP C10 C/R Ø 3/4" x 90°	und	10.00				10.00
04.02.05	TEE PVC-SAP C10 C/R Ø 3/4" x 90°	und	4.00				4.00
04.02.06	REDUCCION (BUSHING) PVC-SAP C10 C/R DE 3/4" a 1/2"	und	9.00				9.00
04.02.07	CODO PVC-SAP C10 C/R Ø 1/2" x 90°	und	36.00				36.00
04.02.08	TEE PVC-SAP C10 C/R Ø 1/2" x 90°	und	8.00				8.00
04.02.09	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 3/4"	und	4.00				4.00
04.02.10	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 1/2"	und	4.00				4.00
04.02.11	CAJA O NICHOS DE MADERA PARA VALVULAS INC. TAPA METALICA	und	3.00				3.00
04.02.12	PRUEBA HIDROSTATICA Y PUESTA EN SERVICIO	glb	1.00				1.00
04.03	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION						
04.03.01	SALIDA DE DESAGUE DE 4"	pto	8.00				8.00
04.03.02	SALIDA DE DESAGUE DE 2"	pto	15.00				15.00
04.03.03	SALIDA VENTILACION DE 2"	pto	4.00				4.00
04.03.04	RED DE DISTRIBUCION DE DESAGUE PVC-SAL 4"	m	19.50				19.50
04.03.05	RED DE DISTRIBUCION DE DESAGUE PVC-SAL 2"	m	27.33				27.33
04.03.06	RED DE VENTILACION PVC-SAL 2"	m	8.30				8.30
04.03.07	RED COLECTORA DE DESAGUE PVC-SAL 4"	m	17.52				17.52
04.03.08	CODO PVC-SAL DE 4"x90°	und	5.00				5.00
04.03.09	CODO PVC-SAL DE 4"x45°	und	4.00				4.00
04.03.10	CODO PVC-SAL SANITARIO DE 4" SALIDA LATERAL 2"	und	4.00				4.00
04.03.11	CODO PVC-SAL DE 2"x90°	und	22.00				22.00
04.03.12	CODO PVC-SAL DE 2"x45°	und	7.00				7.00
04.03.13	YEE PVC-SAL DE 4"x2"	und	21.00				21.00
04.03.14	TRAMPA "P" PVC 2"	und	9.00				9.00
04.03.15	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und	5.00				5.00
04.03.16	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"	und	5.00				5.00
04.03.17	SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL 2"	und	4.00				4.00
04.03.18	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 12"x24" INC. TAPA DE CONCRETO ARMADO	und	6.00				6.00
04.03.19	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	glb	1.00				1.00
04.04	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE						
04.04.01	TANQUE DOMESTICO DE POLIETILENO DE 2500 L	und	1.00				1.00
04.04.02	ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE TANQUE ELEVADO S/DISEÑO	glb	1.00				1.00
04.05	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS						
04.05.01	SUM. E INST. DE TANQUE SEPTICO DE POLIETILENO (BIODIGESTOR)	und	1.00				1.00
04.05.02	RED COLECTORA DE AGUA RESIDUAL PVC-SAL DE 4"	m	10.54				10.54
04.05.03	SALIDA PARA EXTRACCION DE LODOS CON TUBERIA PVC-SAL 2"	m	2.00				2.00
04.05.04	CAJA DE CONCRETO DE 24"x24" INC. TAPA DE C/A° PARA REPARTIR CAUDALES	und	1.00				1.00
04.05.05	CAJA DE CONCRETO DE 32"x32" INC. TAPA DE C/A° PARA EXTRACCION DE LODOS	und	1.00				1.00
04.05.06	IMPLEMENTACION DE ZANJA DE INFILTRACION S/DISEÑO	glb	1.00				1.00
05	INSTALACIONES ELECTRICAS						
05.01	SALIDAS DE INSTALACIONES						
05.01.01	SALIDA CENTRO DE LUZ	pto	58.00				58.00
05.01.02	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	pto	57.00				57.00
05.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pto	20.00				20.00
05.01.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pto	2.00				2.00
05.01.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE	pto	4.00				4.00
05.02	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS						
05.02.01	TUBERIA ELECTRICA PVC-SAP D=50 MM	m	106.00				106.00
05.02.02	TUBERIA ELECTRICA PVC-SAP D=20 MM	m	560.00				560.00
05.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS						
05.03.01	CABLE 2.5MM2 NH-80	m	1002.00				1002.00
05.03.02	CABLE 4MM2 NH-80	m	695.00				695.00
05.03.03	CABLE 6MM2 NH-80	m	50.00				50.00
05.03.04	CABLE 10MM2 NH-80	m	270.00				270.00
05.04	TABLEROS DE DISTRIBUCION						
05.04.01	TABLEROS DE DISTRIBUCION EMPOTRABLE (30 POLOS RIEL DIN)	glb	2.00				2.00
05.05	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION						
05.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16A	und	12.00				12.00
05.05.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A	und	11.00				11.00
05.05.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X20A	und	2.00				2.00
05.05.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X30A	und	2.00				2.00
05.05.05	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A	und	20.00				20.00
05.05.06	INTERRUPTOR HORARIO/CONTACTOR	und	5.00				5.00
05.06	EQUIPOS DE ILUMINACION						
05.06.01	LUMINARIA HERMETICA PIADOSAR LED 1x36W, IP 65, DE 1280X101X101 MM S/ESPECIFICACION	und	28.00				28.00
05.06.02	LUMINARIA LED PARA ADOSAR EN TECHO 20W S/ESPECIFICACION	und	28.00				28.00
05.06.03	LUMINARIA DECORATIVA LED 1x100W PARA POSTE EXTERIOR DE 4" IP 65 S/ESPECIFICACION	und	2.00				2.00
05.06.04	LUZ DE EMERGENCIA LED DE 7.5W	und	7.00				7.00
05.07	CAJAS DE PASE						
05.07.01	CAJA DE PASE DE POLYESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 8x8x4"	und	10.00				10.00
05.08	PRUEBAS Y OTROS						
05.08.01	IMPLEMENTACION INTEGRAL DE POZO A TIERRA VERTICAL	glb	1.00				1.00
05.08.02	BUZONETAS DE C/A° DE 60x60x80 CM INC. TAPA	und	5.00				5.00
05.08.03	PRUEBAS ELECTRICAS SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICADO	und	1.00				1.00

IMELEC S.R.L.
 OSVALDO J. CARDENAS VINCIGLIA
 GERENTE GENERAL

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 22571

IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 22571

PLANILLA DE METRADOS



PLANILLA DE METRADOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
 PROPIETARIO: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA: IMELEC S.R.L.

RESIDENTE: ING. FRANCISCO RAMOS FLORES
 SUPERVISOR: ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

Item	Descripción	Und.	N° de Veces	DIMENSIONES			METRADO	
				Largo	Ancho	Altura	Parcial	Total
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD							
01.01	INSTALACIONES PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA	und	1				1.00	1.00
01.01.02	CASETA PARA RESIDENCIA Y SUPERVISION	m2	1	4.00	3.00		12.00	21.13
	Caseta para Contratista y Supervisión		0.5	4.00	4.00		8.00	
	Almacen de Obra		0.5	1.50	1.50		1.13	
01.01.03	VESTIDORES PARA PERSONAL OBRERO	m2						
01.01.04	SSH PROVISIONALES	mes						
01.01.05	CERCO DE OBRA CON TRONCOS DE MADERA Y MALLA ARPILLERA	m	1	13.40			13.40	47.70
			1	34.30			34.30	
01.01.06	AGUA PARA LA OBRA	mes	0.4				0.40	0.40
	Equivalente a 12 Dias							
01.01.07	ENERGIA PARA LA OBRA	mes						
01.01.08	CASETA DE GUARDIANIA	m2						
01.01.09	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	gib	0.2				0.20	0.20
	Movilizacion de Equipo y Maquinaria							
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA INICIAL Y DURANTE EL PROCESO	mes	0.4				0.40	0.40
	Equivalente a 12 Dias							
01.03	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
01.03.01	IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gib	0.5				0.50	0.50
01.03.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	gib	0.30				0.30	0.30
01.03.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	gib	0.50				0.50	0.50
01.03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gib	0.50				0.50	0.50
01.03.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	gib	0.13				0.13	0.13
01.03.06	RECURSOS PARA EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	gib						
02	ESTRUCTURAS							
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
02.01.01	EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA EN TERRENO SUELTO	m3	1.00	394.80	309.00	1.00	351.03	660.67
	MÓDULO 01 Y MÓDULO 02							
	MÓDULO 01							
	Eje A y F		2.00	56.52	21.92	1.60	171.21	
	Eje 01		1.00	16.38	4.56	1.60	15.78	
	Eje 05		1.00	16.38	3.28	1.60	14.39	
	MÓDULO 02							
	Eje A y F		2.00	56.52	21.92	1.60	171.21	
	Eje 01		1.00	16.38	4.56	1.60	15.78	
	Eje 05		1.00	16.38	3.28	1.60	14.39	
	PATIO CENTRAL		1.00	10.00	1.25	0.55	6.88	
02.01.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SUB-ZAPATAS H=0.50 M TERRENO SUELTO	m3						28.80
	MÓDULO 01							
	Sub Zapata Z-1		10	1.60	1.60	0.40	10.24	
	Sub Zapata Z-2		1	2.85	1.60	0.40	1.82	
	Sub Zapata Z-3		1	3.65	1.60	0.40	2.34	
	MÓDULO 02							
	Sub Zapata Z-1		10	1.60	1.60	0.40	10.24	
	Sub Zapata Z-2		1	2.85	1.60	0.40	1.82	
	Sub Zapata Z-3		1	3.65	1.60	0.40	2.34	
02.01.03	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTO CORRIDO HASTA 1.00 M TERRENO SUELTO	m3						
02.01.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D=1KM	m3						
02.01.05	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO NIVELADO Y COMPACTADO	m3						
02.01.06	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRA GRANDE > 10" H=0.30M	m2						
02.02	CONCRETO SIMPLE							
02.02.01	CONCRETO EN CIMIENTO CORRIDO 1:10+30% G.	m3						
02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTO CORRIDO	m2						
02.02.03	SUB ZAPATA CON CONCRETO f _c = 175kg/cm ² INC. PIEDRA GRANDE >10" H=0.40m	m3						
02.02.04	FALSO PISO CONCRETO f _c = 140kg/cm ² ; H=4"	m2						
02.02.05	CONCRETO EN VEREDAS f _c = 175kg/cm ² DE H=6" ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO	m2						
02.02.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m2						
02.02.07	SOLADO PARA VIGA DE CIMENTACION C/A 1:10 INC. PIEDRA GRANDE 4" H=0.15M	m2						
02.03	CONCRETO ARMADO							
02.03.01	SOBRECIMENTOS							
02.03.01.01	SOBRECIMIENTO: CONCRETO f _c = 140 kg/cm ²	m3						
02.03.01.02	SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2						
02.03.01.03	SOBRECIMIENTO: ACERO DE REFUERZO F _y = 4200 kg/cm ² ; GRADO 60	kg						262.99
	Habilitacion de acero 80% (Ver planilla de Acero)		525.99			50%	262.99	
	Instalacion de acero 20% (Ver planilla de Acero)		525.99			0%	0.00	
02.03.02	ZAPATAS							
02.03.02.01	ZAPATAS: CONCRETO f _c = 210 kg/cm ²	m3						
02.03.02.02	ZAPATAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2						
02.03.02.03	ZAPATAS: ACERO DE REFUERZO F _y = 4200 kg/cm ² ; GRADO 60	kg						413.16
	Habilitacion de acero 80% (Ver planilla de Acero)		826.31			50%	413.16	
	Instalacion de acero 20% (Ver planilla de Acero)		826.31			0%	0.00	
02.03.03	COLUMNAS							

IMELEC S.R.L.

OSVALDO J. GARDENAS VINCHA
GERENTE GENERAL

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
ING. SUPERVISOR DE OBRA

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871



PLANILLA DE METRADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL, EN EL CENTRO AGUJUELA MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
PROPIETARIO: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
CONTRATISTA: IMELEC S.R.L.

RESIDENTE: ING. FRANCISCO RAMOS FLORES
SUPERVISOR: ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

Table with columns: Item, Descripción, Und., N° de Veces, DIMENSIONES (Largo, Ancho, Altura), METRADO (Parcial, Total). Rows include items like COLUMNAS, VIGAS, VIGUETA, DINTEL, LOSA DE PATIO, SOPORTE DE ENCIMERA, ESTRUCTURAS METALICAS, etc.

IMELEC S.R.L.

OSVALDO J. GARDENAS VINCIA
GERENTE GENERAL

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
ING. SUPERVISOR DE OBRA
CIP 98870

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871



PLANILLA DE METRADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
 PROPIETARIO: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA: IMELEC S.R.L.

PRESIDENTE: ING. FRANCISCO RAMOS FLORES
 SUPERVISOR: ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

Item	Descripción	Und.	N° de Veces	DIMENSIONES			METRADO	
				Largo	Ancho	Altura	Parcial	Total
03.06.03.01	PERGOLA DE MADERA SEGUN DISEÑO INC. CARPETAS Y CAJUELAS METALICAS DE SUCCION	gib						
03.07	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA							
03.07.01	VENTANAS DE ALUMINIO							
03.07.01.01	VENTANA TIPO V1 S/DISEÑO DE 1.20x1.60 M	und						
03.07.01.02	VENTANA TIPO V2 S/DISEÑO DE 1.00x2.40 M	und						
03.07.01.03	VENTANA TIPO V3 S/DISEÑO DE 0.70x0.50 M	und						
03.07.02	POSTES METALICOS							
03.07.02.01	POSTE DE ACERO LAC D=4" S/DISEÑO PARA ALUMBRADO EN PATIO CENTRAL	und						
03.08	CERRAJERIA							
03.08.01	BISAGRAS							
03.08.01.01	BISAGRA CAPUCHINAS DE ALUMINIO 4"x4"	und						
03.08.01.02	BISAGRA CAPUCHINAS DE ALUMINIO 3"x3"	und						
03.08.02	CERRADURAS							
03.08.02.01	CERRADURA INTERIOR DE PERILLA TIPO BOLA	und						
03.08.02.02	CERRADURA EXTERIOR DE SOBREPONER DE TRES GOLPES	und						
03.09	VIDRIOS, CRISTALES O SIMILARES							
03.09.01	VIDRIO SISTEMA MODUGLAS 6MM INC. ACCESORIOS	m2						
03.09.02	VIDRIO SISTEMA MODUGLAS 8MM INC. ACCESORIOS	m2						
03.09.03	ESPEJO BORDE BISELADO 0.80x1.35 M	m2						
03.10	PIINTURA							
03.10.01	PASTA MURAL EN INTERIORES INC. BASE IMPRIMANTE	m2						
03.10.02	PIINTURA LATEX SATINADA EN INTERIORES PRIMERA CALIDAD	m2						
03.10.03	PIINTURA LATEX MATE EN EXTERIORES PRIMERA CALIDAD	m2						
03.11	VIARIOS							
03.11.01	JUNTA CON MORTERO ASFALTICO EN VEREDAS	m						
03.11.02	JUNTA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1/2" Y SELLO ELASTOMERICO	m						
03.11.03	FLETE TERRESTRE	gib						
03.11.04	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	gib						
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS							
04.01.01	OVALIN REDONDO DE LOZA VITRIFICADA BLANCO INC. ACCESORIOS	und						
04.01.02	INODORO TIPO ONE PIECE DE LOZA VITRIFICADA BLANCO INC. ACCESORIOS	und						
04.01.03	URINARIO ESTANDAR DE LOZA VITRIFICADA BLANCO INC. ACCESORIOS	und						
04.01.04	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA SOLA POZA INC. ACCESORIOS	und						
04.01.05	LAVADERO DE ROPA DE GRANITO DE DOBLE POZA INC. ACCESORIOS	und						
04.01.06	DUCHA ELECTRICA DE CARBON	und						
04.02	SISTEMA DE AGUA FRIA							
04.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA	pto						
04.02.02	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC-SAP C10 C/R Ø 3/4"	m						
04.02.03	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP C10 C/R Ø 1/2"	m						
04.02.04	CODO PVC-SAP C10 C/R Ø 3/4" x 90°	und						
04.02.05	TEE PVC-SAP C10 C/R Ø 3/4" x 90°	und						
04.02.06	REDUCCION (BUSHING) PVC-SAP C10 C/R DE 3/4" a 1/2"	und						
04.02.07	CODO PVC-SAP C10 C/R Ø 1/2" x 90°	und						
04.02.08	TEE PVC-SAP C10 C/R Ø 1/2" x 90°	und						
04.02.09	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 3/4"	und						
04.02.10	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 1/2"	und						
04.02.11	CAJA O NICHU DE MADERA PARA VALVULAS INC. TAPA METALICA	und						
04.02.12	PRUEBA HIDROSTATICA Y PUESTA EN SERVICIO	gib						
04.03	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION							
04.03.01	SALIDA DE DESAGUE DE 4"	pto						
04.03.02	SALIDA DE DESAGUE DE 2"	pto						
04.03.03	SALIDA VENTILACION DE 2"	pto						
04.03.04	RED DE DISTRIBUCION DE DESAGUE PVC-SAL 4"	m						
04.03.05	RED DE DISTRIBUCION DE DESAGUE PVC-SAL 2"	m						
04.03.06	RED DE VENTILACION PVC-SAL 2"	m						
04.03.07	RED COLECTORA DE DESAGUE PVC-SAL 4"	m						
04.03.08	CODO PVC-SAL DE 4"x90°	und						
04.03.09	CODO PVC-SAL DE 4"x45°	und						
04.03.10	CODO PVC-SAL SANITARIO DE 4" SALIDA LATERAL 2"	und						
04.03.11	CODO PVC-SAL DE 2"x90°	und						
04.03.12	CODO PVC-SAL DE 2"x45°	und						
04.03.13	YEE PVC-SAL DE 4"x2"	und						
04.03.14	TRAMPA "P" PVC 2"	und						
04.03.15	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und						
04.03.16	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"	und						
04.03.17	SOMBREIRO DE VENTILACION PVC-SAL 2"	und						
04.03.18	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 12"x24" INC. TAPA DE CONCRETO ARMADO	und						
04.03.19	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	gib						
04.04	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE							
04.04.01	TANQUE DOMESTICO DE POLIETILENO DE 2500 L	und						
04.04.02	ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE TANQUE ELEVADO S/DISEÑO	gib						
04.05	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS							
04.05.01	SUM. E INST. DE TANQUE SEPTICO DE POLIETILENO (BIODIGESTOR)	und						
04.05.02	RED COLECTORA DE AGUA RESIDUAL PVC-SAL DE 4"	m						
04.05.03	SALIDA PARA EXTRACCION DE LODOS CON TUBERIA PVC-SAL 2"	m						
04.05.04	CAJA DE CONCRETO DE 24"x24" INC. TAPA DE C/A PARA REPARTIR CAUDALES	und						
04.05.05	CAJA DE CONCRETO DE 32"x32" INC. TAPA DE C/A PARA EXTRACCION DE LODOS	und						
04.05.06	IMPLEMENTACION DE ZANJA DE INFILTRACION S/DISEÑO	gib						
05	INSTALACIONES ELECTRICAS							
05.01	SALIDAS DE INSTALACIONES							
05.01.01	SALIDA CENTRO DE LUZ	pto						
05.01.02	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	pto						
05.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pto						
05.01.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pto						
05.01.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE	pto						
05.02	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS							
05.02.01	TUBERIA ELECTRICA PVC-SAP D=50 MM	m						
05.02.02	TUBERIA ELECTRICA PVC-SAP D=20 MM	m						
05.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS							
05.03.01	CABLE 2.5MM2 NH-80	m						
05.03.02	CABLE 4MM2 NH-80	m						
05.03.03	CABLE 6MM2 NH-80	m						

IMELEC S.R.L.
 OSVALDO CARDENAS VARGAS
 GERENTE GENERAL

FRANCISCO RAMOS FLORES
 ING. SUPERVISOR DE OBRA

RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 89371

PLANILLA DE METRADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO AGUICOLA MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
 PROPIETARIO: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 CONTRATISTA: IMELEC S.R.L.

RESIDENTE: ING. FRANCISCO RAMOS FLORES
 SUPERVISOR: ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

Item	Descripción	Und.	N° de Vacos	DIMENSIONES			METRADO	
				Largo	Ancho	Altura	Parcial	Total
05.03.04	CABLE 10MM2 NH-80	m						
05.04	TABLERO DE DISTRIBUCION							
05.04.01	TABLERO DE DISTRIBUCION EMPOTRABLE (30 POLOS RIEL DIN)	gib						
05.05	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION							
05.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16A	und						
05.05.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A	und						
05.05.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X20A	und						
05.05.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X30A	und						
05.05.05	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A	und						
05.05.06	INTERRUPTOR HORARIO/CONTACTOR	und						
05.06	EQUIPOS DE ILUMINACION							
05.06.01	LUMINARIA HERMETICA P/ADOSAR LED 1x36W, IP 65, DE 1280X101X101 MM S/ESPECIFICACION	und						
05.06.02	LUMINARIA LED PARA ADOSAR EN TECHO 20W S/ESPECIFICACION	und						
05.06.03	LUMINARIA DECORATIVA LED 1x100W PARA POSTE EXTERIOR DE 4" IP 65 S/ESPECIFICACION	und						
05.06.04	LUZ DE EMERGENCIA LED DE 7.5W	und						
05.07	CAJAS DE PASE							
05.07.01	CAJA DE PASE DE POLYESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 8x8x4"	und						
05.08	PRUEBAS Y OTROS							
05.08.01	IMPLEMENTACION INTEGRAL DE POZO A TIERRA VERTICAL	gib						
05.08.02	BUZONETAS DE C/A" DE 60x60x80 CM INC. TAPA	und						
05.08.03	PRUEBAS ELECTRICAS SEGUN PROTOCOLO ESPECIFICADO	und						


IMELEC S.R.L.

OSVALDO GARDENAS VINCHA
GERENTE GENERAL

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 85570

RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82371



PLANILLA ACERO DE REFUERZO

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL, EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) RESIDENTE : ING. FRANCISCO RAMOS FLORES
 CONTRATISTA : IMELEC S.R.L. SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

Empalme	0.400	0.450	0.500	le
FC/MI	0.222	0.320	0.565	1.31e
		0.395	0.560	0.994

Detalle	n	Acero de refuerzo									
		Descripción	Ø	Longitud s/emp	Cantidad	# Empalme	6mm ml	8mm ml	3/8 ml	1/2 ml	PARCIAL
02.03.01.03 SOBRECIMIENTO: ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM². GRADO 60											
MÓDULO 01											
Sobrecimientos e=0.25											
Eje 1/F-A											
L= 3.20 m.	2	Vertical	3/8	0.70	12	-	-	-	16.33	-	-
L= 1.00 m.	1	Vertical	3/8	0.70	4	-	-	-	3.03	-	-
L= 8.40 m.	1	Horizontal	3/8	8.40	3	-	-	-	26.00	-	-
Eje 5/F-A											
L= 2.80 m.	2	Vertical	3/8	0.70	10	-	-	-	14.47	-	-
L= 1.80 m.	1	Vertical	3/8	0.70	7	-	-	-	4.90	-	-
L= 8.40 m.	1	Horizontal	3/8	8.40	3	-	-	-	26.00	-	-
Eje F/1-5											
L= 2.75 m.	3	Vertical	3/8	0.70	10	-	-	-	21.35	-	-
L= 2.65 m.	1	Vertical	3/8	0.70	11	-	-	-	7.35	-	-
L= 12.35 m.	1	Horizontal	3/8	12.35	3	1	-	-	42.67	-	-
Eje A/1-5											
L= 2.75 m.	3	Vertical	3/8	0.70	10	-	-	-	21.35	-	-
L= 2.65 m.	1	Vertical	3/8	0.70	11	-	-	-	7.35	-	-
L= 12.35 m.	1	Horizontal	3/8	12.35	3	1	-	-	42.67	-	-
Sobrecimientos e=0.15											
Eje D/1-5											
L= 1.80 m.	3	Vertical	3/8	0.70	7	-	-	-	14.70	-	-
L= 0.55 m.	2	Vertical	3/8	0.70	3	-	-	-	3.97	-	-
L= 2.10 m.	3	Horizontal	3/8	2.10	3	-	-	-	21.00	-	-
L= 1.25 m.	1	Horizontal	3/8	1.25	3	-	-	-	4.17	-	-
Eje C/1-5											
L= 1.80 m.	4	Vertical	3/8	0.70	7	-	-	-	14.70	-	-
L= 2.10 m.	2	Horizontal	3/8	2.10	3	-	-	-	14.00	-	-
L= 4.05 m.	1	Horizontal	3/8	4.05	3	-	-	-	13.50	-	-
Eje 2/A-F											
L= 3.30 m.	2	Vertical	3/8	0.70	12	-	-	-	16.80	-	-
L= 3.70 m.	2	Horizontal	3/8	3.70	3	-	-	-	24.67	-	-
Eje 3/A-F											
L= 3.30 m.	2	Vertical	3/8	0.70	12	-	-	-	16.80	-	-
L= 3.70 m.	2	Horizontal	3/8	3.70	3	-	-	-	24.67	-	-
Eje 3-4/F-D											
L= 3.30 m.	1	Vertical	3/8	0.70	12	-	-	-	8.40	-	-
L= 3.70 m.	1	Horizontal	3/8	3.70	3	-	-	-	24.67	-	-
Eje 4/A-F											
L= 3.30 m.	2	Vertical	3/8	0.70	12	-	-	-	16.80	-	-
L= 3.70 m.	2	Horizontal	3/8	3.70	3	-	-	-	24.67	-	-
División Closett											
L= 0.60 m.	7	Vertical	3/8	0.70	3	-	-	-	14.70	-	-
L= 0.75 m.	7	Horizontal	3/8	0.75	3	-	-	-	17.50	-	-
MÓDULO 02											
Sobrecimientos e=0.25											
Eje 11/F-A											
L= 3.20 m.	2	Vertical	3/8	0.70	12	-	-	-	16.33	-	-
L= 1.00 m.	1	Vertical	3/8	0.70	4	-	-	-	3.03	-	-
L= 8.40 m.	1	Horizontal	3/8	8.40	3	-	-	-	26.00	-	-
Eje 7/F-A											
L= 2.80 m.	2	Vertical	3/8	0.70	10	-	-	-	14.47	-	-
L= 1.80 m.	1	Vertical	3/8	0.70	7	-	-	-	4.90	-	-
L= 8.40 m.	1	Horizontal	3/8	8.40	3	-	-	-	26.00	-	-
Eje F/7-11											
L= 2.75 m.	3	Vertical	3/8	0.70	10	-	-	-	21.35	-	-
L= 2.65 m.	1	Vertical	3/8	0.70	11	-	-	-	7.35	-	-

IMELEC S.R.L.

OSVALDO LARDEN...
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA

C.P. 93871

PLANILLA ACERO DE REFUERZO

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) RESIDENTE : ING. FRANCISCO RAMOS FLORES
 CONTRATISTA : IMELEC S.R.L. SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

Empalme	0.400	0.450	0.500	le
KG/ML	0.222	0.395	0.540	1.3 le

Detalle	n	Acero de refuerzo										PARCIAL
		Descripción	Ø	Longitud s/emp	Cantidad	# Empalme	6mm ml	8mm ml	3/8 ml	1/2 ml		
L= 12.35 m.	1	Horizontal	3/8	12.35	3	1			42.67			
Eje A/1-5												
L= 2.75 m.	3	Vertical	3/8	0.70	10	-			21.35			
L= 2.85 m.	1	Vertical	3/8	0.70	11	-			7.36			
L= 12.35 m.	1	Horizontal	3/8	12.35	3	1			42.67			
Sobrecamientos e=0.15												
Eje D/1-5												
L= 1.80 m.	1	Vertical	3/8	0.70	7	-			4.90			
L= 0.55 m.	2	Vertical	3/8	0.70	3	-			3.97			
L= 2.10 m.	1	Horizontal	3/8	2.10	3	-			7.00			
L= 1.25 m.	1	Horizontal	3/8	1.25	3	-			4.17			
Eje C/9-11												
L= 1.80 m.	2	Vertical	3/8	0.70	7	-			9.80			
L= 2.10 m.	2	Horizontal	3/8	2.10	3	-			14.00			
Eje 9-10/D-F												
L= 1.35 m.	2	Vertical	3/8	0.70	6	-			7.70			
L= 3.15 m.	1	Horizontal	3/8	3.15	3	-			10.50			
Eje 8-9/F-E												
L= 3.30 m.	1	Vertical	3/8	0.70	12	-			8.40			
L= 3.70 m.	1	Horizontal	3/8	3.70	3	-			12.33			
Eje 9-A-F												
L= 3.30 m.	1	Vertical	3/8	0.70	12	-			8.40			
L= 2.50 m.	1	Vertical	3/8	0.70	9	-			6.53			
L= 0.65 m.	1	Vertical	3/8	0.70	3	-			2.22			
L= 3.70 m.	2	Horizontal	3/8	3.70	3	-			24.67			
Eje 9-10/D-F												
L= 2.50 m.	1	Vertical	3/8	0.70	9	-			6.53			
L= 2.80 m.	1	Horizontal	3/8	2.80	3	-			9.33			
Eje 10/A-F												
L= 3.30 m.	1	Vertical	3/8	0.70	12	-			8.40			
L= 2.50 m.	1	Vertical	3/8	0.70	9	-			6.53			
L= 0.65 m.	1	Vertical	3/8	0.70	3	-			2.22			
L= 3.70 m.	2	Horizontal	3/8	3.70	3	-			24.67			
División Closett												
L= 0.60 m.	3	Vertical	3/8	0.70	3	-			6.30			
L= 0.75 m.	3	Horizontal	3/8	0.75	3	-			7.50			

IMELEC S.R.L.

 OSVALDO J. CARDENAS VINCHA
 GERENTE GENERAL

02.03.02.03 ZAPATAS: ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2; GRADO 60												
MÓDULO 01												
Z-1	10	Vertical	1/2	1.66	9	-						149.40
	10	Horizontal	1/2	1.66	9	-						149.40
Z-2	1	Vertical	1/2	1.66	15	-						25.32
	1	Horizontal	1/2	2.91	9	-						26.19
Z-3	1	Vertical	1/2	1.66	15	-						31.96
	1	Horizontal	1/2	3.71	9	-						33.39
MÓDULO 02												
Z-1	10	Vertical	1/2	1.66	9	-						149.40
	10	Horizontal	1/2	1.66	9	-						149.40
Z-2	1	Vertical	1/2	1.66	15	-						25.32
	1	Horizontal	1/2	2.91	9	-						26.19
Z-3	1	Vertical	1/2	1.66	15	-						31.96
	1	Horizontal	1/2	3.71	9	-						33.39

IMELEC S.R.L.

 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 62871

02.03.03.03 COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2; GRADO 60												
MÓDULO 01												
C-01	14	Vertical	1/2	5.23	4	-						292.68
	14	Horizontal	3/8	5.23	4	-						292.68

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 62871

PLANILLA ACERO DE REFUERZO

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL, EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACHA, DEPARTAMENTO TACHA"
 PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) RESIDENTE : ING. FRANCISCO RAMOS FLORES
 CONTRATISTA : IMELEC S.R.L. SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

Empalme	0.400	0.450	0.500	le
KG/ML	0.222	0.395	0.560	1.31e

Detalle	n	Acero de refuerzo										PARCIAL
		Descripción	Ø	Longitud s/emp	Cantidad	# Empalme	6mm ml	8mm ml	3/8 ml	1/2 ml		
	14	Estribos	3/8	0.93	27	-			351.54			
MODULO 02												
C - 01	14	Vertical	1/2	5.23	4	-			292.88			
	14	Vertical	3/8	5.23	4	-			292.88			
	14	Estribos	3/8	0.93	27	-			351.54			1,304.00
02.03.05.03 VIGA DE CONEXION: ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2; GRADO 60												
MODULO 01												
Eje A	1	Horizontal	1/2	12.67	6	1						79.92
	1	Estribos	3/8	1.23	81	-			99.63			
Eje F	1	Horizontal	1/2	12.67	6	1						79.92
	1	Estribos	3/8	1.23	81	-			99.63			
Eje I	1	Horizontal	1/2	8.72	6	-						52.32
	1	Estribos	3/8	1.23	53	-			65.19			
Eje 5	1	Horizontal	1/2	8.72	6	-						52.32
	1	Estribos	3/8	1.23	55	-			67.65			
MODULO 02												
Eje A	1	Horizontal	1/2	12.67	6	1						79.92
	1	Estribos	3/8	1.23	81	-			99.63			
Eje F	1	Horizontal	1/2	12.67	6	1						79.92
	1	Estribos	3/8	1.23	81	-			99.63			
Eje 7	1	Horizontal	1/2	8.72	6	-						52.32
	1	Estribos	3/8	1.23	55	-			67.65			
Eje 11	1	Horizontal	1/2	8.72	6	-						52.32
	1	Estribos	3/8	1.23	53	-			65.19			897.74
02.03.07.03 COLUMNETAS: ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2; GRADO 60												
MODULO 01												
C - 02	14	Vertical	3/8	4.56	4	-			256.36			
	14	Estribos	6mm	0.64	20	-	179.20					
MODULO 02												
C - 02	12	Vertical	3/8	4.56	4	-			218.88			
	12	Estribos	6mm	0.64	20	-	153.60					339.46
02.03.09.03 LOSA PATIO CENTRAL: ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2; GRADO 60												
	1	Vertical	3/8	3.00	42	-			126.60			
	1	Horizontal	3/8	10.30	13	1			139.75			149.16

IMELEC S.R.L.
 OSVALDO C. CORDOBA VILCHIA
 GERENTE GENERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

PANEL FOTOGRAFICO

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA,
DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

CONTRATISTA : IMELEC S.R.L.

IMELEC S.R.L.

SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

 **FONDEPES**
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

[Handwritten signature]

SAMA - TACNA
REGION TACNA

PANEL FOTOGRAFICO

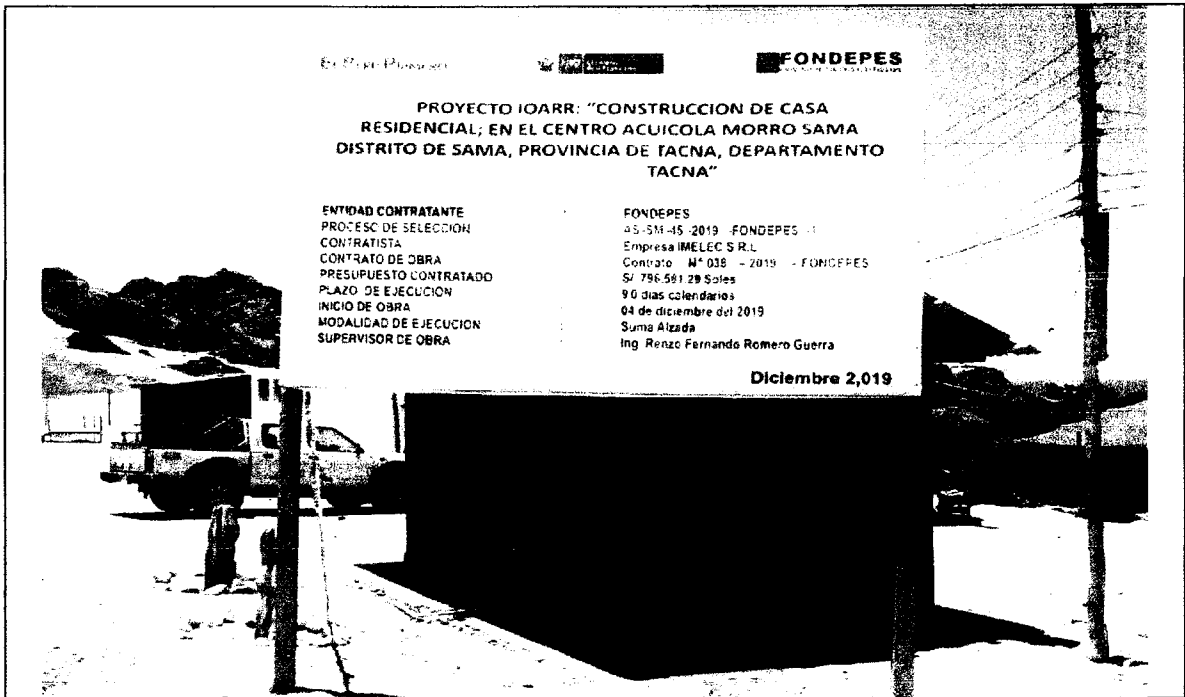


Foto N° 01: VISTA DEL CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA.

IMELEC S.R.L.

OSVALDO ZARUBAS VINCHA
GERENTE GENERAL



RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 89674

Foto N° 02: INSTALACION DE CASETA PARA RESIDENCIA Y SUPERVISION

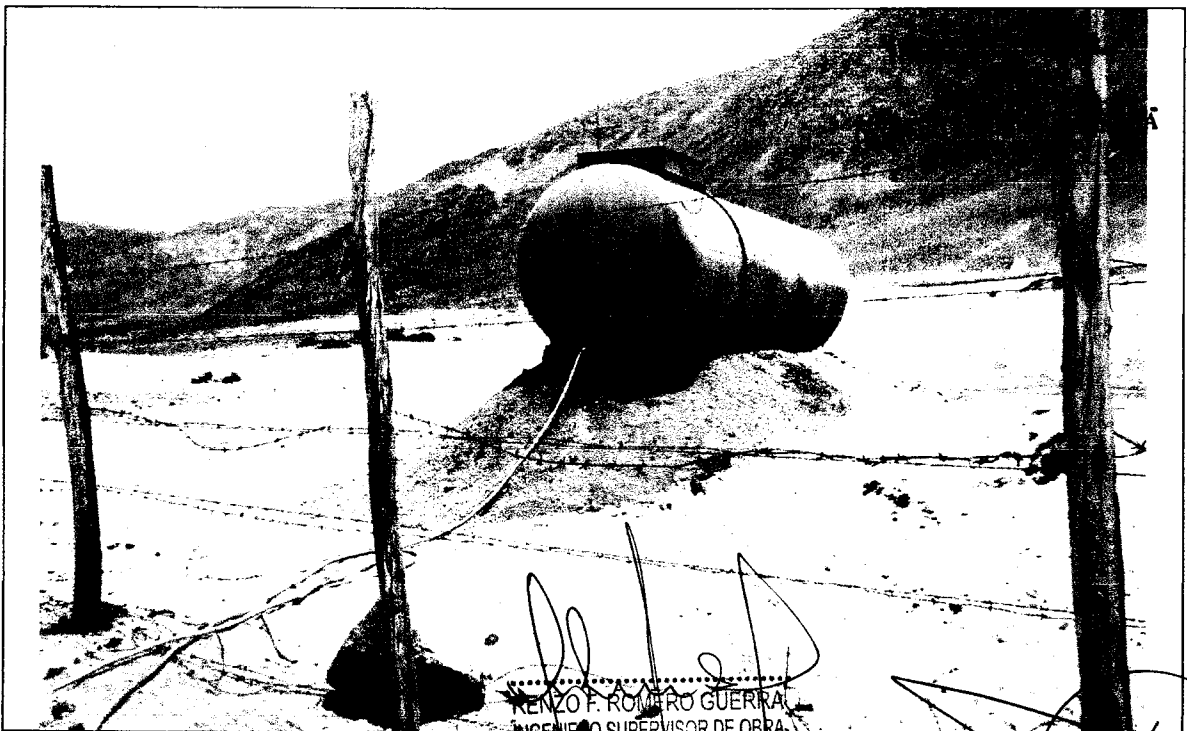
IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 96570

"CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA - DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"



Foto N° 03: INSTALACION DE CERCO PROVISIONAL EN OBRA.



Renzo F. Romero Guerra
RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 32371

Foto N° 04: INSTALACION DE TANQUE CISTERNA PARA ABASTECER AGUA EN LA OBRA.

IMELECS.R.L.

Francisco Ramos Flores
FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 26570

"CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO
SAMA - DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"



Foto N° 05: TRAZO Y NIVELACION INICIAL CON NIVEL TOPOGRAFICO.

IMELEC S.R.L.

OSVALDO CALINENIS VINCHA
GERENTE GENERAL

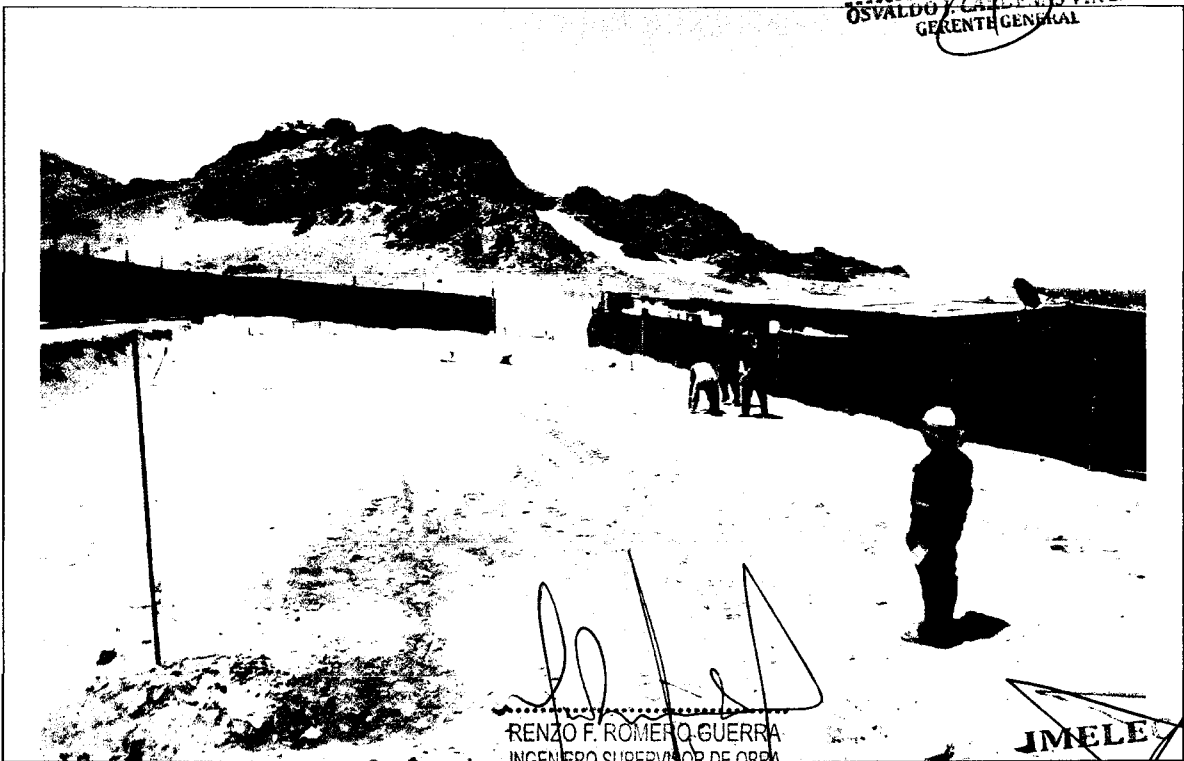


Foto N° 06: TRAZO Y REPLANTEO PARA LA EXCAVACION DE CIMENTACIONES.

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS

CIP 8227

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO FLORES
ING. EN CIVIL

"CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO
SAMA - DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"



Foto N° 07: ENTREGA DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

IMELEC S.R.L.

[Signature]
OSVALDO Y. CARDENAS WINCHA
GERENTE GENERAL



Foto N° 08: CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIANTE LAS CHARLAS DIARIAS ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS E INDUCCION.

[Signature]
RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871

IMELEC S.R.L.
[Signature]
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 90570

"CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA - DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

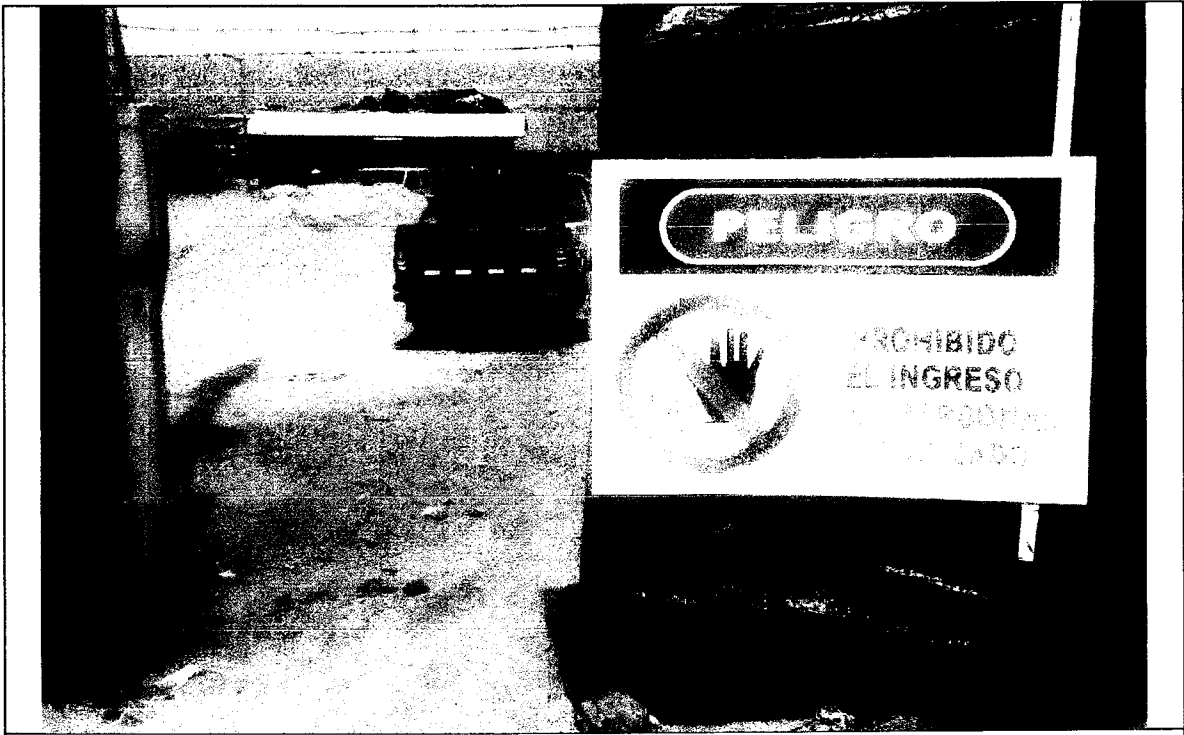


Foto N° 09: INSTALACION DE SEÑALIZACION EN EL INGRESO A LA OBRA

IMELEC S.R.L.

OSVALDO J. CARDENAS VINCHA
GERENTE GENERAL



Foto N° 10: INSTALACION DE SEÑALIZACION ADVIRTIENDO LA PRESENCIA DE MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO.

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 8287

FERNANDO RAMOS FLORES
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 90570

"CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO
SAMA - DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"



Foto N° 11: INSTALACION DE CINTA DE SEGURIDAD, MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR ACCIDENTES.



Foto N° 12: EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA, PARA NIVELAR EL TERRENO.

IMELEC S.R.L.

OSVALDO J. CARDENAS VINCHA
GERENTE GENERAL

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 95870

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82271

"CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO
SAMA - DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"



Foto N° 13: EXCAVACION DE LAS ZAPATAS Y SUB - ZAPATAS CON MAQUINARIA, EN EL MODULO I Y MODULO II.

IMELEC S.R.L.



OSVALDO J. CARDENAS VARELA
INGENIERO GENERAL

Foto N° 14: TRABAJOS DE DEMOLICION POR PROSENCIA DE ROCA EN LAS ZAPATAS Y SUB-ZAPATAS.

RENZO F. RIVERA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS
C.P. 22371

FRANCISCO PABLO ESCOBAR
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS
C.P. 22371

"CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO
SAMA - DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA. DEPARTAMENTO TACNA"



Foto N° 15: VERIFICACION DE LAS EXCAVACIONES EN PRESENCIA DEL RESIDENTE, SUPERVISION Y COORDINADOR DE LA ENTIDAD.

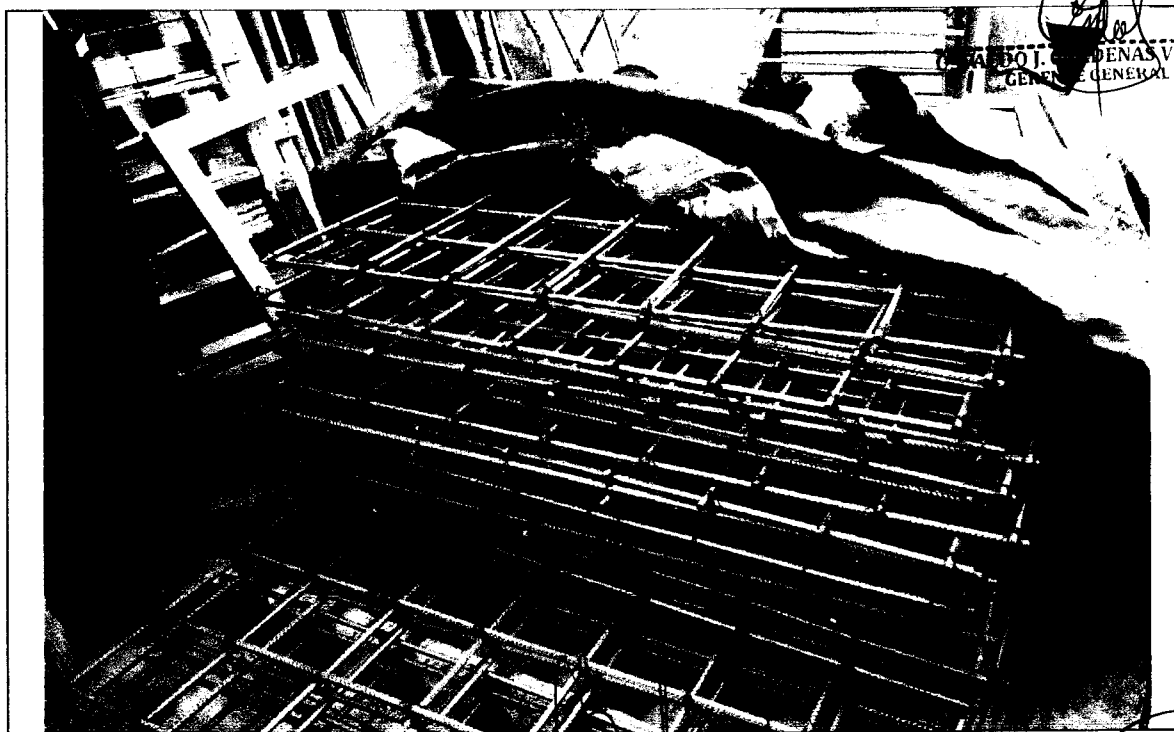


Foto N° 16: HABILITACION DE PARRILLAS PARA ZAPATAS.

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
ING. RESIDENTE DE OBRA
CIP 91570

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 88921

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
ING. RESIDENTE DE OBRA
CIP 91570

"CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA - DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"



Foto N° 17: HABILITACION DE ESTRIBOS PARA EL ARMADO DE ACERO EN COLUMNAS, COLUMNETAS , VIGAS Y VIGAS DE CIMENTACION.

IMELEC S.R.L.

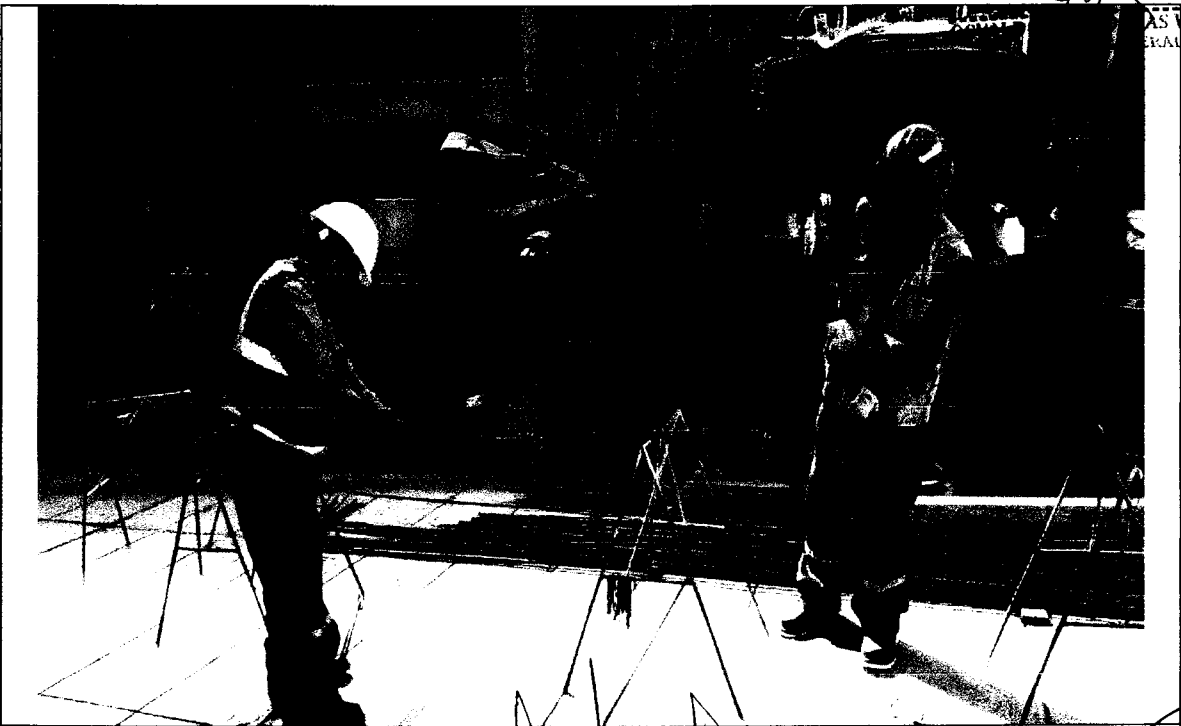


Foto N° 18: ARMADO DE ACERO EN COLUMNAS Y COLUMNETAS.

IMELEC S.R.L.

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82671

FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Registrado de Obra
CIP 93370

"CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO
SAMA - DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA,
DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

CONTRATISTA : IMELEC S.R.L.

IMELEC S.R.L.

SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

 **FONDEPES**
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

SAMA - TACNA
REGION TACNA

MP/2019/4427496



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa IMELEC S.R.L. bajo la Póliza de Pensiones No. 7011900064524 y contrato de Salud No. 7021900074778, con vigencia del 01/12/2019 hasta el 31/12/2019, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : OBRAS DE ELECTRIFICACION Y OBRAS CIVILES EN LA REGIÓN TACNA, MOQUEGUA E ITE.

ASEGURADO(S)

1 DNI	00489235	CARDENAS YUPA, ALFREDO MATEO
2 DNI	44793683	CHURA LIMACHI, EDWIN
3 DNI	00460163	CORNEJO GALLEGOS, WILLAMS ALEJANDRO
4 DNI	00487474	CRUZ MAMANI, ALIPIO
5 DNI	44761782	CRUZ MAMANI, EDSON UBER
6 DNI	00495705	ESTRADA AQUINO, KENEDY MARCIAL
7 DNI	00430136	FLORES MANCILLA, JOSE
8 DNI	41413605	GOMEZ TUYO, WINSTON
9 DNI	47664803	LOPE MAMANI, JAVIER
10 DNI	71378950	LUQUE MARIACA, ANTHONY JUAN
11 DNI	00460321	MACHACA MAMANI, PLASIDO FREY
12 DNI	00460372	MACHACA QUISPE, ROSENDO
13 DNI	00661286	MAMANI ARRAZOLA, JOSE
14 DNI	42290683	MAMANI SIÑA, JULIAN
15 DNI	40276171	MULLISACA MAMANI, RENE ALFREDO
16 DNI	45464851	QUENTA LUQUE, YHINO HUGO
17 DNI	76128738	QUISPE MAMANI, LUIS ANTONIO
18 DNI	00795672	QUIÑONES BARRIOS, VICTOR JULIO
19 DNI	46270390	RUELAS CHAMBI, EDDY JOVANI
20 DNI	01309429	RUELAS COILA, FRANCISCO
21 DNI	00508928	SUPO HALLASI, ALFREDO ELEUTERIO
22 DNI	00671826	TARQUI ZAPANA, AGAPITO
23 DNI	00402909	VALERIANO MAMANI, MOISES
24 DNI	41980073	VALERIANO MAMANI, RUBEN NOE
25 DNI	71090199	VENTURA CONDORI, RICARDO SKINNER

IMELEC S.R.L.

OSVALDO J. GARDEMAS VINCHA
 GERENTE GENERAL

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

02/12/2019 11:03:53 am
 DONGO ARTEAGA, SUSAN MELISSA

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Presidente de Obra

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

MP/2019/4427496



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

IMELEC S.R.L.

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obras
CIP 20175

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS
CIP 22271

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

MP/2019/4434082

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa IMELEC S.R.L. bajo la Póliza de Pensiones No. 7011900064524 y contrato de Salud No. 7021900074778, con vigencia del 01/12/2019 hasta el 31/12/2019, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : OBRAS DE ELECTRIFICACION Y OBRAS CIVILES EN LA REGIÓN TACNA, MOQUEGUA E ITE.

ASEGURADO(S)


1	DNI	44010605	APAZA FUENTES DIEGO ARMANDO
2	DNI	46804769	CARDENAS NUÑEZ PAUL OMAR
3	DNI	00414458	CURO CHATA JORGE
4	DNI	44086192	IDONE ORE VICTOR LEWIS
5	DNI	42733320	PALACIOS AROCUTIPA GUSTAVO ALEXANDER
6	DNI	42180465	RAMOS FLORES FRANCISCO
7	DNI	70679883	VALENCIA CANDIA IVAN JHON

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

03/12/2019 08:15:17 pm
 DONGO ARTEAGA, SUSAN MELISSA


IMELEC S.R.L.



 GWALDO I. CARDENAS PINO
 GERENTE GENERAL



.....
 ISAAC RAMIREZ MOLINA
 UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).


 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82071


IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 14270

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIONES
NÚMERO DE PÓLIZA : 7011900064524

RECIBO : 109596047


CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : IMELEC S.R.L.
RUC : 20119916705
Dirección Principal : RAMON COPAJA MZ M LOTE 12
Actividad : 951202 - REPARACIONES ELECTRICAS
Colectivo Asegurado : OBRAS DE ELECTRIFICACION Y OBRAS CIVILES EN LA

Inicio de Vigencia : 01/12/2019 **Vencimiento** : 01/04/2020
Inicio de Vigencia Aplicación : 01/12/2019 **Vencimiento de Aplicación** : 31/12/2019
Forma de Pago : MENSUAL **Último día de Pago** : 12/12/2019
Moneda : SOLES
Fecha de Emisión : 02/12/2019

IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
OBREROS ALTO RIESGO	25	37500.00	0.89	333.75

IMELEC S.R.L.


Prima Neta :	333.75
Der.Emis. :	10.01
Interés :	0.00
IGV :	61.88
Prima Total :	405.64


El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos. (Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

GRUPO MAPFRE PERU


RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

IMELEC S.R.L.


RENZO F. ROMERO GUERRA
 Ing. Supervisor de Obra
 CIP 82871



SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD

NÚMERO DE PÓLIZA : 7021900074778

RECIBO : 109596048

CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : IMELEC S.R.L.
 RUC : 20119916705
 Dirección Principal : RAMON COPAJA MZ M LOTE 12
 Actividad : 951202 - REPARACIONES ELECTRICAS
 Colectivo Asegurado : OBRAS DE ELECTRIFICACION Y OBRAS CIVILES EN LA

Inicio de Vigencia : 01/12/2019 Vencimiento : 01/04/2020
 Inicio de Vigencia Aplicación : 01/12/2019 Vencimiento de Aplicación : 31/12/2019
 Forma de Pago : MENSUAL Último día de Pago : 12/12/2019
 Moneda : SOLES
 Fecha de Emisión : 02/12/2019

IMPORTE DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
TRABAJADORES ALTO RIESGO	25	37500.00	0.85	318.75

IMELEC S.R.L.

OSWALDO CARRANZA SANCHEZ
GERENTE GENERAL

Prima Neta :	318.75
Der.Emis. :	0.00
Interés :	0.00
IGV :	57.38
Prima Total :	376.13

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

GRUPO MAPFRE PERU

RENZO F. ROLERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS
CIP 2287

IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Responsable de Obras
CIP 20570


MAPFRE

CAPITAL SOCIAL S/. 257,374,769

PAG: 1

 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - RUC: 20202380621
 Direccion: Av. Veintiocho de Julio 873, Miraflores -Telefono: 213-3333

**POLIZA DE SEGURO DE
CONSTRUCCION**

POLIZA 2301933003004	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 04/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 01/06/2020 12:00 Hrs.

CODIGO SBS: RG0743110039

Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

CONDICIONES PARTICULARES

TIPO	N°MOV.	F. EMISION	VIGENCIA DE POLIZA	FORMA DE PAGO	%PARTICIP.	RIESGOS	MONEDA
Emision	0	03/12/2019	04/12/2019 - 01/06/2020	Imeo	100 %	1	S/

DATOS DEL CONTRATANTE

NOMBRE IMELEC S.R.L.	RUC 20119916705
DIRECCION Ramon Copaja Mz M Lote 12 Alto De La Alianza	
EMAIL 247122	TELEFONO
ACTIVIDAD ECONOMICA	

DATOS DEL CORREDOR, PROMOTOR, COMERCIALIZADOR O BANCASEGUROS

NOMBRE Susan Melissa Dongo Arteaga	NOMBRE IMELEC S.R.L.
CODIGO SBS : CODIGO INTERNO : 21874	CODIGO SBS : CODIGO INTERNO : OSVALDO J. GARDENAS VINCHA GERENTE GENERAL
IMPORTE DE LA COMISION 200.74	

Los cargos de agenciamiento por la intermediación de corredores, contratación de promotores, comercializadores y bancaseguros podrán considerar el otorgamiento de bonificaciones, premios y/u otros beneficios en función al cumplimiento de metas de producción y resultados.

DATOS DE COBRO

DIRECCION DE COBRO Asoc. Ramon Copaja Mz M Lote 12 Alto De La Alianza Tacna Tacna
COBRADOR Doris Elena Flores Guillen

PRIMAS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTE
Prima Comercial	1,476.87
Prima Comercial * I.G.V	1,742.71

 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS
 CIP 8287



POLIZA 2301933003004	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 04/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 01/06/2020 12:00 Hrs.

Dentro de los 30 días siguientes de recibida la póliza por EL ASEGURADO, por EL CONTRATANTE o por EL CORREDOR en su caso, se podrán formular observaciones respecto de su contenido, solicitando por escrito su rectificación en forma precisa. Transcurrido ese plazo sin que medie observación, se tendrá por aceptada la póliza emitida.

En caso el texto de la Póliza difiera del contenido de la propuesta u oferta, dicha aceptación se presume solo cuando LA COMPAÑÍA advierte al CONTRATANTE en forma detallada y mediante documento adicional y distinto a la póliza, que existen esas diferencias y que dispone de treinta (30) días para rechazarlas.

Se adjuntan Cláusulas Generales de Contratación CGCRRGG01122013 y Condiciones Generales de la póliza: CGRC01122013

que EL CONTRATANTE y EL ASEGURADO del seguro declaran expresamente conocer y aceptar, y que con las presentes Condiciones Particulares y Solicitud de Seguro forman el contrato de seguros del que son parte integrante y no tienen valor por separado.

● DATOS PERSONALES\b0

El contratante del seguro autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente para la emisión de la póliza, así como la actualización y cesión de los mismos para los fines detallados en el Artículo 23 de las Cláusulas Generales de Contratación cuyo texto declara conocer en su integridad.

IMELEC S.R.L.

OSVALDO CARDENAS VINCIA
GERENTE GENERAL

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMIREZ
GERENTE GENERAL

RIENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82571



POLIZA 2301933003004	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 04/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 01/06/2020 12:00 Hrs.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia, desavenencia o reclamación relacionada o derivada del contrato de seguro, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación, será resuelta por los jueces y tribunales de la ciudad de Lima o del lugar donde domicilia el CONTRATANTE, ASEGURADO O BENEFICIARIO, según corresponda de acuerdo a Ley. Adicionalmente las partes, una vez producido el siniestro, cuando se trate de controversias referidas al monto reclamado, podrán convenir el sometimiento a la jurisdicción arbitral siempre y cuando las diferencias superen los límites económicos por tramos fijados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Sin perjuicio de lo antes indicado, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o BENEFICIARIO podrán presentar su reclamo ante la Defensoría del Asegurado; su denuncia o reclamo según corresponda, ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, entre otros según corresponda.

COMUNICACIONES

Las partes acuerdan como mecanismo de comunicación entre LA COMPAÑÍA y el CONTRATANTE y/o ASEGURADO, el domicilio físico, electrónico y/o telefónico, a las direcciones y números telefónicos que aparecen en las presentes condiciones particulares.

Las comunicaciones cursadas por los contratantes, asegurados o beneficiarios al comercializador, sobre aspectos relacionados con el seguro contratado, tienen los mismos efectos que si hubieran sido presentadas a la empresa. En este sentido, se entienden que dichas comunicaciones son recibidas en la misma fecha por la empresa.

Los pagos efectuados a los comercializadores por los contratantes del seguro, o terceros encargados del pago, se consideran abonados a la empresa en la fecha de realización del pago. Asimismo, la empresa debe prever que el comercializador lleve el control de dichos pagos.

MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

IMELEC S.R.L.
OSVALDO J. CARDENAS VENCHIA
GERENTE GENERAL

EL ASEGURADO

GENERADO POR : EDIOSES

IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 80070

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871


MAPFRE

Pag. 1

Miraflores, 03 de Diciembre del 2019

Señor(es):

Imelec S.R.L.

RUC 20119916705

Asoc. Ramon Copaja Mz M Lote 12 Alto De La Alianza Tacna Tac

Moneda: S/

Corredor 21874 Susan Melissa Dongo Arteaga

De nuestra consideración:

Es grato informarle(s), que nuestra compañía está otorgándole(s) las facilidades de pago que más abajo se detallan.

Importante:

- a) En las fechas indicadas en la columna "obligación de pago" se inicia el plazo establecido para el pago de cada uno de los recibos. La primera cuota del presente convenio vence el primer día de vigencia de su póliza.
- b) En la columna "fecha limite de pago" se indica el plazo del que usted dispone para pagar la prima adeudada, la falta de pago podrá implicar que MAPFRE no estará obligada a cubrir los siniestros ocurridos mientras la cobertura se encuentre suspendida.

POLIZA	SUPLEMENTO	PRIMA COMERCIAL	INTERESES	I.G.V.	TOTAL
2301933003004	0	1,476.87		265.84	1,742.71
					1,742.71

NRO. CUOTA	MONEDA	IMPORTE	FECHA DE		SITUACION RECIBO
			OBLIGACION PAGO	LIMITE DE PAGO	
109616428	SOLES	1,742.71	04/12/2019	03/01/2020	PENDIENTE
					1,742.71

TCEA : 0.00 %

TEA : 0.00 %

IMELEC S.R.L.

OSVALDO CARDENAS VINCIA
GERENTE GENERAL

Lo invitamos a realizar el pago de la cuota adeudada por cualquiera de los siguientes medios:

Ingresando en la WEB de su banco @

En cualquiera de los bancos que se indican, brindando el número del DNI, RUC o carnet de extranjería del contratante de la póliza

Afiliándote al cargo en cuenta y/o tarjeta de crédito MasterCard, VISA, DINERS y American Express

 BBVA
 BCP
 SCOTIABANK
 DE LA NACION (solo presencial)
 FALABELLA
 BIF
 INTERBANK

 Para mayor información, puede comunicarse con nuestro servicio de atención 24 horas (SI24) llamando a los telefonos 01-2133333 en Lima y para Provincias 0801-1-1133 o consultando nuestra web www.mapfreperu.com/oim-clientes

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente en el Perú
CIP 82811RENZO F. TORO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82811



MAPFRE

Miraflores , 03 de Diciembre del 2019

Señor(a)(rta)(es):

Imelec S.R.L.

RUC 20119916705

Asoc. Ramon Copaja Mz M Lote 12 Alto De La Alianza Tacna Tac

Moneda: S/

Corredor: 21874 Susan Melissa Dongo Arteaga

Atentamente ,

FELIPE RIOS GAJATE
DIRECTOR UNIDAD DE GENERALES

CLIENTE ACEPTADO

IMELEC S.R.L.

OSVALDO J. CARRERA VILCHA
GERENTE GENERAL

IMELEC S.R.L.
TRANSACCIONES Y SERVICIOS
S.A. - Calle Comercio 1007A
Lima - Perú - Teléfono: 965 500 000
CIP 965 500 000

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871

**MAPFRE**
**POLIZA DE SEGURO DE
CONSTRUCCION**

PAG: 1

POLIZA 2301933003004	COLECTIVO	SUPLEMENTO
VIGENCIA DESDE 04/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 01/06/2020 12:00 Hrs.	APLICACION

TIPO DE MOVTO <i>Emision</i>	SPTO. 0	FECHA ACTU. 03/12/2019	FECHA INI.POL. 04/12/2019	Nro.RSGOS 1	MON. S/	PRIMA NETA. 1,476.87
---------------------------------	------------	---------------------------	------------------------------	----------------	------------	-------------------------

DATOS DEL ASEGURADO
 NOMBRE DEL ASEGURADO
Imelec S.R.L.

RUC 20119916705

UBICACION DEL RIESGO
Centro Acuicola Morro Sama Las Yaras, Tacna, Tacna, Tacna, Peru
DATOS DEL RIESGOINTERES ASEGURADO : *Segun Hoja Anexa*

VALOR FINAL DE LA OBRA :	796,581	VALOR DE LOS EQUIPOS :	VALOR FINAL DE CONSTRUCCION : 796,581
PERIODO DE LA OBRA (MESES) :	5		PERIODO DE PRUEBA 1 (MESES) :

COBERTURAS CONTRATADAS

DESCRIPCION DE COBERTURA	SUMA ASEGURADA	DEDUCIBLE DE COBERTURA		
		VARIABLE	MINIMO/FIJO	MAXIMO
<i>Principal " A "</i>	<i>796,581</i>	<i>10.00%</i>	<i>Monto Indemnizable S/</i>	<i>7,500</i>
<i>Terremoto " B "</i>	<i>796,581</i>	<i>10.00%</i>	<i>Monto Indemnizable S/</i>	<i>15,000</i>
<i>Inundacion " C "</i>	<i>796,581</i>	<i>10.00%</i>	<i>Monto Indemnizable S/</i>	<i>15,000</i>
<i>Huelga, Motin Y Conmocion Civil</i>	<i>796,581</i>	<i>10.00% de la Perdida</i>	<i>S/</i>	<i>15,000</i>
<i>Terrorismo</i>	<i>796,581</i>	<i>10.00% de la Perdida</i>	<i>S/</i>	<i>15,000</i>

CLAUSULAS ADHERIDAS

- 230 - Cond. Grls. Del Seguro Contra Todo Riesgo Para Contratistas
 000 - Clausulas Generales De Contratacion - Cgrrgg01122013
 001 - Huelgas, Motin Y Conmociones Civiles
 001A - Terrorismo
 008 - Estructuras En Zonas Sismicas

IMELEC S.R.L.

 ESCUDO CARDENAS VINCEN
 GERENTE GENERAL

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

NOTA: Este documento sustituye a los movimientos de numeración y fecha anterior

POLIZA ANTERIOR Nro :

GENERADO POR :

EL ASEGURADO

IMELEC S.R.L.

 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 96579

 RENZO F. ROJERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82271



POLIZA 2301933003004	COLECTIVO	SUPLEMENTO 0
VIGENCIA DESDE 04/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 01/06/2020 12:00 Hrs.	APLICACION 0

CONDICIONES ESPECIALES Y/O DATOS ANEXOS

Se excluyen los siniestros ocurridos previo a la fecha de emisión de la presente póliza o a la fecha de inicio de la cobertura provisional otorgada, si la hubiera.

Obra .-

CONSTRUCCION DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA- DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA.

Lugar .-

CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA- SAMA LAS TARAS-TACNA-TACNA.

Monto de la Obra .-

S/ 796,581.29

Duración .-

Desde 04/12/2019
Hasta: 01/06/2020

IMELEC S.R.L.
OSVATEDOR CALIFICADO
CIP 8287

Coberturas	Suma Asegurada	Deducibles
- Cobertura "A" - Principal. Daños materiales en la obra por accidentes, incendio.	S/ 796,581.29	10% del monto indemnizable mínimo S/ 7,500.00
- " B " - Terremoto, temblor, erupción volcánica	S/ 796,581.29	10% del monto indemnizable mínimo S/ 15,000.00
- " C " - Daños por Inundación, huayco, lluvia, derrumbe, vientos, deslizamientos de terreno.	S/ 796,581.29	10% del monto indemnizable mínimo S/ 15,000.00
- " D " - Mantenimiento simple (06 meses)	S/ 796,581.29	10% del monto indemnizable mínimo S/ 7,500.00
- HMCCDMVT	S/ 796,581.29 Por evento / Vigencia	10% del monto indemnizable, mínimo S/ 15,000.00
- " E " y " F " - Resp. Civil cruzada	S/ 199,145.32 Por evento / Vigencia	Solo Daños Materiales: 10% del monto indemnizable mínimo S/ 7,500.00
- " G " - Rem. Escombros	S/ 199,145.32	El de la cobertura afectada.
- Propiedad adyacente (OPA)	S/ 199,145.32	10% del monto indemnizable, mínimo S/ 7,500.00
- Riesgos de Diseño	S/ 199,145.32	10% del monto indemnizable mínimo S/ 7,500.00
- Vibraciones y Debilitamiento de bases	S/ 199,145.32	10% del monto indemnizable, mínimo S/ 15,000.00
- Flete Aéreo	S/ 5,000.00	10% del valor del flete mínimo S/ 1,000.00
- Gastos extraordinarios	S/ 5,000.00	El de la cobertura afectada.

Tasa Neta .-

1.80% (por mil)

Cláusulas y Condiciones Adicionales .-

IMELEC S.R.L.

RENZO E. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERIOR DE OBRAS
CIP 8287



POLIZA 2301933003004	COLECTIVO	SUPLEMENTO 0
VIGENCIA DESDE 04/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 01/06/2020 12:00 Hrs.	APLICACION 0

Cláusulas Generales de Contratación

Condicionado General contra Todo Riesgo para Contratistas (CAR)

ENDOSO 001 - Huelga, Motín y Comociones Civiles

ENDOSO 001A - Terrorismo

ENDOSO 005 - Condiciones Especiales concernientes al Cronograma de Construcción y/o Montaje.

ENDOSO 006 - Gastos Extraordinarios (Horas extras, trabajos nocturnos, trabajos en días feriados y flete expreso).

ENDOSO 007 - Flete aéreo

ENDOSO 102 - Cables y Tuberías subterráneas

ENDOSO 008 - Estructuras en Zonas Sísmicas

ENDOSO 107 - Campamentos y Almacenes de Materiales de Construcción:

Límite para campamentos y por unidad de Almacenaje de material hasta 15% del Valor de la Obra, máximo S/. 300,000.

ENDOSO 108 - Obligación relativa al Almacenaje de materiales de construcción

ENDOSO 110 - Medidas de Seguridad contra Precipitación, Avenida e Inundación (Período de Recurrencia: 20 años). La Compañía de Seguros solo indemnizará los siniestros de lluvia y/o inundación y/o precipitación y/o avenida en caso el asegurado demuestre que las lluvias que dieron origen al siniestro, superaron en el sitio de la obra el nivel máximo de lluvias ocurridas en los últimos 20 años.

ENDOSO 002 - Responsabilidad civil cruzada

ENDOSO 105 - Cobertura de obras civiles existentes y/o propiedades adyacentes

ENDOSO 115 - Riesgo de diseño

ENDOSO 003 - Mantenimiento (6 meses)

ENDOSO 112 - Equipos Extintores de Incendio

ENDOSO 120 - Vibraciones, eliminación o debilitamiento de elementos portantes

Evento Siniestral - 72 horas

IMELEC S.R.L.

OSVALDO CAJEDAS VINCIG
GERENTE GENERAL

Condiciones Especiales:

- * No se renuncia a la aplicación del infraseguro
- * **No se aceptan prórrogas automáticas**
- * Reajuste de la prima del Seguro al final de la vigencia, sobre la base del valor final alcanzado
- * El cuestionario de solicitud, presupuesto de Construcción, el cronograma de construcción y los estudios geotécnicos o de suelos, forman parte integrante de la póliza.
- * **No se cubren los gastos incurridos por las actividades necesarias para restituir y/o abatir el nivel freático en las zonas aledañas al proyecto de construcción, tampoco se cubren los gastos para estabilizar el terreno y/o aumentar el factor de seguridad del proyecto, por situaciones no contempladas en los estudios geológicos y de suelos.**
- * En caso las condiciones de riesgo se modifiquen, la compañía se reserva el derecho de ajustar la prima.
- * Para la Cobertura de HMCCDMVT:
Aviso de Cancelación 10 días, contados desde la fecha de aviso de cancelación.
No habrá restitución de la suma asegurada en caso de siniestro
Esta cobertura se otorga bajo la garantía de que el asegurado no contratará coberturas o límites adicionales que operen en exceso del límite aquí propuesto. En caso contrario, la cobertura será invalidada de manera automática.
Se excluyen daños biológicos/químicos
Se excluyen daños por cohetes/misiles
Queda excluidos los daños o pérdidas que se originen por Hundimiento y Asentamiento causados por deficiente compactación y/o estabilización del terreno así como por trabajos de hinchado no adecuados o deficientes. Asimismo quedan excluidos daños causados por asentamientos previsibles del terreno (se disponga o no de estudio geotécnico previo) según el subsuelo, los materiales y los métodos de construcción empleados.

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 105579

RENZO F. RONDO BUERRA
INGENIERO SUPERIOR DE OBRA
CIP 60571



POLIZA 2301933003004	COLECTIVO	SUPLEMENTO 0
VIGENCIA DESDE 04/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 01/06/2020 12:00 Hrs.	APLICACION 0

- * **Hurto calificado (Robo): S/.30,000 por evento y S/.60,000 por vigencia. Deducible: 10% del monto indemnizable, mínimo S/.3,000.**
- * Por HMCCDMVT se entenderá: Huelga. Motín, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y Terrorismo
- * **Queda excluido daños a las edificaciones colindantes y/o adyacentes a la obra (demolición o construcción) que estén construidas de materiales de adobe, quincha o similares.**

EVENTO SINIESTRAL - 72 HORAS:

1. ALCANCE:

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones de la póliza, en el caso de un eventual siniestro, cualquier pérdida o daño que sufran los bienes asegurados durante un periodo de 72 horas consecutivas, contados a partir de la ocurrencia del primer evento de daños registrado al bien asegurado, y que sea causado por un mismo fenómeno de la naturaleza, será considerado como un solo evento y por consiguiente constituirá un acontecimiento único para efectos de la aplicación del deducible. Con este propósito, la determinación de cualquier periodo de 72 horas quedará a juicio del asegurado. No obstante, se entiende que no deberán coincidir dos o más de dichos periodos, en el caso de que ocurran daños dentro de un periodo de tiempo más extenso. Para la determinación del inicio del siniestro, la compañía tomará como base los reportes oficiales del evento catastrófico. La inundación a consecuencia de lluvia es el mismo evento solo si entre ellas hay una relación de causa a efecto.

2. DEFINICIONES: Evento Es un siniestro o una serie de siniestros individuales que responden o se producen directamente por la misma causa en un lapso de tiempo determinado. Evento catastrófico Son todas las pérdidas o daños causados por un fenómeno natural, según se detallan en las coberturas B o C de la presente póliza, independiente de la voluntad del asegurado.

3. DEDUCIBLE: Cuando a raíz de un evento se vean afectadas varias secciones de la póliza, se aplicará a cada una el deducible especificado en las condiciones particulares de la póliza.

4. APLICACIÓN: Son de aplicación a esta cláusula las condiciones generales de contratación y las condiciones generales del seguro para contratistas, en cuanto no se hallen modificadas por este acuerdo. las condiciones particulares y especiales prevalecen sobre esta cláusula.

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS

OSVALDO CARTINIAS JIMENEZ
GERENTE GENERAL

EL ASEGURADO

NOTA: Este documento sustituye a los movimientos de numeración y fecha anterior

POLIZA ANTERIOR Nro :

GENERADO POR : EDIOSES

FRANCISCO RAMOS FLORES
ING. RESERVISTA DE OBRAS
CIP 12371

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 62371

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN (LABORAL)

Identificación de la Transacción

Número de orden: 781239587-14

Datos de la Declaración

RUC: 20119916705
 Nombre o Razón Social: IMELEC S.R.L.
 Documento: PLANILLA ELECTRÓNICA
 Periodo: 11/2019
 Rectificatoria: No
 Número de trabajadores: 24
 Número de pensionistas: 0
 P.Serv.Cuarta Categoría: 3
 P.Serv.Mod.Formativa: 0
 Personal Terceros: 0
 Regímenes Especiales: 0

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden: 781239587-14

Detalle de Tributos

Tributos	Deuda	Pago
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	150	150
ESSALUD +VIDA	95	95
SNP - LEY 19990	1,678	538
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	0	0
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	3,045	3,045
Totales	S/. 4,968	S/. 3,828

Detalle de Pago

Banco: NACION
 Num.Operación: 00000000000594351435
 Fecha de Pago: 2019-12-14 10:00:01

IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 9677

IMELEC S.R.L.
 OSVALDO J. CANDENAS VINCHA
 GERENTE GENERAL

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

SUNAT - RP TACNA

CONSTANCIA DE PAGO

16-12-2019 10:07:11

RECIBO Nro 1907639

BOLETA : 1662 - PAGOS VARIOS (PAGO FACIL)
 NUMERO DE ORDEN : 450301060
 NUMERO DE RUC : 20119916705 IMELEC S. R. L.

DECLARADO

PERIODO TRIBUTARIO : 201911
 TRIBUTO PAGADO : 5310 SNP - LEY 19990
 TRIBUTO ASOCIADO :
 DOCUMENTO ASOCIADO :

IMPUTADO

CONCEPTO PAGADO (TRIBUTO)	DOCUMENTO ASOCIADO	PERIODO TRIBUTARIO	IMPORTE
SNP - LEY 19990	0601 781239587	11/2019	1,140.00

TOTAL PAGADO : 1,140.00
 FORMA DE PAGO : EFECTIVO

IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de O.L.
 CIP 11570
 BANCO DE LA NACION
 AGENCIA 1 TACNA
 16 DIC 2019
 1 SUNAT 1

Sr. Contribuyente: verifique que la información proporcionada coincida con el detalle de la constancia. De existir alguna diferencia, comuníquela al personal de la ventanilla. Caso contrario, se entenderá por confirmado el pago.

IMELEC S.R.L.
 OSVALDO I. CORDERO VINCIA
 GERENTE GENERAL

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

 00 8381126600000000 0061022191 68561000 01600161022191 10000 45552222222222 00001 1612201910910 0001907639 1612201900 000000009931828 00

 ORML: 1662 NRO: *****

SUNAT - RP TACNA

CONSTANCIA DE PAGO

16-12-2019 10:06:41

RECIBO Nro 1907638

BOLETA : 1662 - PAGOS VARIOS (PAGO FACIL)
NUMERO DE ORDEN : 450301059
NUMERO DE RUC : 20119916705 IMELEC S. R. L.

DECLARADO

PERIODO TRIBUTARIO : 201911
TRIBUTO PAGADO : 7031 SENCICO
TRIBUTO ASOCIADO :
DOC. SUSTENTATORIO :

IMPUTADO

CONCEPTO PAGADO (TRIBUTO)	DOCUMENTO ASOCIADO	PERIODO TRIBUTARIO	IMPORTE
SENCICO	1662 450301059	11/2019	1,353.00

TOTAL PAGADO : 1,353.00

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

Sr. Contribuyente: verifique que la información proporcionada coincida con el detalle de la constancia. De existir alguna diferencia, comuníquela al personal de la ventanilla. Caso contrario, se entenderá por confirmado el pago.

IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS
 Ing. Residente de
 CIP 9657
 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

IMELEC S.R.L.
 OSVALDO J. CARDENAS VINCHA
 GERENTE GENERAL

BANCO DE LA NACION
AGENCIA TACNA
 18 DIC 2019
1 SUNAT 1

 ORML: 1662 NRO: *****
 01117524302 75064098752423295564 00002 16122019270910 0001907638 1612201900 000000000048401260 00
 JEFEL 5/*****1,353.00 ICHQ1 5/*****00 IDOV1 5/*****00 1701 P9001 5/*****1,353.00

BBVA SERVIC. RECAUDACION 17-12-19
OFIC: 0232 EMISORA: CONAFVICER APOORTE REGULAR
CONVENIO: 0011-001-0004777-000 HORA : 10.55


REF.: 20119916705112019IMELEC SRL
DOC.:
DESC: F.UCTO.: 2019-12-17
NOMB:
F.PA: VALOR EFECTIVO


IMPORTE	S/	343.60
HORA	S/	0.00
SUB TOTAL	S/	343.60
COMISION BANCO	S/	0.00
CANCELACION TOTAL	S/	343.60

CLAVE: RC70/6622/P026167 /00451422/10:55

IMELEC S.R.L.

 OSVALDO L. CARDENAS VINCHA
 GERENTE GENERAL

IMELEC S.R.L.

 FRANCISCO RAMOS FLOI
 Ing. Residente de Obra
 CIP 96570


 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

CONAFVICER 1011-001-0004777-000

AFPnet
CONTRIBUCION

AFP HABITAT - N° 06250392021

Empleador : IMELEC SRL
RUC : 20119916705 Planilla : 2604064198
Monto a pagar :

Fecha de Pago	Fondo de Pensiones	Retenciones y Retribuciones	Total
06/12/2019	122.69	21.22	143.91
07/12/2019	122.75	21.23	143.98
08/12/2019	122.75	21.23	143.98

Emitido : 06/12/2019 5:00pm Impreso : 06/12/2019 5:00pm

Los montos corresponden a las fechas indicadas. Si desea conocer los montos a pagar en una fecha distinta, emita el ticket indicando la nueva fecha de pago.

El ticket se puede pagar desde el 07/12/2019 hasta el 05/01/2020. Para pagar después, será necesario emitirlo nuevamente.

Puede pagar este ticket en los siguientes bancos:

- BANBIF
- BBVA CONTINENTAL
- INTERBANK
- SCOTIABANK

Para efectuar el pago basta indicar la AFP y el número de ticket, no es necesario imprimir el presente formato.

BBVA
OFIC: 0232 EMISORA: AFP HABITAT
CONVENIO: 0011-001-0002466-001
SERVIC. RECAUDACION 10-12-19
HORA : 11.22
REF.: 06250392621
DOC.: PLANILLA 20191206170003R20119916705
DESC: F.VCTO.: 2019-12-10
NOHB: PAGO DE TICKET
F.PA: VALOR EFECTIVO

IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 96570

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871

IMPORTE	S/	144.05
MORA	S/	0.00
SUB TOTAL	S/	144.05
COMISION BANCO	S/	0.00
CANCELACION TOTAL	S/	144.05
REDONDEO	S/	- 0.05
IMPORTE PAGADO	S/	144.00
APORTACION ADMINISTRADORA	S/	122.81
	S/	21.24

IMELEC S.R.L.
OSVALDO I. CORDENAS VINCHA
GERENTE GENERAL

REDONDEO SEGUN CIR. 33-2018-BCRP
CLAVE: RC70/6623/P006618 /00526622/11:22

Número de Planilla 2604064198 Período Devengue 2019-11

CIÓN DEL EMPLEADOR

Razón Social: IMELEC SRL RUC: 20119916705
 Urbanización o Localidad: ASOC.-ASOC RAMON COPAJA
 Departamento: TACNA Teléfono: 952217439
 Provincia: TACNA DNI: 00441616
 Elaborado por: GARCIA RIVERA, GUSTAVO Área: CONTABILIDAD Teléfono: 952217439

DE APORTES AL FONDO

Importe	Si/	122.69
Contribución - Trabajador	Si/	0.00
Contribución - Empleador	Si/	0.00
Importe con fin previsional	Si/	0.00
Importe sin fin previsional	Si/	0.00
Importe del Empleador	Si/	0.00
Importe de Pensiones	Si/	122.69
Importe de Pensiones	Si/	0.12
Importe de Pensiones	Si/	122.81

RESUMEN DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES A OTROS

Prima de Seguro Previsional	Si/	16.56
Comisión AFP	Si/	4.66
Sub-total Retenciones y Retribuciones	Si/	21.22
Intereses Moratorios	Si/	0.02
Total Retenciones y Retribuciones	Si/	21.24

AFP	HABITAT
Tipo de Trabajador	DEPENDIENTE
Tipo de Riesgo	Normal
Nro. de Afiliados Declarados	2
Estado de la Planilla	PAGADA
Fecha de Presentación	06/12/2019
Número de ticket	6250392621
Forma de Pago	Pagada via AFPnet ticket
Fecha de Pago	10/12/2019
Banco	BBVA CONTINENTAL

CUSPP	Nombre	Rel. Lab.	Inicio RL	Cese RL	Excep. de aportar	Remuneración asegurable	Aporte Obligatorio		Aportes Voluntarios		Prima de Seguro	Comisión AFP	
							Trabajador	Empleador	Con fin Prev.	Sin fin Prev.			Empleador
331ACMZA0	CRUZ MAMANI, ALIPIO	S	N	S		673.19	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	2.56
351UAAVH4	ADUVIRI ANAHUA, URIEL OMAR	S	N	S		553.70	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47	2.10

IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS H.
 Ing. Residente de C
 CIP 96570
 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82671

IMELEC S.R.L.
 OSVALDO V. CARDENAS VINCHA
 GERENTE GENERAL

(Existe Relación laboral con el afiliado): S = Si, N = No
 (Relación Laboral inició en el mes): S = Si, N = No
 (Relación Laboral finalizó en el mes): S = Si, N = No

- Excep. de aportar (Motivo por el que excepcionalmente no corresponde hacer aportes obligatorios en el mes) Pueden ser:
 Vacio = Tiene obligación de aportar, L = Licencia sin goce de haber, U = Subsidio en sector público, J = Pensión por Jubilación,
 I = Pensión por Invalidez, P = Inicio de R.L. post cierre de planillas, O = Otros, V = Vacaciones, R = Retiro del 95.5%.

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario:0621

Número de Orden:928142498

Fecha de presentación: 16/12/2019

Datos de la Declaración:

RUC: 20119916705

Nombre o Razón Social: IMELEC S.R.L.

Periodo: 201911

Semana: 0

Tipo de Declaración: Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 - IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 51,757	S/. 0
1016 - IMPTO. IGV ARROZ PILADO	S/. 0	S/. 0
3121 - RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	S/. 9,136	S/. 0
Total a pagar	S/. 60,893	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
201911	1011 - IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 51,757
201911	3121 - RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	S/. 9,136

Portal SUNAT - Declaración jurada

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Ob.
CIP 96570

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871

IMELEC S.R.L.

OSVALDO FERRER BERNIS VINCHIA
GERENTE GENERAL

SUNAT

IGV Renta Mensual

Copia para el Contribuyente (Pag. 1)

DECLARACIÓN PAGO	RUC	20119916705	
621	Razón Social	IMELEC S.R.L.	Período
	Número de Orden	928142498	Fecha de Presentación
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda
			Soles

IGV VENTAS

IGV CUENTA PROPIA

		BASE		TRIBUTO
	Ventas Netas	100	676542.00	101 121778.00
	Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas	102	0.00	103 0.00
GRAVADAS	Ventas de bienes (Ley 27037 inc. 11.1, 11.2, 12.3 y 12.4)	160		161
	Descuentos y Devoluciones (Ley 27037)	162		163
	Exportaciones Facturadas en el período	106	0.00	
	Exportaciones Embarcadas en el período	127		
	Ventas no Gravadas (Sin considerar exportaciones)	105		
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109		
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2, - art. 6 del Reglamento	112		
	Total			131 121778.00

[Handwritten Signature]
RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 8287

IGV COMPRAS

IGV CUENTA PROPIA

		BASE		TRIBUTO
	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	107	243576.00	108 43844.00
NACIONALES	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	110		111
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00	
	Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente	114		115
IMPORTADAS	Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas	116		117
	Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	119		
	Compras internas no gravadas	120	1161.00	
	Compras importadas no gravadas	122		
	Total			178 43844.00
	CREDITO FISCAL ESPECIAL			172
	OTROS CREDITOS			169

IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS FIGUEROA
 Ing. Residente
 CIP 95

IMELEC S.R.L.
OSVALDO VIZCARRA VINCHA
 GERENTE GENERAL

COEFICIENTE

173

IVAP

IVAP

BASE

TRIBUTO

Ventas Gravadas

340

0.00

341

0.00

Otros Créditos IVAP

182

RENTA

RENTA

BASE

TRIBUTO

Ingresos Netos

301

609036.00

312

9136.00

Coefficiente

380

0.0000

Porcentaje

315

1.5

DETERMINACION DE LA DEUDA

DETERMINACION DE LA DEUDA

IGV

IVAP

RENTA

Impuesto Resultante o Saldo a Favor

140

77934.00

353

0.00

302

9136.00

Saldo a Favor del Período anterior

145

26177.00

351

0.00

303

0.00

Tributo a Pagar o Saldo a Favor

184

51757.00

352

0.00

304

9136.00

Percepciones declaradas en el período

171

Saldo de percepciones de periodos anteriores

168

Saldo de Percepciones no aplicadas

164

0.00

Retenciones declaradas en el período

179

Saldo de retenciones de periodos anteriores

176

Saldo de Retenciones no aplicadas

165

0.00

Retenciones de tercera declaradas en el período

326

Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores

327

Compensación Saldo a Favor del Exportador

347

305

Impuesto Temporal a los Activos Netos

328

Otros Créditos permitidos por Ley

306

Sub Total

681

51757.00

683

0.00

682

9136.00

Pagos previos

185

0.00

342

0.00

317

0.00

Interés moratorio

187

0.00

343

0.00

319

0.00

Total deuda tributaria

188

51757.00

344

0.00

324

9136.00

¿Deseo acogerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)?

Si

Portal SUNAT - Declaracion jurada

IMELEC S.R.L.
Residente de C
CIP 96570

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE CSRA
CIP 82871

IMELEC S.R.L.
OSVALDO CALDENAS MARCHA
GERENTE GENERAL

AFPnet
 (C) 2019

AFP PRIMA - N° 5250393024

Empleador : IMELEC SRL
 RUC : 20119916705 Planilla : 2508341443
 Monto a pagar :

Fecha de Pago	Fondo de Pensiones	Retenciones y Retribuciones	Total
06/12/2019	397.82	60.87	458.69
07/12/2019	398.02	60.90	458.92
08/12/2019	398.02	60.90	458.92

Emitido : 06/12/2019 5:00pm Impreso : 06/12/2019 5:00pm

Los montos corresponden a las fechas indicadas. Si desea conocer los montos a pagar en una fecha distinta, emita el ticket indicando la nueva fecha de pago.

El ticket se puede pagar desde el 07/12/2019 hasta el 05/01/2020. Para pagar después, será necesario emitirlo nuevamente.

Puede pagar este ticket en los siguientes bancos:

- BANBIF
- BBVA CONTINENTAL
- INTERBANK
- SCOTIABANK

Para efectuar el pago basta indicar la AFP y el número de ticket, no es necesario imprimir el presente formato.

BBVA SERVIC. RECAUDACION 10-12-19
 OFIC: 0232 EMISORA: AFP PRIMA - AFPNET
 CONVENIO: 0011-001-0000262-001 HORA : 11.21

REF.: 05250393024
 DOC.: PLANILLA 20191206170052R20119916705
 DESC: F.VCTO.: 2019-12-10
 NOMB: PAGO DE TICKET
 F.PA: VALOR EFECTIVO

IMPORTE	S/	459.15
HORA	S/	0.00
SUB TOTAL	S/	459.15
COMISION BANCO	S/	0.00
CANCELACION TOTAL	S/	459.15
REDONDEO	S/	- 0.05
IMPORTE PAGADO	S/	459.10
APORTACION ADMINISTRADORA	S/	398.22
		60.93

IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 96570

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82371

IMELEC S.R.L.
 OSVALDO L. GARCIA VINCIA
 GERENTE GENERAL

REDONDEO SEGUN CIIRC. 33-2018-BCRP
 CLAVE: RC70/6G23/P006618 /00525842/11:21

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO DE APORTES PREVISIONALES

A. 6.2.1

Número de Planilla 2508341443 Período Devengue 19-11

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR

Nombre ó Razón Social: **IMELEC SRL** RUC: 20119916705
 Dirección: **AV.-CIRCUNVALACION NORTE 796** Urbanización o Localidad: **ASOC.-ASOC RAMON COPAJA**
 Distrito: **ALTO DE LA ALIANZA** Provincia: **TACNA** Departamento: **TACNA** Teléfono: 95221743
 Representante Legal: **CARDENAS VINCHA OSVALDO** DNI: 00441616 Elaborado por: **GARCIA RIVERA, GUSTAVO** Área: **CONTABILIDAD** Teléfono: 95221743

RESUMEN DE APORTES AL FONDO

Aporte Obligatorio	Si.	397.82
Aporte Complementario - Trabajador	Si.	0.00
Aporte Complementario - Empleador	Si.	0.00
Aporte Voluntario con fin previsional	Si.	0.00
Aporte Voluntario sin fin previsional	Si.	0.00
Aporte Voluntario del Empleador	Si.	0.00
Sub-Total Fondo de Pensiones	Si.	397.82
Intereses Moratorios	Si.	0.40
Total Fondo de Pensiones	Si.	398.22

RESUMEN DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES A OTROS

Prima de Seguro Previsional	Si.	53.71
Comisión AFP	Si.	7.16
Sub-total Retenciones y Retribuciones	Si.	60.87
Intereses Moratorios	Si.	0.06
Total Retenciones y Retribuciones	Si.	60.93

AFP	PRIMA
Tipo de Trabajador	DEPENDIENTE
Tipo de Riesgo	Normal
Nro. de Afiliados Declarados	3
Estado de la Planilla	PAGADA
Fecha de Presentación	06/12/2019
Número de ticket	5250393024
Forma de Pago	Pagada via AFPnet ticket
Fecha de Pago	10/12/2019
Banco	BBVA CONTINENTAL

Nro	CUSPP	Nombre	Rel. Lab.	Excep. de aporte	Remuneración asegurable	Aporte Obligatorio	Aportes Complementarios		Aportes Voluntarios		Prima de Seguro
							Trabajador	Empleador	Con fin Prev.	Sin fin Prev.	
1	641871RVCTD3	VENTURA CONDORI, RICARDO	S	N	1,478.22	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	19.96
2	589291RMMLA5	MULLISACA MAMANI, RENE ALFREDO	S	N	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
3	650100ADCGZ4	DELGADO CRUZ, ALINA MARINA	S	N	1,500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.25

IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Asistente de Obra
 CIP 96570

IMELEC S.R.L.
 OSVALDO CARDENAS VINCHA
 GERENTE GENERAL

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 62871

Legenda:

- Rel. Lab (Existe Relación laboral con el afiliado): S = Si, N = No
- Inicio RL (Relación Laboral inició en el mes): S = Si, N = No
- Cese RL (Relación Laboral finalizó en el mes): S = Si, N = No

- Excep. de aporte (Motivo por el que excepcionalmente no corresponde hacer aportes obligatorios en el mes) Pueden ser:
 Vacio = Tiene obligación de aportar, L = Licencia sin goce de haber, U = Subsidio en sector público, J = Pensión por Jubilación,
 I = Pensión por Invalidez, P = Inicio de R.L., post cierre de planillas, O = Otros, V = Vacaciones, R = Retiro del 95.5%.

AFPNET
CENTRAL

AFP INTEGRAL - N° 2250392371

Empleador : IMELEC SRL
RUC : 20119916705 Planilla : 2208812607
Monto a pagar :

Fecha de Pago	Fondo de Pensiones	Retenciones y Retribuciones	Total
06/12/2019	760.51	140.06	900.57
07/12/2019	760.89	140.13	901.02
08/12/2019	760.89	140.13	901.02

Emitido : 06/12/2019 4:59pm Impreso : 06/12/2019 4:59pm

Los montos corresponden a las fechas indicadas. Si desea conocer los montos a pagar en una fecha distinta, emita el ticket indicando la nueva fecha de pago.

El ticket se puede pagar desde el 07/12/2019 hasta el 05/01/2020. Para pagar después, será necesario emitirlo nuevamente.

Puede pagar este ticket en los siguientes bancos:

- BANBIF
- BBVA CONTINENTAL
- INTERBANK
- SCOTIABANK

Para efectuar el pago basta indicar la AFP y el número de ticket, no es necesario imprimir el presente formato.

BBVA / SERVIC. RECAUDACION 10-12-19
OFIC: 0232 EMISORA: AFP INTEGRAL - AFPNET
CONVENIO: 0011-001-0000259-001 HORA : 11.20

REF.: 02250392371
DOC.: PLANILLA 20191206165924R20119916705
DESC: F.VCTO.: 2019-12-10
NOHB: PAGO DE TICKET
F.PA: VALOR EFECTIVO

IMPORTE	S/	901.47
HORA	S/	0.00
SUB TOTAL	S/	901.47
COMISION BANCO	S/	0.00
CANCELACION TOTAL	S/	901.47
REDONDEO	S/	- 0.07
IMPORTE PAGADO	S/	901.40
APORTACION ADMINISTRADORA	S/	761.27
	S/	140.20

IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 98570

IMELEC S.R.L.
OSVALDO RAMOS RAMOS VERGATA
GERENTE GENERAL

REDONDEO SEGUN CIRC. 33-2018-BCRP
CLAVE: RC70/6G23/P006618 /00525302/11:20

Número de Planilla 2208812607 Período Devengue 19-11

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR

Nombre o Razón Social: IMELEC SRL
 Dirección: AV.-CIRCUNVALACION NORTE 796
 Distrito: ALTO DE LA ALIANZA
 Representante Legal: CARDENAS VINCHA OSVALDO
 RUC: 20119916705
 Urbanización o Localidad: ASOC.-ASOC RAMON COPAJA
 Departamento: TACNA
 Provincia: TACNA
 DNI: 00441616
 Elaborado por: GARCIA RIVERA, GUSTAVO
 Área: CONTABILIDAD
 Teléfono: 952217
 Teléfono: 952217

RESUMEN DE APORTES AL FONDO

Aporte Obligatorio	Si.	760.51
Aporte Complementario - Trabajador	Si.	0.00
Aporte Complementario - Empleador	Si.	0.00
Aporte Voluntario con fin previsional	Si.	0.00
Aporte Voluntario sin fin previsional	Si.	0.00
Aporte Voluntario del Empleador	Si.	0.00
Sub-Total Fondo de Pensiones	Si.	760.51
Intereses Moratorios	Si.	0.76
Total Fondo de Pensiones	Si.	761.27

RESUMEN DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES A

Prima de Seguro Previsional	Si.	102.66
Comisión AFP	Si.	37.40
Sub-total Retenciones y Retribuciones	Si.	140.06
Intereses Moratorios	Si.	0.14
Total Retenciones y Retribuciones	Si.	140.20

OTROS

AFP	INTEGRA
Tipo de Trabajador	DEPENDIENTE
Tipo de Riesgo	Normal
Nro. de Afiliados Declarados	4
Estado de la Planilla	PAGADA
Fecha de Presentación	06/12/2019
Número de ticket	2250392371
Forma de Pago	Pagada vía AFPnet ticket
Fecha de Pago	10/12/2019
Banco	BBVA CONTINENTAL

Nro	CUSPP	Nombre	Rel. Lab.	Inicio RL	Cese RL	Excep. de aportar	Remuneración asegurable	Aporte Obligatorio	Aportes Complementarios		Aportes Voluntarios		Prima de Seguro
									Trabajador	Empleador	Con fin Prev.	Sin fin Prev.	
1	321511ECMZA8	CRUZ MAMANI, EDSON UBER	S	N	S		475.89	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
2	600281WGT06	GOMEZ TUYO, WINSTON	S	N	N		1,936.76	193.68	0.00	0.00	0.00	0.00	26.15
3	515191OCVDC0	CARDENAS VINCHA, OSVALDO JAVIER	S	N	N		3,575.00	357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26
4	547941ATZQA9	TARQUI ZAPANA, AGAPITO	S	N	N		1,617.35	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83

IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 96570
 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

IMELEC S.R.L.
 OSVALDO CARDENAS VINCHA
 Representante Legal

Leyenda:

- Rel. Lab (Existe Relación laboral con el afiliado): S = Si, N = No
- Inicio RL (Relación Laboral inició en el mes): S = Si, N = No
- Cese RL (Relación Laboral finalizó en el mes): S = Si, N = No

- Excep. de aportar (Motivo por el que excepcionalmente no corresponde hacer aportes obligatorios en el mes) Pueden ser:
 Vacio = Tiene obligación de aportar, L = Licencia sin goce de haber, U = Subsidio en sector público, J = Pensión por Jubilación,
 I = Pensión por Invalidez, P = Inicio de R.L., post cierre de planillas, O = Otros, V = Vacaciones, R = Retiro del 95.5%.



AFP PROFUTURO - N° 3250391838

Empleador : IMELEC SRL
 RUC : 20119916705 Planilla : 2307503248
 Monto a pagar :

Fecha de Pago	Fondo de Pensiones	Retenciones y Retribuciones	Total
06/12/2019	531.16	82.70	613.86
07/12/2019	531.43	82.74	614.17
08/12/2019	531.43	82.74	614.17

Emitido : 06/12/2019 4:58pm Impreso : 06/12/2019 4:58pm

Los montos corresponden a las fechas indicadas. Si desea conocer los montos a pagar en una fecha distinta, emita el ticket indicando la nueva fecha de pago.

El ticket se puede pagar desde el 07/12/2019 hasta el 05/01/2020. Para pagar después, será necesario emitirlo nuevamente.

Puede pagar este ticket en los siguientes bancos:

- BANBIF
- BBVA CONTINENTAL
- INTERBANK
- SCOTIABANK

Para efectuar el pago basta indicar la AFP y el número de ticket, no es necesario imprimir el presente formato.

IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 90075

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

BBVA
 OFIC: 0232 EMISORA: SERVIC. RECAUDACION 10-12-19
 CONVENIO: 0011-001-0000261-001 - AFPNET
 HORA : 11.19

REF.: 03250391838
 DOC.: PLANILLA 20191206165823R20119916705
 DESC: F.VCTO.: 2019-12-10
 NOMB: PAGO DE TICKET
 F.PA: VALOR EFECTIVO

IMPORTE	S/	614.47
MORA	S/	0.00
SUB TOTAL	S/	614.47
COMISION BANCO	S/	0.00
CANCELACION TOTAL	S/	614.47
REDONDEO	S/	- 0.07
IMPORTE PAGADO	S/	614.40
APORTACION ADMINISTRADORA	S/	531.69
	S/	82.78

IMELEC S.R.L.
 OSVALDO GUERRA VINCIA
 GERENTE GENERAL

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR

Nombre o Razón Social: **IMELEC SRL** RUC: 20119916705
 Dirección: **AV. CIRCUNVALACION NORTE 796** Urbanización o Localidad: **ASOC.-ASOC RAMON COPAJA**
 Distrito: **ALTO DE LA ALIANZA** Provincia: **TACNA** Departamento: **TACNA** Teléfono: 9522174
 Representante Legal: **CARDENAS VINCHA OSVALDO** DNI: 00441616 Elaborado por: **GARCIA RIVERA, GUSTAVO** Área: **CONTABILIDAD** Teléfono: 9522174

RESUMEN DE APORTES AL FONDO

Aporte Obligatorio	Si.	531.16
Aporte Complementario - Trabajador	Si.	0.00
Aporte Complementario - Empleador	Si.	0.00
Aporte Voluntario con fin previsional	Si.	0.00
Aporte Voluntario sin fin previsional	Si.	0.00
Aporte Voluntario del Empleador	Si.	0.00
Sub-Total Fondo de Pensiones	Si.	531.16
Intereses Moratorios	Si.	0.53
Total Fondo de Pensiones	Si.	531.69

RESUMEN DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES A OTROS

Prima de Seguro Previsional	Si.	47.12
Comisión AFP	Si.	35.58
Sub-total Retenciones y Retribuciones	Si.	82.70
Intereses Moratorios	Si.	0.08
Total Retenciones y Retribuciones	Si.	82.78

AFP	PROFUTURO
Tipo de Trabajador	DEPENDIENTE
Tipo de Riesgo	Normal
Nro. de Afiliados Declarados	4
Estado de la Planilla	PAGADA
Fecha de Presentación	06/12/2019
Número de ticket	3250391838
Forma de Pago	Pagada via AFPnet ticket
Fecha de Pago	10/12/2019
Banco	BBVA CONTINENTAL

Nro	CUSPP	Nombre	Rel. Lab	Cese RL	Excep. de aporte	Remuneración asegurable	Aporte Obligatorio	Aportes Complementarios		Aportes Voluntarios		Prima de Seguro
								Trabajador	Empleador	Con fin Prev.	Sin fin Prev.	
1	496961JMAAA0	MAMANI ARRAZOLA, JOSE	S	N	N	1,821.17	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	246451FR CLL3	RUELAS COILA, FRANCISCO	S	N	N	2,021.05	202.11	0.00	0.00	0.00	0.00	27.28
3	269601JP SOA5	PALOMINO SUMARE, JAVIER ALFREDO	S	N	N	930.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56
4	577541VGBNR5	QUINONES BARRIOS, VICTOR JULIO	S	N	S	539.33	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28

IMELEC S.R.L.
OSVALDO VINCHA
 C.E. CONTABILIDAD
 FRANCISCO RAMOS FLOR
 Ing. Residente de Obra
 CIP 96570

IMELEC S.R.L.
OSVALDO VINCHA
 C.E. CONTABILIDAD

Leyenda:

- Rel. Lab (Existe Relación laboral con el afiliado): S = Si, N = No
- Inicio RL (Relación Laboral inició en el mes): S = Si, N = No
- Cese RL (Relación Laboral finalizó en el mes): S = Si, N = No

- Excep. de aportar (Motivo por el que excepcionalmente no corresponde hacer aportes obligatorios en el mes) Pueden ser:
 Vacio = Tiene obligación de aportar, L = Licencia sin goce de haber, U = Subsidio en sector público, J = Pensión por Jubilación,
 I = Pensión por invalidez, P = Inicio de R.L., post cierre de planillas, O = Otros, V = Vacaciones, R = Retiro del 95.5%.

R03: Trabajadores - Bases de Cálculo de Tributos y Aportes

RUC : 20119916705

Empleador : IMELEC S.R.L.

Periodo : 11/2019

PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :


Documento de Identidad		Datos del Trabajador				B.C. ESSALUD		Aporte		Aporte		Base ONP D.Ley	
Tipo	Número	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sit.	B.C. ESSALUD	Seg.Regular	Seg.Agrario	Trab.pesq.	19990	19990	19990	
01	00402909	VALERIANO	MAMANI	MOISES	ACTIVO O SUBSIDI/	858.06	83.70			858.06		858.06	
01	00423826	CARDENAS	CARDENAS	BONIFACIO VICTOR	ACTIVO O SUBSIDI/	930.00	83.70			930.00		930.00	
01	00441616	CARDENAS	VINCHA	OSVALDO JAVIER	ACTIVO O SUBSIDI/	3,575.00	321.75			3,575.00			
01	00487474	CRUZ	MAMANI	ALIPIO	ACTIVO O SUBSIDI/	673.19	83.70			673.19			
01	00489235	CARDENAS	YUPA	ALFREDO MATEO	ACTIVO O SUBSIDI/	1,904.18	171.38			1,904.18		1,904.18	
01	00661286	MAMANI	ARRAZOLA	JOSE	ACTIVO O SUBSIDI/	1,821.17	163.91			1,821.17			
01	00671826	TARQUI	ZAPANA	AGAPITO	ACTIVO O SUBSIDI/	1,617.35	145.56			1,617.35			
01	00795672	QUIÑONES	BARRIOS	VICTOR JULIO	BAJA	539.33	83.70			539.33			
01	01309429	RUELAS	COILA	FRANCISCO	ACTIVO O SUBSIDI/	2,021.05	181.89			2,021.05			
01	09552614	PALOMINO	SUMARE	JAVIER ALFREDO	ACTIVO O SUBSIDI/	930.00	83.70			930.00			
01	40276171	MULLISACA	MAMANI	RENE ALFREDO	ACTIVO O SUBSIDI/	1,000.00	90.00			1,000.00			
01	40574577	ADUVIRI	ANAHUA	URIEL OMAR	BAJA	553.70	83.70			553.70			
01	41413605	GOMEZ	TUYO	WINSTON	ACTIVO O SUBSIDI/	1,936.76	174.31			1,936.76			
01	41980073	VALERIANO	MAMANI	RUBEN NOE	ACTIVO O SUBSIDI/	543.73	83.70			543.73		543.73	
01	42290683	MAMANI	SIÑA	JULIAN	ACTIVO O SUBSIDI/	476.29	83.70			476.29		476.29	
01	44761782	CRUZ	MAMANI	EDSON UBER	ACTIVO O SUBSIDI/	475.89	83.70			475.89			
01	45011781	ZAPANA	SALCEDO	JOSE MIGUEL	ACTIVO O SUBSIDI/	1,967.60	177.08			1,967.60		1,967.60	
01	45464851	QUENTA	LUQUE	YHINO HUGO	ACTIVO O SUBSIDI/	476.29	83.70			476.29		476.29	
01	46270390	RUELAS	CHAMBI	EDDY JOVANI	ACTIVO O SUBSIDI/	1,983.94	178.55			1,983.94		1,983.94	
01	47664803	LOPE	MAMANI	JAVIER	ACTIVO O SUBSIDI/	1,836.05	165.24			1,836.05		1,836.05	
01	71090199	VENTURA	CONDORI	RICARDO SKINNER	ACTIVO O SUBSIDI/	1,478.22	133.04			1,478.22			
01	71378950	LUQUE	MARIACA	ANTHONY JUAN	ACTIVO O SUBSIDI/	1,457.16	131.14			1,457.16		1,457.16	
01	72269518	DELGADO	CRUZ	ALINA MARINA LU	ACTIVO O SUBSIDI/	1,000.00	90.00			1,000.00			
01	76128738	QUISPE	MAMANI	LUIS ANTONIO	ACTIVO O SUBSIDI/	476.29	83.70			476.29		476.29	
						30,531.25	3,044.55	0.00	0.00			12,909.59	


IMELEC S.R.L.

OSVALDO STRASSER FLOR
Ing. Residente de Obras
CIP 96570IMELEC S.R.L.
OSVALDO STRASSER FLOR
Ing. Residente de Obras
CIP 96570

Generado por el PDT Planilla Electrónica PLAME


Base de cálculo, Tributos y Aportes del Trabajador										
Aporte ONP D.Ley 19990	Base S.P.P.	Aportes SPP	Base SCTR (ESSALUD)	Tasa (%)	Aporte SCTR (ESSALUD)	Base FDSA	Aporte FDSA	Base Renta 5ta. Categoría	Impuesto a Renta 5ta.	Base FCJMMS
111.55				0.00	0.00			1,064.18	0.00	0.00
120.90	3,575.00	357.50		0.00	0.00			930.00	0.00	0.00
	673.32	67.32		0.00	0.00			3,575.00	150.00	0.00
247.54	1,821.17	182.12		0.00	0.00			841.56	0.00	0.00
	1,617.35	161.74		0.00	0.00			2,361.58	0.00	0.00
	539.33	53.93		0.00	0.00			2,276.67	0.00	0.00
	2,021.05	202.11		0.00	0.00			2,021.88	0.00	0.00
	930.00	93.00		0.00	0.00			674.22	0.00	0.00
	1,000.00	100.00		0.00	0.00			2,506.53	0.00	0.00
	553.70	55.37		0.00	0.00			930.00	0.00	0.00
	1,936.76	193.68		0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
70.68				0.00	0.00			692.19	0.00	0.00
61.92				0.00	0.00			2,363.23	0.00	0.00
	475.89	47.59		0.00	0.00			679.73	0.00	0.00
255.79				0.00	0.00			595.41	0.00	0.00
61.92				0.00	0.00			594.92	0.00	0.00
257.91				0.00	0.00			2,459.72	0.00	0.00
238.69	1,478.22	147.82		0.00	0.00			595.41	0.00	0.00
189.43	1,000.00	100.00		0.00	0.00			2,460.51	0.00	0.00
				0.00	0.00			2,295.22	0.00	0.00
				0.00	0.00			1,847.94	0.00	0.00
				0.00	0.00			1,821.62	0.00	0.00
61.92				0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			595.41	0.00	0.00
1,678.25	17,621.66	1,762.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,182.93	150.00	0.00


IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 90070



 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

IMELEC S.R.L.
 OVALLE
 CALLE...
 VALPARAISO

Aporte FCJMMS	Base Cuota FCJMMS	Ap. Cuota FCJMMS	Base Retención 4TA Cat CAS	Impuesto Retención 4TA	Base ONP - Independiente	Impuesto ONP - Independiente	Base REP - Retención	Impuesto REP - Retención	Base REP - Propia	Impuesto REP - Cta. Propia


 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

IMELEC S.R.L.
 OSVALDO GARCÍA VILLALBA


 IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 90570

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

127

R02: Trabajadores - Detalle de Ingresos


RUC : 20119916705


Empleador : IMELEC S.R.L.

Periodo : 11/2019

PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

Documento de Identidad		Datos del Trabajador				Ingresos		Asignaciones		Bonificaciones		Gratificaciones-Aguinaldos	
Tipo	Número	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sit.	Devengado	Pagado	Devengado	Pagado	Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
01	00402909	VALERIANO	MAMANI	MOISES	ACTIVO O SUE	693.75	693.75	175.27	175.27	121.73	121.73	121.73	121.73
01	00423826	CARDENAS	CARDENAS	BONIFACIO VI	ACTIVO O SUE	930.00	930.00						
01	00441616	CARDENAS	VINCHA	OSVALDO JAV	ACTIVO O SUE	3,575.00	3,575.00						
01	00487474	CRUZ	MAMANI	ALIPIO	ACTIVO O SUE	544.29	544.29			137.49	137.49	95.46	95.46
01	00489235	CARDENAS	YUPA	ALFREDO MA	ACTIVO O SUE	1,539.55	1,539.55			388.94	388.94	270.13	270.13
01	00661286	MAMANI	ARRAZOLA	JOSE	ACTIVO O SUE	1,472.45	1,472.45			371.96	371.96	258.26	258.26
01	00671826	TARQUI	ZAPANA	AGAPITO	ACTIVO O SUE	1,307.66	1,307.66			330.34	330.34	229.36	229.36
01	00795672	QUIÑONES	BARRIOS	VICTOR JULIO	BAJA	436.06	436.06			110.15	110.15	76.48	76.48
01	01309429	RUELAS	COILA	FRANCISCO	ACTIVO O SUE	1,634.04	1,634.04			412.81	412.81	286.71	286.71
01	09552614	PALOMINO	SUMARE	JAVIER ALFREI	ACTIVO O SUE	930.00	930.00						
01	40276171	MULLISACA	MAMANI	RENE ALFREDI	ACTIVO O SUE	1,000.00	1,000.00						
01	40574577	ADUVIRI	ANAHUA	URIEL OMAR	BAJA	447.68	447.68			113.09	113.09	78.52	78.52
01	41413605	GOMEZ	TUYO	WINSTON	ACTIVO O SUE	1,546.21	1,546.21			414.96	414.96	271.27	271.27
01	41980073	VALERIANO	MAMANI	RUBEN NOE	ACTIVO O SUE	439.62	439.62			111.05	111.05	77.11	77.11
01	42290683	MAMANI	SIÑA	JULIAN	ACTIVO O SUE	385.09	385.09			97.28	97.28	67.54	67.54
01	44761782	CRUZ	MAMANI	EDSON UBER	ACTIVO O SUE	384.77	384.77			97.19	97.19	67.49	67.49
01	45011781	ZAPANA	SALCEDO	JOSE MIGUEL	ACTIVO O SUE	1,590.84	1,590.84			401.87	401.87	279.02	279.02
01	45464851	QUENTA	LUQUE	YHINO HUGO	ACTIVO O SUE	385.09	385.09			97.28	97.28	67.54	67.54
01	46270390	RUELAS	CHAMBI	EDDY JOVANI	ACTIVO O SUE	1,604.04	1,604.04			405.23	405.23	281.45	281.45
01	47664803	LOPE	MAMANI	JAVIER	ACTIVO O SUE	1,484.48	1,484.48			375.00	375.00	260.32	260.32
01	71090199	VENTURA	CONDORI	RICARDO SKIN	ACTIVO O SUE	1,195.17	1,195.17			301.92	301.92	209.62	209.62
01	71378950	LUQUE	MARIACA	ANTHONY JUA	ACTIVO O SUE	1,178.14	1,178.14			297.62	297.62	206.64	206.64
01	72269518	DELGADO	CRUZ	ALINA MARIN	ACTIVO O SUE	1,000.00	1,000.00						
01	76128738	QUISPE	MAMANI	LUIS ANTONIC	ACTIVO O SUE	385.09	385.09			97.28	97.28	67.54	67.54
						26,089.02	26,089.02	0.00	0.00	4,736.73	4,736.73	3,272.19	3,272.19


FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 966570


RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871


IMELEC S.R.L.
 OSVALDO CARDENAS VINCHA
 CIP 966570

18/12/2019
12:59:27

Ingresos		Conceptos Varios		Otros Conceptos		Reg. Laboral Público		TOTAL INGRESOS	
Devengado	Pagado	Devengado	Pagado	Devengado	Pagado	Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
155.59	155.59							1,146.34	1,146.34
128.77	128.77							930.00	930.00
345.28	345.28							3,575.00	3,575.00
348.36	348.36							906.01	906.01
309.37	309.37							2,543.90	2,543.90
103.17	103.17							2,451.03	2,451.03
366.48	366.48							2,176.73	2,176.73
								725.86	725.86
								2,700.04	2,700.04
								930.00	930.00
								1,000.00	1,000.00
								745.20	745.20
								2,546.33	2,546.33
								731.79	731.79
								641.01	641.01
								640.48	640.48
								2,648.10	2,648.10
								641.01	641.01
								2,650.46	2,650.46
								2,471.00	2,471.00
								1,989.46	1,989.46
								1,961.13	1,961.13
								1,000.00	1,000.00
								641.01	641.01
0.00	0.00	4,293.95	4,293.95	0.00	0.00	0.00	0.00	38,391.89	38,391.89

Ingresos		Conceptos Varios		Otros Conceptos		Reg. Laboral Público		TOTAL INGRESOS	
Devengado	Pagado	Devengado	Pagado	Devengado	Pagado	Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
155.59	155.59							1,146.34	1,146.34
128.77	128.77							930.00	930.00
345.28	345.28							3,575.00	3,575.00
348.36	348.36							906.01	906.01
309.37	309.37							2,543.90	2,543.90
103.17	103.17							2,451.03	2,451.03
366.48	366.48							2,176.73	2,176.73
								725.86	725.86
								2,700.04	2,700.04
								930.00	930.00
								1,000.00	1,000.00
								745.20	745.20
								2,546.33	2,546.33
								731.79	731.79
								641.01	641.01
								640.48	640.48
								2,648.10	2,648.10
								641.01	641.01
								2,650.46	2,650.46
								2,471.00	2,471.00
								1,989.46	1,989.46
								1,961.13	1,961.13
								1,000.00	1,000.00
								641.01	641.01
0.00	0.00	4,293.95	4,293.95	0.00	0.00	0.00	0.00	38,391.89	38,391.89

[Handwritten Signature]

IMELEC S.R.L.
CALLE LAS VINOCHAS VINOCHA
CARACAS VENEZUELA

[Handwritten Signature]
IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 96570

R01: Trabajadores - Datos de Ingresos, Tributos y Aportes

18/12/2019
12:59:27

RUC : 20119916705
 Empleador : IMELEC S.R.L.
 Período : 11/2019
 PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

Datos del Trabajador				Información declarada						
Documento de Tipo	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sit.	Ingresos	Descuentos	Tributos y aportes del Trabajador	Neto a pagar	Tributos y Aportes del Empleador	
					Devengado					
01	00402909	VALERIANO	MAMANI	MOISES	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,146.34	0.00	129.33	1,017.01	83.70
01	00423826	CARDENAS	CARDENAS	BONIFACIO VICTOR	ACTIVO O SUBSIDIADO	930.00	0.00	120.90	809.10	83.70
01	00441616	CARDENAS	VINCHA	OSVALDO JAVIER	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,575.00	0.00	575.78	2,999.22	321.75
01	00487474	CRUZ	MAMANI	ALIPIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	906.01	0.00	94.00	812.01	83.70
01	00489235	CARDENAS	YUPA	ALFREDO MATEO	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,543.90	0.00	280.90	2,263.00	171.38
01	00661286	MAMANI	ARRAZOLA	JOSE	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,451.03	0.00	251.03	2,200.00	163.91
01	00671826	TARQUI	ZAPANA	AGAPITO	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,176.73	0.00	221.72	1,955.01	145.56
01	00795672	QUIÑONES	BARRIOS	VICTOR JULIO	BAJA	725.86	0.00	77.85	648.01	83.70
01	01309429	RUELAS	COILA	FRANCISCO	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,700.04	0.00	278.03	2,422.01	181.89
01	09552614	PALOMINO	SUMARE	JAVIER ALFREDO	ACTIVO O SUBSIDIADO	930.00	0.00	111.79	818.21	83.70
01	40276171	MULLISACA	MAMANI	RENE ALFREDO	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,000.00	0.00	115.30	884.70	90.00
01	40574577	ADUVIRI	ANAHAUA	URIEL OMAR	BAJA	745.20	0.00	78.19	667.01	83.70
01	41413605	GOMEZ	TUYO	WINSTON	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,546.33	0.00	283.33	2,263.00	174.31
01	41980073	VALERIANO	MAMANI	RUBEN NOE	ACTIVO O SUBSIDIADO	731.79	0.00	83.78	648.01	83.70
01	42290683	MAMANI	SIÑA	JULIAN	ACTIVO O SUBSIDIADO	641.01	0.00	74.01	567.00	83.70
01	44761782	CRUZ	MAMANI	EDSON UBER	ACTIVO O SUBSIDIADO	640.48	0.00	73.48	567.00	83.70
01	45011781	ZAPANA	SALCEDO	JOSE MIGUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,648.10	0.00	290.10	2,358.00	177.08
01	45464851	QUENTA	LUQUE	YHINO HUGO	ACTIVO O SUBSIDIADO	641.01	0.00	74.01	567.00	83.70
01	46270390	RUELAS	CHAMBI	EDDY JOVANI	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,650.46	0.00	292.46	2,358.00	178.55
01	47664803	LOPE	MAMANI	JAVIER	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,471.00	0.00	270.99	2,200.01	165.24
01	71090199	VENTURA	CONDORI	RICARDO SKINNER	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,989.46	0.00	197.46	1,792.00	133.04
01	71378950	LUQUE	MARIACA	ANTHONY JUAN	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,961.13	0.00	216.13	1,745.00	131.14
01	72269518	DELGADO	CRUZ	ALINA MARINA LUGRECIA	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,000.00	0.00	115.30	884.70	90.00
01	76128738	QUISPE	MAMANI	LUIS ANTONIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	641.01	0.00	74.01	567.00	83.70
					38,391.89		4,379.88	34,012.01	3,044.55	
						0.00				

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

IMELEC S.R.L.

OSVALDO JAVIER VINCHA
 CIP 90570

IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 90570

R04: Trabajadores - Tributos, aportes y conceptos a cargo del trabajador

RUC : 20119916705
 Empleado : IMELEC S.R.L.
 Período : 11/2019
 PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

Documento de Identidad		Datos del Trabajador				Sit.	S.P.P. Aporte Obligatorio	S.P.P. Aporte Voluntario	S.P.P. Comisión	S.P.P. Seguro	S.N.P. D.Ley 19990 (ONP)
Tipo	Número	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres							
01	00402909	VALERIANO	MAMANI	MOISES	ACTIVO O SUBSIDIAI					111.55	
01	00423826	CARDENAS	CARDENAS	BONIFACIO VICTOR	ACTIVO O SUBSIDIAI					120.90	
01	00441616	CARDENAS	VINCHA	OSVALDO JAVIER	ACTIVO O SUBSIDIAI		357.50		20.02	48.26	
01	00487474	CRUZ	MAMANI	ALIPIO	ACTIVO O SUBSIDIAI		67.32		2.56	9.09	
01	00489235	CARDENAS	YUPA	ALFREDO MATEO	ACTIVO O SUBSIDIAI						
01	00661286	MAMANI	ARRAZOLA	JOSE	ACTIVO O SUBSIDIAI		182.12		12.20	24.59	
01	00671826	TARQUI	ZAPANA	AGAPITO	ACTIVO O SUBSIDIAI		161.74		9.06	21.83	
01	00795672	QUIÑONES	BARRIOS	VICTOR JULIO	BAJA		53.93		3.61	7.28	
01	01309429	RUELAS	COILA	FRANCISCO	ACTIVO O SUBSIDIAI		202.11		13.54	27.28	
01	09552614	PALOMINO	SUMARE	JAVIER ALFREDO	ACTIVO O SUBSIDIAI		93.00		6.23	12.56	
01	40276171	MULLISACA	MAMANI	RENE ALFREDO	ACTIVO O SUBSIDIAI		100.00		1.80	13.50	
01	40574577	AUVIRI	ANAHUA	URIEL OMAR	BAJA		55.37		2.10	7.47	
01	41413605	GOMEZ	TUYO	WINSTON	ACTIVO O SUBSIDIAI		193.68		30.02	26.15	
01	41980073	VALERIANO	MAMANI	RUBEN NOE	ACTIVO O SUBSIDIAI						
01	42290683	MAMANI	SIÑA	JULIAN	ACTIVO O SUBSIDIAI						
01	44761782	CRUZ	MAMANI	EDSON UBER	ACTIVO O SUBSIDIAI		47.59		7.38	6.42	
01	45011781	ZAPANA	MAMANI	JOSE MIGUEL	ACTIVO O SUBSIDIAI						
01	45464851	QUENTA	SALCEDO	YHINO HUGO	ACTIVO O SUBSIDIAI						
01	46270390	RUELAS	LUQUE	EDDY JOVANI	ACTIVO O SUBSIDIAI						
01	47664803	LOPE	MAMANI	JAVIER	ACTIVO O SUBSIDIAI						
01	71090199	VENTURA	CONDORI	RICARDO SKINNER	ACTIVO O SUBSIDIAI		147.82		2.66	19.96	
01	71378950	LUQUE	MARIACA	ANTHONY JUAN	ACTIVO O SUBSIDIAI						
01	72269518	DELGADO	CRUZ	ALINA MARINA LUC	ACTIVO O SUBSIDIAI		100.00		1.80	13.50	
01	76128738	QUISPE	MAMANI	LUIS ANTONIO	ACTIVO O SUBSIDIAI						
							1,762.18	0.00	112.98	237.89	61.92
											1,678.25

IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 96570

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

IMELEC S.R.L.
OSVALDO F. CARDENAS VILCHIA
 GERENTE GENERAL

18/12/2019
12:59:28

S.N.P. Asegura tu pensión (ONP)	S.N.P. D.Ley 20530	Imp. Renta Sta.catég.	Imp. Retención 4ta Cat.CAS.	CONAFOVICER	+Vida Seguro Accidentes (ESSALUD)	Aporte FCIMMS - LEY 29741	Cuota al Fondo CIMMS - Ley 29741	Otras aportaciones	Aporte a ONP - Independientes	Aporte a REP - Retención
		0.00		12.78	5.00					
		0.00		0.00						
		150.00		0.00						
		0.00		10.03	5.00					
		0.00		28.36	5.00					
		0.00		27.12	5.00					
		0.00		24.09	5.00					
		0.00		8.03	5.00					
		0.00		30.10	5.00					
		0.00		0.00						
		0.00		0.00						
		0.00		8.25	5.00					
		0.00		28.48	5.00					
		0.00		8.10	5.00					
		0.00		7.09	5.00					
		0.00		7.09	5.00					
		0.00		29.31	5.00					
		0.00		7.09	5.00					
		0.00		29.55	5.00					
		0.00		27.30	5.00					
		0.00		22.02	5.00					
		0.00		21.70	5.00					
		0.00		0.00						
		0.00		7.09	5.00					
		150.00		343.58	95.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IMELEC S.R.L.

OSVALDO CABRERA VINCIA
CIP 82871

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871

FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 95570

IMELEC S.R.L.

PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

RELACION DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y EMITIDOS

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA,
DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

CONTRATISTA : IMELEC S.R.L.

IMELEC  S.R.L.


SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA


 **FONDEPES**
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero


SAMA - TACNA
REGION TACNA

RELACION DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y EMITIDOS

DOCUMENTOS EMITIDOS DEL CONTRATISTA	
N°	DESCRIPCION ASUNTO
1	CARTA N°01 -2019/IMELEC-FONDEPES REMITO CALENDARIOS DE EJECUCION DE OBRA, ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
2	CARTA N°02 -2019/IMELEC-FONDEPES REMITO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3	CARTA N°04 -2019/IMELEC-FONDEPES REMITO CONSTANCIA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) DEL PERSONAL DE OBRA
4	CARTA N°05 -2019/IMELEC-FONDEPES REMITO POLIZA CONTRA TODO RIESGO - CAR
5	CARTA N°07 -2019/IMELEC-FONDEPES REMITO VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2019 AL 15/12/2019.
DOCUMENTOS EMITIDOS DE LA SUPERISION	
1	CARTA N° 001 -2019-RFRG-SUPERV/FONDEPES INICIO DE OBRA
2	CARTA N° 002 -2019-RFRG-SUPERV/FONDEPES ACTUALIZACION DE PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS
3	CARTA N° 003 -2019-RFRG-SUPERV/FONDEPES INFORME MENSUAL VALORIZACION N°01, PERIODO (04/12/2019 AL 15/12/2019)

IMELEC S.R.L.

OSVALDO J. CARDENAS VINCHÍA
 GERENTE GENERAL


RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 96570

PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

CARTAS FIANZAS

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA,
DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

CONTRATISTA : IMELEC S.R.L.

IMELEC  S.R.L.

SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

 **FONDEPES**
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

SAMA - TACNA
REGION TACNA

OF. TACNA
AV. SAN MARTIN 665
TACNA

**FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA
IMELEC SRL**

PRESENTE.-

**TACNA, 04-11-2019
CARTA FIANZA N°: 0011-0232-9800060493-68
VENCE EL: 02-04-2020**

Señor/es:



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

IMELEC S.R.L.
[Signature]
OSVALDO CARDENAS VINCHA
GERENTE GENERAL

Presente.-

De nuestra consideración:

S/79,658.13 *****

Por la presente afianzamos ante Ud./s. al/a los señor/es IMELEC SRL en forma solidaria, irrevocable, incondicionada y de realización automática y sin beneficio de excusión, hasta por la suma de S/79.658.13(SOLES) a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones económicas relacionadas con la ejecución de la obra: CONSTRUCCION DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA - DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA, en caso de incumplimiento de nuestro afianzado.

Esta fianza que en ningún caso y por ningún concepto excederá al monto señalado en el párrafo anterior, regirá desde el 04-11-2019 hasta el 02-04-2020, luego de lo cual el Banco quedará liberado de toda responsabilidad.

El requerimiento de pago de la presente fianza deberá de realizarse necesariamente por conducto notarial en un plazo que no deberá exceder del previsto en el artículo 1898 del Código Civil, en la dirección abajo indicada y dentro del horario de atención que tenga establecido el Banco, señalándose obligatoriamente el monto a pagar. De no señalarse dicho monto, se entenderá que el requerimiento es por la suma total al que asciende la presente garantía. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe, se entenderá que Uds. renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago aún cuando el plazo de vencimiento y/o ejecución de esta fianza no hubieren vencido.

De haberse otorgado la presente carta fianza a favor de más de un beneficiario, facultados a ejecutarla indistintamente, los términos de requerimiento de pago o prórroga recibido en primer lugar de uno de los beneficiarios, primarán sobre los posteriores que dirijan los demás beneficiarios y que tengan distinto alcance o condición.

El pago será efectuado de conformidad con lo expresamente establecido en los párrafos precedentes.



La presente fianza no garantiza operaciones de mutuo dinerario, salvo lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 217 de la Ley 26702.

[Signature]
Francisco Ramos Flores
Ing. Residente de Obra
CIP 9657

[Signature]
Marco Antonio Frisancho Contreras
Ejecutivo Empresa
Oficina Tacna

IMELEC S.R.L.
[Signature]
FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 9657

UA311 /V5 - Junio 2019



19110401

RUC 201001308641033298000604936811E0232@/13:05:44
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA S/ 79,658.13


PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL N° SIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

BBVA Continental

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de Ud./s.

Atentamente,

BANCO CONTINENTAL
p.p.




Banco Continental
 Sub Gerente Oficina
 Oficina Tacna




Marco Antonio Frisancho Contreras
 Ejecutivo Empresa
 Oficina Tacna

Dirección donde debe ser requerido su pago OF.TACNA ubicado en AV. SAN MARTIN 665 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro

IMELEC S.R.L.




OSVALDO CARDENAS



RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 61371

IMELEC S.R.L.



FRANCISCO RAMOS PEÑA
 Ing. Residente de Obra
 CIP 99570


UA011 - V5 - Junio 2019



RUC 20100130204

REFRENDO: 13198191104011LE0232@/13:05:44
S/ 79,658.13

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909



La dirección electrónica: confirmaciones@isecrex.com.pe se encuentra a su disposición para confirmar/certificar esta garantía

CARTA FIANZA
N° E2894-00-2019

De nuestra consideración:
Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES *****

OTORGAMOS por el presente documento garantía incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática al sólo requerimiento de ustedes como beneficiarios, a solicitud de **IMELEC S.R.L.** *****

***** **IMELEC S.R.L.** *****
OSVALDO CANO

Que se hará efectiva por el motivo garantizado de **ADELANTO DIRECTO** correspondiente a **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 038-2019-FONDEPES 1° CONVOCATORIA BASES INTEGRADAS CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA del IOARR: CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA - DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA.** *****

La presente Garantía tiene una vigencia de 90 días contados a partir de las 00:00 m. 25 de Noviembre del 2019 hasta las 24:00 m. 22 de Febrero del 2020 fecha de su vencimiento y por la suma de **S/*79,658.12***, (Setenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho con 12/100 Soles), sin que nuestra responsabilidad exceda el importe expresamente señalado.

Su requerimiento, pago y renovación se ajustará a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley No. 30225, su reglamento y normas complementarias, modificatorias y ampliatorias.

SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Garantías quedará liberada de toda responsabilidad si se exigiera notarialmente el cumplimiento de la obligación dentro de los quince (15) días siguientes después de su vencimiento, en concordancia con el Artículo 1898 del Código Civil.

San Isidro, 25 de noviembre del 2019

[Signature]
Luis Alvaro Benítez
Jefe de Contrataciones

[Signature]
IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 26570

[Signature]
Gerente de Asesoría Jurídica

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82271

PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

CONTRATO DE OBRA

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA,
DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

CONTRATISTA : IMELEC S.R.L.

IMELEC  S.R.L.

SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

 **FONDEPES**
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

SAMA - TACNA
REGION TACNA



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CONTRATO N° 048-2019-FONDEPES

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 038-2019-FONDEPES
PRIMERA CONVOCATORIA**

"CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2434305".

Conste por el presente documento, la contratación de la "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2434305", que celebra de una parte:

- El **FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES** con RUC N° 20137921601, con domicilio legal en Av. Petit Thouars N° 115, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Jefa de la Oficina General de Administración, la señora **CARMINA CARRERA AMAYA**, identificada con DNI N° 10327662, designada mediante Resolución Jefatural N° 075-2019-FONDEPES/J de fecha 14 de mayo de 2019 y con las facultades conferidas en materia de contrataciones mediante Resolución Jefatural N° 069-2016-FONDEPES/J de fecha 17 de febrero de 2016, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y de la otra parte,
- La empresa **IMELEC S.R.L.**, con RUC 20119916705, con domicilio legal en Calle Alfa León N° 140 departamento 101, Urb. Calera de Monterrico, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Representante Legal, el señor **CÁRDENAS VINCHA OSVALDO JAVIER**, identificado con DNI N° 00441616, según poder inscrito en el Asiento C0010, de la Partida Electrónica N° 11010705 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tacna, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**.

LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA a quienes en forma conjunta se les denominará **LAS PARTES**, acuerdan en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES


Con fecha 16 de octubre de 2019, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 038-2019-FONDEPES PRIMERA CONVOCATORIA** para la contratación de la "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2434305", a la empresa empresa **IMELEC S.R.L.**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

IMELEC S.R.L.

CÁRDENAS VINCHA OSVALDO JAVIER
REPRESENTANTE LEGAL

FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Lima
CIP 50170

Página 1 de 9





"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación de la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2434305".

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 796,581.29 (Setecientos noventa y seis mil quinientos ochenta y uno con 29/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

IMELEC S.R.L.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en períodos de valorizaciones quincenales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.



En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el marco de lo dispuesto en el artículo 26° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD a efectuar los pagos correspondientes a las valorizaciones del presente contrato mediante depósito en Cuenta Bancaria, para cuyo efecto ha proporcionado su Código de Cuenta Interbancaria del BANCO BBVA CONTINENTAL:

Table with 2 columns: CCI - CUENTA EN SOLES and 011 232 000100041334 62

IMELEC S.R.L.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de noventa (90) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176° del Reglamento.

FRANCISCO RAMOS FLORES Ing. Residente de Obra

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección





"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por el concepto, monto y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: **S/ 79,658.13 (Setenta y nueve mil seiscientos cincuenta y ocho con 13/100 Soles)**, a través de la Carta Fianza N° 011-0232-9800060493-68 emitida por el Banco BBVA Continental. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: SEGUROS

EL CONTRATISTA, deberá presentar las pólizas que se detallan a continuación, en la fecha de inicio de ejecución de la obra:

1. POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO Y MONTAJE (CAR):

- Básica: por el monto del contrato.
- Terremoto: por el monto del contrato de obra.
- Avenida, lluvia e inundación, por el monto del contrato de obra
- Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del contrato de obra.
- Daños materiales, daños personales, remoción de escombros, por el 5% del monto del contrato.
- Huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, terrorismo por el 20% del monto del contrato de obra.

VIGENCIA:

La póliza de Seguro Todo Riesgo y Montaje (CAR) tendrá una vigencia desde la fecha de inicio de obra hasta la liquidación consentida de la obra.

2. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Póliza de Seguro de accidentes individuales de su persona de ingenieros y técnicos, conforme a lo dispuesto por el D.L. N° 688 y D.L. N° 25897.

VIGENCIA:

La póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, tendrá vigencia desde la fecha de inicio de ejecución hasta la recepción de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.



C. CARRERA



IMELEC S.R.L.

OSWALDO J. CARDENAS VINCHA
GERENTE GENERAL

IMELEC S.R.L.



G BURGOS



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"


EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días calendario siguiente a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMO

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo



La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

IMELEC S.R.L.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.



CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlas durante la ejecución contractual, según las disposiciones previstas en la Directiva "Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras":

Por la naturaleza de la intervención, los riesgos previsibles que han tomado en cuenta en la elaboración del expediente técnico y que pueden ocurrir durante la ejecución de las obras, son los siguientes: (ver anexos del expediente técnico)



IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
Gerente de Obra







"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	N° de	1	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	CONSOLIDACIÓN DE LA CASA RESUMINAL EN EL CENTRO AGRICOLA MONJO FAMILIAR, DISTRITO DE SANTA PRISCILA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
	Fecha	14/02/2019		Ubicación Geográfica	ENTIDAD: F.F. ESTADÍSTICA DISTRITO SANTA LAS YARAS, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		4.3 RIESGO ASIGNADO	
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Minimizar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo	4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3.1 Nivel	4.3.2 Comentarios	
1	INCUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DE OBRA	Baja	X				la entidad debe de absolver todos los compromisos y obligaciones de sus contrataciones	X		
2	DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA	Alta	X				proporcionar el combustible para la operación de la obra	X		
3	RENOVO Y CAMBIO DE MATERIALES POR OTROS DE MENOR CALIDAD POR PARTE DEL PERSONAL DE OBRA	Mediana		X			que el contratista gestione de su propia gestión y control de materiales y equipos		X	
4	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA GENERAL Y LOS COMPROMISOS DE REGULACIÓN AMBIENTAL	Alta		X			el contratista de obra tiene la obligación de cumplir los compromisos ambientales para la ejecución de obra de contar con compromisos de la normativa vigente		X	
5	Presencia de insecticidas en la zona donde se ejecuta la obra	Alta	X				el contratista debe de emitir planes de evacuación a zonas seguras		X	
6	Contaminación de residuos generados en obra	Mediana		X			contar con las EPPs y otras seguridad en obra		X	
7	Daños a la estructura de la obra	Mediana	X				contar con las EPPs y otras seguridad en obra		X	
8	RIESGOS DE LA ELECTRICIDAD	Mediana	X				contar con las EPPs y otras seguridad en obra		X	
9	MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO	Mediana	X				contar con las EPPs y otras seguridad en obra		X	
10	MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO	Mediana	X				contar con las EPPs y otras seguridad en obra		X	
11	MEDIDAS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO CON RIESGO ELÉCTRICO	Mediana	X				contar con las EPPs y otras seguridad en obra		X	



DNE: Gerente
Cargo: Gerente de Estudios y Proyectos
Declaro: GISELMA P.

DNI: 4449940
Cargo: Director General de Inversión Pesquera Acuicultura y Acuicultura
Declaro: DANIELA

IMELEC S.R.L.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de **EL CONTRATISTA** es de siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;





"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de **LA ENTIDAD** no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES			
Nº	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.50UIT por día de ausencia del personal de obra	Según informe del inspector y/o Supervisor
2	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no hay aprobado la sustitución de personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones requeridas.	5/1000delmonto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del inspector y/o Supervisor.
3	ACCESO AL CUADERNO DE OBRA Si el contratista o su personal, no permite el acceso a cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias.	5/1000delmonto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del inspector y/o supervisor.
4	Cuando el personal del plantel profesional clave (Residente de Obra y Especialista en Seguridad de obra y medio ambiente) no permanece por el plazo íntegro de la obra, en conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	1 UIT por cada día de ausencia del personal	IMELEC S.R.L. Según informe del Supervisor
5	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado, y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal	Según informe del Supervisor
6	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al Cuaderno de Obra al Supervisor.	Uno por cinco mil (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor



IMELEC S.R.L.
FRANCISCO NAVARRO S.
Ingeniero de Obra



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

7	Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por FONDEPES.	Uno por cinco mil (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor
8	Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad personal.	Uno por cinco mil, (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor
9	Cuando el contratista emplea equipos o maquinarias en obra no autorizadas previamente por el supervisor o cuando los equipos y maquinarias no cumplen con lo mínimo requerido en los presentes Términos de Referencia o cuando no presenta los equipos declarados en su propuesta técnica.	Dos por mil (2/1000) del monto del sub ítem por cada equipo que no cumpla con lo exigido en los TDR	Según informe del Supervisor
10	POLIZA CONTRA TODO RIESGO - CAR De no presentar el contratista los comprobantes que acrediten la cancelación del citado seguro dentro de los 10 días al inicio de la obra se le aplicara la penalidad que se señala.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32° y artículo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164° de su Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165° y 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

IMELEC S.R.L.



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.



CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹

Las controversias que surjan entre LAS PARTES durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según acuerdo entre LAS PARTES.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad de contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

¹ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de contratos cuyo monto contractual original sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).





"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

- **DOMICILIO DE LA ENTIDAD:** Av. Petit Thouars N° 115, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.
- **DOMICILIO DEL CONTRATISTA:** Calle Alfa León N° 140 departamento 101, Urb. Calera de Monterrico, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima.

Asimismo, señala el siguiente correo electrónico: imelec25@hotmail.com

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2019.

IMELEC S.R.L.

OSVALDO J. CARDENAS VINCHA
GERENTE GENERAL

FONDEPES

CAROLINA RAMIREZ AMAYA
GERENTE GENERAL

LA ENTIDAD

IMELEC S.R.L.

ING. OSVALDO J. CARDENAS VINCHA
GERENTE

EL CONTRATISTA



PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

**OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA,
DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"**

CONTRATISTA : IMELEC S.R.L.

IMELEC  S.R.L.

SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

 **FONDEPES**
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

SAMA - TACNA
REGION TACNA



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO PARA EJECUCION DE OBRA

PROCESO : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2019-FONDEPES
CONTRATO : N° 048-2019-FONDEPES
OBRA : "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA IOAPP: CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PPOVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA" CODIGO UNICO N° 2434305"
UBICACIÓN : CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA - DISTRITO DE SAMA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
ENTIDAD : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUEPO (FONDEPES)
CONTRATISTA : EMPRESA IMELEC S.R.L.
PLAZO DE OBRA : 90 DIAS CALENDARIO
MONTO CONTRACTUAL : S/ 796,581.29 (Setecientos Noventa Y Seis Mil Ochenta Y Uno Con 29/100 Soles)

Siendo las 11:00 am horas del día tres (03) de diciembre del 2019, se reunieron en las instalaciones del Centro Acuícola Morro Sama, por una parte en representación del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, el ING. MIGUEL ÁNGEL GÁLVEZ CAPARÓ como Coordinador de Proyecto, y EL ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA como Supervisor de Obra; por la otra parte, el Sr. OSVALDO JAVIER CÁRDENAS VINCHA como representante legal de la Empresa Contratista IMELEC S.R.L., para cumplir con la diligencia de ENTREGA DEL TERRENO para la ejecución de la Obra "CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA - DISTRITO DE SAMA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA".

En tal sentido, luego de efectuar el recorrido y verificar la disponibilidad del lugar, las partes involucradas dejan constancia que se efectúa la correspondiente Entrega de Terreno por parte de FONDEPES al CONTRATISTA "Empresa IMELEC S.R.L." bajo condiciones satisfactorias, declarando que no existe impedimento alguno, para ejecutar físicamente la obra materia de encargo contractual. Siendo las 13:00 pm horas del mismo día, se da por concluida el acto de Entrega de Terreno, firmando los participantes en señal de conformidad al pie del presente documento en cuatro (04) originales.

POR EL CONTRATISTA
Sr. Osvaldo Javier Cárdenas Vincha
Representante Legal
DNI 00441616

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 96570

POR LA SUPERVISION
Ing. Renzo Fernando Romero Guerra
Supervisor de Obra
DNI 01333069

IMELEC S.R.L.

OSVALDO J. CÁRDENAS VINCHA
GERENTE GENERAL

POR FONDEPES

Ing. Miguel Ángel Gálvez Caparó
Coordinador de Proyecto
DNI 29553769

PROPIETARIO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

INFORME DE SEGURIDAD

**OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA,
DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"**

CONTRATISTA : IMELEC S.R.L.

IMELEC  **SRL**

SUPERVISOR : ING. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA

 **FONDEPES**
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero


SAMA - TACNA
REGION TACNA

IMELEC SRL

OBRA:

"CONSTRUCCION DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA-DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871




IMELEC S.R.L.
OSVALDO J. CARDENAS VINCHA
GERENTE GENERAL


RESIDENTE DE OBRA : ING. FRANCISCO RAMOS FLORES

INGENIERO DE SEGURIDAD : ING. PAUL OMAR CARDENAS NUÑEZ

Tacna, 15 de Diciembre de 2019



IMELEC S.R.L.
PAUL CARDENAS NUÑEZ
INGENIERO DE SEGURIDAD
CIP 101100



IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS FLORES
RESIDENTE DE OBRA
CIP 101100

IMELEC SRL	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA-DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
		INFORME N° 01
		Fecha: 15-Diciembre- 2019

INDICE GENERAL

- I. DESCRIPCION DEL PROCESO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
 1. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO EN OBRA
 2. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
 3. REGISTROS DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES EN OBRA
 4. OTROS REGISTROS QUE SE EMPLEAN EN OBRA

- II. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
 1. ESTADISTICAS DEL INDICE DE FRECUENCIA Y GRAVEDAD ACCIDENTE DE TRABAJO
 2. DETALLE DE LOS TEMAS DE LAS CHARLAS DE SEGURIDAD


- III. TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PRESENTE MES SEGÚN LAS PARTIDAS**

- IV. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DURANTE LA EJECUCION DE OBRA**


- V. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES**


- VI. CONCLUSIONES**

- VII. FOTOS**




RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

IMELEC S.R.L.

 OSVALDO J. CARDENAS VELCHA
 GERENTE GENERAL

IMELEC S.R.L.


PAUL CARGENAS NUNEZ
 Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
 CIP 161783

IMELEC S.R.L.


FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 96570

IMELEC SRL	OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CASA RESIDENCIA EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA-DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
		INFORME N° 01
		Fecha: 15-Diciembre 2019

I. DESCRIPCION DEL PROCESO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO EN OBRA

Se ha planteado según la categoría de riesgo de importancia de cada uno de los procedimientos de trabajo seguro. Practicando el IPER'C (Identificación de Peligros, Riesgos y Medidas de Control) en cada una de las actividades de la obra. Las mismas que son parte del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la presente obra.

2. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA PRESENTE OBRA

Se ha elaborado y contiene las partes conformantes que prescribe la NTP G 050. La propia Ley 29783 y su reglamentación correspondiente

3. REGISTRO DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES EN OBRA

Se cuenta con los formatos correspondientes, los mismos que serán de uso cuando se dé la ocurrencia del accidente o incidente. Asimismo, se cuenta formato para Registro Diario sobre Incidentes y/o Accidentes

4. OTROS REGISTROS QUE SE EMPLEA EN OBRA

En observancia a las normativas al respecto, se emplea los Registros que la Ley prescribe así como los que la necesidad exige. Algunos de los cuales se consigna:

IMELEC S.R.L.
OSVALDO CORDERO VINCIGLIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82971

ITEM	DESCRIPCION	ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO
1.00	Charlas diarias de 10 minutos		10	10
2.00	Reporte Diario de Incidentes y/o Accidentes		10	10
3.00	Charlas de Inducción. Adicionado la entrega de RISST y "Compromiso de Cumplimiento"		14	14
4.00	A. T. S. IMELEC S.R.L.		24	24

.....
PAUL CARDENAS NUÑEZ
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
CIP 161783

"CONSTRUCCION DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA-DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

IMELEC S.R.L.
.....
FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 90070

IMELEC SRL	OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CASA RESIDENCIA EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA-DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
		INFORME N° 01
		Fecha: 15-Diciembre 2019

5.00	Check List y/o Inspecciones		2	2
------	-----------------------------	--	---	---

II. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. ESTADISTICAS DEL INDICE DE FRECUENCIA Y GRAVEDAD DE ACCIDENTE DE TRABAJO

ITEM	DESCRIPCION	ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO
1.00	INCIDENTES		0	
2.00	ACCIDENTES LEVES		0	
3.00	ACCIDENTES INCAPACITANTES		0	
4.00	ACCIDENTES MORTALES		0	
5.00	DIAS PERDIDOS		0	
6.00	HORAS-HOMBRES TRABAJADAS		9744	9744
7.00	INDICE DE FRECUENCIA MENSUAL (IFM)		0	
8.00	INDICE DE GRAVEDAD MENSUAL (IGM)		0	
9.00	INDICE DE FRECUENCIA ACUMULADA (IFA)		0	
10.00	INDICE DE GRAVEDAD ACUMULADA (IGA)		0	
11.00	INDICE DE ACCIDENTABILIDAD (IA)		0	

IMELEC S.R.L.
 OSVALDO GONZALEZ
 RENEE ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

IMELEC S.R.L.
 PAUL CARDENAS NUÑEZ
 Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
 CIP 161783

IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 96570

IMELEC SRL	OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CASA RESIDENCIA EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA-DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
		INFORME N° 01
		Fecha: 15-Diciembre 2019

2. DETALLE DE LOS TEMAS DE CHARLAS DE SEGURIDAD DIARIO DE 10 MINUTOS

Las Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo se desarrollan diariamente dentro del horario de trabajo (al inicio de jornada laboral). Lo cual se detalla a continuación:

ECHA	TEMAS	DURACION	PARTICIPANTES
04/12/2019	Estándar básico de Prevención de Accidentes (1)	10 min.	05
05/12/2019	Estándar básico de Prevención de Accidentes (2)	10 min.	05
06/12/2019	Normas de conducta personal	10 min.	07
07/12/2019	Tema de motivación: "El sol brilla más allá"	10 min.	07
09/12/2019	Accidentes de tránsito	10 min.	07
10/12/2019	Uso adecuado del A.T.S. (Análisis de Trabajo Seguro)	10 min.	11
11/12/2019	Procedimientos de almacenamiento y manipuleo de materiales	10 min.	10
12/12/2019	Medidas de seguridad en excavaciones	10 min.	10
13/12/2019	Lesiones en los ojos	10 min.	13
14/12/2019	Cáncer de piel	10 min.	12
14/11/2019	Recomendaciones para evitar accidentes en superficies de trabajo	10 min.	35

III. TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PRESENTE MES

SEGURIDAD Y SALUD

Elaboración, Implementación y Administración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido elaborado en su oportunidad.

La implementación y administración respectiva se ajusta a lo que prescribe el

"CONSTRUCCION DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA-DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"


IMELEC S.R.L.

PAUL CARDENAS NUNEZ
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
CIP 161783

IMELEC SRL	OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CASA RESIDENCIA EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA-DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
		INFORME N° 01
		Fecha: 15-Diciembre 2019

propio documento, así como guarda armonía con la Normativa en general en lo que respecta a Seguridad y Salud en el Trabajo.

Equipos de Protección Personal. - Se ha cumplido con la entrega a todo el personal presente en obra. Incluido en lo que respecta a la segunda dotación de ropa de trabajo. Como también se efectúa las renovaciones que fueren necesarios



 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERIOR DE OBRAS
 CIP 22871

Equipos de Protección Colectivas. - En esta partida se viene implementando todas las protecciones colectivas, para así proteger a todos los trabajadores y personas ajenas a la obra.

Señalización Temporal de Seguridad. - Se ha señalado en todas las áreas exteriores como interiores de la obra que se requiere para su información prohibición y otros; y así poder trabajar con precaución

IMELEC S.R.L.

Capacitación en Seguridad y Salud. - Se viene desarrollando las charlas diariamente con la presencia de los obreros así también a los que ingresan por primera vez se les da su charla de inducción, a quienes se les hace entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo; como también firman el "Compromiso de Cumplimiento" respectivo.




 OSVALDO J. CÁRDENAS NÚÑEZ
 INGENIERO SUPERIOR DE OBRAS
 CIP 22871

Recursos para Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud Durante el Trabajo. - En la obra se cuenta con camilla rígida, extintores y botiquines de primeros auxilios para cualquier tipo de accidente que ocurriera en la obra.

IMELEC S.R.L.


MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

- Esta partida se viene cumpliendo con la limpieza general y en forma permanente, así como con el riego de agua en las zonas de trabajo, para poder cumplir con el humedecimiento y controlar la propagación del polvo en la obra.
- Se cuenta con cilindros debidamente rotulados ubicados en la zona de manejo de residuos sólidos.



 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 96570

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ING. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DURANTE SU EJECUCION DE LA OBRA IMELEC S.R.L.



 PAUL CÁRDENAS NÚÑEZ
 Ing. Residente de Obra
 CIP 161783

- Se ha verificado la entrega a todo el personal obrero y administrativos sus respectivos implementos de seguridad.
- Se viene desarrollando las respectivas charlas de seguridad diariamente a todo el personal obrero y técnicos. Como también lo diálogos específicos según la actividad a realizar, considerando los diferentes frentes de trabajo.
- Así mismo se viene monitoreando el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, durante la ejecución de la obra.
- Se desarrolla el Análisis de Trabajo Seguro (A.T.S.) por cada actividad a desarrollarse durante el día. Asimismo, todo el personal que recibe las charlas de seguridad están firmando sus respectivas asistencias diariamente.
- Se está colocando las señalizaciones en todas las áreas de trabajo que implica cualquier riesgo de accidente en obra.
- En obra se ha implementado de extintor, botiquin y camilla estática
- También se le está dotando a todo el personal obrero y técnico de obra el abastecimiento de agua para el consumo humano diariamente
- Se distribuye los P.E.T.S (Procedimientos Escritos de Tarea Segura) a todo el personal, conforme a la actividad que desarrollan
- En su oportunidad, se desarrollarán los P.E.T.A.R. (Permisos Escritos para Trabajos de Alto Riesgo) para los trabajos en altura, debidamente firmadas por Supervisión de Obra. Como también los Permisos para Trabajos en Espacio Confinado

IMELEC S.R.L.

OSVALDO J. CARDENAS VILCHA
Ingeniero de Obra

V. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

- Se recomienda siempre el orden y limpieza en todas las zonas de trabajo de la obra; ordenar en sus lugares correspondientes sus herramientas de trabajo; y así evitar cualquier tipo de accidentes.
- Se recomienda que toda actividad, con mayor razón las de riesgo -como los trabajos con maquinarias- se coordine con el área de seguridad para poder tener a todo el personal capacitado y las vías de accesos señalizados respectivamente.
- También se debe de contar con todos los requerimientos solicitados en su debido tiempo, y así evitar desabastecimientos que serían vinculantes a cualquier tipo de penalidades por la autoridad inspectora

IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 96578

RENZO F. ROMERO
Ingeniero de Obra
CIP 82071

VI. CONCLUSIONES

- Se comprueba que las charlas de 10 minutos son muy útiles, ya que disminuye el riesgo y probabilidad de accidentes en obra.

IMELEC S.R.L.

PAUL CARDENAS NUÑEZ
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
CIP 161783

IMELEC SRL	OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CASA RESIDENCIA EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA-DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
		INFORME N° 01
		Fecha: 15-Diciembre 2019

- El uso de los A.T.S. permite sensibilizar al trabajador y lograr la concentración vinculante al trabajo a realizar
- También se observa que el personal utiliza sus respectivos implementos de seguridad adecuadamente, salvo excepciones que son corregidas inmediatamente
- Las señalizaciones instaladas en las vías de accesos y en las diferentes actividades de la obra permiten sensibilizar al personal propio y ajeno en el objetivo de evitar cualquier tipo de accidente peatonal y/o vehicular.

VII. FOTOS

IMELEC S.R.L.

.....
PAUL CORDENAS NUNEZ
 Especialista en Medio Ambiente

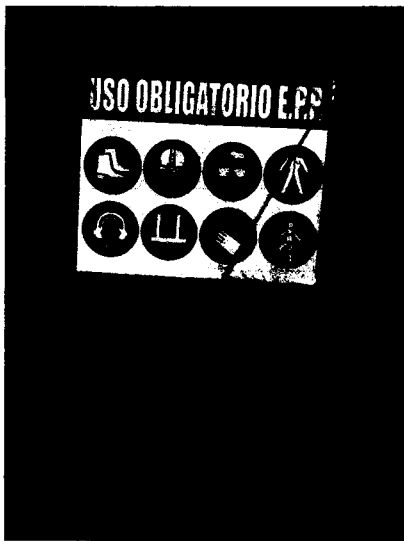
IMELEC S.R.L.

.....
FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 96570


IMELEC S.R.L.

.....
GENOVEVA CORTIñas VINCIA

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871



CARTEL DE OBLIGATORIEDAD DEL USO DE EPPS



BOTIQUIN DE PRIMERO AUXILIOS

[Handwritten Signature]

 RENZO T. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

IMELEC S.R.L.
[Handwritten Signature]

 OSVALDO J. GARDENAS VILCHA
 GERENTE GENERAL

IMELEC S.R.L.
[Handwritten Signature]

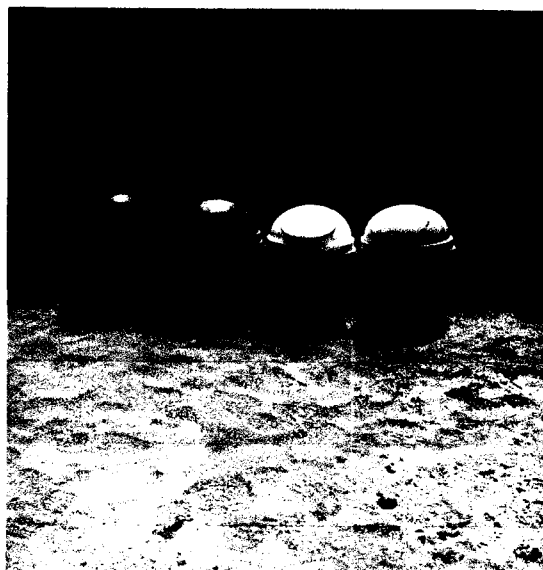
 PAUL GARDENAS NUNEZ
 Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
 CIP 161743

IMELEC S.R.L.
[Handwritten Signature]

 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 36570



EXTINTOR CON SU SEÑAL DE IDENTIFICACION



DEPOSITOS DE RESIDUOS SOLIDOS

[Handwritten Signature]

 REMON RAMIRO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

IMELEC S.R.L.
[Handwritten Signature]

 OSVALDO CARLOS SUAREZ
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 96570

IMELEC S.R.L.

PAUL CORDENAS NUNEZ
 Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
 CIP 161783

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 96570



SEÑAL DE PROHIBICION DEL INGRESO DE PERSONAL AJENA A LA OBRA



CHARLA DIARIA DE CAPACITACION

[Handwritten Signature]

 BENITO ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

IMELEC S.R.L.
[Handwritten Signature]

 OSVALDO J. CARRERAS VINCIGA
 GERENTE GENERAL

IMELEC S.R.L.
[Handwritten Signature]

 PAUL CARDENAS NUNEZ
 Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
 CIP 161783

IMELEC S.R.L.
[Handwritten Signature]

 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 96570

IMELEC SRL

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA – DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA

IMELEC S.R.L.

OSWALDO C. RAMOS FLORES
GERENTE GENERAL

CHARLA DIARIA DE 10 MINUTOS

REYNOLDO ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871

IMELEC S.R.L.

PAUL CARDENAS NUÑEZ
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
CIP 161783

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 96570

N° REGISTRO : REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA

DATOS DEL EMPLEADOR :

1) RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL	2) RUC	3) DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	4) ACTIVIDAD ECONÓMICA	5) N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
IMELEC S.R.L.			Construcción	

MARCAR (X)

6) INDUCCIÓN	7) CAPACITACION	8) ENTRENAMIENTO	9) SIMULACRO DE EMERGENCIA
	X		

10) TEMA: **CAMBIO DE P.I.E.L**

11) FECHA: **14 de diciembre de 2019**

12) NOMBRE DEL CAPACITADOR O ENTRENADOR: **Paul Omar Cardenas Nunez**

13) N° HORAS: **de 07:00 a 07:00 a.m. 2 D.10**

14) APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS CAPACITADOS	15) D.N.I.	16) ÁREA	17) FIRMA	18) OBSERVACIONES
Velazquez Carlos David	00520972			
Malloní Alipio	090487441			
Mamari Plaza Percy	48649420			
Palacios Aroquipa Gustavo	42333370			
Lopez Mamani Javier	47664803			
Edone ore Victor Lewis	44086198			
Apaza Fuentes Diego	44010605			
Cruz Mamani Edson O.	44761782			
Richard Chura Condori	42440843			
Eusacani maron Rogelio	01331102			
CHIPANA CHACAÑA GERMAN D.	45303547			
JENRRY LIMACHE CRUZ	42896473			

RENZO E. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

IMELEC S.R.L.

 FRANCISCO RAMOS FLORES
 GERENTE GENERAL

19) RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre: **Ing. Paul Omar Cardenas Nunez**
 Cargo: **Responsable de Seguridad**
 Fecha: **14/12/19**
 Firma:

IMELEC S.R.L.

 PAUL CARDENAS NUNEZ
 Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
 CIP 161783

IMELEC S.R.L.

 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 90570

CHARLA DE SEGURIDAD

TEMA : CANCER DE PIEL

En nuestro país, la tasa de personas con cáncer de piel se encuentra en aumento, este es uno de los 5 cánceres más frecuentes, debido principalmente a la exposición al sol sin protección, especialmente en horas de mayor intensidad de radiación ultravioleta, es decir, entre las 10 a.m. Y 4 p.m., que es cuando los rayos del sol caen más perpendicularmente a la superficie terrestre.

Hasta hace unos años, el factor edad era clave. Es decir, a mayor edad, más riesgo de cáncer de piel. Sin embargo, hoy en día cualquier persona, a cualquier edad, puede desarrollar este tipo de cáncer. En consecuencia, las recomendaciones van para todos. Es mas, esta tendencia no se va a reducir, sino todo lo contrario, y es que la evolución del cáncer de piel ha cambiado. Antes, este tipo de cáncer se desarrollaba en un tiempo aproximado de 15 años, pero hoy en día puede desarrollarse apenas en 7 años. Esto se da porque las condiciones han variado, ya sea por el deterioro de la capa de ozono, agentes contaminantes y sobre todo por la exposición al sol y el incorrecto uso de bloqueadores solares.

La MELANOMA es un tipo de cáncer de piel altamente agresivo. Para tener una idea: cada año, provoca la muerte de más de 60 mil personas en todo el mundo.

Cada persona debe conocer las manchas, lunares y características de su piel. Los lunares y las manchas nuevas deben ser vistas para descartar que se traten de una lesión maligna. Si usted encuentra un lunar o mancha en la piel en forma extraña, con bordes irregulares, con un tono marrón, rojo o negro, o si sobrepasa los 6 milímetros de diámetro, tiene razones para visitar a un dermatólogo. Podría ser síntoma de cáncer.

Cabe resaltar que el bloqueador es la mejor alternativa que existe para disminuir el riesgo de cáncer de piel. Este debe tener un factor de protección de 50 o más. Póngaselo media hora antes de salir a la exposición al sol y colóqueselo nuevamente cada dos horas, sobre todo cuando transpire o tenga contacto con el agua. Mantenga una buena hidratación y aumente el consumo de vitaminas A y C con frutas y verduras.

DATO IMPORTANTE : 90 % de casos de cáncer de piel aparecen en zonas como cabeza y cuello.

IMELEC S.R.L.

.....
PAUL CARDENAS NUÑEZ
 Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
 CIP 161783

IMELEC S.R.L.

.....
FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 96570

IMELEC S.R.L.

.....
GERARDO CARDENAS VIECHA
 GERENTE GENERAL

.....
RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

N° REGISTRO : REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA

DATOS DEL EMPLEADOR :

1) RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL	2) RUC	3) DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	4) ACTIVIDAD ECONÓMICA	5) N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
IMELEC S.R.L			Construcción	

MARCAR (X)



6) INDUCCIÓN	7) CAPACITACION	8) ENTRENAMIENTO	9) SIMULACRO DE EMERGENCIA
	X		

10) TEMA: Lesiones en la obra

11) FECHA: Viernes 13 de Diciembre de 2015

12) NOMBRE DEL CAPACITADOR O ENTRENADOR: Jorge Ciro Chela

13) N° HORAS: de 07:00 a 07:10 a las 20:10

14) APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS CAPACITADOS	15) D.N.I.	16) ÁREA	17) FIRMA	18) OBSERVACIONES
Velazquez Celso David	00501972		[Firma]	
CRUZ MAMANI ALIPIO	00187914		[Firma]	
CUSACANI MAYOR ROCELIO	01331102		[Firma]	
Richard Chura Condori	42440843		[Firma]	
Palacios Arocutipa Gustavo	42733320		[Firma]	
Cruz Mamani Edron U.	44761782		[Firma]	
CHIPANA CHORBANA GERMÁN D.	45303347		[Firma]	
JENRRY LIMDICHE CRUZ	43896433		[Firma]	
Lopez Mamani ; Javier	47664803		[Firma]	
Mamani Plaza Percy	40649972		[Firma]	
Mamani Silva Julian	42290683		[Firma]	
Edone ore Victor Lewis	44086192		[Firma]	
APAZAFUC FUENTES DIEGO	44010605		[Firma]	
 BENZO ROMERO GUERRA INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA CIP 82871			IMELEC S.R.L.  GENARO CARDENAS NUÑEZ INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	

19) RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre :	Jorge Ciro Chela
Cargo :	especialista 8800A
Fecha :	13/12/2015
Firma :	

IMELEC S.R.L.

 PAUL CARDENAS NUÑEZ
 Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
 CIP 161783

IMELEC S.R.L.

 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 96570

CHARLA DE SEGURIDAD

TEMA : LESIONES EN LOS OJOS

La industria de la construcción es el que reporta un porcentaje mucho más alto de lesiones en los ojos que cualquier industria.

Clavos, partículas de metal, astillas y puntas de alambre pueden saltar por el aire. Al mezclar cemento, serruchar, triturar y picar se produce polvo y grava. También la maquinaria pesada que se mueve de un lado a otro produce lo mismo. Los productos químicos y el arco de soldadura pueden quemarle los ojos. Si no tiene cuidado, se puede lesionar o hasta quedar ciego.

PROTEJASE

-De preferencia utilice gafas que tengan protección a los lados

-Siempre utilice gafas si sabe que habrá mucho polvo

-Si trabaja cerca de un sitio donde estén soldando requiere que haya una pantalla a prueba de fuego alrededor del soldador para proteger a la demás gente de los rayos ultravioletas emanadas al soldar. Sin protección, se puede quemar los ojos. No mire el arco de soldadura ni las reflexiones del arco a menos que tenga puesto un casco para soldar que tenga el mismo lente del soldador.

-Se requiere que haya un lugar en el sitio de trabajo donde pueda lavarse los ojos, en caso de que haya material dañino en el ambiente.

-Si se le introduce un producto químico peligroso o irritante en el ojo, enjuágueselo inmediatamente por 15 o 20 minutos continuos y si usa lentes de contacto, sáqueselo mientras se lava. Si es posible, lávese con el chorro de agua del grifo y atienda con un médico.

Si recibe un golpe en el ojo, póngase una compresa de agua helada. El frío le ayudará a aliviar el dolor y aminorar la inflamación. Si no se le quita el dolor, o comienza a ver borroso, atienda con un médico de inmediato.

Si le duele el ojo, atienda con el médico o vaya de inmediato a la sala de emergencia

IMELEC S.R.L.

OSVALDO CARDENAS VINCIA
GERENTE GENERAL

FRENTO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82671

IMELEC S.R.L.

PAUL CARDENAS NUNEZ
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
CIP 161753

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 96570

CHARLA DE SEGURIDAD

TEMA : MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EXCAVACIONES

1.- Previamente a cualquier excavación, se obtendrá toda la información referente a la ubicación de instalaciones subterráneas (cables eléctricos, tuberías de agua, desagüe, líneas de fibra óptica, etc.) en la zona de trabajo. Asimismo, se deberá evaluar la clase de material que conforma el terreno con el fin de adoptar el tipo de protección conveniente

2.- Toda pared de excavación de 1.50 m. O más de profundidad deberá contar con un sistema de protección para prevenir posibles fallas de taludes y caída de material.

3.- Se deberá inspeccionar en forma continua las excavaciones cuando el personal trabaje dentro de ellas. La inspección estará orientada a detectar fisuras, grietas, ablandamiento, humedad, vibraciones y otros factores que puedan afectar la estabilidad de los taludes o paredes de la excavación.

4.- Se proveerá de medios de acceso apropiados (escaleras o similares) a toda excavación. Si se usa escaleras, éstas deben sobresalir mínimo 1.00 m, del punto de apoyo superior y estar aseguradas para evitar su desplazamiento.

5.- El material extraído de las excavaciones deberá depositarse a no menos de 0.60 m, del borde de las mismas. Para excavaciones de profundidad mayor a 1.20 m, la distancia para el material extraído será la mitad de la profundidad de la excavación.

6.- Cuando la estabilidad de edificaciones o paredes cercanas puede comprometerse por la excavación, se deberá implementar sistemas de apuntalamiento o calzadura apropiados.

7.- No se permite el uso de equipo o maquinaria que origine vibraciones cerca de las excavaciones cuando haya personal dentro de ellas, salvo que se hayan tomado las precauciones para evitar derrumbes.

8.- El polvo en suspensión producido durante la ejecución de excavaciones deberá controlarse con el uso de agua u otros métodos. Se proporcionará respirador para polvos a los trabajadores.

9.- Se colocará señalización de advertencia y acordonamiento a 1.00 m, del borde de las excavaciones o barreras para prevenir la caída de personal, vehículos o equipo a las mismas. Poniendo especial atención a las condiciones de riesgo fuera de los horarios de trabajo en zonas de tránsito peatonal o vehicular, cuidando de colocar señales luminosas (mecheros, circulinas) durante la noche.

10.- Toda excavación de profundidad mayor a 1.20 m, se considerarán "espacio confinado"

IMELEC S.R.L.

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA

OSVALDO L. ...

IMELEC S.R.L.

IMELEC S.R.L.

PAUL CAMPENAS NUNEZ

FRANCISCO RAMOS FLORES

SEGURIDAD SALUD Y BIENESTAR AMBIENTE DE
CONSTRUCCION CIVIL

Jorge ...

obra Construcción de la Casa Residencial de la Comunidad de M. S. S. M.

N° REGISTRO : REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA

DATOS DEL EMPLEADOR :

1) RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL	2) RUC	3) DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	4) ACTIVIDAD ECONÓMICA	5) N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
IMELEC S.R.L.			Construcción	

MARCAR (X)

6) INDUCCIÓN	7) CAPACITACIÓN	8) ENTRENAMIENTO	9) SIMULACRO DE EMERGENCIA
	ON <input checked="" type="checkbox"/>		

10) TEMA: Procedimientos de Almacenamiento y Manejo de Materiales

11) FECHA: Miércoles 11 de Diciembre de 2014

12) NOMBRE DEL CAPACITADOR O ENTRENADOR: Jorge Curo Chata

13) N° HORAS: de 07:00 a 07:10 p.m. = 0:10

14) APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS CAPACITADOS	15) D.N.I.	16) ÁREA	17) FIRMA	18) OBSERVACIONES
CHIPANA CHARANO DAVID	45303347			
Cruz Mamani Alipio	20177474			
Alacios Arcotipa Gustavo	42733320			
Perez Mamani Alvaro	49679987			
Velazquez Calvo David	00501972			
Idone ore Victor Lewis	44086192			
Mamani Sina Julian	42290683			
Ayaza Fuentes Diego A.	44010065			
Cruz Mamani Edson O.	44761782			
Chipana Molina Samuel	00666435			
REPUBLICA PERUANA GUERRA INSTITUTO SUPERIOR DE GERENCIA CIP 20071			IMELEC S.R.L. OSVALDO J. GARDENAS VILCHA GERENTE GENERAL	

19) RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre: Jorge Curo Chata
 Cargo: Especialista en SSOMA
 Fecha: 11/12/14
 Firma:

SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE LA CONSTRUCCIÓN CIVIL

 Jorge Curo Chata
 ESPECIALISTA

IMELEC S.R.L.

 PAULO CURO CHATA
 Especialista en SSOMA

IMELEC S.R.L.

 FRANCISCO FLORES
 Gerente General

CHARLA DE SEGURIDAD

TEMA : PROCEDIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIALES

- La zona de almacenaje tendrá la menor cantidad de elementos contaminantes que hagan variar las propiedades de los materiales apilados.
 - Los estantes anaqueles y estructuras nunca se sobre cargarán
 - Cuando la altura del anaquel exceda tres veces su ancho se arriostrará
 - Los cuartos con controles eléctricos no se usan nunca como depósitos o almacenes.
 - El almacén debe estar siempre limpio y ordenado. Debe permitir el facil acceso del personal y equipos.
 - Los materiales deben ser apilados en areas niveladas y estables.
 - L altura total de la ruma no debe exceder 3 veces la dimensión más pequeña de la base. En ningún caso tendrá una altura superior a 2.40 mt.
 - Se debe dejar espacios suficientes entre filas como para que pasen cómodamente una persona y debe mantenerse libre de obstrucciones.
 - Las pilas de ladrillos deberán estibarse en forma cruzada uno con otro y su altura no podrá exceder de 2.40 mts.
 - Deberán mantenerse almacenes independientes de acuerdo a la naturaleza de los materiales (comunes, peligrosos, hidrocarburos y sus derivados)
 - Los artículos mas pesados se almacenan en la parte mas baja del anaquel.
 - No se apila material de manera que obstruya el equipo contra incendios, las duchas, pilones de agua, la iluminación, los paneles eléctricos o la ventilación.
 - Los tubos u otro material de sección circular deben almacenarse en estructuras especialmente diseñadas, a falta de éstas se colocarán sobre estacas (durmientes) de sección uniforme en número tal con respecto a su longitud que no permita su flexión, debiendo colocarse además cuñas de madera apropiadas a ambos lados de su base.
 - Se debe determinar adecuadamente los lugares de apilamiento. Quedando prohibido hacerlo en los siguientes lugares, entre otros : Bajo las escaleras. Frente y al costado de las puertas. En los pasillos peatonales. Superficies inestables u obstruyendo el acceso a equipos contra incendio.
- Los materiales inflamables y/o combustibles no deben se transferidos o trasladados de un contenedor a otro en las proximidades de trabajo con llama ardiente o cualquier fuente de ignición.
- Debe tener ventilación adecuada para prevenir acumulación de vapores o gases en el área de almacenamiento.
 - No se debe almacenar inflamables y/o combustible a mens de 7 mts, de cualquier estructura habitada y a menos de 15 mts, de fuentes de ignición.

.....
 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 02871

.....
 OSVALDO J. CARRERAS VITICOLA
 GERENTE GENERAL

IMELEC S.R.L.

IMELEC S.R.L.

SEGURIDAD SALUD Y BIENESTAR AMBIENTE DE CONSTRUCCION CIVIL

.....
 PAUL ANTONIO ESPINOZA
 Especialista en Seguridad y Salud Ambiental

.....
 FRANCISCO W. DE FLORES
 Ing. Responsable de Obra

Jorge Luis Chata Espinosa

Obra: Construcción de la Casa Residencial en el Centro Acuicola Mono Sama

N° REGISTRO : REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA

DATOS DEL EMPLEADOR :

1) RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL	2) RUC	3) DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	4) ACTIVIDAD ECONÓMICA	5) N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
CONSORCIO IMELC S.R.L			Construcción	

MARCAR (X)

6) INDUCCIÓN	7) CAPACITACION <input checked="" type="checkbox"/>	8) ENTRENAMIENTO	9) SIMULACRO DE EMERGENCIA
--------------	---	------------------	----------------------------

10) TEMA: Uso adecuado del A.T.S. (Análisis del Trabajo Seguro)

11) FECHA: Martes 10 de Diciembre de 2019

12) NOMBRE DEL CAPACITADOR O ENTRENADOR: Jorge Curo Chata

13) N° HORAS: de 07:00 a 07:10 a.m. = 0.10

14) APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS CAPACITADOS	15) D.N.I.	16) ÁREA	17) FIRMA	18) OBSERVACIONES
CRUZ MAMANI ALIPLO	00487474			
Velasquez Calvoza David	00504977			
Moreno Victor Lewis	44086192			
Tercera Mamani Plágar	48649977			
Ayza Fuentes Diego Armando	44010605			
Palacios Broc tipa Gustavo	42733320			
Mamani Sión Sulim	42790683			
CHIPANA CHARAÑO DAVID	45303347			
JENNY LIMACHE CRUZ	43896433			
CRUZ MAMANI EDSON U.	44761782			
Chipana Molina Samuel	00666433			
 RENZO ROMERO GUERRA INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA CIP 82871			IMELC S.R.L. OSVALDO J. CARDENAS VENCHÍA GERENTE GENERAL	

19) RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre: Jorge Curo Chata
 Cargo: Especialista en SSOMA
 Fecha: 10/ Diciembre / 2019
 Firma:

SEGURIDAD SANITARIA Y MEDIO AMBIENTE DE
 CONSTRUCCION CIVIL
 Jorge Curo Chata
 ESPECIALISTA

IMELC S.R.L.
 PAUL CARDENAS NUNEZ
 Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
 CIP 111735

IMELC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente en Obra
 CIP 96520

**FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO - ATS
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

FECHA : _____
 OBRA : _____
 TRABAJO A REALIZAR : _____

TAREAS Y/O ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS ASOCIADOS	ACCIONES RECOMENDADAS

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

	SI	NO		SI	NO
Manejo de Productos Quimicos Peligrosos			Trabajos en Altura		
Bloqueo y etiquetado			Otros:		
Ingreso a espacios Confinados					
Trabajos en Caliente (Soldadura, Esmeril, otros)					
Lizaje de cargas criticas					

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP / EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPC

SI	NO	ESPECIFICAR EL EPP A USAR	SI	NO	ESPECIFICAR EL EPC A USAR
		Guantes			Arnes de Seguridad y linea de vida
		Lentes			Acordonamiento
		Cascos			Carteles de Seguridad
		Zapatos con punta de acero			
		Zapatos Diaelectricos			EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
		Ropa de Protección personal o traje especial			Extintores
		Tapon de oidos			Botiquin de Primeros Auxilios
		Mascarilla para polvos/gases			Camilla rigida
		Orejas			Otros.
		Careta			

RENZO E. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 23871

Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA	Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA
			7		
2			8		
3			9	SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE CONSTRUCCION CIVIL	
4	IMELEC S.R.L.		10	Ing. Juan Ciro Chata ESPECIALISTA	
5	OSVALDO I. CAMPEN VINCIA GERENTE GENERAL		11		
6			12		

OBSERVACIONES : _____

Los trabajadores afirmamos haber recibido instrucciones precisas para realizar los trabajos con SEGURIDAD

 FIRMA ENCARGADO DEL GRUPO

PAUL CARRERAS NUNEZ
 especialista en construcción de Medio Ambiente
 FIRMA ING. DE SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 FIRMA INGENIERO RESIDENTE

Obra Construcción de la Casa Residencial en el Centro Agrícola Nuevo Saucé

N° REGISTRO : REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA

DATOS DEL EMPLEADOR :

1) RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL	2) RUC	3) DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	4) ACTIVIDAD ECONÓMICA	5) N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
IMELEC S.A.L			Construcción	

MARCAR (X)

6) INDUCCIÓN	7) CAPACITACION	8) ENTRENAMIENTO	9) SIMULACRO DE EMERGENCIA
	X		

10) TEMA: *Accidentes de Tránsito*

11) FECHA: *Lunes 09 de Diciembre de 2019*

12) NOMBRE DEL CAPACITADOR O ENTRENADOR: *Jorge Curo Chata*

13) N° HORAS: *de 07:00 a 07:10 a.m. = 0.10*

14) APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS CAPACITADOS	15) D.N.I.	16) ÁREA	17) FIRMA	18) OBSERVACIONES
<i>Chipana Molina Samuel</i>	<i>60666432</i>		<i>[Signature]</i>	
<i>Victor Lewis Idone ore</i>	<i>44086192</i>		<i>[Signature]</i>	
<i>Palacios Arcutipa Gustavo</i>	<i>42933320</i>		<i>[Signature]</i>	
<i>Apaza Fuentes Diego Armando</i>	<i>44010605</i>		<i>[Signature]</i>	
<i>Cruz Mamani Edson U.</i>	<i>44761782</i>		<i>[Signature]</i>	
<i>Mamani Sina Julian</i>	<i>4290683</i>		<i>[Signature]</i>	
<i>CHIPANO CHASANO DAVID</i>	<i>45303347</i>		<i>[Signature]</i>	

19) RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre: *Jorge Curo Chata*

Cargo: *Especialista en SSOIMA*

Fecha: *09/12/2019*

Firma: *[Signature]*

RENZO RUIZ GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871

IMELEC S.R.L.

OSVALDO J. RAMOS FLORES
ING. ESPECIALISTA EN OBRAS
CIP 96570

SEGURIDAD SALUD Y BIENESTAR AMBIENTE DE CONSTRUCCION CIVIL
Jorge Curo Chata
ESPECIALISTA

IMELEC S.R.L.
PAUL CARDENAS NUNEZ
Culmina en Obra en el Área de Ambiente
CIP 101701

IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Especialista en Obra
CIP 96570

1.- DEFINICIONES DE ACCIDENTES DE TRANSITO

- Suceso eventual involuntario en que intervienen, al menos, un vehículo circulando por la vía y en el que resulta daño para las personas o las cosas.
- Toda falla en el sistema vial ocasionada por conductores, pasajeros, peatones o ambientales como vías y vehículos.
- Suceso negativo producido por un vehículo en circulación o un peatón, con resultado de daños materiales y/o lesiones o muertes.

2.- EL CONDUCTOR

- Es un procesador constante de información con poder de decisión.
- Conducir preventivamente no es ser Exageradamente precavido sino, Razonablemente precavido.

3.- TIPOLOGIA DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO

- Los accidentes de tránsito ocurridos con mayor frecuencia son de los siguientes tipos:
 - Atropello o atropellamiento.
 - Caída.
 - Colisión.
 - Choque.
 - Volcamiento.
 - Despiste.
 - Incendio.
 - Múltiple.
 - En cadena.

4.- FACTORES DE LOS ACCIDENTES DEL TRANSITO

- Factor Humano (conductores, pasajeros, peatones).
- Vehículos.
- Ambiente (vías, señalización, tránsito, leyes, reglamentos, condiciones climáticas, etc.).

5.- PREVENCIÓN

- Velocidad razonable y prudente.
- Buen estado del conductor.
- Mantención general oportuna del vehículo.
- Mantención y reparación oportuna de los elementos del vehículo.
- Buenas condiciones del conductor.
- Atención permanente.
- Educación de tránsito.
- Conducir siempre en las mejores condiciones físicas y mentales.

[Handwritten Signature]
 RENZO RICARDO GUILTYA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

IMELEC S.R.L.
[Handwritten Signature]
 OSVALDO CALDERA VILLALBA
 GERENTE GENERAL

Relator: _____
 Fecha: _____
 Firma: _____

IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLOP
 Ing. Residente de Obra
 CIP 25970

IMELEC S.R.L.
 PAUL CARDENAS NUNEZ
 especialista en Seguridad y Medio Ambiente
 CIP 1101783

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
 Jorge Curo Chata
 Técnico en Seguridad

CHARLA DE MOTIVACION

TEMA : EL SOL BRILLA MÁS ALLÁ

El águila es usada como símbolo de los que esperan y confían en mejorías. Esa ave es interesante desde su origen. Un pollo está listo para ser vendido en el mercado en nueve semanas; las águilas no. Éstas necesitan, como en el caso del águila real, hasta un año para volar solas.

Podemos ver palomas, gaviotas y cotorras que vuelan en bandadas; las águilas no. Siempre están solas; como máximo, dos. Quedan allá en lo alto, mirando el azul infinito.

[Handwritten signature]
RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 2871

¿Pensaste alguna vez adónde van las águilas cuando llega la tormenta? ¿Dónde se esconden? No se esconden. Abren sus alas, que pueden volar a una velocidad de hasta 90 km por hora, y enfrentan la tormenta. Saben que las nubes oscuras, la tempestad y las descargas eléctricas pueden tener una extensión de 30 a 50 metros, pero allá arriba brilla el Sol. En esa lucha terrible pueden perder plumas, herirse, pero no temen y siguen adelante. Después, mientras todo el mundo queda a oscuras allá abajo, ellas vuelan victoriosas, en paz, allí arriba.

IMELEC S.R.L.

[Handwritten signature]
CIVIL

Finalmente, las águilas también mueren, pero ¿encontraste alguna vez un cadáver de águila? Es posible que, en esas carreteras de las reservas ecológicas, hayas encontrado algún cadáver de gallina, de perro o de paloma, o incluso de algún animal de monte, pero al cadáver de un águila no lo encontrarás ¿sabes por qué? Porque cuando sienten que llegó la hora de partir, no se lamentan ni quedan con miedo. Buscan con sus ojos el pico más alto, sacan las últimas fuerzas de su cansado cuerpo, vuelan hacia las cumbres inalcanzables y ahí esperan resignadamente el momento final. Hasta para morir son extraordinarias.

IMELEC S.R.L.

[Handwritten signature]
FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 96570

IMELEC S.R.L.

[Handwritten signature]
PAUL CARDENAS NUNEZ
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
CIP 161723

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCION CIVIL

[Handwritten signature]
Jorge Curo Chata
ESPECIALISTA

CHARLA DE SEGURIDAD

TEMA : NORMAS DE CONDUCTA PERSONAL

1.- Se debe fomentar y mantener la armonía en las relaciones entre los trabajadores a todo nivel, por lo cual no debe permitirse las bromas ofensivas, peleas y juegos agresivos en general.

2.- No está permitido el ingreso a las instalaciones y áreas de trabajo, cuando el personal muestre signos de haber ingerido bebidas alcohólicas o bajo los efectos de sustancias fármaco dependiente ilegales (drogas).

3.- Está prohibido fumar en la proximidad de sustancias inflamables, combustibles o explosivos, y donde existan letreros de "NO FUMAR".

4.- Antes de iniciar cualquier trabajo, el trabajador deberá cerciorarse de que su labor no origine riesgos para él mismo, para otras personas, para los bienes de la obra o para el medio ambiente. Debiendo comunicar oportunamente sus observaciones.

5.- Evitar correr o saltar en los lugares de trabajo. Ninguna emergencia justifica el incumplimiento de esta directiva.

.....
 ROSENDO F. ROVERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIR-82871

IMELEC S.R.L.
 OSVALDO F. GARCÍA DE LAS VINCENAS
 GERENTE GENERAL

6.- Usar permanentemente durante la jornada laboral los equipos de protección personal de uso obligatorio y los complementarios según las actividades que se ejecutan.

7.- Mantener en condiciones de **Orden y Limpieza** todos los lugares y actividades

.....
 OSVALDO F. GARCÍA DE LAS VINCENAS
 GERENTE GENERAL
 Jorge Curo Chata
 ESPECIALISTA

IMELEC S.R.L.
 PAUL CARREÑAS NÚÑEZ
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIR-82871

IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIR-82871

CHARLA DE SEGURIDAD

TEMA : ESTANDAR BASICO DE PREVENCION DE ACCIDENTES (2)

DESCRIPCION :

Toda excavación, abertura en el piso, borde de losa elevada, escalera fija, ducto vertical abierto, etc., deberá estar protegido en forma completa y efectiva para prevenir caída de personas y objetos. Cuando no sea necesario utilizar barandas ($h= 1m$) ó recubrimientos resistentes (etapa de casco terminado), se podrá emplear acordonamiento de seguridad ($0.80 < h < 1.20$ m.) colocado a 1.00 m del borde del área de peligro. Toda mecha de fierro, sistema de fijación de encofrados, tubería o alambre saliente, si no puede eliminarse, deberá estar protegido y/o señalizado adecuadamente. Es responsabilidad del maestro de obra o inspector de seguridad el hacer instalar lo antes posible y mantener en buen estado las referidas protecciones.

Todo trabajador deberá mantener su área de trabajo en buenas condiciones de limpieza y orden, evitando que existan derrames de grasa o aceite, maderas con clavos, alambres o cualquier otro elemento que pueda causar tropiezos, resbalones o heridas, dejando siempre libres los pasillos de circulación que permitan caminar o evacuar el área en forma segura en casos de emergencia. Las áreas de depósito de madera con clavos deberán acordonarse y señalizarse con avisos preventivos.

El maestro de obra o inspector de seguridad deberá solicitar con anticipación el material necesario para señalizar las áreas de riesgo que originen los trabajos de su personal. No se permitirá retirar los avisos de seguridad, señalización, guardas, acordonamientos, ni cualquier otro elemento que prevenga o proteja al trabajador o a terceros contra posibles riesgos inherentes al área o al trabajo.

Es responsabilidad del maestro de obra e inspector de seguridad, verificar que cualquiera de estos elementos que por motivo de trabajo tengan que ser retirados, sean repuestos a la brevedad posible. Así mismo tomar previsiones cuando se trabaje cerca a líneas ó instalaciones eléctricas energizadas.

SEGURIDAD CIVIL Y MEDIO AMBIENTE DE
CONS. INGENIERIA CIVIL

Jorge Luis Chato
ESPECIALISTA

IMELEC S.R.L.

PAUL CARDENAS MUÑOZ
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
CIP 161263

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Registrado de Obra
CIP 95170

IMELEC S.R.L.

USVALDO J. CARDENAS VIRCHA
INGENIERO ESPECIALISTA DE OBRA
CIP 82871

USVALDO J. CARDENAS VIRCHA
INGENIERO ESPECIALISTA DE OBRA
CIP 82871

CHARLA DE SEGURIDAD

TEMA : ESTANDAR BASICO DE PREVENCION DE ACCIDENTES (1)

DESCRIPCION :

El trabajador no creará dentro de su labor una situación insegura capaz de producir un accidente para él o para sus compañeros. Cualquier trabajador que observe una situación de riesgo tiene la obligación de reportarla y si le fuera posible eliminarla. El maestro de obra y/o inspector que reciba un reporte de situación insegura tiene la obligación de tomar acción inmediata para solucionarla.

Todo incidente o accidente (aún cuando no exista lesión) debe ser reportado por el trabajador, si está en condiciones de hacerlo, en forma inmediata al maestro de obra o inspector de seguridad, el cual reportará al residente de obra, de acuerdo a la Ley Peruana, si no es reportado dentro de las 24 horas de sucedido el evento, no será considerado como accidente de trabajo para efectos de seguro.

Las prendas básicas de protección personal de uso obligatorio mientras el trabajador permanezca en obra son: casco de seguridad, lentes protectores, guantes de cuero, máscaras anti polvo, botines de cuero con punta de acero o botas de jebe con punta de acero (salvo para trabajos eléctricos en instalaciones energizadas en que se usarán sin partes metálicas) y ropa de trabajo apropiada. Está totalmente prohibido darles otro uso que no sea el indicado. Si por efecto del trabajo se deterioraran, el trabajador informará al maestro de obra o inspector de seguridad para que la prenda dañada le sea reemplazada.

Para trabajos u obras que encierren riesgos especiales, la MDAА proporcionará al trabajador equipos que lo protejan contra estos riesgos en las mismas condiciones que en el punto anterior, los cuales serán de uso obligatorio.

Los trabajadores serán responsables del uso y cuidado de las herramientas y equipos que se les entregue para realizar su trabajo, debiendo siempre verificar que la herramienta y/o equipo es el adecuado y que se encuentra en buen estado. En caso de pérdida o deterioro de los mismos por negligencia, el trabajador asumirá la responsabilidad económica correspondiente.

Para realizar trabajos en altura se deberá usar arnés de seguridad, en buen estado y firmemente fijado. El uso de cinturones de seguridad se limitará a posicionamiento o restricción. Se tomarán previsiones para evitar la caída de objetos o herramientas. Los andamios, plataformas, rampas y escaleras deberán cumplir con todas las condiciones estipuladas en el Estándar.

SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE
CONSEJO NACIONAL DE REGULACIÓN CIVIL
.....
Jorge Curo Chata
ESPECIALISTA

IMELEC S.R.L.
.....
PAUL CARDENAS NUÑEZ
Especialista en Gestión de Medio Ambiente
CIP 101783


IMELEC S.R.L.
OSVALDO J. CARDENAS VARGAS
.....
RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871
.....
FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 96500

IMELEC SRL


OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL
CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA – DISTRITO DE
SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA

REPORTE DIARIO DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES



RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871



IMELEC S.R.L.

GERARDO C. CÁRDENAS VIRCHÍA
GERENTE GENERAL

REGISTRO DE REPORTE DIARIO DE INCIDENTES F-Nº019
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



INCIDENTE ACCIDENTE
 NO HUBO INCIDENTE NI ACCIDENTE

¿CUAL PUDO SER LA PROBABLE CONSECUENCIA ?
 MENOR MODERADA MAYOR


FECHA	Martes 10 de Diciembre de 2019
OBRA	Constatación de la Casa Residencial en el Centro Agrícola Monseñor Somoza
UBICACIÓN GEOGRAFICA	Monseñor Somoza - Distrito Somoza
NOMBRES Y APELLIDOS DEL INVOLUCRADO	
ENCARGADO DE SEGURIDAD	Ing. Paul Omar Cárdenas Núñez
ENTIDAD	IMELEC S.A.L
DEPARTAMENTO	Tacaná
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	 RENZO F. ROMÁN GUERRA INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA CIP 82371
MEDIDAS CORRECTIVAS	IMELEC S.R.L.  OSVALDO CÁRDENAS GERENTE GENERAL

IMELEC S.R.L.
L. CÁRDENAS NÚÑEZ
FIRMA ENCARGADO DE SEGURIDAD



IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS FLORES
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA


REGISTRO DIARIO DE ACCIDENTES E INCIDENTES


SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE S.A.
CONSTRUCCIÓN CIVIL
Jorge Luis Chiata
ESPECIALISTA

	REGISTRO DE REPORTE DIARIO DE INCIDENTES F-N°019 AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
--	---	---

<input type="checkbox"/> INCIDENTE <input type="checkbox"/> ACCIDENTE <input checked="" type="checkbox"/> NO HUBO INCIDENTE NI ACCIDENTE	¿CUAL PUDO SER LA PROBABLE CONSECUENCIA ? <input type="checkbox"/> MENOR <input type="checkbox"/> MODERARA <input type="checkbox"/> MAYOR
---	--

FECHA	Lunes 09 de Diciembre de 2015
OBRA	Construcción de la Casa Residencial en el Centro Agrícola Mono Soma
UBICACIÓN GEOGRAFICA	Mono Soma - Distrito Soma
NOMBRES Y APELLIDOS DEL INVOLUCRADO	
ENCARGADO DE SEGURIDAD	Ing. Paul Omar Cárdenas Nuñez
ENTIDAD	IMELEC S.R.L.
DEPARTAMENTO	Tacna
BREVE DESCRIPCION DEL EVENTO	 RENZO F. ROMERO SIERRA INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA CIP 82371 IMELEC S.R.L.  OSVALDO J. CÁRDENAS VICENS GERENTE GENERAL
MEDIDAS CORRECTIVAS	

IMELEC S.R.L.

PAUL CÁRDENAS NÚÑEZ
 Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
 CIP 111783
 FIRMA ENCARGADO DE SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 111783
 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

REGISTRO DIARIO DE ACCIDENTES E INCIDENTES



SEGURIDAD SALUD MEDIO AMBIENTE DE
 CONSTRUCCION CIVIL
 Jorge Curo Chata
 ESPECIALISTA

REGISTRO DE REPORTE DIARIO DE INCIDENTES F-Nº019
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



INCIDENTE ACCIDENTE
 NO HUBO INCIDENTE NI ACCIDENTE

¿CUAL PUDO SER LA PROBABLE CONSECUENCIA ?
 MENOR MODERADA MAYOR

FECHA	Sábado 07 - Diciembre - 2019
OBRA	Construcción de la Casa Residencial en el Centro Agrícola - Moma Saca
UBICACIÓN GEOGRAFICA	Moma Saca - Distrito de Saca
NOMBRES Y APELLIDOS DEL INVOLUCRADO	
ENCARGADO DE SEGURIDAD	Ing. Paul Omar Cárdenas Nuñez
ENTIDAD	IMELEC S.R.L.
DEPARTAMENTO	Tarma
BREVE DESCRIPCION DEL EVENTO	 RENZO F. SOLÍS GUERRA INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA CIP 82871
MEDIDAS CORRECTIVAS	 OSVALDO V. CÁRDENAS NUÑEZ GERENTE GENERAL

IMELEC S.R.L.

PAUL CÁRDENAS NUÑEZ
Ingeniero en Seguridad y Medio Ambiente
CIP 1111234

FIRMA ENCARGADO DE SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.


FRANCISCO RAMOS FLORES
Ingeniero Residente de Obra
CIP 211570

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



REGISTRO DIARIO DE ACCIDENTES E INCIDENTES

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE
ASOCIACIÓN CIVIL
Jorge Curo Chata
ESPECIALISTA

REGISTRO DE REPORTE DIARIO DE INCIDENTES F-N°019
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



<input type="checkbox"/> INCIDENTE <input type="checkbox"/> ACCIDENTE <input checked="" type="checkbox"/> NO HUBO INCIDENTE NI ACCIDENTE	¿CUAL PUDO SER LA PROBABLE CONSECUENCIA ? <input type="checkbox"/> MENOR <input type="checkbox"/> MODERADA <input type="checkbox"/> MAYOR
---	--

FECHA	Viernes 06 de Diciembre de 2019
OBRA	Construcción de la Casa Residencial en el Centro Agrícola Honor Sama
UBICACIÓN GEOGRAFICA	Honor Sama - Distrito de Sama
NOMBRES Y APELLIDOS DEL INVOLUCRADO	
ENCARGADO DE SEGURIDAD	Eng. Paul Omar Cárdenas Nuñez
ENTIDAD	IMELEC S.A.
DEPARTAMENTO	Tacna
BREVE DESCRIPCION DEL EVENTO	 RENZO F. ROMERO INGENIERO SUPERIOR DE OBRAS CIVILES
MEDIDAS CORRECTIVAS	 OSVALDO J. CÁRDENAS VIRCHÍA GERENTE GENERAL

IMELEC S.R.L.

PAUL OMAR CÁRDENAS NUÑEZ
Ingeniero Superior de Obras Civiles
 FIRMA ENCARGADO DE SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.


FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

REGISTRO DIARIO DE ACCIDENTES E INCIDENTES



SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE
 CONSTRUCCIÓN CIVIL

Jorge Curo Chata
 ESPECIALISTA

REGISTRO DE REPORTE DIARIO DE INCIDENTES F-N°019
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



<input type="checkbox"/> INCIDENTE <input type="checkbox"/> ACCIDENTE <input checked="" type="checkbox"/> NO HUBO INCIDENTE NI ACCIDENTE	¿CUAL PUDO SER LA PROBABLE CONSECUENCIA ? <input type="checkbox"/> MENOR <input type="checkbox"/> MODERADA <input type="checkbox"/> MAYOR
---	--

FECHA	Jueves 05 de Diciembre de 2019
OBRA	Construcción de la Casa Residencial en el Centro Agrícola Horno Sana
UBICACIÓN GEOGRAFICA	Horno Sana - Distrito de Sana
NOMBRES Y APELLIDOS DEL INVOLUCRADO	
ENCARGADO DE SEGURIDAD	Ing. Paul Omar Cárdenas Núñez
ENTIDAD	IMELEC SRL
DEPARTAMENTO	Tarma
BREVE DESCRIPCION DEL EVENTO	 RENZO F. ROMERO GUERRA INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA CIP 83371 IMELEC S.R.L.  OSVALDO J. CARDENAS GUERRA GERENTE GENERAL
MEDIDAS CORRECTIVAS	

IMELEC S.R.L.

.....
PAUL CARDENAS NUNEZ

FIRMA ENCARGADO DE SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.

.....
FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra


FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

REGISTRO DIARIO DE ACCIDENTES E INCIDENTES



SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE
 CONSTRUCCION CIVIL

Jorge Cruz Chata
 ESPECIALISTA

REGISTRO DE REPORTE DIARIO DE INCIDENTES F-N°019
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



<input type="checkbox"/> INCIDENTE <input type="checkbox"/> ACCIDENTE <input checked="" type="checkbox"/> NO HUBO INCIDENTE NI ACCIDENTE	¿CUAL PUDO SER LA PROBABLE CONSECUENCIA ? <input type="checkbox"/> MENOR <input type="checkbox"/> MODERADA <input type="checkbox"/> MAYOR
---	--

FECHA	Miércoles 04 de Diciembre de 2019
OBRA	Construcción de las casas Residenciales en el Centro Agrícola Madre Susana
UBICACIÓN GEOGRAFICA	Madre Susana - Distrito de Susana
NOMBRES Y APELLIDOS DEL INVOLUCRADO	
ENCARGADO DE SEGURIDAD	Ing. Paul Omar Cardenas Nunez
ENTIDAD	IMELEC S.R.L.
DEPARTAMENTO	Tacna
BREVE DESCRIPCION DEL EVENTO	 RENZO E. ROMERO GUERRA INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA CIP 82071
MEDIDAS CORRECTIVAS	IMELEC S.R.L.  FRANCISCO RAMOS FLORES Ing. Residente de Obra CIP 90570

IMELEC S.R.L.

.....
PAUL CARDENAS NUNEZ
 Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
 CIP 101783

FIRMA ENCARGADO DE SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.

.....
FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 90570

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

REGISTRO DIARIO DE ACCIDENTES E INCIDENTES

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE
 CONSTRUCCIÓN CIVIL


.....
Jorge Cruz Chata
 ESPECIALISTA


IMELEC SRL


OBRA:

**CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL
CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA – DISTRITO DE
SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA**

**CHARLA DE INDUCCION
-Entrega de RISST
-Compromiso de cumplimiento**


.....
RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871


IMELEC S.R.L.
JVALDO
GERENTE GENERAL

FORMATO DE INDUCCIÓN		
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		

TITULAR: IMELEC S.L

OBRA: Continuación de la Casa Residencial en el Centro Agrícola Mono Sana

RESIDENTE: Ing. Francisco Leon Flores

LUGAR: Mono Sana - Distrito Sana

FECHA: 12/12/19

HORA DE INICIO: 07:30 **HORA TÉRMINO:** 08:30 **DURACIÓN:** 1.00 h.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR(A): Richard Alejandro Chura Condori

IDENTIFICADO CON DNI N° 42440843 **EDAD:** 38

FECHA DE INGRESO: 12-12-2019 **N° TELEFONICO** 924337668

PUESTO DE TRABAJO: _____ **N° TELEF. DE UN FAMILIAR:** _____

SE HA CUMPLIDO CON LA EXPOSICION DE LOS SIGUIENTES ITEMS:

1. **Bienvenida y explicación del propósito de la orientación**
2. **Términos y conceptos básicos de Seguridad y Salud en el trabajo**
 - a.- Peligros, Riesgos y Medidas de Control
 - b.- Condiciones y Actos Sub estándar
 - c.- Accidentes e Incidentes
 - d.- Ergonomía
3. **Conocimientos de los Documentos de Gestión de la SST. Control Administrativo**
 - a.- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - b.- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - c.- Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control
 - d.- Mapa de Riesgos
 - e.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
4. **Sobre la Salud Ocupacional**
 - a.- Orden y Limpieza en las Áreas de Trabajo
 - b.- Enfermedades Ocupacionales
 - c.- Sustancias Peligrosas

IMELEC S.R.L.

OSVALDO CALDENAS VINCHA
GERENTE GENERAL

RENZO E. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871-

SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE
CONSTRUCCION CIVIL

Jorge Curo Chat.

IMELEC S.R.L.

PAUL CARDEÑAS NUNEZ
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
CIP 100070

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO J. COCCORIS
Ing. Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
CIP 100070

5. Respecto a los Equipos de Respuesta ante Emergencias

- a.- Ubicación y uso del Botiquín de Primeros Auxilios
- b.- Ubicación y uso de los Extintores según su tipología
- c.- Ubicación y uso de Camilla – otros equipos y/o materiales adicionales


6. Códigos de Colores y Señalización de Seguridad

7. Absolución de Preguntas del Personal INDUCIDO Y ORIENTADO

EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD VIGENTES (G.050), ASI COMO ACATAR LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA, COMO TAMBIEN CON LEY 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y TODO DOCUMENTO Y/O DIRECTIVA QUE CUMPLA EL MISMO FIN. CASO CONTRARIO SERAN SUJETOS A LAS SANCIONES PERTINENTES.

IMELEC S.R.L.
 OSWALDO CARDENAS NUNEZ
 INGENIERO SUPERIOR DE OBRA
 CIP 82871

RENZO F. ROMERO GUILERA
 INGENIERO SUPERIOR DE OBRA
 CIP 82871



[Handwritten signature]

FIRMA DEL TRABAJADOR

HUELLA DACTILAR

SEGURIDAD Y SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE CONSTRUCCION CIVIL
 Jorge Curo Chata
 ESPECIALISTA

FIRMA DEL EXPOSITOR

IMELEC S.R.L.


PAUL CARDENAS NUNEZ
 Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
 CIP 161783

JEFE AREA SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 96570

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FORMATO DE INDUCCIÓN		
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		

TITULAR: IMELEC SRL

OBRA: Construcción de la Casa Residencial en el Centro Agrícola
Morro Serna

RESIDENTE: Rep. Francisco Ramos Flores

LUGAR: Morro Serna - Distrito Serna

FECHA: 12/12/19

HORA DE INICIO: 07:30 **HORA TÉRMINO:** 08:30 **DURACIÓN:** 1.00 h.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR(A): Rogelio Cusacani Maron

IDENTIFICADO CON DNI N° 01331102 **EDAD:** 45

FECHA DE INGRESO: 12-12-2019 **N° TELEFONICO** 994540033

PUESTO DE TRABAJO: Albañil **N° TELEF. DE UN FAMILIAR:** 952212354

SE HA CUMPLIDO CON LA EXPOSICION DE LOS SIGUIENTES ITEMS:

1. **Bienvenida y explicación del propósito de la orientación**
2. **Términos y conceptos básicos de Seguridad y Salud en el trabajo**
 - a.- Peligros, Riesgos y Medidas de Control
 - b.- Condiciones y Actos Sub estándar
 - c.- Accidentes e Incidentes
 - d.- Ergonomía
3. **Conocimientos de los Documentos de Gestión de la SST. Control Administrativo**
 - a.- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - b.- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - c.- Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control
 - d.- Mapa de Riesgos
 - e.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
4. **Sobre la Salud Ocupacional**
 - a.- Orden y Limpieza en las Áreas de Trabajo
 - b.- Enfermedades Ocupacionales
 - c.- Sustancias Peligrosas

IMELEC S.R.L.

OSVALDO J. CHAVEZ SUAREZ
GERENTE GENERAL

RENZO R. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP-82871

SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE
CONSTRUCCIÓN CIVIL

Jorge Curo Chata
ESPECIALISTA

IMELEC S.R.L.


PAUL CORDERO NÚÑEZ
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo
CIP-11740

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Responsable de Obra
CIP-11740


- 5. Respecto a los Equipos de Respuesta ante Emergencias
 - a.- Ubicación y uso del Botiquín de Primeros Auxilios
 - b.- Ubicación y uso de los Extintores según su tipología
 - c.- Ubicación y uso de Camilla – otros equipos y/o materiales adicionales
- 6. Códigos de Colores y Señalización de Seguridad
- 7. Absolución de Preguntas del Personal INDUCIDO Y ORIENTADO


EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD VIGENTES (G.050), ASI COMO ACATAR LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA, COMO TAMBIEN CON LEY 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y TODO DOCUMENTO Y/O DIRECTIVA QUE CUMPLA EL MISMO FIN. CASO CONTRARIO SERAN SUJETOS A LAS SANCIONES PERTINENTES.


 RENZO F. ROMERO ROMERA
 INGENIERO SUPERV. CON OBRA
 CIP 62971


IMELEC S.R.L.


 OSVALDO CALDERAS
 GERENTE GENERAL





 FIRMA DEL TRABAJADOR

HUELLA DACTILAR

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE CONSTRUCCION CIVIL

 Jorge Luis Chata
 ESPECIALISTA
 FIRMA DEL EXPOSITOR

IMELEC S.R.L.

 PAUL CALDERAS NUNEZ
 Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
 CIP 111703
 JEFE AREA SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.

 ANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Responsable de Obra
 CIP 96670
 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

OBRA: Construcción de la Casa Residencial en el Centro Agrícola Porro Sama

ENTREGA DE REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Los abajo firmantes manifiestan haber recibido el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo; y, al haber plenamente comprendido los conceptos y alcances que establece el mencionado reglamento, se comprometen a su fiel cumplimiento.

Fecha: 12/12/19

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
01	RICHARD ALEJANDRO CHURRA TORRES	42440843	
02	ROSELIO CUSUCUNI MACOY	01331102	
03			
04			
05			
06		IMELEC S.R.L.	
07		OSVALDO J. CARDENAS VIQUEZA GERENTE GENERAL	
08			
09		RENZO F. ROMERO GUERRA INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA CIP 82871	
10			

SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE
CONS. INGENIERIA CIVIL

Jorge Curo Chata
ESPECIALISTA

IMELEC S.R.L.

PAUL CARRERA S. RUIZ
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo
CIP 161781

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
Ingeniero Supervisor de Obra
CIP 101120

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO

OBRA: *Construcción de la Casa Residencial en el Centro Acaí en la Morro Sawa*

FECHA: *12/12/13*

LOS QUE FIRMAMOS EL PRESENTE DOCUMENTO, DECLARAMOS QUE EN OBSERVANCIA A LAS NORMATIVAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, HEMOS ASISTIDO A LA CHARLA DE INDUCCION CORRESPONDIENTE. TAMBIEN SE NOS HA HECHO ENTREGA DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. DOCUMENTO EN EL CUAL ENTRE OTROS ASPECTOS PRESCRIBE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR COMO DE LOS TRABAJADORES. CONTIENE TAMBIEN LOS ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OBRA, SALUD E HIGIENE OUPACIONAL, PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y TAMBIEN EN LO QUE CORRESPONDE A FALTAS Y SANCIONES.

AL HABER PLENAMENTE COMPRENDIDO LOS CONCEPTOS Y ALCANCES DE LA CHARLA DE INDUCCION, COMO ASI TAMBIEN DE LO QUE ESTABLECE EL MENCIONADO REGLAMENTO INTERNO, NOS COMPROMETEMOS A SU ESTRICTO CUMPLIMIENTO. CASO CONTRARIO NOS SOMETEMOS A LAS ACCIONES QUE DERIVEN DE SU INOBSERVANCIA

IMELEC S.R.L.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FIRMAS
	<i>Eusebio Marco Boglio</i>	<i>01331102</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Richard A. Herrera Conderi</i>	<i>42440843</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>RENE J. ROMERO GUERRA</i> INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA CIP 82871		
	IMELEC S.R.L.		
	OSVALDO J. GARDENAS MARCHA GERENTE GENERAL		
	FRANCISCO RAMOS FLORES Ing. Residente de Obra CIP 16573		

SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE CONSTRUCCION CIVIL
Jorge Cruz Chata
 ESPECIALISTA

PAUL MARTIN S. LUNEZ
 Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo
 CIP 161214

FORMATO DE INDUCCIÓN		
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		

TITULAR: IMELEC S.R.L.

OBRA: Construcción de la Casa Residencia en el Centro Agrícola Mono Sana

RESIDENTE: Ej. Francisco Ramón Flores

LUGAR: Mono Sana - Distrito Sana

FECHA: 11 de Diciembre - 2019

HORA DE INICIO: 07:35 **HORA TÉRMINO:** 08:40 **DURACIÓN:** 1.05

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR(A): Javier Lopez Mamani

IDENTIFICADO CON DNI N° 47664803 **EDAD:** 37 años

FECHA DE INGRESO: 11-12-2019 **N° TELEFONICO** 970 582796

PUESTO DE TRABAJO: Almacenero **N° TELEF. DE UN FAMILIAR:** _____

SE HA CUMPLIDO CON LA EXPOSICION DE LOS SIGUIENTES ITEMS:

1. **Bienvenida y explicación del propósito de la orientación**
2. **Términos y conceptos básicos de Seguridad y Salud en el trabajo**
 - a.- Peligros, Riesgos y Medidas de Control
 - b.- Condiciones y Actos Sub estándar
 - c.- Accidentes e Incidentes
 - d.- Ergonomía
3. **Conocimientos de los Documentos de Gestión de la SST. Control Administrativo**
 - a.- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - b.- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - c.- Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control
 - d.- Mapa de Riesgos
 - e.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
4. **Sobre la Salud Ocupacional**
 - a.- Orden y Limpieza en las Áreas de Trabajo
 - b.- Enfermedades Ocupacionales
 - c.- Sustancias Peligrosas

IMELEC S.R.L.

OSVALDO J. CÁRDENAS VERCIA
 GERENTE GENERAL

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIR 82671

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE CONSTRUCCION CIVIL

Jorge Curo Chava
 ESPECIALISTA

IMELEC S.R.L.

PAUL C. TORRES ARIZPE
 Gerente General

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Responsable de Obra
 CIR 96570

5. Respecto a los Equipos de Respuesta ante Emergencias

- a.- Ubicación y uso del Botiquín de Primeros Auxilios
- b.- Ubicación y uso de los Extintores según su tipología
- c.- Ubicación y uso de Camilla – otros equipos y/o materiales adicionales

6. Códigos de Colores y Señalización de Seguridad

7. Absolución de Preguntas del Personal INDUCIDO Y ORIENTADO

EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD VIGENTES (G.050), ASI COMO ACATAR LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA, COMO TAMBIEN CON LEY 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y TODO DOCUMENTO Y/O DIRECTIVA QUE CUMPLA EL MISMO FIN. CASO CONTRARIO SERAN SUJETOS A LAS SANCIONES PERTINENTES.

IMELEC S.R.L.
 OSVALDO J. CÁRDENAS VÉRTIZ
 GERENTE GENERAL

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIR 82871



[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL TRABAJADOR

HUELLA DACTILAR

SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE CONSTRUCCION CIVIL
 Tercer Curo Chata
 FIRMADO POR
 FIRMA DEL EXPOSITOR

IMELEC S.R.L.
 PAUL CÁRDENAS NÚÑEZ
 Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
 CIR 111111
 JEFE AREA SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Residente de Obra
 CIR 06600
 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FORMATO DE INDUCCIÓN		
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		

TITULAR: IMELEC S.R.L.

OBRA: Construcción de la Casa Rural en el Centro Agrícola Horno Saco
Distrito de San Francisco de Asís, Departamento Tacuarcun

RESIDENTE: Ing. Francisco Romero Flores

LUGAR: Horno Saco - Distrito de San Francisco de Asís

FECHA: 11/07/2019

HORA DE INICIO: _____ **HORA TÉRMINO:** _____ **DURACIÓN:** _____

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR(A): TERRY S. LIMDICHÉ CRUZ

IDENTIFICADO CON DNI N° 43896433 **EDAD:** 33

FECHA DE INGRESO: 10-12-19 **N° TELEFONICO** 992276400

PUESTO DE TRABAJO: CHOPER **N° TELEF. DE UN FAMILIAR:** _____

SE HA CUMPLIDO CON LA EXPOSICION DE LOS SIGUIENTES ITEMS:

1. **Bienvenida y explicación del propósito de la orientación**
2. **Términos y conceptos básicos de Seguridad y Salud en el trabajo**
 - a.- Peligros, Riesgos y Medidas de Control
 - b.- Condiciones y Actos Sub estándar
 - c.- Accidentes e Incidentes
 - d.- Ergonomía
3. **Conocimientos de los Documentos de Gestión de la SST. Control Administrativo**
 - a.- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - b.- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - c.- Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control
 - d.- Mapa de Riesgos
 - e.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
4. **Sobre la Salud Ocupacional**
 - a.- Orden y Limpieza en las Áreas de Trabajo
 - b.- Enfermedades Ocupacionales
 - c.- Sustancias Peligrosas

IMELEC S.R.L.

OSVALDO CARRERAS VELOZ
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

.....
RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

Don Luis Chata
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IMELEC S.R.L.


PAUL CARRERAS VELOZ
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


IMELEC S.R.L.

FRANCISCO ROMERO FLORES
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- 5. **Respecto a los Equipos de Respuesta ante Emergencias**
 - a.- Ubicación y uso del Botiquín de Primeros Auxilios
 - b.- Ubicación y uso de los Extintores según su tipología
 - c.- Ubicación y uso de Camilla – otros equipos y/o materiales adicionales
- 6. **Códigos de Colores y Señalización de Seguridad**
- 7. **Absolución de Preguntas del Personal INDUCIDO Y ORIENTADO**


EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD VIGENTES (G.050), ASI COMO ACATAR LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA, COMO TAMBIEN CON LEY 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y TODO DOCUMENTO Y/O DIRECTIVA QUE CUMPLA EL MISMO FIN. CASO CONTRARIO SERAN SUJETOS A LAS SANCIONES PERTINENTES.


 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP. 82871




HUELLA DACTILAR


 FIRMA DEL TRABAJADOR

IMELEC S.R.L.

 OSVALDO F. CARRERA
 GERENTE GENERAL

FIRMA DEL EXPOSITOR


 JEFE AREA SEGURIDAD


 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

OBRA: Construcción de la Casa Residencial en el Centro Agrícola Home Sweet

ENTREGA DE REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Los abajo firmantes manifiestan haber recibido el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo; y, al haber plenamente comprendido los conceptos y alcances que establece el mencionado reglamento, se comprometen a su fiel cumplimiento.

Fecha: Miércoles 11 de Diciembre de 2019

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
01	Javier Lope Mamani	47664823	
02			
03			
04			 IMELEC S.R.L. FRANCISCO RAMOS FLORES Ing. Residente en Obra CIP 101763
05			
06			 IMELEC S.R.L. RENZO F. ROMERO GUERRA INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA CIP 82871
07	SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE CONSTRUCCION CIVIL	PAUL CARDENAS NUNEZ Especialista en Seguridad y Medio Ambiente CIP 101763	
08	Jorge Curo Chata ESPECIALISTA		
09		IMELEC S.R.L. OSWALDO CARDENAS YANCHA CIP 101763	
10			

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO

OBRA: Construcción de la Casa Residencial en el Centro Acuicola Horno Seco

FECHA: Miércoles 11- Diciembre- 2019

LOS QUE FIRMAMOS EL PRESENTE DOCUMENTO, DECLARAMOS QUE EN OBSERVANCIA A LAS NORMATIVAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, HEMOS ASISTIDO A LA CHARLA DE INDUCCION CORRESPONDIENTE. TAMBIEN SE NOS HA HECHO ENTREGA DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. DOCUMENTO EN EL CUAL ENTRE OTROS ASPECTOS PRESCRIBE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR COMO DE LOS TRABAJADORES. CONTIENE TAMBIEN LOS ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OBRA, SALUD E HIGIENE OUPACIONAL,PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y TAMBIEN EN LO QUE CORRESPONDE A FALTAS Y SANCIONES.

AL HABER PLENAMENTE COMPRENDIDO LOS CONCEPTOS Y ALCANCES DE LA CHARLA DE INDUCCION, COMO ASI TAMBIEN DE LO QUE ESTABLECE EL MENCIONADO REGLAMENTO INTERNO, NOS COMPROMETEMOS A SU ESTRICTO CUMPLIMIENTO. CASO CONTRARIO NOS SOMETEMOS A LAS ACCIONES QUE DERIVEN DE SU INOBSERVANCIA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FIRMAS
	Lopez Mamani, Javier	47664803	
	IMELEC S.R.L.		
	OSVALDO I. CARDENAS VENCHÍA GERENTE GENERAL		
	IMELEC S.R.L.		
	FRANCISCO RAMOS FLORES Ingr. Residente de la Obra CIP 82871		
	IMELEC S.R.L.		
	PAUL CARDENAS NUNEZ Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo CIP 82871		

SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE en la CONSTRUCCION CIVIL

Jorge Luis Chata
ESPECIALISTA

BENZO ROSENDO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871

FORMATO DE INDUCCIÓN		
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		

TITULAR: IMELEC S.R.L
OBRA: Construcción de la Casa Residencial en el Centro Agrícola Mome Sacma
RESIDENTE: Ing. Francisco Ramos Flores
LUGAR: Mome Sacma - Distrito Sacma
FECHA: 04/12/2015
HORA DE INICIO: 07:20 **HORA TÉRMINO:** 08:30 **DURACIÓN:** 1.10

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR(A): ALIPIO CRUZ MAMANI
IDENTIFICADO CON DNI N° 00487474 **EDAD:** 51
FECHA DE INGRESO: 30-11-2014 **N° TELEFONICO** 996340630
PUESTO DE TRABAJO: de tiempo **N° TELEF. DE UN FAMILIAR:** _____

SE HA CUMPLIDO CON LA EXPOSICION DE LOS SIGUIENTES ITEMS:

1. **Bienvenida y explicación del propósito de la orientación**
2. **Términos y conceptos básicos de Seguridad y Salud en el trabajo**
 - a.- Peligros, Riesgos y Medidas de Control
 - b.- Condiciones y Actos Sub estándar
 - c.- Accidentes e Incidentes
 - d.- Ergonomía
3. **Conocimientos de los Documentos de Gestión de la SST. Control Administrativo**
 - a.- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - b.- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - c.- Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control
 - d.- Mapa de Riesgos
 - e.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
4. **Sobre la Salud Ocupacional**
 - a.- Orden y Limpieza en las Áreas de Trabajo
 - b.- Enfermedades Ocupacionales
 - c.- Sustancias Peligrosas

RENZO E. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

IMELEC S.R.L.

 OSWALDO J. CARDENAS VINCHA
 GERENTE GENERAL

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

 Jorge Curo Chata
 ESPECIALISTA

IMELEC S.R.L.


 PAUL CARDENAS NUNEZ
 Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
 CIP 161763


IMELEC S.R.L.


 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 50510

- 5. **Respecto a los Equipos de Respuesta ante Emergencias**
 - a.- Ubicación y uso del Botiquín de Primeros Auxilios
 - b.- Ubicación y uso de los Extintores según su tipología
 - c.- Ubicación y uso de Camilla – otros equipos y/o materiales adicionales
- 6. **Códigos de Colores y Señalización de Seguridad**
- 7. **Absolución de Preguntas del Personal INDUCIDO Y ORIENTADO**

EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD VIGENTES (G.050), ASI COMO ACATAR LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA, COMO TAMBIEN CON LEY 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y TODO DOCUMENTO Y/O DIRECTIVA QUE CUMPLA EL MISMO FIN. CASO CONTRARIO SERAN SUJETOS A LAS SANCIONES PERTINENTES.


 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIR 82871




 FIRMA DEL TRABAJADOR


HUELLA
 DACTILAR

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE
 CONSTRUCCION CIVIL

 FIRMA DEL EXPOSITOR


IMELEC S.R.L.

 PAUL CARDENAS NUNEZ
 Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
 CIR 82871
 JEFE AREA SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.

 ANCIANO RAMOS FLORES
 Ing. Residente en Obra
 CIR 82871
 FIRMA DEL RESIDENTE DE
 OBRA

IMELEC S.R.L.

 OSWALDO J. CARDENAS VINCHA
 GERENTE GENERAL


FORMATO DE INDUCCIÓN		
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		


TITULAR: IMELEC S.R.L
OBRA: Construcción de la Casa Residencial en el Centro Pucallpa
Horno Sana
RESIDENTE: Ingr. Francisco Ramon Flores
LUGAR: Horno Sana - Distrito Sana
FECHA: 04/12/19
HORA DE INICIO: 07:20 **HORA TÉRMINO:** 08:30 **DURACIÓN:** 1.10

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR(A): DAVID VELAZQUEZ CALISAYA
IDENTIFICADO CON DNI N° 00501977 **EDAD:** 42
FECHA DE INGRESO: 09-12-2019 **N° TELEFONICO** _____
PUESTO DE TRABAJO: CARPINERO **N° TELEF. DE UN FAMILIAR:** _____

SE HA CUMPLIDO CON LA EXPOSICION DE LOS SIGUIENTES ITEMS:

1. **Bienvenida y explicación del propósito de la orientación**
2. **Términos y conceptos básicos de Seguridad y Salud en el trabajo**
 - a.- Peligros, Riesgos y Medidas de Control
 - b.- Condiciones y Actos Sub estándar
 - c.- Accidentes e Incidentes
 - d.- Ergonomía
3. **Conocimientos de los Documentos de Gestión de la SST. Control Administrativo**
 - a.- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - b.- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - c.- Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control
 - d.- Mapa de Riesgos
 - e.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
4. **Sobre la Salud Ocupacional**
 - a.- Orden y Limpieza en las Áreas de Trabajo
 - b.- Enfermedades Ocupacionales
 - c.- Sustancias Peligrosas


 RENZO E. ROMERO
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

IMELEC S.R.L.

 FRANCISCO RAMOS FLORES
 INGENIERO GENERAL


SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE
 CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Jony...
 ESTECIONISTA

IMELEC S.R.L.
 PAUL CARDENAS NUNEZ
 INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 CIP 101705


IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ingr. Residente de Obra
 CIP 82871

- 5. **Respecto a los Equipos de Respuesta ante Emergencias**
 - a.- Ubicación y uso del Botiquín de Primeros Auxilios
 - b.- Ubicación y uso de los Extintores según su tipología
 - c.- Ubicación y uso de Camilla – otros equipos y/o materiales adicionales
- 6. **Códigos de Colores y Señalización de Seguridad**
- 7. **Absolución de Preguntas del Personal INDUCIDO Y ORIENTADO**

EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD VIGENTES (G.050), ASI COMO ACATAR LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA, COMO TAMBIEN CON LEY 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y TODO DOCUMENTO Y/O DIRECTIVA QUE CUMPLA EL MISMO FIN. CASO CONTRARIO SERAN SUJETOS A LAS SANCIONES PERTINENTES.



 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871






 FIRMA DEL TRABAJADOR

SEGUIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE CONSTRUCCION CIVIL
 Jorge Cruz Chuta
 ESPECIALISTA
 FIRMA DEL EXPOSITOR

HUELLA DACTILAR

IMELEC S.R.L.

 PAUL C. TORRES NUNEZ
 Jefe Area Seguridad


 ISCO RAMOS FLORES
 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

IMELEC S.R.L.

 GERBENAS VIRCHA
 GERENTE GENERAL

FORMATO DE INDUCCIÓN		
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		

TITULAR: IMELEC S.A.L

OBRA: Construcción de la Casa Residencial en el Centro Agrícola Horno Seco

RESIDENTE: Dpto. Francisco Ramón Flores

LUGAR: Horno Seco - Distrito Surco

FECHA: 04/12/19

HORA DE INICIO: 07:20 **HORA TÉRMINO:** 08:30 **DURACIÓN:** 1:10

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR(A): Percy Morán Pizarro

IDENTIFICADO CON DNI N° 42649927 **EDAD:** 38

FECHA DE INGRESO: 08-12-2019 **N° TELEFONICO** 925 7557 38

PUESTO DE TRABAJO: Operario **N° TELEF. DE UN FAMILIAR:** _____

SE HA CUMPLIDO CON LA EXPOSICION DE LOS SIGUIENTES ITEMS:

1. **Bienvenida y explicación del propósito de la orientación**
2. **Términos y conceptos básicos de Seguridad y Salud en el trabajo**
 - a.- Peligros, Riesgos y Medidas de Control
 - b.- Condiciones y Actos Sub estándar
 - c.- Accidentes e Incidentes
 - d.- Ergonomía
3. **Conocimientos de los Documentos de Gestión de la SST. Control Administrativo**
 - a.- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - b.- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - c.- Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control
 - d.- Mapa de Riesgos
 - e.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
4. **Sobre la Salud Ocupacional**
 - a.- Orden y Limpieza en las Áreas de Trabajo
 - b.- Enfermedades Ocupacionales
 - c.- Sustancias Peligrosas

RENZO F. ROMEROS QUIÑÁ
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

IMELEC S.R.L.

 FRANCISCO RAMOS FLORES
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 96578

IMELEC S.R.L.

 FRANCISCO RAMOS FLORES
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 96578

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

 Jorge Curo Chata
 ESPECIALISTA

IMELEC S.R.L.

 PAUL CARDENAS NUNEZ
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
 CIP 101341

IMELEC S.R.L.

 FRANCISCO RAMOS FLORES
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 96578


5. **Respecto a los Equipos de Respuesta ante Emergencias**


- a.- Ubicación y uso del Botiquín de Primeros Auxilios
- b.- Ubicación y uso de los Extintores según su tipología
- c.- Ubicación y uso de Camilla – otros equipos y/o materiales adicionales

6. **Códigos de Colores y Señalización de Seguridad**


7. **Absolución de Preguntas del Personal INDUCIDO Y ORIENTADO**

EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD VIGENTES (G.050), ASI COMO ACATAR LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA, COMO TAMBIEN CON LEY 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y TODO DOCUMENTO Y/O DIRECTIVA QUE CUMPLA EL MISMO FIN. CASO CONTRARIO SERAN SUJETOS A LAS SANCIONES PERTINENTES.


 FIRMA DEL TRABAJADOR



HUELLA
 DACTILAR


 ENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82371

SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE
 CONSTRUCCIÓN CIVIL

 Jorge Curo Grata
 ESPECIALISTA
 FIRMA DEL EXPOSITOR

IMELEC S.R.L.

 ILIAR DENAS NUÑEZ
 Jefe de Área Seguridad
 Jefe Área Seguridad

IMELEC S.R.L.

 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 105270
 FIRMA DEL RESIDENTE DE
 OBRA

IMELEC S.R.L.

 OSVALDO CALDERAS VIRENA
 GERENTE GENERAL

FORMATO DE INDUCCIÓN		
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		

TITULAR: IMELEC S.R.L.
OBRA: Construcción de la Casa Residencial en el Centro Comercial Horno Sanaico
RESIDENTE: Ing. Francisco Ramos Flores
LUGAR: Horno Sanaico - Distrito Sanaico
FECHA: 04/12/19
HORA DE INICIO: 09:30 **HORA TÉRMINO:** 08:30 **DURACIÓN:** 1.10

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR(A): Samuel Chivera Molina
IDENTIFICADO CON DNI N° 00666433 **EDAD:** 55
FECHA DE INGRESO: 02-12-19 **N° TELEFONICO cel:** 972944250
PUESTO DE TRABAJO: M. de Obra **N° TELEF. DE UN FAMILIAR:** _____

SE HA CUMPLIDO CON LA EXPOSICION DE LOS SIGUIENTES ITEMS:

1. **Bienvenida y explicación del propósito de la orientación**
2. **Términos y conceptos básicos de Seguridad y Salud en el trabajo**
 - a.- Peligros, Riesgos y Medidas de Control
 - b.- Condiciones y Actos Sub estándar
 - c.- Accidentes e Incidentes
 - d.- Ergonomía
3. **Conocimientos de los Documentos de Gestión de la SST. Control Administrativo**
 - a.- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - b.- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - c.- Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control
 - d.- Mapa de Riesgos
 - e.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
4. **Sobre la Salud Ocupacional**
 - a.- Orden y Limpieza en las Áreas de Trabajo
 - b.- Enfermedades Ocupacionales
 - c.- Sustancias Peligrosas

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82071

IMELEC S.R.L.

 OSVALDO J. CARDENAS VALENZUELA
 GERENTE GENERAL

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

 Jorge Curo Chata
 ESPECIALISTA

IMELEC S.R.L.

 PAUL CARMONA MUNEZ
 Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo
 CIP 10570


IMELEC S.R.L.

 ANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 90570

- 5. **Respecto a los Equipos de Respuesta ante Emergencias**
 - a.- Ubicación y uso del Botiquín de Primeros Auxilios
 - b.- Ubicación y uso de los Extintores según su tipología
 - c.- Ubicación y uso de Camilla – otros equipos y/o materiales adicionales
- 6. **Códigos de Colores y Señalización de Seguridad**
- 7. **Absolución de Preguntas del Personal INDUCIDO Y ORIENTADO**

EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD VIGENTES (G.050), ASI COMO ACATAR LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA, COMO TAMBIEN CON LEY 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y TODO DOCUMENTO Y/O DIRECTIVA QUE CUMPLA EL MISMO FIN. CASO CONTRARIO SERAN SUJETOS A LAS SANCIONES PERTINENTES.

[Handwritten Signature]
 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871



HUELLA
 DACTILAR

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL TRABAJADOR

SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE
 CONSTRUCCION CIVIL

[Handwritten Signature]
 Jorge Luis Chata
 ESPECIALISTA

FIRMA DEL EXPOSITOR

IMELEC S.R.L.


[Handwritten Signature]
 UL CARDENAS NUNEZ
 Ing. en Seguridad y Medio Ambiente
 CIP 161783

JEFE AREA SEGURIDAD

[Handwritten Signature]
 IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 96570
 FIRMA DEL RESIDENTE DE
 OBRA

IMELEC S.R.L.

[Handwritten Signature]
 OSVALDO J. CARDENAS VINCHA
 GERENTE GENERAL

FORMATO DE INDUCCIÓN		
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		

TITULAR: IMELEC S.R.L.

OBRA: Construcción de la Casa Residencial en el Centro Agrícola Home Sana

RESIDENTE: Ing. Francisco Ramón Flores

LUGAR: Home Sana - Distrito Sana

FECHA: 04/12/2015

HORA DE INICIO: 07:20 **HORA TÉRMINO:** 08:30 **DURACIÓN:** 1:10

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR(A): Victor Lewis Idoneose


IDENTIFICADO CON DNI N° 44086192 **EDAD:** 28

FECHA DE INGRESO: _____ **N° TELEFONICO** _____

PUESTO DE TRABAJO: _____ **N° TELEF. DE UN FAMILIAR:** _____


SE HA CUMPLIDO CON LA EXPOSICION DE LOS SIGUIENTES ITEMS:


1. **Bienvenida y explicación del propósito de la orientación**
2. **Términos y conceptos básicos de Seguridad y Salud en el trabajo**
 - a.- Peligros, Riesgos y Medidas de Control
 - b.- Condiciones y Actos Sub estándar
 - c.- Accidentes e Incidentes
 - d.- Ergonomía
3. **Conocimientos de los Documentos de Gestión de la SST. Control Administrativo**
 - a.- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - b.- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - c.- Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control
 - d.- Mapa de Riesgos
 - e.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
4. **Sobre la Salud Ocupacional**
 - a.- Orden y Limpieza en las Áreas de Trabajo
 - b.- Enfermedades Ocupacionales
 - c.- Sustancias Peligrosas



 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIR 82371

IMELEC S.R.L.

 OSVALDO J. CARDENAS VINCHA
 GERENTE GENERAL

SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE
 CONSTRUCCIÓN CIVIL

Jorge Ciro Chata
 ESPECIALISTA


IMELEC S.R.L.

 PAUL CARDENAS NUNEZ
 Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo Ambiente

IMELEC S.R.L.

 FRANCISCO FLORES
 Ing. Supervisor de Obra

- 5. **Respecto a los Equipos de Respuesta ante Emergencias**
 - a.- Ubicación y uso del Botiquín de Primeros Auxilios
 - b.- Ubicación y uso de los Extintores según su tipología
 - c.- Ubicación y uso de Camilla – otros equipos y/o materiales adicionales
- 6. **Códigos de Colores y Señalización de Seguridad**
- 7. **Absolución de Preguntas del Personal INDUCIDO Y ORIENTADO**

EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD VIGENTES (G.050), ASI COMO ACATAR LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA, COMO TAMBIEN CON LEY 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y TODO DOCUMENTO Y/O DIRECTIVA QUE CUMPLA EL MISMO FIN. CASO CONTRARIO SERAN SUJETOS A LAS SANCIONES PERTINENTES.

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL TRABAJADOR



HUELLA DACTILAR

[Handwritten Signature]
 BENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82371

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE
 CONSTRUCCIÓN CIVIL

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL EXPOSITOR

IMELEC S.R.L.

[Handwritten Signature]
 PAUL CARDENAS NUNEZ
 Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
 CIP 101783

JEFE AREA SEGURIDAD

[Handwritten Signature]
 FRANCISCO VARGAS FLORES
 Ing. Responsable de Obra
 CIP 99578
 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

IMELEC S.R.L.
[Handwritten Signature]
 OSVALDO J. CARDENAS VINCHA
 GERENTE GENERAL

FORMATO DE INDUCCIÓN		
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		

TITULAR: IMELEC S.R.L

OBRA: Continuación de la Casa Residencial en el Centro de Salud de Manó Sana

RESIDENTE: Ing. Francisco Ramos Flores

LUGAR: Manó Sana - Distrito Sana

FECHA: 04/12/2019

HORA DE INICIO: 07:20 **HORA TÉRMINO:** 08:30 **DURACIÓN:** 1.10

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR(A): Gustavo Palacios Srocutipa

IDENTIFICADO CON DNI N° 42733320 **EDAD:** 38

FECHA DE INGRESO: 02-12-19 **N° TELEFONICO** 935007193

PUESTO DE TRABAJO: Operario **N° TELEF. DE UN FAMILIAR:** 930044788

SE HA CUMPLIDO CON LA EXPOSICION DE LOS SIGUIENTES ITEMS:

1. **Bienvenida y explicación del propósito de la orientación**
2. **Términos y conceptos básicos de Seguridad y Salud en el trabajo**
 - a.- Peligros, Riesgos y Medidas de Control
 - b.- Condiciones y Actos Sub estándar
 - c.- Accidentes e Incidentes
 - d.- Ergonomía
3. **Conocimientos de los Documentos de Gestión de la SST. Control Administrativo**
 - a.- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - b.- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - c.- Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control
 - d.- Mapa de Riesgos
 - e.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
4. **Sobre la Salud Ocupacional**
 - a.- Orden y Limpieza en las Áreas de Trabajo
 - b.- Enfermedades Ocupacionales
 - c.- Sustancias Peligrpsas

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871

IMELEC S.R.L.

OSVALDO J. CARDENAS VINCHA
GERENTE GENERAL

SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE
COMUNICACION CIVIL

Jorge Curo Chata
ESPECIALISTA

IMELEC S.R.L.

PAUL CARDENAS NUNEZ
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 100000

5. Respeto a los Equipos de Respuesta ante Emergencias


- a.- Ubicación y uso del Botiquín de Primeros Auxilios
- b.- Ubicación y uso de los Extintores según su tipología
- c.- Ubicación y uso de Camilla – otros equipos y/o materiales adicionales


6. Códigos de Colores y Señalización de Seguridad

7. Absolución de Preguntas del Personal INDUCIDO Y ORIENTADO

EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD VIGENTES (G.050), ASI COMO ACATAR LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA, COMO TAMBIEN CON LEY 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y TODO DOCUMENTO Y/O DIRECTIVA QUE CUMPLA EL MISMO FIN. CASO CONTRARIO SERAN SUJETOS A LAS SANCIONES PERTINENTES.


 FIRMA DEL TRABAJADOR




 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

HUELLA DACTILAR

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 ESPECIALISTA
 Jorge Cruz Chuta
 FIRMA DEL EXPOSITOR

IMELEC S.R.L.
 PAUL CARDENAS NUNEZ
 Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
 CIP 14173
 JEFE AREA SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 80570
 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

IMELEC S.R.L.
 OSWALDO CARDENAS VILLCHA
 JEFE DE OBRA

FORMATO DE INDUCCIÓN		
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		

TITULAR: IMELEC S.R.L.

OBRA: Construcción de la Casa Residencia en el Centro Asistido
Maro Sana

RESIDENTE: José Francisco Romeros

LUGAR: Maro Sana - Distrito Sana

FECHA: 04/12/2019

HORA DE INICIO: 07:30 **HORA TÉRMINO:** 08:30 **DURACIÓN:** 1:10

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR(A): Juliam Miamari Sana

IDENTIFICADO CON DNI N° 42290683 **EDAD:** 37

FECHA DE INGRESO: 02-12-19 **N° TELEFONICO** 929502860

PUESTO DE TRABAJO: Peon **N° TELEF. DE UN FAMILIAR:** _____

SE HA CUMPLIDO CON LA EXPOSICION DE LOS SIGUIENTES ITEMS:

1. **Bienvenida y explicación del propósito de la orientación**
2. **Términos y conceptos básicos de Seguridad y Salud en el trabajo**
 - a.- Peligros, Riesgos y Medidas de Control
 - b.- Condiciones y Actos Sub estándar
 - c.- Accidentes e Incidentes
 - d.- Ergonomía
3. **Conocimientos de los Documentos de Gestión de la SST. Control Administrativo**
 - a.- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - b.- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - c.- Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control
 - d.- Mapa de Riesgos
 - e.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
4. **Sobre la Salud Ocupacional**
 - a.- Orden y Limpieza en las Áreas de Trabajo
 - b.- Enfermedades Ocupacionales
 - c.- Sustancias Peligrosas

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIR 82871

IMELEC S.R.L.

OSVALDO J. CARDENAS VINCHA
GERENTE GENERAL

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE
CONSTRUCCIÓN CIVIL

Jorge Carrero Chata
ESPECIALISTA

IMELEC S.R.L.


PAULI CARDENAS NUNEZ
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
CIR 161765

IMELEC S.R.L.
ANCISCO RAMOS FLORES
ING. CONSULTOR


- 5. **Respecto a los Equipos de Respuesta ante Emergencias**
 - a.- Ubicación y uso del Botiquín de Primeros Auxilios
 - b.- Ubicación y uso de los Extintores según su tipología
 - c.- Ubicación y uso de Camilla – otros equipos y/o materiales adicionales
- 6. **Códigos de Colores y Señalización de Seguridad**
- 7. **Absolución de Preguntas del Personal INDUCIDO Y ORIENTADO**

EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD VIGENTES (G.050), ASI COMO ACATAR LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA, COMO TAMBIEN CON LEY 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y TODO DOCUMENTO Y/O DIRECTIVA QUE CUMPLA EL MISMO FIN. CASO CONTRARIO SERAN SUJETOS A LAS SANCIONES PERTINENTES.


 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871



HUELLA
 DACTILAR


 FIRMA DEL TRABAJADOR

SEGURIDAD DEL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE DE
 CONSTRUCCION CIVIL


Jorge Curo Chata
 ESPECIALISTA


FIRMA DEL EXPOSITOR


IMELEC S.R.L.

PAUL GARDENAS NUNEZ
 Inge. Seguridad y Medio Ambiente
 CIP 101781

JEFE AREA SEGURIDAD


 IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 96570
 FIRMA DEL RESIDENTE DE
 OBRA

IMELEC S.R.L.

 OSVALDO J. CARDENAS VINCHA
 GERENTE GENERAL

FORMATO DE INDUCCIÓN		
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		

TITULAR: IMELEC SRL

OBRA: Construcción de la Casa Residencial en el Centro Acuicola
Morro Sama

RESIDENTE: Ing. Francisco Ramos Flor

LUGAR: Morro Sama - Distrito Sama

FECHA: 04/12/2019

HORA DE INICIO: 07:20 **HORA TÉRMINO:** 08:30 **DURACIÓN:** 1.10

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR(A): Diego A. Apaza Fuentes


IDENTIFICADO CON DNI N° 44010605 **EDAD:** 31

FECHA DE INGRESO: 02-12-19 **N° TELEFONICO** 928915206


PUESTO DE TRABAJO: _____ **N° TELEF. DE UN FAMILIAR:** _____

SE HA CUMPLIDO CON LA EXPOSICION DE LOS SIGUIENTES ITEMS:

1. **Bienvenida y explicación del propósito de la orientación**
2. **Términos y conceptos básicos de Seguridad y Salud en el trabajo**
 - a.- Peligros, Riesgos y Medidas de Control
 - b.- Condiciones y Actos Sub estándar
 - c.- Accidentes e Incidentes
 - d.- Ergonomía
3. **Conocimientos de los Documentos de Gestión de la SST. Control Administrativo**
 - a.- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - b.- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - c.- Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control
 - d.- Mapa de Riesgos
 - e.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
4. **Sobre la Salud Ocupacional**
 - a.- Orden y Limpieza en las Áreas de Trabajo
 - b.- Enfermedades Ocupacionales
 - c.- Sustancias Peligrosas



RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 8287

IMELEC S.R.L.


OSVALDO J. CARDENAS VIRCHA
 GERENTE GENERAL

SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE
CONSTRUCCIÓN CIVIL

.....
Jorge Carrero Chuta
 ESPECIALISTA

IMELEC S.R.L.

.....
PAUL CARDENAS NUNEZ
 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
 CIP 161783


IMELEC S.R.L.

.....
FRANCISCO RAMOS FLOR
 Ing. Residente de Obra
 CIP 90070

- 5. **Respecto a los Equipos de Respuesta ante Emergencias**
 - a.- Ubicación y uso del Botiquín de Primeros Auxilios
 - b.- Ubicación y uso de los Extintores según su tipología
 - c.- Ubicación y uso de Camilla – otros equipos y/o materiales adicionales
- 6. **Códigos de Colores y Señalización de Seguridad**
- 7. **Absolución de Preguntas del Personal INDUCIDO Y ORIENTADO**

EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD VIGENTES (G.050), ASI COMO ACATAR LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA, COMO TAMBIEN CON LEY 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y TODO DOCUMENTO Y/O DIRECTIVA QUE CUMPLA EL MISMO FIN. CASO CONTRARIO SERAN SUJETOS A LAS SANCIONES PERTINENTES.

[Handwritten Signature]
 RENZO F. ROMERO GUILERA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP-82871



HUELLA
 DACTILAR

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL TRABAJADOR

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL EXPOSITOR

SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE
 INGENIERIA CIVIL

Jorge Luis Chata
 ESPECIALISTA

IMELEC S.R.L.

[Handwritten Signature]
 JULIO CARDENAS NUNEZ
 Jefe de Seguridad y Medio Ambiente
 CIP-166783
 JEFE AREA SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.

[Handwritten Signature]
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP-86871
 FIRMA DEL RESIDENTE DE
 OBRA

IMELEC S.R.L.

[Handwritten Signature]
 OSVALDO CAJENAS VINCHA
 GERENTE GENERAL

FORMATO DE INDUCCIÓN		
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		

TITULAR: IMELEC S.R.L.

OBRA: Construcción de la Casa Residencial en el Centro
Acuacala Mayo Senca

RESIDENTE: Ing. Francisco Ramos Flores

LUGAR: Mayo Senca - Distrito Sana

FECHA: 04/12/2019

HORA DE INICIO: 07:20 **HORA TÉRMINO:** 08:30 **DURACIÓN:** 1:10

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR(A): EDSON UBER CRUZ MAMANI


IDENTIFICADO CON DNI N° 44761782 **EDAD:** 31

FECHA DE INGRESO: 02-12-2019 **N° TELEFONICO** 952618409


PUESTO DE TRABAJO: _____ **N° TELEF. DE UN FAMILIAR:** _____

SE HA CUMPLIDO CON LA EXPOSICION DE LOS SIGUIENTES ITEMS:


1. **Bienvenida y explicación del propósito de la orientación**
2. **Términos y conceptos básicos de Seguridad y Salud en el trabajo**
 - a.- Peligros, Riesgos y Medidas de Control
 - b.- Condiciones y Actos Sub estándar
 - c.- Accidentes e Incidentes
 - d.- Ergonomía
3. **Conocimientos de los Documentos de Gestión de la SST. Control Administrativo**
 - a.- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - b.- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - c.- Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control
 - d.- Mapa de Riesgos
 - e.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
4. **Sobre la Salud Ocupacional**
 - a.- Orden y Limpieza en las Áreas de Trabajo
 - b.- Enfermedades Ocupacionales
 - c.- Sustancias Peligrosas


REYNOLDO RIVERA GUTIERREZ
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP-82871

IMELEC S.R.L.


OSVALDO Y Cárdenas Vilchta
GERENTE GENERAL


IMELEC S.R.L.


FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP-96570

SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE
CONSTRUCCIÓN CIVIL


Jorge Curo Chata
ESPECIALISTA


IMELEC S.R.L.


PAUL Cárdenas NUNEZ
Especialista en Seguridad y Medio Amb.
CIP-101780

- 5. **Respecto a los Equipos de Respuesta ante Emergencias**
 - a.- Ubicación y uso del Botiquín de Primeros Auxilios
 - b.- Ubicación y uso de los Extintores según su tipología
 - c.- Ubicación y uso de Camilla – otros equipos y/o materiales adicionales
- 6. **Códigos de Colores y Señalización de Seguridad**
- 7. **Absolución de Preguntas del Personal INDUCIDO Y ORIENTADO**

EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD VIGENTES (G.050), ASI COMO ACATAR LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA, COMO TAMBIEN CON LEY 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y TODO DOCUMENTO Y/O DIRECTIVA QUE CUMPLA EL MISMO FIN. CASO CONTRARIO SERAN SUJETOS A LAS SANCIONES PERTINENTES.

[Handwritten Signature]
 RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871



HUELLA
 DACTILAR

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL TRABAJADOR

Y MEDIO AMBIENTE DE
 REGULACIÓN CIVIL

[Handwritten Signature]
 Jorge Curo Chata
 ESPECIALISTA

FIRMA DEL EXPOSITOR

IMELEC S.R.L.

PAUL CARDENAS NUNEZ
 Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
 CIP 101783
 JEFE AREA SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.

[Handwritten Signature]
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 101783
 FIRMA DEL RESIDENTE DE
 OBRA

IMELEC S.R.L.

[Handwritten Signature]
 OSWALDO CARDENAS VINCIA
 COORDINADOR GENERAL

FORMATO DE INDUCCIÓN		
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		

TITULAR: IMELEC S.R.L.
OBRA: Construcción de la Casa Residencial en el Centro Agrícola Morro Serna
RESIDENTE: Ing. Francisco Ramos Flores
LUGAR: Morro Serna - Distrito Serna
FECHA: 04/12/2019
HORA DE INICIO: 07:20 **HORA TÉRMINO:** 08:30 **DURACIÓN:** 1:10

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR(A): GERMAN DAVID CHIPONIS CHACAFIA
IDENTIFICADO CON DNI N° 45303347 **EDAD:** 30
FECHA DE INGRESO: 05-12-19 **N° TELEFONICO** '
PUESTO DE TRABAJO: _____ **N° TELEF. DE UN FAMILIAR:** _____

SE HA CUMPLIDO CON LA EXPOSICION DE LOS SIGUIENTES ITEMS:

1. **Bienvenida y explicación del propósito de la orientación**
2. **Términos y conceptos básicos de Seguridad y Salud en el trabajo**
 - a.- Peligros, Riesgos y Medidas de Control
 - b.- Condiciones y Actos Sub estándar
 - c.- Accidentes e Incidentes
 - d.- Ergonomía
3. **Conocimientos de los Documentos de Gestión de la SST. Control Administrativo**
 - a.- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - b.- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - c.- Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control
 - d.- Mapa de Riesgos
 - e.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
4. **Sobre la Salud Ocupacional**
 - a.- Orden y Limpieza en las Áreas de Trabajo
 - b.- Enfermedades Ocupacionales
 - c.- Sustancias Peligrosas

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 QIP 82871

IMELEC S.R.L.

 GERARDO CARDENAS VILCHRA
 INGENIERO CIVIL

SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE
 CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Jorge Curo Chata

IMELEC S.R.L.

 PAUL CARDENAS NUNEZ
 Especialista en Seguridad y Medio Ambient.
 QIP 161753

IMELEC S.R.L.

 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 QIP 00570


- 5. **Respecto a los Equipos de Respuesta ante Emergencias**
 - a.- Ubicación y uso del Botiquín de Primeros Auxilios
 - b.- Ubicación y uso de los Extintores según su tipología
 - c.- Ubicación y uso de Camilla – otros equipos y/o materiales adicionales
- 6. **Códigos de Colores y Señalización de Seguridad**
- 7. **Absolución de Preguntas del Personal INDUCIDO Y ORIENTADO**

EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD VIGENTES (G.050), ASI COMO ACATAR LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA, COMO TAMBIEN CON LEY 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y TODO DOCUMENTO Y/O DIRECTIVA QUE CUMPLA EL MISMO FIN. CASO CONTRARIO SERAN SUJETOS A LAS SANCIONES PERTINENTES.

IMELEC S.R.L.

OSVALDO ESTEBAN VILLALBA
INGENIERO EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

[Handwritten Signature]
RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871



HUELLA DACTILAR

IMELEC S.R.L.

PAUL CARDENAS NUNEZ
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
CIP 101783

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL TRABAJADOR

SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE CONSTRUCCION CIVIL

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL EXPOSITOR

JEFE AREA SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.
RANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Especialista de Obra
CIP 101783
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

OBRA: Construcción de la Casa Residencial en el Casco Agrícola
Morro Sawa

ENTREGA DE REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Los abajo firmantes manifiestan haber recibido el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo; y, al haber plenamente comprendido los conceptos y alcances que establece el mencionado reglamento, se comprometen a su fiel cumplimiento.

Fecha: Miércoles 11 de Diciembre de 2019

IMELEC S.R.L.

OSVALDO F. GARCIA
GERENTE GENERAL

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
01	Samuel Chipana Malino	00666433	
02	GERMAN D. CHIPANA CHAROÑA	45303347	
03	JERRY LINACHE CRUZ	43890433	
04	EDSON CRUZ MAMANI	44761780	
05	Diego A. Apaza Fuentes	44010605	
06	Julian Mamani Siani	42290683	
07	Victor Lewis Idone ore	44086092	
08	David Velazquez Cadizaya	00501972	
09	Percy Monzon-Blaga	47679921	
10	Gustavo Patricio Drowtipa	42733320	

RENTE F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82271

11 - ALIPCO CRUZ MAMANI 00487474

SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE DE
COMUNIDAD CIVIL
Toda
ESFUERZO

IMELEC S.R.L.
FRANCISCO DE NUNEZ

IMELEC S.R.L.
FRANCISCO DE NUNEZ
FRANCISCO DE NUNEZ FLORES

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO

OBRA: Construcción de la Casa Residencial en el Centro Agrícola Honor Sana

FECHA: Municipal 11 de Diciembre de 2017

LOS QUE FIRMAMOS EL PRESENTE DOCUMENTO, DECLARAMOS QUE EN OBSERVANCIA A LAS NORMATIVAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, HEMOS ASISTIDO A LA CHARLA DE INDUCCION CORRESPONDIENTE. TAMBIEN SE NOS HA HECHO ENTREGA DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. DOCUMENTO EN EL CUAL ENTRE OTROS ASPECTOS PRESCRIBE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR COMO DE LOS TRABAJADORES. CONTIENE TAMBIEN LOS ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OBRA, SALUD E HIGIENE OUPACIONAL, PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y TAMBIEN EN LO QUE CORRESPONDE A FALTAS Y SANCIONES.

AL HABER PLENAMENTE COMPRENDIDO LOS CONCEPTOS Y ALCANCES DE LA CHARLA DE INDUCCION, COMO ASI TAMBIEN DE LO QUE ESTABLECE EL MENCIONADO REGLAMENTO INTERNO, NOS COMPROMETEMOS A SU ESTRICTO CUMPLIMIENTO. CASO CONTRARIO NOS SOMETEMOS A LAS ACCIONES QUE DERIVEN DE SU INOBSERVANCIA

IMELECS R.L.

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FIRMAS
	Chipana Molina Samuel	00666433	
	CHIPANA CHARAÑA GERMAN D.	45303347	
	JENKRY LINDANE CRIU	43896433	
	CRAZ MAMANI EDSON	44761782	
	Araya fuertes Diego A	44006605	
	YACUANI GILLO JOLIAN	4229083	
	Edone ce Victor Lewis	4408092	
	Velazquez Luis Jorge David	00501972	

OSVALDO CARRENAS VERCHA
GERENTE GENERAL

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871

SEGURIDAD SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE DE
CARA INCLUSION CIVIL

Jorge Curo Chuta
ESPECIALISTA

FRANCISCO J. NUÑEZ

FRANCISCO J. NUÑEZ

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO

OBRA: Construcción de la Casa Presidencial en el Centro Acuático H. en Sana

FECHA: Agosto 11 de Diciembre 2010

LOS QUE FIRMAMOS EL PRESENTE DOCUMENTO, DECLARAMOS QUE EN OBSERVANCIA A LAS NORMATIVAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, HEMOS ASISTIDO A LA CHARLA DE INDUCCION CORRESPONDIENTE. TAMBIEN SE NOS HA HECHO ENTREGA DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. DOCUMENTO EN EL CUAL ENTRE OTROS ASPECTOS PRESCRIBE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR COMO DE LOS TRABAJADORES. CONTIENE TAMBIEN LOS ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OBRA, SALUD E HIGIENE OUPACIONAL,PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y TAMBIEN EN LO QUE CORRESPONDE A FALTAS Y SANCIONES.

AL HABER PLENAMENTE COMPRENDIDO LOS CONCEPTOS Y ALCANCES DE LA CHARLA DE INDUCCION, COMO ASI TAMBIEN DE LO QUE ESTABLECE EL MENCIONADO REGLAMENTO INTERNO, NOS COMPROMETEMOS A SU ESTRICTO CUMPLIMIENTO. CASO CONTRARIO NOS SOMETEMOS A LAS ACCIONES QUE DERIVEN DE SU INOBSERVANCIA

INTELUS S.R.L.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FIRMAS
	Moroni Alayo Percy	40099972	[Signature]
	Pobocios Novotipo, Gustavo	42733320	[Signature]
	Cruz Maccioni Alipio	00457474	[Signature]

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871

SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE
CONSTRUCCION CIVIL
Jorge Curi Chata
ESPECIALISTA

INTELUS S.R.L.
PABLO CANO
Especialista


INTELUS S.R.L.
FRANCISCO
CIP 82871


IMELEC SRL

OBRA:

**CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL
CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA – DISTRITO DE
SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA**

A.T.S. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO


.....
RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82371

IMELEC S.R.L.

.....
OSVALDO I. CARDENAS VIRCHA
GERENTE GENERAL

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO - ATS
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

FECHA: 11-12-19
 OBRA: CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO AGROPECUARIO SAMAMORERO
 TRABAJO A REALIZAR: CARGEO DE PIEDRA

TAREAS Y/O ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS ASOCIADOS	ACCIONES RECOMENDADAS
CARGEO DE PIEDRA	* ACCIDENTE	* POLVAREAS	* TRABAJAR CON PRECAUCION Y ATENCION (MASCAS)
AL CAMBIO DE GRUA	* ATROPELLO * FOLLAS * HIDROUCCO	EN EL CORPO * CAIDAS DE PIEDRA Y TROPESON * GOLPES * MORTIDURA	* MIRAR DEBAJTE Y ATRAS E COSTADOS TRAZAR EN MOVIMIENTO

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

	SI	NO		SI	NO
Manejo de Productos Quimicos Peligrosos			Trabajos en Altura		X
Bloqueo y etiquetado		X	Otros:		
Ingreso a espacios Confinados		X			
Trabajos en Caliente (Soldadura, Esmeril, otros)		X			
Lizaje de cargas criticas		X			

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP / EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPC

SI	NO	ESPECIFICAR EL EPP A USAR	SI	NO	ESPECIFICAR EL EPC A USAR
X		Guantes		X	Arnes de Seguridad y linea de vida
X		Lentes		X	Acordonamiento
X		Cascos		X	Carteles de Seguridad
X		Zapatos con punta de acero			
X		Zapatos Dielectricos			
X		Ropa de Protección personal o traje especial	X		EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
X		Tapon de oidos	X		Extintores
X		Mascarilla para polvos/gases		X	Botiquin de Primeros Auxilios
X		Orejeras			Camilla rigida
X		Careta			Otros.

N°	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA	N°	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA
1	GERMAN D. CHIPONA CHURRANO		7		
2	Richard Chura Conconi		8		
3	Victor Lewis Idoneom		9		
4			10		
5			11		
6			12		

IMELEC S.R.L.

OSVALDO CARDESA FERRERA
GERENTE GENERAL

OBSERVACIONES:

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82571


Los trabajadores afirmamos haber recibido instrucciones precisas para realizar los trabajos con SEGURIDAD

FIRMA ENCARGADO DEL GRUPO

FIRMA ING. DE SEGURIDAD

FIRMA INGENIERO RESIDENTE

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO - ATS
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

FECHA: 14-12-19

OBRA:

TRABAJO A REALIZAR: Patillado de zapatos

TAREAS Y/O ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS ASOCIADOS	ACCIONES RECOMENDADAS
<u>Instalación de mangueras</u>	<u>- martillos neumáticos</u>	<u>- lesiones golpes</u>	<u>- uso adecuado de las Maquinas</u>
<u>Patillado para zapatos</u>	<u>- caída de escombros</u> <u>- trapesones</u>	<u>- golpes, fracturas</u> <u>- golpes</u>	<u>- Mantener alejada los materiales a una distancia adecuada</u> <u>- usar correctamente los elementos de seguridad (EPP)</u> <u>- mantener limpio tu zona de trabajo</u>

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

	SI	NO		SI	NO
Manejo de Productos Químicos Peligrosos			Trabajos en Altura		
Bloqueo y etiquetado			Otros:		
Ingreso a espacios Confinados					
Trabajos en Caliente (Soldadura, Esmeril, otros)	<input checked="" type="checkbox"/>				
Izaje de cargas críticas					

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP / EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPC

SI	NO	ESPECIFICAR EL EPP A USAR	SI	NO	ESPECIFICAR EL EPC A USAR
<input checked="" type="checkbox"/>		Guantes		<input checked="" type="checkbox"/>	Arnes de Seguridad y línea de vida
<input checked="" type="checkbox"/>		Lentes		<input checked="" type="checkbox"/>	Acordonamiento
<input checked="" type="checkbox"/>		Cascos	<input checked="" type="checkbox"/>		Carteles de Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>		Zapatos con punta de acero			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Zapatos Dielectricos			EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
<input checked="" type="checkbox"/>		Ropa de Protección personal o traje especial			Extintores
<input checked="" type="checkbox"/>		Tapon de oídos			Botiquin de Primeros Auxilios
<input checked="" type="checkbox"/>		Mascarilla para polvos/gases			Camilla rígida
<input checked="" type="checkbox"/>		Orejas			Otros.
	<input checked="" type="checkbox"/>	Careta			

Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA	Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA
1	<u>Alvaro Cruz el</u>	<u>[Firma]</u>	7		
2	<u>Rogelio Cusacani mara</u>	<u>[Firma]</u>	8		
3	<u>Diego A. Espino Fuentes</u>	<u>[Firma]</u>	9		
4	<u>Castano Baloniz Drouho</u>	<u>[Firma]</u>	10		
5	<u>Edson Cruz Haman</u>	<u>[Firma]</u>	11		
6			(12)		

IMELEC S.R.L.

OSVALDO CARLOS VARELA
GERENTE GENERAL

OBSERVACIONES:

.....
RENÉ F. JONERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

Los trabajadores afirmamos haber recibido instrucciones precisas para realizar los trabajos con **SEGURIDAD**

[Firma]
 FIRMA ENCARGADO DEL GRUPO

[Firma]
 FIRMA ING DE SEGURIDAD

[Firma]
 FIRMA INGENIERO RESIDENTE

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO - ATS
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

FECHA: 13-12-19

OBRA: CONSTRUCCION DE CASA EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE MORRO S OMA

TRABAJO A REALIZAR: LIMPIEZA Y EXCAVACION ZAPORA

TAREAS Y/O ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS ASOCIADOS	ACCIONES RECOMENDADAS
* EXCAVACION	* ATROPELLO	* POLVOS DE RA	
* LIMPIEZA	* ACCIDENTES		SEÑALIZACION
* ADPIO DE MATERIAL DESMONTE	* FOLIAS HIDRAULICO	* CAIDAS DE OBJETO O PERSONAL DE OBRA	LA OBRA
	* DESCOMBENOCARRA	* TROPEZON CON CUALQUIER OBJETO	* CHARLA ESFISICA
			* USO DE EPP

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

	SI	NO		SI	NO
Manejo de Productos Quimicos Peligrosos		X	Trabajos en Altura		X
Bloqueo y etiquetado		X	Otros:		
Ingreso a espacios Confinados		X			
Trabajos en Caliente (Soldadura, Esmeril, otros)		X			
Izaje de cargas criticas		X			

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP / EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPC

SI	NO	ESPECIFICAR EL EPP A USAR	SI	NO	ESPECIFICAR EL EPC A USAR
X		Guantes		X	Arnes de Seguridad y linea de vida
X		Lentes		X	Acordonamiento
X		Cascos	X		Carteles de Seguridad
X		Zapatos con punta de acero			
X		Zapatos Diaelectricos			EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
X		Ropa de Proteccion personal o traje especial	X		Extintores
X		Tapon de oidos	X		Botiquin de Primeros Auxilios
X		Mascarilla para polvos/gases	X		Camilla rigida
X		Orejas			Otros.
X		Careta			

Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA	Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA
1	SELMAN D. CHAPOLA CHAROZA		7		
2			8		
3			9		
4			10	IMELEC S.R.L.	
5			11	ESTALDO CANDELA VILLALBA GONZALEZ	
6		RENTO F. ROMERO GUERRA INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA CIP 62871	12		

OBSERVACIONES:


Los trabajadores afirmamos haber recibido instrucciones precisas para realizar los trabajos con SEGURIDAD

FIRMA ENCARGADO DEL GRUPO

FIRMA ING. DE SEGURIDAD

FIRMA INGENIERO RESIDENTE

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO - ATS
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

FECHA: 13-10-2019

OBRA:

TRABAJO A REALIZAR: *habilitación de terreno*

TAREAS Y/O ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS ASOCIADOS	ACCIONES RECOMENDADAS
<i>Remoción de tierra</i>	<i>caídas</i>	<i>caídas</i>	<i>uso de Casco</i>
			<i>uso de E.P.P.</i>

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

	SI	NO		SI	NO
Manejo de Productos Químicos Peligrosos			Trabajos en Altura		
Bloqueo y etiquetado			Otros:		
Ingreso a espacios Confinados					
Trabajos en Caliente (Soldadura, Esmeril, otros)					
Izaje de cargas críticas					

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP / EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPC

SI	NO	ESPECIFICAR EL EPP A USAR	SI	NO	ESPECIFICAR EL EPCA USAR
<input checked="" type="checkbox"/>		Guantes			Arnes de Seguridad y línea de vida
<input checked="" type="checkbox"/>		Lentes			Acordonamiento
<input checked="" type="checkbox"/>		Cascos			Carteles de Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>		Zapatos con punta de acero			EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
<input checked="" type="checkbox"/>		Zapatos Dieléctricos			Extintores
<input checked="" type="checkbox"/>		Ropa de Protección personal o traje especial			Botiquín de Primeros Auxilios
<input checked="" type="checkbox"/>		Tapon de oídos			Camilla rígida
<input checked="" type="checkbox"/>		Mascarilla para polvos/gases			Otros.
<input checked="" type="checkbox"/>		Orejeras			
<input checked="" type="checkbox"/>		Careta			

Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA	Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA
1	<i>David Velasco</i>	<i>[Firma]</i>	7		
2	<i>Percy Herrera</i>	<i>[Firma]</i>	8		
3			9		
4			10		
5			11		
6			12		

IMELEC S.R.L.
[Firma]
OSCALDO I. GARDENAS VINCIA
 GERENTE GENERAL

RENAO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

OBSERVACIONES:

Los trabajadores afirmamos haber recibido instrucciones precisas para realizar los trabajos con SEGURIDAD

[Firma]
 FIRMA ENCARGADO DEL GRUPO

IMELEC S.R.L.
 PAUL GARDENAS NUÑEZ
 INGENIERO DE SEGURIDAD
 FIRMA ING. DE SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 INGENIERO RESIDENTE
 FIRMA INGENIERO RESIDENTE

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO - ATS
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

FECHA: 13-12-19

OBRA:

TRABAJO A REALIZAR: Patillado de zapatas

TAREAS Y/O ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS ASOCIADOS	ACCIONES RECOMENDADAS
<u>Patillado de zapatas</u>	<u>- Caída de escombros - Martillo neumático</u>	<u>lesiones golpes, trojesones</u>	<u>uso de EPP correctamente usar correctamente el Martillo Neumático uso correctamente los - complementos de seguridad - orden y limpieza en el trabajo</u>

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

	SI	NO		SI	NO
Manejo de Productos Químicos Peligrosos			Trabajos en Altura		
Bloqueo y etiquetado			Otros:		
Ingreso a espacios Confinados					
Trabajos en Caliente (Soldadura, Esmeril, otros)					
Lizaje de cargas críticas					

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP / EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPC

SI	NO	ESPECIFICAR EL EPP A USAR	SI	NO	ESPECIFICAR EL EPC A USAR
<input checked="" type="checkbox"/>		Guantes		<input checked="" type="checkbox"/>	Arnes de Seguridad y línea de vida
<input checked="" type="checkbox"/>		Lentes		<input checked="" type="checkbox"/>	Acordonamiento
<input checked="" type="checkbox"/>		Cascos	<input checked="" type="checkbox"/>		Carteles de Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>		Zapatos con punta de acero			EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zapatos Dieléctricos			Extintores
<input checked="" type="checkbox"/>		Ropa de Protección personal o traje especial			Botiquín de Primeros Auxilios
<input checked="" type="checkbox"/>		Tapón de oídos			Camilla rígida
<input checked="" type="checkbox"/>		Mascarilla para polvos/gases			Otros.
<input checked="" type="checkbox"/>		Orejeras			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Careta			

Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA	Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA
1	<u>Alipio Cruz M.</u>	<u>[Firma]</u>	7		
2	<u>Rogelio Cusucani MORA</u>	<u>[Firma]</u>	8		
3	<u>Julian Manani SVA</u>	<u>[Firma]</u>	9		
4	<u>Diego Apaza Fuentes</u>	<u>[Firma]</u>	10		
5	<u>Edson Cruz Mamau</u>	<u>[Firma]</u>	11		
6			12		

IMELEC S.R.L.
OSVALDO J. GARDENAS VINCIA
GERENTE GENERAL

OBSERVACIONES:

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871

Los trabajadores afirmamos haber recibido instrucciones precisas para realizar los trabajos en SEGURIDAD


IMELEC S.R.L.

[Firma]
FIRMA ENCARGADO DEL GRUPO

PAUL GARDENAS NUNEZ
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
CIP 101783
FIRMA ING. DE SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 90570
FIRMA INGENIERO RESIDENTE

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO - ATS
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

FECHA: 13-12-19

OBRA:

TRABAJO A REALIZAR: replanteo de tramos

TAREAS Y/O ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS ASOCIADOS	ACCIONES RECOMENDADAS
replanteo de tramos	combustible, mechillo, estacos	golpes, chancadura, chancadura	uso adecuado de herramientas, uso adecuado de EPP, orden y limpieza en el area de trabajo

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

	SI	NO		SI	NO
Manejo de Productos Químicos Peligrosos			Trabajos en Altura		
Bloqueo y etiquetado			Otros:		
Ingreso a espacios Confinados					
Trabajos en Caliente (Soldadura, Esmeril, otros)					
Izaje de cargas críticas					

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP / EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPC

SI	NO	ESPECIFICAR EL EPP A USAR	SI	NO	ESPECIFICAR EL EPC A USAR
X		Guantes		X	Arnes de Seguridad y linea de vida
X		Lentes		X	Acordonamiento
X		Cascos		X	Carteles de Seguridad
X		Zapatos con punta de acero			
	X	Zapatos Diaelectricos			EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
	X	Ropa de Protección personal o traje especial			Extintores
X		Tapon de oidos			Botiquin de Primeros Auxilios
	X	Mascarilla para polvos/gases			Camilla rigida
	X	Orejas			Otros.
	X	Careta			

Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA	Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA
1	Gustavo Palacios	<i>[Signature]</i>	7		
2	Victor Lewis Idonaco	<i>[Signature]</i>	8		
3	Richard Chura	<i>[Signature]</i>	9	IMELEC S.R.L.	
4			10	<i>[Signature]</i>	
5			11	OSVALDO J. CARDENAS VINCHA	GERENTE GENERAL
6			12		

OBSERVACIONES:

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 22877

Los trabajadores afirmamos haber recibido instrucciones precisas para realizar los trabajos con SEGURIDAD

[Signature]
 FIRMA ENCARGADO DEL GRUPO
 Gustavo Palacios

[Signature]
 FIRMA ING. DE SEGURIDAD

[Signature]
 FIRMA INGENIERO RESIDENTE

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO - ATS
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

FECHA: 12-12-19
OBRA:

TRABAJO A REALIZAR: Colocación de Balizas

TAREAS Y/O ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS ASOCIADOS	ACCIONES RECOMENDADAS
Colocación de balizas	Combo, martillo	golpes, chancadura, Trazos	- uso adecuado de herramientas - uso adecuado de EPP - orden y limpieza
	Maquinaria pesada	golpes, caídas	mantener distancia de la maquina

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

	SI	NO		SI	NO
Manejo de Productos Químicos Peligrosos			Trabajos en Altura		
Bloqueo y etiquetado			Otros:		
Ingreso a espacios Confinados					
Trabajos en Caliente (Soldadura, Esmeril, otros)					
Izaje de cargas críticas					

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP / EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPC

SI	NO	ESPECIFICAR EL EPP A USAR	SI	NO	ESPECIFICAR EL EPC A USAR
X		Guantes		X	Arnes de Seguridad y línea de vida
X		Lentes		X	Acordonamiento
X		Cascos	X		Carteles de Seguridad
X		Zapatos con punta de acero			
	X	Zapatos Dielectricos			EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
	X	Ropa de Protección personal o traje especial			Extintores
X		Tapon de oídos			Botiquin de Primeros Auxilios
	X	Mascarilla para polvos/gases			Camilla rigida
	X	Orejas			Otros.
	X	Careta			

Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA	Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD ESPECIALISTA	FIRMA
	Gustavo Palacios	[Firma]	7		
2	Victor Lewis Edonose	[Firma]	8		
3			9		
4			10		
5			11		
6			12		

OBSERVACIONES:

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871

IMELEC S.R.L.
OSVALDO J. Cárdenas VINCIA
GERENTE GENERAL


Los trabajadores afirmamos haber recibido instrucciones precisas para realizar los trabajos con SEGURIDAD

FIRMA ENCARGADO DEL GRUPO
Gustavo Palacios

IMELEC S.R.L.
OSVALDO J. Cárdenas NUNEZ
FIRMA INGENIERO DE SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS FLORES
Ingeniero Residente de Obra
FIRMA INGENIERO RESIDENTE

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO - ATS
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

FECHA: 12-12-19
 OBRA:

TRABAJO A REALIZAR: Traslado de personal del campamento a la obra

TAREAS Y/O ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS ASOCIADOS	ACCIONES RECOMENDADAS
Traslado del personal a la obra	Accidente en el trayecto	Accidente del personal de la obra	TENER MAS CUIDADO AL RETRAGRESAR
Traslado de herramienta	Atropello	Fallas de terrenos	MANEJAR ELLO DEFENSIVA
Traslado de carteles de señalización			

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

	SI	NO		SI	NO
Manejo de Productos Quimicos Peligrosos Bloqueado y etiquetado		<input checked="" type="checkbox"/>	Trabajos en Altura		<input checked="" type="checkbox"/>
Ingreso a espacios Confinados		<input checked="" type="checkbox"/>	Otros:		
Trabajos en Caliente (Soldadura, Esmeril, otros)		<input checked="" type="checkbox"/>			
Izaje de cargas criticas		<input checked="" type="checkbox"/>			

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP / EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPC

SI	NO	ESPECIFICAR EL EPP A USAR	SI	NO	ESPECIFICAR EL EPC A USAR
	<input checked="" type="checkbox"/>	Guantes		<input checked="" type="checkbox"/>	Arnes de Seguridad y linea de vida
<input checked="" type="checkbox"/>		Lentes		<input checked="" type="checkbox"/>	Acordonamiento
<input checked="" type="checkbox"/>		Cascos		<input checked="" type="checkbox"/>	Carteles de Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>		Zapatos con punta de acero			
<input checked="" type="checkbox"/>		Zapatos Dielectricos			
<input checked="" type="checkbox"/>		Ropa de Protección personal o traje especial		<input checked="" type="checkbox"/>	EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapon de oidos		<input checked="" type="checkbox"/>	Extintores
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mascarilla para polvos/gases		<input checked="" type="checkbox"/>	Botiquin de Primeros Auxilios
	<input checked="" type="checkbox"/>	Orejeras		<input checked="" type="checkbox"/>	Camilla rigida
	<input checked="" type="checkbox"/>	Careta			Otros.

Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA	Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA
1	JERRY LINCHE CAJAL		7		
2			8		
3			9		
4			10		
5			11		
6			12		

RENZO F. ROMERO GUERRA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

IMELEC S.R.L.
 OSVALDO J. CORDERO VILLALBA
 GERENTE GENERAL

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE CONSTRUCCION CIVIL

Jorge Curo Chata
 INGENIERO ESPECIALISTA

OBSERVACIONES:

Los trabajadores afirmamos haber recibido instrucciones precisas para realizar los trabajos con SEGURIDAD

FIRMA ENCARGADO DEL GRUPO

IMELEC S.R.L.
 FRANCISCA NUNEZ
 FIRMA ING. DE SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.
 FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 FIRMA INGENIERO RESIDENTE

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO - ATS
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

FECHA: 12/12/19
 OBRA:

TRABAJO A REALIZAR: *Excavación y Refinado de Zapata.*

TAREAS Y/O ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS ASOCIADOS	ACCIONES RECOMENDADAS
<i>Refinado de Zapata.</i>	<i>- Tierra. - Piedras.</i>	<i>- Derrumbes y caídas en el área de Trabajo - Tropezones con Piedra y objetos en el área trabajo.</i>	<i>- Uso adecuado EPP. - Señalización adecuada - Conocer el área de trabajo</i>

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

	SI	NO		SI	NO
Manejo de Productos Químicos Peligrosos			Trabajos en Altura		
Bloqueo y etiquetado			Otros:		
Ingreso a espacios Confinados					
Trabajos en Caliente (Soldadura, Esmeril, otros)					
Izaje de cargas críticas					

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP / EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPC

SI	NO	ESPECIFICAR EL EPP A USAR	SI	NO	ESPECIFICAR EL EPC A USAR
<input checked="" type="checkbox"/>		Guantes			Arnes de Seguridad y línea de vida
<input checked="" type="checkbox"/>		Lentes			Acordonamiento
<input checked="" type="checkbox"/>		Cascos			Carteles de Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>		Zapatos con punta de acero			
		Zapatos Diaelectricos			
<input checked="" type="checkbox"/>		Ropa de Protección personal o traje especial			EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
<input checked="" type="checkbox"/>		Tapon de oídos			Extintores
		Mascarilla para polvos/gases			Botiquin de Primeros Auxilios y MEDIO AMBIENTE DE SEGURIDAD CONSTRUCCION CIVIL
		Orejas			Camilla rigida
		Careta			Otros.

REYIJO R. ROMERO GILBERTA
 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 82871

Jorge Curo Chata
 ESPECIALISTA

Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA	Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA
1	<i>Edson Cruz Momani</i>	<i>[Signature]</i>	7		
2	<i>Joliam Manani Sina</i>	<i>[Signature]</i>	8		
3	<i>ALVARO AYUS M</i>	<i>[Signature]</i>	9		
4	<i>ROBERTO CUSCANA MORA</i>	<i>[Signature]</i>	10		
5			11		
6			12		

IMELEC S.R.L.

OSVALDO Y...

OBSERVACIONES:

Los trabajadores afirmamos haber recibido instrucciones precisas para realizar los trabajos con SEGURIDAD

[Signature]
 FIRMA ENCARGADO DEL GRUPO

PAUL CARDENAS NUNEZ
 Controlador Medio Ambiente
 CIP 111783
 FIRMA ING. DE SEGURIDAD

RANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 38570
 FIRMA INGENIERO RESIDENTE

**FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO - ATS
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

12-12-19

CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL: ENEL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA

TRABAJO A REALIZAR: EXCAVACION DE ZANJA ZAPATOS

TAREAS Y/O ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS ASOCIADOS	ACCIONES RECOMENDADAS
EXCAVACION DE ZAPATOS	* ATROPELLO * ACCIDENTE * FOLLOS	* POLVADERA AL MOMENTO DE EXCAVACION * CAIDAS O DERRIUMPE	* SEÑALIZACION * EN EL AREA DONDE YO ESTOY TRABAJANDO EXCAVACION CON SINTAS
USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	HIDRAULICO * RUEDO DE MAQUINA	* TROPESON CON OBJETOS	

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

	SI	NO		SI	NO
Uso de Productos Quimicos Peligrosos y etiquetado		X	Trabajos en Altura		X
Trabajos en espacios Confinados		X	Otros:		
Trabajos en Caliente (Soldadura, Esmeril, otros)		X			
Trabajos con cargas criticas		X			

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP / EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPC

NO	ESPECIFICAR EL EPP A USAR	SI	NO	ESPECIFICAR EL EPC A USAR
	Guantes		X	Arnes de Seguridad y linea de vida
	Lentes		X	Acordonamiento
	Cascos	✓		Carteles de Seguridad
	Zapatos con punta de acero			
X	Zapatos Dielectricos			EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
	Ropa de Protección personal o traje especial	✓		Extintores
X	Tapon de oidos	✓		Botiquin de Primeros Auxilios
X	Mascarilla para polvos/gases	✓		Camilla rigida
	Orejas			Otros.
	Careta			

SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE CONSTRUCCION CIVIL

.....
Curs Chata

NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA	Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA
GERMAN D. CHIPOND CHORATO		7		
		8		
		9		
		10	IMELEC S.R.L.	
RENZO F. ROMERO GUERRA INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA CIP 82871		11	OSTALDO CARDENAS VILCHA GERENTE GENERAL	
		12		

ACCIONES:


Los firmantes afirmamos haber recibido instrucciones precisas para realizar los trabajos con SEGURIDAD :

GERMA ENCARGADO DEL GRUPO

IMELEC S.R.L.
.....
PAUL CARDENAS NUNEZ
Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente
FIRMA INGENIERO DE SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.
.....
FRANCISCO RADO FLORES
Ing Residente de Obra
CIP 96570
FIRMA INGENIERO RESIDENTE

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO - ATS
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

FECHA: 12-12-2019

OBRA:

TRABAJO A REALIZAR: Letaneros y Cantiles de Chino

TAREAS Y/O ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS ASOCIADOS	ACCIONES RECOMENDADAS
Armedo de Letaneros	Torbellinos, Trampas	Cables, Cantiles	Uso de guantes, Uso de E.P.P., Mulet y LAMPETA

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

	SI	NO		SI	NO
Manejo de Productos Quimicos Peligrosos			Trabajos en Altura		
Bloqueo y etiquetado			Otros:		
Ingreso a espacios Confinados					
Trabajos en Caliente (Soldadura, Esmeril, otros)					
Izaje de cargas criticas					

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP / EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPC

SI	NO	ESPECIFICAR EL EPP A USAR	SI	NO	ESPECIFICAR EL EPC A USAR
<input checked="" type="checkbox"/>		Guantes			Arnes de Seguridad y linea de vida
<input checked="" type="checkbox"/>		Lentes			Acordonamiento
<input checked="" type="checkbox"/>		Cascos			Carteles de Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>		Zapatos con punta de acero			
<input checked="" type="checkbox"/>		Zapatos Diaelectricos			
<input checked="" type="checkbox"/>		Ropa de Proteccion personal o traje especial			EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
<input checked="" type="checkbox"/>		Tapon de oidos			Extintores
<input checked="" type="checkbox"/>		Mascarilla para polvos/gases			Botiquin de Primeros Auxilios
<input checked="" type="checkbox"/>		Orejas			Camilla rigida
<input checked="" type="checkbox"/>		Careta			Otros.

Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA	Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA
1	David Velozquez	<i>[Signature]</i>	7		
2	Percy Mazon	<i>[Signature]</i>	8		
3			9		
4			10		
5		RENZO F. ROMERO GUERRA INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA CIP 82871	11		OSWALDO CORDERO VINCIGLIA CENTE GENERAL
6			12		

OBSERVACIONES:


Los trabajadores afirmamos haber recibido instrucciones precisas para realizar los trabajos con SEGURIDAD

[Signature]
FIRMA ENCARGADO DEL GRUPO

[Signature]
PAUL CORDERO NUNEZ
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
FIRMA ING. DE SEGURIDAD

[Signature]
FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
FIRMA INGENIERO RESIDENTE

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO - ATS
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

FECHA: 11-12-19

OBRA:

TRABAJO A REALIZAR: colocación de balizas

TAREAS Y/O ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS ASOCIADOS	ACCIONES RECOMENDADAS
colocación de balizas	combo, Sacaos	golpes, cortes caídas	orden y limpieza, usar correctamente los EPP, uso adecuado de herramientas

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

	SI	NO		SI	NO
Manejo de Productos Químicos Peligrosos			Trabajos en Altura		
Bloqueo y etiquetado			Otros:		
Ingreso a espacios Confinados					
Trabajos en Caliente (Soldadura, Esmeril, otros)					
Lzaje de cargas críticas					

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP / EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPC

SI	NO	ESPECIFICAR EL EPP A USAR	SI	NO	ESPECIFICAR EL EPC A USAR
X		Guantes			Arnes de Seguridad y línea de vida
X		Lentes	X		Acordonamiento
X		Cascos	X		Carteles de Seguridad
X		Zapatos con punta de acero			
	X	Zapatos Dielectricos			
	X	Ropa de Protección personal o traje especial			EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
X		Tapon de oidos			Extintores
	X	Mascarilla para polvos/gases			Botiquin de Primeros Auxilios
	X	Orejas	X		Camilla rigida
	X	Careta			Otros.

N°	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA	N°	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA
1	Gustavo Palacios Practico	[Firma]	7		
2	Victor Lewis Idro ore	[Firma]	8		
3	Armando Cruz	[Firma]	9		
4			10		
5			11		
6			12		

IMELECS R.L.
 [Firma y Sello]

OBSERVACIONES:


Los trabajadores afirmamos haber recibido instrucciones precisas para realizar los trabajos con SEGURIDAD

[Firma]
 FIRMA ENCARGADO DEL GRUPO
 Gustavo Palacios

[Firma]
 FIRMA ING. DE SEGURIDAD

[Firma]
 FIRMA INGENIERO RESIDENTE

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO - ATS
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

FECHA: 17-12-19
 OBRA: CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO AGRICOLA MORO SAMA
 TRABAJO A REALIZAR: EXCAVACION DE ZOPOTAS ZANJA

TAREAS Y/O ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS ASOCIADOS	ACCIONES RECOMENDADAS
EXCAVACION DE ZANJA ZOPOTAS	* ATROPELLO	* POLVADERA	* SEÑALIZACION LA
	* ACCIDENTE	ALMORZAMIENTO DE EXCAVACION	AREA DE EXCAVADO
ACUMULACION DESMORTE	* FASCAS	* DESMORROHAMIENLO	* USO DE MASCARILLA
	HIDROBUICO	* CAIDAS DE OBJETOS.	* USD DE EPP

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

	SI	NO		SI	NO
Manejo de Productos Químicos Peligrosos		<input checked="" type="checkbox"/>	Trabajos en Altura		<input checked="" type="checkbox"/>
Bloqueo y etiquetado		<input checked="" type="checkbox"/>	Otros:		
Ingreso a espacios Confinados		<input checked="" type="checkbox"/>			
Trabajos en Caliente (Soldadura, Esmeril, otros)		<input checked="" type="checkbox"/>			
Izaje de cargas críticas		<input checked="" type="checkbox"/>			

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP / EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPC

SI	NO	ESPECIFICAR EL EPP A USAR	SI	NO	ESPECIFICAR EL EPC A USAR	
<input checked="" type="checkbox"/>		Guantes		<input checked="" type="checkbox"/>	Arnes de Seguridad y linea de vida	
<input checked="" type="checkbox"/>		Lentes		<input checked="" type="checkbox"/>	Acordonamiento	
<input checked="" type="checkbox"/>		Cascos	<input checked="" type="checkbox"/>		Carteles de Seguridad	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zapatos con punta de acero			EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Zapatos Dialectricos				Extintores
<input checked="" type="checkbox"/>		Ropa de Proteccion personal o traje especial	<input checked="" type="checkbox"/>			Botiquin de Primeros Auxilios
	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapon de oidos	<input checked="" type="checkbox"/>			Camilla rigida
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mascarilla para polvos/gases	<input checked="" type="checkbox"/>			Otros.
	<input checked="" type="checkbox"/>	Orejeras				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Careta				

Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA	Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA
1	<u>GERMAN D. CHIPANA CHARANA</u>		7		
2			8		
3			9		
4			10		
5			11		
6			12	<u>RENZO F. ROMERO GUERRA</u>	

OBSERVACIONES:

Los trabajadores afirmamos haber recibido instrucciones precisas para realizar los trabajos con SEGURIDAD

FIRMA ENCARGADO DEL GRUPO

FIRMA ING. DE SEGURIDAD

FIRMA INGENIERO RESIDENTE

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO - ATS
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

FECHA: 11/12/2019
 OBRA: Construcción Casa Residencial En el Centro Acuicola Morro Sima
 TRABAJO A REALIZAR: Excavación de Zapata

TAREAS Y/O ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS ASOCIADOS	ACCIONES RECOMENDADAS
Excavación de Zapata	1) Derrumbes	Quedarse atrapado en el hoyo	- Uso adecuado de Epp. - Limpieza en la obra
	2) Piedras	Tropiezos, caídas que ocasionen lesiones o asfixias.	- Señalización adecuada - Conocer el área de trabajo

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

	SI	NO		SI	NO
Manejo de Productos Químicos Peligrosos			Trabajos en Altura		
Bloqueo y etiquetado			Otros:		
Ingreso a espacios Confinados					
Trabajos en Caliente (Soldadura, Esmeril, otros)					
Lizaje de cargas críticas					

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP / EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPC

SI	NO	ESPECIFICAR EL EPP A USAR	SI	NO	ESPECIFICAR EL EPC A USAR
X		Guantes			Arnes de Seguridad y línea de vida
X		Lentes			Acordonamiento
X		Cascos			Carteles de Seguridad
X		Zapatos con punta de acero			
		Zapatos Dielectricos			
X		Ropa de Protección personal o traje especial			EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
X		Tapon de oídos			Extintores
		Mascarilla para polvos/gases			Botiquin de Primeros Auxilios
		Orejas			Camilla rigida
		Careta			Otros.

Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA	Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA
1	Edson Cruz Mamani	<i>[Firma]</i>	7		
2	Julian Mamani Sña	<i>[Firma]</i>	8	SEGURIDAD AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE DE CONSTRUCCION CIVIL	
3	Diego Apaza Fuentes	<i>[Firma]</i>	9	Jorge Curo Chata ESPECIALISTA	
4			10	IMELEC S.R.L.	
5			11	OSVALDO Y CARMENAS VINCHA GERENTE GENERAL	
6			12		

OBSERVACIONES:

Los trabajadores afirmamos haber recibido instrucciones precisas para realizar los trabajos con SEGURIDAD


IMELEC S.R.L.

[Firma]
 FIRMA ENCARGADO DEL GRUPO

[Firma]
 PAUL O'NEALS NUNEZ
 Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
 FIRMA INGENIERO DE SEGURIDAD

[Firma]
 VICISCO RAMOS FLORES
 Residente
 FIRMA INGENIERO RESIDENTE

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO - ATS
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

FECHA: 11-12-2019
 OBRA: Construcción de la Casa Residencial en el Centro Pecuero Hono Juan
 TRABAJO A REALIZAR: Techo de Polvo con Colores

TAREAS Y/O ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS ASOCIADOS	ACCIONES RECOMENDADAS
Traslad. de	Colores	caída	uso de guante.
colores	resaca	golpe	
Andenes			uso de E.P.P.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

	SI	NO		SI	NO
Manejo de Productos Químicos Peligrosos	X		Trabajos en Altura		
Bloqueo y etiquetado			Otros:		
Ingreso a espacios Confinados					
Trabajos en Caliente (Soldadura, Esmeril, otros)					
Lizaje de cargas críticas					

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP / EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPC

SI	NO	ESPECIFICAR EL EPP A USAR	SI	NO	ESPECIFICAR EL EPC A USAR
X		Guantes			Arnes de Seguridad y línea de vida
X		Lentes			Acordonamiento
X		Cascos			Carteles de Seguridad
X		Zapatos con punta de acero			
		Zapatos Dialectricos			
X		Ropa de Protección personal o traje especial			EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
		Tapon de oídos			Extintores
		Mascarilla para polvos/gases			Botiquin de Primeros Auxilios
		Orejas			Camilla rígida
		Careta			Otros.

Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA	Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA
1	David Velazquez	[Firma]	7		
2	Percy Munoz	[Firma]	8		
3			9		
4			10		
5			11		
6	RENZO F. ROMERO GUERRA INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA CIP 82871	[Firma]	12	IMELEC S.R.L.	[Firma]

OBSERVACIONES:

SVALDOJ. CAMPENAS VINCHA
GERENTE GENERAL

Los trabajadores afirmamos haber recibido instrucciones precisas para realizar los trabajos con SEGURIDAD

[Firma]
FIRMA ENCARGADO DEL GRUPO

PAUL CARLOS NUNEZ
Especialista Medio Ambiente
FIRMA ING. DE SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS LORES
Ing. Residente de Obra
FIRMA INGENIERO RESIDENTE

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO - ATS
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

FECHA: 12-12-2014
 OBRA: Construcción de la Casa Residencial en el Centro Agrícola Horno Sauer
 TRABAJO A REALIZAR: Prueba de balanceo de la obra

TAREAS Y/O ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS ASOCIADOS	ACCIONES RECOMENDADAS
Traslado de listones	golpe caída	Mediana	uso de EPP

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

	SI	NO		SI	NO
Manejo de Productos Químicos Peligrosos			Trabajos en Altura		
Bloqueo y etiquetado			Otros:		
Ingreso a espacios Confinados					
Trabajos en Caliente (Soldadura, Esmeril, otros)					
Lzaje de cargas críticas					

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP / EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPC

SI	NO	ESPECIFICAR EL EPP A USAR	SI	NO	ESPECIFICAR EL EPC A USAR
X		Guantes			Arnes de Seguridad y línea de vida
X		Lentes			Acordonamiento
X		Cascos			Carteles de Seguridad
X		Zapatos con punta de acero			
		Zapatos Dielectricos			EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
		Ropa de Protección personal o traje especial			Extintores
		Tapon de oídos			Botiquin de Primeros Auxilios
		Mascarilla para polvos/gases			Camilla rígida
		Orejas			Otros.
		Careta			

Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA	Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA
1	David Velazquez	[Firma]	7		
2	Percy Rojas	[Firma]	8	SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE CONSTRUCCION CIVIL	
3			9	Jorge Caro Chata	ESPECIALISTA
4			10		
5			11	IMELEC S.R.L.	
6	RENZO F. ROMERO GUERRA	[Firma]	12	OSVALDO J. CARDENAS VINCHA	GERENTE GENERAL

OBSERVACIONES:

Los trabajadores afirmamos haber recibido instrucciones precisas para realizar los trabajos con SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.

IMELEC S.R.L.

[Firma]
 FIRMA ENCARGADO DEL GRUPO

PAUL CARLOS VILLALBA
 Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo
 FIRMA ING. DE SEGURIDAD

FRANCISCO J. MOY FLORES
 Ing. Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo
 FIRMA INGENIERO RESIDENTE

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO - ATS
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

FECHA: 10-12-19
 OBRA: CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO AGROPECUARIO MUREO JAMA

TAREAS Y/O ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS ASOCIADOS	ACCIONES RECOMENDADAS
EXCAVACION DE ZAPATAS	* ATROPELLADO * ACCIDENTE	* POLVO DE TIERRA	* SEÑALIZACION LA AREA - TRABAJO
LIMPIEZA DE TIERRA SOBRENTE	* FALLAS HIDRAULICO * CHOCAR CON ALGUN OBJETO	* REDUMBE DE TIERRA ZANJA ZAPATA * CAIDAS DE OBJETOS	* EL USO DE EPP OBLIGATORIO * CHARLA ESPECIFICA

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

	SI	NO		SI	NO
Manejo de Productos Quimicos Peligrosos		<input checked="" type="checkbox"/>	Trabajos en Altura		<input checked="" type="checkbox"/>
Bloqueo y etiquetado		<input checked="" type="checkbox"/>	Otros:		
Ingreso a espacios Confinados	<input checked="" type="checkbox"/>				
Trabajos en Caliente (Soldadura, Esmeril, otros)		<input checked="" type="checkbox"/>			
Lzaje de cargas criticas		<input checked="" type="checkbox"/>			

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP / EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPC

SI	NO	ESPECIFICAR EL EPP A USAR	SI	NO	ESPECIFICAR EL EPC A USAR
<input checked="" type="checkbox"/>		Guantes		<input checked="" type="checkbox"/>	Arnes de Seguridad y linea de vida
<input checked="" type="checkbox"/>		Lentes		<input checked="" type="checkbox"/>	Acordonamiento
<input checked="" type="checkbox"/>		Cascos		<input checked="" type="checkbox"/>	Carteles de Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>		Zapatos con punta de acero			EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
<input checked="" type="checkbox"/>		Zapatos Diaelectricos		<input checked="" type="checkbox"/>	Extintores
<input checked="" type="checkbox"/>		Ropa de Protección personal o traje especial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Botiquin de Primeros Auxilios
	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapon de oidos		<input checked="" type="checkbox"/>	Camilla rigida
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mascarilla para polvos/gases			Otros.
	<input checked="" type="checkbox"/>	Orejeras			
<input checked="" type="checkbox"/>		Careta			

N°	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA	N°	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA
1	GERMAN D. CHIPANA CHARAÑA	<i>[Signature]</i>	7		
2			8	SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE CONSTRUCCION CIVIL	
3			9	Jorge Puro Chata ESPECIALISTA	
4			10		
5	IMELEC S.R.L.	<i>[Signature]</i>	11		
6	SVALDO J. CARDENAS YINCHA GERENTE GENERAL	<i>[Signature]</i>	12	RENZO F. ROMERO GUERRA INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA CIP 82871	<i>[Signature]</i>

OBSERVACIONES:

Los trabajadores afirmamos haber recibido instrucciones precisas para realizar los trabajos con SEGURIDAD

[Signature]
FIRMA ENCARGADO DEL GRUPO

IMELEC S.R.L.
PAUL AGUIRRE NUNEZ
Especialista Seguridad y Medio Ambiente
CIP 1011113
FIRMA ING. DE SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 1011113
FIRMA INGENIERO RESIDENTE

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO - ATS
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

FECHA: 10-12-14

OBRA: Construcción de la Casa Residencial en el Centro Agrícola Home Sweet Home

TRABAJO A REALIZAR: Trazo en Terreno

TAREAS Y/O ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS ASOCIADOS	ACCIONES RECOMENDADAS
- Traslado a campo en camioneta	cuidos, voladuras, choque	fracturas, golpes	manejar el vehículo según norma de seguridad, usar cinturón de seguridad
- trazo de terreno	golpes, caídas, piedras,	golpes, caídas	orden y limpieza, señalizar los accesos, señalizar área de trabajo, uso adecuado de herramientas

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

	SI	NO		SI	NO
Manejo de Productos Químicos Peligrosos			Trabajos en Altura		
Bloqueo y etiquetado			Otros:		
Ingreso a espacios Confinados					
Trabajos en Caliente (Soldadura, Esmeril, otros)					
Izaje de cargas críticas					

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP / EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPC

SI	NO	ESPECIFICAR EL EPP A USAR	SI	NO	ESPECIFICAR EL EPC A USAR
X		Guantes			Arnes de Seguridad y línea de vida
X		Lentes			Acordonamiento
X		Cascos			Carteles de Seguridad
X		Zapatos con punta de acero			
	X	Zapatos Dielectricos			EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
		Ropa de Protección personal o traje especial			Extintores
		Tapon de oídos			Botiquin de Primeros Auxilios
	X	Mascarilla para polvos/gases			Camilla rígida
		Orejeras			Otros.
		Careta			

Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA	Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA
1	Gustavo Palacios Acuña		7	SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE ORGANIZACIÓN CIVIL	
2	Giclor Lewis Idorena		8		
3	Alipio Cruz		9	Jorge Cruz Chata ESPECIALISTA	
4			10	IMELEC S.R.L.	
5			11	OSVALDO J. CARDENAS VINCHA GERENTE GENERAL	
6			12		

OBSERVACIONES : RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82841

Los trabajadores afirmamos haber recibido instrucciones precisas para realizar los trabajos con SEGURIDAD

FIRMA ENCARGADO DEL GRUPO

FIRMA ING. DE SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.

FRANCISCO RAMIRO FLORES
Ing. Residente de Obra
CIP 90770
FIRMA INGENIERO RESIDENTE

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO - ATS
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

FECHA: SABADO 09-12-19
 OBRA: CONSTRUCCION DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO AGRICOLA MORRO JAMA
 TRABAJO A REALIZAR: ACUMULACION DESMONTRE

TAREAS Y/O ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS ASOCIADOS	ACCIONES RECOMENDADAS
* ACUMULACION MATERIAL DESMONTRE Y NIVELACION	▷ ATRAPELLO X ACCIDENTE	* POLVO * GOLPE CON LA PIEDRA	* USO DE MOBILIARIO * SEÑALIZACION LA AREA

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

	SI	NO		SI	NO
Manejo de Productos Quimicos Peligrosos		<input checked="" type="checkbox"/>	Trabajos en Altura		<input checked="" type="checkbox"/>
Bloqueo y etiquetado		<input checked="" type="checkbox"/>	Otros:		
Ingreso a espacios Confinados		<input checked="" type="checkbox"/>			
Trabajos en Caliente (Soldadura, Esmeril, otros)		<input checked="" type="checkbox"/>			
Lizaje de cargas criticas		<input checked="" type="checkbox"/>			

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP / EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPC

SI	NO	ESPECIFICAR EL EPP A USAR	SI	NO	ESPECIFICAR EL EPC A USAR
<input checked="" type="checkbox"/>		Guantes		<input checked="" type="checkbox"/>	Arnes de Seguridad y linea de vida
<input checked="" type="checkbox"/>		Lentes		<input checked="" type="checkbox"/>	Acordonamiento
<input checked="" type="checkbox"/>		Cascos	<input checked="" type="checkbox"/>		Carteles de Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>		Zapatos con punta de acero			EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
<input checked="" type="checkbox"/>		Zapatos Dielectricos		<input checked="" type="checkbox"/>	Extintores
<input checked="" type="checkbox"/>		Ropa de Protección personal o traje especial	<input checked="" type="checkbox"/>		Botiquin de Primeros Auxilios
<input checked="" type="checkbox"/>		Tapon de oidos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Camilla rigida
<input checked="" type="checkbox"/>		Mascarilla para polvos/gases		<input checked="" type="checkbox"/>	Otros.
<input checked="" type="checkbox"/>		Orejas			
<input checked="" type="checkbox"/>		Careta			

N°	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA	N°	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA
1	<u>GERMAN D. CHIPANA CHORRANO</u>		7		
2			8		
3			9		
4			10		
5			11		
6			12		

OBSERVACIONES:

Los trabajadores afirmamos haber recibido instrucciones precisas para realizar los trabajos con SEGURIDAD

FIRMA ENCARGADO DEL GRUPO

PAUL CARDENAS NUNEZ
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
CIP 103783
FIRMA ING. DE SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
FIRMA INGENIERO RESIDENTE

SECURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE
CONSTRUCCION CIVIL
Jorge Curo Chata
ESPECIALISTA

IMELEC S.R.L.

OSVALDO L. CARDENAS VINCIA
GERENTE GENERAL

**FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO - ATS
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

FECHA: VIERNES 06 de Diciembre de 2019
 OBRA: Construcción de la Casa habitación en el Campesinado Nueva Sierra
 TRABAJO A REALIZAR: ACUMULACION Y TRASLADO DE MATERIAL DESMONTE

TAREAS Y/O ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS ASOCIADOS	ACCIONES RECOMENDADAS
* <u>TRASLADO DE MATERIAL DESMONTE Y ACUMULADO</u>	* <u>CAÍDAS</u>	* <u>POLVO</u>	
	<u>OBJETO SERRANO</u>		* <u>LIMPIEZA LA AREA DEL TRABAJO</u>
	* <u>ACCIONES</u>	* <u>TROPESON</u>	
	* <u>PALLAS HIDRAULICO</u>	* <u>GOLPE CON ALGON OBJETO</u>	* <u>SEÑALIZACION</u>

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

	SI	NO		SI	NO
Manejo de Productos Químicos Peligrosos		<input checked="" type="checkbox"/>	Trabajos en Altura		<input checked="" type="checkbox"/>
Bloqueo y etiquetado		<input checked="" type="checkbox"/>	Otros:		
Ingreso a espacios Confinados		<input checked="" type="checkbox"/>			
Trabajos en Caliente (Soldadura, Esmeril, otros)		<input checked="" type="checkbox"/>			
Izaje de cargas críticas		<input checked="" type="checkbox"/>			

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP / EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPC

SI	NO	ESPECIFICAR EL EPP A USAR	SI	NO	ESPECIFICAR EL EPC A USAR
<input checked="" type="checkbox"/>		Guantes		<input checked="" type="checkbox"/>	Arnes de Seguridad y línea de vida
<input checked="" type="checkbox"/>		Lentes		<input checked="" type="checkbox"/>	Acordonamiento
<input checked="" type="checkbox"/>		Cascos		<input checked="" type="checkbox"/>	Carteles de Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>		Zapatos con punta de acero			EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
<input checked="" type="checkbox"/>		Zapatos Dielectricos			Extintores
<input checked="" type="checkbox"/>		Ropa de Protección personal o traje especial	<input checked="" type="checkbox"/>		Botiquin de Primeros Auxilios
<input checked="" type="checkbox"/>		Tapon de oidos	<input checked="" type="checkbox"/>		Camilla rigida
<input checked="" type="checkbox"/>		Mascarilla para polvos/gases		<input checked="" type="checkbox"/>	Otros.
<input checked="" type="checkbox"/>		Orejeras			
<input checked="" type="checkbox"/>		Careta			

Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA	Nº	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA
1	<u>DAVID CHIPDIO CHAROÑO</u>		7		
2			8	SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE CONSTRUCCION CIVIL	
3			9	<u>Jorge Curo Chata</u> ESPECIALISTA	
4			10	IMELEC S.R.L.	
5			11		
6	<u>RENZO F. ROMERO GUERRA</u> INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA CIP 82877		12	<u>OSVALDO J. CARDENAS VINCHA</u> GERENTE GENERAL	

OBSERVACIONES:


Los trabajadores afirmamos haber recibido instrucciones precisas para realizar los trabajos con SEGURIDAD

FIRMA ENCARGADO DEL GRUPO

PAUL CARDENAS NUNEZ
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
CIP 161733
FIRMA ING. DE SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.
FRANCISCO RAMOS FLORES
Ing. Residente de Obra
FIRMA INGENIERO RESIDENTE

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO - ATS
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

FECHA: 5-12-19
 OBRA: Construcción de la Casa Residencial en el Camino Acuña Mono Sama
 TRABAJO A REALIZAR: MOVIMIENTO DE TIERRA

TAREAS Y/O ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS ASOCIADOS	ACCIONES RECOMENDADAS
<u>CORTE Y EXCAVACION</u>	<u>* ACCIDENTE</u>	<u>* GOLPES</u>	<u>* SEÑALIZACION</u>
<u>NIVELACION DE TIERRA</u>	<u>* ATROPELLON</u>		<u>LA AREA DEL</u>
	<u>AL OBRERO</u>	<u>* DESMORRONAMIENTO</u>	<u>TRABAJO</u>
		<u>EL TERRA</u>	
	<u>* FALLAS</u>	<u>* CALDAS</u>	<u>* USO DE EPP</u>
	<u>HIDRAULICAS</u>		

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

	SI	NO		SI	NO
Manejo de Productos Químicos Peligrosos		<input checked="" type="checkbox"/>	Trabajos en Altura		<input checked="" type="checkbox"/>
Bloqueo y etiquetado		<input checked="" type="checkbox"/>	Otros:		
Ingreso a espacios Confinados		<input checked="" type="checkbox"/>			
Trabajos en Caliente (Soldadura, Esmeril, otros)		<input checked="" type="checkbox"/>			
Izaje de cargas críticas		<input checked="" type="checkbox"/>			

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP / EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPC

SI	NO	ESPECIFICAR EL EPP A USAR	SI	NO	ESPECIFICAR EL EPC A USAR
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Guantes		<input checked="" type="checkbox"/>	Arnes de Seguridad y línea de vida
<input checked="" type="checkbox"/>		Lentes		<input checked="" type="checkbox"/>	Acordonamiento
<input checked="" type="checkbox"/>		Cascos	<input checked="" type="checkbox"/>		Carteles de Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>		Zapatos con punta de acero			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Zapatos Dielectricos			EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
<input checked="" type="checkbox"/>		Ropa de Protección personal o traje especial	<input checked="" type="checkbox"/>		Extintores
	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapon de oidos	<input checked="" type="checkbox"/>		Botiquin de Primeros Auxilios
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mascarilla para polvos/gases		<input checked="" type="checkbox"/>	Camilla rigida
	<input checked="" type="checkbox"/>	Orejas			Otros.
<input checked="" type="checkbox"/>		Careta			

N°	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA	N°	NOMBRE PERSONAL EN LA ACTIVIDAD	FIRMA
1	<u>GERMAN D. CHIPANA CHARANA</u>		7		
2			8		
3			9		
4			10		
5	<u>RENZO F. ROMERO GUERRA</u> INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA CIP 82871		11		
6			12	<u>OSVALDO J. CORDENAS VIERCHA</u> GERENTE GENERAL	

OBSERVACIONES:

Los trabajadores afirmamos haber recibido instrucciones precisas para realizar los trabajos con SEGURIDAD

IMELEC S.R.L.

FIRMA ENCARGADO DEL GRUPO

PAUL CARDENAS NUNEZ
 Ing. Residente de Obra y Medio Ambiente
 CIP 101 243
 FIRMA INGENIERO DE SEGURIDAD


FRANCISCO RAMOS FLORES
 Ing. Residente de Obra
 CIP 96 270
 FIRMA INGENIERO RESIDENTE

IMELEC SRL

OBRA:

**CONSTRUCCIÓN DE LA CASA RESIDENCIAL EN EL
CENTRO ACUÍCOLA MORRO SAMA – DISTRITO DE
SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA**

CHECK LIST Y/O INSPECCIONES


.....
RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIP 82871

IMELEC S.R.L.

.....
OSVALDO J. CARPENAS VINCHA
GERENTE GENERAL

CHECK LIST

INSPECCIONES DE PREUSO DE EQUIPO MÓVIL

OBRA :

CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO AGRICOLA PUERO SAMA

FECHA : 12/12/19

HORA : 7:30

TURNO : DIA

PLACA : CAT 420 F2

CORRECTO	✓	INCORRECTO	X	NO APLICA	N/A
REPARAR :	Inmediato ()	Antes de 10 horas ()	Antes de 24 horas ()	Antes de 1ra Semana ()	()

PARA TODO VEHICULO	ESTADO	CAMION CISTERNA	ESTADO	CARGADOR FRONTAL	ESTADO
** 1.- Motor	✓	** 1.- Sistema de Freno Emergencia		** 1.- Sistema. Frenos de emergencia	
* 2.- Gata y Llaves de Rueda	✓	** 2.- Compresora sistema de aire		** 2.- Botellas Hidráulicas	
** 3.- Luces Direccionales y de Emergencia	✓	** 3.- Descarga a tierra		3.- Cucharon y Puntas	
** 4.- Cinturon de Seguridad	✓	** 4.- Válvulas		4.- Pines y Bocinas	
** 5.- Niveles (Aceite, Agua, Etc)	✓	** 5.- Sistema de tomamesa		EXCAVADORAS	
** 6.- Espejos	✓	** 6.- Acoples sistemas de freno		RETROEXCAVADORAS	
** 7.- Llantas	✓	7.- Acoples-sistemas Eléctrico		** 1.- Rueda guia Esproket	ESTADO
** 8.- Esparragos y Tuercas	✓	8.- Escaleras y Barandas		** 2.- Botella Hidraulica	✓
* 9.- Circulina	✓	9.- Gata y llave ruedas		3.- Mandos Finales	✓
* 10.- Luces Operativas y Micas Limpias	✓	10.- Gatos Mec. de estacionamiento		4.- Orugas y Rodillos	X
* 11.- Estribos y Grilletes	✓	VOLQUETES		5.- Tomamesa	NA
* 12.- Aro y pestañas	NA	** 1.- Sistema frenos de emergencia		6.- Pines de Cucharon	✓
* 13.- Claxon y alarma de retroceso	✓	** 2.- Compresor/sistema de aire		7.- Caderas y Zapatas	NA
* 14.- Panel controles (Velocimetro, Combustible)	✓	** 3.- Pin T seguro de la tolva		GRUAS	
* 15.- Asientos	✓	** 4.- Pines-Piston de levante		** 1.- Pluma o Brazo - Limit Switch	
16.- Radio de Comunicación	NA	5.- Compuerta		** 2.- Estabilizadores	
17.- Vidrios de ventana y limpiaparabrisa	✓	6.- Gata y llave de ruedas		3.- Ganchos de levante	
* 18.- Llanta de repuesto	NA	7.- Espejos y micas limpias		4.- Lengüeta de seg. de Gancho	
* 19.- Pala y pico	X	8.- Malla o toldera		5.- Valvula de seguridad	
20.- Guardafangos	NA	TRACTOR SOBRE ORUGAS		6.- Diagrama de carga	
21.- Estribos y escaleras	✓	** 1.- Mandos finales		7.- Diagrama de señales	
22.- Orden y limpieza en cabina	✓	** 2.- Botellas hidraulicas		ACCESORIOS DE SEGURIDAD	
* 23.- Sistema de direccion	✓	3.- Rueda guia, Sproket		** 1.- Conos de Seguridad	✓
* 24.- Sistema de frenos	✓	** 4.- Pines y bocinas		** 2.- Extintor	✓
* 25.- Sistema hidraulico	✓	5.- Orugas y rodillos		** 3.- Botiquin de Primeros Auxilios	✓
* 26.- Sistema de Suspension	✓	6.- Zapata		** 4.- Tacos de Seguridad	✓
27.- Cable de Remolque	✓	MOTONIVELADORA		** 5.- Cintas Reflectivas	✓
28.- Cable de Energia	✓	** 1.- Mandos Finales		** 6.- Circulina	✓
* 29.- Estado de la batería	✓	** 2.- Sist. de frenos de emergencia		* 7.- Lampa - Picota - Machete	NA
30.- Medidor de aire	✓	3.- Sistema hidraulico de tomamesa		* 8.- Letreros	✓
* Asientos	✓	y dirección		** 9.- Antena Pertiga	✓
* Tolva	✓	4.- Articulacion del escarificador		* 10.- Frazada	X
33.- Otros		5.- Balancin de Direccion		** 11.- Kit de Antiderrame	✓
DOCUMENTACION		ESTADO		ESTADO	
** Tarjeta de Propiedad		** 1.- Rola y sistema de aire		** 13.- Pin de Remolque	NA
** SOAT		** 2.- Sist. De Freno de Emergencia		** 14.- Kit de Herramientas	✓
** Revision Tecnica		3.- Limpiador de rola		Nota : Las banderolas solo se usaran durante en el traslado de equipo pesado	
* Cuaderno de Parte Diario		4.- Motor de Vibracion			

CONDICIONES PARA OPERAR

** Estos puntos deben de estar operativos al 100% para operar el vehiculo o equipo movil.

* De acuerdo al Turno o tiempo deben estar operativos al 100 %


OBSERVACIONES :

RENZO F. ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIF 82071

OSVALDO F. GARDENAS YRUCHA
GERENTE GENERAL

SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE
CONSTRUCCION CIVIL

Jorge Curo Chita
ESPECIALISTA

ELABORADO POR: Nombre y Apellidos GERMAN DAVID CHIPANO CABRERO 	REVISADO POR: IMELEC S.R.L. FRANCISCA RAMOS PUIEZ GERENTE GENERAL	APROBADO POR: IMELEC S.R.L. FRANCISCO RAMOS FLORES INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA CIF 98270
CARGO : OPERADOR DE RETROEXCAVADORA		

CHECK LIST

INSPECCIONES DE PREUSO DE EQUIPO MÓVIL

OBRA :

FECHA : 12/12/19

HORA : 7:30 AM TURNO :

PLACA : 164865

CORRECTO	✓	INCORRECTO	X	NO APLICA	N/A
REPARAR :	Inmediato ()	Antes de 10 horas ()	Antes de 24 horas ()	Antes de 1ra Semana ()	()

PARA TODO VEHICULO	ESTADO	CAMION CISTERNA	ESTADO	CARGADOR FRONTAL	ESTADO
** 1.- Motor	✓	** 1.- Sistema de Freno Emergencia		** 1.- Sistema. Frenos de emergencia	
* 2.- Gata y Llaves de Rueda	✓	** 2.- Compresora sistema de aire		** 2.- Botellas Hidráulicas	
** 3.- Luces Direccionales y de Emergencia	✓	** 3.- Descarga a tierra		3.- Cucharon y Puntas	
** 4.- Cinturon de Seguridad	X	** 4.- Válvulas		4.- Pines y Bocinas	
** 5.- Niveles (Aceite, Agua, Etc)	✓	** 5.- Sistema de tomamesa		EXCAVADORAS	
** 6.- Espejos	✓	** 6.- Acoples sistemas de freno		RETROEXCAVADORAS	
** 7.- Llantas	✓	7.- Acoples-sistemas Eléctrico		** 1.- Rueda guia Esproket	
** 8.- Esparragos y Tuercas	NA	8.- Escaleras y Barandas		** 2.- Botella Hidraulica	
* 9.- Circulina	NA	9.- Gata y llave ruedas		3.- Mandos Finales	
* 10.- Luces Operativas y Micas Limpias	✓	10.- Gatos Mec. de estacionamiento		4.- Orugas y Rodillos	
* 11.- Estribos y Grilletes	X	VOLQUETES		5.- Tomamesa	
** 12.- Aro y pestañas	✓	** 1.- Sistema frenos de emergencia		6.- Pines de Cucharon	
* 13.- Claxon y alarma de retroceso	X	** 2.- Compresor/sistema de aire		7.- Caderas y Zapatas	
* 14.- Panel controles (Velocimetro, Combustible)	X	** 3.- Pin T seguro de la tolva		GRUAS	
* 15.- Asientos	X	** 4.- Pines-Piston de levante		** 1.- Pluma o Brazo - Limit Switch	
16.- Radio de Comunicación	ND	5.- Compuerta		** 2.- Estabilizadores	
17.- Vidrios de ventana y limpiaparabrisa	✓	6.- Gata y llave de ruedas		3.- Ganchos de levante	
* 18.- Llanta de repuesto	✓	7.- Espejos y micas limpias		4.- Lengüeta de seg. de Gancho	
* 19.- Pala y pico	X	8.- Malla o toldera		5.- Valvula de seguridad	
20.- Guardafangos	X	TRACTOR SOBRE ORUGAS		6.- Diagrama de carga	
21.- Estribos y escaleras	NA	** 1.- Mandos finales		7.- Diagrama de señales	
22.- Orden y limpieza en cabina	✓	** 2.- Botellas hidraulicas		ACCESORIOS DE SEGURIDAD	
* 23.- Sistema de direccion	✓	3.- Rueda guia, Sproket		** 1.- Conos de Seguridad	X
* 24.- Sistema de frenos	✓	** 4.- Pines y bocinas		** 2.- Extintor	X
* 25.- Sistema hidraulico	X	5.- Orugas y rodillos		** 3.- Botiquin de Primeros Auxilios	X
* 26.- Sistema de Suspension	X	6.- Zapata		** 4.- Tacos de Seguridad	X
27.- Cable de Remolque	ND	MOTONIVELADORA		** 5.- Cintas Reflectivas	✓
28.- Cable de Energia	ND	** 1.- Mandos Finales		** 6.- Circulina	✓
* 29.- Estado de la bateria	✓	** 2.- Sist. de frenos de emergencia		* 7.- Lampa - Picota - Machete	✓
30.- Medidor de aire	NA	3.- Sistema hidraulico de tomamesa		* 8.- Letreros	✓
* 31.- Asientos	X	4.- Articulacion del escarificador		** 9.- Antepa Periga	✓
* 32.- Tolva	X	5.- Balancin de Direccion		* 10.- Frizada	✓
33.- Otros	X	RODILLOS		** 11.- Kit de Antiderrame	✓
DOCUMENTACION		ESTADO		** 12.- Linterna	✓
** Tarjeta de Propiedad	✓	** 1.- Rola y sistema de aire		** 13.- Pin de Remolque	✓
** SOAT	✓	** 2.- Sist. De Freno de Emergencia		** 14.- Kit de Herramientas	✓
** Revision Tecnica	✓	3.- Limpiador de rola		Nota : Las banderolas solo se usaran durante en el traslado de equipo pesado	
* Cuaderno de Parte Diario	X	4.- Motor de Vibracion			

CONDICIONES PARA OPERAR

** Estos puntos deben de estar operativos al 100% para operar el vehiculo o equipo movil.

* De acuerdo al Turno o tiempo deben estar operativos al 100%

IMELEC S.R.L.

SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE CONSTRUCCION CIVIL

OBSERVACIONES :

OSVALDO CARDENAS VINCHA
GERENTE GENERAL

Jorge Luis Chata
ESPECIALISTA

ROBERTO ROMERO GUERRA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
CIR 62871

<p>ELABORADO POR: Nombre y Apellidos</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">JENNY LIMACHE CRUZ</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">JLC</p> <p>CARGO : CHOFER</p>	<p>REVISADO POR:</p> <p style="text-align: center;">IMELEC S.R.L.</p> <p style="text-align: center;">OSVALDO CARDENAS NUNEZ GERENTE GENERAL</p>	<p>APROBADO POR:</p> <p style="text-align: center;">IMELEC S.R.L.</p> <p style="text-align: center;">FRANCISCO RAMOS FLORES Ingeniero Residente de Obra CIR 96570</p>
---	--	--
