



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"



MEMORANDO N° 395-2020-FONDEPES/DIGENIPAA

A : **ABOG. CARMINA CARRERA AMAYA**
Jefe(a) de la Oficina General de Administración

Atención : **ABOG. GISSELA ZAPATA FLORES**
Coordinador(a) de Logística

Asunto : **VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02 -ENERO 2020**
Obra: "Ampliación de Potencia para el Sistema de Utilización en Media Tensión 22,9 Kv. para el Mejoramiento de los Servicios del DPA en la Localidad de Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar, Región Tumbes".

Referencia : a) Contrato N° 064-2019-FONDEPES
b) Informe N° 024-2020-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/eamr
c) Carta N° 002-2020-HRON

Fecha : Lima, **17 FEB. 2020**

Es grato dirigirme a usted, para saludarle y manifestarle que, de acuerdo con lo indicado en el documento de la referencia b), el Coordinador de la Obra "**Ampliación de Potencia para el Sistema de Utilización en Media Tensión 22,9 Kv. para el Mejoramiento de los Servicios del DPA en la Localidad de Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar, Región Tumbes**", *Edward A. Manrique Rivera*, ha solicitado el pago de la Valorización de Obra N° 02, correspondiente al **Contrato N° 064-2019-FONDEPES – Ejecución de obra**.

El Coordinador presenta como monto final de la Valorización N° 02, la suma de **S/. 148,003.59 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Tres con 59/100 soles)**, inc. IGV, en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista, agregando el reajuste de precios y restando la garantía de fiel cumplimiento de la obra.

Asimismo, conforme a lo solicitado y tal como se indica en el documento de la referencia b), el cual hago mío en todos sus extremos, se han cumplido con todos los requisitos establecidos en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones y su Reglamento, el contrato, las bases integradas y demás documentos que forman parte integrante del expediente de contratación; por lo que esta Dirección concluye que la ENTIDAD debe proseguir con el trámite del pago de la Valorización N° 02 de la Obra, correspondiente al mes de enero del 2020.

Atentamente,

FONDEPES

Jorge Roberto Nahue Siviñchi
Director General de Inversión
Pesquera, Acuicultura y Acuicultura





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

CONFORMIDAD DE PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN DE OBRA


Conste por el presente documento, que el Director de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, al suscribir la presente, da su conformidad para realizar el pago por concepto de **Valorización de Obra N° 02**, correspondiente al mes de **enero del 2020** por la suma de **S/.148,003.59** (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Tres con 59/100 soles) incluido IGV, a favor de la Empresa **VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.**, encargado de la Ejecución de la Obra: **"AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22,9 KV. PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"**, según **CONTRATO N° 064-2019-FONDEPES**.

Lima, **17 FEB. 2020**



FONDEPES
[Handwritten signature]

Jorge Roberto Nahue Sivrichi
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal y Acuicola



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

INFORME N° 022-2020-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/ea

A : ING. JORGE ÑAHUE SIVIRICHI
Director de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

ASUNTO : VALORIZACION DE OBRA N° 02
Obra: "Ampliación de Potencia para el Sistema de Utilización en Media Tensión 22,9 Kv. para el Mejoramiento de los Servicios del DPA en la Localidad de Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar, Región Tumbes".

REFERENCIA : a) Contrato de Obra: N° 64-2019-FONDEPES
b) Carta N° 002-2020-FONDEPES/HRON de fecha 07.02.20

FECHA : Lima, 14 de febrero del 2020

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento la referencia b), a través del cual se remite el Informe de la Valorización de obra N° 02, correspondiente al mes de enero del año 2020 de la Obra "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22,9 KV. PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES", en donde informo lo siguiente:

I. DATOS GENERALES

1.1. Información de la obra

Obra : "Ampliación de Potencia para el Sistema de Utilización en Media Tensión 22,9 Kv. para el Mejoramiento de los Servicios del DPA en la Localidad de Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar, Región Tumbes"

Ubicación :

- Localidad : ACAPULCO
- Distrito : ZORRITOS
- Provincia: : CONTRALMIRANTE VILLAR
- Región : TUMBES

Entidad contratante : FONDEPES
Financiamiento : FONDEPES
Código de proyecto : 2235505
Modalidad de Ejecución : Por Contrato
Sistema de Contratación : Suma Alzada
Denominación del proceso : Adjudicación Simplificada
Fecha Entrega de Terreno : 10/12/2019
Inicio de plazo de Ejecución : 11/12/2019
Término plazo de ejecución : 09/03/2020
Monto del Valor Referencial : S/. 328,733.37
Monto del Contrato de obra : S/. 295,860.04
Factor de relación : 0.90
Plazo de Ejecución de obra : 90 días calendarios

1.2. Información del contratista

Empresa Contratista : VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Representante Legal : Marco Antonio Guty de la Cruz
Dirección : Jirón Zepita N°151 -distrito Baños del Inca - Cajamarca
Contrato : N° 64-2019-FONDEPES
Fecha de Contrato de obra : 26 de noviembre del 2019
Residente de Obra : Henry Flavio Céliz Suárez - CIP 86090.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

1.3. Información de la Supervisión

Supervisor de Obra : Hugo Ricardo Ocaña Navarro
Dirección : Calle Loreto N° 207 – Ica
Contrato : N° 001-2019-FONDEPES-8.UIT
Fecha Contrato Supervisión : 09 de diciembre del 2019
Monto contrato Supervisión : S/. 32,800.00
Plazo Supervisión de Obra : 106 días calendarios
Fecha de inicio de Servicio : 11/12/2019
Fecha término de Servicio : 25/03/2020

II. ANTECEDENTES

2.1. Con fecha 26 de noviembre del 2019, se suscribió el Contrato N°64-2019-FONDEPES, referente a la Ejecución de la Obra.

2.2. Al respecto, la Cláusula Cuarta del Contrato N°64-2019-FONDEPES, indica lo siguiente:

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

"LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a el CONTRATISTA, en periodos de valorizaciones mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases". (...)

De otro lado, Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, menciona en su Artículo 166.- Valorizaciones y metrados, lo siguiente:

(...)

"166.1. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

166.2. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas." (...)

2.3. Con fecha 09 de diciembre del 2019, se suscribió el Contrato N° 001-2019-FONDEPES-8.UIT, referente a la Supervisión de la Obra.

2.4. Mediante Cartas N° 1265 y 1266-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, de fecha 09 de diciembre de 2019, se hace entrega del Expediente Técnico y se comunica al contratista VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L. y al Supervisor ING. HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO que el día 10/12/2019 a las 4:30 pm se realizará la entrega de terreno.

2.5. Con Carta N° 006-2019-VC/CONTRATISTAS SRL-ACAPULCO-DISTRITO DE ZORRITOS de fecha 23.12.2019, el Contratista Ejecutor de la Obra presenta el cronograma valorizado de obra modificado a la fecha de entrega de terreno.

2.6. Mediante Carta N° 001-2019-FONDEPES/HRON-SO, de fecha 15 de diciembre 2019, el Jefe de Supervisión Ing. Hugo Ricardo Ocaña Navarro, emite INFORME N° 001-2019-FONDEPES/HRON-SO de Compatibilidad de Expediente Técnico con el Área de Terreno.

2.7. Mediante el siguiente, se detalla los antecedentes de pago de las valorizaciones de la obra:

N° Valorización	Tipo de pago	Monto S/.	Mes / Año	Fecha recepción de Carta	Coordinador de obra
01	Valorización	13,183.41	Dic / 2019	06/01/2019	Edward A. Manrique Rivera





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

- 2.8. Mediante Carta N° 003-2020/VILLACRUZ CC.SRL, de fecha 01 de febrero del 2020, el Contratista "VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.", presenta a la Supervisión de Obra la valorización N° 02, correspondiente al mes de enero del 2020.
- 2.9. Mediante Carta N° 002-2020-FONDEPES/HRON, de fecha 07 de febrero del 2020, el Supervisor de Obra, Ing. Hugo Ricardo Ocaña Navarro, presenta a la entidad la valorización N° 02, correspondiente a la valorización del mes de enero del 2020, en señal de conformidad, el cual es derivado al suscrito para su trámite correspondiente.

III. BASE LEGAL

- 3.1 Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- 3.2 Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 3.3 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.
- 3.4 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- 3.5 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- 3.6 Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES.

IV. ANÁLISIS

- 4.1. Mediante Carta N° 003-2020/VILLACRUZ CC.SRL, de fecha 01 de febrero del 2020, el Contratista "VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.", presenta a la Supervisión de Obra la valorización N° 02, correspondiente al mes de enero del 2020.
- 4.2. Mediante Carta N° 002-2020-FONDEPES/HRON, de fecha 07 de febrero del 2020, el Supervisor de Obra, Ing. Hugo Ricardo Ocaña Navarro, presenta a la entidad la valorización N° 02, correspondiente a la valorización del mes de enero del 2020, en señal de conformidad e informa que el avance físico de esta valorización es del 76.01%, lo cual hace una valorización acumulada de 80.43% al mes de enero.
- 4.3. De la revisión de la valorización de Obra N°02, presentada por la Supervisión, el Ing. Hugo Ricardo Ocaña Navarro, se ha revisado las fotos de las partidas valorizadas y se ha verificado en obra que no se encuentra in situ el suministro e instalación del equipo Recloser; por lo tanto, el suscrito no lo va a considerar como ejecutado en la presente valorización, la partida en mención es la siguiente:


04.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECONECTADOR DE POTENCIA (RECLOSER), 27KV, 150KV BILL, 630A, INC. ACCESORIOS	und	0.00
----------	--	-----	------

- 4.4. En el siguiente cuadro se muestra la curva S de ejecución de la Obra que el suscrito va a dar conformidad, en donde se aprecia el avance físico acumulado de la obra de 61.51%, con respecto al avance físico programado de 58.00%, se deduce que el avance de obra se encuentra adelantado en un 3.51%.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

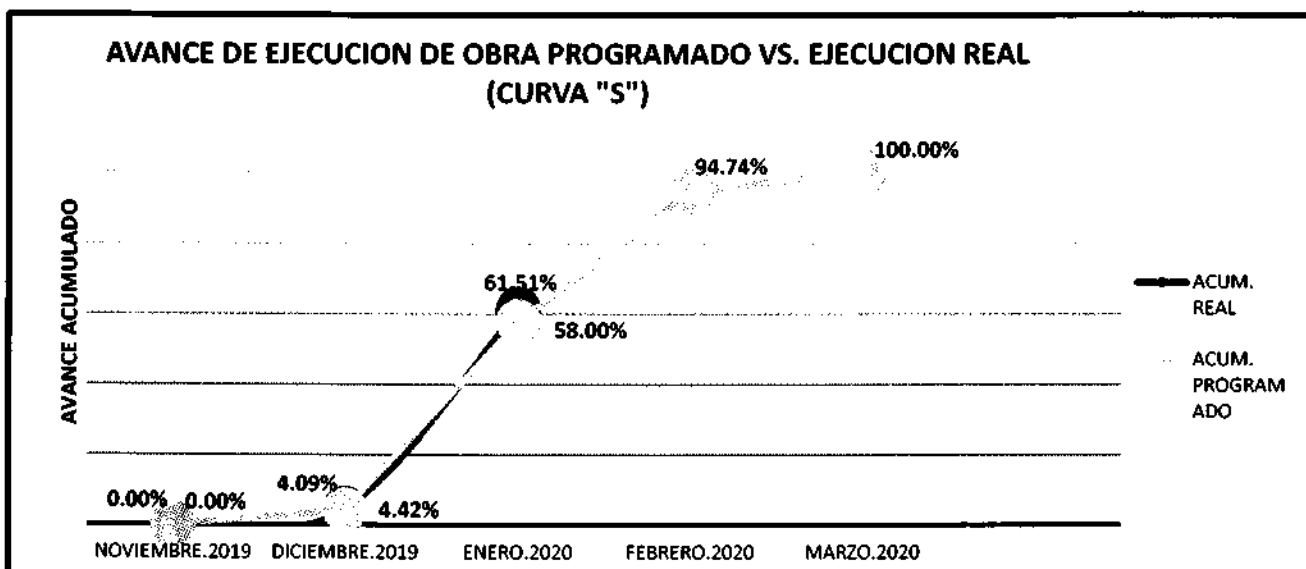

4.5. En el siguiente cuadro de valorización programado de avances del contrato se puede ver que en la valorización N° 02 del mes de enero de 2020, el porcentaje de valorizado acumulado es de 61.51% y el porcentaje pendiente por valorizar es de 38.49%.

		VALORIZACION ANTERIOR	VALORIZACION ACTUAL	VALORIZACION ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
COSTO DIRECTO	210,025.09	9,625.95	124,476.40	134,104.35	83,920.76
GASTOS GENERALES	1000% 21,802.51	962.60	12,447.84	13,410.44	8,382.06
UTILIDAD	500% 10,901.25	481.30	6,223.92	6,705.22	4,195.04
SUB TOTAL	250,728.85	11,069.85	143,150.16	154,220.01	96,598.06
IGV	1800% 45,131.19	1,802.57	25,767.63	27,759.60	17,371.60
MONTO TOTAL OFERTA ECONOMICA	295,860.04	13,872.42	168,917.79	181,979.61	113,880.48
PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL LE RP YRS	100%	4.42%	57.89%	61.51%	38.49%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO LE RP YRS	100%	4.42%	61.51%	61.51%	100.00%

4.6. En el siguiente Cuadro Resumen de la Valorización de Obra N°02, se muestra que el monto total a pagar es de S/.148,003.59, el cual proviene del monto valorizado del mes de enero de S/.168,917.19, sumando el reajuste de precios de S/.1,275.91 y descontando la retención de fiel cumplimiento de S/.22,189.51. Las valorizaciones acumuladas al mes de enero representan un avance del 61.51% del monto contratado, quedando un saldo por valorizar de S/. 113,880.48, equivalente al 38.49% (todos los montos inc. IGV).





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATO	VAL ACUM ANTERIOR	VAL ACTUAL	VAL ACUM ACTUAL	% DE AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION SISTEMA DE UTILIZACION EN 22.9KV DPA ACAPULCO	250,728.85	11,069.85	143,150.16	154,220.01	61.51%	96,508.84
TOTAL CONTRACTUAL	250,728.85	11,069.85	143,150.16	154,220.01	61.51%	96,508.84
% DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA	100.00%	4.42%	57.09%	61.51%		38.49%
REAJUSTES (\$)						
a) Línea Primaria	0.00	102.53	1,081.28	1,183.81		
TOTAL REAJUSTE	0.00	102.53	1,081.28	1,183.81		
DEDUCCION DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR A.D (D)						
a) Líneas Primarias, Redes Primarias	0.00	0.00	0.00	0.00		
b) Redes Secundarias	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL DEDUCCION DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE A.D	0.00	0.00	0.00	0.00		
AMORTIZACION (A)						
Amortización del Adelanto Directo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortización del Adelanto para Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		
VALORIZACION NETA (VN=VA-A-D)	250,728.85	11,172.38	144,231.44	155,403.82		
MULTA POR ATRASO DE OBRA (M)		0.00	0.00	0.00		
OTRAS MULTAS DISTINTAS POR MORA		0.00	0.00	0.00		
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
En efectivo (VN-M)	250,728.85	11,172.38	144,231.44	155,403.82		
En IGV (VN x 18%)	45,131.19	2,011.03	25,981.66	27,972.69		
MONTO TOTAL CON IGV	295,860.04	13,183.41	170,193.10	183,376.51		
Retencion De Fiel Cumplimiento (7.50%)	29,586.01	7,396.50	22,189.51	29,586.01		
TOTAL COMPROMISO			148,003.59			

4.7. El avance de obra real acumulado con respecto al avance acumulado programado, está por encima del 80% del avance de obra programado; exigido en el Art. 203 inciso 203.1 del RLCE vigente.

4.8. De acuerdo a la Clausula Séptima del contrato suscrito, el contratista VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L., solicitó la retención del 10% del monto contratado, de forma prorrateada en sus valorizaciones, por concepto de garantía de fiel cumplimiento.

DESCRIPCIÓN	RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO	ACUMULADO ANTERIOR	VAL. ACTUAL V-1_DIC 2019	ACUMULADO ACTUAL	SALDO
Retención (Fiel Cumplimiento 10%)	S/. 29,586.01	S/. 7,396.50	S/. 22,189.51	S/. 29,586.01	S/. 0.00





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

4.9. Con respecto a los seguros, el contratista presenta las siguientes pólizas de seguro:

POLIZA	N° DE POLIZA	VIGENCIA	
		INICIO	FIN
POLIZA CAR	2312022000002	11/12/2019	09/03/2020
POLIZA SCTR PENSION	5633910	11/01/2020	11/02/2020
POLIZA SCTR SALUD	5607061	11/01/2019	11/02/2020

V. PENALIDADES

5.1. En el mes de enero del 2020, la Supervisión de la obra no reporta a la Entidad penalidades por cobrar al contratista ejecutor de la obra.

Se precisa que el cálculo de penalidades por aplicar al contratista ejecutor de la obra, es permanente, pudiendo cobrarse en la siguiente valorización o en la liquidación final de contrato.

VI. CONCLUSIONES

6.1. La presente valorización cuenta con la conformidad del suscrito, quien informa que el monto pagar por la valorización N°02 de Obra es total a pagar es de S/.148,003.59 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Tres con 59/100 soles), el cual proviene del monto valorizado del mes de enero de S/.168,917.19, sumando el reajuste de precios de S/.1,275.91 y descontando la retención de fiel cumplimiento de S/.22,189.51.

6.2. El suscrito, al haber comprobado que el contratista ha cumplido con entregar lo indicado en la Normativa, relación contractual vigente, y en los plazos previstos, se considera PROCEDENTE el pago de la valorización N° 02.

VII. RECOMENDACIONES

7.1. Se sugiere transferir al contratista de obra la suma de S/.148,003.59 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Tres con 59/100 soles).





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

7.2. Cumplidos los requisitos establecidos en la normativa y la relación contractual vigente, se recomienda que el Director de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, otorgue la conformidad correspondiente, para que la entidad proceda con el pago de Valorización de Obra N° 02, correspondientes al mes de enero del 2020, dentro los plazos legales establecidos.

Es todo cuanto tengo que informar para los fines que estime convenientes.
Atentamente;


Edward Manrique Rivera
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 77186

Visto el Informe N° 022-2020-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/eamr que antecede, el Coordinador de Obras, Equipamiento y Mantenimiento de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, lo hace suyo, disponiendo su derivación a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola con sus respectivos antecedentes, para su conocimiento y atención correspondientes.


FONDEPES
Ing. Luis A. Viquez Chavarry
COORDINADOR DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

IV. REVISIÓN TÉCNICA					
DESCRIPCIÓN		REVISIÓN			OBSERVACIONES
MARQUE CON UN (✓) SI SE CUMPLE CON EL CRITERIO DE REVISIÓN O UNA (X) SI SE INCUMPLE					
16	Presenta valorización de obra debidamente fundamentada y correspondiente al mes valorizado (por partidas y/o especialidades)	✓			Folios 196 - 198
17	Presenta resumen consistente de la valorización mensual	✓			Folio 199
18	Presenta debidamente fundamentado la aplicación del cálculo de reajuste autorizado	✓			Folio 191-192
19	Resumen de valorizaciones de obras ejecutadas correspondiente al mes valorizado y consistente a los requisitos 15, 16 y 17	✓			Folios 199
20	Presenta debidamente fundamentada la aplicación de índices unificados	✓			Folios 128-131
21	Presenta debidamente fundamentada la aplicación de la fórmula Polinómica	✓			Folios 191-192
22	Presenta de manera consistente la deducción por adelanto de materiales	-			No corresponde.
23	Presenta de manera consistente amortización de Adelanto de Materiales	-			No corresponde.
24	Presenta gráfico de la curva "S" (mensual) debidamente fundamentado y reflejando lo valorizado	✓			Folio 187
25	Presenta recibos pago de ESSALUD correspondiente al periodo valorizado	✓			Folio 01
26	Presenta recibo de pago CONAFOVICER correspondiente al periodo valorizado	✓			Folio 05.01-05.02
27	Presenta constancia de no adeudo de SENCICO correspondiente al periodo valorizado	✓			Folio 127-128
28	Presenta copia legible del cuaderno de obra correspondiente al periodo valorizado	✓			Folios 148-168
29	Presenta panel fotográfico y/o evidencia filmica correspondiente a los trabajos ejecutados y consignados en la valorización	✓			Folios 65-88
30	Presenta informe mensual de seguridad correspondiente al periodo valorizado	✓			Folios 06-57
31	Presenta protocolos de pruebas correspondientes al periodo valorizado	✓			Folios 58-64
32	Presenta fichas y/o hojas técnicas de materiales utilizado en el periodo valorizado	✓			Folios 134-142
33	Presenta fichas y/o hojas técnicas de materiales, equipos y equipamientos utilizado en el periodo valorizado	✓			Folios 64.1-64.6
34	Aplica el cálculo de penalidades al periodo valorizado	-			No se aplicó
35	El contrato y/o contratista de la obra se encuentra apercebido	-			No corresponde
36	El proyecto cuenta con certificación presupuestal	✓			
37	El proyecto cuenta con Compromiso Anual	✓			

8

V. CONCLUSIONES		
DESCRIPCIÓN	ESTADO	
La valorización cuenta con la conformidad del Coordinador de Obra, quien reporta un avance físico de 57.09%, encontrándose la obra adelantada en 4.42% con respecto al avance programado de 57.09 %.	En ejecución.	
ESPECIALISTA	N° COLEGIATURA	FIRMA Y SELLO
Ing. Edward A. Manrique Rivera	CIP N° 77195	Edward Manrique Rivera INGENIERO CIVIL CIP. N° 77195



Ministerio de la Producción



Usuario: usuario_obras56

Fecha: 17/02/2020

Hora: 12:34



05047789

CARGO 00420-2020-FONDEPES/AOEM

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

Asunto: CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02- AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 22.9 KV PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO

Referencia: INFORME 00022-2020-FONDEPES/EAMR

Fecha: 17/02/2020

Observación: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A OGA

Fecha de Plazo:

Atentamente,




AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO



3017042	
N° DOC:	00001521-0020
CLAVE:	6777
USUARIO:	Jruelas
FECHA Y HORA:	07/02/2020 15:03:26
TELÉFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	

223

Zorritos, 07 de Febrero de 2020

CARTA N°002-2020- FONDEPES/HRON

SEÑOR : ING EDWARD MANRIQUE
Jefe de Obras - FONDEPES

ASUNTO : VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02

REFERENCIA : OBRA "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9 KV. PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES".

De mi especial consideración:

Por intermedio de la presente me es grato dirigirme a Usted, a fin de alcanzarle el **INFORME N°002-2020-FONDEPES/HRON**, correspondiente a la **VALORIZACION DE OBRA**, remitido por la empresa Villacruz Contratista S.R.L mediante carta N° 003-2020/VILLACRUZ CC.SRL.

En espera de la atención que se merezca, me suscribo de Ud. sin antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Adjunto:

Informe N° 002-2020-FONDEPES/HRON
Carta N° 003-2020/VILLACRUZ CC.SRL
Factura E001-30 emitido por Villacruz Contratistas SRL.
Informe N° 02-2020-VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL (2 originales y una copia)
Archivo de valorización N° 02 en CD.

Atentamente;


HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

INFORME N°002-2020 -FONDEPES/HRON

A : **ING EDWARD MANRIQUE RIVERA**
Jefe de Obras - FONDEPES

DE : **ING HUGO OCAÑA NAVARRO**
Supervisor de Obra

ASUNTO : **CONFORMIDAD VALORIZACION N° 02-Enero 2020**

REFERENCIA : **Obra "AMPLIACION DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 22.9 KV. PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE ALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES"**

FECHA : **07/02/2020**

Tengo el agrado de dirigirme a su despacho con la finalidad de remitirle el informe de Valorización de Obra para su conocimiento de la obra **"AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION 22.9 KV. PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"**.

I.-Antecedentes

Mediante contrato N° 001-2019-FONDEPES-8.IUT de fecha 6/12/2019 FONDEPES Contrata los servicios del suscrito como supervisor de la obra **"AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION 22.9 KV. PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES"**.

Mediante carta N°1266-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, de fecha 09/12/2019, se me comunica que la entrega del terreno se celebrara en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Acapulco, el 10/12/2019, hora 16:30 pm.


 HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

Con fecha 11/12/2019 se da inicio a plazo contractual de la Obra.

Con fecha 02/02/2020, Enosa remite carta NTM. 004.2020/ENOSA, donde autoriza el inicio de obra. ✓

Con fecha 01/02/2020, se recibe la carta N°003-2020/VILLACRUZ CC.SRL, con el asunto: Valorizado N°02 de Obra – ENERO 2020 ✓

II.- Análisis


Se realizó el análisis del Informe de valorización N°02 – Enero 2020, en atención a la carta N° 03-2020/VILLACRUZ CC.SRL de empresa Villacruz Contratistas SRL, recepcionado el 01/02/2020, donde adjunta el Informe de Valorización N° 02, Informe que ha sido revisado y se ha concluido que se encuentra CONFORME, la misma que derivó a la entidad a fin de proseguir con los trámites y obligaciones correspondientes. ✓


Las partidas se encuentran ejecutadas de acuerdo al cronograma de valorización y conforme al expediente técnico y especificaciones técnicas.

Avance de Ejecución de la Obra:

AVANCES MENSUALES DE OBRA				
	DIEMBRE 2019	ENERO 2020	FEBRERO 2020	MARZO 2020
REAL	4.42%	76.01%		
PROGRAMADO	4.00%	53.91%	36.74%	5.29%
AVANCES ACUMULADOS				
	DIEMBRE 2019	ENERO 2020	FEBRERO 2020	MARZO 2020
ACUM. REAL	4.42%	80.43%		
ACUM. PROGRAMADO	4.00%	58.00%	94.74%	100.00%

AVANCE DE EJECUCION DE OBRA PROGRAMADO - REAL
CURVA "S"

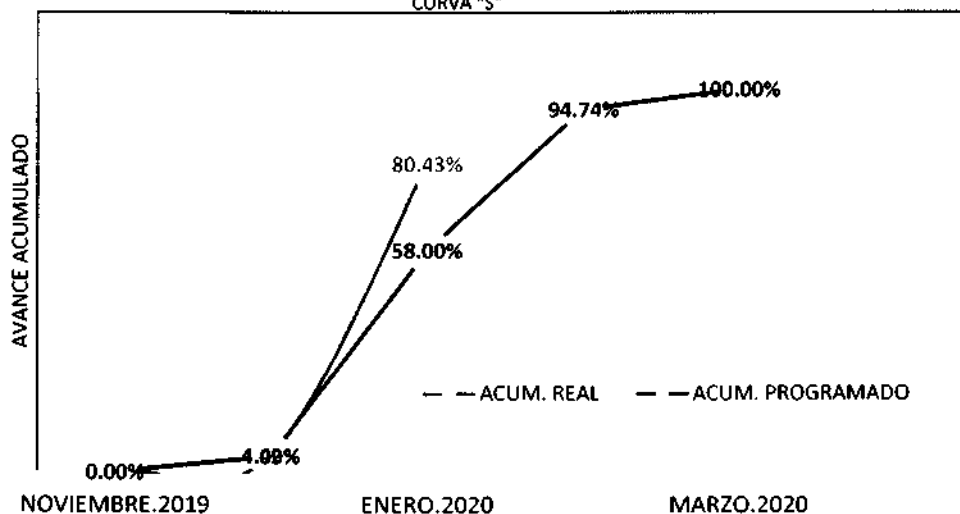


 HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

III.-Conclusiones


La obra se encuentra con un avance acumulado real ejecutado de 80.43% y el avance acumulado programado vigente es de 58.00%, concluyéndose que la obra se encuentra adelantada con un 22.43% sobre el avance programado acumulado del total de la obra.

Recomendaciones

- Se recomienda Aprobar la valorización N°02 Enero 2020, y a la entidad dar el trámite correspondiente para que realice el pago a la contratista.

Es todo cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente;



HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

ANEXO**MES: ENERO DEL 2020****GENERALIDADES**

Obra : AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505"

Entidad Contratante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Localidad : ACAPULCO

Distrito : ZORRITOS

Provincia : CONTRALMIRANTE

Departamento : TUMBES

I.- DATOS GENERALES

1.1 Contrato de Obra : N° 064-2019-FONDEPES

1.2 Fecha de Suscripción : 26.Noviembre.2019

1.3 Contratista de Obra : Villacruz Contratistas SRI

1.4 Monto del Contrato de Obra (con IGV) : 295,860.04

1.5 Supervisor de Obra : ING° HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO

1.6 Contrato de Supervisión N° : 001-2019-FONDEPES-8.UIT

1.7 Fecha de Suscripción : 09/12/2019

1.8 Monto del Contrato de Supervisión (con IGV) : 32,800.00

1.9 Cantidad : 32,800.00 Unidad de Medida SOLES

1.10 Plazo de Ejecución : 90 días calendarios

1.11 Monto del Adelanto (con IGV) : No Aplica

1.12 Fecha : No Aplica

1.13 Fecha entrega de terreno : 10/12/2019

1.14 Fecha contractual inicio de obra : 11/12/2019

1.15 Fecha de término Contractual : 09/03/2020

1.16 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento : REMYPE

Monto : 29,586.01

Entidad Financiera :

Vigencia hasta :

1.17 Carta Fianza Adelanto Directo : No Aplica

Monto :

Entidad Financiera :

Vigencia hasta :

1.18 Carta Fianza Adelanto Materiales : No Aplica

Monto :

Entidad Financiera :

Vigencia hasta :

1.19 Carta Fianza por la Diferencia de la Oferta : No Aplica

Monto :

Entidad Financiera :

Vigencia hasta :

1.2 Ampliaciones de Plazo : No Aplica

R.G.G. N° : Fecha:

N° de días : Hasta

Desde :

Monto (con IGV) : %

1.21 Adicionales de Obra : ---

R.J. N° : Fecha:

N° de días : Hasta

Desde :

Monto (con IGV) : %

Incidencia acumulada : %

1.22 Deductivos de Obra : ---

R.J. N° : Fecha:

N° de días : Hasta


Desde :

Monto (con IGV) : %

Incidencia acumulada : %

II.- SITUACIÓN DE LA OBRA**2.1 ASPECTOS TECNICOS**

2.1.1 1. Situación de la Obra al mes de : Enero - 2020



 HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

ANEXO

MES: ENERO DEL 2020

Durante la ejecución de la obra en presente mes de Enero del 2020, No se presentaron dificultades, circunstancias por las cuales se delimito el área de trabajo con cinta reflectiva de seguridad para impedir el paso de personas ajenas a los trabajos y se ha ejecutado las partidas sin ningun incidente

2.1.2	2. Avance programado vigente	:	53.91%
2.1.3	3. Avance ejecutado al mes	:	76.01%
2.1.4	4. Avance progr. Acum. al mes	:	58.00%
2.1.5	5. Avance ejec. Acum. al mes	:	80.43%
2.1.6	6. Situación actual de la obra	:	
		Normal :	
		Atrasada :	
		Adelantada :	22.10%
2.1.7	Plan de Trabajo	:	Todas las actividades contractuales son verificadas y autorizadas previamente por la Supervisión. Se continuará con la ejecución de las actividades pendientes a fin de lograr el objetivo de la obra de acuerdo a ley.
2.1.8	8. Desarrollo de la Obra	:	
	Aspectos críticos	:	Durante la ejecución de la obra en presente mes de Enero 2020, No se presentaron dificultades, circunstancias por las cuales se delimito el área de trabajo con cinta reflectiva de seguridad para impedir el paso de personas ajenas a los trabajos.
	Problemas encontrados	:	La dificultad encontrada es en el acceso al lugar de la obra pues se encuentra en la panamerica Norte, y se tiene que coordinar con la Municipalidad Provincial de Contralmirante, para su intervención en coordinación con la empresa Concesionaria ENOSA S.A. pero ya se ha solucionado en coordinación con las entidades involucradas
	Acciones correctivas tomadas	:	Se ha coordinado con la Municipalidad y la empresa Concesionaria ENOSA S.A., y el FONDEPES para las autorizaciones conforme la normatividad Vigente. Obteniendo así la autorización de INICIO DE OBRA, por parte de la empresa Concesionaria ENOSA S.A.
	Comentarios relevantes	:	se ha tramitado la documentación de los cronogramas valorizados de obra, así como también el informe de Revisión del Expediente técnico. Además de ello se han realizado las pruebas de control de calidad de los equipos instalados
2.1.9	9. Condiciones Meteorológicas	:	la zona del proyecto es caluroso, por lo que se estará usando polos para el personal técnico y obrero de la obra, con el apoyo de sus IPP
2.1.10	Resultado de la inspección y control de Calidad del trabajo	:	se han efectuado los controles de calidad de los equipos, junto con la supervisión de la Obra y la participación de la entidad FONDEPES
2.1.11	Equipo mecánico empleado por el Contratista	:	Ha la fecha se ha empleado Camión Grúa Brazo articulado, Camioneta Pick up
2.1.12	Personal Profesional y técnico empleado por el contratistas	:	han participado el Ingeniero residente, Ing. seguridad, operario, oficial y obreros.
2.1.13	Visitas efectuadas por funcionarios de la DIGENIPAA	:	Ha visitado el Ing. Manrique durante el procedimiento de la entrega de terreno a la contratista y Ing. Ruben Yacolca Cruzado
2.1.14	Organización del Contratista y Recursos empleados en la ejecución de la Obra	:	ha utilizado conforme su plan de trabajo presentado a ENOSA, para la autorización de INICIO DE OBRA
2.1.15	Organización del Supervisor y Recurso empleado o asignado a la Obra	:	ha utilizado conforme su plan de trabajo presentado a ENOSA, para la autorización de INICIO DE OBRA
2.1.16	Información miscelánea	:	No hay
2.1.17	Conclusiones	:	Se espera continuar en los próximos días con las actividades contractuales pendientes, ha fin de concluir la obra y programar la conexión en media tensión y cumplir con el Expediente técnico, aprobado por la entidad contratante y Enosa .
2.1.18	Recomendaciones	:	Dentro de los presupuestos deben considerar medidas de protección frente a condiciones climatológicas adversas (calor), puesto que el gasto que demandan estas actividades para poder continuar con la ejecución de obra tienen una incidencia considerable. se espera la tramitación de la valorización de obra N°02 para el cumplimiento de compromisos con el personal técnico de Obra de acuerdo a ley


 HUGO RICARDO OCAÑA NAVA
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

ANEXO

MES: ENERO DEL 2020

III. ASPECTO ECONOMICO

1. Numero de valorizaciones tramitadas :		02		
2. Numero de valorizaciones pagadas :		00		
3. Valorización del mes :	S/224,888.22		(con IGV),	76.01%
4. Valoriz. acumulada en el mes :	S/237,950.63		(con IGV),	80.43%
5. Monto Pagado acumulado :	S/0.00			
6. Amortizaciones al mes de				
Adelanto directo :	S/ 0.00	(sin IGV)		
Adelanto por materiales :	S/ 0.00	(sin IGV)		
7. Estado de Fianzas Bancarias				
* Fiel cumplimiento		REMYPE		
Vigente :	---	Vencida :	---	Vigente Renovada ---
* Adelanto Directo				
Vigente :	---	Vencida :	---	Vigente Renovada ---
* Adelanto por materiales				
Vigente :	---	Vencida :	---	Vigente Renovada ---


IV ASPECTO ADMINISTRATIVO

4.1 Ingeniero Residente		01
4.2 N° de Operarios Contratados al presente mes :		03
4.3 N° de Obreros Contratados al presente mes :		06
4.4 N° de Jornales acumulados al presente mes :		180
4.5 N° de Horas Hombre H-H (presente mes) :		1440
4.6 N° de Horas Maquina H-M (presente mes) :		5

V ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :

- 5.1 Resumen Ejecutivo
- 5.2 Copias del Cuaderno de Obra
- 5.3 Cuadro Resumen de la Valorización Mensual
- 5.4 Controles de calidad técnica, pruebas y ensayos de laboratorio de acuerdo a las partidas en ejecución y especificaciones técnicas del proyecto con sus respectivas interpretaciones
- 5.5 graficos de avance programado versus ejecutado, explicando las causas que hayan motivado atrasos, si lo hubiera y de las disposiciones tomadas para superarlos
- 5.6 Panel Fotografico de obra
- 5.7 Copia de las Pollzas de seguros (polizas de seguros CAR vigente, Poliza SCTR), con sus respectivos comprobates de pago
- 5.8 Relacion de documentos recibidos
- 5.9 Relacion de documentos emitidos
- 5.10 otros documentos de la VAL N° 02

FIRMA Y SELLO


 HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

SUPERVISOR

Nombre: Hugo Ricardo Ocaña Navarro
 N° de Colegiatura: 60200
 DNI N° 23002079
 FECHA : 06/01/2020

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contralmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

Distrito de Zorritos, 01 de febrero de 2020

CARTA N° 003 - 2020/VILLACRUZ CC. SRL

Srs. : **ING° HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO**
SUPERVISOR DE OBRA
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
LIMA

ASUNTO : Alcanzo Valorización N° 02 de Obra - ENERO 2020.


OBRA : "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505".

Referencia : CONTRATO N°016-2019-GR.CAJ-GGR.


De nuestra mayor consideración:

Por intermedio de la presente, remito a usted para su aprobación la documentación de la Valorización N° 02 - MES DE ENERO 2020, de la ejecución de la Obra: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505" correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Enero de 2020; para lo cual adjunto (02) original y (01) copias, ejecutada por la empresa Contratista: VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L., conforme al contrato N°064-2019-FONDEPES, en concordancia con el expediente aprobado por la Entidad y la empresa Concesionaria ENOSA S.A.

Atentamente,

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.


Marco Antonio Gutierrez de la Cruz
GERENTE GENERAL



HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

CC. Archivo

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
JR. ZEPITA 151
LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20570531787
E001-30

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **04/02/2020**
Señor(es) : **FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO**
RUC : **20137921601**
Dirección del Cliente : **AV. PETIT THOUARS 115
ESQUINA AV PETIT THOUARS
CON 28 DE JULIO LIMA-LIMA-
LIMA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **CTA. DETRACCIONES N° 00-774-
004807**


Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	1	PAGO DE LA VAL. N02 DE LA EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 22,9KV PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRIT	191664.52	0.00

Valor de Venta de Operaciones
Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 191,664.52
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 191,664.52
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 34,499.61
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 226,164.13

**SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO Y
13/100 SOLES**

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.


HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



PERÚ

Ministerio de la Producción

FONDEPES

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERIA ARTESANAL Y ACUICOLA

A.S. : CONTRATO N° 064-2019-FONDEPES, FECHA 26.NOV.2019
 AMPLIACION DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN
 Obra : MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS
 SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA
 LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA
 CONTRAL MIRANTE VILLAR - REGION TUMBES CODIGO UNICO N°
 Ubicación : TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS
 Inspector : ING° HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 Contratista : VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marcos Antonio Ocaña Navarro
DIRECTOR GENERAL



HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. C.I.P. N° 40200

INFORME DEL CONTRATISTA N° 02

SISTEMA DE UTILIZACION EN 22.9KV DPA ACAPULCO: SUMINISTRO Y MONTAJE ELECTROMECAÁNICO

(del 01 de enero al 31 de enero del 2020) *Henry J. Celiz Suarez*
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. C.I.P. N° 86000



PERÚ

Ministerio
de la Producción
FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERIA ARTESANAL Y ACUICOLA
INFORME N° 02-2020-VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.
OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 30, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO -
DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505"

A : ING° HUGO RICARDO OCANA NAVARRO
SUPERVISOR DE OBRA
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

ASUNTO : VALORIZACION DE OBRA N° 02 (del 01 de enero al 31 de enero del 2020)
SISTEMA DE UTILIZACION EN 22.9KV DPA ACAPULCO

REFERENCIA : Adjudicacion Simplificada :CONTRATO N° 064-2019-FONDEPES, FECHA 26.NOV.2019
Obra: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 30, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505"

LOCALIDAD : TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS
Contratista: VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.
supervisor: ING° HUGO RICARDO OCANA NAVARRO

Adjunto al presente remito a Usted, para su aprobación, la documentación de la Valorización N° 02 de la Obra en Referencia, correspondiente al avance (del 01 de enero al 31 de enero del 2020) y cuyos cálculos son los siguientes:

A.- VALORIZACION CONTRACTUAL		
SISTEMA DE UTILIZACION EN 22.9KV DPA ACAPULCO		190,583.24
VALORIZACION CONTRACTUAL (V)=		190,583.24
AVANCE DE OBRA ACUMULADO REAL	80.43%	
AVANCE DE OBRA ACUMULADO PROGRAMADO	58.00%	
B.- REAJUSTES		
SISTEMA DE UTILIZACION EN 22.9KV DPA ACAPULCO		1,081.28
REAJUSTES (R) =		1,081.28
C.- VALORIZACION BRUTA (VB) = V + R		191,664.52
D.- DEDUCCION DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR A.D		
Línea Primaria		0.00
Redes Primarias		0.00
Redes Secundarias		0.00
TOTAL DEDUCCION DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR A.D (D)		0.00
E.- AMORTIZACION DE ADELANTOS		
(D1) Amortización del adelanto directo = 0.10 * V		0.00
(D2) Amortización del adelanto para materiales = 0.20 * V		0.00
AMORTIZACION DE ADELANTOS (AD) =		0.00
F.- VALORIZACION NETA (VN) = VB-AD-D		191,664.52
G.- PENALIDAD POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA		0.00
H.- OTRAS MULTAS DISTINTAS POR MORA		0.00
I.- MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA		
EFFECTIVO (VN - F)		191,664.52
I.G.V. 18% (VN-F)		34,499.61
TOTAL A PAGAR		226,164.13
J.- DESCUENTO AL CONTRATISTA POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO		
7.50% DEL MONTO DEL CONTRATO		22,189.51
K.- MONTO NETO A PAGAR AL CONTRATISTA (I-J)		203,974.62
L.- MONTO A PAGAR		203,974.62

Marco Antonio Gutty de la Cruz
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. 160200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

HUGO RICARDO OCANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

INFORME DE VALORIZACION N° 02


SISTEMA DE UTILIZACION EN 22.9KV DPA ACAPULCO.


(Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Enero de 2020)

CAPITULO I.- GENERALIDADES

1.1 Datos Generales de Obra

I.- FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	
VALORIZACION DE OBRA N° 02	(del 01 de enero al 31 de enero del 2020)
1 Obra	"AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESMARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2335605"
2 Ubicación	TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS
Area Geográfica	1
3 Metas	INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION: SISTEMA DE UTILIZACION EN 22.9KV DPA ACAPULCO
4 Entidad Contratante	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
5 Contratista	VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.
6 supervisor	ING° HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
7 Residente	ING° HENRY FLAVIO CELIZ SUAREZ
8 Financiamiento	Recursos Ordinarios de la Entidad
9 Adjudicación Simplificada	CONTRATO N° 064-2019-FONDEPES, FECHA 26.NOV.2019
10 Modalidad	SUMA ALZADA
11 Presupuesto base, con IGV y Fecha	S/. 328,733.37
12 Presupuesto base, sin IGV y Fecha	S/. 278,567.60
13 Factor de Relación (FR)	0.9000000
14 Monto del contrato, con IGV (18%)	S/. 295,860.04
15 Monto del contrato, sin IGV	S/. 250,728.85
16 Plazo de ejecución, en d. c.	90
17 Plazo de ejecución según Bases Lic., en d.c.	90
18 Prórrogas, días calendario	
19 Adicionales de obra con IGV	S/. 0.00
Adicionales de obra sin IGV	S/. 0.00
20 Deductivo de obra con IGV	S/. 0.00
Deductivo de obra sin IGV	S/. 0.00
21 Fecha de Firma de Contrato de obra	28-Nov-19
22 Reconocimiento de mora Firma Contrato	
23 Comp.Gastos Incump. entrega terreno	
24 Intereses por Mora, con IGV	
25 Intereses por Mora, sin IGV	
26 Mayor Gastos Gral. prorroga plazo, c/IGV	
27 Mayor Gastos Gral. prorroga plazo, s/IGV	
28 Adelanto directo con IGV (18%) y fecha de pago	S/. 0.00
29 Adelanto directo sin IGV y fecha de pago	S/. 0.00
30 Primer Adelanto para materiales, con IGV	S/. 0.00
31 Primer Adelanto para materiales, sin IGV	S/. 0.00
32 Entrega de terreno	10-Dic-19
33 Inicio oficial de plazo	11-Dic-19
34 Término del plazo de obra contractual	09-Mar-20
35 Nueva fecha de término del plazo de obra contractual	
36 Ampliación N° 1 plazo de obra para Adicionales N° 1	
37 Término vigente programado de obra	09-Mar-20
38 Término Real de obra	
39 Constatación Física	
40 Levantamiento de Observaciones	
41 Acta de Recepción de Obra	
42 Avance Real Mensual de la Obra	76.01%
43 Avance Programado Mensual de la obra	53.91%
44 Avance de la obra respecto al programado	141.01%
45 Avance Real Acumulado DE LA OBRA TOTAL	80.43%
46 Avance Programado Acumulado DE LA OBRA TOTAL	58.00%
47 Avance de obra respecto al programado	138.68%
48 Situación de la obra respecto del avance	OBRA ADELANTADA

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

 Marco Antonio Gutierrez de la Cruz
 GERENTE GENERAL


 HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 80204

31 de Enero de 2020

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
 OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contralmirante - Tumbes
 E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

1.2 Plano de Ubicación de Obra.

El plano de ubicación del proyecto, es coincidente con la realidad donde se va a ejecutar la obra, pero con recomendaciones al momento de realizar el montaje de la Obra del INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION: SISTEMA DE UTILIZACION EN 22.9KV DPA ACAPULCO.

1.3 Metas del Proyecto.

El proyecto denominado "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505". Que comprende el diseño, cálculo y seleccionamiento electromecánico de un tramo de red aérea con estructura y poste de concreto para la estructura de seccionamiento, medición y protección y un tramo subterráneo hasta la subestación del tipo caseta con celdas autosoportadas de remonte, llegada y de transformación, con un transformador de 315 kVA, con un nivel de tensión eléctrica de 22.9 kV trifásico, comprende lo siguiente:

- Acondicionamiento de punto de entrega estructura P1 según plano SU-DA-01.
- Estructura de seccionamiento, medición y protección que tendrá seccionadores tipo Cut-Out 36kV, 170 kV BIL, 100 A, 10 kA, con una línea de fuga de 900 mm y con fusible del tipo chicote "K" de 20 Amp, que se adicionarán a un extensor de línea de fuga de 28 kV, con una línea de fuga de 705 mm, un trafomix de 03 bobinas de tensión y corriente; una relación de corriente de 7.50-15/5 A y un reconectador (recloser) RECLOSER, de apertura con carga, 630 A, 27 kV, 12.5 kA, 150kV BIL, con mando eléctrico.
- Tendido subterráneo, con conductor del tipo N2XSY de 18/30kV de 50 mm² de una longitud aproximada de 135 metros lineales.
- Tendido aéreo, con conductor del tipo AAAC de 50 mm² de una longitud aproximada de 28 metros.
- Subestación Tipo caseta con celda de protección y transformación.
- Acondicionamiento de tablero autosoportado para baja tensión con cable N2XOH.
- Sistema de Puesta a tierra con pozos del tipo vertical para la estructura de Protección y en cada estructura del recorrido de red primaria y en la subestación tipo caseta. La puesta a tierra será del tipo vertical.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO

Villaacruzcontratistas_srl@hotmail.com

Cel. 976581927 - 976761313 - 957992277

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, **Teléfonos:** 976581927 - 976761313 - 076 284107

CAPITULO II.- CONTROL ADMINISTRATIVO

2.1 Coordinación de la Obra con el Ministerio de Trabajo.

El contratista está trabajando conforme la normatividad del ministerio de trabajo y Promoción del Empleo, de acuerdo a la fecha del inicio de su plazo contractual, para cuyo efecto se tiene que pagar los tributos conforme a ley con conforme el avance de ejecución de la Obra.

2.2 Instalación de Medio de Comunicación en Obra.

Por estar la obra en un lugar rural la comunicación es continua con el Inspector de Obra y los responsables de la ejecución de la obra, en lo cual nos comunicamos con teléfonos celulares movistar, Entel, Bitel y Claro, otras señales no acceden a esta zona.

2.3 Implementación de Medidas de Seguridad a Trabajadores.

Todo el personal cuenta con sus respectivas pólizas de seguro, así como con sus respectivos IPPs y EPPs.

El contratista prioriza la utilización de indumentaria de seguridad al personal; asimismo en el Plan de Seguridad y Cuidado Ambiental, así como ponerlo en práctica.

2.4 Personal de Obra y Personal Administrativo.

La Relación de personal que trabajó en el mes de enero de 2020, es el siguiente:

POR LA ENTIDAD:

SUPERVISOR DE OBRA

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.

Supervisor: ING° HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO, quien representa al FONDEPES.

POR LA EMPRESA EJECUTORA: VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL:

Residente de Obra : Ing. Henry Flavio Celiz Suarez.

Maestro de Obra : Tec. Luis Pepito Vásquez Ruiz

Referente de Seguridad : Ing. Joel Zamora Ramírez

Adjunto del Residente de Obra : Ing. Kenny Villalobos Vega

SE ADJUNTA PERSONAL DE PÓLIZA SCTR SALUD Y PENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
 HENRY FLAVIO CELIZ SUAREZ
 GERENTE GENERAL

Henry Flavio Celiz Suarez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

Villacruzcontratistas_srl@hotmail.com

Cel. 976581927 – 976761313 - 957992277

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contralmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

SCTR PENSIONES Póliza 5633910 SCTR SALUD Contrato 5607061

PERSONAL ASEGURADO

SEDE: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS

Nro	NOMBRES	PATERNO	MATERNO	TIPODOC	NRODOC
1	WALTER	BALCAZAR	LADINES	DNI	00327187
2	JOSE DAVID	BALCAZAR	PIZARRO	DNI	73433796
3	VICTOR ALEXIS	BALCAZAR	ZAPATA	DNI	73622462
4	HENRY FLAVIO	CELIZ	SUAREZ	DNI	41996543
5	SANTOS PORFIRIO	DESA	MARIN	DNI	80458439
6	FREDDY DANIEL	GUTIERREZ	MARCANO	DNI	31083070
7	MARCO ANTONIO	GUTTY	DE LA CRUZ	DNI	44988244
8	YORMAN JOSUE	MONTILLAS	CAMPOS	DNI	22940342
9	WILLIAN REYNALDO	RAMIREZ	DIOSES	DNI	00247841
10	EDGAR ALEXIS	RONDON	X	DNI	11189454
11	OMANGEL	SANCHEZ	SERRA	DNI	22871074
12	KENNY	VILLALOBOS	VEGA	DNI	04195876
13	JOEL	ZAMORA	RAMIREZ	DNI	16720966
14	JAIME ROLANDO	ZAPATA	BENTES	DNI	03380937
15	GUIDO ALEXANDER	ZAPATA	BENTES	DNI	40895426

DICHO PERSONAL SE ENCUENTRA ASEGURADO EN LA PÓLIZA SE SEGUROS N° 5633910 – PENSIONES y N° 5607061 – SALUD, VIGENCIA DEL 11/01/2019 AL 10/01/2020 y del 11/01/2020 al 11/02/2020.

8.3 Movilidad:

01 Camioneta marca Toyota 4x4, color negro Placa T8Y-832 entre otras unidades necesarias para el trabajo.

Henry Flávio Celiz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 1348390

2.5 Frente de Trabajo

Actualmente se cuenta con 02 frentes de trabajo, conformado por un promedio de 6 trabajadores, por cada frente de trabajo, quienes realizan labores de campo referente a las actividades programadas de la ejecución de la Obra.

Lo que se enmarca en la ejecución de la obra: " AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO – DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR – REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505".

La relación de personal que interviene en el desarrollo de los trabajos es el consignado en la póliza de seguro.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Celiz de la Cruz
GERENTE GENERAL

Villacruzcontratistas_srl@hotmail.com

Cel. 976581927 – 976761313 - 957992277

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, **Teléfonos:** 976581927 - 976761313 - 076 284107

CAPITULO III.- CONTROL DE AVANCES DE OBRA

3.1 Control de Avance Físico

3.1.1 Programación de Obra.

Presentación del Calendario de Avance de Obra valorizado actualizado a la fecha de inicio de la prestación para el INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION: SISTEMA DE UTILIZACION EN 22.9KV DPA ACAPULCO: suministro y montaje electromecánico de fecha 11/12/2019 y término el 09/03/2020, contabilizando un plazo de 90 días calendarios como plazo contractual, solicitado a la supervisión con carta N° 04-2019-villacruz contratistas de fecha 26.12.2019.

3.1.2 Descripción de los Trabajos Realizados en el Periodo

Los trabajos realizados en el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020, para los cuales tenemos los siguientes metrados ejecutados:

METRADOS EJECUTADOS DE VALORIZACIÓN N° 02 DE OBRA			
INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION: SUMINISTRO Y MONTAJE ELECTROMECHANICO			
PROYECTO	"AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505"		
DISTRITO	TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS		
PROVINCIA	: CONTRALMIRANTE	VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.	
DEPARTAMENTO	: TUMBES	Marco Antonio Gutty de la Cruz	
EJECUTOR:	VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.	GERENTE GENERAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADOS EJECUTADOS
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.01	TRANSPORTE DE MATERIALES ELECTRICOS LIMA- TUMBES	est	1.00
1.02	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA	km	0.11
1.03	CARTEL DE OBRA	U	0.00
2.00	OBRAS PROVISIONALES		
2.01	INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL PARA LA EJECUCION Y SUPERVISION (OFICINAS Y ALMACEN)	m2	0.00
2.02	SS.HH. PORTATILES	glb	0.50
2.03	AGUA PARA LA OBRA	glb	0.50

Villacruzcontratistas_srl@hotmail.com

Cel. 976581927 - 976761313 - 957992277

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
 OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
 E-mail Empresa: villacruzcontratistas.srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

2.04	ENERGÍA PARA LA OBRA	glb	0.50
3.00	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
3.01	ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ELECTRICO	glb	0.00
3.02	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ELECTRICO	jgo	4.00
4.00	INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION		
4.01	PUNTO DE DISEÑO, PROTECCION Y MEDICION		
04.01.01	ARMADO Y CONEXION DE PUNTO DE DISEÑO	glb	0.50
4.02	PUNTO DE PROTECCION Y MEDICION		
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE C.A.C. 15/400/210/435 Y ACCESORIOS	und	1.00
04.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE FERRETERIA ELECTRICA (ARMADO PMI)	und	1.00
04.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONADORES TIPO CUT-OUT, 36 KV, 100A, 170 KVBIL, INC. EXTENSOR DE LINEA DE FUGA	und	1.00
04.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECONECTADOR DE POTENCIA (RECLOSER), 27KV, 150KV BILL, 630A, INC. ACCESORIOS	und	0.75
04.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAFOMIX TRIFASICO, RELACION 22.9/0.23 KV, 10-20/5A, 60HZ, CLASE 0.2S	und	0.00
04.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA MULTIFUNCION, INC. MURETE, CAJA PORTAMEDIDOR Y CABLE.	und	0.00
4.03	RED SUBTERRANEA		
	VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.		
	Marco Antonio Guay de la Cruz GERENTE GENERAL		
04.03.01	EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60 x 1.10m (ANCHO x PROF.) TERRENO SEMIROCOSO	m3	66.66
04.03.02	EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60 x 1.05m (ANCHO x PROF.) TERRENO SEMIROCOSO	m3	3.78
04.03.03	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS	m	124.00
04.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	18.97
04.03.05	CORTE, ROTURA Y REPOSICION DE ASFALTO	m	6.00
04.03.06	CORTE, ROTURA Y REPOSICION DE CONCRETO PARA VEREDA	m	96.00
04.03.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE 4 VIAS (INCLUYE SOLADO)	und	6.00
04.03.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P Ø 100mm	m	95.00
4.04	BUZONES		
01.05.01	BUZON DE CONCRETO DE 1.00x1.00x1.55m (LADO x LADO x PROF.)	und	2.00
4.05	CABLES Y CONDUCTORES		

Villacruzcontratistas_srl@hotmail.com

Cel. 976581927 - 976761313 - 957992277

HUGO RICARDO OCAÑA NAVA
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
 OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
 E-mail Empresa: villacruzcontratistas.srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

04.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE N2XSY 18/30 KV DE 50mm2	m	372.00
04.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO TIPO AAAC-50mm2, CON GRASA	m	81.00
04.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE N2XH 4-1x300mm2	m	15.00
4.06	TERMINALES TERMOCONTRAIBLES		
04.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL TERMOCONTRAIBLE P/USO EXTERIOR 25KV.	kit	3.00
04.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL TERMOCONTRAIBLE P/USO INTERNO, 25KV.	kit	1.00
4.07	EQUIPAMIENTO DE SUBESTACION		
04.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS MODULARES TIPO COMPACTAS 24KV, 630A, 20KA	glb	1.00
04.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE TRANSFORMACION Y TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 315KVA, 22.9/0.40-0.23KV, GRUPO DE CONEXION YNyn6	und	1.00
04.07.03	CONEXION DE CABLE BT DE 300mm2 AL TRANSFORMADOR	und	0.00
4.08	POZO PUESTA A TIERRA		
04.08.01	POZO A PUESTA TIERRA, DE MT EN SUBESTACION R<25 OHMIOS	und	0.50
04.08.02	POZO A PUESTA TIERRA, DE NEUTRO DE BT R<15 OHMIOS	und	0.50
04.08.03	POZO A PUESTA TIERRA, EN PUNTO DE MEDICION R<25 OHMIOS	und	1.00
04.08.04	POZO A PUESTA TIERRA, P/MEDIDOR DE ENERGIA R<03 OHMIOS	und	1.00
04.08.05	POZO A PUESTA TIERRA, P/RECLOSER, R<25 OHMIOS,	und	1.00
04.08.06	CONDUCTOR DE CU 1x95mm2. DESNUDO	m	10.00
04.08.07	CONDUCTOR DE CU 1x50mm2. DESNUDO	m	10.00
4.09	SEÑALIZACION		
04.09.01	SEÑALIZACION DE PUESTA A TIERRA	und	2.00
04.09.03	SEÑALIZACION DE BUZONES ELECTRICOS	und	0.00
4.1	EQUIPOS DE PROTECCION Y MANIOBRAS		
04.10.01	EQUIPOS DE PROTECCION Y MANIOBRAS DE MEDIA TENSION	glb	0.00
4.11	PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO		
04.11.01	COSTO DE CONEXION Y ENERGIZACION DE LA RED	glb	0.00
04.11.02	PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO	glb	0.00
04.11.03	EXPEDIENTE TECNICO FINAL CONFORME A OBRA	und	0.00
4.12	VARIOS		
04.12.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE FIERRO C/PLATINA 1 1/4" x 3/16", DUCTO DE VENTILACION	m2	0.00
04.12.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA ESTRIADA LAC 3/16" DE ESPESOR SOBRE PERFIL ANGULAR	m2	0.00
04.12.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE MALLA DE ACERO GALVANIZADO	m2	0.00

Henry J. Celis Suarez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Hugo S. Navar y de la Cruz
 GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas.srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107


3.1.3 Porcentaje de Avance Real del Periodo y Porcentaje de Avance Acumulado

AVANCE FISICO (PROGRAMADO VS. REAL)

La obra a la fecha, tiene un avance programado acumulado a la fecha del 58.00% Y UN AVANCE REAL EJECUTADO DE 80,43%, por lo que la obra SE ENCUENTRA ADELANTADA a su normal ejecución, estando a un 22.43% sobre el avance programado acumulado del total de la obra, según Calendario de Avance de Obra valorizado actualizado y modificado a la fecha de inicio de la ejecución de la Obra para el suministro y montaje electromecánico: SISTEMA DE UTILIZACION EN 22.9KV DPA ACAPULCO.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION DE LA OBRA

AVANCES MENSUALES DE OBRA				
	DICIEMBRE 2019	ENERO 2020	FEBRERO 2020	MARZO 2020
REAL	4.42%	76.01%		
PROGRAMADO	4.09%	53.91%	36.74%	5.26%
AVANCES ACUMULADOS				
	DICIEMBRE 2019	ENERO 2020	FEBRERO 2020	MARZO 2020
ACUM. REAL	4.42%	80.43%		
ACUM. PROGRAMADO	4.09%	58.00%	94.74%	100.00%

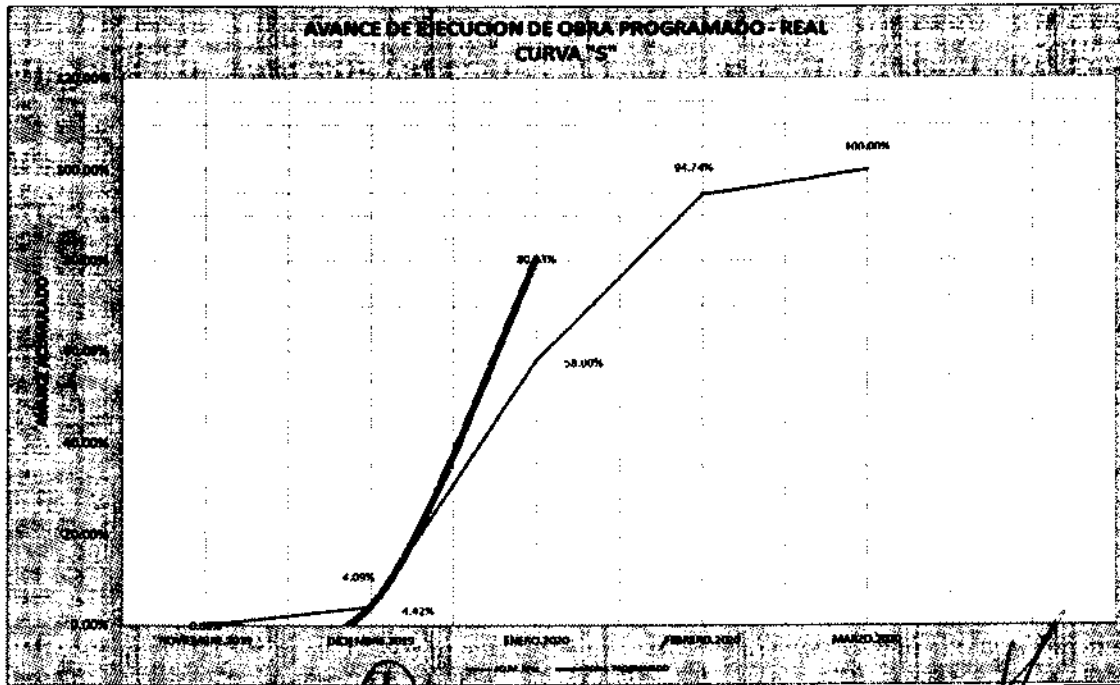

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Marco Antonio de la Cruz
GERENTE GENERAL

Hugo Ricardo Ocaña Navarro
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA

Villacruzcontratistas srl@hotmail.com


Cel. 976581927 - 976761313 - 957992277

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

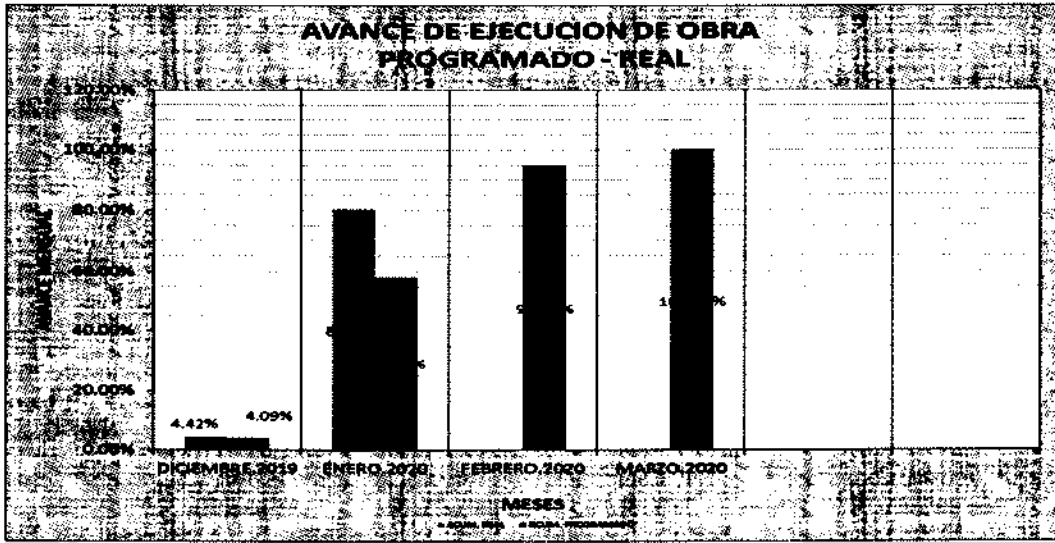

CAPITULO IV.- CONTROL TÉCNICO DE OBRA

Obras Provisionales.

- Almacén de obra

El contratista tiene un almacén adecuado para los materiales valorizados en la Obra, Av. Panamericana n°107- Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contralmirante - Tumbes, para su mejor protección y cuidado de los materiales y equipos del cual se puedan usar.

- Oficina Residente y SS.HH.

La oficina del Residente es la consignada en la propuesta técnico económica en la ciudad de los Baños del Inca - Cajamarca y en zona de trabajo Av. Panamericana n°107- Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contralmirante - Tumbes.

4.1 Control Técnico de la Calidad de los Trabajos.

En el presente mes se han realizado control de calidad a los equipos de transformación. Celdas de transformación, reconector automático, las mismas que están sustentados en la Valorización N° 02 de la Ejecución de la Obra.

También se cuenta con el Inicio de obra de parte de la empresa Concesionaria ENOSA S.A. - Tumbes, con documento NTM.004.2020/ENOSA de fecha 02.enero.2020.

Se adjunta guías de remisión de compra de la compra, protocolos e pruebas etc.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Benítez de la Cruz
GERENTE GENERAL

HUGO RICARDO OCANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA

Villacruzcontratistas_srl@hotmail.com

Cel. 976581927 - 976761313 - 957992277

HUGO RICARDO OCANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

4.3 Control de Recursos

4.3.1 Mano de Obra

A la fecha el personal dispuesto en obra es el siguiente:

- 01 Residente de Obra
- 01 Adjunto del Residente
- 01 Maestro de Obra
- 01 Ingeniero de Seguridad
- 01 Chofer
- 01 Almacenero
- 01 Operarios
- 01 Oficiales

4.3.2 Equipo y Herramientas

Se describen los equipos y herramientas que el contratista tiene en obra de acuerdo al equipamiento necesario para la ejecución de la obra, y que se han empleado en el presente mes:

- 01 Camioneta 4x4.
- 01 GPS.
- 01 Laptop
- 01 Oficina

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
 Marco Antonio C. de la Cruz
 OFICIAL GENERAL

CAPITULO V.- CONSULTAS REFERIDAS A LA EJECUCION DE LA OBRA

- El residente de Obra Mediante Cuaderno de Obra informa a la Supervisión sobre algunos inconvenientes referente a la adquisición de materiales en obra. Tales como:
- El transformix de medida tiene que solicitarse directamente a la concesionaria ENOSA S.A., en consecuencia, mi representara realizará los pagos de dichos equipos para su valorización respectiva.
- Se ha obtenido el Inicio de obra por parte de la empresa Concesionaria ENOSA S.A. para los trabajos de suministro y Montaje del Sistema de Utilización en 22.9Kv.
- Se ha realizado las pruebas eléctricas de los equipos de protección y transformación de la Obra en la ciudad de Lima juntamente con el Supervisor de la Obra.
- En otros detalles descritos en el cuaderno de Obra.
- Finalmente se está presentando la Valorización N° 02 de la Obra, para lo cual se adjunta la documentación necesaria para tal fin, presentando un avance actual del 76.01%, haciendo un acumulado del 80.43%, tal como se detalla en los cuadros antes indicados.

Henry Alvario Coliz Suarez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

CAPITULO VI.- ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO.

A la fecha no se ha solicitado, pero de ser necesario se solicitará a la entidad contratante.

CAPITULO VII.- MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL.

Se está realizando algunas medidas de control ambiental, con el objeto de mitigar los posibles impactos que genere la ejecución de la obra: por ejemplo, en el acarreo de material excedente de las excavaciones, orden y limpieza del área de trabajo, cuidado de posibles derrames de combustibles y lubricantes procedente de los equipos, etc.

CAPITULO VIII.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD E INFORME DE SEGURIDAD.

El Contratista está dotando de indumentaria básica de seguridad al personal dispuesto en obra. Los IPPs básico son: Ropa de trabajo, casco dieléctrico, guantes de cuero, guantes dieléctricos, lentes contar impacto, zapatos dieléctricos, botas de jebe y otros, dependiendo del tipo de trabajo a desarrollar; además se cuenta con un almacén en el lugar de la obra con un botiquín para primeros auxilios.

El contratista viene cumpliendo con la entrega de indumentaria de seguridad al personal dispuesto en obra, tal como se especifica en los documentos de entrega de IPPs y EPP entregada a cada personal.

Henry Flavio Coliz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 66090

CAPITULO IX.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Se está presentado la Valorización N°02 de ejecución de la Obra SISTEMA DE UTILIZACION EN 22.9KV DPA ACAPULCO., conforme a los metrados conciliados con el Supervisor de Obra.
- Los trabajos autorizados por la Supervisión de Obra se han ejecutado a cabalidad y en cumplimiento a las Especificaciones Técnicas del proyecto. También se está coordinando con el Supervisor de la empresa Concesionaria ENOSA S.A.
- A la fecha, la Obra se está ejecutando dando cumplimiento al Cronograma de Ejecución, estando adelantada en un 22.43%.
- El Supervisor de Obra ha dado conformidad a los metrados ejecutados en el presente mes, por lo que recomendamos aprobar la Valorización N° 02 de Obra y realizar el trámite correspondiente para su pago, correspondiente al mes de Enero del 2020.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

CAPITULO X.- VALORIZACIÓN DEL MES.

Hugo Ricardo Ocaña Navarrete
HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRETE
GERENTE GENERAL

La valorización correspondiente al mes de Enero del 2020 comprendida entre el periodo del 01 de enero al 31 de enero del 2020, se detalla en el Sustento de Valorización N°02 de la Obra.



PERÚ

Ministerio de la Producción

FONDEPES

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERIA ARTESANAL Y ACUICOLA

: CONTRATO N° 064-2019-FONDEPES, FECHA 26.NOV.2019
 Obra : AMPLIACION DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRA MIRANTE VII IAR - REGION TUMBES CODIGO UNICO N°
 Ubicación : TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS
 Inspector : ING° HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 Contratista : VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gallo de la Cruz
GERENTE GENERAL



VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02

(SISTEMA DE UTILIZACION EN 22.9KV DPA ACAPULCO: SUMINISTRO Y MONTAJE ELECTROMECAÁNICO)

(del 01 de enero al 31 de enero del 2020)

Henry Jhon Celiz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP N° 66000

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

I.- FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

VALORIZACION DE OBRA N° 02

(del 01 de enero al 31 de enero del 2020)

1 Obra	:	"AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505"
2 Ubicación	:	TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS
	Area Geográfica :	1
3 Metas	:	INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION: SISTEMA DE UTILIZACION EN 22.9KV DPA ACAPULCO
4 Entidad Contratante	:	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
5 Contratista	:	VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.
6 supervisor	:	ING° HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
7 Residente	:	ING° HENRY FLAVIO CELIZ SUAREZ
8 Financiamiento	:	Recursos Ordinarios de la Entidad
9 Adjudicacion Simplificada	:	CONTRATO N° 064-2019-FONDEPES, FECHA 26.NOV.2019
10 Modalidad	:	SUMA ALZADA
11 Presupuesto base, con IGV y Fecha	:	S/. 328,733.37
12 Presupuesto base, sin IGV y Fecha	:	S/. 278,587.60
13 Factor de Retención (FR)	:	0.9000000
14 Monto del contrato, con IGV (18%)	:	S/. 295,860.04
15 Monto del contrato, sin IGV	:	S/. 250,728.85
16 Plazo de ejecución, en d. c.	:	90
17 Plazo de ejecución según Bases Lic., en d.c.	:	90
18 Prórrogas, días calendario	:	
19 Adicionales de obra con IGV	:	S/. 0.00
Adicionales de obra sin IGV	:	S/. 0.00
20 Deductivo de obra con IGV	:	S/. 0.00
Deductivo de obra sin IGV	:	S/. 0.00
21 Fecha de Firma de Contrato de obra	:	26-Nov-19
22 Reconocimiento de mora Firma Contrato	:	
23 Comp.Gastos incump. entrega terreno	:	
24 Intereses por Mora, con IGV	:	
25 Intereses por Mora, sin IGV	:	
26 Mayor Gastos Gral. prorroga plazo, c/IGV	:	
27 Mayor Gastos Gral. prorroga plazo, s/IGV	:	
28 Adelanto directo con IGV (18%) y fecha de pago	:	S/. 0.00
29 Adelanto directo sin IGV y fecha de pago	:	S/. 0.00
30 Primer Adelanto para materiales, con IGV	:	S/. 0.00
31 Primer Adelanto para materiales, sin IGV	:	S/. 0.00
32 Entrega de terreno	:	10-Dic-19
33 Inicio oficial de plazo	:	11-Dic-19
34 Término del plazo de obra contractual	:	09-Mar-20
35 Nueva fecha de término del plazo de obra contractual	:	
36 Ampliación N° 1 plazo de obra para Adicionales N° 1	:	
37 Término vigente programado de obra	:	09-Mar-20
38 Término Real de obra	:	
39 Constatación Física	:	
40 Levantamiento de Observaciones	:	
41 Acta de Recepción de Obra	:	
42 Avance Real Mensual de la Obra	:	76.01%
43 Avance Programado Mensual de la obra	:	53.91%
44 Avance de la obra respecto al programado	:	141.01%
45 Avance Real Acumulado DE LA OBRA TOTAL	:	80.43%
46 Avance Programado Acumulado DE LA OBRA TOTAL	:	58.00%
47 Avance de obra respecto al programado	:	138.68%
48 Situación de la obra respecto del avance	:	OBRA ADELANTADA

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

Henry Flavia Celiz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 55093

HUGO RICARDO OCAÑA NAVA:
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

RESUMEN DE LA VALORIZACION N° 02

INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION: SISTEMA DE UTILIZACION EN 22.9KV DPA ACAPULCO

ADJ. SIMPLIFICADA : CONTRATO N° 084-2019-FONDEPES, FECHA 26.NOV.2019
 "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505"
 OBRA :
 Ubicación : TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS
 Area Geográfica : 1
 Presupuesto Base : S/. 328,733.37 (inc. IGV)
 Presupuesto Base : S/. 278,587.60 (Sin. IGV)
 Monto Contractual : S/. 295,880.04 (inc. IGV)
 Monto Contractual : S/. 250,728.85 (Sin. IGV)
 Inspector : ING° HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 Contratista : VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.
 Plazo de Ejecución de Obra : 90 días calendario

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 02
 MES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2020

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATO	VAL ACUM ANTERIOR	VAL ACUM ANTERIOR	VAL ACUM ACTUAL	% DE AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION SISTEMA DE UTILIZACION EN 22.9KV DPA ACAPULCO	250,728.85	11,069.85	190,583.24	201,653.09	80.43%	49,075.76
TOTAL CONTRACTUAL	250,728.85	11,069.85	190,583.24	201,653.09	80.43%	49,075.76
% DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA	100.00%	4.42%	76.01%	80.43%		19.57%
REAJUSTES (S)						
a) Línea Primaria	0.00	1,081.28	1,081.28	2,162.56		
TOTAL REAJUSTE	0.00	1,081.28	1,081.28	2,162.56		
DEDUCCION DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR A.D (D)						
a) Líneas Primarias, Redes Primarias	0.00	0.00	0.00	0.00		
b) Redes Secundarias	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL DEDUCCION DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE A.D	0.00	0.00	0.00	0.00		
AMORTIZACION (A)						
Amortización del Adelanto Directo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Amortización del Adelanto para Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		
VALORIZACION NETA (VN=VA-A-D)	250,728.85	12,151.13	191,664.52	203,815.65		
MULTA POR ATRASO DE OBRA (M)		0.00	0.00	0.00		
OTRAS MULTAS DISTINTAS POR MORA		0.00	0.00	0.00		
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
En efectivo (VN-M)	250,728.85	12,151.13	191,664.52	203,815.65		
En IGV (VN x 18%)	45,131.19	2,187.20	34,499.61	36,686.82		
MONTO TOTAL CON IGV	295,860.04	14,338.33	226,164.13	240,502.47		
Retencion De Fiel Cumplimiento (7.50%)	29,586.01	7,396.50	22,189.51	29,586.01		
TOTAL COMPROMISO			203,974.62			

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Sully de la Cruz
 GERENTE GENERAL

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

VALORIZACION N° 02 DE OBRA

INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION: SUMINISTRO Y MONTAJE ELECTROMECHANICO

AMPLIACION DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESAVAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIANTE VILLAR - REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2236805

TUMBES - CONTRALMIANTE VILLAR - ZORRITOS

: CONTRALMIANTE

: TUMBES

: VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

PROYECTO
DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO
EJECUTOR:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	METRADO	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	SALDO POR VALORIZAR			%
						Cantidad	Total	ACUMULADO	
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES				7,364.06	0.00	7,364.06	0.00	100.00%
1.01	TRANSPORTE DE MATERIALES ELECTRICOS LIMA - TUMBES	ea	1.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	100.00%
1.02	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA	km	0.11	358.80	39.47	0.11	39.47	0.00	100.00%
1.03	CARTEL DE OBRA	U	1.00	1,024.59	1,024.59	0.00	1,024.59	0.00	100.00%
2.00	OBRAS PROMOSIONALES				9,483.60	1,461.95	8,021.65	1,461.95	100.00%
2.01	INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL PARA LA EJECUCION Y SUPERVISION (ORFINAS Y ALMACEN)	m2	70.00	6,559.70	0.00	70.00	6,559.70	0.00	100.00%
2.02	SSH PORTATILES	gb	1.00	1,000.00	1,000.00	0.50	500.00	500.00	50.00%
2.03	AGUA PARA LA OBRA	gb	1.00	1,000.00	1,000.00	0.50	500.00	500.00	50.00%
2.04	ENERGIA PARA LA OBRA	gb	1.00	923.90	923.90	0.50	461.95	461.95	50.00%
3.00	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				3,666.64	2,041.66	1,624.98	541.66	100.00%
3.01	ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ELECTRICO	gb	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	100.00%
3.02	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ELECTRICO	ipg	8.00	270.83	2,166.64	2.00	1,624.98	541.66	75.00%
4.00	INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION				197,510.79	0.00	156,839.81	40,671.00	100.00%
4.01	PUNTO DE DISEÑO, PROTECCION Y MEDICION				1,518.74	0.00	1,518.74	759.37	100.00%
04.01.01	ARMADO Y CONEXION DE PUNTO DE DISEÑO	gb	1.00	1,518.74	1,518.74	0.50	759.37	759.37	50.00%
4.02	PUNTO DE PROTECCION Y MEDICION				74,561.02	0.00	47,121.26	27,440.56	100.00%
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE C.A.C. 15/400/210/435 Y ACCESORIOS	und	1.00	2,712.38	2,712.38	1.00	2,712.38	0.00	100.00%
04.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE FERRETERIA ELECTRICA (ARMADO PMI)	und	1.00	1,490.20	1,490.20	1.00	1,490.20	0.00	100.00%
04.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONADORES TIPO CUT-OUT, 3Ø KV, 100A, 17Ø KVBL, INC. EXTENSOR DE LINEA DE FUGA	und	1.00	1,672.53	1,672.53	1.00	1,672.53	0.00	100.00%
04.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECONECTOR DE POTENCIA (RECLOSER), 27KV, 15ØKV BHL, 63ØA, INC. ACCESORIOS	und	1.00	54,984.87	54,984.87	0.75	41,246.15	13,748.72	75.00%
04.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAFOMAX TRIFASICO, RELACION 22,90.23 KV, 10-20ØA, 6ØHZ, CLASE Ø.25	und	1.00	11,087.93	11,087.93	0.00	0.00	11,087.93	0.00%
04.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA MULTIFUNCION, INC. MURETE, C.A.M. PORTAMEDIDOR Y CABLE.	und	1.00	2,603.91	2,603.91	0.00	0.00	2,603.91	0.00%
4.03	RED SUBTERRANEA				17,702.02	0.00	17,702.02	0.00	100.00%
04.03.01	EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60 x 1.10m (ANCHO x PROF.) TERRENO SEMIROCOSO	m3	66.66	76.38	5,091.49	66.66	5,091.49	0.00	100.00%
04.03.02	EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60 x 1.05m (ANCHO x PROF.) TERRENO SEMIROCOSO	m3	3.78	72.73	274.92	3.78	274.92	0.00	100.00%

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
CALLE GENERAL
CAROLINO GENERAL

INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
HUGO NICARDO OCAÑA NAVARRO

Reg. CIP. N° 60200
66.66

METRADOS EJECUTADOS DE VALORIZACIÓN N° 02 DE OBRA

INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION: SUMINISTRO Y MONTAJE ELECTROMECHANICO

PROYECTO "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505"

DISTRITO TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS

PROVINCIA :CONTRALMIRANTE

DEPARTAMENTO : TUMBES

EJECUTOR: VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRDAOS EJECUTADOS
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.01	TRANSPORTE DE MATERIALES ELECTRICOS LIMA - TUMBES	est	1.00
1.02	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA	km	0.11
1.03	CARTEL DE OBRA	U	0.00
2.00	OBRAS PROVISIONALES		
2.01	INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL PARA LA EJECUCION Y SUPERVISION (OFICINAS Y	m2	0.00
2.02	SS.HH. PORTATILES	glb	0.50
2.03	AGUA PARA LA OBRA	glb	0.50
2.04	ENERGIA PARA LA OBRA	glb	0.50
	<i>HUGO RICARDO OCAÑA NAVAS</i> INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA Reg. CIP. N° 60200		
3.00	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
3.01	ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ELECTRICO	glb	0.00
3.02	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ELECTRICO	qto	4.00
4.00	INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION		
4.01	PUNTO DE DISEÑO, PROTECCION Y MEDICION		
04.01.01	ARMADO Y CONEXION DE PUNTO DE DISEÑO	glb	0.50
	<i>VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.</i> <i>Marcos Cruz</i> GERENTE GENERAL		
4.02	PUNTO DE PROTECCION Y MEDICION		
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE C.A.C. 15/400/210/435 Y ACCESORIOS	und	1.00
04.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE FERRETERIA ELECTRICA (ARMADO PMI)	und	1.00
04.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONADORES TIPO CUT-OUT, 36 KV, 100A, 170	und	1.00
04.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECONECTADOR DE POTENCIA (RECLOSER), 27KV,	und	0.75
04.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAFOMIX TRIFASICO, RELACION 22.90.23 KV, 10-	und	0.00
04.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA MULTIFUNCION, INC. MURETE,	und	0.00
4.03	RED SUBTERRANEA		
04.03.01	EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60 x 1.10m (ANCHO x PROF.) TERRENO SEMIROCOSO	m3	66.66
04.03.02	EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60 x 1.05m (ANCHO x PROF.) TERRENO SEMIROCOSO	m3	3.78
04.03.03	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS	m	124.00
04.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	18.97
04.03.05	CORTE, ROTURA Y REPOSICION DE ASFALTO	m	6.00
04.03.06	CORTE, ROTURA Y REPOSICION DE CONCRETO PARA VEREDA	m	96.00
04.03.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 4 VIAS (INCLUYE SOLADO)	und	6.00
04.03.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P Ø 100mm	m	95.00
	<i>Hugo Ricardo Ocaña Navas</i> INGENIERO ELECTRICISTA		
4.04	BUZONES		
01.05.01	BUZON DE CONCRETO DE 1.00x1.00x1.55m (LADO x LADO x PROF.)	und	2.00
4.05	CABLES Y CONDUCTORES		
04.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE N2XSY 18/30 kv DE 50mm2	m	372.00
04.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO TIPO AAAC-50mm2, CON GRASA	m	81.00
04.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE N2XH 4-1x300mm2	m	15.00
4.06	TERMINALES TERMOCONTRAIBLES		
04.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL TERMOCONTRAIBLE P/USO EXTERIOR	kit	3.00
04.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL TERMOCONTRAIBLE P/USO INTERNO, 25kv.	kit	1.00
4.07	EQUIPAMIENTO DE SUBESTACION		
04.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS MODULARES TIPO COMPACTAS 24KV, 630A,	glb	1.00
04.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE TRANSFORMACION Y TRANSFORMADOR	und	1.00
04.07.03	CONEXION DE CABLE BT DE 300mm2 AL TRANSFORMADOR	und	0.00
4.08	POZO PUESTA A TIERRA		

METRADOS EJECUTADOS DE VALORIZACIÓN N° 02 DE OBRA

INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION: SUMINISTRO Y MONTAJE ELECTROMECHANICO

PROYECTO "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505"

DISTRITO TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS

PROVINCIA :CONTRALMIRANTE

DEPARTAMENTO : TUMBES

EJECUTOR: VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADOS EJECUTADOS
04.08.01	POZO A PUESTA TIERRA, DE MT EN SUBESTACION R<25 OHMIOS	und	0.50
04.08.02	POZO A PUESTA TIERRA, DE NEUTRO DE BT R<15 OHMIOS	und	0.50
04.08.03	POZO A PUESTA TIERRA, EN PUNTO DE MEDICION R<25 OHMIOS	und	1.00
04.08.04	POZO A PUESTA TIERRA, P/MEDIDOR DE ENERGIA R<03 OHMIOS	und	1.00
04.08.05	POZO A PUESTA TIERRA, P/RECLOSER, R<25 OHMIOS,	und	1.00
04.08.06	CONDUCTOR DE CU 1x95mm2. DESNUDO	m	10.00
04.08.07	CONDUCTOR DE CU 1x50mm2. DESNUDO	m	10.00
4.09 SEÑALIZACION			
04.09.01	SEÑALIZACION DE PUESTA A TIERRA	und	2.00
04.09.03	SEÑALIZACION DE BUZONES ELECTRICOS	und	0.00
4.1 EQUIPOS DE PROTECCION Y MANIOBRAS			
04.10.01	EQUIPOS DE PROTECCION Y MANIOBRAS DE MEDIA TENSION	glb	0.00
4.11 PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO			
04.11.01	COSTO DE CONEXION Y ENERGIZACION DE LA RED	glb	0.00
04.11.02	PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO	glb	0.00
04.11.03	EXPEDIENTE TECNICO FINAL CONFORME A OBRA	und	0.00
4.12 VARIOS			
04.12.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE FIERRO C/PLATINA 1 1/4" x 3/16", DUCTO	m2	0.00
04.12.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA ESTRIADA LAC 3/16" DE ESPESOR SOBRE	m2	0.00
04.12.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE MALLA DE ACERO GALVANIZADO	m2	0.00

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Ámbito de actuación: Tumbes, Acapulco Cruz
SEAL OFICIAL

Henry Flavia Celiz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV -
30, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEL DESBARGADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO -

LEYENDA	
COLOR	DATOS AL INICIO
COLOR	EN CADA VALORIZACION
COLOR	FALTA LLENAR
COLOR	SON CONSECUENCIA (verificar al inicio)
COLOR	SON CONTROLES

FECHA BASE DEL PRESUPUESTO **MAYO - 2019**
MES DE INICIO DE VALORIZACIONES **31/12/2019**

CONTROL DE VALORIZACION (DATOS SIN IGV)			
Nº	MES	SUMINISTRO Y MONTAJE ELECTROMECANICO	TOTAL
1	31/12/2019	11,069.85	11,069.85
2	31/01/2020	190,583.24	190,583.24
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
ACUMULADO ACTUAL		201,653.09	201,653.09
CONTRATO		250,728.85	250,728.85
SALDO		49,075.76	49,075.76

RESUMEN						
ESPECIALIDAD	Monto del Contrato sin IGV	Anterior	Mes Actual	Acumulado	%	Saldo
INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION : SISTEMA DE UTILIZACION EN 22.9KV DPA ACAPULCO	250,728.85	11,069.85	190,583.24	201,653.09	80.43%	49,075.76
SUB-TOTAL	250,728.85	11,069.85	190,583.24	201,653.09	80.43%	49,075.76
IMPUESTO IGV 18%	45,131.19	1,992.37	34,304.98	36,297.56	80.43%	8,833.64
TOTAL	295,860.04	13,062.42	224,888.22	237,950.65	80.43%	57,909.40
				145,413.20	58.00%	
				145,413.21	58.00%	
				26,174.38	58.00%	
				171,587.58	58.00%	
					138.68%	
					138.68%	
					138.68%	

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Ingeniero Mecánico de la Cruz
C.E. N° 60200

CONTROL DE AMORTIZACION DEL ADELANTO PIMATERIALES			
MONTO SIN IGV =	SI/0.00		
FECHA DE PAGO	SI/0.00	AMORTIZ	SALDO
VAL	MES		
1	31-Dic-19	0	
2	31-Ene-20	0	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			0.00

Henry Javier Celiz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. C.E. N° 60200

CONTROL DE AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO			
MONTO SIN IGV =	0.00		
FECHA DE PAGO	0.00	AMORTIZ	SALDO
VAL	MES		
1	31-Dic-19	0	
2	31-Ene-20	0	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL			0.00

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. C.P. N° 60200

CALCULO DE K

Fórmula Polinómica : SISTEMA DE UTILIZACION EN 22.9KV DPA ACAPULCO

Obra : "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2232503"

A.S. N° : CONTRATO N° 044-2019-FONDEPES, FECHA 26.NOV.2019

Fecha de Presup. Base : MAYO - 2019

Area Geográfica : 1

Contratista : VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

VALOR REFERENCIAL : SI. 250,728.85

$$K = 0.190 \cdot (Mr / Mo) + 0.088 \cdot (Cr / Co) + 0.632 \cdot (Mr / Mo) + 0.090 \cdot (Ir / Io)$$

	Base(MAYO-2019)	VAL N°01		VAL N°02	
		Coef.	Indice	INDICE K-1	
				INDICE K-1	INDICE K-1
1	MANO DE OBRA INCLUYE LEYES SOCIALES	0.190	100.00%	619.76	619.76
2	CABLE NYY Y NKY	0.088	100.00%	748.92	750.05
3	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	0.632	100.00%	316.98	315.38
4	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.090	100.00%	459.60	460.59
		1.000		1.0100	0.0100
				1.0080	0.0080

- NOTAS:**
- En la fórmula los sub-índices "o" de cada símbolo corresponden al índice de precios según (CREPCO) a la fecha de Elaboración del Presupuesto (Presupuesto Base) y los sub-índices "r" al índice de precios al momento de registrar o fecha de valorización
 - En el caso de los monomitos compuestos por varios índices se ha considerado para efecto de denominación el símbolo que tiene mayor porcentaje de incidencia

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
 Mecano Ingeniero Civil de la Cruz
 GENERAL

Hugo Ricardo Ocaña Navarero
HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

Henry María Coliz Suarez
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

CALCULO DE LOS REINTEGROS


Contrato Principal


OBRA : "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505"

PROVINCIA: CONTRALMIRANTE

A.S. N°: CONTRATO N° 064-2019-FONDEPES, FECHA 26.NOV.2019 **DEPARTAMENTO** TUMBES

EJECUTOR: VILACRUZ CONTRATISTAS SRL

Val. No.	Fecha	Valorización Programada	Valorización Real	K-1	Reajuste Program.	Reajuste Real	Autorizado Bruto	Deducciones por Adelantos Para Materi.		Reintegro Autorizado Neto
								Directo	J	
A	B	C	D	E	F = C * E	G = D * E	H	I	J	L = H - I - J
SISTEMA DE UTILIZACION EN 22.9KV DPA ACAPULCO										
		250,728.84	201,653.09		1,183.81	1,635.36	1,183.81	-	-	1,183.81
1	31-dic.-19	10,252.73	11,069.85	0.010	102.53	110.70				
2	31-ene.-20	135,160.47	190,583.24	0.008	1,081.28	1,524.67				
3	29-feb.-20	92,130.27								
4	9-mar.-20	13,185.37								
							 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA			
							VILACRUZ CONTRATISTAS S.R.L. RUC 20190600007 de la Cruz GENERAL			
							TOTAL REINTEGRO S.U. 22.9KV REINTEGRO ACUMULADO VALORIZACION ANTERIOR REINTEGRO VALORIZACION PRESENTE		1,183.81 102.53 1,081.28	



 HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

1.0 GRÁFICOS SOBRE EL AVANCE DE OBRA:

2.0 PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA

AVANCES MENSUALES DE OBRA					
	DICIEMBRE.2019	ENERO.2020	FEBRERO.2020	MARZO.2020	
REAL	4.42%	76.01%			
PROGRAMADO	4.00%	53.01%	36.74%	5.26%	

AVANCES ACUMULADOS					
	DICIEMBRE.2019	ENERO.2020	FEBRERO.2020	MARZO.2020	
ACUM. REAL	4.42%	80.43%			
ACUM. PROGRAMADO	4.00%	58.00%	94.74%	100.00%	

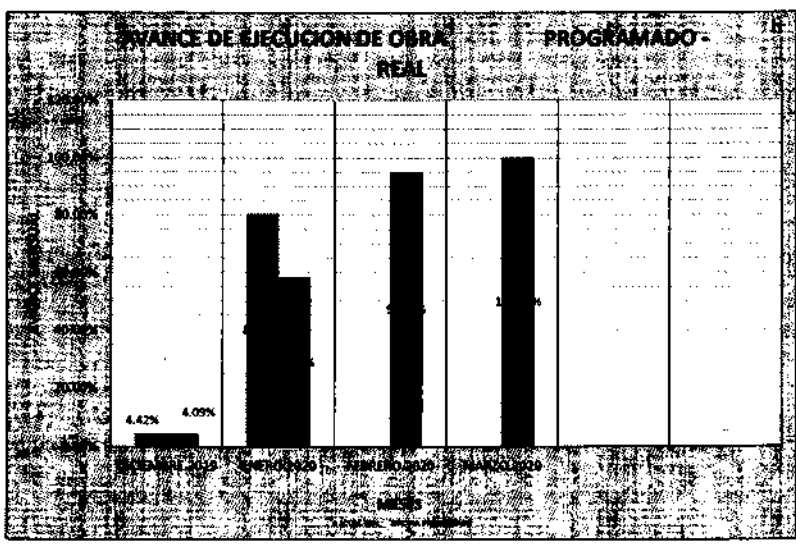

2.1 CONTROL DE VALORIZACIONES DE OBRA

ESPECIALIDAD	Monto del Contrato sin IGV	Anterior	Mes Actual	Acumulado	%	Saldo por valorizar
SISTEMA DE UTILIZACION EN 22.5KV DPA ACAPULCO	250,728.85	11,069.85	190,583.24	201,653.09	80.43%	49,075.76
SUB-TOTAL	250,728.85	11,069.85	190,583.24	201,653.09	80.43%	49,075.76
IMPUESTO IGV 18%	45,131.19	1,992.57	34,304.98	36,297.56	80.43%	8,833.64
MONTO TOTAL VALORIZACION N° 01	295,860.04	13,062.42	224,888.22	237,950.65	80.43%	57,909.40

VILLACRIZ CONTADORAS S.R.L.
 Marco Antonio Góngora de la Cruz
 GERENTE GENERAL


Henry Jhon Peltz Suarez
 INGENIERO EN ELECTRICIDAD

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

3.0 PORCENTAJE DE AVANCE A LA OBRA

AVANCES MENSUALES						
MESES						
	DICIEMBRE.2019	ENERO.2020	FEBRERO.2020	MARZO.2020		
REAL	0.00%	4.42%	76.01%			
PROGRAMADO	0.00%	4.09%	53.91%	36.74%	5.26%	

AVANCES ACUMULADOS						
MESES						
	DICIEMBRE.2019	ENERO.2020	FEBRERO.2020	MARZO.2020		
ACUM. REAL	0.00%	4.42%	80.43%			
ACUM. PROGRAMADO	0.00%	4.09%	58.00%	94.74%	100.00%	

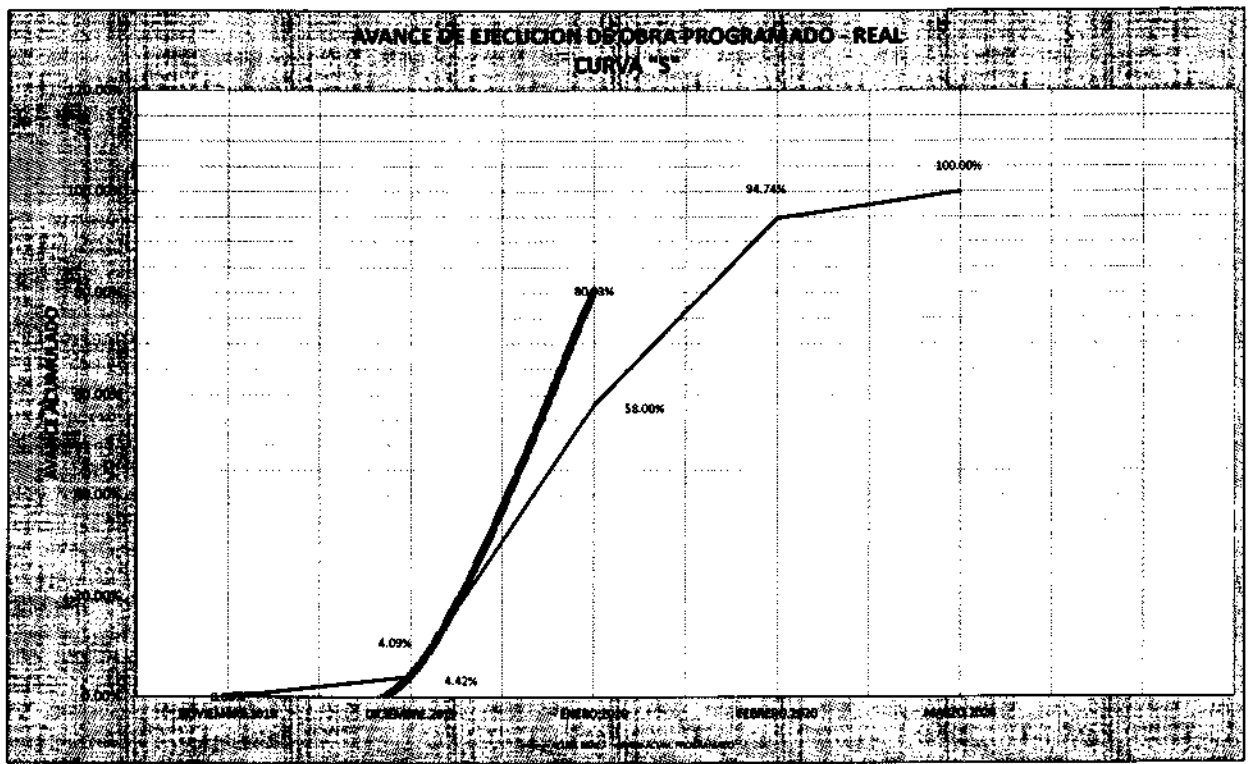

	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS
DICIEMBRE.2019	10,252.73	10,252.73	4.09%	4.09%
ENERO.2020	135,160.47	145,413.20	53.91%	58.00%
FEBRERO.2020	92,130.27	237,543.47	36.74%	94.74%
MARZO.2020	13,185.37	250,728.84	5.26%	100.00%
TOTAL	250,728.84		100.00%	

	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS
DICIEMBRE.2019	11,069.85	11,069.85	4.42%	4.42%
ENERO.2020	190,583.24	201,653.09	76.01%	80.43%
TOTAL	201,653.09		80.43%	

VILLACRUZ ELECTRICISTAS S.R.L.
 Marco Antonio Coliz de la Cruz
 GERENTE GENERAL

Henry J. Coliz Suarez
 INGENIERO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

HUGO RICARDO OCAÑA NAVAL
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

3.1 CONTROL DEL ADELANTO DIRECTO

Monto del adelanto directo con IGV 18% = S/. 0.00
 Monto del adelanto directo sin IGV = S/. 0.00
 Fecha de pago del adel. Directo =

A continuación se presenta en el siguiente cuadro, las amortizaciones que se vienen realizando:

VALORIZACION N°	MES-AÑO	ADELANTO AMORTIZADO S/. (SIN IGV)
1	31-Dic-19	0.00
2	31-Ene-20	0.00
TOTAL AMORTIZADO (B)		0.00
SALDO POR AMORTIZAR (A-B)		

3.2 CONTROL DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Monto primer adelanto materiales con IGV = S/. 0.00
 Monto primer adelanto materiales sin IGV = S/. 0.00
 Monto segundo adelanto materiales sin IGV = S/. 0.00
 Monto adelanto materiales sin IGV = S/. 0.00 (A)
 Fecha de pago del adel. Materiales =

A continuación se presenta en el siguiente cuadro, las amortizaciones que se vienen realizando:

VALORIZACION N°	MES-AÑO	ADELANTO AMORTIZADO S/. (SIN IGV)
1	31-Dic-19	0.00
2	31-Ene-20	0.00
TOTAL AMORTIZADO (B)		0.00
SALDO POR AMORTIZAR (A-B)		

3.3 REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO	FECHA DE CANCELACION	MONTO TOTAL SIN IGV
ADELANTO DIRECTO		0.00
PRIMER ADELANTO MATERIALES		0.00
SEGUNDO ADELANTO MATERIALES		0.00
VALORIZACION DE OBRA N° 01		S/. 12,151.13
VALORIZACION DE OBRA N° 02		S/. 191,664.52
TOTAL A CANCELAR		S/ 203,815.65

EN LOS MONTOS PAGADOS PARA VALORIZACIONES, SE CONSIDERA PARA EL PRESENTE CUADRO:
 VALORIZACION NETA = VALORIZACION BRUTA - AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

MARCO ANTONIO GARCIA DE LA CRUZ
 GERENTE GENERAL

HENRY JUAN COLI SUAREZ
 INGENIERO ELECTRICISTA

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200


3.4 DETERMINACION DEL AVANCE FINANCIERO

TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS SIN IGV = S/. 203,815.65 (A)
 MONTO DEL CONTRATO SIN IGV = S/. 250,729.85 (B)

% AVANCE FINANCIERO = (A/B) x 100 = 81.29%

3.5 COMPARACION ENTRE EL AVANCE FISICO Y EL FINANCIERO

AVANCE FISICO = 80.43%
 AVANCE FINANCIERO = 81.29%



VILLACRIZ CONTRATISTAS S.R.L.


 Marco Antonio Villacriz de la Cruz
 GERENTE GENERAL

AVANCES MENSUALES

MESES				
	DIEMBRE.2019	ENERO.2020	FEBRERO.2020	MARZO.2020
REAL	0.00%	4.42%	76.01%	
PROGRAMADO	0.00%	4.09%	53.91%	36.74%

AVANCES ACUMULADOS

MESES				
	DIEMBRE.2019	ENERO.2020	FEBRERO.2020	MARZO.2020
ACUM. REAL	0.00%	4.42%	80.43%	
ACUM. PROGRAMADO	0.00%	4.09%	58.00%	94.74%

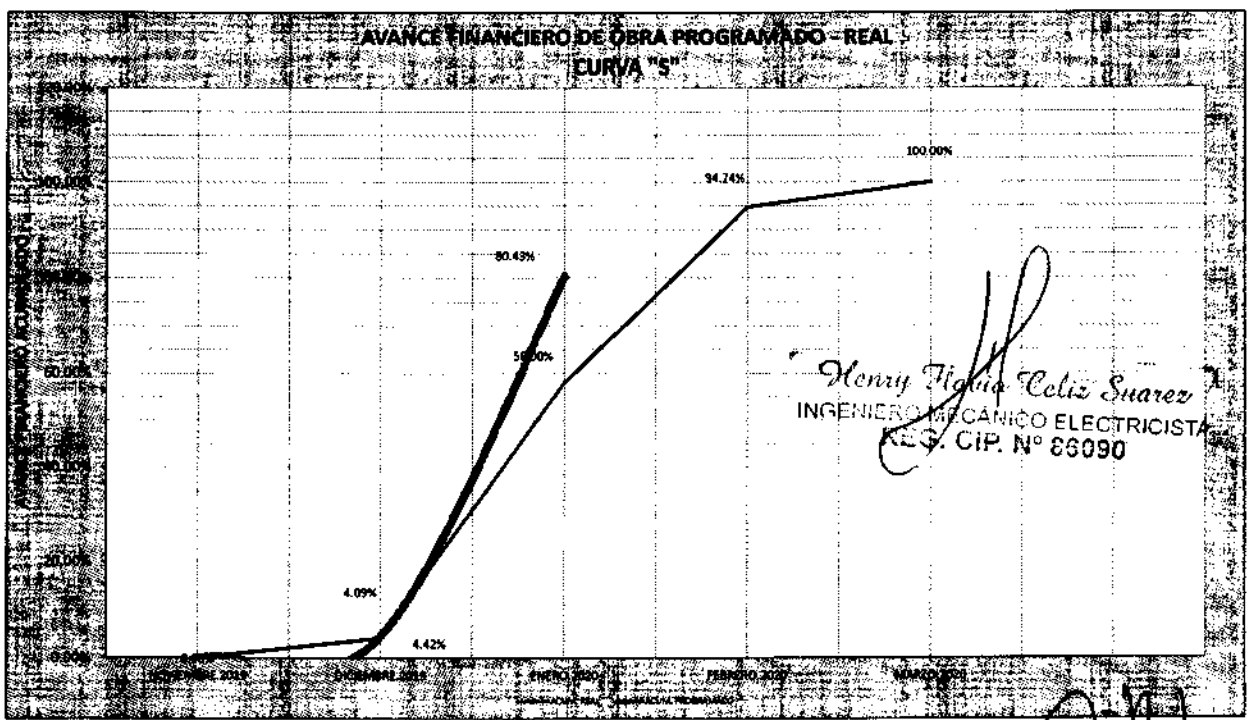

Henry Figlio Celis Suarez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 86090

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

3.6 CONTROL DE CARTAS FIANZA O PÓLIZAS DE CAUCIÓN

DESCRIPCION	BANCO O COMPAÑIA DE SEGUROS	N° CARTA O POLIZA	MONTO S/.	VIGENCIA DESDE HASTA	OBSERVACIONES

ADELANTO DIRECTO					
ADELANTO MATERIALES					
FIEL CUMPLIMIENTO					

3.7 PÓLIZAS DE SEGURO

DESCRIPCIÓN	BANCO O COMPAÑIA DE SEGUROS	Nº CARTA O POLIZA	MONTO S/.	VIGENCIA	OBSERVACIONES
CONTRA TODO RIESGO					
CONTRA ACCIDENTES					

4.0 SITUACION DE LA OBRA

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION DEL SUMINISTRO Y MONTAJE ELECTROMECHANICO

4.1 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE ATRASO O ADELANTO

A LA FECHA (11 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019) TENEMOS LOS SIGUIENTES AVANCES :

ACUMULADO REAL 80.43%
 ACUMULADO PROGRAMADO 58.00%

PORC. DE AVANCE RESPECTO DEL PROG.	80.43 / 58.00	=	138.68%
------------------------------------	---------------	---	---------

AVANCE DE OBRA	22.43%	=	Nº 2
----------------	--------	---	------

OBRA ADELANTADA 22.43% RESPECTO AL PROGRAMDO

4.2 ACCIONES TOMADAS POR EL CONTRATISTA

SE CONTINUARÁ CON EL RITMO DE TRABAJO Y EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD Y LA EMPRESA CONCESIONARIA ENOSA S.A.
 SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

4.3 ACTITUD Y/O VOLUNTAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA ESTÁ CUMPLIENDO CON EL CRONOGRAMA VALORIZADO ACTUALIZADO DE OBRA A LA FECHA DE INICIO. EL CUAL HA SIDO TRAMITADO A LA SUPERVISION CON CARTA N° 004-2019-VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL, DE FECHA 26/12/2019, ENCONTRANDOSE ADELANTADA.

4.4 MATERIALES EXISTENTES EN OBRA

ACTUALMENTE SE HA SUMINISTRO TODOS LOS MATERIALES ELECTRICOS QUE ESTAN MONTADOS Y OTROS QUE ESTAN EN ALMACEN DE OBRA, ASI COMO LOS IPP P. EL PERSONAL TECNICO

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio de la Cruz
 GERENTE GENERAL

Henry Jesús Celis Suarez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60090

Hugo Ricardo Ocaña Navarro
 HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, MODIFICADO A LA ENTREGA DE TERRENO

PROYECTO : AMPLIACION DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESSEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIANTE VILLAR - REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235595

EMPRESA : VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

PLAZO : 90 DIAS CALENDARIOS

LUGAR : TUMBES - CONTRALMIANTE VILLAR - ZORRITOS

INICIO DEL PLAZO : 11 DE DICIEMBRE DEL 2019

TERMINO DEL PLAZO : 09 DE MARZO DEL 2020

	MES 01: MES 01: 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2019	MES 02: MES 02: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	MES 03: MES 03: 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	MES 04: MES 04: 01 AL 09 DE MARZO DEL 2020
04.03.01 EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60 x 1.10m (ANCHO x PROF.) TERRENO SEMIROCOSO	76.38	66.66	5,091.49	-
04.03.02 EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60 x 1.05m (ANCHO x PROF.) TERRENO SEMIROCOSO	72.73	3.78	274.92	-
04.03.03 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS	17.18	124.00	2,130.32	-
04.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	21.26	18.97	403.30	-
04.03.05 CORTE, ROTURA Y REPOSICION DE ASFALTO	37.43	6.00	224.58	-
04.03.06 CORTE, ROTURA Y REPOSICION DE CONCRETO PARA VEREDA	71.03	96.00	6,818.88	-
04.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 4 VAS (INCLUYE SOLADO)	94.46	6.00	566.86	-
04.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P Ø 100mm	23.07	95.00	2,191.65	-
4.04 BUZONES	3,075.12	0.00	3,075.12	0.00
01.05.01 BUZON DE CONCRETO DE 1.00x1.00x1.56m (LADO x LADO x PROF.)	1,537.56	2.00	2.00	0.00
4.05 CABLES Y CONDUCTORES	20,387.84	0.00	13,245.69	0.00
04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NDASY 1830 IV DE 50mm2	34.34	372.00	12,774.46	7,122.75
04.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINO TIPO AAAC-50mm2, CON GRASA	5.81	81.00	470.61	-
04.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE R20H 4x1x300mm2	474.85	15.00	7,122.75	-
4.06 TERMINALES TERMOCONTRARIABLES	3,790.80	0.00	6.00	0.00
04.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL TERMOCONTRARIABLE PUNSO EXTERIOR 28KV.	975.79	3.00	3,790.80	0.00
04.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL TERMOCONTRARIABLE PUNSO INTERNO 28KV.	871.43	1.00	2,927.37	0.00
4.07 EQUIPAMIENTO DE SUBESTACION	58,930.38	0.00	58,930.38	0.00
04.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS MODULARES TIPO COMPACTAS 24KV, 630A, 20KA	20,514.25	1.00	20,514.25	0.00
04.07.02 315KVA, 22-30 40-0.23KV, GRUPO DE CONEXION YVMS	38,758.62	1.00	38,758.62	0.00
04.07.03 CONEXION DE CABLE BT DE 300mm2 AL TRANSFORMADOR	657.51	1.00	657.51	0.00
4.08 POZO PUESTA A TIERRA	5,743.79	0.00	2,592.33	0.00
04.08.01 POZO A PUESTA TIERRA, DE MT EN SUBESTACION R<25 OHMIOS	1,036.93	1.00	518.47	0.00
04.08.02 POZO A PUESTA TIERRA, DE NEUTRO DE BT R<15 OHMIOS	1,036.93	1.00	518.47	0.00
04.08.03 POZO A PUESTA TIERRA, EN PUNTO DE MEDICION R<25 OHMIOS	1,036.93	1.00	518.47	0.00
04.08.04 POZO A PUESTA TIERRA, PANEADOR DE ENERGIA R<40 OHMIOS	1,036.93	1.00	518.47	0.00
04.08.05 POZO A PUESTA TIERRA, PRECLOSER, R<25 OHMIOS.	1,036.93	1.00	518.47	0.00
04.08.06 CONDUCTOR DE CU 1x69mm2, DESNUDO	35.38	10.00	353.80	0.00
04.08.07 CONDUCTOR DE CU 1x50mm2, DESNUDO	205.30	10.00	205.30	0.00
4.09 SEÑALIZACION	203.08	0.00	92.82	0.00
04.09.01 SEÑALIZACION DE PUESTA A TIERRA	89.25	5.00	36.70	0.00
04.09.02 SEÑALIZACION DE SUBESTACION	64.61	1.00	32.31	0.00
04.09.03 SEÑALIZACION DE BUZONES ELECTRICOS	49.22	2.00	24.61	0.00
4.1 EQUIPOS DE PROTECCION Y MANTENIMIENTOS	3,018.35	0.00	0.00	3,018.35

HUGO RICARDO OCANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

Henry David Celis Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
 Calle Antonio Ruiz de la Cruz
 Tumbes - Peru

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, MODIFICADO A LA ENTREGA DE TERRENO

PROYECTO : AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø. PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIIRANTE VILLAR - REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2335505

EMPRESA : VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

PLAZO : 90 DIAS CALENDARIOS

LUGAR : TUMBES - CONTRALMIIRANTE VILLAR - ZORRITOS

INICIO DEL PLAZO : 11 DE DICIEMBRE DEL 2019

TERMINO DEL PLAZO : 09 DE MARZO DEL 2020

	MES 01: MES 01: 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2019	MES 02: MES 02: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	MES 03: MES 03: 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	MES 04: MES 04: 01 AL 09 DE MARZO DEL 2020
04.10.01 EQUIPOS DE PROTECCION Y MANOBRAS DE MEDIA TENSION	3,016.35	0.00	0.00	3,016.35
4.11 PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO	5,941.62	0.00	0.00	5,941.62
04.11.01 COSTO DE CONEXION Y EMERIZACION DE LA RED	2,300.00	-	-	2,300.00
04.11.02 PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO	1,081.62	-	-	1,081.62
04.11.03 EXPEDIENTE TECNICO FINAL CONFORME A OBRA	2,600.00	-	-	2,600.00
4.12 VARIOS	1,611.27	0.00	1,611.27	0.00
04.12.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE FIERRO C/PLATINA 1 1/4" x 3/16", DUCTO DE VENTILACION	238.30	-	1.00	238.30
04.12.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA ESTRIADA LAC 3/16" DE ESPESOR SOBRE PERFIL ANGULAR	857.10	-	3.27	857.10
04.12.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE MALLA DE ACERO GALVANIZADO	515.87	-	2.88	515.87
COSTO DIRECTO	218,025.89	4,915.42	117,530.85	11,465.54
GASTOS GENERALES	21,802.51	891.54	11,753.08	1,146.35
UTILIDAD	16,991.25	445.77	5,876.54	573.28
SUB TOTAL	256,728.65	10,252.73	135,160.47	13,185.17
I.G.V.	45,131.19	1,845.49	24,328.83	2,373.37
MONTO TOTAL OFERTA ECONOMICA	295,860.04	12,098.22	159,489.35	15,558.74

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
 HUGO RICARDO COANA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 60200

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO SOLES

PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL DE EJECUCION DE OBRA	4.09%	53.91%	36.74%	5.26%
PORCENTAJE DE ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCION DE OBRA	4.09%	57.00%	93.74%	100.00%

HUGO RICARDO COANA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 60200

HUGO RICARDO COANA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
 OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
 E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

SUSTENTO DE VALORIZACIÓN

CAPITULO XI.- ANEXOS.

- 11.1 Copia de contrato de Obra.
- 11.2 Acta de entrega de terreno.
- 11.3 Copia del Cuaderno de Obra.
- 11.4 Carta del Cronograma Valorizado de Obra, modificado a la entrega de terreno.
- 11.5 Guías de los materiales suministrados en Obra
- 11.6 Copia de inscripción del Contratista en la REMYPE.
- 11.7 Índices Unificados de Construcción INEI (Publicado en el diario el peruano). Mes de diciembre 2019.
- 11.8 Declaración Jurada de No Adeudo a SENCICO.
- 11.9 Panel Fotográfico de la ejecución de la Obra.
- 11.10 Autorización de retención por Fiel Cumplimiento.
- 11.11 Inicio de Obra otorgado por la empresa Concesionaria ENOSA S. A.
- 11.12 Solicitud de autorización en la Vía Pública
- 11.13 Fórmula polinómica según Expediente Técnico.
- 11.14 Copia de la Pólizas SCTR Salud y Pensión del personal técnico.
- 11.15 Copia de la Pólizas CAR de Montaje de la Obra.
- 11.16 Copia de la póliza de Seguro VIDA LEY.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gory de la Cruz
 GERENTE GENERAL

Henry Flavio Celiz Suarez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana N°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

ANEXOS

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Quiroz de la Cruz
GERENTE GENERAL

Henry Alvaro Peliz Suarez
INGENIERO ELECTRICISTA
N° 150000

Ricardo Ocaña Navarero
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas.srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

11.1 Copia de contrato de Obra.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Mario P. ... de la Cruz
GERENTE GENERAL

Henry ... Celi Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

HUGO RICARDO OCANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CONTRATO N° 064-2019-FONDEPES
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 050-2019-FONDEPES
PRIMERA CONVOCATORIA
"CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22,9KV PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES, CÓDIGO ÚNICO N° 2235505"

Conste por el presente documento, la "CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22,9KV PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES, CÓDIGO ÚNICO N° 2235505", que celebra de una parte:



- EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES con RUC N° 20137921601, con domicilio legal en Av. Petit Thouars N° 115, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Jefa de la Oficina General de Administración, la señora CARMINA CARRERA AMAYA, identificada con DNI N° 10327662, designada mediante Resolución Jefatural N° 075-2019-FONDEPES/J de fecha 14 de mayo de 2019 y con las facultades conferidas en materia de contrataciones mediante Resolución Jefatural N° 069-2016-FONDEPES/J de fecha 17 de febrero de 2016, a quien en adelante se le denominará LA ENTIDAD; y de la otra parte,



- La empresa VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L., con RUC 20572531787, con domicilio legal en Jr. Zepita N° 151, distrito de Los Baños del Inca - provincia y departamento de Cajamarca, debidamente representado por su Gerente General, el señor GUTY DE LA CRUZ MARCO ANTONIO, identificado con DNI N° 44988244, según poder inscrito en el Asiento C00004, de la Partida Electrónica N° 11139233 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Cajamarca, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
MARCO ANTONIO GUTY DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL

LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA a quienes en forma conjunta se les denominará LAS PARTES, acuerdan en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 06 de noviembre de 2019, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 050-2019-FONDEPES PRIMERA CONVOCATORIA para la contratación de la "CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22,9KV PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES, CÓDIGO ÚNICO N°

HUGO RICARDO OCANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60280





"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

2235505", a la empresa **VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación de la "CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22,9KV PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES, CÓDIGO ÚNICO N° 2235505".

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 295,860.04 (Doscientos noventa y cinco mil ochocientos sesenta con 04/100 Soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en periodos de valorizaciones mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

Marco Antonio C. Cruz de la Cruz

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el marco de lo dispuesto en el artículo 26° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD a efectuar los pagos correspondientes a las valorizaciones del presente contrato mediante depósito en Cuenta Bancaria, para cuyo efecto ha proporcionado su Código de Cuenta Interbancaria del **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ**:

CCI - CUENTA EN SOLES 00224500253783908294

Henry Flavio Celiz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 86090

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de noventa (90) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176° del Reglamento.



C. CARRERA



VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Marco Antonio C. Cruz de la Cruz
GERENTE GENERAL



B. BARRIOS

HUGO RICARDO OCANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el postor ganador de la buena pro solicitó la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato:

- "De fiel cumplimiento del contrato: \$/ 29,586.00 (Veintinueve mil quinientos ochenta y seis con 00/100 Soles), a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."



CLÁUSULA OCTAVA: SEGUROS

EL CONTRATISTA, deberá presentar las pólizas que se detallan a continuación, en la fecha de inicio de ejecución de la obra:

1. POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO Y MONTAJE (CAR):

- Básica: por el monto del contrato.
- Terremoto: por el monto del contrato de obra.
- Avenida, lluvia e inundación, por el monto del contrato de obra.
- Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del contrato de obra.
- Daños materiales, daños personales, remoción de escombros, por el 5% del monto del contrato.
- Huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, terrorismo por el 20% del monto del contrato de obra.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Gerente General



VIGENCIA:

La póliza de Seguro Todo Riesgo y Montaje (CAR) tendrá una vigencia desde la fecha de inicio de obra hasta la liquidación consentida de la obra.

2. SEGURO DE VIDA LEY

Póliza de Accidentes Personales: por muerte o invalidez permanente por el 2.5% del monto de la obra por cada obrero. Deberá especificar que se considerarán como terceras personas al personal de la Entidad que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecución de obra.

VIGENCIA:

La póliza de Seguro Vida Ley, tendrá vigencia desde la fecha de inicio de ejecución hasta la recepción de la obra.

3. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Póliza de Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos, conforme a lo dispuesto por el D.L. N° 688 y D.L. N° 25897.

VIGENCIA:

La póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, tendrá vigencia desde la fecha de inicio de ejecución hasta la recepción de la obra.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L. Gerente General

Henny Flavia Coliz Suarez INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA REG. CIP. N° 80000

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA Reg. CIP. N° 60200





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días calendario siguiente a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMO

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

VILLA CRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Maria Cruz de la Cruz
GERENTE GENERAL

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución contractual, según las disposiciones previstas en la Directiva "Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras":

INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 60200

Por la naturaleza de la intervención, los riesgos previsibles que han tomado en cuenta en la elaboración del expediente técnico y que pueden ocurrir durante la ejecución de las obras, son los siguientes: (ver anexos del expediente técnico).



VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Gerente General



HUGO RICARDO OCANA NAVARRO
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Formulario de datos generales del proyecto, incluyendo número y fecha del documento, nombre del proyecto, y ubicación geográfica.

Tabla de especificación del riesgo y plan de respuesta a los riesgos. Incluye columnas para descripción del riesgo, probabilidad, impacto, y acciones a realizar.



Signature and stamp of the project manager.

Signature and stamp of the technical supervisor.

Signature and stamp of the electrical engineer: Henry Jhoia Celiz Suarez.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

En la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40º de la Ley de Contrataciones del Estado y 173º de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo en días)

Donde:


F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Vertical stamp and signature of Villacruz Contratistas S.R.L.

Vertical stamp and signature of Hugo Ricardo Ocaña Navarro.

Signature and stamp of Villacruz Contratistas S.R.L. General Manager.





"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

PENALIDADES			
Nº	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	Cuando el RESIDENTE DE OBRA o el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	1 UIT por día de ausencia del personal de obra.	Según informe del inspector y/o supervisor.
2	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones requeridas.	0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra.
3	ACCESO AL CUADERNO DE OBRA Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias.	5/1000 del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del inspector y/o supervisor.
4	SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por el FONDEPES. La multa es por cada día..	1/2000 del Monto de Contrato.	Según informe del Supervisor
5	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad.	1/2000 del Monto de Contrato.	Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra
6	EQUIPO MINIMO Cuando el contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica, luego de 07 días de ser requerido por el supervisor o coordinador. Cuando la falta de este equipo afecte el correcto desarrollo de la Obra.	1/2000 del Monto de Contrato.	Según informe del Supervisor



VILLAGRIZ CONTRATISTAS S.R.L.
Marco Antonio Sully de la Cruz
GERENTE GENERAL



INGENIERO EN ELECTRICIDAD
HUGO RICARDO OCANA NAVARRETTA
RUC: 20101100000

HUGO RICARDO OCANA NAVARRETTA
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Table with 3 columns: Description of penalty (POLIZA CONTRA TODO RIESGO - CAR), Value (1 UIT), and Reference (Según informe del inspector y/o supervisor o del coordinador de la obra)

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

Official stamp and signature of C. CARRERA

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Handwritten signature and stamp of the General Manager

Official stamp of FONDEPES

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

Handwritten signature and stamp of Henry Horia Veliz Suarez

Vertical stamp and signature of Villacruz Contratas S.R.L.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y

Vertical stamp and signature of Hugo Ricardo Ocana Nava

Official stamp and signature of G. BURGOS



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS!

Las controversias que surjan entre LAS PARTES durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según acuerdo entre LAS PARTES.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45º de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

- DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Petit Thouars N° 115, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.
- DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Condominio Alcazar N° 310, edificio 01, departamento 101, distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima.

1 De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de contratos cuyo monto contractual original sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5000 000,00).



VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Marco Antonio Cruz de la Cruz
GERENTE GENERAL

HUGO RIGARDO OCANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200





"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

- Jr. Zepita N° 151, distrito de Los Baños del Inca - provincia y departamento de Cajamarca.

Asimismo, para efectos de las notificaciones durante la ejecución contractual señala el siguiente correo electrónico: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com y se considerara con la sola recepción del correo en su bandeja electrónica de EL CONTRATISTA.



La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2019.

FONDEPES
CARMINA GARRERA AMAYA
JEFE DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
LA ENTIDAD

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Marco Antonio Cruz de la Cruz
GERENTE GENERAL
EL CONTRATISTA

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Marco Antonio Cruz de la Cruz
GERENTE GENERAL

Hugo Ricardo Ocaña Navarro
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 60200

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

11.2 Acta de entrega de terreno.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Miguel Ángel P. Cruz
GERENTE GENERAL

Hector Peliz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

H-R-N

HUGO RICARDO ODAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO PARA EJECUCION DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°:	050-2019-FONDEPES
CONTRATO N°:	064-2019-FONDEPES
OBRA:	"AMPLIACION DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 22,9 KV. PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES."
UBICACION:	ACAPULCO, TUMBES.
ENTIDAD:	FONDEPES
CONTRATISTA:	VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L
PLAZO DE OBRA:	90 DIAS CALENDARIO.
MONTO DE OBRA:	S/ 295,860.04

Siendo las 16:30h. del día 10 de diciembre de 2019, se reunieron en el lugar de la obra en representación de **FONDEPES**, el Ing. Edward Manrique Rivera; en representación de la empresa Contratista de Ejecución de Obra **VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L**, el Señor **Henry Flavio Celiz Suarez** (Ing. Residente), Señor **Marco Antonio Gutty de la Cruz** (Representante) y, en representación de la Supervisión de Obra **Hugo Ricardo Ocaña Navarro**; con la finalidad de participar en la Entrega del Terreno para la ejecución de la obra:

"AMPLIACION DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 22.9 KV. PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES."


Luego de efectuar el recorrido y verificar la disponibilidad del lugar por el Contratista; se dio por entregado el terreno. Dando fe del acto, firman los participantes el presente documento en 03 originales, a los 10 días del mes de diciembre del año 2019.

POR EL CONTRATISTA DE EJECUCION

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.


Marco Antonio Gutty de la Cruz


REPRESENTANTE GENERAL
Marco Antonio Gutty de la Cruz
D.N.I. N° 44988244


Henry Flavio Celiz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG CIP 86090


Henry Flavio Celiz Suarez
D.N.I. N° 41998543

POR EL CONTRATISTA DE SUPERVISION


VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.



Hugo Ricardo Ocaña Navarro
D.N.I. N° 23002079


HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

POR FONDEPES


Ing. Edward Manrique Rivera
D.N.I. N° 29601070


Henry Flavio Celiz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 86090

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

11.3 Copia del Cuaderno de Obra.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Entero Porcentaje de la Cruz
GERENTE GENERAL

Henry David Celiz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 66090

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRETTA
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

CUADERNO DE OBRA



11

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

167

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

(DAGEN)

Asiento N° 14

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Del Residente de Obra

Del Residente de Obra

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

Fecha: 02/enero/2020.

* Se inicia el día con una charla de Seguridad, al personal técnico y obreros de la Ejecución de la Obra.

* Realizando la Ejecución de Trazo para la Excavación de Zanjas de 0.60x1.10m (Ancho x Prof), Terreno Semiraso.

* Se comunica al Supervisor de Obra, que ENOSA ya autoriza la Ejecución de la Obra con carta NTA 804 2020/ENOSA con fecha 02.01.2020. la misma que está dirigida al Sr. Jorge Roberto Pacheco Sánchez Director General de Supervisión PANDEDES.

Participan: Jrs. Residente de obra, Jrs. de Seguridad Operativa, oficiales y personal obrero.

Henry Flavio Celiz Suárez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
RES CIP 86090

Asiento N° 15

Fecha: 02/enero/2020

Supervisor de Obra

* Se verifica la excavación de zanja realizada por el personal de la contratista, recomendando que debe tener un ancho de 0.60x1.10m (Ancho x Profundidad).

* Se verifica que todo el personal técnico y obrero cuenta con todos sus implementos de seguridad.

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

HUGO RICARDO OCANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
ING. 16118114008

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

ESCRIBIR

Asiento N° 16 VILACRUZ CONTRATISTAS S.R.L. fecha: 04/enero/2020.

Del Presupuesto de obra Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

→ Se continúa con las excavaciones de zanjas del cable subterráneo de 0.60x1.10m (Ambar Proof), teniendo lo indicado en los planos del expediente e proceso por la Entidad.

→ Se informa al Supervisor que en el detalle del Dibujo, se indica la excavación e instalación de 03 tubos, por lo que en el presupuesto solo indica 01, para lo cual, pidiendo la aprobación si ven con 03 tubos de 3" o 01 tubo PVC de 4". La misma que debe ser coherente y lo aprobado por la Entidad.

Henry Flavio Cortiz Suárez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG CIP 85090

Asiento N° 17
Fecha: 04/Enero/2020
Supervisor de Obra

- * Se verificó la excavación de zanja con las dimensiones indicadas en el expediente técnico
- * Referente a la consulta de l uso de tubería para cable subterráneo se recomienda que se realice con una tubería por cada fase según detalle del plano.

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

HUGO RICARDO OCAMARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
INGENIERO SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



013

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

165

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____



Asiento N° 18 VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L. Fecha: 06/enero/2020

Del Presidente de Obra Marco Antonio Gutty de la Cruz GERENTE GENERAL

- Se inicia la jornada con una charla de Seguridad al personal técnico y obrero, por la ejecución de la obra.
- Seguidamente se procede al tapado de Trampas del Vertice No parte del PMI, hacia el Primer Pozo.
- Luego se realiza la instalación de Tubos (03 unidades) y la colocación de ladrillos y cinta roja de señalización en cada Trampa quenzado.
- Se solicita al Supervisor verificar los trabajos ejecutados por nuestra representantes.

Participan: Presidente, Seguridad, obreros, efectos y Obra.

Henry Flavio Celi Suárez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP 80090

Asiento N° 19

Fecha: 06/Enero/2020

Supervisor de Obra

- * Se verifica que el tapado de la tubería (03) esta siendo tapado con los estratos (Arena cerruda, Ladrillo, arena, cinta roja de Seguridad y señalización de Alta tensión y por ultimo la tierra originaria) este siendo colocada según especificaciones técnicas etc

*

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

HUGO RICARDO DE ROSA NAWIRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
ING. SUPERVISOR
Reg. CIP. Nº 8228

CUADERNO DE OBRA



014

164

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

VILLACROZ CONTRATADORA S.R.L.

DAUER

Asiento N° 20

Fecha: 08/09/enero/2020.

Del Residente de obra: Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

- Se continúa con la Excavación de Pozos del Bugon N° 01 al Bugon N° 02, respetando lo indicado en el Expediente Técnico.

- Seguidamente se indica que se está coordinando con ENOSA para el Estudio de Coordinación de la Conexión del Receptor en punto PMI.

- Se indica también que se está coordinando la instalación del PMI, en punto de Diseño, con la Concesionaria ENOSA.

- Participan: Residente de obra, Seguridad, Op, Of. Obra,

Henry Flavio Céliz Suárez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP 86090

Asiento N° 21

Fecha: 08/Enero/2020

Supervisor de Obra

* Se verifica la excavación de zanja y a la vez su tapado según especificación técnica.

* El estudio de Coordinación debe estar coordinado y aprobado por la concesionaria (ENOSA).

* lo referente a la coordinación del P.M.I realizarlo mediante documento, para la formalidad del caso.

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. RICARDO CÉSAR HUARDO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 68298

CUADERNO DE OBRAS



015

163

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____ (BACEN)

Asiento N° 22

VILLACRUZ CONTRATADORA S.R.L.

Fecha: 10-11/enero/2020

Del Residente de Obra: Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

- Se continúa con la Excavación de Zanja hasta el final de la Red Primera en 22.500', para ello se indica al Supervisor de Obra, verificar los trabajos realizados por mi representada.
- Se está presentando el día jueves la Obra a ENOSA, ~~presentando~~ presentando el corte, para la Instalación al PMI.
- Participan: Residente, Seguridad, op. ofic. Obra.

Henry Flavio Cútz Suárez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP 86090

Asiento N° 23

Fecha: 11/enero/2020

Supervisor de Obra.

- * Se verifica la Excavación de zanja del primer al segundo Buzón, recomendando que se coloque la tubería y las Capas (Estratos) de cobertura con las medidas de seguridad de los trabajos y para el personal en general.
Se recomienda avanzar en el tapado para prevenir un posible inadente y/o accidentes en la obra.
- * Se verifica que el personal cuente con todos los implementos de seguridad en buenas condiciones.

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

HUGO RICARDO OCARIMARRO
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 66266

CUADERNO DE OBRA

016



162

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____ DAGEB

Asiento N° 24 VILACRUZ CONTRATISTAS S.R.L. fecha: 13/enero/2020.
Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

Residente de Obra.

- Se inicia la semana con una charla de Seguridad, al personal Técnico y Obrero de Explotación de Obra.
- Se informa al Supervisor de Obra, que con carta N° 003-2020-05/Contratistas SAC, de fecha 13 de enero 2020, se solicita a ENASA, el Presupuesto para la instalación del PMI.
- Se procede a recibir el fopado de los ensijos, luego de finalizar la instalación de tuberías, accesorios y la Onda de Señalización Roja, de Alta Tensión en 22.9KV.
- Se verifica que los Trabajadores estén en la Póliza de Seguros, Salud y Pensión.
- Herramientas: Picos, Palanques, corchetas, Brocas, etc
- Equipos: Camionetas y más
- Personal: Residente de Obra, Seguridad Operarios Oficiales y obreros.

ING. INSPECTOR _____
Henry Flavio Félix Suárez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. C.I. 105098
ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR _____
HUGO RICARDO OCARA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. C.I. 105098
ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



017

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

DAVEN

Asiento No 25

Fecha: 13/Enero/2020

Supervisor de Obra

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

- * Dar seguimiento al documento (CARTA) presentada a la Concesionaria para evitar retrasos en la Obra.
- * Realizar una compactación al tramo del Buzón 01 al Buzón 02 para evitar algún posible daño a la tubería tapada.
- * Se recomienda al contratista programar con la debida anticipación la prueba de los equipos, que serán suministrados en la Obra.

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

Asiento N° 26

Fecha: 15/01/2020.

Del Residente de Obra.

- Se procede a la Evacuación de hoyos, para la instalación de Buzones, para ello se solicita a la Supervisión la opinión es posible realizar las dimensiones de 1.2x1.20x1.55 de prof. con la finalidad de cumplir con el radio de curvatura en la instalación del cable 1/2x5/7 de 50mm², y evitar que éste se quiebre, por cuyo efecto no habrá costos adicionales de mano de obra.
- Se recomienda que nuestro personal, consulte los instrumentos de Seguridad y Salud en obra.

Henry Flavio Céspedes Suárez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. 86090

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

CUADERNO DE OBRA



018

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

160

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

ENCUEN

Asiento N° 27

Fecha: 15/01/2020

Supervisor de Obra.

VILLACROZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Guty de la Cruz
GERENTE GENERAL

- * De acuerdo a lo solicitado por el residente de Obra referente a la excavación de hoyos para buzones y teniendo conocimiento que las dimensiones del los buzones según expediente son de 1.0 x 1.0 x 1.55 m y analizando que habrá una mejora en las dimensiones y no genera costo adicional se le autoriza su ejecución según lo solicitado por el residente de obra.
- * Se recomienda que todo el personal cuente con todos sus implementos de seguridad y estén cubiertos en la póliza de seguro de salud y pensión

Asiento N° 28

Fecha: 16/01/2020

Del Residente de Obra

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 66286

- Se procede a excavar el Buzon N° 01, con las dimensiones autorizadas por el Supervisor de Obra, conforme el Detalle de los Platos.
- Se solicita al Supervisor verificar los trabajos.

Henry Flavio Ortiz Suárez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP 86090

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
ING. SUPERVISOR
Reg. CIP. N° 66286

CUADERNO DE OBRA



019

159

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____



Asiento N° 29
Fecha: 16/01/2020
Supervisor de Obra.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

- * Se verifica que los buzones en este caso el buzón N° 1 está siendo encofrado, según las dimensiones autorizadas.
- * Se recomienda que realice y que tengan cuidado al (vaciado) del concreto y piedra encofrado.

Asiento N° 30

Residente de Obra

Fecha: 17-18/01/2020.

HUGO RICARDO OCARA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 66200

- Se procede a realizar el vaciado del Buzón N° 01, teniendo cuidado en ser limpieza del Buzón y la mezcla respectiva.
- Participan: Residente de Obra, Op. Ef, obreros

Henry Flavio Cárta Suárez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. 66090

Asiento N° 31
Fecha: 18/01/2020
Supervisor de Obra

- * Se verifica que se realice el vaciado del Buzón N° 01 de una buena manera.

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

HUGO RICARDO OCARA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 66200

CUADERNO DE OBRA



020

158

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

UBICACION: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

DAGER

Asiento N° 32

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Fecha: 20/01/2020

Del Residente de obra Marco Antonio Gutty de la Cruz GERENTE GENERAL

- Se inicia la semana con los checks de Seguridad del personal técnico y obrero de obra.
- Se procede mientras el buzón N° 02 de examen de la ejecución de la obra.
- Personal: Operario, Oficiales, obreros.

[Signature]
 Henry Flavio Céliz Suárez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG CIP 86090

Asiento N° 33

Fecha: 20/01/2020

Supervisor de Obra

* Se verifica el vaciado del Buzón N° 02 de una manera adecuada.

[Signature]
 HIRSO RICARDO OCASA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60208

Asiento N° 34

Del Residente de obra

Fecha: 21/01/2020

- Se procede a vaciar el Buzón N° 02, de la ejecución de la obra.
- También se informa al Supervisor que el día jueves y viernes 23 y 24 respectivamente, se están

[Signature]
 Henry Flavio Céliz Suárez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG CIP 86090
 ING. RESIDENTE

ING. INSPECTOR

[Signature]
 HIRSO RICARDO OCASA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60208

CUADERNO DE OBRAS



021

157

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marcos Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

EDICION

Revisando los planos eléctricos de las Celdas de
Allegado, Celda de Protección, Celda de Transformación
Bajo Tensión de 35KV, Reclosers, por lo que
se invita a presencia dichos equipos, en los
fechas programadas.

Henry Flavio Celiz Suárez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG CIP 86090

Asiento N° 35

Fecha: 21/01/2020

Supervisor de Obra

- * Se verifica el correcto vaciado del buzón N° 02 con los agregados y fierro (armado) para su mejor estructura.
- * Se procederá a viajar para estar presente en las pruebas de los equipos descritos por el residente de obra.

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

Asiento N° 36

Del Residente de obra

f. 22.01.2020

Se comunica al Supervisor de obra, que se está
revisando los cables eléctricos 12x84, cable 35KV


Henry Flavio Celiz Suárez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG CIP 86090

ING. INSPECTOR

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

Residente

CUADERNO DE OBRA



022

156

FECHA: _____

MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

ENTIDAD EJECUTORA: _____

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

(DABER)

Cables #2XH de 4x1x300mm², Cable TW 750V 1x35mm²
Duro, Cable cer. de 95mm² y 50mm² de Cu, y CPT de
Jomel por ser de poca cantidad, no es necesario
pases para ello se informo para conocimiento
respectivo.

También se informa que se está evaluando con
la excavación de hoyos de P.T. de la DMI,
trapeo, reboso, y medidas eléctricas multifun-
cional de obra, es preciso solo los cables
betonita y cemento conductivos para su instalación.

Participan: Jig. Residente de Obra, Seguridad,
Operarios, Oficiales, Obreros, etc.

Henry Flavio Céliz Suárez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG CIP 86090

Asiento N° 37

Fecha: 22/01/2020

Supervisor de Obra

- * Por los cables eléctricos sirvase adjuntar sus guías de remisión
- * Se recomienda la señalización de los hoyos hasta la instalación de cada uno de ellos.

HUGO RICARDO OCARA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

HUGO RICARDO OCARA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

CUADERNO DE OBRA



023

155

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 TÍTULO: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

DAGER

Asiento n° 23

Fecha: 25/enero/2020.
VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Del Residente de Obra

- Se indica que los días 23 y 24 de enero se participó en la ciudad de Lima en los trabajos eléctricos según el Ite correspondiente.

Día Jueves 23: Fábrica MENDUTA ELECTRIC SA.
Trabajos Eléctricos:

- Transformador seco 3/5KV, Marca MENDUTA ELECTRIC SA.
- Placa tipo: TDTS
- serie: 1025-12
- Participan:

- * Ing. Henry Celis José Residente de obra.
- * Ing. Katty Villacruz V. Representante de Villacruz
- * Ing. Hugo Osorio Navarro Supervisor de Obra
- * Ing. Nelson Jacobo Caceres Sup. FONDEPES.
- * Ing. Alfredo Alvarado Álvarez Jefe de Los. Mantent.

(2) Cables: ~~24KV~~ Decimador de Potencia:

Marca: SAREL.
Tensión Nominal: 24KV
Serie: 2018.00.0122/0.

Participan:

- * Ing. Henry Celis J. Residente de obra.
- * Ing. Katty V.V. Villacruz Contr. S.R.L.
- * Ing. Hugo Osorio N. Sup. de Obra.

ING. INSPECTOR

Henry Celis Suárez
RESIDENTE
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP 86090

Continúa
HUGO RICARDO OCARA NAVARRO
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
INGENIERO SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
CARRERA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL



Ing. Alfredo Manant Alvarado
Ing. Ruben Yacocca Cruzado

Jefe Lab. Manant
Coordinador de
FONDEPES:

Existiendo una abstracción referente al Role de Protección no especificado en el Exp. Técnico, para ello se queda coordinar con ENOSD, Supervisor Ing. José Nazario Sacrovides, referente al uso del mismo, pero que los equipos están listos para su operación Eléctrica, quedando conforme.

Henry Flavio Céliz Suárez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP 86090

Día 24/enero/2020

→ Se participa de las Pruebas Eléctricas del Reconector Automático.

Marca: RESPAD.

Año = 01-2020.

Serie = 5D1176.

Modelo = RIVE 27KV-3F.

Participan:

- Ing. Henry Céliz Suárez Residente de Obra.
- Ing. Hugo Ocaña N. Supervisor de Obra.
- Ing. Ruben Yacocca C. Especialista FONDEPES.

Quedando conforme, y listos para su traslado a Obra, autorizado por el Supervisor de la Obra.

ING. INSPECTOR

Henry Flavio Céliz Suárez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP 86090
PRESIDENTE

HUGO RICARDO OCAÑA NABARRO
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP N° 60208
ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



25

153

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

Asiento N° 39

Fecha: 25/01/2020

Supervisor de Obra

VILLACROZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz.
GERENTE GENERAL

- * Se participo de las pruebas programadas descritos por el residente de Obra, con presencia del especialista en electricidad de la entidad (FONDEPES)
- * Se autoriza a la contratista el traslado de los equipos a la obra.

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 86200

Asunto N° 40

Fecha: 27/enero/2020

Del Residente de Obra


- Se procede a realizar la recepción de equipos en obra, así como también los cables y otros accesorios.
- Se programa, la instalación de cables Nexs y subtensores, en los Zaps de Media Tensión.
- Participan: Residente de Obra,
Seguridad, Operarios, oficiales, obreros
Honorarios Manuales: Varios.

ING. INSPECTOR

Henry Flavio Céliz Suárez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG CIP 86090

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 86200

CUADERNO DE OBRA



UBICACIÓN: _____ MODALIDAD: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

Asiento N° 41

Fecha: 27/01/2020

Supervisor de Obra

VILLACRIZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

* Se recomienda que se realice una correcta descarga de los equipos y cables para evitar su daño a la vez que se almacenen en buenas condiciones para evitar daños del material descrito por el residente de obra.

Asiento N° 42

Fecha: 28/enero/2020.

Del Residente de Obra

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. C.M.C. N° 80208

* Se procede a realizar el tendido del cable N2XSY de 1x50mm² por fase, teniendo mucho cuidado que este no se anastre y no sufra esfuerzos que puedan comprometer con el aislamiento del conductor.

Se solicita al Supervisor de Obra, verificar los trabajos realizados en obra.

Participan:

- Ing. Residente de Obra
- Ing. Seguridad, of y oficios

ING. INSPECTOR

Henry Flavio Celiz Suárez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. C.M.C. N° 80208
RESIDENTE

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
ING. RESIDENTE

CUADERNO DE OBRA



HA: _____ MODALIDAD: _____
A: _____
YECTO: _____
GRAMA: _____
IDAD EJECUTORA: _____ (DACC)

Asiento N° 43

Fecha: 28/Enero/2020

Supervisor de Obra

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL.

* Se verifica que realiza el correcto tendido del cable N2XSY 1x50 considerando las fases correcta (R,S,T), para un nivel de tensión 22.9 KV.

HUGO RICARDO OCARA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

Asiento N° 44

Fecha: 29/Enero/2020

Del Residente de Obra.

- Se continúa con el tendido del cable N2XSY de 1x50mm², en las fases R,S,T, premiando que el cable no se amastre y/o quiebre para obtener resultados favorables en su prueba.

- Se instala la fuente a tierra del PMI, Redasec, Mexamix, y medidor multifunción, así como también, se tapa y cubre de los cajas de registro en cada caso.

- Participan: Residente de Obra, Depend. Oper., oficial, Obra.

ING. INSPECTOR

Henry Flavio Cárdenas Suárez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 60200

HUGO RICARDO OCARA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____ (DAGER)

Asiento N° 45

Fecha: 29/Enero/2020

Supervisor de Obra

VILLACUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

- * Se verifica que se realiza y continuación del tendido del cable Nexsy de $1 \times 50 \text{ mm}^2$ con sus respectivas Fases R, S, T
- * Se verifica la correcta instalación de cada una de las puestas a tierra del PHI, RECLOSER, TRAFOMIX cada uno con su respectiva tapa y caja de registro.

HUGO RICARDO OCAÑA NABARRO
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60299

Asiento N° 46
Del Residente de Obra

Fecha: 30/Enero/2020

- Se procede a realizar el izado de poste en PHI, junto con los momentos de ese de 1.2m, 1.0m, 0.8m, por ello, se solicita su verificación por parte de la Supervisión.
- Se indica al Supervisor que el cambio de momentos se debe al tipo de armados a utilizar en cumplimiento de la norma técnica de CSE - Distancia de Seguridad, ya que según como se han proyectado no estarían cumpliendo respecto al Recloser y Trafomix.
- Por lo que solicita su autorización y aprobación respectiva.

ING. INSPECTOR

Henry Plavio Celiz Suárez
ING. RESIDENTE
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG CIP 86090

HUGO RICARDO OCAÑA NABARRO
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
ING. RESIDENTE
REG. CIP. N° 60299

CUADERNO DE OBRA



029
149

CHA: _____ MODALIDAD: _____
RA: _____
YECTO: _____
GRAMA: _____
IDAD EJECUTORA: _____



Asiento N° 47

Fecha: 30/Enero/2020

Supervisor de Obra

VILLACRIZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

- * Se verifica el izado de poste, con respecto al uso de mensulas se a tomado en cuenta el cumplimiento de las distancias de seguridad (CNE-SUMINISTRO 2011), por lo que sí es factible su instalación.
- * Se recomienda al contratista coordinar con la Concesionaria (ENOSA) la instalación del PMI y el medidor multifunción, así como su conexión al punto de diseño otorgado por dicha entidad.

CJ

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 86200

Asiento N° 48


Del Residente de Obra

Fecha: 31/Enero/2020

- Se instala los accesorios en paraterra en el PMI, así como los Secionadores Cut up de 500 amp, por lo que se verifica su correcta instalación.
- Se informa al Supervisor de Obra, que la ~~esta~~ Valorización N° 02 de Ejecución de Obra, queda al 76.01% haciendo un acumulado del 80.43% del monto acumulado; estando aprobado conforme al cronograma otorgado, modificado a la fecha de rubrica de término.
- Se concilia probados, y se prepara documentación para su presentación definitiva, en cumplimiento

Continua

ING. INSPECTOR

Henry Flavio 
RESIDENTE
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. 86090

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO SUPERVISOR
Reg. CIP. N° 86200

CUADERNO DE OBRAS



030
148

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
LUGAR: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL



Del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
y sus modificaciones
Por lo que se solicita, se presente respectivo.

Henry Flavio Céliz Suárez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP 88090

Asiento N° 49

Fecha: 31/Enero/2020

Supervisor de Obra

- * Se aprueba el armado del P.M.I
- * Se solicita al residente de obra preparar la documentación de la valorización N° 02 incluyendo el cálculo de fórmula polinómica al mes de diciembre del 2019 para su trámite y aprobación conforme al reglamento de la ley de contrataciones del estado y sus modificatorias.
Debe adjuntar su Factura correspondiente al mes de enero del 2020.

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 68290

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

4
HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 68290

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas.srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

11.4 Carta del Cronograma Valorizado de Obra, modificado a la entrega de terreno.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Hugo Ricardo Ocará Navarro
C.A. VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Henry María Celiz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 1170000

HUGO RICARDO OCARA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

RUC N° 20570531787

OBRA: AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PESQUEROS ARTESANALES EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES

Distrito de Zorritos, 23 de diciembre del 2019

CARTA N° 006 - 2019-VC/Contratistas SRL - Acapulco-distrito de Zorritos.

Srs.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

ATENCION:

ING. EDWARD MANRIQUE RIVERA
COORDINADOR DE OBRA - FONDEPES
LIMA

ASUNTO : HACE CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA MODIFICADO A LA FECHA DE ENTREGA DE TERRENO.

OBRA : "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PESQUEROS ARTESANALES EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES".

Referencia : CONTRATO N° 064-2019-FONDEPES, de fecha 26.11.2019.

Por la presente le saludo cordialmente y al mismo tiempo para hacerle llegar el Cronograma Valorizado de Obra, modificado a la fecha de la entrega de terreno para la ejecución de la obra: TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION, para la ejecución de la obra: AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PESQUEROS ARTESANALES EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES, para su aprobación resolutive con fines de valorización mensual contractual de ejecución de Obra.


Sin otro particular, me despido de Usted, aprovechando la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
[Signature]
Marco Antonio Ocaña Navarro
GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
[Signature]
Marco Antonio Ocaña Navarro
GERENTE GENERAL

CC.
Archivo

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	
	
2994633	
N° DOC:	00013098-2019
CLAVE:	9767
FECHA Y HORA:	26/12/2019 00:31:49
TELEFONO:	2087780
www.fondepes.gob.pe	

[Signature]
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia
Contraalmirante - Tumbes

E-mail Empresa:
Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107


[Signature]
HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200


CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORADO, MODIFICADO CON LA ENTREGA DE TERRENO


AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22.9 KV - 56, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PESQUEROS ARTESANALES EN LA LOCALIDAD DE AGAPILCO - ZORRITOS, CONTRALIBRANTE VILLAR - TUMBES

Subproyecto: INSTALACIONES ELÉCTRICAS MEDIA TENSIÓN
 Obra: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 Lugar: TUMBES - CONTRALIBRANTE VILLAR - ZORRITOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	METRADO	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	MES 01: 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019		MES 02: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020		MES 03: 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020		MES 04: 01 AL 09 DE MARZO DEL 2020	
						METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES				7,564.00								
1.01	TRANSPORTE DE MATERIALES ELÉCTRICOS LIMA - TUMBES	caj	1.00	6,300.00	6,300.00								
1.02	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA	km	0.11	339.80	39.47								
1.03	CARTEL DE OBRA	U	1.00	1,024.50	1,024.50								
2.00	OBRAS PROVISIONALES				9,463.60								
2.01	INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN (OFICINAS Y ALMACÉN)	m2	70.00	83.71	6,559.70								
2.02	SS.HH. PORTÁTILES	cb	1.00	1,000.00	1,000.00								
2.03	AGUA PARA LA OBRA	cb	1.00	1,000.00	1,000.00								
2.04	ENERGÍA PARA LA OBRA	cb	1.00	923.90	923.90								
3.00	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				3,466.64								
3.01	ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ELÉCTRICO	pb	1.00	1,500.00	1,500.00								
3.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ELÉCTRICO	pb	6.00	270.63	2,165.64								
4.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS MEDIA TENSIÓN				197,576.70								
4.01	PUNTO DE DISEÑO, PROTECCIÓN Y MEDICIÓN				1,518.74								
04.01.01	ARMADO Y CONEXIÓN DE PUNTO DE DISEÑO	pb	1.00	1,518.74	1,518.74								
4.02	PUNTO DE PROTECCIÓN Y MEDICIÓN				74,961.82								
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE C.A.C. 154002/10A35 Y ACCESORIOS	und	1.00	2,712.38	2,712.38								
04.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA (ARMADO PM)	und	1.00	1,490.20	1,490.20								
04.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECCIONADORES TIPO CUT-OUT, 36 KV, 100A, 170 AVAIL, INC. EXTENSOR DE LÍNEA DE FUGA	und	1.00	1,672.53	1,672.53								
04.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECONECTOR DE POTENCIA (RECLOSER), 27KV, 1500V BIL, 030A, INC. ACCESORIOS	und	1.00	54,994.87	54,994.87								
04.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAFOMAX TRIFÁSICO, RELACION 22.9/0.23 KV, 10-200VA, 00VZ, CLASE 0.2S	und	1.00	11,087.93	11,087.93								
04.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA MULTIFUNCIÓN, INC. MURETE, CAJA PORTAMEDIDOR Y CABLE	und	1.00	2,603.91	2,603.91								
4.03	RED SUBTERRÁNEA				17,702.82								
04.03.01	EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 0.80 x 1.10m (ANCHO x PROF.) TERRENO SEMIROCOSO	m3	66.68	76.38	5,091.49								
04.03.02	EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 0.60 x 1.06m (ANCHO x PROF.) TERRENO SEMIROCOSO	m3	3.78	72.73	274.92								
04.03.03	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS	m	124.00	17.18	2,130.32								
04.03.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCESIVAMENTE	m3	18.97	21.26	403.30								


HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200


VILLACRUZ CONTRATAS S.R.L.
 GENERAL


Henry Flayo Celiz Suárez
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATAS S.R.L.


Henry Flayo Celiz Suárez
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA


CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, MODIFICADO CON LA ENTREGA DE TERRENO

AMPLIACION DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PESQUEROS ARTESANALES EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - ZORRITOS, CONTRALIBRANTE WILLAR - TUMBES

INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
TUMBES - CONTRALIBRANTE WILLAR - ZORRITOS


ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	MES 01: 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2019		MES 02: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020		MES 03: 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020		MES 04: 01 AL 09 DE MARZO DEL 2020	
						METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO
04.03.05	CORTE, ROTURA Y REPOSICION DE ASFALTO	m	6.00	37.43	224.58			6.00	224.58				
04.03.06	CORTE, ROTURA Y REPOSICION DE CONCRETO PARA VEREDA	m	96.00	71.03	6,818.88			96.00	6,818.88				
04.03.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 4 VAS (INCLUYE SOLDADO)	und	6.00	94.48	566.88			6.00	566.88				
04.03.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P Ø 100mm	m	95.00	23.07	2,191.65			95.00	2,191.65				
4.04	BUZONES												
01.05.01	BUZON DE CONCRETO DE 1.00x1.00x1.56m (LADO X LADO X PROF.)	und	2.00	1,537.56	3,075.12		0.00	2.00	3,075.12				0.00
4.05	CABLES Y CONDUCTORES												
04.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NZXSY 1800 KV DE 50mm ²	m	372.00	34.34	12,774.48		0.00	372.00	12,774.48				0.00
04.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO TIPO AAAC-50mm ² CON GRASA	m	61.00	5.81	470.61			61.00	470.61				0.00
04.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NZXH 4-1x300mm ²	m	15.00	474.86	7,122.76			15.00	7,122.76				0.00
4.06	TERMINALES TERMOCONTRAIABLES												
04.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL TERMOCONTRAIABLE PAISO EXTERIOR 28KV.	lot	3.00	975.79	2,927.37		0.00	3.00	2,927.37				0.00
04.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL TERMOCONTRAIABLE PAISO INTERNO, 28KV.	lot	1.00	871.43	871.43			1.00	871.43				0.00
4.07	EQUIPAMIENTO DE SUBESTACION												
04.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS MODULARES TIPO COMPACTAS 24KV, 630A, 20KA	gb	1.00	20,514.25	20,514.25		0.00	1.00	20,514.25				0.00
04.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE TRANSFORMACION Y CONEXION YVW6	und	1.00	38,758.62	38,758.62			1.00	38,758.62				0.00
04.07.03	CONEXION DE CABLE BT DE 300mm ² AL TRANSFORMADOR	und	1.00	657.51	657.51			1.00	657.51				0.00
4.08	POZO PUESTA A TIERRA												
04.08.01	POZO A PUESTA TIERRA DE MT EN SUBESTACION R<25 OHMS	und	1.00	1,036.93	1,036.93		0.00	1.00	1,036.93				0.00
04.08.02	POZO A PUESTA TIERRA DE NEUTRO DE BT R<15 OHMS	und	1.00	1,036.93	1,036.93			1.00	1,036.93				0.00
04.08.03	POZO A PUESTA TIERRA EN PUNTO DE MEDICION R<25 OHMS	und	1.00	1,036.93	1,036.93			1.00	1,036.93				0.00
04.08.04	POZO A PUESTA TIERRA EN PUNTO DE MEDICION R<25 OHMS	und	1.00	1,036.93	1,036.93			1.00	1,036.93				0.00
04.08.05	POZO A PUESTA TIERRA PRECLOSER, R<25 OHMS.	und	1.00	1,036.93	1,036.93			1.00	1,036.93				0.00
04.08.06	CONDUCTOR DE CU 1x95mm ² DESALDO	m	10.00	35.36	353.60			10.00	353.60				0.00
04.08.07	CONDUCTOR DE CU 1x50mm ² DESALDO	m	10.00	20.53	205.30			10.00	205.30				0.00
4.09	SEÑALIZACION												
04.09.01	SEÑALIZACION DE PUESTA A TIERRA	und	5.00	17.85	89.25		0.00	2.00	35.70				0.00


 HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA


 HENRY FLAYIB CELIZ SUÁREZ
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA

VILLACRENS CONSULTORES S.R.L.


Henry Flayib Celiz Suárez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA


 HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, INDICADO CON LA ENTREGA DE TERRENO													
AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION EN 230 KV - 30, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PERQUEROS ARTESANALES EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - ZORRITOS, CONTRALIBRAMIENTE VILLAR - TUNDES													
SUBESTACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION													
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL													
TUNDES - CONTRALIBRAMIENTE VILLAR - ZORRITOS													
ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	MES 01: 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019		MES 02: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020		MES 03: 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020		MES 04: 01 AL 09 DE MARZO DEL 2020	
						METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO
04.09.02	SEÑALIZACION DE SUBESTACION	und	1.00	64.61	64.61			0.50	32.31	0.50	32.31		
04.09.03	SEÑALIZACION DE BUENOS ELECTRICOS	und	2.00	24.61	49.22			1.00	24.61	1.00	24.61		
04.10.01	EQUIPOS DE PROTECCION Y MANOBRAS	gp	1.00	3,016.35	3,016.35			0.00	0.00		0.00		3,016.35
04.11.01	EQUIPOS DE PROTECCION Y MANOBRAS DE MEDIA TENSION	gp	1.00	3,016.35	3,016.35			0.00	0.00		0.00		3,016.35
04.11.02	PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO	gp	1.00	5,991.62	5,991.62			0.00	0.00		0.00		5,991.62
04.11.03	COSTO DE CONEXION Y ENERGIZACION DE LA RED	gp	1.00	2,300.00	2,300.00								2,300.00
04.11.03	PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO	gp	1.00	1,061.62	1,061.62								1,061.62
04.11.03	EXPEDIENTE TECNICO FINAL CONFORME A OBRA	und	1.00	2,600.00	2,600.00								2,600.00
4.12	VANOS												
04.12.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE FIERRO DPLATINA 1 1/4" x 3/16", DUCTO DE VENTILACION	m2	1.00	238.30	238.30					1.00	238.30		
04.12.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA ESTRADA LAC 3/16" DE ESPESOR SOBRE PERFIL ANGULAR	m2	3.27	262.11	857.10					3.27	857.10		
04.12.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE MALLA DE ACERO GALVANIZADO	m2	2.88	175.12	515.87					2.88	515.87		
COSTO DIRECTO						216,025.04	8,916.43	117,850.85	86,112.29			11,863.54	
GASTOS GENERALES													
UTILIDAD						21,862.51	891.54	11,752.82	8,911.33			1,146.55	
SUB TOTAL						18,991.25	468.77	5,476.54	4,995.66			673.28	
I.B.V.						284,728.83	10,252.73	155,100.47	82,139.27			13,168.37	
MONTO TOTAL OFERTA ECONOMICA						48,131.79	1,848.48	24,328.89	18,880.45			2,373.37	
CON: EGRESOS MATERIALES Y FUENTES DE INFORMACION SUBMITIDA Y FOTOFOLIO						285,098.94	12,893.22	159,489.35	106,713.72			15,588.74	
PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL DE EJECUCION DE OBRA							4.86%	53.91%	36.74%			5.38%	
PORCENTAJE DE ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCION DE OBRA							4.86%	57.86%	93.74%			100.00%	

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
 VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
 VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

[Handwritten Signature]
 HENRY FLAYO CÉLIZ SUÁREZ
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA

[Handwritten Signature]
 HENRY FLAYO CÉLIZ SUÁREZ
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 86090

[Handwritten Signature]
 HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
 VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
 VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.



MENAUTT ELECTRIC S.A.C.

Fabricación, Reparación y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos

Mz. M Lt. 3 Avp. El Dorado Alameda Del Norte Sector 13

Puente Piedra - Lima - Lima

Cel.: 985 033 535 - 947 543 748 - 999 492 922

E-mail: menautt@menauttelectric.com.pe Web: www.menauttelectric.com.pe

R.U.C. 20428875878

GUIA DE REMISION - REMITENTE

001- N° 007823

PUNTO DE PARTIDA

.....**CHANCHAMAYO MZ. "M" LOTE 3 AVP. EL DORADO ALAMEDA**.....

.....**DEL NORTE SECTOR 13. PUENTE PIEDRA. LIMA.**.....

Fecha de Emisión: **25/01/2020** Fecha de inicio de traslado:

PUNTO DE LLEGADA

.....**OFICINA DE PIURA**.....

Nombre ó Razón Social del Destinatario:
VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L

R.U.C.: **20570531787**

UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

Marca y N° de Placa:

Constancia de Inscripción: Lic. de Conducir:

EMPRESA DE TRANSPORTES

Nombre ó Razón Social:
SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.

JR. RAYMONDI NRO. 113 LIMA - LA VICTORIA

R.U.C.: **20512528458**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID. MEDIDA	PESO TOTAL
ITEM 01	<p>TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO SECO DE LAS SGTES. ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p> <p>MARCA: MENAUTT ELECTRIC</p> <p>POTENCIA: 315 KVA</p> <p>TENSION : 22900/400-231V</p> <p>CONEXIÓN: YNyn6</p> <p>ALTITUD 1000 M</p> <p>SERIE : 1025-12</p> <p>CONTACTO SR. MARCO ANTONIO GUTTY DE LA CRUZ Y/O KENNY VILLALOBOS DNI 44988244</p> <p>ACCESORIOS " 04 RUEDAS DE 4"</p>	01	Unid.	

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

[Signature]


HUGO RICARDO OCANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

MOTIVO DEL TRASLADO:

1. Venta <input type="checkbox"/>	4. Consignación <input type="checkbox"/>	7. Traslado de bienes para transformación <input type="checkbox"/>	10. Traslado Zona Primaria <input type="checkbox"/>
2. Venta sujeta a Confirmación de comprador <input checked="" type="checkbox"/>	5. Devolución <input type="checkbox"/>	8. Recajo bienes <input type="checkbox"/>	11. Importación <input type="checkbox"/>
3. Compra <input type="checkbox"/>	6. Traslado entre establecimientos de una misma empresa <input type="checkbox"/>	9. Traslado por Emisor /Itinerario de Comprobantes de Pago <input type="checkbox"/>	12. Exportación <input type="checkbox"/>
14. Otros no incluidos en los puntos anteriores			13. Venta con entrega a terceros <input type="checkbox"/>

COMPROBANTE DE PAGO

Tipo _____ N° _____



CORGRAPHIC E.I.R.L.
R.U.C. 20451535685

DESTINATARIO



MENAUTT ELECTRIC S.A.C.

Fabricación, Reparación y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos

Mz. M Lt. 3 Av. El Dorado Alameda Del Norte Sector 13

Puente Piedra - Lima - Lima

Cel.: 985 033 535 - 947 543 748 - 999 492 922

E-mail: menautt@menauttelectric.com.pe Web: www.menauttelectric.com.pe

R.U.C. 20428875878

GUIA DE REMISION - REMITENTE

001- N° 007824

PUNTO DE PARTIDA

CHANCHAMAYO MZ. "M" LOTE 3 APV. EL DORADO ALAMEDA DEL NORTE SECTOR 13. PUENTE PIEDRA. LIMA.

Fecha de Emisión: 26/01/2020 Fecha de inicio de traslado:

PUNTO DE LLEGADA

OFICINA DE PIURA

Call Tacna 511

Nombre ó Razón Social del Destinatario:

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L

R.U.C.: 20570531787

UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

Marca y N° de Placa:

Constancia de Inscripción:

Lic. de Conducir:

EMPRESA DE TRANSPORTES

Nombre ó Razón Social:

SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.

JR. RAYMONDI NRO. 113 LIMA - LA VICTORIA

R.U.C.: 20512528458

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID. MEDIDA	PESO TOTAL
ITEM 01	CELDA COMPACTA DE REMONTE 24KV SERIE: SE/275-12	01	Unid.	
ITEM 02	CELDA COMPACTA DE SALIDA 24KV, MARCA SAREL SERIE: SE/276-12	01	Unid.	
REFERENCIA		ORDEN DE COMPRA No. 014-2019		
CONTACTO		SR. MARCO ANTONIO GUTTY DE LA CRUZ Y/O KENNY VILLALOBOS DNI 44988244		
ACCESORIOS		01 CAJITA DE MADERA CONTIENE: 03 FUSIBLES DE 24KV - 10A 01 PALANA DE MANIOBRA 01 LLAVE CELDA		
		<p>VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.</p> <p>Marco Antonio Guty de la Cruz GERENTE GENERAL</p> <p>HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO INGENIERO MECANICO/ELECTRICISTA Reg. CIP. N° 60200</p>		

MOTIVO DEL TRASLADO:

- 1. Venta
- 2. Venta sujeta a Confirmación de comprador
- 3. Compra
- 4. Consignación
- 5. Devolución
- 6. Traslado entre establecimientos de una misma empresa
- 7. Traslado de bienes para transformación
- 8. Recajo bienes
- 9. Traslado por Emisor Itinerante de Comprobantes de Pago
- 10. Traslado Zona Primaria
- 11. Importación
- 12. Exportación
- 13. Venta con entrega a terceros
- 14. Otros no incluidos en los puntos anteriores

COMPROBANTE DE PAGO

Tipo _____ N° _____

DESTINATARIO

CORGRAPHIC E.I.R.L.
R.U.C. 20451535685



Marco Antonio Guty de la Cruz
INGENIERO MECANICO/ELECTRICISTA

Hugo Ricardo Ocaña Navarro
INGENIERO MECANICO/ELECTRICISTA

2020-01-26 10:58 AM

ONE LUX S.A.C.

**GUÍA DE REMISIÓN
ELECTRÓNICA - REMITENTE
RUC: 20602341586
EG01-917**

DATOS DEL TRASLADO

Fecha de Emisión : 2020-01-29
 Fecha de Inicio del traslado : 2020-01-29
 Motivo de traslado : Otros motivos - MATERIAL PUESTO EN PLANTA OC 28-01-2020
 Modalidad de transporte : Transporte Privado
 Peso Bruto Total de la Guía (KGM): 4000

DATOS DEL DESTINATARIO

Apellidos y nombres, denominación o razón : VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
 Documento de identidad : 20570531787

Hugo Ricardo Ocaña Navarro
 HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

DATOS DEL PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA

Dirección del punto de partida : 130104 - SECTOR EL MILAGRO LOTE 3
 Dirección del punto de llegada : 240101 - PAN NORTE SIN NUM DISTRITO ZORRITOS TUMBES

DATOS DEL TRANSPORTE

Datos de los Vehículos *Rubio García Cason*

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco A. García
 Marco A. García, Jefe de la Cruz
 C. Villacruz S.R.L.

Nro. placa

D4H-776

T0K-973

Datos de los Conductores *Victor Gonzales Torres - Brebete: @ 25858003*


Nro.	Tipo doc.	Nro docu
1	DNI	25858003

DATOS DE LOS BIENES *3 cosas de Madero - Generador y Placas*

Nro	Cod. bien	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	0001	POSTE DE 15 400 210 435 CON PERILLA	NIU	1
2	0002	MENSULA DE 0.80 250	NIU	1
3	0003	MENSULA DE 1.00 250	NIU	1
4	0004	MENSULA DE 1.20 250	NIU	1
5	0005	PALOMILLA DE 2.20	NIU	1
6	0006	MEDIA LOZA DE 1.30 750	NIU	1
7	0007	CAJA PARA P.A.I CON TAPA	NIU	5

David Diaz Bada
 29-01-2020
 ENTREGADO

LA MERCADERIA ES ENTREGADA CONFORME, SALIDA DE PLANTA NO HAY RECLAMO



J&S ELECTRICO S.R.L.

SUMINISTROS DE MATERIALES
ELECTRICOS
ALTA, MEDIANA Y BAJA TENSION

Jr. Junin N° 1451 Oficina 6 - Barrios Altos - Lima - Lima
Teléf.: 328-0885 / 998 261 809

R.U.C. 20602790429

GUIA DE REMISION-REMITENTE

0001- N° 000072

Fecha de Emisión: 28.01.20

Fecha de inicio del traslado: 28.01.20

DOMICILIO DE PARTIDA

DIRECCION: JR JUNIN
 Nº: 1451 INTERIOR: 6 ZONA: LIMA
 DIST.: PROV.: DEP.: LIMA

DOMICILIO DE LLEGADA

DIRECCION: OF. SHALOM.
 Nº: INTERIOR: ZONA:
 DIST.: PROV.: DEP.: PURA

DESTINATARIO

APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL: VILLACRUZ
 CONTRATISTAS S.R.L.
 R.U.C. Nº: 20570531787
 TIPO Y Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTORES

VEHICULO MARCA Y PLACA Nº:
 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Nº:
 LICENCIA DE CONDUCIR Nº:
 COSTO MINIMO DEL TRASLADO:

CODIGO DE IDENTIFICACION	CANTIDAD	PESO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION (Detallada de los bienes)	TOTAL
	10		BOLS.	CEMENTO CONDUCTIVO	
	10		BOLS.	BENTONITA SUDICA	
RECOGE: MARCO ANTONIO GUTTY OCLA CRUZ DNI. 44988244 Y/O KENNY VILLALBO					

TA VALENZUELA STEFANNIE MICHELLE
 R.U.C. 10415611019
 SERIE 0001 DEL 1 AL 200
 Aut. N° 13272109023
 F.I. 12-01-2018

TRANSPORTISTA

NOMBRE:
 R.U.C.:

COMPROBANTE DE PAGO

TIPO Y NUMERO: 006 0011

MOTIVO DEL TRASLADO

1. VENTA 6. TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS 10. TRASLADO ZONA PRIMARIA
 2. VENTA SUJETA A CONFIRMACION DE LA MISMA EMPRESA 11. IMPORTACION
 DEL COMPRADOR 7. TRASLADO DE BIENES PARA TRANSFORMACION 12. EXPORTACION
 3. COMPRA 8. RECOJO DE BIENES TRANSFORMADOS 13. EXHIBICION
 4. CONSIGNACION 9. TRASLADO POR EMISSOR ITINERANTE 14. DEMOSTRACION
 5. DEVOLUCION 15. OTROS

Conformidad del Cliente

J&S ELECTRICO S.R.L.

DESTINATARIO

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty Oclá Cruz
GERENTE GENERAL

Henry Flavia Celis Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. Nº 00090

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. Nº 60200



J&S ELECTRICO S.R.L.

SUMINISTROS DE MATERIALES
ELECTRICOS
ALTA, MEDIANA Y BAJA TENSION

Jr. Junin N° 1451 Oficina 6 - Barrios Altos - Lima - Lima - Lima
Teléf.: 328-0885 / 998 261 809

R.U.C. 20602790429

GUIA DE REMISION-REMITENTE

0001- N° 000073

Fecha de Emisión **29/01/20**

Fecha de inicio del traslado **29/01/20**

DOMICILIO DE PARTIDA

DIRECCION: **Jr. Junin 1451**
N°: **Lima** INTERIOR: **6** ZONA: **Lima**
DIST.: **Lima** PROV.: **Lima** DEP.: **Lima**

DOMICILIO DE LLEGADA

DIRECCION: **Oficina SHALOM**
N°: **Calle Tacna 509 - Piura.** ZONA: **Piura**
DIST.: **Piura** PROV.: **Piura**

DESTINATARIO

APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL: **Villacruz Contratas S.R.**
R.U.C. N°: **20570531707**
TIPO Y N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTORES

VEHICULO MARCA Y PLACA N°:
CERTIFICADO DE INSCRIPCION N°:
LICENCIA DE CONDUCIR N°:
COSTO MINIMO DEL TRASLADO:

CODIGO DE IDENTIFICACION	CANTIDAD	PESO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION (Detallada de los bienes)	TOTAL
	3	P	PIESA	Aisador tipo PIN 36KV	
	11		PIEZA	Perno Partido 35mm	
	9		" "	VARELLA ROSCADA 5/8" X 22	
	3		" "	Perno OSO 5/8 X 8	
	18		MT	FLEJE 3/4"	
	9		PIEZAS	GRAPA Cinta Bari 3/4"	
	13		" "	Terminal de Compresion 35m	
	3		" "	FUSIBLE chicote de 10A	
	8		" "	Plancha "5"	
	2		" "	Cinta 23	
	8		" "	terminal 50/4 PPA I den 300	
	5		" "	Varilla de cobre 5/8 X 210	
	2		" "	terminal de 95	
	2		" "	terminal de 70	

VALENZUELA STEFANNE MICHELLE
R.U.C. 10415611019
SERIE 0001 DEL 1 AL 200
Aut. N° 13272109023
F.I. 12-01-2018

TRANSPORTISTA
NOMBRE:
R.U.C.:

COMPROBANTE DE PAGO
TIPO Y NÚMERO: **0010**

MOTIVO DEL TRASLADO

1. VENTA	<input checked="" type="checkbox"/> 6. TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE LA MISMA EMPRESA	<input type="checkbox"/> 10. TRASLADO ZONA PRIMARIA
2. VENTA SUJETA A CONFIRMACION DEL COMPRADOR	<input type="checkbox"/> 7. TRASLADO DE BIENES PARA TRANSFORMACION	<input type="checkbox"/> 11. IMPORTACION
3. COMPRA	<input type="checkbox"/> 8. RECOJO DE BIENES TRANSFORMADOS	<input type="checkbox"/> 12. EXPORTACION
4. CONSIGNACION	<input type="checkbox"/> 9. TRASLADO POR EMISOR ITINERANTE	<input type="checkbox"/> 13. EXHIBICION
5. DEVOLUCION	<input type="checkbox"/> 14. DEMOSTRACION	<input type="checkbox"/> 15. OTROS

Conformidad del Cliente

P. J&S ELECTRICO S.R.L.

Recebo: **MARCO ANTONIO GUTIERREZ DE LA CRUZ**
DNI: **44980244** o **Keyy Villabobas**

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutierrez de la Cruz
COMANDANTE GENERAL

Henry Javier Celis Suarez
INGENIERO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 6990

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S.A.

Cal. Alexander Fleming N° 454 Urb. Ind. Santa Rosa - Lima - Lima - Ate
Telf.: 326-1373 / 326-1374 Correo electrónico: ventas@celsa.com.pe

R.U.C. 20100063680
GUIA DE REMISION-REMITENTE
0001- N° 111533

s): VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
JR. ZEPITA NRO. 151
CAJAMARCA - CAJAMARCA - LOS BAÑOS DEL INCA
20570531787

FACTURA	ORDEN DE COMPRA	FECHA EMISION	FECHA INICIO DE TRASLADO
F001-00036728	03-01-2020	22/01/2020	23-01-2020

1er. PUNTO DE PARTIDA
ANDER FLEMING 454
LIMA - LIMA

1er. PUNTO DE LLEGADA
AV. MEXICO 1187 - LA VICTORIA

UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR
Placa: Foton CSP 860
Conductor: VICTOR CASTILLO
N° de Conducir: 910660431 N° Inscripción:

EMPRESA DE TRANSPORTE
Razón Social: ZUMA INDUSTRIAS
R.U.C.: 20516161541

2do. PUNTO DE PARTIDA
AV. MEXICO 1187 - LA VICTORIA

2do. PUNTO DE LLEGADA
AV. ARICA N° 350 - TUMBES

UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR
Placa:
Conductor:

EMPRESA DE TRANSPORTE
Razón Social: SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.
R.U.C.: 20512528458

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PESO BRUTO	TARA
222NC0	N2XOH 4-1x300 mm² 0,6/1kV	15.00	Mts		
3228C0	THW-90 CAB. 35 mm² 750 V. amarillo	18.00	Mts		
1117C0	CPI (WP) CAB. 10 mm² negro	15.00	Mts		
5071C0	CUC SUAVE 19A 95 mm²	10.00	Mts		
5069C0	CUC SUAVE 19A 50 mm²	10.00	Mts		

PLACA : AVC-820
MARCA : FURTON
N° CERT. INSC.: 151-62357
N° LIC.: 50854779
PB: 7,500 C.U.: 4,500

Henry Aníbal Coliz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 60090

SPACIO
23 ENE 2020
Entregado Externo

CELSA
CONTROL DE VIGILANCIA
23 ENE 2020
ENTREGADO
FURTON

TITULO DEL TRANSFERENCIO:

1. VENTA 2. CONSIGNACION 3. IMPORTACION 4. COMPRA 5. DEVOLUCION 6. EXPORTACION 7. TRANSFORMACION 8. TRASL. ESTABLEC. 9. OTRAS..... 10. VENTA SUJETA A CONFIRMACION DEL COMPRADOR 11. RECOJO DE BIENES

IONES/Acabados en Alcántara Montos 265-1425 10078347919 0001 del 111101 al 114100 14181289023 F.I. 21/11/2019

LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR - SIRVASE EXTENDER EL CHEQUE A FAVOR DE CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S.A.

RECIBIDO CONFORME CLIENTE

EL NO PAGO DE LA FACTURA O LETRA, A SU VENCIMIENTO, GENERARA EL PAGO DE INTERESES MONETARIOS A LA MAS ALTA TASA DE INTERES FIJADA POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA PARA LAS OPERACIONES BANCARIAS ACTIVAS, NO SIENDO NECESARIO INTIMACION ALGUNA PARA CONSTITUIR EN MORA AL DEUDOR"

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

DESTINATARIO

Marco Antonio Guty de la Cruz
GERENTE GENERAL

HUGO RICARDO OSANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



ANIXTER JORVEX S.A.C.
Av. Tingo María Nº 311, Breña - Lima - Lima
Telf.: 4170202 / Fax: 4319324

R.U.C. Nº 20545135184
GUIA DE REMISION
REMITENTE
Nº 701 - 0077533

SEÑOR (ES): **VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.**
R.U.C.: **20545135184**
PUNTO DE LLEGADA:
AV. MEXICO 1187 LA VICTORIA

Fecha de Emision: **22/01/2020** Dirección de punto de partida: **Av Tingo María 311 Breña, Lima Peru** Código AR: **50N038856**
Orden de Venta: **35666** Orden de Compra: **01-01-2020** Fecha Factura: **22/01/2020**
Código Av: **243653** Términos de Despacho: **PREPAGADO** Términos de Pago: **PREPAGO**

ITEM	CANTIDAD	UNID. MEDIDA	DESCRIPCION
	372	MT	N2XSY30-1X50N-03 10031656 INDECO SA CABLE N2XSY 16/30 KV 1X50 MM2 ND-H *****

F. 701 - 50604

HUGO RICARDO OCANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. Nº 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

VIGILANCIA PERSONAL
NOMBRE: *Julio Zera Olave*
HORA: *16:20*

Henry Juan Celis Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. Nº 60200

Julio Zera Olave
44282290

DEJAR EN TRANSPORTES SHALOM
EMBALADO EN UN CARRETE X 563 KG
PIEDE LITONING - TUMBES
ATT: MARCO ANTONIO GUTTY DE LA CRUZ. DNI 44988244

PLACA MARCA Nº Cert. Insc. 15187534
VALOM EMPRESA
DESPACHADO POR: [Signature]
FECHA: 22/01/2020
LA VICTORIA

MOTIVO DE TRASLADO

<input checked="" type="checkbox"/> VENTA	<input type="checkbox"/> DEVOLUCION	<input type="checkbox"/> TRASLADO POR EMISOR ITINERANTE DE COMPROBANTES DE PAGO
<input type="checkbox"/> VENTA SUJETA A CONFIRM. DEL COMP.	<input type="checkbox"/> TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE LA MISMA EMPRESA	<input type="checkbox"/> TRASLADO ZONA PRIMARIA
<input type="checkbox"/> COMPRA	<input type="checkbox"/> TRASLADO DE BIENES PARA TRANSFORMACION	<input type="checkbox"/> IMPORTACION
<input type="checkbox"/> CONSIGNACION	<input type="checkbox"/> RECOJO DE BIENES	<input type="checkbox"/> EXPORTACION
<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/>	

TRANSPORTISTA: **INVERSIONES MOY S.A.C**

R.U.C.: **20297401033** BREVETE: **Q-44332257**

MARCA: **HYUNDAI** PLACA: **AFQ-934**

DESTINATARIO



Domicilio Fiscal: Bl. M Nro. 18 Urb. Ramón Castilla Prov. Const. del Callao - Prov. Const. del Callao - Callao
Ofic.: Av. Argentina Nro. 575 Int. Ref (Av. Argentina 575 Pab F Tda 5) Lima - Lima - Lima
Telf: 373-7533 Cel: 999402128 / E-mail: ventas@mediumvoltagesac.com
www.mediumvoltagesac.com

R.U.C. N° 20556504033

GUIA DE EMISION REMITENTE

0004 - N° 001375

004 - 1375

FECHA INICIO DEL TRASLADO: 28-ene-20
FECHA DE EMISION: 28-ene-20
N° FACTURA: F001-232
ORDEN DE COMPRA: D7-D1-2020
COSTO MÍNIMO

AV. ARGENTINA 575 INT. F-5 C/ LA CHIMENEA LIMA - LIMA - LIMA
TUMBES - TUMBES *DNI: DRICO 3301*

APELLIDOS Y NOMBRES / RAZON SOCIAL: VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Vehículo Marca y Placa N°
Certificado de Inscripción N°
Licencia de Conducir N°

R.U.C.: 20570531787
D.N.I.

- 5.00 UNIDAD AISLADOR POLIMERICO DE SUSPENSION 36KV
- 5.00 UNIDAD SECCIONADOR CUT OUT DE LOZA 36KV 100A 170KV/11
- 1.00 KIT TERMINAL EXTERIOR TERMOCONTRAIBLE DE 50mm2. 25KV
- 1.00 KIT TERMINAL INTERIOR TERMOCONTRAIBLE DE 50mm2. 25KV

RECOGE:
MARCO ANTONIO GUTTY DE LA CRUZ DNI N° 44988244
KENNY VILLALOBOS VEGA DNI: 41958076

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
[Signature]
MARCO ANTONIO GUTTY DE LA CRUZ
KENNY VILLALOBOS VEGA

PLACA MATRICA N° Call. Inss 151723326
Nro. L.C. N° 2017-0044
PB: 24,140 C.U: 15,000
VALOM ENTREGAS S.A.C.
R.U.C.: 20512223958
AV. MEXICO Nº 100 LA VICTORIA
p. MEDVOLT VOLTAGE S.A.C. RECIBI CONFORME

NOMBRE O RAZON SOCIAL: *[Redacted]* Venta R.U.C.: *[Redacted]*

CONSIGNACION TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE LA MISMA EMPRESA RECOJO DE BIENES TRANSFORMADOS TRASLADO POR EMISOR ITENERANTE DE COMPROBANTES DE PAGO

VENTA COMPRA DEVOLUCION VENTA SUjeta a CONFIRMACION TRASLADO DE BIENES PARA TRANSFORMACION OTROS DESTINATARIO

[Signature]
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 66000

[Signature]
HUGO RICARDO DCANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

11.6 Copia de inscripción del Contratista en la REMYPE.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Mario Villacruz
Gerente General

Henry Flaminio Celiz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 63030

HUGO RICARDO OCANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
REMYPE
ACREDITACIÓN

RUC N° : 20570531787
RAZÓN SOCIAL : VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Actividad Económica : CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
CIU : 45207
Domicilio : JIRON ZEPITA NRO. 151 --
Distrito : LOS BAÑOS DEL INCA
Provincia : CAJAMARCA
Departamento : CAJAMARCA
Gerente General : MARIA LUISA GUTTY DE LA CRUZ
Representante Legal : MARIA LUISA GUTTY DE LA CRUZ
Queda acreditada como: MICRO EMPRESA

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
 HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

Número de Registro - Solicitud de Inscripción REMYPE : 0001280221-2014
Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE : 05/06/2014

Henry Alipio Poliz Suarez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicado al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 12/06/2014

Código N° 220368

Impreso el 27/10/2014 a las 01:22:50

www.mmp.gob.pe | Av. Solvay N° 855
 Lima, Perú | T. (011) 630-6000

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

11.7 Índices Unificados de Construcción INEI (Publicado en el diario el peruano).

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marcos A. ... de la Cruz
GERENTE GENERAL

Hector ... Peliz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 88090

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

elaborará guías, instructivos y/o manuales para facilitar dicha fase;

Que, mediante Informe N° 000007-2019-BNP-J-DDPB-EAC, Informe Técnico N° 000001-2019-BNP-J-DDPB-EAC y Memorando N° 000378-2019-BNP-J-DDPB, la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias solicitó la aprobación de un documento para el fortalecimiento y gestión de bibliotecas públicas municipales, cuyo objetivo sería "Desarrollar mecanismos técnicos que permitan fortalecer la gestión de las bibliotecas públicas municipales integrantes del Sistema Nacional de Bibliotecas, con la finalidad de brindar servicios de calidad al ciudadano";

Que, por medio del Memorando N° 001382-2019-BNP-GG-OPP, del Informe Técnico N° 000153-2019-BNP-GG-OPP-EMO y del correo electrónico de fecha 27 de diciembre de 2019, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y su Equipo de Trabajo de Modernización, emitieron opinión favorable respecto de la aprobación de la "Guía para el fortalecimiento y gestión de Bibliotecas Públicas Municipales";

Que, con el Informe Legal N° 000389-2019-BNP-GG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica consideró legalmente viable que la titular de la entidad emita el acto resolutivo a través del cual apruebe la "Guía para el fortalecimiento y gestión de Bibliotecas Públicas Municipales";

Con el visado de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias; de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, del Equipo de Trabajo de Modernización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

De conformidad con la Ley N° 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas; y, demás normas pertinentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR la "Guía para el fortalecimiento y gestión de Bibliotecas Públicas Municipales", que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- DISPONER que la Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística publique la presente Resolución y su Anexo en el portal web institucional (www.bnpp.gov.pe), en la fecha de publicación de la Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EZIO NEYRA MAGAGNA
Jefe Institucional

1846701-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Declaran barrera burocrática ilegal el numeral 24.3) del Artículo 24 de la Ordenanza N° 457-MDA de la Municipalidad Distrital de Ate

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

RESOLUCIÓN N° 0597-2019/SEL-INDECOPI

AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN: 18 de diciembre de 2019

ENTIDAD QUE IMPUSO LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS DECLARADAS ILEGALES: Municipalidad Distrital de Ate

NORMA QUE CONTIENE LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS DECLARADAS ILEGALES: Numeral 24.3) del artículo 24 de la Ordenanza 457-MDA.

PRONUNCIAMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA REVOCADO: Resolución 0522-2018/CEB-INDECOPI del 24 de octubre de 2018

BARRERA BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL Y SUSTENTO DE LA DECISIÓN:

La exigencia de que los vehículos incluidos en una solicitud de modificación del registro municipal de vehículos menores por cambio de datos, en la modalidad de sustitución de unidades vehiculares, tengan que aprobar una verificación vehicular previa, como condición para la tramitación de dicha solicitud, materializada en el numeral 24.3) del artículo 24 de la Ordenanza 457-MDA, Ordenanza que regula el Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores Motorizados y No Motorizados en el distrito de Ate.

El fundamento de la decisión obedece a que la citada medida excede a lo previsto en la Ordenanza 1693, ordenanza marco que regula el servicio de transporte público especial de pasajeros y carga en vehículos menores motorizados o no motorizados en Lima Metropolitana, la cual no prevé a la verificación vehicular como condición para el procedimiento de sustitución de unidades vehiculares.

ANA ASUNCIÓN AMPUERO MIRANDA
Presidenta

1846978-1

Henry Flavia Celis Suarez
INGENIERO EN SISTEMAS DE ELECTRICIDAD
N° 1234567890

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Aprueban Índices Unificados de Precios de la Construcción para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de diciembre de 2019

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 017-2020-INEI VILLAGRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Lima, 16 de enero de 2020

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novenava Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe N° 02-12-2019/DTIE, referido a los Índices Unificados de Precios de la Construcción para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de Diciembre de 2019 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y;

[Firma]
Pablo Cruz
GERENTE GENERAL

[Firma]
HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

Con las visaciones de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y, En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Índices Unificados de Precios de la Construcción (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Diciembre de 2019, que se indican en el cuadro siguiente:

Table with columns: Área, Cód., 1, 2, 3, 4, 5, 6. It lists 80 rows of data for various geographical areas and their corresponding price indices.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

(*) Sin Producción

Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatura N° 001-2020-INEI.

HILGO RICARDO OCAÑA NAVARRO INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA Reg. CIP. N° 60200

Artículo 2.- Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1, comprende a los siguientes departamentos:

- Área 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
Área 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.
Área 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
Área 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.
Área 5: Loreto.
Área 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3.- Los Índices Unificados de Precios de la Construcción, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fletes.


Regístrese y comuníquese. JOSE GARCIA ZANABRIA Jefe(e) 1846968-1

Henry Flavia Celiz Suarez INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA REG. CIP. N° 86090


VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana N°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

11.8 Declaración Jurada de No Adeudo a SENCICO.


VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Guay de la Cruz
GERENTE GENERAL


Henry Mejia Celiz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 80090


HUGO RICARDO OCAÑA NAVA
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com. Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

DECLARACIÓN JURADA DE NO ADEUDOS AL SENCICO

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

LIMA


REFERENCIA: CONTRATO N°016-2019-GR.CAJ-GGR – VALORIZACION N°02


De nuestra consideración:


Yo, MARCO ANTONIO GUTTY DE LA CRUZ, identificado con DNI N° 44988244, en calidad de Representante Legal VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L. con RUC N° 20570531787, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE MI REPRESENTADA NO TIENE ADEUDO CON EL SENCICO HASTA LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACIÓN N° 02 DE LA OBRA “AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO – DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR – REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505”, debido a que hasta la fecha la entidad NO cancela los comprobante de pago emitido por mi representada de la Ejecución de la Obra.

Para mayor constancia firmo la presente en señal de conformidad.

Distrito de Zorritos, 31 de enero 2020.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Guty de la Cruz
GERENTE GENERAL


Henry J. Celis Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA,
Reg. CIP. N° 86630


HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRETE
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com. Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

11.9 Autorización de retención por Fiel Cumplimiento.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Hugo Ricardo Ocaña Navarroc
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

Henry Alvin Celiz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 86090

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
RUC N° 20570531787
SERVICIOS, CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL

"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"

Cajamarca, 21 de noviembre del 2019

Carta N° 001-2019- VC/Contratistas S.R.L-Loc. Acapulco – Distr. Zorritos.

Señores:
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Atención:
Unidad de Logística del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.

Presente

Asunto: Garantía de Fiel Cumplimiento

Referencia: Buena Pro AS-SM-50-2019-FONDEPES-1.

De nuestra especial consideración:

Sirva la presente para saludarles cordialmente y a la vez al amparo de lo dispuesto por el Art. 39° de la Ley de Contrataciones del Estado y el Art. 158° del Reglamento de la ley, respecto a la presentación de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (Carta Fianza), me acojo y autorizo que su representada realice la Retención del Diez por ciento (10%) del monto del Contrato original, por ser mi representada una REMYPE, como consta en mi Propuesta Técnica (adjunto copia de Acreditación).

Sin otro particular me despido de Ud., aprovechando la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
[Signature]

Marco Antonio Gutierrez de la Cruz
GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
[Signature]

Cajamarca, 21 de noviembre del 2019

C.C
Archivo

[Signature]
Diana Patricia Colla Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 86090


[Signature]
HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

Dirección: Condominio Alcázar N° 310, Edificio 01, Departamento 101-Rimac
Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com
Teléfono: 076284107 Cel: 976581927 - 945180984

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.


Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com. Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

11.10 Inicio de Obra autorizado por ENOSA S. A.


VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Villacruz
GERENTE GENERAL


Henry David Celiz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 86090




HUGO RICARDO OCANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Lima, 23 DIC 2019

CARTA N° 1342 -2019-FONDEPES/DIGENIPAASeñores:
ENOSA

Asunto: INICIO DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PESQUEROS ARTESANALES EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES".



De nuestra consideración:

Es grato dirigirles la presente para expresarles mi cordial saludo y al mismo tiempo solicitar el inicio de obra del proyecto: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PESQUEROS ARTESANALES EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES", cuyo expediente técnico cuenta con la conformidad de ENOSA. la cual ha sido otorgada mediante documento NTM.3202.2018/ENOSA de fecha 06.12.2018, el cual se anexa al presente.

Cabe precisar que para la ejecución de la obra mi representada ha contratado a la empresa **VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.**, con RUC: 20570531787, quienes a su vez han designado como Residente de la Obra al Ingeniero Mecánico Electricista, Henry Flavio Celiz Suarez, con DNI N° 41998543 y Reg. CIP N° 86090.

Es por ello que cumpliendo con lo estipulado en el capítulo 12.2.1 de la R.D. N° 018-2002-EM/DGE, damos **AVISO** a su representada sobre el **Inicio de Obra**, para lo cual adjuntamos los siguientes documentos:

Copia de Conformidad del Proyecto.
Copia de expediente técnico aprobado por ENOSA.
Cuaderno de Obra A4, legalizado.
Registro del OSCE
Certificado de Habilidad original del Ingeniero Residente.
Cronograma de ejecución de obra actualizado y metrado general
Plan de Trabajo
Plan de Emergencia o Contingencia.
Plan de Prevención de Riesgos.
Procedimiento escrito de Trabajo Seguro (PETS)
Análisis de Seguridad en el Trabajo - AST
Matriz IPERC
Plan de Seguridad.
Copia de Exámenes médicos ocupacionales del personal técnico.
Relación de Dotación de IPP y EPP.
Currículum Vitae No documentado del Ing. Residente y personal técnico calificado.
Copia de la Póliza de Seguros Contra Accidentes de Trabajo de Riesgo (SCRT) Salud Y Pensión.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

HUGO RICARDO COYÑA NAVARRO

HUGO RICARDO COYÑA NAVARRO
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

Henry Flavio Celiz Suarez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 86090

Esperando haber cumplido con los requisitos exigidos aprovecho la oportunidad para expresar mi consideración y estima.

Atentamente,


FONDEPES

Jorge Roberto Nahue Sivrichi
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal y Acuicultura




VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.


Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

11.11 Solicitud de autorizacion en la Vía Publica


VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L. Cruz
OFICINA PRINCIPAL


Hugo Ricardo Ocaña Navarros
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 80090



HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



Lima, 23 DIC 2019

CARTA N° 1343 -2019-FONDEPES/DIGENIPAA

Señores:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONTRALMIRANTE VILLAR ZORRITOS

Atención : SUBGERENCIA DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Asunto : SOLICITUD DE PERMISO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA
OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PESQUEROS ARTESANALES EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES"


Es grato dirigirme a su digno despacho, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo solicitarte **EL PERMISO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONTRALMIRANTE VILLAR ZORRITOS, PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA VÍA PUBLICA** para la Obra: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PESQUEROS ARTESANALES EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES", teniendo en cuenta los Metrados y el recorrido de la Red de media tensión, para ello presentamos 01 Juego del Expediente Técnico con su respectivo CD, de la obra de la referencia

Por tanto, esperando pronta y oportuna respuesta por parte de su representada quedo de Uds.

Atentamente,



FONDEPES
Jorge Roberto Nalvar Sánchez
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal y Acuicola



VILLACRIZ CONTRATOS S.R.L.

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200
Henry Julio Celis Suarez
REG. CIP. N° 86000





VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.


Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

11.12 Fórmula polinómica según Expediente Técnico.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.


Marco Antonio Cruz de la Cruz
GERENTE GENERAL


Henry Jesús Celiz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 60200


HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



Fórmula Polinómica

Presupuesto SISTEMA DE UTILIZACION EN 22.9 KV DPA ACAPULCO
 Subpresupuesto MEDIA TENSION
 Fecha Presupuesto 20/04/2018
 Moneda NUEVOS SOLES
 Ubicación Geográfica TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS

$$K = 0.190*(Mr / Mo) + 0.088*(Cr / Co) + 0.632*(Mr / Mo) + 0.090*(Ir / Io)$$

Monomi	Factor	(%)	Símbolo	Indice	Descripción
1	0.190	100.000	M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
2	0.088	100.000	C	19	CABLE NYN Y NKY
3	0.632	100.000	M	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
4	0.090	100.000	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
 Mercado de la Cruz
 General

Henry Felvia Celiz Suarez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

11.13 Copia de la Pólizas SCTR Salud y Pensión del personal técnico.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Firma: [Firma] Villacruz

OFICINA PRINCIPAL

[Firma]
Henry Alberto Celis Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
C.I.P. N° 2186633

[Firma]

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARETTE
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

Cajamarca, 14 de enero del 2020

T.P. / T.S.

CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

VIGENCIA: 11/01/2020 AL 11/02/2020

ACTIVIDAD: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PESQUEROS ARTESANALES EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES"

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados líneas abajo, conforme al Decreto Supremo 003-98-SA, se encuentran amparados bajo la cobertura de pensión y salud.

SCTR PENSIONES Póliza 5633910 SCTR SALUD Contrato 5607061

PERSONAL ASEGURADO


VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

SEDE: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS

Nro	NOMBRES	PATERNO	MATERNO	TIPODOC	NRODOC
1	WALTER	BALCAZAR	LADINES	DNI	00327187
2	JOSE DAVID	BALCAZAR	PIZARRO	DNI	73433796
3	VICTOR ALEXIS	BALCAZAR	ZAPATA	DNI	73622462
4	HENRY FLAVIO	CELIZ	SUAREZ	DNI	41998543
5	SANTOS PORFIRIO	DESA	MARIN	DNI	80458439
6	FREDDY DANIEL	GUTIERREZ	MARCANO	DNI	31083070
7	MARCO ANTONIO	GUTTY	DE LA CRUZ	DNI	44988244
8	YORMAN JOSUE	MONTILLAS	CAMPOS	DNI	22940342
9	WILLIAN REYNALDO	RAMIREZ	DIOSES	DNI	00247841
10	EDGAR ALEXIS	RONDON	X	DNI	11189454
11	OMANGEL	SANCHEZ	SERRA	DNI	22871074
12	KENNY	VILLALOBOS	VEGA	DNI	04195876
13	JOEL	ZAMORA	RAMIREZ	DNI	16720966
14	JAIME ROLANDO	ZAPATA	BENITES	DNI	03380937
15	GUIDO ALEXANDER	ZAPATA	BENITES	DNI	40895426

Extendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente: VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.




INGENIERO EN ELECTRICIDAD


HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

Francisco Noya Bao
Gerente Comercial
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros

Enrique Gonzáles Martínez
Director Comercial
La Positiva EPS S.A.

Nota:

El presente documento está sujeto a la política de suscripción de la Compañía y queda sin efecto en caso que el cliente mantenga obligaciones pendientes a favor de la compañía por este concepto.


Así mismo, esta constancia carecerá de validez respecto de aquellos asegurados sobre los que, con anterioridad a la fecha de emisión de este documento, se haya producido un siniestro (fallecimiento y/o accidente de trabajo) relacionado al riesgo cubierto por el SCTR. En este supuesto, la Compañía no será responsable de cancelar el beneficio de este seguro, debido a la inexistencia del riesgo.

Tratándose de configuración de invalidez, se aplicará la política de delimitación del riesgo de la Compañía, en caso corresponda. Le recordamos cumplir con las medidas de prevención y salud ocupacional establecidas en Minería, DS 024-2016-EM y normas modificatorias (en caso de actividad minera), o en las normas del sector donde se realice la actividad de riesgo, y, poner a disposición de la Compañía, cuando ésta la requiera, las Evaluaciones Médicas Ocupacionales de los asegurados.


Cláusula Garantía (SCTR Pensión)


La presente póliza cubre actividades y servicios que se prestan dentro de la concesión minera en las sedes administrativas y/o en superficie. No cubre las actividades de exploración, explotación y extracción de mina realizada en SUPERFICIE y/o en SOCAVON o cualquier otra actividad realizada en socavón de una mina. En ese sentido, La Positiva no se hará responsable de atender los siniestros ocasionados de las actividades mencionadas anteriormente.

ELIFERNANDEZ


VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

MARCOS VILLACRUZ
GERENTE GENERAL


HENRY ALVARIO CELIZ SUAREZ
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA



HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

Endoso de Declaración N° 5633910 de Fecha 11/01/2020

Por medio del presente endoso y de acuerdo a lo solicitado por la Entidad Empleadora con documento indicado en la sección Observaciones y Comentarios, esta póliza queda facturada según el siguiente detalle:

Póliza N°	: 5633910	Ramo	: SCTR PENSION
Vigencia desde	: 11/01/2020	Hasta	: 11/02/2020
Sede(s)	: Detallada(s) en Anexo de la Póliza		
Contratante	: VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.		
Dirección	: JR. ZEPITA NRO. 151		
Código SBS	: VI2077710027		

Observaciones y Comentarios:

Se hace constar por medio del presente endoso que se procede a efectuar la liquidación de prima correspondiente al periodo 11/01/2020 al 11/02/2020 de acuerdo al siguiente detalle.

Sede	Actividad	Clase Trab	Cant.	Planilla	Tasa	Mes	Año
PRINCIPAL	CONSTRUCCION	ADMINISTRATIVO	15	14,250.00	0.60 %	1	2020
Prima Comercial (Incluye 3% de Costos de Emisión):						S/	105.00
Prima Comercial + IGTV:						S/	123.90

Asimismo, por el presente documento, declaro conocer y manifiesto mi consentimiento para que se remita alternativamente por los medios electrónicos que correspondan, toda comunicación o documentación relativa a mis pólizas de seguro, así como sus endosos y/o renovaciones, pudiendo incluso haber sido contratadas con anterioridad o en el futuro; incluyendo adicionalmente, comprobantes de pago electrónicos y las comunicaciones de cobranza que correspondan.

Declaro también actualizar ante algún cambio los referidos medios electrónicos a fin de que se efectúen las referidas comunicaciones.


El presente endoso queda adherido y forma parte integrante de la póliza arriba mencionada. Todos los términos y condiciones de la póliza a excepción de los expresamente variados por el presente endoso quedan en todo su vigor. Queda asentado en los Registros de La Positiva Vida.


La Entidad Empleadora deberá firmar y devolver una copia de este endoso en señal de conformidad, según lo dispuesto en el Art. 341 de la Ley 26702.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Cláusula Garantía (SCTR Pensión)

La presente póliza cubre actividades y servicios que se prestan dentro de la concesión minera en las sedes administrativas y/o en superficie. No cubre las actividades de exploración, explotación y extracción de mina realizada en SUPERFICIE y/o en SOCAVON o cualquier otra actividad realizada en socavón de una mina. En ese sentido, La Positiva no se hará responsable de atender los siniestros ocasionados de las actividades mencionadas anteriormente.


HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200


Henry Flavio Celis Suarez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

CAJAMARCA, 11 de Enero del 2020

La Positiva Vida Seguros y Reaseguros

Entidad Empleadora

VILLACRUZ INGENIERISTAS S.R.L.

INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

Henry Maria Coliz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



Póliza : 5633910
 Fecha : 11/01/2020
 VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Anexo a la Póliza N° 5633910

Vigencia desde: 11/01/2020 Hasta: 11/02/2020

Detalle Actividad: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PESQUEROS ARTESANALES EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES"

Sede: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS

Relación de Asegurados

N°	NOMBRE	N° Documento
ADMINISTRATIVO		
1	WALTER BALCAZAR LADINES	00327187
2	JOSE DAVID BALCAZAR PIZARRO	73433796
3	VICTOR ALEXIS BALCAZAR ZAPATA	73622462
4	HENRY FLAVIO CELIZ SUAREZ	41998543
5	SANTOS PORFIRIO DESA MARIN	80458439
6	FREDDY DANIEL GUTIERREZ MARCANO	31083070
7	MARCO ANTONIO GUTTY DE LA CRUZ	44988244
8	YORMAN JOSUE MONTILLAS CAMPOS	22940342
9	WILLIAN REYNALDO RAMIREZ DIOSES	00247841
10	EDGAR ALEXIS RONDON X	11189454
11	OMANGEL SANCHEZ SERRA	22871074
12	KENNY VILLALOBOS VEGA	04195876
13	JOEL ZAMORA RAMIREZ	16720966
14	JAIME ROLANDO ZAPATA BENITES	03380937
15	GUIDO ALEXANDER ZAPATA BENITES	40895426

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gatty de la Cruz
 GERENTE GENERAL

T.O/ELIFERNANDEZ

Henry Flavio Celiz Suarez
 INGENIERO MECANICO-ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 21520

Hugo Ricardo Ocaña Navarro
 HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO-ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200



Proforma de Cobertura (Cobro)

Número de Proforma : 250337769 Emisión : 14/01/2020
R.U.C.: : 20570531787 Nro. Trámite : 0

DATOS DEL RECIBO

Oficina	: Cajamarca	Moneda	: Soles
Póliza Nro	: 5633910	Ramo	: SCTR PENSION
Vigencia Desde	: 11/01/2020	Hasta	: 11/02/2020
Contratante	: VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.		
Asegurado	: TRABAJADORES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE		
Dirección	: JR. ZEPITA NRO. 151		
Distrito	: LOS BAÑOS DEL INCA (CAJAMARCA)	Localidad	: CAJAMARCA
Teléfonos	: 976581927	Sede(s)	: Detallada(s) en Anexo de la Póliza
Intermediario	: DIRECTOS		

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN

Descripción			Importes
Sobrevivencia	VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.	S/	100.00
Costos de Emision		S/	5.00
Impuesto General a las Ventas	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	S/	18.90
Prima Comercial + IGV		S/	123.90

Referencia:


Girar cheque a la orden de: LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS:


MUY IMPORTANTE

Estimado(s) Cliente(s):

La cancelación de esta Proforma deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 días, contados desde la fecha de recepción del presente documento y de acuerdo a las condiciones estipuladas en el "Convenio de Pago de Primas de Seguros" correspondiente.

CLIENTE


HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA


HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

Proforma de Cobertura (Cobro)

Número de Proforma : 250337769 Emisión : 14/01/2020
R.U.C.: : 20570531787 Nro. Trámite : 0

DATOS DEL RECIBO

Oficina	: Cajamarca	Moneda	: Soles
Póliza Nro	: 5633910	Ramo	: SCTR PENSION
Vigencia Desde	: 11/01/2020	Hasta	: 11/02/2020
Contratante	: VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.		
Asegurado	: TRABAJADORES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE		
Dirección	: JR. ZEPITA NRO. 151		
Distrito	: LOS BAÑOS DEL INCA (CAJAMARCA)	Localidad	: CAJAMARCA
Teléfonos	: 976581927	Sede(s)	: Detallada(s) en Anexo de la Póliza
Intermediario	: DIRECTOS		

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN

Descripción		Importes
Sobrevivencia	S/	100.00
Costos de Emision	S/	5.00
Impuesto General a las Ventas	S/	18.90
Prima Comercial + IGV		S/ 123.90

Referencia:

Girar cheque a la orden de: LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS:

MUY IMPORTANTE

Estimado(s) Cliente(s):

La cancelación de esta Proforma deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 días, contados desde la fecha de recepción del presente documento y de acuerdo a las condiciones estipuladas en el "Convenio de Pago de Primas de Seguros" correspondiente.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

BROKER

Marco Antonio Guillot de la Cruz
GERENTE GENERAL

Henry Alcibia Coliz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



Contrato : 5607061
 Fecha : 11/01/2020
 VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Endoso de Renovación N° 5607061 de Fecha 11/01/2020

Por medio del presente endoso y de acuerdo a lo solicitado por la Entidad Empleadora con documento indicado en la sección Observaciones y Comentarios, este Contrato queda facturado según el siguiente detalle:

Contrato No.	: 5607061	Ramo:	SCTR SALUD
Vigencia desde	: 11/01/2020	Hasta:	11/02/2020
Sede(s)	: Detallada(s) en Anexo del Contrato		
Contratante	: VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.		
Dirección	: JR. ZEPITA NRO. 151		

Observaciones y Comentarios

Se hace constar por medio del presente endoso que se procede a efectuar la liquidación de prima correspondiente al periodo 11/01/2020 al 11/02/2020 de acuerdo al siguiente detalle.

Sede	Actividad	Clase Trab	Cant.	Planilla	Tasa	Mes	Año
PRINCIPAL	2285 CONSTRUCCION	ADMINISTRATIVO	15	14,250.00	0.60	1	2020
		Prima Neta		: S/			100.00
		I.G.V.		: S/			18.00
		Total		: S/			118.00


Asimismo, por el presente documento, declaro conocer y manifiesto mi consentimiento para que se remita alternativamente por los medios electrónicos que correspondan, toda comunicación o documentación relativa a mis pólizas de seguro, así como sus endosos y/o renovaciones, pudiendo incluso haber sido contratadas con anterioridad o en el futuro; incluyendo adicionalmente, comprobantes de pago electrónicos y las comunicaciones de cobranza que correspondan.

Declaro también actualizar ante algún cambio los referidos medios electrónicos a fin de que se efectúen las referidas comunicaciones.

El presente endoso queda adherido y forma parte integrante del Contrato arriba mencionado. Todos los términos y condiciones del Contrato a excepción de los expresamente variados por el presente endoso quedan en todo su vigor. Queda asentado en los Registros de La Positiva EPS.


CAJAMARCA, 14 de Enero del 2020


VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Merco  de la Cruz
 GERENTE GENERAL

La Positiva EPS

Entidad Empleadora


 Henry *Henry* Celis Suarez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 RES. CIP. N° 86090


 HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200



Contrato : 5607061
 Fecha : 11/01/2020
 VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Anexo a el Contrato N° 5607061
 Vigencia desde: 11/01/2020 Hasta: 11/02/2020
 Detalle Actividad: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PESQUEROS ARTESANALES EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES"
 Sede: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS

Relación de Asegurados

<u>N° NOMBRE</u>	<u>N° Documento</u>
ADMINISTRATIVO	
1 WALTER BALCAZAR LADINES	00327187
2 JOSE DAVID BALCAZAR PIZARRO	73433796
3 VICTOR ALEXIS BALCAZAR ZAPATA	73622462
4 HENRY FLAVIO CELIZ SUAREZ	41998543
5 SANTOS PORFIRIO DESA MARIN	80458439
6 FREDDY DANIEL GUTIERREZ MARGANO	31083070
7 MARCO ANTONIO GUTTY DE LA CRUZ	44988244
8 YORMAN JOSUE MONTILLAS CAMPOS	22940342
9 WILLIAN REYNALDO RAMIREZ DIOSES	00247841
10 EDGAR ALEXIS RONDON X	11189454
11 OMANGEL SANCHEZ SERRA	22871074
12 KENNY VILLALOBOS VEGA	VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L. 04195876
13 JOEL ZAMORA RAMIREZ	16720966
14 JAIME ROLANDO ZAPATA BENITES	03380937
15 GUIDO ALEXANDER ZAPATA BENITES	40895426

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

T.0/ ELIFERNANDEZ

Henry Flavio Celiz Suarez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 60200

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRETE
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200



PROFORMA DE PAGO

Número de Proforma : 802648462 Emisión : 14/01/2020
 R.U.C.: : 20570531787 Nro. Trámite : 0

DATOS DEL RECIBO

Oficina : Cajamarca	Moneda : Soles
Contrato Nro : 5607061	Ramo : SCTR Salud
Vigencia Desde : 11/01/2020	Hasta : 11/02/2020
Contratante : VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.	
Asegurado : TRABAJADORES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	
Dirección : JR. ZEPITA NRO. 151	
Distrito : LOS BAÑOS DEL INCA (CAJAMARCA)	Localidad : CAJAMARCA
Teléfonos :	Sede(s) : Detallada(s) en Anexo del Contrato
Asesor : DIRECTOS	

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN

<u>Descripción</u>	<u>Importes</u>
SCTR SALUD	S/ 100.00
Impuesto General a las Ventas	S/ 18.00
Prima Total	S/ 118.00

Referencia:

Vencimiento: 11/02/2020

Puede efectuar sus pagos, via web o en las ventanillas, en los bancos Continental, Scotiabank, Banco de Crédito e Interbank identificándose con su N° de RUC/DNI o en nuestra red de oficinas. Asimismo, podrá afiliarse al servicio de Débito Automático a través de Tarjetas de Crédito y/o girar cheque a la Orden de : LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD

MUY IMPORTANTE

Estimado(s) Cliente(s):

La cancelación de esta Proforma deberá efectuarse dentro del plazo de vencimiento establecido en el presente documento o de acuerdo a las condiciones estipuladas en el "Convenio de Pago de Primas" correspondiente.

CLIENTE

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

[Firma]
 HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. C.I.P. N° 60200

[Firma]
 HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. C.I.P. N° 60200

[Firma]
 HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. C.I.P. N° 60200



PROFORMA DE PAGO

Número de Proforma : 802648462 Emisión : 14/01/2020
 R.U.C.: : 20570531787 Nro. Trámite : 0

DATOS DEL RECIBO

Oficina	: Cajamarca	Moneda	: Soles
Contrato Nro	: 5607061	Ramo	: SCTR Salud
Vigencia Desde	: 11/01/2020	Hasta	: 11/02/2020
Contratante	: VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.		
Asegurado	: TRABAJADORES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE		
Dirección	: JR. ZEPITA NRO. 151		
Distrito	: LOS BAÑOS DEL INCA (CAJAMARCA)	Localidad	: CAJAMARCA
Teléfonos	:	Sede(s)	: Detallada(s) en Anexo del Contrato
Asesor	: DIRECTOS		

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN

<u>Descripción</u>		<u>Importes</u>
SCTR SALUD	S/	100.00
Impuesto General a las Ventas	S/	18.00
Prima Total	S/	118.00

Referencia:

Vencimiento: 11/02/2020

Puede efectuar sus pagos, via web o en las ventanillas, en los bancos Continental, Scotiabank, Banco de Crédito e Interbank identificándose con su N° de RUC/DNI o en nuestra red de oficinas. Asimismo, podrá afiliarse al servicio de Débito Automático a través de Tarjetas de Crédito y/o girar cheque a la Orden de : LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD

MUY IMPORTANTE

Estimado(s) Cliente(s):

La cancelación de esta Proforma deberá efectuarse dentro del plazo de vencimiento establecido en el presente documento o de acuerdo a las condiciones estipuladas en el "Convenio de Pago de Primas" correspondiente.

ASESOR

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

[Firma]
 Director General

[Firma]
 HENRY RICARDO COLIZ SUAREZ
 INGENIERO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRICISTA
 REG. C. 10.111.0000

[Firma]
 HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200



LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS


Cal. Francisco Masías 370 LIMA - LIMA - San Isidro
Teléfono: 211-0000
www.lapositiva.com.pe


R.U.C. 20454073143
FACTURA
ELECTRÓNICA
F332- 00001795

Fecha de Emisión: 23/12/2019

CONTRATANTE	: VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.	N° PROFORMA	: 199795781
RUC N°	: 20570531787	INICIO VIG.DOC.	: 11/12/2019
DIRECCIÓN	: JR ZEPITA NRO 151	FIN VIG. DOC.	: 11/01/2020
LOCALIDAD	: LOS BAÑOS DEL INCA	VENC. DOC.	: 13/12/2019
ASEGURADO	: VARIOS ASEGURADOS	COD.CONTRATANTE	: R071916819
MONEDA	: SOLES		
PRIMA COMERCIAL	: 105.00		
OFICINA	: Cajamarca		
POLIZA	: 5633910		
RAMO	: ACCIDENT TRAB Y ENFERM PROFESI		
F. INICIO VIGENCIA	: 11/12/2019		
F. FIN VIGENCIA	: 11/01/2020		

CANT.	UMV	CONCEPTO	PRECIO DE VTA. UNIT.	PRIMA TOTAL
1.00	ZZ	PRIMA COMERCIAL-ACCIDENT TRAB Y ENFERM PROFESI	123.90	123.90

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

 HUGO RICARDO CCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200


 HUGO RICARDO CCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200


 Henry Javier Celiz Suarez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. EXONERADAS	S/	0.00
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. GRAVADAS	S/	105.00
TOT. DSCTO	S/	0.00
I.G.V.	S/	18.90
IMPORTE TOTAL	S/	123.90

SON: CIENTO VEINTITRES y 90 /100 Soles



Powered by Paperless



LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD

Cal. Francisco Masias 370 LIMA - LIMA - San Isidro
Teléfono: 223-9600
www.lapositiva.com.pe

R.U.C. 20601978572

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

F332- 00001543

Fecha de Emisión: 23/12/2019

CONTRATANTE : VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
RUC N° : 20570531787
DIRECCIÓN : JR ZEPITA NRO 151
LOCALIDAD : LOS BAÑOS DEL INCA
AFILIADO : VARIOS ASEGURADOS

MONEDA : SOLES
OFICINA : Cajamarca
CONTRATO : 5607061
PLAN : SCTR
F. INICIO VIGENCIA : 11/12/2019
F. FIN VIGENCIA : 11/01/2020

N° PROFORMA : 802580745
INICIO VIG.DOC. : 11/12/2019
FIN VIG. DOC. : 11/01/2020
COD.CONTRATANTE : R071916819

CANT.	UMV	CONCEPTO	PRECIO DE VTA. UNT.	IMPORTE TOTAL
1.00	ZZ	APORTE-FA802580745-SCTR	118.00	118.00

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Gerente General

INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

OP. GRATUITAS	SI	0.00
OP. EXONERADAS	SI	0.00
OP. INAFECTA	SI	0.00
OP. GRAVADAS	SI	100.00
TOT. DSCTO	SI	0.00
I.G.V.	SI	18.00
IMPORTE TOTAL	SI	118.00

SON: CIENTO DIECIOCHO y 00 /100 Soles




Powered by Paperless


VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107


11.14 Copia de la Pólizas CAR de Montaje de la Obra.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.


VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
CALLE DEL COMERCIO



HUGO RICARDO DCANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



HUGO RICARDO DCANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

**MAPFRE**

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - RUC: 20202380621

Direccion: Av. Veintiocho de Julio 873, Miraflores - Telefono: 213-3333

**POLIZA DE SEGURO DE
MONTAJE**

POLIZA 2312022000002	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 11/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 09/03/2020 12:00 Hrs.

CODIGO SBS: RG0743510040

Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

CONDICIONES PARTICULARES

TIPO	N°MOV.	F. EMISION	VIGENCIA DE POLIZA	FORMA DE PAGO	%PARTICIP.	RIESGOS	MONEDA
Emission	0	31/01/2020	11/12/2019 - 09/03/2020	Imeo	100 %	1	S/

DATOS DEL CONTRATANTE

NOMBRE VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.	RUC 20570531787
DIRECCION Zepita Nro 151 Los Baños Del Inca	
EMAIL 976581927	TELEFONO
ACTIVIDAD ECONOMICA	

DATOS DEL CORREDOR, PROMOTOR, COMERCIALIZADOR O BANCASEGUROS

NOMBRE Roca Fuerte Corredores De Seguros Sac	NOMBRE VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
CODIGO SBS : J0717	CODIGO SBS : [Signature]
CODIGO INTERNO : 2926	CODIGO INTERNO : [Signature]

IMPORTE DE LA COMISION 91.00

Los cargos de agenciamiento por la intermediación de corredores, contratación de promotores, comercializadores y bancaseguros podrán considerar el otorgamiento de bonificaciones, premios y/u otros beneficios en función al cumplimiento de metas de producción y resultados.

DATOS DE COBRO

DIRECCION DE COBRO Jiron Zepita Nro 151 Los Baños Del Inca Cajamarca Cajamarca	[Signature]
COBRADOR Matias Beltran Arce Flores	INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA R.U.C. CIP. N° 86090

PRIMAS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTE
Prima Comercial	721.01
Prima Comercial + I.G.V.	850.79

[Signature]
HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



MAPFRE

POLIZA 2312022000002	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 11/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 09/03/2020 12:00 Hrs.

Dentro de los 30 días siguientes de recibida la póliza por EL ASEGURADO, por EL CONTRATANTE o por EL CORREDOR en su caso, se podrán formular observaciones respecto de su contenido, solicitando por escrito su rectificación en forma precisa. Transcurrido ese plazo sin que medie observación, se tendrá por aceptada la póliza emitida.

En caso el texto de la Póliza difiera del contenido de la propuesta u oferta, dicha aceptación se presume solo cuando LA COMPAÑÍA advierte al CONTRATANTE en forma detallada y mediante documento adicional y distinto a la póliza, que existen esas diferencias y que dispone de treinta (30) días para rechazarlas.

Se adjuntan Cláusulas Generales de Contratación CGCRRGG01122013 y Condiciones Generales de la póliza: CGRM01122013

que EL CONTRATANTE y EL ASEGURADO del seguro declaran expresamente conocer y aceptar, y que con las presentes Condiciones Particulares y Solicitud de Seguro forman el contrato de seguros del que son parte integrante y no tienen valor por separado.

DATOS PERSONALES

El contratante del seguro autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente para la emisión de la póliza, así como la actualización y cesión de los mismos para los fines detallados en el Artículo 23 de las Cláusulas Generales de Contratación cuyo texto declara conocer en su integridad.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marcos Antonio Villacruz
C.R. 12345678901234567890
REG. CIP. N° 60200

Henry Julián Celis Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 60200

HUGO RICARDO OCAÑA NAVAS
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



MAPFRE

POLIZA 2312022000002	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 11/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 09/03/2020 12:00 Hrs.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia, desavenencia o reclamación relacionada o derivada del contrato de seguro, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación, será resuelta por los jueces y tribunales de la ciudad de Lima o del lugar donde domicilia el CONTRATANTE, ASEGURADO O BENEFICIARIO, según corresponda de acuerdo a Ley. Adicionalmente las partes, una vez producido el siniestro, cuando se trate de controversias referidas al monto reclamado, podrán convenir el sometimiento a la jurisdicción arbitral siempre y cuando las diferencias superen los límites económicos por tramos fijados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Sin perjuicio de lo antes indicado, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o BENEFICIARIO podrán presentar su reclamo ante la Defensoría del Asegurado; su denuncia o reclamo según corresponda, ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, entre otros según corresponda.

COMUNICACIONES

Las partes acuerdan como mecanismo de comunicación entre LA COMPAÑÍA y el CONTRATANTE y/o ASEGURADO, el domicilio físico, electrónico y/o telefónico, a las direcciones y números telefónicos que aparecen en las presentes condiciones particulares.

Las comunicaciones cursadas por los contratantes, asegurados o beneficiarios al comercializador, sobre aspectos relacionados con el seguro contratado, tienen los mismos efectos que si hubieran sido presentadas a la empresa. En este sentido, se entienden que dichas comunicaciones son recibidas en la misma fecha por la empresa.

Los pagos efectuados a los comercializadores por los contratantes del seguro, o terceros encargados del pago, se consideran abonados a la empresa en la fecha de realización del pago. Asimismo, la empresa debe prever que el comercializador lleve el control de dichos pagos.

MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

EL ASEGURADO

GENERADO POR : SANSILV

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Mercedes Amador de la Cruz
GERENTE GENERAL

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

Manuel Javier Coliz Suarez
INGENIERO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 85930



MAPFRE

Cajamarca, 31 de Enero del 2020

Señor(es):

Villacruz Contratistas S.R.L.

RUC 20570531787

Jiron Zepita Nro 151 Los Baños Del Inca Cajamarca Cajamarca

Moneda: S/

Corredor 2926 Roca Fuerte Corredores De Segu

De nuestra consideración:

Es grato informarle(s), que nuestra compañía está otorgándole(s) las facilidades de pago que más abajo se detallan.

Importante:

- a) En las fechas indicadas en la columna "obligación de pago" se inicia el plazo establecido para el pago de cada uno de los recibos. La primera cuota del presente convenio vence el primer día de vigencia de su póliza.
- b) En la columna "fecha limite de pago" se indica el plazo del que usted dispone para pagar la prima adeudada, la falta de pago podrá implicar que MAPFRE no estará obligada a cubrir los siniestros ocurridos mientras la cobertura se encuentre suspendida.

POLIZA	SUPLEMENTO	PRIMA COMERCIAL	INTERESES	I.G.V.	TOTAL
2312022000002	0	721.01		129.78	850.79
					850.79

NRO. CUOTA	MONEDA	IMPORTE	FECHA DE		SITUACION RECIBO
			OBLIGACION PAGO	LIMITE DE PAGO	
111183993	SOLES	850.79	11/12/2019	10/01/2020	PAGADO
		850.79			

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
 Marco Antonio Villacruz
 GERENTE GENERAL

TCEA : 0.00 %

TEA : 0.00 %

Lo invitamos a realizar el pago de la cuota adeudada por cualquiera de los siguientes medios:

Ingresando en la WEB de su banco @	BBVA BCP SCOTIABANK DE LA NACION (solo presencial) FALABELLA BIF INTERBANK
En cualquiera de los bancos que se indican, brindando el número del DNI, RUC o carnet de extranjería del contratante de la póliza	
Afiliándote al cargo en cuenta y/o tarjeta de crédito MasterCard, VISA, DINERS y American Express	

Para mayor información, puede comunicarse con nuestro servicio de atención 24 horas (SI24) llamando a los telefonos 01-2133333 en Lima y para Provincias 0801-1-1133 o consultando nuestra web www.mapfreperu.com/oim-clientes

Hugo Ricardo Ocaña Navarro
 HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

Marco Antonio Villacruz
 INGENIERO EN ELECTRICIDAD
 REG. CIP. N° 60090

D0911010 - 05/01



MAPFRE

Cajamarca , 31 de Enero del 2020

Señor(a)(rta)(es):

Villacruz Contratistas S.R.L.

RUC 20570531787

Jiron Zepita Nro 151 Los Baños Del Inca Cajamarca Cajamarca

Moneda: S/

Corredor: 2926 Roca Fuerte Corredores De Segu

Atentamente ,

**FELIPE RIOS GAJATE
DIRECTOR UNIDAD DE GENERALES**

CLIENTE ACEPTADO

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

[Handwritten signature]
Lima, 31 de Enero del 2020

[Handwritten signature]
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 86090

[Handwritten signature]
HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



PAG: 1

MAPFRE

POLIZA DE SEGURO DE MONTAJE

POLIZA 2312022000002	COLECTIVO	SUPLEMENTO
VIGENCIA DESDE 11/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 09/03/2020 12:00 Hrs.	APLICACION

TIPO DE MOVTO <i>Emission</i>	SPTO. 0	FECHA ACTU. 31/01/2020	FECHA INI.POL. 11/12/2019	Nro.RSGOS 1	MON. S/	PRIMA NETA. 721.01
----------------------------------	------------	---------------------------	------------------------------	----------------	------------	-----------------------

DATOS DEL ASEGURADO

NOMBRE DEL ASEGURADO
Villacruz Contratistas S.R.L.

RUC
20570531787

UBICACION DEL RIESGO

Instalaciones Pesqueras Artesanales - Localidad De Acapulco, Otros, Contralmira,

DATOS DEL RIESGO

INTERES

ASEGURADO: *Ampliacion De Potencia Para El Sistema De Utilizacion En Media Tension 22.9kv -*

VALOR FINAL
DE LA OBRA : 295,860

VALOR DE
EQUIPOS : 295,860

VALOR FINAL
DEL MONTAJE : 295,860

PERIODO DE OBRA (MESES) : 2

PERIODO DE PRUEBAS (MESES): 1

COBERTURAS CONTRATADAS

DESCRIPCION DE COBERTURA	SUMA ASEGURADA	DEDUCIBLE DE COBERTURA		
		VARIABLE	MINIMO/FIJO	MAXIMO
<i>Principal " A "</i>	<i>295,860</i>	<i>10.00% Monto Indemnizable S/ 7,500</i>		
<i>Terremoto " B "</i>	<i>295,860</i>	<i>20.00% Monto Indemnizable S/ 30,000</i>		
<i>Inundacion " C "</i>	<i>295,860</i>	<i>15.00% Monto Indemnizable S/ 20,000</i>		
<i>Huelga, Motin Y Conmocion Civil</i>	<i>295,860</i>	<i>10.00% de la Perdida</i>	<i>S/ 15,000</i>	
<i>Terrorismo</i>	<i>295,860</i>	<i>10.00% de la Perdida</i>	<i>S/ 15,000</i>	

CLAUSULAS ADHERIDAS

- 231 - Condiciones Generales Del Seguro Contra Riesgos De Montaje
- 999 - Clausulas Generales De Contratacion - Cgcrngg01122013
- 001 - Huelgas, Motin Y Conmociones Civiles
- 002 - Terrorismo
- 006 - Cond. Especiales Cronograma De Construccion Y/O Montaje
- 009 - Estructuras En Zonas Sismicas
- 011 - Maquinaria Usada
- 015 - Campamentos Y Almacenes De Materiales De Construccion
- 016 - Cables Y Tuberia Subterranea

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

[Signature]
Marta Villacruz Contralimira Cruz
GERENTE GENERAL

[Signature]
HUGO RICARDO OCANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

[Signature]
Nelson David Celis Suarez
INGENIERO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 36090

D0004002 - 10/00



POLIZA 2312022000002	COLECTIVO	SUPLEMENTO 0
VEGENCIA DESDE 11/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 09/03/2020 12:00 Hrs.	APLICACION 0

CONDICIONES ESPECIALES Y/O DATOS ANEXOS

Se excluyen los siniestros ocurridos previo a la fecha de emisión de la presente póliza o a la fecha de inicio de la cobertura provisional otorgada, si la hubiera.

Obra .- AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PESQUEROS ARTESANALES EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO

Lugar .- INSTALACIONES PESQUERAS ARTESANALES - LOCALIDAD DE ACAPULCO – ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR – TUMBES

Monto de la Obra.- S/. 295,860.04

Duración .- 11/12/2019 al 09/03/2020
(debe coincidir con el cronograma de avance e obra)

Coberturas y explicación resumida	S. Asegurada	Deducibles por cada Etapa
- " A " - Principal	S/. 295,860.04	10% del monto indemnizable, minimo S/ 7,500
Daños materiales en la obra por accidentes, INCENDIO (incluye 30 días de prueba para equipos nuevos)		15% del monto indemnizable, minimo S/ 20,000
- " B " - Terremoto, temblor, erupción volcánica, (excluyendo Maremoto).	S/. 295,860.04	20% del monto indemnizable, minimo S/. 30,000
- " C " - Daños por Inundación, huayco, lluvia, derrumbe, vientos, deslizamientos de terreno.	S/. 295,860.04	15% del monto indemnizable, minimo S/.20,000
- " D " - Riesgo de Diseño	S/. 59,172.01	10% del monto indemnizable, minimo S/. 15,000
Mantenimiento simple (01 mes)	S/. 295,860.04	10% del monto indemnizable, minimo S/. 15,000
- HMCCDMVT	S/. 295,860.04	10% del monto indemnizable, minimo S/. 15,000
Daños por Huelgas, motin, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo, terrorismo.	Vigencia	S/. 15,000
- " E " y " F " - Resp. Civil cruzada	S/. 59,172.01	Por reclamante:
Responsabilidad civil por daños materiales o corporales, a terceros.	Vigencia	10% del monto indemnizable, minimo S/. 10,000
Otras Propiedades Aydacentes	S/. 59,172.01	15% del monto indemnizable, minimo S/. 7,500
- " G " - Rem. Escombros	S/. 29,586.00	El de la cobertura afectada

Henry Flavia Celiz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 60690

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

[Signature]
H. Cruz

[Signature]
HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



POLIZA 2312022000002	COLECTIVO	SUPLEMENTO 0
VIGENCIA DESDE 11/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 09/03/2020 12:00 Hrs.	APLICACION 0

- Flete Aéreo	S/. 10,000.00	10% del valor del flete, minimo S/. 3,500
- Gastos extraordinarios	S/. 10,000.00	El de la cobertura afectada

Prima Neta por el Período .-	S/. 700.00	
Prima Total por el Período .-	S/. 850.78	(Incluye Gastos e Impuestos)

Cláusulas Adheridas .-

Condicionado General contra Todo Riesgo para Contratistas (EAR)

Cláusulas Generales de Contratación

Huelga, Motín y Comociones Civiles

Terrorismo

Condiciones Especiales

Exclusión de vientos huracanados

Cables subterráneos, Tuberías y demás instalaciones subterranas. Deducible: 15% del monto indemnizable, mínimo S/.10,000

Estructuras en Zonas Sísmicas

Campamentos y Almacenes de Materiales de Construcción:

- Límite para campamentos y por unidad de Almacenaje de material hasta S/. 500,000.00

Medidas de Seguridad contra Precipitación, Avenida e Inundación (Período de Recurrencia: 20 años). La Compañía de Seguros solo indemnizará los siniestros de lluvia y/o inundación y/o precipitación y/o avenida en caso el asegurado demuestre que las lluvias que dieron origen al siniestro, superaron en el sitio de la obra el nivel máximo de lluvias ocurridas en los últimos 20 años.

Responsabilidad civil cruzada

Exclusión de Asentamientos

Robo, cobertura hasta S/ 30,000.00; Deducible: 20% del monto indemnizable, minimo S/.5,000; se excluye robo de cables (cables de cobre)

Mantenimiento simple (01 mes)

Ciclon, Avenida, Inundación

Cláusula de indemnización

Flete aéreo

Riesgo de Diseño

Taludes

Equipo Extintores de Incendio

Otras Propiedades Adyacentes

Remoción de escombros

72 horas

Gastos adicionales (horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días festivos, flete expreso)

Cronograma de de avance de de los Trabajos de Construcción y/o Montaje (Desviación maxima 04 semanas)

Otras

Condiciones

- * No se renuncia a la aplicación del infraseguro
- * No se aceptan prorrogas automáticas

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Barso de la Cruz

Gerente General

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

Ing. María Celis Suarez
INGENIERA MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 58830



POLIZA 2312022000002	COLECTIVO	SURTIENTO 0
VIGENCIA DESDE 11/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 09/03/2020 12:00 Hrs.	APLICACION 0

- * La memoria descriptiva , el resumen ejecutivo , el contrato , presupuesto de construcción , el cronograma y los estudios geotécnicos o de sub suelos forman parte integrante de la póliza
- * El asegurado se compromete a colocar e instalar avisos y señales muy visibles advirtiendo sobre la ejecución de la obra, en cantidad suficiente y en todos los lugares que se requiera. Estos avisos y señales deben ser luminosos por la noche. Al finalizar los trabajos de la obra, los avisos y señales deberán ser retirados; caso contrario y de ocurrir un siniestro amparado, la compañía de seguros no asumirá responsabilidad indemnizatoria.
- * Se deben seguir todas la recomendaciones del estudio de suelos y en caso de cambios en el mismo deberá informarse al asegurador de inmediato; caso contrario no hay responsabilidad de la aseguradora.
- * Si durante el periodo de vigencia de la póliza de seguros, hubiera fluctuaciones en los sueldos y precios, el asegurado esta obligado a declararlos al final de la vigencia para proceder con el ajuste de prima correspondiente
- * La cobertura de responsabilidad civil termina en la fecha indicada en el periodo de construcción o montaje o cuando hayan cesado las actividades de construcción o montaje, según lo que ocurra primero.
- * Bajo la cláusula Propiedad Adyacente, el asegurado se compromete a entregar a la Cia de seguros dentro de los 15 días posteriores al inicio de vigencia una relación detallada y valorizada de toda propiedad existente o propiedad que queda bajo su cuidado y/o custodia y/o bajo su supervisión . En caso de no entregarse dicha relación , la cobertura de la presente cláusula queda sin efecto.
- * Cualquier cambio en el periodo de construcción será considerado como prórroga
- * Las prórogas no son automáticas, su aceptación o rechazo son sujeto de evaluación por parte de la Cia.
- * Reajuste de la prima del Seguro al final de la vigencia, sobre la base del valor final alcanzado por el proyecto asegurado
- * No se cubren los gastos incurridos por las actividades necesarias para restituir y/o abatir el nivel freatico en las zonas aledañas al proyecto de construcción, tampoco se cubren los gastos para estabilizar el terreno y/o aumentar el factor de seguridad del proyecto, por situaciones no contempladas en los estudios geologicos y de suelos.
- * Para la Cobertura de Huelga, Motín, Conmocion Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y Terrorismo:
 Aviso de Cancelacion 10 días, contados desde la fecha de aviso de cancelacion.
 Sumas aseguradas en agregado por la vigencia
 Esta cobertura se otorga bajo la garantia de que el asegurado no contratara coberturas o limites adicionales que operen en exceso del limite aquí propuesto. En caso contrario, la cobertura sera invalidada de manera automatica.
 Se excluyen daños biologicos/quimicos
 Se excluyen daños por cohetes/misiles
 Por HMCCDMVT se entenderá Huelga, Motín, Conmocion Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y Terrorismo

Condiciones especiales:

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Cláusula de Garantía:

[Signature]

[Signature]
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. C.I.P. N° 60200

Es condicion de cobertura de robo, que las obras y sitios de obras, cuentan con vigilancia permanente con arma y que se realicen rondas periódicas semanales a lo largo de las obras, en caso de incumplimiento, la compañía de seguros no será

[Signature]
HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. C.I.P. N° 60200



POLIZA 2312022000002	COLECTIVO	SUPLEMENTO 0
IGENCIA DESDE 11/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 09/03/2020 12:00 Hrs.	APLICACION 0

responsable en caso de siniestro.

Exclusión de Asentamientos:

Queda excluidos los daños o pérdidas que se originen por Hundimiento y Asentamiento causados por deficiente compactación y/o estabilización del así como por trabajos de hinchado no adecuados o deficientes. Así mismo quedan excluidos daños causados por asentamientos previsibles del terreno (se disponga o no de estudio geotécnico previo) según el subsuelo, los materiales y los métodos de construcción empleados.

Cláusula de Taludes.-

Para efectos de esta póliza y la materia asegurada, se consideran taludes todos aquellos trabajos de perfilamiento (cortes y pendientes) definidos en el proyecto de construcción y modificaciones posteriores y los cortes realizados durante la ejecución del proyecto para lograr el ensanche de la ruta o un mejoramiento de esta pero que no presentan cortes escalonados y pendientes. No se encuentran dentro de la materia asegurada los taludes naturales.

Exclusiones .-

Adicionalmente a las indicadas en el condicionado general, queda excluido:

Hurto simple y/o desaparición misteriosa, Responsabilidad civil patronal , Responsabilidad Civil de contratistas

Responsabilidad civil por accidentes de trabajo, responsabilidad civil consecencial, contaminación y/o polución del medio ambiente, ALOP, TREC (equipo y maquinaria de construcción), túneles, pruebas para maquinaria, equipos y partes usadas; Transporte nacional e internacional, Construcción de puentes y túneles .

Subsuelos y Masas de Tierra.

Responsabilidad Civil durante el periodo de mantenimiento

Los gastos incurridos por las actividades necesarias para restituir el nivel freático en las zonas aledañas al proyecto de construcción.

Tampoco se cubren los gastos para estabilizar el terreno y/o aumentar el factor de seguridad del proyecto , por situaciones no contempladas en el estudio de suelos.

La estabilización de áreas de roca sueltas y/u otras medidas adicionales de seguridad , aún cuando esta necesidad se presente solamente durante la ejecución de los trabajos de construcción.

Los daños causados de la edificación asegurada causados por asentamientos diferenciales de la misma, al igual que los daños a la estructura causados por rebote elástico del suelo.

Daños producidos o agravados por arcillas expansivas y/o fallas geológicas

Siniestros anteriores al inicio de vigencia

Multas, incumplimientos contractuales, obradores y otras instalaciones provisorias de obra.

Herramientas, Equipos de contratistas.

VILLASOR CONTRATISTAS S.R.L.

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

EVENTO SINIESTRAL - 72 HORAS:

1. ALCANCE:

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones de la póliza, en el caso de un eventual siniestro, cualquier pérdida o daño que sufran los bienes



POLIZA 2312022000002	COLECTIVO	SUPLEMENTO 0
VIGENCIA DESDE 11/12/2019 12:00 Hrs.	HASTA 09/03/2020 12:00 Hrs.	APLICACION 0

asegurados durante un periodo de 72 horas consecutivas, contados a partir de la ocurrencia del primer evento de daños registrado al bien asegurado, y que sea causado por un mismo fenómeno de la naturaleza, será considerado como un solo evento y por consiguiente constituirá un acontecimiento único para efectos de la aplicación del deducible. Con este propósito, la determinación de cualquier periodo de 72 horas quedará a juicio del asegurado. No obstante, se entiende que no deberán coincidir dos o más de dichos periodos, en el caso de que ocurran daños dentro de un periodo de tiempo más extenso. Para la determinación del inicio del siniestro, la compañía tomará como base los reportes oficiales del evento catastrófico. la inundación a consecuencia de lluvia es el mismo evento solo si entre ellas hay una relación de causa a efecto.

2. DEFINICIONES: Evento Es un siniestro o una serie de siniestros individuales que responden o se producen directamente por la misma causa en un lapso de tiempo determinado. Evento catastrófico Son todas las pérdidas o daños causados por un fenómeno natural, según se detallan en las coberturas B o C de la presente póliza, independiente de la voluntad del asegurado.

3. DEDUCIBLE: Cuando a raíz de un evento se vean afectadas varias secciones de la póliza, se aplicará a cada una el deducible especificado en las condiciones particulares de la póliza.

4. APLICACIÓN: Son de aplicación a esta cláusula las condiciones generales de contratación y las condiciones generales del seguro para contratistas, en cuanto no se hallen modificadas por este acuerdo. las condiciones particulares y especiales prevalecen sobre esta cláusula.

Cláusula de Taludes.-

Para efectos de esta póliza y la materia asegurada, se consideran taludes todos aquellos trabajos de perfilamiento (cortes y pendientes) definidos en el proyecto de construcción y modificaciones posteriores y los cortes realizados durante la ejecución del proyecto para lograr el ensanche de la ruta o un mejoramiento de esta pero que no presentan cortes escalonados y pendientes. No se encuentran dentro de la materia asegurada los taludes naturales.

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

EL ASEGURADO

NOTA: Este documento sustituye a los movimientos de numeración y fecha anterior

POLIZA ANTERIOR Nro:
GENERADO POR: SANSILV

María J. Ortiz Suarez
INGENIERA EN SISTEMAS DE INGENIERIA

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco S. ...
GERENTE GENERAL

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

11.15 Copia de la póliza de Seguro VIDA LEY.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

Hugo Ricardo Ocaña Navarro
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



Cajamarca, 03 de Enero de 2020

57282108

CONSTANCIA SEGURO VIDA LEY

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
VIGENCIA: 11/01/2020 AL 11/02/2020

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados líneas abajo, conforme al Decreto Legislativo N° 688, se encuentran amparados bajo las coberturas de Vida Ley.

SEGURO VIDA LEY POLIZA: 0

INCLUSIÓN DE PERSONAL ASEGURADO

NRO	NOMBRES	PATERNO	MATERNO	NRODOC
1	EDGAR	HOYOS	CUBAS	40947124
2	LUIS PEPITO	VASQUEZ	RUIZ	46018720
3	LUIS FERNANDO	ROJAS	TARRILLO	77924799
4	HENRY	CELIZ	SUAREZ	41998543
5	JOEL	ZAMORA	RAMIREZ	16720966
6	SUBAR OLISTER	BERNAL	HERNANDEZ	42488756
7	KENNY	VILLALOBOS	VEGA	04195876
8	JAVIER ARTURO	RAMIREZ	VERA	16593371
9	MARCO	GUTTY	DE LA CRUZ	44988244

Extendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente: VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

Francisco Noya Bao

Francisco Noya Bao
Gerente Comercial
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros

Nota:

El presente documento está sujeto a la política de suscripción de la Compañía y queda sin efecto en caso de que el cliente mantenga obligaciones referentes al presente rubro.

VILLACRISTAL SEGUROS S.R.L.
CALLE DE LA CRUZ
SANTO DOMINGO, D.R.


Henry Fernando Celiz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 80080


Hugo Ricardo Ocaña Navarro
HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

11.16 Panel Fotográfico de la ejecución de la Obra

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Maestro de Obra:  **Henry Félix Celiz Suarez**
Gerente General


HENRY FÉLIX CELIZ SUAREZ
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 86000


HUGO RICARDO DEANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

TRANSPORTE DE MATERIALES ELÉCTRICOS LIMA - TUMBES



LACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
[Signature]
Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL



[Signature]
Henry Alvaro Celiz Suarez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 69039



[Signature]
HUGO RICARDO OCANA NAVARRO
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 60200

TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA



VILLACRIZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Guitty de la Cruz
GERENTE GENERAL



Henry Fiquito Celiz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 86090



HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

CARTEL DE OBRA



VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL



Henry Flavia Coliz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 86090



HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60290


OBRAS PROVISIONALES

SS.HH. PORTATILES



VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Guty de la Cruz
GERENTE GENERAL

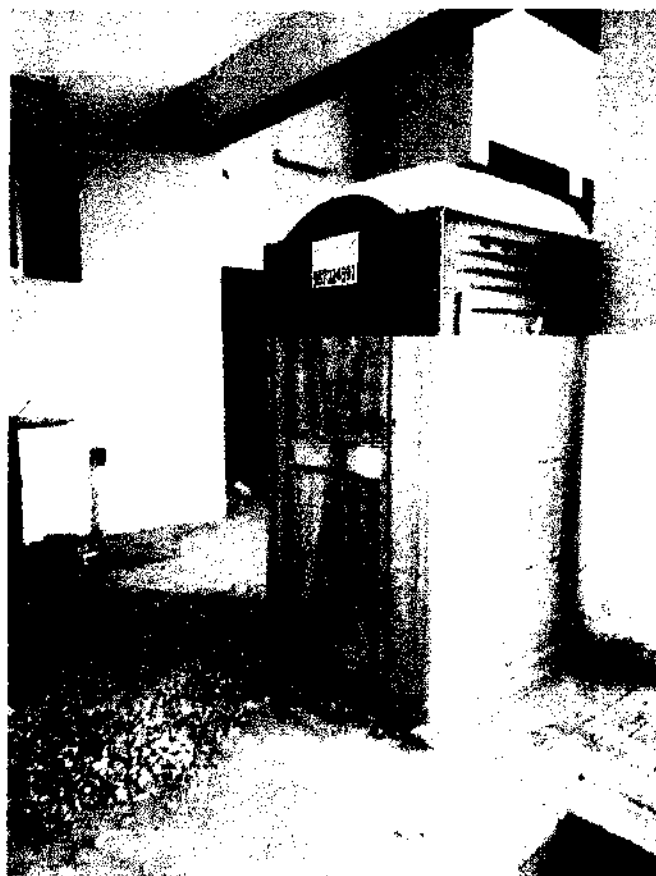

Henry Flaco Celis Sae
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA

H-4-1
HUGO RICARDO OCANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

AGUA PARA LA OBRA



VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

[Signature]

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

[Signature]
Henry Flavia M. S.
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 8609



[Signature]

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

ENERGÍA PARA LA OBRA



VILLACROZ CONTRATISTAS S.R.L.
[Signature]

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

[Signature]
Henry Flavio Celiz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. C.I.P. N° 86090

[Signature]
HUGO RICARDO OCANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. C.I.P. N° 60200

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ELECTRICO



VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL



Henry Flavia Celiz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 86090

H-1
HUGO RICARDO OCANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

PUNTO DE PROTECCION Y MEDICION



VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Marco Antonio Guty de la Cruz
GERENTE GENERAL

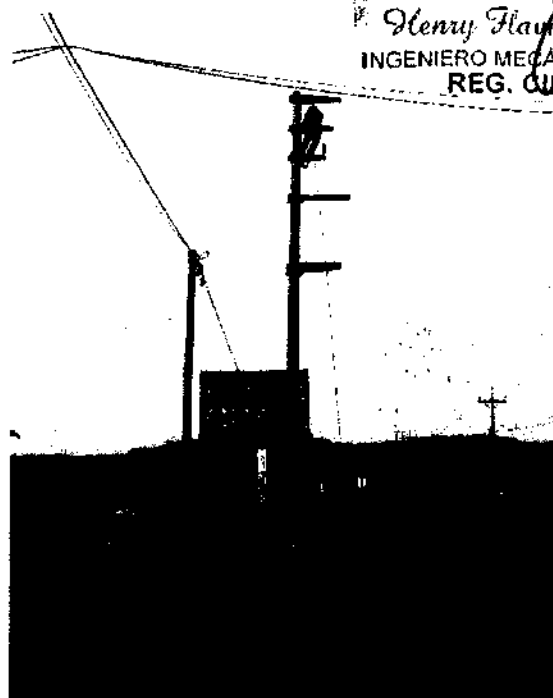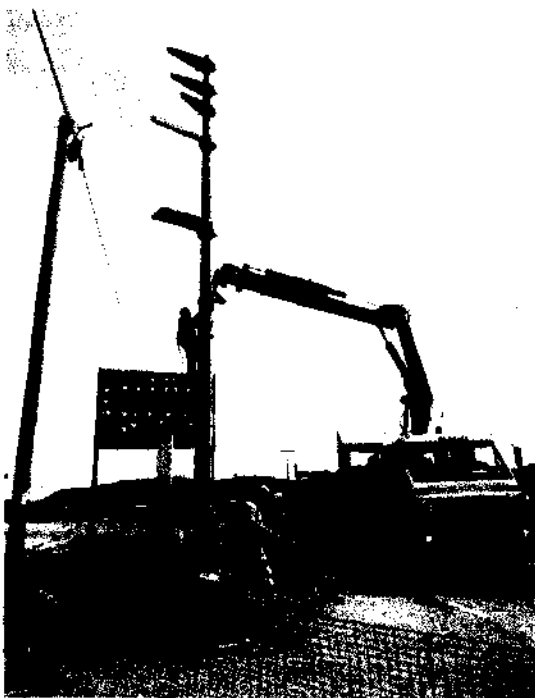

Henry Flavio Celiz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 86090

NA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

PRUEBA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE LIMA (MENAUTT)



LLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.


Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL



Henry Flavia Celiz Soto
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 86090

Hugo Ricardo Ocaña

HUGO RICARDO OCAÑA N.A.
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Marco Antonio Gutty de la Cruz

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

Henry Flavio Celiz Suarez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 86090


Hugo Ricardo Ocaña Navarro
HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

D

Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL



Q-41

OCANA NAVARRO
MÉCANICO ELECTRICISTA
R. N° 60200

J
Henry Florio Veliz Saez
INGENIERO MECANICO ELECTE.
REG. CIP. N° 80000

RED SUBTERRANEA

EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60 x 1.10m (ANCHO x PROF.) TERRENO SEMIROCOSO




CONTRATISTAS S.R.L.
 Mario Gully de la Cruz
 REPRESENTANTE GENERAL



HUBO RICA... NAVARRO
 INGENIERO... ELECTRICISTA
 Reg. GIC N° 80206

Henry Flavio Coliz Suarez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. GIC N° 86050

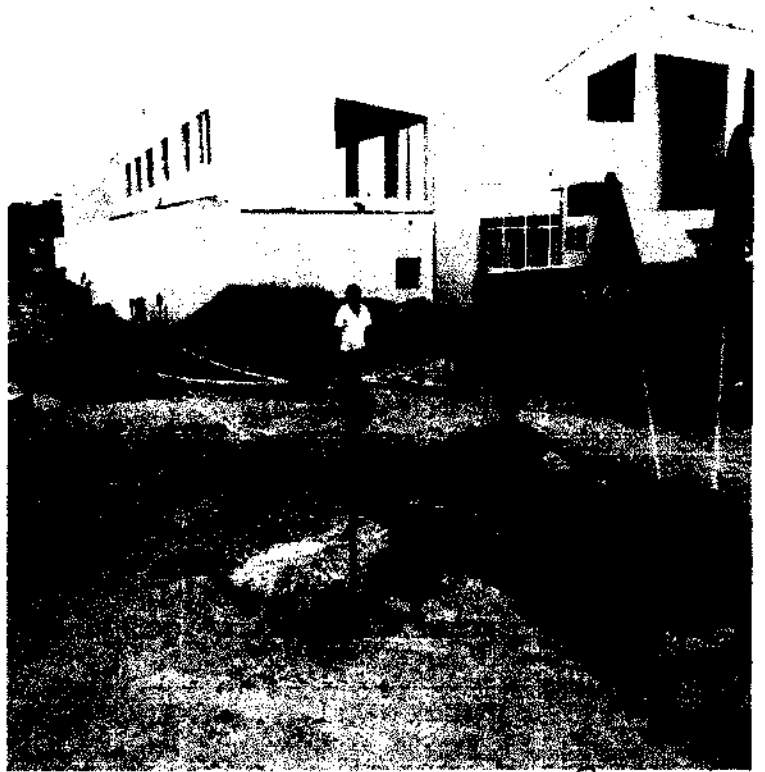

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

HUBO DE LA CRUZ NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 60200

Henry Florio Celis Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 86090

CORTE, ROTURA DE ASFALTO



SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P Ø 100mm




VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

Henry Flavia Celiz Saca
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 86090

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200




VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

 Marco Antonio Gutty de la Cruz
 GERENTE GENERAL

Henry Flaco Coliz
 INGENIERO MECANICO/ELEC.
 REG. CIP. N° 86095

H-4-1
 HUGO RICARDO OCANA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

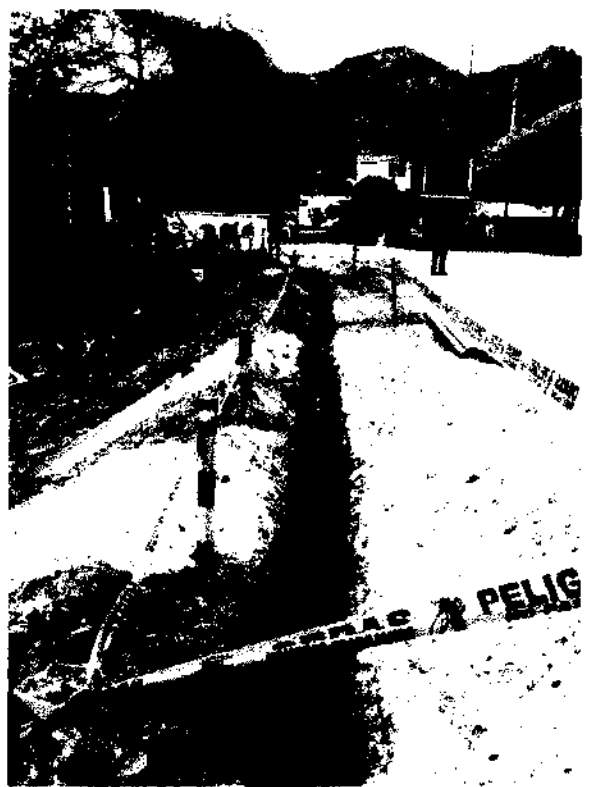

1
A NAVARRO
ELECTRICISTA
200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.


Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

Henry Flavio Celiz San
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 86090



—

—

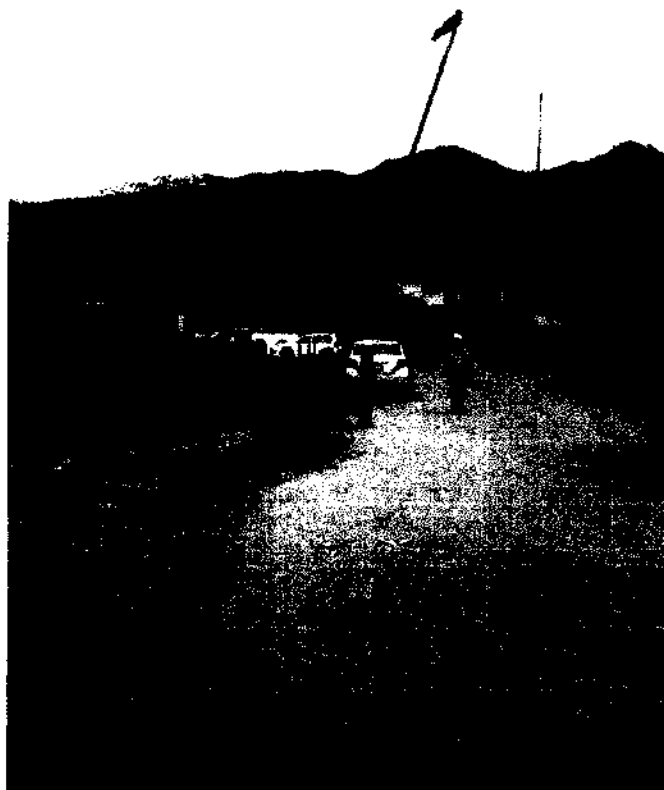


BUZONES DE CONCRETO DE 1.00x1.00x1.55m (LADO x LADO x PROF.)



A-401
CARDO OCANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
[Signature]
Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

[Signature]
Henry Fianco Celiz Soria
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 86090


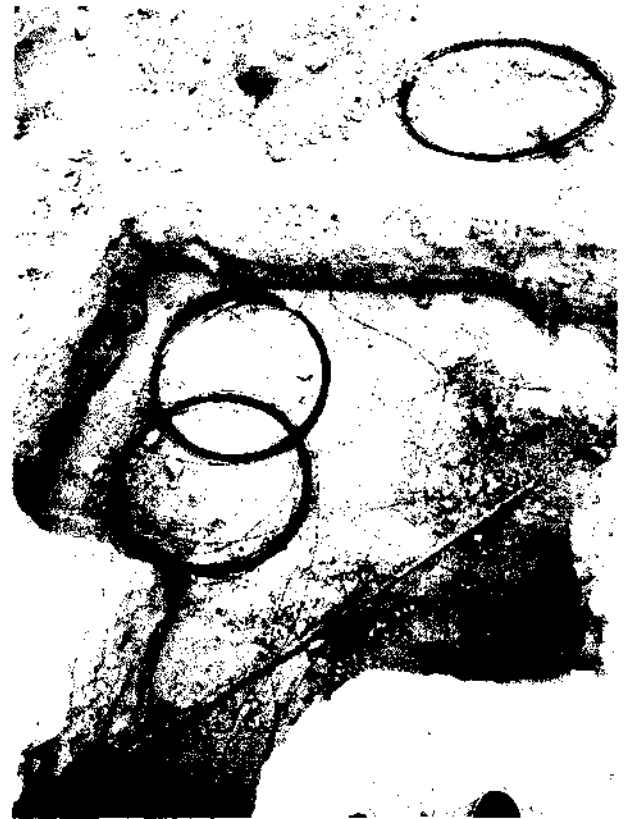


VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

Henry Flavia Celiz Sa
INGENIERO MECANICO ELECTRI
REG. CIP N° 86090

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

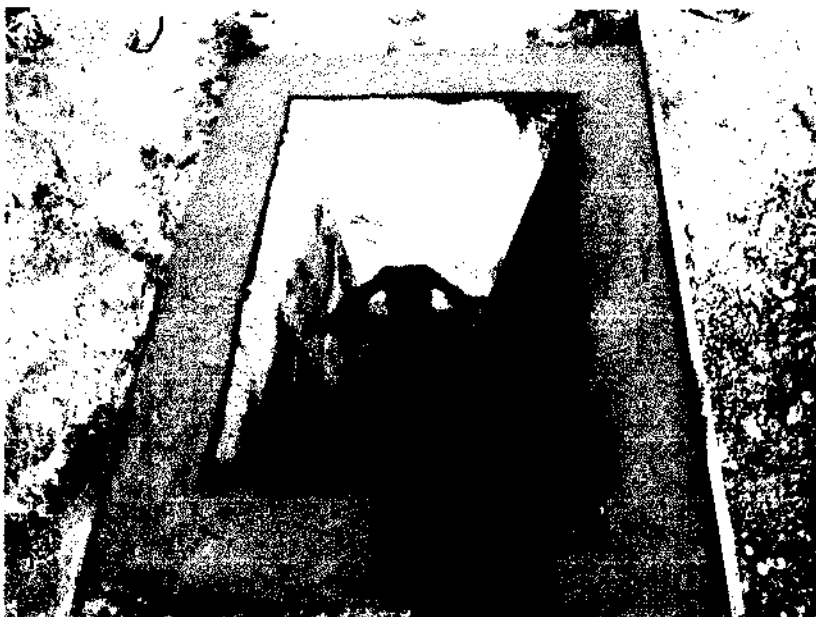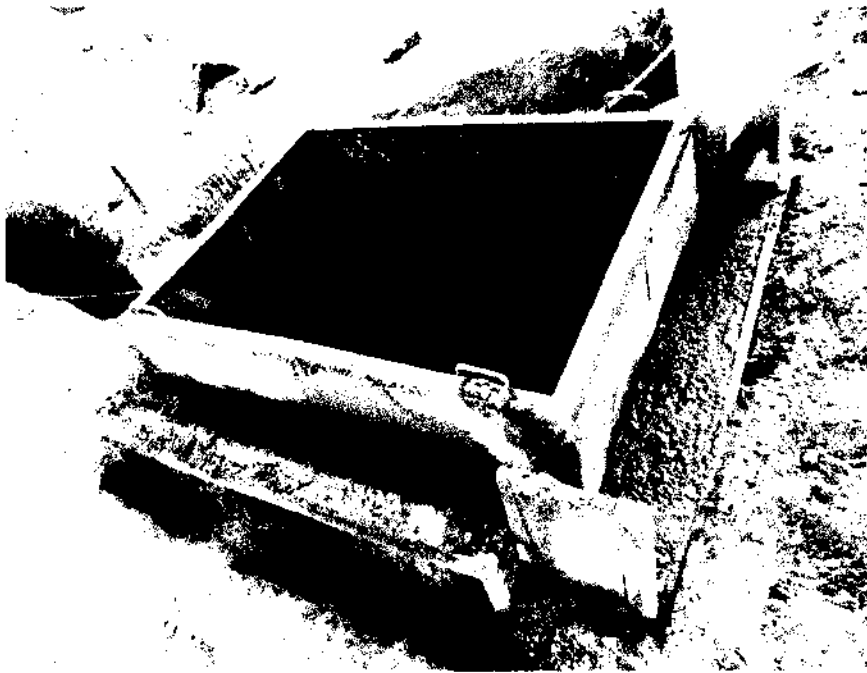

Henry Flavia Coliz Snc
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. C.P. N° 86000

7-4-1
 LUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.P.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
 GERENTE GENERAL



VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.


Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

Henry Jairo Celis San
INGENIERO MECANICO ELECTRI
REG. CIP. N° 86090


Hugo Ricardo Ospina
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

CABLES Y CONDUCTORES

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE N2XSY 18/30 KV DE 50mm2



POZO PUESTA A TIERRA

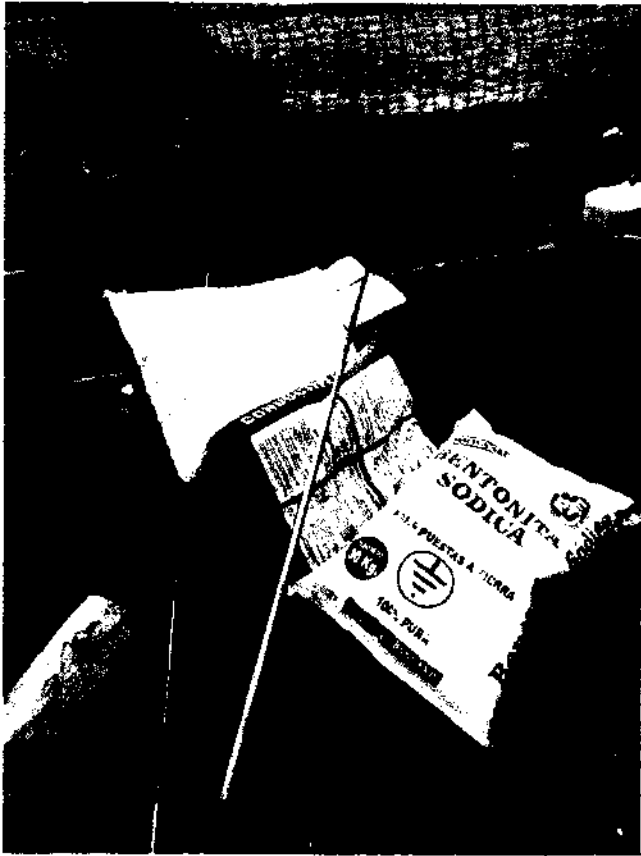

VILLACRUZ ELECTRICISTAS S.R.L.




HUGO RICARDO DE ANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 66090

SEÑALIZACION

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
[Signature]
Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

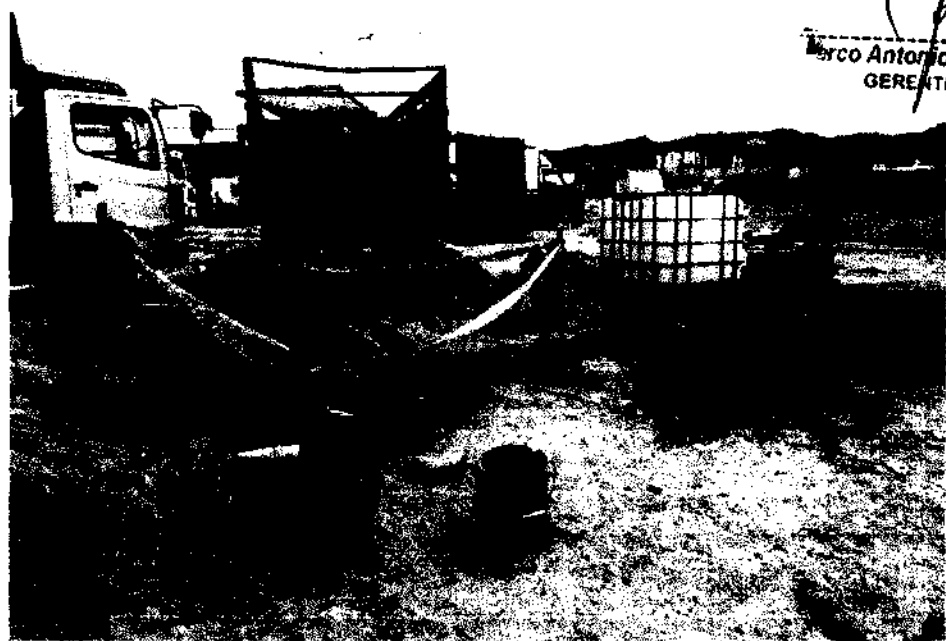

[Signature]
Henry Flujio Coliz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 86090

INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 60200

626

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

RUC N° 20570531787

OBRA: AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø,
PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PESQUEROS ARTESANALES EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO -
ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES.

FICHA TECNICA DE LOS EQUIPOS

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

Marco A. Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia
Contraalmirante - Tumbes

E-mail Empresa: info@villacruzcontratistas.com
Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107



MENAUTT ELECTRIC S.A.C.

TABLA DE DATOS TECNICOS DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO EN SECO 315 KVA

ITEM	CARACTERÍSTICA	UNIDAD	VALOR GARANTIZADO	OFERTADO
1	Características Generales			
1.1	País de procedencia	—		PERÚ
1.2	Fabricante	—		MENAUTT ELECTRIC SAC
1.3	Cantidad	UND	01	01
1.4	Modelo	—		TDT5
2	Características técnicas			
2.1	Potencia nominal	KVA	315	315
2.2	Tensión nominal primaria	KV	22.9 ±2.5%	22.9 ±2.5%
2.3	Tensión nominal secundaria en vacío	KV	0.40-0.23	0.40-0.23
2.4	Tensión nominal secundaria con carga	KV	0.38-0.22	0.38-0.22
2.4	Regulación en lado de 10 KV		+/- 2x2.5%	+/- 2x2.5%
2.5	Grupo de conexión		Yyn6	Yyn6
2.6	Numero de fases		4	4
2.7	Clase de aislamiento térmico		F (155°C)	F (155°C)
2.8	Nº de aislamiento en A.T. / B.T.		3 / 4	4 / 4
2.9	Tipo de aisladores primario		Resina	Resina
2.10	Clase de aislamiento		BOBINAS MT: ENCAPSULADAS (RESINA EPOXICA) BOBINAS BT: IMPREGNADAS EN BARNIZ AISLANTE (CLASE "F")	BOBINAS MT: ENCAPSULADAS (RESINA EPOXICA) BOBINAS BT: IMPREGNADAS EN BARNIZ AISLANTE (CLASE "F")
2.11	Nivel de aislamiento en el primario	KV	24/50/125	24/50/125
2.12	BN exterior	KV	170	170
2.13	Nivel de aislamiento en el secundario	KV	1.1/3	1.1/3
2.14	Calentamiento promedio de los devanados	K	100	100
2.15	Temperatura máxima de ambiente	°C	40	40
2.16	Sistema de disipación de calor		AN	AN
2.17	Tensión de cortocircuito		6.0%±10%	6.0%±10%
2.18	Frecuencia		60 Hz	60 Hz

MENAUTT ELECTRIC S.A.C.

 Gerente General

Oficina: Jr. El Estano 5784 Urb. Industrial Infantes - Los Olivos
 Planta: Mz. M Lt. 3 Av. El Dorado Alameda Del Norte Sector 13 Puente Piedra - Lima - Lima
 Telfs.: 528-8626 / 528-8869 Celular: 947 543 748 / 999 492 922 / 985 033 535
 E-Mail: menautt@menauttelectric.com.pe
 ventas@menauttelectric.com.pe

Marco A. Gully de la Cruz
 Gerente General



MENAUTT ELECTRIC S.A.C.

2.18	Frecuencia		60 Hz	60 Hz
2.19	Pérdidas			
	-En vacío con Tensión y Frecuencia Nominal (Hierro)	KW	1.00	1.7
	-En cortocircuito con corriente nominal a 75°C (Cobre)	Kw	4.10	3.5
	Pérdidas Totales	KW	5.10	5.2
2.20	Altura máxima de trabajo	mshn	1000	1000
2.21	Factor de potencia		0.9	0.9
2.22	Nivel de ruido	DB	55DB (Norma ST 20)	55DB (Norma ST 20)
2.21	Trabajo		Continuo	Continuo
2.22	Montaje		Interior	Interior
2.23	Norma de fabricación		IEC-60076-11	IEC-60076-11
2.24	Peso total			1700 Kg.
3	Accesorios			
3.1	Manifold de puentes de conmutación exterior, de accionamiento sin carga		SI	SI
3.2	Central de control de temperatura PT100 con monitores de cada fase y contactos para control de alarma		SI	SI
3.3	Ojales de tornillo para levantar la parte activa del transformador completo		SI	SI
3.4	Borne de conexión a tierra		SI	SI
3.5	Ruedas bidireccionales		SI	SI
3.6	Punto para terminal para puesta a tierra		SI	SI
3.7	Bornera de conexión de las sondas de protección por una caja IP65		SI	SI
3.8	Placa de características		SI	SI

MENAUTT ELECTRIC S.A.C.
 Marco A. Gutierrez
 GERENTE GENERAL

VLLACRUZ CONTRATISTAS SRL.
 Marco A. Gutierrez de la Cruz
 GERENTE GENERAL


Oficina: Jr. El Estañó 5784 Urb. Industrial Infantas - Los Olivos
 Planta: Mz. M Lt. 3 Av. El Dorado Alameda Del Norte Sector 13 Puente Piedra - Lima - Lima
 Telfs.: 528-8626 / 528-8869 Celular: 947 543 748 / 999 492 922 / 985 033 535
 E-Mail: menautt@menauttelectric.com.pe
 ventas@menauttelectric.com.pe

Accesorios:

01	5000 mm	Cables U3 (para prueba del núcleo)
02	1500 mm	Cables U de 4" (normal de flexión)
03	5000mm	Esperos de 50"
04	4m	de pilas de 50-25...
05	04	Puntos de 2" 1/2 x 5/8" (conexión)
06	01	Tablero de Fibras de vidrio de 600x100x10...
07	01	Cable de sensor de temperatura
08	04	Cáncamos de 2"
09	04	Resortes Bidireccionales



Gabinete de Protección

Cáncamo de izaje

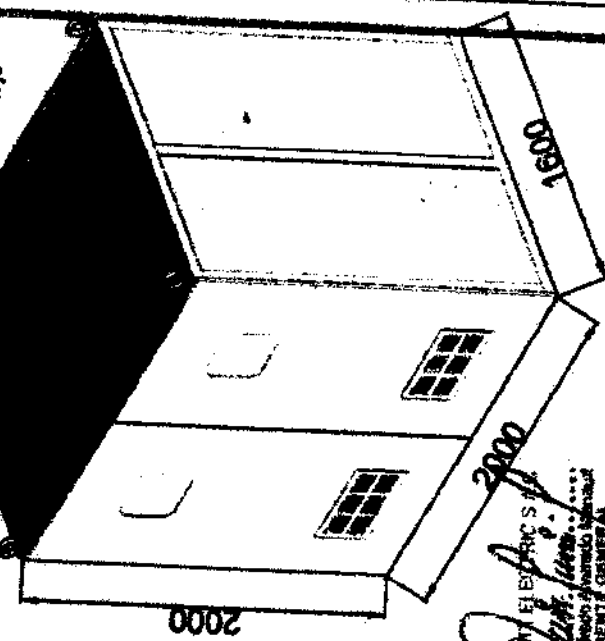


Mano de obra
 MANAULT ELECTRIC S.A.
 P.O. Box 1025-12
 GERENTE GENERAL


Vista Lateral

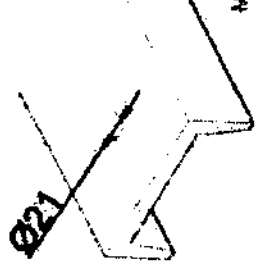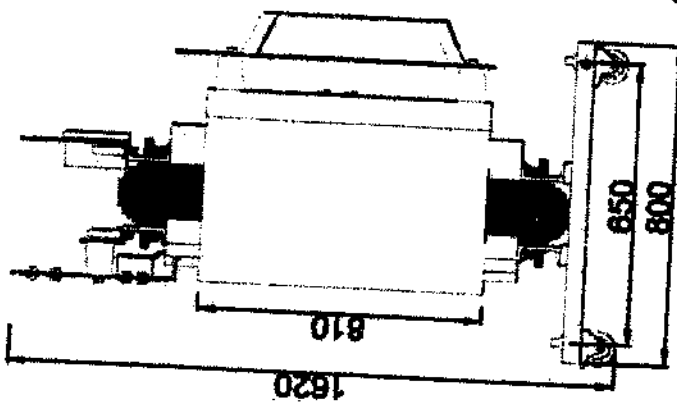

Vista Frontal

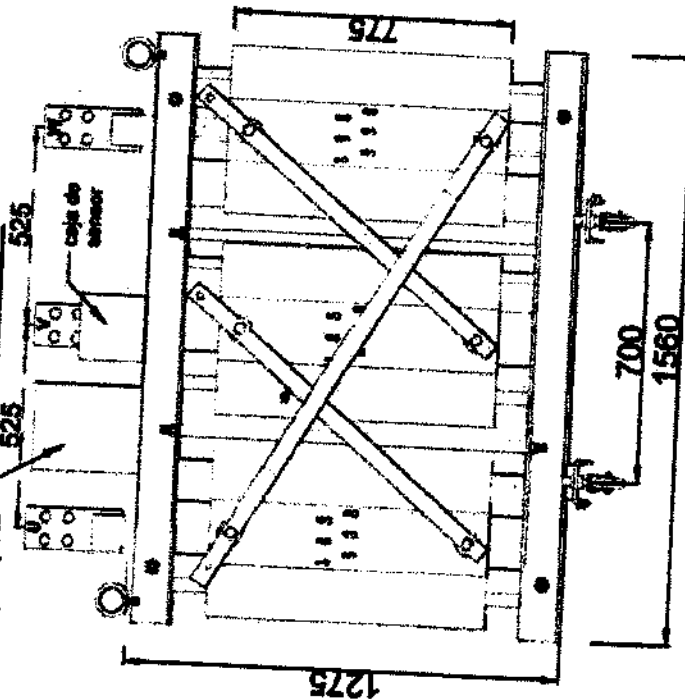

Vista Superior

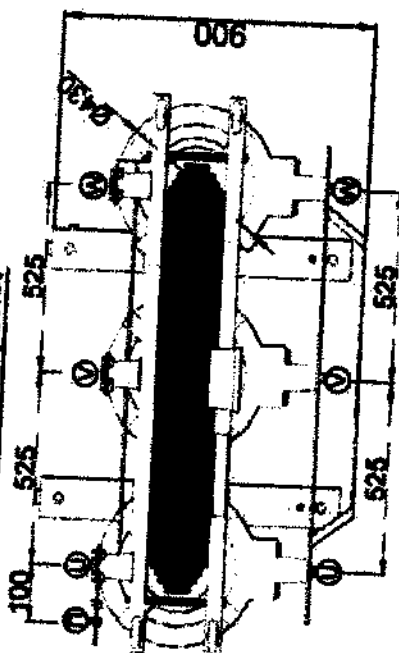

PROYECTO DE:	PROYECTO DE:	PROYECTO DE:	PROYECTO DE:
Villacruz Contratistas SRL	S.E.	A-4	01/001
1025-12	2012/2019	01/001	01/001
Jose Sanchez	Alfredo Alvarado		

Transformador Trifásico Encapsulado
 315 KVA
 Tension: 2300/400-231V Conexión: Y/Ynd Alura: 600mm

MENAUTT ELECTRIC SAC

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL.
 Marco A. Villacruz de la Cruz
 GERENTE GENERAL

ITEM	CARACTERÍSTICA	UNIDAD	VALOR GARANTIZADO
1	Marca		RESEAD
2	Procedencia		PERU
3	Modelo		RIVE 27KV-3F-430A-12.5KA-125KV
4	Norma fabricación/pruebas		ANSI C37.60-IEC62271-111
5	Montaje		Intemperie
6.1	Temperatura Ambiente	°C	-40 a 55
6.2	Humedad Relativa	%	70 a 100
6.3	Altura max. Sobre nivel del mar	m	2500
7.1	Corriente Nominal	A	630
7.2	Tensión max. De Operación	kV	27
7.3	Frecuencia	Hz	60
7.4	Nº de Fases		3ø
7.5	Corriente de Interrupción	kA	12.5
7.6	Capacidad de Corto Circuito eff(3seg.)/pico	kA	12.5/32.5
7.7	Enfriamiento.		SNAN
7.8	Expectativa de vida Eléctrica.	op.	10 000 oper a corriente nominal
7.9	Número de operaciones mecánicas	op.	20 000
7.10	Medio de Interrupción		Vacío
7.11	Medio aislante		Resina epóxica
8.1	Tensión Nominal de Aislamiento	kV	27
8.2	Tensión de ensayo con onda de impulso 12,2/50 us interno	kV pico	125
8.3	Tensión de ensayo con onda de impulso ,externo	kV	150
8.4	Tensión de ensayo a frecuencia industrial durante 1 minuto.	kV r.ms	60
8.5	Línea de fuga de aisladores.	mm.	960
8.6	Aislante externo.		Goma de Silicona
8.7	Línea de fuga específica	mm/kV	35.56
9.1	Mecanismo de mando.		Actuador Magnético
9.2	Tiempos de apertura y cierre	mS	20-35 / 35-60
9.3	Ciclo de operación		O-0.2S-CO-2S-CO-2S-CO-LOCKOUT
10.1	Relación de Transformación.	A	200 - 400 / 1
10.2	Potencia/Clase		5 VA/5P20
	Transformador de corriente homopolar		No suministrado
10.3	Relación de Transformación.	A	-
10.4	Potencia/Clase		-
	Sensor de Tensión		3 sensores lado carga
10.5	Relación de Transformación.	kV	27÷√3
10.6	Tipo / precisión		Capacitivo/±2%
11.1	Requerimiento de Construcción		ANSI C37.60-IEC62271-111
11.2	Material		Acero Inoxidable C304 / Pintado RAL7032
11.3	Grado de Protección	IP	IP55
12.1	Fabricante		Silicon technology SAC
12.2	Normas		ASTM D624, DIN 63504, IEC60587
	Características de fabricación		
12.3	Núcleo		Fibra de vidrio
12.4	Material Aislante		Goma de silicona
12.5	Elongación a la ruptura	%	450 (según norma DIN 53504) 6 500 (ISO37) (**)
12.6	Resistencia al desgaste		>20 (Según norma ASTM D624)
12.7	Resistencia al Tracking y erosión		Clase 2A, 6 (según IEC 60587)
12.8	Pruebas de resistencia a los rayos UV		Según ASTM G154 y ASTM G155

* Si tiene otras condiciones ambientales, consultar al fabricante.

** De acuerdo al tipo ofertado o solicitud del cliente.

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL.

Marco A. Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL



Eng. John Pizarro S.
JEFE DPTO. INGENIERIA COMERCIAL
RESEARCH ENGINEERING
AND DEVELOPMENT S.A.C.

Sistema de Control y Protección			
	Gabinete de Control		
13.1	Norma de Fabricación		ANSI / IEEE C37.90
13.2	Material		Acero Inoxidable C304
13.3	Espesor de material		2 mm.
13.4	Grado de Protección		IP55
13.5	Acabado		Pintado electrostático
13.6	Color		RAL 7032
	Características del Rele		
13.7	País de procedencia		Estados Unidos
13.8	Fabricante		SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES
13.9	Modelo		SEL751
13.10	Funciones de Protección		SEF, 50/51, 50N/51N, 27, 27I, 32, 49IEC, 59, 59I, 81.25, 55, 79, 78VS
13.11	Grupos de Ajustes		4
13.12	Configuración de Parámetros de Protección		Curvas Standard ANSI, Curvas Standard IEC
13.13	Funciones de Reporte		Almacena eventos, oscilografías, reporte de medición
13.14	Comunicación		
13.15	Protocolo de Comunicación		Modbus RTU, Modbus TCP/IP, DNP3.0
13.16	Puertos de Comunicación		RS232(2), Ethernet(2)
13.17	Software de Configuración		AcSELerator SEL-5030
13.18	Cable de comunicación Rele-PC		SEL Cable C662 5 mt
13.19	Cable control desenchufable tablero-tanque	metros	6 m.
13.20	Sistema de Alimentación		
	Transformador de Control		Monofásico SNAN
	Potencia, relación		500VA, 22.9/0.22KV BIL 170kV
	Instalación		Exterior
13.21	Baterías de Respaldo selladas		
	País de procedencia		CHINA
	Fabricante		Yuasa o Riitar
	Tipo		plomo ácido, sellados
	Tensión de operación		2X12V-12AH
	Horas de autonomía ante falla de tensión		48 Hr.
	Cantidad de operaciones unitarias ante falta de tensión / cantidad de op solo con baterías		>10
13.22	Sistema de Carga de Baterías		
	País de procedencia		CHINA
	Fabricante		MEANWELL
	Tensión auxiliar	Vac	90 a 250Vac/ 125 a 300Vdc
	Sistema		monofásico
14.1	Soporte de Reconectador	01 und	Soporte Frontal Inox. ó Lateral Galv.
14.2	Tipo Abrazadera de Reconectador	02 und	Abrazadera Fe Gvdo cass diam 220mm
14.3	Soporte de Transformador de Control	02 und	Soporte de Fe Gvdo con Abrazadera diam 220mm
14.4	Abrazadera de Gabinete Reconectador	01 und	Abrazadera Fe Gvdo cass diam 250mm
14.5	Sistema de Comunicación	01 und	No Suministrado

** De acuerdo al tipo ofertado o solicitud del cliente.

*** De acuerdo a la tensión de batería y sistema de carga.

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL.

Marcos A. Gutierrez de la Cruz
GERENTE GENERAL




Ing. Javier Figueroa S.
JEFE DPTO. INGENIERIA COMERCIAL
RESEARCH ENGINEERING
AND DEVELOPMENT S.A.C.


VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana N°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

11.17 Protocolo de pruebas de los equipos


VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Gerente General de la Cruz
Gerente General


Ingeniero Mecánico Electricista


HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

RESEAD **REPORTE DE PRUEBAS**
RECONECTADOR AUTOMÁTICO

CLIENTE: VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L. O.F.: 20/04
OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PESQUEROS ARTESANALES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO

Características del Equipo:

Marca	RESEAD	Tensión Max.	27 kV	Capacidad de Apertura	12.5 kA
Año	01-2020	Corriente Nom.	630A	I cc rms / I cpeak	12.5 / 32.5kA
Número de Serie	501176	Frecuencia	60 Hz.	Relación TC Fase	200-400 / 1A
Modelo	RIVE 27KV-3F	Nivel de aislamiento	27/70/125 kV	Relación TC Homopolar	—
Tipo	Al Vacío	BIL	150 kV	Peso	150 kg.
Altura de Operación	2500 msnm	Sensor Capacitivo	LEA 3x27kV	Norma	ANSI C37.60 / IEC 62271-111

I.- Pruebas Eléctricas: Temperatura 23.5 °C H.R.: 62%

I.1.- Resistencia de Aislamiento:

Descripción	Tres fases-Masa	Tension DC	Resultado:	Equipo
Reclouer con contacto cerrado (L-M)	1 800 GΩ	5kV	Bien	Megohmetro Digital
Reclouer con contacto abierto (C-M)	1 500 GΩ	5kV		Metrel, MI3205
Transformador de Corriente (AT-BT)	1 400 GΩ	5kV		NS: 16440241
Transformador de Corriente (BT-M)	19.7 GΩ	0,5kV		
Transformador de Corriente Homopolar (BT-M)	N/A	0,5kV		

I.2.- Prueba de Resistencia de Contactos

Descripción	Cte. De Prueba	Fase "R"	Fase "S"	Fase "T"	Resultado:	Equipo
Se realiza la prueba de Resistencia de Contactos con 100 A (DC)	100A	60.00 μΩ	59.40 μΩ	60.10 μΩ	Bien	Microohmmetro digital MPK-102e Megabras, NS: MO 5221 G

I.3.- Simultaneidad de Fases

Condición	Tiempo de Apertura			Tiempo de Cierre			Resultado:	Equipo
	R	S	T	R	S	T		
Tiempo	21.80 ms	24.95 ms	28.05 ms	53.75 ms	54.75 ms	52.30 ms	Bien	Equipo Analizador de Interruptor Vanguard, CT-8500 NS: 66108

I.4.- Tensión Aplicada

Nivel de Tensión	Corriente de Fuga	Resultado:	Equipo
80 kV	10.4 mA	Bien	Transformador Elevador 95A.23kV

II.- Pruebas de Operación:

II.1.- Verificación de TC's

Relación TC Fase	Fase R	Fase S	Fase T	Resultado:	Equipo
200 / 1 A	201.30 Rel. 30 mA	199.61 Rel. 22 mA	200.40 Rel. 29 mA	Bien	AEMC
400 / 1 A	401.02 Rel. 11 mA	400.83 Rel. 8 mA	400.18 Rel. 11 mA		DTR 8500 NS: 211408GBDV

Relación TC Homopolar

Relación	Resultado:	Equipo
50/1A	N/A	
100/1A	N/A	

II.2.- Operaciones Mecánicas

Prueba en forma manual	Operación de Apertura	Operación de Cierre	Tension Control	Resultado:	Equipo
Número de op.	10	10	Min./Nom./Max.	Bien	

II.3.- Sistema de Protección

Operación del rele en Modo de Prueba SEL 751A	Operación de Apertura	Operación de Cierre	Resultado:
	15	15	Bien

II.4.- Simulación de falla sensitiva a tierra

I prim.	5 Amp	Secuencia de Operaciones	Resultado:
Tiempo de 1° rec.	2 seg.	Disparo	Conforme
Tiempo de 2° rec.	4 seg.	Recierre	Conforme
N° de reciermes:	2	Apertura	Conforme

III.- Observaciones:

- El Reconectador RIVE 27KV-3F con N° serie 501176, sale de fábrica en la relación de corriente fase de 200/1A.
- El Gabinete de Control RIVE-SEL 751 con N° serie 501177, sale de fábrica programado con ratio fase 200/1A.
- De las mediciones eléctricas los resultados es CONFORME.
- Se sateado el rele 751 acorde con el ECP con los siguientes valores: 51P: I>10amp, T> 0.05, curva C2; 50P: I>>76amp, T>> 0, curva TD 51N: I>6 amp, T>0.05, curva C2; 50G: I>>30amp, T>> 0.01, curva TD / SEF 50N: I>2 amp, T> 0.15, curva TD

Area de Pruebas: Realizado por: [Firma] Fecha: 24/01/2020
 Area de Ingeniería: Realizado por: Ing. Juan Pizarro Y. Fecha: 24/01/2020
 Cliente / Supervisor: Especialista FONDEPES: Ing. Ruben Yacola C. Residente de Obra: Henry Celiz S. Supervisor de Obra: Hugo Ocaña N.



MENAUTT ELECTRIC S.A.C.

PROTOCOLO DE PRUEBAS		TRANSFORMADOR TRIFASICO ENCAPSULADO				TIPO : RESINA							
CLIENTE :		VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL											
OBRA :		"AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22.9 KV - 3 Ø. PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS											
		PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGIÓN TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505 "											
		PROTOCOLO DE PRUEBAS											
Marca	: Menault Electric	Potencia	: 315	KVA	Refrigeración	: AN							
Número de Serie	: 1025 - 12	Relac. de Tensión	: 22900 / 400 - 231	V	Nivel Aislam. Primario	: 24 / 50 / 125	kV						
Tipo	: TDTS	Relac. de Corriente	: 7.94 / 454.66	A	Nivel Aislam. Secundario	: 1.1 / 3.0	kV						
Año de Fabricación	: 2019	Grupo de Conexión	: YNyn6		Clase al Fuego	: F1							
Norma	: IEC 60076 - 11	Tcc (%)	: 5.6		Clase Climática	: C2							
Frecuencia	: 60 Hz	Regulación lado primario	: ± 2 x 2.5	%	Clase Ambiental	: E2							
Montaje	: INTERIOR	Clase Mat. Aislante	: F		Peso	: 1250	kg						
Altitud	: 1 000 m.s.n.m	Calentamiento Medio (K)	: 100										
1.- MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO:						T amb. = 25 °C							
DENOMINACION		Primario - Secundario		Primario - Masa		Secundario - Masa							
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (1')		1.36 TΩ		822 GΩ		284 GΩ							
INDICE DE POLARIZACION		IP > 1.4		IP > 1.4		IP > 1.4							
VOLTAJE APLICADO		5 000 V		5 000 V		1 000 V							
2.- MEDIDA DE LA RELACION DE TRANSFORMACION, VERIFICACION DE LA POLARIDAD Y GRUPO:													
POS.	CRUPO CONEXIÓN YNyn6		RELACION TEORICA	RELACION DE MEDIDA			ERROR DE RELACION (%) ± 0.5 %						
COM.	U - V - W	U - V - W		U	V	W	U	V	W				
1	24045	400	60.113	60.131	60.127	60.137	-0.0308	-0.0241	-0.0407				
2	23473	400	58.681	58.662	58.658	58.670	0.0328	0.0396	0.0192				
3	22900	400	57.250	57.206	57.204	57.207	0.0769	0.0804	0.0752				
4	22328	400	55.819	55.746	55.752	55.755	0.1305	0.1197	0.1143				
5	21755	400	54.388	54.298	54.295	54.299	0.1648	0.1704	0.1630				
3.- PRUEBA EN VACIO : Alimentación por el lado Secundario													
POS.	VOLTIOS CV = 1			AMPERIOS CA = 1				WATIOS CW = 1					
COM.	u - v	v - w	w - u	u	v	w	W1	W2	TOTAL				
	Lect. V	Lect. V	Lect. V	Lect. A	Lect. A	Lect. A							
3	400	400	400	9.84	9.84	6.17	6.17	9.45	9.45	2080	2080		
4.- MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE LOS ARROLLAMIENTOS :													
ARROLLAMIENTO DEL SECUNDARIO			T amb. = 25 °C			ARROLLAMIENTO DEL PRIMARIO			T amb. = 25 °C				
u - v	3.05	mV	1.00	A	3.05	mΩ	U - V	13.70	V	1.00	A	13.70	Ω
v - w	3.26	mV	1.00	A	3.26	mΩ	V - W	13.80	V	1.00	A	13.80	Ω
w - u	3.23	mV	1.00	A	3.23	mΩ	W - U	13.80	V	1.00	A	13.80	Ω
5.- PRUEBA EN CORTOCIRCUITO : Alimentación por el lado Primario													
POS.	VOLTIOS CV = 1			AMPERIOS CA = 1				WATIOS CW = 1			Pcu	Tcc	
COM.	U - V	V - W	W - U	U	V	W	W1	W2	TOTAL	(Watts)	(%)		
	Lect. V	Lect. V	Lect. V	Lect. A	Lect. A	Lect. A							
3	1089	1089	1089	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	3259	3259	4.76	

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Km. 04 de la Cruz
BOULEVARD GENERAL

Hugo Ricardo Ocaña Navarro
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

Alameda Del Norte Sector 13 Mz. M Lt. 3 Avp. El Dorado - Puente Piedra - Lima - Lima
Cel.: 985 033 535 - 947 543 748 - 999 492 922



MENAUTT ELECTRIC S.A.C.

6.- PRUEBA DE TENSION INDUCIDA :				7.- PRUEBA DE TENSION APLICADA :		RESULTADO	TIEMPO
Alim. por Secund.	Frecuencia	RESULTADO	SEGUNDOS	Primario / Secund - M	50 kV	BIEN	60 Seg.
800 V	120 Hz	OK	60	Secundario / Prima - M	3.0 kV	BIEN	60 Seg.
8.- RESUMEN:				CALCULADO	MEDIDO	GARANTIZADO	TOLERANCIA (%)
Pfe a V nom (Watts)				2518	2080	BIEN	+ 15
Pcu a 75 °C a I nom (Watts)				3520	3886	BIEN	+ 15
Tcc a 75 °C a I nom (%)				5.84	4.80	BIEN	+ - 10
Io a V nom (%)				3.09	1.87	BIEN	+ 30
Pcu a 20 °C a I nom (Watts)					3196		
Tcc a 20 °C a I nom (%)					4.75		
OBSERVACIONES :							
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA				DEPARTAMENTO DE SALA DE PRUEBAS			
 MENAUTT ELECTRIC SAC Dpto. DE INGENIERIA				 MENAUTT ELECTRIC SAC SALA DE PRUEBAS VºEº			
Revisado Por	Fecha de Vº Bº	Probado por	Fecha de Prueba	Ing. Ruben Yacolca Cruzado			
Alfredo Alvarado Menautt	23/01/2020	Paul Flores Cardenas	23/01/2020	FONDEPES			

Ing. Hugo Ocaña Navarro
 SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Henry Flavio Celiz Suarez
 RESIDENTE DE OBRA

Ing. Kenyu Villalobos Vega
 VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
 Marco Antonio Bully de la Cruz
 GERENTE GENERAL

Henry Flavio Celiz Suarez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200



MENAUTT ELECTRIC S.A.C.

PROTOCOLO DE PRUEBAS

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

OBRA : *AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3 Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGIÓN TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235503 *

Equipo	: SECCIONADOR DE POTENCIA	N° Serie	: 2018.00.0122/0
Marca	: SAREL	Tensión Nominal	: 24 KV
Tipo	: SYStem-6	Corriente Nominal	: 630 A
Año	: 2018	Capacidad de Cierre	: 40 kA
Montaje	: VERTICAL	BILL	: 125 KV
Frecuencia	: 60 Hz	Norma	: IEC 62271 - 200

1.- PRUEBA MECÁNICAS

1.1 - Inspección Visual	RESULTADO
1.2 - Verificación de Trabajo Mecánico	CONFORME
a) Cierre - Apertura por palanca - (05 Operaciones)	CONFORME
b) Apertura por sistema de desconexión por Fusibles (05 Operaciones)	CONFORME
c) Apertur por bobina de disparo	NO APLICA

2.- PRUEBA ELÉCTRICAS

2.1 Medición de la Resistencia de Aislamiento

Puntos	Voltaje Prueba	Valores	Tiempo (seg)
R - Masa	10 kVcc.	50.2 GΩ	60
S - Masa	10 kVcc.	50.8 GΩ	60
T - Masa	10 kVcc.	50.7 GΩ	60
R - S	10 kVcc.	52.1 GΩ	60
S - T	10 kVcc.	52.2 GΩ	60
T - R	10 kVcc.	52.2 GΩ	60

2.2 Prueba de Tensión Aplicada

Fase - Tierra			
Puntos	Voltaje Prueba	I (mA)	t (seg)
R - Masa	40 kV	0.72	60
S - Masa	40 kV	0.70	60
T - Masa	40 kV	0.73	60

Seccionamiento			
Puntos	Voltaje Prueba	I (mA)	t (seg)
R - Masa	50 kV	0.85	60
S - Masa	50 kV	0.85	60
T - Masa	50 kV	0.86	60

2.3 Medición de la Resistencia de Contactos. (I.Prueba = 100 Acc)

Puntos	Fase R	Fase S	Fase T
Valores	97.2 μΩ	97.1 μΩ	97.2 μΩ

Henry Flavio Celiz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

OBSERVACIONES:

DEPARTAMENTO INGENIERIA		SALA DE PRUEBAS	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
Revisado Por	Fecha de V° P°	Elaborado por	Fecha de Prueba
Alfredo Alvarado Menautt	23/01/2020	Paul Flores Cardenas	23/01/2020
			Ing. Ruben Yacolla Cruzado FONDEPES

[Signature]
Ing. Hugo Ocaña Navarro
SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
Ing. Henry Flavio Celiz Suarez
RESIDENTE DE OBRA

[Signature]
Ing. Keny Villalobos Vega
VILLACRUZ CONTRATISTA SRL

[Signature]
HUGO RICARDO OCANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



CARTA DE GARANTIA

Lima, 21 de Enero del 2020

Señores
VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Lima.-

Ref.: **ORDEN DE COMPRA Nro. 01-01-2020**

Estimados señores:

ANIXTER JORVEX S.A.C. garantiza que los cables suministrados según orden de compra en referencia y han sido fabricados por INDECO con materiales de primera mano, siguiendo las pautas indicadas en las normas de fabricación internacionalmente aceptadas.

Asimismo, garantizamos estos productos durante el lapso de **2 Años** contados a partir de la fecha de recepción del material, por cualquier desperfecto o mal funcionamiento debido a una falla de fabricación, siempre y cuando no haya sufrido deterioros o daños mecánicos en el material por mal almacenamiento o manipuleo. Igualmente, no se considerará responsable por fallas de instalación.

En caso que hubiera que reponer algún tramo del cable **ANIXTER JORVEX** lo haría en un tiempo razonable, no responsabilizándose por los gastos que se deriven del retiro e instalación.

Atentamente,

ING. CARLOS VILLAR
 P.M. ELECTRICAL WIRE & CABLE
 ANIXTER JORVEX S.A.C.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

 Marco A. Villacruz de la Cruz
 GERENTE GENERAL

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

 María Teresita Suárez
 INGENIERA MECANICA ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

Anixter Jorvex s.a.c.

Av. Tingo María 311 - Breña, Lima | Central Telefonica: (01) 417-0202
 Fax: (01) 431-9324 | ventas@jorvex.com | www.jorvex.com

PROTOCOLO DE PRUEBA

N° CERTIFICADO: C.C. 7-200103-F
FECHA: 03/01/2020
NORMA: NTP-IEC 60502-2

CLIENTE: AMXTER JORVEX S.A.C.

PRODUCTO: CABLENEXSY 18/30 kV 50 mm² ROJO
QF: 125825 / 122737
81227195 / 81227137 / 81227136

N° de LOTE	ESPESORES (mm)				RESISTENCIA ELECTRICA		RESISTENCIA AISLAMIENTO	DESCARGA PARCIAL	Longitud (m)	N° DE CARRETE
	AISLAMIENTO		CUBIERTA		CONDUCTOR	PANTALLA				
	MAXIMO UN PUNTO	MINIMO UN PUNTO	MINIMO PROMEDIO	MINIMO UN PUNTO	D/Km 20 °C					
NORMA	8,4	7,1				Max. 0,347	Max. 1,5	31,1 kV		
1001299878	7,99	7,14	1,48	1,44	0,3896	1,354	Min. 1,541	10 pC	2 017	RCCA21 D8 9738
1001299830	7,74	7,31	1,39	1,35	0,3883	1,356	441 598	1,28	2 004	RCCA21 D6 9860
1001299559	7,74	7,28	1,39	1,34	0,3833	1,334	1 392 223	1,20	2 003	CACA23 B9 2375
1001299575	7,74	7,28	1,39	1,34	0,3855	1,343	69 844	5,60	2 002	RCCA21 D9 9865
1001298821	7,74	7,31	1,39	1,35	0,3859	1,360	63 032	1,00	2 002	RCCA21 D8 9886

NOTA: Todos los cables han pasado satisfactoriamente la prueba de tensión C.A. (63 kV - 5 minutos)

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio de la Cruz
GERENTE GENERAL

[Signature]
ING. SIGIFRIDO HANO P.
JEFE CONTROL DE CALIDAD

[Signature]
HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRA
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP: N° 6020

* En caso de presentarse algún reclamo indicar el número de Control de Calidad (N° de C.C.) al cual se refiere.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
 OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
 E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

11.18 Informe de seguridad.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Empresa contratista de la Cruz
 GERENTE GENERAL

INGENIERO



Ing. Joel Zamora Ramirez
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 120872

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

Villacruzcontratistas_srl@hotmail.com


Cel. 976581927 - 976761313 - 957992277

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO – ENERO 2020

INDICE


1. OBJETIVO
2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE PREVENCIÓN
3. REUNIÓN DEL COMITÉ DE SSOMA DE LA CONTRATISTA
4. CAPACITACIONES
5. CHARLAS DE 10-15 MINUTOS DIARIAS.
6. CONCLUSIONES
7. RECOMENDACIONES
8. ANEXOS

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.




Marco Antonio Quiroga de la Cruz
GERENTE GENERAL






Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120872



Henry David Celiz Suarez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 25090




HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRETE
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

INFORME N° 01- SRT- SSOMA-20

A : ING° HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
SUPERVISOR DE OBRA
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO.

DE : Ing. JOEL ZAMORA RAMIREZ
Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional
VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.



OBRA : "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO – DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR – REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505"

ASUNTO : INFORME DE ACTIVIDADES DEL 02/01/2020 AL 31/01/2020

FECHA : ZORRITOS, 31 DE ENERO DEL 2020.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marcelo ... de la Cruz
GERENTE GENERAL

1. OBJETIVO:

Tiene por objetivo informar a la Supervisión de cómo se está llevando a cabo el cumplimiento de las actividades de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en la ejecución de la obra: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO – DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR – REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505".

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE PREVENCION:

Durante el presente mes de Enero – 2020 se desarrollaron las siguientes actividades:

Hertry Flavio Celis Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 83030

ITEM	ACTIVIDAD	COMENTARIO
1	Se viene realizando la Inducción básica y específica al personal nuevo.	Inducción al Residente Ing. Hertry Flavio Celis Suarez
2	Todo el personal cuenta con las pólizas de seguro SCTR. Pensión y Salud.	Renovación de póliza mensual.
3	Se viene entregando el Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	Como parte del cumplimiento de la ley, se viene entregando a cada trabajador el RISST.
4	Se viene entregando el Reglamento Interno de Trabajo.	
5	Se viene entregando Equipos de Protección al personal nuevo.	Se renueva EPPs al personal cada vez que se requiere.
6	Se realiza Charlas diarias de cinco minutos.	Se desarrolla de manera diaria antes del inicio de labores la charla de 10-15 minutos con la participación del personal administrativo, personal supervisor y personal obrero. Estas actividades están lideradas por los supervisores.
7	Se realiza Check List de Vehículo (camioneta, Camión y grúa). Así mismo a los equipos anti	Diariamente los conductores realizan check list a los Vehículos.


 HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO – NOVIEMBRE 2019

	caídas (Amés).	
8	Se tiene registro de las estadísticas de seguridad. (evaluación de índice de frecuencia, severidad y accidentabilidad)	Cero accidentes en el presente mes
9	Se realizó inspección a los extintores, botiquines de las unidades y oficinas.	.

3. REUNION DEL COMITÉ DE SSOMA DE LA CONTRATISTA:


Aún no se ha conformado el comité de Seguridad y Salud en el trabajo. De acuerdo al D.S. – 005-2012-TR, Reglamento de la Ley 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo, Capítulo IV DEL COMITÉ O SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, este se debe conformar a partir de 20 trabajadores. A la Fecha **VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.** cuenta con un promedio de 08 trabajadores en la Obra: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO – DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR – REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505".

4. CAPACITACIONES:

Capacitación personal nuevo:

Se realizó la siguiente capacitación:

- Inducción Básica en Seguridad y Salud en el Trabajo (a todo el personal ingresante).
- Inducción específica.
- Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo con Electricidad. R.M. N° 111-2013 – MEM/DM.
- Reglamento interno de Trabajo de VILLACRUZ CONTRAISTAS S. R. L.
- Difusión de PETS
- Plan de contingencia.



Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120872

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Mano de la Cruz
C.O. ARTESANAL


5. EPP:

Se adjunta en Anexos copias de entrega de EPPs al personal que está trabajando en Obra.

6. CHARLAS DE 10-15 MINUTOS DIARIAS:

Como parte de las actividades del plan de prevención de VILLACRUZ CONTRAISTAS S. R. L., se desarrolla de manera diaria antes del inicio de labores la charla de 10-15 minutos con la participación del personal administrativo, personal supervisor y personal obrero. Estas actividades están lideradas por los supervisores; sin embargo también participan los trabajadores.


Se adjunta en Anexos copias de Charlas de 5 minutos.



Sr. Juan Carlos Suarez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120872

7. CONCLUSIONES:

- Tener cero accidentes en el presente mes.
- Se logró en los trabajadores la actitud de identificar sus peligros y evaluar los riesgos; tomando sus respectivas medidas de control dentro de su área de trabajo.
- Vienen trabajando con los documentos de gestión que se han elaborado.
- Compromiso de la supervisión en el cumplimiento de sus obligaciones.
- Compromiso de la supervisión en la realización de inspecciones y observaciones planeadas de tarea como actividades de prevención.



HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO – NOVIEMBRE 2019

8. RECOMENDACIONES:

- Continuar con una buena gestión de concientizar a los trabajadores en realizar sus trabajos seguros.
- Sensibilizar en el manejo adecuado de herramientas de gestión,
- Realizar inspecciones.

9. ANEXOS

INDICE

1. OBJETIVO

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE PREVENCION

3. REUNION DEL COMITÉ DE SSOMA DE LA CONTRATISTA


4. CAPACITACIONES

5. CHARLAS DE 10-15 MINUTOS DIARIAS.

6. CONCLUSIONES

7. RECOMENDACIONES

8. ANEXOS



VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

[Signature]
 Ricardo Aguilar Salazar de la Cruz
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 Juan Ramirez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 120872

[Signature]
 HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

PLAN DE CONTINGENCIA DE LA OBRA

"AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO – DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR – REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505"



Ing. Joel Zamora Ramirez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 120872

DPTO DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

AÑO 2020

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Guty de la Cruz
 GERENTE GENERAL

Ing. Hugo Ricardo Ocaña Navar
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 60200

HUGO RICARDO OCAÑA NAVAR
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

ÍNDICE

1. OBJETIVO
2. ALCANCES.
3. GENERALIDADES
4. NORMATIVIDAD LEGAL
5. DESCRIPCIÓN DE RIESGOS PRESENTES EN LA OBRA
 - 5.1 SISMOS
 - 5.2 RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN
 - 5.3 ACCIDENTES VEHICULARES
 - 5.4 DESORDENES CIVILES (ASALTOS Y ROBOS POR TERCEROS).
 - 5.5 RIESGOS ELÉCTRICO
 - 5.6 ACCIDENTES
 - 5.7 DESCARGAS ELÉCTRICAS
6. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DE RESPUESTA.
7. RECURSOS.
8. PROGRAMA DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS.
 - 8.1 PROCEDIMIENTO EN CASO EMERGENCIA.
 - 8.2 REGLA GENERAL DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ELECTROCUCIÓN.
9. PRIMEROS AUXILIOS.
10. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIAS.
 - 11.1 DIRECTORIO TELEFONICO DE EMERGENCIAS.



Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120872

VILLACREZ CONTRATISTAS S.R.L.

Pe la Cruz
S.R.L.

Hugo Ricardo Ocaña Navarrete
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 60200

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRETE
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

1. OBJETIVOS

Desarrollar procedimientos para controlar y/o disminuir los riesgos de accidentes como electrocución, caídas de distinto nivel.

Deslindar responsabilidades frente a un problema manteniendo una organización interna de la obra que permita afrontar de manera rápida, eficiente y planificada, cualquier situación de emergencia que pueda afectar a las operaciones.

Desarrollar métodos tendientes a solucionar la situación con la mayor prontitud posible y con el menor riesgo para el personal y para la propiedad estableciendo procedimientos que prevean esfuerzos bien coordinados de parte de los organismos externos de respuesta de emergencias.

Implementar las brigadas de emergencia, las cuales tiene como objetivo fundamental administrar en forma organizada, oportuna y adecuada la contingencia y/o emergencia presentada.



Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120872

2. ALCANCE

Este plan comprende desde el planeamiento y organización de respuesta a la emergencia hasta el reinicio de las actividades interrumpidas.

3. GENERALIDADES:

El presente Plan de Emergencia / Contingencia ha sido elaborado para el proyecto con ENOSA, que involucran el frente de trabajo para la Obra, contemplando los diferentes riesgos de las actividades ha desarrollar en este proyecto.

La labor que efectúa **VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.** en esta Obra, es de índole riesgosa, debido a la constante exposición del trabajador a peligros derivados de esta labor, en este caso la de excavación de hoyos e instalación de poste y tendido de línea para la presente obra, destacándose los siguientes riesgos:

- Atrapamiento en excavación de hoyos.
- Caídas al mismo y diferente nivel.
- Accidentes vehiculares
- Choques eléctricos
- Aplastamiento de cargas
- Deshidratación.
- Insolación por exposición al Sol

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marcos
GENERAL

HUGO RICARDO OCAÑA NAVA
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

4. NORMATIVIDAD LEGAL

- Código Nacional de Electricidad
- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783y su Reglamento D.S 005-2012-TR
- Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo con Electricidad, R.M. N°1111/2013 MEN
- Reglamento Interno de seguridad de la Empresa
- Ley de Concesiones Eléctricas D.L. 25844
- Directivas emitidas por la Empresa en materia de seguridad.
- Niveles Máximos permisibles para efluentes líquidos, producto de las actividades de Distribución, Generación y Transmisión de energía eléctrica R. D N° 391 – 96 EM/ SGAA.

Henry
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 58000

- Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo - D. S. N° 00258-75-SA - 22.09.75.
- Límites Máximos Permisibles para Emisiones Contaminantes para vehículos automotores que circulan en la red vial - D.S. N° 047-2001-MTC- 31.10.2001
- Reglamento Nacional de Construcciones

5. DESCRIPCIÓN DE RIESGOS PRESENTES EN LA OBRA

5.1 SISMOS.

Un sismo consiste en la manifestación superficial de la liberación de la energía interna de nuestro planeta, transmitida en forma de ondas sísmicas. Movimiento o sacudida brusca de corta duración de la corteza terrestre.

Los sismos se pueden medir de dos maneras: por su Intensidad o por su Magnitud.

EFFECTOS DE LOS SISMOS

Cabe mencionar que el daño ocasionado no solo se debe a la violenta sacudida sino también a los eventos no deseados que puede ocasionar, como: derrumbamiento de taludes en la excavación de hoyos y atrapamiento de personas en la excavación, choques eléctricos, caídas al mismo y a diferente nivel, accidentes vehiculares.

5.2 RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN.

En el caso de emergencia por incendio, generalmente se cuenta con un pequeño margen de tiempo para organizar la extinción y disponer la evacuación, si tal medida se hiciese necesaria. Muchas conflagraciones comienzan por fuegos pequeños, por cuyo motivo la rápida intervención de un pequeño grupo adecuadamente preparado suele ser suficiente para controlar la situación. Es necesario mantener bajo vigilancia cualquier fuego, los cinco primeros minutos se consideran los más importantes.



Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120873

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

5.3 ACCIDENTES VEHICULARES

Debido a que esta obra se realiza en zonas de vías, avenidas, carreteras, etc. la probabilidad de que suceda este tipo de evento es probable, teniendo en cuenta el uso adecuado de las señalizaciones vehiculares dado que las carreteras asfaltadas tienen poca fluidez de tráfico liviano y pesado. La peor consecuencia en un accidente vehicular es la muerte del accidentado, de no ser así, aparecen las complicaciones comunes ya conocidas como: atrapamiento entre fierros, lesiones a la persona, incendio, explosión, etc. Por ello es necesario contar con una rápida información sobre la ubicación de unidades de emergencia disponibles en esta Provincia como: hospitales, ambulancias, defensa civil, etc., como también un plan efectivo que permita la rápida respuesta y conocimiento de las personas responsables para este caso.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

5.4 DESORDENES CIVILES (ASALTOS Y ROBOS POR TERCEROS).

En este tipo de emergencias se suele tomar las mismas medidas que en caso de desastres naturales; existiendo la diferencia en la intervención de seres humanos; lo cual trae a primer plano la cuestión del derecho a defender la propiedad privada.

Algunos aspectos implicados en esta situación son los siguientes:

HUGO RICARDO OCANA NAVA
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

- Interrupción de las actividades laborales y prestación de servicios a terceros.
- Protección contra cualquier intento por parte de una turba de destruir la propiedad privada.
- Solicitud eventual de ayuda a las personas y autoridades circundantes a la zona de trabajo.
- Protección contra cualquier intento de robo o asalto por parte de una turba.


5.5 RIESGOS ELÉCTRICOS

La electricidad puede constituir riesgos y causar pérdidas (lesiones o daños materiales) cuando:

- Una persona pasa a ser parte de un circuito eléctrico.
- Se produce un arco o chispa a consecuencia de un fognazo como consecuencia de un cortocircuito y/o descarga a tierra.
- Elementos de un circuito eléctrico mal calculados o desprotegidos, son susceptibles de sobrecargarse y recalentarse.


5.6 ACCIDENTES

Definimos accidente como aquel suceso no deseado, no planeado que da por resultado un daño (lesión o enfermedad ocupacional) a una persona, un daño a la propiedad (equipos, materiales y al ambiente), o pérdidas en los procesos.

 **Ing. Joel Zamora Ramirez**
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 120872

5.7 DESCARGAS ELÉCTRICAS

En este punto nos referimos a aquellos fenómenos climáticos que se caracterizan por la descarga súbita o repentina de corriente eléctrica (rayos, truenos) que al hacer contacto con cuerpos conductores producen daños tales como calcinación, electrocución, quemaduras, etc.

 **Ing. Luis Suarez**
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 60000


6. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DE RESPUESTA

Los presentes Procedimientos Operacionales, tienen por finalidad establecer las normas, disposiciones y pautas que regulan las acciones para proteger la vida del personal, y reducir las pérdidas materiales durante situaciones de Emergencia.

ACCIDENTE A PERSONAS

Debido a las características de la obra, se pueden presentar los siguientes casos:


- a. Accidente producido en presencia del supervisor
- b. Accidente producido en presencia de la movilidad
- c. Accidente producido en ausencia de ambos.

 **VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.**
Marco Antonio Gutty de la Cruz
 GERENTE GENERAL

En caso de producirse algún accidente se cumplirá con los siguientes procedimientos:

- 1.- Se paralizarán las actividades en toda el área de trabajo.
- 2.- Aislamiento del área de ubicación del accidentado.
- 3.- El personal calificado en primeros auxilios evaluará y prestará los primeros auxilios al personal accidentado, tratando de no moverlo la parte lesionada por tener posibles fracturas.
- 4.- Cualquier personal informará por medio del celular.

Detallando el estado del paciente, lugar y solicitando el apoyo necesario, los equipos de comunicación solo quedaran disponibles, para esta contingencia.

 **HUGO RICARDO OCAÑA NAVA**
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

5.- Evacuar al accidentado en forma inmediatamente al hospital Centro de Salud más cercano y para su atención y luego si amerita el caso será evacuado a un centro Especializado de cobertura de la aseguradora de la póliza.

6. Se informará al Supervisor de Seguridad o al comité de SST para la Investigación del Accidente.

En caso el accidente se produzca ante la ausencia del supervisor y de la movilidad, sus compañeros de trabajo luego de dar los primeros auxilios buscarán una movilidad (Taxi, Colectivo, o otra movilidad, etc.) para el traslado del accidentado, luego darán aviso al Supervisor de Obra.

Toda acción que se tome y que esté especificado en el presente procedimiento, dará origen a la presentación de un informe, siendo remitido dentro de las 24 horas subsiguientes.

7. RECURSOS.

Unidades Móviles. -

- Camioneta 4X4 - Toyota

Personal.

- Línea de Mando: Supervisor / Jefe de Grupo.
- Brigadista
- Trabajadores

Logísticos. -

- Celulares
- Camioneta
- Botiquín Básico de Primeros Auxilios

Materiales de Contingencia. -

- Botiquín de Primeros Auxilios.
- Vehículo para trasladar lesionado
- Otros.

[Handwritten signature]
 VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
 Ing. Joel Zamora Ramirez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 120872

[Handwritten signature]
 VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
 Marco Antonio Rojas de la Cruz
 GENERAL GERENTE

[Handwritten signature]
 HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

8. PROGRAMA DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS.

Todo desastre se origina por un fenómeno anormal no previsto, ya sea éste de carácter natural o artificial. El objetivo del Programa de Emergencia para casos de desastres es minimizar las consecuencias que puedan ocurrir con una adecuada orientación y capacitación continua.

Este Plan de Contingencia tiene por objetivo establecer las acciones que se deben ejecutar para prevenir o controlar riesgos ambientales o posibles accidentes y desastres que se puedan producir en las instalaciones de la obra.

En este Plan de Contingencia esquematiza las acciones que deben ser implementados si ocurrieran contingencias que no pueden ser controladas con simples medidas de mitigación.

El Plan se ha elaborado para contrarrestar emergencias producidas por alguna falla de las instalaciones de seguridad o error involuntario en la operación y mantenimiento de equipos e infraestructura, accidentes por contactos eléctricos, caídas de altura, golpes, caídas de objetos.

8.1 PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIAS

El Ingeniero de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente deberá obtener información del área correspondiente sobre los trabajadores que presten servicios para la empresa, la misma que debe ser actualizada periódicamente a fin de solicitarles sus propias previsiones de seguridad; así como, exigirles las coberturas de pólizas de seguros contra accidentes y el conocimiento de la clínica y/o clínicas con que trabajan.

De otro lado, la oficina de SSTMA les deberá alcanzar instrucciones a seguir en caso de emergencia, precisándoles la responsabilidad que le asiste.

8.2 REGLAS GENERALES DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ELECTROCUCIÓN

Si la víctima ha estado en contacto con la electricidad se deberá actuar de la siguiente manera:

1. Desconectar la fuente de energía (llave general, interruptor) y retirar a la víctima de la fuente con un material aislante.
2. Se asignará la responsabilidad a una persona para llamar al médico y apartar a los curiosos.
3. Establecer un diagnóstico posible, ver que síntomas presenta, verificar si está consciente o inconsciente, si está consciente preguntarle que siente.
4. Si la víctima está inconsciente o en estado de shock, verificar los estados vitales, de ser necesario aplicar respiración artificial.
5. Si hay pérdida de sangre, detenerla inmediatamente.
6. No mover a la víctima, salvo que sea necesario.
7. Mantener la temperatura normal del cuerpo.
8. Aflojar prendas de vestir.
9. Efectuar estabilización y transportar inmediatamente.

10. PRIMEROS AUXILIOS.

NOCIONES BÁSICAS DE PRIMEROS AUXILIOS

La persona que proporciona primeros auxilios debe:

1. Evitar el pánico, mantener la calma, ordenar ideas, pero no perder tiempo.
2. Inspirar confianza, tomar el mando y dar órdenes.
3. Solicitar la ayuda médica.
4. No hacer más de lo que sea necesario, hasta que llegue ayuda profesional.

Es aconsejable administrar los primeros auxilios en el siguiente orden:

5. Respiración Artificial: Esta se debe iniciar inmediatamente si se nota que la respiración es muy débil o ha cesado.
6. Control de Hemorragias: Detener la hemorragia aplicando presión directamente sobre la herida; de preferencia utilizar una almohadilla de tela.
7. Controlar el síncope o shock: Manteniendo a la víctima acostada. Abrigarla.
8. Cortaduras u otras "Aberturas" de la piel: Proteger la herida contra infecciones y controle la hemorragia.
9. Quemaduras: Aliviar el dolor, impedir la infección y aplicar el tratamiento para el síncope.
10. Fracturas: Mantenga inmóvil los extremos rotos. Proporcione los primeros auxilios para síncope.
11. Transporte de lesionados: Evitar movimientos innecesarios; impedir que las partes lesionadas se fuerzan, flexionen o se sacudan.

VILLACRUZ CONTROTORIA S.R.L.

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLACRUZ
CARRERA 100 No. 100-100

HUGO RICARDO OCARA NAVARRO
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA


- 12. El juicio sereno y sentido común del que proporciona los primeros auxilios es indispensable cuando la gravedad de la lesión requiere la atención simultánea de cualquiera de los pasos anteriores.

BOTIQUÍN DE EMERGENCIAS

1	Alcohol puro	mL	100	Limpieza del borde de la herida
2	Algodón	Gramos	25	Desinfección y aplicación de inyectable
3	Agua oxigenada	mL	100	Desinfección de heridas
4	Mentholate	mL	100	Desinfección de heridas
5	Curitas	Unidad	10	Cubrir heridas pequeñas
6	Gasa	Paquete	2 gasa grande	Limpiar y cubrir heridas
7	Vendas elásticas de 4".	Rollo	1 de cada uno	Inmovilizar miembros. Sujetar apósitos y gasas
8	Espardrapo	Rollo	01	Sujetar gasas
9	Panadol	Tabletas	10	Analgésico, dolor de muelas, dolor de cabeza y fiebre.
11	Isodine solución	Frasco	01	Desinfectar heridas

Los botiquines existentes son para simples curaciones de primeros auxilios, en ningún momento o circunstancia dicha curación de primeros auxilios exime de la obligación de notificar a su supervisor, quien deberá enviar al accidentado al auxilio médico para el examen y tratamiento que fuese necesario.

11. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIAS.

[Handwritten Signature]
 **Ing. Joel Zamora Ramirez**
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 120872

En caso de suceder algún imprevisto, eventualidad o situación imprevista que pueda traer como consecuencia de cualquier tipo de accidente de trabajo producto de alguna mala maniobra, distracción o cometer alguna Acción Sub estándar.

La Contratista para afrontar las eventualidades ha localizado los centros asistenciales y además dispone de unidades móviles para realizar las evacuaciones si el caso lo requiere

11.1 DIRECTORIO TELEFONICA DE EMERGENCIAS

- Emergencia de la PNP
- I Comisaría PNP Zorritos
- Essalud Hospital II – Zorritos
- Gobierno Regional de Tumbes
- Centro de Defensa de Derechos Fundamentales
- Ministerio Público de Zorritos

105


[Handwritten Signature]
 VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
 Calle Ayacucho 41 y 58 de la Cruz
 GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
Henry María Celiz Suarez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 60000


[Handwritten Signature]
HUGO RICARDO QCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200



INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO – ENERO 2020


ENTREGA DE EPP Y IPP


VILLACRUZ CONTROLDORAS S.R.L.

Marzo 2020 Villacruz
C.E. Villacruz


Henry Alberto Celiz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 12083



Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120872


HUGO RICARDO OCANA NAVA
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

E-mail empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com



CELULAR: 976581927 - 945180984

FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

CODIGO: CH-002 FECHA: 02-07-2020
 VERSION: 2 Jueves
 HORA: 7:30 am

LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES

OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505"

ITEM	EQUIPO DE PROTECCION	ESTADO*		OBSERVACIONES
		NUEVO	BUENO	
1.00	CASCO CON BARBIQUEJO	X		
2.00	LENTES DE PROTECCION	X		
3.00	GUANTES DIELECTRICO Y/O DE MANIOBRA Y/O BADANA	X		
4.00	CHALÉCO REFLECTIVO O DE PROTECCION	X		
5.00	ZAPATOS DIELECTRICOS	X		
6.00	ARNES DE SEGURIDAD			
7.00	MEMELUCO O PANTALON SIMILAR			
8.00	CAMISA O SIMILAR	X		
9.00	LINEA DE VIDA			
10.00	ESTROGOS Y CINTURON DE SEGURIDAD			
11.00	OTROS (DETALLAR)			
12.00				
13.00				
14.00				
15.00				
16.00				
17.00				



Ing. Joel Zamora Ramirez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 120872

HUGO RICARDO OCANA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

Henry Haup...
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 86090

NOTA: Estos Equipos son propiedad exclusiva de la empresa, luego de culminar los trabajos, sirvase devolver los mismo de ser necesario

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
 GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL
 RUC N° 20570631787

omangel

NOMBRE OMANGEL Sanchez Serrano
 DNI N° 22871074





VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

E-mail empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com



CELULAR: 976581927 - 945180984

FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

CODIGO: CH-002 FECHA: 02-01-2020
 Jueves
 VERSION: 2 HORA: 7:30 am

LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES

OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505"

ITEM	EQUIPO DE PROTECCION	ESTADO*		OBSERVACIONES
		NUEVO	BUENO	
1.00	CASCO CON BARBIQUEJO	X		
2.00	LENTES DE PROTECCION	X		
3.00	GUANTES DIELECTRICO Y/O DE MANIOBRA Y/O BADANA	X		
4.00	CHALÉCO REFLECTIVO O DE PROTECCION	X		
5.00	ZAPATOS DIELECTRICOS	X		
6.00	ARNES DE SEGURIDAD			
7.00	MEMELUCO O PANTALON SIMILAR			
8.00	CAMISA O SIMILAR	X		
9.00	LINEA DE VIDA			
10.00	ESTROGOS Y CINTURON DE SEGURIDAD			
11.00	OTROS (DETALLAR)			
12.00				
13.00				
14.00				
15.00				
16.00				
17.00				



Ing. Joel Zamora Ramirez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 120872

Henry Flavio Celiz Suarez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 86090

Hugo Ricardo Ucana Navarro
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

NOTA: Estos Equipos son propiedad exclusiva de la empresa, luego de culminar los trabajos, sirvase devolver los mismo de ser necesario

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Marco Antonio Gutty de la Cruz
 GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL
 RUC N° 20570531787

Freddy
 NOMBRE: FREDDY DANIEL GUTIERREZ MARCANO
 DNI N° 31083070





VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

E-mail empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com



CELULAR: 976581927 - 945180984

FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

CODIGO: CH-002 FECHA: 02-01-2020
 VERSION: 2 Jueves
 HORA: 7:30 am

LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR – TUMBES

OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO – DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR – REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505"

ITEM	EQUIPO DE PROTECCION	ESTADO*		OBSERVACIONES
		NUEVO	BUENO	
1.00	CASCO CON BARBIQUEJO	X		
2.00	LENTES DE PROTECCION	Y		
3.00	GUANTES DIELECTRICO Y/O DE MANIOBRA Y/O BADANA	X		
4.00	CHALÉCO REFLECTIVO O DE PROTECCION	X		
5.00	ZAPATOS DIELECTRICOS	X		
6.00	ARNES DE SEGURIDAD			
7.00	MEMELUCO O PANTALON SIMILAR			
8.00	CAMISA O SIMILAR	X		
9.00	LINEA DE VIDA			
10.00	ESTROGOS Y CINTURON DE SEGURIDAD			
11.00	<u>OTROS (DETALLAR)</u>			
12.00				
13.00				
14.00				
15.00				
16.00				
17.00				



Ing. Joel Zamora Rana
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 120972

Henry Flavio Celiz Suarez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 86090

HUGO RICARDO QCANNA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

NOTA: Estos Equipos son propiedad exclusiva de la empresa, luego de culminar los trabajos, sirvase devolver los mismo de ser necesario

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Marco Antonio Gutty de la Cruz
 GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL
 RUC N° 20570531787

Alexis Rondon
 NOMBRE: ALEXIS RONDON
 DNI N° 11189454







VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

E-mail empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com



CELULAR: 976581927 - 945180984

FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

CODIGO: CH-002

FECHA: 27-01-2020

VERSION: 2

HORA: 7:30 am

LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES

OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505"

ITEM	EQUIPO DE PROTECCION	ESTADO*		OBSERVACIONES
		NUEVO	BUENO	
1.00	CASCO CON BARBIQUEJO	X		
2.00	LENTE DE PROTECCION	X		
3.00	GUANTES DIELECTRICO Y/O DE MANIOBRA Y/O BADANA	X		
4.00	CHALÉCO REFLECTIVO O DE PROTECCION	X		
5.00	ZAPATOS DIELECTRICOS	X		
6.00	ARNES DE SEGURIDAD			
7.00	MEMELUCO O PANTALON SIMILAR			
8.00	CAMISA O SIMILAR	X		
9.00	LINEA DE VIDA			
10.00	ESTROGOS Y CINTURON DE SEGURIDAD			
11.00	<u>OTROS (DETALLAR)</u>			
12.00				
13.00				
14.00				
15.00				
16.00				
17.00				



Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120972

Henry Flavia
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 860

HUGO RICARDO OJANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

NOTA: Estos Equipos son propiedad exclusiva de la empresa, luego de culminar los trabajos, sirvase devolver los mismo de ser necesario

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL
RUC N° 20570591787

NOMBRE: Herniles Diaz Linares
DNI N° 43718911





VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

E-mail empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com



CELULAR: 976581927 - 945180984

FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

CODIGO: CH-002

FECHA: 27-01-2020

VERSION: 2

HORA: 7:30 am

LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES

OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505"

ITEM	EQUIPO DE PROTECCION	ESTADO*		OBSERVACIONES
		NUEVO	BUENO	
1.00	CASCO CON BARBIQUEJO	X		
2.00	LENTES DE PROTECCION	X		
3.00	GUANTES DIELECTRICO Y/O DE MANIOBRA Y/O BADANA	X		
4.00	CHALÉCO REFLECTIVO O DE PROTECCION	X		
5.00	ZAPATOS DIELECTRICOS	X		
6.00	ARNES DE SEGURIDAD			
7.00	MEMELUCO O PANTALON SIMILAR			
8.00	CAMISA O SIMILAR	X		
9.00	LINEA DE VIDA			
10.00	ESTROGOS Y CINTURON DE SEGURIDAD			Ing. Joel Zamora Ramirez INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA REG. CIP N° 120872
11.00	<u>OTROS (DETALLAR)</u>			
12.00				
13.00				
14.00				
15.00				HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA Reg. CIP. N° 60200
16.00				
17.00				HENRY FLAVIO CELIS SUAREZ INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA REG. CIP N° 86090

NOTA: Estos Equipos son propiedad exclusiva de la empresa, luego de culminar los trabajos, sirvase devolver los mismo de ser necesario

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gatty de la Cruz
GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL
RUC N° 20570691787

NOMBRE: Walter Bedcuzza Ledenes
DNI N°





VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

E-mail empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com



CELULAR: 976581927 - 945180984

FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

CODIGO: CH-002

FECHA: 27-01-2020

VERSION: 2

HORA: 7:30 am

LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES

OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGION TUMBES, CODIGO UNICO N° 2235505"

ITEM	EQUIPO DE PROTECCION	ESTADO*		OBSERVACIONES
		NUEVO	BUENO	
1.00	CASCO CON BARBIQUEJO	X		
2.00	LENTES DE PROTECCION	X		
3.00	GUANTES DIELECTRICO Y/O DE MANIOBRA Y/O BADANA	Y		
4.00	CHALÉCO REFLECTIVO O DE PROTECCION	X		
5.00	ZAPATOS DIELECTRICOS	X		
6.00	ARNES DE SEGURIDAD			
7.00	MEMELUCO O PANTALON SIMILAR			
8.00	CAMISA O SIMILAR	X		
9.00	LINEA DE VIDA			
10.00	ESTROGOS Y CINTURON DE SEGURIDAD			
11.00	OTROS (DETALLAR)			
12.00				
13.00				
14.00				
15.00				
16.00				
17.00				



Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120872

Henry Flores Veliz Sosa
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 86090

HUGO RICARDO DEANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60290



Guido Alexander Zapata Benites

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL
RUC N° 20670691787

NOMBRE: Guido Alexander Zapata Benites
DNI N° 40895426

NOTA: Estos Equipos son propiedad exclusiva de la empresa, luego de culminar los trabajos, sirvase devolver los mismo de ser necesario

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO – ENERO 2020

CHARLAS DE SEGURIDAD

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Miguel Ángel de la Cruz
GERENTE GENERAL

Stiven Polio Suarez
ELECTRICISTA



Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120872

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRETE
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE CHARLA SEGURIDAD DE 10-15 MINUTOS

CODIGO: CH-001 FECHA: 02-01-2020
 LUN, JUEVES
 VERSION: 1 HORA: 7:30 am

ACTIVIDAD A EJECUTAR: replanteo para indicación de trazo para excavación de zanja
 NOMBRE DEL EXPOSITOR: Para M.T ING. JOEL ZAMORA RAMIREZ

LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES

OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGIÓN TUMBES, CÓDIGO ÚNICO N° 2235606"

N°	RIESGOS IDENTIFICADOS
1.00	Traumatismo
2.00	Fractura de cabeza, Tórax, manos y pies
3.00	
4.00	

N°	MEDIDAS ADOPTIVAS
1.00	Usar todos los EPP: Casco barbiguajo, lentes, chaleco, Guantes y zapatos de seguridad
2.00	Usar las herramientas apropiadas y en buen estado. wincha, estacas (Hilos)
3.00	Yeso, barreta, plomada y definir el trazo para la zanja la cual servirá para colocación de tubería para el cableado de M.T
4.00	

N°	CONTROL DE LA ACTIVIDAD
1.0	Señalizar el trazo con cinta de seguridad la cual estará sujeta por las estacas e impedir que personas ajenas al trabajo entren a nuestra área
2.0	

PERSONAL PARTICIPANTE			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
1.00	YORMAN JOSUE MONTILLA CAMPOS	22940342	<i>Yorman</i>
2.00	FREDDY DANIEL GUTIERREZ CARMANO	31083670	<i>Freddy</i>
3.00	EDGAR ALEXIS RONDON	1189454	<i>alex</i>
4.00	OMANGEL SANCHEZ SERRA	22871074	<i>Ommangel</i>
5.00			
6.00	Henry Flavia Celiz Suarez INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA		
7.00	REG. CIP. N° 86090	HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA	
8.00		Reg. CIP. N° 60200	

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

RUC N° 20570531787



Ing. Joel Zamora Ramirez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 120872



FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE CHARLA SEGURIDAD DE 10-15 MINUTOS

CODIGO: CH-004 FECHA: 06-01-2020
 VERSION: 1 DIA: Lunes
 HORA: 7:00 am

ACTIVIDAD A EJECUTAR:
 NOMBRE DEL EXPOSITOR: ING. JOEL ZAMORA RAMIREZ
 LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES
 OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGIÓN TUMBES, CÓDIGO ÚNICO N° 2235505"

N°	RIESGOS IDENTIFICADOS
1.00	traumatismo
2.00	Fractura de manos, pies, cabeza, tórax
3.00	
4.00	

N°	MEDIDAS ADOPTIVAS
1.00	Usar los EAP, como Casco, lentes, barbiquejo, chaleco, guantes y zapatos de seguridad
2.00	Usar las herramientas necesarias para apertura de zona, colocación de tubería para fases y sus respectivos estratos para su fijado según
3.00	Expediente técnico (arena tubería, arena, cinta roja de señalización, arena, lodrillo)
4.00	

N°	CONTROL DE LA ACTIVIDAD
1.0	Realizar la identificación del área de trabajo para señalización y dentro se
2.0	encuentran las herramientas. No debe haber personas ajenas a nuestra actividad

PERSONAL PARTICIPANTE			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
1.00	YORHAN JOSUE MONTILLA CAMPOS	22940342	
2.00	FREDDY DANIEL GUTIERREZ MARCANO	31083070	
3.00	ALEXIS RONDON	11189454	
4.00	OMAR GEL SANCHEZ SERRA	22871074	
5.00			
6.00			
7.00	INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA REG. CIP. N° 86090	HUGO RICARDO OCANA NAVARRO INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA Reg. CIP. N° 60200	
8.00			

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL
RUC N° 20570591787



Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120872



FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE CHARLA SEGURIDAD DE 10-15 MINUTOS

CODIGO: CH-005 FECHA: 07-01-2020
 VERSION: 1 DIA: Martes
 HORA: 7:30 am

ACTIVIDAD A EJECUTAR: *Apertura de zanja para instalación de tubería para MT*
 NOMBRE DEL EXPOSITOR: ING. JOEL ZAMORA RAMIREZ
 LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES
 OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGIÓN TUMBES, CÓDIGO ÚNICO N° 2236606"

N°	RIESGOS IDENTIFICADOS
1.00	Traumatismo
2.00	Fractura de manos, pies, cabeza y tórax
3.00	
4.00	

N°	MEDIDAS ADOPTIVAS
1.00	Usar los EPP, como: Casco, lentes, barbiguete, chaleco, guantes y zapatos de seguridad
2.00	Usar las herramientas necesarias para esta actividad y que tengan las condiciones adecuadas para realizar la excavación de la zanja, siguiendo el trazo marcado en el replanteo, teniendo siempre las medidas de Seguridad.
3.00	
4.00	

N°	CONTROL DE LA ACTIVIDAD
1.0	Realizar la ubicación del área de trabajo para la señalización y dentro
2.0	deben encontrarse todas las herramientas y materiales.

PERSONAL PARTICIPANTE			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
1.00	YORMAN JOSUE MONTILLA CAMPOS	22940342	<i>Yorman</i>
2.00	FREDDY DANIEL GUTIERREZ MARCANO	31083070	<i>Freddy</i>
3.00	ALEXIS RONDON	11189454	<i>Alex</i>
4.00	OMANGEL SANCHEZ SERRA	22871074	<i>Omangel</i>
5.00			
6.00			
7.00	<i>Henry Flavia Ledez Snc</i> INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA REG. CIP. N° 86090		<i>HUGO RICARDO CAÑA NAVARRO</i> INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA Reg. CIP. N° 60200
8.00			

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

RUC N° 90570631787



Joel Zamora Ramirez
 Ing. Joel Zamora Ramirez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 120072



FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE CHARLA SEGURIDAD DE 10-15 MINUTOS

CODIGO: CH-006 FECHA: 08-01-2020
 DIA: Miércoles
 VERSION: 1 HORA: 7:30 am

ACTIVIDAD A EJECUTAR: Excavación de terreno para zanja y ubicación de tubería para M.T
 NOMBRE DEL EXPOSITOR: ING. JOEL ZAMORA RAMIREZ
 LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES
 OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGIÓN TUMBES, CÓDIGO ÚNICO N° 2236606"

N°	RIESGOS IDENTIFICADOS
1.00	Traumatismo
2.00	Fractura de manos, pies, cabeza y tórax
3.00	
4.00	

N°	MEDIDAS ADOPTIVAS
1.00	Usar los EPP, como ; Casco, lentes, barbiguero, chaleco, guantes y zapatos de seguridad.
2.00	Usar las herramientas las cuales deben estar en buen estado, siguiendo el trazo marcado del siguiente tramo a perforar.
3.00	
4.00	

N°	CONTROL DE LA ACTIVIDAD
1.0	Realizar la señalización del tramo a excavar para realizar la zanja
2.0	El personal permanece atento para que no ingresen personas ajena al área de trabajo

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
1.00	YORMAN JOSUE MONTILLA CAMPOS	22940342	<i>[Signature]</i>
2.00	FREDDY DANIEL GUTIERREZ MARCANO	31083070	<i>[Signature]</i>
3.00	ALEXIS RONDON	11189454	<i>[Signature]</i>
4.00	OMANGEL SANCHEZ SERRA	22871074	<i>[Signature]</i>
5.00			
6.00	<i>[Signature]</i> HENRY FLAVIO GUTIERREZ SANCHEZ INGENIERO MECANICO ELECTRIC REG. CIP. N° 86090		<i>[Signature]</i>
7.00		HUGO RICARDO OCANA NAVARRO INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA Reg. CIP. N° 60200	
8.00			

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL
RUC N° 90570531787



Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120872



FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE CHARLA SEGURIDAD DE 10-15 MINUTOS

CODIGO: CH-007 FECHA: 09-01-2020
 VERSION: 1 DIA: jueves
 HORA: 7:30 am

ACTIVIDAD A EJECUTAR: Excavación de terreno para zanja y colocación de tubería para M.F.

NOMBRE DEL EXPOSITOR: ING. JOEL ZAMORA RAMIREZ

LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES

OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGIÓN TUMBES, CÓDIGO ÚNICO N° 2235505"

N°	RIESGOS IDENTIFICADOS
1.00	Traumatismo
2.00	Fractura de manos, pies, cabeza y torax
3.00	
4.00	

N°	MEDIDAS ADOPTIVAS
1.00	USar los EPP como: casco, lentes, barbiquejo, chaleco, guantes y zapatos de seguridad
2.00	Usar las herramientas las cuales deben estar en buen estado, siguiendo el
3.00	Trazo marcado del tramo a perforar.
4.00	

N°	CONTROL DE LA ACTIVIDAD
1.0	Realizar la señalización del tramo a perforar para realizar la zanja
2.0	El personal permanece atento para que no ingresen personas ajenas al área de trabajo

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
1.00	JORJON JOSUE MONTILLA CAMPOS	22940342	<i>Jorjon</i>
2.00	FREDDY DANIEL GUTIERREZ MORAÑO	31083070	<i>Freddy</i>
3.00	ALEXIS RONDON	11189454	<i>alex</i>
4.00	OMANGEL SANCHEZ SERRA	22871074	<i>Omangel</i>
5.00			
6.00			
7.00	<i>Henry Flavia Celiz Sica</i> INGENIERO MECANICO ELECTR REG. CIP. N° 86050		HUGO RICARDO OCANA NAVARRO INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA Reg. CIP. N° 50200
8.00			

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Amforto Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL



Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120872

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL
RUC N° 90570591787



FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE CHARLA SEGURIDAD DE 10-15 MINUTOS

CODIGO: CH-009 FECHA: 11-01-2020
 VERSION: 1 DIA: Sabado
 HORA: 7:30 am

ACTIVIDAD A EJECUTAR: *Excavación de terreno para zanja su tapado de tuberío para M.T*

NOMBRE DEL EXPOSITOR: ING. JOEL ZAMORA RAMIREZ

LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES

OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGIÓN TUMBES, CÓDIGO ÚNICO N° 2236606"

N°	RIESGOS IDENTIFICADOS
1.00	<i>Traumatismo</i>
2.00	<i>Fractura de manos, pies, Cabeza y Tórax</i>
3.00	
4.00	

N°	MEDIDAS ADOPTIVAS
1.00	<i>Usar los EPP como: casco, barbiquejo, chaleco, guantes y zapatos de seguridad.</i>
2.00	
3.00	<i>Usar los herramientas necesarias para la excavación tanto para</i>
4.00	<i>apertura de zanja y su tapado</i>

N°	CONTROL DE LA ACTIVIDAD
1.0	<i>Realizar la señalización del tramo de apertura y tapado de</i>
2.0	<i>zanja previa colocación de los materiales entre otros.</i>

PERSONAL PARTICIPANTE			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
1.00	<i>YORMAN JOSUE MONTILLA CAMPOS</i>	<i>22940342</i>	<i>[Firma]</i>
2.00	<i>FREDDY DANIEL GUTIERREZ MARCONO</i>	<i>31083070</i>	<i>[Firma]</i>
3.00	<i>ALEXIS RONDON</i>	<i>11189454</i>	<i>Alex</i>
4.00	<i>OMANGEL SANCHEZ SERRA</i>	<i>22871074</i>	<i>Omangel</i>
5.00			
6.00	<i>[Firma]</i>		
7.00	<i>Henry Flavia [Firma] Sr. INGENIERO MECANICO ELECTR. REG. CIP. N° 84939</i>		<i>HUGO RICARDO OCANA NAVARRO INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA Reg. CIP. N° 60200</i>
8.00			

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

[Firma]
 Marco Antonio Gutty de la Cruz
 GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL
 RUC N° 20570531787



[Firma]
 Ing. Joel Zamora Ramirez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 120872



FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE CHARLA SEGURIDAD DE 10-15 MINUTOS

CODIGO: CH-00 10 FECHA: 13 - 07 - 2020
 PAGINA: 1.0 de 2.0 DIA: LUNES
 VERSION: 1 HORA: 7:30 am

ACTIVIDAD A EJECUTAR: Excavación de terreno para zanja, su tapado de tubería para M.T
 NOMBRE DEL EXPOSITOR: ING. JOEL ZAMORA RAMIREZ
 LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES
 OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGIÓN TUMBES, CÓDIGO ÚNICO N° 2235606"

N°	RIESGOS IDENTIFICADOS
1.00	Traumatismo
2.00	Fractura de manos, pies, cabeza y tórax
3.00	
4.00	

N°	MEDIDAS ADOPTIVAS
1.00	Usar los EPP como: casco, barbiguero, chaleco, guantes y zapatos de seguridad
2.00	Usar herramientas necesarias para la excavación tanto para la
3.00	apertura de zanja y el respectivo tapado de la tubería de M.T
4.00	(Arena, ladrillo, arena, cinta de señalización, arena, tierra originaria

N°	CONTROL DE LA ACTIVIDAD
1.0	Realizar la señalización del tramo de apertura y tapado de zanja,
2.0	previa colaboración de los materiales entre otros

PERSONAL PARTICIPANTE

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
1.00	YORMAN JOSUE MONTILLA CAMPOS	22940342	<i>[Firma]</i>
2.00	FREDDY DANIEL GUTIERREZ MARCONO	31083070	<i>[Firma]</i>
3.00	ALEXIS RONDON	11189454	<i>[Firma]</i>
4.00	OMANGEL SANCHEZ SERRA	22871074	<i>[Firma]</i>
5.00			
6.00			
7.00	<i>[Firma]</i> HENRY FERRER FELIZ SUAREZ INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA REG. CIP. N° 86090		<i>[Firma]</i> HUGO RICARDO OCANA NAVARRO INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA Reg. CIP. N° 60200
8.00			

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

[Firma]
Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

RUC N° 20570591787



[Firma]
Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 125271



CELULAR: 976581927 - 945180984

FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE CHARLA SEGURIDAD DE 10-15 MINUTOS

CODIGO: CH-00 11 FECHA: 14 - 01 - 2020
 PAGINA: 1.0 de 2.0 DIA: Viernes
 VERSION: 1 HORA: 9:30 AM

ACTIVIDAD A EJECUTAR: Excavación de terreno para zanja, y tapado de tubería de H.T
 NOMBRE DEL EXPOSITOR: ING. JOEL ZAMORA RAMIREZ
 LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES
 OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGIÓN TUMBES, CÓDIGO ÚNICO N° 2236505"

N°	RIESGOS IDENTIFICADOS
1.00	Traumatismo
2.00	Fractura de manos, pies, cabeza y torax
3.00	
4.00	

N°	MEDIDAS ADOPTIVAS
1.00	Usar todos los EPP: Casco, barbiguero, chaleco, guantes y zapatos de seguridad
2.00	Usar las herramientas necesarias para la excavación para la apertura de zanja y su respectivo tapado de la tubería de H.T
3.00	
4.00	Arena, ladrillo, arena, cinta de seguridad, arena y tierra originaria.

N°	CONTROL DE LA ACTIVIDAD
1.0	Verificar que la señalización de seguridad del límite correctamente
2.0	La zona de trabajo.

PERSONAL PARTICIPANTE			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
1.00	YORMAN JOSUE MONTILLA CAMPOS	22940342	<i>Yorman</i>
2.00	FREDDY DANIEL GUTIERREZ MARIANO	31083070	<i>Freddy</i>
3.00	ALEXIS RONDON	71189454	<i>Alexis</i>
4.00	OMANGEL SANCHEZ SERPA	22871074	<i>Omangel</i>
5.00			
6.00	<i>Henry Flavia Coliz S...</i>		<i>HFC</i>
7.00	INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA REG. CIP. N° 86000		HUGO NICOLÁS OCAÑA NAVARRO INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA Reg. CIP. N° 60200
8.00			

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

 Marco Antonio Gutty de la Cruz
 GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL
 RUC N° 20570531787

Ing. Joel Zamora Ramirez
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 120872



FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE CHARLA SEGURIDAD DE 10-15 MINUTOS

CODIGO: CH-0012 FECHA: 15-01-2020
PAGINA: 1.0 de 2.0 DIA: Miércoles
VERSION: 1 HORA: 7:30 AM

ACTIVIDAD A EJECUTAR: Excavación de terreno para zanja, su tapado de tubería para H.T
NOMBRE DEL EXPOSITOR: ING. JOEL ZAMORA RAMIREZ
LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES
OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGIÓN TUMBES, CÓDIGO ÚNICO N° 2235505"

N°	RIESGOS IDENTIFICADOS
1.00	Traumatismo
2.00	Fractura de manos, pies, cabeza y tórax
3.00	
4.00	

N°	MEDIDAS ADOPTIVAS
1.00	Usar los EPP como: casco, barbiquejo, chaleco, guantes y zapatos de seguridad
2.00	Usar las herramientas necesarias para la excavación tanto para la
3.00	apertura de zanja y su respectivo tapado de la tubería de H.T
4.00	arena, ladrillo, arena, cinta de señalización, arena, tierra originaria de la zona

N°	CONTROL DE LA ACTIVIDAD
1.0	Proceder a verificar si la señalización de seguridad esta en buenas condiciones y definir la zona de trabajo
2.0	

PERSONAL PARTICIPANTE			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
1.00	YORMAN JOSUE MONTILLA CAMPOS	22940342	<i>[Firma]</i>
2.00	FREDDY DANIEL GUTIERREZ MARCANO	31083070	<i>[Firma]</i>
3.00	ALEXIS RONDON	11189454	<i>[Firma]</i>
4.00	OHANGEL SANCHEZ SERRA	22871074	<i>[Firma]</i>
5.00			
6.00	<i>[Firma]</i> Henry Flavio Coliz Suñ INGENIERO MECANICO ELECTRI REG. CIP. N° 86090		<i>[Firma]</i> HUGO RICARDO OCANA NAVARRO INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA Reg. CIP. N° 60200
7.00			
8.00			

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
[Firma]
Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL
RUC N° 20570591787



[Firma]
Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120872



FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE CHARLA SEGURIDAD DE 10-15 MINUTOS

CODIGO: CH-0013 FECHA: 16-01-2020
 PAGINA: 1.0 de 2.0 DIA: JUEVES
 VERSION: 1 HORA: 7:30 AM

ACTIVIDAD A EJECUTAR: *Excavación de hoyos para elaboración de buzones y encofrado*
 NOMBRE DEL EXPOSITOR: ING. JOEL ZAMORA RAMIREZ
 LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES
 OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGIÓN TUMBES, CÓDIGO ÚNICO N° 2235605"

N°	RIESGOS IDENTIFICADOS
1.00	<i>Traumatismos, Cortes</i>
2.00	<i>FRACTURA de Cabeza, torax, manos y pies.</i>
3.00	<i>cortes en las partes del cuerpo del ITEM 2-00</i>
4.00	

N°	MEDIDAS ADOPTIVAS
1.00	<i>Usar EPP: Casco, barbiguajo, chaleco, guantes y zapatos de seguridad</i>
2.00	<i>Usar las herramientas necesarias para la Excavación de los hoyos para los buzones y controlar el desborde de la arena.</i>
3.00	
4.00	

N°	CONTROL DE LA ACTIVIDAD
1.0	<i>Señalizar el área total de la excavación y permanecer atentos</i>
2.0	<i>para que ninguna persona ajena al trabajo ingrese dentro de la zona.</i>

PERSONAL PARTICIPANTE			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
1.00	<i>YORMAN JOSUE MONTILLA CAMPOS</i>	<i>22940342</i>	<i>Yorman</i>
2.00	<i>FREDDY DANIEL GUTIERREZ MARCONO</i>	<i>31083070</i>	<i>Freddy</i>
3.00	<i>OMANGEL SANCHEZ SERRA</i>	<i>11189454</i>	<i>Omanuel</i>
4.00	<i>EDGAR ALEXIS RONDON</i>	<i>22871074</i>	<i>alex</i>
5.00			
6.00	<i>Henry Flavia...</i>		
7.00	INGENIERO MECÁNICO ELÉCT. REG. CIP. N° 60200		HUGO RICARDO OCANA NAVARRO INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA Reg. CIP. N° 60200
8.00			

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL
RUC N° 20570531787



Ing. Joel Zamora
INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO
REG. CIP. N° 120872



FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE CHARLA SEGURIDAD DE 10-15 MINUTOS

CODIGO: CH-0014 FECHA: 17-01-2020
 PAGINA: 1.0 de 2.0 DIA: viernes
 VERSION: 1 HORA: 7:30 AM

ACTIVIDAD A EJECUTAR: Excavación de hoyos para elaboración de buzones (vacados)
 NOMBRE DEL EXPOSITOR: ING. JOEL ZAMORA RAMIREZ
 LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES
 OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGIÓN TUMBES, CÓDIGO ÚNICO N° 2235605"

N°	RIESGOS IDENTIFICADOS
1.00	Traumatismos, cortes
2.00	Fractura de cabeza, torax, manos y pies
3.00	Cortes de en las partes del cuerpo del ITEM 2.00
4.00	

N°	MEDIDAS ADOPTIVAS
1.00	Usar EPP: casco, barbi quejo, chaleco, guantes y zapatos de seguridad
2.00	Usar las herramientas necesarias para la excavación de los hoyos para los buzones, colocar agua para compactar la arena para que no se desborde
3.00	
4.00	

N°	CONTROL DE LA ACTIVIDAD
1.0	señalizar el area total de la excavación y permanecer atentos
2.0	para que ninguna persona ajena al trabajo ingrese a la zona indicada

PERSONAL PARTICIPANTE			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
1.00	YORMAN JOSUE MONTILLA CAMPOS	22940342	<i>Yorman</i>
2.00	FREDDY DANIEL GUTIERREZ MARIANO	31083070	<i>Freddy</i>
3.00	OMANGEL SANCHEZ SERRA	11189454	Omangel
4.00	EDGAR ALEXIS RONDON	22871034	alca
5.00			
6.00	<i>Henry Flavio Ortiz Suarez</i> INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA REG. CIP N° 60200		<i>HUGO RICARDO GCAÑA NAVARRO</i> INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA Reg. CIP N° 60200
7.00			
8.00			

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL
RUC N° 20570531787

Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP N° 2235605



FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE CHARLA SEGURIDAD DE 10-15 MINUTOS

CODIGO: CH-0015 FECHA: 10-01-2020
 PAGINA: 1.0 de 2.0 DIA: sábado
 VERSION: 1 HORA: 7:30 AM

ACTIVIDAD A EJECUTAR: *Excavación de hoyos para elaboración de buzones (vaceado)*

NOMBRE DEL EXPOSITOR: ING. JOEL ZAMORA RAMIREZ

LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES

OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGIÓN TUMBES, CÓDIGO ÚNICO N° 2235505"

N°	RIESGOS IDENTIFICADOS
1.00	<i>Traumatismos, cortes</i>
2.00	<i>Fractura de cabeza torax, manos y pies</i>
3.00	<i>Cortes en los partes del cuerpo mencionadas en el ITEM 2.00</i>
4.00	

N°	MEDIDAS ADOPTIVAS
1.00	<i>Usar los EPP: casco, barbiguayo, chaleco, guantes y zapatos de seguridad</i>
2.00	<i>Usar las herramientas destinadas para la actividad y que estén en buenas condiciones, y tomar las medidas necesarias para evitar algún accidente.</i>
3.00	
4.00	

N°	CONTROL DE LA ACTIVIDAD
1.0	<i>Señalizar el área total para realizar el vaceado de concreto.</i>
2.0	<i>para que personas ajenas al trabajo no ingresen.</i>

PERSONAL PARTICIPANTE			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
1.00	<i>YORMAN JOSUE MONTILLA CAMPOS</i>	<i>22940342</i>	<i>Yorman</i>
2.00	<i>FREDDY DANIEL GUTIERREZ MORAÑO</i>	<i>31083070</i>	<i>Freddy</i>
3.00	<i>OMANGEL SANCHEZ SERA</i>	<i>22871034</i>	<i>Omangel</i>
4.00	<i>EDGAR ALEXIS RONDON</i>	<i>11189454</i>	<i>alex</i>
5.00			
6.00	<i>Henry Flavio Colla Sa</i> INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA REG. CIP. N° 86090		<i>[Firma]</i>
7.00			<i>HUGO RICARDO OCANA NAVARRO</i> INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA Reg. CIP. N° 60200
8.00			

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

[Firma]
 Marco Antonio Gutty de la Cruz
 GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

RUC N° 20570531787



[Firma]
 Ing. Joel Zamora Ramirez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 120872



FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE CHARLA SEGURIDAD DE 10-15 MINUTOS

CODIGO: CH-0016 FECHA: 20-01-2020
 PAGINA: 1.0 de 2.0 DIA: Lunes
 VERSION: 1 HORA: 7:30 AM

ACTIVIDAD A EJECUTAR: *realizar el enofrado del buzón y su vaciado si fuere*
 NOMBRE DEL EXPOSITOR: *el caso* ING. JOEL ZAMORA RAMIREZ
 LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES
 OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULGO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGIÓN TUMBES, CÓDIGO ÚNICO N° 2235505"

N°	RIESGOS IDENTIFICADOS
1.00	<i>Traumatismos, cortes</i>
2.00	<i>Fractura de cabeza, torax, mano y pies.</i>
3.00	
4.00	

N°	MEDIDAS ADOPTIVAS
1.00	<i>Usar los EPP: Casco, barbiquejo, chaleco, guantes y zapatos de seguridad</i>
2.00	<i>Usar las herramientas destinadas y que se encuentren en buenas condiciones, y tomar las medidas preventivas para evitar algún accidente.</i>
3.00	
4.00	

N°	CONTROL DE LA ACTIVIDAD
1.0	<i>Señalizar el área de trabajo para realizar el vaciado de</i>
2.0	<i>concreto. Estar atentos para no permitir que personas ajenas no ingresen</i>

PERSONAL PARTICIPANTE			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
1.00	<i>YORMAN JOSUE MONTILLA CAMPOS</i>	<i>22940342</i>	<i>[Firma]</i>
2.00	<i>FREDDY DANIEL GUTIERREZ MORAÑO</i>	<i>31083070</i>	<i>[Firma]</i>
3.00	<i>OMANGEL SANCHEZ SERRA</i>	<i>22871034</i>	<i>Omangel</i>
4.00	<i>EDGAR ALEXIS RONDOON</i>	<i>11189454</i>	<i>alca</i>
5.00			
6.00	<i>Henry Fajardo Celiz Sr.</i> INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA REG. CIP. N° 86090		<i>[Firma]</i>
7.00			HUGO RICARDO OJANA NAVARRO INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA Reg. CIP. N° 60200
8.00			

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

RUC N° 20570591787



Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120872



CCLULAR: 976581927 - 945180984

FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE CHARLA SEGURIDAD DE 10-15 MINUTOS

CODIGO: CH-00 77 FECHA: 21-07-2020
 PAGINA: 1.0 de 2.0 DIA: Martes
 VERSION: 1 HORA: 7:30 AM

ACTIVIDAD A EJECUTAR: *Realizar el vaciado de concreto en el segundo brún*
 NOMBRE DEL EXPOSITOR: ING. JOEL ZAMORA RAMIREZ
 LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES
 OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGIÓN TUMBES, CÓDIGO ÚNICO N° 2235605"

N°	RIESGOS IDENTIFICADOS
1.00	<i>Traumatismo, cortes</i>
2.00	<i>Fractura en cabeza, torax y pies.</i>
3.00	
4.00	

N°	MEDIDAS ADOPTIVAS
1.00	<i>Usar los EPP: casco, barbiquejo, chaleco, guantes y zapatos de seguridad</i>
2.00	<i>Usar las herramientas, equipos y materiales adecuados y</i>
3.00	<i>en buenas condiciones y tomar medidas preventivas para</i>
4.00	<i>evitar algún accidente.</i>

N°	CONTROL DE LA ACTIVIDAD
1.0	<i>señalizar el área de trabajo para realizar el vaciado</i>
2.0	<i>de concreto previo colocación de malla de fierro.</i>

PERSONAL PARTICIPANTE			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
1.00	<i>YORMAN JOSUE MONTILLA CAMPOS</i>	<i>22940342</i>	<i>Yorman</i>
2.00	<i>FREDDY DANIEL GUTIERREZ MARCONO</i>	<i>31083070</i>	<i>Freddy</i>
3.00	<i>OMANGEL SANCHEZ SERRA</i>	<i>22871034</i>	<i>Omangel</i>
4.00	<i>EDGAR ALEXIS RONDON</i>	<i>11189454</i>	<i>alex</i>
5.00			
6.00			<i>HUGO RICARDO DOÑA NAVARRO</i>
7.00	<i>Henny Diana Celis Suarez</i> INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA REG. CIP. N° 86090		<i>INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA</i> Reg. CIP. N° 60200
8.00			

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

 Marco Antonio Gutty de la Cruz
VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL
 RUC N° 20570591787

Ing. Joel Zamora Ramirez
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 120872



FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE CHARLA SEGURIDAD DE 10-15 MINUTOS

CODIGO: CH-00 18 **FECHA:** 22 - 01 - 2020
PAGINA: 1.0 de 2.0 **DIA:** Miércoles
VERSION: 1 **HORA:** 7:30 AM

ACTIVIDAD A EJECUTAR: Apertura de terreno (excavación de hoyos para puestas a Tierra para M.O.T.)
NOMBRE DEL EXPOSITOR: ING. JOEL ZAMORA RAMIREZ
LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES
OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGIÓN TUMBES, CÓDIGO ÚNICO N° 2235505"

N°	RIESGOS IDENTIFICADOS
1.00	Traumatismos cortes
2.00	Fractura en Cadera, Torax y pies
3.00	
4.00	

N°	MEDIDAS ADOPTIVAS
1.00	Usar los EPP: Casco, barbiquejo, chaleco, guantes y zapatos de seguridad
2.00	Usar las herramientas, equipos y materiales adecuados si fuera el caso y estos estén en buenas condiciones, para lo cual se
3.00	Loman las medidas preventivas en cuanto al personal y señalización
4.00	

N°	CONTROL DE LA ACTIVIDAD
1.0	Señalizar el área de trabajo para realizar la excavación de hoyos para la M.T.
2.0	

PERSONAL PARTICIPANTE			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
1.00	YORMAN JOSUE MONTILLA COMPOS	22940342	<i>[Firma]</i>
2.00	FREDDY DANIEL GUTIERREZ MARCONO	31083070	<i>[Firma]</i>
3.00	OMANGEL SANCHEZ SERRA	22871034	Omangel
4.00	EDGAR ALEXIS RONDON	11189454	alex
5.00			
6.00	Henny Flavio Celis Suarez INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA REG. CIP. N° 66090	HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA Reg. CIP. N° 61200	<i>[Firma]</i>
7.00			
8.00			

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

[Firma]
Marco Antonio Gutierrez



[Firma]
Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120872

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL
RUC N° 20570531787



FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE CHARLA SEGURIDAD DE 10-15 MINUTOS

CODIGO: CH-00 19 FECHA: 27-01-2020
 PAGINA: 1.0 de 2.0 DIA: Lunes
 VERSION: 1 HORA: 7:30 AM

ACTIVIDAD A EJECUTAR: *Instalación de cable N2 xSY en la zanja subterránea M-T*
 NOMBRE DEL EXPOSITOR: ING. JOEL ZAMORA RAMIREZ
 LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES
 OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGIÓN TUMBES, CÓDIGO ÚNICO N° 2235505"

N°	RIESGOS IDENTIFICADOS
1.00	<i>Traumatismo cortes</i>
2.00	<i>Fractura en Cabeza, Torax, manos y extremidades inferiores</i>
3.00	
4.00	

N°	MEDIDAS ADOPTIVAS
1.00	<i>Usar los EPP designados: casco, barbiquejo, chaleco, guantes y zapatos de seguridad</i>
2.00	<i>Colocar la bobina del cable sobre la porta bobina para facilitar</i>
3.00	<i>y asegurar la integridad de las personas y del cable, a la vez</i>
4.00	<i>para optimizar la seguridad en el trabajo</i>

N°	CONTROL DE LA ACTIVIDAD
1.0	<i>Definir el área de trabajo para realizar la señalización, en todo</i>
2.0	<i>momento se observa que ninguna persona ingrese a nuestra zona de trabajo</i>

PERSONAL PARTICIPANTE

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
1.00	<i>GUIDO ALEXANDER ZAPATA BENITES</i>	<i>40895426</i>	<i>[Firma]</i>
2.00	<i>SANTOS PORFIRIO DESA MARIN</i>	<i>80458439</i>	<i>[Firma]</i>
3.00	<i>WALTER BALCAZAR LADINES</i>	<i>00327187</i>	<i>[Firma]</i>
4.00	<i>JAIKE ROLANDO ZAPATA BENITES</i>	<i>03380937</i>	<i>[Firma]</i>
5.00	<i>ROSARIO PACHAMANGO MARTINES</i>	<i>41751562</i>	<i>[Firma]</i>
6.00	<i>GIORGIO ANTONIO GUTY DE LA CRUZ</i>	<i>44988244</i>	<i>[Firma]</i>
7.00	<i>HENRY FLAVIO CELIZ SUAREZ</i>	<i>41998543</i>	<i>[Firma]</i>
8.00	<i>Hermiles Diaz Linares</i>	<i>43718911</i>	<i>[Firma]</i>

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Guty de la Cruz
GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL
RUC N° 20570531787

Henry Flavio Celiz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120872



Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120872

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE CHARLA SEGURIDAD DE 10-15 MINUTOS

CODIGO: CH-002.0 FECHA: 20-01-2020
 PAGINA: 1.0 de 2.0 DIA: Martes
 VERSION: 1 HORA: 7:30 am

ACTIVIDAD A EJECUTAR: *Instalacion de cable N2XSy en la zanja subterraneo para H.T*
 NOMBRE DEL EXPOSITOR: ING. JOEL ZAMORA RAMIREZ
 LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES
 OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGIÓN TUMBES, CÓDIGO ÚNICO N° 2236505"

N°	RIESGOS IDENTIFICADOS
1.00	<i>Traumatismo, cortes</i>
2.00	<i>FRACTURA de cabeza, torax, manos y extremidades inferiores.</i>
3.00	
4.00	

N°	MEDIDAS ADOPTIVAS
1.00	<i>Usar los EPP designados: Casco, barbiquejo, chaleco, guantes y zapatos de seguridad.</i>
2.00	<i>Colocar la bobina del cable sobre la porta bobina para</i>
3.00	<i>Facilitar y asegurar la integridad de las personas y la del cable, a</i>
4.00	<i>la vez para la para optimizar la seguridad en el trabajo</i>

N°	CONTROL DE LA ACTIVIDAD
1.0	<i>Verificar si la señalización esta en buenas condiciones y</i>
2.0	<i>delimitando nuestra área de trabajo para evitar accidentes</i>

PERSONAL PARTICIPANTE

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
1.00	<i>SANTOS PORFIRIO DESA MARIN</i>	<i>80450439</i>	<i>Santos P.D.M.</i>
2.00	<i>ROSARIO PACHAMANGO MANTILLA</i>	<i>47751562</i>	<i>Rosario P.</i>
3.00	<i>GUIDO ALEXANDER ZAPATA BENITES</i>	<i>40895426</i>	<i>Guido A.Z.B.</i>
4.00	<i>GUALTER BALCAZAR LADINES</i>	<i>00327187</i>	<i>Gualter B.</i>
5.00	<i>JAIME ROLONDO ZAPATA BENITES</i>	<i>03380937</i>	<i>Jaime R.Z.B.</i>
6.00	<i>MARCO ANTONIO GUTY DE LA CRUZ</i>	<i>44980244</i>	<i>Marco A.G.</i>
7.00	<i>HECHILES DIAZ LINDRES</i>	<i>43718911</i>	<i>Hechiles D.</i>
8.00			

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

 Marco Antonio Guty de la Cruz
 GERENTE GENERAL

Henry Flaque
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 80680

Ing. Joel Zamora Ramirez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 120672

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL
 RUC N° 20570531787

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200



FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE CHARLA SEGURIDAD DE 10-15 MINUTOS

CODIGO: CH-0020 FECHA: 30-01-2020
 PAGINA: 1.0 de 2.0 DIA: Jueves
 VERSION: 1 HORA: 7:30 am

ACTIVIDAD A EJECUTAR:

NOMBRE DEL EXPOSITOR: ING. JOEL ZAMORA RAMIREZ

LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES

OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGIÓN TUMBES, CÓDIGO ÚNICO N° 2235505"

N°	RIESGOS IDENTIFICADOS
1.00	traumatismo, cortes
2.00	Fractura de cabeza, torax, manos y extremidades inferiores
3.00	
4.00	

Henry Flavió Celiz S. S. S. S. S.
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 36000

N°	MEDIDAS ADOPTIVAS
1.00	Usar los EPP designados. cascos, barbiguayo, lentes chaleco y zapatos de seguridad. Se verifica que la grúa si cumple con los requisitos mínimos para realizar el trazo del poste de 15/400 (M.T), contar con todas las herramientas y que estas estén en buen estado.
2.00	
3.00	
4.00	

N°	CONTROL DE LA ACTIVIDAD
1.0	Realizar la señalización del área en donde se trabajara
2.0	para que ninguna persona ajena a nuestro trabajo se encuentre dentro

PERSONAL PARTICIPANTE

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
1.00	ROSARIO PACHOMANBO MANTILLA	41751562	Rosario PPH
2.00	SANTOS BRFIRIO DESA MARIN	80458439	Santos PPH
3.00	GUIDO ALEXANDER ZAPATA BENITES	40895426	Guido PPH
4.00	WALTER BOLCAZAR ZAPARES	00327187	Walter PPH
5.00	JAIME ROLANDO ZAPATA BENITES	03380937	Jaime PPH
6.00	MARLO ANTONIO GUTTY DE LA CRUZ	44988244	Marlo PPH
7.00	HENRY FLAVIO CELIZ SANCHEZ	41998543	Henry PPH
8.00	HERMILES DIAZ LINAREZ	43718911	Hermiles PPH

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Guty de la Cruz
 GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

RUC N° 20570531787



Ing. Joel Zamora Ramirez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 129872

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200



FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE CHARLA SEGURIDAD DE 10-15 MINUTOS

CODIGO: CH-0021 FECHA: 29 - 01 - 2020
 PAGINA: 1.0 de 2.0 DIA: Miércoles
 VERSION: 1 HORA: 7:30 am

ACTIVIDAD A EJECUTAR: *Instalación de puestas a tierra M.T*
 NOMBRE DEL EXPOSITOR: ING. JOEL ZAMORA RAMIREZ
 LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES
 OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGIÓN TUMBES, CÓDIGO ÚNICO N° 2235505"

N°	RIESGOS IDENTIFICADOS
1.00	<i>Traumatismo, cortes</i>
2.00	<i>Fractura de cabeza, torax, manos y extremidades inferiores</i>
3.00	
4.00	

N°	MEDIDAS ADOPTIVAS
1.00	<i>Usar los EPP designados: Casco, barbiquejo, lentes, chuleta, guantes y zapatos de seguridad. Pasado de cobre desnudo para lo cual</i>
2.00	<i>Todas las herramientas estén en buenas condiciones, no olvidar</i>
3.00	<i>la señalizando antes de empezar con nuestros trabajos programados</i>
4.00	

N°	CONTROL DE LA ACTIVIDAD
1.0	<i>Verificar si la señalización estén delimitando el área de</i>
2.0	<i>trabajo</i>

PERSONAL PARTICIPANTE

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
1.00	<i>SANTOS PORFIRIO DESA MARIN</i>	<i>80458439</i>	<i>[Firma]</i>
2.00	<i>ROSARIO PACHAMANBO MANTUADA</i>	<i>41751562</i>	<i>[Firma]</i>
3.00	<i>GUIDO ALEXANDER ZAPATA BENITES</i>	<i>40895426</i>	<i>[Firma]</i>
4.00	<i>WALTER BALCAZAR LAOINES</i>	<i>00327187</i>	<i>[Firma]</i>
5.00	<i>JAIME ROLONDO ZAPATA BENITE</i>	<i>03380937</i>	<i>[Firma]</i>
6.00	<i>MARCO ANTONIO GUTTY DE LA CRUZ</i>	<i>44988244</i>	<i>[Firma]</i>
7.00	<i>HERMILES DIAZ LINARES</i>	<i>43718911</i>	<i>[Firma]</i>
8.00			

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Guty de la Cruz
GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL
RUC N° 20570531787

Henry Flavio Celiz Soria
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 66690



Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 12027

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



FORMATO DE REGISTRO

FORMATO DE CHARLA SEGURIDAD DE 10-15 MINUTOS

CODIGO: CH-0029 FECHA: 31-01-2020
 PAGINA: 1.0 de 2.0 DIA: Miernes
 VERSION: 1 HORA: 9:30 am

ACTIVIDAD A EJECUTAR: *Instalación de accesorios en Ferreteria en el PHI*
 NOMBRE DEL EXPOSITOR: ING. JOEL ZAMORA RAMIREZ
 LUGAR: CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES
 OBRA: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - REGIÓN TUMBES, CÓDIGO ÚNICO N° 2235505"

N°	RIESGOS IDENTIFICADOS
1.00	<i>Traumatismo</i>
2.00	<i>FRACTURA DE MANO, CODO, CABEZA Y EXTREMIDADES INFERIORES</i>
3.00	
4.00	

Henny Huanca Veliz Sual
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 228000

N°	MEDIDAS ADOPTIVAS
1.00	<i>Usar los EPP: Casco, barbiquejo, lentes, chaleco y zapatos de seguridad</i>
2.00	<i>Usar las herramientas movilidad (grúa) la cual debe 1</i>
3.00	<i>cumplir con los estándares de calidad para prevenir algunos</i>
4.00	<i>accidentes en el trabajo.</i>

N°	CONTROL DE LA ACTIVIDAD
1.0	<i>Realizar la señalización de la zona donde se realizara</i>
2.0	<i>la manobra y evitar que personas ajenas se pertenezcan al trabajo</i>

PERSONAL PARTICIPANTE			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
1.00	<i>SANTOS PORFIRIO DESA MARIN</i>	<i>80458439</i>	<i>Santos Desamarin</i>
2.00	<i>ROSARIO PACHAMANGO MONTILLA</i>	<i>41751562</i>	<i>Rosario Pachamango</i>
3.00	<i>GUIDO ALEXANDER ZAPATA BENITES</i>	<i>40895426</i>	<i>Guido Zapata</i>
4.00	<i>WALTER BALCAZAR LADINES</i>	<i>00327187</i>	<i>Walter Balcazar</i>
5.00	<i>JAIME ROLANDO ZAPATA BENITES</i>	<i>03380937</i>	<i>Jaime Zapata</i>
6.00	<i>MARCO ANTONIO GUTTY DE LA CRUZ</i>	<i>44988244</i>	<i>Marco Guty</i>
7.00	<i>HERMILES DIAZ LINARES</i>	<i>43718911</i>	<i>Hermiles Diaz</i>
8.00			

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

 Marco Antonio Guty de la Cruz
 GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL
 RUC N° 20570531787



Ing. Joel Zamora Ramirez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 120872

HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200


INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO – ENERO 2020

POLIZA DE SEGUROS DE LOS TRABAJADORES

VILLACORTE INGENIEROS S.R.L.

Ing. Cruz

Henry Jhon Poliz Suarez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 199



Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120872

HUGO RICARDO OCANA NAVARRO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

Cajamarca, 14 de enero del 2020

T.P. / T.S:

CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

VIGENCIA: 11/01/2020 AL 11/02/2020

ACTIVIDAD: "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PESQUEROS ARTESANALES EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO – ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR – TUMBES"

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados líneas abajo, conforme al Decreto Supremo 003-98-SA, se encuentran amparados bajo la cobertura de pensión y salud.

SCTR PENSIONES Póliza 5633910

SCTR SALUD Contrato 5607061

PERSONAL ASEGURADO

SEDE: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS

Henry...
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA

Nro	NOMBRES	PATERO	MATERO	TIPODOC	NRODOC
1	WALTER	BALCAZAR	LADINES	DNI	00327187
2	JOSE DAVID	BALCAZAR	PIZARRO	DNI	73433796
3	VICTOR ALEXIS	BALCAZAR	ZAPATA	DNI	73622462
4	HENRY FLAVIO	CELIZ	SUAREZ	DNI	41998543
5	SANTOS PORFIRIO	DESA	MARIN	DNI	80458439
6	FREDDY DANIEL	GUTIERREZ	MARCANO	DNI	31083070
7	MARCO ANTONIO	GUTTY	DE LA CRUZ	DNI	44988244
8	YORMAN JOSUE	MONTILLAS	CAMPOS	DNI	22940342
9	WILLIAN REYNALDO	RAMIREZ	DIOSES	DNI	00247841
10	EDGAR ALEXIS	RONDON	X	DNI	11189454
11	OMANGEL	SANCHEZ	SERRA	DNI	22871074
12	KENNY	VILLALOBOS	VEGA	DNI	04195876
13	JOEL	ZAMORA	RAMIREZ	DNI	16720966
14	JAIME ROLANDO	ZAPATA	BENITES	DNI	03380937
15	GUIDO ALEXANDER	ZAPATA	BENITES	DNI	40895426

Extendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente: VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Francisco Noya Bao

Francisco Noya Bao
Gerente Comercial
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Enrique Gonzáles Martínez
Enrique Gonzáles Martínez
Director Comercial

Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120872

La Positiva EPS S.A.

Nota:

El presente documento está sujeto a la política de suscripción de la Compañía y queda sin efecto en caso que el cliente mantenga obligaciones pendientes a favor de la compañía por este concepto.

Hugo Ricardo Ocaña Navarrete
HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRETE
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

Así mismo, esta constancia carecerá de validez respecto de aquellos asegurados sobre los que, con anterioridad a la fecha de emisión de este documento, se haya producido un siniestro (fallecimiento y/o accidente de trabajo) relacionado al riesgo cubierto por el SCTR. En este supuesto, la Compañía no será responsable de cancelar el beneficio de este seguro, debido a la inexistencia del riesgo.

Tratándose de configuración de invalidez, se aplicará la política de delimitación del riesgo de la Compañía, en caso corresponda. Le recordamos cumplir con las medidas de prevención y salud ocupacional establecidas en Minería, DS 024-2016-EM y normas modificatorias (en caso de actividad minera), o en las normas del sector donde se realice la actividad de riesgo, y, poner a disposición de la Compañía, cuando ésta la requiera, las Evaluaciones Médicas Ocupacionales de los asegurados.

Cláusula Garantía (SCTR Pensión)

La presente póliza cubre actividades y servicios que se prestan dentro de la concesión minera en las sedes administrativas y/o en superficie. No cubre las actividades de exploración, explotación y extracción de mina realizada en SUPERFICIE y/o en SOCAVON o cualquier otra actividad realizada en socavón de una mina. En ese sentido, La Positiva no se hará responsable de atender los siniestros ocasionados de las actividades mencionadas anteriormente.

ELIFERNANDEZ

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Miguel Ángel Villacruz
GERENTE GENERAL

Hugo Ricardo Celis Suarez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 86690

Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 129872

HUGO RICARDO OCANA NAVARRO
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO – ENERO 2020

PANEL FOTOGRAFICO.

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Banco Industrial de la Cruz
GERENTE GENERAL

Henry David Celiz Suarez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 80090

Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120872


Hugo Ricardo Ocaña Navas
HUGO RICARDO OCAÑA NAVAS
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

CHARLA Y ACTIVIDADES DE SEGURIDAD




VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

 Marco Antonio Gentry de la Cruz
 GERENTE GENERAL

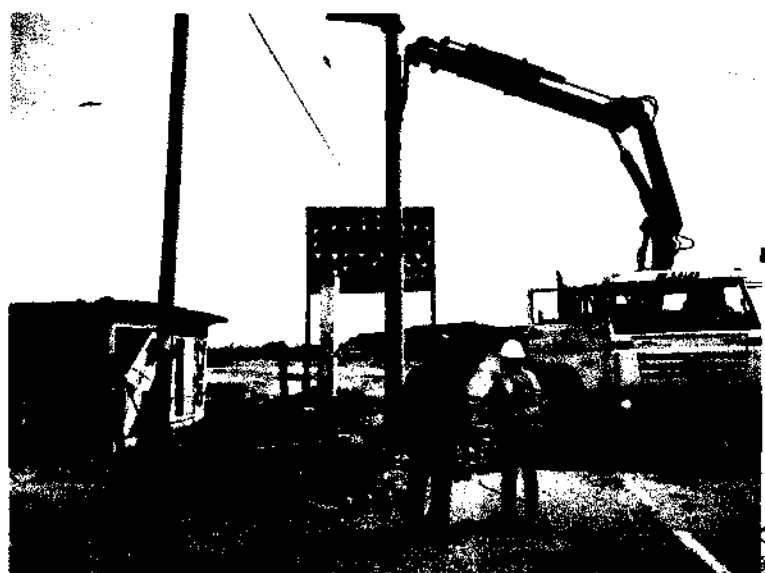

Henry Flayco Coliz Suarez
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 86090

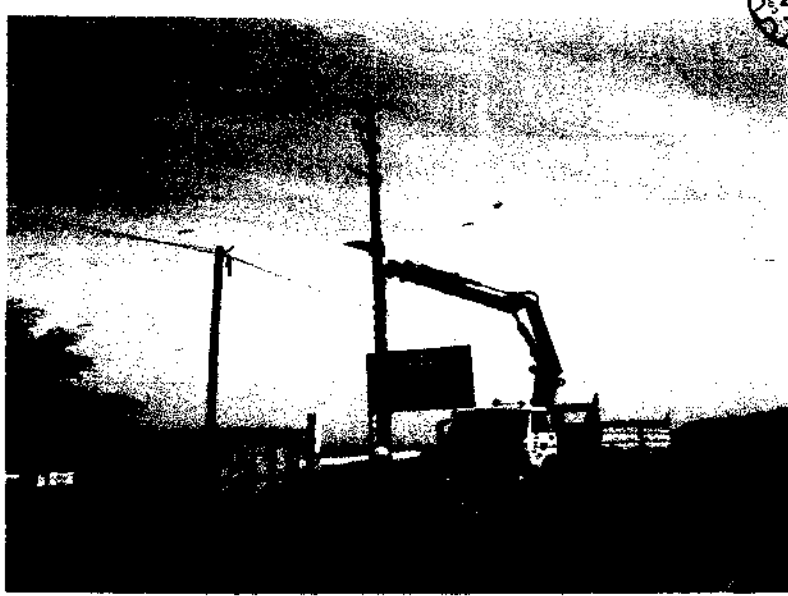

Ing. José María...
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 1200

HUGO RICARDO DCAÑA NAVARRO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

RUC N° 20570531787

OBRA: AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø,
PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PESQUEROS ARTESANALES EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO -
ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES.

FICHA RUC DE VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL
Mareo A. Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia
Contraalmirante - Tumbes

E-mail Empresa: ventas@villacruzcontratistas.com
Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

RUC




FICHA RUC : 20570531787
VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
CIR- COMPROBANTE DE INFORMACIÓN REGISTRADA
Número de Transacción : 45475038

Lote: 43893

Página: 19

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social : VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
 Tipo de Contribuyente : 28 -SOC.COM.RESPONS. LTDA
 Fecha de Inscripción : 09/05/2013
 Fecha de Inicio de Actividades : 09/05/2013
 Estado del Contribuyente : ACTIVO
 Dependencia SUNAT : 0163 - I.R.CAJAMARCA-MEPECO
 Condición del Domicilio Fiscal : HABIDO
 Emisor electrónico desde : 06/03/2019
 Comprobantes electrónicos : FACTURA (desde 06/03/2019)
 Operador Autorizado de Comercio Exterior : -



Datos del Contribuyente

Nombre Comercial : -
 Tipo de Representación : 1 - INDISTINTA
 Actividad Económica Principal : 4321 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS
 Actividad Económica Secundaria 1 : 71118 - ALQUILER EQUIPO TRANSPORTE V. TERRES.
 Actividad Económica Secundaria 2 : 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
 Sistema Emisión Comprobantes de Pago : MANUAL
 Sistema de Contabilidad : COMPUTARIZADO
 Código de Profesión / Oficio : -
 Actividad de Comercio Exterior : SIN ACTIVIDAD
 Número Fax : -
 Teléfono Fijo 1 : -
 Teléfono Fijo 2 : -
 Teléfono Móvil 1 : -
 Teléfono Móvil 2 : -- 976581927
 Correo Electrónico 1 : villacruzcontratistas_srl@hotmail.com
 Correo Electrónico 2 : -

Domicilio Fiscal

Actividad Económica Principal : 4321 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS
 Departamento : CAJAMARCA
 Provincia : CAJAMARCA
 Distrito : LOS BAÑOS DEL INCA
 Tipo y Nombre Zona : -
 Tipo y Nombre Vía : JR. ZEPITA
 Nro : 151
 Km : -
 Mz : -
 Lote : -
 Dpto : -
 Interior : -
 Otras Referencias : -
 Condición del Inmueble declarado como Domicilio Fiscal : PROPIO

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL
 Marco A. Gutty de la Cruz
 GERENTE GENERAL

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP : 25/04/2013
 Número de Partida Registral : 11139233
 Tomo/Ficha : -
 Folio : -
 Asiento : -
 Origen de la Entidad : NACIONAL
 País de Origen : -

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	09/05/2013	-	-	-
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	01/02/2018	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/10/2015	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/01/2015	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	01/01/2015	-	-	-
SNP - LEY 19990	01/08/2015	-	-	-
SENCICO	09/05/2013	-	-	-

Representantes Legales

Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD - 42407436	GUTTY DE LA CRUZ MARIA LUISA	GERENTE ADMINISTRATIVO	19/06/1984	24/09/2019	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
	JR. ZEPITA 151	CAJAMARCA CAJAMARCA LOS BAÑOS DEL INCA	---	-	
Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD - 44988244	GUTTY DE LA CRUZ MARCO ANTONIO	GERENTE GENERAL	13/03/1988	24/09/2019	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
	JR. ZEPITA 151	CAJAMARCA CAJAMARCA LOS BAÑOS DEL INCA	---	-	

Otras Personas Vinculadas

Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -44988244	GUTTY DE LA CRUZ MARCO ANTONIO	SOCIO	13/03/1988	01/09/2015	-	54.91
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -42407436	GUTTY DE LA CRUZ MARIA LUISA	SOCIO	19/06/1984	01/09/2015	-	45.09
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

Marco A. Guty de la Cruz
 GERENTE GENERAL


Importante

Puede obtener mayor información en SUNAT Virtual www.sunat.gob.pe o llamando a nuestra Central de Consultas desde teléfonos fijos al 0-801-12-100 (al costo de llamada local) o desde celulares al (01) 315-0730.

Acceda a SUNAT Operaciones en Línea (SOL) con su código de usuario y clave de acceso para actualizar y/o modificar los datos del RUC así como para realizar sus operaciones. También podrá realizar algunas operaciones a través del canal telefónico.

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA AUTORIZADA
LOS DATOS SON CONSIGNADOS EN CALIDAD DE DECLARACIÓN JURADA Y EXPRESAN LA VERDAD



Apellidos y Nombres	Firma	Huella digital	Sello y Firma del Res

Tipo y Nro. de Documento :

RUC


WILLACRUZ CONTRATISTAS SRL.
 Marco A. Gutty de la Cruz
 GERENTE GENERAL

0204

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

RUC N° 20570531787

OBRA: AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø,
PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PESQUEROS ARTESANALES EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO -
ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES.

NUMERO DE CUENTA DE VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

BANCO DE CREDITO DEL PERU

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL


Marco A. Gully de la Cruz
GERENTE GENERAL

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia
Contraalmirante - Tumbes

E-mail Empresa: info@villacruzcontratistas.com
Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"

Cajamarca, 21 de noviembre del 2019

Carta N° 002-2019-VC/Contratistas S.R.L.-Lec. Acapulco - Distr. Zorritos.

Señores:
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Atención:
Unidad de Logística del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.

Presente

Asunto : Autorización para el Pago con Abonos en Cuenta

Referencia : Buena Pro AS-SM-50-2019-FONDEPES-1.

De nuestra especial consideración:

Sirva la presente para saludarle cordialmente y a la vez comunico a Ud., que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la Empresa que represento es el 00224500253783908294 y el Código de Cuenta: 245-2537839-0-82 a nombre de la Empresa VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco de Crédito del Perú (BCP).

Sin otro particular me despido de Ud., aprovechando la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

C.C
Archivo

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.



Marco A. Gutierrez de la Cruz
GERENTE GENERAL

OPERACIÓN SUJETA AL
SPOT D.L. 940 - CTE. B.N.
DERIVACIÓN N° 00774-00007

OPERACIÓN SUJETA AL
SPOT D.L. 940 CTA. CTE. B.N.
DERIVACIÓN N° 00774-00007

Dirección: Condominio Alcázar N° 310, Edificio 01, Departamento 101-Rímac
Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
E-mail Empresa: villacruzcontratistas.srl@hotmail.com
Teléfono: 076284107 Cel: 976581927 - 945180984

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.


Marco A. Gutierrez de la Cruz
GERENTE GENERAL

05.01

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

RUC N° 20570531787

*OBRA: AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø,
PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PESQUEROS ARTESANALES EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO -
ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES.*

**NUMERO DE CUENTA DE DETRACCIONES DE VILLACRUZ
CONTRATISTAS SRL**

RUC N°20570531787

BANCO DE LA NACION

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL.

Marco A. Guey de la Cruz
GERENTE GENERAL

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia
Contraalmirante - Tumbes

E-mail Empresa: ventas@villacruzcontratistas.com
Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

RUC N° 20570531787

OBRA: AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PESQUEROS ARTESANALES EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES.

Distrito de Zorritos, 13 de febrero del 2020

CARTA N° 006 - 2020 -VC/Contratistas SRL - Acapulco-distrito de Zorritos.

Srs.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

ATENCION:

ING. EDWARD MANRIQUE RIVERA
COORDINADOR DE OBRA - FONDEPES
LIMA

ASUNTO : HACE LLEGAR CUETA DE DETRACCIONES.

OBRA : "AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PESQUEROS ARTESANALES EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES".

Referencia : CONTRATO N° 064-2019-FONDEPES, de fecha 26.11.2019.

Por la presente le saludo cordialmente y al mismo tiempo para hacerle llegar el número de cuenta de **Detracciones N° 00-774-00807**, del Banco de la Nación. Para la ejecución de la Obra: **AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PESQUEROS ARTESANALES EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO - ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES, para su conocimientos y fines.**

Sin otro particular, me despido de Usted, aprovechando la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

CC.
Archivo

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL
[Signature]
Meryo A. Guay de la Cruz
GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL
[Signature]
Meryo A. Guay de la Cruz
GERENTE GENERAL

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia
Contraalmirante - Tumbes

E-mail Empresa: *[illegible]*
Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

RUC N° 20570531787

OBRA: AMPLIACIÓN DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV - 3Ø,
PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PESQUEROS ARTESANALES EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO -
ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES.

PAGO DEL CONAFOVICER

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL

Marco A. Gutierrez de la Cruz
GERENTE GENERAL

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia
Contraalmirante - Tumbes

E-mail Empresa: villacruzcontratistas@gmail.com
Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107



BANCO DE LA NACION

PAGO CONTRIBUCIONES EFECTIVO Y CHEQUE

TRIBUTO : 00035 CONAFVICER
TIPO DOCUM : RUC NRO: 20570531787
VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
PERIODO : 122019

IMPORTE : S/ *****289.00

0115286 03FEB2020 9700 6275 0774 16:40

3CEC74 CLIENTE

627500306

"Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla"



04051754-5-Q, Banco de la Nación Banco de la Nación

VILLACRUZ CONTRATISTAS SRL.

Marco A. Gaitly de la Cruz
GERENTE GENERAL

VILLACRUZ CONTRATISTAS S. R. L.

Dirección: OFICINA PRINCIPAL: Jr. Zepita N° 151 - Baños del Inca - Cajamarca
OFICINA OBRA: Av. Panamericana n°107 - Acapulco - Distrito de Zorritos - Provincia Contraalmirante - Tumbes
E-mail Empresa: villacruzcontratistas_srl@hotmail.com, Teléfonos. 976581927 - 976761313 - 076 284107




Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120872

11.19 Pagos de Impuesto Villacruz Contratistas SRL


HUGO RICARDO DCAÑA NARI
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL


Henry Fabio Celis Suarez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 86090

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario:0621

Número de Orden:930388500

Fecha de presentación: 21/01/2020

Datos de la Declaración:

RUC: 20570531787

Nombre o Razón Social: VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Periodo: 201912

Semana: 0


Tipo de Declaración: Original

Detalle de Tributos:


Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 - IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 16,201	S/. 0
3031 - RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA. PROPIA	S/. 6,469	S/. 0
Total a pagar	S/. 22,670	S/. 0

Sr. Contribuyente por el pago realizado se generaron boletas de pago


Portal SUNAT - Declaración jurada simplificada




Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120872



VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL



HUGO RICARDO OCARÁ NAV.
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200



Henry José Veliz Suarez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 86090

Identificación de la Transacción:


Número de Formularios: 1662
Número de Orden: 930388502

Datos Generales:


RUC: 20570531787
Nombre o Razón Social: VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Período: 12/2019
Tributo: 1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA
Código de Declaración Jurada Asociada: 0621
Número de Orden de la Declaración Jurada Asociada: 930388500
Importe Pagado: S/. 16,201


Detalle de Pago:


Número de Operación SUNAT: 1018165780
Medio de Pago: Cargo en cuenta de detracciones - cuenta convencional
Banco: Banco de la Nación
Número de Operación: 00000000001018165780
Fecha de Pago: 21/01/2020 15:31:41


Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120872

Portal SUNAT - Boleta de pago autogenerada

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.

Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL


HUGO RICARDO OCAÑA NAVAS
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200


Henry Heredia Celis Suarez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 85090

Identificación de la Transacción:


Número de Formularios: 1662
Número de Orden: 930388503

Datos Generales:


RUC: 20570531787
Nombre o Razón Social: VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Período: 12/2019
Tributo: 3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA. PROPIA
Código de Declaración Jurada Asociada: 0621
Número de Orden de la Declaración Jurada Asociada: 930388500
Importe Pagado: S/. 6,469


Detalle de Pago:


Número de Operación SUNAT: 1018165780
Medio de Pago: Cargo en cuenta de detracciones - cuenta convencional
Banco: Banco de la Nación
Número de Operación: 00000000001018165780
Fecha de Pago: 21/01/2020 15:31:41


Ing. Joel Ramirez Ramirez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120872

Portal SUNAT - Boleta de pago autogenerada


VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL


HUGO RICARDO OCAÑA NAV.
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200


Henry Flavio Celiz Suarez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 86090


Identificación de la Transacción:

Número de Formulario: 0601
Número de Orden: 930376519
Fecha de presentación: 21/01/2020

Datos de la Declaración:

RUC: 20570531787
Nombre o Razón Social: VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Periodo: 201912
Semana: 0
Tipo de Declaración: Original

Número de Trabajadores: 22
Número de Pensionistas: 0
Personal Cuarta Categoría: 0
Personal Modalidad Formativa: 0
Terceros: 0
Regímenes Especiales: 0


Ing. Joel Zamora Ramirez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 120872


Detalle de Tributos:


Tributos	Total Deuda	Monto Pago
3052 RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	S/. 0	S/. 0
5210 ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	S/. 1,915	S/. 1,915
5310 SNP - LEY 19990	S/. 251	S/. 251
Total a pagar	S/. 2,166	S/. 2,166

Detalle de Pago:

Número de Operación SUNAT: 1018165927
Medio de Pago: Cargo en cuenta de detracciones - cuenta convencional
Banco: Banco de la Nación
Número de Operación: 00000000001018165927
Fecha de Pago: 21/01/2020 15:31:08

VILLACRUZ CONTRATISTAS S.R.L.
Marco Antonio Gutty de la Cruz
GERENTE GENERAL


HUGO RICARDO OCAÑA NAVARRETE
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 60200


Henry J. Ruiz Celiz Suarez
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 86090
