

CARTA N° 431-2020/GRUPOAYS

Lima, 21 de diciembre del 2020.

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Av. Petit Thoars N°115, Cercado de Lima – Lima – Lima.

Presente.-

ATENCIÓN : Ing. Miguel Ángel Gálvez Caparó
Coordinador de Proyecto – DIGENIPAA.

ASUNTO : INFORME DE APROBACIÓN DE VALORIZACIÓN N° 02 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 (DEL 01/12/2020 AL 19/12/2020).


REFERENCIA : a) CONTRATO N° 090-2019-FONDEPES, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR: "REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOBITOS EN LA LOCALIDAD LOBITOS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA, CÓDIGO ÚNICO N°2359433".

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de saludarle muy cordialmente y en atención a las obligaciones y responsabilidades establecidas en el contrato de la referencia a), mediante la presente remitimos a su representada el INFORME DE APROBACIÓN DE VALORIZACIÓN N° 02 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 (DEL 01/12/2020 AL 19/12/2020).

Sin otro particular me valgo de la oportunidad para renovar a usted los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

GRUPO AYS S.A.C.

CINDIA ELOBELA DOMINGUEZ
ELIAS DE HUERTAS
REPRESENTANTE LEGAL

Adjunto:

INFORME N° 038-2020/LACO/JSO/GRUPOAYS, de la Supervisión.



INFORME N° 038-2020/LACO/JSO/GRUPOAYS

De : Ing. Luis Antonio Calderón Ortiz
JEFE DE SUPERVISIÓN

A : Miguel A. Gálvez Carapó
COORDINADOR DE PROYECTO

Asunto : INFORME DE APROBACIÓN DE VALORIZACIÓN N°02 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 (DEL 01/12/2020 AL 19/12/2020).

Referencia :

- a) "REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOBITOS EN LA LOCALIDAD LOBITOS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA, CÓDIGO ÚNICO N°2359433".
- b) CONTRATO N° 090-2019-FONDEPES, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR: "REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOBITOS EN LA LOCALIDAD LOBITOS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA, CÓDIGO ÚNICO N°2359433".
- c) CARTA N°155-2020-C.LOBITOS

Fecha : 20 de diciembre del 2020

De mi mayor consideración:

Mediante el presente informe hago entrega de la Valorización N°02 de la Prestación Adicional de Obra N.º 01 correspondiente al mes de Diciembre 2020 (Del 01/12/2020 AL 19/12/2020), para que se genere el pago correspondiente; el mismo que fue aprobado mediante RESOLUCION N°128-2020-FONDEPES/DIGENIPAA, para el cuál se informa lo siguiente:


1. FINALIDAD

El presente informe tiene como finalidad presentar a la Entidad, la Valorización N°02 de la Prestación Adicional de Obra N.º 01 correspondiente al mes de Diciembre 2020 (Del 01/12/2020 AL 19/12/2020);

2. DATOS GENERALES DE LA OBRA

2.1. Proyecto :

REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOBITOS EN LA LOCALIDAD DE LOBITOS, DISTRITO DE LOBITOS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA, CODIGO UNICO N°2359433

GRUPO AYS S.A.C.

 LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 Reg. CIP N° 128113



2.2. Sub proyecto	: PRESTACION ADICIONAL N°01
2.3. Modalidad De Ejecución	: Por Contrata
2.4. Contrato de Obra	: CONTRATO N°003-2020-FONDEPES
2.5. Fecha de Suscripción	: 08 de Enero del 2020
2.6. Contratista	: "CONSORCIO LOBITOS": Conformado por la empresa PROYECTOS INDUSTRIALES JR S.A.C. y la empresa ALTAVISTA INVE1RSIONES GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AIG S.A.C.
2.7. Monto del Contrato (Inc. IGV)	: S/. 5,043,496.30 Soles Incluido IGV.
2.8. Prestación Adicional N°01 FONDEPES/DIGENIPAA	: Aprobado mediante RESOLUCION N°128-2020-
2.9. Monto Prestación Adicional N°01	: S/. 739,266.72 Soles Incluido IGV.
2.10. % Incidencia	: 14.66% Monto Contractual
2.11. Fecha de Inicio plazo Adicional	: 13 noviembre del 2020
2.12. Plazo de Ejecución Adicional	: 37 días Calendario
2.13. Ampliación de plazo por adicional	: 9 días calendario
2.14. Fecha de Fin plazo Adicional	: 19 diciembre del 2020
2.15. Numero de Valorización	: 02
2.16. Periodo de Valorización	: N 02 - DICIEMBRE
2.17. Monto de Valorización a Pagar	: S/ 69,859.35 Soles
2.18. Monto de Valorización. Tec. Actual	: S/ 69,859.35 Soles
2.19. % de Avance Físico del Periodo Actual	: 9.45%
2.20. Monto de Valorización Acumulada	: S/ 739,266.72 Soles
2.21. % de Avance Físico Acumulado	: 100.00%
2.22. Estado de la Obra	: TERMINADA
2.23. Sistema De Contratación	: Suma Alzada
2.24. Representante Legal	: Jony Jesús Rosales Perez
2.25. Residente De Obra	: Ing. Rony Ángel Mariños Mejía
2.26. Supervisor de Obra	: Ing. Luis Antonio Calderón Ortiz
2.27. Contrato de Supervisión	: CONTRATO N°090-2019-FONDEPES
2.28. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento:	

Numero: N° 0011-0307-9800099923-69

Monto: S/. 252,174.82

Entidad Financiera: BBVA Continental

Vigencia: 21 de Enero del 2021

GRUPO AYS S.A.C.

 LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 Reg. CIP N° 128113



Numero: N° 0011-0155-9800022682-93

Monto: S/. 326,101.48

Entidad Financiera: BBVA Continental

Vigencia: 28 de Febrero del 2021

2.29. Monto de Adelanto por Mat Adic. : No corresponde



GRUPO AYS S.A.C.
LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113



3. ANÁLISIS

La prestación adicional de obra N.º 01 tiene un avance físico acumulado al mes de DICIEMBRE correspondiente a la Valorización N.º 02 igual a 100.00%, versus un avance programado acumulado de 100.00 %, apreciándose que la obra se encuentra TERMINADA, resultando favorable al objetivo establecido. **El monto valorizado en el presente mes asciende a S/ 69,859.35 Soles incluido IGV.**

4. METRADOS EJECUTADOS

A continuación, se describe las partidas con sus correspondientes metrados en las cuales se han ejecutado los trabajos de la prestación adicional de obra N.º 01 correspondiente al mes de Diciembre:

ITEM	DESCRIPCION	UND.	TOTAL
01	SEGURIDAD Y SALUD		
01.01	Equipo de protección individual	glb	0.51
01.02	Equipo de protección colectiva	glb	0.51
01.03	Recursos para respuesta ante emergencia en seguridad y salud en el trabajo - COVID	glb	0.51
02	DADOS DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE CERCO PERIMETRICO		
02.03	CONCRETO SIMPLE		
02.03.01	Concreto $f_c=210$ kg/cm ²	m ³	0.78
08	REHABILITACION SISTEMA PUENTE-CABEZO-PLATAFORMA BAJA N.º 02		
08.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
08.01.06	Limpieza de superficie de fondo de losa de concreto en el puente N.º02 y Cabeza N.º02	m ²	203.65
08.02	OBRAS DE CONCRETO		
08.02.01	FONDO DE CABEZO Y PUENTE		
08.02.01.01	Colocacion de aditivo transformador de oxido losa de fondo	m ²	203.65
08.02.01.02	COLOCACION DE ADITIVO PARA CONCRETO VIEJO-NUEVO	m ²	203.65
08.02.01.03	Tarrajeo con impermeabilizante fondo de cabezo N.º02 y puente N.º02 E=0.05M	m ²	203.65
08.02.01.04	Colocacion de masilla epoxica submarina en Cabezo N.º02	m ²	106.70
08.02.02	LOSA DE CABEZO Y PUENTE		
08.02.03	ESCALERA DE 2DO CABEZO		
08.02.03.04	Suministro e Instalación Escalera de jaula de gato para Muelle Marino	glb	0.50


GRUPO AYS S.A.C.
 LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 Reg. CIP N.º 128113



Con los metrados ejecutados en el periodo del mes de DICIEMBRE 2020, indicados en los cuadros anteriores, se ha procedido a elaborar la valorización respectiva, cuyo resumen se presenta en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (Sin IGV) S/.	VALORIZACION			%	SALDO POR
		ANTERIOR S/.	ACTUAL S/.	ACUMULADO S/.	AVANCE	VALORIZAR
					ACUMULADO	S/.
1. VALORIZACION -						
PRESTACION ADICIONAL N°01 - REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOBITOS EN LA LOCALIDAD DE LOBITOS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA	626,497.22	567,294.38	59,202.84	626,497.22	100.00%	0.00
TOTAL CONTRACTUAL (V)	626,497.22	567,294.38	59,202.84	626,497.22		0.00
TOTAL CONTRACTUAL (C/IGV)	739,266.72	669,407.37	69,859.35	739,266.72		0.00
AVANCE EJECUTADO DE OBRA		90.55%	9.45%	100.00%	100.00%	0.00%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		35.17%	64.83%	100.00%	100.00%	0.00%
ESTADO DE LA OBRA				TERMINADA	0.00%	
COSTO DIRECTO	547,015.94		51,692.00			
GASTOS GENERALES 4.5299750%	24,779.69		2,341.64			
UTILIDADES 10.00%	54,701.59		5,169.20			
SUB TOTAL	626,497.22	Val. Bruta	59,202.84			

RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA -PRESTACION ADICIONAL N°01					
A. MONTO VALORIZADO EN EL PRESENTE MES					59,202.84
VALORIZACION N°02 - PRESTACION ADICIONAL N°01	Diciembre		59,202.84		
B. AMORTIZACION DEL ADELANTO EN EFECTIVO	Diciembre			0.00	No Corresponde
C. AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES EN EL PRESENTE MES	Diciembre			0.00	No Corresponde
I. MONTO NETO DE VALORIZACION (Sin I.G.V) = A+B+C=					59,202.84
II. IGV 18%					10,656.51
II. TOTAL A FACTURAR		S/.	S/.		69,859.35
RETENCION POR FONDO DE GARANTIA 0%					0.00
TOTAL A CANCELAR A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/.	S/.		69,859.35

GRUPO AYS S.A.C.
 LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 Dpto. CIP N° 128113



5. REAJUSTES

Como efecto de la valorización de los precios de los elementos que intervienen en la obra, y están constituidos en la fórmula polinómica, nos permiten realizar en forma automática los reajustes de la valorización de cada especialidad. En esta obra por acuerdo de las partes se ha decidido efectuar el reajuste en la liquidación final.

6. DEDUCCIONES Y AMORTIZACIONES

No corresponde.

GRUPO AYS S.A.C.
.....
LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113



7. TOTAL, VALORIZADO

El monto valorizado a favor del contratista es **S/ 59,202.84** (Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Dos con 84/100 soles).
Sin inc. IGV.

El Impuesto general a la venta (I.G.V) es **S/. 10,656.51** (Diez Mil Seiscientos Cincuenta y Seis con 51/100 soles).

EL MONTO TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA es **S/ 69,859.35** (Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve con 35/100 soles).

8. ESTADO FINANCIERO

VALORIZACIÓN BRUTA ACTUAL SIN INC. IGV	S/ 59,202.84
PORCENTAJE DE LA VALORIZACIÓN ACTUAL	9.45 %
VALORIZACIÓN ACUMULADA SIN INC. IGV	S/ 626,497.22
PORCENTAJE DE VALORIZACIÓN ACUMULADA	100.00%
SALDO POR VALORIZAR SIN INC. IGV	S/. 0.00
PORCENTAJE DE SALDO POR VALORIZAR	0.00%

GRUPO AYS S.A.C.

 LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 Reg. CIP N° 128113



9. RESUMEN DE VALORIZACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2020

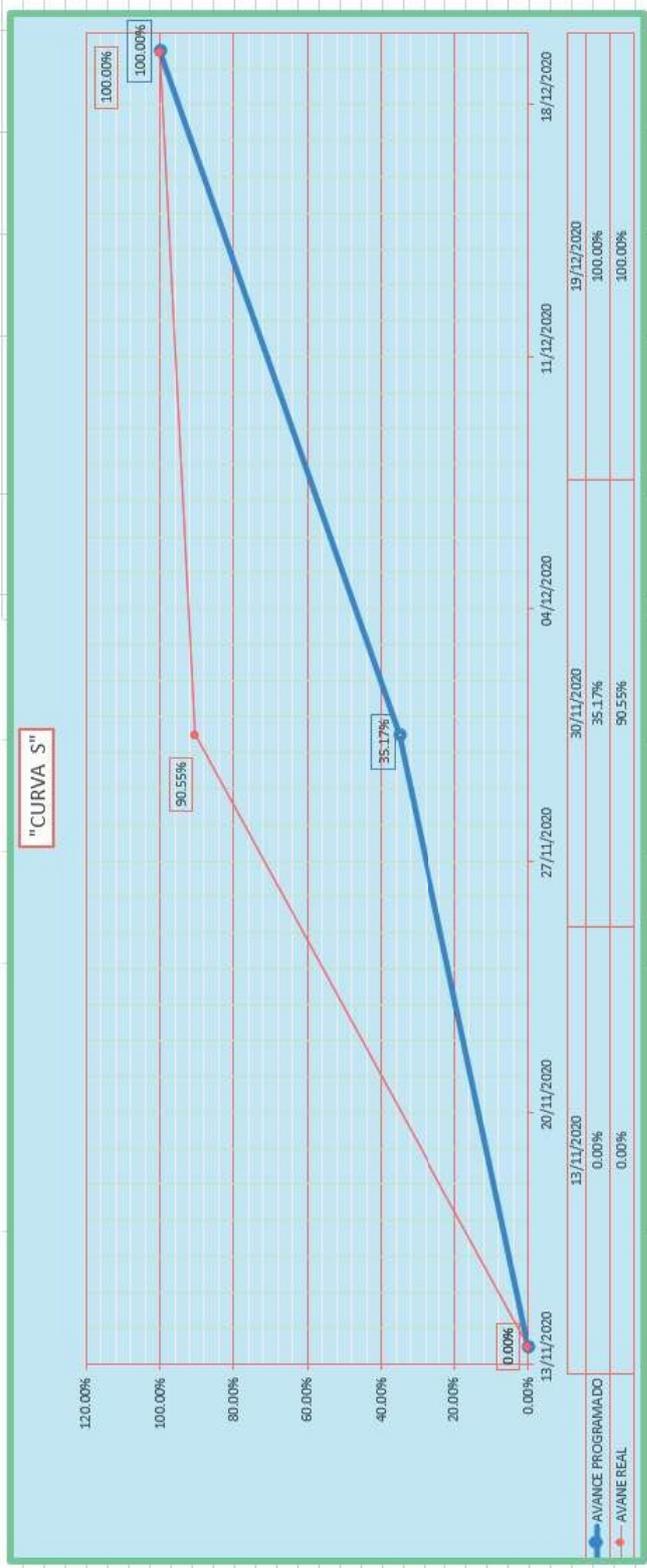
SUB PAQUETE	DESCRIPCIÓN	TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
			%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%
1.00	PRESTACION ADICIONAL N°01.- REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BARRIO SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUEBLE; EN EL DISEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOBITOS EN LA LOCALIDAD DE LOBITOS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA TALARÁ, DEPARTAMENTO DE PIURA	547,015.94	90.55%	495,323.94	90.55%	51,692.00	9.45%	547,015.94	100.00%	-	0.00%
	COSTO DIRECTO	S/ 547,015.94	90.55%	495,323.94	90.55%	51,692.00	9.45%	547,015.94	100.00%	S/ -	0.00%
	GASTOS GENERALES	24,779.69		22,438.05		2,341.64		24,779.69		-	
	UTILIDADES	54,701.59	10.00%	48,532.39		5,169.20		54,701.59		-	
	VALORIZACION BRUTA (VB)	S/ 626,407.22	90.55%	567,294.38	90.55%	50,202.84	9.45%	626,407.22	100.00%	S/ -	0.00%
	IGV	112,769.50	18.00%	102,112.89		10,656.61		112,769.50		-	
	TOTAL GENERAL (TG) - VDTIGV	S/ 739,200.72	90.55%	669,407.37	90.55%	69,059.35	9.45%	739,200.72	100.00%	S/ -	0.00%
	AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO (AE)	NO CORRESPONDE				-					
	AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES	NO CORRESPONDE				-					
	TOTAL A FACTURAR POR EL CONTRATISTA:					S/ 69,859.35					
	RETENCION FONDO DE GARANTIA		0.00%			-					
	MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA					S/ 69,859.35					

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA REAL ACUMULADO	100.00%
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA ACUMULADO PROGRAMADO	100.00%
PORCENTAJE DE OBRA	0.00%


GRUPO AYS S.A.C.
 LUIS ALFONSO CALDERON ORTIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 Reg. C.I.P. N° 128113



10. CURVA S DE AVANCE DE OBRA AL 19 DE DICIEMBRE 2020



DESCRIPCION	13/11/2020	30/11/2020	19/12/2020
%AVANCE PROGRAMADO	0.00%	35.17%	100.00%
%AVANCE REAL	0.00%	90.55%	100.00%

GRUPO AYS S.A.C.
 LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 Reg. CIP N° 128115



GRUPO AYS S.A.C.

LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL MONTO TOTAL VALORIZADO POR EL CONTRATISTA ES S/ 69,859.35 (Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve con 35/100 soles). Esta supervisión concluye que los metrados de la Valorización N.º 02 de la Prestación Adicional de Obra N.º 01 correspondientes al mes de DICIEMBRE 2020 están sustentados debidamente; Habiéndose verificado en campo, motivo por el cual otorga la conformidad y se emite el pronunciamiento de aprobación ante la entidad.

12. PANEL FOTOGRÁFICO



CHARLA DE SEGURIDAD



DADOS DE CONCRETO SIMPLE PARA PATA DE GALLO DE CERCO PERIMÉTRICO EN TIERRA

GRUPO AYS S.A.C.
LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113



COLOCACION DE ESCALERA METALICA

GRUPO AYS S.A.C.
LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113



TARRAJEO EN LOSA DE FONDO



GRUPO AYS S.A.C.
LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113



COLOCACIÓN DE MASILLA SUBMARINA

GRUPO AYS S.A.C.
 LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 Reg. CIP N° 126113

Dirección: Cooperativa Residencial la Ensenada Mz. R1 Lt. 7 Dpto 202, Distrito de Puente Piedra, Provincia y Departamento de Lima – Perú
 Telf.: (01) 279 7217

Email: supervisiongrupoays@gmail.com

RUC: 20600020430
