

CARTA N° 427-2020/GRUPOAYS

Lima, 21 de diciembre del 2020.

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Av. Petit Thoars N°115, Cercado de Lima – Lima – Lima.

Presente.-

ATENCIÓN : Ing. Miguel Ángel Gálvez Caparó
Coordinador de Proyecto - DIGENIPAA

ASUNTO : REMITO VALORIZACIÓN DE OBRA N°09 – DICIEMBRE 2020.

REFERENCIA. : a) Contrato N°090-2019-FONDEPES SUPERVISIÓN DE OBRA
b) Contrato N° 003-2020 – FONDEPES EJECUCION DE OBRA IOARR: "REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOBITOS EN LA LOCALIDAD LOBITOS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA, CÓDIGO ÚNICO N°2359433".

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarle muy cordialmente y con el fin de cumplir nuestras responsabilidades contractuales, establecidas contrato de la referencia b) mediante la presente remitimos a su representada la **VALORIZACIÓN DE OBRA N°09**, correspondiente al mes de diciembre del 2020.

Sin otro particular me valgo de la oportunidad para renovar a usted los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

GRUPO AYS S.A.C.

CINDIA ELOBELA DOMÍNGUEZ
ELIAS DE HUERTAS
REPRESENTANTE LEGAL

Se adjunta:

- Informe N°037-2020/LACO/JSO/GRUPO AYS.
- Valorización de Obra N°09. diciembre 2020



INFORME N° 037-2020/LACO/JSO/GRUPOAYS

De : Ing. Luis Antonio Calderón Ortiz
JEFE DE SUPERVISIÓN

A : Miguel A. Gálvez Carapó
COORDINADOR DE PROYECTO

Asunto : INFORME DE APROBACIÓN DE VALORIZACIÓN DE OBRA N°09 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.

Referencia :

a) "REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOBITOS EN LA LOCALIDAD LOBITOS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA, CÓDIGO ÚNICO N°2359433".

b) CONTRATO N° 090-2019-FONDEPES, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR: "REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOBITOS EN LA LOCALIDAD LOBITOS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA, CÓDIGO ÚNICO N°2359433".

Fecha : 20 de diciembre del 2020

De mi mayor consideración:

Mediante el presente informe hago entrega de la Valorización N°09 correspondiente al mes de Diciembre 2020, para que se genere el pago correspondiente según Contrato de Obra N°003-2020-FONDEPES del proyecto en referencia (a), la misma que se ejecuta bajo el Sistema de Obra por Contrata - Suma Alzada, para el cuál se informa lo siguiente:

1. FINALIDAD

El presente informe tiene como finalidad presentar a la Entidad, la Valorización N°09 correspondiente al mes de Diciembre 2020:

2. DATOS GENERALES DE LA OBRA

- 2.1. Proyecto :
REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOBITOS EN LA LOCALIDAD DE LOBITOS, DISTRITO DE LOBITOS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA, CODIGO UNICO N°2359433
- 2.2. Ubicación : Departamento de Piura – Provincia de Talara – Distrito de Lobitos
- 2.3. Modalidad De Ejecución : Suma Alzada
- 2.4. Contrato de Obra : CONTRATO N°003-2020-FONDEPES
- 2.5. Fecha de Suscripción : 08 de enero del 2020

GRUPO AYS S.A.C.
LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113



2.6. Contratista	: "CONSORCIO LOBITOS": Conformado por la empresa PROYECTOS INDUSTRIALES JR S.A.C. y la empresa ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AIG S.A.C.
2.7. Monto del Contrato (Inc. IGV)	: S/. 5,043,496.30 Soles Incluido IGV.
2.8. Numero de Valorización	: 09
2.9. Periodo de Valorización	: N 09 - DICIEMBRE
2.10. Monto de Valorización a Pagar	: S/ 106,120.13 Soles
2.11. Monto de Valorización. Tec. Actual inc. IGV	: S/ 106,120.13 Soles
2.12. % de Avance Físico del Periodo Actual	: 2.10 %
2.13. Monto de Valorización Acumulada	: S/ 5'043,496.30 Soles
2.14. % de Avance Físico Acumulado	: 100.00%
2.15. Sistema De Contratación	: Suma Alzada
2.16. Plazo de Ejecución Contractual	: 150 días Calendario
2.17. Ampliación excepcional de plazo	: 172 días Calendario
2.18. Fecha de Entrega de Terreno	: 23/01/2020
2.19. Fecha de Inicio Contractual	: 24/01/2020
2.20. Nueva Fecha de término de obra	: 10/12/2020 (Con la ampliación excepcional de plazo).
2.21. Representante Legal	: Jony Jesús Rosales Pérez
2.22. Residente De Obra	: Ing. Rony Ángel Mariños Mejía
2.23. Supervisor de Obra	: Ing. Luis Antonio Calderón Ortiz
2.24. Contrato de Supervisión	: CONTRATO N°090-2019-FONDEPES
2.25. Plazo de la Supervisión	: 180 días Calendario (Contractual).
2.26. Monto de la Supervisión (Inc. IGV)	: S./232,818.84 Soles.
2.27. Fecha de Inicio del Servicio	: 24/01/2020
2.28. Fecha de Término del Servicio	: 10/12/2020(Con la ampliación excepcional de plazo).
2.29. Ampliación excepcional de plazo del Servicio	: 172 días Calendario
2.30. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento:	

Numero: N.º 0011-0307-9800099923-69

Monto: S/. 252,174.82

Entidad Financiera: BBVA Continental

Vigencia: 21 de Enero del 2021

Numero: N.º 0011-0155-9800022682-93

Monto: S/. 326,101.48

Entidad Financiera: BBVA Continental

Vigencia: 28 de Febrero del 2021

GRUPO AYS S.A.C.
 LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 Reg. CIP N° 128113



2.31. Carta Fianza por Adelanto Directo:

Numero: N.º 0011-0307-9800100581-62

Monto: S/. 55,092.86

Entidad Financiera: BBVA Continental

Vigencia: 23 de Enero del 2021

Numero: N.º 0011-0155-9800022712-98

Monto: S/. 55,092.86

Entidad Financiera: BBVA Continental

Vigencia: 26 de Enero del 2021

2.32. Monto de Adelanto por Mat N°01 : S./ 691,369.04 Soles Incl. IG.V. (13.71%)

2.33. Fecha de Pago Adelanto Mat N°01 : 27/02/2020

2.34. Monto de Adelanto por Mat N.º 02 : S./ 317,330.22 Soles Incl. IG.V. (6.29%)

2.35. Fecha de Pago Adelanto Mat N.º 02 : 18/08/2020

2.36. Carta fianza por Adelanto Por Mat. :

Numero: N° 0011-0155-980022771-94

Monto: S/. 107,495.01

Entidad Financiera: BBVA Continental

Vigencia: 06.02.2021

Numero: N°001219269700

Monto: S/. 107,495.01

Entidad Financiera: BANCO PICHINCHA

Vigencia: 01.02.2021

2.37. Ampliación de plazo N 01 : 9 días calendario

2.38. Nueva Fecha Fin de Plazo de Ejec. de Obra : 19 de diciembre del 2020

2.39. Adicional de Obra N 01 : APROBADO (S/. 739,266.72 Soles, Aprobado Mediante Resolución de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola N°128-2020-FONDEPES/DIGENIPAA).

2.40. Fecha de inicio del Plazo Adicional : 13 de noviembre del 2020

2.41. Plazo de Ejecución Adicional : 37 días calendario

GRUPO AYS S.A.C.
 LUIS ANTONIO CALDERÓN ORTIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 Reg. CIP N° 128113



3. ANÁLISIS

La obra tiene un avance físico acumulado al mes de DICIEMBRE correspondiente a la Valorización N° 09 igual a 100.00 %, versus un avance programado acumulado de 100.00 %, apreciándose que la Obra se encuentra TERMINADA, resultando favorable al objetivo establecido. **El monto valorizado en el presente mes asciende a S/ 106,120.13 Soles incluido IGV.**

El contratista sumió con responsabilidad las omisiones al proyecto, ejecutando diversas partidas necesarias de acuerdo a lo indicado en los planos según a lo estipulado contractualmente, y cumpliendo estrictamente con las disposiciones del Gobierno en cuanto al contexto de emergencia sanitaria a nivel nacional e internacional por el brote del COVID-19.

4. METRADOS EJECUTADOS

A continuación, se describe las partidas con sus correspondientes metrados en las cuales se han ejecutado los trabajos del periodo del mes de Diciembre:


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO ACTUAL
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.05	MOVILIZACION DE ESTRUCTURAS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS		
01.01.05.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GLB	0.10
02	ESTRUCTURAS		
02.01	OBRAS EN TIERRA		
02.01.03.08	PISO DE CONCRETO ARMADO		
02.01.03.08.01	CONCRETO F'C=280 KG/CM2, PISO DE CONCRETO ARMADO	M3	13.72
02.01.03.08.02	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO NORMAL EN PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	17.78
02.01.05	VARIOS		
02.01.05.01	JUNTA DE DILATAACION DE 1/2" CON SELLO ELASTOMERICO	M	96.62
02.01.05.02	REACOMODO DE ENROCADO	M3	81.20
02.02	OBRAS EN MAR		
02.02.03	DEFENSAS DE ATRAQUE		
02.02.03.03	SUMINISTRO, HABILITACION Y MONTAJE DE LARGUEROS METALICOS C/PERFIL TIPO RIEL 60 LB/YD	M	21.93
02.02.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO C/NEOPRENE 12"X6"X2" (EMBUTIDA)	U	4.00
03	ARQUITECTURA		
03.08	CARPINTERIA METALICA		



03.08.02	CERCO METALICO DE MALLA ELECTROSOLDADA 2"X2" N°10 SEGUN DISEÑO	M	5.15
03.08.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS METÁLICAS CON MALLA GALVANIZADA PLASTIFICADA N°10, 2"X2"	M2	0.76
03.08.13	ARENADO Y MANTENIMIENTO DE REJILLAS METÁLICAS EXISTENTES	M	6.49
03.11	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES		
03.11.02	ESPEJO BISELADO DE 6MM. INCL/ LAMINA DE SEGURIDAD	M2	6.58
03.12	PINTURA		
03.12.01	PINTURA EPOXICA 2 MANOS EN CIELO RASOS	M2	73.62
03.12.02	PINTURA EPOXICA 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES	M2	230.81
03.12.03	PINTURA EPOXICA 2 MANOS EN MUROS INTERIORES	M2	150.84
03.13	VARIOS Y LIMPIEZA		
03.13.01	BARANDA DE FIBRA DE VIDRIO H=0.90 M	M	80.78
03.13.02	LIMPIEZA DE PISOS, CONTRAZOCALOS, ZOCALOS	M2	104.13
03.13.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GLB	1.00
04	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.01	SISTEMA DE AGUA POTABLE		
04.01.01.04.01	PRUEBA HIDRAULICA /INC. DESINFECCIÓN PARA TUBERIA	M	41.60
04.01.02	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE		
04.01.02.01	SALIDA DE AGUA		
04.01.02.06.03	CAJA PARA VALVULAS CON MARCO Y TAPA FIBRA DE VIDRIO INC. TIRADOR DE BRONCE	U	2.00
04.02	SISTEMA DE AGUA SALADA EN MUELLE		
04.02.02.01.01	SUM./INST./ELECTROBOMBA CENTRIFUGA Q= 1.94 L/S, ADT= 15.00M P/A.S	U	0.70
04.02.02.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA ELECTROBOMBAS CENTRIFUGA (AGUA SALADA)	GLB	0.80
04.02.03.01.01	SUM./INST./ELECTROBOMBA CENTRIFUGA Q= 1.94 L/S, ADT= 15.00M P/A.S	U	0.30
04.02.03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA ELECTROBOMBAS CENTRIFUGA	GLB	0.80
04.03	SISTEMA DE DESAGUE		
04.03.02.07.01	SOMBRERO DE VENTILACIÓN 2"	U	11.00
04.03.02.08	PRUEBA HIDRAULICA		
04.03.02.08.01	PRUEBA HIDRAULICA P/DESAGUE	M	114.90
04.07	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
04.07.01.05	DUCHA TIPO TELEFONO	U	2.00
04.07.01.06	SISTEMA DE GRIFERIA GALVANIZADA CON ACCIONAMIENTO A PEDAL (INC. ACCESORIOS Y GRIFERIA TIPO CUELLO DE GANZO DE ACERO INOX.)	U	2.00
04.07.02.06	PAPELERA DE PISO	U	8.00



05	INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION		
05.04	CABLES ELECTRICOS		
05.04.07	1X50MM2, LSOH-80 (TIERRA)	M	201.90
05.07	SALIDAS ELECTRICAS		
05.07.08	SIRENA AUDITIBLE	U	2.00
05.13	PRUEBAS		
05.13.01	PRUEBA DE AISLAMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA	GLB	1.00
05.13.02	PUESTA EN SERVICIO	GLB	1.00


GRUPO AYS S.A.C.


 LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 Reg. CIP N° 126113



Con los metrados ejecutados en el periodo del mes de DICIEMBRE 2020, indicados en los cuadros anteriores, se ha procedido a elaborar la valorización respectiva, cuyo resumen se presenta en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (Sin IGV) S/.	VALORIZACION			%	SALDO POR
		ANTERIOR S/.	ACTUAL S/.	ACUMULADO S/.	AVANCE	VALORIZAR
					ACUMULADO	S/.
1. VALORIZACION CONTRACTUAL :						
REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOBITOS EN LA LOCALIDAD DE LOBITOS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA	4,274,149.41	4,184,217.10	89,932.31	4,274,149.41	100.00%	0.00
TOTAL CONTRACTUAL (V)	4,274,149.41	4,184,217.10	89,932.31	4,274,149.41		0.00
TOTAL CONTRACTUAL (C/IGV)	5,043,496.30	4,937,376.18	106,120.13	5,043,496.30		-0.01
AVANCE EJECUTADO DE OBRA		97.90%	2.10%	100.00%	100.00%	0.00%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		97.52%	2.48%	100.00%	100.00%	0.00%
ESTADO DE LA OBRA					0.00%	
COSTO DIRECTO	3,493,711.78		73,511.14			
GASTOS GENERALES 12.3383520%	431,066.45		9,070.06			
UTILIDADES 10.00%	349,371.18		7,351.11			
SUB TOTAL	4,274,149.41	Val. Bruta	89,932.31			

RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA				
A. MONTO VALORIZADO EN EL PRESENTE MES				89,932.31
VALORIZACION N°09		Diciembre	89,932.31	
B. AMORTIZACION DEL ADELANTO EN EFECTIVO				0.00
Del Adelanto Directo - Val N°09		Diciembre	-	
Deducción del Adelanto Directo - Val N°09			-	
C. AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES N°01 EN EL PRESENTE MES				0.00
Por Adelanto de Materiales N°1		Diciembre	-	
Deducción que no corresponden - Adelanto de materiales N°1			-	
D. AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES N°02 EN EL PRESENTE MES				0.00
Por Adelanto de Materiales N°2		Diciembre	-	
Deducción que no corresponden - Adelanto de materiales N°2			-	
I. MONTO NETO DE VALORIZACION (Sin I.G.V) - A+B+C+D -				89,932.31
II. IGV 18%				16,187.82
II. TOTAL A FACTURAR		S/.	S/.	106,120.13
RETENCION POR FONDO DE GARANTIA 0%				0.00
TOTAL A CANCELAR A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/.	S/.	106,120.13

GRUPO AYS S.A.C.

 LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 Reg. CIP N° 128113



5. REAJUSTES

Como efecto de la valorización de los precios de los elementos que intervienen en la obra, y están constituidos en la fórmula polinómica, nos permiten realizar en forma automática los reajustes de la valorización de cada especialidad. En esta obra por acuerdo de las partes se ha decidido efectuar el reajuste en la liquidación final.

6. DEDUCCIONES Y AMORTIZACIONES

AMORTIZACIÓN POR ADELANTO DIRECTO:

Para la presente Valorización no hubo cálculo de Amortización ya que el ADELANTO DIRECTO fue amortizado al 100% en la valorización N°08, como se muestra en el siguiente cuadro de resumen:

INICIO CONTRAC. 24/01/2020

A.- ADELANTO DIRECTO

Monto (S/.) : **5,043,496.30 (Con IGV)**
Monto AD (S/.) : **504,349.64 (Con IGV)**

Monto (S/.) : **4,274,149.41 (Sin IGV)**
Monto AD (S/.) : **427,414.95 (Sin IGV)**

10.00%

N°	Valorización			Amortización de Adelanto Directo		
	Mes	Monto	Saldo Valoriz.	Monto Adelanto	Amortización	Saldo por A.
1.00	31/01/2020	24,652.90	5,018,843.40	S/ 504,349.64	2,465.30	501,884.34
2.00	29/02/2020	564,519.43	4,454,323.97		56,451.94	445,432.40
3.00	15/03/2020	1,107,396.22	3,346,927.75		110,739.62	334,692.78
4.00	31/07/2020	276,184.93	3,070,742.82		27,618.49	307,074.29
5.00	31/08/2020	724,052.43	2,346,690.39		72,405.24	234,669.05
6.00	30/09/2020	1,244,833.35	1,101,857.04		124,483.34	110,185.71
7.00	31/10/2020	433,510.23	668,346.81		43,351.03	66,834.68
8.00	30/11/2020	562,226.68	106,120.13		66,834.70	0.02
9.00	19/12/2020	106,120.13	-			
Monto		5,043,496.30		Monto	504,349.66	

GRUPO AYS S.A.C.

LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113



AMORTIZACIÓN POR ADELANTO DE MATERIALES:

Para la presente Valorización no hubo cálculo de Amortización ya que los ADELANTOS POR MATERIALES fueron amortizados al 100% en la valorización N°08, como se muestra en el siguiente cuadro de resumen:

A.- ADELANTO MATERIALES

Monto (S./) : **5,043,496.30 (Con IGV)** **4,274,149.41 (Sin IGV)**

ADELANTO DE MATERIALES N°01

Monto A.M. (S./) : **691,369.04 (Con IGV)** **585,905.97 (Sin IGV)** **13.71%**

ADELANTO DE MATERIALES N°02

Monto A.M. (S./) : **317,330.22 (Con IGV)** **268,923.92 (Sin IGV)** **6.29%**

Valorización			Amortización de Adelanto Materiales N°01			Amortización de Adelanto Materiales N°02		
N°	Mes	Monto	Monto Adelanto	Amortización	Saldo por A.	Monto Adelanto	Amortización	Saldo por A.
1.00	31/01/2020	24,652.90		-	-			-
2.00	29/02/2020	564,519.43		-	-			-
3.00	15/03/2020	1,107,396.22	691,369.04	249,995.76	441,373.28			-
4.00	31/07/2020	276,184.93		56,092.20	385,281.08	317,330.22		317,330.22
5.00	31/08/2020	724,052.43		101,816.36	283,464.72		126,985.36	190,344.86
6.00	30/09/2020	1,244,833.35		154,402.81	129,061.91		104,416.76	85,928.10
7.00	31/10/2020	433,510.23		49,361.43	79,700.48		34,274.50	51,653.60
8.00	30/11/2020	562,226.68		79,700.48	0.00		51,653.60	0.00
9.00	19/12/2020	106,120.13						
Monto con IGV			50,434,936.30	Monto con IGV	691,369.04	Monto con IGV	317,330.22	

GRUPO AYS S.A.C.
 LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 Reg. C.I.P. N° 128113



7. TOTAL, VALORIZADO

El monto valorizado a favor del contratista es **S/ 89,932.31** (Ochenta y Nueve Mil Novecientos Treinta y Dos con 31/100 soles). Sin inc. IGV.

El Impuesto general a la venta (I.G.V) es **S/. 16,187.82** (Dieciséis Mil Ciento Ochenta y Siete con 82/100 soles).

EL MONTO TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA es **S/ 106,120.13** (Ciento Seis Mil Ciento Veinte con 13/100 soles).

8. ESTADO FINANCIERO

VALORIZACIÓN BRUTA ACTUAL SIN INC. IGV	S/. 89,932.31
PORCENTAJE DE LA VALORIZACIÓN ACTUAL	2.10%
VALORIZACIÓN ACUMULADA SIN INC. IGV	S/. 4'274,149.41
PORCENTAJE DE VALORIZACIÓN ACUMULADA	100.00%
AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO SIN INC.IGV	S/. 0.00
AMORTIZACIÓN DE ADELANTO POR MATERIALES N.º 01 SIN INC. IGV	S/. 0.00
AMORTIZACIÓN DE ADELANTO POR MATERIALES N.º 02 SIN INC. IGV	S/. 0.00
DEDUCCIÓN QUE NO CORRESPONDE X AD. DIRECTO SIN INC. IGV	S/. 0.00
DEDUCCIÓN QUE NO CORRESP. X AD. DE MATERIALES N.º 01 SIN INC. IGV	S/. 0.00
DEDUCCIÓN QUE NO CORRESP.X AD. DE MATERIALES N.º 02 SIN INC. IGV	S/. 0.00
PORCENTAJE DE ADELANTO DIRECTO	10.00%
PORCENTAJE DE ADELANTO POR MATERIALES N.º 01	13.71%
PORCENTAJE DE ADELANTO POR MATERIALES N.º 02	6.29%
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	100.00%
SALDO POR VALORIZAR SIN INC. IGV	S/. 0.00
PORCENTAJE DE SALDO POR VALORIZAR	0.00%

GRUPO AYS S.A.C.
 LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 Reg. CIP N° 128113



9. RESUMEN DE VALORIZACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2020

SUB PAQUETE	DESCRIPCIÓN	TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
		TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%
1.00	REMEDIACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBAZADO PESQUERO ARTESANAL LOBITOS EN LA LOCALIDAD DE LOBITOS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA TALARÁ, DEPARTAMENTO DE PIURA	3,493,711.78	97.90% S/	3,420,200.64	97.90% S/	73,511.14	2.10%	3,493,711.78	100.00%	-	0.00%
	COSTO DIRECTO	S/ 3,493,711.78	97.90% S/	3,420,200.64	97.90% S/	73,511.14	2.10% S/	3,493,711.78	100.00% S/	-	0.00%
	GASTOS GENERALES	431,066.45		421,996.39		9,070.06		431,066.45		-	
	UTILIDADES	345,371.18		342,020.07		7,351.11		345,371.18		-	
	VALORIZACION BRUTA (VB)	S/ 4,274,149.41	97.90% S/	4,184,217.10	97.90% S/	89,932.31	2.10% S/	4,274,149.41	100.00% S/	-	0.00%
	IGV	769,346.89		753,159.07		16,187.82		769,346.89		-	
	TOTAL GENERAL (TG) = VB+IGV	S/ 5,043,496.30	97.90% S/	4,937,376.17	97.90% S/	106,120.13	2.10% S/	5,043,496.30	100.00% S/	-	0.00%
	AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO (AE)										
	DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO										
	VALORIZACION N°09										
	AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES N°01 (AM)										
	DEDUCCION QUE NO CORRESPONDEN - ADELANTO MATERIALES N°01										
	AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES N°02 (AM)										
	DEDUCCION QUE NO CORRESPONDEN - ADELANTO MATERIALES N°02										
	TOTAL A FACTURAR POR EL CONTRATISTA:	S/ 106,120.13	S/								
	RETENCION FONDO DE GARANTIA										
	MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	S/ 106,120.13	S/								

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA REAL ACUMULADO	100.00%
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA ACUMULADO PROGRAMADO	100.00%
PORCENTAJE DE OBRA	0.00%

GRUPO AYS S.A.C.
 LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 Reg. C.I.P. N° 128113



10. CURVA S DE AVANCE DE OBRA AL 19 DE DICIEMBRE 2020



DESCRIPCION	14/01/2020	31/01/2020	29/02/2020	15/03/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	19/12/2020
%AVANCE PROGRAMADO	0.00%	0.25%	11.40%	34.31%	34.34%	46.44%	78.65%	91.68%	97.52%	100.00%
%AVANCE REAL	0.00%	0.49%	11.68%	33.64%	39.11%	53.47%	78.15%	86.75%	97.90%	100.00%

GRUPO AYS S.A.C.

 LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 Reg. CIP N° 128113



11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL MONTO TOTAL VALORIZADO POR EL CONTRATISTA ES S/ 106,120.13 (Ciento Seis Mil Ciento Veinte con 13/100 soles). Esta supervisión concluye que los metrados de obra de la valorización mensual de DICIEMBRE 2020 están sustentados debidamente; Habiéndose verificado en campo, motivo por el cual otorga la conformidad y se emite el pronunciamiento de aprobación ante la entidad.

12. PANEL FOTOGRÁFICO



PANORAMA GENERAL DE OBRA CULMINADA AL 100%



REACOMODO DE ENROCADO


GRUPO AYS S.A.C.

LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113




COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION

GRUPO AYS S.A.C.
LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113

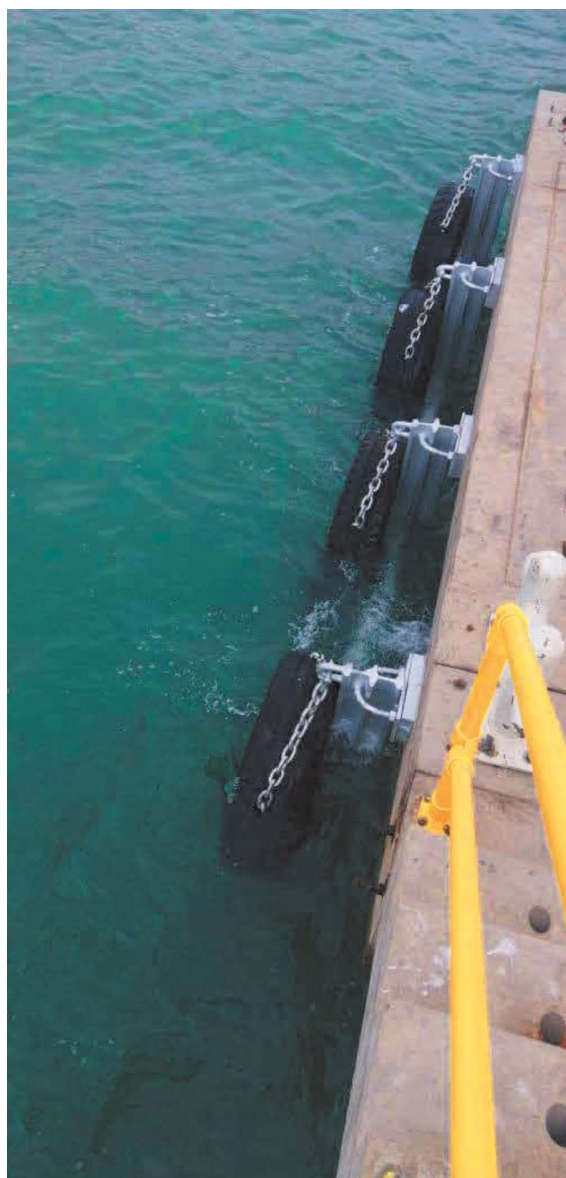


**SUMINISTRO, HABILITACION Y MONTAJE DE LARGUEROS METALICOS C/PERFIL TIPO RIEL 60
lb/yd**

GRUPO AYS S.A.C.

LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113



**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO C/NEOPRENE 12"x6"x2"
(EMBUTIDA)**

GRUPO AYS S.A.C.

LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113



CERCO METALICO DE MALLA ELECTROSOLDADA 2"x2" N°10 SEGUN DISEÑO

GRUPO AYS S.A.C.
 LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 Reg. CIP N° 128113



COLOCACIÓN DE PÚAS EN CERCO DE MALLA

GRUPO AYS S.A.C.

LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113



ARENADO Y MANTENIMIENTO DE REJILLAS METÁLICAS EXISTENTES

GRUPO AYS S.A.C.
LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113

Direc
Telf.: (01) 279 7217
Email: supervisiongrupoays@gmail.com

202, Distrito de Puente Piedra, Provincia y Departamento de Lima - Perú
RUC: 20600020430



ESPEJO BISELADO DE 6mm. INCL/ LAMINA DE SEGURIDAD


GRUPO AYS S.A.C.
.....
LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113




PINTURA EPOXICA 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES


GRUPO AYS S.A.C.

LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113

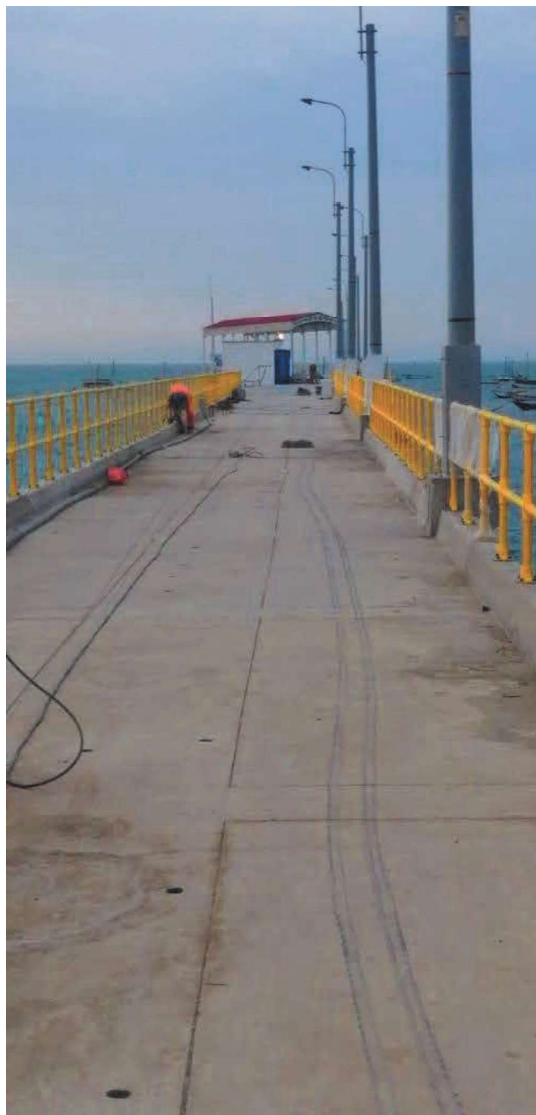

BARANDA DE FIBRA DE VIDRIO H=0.90 M

GRUPO AYS S.A.C.

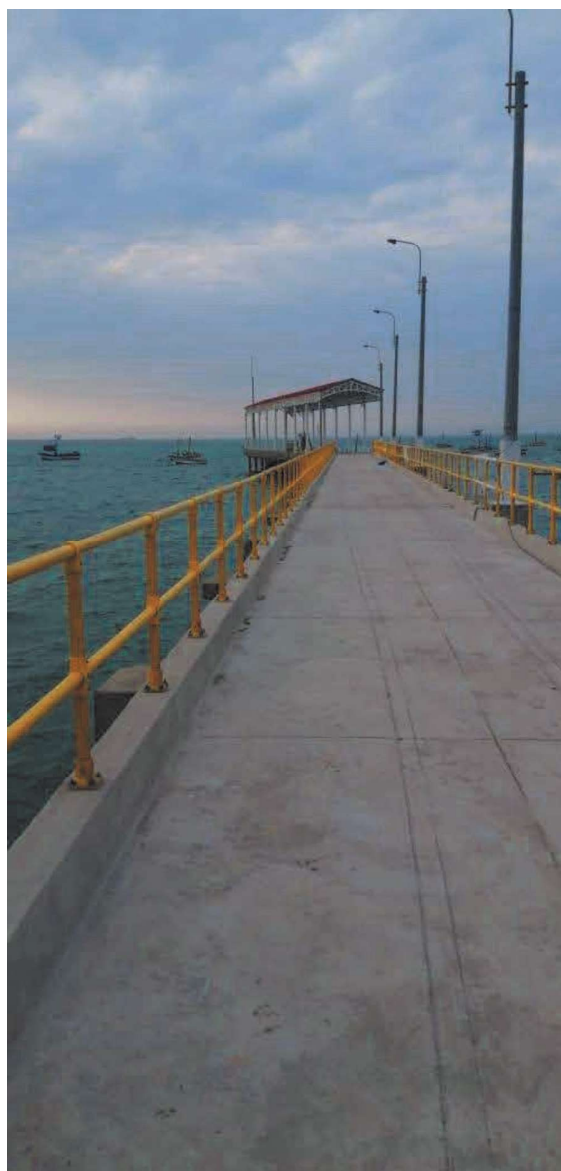LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113



BARANDA DE FIBRA DE VIDRIO H=0.90 M

GRUPO AYS S.A.C.
.....
LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113



RAMPA Y SARDINEL DE INGRESO



ÁREA DE CONFITILLO

GRUPO AYS S.A.C.


LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113



LIMPIEZA FINAL DE OBRA

GRUPO AYS S.A.C.

LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113

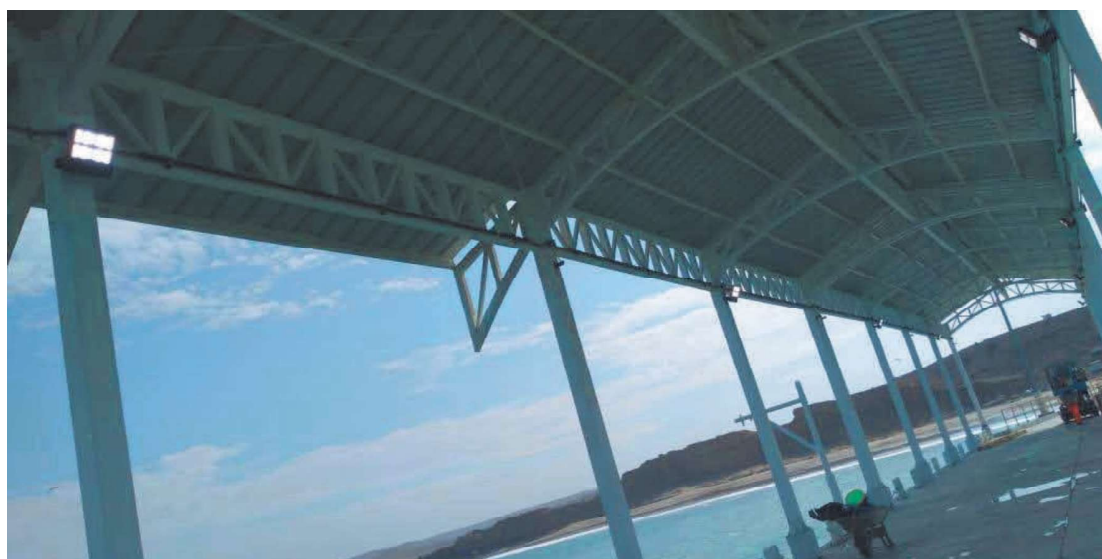

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

GRUPO AYS S.A.C.
.....
LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113



PRUEBA HIDRÁULICA



CAJA PARA VALVULAS CON MARCO Y TAPA FIBRA DE VIDRIO INC. TIRADOR DE BRONCE

GRUPO AYS S.A.C.
.....
LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113



CAJA PARA VALVULAS CON MARCO Y TAPA FIBRA DE VIDRIO INC. TIRADOR DE BRONCE



ACCESORIOS SANITARIOS

GRUPO AYS S.A.C.
LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113




GRUPO AYS S.A.C.
[Handwritten Signature]
LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113

ACCESORIOS SANITARIOS



SISTEMA DE GRIFERIA GALVANIZADA CON ACCIONAMIENTO A PEDAL (INC. ACCESORIOS Y GRIFERIA TIPO CUELLO DE GANZO DE ACERO INOX.)

GRUPO AYS S.A.C.

 LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 Reg. CIP N° 128113

Dirección: Cooperativa Residencial la Ensenada Mz. R1 Lt. 7 Dpto 202, Distrito de Puente Piedra, Provincia y Departamento de Lima – Perú
 Telf.: (01) 279 7217

Email: supervisiongrupoays@gmail.com

RUC: 20600020430




SOMBREROS DE VENTILACIÓN



INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BOMBAS DE AGUA SALADA

GRUPO AYS S.A.C.
LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113

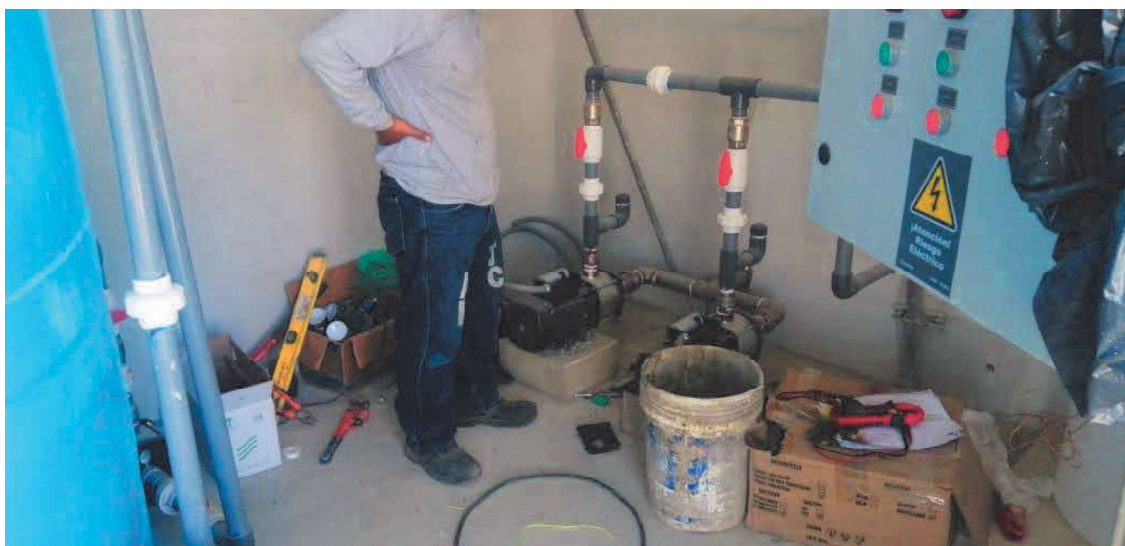

CASETA DE BOMBAS

GRUPO AYS S.A.C.
 LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 Reg. CIP N° 128113



SISTEMA DE AGUA SALADA EN MUELLE

GRUPO AYS S.A.C.

LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113



PRUEBAS DE SERVICIO Y ASILAMIENTO ELECTRICO

GRUPO AYS S.A.C.

LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113




PRUEBA DE PUESTA DE SERVICIO SISTEMA ELECTRICO

GRUPO AYS S.A.C.
.....
LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113





GRUPO AYS S.A.C.
.....
LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113

PRUEBA DE PUESTA DE SERVICIO

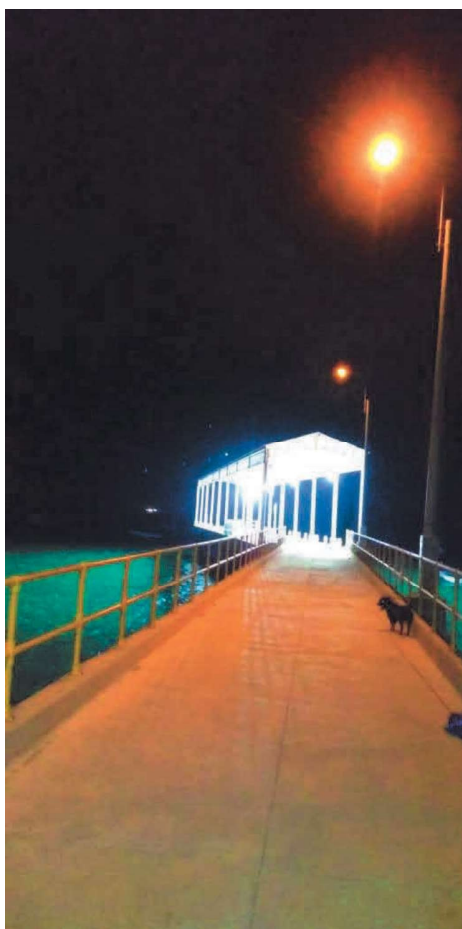


PRUEBA DE PUESTA DE SERVICIO

GRUPO AYS S.A.C.
LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113

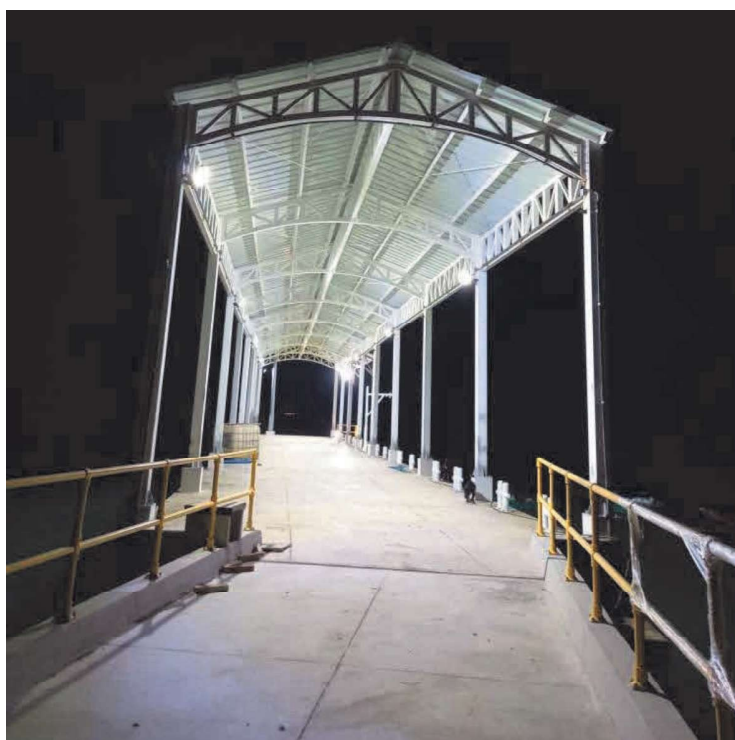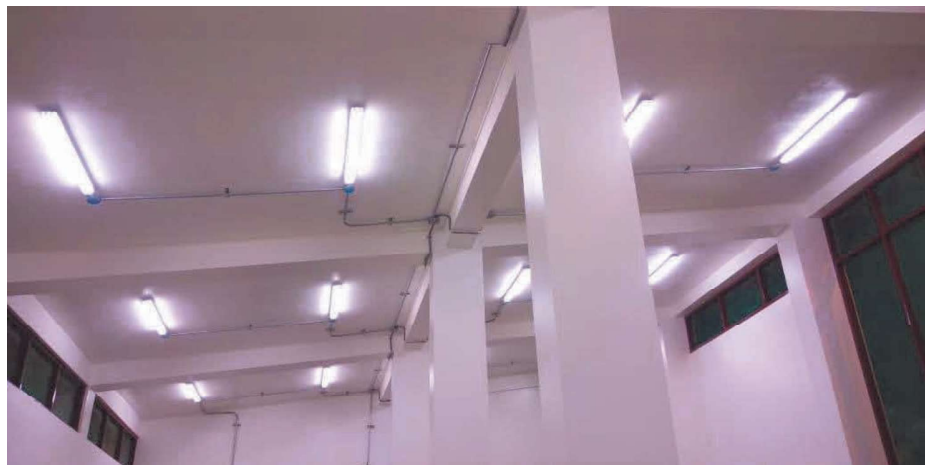

PRUEBA DE PUESTA DE SERVICIO

GRUPO AYS S.A.C.

LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113



PRUEBA DE PUESTA DE SERVICIO

GRUPO AYS S.A.C.
.....
LUIS ANTONIO CALDERON ORTIZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 128113
