

## REPORTE MOVIMIENTOS DE UN DOCUMENTO



### Detalles del Documento Principal

N° Documento:	<b>00003596-2020 [43 Folios]</b>	Fecha de Ingreso:	07/05/2020
Interesado:	ROJAS MAMANI DIONISIO	Clave:	1917
	DNI / RUC:	Tipo:	EXTERNO
	Dirección: NO ESPECIFICADO	Teléfono:	E-mail:
Asunto:	REMITE: CARTA N°260-2020-IDRM/C VALORIZACION N° 04 PERIODO 1-5 DE MARZO DEL 2020		
Documento Adjunto:	 CARTA N 260 2020 VAL 4 MAR20 MORIN COMPLETO.pdf (5)		
Situación:	FINALIZADO		

N° de Documento	Asunto	Avance / Finalización	Destino	F.Envío	Estado	
00003596-2020	REMITE: CARTA N°260-2020-IDRM/C VALORIZACION N° 04 PERIODO 1-5 DE MARZO DEL 2020		DIGENIPAA	07/05/2020 17:50:33 jcabanillas	DERIVADO 07/05/2020 18:21 nancyfu	  (5)
MEMORANDO INTERNO 02698-2020-FONDEPES/DIGENIPAA	REMITE: CARTA N°260-2020-IDRM/C VALORIZACION N° 04 PERIODO 1-5 DE MARZO DEL 2020		AOEM	07/05/2020 18:21:52 nancyfu	DERIVADO 07/05/2020 18:45 pruiz	
MEMORANDO INTERNO 01872-2020-FONDEPES/AOEM	REMITE: CARTA N°260-2020-IDRM/C VALORIZACION N° 04 PERIODO 1-5 DE MARZO DEL 2020		SCV	07/05/2020 18:45:53 pruiz	DERIVADO 15/05/2020 20:54 scarpio	 
INFORME 00048-2020-FONDEPES/SCV	VALORIZACIÓN DE OBRA N°04 - MARZO DEL 2020 OBRA: ?REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORIN, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Ref: A) CARTA N°260-2020-IDRM/C DE FECHA 07/05/2020 B) CARTA N°015-2020/CONSORCIO NUEVO TUMBES -T DE FECHA 31/03/2020 C) INFORME N°11-2020-VPT/JS DE FECHA 03/04/2020 D) INFORME N°04-2020-VPT/JS E) CONTRATO N°061-2019-FONDEPES F) CONTRATO N°068-2019-FONDEPES		AOEM	15/05/2020 20:54:10 scarpio	DERIVADO 26/05/2020 19:46 pruiz	  (10)
	ANEXO:  MEMO					
CARGO 00769-2020-FONDEPES/AOEM	VALORIZACIÓN DE OBRA N°04 - MARZO DEL 2020 OBRA: ?REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORIN, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Obs: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A OGA		DIGENIPAA	26/05/2020 19:46:14 pruiz	DERIVADO 28/05/2020 20:06 nancyfu	 
	ANEXO:  memo  informe 48					
CARGO 00457-2020-FONDEPES/DIGENIPAA	VALORIZACIÓN DE OBRA N°04 - MARZO DEL 2020 OBRA: ?REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORIN, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Obs: A SOLICITUD DEL DIRECTOR SE DEVUELVE EL DOCUMENTO EN LA CUAL SOLICITA QUE INDIQUE QUE ACCIONES DEBE REALIZAR LA OGA.		AOEM	28/05/2020 20:06:38 nancyfu	DERIVADO 29/05/2020 11:58 pruiz	
CARGO 00776-2020-FONDEPES/AOEM	VALORIZACIÓN DE OBRA N°04 - MARZO DEL 2020 OBRA: ?REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORIN, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		SCV	29/05/2020 11:58:00 pruiz	DERIVADO 30/05/2020 12:57 scarpio	 
CARGO 00029-2020-FONDEPES/SCV	VALORIZACIÓN DE OBRA N°04 - MARZO DEL 2020 OBRA: ?REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORIN, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Obs: SE MODIFICÓ EL INFORME ACORDE A LO COORDINADO CON EL ING. ÑAHUE.		AOEM	30/05/2020 12:57:06 scarpio	DERIVADO 06/06/2020 00:49 lvilchez	  (2)
MEMORANDO INTERNO 02109-2020-FONDEPES/AOEM	VALORIZACIÓN DE OBRA N°04 - MARZO DEL 2020 OBRA: ?REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS		SCV	06/06/2020 00:49:23	DERIVADO 10/06/2020	

	PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORIN, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD <b>Ref: NOTIFICAR AL CONTRATISTA Y APERCIBIR SI CORRESPONDE X ATRAZO Y POR PRESENTAR PENALIDAD</b>		Ivilchez	14:44 scarpio	
CARGO 00032-2020-FONDEPES/SCV	VALORIZACIÓN DE OBRA N°04 - MARZO DEL 2020 OBRA: ?REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORIN, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD <b>Ref: INFORME N°56-2020/FONDEPES/DIGENIPAA/UFIM/SCV</b> <b>Obs: DEBIDO A LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 025-2020-FONDEPES/GG APROBANDO LAS NUEVAS UNIDADES FUNCIONALES SE REMITE SE REMITE NUEVO INFORME CON FECHA ACTUAL</b>	UFIM	10/06/2020 14:44:21 scarpio	DERIVADO 12/06/2020 00:28 havalos	   <b>(4)</b>
NOTA 00007-2020-FONDEPES/UFIM	VALORIZACIÓN DE OBRA N°04 - MARZO DEL 2020 OBRA: ?REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORIN, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD <b>Obs: INFORME N°56-2020/FONDEPES/DIGENIPAA/UFIM/SCV</b>	DIGENIPAA	12/06/2020 00:28:19 havalos	DERIVADO 19/06/2020 12:59 nancyfu	   <b>(3)</b>
CARGO 00601-2020-FONDEPES/DIGENIPAA	VALORIZACIÓN DE OBRA N°04 - MARZO DEL 2020 OBRA: ?REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORIN, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD <b>Obs: SE DEVUELVE EL DOCUMENTO DE ACUERDO A LO CONVERSADO CON EL COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL.</b>	UFIM	19/06/2020 12:59:10 nancyfu	DERIVADO 19/06/2020 13:29 havalos	
CARGO 00013-2020-FONDEPES/UFIM	VALORIZACIÓN DE OBRA N°04 - MARZO DEL 2020 OBRA: ?REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORIN, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD <b>Obs: DOCUMENTO PARA CONOCIMIENTO DE LA DIGENIPAA Y ARCHIVAMIENTO EN EL LEGAJA DEL IOARR PUERTO MORIN</b>	ARCHIVO	19/06/2020 13:29:32 havalos	FINALIZADO 19/06/2020 17:39 nancyfu	

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

**INFORME N°56-2020/FONDEPES/DIGENIPAA/UFIM/SCV**

- A :** **ING. JORGE ROBERTO ÑAHUE SIVIRICHI**  
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola
- Asunto :** **Valorización de obra N°04 - marzo de 2020**  
Obra: "Remodelación de las Instalaciones Eléctricas de los Módulos de Desinfección, tareas previas y fríos, Remodelación de la grifería de tareas previas y Remodelación del Sistema de Defensa y Cobertura en el Cabezo en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Puerto Morín, en la localidad de Morín, distrito de Viru, provincia de Virú, departamento de la Libertad".
- Referencia :** a) MEMORANDO INTERNO 02109-2020-FONDEPES/AOEM  
b) Carta N°260-2020-IDRM/C de fecha 07/05/2020  
c) Carta N°015-2020/Consortio Nuevo Tumbes -T de fecha 31/03/2020  
d) Informe N°11-2020-VPT/JS de fecha 03/04/2020  
e) Informe N°04-2020-VPT/JS  
f) Contrato N°061-2019-FONDEPES  
g) Contrato N°068-2019-FONDEPES
- Fecha :** Lima, 10 de Junio del 2020

Mediante el presente, me dirijo a usted, atención al documento de la referencia a), donde se remite la valorización mensual de la obra: "Remodelación de las Instalaciones Eléctricas de los Módulos de Desinfección, tareas previas y fríos, Remodelación de la grifería de tareas previas y Remodelación del Sistema de Defensa y Cobertura en el Cabezo en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Puerto Morín, en la localidad de Morín, distrito de Viru, provincia de Virú, departamento de la Libertad" donde se menciona lo siguiente:

**I. DATOS GENERALES**

**1.1 INFORMACIÓN DE LA OBRA:**

**Obra :** "Remodelación de las Instalaciones Eléctricas de los Módulos de Desinfección, tareas previas y fríos, Remodelación de la grifería de tareas previas y Remodelación del Sistema de Defensa y Cobertura en el Cabezo en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Puerto Morín, en la localidad de Morín, distrito de Viru, provincia de Virú, departamento de la Libertad".

**Ubicación :**

- Localidad: Morín
- Distrito: Virú
- Provincia: Virú
- Región: La Libertad

**Entidad contratante :** FONDEPES  
**Financiamiento :** FONDEPES  
**Código de proyecto :** 2359411  
**Modalidad de Ejecución :** Contrata  
**Sistema de Contratación :** A suma alzada  
**Denominación del proceso :** A.S. N°049-2019-FONDEPES-1  
**Fecha Entrega de Terreno :** 09/12/2019  
**Inicio de plazo de Ejecución :** 10/12/2019



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

Término del plazo de ejecución : 08/03/2020  
Presupuesto Base Ref. : S/. 1'061,406.90  
Monto del Contrato de obra : S/. 955,266.22  
Factor de relación : 0.90000  
Plazo de Ejecución de obra : 90 días calendarios

### 1.2 Información del Contratista

Empresa Contratista : CONSORCIO NUEVO TUMBES  
(Conformado por: CONPROVI E.I.R.L y  
BRECAL CONTRATISTAS GENERALES  
S.R.L)

Representante Legal del contratista : Eifed Carrasco Perez  
Dirección: Mz. T lote 12 A.A.H.H. Los Ángeles, distrito,  
provincia y departamento de Tumbes.

Contrato : Contrato N°061-2019-FONDEPES  
Fecha de Contrato de obra : 25 de noviembre del 2019  
Residente de Obra : Freddy Carrasco Pérez; con Reg. con CIP  
40216

### 1.3 Información de la Supervisión

Representante Legal de la supervisión : Dionisio Rojas Mamani  
Jefe de Supervisión : Víctor Plasencia Tucto; Reg. CIP 83231  
Dirección : Calle Los Fresnos N°122, DISTRITO DE  
Santa Anita, Provincia y Departamento de  
Lima.

Denominación del proceso : A.S. N°053-2019-FONDEPES-1  
Contrato : Contrato N°068-2019-FONDEPES  
Fecha del contrato del supervisor : 28/11/2019  
Monto del contrato Supervisión : S/. 81,645.03  
Plazo de supervisión de Obra : 120 días calendario  
Fecha de inicio de supervisión : 10/12/2019  
Fecha de término de supervisión : 07/04/2020

## II. ANTECEDENTES:

2.1 Referente al Contrato N°061-2019-FONDEES indica en la **Cláusula Cuarta: Del Pago**; se indica lo siguiente:

*"LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de **valorizaciones mensuales** conforme a lo previsto en la acción específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el pazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.*

2.2 En las bases integradas, numeral **2.6 Valorizaciones del Capítulo II DEL PROCESO DE SELECCION**, se indica lo siguiente:  
*"El periodo de valorización será mensual"*

2.3 De otro lado, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado menciona en su artículo

*"...Artículo 194. Valorizaciones y Metrados*

*194.1. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista..."*





PERÚ


Ministerio  
de la Producción



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"


194.3. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

- 2.4 Con fecha 24 de octubre de 2019, el Comité de Selección adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación Simplificada N°049-2019-FONDEPES – *Primera Convocatoria*, para la contratación de la ejecución de la obra "Remodelación de las Instalaciones Eléctricas de los Módulos de Desinfección, tareas previas y fríos, Remodelación de la grifería de tareas previas y Remodelación del Sistema de Defensa y Cobertura en el Cabezo en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Puerto Morín, en la localidad de Morín, distrito de Viru, provincia de Virú, departamento de la Libertad", a la empresa CONSORCIO NUEVO TUMBES (Conformado por: CONPROVI E.I.R.L y BRECAL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L).
- 2.5 Con fecha 25 de noviembre de 2019, se suscribió el **Contrato N°061-2019-FONDEPES** referente a la ejecución de la obra: "Remodelación de las Instalaciones Eléctricas de los Módulos de Desinfección, tareas previas y fríos, Remodelación de la grifería de tareas previas y Remodelación del Sistema de Defensa y Cobertura en el Cabezo en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Puerto Morín, en la localidad de Morín, distrito de Viru, provincia de Virú, departamento de la Libertad" con la empresa **CONSORCIO NUEVO TUMBES**.
- 2.6 Con fecha 28 de octubre de 2019 se adjudicó la buena pro la Adjudicación Simplificada N°053-2019-FONDEPES, para la Contratación del servicio de consultoría para la supervisión de obra: "Remodelación de las Instalaciones Eléctricas de los Módulos de Desinfección, tareas previas y fríos, Remodelación de la grifería de tareas previas y Remodelación del Sistema de Defensa y Cobertura en el Cabezo en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Puerto Morín, en la localidad de Morín, distrito de Viru, provincia de Virú, departamento de la Libertad" a nombre del Sr. Dionisio Rojas Mamani.
- 2.7 Con fecha 28 de noviembre de 2019, se suscribe el **Contrato N°068-2019-FONDEPES** de supervisión de obra "Remodelación de las Instalaciones Eléctricas de los Módulos de Desinfección, tareas previas y fríos, Remodelación de la grifería de tareas previas y Remodelación del Sistema de Defensa y Cobertura en el Cabezo en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Puerto Morín, en la localidad de Morín, distrito de Viru, provincia de Virú, departamento de la Libertad", a nombre del Sr. Dionisio Rojas Mamani, quien asumirá la representación de la entidad ante el contratista de obra.
- 2.8 Con fecha 02 de diciembre de 2020, mediante Carta N°006-2019/CONORCIO NUEVO TUMBES-T el contratista de obra CONSORCIO NUEVO TUMBES solicitó adelanto directo del 10%.
- 2.9 Con fecha 06 de diciembre del 2019, mediante Carta N°1257-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, FONDEPES entrega el expediente técnico de obra al CONSORCIO NUEVO TUMBES.
- 2.10 Con fecha 06 de diciembre del 2019, mediante Carta N°1256-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, FONDEPES entrega el expediente técnico de obra a la supervisión **DIONISIO ROJAS MAMANI**.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

- 2.11 Con fecha 06 de diciembre del 2019, mediante Carta N°1260-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, FONDEPES notifica al contratista de obra CONSORCIO NUEVO TUMBES sobre la designación de la supervisión de obra.
- 2.12 Con fecha 09 de diciembre del 2019 se suscribió el acta de entrega de terreno para ejecución de obra entre FONDEPES y el Contratista, Consorcio NUEVO TUEMBES.
- 2.13 Con fecha 10 de diciembre de 2019, se inicia el plazo contractual de ejecución de obra "Remodelación de las Instalaciones Eléctricas de los Módulos de Desinfección, tareas previas y fríos, Remodelación de la grifería de tareas previas y Remodelación del Sistema de Defensa y Cobertura en el Cabezo en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Puerto Morín, en la localidad de Morín, distrito de Viru, provincia de Virú, departamento de la Libertad", habiéndose cumplido con todos los requisitos del artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado.
- 2.14 Con fecha 19 de diciembre de 2019, el supervisor de obra el Ing. Víctor Plasencia Tucto CIP 83231 presenta mediante Carta N°002-2019-VT/JS, la solicitud sobre calendarios y cronogramas actualizados al inicio de obra.
- 2.15 Con fecha 19 de diciembre del 2019, mediante Carta N°001-2019-VPT/JS, de fecha, la supervisión mediante el jefe de supervisión el Ing. Víctor Plasencia Tucto CIP 83231 presenta a la entidad el Informe Compatibilidad del Expediente Técnico, indicando que opinión técnica de la supervisión es: Expediente técnico viable compatible, en cumplimiento de las bases integradas.
- 2.16 Con fecha 23 de diciembre del 2019 mediante Carta N°003-CONORCIO NUEVO TUMBES/Residente de Obra, el residente de obra **Ing. Freddy Carrasco Pérez**, remite a la supervisión de obra el calendario actualizado a la fecha de inicio de plazo contractual.
- 2.17 Con fecha 23 de diciembre de 2019, el supervisor de obra el Ing. Víctor Plasencia Tucto CIP 83231 presenta mediante Carta N°004-2019-VT/JS, documento complementario de los calendarios y cronogramas actualizados al inicio de obra.
- 2.18 Con fecha 24 de diciembre del 2019, mediante Carta N°006-2019-VPT/JS, de la supervisión mediante el jefe de supervisión el **Ing. Víctor Plasencia Tucto** CIP 83231 presenta a la entidad el Informe de revisión del Expediente Técnico, indicando que opinión técnica de la supervisión es: Expediente técnico viable compatible.
- 2.19 Con fecha 30 de diciembre del 2019, mediante Carta N°007-2019-VPT/JS la supervisión adjunta documentos complementarios de la revisión de compatibilidad de expediente técnico (adjunta el Plan de trabajo).
- 2.20 Con fecha 03 de enero de 2020, FONDEPES notifica mediante Carta N°1373-2019-FONDEPES/DIGENIPAA a la supervisión, la reformulación del calendario de avance de obra valorizado y fechado respecto del Diagrama CPM, los cuales son incompatibles, otorgando un plazo de 5 días calendarios.
- 2.21 Con fecha 06 de enero de 2020, el supervisor de obra el Ing. Víctor Plasencia Tucto CIP 83231 mediante Carta N°015-2020-VT/JS, presenta calendarios y



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

cronograma reformulados en repuesta a la Carta N°1373-2019-FONDEPES/DIGENIPAA.

- 2.22 Con fecha 08 de enero de 2020, FONDEPES notifica mediante Carta N°0049-2020-FONDEPES/DIGENIPAA a la supervisión, reiterando las observaciones al Calendario y cronogramas de la obra en mención, otorgando un plazo de 2 días calendarios.
- 2.23 Con fecha 08 de enero del 2020 mediante Carta N°20-2020- IDRM/C, el supervisor de obra **Ing. Víctor Plasencia Tucto** CIP 83231, presenta el levantamiento de observaciones y da conformidad al calendario actualizado a la fecha de inicio de plazo contractual.
- 2.24 Con fecha 30 de enero de 2020 el Contratista CONSORCIO NUEVO TUMBES mediante Carta N°016-2020/CONSORCIO NUEVO TUMBES- RESIDENTE DE OBRA tramita ante la supervisión de obra, la solicitud de adelanto por materiales.
- 2.25 Con fecha 31 de enero de 2020 mediante Carta N°062-2020-IDRM/C la Supervisión de obra anexa el INFORME N°01-2020-VPT/JS de adelanto de materiales del Jefe de Supervisión el Ing. Víctor Plasencia Tucto CIP 83231, donde da conformidad a lo solicitado por el CONSORCIO NUEVO TUMBRES, por un monto ascendente a la suma S/. 174,007.55 Soles.
- 2.26 Asimismo, a través del siguiente cuadro se detallan los antecedentes de pago de valorizaciones de la obra:

N° de Valorización	Tipo de pago	Monto (S/)	Mes/Año	Fecha de recepción de la carta	Coordinador de obra
01	Mensual	63,459.80	Diciembre -2019	06/ENE/2019	Stefany A. Carpio Velásquez
02	Mensual	289,904.97	Enero - 2020	07/FEB/2020	Stefany A. Carpio Velásquez
03	Mensual	136,901.67	Febrero -2020	06/MAR/2020	Stefany A. Carpio Velásquez

- 2.27 Con fecha 16 de marzo de 2020 se publica en el diario el Peruano el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM - Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, disponiendo el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por 15 días calendario (Del 16/03/2020 hasta el 30/03/2020), siendo precisando con Decreto Supremo N° 046-2020-PCM.
- 2.28 Con fecha 27 de marzo de 2020 se publica en el diario el Peruano el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM - Prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM por un periodo de 13 días calendario a partir del 31 de marzo hasta el 12 de abril de 2020.
- 2.29 Con fecha 30 de marzo de 2020 mediante Resolución Gerencial General N°016-2020-FONDEPES/GG, se aprueba los «Lineamientos para el pago de proveedores durante el estado de emergencia nacional a causa de la propagación del coronavirus (COVID19), del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero», vigente hasta la culminación del estado de emergencia nacional dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y normas modificatorias.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

- 2.30 Con fecha 10 de abril de 2020 se publica en el diario el Peruano el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM – Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19 por un periodo de 14 días calendario a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril de 2020.
- 2.31 Con fecha 25 de abril de 2020 se publica en el diario el Peruano el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM – Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19 por un periodo de 14 días calendario a partir del 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020.
- 2.32 Con fecha 10 de mayo de 2020 se publica en el diario el Peruano el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM – Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19 por un periodo de 14 días calendario a partir del 11 de mayo de 2020 hasta el 24 de mayo de 2020.

### 2.33 VALORIZACIÓN N°04 – MES DE MARZO 2020

2.33.1 Que, mediante Carta N°015-2020/CONSORCIO NUEVO TUMBES/Residente de obra, del contratista de obra CONSORCIO NUEVO TUMBES presenta a la supervisión de obra la Valorización de Obra N°04 correspondiente al mes de marzo (Desde el 01 hasta el 15) del 2020, conforme al Contrato N°061-2019-FONDEPES.

2.33.2 Que, en fecha 07 de mayo de 2020, la supervisión de obra presenta la Carta N°260-2020-IDRM/C anexando el informe N°11-2020- VPT/JS de Valorización de obra N°04 - Marzo (Desde el 01 hasta el 15) 2020 del Jefe de Supervisión Ing. Víctor Plasencia Tucto CIP 83231.

### III. BASE LEGAL

- 3.1 Decreto Legislativo N°1252, Decreto legislativo que crea al Sistema Nacional de Programación Multianual Y Gestión de Inversiones.
- 3.2 Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 3.3 Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el reglamento de la ley N°30225, ley de contrataciones del estado y modificatorias.
- 3.4 Decreto Supremo N°004-2019-JUS, que aprueba el texto único ordenado de la ley N°27444, ley de procedimiento administrativo general.
- 3.5 Decreto Supremo N°082-2019-EF, que aprueba el texto único ordenado de la ley N°30225 ley de contrataciones del estado.
- 3.6 Resolución Ministerial N°346-2012-PRODUCE, que aprueba el reglamento de organización y funciones del FONDEPES.

### IV. ANÁLISIS:

- 4.1 El 16/03/2020 mediante Decreto Supremo N°44-2020-PCM que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19, precisando con Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, constituye una situación de fuerza mayor que puede afectar





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

los vínculos contractuales celebrados al amparo de la normativa de Contrataciones del Estado, tanto de lado del contratista como del lado de la Entidad contratante, posteriormente se ha emitido decretos supremos ampliando la cuarentena estando vigente el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM – Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional hasta el 26 de mayo de 2020.

- 4.2 El 30/03/2020 mediante Resolución de Gerencia General N°020-2020-FONDEPES/GG el FONDEPES resuelve lo siguiente:

**Artículo 1º.-** Aprobar los "Lineamientos para el pago de proveedores durante el estado de emergencia nacional a causa de la propagación del coronavirus (COVID 19), del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero", los mismos que forman parte integrante del presente documento en calidad de anexo.

**Artículo 2º.-** Disponer la eficacia anticipada del numeral 6.2 de los lineamientos aprobados en el artículo precedente a partir del 16 de marzo de 2020.

- 4.3 El 01/04/2020 mediante correo electrónico se comunicó al Ing. Eifed Carrasco Pérez Representante Legal del CONSORCIO NUEVO TUMBES [conprovieirl@hotmail.com](mailto:conprovieirl@hotmail.com) y por parte de la Supervisión al Representante Legal el Ing. Dionisio Rojas Mamani [yplasencia@hotmail.com](mailto:yplasencia@hotmail.com) y al supervisor el Ing. Víctor Plasencia Tucto [rojas\\_2080\\_consultor@hotmail.com](mailto:rojas_2080_consultor@hotmail.com), los "Lineamientos para el pago de proveedores durante el estado de emergencia nacional a causa de la propagación del coronavirus (COVID 19), del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero" aprobados el 30/03/2020 por FONDEPES.

- 4.4 Mediante Carta N°260-2020-IDRM/C presentada por el Representante Legal de la Supervisión Ing. Dionisio Rojas Mamani al FONDEPES mediante correo electrónico [mesadepartes@fondpes.gob.pe](mailto:mesadepartes@fondpes.gob.pe) de fecha 7 de mayo de 2020, adjunta la valorización de obra N°04- marzo 2020, indicando que el contratista dentro del periodo comprendido entre el 01 al 15 de marzo de 2020 no ha ejecutado partida alguna y su avance ejecutado acumulado actual sigue y se mantiene en el 67.96%, siendo que la Valorización en el presente periodo es de zeros soles (S/. 0.00); asimismo anexó la siguiente documentación escaneada:

- ✓ Carta N° 063-2020-VPT/JS presentada por el Jefe de Supervisión Ing. Víctor Plasencia Tucto, donde señala que hasta el 15 de marzo el contratista ha mantenido un avance igual al del mes anterior, es decir 67.96 %, siendo su avance al 15 de marzo de 0%.
- ✓ Informe N°11-2020-VPT/JS de Valorización de obra N°04- marzo (Desde el 01 hasta el 15) 2020 del Jefe de Supervisión Ing. Víctor Plasencia Tucto CIP 83231, en el cual también señala que:

- Término del plazo de ejecución de la obra: 08/03/2020
- Situación de la obra: Atrasada en un 32.04%
- Avance ejecutado hasta el 15 de marzo: 67.96%
- La empresa contratista Consorcio Nuevo Tumbes no presentó la valorización N°4 correspondiente al 01 al 15 de Marzo de 2020.
- La empresa contratista Consorcio Nuevo Tumbes solo presentó la Carta N°015-2020/CONSORCIO NUEVO TUMBES-T en la que dar a conocer que habiendo el Gobierno decretado Estado de Emergencia a nivel nacional y la inmovilización de todas las personas a partir del día 16 de Marzo del presente año, no se ha podido tener acceso a las anotaciones





PERÚ

Ministerio  
de la Producción



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

del cuaderno de Obra y ver los metrados avanzados desde el 01 hasta el día 15 de Marzo, por lo que comunico a la Supervisión que no estaremos presentando valorización por el mes de Marzo.

- Se indica que no se presenta las copias del cuaderno de obra completo por no tener acceso a este, dada las circunstancias originales por la paralización de las actividades.
- El contratista Nuevo Tumbes a valorizado en el periodo del 01 al 15 de Marzo de 2020 0%.
- Se recomienda que en el Contrato N°61-2019-FONDEPES, indica en la Clausula Decimo Sexta: PENALIDADES, ... si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de retraso.

- ✓ Carta N°015-2020/CONSORCIO NUEVO TUMBES-T de fecha 31/03/2020 del Representante común del CONSORCIO NUEVO TUMBES el Ing. Eifed Carrasco Pérez, comunica al Supervisor de obra el Ing. Víctor Plasencia Tucto sobre la valorización N°4 correspondiente al mes de marzo del 2020 lo siguiente:

- Dar a conocer que habiendo el Gobierno decretado Estado de Emergencia a nivel nacional y la inmovilización de todas las personas a partir del día 16 de Marzo del presente año, no se ha podido tener acceso a las anotaciones del cuaderno de Obra y ver los metrados avanzados desde el 01 hasta el día 15 de Marzo, por lo que comunico a la Supervisión que no estaremos presentando valorización por el mes de Marzo.

- 4.5 Según los «Lineamientos para el pago de proveedores durante el estado de emergencia nacional a causa de la propagación del coronavirus (COVID19), del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero» aprobados con fecha 30 de marzo de 2020 mediante Resolución Gerencial General N°016-2020-FONDEPES/GG, en el punto VI. Disposiciones Específicas indica lo siguiente:

#### 6.1. Procedimiento de pago de valorizaciones de obra y supervisión


6.1.1. El contratista ingresa su requerimiento de pago y documentación correspondiente mediante correo electrónico dirigido a [mesadepartes@fondepes.gob.pe](mailto:mesadepartes@fondepes.gob.pe). Esta documentación es derivada al Director de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (en adelante, DIGENIPAA) mediante el SITRADO.

(...)

6.1.3. El Coordinador de Obra recibe, revisa y analiza la documentación relacionada al requerimiento de pago y elabora y consolida el expediente de conformidad respectivo, según el siguiente detalle:

##### a) Valorizaciones de obra

- Informe de valorización que incluya el resumen de valorización de la obra, así como el pronunciamiento en relación a las penalidades a que dieran lugar (Ver Anexo 1).
- Pólizas escaneadas (SCTR vigente y Póliza CAR), de conformidad a lo establecido en las bases.
- Factura electrónica o escaneada.
- Informe del supervisor, escaneado.
- Acta de conformidad (Ver Anexo 2).




"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
 "Año de la Universalización de la Salud"

4.6 De lo revisado se indica lo siguiente sobre la Valorización N°4:

- ✓ La valorización N°4 presentada por la supervisión tiene un monto equivalente a S/.0.00.
- ✓ De lo señalado por la Supervisión y siendo que el plazo de ejecución contractual culminó el 8 de marzo de 2020 y a la fecha el contratista no ha culminado la obra, se encuentra incurriendo en penalidad por mora.
- ✓ El supervisor informa que la obra hasta el 15 de marzo correspondiente a la Valorización N°4 tiene un avance acumulado real de **67.96%**, porcentaje que es el mismo que de la Valorización N°3 – febrero 2020.
- ✓ El plazo contractual de culminación de ejecución de obra era el 08/03/2020, por lo cual hasta el 15/03/2020 se contabiliza 7 días de penalidad.
- ✓ El avance mensual programado para la valorización N°4 (Del 01/03/2020 al 08/03/2020) era de 5.76%.
- ✓ De lo indicado por la supervisión la obra se encontraba atrasada en un 32.04%

4.7 En el siguiente cuadro encontraremos el diagrama de curva S de Avance Físico de la Obra (Avance Programado VS Avance Ejecutado):

CURVA "S" DE AVANCE FÍSICO

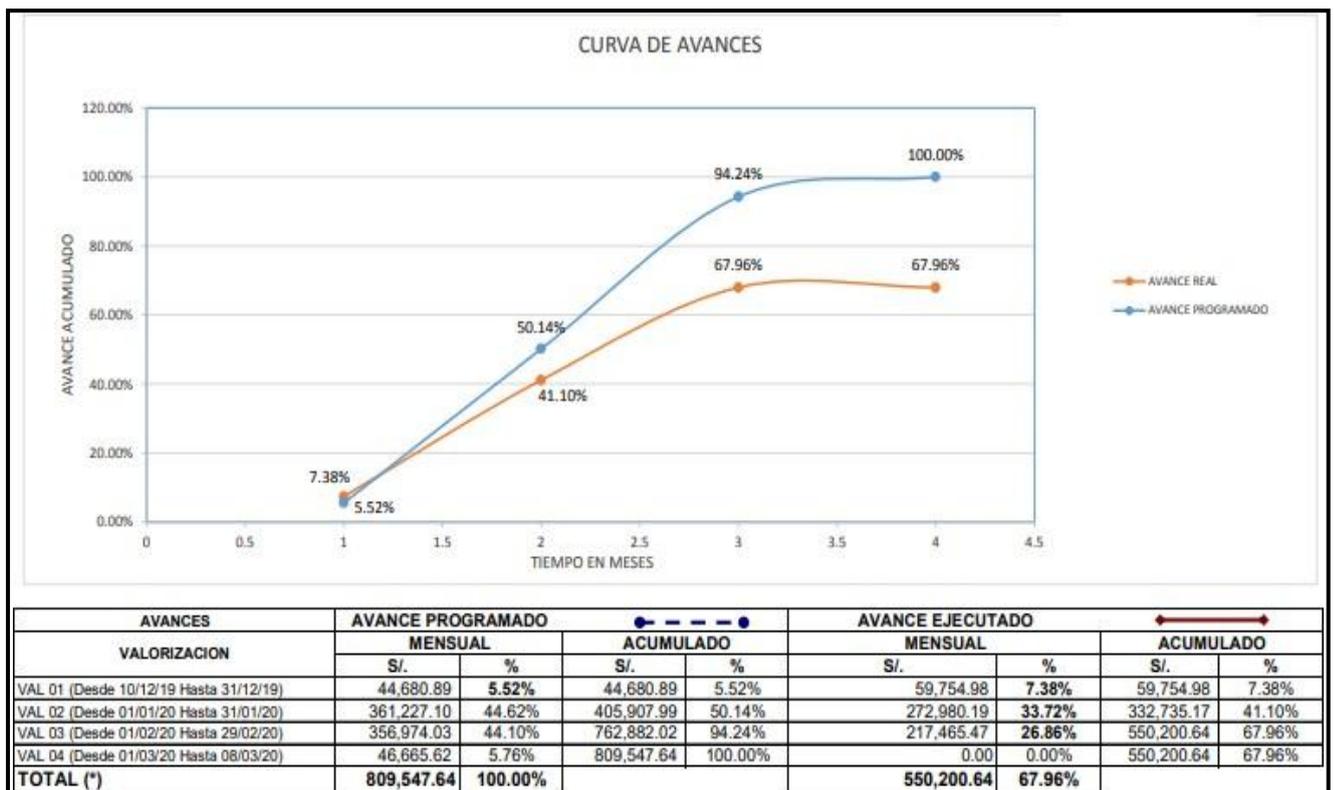

4.8 Valorización del Contrato:

- 4.8.1. Según la valorización correspondiente al mes de **marzo (01 al 15) del 2020**, el supervisor informa que tiene un avance acumulado real de **67.96%**.

Stelany Alejandra Carpio Velásquez  
 ARQUITECTA  
 CAP 16420

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATO	VAL ACUM ANTERIOR	VAL ACTUAL	VAL ACUM ACTUAL	% DE AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
a) Fórmula No 01 Obras Portuarias	326,365.54	67,018.54	0.00	67,018.54	20.53	259,347.00
b) Fórmula No 02 Estructuras	105,012.77	105,012.77	0.00	105,012.77	100.00	0.00
c) Fórmula No 03 Arquitectura	107,254.70	107,254.70	0.00	107,254.70	100.00	0.00
d) Fórmula No 04 Instalaciones Eléctricas	240,808.41	240,808.41	0.00	240,808.41	100.00	0.00
e) Fórmula No 05 Plan de Contingencia	30,106.22	30,106.22	0.00	30,106.22	100.00	0.00
<b>TOTAL CONTRACTUAL</b>	<b>809,547.64</b>	<b>550,200.64</b>	<b>0.00</b>	<b>550,200.64</b>	<b>67.96</b>	<b>259,347.00</b>
<b>% DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA</b>		<b>67.96%</b>	<b>0.00%</b>	<b>67.96%</b>		<b>32.04%</b>
<b>AMORTIZACION (A)</b>						
Amortización del Adelanto en Efectivo	80,954.76	55,020.07	0.00	55,020.07		25,934.70
	147,464.03	79,700.56	0.00	79,700.56		67,763.47
<b>TOTAL AMORTIZACIONES</b>	<b>228,418.79</b>	<b>134,720.63</b>	<b>0.00</b>	<b>134,720.63</b>		<b>93,698.16</b>
<b>VALORIZACION NETA (VN=VA-A)</b>		<b>415,480.01</b>	<b>0.00</b>	<b>415,480.01</b>		
<b>MULTA POR ATRASO DE OBRA (M)</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
<b>MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>						
En efectivo (VN-M)		415,480.01	0.00	415,480.01		
En IGV (VN x 18%)		74,786.40	0.00	74,786.40		
<b>MONTO TOTAL CON IGV</b>		<b>490,266.41</b>	<b>0.00</b>	<b>490,266.41</b>		
<b>TOTAL COMPROMISO</b>			<b>0.00</b>	<b>490,266.41</b>		

#### 4.8.2. Resumen de Valorización de Obra:

Luego de revisar la documentación que sustenta por el supervisor de obra correspondiente a la valorización de obra N°04 – marzo (01 al 15) del 2020, aprobada y remitido por la Supervisión, tiene la siguiente estructura de pagos:

Valorización Neta	0.00
IGV (18%)	0.00
<b>TOTAL S/.</b>	<b>0.00</b>

4.8.3. La supervisión presenta como monto final de la **Valorización N°04**, la suma de S/ 0.00 (Cero con 00/100 soles).

#### V. PENALIDADES

5.1 La valorización N°4 correspondiente al mes de Marzo es 0%, por lo que el monto hace inviable considerar este ítem.

#### VI. CONCLUSIONES:

6.1 La supervisión presenta como monto final de la Valorización N°04, la suma de S/ 0.00 (Cero con 00/100 soles).

6.2 La valorización N°4 correspondiente al mes de Marzo debió ser presentada hasta el 06 de Abril del 2020, sin embargo fue presentada por la supervisión en fecha 07/05/2020.

6.3 La supervisión ha verificado hasta el 15 de marzo que la empresa contratista **CONSORCIO NUEVO TUMBES** se mantiene en un avance igual que el mes





PERÚ

Ministerio  
de la Producción



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

pasado (febrero-2020) es decir en un 67.96% siendo su avance al 15 de marzo el 0%.


- 6.4 El plazo contractual de culminación de ejecución de obra era el 08/03/2020, por lo cual hasta el 15/03/2020 se contabiliza 7 días de penalidad.
- 6.5 El avance mensual programado para la valorización N°4 (Del 01/03/2020 al 08/03/2020) era de 5.76%.
- 6.6 De lo indicado por la supervisión la obra se encontraba atrasada en un 32.04%

## VII. RECOMENDACIONES.

- 7.1 Se sugiere el presente informe a la Oficina General de Administración - OGA a fin de que tome conocimiento y acciones pertinentes acorde a su competencia.
- 7.2 Se recomienda derivar el presente informe al archivo de la DIGENIPAA, a fin de que se adjunte al legajo de la supervisión de obra: Contratación del servicio de consultoría de supervisión de obra: "Remodelación de las Instalaciones Eléctricas de los Módulos de Desinfección, tareas previas y fríos, Remodelación de la grifería de tareas previas y Remodelación del Sistema de Defensa y Cobertura en el Cabezo en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Puerto Morín, en la localidad de Morín, distrito de Viru, provincia de Virú, departamento de la Libertad"

Es todo cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,



Visto el Informe N°56-2020/FONDEPES/DIGENIPAA/UFIM/SCV que antecede, el Coordinador de la Unidad de Formulación de Inversiones Menores de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, lo hace suyo, disponiendo su derivación a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola con sus respectivos antecedentes, para su conocimiento y atención correspondiente.

Firmado digitalmente por:  
AVALOS SALINAS Henry  
Alberto FAU 20137921601 soft  
Motivo: En señal de  
conformidad  
Fecha: 11/06/2020 23:54:57-0500



**Zimbra:****scarpio@fondepes.gob.pe**

---

**Urgente Comunicado : LINEAMIENTOS PARA EL PAGO DE PROVEEDORES DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL A CAUSA DE LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID19), DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**

---

**De :** Stefany Carpio Velasquez  
<scarpio@fondepes.gob.pe>

mié, 01 de abr de 2020 16:10

 3 ficheros adjuntos

**Asunto :** Urgente Comunicado : LINEAMIENTOS PARA EL PAGO DE PROVEEDORES DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL A CAUSA DE LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID19), DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

**Para :** conprovieirl@hotmail.com,  
vplasencia@hotmail.com, rojas 2080 consultor  
<rojas\_2080\_consultor@hotmail.com>

**Para o CC :** Henry A. Avalos Salinas  
<coordinador\_mantenimiento@fondepes.gob.pe>,  
Luis A. Vilchez Chavarry  
<lvilchez@fondepes.gob.pe>, Carmina Carrera  
Amaya <ccarrera@fondepes.gob.pe>

Estimados:

**Eifed Carrasco Perez**  
**Representante Legal de CONSORCIO NUEVO TUMBES**

**Dionisio Rojas Mamani**  
Representante legal de la Supervisión

Obra: "Remodelación de las Instalaciones Eléctricas de los Módulos de Desinfección, tareas previas y fríos, Remodelación de la grifería de tareas previas y Remodelación del Sistema de Defensa y Cobertura en el Cabezo en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Puerto Morín, en la localidad de Morín, distrito de Virú, provincia de Virú, departamento de la Libertad"

Saludos,

Mediante Decreto Supremo N° 44-2020-PCM que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19, precisando con Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, constituye una situación de fuerza mayor.

- 1.1 Mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM se amplía por 13 días calendario el periodo de Estado de Emergencia Nacional por pandemia de coronavirus (COVID-19), declarado en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, desde el 31 de marzo hasta el 12 de abril de 2020.

**Mediante Resolución de Gerencia General N° 020-2020-FONDEPES/GG del 30 de marzo de 2020 , se aprobó "LINEAMIENTOS PARA EL PAGO DE PROVEEDORES**

**DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL A CAUSA DE LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID19), DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO".**

Por lo expuesto, se hace anexa la Resolución y lineamiento aprobado por FONDEPES a fin de que tome conocimiento y proceda conforme a lo señalado.

Atentamente

Stefany Carpio Velásquez

Arquitecta

Dirección General De Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola - DIGENIPA

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Av. Petit Thouars 115 - Lima

Teléfono: (511) 209-7700 Anexo: 7377

[www.fondepes.gob.pe](http://www.fondepes.gob.pe)



**logofondepes\_1.jpg**

7 KB

**Lineamientos para pagos periodo EEN 30.03.2020 v5 VF[R][R] (2)[R][R]**



**[R].pdf**

1 MB



**RGG\_202016.pdf**

152 KB

**Detalles del Documento Principal**

N° Documento:	<b>00003596-2020 [43 Folios]</b>	Fecha de Ingreso:	07/05/2020
Interesado:	ROJAS MAMANI DIONISIO	Clave:	1917      Tipo: EXTERNO
	DNI / RUC: Dirección: NO ESPECIFICADO      Teléfono:      E-mail:		
Asunto:	REMITE: CARTA N°260-2020-IDRM/C VALORIZACION N° 04 PERIODO 1-5 DE MARZO DEL 2020		
Situación:	PENDIENTE	N° de Días en Trámite:	7
Documento Adjunto:	CARTA N 260 2020 VAL 4 MAR20 MORIN COMPLETO.pdf (3)		

N° de Documento	Asunto	Avance / Finalización	Destino	F.Envío	Estado	
00003596-2020	REMITE: CARTA N°260-2020-IDRM/C VALORIZACION N° 04 PERIODO 1-5 DE MARZO DEL 2020 -		<b>DIGENIPAA</b>	07/05/2020 17:50:33 jcabanillas	DERIVADO 07/05/2020 18:21 nancyfu	   (3)
MEMORANDO INTERNO 02698-2020- FONDEPES/DIGENIPAA	REMITE: CARTA N°260-2020-IDRM/C VALORIZACION N° 04 PERIODO 1-5 DE MARZO DEL 2020 -		<b>AOEM</b>	07/05/2020 18:21:52 nancyfu	DERIVADO 07/05/2020 18:45 pruiz	
MEMORANDO INTERNO 01872-2020- FONDEPES/AOEM	REMITE: CARTA N°260-2020-IDRM/C VALORIZACION N° 04 PERIODO 1-5 DE MARZO DEL 2020 -		<b>SCV</b>	07/05/2020 18:45:53 pruiz	NO ACEPTADO	 



Lima, 07 de Mayo del 2020

Carta No. 260-2020-IDRM/C

Señores:

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES**

Av. Petit Thouars N° 115 – Cercado de Lima.

Presente. -

ATENCION : ARQ. STEFANY CARPIO VELASQUEZ  
COORDINADORA DE OBRA

ASUNTO : VALORIZACION N° 04  
PERIODO 1-15 DE MARZO DEL 2020

REFERENCIA: 1. CONTRATO N° 068-2019-FONDEPES  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 053-2019-  
FONDEPES - PRIMERA CONVOCATORIA  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA  
LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:  
"REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y  
FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS  
PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y  
COBERTURA DE CABEZO EN EL DESEMBARCADERO  
PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO MORÍN, EN LA  
LOCALIDAD DE MORÍN, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE  
VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"  
CODIGO ÚNICO: 2359411  
2. CARTA N° 015-2020/CONSORCIO NUEVO  
TUMBES – T

De mi mayor consideración:

Por medio del presente previo cordial saludo, me dirijo a Ustedes, con la finalidad de presentar la Valorización N° 04, correspondiente al periodo marzo del 2020, en cumplimiento de obligaciones del contrato mencionado en la referencia.

En el periodo del 01-15 de marzo del 2020, el contratista ejecutor de Obra, CONSORCIO NUEVO TUMBES, no ha ejecutado ninguna partida y su avance ejecutado acumulado actual sigue y se mantiene en el 67.96%, siendo que la Valorización en el presente periodo es cero soles (S/. 0.00).

**POR LO EXPUESTO:**

Señores de FONDEPES, se cumple en presentar debidamente aprobado por el Jefe de Supervisión de Obra; conforme lo establece el Artículo 194°.- Valorizaciones y Metrados, en tanto el contratista ejecutor de Obra no tiene ningún metrado ejecutado en el periodo marzo del 2020, para los trámites correspondientes.

Sin otro particular, quedo de Ustedes, aprovechando la oportunidad para reiterarle mi consideración más distinguida.

Atentamente,

  
DIONISIO ROJAS MAMANI  
Ingeniero ACivil  
CIP N° 62336

# FONDO DE DESARROLLO PESQUERO

## FONDEPES

L.P.N : A.S. N° 049-2019-FONDEPES

Obra : REMODELACION DE LAS II.EE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD

Ubicación : VIRU - VIRU - LA LIBERTAD

Supervisor : Ing. Victor Plasencia Tucto

Contratista : CONSORCIO NUEVO TUMBES



## VALORIZACION DE OBRA N°4

(del 01 de Marzo al 15 de Marzo del 2020)



Lima, 03 de abril del 2020

Carta No. 063-2020-VPT/JS

Señor:  
**ING. DIONISIO ROJAS MAMANI**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

Presente. -

ASUNTO : CARTA DE CONTRATISTA CONSORCIO NUEVO  
TUMBES DE VALORIZACION N°04 DE MARZO DE 2020

REFERENCIA : 1. CONTRATO N° 068-2019-FONDEPES  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 053-2019-  
FONDEPES  
"REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE  
DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA  
DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y  
COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO  
ARTESANAL DE PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORÍN, DISTRITO DE  
VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" código único  
2359411  
- CARTA N°015-2020/CONSORCIO NUEVO TUMBES-T

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de saludarlo cordialmente, con la finalidad de hacerle llegar la CARTA N°015-2020/CONSORCIO NUEVO TUMBES-T de parte de la contratista indicando la NO presentación de la valorización N°04 al correspondiente al periodo del 01 al 15 de marzo de 2020 indicando en la carta que se adjunta la justificación del caso , esta supervisión ha verificado hasta el 15 de marzo que la contratista CONSORCIO SUPERVISION TUMBES se mantiene en un avance igual que el mes pasado es decir en un 67.96% siendo su avance al 15 de marzo el 0%.

Se indica que esta supervisión va a realizar las actividades una vez se levante el estado de emergencia

Adjunto:  
- CARTA N°015-2020/CONSORCIO NUEVO TUMBES-T

Sin otro particular, quedo de Ud., aprovechando la oportunidad para reiterarle mi consideración más distinguida.

Atentamente,

  
VICTOR PLASENCIA TUCTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231

# CONSORCIO NUEVO TUMBES

---

Mz. T Lote 12 Sector El Roble del AA.HH. Los Ángeles -Tumbes

Tumbes, 31 de marzo del 2020.

**Carta N° 015— 2020 / CONSORCIO NUEVO TUMBES - T**

Señores

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

ATENCION:

**ING. VICTOR PLASENCIA TUCTO**

SUPERVISOR DE OBRA

ASUNTO: COMUNICA LA NO PRESENTACION DE VAL 04

**REFERENCIA:** OBRA "REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORIN DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.


De mi mayor consideración:

Por medio de la presente le saludo cordialmente y a la vez para dar a conocer que habiendo el Gobierno decretado Estado de Emergencia a nivel nacional y la inmovilización de todas las personas a partir del día 16 de Marzo del presente año, no se ha podido tener acceso a las anotaciones del cuaderno de Obra y ver los metrados avanzados desde el 01 hasta el día 15 de Marzo, por lo que comunico a la Supervisión que no estaremos presentando valorización por el mes de Marzo.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO  
"NUEVO TUMBES"  
Ing. Eifed Carrasco Pérez  
REPRESENTANTE COMÚN





**Informe N° 011-2020-VPT/JS**

Al : Ing. JORGE ROBERTO ÑAHUE SIVIRICHI  
DIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES PESQUERAS ARTESANAL Y  
ACUICOLA

Del : Ing. VICTOR PLASENCIA TUCTO  
JEFE DE SUPERVISIÓN

ATENCION : ARQ STEFANY CARPIO VELASQUEZ  
COORDINADORA DE OBRA

ASUNTO : VALORIZACION N°04 PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2020

REF. : 1. CONTRATO N° 068-2019-FONDEPES  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 053-2019-  
FONDEPES  
"REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE  
DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS  
PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL  
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE  
MORIN, DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" código  
único 2359411

Fecha : Lima 03 de Abril de 2020

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez comunicarle que el plazo contractual de la obra en mención que viene realizando la contratista CONSORCIO NUEVO TUMBES según cronograma de obra aprobado, ha concluido el 08 de marzo de 2020, sin embargo todavía quedan algunas partidas por concluir en Obras Portuarias, a partir del 09 de marzo de 2020 se aplicara el numeral 162.1 del Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Sin otro particular quedo de ustedes, aprovechando la oportunidad para reiterarle mi consideración más distinguida.

Atentamente,

  
VÍCTOR PLASENCIA TUCTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231



## 1. GENERALIDADES

### 1.1 INFORMACIÓN DE LA OBRA

- Ubicación : MORIN – VIRU – VIRU – LA LIBERTAD.
- Contratista : CONSORCIO NUEVO TUMBES
- Supervisión : DIONISIO ROJAS MAMANI
- Jefe de Supervisión : Ing. VICTOR PLASENCIA TUCTO
- Sistema de Contratación : SUMA ALZADA
- Proceso de Selección : ADJUDIC. SIMPLIF. N°049-2019-FONDEPES
- Número del Contrato : Contrato N° 061-2019- FONDEPES
- Monto Base : S/. 1'061,406.90 Soles (Inc. IGV)
- Monto Contratado : S/. 955,266.22 Soles (Inc. IGV)
- Entrega del Terreno : 09/12/2019
- Fecha de inicio de obra : 10/12/2019
- Fecha de Término de obra : 08/03/2020
- Plazo de ejecución : 120 días calendarios

### 1.2 SITUACION DE LA OBRA:

#### ASPECTOS TECNICOS

- SITUACION DE LA OBRA : **ATRASADA**
- AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO AL 15 DE MARZO : **100.00%**
- FECHA DEL TÉRMINO CONTRACTUAL.
- AVANCE EJECUTADO ACUMULADO AL 15 DE MARZO : **67.96 %**
- FECHA DEL TÉRMINO CONTRACTUAL.
- SITUACION ACTUAL DE AVANCE DE OBRA
- ATRAZADO** : **32.04 %**

  
VICTOR PLASENCIA TUCTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231

### 1.3 ANTECEDENTES:

- Con fecha 24 de octubre de 2019 , el comité de selección adjudico la buena pro de la adjudicación simplificada N°049-2019-FONDEPES-primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de obra “REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORÍN, DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” , a la empresa CONSORCIO NUEVO TUMBES (conformado por :CONPROVI EIRL y BRECAL CONTRATISTAS GENERALES SRL).
- Con fecha 25 de noviembre de 2019, se suscribió el contrato N°061-2019-FONDEPES referente a la ejecución de la obra :” REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORÍN, DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” con la empresa CONSORCIO NUEVO TUMBES.
- Con fecha 28 de octubre del 2019 se adjudicó la buena Pro la adjudicación Simplificada - 2019-N°053 FONDEPES para la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de obra: :” REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORÍN, DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” a nombre del Sr. Dionisio Rojas Mamani.
- Con fecha 28 de noviembre del 2019 , se suscribe el contrato N°068-2019- FONDEPES de supervisión de Obra :” REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORÍN, DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” a nombre del Sr. Dionisio Rojas Mamani., quien asumirá la representación de la Entidad ante el Contratista de Obra.
- Con fecha 02 de diciembre 2019, mediante la carta N°006-2019/CONSORCIO NUEVO TUMBES-T el contratista de obra CONSORCIO NUEVO TUMBES solicito adelanto directo del 10%.

  
VICTOR PLASENCIA TUCTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231



- Con fecha 06 de diciembre del 2019, mediante Carta N°1257-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, FONDEPES entrega el expediente técnico de obra al CONSORCIO NUEVO TUMBES.
- Con fecha 06 de diciembre del 2019, mediante la carta N° 1256-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, FONDEPES entrega el expediente técnico de obra a la Supervisión Dionisio Rojas Mamani.
- Con fecha 06 de diciembre del 2019, mediante la carta N° 1260-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, FONDEPES notifica al contratista de obra CONSORCIO NUEVO TUMBES sobre la designación de la supervisión de obra.
- Con fecha 09 de diciembre del 2019, se suscribió el acta de entrega de terreno para la ejecución de la obra entre FONDEPES y el contratista CONSORCIO NUEVO TUMBES
- Con fecha 10 de diciembre del 2019, se inicia el plazo contractual de la ejecución de la obra:” REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORÍN, DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” , habiéndose cumplido con todos los requisitos del Artículo N°176 de la ley de Contrataciones con el Estado .

#### **1.4 BASE LEGAL:**

Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante DS N° 344-2018- EF

Artículo 208.- RECEPCION DE LA OBRA Y PLAZOS de la Ley N° 30225

De conformidad con el Artículo 208 de la Ley,.....de no constatar la culminación de la Obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la entidad en el mismo plazo (05 días calendarios del término de plazo contractual).

  
VICTOR PLASEÑCIA TUCTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231

#### **1.5 CONCLUSIONES:**

1. El 10 de diciembre del 2019 se inicia la Obra en mención teniendo un plazo contractual de 120 días calendarios el cual se ha cumplido el 08 de marzo de 2020.
2. Al 15 de marzo del 2020 la obra se encuentra atrasada en un **67.96 %**.



3. El porcentaje de ejecución programado al 08 de marzo de 2020 es de **100.00%** existiendo un acumulado real de **67.96 %**, por lo tanto, a la fecha del termino contractual la obra se encuentra ATRAZADA en un **de 32.04 %**
4. Se indica a la Entidad que la Contratista CONSORCIO NUEVO TUMBES, continúa laborando con su personal en Obra.
5. Se indica que la contratista CONSORCIO NUEVO TUMBES no presento la valorización N°04 correspondiente al periodo del 01 al 15 de Marzo de 2020.
6. La contratista CONSORCIO NUEVO TUMBES solo presento la carta N° 015 -2020 / CONSORCIO NUEVO TUMBES-T en la cual indica que por medio de la presente le saludo cordialmente y a la vez para dar a conocer que habiendo el Gobierno decretado Estado de Emergencia a nivel nacional y la inmovilización de todas las personas a partir del día 16 de Marzo del presente año, no se ha podido tener acceso a las anotaciones del cuaderno de Obra y ver los metrados avanzados desde el 01 hasta el día 15 de Marzo, por lo que comunico a la Supervisión que no estaremos presentando valorización por el mes de Marzo.
7. Se indica que no se presenta las copias del cuaderno de Obra por no tener acceso a esta, dada las circunstancias originadas por la paralización de las actividades.
8. Por lo indicado ella contratista CONSORCIO NUEVO TUMBES a Valorizado en el periodo del 01 al 15 de marzo 0%.

**1.6 RECOMENDACIONES:**

1. Se recomienda a la Contratista CONSORCIO NUEVO TUMBES acelerar con los trabajos de las partidas inconclusas a partir del reinicio de las actividades ya que a la fecha están en penalidad.
2. Se indica que en su CONTRATO N°61-2019- FONDEPES, dice en la CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES,.... Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso.
3. Se recomienda a la contratista acelerar con los trabajos y terminar lo más antes posible ya que cada día que pasa las penalidades van sumando perjudicándose económicamente.

  
VICTOR PLASENCIA TUCTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231

# FONDO DE DESARROLLO PESQUERO

## INFORME N° 04-2020-VPT/JS

A : Ing. Dionisio Rojas Mamani  
Supervisión de Obra

ASUNTO : VALORIZACION DE OBRA N°4 (del 01 de Marzo al 15 de Marzo del 2020)

REFERENCIA : Licitación Pública :A.S. N°049-2019-FONDEPES

Obra:REMODELACION DE LAS II.EE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS,  
REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA  
EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD  
VIRU - VIRU - LA LIBERTAD  
Contratista:CONSORCIO NUEVO TUMBES  
Supervisor:Ing. Victor Plasencia Tucto

Adjunto a la presente remito a usted, para su tramite, la aprobación de la documentación de la Valorización N° 4 de la Obra en Referencia, correspondiente al avance (del 01 de Marzo al 15 de Marzo del 2020) y cuyos cálculos son los siguientes:

### A.- VALORIZACIÓN CONTRACTUAL.

Obras Portuarias		0.00
Estructuras		0.00
Arquitectura		0.00
Instalaciones Electricas		0.00
Plan de Contingencia		0.00
<b>VALORIZACIÓN CONTRACTUAL ( V)=</b>		<b>0.00</b>
AVANCE DE OBRA ACUMULADO REAL	67.96%	
AVANCE DE OBRA ACUMULADO PROGRAMADO	100.00%	

### B.- REAJUSTES.

Obras Portuarias		0.00
Estructuras		0.00
Arquitectura		0.00
Instalaciones Electricas		0.00
Plan de Contingencia		0.00
<b>REAJUSTES (R) =</b>		<b>0.00</b>

C.- VALORIZACIÓN BRUTA (VB)= V +R **0.00**

### D.- AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS.

(D1) Amortización del adelanto directo = 0.10 * V		0.00
(D2) Amortización del adelanto para materiales		0.00

**AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS (D) = 0.00**

E.- VALORIZACIÓN NETA (VN) = VB-D **0.00**

F.- PENALIDAD POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA **0.00**

### G.- MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA

EFFECTIVO (VN - F)		0.00
I.G.V. 18% (VN-F)		0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>0.00</b>

  
VÍCTOR PLASENCIA TUCTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231

H.- CALENDARIO DE COMPROMISOS A SOLICITAR **0.00**  
(VN) + I.G.V.

Atentamente

FECHA BASE DEL PRESUPUESTO	01/06/19
MES DE INICIO DE VALORIZACIONES	01/12/19

  
 VÍCTOR PLASEÑCIA TUCTO  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 83231

CONTROL DE VALORIZACION (DATOS SIN IGV)							
Nº	MES	PORTUARIAS	ESTRUCTURAS	ARQUITECTURA	INST. ELECT.	CONTINGENCIA	TOTAL
1	01/12/2019	22,094.98	5,276.24	106.81	13,988.81	18,288.14	59,754.98
2	01/01/2020	25,755.78	88,120.53	74,242.55	73,043.25	11,818.08	272,980.19
3	01/02/2020	19,167.78	11,616.00	32,905.34	153,776.35	0.00	217,465.47
4	01/03/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACUMULADO ACTUAL</b>		<b>67,018.54</b>	<b>105,012.77</b>	<b>107,254.70</b>	<b>240,808.41</b>	<b>30,106.22</b>	<b>550,200.64</b>
<b>CONTRATO</b>		<b>326,365.54</b>	<b>105,012.77</b>	<b>107,254.70</b>	<b>240,808.41</b>	<b>30,106.22</b>	<b>809,547.64</b>
<b>SALDO</b>		<b>259,347.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,347.00</b>

CONTROL DE LA VALORIZACION									
ESPECIALIDAD	Monto del Contrato sin IGV	Anterior	Mes Actual	Acumulado	%	Saldo	%	Avance Programado Acumulado	%
OBRAS PORTUARIAS	326,365.54	67,018.54	0.00	67,018.54	20.53%	259,347.00	79.47%	326,365.54	100.00%
ESTRUCTURAS	105,012.77	105,012.77	0.00	105,012.77	100.00%	0.00	0.00%	105,012.77	100.00%
ARQUITECTURA	107,254.70	107,254.70	0.00	107,254.70	100.00%	0.00	0.00%	107,254.70	100.00%
INST. ELECTRICAS	240,808.41	240,808.41	0.00	240,808.41	100.00%	0.00	0.00%	240,808.41	100.00%
PLAN DE CONTINGENCIA	30,106.22	30,106.22	0.00	30,106.22	100.00%	0.00	0.00%	30,106.22	100.00%
<b>SUB-TOTAL</b>	809,547.64	550,200.64	0.00	550,200.64	67.96%	259,347.00	32.04%	809,547.64	100.00%
<b>IMPUESTO IGV 18%</b>	145,718.58	99,036.12	0.00	99,036.12	67.96%	46,682.46	32.04%	145,718.58	100.00%
<b>TOTAL</b>	955,266.22	649,236.76	0.00	649,236.76	<b>67.96%</b>	306,029.46	32.04%	955,266.22	<b>100.00%</b>

  
**VÍCTOR PLASENCIA TUCTO**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 83231

CONTROL DE AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO			
MONTO SIN IGV =		80,954.76	
FECHA DE PAGO		06-dic-19	
VAL	MES		SALDO
1	01-dic-19	5,975.50	74,979.26
2	01-ene-20	27,298.02	47,681.24
3	01-feb-20	21,746.55	25,934.69
4	01-mar-20	0.00	25,934.69
<b>TOTAL</b>		55,020.07	

CONTROL DE AMORTIZACION DEL ADELANTO P/MATERIALES			
MONTO SIN IGV =		S/. 147,464.03	
FECHA DE PAGO		06-feb-20	
VAL	MES	AMORTIZ.	SALDO
1	01-dic-19	0.00	147,464.03
2	01-ene-20	0.00	147,464.03
3	01-feb-20	79,700.56	67,763.47
4	01-mar-20	0.00	67,763.47
	<b>TOTAL</b>	79,700.56	

L.P.N. : A.S. N° 049-2019-FONDEPES  
 Obra : REMODELACION DE LAS I.I.EE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD  
 Ubicación : VIRU - VIRU - LA LIBERTAD  
 Area Geográfica : 1  
 Valor Referencial : S/. 1,061,406.90  
 Monto Contractual : S/. 955,266.22  
 Supervisor : Ing. Victor Plasencia Tucto  
 Contratista : CONSORCIO NUEVO TUMBES  
 Plazo de Ejecución de Obra : 90 días calendarios

**RESUMEN DE VALORIZACION 03**  
 MES DE FEBRERO 2020

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATO	VAL ACUM ANTERIOR	VAL ACTUAL	VAL ACUM ACTUAL	% DE AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
a) Fórmula No 01 Obras Portuarias	326,365.54	67,018.54	0.00	67,018.54	20.53	259,347.00
b) Fórmula No 02 Estructuras	105,012.77	105,012.77	0.00	105,012.77	100.00	0.00
c) Fórmula No 03 Arquitectura	107,254.70	107,254.70	0.00	107,254.70	100.00	0.00
d) Fórmula No 04 Instalaciones Electricas	240,808.41	240,808.41	0.00	240,808.41	100.00	0.00
e) Fórmula No 05 Plan de Contingencia	30,106.22	30,106.22	0.00	30,106.22	100.00	0.00
<b>TOTAL CONTRACTUAL</b>	<b>809,547.64</b>	<b>550,200.64</b>	<b>0.00</b>	<b>550,200.64</b>	<b>67.96</b>	<b>259,347.00</b>
<b>% DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA</b>		<b>67.96%</b>	<b>0.00%</b>	<b>67.96%</b>		<b>32.04%</b>
<b>REAJUSTES (S)</b>						
a) Fórmula No 01 Obras Portuarias			0.00	0.00		
b) Fórmula No 02 Estructuras			0.00	0.00		
c) Fórmula No 03 Arquitectura			0.00	0.00		
d) Fórmula No 04 Instalaciones Electricas			0.00	0.00		
e) Fórmula No 05 Plan de Contingencia			0.00	0.00		
<b>TOTAL REAJUSTE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>AMORTIZACION (A)</b>						
Amortización del Adelanto en Efectivo	80,954.76	55,020.07	0.00	55,020.07		25,934.69
Amortización del Adelanto para Materiales	147,464.03	79,700.56	0.00	79,700.56		67,763.47
<b>TOTAL AMORTIZACIONES</b>	<b>228,418.79</b>	<b>134,720.63</b>	<b>0.00</b>	<b>134,720.63</b>		<b>93,698.16</b>
<b>VALORIZACION NETA (VN=VA-A)</b>		<b>415,480.01</b>	<b>0.00</b>	<b>415,480.01</b>		
<b>MULTA POR ATRASO DE OBRA (M)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>						
En efectivo (VN-M)		415,480.01	0.00	415,480.01		
En IGV (VN x 18%)		74,786.40	0.00	74,786.40		
<b>MONTO TOTAL CON IGV</b>		<b>490,266.41</b>	<b>0.00</b>	<b>490,266.41</b>		
<b>TOTAL COMPROMISO</b>			<b>0.00</b>	<b>490,266.41</b>		

  
 VICTOR PLASENCIA TUCTO  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 83231

## I.- FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

**VALORIZACION DE OBRA N° 4 (del 01 de Marzo al 15 de Marzo del 2020)**

	REMODELACION DE LAS II.EE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD		
<b>1 Obra</b>	:	MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD	
<b>2 Ubicación</b>	:	VIRU - VIRU - LA LIBERTAD	
	Area Geografica	:	1
<b>3 Metas</b>	:	<b>Obras Portuarias</b> (Construcción de sistema de defensa y amarre en plataforma 1 y 2 de cabezo de muelle) <b>Estructuras</b> (Construcción de estructura metálica para techo de plataforma 1 y 2 de cabezo de muelle) <b>Arquitectura</b> (Remodelación de 4 lavamanos existentes, impermeabilizar techos y cobertura de estructura en cabezo de muelle) <b>Instalaciones Electricas</b> (Remodelación del sistema de inst. electricas)	
<b>4 Entidad Contratante</b>	:	FONDEPES	
<b>5 Contratista</b>	:	CONSORCIO NUEVO TUMBES	
<b>6 Supervisor</b>	:	Ing. Victor Plasencia Tucto	CIP N° 83231
<b>7 Residente</b>	:	Ing. Freddy Carrasco Perez	CIP N° 40216
<b>8 Financiamiento</b>	:	Recursos Ordinarios de la Entidad	
<b>9 Licitación Pública</b>	:	A.S. N° 049-2019-FONDEPES	
<b>10 Modalidad</b>	:	A Suma Alzada	
<b>11 Presupuesto base, con IGV y Fecha</b>	:	S/. 1,061,406.90	01-jun-19
<b>12 Presupuesto base, sin IGV y Fecha</b>	:	S/. 899,497.37	
<b>13 Factor de Relación (FR)</b>	:	0.90000	
<b>14 Monto del contrato, con IGV</b>	:	S/. 955,266.22	
<b>15 Monto del contrato, sin IGV</b>	:	S/. 809,547.64	
<b>16 Plazo de ejecución, en d. c.</b>	:	90	
<b>17 Plazo de ejecución según Bases Lic., en d.c.</b>	:	90	
<b>18 Prórrogas, días calendario</b>	:	0	
<b>19 Adicionales de obra con IGV</b>	:	1 S/. 0.00	
<b>Adicionales de obra sin IGV</b>	:	1 S/. 0.00	
<b>20 Deductivo de obra con IGV</b>	:	1 S/. 0.00	
<b>Deductivo de obra sin IGV</b>	:	1 S/. 0.00	
<b>21 Fecha de Firma de Contrato de obra</b>	:		
<b>22 Reconocimiento de mora Firma Contrato</b>	:		
<b>23 Comp.Gastos incump. entrega terreno</b>	:		
<b>24 Intereses por Mora, con IGV</b>	:		
<b>25 Intereses por Mora, sin IGV</b>	:		
<b>26 Mayor Gastos Gral. prorroga plazo, c/IGV</b>	:		
<b>27 Mayor Gastos Gral. prorroga plazo, s/IGV</b>	:		
<b>28 Adelanto directo con IGV y fecha de pago</b>	:	S/. 95,526.62	06-dic-19 10.00%
<b>29 Adelanto directo sin IGV y fecha de pago</b>	:	S/. 80,954.76	06-dic-19
<b>30 Adelantos para materiales, con IGV</b>	:	S/. 174,007.55	06-feb-20 18.22%
<b>31 Adelantos para materiales, sin IGV</b>	:	S/. 147,464.03	06-feb-20
<b>32 Entrega de terreno</b>	:	09-dic-19	
<b>33 Inicio oficial de plazo</b>	:	10-dic-19	
<b>34 Término original programado de obra</b>	:	08-mar-20	
<b>35 Término vigente programado de obra</b>	:	08-mar-20	
<b>36 Término Real de obra</b>	:		
<b>37 Constatación Física</b>	:		
<b>38 Levantamiento de Observaciones</b>	:		
<b>39 Acta de Recepción de Obra</b>	:		
<b>40 Avance Real Acumulado</b>	:	67.96%	
<b>41 Avance Programado Acumulado</b>	:	100.00%	
<b>42 Situación de la obra respecto del avance</b>	:	<b>Atrasada</b>	

  
 VICTOR PLASENCIA TUCTO  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 83231

## OBRAS PORTUARIAS

VALORIZACION DE OBRA N°

4

(del 01 de Marzo al 15 de Marzo del 2020)

OBRA :

REMODELACION DE LAS ILEE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD

UBICACIÓN :

VIRU - VIRU - LA LIBERTAD

L.P.N. N°

: A.S. N° 049-2019-FONDEPES

PRESUPUESTO BASE :

1,061,406.90

F.R. = 0.90000

CONTRATISTA

: CONSORCIO NUEVO TUMBES

MONTO DEL CONTRATO :

955,266.22

PAG. N° 1

PART.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO BASE				AVANCES							SALDOS		
		UND.	METRADO	P.UNIT. S/.	PRESUP. S/.	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO			METRADO	VALOR S/.	
						METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	%			
<b>01.01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>														
01.01.01	MOVILIZ. Y DESMOVILIZ. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	4,500.00	4,500.00	0.50	2,250.00	0.00	0.00	0.50	2,250.00	50.00	0.50	2,250.00	
01.01.02	FLETE TERRESTRE DE MATERIALES	ton	1.00	6,736.95	6,736.95	1.00	6,736.95	0.00	0.00	1.00	6,736.95	100.00	0.00	0.00	
01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA	mes	3.00	850.05	2,550.15	2.50	2,125.13	0.00	0.00	2.50	2,125.13	83.33	0.50	425.03	
01.01.04	AGUA PARA OBRA	mes	3.00	516.96	1,550.88	2.50	1,292.40	0.00	0.00	2.50	1,292.40	83.33	0.50	258.48	
01.01.05	ENERGIA PARA OBRA	mes	3.00	1,861.42	5,584.26	2.50	4,653.55	0.00	0.00	2.50	4,653.55	83.33	0.50	930.71	
01.01.06	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA	und	1.00	1,685.31	1,685.31	1.00	1,685.31	0.00	0.00	1.00	1,685.31	100.00	0.00	0.00	
01.01.07	OFICINAS, ALMACENES Y TALLERES	m2	21.00	105.40	2,213.40	21.00	2,213.40	0.00	0.00	21.00	2,213.40	100.00	0.00	0.00	
01.01.08	SS.HH. PROVISIONALES	mes	3.00	380.00	1,140.00	2.50	950.00	0.00	0.00	2.50	950.00	83.33	0.50	190.00	
<b>01.02</b>	<b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>														
01.02.01	PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPAC. Y MEDIO AMBIENTE	glb	1.00	3,835.00	3,835.00	0.83	3,183.05	0.00	0.00	0.83	3,183.05	83.00	0.17	651.95	
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	4,067.50	4,067.50	0.83	3,376.03	0.00	0.00	0.83	3,376.03	83.00	0.17	691.48	
01.02.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	1,515.75	1,515.75	0.83	1,258.07	0.00	0.00	0.83	1,258.07	83.00	0.17	257.68	
01.02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	3,176.30	3,176.30	0.83	2,636.33	0.00	0.00	0.83	2,636.33	83.00	0.17	539.97	
01.02.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	2,500.00	2,500.00	0.83	2,075.00	0.00	0.00	0.83	2,075.00	83.00	0.17	425.00	
<b>01.03</b>	<b>DESMONTAJES</b>														
01.03.01	DESMONTAJE DE SISTEMA DE DEFENSA EXISTENTE	glb	1.00	4,837.47	4,837.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,837.47	
01.03.02	DESMONTAJE DE PESCANTES EXISTENTES	und	2.00	573.93	1,147.86	2.00	1,147.86	0.00	0.00	2.00	1,147.86	100.00	0.00	0.00	
01.03.03	DESMONTAJE DE BITAS EXISTENTES	und	6.00	123.46	740.76	6.00	740.76	0.00	0.00	6.00	740.76	100.00	0.00	0.00	
<b>01.04</b>	<b>SISTEMA DE DEFENSA</b>														
01.04.01	LIMPIEZA PILOTES D/CONC. ARMADO DE PLATAF. BAJA	und	12.00	300.36	3,604.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	3,604.32	
01.04.02	SUM. E INST. ARRIOS. SEG. PILOTES DE PLATAF. BAJA Y CAB.	und	3.00	3,835.32	11,505.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	11,505.96	
01.04.03	SUM. E INST. ABRAZAD. MET. INC. MONTAJE Y SOLDADURA	und	9.00	1,344.75	12,102.75	6.00	8,068.50	0.00	0.00	6.00	8,068.50	66.67	3.00	4,034.25	
01.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPES DE MADERA	und	9.00	614.06	5,526.54	6.00	3,684.36	0.00	0.00	6.00	3,684.36	66.67	3.00	1,842.18	
01.04.05	SUM. E INST. DE VIGA W12X65 INC. MONTAJE Y SOLDADURA	m	33.00	675.04	22,276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	22,276.32	
01.04.06	ARENADO Y PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS	m2	91.06	129.15	11,760.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.06	11,760.40	
01.04.07	SUM. E INSTALACION DE PARANTES DE MADERA 8" x 10"	m	66.00	479.23	31,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	31,629.18	
01.04.08	SUM. E INSTALACION DE LARGUEROS DE MADERA 8" x 10"	m	165.00	586.48	96,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	96,769.20	
01.04.09	SUM. E INST. D/CALZOS D/MADERA C/ALIVIAD. PLATAF. BAJA	m	16.41	538.33	8,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.41	8,834.00	
01.04.10	SUM. Y APLIC. PRESERV. DE MADERA EN SIST. DE DEFENSA	m2	218.73	15.96	3,490.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.73	3,490.93	
01.04.11	SUM. E INSTALACION DE NEUMATICOS ARO 20 EN DESUSO	und	55.00	320.42	17,623.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	17,623.10	
01.04.12	SUM. E INST. DE BITAS DE AMARRE INC. ARENADO Y PINTADO	und	6.00	1,601.43	9,608.58	6.00	9,608.58	0.00	0.00	6.00	9,608.58	100.00	0.00	0.00	
01.04.13	MANTENIM. DE BITAS EXIST. (PLATAFORMA 3 Y CABEZO)	und	5.00	98.11	490.55	5.00	490.55	0.00	0.00	5.00	490.55	100.00	0.00	0.00	
01.04.14	ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE SOLDADURA	pto	12.00	25.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	300.00	

TOTAL COSTO DIRECTO

(A)

283,303.42

58,175.82

0.00

58,175.82 20.53%

225,127.59

GASTOS GENERALES 9.2%

(B)

26,063.91

5,352.18

0.00

5,352.18 20.53%

20,711.74

UTILIDADES 6%

(C)

16,998.21

3,490.54

0.00

3,490.54

13,507.66

SUB TOTAL

(A + B + C)

326,365.54

67,018.54

0.00

67,018.54 20.53%

259,346.99

  
 VICTOR PLASENCIA TUCTO  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 83231

## ESTRUCTURAS

VALORIZACION DE OBRA N°

4

(del 01 de Marzo al 15 de Marzo del 2020)

OBRA

REMODELACION DE LAS ILEE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS  
: PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU -  
VIRU - LA LIBERTAD

UBICACIÓN :

VIRU - VIRU - LA LIBERTAD

L.P.N. N°

: A.S. N° 049-2019-FONDEPES

PRESUPUESTO BASE

: 1,061,406.90

F.R. = 0.90000

CONTRATISTA

: CONSORCIO NUEVO TUMBES

MONTO DEL CONTRATO

: 955,266.22

PAG. N° 1

PART.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO BASE				AVANCES						SALDOS		
		UND	METRADO	P.UNIT. S/.	PRESUP. S/.	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		METRADO	VALOR S/.	
						METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.			%
<b>0201</b>	<b>DESMONTAJES Y DEMOLICIONES</b>													
02.01.01	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA EXISTENTE	m2	89.84	25.81	2,318.77	89.84	2,318.77	0.00	0.00	89.84	2,318.77	100.00	0.00	0.00
02.01.02	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO	m3	0.10	282.30	28.23	0.10	28.23	0.00	0.00	0.10	28.23	100.00	0.00	0.00
02.01.03	DESMONTAJE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES	m	165.80	10.44	1,730.95	165.80	1,730.95	0.00	0.00	165.80	1,730.95	100.00	0.00	0.00
02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	m3	0.13	42.05	5.47	0.13	5.47	0.00	0.00	0.13	5.47	100.00	0.00	0.00
<b>0202</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>													
02.02.01	<b>PEDESTALES</b>													
02.02.01.01	CONCRETO Fc= 280 kg/cm2, PEDESTALES	m3	1.02	496.15	506.07	1.02	506.07	0.00	0.00	1.02	506.07	100.00	0.00	0.00
02.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTALES	m2	11.66	50.60	590.00	11.66	590.00	0.00	0.00	11.66	590.00	100.00	0.00	0.00
02.02.01.03	ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2, PEDESTALES	kg	159.88	4.93	788.21	159.88	788.21	0.00	0.00	159.88	788.21	100.00	0.00	0.00
02.02.02	<b>MANILUVIOS</b>													
02.02.02.01	CONCRETO Fc= 210 kg/cm2, MANILUVIOY LAVABOTAS	m3	0.80	431.32	345.06	0.80	345.06	0.00	0.00	0.80	345.06	100.00	0.00	0.00
02.02.02.02	ENCOF. Y DESENCOF. DE MUROS MANILUVIOS Y LAVABOTAS	m2	11.24	50.60	568.74	11.24	568.74	0.00	0.00	11.24	568.74	100.00	0.00	0.00
02.02.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN MANILUVIOS Y LAVABOTAS	kg	41.60	4.93	205.09	41.60	205.09	0.00	0.00	41.60	205.09	100.00	0.00	0.00
02.02.02.04	ANCLAJES Y PERFORACIONES EN CONCRETO EXISTENTE	pto	24.00	27.92	670.08	24.00	670.08	0.00	0.00	24.00	670.08	100.00	0.00	0.00
<b>0203</b>	<b>ESTRUCTURAS METALICAS PARA COBERTURA</b>													
02.03.01	APOYO VERTICAL P/COLUMNA METALICAS	und	10.00	168.49	1,684.90	10.00	1,684.90	0.00	0.00	10.00	1,684.90	100.00	0.00	0.00
02.03.02	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	kg	3,955.14	17.65	69,808.22	3,955.14	69,808.22	0.00	0.00	3,955.14	69,808.22	100.00	0.00	0.00
02.03.03	PRUEBA DE SOLDADURA Y CONTROL DE CALIDAD	glb	1.00	500.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	100.00	0.00	0.00
02.03.04	SISTEMA DE PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA, e=13mills	m2	112.89	89.32	10,083.33	112.89	10,083.33	0.00	0.00	112.89	10,083.33	100.00	0.00	0.00
02.03.05	<b>VIARIOS</b>													
02.03.05.01	PUENTE DE ADHERENCIA EN BASE DE PEDESTALES	und	10.00	18.87	188.70	10.00	188.70	0.00	0.00	10.00	188.70	100.00	0.00	0.00
02.03.05.02	ANCLAJES DE REFUERZO C/ RESINA EPOXICA	und	10.00	113.51	1,135.10	10.00	1,135.10	0.00	0.00	10.00	1,135.10	100.00	0.00	0.00

<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>	(A)	<b>91,156.92</b>	<b>91,156.92</b>	<b>0.00</b>	<b>91,156.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>GASTOS GENERALES 9.2%</b>	(B)	<b>8,386.43</b>	<b>8,386.43</b>	<b>0.00</b>	<b>8,386.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>
<b>UTILIDADES 6%</b>	(C)	<b>5,469.42</b>	<b>5,469.42</b>	<b>0.00</b>	<b>5,469.42</b>		<b>0.00</b>
<b>SUB TOTAL</b>	(A + B + C)	<b>105,012.77</b>	<b>105,012.77</b>	<b>0.00</b>	<b>105,012.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>

  
 VICTOR PLASENCIA TUCTO  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 83231

## ARQUITECTURA

VALORIZACION DE OBRA N°

4

(del 01 de Marzo al 15 de Marzo del 2020)

OBRA

REMODELACION DE LAS ILEE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE  
: TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD  
MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD

UBICACIÓN :

VIRU - VIRU - LA LIBERTAD

L.P.N. N°

: A.S. N° 049-2019-FONDEPES

PRESUPUESTO BASE

: 1,061,406.90

F.R. = 0.90000

CONTRATISTA

: CONSORCIO NUEVO TUMBES

MONTO DEL CONTRATO

: 955,266.22

PAG. N° 1

PART.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO BASE				AVANCES							SALDOS	
		UND	METRADO	P.UNIT. S/.	PRESUP. S/.	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO			METRADO	VALOR S/.
						METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	%		
<b>03.01</b>	<b>DEMOLICIONES</b>													
03.01.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO SIMPLE	m3	0.47	136.18	64.00	0.47	64.00	0.00	0.00	0.47	64.00	100.00	0.00	0.00
03.01.02	ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES	m3	0.47	19.05	8.95	0.47	8.95	0.00	0.00	0.47	8.95	100.00	0.00	0.00
03.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	0.56	42.05	23.55	0.56	23.55	0.00	0.00	0.56	23.55	100.00	0.00	0.00
<b>03.02</b>	<b>REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS</b>													
03.02.01	TARRAJEO C/IMPERMEAB. ACABADO CEMEN. PULIDO MANILUVIOS	m2	19.16	45.54	872.55	19.16	872.55	0.00	0.00	19.16	872.55	100.00	0.00	0.00
<b>03.03</b>	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>													
03.03.01	PISO CEMEN. PULIDO C/IMPER. e=5cm., CONC. 1:10 P/ACC. MANILUVIOS	m2	2.00	45.43	90.86	2.00	90.86	0.00	0.00	2.00	90.86	100.00	0.00	0.00
03.03.02	PISO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE	m2	718.78	40.23	28,916.52	718.78	28,916.52	0.00	0.00	718.78	28,916.52	100.00	0.00	0.00
<b>03.04</b>	<b>COBERTURAS</b>													
03.04.01	SUM. E INST. COBERT. LIGERA CALAMINON TR-4, ROJO, E=6MM	m2	138.45	165.80	22,955.01	138.45	22,955.01	0.00	0.00	138.45	22,955.01	100.00	0.00	0.00
<b>03.05</b>	<b>PINTURA</b>													
03.05.01	PINTURA EPOXICA EN SARDINELES	m2	107.77	33.70	3,631.85	107.77	3,631.85	0.00	0.00	107.77	3,631.85	100.00	0.00	0.00
<b>03.06</b>	<b>APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS</b>													
03.06.01	SIST. GRIF. GALV. CUELLO GANZO C/ACC. A PEDAL (INC. ACCES.)	und	4.00	742.44	2,969.76	4.00	2,969.76	0.00	0.00	4.00	2,969.76	100.00	0.00	0.00
<b>03.07</b>	<b>OTROS</b>													
03.07.01	SUM. E INST. DE BARANDAS FRP DE E=2" INC./ACCESORIOS	m	165.80	190.55	31,593.19	165.80	31,593.19	0.00	0.00	165.80	31,593.19	100.00	0.00	0.00
03.07.02	RESANE C/IMPERMEABILIZANTE EN SARDINELES	glb	1.00	1,976.80	1,976.80	1.00	1,976.80	0.00	0.00	1.00	1,976.80	100.00	0.00	0.00

TOTAL COSTO DIRECTO

(A)

93,103.04

93,103.04

0.00

93,103.04 100.00%

0.00

GASTOS GENERALES 9.2%

(B)

8,565.48

8,565.48

0.00

8,565.48 100.00%

0.00

UTILIDADES 6%

(C)

5,586.18

5,586.18

0.00

5,586.18

0.00

SUB TOTAL

(A + B + C)

107,254.70

107,254.70

0.00

107,254.70 100.00%

0.00

  
 VÍCTOR PLASENCIA TUCTO  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 83231

## INSTALACIONES ELECTRICAS

VALORIZACION DE OBRA N°

4

(del 01 de Marzo al 15 de Marzo del 2020)

REMODELACION DE LAS ILEE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD

OBRA : MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD

UBICACIÓN : VIRU - VIRU - LA LIBERTAD

L.P.N. N° : A.S. N° 049-2019-FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO NUEVO TUMBES

PRESUPUESTO BASE : 1,061,406.90  
 MONTO DEL CONTRATO : 955,266.22

F.R. = 0.90000

PAG. N° 1

PART.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO BASE				AVANCES							SALDOS	
		UND	METRADO	P.UNIT. S/.	PRESUP. S/.	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO			METRADO	VALOR S/.
						METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	%		
<b>04.01</b>	<b>ZONA EXTERIORES Y MUELLE - CABEZO</b>													
<b>04.01.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>													
04.01.01.01	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	glb	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00
04.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PARA IIEE	glb	1.00	612.84	612.84	1.00	612.84	0.00	0.00	1.00	612.84	100.00	0.00	0.00
04.01.01.03	BASE DE CONCRETO PARA PARANTE	glb	1.00	354.94	354.94	1.00	354.94	0.00	0.00	1.00	354.94	100.00	0.00	0.00
04.01.01.04	CORTE Y REPOSICION DE PISO, PARED Y TECHO	m	125.50	48.23	6,052.87	125.50	6,052.87	0.00	0.00	125.50	6,052.87	100.00	0.00	0.00
04.01.01.05	CORTE Y DEMOLICION DE LOSA SECCION 50X20CM	m	105.63	23.78	2,511.88	105.63	2,511.88	0.00	0.00	105.63	2,511.88	100.00	0.00	0.00
04.01.01.06	EXCAVACION DE ZANJA DE 50X60cm	m	105.63	15.33	1,619.31	105.63	1,619.31	0.00	0.00	105.63	1,619.31	100.00	0.00	0.00
04.01.01.07	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS 50x60cm	m	105.63	13.26	1,400.65	105.63	1,400.65	0.00	0.00	105.63	1,400.65	100.00	0.00	0.00
04.01.01.08	RESANE DE LOSA 50x20cm	m	105.63	36.35	3,839.65	105.63	3,839.65	0.00	0.00	105.63	3,839.65	100.00	0.00	0.00
04.01.01.09	DESMONTAJE DE POSTE DE CONCRETO	und	1.00	524.74	524.74	1.00	524.74	0.00	0.00	1.00	524.74	100.00	0.00	0.00
<b>04.01.02</b>	<b>RETIRO DE ALIMENTADORES Y TABLEROS EXISTENTES</b>													
04.01.02.01	RETIRO DE ALIMENTADOR EXISTENTE GA-2 DEL TABLERO TA-2	m	60.00	1.90	114.00	60.00	114.00	0.00	0.00	60.00	114.00	100.00	0.00	0.00
04.01.02.02	RETIRO DE ALIMENT. EXISTENTE GA-3 DEL TABLERO TA-3	m	90.00	1.90	171.00	90.00	171.00	0.00	0.00	90.00	171.00	100.00	0.00	0.00
04.01.02.03	RETIRO Y REINST. ALIMEN. EXIST. TABLERO EN CASETA	m	38.00	1.90	72.20	38.00	72.20	0.00	0.00	38.00	72.20	100.00	0.00	0.00
04.01.02.04	RETIRO DE TABLERO EXISTENTE TA-2	glb	1.00	202.47	202.47	1.00	202.47	0.00	0.00	1.00	202.47	100.00	0.00	0.00
04.01.02.05	RETIRO DE TABLERO EXISTENTE TA-3	glb	1.00	202.47	202.47	1.00	202.47	0.00	0.00	1.00	202.47	100.00	0.00	0.00
<b>04.01.03</b>	<b>MANT. TAB. GRAL., ALUMBRADO EXTERIOR Y BUZONES</b>													
04.01.03.01	MANT. Y CORRECCION DE TABLERO GENERAL TG	glb	1.00	2,438.42	2,438.42	1.00	2,438.42	0.00	0.00	1.00	2,438.42	100.00	0.00	0.00
04.01.03.02	MANT. DE POSTES DE ALUMBRADO CON DOBLE PASTORAL	und	10.00	240.00	2,400.00	10.00	2,400.00	0.00	0.00	10.00	2,400.00	100.00	0.00	0.00
04.01.03.03	MANT. DE POSTES DE ALUMBRADO CON UN PASTORAL	und	11.00	200.98	2,210.78	11.00	2,210.78	0.00	0.00	11.00	2,210.78	100.00	0.00	0.00
04.01.03.04	MANT. Y CORRECCION DE CIRCUITO DE ILUMINAC. GA-07	m	190.00	6.05	1,149.50	190.00	1,149.50	0.00	0.00	190.00	1,149.50	100.00	0.00	0.00
04.01.03.05	MANT. Y CORRECCION DE CIRCUITO DE ILUMINAC. GA-08	m	450.00	7.05	3,172.50	450.00	3,172.50	0.00	0.00	450.00	3,172.50	100.00	0.00	0.00
04.01.03.06	MANTENIMIENTO DE BUZONES ELECTRICOS	und	10.00	47.52	475.20	10.00	475.20	0.00	0.00	10.00	475.20	100.00	0.00	0.00
04.01.03.07	MANTENIMIENTO DE POZO PUESTA A TIERRA	und	3.00	684.67	2,054.01	3.00	2,054.01	0.00	0.00	3.00	2,054.01	100.00	0.00	0.00
<b>04.01.04</b>	<b>BUZONES ELECTRICOS</b>													
04.01.04.01	SUM. E INST. DE TAPAS METALICAS P/BUZONES ELECT.	und	5.00	2,519.69	12,598.45	5.00	12,598.45	0.00	0.00	5.00	12,598.45	100.00	0.00	0.00
04.01.04.02	BUZON DE CONCRETO BZ-13 C/TAPA METALICA	und	1.00	1,699.58	1,699.58	1.00	1,699.58	0.00	0.00	1.00	1,699.58	100.00	0.00	0.00
04.01.04.03	BANCO DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS x Ø90mm	m	20.00	78.92	1,578.40	20.00	1,578.40	0.00	0.00	20.00	1,578.40	100.00	0.00	0.00
<b>04.01.05</b>	<b>CANALIZACIONES ELECTRICAS</b>													
04.01.05.01	CANALIZ. DE TRONCAL PARA ILUMINACION EN CABEZO	m	34.00	171.45	5,829.30	34.00	5,829.30	0.00	0.00	34.00	5,829.30	100.00	0.00	0.00
04.01.05.02	SUM. E INST. CABL. Y CONEX. DE CARGAS EN INT. CASETA	glb	1.00	320.99	320.99	1.00	320.99	0.00	0.00	1.00	320.99	100.00	0.00	0.00
04.01.05.03	TUBERIA CONDUIT PVC D=40mm	m	146.50	14.82	2,171.13	146.50	2,171.13	0.00	0.00	146.50	2,171.13	100.00	0.00	0.00
04.01.05.04	TUBERIA CONDUIT PVC D=65mm	m	210.00	32.22	6,766.20	210.00	6,766.20	0.00	0.00	210.00	6,766.20	100.00	0.00	0.00
04.01.05.05	CANALIZACION CONDULET Ø1 1/2" AEREO SOPORTADO	m	297.00	136.31	40,484.07	297.00	40,484.07	0.00	0.00	297.00	40,484.07	100.00	0.00	0.00
04.01.05.06	CAJA DE PASE ALUMINO 200x200x120mm ADOSADO, IP65	und	2.00	88.04	176.08	2.00	176.08	0.00	0.00	2.00	176.08	100.00	0.00	0.00
04.01.05.07	SOPORTE SP-1	und	198.00	139.93	27,706.14	198.00	27,706.14	0.00	0.00	198.00	27,706.14	100.00	0.00	0.00

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO BASE											SALDOS				
		UND	METRADO	P.UNIT. S/.	PRESUP. S/.	ACUMULADO		ACTUAL		ACUMULADO							
						METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	%	METRADO	VALOR S/.			
<b>04.01.06</b>	<b>CABLES Y CONDUCTORES</b>																
04.01.06.01	CABLE 4-1x16mm2, N2XH	m	419.63	35.94	15,081.50	419.63	15,081.50	0.00	0.00	419.63	15,081.50	100.00	0.00	0.00			
04.01.06.02	CABLE 4-1x10mm2, N2XH	m	150.00	26.86	4,029.00	150.00	4,029.00	0.00	0.00	150.00	4,029.00	100.00	0.00	0.00			
04.01.06.03	CABLE 1x10mm2 NH-80 P/TIERRA	m	419.63	6.37	2,673.04	419.63	2,673.04	0.00	0.00	419.63	2,673.04	100.00	0.00	0.00			
<b>04.01.07</b>	<b>TABLEROS E INTERRUPTORES</b>																
04.01.07.01	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO TA-2 (SEGUN NORMA)	und	1.00	2,128.44	2,128.44	1.00	2,128.44	0.00	0.00	1.00	2,128.44	100.00	0.00	0.00			
04.01.07.02	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO TA-3 (SEGUN NORMA)	und	1.00	1,632.77	1,632.77	1.00	1,632.77	0.00	0.00	1.00	1,632.77	100.00	0.00	0.00			
04.01.07.03	INSTALACION DE TABLERO DE FUERZA Y CONTROL	und	1.00	2,311.47	2,311.47	1.00	2,311.47	0.00	0.00	1.00	2,311.47	100.00	0.00	0.00			
<b>04.01.08</b>	<b>LUMINARIAS Y ACCESORIOS DE UTILIZACION</b>																
04.01.08.01	SUM. E INST. DE PARANTE ALIMENTADOR PARA LUMINARIAS	und	1.00	364.89	364.89	1.00	364.89	0.00	0.00	1.00	364.89	100.00	0.00	0.00			
04.01.08.02	SUM. E INST. LUMIN. SUSPENDIDA INCL. CANALIZACION Y CABLEADO	und	30.00	288.47	8,654.10	30.00	8,654.10	0.00	0.00	30.00	8,654.10	100.00	0.00	0.00			
<b>04.02</b>	<b>ZONA DE TAREAS PREVIAS - CIRCUITOS DERIVADOS TA-2</b>																
<b>04.02.01</b>	<b>RETIRO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS</b>																
04.02.01.01	RETIRO DE LUMINARIAS INC. CABLES EXISTENTES	pto	43.00	13.33	573.19	43.00	573.19	0.00	0.00	43.00	573.19	100.00	0.00	0.00			
04.02.01.02	RETIRO DE TOMACORRIENTES INC. CABLES EXISTENTES	pto	30.00	7.14	214.20	30.00	214.20	0.00	0.00	30.00	214.20	100.00	0.00	0.00			
04.02.01.03	RETIRO LUM. INC. CABLES Y CANALIZ. EXIST. EN TECHO EXTERIOR	glb	1.00	348.73	348.73	1.00	348.73	0.00	0.00	1.00	348.73	100.00	0.00	0.00			
<b>04.02.02</b>	<b>CANALIZACIONES ELECTRICAS</b>																
04.02.02.01	CANALIZACION DE TRONCAL PARA ILUMINAC. EN TECHO EXTERIOR	m	30.00	137.96	4,138.80	30.00	4,138.80	0.00	0.00	30.00	4,138.80	100.00	0.00	0.00			
04.02.02.02	CANALIZ. DE BOTONERA A MOTOR DE PUERTAS ENROLLABLES	und	5.00	432.07	2,160.35	5.00	2,160.35	0.00	0.00	5.00	2,160.35	100.00	0.00	0.00			
04.02.02.03	SALIDA PARA LUMINARIA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)	pto	13.00	27.30	354.90	13.00	354.90	0.00	0.00	13.00	354.90	100.00	0.00	0.00			
04.02.02.04	CANALIZACION P/LUZ DE EMERGENCIA	pto	13.00	32.49	422.37	13.00	422.37	0.00	0.00	13.00	422.37	100.00	0.00	0.00			
<b>04.02.03</b>	<b>CABLES Y CONDUCTORES</b>																
04.02.03.01	CABLE NH-80, 1x4mm2	m	165.00	6.87	1,133.55	165.00	1,133.55	0.00	0.00	165.00	1,133.55	100.00	0.00	0.00			
04.02.03.02	CABLE NH-80, 1x2.5mm2	m	1,000.00	6.03	6,030.00	1,000.00	6,030.00	0.00	0.00	1,000.00	6,030.00	100.00	0.00	0.00			
<b>04.02.04</b>	<b>INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO</b>																
04.02.04.01	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	5.00	56.49	282.45	5.00	282.45	0.00	0.00	5.00	282.45	100.00	0.00	0.00			
04.02.04.02	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto	3.00	59.54	178.62	3.00	178.62	0.00	0.00	3.00	178.62	100.00	0.00	0.00			
04.02.04.03	INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE	pto	2.00	65.17	130.34	2.00	130.34	0.00	0.00	2.00	130.34	100.00	0.00	0.00			
04.02.04.04	INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CONMUTACION	pto	4.00	57.00	228.00	4.00	228.00	0.00	0.00	4.00	228.00	100.00	0.00	0.00			
04.02.04.05	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE A PRUEBA DE AGUA	und	1.00	125.91	125.91	1.00	125.91	0.00	0.00	1.00	125.91	100.00	0.00	0.00			
04.02.04.06	INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE A PRUEBA DE AGUA	und	2.00	131.85	263.70	2.00	263.70	0.00	0.00	2.00	263.70	100.00	0.00	0.00			

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO BASE											SALDOS				
		UND	METRADO	P.UNIT. S/.	PRESUP. S/.	ACUMULADO		ACTUAL		ACUMULADO			METRADO	VALOR S/.			
						METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	%					
<b>04.02.05</b>	<b>TOMACORRIENTES</b>																
04.02.05.01	INST. DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA	und	11.00	106.02	1,166.22	11.00	1,166.22	0.00	0.00	11.00	1,166.22	100.00	0.00	0.00			
04.02.05.02	INST. TOMAC. BIPOLAR DOBLE C/LINEA DE TIERRA A PRUEBA AGUA	und	13.00	182.11	2,367.43	13.00	2,367.43	0.00	0.00	13.00	2,367.43	100.00	0.00	0.00			
<b>04.02.06</b>	<b>LUMINARIAS Y ACCESORIOS DE UTILIZACION</b>																
04.02.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SUSPENDIDA	und	23.00	304.37	7,000.51	23.00	7,000.51	0.00	0.00	23.00	7,000.51	100.00	0.00	0.00			
04.02.06.02	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LUMINARIA ADOSADA	und	23.00	40.80	938.40	23.00	938.40	0.00	0.00	23.00	938.40	100.00	0.00	0.00			
04.02.06.03	SUM. E INST. DE LUM. ADOSADA INCL. CANALIZACION Y CABLEADO	und	7.00	180.83	1,265.81	7.00	1,265.81	0.00	0.00	7.00	1,265.81	100.00	0.00	0.00			
04.02.06.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA	und	13.00	224.01	2,912.13	13.00	2,912.13	0.00	0.00	13.00	2,912.13	100.00	0.00	0.00			
<b>04.03</b>	<b>ZONA DE TAREAS PREVIAS - CIRCUITOS DERIVADOS TA-3</b>																
<b>04.03.01</b>	<b>RETIRO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS</b>																
04.03.01.01	RETIRO DE LUMINARIAS INC. CABLES EXISTENTE	pto	24.00	13.33	319.92	24.00	319.92	0.00	0.00	24.00	319.92	100.00	0.00	0.00			
04.03.01.02	RETIRO DE TOMACORRIENTES INC. CABLES EXISTENTES	pto	21.00	7.14	149.94	21.00	149.94	0.00	0.00	21.00	149.94	100.00	0.00	0.00			
<b>04.03.02</b>	<b>CANALIZACIONES ELECTRICAS</b>																
04.03.02.01	CANALIZACION P/LUZ DE EMERGENCIA	pto	6.00	32.49	194.94	6.00	194.94	0.00	0.00	6.00	194.94	100.00	0.00	0.00			
<b>04.03.03</b>	<b>CABLES Y CONDUCTORES</b>																
04.03.03.01	CABLE NH-80, 1x2.5mm <sup>2</sup>	m	480.00	6.03	2,894.40	480.00	2,894.40	0.00	0.00	480.00	2,894.40	100.00	0.00	0.00			
<b>04.03.04</b>	<b>INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO</b>																
04.03.04.01	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	1.00	56.49	56.49	1.00	56.49	0.00	0.00	1.00	56.49	100.00	0.00	0.00			
04.03.04.02	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto	3.00	59.54	178.62	3.00	178.62	0.00	0.00	3.00	178.62	100.00	0.00	0.00			
04.03.04.03	INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CONMUTACION	pto	4.00	57.00	228.00	4.00	228.00	0.00	0.00	4.00	228.00	100.00	0.00	0.00			
<b>04.03.05</b>	<b>TOMACORRIENTES</b>																
04.03.05.01	INST. DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA	und	2.00	106.02	212.04	2.00	212.04	0.00	0.00	2.00	212.04	100.00	0.00	0.00			
04.03.05.02	INST. TOMAC. BIPOLAR DOBLE C/LINEA DE TIERRA A PRUEBA AGUA	und	8.00	182.11	1,456.88	8.00	1,456.88	0.00	0.00	8.00	1,456.88	100.00	0.00	0.00			
<b>04.03.06</b>	<b>LUMINARIAS Y ACCESORIOS DE UTILIZACION</b>																
04.03.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA	und	6.00	224.01	1,344.06	6.00	1,344.06	0.00	0.00	6.00	1,344.06	100.00	0.00	0.00			
04.03.06.02	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LUMINARIA ADOSADA	und	24.00	40.80	979.20	24.00	979.20	0.00	0.00	24.00	979.20	100.00	0.00	0.00			

<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>	(A)	209,035.08	209,035.08	0.00	209,035.08	100.00%	0.00
<b>GASTOS GENERALES 9.2%</b>	(B)	19,231.23	19,231.23	0.00	19,231.23	100.00%	0.00
<b>UTILIDADES 6%</b>	(C)	12,542.10	12,542.10	0.00	12,542.10	100.00%	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	(A + B + C)	240,808.41	240,808.41	0.00	240,808.41	100.00%	0.00

  
**VICTOR PLASENCIA TUCTO**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP. N° 83231

**PLAN DE CONTINGENCIA**

VALORIZACION DE OBRA N°

4

(del 01 de Marzo al 15 de Marzo del 2020)

OBRA

REMODELACION DE LAS ILEE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE : TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD

UBICACIÓN :

VIRU - VIRU - LA LIBERTAD

L.P.N. N° : A.S. N° 049-2019-FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO NUEVO TUMBES

PRESUPUESTO BASE : 1,061,406.90  
 MONTO DEL CONTRATO : 955,266.22

PAG. N° 1

PART.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO BASE				AVANCES							SALDOS		
		UND	METRADO	P.UNIT. S/.	PRESUP. S/.	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO			METRADO	VALOR S/.	
						METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	%			
<b>05.01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>														
05.01.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON TRIPLAY	m2	179.55	75.65	13,582.96	179.55	13,582.96	0.00	0.00	179.55	13,582.96	100.00	0.00	0.00	
05.01.02	MALLA RASCHEL AL 90% EN COBERTURA EXISTENTE	m2	40.60	9.17	372.30	40.60	372.30	0.00	0.00	40.60	372.30	100.00	0.00	0.00	
<b>05.02</b>	<b>TECHOS MOVILES</b>														
05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHOS MOVILES	m2	27.00	425.68	11,493.36	27.00	11,493.36	0.00	0.00	27.00	11,493.36	100.00	0.00	0.00	
<b>05.03</b>	<b>PINTURA</b>														
05.03.01	PINTURA EPOXICA EN PISOS PARA SEÑALIZACION	m2	1.40	19.04	26.66	1.40	26.66	0.00	0.00	1.40	26.66	100.00	0.00	0.00	
<b>05.04</b>	<b>VARIOS</b>														
05.04.01	SUM. E INSTALACION DE ESTACION DE DESINFECCION TEMPORAL	glb	1.00	658.59	658.59	1.00	658.59	0.00	0.00	1.00	658.59	100.00	0.00	0.00	

<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>	(A)	26,133.87	26,133.87	0.00	26,133.87	100.00%	0.00
<b>GASTOS GENERALES 9.2%</b>	(B)	2,404.32	2,404.32	0.00	2,404.32	100.00%	0.00
<b>UTILIDADES 6%</b>	(C)	<u>1,568.03</u>	<u>1,568.03</u>	<u>0.00</u>	<u>1,568.03</u>		<u>0.00</u>
<b>SUB TOTAL</b>	(A + B + C)	<b>30,106.22</b>	<b>30,106.22</b>	<b>0.00</b>	<b>30,106.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>

  
 VICTOR PLASENCIA TUCTO  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 83231

**REMODELACION DE LAS ILEE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA  
- COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD**

**RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA**

<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO NUEVO TUMBES
<b>SUPERVISOR</b>	Ing. Victor Plasencia Tucto
<b>OBJETIVO</b>	Const. defensas potuarias, estructura techada en cabezo de muelle, impermeabilizar techos, remodelacion inst. electricas.

<b>N° DE CONTRATO OBRA</b>	061-2019-FONDEPES
<b>FECHA DE INICIO</b>	10-dic-19
<b>PLAZO DE TERMINO CONTRACTUAL</b>	08-mar-20
<b>AMPLIACION DE PLAZO</b>	-
<b>FECHA DE TERMINO AMPLIACION</b>	-
<b>PPTO ADICIONAL N° 01</b>	-
<b>PPTO ADICIONAL N°02</b>	-

MONTOS	NETO	IGV	BRUTO
<b>CONTRACTUAL</b>	809,547.64	145,718.58	955,266.22
<b>ADICIONAL N°01</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>809,547.64</b>	<b>145,718.58</b>	<b>955,266.22</b>

N° DE VALORIZACION	VALORIZACION BRUTA	REINTEGRO	ADELANTO EN EFECTIVO		ADELANTO EN MATERIALES		IGV	VALORIZACION NETA
			ADELANTO	AMORTIZACION	ADELANTO	AMORTIZACION		
01	S/. 59,754.98	0.00	80,954.76	5,975.50		0.00	S/. 9,680.31	S/. 63,459.81
02	S/. 272,980.19	0.00		27,298.02		0.00	S/. 44,222.79	S/. 289,904.97
03	S/. 217,465.47	0.00		21,746.55	147,464.03	79,700.56	S/. 20,883.33	S/. 136,901.67
04	S/. 0.00	0.00		0.00			S/. 0.00	S/. 0.00
05								
<b>PARCIAL</b>	550,200.64	0.00		55,020.07		79,700.56	74,786.41	490,266.44
<b>SALDOS</b>	<b>259,347.00</b>			<b>25,934.69</b>		<b>67,763.47</b>	<b>S/. 29,816.79</b>	<b>S/. 195,465.63</b>

AVANCE FISICO	
ACTUAL	ACUMULADO
7.38%	7.38%
33.7%	41.10%
26.86%	67.96%

**ADICIONAL N°**

N°	VALORIZACION BRUTA	REINTEGRO	ADELANTO EN EFECTIVO	ADELANTO EN MATERIALES	IGV	VALORIZACION NETA
1						
2						
Parcial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>550,200.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,020.07</b>	<b>0.00</b>	<b>79,700.56</b>	<b>74,786.41</b>	<b>490,266.44</b>
----------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

  
**VICTOR PLASENCIA TUCTO**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 83231

## CURVA DE AVANCE DE OBRA

**OBRA**

REMODELACION DE LAS II.EE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD

**ENTIDAD**

FONDEPES

**CONTRATISTA**

CONSORCIO NUEVO TUMBES


**SUPERVISION**

Ing. Victor Plasencia Tucto

**MONTO DE OBRA**

S/.955,266.22 Inc. IGV

  
VÍCTOR PLASENCIA TUCTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231

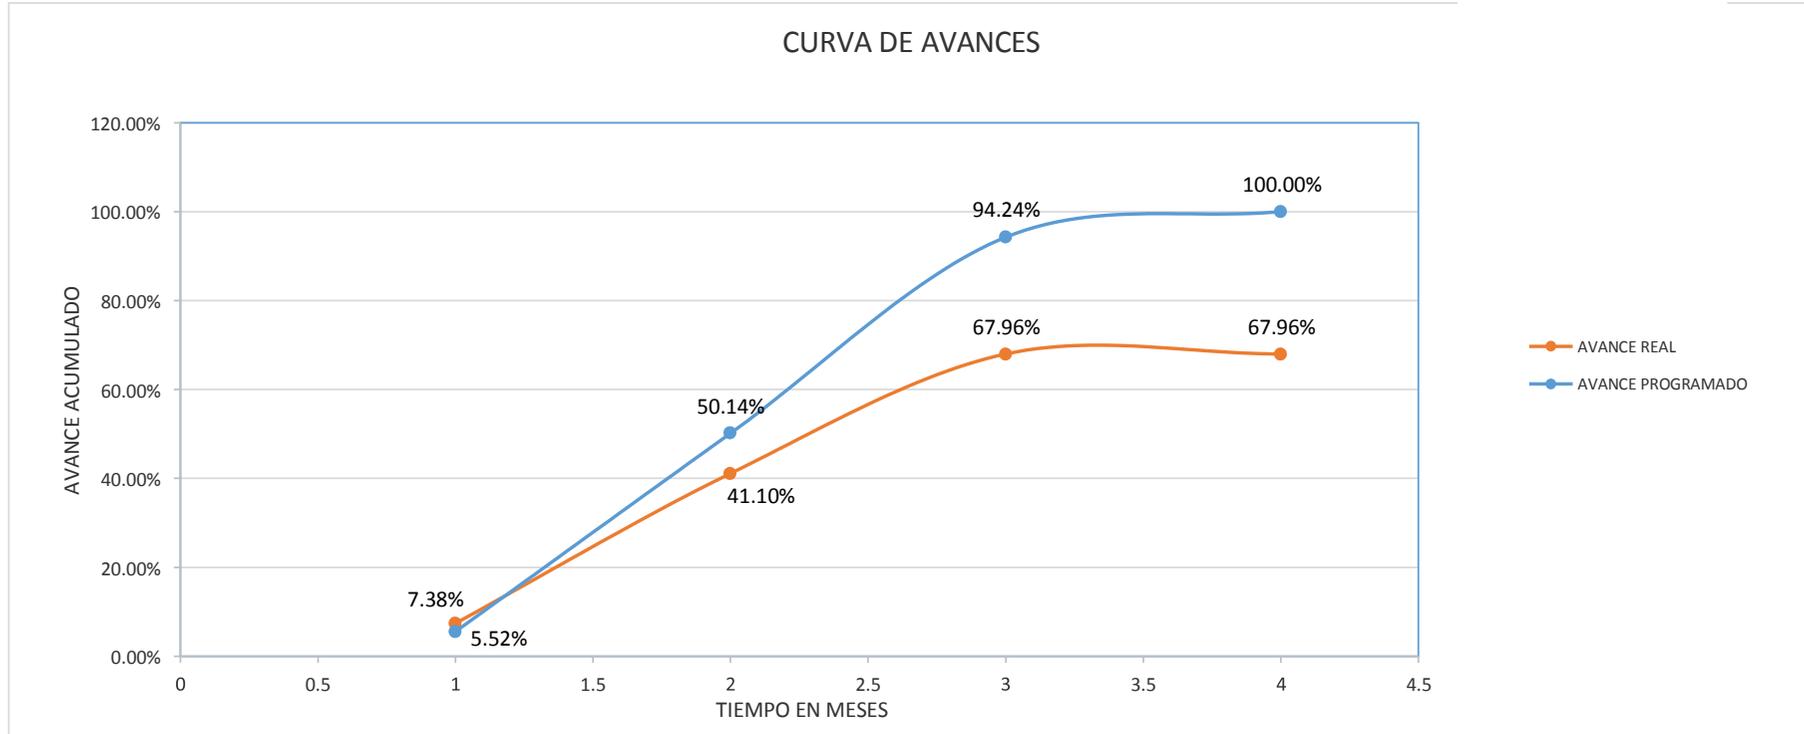

AVANCES VALORIZACION	AVANCE PROGRAMADO 				AVANCE EJECUTADO 			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
	S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
VAL 01 (Desde 10/12/19 Hasta 31/12/19)	44,680.89	5.52%	44,680.89	5.52%	59,754.98	7.38%	59,754.98	7.38%
VAL 02 (Desde 01/01/20 Hasta 31/01/20)	361,227.10	44.62%	405,907.99	50.14%	272,980.19	33.72%	332,735.17	41.10%
VAL 03 (Desde 01/02/20 Hasta 29/02/20)	356,974.03	44.10%	762,882.02	94.24%	217,465.47	26.86%	550,200.64	67.96%
VAL 04 (Desde 01/03/20 Hasta 08/03/20)	46,665.62	5.76%	809,547.64	100.00%	0.00	0.00%	550,200.64	67.96%
<b>TOTAL (*)</b>	<b>809,547.64</b>	<b>100.00%</b>			<b>550,200.64</b>	<b>67.96%</b>		


**GRAFICOS SOBRE EL AVANCE DE OBRA**

**AVANCES MENSUALES**

	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
REAL	7.38	33.72	26.86	0			
PROGRAMADO	5.52	44.62	44.1	5.76			

**AVANCES ACUMULADOS**

	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
ACUMULADO REAL	7.38	41.10	67.96	0.00			
ACUMULADO PROGRAMADO	5.52	50.14	94.24	100			

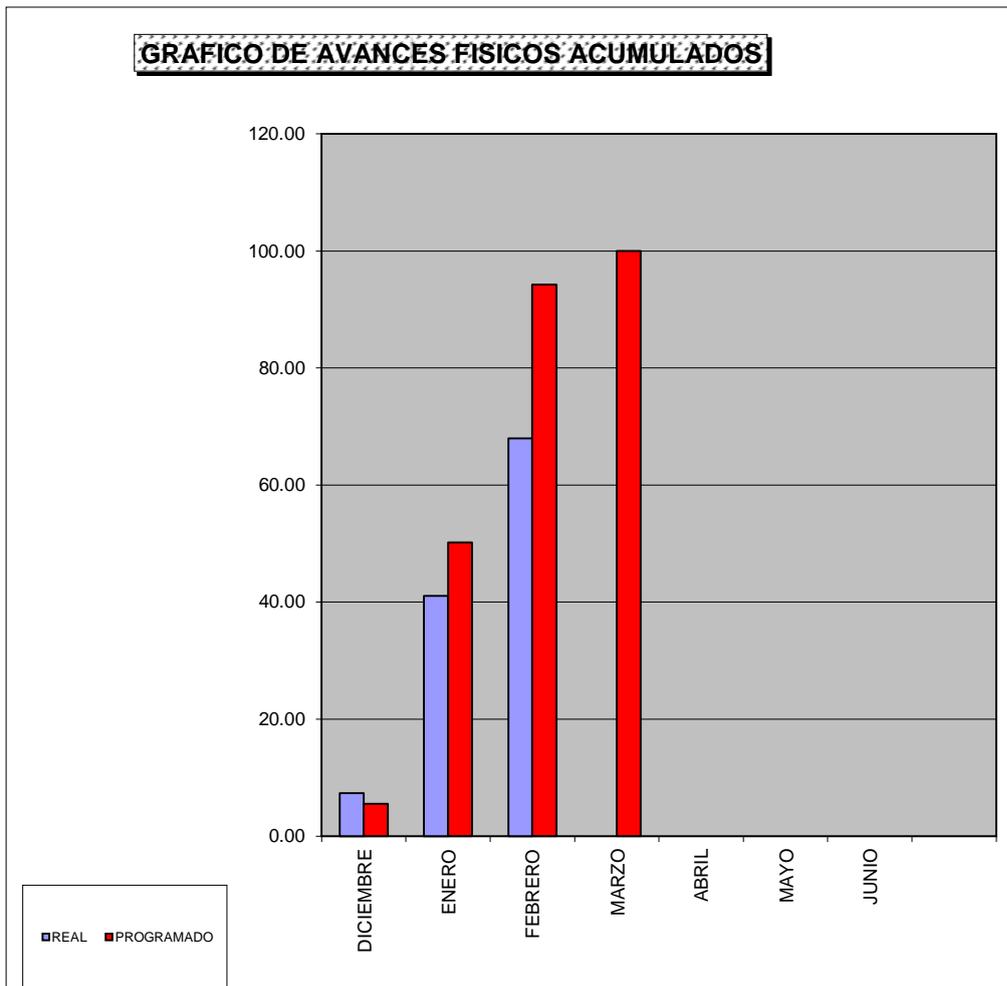

  
**VÍCTOR PLASENCIA TUCTO**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 83231

## CONTROL DEL AVANCE FINANCIERO

### CONTROL DEL ADELANTO DIRECTO

Monto del adelanto directo con IGV = S/. 95,526.62  
Monto del adelanto directo sin IGV = S/. 80,954.76 (A)  
Fecha de pago del adel. Directo = 06-dic-19

A continuación se presenta en el siguiente cuadro, las amortizaciones que se vienen realizando:

VALORIZACION N°	MES-AÑO	ADELANTO AMORTIZADO S/. (SIN IGV)
1	01-dic-19	5,975.50
2	01-ene-20	27,298.02
3	01-feb-20	21,746.55
4	01-mar-20	0.00
<b>TOTAL AMORTIZADO (B)</b>		<b>55,020.07</b>
<b>SALDO POR AMORTIZAR (A-B)</b>		<b>25,934.69</b>

### CONTROL DE VALORIZACIONES

ESPECIALIDAD	Monto del Contrato sin IGV	Anterior	Mes Actual	Acumulado	Saldo por valorizar
OBRAS PORTUARIAS	326,365.54	67,018.54	0.00	67,018.54	259,347.00
ESTRUCTURAS	105,012.77	105,012.77	0.00	105,012.77	0.00
ARQUITECTURA	107,254.70	107,254.70	0.00	107,254.70	0.00
INSTALACIONES ELECTRICAS	240,808.41	240,808.41	0.00	240,808.41	0.00
PLAN DE CONTINGENCIA	30,106.22	30,106.22	0.00	30,106.22	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>809,547.64</b>	<b>550,200.64</b>	<b>0.00</b>	<b>550,200.64</b>	<b>259,347.00</b>
<b>IMPUESTO IGV 18%</b>	<b>145,718.58</b>	<b>99,036.12</b>	<b>0.00</b>	<b>99,036.12</b>	<b>46,682.46</b>
<b>TOTAL S/.</b>	<b>955,266.22</b>	<b>649,236.76</b>	<b>0.00</b>	<b>649,236.76</b>	<b>306,029.46</b>

### CONTROL DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Monto del adelanto directo con IGV = S/. 174,007.55  
Monto del adelanto directo sin IGV = S/. 147,464.03 (A)  
Fecha de pago del adel. Directo = 06-feb-20

  
VICTOR PLASENCIA TUCTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231

A continuación se presenta en el siguiente cuadro, las amortizaciones que se vienen realizando:

VALORIZACION N°	MES-AÑO	ADELANTO AMORTIZADO S/. (SIN IGV)
1	01-dic-19	0.00
2	01-ene-20	0.00
3	01-feb-20	79,700.56
4	01-mar-20	0.00
<b>TOTAL AMORTIZADO (B)</b>		<b>79,700.56</b>
<b>SALDO POR AMORTIZAR (A-B)</b>		<b>67,763.47</b>

## REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO	FECHA DE CANCELACION	MONTO TOTAL SIN IGV	
ADELANTO DIRECTO	06-dic-19	S/.	80,954.76
ADELANTO MATERIALES	06-feb-20	S/.	147,464.03
VALORIZACION N°01		S/.	53,779.48
VALORIZACION N°02		S/.	289,904.97
VALORIZACION N°03		S/.	116,018.36
VALORIZACION N°04		S/.	
<b>TOTAL CANCELADO</b>		S/.	<b>688,121.60</b>

EN LOS MONTOS PAGADOS PARA VALORIZACIONES, SE CONSIDERA PARA EL PRESENTE CUADRO:

VALORIZACION NETA = VALORIZACION BRUTA - AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO


### DETERMINACION DEL AVANCE FINANCIERO

TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS = S/ 688,121.60 (A)  
 MONTO DEL CONTRATO SIN IGV = S/ 809,547.64 (B)

<b>% AVANCE FINANCIERO</b>	=	(A/B) x 100	=	<b>85.00%</b>
----------------------------	---	-------------	---	---------------

### COMPARACION ENTRE EL AVANCE FISICO Y EL FINANCIERO

AVANCE FISICO = 67.96%  
 AVANCE FINANCIERO = 85.00%

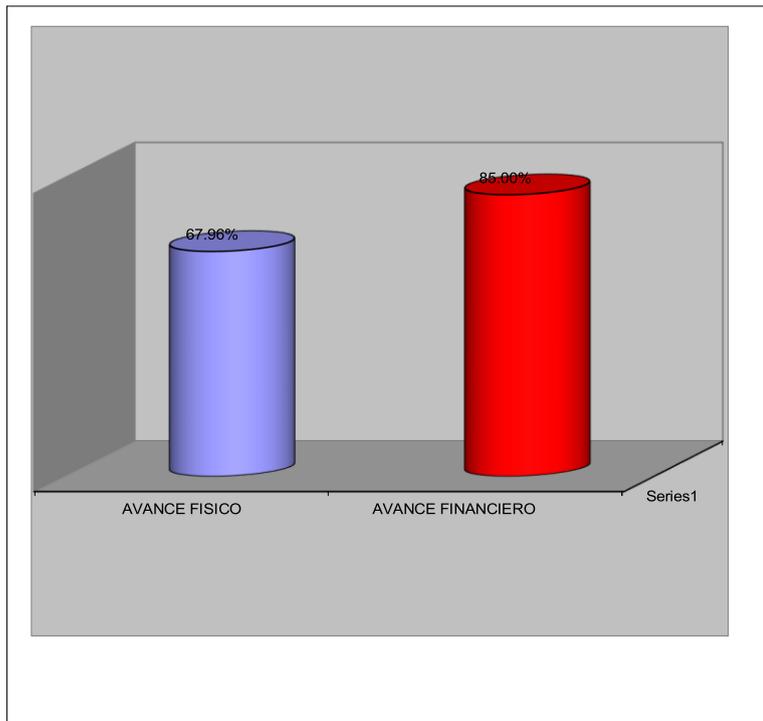

*Victor Plasencia Tucto*  
 VICTOR PLASENCIA TUCTO  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 83231

**A.S. N° 049-2019-FONDEPES**

REMODELACION DE LAS II.EE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD



**FOTO N°01.-** SE APRECIA LA APLICACIÓN DE ADITIVO PARA VERIFICAR SI LA SOLDADURA ESTA BIEN TRABAJADA



**FOTO N°02.-** SE APRECIA EL MANTENIMIENTO DE BITAS DE LADO DERECHO DE CABEZO DE MUELLE DPA PTO MORIN

**VALORIZACION DE OBRA N°4**  
(del 01 de Marzo al 15 de Marzo del 2020)

  
VÍCTOR PLASENCIA TUCTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231

**A.S. N° 049-2019-FONDEPES**

REMODELACION DE LAS II.EE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD



**FOTO N°03.-** SE APRECIA CHARLAS DE SEGURIDAD



**FOTO N°04.-** SE APRECIA COLOCADO DE SOPORTES CON ANGULO GALBANIZADO EN LADO DERECHO

**VALORIZACION DE OBRA N°4**  
(del 01 de Marzo al 15 de Marzo del 2020)


  
VICTOR PLASENCIA TUCTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231

**A.S. N° 049-2019-FONDEPES**

**REMEDIACION DE LAS II.EE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMEDIACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMEDIACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD**



**FOTO N°05.- SE APRECIA PINTADO DE BARANDAS Y SARDINEL Y CLOCADO DE ANGULO GALBANIZADO**

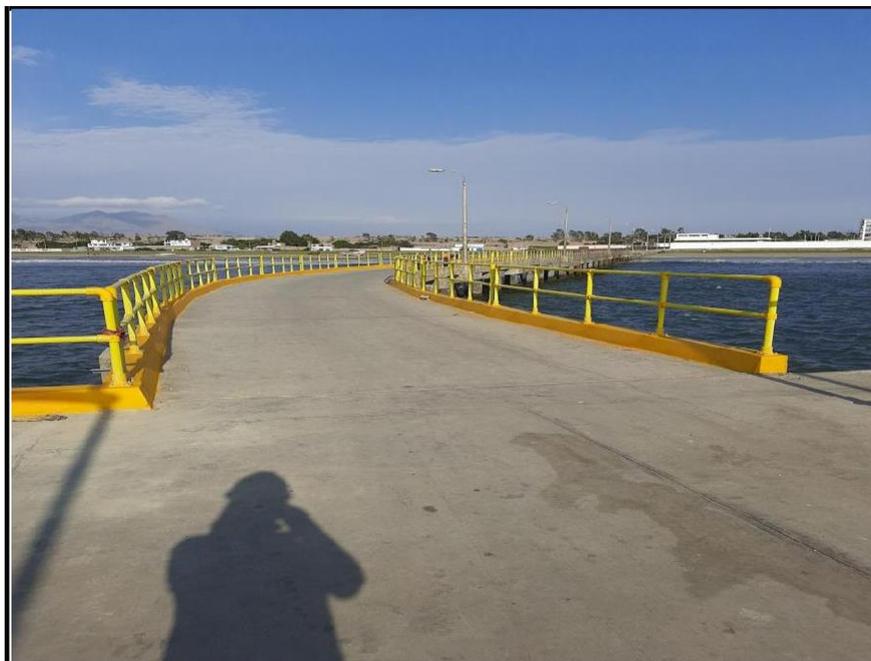

**FOTO N°06.- SE APRECIA PINTADO DE BANDAS A LA LLEGADA AL CABEZO**

**VALORIZACION DE OBRA N°4  
(del 01 de Marzo al 15 de Marzo del 2020)**

  
**VÍCTOR PLASENCIA TUCTO**  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231

**A.S. N° 049-2019-FONDEPES**

REMODELACION DE LAS I.I.EE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD



**FOTO N°07.-** SE APRECIA EL PINTADO DE BARANDAS Y SARDINELES AL INICIO DE LOS TRABAJOS EN CAMINO AL MUELLE



**FOTO N°08.-** SE APRECIA LOS TRABAJOS EN LOS POZOS ELECTRICOS

**VALORIZACION DE OBRA N°4**  
(del 01 de Marzo al 15 de Marzo del 2020)

  
VÍCTOR PLASENCIA TUCTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231

**A.S. N° 049-2019-FONDEPES**

REMODELACION DE LAS II.EE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD



**FOTO N°09.-** SE APRECIA EL COLOCADO DE TUBERIA CONDUIT HACIA EL CABEZO SUPERVISADO POR LOS ESPECIALISTAS ELECTRICOS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISION



**FOTO N°10.-** SE APRECIA EL TABLERO GENERAL REVISADO POR LOS ESPECIALISTAS ELECTRICOS ANTES DE SER COLOCADOS

**VALORIZACION DE OBRA N°4**  
(del 01 de Marzo al 15 de Marzo del 2020)

  
VICTOR PLASENCIA TUCTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231

**A.S. N° 049-2019-FONDEPES**

REMODELACION DE LAS II.EE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS,  
REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA -  
COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD



**FOTO N° 11.-** SE APRECIA EL TENDIDO DE LA TUBERIA CONDUIT Y LA CAJA DE PASE COLOCADA CORRECTAMENTE



**FOTO N° 12.-** SE VERIFICA EL TABLERO GENERAL ANTES DE SER COLOCADO

**VALORIZACION DE OBRA N°4**  
**(del 01 de Marzo al 15 de Marzo del 2020)**

**A.S. N° 049-2019-FONDEPES**

REMODELACION DE LAS II.EE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS,  
REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA -  
COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD



**FOTO N° 13.- SE APRECIA EL PINTADO DE LOS PEDESTALES**



**FOTO N° 14.- SE APRECIA DESMONTAJE DE PROTECCION EXISTENTE DE PLATAFORMA N°01**

**VALORIZACION DE OBRA N°4**  
**(del 01 de Marzo al 15 de Marzo del 2020)**

  
VÍCTOR PLASENCIA TUCTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231

**A.S. N° 049-2019-FONDEPES**

**REMDELACION DE LAS II.EE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMDELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMDELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD**



**FOTO N° 15.- SE APRECIA EL COLOCADO DE ABRAZADERAS TOPES Y VIGA COMO ARRIOSTRE**



**FOTO N° 16.- SE APRECIA LA INSTALACION DE ABRAZADERAS CON SUS RESPECTIVOS TOPES**

**VALORIZACION DE OBRA N°4  
(del 01 de Marzo al 15 de Marzo del 2020)**

**A.S. N° 049-2019-FONDEPES**

**REMDELACION DE LAS II.EE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMDELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMDELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD**



**FOTO N° 17.- SE APRECIA ABRAZADERA TOPE Y VIGA DE ARRIOSTRE EN PLATAFORMA N°01**




**FOTO N° 18.- SE APRECIA EL DESMONTAJE DE PARANTES EXISTENTES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO**

**VALORIZACION DE OBRA N°4  
(del 01 de Marzo al 15 de Marzo del 2020)**

  
VÍCTOR PLASENCIA TUCTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231

**A.S. N° 049-2019-FONDEPES**

REMEDIACION DE LAS II.EE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS,  
REMEDIACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMEDIACION DEL SISTEMA DE DEFENSA -  
COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD

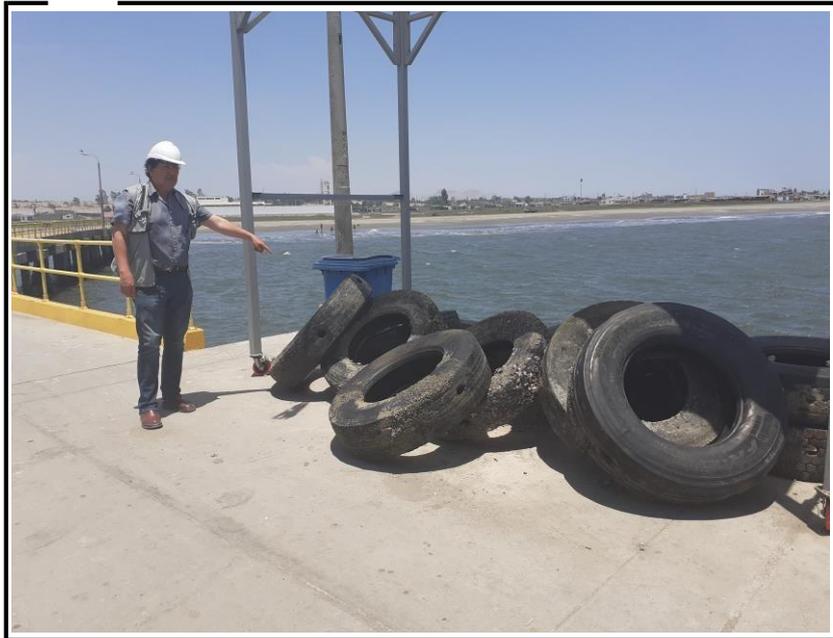

**FOTO N° 19.-** SE APRECIA EL DESMONTAJE DE LLANTAS DEL SISTEMA DE PROTECCION EXISTENTE



**FOTO N° 20.-** SE APRECIA LA VIGA DE ARRIOSTRE DESMONTADA A CAMBIAR

**VALORIZACION DE OBRA N°4**  
**(del 01 de Marzo al 15 de Marzo del 2020)**

  
VÍCTOR PLASENCIA TUCTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231

**A.S. N° 049-2019-FONDEPES**

REMEDIACION DE LAS II.EE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS,  
REMEDIACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMEDIACION DEL SISTEMA DE DEFENSA -  
COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD



**FOTO N° 21.-** SE APRECIA EL COLOCADO DE LUMINARIAS EN ESTRUCTURA METALICA EN AREA DEL CABEZO DEL MUELLE



**FOTO N° 22.-** SE APRECIA LA CAJA DE PASE PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESTRUCTURA METALICA

**VALORIZACION DE OBRA N°4**  
**(del 01 de Marzo al 15 de Marzo del 2020)**

  
VÍCTOR PLASENCIA TUCTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231

**A.S. N° 049-2019-FONDEPES**

**REMODELACION DE LAS II.EE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD**



**FOTO N° 23.- SE APRECIA DESMONTAJE DE PARANTES DE SISTEMA EXISTENTE DE PROTECCION EN AREA DE PLATAFORMA 01**



**FOTO N° 24.- SE LA VIGA METALICA A SER COLOCADA EN LA PARTE POSTERIOR COMO ARRIOSTRE EN LA PLATAFORMA N 01**

**VALORIZACION DE OBRA N°4  
(del 01 de Marzo al 15 de Marzo del 2020)**

  
VÍCTOR PLASENCIA TUCTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231




FECHA:  
OBRA:  
PROYECTO:  
PROGRAMA:  
ENTIDAD EJECUTORA:

ASIENTO N° 99 DEL RESIDENTE 04/03/2020


Conforme a lo requerido por la Supervisión vía correo electrónico al Contratista, se descargó por el mismo medio el calendario Acelerado Valorizado de Pérdida de obra, así como los programas PERT, EPM acelerados solicitados. Hasta la presente fecha 04/03/2020, no se descargan la absolución de la consulta y fechada el 10/02/2020, mediante el Asiento N° 73, lo cual se está ocasionando un atasco de obra teniendo en cuenta que el plazo contractual vence el 08/03/2020 por lo que se está a la espera de la respuesta a la solicitud de ampliación de plazo por el presentada. Se informa que continúan los trabajos de acuerdo a lo programado en la plataforma 1.

  
Freddy Campasco Pérez  
INGENIERO CIVIL  
CIP 40210

ASIENTO N° 100 DE LA SUPERVISION DE OBRA 04/03/2020  
A LA FECHA SE RECIBE EL CRONOGRAMA ACCELERADO DE AVANCE DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATADORA WAL FUE ELEVADO A LA ENTIDAD FONDERES DIBENIPAA, SOBRE LA ABSOLUCION A LA CONSULTA SE ESTA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA EL PROYECTISTA A LA FECHA SE APPRECIAN EL DESMONTAJE DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE EN LO QUE SE REFIERE AL SISTEMA DE DEFENSA, CON RESPECTO A LA CONSULTA DEL ASIENTO 93, SE INDICAN LOS FLUORESCENTES ADJUDICADOS A LA ESTRUCTURA

  
VICTOR PLASENCIA TUCTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231

ING. INSPECTOR

  
ING. RESIDENTE  
Freddy Campasco Pérez  
INGENIERO CIVIL  
CIP 40210

  
ING. SUPERVISOR  
VICTOR PLASENCIA TUCTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231

# CUADERNO DE OBRA



58

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

AYUDIA N° 101 DEL RESIDUENTE 06/03/2020

Se deja constancia que hasta la fecha 06/03/2020 no se ha avanzado la obra de construcción de la planta de procesamiento de residuos sólidos de la zona de la comunidad de San Juan de los Rios, distrito de San Juan de los Rios, provincia de Lima, departamento de Lima, a raíz de que se recibió el informe de la comunidad de San Juan de los Rios de que se encuentra que el pago del traslado de los residuos sólidos de la zona de la comunidad de San Juan de los Rios, distrito de San Juan de los Rios, provincia de Lima, departamento de Lima, no se ha realizado, por lo que se ha solicitado al Sr. Alcalde Municipal de San Juan de los Rios, distrito de San Juan de los Rios, provincia de Lima, departamento de Lima, que se realice el pago del traslado de los residuos sólidos de la zona de la comunidad de San Juan de los Rios, distrito de San Juan de los Rios, provincia de Lima, departamento de Lima, para que se pueda continuar con la obra de construcción de la planta de procesamiento de residuos sólidos de la zona de la comunidad de San Juan de los Rios, distrito de San Juan de los Rios, provincia de Lima, departamento de Lima.

Victor Plasencia Tuerto  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231

Asiento N° 102 de la Gobernación de Obra 06/03/2020  
A LA FECHA SE HA HECHO TODA LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN EN UNO DE LOS PUNTO DE LA OBRA, CON RESPALDO A LA ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA REALIZADA EN LA CANTONATA DE SAN JUAN DE LOS RIOS DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Victor Plasencia Tuerto  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231

ING. INSPECTOR Victor Plasencia Tuerto  
ING. RESIDENTE Victor Plasencia Tuerto  
ING. SUPERVISOR Victor Plasencia Tuerto  
INGENIERO CIVIL Victor Plasencia Tuerto  
Reg. CIP N° 83231

# CUADERNO DE OBRA



59

FECHA \_\_\_\_\_ MODALIDAD \_\_\_\_\_  
OBRA \_\_\_\_\_  
PROYECTO \_\_\_\_\_  
PROGRAMA \_\_\_\_\_  
ENTIDAD EJECUTORA \_\_\_\_\_

Asiento N° 103 del Residente 07/03/2020  
El día de hoy 07/03/2020 se recibió la Carta N° 62-2020-VPT/JS  
mediante la cual se solicita a la consultora, a la evaluación y  
de acuerdo a lo compatible con la realidad se dará por terminado  
la ejecución y se levantará el Tiempo Transcurrido desde el  
inicio 10/02/2020 para solicitar la ampliación correspondiente  
a la solicitud de ampliación de plazo por el N° 1 permitida de  
Mano 03/03/2020. Se continúa en trabajos de defensa portua-  
ria de plataforma baja 1, de acuerdo a la defensa portuaria  
aprobada de que hoy usamos baja.

Freddy Carrilaco Pérez  
INGENIERO CIVIL  
CIP 40210

Asiento N° 304 DE LA SUPERVISION DE OBRA 01/07/2020  
A LA FOLIA SE HACE ENTREGA A LA CONTRATISTA LA  
CARTA N° 62-2020-VPT/JS Y LA CARTA N° 366-2020-  
FONDEPES/DIGENIPA EN DONDE SE REALIZA LA RESPUESTA  
A LA CONSULTA N° 02 REFERENTE A LA EJECUCION DE DEFENSA  
PORTUARIA EN PLATAFORMA BATA 2, RESPUESTA ABOGATA  
POR PARTE DEL PROYECTISTA EN EL INFORME N° 32-2020/  
FONDEPES/DIGENIPA/AOEN/BCV RESPALDADA POR EL  
PROYECTISTA ING LEHI ENRIQUE ROTA S ARIAS EN SU  
INFORME N° 008-2020-FONDEPES/LERA EN DONDE  
ABOGA Y TODAS LAS CONSULTAS REALIZADA POR LA  
CONTRATISTA. CON RESPECTO A LA DEFENSA PORTUARIA  
EN LA PLATAFORMA N° 02 DEL PROYECTO, RESPUESTA A  
LA CARTA N° 017-2020- (CONSULTA NUMOTUNAS)

ING. INSPECTOR

Freddy Carrilaco Pérez  
INGENIERO CIVIL  
CIP 40210

VICTOR PLASENCIA TUCTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231

VICTOR PLASENCIA TUCTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231

# CUADERNO DE OBRA



60

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

ASIENTO N° 105 DE LA SUPERVISION DE OBRA 02/03/2020  
A LA FECHA SE COMPLETA EL PUNTO CONTRACTUAL DE  
OBRA EN LA QUE SE APLICABA QUE LA OBRA SE  
ENCUENTRA EN UN 72% APROXIMADO, POR LO QUE  
ESTA SUPERVISION RECOMIENDA ACELERAR CON LOS  
TRABAJOS EN VISTA QUE A PARTIR DEL DIA 09/03/2020  
LA CONTRATISTA CONSORCIA NUEVO TOMBES SE ENCON-  
TRA EN PENALIDAD.

SE INDICA QUE A LA FECHA EXISTE UNA AMPLIACION  
DE PLAZO LA CUAL SE ENCUENTRA EN TRAMITE.

VICTOR PLASENCIA TUCTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231

ASIENTO N° 106 DEL RESIDENTE 08/03/2020  
Se deja constancia que la absolución de la consulta de alcuan-  
zación el 07/03/2020 en consecuencia en la plataforma baja 2  
no se ha podido trabajar, se debe replantear los trabajos  
en base a la absolución de la consulta la cual ya que está sien-  
do evaluada por nuestros especialistas en estructuras por lo que  
se continúa a la espera de la ampliación de plazo parcial soli-  
citada y conforme a Reglamento dentro de los 15 días si-  
guientes de haber concluido el evento (absolución de la consulta)  
se estará presentando la solicitud de ampliación de plazo  
complementaria ya que la solicitud presentada anterior-  
mente fue parcial ya que aun no había concluido el  
evento.

ING. INSPECTOR

Freddy Garrasco Pérez  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 40210

VICTOR PLASENCIA TUCTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83231
