

**R.U.C. No. 10021511116**

Lima, 07 de Agosto del 2020

Carta No. 440-2020-IDRM/C

Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Av. Petit Thouars N° 115 – Cercado de Lima.

Presente. -

ATENCION : ING. JORGE ROBERTO ÑAHUE SIVIRICHI
DIRECTOR GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL
Y ACUICOLA

C.C. : ARQ. STEFANY ALEJANDRA CARPIO VELASQUEZ
COORDINADORA DE OBRA

ASUNTO : VALORIZACION N° 05
PERIODO JULIO DEL 2020,

REFERENCIA: 1. CONTRATO N° 068-2019-FONDEPES
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 053-2019-
FONDEPES - PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA
LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:
"REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y
FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS
PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y
COBERTURA DE CABEZO EN EL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO MORÍN, EN LA
LOCALIDAD DE MORÍN, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE
VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
CODIGO ÚNICO: 2359411
2. Informe N° 008-2020-VPT/JS

De mi mayor consideración:

Por medio del presente previo cordial saludo, me dirijo a Ustedes, con la finalidad de presentar la Valorización N° 05, correspondiente al periodo julio del 2020, en cumplimiento de obligaciones del contrato mencionado en la referencia.

En el periodo del 30-31 de julio del 2020, el contratista ejecutor de Obra, CONSORCIO NUEVO TUMBES, no ha ejecutado ninguna partida y su avance ejecutado acumulado actual sigue y se mantiene en el 67.96%, siendo que la Valorización en el presente periodo es cero soles (S/. 0.00).

POR LO EXPUESTO:

Señores de FONDEPES, se cumple en presentar debidamente verificado y aprobado por el Jefe de Supervisión de Obra; conforme lo establece el Artículo 194°. - Valorizaciones y Metrados, en tanto el contratista ejecutor de Obra no tiene ningún Metrado ejecutado en el periodo marzo del 2020, para los trámites correspondientes.

Sin otro particular, quedo de Ustedes, aprovechando la oportunidad para reiterarle mi consideración más distinguida.

Atentamente,



Dionisio Rojas Mamani
CONSULTOR DE OBRAS RNP. C15092

**R.U.C. No. 10021511116****Informe N° 008-2020-VPT/JS**

Al : Ing. JORGE ROBERTO ÑAHUE SIVIRICHI
DIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES PESQUERAS ARTESANAL Y
ACUICOLA

Del : Ing. VICTOR PLASENCIA TUCTO
JEFE DE SUPERVISIÓN

ATENCION : ARQ STEFANY CARPIO VELASQUEZ
COORDINADORA DE OBRA

ASUNTO : INFORME DE LA VALORIZACION N°05 CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2020

REF. : 1. CONTRATO N° 068-2019-FONDEPES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 053-2019-
FONDEPES
"REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE
DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS
PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE
MORÍN, DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" código
único 2359411

Fecha : Lima 07 de AGOSTO de 2020

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle y a la vez el Informe de la Valorización N°05 de la Obra "REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORÍN, DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" código único 2359411 a la fecha del 31 de julio de 2020.

Sin otro particular quedo de ustedes, aprovechando la oportunidad para reiterarle mi consideración más distinguida.

Atentamente,


VÍCTOR PLASENCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231



1. GENERALIDADES

1.1 INFORMACIÓN DE LA OBRA

- Ubicación : MORIN – VIRU – VIRU – LA LIBERTAD.
- Contratista : CONSORCIO NUEVO TUMBES
- Supervisión : DIONISIO ROJAS MAMANI
- Jefe de Supervisión : Ing. VICTOR PLASENCIA TUCTO
- Sistema de Contratación : SUMA ALZADA
- Proceso de Selección : ADJUDIC. SIMPLIF. N°049-2019-FONDEPES
- Número del Contrato : Contrato N° 061-2019- FONDEPES
- Monto Base : S/. 1'061,406.90 Soles (Inc. IGV)
- Monto Contratado : S/. 955,266.22 Soles (Inc. IGV)
- Entrega del Terreno : 09/12/2019
- Fecha de inicio de obra : 10/12/2019
- Fecha de Término de obra : 08/03/2020
- Plazo de ejecución : 90 días calendarios
- Inicio de Plan COVID -19 : 25 de Julio de 2020
- Reinicio de las Actividades de obra : 31 de Julio de 2020

1.2 SITUACION DE LA OBRA:

ASPECTOS TECNICOS

- SITUACION DE LA OBRA : **ATRASADA**
- AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO AL 31 DE JULIO : **100.00%**
- FECHA DEL TÉRMINO CONTRACTUAL.
- AVANCE EJECUTADO ACUMULADO AL 31 DE JULIO : **67.96%**
- FECHA DEL TÉRMINO CONTRACTUAL.
- SITUACION ACTUAL DE AVANCE DE OBRA
- ATRAZADA** : **32.04 %**


 VÍCTOR PLASENCIA TUCTO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 83231



1.3 ANTECEDENTES:

- Con fecha 24 de octubre de 2019 , el comité de selección adjudico la buena pro de la adjudicación simplificada N°049-2019-FONDEPES-primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de obra “REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORÍN, DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” , a la empresa CONSORCIO NUEVO TUMBES (conformado por :CONPROVI EIRL y BRECAL CONTRATISTAS GENERALES SRL).
- Con fecha 25 de noviembre de 2019, se suscribió el contrato N°061-2019-FONDEPES referente a la ejecución de la obra :” REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORÍN, DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” con la empresa CONSORCIO NUEVO TUMBES.
- Con fecha 28 de octubre del 2019 se adjudicó la buena Pro la adjudicación Simplificada - 2019-N°053 FONDEPES para la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de obra: :” REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORÍN, DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” a nombre del Sr. Dionisio Rojas Mamani.
- Con fecha 28 de noviembre del 2019 , se suscribe el contrato N°068-2019- FONDEPES de supervisión de Obra :” REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA **DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORÍN, DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**” a nombre del Sr. Dionisio Rojas Mamani., quien asumirá la representación de la Entidad ante el Contratista de Obra.
- Con fecha 02 de diciembre 2019, mediante la carta N°006-2019/CONSORCIO NUEVO TUMBES-T el contratista de obra CONSORCIO NUEVO TUMBES solicito adelanto directo del 10%.


 VICTOR PLASENCIA TUCO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 83231

**R.U.C. No. 10021511116**

- Con fecha 06 de diciembre del 2019, mediante Carta N°1257-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, FONDEPES entrega el expediente técnico de obra al CONSORCIO NUEVO TUMBES.
- Con fecha 06 de diciembre del 2019, mediante la carta N° 1256-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, FONDEPES entrega el expediente técnico de obra a la Supervisión Dionisio Rojas Mamani.
- Con fecha 06 de diciembre del 2019, mediante la carta N° 1260-2019-FONDEPES/DIGENIPAA, FONDEPES notifica al contratista de obra CONSORCIO NUEVO TUMBES sobre la designación de la supervisión de obra.
- Con fecha 09 de diciembre del 2019, se suscribió el acta de entrega de terreno para la ejecución de la obra entre FONDEPES y el contratista CONSORCIO NUEVO TUMBES
- Con fecha 10 de diciembre del 2019, se inicia el plazo contractual de la ejecución de la obra:” REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORÍN, DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” , habiéndose cumplido con todos los requisitos del Artículo N°176 de la ley de Contrataciones con el Estado .
- Con fecha 08 de marzo de 2020, se terminó el plazo contractual de la ejecución de la obra:” REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORÍN, DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”
- Al 15 de marzo de 2020 la contratista CONSORCIO NUEVO TUMBES continuó con las labores a fin de culminar las partidas faltantes.
- A partir del 16 de Marzo de 2020 se paralizan las actividades mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Declara en estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.



VICTOR PLASENCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231



R.U.C. No. 10021511116

1.4 BASE LEGAL:

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante DS N° 344-2018- EF
- Artículo 208.- RECEPCION DE LA OBRA Y PLAZOS de la Ley N° 30225
- De conformidad con el Artículo 208 de la Ley,.....de no constatar la culminación de la Obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la entidad en el mismo plazo (05 días calendarios del término de plazo contractual).
- *Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Declara en estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.*
- *Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, proroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.*
- *Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, proroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.*
- *Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, proroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.*
- *Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, proroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.*
- *Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, proroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.*
- *Decreto Legislativo N° 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas.*
- *Decreto Supremo 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.*
- *Decreto Supremo 101-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 y modifica el Decreto Supremo 080-2020-PCM.*
- *Resolución Ministerial 239-2020-MINSA, Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”.*
- *Resolución Ministerial 265-2020-MINSA y Resolución Ministerial 283-2020-MINSA, Modificar el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”.*


 VÍCTOR PLASENCIA TUCTO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 63231

**R.U.C. No. 10021511116**

- *Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, Alcances y disposiciones para la reactivación de obras públicas y contratos de supervisión, en el marco de la segunda disposición complementaria transitoria del decreto legislativo N° 1486.*

1.5 SITUACION DE LA OBRA

Esta supervisión verifica al 31 de JULIO de 2020 que a la fecha indicada no se han ejecutado ninguna partida faltante en la obra "REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORÍN, DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, de acuerdo a la último día laborable que fue el 15 de marzo de 2020.


Se indica que no se han ejecutado alguna partida desde la última valorización presentada por la contratista CONSORCIO NUEVO TUMBES que fue de fecha 29 de febrero de 2020 con 67.96% de avance ejecutado y un atraso de obra de 32.04%.

Se indica que a la fecha no se han ejecutado ni implementado el Plan del proceso COVID-19, no cumpliendo como lo mencionado en la Resolución de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola N°078-2020-FONDEPES/DIGENIPAA, en la cual puntualiza que la el proceso COVID-19, debe empezar al día siguiente del comunicado de la Resolución antes dicha, esto quiere decir que se debió de empezar con el proceso COVID-19 el día 25 de julio de 2020 y culminar el día 30 de julio de 2020 (06 días como se indica en la Resolución N°078), iniciándose las actividades de Obra el día 31 de julio de 2020.

De igual manera se deja indicado que se verifico la ausencia del residente de obra Ing. Freddy Carrasco Pérez y del personal a su cargo.

También se indica el no tener acceso al cuaderno de obra, ya que no existe persona alguna que me lo brindara para poder anotar las ocurrencias del estado situacional de la obra.

A la fecha la empresa no se ha comunicado con esta supervisión para presentar la valorización correspondiente al 31 de julio del 2020.


VÍCTOR PLASENCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231

**1.7 CONCLUSIONES:**

- 1 Se concluye que la máxima penalidad se cumple el 05 de agosto de 2020
- 2 Se indica que a la fecha del 31 de JULIO de 2020 la contratista CONSORCIO NUEVO TUMBES a estado ejecutando la Obra con 08 días calendarios de penalidad.
- 3 A la fecha la contratista CONSORCIO NUEVO TUMBES se encuentra en penalidad

1.8 RECOMENDACIONES:

- 1 Se recomienda a la Contratista CONSORCIO NUEVO TUMBES continuar con las labores para Acelerar con los trabajos de las partidas inconclusas ya que a partir lo más antes posible
- 2 Se recomienda CONSORCIO NUEVO TUMBES implementar lo más antes posible el Plan COVID-19 en la obra de lo contrario no podrá ejecutar ningún trabajo.
- 5 Se indica a la Contratista CONSORCIO NUEVO TUMBES que al no cumplir con los trabajos Faltantes y el Plan COVID 19, corre el riesgo de que la Entidad FONDEPES/DIGENIPAA le Resuelva el contrato
- 6 Se recomienda que la entidad realice el apercibimiento de incumplimiento de obligaciones del Contrato de ejecución de obra conforme a la Ley de Contrataciones con el Estado, conforme se Indica en el artículo N°164.- CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO.



VÍCTOR PLASENCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231



FOTOS AL 01 DE AGOSTO DE 2020 NO SE PLAN COVID 19, NI TAMPOCO PERSONAL LABORANDO




VÍCTOR PLASENCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231





VÍCTOR PLASENCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231






VICTOR PLASEÑCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231

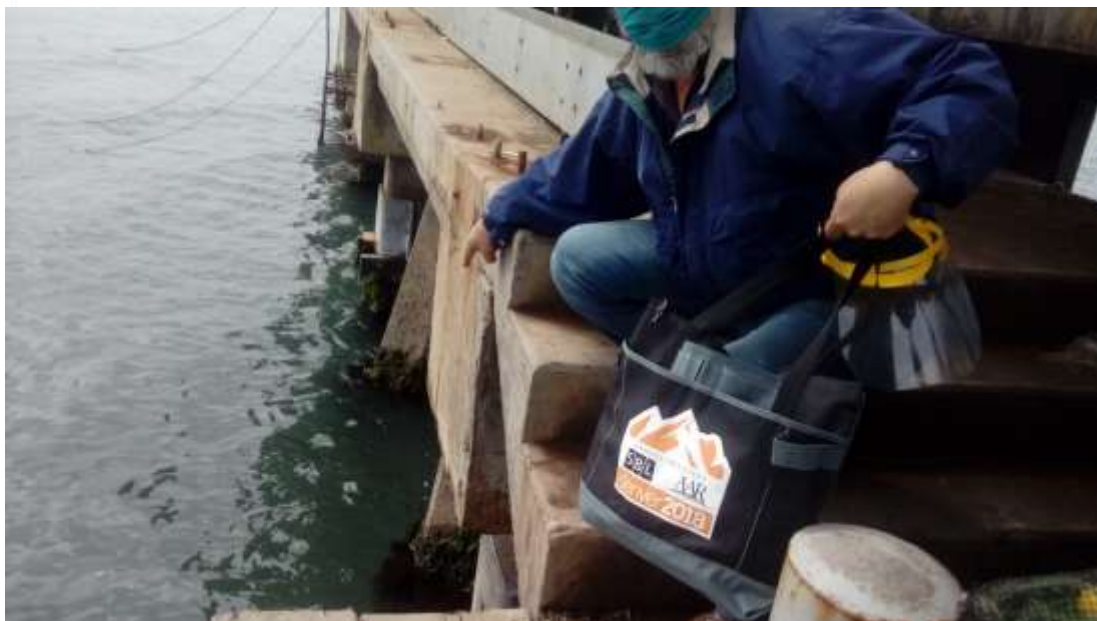


VICTOR PLASENCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231



Victor Plasencia Tucto
VÍCTOR PLASENCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231





DRM




VICTOR PLASENCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231




VICTOR PLASENCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231




VICTOR PLASENCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231



R.U.C. No. 10021511116



Victor Plaseñcia Tucto
VÍCTOR PLASENCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231





Victor Plasencia Tucto
VICTOR PLASENCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231






ACTA DE CONSTATAción DE
INICIO DE ACTIVIDADES
IMPLEMENTACION COVID-19 PUERTO MORIN

SIENDO LAS 12:00 AM DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2020 NOS HICIMOS PRESENTE EN LA OBRA "RENOVACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS RODILLOS DE DESINFECCION, TAREAS PNEUMATICAS Y FRIO, RENOVACION DE LA CERRAJERIA DE TAREAS PNEUMATICAS Y LA RENOVACION DEL SISTEMA DE DESMUNDO Y COBERTURA EN EL CASO EN EL DESMUNDO PESQUERA ARTESANAL PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORIN, DISTRITO DE VIRU DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EN EL CUAL SE REALIZO EL RECORRIDO Y LA VERIFICACION DE QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EL PROCESO COVID-19 FISICAMENTE EN LA OBRA LO CUAL DEBIO EMPEZAR EL 25 DE JULIO DE 2020 Y CULMINAR EL 30 DE JULIO DE 2020, Y A LA VEZ SE REINICIO DE LAS ACTIVIDADES EL DIA 31 DE JULIO DE 2020 SEGUN SE INDICA EN LA RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA N° 078 - 2020 - FONDEPES / DIBENIPAA FIRMANDO LOS PRESENTES:


VICTOR PLASENCIA TUOTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231
SUPERVISOR DE OBRA
PUERTO MORIN


DEPARTAMENTO PESQUERA ARTESANAL
PUERTO MORIN

Walter Edwin Castillo Solano
ADMINISTRADOR



R.U.C. No. 1002151116

ACTA DE CONSTATAION DEL
REINICIO DE LAS ACTIVIDADES
EN PUERTO MORIN

SIENDO LAS 11:00 AM DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2020 NOS HICIMOS PRESENTE EN LA OBRA "RENOVACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREEVIAS Y FRIOS, RENOVACION DE LA GRATERIA DE TAREAS PREEVIAS Y LA REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CAJON EN EL DESMARCADERO PESQUERO ARRESTAL PUERTO MORIN, EN LA LOCALIDAD DE MORIN (DISTRITO DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LINDERA), EN EL CUAL SE VERIFICO LA AUSENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA ING. FREDDY CARRASCO PEREZ Y DEL PERSONAL A SU CARGO, DE IGUAL MANERA NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA, VIENDOME IMPOSIBILITADO DE ANOTAR LAS OCURRENCIAS DEL ESTADO DE LA OBRA SE INDICA QUE EL REINICIO DE OBRA ES EL 30 DE JULIO DE 2020, SEGUN INDICA LA RESOLUCION N° 078-2020-FONDIETES/DIGENIPAA
FINHAN LOS PRESENTES


VICTOR PLASENCIA TUOTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 63231

SUPERVISOR DE OBRA
PUERTO MORIN

DESARROLLO PESQUERO ARRESTAL
Walter Edwin Castillo Solari
ADMINISTRADOR

FONDO DE DESARROLLO PESQUERO

FONDEPES

L.P.N : **A.S. N° 049-2019-FONDEPES**

Obra : **REMODELACION DE LAS II.EE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD**

Ubicación : **VIRU - VIRU - LA LIBERTAD**

Supervisor : **Ing. Victor Plasencia Tucto**

Contratista : **CONSORCIO NUEVO TUMBES**




VALORIZACION DE OBRA N°5


(Al 31 de Julio del 2020)

FECHA BASE DEL PRESUPUESTO	01/06/19
MES DE INICIO DE VALORIZACIONES	01/12/19

CONTROL DE VALORIZACION (DATOS SIN IGV)							
Nº	MES	PORTUARIAS	ESTRUCTURAS	ARQUITECTURA	INST. ELECT.	CONTINGENCIA	TOTAL
1	01/12/2019	22,094.98	5,276.24	106.81	13,988.81	18,288.14	59,754.98
2	01/01/2020	25,755.78	88,120.53	74,242.55	73,043.25	11,818.08	272,980.19
3	01/02/2020	19,167.78	11,616.00	32,905.34	153,776.35	0.00	217,465.47
4	08/03/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	31/07/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACUMULADO ACTUAL		67,018.54	105,012.77	107,254.70	240,808.41	30,106.22	550,200.64
CONTRATO		326,365.54	105,012.77	107,254.70	240,808.41	30,106.22	809,547.64
SALDO		259,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,347.00


 VÍCTOR PLASEÑCIA TUCTO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 83231

CONTROL DE LA VALORIZACION									
ESPECIALIDAD	Monto del Contrato sin IGV	Anterior	Mes Actual	Acumulado	%	Saldo	%	Avance Programado Acumulado	%
OBRAS PORTUARIAS	326,365.54	67,018.54	0.00	67,018.54	20.53%	259,347.00	79.47%	326,365.54	100.00%
ESTRUCTURAS	105,012.77	105,012.77	0.00	105,012.77	100.00%	0.00	0.00%	105,012.77	100.00%
ARQUITECTURA	107,254.70	107,254.70	0.00	107,254.70	100.00%	0.00	0.00%	107,254.70	100.00%
INST. ELECTRICAS	240,808.41	240,808.41	0.00	240,808.41	100.00%	0.00	0.00%	240,808.41	100.00%
PLAN DE CONTINGENCIA	30,106.22	30,106.22	0.00	30,106.22	100.00%	0.00	0.00%	30,106.22	100.00%
SUB-TOTAL	809,547.64	550,200.64	0.00	550,200.64	67.96%	259,347.00	32.04%	809,547.64	100.00%
IMPUESTO IGV 18%	145,718.58	99,036.12	0.00	99,036.12	67.96%	46,682.46	32.04%	145,718.58	100.00%
TOTAL	955,266.22	649,236.76	0.00	649,236.76	67.96%	306,029.46	32.04%	955,266.22	100.00%


VÍCTOR PLASENCIA TUCTO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 83231


CONTROL DE AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO			
MONTO SIN IGV =			80,954.76
FECHA DE PAGO			06-dic-19
VAL	MES		SALDO
1	01-dic-19	5,975.50	74,979.26
2	01-ene-20	27,298.02	47,681.24
3	01-feb-20	21,746.55	25,934.69
4	08-mar-20	0.00	25,934.69
5	31-jul-20	0.00	25,934.69
TOTAL		55,020.07	

CONTROL DE AMORTIZACION DEL ADELANTO P/MATERIALES			
MONTO SIN IGV =			S/. 147,464.03
FECHA DE PAGO			06-feb-20
VAL	MES	AMORTIZ.	SALDO
1	01-dic-19	0.00	147,464.03
2	01-ene-20	0.00	147,464.03
3	01-feb-20	79,700.56	67,763.47
4	08-mar-20	0.00	67,763.47
5	31-jul-20	1.00	67,762.47
	TOTAL	79,701.56	

I.- FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

VALORIZACION DE OBRA Nº 5 (Al 31 de Julio del 2020)

		REMODELACION DE LAS II.EE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD			
1 Obra	:	MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD			
2 Ubicación	:	VIRU - VIRU - LA LIBERTAD			
	Area Geografica	:	1		
3 Metas	:	Obras Portuarias (Construcción de sistema de defensa y amarre en plataforma 1 y 2 de cabezo de muelle) Estructuras (Construcción de estructura metálica para techo de plataforma 1 y 2 de cabezo de muelle) Arquitectura (Remodelación de 4 lavamanos existentes, impermeabilizar techos y cobertura de estructura en cabezo de muelle) Instalaciones Electricas (Remodelación del sistema de inst. electricas)			
4 Entidad Contratante	:	FONDEPES			
5 Contratista	:	CONSORCIO NUEVO TUMBES			
6 Supervisor	:	Ing. Victor Plasencia Tucto		CIP Nº 83231	
7 Residente	:	Ing. Freddy Carrasco Perez		CIP Nº 40216	
8 Financiamiento	:	Recursos Ordinarios de la Entidad			
9 Licitación Pública	:	A.S. Nº 049-2019-FONDEPES			
10 Modalidad	:	A Suma Alzada			
11 Presupuesto base, con IGV y Fecha	:	S/. 1,061,406.90		01-jun-19	
12 Presupuesto base, sin IGV y Fecha	:	S/. 899,497.37			
13 Factor de Relación (FR)	:	0.90000			
14 Monto del contrato, con IGV	:	S/. 955,266.22			
15 Monto del contrato, sin IGV	:	S/. 809,547.64			
16 Plazo de ejecución, en d. c.	:	90			
17 Plazo de ejecución según Bases Lic., en d.c	:	90			
18 Prórrogas, días calendario	:	0			
19 Adicionales de obra con IGV	:1	S/. 0.00			
Adicionales de obra sin IGV	:1	S/. 0.00			
20 Deductivo de obra con IGV	:1	S/. 0.00			
Deductivo de obra sin IGV	:1	S/. 0.00			
21 Fecha de Firma de Contrato de obra	:				
22 Reconocimiento de mora Firma Contrato	:				
23 Comp.Gastos incump. entrega terreno	:				
24 Intereses por Mora, con IGV	:				
25 Intereses por Mora, sin IGV	:				
26 Mayor Gastos Gral. prorroga plazo, c/IGV	:				
27 Mayor Gastos Gral. prorroga plazo, s/IGV	:				
28 Adelanto directo con IGV y fecha de pago	:	S/. 95,526.62	06-dic-19	10.00%	
29 Adelanto directo sin IGV y fecha de pago	:	S/. 80,954.76	06-dic-19		
30 Adelantos para materiales, con IGV	:	S/. 174,007.55	06-feb-20	18.22%	
31 Adelantos para materiales, sin IGV	:	S/. 147,464.03	06-feb-20		
32 Entrega de terreno	:	09-dic-19			
33 Inicio oficial de plazo	:	10-dic-19			
34 Término original programado de obra	:	08-mar-20			
35 Término vigente programado de obra	:	08-mar-20			
36 Término Real de obra	:				
37 Constatación Física	:				
38 Levantamiento de Observaciones	:				
39 Acta de Recepción de Obra	:				
40 Avance Real Acumulado	:	67.96%			
41 Avance Programado Acumulado	:	100.00%			
42 Situación de la obra respecto del avance	:	Atrasada			


 VÍCTOR PLASENCIA TUCTO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 83231

OBRAS PORTUARIAS

VALORIZACION DE OBRA N°

5

(Al 31 de Julio del 2020)

OBRA

REMODELACION DE LAS ILEE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD

UBICACIÓN :

VIRU - VIRU - LA LIBERTAD

L.P.N. N°

: A.S. N° 049-2019-FONDEPES

PRESUPUESTO BASE

: 1,061,406.90

F.R. = 0.90000

CONTRATISTA

: CONSORCIO NUEVO TUMBES

MONTO DEL CONTRATO

: 955,266.22

PAG. N° 1

PART.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO BASE				AVANCES							SALDOS		
		UND.	METRADO	P.UNIT. S/.	PRESUP. S/.	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO			METRADO	VALOR S/.	
						METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	%			
01.01	OBRAS PROVISIONALES														
01.01.01	MOVILIZ. Y DESMOVILIZ. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	4,500.00	4,500.00	0.50	2,250.00	0.00	0.00	0.50	2,250.00	50.00	0.50	2,250.00	
01.01.02	FLETE TERRESTRE DE MATERIALES	ton	1.00	6,736.95	6,736.95	1.00	6,736.95	0.00	0.00	1.00	6,736.95	100.00	0.00	0.00	
01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA	mes	3.00	850.05	2,550.15	2.50	2,125.13	0.00	0.00	2.50	2,125.13	83.33	0.50	425.03	
01.01.04	AGUA PARA OBRA	mes	3.00	516.96	1,550.88	2.50	1,292.40	0.00	0.00	2.50	1,292.40	83.33	0.50	258.48	
01.01.05	ENERGIA PARA OBRA	mes	3.00	1,861.42	5,584.26	2.50	4,653.55	0.00	0.00	2.50	4,653.55	83.33	0.50	930.71	
01.01.06	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA	und	1.00	1,685.31	1,685.31	1.00	1,685.31	0.00	0.00	1.00	1,685.31	100.00	0.00	0.00	
01.01.07	OFICINAS, ALMACENES Y TALLERES	m2	21.00	105.40	2,213.40	21.00	2,213.40	0.00	0.00	21.00	2,213.40	100.00	0.00	0.00	
01.01.08	SS.HH. PROVISIONALES	mes	3.00	380.00	1,140.00	2.50	950.00	0.00	0.00	2.50	950.00	83.33	0.50	190.00	
01.02	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														
01.02.01	PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPAC. Y MEDIO AMBIENTE	glb	1.00	3,835.00	3,835.00	0.83	3,183.05	0.00	0.00	0.83	3,183.05	83.00	0.17	651.95	
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	4,067.50	4,067.50	0.83	3,376.03	0.00	0.00	0.83	3,376.03	83.00	0.17	691.48	
01.02.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	1,515.75	1,515.75	0.83	1,258.07	0.00	0.00	0.83	1,258.07	83.00	0.17	257.68	
01.02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	3,176.30	3,176.30	0.83	2,636.33	0.00	0.00	0.83	2,636.33	83.00	0.17	539.97	
01.02.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	2,500.00	2,500.00	0.83	2,075.00	0.00	0.00	0.83	2,075.00	83.00	0.17	425.00	
01.03	DESMONTAJES														
01.03.01	DESMONTAJE DE SISTEMA DE DEFENSA EXISTENTE	glb	1.00	4,837.47	4,837.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,837.47	
01.03.02	DESMONTAJE DE PESCANTES EXISTENTES	und	2.00	573.93	1,147.86	2.00	1,147.86	0.00	0.00	2.00	1,147.86	100.00	0.00	0.00	
01.03.03	DESMONTAJE DE BITAS EXISTENTES	und	6.00	123.46	740.76	6.00	740.76	0.00	0.00	6.00	740.76	100.00	0.00	0.00	
01.04	SISTEMA DE DEFENSA														
01.04.01	LIMPIEZA PILOTES D/CONC. ARMADO DE PLATAF. BAJA	und	12.00	300.36	3,604.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	3,604.32	
01.04.02	SUM. E INST. ARRIVOS. SEG. PILOTES DE PLATAF. BAJA Y CAB.	und	3.00	3,835.32	11,505.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	11,505.96	
01.04.03	SUM. E INST. ABRAZAD. MET. INC. MONTAJE Y SOLDADURA	und	9.00	1,344.75	12,102.75	6.00	8,068.50	0.00	0.00	6.00	8,068.50	66.67	3.00	4,034.25	
01.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE DE MADERA	und	9.00	614.06	5,526.54	6.00	3,684.36	0.00	0.00	6.00	3,684.36	66.67	3.00	1,842.18	
01.04.05	SUM. E INST. DE VIGA W12X65 INC. MONTAJE Y SOLDADURA	m	33.00	675.04	22,276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	22,276.32	
01.04.06	ARENADO Y PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS	m2	91.06	129.15	11,760.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.06	11,760.40	
01.04.07	SUM. E INSTALACION DE PARANTES DE MADERA 8" x 10"	m	66.00	479.23	31,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	31,629.18	
01.04.08	SUM. E INSTALACION DE LARGUEROS DE MADERA 8" x 10"	m	165.00	586.48	96,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	96,769.20	
01.04.09	SUM. E INST. D/CALZOS D/MADERA C/ALIVIAD. PLATAF. BAJA	m	16.41	538.33	8,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.41	8,834.00	
01.04.10	SUM. Y APLIC. PRESERV. DE MADERA EN SIST. DE DEFENSA	m2	218.73	15.96	3,490.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.73	3,490.93	
01.04.11	SUM. E INSTALACION DE NEUMATICOS ARO 20 EN DESUSO	und	55.00	320.42	17,623.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	17,623.10	
01.04.12	SUM. E INST. DE BITAS DE AMARRE INC. ARENADO Y PINTADO	und	6.00	1,601.43	9,608.58	6.00	9,608.58	0.00	0.00	6.00	9,608.58	100.00	0.00	0.00	
01.04.13	MANTENIM. DE BITAS EXIST. (PLATAFORMA 3 Y CABEZO)	und	5.00	98.11	490.55	5.00	490.55	0.00	0.00	5.00	490.55	100.00	0.00	0.00	
01.04.14	ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE SOLDADURA	pto	12.00	25.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	300.00	

TOTAL COSTO DIRECTO

(A)

283,303.42

58,175.82

0.00

58,175.82

20.53%

225,127.59

GASTOS GENERALES 9.2%

(B)

26,063.91

5,352.18

0.00

5,352.18

20.53%

20,711.74

UTILIDADES 6%

(C)

16,998.21

3,490.54

0.00

3,490.54

20.53%

13,507.66

SUB TOTAL

(A + B + C)

326,365.54


67,018.54

0.00

67,018.54

20.53%

259,346.99


VICTOR PLASENCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231

ESTRUCTURAS

VALORIZACION DE OBRA N°

5

(Al 31 de Julio del 2020)

OBRA

REMODELACION DE LAS ILEE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS
: PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU -
VIRU - LA LIBERTAD

UBICACIÓN :

VIRU - VIRU - LA LIBERTAD

L.P.N. N°

: A.S. N° 049-2019-FONDEPES

PRESUPUESTO BASE

: 1,061,406.90

F.R. = 0.90000

CONTRATISTA

: CONSORCIO NUEVO TUMBES

MONTO DEL CONTRATO

: 955,266.22

PAG. N° 1

PART.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO BASE				AVANCES						SALDOS		
		UND	METRADO	P.UNIT. S/.	PRESUP. S/.	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		METRADO	VALOR S/.	
						METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.			%
02.01	DESMONTAJES Y DEMOLICIONES													
02.01.01	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA EXISTENTE	m2	89.84	25.81	2,318.77	89.84	2,318.77	0.00	0.00	89.84	2,318.77	100.00	0.00	0.00
02.01.02	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO	m3	0.10	282.30	28.23	0.10	28.23	0.00	0.00	0.10	28.23	100.00	0.00	0.00
02.01.03	DESMONTAJE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTES	m	165.80	10.44	1,730.95	165.80	1,730.95	0.00	0.00	165.80	1,730.95	100.00	0.00	0.00
02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	m3	0.13	42.05	5.47	0.13	5.47	0.00	0.00	0.13	5.47	100.00	0.00	0.00
02.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO													
02.02.01	PEDESTALES													
02.02.01.01	CONCRETO f _c = 280 kg/cm2, PEDESTALES	m3	1.02	496.15	506.07	1.02	506.07	0.00	0.00	1.02	506.07	100.00	0.00	0.00
02.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTALES	m2	11.66	50.60	590.00	11.66	590.00	0.00	0.00	11.66	590.00	100.00	0.00	0.00
02.02.01.03	ACERO CORRUGADO f _y = 4200 kg/cm2, PEDESTALES	kg	159.88	4.93	788.21	159.88	788.21	0.00	0.00	159.88	788.21	100.00	0.00	0.00
02.02.02	MANILUVIOS													
02.02.02.01	CONCRETO f _c = 210 kg/cm2, MANILUVIOY LAVABOTAS	m3	0.80	431.32	345.06	0.80	345.06	0.00	0.00	0.80	345.06	100.00	0.00	0.00
02.02.02.02	ENCOF. Y DESENCOF. DE MUROS MANILUVIOS Y LAVABOTAS	m2	11.24	50.60	568.74	11.24	568.74	0.00	0.00	11.24	568.74	100.00	0.00	0.00
02.02.02.03	ACERO DE REFUERZO f _y =4200 kg/cm2 EN MANILUVIOS Y LAVABOTAS	kg	41.60	4.93	205.09	41.60	205.09	0.00	0.00	41.60	205.09	100.00	0.00	0.00
02.02.02.04	ANCLAJES Y PERFORACIONES EN CONCRETO EXISTENTE	pto	24.00	27.92	670.08	24.00	670.08	0.00	0.00	24.00	670.08	100.00	0.00	0.00
02.03	ESTRUCTURAS METALICAS PARA COBERTURA													
02.03.01	APOYO VERTICAL P/COLUMNA METALICAS	und	10.00	168.49	1,684.90	10.00	1,684.90	0.00	0.00	10.00	1,684.90	100.00	0.00	0.00
02.03.02	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	kg	3,955.14	17.65	69,808.22	3,955.14	69,808.22	0.00	0.00	3,955.14	69,808.22	100.00	0.00	0.00
02.03.03	PRUEBA DE SOLDADURA Y CONTROL DE CALIDAD	glb	1.00	500.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	100.00	0.00	0.00
02.03.04	SISTEMA DE PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA, e=13mills	m2	112.89	89.32	10,083.33	112.89	10,083.33	0.00	0.00	112.89	10,083.33	100.00	0.00	0.00
02.03.05	VARIOS													
02.03.05.01	PUENTE DE ADHERENCIA EN BASE DE PEDESTALES	und	10.00	18.87	188.70	10.00	188.70	0.00	0.00	10.00	188.70	100.00	0.00	0.00
02.03.05.02	ANCLAJES DE REFUERZO C/ RESINA EPOXICA	und	10.00	113.51	1,135.10	10.00	1,135.10	0.00	0.00	10.00	1,135.10	100.00	0.00	0.00

TOTAL COSTO DIRECTO

(A)

91,156.92

91,156.92

0.00

91,156.92 100.00%

0.00

GASTOS GENERALES 9.2%

(B)

8,386.43

8,386.43

0.00

8,386.43 100.00%

0.00

UTILIDADES 6%

(C)

5,469.42

5,469.42

0.00

5,469.42

0.00

SUB TOTAL

(A + B + C)


105,012.77

105,012.77

0.00

105,012.77 100.00%

0.00


VICTOR PLASENCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231

ARQUITECTURA

VALORIZACION DE OBRA N°

5

(Al 31 de Julio del 2020)

OBRA

REMODELACION DE LAS ILEE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE
: TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD
MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD

UBICACIÓN :

VIRU - VIRU - LA LIBERTAD

L.P.N. N°

: A.S. N° 049-2019-FONDEPES

PRESUPUESTO BASE

: 1,061,406.90

F.R. = 0.90000

CONTRATISTA

: CONSORCIO NUEVO TUMBES

MONTO DEL CONTRATO

: 955,266.22

PAG. N° 1

PART.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO BASE				AVANCES							SALDOS	
		UND	METRADO	P.UNIT. S/.	PRESUP. S/.	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO			METRADO	VALOR S/.
						METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	%		
03.01	DEMOLICIONES													
03.01.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO SIMPLE	m3	0.47	136.18	64.00	0.47	64.00	0.00	0.00	0.47	64.00	100.00	0.00	0.00
03.01.02	ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES	m3	0.47	19.05	8.95	0.47	8.95	0.00	0.00	0.47	8.95	100.00	0.00	0.00
03.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	0.56	42.05	23.55	0.56	23.55	0.00	0.00	0.56	23.55	100.00	0.00	0.00
03.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS													
03.02.01	TARRAJEO C/IMPERMEAB. ACABADO CEMEN. PULIDO MANILUVIOS	m2	19.16	45.54	872.55	19.16	872.55	0.00	0.00	19.16	872.55	100.00	0.00	0.00
03.03	PISOS Y PAVIMENTOS													
03.03.01	PISO CEMEN. PULIDO C/IMPER. e=5cm, CONC. 1:10 P/ACC. MANILUVIOS	m2	2.00	45.43	90.86	2.00	90.86	0.00	0.00	2.00	90.86	100.00	0.00	0.00
03.03.02	PISO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE	m2	718.78	40.23	28,916.52	718.78	28,916.52	0.00	0.00	718.78	28,916.52	100.00	0.00	0.00
03.04	COBERTURAS													
03.04.01	SUM. E INST. COBERT. LIGERA CALAMINON TR-4, ROJO, E=6MM	m2	138.45	165.80	22,955.01	138.45	22,955.01	0.00	0.00	138.45	22,955.01	100.00	0.00	0.00
03.05	PINTURA													
03.05.01	PINTURA EPOXICA EN SARDINELES	m2	107.77	33.70	3,631.85	107.77	3,631.85	0.00	0.00	107.77	3,631.85	100.00	0.00	0.00
03.06	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS													
03.06.01	SIST. GRIF. GALV. CUELLO GANZO C/ACC. A PEDAL (INC. ACCES.)	und	4.00	742.44	2,969.76	4.00	2,969.76	0.00	0.00	4.00	2,969.76	100.00	0.00	0.00
03.07	OTROS													
03.07.01	SUM. E INST. DE BARANDAS FRP DE E=2" INC./ACCESORIOS	m	165.80	190.55	31,593.19	165.80	31,593.19	0.00	0.00	165.80	31,593.19	100.00	0.00	0.00
03.07.02	RESANE C/IMPERMEABILIZANTE EN SARDINELES	gib	1.00	1,976.80	1,976.80	1.00	1,976.80	0.00	0.00	1.00	1,976.80	100.00	0.00	0.00

TOTAL COSTO DIRECTO

(A)

93,103.04

93,103.04

0.00

93,103.04 100.00%

0.00

GASTOS GENERALES 9.2%

(B)

8,565.48

8,565.48

0.00

8,565.48 100.00%

0.00

UTILIDADES 6%

(C)

5,586.18

5,586.18

0.00

5,586.18

0.00

SUB TOTAL

(A + B + C)


107,254.70

107,254.70

0.00

107,254.70 100.00%

0.00


VÍCTOR PLASENCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231

INSTALACIONES ELECTRICAS

VALORIZACION DE OBRA N°

5

(Al 31 de Julio del 2020)

REMODELACION DE LAS ILEE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD

OBRA

: MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD

UBICACIÓN :

VIRU - VIRU - LA LIBERTAD

L.P.N. N°

: A.S. N° 049-2019-FONDEPES

PRESUPUESTO BASE

: 1,061,406.90

F.R. = 0.90000

CONTRATISTA

: CONSORCIO NUEVO TUMBES

MONTO DEL CONTRATO

: 955,266.22

PAG. N° 1

PART.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO BASE				AVANCES							SALDOS	
		UND	METRADO	P.UNIT. S/.	PRESUP. S/.	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO			METRADO	VALOR S/.
						METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	%		
04.01	ZONA EXTERIORES Y MUELLE - CABEZO													
04.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES													
04.01.01.01	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	glb	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00
04.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PARA IIEE	glb	1.00	612.84	612.84	1.00	612.84	0.00	0.00	1.00	612.84	100.00	0.00	0.00
04.01.01.03	BASE DE CONCRETO PARA PARANTE	glb	1.00	354.94	354.94	1.00	354.94	0.00	0.00	1.00	354.94	100.00	0.00	0.00
04.01.01.04	CORTE Y REPOSICION DE PISO, PARED Y TECHO	m	125.50	48.23	6,052.87	125.50	6,052.87	0.00	0.00	125.50	6,052.87	100.00	0.00	0.00
04.01.01.05	CORTE Y DEMOLICION DE LOSA SECCION 50X20CM	m	105.63	23.78	2,511.88	105.63	2,511.88	0.00	0.00	105.63	2,511.88	100.00	0.00	0.00
04.01.01.06	EXCAVACION DE ZANJA DE 50X60cm	m	105.63	15.33	1,619.31	105.63	1,619.31	0.00	0.00	105.63	1,619.31	100.00	0.00	0.00
04.01.01.07	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS 50x60cm	m	105.63	13.26	1,400.65	105.63	1,400.65	0.00	0.00	105.63	1,400.65	100.00	0.00	0.00
04.01.01.08	RESANE DE LOSA 50x20cm	m	105.63	36.35	3,839.65	105.63	3,839.65	0.00	0.00	105.63	3,839.65	100.00	0.00	0.00
04.01.01.09	DESMONTAJE DE POSTE DE CONCRETO	und	1.00	524.74	524.74	1.00	524.74	0.00	0.00	1.00	524.74	100.00	0.00	0.00
04.01.02	RETIRO DE ALIMENTADORES Y TABLEROS EXISTENTES													
04.01.02.01	RETIRO DE ALIMENTADOR EXISTENTE GA-2 DEL TABLERO TA-2	m	60.00	1.90	114.00	60.00	114.00	0.00	0.00	60.00	114.00	100.00	0.00	0.00
04.01.02.02	RETIRO DE ALIMENT. EXISTENTE GA-3 DEL TABLERO TA-3	m	90.00	1.90	171.00	90.00	171.00	0.00	0.00	90.00	171.00	100.00	0.00	0.00
04.01.02.03	RETIRO Y REINST. ALIMEN. EXIST. TABLERO EN CASETA	m	38.00	1.90	72.20	38.00	72.20	0.00	0.00	38.00	72.20	100.00	0.00	0.00
04.01.02.04	RETIRO DE TABLERO EXISTENTE TA-2	glb	1.00	202.47	202.47	1.00	202.47	0.00	0.00	1.00	202.47	100.00	0.00	0.00
04.01.02.05	RETIRO DE TABLERO EXISTENTE TA-3	glb	1.00	202.47	202.47	1.00	202.47	0.00	0.00	1.00	202.47	100.00	0.00	0.00
04.01.03	MANT. TAB. GRAL., ALUMBRADO EXTERIOR Y BUZONES													
04.01.03.01	MANT. Y CORRECCION DE TABLERO GENERAL TG	glb	1.00	2,438.42	2,438.42	1.00	2,438.42	0.00	0.00	1.00	2,438.42	100.00	0.00	0.00
04.01.03.02	MANT. DE POSTES DE ALUMBRADO CON DOBLE PASTORAL	und	10.00	240.00	2,400.00	10.00	2,400.00	0.00	0.00	10.00	2,400.00	100.00	0.00	0.00
04.01.03.03	MANT. DE POSTES DE ALUMBRADO CON UN PASTORAL	und	11.00	200.98	2,210.78	11.00	2,210.78	0.00	0.00	11.00	2,210.78	100.00	0.00	0.00
04.01.03.04	MANT. Y CORRECCION DE CIRCUITO DE ILUMINAC. GA-07	m	190.00	6.05	1,149.50	190.00	1,149.50	0.00	0.00	190.00	1,149.50	100.00	0.00	0.00
04.01.03.05	MANT. Y CORRECCION DE CIRCUITO DE ILUMINAC. GA-08	m	450.00	7.05	3,172.50	450.00	3,172.50	0.00	0.00	450.00	3,172.50	100.00	0.00	0.00
04.01.03.06	MANTENIMIENTO DE BUZONES ELECTRICOS	und	10.00	47.52	475.20	10.00	475.20	0.00	0.00	10.00	475.20	100.00	0.00	0.00
04.01.03.07	MANTENIMIENTO DE POZO PUESTA A TIERRA	und	3.00	684.67	2,054.01	3.00	2,054.01	0.00	0.00	3.00	2,054.01	100.00	0.00	0.00
04.01.04	BUZONES ELECTRICOS													
04.01.04.01	SUM. E INST. DE TAPAS METALICAS P/BUZONES ELECT.	und	5.00	2,519.69	12,598.45	5.00	12,598.45	0.00	0.00	5.00	12,598.45	100.00	0.00	0.00
04.01.04.02	BUZON DE CONCRETO BZ-13 C/TAPA METALICA	und	1.00	1,699.58	1,699.58	1.00	1,699.58	0.00	0.00	1.00	1,699.58	100.00	0.00	0.00
04.01.04.03	BANCO DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS x Ø90mm	m	20.00	78.92	1,578.40	20.00	1,578.40	0.00	0.00	20.00	1,578.40	100.00	0.00	0.00
04.01.05	CANALIZACIONES ELECTRICAS													
04.01.05.01	CANALIZ. DE TRONCAL PARA ILUMINACION EN CABEZO	m	34.00	171.45	5,829.30	34.00	5,829.30	0.00	0.00	34.00	5,829.30	100.00	0.00	0.00
04.01.05.02	SUM. E INST. CABL. Y CONEX. DE CARGAS EN INT. CASETA	glb	1.00	320.99	320.99	1.00	320.99	0.00	0.00	1.00	320.99	100.00	0.00	0.00
04.01.05.03	TUBERIA CONDUIT PVC D=40mm	m	146.50	14.82	2,171.13	146.50	2,171.13	0.00	0.00	146.50	2,171.13	100.00	0.00	0.00
04.01.05.04	TUBERIA CONDUIT PVC D=65mm	m	210.00	32.22	6,766.20	210.00	6,766.20	0.00	0.00	210.00	6,766.20	100.00	0.00	0.00
04.01.05.05	CANALIZACION CONDULET Ø1 1/2" AEREO SOPORTADO	m	297.00	136.31	40,484.07	297.00	40,484.07	0.00	0.00	297.00	40,484.07	100.00	0.00	0.00
04.01.05.06	CAJA DE PASE ALUMINO 200x200x120mm ADOSADO, IP65	und	2.00	88.04	176.08	2.00	176.08	0.00	0.00	2.00	176.08	100.00	0.00	0.00
04.01.05.07	SOPORTE SP-1	und	198.00	139.93	27,706.14	198.00	27,706.14	0.00	0.00	198.00	27,706.14	100.00	0.00	0.00

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO BASE											SALDOS		
		UND	METRADO	P.UNIT. S/.	PRESUP. S/.	ACUMULADO		ACTUAL		ACUMULADO			METRADO	VALOR S/.	
						METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	%			
04.01.06	CABLES Y CONDUCTORES														
04.01.06.01	CABLE 4-1x16mm2, N2XH	m	419.63	35.94	15,081.50	419.63	15,081.50	0.00	0.00	419.63	15,081.50	100.00	0.00	0.00	
04.01.06.02	CABLE 4-1x10mm2, N2XH	m	150.00	26.86	4,029.00	150.00	4,029.00	0.00	0.00	150.00	4,029.00	100.00	0.00	0.00	
04.01.06.03	CABLE 1x10mm2 NH-80 P/TIERRA	m	419.63	6.37	2,673.04	419.63	2,673.04	0.00	0.00	419.63	2,673.04	100.00	0.00	0.00	
04.01.07	TABLEROS E INTERRUPTORES														
04.01.07.01	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO TA-2 (SEGUN NORMA)	und	1.00	2,128.44	2,128.44	1.00	2,128.44	0.00	0.00	1.00	2,128.44	100.00	0.00	0.00	
04.01.07.02	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO TA-3 (SEGUN NORMA)	und	1.00	1,632.77	1,632.77	1.00	1,632.77	0.00	0.00	1.00	1,632.77	100.00	0.00	0.00	
04.01.07.03	INSTALACION DE TABLERO DE FUERZA Y CONTROL	und	1.00	2,311.47	2,311.47	1.00	2,311.47	0.00	0.00	1.00	2,311.47	100.00	0.00	0.00	
04.01.08	LUMINARIAS Y ACCESORIOS DE UTILIZACION														
04.01.08.01	SUM. E INST. DE PARANTE ALIMENTADOR PARA LUMINARIAS	und	1.00	364.89	364.89	1.00	364.89	0.00	0.00	1.00	364.89	100.00	0.00	0.00	
04.01.08.02	SUM. E INST. LUMIN. SUSPENDIDA INCL. CANALIZACION Y CABLEADO	und	30.00	288.47	8,654.10	30.00	8,654.10	0.00	0.00	30.00	8,654.10	100.00	0.00	0.00	
04.02	ZONA DE TAREAS PREVIAS - CIRCUITOS DERIVADOS TA-2														
04.02.01	RETIRO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS														
04.02.01.01	RETIRO DE LUMINARIAS INC. CABLES EXISTENTES	pto	43.00	13.33	573.19	43.00	573.19	0.00	0.00	43.00	573.19	100.00	0.00	0.00	
04.02.01.02	RETIRO DE TOMACORRIENTES INC. CABLES EXISTENTES	pto	30.00	7.14	214.20	30.00	214.20	0.00	0.00	30.00	214.20	100.00	0.00	0.00	
04.02.01.03	RETIRO LUM. INC. CABLES Y CANALIZ. EXIST. EN TECHO EXTERIOR	glb	1.00	348.73	348.73	1.00	348.73	0.00	0.00	1.00	348.73	100.00	0.00	0.00	
04.02.02	CANALIZACIONES ELECTRICAS														
04.02.02.01	CANALIZACION DE TRONCAL PARA ILUMINAC. EN TECHO EXTERIOR	m	30.00	137.96	4,138.80	30.00	4,138.80	0.00	0.00	30.00	4,138.80	100.00	0.00	0.00	
04.02.02.02	CANALIZ. DE BOTONERA A MOTOR DE PUERTAS ENROLLABLES	und	5.00	432.07	2,160.35	5.00	2,160.35	0.00	0.00	5.00	2,160.35	100.00	0.00	0.00	
04.02.02.03	SALIDA PARA LUMINARIA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)	pto	13.00	27.30	354.90	13.00	354.90	0.00	0.00	13.00	354.90	100.00	0.00	0.00	
04.02.02.04	CANALIZACION P/LUZ DE EMERGENCIA	pto	13.00	32.49	422.37	13.00	422.37	0.00	0.00	13.00	422.37	100.00	0.00	0.00	
04.02.03	CABLES Y CONDUCTORES														
04.02.03.01	CABLE NH-80, 1x4mm2	m	165.00	6.87	1,133.55	165.00	1,133.55	0.00	0.00	165.00	1,133.55	100.00	0.00	0.00	
04.02.03.02	CABLE NH-80, 1x2.5mm2	m	1,000.00	6.03	6,030.00	1,000.00	6,030.00	0.00	0.00	1,000.00	6,030.00	100.00	0.00	0.00	
04.02.04	INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO														
04.02.04.01	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	5.00	56.49	282.45	5.00	282.45	0.00	0.00	5.00	282.45	100.00	0.00	0.00	
04.02.04.02	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto	3.00	59.54	178.62	3.00	178.62	0.00	0.00	3.00	178.62	100.00	0.00	0.00	
04.02.04.03	INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE	pto	2.00	65.17	130.34	2.00	130.34	0.00	0.00	2.00	130.34	100.00	0.00	0.00	
04.02.04.04	INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CONMUTACION	pto	4.00	57.00	228.00	4.00	228.00	0.00	0.00	4.00	228.00	100.00	0.00	0.00	
04.02.04.05	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE A PRUEBA DE AGUA	und	1.00	125.91	125.91	1.00	125.91	0.00	0.00	1.00	125.91	100.00	0.00	0.00	
04.02.04.06	INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE A PRUEBA DE AGUA	und	2.00	131.85	263.70	2.00	263.70	0.00	0.00	2.00	263.70	100.00	0.00	0.00	


PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO BASE											SALDOS				
		UND	METRADO	P.UNIT. S/.	PRESUP. S/.	ACUMULADO		ACTUAL		ACUMULADO			METRADO	VALOR S/.			
						METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	%					
04.02.05	TOMACORRIENTES																
04.02.05.01	INST. DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA	und	11.00	106.02	1,166.22	11.00	1,166.22	0.00	0.00	11.00	1,166.22	100.00	0.00	0.00			
04.02.05.02	INST. TOMAC. BIPOLAR DOBLE C/LINEA DE TIERRA A PRUEBA AGUA	und	13.00	182.11	2,367.43	13.00	2,367.43	0.00	0.00	13.00	2,367.43	100.00	0.00	0.00			
04.02.06	LUMINARIAS Y ACCESORIOS DE UTILIZACION																
04.02.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SUSPENDIDA	und	23.00	304.37	7,000.51	23.00	7,000.51	0.00	0.00	23.00	7,000.51	100.00	0.00	0.00			
04.02.06.02	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LUMINARIA ADOSADA	und	23.00	40.80	938.40	23.00	938.40	0.00	0.00	23.00	938.40	100.00	0.00	0.00			
04.02.06.03	SUM. E INST. DE LUM. ADOSADA INCL. CANALIZACION Y CABLEADO	und	7.00	180.83	1,265.81	7.00	1,265.81	0.00	0.00	7.00	1,265.81	100.00	0.00	0.00			
04.02.06.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA	und	13.00	224.01	2,912.13	13.00	2,912.13	0.00	0.00	13.00	2,912.13	100.00	0.00	0.00			
04.03	ZONA DE TAREAS PREVIAS - CIRCUITOS DERIVADOS TA-3																
04.03.01	RETIRO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS																
04.03.01.01	RETIRO DE LUMINARIAS INC. CABLES EXISTENTE	pto	24.00	13.33	319.92	24.00	319.92	0.00	0.00	24.00	319.92	100.00	0.00	0.00			
04.03.01.02	RETIRO DE TOMACORRIENTES INC. CABLES EXISTENTES	pto	21.00	7.14	149.94	21.00	149.94	0.00	0.00	21.00	149.94	100.00	0.00	0.00			
04.03.02	CANALIZACIONES ELECTRICAS																
04.03.02.01	CANALIZACION P/LUZ DE EMERGENCIA	pto	6.00	32.49	194.94	6.00	194.94	0.00	0.00	6.00	194.94	100.00	0.00	0.00			
04.03.03	CABLES Y CONDUCTORES																
04.03.03.01	CABLE NH-80, 1x2,5mm2	m	480.00	6.03	2,894.40	480.00	2,894.40	0.00	0.00	480.00	2,894.40	100.00	0.00	0.00			
04.03.04	INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO																
04.03.04.01	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	1.00	56.49	56.49	1.00	56.49	0.00	0.00	1.00	56.49	100.00	0.00	0.00			
04.03.04.02	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto	3.00	59.54	178.62	3.00	178.62	0.00	0.00	3.00	178.62	100.00	0.00	0.00			
04.03.04.03	INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CONMUTACION	pto	4.00	57.00	228.00	4.00	228.00	0.00	0.00	4.00	228.00	100.00	0.00	0.00			
04.03.05	TOMACORRIENTES																
04.03.05.01	INST. DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA	und	2.00	106.02	212.04	2.00	212.04	0.00	0.00	2.00	212.04	100.00	0.00	0.00			
04.03.05.02	INST. TOMAC. BIPOLAR DOBLE C/LINEA DE TIERRA A PRUEBA AGUA	und	8.00	182.11	1,456.88	8.00	1,456.88	0.00	0.00	8.00	1,456.88	100.00	0.00	0.00			
04.03.06	LUMINARIAS Y ACCESORIOS DE UTILIZACION																
04.03.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA	und	6.00	224.01	1,344.06	6.00	1,344.06	0.00	0.00	6.00	1,344.06	100.00	0.00	0.00			
04.03.06.02	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LUMINARIA ADOSADA	und	24.00	40.80	979.20	24.00	979.20	0.00	0.00	24.00	979.20	100.00	0.00	0.00			

TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 9.2%
UTILIDADES 6%
SUB TOTAL

(A)
(B)
(C)
(A + B + C)

209,035.08
19,231.23
12,542.10
240,808.41

209,035.08
19,231.23
12,542.10
240,808.41


VICTOR PLASEÑCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231

0.00
0.00
0.00
0.00

209,035.08 100.00%
19,231.23 100.00%
12,542.10 100.00%
240,808.41 100.00%

0.00
0.00
0.00
0.00

PLAN DE CONTINGENCIA

VALORIZACION DE OBRA N°

5

(Al 31 de Julio del 2020)

OBRA

REMODELACION DE LAS ILEE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD

UBICACIÓN :

VIRU - VIRU - LA LIBERTAD

L.P.N. N°

: A.S. N° 049-2019-FONDEPES

PRESUPUESTO BASE

: 1,061,406.90

CONTRATISTA

: CONSORCIO NUEVO TUMBES

MONTO DEL CONTRATO

: 955,266.22

PAG. N° 1

PART.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO BASE				AVANCES							SALDOS	
		UND	METRADO	P.UNIT. S/.	PRESUP. S/.	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO			METRADO	VALOR S/.
						METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	%		
05.01	OBRAS PROVISIONALES													
05.01.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON TRIPLAY	m2	179.55	75.65	13,582.96	179.55	13,582.96	0.00	0.00	179.55	13,582.96	100.00	0.00	0.00
05.01.02	MALLA RASCHEL AL 90% EN COBERTURA EXISTENTE	m2	40.60	9.17	372.30	40.60	372.30	0.00	0.00	40.60	372.30	100.00	0.00	0.00
05.02	TECHOS MOVILES													
05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHOS MOVILES	m2	27.00	425.68	11,493.36	27.00	11,493.36	0.00	0.00	27.00	11,493.36	100.00	0.00	0.00
05.03	PINTURA													
05.03.01	PINTURA EPOXICA EN PISOS PARA SEÑALIZACION	m2	1.40	19.04	26.66	1.40	26.66	0.00	0.00	1.40	26.66	100.00	0.00	0.00
05.04	VARIOS													
05.04.01	SUM. E INSTALACION DE ESTACION DE DESINFECCION TEMPORAL	glb	1.00	658.59	658.59	1.00	658.59	0.00	0.00	1.00	658.59	100.00	0.00	0.00

TOTAL COSTO DIRECTO

(A)

26,133.87

26,133.87

0.00

26,133.87

100.00%

0.00

GASTOS GENERALES 9.2%

(B)

2,404.32

2,404.32

0.00

2,404.32

100.00%

0.00

UTILIDADES 6%

(C)

1,568.03

1,568.03

0.00

1,568.03

100.00%

0.00

SUB TOTAL

(A + B + C)

30,106.22

30,106.22

0.00

30,106.22

100.00%


0.00


VICTOR PLASENCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231

L.P.N. : A.S. N° 049-2019-FONDEPES
 Obra : REMODELACION DE LAS I.I.EE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD
 Ubicación : VIRU - VIRU - LA LIBERTAD
 Area Geográfica : 1
 Valor Referencial : S/. 1,061,406.90
 Monto Contractual : S/. 955,266.22
 Supervisor : Ing. Victor Plasencia Tucto
 Contratista : CONSORCIO NUEVO TUMBES
 Plazo de Ejecución de Obra : 90 días calendarios

RESUMEN DE VALORIZACION 03
 MES DE FEBRERO 2020

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATO	VAL ACUM ANTERIOR	VAL ACTUAL	VAL ACUM ACTUAL	% DE AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
a) Fórmula No 01 Obras Portuarias	326,365.54	67,018.54	0.00	67,018.54	20.53	259,347.00
b) Fórmula No 02 Estructuras	105,012.77	105,012.77	0.00	105,012.77	100.00	0.00
c) Fórmula No 03 Arquitectura	107,254.70	107,254.70	0.00	107,254.70	100.00	0.00
d) Fórmula No 04 Instalaciones Electricas	240,808.41	240,808.41	0.00	240,808.41	100.00	0.00
e) Fórmula No 05 Plan de Contingencia	30,106.22	30,106.22	0.00	30,106.22	100.00	0.00
TOTAL CONTRACTUAL	809,547.64	550,200.64	0.00	550,200.64	67.96	259,347.00
% DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA		67.96%	0.00%	67.96%		32.04%
REAJUSTES (S)						
a) Fórmula No 01 Obras Portuarias			0.00	0.00		
b) Fórmula No 02 Estructuras			0.00	0.00		
c) Fórmula No 03 Arquitectura			0.00	0.00		
d) Fórmula No 04 Instalaciones Electricas			0.00	0.00		
e) Fórmula No 05 Plan de Contingencia			0.00	0.00		
TOTAL REAJUSTE			0.00	0.00		
AMORTIZACION (A)						
Amortización del Adelanto en Efectivo	80,954.76	55,020.07	0.00	55,020.07		25,934.69
Amortización del Adelanto para Materiales	147,464.03	79,700.56	0.00	79,700.56		67,763.47
TOTAL AMORTIZACIONES	228,418.79	134,720.63	0.00	134,720.63		93,698.16
VALORIZACION NETA (VN=VA-A)		415,480.01	0.00	415,480.01		
MULTA POR ATRASO DE OBRA (M)		0.00	0.00	0.00		
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
En efectivo (VN-M)		415,480.01	0.00	415,480.01		
En IGV (VN x 18%)		74,786.40	0.00	74,786.40		
MONTO TOTAL CON IGV		490,266.41	0.00	490,266.41		
TOTAL COMPROMISO			0.00	490,266.41		


 VÍCTOR PLASENCIA TUCTO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 83231

REMODELACION DE LAS ILEE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA
- COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO NUEVO TUMBES
SUPERVISOR	Ing. Victor Plasencia Tucto
OBJETIVO	Const. defensas potuarias, estructura techada en cabezo de muelle, impermeabilizar techos, remodelacion inst. electricas.

N° DE CONTRATO OBRA	061-2019-FONDEPES
FECHA DE INICIO	10-dic-19
PLAZO DE TERMINO CONTRACTUAL	08-mar-20
AMPLIACION DE PLAZO	-
FECHA DE TERMINO AMPLIACION	-
PPTO ADICIONAL N° 01	-
PPTO ADICIONAL N°02	-

MONTOS	NETO	IGV	BRUTO
CONTRACTUAL	809,547.64	145,718.58	955,266.22
ADICIONAL N°01	-	-	-
TOTAL	809,547.64	145,718.58	955,266.22


N° DE VALORIZACION	VALORIZACION BRUTA	REINTEGRO	ADELANTO EN EFECTIVO		ADELANTO EN MATERIALES		IGV	VALORIZACION NETA
			ADELANTO	AMORTIZACION	ADELANTO	AMORTIZACION		
01	S/. 59,754.98	0.00	80,954.76	5,975.50		0.00	S/. 9,680.31	S/. 63,459.81
02	S/. 272,980.19	0.00		27,298.02		0.00	S/. 44,222.79	S/. 289,904.97
03	S/. 217,465.47	0.00		21,746.55	147,464.03	79,700.56	S/. 20,883.33	S/. 136,901.67
04	S/. 0.00	0.00		0.00			S/. 0.00	S/. 0.00
05	S/. 0.00	0.00		0.00			S/. 0.00	S/. 0.00
PARCIAL	550,200.64	0.00		55,020.07		79,700.56	74,786.43	490,266.45
SALDOS	259,347.00			25,934.69		67,763.47	S/. 29,816.79	S/. 195,465.63

AVANCE FISICO	
ACTUAL	ACUMULADO
7.38%	7.38%
33.7%	41.10%
26.86%	67.96%

ADICIONAL N°

1								
2								
Parcial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL GENERAL	550,200.64	0.00	0.00	55,020.07	0.00	79,700.56	74,786.43	490,266.45
----------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------


VICTOR PLASENCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231

CURVA DE AVANCE DE OBRA

OBRA

REMODELACION DE LAS II.EE DE LOS MODULOS DE DESINFECCION, TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERIA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA - COBERTURA EN EL CABEZO EN DPA PUERTO MORIN, LOCALIDAD MORIN, VIRU - VIRU - LA LIBERTAD

ENTIDAD

FONDEPES

CONTRATISTA


CONSORCIO NUEVO TUMBES


SUPERVISION

Ing. Victor Plasencia Tucto

MONTO DE OBRA

S/.955,266.22 Inc. IGV


VÍCTOR PLASENCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231

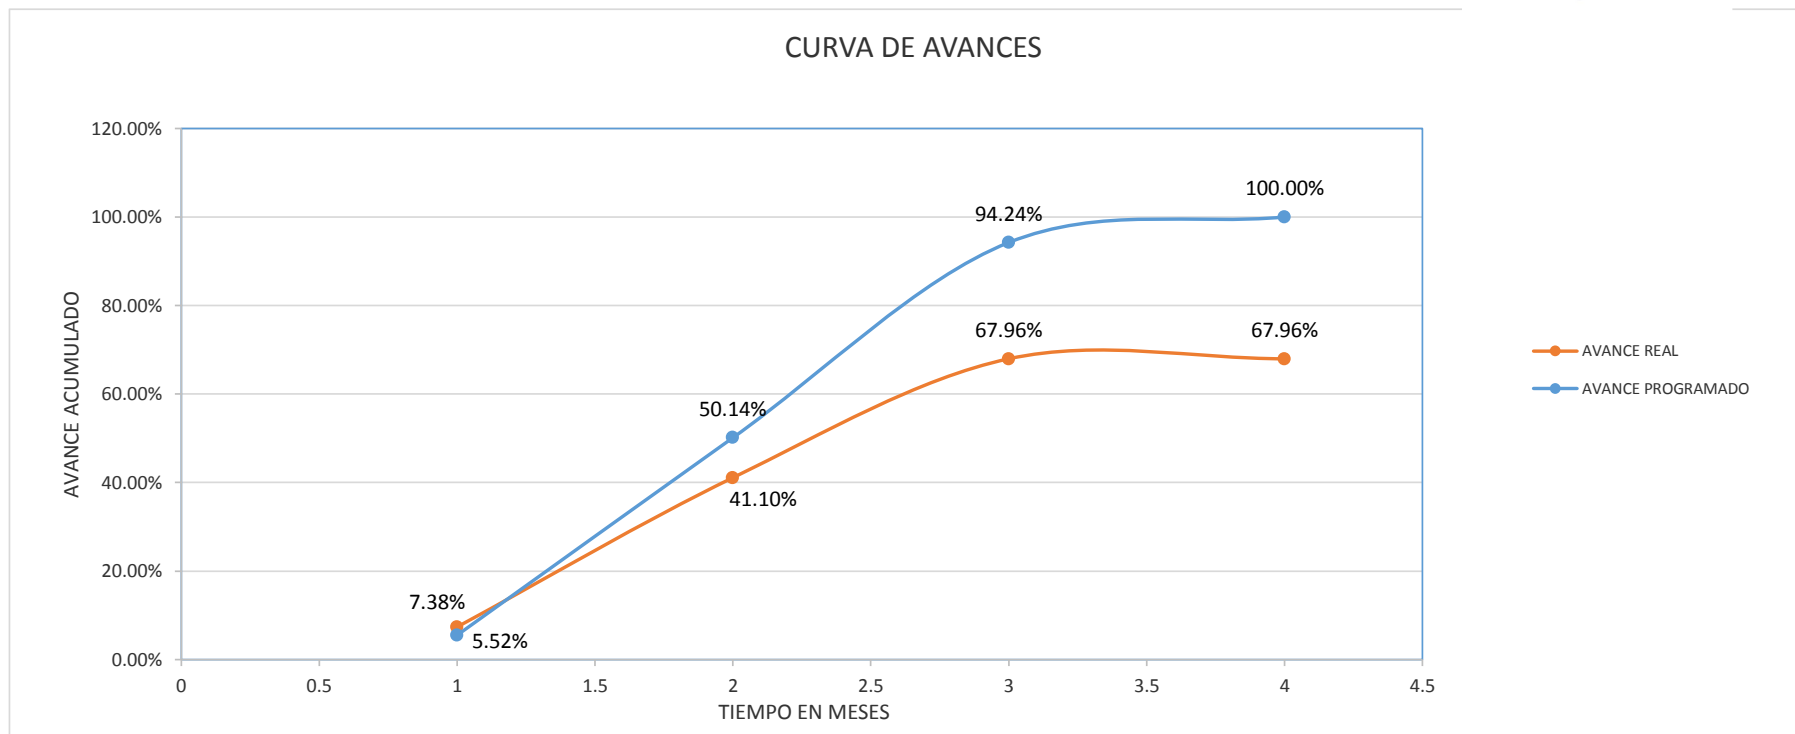

AVANCES VALORIZACION	AVANCE PROGRAMADO				AVANCE EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
	S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
VAL 01 (Desde 10/12/19 Hasta 31/12/19)	44,680.89	5.52%	44,680.89	5.52%	59,754.98	7.38%	59,754.98	7.38%
VAL 02 (Desde 01/01/20 Hasta 31/01/20)	361,227.10	44.62%	405,907.99	50.14%	272,980.19	33.72%	332,735.17	41.10%
VAL 03 (Desde 01/02/20 Hasta 29/02/20)	356,974.03	44.10%	762,882.02	94.24%	217,465.47	26.86%	550,200.64	67.96%
VAL 04 (Desde 01/03/20 Hasta 08/03/20)	46,665.62	5.76%	809,547.64	100.00%	0.00	0.00%	550,200.64	67.96%
VAL 05 (al 31 de julio de 2020)	46,666.62	5.76%	809,547.64	100.00%	0.00	0.00%	550,200.64	67.96%
TOTAL (*)	809,547.64	100.00%			550,200.64	67.96%		


GRAFICOS SOBRE EL AVANCE DE OBRA

AVANCES MENSUALES

	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	JULIO		
REAL	7.38	33.72	26.86	0	0.00		
PROGRAMADO	5.52	44.62	44.1	5.76	0.00		

AVANCES ACUMULADOS

	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	JULIO		
ACUMULADO REAL	7.38	41.10	67.96	0.00	0.00		
ACUMULADO PROGRAMADO	5.52	50.14	94.24	100	100.00		

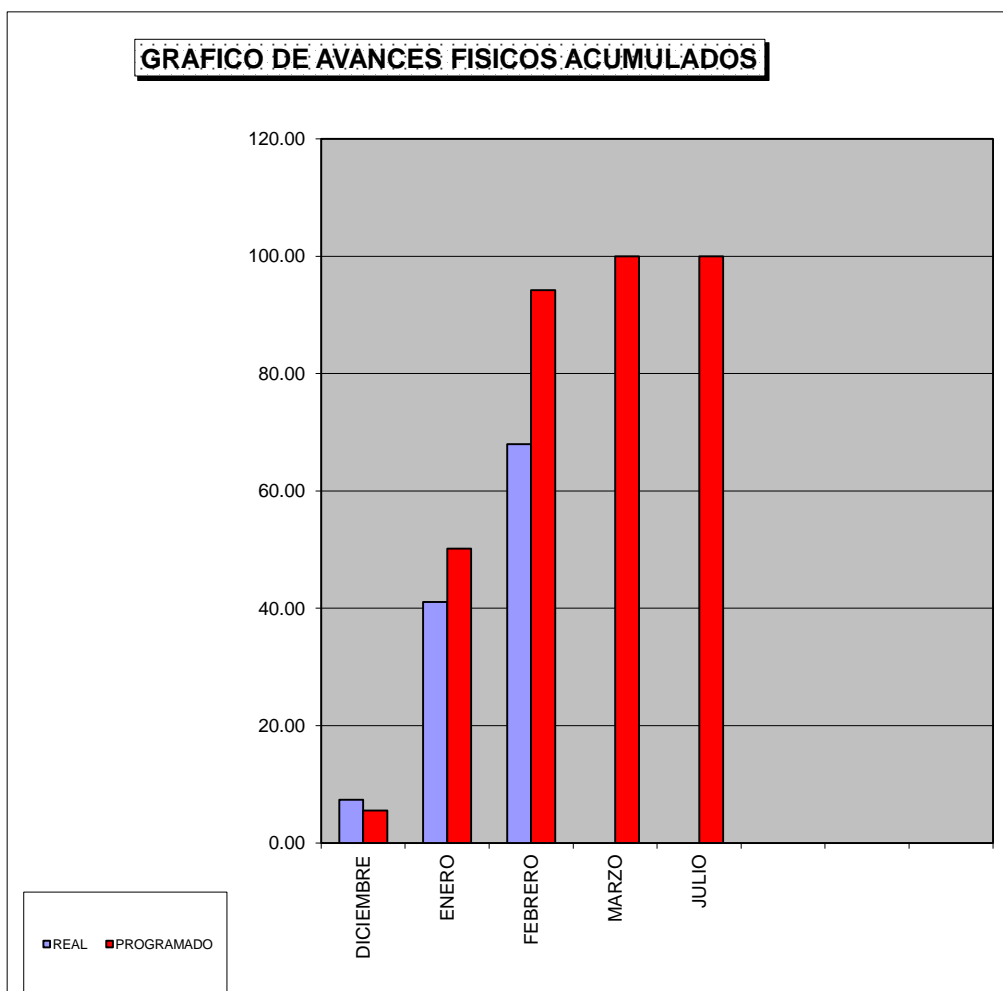

Victor Plasencia Tucto
 VICTOR PLASENCIA TUCTO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 83231

CONTROL DEL AVANCE FINANCIERO

CONTROL DEL ADELANTO DIRECTO

Monto del adelanto directo con IGV = S/. 95,526.62
 Monto del adelanto directo sin IGV = S/. 80,954.76 (A)
 Fecha de pago del adel. Directo = 06-dic-19

A continuación se presenta en el siguiente cuadro, las amortizaciones que se vienen realizando:


VALORIZACION N°	MES-AÑO	ADELANTO AMORTIZADO S/. (SIN IGV)
1	01-dic-19	5,975.50
2	01-ene-20	27,298.02
3	01-feb-20	21,746.55
4	01-mar-20	0.00
5	31-jul-20	0.00
TOTAL AMORTIZADO (B)		55,020.07
SALDO POR AMORTIZAR (A-B)		25,934.69

CONTROL DE VALORIZACIONES

ESPECIALIDAD	Monto del Contrato sin IGV	Anterior	Mes Actual	Acumulado	Saldo por valorizar
OBRAS PORTUARIAS	326,365.54	67,018.54	0.00	67,018.54	259,347.00
ESTRUCTURAS	105,012.77	105,012.77	0.00	105,012.77	0.00
ARQUITECTURA	107,254.70	107,254.70	0.00	107,254.70	0.00
INSTALACIONES ELECTRICAS	240,808.41	240,808.41	0.00	240,808.41	0.00
PLAN DE CONTINGENCIA	30,106.22	30,106.22	0.00	30,106.22	0.00
SUB-TOTAL	809,547.64	550,200.64	0.00	550,200.64	259,347.00
IMPUESTO IGV 18%	145,718.58	99,036.12	0.00	99,036.12	46,682.46
TOTAL S/.	955,266.22	649,236.76	0.00	649,236.76	306,029.46

CONTROL DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Monto del adelanto directo con IGV = S/. 174,007.55
 Monto del adelanto directo sin IGV = S/. 147,464.03 (A)
 Fecha de pago del adel. Directo = 06-feb-20


 VICTOR PLASENCIA TUCTO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 83231

A continuación se presenta en el siguiente cuadro, las amortizaciones que se vienen realizando:

VALORIZACION N°	MES-AÑO	ADELANTO AMORTIZADO S/. (SIN IGV)
1	01-dic-19	0.00
2	01-ene-20	0.00
3	01-feb-20	79,700.56
4	01-mar-20	0.00
5	31-jul-20	0.00
TOTAL AMORTIZADO (B)		79,700.56
SALDO POR AMORTIZAR (A-B)		67,763.47

REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO	FECHA DE CANCELACION	MONTO TOTAL	
		SIN IGV	
ADELANTO DIRECTO	06-dic-19	S/.	80,954.76
ADELANTO MATERIALES	06-feb-20	S/.	147,464.03
VALORIZACION N°01		S/.	53,779.48
VALORIZACION N°02		S/.	289,904.97
VALORIZACION N°03		S/.	116,018.36
VALORIZACION N°04		S/.	0.00
VALORIZACION N°05		S/.	0.00
TOTAL CANCELADO		S/.	688,121.60

EN LOS MONTOS PAGADOS PARA VALORIZACIONES, SE CONSIDERA PARA EL PRESENTE CUADRO:

VALORIZACION NETA = VALORIZACION BRUTA - AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO


DETERMINACION DEL AVANCE FINANCIERO

TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS = S/. 688,121.60 (A)
 MONTO DEL CONTRATO SIN IGV = S/. 809,547.64 (B)

% AVANCE FINANCIERO	=	$(A/B) \times 100$	=	85.00%
----------------------------	---	--------------------	---	---------------

COMPARACION ENTRE EL AVANCE FISICO Y EL FINANCIERO

AVANCE FISICO = 67.96%
 AVANCE FINANCIERO = 85.00%

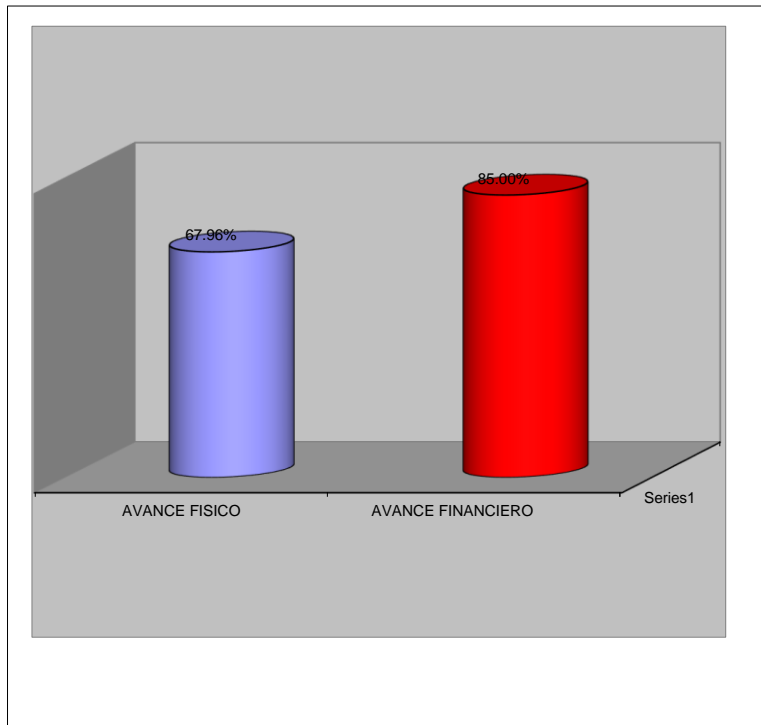

Victor Plasencia Tucto
 VICTOR PLASENCIA TUCTO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 83231

SERVICIOS ELECTROMECHANICAS**RUC - 1002440606****INFORME N° 016 – 2020 / EAP / SIE**

ATENCION : **ING. VICTOR PLASENCIA TUCTO**
Jefe de Supervisión

DE : **ING. EDWIN R. AQUISE PARI**
Especialista – Instalaciones Eléctricas

ASUNTO : **INFORME MENSUAL - JULIO**
Área - Instalaciones Eléctricas.

REFERENCIA : **PROYECTO: "REMODELACION DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCION TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD DE MORIN, DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" código único 2359411.**

FECHA : **AGOSTO 03, DEL 2020**

Mediante el presente me dirijo a Ud. para hacerle alcance El Informe de Actividades de la Supervisión de Instalaciones Eléctricas Durante el *MES DE JULIO* del año 2020, de la Ejecución de Obra del Proyecto: "REMODELACION DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCION TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD DE MORIN, DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" código único 2359411 lo cual consiste en lo siguiente.


DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- 1- Informe Técnico de Obra
- 2- Panel Fotográfico de Actividades

Es cuanto puedo alcanzarle a Ud. para que tenga en conocimiento al respecto.

Atentamente


EDWIN R. AQUISE PARI
Ing. Mecánico Electricista
CIP - 80350


VÍCTOR PLASENCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231

LIMA:

Jr. Daniel Alcides Carrion "Mzn. Q1" Lte. 8
Dist. Los Olivos - Telf. 015316906 - Cel. 932113028
E-Mail – eaquisep@hotmail.com

INFORME TÉCNICO MES DE JULIO - 2020**I. DATOS GENERALES****1.1 UBICACIÓN.**

PROYECTO : "REMODELACION DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCION TAREAS PREVIAS Y FRIOS, REMODELACION DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACION DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN EN LA LOCALIDAD DE MORIN, DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" código único 2359411

DISTRITO : VIRÚ
 PROVINCIA : VIRÚ
 DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD


1.2 DATOS DEL PERSONAL RESPONSABLE

1.2.1 Nombre del Contratista : CONSORCIO NUEVO TUMBES.
 1.2.2 Nombre del Residente de Obra : Ing. Ronald Eulogio Leyva
 1.2.3 Nombre del Consultor : Ing. Dionisio Rojas Mamani
 1.2.4 Nombre Jefe de Supervisión de Obra : Ing. Victor Plasencia Tucto
 1.2.5 Nombre Supervisor Inst. Eléctricas : Ing. Edwin R. Aquise Pari
 1.2.6 Entidad de Financiera : Ministerio de la Producción

1.3 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

1.3.1 Fecha de Entrega de Terreno : 09 de Diciembre del 2019
 1.3.2 Inicio Físico de la Obra : 10 de Diciembre del 2019
 1.3.3 Plazo de Ejecución de Obra : 90 días calendarios
 1.3.3 Ampliación de Plazo :
 1.3.4 Fecha de Terminación de Obra :


EDWIN R. AQUISE PARI
 Ing. Mecánico Electricista
 CIP - 80350


VICTOR PLASENCIA TUCTO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 83231

ii. ACTIVIDADES INTERRUMPIDOS POR ESTADO DE EMERGENCIA

- Por orden del Gobierno del Perú se declara estado de emergencia a nivel nacional a partir de 15 marzo hasta hoy con fecha indefinida, por lo cual toda las actividades laborales se someten a una paralización temporal por motivos del expansión del COVID 19, aun así, el 15 de Julio se reactivan algunas actividades con ciertas medidas de prevención y, en caso del Contratista Consorcio Nuevo Tumbes, según nuestro equipo de supervisión se ha visitado a ia obra y no se encontró personal de trabajador en obra y se considera despreocupación y poco interés al cumplimiento del compromiso pactado con la entidad, hasta la actualidad no se ha remitido ningún documento alguno al respecto de su inactividad, en función a ello la valorización de avance de obra en la especialidad de Inst. eléctricas del mes de Julio es cero.
- No se dio reinicio de obra en PUERTO MORIN no hay avance físico de instalaciones eléctricas y mecánicas no se realizó ninguna partida, no se ha movido ni se ha adquirido ninguna pieza, accesorio de materiales eléctricos, el personal trabajador no ha retornado al lugar de trabajo el Contratista no se ha reportado el motivo del caso.

2.4- ULTIMOS TRABAJOS REALIZADOS EN ANTERIOR VALOROZACION


- MEDICION DE POZO A TIERRA: Se ha realizado los protocolos de pruebas de mantenimiento de pozos a tierra con instrumento denominado telurómetro los cuales están dentro del rango de 3 – 7 ohmios según el requerimiento del expediente técnico debe ser menor o igual 10 ohmios lo cual cumple con las medidas estándares del proyecto

- PRUEBAS DE AISLAMIENTO: se ha realizado la prueba de aislamiento de los tableros con instrumento denominado megóhmetro y como resultado se tiene de 500 - 1000 ohmios con una frecuencia de 60 segundos lo cual indica que la resistencia de aislamiento de los interruptores con respecto a los circuitos de salida es de 500 ohmios como mínimo y1000 ohmios como máximo y cumple con los parámetros estándares.

- PRUEBAS DE CONTINUIDAD: se han realizado las pruebas de continuidad con instrumento denominado multímetro las salidas y entradas de conexión de los bornes de contacto están bien ajustados con pernos tipo rosca y con terminales prensados a presión como resultado indica el instrumento que hay un buen contacto en los ajustes de pernos en los puntos de salida.

2.5- TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR EN INST. ELECTRICAS

- De los trabajos de mediciones eléctricas realizados anteriormente de los cuales son aptos y otros en proceso de mejoramiento se debe adjuntar los documentos de sustento para su validez y garantía, los siguientes.
 - Certificación de protocolo de pruebas de mediciones eléctricas
 - Certificación de calibración de equipos de medición empleados en obra
 - Adjuntar fichas técnicas de materiales eléctricos de adquisición
 - Etiquetado y pintado de señalizaciones de tapas de pozos a tierra
 - Señalización y etiquetado de Tableros y circuitos de alimentación


VÍCTOR PLASEÑCIA TUOTE
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 83231


2.6- CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

- Sugerencias al Contratista, debe reiniciar con las actividades laborales en obra, en coordinación con la supervisión, para tomar medidas de seguridad de protección y portar equipos personales y, la forma de trabajo.
- Se sugiere al Contratista coordinar con su especialista del área para brindar capacitación técnica básico al personal de servicio ó encargado de mantenimiento de la Institución, para intervenir en cuanto al operación y maniobra de los equipos Instalados.
- Brindar manuales y catálogos de operación y maniobra de los tableros de alimentación, planos y otros que pueden ser útiles y fácil de operación para el personal encargado y, adjuntar para su conformidad con una acta de capacitación brindado, y firmado por ambos participantes

III. PANEL FOTOGRAFICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS


1- Cuadro fotográfico de mediciones de pozo a tierra del TG con telurómetro


EDWIN R. AQUISE RARI
Ing. Mecánico Electricista
CIP-80350


VÍCTOR PLASENCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 63231



2- Vista fotográfica de mediciones de pozos a tierra como resultado son menores a 10 ohmios tal como requiere el proyecto.

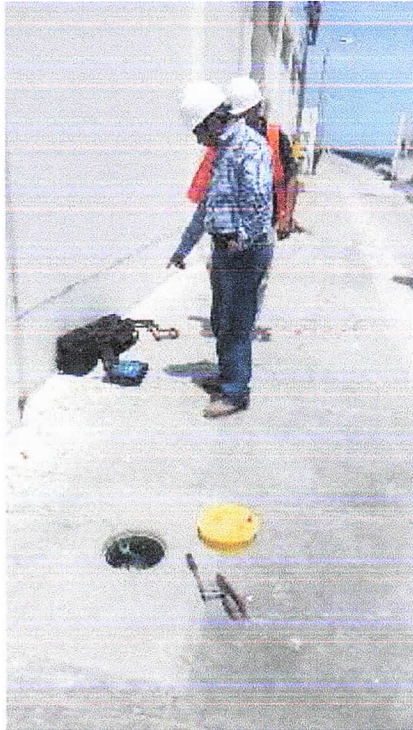

- 3- Cuadro fotográfico izquierda continua mediciones de pozo a tierra en pasillo hacia la salida al muelle, derecha prueba de continuidad en interruptores TM del tablero de distribución

EDWIN R. AQUISE PARI
Ing. Mecánico Electricista
CIP - 80350



VÍCTOR PLASENCIA TUZCO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231

- 4- Vista fotográfica en izquierda y derecha pruebas de aislamiento con megómetro en tablero de distribución



R.U.C. No. 10021511116

INFORME DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL N° 06-2020/MAHV/ESPEC. ESTRUCTURAS

DE : **Ing. Kevin Toledo Calla**
Especialista en Estructuras

PARA : **Ing. Víctor Plasencia Tucto**
Jefe de Supervisión

ASUNTO : INFORME AL 31 DE JULIO DE 2020

REFERENCIA : SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA DE CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO MORÍN, EN LA LOCALIDAD DE MORÍN, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"


FECHA : 31 DE JULIO DE 2020.

Mediante el presente me dirijo a usted, para informarle sobre el expediente técnico del proyecto: "REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA DE CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO MORÍN, EN LA LOCALIDAD DE MORÍN, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

1. GENERALIDADES**1.1 INFORMACIÓN DE LA OBRA**

- Ubicación : MORIN - VIRU - VIRU - LA LIBERTAD.
- Contratista : CONSORCIO NUEVO TUMBES
- Supervisión : DIONISIO ROJAS MAMANI
- Jefe de Supervisión : Ing. VICTOR PLASENCIA TUCTO
- Sistema de Contratación : SUMA ALZADA
- Proceso de Selección : ADJUDIC. SIMPLIF. N°049-2019-FONDEPES
- Número del Contrato : Contrato N° 061-2019- FONDEPES
- Monto Base : S/. 1'061,406.90 Soles (Inc. IGV)
- Monto Contratado : S/. 955,266.22 Soles (Inc. IGV)
- Entrega del Terreno : 09/12/2019
- Fecha de inicio de obra : 10/12/2019
- Fecha de Término de obra : 08/02/2019
- Plazo de ejecución : 120 días calendarios
- Adelanto Directo : S/. 95,526.62 cancelado el 06/12/2019


KENNY D. TOLEDO CALLA
INGENIERO CIVIL
CIP 111798


VÍCTOR PLASENCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 83231



R.U.C. No. 10021511116

2. ANTECEDENTES


1. Se ha verificado el Montaje de las estructuras metálicas para la cobertura, según lámina A-02, A-03, realizando la prueba de líquidos penetrantes en los cordones de soldadura de dichas estructuras.
2. Se ha verificado el alineamiento para la colocación de la Viga W12X65, sobre pilotes, según lámina ED-01 en la que existe un desalineamiento que se pueden corregir siguiendo el proceso constructivo.
3. Se ha verificado el arenado del Perfil W12x65, para realizar la aplicación del imprimante.
4. Se ha verificado la aplicación del Preservante Hidro-repelente a la madera

3. BASE LEGAL

- 3.1 Decreto Legislativo N°1252; decreto legislativo que se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
- 3.2 Decreto Legislativo N°1439; decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento
- 3.3 Decreto Supremo N°344-2018EF, que aprueba el reglamento de la Ley N° 30225; Ley de Contrataciones del Estado y Modificatorias
- 3.4 Decreto Supremo N°004-2019-JUS; que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°27444; Ley del Procedimiento Administrativo General.
- 3.5 Decreto Supremo N°082-2019EF; que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- 3.6 Resolución Ministerial N°346-2012-PRODUCE; que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de FONDEPES


4. ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31 DE JULIO DE 2020

No se llegó a terminar ninguna partida


 KENNY D. TOLEDO CALLA
 INGENIERO CIVIL
 CIP 111798

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Se indica que la contratista debe de seguir el proceso constructivo de colocado de vigas W12X65 de tal manera quede firme las estructuras entrelazadas.
2. Se indica que el alineamiento para la colocación de la Viga W12X65, sobre pilotes, según lámina ED-01 en la que existe un desalineamiento que se pueden corregir siguiendo el proceso constructivo.
3. Se procedió a la verificación del alineamiento de los Pilotes para la colocación de la Viga W12X65, como se encuentra indico en Lámina DE-01,
4. Se recomienda respetar las siguientes Normas :
 - E.020 – Norma de Cargas


 VÍCTOR PLASENCIA TUCTO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 83231

**R.U.C. No. 10021511116**

- E.050 – Norma de Suelos y Cimentaciones
 - E.060 – Norma de Concreto Armado
 - E.090 – Norma Técnica de Estructuras Metálicas
5. Se recomendó al contratista respetar los recubrimientos para cada elemento estructural.

KENNY D. TOLEDO CALLA
INGENIERO CIVIL
CIP 111798

VÍCTOR PLASENCIA TUCTO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 06231




PANEL FOTOGRÁFICO



Kenny D. Toledo Calla
 KENNY D. TOLEDO CALLA
 INGENIERO CIVIL
 CIP 111703

FOTO N°01: SE APRECIA MANILUVIO TERMINADOS

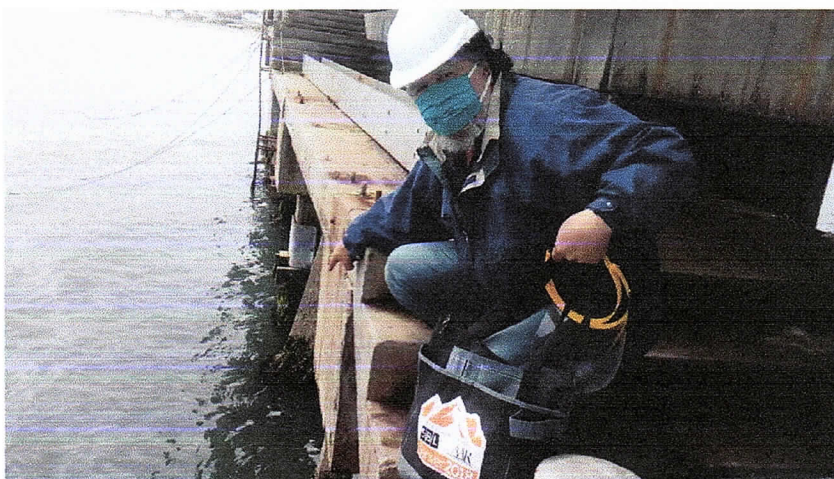

Víctor Plasencia Tucto
 VÍCTOR PLASENCIA TUCTO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 33231

FOTO N°02 SE VERIFICA COLOCADO DE ABRAZADERAS EN PILOTES DE 2DA PLATAFORMA



R.U.C. No. 10021511116



FOTO N°03 SE OBSERVA VIGA ESTRUCTURAL PARA SER COLOCADA ENTRE PILOTES



FOTO N°04 OBSERVA TODA LA COBERTCABEZO TERMINADAURA DEL AREA DEL

Kenny D. Toledo Calla
 KENNY D. TOLEDO CALLA
 INGENIERO CIVIL

Victor Plasencia Tucto
 VÍCTOR PLASENCIA TUCTO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 83231

Zimbra:**mesadepartes@fondepes.gob.pe**

Carta N° 440-2020... presento valorización nro. 05, periodo julio 2020, supervisión de obra puerto morin

De : DIONISIO ROJAS MAMANI
<rojas_2080_consultor@hotmail.com>

vie, 07 de ago de 2020 08:48

 1 ficheros adjuntos


Asunto : Carta N° 440-2020... presento valorización nro. 05, periodo julio 2020, supervisión de obra puerto morin

Para : Mesa de Partes FONDEPES
<mesadepartes@fondepes.gob.pe>

señores
fondepes
previo cordial saludo

presento Carta N° 440-2020... presento valorización nro. 05, periodo julio 2020, supervisión de obra puerto morin.

Atte,
ING. DIONISIO ROJAS MAMANI
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

 **Carta N° 440-2020 Val. 05, jul20 morin completo.pdf**
8 MB
