

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

**INFORME N°048-2021-FONDEPES-DIGENIPAA/UFEP/GRZM**

Atención : **ING. JORGE ROBERTO ÑAHUE SIVIRICHI**  
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola

Asunto : **Valorización N°07 del Adicional de Obra N°09 y Deductivo vinculado N°08: Modificación al muelle correspondiente al mes de FEBRERO 2021 (01.02.2021 al 28.02.2021) de la obra:**  
"Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima"

Referencia : a) Carta CSL.174302.PU.DPA.S.741.21:  
b) Carta C048-2021-CMN-SUPE: Valorización de CMN  
c) Carta C050-2021-CMN-SUPE: Informe Mensual CMN

Fecha : 09 de Marzo del 2021.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para remitir el presente Informe con la finalidad de solicitarle se sirva dar trámite a la **Valorización N°07 del Adicional de Obra N°09 y Deductivo vinculado N°08: Modificación al muelle, correspondiente al mes de febrero 2021 (01.02.2021 al 28.02.2021) de la obra: "Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima"**, cuya ejecución se encuentra a cargo del contratista CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE y que ha sido revisada por la Supervisión de obra CESEL SA.

Al respecto, puedo informar:

**I. DATOS GENERALES DE LA OBRA**

**1.1 Información de la obra**

Proceso : L.P. N° 0001-2017-FONDEPES (1ra. Convocatoria)  
Obra : Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima".

Entidad contratante : FONDEPES  
Financiamiento : FONDEPES

Proceso : L.P. N° 0001-2017-FONDEPES (1ra. Convocatoria)  
Contrato : N° 025-2017-FONDEPES  
Código SNIP N° : 182813  
Modalidad de Ejecución: FONDEPES  
Sistema de Contratación: A precios Unitarios  
Monto Obra : S/. 21'509,091.48 (incluye IGV)  
Contratista : CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE  
Residente : Ing. Carlos Ricardo Pereda Méndez con CIP N°34484  
Fecha de Inicio : 19 de setiembre del 2017  
Plazo Ejecución : 270 días calendario



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Término Inicial : 15 de junio del 2018  
 Avance Físico : 59.25 % al 28 de febrero 2021.  
 Monto Vigente : S/. 26'932,907.22 (incluye IGV)  
 Total Adicional : S/. 5,423,815.74 (25.22%).  
 Fecha de Término : 01 de mayo del 2021.  
 Contractual actual

**ADICIONALES**

Adic. Obra 01 : S/. 2'213,942.02 – R.J. N° 008-2018-FONDEPES/J del 18.01.18  
 Deduc. Vinc. 01 : S/. 1'879,271.36 – R. J. N° 008-2018-FONDEPES/J del 18.01.18.  
 Adic. Obra 02 : S/. 160,884.73 – R.J. N° 052-2018-FONDEPES/J del 18.05.18  
 Adic. Obra 03 : S/. 676,072.37 – R.J. N° 094-2018-FONDEPES/J del 22.08.18  
 Deduc. Vinc. 02 : S/. 242,870.31  
 Adic. Obra 04 : S/. 417,954.90 – R.J. N° 095-2018-FONDEPES/J del 22.08.18  
 Deduc. Vinc. 03 : S/. 220,209.97  
 Adic. Obra 05 : S/. 562,775.06 – R.J. N° 133-2018-FONDEPES/J del 26.10.18  
 Deduc. Vinc. 04 : S/. -187,675.96  
 Adic. Obra 06 : S/. 340,246.17 – R.J. N° 158-2018-FONDEPES/J del 28.12.18  
 Deduc. Vinc. 05 : S/. -339,697.56  
 Adic. Obra 07 : S/. 408,954.61 – R.J. N° 044-2019-FONDEPES/J del 15.03.19  
 Deduc. Vinc. 06 : S/. -257,918.77  
 Adic. Obra 08 : S/. 598,810.85 - R.J. N° 156-2019-FONDEPES/J del 19.11.19  
 Deduc. Vinc. 07 : S/. -160,343.92. RD N°003-2021-FONDEPES/DIGENIPAA del 25.01.21  
 Adic. Obra 09 : S/. 4'441,450.47 - Resolución Directoral N° 043-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 03.03.2020  
 Deduc. Vinc. 08 : S/. -1'109,287.59. RD N° 005-2021-FONDEPES/DIGENIPAA del 26.01.21

**AMPLIACIONES**

Ampliac. N° 01 : 16 d.c. (Denegada).  
 Ampliac. N° 02 : 67 d.c. (Denegada con Resolución de S.G. N° 001-2018-FONDEPES/SG).  
 Ampliac. N° 03 : 42 d.c. (Aprobada con Resolución de S.G. N° 028-2018-FONDEPES/SG).  
 Término : 27 de julio del 2018.  
 Ampliac. N° 04 : 32 d.c. (Aprobada con Resolución de S.G. N° 029-2018-FONDEPES/SG).  
 Nvo. Término : 28 de agosto del 2018.  
 Ampliac. N° 05 : 28 d.c. (Aprobada Resolución de S.G. N° 110-2018-FONDEPES/SG)  
 Nvo. Término : 25 de setiembre del 2018.  
 Ampliac. N° 06 : 120 d.c. (Denegada con Resolución de S.G. N° 111-2018-FONDEPES/SG).  
 Ampliac. N° 07 : 19 d.c. (Denegada con Resolución de S.G. N° 112-2018-FONDEPES/SG).



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Ampliac. N° 08	:	52 d.c. (Aprobada con Resolución de S.G. N° 171-2018-FONDEPES/SG).
Término	:	16 de noviembre del 2018.
Ampliac. N° 09	:	57 d.c. (Denegada con Resolución de S.G. N° 172-2018-FONDEPES/SG).
Ampliac. N° 10	:	44 d.c. (Aprobada con Resolución de S.G. N° 215-2018-FONDEPES/SG).
Término	:	30 de diciembre del 2018.
Ampliac. N° 11	:	43 d.c. (Denegada con Resolución de S.G. N° 216-2018-FONDEPES/SG).
Ampliac. N° 12	:	4 d.c. (Denegada con Resolución de S.G. N° 217-2018-FONDEPES/SG).
Ampliac. N° 13	:	58 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 012-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 14	:	75 d.c. (Aprobada con Resolución de G.G. N° 013-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 15	:	17 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 049-2019-FONDEPES/GG).
Término	:	15 de marzo del 2019.
Ampliac. N° 16	:	45 d.c. Resolución de G.G. N° 071-2019-FONDEPES/GG del 15.04.2019.
Ampliac. N° 17	:	144 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 098-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 18	:	143 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 099-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 19	:	60 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 105-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 20	:	36 d.c. (Resolución de G.G. N° 097-2019-FONDEPES/GG.)
Fecha Término	:	04 de Junio del 2019.
Ampliac. N° 21	:	164 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 117-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 22	:	140 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 118-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 23	:	60 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 119-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 24	:	260 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 120-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 25	:	344 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 193-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 26	:	(Denegada con Resolución de G.G. N° 199-2019-FONDEPES/GG).

SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA del 04.06.2019 por 227 días calendario, hasta el 16.01.2020.

Reinicio de obra	:	17 de enero del 2020 (01 día de plazo vigente trasladado del 04.06.2019)
Ampliac. N° 27	:	29D.C.(Resolución N° 024-2020-FONDEPES/DIGENIPAA). (computado desde el 18.01.2020 al 15.02.2020)
Ampliac. N° 28	:	Denegada Resol N° 032-2020-FONDEPES/DIGENIPAA
Ampliac. N° 29	:	Denegada con Resolución Directoral N° 052-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 17.06.2020.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Ampliac. N° 30	:	Denegada con Resolución Directoral N° 055-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 24.06.2020.
Ampliación Excepc.	:	111 D.C. Aprobada en parte con Resolución Directoral N° 058-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 04.07.2020.
Ampliac. N° 31	:	Denegada con Resolución Directoral N° 061-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 08.07.2020
Ampliac. N° 32	:	Aprobada con Resolución Directoral N° 0112-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 06.10.2020
Ampliac. N° 33	:	Denegada con Resolución Directoral N° 0113-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 06.10.2020

## 1.2 Información del Contratista Supervisor

Empresa Contratista	:	CESEL S.A.
Representante Legal	:	Jesus Gattas Abugattas Abuid
Dirección	:	Av. José Gálvez Barrenechea N° 646 San Isidro - Lima
Contrato	:	N° 030-2017-FONDEPES
Fecha de Contrato	:	15 de Setiembre del 2017
Monto del contrato Supervisión	:	S/. 1'651,890.27
Plazo Supervisión de Obra	:	270 días calendario
Fecha de inicio de Servicio	:	19 de setiembre del 2017
Fecha de término de Servicio	:	15 de junio del 2018
Supervisor	:	Ing. Yessica Yuliana Arroyo Sampen CIP N° 147611

## II. ANTECEDENTES

### 1.1 Antecedentes Generales:

- Con fecha 24 de Julio del 2017, el Comité de Selección como resultado del Proceso de Selección LICITACION PUBLICA: N° 0001-2017-FONDEPES para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima", adjudico la Buena Pro al CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE, por el monto de S/. 21'509,091.48 y un plazo de ejecución de 270 días calendario; suscribiéndose el Contrato N° 025-2017-FONDEPES con fecha 22 de agosto del 2017.
- Con fecha 29 de agosto del 2017, el Comité de Selección como resultado del Proceso de Selección CONCURSO PUBLICO N° 0001-2017-FONDEPES para la consultoría de la supervisión de la obra: "Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima", adjudicó la Buena Pro a la empresa CESEL S.A. por el monto de S/. 1'651,890.27 y con un plazo del servicio por 270 días calendario; suscribiéndose el Contrato N° 030-2017-FONDEPES con fecha 15 de setiembre del 2017.

### 1.2 Antecedentes Normas COVID-19:

- Decreto Supremo N°044-2020-PCM de fecha 15 de marzo, que declara el Estado de Emergencia Nacional y dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afecta la vida de la nación a consecuencia del brote del



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

COVID-19, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM.

- Decreto Legislativo N°1486, para la reactivación de las obras, se genera la extensión del plazo de ejecución contractual y el reconocimiento de mayores costos directos y gastos generales, considerando el impacto en plazo del Estado de Emergencia Nacional y la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19.
- DECRETO SUPREMO N° 101-2020-PCM publicado el 04 de junio del 2020, que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM.
- Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA del 28 de abril del 2020, aprueba el documento técnico de los Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y sus modificatorias.
- Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA del 07 de mayo del 2020, aprueba el Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades y sus modificatorias.
- El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE publicó el 19.05.2020, la **DIRECTIVA N°005-2020-OSCE/CD**, que tiene por finalidad desarrollar los alcances y procedimientos para implementar las medidas dispuestas en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del **Decreto Legislativo N° 1486** publicada el 10 de mayo de 2020, **destinadas exclusivamente a la reactivación de los contratos de obra y sus respectivos contratos de supervisión**, que se encuentran paralizadas por efecto del Estado de Emergencia Nacional, declarado por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus modificatorias.
- Resolución Ministerial N°116-2020-VIVIENDA, con fecha 09 de junio de 2020 se aprueba el inicio de las actividades de Construcción aprobadas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades para la zona urbana de los departamentos y provincias señalados en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM.
- Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA del 30 de JUNIO del 2020, aprueba el documento técnico de los Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N°117-2020-PCM, con fecha 30 de junio de 2020 que aprueba la Fase 3 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.
- Resolución N°102-2020-OSCE/PRE, que formalizan aprobación de la modificación de los numerales 6.2 y 7.1.1 de la Directiva N°005-2020-OSCE/CD “Alcances y Disposiciones para la reactivación de Obras Públicas y Contratos de Supervisión, en



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

el marco de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N°1486".

### 1.3 Antecedentes Específicos:

- ✓ Mediante Memorando N.º 4104-2020-FONDEPES/DIGENIPAA la DIGENIPAA dispuso al Coordinador de la Unidad Funcional de Ejecución de Proyectos (UFEP) implementar el Decreto de Urgencia N.º 133- 2020 y comunicar el procedimiento y sustento de aquellas valorizaciones correspondientes al mes de diciembre que deban ser objeto de modificaciones contractuales.
- ✓ Mediante Memorando Interno N.º 03019-2020-FONDEPES/UFEP el Coordinador de UFEP requirió disponer la implementación del mencionado Decreto de Urgencia
- ✓ Mediante Adenda N° 07 al contrato N° 025-2017-FONDEPES se modifica el contrato, en el extremo referido a que la ejecución de la obra efectuada en el mes de diciembre de 2020, se valore en 2 periodos, conforme se detalla a continuación:
  - Primer periodo: Valorización por la ejecución de la obra en el periodo del 01 al 18 de diciembre de 2020.
  - Segundo periodo: Valorización por la ejecución de la obra en el periodo del 19 al 31 de diciembre del 2020.
- ✓ Con Carta CSL.174302.PU.DPA.S.741.21 del 03 de marzo del 2021, la Supervisión de obra, CESEL SA remite a FONDEPES, su **Informe de valorización de obra N°07 del Adicional N°9 correspondiente al mes de FEBRERO del 2021** (01.02.2021 al 28.02.2021), **en atención a la Carta C048-2021-CMN-SUPE** del 01 de marzo del 2021.
- ✓ Con Carta CSL.174302.PU.DPA.S.744.21 del 02 de marzo del 2021, la Supervisión de obra, CESEL SA remite a FONDEPES, el Informe Mensual N°35 del Contratista CMN (01.02.2021 al 28.02.2021).



### 1.4 Antecedentes de obra atrasada

- ✓ Con Carta CSL.174302.PU.DPA.S.467.20 la supervisión de obra de CESEL SA del 18 de febrero del 2020, informa sobre el desabastecimiento de distintos materiales que generan atrasos constantes de obra, que están anotadas en cuaderno de obra mucho antes de la suspensión de obra e informes mensuales desde el 2019 e informa también que se evidencia que ninguna ampliación de plazo será suficiente si el contratista continua con el ritmo lento de trabajo (14 personas de obra en el mes de febrero) y que podría llevar a atrasos injustificados y que es inaplazable que el contratista deberá acrecentar su producción cumpliendo con las normas de seguridad y calidad necesaria.
- ✓ Concluye además que el contratista tiene **ATRASOS INJUSTIFICADOS** y que no cuenta con la capacidad económica necesaria para poder cumplir con las metas propuesta en el plazo vigente, que se refleja en el bajo número de personas en obra y falta de recursos para ejecutar en distintos frentes.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

- ✓ Con carta CSL.174302.PU.DPA.S.475.20, del 26 de febrero del 2020, la supervisión de obra CESEL SA, informa sobre la paralización de obra injustificada por parte del contratista CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE desde el 24 de febrero indicando no estar de acuerdo con el documento de respuesta emitido por la Entidad y ratificarse en solicitar el adicional correspondiente a la partida del emisor submarino y que la ejecución de estos trabajos se encuentra paralizada.

Ante la paralización de ejecución de trabajos, la supervisión realizó la anotación en el cuaderno de obra (asiento N°1029 del 24.02.2020), solicitando el reinicio de las actividades, la continuidad de los trabajos y que todo atraso es responsabilidad del Contratista.

Ante lo expuesto, solicitamos que la Entidad realice las gestiones del caso para indicar al Residente la continuación de los trabajos y notifique al Contratista que según la cláusula Décimo Quinto "Penalizaciones" de su CONTRATO N° 025-2017.FONDEPES, si el **Contratista incurre en retraso injustificado** en la ejecución de las prestaciones objeto al contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso.

CSL.174302.PU.DPA.S.483.20, del 03.03.2020, **continuidad de paralización de obra** DPA SUPE, solicitamos que la Entidad realice las gestiones del caso para indicar al Residente la continuación de los trabajos y notifique al Contratista que según la cláusula Décimo Quinto "Penalizaciones" de su CONTRATO N° 025-2017.FONDEPES, si el Contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto al contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso.

Esta Supervisión recomienda a la Entidad evaluar el uso del Art. 135 del RLCE, en vista que el CMN ha paralizado injustificadamente la ejecución de la prestación del Servicio DPA SUPE.

- ✓ Con carta CSL.174302.PU.DPA.S.483.20 del 04.03.2020, la supervisión de obra CESEL SA, informa sobre la paralización de obra injustificada por parte del contratista CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE desde el 24 de febrero.
- ✓ Con carta CSL.174302.PU.DPA.S.492.20 del 11.03.2020 e Informe Especial N°CSL.174302.PU.ESP.82.20, la supervisión de obra CESEL SA, informa sobre el Estado Situacional de la obra, de la obra donde concluye que:

- El avance que hasta la fecha viene desarrollando la empresa CMN, dejar constancia que no cuenta con la capacidad económica necesaria para poder cumplir con las metas propuesta del proyecto, esto se refleja en la cantidad de personal y la falta de recursos para ejecutar trabajos distintos frentes.
- el avance logrado por el contratista hasta el mes de FEBRERO 2020 fue de: 55.84% y en marzo es de 55.87% menor al 80% del porcentaje acumulado programado donde indica que la obra se encuentra atrasada respecto al Calendario valorizado con la Ampliación de plazo 27, además que



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”  
se encontró paralizada en sus trabajos desde el 24.02.2020.

- ✓ Con Carta N° 1123-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 27/10/2020, la Entidad comunica al Supervisor la aprobación del Cronograma de obra y el Calendario Valorizado actualizado adecuado a la Ampliación de plazo N° 32 de la obra, que fuera remitido por la Supervisión con Carta CSL.174302.PU.DPA.S.581.20
- ✓ Con carta CSL.174302.PU.DPA.S.651.20 del 14.12.2020, la supervisión de obra CESEL SA, remite a la entidad el Cronograma de obra, Calendario Valorizado de Avance de obra Acelerado y Curva S, que fue entregado por el Contratista CMN, con carta C078-2020-CMN-SUPE conforme a lo solicitado por la Supervisión al no haber alcanzado el 80% del avance programado acumulado del Calendario Valorizado de Avance de obra vigente en la Valorización del mes de noviembre 2020.
- ✓ Con Carta N° 1147-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 30/12/2020, la Entidad comunica al Supervisor la aprobación del Calendario Valorizado acelerado.

### III. MARCO LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada por Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 350-2015-EF y modificado por D.S. N° 056-2017, del 19 de marzo del 2017.
- Contrato N° 25-2017-FONDEPES.
- Resolución de Gerencia General N°016-2020-FONDEPES/GG

Específicas:

- ✓ Artículo 166° del Reglamento de Contrataciones del Estado.
- ✓ Artículo 175° del Reglamento de Contrataciones del Estado.



### IV. ANALISIS

- ✓ El avance físico acumulado logrado por el contratista hasta el mes de FEBRERO 2021 fue de:  $59.25\% - 80.45\% = -21.20\% < 0.0\%$ , lo cual indica que la obra se encuentra atrasada respecto al Calendario valorizado acelerado con la Ampliación de plazo 32, considerando el Adicional de Obra N°01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09; y el Deductivo vinculante N°01,02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08.
- ✓ Se deja constancia que ya se aprobó la ampliación de plazo 32, cuya fecha de término en el 01/05/2021
- ✓ El rendimiento (desempeño) del contratista durante el mes de FEBRERO 2021 fue de:  $59.25\% / 80.45\% = 73.65\% < 80.0\%$  por lo que se debe aplicar lo dispuesto en el Artículo 173° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, por “Demora injustificada en la ejecución de la obra”.

*Según el artículo 173° del reglamento de contrataciones el estado, el contratista esta obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente, y en el caso de **retraso injustificado**, cuando el monto de una valorización a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha se le ordenará al contratista que presente un*



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

*calendario que contemple la aceleración de trabajos de modo que garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.*

**Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor debe anotar el hecho en el cuaderno de obra e informar a la Entidad. Dicho retraso puede ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra**

- ✓ La Supervisión informa a la Entidad que el contratista tiene atrasos injustificados, y manifiesta aplicar las medidas establecidas en la Ley, incluyendo intervención económica, de acuerdo a las cláusulas del contrato.
- ✓ Indicar que esta Supervisión ha informado oportunamente la aplicación de las **penalidades** previstas en el contrato, por el incumplimiento reiterativo del contratista, mediante cartas de Estado actual de OBRA.

El supervisor presentó:

- ✓ Con Carta CSL.174302.PU.DPA.S.741.21 del 03 de marzo del 2021, la Supervisión de obra, CESEL SA remite a FONDEPES, su **Informe de valorización de obra N°07 del Adicional N°9 correspondiente al mes de FEBRERO del 2021 (01.02.2021 al 28.02.2021), en atención a la Carta C048-2021-CMN-SUPE del 01 de marzo del 2021.**
- ✓ Con Carta CSL.174302.PU.DPA.S.744.21 del 02 de marzo del 2021, la Supervisión de obra, CESEL SA remite a FONDEPES, el Informe Mensual N°35 del Contratista CMN (01.02.2021 al 28.02.2021).

**RESUMEN DE LA VALORIZACION N°07 DEL ADICIONAL N°09 - FEBRERO 2021 (01.02.2021 al 28.02.2021).**

- ✓ El avance físico acumulado del adicional N° 09 es del 40.66%. La fecha de culminación del adicional N° 09 es el 01.05.2021. El presente adicional de obra se encuentra atrasado.
- ✓ La Valorización N°07 del Adicional N°09 de la MODIFICACION AL MUELLE correspondiente al mes de FEBRERO 2021 (01.02.2021 al 28.02.2021), donde el contratista CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE presenta su Valorización conciliados con la Supervisión de Obra CESEL SA por un monto de **S/. 486,361.04 (Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Uno con 04/100 soles), incluido IGV.**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"


	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MONTO MENSUAL	ACUMULADO ACTUAL
<b>MONTOS CONTRACTUALES ( V ) - Sin I.G.V.</b>				
Presupuesto Val. Muelle espigon	S/2,862,381.30	S/1,174,890.95	S/355,594.53	S/1,530,485.48
Presupuesto Val. Estructuras	S/573,380.93			
Presupuesto Val. Arquitectura	S/151,956.80			
Presupuesto Val. Instalaciones Electricas	S/117,792.88			
Presupuesto Val. Instalaciones Sanitarias	S/58,429.17			
<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>S/3,763,941.08</b>	<b>S/1,174,890.95</b>	<b>S/355,594.53</b>	<b>S/1,530,485.48</b>
I.G.V.	S/677,509.39	S/211,480.37	S/64,007.02	S/275,487.39
<b>PRESUPUESTO TOTAL Con I.G.V.</b>	<b>S/4,441,450.47</b>	<b>1,386,371.32</b>	<b>S/419,601.55</b>	<b>S/1,805,972.87</b>
<b>REAJUSTES y REGULARIZACION REAJUSTES ( S ) - Sin I.G.V.</b>				
REAJUSTE DE VAL. MUELLE ESPIGON		149,289.26	56,575.84	205,865.10
REAJUSTE DE VAL. ESTRUCTURAS				
REAJUSTE DE VAL. ARQUITECTURA				
REAJUSTE DE VAL. INSTALACIONES ELECTRICAS				
REAJUSTE DE VAL. INSTALACIONES SANITARIAS				
<b>TOTAL REAJUSTES</b>		<b>149,289.26</b>	<b>56,575.84</b>	<b>205,865.10</b>
<b>VALORIZACION NETA ( VN = A' + B )</b>				
		<b>1,324,180.21</b>	<b>412,170.37</b>	<b>1,736,350.58</b>
<b>MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA</b>				
En Efectivo (VN)		<b>1,324,180.21</b>	<b>412,170.37</b>	<b>1,736,350.58</b>
I.G.V.( =VN x 18%)		<b>238,352.44</b>	<b>74,190.67</b>	<b>312,543.10</b>
<b>MONTO TOTAL DE LA VALORIZACION CON I.G.V. EN NUEVOS SOLES</b>				
		<b>1,562,532.65</b>	<b>486,361.04</b>	<b>2,048,893.68</b>
<b>CALENDARIO DE COMPROMISO A SOLICITAR EN NUEVOS SOLES</b>				
			<b>486,361.04</b>	



*[Handwritten signature]*



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”



**RESUMEN**

**VALORIZACIÓN N°07 DE PRESTACIÓN DE ADICIONAL N°09 - MODIFICACION EN EL MUELLE ESPIGON DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021**

CONCEPTOS	VALORIZACION ACTUAL	VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR	VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL
1.1 MONTO VAL. OBRAS ADICIONAL 09	355,594.53	1,174,890.95	1,530,485.48
1.2 REAJUSTE DE VAL. MUELLE ESPIGON	56,575.84	149,289.26	205,865.10
1.3 REAJUSTE DE VAL. ESTRUCTURAS	-	-	-
1.4 REAJUSTE DE VAL. ARQUITECTURA	-	-	-
1.5 REAJUSTE DE VAL. INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-	-
1.6 REAJUSTE DE VAL. INSTALACIONES SANITARIAS	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>412,170.37</b>	<b>1,324,180.21</b>	<b>1,736,350.58</b>
4.0 IGV 18%	74,190.67	238,352.44	312,543.11
5.0 LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA (A-B-C+IGV)	486,361.04	1,562,532.65	2,048,893.69
A FAVOR DEL CONTRATISTA	412,170.37	1,324,180.20	1,736,350.58
POR CONCEPTO DE I.G.V	74,190.67	238,352.44	312,543.11



CONDICIONADO AL CUMPLIMIENTO DEL MONTE  
DE SEGURO MARCADOR INTERSANTAL DE SUPRE  
*Carlos Ricardo Pacheco*  
CARLOS RICARDO PACHECO  
FISCALIA DE LA OFICINA  
REG. CIP N° 50004


*Jessica Y. Arroyo Sampaen*  
Ing. Jessica Y. Arroyo Sampaen  
JEFE SUPERVISOR - CESEL SA  
REG. CIP N° 147611

✓ El contratista entregó su valorización con metrados conciliados con la Supervisión.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"



**AVANCE FÍSICO CON LA CURVA "S":**

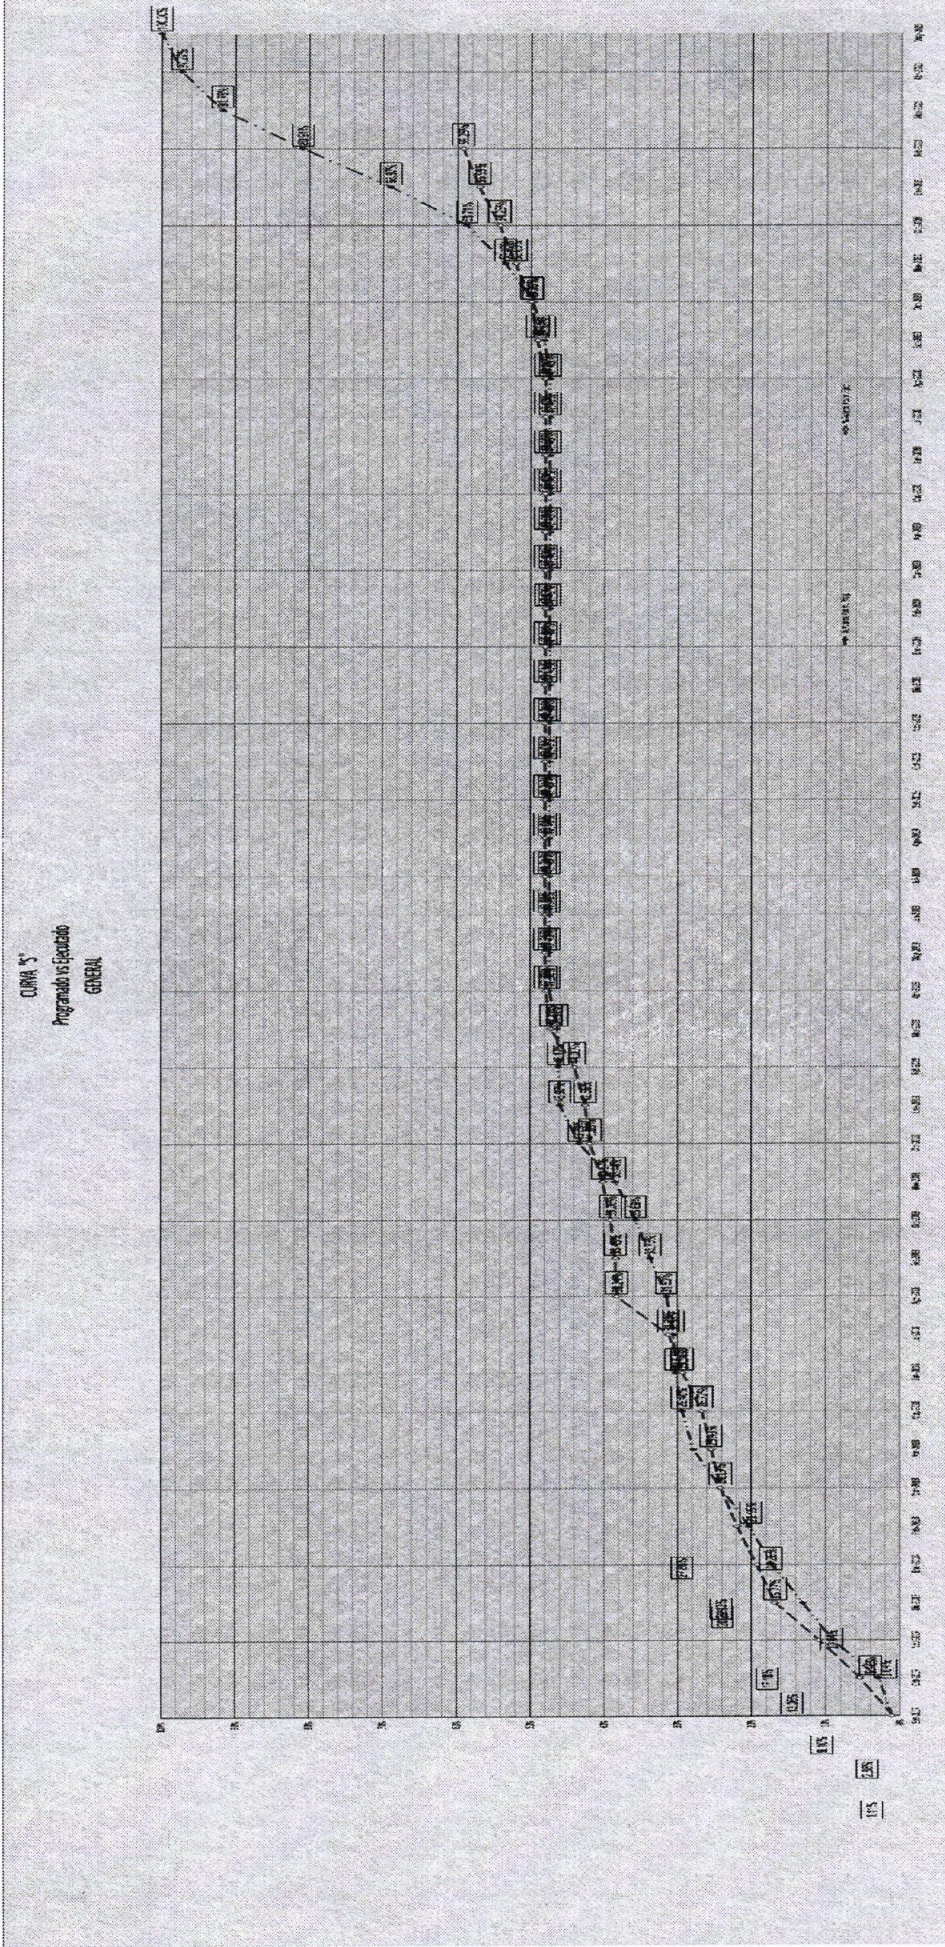

Porcentaje de avance físico acumulado al mes de febrero 2021 (01.02.2021 al 28.02.2021) de 59.25%

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

## VI. PENALIDADES

- ✓ Al respecto se indica que el contratista viene ejecutando la obra con atrasos atribuibles al Contratista, tal como ha informado la Supervisión de Obra en varias oportunidades, pudiendo haber incurrido en penalidad la que será cuantificada y ejecutada en la liquidación de obra.

## VII. CONCLUSIONES

- ✓ El contratista tiene atrasos injustificados y a dos (02) meses de culminar el plazo de ejecución (01.05.2021), existen riesgos y desviaciones respecto a la fecha de término del proyecto DPA SUPE, por lo expuesto se recomienda a la Entidad aplicar las medidas establecidas en el artículo 173 del RLCE, intervención económica.
- ✓ Por tanto, la Valorización N°07 del Adicional de Obra N°09 y Deductivo vinculado N°08: **Modificación del muelle**, correspondiente al mes de FEBRERO 2021 (01.02.2021 al 28.02.2021) de la obra: "Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima", **es procedente**.
- ✓ El suscrito opina que para proseguir con el trámite de pago de la Valorización N°07 del Adicional de Obra N°09 y Deductivo vinculado N°08, correspondiente al mes de FEBRERO 2021 (01.02.2021 al 28.02.2021) por un monto de **S/. 486,361.04 (Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Uno con 04/100 soles)**, incluido el IGV es necesario contar con la **Garantía de fiel cumplimiento** renovada.

## VIII. RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda por medio de la Oficina General de Administración, verificar la Garantía de fiel cumplimiento y de La Póliza CAR renovadas, previo al pago.

Es cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines

  
GIL ROBERTO ZANABRIA MOTTA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Del Colegio de Ingenieros N° 42133

Visto el Informe N°048-2021-FONDEPES-DIGENIPAA/UFEP/GRZM que antecede, el Coordinador de la Unidad Funcional de Ejecución de Proyectos de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, lo hace suyo, disponiendo su derivación a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola con sus respectivos antecedentes, para su conocimiento y atención correspondientes.

  
FONDEPES  
.....  
Arg. Miguel Saavedra Tineo  
COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL  
DE EJECUCION DE PROYECTOS (E)
