

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

INFORME N°086-2021-FONDEPES-DIGENIPAA/UFEP/GRZM

Atención : **ING. JORGE ROBERTO ÑAHUE SIVIRICHI**
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

Asunto : **Valorización N°37 correspondiente al mes de ABRIL 2021 (01.04.2021 al 30.04.2021) de la obra:**
"Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima"

Referencia : a) Carta CSL.174302.PU.DPA.S.842.21
b) Carta C137-2021-CMN-SUPE: Valorización de CMN
c) Carta C136-2021-CMN-SUPE: Informe CMN

Fecha : 11 de mayo del 2021.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para remitir el presente Informe con la finalidad de solicitarle se sirva dar trámite a la **Valorización N°37**, correspondiente al mes de ABRIL 2021 (01.04.2021 al 30.04.2021) de la obra: "Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima", cuya ejecución se encuentra a cargo del contratista CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE y que ha sido revisada por la Supervisión de obra CESEL SA.

Al respecto, puedo informar:

I. DATOS GENERALES DE LA OBRA

1.1 Información de la obra

Proceso : L.P. N° 0001-2017-FONDEPES (1ra. Convocatoria)
Obra : Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima".
Entidad contratante : FONDEPES
Financiamiento : FONDEPES

Proceso : L.P. N° 0001-2017-FONDEPES (1ra. Convocatoria)
Contrato : N° 025-2017-FONDEPES
Código SNIP N° : 182813
Modalidad de Ejecución : FONDEPES
Sistema de Contratación : A precios Unitarios
Monto Obra : S/. 21'509,091.48 (incluye IGV)
Contratista : CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE
Residente : Ing. Carlos Ricardo Pereda Méndez con CIP N°34484
Fecha de Inicio : 19 de setiembre del 2017
Plazo Ejecución : 270 días calendario
Término Inicial : 15 de junio del 2018
Avance Físico : 63.68 % al 30 de ABRIL 2021.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Monto Vigente : S/. 26'932,907.22 (incluye IGV)
Total Adicional : S/. 5,423,815.74 (25.22%).
Fecha de Término Contractual actual : 01 de mayo del 2021.

ADICIONALES

Adic. Obra 01 : S/. 2'213,942.02 – R.J. N° 008-2018-FONDEPES/J del 18.01.18
Deduc. Vinc. 01 : S/. 1'879,271.36 – R. J. N° 008-2018-FONDEPES/J del 18.01.18.
Adic. Obra 02 : S/. 160,884.73 – R.J. N° 052-2018-FONDEPES/J del 18.05.18
Adic. Obra 03 : S/. 676,072.37 – R.J. N° 094-2018-FONDEPES/J del 22.08.18
Deduc. Vinc. 02 : S/. 242,870.31
Adic. Obra 04 : S/. 417,954.90 – R.J. N° 095-2018-FONDEPES/J del 22.08.18
Deduc. Vinc. 03 : S/. 220,209.97
Adic. Obra 05 : S/. 562,775.06 – R.J. N° 133-2018-FONDEPES/J del 26.10.18
Deduc. Vinc. 04 : S/. -187,675.96
Adic. Obra 06 : S/. 340,246.17 – R.J. N° 158-2018-FONDEPES/J del 28.12.18
Deduc. Vinc. 05 : S/. -339,697.56
Adic. Obra 07 : S/. 408,954.61 – R.J. N° 044-2019-FONDEPES/J del 15.03.19
Deduc. Vinc. 06 : S/. -257,918.77
Adic. Obra 08 : S/. 598,810.85 - R.J. N° 156-2019-FONDEPES/J del 19.11.19
Deduc. Vinc. 07 : S/. -160,343.92. RD N°003-2021-FONDEPES/DIGENIPAA del 25.01.21
Adic. Obra 09 : S/. 4'441,450.47 - Resolución Directoral N° 043-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 03.03.2020
Deduc. Vinc. 08 : S/. -1'109,287.59. RD N°005-2021-FONDEPES/DIGENIPAA del 26.01.21

AMPLIACIONES

Ampliac. N° 01 : 16 d.c. (Denegada).
Ampliac. N° 02 : 67 d.c. (Denegada con Resolución de S.G. N° 001-2018-FONDEPES/SG).
Ampliac. N° 03 : 42 d.c. (Aprobada con Resolución de S.G. N° 028-2018-FONDEPES/SG).
Término : 27 de julio del 2018.
Ampliac. N° 04 : 32 d.c. (Aprobada con Resolución de S.G. N° 029-2018-FONDEPES/SG).
Nvo. Término : 28 de agosto del 2018.
Ampliac. N° 05 : 28 d.c. (Aprobada Resolución de S.G. N° 110-2018-FONDEPES/SG).
Nvo. Término : 25 de setiembre del 2018.
Ampliac. N° 06 : 120 d.c. (Denegada con Resolución de S.G. N° 111-2018-FONDEPES/SG).
Ampliac. N° 07 : 19 d.c. (Denegada con Resolución de S.G. N° 112-2018-FONDEPES/SG).
Ampliac. N° 08 : 52 d.c. (Aprobada con Resolución de S.G. N° 171-2018-FONDEPES/SG).







"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Término	:	16 de noviembre del 2018.
Ampliac. N° 09	:	57 d.c. (Denegada con Resolución de S.G. N° 172-2018-FONDEPES/SG).
Ampliac. N° 10	:	44 d.c. (Aprobada con Resolución de S.G. N° 215-2018-FONDEPES/SG).
Término	:	30 de diciembre del 2018.
Ampliac. N° 11	:	43 d.c. (Denegada con Resolución de S.G. N° 216-2018-FONDEPES/SG).
Ampliac. N° 12	:	4 d.c. (Denegada con Resolución de S.G. N° 217-2018-FONDEPES/SG).
Ampliac. N° 13	:	58 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 012-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 14	:	75 d.c. (Aprobada con Resolución de G.G. N° 013-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 15	:	17 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 049-2019-FONDEPES/GG).
Término	:	15 de marzo del 2019.
Ampliac. N° 16	:	45 d.c. Resolución de G.G. N° 071-2019-FONDEPES/GG del 15.04.2019.
Ampliac. N° 17	:	144 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 098-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 18	:	143 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 099-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 19	:	60 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 105-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 20	:	36 d.c. (Resolución de G.G. N° 097-2019-FONDEPES/GG.)
Fecha Término	:	04 de Junio del 2019.
Ampliac. N° 21	:	164 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 117-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 22	:	140 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 118-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 23	:	60 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 119-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 24	:	260 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 120-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 25	:	344 d.c. (Denegada con Resolución de G.G. N° 193-2019-FONDEPES/GG).
Ampliac. N° 26	:	(Denegada con Resolución de G.G. N° 199-2019-FONDEPES/GG).



SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA del 04.06.2019 por 227 días calendario, hasta el 16.01.2020.

Reinicio de obra	:	17 de enero del 2020 (01 día de plazo vigente trasladado del 04.06.2019)
Ampliac. N° 27	:	29 D.C. (Resolución N°024-2020-FONDEPES/DIGENIPAA). (computado desde el 18.01.2020 al 15.02.2020)
Ampliac. N° 28	:	Denegada Resol N° 032-2020-FONDEPES/DIGENIPAA
Ampliac. N° 29	:	Denegada con Resolución Directoral N° 052-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 17.06.2020.
Ampliac. N° 30	:	Denegada con Resolución Directoral N° 055-2020-

[Handwritten signature]



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"


Ampliación Excepc. :	FONDEPES/DIGENIPAA del 24.06.2020. 111 D.C. Aprobada en parte con Resolución Directoral N° 058-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 04.07.2020.
Ampliac. N° 31 :	Denegada con Resolución Directoral N° 061-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 08.07.2020
Ampliac. N° 32 :	Aprobada con Resolución Directoral N° 0112-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 06.10.2020
Ampliac. N° 33 :	Denegada con Resolución Directoral N° 0113-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 06.10.2020
Ampliac. N° 34 :	Denegada con Resolución Directoral N° 036-2021-FONDEPES/DIGENIPAA del 03.05.2021

1.2 Información del Contratista Supervisor

Empresa Contratista :	CESEL S.A.
Representante Legal :	Jesus Gattas Abugattas Abuid
Dirección :	Av. José Gálvez Barrenechea N° 646 San Isidro - Lima
Contrato :	N° 030-2017-FONDEPES
Fecha de Contrato :	15 de Setiembre del 2017
Monto del contrato Supervisión :	S/. 1'651,890.27
Plazo Supervisión de Obra :	270 días calendario
Fecha de inicio de Servicio :	19 de setiembre del 2017
Fecha de término de Servicio :	15 de junio del 2018
Supervisor :	Ing. Yessica Yuliana Arroyo Sampen CIP N° 147611

II. ANTECEDENTES

1.1 Antecedentes Generales:

- 
- Con fecha 24 de Julio del 2017, el Comité de Selección como resultado del Proceso de Selección LICITACION PUBLICA: N° 0001-2017-FONDEPES para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima", adjudico la Buena Pro al CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE, por el monto de S/. 21'509,091.48 y un plazo de ejecución de 270 días calendario; suscribiéndose el Contrato N° 025-2017-FONDEPES con fecha 22 de agosto del 2017.
 - Con fecha 29 de agosto del 2017, el Comité de Selección como resultado del Proceso de Selección CONCURSO PUBLICO N° 0001-2017-FONDEPES para la consultoría de la supervisión de la obra: "Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima", adjudicó la Buena Pro a la empresa CESEL S.A. por el monto de S/. 1'651,890.27 y con un plazo del servicio por 270 días calendario; suscribiéndose el Contrato N° 030-2017-FONDEPES con fecha 15 de setiembre del 2017.
- 

1.2 Antecedentes Normas COVID-19:

- Decreto Supremo N°044-2020-PCM de fecha 15 de marzo, que



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

- Resolución N°102-2020-OSCE/PRE, que formalizan aprobación de la modificación de los numerales 6.2 y 7.1.1 de la Directiva N°005-2020-OSCE/CD "Alcances y Disposiciones para la reactivación de Obras Públicas y Contratos de Supervisión, en el marco de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N°1486".

1.3 Antecedentes Específicos:

- ✓ Mediante Memorando N.º 4104-2020-FONDEPES/DIGENIPAA la DIGENIPAA dispuso al Coordinador de la Unidad Funcional de Ejecución de Proyectos (UFEP) implementar el Decreto de Urgencia N.º 133- 2020 y comunicar el procedimiento y sustento de aquellas valorizaciones correspondientes al mes de diciembre que deban ser objeto de modificaciones contractuales.
- ✓ Mediante Memorando Interno N.º 03019-2020-FONDEPES/UFEP el Coordinador de UFEP requirió disponer la implementación del mencionado Decreto de Urgencia
- ✓ Mediante Adenda N° 07 al contrato N° 025-2017-FONDEPES se modifica el contrato, en el extremo referido a que la ejecución de la obra efectuada en el mes de diciembre de 2020, se valore en 2 periodos, conforme se detalla a continuación:
 - Primer periodo: Valorización por la ejecución de la obra en el periodo del 01 al 18 de diciembre de 2020.
 - Segundo periodo: Valorización por la ejecución de la obra en el periodo del 19 al 31 de diciembre del 2020.
- ✓ Con carta CSL.174302.PU.DPA.S.842.21 del 06 de mayo del 2021, la Supervisión de obra, CESEL SA remite a FONDEPES, su **Informe de valorización de obra N°37 correspondiente al mes de ABRIL del 2021** (01.04.2021 al 30.04.2021), **en atención a la Carta C137-2021-CMN-SUPE** del 05 de mayo del 2021.
- ✓ Con Carta CSL.174302.PU.DPA.S.841.21 del 05 de mayo del 2021, la Supervisión de obra, CESEL SA remite a FONDEPES, el Informe Mensual N°37 del Contratista CMN (01.04.2021 al 30.04.2021).

1.4 Antecedentes de obra atrasada

- ✓ Con Carta CSL.174302.PU.DPA.S.467.20 la supervisión de obra de CESEL SA del 18 de febrero del 2020, informa sobre el desabastecimiento de distintos materiales que generan atrasos constantes de obra, que están anotadas en cuaderno de obra mucho antes de la suspensión de obra e informes mensuales desde el 2019 e informa también que se evidencia que ninguna ampliación de plazo será suficiente si el contratista continua con el ritmo lento de trabajo (14 personas de obra en el mes de febrero) y que podría llevar a atrasos injustificados y que es inaplazable que el contratista deberá acrecentar su producción cumpliendo con las normas de seguridad y calidad necesaria.
- ✓ Concluye además que el contratista tiene **ATRASOS INJUSTIFICADOS** y que no cuenta con la capacidad económica necesaria para poder cumplir con las metas propuesta en el plazo vigente, que se refleja en el bajo número de personas en obra y falta de recursos para ejecutar en distintos frentes.
- ✓ Con carta CSL.174302.PU.DPA.S.475.20, del 26 de febrero del 2020, la supervisión de obra CESEL SA, informa sobre la paralización de obra injustificada por



B



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

parte del contratista CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE desde el 24 de febrero indicando no estar de acuerdo con el documento de respuesta emitido por la Entidad y ratificarse en solicitar el adicional correspondiente a la partida del emisor submarino y que la ejecución de estos trabajos se encuentra paralizada.

Ante la paralización de ejecución de trabajos, la supervisión realizó la anotación en el cuaderno de obra (asiento N°1029 del 24.02.2020), solicitando el reinicio de las actividades, la continuidad de los trabajos y que todo atraso es responsabilidad del Contratista.

Ante lo expuesto, solicitamos que la Entidad realice las gestiones del caso para indicar al Residente la continuación de los trabajos y notifique al Contratista que según la cláusula Décimo Quinto "Penalizaciones" de su CONTRATO N° 025-2017.FONDEPES, si el Contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto al contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso.

CSL.174302.PU.DPA.S.483.20, del 03.03.2020, **continuidad de paralización de obra** DPA SUPE, solicitamos que la Entidad realice las gestiones del caso para indicar al Residente la continuación de los trabajos y notifique al Contratista que según la cláusula Décimo Quinto "Penalizaciones" de su CONTRATO N° 025-2017.FONDEPES, si el Contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto al contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso.

- ✓ **Esta Supervisión recomienda a la Entidad evaluar el uso del Art. 135 del RLCE, en vista que el CMN ha paralizado injustificadamente la ejecución de la prestación del Servicio DPA SUPE.**
- ✓ Con carta CSL.174302.PU.DPA.S.483.20 del 04.03.2020, la supervisión de obra CESEL SA, informa sobre la paralización de obra injustificada por parte del contratista CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE desde el 24 de febrero.
- ✓ Con carta CSL.174302.PU.DPA.S.492.20 del 11.03.2020 e Informe Especial N°CSL.174302.PU.ESP.82.20, la supervisión de obra CESEL SA, informa sobre el Estado Situacional de la obra, de la obra donde concluye que:
 - El avance que hasta la fecha viene desarrollando la empresa CMN, dejar constancia que no cuenta con la capacidad económica necesaria para poder cumplir con las metas propuesta del proyecto, esto se refleja en la cantidad de personal y la falta de recursos para ejecutar trabajos distintos frentes.
 - El avance logrado por el contratista hasta el mes de FEBRERO 2020 fue de: 55.84% y en marzo es de 55.87% menor al 80% del porcentaje acumulado programado donde indica que la obra se encuentra atrasada respecto al Calendario valorizado con la Ampliación de plazo 27, además que se encontró paralizada en sus trabajos desde el 24.02.2020.
- ✓ Con Carta N° 1123-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 27/10/2020, la Entidad comunica al Supervisor la aprobación del Cronograma de obra y el Calendario Valorizado actualizado adecuado a la Ampliación de plazo N° 32 de la obra, que fuera remitido por la Supervisión con Carta CSL.174302.PU.DPA.S.581.20
- ✓ Con carta CSL.174302.PU.DPA.S.651.20 del 14.12.2020, la supervisión de obra CESEL SA, remite a la entidad el Cronograma de obra, Calendario Valorizado de



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Avance de obra Acelerado y Curva S, que fue entregado por el Contratista CMN, con carta C078-2020-CMN-SUPE conforme a lo solicitado por la Supervisión al no haber alcanzado el 80% del avance programado acumulado del Calendario Valorizado de Avance de obra vigente en la Valorización del mes de Noviembre 2020.

- ✓ Con Carta N° 1147-2020-FONDEPES/DIGENIPAA del 30/12/2020, la Entidad comunica al Supervisor la aprobación del Calendario Valorizado acelerado.
- ✓ Mediante Carta N°13-2021-FONDEPES/GG, de fecha 23.03.2021, se notifica al Consorcio Marítimo del Norte, la Resolución de Gerencia General N° 18-2021-FONDEPES/GG que aprueba la Intervención Económica de la obra otorgándose el plazo de tres (3) días hábiles para que el referido Consorcio acepte o rechace la Intervención Económica de la obra.

III. MARCO LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada por Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 350-2015-EF y modificado por D.S. N° 056-2017, del 19 de marzo del 2017.
 - Contrato N° 25-2017-FONDEPES.
 - Resolución de Gerencia General N°016-2020-FONDEPES/GG
- Específicas:
- ✓ Artículo 166° del Reglamento de Contrataciones del Estado.
 - ✓ Artículo 175° del Reglamento de Contrataciones del Estado.

IV. ANALISIS

- ✓ El avance físico acumulado logrado por el contratista hasta el mes de ABRIL 2021 fue de: $63.68\% - 96.80\% = -33.12\% < 0.0\%$, lo cual indica que la obra se encuentra atrasada respecto al Calendario valorizado acelerado con la Ampliación de plazo 32, considerando el Adicional de Obra N°01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09; y el Deductivo vinculante N°01,02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08.

El rendimiento (desempeño) del contratista durante el mes de ABRIL 2021 fue de: $63.68\% / 96.80\% = 65.79\% < 80.0\%$.

Se deja constancia que ya se aprobó la ampliación de plazo 32, cuya fecha de término en el 01.05.2021.

- ✓ Se deja constancia que la obra DPA SUPE a la fecha no cuenta con plazo de ejecución, el plazo de ejecución vigente culminó el 01.05.2021.
- ✓ La Supervisión señala que viene haciendo uso del art. 166. Valorizaciones y metrados. Por tanto ha elaborado la valorización N°37 (ANEXO 1), cuya diferencia es la No valorización de la partida Suministro de la tubería lisa HDPE, sustento que se ha explicado en la valorización N°36 de Supervisión, derivada con carta CSL.174302.PU.DPA.S.790.2.

Respecto de la carta C137-2021-CMN-SUPE-VALORIZACION CONTRACTUAL N° 37, del contratista se debe dilucidar sus sustentos de la no conformidad:

1. Los montos metrados del mes de abril han sido conciliados (contratista y supervisión) así como también el monto SUBTOTAL de: S/.42,859.23.
2. La diferencia en monto TOTAL A VALORIZAR, porcentaje de avance y montos



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

acumulados se debe a la no valorización Suministro de la tubería lisa HDPE, en la especialidad de instalaciones sanitarias, proveniente del mes de marzo del 2021. Motivo por la cual no se da conformidad a la valorización del contratista y se adjunta en el anexo 2.

- ✓ Para la presente valorización de obra, se ha tomado en consideración el presupuesto de obra ofertado por el contratista con precios base a MARZO 2017 y el Calendario de avance de obra valorizado actualizado por Ampliación de Plazo N° 32, descontando el deductivo vinculante N°01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08; e incluyendo el Adicional de Obra N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, actualizado a la fecha real de inicio de obra, el 19 de setiembre 2017. Con ello se ha realizado la curva S y la comparación de avance de obra real vs avance programado.
- ✓ La Supervisión deja constancia que el monto del mayor metrado ENERO del 2021 aprobado con Resolución de la Dirección General de Inversión pesquera artesanal y acuícola N°018-2021-FONDEPES/DIGENIPAA de 17.03.2021, no se encuentra incluido en el porcentaje de avance acumulado al mes de abril del 2021.
- ✓ Se recalca que la presente valorización N°37 el contratista y la supervisión han procedido a actualizar los reajustes de los meses del año 2017, 2018, 2019 y hasta marzo del 2021 de cada una de las fórmulas polinómicas.
- ✓ Con carta CSL.174302.PU.DPA.S.842.21 del 06 de mayo del 2021, la Supervisión de obra, CESEL SA remite a FONDEPES, su Informe de valorización de obra N°37 correspondiente al mes de ABRIL del 2021 (01.04.2021 al 30.04.2021), en atención a la Carta C137-2021-CMN-SUPE del 05 de mayo del 2021.
- ✓ Con Carta CSL.174302.PU.DPA.S.841.21 del 05 de mayo del 2021, la Supervisión de obra, CESEL SA remite a FONDEPES, el Informe Mensual N°37 del Contratista CMN (01.04.2021 al 30.04.2021).

RESUMEN DE LA VALORIZACION N°37 – ABRIL 2021 (01.04.2021 al 30.04.2021).

- ✓ La Valorización N°37, correspondiente al mes de ABRIL 2021 (01.04.2021 al 30.04.2021), donde el contratista CONSORCIO MARITIMO DEL NORTE presenta su Valorización por el monto de S/. 58,616.00 soles incluido IGV, no habiendo conciliado el metrado de la partida Suministro de la Tubería lisa HDPE. Con la Supervisión.
- ✓ La Supervisión de Obra CESEL SA ha recalculado la Valorización N°37, correspondiente al mes de ABRIL 2021 (01.04.2021 al 30.04.2021) por un monto de **S/. 55,521.76 (Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Veintiuno con 76/100 soles), incluido IGV**, señalando que la diferencia es la No valorización de la partida Suministro de la tubería lisa HDPE, sustento que se ha explicado en la valorización N°36 de Supervisión, derivada con carta CSL.174302.PU.DPA.S.790.2.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MONTO MENSUAL	ACUMULADO ACTUAL
MONITOS CONTRACTUALES (V) - Sin I.G.V.				
Presupuesto Expediente Técnico (Sin I.G.V.)	S/14,578,589.43	S/10,206,119.46	S/42,859.23	S/10,248,978.69
Presupuesto Obras Portuarias	S/6,447,373.02	S/4,843,546.15	S/32,329.33	S/4,875,875.46
Presupuesto Edificación en Tierra - Estructura	S/3,265,483.49	S/2,896,814.45	S/2,942.71	S/2,899,757.16
Presupuesto Edificación en Tierra - Arquitectura	S/1,665,402.03	S/826,044.03	S/2,067.46	S/828,111.50
Presupuesto Edificación en Tierra - Instalaciones Eléctricas	S/146,095.75	S/46,184.31	S/5,499.73	S/51,684.05
Presupuesto Edificación en Tierra - Instalaciones Sanitarias	S/626,873.47	S/171,158.15	S/0.00	S/171,158.15
Presupuesto Edificación en Tierra - Equipamiento	S/2,373,404.06	S/1,378,948.60	S/0.00	S/1,378,948.60
Presupuesto Impacto Ambiental	S/53,957.81	S/43,423.76	S/0.00	S/43,423.76
deductivo obra				
SUB TOTAL PRESUPUESTO	S/14,578,589.43	S/10,206,119.46	S/42,859.23	S/10,248,978.69
I.G.V.	S/2,624,146.10	S/1,837,101.50	S/7,714.66	S/1,844,816.16
PRESUPUESTO TOTAL Con I.G.V.	S/17,202,735.53	S/12,043,220.96	S/50,573.89	S/12,093,794.86
REAJUSTES y REGULARIZACION REAJUSTES (\$) - Sin I.G.V.				
Reajuste Fórmula Polinómica Val. 37 - Indices Marzo 2021 Obras Portuarias		S/360,643.60	S/14,103.29	S/374,746.89
Reajuste Fórmula Polinómica Val. 37 - Indices Marzo 2021 Estructuras		S/79,219.50	S/0.00	S/79,219.50
Reajuste Fórmula Polinómica Val. 37 - Indices Marzo 2021 Arquitectura		S/52,651.11	S/522.60	S/53,173.70
Reajuste Fórmula Polinómica Val. 37 - Indices Marzo 2021 Eléctricas		-S/1,614.52	S/752.55	-S/861.97
Reajuste Fórmula Polinómica Val. 37 - Indices Marzo 2021 Sanitarias		S/24,831.85	-S/3,076.96	S/21,754.89
Reajuste Fórmula Polinómica Val. 37 - Indices Marzo 2021 Equipamiento		S/40,576.47	S/0.00	S/40,576.47
Reajuste Fórmula Polinómica Val. 37 - Indices Marzo 2021 Impacto Ambiental		S/541.41	S/0.00	S/541.41
TOTAL REAJUSTES		S/656,849.43	S/12,391.48	S/669,240.91
VALORIZACION BRUTA (VB = V+S)		S/10,702,968.85	S/55,168.71	S/10,816,129.60
DEDUCCIONES (D) - Sin I.G.V.				
Deducciones del Adelanto Directo				
Deducciones del Adelanto Directo Obras Portuarias		35547.34	S/1,950.54	37497.88
Deducciones del Adelanto Directo Edif. en Tierra Estructuras		6764.92	S/72.07	6836.99
Deducciones del Adelanto Directo Edif. en Tierra Arquitectura		4627.94	S/70.31	4698.25
Deducciones del Adelanto Directo Edif. en Tierra Instalaciones Eléctricas		-256.77	S/97.91	-158.86
Deducciones del Adelanto Directo Edif. en Tierra Instalaciones Sanitarias		3343.08	-S/454.72	2888.36
Deducciones del Adelanto Directo Edif. en Tierra Equipamiento		5363.81	S/0.00	5363.81
Deducciones del Adelanto Directo Impacto Ambiental		36.28	S/0.00	36.28
Deducciones del Adelanto de Materiales				



Handwritten signature



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Deducciones del Adelanto de materiales Obras Portuarias		S/25,427.21	S/0.00	25427.21
Deducciones del Adelanto de materiales Edif. en Tierra Estructuras		S/35,725.22	S/0.00	35725.22
Deducciones del Adelanto de materiales Edif. en Tierra Arquitectura		S/5,892.73	S/0.00	5892.73
Deducciones del Adelanto de materiales Edif. en Tierra Instalaciones Eléctricas		0.00	S/0.00	0.00
Deducciones del Adelanto de materiales Edif. en Tierra Instalaciones Sanitarias		0.00	S/0.00	0.00
Deducciones del Adelanto de materiales Edif. en Tierra Equipamiento		0.00	S/0.00	0.00
Deducciones del Adelanto de materiales Impacto Ambiental		0.00	S/0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		122,471.76	1,736.11	124,207.87
AMORTIZACIONES (A)				
Amortización de Adelanto Directo (12.81%)	1,822,884.37	1,172,863.65	6,372.25	1,179,235.30
Amortización del Adelanto Directo Obras Portuarias	889,711.31	S/562,521.27	S/4,807.51	567,328.78
Amortización del Adelanto Directo Edif. En Tierra Estructuras	369,140.85	S/314,891.11	S/437.29	315,328.39
Amortización del Adelanto Directo Edif. En Tierra Arquitectura	173,822.12	S/105,879.26	S/310.20	106,189.45
Amortización del Adelanto Directo Edif. En Tierra Instalaciones Eléctricas	65,308.36	S/5,648.57	S/617.25	6465.83
Amortización del Adelanto Directo Edif. En Tierra Instalaciones Sanitarias	82,093.05	S/24,083.91	S/0.00	24083.91
Amortización del Adelanto Directo Edif. En Tierra Equipamiento	237,340.41	S/154,993.82	S/0.00	154993.82
Amortización del Adelanto Directo Impacto Ambiental	5,395.76	S/4,845.11	S/0.00	4845.11
		0.00		0.00
Amortización de Adelanto de materiales	3,031,779.66	2,802,634.99	8.06	2,802,634.99
Amortización del Adelanto de Materiales Obras Portuarias N°01		754057.66	0.00	754,057.66
Amortización del Adelanto de Materiales Obras Portuarias N°02		405085.28	0.00	405,085.28
Amortización del Adelanto de Materiales Obras Portuarias N°03		41997.36	0.00	41,997.36
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Estructuras N°01		208736.47	0.00	208,736.47
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Estructuras N°02		498904.71	0.00	498,904.71
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Estructuras N°03		31012.40	0.00	31,012.40
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Arquitectura N°01		0.00	0.00	0.00
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Arquitectura N°02		52781.11	0.00	52,781.11
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Arquitectura N°03		0.00	0.00	0.00
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Instalaciones Eléctricas		0.00	0.00	0.00
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Instalaciones Sanitarias		0.00	0.00	0.00
Amortización del Adelanto de Materiales Edif. En Tierra Equipamiento		0.00	0.00	0.00
Amortización del Adelanto de Materiales Impacto Ambiental		0.00	0.00	0.00
TOTAL AMORTIZACIONES		3,175,498.04	6,372.25	3,161,870.30
VALORIZACION NETA (VN = VB-D-A)		7,464,999.11	47,852.34	7,512,851.45
MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA				
En Efectivo (VN)		7,464,999.11	47,852.34	7,512,851.45
I.G.V. (=VN x 18%)		1,343,899.84	8,469.42	1,352,169.26
MONTO TOTAL DE LA VALORIZACION CON I.G.V. EN NUEVOS SOLES		8,808,698.95	55,521.76	8,864,220.71
CALENDARIO DE COMPROMISO A SOLICITAR EN NUEVOS SOLES			S/ 55,521.76	



Handwritten mark or signature.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Nº de C.O.B.:		RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 37 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021				FONDEPES CEBEL INGENIERÍA S.A.	
Código:		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MONTO ORIGINAL	ACUMULADO ACTUAL	% DE EJECUCIÓN	MONTO
"Iniciativa Integración Democrática - Programa Ambiental de C. P."		074.878.888.43	076.206.118.48	084.888.23	076.206.878.88	78.0%	084.888.23
Ubicación: Marina del Norte		085.447.373.02	04.843.948.15	002.320.00	04.843.948.15	78.0%	04.843.948.15
Fecha: 17 Mar 2021		025.288.483.48	023.888.814.45	003.943.74	023.888.814.45	88.0%	023.888.814.45
		071.688.422.03	008.044.03	003.087.46	008.044.03	48.0%	003.087.46
		071.463.888.75	048.184.91	048.184.91	048.184.91	35.0%	048.184.91
		0826.873.47	000.00	000.00	000.00	27.0%	000.00
		003.773.454.06	071.378.948.81	000.00	071.378.948.81	98.1%	071.378.948.81
		053.087.81	043.423.76	000.00	043.423.76	88.3%	043.423.76
Subtotal de obra							
SUB TOTAL PRESUPUESTO		074.878.888.43	076.206.118.48	084.888.23	076.206.878.88	78.30%	084.888.23
I.C.M.		00.024.146.10	00.000.000.00	07.714.68	00.000.000.00		00.000.000.00
PRESUPUESTO TOTAL Con I.C.M.		074.903.034.53	076.206.118.48	092.602.91	076.206.878.88	78.30%	084.888.23
B REAJUSTES y REGULACIÓN REAJUSTES (B) - Sin I.C.M.							
Rescate Fórmula Polidroma Vot. 37 - Ingreso Marzo 2021 Obras Portuarias			0280.843.80	074.103.39	0274.746.88		
Rescate Fórmula Polidroma Vot. 37 - Ingreso Marzo 2021 Estructuras			078.218.90	000.00	078.218.90		
Rescate Fórmula Polidroma Vot. 37 - Ingreso Marzo 2021 Arquitectura			043.861.11	043.861.11	043.861.11		
Rescate Fórmula Polidroma Vot. 37 - Ingreso Marzo 2021 Electricidad			0783.88	0783.88	0783.88		
Rescate Fórmula Polidroma Vot. 37 - Ingreso Marzo 2021 Servicios			004.814.82	-004.814.82	000.00		
Rescate Fórmula Polidroma Vot. 37 - Ingreso Marzo 2021 Equipamiento			040.078.47	000.00	040.078.47		
Rescate Fórmula Polidroma Vot. 37 - Ingreso Marzo 2021 Impacto Ambiental			084.141	000.00	084.141		
TOTAL REAJUSTES			0894.864.43	071.301.68	0894.864.43		
C VALORIZACIÓN BRUTA (VB + VB2)			070.762.088.88	078.708.71	078.878.128.03		
D DEDUCCIONES (D) - Sin I.C.M.							
Deducciones del Adelanto Directo							
Deducciones del Adelanto Directo Obras Portuarias			0847.34	071.860.54	071.860.54		
Deducciones del Adelanto Directo Estructuras			078.32	078.32	078.32		
Deducciones del Adelanto Directo Estructuras E.I.F. en Tierra Arquitectura			488.38	488.38	488.38		
Deducciones del Adelanto Directo Estructuras E.I.F. en Tierra Instalaciones Electricas			-084.77	-084.77	-084.77		
Deducciones del Adelanto Directo Estructuras E.I.F. en Tierra Instalaciones Servicios			000.00	-0484.72	000.00		
Deducciones del Adelanto Directo Estructuras E.I.F. en Tierra Equipamiento			000.00	000.00	000.00		
Deducciones del Adelanto Directo Impacto Ambiental			38.28	000.00	38.28		
Deducciones del Adelanto de Materiales							
Deducciones del Adelanto de Materiales Obras Portuarias			008.427.21	000.00	008.427.21		
Deducciones del Adelanto de Materiales Estructuras E.I.F. en Tierra Estructuras			008.728.22	000.00	008.728.22		
Deducciones del Adelanto de Materiales Estructuras E.I.F. en Tierra Arquitectura			000.00	000.00	000.00		
Deducciones del Adelanto de Materiales Estructuras E.I.F. en Tierra Instalaciones Electricas			0.00	0.00	0.00		
Deducciones del Adelanto de Materiales Estructuras E.I.F. en Tierra Instalaciones Servicios			0.00	0.00	0.00		
Deducciones del Adelanto de Materiales Estructuras E.I.F. en Tierra Equipamiento			0.00	0.00	0.00		
Deducciones del Adelanto de Materiales Impacto Ambiental			0.00	0.00	0.00		
TOTAL DEDUCCIONES			122.471.78	178.11	122.471.78		
E AMORTIZACIONES (A)							
Amortización de Adelanto Directo (N.E. 81%)		1.822.884.37	1.172.883.88	8.372.28	1.172.883.88		843.888.23
Amortización del Adelanto Directo Obras Portuarias		080.711.81	0982.528.23	04.827.88	080.711.81		000.000.00
Amortización del Adelanto Directo Estructuras E.I.F. en Tierra Estructuras		081.143.88	000.00	000.00	081.143.88		000.000.00
Amortización del Adelanto Directo Estructuras E.I.F. en Tierra Arquitectura		175.822.12	000.00	000.00	175.822.12		000.000.00
Amortización del Adelanto Directo Estructuras E.I.F. en Tierra Instalaciones Electricas		88.320.36	000.00	000.00	88.320.36		000.000.00
Amortización del Adelanto Directo Estructuras E.I.F. en Tierra Instalaciones Servicios		000.00	000.00	000.00	000.00		000.000.00
Amortización del Adelanto Directo Estructuras E.I.F. en Tierra Equipamiento		252.340.41	0194.888.82	000.00	252.340.41		000.000.00
Amortización del Adelanto Directo Impacto Ambiental		0.00	000.00	000.00	0.00		000.000.00
Amortización de Adelanto de Materiales		1.011.778.88	1.002.824.88	0.00	1.002.824.88		1.002.824.88
Amortización del Adelanto de Materiales Obras Portuarias N°01			000.00	0.00	000.00	1.00	000.000.00
Amortización del Adelanto de Materiales Obras Portuarias N°02			408.088.28	0.00	408.088.28	2.00	000.000.00
Amortización del Adelanto de Materiales Obras Portuarias N°03			41.887.38	0.00	41.887.38	3.00	000.000.00
Amortización del Adelanto de Materiales Estructuras E.I.F. en Tierra Estructuras N°01			000.00	0.00	000.00	1.00	000.000.00
Amortización del Adelanto de Materiales Estructuras E.I.F. en Tierra Estructuras N°02			000.00	0.00	000.00	1.00	000.000.00
Amortización del Adelanto de Materiales Estructuras E.I.F. en Tierra Arquitectura N°01			000.00	0.00	000.00	3.00	000.000.00
Amortización del Adelanto de Materiales Estructuras E.I.F. en Tierra Arquitectura N°02			000.00	0.00	000.00	1.00	000.000.00
Amortización del Adelanto de Materiales Estructuras E.I.F. en Tierra Instalaciones Electricas N°01			000.00	0.00	000.00	3.00	000.000.00
Amortización del Adelanto de Materiales Estructuras E.I.F. en Tierra Instalaciones Electricas N°02			000.00	0.00	000.00	1.00	000.000.00
Amortización del Adelanto de Materiales Estructuras E.I.F. en Tierra Instalaciones Servicios			000.00	0.00	000.00	1.00	000.000.00
Amortización del Adelanto de Materiales Estructuras E.I.F. en Tierra Equipamiento			000.00	0.00	000.00	1.00	000.000.00
Amortización del Adelanto de Materiales Impacto Ambiental			000.00	0.00	000.00	1.00	000.000.00
TOTAL AMORTIZACIONES			3.175.668.04	8.372.28	3.184.040.32		
F VALORIZACIÓN NETA (VB + VB2 - D - A)			7.484.888.11	47.662.34	7.512.681.46		
G MONEDAS DE INGRESO CONTRATISTA							
En Moneda N°01 (I.C.M. + IVA + ITPU)			7.484.888.11	47.662.34	7.512.681.46		
			1.343.888.88	8.488.42	1.352.377.30		
H MONTO TOTAL DE LA VALORIZACIÓN CON I.C.M. EN MONEDAS N°01			8.828.776.22	56.144.68	8.865.058.76		
I CALENDARIO DE COMPROMISO A REALIZAR EN MONEDAS N°01				8.865.058.76			




Yessica Yuliana...
YESSICA YULIANA...
INGENIERA CIVIL
Reg CIP N° 147811



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

AVANCE FÍSICO CON LA CURVA "S":

CURVA "S"
Programa Especializado
GENERAL

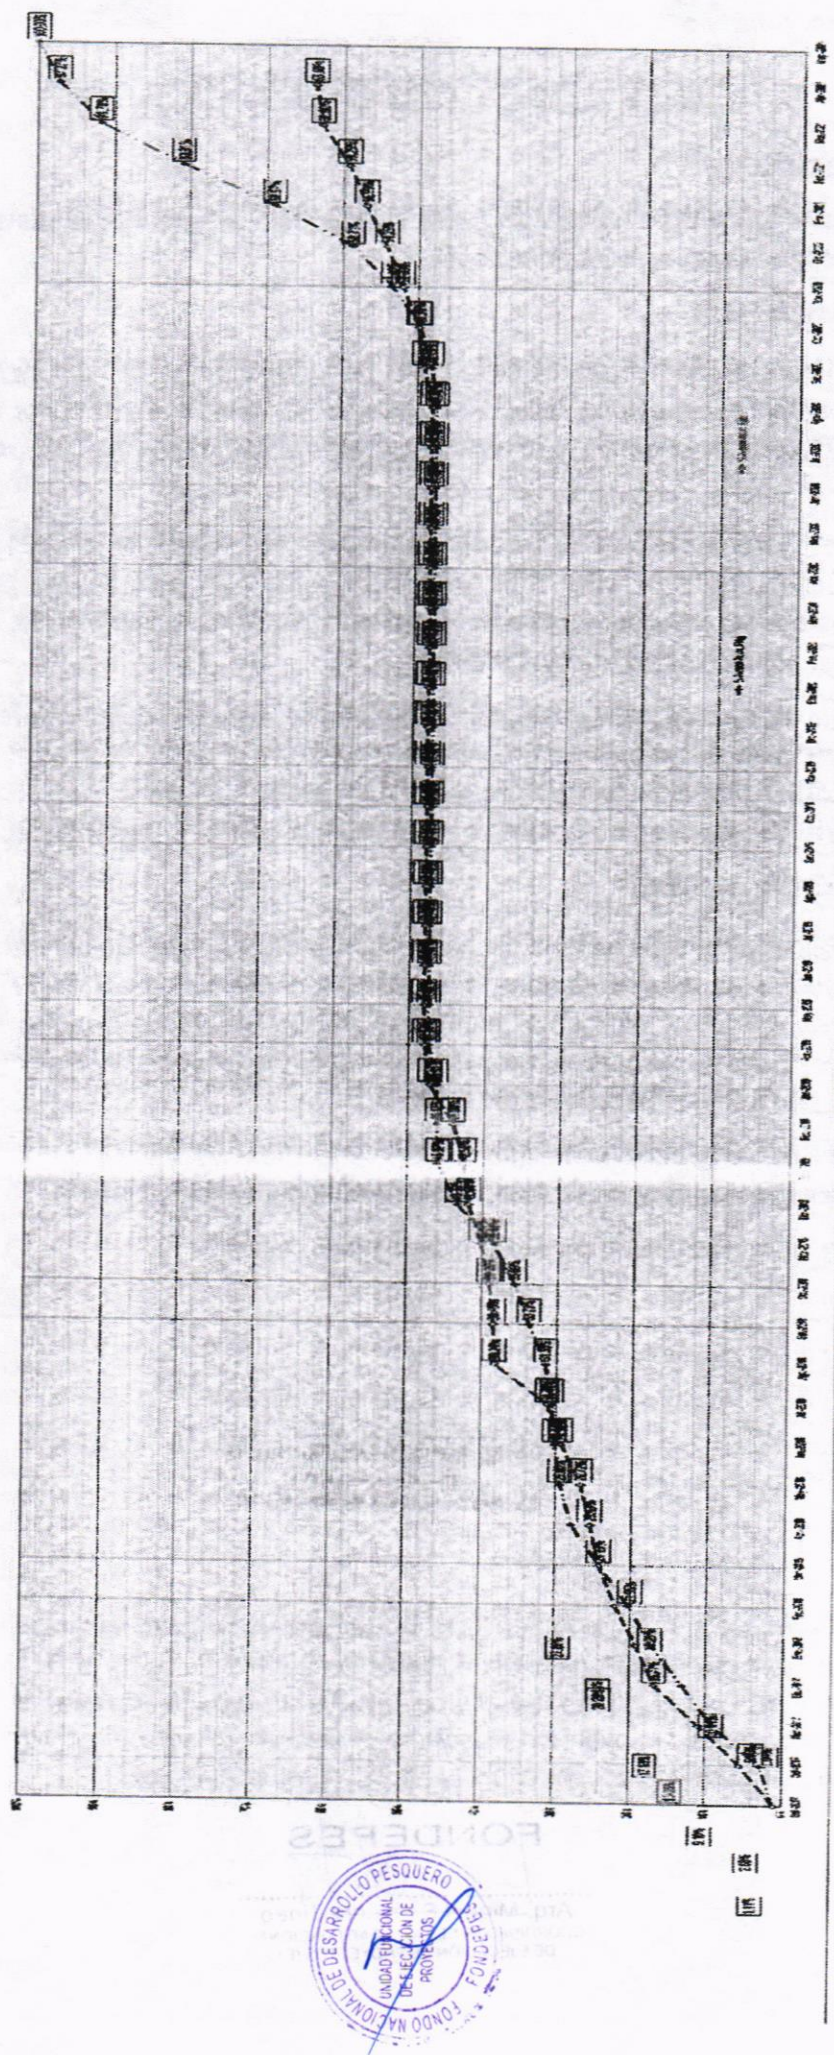

Porcentaje de avance físico acumulado al mes de ABRIL 2021 (01.04.2021 al 30.04.2021) de 63.68%



BICENTENARIO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

V. PENALIDADES

- ✓ La Supervisión de obra no ha informado sobre penalidades al contratista, por lo cual no corresponde en el presente periodo.

VI. CONCLUSIONES

- ✓ La Supervisión de Obra CESEL SA ha recalculado la Valorización N°37, correspondiente al mes de ABRIL 2021 (01.04.2021 al 30.04.2021) por un monto de S/. 55,521.76 (Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Veintiuno con 76/100 soles), incluido IGV.
- ✓ Por tanto, la Valorización N°37, correspondiente al mes de ABRIL 2021 (01.04.2021 al 30.04.2021) de la obra: "Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima", **es procedente**.
- ✓ El suscrito opina que para proseguir con el trámite de pago de la Valorización N°37, correspondiente al mes de ABRIL 2021 (01.04.2021 al 30.04.2021) por el monto de **S/. 55,521.76 (Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Veintiuno con 76/100 soles), incluido IGV**, es necesario contar con la **Garantía de fiel cumplimiento renovada**.

VII. RECOMENDACIONES

- ✓ Cumplidos los requisitos establecidos en la normativa y la relación contractual vigente, se recomienda que el Director de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, otorgue la conformidad correspondiente, para que la entidad proceda con el pago de Valorización de Obra N° 37, correspondiente al mes de ABRIL del 2021, dentro los plazos legales vigentes.
- ✓ Se recomienda por medio de la Oficina General de Administración, verificar la Garantía de fiel cumplimiento y de La Póliza CAR **renovadas**, previo al pago.

Es cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines


GIL ROBERTO ZANABRIA MOTTA
INGENIERO CIVIL
Reg. Del Colegio de Ingenieros N° 42133

Visto el Informe N°086-2021-FONDEPES-DIGENIPAA/UFEP/GRZM que antecede, el Coordinador de la Unidad Funcional de Ejecución de Proyectos de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, lo hace suyo, disponiendo su derivación a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola con sus respectivos antecedentes, para su conocimiento y atención correspondientes.


FONDEPES
Arq. Miguel Saavedra Tineo
COORDINADOR DE LA UNIDAD FUNCIONAL
DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS (E)

