


Arequipa, 02 de Junio del 2016

**Carta N° 36 - 16-GMC**

Señores  
**FONDEPES**  
**DIGENIPAA**  
Presente.-



ASUNTO : REMITO VALORIZACIÓN N° 01 DEL ADICIONAL N° 05

ATENCIÓN : ING. RAQUEL GUERRA SANTA CRUZ


REFERENCIA : CONTRATO N° 002-2015-FONDEPES  
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL  
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO,  
DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA".

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de de remitirle la Valorización N° 01 del Adicional N° 05 de la obra indicada en la referencia, correspondiente al mes de mayo del presente año, cuya ejecución está a cargo de la Constructora Dávalos SAC.

Cabe señalar que se han verificado los Metrados ejecutados a la fecha indicada, conforme a lo establecido por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES.

Sin otro particular, quedo de usted.

  
.....  
ING. GARY DEL CARPIO URDAY  
CIP N° 40252

C.c. Constructora Dávalos SAC  
GMC/lp  
REG-SAL-36-16-GS



## FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO



Fondo Nacional  
de Desarrollo Pesquero

**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA\*.**

**VALORIZACION N° 01 ADICIONAL N° 05**



**ING. GARY MARIO DEL CARPIO URDAY**

Calle Leoncio Martell N° 129 Urb. Guardia Civil


Paucarpata, Arequipa

Teléfono: 95-9690181 RPM \*539112

e-mail: garydelc@yahoo.com.ar

**MAYO 2016**

GARY MARIO DEL CARPIO URDAY  
INGENIERO CIVIL C.º N° 46252





## I. DATOS GENERALES

1. Contrato de Obra : N° 002-2015-FONDEPES  
Fecha de suscripción : 17 de Febrero del 2015
2. Contratista de Obra : Constructora Dávalos SAC
3. Monto del Contrato de la Obra : S/. 7'145,130.75 Nuevos Soles (Incluye IGV)
4. Valor Referencial de la Obra : S/. 7'939,034.16 Nuevos Soles (Incluye IGV)
5. Modalidad : Precios Unitarios
6. Residente de Obra : Ing. Mario Dávalos Rojas
7. Supervisor de Obra : ING. GARY DEL CARPIO URDAY
8. Contrato de Supervisión de Obra : N° 007-2015-FONDEPES/OGA  
Fecha de suscripción : 14 de Abril del 2015
9. Monto del Contrato de Supervisión : S/. 283,543.20 Nuevos Soles
10. Fecha de entrega de terreno : 27 de Abril del 2015
11. Fecha de cobro adelanto directo : 27 de Marzo del 2015
12. Monto de Adelanto Directo (con IGV) : 1'429,026.15 (Incluye IGV)
13. Fecha de adelanto de materiales : 16 de Junio del 2015
14. Fecha de inicio de obra contractual : 28 de Abril del 2015
15. Plazo de Ejecución : 240 días calendarios
16. Fecha de término contractual : 23 de Diciembre del 2015
17. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento : N° 010475028000  
Monto : S/. 357,257.00 Nuevos Soles  
Entidad Financiera : Banco Scotiabank  
Vigencia : 17 de Diciembre del 2015 (Renovada)
- Carta Fianza de Fiel Cumplimiento : N° D215-00170132  
Monto : S/. 357,256.54 Nuevos Soles  
Entidad Financiera : Banco de Crédito  
Vigencia : 9 de Diciembre del 2015 (Renovada)
18. Carta Fianza Adelanto en Efectivo : 010475050-004  
Monto : S/. 562,002.79 Nuevos Soles (amortizado 100%)  
Entidad Financiera : Banco Scotiabank  
Vigencia : 19 de Febrero del 2016
- Carta Fianza Adelanto en Efectivo : 000695958704 (amortizado 100%)  
Monto : S/. 396,644.98 Nuevos Soles  
Entidad Financiera : Banco Financiero  
Vigencia : 19 de Febrero del 2016
19. Carta Fianza Adelanto Materiales : 000720637198 (amortizado 100%)  
Monto : S/. 501,569.06 Nuevos Soles  
Entidad Financiera : Banco Financiero  
Vigencia : 18 de Febrero del 2016
- Carta Fianza Adelanto Materiales : 000720277647 (amortizado 100%)  
Monto : S/. 501,569.06 Nuevos Soles  
Entidad Financiera : Banco Financiero  
Vigencia : 18 de Febrero del 2016
20. Ampliaciones de Plazo N° 01 : Tres (03) días R N° 145-2015-FONDEPES/SG

21. Ampliaciones de Plazo N° 02	:	Noventa y tres (96) días R N° 206-2015-FONDEPES/SG
22. Ampliaciones de Plazo N° 03	:	Denegada
23. Ampliaciones de Plazo N° 04	:	Veintisiete (27) días R N° 054-2016-FONDEPES/SG
24. Ampliaciones de Plazo N° 05	:	Catorce (14) días R N° 068-2016-FONDEPES/SG
25. Ampliaciones de Plazo N° 06	:	Catorce (14) días R N° 074-2016-FONDEPES/SG
26. Ampliaciones de Plazo N° 07	:	Catorce (57) días En trámite
27. Nueva fecha de término de obra	:	21 de Julio del 2016
28. Adicionales de Obra N° 01	:	RJ N° 330-2015-FONDEPES/J (01/12/15)
29. Adicionales de Obra N° 02	:	RJ N° 002-2016-FONDEPES/J (05/01/16)
30. Adicionales de Obra N° 03	:	RJ N° 027-2016-FONDEPES/J (18/01/16)
31. Adicionales de Obra N° 04	:	RJ N° 096-2016-FONDEPES/J (30/03/16)
32. Adicionales de Obra N° 05	:	RJ N° 201-2016-FONDEPES/J (25/05/16)
33. Deductivos de Obra N° 01	:	RJ N° 330-2015-FONDEPES/J (01/12/15)
34. Deductivos de Obra N° 02	:	RJ N° 096-2016-FONDEPES/J (30/03/16)
35. Deductivos de Obra N° 03	:	RJ N° 201-2016-FONDEPES/J (25/05/16)

## II. SITUACION DE LA OBRA

### A. ASPECTOS TECNICOS

Al 31 de Mayo del 2016, la obra reporta un avance acumulado de 34.15%, correspondiente al Adicional 05, respecto a lo programado.

1. Avance Programado vigente	:	10.00%
2. Avance Ejecutado en el mes	:	34.15%
3. Avance Programado Acumulado al mes	:	10.00%
4. Avance Ejecutado Acumulado al mes	:	34.15%
5. Situación Actual de la obra	:	Adelantada

#### 6. Conclusiones y Recomendaciones

##### Conclusiones

- De la revisión y evaluación de la Valorización N° 01 Adicional N° 05, que corresponde a los trabajos realizados entre el 26/05/16 al 31/05/16, se tiene que ésta se encuentra **CONFORME**.
- El monto de la Valorización N° 01 Adicional N° 05 asciende a la suma de: **S/. 109,835.11**; que equivale al **34.15%** del monto del contrato. Por consiguiente la obra se encuentra **adelantada**.
- Por lo expuesto, ésta Supervisión de obra, **APRUEBA** y considera **PROCEDENTE** la **Valorización N° 01 Adicional N° 05** correspondiente al 31 de Mayo del 2016.

### Recomendaciones

- La Supervisión recomienda a la Entidad **tramitar** la presente, para que el Contratista efectúe el cobro correspondiente.

### B. ASPECTOS ECONÓMICOS

- |                                |   |                               |
|--------------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Valorizaciones Tramitadas   | : | 01                            |
| Valorización Nro 01. Mayo 2016 | : | S/. 129,605.43 (neto a pagar) |
| 2. Valorizaciones Pagadas      | : | Ninguna                       |

## RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN



GARY MARIO DEL CARPIO URDAY  
INGENIERO CIVIL CIP N° 10252

**RESUMEN DE LA VALORIZACION N° 01 -  
ADICIONAL N° 05**

**AL 31 DE MAYO DEL 2016**

**OBRA** : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA  
**CONTRATISTA** : CONSTRUCTORA DAVALOS SAC  
**SUPERVISION** : ING. GARY DEL CARPIO URDAY  
**RESIDENTE** : ING. MARIO DAVALOS ROJAS  
**CONTRATO** : N° 002-2015-FONDEPES/OGA  
**LICIT. PUBLICA** : N° 09-2014-FONDEPES

DESCRIPCION	MONTO CONTRATADO	VAL. ACUMUL. ANTERIOR	VALORIZACION ACTUAL	VAL. ACUMUL. ACTUAL	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
<b>ADICIONALES</b>						
ADICIONAL N° 05 - NUEVAS PARTIDAS	135,527.55	0.00	47,339.12	47,339.12	34.93%	88,188.43
ADICIONAL N° 05 - MAYORES METRADOS	186,066.15	0.00	62,495.99	62,495.99	33.59%	123,570.16
<b>TOTAL CONTRACTUAL (V)</b>	<b>321,593.70</b>	<b>0.00</b>	<b>109,835.11</b>	<b>109,835.11</b>		<b>211,758.59</b>
% DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA		<b>0.00%</b>	<b>34.15%</b>	<b>34.15%</b>	<b>34.15%</b>	<b>65.85%</b>
<b>REAJUSTES (S) (*)</b>						
ADICIONAL N° 05		0.00	0.00	0.00		
ADICIONAL N° 05 - MAYORES METRADOS						
<b>TOTAL REAJUSTES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>VALORIZACION BRUTA (VB=V+S)</b>		<b>0.00</b>	<b>109,835.11</b>	<b>109,835.11</b>		
<b>AMORTIZACIONES (A)</b>						
AMORTIZACION DEL ADEL. EFECTIVO		0.00	0.00	0.00		
AMORTIZACION DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL AMORTIZACIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>VALORIZACION NETA (VN=VB-A)</b>		<b>0.00</b>	<b>109,835.11</b>	<b>109,835.11</b>		
GASTOS DE LICITACION (L)		0.00	0.00	0.00		
MULTA PORATRASO DE OBRA (M)		0.00	0.00	0.00		
<b>MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA</b>						
EN EFECTIVO (VN-L)		0.00	109,835.11	109,835.11		
EN I.G.V. (VN*0.18)		0.00	19,770.32	19,770.32		
<b>MONTO TOTAL CON I.G.V.</b>		<b>0.00</b>	<b>129,605.43</b>	<b>129,605.43</b>		
<b>TOTAL COMPROMISO</b>		<b>0.00</b>	<b>129,605.43</b>	<b>129,605.43</b>		



MARIO DAVALOS ROJAS  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. 37143

GARY MARIO DEL CARPIO URDAY  
 INGENIERO CIVIL, CIP N° 40252

**RESUMEN DE VALORIZACION N° 01 - ADICIONAL N° 05**  
**AL 31 DE MAYO DEL 2016**  
**GENERAL**

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA

OBRA :  
 DPTO. :  
 CONTRATISTA :  
 FECHA :

AREQUIPA  
 CONSTRUCTORA DAVALOS SAC  
 31 DE MAYO DEL 2016

DISTRITO :  
 RESIDENTE :  
 SUPERVISOR :

ATICO  
 : ING. MARIO DAVALOS ROJAS  
 : ING. GARY DEL CARPIO URDAY

CÓD.	DESCRIPCIÓN	COSTO DIRECTO	VALORIZACIÓN ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR	
			PARCIAL	%	PARCIAL	%	PARCIAL	%	PARCIAL	%
1.00	ADICIONAL 05: MAYORES METRADOS	171,142.52	0.00	0.00%	57,483.43	33.59%	57,483.43	33.59%	113,659.09	66.41%
2.00	ADICIONAL 05: PARTIDAS NUEVAS	124,657.42	0.00	0.00%	43,542.24	34.93%	43,542.24	34.93%	81,115.18	65.07%
	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>295,799.94</b>	-	0.00%	<b>101,025.67</b>	<b>34.15%</b>	<b>101,025.67</b>	<b>34.15%</b>	<b>194,774.27</b>	<b>65.85%</b>
	GASTOS GENERALES 5.50%	16,269.00	0.00		5,556.41		5,556.41		10,712.58	
	UTILIDAD 3.22%	9,524.76	0.00		3,253.03		3,253.03		6,271.73	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>321,593.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>109,835.11</b>	<b>34.15%</b>	<b>109,835.11</b>	<b>34.15%</b>	<b>211,758.59</b>	<b>65.85%</b>
	COSTO TOTAL SIN I.G.V.	321,593.70	0.00		109,835.11		109,835.11		211,758.59	
	I.G.V. 18%	57,866.87	0.00		19,770.32		19,770.32		38,116.54	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>379,460.57</b>	<b>0.00</b>		<b>129,605.43</b>		<b>129,605.43</b>		<b>249,875.12</b>	



MARIO DAVALOS ROJAS  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. 37143

GARY DEL CARPIO URDAY  
 INGENIERO CIVIL CIP N° 46252



**VALORIZACION N° 01 - ADICIONAL N° 05**  
**AL 31 DE MAYO DEL 2016**  
**ADICIONAL 05 / PARTIDAS NUEVAS**

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTEISANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, PROVINCIA DE CARABELI, REGION AREQUIPA

DISTRITO : ATICO  
 RESIDENTE : ING. MARIO DAVALOS ROSAS  
 SUPERVISOR : ING. GARY DEL C. CABOTURDAY

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTEISANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, PROVINCIA DE CARABELI, REGION AREQUIPA  
 DFTO. : AREQUIPA  
 CONTRATISTA : CONSTRUCTORA DAVALOS SAC  
 FECHA : 31 DE MAYO DEL 2016

COD.	DESCRIPCION	UNID.	Metodo Adicional	P.U.	VALORIZACION ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		VALORIZACION ACUMULADA		SALDO VALORIZAR	
					Metodo	%	Metodo	%	Metodo	%	Metodo	%
01	ADICIONAL 01 POR PARTIDAS NUEVAS											
01.01	SEÑALIZACION											
01.02	OTROS			2,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,200.00
02	ESTRUCTURAS EN TIERRA											
02.01	DEBARRAS DE ZANJILLO ARMADO											
02.01.01	CONCRETO FC-10 ACIEMA TRAMPA DE SOLOS	m <sup>2</sup>	1.72	581.52	0.00	0.00%	1.72	812.28	1.72	100.00%	0.00	581.52
02.01.02	ENCORCADO Y DESCORCADO PARA TRAMPA DE SOLOS	m <sup>2</sup>	20.01	54.59	0.00	0.00%	20.01	1,286.40	20.01	100.00%	0.00	54.59
02.01.03	AGUERO DE REFLEJO P/1=200 MM TRAMPA DE SOLOS	m <sup>2</sup>	100.01	4.89	0.00	0.00%	100.01	472.27	100.01	100.00%	0.00	4.89
02.02	ESTRUCTURA DE MADERA											
02.02.01	ESTRUCTURA DE MADERA	m <sup>2</sup>	13.27	63.95	0.00	0.00%	13.27	842.19	13.27	100.00%	0.00	63.95
02.02.02	ALERO DE MADERA	m	20.25	258.74	0.00	0.00%	20.25	7,544.02	20.25	100.00%	0.00	258.74
03	INSTALACIONES ELÉCTRICAS											
03.01	TUBERIAS NUEVAS											
03.01.01	TUBERIA GENERAL DE DISTRIBUCION AUTOGORRIZADO (D)	m	1.00	5,962.20	0.00	0.00%	1.00	5,962.20	1.00	100.00%	0.00	5,962.20
03.01.02	TABLEROS DE DISTRIBUCION T4-0 (REFORMULADO)	m <sup>2</sup>	1.00	1,411.32	0.00	0.00%	1.00	1,411.32	1.00	100.00%	0.00	1,411.32
03.01.03	TABLEROS DE DISTRIBUCION T4-2 (REFORMULADO)	m <sup>2</sup>	1.00	1,956.91	0.00	0.00%	1.00	1,956.91	1.00	100.00%	0.00	1,956.91
03.01.04	TABLEROS DE DISTRIBUCION T4-3 (REFORMULADO)	m <sup>2</sup>	1.00	5,698.32	0.00	0.00%	1.00	5,698.32	1.00	100.00%	0.00	5,698.32
03.01.05	TABLEROS DE DISTRIBUCION T4-4 (REFORMULADO)	m <sup>2</sup>	1.00	1,787.22	0.00	0.00%	1.00	1,787.22	1.00	100.00%	0.00	1,787.22
03.01.06	TABLEROS DE DISTRIBUCION T4-5 (REFORMULADO)	m <sup>2</sup>	1.00	1,485.77	0.00	0.00%	1.00	1,485.77	1.00	100.00%	0.00	1,485.77
03.01.07	TABLEROS DE DISTRIBUCION T4-6 (REFORMULADO)	m <sup>2</sup>	1.00	1,003.96	0.00	0.00%	1.00	1,003.96	1.00	100.00%	0.00	1,003.96
03.01.08	TABLEROS DE DISTRIBUCION T4-7 (REFORMULADO)	m <sup>2</sup>	1.00	962.25	0.00	0.00%	1.00	962.25	1.00	100.00%	0.00	962.25
03.01.09	TABLEROS DE DISTRIBUCION T4-8 (REFORMULADO)	m <sup>2</sup>	1.00	1,095.85	0.00	0.00%	1.00	1,095.85	1.00	100.00%	0.00	1,095.85
03.01.10	TABLEROS DE DISTRIBUCION T4-9 (REFORMULADO)	m <sup>2</sup>	1.00	4,400.00	0.00	0.00%	1.00	4,400.00	1.00	100.00%	0.00	4,400.00
03.01.11	TABLEROS DE DISTRIBUCION T4-10 (REFORMULADO)	m <sup>2</sup>	1.00	1,888.52	0.00	0.00%	1.00	1,888.52	1.00	100.00%	0.00	1,888.52
03.01.12	TABLEROS DE DISTRIBUCION T4-11 (REFORMULADO)	m <sup>2</sup>	1.00	3,738.40	0.00	0.00%	1.00	3,738.40	1.00	100.00%	0.00	3,738.40
03.01.13	TABLEROS DE BOMBAS T4-12 (REFORMULADO)	m <sup>2</sup>	1.00	4,073.34	0.00	0.00%	1.00	4,073.34	1.00	100.00%	0.00	4,073.34
03.01.14	TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO T14	m <sup>2</sup>	1.00	15,861.96	0.00	0.00%	1.00	15,861.96	1.00	100.00%	0.00	15,861.96
04	INSTALACIONES SANITARIAS											
04.01	INSTALACIONES SANITARIAS											
04.01.01	EQUIPOS DE BOMBEO SISTEMAS DE DESAGUES											
04.01.01.01	TUBERIA DE IMPLANTACION DE BOMBA P/10 D=2"	m	125.50	16.27	0.00	0.00%	125.50	2,041.97	125.50	100.00%	0.00	16.27
04.01.01.02	TUBERIA DE IMPLANTACION DE BOMBA P/4 D=2"	m	40.50	20.86	0.00	0.00%	40.50	1,046.67	40.50	100.00%	0.00	20.86
04.02	SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS											
04.02.01	GRUPO TRANSFORMADOR DE 102											
04.02.01.01	SISTEMA DE AGUA SALADA											
04.02.01.01.01	SISTEMA DE AGUA SALADA	m	28.00	124.90	0.00	0.00%	28.00	3,497.12	28.00	100.00%	0.00	124.90
04.02.01.01.02	CAJETA DE SENSACION											
04.02.01.01.02.01	TUBERIA P/10 D=2"	m	1.50	27.86	0.00	0.00%	1.50	41.79	1.50	100.00%	0.00	27.86
04.02.01.01.02.02	EQUIPOS DE BOMBEO P/20 D=2"	m	0.00	20.86	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	20.86
04.02.01.01.02.03	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO D=2"	m	3.50	104.22	0.00	0.00%	3.50	364.77	3.50	100.00%	0.00	104.22
04.02.01.01.02.04	SERVICIO DE TERMOFLEXION DE TUBERIA DE PLAMA P/4-12	m <sup>2</sup>	1.00	315.00	0.00	0.00%	1.00	315.00	1.00	100.00%	0.00	315.00
04.02.01.01.02.05	EQUIPO DE BOMBEO											
04.02.01.01.02.05.01	EQUIPO DE BOMBEO	m	1.00	41.49	0.00	0.00%	1.00	41.49	1.00	100.00%	0.00	41.49
04.02.01.01.02.05.02	EQUIPO DE BOMBEO	m	1.00	336.15	0.00	0.00%	1.00	336.15	1.00	100.00%	0.00	336.15
04.02.01.01.02.05.03	EQUIPO DE BOMBEO	m	1.00	354.77	0.00	0.00%	1.00	354.77	1.00	100.00%	0.00	354.77
04.02.01.01.02.05.04	EQUIPO DE BOMBEO	m	1.00	315.00	0.00	0.00%	1.00	315.00	1.00	100.00%	0.00	315.00




**VALORIZACION N° 01 - ADICIONAL N° 05**  
**AL 31 DE MAYO DEL 2016**  
**ADICIONAL 05 / PARTIDAS NUEVAS**

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, PROVINCIA DE CARANVELI, REGION AREQUIPA  
 ING. GARY DEL CAMPIO URDAY  
 RESIDENTE SUPERVISOR

CONTRATISTA : ATRIO  
 CENINHO  
 CONSTRUCTORA DAVALOS SAC  
 ING. MARIO DAVALOS ROJAS  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. 37143

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	Metrado Adicional	P.U.	PARCIAL	VALORIZACION ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA			SALDO VALORIZAR		
						Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%
04.01.02.01	SUME INST DE ELECTROSCOMBIA AUTOCESANTE 24x12 HP 10T = 22	pie	2.00	4,327.46	8,654.92	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	8,654.92	100.00%
04.01.01.01	TRAMO ENTERRADO	m	119.00	59.32	6,959.04	0.00	0.00	0.00%	46.00	2,627.80	38.11%	46.00	2,627.80	38.11%	72.20	3,431.24	54.27%
04.01.01.02	TUBERIA PVC 2" D = 4"	pie	8.00	35.36	282.88	0.00	0.00	0.00%	2.00	71.72	33.33%	2.00	71.72	33.33%	4.20	141.44	58.67%
04.04.01.03	CODO PVC 2" D = 4"	pie	2.00	45.20	90.40	0.00	0.00	0.00%	1.00	45.20	50.00%	1.00	45.20	50.00%	1.20	54.24	60.00%
04.04.01.02	TUBERIA PVC 1" D = 4"	pie	4.00	109.55	438.20	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.20	462.20	100.00%
04.05.01.01	EMPUJE DE BOMBEEO	und	2.00	8,528.89	17,057.78	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	17,057.78	100.00%
04.05.01.02	SUME INST DE ELECTROSCOMBIA AUTOCESANTE 11.5 HP 10T = 43	und	1.00	191.04	191.04	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.20	38.21	100.00%
04.05.01.03	EQUIPO DE AGUA POTABLE - ESTERILIZADOR INVERSA	m	38.00	5.87	223.06	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	11.74	100.00%
04.05.01.04	CODO PVC 4" D = 3"	pie	2.00	15.64	31.28	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	31.28	100.00%
					124,657.42		0.00%			43,142.24	34.63%		43,142.24	34.63%		91,151.13	85.07%
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>124,657.42</b>					<b>43,142.24</b>			<b>43,142.24</b>			<b>91,151.13</b>	
<b>COSTOS GENERALES</b>					<b>6,856.15</b>					<b>2,384.82</b>			<b>2,384.82</b>			<b>4,461.33</b>	
<b>UTILIDAD</b>					<b>4,018.87</b>					<b>1,402.05</b>			<b>1,402.05</b>			<b>2,811.91</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>135,532.44</b>					<b>47,339.12</b>			<b>47,339.12</b>			<b>88,188.42</b>	
<b>COSTO TOTAL SIN I.G.V.</b>					<b>135,532.44</b>					<b>47,339.12</b>			<b>47,339.12</b>			<b>88,188.42</b>	
<b>IMPUESTO</b>					<b>24,394.96</b>					<b>8,521.34</b>			<b>8,521.34</b>			<b>15,873.62</b>	
<b>TOTAL PREPUESTO</b>					<b>160,022.81</b>					<b>55,860.46</b>			<b>55,860.46</b>			<b>104,092.34</b>	




GARY MARIO DEL CAMPIO URDAY  
 INGENIERO CIVIL CIP N° 46252

# VALORIZACION N° 01

## CONTROL GRAFICO DE VALORIZACIONES (CURVAS S)

<p><b>OBRA</b></p> <p>ENTIDAD</p> <p>CONTRATISTA</p> <p>SUPERVISIÓN</p> <p>RESIDENTE DE OBRA</p> <p>LICITAC. PUBLICA</p>	<p><b>MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA</b></p> <p>: FONDEPES</p> <p>: CONSTRUCTORA DAVALOS SAC</p> <p>: ING. GARY DEL CARPIO URDAY</p> <p>: ING. MARIO DAVALOS ROJAS</p> <p>: N° 09-2014-FONDEPES</p>
--	---

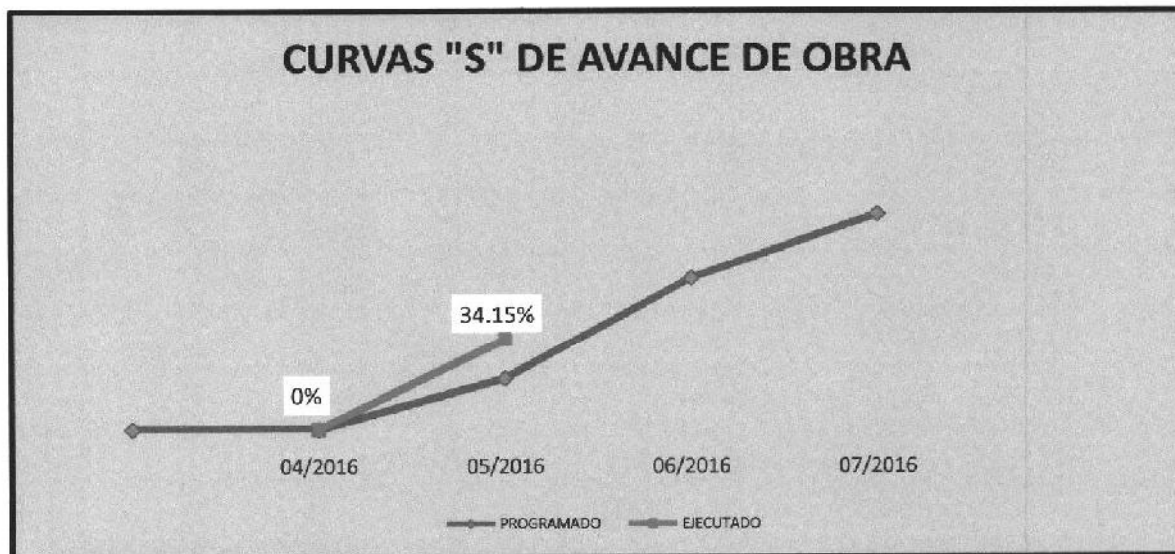

AVANCE DE OBRA (montos sin IGV)							SITUACIÓN DE LA OBRA
PERIODO	PROGRAMADO			EJECUTADO			
	PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO		
	S/.	S/.	%	S/.	S/.	%	
30-abr-16	-	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	ADELANTADA
31-may-16	61,575.98	61,575.98	23.25%	109,835.11	109,835.11	34.15%	ADELANTADA
30-jun-16	125,278.22	186,854.20	70.56%	0.00	109,835.11		
21-jul-16	77,976.27	264,830.47	100.00%	0.00	109,835.11		

  
 MARIO DAVALOS ROJAS  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. 37143

  
 GARY MARIO DEL CARPIO URDAY  
 INGENIERO CIVIL, C.I.P. N° 40252
