

Arequipa, 04 de Julio del 2,016

**Carta N° 41-2016-GMC**

**ING. JORGE MEDINA ROSELL**

Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola  
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Presente.-



ASUNTO : REMITO VALORIZACIÓN N° 02 DEL ADICIONAL N° 05

ATENCIÓN : ING. RAQUEL GUERRA SANTA CRUZ

REFERENCIA : CONTRATO N° 002-2015-FONDEPES  
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL  
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO,  
DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA".

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de de remitirle la Valorización N° 02 del Adicional N° 05 de la obra indicada en la referencia, correspondiente al mes de JUNIO del presente año, cuya ejecución está a cargo de la Constructora Dávalos SAC.

Cabe señalar que se han verificado los Metrados ejecutados a la fecha indicada, conforme a lo establecido por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES.

Sin otro particular, quedo de usted.

  
ING. GARY DEL CARPIO URDAY  
CIP N° 40252

C.c. Constructora Dávalos SAC  
GMC/p  
REG-SAL-41-16-GS

## **FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**



**Fondo Nacional  
de Desarrollo Pesquero**

**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO  
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO,  
DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN  
AREQUIPA\*.**

**VALORIZACION N° 02 ADICIONAL N° 05**



**ING. GARY MARIO DEL CARPIO URDAY**  
Calle Leoncio Martell N° 129 Urb. Guardia Civil  
Paucarpata, Arequipa  
Teléfono: 95-9690181 RPM \*539112  
e-mail: garydelc@yahoo.com.ar

**JUNIO 2016**



**GARY MARIO DEL CARPIO URDAY**  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 4025.

## I. DATOS GENERALES

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. Contrato de Obra                     | : | N° 002-2015-FONDEPES                               |
| Fecha de suscripción                    | : | 17 de Febrero del 2015                             |
| 2. Contratista de Obra                  | : | Constructora Dávalos SAC                           |
| 3. Monto del Contrato de la Obra        | : | S/. 7'145,130.75 Nuevos Soles (Incluye IGV)        |
| 4. Valor Referencial de la Obra         | : | S/. 7'939,034.16 Nuevos Soles (Incluye IGV)        |
| 5. Modalidad                            | : | Precios Unitarios                                  |
| 6. Residente de Obra                    | : | Ing. Mario Dávalos Rojas                           |
| 7. Supervisor de Obra                   | : | ING. GARY DEL CARPIO URDAY                         |
| 8. Contrato de Supervisión de Obra      | : | N° 007-2015-FONDEPES/OGA                           |
| Fecha de suscripción                    | : | 14 de Abril del 2015                               |
| 9. Monto del Contrato de Supervisión    | : | S/. 283,543.20 Nuevos Soles                        |
| 10. Fecha de entrega de terreno         | : | 27 de Abril del 2015                               |
| 11. Fecha de cobro adelanto directo     | : | 27 de Marzo del 2015                               |
| 12. Monto de Adelanto Directo (con IGV) | : | 1'429,026.15 (Incluye IGV)                         |
| 13. Fecha de adelanto de materiales     | : | 16 de Junio del 2015                               |
| 14. Fecha de inicio de obra contractual | : | 28 de Abril del 2015                               |
| 15. Plazo de Ejecución                  | : | 240 días calendarios                               |
| 16. Fecha de término contractual        | : | 23 de Diciembre del 2015                           |
| 17. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento   | : | N° 010475028000                                    |
| Monto                                   | : | S/. 357,257.00 Nuevos Soles                        |
| Entidad Financiera                      | : | Banco Scotiabank                                   |
| Vigencia                                | : | 17 de Diciembre del 2015 (Renovada)                |
| Carta Fianza de Fiel Cumplimiento       | : | N° D215-00170132                                   |
| Monto                                   | : | S/. 357,256.54 Nuevos Soles                        |
| Entidad Financiera                      | : | Banco de Crédito                                   |
| Vigencia                                | : | 9 de Diciembre del 2015 (Renovada)                 |
| 18. Ampliaciones de Plazo N° 01         | : | Tres (03) días R N° 145-2015-FONDEPES/SG           |
| 19. Ampliaciones de Plazo N° 02         | : | Noventa y tres (96) días R N° 206-2015-FONDEPES/SG |
| 20. Ampliaciones de Plazo N° 04         | : | Veintisiete (27) días R N° 054-2016-FONDEPES/SG    |
| 21. Ampliaciones de Plazo N° 05         | : | Catorce (14) días R N° 068-2016-FONDEPES/SG        |
| 22. Ampliaciones de Plazo N° 06         | : | Catorce (14) días R N° 074-2016-FONDEPES/SG        |
| 23. Ampliaciones de Plazo N° 07         | : | Cincuentisiete (57) días R N° 084-2016-FONDEPES/SG |
| 24. Nueva fecha de término de obra      | : | 21 de Julio del 2016                               |
| 25. Fecha de culminación real           | : | 21 de Junio 2016                                   |
| 26. Adicionales de Obra N° 01           | : | RJ N° 330-2015-FONDEPES/J (01/12/15)               |
| 27. Adicionales de Obra N° 02           | : | RJ N° 002-2016-FONDEPES/J (05/01/16)               |
| 28. Adicionales de Obra N° 03           | : | RJ N° 027-2016-FONDEPES/J (18/01/16)               |



ING. GARY DEL CARPIO URDAY

29. Adicionales de Obra N° 04	:	RJ N° 096-2016-FONDEPES/J (30/03/16)
30. Adicionales de Obra N° 05	:	RJ N° 2016-2016-FONDEPES/J (25/05/16)
31. Deductivos de Obra N° 01	:	RJ N° 330-2015-FONDEPES/J (01/12/15)
32. Deductivos de Obra N° 02	:	RJ N° 096-2016-FONDEPES/J (30/03/16)
33. Deductivos de Obra N° 03	:	RJ N° 2016-2016-FONDEPES/J (25/05/16)

## II. SITUACION DE LA OBRA

### A. ASPECTOS TECNICOS

Al 21 de Junio del 2016, la obra reporta un avance acumulado de 100.00%, correspondiente al Adicional 05, respecto a lo programado.

➤ **ADICIONAL N° 05 POR PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS**, con un avance acumulado de 100.00%

1. Avance Programado vigente	:	47.31%
2. Avance Ejecutado en el mes	:	65.85%
3. Avance Programado Acumulado al mes	:	70.56%
4. Avance Ejecutado Acumulado al mes	:	100.00%
5. Situación Actual de la obra	:	Culminada

### 6. Conclusiones y Recomendaciones

#### Conclusiones

- De la revisión y evaluación de la Valorización N° 02 Adicional N° 05, que corresponde a los trabajos realizados entre el 01/06/16 al 21/06/16, se tiene que ésta se encuentra **CONFORME**.
- El monto de la Valorización N° 02 Adicional N° 05 asciende a la suma de: **S/. 249,875.15**; que equivale al 100.00% del monto del contrato. Por consiguiente la obra se encuentra **Culminada**
- Por lo expuesto, ésta Supervisión de obra, **APRUEBA** y considera **PROCEDENTE** la **Valorización N° 02 Adicional N° 05** correspondiente al 21 de Junio del 2016.

#### Recomendaciones

- La Supervisión recomienda a la Entidad **tramitar** la presente, para que el Contratista efectúe el cobro correspondiente.

### B. ASPECTOS ECONÓMICOS

1. Valorizaciones Tramitadas	:	01
Valorización Nro 01. Mayo 2015	:	S/. 129,605.42 (neto a pagar)
Valorización Nro 02. Junio 2015	:	S/. 249,875.15 (neto a pagar)
2. Valorizaciones Pagadas	:	Ninguna

  
GARY MARIO DEL CARPIO URDAY  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 4025

## RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN

**RESUMEN DE LA VALORIZACION N° 02 -  
ADICIONAL N° 05**

**AL 21 DE JUNIO DEL 2016**

**OBRA**

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO  
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, PROVINCIA  
DE CARAVELI, REGION AREQUIPA"

**CONTRATISTA** : CONSTRUCTORA DAVALOS SAC  
**SUPERVISION** : ING. GARY DEL CARPIO URDAY  
**RESIDENTE** : ING. MARIO DAVALOS ROJAS  
**CONTRATO** : N° 002-2015-FONDEPESOGA  
**LICIT. PUBLICA** : N° 09-2014-FONDEPES

DESCRIPCION	MONTO CONTRATADO	VAL. ACUMUL. ANTERIOR	VALORIZACION ACTUAL	VAL. ACUMUL. ACTUAL	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
<b>ADICIONALES</b>						
ADICIONAL N° 05 - NUEVAS PARTIDAS	135,527.55	47,339.11	86,188.44	135,527.55	100.00%	0.00
ADICIONAL N° 05 - MAYORES METRADOS	196,066.15	62,495.99	123,570.16	196,066.15	100.00%	0.00
<b>TOTAL CONTRACTUAL (V)</b>	<b>321,593.70</b>	<b>109,835.10</b>	<b>211,758.60</b>	<b>321,593.70</b>		<b>0.00</b>
% DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA		<b>34.15%</b>	<b>65.85%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>REAJUSTES (S) (*)</b>						
ADICIONAL N° 05		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
ADICIONAL N° 05 - MAYORES METRADOS						
TOTAL REAJUSTES		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>VALORIZACION BRUTA (VB=V+S)</b>		<b>109,835.10</b>	<b>211,758.60</b>	<b>321,593.70</b>		
<b>AMORTIZACIONES (A)</b>						
AMORTIZACION DEL ADEL. EFECTIVO		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
AMORTIZACION DE MATERIALES		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL AMORTIZACIONES		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>VALORIZACION NETA (VN=VB-A)</b>		<b>109,835.10</b>	<b>211,758.60</b>	<b>321,593.70</b>		
GASTOS DE LICITACION (L)		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
MULTA PORTRASO DE OBRA (M)		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA</b>						
EN EFECTIVO (VN-L)		<b>109,835.10</b>	<b>211,758.60</b>	<b>321,593.70</b>		
EN I.G.V. (VN*0.18)		<b>19,770.32</b>	<b>38,116.55</b>	<b>57,886.67</b>		
MONTO TOTAL CON I.G.V.		<b>129,605.42</b>	<b>249,875.15</b>	<b>379,480.37</b>		
<b>TOTAL COMPROMISO</b>		<b>129,605.42</b>	<b>249,875.15</b>	<b>379,480.37</b>		



MARIO CESAR DAVALOS ROJAS  
INGENIERO CIVIL  
C.I.P. 37143

GARY MARIO DEL CARPIO URDAY  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 4025.

## VALORIZACIÓN DE LA OBRA

**VALORIZACION N° 02 - ADICIONAL N° 05**  
**AL 21 DE JUNIO DEL 2016**  
**ADICIONAL 05 / PARTIDAS NUEVAS**

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELLI, REGION AREQUIPA"

CORREA : AREQUIPA DISTRITO : ATICO  
 DFTO. : INGENIERO MARIO DAVALOS ROJAS  
 CONTRATISTA : CONSTRUCTORA DAVALOS SAC RESIDENTE : ING. MARIO DAVALOS ROJAS  
 FECHA : 21 DE JUNIO DEL 2016 SUPERVISOR : ING. GARY DEL CARRO URDAY

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UNID.	Mezcla Adicional	P.U.	PARCIAL		VALORIZACION ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		VALORIZACION ACUMULADA		SALDO VALORIZAR	
					Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%
01	ADICIONAL 01 POR PARTIDAS NUEVAS													
01.01	ARQUITECTURA													
01.02	OTROS													
01.02.01	ESCALERA DE GATO	q		2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,200.00	100.00%	2,200.00	100.00%	0.00
02	ESTRUCTURAS EN TIERRA													
02.01	OBRAS DE CONCRETO ARMADO													
02.01.01	TRAMPA DE BOLSILLOS	m		512.38	1.78	972.38	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	972.38	100.00%	0.00
02.01.01.01	CONCRETO FC-210 VIGAS TRAMPA DE BOLSILLOS	m <sup>2</sup>		64.39	20.01	1,268.45	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1,268.45	100.00%	0.00
02.01.01.02	ENCORADO Y DESENCORADO PARA TRAMPA DE BOLSILLOS	m <sup>2</sup>		64.39	20.01	1,268.45	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1,268.45	100.00%	0.00
02.01.01.03	ACERO DE REFUERZO 1/4" x 200mm2 TRAMPA DE BOLSILLOS	kg		4.68	100.81	472.28	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	472.28	100.00%	0.00
02.02	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TERCIO													
02.02.01	ESTRUCTURA DE MADERA	m <sup>2</sup>		181.27	80.03	14,501.97	0.00	0.00%	131.27	10,940.57	100.00%	10,940.57	100.00%	0.00
02.02.02	ALERO DE MADERA	m		28.35	288.14	7,954.02	0.00	0.00%	28.35	7,954.02	100.00%	7,954.02	100.00%	0.00
03	INSTALACIONES ELÉCTRICAS													
03.01	TABLEROS NUEVOS													
03.01.01	TAB. ERO GENERAL DE DISTRIBUCION AUTOCORRIJIDO TDS	und		5,365.23	1.00	5,365.23	0.00	0.00%	0.40	2,146.48	40.00%	5,365.23	100.00%	0.00
03.01.02	TAB. ERO DE DISTRIBUCION TA-01 (REFORMULADO)	und		1,411.32	1.00	1,411.32	0.00	0.00%	0.40	564.53	40.00%	1,411.32	100.00%	0.00
03.01.03	TAB. ERO DE DISTRIBUCION TA-02 (REFORMULADO)	und		1,986.81	1.00	1,986.81	0.00	0.00%	0.40	788.72	40.00%	1,986.81	100.00%	0.00
03.01.04	TAB. ERO DE DISTRIBUCION TA-03 (REFORMULADO)	und		9,085.38	0.89	9,085.38	0.00	0.00%	0.40	3,582.52	40.00%	9,085.38	100.00%	0.00
03.01.05	TAB. ERO DE DISTRIBUCION TA-04 (REFORMULADO)	und		1,767.52	1.00	1,767.52	0.00	0.00%	0.40	713.01	40.00%	1,767.52	100.00%	0.00
03.01.06	TAB. ERO DE DISTRIBUCION TA-05 (REFORMULADO)	und		1,455.77	0.89	1,455.77	0.00	0.00%	0.40	582.31	40.00%	1,455.77	100.00%	0.00
03.01.07	TAB. ERO DE DISTRIBUCION STA-01-1 (REFORMULADO)	und		1,004.89	1.00	1,004.89	0.00	0.00%	0.40	402.00	40.00%	1,004.89	100.00%	0.00
03.01.08	TAB. ERO DE DISTRIBUCION STA-01-2 (REFORMULADO)	und		865.23	1.00	865.23	0.00	0.00%	0.40	368.10	40.00%	865.23	100.00%	0.00
03.01.09	TAB. ERO DE DISTRIBUCION STA-02 (REFORMULADO)	und		1,058.65	1.00	1,058.65	0.00	0.00%	0.40	423.48	40.00%	1,058.65	100.00%	0.00
03.01.10	TAB. ERO DE DISTRIBUCION STA-04-1 (REFORMULADO)	und		8,438.09	1.00	8,438.09	0.00	0.00%	0.40	3,383.90	40.00%	8,438.09	100.00%	0.00
03.01.11	TAB. ERO DE DISTRIBUCION STA-04-2 (REFORMULADO)	und		1,886.52	1.00	1,886.52	0.00	0.00%	0.40	874.61	40.00%	1,886.52	100.00%	0.00
03.01.12	TAB. ERO DE DISTRIBUCION STA-04-3 (REFORMULADO)	und		3,735.40	0.89	3,735.40	0.00	0.00%	0.40	1,485.08	40.00%	3,735.40	100.00%	0.00
03.01.13	TAB. ERO DE BIOMAS TDS-01	und		2,081.24	1.00	2,081.24	0.00	0.00%	0.40	812.50	40.00%	2,081.24	100.00%	0.00
03.01.14	TAB. ERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO TTA	und		18,861.98	0.60	18,861.98	0.00	0.00%	0.40	7,560.79	40.00%	18,861.98	100.00%	0.00
04	INSTALACIONES SANITARIAS													
04.01	INSTALACIONES SANITARIAS													
04.01.01	EQUIPOS DE BOMBEO SISTEMA DE REGAJES													
04.01.01.01	TUBERIA DE MP. L. SION DE DESAGUE PVC-C-100x2'	m		15.31	25.89	2,227.91	0.00	15.02%	100.00	1,940.16	80.00%	2,227.91	100.00%	0.00
04.01.01.02	TUBERIA DE MP. L. SION DE DESAGUE PVC-C-100x3'	m		24.66	20.00	1,066.81	0.00	45.98%	23.80	965.41	54.02%	1,066.81	100.00%	0.00
04.02	SISTEMAS DE ARIARILLA													
04.02.01	GRIFOS PARA INVERNAJOS													
04.02.01.01	GRIFO TEMPORIZADO DE 10"	und		124.83	15.00	1,872.50	0.00	51.72%	14.00	1,748.60	48.28%	1,872.50	100.00%	0.00
04.03	SISTEMAS DE ARIARILLA													
04.03.01	CABERA DE CANTONAO	m		27.88	0.80	41.49	0.00	0.00%	1.00	41.49	100.00%	41.49	100.00%	0.00
04.03.01.01	TUBERIA PVC 15 D = 3"	m		25.86	0.80	59.16	0.00	0.00%	13.00	335.18	100.00%	335.18	100.00%	0.00
04.03.01.02	SUMINISTRO DE TUBERIA LUBRO PVC-C-100 D=10 MM (7) P=1	m		104.22	0.60	86,177	0.00	0.00%	3.00	36,177	100.00%	86,177	100.00%	0.00
04.03.01.03	TUBO DE FIBRO 200MMX200 D = 6"	m		315.02	0.40	315.02	0.00	0.00%	1.00	315.02	100.00%	315.02	100.00%	0.00
04.03.01.04	SERVICIO DE TRABAJO DE TUBERIAS DE 60 MM P=10	gb		-	-	-	0.00	0.00%	2.00	9,854.82	100.00%	9,854.82	100.00%	0.00
04.03.02	EQUIPO DE BOMBEO													
04.03.02.01	SUMINISTRO DE ELECTROMOTOR AUTOCORRIJENTE P=1.5 HP, ADT=22"	und		4,841.48	0.80	9,854.82	0.00	0.00%	2.00	9,854.82	100.00%	9,854.82	100.00%	0.00



MARIO CESAR DAVALOS ROJAS  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. 37143

GARY MATO DEL CARRO URDAY  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 4075



**VALORIZACION N° 02 - ADICIONAL N° 05  
AL 21 DE JUNIO DEL 2016  
ADICIONAL 05 / PARTIDAS NUEVAS**

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESMARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVALLI, REGION AREQUIPA"

OBRA : AREQUIPA  
DISTRITO : ATICO  
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA DAVALOS SAC  
RESIDENTE : ING. MARIO DAVALOS ROJAS  
FECHA : 21 DE JUNIO DEL 2016  
SUPERVISOR : ING. GARY DEL CARMO URAY

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UNID.	Metrado Adicional	P.U.	VALORIZACION ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		VALORIZACION ACUMULADA		SALDO VALORIZAR				
					Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%	
0404	CONEXION SISTEMA CONTRA INCENDIO	-	-	-	40.00	2,026.80	38.71%	72.00	3,537.44	64.29%	112.00	5,564.24	100.00%	0.00	0.00%
04.04.01	TUBERIA PVC C-15 D=4"	m	112.00	56.33	2.00	70.73	31.33%	4.00	141.44	66.67%	6.00	212.88	100.00%	0.00	0.00%
04.04.02	CODO PVC C-15 D=4"	und	8.00	35.36	1.00	45.20	56.50%	1.00	45.20	50.00%	2.00	90.40	100.00%	0.00	0.00%
04.04.03	TEE PVC C-15 D=4"	und	2.00	45.20	0.00	0.00	0.00%	4.00	180.80	100.00%	4.00	180.80	100.00%	0.00	0.00%
04.04.04	CONEXION SISTEMA CONTRA INCENDIO	-	-	-	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
04.04.05	WAGON PRESSER -#	und	4.00	126.85	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
04.05	EMBICOR	-	-	-	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
04.05.01	EMPUJOS DE DOMINIO	-	-	-	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
04.05.02	SUM. C. INST. DE ELECTROBOMBA AUTOCARGANTE P=115 HP, AUT=45L	und	2.00	8,526.66	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
04.06	EQUIPO DE AGUA POTABLE - SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA	-	-	-	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
04.06.01	TUBERIA PVC C-15 D=3W"	m	32.00	5.97	0.00	0.00	0.00%	32.00	191.04	100.00%	32.00	191.04	100.00%	0.00	0.00%
04.06.02	CODO PVC C-15 D=3W"	und	2.00	8.02	0.00	0.00	0.00%	2.00	16.04	100.00%	2.00	16.04	100.00%	0.00	0.00%
					124,857.42	43,542.23	34.89%	81,115.19	65.07%	124,857.42	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>COSTO DIRECTO</b>				124,857.42	43,542.23		81,115.19		124,857.42		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>GASTOS GENERALES</b>	5.20%			6,496.16	2,264.82		4,481.34		6,496.16		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>UTILIDAD</b>	3.22%			4,013.97	1,422.26		2,911.51		4,013.97		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>SUB TOTAL</b>				135,327.55	47,229.31		88,186.44		135,327.55		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>COSTO TOTAL SIN I.G.V.</b>				135,327.55	47,229.31		88,186.44		135,327.55		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>IMPUESTO</b>	10%			24,334.96	8,051.04		15,873.92		24,334.96		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				159,662.51	55,280.35		104,060.36		159,662.51		0.00	0.00%	0.00	0.00%




MARIO CESAR DAVALOS ROJAS  
INGENIERO CIVIL  
C.I.P. 37143

GARY MARIO DEL CARMO URAY  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 4025

# VALORIZACION N° 02 DEL ADICIONAL N° 05

## CONTROL GRAFICO DE VALORIZACIONES (CURVAS S)

<p>OBRA</p> <p>ENTIDAD</p> <p>CONTRATISTA</p> <p>SUPERVISIÓN</p> <p>RESIDENTE DE OBRA</p> <p>LICITAC. PUBLICA</p>	<p>MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA</p> <p>: FONDEPES</p> <p>: CONSTRUCTORA DAVALOS SAC</p> <p>: ING. GARY DEL CARPIO URDAY</p> <p>: ING. MARIO DAVALOS ROJAS</p> <p>: N° 09-2014-FONDEPES</p>
---	--

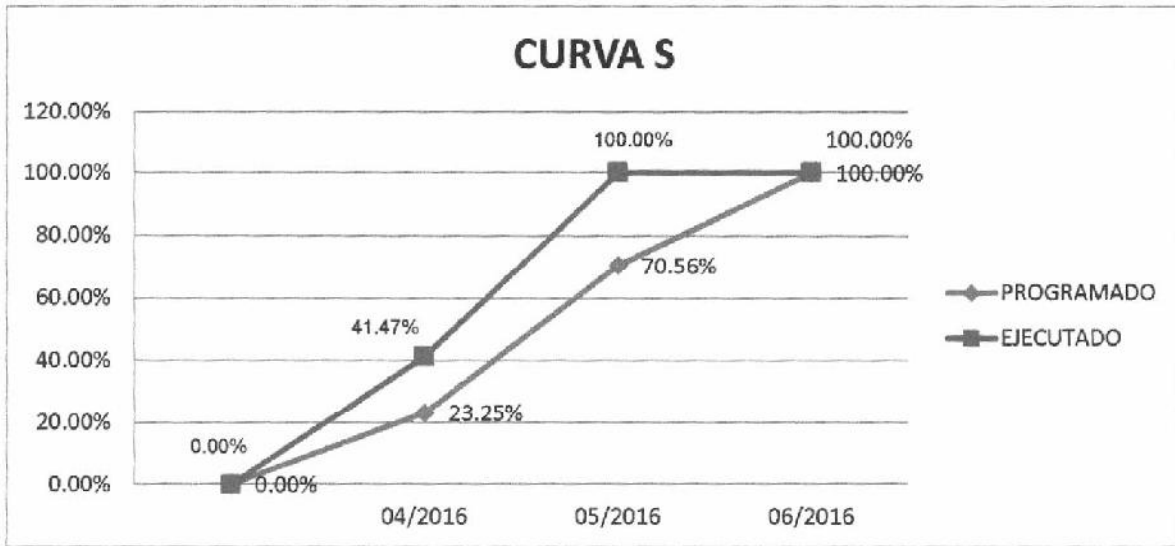

AVANCE DE OBRA (montos sin IGV)							SITUACIÓN DE LA OBRA
PERIODO	PROGRAMADO			EJECUTADO			
	PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO		
	S/.	S/.	%	S/.	S/.	%	
30-abr-16	-	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	ADELANTADA
31-may-16		61,575.98	23.25%	109,835.11	109,835.11	41.47%	ADELANTADA
30-jun-16	125,278.22	186,854.20	70.56%	154,995.36	264,830.47	100.00%	CULMINADA
21-jul-16	77,976.27	264,830.47	100.00%	0.00	264,830.47	100.00%	CULMINADA



**MARIO CESAR DAVALOS ROJAS**  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. 37143

**GARY MARIO DEL CARPIO URDAY\***  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 4025.
