

Arequipa, 02 de Mayo del 2016

Carta N° 29-2016-GMC

Señores
FONDEPES
DIGENIPAA
Presente.-

FONDEPES RECEPCIÓN	
Fecha: Por:	02 MAYO 2016
Hora:	N° Registro:
12:37	2130

NO IMPLETA CONFORMIDAD
NI ACEPTACIÓN

ASUNTO : REMITO VALORIZACIÓN N° 13 – MES DE ABRIL 2016

ATENCIÓN : ING. RAQUEL GUERRA SANTA CRUZ


REFERENCIA : CONTRATO N° 002-2015-FONDEPES
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO,
DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA".

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de de remitirle la Valorización N° 13 de la obra indicada en la referencia, correspondiente al mes de ABRIL del presente año, cuya ejecución está a cargo de la Constructora Dávalos SAC.

Cabe señalar que se han verificado los Metrados ejecutados a la fecha indicada, conforme a lo establecido por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES.

Sin otro particular, quedo de usted.


ING. GARY DEL CARPIO URDAY
CIP N° 40252

C.c. Constructora Dávalos SAC
GMC/lp
REG-SAL-29-16-GS

FONDEPES DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIÓN PESQUERA	
02 MAYO 2016	
RECIBIDO	
N° Registro:	Hora:
	16:49

I. DATOS GENERALES

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Contrato de Obra | : | N° 002-2015-FONDEPES |
| Fecha de suscripción | : | 17 de Febrero del 2015 |
| 2. Contratista de Obra | : | Constructora Dávalos SAC |
| 3. Monto del Contrato de la Obra | : | S/. 7'145,130.75 Nuevos Soles (Incluye IGV) |
| 4. Valor Referencial de la Obra | : | S/. 7'939,034.16 Nuevos Soles (Incluye IGV) |
| 5. Modalidad | : | Precios Unitarios |
| 6. Residente de Obra | : | Ing. Mario Dávalos Rojas |
| 7. Supervisor de Obra | : | ING. GARY DEL CARPIO URDAY |
| 8. Contrato de Supervisión de Obra | : | N° 007-2015-FONDEPES/OGA |
| Fecha de suscripción | : | 14 de Abril del 2015 |
| 9. Monto del Contrato de Supervisión | : | S/. 283,543.20 Nuevos Soles |
| 10. Fecha de entrega de terreno | : | 27 de Abril del 2015 |
| 11. Fecha de cobro adelanto directo | : | 27 de Marzo del 2015 |
| 12. Monto de Adelanto Directo (con IGV) | : | 1'429,026.15 (Incluye IGV) |
| 13. Fecha de adelanto de materiales | : | 16 de Junio del 2015 |
| 14. Fecha de inicio de obra contractual | : | 28 de Abril del 2015 |
| 15. Plazo de Ejecución | : | 240 días calendarios |
| 16. Fecha de término contractual | : | 23 de Diciembre del 2015 |
| 17. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento | : | N° 010475028000 |
| Monto | : | S/. 357,257.00 Nuevos Soles |
| Entidad Financiera | : | Banco Scotiabank |
| Vigencia | : | 17 de Diciembre del 2015 (Renovada) |
| Carta Fianza de Fiel Cumplimiento | : | N° D215-00170132 |
| Monto | : | S/. 357,256.54 Nuevos Soles |
| Entidad Financiera | : | Banco de Crédito |
| Vigencia | : | 9 de Diciembre del 2015 (Renovada) |
| 18. Ampliaciones de Plazo N° 01 | : | Tres (03) días R N° 145-2015-FONDEPES/SG |
| 19. Ampliaciones de Plazo N° 02 | : | Noventa y tres (96) días R N° 206-2015-FONDEPES/SG |
| 20. Ampliaciones de Plazo N° 04 | : | Veintisiete (27) días R N° 054-2016-FONDEPES/SG |
| 21. Nueva fecha de término de obra | : | 27 de Abril del 2016 |
| 22. Adicionales de Obra N° 01 | : | RJ N° 330-2015-FONDEPES/J (01/12/15) |
| 23. Adicionales de Obra N° 02 | : | RJ N° 002-2016-FONDEPES/J (05/01/16) |
| 24. Adicionales de Obra N° 03 | : | RJ N° 027-2016-FONDEPES/J (18/01/16) |
| 25. Adicionales de Obra N° 04 | : | RJ N° 096-2016-FONDEPES/J (30/03/16) |
| 26. Deductivos de Obra N° 01 | : | RJ N° 330-2015-FONDEPES/J (01/12/15) |
| 27. Deductivos de Obra N° 02 | : | RJ N° 096-2016-FONDEPES/J (30/03/16) |

RESUMEN DE LA VALORIZACION N° 13

AL 30 DE ABRIL DEL 2016

OBRA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA DAVALOS SAC
SUPERVISION : ING. GARY DEL CARPIO URDAY
RESIDENTE : ING. MARIO DAVALOS ROJAS
CONTRATO : N° 002-2015-FONDEPES/OGA
LICIT. PUBLICA : N° 09-2014-FONDEPES

DESCRIPCION	MONTO CONTRATADO	VAL. ACUMUL. ANTERIOR	VALORIZACION ACTUAL	VAL. ACUMUL. ACTUAL	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
VALORIZACION CONTRACTUAL						
FORMULA N° 01 - ARQUITECTURA	581,860.11	458,140.57	58,387.49	516,528.06	88.77%	65,332.05
FORMULA N° 02 - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	692,705.13	588,644.87	103,568.87	692,313.74	99.94%	391.39
FORMULA N° 03 - ESTRUCTURAS PORTUARIAS Y REH ENROCADO	2,462,244.57	249,377.73	22,361.21	271,738.94	11.04%	2,190,505.63
FORMULA N° 04 - ESTRUCTURAS DE TIERRA	963,189.70	851,947.28	12,879.12	864,826.40	89.79%	98,363.30
FORMULA N° 05 - INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES	242,186.33	139,909.68	67,099.28	207,008.97	85.48%	35,177.36
FORMULA N° 06 - INSTALACIONES SANITARIAS	1,054,947.92	941,330.78	53,761.43	995,092.21	94.34%	59,755.71
FORMULA N° 07 - IMPACTO AMBIENTAL	58,151.78	34,147.41	24,014.35	58,151.78	100.00%	0.00
TOTAL CONTRACTUAL (V)	6,055,195.54	3,263,498.33	342,171.75	3,605,670.10		2,449,525.44
% DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA		53.90%	5.65%	58.55%	59.55%	40.45%
REAJUSTES (S)						
FORMULA N° 01 - ARQUITECTURA		20,328.05	3,494.69	23,822.74		
FORMULA N° 02 - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO		74,818.41	16,337.90	91,155.31		
FORMULA N° 03 - ESTRUCTURAS PORTUARIAS Y REH ENROCADO		-71,312.12	1,950.56	-69,351.56		
FORMULA N° 04 - ESTRUCTURAS DE TIERRA		44,279.86	609.43	44,889.09		
FORMULA N° 05 - INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES		13,430.78	6,243.12	19,673.90		
FORMULA N° 06 - INSTALACIONES SANITARIAS		83,391.98	4,973.86	88,365.84		
FORMULA N° 07 - IMPACTO AMBIENTAL		1,751.51	1,697.95	3,449.46		
TOTAL REAJUSTES		165,688.27	35,317.51	202,005.78		
VALORIZACION BRUTA (VB=V+S)		3,430,186.60	377,489.26	3,807,675.88		
AMORTIZACIONES (A)						
AMORTIZACION DEL ADEL EFECTIVO	1,211,039.11	1,211,039.11	0.00	1,211,039.11		0.00
AMORTIZACION DE MATERIALES	1,211,039.09	1,211,039.09	0.00	1,211,039.09		0.00
TOTAL AMORTIZACIONES		2,422,078.20	0.00	2,422,078.20		0.00
VALORIZACION NETA (VN=VB-A)		1,008,108.40	377,489.27	1,385,597.68		
GASTOS DE LICITACION (L)		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA (M)		0.00	0.00	0.00		
MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-L-M)		1,008,108.40	377,489.27	1,385,597.68		
EN I.G.V. (VN*0.18)		181,458.51	67,948.07	249,407.58		
MONTO TOTAL CON I.G.V.		1,189,567.91	445,437.34	1,635,005.26		
TOTAL COMPROMISO		1,189,567.91	445,437.34	1,635,005.26		



MARIO CESAR DAVALOS ROJAS
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. 37143

GARY MARIO DEL CARPIO URDAY
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 4025.

VALORIZACION N° 13 CONTROL GRAFICO DE VALORIZACIONES (CURVAS S)

OBRA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA

ENTIDAD

: FONDEPES

CONTRATISTA

: CONSTRUCTORA DAVALOS SAC

SUPERVISIÓN

: ING. GARY DEL CARPIO URDAY


RESIDENTE DE OBRA

: ING. MARIO DAVALOS ROJAS

LICITAC. PUBLICA

: N° 09-2014-FONDEPES

MES EVALUADO ABRIL DEL 2016

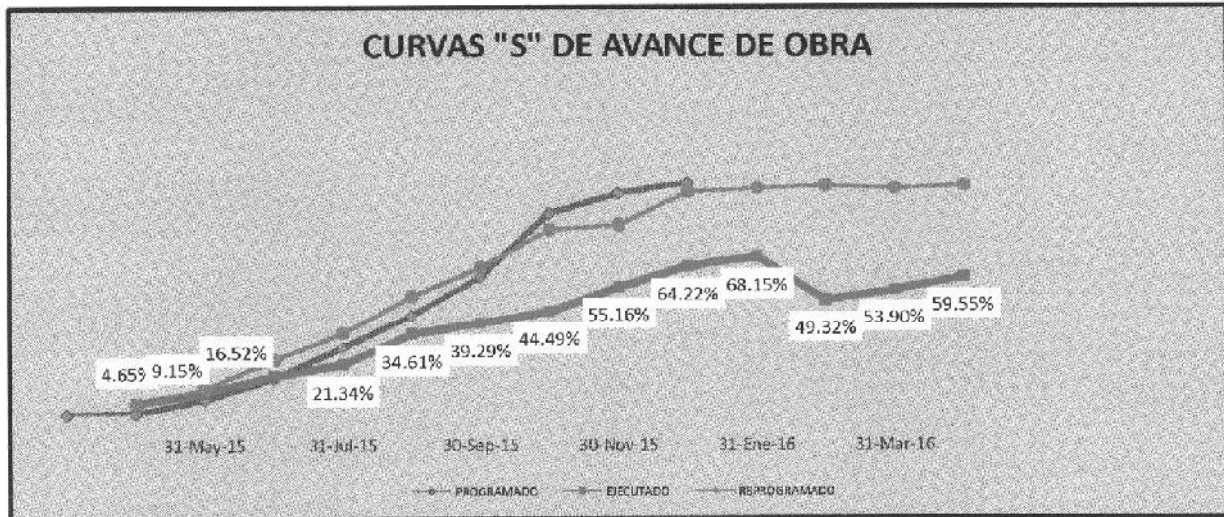

AVANCE DE OBRA (montos sin IGV)										SITUACIÓN DE LA OBRA
PERIODO	PROGRAMADO			REPROGRAMADO			EJECUTADO			
	PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO		
	S/.	S/.	%	S/.	S/.	%	S/.	S/.	%	
30-Abr-15	31,441.83	31,441.63	0.52%	256,957.93	256,957.93	4.24%	281,401.27	281,401.27	4.65%	ADELANTADA
31-May-15	353,025.03	384,466.66	6.35%	418,556.19	673,514.12	11.12%	272,876.00	554,277.27	9.15%	ADELANTADA
30-Jun-15	559,717.20	944,183.86	15.59%	750,338.05	1,423,852.17	23.51%	446,083.15	1,000,360.42	16.52%	ADELANTADA
31-Jul-15	812,049.56	1,756,233.42	29.00%	705,400.03	2,129,252.20	35.16%	292,099.67	1,292,460.09	21.34%	ATRASADA
31-Ago-15	828,979.93	2,585,213.35	42.69%	965,670.64	3,094,922.84	51.11%	803,085.07	2,095,525.16	34.61%	ATRASADA
30-Sep-15	1,023,813.35	3,609,026.70	59.60%	761,683.29	3,856,606.13	63.69%	283,366.50	2,378,892.06	39.29%	ATRASADA
31-Oct-15	1,644,457.54	5,253,484.24	86.76%	971,357.63	4,827,963.76	79.73%	314,905.42	2,693,797.48	44.49%	ATRASADA
30-Nov-15	518,210.44	5,771,694.68	95.32%	124,247.05	4,952,210.81	81.78%	646,429.07	3,340,226.55	55.16%	ATRASADA
31-Dic-15	283,500.87	6,055,195.55	100.00%	868,226.89	5,820,437.70	95.12%	548,251.31	3,888,477.86	64.22%	ATRASADA
31-Ene-16				86,915.72	5,907,353.42	97.56%	236,335.27	4,126,813.13	68.15%	ATRASADA
29-Feb-16				71,746.66	5,979,100.08	98.74%	-1,140,198.39	2,966,616.74	49.32%	ATRASADA
31-Mar-16				0.00	5,907,353.42	97.56%	276,881.60	3,263,498.34	53.90%	ATRASADA
31/04/2016				0.00	5,979,100.08	98.74%	342,171.75	3,605,670.09	59.55%	ATRASADA


MARIO CESAR DAVALOS ROJAS
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. 37143


GARY MARIO DEL CARPIO URDAY
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 4629
