

INFORME N°336-2023-EAVA

Para : **ING. JEFFERSON ROSAMBEL DÍAZ FERREYRA**
UNIDAD FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Asunto : **VALORIZACIÓN DE OBRA N°11 – NOVIEMBRE 2023**
Ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Chancay, distrito de Chancay, provincia de Huaral, región Lima” con código único de inversión N°2323633.

Referencia : a) Carta N°198-2023-COZAQUI/YYSRCD-GG, (06/12/2023) Informe de valorización.
b) Carta N°093-2023-CCH (30/11/2023) – contratista de obra.
c) Carta N°199-2023-COZAQUI/YYSRCD-GG, (06/12/2023) de la supervisión inf. Mensual

Fecha : Lima, 13 de diciembre del 2023.

Es grato dirigirme a usted, a través del cual para informa lo siguiente:

APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	
Fecha de Aprobación	: 11 de octubre del 2022
Presupuesto de Obra	: Agosto del 2022
Código único de proyecto	: 2323633
Plazo de Ejecución	: 240 días calendario
Ubicación	- Localidad: DPA Chancay
	- Distrito: Chancay
	- Provincia: Huaral
	- Región: Lima

EJECUCIÓN DE OBRA: CONTRATISTA DE OBRA	
Nombre de la Obra	: “Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de chancay, distrito de chancay, provincia de Huaral, región Lima” con código único de inversión N° 2323633
Modalidad de Ejecución	: Por contrata – llave en mano
Plazo de Ejecución de obra la firma del contrato	: 240 días calendario
Inicio del Plazo de Ejecución	: 07 de enero del 2023
Fin del plazo de ejecución a la firma del contrato.	: 04 de setiembre del 2023
Suspensión de plazo N°01	: 15 días calendario
Suspensión de plazo N°02	: 15 días calendario
Ampliación de plazo N°01	: Denegada RD-99-2023-13/mar/23
Ampliación de plazo N°02	: 02 días calendarios (por oleajes anómalos) RD-39-2023-20/jun/23
Ampliación de plazo N°03	: 02 días calendarios (por oleajes anómalos) RD-41-2023-22/jun/23
Ampliación de plazo N°04	: Denegada (por oleajes anómalos)
Ampliación de plazo N°05	: Denegada (por oleajes anómalos)
Ampliación de plazo N°06	: Denegada (por oleajes anómalos)
Ampliación de plazo N°07	: Denegada (por oleajes anómalos)
Ampliación de plazo N°08	: Denegada (por oleajes anómalos)
Ampliación de plazo N°09	: Denegada (por oleajes anómalos)
Nueva fecha final de obra	: 07 de octubre del 2023
Empresa Contratista:	: CONSORCIO CHANCAY integrado por las empresas SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VÍAS AMM S.A.S. y AUGURIS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
Dirección	: Desde el 16jun2023 - Av. La Encalada N°1388-Oficina 802, edificio empresarial El Polo Hunt I, Urb. El polo Hunt, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.
Correo	: consorciochancay2023@gmail.com
Representante Legal	: Sr. Raúl Fernando Jesús Jaén Santivañez
Residente de Obra	: Ing. Quiroz Barton Rodolfo Augusto
Procedimiento de Selección:	: L.P. N°05-2022-FONDEPES-1
Nomenclatura de Contrato	: contrato N°059-2022-FONDEPES
Fecha del contrato	: 22 de diciembre del 2022
Adelanto Directo	: S/ 1'612,331.45
Adelanto de Materiales 1	: S/ 1,612,694.15
Adelanto de Materiales 2	: S/ 1'046,294.15
Adelanto de Materiales 2	: S/ 565,674.61
Monto de Contrato	: S/ 16'123,314.53
Fecha de Entrega de Terreno	: 06 de enero del 2023


SUPERVISIÓN DE OBRA	
Empresa Supervisora:	: COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Representante Legal	: Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
Dirección	: Jr. Hermilio Valdizan N°528, Dep. 402, distrito de Jesus maria, Provincia y departamento de Lima
Correo	: cozaquiproyectos2016@gmail.com
Jefe de Supervisión	: Ing. Renzo Alberto Herrera Loarte
Procedimiento de Selección:	: C.P. 05-2022-FONDEPES
Sistema de Contratación – Ejecución	: Tarifas
Sistema de Contratación – Liquidación	: A suma alzada
Nomenclatura de Contrato	: contrato N°003-2023-FONDEPES
Fecha del contrato	: 01 de febrero del 2023
Adelanto Directo	: S/ 369,114.03 – 30%
Monto de Contrato	: S/ 1'230,380.10
Plazo de Ejecución – Supervisión	: 300 días calendario de los cuales 240 días para la etapa de ejecución y 60 días para la etapa de liquidación

1. ANTECEDENTES.

- 1.1. Con fecha 11 de octubre del 2022 se emitió la Resolución de la Dirección general de inversión pesquera artesanal y acuícola N° 066-2022-FONDEPES/DIGENIPAA, que aprobó el expediente técnico "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Chancay, distrito de Chancay, provincia de Huaral, región Lima" con código único de inversión N° 2323633, S/ 17,914,793.91 (Diecisiete millones novecientos catorce mil setecientos noventa y tres con 91/100 soles), incluido IGV y con un plazo de ejecución de 240 días calendarios.
- 1.2. Con fecha 19 de octubre del 2022 se publica en el portal OSCE la licitación pública N°05-2022-FONDEPES-1 – contratación de la ejecución de obra: Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de chancay, distrito de Chancay, provincia de Huaral, región Lima. Con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2323633.
- 1.3. Con fecha 28 de noviembre del 2022, se adjudicó la buena pro de la Licitación Pública N° 05-2022-FONDEPES-1, para la contratación de la ejecución de obra: Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Chancay, distrito de Chancay, provincia de Huaral, región Lima.
- 1.4. Con fecha 22 de diciembre del 2022, se suscribió el Contrato N° 059-2022-FONDEPES para la contratación de la ejecución de obra: Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Chancay, distrito de Chancay, provincia de Huaral, región Lima. Con código único de inversión N°2323633 con el CONSORCIO CHANCAY, integrado por las empresas SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VÍAS AMM S.A.S. y AUGURIS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., proponiendo el siguiente equipo de profesionales.

EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATISTA DE OBRA				
N°	Particip. En obra	CARGO	Profesional	Colegiatura
01	100%	Ingeniero Residente de Obra	Ing. Civil Quiroz Barton Rodolfo Augusto	CIP 11578
02	100%	Ingeniero especialista en estructuras	Ing. Civil Zavaleta Meléndez Raúl Elmer	CIP 46489
03	100%	Ingeniero especialista en mecánica eléctrica	Ing. Mecánico eléctrico Valladolid Ormeño Jorge Anibal	CIP 67494
04	100%	Ingeniero especialista en instalaciones sanitarias	Ing. sanitario Jair Gustavo Luna Escalante	CIP 223765
05	100%	Especialista en Seguridad de Obra y Medio Ambiente	Ing. Industrial Milton Jose Caipo Castro	CIP 192349
06	100%	Ingeniero Especialista en Control y Calidad	Ing. Civil Saavedra Veintimilla José Alejo	CIP 54903
07	100%	Ingeniero Especialista en Costos, Metrados y Valorizaciones	Ing. Civil Serapio Agapito Villanueva de la cruz	CIP 58824
08	100%	Arquitecto	Arquitecto Soto Carbajal Jorge Alexander	CAP 19825

- 1.5. Con fecha 11 de enero del 2023, mediante la Carta N° 009-2023-CCH, el CONSORCIO CHANCAY, solicitó la suspensión del plazo de ejecución de obra.



- 1.6. Con fecha 12 de enero del 2023, mediante el INFORME N° 003-2023-FONDEPES/CHN, el inspector de obra opinó favorablemente respecto a la solicitud del contratista de la suspensión del plazo de ejecución de obra.
- 1.7. Con fecha 13 de enero del 2023, mediante INFORME N° 022-2023-FONDEPES/ UFI, de, el coordinador de la unidad funcional de infraestructura de la DIGENIPAA, opinó favorablemente respecto a la suspensión del plazo de ejecución y solicita su derivación a la oficina general de administración de la entidad, adjuntándose el proyecto de acta de suspensión.
- 1.8. Con fecha 25 de enero del 2023, se suscribió la Adenda N° 01 al contrato N° 059-2022-FONDEPES, que suspende la obra por el periodo de 15 días calendarios, por lo que, se difiere la fecha de culminación al 18 de setiembre del 2023.
- 1.9. Con fecha 19 de octubre del 2023, se suscribe la Adenda N°03 al contrato N°059-2022-FONDEPES, en la que se formaliza la suspensión del plazo de ejecución N°02, por 15 días que, es del 01 de setiembre del 2023 al 15 de setiembre del 2023, la cual difiera la fecha de culminación al **07 de octubre del 2023**
- 1.10. Con fecha 01 de febrero del 2023, se suscribe el contrato N°003-2023-FONDEPES para la contratación de la supervisión de la ejecución de obra: Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Chancay, distrito de Chancay, provincia de Huaral, región Lima. Con código único de inversión N° 2323633 con la supervisión COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

EQUIPO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA				
N°	Particip. en obra	CARGO	Profesional	Colegiatura
01	100%	Supervisor de Obra	Ing. Civil Herrera Loarte Renzo Alberto	CIP 210189
02	100%	Ingeniero especialista en estructuras	Ing. Civil Otiniano Arribasplata Miguel Ángel	CIP 202625
03	100%	Ingeniero especialista en mecánica eléctrica	Ing. Mecánico Electricista Cano Corales Ismael Anibal	CIP 163827
04	100%	Ingeniero especialista en instalaciones sanitarias	Ing. Sanitario Valdivia Chacon Pablo Adolfo Humberto	CIP 14649
05	100%	Especialista en Seguridad de Obra y Medio Ambiente	Ing. Agrícola Haro Sánchez Jesús Newton	CIP 210187
06	100%	Ingeniero Especialista en Control y Calidad	Ing. Civil Abanto Leau julio Renzo	CIP 235050
07	100%	Ingeniero Especialista en Costos, Metrados y Valorizaciones	Ing. Civil Napolinar matos López	CIP 85814
08	100%	Arquitecto	Arquitecto Manuel francisco Gutiérrez Samaniego	CAP 19377

- 1.11. Asimismo, a través del siguiente cuadro se detallan los antecedentes de pago de valorizaciones de la obra:

N°-de Val	Tipo de pago	Monto (\$/)	Mes/Año	Fecha de recepción de carta	Estado
01	Obra	195,179.02	Ene – 2023	06/Feb/23	Pagado
02	Obra	938,600.54	Feb – 2023	06/Mar/23	Pagado
03	Obra	879,703.49	Mar – 2023	05/Abr/23	Pagado
04	Obra	613,798.07	Abr – 2023	04/May/23	Pagado
05	Obra	1,046,820.86	May – 2023	05/Jun/23	Pagado
06	Obra	521,149.60	Jun - 2023	07/jul/23	Pagado
07	Obra	1,450,924.28	Jul - 2023	03/Ago/23	Pagado
08	Obra	1,452,548.65	Ago - 2023	05/Set/23	Pagado
09	Obra	1,035,145.77	Set - 2023	06/Oct/23	Pagado
10	Obra	1,926,979.54	Oct – 2023	06/Nov/23	Pagado
11	Obra	234,542.90	Nov – 2023	06/Dic/23	En tramite

- 1.12. **VALORIZACIÓN DE OBRA N°11 – PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.**

- 1.12.1 Con fecha 30 de noviembre del 2023, mediante la **Carta N°093-2023-CCH**, el contratista CONSORCIO CHANCAY presentó a la Supervisión la Valorización de obra **N°11 del periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023.**

1.12.2 Con fecha 06 de diciembre del 2023, mediante **Carta N°198-2023-COZAQUI/YYSRD-GG**, la supervisión de obra presenta a la entidad, la valorización de obra **N°11 – periodo 01 al 30 de noviembre del 2023**.


2. BASE LEGAL.

- 2.1. Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero de 2019). Ver Fe de Erratas. Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EFy Decreto Supremo N° 168-2020-EF.
- 2.2. Resolución directoral N° 018-2002-EM/DGE.- Norma de procedimientos para la elaboración de proyectos y ejecución de obras en sistemas de utilización en media tensión en zonas de concesión de distribución.
- 2.3. Resolución de gerencia general N° 032-2021-FONDEPES/GG - «Directiva para el control de ejecución y supervisión de obras por contrata en el marco de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES.

3. ANÁLISIS.

- 3.1. Luego de recibida la Valorización de obra **N°11** correspondiente al **periodo 01 al 30 de noviembre del 2023**, se procedió con su revisión, identificando la siguiente Curva S de Avance Físico de la Obra (AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO):

PERIODO	VALORIZACION PROGRAMADA				VALORIZACION EJECUTADA				SITUACIÓN DE LA OBRA
	PARCIAL	ACUMULADO	PARC. %	ACUM. %	PARCIAL	ACUM.	PARCIAL	ACUM.	
	(S/.)	(S/.)			(S/.)	(S/.)	%	%	
INICIO	0			0	0			0	
VAL 01	165,405.94	165,405.94	1.21%	1.21%	165,405.95	165,405.95	1.21%	1.21%	ADELANTADO
VAL 02	883,804.65	1,049,210.59	6.47%	7.68%	883,804.65	1,049,210.60	6.47%	7.68%	ADELANTADO
VAL 03	1,240,508.77	2,289,719.35	9.08%	16.76%	1,240,508.78	2,289,719.38	9.08%	16.76%	ADELANTADO
VAL 04	970,580.37	3,260,299.73	7.10%	23.86%	970,580.37	3,260,299.75	7.10%	23.86%	ADELANTADO
VAL 05	1,504,576.31	4,764,876.04	11.01%	34.87%	1,504,576.30	4,764,876.05	11.01%	34.87%	ADELANTADO
VAL 06	731,333.02	5,496,209.06	5.35%	40.22%	731,333.02	5,496,209.07	5.35%	40.22%	ADELANTADO
VAL 07	1,499,479.85	6,995,688.91	10.97%	51.20%	1,499,479.85	6,995,688.92	10.97%	51.20%	ADELANTADO
VAL 08	1,654,597.35	8,650,286.25	12.11%	63.31%	1,654,597.35	8,650,286.25	12.11%	63.31%	ADELANTADO
VAL 09	1,357,235.89	10,007,522.15	9.93%	73.24%	1,336,671.28	9,986,957.53	9.78%	73.09%	ATRASADO
VAL 10	3,656,303.72	13,663,825.87	26.76%	100.00%	1942619.94	11,929,577.47	14.22%	87.31%	ATRASADO
VAL 11	-	13,663,825.87	-	100.00%	213,989.04	12,143,566.51	1.57%	88.87%	ATRASADO

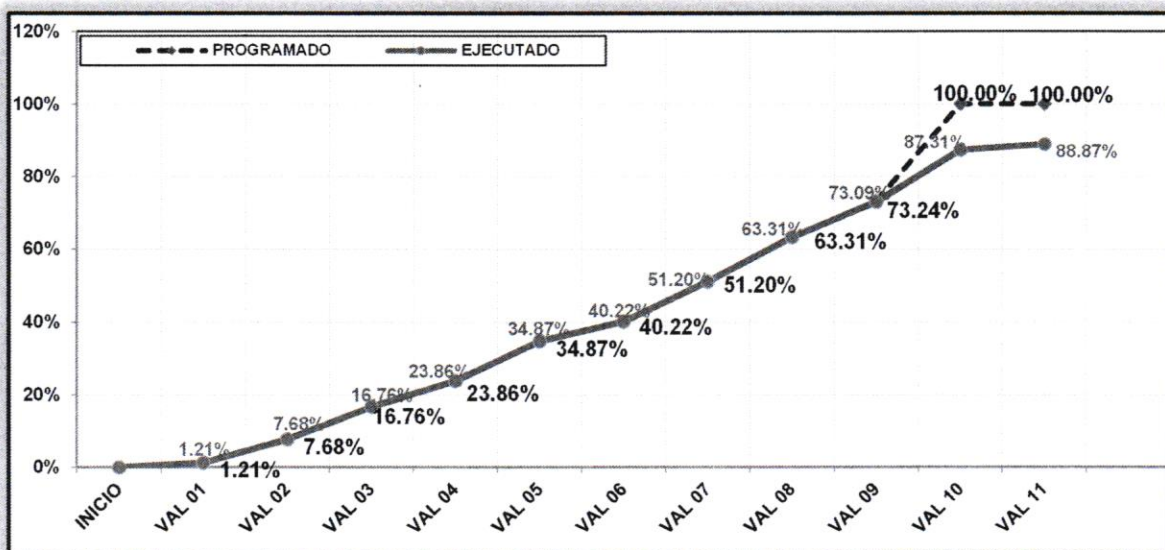

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres»
«Año de la unidad, la paz y el desarrollo»

La obra tiene un avance acumulado de **88.87%** hasta el 30 de noviembre del 2023.
La obra tiene un atraso de **11.13%** respecto al programado
La obra al **07 de octubre del 2023** debería de estar al **100%** de avance en su ejecución física, por lo que, la obra se encuentra atrasada y en periodo de penalidad.

- 3.2. Según la **Valorización de obra N°11 – del periodo 01 al 30 noviembre del 2023**, el supervisor informó que la obra tiene un avance de **1.57% correspondiente** al periodo de **noviembre del 2023** y un **88.87%** de avance acumulado de ejecución física.

Item	Descripción	Monto Contratado	Valorización			Saldo por Valorizar
			Anterior	Actual	Acumulado	
A	VALORIZACIÓN CONTRACTUAL					
	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	590,137.27	590,137.27	-	590,137.27	-
	ESTRUCTURAS	8,865,074.10	8,508,555.30	13,634.70	8,522,190.00	342,884.10
	ARQUITECTURA	2,330,721.62	2,140,220.88	22,138.51	2,162,359.39	168,362.23
	INSTALACIONES SANITARIAS	570,261.90	386,186.63	2,319.47	388,506.10	181,755.80
	INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION	664,996.26	177,841.02	175,896.36	353,737.38	311,258.88
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	642,634.72	126,636.39	-	126,636.39	515,998.33
MONTO TOTAL (A)	13,663,825.87	11,929,577.49	213,989.04	12,143,566.53	1,520,259.34	
B.	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO		87.31%	1.57%	88.87%	
	REAJUSTES POR FORMULA POLINOMICA (R)					
	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		21,490.62	-	21,490.62	
	ESTRUCTURAS		329,545.76	654.47	330,200.23	
	ARQUITECTURA		88,954.77	1,129.06	90,083.83	
	INSTALACIONES SANITARIAS		3,291.95	53.35	3,345.29	
	INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION		4,364.29	6,332.27	10,696.56	
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO		1,519.64	-	-1,519.64		
MONTO TOTAL (B)		446,127.75	8,169.15	454,296.90		
C.	AMORTIZACIONES					
	DEL ADELANTO DIRECTO (10%)	1,366,382.59	1,192,957.75	21,398.90	1,214,356.66	152,025.93
	ADELANTO DE MATERIALES (20%)	2,732,765.18	2,720,918.44	1,950.41	2,722,868.85	9,896.33
	Adelanto de materiales N° 01	1,366,689.96	1,366,689.96	-	1,366,689.96	0.00
	Adelanto de materiales N° 02	886,689.96	874,843.22	1,950.41	876,793.63	9,896.33
Adelanto de materiales N° 03	479,385.26	479,385.26	-	479,385.26	-	
MONTO TOTAL (C)		3,913,876.19	23,349.31	3,937,225.50	161,922.26	
D.	REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE DEL ADELANTO DIRECTO (10%)		4,553.53	43.70	4,597.23	
	ADELANTO DE MATERIALES (20%)		-57,286.14	-	-57,286.14	
	Adelanto de materiales N° 01		-18,538.91	-	-18,538.91	
	Adelanto de materiales N° 02		-38,747.23	-	-38,747.23	
	Adelanto de materiales N° 03		-	-	-	
MONTO TOTAL (D)		-52,732.61	43.70	-52,688.91		
E.	VALORIZACION NETA (VN=A+R-B):		8,514,561.67	198,765.17	8,713,326.84	
	MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA EN EFECTIVO (VN-C): MONTO TOTAL (E)		8,514,561.67	198,765.17	8,713,326.84	
	IGV (18% VN):		1,532,621.10	35,777.73	1,568,398.83	
TOTAL (F):		10,047,182.77	234,542.90	10,281,725.67		
F	TOTAL MONTO A SOLICITAR (S/.)			234,542.90		

CONTROL DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO:

VALORIZACIONES EJECUTADOS (SIN IGV)			ADELANTO DIRECTO	AMORTIZACIÓN AD. DIRECTO	SALDO POR AMORTIZAR
No.	MES	MONTO VALORIZADO (V)	(A)	(Am) = V*A/C	S = A-Am
1	Enero 2023	-	-	-	-
2	Febrero 2023	795,424.19	1,366,382.59	88,380.47	1'278,002.12
3	Marzo 2023	745,511.43		124,050.88	1'153,951.24
4	Abril 2023	520,167.86		97,058.04	1'056,893.21
5	Mayo 2023	887,136.32		150,457.63	906,435.57
6	Junio 2023	441,652.20		73,133.30	833,302.27
7	Julio 2023	1,229,596.85		149,947.99	683,354.29
8	Agosto 2023	1,230,973.43		182,000.34	501,353.96
9	Setiembre 2023	877,242.18		133,667.13	367,686.83
10	Octubre 2023	1,633,033.51		194,261.99	173,424.83
11	Diciembre 2023			21,398.90	152,025.93

CONTROL DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES N°1:

Monto adelantado sin IGV				1,366,689.96
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES				
VALORIZACION		AMORTIZACIÓN		
MES	N° 01	F.P. N° 01	ACUMUL.	SALDO
Ene-23	0	0	0	0
Feb-23	0	0	0	0
Mar-23	745,511.43	370,946.48	370,946.48	995,743.48
Abr-23	520,167.86	353,354.47	724,300.95	642,389.01
May-23	887,136.32	367,067.82	1,102,951.04	263,738.91
Jun-23	441,652.20	153,125.85	1,256,076.89	110,613.07
Jul-23	1,229,596.85	110,613.07	1,366,689.96	0.00

CONTROL DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES N°2:

Monto adelantado sin IGV				886,689.96
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES				
VALORIZACION		AMORTIZACIÓN		
MES	N° 01	F.P. N° 01	ACUMULADO	SALDO
Ene-23	0	0	0	0
Feb-23	0	0	0	0
Mar-23	0	0	0	0
Abr-23	0	0	0	0
May-23	0	0	0	0
Jun-23	0	0	0	886,689.96
Jul-23	1,229,596.85	164,237.85	164,237.85	722,452.11
Ago-23	1,230,973.43	187,997.76	352,235.61	534,454.34
Set-23	877,242.18	325,748.10	677,983.71	208,706.25
Oct-23	1,633,033.51	196,859.51	874,843.22	11,846.74
Nov-23	198,765.17	1,950.41	876,793.63	9,896.33

CONTROL DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES N°3:

Monto adelantado sin IGV				479,385.26
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES				
VALORIZACION		AMORTIZACIÓN		
MENS.	N° 01	F.P. N° 01	ACUMULADO	SALDO
Ene-23	0	0	0	0
Feb-23	0	0	0	0
Mar-23	0	0	0	0
Abr-23	0	0	0	0
May-23	887,136.32	99,914.53	99,914.53	379,470.73
Jun-23	441,652.20	63,421.67	163,336.18	316,049.08
Jul-23	1,229,596.85	140,743.00	304,079.18	175,306.08
Ago-23	1,230,973.43	107,672.74	411,751.92	67,633.34
Set-23	877,242.18	67,633.34	479,385.26	0.00

3.3. Resumen de Valorización de Obra:

Luego de revisar la documentación que sustenta por el supervisor de obra correspondiente a la **Valorización de obra N°11 – Periodo del 01 al 30 noviembre del 2023**, aprobada y remitido por la Supervisión, tiene la siguiente estructura de pagos:

Valorización Neta	198,765.17
IGV (18%)	35,777.73
TOTAL	234,542.90

- 3.4. El supervisor de obra aprobó la **Valorización de obra N°11 – Periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023**, por el monto de **S/ 234,542.90** (doscientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y dos con 90/100 Soles) incluido IGV, en función de los metrados ejecutados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad en cada componente. Es importante señalar que, que la valorización es aprobada por la supervisión de obra con la **Carta N°198-2023-COZAQUI/YYSCRD-GG**, por cuanto es el responsable directo de velar por el control de los trabajos en la obra, cautelando de forma permanente y directa, la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado.
- 3.5. Como parte del contrato N°059-2022-FONDEPES, el contratista de obra CONSORCIO CHANCAY, **solicitó la retención del 10% como garantía de fiel cumplimiento** conforme al decreto de urgencia N°020-2022, en donde se establece medidas extraordinarias y

complementarias, durante el año fiscal 2022, para la reactivación económica en el marco del sistema nacional de abastecimiento, en virtud a ello el órgano encargado de las contrataciones OEC, efectuó la retención de acuerdo al siguiente cuadro:

Mes de la Valorización	FIEL CUMPLIMIENTO		S/ 1,612,331.45	
	Programado	Retenido	Saldo por retener en el periodo	Saldo por retener
Ene-23	403,082.86	187,371.86	215,711.00	1,424,959.59
Feb-23	403,082.86	618,793.87	-	806,165.73
Mar-23	403,082.86	403,082.86	-	403,082.86
Abr-23	403,082.86	403,082.86	-	0.00
	1,612,331.45	1,612,331.45		

Cabe precisar que los pagos referentes a ESSALUD y SNP, correspondientes al mes de noviembre 2023, no se han adjuntado, ya que la fecha de pago del Contratista referidos a estos aportes de acuerdo a su número de RUC, les corresponde realizar en quincena del mes de diciembre, es por ello han adjuntado los aportes realizados correspondientes al mes de octubre del 2023.

- 3.6. Adicional a ello el contratista de obra presenta el reporte de las consultas realizadas en el mes (Folio 45).

4. PENALIDADES.

- 4.1. El contratista de obra **CONSORCIO CHANCAY** a la fecha ingreso a periodo de penalidad¹ por mora toda vez que, su plazo contractual **venció del 07 de octubre del 2023**, lo cual corresponde aplicar la penalidad por mora en su ejecución, por lo tanto, la penalidad por mora en la ejecución de la prestación será **deducida** en la liquidación del contrato con cargo a la garantía de fiel cumplimiento, en atención al numeral 161.4 del artículo 161 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

5. CONCLUSIONES


- 5.1. El Supervisor de obra **Ing. Renzo Alberto Herrera Loarte con CIP N° 210189, APROBÓ la VALORIZACIÓN N°11 del periodo del 01 al 30 noviembre del 2023**, de la obra "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Chancay, distrito de Chancay, provincia de Huaral, región Lima", presentado a la entidad con la **Carta N°198-2023-COZAQUI/YYS CRD-GG** del 06 de diciembre del 2023, por el monto de pago de **S/ 234,542.90 (doscientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y dos con 90/100 Soles) incluido IGV.**
- 5.2. En ese sentido, el suscrito en calidad de administrador del contrato de obra señalada, al haber verificado que, el contratista cumplió con entregar la documentación técnica y administrativa indicada en el contrato y con la aprobación del supervisor de obra, considera procedente otorgar la conformidad al pago de la valorización por el importe de **S/ 234,542.90 (doscientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y dos con 90/100 Soles) incluido IGV.**
- 5.3. La obra presenta un atraso del **11.13%**, por lo que hasta el 07 de octubre del 2023 estaba programado un avance acumulado del 100%. El plazo contractual venció del 07 de octubre del 2023, lo cual corresponde aplicar la penalidad por mora en su ejecución, por lo tanto, la penalidad por mora en la ejecución de la prestación será deducida en la liquidación del contrato con cargo a la garantía de fiel cumplimiento, en atención al numeral 161.4 del artículo 161 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

6. RECOMENDACIONES.

- 6.1. Cumplidos los requisitos establecidos en la normativa y la relación contractual vigente con la supervisión de obra, se recomienda que el Director de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, otorgue la conformidad correspondiente, para que la entidad proceda con el pago de la Valorización de obra **N° 11**, correspondiente al **periodo del 01 al 30 noviembre del 2023**, dentro del plazo legal vigente, por la suma de **S/ 234,542.90**

¹ Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso (...)



«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres»
«Año de la unidad, la paz y el desarrollo»

(doscientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y dos con 90/100 Soles) incluido IGV.

Es cuanto tengo que informar a Ud. para los fines que estime convenientes.

Atentamente;



Edgard A. Vargas Aguilar
Arquitecto
CAP 11782

Edgard Álvaro Vargas Aguilar
DNI N° 40698128

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres»
«Año de la unidad, la paz y el desarrollo»

ANEXO 2: LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE VALORIZACIONES DE OBRA

I. INFORMACIÓN DE LA VALORIZACIÓN					
Nombre del proyecto/obra	"Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Chancay, distrito de Chancay, provincia de Huaral, región Lima" con código único de inversión No 2323633				
Monto de la valorización	S/	234,542.90	Fecha de presentación	06/12/2023	2023-0007559
Periodo y mes de la valorización	01 al 30 noviembre – 2023		N° valorización	11	
II. INFORMACIÓN DEL PROYECTO					
Nombre del proyecto/obra	Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2323633"				
Código	2323633		Provincia	Huaral	
Departamento	Lima		Distrito	Chancay	
III. REVISIÓN DOCUMENTADA					
DESCRIPCIÓN		REVISIÓN		OBSERVACIONES	
Marque con un (✓) si se cumple con el criterio de revisión o una (X) si se incumple					
1	Adjunta carta de presentación de la valorización correspondiente al mes valorizado	✓	Carta N°198-2023-COZAQUI/YYSRCD-GG - Presentación en físico, incluido CD		
2	Presenta informe mensual de la valorización correspondiente al mes valorizado	✓	Carta N°199-2023-COZAQUI/ YYSRCD-GG – información digital y físico.		
3	Adjunta grafico de la curva "S" correspondiente al avance acumulado	✓	FOLIO 1096 - 1089		
4	Presenta copia legible del contrato de obra	✓	FOLIO 778 - 753		
5	Presenta copia legible del contrato de consorcio	✓	FOLIO 785 - 779		
6	Presenta copia legible del acta de entrega de terreno	✓	FOLIO 1015 - 1014		
7	Presenta código de cuenta interbancaria (CCI)	✓	FOLIO 743 – 742		
8	Presenta cuenta de detracciones	✓	FOLIO 741 – 740		
9	Presenta factura correspondiente al monto y mes de la valorización	✓	FOLIO 739 – 738		
10	Presenta copia de seguros (SCTR – POLIZA CAR)	✓	FOLIO 736 SCTR de la valorización Folio 730 CAR De La Valorización		
11	Presenta ficha ruc del consorcio y/o empresa correspondiente	✓	FOLIO 647 – 645		
12	Presenta copia legible y vigente de la carta fianza de acuerdo al monto acordado	✓	FOLIO 644 – 628, el contratista se acogió al decreto de urgencia N°020-2022		
13	Presenta control de metrados ejecutados del periodo valorizado	✓	FOLIO 1173 – 1121		
14	Presenta ficha de identificación de la obra	✓	FOLIO 1196 – 1195		
15	Presenta calendario valorizado consistente y correspondiente al mes valorizado	✓	FOLIO 1031 – 1023		
16	Presenta valorización de obra debidamente fundamentada y correspondiente al mes valorizado.	✓	FOLIO 1116 – 1097		
17	Presenta resumen consistente de la valorización mensual	✓	FOLIO 1194 – 1182		
18	Presenta debidamente fundamentada la aplicación del reajuste autorizado.	✓	FOLIO 1079 – 1066		
19	Resumen de valorizaciones de obras ejecutadas correspondiente al mes valorizado y consistente a los requisitos 15, 16 y 17	✓	FOLIO 1120 – 1117		
20	Presenta debidamente fundamentada la aplicación de índices unificados	✓	FOLIO 1065 – 1041		
21	Presenta debidamente fundamentada la aplicación de la fórmula polinómica	✓	FOLIO 1088 - 1080		
22	Presenta de manera consistente la amortización de adelanto de directo	✓	FOLIO 1039 – 1037		
23	Presenta de manera consistente la amortización de adelanto de materiales	✓	FOLIO 1036 – 1032		
24	Presenta grafico de la curva "s" (mensual)debidamente fundamentada y reflejando lo valorizado	✓	FOLIO 1096 – 1089		

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres»
«Año de la unidad, la paz y el desarrollo»

25	Presenta recibos de pago de ESSALUD correspondiente al periodo valorizado	✓	FOLIO 777 – 775 de la valorización de obra. Cabe precisar que los pagos referentes a ESSALUD y SNP, correspondientes al mes de noviembre 2023, no se han adjuntado, ya que la fecha de pago del Contratista referidos a estos aportes de acuerdo a su número de RUC, les corresponde realizar en quincena del mes de diciembre, es por ello han adjuntado los aportes realizados correspondientes al mes de octubre del 2023.
26	Presenta recibo de pago CONAFOVICER correspondiente al periodo valorizado	✓	FOLIO 620 de la valorización
27	Presenta constancia de no adeudo de SENCICO correspondiente al periodo valorizado	✓	FOLIO 623 de la valorización de obra. correspondientes al mes de noviembre 2023
28	Presenta copia legible del cuaderno de obra correspondiente al periodo valorizado	✓	FOLIO 1013 – 987
29	Presenta panel fotográfico y/o evidencia filmica correspondiente a los trabajos ejecutados y consignados en la valorización	✓	FOLIO 1022 – 1017
30	presenta informe mensual de seguridad correspondiente al periodo valorizado	✓	FOLIO 447 – 60
31	presenta protocolos de pruebas correspondientes al periodo valorizado	✓	FOLIO 479 – 469
32	Presenta fichas y/o hojas técnicas de materiales utilizado en el periodo valorizado	✓	FOLIO 981 – 821
33	Presenta fichas y/o hojas técnicas de materiales, equipos y mantenimientos utilizado en el periodo valorizado	✓	FOLIO 34 – 3
34	Aplica el cálculo de penalidades al periodo valorizado	✓	Respecto a las penalidades se encuentra detallada en el presente informe (ítem 4), adicional a ello el supervisor no informo respecto a otras penalidades.
35	Contrato y/o contratista de la obra se encuentra apercibido	✓	NO CORRESPONDE
36	El proyecto cuenta con certificación presupuestal	✓	Si cuenta (conforme a la información proporcionada por el especialista en presupuestos de la DIGENIPAA)
37	El proyecto cuenta con compromiso anual	✓	NO CORRESPONDE A ESTA ÁREA

IV. CONCLUSIONES

DESCRIPCIÓN	ESTADO CONFORME	
Cuenta con toda la información requerida para el procedimiento de pago de la valorización		
ESPECIALISTA	N° C.A.P.	FIRMA Y SELLO
Arq. Edgard Álvaro Vargas Aguilar	11782	

Edgard A. Vargas Aguilar
Arquitecto
CAP 11782

