

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres»  
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

**INFORME N°085-2024/RGB**

<b>Para</b>	:	<b>ING. JEFFERSON ROSAMBEL DÍAZ FERREYRA</b> UNIDAD FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURA
<b>Asunto</b>	:	<b>VALORIZACIÓN DE OBRA N°19 – JUNIO 2024</b> Ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Chancay, distrito de Chancay, provincia de Huaral, región Lima” con código único de inversión N°2323633.
<b>Referencia</b>	:	a) PROVEIDO 020747-2024-FONDEPES/OGA-UFA b) CARTA N°096-2024-COZAQUI/YSCD-GG c) Carta N°028-2024-CCH
<b>Fecha</b>	:	Lima, 16 de julio del 2024.

Por el presente me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual la Unidad Funcional de Abastecimiento (UFA), remite a la DIGENIPAA las observaciones a la Valorización de la Obra N°19 correspondiente a la segunda quincena del mes de junio periodo 16 al 30, para informarlo siguiente:

APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	
Fecha de Aprobación	: 11 de octubre del 2022
Presupuesto de Obra	: Agosto del 2022
Código único de proyecto	: <b>2323633</b>
Plazo de Ejecución	: 240 días calendario
Ubicación	: - Localidad: DPA Chancay
	: - Distrito: Chancay
	: - Provincia: Huaral
	: - Región: Lima

EJECUCIÓN DE OBRA: CONTRATISTA DE OBRA	
Nombre de la Obra	: “Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de chancay, distrito de chancay, provincia de Huaral, región Lima” con código único de inversión N° 2323633
Modalidad de Ejecución	: Por contrata – llave en mano
Plazo de Ejecución de obra la firma del contrato	: 240 días calendario
Inicio del Plazo de Ejecución	: 07 de enero del 2023
Fin del plazo de ejecución a la firma del contrato.	: 04 de setiembre del 2023
Suspensión de plazo N°01	: 15 días calendario
Suspensión de plazo N°02	: 15 días calendario
Ampliación de plazo N°01	: Denegada RD-99-2023-13/mar/23
Ampliación de plazo N°02	: 02 días calendarios (por oleajes anómalos) RD-39-2023-20/jun/23
Ampliación de plazo N°03	: 02 días calendarios (por oleajes anómalos) RD-41-2023-22/jun/23
Ampliación de plazo N°04	: Denegada (por oleajes anómalos)
Ampliación de plazo N°05	: Denegada (por oleajes anómalos)
Ampliación de plazo N°06	: Denegada (por oleajes anómalos)
Ampliación de plazo N°07	: Denegada (por oleajes anómalos)
Ampliación de plazo N°08	: Denegada (por oleajes anómalos)
Ampliación de plazo N°09	: Denegada (por oleajes anómalos)
Nueva fecha final de obra	: <b>07 de octubre del 2023</b>
Empresa Contratista:	: CONSORCIO CHANCAY integrado por las empresas SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VÍAS AMM S.A.S. y AUGURIS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
Dirección	: Desde el 16jun2023 - Av. La Encalada N°1388-Oficina 802, edificio empresarial El Polo Hunt I, Urb. El polo Hunt, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.
Correo	: <a href="mailto:consorciochancay2023@gmail.com">consorciochancay2023@gmail.com</a>
Representante Legal	: Sr. Raúl Fernando Jesús Jaén Santivañez
Residente de Obra	: Ing. Quiroz Barton Rodolfo Augusto
Procedimiento de Selección:	: L.P. N°05-2022-FONDEPES-1
Nomenclatura de Contrato	: contrato N°059-2022-FONDEPES
Fecha del contrato	: 22 de diciembre del 2022
Adelanto Directo	: S/ 1'612,331.45
Adelanto de Materiales 1	: S/ 1,612,694.15
Adelanto de Materiales 2	: S/ 1'046,294.15
Adelanto de Materiales 2	: S/ 565,674.61
Monto de Contrato	: S/ 16'123,314.53



Firmado digitalmente por:  
**GUZMAN-BALLON-ROGELIO-FIR**  
 08222788 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 30/07/2024 15:44:54-0500

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres»  
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Fecha de Entrega de Terreno	: 06 de enero del 2023
<b>SUPERVISIÓN DE OBRA</b>	
Empresa Supervisora:	: COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Representante Legal	: Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
Dirección	: Jr. Hermilio Valdizan N°528, Dep. 402, distrito de Jesus maría, Provincia y departamento de Lima
Correo	: <a href="mailto:cozaquiproyectos2016@gmail.com">cozaquiproyectos2016@gmail.com</a>
Jefe de Supervisión	: Ing. Renzo Alberto Herrera Loarte
Procedimiento de Selección:	: C.P. 05-2022-FONDEPES
Sistema de Contratación – Ejecución	: Tarifas
Sistema de Contratación – Liquidación	: A suma alzada
Nomenclatura de Contrato	: contrato N°003-2023-FONDEPES
Fecha del contrato	: 01 de febrero del 2023
Adelanto Directo	: S/ 369,114.03 – 30%
Monto de Contrato	: S/ 1'230,380,10
Plazo de Ejecución – Supervisión	: 300 días calendario de los cuales 240 días para la etapa de ejecución y 60 días para la etapa de liquidación

## 1. ANTECEDENTES.

- 1.1. Con fecha 11 de octubre del 2022 se emitió la Resolución de la Dirección general de inversión pesquera artesanal y acuícola N° 066-2022-FONDEPES/DIGENIPAA, que aprobó el expediente técnico “Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Chancay, distrito de Chancay, provincia de Huaral, región Lima” con código único de inversión N° 2323633, S/ 17,914,793.91 (Diecisiete millones novecientos catorce mil setecientos noventa y tres con 91/100 soles), incluido IGV y con un plazo de ejecución de 240 días calendarios.
- 1.2. Con fecha 19 de octubre del 2022 se publica en el portal OSCE la licitación pública N°05-2022-FONDEPES-1 – contratación de la ejecución de obra: Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de chancay, distrito de Chancay, provincia de Huaral, región Lima. Con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2323633.
- 1.3. Con fecha 28 de noviembre del 2022, se adjudicó la buena pro de la Licitación Pública N° 05-2022-FONDEPES-1, para la contratación de la ejecución de obra: Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Chancay, distrito de Chancay, provincia de Huaral, región Lima.
- 1.4. Con fecha 22 de diciembre del 2022, se suscribió el Contrato N° 059-2022-FONDEPES para la contratación de la ejecución de obra: Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Chancay, distrito de Chancay, provincia de Huaral, región Lima. Con código único de inversión N°2323633 con el CONSORCIO CHANCAY, integrado por las empresas SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VÍAS AMM S.A.S. y AUGURIS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
- 1.5. Con fecha 11 de enero del 2023, mediante la Carta N° 009-2023-CCH, el CONSORCIO CHANCAY, solicitó la suspensión del plazo de ejecución de obra.
- 1.6. Con fecha 12 de enero del 2023, mediante el INFORME N° 003-2023-FONDEPES/CHN, el inspector de obra opinó favorablemente respecto a la solicitud del contratista de la suspensión del plazo de ejecución de obra.
- 1.7. Con fecha 13 de enero del 2023, mediante INFORME N° 022-2023-FONDEPES/ UFI, de, el coordinador de la unidad funcional de infraestructura de la DIGENIPAA, opinó favorablemente respecto a la suspensión del plazo de ejecución y solicita su derivación a la oficina general de administración de la entidad, adjuntándose el proyecto de acta de suspensión.
- 1.8. Con fecha 25 de enero del 2023, se suscribió la Adenda N° 01 al contrato N° 059-2022-FONDEPES, que suspende la obra por el periodo de 15 días calendarios, por lo que, se difiere la fecha de culminación al 18 de setiembre del 2023.
- 1.9. Con fecha 19 de octubre del 2023, se suscribe la Adenda N°03 al contrato N°059-2022-FONDEPES, en la que se formaliza la suspensión del plazo de ejecución N°02, por 15 días que, es del 01 de setiembre del 2023 al 15 de setiembre del 2023, la cual difiera la fecha de culminación al **07 de octubre del 2023**
- 1.10. Con fecha 01 de febrero del 2023, se suscribe el contrato N°003-2023-FONDEPES para la contratación de la supervisión de la ejecución de obra: Mejoramiento de los servicios del

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres»  
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Chancay, distrito de Chancay, provincia de Huaral, región Lima. Con código único de inversión N° 2323633 con la supervisión COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

- 1.11. Con fecha 05 de junio de 2024, se suscribe la adenda al contrato de obra N°059-2022-FONDEPES, es modificar la Clausula Cuarta del Contrato N°059-2022-FONDEPES, relacionado a la periodicidad de las valorizaciones de mensuales a quincenales.
- 1.12. Con fecha 14 de junio de 2024, se suscribe la Adenda N°01 al Contrato N°03-2023-FONDEPES, de la Contratación de la Supervisión de la Ejecución de la Obra: **“Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Chancay, distrito de Chancay, provincia de Huaral, región Lima”** relacionado a presentar la valorización dentro de los tres (03) días calendario, contados a partir del primer día hábil de la quincena siguiente a la valorización respectiva.
- 1.13. Asimismo, a través del siguiente cuadro se detallan los antecedentes de pago de valorizaciones de la obra:

N°-de Val	Tipo de pago	Monto (S/)	Mes/Año	Fecha de recepción de carta	Estado
01	Obra	195,179.02	Ene – 2023	06/Feb/23	Pagado
02	Obra	938,600.54	Feb – 2023	06/Mar/23	Pagado
03	Obra	879,703.49	Mar – 2023	05/Abr/23	Pagado
04	Obra	613,798.07	Abr – 2023	04/May/23	Pagado
05	Obra	1,046,820.86	May – 2023	05/Jun/23	Pagado
06	Obra	521,149.60	Jun - 2023	07/jul/23	Pagado
07	Obra	1,450,924.28	Jul - 2023	03/Ago/23	Pagado
08	Obra	1,452,548.65	Ago - 2023	05/Set/23	Pagado
09	Obra	1,035,145.77	Set - 2023	06/Oct/23	Pagado
10	Obra	1,926,979.54	Oct – 2023	06/Nov/23	Pagado
11	Obra	234,542.90	Nov – 2023	06/Dic/23	Pagado
12	Obra	270,734.24	Dic - 2023	08/ene/24	Pagado
13	Obra	225,177.95	Ene – 2024	05/feb/24	Pagado
14	Obra	113,630.51	Feb – 2024	05/mar/24	Pagado
15	Obra	33,468.36	Mar – 2024	05/abr/24	Pagado
16	Obra	19,088.10	Abr - 2024	08/may/24	Pagado
17	Obra	123,055.98	May - 2024	10/Jun/24	Pagado
18	Obra	217,872.17	Jun - 2024	19/Jun/24	Pagado
19	Obra	69,651.12	Jul - 2024	12/Jul/24	En Tramite

1.14. **VALORIZACIÓN DE OBRA N°19 – PERIODO 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

- 1.12.1 Con fecha **05 de julio del 2024**, mediante **CARTA N°093-2024-COZAQUI/YSCD-GG**, la supervisión de obra presenta a la Entidad, la valorización de obra elaborada por la supervisión de obra **N°19 – periodo 16 al 30 de junio del 2024**, toda vez que, el contratista de obra adjunta toda la documentación técnico administrativa.
- 1.12.2 Con fecha **10 de julio de 2024**, la DIGENIPAA mediante **CARTA N°00026-2024-FONDEPES/DIGENIPAA**, notifico a la supervisión de la obra COZAQUI INGENIEROS S.A.C. la devolución de la Valorización N°19 periodo del **16 al 30 de junio del 2024** correspondiente a la segunda quincena para el levantamiento de observaciones.
- 1.12.3 Con fecha **12 de julio de 2024**, mediante **CARTA N°096-2024-COZAQUI/YSCD-GG**, la supervisión de obra presenta a la Entidad, el levantamiento de observaciones de la valorización de obra N°19 correspondiente al periodo **16 al 30 de junio del 2024**, correspondiente a la segunda quincena, con toda la documentación requerida

**2. BASE LEGAL.**


- 2.1. Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero de 2019). Ver Fe de Erratas. Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EFy Decreto Supremo N° 168-2020-EF.

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres»  
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- 2.2. Resolución directoral N° 018-2002-EM/DGE. - Norma de procedimientos para la elaboración de proyectos y ejecución de obras en sistemas de utilización en media tensión en zonas de concesión de distribución.
- 2.3. Resolución de gerencia general N° 032-2021-FONDEPES/GG - «Directiva para el control de ejecución y supervisión de obras por contrata en el marco de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES.

### 3. ANÁLISIS.

- 3.1. Luego de recibida la Valorización de obra **N°19** correspondiente al **periodo 16 al 30 de junio del 2024**, se procedió con su revisión, identificando la siguiente Curva S de Avance Físico de la Obra (AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO):

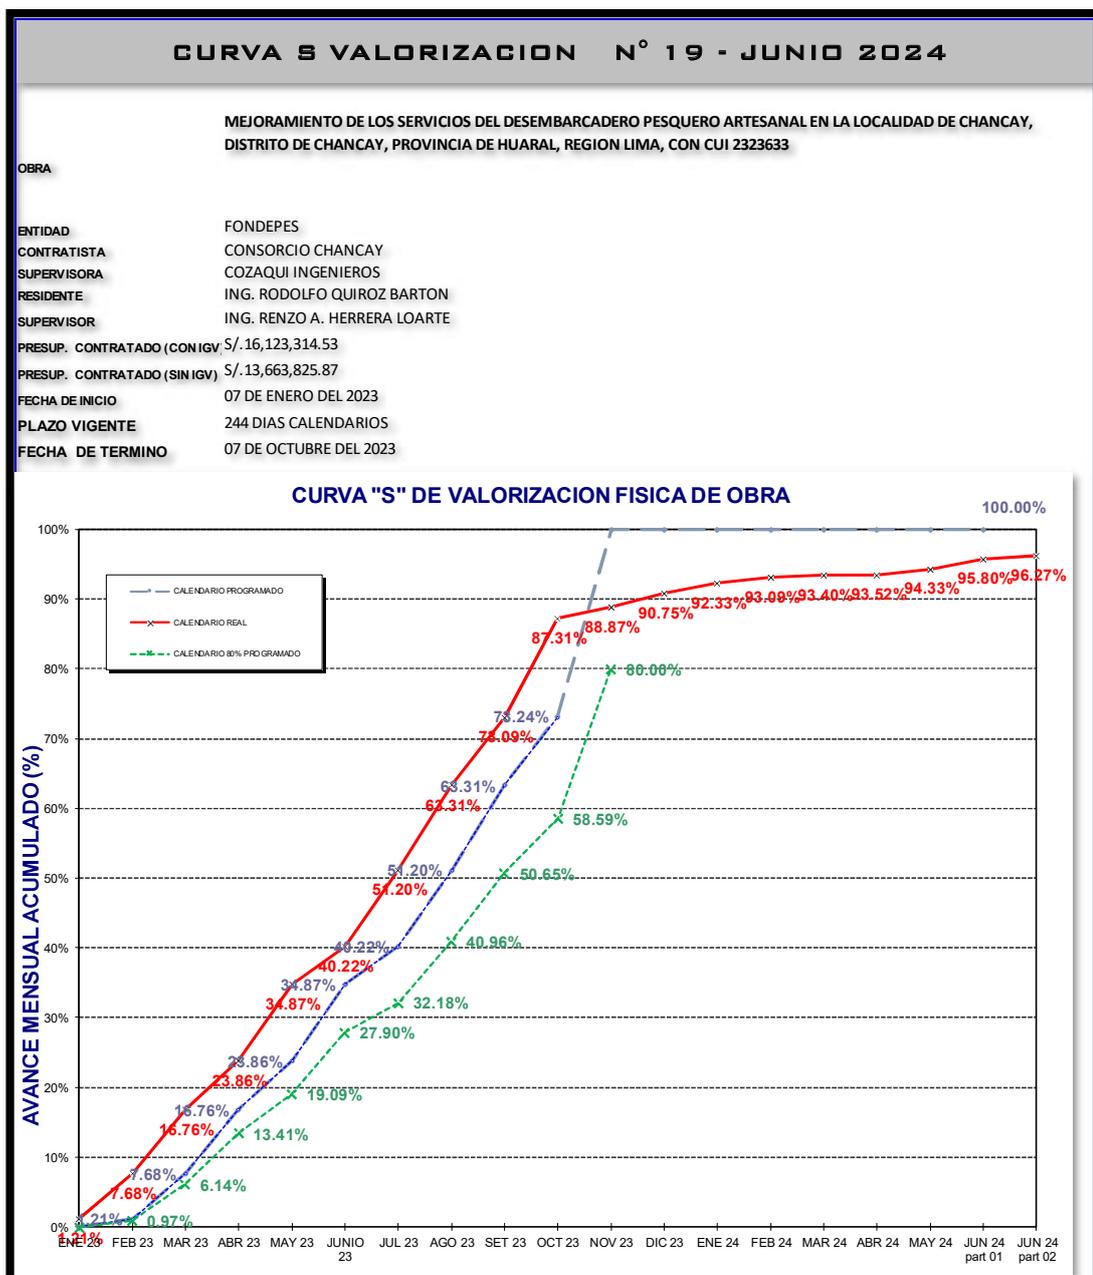

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres»  
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

MES	PROGRAMADO (SIN IGV)			EJECUTADO (SIN IGV)			ESTADO DE LA OBRA	
	PARCIAL S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %	PARCIAL S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %	MENSUAL	ACUMULADA
ENE 23	165,405.94	1.21%	1.21%	165,405.95	1.21%	1.21%	ADELANTADO	ADELANTADO
FEB 23	883,804.65	6.47%	7.68%	883,804.65	6.47%	7.68%	ADELANTADO	ADELANTADO
MAR 23	1,240,508.77	9.08%	16.76%	1,240,508.78	9.08%	16.76%	ADELANTADO	ADELANTADO
ABR 23	970,580.37	7.10%	23.86%	970,580.37	7.10%	23.86%	ADELANTADO	ADELANTADO
MAY 23	1,504,576.31	11.01%	34.87%	1,504,576.30	11.01%	34.87%	ADELANTADO	ADELANTADO
JUNIO 23	731,333.02	5.35%	40.22%	731,333.02	5.35%	40.22%	ADELANTADO	ADELANTADO
JUL 23	1,499,479.85	10.97%	51.20%	1,499,479.85	10.97%	51.20%	ADELANTADO	ADELANTADO
AGO 23	1,654,597.35	12.11%	63.31%	1,654,597.35	12.11%	63.31%	ADELANTADO	ADELANTADO
SET 23	1,357,235.89	9.93%	73.24%	1,336,671.28	9.78%	73.09%	ATRASADO	ATRASADO
OCT 23	3,656,303.72	26.76%	100.00%	1,942,619.94	14.22%	87.31%	ATRASADO	ATRASADO
NOV 23			100.00%	213,989.04	1.57%	88.87%	ATRASADO	ATRASADO
DIC 23			100.00%	256,798.16	1.88%	90.75%	ATRASADO	ATRASADO
ENE 24			100.00%	215,867.20	1.58%	92.33%	ATRASADO	ATRASADO
FEB 24			100.00%	103,436.46	0.76%	93.09%	ATRASADO	ATRASADO
MAR 24			100.00%	42,179.16	0.31%	93.40%	ATRASADO	ATRASADO
ABR 24			100.00%	17,088.74	0.13%	93.52%	ATRASADO	ATRASADO
MAY 24			100.00%	110,908.14	0.81%	94.33%	ATRASADO	ATRASADO
JUN 24 part 01			100.00%	201,081.57	1.47%	95.80%	ATRASADO	ATRASADO
JUN 24 part 02			100.00%	64,256.80	0.47%	96.27%	ATRASADO	ATRASADO
<b>TOTAL</b>	<b>13,663,825.87</b>	<b>100.00%</b>		<b>13,155,182.76</b>	<b>96.27%</b>			

La obra tiene un avance acumulado de **96.27%** hasta el 30 de junio del 2024.

La obra tiene un atraso de **3.73%** respecto al programado

La obra al **07 de octubre del 2023** debería de estar al **100%** de avance en su ejecución física, por lo que, la obra se encuentra atrasada y en periodo de penalidad.

- 3.2. Según la **Valorización de obra N°19 – del periodo 16 al 30 de junio del 2024**, el supervisor informó que la obra tiene un avance de **0.47% correspondiente** al periodo de la segunda quincena de junio **del 2024** y un **96.27%** de avance acumulado de ejecución física.

## **VALORIZACION DE OBRA N° 19** **RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR**

► ENTIDAD EJECUTORA	FONDEPES		
► OBRA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA, CON CUI 2323633		
► CONTRATISTA	CONSORCIO CHANCAY		
► SUPERVISA	COZAQUI INGENIEROS		
► SUPERVISOR	ING. RENZO A. HERRERA LOARTE		
► RESIDENTE	ING. RODOLFO QUIROZ BARTON		
► MODALIDA DE EJECUCION	SUMA ALZADA		
► MONTO REFERENCIAL	: 17,914,793.91	INC. IGV	
► MONTO CONTRATADO	: 16,123,314.53	INC. IGV	

**16-30 de JUNIO 2024**

ADELANTOS OTORGADOS	FECHA	MONTO C/IGV	MONTO S/IGV	% PRESUPUESTO
1.- Adelanto Directo	ENERO 2023	1,612,331.45	1,366,382.59	10.00%
2.- Adelanto de Materiales	ABRIL 2023	3,224,662.91	2,732,765.17	20.00%
<b>TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO</b>		<b>4,836,994.36</b>	<b>4,099,147.76</b>	<b>30.00%</b>

DESCRIPCION	MONTO S/.
<b>RESUMEN DE SUB. TOTALES</b>	
E01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	0.00
E02 ESTRUCTURAS	9,347.48
E03 ARQUITECTURA	0.00
E04 INSTALACIONES SANITARIAS	0.00
E05 INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION	29,530.97
E06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	25,378.35
<b>VALORIZACION PARCIAL</b>	<b>S/. 64,256.80</b>
<b>RESUMEN DE REAJUSTES</b>	<b>1,207.25</b>
<b>REAJUSTE</b>	
E01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	
E02 ESTRUCTURAS	448.68
E03 ARQUITECTURA	
E04 INSTALACIONES SANITARIAS	
E05 INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION	1,063.11
E06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	-304.54
<b>RESUMEN DE DEDUCCION DE REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN</b>	<b>12.00</b>
POR ADELANTO DIRECTO	12.00
POR ADELANTO PARA MATERIALES	
<b>VALORIZACION BRUTA (V.B.)</b>	<b>S/. 65,452.05</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>	
ADELANTO DIRECTO 10.00%	6,425.68
ADELANTO DE MATERIALES N°01	
ADELANTO DE MATERIALES N°02	
ADELANTO DE MATERIALES N°03	
<b>VALORIZACION NETA (V.N.)</b>	<b>S/. 59,026.37</b>
IGV 18% (VN)	10,624.75
<b>MONTO A FACTURAR : VN+IGV</b>	<b>S/. 69,651.12</b>

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres»  
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

**CONTROL DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO:**

VALORIZACIONES EJECUTADOS (SIN IGV)			ADELANTO DIRECTO	AMORTIZACIÓN AD. DIRECTO	SALDO POR AMORTIZAR
No.	MES	MONTO VALORIZADO (V)	(A)	(Am) =V*A/C	S = A-Am
1	Enero 2023	-	-	-	-
2	Febrero 2023	795,424.19	1,366,382.59	88,380.47	1'278,002.12
3	Marzo 2023	745,511.43		124,050.88	1'153,951.24
4	Abril 2023	520,167.86		97,058.04	1'056,893.21
5	Mayo 2023	887,136.32		150,457.63	906,435.57
6	Junio 2023	441,652.20		73,133.30	833,302.27
7	Julio 2023	1,229,596.85		149,947.99	683,354.29
8	Agosto 2023	1,230,973.43		182,000.34	501,353.96
9	Setiembre 2023	877,242.18		133,667.13	367,686.83
10	Octubre 2023	1,633,033.51		194,261.99	173,424.83
11	Noviembre	198,765.17		21,398.90	152,025.93
12	Diciembre 2023	229,435.80		25,679.82	126,346.11
13	Enero 2024	190,828.77		21,586.72	104,759.39
14	Febrero 2024	96,297.04		10,343.65	94,415.75
15	Marzo 2024	28,363.02		4,217.92	90,197.83
16	Abril 2024	16,176.36		1,708.87	88,488.96
17	Mayo 2024	110,908.14		11,090.81	77,398.15
18	Junio 2024	217,872.17		20,108.16	57,289.99
19	Julio	64,256.80		6,425.68	50,864.30

**CONTROL DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES N°1:**

Monto adelantado sin IGV				1,366,689.96
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES				
VALORIZACIÓN		AMORTIZACIÓN		
MES	N° 01	F.P. N° 01	ACUMUL.	SALDO
Ene-23	0	0	0	0
Feb-23	0	0	0	0
Mar-23	745,511.43	370,946.48	370,946.48	995,743.48
Abr-23	520,167.86	353,354.47	724,300.95	642,389.01
May-23	887,136.32	367,067.82	1'102,951.04	263,738.91
Jun-23	441,652.20	153,125.85	1,256,076.89	110,613.07
Jul-23	1,229,596.85	110,613.07	1,366,689.96	0.00

**CONTROL DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES N°2:**

Monto adelantado sin IGV				886,689.96
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES				
VALORIZACIÓN		AMORTIZACIÓN		
MES	N ° 01	F.P. N° 01	ACUMULADO	SALDO
Ene-23	0	0	0	0
Feb-23	0	0	0	0
Mar-23	0	0	0	0
Abr-23	0	0	0	0
May-23	0	0	0	0
Jun-23	0	0	0	886,689.96
Jul-23	1,229,596.85	164,237.85	164,237.85	722,452.11
Ago-23	1,230,973.43	187,997.76	352,235.61	534,454.34
Set-23	877,242.18	325,748.10	677,983.71	208,706.25
Oct-23	1,633,033.51	196,859.51	874,843.22	11,846.74
Nov-23	198,765.17	1,950.41	876,793.63	9,896.33
Dic-24	229,435.80	0	876,793.63	9,896.33
Ene-24	190,828.77	9,896.33	886,689.96	0

**CONTROL DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES N°3:**

Monto adelantado sin IGV				479,385.26
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES				
VALORIZACIÓN		AMORTIZACIÓN		
MENS.	N° 01	F.P. N° 01	ACUMULADO	SALDO
Ene-23	0	0	0	0
Feb-23	0	0	0	0
Mar-23	0	0	0	0
Abr-23	0	0	0	0
May-23	887,136.32	99,914.53	99,914.53	379,470.73
Jun-23	441,652.20	63,421.67	163,336.18	316,049.08
Jul-23	1,229,596.85	140,743.00	304,079.18	175,306.08
Ago-23	1,230,973.43	107,672.74	411,751.92	67,633.34
Set-23	877,242.18	67,633.34	479,385.26	0.00

### 3.3. Resumen de Valorización de Obra:

Luego de revisar la documentación que sustenta por el supervisor de obra correspondiente a la **Valorización de obra N°19 – Periodo del 16 al 30 de junio del 2024**, aprobada y remitido por la Supervisión, tiene la siguiente estructura de pagos:

Valorización Neta	59,026.37
IGV (18%)	10,624.75
<b>TOTAL</b>	<b>69,651.12</b>

3.4. El supervisor de obra aprobó la **Valorización de obra N°19 – Periodo del 16 al 30 de junio del 2024**, por el monto de **S/ 69,651.12 (Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Uno con 12/100 soles) incluido IGV**, en función de los metrados ejecutados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad en cada componente. Es importante señalar que, que la valorización es aprobada por la supervisión de obra con la **CARTA N°096-2024-COZAQUI /YYSCD-GG**, por cuanto es el responsable directo de velar por el control de los trabajos en la obra, cautelando de forma permanentemente y directa, la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado.

3.5. Como parte del contrato N°059-2022-FONDEPES, el contratista de obra CONSORCIO CHANCAY, **solicitó la retención del 10% como garantía de fiel cumplimiento** conforme al decreto de urgencia N°020-2022, en donde se establece medidas extraordinarias y complementarias, durante el año fiscal 2022, para la reactivación económica en el marco del sistema nacional de abastecimiento, en virtud a ello el órgano encargado de las contrataciones OEC, efectuó la retención de acuerdo al siguiente cuadro:

Mes de la Valorización	FIEL CUMPLIMIENTO		S/ 1,612,331.45	
	Programado	Retenido	Saldo por retener en el periodo	Saldo por retener
Ene-23	403,082.86	187,371.86	215,711.00	1,424,959.59
Feb-23	403,082.86	618,793.87	-	806,165.73
Mar-23	403,082.86	403,082.86	-	403,082.86
Abr-23	403,082.86	403,082.86		0.00
	1,612,331.45	1,612,331.45		

3.6. Adicional a ello el contratista de obra presenta el reporte de las consultas realizadas en el mes (Folios 35-37).

## 4. PARTICIPACION DE ESPECIALISTAS

En la presente valorización de obra N° 18 correspondiente a la primera consulta del mes de junio del 2024, se han ejecutado trabajos relacionados a la especialidad de estructuras, instalaciones eléctricas y equipamiento.

## 5. APROBACION DE REAJUSTRES DE LAS VALORIZACIONES 07, 08 Y 09

5.1. Con fecha 10 de agosto del 2023, mediante Memorando N° 003096-2023-FONDEPES/DIGENIPAA, se precisa el cumplimiento con todos los requisitos establecidos en la Ley N° 30225, ley de contrataciones y su reglamento, por lo que la DIGENIPAA concluye que la ENTIDAD debe proseguir con el trámite de pago de la **VALORIZACIÓN DE OBRA N° 07**- correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio del 2023 la suma de S/ 1,450,924.28 (Un millón cuatrocientos cincuenta mil novecientos veinticuatro con 28/100 soles) incluido IGV.

5.2. Con fecha 13 de setiembre del 2023, mediante Memorando N° 003682-2023-FONDEPES/DIGENIPAA, se precisa el cumplimiento con todos los requisitos establecidos en la Ley N° 30225, ley de contrataciones y su reglamento, por lo que la DIGENIPAA concluye que la ENTIDAD debe proseguir con el trámite de pago de la **VALORIZACIÓN DE OBRA N° 08** - correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto del 2023, la suma de S/ 1,452,548.65 (Un millón cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos cuarenta y ocho con 65/100 soles) incluye IGV.

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres»  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- 5.3. Con fecha 20 de octubre del 2023, mediante Memorando N° 004417-2023-FONDEPES/DIGENIPAA, se precisa el cumplimiento con todos los requisitos establecidos en la Ley N° 30225, ley de contrataciones y su reglamento, por lo que la DIGENIPAA concluye que la ENTIDAD debe proseguir con el trámite de pago de la **VALORIZACIÓN DE OBRA N° 09** - correspondiente al periodo del 16 al 30 de setiembre del 2023, la suma de S/ 1,035,145.77 (Un millón treinta y cinco mil ciento cuarenta y cinco con 77/100 soles) incluye IGV.
- 5.4. Es preciso señalar e informar que, referente al pago de **las VALORIZACIONES N° 07, 08 y 09**, se pagó el monto total de S/ 3,938,618.71 (tres millones novecientos treinta y ocho mil seiscientos dieciocho con 71/100 soles) **monto que incluye los reajustes**, los mismos que fueron aprobados y cuentan con la conformidad por parte de la Unidad Funcional de Infraestructura y de la DIGENIPAA, mediante los Memorando N° 003096-2023-FONDEPES/DIGENIPAA, Memorando N° 003682-2023-FONDEPES/DIGENIPAA, Memorando N° 004417-2023-FONDEPES/DIGENIPAA, según como se detalla a continuación:

VALORIZACIÓN	MES	MONTO PAGADO	DOCUMENTO
VAL 7	Jul-23	1,450,924.29	Memorando 003096-2023-DIGENIPAA
VAL 8	Ago-23	1,452,548.62	Memorando 003682-2023-DIGENIPAA
VAL 9	Set-23	1,035,145.78	Memorando 004417-2023-DIGENIPAA
<b>Monto total</b>		<b>3,938,618.71</b>	

- 5.5. Al respecto, se precisa que por el concepto de reajustes de las valorizaciones 07, 08 y 09 se pagó el monto total de S/ 492,443.84 (Cuatrocientos noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y tres con 84/100 soles) inc. IGV, y se informa que cuentan con conformidad por parte de la Unidad Funcional de Infraestructura y de la DIGENIPAA, mediante los Memorando N° 003096-2023-FONDEPES/DIGENIPAA, Memorando N° 003682-2023-FONDEPES/DIGENIPAA, Memorando N° 004417-2023-FONDEPES/DIGENIPAA, según como se detalla a continuación:

VALORIZACIÓN	REAJUSTE TOTAL CON IGV	DOCUMENTO DE APROBACIÓN
VAL 7	348,877.50	Memorando 003096-2023-DIGENIPAA
VAL 8	63,775.37	Memorando 003682-2023-DIGENIPAA
VAL 9	79,790.97	Memorando 004417-2023-DIGENIPAA
<b>Monto total</b>	<b>492,443.84</b>	

## 6. PENALIDADES Y OTRAS PENALIDADES

- 6.1. El contratista de obra CONSORCIO CHANCAY a la fecha ingreso a periodo de penalidad<sup>1</sup> por mora toda vez que, su plazo contractual **venció del 07 de octubre del 2023**, lo cual corresponde aplicar la penalidad por mora en su ejecución, por lo tanto, la penalidad por mora en la ejecución de la prestación será deducida en la liquidación del contrato con cargo a la garantía de fiel cumplimiento, en atención al numeral 161.4 del artículo 161 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- 6.2. Del reglamento de la ley de contrataciones de estado en su el Artículo 189 indica lo siguiente: *En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de inspección o supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de las valorizaciones y/o de la liquidación del contrato de ejecución de obra. La Entidad puede asumir provisionalmente dichos costos durante la ejecución de la obra, cuando corresponda*".

<sup>1</sup> Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso (...)

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres»  
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

6.3. De lo mencionado en el artículo 189 del RLCE se recomienda que, el mayor costo por extensión del servicio de supervisión de obra se hará efectivo en la liquidación del contrato de ejecución de la obra.

## 7. OTRAS PENALIDADES

- 7.1. El contratista de obra CONSORCIO CHANCAY al no haber presentado la información completa para efectos de trámite de la valorización correspondiente a la segunda quincena del mes de junio, se requiere al órgano encargado de las contrataciones del FONDEPES la aplicación de la siguiente otra penalidad.
- 7.2. Mediante CARTA N°028-2024-CCH, de fecha 10.07.2024 la empresa contratista CONSORCIO CHANCAY remite a la supervisión de la obra el levantamiento de observación de la valorización N°19 correspondiente a la segunda quincena del mes de junio del 2024.
- 7.3. Mediante CARTA N°096-2024-COZAQUI/YYSCD-GG, de fecha **12.07.2024**, la supervisión de obra presenta a la Entidad, el levantamiento de observaciones de la valorización de obra N°19 correspondiente al periodo **16 al 30 de junio del 2024**, correspondiente a la segunda quincena, con toda la documentación requerida
- 7.4. Al respecto la supervisión de obra informa que el contratista de obra demoro **siete (07) días** en remitir la información completa, penalidad que sería descontado en la liquidación del contrato de obra de conformidad con el artículo 161.42 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

<u>ENTREGA DE DOCUMENTACION O INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON ERRORES</u>		
7	Cuando el Contratista entregue de forma incompleta o con errores los documentos e informes siguientes: - Informe técnico de revisión del expediente técnico de obra - Cronograma de ejecución de obra CPM para el perfeccionamiento del contrato - Cronograma actualizado al inicio de obra - Cronograma reprogramado - <u>Valorizaciones mensuales</u> - Resultados de los controles de calidad - Liquidaciones de contratos de obra - Pólizas de seguro CAR - Otros informes solicitados por la Supervisión o la Entidad	0.5 UIT por la presentación en forma incompleta y/o con errores y por cada día transcurrido hasta la subsanación correspondiente
		Según informe del Inspector o Supervisor de la obra, según corresponda

## 8. CONCLUSIONES

- 8.1. El Supervisor de obra Ing. **Renzo Alberto Herrera Loarte con CIP N° 210189, APROBÓ la VALORIZACIÓN N°19 del periodo del 16 al 30 de junio del 2024**, de la obra “Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Chancay, distrito de Chancay, provincia de Huaral, región Lima”, presentado a la entidad con la **CARTA N°096-2024-COZAQUI /YYSCD-GG** del 12 de julio del 2024, por el monto de pago de **S/217,872.17 (doscientos diecisiete mil ochocientos setenta y dos con 17/100 soles) incluido IGV.**
- 8.2. En ese sentido, el suscrito en calidad de administrador del contrato de obra señalada, al haber verificado que, el contratista cumplió con entregar la documentación técnica y administrativa indicada en el contrato y con la aprobación del supervisor de obra, considera procedente otorgar la conformidad al pago de la valorización por el importe de **S/ 69,651.12 (Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Uno con 12/100 soles) incluido IGV.**
- 8.3. La obra presenta un atraso del **0.47%** por lo que hasta el 07 de octubre del 2023 estaba programado un avance acumulado del 100%  
 El plazo contractual venció del 07 de octubre del 2023, lo cual corresponde aplicar la penalidad por mora en su ejecución, por lo tanto, la penalidad por mora en la ejecución de la prestación será deducida en la liquidación del contrato con cargo a la garantía de fiel cumplimiento, en atención al numeral 161.4 del artículo 161 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres»  
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

8.4. En la presente valorización el contratista ha incurrido en penalidad, siendo siete (07) días de demora por parte del contratista en remitir la información a la supervisión.

## 9. RECOMENDACIONES.

9.1. Cumplidos los requisitos establecidos en la normativa y la relación contractual vigente con la supervisión de obra, se recomienda que el Director de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, otorgue la conformidad correspondiente, para que la entidad proceda con el pago de la Valorización de obra **N°19**, correspondiente al **periodo del 16 al 30 junio del 2024**, dentro del plazo legal vigente, por la suma de **S/ 69,651.12 (Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Uno con 12/100 soles) incluido IGV.**

9.2. El contratista de obra al estar en periodo de penalidad y adicional a ello al haber llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora en la ejecución de su prestación, correspondería el cobro de la valorización por extensión del servicio de supervisión de conformidad con el artículo N°189

Es cuanto tengo que informar a Ud. para los fines que estime convenientes.

Atentamente;

[https://drive.google.com/drive/folders/1lqN9ih\\_2afFhbIHx0bGeSIHJuGR2ei79?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1lqN9ih_2afFhbIHx0bGeSIHJuGR2ei79?usp=drive_link)
