

JULIACA
Av. Nueva Zelandia No. 539
TeleFax 051-326355
rojas_2080_consultor@hotmail.com

CONSORCIO INGENIERIA HIDRAULICA




81

CARTA N° 020-2016-CIH/C

SEÑOR:

Ing. JORGE ALEJANDRO MEDINA ROSELL
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
AV. PETIT THOUARS N° 115 – CERCADO DE LIMA
Lima.-



Lima, 04 de Marzo del 2016.



ATENCION : **ING. CARLOS M. SANABRIA ESQUICHE**
COORDINADOR DE OBRA

ASUNTO : **PRESENTAMOS LA VALORIZACION N° 16,**
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO -2016
DEL CONTRATISTA CONSORCIO MANCORA

REF. : **CONTRATO N° 015-2015-FONDEPES**
SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGION
PIURA".

De nuestra mayor consideración:

Por medio del presente, previo cordial saludo, nos dirigimos a Ustedes, con la finalidad de Presentar la Valorización No. 16, correspondiente al mes de Febrero – 2016, para el Pago al Contratista Ejecutor de Obra CONSORCIO MANCORA.

Procedimiento aplicado conforme establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Aprobado mediante D.S. No. 184-2008-EF, modificado mediante D.S. N° 138-2012-EF), Artículo 197°.- Valorizaciones y Metrados.

Expediente que presentamos dentro del plazo otorgado por la referida norma legal.

Sin otro particular, quedamos anticipadamente de ustedes, aprovechando la oportunidad para reiterarles nuestras consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

CONSORCIO INGENIERIA HIDRAULICA

Srta. Elizabeth Campos Mamant
DNI: 78036336
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO INGENIERIA HIDRAULICA

DIONISIO ROJAS MAMANT
ING. CIVIL / CIP. N° 62336
JEFE DE SUPERVISION

SUPERVISIÓN DE LA OBRA:

78

**“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE
TALARA, REGIÓN PIURA”**

1. FICHA TECNICA Y DATOS GENERALES DE LA OBRA**1.1 DATOS GENERALES****1.1.1 DEL CONTRATISTA:**

- | | |
|----------------------------|---|
| a. Contratista | : CONSORCIO MANCORA |
| b. Contrato de Ejecución | : Contrato N°062-2014-FONDEPES/OGA |
| c. Sistema de Contratación | : Precios Unitarios. |
| d. Monto del Contrato | : S/. 7'678,006.01 |
| e. Firma del Contrato | : 21 de Octubre del 2014 |
| f. Residente | : Ing. Juan Manuel Manco Céspedes – CIP. 15727 |
| g. Representante Legal | : Emiliano Isaac Trujillo Luna |
| h. Domicilio | : Av. Próceres de Independencia N° 3634, urb.
Canto Grande 2da. Etapa (2 Cuadras antes de
ESSALUD). |

1.1.2 DE LA SUPERVISIÓN:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| a. Consultoría de Supervisión | : CONSORCIO INGENIERIA HIDRAULICA |
| b. Contrato de Supervisión de Obra | : Contrato No. 015-2015-FONDEPES |
| c. Convocatoria Supervisión de Obra | : AMC N° 8-2015-FONDEPES derivada del CP
N° 006-2014-FONDEPES |
| d. Sistema de Contratación | : Suma Alzada |
| e. Monto del Contrato | : S/. 286,065.10 |
| f. Fecha de Suscripción de Contrato | : 16 de Junio del 2015 |
| g. Jefe Supervisor de Obra | : Ing. Dionisio Rojas Mamani – CIP. 62336 |
| h. Representante Legal | : Srta. Elizabeth Campos Mamani |
| i. Dirección | : Pasaje Los Fresnos No. 122 – Santa Anita – Lima
Avda. Nueva Zelandia No. 539 - Juliaca |

1.2 FICHA TÉCNICA:**1.2.1 CONTRATISTA:****DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA EL CONTRATISTA**

- | | |
|---|----------------------------------|
| a. Plazo de Ejecución | : 330 días calendarios |
| b. Fecha de Entrega de terreno | : 30 de Octubre del 2014 |
| c. Monto de Adelanto Directo | : S/. 1'535,601.20 (INC. I.G.V.) |
| d. Fecha de Inicio de Plazo Contractual | : 06 Noviembre del 2014 |
| e. Fecha de Término de Obra | : 01 de Octubre del 2015 |

DE LOS ADELANTOS:

- | | |
|------------------------------|--|
| i. Fecha de Adelanto Directo | : 04 de noviembre del 2014 |
| j. Monto de Adelanto Directo | : S/. 1'535,601.20 – INC. I.G.V. (20%) |

VIGENCIA DE LAS CARTAS FIANZAS:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| k. Carta Fianza Fiel Cumplimiento | : N° 0011-0962-9800015195-85 |
|-----------------------------------|------------------------------|

CONSORCIO INGENIERIA HIDRAULICA


 DIONISIO ROJAS MAMANI
 INGENIERO CIVIL, N° 62336
 JEFE DE SUPERVISIÓN

- Banco Continental - BBVA
Fecha Vencimiento: 09/10/2015
Importe: S/. 767,801.00
- Renovación de Carta Fianza Fiel Cumplimiento : N° 0011-0962-9800015195-85
Banco Continental - BBVA
Fecha Vencimiento: 29/02/2016
Importe: S/. 767,801.00
- l. Carta Fianza Fiel Cumplimiento Adicional N°2 : N° 0011-0962-9800023988-83
Banco Continental - BBVA
Fecha Vencimiento: 29/02/2016
Importe: S/. 24,681.00
- m. Carta Fianza Fiel Cumplimiento Adicional N°3 : No reporta el Contratista.
- n. Carta Fianza Adelanto Directo : N° 0011-0962-9800015799-84
Banco Continental - BBVA
Fecha Vencimiento: 25/02/2015
Importe: S/. 1'535,601.20
- Renovación de Carta Fianza Adelanto Directo : N° 0011-0962-9800015799-84
Banco Continental - BBVA
Prorrogado y reducido con
Fecha Vencimiento: 24/08/2015
Importe: S/. 1'085,000.00
- Renovación de Carta Fianza Adelanto Directo : N° 0011-0962-9800015799-84
Banco Continental - BBVA
Fecha Vencimiento: 22/11/2015
Importe: S/. 789,071.00
- Renovación de Carta Fianza Adelanto Directo : N° 0011-0962-9800015799-84
Banco Continental - BBVA
Fecha Vencimiento: 20/02/2016
Importe: S/. 529,552.00

DE LOS PRESUPUESTOS ADICIONALES:

- o. Adicional N° 01 : Denegado.
Resolución Jefatural N° 279-2015FONDEPES/J
04/09/2015.
- p. Adicional N° 02 : Aprobado.
Resolución Jefatural N° 282-2015FONDEPES/J
07/09/2015.
Monto Aprobado S/. 246,801.98
Incidencia VS. Monto Contratado 3.33%.
- q. Adicional N° 03 : Aprobado.
Resolución Jefatural N° 362-2015-FONDEPES/J
16/12/2015.
Monto Aprobado S/. 130,255.76
Monto Aprobado efectivo S/. 124,255.76
Incidencia VS. Monto Contratado 1.62%
Incidencia VS. Monto Contratado Acumulado
4.83%
- r. Adicional N° 04 : Aprobado.

CONSORCIO INGENIERIA HIDRAULICA



DIONISIO ROJAS MAMANI
ING. CIVIL (G) N° 62336
JEFE DE SUPERVISION

Resolución Jefatural N° 075-2016-FONDEPES/J
16/12/2015.

Monto Aprobado S/. 840,136.40

Monto Aprobado efectivo S/. 743,210.06

Incidencia VS. Monto Contratado 10.94%

Incidencia VS. Monto Contratado Acumulado
14.51%

76

DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZOS DE EJECUCION DE OBRA:

- s. Ampliación de Plazo N° 01 : Denegada.
Resolución de Secretaria General
N° 041-2015-FONDEPES/SG.
19/03/2015

- t. Ampliación de Plazo N° 02 : Aprobado.
Resolución de Secretaria General
N° 129-2015-FONDEPES/SG.
03/09/2015
54 Días Calendarios
Nueva fecha de vencimiento de Plazo 24/11/2015

- u. Ampliación de Plazo N° 03 : Aprobado.
Resolución de Secretaria General
N° 193-2015-FONDEPES/SG.
01/12/2015
23 Días Calendarios
Nueva fecha de vencimiento de Plazo 17/12/2015

- v. Ampliación de Plazo N° 04 : Aprobado.
Resolución de Secretaria General
N° 210-2015-FONDEPES/SG.
30/12/2015
22 Días Calendarios
Nueva fecha de vencimiento de Plazo 08/01/2016

- w. Ampliación de Plazo N° 05 : Aprobado.
Resolución de Secretaria General
N° 011-2016-FONDEPES/SG.
28/01/2016
29 Días Calendarios
Nueva fecha de vencimiento de Plazo 06/02/2016

- x. Ampliación de Plazo N° 06 : Aprobado.
Resolución de Secretaria General
N° 028-2016-FONDEPES/SG.
26/01/2016
29 Días Calendarios
Nueva fecha de vencimiento de Plazo 02/03/2016

DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA:

- y. Residente de Obra : Ing. Juan Manuel Manco Céspedes – CIP. 15727
Oficina: Mancora
Teléfonos: 999011411

CONSORCIO INGENIERIA HIDRAULICA

DIONISIO ROJAS MAMANI
ING. CIVIL / CIP. N° 62336
JEFE DE SUPERVISIÓN

1.2.2 SUPERVISIÓN**DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN**

- a. Plazo de Ejecución : 270 días calendarios
 b. Fecha de Inicio de Servicios : 17 de Junio del 2015
 c. Fecha de Culminación : 12 de Marzo del 2016

DE LOS ADELANTOS:

- d. Adelanto Directo : No se ha solicitado

DE LOS PRESUPUESTOS ADICIONALES DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN:

- e. Adicional N° 01 : No se tiene

VIGENCIA DE LAS CARTAS FIANZAS:

- f. Carta Fianza Fiel Cumplimiento : REMYPE, retención del 10% del Monto del Contrato
Monto retenido S/. 28,606.51
 g. Carta Fianza de Adelanto : No se ha solicitado.

DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA:

- h. Jefe de Supervisión : Ing. Dionisio Rojas Mamani
Oficina en Obra: Mancora
Teléfonos: 951416356, RPM: *553714
E_mail: rojas_2080_consultor@hotmail.com
 i. Asistente de Supervisión : Ing. Julio Quispe Pampamalco.
 Nuevo Asistente de Supervisión : Ing. Víctor Plasencia Tuco
 j. Gerente de Supervisión : Ing. Juan Roger Quintanilla Anyaipoma.
 k. Especialista en Seguridad : Ing. Fernando Coila Llanque.
 Nuevo Especialista de Seguridad : Ing. Leónidas Quispe Pampamalco.

DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZOS DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA:

- z. Ampliación de Plazo N° 01 : Denegada.
Resolución de Secretaria General
N° 207-2015-FONDEPES/SG.
23/12/2015
 aa. Ampliación de Plazo N° 02 : Denegada.
Resolución de Secretaria General
N° 009-2016-FONDEPES/SG.
27/01/2016
 bb. Ampliación de Plazo N° 03 : Aprobado
Resolución de Secretaria General
N° 019-2016-FONDEPES/SG.
15/02/2016
21 Días Calendarios


CONSORCIO INGENIERIA HIDRAULICA

DIONISIO ROJAS MAMANI
 INGL CIVIL - CIP. N° 62336
 JEFE DE SUPERVISIÓN

CONTROL DE AVANCE DE OBRA - GRAFICO CURVA S

VALORIZACION DE OBRA N° 16 - FEBRERO - 2016

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, REGION PIURA.
 ENTIDAD : FONDEPES
 SUPERVISION : CONSORCIO INGENIERIA HIDRAULICA Jefe de Supervision : Ing. Dionisio Rojas Mamani CIP N° 62336
 CONTRATISTA : CONSORCIO MANCORA Residente : Ing. Juan Manuel Manco Céspedes CIP. 15737
 FECHA : 31 DE ENERO DEL 2016

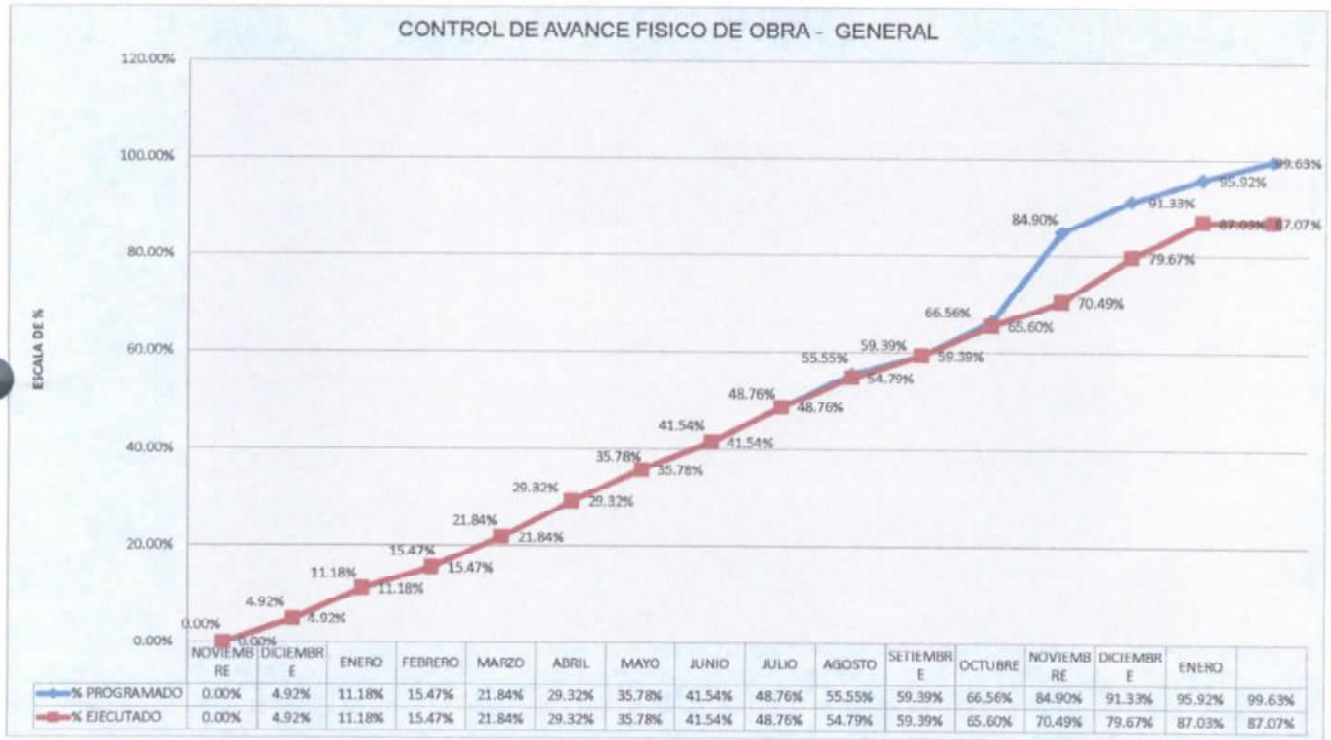

MES	FECHA		AVANCE FISICO PROGRAMADO		% PROGRAMADO		AVANCE FISICO DEL MES (EJECUTADO)		% EJECUTADO		BALANCE	
	INICIO	FIN	AVANCE FISICO PROGRAMADO	AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO	% DEL MES PROGRAMADO	% ACUMULADO	AVANCE FISICO DEL MES (EJECUTADO)	AVANCE FISICO DEL MES ACUMULADO (EJECUTADO)	% AVANCE FISICO DEL MES (EJECUTADO)	(BASE AVANCE FISICO DEL MES (EJECUTADO))	DESFASE DE OBRA (AVANCE-SAP)	CONDICION DE OBRA (AVANCE/SAP) > 80%
NOVIEMBRE	06/11/2014	30/11/2014	268,127.97	268,127.97	4.92%	4.92%	268,127.97	268,127.97	4.92%	4.92%	0.00%	OK
DICIEMBRE	01/12/2014	31/12/2014	341,006.60	609,134.57	6.26%	11.18%	341,006.60	609,134.57	6.26%	11.18%	0.00%	OK
ENERO	01/01/2015	31/01/2015	233,657.83	842,792.40	4.29%	15.47%	233,657.83	842,792.40	4.29%	15.47%	0.00%	OK
FEBRERO	01/02/2015	28/02/2015	346,024.05	1,188,717.35	6.37%	21.84%	346,024.05	1,188,717.35	6.37%	21.84%	0.00%	OK
MARZO	01/03/2015	31/03/2015	406,975.94	1,596,693.29	7.47%	29.32%	406,975.94	1,596,693.29	7.47%	29.32%	0.00%	OK
ABRIL	01/04/2015	30/04/2015	351,959.21	1,948,652.50	6.46%	35.78%	351,959.21	1,948,652.50	6.46%	35.78%	0.00%	OK
MAYO	01/05/2015	31/05/2015	313,862.04	2,262,514.54	5.70%	41.54%	313,862.04	2,262,514.54	5.70%	41.54%	0.00%	OK
JUNIO	01/06/2015	30/06/2015	393,270.48	2,655,785.02	7.22%	48.76%	393,270.48	2,655,785.02	7.22%	48.76%	0.00%	OK
JULIO	01/07/2015	31/07/2015	369,923.36	3,025,708.38	6.79%	55.55%	328,349.89	2,984,134.91	6.03%	54.79%	-0.76%	ATRAZADO
AGOSTO	01/08/2015	31/08/2015	208,807.01	3,234,515.39	3.83%	59.39%	250,380.48	3,234,515.39	4.60%	59.39%	0.76%	OK
SEPTIEMBRE	01/09/2015	30/09/2015	390,410.96	3,624,926.35	7.17%	66.56%	338,249.89	3,572,765.28	6.21%	65.60%	-0.96%	OK
OCTUBRE	01/10/2015	31/10/2015	999,212.79	4,624,139.14	18.35%	84.90%	266,214.68	3,838,979.96	4.89%	70.49%	-13.46%	ATRAZADO
NOVIEMBRE	01/11/2015	30/11/2015	350,000.00	4,974,139.14	6.43%	91.33%	500,322.26	4,339,302.22	9.19%	79.67%	2.76%	OK
DICIEMBRE	01/12/2015	31/12/2015	250,000.00	5,224,139.14	4.59%	95.92%	400,635.19	4,739,937.41	7.36%	87.03%	2.77%	OK
ENERO	31/01/2016	31/12/2015	202,251.26	5,426,390.42	3.74%	99.63%	2,430.48	4,742,367.89	0.04%	87.07%	-3.67%	ATRAZADO
FEBRERO	27/09/2453	21/06/2584	20,043.10	5,446,433.52	0.37%	100.00%	240.86	4,742,608.75	0.00%	87.08%	-0.36%	ATRAZADO
TOTAL			5,446,433.52			99.63%						

CONSORCIO INGENIERIA HIDRAULICA
 DIONISIO ROJAS MAMANI
 ING. CIVIL / CIP. N° 62336
 JEFE DE SUPERVISION

RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR

VALORIZACION DE OBRA N° 16 - FEBRERO - 2016

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, REGIÓN PIURA.
 ENTIDAD : FONDEPES
 SUPERVISION : CONSORCIO INGENIERIA HIDRAULICA
 CONTRATISTA : CONSORCIO MANCORA
 FECHA : 31 DE ENERO DEL 2016

MONTO DEL CONTRATO CON IGV 7,678,006.01 INCLUYE IGV
 MONTO DEL CONTRATO SIN IGV 6,506,784.75 SIN IGV

ADELANTOS OTORGADOS	FECHA	MONTO C/IGV	MONTO S/IGV	PORCENTAJE (%)
1.- Adelanto Directo	05/11/2014	1,535,601.20	1,301,356.95	20.00%
2.- Adelanto de Materiales				
TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO		1,535,601.20	1,301,356.95	20.00%
RESUMEN				
VALORIZACION DE OBRA N° 16 - FEBRERO - 2016				
DESCRIPCION				MONTO S/.
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS				
FORMULA 01 : ARQUITECTURA				10,240.45
FORMULA 02 : ESTRUCTURAS EN TIERRA				0.00
FORMULA 03 : OBRAS PORTUARIAS				28,546.98
FORMULA 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS				0.00
FORMULA 05 : INSTALACIONES SANITARIAS				21,999.59
FORMULA 06 : VIA DE ACCESO				0.00
FORMULA 07 : EQUIPAMIENTO				1,920.00
FORMULA 08 : MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL				0.00
COSTO DIRECTO TOTAL				62,707.02
GASTOS GENERALES	9.81%			6,214.27
UTILIDADES	10.00%			6,270.70
SUB-TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL				75,191.99
FACTOR RELACION	1.000			75,191.99
SUB - TOTAL VALORIZACION CONTRACTUAL				75,191.99
RESUMEN DE REAJUSTES				
(SE HA REAJUSTADO UTILIZANDO LOS INDICES UNIFICADOS PUBLICADO A LA FECHA - DICIEMBRE 2015)				
FORMULA 01 : ARQUITECTURA		Kr = 1.079		970.07
FORMULA 02 : ESTRUCTURAS EN TIERRA		Kr = 1.080		0.00
FORMULA 03 : OBRAS PORTUARIAS		Kr = 1.109		3,731.15
FORMULA 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS		Kr = 1.135		0.00
FORMULA 05 : INSTALACIONES SANITARIAS		Kr = 1.099		2,611.59
FORMULA 06 : VIA DE ACCESO		Kr = 1.138		0.00
FORMULA 07 : EQUIPAMIENTO		Kr = 1.074		170.37
FORMULA 08 : MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL		Kr = 1.103		0.00
			REINTEGRO	7,483.18
DEDUCCIONES:				
.-DEDUCCION DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DIRECTO				
FORMULA 01 : ARQUITECTURA		Kr = 1.079		121.84
FORMULA 02 : ESTRUCTURAS EN TIERRA		Kr = 1.080		0.00
FORMULA 03 : OBRAS PORTUARIAS		Kr = 1.109		447.20
FORMULA 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS		Kr = 1.135		0.00
FORMULA 05 : INSTALACIONES SANITARIAS		Kr = 1.099		347.98
FORMULA 06 : VIA DE ACCESO		Kr = 1.138		0.00
FORMULA 07 : EQUIPAMIENTO		Kr = 1.074		0.00
FORMULA 08 : MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL		Kr = 1.103		0.00
			DEDUCCION	917.02
VALORIZACION BRUTA (V.B)				81,758.15
AMORTIZACIONES				
Amortización Adelantos Directos	20.00%			19,743.13
Amortización de Adelantos de materiales	0.00%			0.00
			TOTAL	19,743.13
VALORIZACION NETA (V.N)				62,015.02
MONTO A FACTURAR AL CONTRATISTA				
IGV 18%(VN)	18.00%			11,162.70
TOTAL VN - IGV				73,177.72


 Srta. Elizabeth Campos Mamani
 DNI: 70036330
 REPRESENTANTE LEGAL


 DIONISIO ROJAS MAMANI
 ING. CIVIL IGP. N° 62356
 JEFE DE SUPERVISION

RESUMEN GENERAL

VALORIZACION DE OBRA N° 16 - FEBRERO - 2016

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, REGION PIURA.

ENTIDAD : FONDEPES
 SUPERVISION : CONSORCIO INGENIERIA HIDRAULICA
 CONTRATISTA : CONSORCIO MANCORA
 FECHA : 31 DE ENERO DEL 2016

MONTO DEL CONTRATO CON IGV	7,678,006.01	INCLUYE IGV
MONTO DEL CONTRATO SIN IGV	6,506,784.75	SIN IGV

CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	VAL. ACUM. ANTERIOR	VALORIZACION ACTUAL	VAL. ACUM ACTUAL	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
TOTAL CONTRACTUAL SIN IGV	6,506,784.75					
VALORIZACION CONTRACTUAL		5,782,376.84	75,191.99	5,857,568.83	90.02%	9.98%
REAJUSTE		348,325.34	7,483.18	355,808.52		
DEDUCCIONES		25,419.35	917.02	25,336.37		
VALORIZACION BRUTA		6,105,282.83	81,758.15	6,187,040.98		
AMORTIZACIONES						
DEL ADELANTO DIRECTO		870,588.07	19,743.13	890,331.20		
DEL ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00		
TOTAL AMORTIZACIONES		870,588.07	19,743.13	890,331.20		
VALORIZACION NETA		5,234,694.76	62,015.03	5,296,709.78		
I.G.V. 18.00%	1,171,221.26	942,245.06	11,162.70	953,407.76		
TOTALES	7,678,006.01	6,176,939.81	73,177.72	6,250,117.54	90.02%	9.98%


 CONSORCIO INGENIERIA HIDRAULICA
 Srta. Elizabeth Campos Manara
 DNI: 80036339
 REPRESENTANTE LEGAL


 CONSORCIO INGENIERIA HIDRAULICA
 Sr. [Illegible]
 DNI: [Illegible]
 REPRESENTANTE LEGAL
