


FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

MEMORANDO N° 656 -2018-FONDEPES/DIGENIPAA



A: **C.P.C. JAVIER CHANG SERRANO**
Jefe de la Oficina General de Administración

Asunto: **SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE VALORIZACIÓN DE OBRA N°5 - FEBRERO 2018**
CONTRATO N°028-2017-FONDEPES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA"

Referencia: a) CARTA N°019-2018-CMM
b) INFORME N°043-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/RAS

Fecha: **Lima, 21 MAR 2018**

Por medio de la presente, me dirijo a usted para saludarlo y manifestarle que, de acuerdo a lo indicado en la carta de la referencia a), el contratista **P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.** encargado de la Ejecución de la Obra **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA"**; ha solicitado la **VALORIZACION DE OBRA N°05** correspondiente al **CONTRATO N°028-2017-FONDEPES**.



En vista de lo solicitado y tal como se indica en el Informe de la referencia b); se han cumplido con todos los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, el contrato, las bases integradas y demás documentos que forman parte integrante del expediente de contratación; por lo que esta Dirección concluye que **LA ENTIDAD** debe otorgar la **Valorización N°05 - febrero 2018** solicitada.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración.

Atentamente;

FONDEPES
Ing. Luis Alberto Barbieri Quino
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola

CCP-153

LABQ/RAMG/RAS






CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por el presente documento, que el director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, al suscribir la presente; da su conformidad para realizar el pago por concepto de **VALORIZACION DE OBRA N°5 - FEBRERO 2018** por la suma de **S/0.00 (CERO CON 00/100 SOLES)** a favor del contratista **P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.** encargado de la Ejecución de Obra: **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA”**; según **CONTRATO N°028-2017-FONDEPES.**

Lima, 10.11.2017




FONDEPES

Ing. Luis Barberi Quino
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola

CCP-153



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



INFORME N°043-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/RAS

A: **ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO**
Director General de la DIGENIPAA

Asunto: **VALORIZACION DE OBRA N°05 - FEBRERO-2018 - P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.**
CONTRATO N° 028-2017-FONDEPES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA"

Referencia: **CARTA N°019-2018-CMM**

Fecha: **Lima, 15 de marzo de 2018**

Por medio de la presente, me dirijo a usted para saludarlo y manifestarle que, según la carta de la referencia, el **CONSORCIO MESONES MURO** encargado de la Supervisión de Obra; manifiesta que el contratista de ejecución **P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.** encargado de la Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA"**; ha presentado la **VALORIZACION DE OBRA N° 05**, correspondiente al mes de febrero de 2018. Al respecto, debo manifestar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1 Datos generales:

Proceso de Selección:	LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2017-FONDEPES
Contrato:	CONTRATO N° 028-2017-FONDEPES
Fecha de Firma de Contrato:	15 DE SETIEMBRE DE 2017
Obra:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA
Sistema del Contrato:	PRECIOS UNITARIOS
Monto de Contrato:	S/ 8'871,166.29 (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 29/100 SOLES)
Contratista Ejecución de Obra:	P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.
Residente de Obra:	ING. JORGE JULIO ESPICHAN AVILES
Contratista Supervisión de Obra:	CONSORCIO MESONES MURO
Supervisor de Obra:	ING. LUIS ALBERTO AVILA MORALES
Plazo de Ejecución:	240 (DOSCIENTOS CUARENTA) DIAS CALENDARIO
Adelanto Directo (10%):	S/ 887,116.63 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISEIS CON 63/100 SOLES)
Fecha de Pago Adelanto Directo:	240 (DOSCIENTOS CUARENTA) DIAS CALENDARIO
Fecha de Entrega de Terreno:	29 DE SETIEMBRE DE 2017
Fecha de Inicio de Obra:	30 DE SETIEMBRE DE 2017
Fecha Valorización N° 05:	28 DE FEBRERO DE 2018





II. ANÁLISIS

2.1 La Cláusula Cuarta: Del Pago; se indica lo siguiente:

"LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de valorización mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. (...)"

2.2 En las bases integradas, numeral 2.7 Valorizaciones, se indica lo siguiente:

"El periodo de valorización será mensual. De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del Artículo 166° del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo".

2.3 Asimismo, en las bases integradas, numeral 3.14 Valorizaciones, Presentaciones de Informes y Pago, se indica lo siguiente:

"(...) Los metrados de obra ejecutados, se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor y presentados al FONDEPES dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o el supervisor no se presentan para la valorización conjunta con el contratista, éste la efectúa. El inspector o supervisor debe revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.

El contratista está obligado a presentar para la aprobación de la supervisión y remisión al FONDEPES, informes mensuales de avance de Obra y otros informes que el supervisor y la entidad solicite, los cuales se presentarán como máximo el quinto (5to) día hábil de cada mes junto con la valorización mensual de avance de obra correspondiente (...)"

2.4 El mes de FEBRERO 2018 no se realizó ninguna actividad dentro de la obra por motivos de paralización debido a los acontecimientos descritos en el Informe de Supervisión N°18-2018/LAAM/JS. (Artefacto explosivo encontrado en obra el 30 de enero de 2018)

2.5 El resumen de Valorización de Obra N°05, es el siguiente:





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”



RESUMEN GENERAL
VALORIZACIÓN N° 05
Febrero 2018

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
UBICACIÓN: MARCONA - NAZCA - ICA.
CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
FECHA: 28 de Febrero del 2018

I.- MONTO PRESUPUESTO CONTRACTUAL SIN IGV :	S/.	7,517,837.53
II.- VALORIZACIÓN	S/.	0.00
COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES + UTILIDAD	S/.	0.00
AMORTIZACIÓN ADELANTO DIRECTO	S/.	0.00
AMORTIZACIÓN ADELANTO POR MATERIALES	S/.	0.00
DEDUCTIVO	S/.	0.00
SUB TOTAL	S/.	0.00
VALORIZACIÓN:	S/.	0.00
IGV 18 %:		0.00
TOTAL (incl. IGV):	S/.	0.00
IV.- PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL		
Porcentaje de avances de la presente valorización:		0.00%
Porcentaje de avance acumulado:		17.28%

Son: Cero con 00/100 Soles incluido IGV.

Figura 1: Resumen General Valorización N°5

- 2.6 Los gastos por reconocer a la fecha según el contratista P.S.V CONSTRUCTORES de acuerdo al Informe presentado N°11-2018/PSV-CMM, está compuesta por MAYORES GASTOS GENERALES, COSTOS POR DAÑOS Y PERJUICIOS y COSTOS POR REANUDACIÓN, tal como se muestra a continuación;



Descripción	Parcial sin IGV
Mayores Gastos Generales	S/97,707.77
Costos por daños y perjuicios N°1	S/84,773.55
Costos por daños y perjuicios N°2	S/11,626.20
Costos por reanudación	S/23,862.28
Total de costos solicitados por P.S.V.	S/217,969.80

Tabla N°1: Resumen de costos solicitados por P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

00014



MAYORES GASTOS GENERALES

Febrero 2018

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA.
UBICACION: MARCONA - NASCA - ICA.
CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
FECHA: 28 de Febrero del 2018

I.- MONTO PRESUPUESTO CONTRACTUAL SIN IGV :		S/. 7,517,937.83
II.- GASTOS GENERALES	12.30%	S/. 701,062.14
III.- PLAZO DE OBRA CONTRACTUAL		240.00 Días
III.- CÁLCULO DEL COSTO DIARIO POR GASTOS GENERALES		S/. 3,296.93
IV.- CÁLCULO DEL COSTO POR GASTOS GENERALES POR 30 DÍAS Del 30/01/2018 al 29/02/2018 son 30 días calendario		S/. 97,707.77
SUB TOTAL		97,707.77
IGV 18 %:		17,587.46
TOTAL (incl. IGV):		S/. 115,295.17

Son: Ciento quince mil doscientos noventa y cinco con 17/100 Soles incluido IGV.

Figura 2: Mayores Gastos Generales – Febrero 2018

00012



COSTOS POR DAÑOS Y PERJUICIOS

Febrero 2018

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA.
UBICACION: MARCONA - NASCA - ICA.
CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
FECHA: 28 de Febrero del 2018

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Parcial
01	Perdida de Cemento Tipo V	Bis	877.00	16.95	11,475.15
02	Transporte para eliminación de cemento	Viaje	1.00	3,400.00	3,400.00
03	Aulino removedor de oxido para limpieza de armadura	Qin	110.00	40.56	4,462.00
04	Mano de Obra para limpieza de armadura habilitada y colocada	H=1	432.00	17.07	7,374.24
05	Mano de Obra para reemplazo de alambre N° 18 de armadura habilitada y colocada	H=1	288.00	17.07	4,916.16
06	Alquiler de encofrado metálico	Mes	1.00	6,679.60	6,679.60
07	Stand By de equipos propios	Mes			44,266.20
07.01	Grúa de Celosía Fuchs F118.3 20 Ton.	Mes	1.00	32,640.00	32,640.00
07.02	Camioneta Pick UP	Mes		Considerado en GG	
07.03	Equipo Menores	Mes	1.00	11,626.20	11,626.20

SUB TOTAL	S/. 84,773.65
IGV 18 %:	S/. 15,288.24
TOTAL (incl. IGV):	S/. 100,061.89

Son: Cien mil treinta y dos con 73/100 Soles incluido IGV.

Figura 3: Costos por daños y perjuicios N°1 – Febrero 2018





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

00011



COSTOS POR DAÑOS Y PERJUICIOS

Febrero 2018

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA.
UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.
CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
FECHA: 28 de Febrero del 2018

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Cantidad Todo Proyecto	Cantidad por mes	Parcial
07.04	Trompo mezcladora de concreto	Unid.	2.00	25.00	1,810.00	168.75	4,719.00
07.05	Vibradores de concreto	Unid.	2.00	15.00	1,015.00	126.84	1,903.29
07.06	Vibro Apilador	Unid.	1.00	10.00	570.50	0.00	0.00
07.07	Plancha Compactadora	Unid.	1.00	10.00	570.50	71.38	713.93
07.08	Andamios	Cuerpo	8.00	2.50	4,015.34	501.92	1,254.76
07.09	Inversora Miller	Unid.	1.00	15.00	54.40	5.80	102.00
07.10	Equipo de oír-orte	Unid.	2.00	10.00	440.20	55.03	650.25
07.11	Generador Electrico Panther 170F	Unid.	1.00	35.00	27.20	3.40	119.00
07.12	Nivel Topográfico	Unid.	1.00	Considerado en los GC			
07.13	Mesa Sierra Circular	Unid.	1.00	5.00		49.00	770.00
07.14	Sierra circular manual	Unid.	1.00	6.00	102.88	12.96	77.16
07.15	Tronzadora	Unid.	1.00	10.00		96.00	960.00
07.16	Amoladoras	Unid.	1.00	10.00	283.66	35.46	354.58
07.17	Taladro	Unid.	1.00	10.00	122.00	15.25	182.50

SUB TOTAL POR MES S/. 11,526.26

Figura 4: Costos por daños y perjuicios N°2 – Febrero 2018

00015



COSTOS DE REANUDACIÓN

Febrero 2018

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA.
UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.
CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
FECHA: 28 de Febrero del 2018

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Parcial
Examen Médico Pre-ocupacional para el personal	Unid.	40.00	145.42	5,816.80
Paseje Marcona - Lima (por paralización de obra) Personal	Unid.	20.00	59.32	1,186.44
Mano de obra calificada				
Paseje Marcona - Lima (por paralización de obra) personal Staff	Unid.	9.00	59.32	533.90
Paseje Lima - Marcona (reanudación de obra) Personal	Unid.	23.00	59.32	1,166.44
Mano de obra calificada				
Paseje Lima - Marcona - Lima (reanudación de obra)	Unid.	9.00	59.32	533.90
personal Staff				
EPP (Uniforme, bota, casco, guantes, etc.) Dos juego por persona)	Juego	80.00	148.42	11,873.60
Inducción de ingreso de personal (40 instructores x 4 horas c/u)	H/H	160.00	17.07	2,731.20

SUB TOTAL S/. 23,662.28
IGV 18 % S/. 4,259.21
TOTAL (incl. IGV) S/. 28,167.49

Son: Veintidós mil ciento cincuenta y siete con 49/100 Soles incluido IGV.

Figura 5: Costos por reanudación – Febrero 2018



III. CONCLUSIONES

3.1 El contratista Supervisor de Obra **CONSORCIO MESONES MURO**, ha remitido la **CARTA N° 019-2018-CMM**, mediante la cual aprueba la **Valorización de Obra N° 05** correspondiente al mes de FEBRERO de 2018 (Figura N°1 *Resumen General Valorización N°1*), presentada por el contratista **P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.**, encargada de la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA"**.

3.2 El contratista Supervisor de Obra **CONSORCIO MESONES MURO**, recomienda reconocer el monto por concepto de análisis de gastos generales en el informe elaborado por ellos, con una suma de **S/.22,800.00** (Veintidós Mil, Ochocientos con 00/100 soles) sin IGV.



**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”**

Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables

Item	Descripción	Unid.	Cant. Descripción	Tiempo Total de Participación	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
1.00 PERSONAL DE OBRA						TOTAL= 16,000.00
INGENIERÍA						
1.01	Ingeniera Residente de Obra	Mes	1.00	1.00	16,000.00	16,000.00
						SUB TOTAL 16,000.00
ADMINISTRACIÓN						
1.11	Administrador de Obra	Mes	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
1.14	Guardián	Mes	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
						SUB TOTAL 6,000.00
3.00 VEHICULOS						TOTAL= 5,500.00
3.01	Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4/radio transmisor (*)	Mes	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
(*) Incluye operador						
7.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES						TOTAL= 1,800.00
7.01	Gerente de Obra	Mes	0.15	1.00	12,000.00	1,800.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES S/.						23,800.00
IGV 18 %						4188
TOTAL (Incl. IGV):						28,000.00

Figura 6: Análisis de Gastos Generales recomendado por supervisión – Febrero 2018

IV. RECOMENDACIONES

4.1 Se recomienda que la **DIGENIPAA** otorgue la conformidad respectiva, para que la Oficina General de Administración le dé continuidad a los procedimientos correspondientes.

Es cuanto tengo que informar a Ud. para los fines que estime convenientes.

Atentamente;


Ricardo Alvarado Solomayo
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. No. 76979

Con la conformidad del Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento; pase el presente informe y los antecedentes, a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola; para su atención y trámite correspondiente.



187

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PRESS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04702867

Usuario: **jmoralesc**
Fecha: **21/03/2018**
Hora: **07:33**



CARGO 00067-2018-FONDEPES/JMC

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA
Asunto: SE SOLICITA CONTINÚE CON TRÁMITE, CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO N° 153-2018, VALORIZACIÓN N° 05 DEL EJECUTOR-PERÍODO FEBRERO 2018 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA DE SAN JUAN DE MARCONA -NAZCA-ICA


Referencia:

Fecha: 21/03/2018

Observación:

Atentamente,

[Handwritten Signature]
MORALES CUZCANO JUAN
JMC





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04701205

Usuario: **pruiz**
Fecha: **16/03/2018**
Hora: **11:35**



CARGO 00721-2018-FONDEPES/AOEM

A: MORALES CUZCANO JUAN
Asunto: CARTA N° 019-2018-CMM
REMITE VALORIZACIÓN N° 05 DEL EJECUTOR-PERIDO FEBRERO 2018 REF: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA DE SAN JUAN DE MARCONA -NAZCA-ICA"
Referencia: INFORME 00043-2018-FONDEPES/RAS
Fecha: 16/03/2018
Observación: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A OGA



AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO

cop 153

PSA


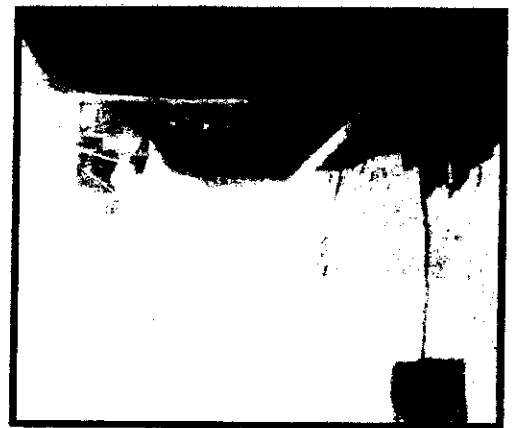


Figura 6: Vidrios de las oficinas rotos



CONSORCIO MESONES MURO
Calle Rodriguez Trigoso N° 110 (3er
piso), Urb. Villarreal - Chiclayo
TELEFONOS: #949611859 / 949611859



"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

Lima, 05 de Marzo del 2018

CARTA N° 019-2018-CMM

Señores:

Luis Alberto Barbieri Quino - DIGENIPAA
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES
Av. Petit Thouars N° 115, Cercado de Lima

Atención

Ing. Ricardo Tomás Altuna Sotomayor

Coordinador de Obra

Presente.-

Asunto : Valorización N° 05 – del Ejecutor (Periodo Febrero del 2018)

Referencia : Contrato N° 028-2017-FONDEPES
Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los servicios del desembarcadero
pesquero artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona,
provincia de Nazca, Región Ica"

De mi Especial consideración:

Quien suscribe, **Juan Esteban Zapata Zuloeta**, identificado con DNI N° **41349923**, representante legal del **Consortio Mesones Muro**, con **RUC N° 20600617614**, me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente, asimismo solicitarle el pago de la **valorización N° 05** - del ejecutor, correspondiente al periodo Febrero del 2018, materia del contrato de la referencia.

Por lo tanto esta Supervisión aprueba la valorización N° 05 del ejecutor de obra, ya que la Obra se encontró **Suspendida** durante todo el mes de Febrero del 2018 por los problemas ya mencionados que ocurrieron en la Obra, por lo que se recomienda cancelar el monto señalado en el informe elaborado por nuestra supervisión (análisis de gastos generales), al contratista **P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.**

Asimismo, hacemos de su conocimiento que la obra se encuentra **Atrasada**.

CONSORCIO MESONES MURO

Ing° Juan Esteban Zapata Zuloeta
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO MESONES MURO
Ing. Juan Esteban Zapata Zuloeta
REPRESENTANTE LEGAL
Cel.: 949611859
estebanzuloeta@hotmail.com

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO

	
2692928	
N° DOC:	00001740-2018
CLAVE:	3620
USUARIO:	dgalindo
FECHA Y HORA:	05/03/2018 14:36:23
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	

Adjunto Informe N 18-2018/LAAM/JS
Ajunto CD

estebanzuloeta@hotmail.com

/ jez

156

CONSORCIO MESONES MURO
Calle Rodríguez Trigoso N° 110 (3er piso), Urb. Villarreal - Chiclayo
TELEFONOS: #949611859 / 949611859



INFORME DE SUPERVISIÓN N° 18-2018/LAAM/JS

VALORIZACIÓN N° 05
(DEL 01/02/2018 al 28/02/2018)

A : **CONSORCIO MESONES MURO**
Empresa Supervisora
Calle Rodríguez Trigoso N° 110 (tercer piso) – Urb. Federico Villarreal, distrito y
provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque

DE : **Ing. Luis Alberto Avila Morales**
Jefe de Supervisión

ASUNTO : **Informe Mensual de Supervisión del Mes de Febrero**

FECHA : **Marcona, 02 de Marzo del 2018**

1. GENERALIDADES

1.1. Entidad contratante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES

1.2. Modalidad : Contrata

1.3. Obra : “Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, Región Ica”

1.4. Jefe de Supervisión : Luis Alberto Avila Morales

1.5. Residente de obra : Jorge Julio Espichan Aviles

2. DATOS GENERALES

2.1. Contratista de la Obra : P.S.V. CONSTRUCTORES S.A

2.2. Contrato de Obra N° : 028-2017-FONDEPES

2.3. Fecha de contrato ejecutor : 15/09/2017

2.4. Monto de Contrato ejecutor : S/. 8'871,166.29, incluido I.G.V.

2.5. Plazo de Ejecución : 240 días calendarios

2.6. Empresa Supervisora : CONSORCIO MESONES MURO

2.7. Contrato de Supervisión N° : 027-2015-FONDEPES

2.8. Fecha de contrato supervisor : 01/09/2015

2.9. Monto de Contrato supervisor : S/. 318,661.60, incluido I.G.V.

2.10. Plazo de Supervisión : 285 días calendarios

2.11. Monto del Adelanto Directo al Contratista (con IGV) : S/. 887,116.63

2.12. Fecha de pago del Adelanto Directo : 27/09/2017

CONSORCIO MESONES MURO

Ing° Juan Espinoza
REPRESENTANTE LEGAL

155

CONSORCIO MESONES MURO
Calle Rodríguez Trigoso N° 110 (3er piso), Urb. Villarreal - Chiclayo
TELEFONOS: #949611859 / 949611859



- 2.13. Monto del Adelanto de Materiales al Contratista (con IGV) : S/. 1'774,233.30
- 2.14. Fecha de pago del Adelanto de Materiales : 24/11/2017
- 2.15. Fecha de entrega de terreno : 29/09/2017
- 2.16. Fecha de inicio de ejecución de obra: 30/09/2017
- 2.17. Fecha de término Contractual : 27/05/2018
- 2.18. Garantía de Fiel Cumplimiento, Carta Fianza N° : 1842201 (La Positiva Seguros): S/. 887,116.63
- 2.19. Garantía de Adelanto Directo, Carta Fianza N° : 30000531 (La Positiva Seguros): S/. 887,116.63
- 2.20. Garantía de Adelanto de Materiales Carta Fianza N° : 30003281 (La Positiva Seguros): S/. 1'774,233.30
- 2.21. Ampliaciones de Plazo : Se ha presentado una ampliación de plazo (el 30/11/2017), se está a la espera de respuesta.
- 2.22. Adicionales de Obra : No hubo (al 31/01/2018)
- 2.23. Deductivos de Obra : No hubo (al 31/01/2018)
- 2.24. Seguros : AVLA Perú Compañía de Seguros S.A.
- 2.24.1. Vida Ley : Del 20/09/2017 - 31/05/2018
- 2.24.2. Complementario de Trabajo y riesgo : Del 01/09/2017 - Indefinido
- 2.24.3. Todo riesgo y montaje : Del 15/09/2017 - 31/05/2018

3. SITUACIÓN DE LA OBRA

3.1 ASPECTO TÉCNICO

3.1.1 Situación de la Obra al 28/02/2018:

a. Resumen del Trabajo Efectuado

Este mes de febrero no se realizó ningún tipo de trabajo por motivos de paralización de la obra por los acontecimientos sucedidos (se encontró un artefacto explosivo en obra).

3.1.2 Avance de Obra

- a. Avance Programado Vigente 16.74 %
- b. Avance ejecutado en el Mes 0.00 %
- c. Avance Programado Acumulado al Mes 36.94 %
- d. Avance Ejecutado Acumulado al Mes 17.28 %

Situación Actual de la Obra: **SUSPENDIDA**

CONSORCIO MESONES MURO

Ing° Juan E. Zuloeta
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO MESONES MURO
Calle Rodriguez Trigoso N° 110 (3er piso), Urb. Villarreal - Chiclayo
TELEFONOS: #949611859 / 949611859



3.1.3 Plan de Trabajo

- Para este mes de febrero, no se realizó ningún plan de trabajo ya que a la actualidad la obra se encuentra **SUSPENDIDA**.

3.1.4 Desarrollo de la Obra

a. Aspectos Críticos

El 30 de enero del 2018, se encontró en obra un artefacto explosivo (granada tipo piña) la cual ha traído como consecuencia la Suspensión de la Obra hasta la actualidad, poniendo de conocimiento a FONDEPES con CARTA N° 016-2018-CMM sobre la Supervisión de la Obra.

b. Problemas Presentados

Este mes no se ha presentado problemas en la ejecución de partidas ya que no se realizaron trabajos por la Suspensión de la obra.

El ingeniero Residente continuó con el llenado de Cuaderno de Obra con los siguientes asientos: Asiento N° 174 con fecha 01/02/2018, Asiento N° 175 con fecha 05/02/2018, Asiento N° 176 con fecha 08/02/2018, Asiento N° 178 con fecha 18/02/2018, Asiento N° 179 con fecha 24/02/2018, Asiento N° 180 con fecha 27/02/2018 y Asiento N° 181 con fecha 28/02/2018.

Por parte de la Supervisión no se pudo llenar cuaderno de obra por tenerlo en su poder el Ing. Residente.

c. Acciones Correctivas

Asiento N° 171 del Supervisor del 30/01/18

El día de hoy en la mañana se constató la presencia de una granada de guerra dentro de la zona de trabajo se le comunicó a la policía y se realizó la denuncia ante la policía.

Debido a la presencia de este artefacto se tomó la decisión de Suspender la obra por medida de seguridad y evitar algún tipo de accidente al personal que labora en la Obra.

Hoy a la 6:45 pm recién fue desactivada la granada por la Policía Nacional.

3.1.5 Condiciones Meteorológicas

El clima es cálido árido, con escasas precipitaciones.

3.1.6 Resultados de la Inspección y Control de Calidad

Se tomaron las siguientes:

CONSORCIO MESONES MURO

Ing° Juan Esteban Zuloeta
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO MESONES MURO
Calle Rodriguez Trigoso N° 110 (3er piso), Urb. Villarreal - Chiclayo
TELEFONOS: #949611859 / 949611859



- No se realizaron ningún tipo de pruebas y/o ensayos de control de seguridad.

3.1.7 Equipo Estratégico empleado por el Contratista

Por motivo de la **Obra Suspendida** no se utilizaron los equipos correspondientes para este mes de la obra en mención.

3.1.8 Personal Profesional y Técnico empleado por el Contratista

- 01 Ingeniero Residente de obra
- 01 Ingeniero Asistente de Oficina Técnica
- 01 Administrador

3.1.9 Visitas efectuadas por Funcionarios de la Entidad

Este mes de febrero no se ha realizado ninguna visita por parte de la Entidad, pero se mantiene una constante comunicación entre las partes respectivas.

3.1.10 Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- El avance ejecutado mensual es de **0.00 %**, por estar paralizada.
- El avance ejecutado acumulado mensual es **17.28 %**, se mantiene el mismo avance puesto que se encuentra Suspendida.
- El avance programado Acumulado Mensual es de **36.94 %**
- Por lo tanto la obra se encuentra **Suspendida y Retrasada.**
- La Entidad FONDEPES **no** es responsable por los Costos solicitados como **Costos por Daños y Prejuicios y Costos de Reanudación.**

Recomendaciones


- La Supervisión recomienda al Contratista realizar con anticipación cualquier consulta para no generar atraso en su ruta crítica debido a la falta de información o pronunciamiento de especialistas.
- Se le recomienda al contratista tener mucha consideración de las sugerencias dadas por la Supervisión sobre los trabajos programados en el mes.
- **LA SUPERVISIÓN CONCLUYE QUE LA VALORIZACIÓN N° 05, tiene valor Cero** por la Suspensión de la obra.

CONSORCIO MESONES MURO

Ing° Juan L. Zuloeta
REPRESENTANTE

152

CONSORCIO MESONES MURO
 Calle Rodriguez Trigoso N° 110 (3er piso), Urb. Villarreal - Chiclayo
 TELEFONOS: #949611859 / 949611859



- LA SUPERVISIÓN RECOMIENDA RECONOCER LOS GASTOS GENERALES UTILIZADOS EN EL MES DE FEBRERO, de acuerdo al siguiente cuadro:

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESENAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, DEPARTAMENTO DE ICA"

Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables

Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Tiempo Total de Participacion	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
1.00	PERSONAL DE OBRA				TOTAL=	16,000.00
	INGENIERÍA					
1.01	Ingeniero Residente de Obra	Mes	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
					SUB TOTAL	10,000.00
	ADMINISTRACIÓN					
1.11	Administrador de Obra	Mes	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
1.14	Guardián	Mes	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
					SUB TOTAL	6,000.00
3.00	VEHÍCULOS				TOTAL=	5,000.00
3.01	Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4/radio transmisor (*) (*) Incluye operador	Mes	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
7.00	GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES				TOTAL=	1,800.00
7.01	Gerente de Obra	Mes	0.15	1.00	12,000.00	1,800.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES S/.						22,800.00
IGV 18 %						4104
TOTAL (Incl. IGV):						26,904.00

CONSORCIO MESONES MURO

Ing° Juan Es... Zuloeta
 REPRESE... AL

CONSORCIO MESONES MURO
Calle Rodríguez Trigoso N° 110 (3er piso), Urb. Villarreal - Chiclayo
TELEFONOS: #949611859 / 949611859



3.2 ASPECTO ECONÓMICO DE LA OBRA

Número de valorizaciones tramitadas	:	5	
Número de valorizaciones pagadas	:	3	
Monto valorizado en el mes	:	S/.	0,000.00
Adelanto Directo Amortizado al mes	:	S/.	0,000.00
Adelanto Amortizado al mes	:	S/.	0,000.00
Subtotal (Sin IGV)	:	S/.	0,000.00
Monto a Pagar (Incluido IGV)	:	S/.	0,000.00

3.3 ASPECTO ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA


- Ingeniero Residente:
- Nombre : Ing. Jorge Julio Espichan Aviles
- Registro CIP N° : 119009
- DNI : 10323344

4.0 DOCUMENTOS ANEXOS

- ✓ Valorización mensual de Supervisión de obra
- ✓ Valorización mensual de Ejecutor de obra
- ✓ Panel Fotográfico
- ✓ Documentos tramitados ante la Entidad y recibidos
- ✓ Acta de Entrega de Terreno
- ✓ Copias del cuaderno de obra del mes valorizado
- ✓ Copia de Contrato de Supervisión
- ✓ Ficha RUC del CONSORCIO MESONES MURO, encargado de facturar
- ✓ Certificado de habilidad del Jefe de Supervisión de Obra
- ✓ Factura en original


 Luis Alberto Avila Morales
 Jefe de Supervisión

Adjunto valorización N° 05 del Ejecutor

CONSORCIO MESONES MURO

 Ing° Juan Espichan Aviles
 REPRESENTANTE

Zuloeta
C.A.T.



00150

Carta N° 063-2018/PSV-CMM

San Juan de Marcona, 28 de Febrero del 2018.

Señores:

CONSORCIO MESONES MURO

Atención:

Ing. Luis Alberto Avila Morales

Supervisor de Obra

Asunto : Entrega de Informe Mensual Febrero 2018


Referencia: Obra: "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia de Nazca, Región Ica".


De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted para hacerle llegar un saludo cordial y al mismo tiempo hacerle llegar el Informe Mensual de Obra correspondiente al mes de Febrero 2018, de la Obra de la referencia, para su revisión y aprobación.

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente,


JORGE JULIO
ESPICHAN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009


02/03/2018

INFORME N° 011-2018/PSV-CMM

A : **Ing. Luis Alberto Avila Morales**
Supervisor de Obra - Consorcio Mesones Muro

DE : **Ing. Jorge Espichán Avilés**
Residente de Obra - PSV Constructores S.A.

ASUNTO : Informe Mensual del Mes de Febrero 2018.

FECHA : 28 de Febrero del 2018.

REFERENCIA : Obra: "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia Nazca, Región Ica".



CONTENIDO

- 1.- GENERALIDADES
- 2.- CONTROL DE AVANCE DE OBRA
- 3.- CONTROL DE CALIDAD EN OBRA
- 4.- CONTROL DE SSOMA EN LA OBRA
- 5.- COMENTARIOS - MES DE FEBRERO
- 6.- RESPONSABILIDADES
- 7.- RECURSOS

ANEXOS

- ANEXO N° 01: VALORIZACIÓN DE OBRA
- ANEXO N° 02: PANEL FOTOGRÁFICO
- ANEXO N° 03: CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
- ANEXO N° 04: CURVA DE AVANCE DE OBRA
- ANEXO N° 05: CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO
- ANEXO N° 06: CARTA FIANZA BUEN MANEJO DE ANTICIPO POR ADELANTO DIRECTO
- ANEXO N° 07: CARTA FIANZA BUEN MANEJO DE ANTICIPO POR ADELANTO DE MATERIALES
- ANEXO N° 08: SCTR
- ANEXO N° 09: CONSTANCIAS DE PAGOS DE DERECHOS A SENCICO
- ANEXO N° 10: CONSTANCIAS DE PAGOS DE DERECHOS A CONAFOVISER
- ANEXO N° 11: CONSTANCIAS DE PAGOS DE IMPUESTOS
- ANEXO N° 12: COPIA CUADERNO DE OBRA
- ANEXO N° 13: CONTRATO
- ANEXO N° 14: MAYORES GASTOS GENERALES
- ANEXO N° 15: COSTOS POR DAÑOS Y PERJUICIOS
- ANEXO N° 16: COSTOS DE REANUDACIÓN
- ANEXO N° 17: DENUNCIAS POLICIALES



Luis Alberto Avila Morales
Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

ESPERAN AVILES
ESPERAN AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

1.- GENERALIDADES

1.1.- OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Debido a la exigencia demandada por el mercado internacional y acorde a las Normas Sanitarias Vigentes, es necesario contar con la Infraestructura Pesquera adecuada a dichas exigencias.

1.2.- OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO


El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones en la prestación de servicio del Desembarcadero Pesquero Artesanal San Juan de Marcona, a través del mejoramiento de su infraestructura de mar y tierra adecuada a la Norma Sanitaria 040, así como la implementación necesaria de equipos y desarrollo de talleres de capacitación con la finalidad de satisfacer la demanda actual.

1.3.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El DPA San Juan de Marcona se encuentra ubicada en la costa sur del Perú, en la Localidad de San Juan de Marcona.
 Distrito: Marcona.
 Provincia: Nazca.
 Región: Ica.



Foto N° 01: Ubicación del Distrito de Marcona.


Luis Alberto Añón Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA



JORGE JULIO
ESPINOZA AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009




Foto N° 02: Ubicación del DPA San Juan de Marcona.


1.4.- DATOS DE OBRA

Entidad contratante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 Modalidad : Licitación Pública N° 002-2017-FONDEPES
 Obra : "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia de Nazca, Región Ica"
 Jefe de Supervisión : Luis Alberto Avila Morales
 Residente de Obra : Jorge Julio Espichán Avilés

1.5.- DATOS GENERALES

Contratista de la Obra : P.S.V. Constructores S.A.
 Contrato de Obra N° : 028-2017-FONDEPES
 Fecha de Contrato Ejecutor : 15/09/2017
 Monto de Contrato Ejecutor : S/. 8'871,166.29, incl. I.G.V.
 Monto por Mayor Metrado N° 01 : S/. 99,350.22 incl. I.G.V. (en trámite).
 Plazo de Ejecución Contractual : 240 días calendarios
 Ampliación de Plazo N° 01 : 06 días calendarios (en trámite).


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA


 JORGE JULIO
 ESPICHÁN AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

Empresa Supervisora	:	Consortio Mesones Muro
Monto del Adelanto Directo al Contratista	:	S/. 887,116.63 incluido I.G.V.
Monto del Adelanto por Materiales al Contratista	:	S/. 1'774,233.30 incluido I.G.V.
Fecha de Pago del Adelanto Directo	:	27/09/2017
Fecha de Pago del Adelanto por Materiales	:	24/11/2017
Fecha de Entrega de Terreno	:	29/09/2017
Fecha de Inicio de Ejecución de Obra	:	30/09/2017
Fecha de Término Contractual	:	27/05/2018
Fecha de Término por Ampliación de Plazo N° 01	:	02/06/2017 (en trámite).

2.- CONTROL DE AVANCE DE OBRA

2.1.- DESCRIPCIÓN

El correcto control y monitoreo de los recursos en general en obra, es parte importante de cualquier proyecto en construcción, debido a que, con este seguimiento de avance y monitoreo de las actividades, se tienen que ir revisando y en su caso, reprogramando cada una de ellas para que se logren alcanzar los objetivos.



El control y monitoreo influirá en los futuros eventos, basando las decisiones en posibles soluciones después de haber detectado el problema. Un buen sistema de control y monitoreo comunicará cada uno de los aspectos que intervienen en la obra. Por ende, una buena comunicación proveerá de información y un estado exacto de avance en el que se encuentra la obra, para que con esto se tomen acciones que permitirán obtener mejores resultados.


Es por ello necesaria la programación, cada cierto tiempo, de un control a corto plazo del avance de la obra para realizar una comparación de lo planeado versus lo real, con la finalidad de evitar las multas estipuladas en el contrato, así como un retraso general del proyecto.

2.2.- CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

El control y monitoreo de la obra tiene su fundamento en el correcto avance de la obra según el cronograma. Es por esto por lo que, con el correcto monitoreo y control de cada una de las actividades, se logre equilibrar estas tres variables, ya que una va depender de la otra, si se descuida una se verá reflejada en las demás. Por ende, se expresará en el programa inicialmente realizado.

Para tener un buen avance se debe de emplear la técnica más apropiada para realizar seguimiento a la obra, el encargado debe realizar un análisis previo de los posibles errores que se han cometido. Principalmente debe de reconocer si existen errores, ya sean de coordinación, entendimiento, tiempo, especificaciones, etc.; y por consiguiente en que actividades o eventos está afectando el avance de la obra. No debe dejar de


 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA


ESEQUIEL AVILA MORALES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

verificar la calidad, ya que puede traer repercusiones importantes en el proyecto, teniendo en mente siempre, que será aplicado a un nivel gerencial operativo.

Anteriormente se habló de la programación a corto plazo como una técnica de monitoreo en un periodo corto en donde la temprana corrección y detección de errores, permite seguir con el progreso de las actividades, además de mostrar los requerimientos de recursos y lo más importante, que sean usados de manera eficiente. Es por esto por lo que se le debe de poner más interés a este sistema de programación en donde todas las condiciones afectarán el avance de la obra según el cronograma.

2.3.- CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

A partir de la realización de un control y monitoreo de las actividades en obra, se elabora un cronograma físico-financiero que permite controlar el avance de la obra, verificando y comparando lo programado con lo ejecutado respecto a la adquisición y valorización de los diversos elementos de la obra, a partir de este punto, se puede conocer si la empresa se encuentra con la capacidad de asumir financieramente los gastos que demanda el proyecto. Se muestra en anexos el documento descrito.

2.4.- AVANCE FÍSICO DE OBRA

El programar un buen plan de trabajo, así como la selección de cada uno de los recursos, materiales, humanos y financieros, no dan al proyecto una certeza éxito. Dentro del proceso de construcción, van a existir eventos o circunstancias que van a afectar el avance del mismo, por ello es importante detectarlos a tiempo para prevenir dicha problemática a través de un proceso de monitoreo.

Este proceso de monitoreo y control de actividades de lo planeado con lo realizado está comprendido de tres básicos elementos:

- Monitoreo de actividades
- Comparación del progreso con las metas establecidas
- Implementación de acciones correctivas o preventivas


Una vez realizado esto, se cuantificará el avance proyecto, en base a los metrados de las actividades realizadas en el día a día.


3.- CONTROL DE CALIDAD EN OBRA

3.1.- DESCRIPCIÓN

PSV CONSTRUCTORES S.A. implementa, documenta y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) como un medio para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos especificados por el cliente.

El Plan de Calidad describe la metodología, organización, medios y la secuencia de actividades que la empresa empleará para el cumplimiento de los requisitos contractuales uniformizando los métodos de trabajo, para lograr que en todo momento


Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA


Luis Alberto Avila Morales
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

las actividades, procesos y servicios se realicen sobre la base de cumplimiento de la política, objetivos de calidad y procedimientos elaboradas dentro de la organización.

El área de Control de Calidad, en coordinación con las áreas involucradas en los procesos aplicables al proyecto, supervisarán las actividades propias del mismo para asegurar que se cumpla el Plan de Calidad.

La Organización del Proyecto logrará la aplicación efectiva del Sistema de Gestión de Calidad incluyendo procesos para la mejora continua y el aseguramiento de conformidad de los requerimientos regulatorios aplicables. El SGC es documentado, implementado, mantenido y mejorado continuamente.

PSV CONSTRUCTORES S.A. precisa en el SGC, los procesos que socorren al suministro de un producto o servicio que desempeña los requerimientos específicos, y mantiene estos procesos bajo control.

A partir de lo mencionado, la empresa plantea los siguientes objetivos:



- Implantar un plan de acción capaz de controlar y registrar la calidad de los trabajos implicados en el proyecto, buscando la mejora continua y la satisfacción del cliente.
- Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato marco y de las entidades y normativas reguladoras vigentes.
- Asegurar la aceptación de las obras por parte de la Supervisión.
- Mantener acciones de Control de Calidad que aseguren que los productos de cada proceso cumplirán con lo establecido en el Contrato.
- Establecer caminatas para detección y corrección oportuna de observaciones durante la construcción.
- Informar del cumplimiento de los procedimientos de Control de Calidad propios, y de nuestros subcontratistas y proveedores.


5.- COMENTARIOS - MES DE FEBRERO

5.1.- COMENTARIOS RESPECTO AL AVANCE DE OBRA

- El día 30/01/2018, siendo aproximadamente a las 08:45 horas de la mañana, mientras se realizaban las labores de obra con total normalidad, nos dimos con la sorpresa de que en el sector de habilitado de armadura de acero corrugado, un personal obrero encontró entre las armadura de acero corrugado una **granada de guerra tipo piña** de color negro; dando de conocimiento al Supervisor de Seguridad, por lo que se procedió llamar a la Policía de la Localidad de Marcona; quienes se apersonaron a constatar lo antes descrito, constatando que efectivamente se trataba de una granada de guerra, y que se encontraba sin su pin de seguridad, pudiendo explotar al menor movimiento.

Como medida necesaria de seguridad tanto del personal de PSV como de la población que vive en las zonas aledañas se tuvo que suspender todas las actividades y alejar al personal de la zona de habilitado de armadura metálica.


 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS


Espinoza Aviles
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 113009

La Policía procedió a acordonar la zona de afluencia de la onda explosiva ante una posible detonación del aparato explosivo.

Con oficio la PNP solicito la presencia de un representante del Ministerio Público, quien se hizo presente la Fiscal adjunto de la Fiscalía Mixta Corporativa de Vista alegre - Nazca la Dra. Paola Mercedes Saenz Venero quien constató en el lugar de los hechos, la granada de guerra y disponiendo que sea retirado por personal especializado en el recojo de este tipo aparato explosivo.

Luego de haberse realizado la constatación policial y fiscal, los agentes policiales recomendaron que, por medida de seguridad personal, todo el personal debería retirarse de la obra, hasta que una Unidad Especial de la PNP se apersonen y disponga del artefacto explosivo.

Siendo aproximadamente a las 18:45 horas del día 30/01, se realizó la detonación del artefacto explosivo, realizado por efectivo policial especializado.

La Sra. Darinka Lorena Carmona Valdivia, trabajadora de la obra, testifica en la Comisaría de Marcona sobre un posible implicado en el atentado de nombre Fernando Jesús Saavedra Gallardo, agremiado del Sindicato de Construcción Civil de Hombre y Mujeres del Muelle, liderado por el Sr. Alex Rondón Valdivia, el mismo que en anteriores oportunidades ha participado en actos vandálicos con daños materiales y lesiones a trabajadores en agravio de la empresa P.S.V. Constructores en el mes de Noviembre y Diciembre del 2017 y que fueron denunciado en su debida oportunidad ante la Comisaría de Marcona.



- Con fecha 31/01/2018 se hace entrega a la Supervisión la Carta N° 058-2018/PSV-CMM en donde se indica que debido al incidente ocurrido el día 30/01/2018 en obra y por la carencia de garantías otorgadas por el propietario de la obra – Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) a pesar de no ser éste el primer acontecimiento vandálico ocurrido en contra de nuestra representada y/o de nuestros trabajadores durante la ejecución de la obra, se decidió la paralización de la obra debido a la inseguridad y la falta de garantías con las que se cuentan dentro de las instalaciones de la obra y que ponen en riesgo la integridad física de todo el personal de obra y ciudadanos que viven de manera aledaña a la obra.
- El día 31/01/2018 a eso de las 15:00 horas, el Sr. Alex Rondón Valdivia, se apersonó a la Obra y tuvo una conversación con el Ing. de Seguridad de PSV Enzo Cuzcano Sisniega a quien le indicó que estaba observando personal obrero ingresando a obra y que si los trabajos se reanudaban debían considerar a sus agremiados, se le informó que solo estaban realizando labores de orden y limpieza. De esta manera se verifica la falta de seguridad que permanecía en las instalaciones donde se ejecutaba la obra.




Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Enzo Cuzcano Sisniega
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119179

- Con fecha 02/02/2018 siendo las 16:00 horas aproximadamente, el Sr. Walter Raúl Inca Huayllani, subcontratista que brindaba servicio a nuestra representada en la instalación de cobertura de policarbonato que forma parte del Plan de Contingencia Social para uso de los pescadores, fue agredido por parte del Sr. Alex Rondón Valdivia acompañado por un sujeto de tez morena, lo mismo que le propinaron golpes de puño en distinta parte del cuerpo, debido a que horas antes se negó en colaborarle con polladas que le estaban ofreciendo, se adjunta su denuncia policial. Todo lo indicado ha sido puesto en conocimiento de la supervisión en su posición de representante del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, sin que a la fecha se tenga alguna respuesta activa por su parte.
- Dado a las muestras de falta de interés en resolver los conflictos presente que no dejaban reanudar las labores de la obra, nuestros representantes acudieron de manera directa a una reunión el día lunes 05/02/2018, en las oficinas de Lima del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - Fondepes con el Ing. Luis Alberto Barbieri Quino - Director General de Inversiones Pesqueras Artesanales y Acuícolas (DIGENIPAA) y el Sr. Pedro Medina y por parte de P.S.V. Constructores S.A. el Ing. Residente DPA Marcona Jorge Espichán y la Abog. Milagros Ríos del Área Legal; en donde se hizo entrega de las denuncias policiales sobre los incidentes que se ha tenido en el DPA Marcona. El Ing. Barbieri indico que estas denuncias lo presentaría al Ministerio del Interior de modo actúen de inmediato ante los diversos daños y perjuicios que dicho conflicto causaba a la obra y a P.S.V. Constructores S.A.
- El día 08/02/2018 nuestra Gerencia hace entrega al Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - Fondepes la Carta N° 059-2018/PSV-FONDEPES en donde se hace mención de los incidentes ocurrido en el DPA Marcona y los perjuicios que está ocasionando al proyecto.
- En varias oportunidades se le ha visto al Sr. Alex Rondón Valdivia merodeando por la obra e incluso en varias ocasiones ha estado observando desde el cerco perimétrico hacia el interior de la obra; y en otras ocasiones se le ha visto a sus cómplices frente a la obra y frente a lugar de la residencia del personal Staff en una actitud vigilante. A la fecha y a pesar de que P.S.V. Constructores S.A. continúa con las denuncias y procesos legales correspondientes no se tiene ninguna respuesta o solución que denote la seguridad suficiente para la reanudación de las actividades de la obra, ello es de conocimiento del Supervisor de la obra en su condición de representante del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES en el DPA Marcona.
- El día 24/02/2018 aproximadamente a las 11:30 horas, cuando el Sr. Juan Vega (Empleado de P.S.V. Constructores S.A.) salía del DPA Marcona fue interceptado por el Sr. Alex Rondón Valdivia y tres sujetos más, y con aptitud altanera y amedrentadora le increparon el motivo por el cual existían personal en obra, estando la obra paralizada y por tal motivo nadie debería estar laborando; al parecer esta persona se están tomando atribuciones que no le corresponden y



 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA


JUAN ESPICHÁN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

continúa amedrentando a parte de nuestro personal que se encuentra en la zona.

- El avance del presente mes es de 0.00%, el avance acumulado que se tiene hasta la fecha es de 17.28%.
- Hasta la fecha se tiene 30 días calendarios de obra paralizada, estos nos están ocasionando Mayores Gastos Generales (Ver Anexo N° 14); gastos de estadía, alimentación de personal indirecto establecido en Marcona, etc. Tal como señala la norma de Contrataciones con el Estado, la entidad deberá cubrir los gastos generales que se produzcan por la ampliación de plazo que se viene estableciendo desde el 30 de enero del 2018, así como los daños y perjuicios que ésta ampliación produzca.
- Esta paralización nos está causando otros gastos por Daños y Perjuicios (Ver Anexo N° 15); se tiene materiales consumibles en obra que con el tiempo se están echando a perder, como son cemento, acero, aditivos, etc.; contamos con encofrado metálico en alquiler que no se está dando uso, sin embargo, el costo por alquiler sigue transcurriendo, stand by de equipos propios, etc.
- Cuando se tenga que realizar la reanudación de la obra, se deberá realizar gastos adicionales en la contratación de personal obrero nuevo (Ver Anexo N° 16); que tenga que cumplir con todos los protocolos de ingreso (exámenes médicos inducciones, uniforme, EPP, pasajes, etc.).
- El día 27/02/2018 el Coordinador de Obra del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – Fondapes, Ing. Ricardo Altuna, nos comunicó vía telefónica, que un contingente Policial salía el día 28/02/2018 en horas de la mañana hacia la ciudad de Marcona.
- Debido a este acto delincencial y de continua amenaza, amedrentamiento incluso lesiones de la cual los colaboradores de nuestra representada han sido víctima, y que quisieron atentar contra la integridad física de todo nuestro personal, desde el día 30/01/2018 la obra se encuentra paralizada, sin fecha prevista de conclusión, afectando de manera total el cronograma de obra; siendo una causal para ampliación de plazo y reconocimiento de mayores gastos generales. A la fecha no tenemos ninguna respuesta formal por parte del cliente Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, solo comunicaciones verbales o por internet donde nos manifiestan su apoyo, las mismas que no se concretizan en ninguna acción certera para la reanudación de labores, así como la posición por parte del cliente respecto a los más de 30 días sin trabajo respecto del contrato de obra suscrito. Resulta necesaria la respuesta por parte del cliente a efectos de evitar resoluciones del contrato por causas no atribuibles a el contratista y las consecuencias de la misma.


 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA


JORGE JULIO
ESPINOZA AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

5.2. COMENTARIOS RESPECTO AL CONTROL DE CALIDAD EN OBRA

- Se le ha presentado a la Supervisión los RFI (Solicitud de Información) 10, 11, 12, 13 y 14.

6.- RESPONSABILIDADES

Residente de Obra

Liderar, organizar, coordinar y supervisar directamente las operaciones en campo, según los planos, normas y especificaciones técnicas aplicables y los parámetros o adecuaciones establecidas.

Ingenieros de Campo / Producción

Organizar, Coordinar, Planificar y distribuir las actividades diarias de la producción, cumpliendo con el cronograma de obra y secuencia de actividades establecidas.

Registrar los resultados de las inspecciones en los formatos de aseguramiento de calidad correspondientes.

Supervisar el suministro de equipos, herramientas y materiales necesarios para las actividades programadas; verificar y reportar acerca de la disponibilidad de los materiales, equipos y herramientas para ejecutar las actividades programadas.

Cumplir los lineamientos establecidos por el Programa de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del Proyecto

Cuidar y mantener en forma adecuada las herramientas y equipos requeridos para desempeñar su función.

Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente

Liderar, organizar, coordinar y supervisar la adecuada implementación de los procedimientos, dentro del marco de aplicación de las políticas y estándares de seguridad esperados por el cliente.

Ingeniero Encargado de Oficina Técnica

Realizar el control y seguimiento de la obra mediante la realización de reportes diarios y mensuales del avance de obra.

Supervisar el llenado de los protocolos o registros respectivos durante la ejecución del proyecto.


Realizar los reportes de obra solicitados por el Cliente y la Gerencia de la Empresa. Revisar los documentos de construcción aplicables (planos, especificaciones técnicas, procedimientos, otros).

Controlar, Archivar y distribuir los planos, especificaciones técnicas con revisión vigente y recuperar los planos u especificaciones técnicas superadas.


Administrar las modificaciones o cambios de los documentos contractuales previos al inicio y durante la ejecución de la obra.

Elaborar las consultas técnicas al cliente.

Registrar diariamente información correspondiente al informe de producción a través de los formatos de control.




Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA



ESPINOSA AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



7.- RECURSOS


Personal Indirecto:

- 01 Ingeniero Residente de Obra
- 01 Ingeniero Encargado de Oficina Técnica
- 01 Asistente de Oficina Técnica
- 01 Ingeniero de Jefe de Producción
- 01 Ingeniero Asistente de Producción
- 01 Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente
- 01 Administrador de Obra
- 01 Responsable de Logística
- 01 Asistente Administrativo
- 01 Encargado de Almacén
- 01 Conductor
- 03 Guardianes

Equipo y Maquinaria:

- 01 Grúa de Celosía Fuchs F118.3 20 Ton.
- 01 Inversora Miller
- 02 Equipo de Oxicorte
- 01 Generador Electrico Panther 170F
- 01 Trompo Mezclador de Concreto 9p³
- 01 Trompo Mezclador de Concreto 11p³
- 02 Camioneta Pickup Nissan Frontier
- 01 Nivel Topográfico Leica NA332
- 02 Vibradoras de aguja para concreto.
- 01 Plancha Compactadora
- 01 Vibro apisonador
- 01 Mesa Sierra circular
- 01 Sierra circular de mano.
- 01 Tronzadora
- 05 Amoladoras 4 ½" y 7"
- 16 Cuerpos de andamios
- 178 m² Encofrado Metálico, Viga, Cabezal, Tripode y puntales.


 **Luis Alberto Avila Morales**
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA


Jorge Juan Estrella Aviles
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

**ANEXO N° 01:
VALORIZACIÓN DE OBRA**



Luis Alberto Avila Morales
Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

Jorge Julio Espinosa Avilés
JORGE JULIO
ESPINOSA AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



RESUMEN GENERAL
VALORIZACIÓN N° 05
Febrero 2018

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.
CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
FECHA: 28 de Febrero del 2018


I.- MONTO PRESUPUESTO CONTRACTUAL SIN IGV :	S/. 7,517,937.53
 II.- VALORIZACIÓN	 S/. 0.00
COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES + UTILIDAD	S/. 0.00
AMORTIZACIÓN ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00
AMORTIZACIÓN ADELANTO POR MATERIALES	S/. 0.00
DEDUCTIVO	S/. 0.00
SUB TOTAL	0.00
VALORIZACIÓN:	S/. 0.00
IGV 18 %:	0.00
TOTAL (Incl. IGV):	S/. 0.00

IV.- PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL
 Porcentaje de avance de la presente valorización: **0.00%**
 Porcentaje de avance acumulado: **17.28%**

Son: Cero con 00/100 Soles incluido IGV.



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA


JORGE JULIO
ESPINOZA AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009





VALORIZACIÓN N° 05

Febrero 2018

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.
CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
FECHA: 28 de Febrero del 2018

Item	Descripción	Costo Directo S/.	Valorización Anterior S/.	Valorización Actual S/.	Valorización Acumulada S/.	Saldo a Valorizar S/.
001	ESTRUCTURAS	2,309,433.94	1,009,808.74	-	1,009,808.74	1,299,625.21
002	ARQUITECTURA	1,196,490.72	13,977.10	-	13,977.10	1,182,513.62
003	INSTALACIONES SANITARIAS	803,797.67	-	-	-	803,797.67
004	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	395,182.34	-	-	-	395,182.34
005	OBRAS DE MAR	630,698.61	74,293.38	-	74,293.38	556,405.23
006	EQUIPAMIENTO	1,019,373.50	-	-	-	1,019,373.50
COSTO DIRECTO						
	GASTOS GENERALES	6,354,976.78	1,098,079.22	0.00	1,098,079.22	5,256,897.57
	UTILIDAD	781,662.14	135,063.74	0.00	135,063.74	646,598.40
		381,298.61	65,884.75	0.00	65,884.75	315,413.85
	SUB-TOTAL PRESUPUESTO	7,517,937.53	1,299,027.71	0.00	1,299,027.71	6,218,909.82
	AMORTIZACIÓN POR ADELANTO DIRECTO		129,902.77	0.00	129,902.77	621,890.98
	AMORTIZACIÓN POR ADELANTO DE MATERIALES		259,805.55	0.00	259,805.55	1,243,781.99
	TOTAL PRESUPUESTO (sin IGV)	7,517,937.53	1,039,222.16	0.00	1,039,222.16	4,975,127.83
AVANCE DE OBRA (%)						
		100.00%	17.28%	0.00%	17.28%	82.72%


Luis Alberto Avila Morales
 C.I.P. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA


SPICHAK AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

001335



CUADRO DE AMORTIZACIONES

Febrero 2018

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.

UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.

CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO.

FECHA: 28 de Febrero del 2018

1) MONTO VALORIZADO POR PSV

Descripción	SUB TOTAL	IGV (18 %)	TOTAL
MONTO DEL CONTRATO	S/. 7,517,937.53	S/. 1,353,228.76	S/. 8,871,166.29

% Avance de obra = 0.00%

Monto Valorizado PSV = (Monto Contractual PSV) * (% Avance de Obra)
 Monto Valorizado PSV (Sin IGV) = S/. 0.00 (b)

2) MONTO TOTAL Y CÁLCULO DEL % AMORTIZACIÓN POR CONCEPTO DE ADELANTOS

Adelantos Otorgados	PARCIAL	IGV (18 %)	TOTAL
Adelanto Directo	S/. 751,793.75	S/. 135,322.88	S/. 887,116.63
TOTAL DE ADELANTOS	S/. 751,793.75	S/. 135,322.88	S/. 887,116.63

% para Amortización por Total Adelantos = % del avance del mes

% para Amortización por Adelanto Directo = 0.00% (a)

3) AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO EN LA VALORIZACIÓN (SIN IGV)

N° Valorización	Monto Val (Sin Reajuste sin IGV (b))	Monto Total Adelantos sin IGV (c / c')	Amortización		
			Parcial sin IGV d = a x c	Acumulado sin IGV (e)	Saldo sin IGV f = c - e
Adelanto Directo		S/. 751,793.75			S/. 751,793.75
VALORIZACIÓN N° 01	S/. 138,824.66		S/. 13,882.47	S/. 13,882.47	S/. 737,911.29
VALORIZACIÓN N° 02	S/. 91,772.13		S/. 9,177.21	S/. 23,059.68	S/. 728,734.08
VALORIZACIÓN N° 03	S/. 1,040,648.68		S/. 104,064.87	S/. 127,124.55	S/. 624,669.21
VALORIZACIÓN N° 04	S/. 27,782.27		S/. 2,778.23	S/. 129,902.77	S/. 621,890.98
VALORIZACIÓN N° 05	S/. 0.00		S/. 0.00	S/. 129,902.77	S/. 621,890.98

Amortización Calculada = (adelanto) * (% PARA AMORTIZACIÓN)

Amortización Calculada Actual = S/. 0.00



Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

JORGE JULIO
 ESPICHAN AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009



CUADRO DE AMORTIZACIONES

Febrero 2018

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.

UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.

CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO.

FECHA: 28 de Febrero del 2018

1) MONTO VALORIZADO POR PSV

Descripción	SUB TOTAL	IGV (18 %)	TOTAL
MONTO DEL CONTRATO	S/. 7,517,937.53	S/. 1,353,228.76	S/. 8,871,166.29

% Avance de obra acumulado = 0.00%

Monto Valorizado PSV = (Monto Contractual PSV) * (% Avance de Obra)
 Monto Valorizado PSV (Sin IGV) = S/. 0.00 (b)

2) MONTO TOTAL Y CÁLCULO DEL % AMORTIZACIÓN POR CONCEPTO DE ADELANTOS

Adelantos Otorgados	PARCIAL	IGV (18 %)	TOTAL
Adelanto de Materiales	S/. 1,503,587.54	S/. 270,645.76	S/. 1,774,233.30
TOTAL DE ADELANTOS	S/. 1,503,587.54	S/. 270,645.76	S/. 1,774,233.30

% para Amortización por Total Adelantos = % del avance del mes

% para Amortización por Adelanto de Materiales = 0.00% (a)

3) AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES EN LA VALORIZACIÓN (SIN IGV)

N° Valorización	Monto Val (Sin Reajuste) sin IGV (b)	Monto Total Adelantos sin IGV (c / c')	Amortización		
			Parcial sin IGV d = a x c	Acumulado sin IGV (e)	Saldo sin IGV f = c - e
Adelanto Directo		S/. 1,503,587.54			S/. 1,503,587.54
VALORIZACIÓN N° 03	S/. 1,040,648.68		S/. 254,249.10	S/. 254,249.10	S/. 1,249,338.44
VALORIZACIÓN N° 04	S/. 27,782.27		S/. 5,556.45	S/. 259,805.55	S/. 1,243,781.99
VALORIZACIÓN N° 05	S/. 0.00		S/. 0.00	S/. 259,805.55	S/. 1,243,781.99

Amortización Calculada = (adelanto) * (% PARA AMORTIZACIÓN)

Amortización Calculada Actual = S/. 0.00



Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

JORGE JULIO
 ESPICHAN AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009



VALORIZACIÓN N° 05

Febrero 2018

001.- ESTRUCTURAS


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
 UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
 CLIENTE:
 FECHA: 28 de Febrero del 2018

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Sub Total S/.	Valorización anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Saldo a Valorizar	
						Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.
01	OBRA PRELIMINARES				107,384.11								
01.01	ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANA	m ²	80.00	80.14	6,411.20	60,784.11	-	-	60,784.11	80.00	6,411.20	-	46,600.00
01.02	CARTEL DE OBRA DE 2.40 m. x 3.60 m.	Pza.	1.00	1,422.29	1,422.29	1,422.29	-	-	1,422.29	1.00	1,422.29	-	-
01.03	BAÑOS QUIMICOS PARA EL PERSONAL	Mes	8.00	1,750.00	14,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	4.00	7,000.00	4.00	7,000.00
01.04	CERCO DE MALLA RASHELL CON MADERA ROLLIZO	m	1,500.00	20.45	30,675.00	14,315.00	-	-	14,315.00	700.00	14,315.00	800.00	16,380.00
01.05	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	Mes	8.00	500.00	4,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	4.00	2,000.00	4.00	2,000.00
01.06	TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	Gib.	1.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	0.50	6,000.00	0.50	6,000.00
01.07	TANQUE DE ALMACENAMIENTO PROVISIONAL DE AGUA PARA LA OBRA (9 m ³)	Pza.	1.00	1,375.62	1,375.62	1,375.62	-	-	1,375.62	1.00	1,375.62	-	-
01.08	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	Mes	8.00	300.00	2,400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	4.00	1,200.00	4.00	1,200.00
01.09	FLETE TERRESTRE	Gib.	1.00	35,100.00	35,100.00	21,060.00	-	-	21,060.00	0.60	21,060.00	0.40	14,040.00
02	SEGURIDAD Y SALUD				26,124.72								
02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Und.	1.00	6,350.00	6,350.00	3,238.50	-	-	3,238.50	0.51	3,238.50	0.49	3,111.50
02.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	Und.	1.00	1,128.00	1,128.00	575.28	-	-	575.28	0.51	575.28	0.49	552.72
02.03	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	Und.	1.00	15,823.50	15,823.50	8,069.99	-	-	8,069.99	0.51	8,069.99	0.49	7,753.52
02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	Und.	1.00	1,113.22	1,113.22	567.74	-	-	567.74	0.51	567.74	0.49	545.48
02.05	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	Und.	1.00	1,710.00	1,710.00	872.10	-	-	872.10	0.51	872.10	0.49	837.90
03	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				17,935.56								
03.01	RIEGO DEL AREA DE TRABAJO	m ²	3,155.28	1.29	4,070.31	1,577.64	-	-	1,577.64	1,577.64	1,577.64	1,577.64	7,332.53
03.02	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	m ²	3,155.28	0.71	2,240.25	1,577.64	-	-	1,577.64	1,577.64	1,577.64	1,577.64	2,035.16
03.03	PLAN DE CONTINGENCIA	Und.	1.00	2,000.00	2,000.00	1,020.00	-	-	1,020.00	0.51	1,020.00	0.49	1,120.12
03.04	PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	Und.	1.00	3,000.00	3,000.00	1,530.00	-	-	1,530.00	0.51	1,530.00	0.49	980.00
03.05	PLAN DE CIERRE Y ABANDONO	Und.	1.00	2,500.00	2,500.00	1,275.00	-	-	1,275.00	0.51	1,275.00	0.49	1,470.00
03.06	MEDIDAS DE CONCIENTIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL	Und.	1.00	1,025.00	1,025.00	522.75	-	-	522.75	0.51	522.75	0.49	502.25
03.07	CARTEL DE MANEJO AMBIENTAL 1.00 X 0.5 M	Und.	8.00	200.00	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	8.00	1,600.00	-	-
03.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR DE BASURA	Und.	10.00	150.00	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	10.00	1,500.00	-	-
04	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO				37,572.23								
04.01	DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA- CABEZA	m ²	149.42	3.28	490.10	149.42	-	-	149.42	149.42	490.10	-	490.10
04.02	DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA- SOGA	m ²	606.90	3.28	1,990.63	606.90	-	-	606.90	606.90	1,990.63	-	1,990.63
04.03	DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA-CANTO	m ²	17.10	2.98	50.96	17.10	-	-	50.96	17.10	50.96	-	50.96
04.04	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO SIMPLE	m ³	641.99	11.91	7,646.10	641.99	-	-	7,646.10	641.99	7,646.10	-	7,646.10
04.05	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m ²	2,620.00	5.02	13,152.40	2,620.00	-	-	13,152.40	2,620.00	13,152.40	-	13,152.40
04.06	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO	m ³	106.60	16.15	1,721.59	106.60	-	-	1,721.59	106.60	1,721.59	-	1,721.59
04.07	DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS	Und.	6.00	6.60	39.60	39.60	-	-	39.60	6.00	39.60	-	39.60
04.08	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	Und.	10.00	52.44	524.40	524.40	-	-	524.40	10.00	524.40	-	524.40
04.09	DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO EN ZONA DE FRIO	Und.	1.00	524.45	524.45	524.45	-	-	524.45	1.00	524.45	-	524.45

Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

00133

05.05.02	EXCAVACION DE PATIOS DE MANIOBRAS MASIVA	m³	575.00	5.30	3,047.50	-	-	-	-	-	-	575.00	3,047.50
05.05.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO	m³	189.80	16.41	3,114.62	-	-	-	-	-	-	189.80	3,114.62
05.05.04	ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m³	539.28	11.00	5,932.08	-	-	-	-	-	-	539.28	5,932.08
05.05.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m³	539.28	20.47	11,039.06	-	-	-	-	-	-	539.28	11,039.06
05.05.06	NIVELACION EXTERIOR PATIO DE VEREDAS	m²	1,150.00	4.99	5,738.50	-	-	-	-	-	-	1,150.00	5,738.50
05.05.07	AFIRMADO H=0.30 EN 2 CAPAS	m²	1,150.00	28.34	32,591.00	-	-	-	-	-	-	1,150.00	32,591.00
05.05.08	LOSA DE CONCRETO F'c=315KG/CM2	m³	253.00	462.05	116,898.65	-	-	-	-	-	-	253.00	116,898.65
05.05.09	LOSA DE CONCRETO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m²	160.28	48.59	7,948.29	-	-	-	-	-	-	160.28	7,948.29
05.05.10	LOSA DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO F'y=4200 KG/CM2	Kg	17,303.44	4.16	71,982.31	-	-	-	-	-	-	17,303.44	71,982.31
05.05.11	JUNTA DE DILATACION CON TECNOPORT E=1"	m	728.55	3.55	2,586.35	-	-	-	-	-	-	728.55	2,586.35
05.06	INSTALACIONES SANITARIAS CONCRETO ARMADO				219,225.07	-	-	-	-	-	-		47,603.48
05.06.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	95.03	3.53	335.46	171,621.59	-	-	-	-	-	95.03	335.46
05.06.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	333.79	1.10	367.17	333.79	95.03	-	-	-	-	333.79	367.17
05.06.03	EXCAVACION DE ESTRUCTURAS PARA CIMENTACION PROPIO Y VEREDAS	m³	323.47	35.05	11,337.62	323.47	323.47	11,337.62	-	-	-	323.47	11,337.62
05.06.04	NIVELACION INTERIOR APISONADO PARA FALSO PISO, PATIO Y VEREDAS	m²	116.20	4.99	579.84	116.20	116.20	579.84	-	-	-	116.20	579.84
05.06.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m³	199.27	40.79	8,128.22	199.27	199.27	8,128.22	-	-	-	199.27	8,128.22
05.06.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMIO	m³	4.19	79.89	334.74	4.19	4.19	334.74	-	-	-	4.19	334.74
05.06.07	ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m³	174.15	11.00	1,915.65	174.15	174.15	1,915.65	-	-	-	174.15	1,915.65
05.06.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m³	174.15	20.47	3,564.85	174.15	174.15	3,564.85	-	-	-	174.15	3,564.85
05.06.09	SOLIDADO CONCRETO F'c= 100KG/CM2 H=4"	m³	92.69	30.89	1,627.59	92.69	92.69	1,627.59	-	-	-	92.69	1,627.59
05.06.10	ZAPATAS, CONCRETO f'c=315 kg/cm2	m³	3.91	475.25	1,858.23	3.91	3.91	1,858.23	-	-	-	3.91	1,858.23
05.06.11	ZAPATAS, ACERO F'y=4200 kg/cm2	Kg	282.92	4.16	1,093.75	282.92	282.92	1,093.75	-	-	-	282.92	1,093.75
05.06.12	COLUMNAS, CONCRETO F'c=315 kg/cm2	m³	1.02	538.54	549.31	1.02	1.02	549.31	-	-	-	1.02	549.31
05.06.13	COLUMNAS, ENFRADO Y DESENCOFRADO	m²	15.59	58.33	909.36	15.59	15.59	909.36	-	-	-	15.59	909.36
05.06.14	COLUMNAS, ACERO F'y=4200 kg/cm2	Kg	843.26	4.16	3,507.96	843.26	843.26	3,507.96	-	-	-	843.26	3,507.96
05.06.15	VIGAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2	m³	0.73	527.05	384.75	0.73	0.73	384.75	-	-	-	0.73	384.75
05.06.16	VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	7.81	57.12	446.11	7.81	7.81	446.11	-	-	-	7.81	446.11
05.06.17	VIGAS, ACERO F'y=4200 kg/cm2	Kg	127.97	4.16	532.36	127.97	127.97	532.36	-	-	-	127.97	532.36
05.06.18	MURO DE CONCRETO F'c=315 kg/cm2	m³	86.46	542.12	46,871.70	77.81	77.81	42,182.36	-	-	-	77.81	42,182.36
05.06.19	MURO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	955.06	69.30	66,185.66	859.56	859.56	59,567.51	-	-	-	859.56	59,567.51
05.06.20	MURO, ACERO F'y=4200 kg/cm2	Kg	7,788.16	4.16	32,398.75	7,788.16	7,788.16	32,398.75	-	-	-	7,788.16	32,398.75
05.06.21	LOSA ALIGERADA, CONCRETO F'c=210 kg/cm2	m³	0.61	395.77	241.42	-	-	-	-	-	-	0.61	241.42
05.06.22	LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	7.00	48.93	342.51	-	-	-	-	-	-	7.00	342.51
05.06.23	LOSA ALIGERADA, ACERO F'y=4200 kg/cm2	Kg	120.35	4.16	500.66	-	-	-	-	-	-	120.35	500.66
05.06.24	LOSA ALIGERADA, LADRILLO HUECO 15X30X30	Und.	59.00	3.23	190.57	-	-	-	-	-	-	59.00	190.57
05.06.25	LOSAS MACIZAS CONCRETO F'c=280 kg/cm2	m³	24.65	464.44	11,448.45	-	-	-	-	-	-	24.65	11,448.45
05.06.26	LOSAS MACIZAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m²	39.60	55.38	2,193.05	-	-	-	-	-	-	39.60	2,193.05
05.06.27	LOSAS MACIZAS, ACERO F'y=4200 kg/cm2	Kg	2,495.54	4.16	10,381.45	-	-	-	-	-	-	2,495.54	10,381.45
05.06.28	MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M.1.4 E=1.5cm	m²	17.07	65.28	1,114.33	-	-	-	-	-	-	17.07	1,114.33
05.06.29	LADRILLO PASTELERO	m²	21.84	76.63	1,673.60	-	-	-	-	-	-	21.84	1,673.60
05.06.30	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS INTERIORES	m²	302.95	27.10	8,209.95	-	-	-	-	-	-	302.95	8,209.95
05.07	SISTEMA DE AGUA FRIA CISTERNA-TANQUE ELEVADO				125,558.84	-	-	-	-	-	-		54,015.60
05.07.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	39.60	3.53	139.79	39.60	39.60	139.79	-	-	-	39.60	139.79
05.07.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	39.60	1.10	43.56	39.60	39.60	43.56	-	-	-	39.60	43.56
05.07.03	EXCAVACION DE ESTRUCTURAS PARA CIMENTACION PROPIO Y VEREDAS	m³	140.58	35.05	4,927.33	140.58	140.58	4,927.33	-	-	-	140.58	4,927.33
05.07.04	NIVELACION INTERIOR APISONADO PARA FALSO PISO, PATIO Y VEREDAS	m²	39.60	4.99	197.60	39.60	39.60	197.60	-	-	-	39.60	197.60
05.07.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m³	53.28	40.79	2,173.29	53.28	53.28	2,173.29	-	-	-	53.28	2,173.29
05.07.06	ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m³	122.22	11.00	1,344.42	122.22	122.22	1,344.42	-	-	-	122.22	1,344.42




Luis Alberto Avila Miralles

 CIP No 84746

 SUPERVISOR DE OBRA

05.07.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m ³	20.47	2,501.84	122.22	2,501.84	122.22	2,501.84	122.22	2,501.84		
05.07.08	SOLADO CONCRETO F'C= 100KG/CM2 H=4"	m ²	30.89	1,223.24	39.60	1,223.24	39.60	1,223.24	39.60	1,223.24		
05.07.09	LOSA DE CIMENTACION CISTERNA-CONCRETO F'C=315 KG/CM2	m ³	488.89	15,703.15	32.12	15,703.15	32.12	15,703.15	32.12	15,703.15		
05.07.10	LOSA DE CIMENTACION, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	63.52	2,679.27	42.18	2,679.27	42.18	2,679.27	42.18	2,679.27		
05.07.11	LOSA CIMENTACION-ACERO Fy=4200 kg/cm2	Kg	4.16	9,235.03	2,219.96	9,235.03	2,219.96	9,235.03	2,219.96	9,235.03		
05.07.12	CONCRETO F'c=315 kg/cm2-COLUMNAS TANQUE ELEVADO	m ³	564.11	7,908.82	14.02	7,908.82	14.02	7,908.82	14.02	7,908.82		
05.07.13	COLUMNAS TANQUE ELEVADO-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	70.11	8,481.91	120.98	8,481.91	120.98	8,481.91	120.98	8,481.91		
05.07.14	COLUMNAS TANQUE ELEVADO, ACERO Fy=4200 kg/cm2	Kg	4.16	14,983.99	3,601.92	14,983.99	3,601.92	14,983.99	3,601.92	14,983.99		
05.07.15	MURO CISTERNA CONCRETO F'c=315 kg/cm2	m ³	596.93	7,348.21								12.31
05.07.16	MURO CISTERNA-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	66.05	6,861.08								122.41
05.07.17	MURO CISTERNA, ACERO Fy=4200 kg/cm2	Kg	4.16	5,252.00								1,262.50
05.07.18	MURO TANQUE ELEVADO CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m ³	531.30	5,233.31								9.85
05.07.19	MURO TANQUE ELEVADO-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	67.37	6,908.79								102.55
05.07.20	MURO TANQUE ELEVADO, ACERO Fy=4200 kg/cm2	Kg	4.16	2,932.55								704.94
05.07.21	VIGAS TANQUE ELEVADO CONCRETO F'c=315 kg/cm2	m ³	584.11	5,285.71								9.37
05.07.22	VIGAS TANQUE ELEVADO-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	70.11	4,442.17								63.36
05.07.23	VIGAS TANQUE ELEVADO, ACERO Fy=4200 kg/cm2	Kg	4.16	3,332.62								801.11
05.07.24	LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO CONCRETO F'c=210 kg/cm2	m ³	463.76	1,822.58								3.93
05.07.25	LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	62.40	1,227.41								19.67
05.07.26	LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO, ACERO Fy=4200 kg/cm2	Kg	4.16	2,114.11								508.20
05.07.27	LOSA ALIGERADA, CONCRETO F'c=210 kg/cm2	m ³	395.77	324.53								0.82
05.07.28	LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	48.93	461.41								9.43
05.07.29	LOSA ALIGERADA, ACERO Fy=4200 kg/cm2	Kg	4.16	213.95								51.43
05.07.30	LOSA ALIGERADA, LADRILLO HUECO 15X30X30	Und.	3.23	255.17								79.00
06	ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA EN PUENTE			66,341.84								66,341.84
06.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m ²	1.10	89.98								81.80
06.02	ESTRUCTURA METALICA EN PUENTE	Und.	24,379.03	24,379.03								1.00
06.03	ESTRUCTURA METALICA EN PUENTE (MANO DE OBRA)	Kg	4.32	41,399.25								9,583.16
06.04	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE CARPINTERIA METALICA	m ²	23.87	473.58								19.84
07	ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA EN ZONA DE RECEPCION DE ALIMENTOS MARCONA			95,294.80								95,294.80
07.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m ²	1.10	280.70								237.00
07.02	ESTRUCTURA METALICA EN ZONA DE RECEPCION DE ALIMENTOS (MATERIALES)	Und.	45,483.55	45,483.55								1.00
07.03	ESTRUCTURA METALICA EN ZONA DE RECEPCION DE ALIMENTOS (MANO DE OBRA)	Kg	4.32	45,571.42								10,548.94
07.04	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE CARPINTERIA METALICA	m ²	23.87	3,979.13								166.70
08	ESTRUCTURA METALICA EN ALMACEN DE REDES			14,382.21								14,382.21
08.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m ²	1.10	136.75								124.32
08.02	ESTRUCTURA METALICA EN ALMACEN DE REDES (MATERIALES)	Und.	6,451.27	6,451.27								1.00
08.03	ESTRUCTURA METALICA EN ALMACEN DE REDES (MANO DE OBRA)	Kg	4.32	4,300.56								995.50
08.04	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE CARPINTERIA METALICA	m ²	23.87	744.03								31.17
08.05	ESTRUCTURA METALICA SUSPENDIDA EN INGRESO	Und.	2,749.60	2,749.60								1.00
09	PROTECCION CON ENROCADO			14,205.79								14,205.79




Luis Alberto Avila Morales

 C.I.P. Nº 84746

 SUPERVISOR DE OBRAS


09.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m ²	19.00	1.10	20.90	-	-	-	-	19.00	20.90
09.02	EXCAVACION PARA UNA ANTISOCAVAMIENTO	m ³	41.80	7.63	318.93	-	-	-	-	41.80	318.93
09.03	REFINE Y PERFILADO DE TALUD ZONA ENROCADO	m ³	108.30	5.08	550.16	-	-	-	-	108.30	550.16
09.04	EXTRACCION DE ROCA CON MAQUINARIA	m ³	162.50	27.50	4,468.75	-	-	-	-	162.50	4,468.75
09.05	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DE CANTERA-OBRA Dmin=0.8m	m ³	162.50	31.69	5,149.63	-	-	-	-	162.50	5,149.63
09.06	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE, Dmin=0.8m	m ³	62.70	16.90	1,059.63	-	-	-	-	62.70	1,059.63
09.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE, Dmin=0.8m	m ³	99.75	14.08	1,404.48	-	-	-	-	99.75	1,404.48
09.08	SUMINISTRO Y HABILITACION DE GEOTEXTIL TEJIDO 270 gr/cm2	m ²	146.30	8.43	1,233.31	-	-	-	-	146.30	1,233.31
COSTO DIRECTO				SI.	2,309,433.94					1,009,808.74	1,289,825.21
GASTOS GENERALES				SI.	284,060.37					124,206.48	159,853.90
UTILIDAD			12.30%	SI.	138,568.04					60,588.52	77,977.51
SUB-TOTAL PRESUPUESTO			6.00%	SI.	2,732,060.35					1,194,603.74	1,637,456.62
AMORTIZACION				SI.	2,732,060.35					1,194,603.74	1,637,456.62
TOTAL PRESUPUESTO (sin IGV)				SI.	2,732,060.35					1,194,603.74	1,637,456.62
AVANCE DE SUBPRESUPUESTO (%)					100.00%				0.00%	43.73%	58.27%



 Luis Alberto Avila Morales

 CIP. N° 84746

 SUPERVISOR DE OBRAS



 ESPINOSA AVILES

 INGENIERO CIVIL

 Reg. CIP N° 119009



VALORIZACIÓN N° 05

Febrero 2018


002.- ARQUITECTURA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
 UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
 CLIENTE:
 FECHA: 28 de Febrero del 2018

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Sub Total S/.	Valorización anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Saldo a Valorizar	
						Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.
10	ARQUITECTURA				1,196,490.72		13,977.10			13,977.10			1,182,513.62
10.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				155,165.34		13,977.10			13,977.10			141,188.24
10.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5cm	m ²	2,376.92	65.28	155,165.34	214.11	13,977.10			214.11		2,162.81	141,188.24
10.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				155,813.81								155,813.81
10.02.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES Y CERCO PERIMETRICO	m ²	2,406.04	28.39	68,307.48							2,406.04	68,307.48
10.02.02	TARRAJEO EN MURO, INTERIOR	m ²	2,210.88	22.65	50,076.43							2,210.88	50,076.43
10.02.03	TARRAJEO DE COLUMNAS	m ²	531.46	33.72	17,920.83							531.46	17,920.83
10.02.04	TARRAJEO DE VIGAS	m ²	61.17	50.48	3,087.86							61.17	3,087.86
10.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES 1:5	m ²	48.43	12.31	596.17							48.43	596.17
10.02.06	TARRAJEO DE MESSAS DE CONCRETO CON CEMENTO PULIDO BOLEADO EN SERVICIOS HIGIENICOS	m ²	11.50	34.61	398.02							11.50	398.02
10.02.07	TARRAJEO DE MESSAS DE CONCRETO PULIDO, RECEPCION DE ALIMENTOS HIDROBIOLÓGICOS	m ²	32.40	34.61	1,121.36							32.40	1,121.36
10.02.08	TARRAJEO DE MESSAS DE CONCRETO PULIDO, TARRAJEO PULIDO DE MANILUVIOS, LAVADO DE BOTAS, LAVADEROS, ETC	m ²	11.86	34.61	410.47							11.86	410.47
10.02.09	TARRAJEO EN ESCALERAS	m ²	63.97	37.16	2,377.13							63.97	2,377.13
10.02.10	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CISTERNA	m ²	164.70	27.10	4,463.37							164.70	4,463.37
10.02.11	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN TANQUE ELEVAD	m ²	179.60	39.28	7,054.69							179.60	7,054.69
10.03	CIELO RASOS				46,317.71								46,317.71
01.03.01	CIELO RASO CON MEZCLA C.A 1:5	m ²	1,114.21	41.57	46,317.71							1,114.21	46,317.71
10.04	PISOS Y PAVIMENTOS				152,842.97								152,842.97
10.04.01	FALSO PISO E=2" DE CONCRETO 1:10	m ²	1,324.64	34.80	46,097.47							1,324.64	46,097.47
10.04.02	PISO DE CEMENTO PULIDO (CON FIBRAS DE ACERO DRAMIX, INC. JUNTAS DE DILATACION)	m ²	861.57	42.14	36,306.56							861.57	36,306.56
10.04.03	PISO FROTACHADO BRUÑADO	m ²	71.75	27.76	1,991.78							71.75	1,991.78
10.04.04	PISO DE PORCELANATO 0.6X0.6m ANTIDESLIZANTE	m ²	345.50	73.07	25,245.69							345.50	25,245.69
10.04.05	PISO DE PORCELANATO 0.3X0.3m ANTIDESLIZANTE	m ²	22.75	62.07	1,412.09							22.75	1,412.09
10.04.06	VEREDA DE CONCRETO Fc=175 kg/cm2 E=4" FROT. Y BRUÑADO	m ²	688.04	52.57	36,170.26							688.04	36,170.26
10.04.07	VEREDA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	156.00	36.02	5,619.12							156.00	5,619.12
10.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				43,466.81								43,466.81
10.04.01	ZOCALO DE PORCELANATO RECTIFICADO DE COLOR 0.30X0.60m	m ²	269.44	93.62	25,224.97							269.44	25,224.97
10.04.02	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO RECTIFICADO DE COLOR 0.30X0.60m (H=0.10m)	m	222.27	19.97	4,438.73							222.27	4,438.73
10.04.03	CONTRAZOCALO SANITARIO S/COLOREAR H=10 cm, MEZCLA 1:2, E=1.5cm	m	230.95	19.26	4,448.10							230.95	4,448.10
10.04.04	CONTRAZOCALO S/COLOREAR H=30cm, MEZCLA 1:2, E=1.5cm	m	624.50	14.98	9,355.01							624.50	9,355.01
10.06	COBERTURAS				114,898.91								114,898.91


Luis Alberto Peña Morales
 C.I.P. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

10.06.01	COBERTURA POLICARBONATO COLOR BLANCO E=6mm(INCLUYE ACCESORIOS,PROVISION Y COLOCACION)	m ²	470.31	75.50	35,508.41	-	-	-	-	-	470.31	35,508.41
10.06.02	COBERTURA LADRILLO PASTELERO 24x24 ASENTADO CON MEZCLA 1:5.2.5cm JUNTA 1:5 1.5cm	m ²	1,050.00	75.61	79,390.50	-	-	-	-	-	1,050.00	79,390.50
10.07	CARPINTERIA DE MADERA	m ²	4.32	351.90	38,788.93	-	-	-	-	-	4.32	38,788.93
10.07.01	PUERTA SIMPLE VAIVEN CONTRAPLACADA E=45mm, TRIPLAY LUPUNA 6mm CON MARCO DE MADERA CEDRO 1/24"x4"	m ²	37.80	351.90	13,301.82	-	-	-	-	-	37.80	13,301.82
10.07.02	PUERTA SIMPLE CONTRAPLACADA E=45mm, TRIPLAY LUPUNA 6mm CON MARCO DE MADERA CEDRO 1/24"x4"	m ²	2.40	372.78	894.67	-	-	-	-	-	2.40	894.67
10.07.03	PUERTA SIMPLE CONTRAPLACADA CON BARRA DISCAPAC. E=45mm,TRIPLAY LUPUNA 6mm CON MARCO DE MADERA DE CEDRO 1/24"x4"	m ²	4.80	546.34	2,622.43	-	-	-	-	-	4.80	2,622.43
10.07.04	PUERTA SIMPLE RANURADA APANELADA DEMADERA, CON MARCO DE MADERA, CEDRO 1/2"x6"	Und.	9.60	664.91	6,383.14	-	-	-	-	-	9.60	6,383.14
10.07.05	PUERTA DOBLE RANURADA APANELADA DE MADERA, CON MARCO DE MADERA, CEDRO 1/2"x6"	m.	2.88	888.37	2,558.51	-	-	-	-	-	2.88	2,558.51
10.07.06	PUERTA SIMPLE APANELADA DE MADERA, CON MARCO DE MADERA, CEDRO 1/2"x6"	m ²	24.08	154.72	3,725.66	-	-	-	-	-	24.08	3,725.66
10.07.07	TABIQUE DE MALAMINE PARA BAÑOS Y VESTIDORES, E=18mm	m ²	34.72	224.15	7,782.49	-	-	-	-	-	34.72	7,782.49
10.08	PUERTA PARA TABIQUE DE MELAMINE PARA BAÑOS Y VESTIDORES, E=18mm	m ²	1.00	856.50	856.50	-	-	-	-	-	1.00	856.50
10.08.01	CARPINTERIA METALICA	Und.	1.00	828.00	828.00	-	-	-	-	-	1.00	828.00
10.08.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA 1.00x2.40m(INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	1,045.57	1,045.57	-	-	-	-	-	1.00	1,045.57
10.08.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE ACERO 1.00x3.10m(INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	954.71	954.71	-	-	-	-	-	1.00	954.71
10.08.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE ACERO 1.20x2.50m(INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	6,586.60	6,586.60	-	-	-	-	-	1.00	6,586.60
10.08.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE 02 HOJAS DE ACERO 6.20x3.50m(INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	3,163.38	3,163.38	-	-	-	-	-	1.00	3,163.38
10.08.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO AL MUELLE 2 HOJAS DE ACERO 4.00x3.00m(INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	11,573.01	11,573.01	-	-	-	-	-	1.00	11,573.01
10.08.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA VAIVEN ALTO IMPACTO 1.80x2.40 (INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	9,710.15	9,710.15	-	-	-	-	-	1.00	9,710.15
10.08.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA VAIVEN ALTO IMPACTO 1.20x2.40 (INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	10,874.43	10,874.43	-	-	-	-	-	1.00	10,874.43
10.08.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA VAIVEN ALTO IMPACTO 1.40x2.40 (INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	8,778.70	8,778.70	-	-	-	-	-	1.00	8,778.70
10.08.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SIMPLE ALTO IMPACTO 0.80x2.40 (INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	9,244.43	9,244.43	-	-	-	-	-	1.00	9,244.43
10.08.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SIMPLE ALTO IMPACTO 1.00x2.40 (INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	13,435.88	13,435.88	-	-	-	-	-	1.00	13,435.88
10.08.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE ALTO IMPACTO 1.95x2.40 (INC ACCESORIOS)	Und.	3.00	12,970.15	38,910.45	-	-	-	-	-	3.00	38,910.45
10.08.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE ALTO IMPACTO 1.80x2.40 (INC ACCESORIOS)	Und.	48.06	124.81	5,988.37	-	-	-	-	-	48.06	5,988.37
10.08.14	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"(Ver planos de detalles)	m.	44.96	60.45	2,717.83	-	-	-	-	-	44.96	2,717.83
10.08.15	PASAMANO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"(Ver planos de detalles)	m.				-	-	-	-	-		





Luis Alberto Avila Montalvo
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

10.08.16	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE EN MESA DE RECEPCION DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS (INC MANDIL H=10cm, AMBOS LADOS)	m ²	32.40	285.56	9,252.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.40	9,252.79
10.08.17	TAPA METALICA CON PLANCHA DE FIERRO EN CISTERNA, INC TIRADOR, CANDADO Y ACCESORIOS(Ver planos de detalles)	Und.	2.00	290.36	580.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	580.72
10.08.18	TAPA METALICA CON PLANCHA DE FIERRO EN TANQUE ELEVADO, INC TIRADOR, CANDADO Y ACCESORIOS(Ver planos de detalles)	Und.	2.00	290.36	580.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	580.72
10.08.19	ESCALERA DE METAL DE F'G' EN TANQUE SEPTICO(Ver planos de detalles)	Und.	1.00	386.98	386.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	386.98
10.08.20	ESCALERA DE METAL DE F'G' EN TANQUE ELEVADO(Va desde el 1er nivel hasta el T.E ver planos de detalles)	Und.	1.00	2,324.14	2,324.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	2,324.14
10.09	CARPINTERIA DE ALUMINIO, VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				113,708.05														113,708.05
10.09.01	SUMISTRO E INSTALACION DE PUERTA SECCIONABLE	Und.	6.00	5,618.15	33,708.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	33,708.90
10.09.02	SUMISTRO E INSTALACION DE PUERTA SECCIONABLE	Und.	1.00	4,918.15	4,918.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	4,918.15
10.09.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA ENROLLABLE 1.50x1.80m	Und.	5.00	2,304.81	11,524.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	11,524.05
10.09.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA ENROLLABLE 2.00x1.80m	Und.	1.00	2,581.08	2,581.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	2,581.08
10.09.05	VENTANA DE ALUMINIO Y CRISTAL LAMINADO 10mm	m ²	10.82	477.72	5,168.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.82	5,168.93
10.09.06	VENTANA DE ALUMINIO SEMIPESADO DE COLOR NATURAL, MALLA RACHEL Y CON VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6mm	m ²	62.50	460.79	28,799.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.50	28,799.38
10.09.07	VENTANA DE ALUMINIO SEMIPESADO DE COLOR NATURAL CON VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6mm	m ²	69.14	336.92	23,294.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.14	23,294.65
10.09.08	CRISTAL DE SEGURIDAD 10mm REFLEJANTE	m ²	1.35	453.72	612.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35	612.52
10.09.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO SIN BISEL EMPOTRADO EN PARED (e=3mm)	m ²	18.48	167.77	3,100.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.48	3,100.39
10.10	CERRAJERIA				8,837.28														8,837.28
10.10.01	CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA, CON TIRADOR	Pza.	34.00	75.84	2,578.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.00	2,578.56
10.10.02	CERRADURA DE PERILLA EN PUERTAS CONTRAPLACADAS/SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES)	Und.	8.00	57.84	462.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00	462.72
10.10.03	BISAGRA CAPUCHINA DE 3"X3 1/2"	Und.	180.00	32.20	5,796.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	5,796.00
10.11.01	PINTURA EN MUROS INTERIORES CON EPOXICO	m ²	2,210.88	14.07	111,027.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,210.88	111,027.33
10.11.02	PINTURA EN MUROS INTERIORES CON EPOXICO	m ²	2,406.04	15.31	31,107.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,406.04	31,107.08
10.11.03	PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON EPOXICO	m ²	531.46	15.31	36,836.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531.46	36,836.47
10.11.04	PINTURA EN COLUMNAS CON EPOXICO	m ²	61.17	15.96	8,136.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.17	8,136.65
10.11.05	PINTURA EN VIGAS CON EPOXICO	m ²	48.43	15.31	976.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.43	976.27
10.11.06	PINTURA EN DERRAMES CON EPOXICO	m ²	63.97	14.07	741.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.97	741.46
10.11.07	PINTURA EN ESCALERAS CON EPOXICO	m ²	1,114.21	16.11	900.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,114.21	900.06
10.11.08	PINTURA EN CIELORRASO CON EPOXICO	m ²	889.00	12.50	17,949.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	889.00	17,949.92
10.11.09	PINTURA EN PISO CON EPOXICO	m ²	179.60	18.19	11,112.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.60	11,112.50
10.12	PINTURA PARA TANQUE ELEVADO CON EPOXICO				3,266.92														3,266.92
10.12.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				29,892.77														29,892.77
10.12.01	ACCESORIOS	Pza.	19.00	238.00	4,522.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.00	4,522.00
10.12.01	INODORO BLANCO D/LOSA 1ERA NAC.+T.BAJO INC.	Pza.	4.00	588.22	2,352.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	2,352.88
10.12.01	URINARIO DE LOZA DE PICO BLANCO(INC. ACCESORIOS)	Und.	18.00	79.00	1,422.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00	1,422.00
10.12.01	W.C. EN LOZA (INC. ACCESORIOS)	Pza.	3.00	85.00	255.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	255.00
10.12.01	GRIFERIA DE BRONCE CON TEMPORIZADOR AL MUEBLE(INC. ACCESORIOS)	Und.	32.00	185.90	5,948.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00	5,948.80


Luis Alberto Anula Morales
 C.I.P. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

10.12.06	GRIFERIA DE BRONCE TIPO JARDIN DE BOLA (INC. ACCESORIOS)	Und.	11.00	99.90	1,098.90	-	-	-	-	11.00	1,098.90
10.12.07	GRIFERIA DE BRONCE TIPO CUELLO DE GANZO AL MUEBLE (INC. ACCESORIOS)	Und.	1.00	109.25	109.25	-	-	-	-	1.00	109.25
10.12.08	DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIO Y LLAVE (INC. ACCESORIOS)	Und.	9.00	123.65	1,112.85	-	-	-	-	9.00	1,112.85
10.12.09	ACCESORIOS PARA BAÑO: DISPENSADOR LIQUIDO	Und.	16.00	75.42	1,206.72	-	-	-	-	16.00	1,206.72
10.12.10	JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO	Und.	9.00	15.00	135.00	-	-	-	-	9.00	135.00
10.12.11	TOALLERO DE LOSA BLANCO	Pza.	12.00	10.50	126.00	-	-	-	-	12.00	126.00
10.12.12	PORTARROLLOS DE LOSA BLANCA Y PAPELERA	Und.	18.00	72.90	1,312.20	-	-	-	-	18.00	1,312.20
10.12.13	ACCESORIOS PARA BAÑOS: BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 1" PARA DUCHA (INC. CORTINA PARA DUCHA)	Und.	11.00	58.07	638.77	-	-	-	-	11.00	638.77
10.12.14	COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	Pza.	97.00	73.12	7,092.64	-	-	-	-	97.00	7,092.64
10.12.15	COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	Pza.	56.00	46.71	2,559.76	-	-	-	-	56.00	2,559.76
10.13	OTROS				87,927.45	-	-	-	-		87,927.45
10.13.01	CORTINA DE TRASLAPE DE PVC (PROVISION Y COLOCACION)	m ²	8.93	362.37	3,235.96	-	-	-	-	8.93	3,235.96
10.13.02	PROTECCION DE BORDE DE PLATAFORMA	Und.	14.00	221.95	3,107.30	-	-	-	-	14.00	3,107.30
10.13.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRIGO REFRACTIL	Und.	7.00	2,790.09	19,530.63	-	-	-	-	7.00	19,530.63
10.13.04	COLOCACION DE REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN CANALETA	m.	174.21	220.77	38,460.34	-	-	-	-	174.21	38,460.34
10.13.05	COLOCACION DE REJILLA DE ACERO GALVANIZADO EN CANALETA	m.	64.55	131.84	8,510.27	-	-	-	-	64.55	8,510.27
10.13.06	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m ²	3,155.28	1.79	5,647.95	-	-	-	-	3,155.28	5,647.95
10.13.07	BRUNAS SEGUN DETALLE	m.	1,500.00	6.29	9,435.00	-	-	-	-	1,500.00	9,435.00
COSTO DIRECTO				S/.	1,196,490.72	13,977.10	0.00	13,977.10			1,182,513.62
GASTOS GENERALES				S/.	147,168.36	1,719.18	0.00	1,719.18			145,449.18
UTILIDAD				S/.	71,789.44	838.63	0.00	838.63			70,950.82
SUB-TOTAL PRESUPUESTO				S/.	1,415,448.52	16,534.91	0.00	16,534.91			1,398,913.62
AMORTIZACION				S/.							
TOTAL PRESUPUESTO (sin IGV)				S/.	1,415,448.52	16,534.91	0.00	16,534.91			1,388,913.62
AVANCE DE SUBPRESUPUESTO (%)					100.00%	1.17%	0.00%	1.17%			98.83%


Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA


JORGE JULIO ESPICHAN AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009



VALORIZACIÓN N° 05

Febrero 2018


003.- INSTALACIONES SANITARIAS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
 UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
 CLIENTE:
 FECHA: 28 de Febrero del 2018

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Sub Total \$/.	Valorización anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Saldo a Valorizar	
						Metrado	Parcial \$/.	Metrado	Parcial \$/.	Metrado	Parcial \$/.	Metrado	Parcial \$/.
11	INSTALACIONES SANITARIAS				803,797.67								803,797.67
11.01	SISTEMA DE AGUA FRIA				36,658.20								36,658.20
11.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				309.76								309.76
11.01.01.01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS ML	m.	197.30	1.57	309.76							197.30	309.76
11.01.02	MOVIMIENTOS DE TIERRAS				5,559.91								5,559.91
11.01.02.01	EXCAV. DE ZANJA PARA TUBERIA	m.	197.30	11.68	2,304.46							197.30	2,304.46
11.01.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/TUBERIA	m.	197.30	2.13	420.25							197.30	420.25
11.01.02.03	CAMA DE APOYO E=0.10M	m.	197.30	7.37	1,454.10							197.30	1,454.10
11.01.02.04	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m.	197.30	7.00	1,381.10							197.30	1,381.10
11.01.03	SALIDAS DE AGUA FRIA				5,214.73								5,214.73
11.01.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP Ø 1/2"	Pto.	71.00	71.63	5,085.73							71.00	5,085.73
11.01.03.02	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP Ø 3/4"	Pto.	2.00	64.50	129.00							2.00	129.00
11.01.04	RED DE DISTRIBUCION				1,582.66								1,582.66
11.01.04.01	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRATUB PVC Ø=1/2" C-10	m.	5.00	12.59	62.95							5.00	62.95
11.01.04.02	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRATUB PVC Ø=3/4" C-10	m.	12.00	13.64	163.68							12.00	163.68
11.01.04.03	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRATUB PVC Ø=1" C-10	m.	3.30	12.28	40.52							3.30	40.52
11.01.04.04	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRATUB PVC Ø=1 1/2" C-10	m.	14.00	13.54	189.56							14.00	189.56
11.01.04.05	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRATUB PVC Ø=2" C-10	m.	23.00	14.69	337.87							23.00	337.87
11.01.04.06	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRATUB PVC Ø=2 1/2" C-10	m.	20.00	19.28	385.60							20.00	385.60
11.01.04.07	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRATUB PVC Ø=2 1/2" C-10 (T.E. Sistema)	m.	18.00	22.36	402.48							18.00	402.48
11.01.05	RED DE ALIMENTACION				2,106.88								2,106.88
11.01.05.01	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRATUB PVC Ø=2 1/2" C-10 (Solucion)	m.	6.00	19.28	115.68							6.00	115.68
11.01.05.02	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRATUB HDPE Ø=2" C-10 (Cisterna-T.E)	m.	20.00	18.32	366.40							20.00	366.40
11.01.05.03	Sum./Inst /Prueba Hidraulica/Tuberia PVC C-10 1 1/2" (medidor-cisterna)	m.	120.00	13.54	1,624.80							120.00	1,624.80
11.01.06	ACCESORIOS				3,364.60								3,364.60
11.01.06.01	TEE PVC-SAP 1/2"	Und.	5.00	9.68	48.40							5.00	48.40
11.01.06.02	TEE PVC-SAP 3/4"	Und.	31.00	10.56	327.36							31.00	327.36
11.01.06.03	TEE PVC-SAP 1"	Und.	20.00	12.53	250.60							20.00	250.60
11.01.06.04	TEE PVC-SAP 1 1/2"	Und.	2.00	22.05	44.10							2.00	44.10
11.01.06.05	TEE PVC-SAP 2"	Und.	8.00	19.31	154.48							8.00	154.48
11.01.06.06	ODO PVC-SAP 1/2"	Und.	102.00	13.46	1,372.92							102.00	1,372.92
11.01.06.07	ODO PVC-SAP 3/4"	Und.	17.00	14.41	244.97							17.00	244.97
11.01.06.08	ODO PVC-SAP 1"	Und.	1.00	6.46	6.46							1.00	6.46
11.01.06.09	ODO PVC-SAP 2"	Und.	4.00	18.91	75.64							4.00	75.64
11.01.06.10	ODO PVC-SAP 3"	Und.	2.00	19.41	38.82							2.00	38.82
11.01.06.11	ODO PVC-SAP 4"	Und.	39.00	11.26	439.14							39.00	439.14
11.01.06.12	REDUCCION PVC SAP 3/4"-1/2"	Und.	19.00	11.71	222.49							19.00	222.49
11.01.06.13	REDUCCION PVC SAP 1"-1/2"	Und.	3.00	5.96	17.88							3.00	17.88
11.01.06.14	REDUCCION PVC SAP 1 1/2"-1/2"	Und.	1.00	6.46	6.46							1.00	6.46

Luis Alberto Avitia Morales
 CIP N° 64746
 SUPERVISOR DE OIFA

11.01.06.15	REDUCCION PVC SAP 1 1/2"-3/4"	Und.	1.00	6.76	6.76	-	-	-	-	1.00	6.76
11.01.06.16	REDUCCION PVC SAP 2 1/2"-1 1/2"	Und.	1.00	6.96	6.96	-	-	-	-	1.00	6.96
11.01.06.17	REDUCCION PVC SAP 2"-1/2"	Und.	5.00	12.96	64.80	-	-	-	-	5.00	64.80
11.01.06.18	TAPON DE PVC DE 2"	Und.	2.00	18.18	36.36	-	-	-	-	2.00	36.36
11.01.07.01	VALVULAS	Und.	24.00	91.17	5752.45	-	-	-	-	24.00	5752.45
11.01.07.02	VALVULA COMPUERTA 1/2" CON U"U"	Und.	2.00	102.11	2188.08	-	-	-	-	2.00	2188.08
11.01.07.03	VALVULA COMPUERTA 1" CON U"U"	Und.	4.00	115.61	462.44	-	-	-	-	4.00	462.44
11.01.07.04	VALVULA COMPUERTA 2" CON U"U"	Und.	3.00	236.69	716.07	-	-	-	-	3.00	716.07
11.01.07.05	MEDIDOR DE CAUDAL DE 1"	Und.	1.00	2,181.64	2,181.64	-	-	-	-	1.00	2,181.64
11.01.08.01	EQUIPOS DE BOMBEO	Und.	2.00	1,717.55	12,767.21	-	-	-	-	2.00	12,767.21
11.01.08.02	ELECTROBOMBA, Q=2.92 Lis/seg, Adt=23m, Pot.Aprox=2HP	Und.	1.00	3,522.05	3,435.10	-	-	-	-	1.00	3,435.10
11.01.08.03	EQUIPO Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLORACION-DESINFECCION	Und.	1.00	3,522.05	3,522.05	-	-	-	-	1.00	3,522.05
11.01.08.04	VALVULA FLOTADORA DE 1 1/2"	Und.	1.00	99.68	99.68	-	-	-	-	1.00	99.68
11.01.08.05	VALVULA COMPUERTA 2" CON U"U"	Und.	2.00	238.69	477.38	-	-	-	-	2.00	477.38
11.01.08.06	VALVULA CHECK DE 2"	Und.	2.00	535.52	1,071.04	-	-	-	-	2.00	1,071.04
11.01.08.07	VALVULA DE PIE DE 2 1/2"	Und.	2.00	85.59	171.18	-	-	-	-	2.00	171.18
11.01.08.08	UNION UNIVERSAL DE 1/2"	Und.	2.00	10.26	20.52	-	-	-	-	2.00	20.52
11.01.08.09	UNION DRESSER 2 1/2"	Und.	2.00	151.76	303.52	-	-	-	-	2.00	303.52
11.01.08.10	CANASTILLA DE 2 1/2"	Und.	4.00	169.76	679.04	-	-	-	-	4.00	679.04
11.01.08.11	CODO PVC-SAP 2"	Und.	2.00	183.53	367.06	-	-	-	-	2.00	367.06
11.01.08.12	CODO PVC-SAP 2 1/2"	Und.	3.00	18.91	56.73	-	-	-	-	3.00	56.73
11.01.08.13	TEE PVC-SAP 2"	Und.	4.00	19.31	77.24	-	-	-	-	4.00	77.24
11.01.08.14	TAPON DE PVC DE 2"	Und.	3.00	18.18	54.54	-	-	-	-	3.00	54.54
11.01.08.15	ABRAZADERAS, SOPORTES Y COLGADORES 2"	Pza.	9.00	138.43	1,245.87	-	-	-	-	9.00	1,245.87
11.01.08.16	ABRAZADERAS, SOPORTES Y COLGADORES 2 1/2"	Pza.	8.00	143.43	1,147.44	-	-	-	-	8.00	1,147.44
11.02.01	SISTEMA DE AGUA SALADA			53,098.65	53,098.65	-	-	-	-		53,098.65
11.02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m.	243.00	1.57	381.51	-	-	-	-	243.00	381.51
11.02.01.02	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS ML	m.	243.00	11.68	6,847.74	-	-	-	-	243.00	6,847.74
11.02.02.01	EXCAV. DE ZANJA P/TUBERIA	m.	243.00	2.13	2,838.24	-	-	-	-	243.00	2,838.24
11.02.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/TUBERIA	m.	243.00	7.37	517.59	-	-	-	-	243.00	517.59
11.02.02.03	CAMA DE APOYO E=0.10M	m.	243.00	7.00	1,790.91	-	-	-	-	243.00	1,790.91
11.02.02.04	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m.	243.00	7.00	1,701.00	-	-	-	-	243.00	1,701.00
11.02.03.01	SALIDAS DE AGUA SALADA	Pto.	2.00	72.33	3,677.18	-	-	-	-	2.00	3,677.18
11.02.03.02	SALIDA DE AGUA SALADA 1/2"	Pto.	34.00	89.03	144.66	-	-	-	-	34.00	144.66
11.02.03.03	SALIDA DE AGUA SALADA 1 1/2"	Pto.	5.00	101.10	3,027.02	-	-	-	-	5.00	3,027.02
11.02.04.01	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA SALADA	m.	120.00	13.64	2,930.47	-	-	-	-	120.00	2,930.47
11.02.04.02	SUM./INST./PRUEBA HIDRATUB PVC Ø 3/4" C-10	m.	25.00	14.69	1,636.80	-	-	-	-	25.00	1,636.80
11.02.04.03	SUM./INST./PRUEBA HIDRATUB PVC Ø 2" C-10	m.	20.00	20.59	367.25	-	-	-	-	20.00	367.25
11.02.04.04	SUM./INST./PRUEBA HIDRATUB HDPE Ø 2" C-10 (T.E-Cisterna)	m.	18.00	28.59	411.80	-	-	-	-	18.00	411.80
11.02.05.01	RED DE ALIMENTACION	m.	2.00	21.22	4,898.07	-	-	-	-	2.00	4,898.07
11.02.05.02	SUM./INST./PRUEBA HIDRATUB PVC Ø 2 1/2" C-10 (Colgada)	m.	6.00	19.28	42.44	-	-	-	-	6.00	42.44
11.02.05.03	SUM./INST./PRUEBA HIDRATUB PVC Ø 3" C-10	m.	32.00	20.59	115.68	-	-	-	-	32.00	115.68
11.02.05.04	SUM./INST./PRUEBA HIDRATUB PVC Ø 3" C-10	m.	120.00	20.24	658.88	-	-	-	-	120.00	658.88
11.02.05.05	SUM./INST./PRUEBA Hidra./ Tub. HDPE Ø 2 1/2" C-10 Expuesta	m.	46.00	22.36	2,428.80	-	-	-	-	46.00	2,428.80
11.02.05.06	SUM./INST./PRUEBA Hidra./ Tub. HDPE Ø 2 1/2" C-10 Enterrada	m.	20.00	18.32	1,028.56	-	-	-	-	20.00	1,028.56
11.02.05.07	SUM./INST./PRUEBA HIDRATUB HDPE Ø 2" C-10 (Cisterna)	m.	9.00	28.59	366.40	-	-	-	-	9.00	366.40
11.02.05.08	ACCESORIOS	Und.	18.00	10.56	257.31	-	-	-	-	18.00	257.31
11.02.05.09	TEE PVC-SAP 3/4"	Und.	14.00	19.31	1,560.74	-	-	-	-	14.00	1,560.74
11.02.06.02	TEE PVC-SAP 2"	Und.	14.00	19.31	190.08	-	-	-	-	14.00	190.08
					270.34	-	-	-	-		270.34




Luis Alberto Amila Morales


 C.I.P. No 84746

 SUPERVISOR DE OBRAS


11.02.06.03	TEE PVC-SAP 2 1/2"	Und.	5.00	22.28	111.40							5.00	111.40
11.02.06.04	TEE PVC-SAP 3"	Und.	1.00	22.96	22.96							1.00	22.96
11.02.06.05	CODO PVC-SAP 1/2"	Und.	2.00	13.46	26.92							2.00	26.92
11.02.06.06	CODO PVC-SAP 3/4"	Und.	7.00	14.41	100.87							7.00	100.87
11.02.06.07	CODO PVC-SAP 3"	Und.	3.00	20.96	62.88							3.00	62.88
11.02.06.08	CODO PVC-SAP 2"	Und.	15.00	16.91	253.65							15.00	253.65
11.02.06.09	CODO PVC-SAP 2 1/2"	Und.	8.00	19.41	155.28							8.00	155.28
11.02.06.10	REDUCCION PVC SAP 2"-1 1/2"	Und.	5.00	8.36	41.80							5.00	41.80
11.02.06.11	REDUCCION PVC SAP 2"-3/4"	Und.	15.00	13.38	200.70							15.00	200.70
11.02.06.12	REDUCCION PVC SAP 2 1/2"-2"	Und.	2.00	14.66	29.32							2.00	29.32
11.02.06.13	TAPON DE PVC DE 2"	Und.	3.00	18.18	54.54							3.00	54.54
11.02.07	VALVULAS				3,069.35								3,069.35
11.02.07.01	VALVULA COMPUERTA 1/2" CON U"U"	Und.	2.00	91.17	182.34							2.00	182.34
11.02.07.02	VALVULA COMPUERTA 3/4" CON U"U"	Und.	15.00	102.11	1,531.65							15.00	1,531.65
11.02.07.03	VALVULA COMPUERTA 1 1/2" CON U"U"	Und.	5.00	174.91	874.55							5.00	874.55
11.02.07.04	VALVULA COMPUERTA 3" CON U"U"	Und.	1.00	480.81	480.81							1.00	480.81
11.02.08	EQUIPOS DE BOMBEO				29,743.59								29,743.59
11.02.08.01	EQUIPO DE BOMBEO AGUA SALADA 2.0 HP C/CLORADOR C/ACCESORIOS	Und.	2.00	2,183.65	4,367.30							2.00	4,367.30
11.02.08.02	EQUIPO Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLORACION-DESINFECTACION	Und.	1.00	3,522.05	3,522.05							1.00	3,522.05
11.02.08.03	VALVULA COMPUERTA 2" CON U"U"	Und.	2.00	238.69	477.38							2.00	477.38
11.02.08.04	VALVULA FLOTADORA DE 1 1/2"	Und.	2.00	99.68	199.36							2.00	199.36
11.02.08.05	VALVULA CHECK DE 2"	Und.	2.00	536.52	1,071.04							2.00	1,071.04
11.02.08.06	VALVULA DE PIE Y CANASTILLA DE SUCCION DE 2 1/2"	Und.	2.00	288.73	577.46							2.00	577.46
11.02.08.07	UNION UNIVERSAL DE 2"	Und.	2.00	37.12	74.24							2.00	74.24
11.02.08.08	UNION DRESSER 2"	Und.	2.00	161.76	303.52							2.00	303.52
11.02.08.09	UNION DRESSER 2 1/2"	Und.	4.00	168.76	675.04							4.00	675.04
11.02.08.10	CODO PVC-SAP 2"	Und.	3.00	18.91	56.73							3.00	56.73
11.02.08.11	CODO PVC-SAP 2 1/2"	Und.	2.00	18.41	36.82							2.00	36.82
11.02.08.12	TEE PVC-SAP 2"	Und.	4.00	19.31	77.24							4.00	77.24
11.02.08.13	TAPON DE PVC DE 2"	Und.	3.00	18.18	54.54							3.00	54.54
11.02.08.14	Adquis./Inst./Electrob.Autosebante, Q=3, 10 Lts/seg. Adt=222m, P	Und.	2.00	1,686.70	3,333.40							2.00	3,333.40
11.02.08.15	Adquis./Inst./Equipo de Filtrado de 20 GPM	Und.	1.00	1,269.24	1,269.24							1.00	1,269.24
11.02.08.16	TUBERIA DE F" G" 8" INC.SOPORTES Y PINTADO	Und.	1.00	803.02	803.02							1.00	803.02
11.02.08.17	VALVULA COMPUERTA 2 1/2" CON U"U"	Und.	2.00	323.81	647.62							2.00	647.62
11.02.08.18	VALVULA CHECK DE 2 1/2"	Und.	2.00	406.93	813.86							2.00	813.86
11.02.08.19	VALVULA DE PIE Y CANASTILLA DE SUCCION DE 3"	Und.	1.00	317.59	317.59							1.00	317.59
11.02.08.20	UNION DRESSER 2 1/2"	Und.	2.00	168.76	339.52							2.00	339.52
11.02.08.21	UNION DRESSER 3"	Und.	3.00	159.76	479.28							3.00	479.28
11.02.08.22	CODO PVC-SAP 2 1/2"	Und.	4.00	19.41	77.64							4.00	77.64
11.02.08.23	CODO PVC-SAP 3"	Und.	4.00	20.96	83.84							4.00	83.84
11.02.08.24	TEE PVC-SAP 2 1/2"	Und.	4.00	22.28	89.12							4.00	89.12
11.02.08.25	TEE PVC-SAP 3"	Und.	1.00	22.96	22.96							1.00	22.96
11.02.08.26	TAPON DE PVC DE 2 1/2"	Und.	3.00	18.80	56.40							3.00	56.40
11.02.08.27	ABRAZADERA SOPORTES Y COLGADORES 2"	Pza.	9.00	138.43	1,245.87							9.00	1,245.87
11.02.08.28	ABRAZADERAS SOPORTES Y COLGADORES 2 1/2"	Und.	8.00	143.43	1,147.44							8.00	1,147.44
11.02.08.29	ABRAZADERAS SOPORTES Y COLGADORES DE 3"	Pza.	49.00	153.43	7,518.07							49.00	7,518.07
11.03	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				2,301.17								2,301.17
11.03.01	RED DE DRENAJE PLUVIAL				1,222.93								1,222.93
11.03.02	SUME INST. DE TUBERIA PVC-SAP 2"	m.	83.00	9.59	785.97							83.00	785.97
11.03.03	SUME INST. DE TUBERIA PVC-SAP 3"	m.	36.00	11.86	426.96							36.00	426.96
11.03.04	SUME INST. SUMIDERO BRONCE DE 2"	Und.	28.00	34.34	961.52							28.00	961.52
11.03.05	SUME INST. REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2"	Und.	8.00	9.97	79.76							8.00	79.76
11.03.06	SUME INST. REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 3"	Und.	3.00	12.32	36.96							3.00	36.96
11.03.07	DESAGUE VENTILACION				57,277.35								57,277.35


Lina Alberto Avitia Morán
 C.I.P. N° 84746
 SUPERVISOR DE O.C.P.A


11.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m.	275.20	1.57	432.06	-	-	-	-	-	432.06
11.04.01.01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS ML	m.	275.20	1.57	432.06	-	-	-	-	-	432.06
11.04.02	MOVIMIENTOS DE TIERRAS	m.	275.20	11.68	8,123.60	-	-	-	-	-	8,123.60
11.04.02.01	EXCAV. DE ZANJA PARA TUBERIA	m.	275.20	2.13	3,214.34	-	-	-	-	-	3,214.34
11.04.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/TUBERIA	m.	275.20	7.37	586.18	-	-	-	-	-	586.18
11.04.02.03	CAMA DE APOYO E=0.10M	m.	275.20	7.00	2,028.22	-	-	-	-	-	2,028.22
11.04.02.04	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m.	275.20	7.00	1,928.40	-	-	-	-	-	1,928.40
11.04.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m³	18.00	20.47	368.46	-	-	-	-	-	368.46
11.04.03	SALIDA DE DESAGUE	Pto.	44.00	55.80	4,445.98	-	-	-	-	-	4,445.98
11.04.03.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2"	Pto.	5.00	61.01	2,455.20	-	-	-	-	-	2,455.20
11.04.03.02	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 3"	Pto.	20.50	54.46	305.05	-	-	-	-	-	305.05
11.04.03.03	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4"	Pto.	10.00	56.93	1,116.43	-	-	-	-	-	1,116.43
11.04.04	RED DE DERIVACION DE DESAGUE	m.	89.20	9.59	569.30	-	-	-	-	-	569.30
11.04.04.01	SUM.E INST DE TUBERIA PVC-SAP 2"	m.	42.00	11.86	9,317.71	-	-	-	-	-	9,317.71
11.04.04.02	SUM.E INST DE TUBERIA PVC-SAP 3"	m.	3.00	12.28	855.43	-	-	-	-	-	855.43
11.04.04.03	SUM.E INST DE TUBERIA PVC-SAP 4"	m.	28.00	9.59	498.12	-	-	-	-	-	498.12
11.04.04.04	SUM.E INST DE MONTANTE PVC-SAP 2"	m.	14.00	12.28	36.84	-	-	-	-	-	36.84
11.04.04.05	SUM.E INST DE MONTANTE PVC-SAP 4"	m.	23.00	14.00	268.52	-	-	-	-	-	268.52
11.04.04.06	SUM.E INST DE TUBERIA PVC-SAL 2" VENTILACION	m.	23.00	54.41	171.92	-	-	-	-	-	171.92
11.04.04.07	SUM.E INST TUBERIA HDPE 4"(SUMIDERO MUELLE)	m.	140.00	27.32	1,251.43	-	-	-	-	-	1,251.43
11.04.04.08	SUM.E INST TUBERIA HDPE 3"	m.	22.00	16.92	3,824.80	-	-	-	-	-	3,824.80
11.04.04.09	TUBERIA PVC 3"-C-10 (IMPULSION A CAMARA DE BOMBEO)	m.	99.00	20.59	372.24	-	-	-	-	-	372.24
11.04.05	ACCESORIOS	Und.	23.00	13.32	2,038.41	-	-	-	-	-	2,038.41
11.04.05.01	SUM.E INST YEE PVC-SAP 3"	Und.	3.00	21.56	7,565.48	-	-	-	-	-	7,565.48
11.04.05.02	SUM.E INST YEE PVC-SAP 4"	Und.	32.00	9.52	306.36	-	-	-	-	-	306.36
11.04.05.03	SUM.E INST TEE SANITARIA PVC-SAP 2"	Und.	5.00	15.20	64.68	-	-	-	-	-	64.68
11.04.05.04	SUM.E INST CODO 45° SANITARIA PVC-SAP 2"	Und.	23.00	11.82	304.64	-	-	-	-	-	304.64
11.04.05.05	SUM.E INST CODO 45° SANITARIA PVC-SAP 3"	Und.	1.00	18.59	76.00	-	-	-	-	-	76.00
11.04.05.06	SUM.E INST CODO 45° SANITARIA PVC-SAP 4"	Und.	1.00	86.62	271.86	-	-	-	-	-	271.86
11.04.05.07	SUM.E INST. CODO 45° SANITARIA HDPE 4"	Und.	1.00	53.12	18.59	-	-	-	-	-	18.59
11.04.05.08	SUM.E INST. CODO 90° SANITARIA HDPE 3"	Und.	12.00	16.05	86.62	-	-	-	-	-	86.62
11.04.05.09	SUM.E INST YEE DOBLE SANITARIA PVC-SAP 2"	Und.	2.00	13.32	53.12	-	-	-	-	-	53.12
11.04.05.10	SUM.E INST YEE DOBLE SANITARIA PVC-SAP 3"	Und.	1.00	21.56	192.60	-	-	-	-	-	192.60
11.04.05.11	SUM.E INST YEE DOBLE SANITARIA PVC-SAP 4"	Und.	22.00	16.12	26.64	-	-	-	-	-	26.64
11.04.05.12	SUM.E INST YEE HDPE 4"	Und.	1.00	167.12	21.56	-	-	-	-	-	21.56
11.04.05.13	SUM.E INST YEE HDPE 3"	Und.	1.00	148.12	3,676.64	-	-	-	-	-	3,676.64
11.04.05.14	SUM.E INST SUMIDERO DE BRONCE 2"	Und.	3.00	34.34	146.12	-	-	-	-	-	146.12
11.04.05.15	SUM.E INST SUMIDERO DE BRONCE 3"	Und.	37.00	43.84	103.02	-	-	-	-	-	103.02
11.04.05.16	SUM.E INST SUMIDERO ROSCADO DE BRONCE 2"	Und.	23.00	9.97	1,622.08	-	-	-	-	-	1,622.08
11.04.05.17	SUM.E INST REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2"	Und.	15.00	12.32	229.31	-	-	-	-	-	229.31
11.04.05.18	SUM.E INST REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 3"	Und.	6.00	30.14	184.80	-	-	-	-	-	184.80
11.04.06	CAMARA DE INSPECCION	Und.	11.00	229.92	180.84	-	-	-	-	-	180.84
11.04.06.01	CAJA DE REGISTRO DE 12"X24" CON TAPA DE CONCRETO	Und.	1.00	279.45	8,356.70	-	-	-	-	-	8,356.70
11.04.06.02	CAJA DE REGISTRO DE 24"X24" CON TAPA DE CONCRETO	Und.	1.00	1,288.13	2,529.12	-	-	-	-	-	2,529.12
11.04.06.03	SUM.E INST BUZON CON TAPA DE 1.20m DE DIAMETRO H=1.40m	Und.	1.00	1,288.13	279.45	-	-	-	-	-	279.45
11.04.06.04	CANALETAS METALICAS DE REJILLAS FIERRO PLATINA 1 1/4" X 1/4" DE 0.30 DE ANCHO	m.	25.00	170.40	4,260.00	-	-	-	-	-	4,260.00
11.04.07	INSTALACIONES ESPECIALES	Und.	1.00	2,032.41	5,523.43	-	-	-	-	-	5,523.43
11.04.07.01	EQUIPAMIENTO DE TANQUE SEPTICO	Und.	2.00	1,745.51	2,032.41	-	-	-	-	-	2,032.41
11.04.08	ACCESORIOS DE CAMARAS	Und.	2.00	289.43	3,491.02	-	-	-	-	-	3,491.02
11.04.08.01	VALVULA MARROSA 3"	Und.	2.00	289.43	13,512.39	-	-	-	-	-	13,512.39
11.04.08.02	VALVULA COMPUERTA 3" CON U"U	Und.	1.00	480.81	578.86	-	-	-	-	-	578.86
11.04.08.03	VALVULA CHECK DE 3"	Und.	2.00	477.53	480.81	-	-	-	-	-	480.81
					955.06						955.06


Luis Alberto Peña Morán
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE O.E.P.A.

11.04.08.04	UNION DRESSER 3"	Und.	3.00	159.76	479.28					3.00	479.28
11.04.08.05	TEE F°G°3"	Und.	1.00	201.53	201.53					1.00	201.53
11.04.08.06	CODO F°G°3"	Und.	4.00	196.33	785.32					4.00	785.32
11.04.08.07	TUBERIA F°G° 3"	Und.	3.00	217.53	652.59					3.00	652.59
11.04.08.08	ABRAZADERA, SOPORTES Y COLGADORES 3"	Pza.	10.00	153.43	1,534.30					10.00	1,534.30
11.04.08.09	ABRAZADERA, SOPORTES Y COLGADORES 4"	Pza.	48.00	163.43	7,844.64					48.00	7,844.64
11.05	REDES DE DESAGUE INDUSTRIAL				122,732.42						122,732.42
11.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				564.57						564.57
11.05.01.01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS ML	m.	359.60	1.57	564.57					359.60	564.57
11.05.02	MOVIMIENTOS DE TIERRAS				10,645.28						10,645.28
11.05.02.01	EXCAV. DE ZANJA PARA TUBERIA	m.	359.60	11.68	4,200.13					359.60	4,200.13
11.05.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/TUBERIA	m.	359.60	2.13	765.95					359.60	765.95
11.05.02.03	CAMA DE APOYO E=0.10M	m.	359.60	7.37	2,650.25					359.60	2,650.25
11.05.02.04	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m.	359.60	7.00	2,517.20					359.60	2,517.20
11.05.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m³	25.00	20.47	511.75					25.00	511.75
11.05.03	SALIDA DE DESAGUE				1,747.21						1,747.21
11.05.03.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 3"	Pto.	9.00	61.01	549.09					9.00	549.09
11.05.03.02	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4"	Pto.	22.00	54.46	1,198.12					22.00	1,198.12
11.05.04	RED DE DERIVACION DE DESAGUE				10,835.32						10,835.32
11.05.04.01	SUM.E INST. DE TUBERIA PVC-SAL 2"	m.	7.00	9.59	67.13					7.00	67.13
11.05.04.02	SUM.E INST. DE TUBERIA PVC-SAL 3"	m.	21.00	11.86	249.06					21.00	249.06
11.05.04.03	SUM.E INST. DE TUBERIA PVC-SAL 4"	m.	34.00	12.28	417.52					34.00	417.52
11.05.04.04	SUM.E INST. DE TUBERIA PVC-SAL 6"	m.	3.00	26.83	80.49					3.00	80.49
11.05.04.05	SUM.E INST. TUBERIA HDPE 3" (IMPULSION) COLGADA	m.	120.00	23.26	2,791.20					120.00	2,791.20
11.05.04.06	SUM.E INST. TUBERIA HDPE 3" (DES. T.E)	m.	22.00	23.26	511.72					22.00	511.72
11.05.04.07	TUBERIA PVC 3"-C-10"(IMPULSION ENTERRADA)	m.	230.00	20.59	4,735.70					230.00	4,735.70
11.05.04.08	TUBERIA DE PVC SAL 6" C-10 EMISOR	m.	65.00	30.50	1,982.50					65.00	1,982.50
11.05.05	ACCESORIOS				1,383.48						1,383.48
11.05.05.01	SUM. E. INST. CODO 45° SANITARIA PVC-SAL 4"	Und.	1.00	12.48	12.48					1.00	12.48
11.05.05.02	SUM. E. INST. CODO 90° SANITARIA PVC-SAL 4"	Und.	6.00	11.63	69.78					6.00	69.78
11.05.05.03	SUM. E. INST. CODO 90° SANITARIA HDPE 3"	Und.	1.00	53.12	53.12					1.00	53.12
11.05.05.04	SUM. E. INST. TEE HDPE 3"	Und.	1.00	146.12	146.12					1.00	146.12
11.05.05.05	SUM. E. INST. SUMIDERO DE BRONCE 4"	Und.	22.00	50.09	1,101.98					22.00	1,101.98
11.05.06	CAMARA DE INSPECCION				54,048.45						54,048.45
11.05.06.01	CAJA DE REGISTRO DE 24"X24" CON TAPA DE CONCRETO	Und.	4.00	279.45	1,117.80					4.00	1,117.80
11.05.06.02	ACCESORIOS TRAMPA DE GRASAS	Und.	3.00	37.96	113.88					3.00	113.88
11.05.06.03	CANALETAS REJILLA FRD(FIBRA DE VIDRIO DE PLASTICO REFORZADO) 0.30 DE ANCHO	m²	120.60	437.95	52,816.77					120.60	52,816.77
11.05.07	INSTALACIONES ESPECIALES				25,362.38						25,362.38
11.05.07.01	Equipo de bombeo. 02 Bombas sumergibles Q=1.7 L/S; HDT=10m;Pot=1.5HP	Und.	2.00	1,745.51	3,491.02					2.00	3,491.02
11.05.07.02	Equipo de bombeo. 02 Bombas sumergibles Q=1.7 L/S; HDT=8m;Pot=1.5HP	Und.	2.00	1,745.51	3,491.02					2.00	3,491.02
11.05.07.03	Equipo de bombeo. 02 Bombas sumergibles Q=1.7 L/S; HDT=6m;Pot=1.0HP	Und.	2.00	1,745.51	3,491.02					2.00	3,491.02
11.05.07.04	Equipo de bombeo. 02 Bombas sumergibles Q=6 L/S; HDT=20m;Pot=6.0HP	Und.	2.00	7,444.66	14,889.32					2.00	14,889.32
11.05.08	ACCESORIOS				18,145.73						18,145.73
11.05.08.01	REJILLA MARIPOSA 2"	Und.	6.00	268.53	1,611.18					6.00	1,611.18
11.05.08.02	REJILLA MARIPOSA 6"	Und.	2.00	386.93	773.86					2.00	773.86
11.05.08.03	REJILLA CUADRADA 3" CON U°U°	Und.	1.00	480.81	480.81					1.00	480.81
11.05.08.04	REJILLA CHECK DE 2"	Und.	6.00	535.52	3,213.12					6.00	3,213.12
11.05.08.05	REJILLA CHECK DE 6"	Und.	2.00	972.53	1,945.06					2.00	1,945.06
11.05.08.06	UNION DRESSER 2"	Und.	9.00	151.76	1,365.84					9.00	1,365.84
11.05.08.07	UNION DRESSER 6"	Und.	2.00	214.76	429.52					2.00	429.52
11.05.08.08	TEE PVC-SAL 2"	Und.	2.00	6.66	13.32					2.00	13.32
11.05.08.09	TEE PVC-SAL 3"	Und.	1.00	9.46	9.46					1.00	9.46


Luis Alberto Avila Moral, S
 C.I.P. No 84746
 SUPERVISOR DE O.S.T.A

11.05.08.10	YEE PVC 6"	Und.	1.00	26.12	26.12	-	-	-	-	1.00	26.12
11.05.08.11	CODO PVC SAL 2"X90°	Pza.	11.00	26.44	279.54	-	-	-	-	11.00	279.54
11.05.08.12	CODO PVC SAL 6"X90°	Pza.	2.00	40.94	81.88	-	-	-	-	2.00	81.88
11.05.08.13	CODO PVC SAL 6"X45°	Pza.	3.00	27.14	81.42	-	-	-	-	3.00	81.42
11.05.08.14	REDUCCION DE PVC SAL DE 3"-2"	Und.	4.00	40.70	162.80	-	-	-	-	4.00	162.80
11.05.08.15	ABRAZADERAS SOPORTES Y COLGADORES 3" EN MUELLE	Pza.	41.00	153.43	6,290.63	-	-	-	-	41.00	6,290.63
11.05.08.16	ABRAZADERAS SOPORTES Y COLGADORES 3" EN T.E	Pza.	9.00	153.43	1,380.87	-	-	-	-	9.00	1,380.87
11.06	EMISOR SUBMARINO				531,729.88						531,729.88
11.06.01	OBRAS PRELIMINARES				1,381.60						1,381.60
11.06.01.01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS ML	m.	880.00	1.57	1,381.60					880.00	1,381.60
11.06.02	MOVIMIENTOS DE TIERRAS				550.00						550.00
11.06.02.01	ACOMODO DE ENROCADO DE PROTECCION	m³	20.00	27.50	550.00					20.00	550.00
11.06.03	SUMINISTRO DE TUBERIA				198,748.44						198,748.44
11.06.03.01	SUM. E INST. DE TUBERIA LISA HDPEPECC-100 Dext. 160MM (6") PN-10	m.	880.00	29.32	25,801.60					880.00	25,801.60
11.06.03.02	SUMINISTRO DE TUBERIA LISA HDPEPECC-100 Dext. 160MM (6") CON PERFORACIONES PARA USO DE DIFUSOR	m.	20.00	27.93	558.60					20.00	558.60
11.06.03.03	SUMINIST E INST DE LINEA AUXILIAR DE 90MM PARA MANIOBRA DE FLOTACION	m.	880.00	14.85	13,068.00					880.00	13,068.00
11.06.03.04	ACCESORIOS SUMINISTRO DE TUBERIAS HOPE	Und.	2.00	1,789.87	3,579.74					2.00	3,579.74
11.06.03.05	LASTRE DE CONCRETO TIPO A SEPARACION DE 1.70 C/U	Und.	530.00	293.85	155,740.50					530.00	155,740.50
11.06.04	TERMOFUSION				12,362.00						12,362.00
11.06.04.01	SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS DE 160MM PN-10	Und.	1.00	8,430.00	8,430.00					1.00	8,430.00
11.06.04.02	SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS DE 90MM PN-10 (LINEAS 1.00 LINEAS AUXILIARES DE FLOTACION)	Und.	1.00	3,932.00	3,932.00					1.00	3,932.00
11.06.05	ULTRASONIDO-CONTROL DE CALIDAD				15,811.00						15,811.00
11.06.05.01	INSPECCION ULTRASONICA DE JUNTA	Und.	1.00	15,811.00	15,811.00					1.00	15,811.00
11.06.06	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO				302,876.84						302,876.84
11.06.06.01	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO DE LINEA	m.	900.00	169.61	152,649.00					900.00	152,649.00
11.06.06.02	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO DE LASTRE DE CONCRETO TIPO A	Und.	530.00	169.61	89,893.30					530.00	89,893.30
11.06.06.03	FIJACION PRIMEROS METROS DE TUBERIA CON CONCRETO CICLOPEO	m³	6.00	1,482.82	8,776.92					6.00	8,776.92
11.06.06.04	PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA EMISOR SUBMARINO	Und.	1.00	51,557.62	51,557.62					1.00	51,557.62
COSTO DIRECTO											803,797.67
GASTOS GENERALES											98,867.11
UTILIDAD											48,227.86
SUB-TOTAL PRESUPUESTO											950,892.64
AMORTIZACION											0.00
TOTAL PRESUPUESTO (sin IGV)											950,892.64
AVANCE DE SUBPRESUPUESTO (%)											100.00%
COSTO DIRECTO											0.00
GASTOS GENERALES											0.00
UTILIDAD											0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTO											0.00
AMORTIZACION											0.00
TOTAL PRESUPUESTO (sin IGV)											0.00
AVANCE DE SUBPRESUPUESTO (%)											0.00%
COSTO DIRECTO											0.00
GASTOS GENERALES											0.00
UTILIDAD											0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTO											0.00
AMORTIZACION											0.00
TOTAL PRESUPUESTO (sin IGV)											0.00
AVANCE DE SUBPRESUPUESTO (%)											0.00%
COSTO DIRECTO											0.00
GASTOS GENERALES											0.00
UTILIDAD											0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTO											0.00
AMORTIZACION											0.00
TOTAL PRESUPUESTO (sin IGV)											0.00
AVANCE DE SUBPRESUPUESTO (%)											0.00%
COSTO DIRECTO											0.00
GASTOS GENERALES											0.00
UTILIDAD											0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTO											0.00
AMORTIZACION											0.00
TOTAL PRESUPUESTO (sin IGV)											0.00
AVANCE DE SUBPRESUPUESTO (%)											0.00%



Luis Alberto Avila Morán

 CIP. N° 84746

 SUPERVISOR DE OBRAS

LUIS ALBERTO AVILA MORAN

 INGENIERO CIVIL

 Reg. CIP N° 119009

001110



VALORIZACIÓN N° 05

Febrero 2018


004.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
 UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
 CLIENTE:
 FECHA: 28 de Febrero del 2018

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Sub Total S/.	Valorización anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Saldo a Valorizar	
						Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSION				268,220.19								
12.01	TRABAJOS PRELIMINARES				2,518.67								2,518.67
12.01.01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS ML	m.	359.66	1.57	564.67							359.66	564.67
12.01.02	TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS A LA OBRA	Glb.	1.00	1,954.00	1,954.00							1.00	1,954.00
12.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				6,923.15								6,923.15
12.02.01	EXCAV. DE ZANJA DE 0.50x0.60m. PARA INSTALACION DE DUCTOS	m.	359.66	11.68	4,200.83							359.66	4,200.83
12.02.02	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m.	359.66	7.00	2,517.62							359.66	2,517.62
12.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m ³	10.00	20.47	204.70							10.00	204.70
12.03	SALIDAS DE ILUMINACION				15,586.45								15,586.45
12.03.01	SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)	Pto.	180.00	72.87	13,116.60							180.00	13,116.60
12.03.02	SALIDA DE TECHO(CENTRO LUZ) C/CONDUIT	Und.	27.00	81.27	2,194.29							27.00	2,194.29
12.03.03	SALIDA PARA BRAQUETE (PARED)	Pto.	4.00	68.89	275.56							4.00	275.56
12.04	INTERRUPTORES				7,405.80								7,405.80
12.04.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	Pto.	35.00	76.77	2,686.95							35.00	2,686.95
12.04.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	Pto.	6.00	77.81	466.86							6.00	466.86
12.04.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE	Pto.	5.00	91.01	455.05							5.00	455.05
12.04.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION	Pto.	22.00	110.68	2,434.96							22.00	2,434.96
12.04.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE	Pto.	8.00	156.42	1,251.36							8.00	1,251.36
12.04.06	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 4 VIAS	Pto.	1.00	110.62	110.62							1.00	110.62
12.05	TOMACORRIENTES				7,024.05								7,024.05
12.05.01	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H=0.40 SNPT	Pto.	58.00	70.95	4,115.10							58.00	4,115.10
12.05.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA A PRUEBA DE AGUA H=0.40 SNPT	Pto.	15.00	70.95	1,064.25							15.00	1,064.25
12.05.03	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H=2.20 SNPT LUZ DE EMERGENCIA	Pto.	26.00	70.95	1,844.70							26.00	1,844.70
12.06	SALIDA DE DATA Y TELEFONIA				665.50								665.50
12.06.01	SALIDA PARA TELEFONIA	Pto.	6.00	66.55	399.30							6.00	399.30
12.06.02	SALIDA DE RED DE COMPUTOS	Pto.	4.00	66.55	266.20							4.00	266.20
12.07	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO				5,461.30								5,461.30
12.07.01	SALIDA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO INC. SENSOR DE HUMO	Und.	1.00	5,461.30	5,461.30							1.00	5,461.30
12.08	TUBERIAS DE PVC				12,606.26								12,606.26
12.08.01	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=20MM	m.	166.56	11.78	1,965.64							166.56	1,965.64
12.08.02	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=25MM	m.	40.11	12.08	484.53							40.11	484.53
12.08.03	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=35MM	m.	498.81	15.10	7,532.03							498.81	7,532.03
12.08.04	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=40MM	m.	20.20	19.58	396.52							20.20	396.52
12.08.05	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=65MM	m.	33.36	37.33	1,245.33							33.36	1,245.33
12.08.06	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=80MM	m.	13.85	33.02	457.33							13.85	457.33
12.08.07	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=100MM	m.	14.71	34.39	505.88							14.71	505.88
12.09	CABLES Y CONDUCTORES				25,199.43								25,199.43
12.09.01	CABLE NH-80.3x4xhmm2.450/750V	m.	82.96	9.93	823.79							82.96	823.79

Luis Alberto Aquila Morales
 C.I.P. No 84746
 SUPERVISOR DE O.P.A.

12.09.02	CABLE NH-80, 3-1x10mm ² , 450/750V	m.	40.11	13.43	538.68					40.11	538.68
12.09.03	CABLE NH-80, 3-1x16mm ² , 450/750V	m.	157.90	17.76	2,804.30					157.90	2,804.30
12.09.04	CABLE NH-80, 3-1x25mm ² , 450/750V	m.	165.13	24.93	4,116.69					165.13	4,116.69
12.09.05	CABLE NH-80, 3-1x35mm ² , 450/750V	m.	195.98	33.24	6,514.38					195.98	6,514.38
12.09.06	CABLE NH-80, 3-1x70mm ² , 450/750V	m.	6.25	60.95	380.94					6.25	380.94
12.09.07	CABLE NH-80, 3-1x120mm ² , 450/750V	m.	13.85	97.79	1,354.39					13.85	1,354.39
12.09.08	CABLE NH-80, 2-1x10mm ² , 450/750V	m.	88.60	10.58	937.39					88.60	937.39
12.09.09	CABLE NH-80, 1x6mm ² (T), 450/750V	m.	82.96	6.53	541.73					82.96	541.73
12.09.10	CABLE NH-80, 1x10mm ² (T), 450/750V	m.	630.25	7.73	4,871.83					630.25	4,871.83
12.09.11	CABLE NH-80, 1x16mm ² (T), 450/750V	m.	27.11	9.22	248.95					27.11	248.95
12.09.12	CABLE NH-80, 1x25mm ² (T), 450/750V	m.	6.25	11.69	73.06					6.25	73.06
12.09.13	CABLE NH-80, 1x35mm ² (T), 450/750V	m.	13.85	14.05	194.59					13.85	194.59
12.09.14	CABLE N2XOH, 3-1x120 mm ² , 0.6/1kV	m.	14.71	103.36	1,520.43					14.71	1,520.43
12.09.15	CABLE N2XOH, 1x35 mm ² , 0.6/1kV	m.	14.71	18.85	277.28					14.71	277.28
12.10	BUZONES Y DUCTOS DE CONCRETO				5,954.91						5,954.91
12.10.01	BUZON DE CONCRETO DE 0.60x0.60x0.70m	Und.	3.00	1,288.13	3,864.39					3.00	3,864.39
12.10.02	DUCTO DE CONCRETO DE 04 VIAS	m.	18.00	116.14	2,090.52					18.00	2,090.52
12.11	TABLEROS DISTRIBUCION				24,163.75						24,163.75
12.11.01	TABLERO GENERAL TG	Und.	1.00	13,740.93	13,740.93					1.00	13,740.93
12.11.02	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1	Pza.	1.00	1,920.47	1,920.47					1.00	1,920.47
12.11.03	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2	Pza.	1.00	2,270.47	2,270.47					1.00	2,270.47
12.11.04	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3	Pza.	1.00	1,770.47	1,770.47					1.00	1,770.47
12.11.05	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-4	Pza.	1.00	1,120.47	1,120.47					1.00	1,120.47
12.11.06	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-5	Pza.	1.00	2,120.47	2,120.47					1.00	2,120.47
12.11.07	TABLERO DE DISTRIBUCION T D-CGE	Pza.	1.00	1,220.47	1,220.47					1.00	1,220.47
12.12	TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA FUERZA				14,867.77						14,867.77
12.12.01	TABLERO DE DISTRIBUCION T MQ-AF1	Und.	1.00	1,570.47	1,570.47					1.00	1,570.47
12.12.02	TABLERO DE DISTRIBUCION T MQ-AF2	Und.	1.00	8,570.47	8,570.47					1.00	8,570.47
12.12.03	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-EB	Und.	1.00	2,250.47	2,250.47					1.00	2,250.47
12.12.04	TABLERO DE DISTRIBUCION ST-B1	Und.	1.00	493.42	493.42					1.00	493.42
12.12.05	TABLERO DE DISTRIBUCION ST-B2	Und.	1.00	1,470.47	1,470.47					1.00	1,470.47
12.12.06	TABLERO DE DISTRIBUCION T-TRAF	Und.	1.00	512.47	512.47					1.00	512.47
12.13	TABLERO DE CONTROL DE ELECTROBOMBAS				4,117.65						4,117.65
12.13.01	TABLERO ALTERNADOR PARA BOMBA AUTOCEBANTE 3HF	Und.	1.00	776.13	776.13					1.00	776.13
12.13.02	TABLERO ALTERNADOR PARA BOMBA CENTRIFUGA 2HP	Und.	1.00	776.13	776.13					1.00	776.13
12.13.03	TABLERO DE CONTROL PARA BOMBAS SUMERGIBLES 1.5HP	Und.	1.00	776.13	776.13					1.00	776.13
12.13.04	TABLERO DE CONTROL PARA BOMBAS SUMERGIBLES 1 HP	Und.	1.00	776.13	776.13					1.00	776.13
12.13.05	TABLERO DE CONTROL PARA BOMBAS SUMERGIBLES 10 HP	Und.	1.00	1,013.13	1,013.13					1.00	1,013.13
12.14	PUESTA A TIERRA				1,525.40						1,525.40
12.14.01	POZO DE PUESTA A TIERRA CON CEMENTO CONDUCTIVO MENOR O IGUAL A 5 OHM	Und.	1.00	1,525.40	1,525.40					1.00	1,525.40
12.15	ALUMBRADO EXTERIOR				32,035.58						32,035.58
12.15.01	POSTE DE CONCRETO DE 11 METROS	Und.	6.00	1,022.26	6,133.56					6.00	6,133.56
12.15.02	CRUZETA DE 1.50 METROS	Und.	1.00	220.60	220.60					1.00	220.60
12.15.03	REFLECTOR DE 400W VAPOR DE SODIO	Und.	6.00	529.93	3,179.58					6.00	3,179.58
12.15.04	DUCTO DE CONCRETO	m.	12.00	86.14	1,033.68					12.00	1,033.68
12.16	POSTE DE ACERO GALVANIZADO				7,734.40						7,734.40
12.16.01	POSTE ALTERNADOR DE ACERO GALVANIZADO PARA LUMINARIA	Und.	8.00	966.80	7,734.40					8.00	7,734.40
12.16.02	REFLECTOR DE 70W VAPOR DE SODIO	Und.	8.00	371.56	2,972.48					8.00	2,972.48
12.16.03	POSTE DE ILUMINACION CON PVC-P	Und.	8.00	1,345.16	10,761.28					8.00	10,761.28
12.16.04	REFLECTOR FLUORESCENTE HERMETICO 2x36W	Und.	145.00	125.02	18,127.90					145.00	18,127.90
12.16.05	REFLECTOR FLUORESCENTE LINEAL 2x36W	Und.	7.00	110.02	770.14					7.00	770.14
12.16.06	REFLECTOR FLUORESCENTE CIRCULAR HERMETICO	Und.	28.00	87.28	2,443.84					28.00	2,443.84


 Gris Alberta Avila Morales
 C.I.P. Nº 84746
 SUPERVISOR DE O.P.P.

12.16.04	LUZ DE EMERGENCIA	Und.	26.00	108.55	2,822.30	-	-	-	-	26.00	2,822.30
12.17	EQUIPOS DE ILUMINACION CON CONDUIT				3,996.74	-	-	-	-	-	3,996.74
12.17.01	ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2x36W C/CONDUIT	Und.	27.00	125.02	3,375.54	-	-	-	-	27.00	3,375.54
12.17.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE C/CONDUIT	Pto.	1.00	63.00	63.00	-	-	-	-	1.00	63.00
12.17.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR COMUTACION SIMPLE C/CONDUIT	Pto.	2.00	117.68	235.36	-	-	-	-	2.00	235.36
12.17.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR COMUTACION DOBLE C/CONDUIT	Pto.	2.00	161.42	322.84	-	-	-	-	2.00	322.84
12.18	GRUPO ELECTROGENO 165KVA (INCLUYE TANQUE DE COMBUSTIBLE)				74,003.60	-	-	-	-	-	74,003.60
12.18.01	GRUPO ELECTROGENO DE 165 KVA, 220V, 60 Hz INCLUTE TANQUE DE COMBUSTIBLE E INSTALACION	Und.	1.00	57,225.20	57,225.20	-	-	-	-	1.00	57,225.20
12.18.02	TABLERO DE TRANSFERENCIA	Und.	1.00	16,778.40	16,778.40	-	-	-	-	1.00	16,778.40
13	INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSION				126,962.15	-	-	-	-	-	126,962.15
13.01	TRABAJOS PRELIMINARES				66.76	-	-	-	-	-	66.76
13.01.01	REPLANTEO TOPOGRAFICO DE REDES Y UBICACION DE ESTRUCTURAS	Km.	0.16	417.28	66.76	-	-	-	-	0.16	66.76
13.02	EXCAVACION				15,395.88	-	-	-	-	-	15,395.88
13.02.01	APERTURA Y CIERRE DE ZANJA 0.6mx1.10m	m ³	102.30	101.93	10,427.44	-	-	-	-	102.30	10,427.44
13.02.02	EJECUCION DE CRUZADA	m ³	9.60	158.14	1,518.14	-	-	-	-	9.60	1,518.14
13.02.03	COMPACTACION DE ZANJA	m ²	93.00	37.10	3,450.30	-	-	-	-	93.00	3,450.30
13.03	CABLES Y CONDUCTORES				46,131.13	-	-	-	-	-	46,131.13
13.03.01	ENTUBADO PVC-P 4"x3m	m.	23.00	22.44	516.12	-	-	-	-	23.00	516.12
13.03.02	TENDIDO DE CABLE NXSY 50 mm2 C/CONFIG. AV-33	m.	465.00	52.38	24,356.70	-	-	-	-	465.00	24,356.70
13.03.03	SUBIDA DE CABLE NXSY 50mm2 EN SAB	m.	13.00	52.57	683.41	-	-	-	-	13.00	683.41
13.03.04	TENDIDO DE CABLE NXOH 300 mm2	m.	90.00	228.61	20,574.90	-	-	-	-	90.00	20,574.90
13.04	CABEZA DE TERMINAL				3,265.94	-	-	-	-	-	3,265.94
13.04.01	EJECUCION TERMINAL EXTERIOR	Kit	2.00	1,632.97	3,265.94	-	-	-	-	2.00	3,265.94
13.05	SUBESTACION AEREA BIPOSTE Y TRAFOMIX				46,369.09	-	-	-	-	-	46,369.09
13.05.01	IZAJE DE POSTES C-A-C 13/400	Und.	3.00	1,309.16	3,927.48	-	-	-	-	3.00	3,927.48
13.05.02	MONTAJE DE MEDIA LOZA C.A.V	Und.	3.00	578.81	1,730.43	-	-	-	-	3.00	1,730.43
13.05.03	MONTAJE DE PALOMILLA C.A.V	Und.	1.00	546.81	546.81	-	-	-	-	1.00	546.81
13.05.04	MONTAJE DE CRUCETA ASIMETRICA C.A.V	Und.	1.00	516.81	516.81	-	-	-	-	1.00	516.81
13.05.05	MONTAJE DE TRANSFORMADOR 250KVA	Und.	1.00	18,985.90	18,985.90	-	-	-	-	1.00	18,985.90
13.05.06	MONTAJE DE TRAFOMIX	Und.	1.00	10,604.00	10,604.00	-	-	-	-	1.00	10,604.00
13.05.07	MONTAJE DE SECCIONADORES CUT OUT	Pza.	6.00	1,679.61	10,077.66	-	-	-	-	6.00	10,077.66
13.06	BUZONES				1,524.75	-	-	-	-	-	1,524.75
13.06.01	BUZON DE CONCRETO 1.0mx1.0mx1.0m	Und.	1.00	1,524.75	1,524.75	-	-	-	-	1.00	1,524.75
13.07	PUESTA A TIERRA				7,627.00	-	-	-	-	-	7,627.00
13.07.01	POZO PUESTA A TIERRA	Und.	5.00	1,525.40	7,627.00	-	-	-	-	5.00	7,627.00
13.08	ACTIVIDADES FINALES				1,527.10	-	-	-	-	-	1,527.10
13.08.01	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	Und.	1.00	1,527.10	1,527.10	-	-	-	-	1.00	1,527.10
13.09	SEGURIDAD				4,808.86	-	-	-	-	-	4,808.86
13.09.01	ADQUISICION DE EQUIPOS DE MANIOBRA	Und.	1.00	4,808.86	4,808.86	-	-	-	-	1.00	4,808.86
13.10	ORDEN Y LIMPIEZA				245.64	-	-	-	-	-	245.64
13.10.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m ³	12.00	20.47	245.64	-	-	-	-	12.00	245.64
<p style="text-align: center;">Supervisor: Luis Alberto Peña Morán S. CIP. N° 84746 SUPERVISOR DE O.P.A.</p>											
<p style="text-align: center;">RESUMEN GENERAL</p>											
COSTO DIRECTO		Si.	12.30%		395,182.34	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	395,182.34
GASTOS GENERALES		Si.	6.00%		48,607.43	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	48,607.43
UTILIDAD		Si.			23,710.94	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	23,710.94
SUB-TOTAL PRESUPUESTO		Si.			467,600.71	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	467,600.71
AMORTIZACION		Si.				0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	
TOTAL PRESUPUESTO (sin IGV)		Si.			467,600.71	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	467,600.71
AVANCE DE SUBPRESUPUESTO (%)					100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

ESPECIALISTAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



VALORIZACIÓN N° 05

Febrero 2018

005.- OBRAS DE MAR


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
 UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
 CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
 FECHA: 28 de Febrero del 2018

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Sub Total \$/.	Valorización anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Saldo a Valorizar	
						Metrado	Parcial \$/.	Metrado	Parcial \$/.	Metrado	Parcial \$/.	Metrado	Parcial \$/.
14	OBRAS DE MAR				630,688.61		74,293.38				74,293.38		556,405.23
14.01	OBRAS PRELIMINARES				105,397.61		28,489.34				28,489.34		76,908.27
14.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN OBRAS DE MAR	m ²	908.40	3.09			908.40			908.40			
14.01.02	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO	Glb.	1.00	16,000.00			0.50			0.50			8,000.00
14.01.03	DESMONTAJE DE POSTE DE ENERGIA EXISTENTE	Und.	2.00	185.61	391.22		2.00			2.00			0.50
14.01.04	DESMONTAJE DE SISTEMA DE DEFENSA DE MUELLE CON NEUMATICOS	m.	100.65	135.14	13,601.84		100.65			100.65			13,601.84
14.01.05	DESMONTAJE DE SISTEMA DE DEFENSA DE MUELLE CON JEBE TIPO D	m.	27.30	135.14	3,689.32		27.30			27.30			3,689.32
14.01.06	PICADO DE LOSA DE CONCRETO	m ²	832.90	58.99	49,132.77							832.90	49,132.77
14.01.07	PICADO DE MURO DE CONCRETO-VIGAS DE CONCRETO	m ²	292.86	38.42	11,251.68							292.86	11,251.68
14.01.08	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO	m ³	39.88	16.15	644.06							39.88	644.06
14.01.09	DEMOLICION DE CONCRETO EN MUELLE PARA REFORZAMIENTO EBD N°01	m ³	10.92	225.88	2,466.61							10.92	2,466.61
14.01.10	ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m ³	172.01	11.00	1,892.11							172.01	1,892.11
14.01.11	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMAQUINA	m ³	172.01	20.47	3,521.04							172.01	3,521.04
14.02.01	COLOCADO PERNOS DE ANCLAJE 3/4"x22" CON ADITIVO	Und.	44.00	54.93	2,416.92							44.00	2,416.92
14.02.02	COLOCACION DE ADITIVO PARA CONCRETO VIEJO-LOSA DE CONCRETO	m ²	832.90	24.16	20,122.86							832.90	20,122.86
14.02.03	COLOCACION DE ADITIVO PARA CONCRETO VIEJO-MURO DE CONCRETO ZONA DE VIGAS	m ²	292.86	26.45	7,746.15							292.86	7,746.15
14.02.04	COLOCACION DE ADITIVO TRANSFORMADOR DE OXIDO LOSA DE PISO	m ²	826.60	8.25	6,819.45							826.60	6,819.45
14.02.05	COLOCACION DE ADITIVO TRANSFORMADOR DE OXIDO-MURO ZONAS VIGAS	m ²	292.86	9.27	2,714.81							292.86	2,714.81
14.02.06	COLOCACION DE MALLA DE ACERO DE REFUERZO PARA MURO DE CONCRETO-ZONA DE VIGA	m ²	292.86	34.75	10,176.89							292.86	10,176.89
14.02.07	PISO DE CONCRETO F'C=280 KG/CM2	m ³	62.47	528.87	33,038.51							62.47	33,038.51
14.02.08	RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN MUROS Y VIGAS	m ³	21.96	503.96	11,066.96							21.96	11,066.96
14.03	SISTEMA DE DEFENSA				241,686.96								241,686.96
14.03.01	ESTRUCTURA DE MADERA PARA DEFENSA EN MUELLE NUEVO CON JEBE TIPO D	m.	27.30	1,827.78	49,898.39							27.30	49,898.39
14.03.02	ESTRUCTURA DE MADERA PARA DEFENSA ZONA DE PLATAFORMA BAJA	m.	31.20	1,215.59	37,926.41							31.20	37,926.41
14.03.03	SISTEMA DE DEFENSA REPOSICION DE JEBE TIPO D	Und.	38.00	713.60	27,116.80							38.00	27,116.80
14.03.04	SISTEMA DE DEFENSA CON 02 NEUMATICOS CADENA EN PLATAFORMA ABRAZADERA	m.	80.20	850.73	68,228.55							80.20	68,228.55
14.03.05	SISTEMA DE DEFENSA CON 01 NEUMATICO CADENA CON PLATAFORMA ABRAZADERA	m.	32.50	443.29	14,406.93							32.50	14,406.93

Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

REG. N° 119009
 CIVIL
 119009



14.03.06	BITAS TIPO B-1	Und.	28.00	319.10	8,994.80	-	-	-	-	28.00	8,994.80
14.03.07	SARDINEL DE MADERA DE 12"x12"x18"	Und.	28.00	1,131.84	31,691.52	-	-	-	-	28.00	31,691.52
14.03.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PESCANTE CAP. W=500KG	Und.	2.00	1,741.78	3,483.56	-	-	-	-	2.00	3,483.56
14.04	PLATAFORMA BAJA Y REFORZAMIENTO DE MUELLE PARA EBD No 01					1,664.20	-	-	-	1,664.20	
14.04.01	CONCRETO VIGAS Y NUCLEO, Fc=280 kg/cm2	m ³	7.93	622.09	14,454.82	-	-	-	-	7.93	14,454.82
14.04.02	VIGAS Y NUCLEOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	38.70	70.16	4,933.17	-	-	-	-	38.70	4,933.17
14.04.03	VIGAS Y NUCLEO, ACERO Fy=4200 kg/cm2	Kg.	1,236.12	4.16	2,715.19	-	-	-	-	1,236.12	2,715.19
14.04.04	CONCRETO EN ESCALERA FC=280 kg/cm2	m ³	7.41	528.81	745.34	-	-	-	-	7.41	745.34
14.04.05	ESCALERAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	7.70	89.25	687.23	-	-	-	-	7.70	687.23
14.04.06	ESCALERAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2	Kg.	55.68	4.16	231.63	-	-	-	-	55.68	231.63
14.05	PILOTAJE										
14.05.01	CONCRETO FC=350 KG/CM2 PARA PILOTAJES	m ³	7.35	591.91	41,597.55	-	-	-	-	7.35	41,597.55
14.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA PILOTES	m ²	84.00	75.39	4,350.54	-	-	-	-	84.00	4,350.54
14.05.03	PILOTES, ACERO Fy=4200kg/cm2	Kg.	3,210.18	4.16	6,332.76	-	-	-	-	3,210.18	6,332.76
14.05.04	PUNTA PARA PILOTES	Und.	6.00	267.70	1,606.20	-	-	-	-	6.00	1,606.20
14.05.05	TRANSPORTE DE PILOTES	Und.	6.00	288.67	1,733.02	-	-	-	-	6.00	1,733.02
14.05.06	HINCAJE DE PILOTES (INC. MOV. Y POSIC. PLANTILLA)	Und.	6.00	2,247.37	13,484.22	-	-	-	-	6.00	13,484.22
14.05.07	DESCABEZADO DE PILOTAJE	Und.	6.00	142.91	857.46	-	-	-	-	6.00	857.46
14.06	CABEZALES PREFABRICADOS										
14.06.01	CONCRETO FC=280 KG/CM2 PARA CABEZAL PREFABRICADO	m ³	4.13	510.23	12,145.99	-	-	-	-	4.13	12,145.99
14.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CABEZAL PREFABRICADO	m ²	27.71	72.44	2,007.31	-	-	-	-	27.71	2,007.31
14.06.03	CABEZAL PREFABRICADO, ACERO Fy=4200 kg/cm2	Kg.	575.26	4.16	2,393.08	-	-	-	-	575.26	2,393.08
14.06.04	TRANSPORTE DE CABEZAL PREFABRICADO	Und.	3.00	320.60	961.80	-	-	-	-	3.00	961.80
14.06.05	COLOCACION DE CABEZAL PREFABRICADO	Und.	3.00	1,558.85	4,676.55	-	-	-	-	3.00	4,676.55
14.07	LOSAS PREFABRICADAS EN PLATAFORMA BAJA										
14.07.01	CONCRETO FC=280 KG/CM2 PARA LOSAS PREFABRICADAS	m ³	5.41	634.09	3,430.43	-	-	-	-	5.41	3,430.43
14.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS PREFABRICADAS	m ²	90.10	72.44	6,526.84	-	-	-	-	90.10	6,526.84
14.07.03	LOSAS PREFABRICADAS, ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2	Kg.	488.24	4.16	2,031.08	-	-	-	-	488.24	2,031.08
14.07.04	TRANSPORTE Y COLOCADO DE LOSA PREFABRICADA	Und.	106.00	120.27	12,748.62	-	-	-	-	106.00	12,748.62
14.07.05	COLOCACION DE ADITIVO MASILLA EPOXICA SUBMARINA	m ²	1,219.55	79.19	96,576.16	-	-	-	-	1,219.55	96,576.16
COSTO DIRECTO											
GASTOS GENERALES		SI.	12.30%	630,698.61	74,293.38	6.49%				74,293.38	556,405.23
UTILIDAD		SI.	6.00%	77,575.93	9,138.09	0.00%				9,138.09	68,437.84
SUB-TOTAL PRESUPUESTO		SI.		37,841.92	4,457.60	0.00%				4,457.60	33,384.31
AMORTIZACION		SI.		746,116.46	87,889.07	0.00%				87,889.07	658,227.38
TOTAL PRESUPUESTO (\$sin IGV)		SI.		746,116.46	87,889.07	0.00%				87,889.07	658,227.38
AVANCE DE SUBPRESUPUESTO (%)											
					100.00%					11.78%	88.22%



Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE O.P.R.A.


JORGE JULIO ESPINOSA AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009



**ANEXO N° 02:
PANEL FOTOGRÁFICO**


 Luis Alberto Avila Morán
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS


JON DE JULIO
ESPINOSA AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

PANEL FOTOGRÁFICO

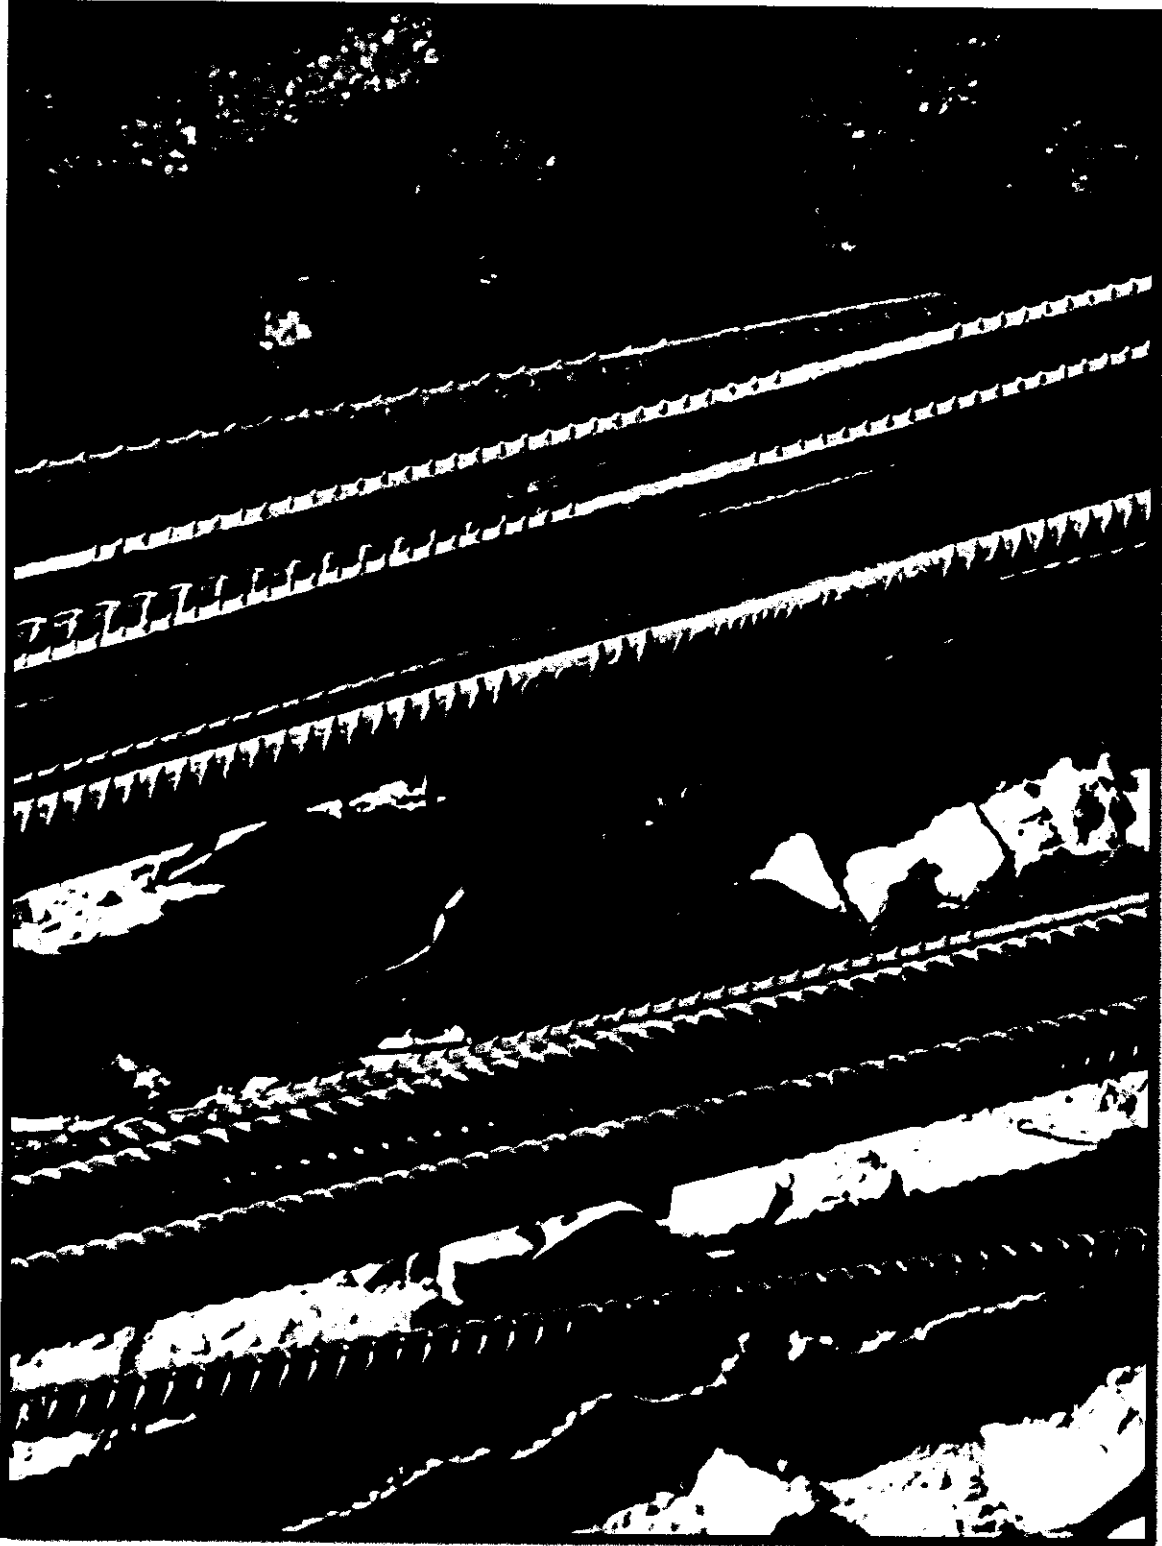



Figura 1: Granada encontrada entre las armaduras.


Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA



JORGE JULIO
ESPINOSA AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



Figura 2: Granada encontrada entre las armaduras.




Luis Alberto Avila Morales
Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

ESPIRITAN AVILÉS
ESPIRITAN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



Figura 3: Granada encontrada entre las armaduras.


Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA




ING. GF JULIO
ESPINOSA AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



Figura 4: Presencia Policial en Obra.



Figura 5: Acordonamiento policial en obra.


Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA



JORGE JULIO
ESPINOZA AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



Figura 6: Constatación policial de la presencia del artefacto explosivo en obra.


Luis Alberto Avila Morales
Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

Jorge Julio
Jorge Julio
ESPINOZA AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009


SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA




Figura 7: Obra paralizada, sin actividades



Figura 8: Sin actividad en obra / Área de Administración


Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA


JORGE JULIO
ESCORBAR AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

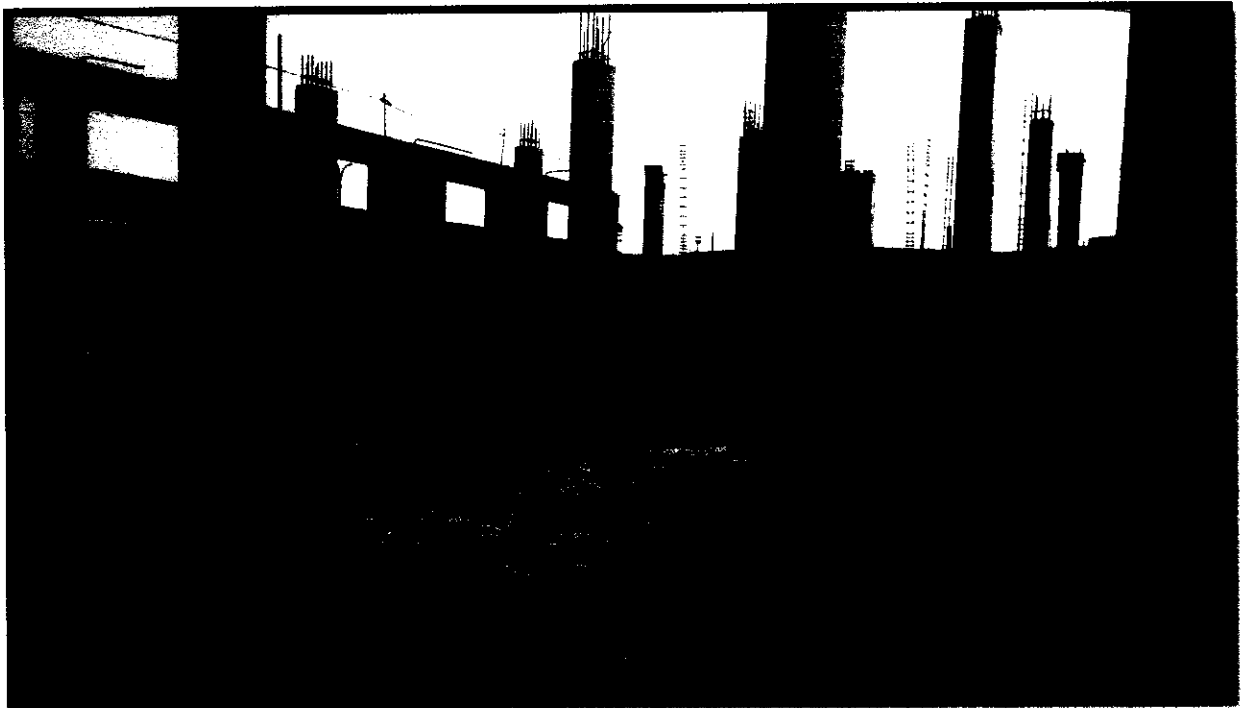




Figura 9: Sin actividad en obra / Área de Tareas Previas



Figura 10: Sin actividad en obra / Área de Recepción de Recursos


 **Luis Alberto Avila Morales**
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA



JOSÉ JULIO ESPINÁN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



Figura 11: Armadura expuesta en Cisterna-Tanque Elevado



Luis Alberto Avila Morales
Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

José Julio Espinosa Avilés
JOSÉ JULIO
ESPINOSA AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



Figura 12: Varillas de acero corrugado en obra



Luis Alberto Avila Moral
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

[Handwritten Signature]
ROSE JUNIO
ESPIZAN AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



Figura 13: Armadura protegida




Luis Alberto Avila Morales
Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

Julio
JULIO
JULIAN AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



Figura 14: Encofrado metálico alquilado


 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS


17 DE JULIO
JUAN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

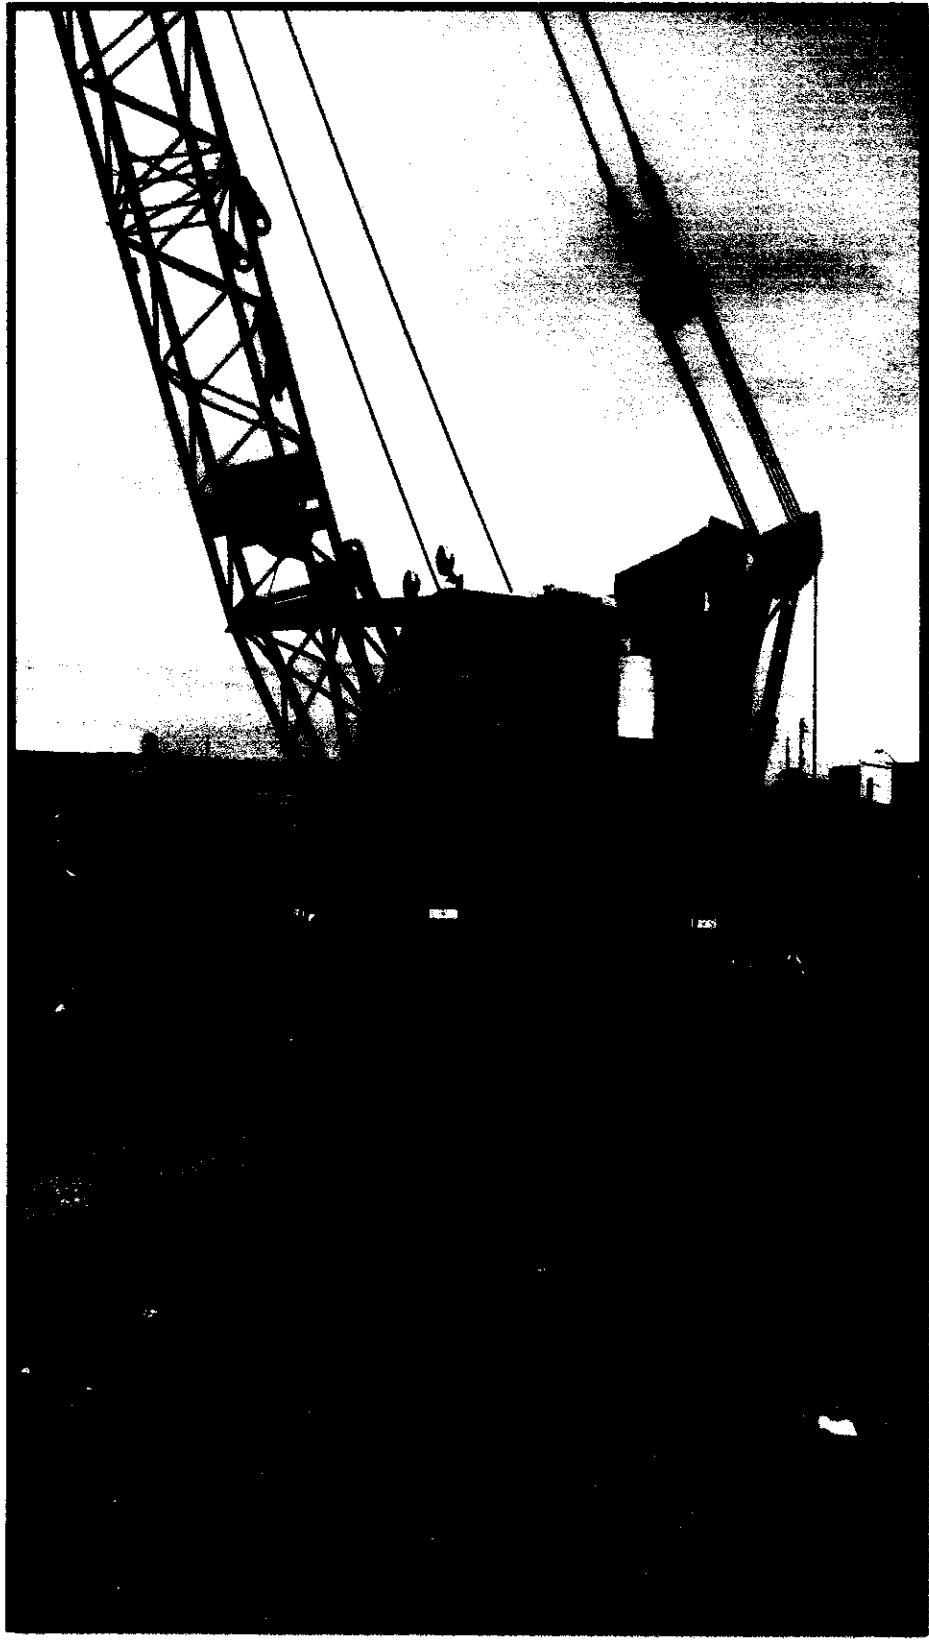



Figura 15: Grúa de Celosía FUCHS 20 Ton en Stand By


Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS


JULIO ESPINOSA AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

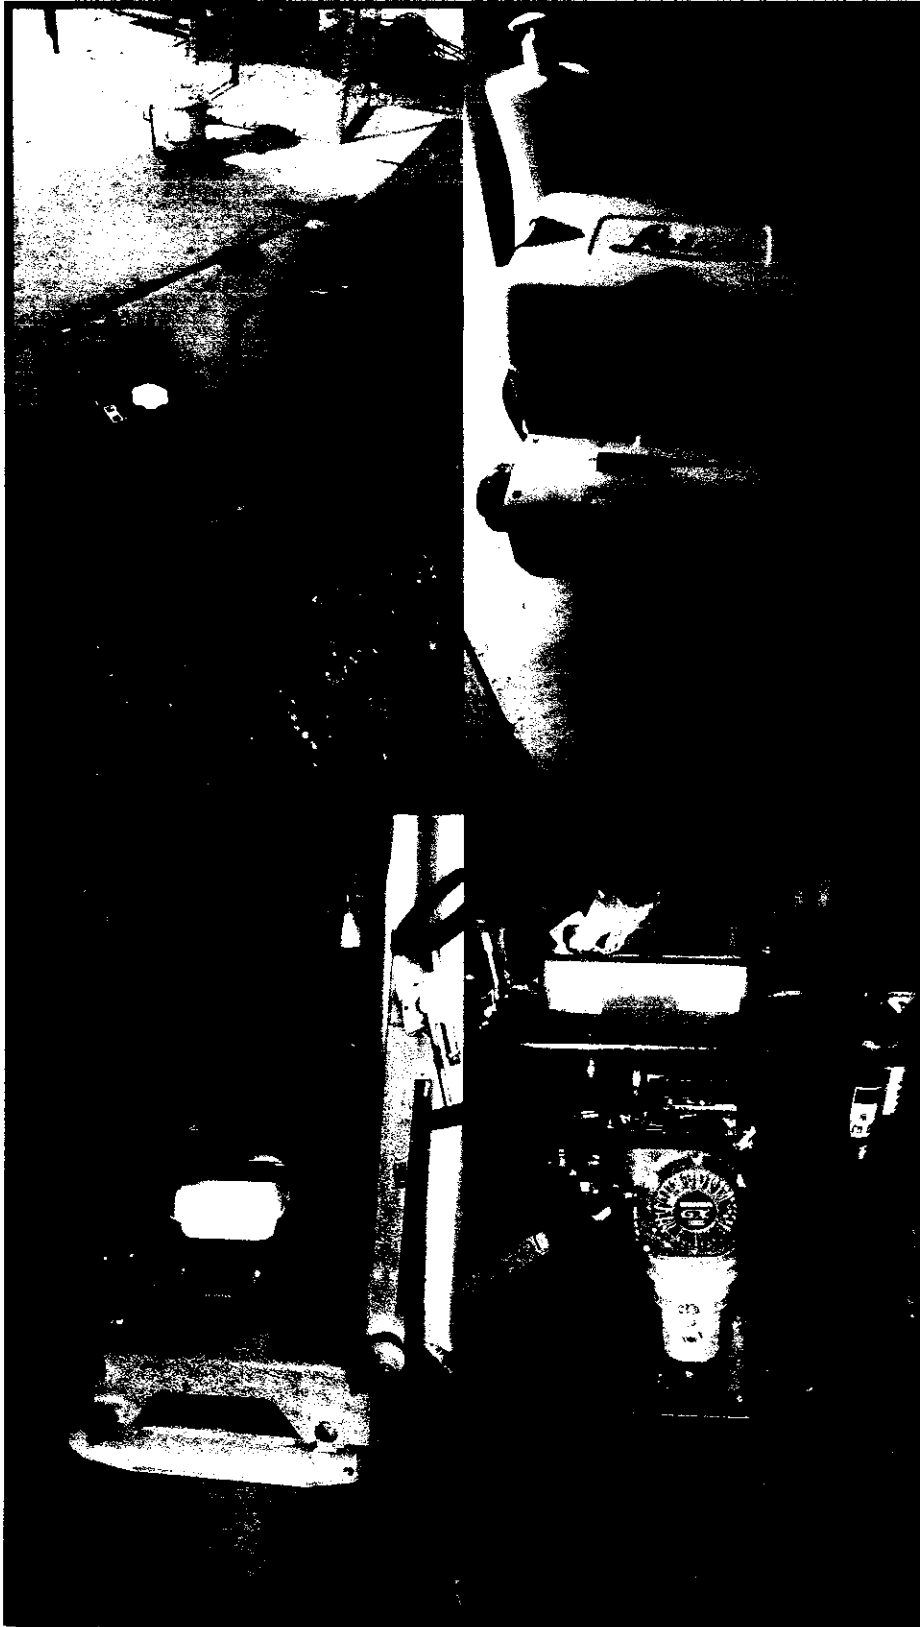


Figura 16: Equipos Menores en stand by



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE CLIMA

JOSÉ JULIO
ESPILHAN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



Figura 17: Equipos en stand by



Luis Alberto Avila Morales
Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84745
SUPERVISOR DE OBRAS

[Signature]
JULIO
ESPINOZA AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



**ANEXO N° 03:
CRONOGRAMA VALORIZADO
DE OBRA**


 **Luis Alberto Avila Morales**
CIP. N° 84749
SUPERVISOR DE OBRAS


**JORGE JULIO
ESPINOSA AVILÉS**
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Obras Mejoramiento de los Servicios de Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia de Nazca, Region ICA
Ubicacion: MARCONA-NASCA - ICA
Fecha Diciembre 2017
Cliente: FONDEPES

Table with columns: Mes, Unidad, Descripción, Método, P. Unit. \$, Pondera. \$, Oct 17 Pondera. (\$), Nov 17 Pondera. (\$), Dic 17 Pondera. (\$), Ene 18 Pondera. (\$), Feb 18 Pondera. (\$), Mar 18 Pondera. (\$), Abr 18 Pondera. (\$), May 18 Pondera. (\$), TOTAL.

Ing. Alberto Avila Moran...
CIP. No 84745
SUPERVISOR DE OBRAS

INGENIERO JULIO
ESCHIGUER AVILES
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N. 119009




CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Otra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA
Ubicada: MARCONA - NASCA - ICA
Fecha Diciembre 2017
Cliente: FONDEPES

Table with columns: Mes, Descripción, Unidad, Medida, P. Unit. \$, P. Mensual \$, Oct 17, Nov 17, Dic 17, Ene 18, Feb 18, Mar 18, Abr 18, May 18, TOTAL. Rows include items like OBRAS DE CONCRETO ARMADO, ZAPATAS, SOBRECIMENTOS, etc.

Luis Alberto Avila Morales
CIP. No 84743
SUPERVISOR DE OBRAS

10 DE JULIO
ESPECIAL AVILES
INGENIERO CIVIL
REG. CIP No. 119009



CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Objeto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA
Ubicacion: MARCONA - NAZCA - ICA
Fecha Diciembre 2017
Clientes: FONDEPES

Table with columns: Mes, Descripción, Unidad, Medida, P. Unit. \$, Parcial \$, Oct 17 Parcial (\$), Nov 17 Parcial (\$), Dic 17 Parcial (\$), Ene 18 Parcial (\$), Feb 18 Parcial (\$), Mar 18 Parcial (\$), Abr 18 Parcial (\$), May 18 Parcial (\$), TOTAL. Rows include items like LOSA ALIGERADA, LOSAS MACIZAS, MUROS DE LADRILLO, etc.



Los Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

INGENIERO JUAN AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
 Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA
 Ubicación: MARCONA - NASCA - ICA
 Fecha: Diciembre 2017
 Cliente: FONDEPES

Mes	Descripción	Unid.	Materiales	P. Unit. \$/m	Presup. \$/m	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	TOTAL
						Presup. (\$)	Presup. (\$)	Presup. (\$)	Presup. (\$)	Presup. (\$)	Presup. (\$)	Presup. (\$)	Presup. (\$)	Presup. (\$)
08.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALLAD DE DIQUE. Dimas=0.8 m	m ³	89.75	14.08	1,404.48				1,404.48					1,404.48
08.08	SUMINISTRO Y HABILITACION DE GEOTEXTIL TEJIDO 270 gr/cm2	m ²	146.50	8.43	1,233.31				1,233.31					1,233.31
10.01	ARQUITECTURA													
10.01.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANELERIA	m ²			1,196,490.72									
10.02	MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M.1.14 E=1.5 cm	m ²	2,376.82	65.28	155,165.34									
10.02.01	REVOLUCOS EN LUCIDOS Y MOLDURAS	m ²			155,165.34									
10.02.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES Y CERCO PERIMETRICO	m ²	2,406.04	28.39	68,307.48									
10.02.03	TARRAJEO EN MURO ANTERIOR	m ²	2,210.88	23.85	52,705.43									
10.02.04	TARRAJEO DE COLUMNAS	m ²	531.46	33.72	17,920.83									
10.02.05	TARRAJEO DE VIGAS	m ²	81.17	50.48	3,087.86									
10.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES 1:5	m ²	48.43	12.31	596.17									
10.02.07	TARRAJEO DE MESAS DE CONCRETO CON CEMENTO PULIDO BOLEADO EN SERVICIOS HIGIENICOS	m ²	11.50	34.61	398.02									
10.02.08	TARRAJEO DE MESAS DE CONCRETO PULIDO. RECEPCION DE ALIMENTOS HIDROBIOLÓGICOS	m ²	32.40	34.61	1,121.38									
10.02.09	TARRAJEO DE MESAS DE CONCRETO PULIDO. TARRAJEO PULIDO DE MANILUVIOS, LAVADO DE BOTAS, LAVADEROS, ETC.	m ²	11.86	34.61	410.47									
10.02.10	TARRAJEO EN ESCALERAS	m ²	83.97	37.18	3,117.13									
10.02.11	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CISTERNA	m ²	164.70	27.10	4,463.37									
10.03	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN TANQUE ELEVADO	m ²	178.90	39.28	7,054.89									
10.03.01	CIELO RASO	m ²			48,317.71									
10.03.02	CIELO RASO CON MEZCLA C.A 1:5	m ²	1,144.21	41.57	47,537.71									
10.04	PISOS Y PAVIMENTOS				152,842.07									
10.04.01	FALSO PISO E=2" DE CONCRETO 1:10	m ²	1,324.64	34.80	46,087.47									
10.04.02	PISO DE CEMENTO PULIDO (CON FIBRAS DE ACERO DRAMIX, INC. JUNTAS DE DILATACION)	m ²	881.57	42.14	36,306.56									
10.04.03	PISO FROTACHADO BRUNADO	m ²	71.75	27.76	1,991.78									
10.04.04	PISO DE PORCELANATO 0.8x0.8 m ANTIFELIZANTE	m ²	345.50	73.07	25,245.89									
10.04.05	PISO DE PORCELANATO 0.5x0.3 m ANTIFELIZANTE	m ²	22.75	62.07	1,412.09									
10.04.06	VEREDA DE CONCRETO F=7% kg/cm2 E=4" FROT. Y BRUNADO	m ²	688.04	52.57	36,170.28									
10.04.07	VEREDA ENOPRADO Y DESENCOFRADO	m ²	158.00	38.02	5,987.12									
10.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				43,466.81									
10.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO RECTIFICADO DE COLOR 0.30x0.60m	m ²	269.44	93.82	25,224.87									
10.05.02	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO RECTIFICADO DE COLOR 0.30x0.60m (H=0.10 m)	m ²	222.27	18.97	4,238.73									
10.05.03	CONTRAZOCALO SANITARIO S/COLORAR H=10 cm. MEZCLA 1:2 E=1.5 cm	m ²	230.95	19.26	4,448.10									
10.05.04	CONTRAZOCALO S/COLORAR H=30 cm. MEZCLA 1:2 E=1.5 cm	m ²	824.50	14.98	12,355.01									
10.06	COBERTURAS				114,899.91									
10.06.01	COBERTURA POLICARBONATO COLOR BLANCO E=6mm (INCLUYE ACCESORIOS, PROVISION Y COLOCACION)	m ²	470.31	75.50	35,508.41									
10.06.02	COBERTURA LADRILLO PASTELERO 24x24 ASENTADO CON MEZCLA 1:5	m ²	1,050.00	75.61	79,390.50									
10.07	CARPINTERIA DE MADERA				38,789.93									
10.07.01	PUERTA SIMPLE VAVEN CONTRAPLACADA E=45 mm. TRIPLAY LUPUNA 6 mm CON MARCO DE MADERA CEDRO 1 1/2" x 4"	m ²	4.32	351.90	1,520.21									
10.07.02	PUERTA SIMPLE CONTRAPLACADA E=45 mm. TRIPLAY LUPUNA 6 mm CON MARCO DE MADERA CEDRO 1 1/2" x 4"	m ²	37.80	351.90	13,301.82									
10.07.03	PUERTA SIMPLE CONTRAPLACADA CON BARRA DISCAPAC. E=45 mm. TRIPLAY LUPUNA 6 mm CON MARCO DE MADERA CEDRO 1 1/2" x 4"	m ²	2.40	372.78	894.67									
10.07.04	PUERTA SIMPLE RANURADA APANELADA DE MADERA. CON MARCO DE MADERA CEDRO 1 1/2" X 4"	m ²	4.80	546.34	2,622.43									
10.07.05	PUERTA DOBLE RANURADA APANELADA DE MADERA. CON MARCO DE MADERA CEDRO 1 1/2" X 4"	m ²	9.60	684.81	6,583.14									
10.07.06	PUERTA SIMPLE APANELADA DE MADERA. CON MARCO DE MADERA CEDRO 1 1/2" X 4"	m ²	2.88	888.37	2,558.51									
10.07.07	TABIQUE DE MELAMINE PARA BANOS Y VESTIDORES E= 18 mm	m ²	24.08	154.72	3,725.68									
10.07.08	PUERTA PARA TABIQUE DE MELAMINE PARA BANOS Y VESTIDORES. E= 18 mm	m ²	34.72	224.15	7,782.49									
10.08	CARPINTERIA METALICA				137,803.38									
10.08.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA 1.00 x 2.40 m (INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	856.50	856.50									
10.08.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA 0.80 x 2.10 m (INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	828.00	828.00									

Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84743
 SUPERVISOR DE OBRA

10 DE JUNIO
ESTEBAN JAVIERES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119003



CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Obj: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA
 Ubicación: MARCONA - NASCA - ICA
 Fecha Diciembre 2017
 Cliente: FONDEFES

Item	Descripción	Und	Metrado	P. Unit S/	Parcial S/	Oct 17 Parcial (S/)	Nov 17 Parcial (S/)	Dic 17 Parcial (S/)	Ene 18 Parcial (S/)	Feb 18 Parcial (S/)	Mar 18 Parcial (S/)	Abr 18 Parcial (S/)	May 18 Parcial (S/)	TOTAL
10.08.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE ACERO 1.00x3.10 m (INC. ACCESORIOS)	Und.	1.00	1,045.57	1,045.57							1,045.57		1,045.57
10.08.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE ACERO 1.20x2.50 m (INC. ACCESORIOS)	Und.	1.00	954.71	954.71							954.71		954.71
10.08.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE 02 HOJAS DE ACERO 1.20x3.50 m (INC. ACCESORIOS)	Und.	1.00	6,586.60	6,586.60							6,586.60		6,586.60
10.08.06	MUJELLE 2 HOJAS DE ACERO 4.00x 3.00m (INC. ACCES)	Und.	1.00	3,183.38	3,183.38							3,183.38		3,183.38
10.08.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA VAVEN ALTO IMPACTO 1.80 x 2.40 (INC. ACCESORIOS)	Und.	1.00	11,573.01	11,573.01							11,573.01		11,573.01
10.08.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA VAVEN ALTO IMPACTO 1.20 x 2.40 (INC. ACCESORIOS)	Und.	1.00	9,710.15	9,710.15							9,710.15		9,710.15
10.08.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA VAVEN ALTO IMPACTO 1.40 x 2.40 (INC. ACCESORIOS)	Und.	1.00	10,874.43	10,874.43							10,874.43		10,874.43
10.08.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SIMPLE ALTO IMPACTO 0.80 x 2.40 (INC. ACCESORIOS)	Und.	1.00	8,778.70	8,778.70							8,778.70		8,778.70
10.08.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SIMPLE ALTO IMPACTO 1.00 x 2.40 (INC. ACCESORIOS)	Und.	1.00	9,244.43	9,244.43							9,244.43		9,244.43
10.08.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE ALTO IMPACTO 1.95x2.40m (INC. ACCES)	Und.	1.00	13,435.88	13,435.88							13,435.88		13,435.88
10.08.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE ALTO IMPACTO 1.80x2.40 m (INC. ACCESORIOS)	Und.	3.00	12,870.15	38,610.45							38,610.45		38,610.45
10.08.14	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" (Ver planos de detalles)	m.	48.06	124.81	5,988.37							5,988.37		5,988.37
10.08.15	PASAMANO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" (Ver planos de detalles)	m.	44.96	60.45	2,717.83							2,717.83		2,717.83
10.08.16	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE EN MESA DE RECEPCION DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS (INC. MANDIL H=10cm, AMBOS LADOS)	m²	32.40	285.58	9,252.79							9,252.79		9,252.79
10.08.17	TAPA METALICA CON PLANCHA DE FIERRO EN CISTERNA, INC. TIRADOR CANTADO Y ACCESORIOS (Ver planos de detalles)	Und.	2.00	290.36	580.72							580.72		580.72
10.08.18	TAPA METALICA CON PLANCHA DE FIERRO EN TANQUE ELEVADO, INC. TIRADOR, CANTADO Y ACCESORIOS (Ver planos de detalles)	Und.	2.00	290.36	580.72							580.72		580.72
10.08.19	ESCALERA DE METAL DE F°3° EN TANQUE SEPTICO (Ver planos de detalles)	Und.	1.00	386.98	386.98							386.98		386.98
10.08.20	ESCALERA DE METAL DE F°3° EN TANQUE ELEVADO (Va desde el 1er nivel hasta el T.E. Ver planos de detalles)	Und.	1.00	2,324.14	2,324.14							2,324.14		2,324.14
10.09	CARPINTERIA DE ALUMINIO, VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES	Und.			113,708.05									113,708.05
10.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SECCIONABLE 2.00 x 3.00 m	Und.	6.00	5,818.15	34,908.90									34,908.90
10.09.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SECCIONABLE 2.33 x 2.50 m	Und.	1.00	4,918.15	4,918.15									4,918.15
10.09.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA ENROLLABLE 1.50 x 1.80 m	Und.	5.00	2,304.81	11,524.05									11,524.05
10.09.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA ENROLLABLE 2.00 x 1.80 m	Und.	1.00	2,581.08	2,581.08									2,581.08
10.09.05	VENTANA DE ALUMINIO Y CRISTAL LAMINADO 10 mm	m²	10.82	477.72	5,168.83									5,168.83
10.09.06	RACHEL Y CON VIDRIO SEMIPESADO DE COLOR NATURAL, MALLA	m²	62.50	460.79	28,789.38									28,789.38
10.09.07	VENTANA DE ALUMINIO SEMIPESADO DE COLOR NATURAL CON VIDRIO INCOLORO, TEMPLADO DE 8mm	m²	69.14	336.92	23,294.65									23,294.65
10.09.08	CRISTAL DE SEGURIDAD 10 mm, REFLEJANTE	m²	1.35	453.72	612.52									612.52
10.09.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO SIN BISEL EMPOTRADO EN PARED (e=3mm)	m²	18.48	167.77	3,100.39									3,100.39
10.10	CERRAJERIA	Und.			8,837.28									8,837.28
10.10.01	CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA, CON TIRADOR HIGIENICOS Y VESTIDORES)	Und.	34.00	75.94	2,582.96									2,582.96
10.10.02	BISAGRA CARUCHINA DE 3" X 1/2"	Und.	6.00	57.84	347.04									347.04
10.10.03	PINTURA EN MUROS INTERIORES CON EPOXICO	m²	2,210.88	14.07	31,107.08									31,107.08
10.10.04	PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON EPOXICO	m²	2,408.04	15.31	36,858.47									36,858.47
10.10.05	PINTURA EN COLUMNAS CON EPOXICO	m²	531.46	15.31	8,136.65									8,136.65
10.10.06	PINTURA EN VIGAS CON EPOXICO	m²	51.17	15.98	816.27									816.27
10.10.07	PINTURA EN ESCALERAS CON EPOXICO	m²	65.97	15.31	1,009.08									1,009.08
10.10.08	PINTURA EN PISOS CON EPOXICO	m²	1,114.21	14.07	15,674.46									15,674.46
10.10.09	PINTURA PARA TANQUE ELEVADO CON EPOXICO	m²	889.00	12.50	11,112.50									11,112.50
10.10.10	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	m²	179.60	18.19	3,266.92									3,266.92
10.10.11	INODORO BLANCO DIFUSA Tra MAC. + T. BAJO INC. ACCESORIOS	Pza.	18.00	238.00	4,284.00									4,284.00
10.10.12														

Luis Alberto Avila Morales
 CIP. Nº 84743
 SUPERVISOR DE OBRAS

Juan Julio
 ING. JUAN JULIO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP Nº 119009



CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Obr: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA

Ubicación: MARCONA - NASCA - ICA

Fecha Diciembre 2017

Client: FONDERPE

Table with columns: Mes, Descripción, Unidad, Material, P. Unid., Porcentaj, Oct 17, Nov 17, Dic 17, Ene 18, Feb 18, Mar 18, Abr 18, May 18, TOTAL. Rows include items like URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO, LAVATORIO CON PEDESTAL, GRIFERIA DE BRONCE, etc.

Logo and signature of Luis Alberto Avila Morales, CIP. No 84740, SUPERVISOR DE OBRA

Signature and text: INGENIERO CIVIL, Reg. CIP No 119009

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Oltre MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE MAZCA, REGION ICA
 Ubicación: MARCONA - MAZCA - ICA

Cliente: FONDEPES

Fecha: Diciembre 2017

Item	Descripción	Unid.	Mostrado	P. Unid. \$.	Parcial \$.	Oct 17 Parcial (\$.)	Nov 17 Parcial (\$.)	Dic 17 Parcial (\$.)	Ene 18 Parcial (\$.)	Feb 18 Parcial (\$.)	Mar 18 Parcial (\$.)	Abr 18 Parcial (\$.)	May 18 Parcial (\$.)	TOTAL
11.01.06.14	REDUCCION PVC SAP 1 1/2" - 1/2"	Und.	1.00	6.46	6.46				6.46					6.46
11.01.06.15	REDUCCION PVC SAP 1 1/2" - 3/4"	Und.	1.00	6.76	6.76				6.76					6.76
11.01.06.16	REDUCCION PVC SAP 2 1/2" - 1 1/2"	Und.	1.00	6.98	6.98				6.98					6.98
11.01.06.17	REDUCCION PVC SAP 2" - 1/2"	Und.	5.00	12.96	64.80				64.80					64.80
11.01.06.18	TAPON DE PVC DE 2"	Und.	2.00	18.18	36.36				36.36					36.36
11.01.07.01	VALVULA COMPUERTA 1 1/2" CON U/P	Und.	24.00	91.17	2,188.08				2,188.08					2,188.08
11.01.07.02	VALVULA COMPUERTA 3/4" CON U/P	Und.	2.00	102.11	204.22				204.22					204.22
11.01.07.03	VALVULA COMPUERTA 1" CON U/P	Und.	4.00	115.61	462.44				462.44					462.44
11.01.07.04	VALVULA COMPUERTA 2" CON U/P	Und.	3.00	288.68	866.04				866.04					866.04
11.01.07.05	MEDIDOR DE CAUDAL DE 1"	Und.	1.00	2,181.84	2,181.84				2,181.84					2,181.84
11.01.08.01	ELECTROBOMBA, Q= 2,821lt/Seg, Aql=23 m, Pot. Aprox.=2 HP	Und.	2.00	1,717.55	3,435.10				3,435.10					3,435.10
11.01.08.02	EQUIPO Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLORACION	Und.	1.00	3,522.05	3,522.05				3,522.05					3,522.05
11.01.08.03	VALVULA FLOTADORA DE 1 1/2"	Und.	1.00	89.68	89.68				89.68					89.68
11.01.08.04	VALVULA COMPUERTA 2" CON U/P	Und.	2.00	238.69	477.38				477.38					477.38
11.01.08.05	VALVULA CHECK DE 2"	Und.	2.00	595.52	1,191.04				1,191.04					1,191.04
11.01.08.06	VALVULA DE PIE DE 2 1/2"	Und.	2.00	10.26	20.52				20.52					20.52
11.01.08.07	UNION UNIVERSAL DE 1/2"	Und.	2.00	85.59	171.18				171.18					171.18
11.01.08.08	UNION DRESSER 2"	Und.	2.00	151.76	303.52				303.52					303.52
11.01.08.09	UNION DRESSER 2 1/2"	Und.	4.00	189.76	759.04				759.04					759.04
11.01.08.10	CANASTILLA DE 2 1/2"	Und.	2.00	183.53	367.06				367.06					367.06
11.01.08.11	CODO PVC-SAP 2"	Und.	3.00	18.91	56.73				56.73					56.73
11.01.08.12	CODO PVC-SAP 2 1/2"	Und.	2.00	19.41	38.82				38.82					38.82
11.01.08.13	TEE PVC-SAP 2"	Und.	4.00	18.31	73.24				73.24					73.24
11.01.08.14	TAPON DE PVC DE 2"	Und.	3.00	18.16	54.48				54.48					54.48
11.01.08.15	ABRAZADERAS SOPORTES Y COLGADORES 2"	Pz=	9.00	138.43	1,245.87				1,245.87					1,245.87
11.01.08.16	ABRAZADERAS SOPORTES Y COLGADORES 2 1/2"	Pz=	8.00	143.43	1,147.44				1,147.44					1,147.44
11.02.01.01	SISTEMA DE AGUA SALADA	Und.			53,088.56									53,088.56
11.02.01.02	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS / MIL	m.	243.00	1.57	381.51				381.51					381.51
11.02.02.01	EXCAV. DE ZANJA P/UBERIA	m.	243.00	11.98	2,898.24				2,898.24					2,898.24
11.02.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/UBERIA	m.	243.00	2.13	517.59				517.59					517.59
11.02.02.03	CAMA DE APOYO E=0.10M	m.	243.00	7.37	1,790.81				1,790.81					1,790.81
11.02.02.04	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m.	243.00	7.00	1,701.00				1,701.00					1,701.00
11.02.03.01	VALVULA DE AGUA SALADA	Pto.	2.00	72.33	144.66				144.66					144.66
11.02.03.02	VALVULA DE AGUA SALADA 3/4"	Pto.	34.00	89.03	3,027.02				3,027.02					3,027.02
11.02.03.03	VALVULA DE AGUA SALADA 1 1/2"	Pto.	5.00	101.10	505.50				505.50					505.50
11.02.04.01	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 3/4" C-10	m.	120.00	13.64	1,636.80				1,636.80					1,636.80
11.02.04.02	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 1/2" C-10	m.	25.00	14.68	367.25				367.25					367.25
11.02.04.03	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 3" C-10	m.	20.00	20.59	411.80				411.80					411.80
11.02.04.04	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRA/TUB. HDPE Ø 3" C-10 (T.E.-Clatema)	m.	18.00	28.59	514.62				514.62					514.62
11.02.05.01	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 2" C-10 (Colgada)	m.	2.00	21.22	42.44				42.44					42.44
11.02.05.02	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 2 1/2" C-10 (Succión)	m.	8.00	19.28	154.24				154.24					154.24
11.02.05.03	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRA/TUB. PVC Ø 3" C-10	m.	32.00	20.59	658.88				658.88					658.88
11.02.05.04	SUM./Inst. T/Prueba Hidra / Tub. HDPE Ø 2 1/2" C-10 Espuesta (Captacion - Clatema)	m.	120.00	20.24	2,428.80				2,428.80					2,428.80
11.02.05.05	SUM./Inst. T/Prueba Hidra / Tub. HDPE Ø 2 1/2" C-10 Enterrada (Captacion - Clatema)	m.	46.00	22.36	1,028.56				1,028.56					1,028.56
11.02.05.06	SUM./Inst. T/Prueba Hidra / Tub. HDPE Ø 2" C-10 (Clatema - T.E.)	m.	20.00	18.32	366.40				366.40					366.40
11.02.05.07	SUM./Inst. T/Prueba Hidra / Tub. HDPE Ø 3" C-10. Captacion	m.	8.00	28.59	228.72				228.72					228.72
11.02.06.01	TEE PVC-SAP 3/4"	Und.	18.00	10.56	190.08				190.08					190.08
11.02.06.02	TEE PVC-SAP 2"	Und.	14.00	19.31	270.34				270.34					270.34
11.02.06.03	TEE PVC-SAP 2 1/2"	Und.	5.00	22.28	111.40				111.40					111.40
11.02.06.04	TEE PVC-SAP 3"	Und.	1.00	22.86	22.86				22.86					22.86
11.02.06.05	CODO PVC-SAP 1/2"	Und.	2.00	13.46	26.92				26.92					26.92
11.02.06.06	CODO PVC-SAP 3/4"	Und.	7.00	14.41	100.87				100.87					100.87
11.02.06.07	CODO PVC-SAP 2"	Und.	3.00	20.96	62.88				62.88					62.88
11.02.06.08	CODO PVC-SAP 2"	Und.	15.00	18.91	283.65				283.65					283.65

Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84749
 SUPERVISOR DE OBRA

Jorge Julio Espinosa Aviles
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009



Ofici: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA
 Ubicacion: MARCONA - NAZCA - ICA
 Fecha: Diciembre 2017
 Cliente: FONDEPES

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Item	Unid	Monto	P. Unid.	Preciada	Oct 17	Nov 17	Dic 17	Ene 18	Feb 18	Mar 18	Abr 18	May 18	TOTAL
				(\$)	Preciada (\$)	Preciada (\$)	Preciada (\$)	Preciada (\$)	Preciada (\$)	Preciada (\$)	Preciada (\$)	Preciada (\$)	(\$)
11.02.06.09	Und	8.00	19.41	155.28									155.28
11.02.06.10	Und	5.00	8.36	41.80									41.80
11.02.06.11	Und	15.00	13.38	200.70									200.70
11.02.06.12	Und	2.00	14.66	29.32									29.32
11.02.06.13	Und	3.00	18.16	54.54									54.54
11.02.07.01	Und	2.00	91.17	182.34									182.34
11.02.07.02	Und	15.00	102.11	1,531.65									1,531.65
11.02.07.03	Und	5.00	174.81	874.55									874.55
11.02.07.04	Und	1.00	480.81	480.81									480.81
11.02.08.01	Und	2.00	2,183.85	4,367.70									4,367.70
11.02.08.02	Und	1.00	3,522.05	3,522.05									3,522.05
11.02.08.03	Und	2.00	238.69	477.38									477.38
11.02.08.04	Und	2.00	99.68	199.36									199.36
11.02.08.05	Und	2.00	535.52	1,071.04									1,071.04
11.02.08.06	Und	2.00	288.73	577.46									577.46
11.02.08.07	Und	2.00	37.12	74.24									74.24
11.02.08.08	Und	2.00	151.78	303.52									303.52
11.02.08.09	Und	4.00	189.78	759.12									759.12
11.02.08.10	Und	3.00	18.91	56.73									56.73
11.02.08.11	Und	2.00	19.41	38.82									38.82
11.02.08.12	Und	4.00	19.31	77.24									77.24
11.02.08.13	Und	3.00	18.18	54.54									54.54
11.02.08.14	Und	2.00	1,666.70	3,333.40									3,333.40
11.02.08.15	Und	1.00	1,289.24	1,289.24									1,289.24
11.02.08.16	Und	1.00	803.02	803.02									803.02
11.02.08.17	Und	2.00	323.81	647.62									647.62
11.02.08.18	Und	2.00	408.93	817.86									817.86
11.02.08.19	Und	1.00	317.59	317.59									317.59
11.02.08.20	Und	2.00	169.78	339.52									339.52
11.02.08.21	Und	4.00	19.41	77.64									77.64
11.02.08.22	Und	4.00	20.86	83.44									83.44
11.02.08.23	Und	4.00	22.28	89.12									89.12
11.02.08.24	Und	1.00	22.96	22.96									22.96
11.02.08.25	Und	3.00	18.90	56.70									56.70
11.02.08.26	Und	9.00	138.43	1,245.87									1,245.87
11.02.08.27	Und	8.00	143.43	1,147.44									1,147.44
11.02.08.28	Und	48.00	153.43	7,313.04									7,313.04
11.03	Pza			2,301.17									2,301.17
11.03.01	m.	83.00	9.59	795.87									795.87
11.03.01.02	m.	36.00	11.86	426.96									426.96
11.03.02.01	Und	28.00	34.34	961.52									961.52
11.03.02.02	Und	8.00	9.97	79.76									79.76
11.03.02.03	Und	3.00	12.32	36.96									36.96
11.04				57,277.35									57,277.35
11.04.01	m.	275.20	1.57	432.06									432.06
11.04.02	m.	275.20	14.88	4,080.18									4,080.18
11.04.02.01	m.	275.20	2.13	586.18									586.18
11.04.02.02	m.	275.20	7.37	2,028.22									2,028.22
11.04.02.03	m.	275.20	7.00	1,928.40									1,928.40
11.04.02.04	m.	18.00	20.47	368.46									368.46
11.04.03.01	Pza	44.00	58.80	2,587.52									2,587.52
11.04.03.02	Pza	5.00	81.01	405.05									405.05
11.04.03.03	Pza	20.80	54.46	1,132.77									1,132.77
11.04.03.04	Pza	10.00	56.93	569.30									569.30

Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84745
 SUPERVISOR DE OBRAS

Jorge Julio Espinoza Aviles
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Otra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA

Ubicación: MARCONA - NAZCA - ICA

Fecha: Diciembre 2017

Cliente: FONDERPES

Table with columns: Mes, Descripción, Unidad, Material, P. Unit. \$, Parcial \$, Oct 17 Parcial (\$), Nov 17 Parcial (\$), Dic 17 Parcial (\$), Ene 18 Parcial (\$), Feb 18 Parcial (\$), Mar 18 Parcial (\$), Abr 18 Parcial (\$), May 18 Parcial (\$), TOTAL. Rows include items like TUBERIA PVC-SAP 2", VALVULA COMPUESTA 3" CON U"U, and EQUIPAMIENTO DE TANQUE SEPTICO.

Luís Alberto Avila Morales CIP. N° 84747 SUPERVISOR DE OBRAS

Jorge Julio... INGENIERO CIVIL REG. CIR N° 119009




CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Obj: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA
Ubicación: MARCONA - MASCA - ICA
Fecha Diciembre 2017
Cliente: FONDEPES

Table with columns: Mes, Descripción, Und, P. Unid. M, Material, P. Unid. M, Periodo (Mes), May 18, Jun 18, Jul 18, Ago 18, Sep 18, Oct 18, Nov 18, Dic 18, TOTAL. Rows include items like SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAL 4", VALVULA WARIPOSA 2", EQUIPO DE BOMBEO, etc.

Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84743
SUPERVISOR DE OBRAS

JORGE JULIO ESPINOZA AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Obras: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA
 Ubicación: MARCONA - NAZCA - ICA
 Fecha Diciembre 2017
 Cliente: FONDEPES

Item	Descripción	Und	Material	P. Unit.	Parcial	Oct 17	Nov 17	Dic 17	Ene 18	Feb 18	Mar 18	Abr 18	May 18	TOTAL
			Mts	\$/ Mts	\$	Parcial (\$)	Parcial (\$)	Parcial (\$)	Parcial (\$)	Parcial (\$)	Parcial (\$)	Parcial (\$)	Parcial (\$)	Parcial (\$)
11.06.06.03	FLUJACION PRIMEROS METROS DE TUBERIA CON CONCRETO CICLOPEO	m	6.00	1,462.82	8,776.92									8,776.92
11.06.06.04	PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA EMISOR SUBMARINO	Und	1.00	51,557.82	51,557.82									51,557.82
12	INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION				268,220.19									268,220.19
12.01	TRABAJOS PRELIMINARES				2,518.67									2,518.67
12.01.01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS / MI	m	359.86	1.57	564.87									564.87
12.01.02	TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS A LA OBRA	Gib.	1.00	1,954.00	1,954.00									1,954.00
12.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				6,923.15									6,923.15
12.02.01	EXCAV. DE ZANJA DE 0.50x0.80m. PARA INSTALACION DE DUCTOS	m	359.66	11.69	4,200.83									4,200.83
12.02.02	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m	359.66	7.00	2,517.62									2,517.62
12.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m³	10.00	20.47	204.70									204.70
12.03	SALIDAS DE ILUMINACION				15,585.43									15,585.43
12.03.01	SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)	Pto.	180.00	72.87	13,116.60									13,116.60
12.03.02	SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) C/CONDUIT	Und.	27.00	81.27	2,194.29									2,194.29
12.03.03	SALIDA PARA BRAQUETE (PARED)	Pto.	4.00	68.89	275.56									275.56
12.04	INTERRUPTORES				7,405.80									7,405.80
12.04.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	Pto.	35.00	76.77	2,686.95									2,686.95
12.04.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	Pto.	6.00	77.81	466.86									466.86
12.04.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE	Pto.	5.00	91.01	455.05									455.05
12.04.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR COMUTACION	Pto.	22.00	110.66	2,434.96									2,434.96
12.04.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR COMUTACION DOBLE	Pto.	8.00	158.42	1,267.36									1,267.36
12.04.06	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 4 VIAS	Pto.	1.00	110.62	110.62									110.62
12.05	TOMACORRIENTES				7,024.05									7,024.05
12.05.01	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H=0.40	Pto.	59.00	70.95	4,115.10									4,115.10
12.05.02	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA	Pto.	15.00	70.95	1,064.25									1,064.25
12.05.03	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H=2.20	Pto.	26.00	70.95	1,844.70									1,844.70
12.06	SALIDAS DE DATA Y TELEFONIA				665.50									665.50
12.06.01	SALIDA PARA TELEFONIA	Pto.	8.00	66.55	532.38									532.38
12.06.02	SALIDA DE RED DE COMPUTOS	Pto.	4.00	66.55	266.20									266.20
12.07	SISTEMA DE ALARMA CONTRAINCENDIO				5,461.30									5,461.30
12.07.01	SALIDA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO INC. SENSOR DE HUMEDAD	Und.	1.00	5,461.30	5,461.30									5,461.30
12.08	TUBERIAS DE PVC				12,506.28									12,506.28
12.08.01	TUBERIA PVC S/APP (ELECTRICA) D=20mm	m	188.56	11.78	2,218.54									2,218.54
12.08.02	TUBERIA PVC S/APP (ELECTRICA) D=25mm	m	40.11	12.08	484.53									484.53
12.08.03	TUBERIA PVC S/APP (ELECTRICA) D=35mm	m	498.81	15.10	7,532.03									7,532.03
12.08.04	TUBERIA PVC S/APP (ELECTRICA) D=40mm	m	20.20	19.58	395.52									395.52
12.08.05	TUBERIA PVC S/APP (ELECTRICA) D=50mm	m	33.36	37.33	1,245.33									1,245.33
12.08.06	TUBERIA PVC S/APP (ELECTRICA) D=60mm	m	13.85	33.02	457.33									457.33
12.08.07	TUBERIA PVC S/APP (ELECTRICA) D=100mm	m	14.71	34.36	505.66									505.66
12.09	CABLES ALIMENTADORES				25,199.43									25,199.43
12.09.01	CABLE NH-80, 3-1x6mm², 450/750V	m	82.96	9.93	823.79									823.79
12.09.02	CABLE NH-80, 3-1x10mm², 450/750V	m	40.11	13.43	538.66									538.66
12.09.03	CABLE NH-80, 3-1x16mm², 450/750V	m	157.90	17.78	2,804.30									2,804.30
12.09.04	CABLE NH-80, 3-1x25mm², 450/750V	m	165.13	24.93	4,116.89									4,116.89
12.09.05	CABLE NH-80, 3-1x35mm², 450/750V	m	195.88	33.24	6,514.39									6,514.39
12.09.06	CABLE NH-80, 3-1x50mm², 450/750V	m	6.25	60.95	380.94									380.94
12.09.07	CABLE NH-80, 3-1x70mm², 450/750V	m	13.85	87.78	1,215.36									1,215.36
12.09.08	CABLE NH-80, 2-1x10mm², 450/750V	m	86.80	10.59	917.39									917.39
12.09.09	CABLE NH-80, 1x6mm² (T), 450/750V	m	62.88	8.53	534.73									534.73
12.09.10	CABLE NH-80, 1x10mm² (T), 450/750V	m	650.25	7.73	5,017.53									5,017.53
12.09.11	CABLE NH-80, 1x16mm² (T), 450/750V	m	27.11	8.22	224.85									224.85
12.09.12	CABLE NH-80, 1x25mm² (T), 450/750V	m	6.25	11.69	73.06									73.06
12.09.13	CABLE NH-80, 1x35mm² (T), 450/750V	m	13.85	14.05	194.59									194.59
12.09.14	CABLE NH-80, 3-1x120mm², 0.6/1kV	m	14.71	103.36	1,520.43									1,520.43
12.09.15	CABLE NH-80, 1x35mm², 0.6/1kV	m	14.71	18.85	277.28									277.28
12.10	BUZONES Y DUCTOS DE CONCRETO				5,954.01									5,954.01
12.10.01	BUZON DE CONCRETO DE 0.60x0.60x0.70m	Und.	3.00	1,288.13	3,864.39									3,864.39
12.10.02	DUCTO DE CONCRETO 04 VIAS	m	18.00	116.14	2,090.52									2,090.52
12.11	TABLEROS DE DISTRIBUCION				24,133.75									24,133.75
12.11.01	TABlero GENERAL TG	Und.	1.00	13,740.93	13,740.93									13,740.93
12.11.02	TABlero DE DISTRIBUCION T.D.-1	Pza.	1.00	1,920.47	1,920.47									1,920.47
12.11.03	TABlero DE DISTRIBUCION T.D.-2	Pza.	1.00	2,270.47	2,270.47									2,270.47

Luis Alberto Avila Morales
 CIP. No 84743
 SUPERVISOR DE OBRAS

MORENO
 ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. ZIP No 119009



CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Obr: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA
Ubicacion: MARCONA - NASCA - ICA
Fecha Diciembre 2017
Cliente: FONDERPES

Item	Unid	Medida	P. Unit. S/	Parcial S/	Oct 17 Parcial (S/)	Nov 17 Parcial (S/)	Dic 17 Parcial (S/)	Ene 18 Parcial (S/)	Feb 18 Parcial (S/)	Mar 18 Parcial (S/)	Abr 18 Parcial (S/)	May 18 Parcial (S/)	TOTAL
12.11.04	Tablero de Distribucion T.D - 3	Und	1,00	1,770.47									1,770.47
12.11.05	Tablero de Distribucion T.D - 4	Und	1,00	1,120.47									1,120.47
12.11.06	Tablero de Distribucion T.D - 5	Und	1,00	1,120.47									1,120.47
12.11.07	Tablero de Distribucion T.D - CGE	Und	1,00	1,220.47									1,220.47
12.12	Tableros de Distribucion para Fuerza	Und	1,00	1,220.47									1,220.47
12.12.01	Tablero de Distribucion TMO-AF1	Und	1,00	1,570.47									1,570.47
12.12.02	Tablero de Distribucion TMO-AF2	Und	1,00	8,570.47									8,570.47
12.12.03	Tablero de Distribucion T.D-EB	Und	1,00	2,250.47									2,250.47
12.12.04	Tablero de Distribucion ST-B1	Und	1,00	493.42									493.42
12.12.05	Tablero de Distribucion ST-B2	Und	1,00	1,470.47									1,470.47
12.12.06	Tablero de Distribucion L-TRAF	Und	1,00	512.47									512.47
12.13	Tableros de Control de Electrobombas	Und	1,00	4,117.65									4,117.65
12.13.01	Tablero Alternador para Bomba Autocebante 3HP	Und	1,00	776.13									776.13
12.13.02	Tablero Alternador para Bomba Centrifuga 2HP	Und	1,00	776.13									776.13
12.13.03	Tablero de Control para Bombas Sumergibles 1.5 HP	Und	1,00	776.13									776.13
12.13.04	Tablero de Control para Bombas Sumergibles 1 HP	Und	1,00	776.13									776.13
12.13.05	Tablero de Control para Bombas Sumergibles 10 HP	Und	1,00	1,013.13									1,013.13
12.14	Puesta a Tierra	Und	1,00	1,525.40									1,525.40
12.14.01	Pozo Puesta a Tierra con Cemento Conductivo Menor o Igual 5.0mH	Und	1,00	1,525.40									1,525.40
12.15	Alumbrado Exterior	Und	1,00	32,035.58									32,035.58
12.15.01	Poste de Concreto de 11 Metros	Und	6,00	1,022.26									6,133.56
12.15.02	Cruceta de 1.50 Metros	Und	1,00	220.60									220.60
12.15.03	Reflector de 400W Vapor de Sodio	Und	6,00	528.93									3,173.58
12.15.04	Ducto de Concreto	m	12,00	88.14									1,057.68
12.15.05	Poste de Acero Galvanizado	Und	8,00	966.80									7,734.40
12.15.06	Pastoral de Acero Galvanizado para Luminaria	Und	8,00	371.96									2,975.68
12.15.07	Reflector de 70W Vapor de Sodio	Und	8,00	1,345.16									10,761.28
12.16	Equipos de Iluminacion con PVC P	Und	1,00	24,164.18									24,164.18
12.16.01	Artefacto Fluorescente Hermético 2x38W	Und	145,00	125.02									18,127.90
12.16.02	Artefacto Fluorescente Lineal 2x38W	Und	7,00	110.02									770.14
12.16.03	Artefacto Fluorescente Circular Hermético 22W Alto Factor de Energia	Und	28,00	87.28									2,443.84
12.16.04	Luz de Emergencia	Und	28,00	108.55									3,032.30
12.17	Equipos de Iluminacion con Conduit	Und	27,00	125.02									3,375.54
12.17.01	Artefacto Fluorescente Hermético 2x38W C/Conduit	Und	27,00	125.02									3,375.54
12.17.02	Salida para Interruptor Simple C/Conduit	Pie	1,00	63.00									63.00
12.17.03	Salida para Interruptor Conmutacion Simple C/Conduit	Pie	2,00	117.68									235.36
12.17.04	Salida para Interruptor Conmutacion Doble C/Conduit	Pie	2,00	161.42									322.84
12.18	Grupo Electrogeno 155 KVA (incluye tanque de combustible)	Und	1,00	74,003.60									74,003.60
12.18.01	Grupo Electrogeno de 120 KVA, 380/220V, 60Hz Incinstalacion	Und	1,00	57,225.20									57,225.20
12.18.02	Tablero de Transferecia	Und	1,00	16,778.40									16,778.40
13	Instalaciones Electricas Media Tension	Km	0.18	417.28									75.11
13.01	Trabajos Preliminares	Km	0.18	417.28									75.11
13.02	Excavacion	m³	102.30	101.93									10,427.44
13.02.01	Apertura y Cierre de Zanja 0.6m x 1.0m	m³	9.60	158.14									1,518.14
13.02.02	Ejecucion de Cruzada	m³	93.00	37.10									3,450.30
13.02.03	Compactacion de Zanja	m³	93.00	37.10									3,450.30
13.03	Cables y Conectores	m	23.00	22.44									516.12
13.03.01	Entubado PVC 4 x 25m	m	23.00	22.44									516.12
13.03.02	Tendido de Cable NX2SY 50mm2	m	465.00	52.38									24,356.70
13.03.03	C/Config. AV-33	m	13.00	52.57									683.41
13.03.04	Subido de Cable NX2OH 300mm2	m	60.00	226.61									13,596.60
13.04	Cabeza de Terminal	Kil	2.00	1,932.97									3,865.94
13.04.01	Ejecucion Terminal Exterior	Kil	2.00	1,932.97									3,865.94
13.05	Subestacion Aerea BIPOLAR Y TRAFOMIX	Und	3.00	1,309.18									3,927.48
13.05.01	IZAJE DE POSTES C.A.C 13M400	Und	3.00	576.81									1,730.43
13.05.02	Montaje de Media Loza C.A.V	Und	1.00	546.81									546.81
13.05.03	Montaje de Palomilla C.A.V	Und	1.00	516.81									516.81
13.05.04	Montaje de Cruzeta Asimetrica C.A.V	Und	1.00	18,965.90									18,965.90
13.05.05	Montaje de Transformador 250KV	Und	1.00	10,804.00									10,804.00
13.05.06	Montaje de Trafomix	Und	1.00	10,804.00									10,804.00

Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

JORGE JULIO
ESPINOZA AVILES
INGENIERO CIVIL
R.O.CIP N° 119009



CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Objeto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBAZCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA
Ubicación: MARCONA - NASCA - ICA
Fecha Diciembre 2017
Cliente: FONPEPES

Table with columns: Mes, Descripción, Unidad, Cantidad, P. Unit. \$, Partida %, Nov 17, Dic 17, Ene 18, Feb 18, Mar 18, Abr 18, May 18, TOTAL. Rows include items like MONTAJE DE SECCIONADORES CUT OUT, BUZONES, BUZON DE CONCRETO, PUERTA TIERRA, POZO PUESTA TIERRA, ACTIVIDADES FINALES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, etc.

Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

ING. GEORGINA AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



Obr: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA
 Ubicacion: MARCONA - MASCA - ICA
 Fecha Diciembre 2017
 Cliente: FONDERES

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Item	Descripción	Unid	Marcado	P. Unid. \$/.	Parcial \$/.	Oct 17 Parcial (\$/.)	Nov 17 Parcial (\$/.)	Dic 17 Parcial (\$/.)	Ene 18 Parcial (\$/.)	Feb 18 Parcial (\$/.)	Mar 18 Parcial (\$/.)	Abr 18 Parcial (\$/.)	May 18 Parcial (\$/.)	TOTAL
14.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CABEZAL PREFABRICADO	m ²	27.71	72.44	2,007.31				1,019.04			988.27		2,007.31
14.06.03	CABEZAL PREFABRICADO, ACERO FY=4200 kg/cm ²	Kg	575.28	4.18	2,383.08				1,214.08			1,178.20		2,393.08
14.06.04	TRANSPORTE DE CABEZAL PREFABRICADO	Unid	3.00	393.60	861.80				488.27			473.53		861.80
14.06.05	COLOCACION DE CABEZAL PREFABRICADO	Unid	3.00	1,558.85	4,676.55				2,374.10			2,302.45		4,676.55
14.07	LOSAS PREFABRICADAS EN PLATA ORMA BAJA				121,313.13									
14.07.01	CONCRETO FC=280 KG/CM2 PARA LOSAS PRE FABRICADAS	m ³	5.41	634.09	3,439.43				866.09			2,744.34		3,439.43
14.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS PRE FABRICADAS	m ²	80.10	72.44	5,826.84				1,305.37			5,221.47		6,528.34
14.07.03	LOSAS PREFABRICADAS, ACERO DE REFUERZO FY = 4,200 KG/CM2.	Kg	488.24	4.18	2,031.08				408.22			1,624.36		2,031.08
14.07.04	TRANSPORTE Y COLOCADO DE LOSA PREFABRICADA	Unid	106.00	120.27	12,748.62				1,274.36			11,473.78		12,748.62
14.07.05	COLOCACION DE ADITIVO MASILLA EPOXICA SUBMARINA	m ²	1,218.55	78.19	96,376.18				9,657.62			86,818.54		96,376.18
15	EQUIPAMIENTO				889,864.26									
15.01	CAMARA FRIGORIFICA DE 5 TM	Unid	1.00	67,034.82	67,034.82							67,034.82		67,034.82
15.02	CAMARA FRIGORIFICA DE 10 TM	Unid	1.00	75,582.46	75,582.46							75,582.46		75,582.46
15.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PARA ENFRAMIENTOS DE AGUA PARA EL PRODUCTOR DE HIELO (ENFRAMIENTOS DE AGUA 10 M3)	Unid	1.00	636,896.46	636,896.46							636,896.46		636,896.46
15.04	PARA EL PRODUCTOR DE HIELO (ENFRAMIENTOS DE AGUA 10 M3)	Unid	1.00	20,230.22	20,230.22							20,230.22		20,230.22
15.05	EQUIPAMIENTO DE TAREAS PREVIAS	Unid	1.00	83,341.90	83,341.90							83,341.90		83,341.90
15.06	ACCESORIOS PARA TRANSPORTE Y ESTIBA	Unid	1.00	85,788.40	85,788.40							85,788.40		85,788.40
15.07	ACCESORIOS PARA PERSONAL OPERATIVO	Unid	1.00	20,970.00	20,970.00							20,970.00		20,970.00
16	MOBILIARIO				29,509.24									
16.01	MOBILIARIO VARIOS	Unid	1.00	29,509.24	29,509.24							29,509.24		29,509.24
	TOTAL COSTO DIRECTO				6,364,978.76	117,540.08	77,575.78	326,800.06	769,646.53	1,093,612.32	1,162,615.16	1,266,455.56	1,686,660.33	6,354,978.76
	GASTOS GENERALES				12.90%	14,434.01	9,541.62	40,449.89	93,436.52	130,848.91	143,001.67	166,844.03	183,105.39	781,682.14
	UTILIDAD				6.00%	7,040.96	4,654.55	19,731.65	45,578.79	63,838.74	69,758.01	81,387.33	89,319.66	381,298.61
	SUB.TOTAL				18.80%	138,624.85	91,772.12	386,042.39	888,661.84	1,259,469.97	1,376,373.75	1,604,686.93	1,781,086.98	7,517,987.53
	RESUMIESTO TOTAL					24,968.44	16,518.88	70,027.63	161,799.13	226,528.19	247,567.28	288,843.55	316,995.46	1,353,228.76
	TOTAL AVANCE ACUMULADO					163,813.89	198,291.10	486,870.62	1,094,428.97	1,488,918.17	1,622,341.43	1,888,180.67	2,370,881.54	8,971,188.29
	PORCENTAJE AVANCE FACIAL					1.85%	1.22%	5.17%	11.25%	16.74%	18.25%	21.94%	23.43%	
	PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO					1.85%	3.07%	8.24%	20.26%	38.84%	55.23%	78.87%	100.00%	


Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

Jorge Juanio Espinoza Avilés
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

**ANEXO N° 04:
CURVA DE AVANCE DE OBRA**




Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

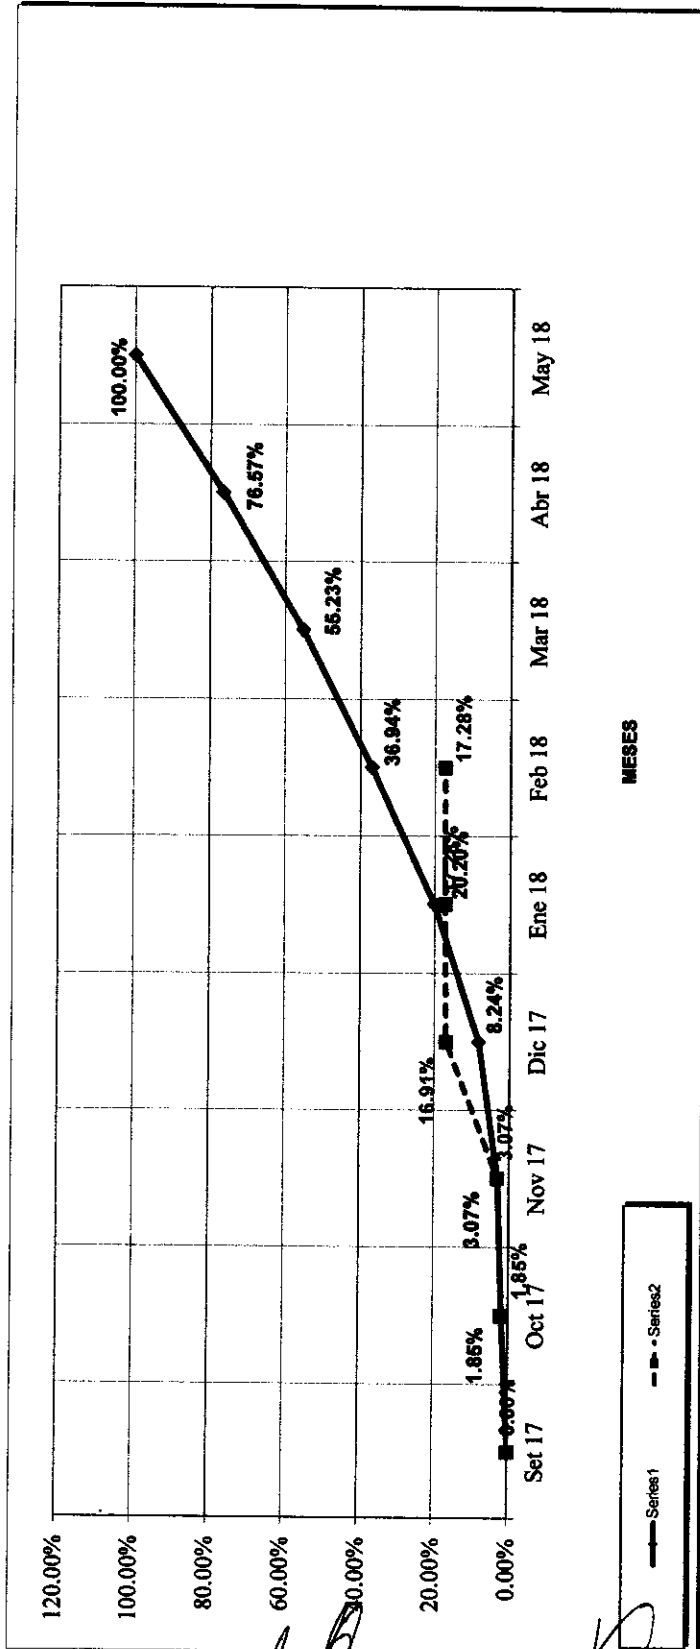


JORGE JULIO
ESPICHAN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



VALORIZACION N° 04 CURVA DE AVANCE DE OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA
UBICACION: MARCONA - NAZCA - ICA
CONTRATISTA: P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.
SUPERVISION: CONSORCIO MESONES MURO




Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84743
 SUPERVISOR DE OBRA

Jorge Julio Espinoza Avila
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

	Set 17	Oct 17	Nov 17	Dic 17	Ene 18	Feb 18	Mar 18	Abr 18	May 18	TOTAL
TOTAL PROGRAMADO SIGV	0.00	138,824.66	91,772.13	389,042.39	898,661.84	1,258,489.97	1,375,373.75	1,604,686.92	1,761,085.86	7,517,937.52
AVAN. MENS. PROGRAMADO	0.00%	1.85%	1.22%	5.17%	11.95%	16.74%	18.29%	21.34%	23.43%	
AVAN. ACUM. PROGRAMADO	0.00	138,824.66	230,596.79	619,639.18	1,518,301.02	2,776,790.99	4,152,164.74	5,756,851.66	7,517,937.52	
AVAN. ACUM. PROGRAMADO	0.00%	1.85%	3.07%	8.24%	20.20%	36.94%	55.23%	76.57%	100.00%	
TOTAL VALORIZADO SIGV	0.00	138,824.66	91,772.13	1,040,648.68	27,782.27	0.00				1,299,027.74
AVANCE MENSUAL VALORIZ.	0.00%	1.85%	1.22%	13.84%	0.37%	0.00%				
AVAN. ACUM. VALORIZADO	0.00	138,824.66	230,596.79	1,271,245.47	1,299,027.74	1,299,027.74				
AVANCE ACUM. VALORIZADO	0.00%	1.85%	3.07%	16.91%	17.28%	17.28%				

**ANEXO N° 05:
CARTA FIANZA DE FIEL
CUMPLIMIENTO**


 **Luis Alberto Avila**
CIP. N° 84712
SUPERVISOR DE OBRAS
**JORGE JULIO
ESPINOSA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 119009**

**CARTA FIANZA N° 1842201
FIEL CUMPLIMIENTO**

LIMA, 31 de agosto de 2017

Señores
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
RUC 20137921601
Av. Petit Thouars Nro. 115 - Cercado de Lima.
Presente.-

De nuestra consideración:

Por la presente, constituimos fianza para nuestro cliente P.S.V. **CONSTRUCTORES S.A.C.** hasta por la suma de **S/ 887,116.63 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISEIS CON 63/100 SOLES)**, siendo esta solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, y de realización automática a solo requerimiento de ustedes, para garantizar **EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2017-FONDEPES PRIMERA CONVOCATORIA - CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA". Código SNIP N° 278545.**

Esta fianza tiene una vigencia de 271 días calendario, contados a partir del 05/09/2017 hasta las 12:00 hrs. del 02/06/2018, fecha de su vencimiento, pudiendo ser renovada a solicitud de la parte interesada y previa confirmación por escrito; quedando entendido que esta garantía no podrá exceder en ningún caso por ningún concepto la cantidad de **S/887,116.63**.

Es expresamente entendido, que cualquier solicitud de ejecución respecto a esta garantía, se realizará en estricta observancia de lo establecido en Código Civil y Código Procesal Civil, debiendo precisar que la misma deberá ser notificada notarialmente a nuestra Oficina ubicada en la Esquina de Javier Prado Este y Francisco Masías 370, Distrito de San Isidro - Lima, a la atención del Departamento de Cauciones.

Todas nuestras obligaciones con respecto a esta fianza cesarán pasado de décimo quinto día calendario posterior a la fecha de vencimiento de nuestra garantía, conforme lo dispone el artículo 1898° del Código Civil vigente.

Cualquier controversia respecto a esta fianza se someterá exclusivamente a los jueces y tribunales de la ciudad de Lima, Perú.

Atentamente,

La Positiva
Seguros

RAFAEL ENCISO RIVIERA
GERENTE DE ÁREA

La Positiva
Generales

JUAN MANUEL PEÑA HENDERSON
GERENTE GENERAL

Con Certificación ISO 9001:2008 en nuestros
Procesos de Gestión para la Comercialización,
Suscripción, Emisión y Atención de los
Sinistros; SOAT, Vehículos, Asistencia Médica
y Servicios de Atención al Cliente.

La Positiva Seguros y Reaseguros
Esq. Javier Prado Este y Francisco Masías Nro. 370, San Isidro, Lima - Perú
Telf.: (511) 211-0000 Fax: (511) 211-0011

Oficinas en: Arequipa - Cajamarca - Cuzco - Chiclayo - Chimbóte - Huancayo - Ica - Iquitos - Piura - Pucallpa - Puno - Tacna - Trujillo
www.lapositiva.com.pe



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

ING. JUAN AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009





**ANEXO N° 06:
CARTA FIANZA BUEN MANEJO
DE ANTICIPO POR ADELANTO
DIRECTO**



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS


**JUAN JULIO
ESPINOSA AVILÉS**
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

**CARTA FIANZA N° 30000531
BUEN MANEJO DE ANTICIPO**

LIMA, 08 de septiembre de 2017

Señores
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
RUC 20137921601
Av. Petit Thouars Nro. 115 - Cercado de Lima.
Presente.-

De nuestra consideración:

Por la presente, constituimos fianza para nuestro cliente P.S.V. **CONSTRUCTORES S.A.C.** hasta por la suma de **S/ 887,116.63 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISEIS CON 63/100 SOLES)**, siendo esta solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, y de realización automática a solo requerimiento de ustedes, para garantizar **EL ADELANTO DIRECTO DEL CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2017-FONDEPES PRIMERA CONVOCATORIA - CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA"**. Código SNIP N° 278545.

Esta fianza tiene una vigencia de 182 días calendario, contados a partir del 08/09/2017 hasta las 12:00 hrs. del 08/03/2018, fecha de su vencimiento, pudiendo ser renovada a solicitud de la parte interesada y previa confirmación por escrito; quedando entendido que esta garantía no podrá exceder en ningún caso por ningún concepto la cantidad de **S/887,116.63**.

Es expresamente entendido, que cualquier solicitud de ejecución respecto a esta garantía, se realizará en estricta observancia de lo establecido en Código Civil y Código Procesal Civil, debiendo precisar que la misma deberá ser notificada notarialmente a nuestra Oficina ubicada en la Esquina de Javier Prado Este y Francisco Masías 370, Distrito de San Isidro - Lima, a la atención del Departamento de Cauciones.

Todas nuestras obligaciones con respecto a esta fianza cesarán pasado de décimo quinto día calendario posterior a la fecha de vencimiento de nuestra garantía, conforme lo dispone el artículo 1898° del Código Civil vigente.

Cualquier controversia respecto a esta fianza se someterá exclusivamente a los jueces y tribunales de la ciudad de Lima, Perú.

Atentamente,

La Positiva
Seguros

La Positiva
Generales

RAFAEL ENCISO RIVERA
GERENTE GENERAL

JUAN MANUEL PEÑA HENDERSON
PRESIDENTE GENERAL

Con Certificación ISO 9001:2008 en nuestros
Procesos de Gestión para la Comercialización,
Suscripción, Emisión y Atención de los
Sinistros; SOAT, Vehículos, Asistencia Médica
y Servicios de Atención al Cliente.



La Positiva Seguros y Reaseguros
Esq. Javier Prado Este y Francisco Masías Nro. 370, San Isidro, Lima - Perú
Telf.: (511) 211-0000 Fax: (511) 211-0011
Oficinas en: Arequipa - Cajamarca - Cuzco - Chiclayo - Chimbote - Huancayo - Ica - Iquitos - Piura - Pucallpa - Puno - Tacna - Trujillo
www.lapositiva.com.pe

Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OCUA


**JOSE JULIO
ESPINOZA AVILÉS**
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



**ANEXO N° 07:
CARTA FIANZA BUEN MANEJO
DE ANTICIPO POR ADELANTO
DE MATERIALES**

Luis Alberto Avila Moran
CIP. N° 84743
SUPERVISOR DE OBRAS



INGRID JULIO
ESPINOZA AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

**CARTA FIANZA N° 30003281
BUEN MANEJO DE ANTICIPO**

LIMA, 20 de octubre de 2017

Señores
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
RUC 20137921601
Av. Petit Thouars Nro. 115 - Cercado de Lima.
Presente.-

De nuestra consideración:

Por la presente, constituimos fianza para nuestro cliente P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.C. hasta por la suma de S/ 1,774,233.30 (UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 30/100 SOLES), siendo esta solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, y de realización automática a solo requerimiento de ustedes, para garantizar EL ADELANTO DE MATERIALES DEL CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2017-FONDEPES PRIMERA CONVOCATORIA - CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA". Código SUP N° 278545.

Esta fianza tiene una vigencia de 183 días calendario, contados a partir del 20/10/2017 hasta las 12:00 hrs. del 20/04/2018, fecha de su vencimiento, pudiendo ser renovada a solicitud de la parte interesada y previa confirmación por escrito; quedando en el hecho que esta garantía no podrá exceder en ningún caso por ningún concepto la cantidad de S/ 1,774,233.30.

Es expresamente entendido, que cualquier solicitud de ejecución respecto a esta garantía, se realizará en estricta observancia de lo establecido en Código Civil y Código Procesal Civil, debiendo precisar que la misma deberá ser notificada notarialmente a nuestra Oficina ubicada en la Esquina de Javier Prado Este y Francisco Morúa 270, Distrito de San Isidro - Lima, a la atención del Departamento de Cauciones.

Todas nuestras obligaciones con respecto a esta fianza cesarán pasado de décimo quinto día calendario posterior a la fecha de vencimiento de nuestra garantía, conforme lo dispone el artículo 1898° del Código Civil vigente.

Cualquier controversia respecto a esta fianza se someterá exclusivamente a los jueces y tribunales de la ciudad de Lima, Perú.

Atentamente,

La Positiva
Seguros Generales

La Positiva
Generales

JUAN MANUEL PEÑA HENDERSON
GERENTE GENERAL



RAFAEL ENCISO RIVERA
GERENTE GENERAL




Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

JULIO
ESPILGAN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

**ANEXO N° 08:
SCTR**

Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84743
SUPERVISOR DE OBRAS



JORGE JULIO
ESPECHAN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

Pacífico EPS**Pacífico Seguros**

San Isidro, 30 de Enero del 2018

CONSTANCIA N° 2792486

Señores
PSV CONSTRUCTORES SA
 Presente.-

Ref.: **SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – SALUD Y PENSION**

Estimados Señores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha incluido la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Febrero del 2018 al 28 de Febrero del 2018 correspondiente a:

CONTRATO N° **60666** en SALUD y,
POLIZA N° **62036427** en PENSION

para la siguiente relación de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. DOCUMENTO	INICIO DE COBERTURA
000001	AGUINAGA VARGAS EDUARDO	47768294	01 de Febrero del 2018
000002	ALARCON FERNANDEZ GARY JHONATAN	71307557	01 de Febrero del 2018
000003	ALCAZAR OLAZABAL JUAN DANIEL	21558656	01 de Febrero del 2018
000004	ALVA CUETO LUIS FERNANDO	06232631	01 de Febrero del 2018
000005	[REDACTED]	42039361	01 de Febrero del 2018
000006	ANICETO GONZALES JUNIOR JASON	73713794	01 de Febrero del 2018
000007	ARIAS CAPPELLETTI ALDO ALFREDO	09931447	01 de Febrero del 2018
000008	ARMAS VELA ALFREDO	44228417	01 de Febrero del 2018
000009	AUCEJO SODERSTRONG NINO WILMER	80390918	01 de Febrero del 2018
000010	BELTRAN GORDILLO JOHNNY FREDY	04644583	01 de Febrero del 2018
000011	BORDA CHAUCA MARCO ANTONIO	25490887	01 de Febrero del 2018
000012	CARRANZA JARA FELIPE AMADO	18078473	01 de Febrero del 2018
000013	[REDACTED]	48012203	01 de Febrero del 2018
000014	CAYLLAHUA ROMERO ANTHONY RAFAEL	71741664	01 de Febrero del 2018
000015	CHAMORRO MATAMOROS HENRY DAVID	45650073	01 de Febrero del 2018
000016	CISNEROS CERDA MARCO ANTONIO	46265757	01 de Febrero del 2018
000017	DIAZ MEZA FELIX	48182970	01 de Febrero del 2018

Oficina Principal: Av. Juan de A. Oña 830 San Isidro, Lima 27 Perú / Central de Información y Consultas Clientes: 513 5000
 Central Administrativa: 518-4000 / W: www.pacifico.com.pe



Alberto Avila Morales
Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84745
 SUPERVISOR DE OBRAS

[Signature]
JULIO
ESPINOZA AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

Pacífico EPS

Pacífico Seguros

000018	DOÑEZ PINEDO ADOLFO	41885332	01 de Febrero del 2018
000019	ESPEJO LLACAS VICTOR OSCAR	40390888	01 de Febrero del 2018
000020	ESTRADA SALDARRIAGA CARLOS	40009350	01 de Febrero del 2018
000021	FIGUEROA DUEÑAS ARNOLD JAVIER	44830024	01 de Febrero del 2018
000022	FIGUEROA RODRIGUEZ PEPE JAVIER	32846563	01 de Febrero del 2018
000023	FONTALVO TORRES JORDAN MAYRON	001286846	01 de Febrero del 2018
000024	GARCIA QUIROZ ROBERT WALTER	32942511	01 de Febrero del 2018
000025	GONGORA CCASANI FRANCISCO	20407859	01 de Febrero del 2018
000026	GUERRERO HUACHO FRANCISCO JAVIER	09707660	01 de Febrero del 2018
000027	[REDACTED]	10055148	01 de Febrero del 2018
000028	GUTIERREZ IZUSQUI NATANAEL SANTIAGO	48121610	01 de Febrero del 2018
000029	GUTIERREZ PAREDES GIANCARLO	40123482	01 de Febrero del 2018
000030	GUZMAN ARAUJO CARLOS AGUSTIN	32932807	01 de Febrero del 2018
000031	GUZMAN ARAUJO LUIS BELTRAN	08459321	01 de Febrero del 2018
000032	ISUIZA ISUIZA EYSON	45872393	01 de Febrero del 2018
000033	LANDA PINEDO ROGER AUGUSTO	00128562	01 de Febrero del 2018
000034	LARA LLACAS JULIO RICARDO	41897444	01 de Febrero del 2018
000035	LITANO PAZ PABLO	03473251	01 de Febrero del 2018
000036	LLAGUARIMAY CHIPANA ANDRES	10696138	01 de Febrero del 2018
000037	LOZANO REYES GILMER YOVANI	22717557	01 de Febrero del 2018
000038	MEDINA TORRES EDWIN DAVID ALONSO	71449577	01 de Febrero del 2018
000039	MEJIA HERNANDEZ KAREN ALEJANDRA	47349433	01 de Febrero del 2018
000040	MERGILDO RODRIGUEZ ALIN	48357468	01 de Febrero del 2018
000041	MEZA ARMAS ROGER MARCOS	42033855	01 de Febrero del 2018
000042	MEZA HUARANCA MARIO	22087635	01 de Febrero del 2018
000043	MIRANDA ARANDA FRANK JUNIOR	77437402	01 de Febrero del 2018
000044	MONTALVAN PALOMINO MARCO ANTONIO	80095767	01 de Febrero del 2018
000045	MONTALVO CARO RICARDO JESUS	09697282	01 de Febrero del 2018
000046	MONTOYA HERMOSA JAIME	47380345	01 de Febrero del 2018
000047	MORILLAS OSTOLAZA ROLANDO ALBERTO	40254887	01 de Febrero del 2018
000048	OROYA RAMOS JULIO GREGORIO	25808461	01 de Febrero del 2018
000049	PARAGUAY MARREROS BERNARDINA MILEN	47874173	01 de Febrero del 2018
000050	PAXI TITO RAFAEL TORIBIO	25428416	01 de Febrero del 2018
000051	PEÑA FUENTES MARIO	06109501	01 de Febrero del 2018
000052	PICHIHUA CHECO ADRIAN ORLANDO	70048815	01 de Febrero del 2018

Oficina Principal: Av. Juan de Arona 630 San Isidro, Lima 27 Perú / Central de Información y Consultas Clientes: 513-5000
 Central Administrativa: 513-4000 / W: www.pacifico.com.pe



Alberto Avila Montoya
 CIP. N° 84745
 SUPERVISOR DE...

JULIO
 ESPINOZA AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

Pacífico EPS


Pacífico Seguros


000053	PINEDA VASQUEZ ISRAEL ADHEMIR	10205712	01 de Febrero del 2018
000054	PINEDO TORRES ADOLFO	00089899	01 de Febrero del 2018
000055	PORTALINO SEGUNDO LUIS ALBERTO	06908284	01 de Febrero del 2018
000056	QUISPE ANAMPA EDDYNSON OSWALDO	45589275	01 de Febrero del 2018
000057	[REDACTED]	07892426	01 de Febrero del 2018
000058	[REDACTED]	46588803	01 de Febrero del 2018
000059	QUISPE SANCHEZ SAYURI YASMIN	73081503	01 de Febrero del 2018
000060	RAMIREZ VIDAL HELENEN REYNALDO	02822515	01 de Febrero del 2018
000061	RENGIFO ALIAGA DIEGO ALEJANDRO	72694751	01 de Febrero del 2018
000062	RIQUELME HUARCA ANTHONY WILLIAN	46790996	01 de Febrero del 2018
000063	RODRIGUEZ VILLEGAS MAYRA ALEJANDRA	73768069	01 de Febrero del 2018
000064	ROJAS ARIAS LEHI ENRIQUE	43533863	01 de Febrero del 2018
000065	ROJAS COTRINA JULIO CESAR	09905680	01 de Febrero del 2018
000066	ROJAS LOPEZ SMITH FRANKLIN	43528279	01 de Febrero del 2018
000067	RUA NAJARRO EDGAR ZOCIMO	10233070	01 de Febrero del 2018
000068	SUITO CARRASCO RENZO GUSTAVO	41749225	01 de Febrero del 2018
000069	TIBURCIO VILCHEZ LUIS ALONSO	74231521	01 de Febrero del 2018
000070	TOLENTINO TOLENTINO JHON JAIRO	74079194	01 de Febrero del 2018
000071	TRILLO CHIRE LUIS ENRIQUE	46261612	01 de Febrero del 2018
000072	URIETA ALFARO YEINER ANDRES	001644907	01 de Febrero del 2018
000073	URQUIZO MISARE RICARDO RICHARD	46635898	01 de Febrero del 2018
000074	VALDIVIA ROJAS JORGE VIDAL	10171182	01 de Febrero del 2018
000075	VALDIVIA ROJAS MENELAO TOBIT	41252192	01 de Febrero del 2018
000076	VASQUEZ ROJAS LUIS AGAPITO	17963928	01 de Febrero del 2018
000077	VEGA SEGURA JUAN JESUS	06589525	01 de Febrero del 2018
000078	YANAC CAYCHO EDWARD KENEDY	76581516	01 de Febrero del 2018
000079	YOVERA LITANO WILMER ALEXANDER	41565719	01 de Febrero del 2018
000080	ZAPATA FLORES JOSE ENRIQUE	72868851	01 de Febrero del 2018
000081	ZEVALLOS MARTINEZ MARIO ERNESTO	09447505	01 de Febrero del 2018

Sin otro particular , quedamos de ustedes

Atentamente,

Oficina Principal: Av. Juan de Arona 830 San Isidro, Lima 27 Perú / Central de Información y Consultas Clientes: 513-5000
Central Administrativa: 518-4000 / W: www.pacifico.com.pe


Luis Alberto Avila Moya
CIP. N° 84743
SUPERVISOR DE


JULIO
ESPIÑOZA AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

Pacífico EPS

Pacífico Seguros

CARLOS SILES
GERENTE

ANGEL ARMIÑO HIDALGO
GERENTE

Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

JORGE JULIO
ESPINOZA AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 113009

Pacífico EPS**Pacífico Seguros**

San Isidro, 30 de Enero del 2018

CONSTANCIA N° 2793330

Señores
PSV CONSTRUCTORES SA
 Presente.-

Ref.: **SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – SALUD Y PENSION**

Estimados Señores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha incluido la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Febrero del 2018 al 28 de Febrero del 2018 correspondiente a:


CONTRATO N° **66330** en SALUD y,
POLIZA N° **62041765** en PENSIÓN


para la siguiente relación de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. DOCUMENTO	INICIO DE COBERTURA
000001	ACEDO QUEREVALU JOSE JAVIER	03671895	01 de Febrero del 2018
000002	ACHO AHUANARI ANDERSON	43689568	01 de Febrero del 2018
000003	ACOSTA MEZA JIMMY HERNAN	40569263	01 de Febrero del 2018
000004	AGUIRRE ARRIETA ANA JULIA	001633545	01 de Febrero del 2018
000005	ALDANA ECCA JUAN VICTOR	42475416	01 de Febrero del 2018
000006	ALMESTAR QUEREVALU PAUL MARTIN	76591066	01 de Febrero del 2018
000007	ALTAMIRANO RAMOS FRANCISCO MARTIN	25654916	01 de Febrero del 2018
000008	ANAYA GAMARRA LUIS ENRIQUE	46857266	01 de Febrero del 2018
000009	ARICOCHEA CARPIO DIEGO ANDRES	72192449	01 de Febrero del 2018
000010	ARISMENDIZ LOPEZ LAZARO JAVIER	03899428	01 de Febrero del 2018
000011	ARMAS PINO MANOLITO	44066941	01 de Febrero del 2018
000012	ASTO ARANGO JOSE ANTONIO	10092386	01 de Febrero del 2018
000013	AURIS YNGA MIGUEL ANGEL	42243510	01 de Febrero del 2018
000014	BAUTISTA FERNANDEZ RAUL	41678222	01 de Febrero del 2018
000015	BECERRA ROJAS FRANKLIN	44291654	01 de Febrero del 2018
000016	[REDACTED]	45995168	01 de Febrero del 2018
000017	BENITES VERA RONAL DANIEL	45016959	01 de Febrero del 2018

Oficina Principal: Av. Juan de Arona 830 San Isidro, Lima 27 Perú / Central de Información y Consultas Clientes: 513-5000
 Central Administrativa: 518-4000 / W: www.pacifico.com.pe

 **Luis Alberto Avila Morales**
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA



JORGE JULIO
ESPINOZA AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009


Pacífico EPS

Pacífico Seguros

000018	BUENO SANCHEZ MIKER GILMER	45701615	01 de Febrero del 2018
000019	CACERES AGUILAR HORTENCIA	44235751	01 de Febrero del 2018
000020	CACERES CALLE JOSE RAUL	48584206	01 de Febrero del 2018
000021	[REDACTED]	09515372	01 de Febrero del 2018
000022	[REDACTED]	15681948	01 de Febrero del 2018
000023	CANCHARI RAMOS CARLOS ENRIQUE	40283790	01 de Febrero del 2018
000024	CARCAMO MADRID JULIAN MEMET	41002770	01 de Febrero del 2018
000025	[REDACTED]	42464115	01 de Febrero del 2018
000026	[REDACTED]	71486025	01 de Febrero del 2018
000027	[REDACTED]	42792206	01 de Febrero del 2018
000028	[REDACTED]	40503267	01 de Febrero del 2018
000029	[REDACTED]	46603814	01 de Febrero del 2018
000030	CASTILLO ABRIL HENRY DANIEL	40399953	01 de Febrero del 2018
000031	[REDACTED]	04647576	01 de Febrero del 2018
000032	CHAVEZ CRUZ JORGE LUIS	29745601	01 de Febrero del 2018
000033	CHAVEZ QUIÑONEZ TITO WILER	42617677	01 de Febrero del 2018
000034	CHAVEZ RAMIREZ JORGE ARMANDO	41025871	01 de Febrero del 2018
000035	CHERO ORDOÑEZ SHARON AMERICA	47952305	01 de Febrero del 2018
000036	[REDACTED]	80090513	01 de Febrero del 2018
000037	CHIRA REYES DENIS LEANDRO	45894231	01 de Febrero del 2018
000038	CHURA CORRALES WINDER YOEL	44169452	01 de Febrero del 2018
000039	COCIOS VELIZ BENITO	18052554	01 de Febrero del 2018
000040	CONTRERAS RAMIREZ RENE HEBERT	42655900	01 de Febrero del 2018
000041	CORNEJO PACHECO ROLY	46595611	01 de Febrero del 2018
000042	CORREA SERNAQUE JORGE LUIS	02671115	01 de Febrero del 2018
000043	CORREA SERNAQUE MANUEL JESUS	18190898	01 de Febrero del 2018
000044	CRISOLOGO ESCOBEDO REYES MILIANO	10173845	01 de Febrero del 2018
000045	CRISOLOGO RUIZ MARTIN INXIDOR	41131180	01 de Febrero del 2018
000046	CRISOLOGO RUIZ VICTOR	19562373	01 de Febrero del 2018
000047	CRUZ VILCA BERNARDINO	29565488	01 de Febrero del 2018
000048	CRUZALEGUI DAVILA WILDER	03503396	01 de Febrero del 2018
000049	CUITO PARI JULIO CESAR	44523801	01 de Febrero del 2018
000050	CULQUICHICON TERRONES RICHARD EDGAR	74816309	01 de Febrero del 2018
000051	[REDACTED]	44932099	01 de Febrero del 2018
000052	DE LA CRUZ VALERIO ANGEL FELIX	40542095	01 de Febrero del 2018

Oficina Principal: Av. Juan de Arona 830 San Isidro, Lima 27 Perú / Central de Información y Consultas Clientes: 513-5000
 Central Administrativa: 518-4000 / W: www.pacifico.com.pe


Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE ()


JORGE JULIO ESPINOZA AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009


Pacífico EPS

Pacífico Seguros

000053	DELGADILLO ALVAREZ HECTOR	30418894	01 de Febrero del 2018
000054	DONAYRE AHUMADA MAX OSCAR	70305723	01 de Febrero del 2018
000055	ECHARRI SOTO ALBERTO EDUARDO	08838238	01 de Febrero del 2018
000056	ELIAS YARLEQUE KARINA CARLA	47866822	01 de Febrero del 2018
000057	ESCUDERO HUAMANI ABRAHAN ISAAC	70815925	01 de Febrero del 2018
000058	[REDACTED]	10323344	01 de Febrero del 2018
000059	ESPINOZA MENDOZA OLMER CARLITOS	70918197	01 de Febrero del 2018
000060	[REDACTED]	42469550	01 de Febrero del 2018
000061	FIESTAS GALAN MANUEL MEDARDO	03853617	01 de Febrero del 2018
000062	FLORES TOCTO RICARDO	03132837	01 de Febrero del 2018
000063	GALAN VITE HENRY ALEXANDER	45040289	01 de Febrero del 2018
000064	GARCIA AVILA CESAR ANTENOR	32778754	01 de Febrero del 2018
000065	GARCIA PEREZ DEMETRIO	09099829	01 de Febrero del 2018
000066	GARCIA RAMOS ZACARIAS	32760956	01 de Febrero del 2018
000067	GARCIA TRIGOSO VICTOR MARTIN	22092933	01 de Febrero del 2018
000068	GASTELO BUSTAMANTE WALTER RONALD	16789136	01 de Febrero del 2018
000069	GOMEZ GASPAR EFRAIN	09882095	01 de Febrero del 2018
000070	GOMEZ GONZALES SIGFREDO	25490790	01 de Febrero del 2018
000071	GOMEZ YPANAQUE MICHAEL JONATHAN	43325922	01 de Febrero del 2018
000072	GUERRERO MOSQUITO ARTURO	03473278	01 de Febrero del 2018
000073	GUEVARA CENTENO RAFAEL GUSTAVO	70359678	01 de Febrero del 2018
000074	[REDACTED]	41882259	01 de Febrero del 2018
000075	GUTIERREZ FLORES DEMETRIO	29242003	01 de Febrero del 2018
000076	[REDACTED]	42501692	01 de Febrero del 2018
000077	HARO ESPINOZA PALU JAVEL	45993512	01 de Febrero del 2018
000078	HEREDIA ESPINOZA IRWIN JAVIER	46836436	01 de Febrero del 2018
000079	HUAMAN HUAMANÑAHUI JULIO CESAR	77464751	01 de Febrero del 2018
000080	HUAMAN QUISPE MARCELIANO	09444725	01 de Febrero del 2018
000081	HUAMANI BECERRA EDMUNDO AQUILINO	30429927	01 de Febrero del 2018
000082	HUAMANI CONDOR ERIC GONZALO	45527866	01 de Febrero del 2018
000083	[REDACTED]	44519235	01 de Febrero del 2018
000084	[REDACTED]	42605586	01 de Febrero del 2018
000085	HUAPAYA SILVERIO MARIA DEL PILAR	03503685	01 de Febrero del 2018
000086	[REDACTED]	62039339	01 de Febrero del 2018
000087	IMAN CHAVEZ HILARIO	41194951	01 de Febrero del 2018

Oficina Principal: Av. Juan de Arona 830 San Isidro Lima 27 Perú / Central de Información y Consultas Clientes: 513 5000
 Central Administrativa: 516 4000 / W: www.pacifico.com.pe




 DR. JULIO
 ESPINOZA AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

Pacífico EPS

Pacífico Seguros

000088	JUAREZ IMAN BALTAZAR	42716665	01 de Febrero del 2018
000089	LANDACAY CORDOVA EDIL MIGUEL	77140715	01 de Febrero del 2018
000090	LLAMOCTANTA ACUÑA GREGORIO	16609233	01 de Febrero del 2018
000091	LOPEZ GONZAGA JUAN JESUS	47391245	01 de Febrero del 2018
000092	[REDACTED]	22090147	01 de Febrero del 2018
000093	[REDACTED]	44861870	01 de Febrero del 2018
000094	[REDACTED]	22100015	01 de Febrero del 2018
000095	MANCHA MAMANI JAIME	02410384	01 de Febrero del 2018
000096	[REDACTED]	42704258	01 de Febrero del 2018
000097	[REDACTED]	41838996	01 de Febrero del 2018
000098	MARIÑAS CASTILLO HEVER DAVID	45176451	01 de Febrero del 2018
000099	[REDACTED]	05205696	01 de Febrero del 2018
000100	MARTINEZ CHUNGA JOSE ANTONIO	03879223	01 de Febrero del 2018
000101	MEDINA SICHA RONALD PELAGIO	70835887	01 de Febrero del 2018
000102	MENDEZ ALVAREZ EUTEMIO CLAUDIO	25849840	01 de Febrero del 2018
000103	MERCADO BORJA DIONICIO FELIX	08396626	01 de Febrero del 2018
000104	MERCADO TAQUILA DAIVEL YEFERSON	45965790	01 de Febrero del 2018
000105	MERCADO TAQUILA HENRY FELIX	43566923	01 de Febrero del 2018
000106	MEZA ARMAS OSCAR VALENTIN	42958291	01 de Febrero del 2018
000107	MILLONEZ ESPINOZA MANUEL AUGUSTO	06888774	01 de Febrero del 2018
000108	MOLINA CHAHUA HILARIO	30418417	01 de Febrero del 2018
000109	MONDALGO QUISPE ERNESTO MANUEL	06122385	01 de Febrero del 2018
000110	MORALES PURIZACA JULIO ANTONIO	03490636	01 de Febrero del 2018
000111	MUÑOZ SANCHEZ ARTURO	08972277	01 de Febrero del 2018
000112	NAVARRO FLORES GERARDO	43848349	01 de Febrero del 2018
000113	NORABUENA CASTRO EUFEMIO ERASMO	32813588	01 de Febrero del 2018
000114	NUÑEZ SERNAQUE RIGOBERTO	03853789	01 de Febrero del 2018
000115	OTERO FARFAN JIMMY CHARLEY	80297145	01 de Febrero del 2018
000116	OVIEDO ZUNI CRISTIAN IVAN	40364660	01 de Febrero del 2018
000117	PACAYA IHUARAQUI OSWALDO ARON	80340607	01 de Febrero del 2018
000118	[REDACTED]	15957679	01 de Febrero del 2018
000119	PALINGINIS GOFFINI JONATHAN STEFAN	73240485	01 de Febrero del 2018
000120	PANCCA MAMANI VICTORIANO	30424229	01 de Febrero del 2018
000121	PANTA AYALA JOSE JESUS	46234628	01 de Febrero del 2018
000122	PAUCAR LIMA GUSTAVO VLADIMIR	45621207	01 de Febrero del 2018

Oficina Principal: Av. Juan de Arona 830 San Isidro, Lima 27 Perú / Central de Información y Consultas Clientes: 513-5000
 Central Administrativa: 518-4000 / W: www.pacifico.com.pe



Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84743
 SUPERVISOR DE

INDIO JULIO
 ESPINOZA AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

Pacífico EPS

Pacífico Seguros

000123	PAULINI CISNEROS JUAN JOSE	47443199	01 de Febrero del 2018
000124	PEREZ HERNANDEZ LEONARDO	05334424	01 de Febrero del 2018
000125	PICON BARBOZA JOB	46355375	01 de Febrero del 2018
000126	PINTADO RAMIREZ INGRID ARLETTY	73667443	01 de Febrero del 2018
000127	POMEZ MONTIEL JULIO GONZALO	45138959	01 de Febrero del 2018
000128	PRIETO GARCIA GINO TOMAS	41196589	01 de Febrero del 2018
000129	QUEREVALU PANTA JUAN JULIAN	44718799	01 de Febrero del 2018
000130	QUIROGA SERNAQUE JHAIR DAVID	74740187	01 de Febrero del 2018
000131	QUISPE CAMACHO JULIO CESAR	09934624	01 de Febrero del 2018
000132	QUISPE HUAMANÑAHUI SANDY MITZI	75362569	01 de Febrero del 2018
000133	QUISPE HUILLCA GILBERTO HUALBERTO	44627793	01 de Febrero del 2018
000134	[REDACTED]	70294446	01 de Febrero del 2018
000135	QUISPE TURPO EDGAR	01332344	01 de Febrero del 2018
000136	QUISPE VIZCARRA LIZ XIOMARA	44925513	01 de Febrero del 2018
000137	RAMIREZ CALLE MIGUEL HELENEN	70088290	01 de Febrero del 2018
000138	RAMOS PEÑA JUAN CARLOS	42345697	01 de Febrero del 2018
000139	RAMOS VILELA CARLOS ENRIQUE	03683352	01 de Febrero del 2018
000140	[REDACTED]	73192630	01 de Febrero del 2018
000141	RETO LISAMA CARLOS ALBERTO	32735140	01 de Febrero del 2018
000142	RIVERA RIVEROS VICTOR FERNANDO	80295299	01 de Febrero del 2018
000143	RIVERA VELA ROOSEVELT ROMMEL	70756112	01 de Febrero del 2018
000144	ROJAS RAMOS JONNY ALBERTO	47219897	01 de Febrero del 2018
000145	ROMAN ALVAREZ GREGORY ARTURO	45467921	01 de Febrero del 2018
000146	ROMAN HURTADO JORGE LUIS	41392290	01 de Febrero del 2018
000147	[REDACTED]	46166658	01 de Febrero del 2018
000148	RUA NAJARRO EUCEVIO	10753660	01 de Febrero del 2018
000149	[REDACTED]	70811167	01 de Febrero del 2018
000150	[REDACTED]	04314684	01 de Febrero del 2018
000151	RUIZ MORALES MARVIN IVAN	46723824	01 de Febrero del 2018
000152	RUIZ RAMIREZ BECQUER PAUL	45033564	01 de Febrero del 2018
000153	[REDACTED]	17926207	01 de Febrero del 2018
000154	[REDACTED]	74993384	01 de Febrero del 2018
000155	[REDACTED]	10256377	01 de Febrero del 2018
000156	SALAZAR CACERES GELVER FRANCISCO	40100221	01 de Febrero del 2018
000157	SALDARRIAGA OJEDA JESUS DAVID	41317671	01 de Febrero del 2018

Oficina Principal: Av. Juan de Arona 530 San Isidro, Lima 27 Perú / Central de Información y Consultas Clientes: 513-5000
 Central Administrativa: 518-4000 / www.pacifico.com.pe



Luis Alberto Avila Moral
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE...

JULIO
 ESPINOSA AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009



Pacífico EPS

Pacífico Seguros


000158	[REDACTED]	46056022	01 de Febrero del 2018
000159	SANCHEZ MUCUSHUA REIMER	44716380	01 de Febrero del 2018
000160	SANCHEZ NINA VICTOR EDUARDO	40277163	01 de Febrero del 2018
000161	[REDACTED]	43008874	01 de Febrero del 2018
000162	[REDACTED]	24951566	01 de Febrero del 2018
000163	[REDACTED]	42183504	01 de Febrero del 2018
000164	SERRANO TRUEVAS MARTIN	41057353	01 de Febrero del 2018
000165	SUXE BURGA VICTOR ARSENIO	25751987	01 de Febrero del 2018
000166	[REDACTED]	47552133	01 de Febrero del 2018
000167	[REDACTED]	73128173	01 de Febrero del 2018
000168	TUME QUEREVALU JOSE DANIEL	46910618	01 de Febrero del 2018
000169	TUME VITE CARLOS ALBERTO	45597472	01 de Febrero del 2018
000170	VASQUEZ VASQUEZ LINO	02872727	01 de Febrero del 2018
000171	VEGA JAIME JEAN CARLO	46334936	01 de Febrero del 2018
000172	VEGAS FLORES GENARO ANTONIO	02777045	01 de Febrero del 2018
000173	VELA TABORGA JORGE LUIS	43041686	01 de Febrero del 2018
000174	VENTURO CAPILLO VICTOR ABRAHAN	45935818	01 de Febrero del 2018
000175	VILLANUEVA CORNEJO WALTER RENEE	04627862	01 de Febrero del 2018
000176	VILLANUEVA VIGO OSCAR MANUEL	46991567	01 de Febrero del 2018
000177	VITE JACINTO BERNARDO	03851140	01 de Febrero del 2018
000178	VITE PERICHE MAXIMO	03850510	01 de Febrero del 2018
000179	VITE VILCHEZ DARWIN JAVIER	74752225	01 de Febrero del 2018
000180	YARLEQUE VALENCIA MARCOS ORLANDO	43653066	01 de Febrero del 2018
000181	ZAMORA CHAVEZ PEDRO LUIS	02882455	01 de Febrero del 2018

Sin otro particular , quedamos de ustedes

Atentamente,


 Luis Alberto Avila Morán
 CIP. N° 84747
 SUPERVISOR S.S.

Oficina Principal: Av. Juan de Arona 830 San Isidro, Lima 27 Perú / Central de Información y Consultas Clientes: 513-5000
 Central Administrativa: 516-4000 / W:www.pacifico.com.pe


 JULIO
 ESPINOSA AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

Pacífico EPS

CARLOS SILES
GERENTE


Pacífico Seguros

ANGEL ARMIÑO HIDALGO
GERENTE


Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

JORGE JULIO
ESPICHAN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

**ANEXO N° 09:
CONSTANCIAS DE PAGOS DE
DERECHOS A SENCICO**

Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84745
SUPERVISOR DE OBRAS



JORGE JULIO
ESPICHAN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Rég. CIP N° 119009



Constancia de Pago


00061

Pago Varios - Formulario 1662



Número de orden : 280070423

RUC : 20112182021
Razón social : P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.
Periodo : 01/2018
Indicador de pago : 1 Tributo
Tributo : 7031 SENCICO
Importe pagado : S/. 9,940
Número de operación: 000142505288
Tipo de pago: Pago con cargo en cuenta bancaria
Banco: DE CREDITO DEL PERU
Número de operación 0146677
Fecha de operación bancaria: 23/02/2018 11:58:34



 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84743
SUPERVISOR DE OBRAS


ING. JULIO
ESPINOZA AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

**ANEXO N° 10:
CONSTANCIAS DE PAGOS DE
DERECHOS A CONAFOVISER**



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS




JORGE JULIO
ESQUIVEL AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

Datos de la transferencia

N° Transferencia: 3600599
 Estado: Procesado
 Fecha: 21/02/2018
 Registrado por: JENNY LOPEZ MASLUCAN 04:50:49
 Aprobado por: MARIO PEÑA FUENTES 05:11:23
 Referencia: CONAFOVICER ENERO 2018
Cuenta de origen:
 Tipo y Número: Cuenta Corriente Soles - 000503484725
 Monto a transferir: S/. 5866.38
Cuenta de destino:
 Número: 00219300157291906814
 Banco: BANCO CREDITO
 Cuenta propia: No
 Titular: CONAFOVICER
 ID Titular: RUC 20100816611
 Dirección: PROLG CANGALLO 670 LA VICTORIA
 Monto a abonar: S/. 5866.38


 **Luis Alberto Avila Morales**
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE...


**RÓMULO JULIO
 ESPICHAN AVILÉS**
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

**ANEXO N° 11:
CONSTANCIAS DE PAGOS DE
IMPUESTOS**



Luis Alberto Avila Morales
Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84745
SUPERVISOR DE

Jose Julio Espinosa Aviles
JOSE JULIO
ESPINOSA AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

Constancia de Pago



00057


Pago de valores - Formulario 1662

Número de orden : 280059371

RUC : 20112182021
Razón social : P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.
Periodo : 01/2018
Tipo de pago : 1 Valor
Número de documento : 0210010410747
Tributo : 5210 ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR
Importe pagado : S/. 40,000

Número de operación SUNAT: 000142496119
Tipo de pago: Pago con cargo en cuenta de detracciones
Banco: NACION
Número de operación bancaria: 00000000000449883750
Fecha de operación bancaria: 23/02/2018 08:58:02


 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS


JORGE JULIO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

Constancia de Pago


Pago de valores - Formulario 1662

N° mero de orden : 280070222

RUC : 20112182021
Raz n social : P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.
Periodo : 01/2018
Tipo de pago : 1 Valor
N° mero de documento : 0210010410747
Tributo : 5210 ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR
Importe pagado : S/. 32,208

N° mero de operaci n SUNAT: 000142505188
Tipo de pago: Pago con cargo en cuenta bancaria
Banco: DE CREDITO DEL PERU
N° mero de operaci n bancaria: 0144656
Fecha de operaci n bancaria: 23/02/2018 11:56:02


 **Luis Alberto Avila Morales**
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE C


JULIO ESPINHAN AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



Constancia de Pago


00055

Pago Varios - Formulario 1662

Número de orden : 279653714

RUC : 20112182021
Razón social : P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.
Periodo : 01/2018
Indicador de pago : 1 Tributo
Tributo : 3052 RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES
Importe pagado : S/. 56,482
Número de operación: 000141633137
Tipo de pago: Pago con cargo en cuenta de detracciones
Banco: NACION
Número de operación 0000000000447636904
Fecha de operación bancaria: 16/02/2018 10:40:56


 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84745
SUPERVISOR DE OBRAS


JORGE JULIO
ESPILMAN AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



PACÍFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Av. Juan de Arona 830 - San Isidro - Lima - Lima Peru

Telef. 513 5000

CONTRATANTE: PSV CONSTRUCTORES S.A.

DIRECCION : AV. EL PINAR NRO 180 INT 1104

LOCALIDAD : SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

RUC N° : 20112182021

N° RELACION : R.I. 3355945 COD. CONT.: 55515

FECHA DE EMISIÓN : 07/02/2018

ASEGURADO : (55515) PSV CONSTRUCTORES S.A.

ASESOR/AGENTE : (300500) SIN INTERMEDIACION,

MONEDA : SOL

PRIMA : 1182.17

R.U.C. 20332970411

FACTURA ELECTRONICA

F050 N° 00162589

RAMO	DOCUMENTO	POLIZA	GIRO	VIGENCIA	PRIMA TOTAL
62 - Acc. de Trabajo	8068913	62036427	620	01/01/2018 31/01/2018	1,394.96

OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. EXONERADA	S/	0.00
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. GRAVADA	S/	1,182.17
TOT. DSCTO.	S/	0.00
I.G.V.	S/	212.79
IMPORTE TOTAL	S/	1,394.96



SON: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 96/100 SOLES

Autorizado mediante resolución N° 0180050001295/SUNAT

Representación impresa de la Factura electrónica

Documento emitido de acuerdo al inciso b) del numeral 6.1 del artículo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago

Powered by Paperless



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

JORGE JULIO
ESPICHA AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

Transferencia interbancaria

P S V CONSTRUCTORES SA

N° transferencia: 3573125
Estado: Procesado
Fecha: 03/02/2018
Registrado por: JENNY LOPEZ MASLUCAN 08:48:31
Aprobado por: MARIO PEÑA FUENTES 09:00:44
Referencia: SCTR PENSION ENERO

Cuenta de origen


Tipo y número: Cuenta Corriente Soles - 000503484725
Monto a transferir: S/. 1394.96

Cuenta de destino

Número: 00219300008333102611
Banco: CREDITO
Cuenta propia: No
Titular: CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
ID Titular: RUC 20332970411
Dirección: AV JUAN DE ARONA 830 SAN ISIDRO
Monto a abonar: S/. 1394.96



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84743
SUPERVISOR DE


JORGE JULIO
ESPIHAN AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD
AV JUAN DE ARONA NRO 830 - - LIMA - SAN ISIDRO

R.U.C. 20431115825
FACTURA ELECTRONICA
F027 N° 00101549

CLIENTE : PSV CONSTRUCTORES SA
DIRECCION : AV DEL PINAR NRO 180 INT 1104 URB CHACARILLA DEL ESTANQUE
LOCALIDAD : REF CDRA 4 DE AV PRIMAVERA
RUC N° : 20112182021
N° RELACION :

FECHA DE EMISION : 30/01/2018
ASEGURADO :
ASESOR :
MONEDA : SOL
PRIMA :

CONCEPTO	VALOR VENTA
RECIBO DE PRIMA Contrato/Póliza: 60666 Producto: SCTR Vcto: 15-FEB-18	1,739.03


OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. EXONERADA	S/	0.00
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. GRAVADA	S/	1,473.75
TOT. DSCTO.	S/	0.00
I.G.V.	S/	265.28
IMPORTE TOTAL	S/	1,739.03


SON: UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 03/100 SOLES



Autorizado mediante resolución N° 0180050001200/SUNAT
Representación impresa de la factura electrónica

Powered by Paperless


Luis Alberto Avila Mon...
CIP. N° 84743
SUPERVISOR DE...



JORGE JULIO
ESPICHAN AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

Datos de la transferencia

Nº Transferencia: 3573087
Estado: Procesado
Fecha: 03/02/2018
Registrado por: JENNY LOPEZ MASLUCAN 08:40:57
Aprobado por: MARIO PEÑA FUENTES 08:58:27
Referencia: SCTR SALUD ENERO
Cuenta de origen:
Tipo y Número: Cuenta Corriente Soles - 000503484725
Monto a transferir: S/. 1739.03
Cuenta de destino:
Número: 00219300110105708714
Banco: BANCO CREDITO
Cuenta propia: No
Titular: PACIFICO SA
ID Titular: RUC 20431115825
Dirección: CAL JUAN DE ARONA 830 LIMA
Monto a abonar: S/. 1739.03





Luis Alberto Avila Morales
CIP. Nº 84743
SUPERVISOR DE



JORGE JUAN
ESPICHAN AVILARES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP Nº 119009



Comprobante de Pago en Línea en AFPnet

AFP:	PRIMA
Devengue:	01/2018
Número de Planilla:	2505859104
RUC/DNI:	20112182021
Razón Social/Nombre:	P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.
Banco:	BCP
Fecha de pago :	23/02/2018
Hora de pago:	12:12:55
Número de operación:	0000265
Monto Fondo de Pensiones (S/.) :	7,468.90
Monto de Retenciones y Retribuciones (S/.) :	1,400.24


 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84745
SUPERVISOR DE


ESPECIALISTAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

PLANII DE DECLARACIÓN Y PAGO DE APORTE REVISIONALES

Número de Planilla 2505859104 Período Devengue 2018-01



IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR

Nombre ó Razón Social: P.S.V. CONSTRUCTORES S.A. RUC: 20112182021
 Dirección: AV.-DEL PINAR 180 Urbanización o Localidad: URB.-CHACARILLA DEL ESTANQUE OFICI 1104
 Distrito: SANTIAGO DE SURCO Provincia: LIMA Departamento: LIMA
 Representante Legal: PENA FUENTES MARIO DNI: 06109501 Elaborado por: PONCE CASTILLO, MARIA Area: RRRH Teléfono: 3721145
 Teléfono: 3721145

RESUMEN DE APORTES AL FONDO

Aporte Obligatorio	S/.	6,194.38
Aporte Complementario - Trabajador	S/.	619.42
Aporte Complementario - Empleador	S/.	619.42
Aporte Voluntario con fin previsional	S/.	0.00
Aporte Voluntario sin fin previsional	S/.	0.00
Aporte Voluntario del Empleador	S/.	0.00
Sub-Total Fondo de Pensiones	S/.	7,433.22
Intereses Moratorios	S/.	35.68
Total Fondo de Pensiones	S/.	7,468.90

RESUMEN DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES A OTROS

Prima de Seguro Previsional	S/.	842.43
Comisión AFP	S/.	551.12
Sub-total Retenciones y Retribuciones	S/.	1,393.55
Intereses Moratorios	S/.	6.69
Total Retenciones y Retribuciones	S/.	1,400.24

Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84743
 SUPERVISOR DE C.U.A.

Forma de Pago Pagada via AFPnet línea
 Fecha de Pago 23/02/2018
 Banco BCP

Nro	CUSPP	Nombre	Rel. Lab.	Inicio PL	Fin de aporte PL	Remuneración asegurable	Aporte Obligatorio	Aportes Complementarios		Aportes Voluntarios		Prima de Seguro	Comisión AFP
								Trabajador	Empleador	Con fin Prev.	Sin fin Prev.		
1	543561VBCAD5	BOCANEGRA CALDERON, VICTOR	S	N	N	211.17	21.12	2.11	2.11	0.00	0.00	2.87	3.38
2	581591ALCGP7	LLAGUARIMAY CHIPANA, ANDRES	S	N	N	4,826.08	482.61	48.26	48.26	0.00	0.00	65.63	77.22
3	508231GLAMN1	LLAMOCTANTA ACUNA, GREGORIO	S	N	N	3,946.45	394.65	39.46	39.46	0.00	0.00	53.67	63.14
4	622601HMCIT4	MARINAS CASTILLO, HEVER DAVID	S	N	N	2,463.20	246.32	24.63	24.63	0.00	0.00	33.50	39.41
5	579311IPVEQ0	PINEDA VASQUEZ, ISRAEL ADHEMIR	S	N	N	4,127.26	412.73	41.27	41.27	0.00	0.00	56.13	66.04
6	324321EQASM2	QUISPE ANAMPA, EDDYNSON	S	N	N	3,303.01	330.30	33.03	33.03	0.00	0.00	44.92	5.95
7	615081LRAAA3	ROJAS ARIAS, LEHI ENRIQUE	S	N	N	3,779.43	377.94	37.79	37.79	0.00	0.00	51.40	6.80
8	575191FSGVL8	SAAVEDRA GALLARDO, FERNANDO	S	N	S	1,671.50	167.15	16.72	16.72	0.00	0.00	22.73	26.74
9	321581RSD8Z2	SAMBACHI DIAZ, ROBERTO	S	N	N	2,561.96	256.20	25.62	25.62	0.00	0.00	34.84	4.61
10	527341VSPM06	SARMIENTO PALOMINO, VICTOR	S	S	S	2,194.53	219.45	21.95	21.95	0.00	0.00	29.85	35.11
11	561891MSTRE1	SERRANO TRUEVAS, MARTIN	S	N	N	3,959.31	395.93	39.59	39.59	0.00	0.00	53.85	63.35
12	329501LTLCL0	TRILLO CHIRE, LUIS ENRIQUE	S	N	N	2,948.27	294.83	29.48	29.48	0.00	0.00	40.10	5.31
13	579121JVRA5	VALDIVIA ROJAS, JORGE VIDAL	S	N	N	2,796.91	279.69	27.97	27.97	0.00	0.00	38.04	44.75

- Excep. de aportar (Motivo por el que excepcionalmente no corresponde hacer aportes obligatorios en el mes) Pueden ser:
 Vacío = Tiene obligación de aportar, L = Licencia sin goce de haber, U = Subsidio en sector público, J = Pensión por Jubilación,
 I = Pensión por Invalidez, P = Inicio de R.L., post cierre de planillas, O = Otros, V = Vacaciones, R = Retiro del 95.5%.

PLANII DE DECLARACIÓN Y PAGO DE APORTE PREVISIONALES



PRIMA AFP
Grupo 2 Crédito

Número de Planilla 2505859104 Período Devengue 2018-01

Nro	CUSPP	Nombre	Rel. Lab.	Inicio RL	Cese RL	Excep. de aportar	Remuneración asegurable	Aportes Obligatorios		Aportes Voluntarios			Prima de Seguro	Comisión AFP
								Trabajador	Empleador	Con fin Prev.	Sin fin Prev.	Empleador		
14	518771LVRQA2	VASQUEZ ROJAS, LUIS AGAPITO	S	S	N		1,544.88	154.49	15.45	0.00	0.00	0.00	21.01	2.78
15	634581BTLIE6	TIPISMANA LOPEZ, BRYAN ALEXIS	S	N	S		2,262.03	226.20	22.62	0.00	0.00	0.00	30.76	4.07
16	617311RSMCU5	SANCHEZ MUCUSHUA, REIMER	S	N	N		3,202.00	320.20	32.02	0.00	0.00	0.00	43.55	5.76
17	584200GSCAE1	SALAZAR CACERES, GELVER	S	S	N		1,704.35	170.44	17.04	0.00	0.00	0.00	23.18	27.27
18	513631PLPEE0	LOPEZ PEREZ, PABLO EDUARDO	S	N	S		2,331.11	233.11	23.31	0.00	0.00	0.00	31.70	4.20
19	521311EDVAD4	DAMACEN VALDIVIA, ELIADES	S	N	N		291.86	29.19	2.92	0.00	0.00	0.00	3.97	4.67
20	660241PAQER0	ALMESTAR QUEREVALU, PAUL MARTIN	S	N	N		2,216.89	221.69	22.17	0.00	0.00	0.00	30.15	3.99
21	307971JAEAA0	ALDANA ECCA, JUAN VICTOR	S	N	N		2,342.44	234.24	23.42	0.00	0.00	0.00	31.86	4.22
22	615931MVLLE9	YARLEQUE VALENCIA, MARCOS	S	N	N		2,766.18	276.62	27.66	0.00	0.00	0.00	37.62	44.26
23	601121JVTAO8	VELA TABORGA, JORGE LUIS	S	S	N		1,305.96	130.60	13.06	0.00	0.00	0.00	17.76	2.35
24	575241LVVQO6	VASQUEZ VASQUEZ, LINO	S	N	N		3,186.84	318.68	31.87	0.00	0.00	0.00	43.34	5.74

Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE CELA

JORGE JULIO
PACHAN AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

Leyenda:


- Rel. Lab (Existe Relación laboral con el afiliado): S = Si, N = No
- Inicio RL (Relación Laboral inició en el mes): S = Si, N = No
- Cese RL (Relación Laboral finalizó en el mes): S = Si, N = No


- Excep. de aportar (Motivo por el que excepcionalmente no corresponde hacer aportes obligatorios en el mes) Pueden ser:
 Vacio = Tiene obligación de aportar, L = Licencia sin goce de haber, U = Subsidio en sector público, J = Pensión por Jubilación,
 I = Pensión por Invalidez, P = Inicio de R.L. post cierre de planillas, O = Otros, V = Vacaciones, R = Retiro del 95.5%.



Comprobante de Pago en Línea en AFPnet

AFP: PROFUTURO
Devengue: 01/2018
Número de Planilla: 2305518504
RUC/DNI: 20112182021
Razón Social/Nombre: P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.
Banco: BCP
Fecha de pago : 23/02/2018
Hora de pago: 12:13:20
Número de operación: 0000266
Monto Fondo de Pensiones (S/.) : 16,733.22
Monto de Retenciones y Retribuciones (S/.) : 3,803.70


 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS


Juan Carlos Avila
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

Número de Planilla: 2305518504 Período Devengue: 2018-01

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR

Nombre ó Razón Social: P. S. V. CONSTRUCTORES S.A. RUC: 20112182021
 Dirección: AV.-DEL PINAR 180 Urbанизación o Localidad: URB.-CHACARILLA DEL ESTANQUE OFICI 1104
 Distrito: SANTIAGO DE SURCO Provincia: LIMA Departamento: LIMA
 Representante Legal: PENA FUENTES MARIO DNI: 06109501 Elaborado por: PONCE CASTILLO, MARIA Área: RRRHH Teléfono: 3721145
 Teléfono: 3721145

RESUMEN DE APORTES AL FONDO

Aporte Obligatorio	S/.	13,877.82
Aporte Complementario - Trabajador	S/.	1,387.73
Aporte Complementario - Empleador	S/.	1,387.73
Aporte Voluntario con fin previsional	S/.	0.00
Aporte Voluntario sin fin previsional	S/.	0.00
Aporte Voluntario del Empleador	S/.	0.00
Sub-Total Fondo de Pensiones	S/.	16,653.28
Intereses Moratorios	S/.	79.94
Total Fondo de Pensiones	S/.	16,733.22

RESUMEN DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES A OTROS

Prima de Seguro Previsional	S/.	1,820.15
Comisión AFP	S/.	1,965.38
Sub-total Retenciones y Retribuciones	S/.	3,785.53
Intereses Moratorios	S/.	18.17
Total Retenciones y Retribuciones	S/.	3,803.70

Ernis Alberto Avila Morales
CIP. No 84746
SUPERVISOR DE CUENTA

Forma de Pago: Pagada via AFPnet línea
 Fecha de Pago: 23/02/2018
 Banco: BCP

Nro	CUSPP	Nombre	Rel. Lab.	Inicio de Rel. Lab.	Caso de Aportar	Excepción de Aportar	Remuneración asegurable	Aporte Obligatorio	Aportes Complementarios		Aportes Voluntarios		Prima de Seguro	Comisión AFP
									Trabajador	Empleador	Con fin Prev.	Sin fin Prev.		
1	564671RACCL1	ANCCO CCALLO, RUMUALDO	S	N	S	2,908.94	290.89	29.09	29.09	0.00	0.00	39.56	49.16	
2	605161MAPAO9	ARMAS PINO, MANOLITO	S	N	N	3,553.49	355.35	35.53	35.53	0.00	0.00	48.33	38.02	
3	570401JAAON4	ASTO ARANGO, JOSE ANTONIO	S	N	N	3,856.66	385.67	38.57	38.57	0.00	0.00	52.45	41.27	
4	575351NASEE4	AUCEJO SODERSTRONG, NINO	S	N	N	4,229.46	422.95	42.29	42.29	0.00	0.00	57.52	71.48	
5	585311JCTAJ8	CASAS TRUJILLO, JOSE CARLOS	S	N	S	2,707.27	270.73	27.07	27.07	0.00	0.00	36.82	28.97	
6	622551HCMMA7	CHAMORRO MATAMOROS, HENRY	S	N	N	4,998.68	499.87	49.99	49.99	0.00	0.00	67.98	84.48	
7	628641DCRRE5	CHIRA REYES, DENIS LEANDRO	S	S	N	1,670.71	167.07	16.71	16.71	0.00	0.00	22.72	17.88	
8	561121WCDZ13	CRUZALEGUI DAVILA, WILDER	S	N	N	4,743.17	474.32	47.43	47.43	0.00	0.00	64.51	80.16	
9	558981EPPA19	ECCA PERICHE, ELADIO	S	N	N	148.45	14.85	1.48	1.48	0.00	0.00	2.02	2.57	
10	588081LEJIR4	ESPIÑOZA JUAREZ, LUIS ALBERTO	S	N	S	325.21	32.52	3.25	3.25	0.00	0.00	4.42	5.50	
11	552171PERIA9	ESPIRITU ROSALES, PEDRO JESUS	S	N	S	2,928.23	292.82	29.28	29.28	0.00	0.00	39.82	49.49	
12	579791CESRD3	ESTRADA SALDARRIAGA, CARLOS	S	N	N	2,954.36	295.44	29.54	29.54	0.00	0.00	40.18	49.93	
13	589321GGPIE0	GUTIERREZ PAREDES, GIANCARLO	S	N	N	3,895.34	389.53	38.95	38.95	0.00	0.00	52.98	65.83	

Excep. de aportar (Motivo por el que excepcionalmente no corresponde hacer aportes obligatorios en el mes) Pueden ser:
 Vacío = Tiene obligación de aportar, L = Licencia sin goce de haber, U = Subsidio en sector público, J = Pensión por Jubilación,
 I = Pensión por Invalidez, P = Inicio de R.L. post cierre de planillas, O = Otros, V = Vacaciones, R = Retiro del 95.5%.

Existe Relación laboral con el afiliado): S = Si, N = No
Inicio RL (Relación Laboral inició en el mes): S = Si, N = No
Cese RL (Relación Laboral finalizó en el mes): S = Si, N = No

Número de Planilla 2305518504 Período Devengue 2018-01

Nro	CUSPP	Nombre	Rel. Lab.	Inicío RL	Cese RL	Excep. de aporte	Remuneración asegurable	Aporte Obligatorio	Aportes Complementarios		Aportes Voluntarios				Prima de Seguro	Comisión AFP
									Trabajador	Empleado	Con fin Prev.	Sin fin Prev.	Empleado			
14	258551OIVZC9	ILIZARBE VILCA, OSCAR	S	N	S		3.382.03	338.20	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	57.16
15	590951JIPAA9	INGA PALACIOS, JOSE ROBERTO	S	S	N		260.11	26.01	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	2.78
16	611761GLVLA9	LEAL VEGA, GERSON	S	N	S		2.582.84	258.28	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	35.13	27.64
17	634111JLGEZ9	LOPEZ GONZAGA, JUAN JESUS	S	N	N		2.454.96	245.50	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	33.39	26.27
18	243121JMPAIO	MORALES PURIZACA, JULIO ANTONIO	S	N	N		2.777.91	277.79	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78	29.72
19	275271JMPBI3	MOREYRA PADILLA, JORGE LUIS	S	S	N		319.39	31.94	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34	3.42
20	241671AMSOCI	MUNOZ SANCHEZ, ARTURO	S	N	N		4.088.81	408.88	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	55.61	69.10
21	588971JOFRF3	OTERO FARFAN, JIMMY CHARLEY	S	N	N		3.109.30	310.93	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	42.29	52.55
22	588451JQARO8	QUEREVALU ANTON, JOSE MANUEL	S	N	N		291.15	29.12	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	4.92
23	323541ARMITO	RAMIREZ MONTEZA, ADELMO	S	N	N		31.87	3.19	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.34
24	559811HRVIA2	RAMIREZ VIDAL, HELENE REYNALDO	S	N	N		3.373.46	337.35	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	45.88	57.01
25	612471SRLAE9	ROJAS LOPEZ, SMITH FRANKLIN	S	N	N		1.547.67	154.77	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	21.05	26.16
26	228891LRFZRB	RUIZ FLORES, LUIS ALBERTO	S	N	N		4.358.47	435.85	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	59.28	73.66
27	600491JSODD5	SALDARRIAGA OJEDA, JESUS DAVID	S	N	N		3.472.17	347.22	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	47.22	37.15
28	566671VSNCA9	SANCHEZ NINA, VICTOR EDUARDO	S	N	N		2.889.91	288.99	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	39.30	30.92
29	625641CTVEE4	TUME VITE, CARLOS ALBERTO	S	N	N		2.147.14	214.71	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20	22.97
30	555501MZMAT1	ZEVALLOS MARTINEZ, MARIO	S	N	N		2.522.67	252.27	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	34.31	26.99
31	216221DMBCJ3	MERCADO BORJA, DIONICIO FELIX	S	N	N	O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	569101WSPCI9	SANCHEZ PERICHE, WILLIAM	S	N	N		275.13	27.51	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	2.94
33	275601ERNAA3	RUA NAJARRO, EDGAR ZOCIMO	S	N	N		2.998.05	299.81	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	40.77	32.08
34	498281RPTIO9	PAXI TITO, RAFAEL TORIBIO	S	N	N		2.790.48	279.05	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	37.95	47.16
35	669301LPQIR3	PANTA QUEREVALU, LUIS ENRIQUE	S	S	N		260.11	26.01	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	2.78
36	580131JORYO8	OROYA RAMOS, JULIO GREGORIO	S	N	N		4.599.93	459.99	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.56	49.22
37	617791JFMGOC0	MOZOMBITE GARCES, FREDDY	S	N	S		2.242.07	224.21	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	30.49	37.89
38	575481JMCCTN4	MARTINEZ CHUNGA, JOSE ANTONIO	S	N	N		2.060.44	206.04	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	28.02	34.82
39	587761RLPDE9	LANDA PINEDO, ROGER AUGUSTO	S	S	N		1.544.88	154.49	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01	26.11
40	572271VIJAR2	INGA JUAREZ, VICENTE	S	S	N		250.81	25.08	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	2.68
41	253851MHQMS3	HUAMAN QUISPE, MARCELIANO	S	N	N		3.585.24	358.52	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	48.76	60.59
42	339941INGIISO	GUTIERREZ IZUSQUI, NATANAEL	S	N	N		2.654.25	265.43	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	36.10	44.86
43	604491RGRLI4	GUILLEN RAMIREZ, ROSALINO RUBEN	S	N	S		1.377.86	137.79	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74	14.74
44	584071WGBTI2	GASTELO BUSTAMANTE, WALTER	S	N	N		2.714.81	271.48	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	36.92	29.05


- Excep. de aportar (Motivo por el que excepcionalmente no corresponde hacer aportes obligatorios en el mes) Pueden ser:
 Vacio = Tiene obligación de aportar, L = Licencia sin goce de haber, U = Subsido en sector público, J = Pensión por Jubilación,
 I = Pensión por Invalidez, P = Inicio de R.L., post cierre de planillas, O = Otros, V = Vacaciones, R = Retiro del 95.5%.

- Rel. Lab (Existe Relación laboral con el afiliado): S = Si, N = No
 - Inicío RL (Relación Laboral inició en el mes): S = Si, N = No
 - Cese RL (Relación Laboral finalizó en el mes): S = Si, N = No

Número de Planilla 2305518504 Período Devengue 2018-01

Nro	CUSPP	Nombre	Rel. Lab.	Cese RL	Excep. de aporte	Remuneración asegurable	Aporte Obligatorio	Aportes Complementarios			Aportes Voluntarios			Prima de Seguro	Comisión AFP
								Trabajador	Empleado	Empleado	Con fin Prev.	Sin fin Prev.	Empleado		
45	540051DGPCE0	GARCIA PEREZ, DEMETRIO	S	N	N	3,648.67	364.87	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	49.62	61.66	
46	171861CGACL3	GARCIA AVILA, CESAR ANTONIO	S	N	N	4,943.34	494.33	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	52.89	
47	270921VCRSZ9	CRISOLOGO RUIZ, VICTOR	S	N	N	4,510.29	451.03	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	61.34	76.22	
48	230151RCESO1	CRISOLOGO ESCOBEDO, REYES	S	N	N	4,692.13	469.21	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	63.81	79.30	
49	629701MCCND8	CISNEROS CERDA, MARCO ANTONIO	S	N	N	2,744.36	274.44	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	37.32	29.36	
50	559581CCMNA8	CHINCHAY MATA, CARLOS PABLO	S	N	S	3,288.31	328.83	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	44.72	35.18	
51	590421JCRV17	CHAVEZ RAMIREZ, JORGE ARMANDO	S	N	N	3,021.49	302.15	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	41.09	32.33	
52	563181RCQPR2	CHAPA QUEREVALU, RAUL ENRIQUE	S	S	N	551.55	55.16	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	7.50	5.90	
53	584711JANA18	ARGAYA NORIEGA, JUAN CARLOS	S	N	N	490.92	49.09	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	6.68	5.25	
54	231921FARAO2	ALTAMIRANO RAMOS, FRANCISCO	S	S	N	2,484.03	248.40	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	33.78	41.98	
55	635031OVVLO0	VILLANUEVA VIGO, OSCAR MANUEL	S	N	N	2,518.94	251.89	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	34.26	26.95	


Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84743
 SUPERVISOR DE PLANILLAS


JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

Legenda:



- Rel. Lab (Existe Relación laboral con el afiliado): S = Si, N = No
- Inicio RL (Relación Laboral inició en el mes): S = Si, N = No
- Cese RL (Relación Laboral finalizó en el mes): S = Si, N = No

- Excep. de aporte (Motivo por el que excepcionalmente no corresponde hacer aportes obligatorios en el mes) Pueden ser:
 Vacío = Tiene obligación de aportar, L = Licencia sin goce de haber, U = Subsídido en sector público, J = Pensión por Jubilación,
 I = Pensión por invalidez, P = Inicio de R.L. post cierre de planillas, O = Otros, V = Vacaciones, R = Retiro del 95.5%.



Comprobante de Pago en Línea en AFPnet

AFP: PROFUTURO
Devengue: 01/2018
Número de Planilla: 2305518506
RUC/DNI: 20112182021
Razón Social/Nombre: P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.
Banco: BCP
Fecha de pago : 23/02/2018
Hora de pago: 12:13:48
Número de operación: 0000267
Monto Fondo de Pensiones (S/.) : 5,758.10
Monto de Retenciones y Retribuciones (S/.) : 1,609.21


 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84745
SUPERVISOR DE OBRAS


JORGE JULIO
ESPIÑAN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR


Nombre ó Razón Social: P.S.V. CONSTRUCTORES S.A. RUC: 20112182021
 Dirección: AV.-DEL PINAR 180 Urbanización o Localidad: URB.-CHACARILLA DEL ESTANQUE OFICI 1104
 Distrito: SANTIAGO DE SURCO Provincia: LIMA Departamento: LIMA
 Representante Legal: PENA FUENTES MARIO DNI: 06109501 Elaborado por: PONCE CASTILLO, MARIA Area: RRRHH Teléfono: 3721145
 Teléfono: 3721145

RESUMEN DE APORTES AL FONDO

Aporte Obligatorio	S/.	5,730.59
Aporte Complementario - Trabajador	S/.	0.00
Aporte Complementario - Empleador	S/.	0.00
Aporte Voluntario con fin previsional	S/.	0.00
Aporte Voluntario sin fin previsional	S/.	0.00
Aporte Voluntario del Empleador	S/.	0.00
Sub-Total Fondo de Pensiones	S/.	5,730.59
Intereses Moratorios	S/.	27.51
Total Fondo de Pensiones	S/.	5,758.10

RESUMEN DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES A OTROS

Prima de Seguro Previsional	S/.	731.38
Comisión AFP	S/.	870.14
Sub-total Retenciones y Retribuciones	S/.	1,601.52
Intereses Moratorios	S/.	7.69
Total Retenciones y Retribuciones	S/.	1,609.21


 Luis Alberto Acosta Morales
 C.I.P. No 84745
 SUPERVISOR DE CUNA

Forma de Pago Pagada vía AFPnet línea
 Fecha de Pago 23/02/2018
 Banco BCP

Nro	CUSPP	Nombre	Rel. Lab	Inicio RL	Cese RL	Aportes \$	Remuneración asegurable	Aporte Obligatorio	Aportes Complementarios		Aportes Voluntarios		Prima de Seguro	Comisión AFP
									Trabajador	Empleador	Con fin Prev.	Sin fin Prev.		
1	233741LACAT5	ALVA CUETO, LUIS FERNANDO	S	N	N	4,005.00	400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.47	67.68
2	605621FAMY10	AMAYA MEDINA, FREDDY EDER	S	N	N	2,243.00	224.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	24.00
3	554431ECCDC1	CALDERON COLCHADO, ENRIQUE	S	N	N	4,344.50	434.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.09	46.49
4	591491VELEC5	ESPEJO LLACAS, VICTOR OSCAR	S	N	N	1,981.67	198.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.95	33.49
5	612261MGYEN9	GOMEZ YPANAQUE, MICHAEL	S	N	N	1,740.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.66	29.41
6	574170JGEL10	GUILLEN ESPINOZA, JUANA LILIANA	S	S	N	4,293.33	429.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.39	72.56
7	551961PLPAZ4	LITANO PAZ, PABLO	S	N	N	1,570.67	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.36	16.81
8	552610JLMEL9	LOPEZ MASLUCAN, JENNY	S	N	N	3,485.00	348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.40	58.90
9	52151JMMQ10	MARQUEZ MARIN, JHONER	S	N	N	1,500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40	16.05
10	218551MMEL10	MILLONEZ ESPINOZA, MANUEL	S	N	N	12,850.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.77	217.17
11	569261TORIAR1	PACAYA IHUARAQUI, OSWALDO ARON	S	N	N	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60	10.70
12	836441ARHNR5	RIQUELME HUARCA, ANTHONY WILLIAN	S	S	N	1,066.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.51	18.03
13	599751JRHAT1	ROMAN HURTADO, JORGE LUIS	S	N	N	4,463.00	446.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.70	75.42

Legenda:


- Rel. Lab (Existe Relación laboral con el afiliado): S = Si, N = No
- Inicio RL (Relación Laboral inició en el mes): S = Si, N = No
- Cese RL (Relación Laboral finalizó en el mes): S = Si, N = No

- Excep. de aportar (Motivo por el que excepcionalmente no corresponde hacer aportes obligatorios en el mes) Pueden ser:
 Vacío = Tiene obligación de aportar, L = Licencia sin goce de haber, U = Subsidio en sector público, J = Pensión por Jubilación,
 I = Pensión por Invalidez, P = Inicio de R.L. post cierre de planillas, O = Otros, V = Vacaciones, R = Retiro del 95.5%.

Número de Planilla Período Devengue

Nro	CUSPP	Nombre	Rel. Lab.	Inicio RL	Cese RL	Excep. de aportes	Remuneración asegurable	Aportes Obligatorios		Aportes Voluntarios			Prima de Seguro	Comisión AFP
								Trabajador	Empleado	Con fin Prev.	Sin fin Prev.	Empleado		
14	567311VSBEG2	SUXE BUJGA, VICTOR ARSENI	S	N	N		1,785.00	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24.28	19.10
15	222421JVS AU6	VEGA SEGURA, JUAN JESUS	S	N	N		4,070.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.35	68.78
16	499601EMQDS0	MONDALGO QUISPE, ERNESTO	S	N	N		3,488.00	348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47.44	58.95
17	580550MHS PV0	HUAPAYA SILVERIO, MARIA DEL PILAR	S	N	N		1,495.00	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.33	16.00
18	599771ADPEE7	DONEZ PINEDO, ADOLFO	S	N	N		1,585.00	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21.56	16.96
19	618551AAVAA3	ARMAS VELA, ALFREDO	S	S	N		340.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	3.64


Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE PLANILLAS


JORGE JULIO
ESPINOZA AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

Leyenda:

- Rel. Lab (Existe Relación laboral con el afiliado): S = Si, N = No
- Inicio RL (Relación Laboral inició en el mes): S = Si, N = No
- Cese RL (Relación Laboral finalizó en el mes): S = Si, N = No

- Excep. de aportes (Motivo por el que excepcionalmente no corresponde hacer aportes obligatorios en el mes) Pueden ser:
 Vacío = Tiene obligación de aportar, L = Licencia sin goce de haber, U = Subsidio en sector público, J = Pensión por Jubilación,
 I = Pensión por invalidez, P = Inicio de R.L. post cierre de planillas, O = Otros, V = Vacaciones, R = Retiro del 95.5%.


100041



Comprobante de Pago en Línea en AFPnet

AFP: INTEGRA
Devenque: 01/2018
Número de Planilla: 2206472602
RUC/DNI: 20112182021
Razón Social/Nombre: P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.
Banco: BCP
Fecha de pago : 23/02/2018
Hora de pago: 12:11:57
Número de operación: 0000263
Monto Fondo de Pensiones (S/.): 11,425.00
Monto de Retenciones y Retribuciones (S/.): 2,581.54


 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS


JORGE JULIO
ESPICHAN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

Número de Planilla 2206472602 Período Devengue 2018-01

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR

Nombre ó Razón Social: P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.		RUC: 20112182021	
Dirección: AV.-DEL PINAR 180		Urbanización o Localidad: URB.-CHACARILLA DEL ESTANQUE OFICI 1104	
Distrito: SANTIAGO DE SURCO		Departamento: LIMA	
Representante Legal: PEÑA FUENTES MARIO		Elaborado por: PONCE CASTILLO, MARIA	
Provincia: LIMA		Área: RRRH	
DNI: 06109501		Teléfono: 3721145	
		Teléfono: 3721145	

RESUMEN DE APORTES AL FONDO

Aporte Obligatorio	S/.	11,370.42
Aporte Complementario - Trabajador	S/.	0.00
Aporte Complementario - Empleador	S/.	0.00
Aporte Voluntario con fin previsional	S/.	0.00
Aporte Voluntario sin fin previsional	S/.	0.00
Aporte Voluntario del Empleador	S/.	0.00
Sub-Total Fondo de Pensiones	S/.	11,370.42
Intereses Moratorios	S/.	54.58
Total Fondo de Pensiones	S/.	11,425.00

RESUMEN DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES A OTROS

Prima de Seguro Previsional	S/.	1,174.08
Comisión AFP	S/.	1,395.13
Sub-total Retenciones y Retribuciones	S/.	2,569.21
Intereses Moratorios	S/.	12.33
Total Retenciones y Retribuciones	S/.	2,581.54

Luis Alberto Peña Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE CUENTA

AFP	INTEGRA
Tipo de Trabajador	DEPENDIENTE
Tipo de Riesgo	Normal
Nro. de Afiliados Declarados	18
Estado de la Planilla	PAGADA
Fecha de Presentación	06/02/2018

Forma de Pago	Pagada vía AFPnet línea
Fecha de Pago	23/02/2018
Banco	BCP

Nro	CUSPP	Nombre	Rel. Lab	Inicio RL	Cese RL	Ejec. de aporte	Remuneración asegurable	Aporte Obligatorio	Aportes Complementarios		Aportes Voluntarios		Prima de Seguro	Comisión AFP
									Trabajador	Empleador	Con fin Prev.	Sin fin Prev.		
1	548493AACAP3	ARIAS CAPPELLETTI, ALDO ALFREDO	S	N	N		4,285.00	428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	58.28	66.42
2	603141RBFN8	BAUTISTA FERNANDEZ, RAUL	S	N	N		6,300.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.68	97.65
3	597661JCMCR0	CARCAMO MADRID, JULIAN MEMET	S	N	N		4,350.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.16	67.43
4	588771HCAT9	CASTILLO ABRIL, HENRY DANIEL	S	N	N		1,585.00	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21.56	14.27
5	623541MDAAM4	DONAYRE AHUMADA, MAX OSCAR	S	N	N		4,850.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.96	75.18
6	524981GLRAE7	LOZANO REYES, GILMER YOVANI	S	N	N		2,160.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.38	33.48
7	232901MPFAN9	PEÑA FUENTES, MARIO	S	N	N		26,960.00	2,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.77	242.64
8	54110151JQCSA0	QUISPE CAMACHO, JULIO CESAR	S	N	N		9,711.00	971.10	0.00	0.00	0.00	0.00	126.77	150.52
9	541051LPSTU4	PORTALINO SEGUNDO, LUIS ALBERTO	S	N	N		18,669.00	1,866.90	0.00	0.00	0.00	0.00	126.77	168.02
10	541051LLAC6	LARA LLACAS, JULIO RICARDO	S	N	N		7,818.21	781.82	0.00	0.00	0.00	0.00	106.33	121.18
11	541051NEN8	CUZCANO SISNIEGAS, ENZO FRANCO	S	N	N		4,665.00	466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	63.44	72.31
12	541051MRCD08	BORDA CHAUCA, MARCO ANTONIO	S	N	N		2,270.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.87	35.19
13	541051JACAZ3	ALCAZAR OLAZABAL, JUAN DANIEL	S	N	N		3,835.00	383.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52.16	59.44

Legenda:

- Rel. Lab (Existe Relación laboral con el afiliado): S = Si, N = No
- Inicio RL (Relación Laboral inició en el mes): S = Si, N = No
- Cese RL (Relación Laboral finalizó en el mes): S = Si, N = No

- Excep. de aportar (Motivo por el que excepcionalmente no corresponde hacer aportes obligatorios en el mes) Pueden ser:
 Vacío = Tiene obligación de aportar, L = Licencia sin goce de haber, U = Subsidio en sector público, J = Pensión por Jubilación,
 I = Pensión por Invalidez, P = Inicio de R.L. post cierre de planillas, O = Otros, V = Vacaciones, R = Retiro del 95.5%.

Número de Planilla 2206472602 Período Devengue 2018-01

Nro	CUSPP	Nombre	Rel. Lab.	Inicio RL	Cese RL	Excep. de aporte	Remuneración asegurable	Aporte Obligatorio	Aportes Complementarios		Aportes Voluntarios			Prima de Seguro	Comisión AFP
									Trabajador	Empleador	Con fin Prev.	Sin fin Prev.	Empleador		
14	552801GAFIN5	AGUILAR FUENTES, GERARDO FREDY	S	N	N		6,950.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.52	107.73
15	194211WVCLN9	VILLANUEVA CORNEJO, WALTER	S	N	N		4,076.00	407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.43	36.68
16	327781VVCT18	VENTURO CAPILLO, VICTOR ABRAHAM	S	N	N		2,085.00	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.36	18.77
17	611591WSTTV3	SANTILLAN TRAVERSO, WILLY BOYD	S	N	N		1,250.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	11.25
18	638571RMSIH6	MEDINA SICHÁ, RONALD PELAGIO	S	N	N		1,885.00	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64	16.97



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE...

JORGE JULIO
ESPINOZA AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

Leyenda:



- Rel. Lab (Existe Relación laboral con el afiliado): S = Si, N = No
- Inicio RL (Relación Laboral inició en el mes): S = Si, N = No
- Cese RL (Relación Laboral finalizó en el mes): S = Si, N = No


- Excep. de aportar (Motivo por el que excepcionalmente no corresponde hacer aportes obligatorios en el mes) Pueden ser:
 Vacio = Tiene obligación de aportar, L = Licencia sin goce de haber, U = Subsidio en sector público, J = Pensión por Jubilación,
 I = Pensión por Invalidez, P = Inicio de R.L. post cierre de planillas, O = Otros, V = Vacaciones, R = Retiro del 95.5%.



Comprobante de Pago en Línea en AFPnet

AFP: HABITAT
Devenque: 01/2018
Número de Planilla: 2602489472
RUC/DNI: 20112182021
Razón Social/Nombre: P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.
Banco: BCP
Fecha de pago : 23/02/2018
Hora de pago: 12:10:49
Número de operación: 0000261
Monto Fondo de Pensiones (S/.) : 1,592.19
Monto de Retenciones y Retribuciones (S/.) : 230.87


 **Luis Alberto Avila Morales**
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS


JORGE JULIO ESPINOSA AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

Número de Planilla 2602489472 Periodo Devengue 2018-01

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR

Nombre ó Razón Social: P.S.V. CONSTRUCTORES S.A. RUC: 20112182021
 Dirección: AV.- DEL PINAR 180 Urbanización o Localidad: URB.-CHACARILLA DEL ESTANQUE OFICI 1104
 Distrito: SANTIAGO DE SURCO Provincia: LIMA Departamento: LIMA
 Representante Legal: PENA FUENTES MARIO DNI: 06109501 Elaborado por: PONCE CASTILLO, MARIA Área: RRRHH
 Teléfono: 3721145
 Teléfono: 3721145

RESUMEN DE APORTES AL FONDO


Aporte Obligatorio	S/.	1,320.48
Aporte Complementario - Trabajador	S/.	132.05
Aporte Complementario - Empleador	S/.	132.05
Aporte Voluntario con fin previsional	S/.	0.00
Aporte Voluntario sin fin previsional	S/.	0.00
Aporte Voluntario del Empleador	S/.	0.00
Sub-Total Fondo de Pensiones	S/.	1,584.58
Intereses Moratorios	S/.	7.61
Total Fondo de Pensiones	S/.	1,592.19

RESUMEN DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES A OTROS

Prima de Seguro Previsional	S/.	179.59
Comisión AFP	S/.	50.18
Sub-total Retenciones y Retribuciones	S/.	229.77
Intereses Moratorios	S/.	1.10
Total Retenciones y Retribuciones	S/.	230.87

Forma de Pago Pagada vía AFPnet línea
 Fecha de Pago 23/02/2018
 Banco BCP

Nro	CUSPP	Nombre	Rel. Lab.	Inicio RL	Cese RL	Excepción de Aportes	Remuneración asegurable	Aporte Obligatorio	Aportes Complementarios		Aportes Voluntarios		Prima de Seguro	Comisión AFP
									Trabajador	Empleador	Con fin Prev.	Sin fin Prev.		
1	630801RCPNH6	CORNEJO PACHECO, ROLY	S	N	N		2,350.11	235.01	23.50	23.50	0.00	0.00	31.96	8.93
2	619561CLTALO	LUNA TALLEDO, CESAR AUGUSTO	S	N	N		2,970.60	297.06	29.71	29.71	0.00	0.00	40.40	11.29
3	344531LRSZL1	RUIZ SIALER, LUIS ALBERTO	S	N	S		1,747.54	174.75	17.48	17.48	0.00	0.00	23.77	6.64
4	645971ELCDD1	LANDACAY CORDOVA, EDIL MIGUEL	S	N	N		2,263.20	226.32	22.63	22.63	0.00	0.00	30.78	8.60
5	323371MBSNC4	BUENO SANCHEZ, MIKER GILMER	S	S	N		1,922.44	192.24	19.22	19.22	0.00	0.00	26.15	7.31
6	648371EYCAC1	YANAC CAYCHO, EDWARD KENEDY	S	N	N		1,950.97	195.10	19.51	19.51	0.00	0.00	26.53	7.41


 Luis Alberto Avilés Morales
 CIP. No 8.4745
 SUPERVISOR DE CUENTA


 JORGE JULIO ESPINOZA AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

Legenda:
 - Rel. Lab (Existe Relación laboral con el afiliado): S = Si, N = No
 - Inicio RL (Relación Laboral inició en el mes): S = Si, N = No
 - Cese RL (Relación Laboral finalizó en el mes): S = Si, N = No

- Excep. de aportar (Motivo por el que excepcionalmente no corresponde hacer aportes obligatorios en el mes) Pueden ser:
 V = Tiene obligación de aportar, L = Licencia sin goce de haber, U = Subsidio en sector público, J = Pensión por Jubilación,
 I = Pensión por Invalidez, P = Inicio de R.L. post cierre de planillas, O = Otros, V = Vacaciones, R = Retiro del 95.5%.

Impreso el 27/02/2018 08:08:03

PLANILLA DE DECLARACIÓN Y PAGO DE APORTE PREVISIONALES

Número de Planilla 2505859102 Período Devengue 2018-01



IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR

Nombre ó Razón Social: P.S.V. CONSTRUCTORES S.A. RUC: 20112182021
 Dirección: AV.-DEL PINAR 180 Urbanización o Localidad: URB.-CHACARILLA DEL ESTANQUE OFICI 1104
 Distrito: SANTIAGO DE SURCO Provincia: LIMA Departamento: LIMA
 Representante Legal: PEÑA FUENTES MARIO DNI: 06109501 Elaborado por: PONCE CASTILLO, MARIA Area: RRRHH
 Teléfono: 3721145
 Teléfono: 3721145

RESUMEN DE APORTES AL FONDO

Aporte Obligatorio	S/.	7,680.71
Aporte Complementario - Trabajador	S/.	0.00
Aporte Complementario - Empleador	S/.	0.00
Aporte Voluntario con fin previsional	S/.	0.00
Aporte Voluntario sin fin previsional	S/.	0.00
Aporte Voluntario del Empleador	S/.	0.00
Sub-Total Fondo de Pensiones	S/.	7,680.71
Intereses Moratorios	S/.	36.87
Total Fondo de Pensiones	S/.	7,717.58

RESUMEN DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES A OTROS

Prima de Seguro Previsional	S/.	937.65
Comisión AFP	S/.	714.12
Sub-total Retenciones y Retribuciones	S/.	1,651.77
Intereses Moratorios	S/.	7.93
Total Retenciones y Retribuciones	S/.	1,659.70

Carlos Alberto Avila Morales
 C.I.P. N° 84745
 SUPERVISOR DE CELA

Forma de Pago Pagada vía AFPnet línea
 Fecha de Pago 23/02/2018
 Banco BCP

Nro	CUSPP	Nombre	Rel. Lab.	Inicio RL	Cese RL	Excep. de aporte	Remuneración asegurable	Aporte Obligatorio	Aportes Complementarios		Aportes Voluntarios		Prima de Seguro	Comisión AFP
									Trabajador	Empleador	Con fin Prev.	Sin fin Prev.		
1	647790PCAAEE9	CANAVAL ANGELATS, PALOMA ANDREA	S	N	N		1,844.00	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08	3.32
2	504091AESAO3	ECHARRI SOTO, ALBERTO EDUARDO	S	N	N		17,184.00	1,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	126.77	274.94
3	597741CELEC4	ESPEJO LLACAS, CARLOS ALBERTO	S	N	N		4,189.69	418.97	0.00	0.00	0.00	0.00	56.98	7.54
4	572781JEA17	ESPICHAN AVILES, JORGE JULIO	S	N	N		6,740.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.66	107.84
5	640410TJOKM2	JACKSON OCAMPO, THALIA	S	N	N		1,548.60	154.86	0.00	0.00	0.00	0.00	21.06	2.79
6	637210KMHIN7	MEJIA HERNANDEZ, KAREN	S	N	N		2,500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	4.50
7	638320BPMAR0	PARAGUAY MARREROS, BERNARDINA	S	N	N		1,035.00	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.08	1.86
8	636391JPCLN9	PAULINI CISNEROS, JUAN JOSE	S	N	N		1,900.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.84	3.42
9	637030MPCCT0	PONCE CASTILLO, MARIA DEL CARMEN	S	N	N		2,970.83	297.08	0.00	0.00	0.00	0.00	40.40	47.53
10	637030MPCCT0	QUIROGA SERNAQUE, JHAIR DAVID	S	N	N		850.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.56	1.53
11	637030MPCCT0	RUIZ MORALES, MARVIN IVAN	S	N	N		2,500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	4.50
12	637030MPCCT0	SRINIDAD MENDOZA, JOSE LUIS	S	N	N		1,850.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.16	3.33
13	637030MPCCT0	SEGOVIA ALCAZAR, LUIS EMILIO	S	N	N		1,585.00	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21.56	2.85

Leyenda:

- Rel. Lab (Existe Relación laboral con el afiliado): S = Si, N = No
- Inicio RL (Relación Laboral inició en el mes): S = Si, N = No
- Cese RL (Relación Laboral finalizó en el mes): S = Si, N = No


- Excep. de aportar (Motivo por el que excepcionalmente no corresponde hacer aportes obligatorios en el mes) Pueden ser:
 Vacio = Tiene obligación de aportar, L = Licencia sin goce de haber, U = Subsidio en sector público, J = Pensión por Jubilación,
 I = Pensión por Invalidez, P = Inicio de R.L. post cierre de planillas, O = Otros, V = Vacaciones, R = Retiro del 95.5%.


PLANILLA DE DECLARACIÓN Y PAGO DE APOORTE PREVISIONALES



Número de Planilla 2505859102 Período Devengue 2018-01

Nro	CUSPP	Nombre	Rel. Lab.	Inicio RL	Cese RL	Excep. de aportar	Remuneración asegurable	Aporte Obligatorio	Aportes Complementarios		Aportes Voluntarios			Prima de Seguro	Comisión AFP
									Trabajador	Empleador	Con fin Prev.	Sin fin Prev.	Empleador		
14	644191DRAGA2	RENGIFO ALIAGA, DIEGO ALEJANDRO	S	N	N		2,300.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.28	4.14
15	648840IPRTI2	PINTADO RAMIREZ, INGRID ARLETTY	S	N	N		1,450.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.72	2.61
16	604291RMAAA1	MEZA ARMAS, ROGER MARCOS	S	N	N		3,800.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.68	60.80
17	609221CMGRN3	MANRIQUE GRANADOS, CHRISTOPHER	S	N	N		3,885.00	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.84	62.16
18	628560EGRMA3	GUZMAN ROJAS, ESTEFHANY LISSET	S	N	N		2,500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	4.50
19	553421JBGTD8	BELTRAN GORDILLO, JOHNNY FREDY	S	N	N		5,975.00	597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.26	95.60
20	637990AAA18	AGUIRRE ARRIETA, ANA JULIA DEL	S	N	N		3,300.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.88	5.94
21	629841YUAE8	URIETA ALFARO, YEINER ANDRES	S	N	N		3,700.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.32	6.66
22	603341RSCTR3	SUITO CARRASCO, RENZO GUSTAVO	S	S	N		3,200.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.52	5.76


 Luis Alberto Avila Moral
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE CENSA


 JOSEP JULIO
 ESPINOZA AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

Leyenda:
 - Rel. Lab (Existe Relación laboral con el afiliado): S = Si, N = No
 - Inicio RL (Relación Laboral inició en el mes): S = Si, N = No
 - Cese RL (Relación Laboral finalizó en el mes): S = Si, N = No



- Excep. de aportar (Motivo por el que excepcionalmente no corresponde hacer aportes obligatorios en el mes) Pueden ser:
 Vacío = Tiene obligación de aportar, L = Licencia sin goce de haber, U = Subsidio en sector público, J = Pensión por Jubilación,
 I = Pensión por invalidez, P = Inicio de R.L. post cierre de planillas, O = Otros, V = Vacaciones, R = Retiro del 95.5%.


00033



Comprobante de Pago en Línea en AFPnet

AFP: INTEGRA
Devengue: 01/2018
Número de Planilla: 2206472587
RUC/DNI: 20112182021
Razón Social/Nombre: P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.
Banco: BCP
Fecha de pago : 23/02/2018
Hora de pago: 12:11:19
Número de operación: 0000262
Monto Fondo de Pensiones (S/.): 14,987.86
Monto de Retenciones y Retribuciones (S/.): 3,255.42


 Luis Alberto Avila Morán
CIP. N° 84745
SUPERVISOR DE OBRAS


JORGE JULIO
ESPIHAN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR

Nombre ó Razón Social: P. S.V. CONSTRUCTORES S.A. RUC: 20112182021
 Dirección: AV. - DEL PINAR 180 Urbamización o Localidad: URB.-CHACARILLA DEL ESTANQUE OFICI 1104
 Distrito: SANTIAGO DE SURCO Provincia: LIMA Departamento: LIMA
 Representante Legal: PENA FUENTES MARIO DNI: 06109501 Elaborado por: PONCE CASTILLO, MARIA Area: RHHH
 Teléfono: 3721145
 Teléfono: 3721145

RESUMEN DE APORTES AL FONDO

Aporte Obligatorio	S/.	12,430.22
Aporte Complementario - Trabajador	S/.	1,243.02
Aporte Complementario - Empleador	S/.	1,243.02
Aporte Voluntario con fin previsional	S/.	0.00
Aporte Voluntario sin fin previsional	S/.	0.00
Aporte Voluntario del Empleador	S/.	0.00
Sub-Total Fondo de Pensiones	S/.	14,916.26
Intereses Moratorios	S/.	71.60
Total Fondo de Pensiones	S/.	14,987.86

RESUMEN DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES A OTROS

Prima de Seguro Previsional	S/.	1,690.50
Comisión AFP	S/.	1,549.37
Sub-total Retenciones y Retribuciones	S/.	3,239.87
Intereses Moratorios	S/.	15.55
Total Retenciones y Retribuciones,	S/.	3,255.42

Caris Alberto Abitia Morales
 CIP. No 84746
 SUPERVISOR DE O.C.A.

Forma de Pago Pagada vía AFPnet línea
 Fecha de Pago 23/02/2018
 Banco BCP

Nro	CUSPP	Nombre	Rel. Lab	Inicio RL	Cese RL	Excep de aporte	Remuneración asegurable	Aporte Obligatorio	Aportes Complementarios		Aportes Voluntarios		Prima de Seguro	Comisión AFP
									Trabajador	Empleador	Con fin Prev.	Sin fin Prev.		
1	593141JAMSAB	ACOSTA MEZA, JIMMY HERNAN	S	N	S		679.36	67.94	6.79	0.00	0.00	0.00	9.24	10.53
2	607421MAIA2	AURIS YNGA, MIGUEL ANGEL	S	N	N		3,044.27	304.43	30.44	0.00	0.00	0.00	41.40	27.40
3	561851FCJRA8	CARRANZA JARA, FELIPE AMADO	S	S	N		2,463.12	246.31	24.63	0.00	0.00	0.00	33.50	38.18
4	592101JCTAJ8	CASAS TRUJILLO, JESUS ELISBAN	S	N	S		4,495.81	449.58	44.96	0.00	0.00	0.00	61.14	69.69
5	561911PCMMA1	CHAMPI MAMANI, PEDRO	S	N	S		4,942.98	494.30	49.43	0.00	0.00	0.00	67.22	76.62
6	607171TCQVN8	CHAVEZ QUINONES, TITO WILER	S	N	N		3,400.95	340.10	34.01	0.00	0.00	0.00	46.25	30.61
7	552191WCQNR0	CHUNGA QUEREVALU, WILFREDO	S	S	N		250.81	25.08	2.51	0.00	0.00	0.00	3.41	2.26
8	536111JCSRN0	CORREA SERNAGUE, JORGE LUIS	S	S	N		2,821.71	282.17	28.22	0.00	0.00	0.00	38.38	43.74
9	5000011MCRS23	CRISOLOGO RUIZ, MARTIN INXIDOR	S	N	N		3,853.02	385.30	38.53	0.00	0.00	0.00	52.40	34.68
10	5000011PPFRU2	FIGUEROA RODRIGUEZ, PEPE JAVIER	S	N	N		4,102.14	410.21	41.02	0.00	0.00	0.00	55.79	63.58
11	5000011PPFRU9	FLORES TOCTO, RICARDO	S	N	N		3,437.37	343.74	34.37	0.00	0.00	0.00	46.75	53.28
12	566371ASMR08	GUERRERO MOSQUITO, ARTURO	S	N	N		3,859.64	385.96	38.60	0.00	0.00	0.00	52.49	59.82
13	5000011PHEQ16	HARO ESPINOZA, PALU JAVEL	S	S	N		1,743.95	174.40	17.44	0.00	0.00	0.00	23.72	15.70

Legenda:

- Rel. Lab (Existe Relación laboral con el afiliado): S = Si, N = No
- Inicio RL (Relación Laboral inició en el mes): S = Si, N = No
- Cese RL (Relación Laboral finalizó en el mes): S = Si, N = No

- Excep. de aportar (Motivo por el que excepcionalmente no corresponde hacer aportes obligatorios en el mes) Pueden ser:
 Vacio = Tiene obligación de aportar, L = Licencia sin goce de haber, U = Subsido en sector público, J = Pensión por Jubilación,
 I = Pensión por Invalidez, P = Inicio de R.L. post cierre de planillas, O = Otros, V = Vacaciones, R = Retiro del 95.5%.

Nro	CUSPP	Nombre	Rel. Lab.	Inicio RL	Cese RL	Excep. de aporte	Remuneración asegurable	Aporte Obligatorio	Aportes Complementarios		Aportes Voluntarios			Prima de Seguro	Comisión AFP
									Trabajador	Empleado	Con fin Prev.	Sin fin Prev.	Empleado		
14	604101MHMNT4	HUANCA MOTTA, MANUEL LEONARDO	S	N	N		3,204.39	320.44	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	43.58	28.84
15	587591RICNV8	IMAN CHAVEZ, REYES	S	S	N		363.79	36.38	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	4.95	3.27
16	605031JMAUJ0	MANUYAMA AGUITUARI, JUAN JOEL	S	N	N		3,637.84	363.78	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	49.47	32.74
17	223781YPRMA8	PALMA ROSAS, YZAQUEL	S	N	N		316.62	31.66	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	4.31	4.91
18	549251VPMCA7	PANCCA MAMANI, VICTORIANO	S	N	N		2,487.75	248.78	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	33.83	22.39
19	629481JPATL3	PANTA AYALA, JOSÉ JESUS	S	N	N		2,649.35	264.94	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	36.03	41.06
20	548531LPHEN7	PEREZ HERNANDEZ, LEONARDO	S	N	N		3,571.74	357.17	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	48.58	55.96
21	606561TPGER8	PINEDO GUERRA, TITO EDINSON	S	N	S		2,582.84	258.28	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	35.13	40.03
22	273291JRCAR8	ROJAS GOTRINA, JULIO CESAR	S	N	N		4,195.37	419.54	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	57.06	37.76
23	617851BSRAI4	SALAS RAMIREZ, BAUTÍ JESUS	S	N	N		270.02	27.00	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	3.67	4.19
24	594651MVRDA3	VALDIVIA ROJAS, MENELAO TOBIT	S	N	N		3,779.43	377.94	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	51.40	58.58
25	257621CVFAJ9	VELA FEJOO, CESAR AUGUSTO	S	N	N		175.53	17.55	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	2.39	2.72
26	509731FRZZ4	RUIZ RUIZ, FRANCISCO	S	N	N		3,126.65	312.67	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	42.52	48.46
27	584891ERNAA8	RUA NAJARRO, EUCEVIO	S	N	S		3,028.81	302.88	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	41.19	27.26
28	569751EQTSP6	QUISPE TURPO, EDGAR	S	S	S		2,650.92	265.09	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	36.05	23.86
29	599581GPGEC6	PRIETO GARCIA, GINO TOMAS	S	N	N		3,750.84	375.08	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	51.01	33.76
30	589871COZEI2	OVIEDO ZUNI, CRISTIAN IVAN	S	N	N		2,609.11	260.91	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	35.48	23.48
31	540971RNSEN4	NUNEZ SERNAQUE, RIGOBERTO	S	N	N		3,047.68	304.77	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	41.45	47.24
32	232551ENCAT4	NORABUENA CASTRO, EUFEMIO	S	N	N		3,725.78	372.58	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	50.67	57.75
33	2271HMTCLU0	MERCADO TAQUILA, HENRY FELIX	S	N	N		2,596.29	259.63	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	35.31	23.37
34	581831CMADA0	MENDEZ ALVAREZ, EUTEMIO CLAUDIO	S	N	N		4,770.33	477.03	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	64.88	73.94
35	529291LGAMU7	GUZMAN ARAUJO, LUIS BELTRAN	S	N	N		3,201.38	320.14	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	43.54	49.62
36	250601FGHRC7	GUERRERO HUACHO, FRANCISCO	S	S	N		1,544.88	154.49	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	21.01	23.95
37	552061EGGEP6	GOMEZ GASPAR, EFRAIN	S	N	N		4,712.81	471.28	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	64.09	42.42
38	549741BCVZC9	CRUZ VILCA, BERNARDINO	S	S	N		1,400.79	140.08	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	19.05	21.71
39	2001441WCCRR3	CHURA CORRALES, WINDER YOEL	S	N	N		3,119.33	311.93	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	42.42	28.07
40	2001441WCCRR3	CHACCA CASTILLO, RAUL	S	N	N		426.60	42.66	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	5.80	3.84
41	25811UBTIR9	BONILLA TORRES, ULISES ANTONIO	S	S	S		350.93	35.09	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	4.77	3.16
42	225021PBNAR8	BOCA MEJIA, FERNANDO ANTONINO	S	N	S		3,130.20	313.02	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	42.57	48.52
43	2001441WCCRR3	BENITES VERA, RONAL DANIEL	S	N	N		2,323.38	232.34	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	31.60	20.91
44	57761LALSE8	ARISMENDIZ LOPEZ, LAZARO JAVIER	S	N	N		2,156.44	215.64	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	29.33	38.42

Leyenda:

- Rel. Lab (Existe Relación laboral con el afiliado): S = Si, N = No
- Inicio RL (Relación Laboral inició en el mes): S = Si, N = No
- Cese RL (Relación Laboral finalizó en el mes): S = Si, N = No

- Excep. de aportar (Motivo por el que excepcionalmente no corresponde hacer aportes obligatorios en el mes) Pueden ser:
 Vacio = Tiene obligación de aportar, L = Licencia sin goce de haber, U = Subsidio en sector público, J = Pensión por Jubilación,
 I = Pensión por Invalidez, P = Inicio de R.L. post cierre de planillas, O = Otros, V = Vacaciones, R = Retiro del 95.5%.

Número de Planilla 2206472587 Período Devengue 2018-01

Nro	CUSPP	Nombre	Rel. Lab.	Inicio RL	Cese RL	Discap. Aportada	Remuneración asegurable	Aporte Obligatorio		Aportes Complementarios		Aportes Voluntarios			Prima de Seguro	Comisión AFP
								Trabajador	Empleador	Trabajador	Empleador	Con fin Prev.	Sin fin Prev.	Empleador		
45	612931AAQA5	ACHO AHUANARI, ANDERSON	S	N	N		3,983.59	398.36	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	54.18	35.85	
46	575061PZCOV0	ZAMORA CHAVEZ, PEDRO LUIS	S	N	N		2,091.34	209.13	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	28.44	18.82	
47	238721GTMAE0	TOMAS MELENDEZ, GIOVANI	S	N	N		224.44	22.44	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	3.05	2.02	




Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR

JORGE JULIO
ESPINOZA AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

Leyenda:
 - Rel. Lab (Existe Relación laboral con el afiliado): S = Si, N = No
 - Inicio RL (Relación Laboral inició en el mes): S = Si, N = No
 - Cese RL (Relación Laboral finalizó en el mes): S = Si, N = No

- Excep. de aportar (Motivo por el que excepcionalmente no corresponde hacer aportes obligatorios en el mes) Pueden ser:
 Vació = Tiene obligación de aportar. L = Licencia sin goce de haber, U = Subsidio en sector público, J = Pensión por Jubilación,
 I = Pensión por Invalidez, P = Inicio de R.L. post cierre de planillas, O = Otros, V = Vacaciones, R = Retiro del 95.5%.

**ANEXO N° 12:
COPIA CUADERNO DE OBRA**


 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84745
SUPERVISOR DE
JORGE JULIO
ESPINOSA AVILES
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 119009

CUADERNO DE OBRA



00028

090

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

ADICION

Asiento N° 174 - 01/02/2018 De PSV Constructores S.A.
Con fecha 31/01/2018 se le entrega a la Supervisión la Carta N° 058-2018/RIV-CMM en donde se manifiesta que debido al incidente ocurrido el día 30/01/2018 en obra y por la carencia de garantías otorgadas por el propietario de la obra FONDEPES, y a pesar de no ser este el primer acontecimiento vandálico ocurrido en contra de nuestra representada y/o de nuestros trabajadores durante la ejecución de la obra, se decide la paralización de la obra debido a la inseguridad y la falta de garantías con las que se cuentan dentro de las instalaciones de la obra, poniendo en riesgo la integridad física de todo el personal de obra.

[Handwritten signature]
Luis Alberto Avila Morales
ESPECIALISTA EN OBRAS
ING. CIVIL
R.O.C. N° 1009

05/02/2018

Asiento N° 175 De PSV Constructores S.A.
El día de hoy en la oficina de Fondapes en Lima, se tuvo una reunión con el Ing. Luis Barbieri Guano - Director General DIGENIPAA y el Sr. Pedro Medina y por parte de PSV el Ing. Residente DPA Marcona Jorge Espedrán Avilés y la Abogada Milagros Ríos de Ariza Legal; en donde se hizo entrega en forma física las denuncias policiales sobre los incidentes ocurrido en el DPA Marcona. El Ing. Barbieri indicó que estas denuncias lo presentaría al Ministerio del Interior de manera que actúen rápido ante todo lo acontecido.

[Handwritten signature]
Luis Alberto Avila Morales
ESPECIALISTA EN OBRAS

[Handwritten signature]
Luis Alberto Avila Morales
ESPECIALISTA EN OBRAS

[Handwritten signature]
Jorge Espedrán Avilés
INGENIERO CIVIL

CUADERNO DE OBRA

BM 00027
N° 091
NOTARIA
BENVENUTO

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

DACER

08/02/2018

Asiento N° 176

De PSV Constructores S.A.
Nuestra Gerencia General hace entrega a FONDEPES

la carta N° 059-2018/PSV-FONDEPES en donde se
hace mención de los incidentes ocurridos en el DPA
- Marcona y los perjuicios que esta ocasionando
al proyecto.

Habiendo transcurrido 10 días de haberse paralizado
la obra y a pesar de que PSV continúa con las denuncias
y procesos legales correspondientes no se tiene
ninguna respuesta o solución que denote la seguridad
suficiente para la reanudación de las actividades
de la obra, se hace de conocimiento a la Supervisión
de obra en su condición de representante del Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES en el DPA
Marcona.

JORGE JULIO
ESPICIMAN AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

13/02/2018

Asiento N° 177

De PSV Constructores S.A.
Habiendo transcurrido 15 días de haber paralizado
la obra, no se tiene ni una respuesta por parte de
la entidad de manera formal, esta paralización
nos esta ocasionando Mayores Gastos Generales como
son gastos de estudios, alimentación, etc. del personal
indirecto establecido en Marcona y tal como...

ING. INSPECTOR

JORGE JULIO
ESPICIMAN AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

Luis Alberto Avila Morales
ING. SUPERVISOR

JORGE JULIO
ESPICIMAN AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

CUADERNO DE OBRA



00026

092

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____


PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

DAOBEM

Señala la norma de contrataciones con el Estado.



JORGE JULIO
ESPICHÁN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

18/02/2018

Asiento N° 178

De PSV Constructores S.A.

Hasta la fecha se tiene 20 días calendario de obra paralizada y no tenemos ninguna respuesta formal por parte del Cliente FANDEPES, no existe ninguna acción certera para la reanudación de las labores de obra, como son la existencia de las garantías para salvaguardar la integridad personal de todos los Trabajadores de obra, así como de las instalaciones de la obra; inclusive se le han visto a los períodos anteriores de los actos vandálicos ocurrido días anteriores, merodeando por la obra, y en varias ocasiones han estado observando desde el cerco perimetral hacia el interior de la obra, y en otras ocasiones más frente a la obra y frente al lugar de residencia en Maicora del personal staff en actitud vigilante.


JORGE JULIO
ESPICHÁN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009


ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84745

ING. SUPERVISOR


JORGE JULIO
ESPICHÁN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

CUADERNO DE OBRA

00025
BM
NOTARIA
BENVENUTO
093

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

DAGER

24/02/2018

Asiento N° 179 De PSV Constructores S.A.
Asiento: Incidente ocurrido en obra con Sindicalista.
Siendo aproximadamente a las 11:30 horas, cuando
el Sr. Juan Vega S. (Empleado de PSV) salía del DPA
Marcona, fue interceptado por el Sr. Alex Pando
Valdivia (Secretario General del Sindicato de Hombres y Mujeres del Muelle)
y tres sujetos más y con actitud altanera y
amenazadora le increparon el motivo por el cual
existían personal en obra, estando la obra paralizada y
por tal motivo nadie debería estar libreando; este señor
que había denunciado como posible autor de los actos
vandalicos ocurridos en el DPA Marcona, se estaba
atribuyendo que no le corresponde y continúa amenazando
a nuestro personal que se encuentra en Marcona.

JOSÉ JULIO
ESPINOZA AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

27/02/2018

Asiento N° 180 De PSV Constructores S.A.
El coordinador de Obra de Fondaper Ing. Ricardo
ALTUNA, nos informó vía telefonica, que un
contingente Policial salía de la Ciudad de Lima el
dia 26/02/2018 hacia Marcona; se están coordinando
con el General PNP Juan Carlos Jotil vía telefonica
para una reunión en Marcona, el dia 28/02/2018.

JOSÉ JULIO
ESPINOZA AVILES
INGENIERO CIVIL
ING. PRESIDENTE

JOSÉ JULIO
ESPINOZA AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009
Luis Alberto Anila Morales
CIP N° 34746
SUPERVISOR DE OBRA
ING. SUPERVISOR

ING. INSPECTOR

CUADERNO DE OBRA

00024



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

28/02/2018

Asiento N° 181

De PSV Constructores S.A.

Habiendo transcurrido 30 días de haberse paralizado la obra, debido a los actos delincuenciales y de continua amenaza, amedrentamiento e incluso lesiones personales de la cual los colaboradores de nuestra representada han sido víctimas, no existiendo fecha prevista de conclusión, afectando de manera total el cronograma de obra, siendo esta una causal de ampliación de plazo y por consecuencia un reconocimiento por mayores gastos generales por parte de la entidad.

Esta paralización también nos ocasiona otros gastos por daños y perjuicios, debido a materiales consumibles en obra que con el tiempo se están echando a perder como son cementos, aditivos, etc. o requirieron un tratamiento especial para su recuperación: acero y se cuenta con encastrado metálico en alquiler y no se está dando uso, sin embargo el costo de alquiler sigue transcurriendo, stand by de equipos propios, etc.

El día que se tenga que reanudar la obra, se deberá realizar gastos adicionales en la contratación de personal obrero nuevo, que tenga que cumplir con todos los protocolos de ingreso: exámenes médicos, inducciones, uniforme, EPP, pasajes, etc.).

Resalta necesario la respuesta y posición por parte del cliente a efectos de evitar resoluciones del contrato por causas no atribuibles al contratista y las consecuencias de lo mismo.

ING. INSPECTOR

JORGE JULIO
ESPIGA EN AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119008
ING. RESIDENTE



ING. SUPERVISOR

ALFONSO ALBERTO AMILLO MORA
INGENIERO CIVIL
C.I.F. N° 34746
SUPERVISOR

JORGE JULIO
ESPIGA EN AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119008

**ANEXO N° 13:
CONTRATO**




Luis Alberto Acosta
CIP. N° 84773
SUPERVISOR DE



JORGE JULIO
ESPINOSA AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

**CONTRATO N° 028-2017-FONDEPES
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA,
DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA"**

Conste por el presente documento, la contratación de la EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA", derivada de la Licitación Pública N° 002-2017-FONDEPES, que celebran de una parte:

- **EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES**, con RUC. N° 20137921601, con domicilio legal en Av. Petit Thouars N° 115, Cercado de Lima, Lima, debidamente representado por el Jefe de la Oficina General de Administración, el señor **JAVIER EDUARDO CHANG SERRANO**, identificado con DNI. N° 07209780; designado mediante Resolución Jefatural N° 044-2017-FONDEPES/J y con las facultades conferidas en materia de contrataciones mediante Resolución Jefatural N° 069-2017-FONDEPES/J de fecha 17 de noviembre de 2016, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y de la otra parte;

- La empresa **P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.**, con RUC N° 20112182021, con domicilio legal en Av. El Pinar N° 180 interior 104 Urbanización Chacarilla del Estanque en el Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, inscrita en la Partida N° 00378496, del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, debidamente representado por su Gerente General, el señor **MARIO PEÑA FUENTES** identificado con DNI. N° 06109501, según Poder Inscrito en el Asiento N° B00003 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**.



LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA a quienes en forma conjunta se les denominará **LAS PARTES**, acuerdan en los términos y condiciones siguientes:


CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES


Con fecha 25 de agosto de 2017, el Comité de Selección adjudicó la buena pro de la Licitación Pública N° 002-2017 Primera Convocatoria para la EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA", a la empresa **P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente documento tiene por objeto la contratación de la EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA", bajo el Sistema de Precios Unitarios.




Luis Alberto Avila M...
UCIP. N° 84745
SUPERVISOR DE


Página 1 de 2
JUAN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 119009



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/. 8'871,166.29 (Ocho millones ochocientos setenta y un mil ciento sesenta y seis con 29/100 Soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en Soles, en periodos de valorización mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, **LA ENTIDAD** o **EL CONTRATISTA**, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**, **EL CONTRATISTA** tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria es de **doscientos cuarenta (240) días calendario**, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las bases.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para **LAS PARTES**.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía **EL CONTRATISTA** entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De Fiel Cumplimiento del Contrato: Por el monto de **S/. 887,116.63 (Ochocientos ochenta y siete mil ciento dieciséis con 63/100 Soles)**, a través de la Carta Fianza N° 1842201 emitida por **LA POSITIVA SEGUROS**, monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA**

PSV CONST... S.A.
MARIO PIENA FUENTES
GERENTE GENERAL



[Handwritten signature]



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84743
SUPERVISOR DE OBRAS

Página 2 de 2
JULIO ESPINOSA AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009





PERU

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

00020

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un (1) adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes al inicio de la ejecución de la obra¹, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantados mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelanto para materiales o insumos hasta por el 20% del monto del contrato original conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantados se realizará en un plazo de diez (10) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantados mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA


EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Por la naturaleza de la intervención no existen riesgos previsibles que pueda ocurrir durante la ejecución de las obras.

¹ El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico debe indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra debe indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

CONSTRUCTORES S.A.
MARICENIA FLORES
GERENTE GENERAL



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84745
SUPERVISOR DE OBRAS

Página 3 de 7
JOSÉ JULIO ESTEBAN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de **EL CONTRATISTA** es de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =	0.10 x Monto
	F x Plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: OTRAS PENALIDADES


LA ENTIDAD, conforme al artículo 134° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará a **EL CONTRATISTA** las siguientes penalidades:

PENALIDADES			
N°	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por FONDEPES.	Uno por cinco mil (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor
2	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad.	Uno por cinco mil, (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor
3	RESIDENTE DE OBRA Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra.	Uno por cinco mil (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor

DIRECTOR GENERAL
 MARIO PENAFUENTES
 PRESIDENTE GENERAL



[Handwritten signature]



Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE...

Página 4 de 4
 JULIO
 AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009



PERU

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

00018

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

4	CUADERNO DE OBRA Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, o cuando el cuaderno de obra no está in situ o no está al día.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor
5	PERDIDA DEL CUADERNO DE OBRA Si el contratista o su personal, pierde el cuaderno de obra.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor
6	EQUIPO MINIMO Cuando el contratista emplea equipos o maquinarias en obra no autorizadas previamente por el supervisor o cuando los equipos y maquinarias no cumplen con lo mínimo requerido en los presentes Términos de Referencia o cuando no presenta los equipos declarados en su propuesta técnica.	Dos por mil (2/1000) del monto del sub ítem por cada equipo que no cumpla con lo exigido en los TRD.	Según informe del Supervisor
7	MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRA No cuenta con los materiales necesarios en obra de acuerdo a su Calendario de Adquisición de Materiales.	Dos por mil (2/1000) del Monto del Contrato por ocurrencia	Según informe del Supervisor
8	POLIZA CONTRA TODO RIESGO - CAR Por cada día de atraso de no presentar la póliza.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor
9	PERSONAL PROPUESTO En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	1 UIT	Según informe del Supervisor.

CONSTRUCIONES S.A.
MARIO PENAFORTES
GERENTE GENERAL



Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 136 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Quando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de LAS PARTES, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Handwritten signature and stamp of the General Administration of FONDEPES.

P. APARICIO

Luis Alberto Avila Morán
CIP. N° 84745
SUPERVISOR DE OBRAS

Página 4 de 4
ESPIRITAN AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de LAS PARTES del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

De acuerdo a lo establecido en el artículo 45° de la Ley, las controversias que surjan entre LAS PARTES sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de LAS PARTES. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

LAS PARTES acuerdan que todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante arbitraje institucional bajo la organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo a su Reglamento.

Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es menor o igual a 30 (treinta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de su presentación, el Tribunal Arbitral estará compuesto por árbitro único.

Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es mayor a 30 (treinta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de su presentación, el Tribunal Arbitral estará compuesto por tres árbitros.

PSV CONSTRUCTORES S.A.
MARIO PENAFUENTES
GERENTE GENERAL



J. CHANG



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84740
SUPERVISOR DE OBRAS

JORGE JULIO
Página 6 de 7
JUAN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Rég. CIP N° 119009



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es indeterminable, el Tribunal Arbitral estará compuesto por tres árbitros.

LAS PARTES acuerdan que las actuaciones arbitrales se realizaran en los plazos establecidos, sin que el Tribunal Arbitral tenga facultad alguna para ampliarlos o modificarlos, no siendo posible que el Tribunal Arbitral haga uso de la facultad contenida en el numeral 4 del artículo 34 del Decreto Legislativo N° 1071.

El Laudo Arbitral emitido obligará a LAS PARTES y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutará como una sentencia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de LAS PARTES puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

LAS PARTES declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

- **DOMICILIO DE LA ENTIDAD:** Av. Petit Thouars N° 115, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.
- **DOMICILIO DEL CONTRATISTA:** Av. El Pinar N° 180 interior 104 Urbanización Chacarilla del Estanque en el Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima.

Correo electrónico: obras@psv.com.pe y mariopena@psv.com.pe

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de LAS PARTES debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, LAS PARTES lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los 15 días del mes de setiembre de 2017.

FONDEPES

LA ENTIDAD

PSV CONSTRUCTORES S.A.

MARIO PEÑA FUENTES
GERENTE GENERAL


"EL CONTRATISTA"

Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE CSRA

Página 7 de 7
JULIO
AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009






F. PANTA



D. SPARKO

**ANEXO N° 14:
MAYORES GASTOS
GENERALES**


 **Luis Alberto Avila Morales**
CIP. N° 84748
SUPERVISOR DE OBRAS


JORGE JULIO ESTEBAN AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009




MAYORES GASTOS GENERALES


Febrero 2018

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.
CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
FECHA: 28 de Febrero del 2018


I.- MONTO PRESUPUESTO CONTRACTUAL SIN IGV :		S/. 7,517,937.53
II.- GASTOS GENERALES	12.30%	S/. 781,662.14
III.- PLAZO DE OBRA CONTRACTUAL		240.00 Días
III.- CÁLCULO DEL COSTO DIARIO POR GASTOS GENERALES		S/. 3,256.93
IV.- CÁLCULO DEL COSTO POR GASTOS GENERALES POR 30 DÍAS Del 30/01/2018 al 28/02/2018 son 30 días calendarios		S/. 97,707.77
SUB TOTAL		97,707.77
IGV 18 %:		17,587.40
TOTAL (Incl. IGV):		S/. <u>115,295.17</u>


Son: Ciento quince mil doscientos noventa y cinco con 17/100 Soles incluido IGV.

 **Luis Alberto Avilés Morales**
 CIP. N° 84740
 SUPERVISOR DE OBRAS


 Juan Avilés
 ESP. JUAN AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

**ANEXO N° 15:
COSTOS POR DAÑOS Y
PERJUICIOS**

 **Luis Alberto Avila Morales**
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS


**JORGE JULIO
ESPINOZA AVILÉS**
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



COSTOS POR DAÑOS Y PERJUICIOS

Febrero 2018

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.

UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.

CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.

FECHA: 28 de Febrero del 2018

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Parcial
01	Perdida de Cemento Tipo V	Bls.	677.00	16.95	11,475.15
02	Transporte para eliminación de cemento	Viaje	1.00	3,400.00	3,400.00
03	Aditivo removedor de oxido para limpieza de armadura	Gln.	110.00	40.56	4,462.00
04	Mano de Obra para limpieza de armadura habilitada y colocada	HH	432.00	17.07	7,374.24
05	Mano de Obra para reemplazo de alambre N° 16 de armadura habilitada y colocada	HH	288.00	17.07	4,916.16
06	Alquiler de encofrado metálico	Mes	1.00	8,879.80	8,879.80
07	Stand By de equipos propios:	Mes			44,266.20
07.01	Grúa de Celosía Fuchs F118.3 20 Ton.	Mes	1.00	32,640.00	32,640.00
07.02	Camioneta Pick UP	Mes	Considerado en GG		
07.03	Equipo Menores	Mes	1.00	11,626.20	11,626.20

SUB TOTAL

S/. 84,773.55


IGV 18 %:


S/. 15,259.24

TOTAL (Incl. IGV):

S/. 100,032.79

Son: Cien mil treinta y dos con 79/100 Soles incluido IGV.


Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS


JORGE JULIO
ESPINOZA AVILÉS
INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009



COSTOS POR DAÑOS Y PERJUICIOS

Febrero 2018

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.

UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.

CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.


FECHA: 28 de Febrero del 2018

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio HH	Cantidad Todo Proyecto	Cantidad por mes	Parcial
07.04	Trompo mezcladora de concreto	Unid.	2.00	25.00	1,510.08	188.76	4,719.00
07.05	Vibradores de concreto	Unid.	2.00	15.00	1,015.09	126.89	1,903.29
07.06	Vibro Apisonador	Unid.	1.00	10.00		0.00	0.00
07.07	Plancha Compactadora	Unid.	1.00	10.00	570.90	71.36	713.63
07.08	Andamios	Cuerpo	8.00	2.50	4,015.34	501.92	1,254.79
07.09	Inversora Miller	Unid.	1.00	15.00	54.40	6.80	102.00
07.10	Equipo de oxicorte	Unid.	2.00	10.00	440.20	55.03	550.25
07.11	Generador Electrico Panther 170F	Unid.	1.00	35.00	27.20	3.40	119.00
07.12	Nivel Topografico	Unid.	1.00	Considerado en los GG			
07.13	Mesa Sierra Circular	Unid.	1.00	15.00		48.00	720.00
07.14	Sierra circular manual	Unid.	1.00	6.00	102.88	12.86	77.16
07.15	Tronzadora	Unid.	1.00	10.00		96.00	960.00
07.16	Amoladoras	Unid.	1.00	10.00	283.66	35.46	354.58
07.17	Taladro	Unid.	1.00	10.00	122.00	15.25	152.50

SUB TOTAL POR MES


S/. 11,626.20


 Luis Alberto Avilés
 CIP. No. 119009
 SUPERVISOR


 JORGE JULIO
 ESTAYMAN AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP No 119009

**ANEXO N° 16:
COSTOS DE REANUDACIÓN**


 **Luis Alberto Avila Morales**
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS


**JORGE JULIO
LLANTHAN AVILÉS**
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 119009



COSTOS DE REANUDACIÓN

Febrero 2018

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.
CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
FECHA: 28 de Febrero del 2018

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Parcial
Examen Medico Pre-ocupacional para el personal	Und.	40.00	145.42	5,816.80
Pasaje Marcona - Lima (por paralización de obra) Personal Mano de obra calificada	Und.	20.00	59.32	1,186.44
Pasaje Marcona - Lima (por paralización de obra) personal Staff	Und.	9.00	59.32	533.90
Pasaje Lima - Marcona (reanudación de obra) Personal Mano de obra calificada	Und.	20.00	59.32	1,186.44
Pasaje Lima - Marcona - Lima (reanudación de obra) personal Staff	Und.	9.00	59.32	533.90
EPP (Uniforme, bota, casco, guantes, etc. Dos juego por persona)	Juego	80.00	148.42	11,873.60
Inducción de ingreso de personal (40 trabajadorres x 4 horas c/u)	HH	160.00	17.07	2,731.20

SUB TOTAL	SI. 23,862.28
IGV 18 %:	SI. 4,295.21
TOTAL (Incl. IGV):	SI. 28,157.49

Son: Ventiocho mil ciento cincuenta y siete con 49/100 Soles incluido IGV.



Luis Alberto Avila Morán
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS


JUAN AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

**ANEXO N° 17:
DENUNCIAS POLICIALES**



[Handwritten Signature]
Luis Alberto
CIP. N° 8424
SUPERVISOR DE

[Handwritten Signature]
ROBERTO JULIO
ESPINOZA AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

**POLICIA NACIONAL DEL PERU
REGPOL - ICA**

**COMISARIA PNP
S. J. DE MARCONA**

Nro de Orden : **000007** Clave : **000007**

COPIA CERTIFICADA GRATUITA - D.L 1246

**EL SR ALFZ. PNP COMISARIO DE LA SSUU DE : S. J. DE MARCONA
QUE SUSCRIBE , CERTIFICA**

QUE EN EL SISTEMA INFORMATICO DE DENUNCIAS POLICIALES, EXISTE UNA CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE :

Tipo	DENUNCIA	Fecha y Hora Registro	02/02/2018 16:41:11 Hrs.
Formalidad	VERBAL	Fecha y Hora Hecho	02/02/2018 16:00:00 Hrs.
Condición de la Denuncia	REINFORMA DENUNCIA DIRECTA DELITO NRO 000007		



Código QR

IDENTIFICACION

- FUERO COMUN/FALTAS/FALTAS CONTRA LAS PERSONAS/LESION DOLOSA

LUGAR DEL HECHO

ICA / NAZCA / MARCONA / OTROS ZONA SAN PEDRO - MARCONA MZ :

DENUNCIANTE

- 1) WALTER RAUL INCA HUAYLLANI(38), CON FECHA DE NACIMIENTO 02/02/1980 , ESTADO CIVIL : SOLTERO(A), CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI NRO : 42752709, DIRECCION : ICA / NAZCA / MARCONA : AA.HH. SAN JUAN BAUTISTA MZ. Q LT. 12

DENUNCIADO


- 1) ALEX ELIAS RONDON VALDIVIA(34), CON FECHA DE NACIMIENTO 18/10/1983 , ESTADO CIVIL : SOLTERO(A), CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI NRO : 42471410, DIRECCION : ICA / NAZCA / MARCONA : ZONA SAN PEDRO 29


CONTENIDO

- EN LA CIUDAD DE MARCONA SIENDO LAS 16:25 HRS DEL DIA 02FEB2018, SE PRESENTO A ESTA DEPENDENCIA POLICIAL LA PERSONA DE WALTER RAUL INCA HUAYLLANI (38), NATURAL DE AYACUCHO, ESTADO CIVIL CONVIVIENTE, OCUPACION OBRERO, IDENTIFICADO CON DNI NRO. 42752709, DOMICILIADO EN AA.HH. SAN JUAN BAUTISTA MZ. Q LT. 12 N MARCONA, EL MISMO QUE DENUNCIA HABER SIDO VICTIMA DE AGRESION FISICA EL DIA DE LA FECHA A HORAS 16:00 APROX., POR PARTE DE LA PERSONA DE ALEX RONDON VALDIVIA Y UN SUJETO DE TEZ MORENA, ESTATURA REGULAR, CONTEXTURA MEDIA, DE UNOS 30 AÑOS APROX., LOS MISMOS QUE LE PROPINARON GOLPES DE PUÑO POR DISTINTAS PARTES DEL CUERPO A RAIZ QUE EL DENUNCIANTE HORAS ANTES SE NEGÓ A COLABORAR CON UNA POLLADA QUE LE ESTABAN OFRECIENDO. ES TODO LO QUE DENUNCIA ANTE LA PNP PARA LOS FINES DEL CASO.

Fdo EL INSTRUCTOR .- Fdo EI DENUNCIANTE .- IMPRESION DIGITAL

Preparar Impresión


Los Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA


JUAN AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 R.M. CIP N° 119009

00006

El código QR impreso en la parte superior de esta denuncia, sirve para verificar el contenido de la misma contrastándola con la que se encuentra en la base de datos. Para visualizar dicho resultado, se debe utilizar la app para teléfonos móviles llamada SIDPOL QR disponible en Play Store.



[Handwritten signature]

OP. 354779
Walter Raúl Pórras Olortegui
ALFÉREZ - PNP



[Handwritten signature]

CIP. 80533130
ANTONIO ROMERO RAMOS
S/1 PNP



[Handwritten signature]

Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84745
SUPERVISOR DE OBRAS

[Handwritten signature]
JORGE JULIO
ESPILHAN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Marcona, 02 de Febrero del 2018.

OFICIO Nro. 045 -2018-VIII- MACREPOL-AYA-ICA/DIVPOL-NASCA-CSJM-SIDF.

Señor : Dra. Yaneth MEDINA VALDIVIA.
Jefe de la División Médico Legal Vista Alegre – Nasca.
Asunto : Reconocimiento Médico Legal de persona; por motivo que se indica.- **SOLICITA.**

Tengo el agrado de dirigirme a su usted, con la finalidad de solicitarle, tenga a bien disponer por quien corresponda, se practique el examen de Reconocimiento Médico Legal en la persona de Ralter Raul INCA HUAYLLANI (38) identificado con DNI Nro. 42752709 el mismo que manifiesta haber sido víctima de agresión física por parte de la persona de Alex RONDON VALDIVIA, hecho ocurrido el día de la fecha al promediar las 16:00 hrs aprox., en esta localidad, lo solicitado se requiere con carácter de URGENTE, a fin de proseguir con las diligencias de ley.

Aprovecho la oportunidad para renovar los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Dios guarde a usted.

WRPO/maaf.



[Signature]
OP 364779
Walter Raúl Porras Olortegui
ALFEREZ - PNP



[Signature]
Luis Alberto Aviles Aviles
CIP. N° 84445
SUPERVISOR DE...

Avenida Andrés Avelino Cáceres S/N distrito de Marcona, provincia de Nasca departamento de Ica.
Teléfono: 056526632

[Signature]
Luis Alberto Aviles Aviles
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 119009

POLICIA NACIONAL DEL PERU

REGPOL - ICA

Fecha Imp : 30/01/2018 20:59 Hrs


COMISARIA PNP

S. J. DE MARCONA

O.P Imp. : SOT1.PNP MOISES AGUSTIN VILCA MAYTA

Nro de Orden : 10933046 Clave : 8oXHLWfw 8oXHLWfw

ESTO NO ES COPIA CERTIFICADA

Tipo	DENUNCIA	Fecha y Hora Registro	30/01/2018 20:48:09 Hrs.	
Formalidad	VERBAL	Fecha y Hora Hecho	30/01/2018 08:45:00 Hrs.	
Condición de la Denuncia	[DEINPOL] DENUNCIA DIRECTA DELITO Nro : 28			
				Código QR

TIPIFICACION

- FUERO COMUN/SEGURIDAD PUBLICA (DELITO)/MEDIOS DE TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS/ATENTADO SOBRE LA SEGURIDAD COMUN

LUGAR DEL HECHO

ICA / NAZCA / MARCONA / OTROS ZONA SAN PEDRO - EMPRESA PSV
CONSTRUCTORES SA. MARCONA MZ :

DENUNCIANTE

- 1) JORGE JULIO ESPICHAN AVILES(43), CON FECHA DE NACIMIENTO 08/09/1974 , ESTADO CIVIL : CASADO (A), CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI NRO : 10323344, DIRECCION : LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO : AV. GUARDIA CIVIL 1035 BLOCK B DPTO. 504 URB. SANTA ROSA DE

TESTIGO

- 1) DARINKA LORENA CARMONA VALDIVIA(24), CON FECHA DE NACIMIENTO 05/11/1993 , ESTADO CIVIL : SOLTERO(A), CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI NRO : 71488025, DIRECCION : ICA / NAZCA / MARCONA : ZONA SAN PEDRO S/N

PRESUNTO IMPLICADO

- 1) FERNANDO JESUS SAAVEDRA GALLARDO(42), CON FECHA DE NACIMIENTO 07/05/1975 , ESTADO CIVIL : SOLTERO(A), CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI NRO : 19256377, DIRECCION : LA LIBERTAD / PACASMAYO / PACASMAYO : CALLE TACNA S/N

CONTENIDO


- EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MARCONA, SIENDO LAS 19:30 HORAS DEL DIA 30ENE2018, EN LA OFICINA DE INVESTIGACION DE DELITOS Y FALTAS DE LA COMISARIA PNP MARCONA, SE HIZO PRESENTE LA PERSONA DE JORGE ESPICHAN AVILES (43), LIMA, CASADO, INGENIERO CIVIL, SUPERIOR CON DNI. NRO. 10323344 CON DOMICILIO EN AV. LAS TURQUESAS S/N MARCONA, QUIEN EN SU CONDICION DE INGENIERO RESIDENTE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DENUNCIA EL PRESUNTO ATENTADO A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PSV CONSTRUCTORES S.A. Y SUS INSTALACIONES, QUE EL DIA DE HOY 30ENE2018 A HORAS 08:45 APROX, TOMO CONOCIMIENTO SOBRE LA PRESENCIA DE UNA GRANADA DE GUERRA EN EL AREA DE HABILITADO DE ACERO CORRUGADO DE LA PRECITADA OBRA, DESCONOCIENDO QUIEN SEA EL RESPONSABLE QUE HAYA DEJADO LA GRANADA DE GUERRA, SIN EMBARGO SEÑALA QUE A HORAS 18:50 APROX., DE MISMO DIA, UNA TRABAJADORA DE LA EMPRESA DE NOMBRE DARINKA CARMONA VALDIVIA, AL ESCUCHAR LA DETONACION EXPLOSIVA EN EL INTERIOR DEL LA OBRA SE LE ACERCO Y LE COMENTO QUE EL DIA DE AYER 29ENE2018, EL TRABAJADOR DE NOMBRE JESUS SAAVEDRA LE COMENTO QUE PARA EL DIA DE HOY IBA HABER UNA SORPRESA EN LA OBRA, DEDUCIENDO EL DEPONENTE QUE LA SORPRESA ERA LA GRANADA DE GUERRA, DE IGUAL FORMA INDICA QUE ESTE TRABAJADOR SERIA LA PERSONA DE JESUS SAAVEDRA GALLARDO, QUIEN ESTARIA IMPLICADO EN EL ATENTADO, QUIEN ES AGREMIADO DEL SINDICATO DE HOMBRE Y MUJERES DEL MUELLE SAN PEDRO LIDERADO POR EL DIRIGENTE ALEX RONDON VALDIVIA, QUIEN HA PARTICIPADO EN ACTOS VANDALICOS CON DAÑOS MATERIALES Y LESIONES A TRABAJADORES EN AGRAVIO DE LA EMPRESA PSV CONSTRUCTORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, LO QUE DENUNCIA ANTE LA PNP PARA LOS FINES DEL CASO.

EL INSTRUCTOR


Luis Alberto Adillo Morán
CIP. N° 84743
SUPERVISOR DE ...

DENUNCIANTE

JORGE JULIO
ESPICHAN AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



C.I.P : 30863206
VILCA MAYTA, MOISES AGUSTIN
SOT1.PNP



DNI 10323344
ESPICHAN AVILES JORGE JULIO

El código QR impreso en la parte superior de esta denuncia, sirve para verificar el contenido de la misma contrastándola con la que se encuentra en la base de datos. Para visualizar dicho resultado, se debe utilizar la app para teléfonos móviles llamada SIDPOL QR disponible en Play Store.




Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84745
SUPERVISOR DE OBRAS



JORGE JULIO
ESPICHAN AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

POLICIA NACIONAL DEL PERU REGPOL - ICA	COMISARIA PNP S. J. DE MARCONA
---	---

Nro de Orden :


Clave :

COPIA CERTIFICADA GRATUITA - D.L 1246

EL SR MAYOR PNP COMISARIO DE LA SSUU DE : S. J. DE MARCONA

QUE SUSCRIBE , CERTIFICA

QUE EN EL SISTEMA INFORMATICO DE DENUNCIAS POLICIALES, EXISTE UNA CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE :

Fecha y Hora Registro	30/01/2018 09:55:38 Hrs.	
Formalidad ESCRITA	Fecha y Hora Hecho 30/01/2018 08:45:00 Hrs.	
Condición de la Denuncia		

Código QR

TIPIFICACION

- INTERVENCION POLICIALES

LUGAR DEL HECHO

ICA / NAZCA / MARCONA / OTROS ZONA SAN PEDRO - MUELLE MZ :

SOLICITANTE

- 1) JORGE JULIO ESPICHAN AVILES(43), CON FECHA DE NACIMIENTO 08/09/1974 , ESTADO CIVIL : CASADO (A), CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI NRO : 10323344, DIRECCION : LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO : AV. GUARDIA CIVIL 1035 BLOCK B DPTO. 504 URB. SANTA ROSA DE

CONTENIDO



- EN LA CIUDAD DE MARCONA SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DIA 30/01/2018 , EL SUSCRITO ENCONTRANDOSE DE SERVICIO DE PATRUJE MOTORIZADO A BORDO DE LA MOVIL POLICIA KN-16337, FUIMOS COMUNICADOS POR PARTE DEL CLASE DE DIA DE ESTA CIA PNP, QUE EN EL INTERIOR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL MUELLE, A CARGO DE LA EMPRESA "PSV CONSTRUCCION", SE HABRIA ENCONTRADO AL PARECER UNA GRANADA DE GUERRA TIPO PIÑA DE COLOR NEGRO, DE DEBAJO DE UNOS FIERROS CORRUGADOS DE CONSTRUCCION QUE SE ENCUENTRAN EN EL LUGAR, POR LOS MEDIOS MAS RAPIDOS NOS CONSTITUIMOS AL LUAGAR DE LOS HECHOS DONDE NOS ENTREVISTAMOS CON EL RESIDENTE ENCARGADO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL MUELLE DE SAN JUAN DE MARCONA, INGENIERO JORGE JULIO ESPICHAN AVILES (43), CON DNI NRO. 10323344, EL MISMO QUE REFIERE QUE EN MOMENTOS QUE SE ENCONTRABAN TODO EL PERSONAL REALIZANDO SUS ACTIVIDADES, ES QUE SE DIERON CON LA SORPRESA DE DICHO ARTEFACTO EXPLOSIVO. EL SUSCRITO EN EFECTO LOGRA CONSTATAR DICHA GRANADA, QUE SE ENCONTRABA EN EL SUELO DE COSTADO DEBAJO DE UNOS FIERRO DE CONSTRUCCION , POR LO QUE DE INMEDIATO SE COMUNICO AL COMISARIO DE ESTA DEPENDENCIA POLICIAL , A FIN DE QUE DISPONGA QUE SE REALIZE LAS DILIGENCIAS PERTINENTES.


Fdo EL INSTRUCTOR .- Fdo EI DENUNCIANTE .- IMPRESION DIGITAL

INTERVINIENTE : SO.2DA. PNP ANTHONY ALEX AYBAR ALVAREZ

AUTENTIFICADOR 1 : SO2.PNP ANTHONY ALEX AYBAR ALVAREZ

AUTENTIFICADOR 2 : ALFZ. PNP PORRAS OLORTEGUI,WALTER RAUL



Luis Alberto Avila
 /CIP. N° 84745
 SUPERVISOR DE


JORGE JULIO ESPICHAN AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

