




"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



MEMORANDO N° 1309 - 2018-FONDEPES/DIGENIPAA

A : CPC. JAVIER EDUARDO CHANG SERRANO
Jefe de la Oficina General de Administración

Asunto : VALORIZACIÓN DE OBRA N°07 – ABRIL 2018
CONTRATO N 028-2017 – FONDEPES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA".

Referencia : a) CARTA N°046-2018-CMM
b) Informe N°066-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/jpo

Fecha : Lima, 16 de mayo de 2018

Tengo a bien dirigirme a su despacho, para saludarlo y manifestarle que, de acuerdo con lo indicado en la carta de la referencia a), el contratista **P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.** encargado de la Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA"**; ha solicitado la Valorización de Obra N°07 correspondiente al **CONTRATO N°028-2017-FONDEPES**.


Así mismo, conforme a lo solicitado y tal como se indica en el informe de la referencia b); se han cumplido con todos los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, el contrato, las bases integradas y demás documentos que forman parte integrante del expediente de contratación; por lo que esta dirección concluye que la ENTIDAD debe de otorgar la Valorización N°07 – abril 2018 solicitada.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración.

Atentamente:

FONDEPES

P. [Signature]
Ing. Luis Alberto Barbieri Quiño
Director General de Inspección
Pesquera Artesanal Y Acuicultura



LBQRAMG//jpo



CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por el presente documento, que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, al suscribir la presente; da su conformidad para realizar el pago por concepto de **Valorización de Obra N°07 – Abril 2018** por la suma de **S/ 255,826.02 (Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Veintiséis con 02/100 soles)**, a favor del Contratista **P.S.V. CONSTRUCTORES SA**, encargado de la Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA"**, según **CONTRATO N°028-2017-FONDEPES**.

Lima,



FONDEPES
P. Barbieri Quino
Ing. Luis Alberto Barbieri Quino
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal y Acuícola



INFORME N°066-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/jpo

10 MAY 2018
1656

A: **ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO**
Director General de la DIGENIPAA

Asunto: **VALORIZACION DE OBRA N°07 (ABRIL-2018)**
Obra: "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, Región Ica"
CONTRATO N° 028-2017-FONDEPES

Referencia: **CARTA N° 046-2018-CMM**

Fecha: **Lima, 15 de mayo de 2018**

Por medio de la presente, me dirijo a usted para saludarlo y manifestarle que, según la carta de la referencia, el **CONSORCIO MESONES MURO** encargado de la Supervisión de Obra; manifiesta que el contratista de ejecución **P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.** encargado de la Ejecución de la Obra: **"Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, Región Ica"**; ha presentado la **VALORIZACION DE OBRA N° 07**, correspondiente al mes de abril de 2018. Al respecto, debo manifestar lo siguiente:

INFORMACION GENERAL DE LA OBRA:

Obra	:	"Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, Región Ica"
Licitación	:	Licitación Pública N° 002-2017-FONDEPES.
Área Geográfica	:	2
Ubicación	:	Distrito de Marcona, Provincia de Nazca, Región Ica
Sistema de Contratación	:	Precios Unitarios
Monto referencial	:	S/. 8'871,166.29
Monto contratado	:	S/. 8'871,166.29 con IGV S/. 7'517,93.53 sin IGV
Monto vigente	:	S/. 8'871,166.29 con IGV
Adelanto directo	:	S/. 887,116.63 con IGV
Plazo de ejecución de la obra	:	240 días calendario
Nuevo plazo contractual vigente	:	308 días calendario
Contratista principal	:	P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.
Representante legal Contratista	:	Ing. Mario Peña Fuentes
Residente de obra	:	Ing. Jorge Julio Espichan Avilés
Representante legal de Supervisión	:	Ing. Juan Esteban Zapata Zuloeta
Supervisor de obra	:	Ing. Luis Alberto Ávila Morales
Contrato	:	CONTRATO N° 028-2017-FONDEPES
Entrega de Adelanto Directo	:	S/. 887,116.63 (Inc. IGV), Fecha: 27-set-2017
Entrega de Adelanto de Materiales	:	S/. 1'714,233.30 (Inc. IGV), Fecha: 03-nov-2017
Fecha de Contrato	:	15-set-2017
Entrega de Terreno	:	29-set-2017
Inicio Contractual de Obra	:	30-set-2017
Inicio real de Obra	:	30-set-2017



[Handwritten signature]



Ampliación de plazo N° 01	: 06 días calendario
Ampliación de plazo N° 02	: 62 días calendario (Denegada)
Suspensión de plazo	: 62 días calendario
Fin contractual de obra	: 27-may-2018
Fecha Término Contrato Vigente	: 03-ago-2018

II. ANTECEDENTES:

2.1 Con fecha 15 de setiembre del 2017, se firma el **CONTRATO N° 028-2017-FONDEPES** con la empresa **P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.** para la Ejecución de la Obra: **“Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, Región Ica”**, bajo el sistema de Precios Unitarios; por un monto total de **S/ 8'871,166.29 (Ocho Millones Ochocientos Setenta y Un Mil Ciento Sesenta y Seis con 29/100 Soles)** y un plazo total de **240 (Doscientos Cuarenta) días calendario**.

2.2 Con Referencia a Ampliaciones de Plazo y Vencimiento de Contrato Vigente:

- Se consiente la ampliación de plazo N°01 por 6 días calendario.
- Con Resolución de Secretaria General N° 069-2018-FONDEPES/SG; del 24.04.2018, se deniega la ampliación de plazo N° 02 por 62 días calendario.



2.3 Valorización N°7 – Mes de abril 2018:

2.3.1 Mediante Carta N°046–2018-CMM de fecha 04 de mayo de 2018 el supervisor de obra presenta la valorización N°7, correspondiente al mes de abril de 2018.

2.3.2 Conforme al informe técnico mensual del supervisor – abril 2018, de fecha 04/05/2018, adjunto a la referencia, el supervisor de la obra concluye en la presente valorización N°07, que a la fecha el avance ejecutado mensual es del 4.12%, el avance ejecutado acumulado mensual es de 21.40%, contra un avance programado acumulado programado mensual del 76.57%.

III. ASPECTOS LEGALES:

3.1. **La Cláusula Cuarta: Del Pago;** se indica lo siguiente:

“LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de valorización mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. (...)”

3.2. En las bases integradas, numeral **2.7 Valorizaciones**, se indica lo siguiente:

“El periodo de valorización será mensual. De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del Artículo 166° del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo”.

3.3. Asimismo, en las bases integradas, numeral **3.14 Valorizaciones, Presentaciones de**



Informes y Pago, se indica lo siguiente:

*“(…) Los metrados de obra ejecutados, se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor y presentados al **FONDEPES** dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o el supervisor no se presentan para la valorización conjunta con el contratista, éste la efectúa. El inspector o supervisor debe revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.*

*El contratista está obligado a presentar para la aprobación de la supervisión y remisión al **FONDEPES**, informes mensuales de avance de Obra y otros informes que el supervisor y la entidad solicite, los cuales se presentarán como máximo el quinto (5to) día hábil de cada mes junto con la valorización mensual de avance de obra correspondiente (…).”*

IV. ANÁLISIS:

4.1 De acuerdo con los Antecedentes:

4.1.1 Mediante Carta N°046–2018-CMM de fecha 04 de mayo de 2018 el supervisor de obra presenta la valorización N°7, presentada por el contratista P.S.V. CONSTRUCTORES S.A., correspondiente al mes de abril de 2018.



2 Conforme al informe técnico mensual del supervisor – abril 2018, de fecha 04/05/2018, adjunto a la referencia, el supervisor de la obra concluye en la presente valorización N°07, que a la fecha el avance ejecutado mensual es del 4.12%, el avance ejecutado acumulado mensual es de 21.40%, contra un avance programado acumulado mensual del 76.57%.

4.1.3 El supervisor informa que la obra se encuentra retrasada en 55.17% con respecto al avance acumulado, por motivos de la suspensión de la obra en los meses de febrero y marzo, por parte del contratista.

Además, en sus recomendaciones la supervisión de obra aprueba la valorización N°07, ya que señala que se han ejecutado los trabajos en el mes de abril del 2018, por lo que recomienda a la entidad la cancelación correspondiente al contratista P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.

4.1.4 Habiéndose verificado la valorización N° 07, se ha encontrado que la planilla de metrado elaborada por el contratista y la supervisión el cual aprueba la misma, sustentando lo valorizado, por lo que se determina que el monto a cancelar es de **S/ 255,826.02 (Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Veintiséis con 02/100 soles)**. Incluye IGV.

4.2 Control Económico del Contrato:

4.2.1 Valorización del Contrato Principal:

Según valorización correspondiente al mes de abril de 2018, el supervisor informa que se tiene un avance acumulado real de 21.40% contra un avance acumulado programado de 76.57% del contractual; con respecto al calendario actualizado de obra, aprobado el mes de enero del 2018.



CONTROL DE AMORTIZACIONES

Adelanto Directo

N° Valorización	Monto Val sin IGV (b)	Monto Total, Adel. sin IGV (c / c')	Amortización		
			Parcial sin IGV d = 10% b	Acumulado sin IGV (e)	Saldo sin IGV f = c - e
Adelanto Directo		S/. 751,793.75			S/. 751,793.75
VAL. N° 01	S/. 138,824.66		S/. 13,882.47	S/. 13,882.47	S/. 737,911.28
VAL. N° 02	S/. 91,772.13		S/. 9,177.21	S/. 23,059.68	S/. 728,734.07
VAL. N° 03	S/. 1,040,648.68		S/. 104,064.87	S/. 127,124.55	S/. 624,669.20
VAL. N° 04	S/. 27,782.27		S/. 2,778.23	S/. 129,902.78	S/. 621,890.97
VAL. N° 05	S/. 0.00		S/. 0.00	S/. 129,902.78	S/. 621,890.97
VAL. N° 06	S/. 0.00		S/. 0.00	S/. 129,902.78	S/. 621,890.97
VAL. N° 07	S/. 309,716.74		S/. 30,971.67	S/. 160,874.45	S/. 590,919.30

Adelanto de Materiales

N° Valorización	Monto Val sin IGV (b)	Monto Total, Adel. sin IGV (c / c')	Amortización		
			Parcial sin IGV d = 20% b	Acumulado sin IGV (e)	Saldo sin IGV f = c - e
Adelanto de Materiales		S/. 1,503,587.54			S/. 1,503,587.54
VAL. N° 03	S/. 1,040,648.68		S/. 254,249.10	S/. 254,249.10	S/. 1,249,338.44
VAL. N° 04	S/. 27,782.27		S/. 5,556.45	S/. 259,805.55	S/. 1,243,781.99
VAL. N° 05	S/. 0.00		S/. 0.00	S/. 259,805.55	S/. 1,243,781.99
VAL. N° 06	S/. 0.00		S/. 0.00	S/. 259,805.55	S/. 1,243,781.99
VAL. N° 07	S/. 309,716.74		S/. 61,943.35	S/. 321,748.90	S/. 1,181,838.64

- **Adelanto de Materiales:**

Monto Adelanto Materiales (Sin IGV) : S/. 1'503,587.54
Fecha de pago : 03/11/2017

- **Adelanto directo:**

Monto Adelanto Directo (Sin IGV) : S/. 751,793.75
Fecha de pago : 27/09/2017

4.2.2 Resumen de Valorización de Obra:



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Luego de revisar la documentación que sustenta la valorización de obra N° 07, correspondiente al periodo del mes de abril 2018, se aprueba con la siguiente estructura de pagos:

RESUMEN DE LA VALORIZACION N° 7			
Del 1 al 30 de abril de 2018			
Obra	:	Licitación Pública N° 002-2017-FONDEPES: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA”	
Entidad	:	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	
Contratista	:	PSV CONSTRUCTORES SA	
Lugar	:	REGION ICA, PROVINCIA DE NAZCA, DISTRITO DE MARCONA	
Fecha P.B.	:		
Plazo	:	240 DIAS CALENDARIOS	
A.	VALORIZACION N° 07 (contractual)		261,806.21
B.	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES		47,910.54
	Gastos generales (12.30%)	32,202.16	
	Utilidades (6.0%)	15,708.37	
C.	AMORTIZACIONES		92,915.02
	Adelanto Directo 10.00%	30,971.67	
	Adelanto de Materiales 20.00%	61,943.35	
D.	REAJUSTES		0.00
	Total de reajustes (*)	0.00	
E.	SUB TOTAL VALORIZACIÓN N° 07		216,801.71
	Total Valorización (A+B-C+D)		
	I.G.V. (18%)		39,024.31
F.	TOTAL A FACTURAR VALORIZACIÓN N° 07		255,826.02
G.	GARANTIAS		0.00
	Monto por Retencion fondo de Garantia	0.00	
H.	MONTO NETO A PAGAR		255,826.02

(*) El reajuste se determinara en la liquidacion de obra.

V. CONCLUSIONES

- 5.1. El contratista Supervisor de Obra CONSORCIO MESONES MURO, ha remitido la CARTA N° 046-2018-CMM, mediante la cual aprueba la Valorización de Obra N° 07 correspondiente al mes de abril de 2018, presentada por el contratista P.S.V. CONSTRUCTORES S.A., encargado de la ejecución de la obra: “Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, Región Ica”. Asimismo, el contratista Supervisor de Obra CONSORCIO MESONES MURO, solicita el pago de la Valorización de Obra N° 07 por el monto total de **S/ 255,826.02 (Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Veintiséis con 02/100 soles)**. Incluye IG.V.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

- 5.2. Se ha verificado que la presentación de la **Valorización de Obra N° 07** del contratista **P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.**, ha cumplido con todos los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, su contrato, las bases integradas y demás documentos que forman parte integrante del expediente de contratación.

VI. RECOMENDACIONES

- 6.1. Cumplidos los todos requisitos establecidos, Se recomienda que la **DIGENIPAA** otorgue la conformidad respectiva, para que **LA ENTIDAD** proceda al pago de la **Valorización de Obra N°07** correspondiente al mes de abril de 2018, dentro de los plazos establecidos.

- 6.2. Resumen:

Valorización N° 07	:	S/	216,801.71
Impuesto IGV	:	S/	<u>39,024.31</u>
Total, a Facturar	:	S/	255,826.02

Es cuanto tengo que informar a Ud. para los fines que estime convenientes.

Atentamente;



JOSE ANTONIO
PAREDES OLIVOS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 193610

Con la conformidad del Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento; pase el presente informe y los antecedentes, a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola; para su atención y trámite correspondiente.

FONDEPES


Ing. Paul A. Mora Guillen
COORDINADOR DE OBRAS EQUIPAMIENTO
Y MANTENIMIENTO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04723788

Usuario: **jmoralesc**
Fecha: **16/05/2018**
Hora: **07:32**



CARGO 00179-2018-FONDEPES/JMC

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

Asunto: SE SOLICITA CONTINÚE CON TRÁMITE, CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO N°153-2018, MONTO S/255,826.02; VALORIZACIÓN N° 7 - DEL EJECUTOR (PERIODO ABRIL 2018) REF: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA DE SAN JUAN DE MARCONA-NAZCA-ICA.

Referencia:


Fecha: 16/05/2018

Observación:

Atentamente,

MORALES CUZCANO JUAN

JMC





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04723629

Usuario: **pruiz**
Fecha: **15/05/2018**
Hora: **15:48**



CARGO 01275-2018-FONDEPES/AOEM

A: MORALES CUZCANO JUAN
Asunto: CARTA N° 046-2018-CMM
REMITE VALORIZACIÓN N° 7 - DEL EJECUTOR (PERIODO ABRIL 2018) REF: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA DE SAN JUAN DE MARCONA-NAZCA-ICA"
Referencia: INFORME 00066-2018-FONDEPES/JAPO
Fecha: 15/05/2018
Observación: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A OGA

Atentamente,



AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO

*Exp. 1534
cep. 153*



MEMORÁNDUM INTERNO N° 1553 -201-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM

Asunto : Memo Interno N° 1886-2018- DIGENIPAA

Referencia : _____ Registro: 3449

Destino	Indicación	Destino	Indicación
#/1309/			
Observaciones: _____			
Ing ^o Jose Paredes			

Atentamente:

[Handwritten Signature]
04/05/18
16:44 pm



Indicaciones:

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 0.1. Autorizado/Aprobado | 0.2. Calificar/Evaluar | 0.3. Informe | 0.4. Proyectar resolución |
| 0.5. Atención/Tramitación | 0.6. Conocimiento y fines | 0.7. Notificar al interesado | 0.8. Reformular |
| 0.9. Ayuda memoria | 10. Coordinar | 11. Opinión/Recomendación | 12. Consolidar |
| 13. Aclarar redacción | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta | 16. Visación |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo | 19. Ampliar | 20. Seguimiento |



PERÚ

Ministerio de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Fecha: 04/05/18

MEMORÁNDUM INTERNO N° 1886 - 201 - FONDEPES/ DIGENIPAA

Asunto: Canta #046/cnn.

Referencia: _____ Registro: 3449

Destino	Indicación	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	
OCI		OGAJ	
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	<u>AOEM.</u>
Observaciones: _____			

FONDEPES
AREA DE OBRAS EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO
06 MAYO 2018
RECIBIDO
Registro: Hora:
[Signature]

Atentamente:



Indicaciones:

- 01. Autorización Aprobado
- 02. Calificar/Evaluar
- 03. Informe
- 04. Proyectar resolución
- 05. Atención/Tramitación
- 06. Conocimiento y fines
- 07. Notificar al interesado
- 08. Reformular
- 09. Ayuda memoria
- 10. Coordinar
- 11. Opinión/Recomendación
- 12. Consolidar
- 13. Aclarar redacción
- 14. Implementar/Ejecutar
- 15. Preparar respuesta
- 16. Visación
- 17. Agregar a sus antecedentes
- 18. Archivo
- 19. Ampliar
- 20. Seguimiento

12

CONSORCIO MESONES MURO
Calle Rodriguez Trigoso N° 110 (3er piso), Urb. Villarreal - Chiclayo
TELEFONOS: #949611859 / 949611859



“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional”

Lima, 04 de Mayo del 2018

CARTA N° 046-2018-CMM

Señores:

Luis Alberto Barbieri Quino - DIGENIPAA
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES
Av. Petit Thouars N° 115, Cercado de Lima

Atención
Ing. José Paredes
Coordinador de Obra
Presente.-

Asunto : Valorización N° 07 – del Ejecutor (Periodo Abril del 2018)

Referencia : Contrato N° 028-2017-FONDEPES
Ejecución de la Obra: “Mejoramiento de los servicios del desembarcadero
pesquero artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona,
provincia de Nazca, Región Ica”

De mi Especial consideración:

Quien suscribe, **Juan Esteban Zapata Zuloeta**, identificado con DNI N° **41349923**, representante legal del **Consortio Mesones Muro**, con **RUC N° 20600617614**, me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente, asimismo solicitarle el pago de la **valorización N° 07** - del ejecutor, correspondiente al periodo Abril del 2018, materia del contrato de la referencia.


Por lo tanto, esta Supervisión aprueba la valorización N° 07 del ejecutor de obra, ya que efectivamente se han ejecutado los trabajos programados en el mes de abril del 2018, por lo que se recomienda cancelar el monto señalado en el párrafo anterior, al contratista **P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.**

Asimismo, hacemos de su conocimiento que la obra se encuentra **Atrasada**.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO

	
2714674	
N° DOC:	00003449-2018
CLAVE:	2520
USUARIO:	dgalindo
FECHA Y HORA:	04/05/2018 14:44:42
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	


CONSORCIO MESONES MURO
Ing. Juan Esteban Zapata Zuloeta
REPRESENTANTE LEGAL
Cel.: 949611859
estebanzuloeta@hotmail.com



adjunto informe N 35-2018/LAAM/JS

estebanzuloeta@hotmail.com

/

jezz82_@hotmail.com

CONSORCIO MESONES MURO
 Calle Rodríguez Trigoso N° 110 (3er piso), Urb. Villarreal - Chiclayo
 TELEFONOS: #949611859 / 949611859



INFORME DE SUPERVISIÓN N° 35-2018/LAAM/JS

VALORIZACIÓN N° 07
(ABRIL DEL 2018)

A : **CONSORCIO MESONES MURO**
 Empresa Supervisora
 Calle Rodríguez Trigoso N° 110 (tercer piso) – Urb. Federico Villarreal, distrito y
 provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque

DE : **Ing. Luis Alberto Avila Morales**
 Jefe de Supervisión

ASUNTO : **Informe Mensual de Supervisión N°07**


FECHA : **Marcona, Mayo del 2018**

1. GENERALIDADES


- 1.1. Entidad contratante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES
- 1.2. Modalidad : Contrata
- 1.3. Obra : "Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, Región Ica"
- 1.4. Jefe de Supervisión : Luis Alberto Avila Morales
- 1.5. Residente de obra : Jorge Julio Espichan Aviles

2. DATOS GENERALES



- 2.1. Contratista de la Obra : P.S.V. CONSTRUCTORES S.A
- 2.2. Contrato de Obra N° : 028-2017-FONDEPES
- 2.3. Fecha de contrato ejecutor : 15/09/2017
- 2.4. Monto de Contrato ejecutor : S/. 8'871,166.29, incluido I.G.V.
- 2.5. Plazo de Ejecución : 240 días calendarios
- 2.6. Empresa Supervisora : CONSORCIO MESONES MURO
- 2.7. Contrato de Supervisión N° : 027-2015-FONDEPES
- 2.8. Fecha de contrato supervisor : 01/09/2015
- 2.9. Monto de Contrato supervisor : S/. 318,661.60, incluido I.G.V.
- 2.10. Plazo de Supervisión : 285 días calendarios
- 2.11. Monto del Adelanto
 Directo al Contratista (con IGV) : S/. 887,116.63
- 2.12. Fecha de pago del Adelanto Directo : 27/09/2017
- 2.13. Monto del Adelanto de


 Luis Alberto Avila M.
 CIP. N° 8471
 SUPERVISOR


CONSORCIO MESONES MURO
 Calle Rodríguez Trigoso N° 110 (3er piso), Urb. Villarreal - Chiclayo
 TELEFONOS: #949611859 / 949611859



- Materiales al Contratista (con IGV) : S/. 1'774,233.30
- 2.14. Fecha de pago del Adelanto de Materiales : 24/11/2017
- 2.15. Fecha de entrega de terreno : 29/09/2017
- 2.16. Fecha de inicio de ejecución de obra: 30/09/2017
- 2.17. Fecha de término Contractual : 27/05/2018
- 2.18. Garantía de Fiel Cumplimiento, Carta Fianza N°1842201 : S/. 887,116.63
- 2.19. Garantía de Adelanto Directo, Carta Fianza N°30000531-01 : S/. 733,831.36
- 2.20. Garantía de Adelanto de Materiales Carta Fianza N°30003281-01 : S/. 1'467,662.75
- 2.21. Ampliaciones de Plazo :
- Ampliación de Plazo N° 01**
- RDN° : Automática (En Resolución de Secretaría General N° 069-2018-FONDEPES/SG hace referencia que fue aprobada)
- Fecha : 24 de abril del 2018
- Duración : 06 días
- Desde : 28 de abril del 2018
- Hasta : 02 de junio del 2018
- Causal : Debido a la inseguridad y falta de garantías que pusieron en riesgo la integridad física de todo el personal de obra, tanto directo como indirecto, se tomó la decisión de paralizar la obra hasta que se cuente con las garantías suficientes de seguridad personal y de las instalaciones en obra.
- Situación : **Aprobada**
- Ampliación de Plazo N° 02**
- RDN° : Resolución de Secretaría General N° 069-2018-FONDEPES/SG
- Fecha : 24 de abril del 2018
- Duración : 62 días
- Desde :
- Hasta :



 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84745
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MESONES MURO
Calle Rodríguez Trigoso N° 110 (3er piso), Urb. Villarreal - Chiclayo
TELEFONOS: #949611859 / 949611859



Causal : Debido a la inseguridad y falta de garantías que pusieron en riesgo la integridad física de todo el personal de obra, tanto directo como indirecto, la empresa tomó la decisión de paralizar la obra hasta que se cuente con las garantías suficientes de seguridad personal y de las instalaciones en obra.

Situación : **Denegada**

- 2.22. Adicionales de Obra : No Hubo (al 30/04/2018)
- 2.23. Deductivos de Obra : No hubo (al 30/04/2018)
- 2.24. Seguros : AVLA Perú Compañía de Seguros S.A.
- 2.24.1. Vida Ley : Del 20/09/2017 - 31/05/2018
- 2.24.2. Complementario de Trabajo y riesgo : Del 01/09/2017 – Indefinido
- 2.24.3. Todo riesgo y montaje : Del 15/09/2017 – 31/05/2018

3. SITUACIÓN DE LA OBRA

3.1 ASPECTO TÉCNICO

3.1.1 Situación de la Obra al 30/04/2018:

a. Resumen del Trabajo Efectuado

OBRAS PRELIMINARES

- Baños Químicos para el Personal

El contratista ha realizado la instalación de baños químicos correspondiente a 01 mes.

- Cerco de Malla Rashell con Madera Rollizo

Según avance de obra, han realizado la instalación de cerco en un total de 334.00 m.

- Agua para la Construcción

El contratista ha realizado el suministro de agua correspondiente a 01 mes.

- Energía Eléctrica Provisional

Según avance de obra, se han abastecido lo que corresponde a 01 mes de energía eléctrica provisional.

 *Luis Alberto Avila M.*
 CIP. N° 84743
 SUPERVISOR DE OBRAS

CONSORCIO MESONES MURO
 Calle Rodriguez Trigoso N° 110 (3er piso), Urb. Villarreal - Chiclayo
 TELEFONOS: #949611859 / 949611859



- Flete Terrestre

El contratista ha realizado al flete terrestre correspondiente a 01 glb.

SEGURIDAD Y SALUD

- Elaboración, Implementación y Administración de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 0.12 und. del plan de seguridad y salud.

- Equipos de Protección Colectiva

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 0.12 und. de EPP's colectivo.

- Equipos de Protección Individual

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 0.12 und. de EPP's individual.

- Señalización Temporal de Seguridad

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 0.12 und de seguridad temporal de seguridad.

- Recursos para respuesta ante Emergencias en Seguridad y Salud durante el Trabajo

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 0.12 und sobre respuesta ante emergencia.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

- Riego del Área de Trabajo

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 394.41 m² de riego del área de trabajo.

- Limpieza General de la Obra

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 394.41 m² de limpieza general de la obra.

- Plan de Contingencia

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 0.12 und. sobre el plan de contingencia.

- Plan de Seguimiento y Control


Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 0.12 und. sobre el plan de seguimiento y control.

- Plan de Cierre y Abandono

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 0.12 und sobre el plan de cierre y abandono.


 **Luis Alberto Avila Morales**
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

CONSORCIO MESONES MURO
 Calle Rodriguez Trigoso N° 110 (3er piso), Urb. Villarreal - Chiclayo
 TELEFONOS: #949611859 / 949611859



- Medida de Concientización y Educación Ambiental.

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 0.12 und.

ESTRUCTURAS

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

- Falso Piso Mezcla 1:8 E=4"

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 386.35 m² correspondiente a la partida de falso mezcla 1:8 E=4".

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

- Vigas, Acero f_y=4200 kg/cm²

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 3,980.70 kg. correspondiente a Vigas, acero f_y=4200 kg/cm².

- Muro de Concreto, Concreto f_c=315 kg/cm²

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 106.17 m³ correspondiente a muro de concreto, concreto f_c= 315 kg/cm².

- Muro de Concreto, Encofrado y Desencofrado

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 380.04 m² correspondiente a muro de concreto, encofrado y desencofrado.

- Muro, Acero f_y=4200 kg/cm²

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 7,967.27 kg. correspondiente a muro, acero f_y=4200 kg/cm².

- Losa Aligerada, Encofrado y Desencofrado

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 228.70 m² correspondiente al sobrecimiento armado, encofrado y desencofrado.

- Losa Aligerada, Acero f_y=4200 kg/cm²

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 866.33 kg. correspondiente a losa aligerada, acero f_y=4200 kg/cm².



- Losa Aligerada, Ladrillo Hueco 15x30x30

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 2,287.00 und. correspondiente a losa aligerada, ladrillo hueco 15x30x30.

- Losas Macizas, Concreto f_c=210 kg/cm²

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 1.80 m³ correspondiente a losas macizas, concreto f_c=210 kg/cm².

- Losas Macizas, Encofrado y Desencofrado


 **Luis Alberto Avila Morales**
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

CONSORCIO MESONES MURO
Calle Rodriguez Trigoso N° 110 (3er piso), Urb. Villarreal - Chiclayo
TELEFONOS: #949611859 / 949611859



Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 31.68 m² correspondiente a losas macizas, encofrado y desencofrado.

- Losas Macizas, Acero $f_y=4200$ kg/cm²

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 45.00 kg. correspondiente a losas macizas, acero $f_y=4200$ kg/cm².

SISTEMA DE AGUA FRÍA CISTERNA – TANQUE ELEVADO

- Muro Sistema Concreto $f_c=315$ kg/cm²

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 12.31 m³ correspondiente a losa cimentación concreto $f_c= 315$ kg/cm².

- Muro Sistema - Encofrado y Desencofrado

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 122.41 m² correspondiente a muro sistema - encofrado y desencofrado.

- Muro Sistema, Acero $f_y=4200$ kg/cm²

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 1,262.50 kg. correspondiente a muro sistema, acero $f_y= 4200$ kg/cm².

- Losa Aligerada, Concreto $f_c=210$ kg/cm²

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 0.82 m³ correspondiente a losa aligerada, concreto $f_c= 210$ kg/cm².

- Losa Aligera, Encofrado y Desencofrado

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 9.73 m² correspondiente a losa aligerada, encofrado y desencofrado.

- Losa Aligerada, Acero $f_y=4200$ kg/cm²

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 51.43 kg. correspondiente a losa aligerada, acero $f_y= 4200$ kg/cm².

- Losa Aligerada, Ladrillo Hueco 15x30x30

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 79.00 und. correspondiente a losa aligerada, ladrillo hueco 15x30x30.



PROTECCIÓN CON ENROCADO

- Trazo y Replanteo Preliminar

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 19.00 m² correspondiente al trazo y replanteo preliminar.

- Excavación para Uña Antisocavamiento

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 41.80 m³ correspondiente a la excavación para uña antisocavamiento.


 **Luis Alberto Avila Morales**
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

CONSORCIO MESONES MURO
 Calle Rodríguez Trigoso N° 110 (3er piso), Urb. Villarreal - Chiclayo
 TELEFONOS: #949611859 / 949611859



- Refine y Perfilado de Talud Zona Enrocado

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 108.30 m³ correspondiente al refine y perfilado de talud zona enrocado.

- Extracción de Roca con Maquinaria

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 162.50 m³ correspondiente al extracción de roca con maquinaria.

- Carguío y Transporte de Roca de Cantera – Obra Dmin=0.8 m.

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 162.50 m³ correspondiente al carguío y transporte de roca de cantera – obra Dmin=0.8 m.

- Colocación y Acomodo de Roca en Uña de Dique, Dmin=0.8 m.

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 62.70 m³ correspondiente al colocación y acomodo de roca en uña de dique, Dmin=0.8 m.

- Colocación y Acomodo de Roca en Talud de Dique, Dmin=0.8 m.

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 99.75 m³ correspondiente al colocación y acomodo de roca en talud de dique, Dmin=0.8 m.

- Suministro y Habilitación de Geotextil Tejido 270 gr/m²

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 146.30 m² correspondiente al suministro y habilitación de geotextil tejido 270 gr/m².

ARQUITECTURA

MUROS Y TABIQUE DE ALBAÑILERIA

- Muro de Ladrillo KK Tipo IV Soga M:1:4 E=1.5 cm.

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 192.80 m² correspondiente al muro de ladrillo KK tipo IV soga M:1:4 E=1.5 cm.

PISOS Y PAVIMENTOS

- Falso Piso E=2" de Concreto 1:10.


Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 11.18 m² correspondiente a esta partida.

OBRAS DE MAR

OBRAS PRELIMINARES

- Picado de Losa de Concreto

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 220.00 m². correspondiente a esta partida.


 Luis Alberto Avila Moral
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

CONSORCIO MESONES MURO
 Calle Rodríguez Trigoso N° 110 (3er piso), Urb. Villarreal - Chiclayo
 TELEFONOS: #949611859 / 949611859



- Acarreo Interno, Material Procedente de Excavaciones

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 30.80 m³. correspondiente a esta partida.

- Eliminación de Material Excedente c/Maquina

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 30.80 m³. correspondiente a esta partida.

PLATAFORMA BAJA Y REFORZAMIENTO DE MUELLE PARA EBD N° 01

- Concreto Vigas y Núcleo, F'c=280 kg/cm²

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 1.95 m³. correspondiente a esta partida.

- Vigas y Núcleos, Encofrado y Desencofrado

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 15.60 m². correspondiente a esta partida.

- Vigas y Núcleos, Acero F'y=4200 kg/cm²

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 1,078.68 m². correspondiente a esta partida.

PILOTAJE

- Transporte de Pilotes

Según avance de obra sobre esta partida se ha realizado el 6.00 und. correspondiente a esta partida.

3.1.2 Avance de Obra

a. Avance Programado Vigente	21.34 %
b. Avance ejecutado en el Mes	4.12 %
c. Avance Programado Acumulado al Mes	76.57 %
d. Avance Ejecutado Acumulado al Mes	21.40 %
e. Situación Actual de la Obra	

Retrasada:

55.17 %, debido a 02 meses de suspensión de labores


 **Luis Alberto Avila Morales**
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

CONSORCIO MESONES MURO
 Calle Rodríguez Trigoso N° 110 (3er piso), Urb. Villarreal - Chicalayo
 TELEFONOS: #949611859 / 949611859



3.1.3 Plan de Trabajo

- Desde el inicio de la Obra, la Supervisión ha solicitado al Residente de Obra el Calendario de Avance de Obra Actualizado; para realizar el seguimiento de la Obra. En tal sentido el análisis de avances que se hace en el presente informe corresponde a dicho calendario.
- Se le solicitará al Contratista el nuevo Cronograma Acelerado N° 02.

3.1.4 Desarrollo de la Obra

a. Aspectos Críticos

Este mes no se ha registrado ningún aspecto crítico.

b. Problemas Presentados

La incompatibilidad entre planos de detalles de estructuras, especificaciones técnicas, presupuesto.

c. Acciones Correctivas

Asiento N° 190 del Supervisor del 02/04/18

Se le recomienda al Ing. Residente el cepillado de los fierros debido al óxido acumulado en estos dos meses de paralización.

Asiento N° 193 del Supervisor del 04/04/18

Se le solicita la presencia de los profesionales ofertados en caso contrario se le aplicara la penalidad de acuerdo a ley.

Asiento N° 197 del Supervisor del 06/04/18

Se le solicita al Ing. Residente la presencia de los especialistas en estructuras, eléctricas y sanitarias.

Asiento N° 201 del Supervisor del 09/04/18

Se recomienda el fraguado continuo a los pilotes bajo responsabilidad del contratista.

Asiento N° 207 del Supervisor del 12/04/18

Se continua con el encofrado de la losa aligerada en el área de tareas previas se le recomienda al Ing. Residente respetar la altura que manda el Expediente Técnico.


 Luis Alberto Avila
 CIP. N° 84743
 SUPERVISOR DE OBRAS

CONSORCIO MESONES MURO
Calle Rodriguez Trigoso N° 110 (3er piso), Urb. Villarreal - Chiclayo
TELEFONOS: #949611859 / 949611859



Asiento N° 210 del Supervisor del 13/04/18

Se le solicita y reitera al Ing. Residente la presencia de los especialistas en obra bajo su responsabilidad.

Asiento N° 214 del Supervisor del 14/04/18

Se le reitera de nuevo al Ing. Residente de los especialistas que indica las bases como son: Estructuras, Eléctrico y Sanitario la cual no están cumpliendo generando penalidades de acuerdo al Reglamento Nacional de Construcción.

Asiento N° 227 del Supervisor del 19/04/18

Se comprobó la presencia de basura en el eje que da para la playa del cerco perimétrico, se recomienda reemplazar con material de préstamo y su respectiva compactación.

Asiento N° 233 del Supervisor del 21/04/18



Se va a comunicar a FONDEPES sobre una recomendación de una mejora en el Expediente Técnico, se le solicita al Residente presentar los RFI con anticipación ya que lo está presentando a pocos días de su ejecución.

Asiento N° 235 del Supervisor del 23/04/18

Se le indica al Ing. Residente que se acepta lo que está proponiendo en las columnas de amarre en el muro de contención, se le indica al Ing. Respetar el proceso constructivo para el vaceado de losa del muelle.

Asiento N° 238 del Supervisor del 23/04/18

Se está verificando la ubicación del pilote en el eje III en la plataforma baja lado izquierdo se ubica en talud del enrocado, se va a comunicar a FONDEPES y de su opinión, la supervisión sugiere el traslado del eje III a una corta distancia para que no afecte la estabilidad del enrocado.


 Luis Alberto Avila M.
CIP. N° 84711
SUPERVISOR DE

CONSORCIO MESONES MURO
 Calle Rodríguez Trigoso N° 110 (3er piso), Urb. Villarreal - Chiclayo
 TELEFONOS: #949611859 / 949611859



3.1.5 Condiciones Meteorológicas

El clima es cálido árido, con escasas precipitaciones.

3.1.6 Resultados de la Inspección y Control de Calidad

- Este mes no se realizaron ningún tipo de pruebas de control de calidad.

3.1.7 Equipo Estratégico empleado por el Contratista

- 01 Grúa de Celosía Fuchs F118.3 20 Ton.
- 01 Camión Volquete 15 m³
- 01 Motosoldadora Miller Bobcat 250A
- 01 Motosoldadora Miller Traiblazer 325A
- 02 Equipo de Oxicorte
- 01 Grupo Electrónico Panther 170F
- 02 Trompo Mezclador de Concreto 9p³
- 01 Camioneta Pickup Nissan Frontier
- 01 Nivel Topográfico Leica NA332
- 01 Estación Total Leica TS06R500
- 01 Plancha compactadora
- 01 Compactador tipo canguro



3.1.8 Personal Profesional y Técnico empleado por el Contratista

- 01 Ingeniero Residente de obra
- 01 Ingeniero Encargado de Oficina Técnica
- 01 Ingeniero Asistente de Oficina Técnica
- 01 Ingeniero Jefe de Producción
- 01 Ingeniero Asistente de Producción
- 01 Ingeniero Especialista en Seguridad de Obra y Medio Ambiente
- 01 Administrador
- 01 Asistente Administrativo
- 01 Topógrafos
- 01 Técnico Electricista

3.1.9 Visitas efectuadas por Funcionarios de la Entidad

El 11 de abril del 2018 se tuvo la visita del Ing. Raúl Mora, jefe de obras de FONDEPES.

El 26 de abril del 2018 se tuvo la visita del Ing. Juan Marquina Villanueva, especialista estructural de FONDEPES.


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84745
 SUPERVISOR DE OBRAS

CONSORCIO MESONES MURO
Calle Rodriguez Trigoso N° 110 (3er piso), Urb. Villarreal - Chiclayo
TELEFONOS: #949611859 / 949611859



3.1.10 Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- El avance ejecutado mensual es de **4.12 %**.
- El avance ejecutado acumulado mensual es **21.40 %**
- El avance programado acumulado mensual es de **76.57 %**
- Por lo tanto la obra se encuentra retrasada en **55.17 %** con respecto al avance acumulado, por motivos de suspensión de labores en los meses de febrero y marzo por parte del contratista.
- Se le solicitará al Contratista la elaboración del Cronograma Acelerado N° 02.
- El contratista viene ejecutando de forma correcta los trabajos realizados.
- El contratista cuenta con su personal y maquinaria propuesta, en obra. Asimismo, todo su plantel cuenta con la indumentaria de seguridad correspondiente.

Recomendaciones

- La Supervisión recomienda al Contratista aumentar el rendimiento y programar sus actividades diarias con anticipación para cumplir con lo establecido en su cronograma.
- La Supervisión recomienda al Contratista realizar con anticipación cualquier consulta para no generar atraso en su ruta crítica debido a la falta de información o pronunciamiento de especialistas, ya que estas consultas (RFI) lo hacen al momento de ejecutar la partida estos RFI no generarán ampliación de plazo.
- La Supervisión recomienda a la Entidad realizar el seguimiento y dar respuesta a las consultas (RFI) dentro de los plazos establecidos por Ley.
- **LA SUPERVISIÓN APRUEBA LA VALORIZACIÓN N° 07**, ya que efectivamente se han ejecutado los trabajos en Abril del 2018, por lo que se recomienda a la Entidad la cancelación correspondiente al contratista.

3.2 ASPECTO ECONÓMICO DE LA OBRA

Número de valorizaciones tramitadas	:	7
Número de valorizaciones pagadas	:	4
Monto valorizado en el mes	:	+ S/. 309,716.74
Adelanto Directo Amortizado al mes	:	- S/. 30,971.67
Adelanto por Materiales Amortizado al mes	:	- S/. 61,943.35
Subtotal (Sin IGV)	:	S/. 216,801.71
Monto a Pagar (Incluido IGV)	:	S/. 255,826.02




Luis Alberto Avila M.

CIP. N° 84715

SUPERVISOR DE OBRAS

CONSORCIO MESONES MURO
Calle Rodriguez Trigoso N° 110 (3er piso), Urb. Villarreal - Chiclayo
TELEFONOS: #949611859 / 949611859




3.3 ASPECTO ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA

- Ingeniero Residente:
- Nombre : Ing. Jorge Julio Espichan Aviles
- Registro CIP N° : 119009
- DNI : 10323344
- N° de Maestros de obra contratados al presente mes : 01
- N° de Operarios contratados al presente mes : 13
- N° de Oficiales contratados al presente mes : 01
- N° de Obreros contratados al presente mes : 10

SE ADJUNTA:

- CARTA N° 084-2018/PSV-CMM
- INFORME N° 014-2018/PSV-CMM



 Luis Alberto Avila Morales
 CIP N° 84746
 Luis Alberto Avila Morales
 Jefe de Supervisión

Carta N° 084-2018/PSV-CMM

San Juan de Marcona, 30 de Abril del 2018.

Señores:
CONSORCIO MESONES MURO
Atención:
Ing. Luis Alberto Avila Morales
Supervisor de Obra

Asunto : Entrega de Informe Mensual Abril 2018


Referencia: Obra: "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia de Nazca, Región Ica".

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted para hacerle llegar un saludo cordial y al mismo tiempo hacerle llegar el Informe Mensual de Obra correspondiente al mes de Abril 2018, de la Obra de la referencia, para su revisión y aprobación.

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente,


JORGE JULIO
ESPINOZA AVILA
INGENIERO CIVIL
REG. Nº 111111111


 **Luis Alberto Avila Morales**
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

Recibido
02/05/18
folio = 224
10am

INFORME N° 014-2018/PSV-CMM


A : **Ing. Luis Alberto Avila Morales**
Supervisor de Obra - Consorcio Mesones Muro

DE : **Ing. Jorge Espichán Avilés**
Residente de Obra - PSV Constructores S.A.

ASUNTO : Informe Mensual del Mes de Abril 2018.

FECHA : 30 de Abril del 2018.

REFERENCIA : Obra: "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia Nazca, Región Ica".

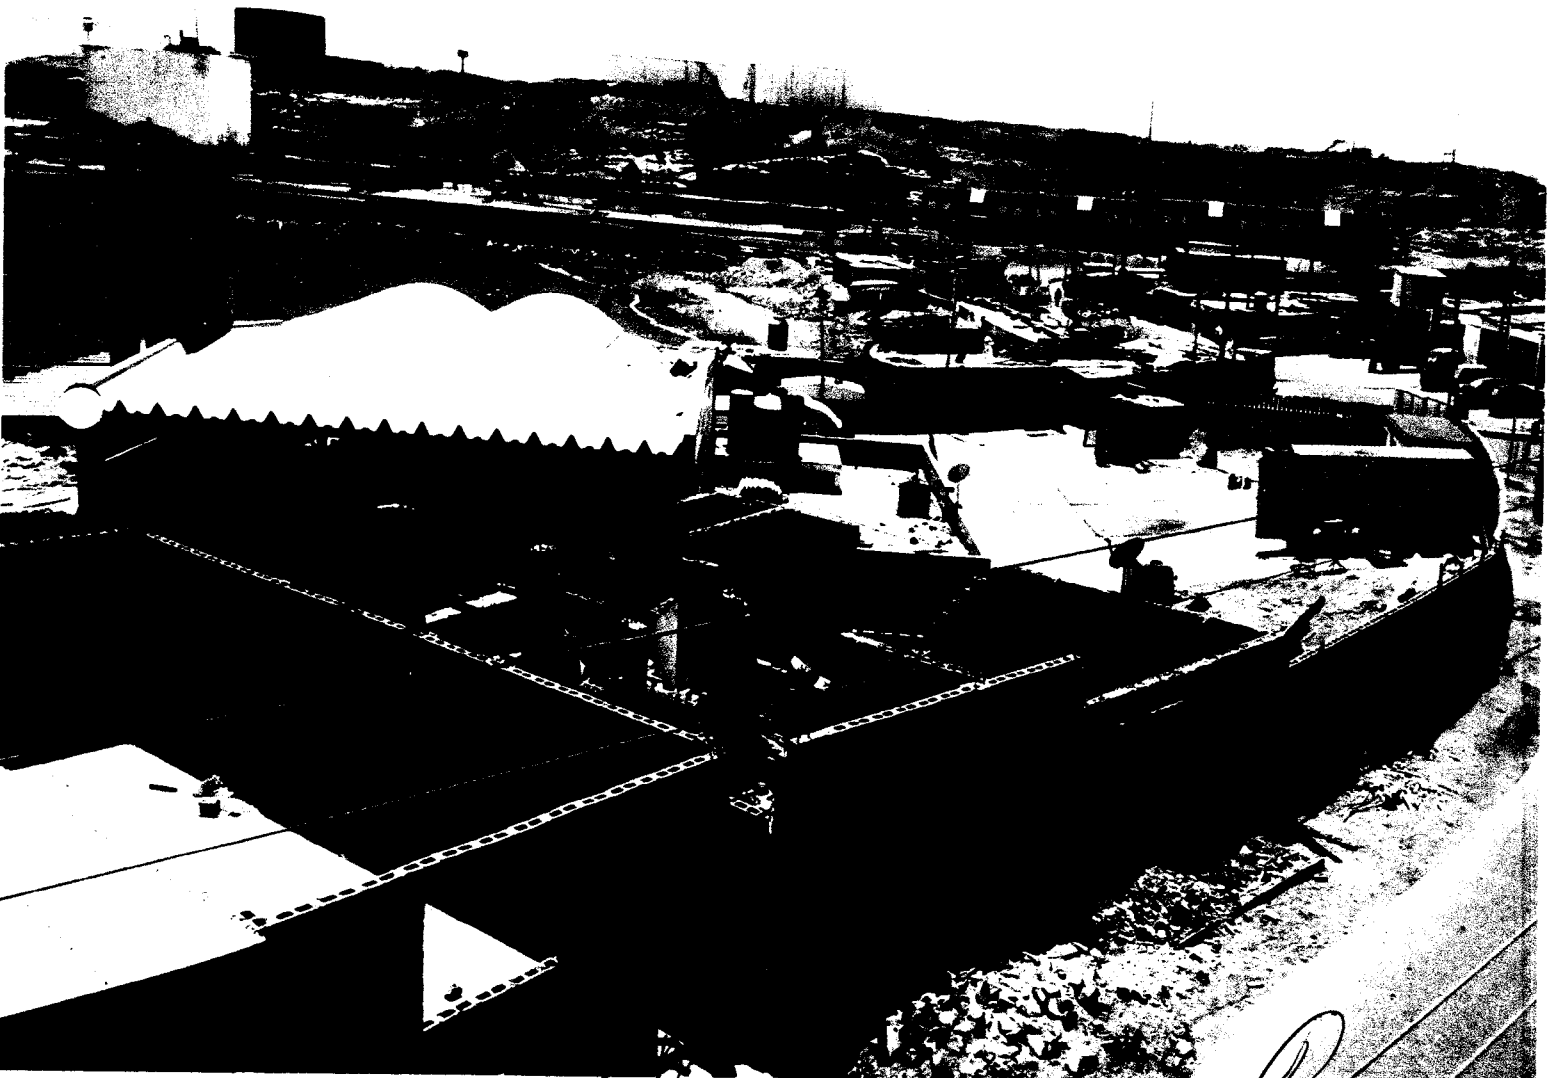




CONTENIDO


- 1.- GENERALIDADES
- 2.- CONTROL DE AVANCE DE OBRA
- 3.- CONTROL DE CALIDAD EN OBRA
- 4.- CONTROL DE SSOMA EN LA OBRA
- 5.- COMENTARIOS - MES DE ABRIL
- 6.- RESPONSABILIDADES
- 7.- RECURSOS

ANEXOS

- ANEXO N° 01: VALORIZACIÓN DE OBRA
- ANEXO N° 02: SUSTENTO DE METRADOS
- ANEXO N° 03: PANEL FOTOGRÁFICO
- ANEXO N° 04: CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
- ANEXO N° 05: CURVA DE AVANCE DE OBRA
- ANEXO N° 06: INFORME DE SEGURIDAD
- ANEXO N° 07: INFORME DE ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- ANEXO N° 08: INFORME DE ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
- ANEXO N° 09: INFORME DE ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
- ANEXO N° 10: CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO
- ANEXO N° 11: CARTA FIANZA BUEN MANEJO DE ANTICIPO POR ADELANTO DIRECTO
- ANEXO N° 12: CARTA FIANZA BUEN MANEJO DE ANTICIPO POR ADELANTO DE MATERIALES
- ANEXO N° 13: SCTR DE PERSONAL
- ANEXO N° 14: CONSTANCIAS DE PAGOS DE DERECHOS A SENCICO
- ANEXO N° 15: CONSTANCIAS DE PAGOS DE DERECHOS A CONAFOVISER
- ANEXO N° 16: CONSTANCIAS DE PAGOS DE IMPUESTOS
- ANEXO N° 17: COPIA CUADERNO DE OBRA
- ANEXO N° 18: CONTRATO




 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA


 JORGE JULIO
 ESPINOZA AVILES
 INGENIERO CIVIL
 REG. N° 1115000



1.- GENERALIDADES

1.1.- OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Debido a la exigencia demandada por el mercado internacional y acorde a las Normas Sanitarias Vigentes, es necesario contar con la Infraestructura Pesquera adecuada a dichas exigencias.

1.2.- OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones en la prestación de servicio del Desembarcadero Pesquero Artesanal San Juan de Marcona, a través del mejoramiento de su infraestructura de mar y tierra adecuada a la Norma Sanitaria 040, así como la implementación necesaria de equipos y desarrollo de talleres de capacitación con la finalidad de satisfacer la demanda actual.

1.3.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El DPA San Juan de Marcona se encuentra ubicada en la costa sur del Perú, en la Localidad de San Juan de Marcona.


Distrito: Marcona.

Provincia: Nazca.

Región: Ica.



Foto N° 01: Ubicación del Distrito de Marcona.


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS



 JORGE JULIO
 ESPINOSA AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Registrado en el



Foto N° 02: Ubicación del DPA San Juan de Marcona.

1.4.- DATOS DE OBRA

Entidad contratante : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 Modalidad : Licitación Pública N° 002-2017-FONDEPES
 Obra : "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la Localidad de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia de Nazca, Región Ica"
 Jefe de Supervisión : Luis Alberto Avila Morales
 Residente de Obra : Jorge Julio Espichán Avilés

1.5.- DATOS GENERALES

Contratista de la Obra : P.S.V. Constructores S.A.
 Contrato de Obra N° : 028-2017-FONDEPES
 Fecha de Contrato Ejecutor : 15/09/2017
 Monto de Contrato Ejecutor : S/. 8'871,166.29, incl. I.G.V.
 Monto por Mayor Metrado N° 01 : S/. 99,350.22 incl. I.G.V.
 Plazo de Ejecución Contractual : 240 días calendarios
 Ampliación de Plazo N° 01 : 06 días calendarios.
 Empresa Supervisora : Consorcio Mesones Muro



Luis Alberto Avila Morales
 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

Jorge Julio Espichán Avilés
 JORGE JULIO
 ESPICHÁN AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 112049



Monto del Adelanto Directo al Contratista	:	S/. 887,116.63 incluido I.G.V.
Monto del Adelanto por Materiales al Contratista	:	S/. 1'774,233.30 incluido I.G.V.
Fecha de Pago del Adelanto Directo	:	27/09/2017
Fecha de Pago del Adelanto por Materiales	:	24/11/2017
Fecha de Entrega de Terreno	:	29/09/2017
Fecha de Inicio de Ejecución de Obra	:	30/09/2017
Fecha de Término Contractual	:	27/05/2018
Fecha de Término por Ampliación de Plazo N° 01	:	02/06/2018

2.- CONTROL DE AVANCE DE OBRA

2.1.- DESCRIPCIÓN

El correcto control y monitoreo de los recursos en general en obra, es parte importante de cualquier proyecto en construcción, debido a que, con este seguimiento de avance y monitoreo de las actividades, se tienen que ir revisando y en su caso, reprogramando cada una de ellas para que se logren alcanzar los objetivos.

El control y monitoreo influirá en los futuros eventos, basando las decisiones en posibles soluciones después de haber detectado el problema. Un buen sistema de control y monitoreo comunicará cada uno de los aspectos que intervienen en la obra. Por ende, una buena comunicación proveerá de información y un estado exacto de avance en el que se encuentra la obra, para que con esto se tomen acciones que permitirán obtener mejores resultados.

Es por ello necesaria la programación, cada cierto tiempo, de un control a corto plazo del avance de la obra para realizar una comparación de lo planeado versus lo real, con la finalidad de evitar las multas estipuladas en el contrato, así como un retraso general del proyecto.


2.2.- CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

El control y monitoreo de la obra tiene su fundamento en el correcto avance de la obra según el cronograma. Es por esto por lo que, con el correcto monitoreo y control de cada una de las actividades, se logre equilibrar estas tres variables, ya que una va depender de la otra, si se descuida una se verá reflejada en las demás. Por ende, se expresará en el programa inicialmente realizado.

Para tener un buen avance se debe de emplear la técnica más apropiada para realizar seguimiento a la obra, el encargado debe realizar un análisis previo de los posibles errores que se han cometido. Principalmente debe de reconocer si existen errores, ya sean de coordinación, entendimiento, tiempo, especificaciones, etc.; y por consiguiente en que actividades o eventos está afectando el avance de la obra. No debe dejar de



 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS


 JORGE JULIO
 ESPINOZA AVILA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 11534

verificar la calidad, ya que puede traer repercusiones importantes en el proyecto, teniendo en mente siempre, que será aplicado a un nivel gerencial operativo.

Anteriormente se habló de la programación a corto plazo como una técnica de monitoreo en un periodo corto en donde la temprana corrección y detección de errores, permite seguir con el progreso de las actividades, además de mostrar los requerimientos de recursos y lo más importante, que sean usados de manera eficiente. Es por esto por lo que se le debe de poner más interés a este sistema de programación en donde todas las condiciones afectarán el avance de la obra según el cronograma.

2.3.- CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

A partir de la realización de un control y monitoreo de las actividades en obra, se elabora un cronograma físico-financiero que permite controlar el avance de la obra, verificando y comparando lo programado con lo ejecutado respecto a la adquisición y valorización de los diversos elementos de la obra, a partir de este punto, se puede conocer si la empresa se encuentra con la capacidad de asumir financieramente los gastos que demanda el proyecto. Se muestra en anexos el documento descrito.

2.4.- AVANCE FÍSICO DE OBRA

El programar un buen plan de trabajo, así como la selección de cada uno de los recursos, materiales, humanos y financieros, no dan al proyecto una certeza éxito. Dentro del proceso de construcción, van a existir eventos o circunstancias que van a afectar el avance del mismo, por ello es importante detectarlos a tiempo para prevenir dicha problemática a través de un proceso de monitoreo.

Este proceso de monitoreo y control de actividades de lo planeado con lo realizado está comprendido de tres básicos elementos:

- Monitoreo de actividades
- Comparación del progreso con las metas establecidas
- Implementación de acciones correctivas o preventivas

Una vez realizado esto, se cuantificará el avance proyecto, en base a los metrados de las actividades realizadas en el día a día.

3.- CONTROL DE CALIDAD EN OBRA

3.1.- DESCRIPCIÓN

PSV CONSTRUCTORES S.A. implementa, documenta y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) como un medio para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos especificados por el cliente.

El Plan de Calidad describe la metodología, organización, medios y la secuencia de actividades que la empresa empleará para el cumplimiento de los requisitos contractuales uniformizando los métodos de trabajo, para lograr que en todo momento



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

JOSE JULIO
ESPINOSA AVILA'S
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 11901

las actividades, procesos y servicios se realicen sobre la base de cumplimiento de la política, objetivos de calidad y procedimientos elaborados dentro de la organización.

El área de Control de Calidad, en coordinación con las áreas involucradas en los procesos aplicables al proyecto, supervisarán las actividades propias del mismo para asegurar que se cumpla el Plan de Calidad.

La Organización del Proyecto logrará la aplicación efectiva del Sistema de Gestión de Calidad incluyendo procesos para la mejora continua y el aseguramiento de conformidad de los requerimientos regulatorios aplicables. El SGC es documentado, implementado, mantenido y mejorado continuamente.

PSV CONSTRUCTORES S.A. precisa en el SGC, los procesos que socorren al suministro de un producto o servicio que desempeña los requerimientos específicos, y mantiene estos procesos bajo control.

A partir de lo mencionado, la empresa plantea los siguientes objetivos:

- Implantar un plan de acción capaz de controlar y registrar la calidad de los trabajos implicados en el proyecto, buscando la mejora continua y la satisfacción del cliente.
- Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato marco y de las entidades y normativas reguladoras vigentes.
- Asegurar la aceptación de las obras por parte de la Supervisión.
- Mantener acciones de Control de Calidad que aseguren que los productos de cada proceso cumplirán con lo establecido en el Contrato.
- Establecer caminatas para detección y corrección oportuna de observaciones durante la construcción.
- Informar del cumplimiento de los procedimientos de Control de Calidad propios, y de nuestros subcontratistas y proveedores.



4.- CONTROL DE SSOMA EN LA OBRA


En el Anexo 06 se muestra el detalle del control de seguridad realizado durante el mes de Abril 2018.

5.- COMENTARIOS - MES DE ABRIL

5.1.- COMENTARIOS RESPECTO AL AVANCE DE OBRA



- La obra estuvo paralizada 62 días calendarios desde el día 30/01/2018 hasta el 01/04/2018 por actos vandálicos y terrorista ocurrido el día 30/01/2018; la reanudación de la obra fue el día 02/04/2018.
- Esta paralización ha causado gastos por Daños y Perjuicios, se tiene materiales consumibles en obra que con el tiempo se han echado a perder, como son cemento, acero, aditivos, etc.; se ha tenido encofrado metálico en alquiler que no se ha dado uso en el lapso del tiempo que duro la paralización, sin embargo, el costo por alquiler ha seguido transcurriendo, stand by de equipos propios, etc.;



 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA


JORGE JULIO
ESPICHÁN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. C.P. N° 11111

para la recuperación del acero corrugado colocado y habilitado se ha tenido que adquirir aditivos como el removedor de óxido y transformador de óxido y realizar una limpieza mecánica antes de realizar el fundido de concreto.

- Previo a la reanudación de la obra, se ha realizado gastos adicionales en la contratación de personal obrero nuevo; que tenga que cumplir con todos los protocolos de ingreso (exámenes médicos inducciones, uniforme, EPP, pasajes, etc.).
- Con lo que respecta a Seguridad y Salud en obra; se continua la implementación de los planes correspondientes al Área de Seguridad y Medio Ambiente, según lo presentado en la propuesta del proyecto.
- El Plan de Manejo Ambiental, de riego y limpieza dentro de obra; de los Planes de Contingencia, de Seguimiento y Control.
- Las principales actividades realizadas en el proyecto fueron:
 - Obras Preliminares: Baños Químicos, cerco de malla rashell, agua para construcción, energía eléctrica provisional y flete terrestre.
 - Seguridad y Salud: Elaboración, implementación y administración de plan de seguridad y Salud Todo el personal Directo e Indirecto cuenta con sus implementos de protección individual y colectiva, Las instalaciones de la obra cuenta con señalización de seguridad, Se cuenta con los recursos para respuesta ante emergencias en seguridad y salud durante el trabajo.
 - Plan de Manejo Ambiental: se está realizando labores Riego del área de trabajo y limpieza general de obra; se hace cumplimiento Plan de contingencia, Plan de Seguimiento y Control, Medida de concientización y educación ambiental.
 - Estructuras: Falso piso, vigas, losa aligerada, columnas, Muro y Tabiques de Albañilería en los diferentes sectores: Servicios, Cuarto de control, Administración, Tareas Previas.
 - Protección con Enrocado: se ha extraído y suministrado roca para la protección con enrocado, excavación de uña, enrocado en uña y talud y colocación de geotextil.
 - En Obra de Mar: se ha picado la losa del muelle, colocación de aditivo trasformador de óxido, fundido de vigas prefabricada para plataforma baja nueva.
- Es necesario continuar con el sistema de planificación empleado para poder cuantificar el desarrollo de las actividades realizadas en el proyecto, además de poder localizar los posibles inconvenientes que se puedan presentar en el proyecto, para que, a partir de ello, se pueda lograr solucionar dichos problemas antes de que sean presentados en el proyecto; así de esta manera, cumplir a cabalidad con las fechas previstas para cada actividad.
- El avance del presente mes es de 4.12%, el avance acumulado que se tiene hasta la fecha es de 21.40%.





 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA



 JORGE JULIO
 ESPINOSA AVILA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 115004



5.2. COMENTARIOS RESPECTO AL CONTROL DE CALIDAD EN OBRA

- Se está a la espera de las respuestas de los RFI (Solicitud de Información) 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 recepcionada por la supervisión.
- Según acta de reunión del día 02/02/2018 entre Fondepes y PSV, se acordó que Fondepes entregaría el Proyecto de Media Tensión aprobado al contratista en aproximadamente 15 días, en reunión del día 16/04/2018 en oficina de FONDEPES, se hizo la consulta a la entidad y nos informan que el expediente ya ha sido aprobado por el concesionario (Municipalidad) y que nos estarán haciendo la entrega formal a la brevedad; hasta la fecha no se puede iniciar los trabajos sobre el Sistema de Utilización en Media Tensión, ya que no existe respuesta formal por parte de la Entidad.
- Con fecha 12-02-2018 se generó el RFI 10 sobre el expediente técnico de IIEE Baja tensión, mencionándose los puntos más críticos en referencia a las observaciones indicadas en el RFI N°05, las cuales implicarían cambios considerables en el expediente técnico de IIEE Baja tensión.
- El Informe N° 012-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/RGYC de fecha 25 de Marzo del 2018, respecto a las consultas indicadas en el RFI-10, recomienda dar mejoras al expediente técnico y replantear conforme a las recomendaciones del especialista de PSV en la mayoría de sus puntos.
- Así mismo, en reunión del día 16 de Abril 2018, en oficina de FONDEPES, se acordó que el expediente técnico de IIEE Baja tensión será replanteado conforme a los puntos indicados en dicha reunión y las consideraciones planteadas en otros DPAs. (entregadas vía correo al especialista de FONDEPES), tampoco se contó con la presencia de la supervisión en esta reunión.
- Conforme a los 3 puntos anteriores y teniendo programado el fundido de concreto en la losa de tareas previas, servicios y administración para el siguiente mes y ya estando fundido la losa del cuarto de control, se solicita mediante cuaderno de Obra que la supervisión que coordine con la Entidad FONDEPES para que indique fecha de entrega de estas mejoras y replanteos del expediente técnico o caso contrario confirme continuar con los planos contractuales, indicando que de continuar con los planos contractuales, la ejecución de futuros planos replanteados conllevará a diversas demoliciones.
- En reunión del día 30/04/2018 en oficina de FONDEPES, se continuaron con las coordinaciones con el Ingeniero Ruben Yacolca de FONDEPES, sobre la actualización del expediente técnico de IIEE Baja tensión. Conforme a lo acordado en la reunión del día 30/04/2018 en oficina de FONDEPES, se enviarán RFIs sobre planteamientos de nuevo ambiente para grupo electrógeno y la construcción de un sardinel en muelle para embeber las tuberías eléctricas. El ingeniero Ruben Yacolca de FONDEPES, estará enviando el replanteo de las IIEE en el muelle para que se considere antes del fundido de la losa.



Luis Alberto Avila Merillas
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS


JORGE JULIO
ESPICHAN AVILES
INGENIERO CIVIL 36
 Reg. CIP N° 119000

- En reunión del día 30/04/2018 en oficina de FONDEPES, se reiteró la entrega de planos de seguridad y evacuación, necesarios para compatibilizar con la actualización del expediente técnico de IIEE Baja tensión, los mismos que servirán para el replanteo de las salidas de alarmas contra incendio y luces de emergencia, aun no se cuenta con fecha de entrega; en esta reunión también se reiteró a los especialistas de Arquitectura de FONDEPES actualizar la Arquitectura del DPA, considerando los planos de evacuación y seguridad, detalles solicitados por nuestro especialista de frio (CATRI), ubicación de cisterna, retiro de escalera en zona de frio, entre otros, hasta la fecha no se tiene respuesta; se informó sobre el retiro de la cobertura existente en el muelle, solicitándonos se regularice mediante respuesta al RFI presentado. Al respecto se coordinó con Ingeniero Ruben Yacolca de FONDEPES, quien analizará las respectivas modificaciones de las instalaciones eléctricas involucradas para la actualización del expediente técnico de IIEE Baja tensión
- Cabe resaltar que las demoras en la entrega de las mejoras del expediente, ocasionaría retrasos en la ejecución de la obra y/o trabajos por rehacer, adicionales, mayores metrados y/o deductivos.
- Se ha verificado el déficit de abastecimiento de agua potable: cobertura baja, se tiene 1 hora al día por zonas, cuando hay desabastecimiento compran a un camión cisterna de agua. Debido a ello con la finalidad de previsión se está viendo la necesidad de considerar una PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POR OSMOSIS INVERSA.

5.3.- COMENTARIOS RESPECTO AL SSTMA EN LA OBRA

Entre las actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente programadas para el siguiente mes, tenemos:

- Elaboración de Permisos de Trabajo específicos y Check List para Equipos y Servicios.
- Ejecución de Entrenamiento Diario de Seguridad.
- Reforzar una Cultura de Prevención en el personal.

6.- RESPONSABILIDADES



Residente de Obra


Liderar, organizar, coordinar y supervisar directamente las operaciones en campo, según los planos, normas y especificaciones técnicas aplicables y los parámetros o adecuaciones establecidas.

Ingenieros de Campo / Producción

Organizar, Coordinar, Planificar y distribuir las actividades diarias de la producción, cumpliendo con el cronograma de obra y secuencia de actividades establecidas.

Registrar los resultados de las inspecciones en los formatos de aseguramiento de calidad correspondientes.



 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA


 JORGE JULIO
 ESPICHAN AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 119017

Supervisar el suministro de equipos, herramientas y materiales necesarios para las actividades programadas; verificar y reportar acerca de la disponibilidad de los materiales, equipos y herramientas para ejecutar las actividades programadas.

Cumplir los lineamientos establecidos por el Programa de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del Proyecto

Cuidar y mantener en forma adecuada las herramientas y equipos requeridos para desempeñar su función.

Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente

Liderar, organizar, coordinar y supervisar la adecuada implementación de los procedimientos, dentro del marco de aplicación de las políticas y estándares de seguridad esperados por el cliente.

Ingeniero Encargado de Oficina Técnica

Realizar el control y seguimiento de la obra mediante la realización de reportes diarios y mensuales del avance de obra.

Supervisar el llenado de los protocolos o registros respectivos durante la ejecución del proyecto.

Realizar los reportes de obra solicitados por el Cliente y la Gerencia de la Empresa.

Revisar los documentos de construcción aplicables (planos, especificaciones técnicas, procedimientos, otros).

Controlar, Archivar y distribuir los planos, especificaciones técnicas con revisión vigente y recuperar los planos u especificaciones técnicas superadas.

Administrar las modificaciones o cambios de los documentos contractuales previos al inicio y durante la ejecución de la obra.

Elaborar las consultas técnicas al cliente.

Registrar diariamente información correspondiente al informe de producción a través de los formatos de control.



7.- RECURSOS


Personal Indirecto:

- 01 Ingeniero Residente de Obra
- 01 Ingeniero Encargado de Oficina Técnica
- 01 Ingeniero de Jefe de Producción
- 01 Ingeniero Especialista en Estructura
- 01 Ingeniero Especialista en IIEE
- 01 Ingeniero Especialista en IISS
- 01 Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente
- 01 Administrador de Obra
- 01 Responsable de Logística
- 01 Encargado de Almacén
- 01 Conductor
- 03 Guardianes

Equipo y Maquinaria:

- 01 Grúa de Celosía Fuchs F118.3 20 Ton.
- 01 Martillo Hinca pilotes D36-42




 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA


 JORGE JULIO
 ESTACIÓN AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C. 1111111111

- 01 Retroexcavadora
- 01 Excavadora sobre oruga
- 02 Camión Volquete 15 m³
- 01 Compresora de aire eléctrica.
- 01 Motosoldadora
- 02 Equipo de Oxicorte
- 01 Generador Eléctrico Panther 170F
- 01 Trompo Mezclador de Concreto 9p³
- 01 Trompo Mezclador de Concreto 11p³
- 02 Camioneta Pickup Nissan Frontier
- 01 Nivel Topográfico Leica NA332
- 01 Estación Total
- 02 Vibradoras de aguja para concreto.
- 01 Plancha Compactadora
- 01 Vibro apisonador
- 01 Rodillo Liso 1 Tn.
- 01 Mesa Sierra circular
- 01 Sierra circular de mano.
- 01 Tronzadora
- 05 Amoladoras 4 ½" y 7"
- 16 Cuerpos de andamios
- 478 m² Encofrado Metálico, Paneles, Viga, Cabezal, Trípode y puntales; para encofrado de muros, frisos y fondo de losa.





Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA



GERARDO JULIO
 ESCOBAR AVILA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 119009

**ANEXO N° 01:
VALORIZACIÓN DE OBRA**


 **Luis Alberto Añón Morales**
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA
JULIO
ESPINOSA AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 119009



RESUMEN GENERAL

VALORIZACIÓN N° 07

Abril 2018

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.
CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
FECHA: 30 de Abril del 2018

I.- MONTO PRESUPUESTO CONTRACTUAL SIN IGV : **SI. 7,517,937.53**

II.- VALORIZACIÓN **SI. 261,806.21**

COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES + UTILIDAD	SI. 309,716.74
AMORTIZACIÓN ADELANTO DIRECTO	SI. 30,971.67
AMORTIZACIÓN ADELANTO POR MATERIALES DEDUCTIVO	SI. 61,943.35
SUB TOTAL	SI. 216,801.71
VALORIZACIÓN:	SI. 216,801.71
IGV 18 %:	39,024.31
TOTAL (Incl. IGV):	SI. 255,826.02

IV.- PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL

Porcentaje de avance de la presente valorización:

4.12%

Porcentaje de avance acumulado:

21.40%

Son: Doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos ventiseis con 02/100 Soles incluido IGV.



Luis Alberto Avila Morales
Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

JOSE JULIO ESPICAYAN AVILES
JOSE JULIO ESPICAYAN AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 115009



CUADRO DE AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO Abril 2018

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.
CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO.
FECHA: 30 de Abril del 2018

1) MONTO VALORIZADO POR PSV

Descripción	SUB TOTAL	IGV (18 %)	TOTAL
MONTO DEL CONTRATO	S/. 7,517,937.53	S/. 1,353,228.76	S/. 8,871,166.29

% Avance de obra = **4.12%**

Monto Valorizado PSV = (Monto Contractual PSV) * (% Avance de Obra)
Monto Valorizado PSV (Sin IGV) = S/. 309,716.74 (b)

2) MONTO TOTAL Y CÁLCULO DEL % AMORTIZACIÓN POR CONCEPTO DE ADELANTOS

Adelantos Otorgados	PARCIAL	IGV (18 %)	TOTAL
Adelanto Directo	S/. 751,793.75	S/. 135,322.88	S/. 887,116.63
TOTAL DE ADELANTOS	S/. 751,793.75	S/. 135,322.88	S/. 887,116.63


% para Amortización por Total Adelantos = % del avance del mes
% para Amortización por Adelanto Directo = **4.12%** (a)



3) AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO EN LA VALORIZACIÓN (SIN IGV)

N° Valorización	Monto Val (Sin Reajuste) sin IGV (b)	Monto Total Adelantos sin IGV (c / c')	Amortización		
			Parcial sin IGV d = a x c	Acumulado sin IGV (e)	Saldo sin IGV f = c - e
Adelanto Directo		S/. 751,793.75			S/. 751,793.75
VALORIZACIÓN N° 01	S/. 138,824.66		S/. 13,882.47	S/. 13,882.47	S/. 737,911.28
VALORIZACIÓN N° 02	S/. 91,772.13		S/. 9,177.21	S/. 23,059.68	S/. 728,734.07
VALORIZACIÓN N° 03	S/. 1,040,648.68		S/. 104,064.87	S/. 127,124.55	S/. 624,669.20
VALORIZACIÓN N° 04	S/. 27,782.27		S/. 2,778.23	S/. 129,902.78	S/. 621,890.97
VALORIZACIÓN N° 05	S/. 0.00		S/. 0.00	S/. 129,902.78	S/. 621,890.97
VALORIZACIÓN N° 06	S/. 0.00		S/. 0.00	S/. 129,902.78	S/. 621,890.97
VALORIZACIÓN N° 07	S/. 309,716.74		S/. 30,971.67	S/. 160,874.45	S/. 590,919.30

Amortización Calculada = (adelanto) * (% PARA AMORTIZACIÓN)

Amortización Calculada Actual= **S/. 30,971.67**


 JUAN JULIO
 ESPICHAN AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009



 Luis Alberto Acuña Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS



CUADRO DE AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES Abril 2018

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.
CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO.
FECHA: 30 de Abril del 2018

1) MONTO VALORIZADO POR PSV

Descripción	SUB TOTAL	IGV (18 %)	TOTAL
MONTO DEL CONTRATO	S/. 7,517,937.53	S/. 1,353,228.76	S/. 8,871,166.29

% Avance de obra acumulado = 4.12%

Monto Valorizado PSV = (Monto Contractual PSV) * (% Avance de Obra)
 Monto Valorizado PSV (Sin IGV) = S/. 309,716.74 (b)

2) MONTO TOTAL Y CÁLCULO DEL % AMORTIZACIÓN POR CONCEPTO DE ADELANTOS

Adelantos Otorgados	PARCIAL	IGV (18 %)	TOTAL
Adelanto de Materiales	S/. 1,503,587.54	S/. 270,645.76	S/. 1,774,233.30
TOTAL DE ADELANTOS	S/. 1,503,587.54	S/. 270,645.76	S/. 1,774,233.30

% para Amortización por Total Adelantos = % del avance del mes

% para Amortización por Adelanto de Materiales = 4.12% (a)


3) AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES EN LA VALORIZACIÓN (SIN IGV)

N° Valorización	Monto Val (Sin Reajuste) sin IGV (b)	Monto Total Adelantos sin IGV (c / c')	Amortización		
			Parcial sin IGV d = a x c	Acumulado sin IGV (e)	Saldo sin IGV f = c - e
Adelanto Directo		S/. 1,503,587.54			S/. 1,503,587.54
VALORIZACIÓN N° 03	S/. 1,040,648.68		S/. 254,249.10	S/. 254,249.10	S/. 1,249,338.44
VALORIZACIÓN N° 04	S/. 27,782.27		S/. 5,556.45	S/. 259,805.55	S/. 1,243,781.99
VALORIZACIÓN N° 05	S/. 0.00		S/. 0.00	S/. 259,805.55	S/. 1,243,781.99
VALORIZACIÓN N° 06	S/. 0.00		S/. 0.00	S/. 259,805.55	S/. 1,243,781.99
VALORIZACIÓN N° 07	S/. 309,716.74		S/. 61,943.35	S/. 321,748.90	S/. 1,181,838.64

Amortización Calculada = (adelanto) * (% PARA AMORTIZACIÓN)

Amortización Calculada Actual= S/. 61,943.35


 SR. JULIO
 ESPINOZA AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009


 Luján Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS



VALORIZACIÓN N° 07

Abril 2018

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
 UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.
 CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
 FECHA: 30 de Abril del 2018

Item	Descripción	Costo Directo S/.	Valorización Anterior S/.	Valorización Actual S/.	Valorización Acumulada S/.	Saldo a Valorizar S/.
001	ESTRUCTURAS	2,309,433.94	1,009,808.74	226,477.18	1,236,285.92	1,073,148.01
002	ARQUITECTURA	1,196,490.72	13,977.10	12,975.04	26,952.14	1,169,538.57
003	INSTALACIONES SANITARIAS	803,797.67	-	-	-	803,797.67
004	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	395,182.34	-	-	-	395,182.34
005	OBRAS DE MAR	630,698.61	74,293.38	22,353.99	96,647.37	534,051.27
006	EQUIPAMIENTO	1,019,373.50	-	-	-	1,019,373.50
COSTO DIRECTO						
		6,354,976.78	1,098,079.22	261,806.21	1,359,885.43	4,995,091.36
	GASTOS GENERALES	781,662.14	135,063.74	32,202.16	167,265.91	614,396.24
	UTILIDAD	381,298.61	65,884.75	15,708.37	81,593.13	299,705.48
	SUB-TOTAL PRESUPUESTO	7,517,937.53	1,299,027.71	309,716.74	1,608,744.47	5,909,193.08
	AMORTIZACIÓN POR ADELANTO DIRECTO		129,902.78	30,971.67	129,902.78	621,890.97
	AMORTIZACIÓN POR ADELANTO DE MATERIALES		259,805.55	61,943.35	259,805.55	1,243,781.99
	TOTAL PRESUPUESTO (sin IGV)	7,517,937.53	1,039,222.16	216,601.71	1,348,938.92	4,665,411.09
AVANCE DE OBRA (%)						
		100.00%	17.28%	4.12%	21.40%	78.60%

Luis Alberto Avilés Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

JORGE JULIO
 ESPICHAN AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 119003

000207


VALORIZACIÓN N° 07

Abril 2018

001.- ESTRUCTURAS


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
 UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
 FECHA: 30 de Abril del 2018

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Sub Total S/.	Valorización anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Saldo a Valorizar	
						Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.
01	OBRAS PRELIMINARES				107,384.11								
01.01	ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA	m ²	80.00	80.14	6,411.20	60,784.11	14,645.30	76,428.41	80.00	6,411.20	31,984.70		
01.02	CARTEL DE OBRA DE 2.40 m. x 3.60 m.	Pza.	1.00	1,422.29	1,422.29	1,422.29		1,422.29	1.00	1,422.29			
01.03	BAÑOS QUÍMICOS PARA EL PERSONAL	Mes	8.00	1,750.00	14,000.00	7,000.00		8,750.00	5.00	8,750.00			5,250.00
01.04	CERCO DE MALLA RASHELL CON MADERA ROLLIZO	m.	1,500.00	20.45	30,675.00	14,315.00	394.00	21,145.30	1,034.00	1,034.00	466.00		9,528.70
01.05	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	Mes	8.00	500.00	4,000.00	2,000.00	1.00	2,000.00	5.00	2,500.00	3.00		1,500.00
01.06	TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	Gib.	1.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00		6,000.00	0.50	6,000.00	0.50		6,000.00
01.07	TANQUE DE ALMACENAMIENTO PROVISIONAL DE AGUA PARA LA OBRA (9 m ³)	Pza.	1.00	1,375.62	1,375.62	1,375.62		1,375.62	1.00	1,375.62			
01.08	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	Mes	8.00	300.00	2,400.00	1,200.00		1,200.00	5.00	1,500.00	3.00		900.00
01.09	FLETE TERRESTRE	Gib.	1.00	35,100.00	35,100.00	21,060.00	0.15	5,265.00	0.75	26,325.00	0.25		8,775.00
02	SEGURIDAD Y SALUD				26,124.72	13,323.61		16,468.58					9,666.16
02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Und.	1.00	6,350.00	6,350.00	3,238.50	0.12	762.00	0.63	4,000.50	0.37		2,349.50
02.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	Und.	1.00	1,128.00	1,128.00	575.28	0.12	135.36	0.63	710.64	0.37		417.36
02.03	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	Und.	1.00	15,823.50	15,823.50	8,089.99	0.12	1,888.82	0.63	9,968.81	0.37		5,854.70
02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	Und.	1.00	1,113.22	1,113.22	567.74	0.12	133.59	0.63	701.33	0.37		411.89
02.05	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	Und.	1.00	1,710.00	1,710.00	872.10	0.12	205.20	0.63	1,077.30	0.37		632.70
03	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				17,935.56	10,603.03		18,111.82					6,620.71
03.01	RIEGO DEL AREA DE TRABAJO	m ²	3,155.28	1.29	4,070.31	2,035.16	384.41	508.79	1,972.05	2,543.94	1,183.23		1,526.37
03.02	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	m ²	3,155.28	0.71	2,240.25	1,577.64	394.41	280.03	1,972.05	1,400.16	1,183.23		840.09
03.03	PLAN DE CONTINGENCIA	Und.	1.00	2,000.00	2,000.00	1,020.00	0.12	240.00	0.63	1,260.00	0.37		740.00
03.04	PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	Und.	1.00	3,000.00	3,000.00	1,530.00	0.12	360.00	0.63	1,890.00	0.37		1,110.00
03.05	PLAN DE CIERRE Y ABANDONO	Und.	1.00	2,500.00	2,500.00	1,275.00	0.12	300.00	0.63	1,575.00	0.37		925.00
03.06	MEDIDAS DE CONCIENTIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL	Und.	1.00	1,025.00	1,025.00	522.75	0.12	123.00	0.63	645.75	0.37		379.25
03.07	CARTEL DE MANEJO AMBIENTAL 1.00 X 0.5 M	Und.	8.00	200.00	1,600.00	1,600.00			8.00	1,600.00			
03.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR DE BASURA	Und.	10.00	150.00	1,500.00	1,500.00			10.00	1,500.00			
04	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO				37,872.23	37,872.23							
04.01	DEMOLICION DE MUROS DE ALBANILERIA- CABEZA	m ²	149.42	3.28	490.10	149.42		490.10	149.42	490.10			
04.02	DEMOLICION DE MUROS DE ALBANILERIA- SOGA	m ²	606.90	3.28	1,980.63	606.90		1,980.63	606.90	1,980.63			
04.03	DEMOLICION DE MUROS DE ALBANILERIA-CANTO	m ²	17.10	2.98	50.96	17.10		50.96	17.10	50.96			
04.04	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO SIMPLE	m ³	641.99	11.91	7,646.10	641.99		7,646.10	641.99	7,646.10			
04.05	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m ²	2,820.00	5.02	13,152.40	2,820.00		13,152.40	2,820.00	13,152.40			
04.06	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO	m ³	106.60	16.15	1,721.59	106.60		1,721.59	106.60	1,721.59			
04.07	DESMTAJE DE APARATOS ELECTRICOS	Und.	6.00	6.60	39.60	39.60		39.60	6.00	39.60			
04.08	DESMTAJE DE APARATOS SANITARIOS	Und.	10.00	52.44	524.40	524.40		524.40	10.00	524.40			
04.09	DESMTAJE DE EQUIPAMIENTO EN ZONA DE FRIO	Und.	1.00	524.45	524.45	524.45		524.45	1.00	524.45			


 Luis Alberto Amador Morales
 C.I.P. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

JOSÉ LUIS JULIO
 ESPINOZA AVILES
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 112009

05.05.02	EXCAVACION DE PATIOS DE MANIOBRAS MASIVA	m ³	575.00	5.30	3,047.50	-	-	-	-	-	575.00	3,047.50
05.05.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO	m ³	189.80	16.41	3,114.62	-	-	-	-	-	189.80	3,114.62
05.05.04	ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m ³	539.28	11.00	5,932.08	-	-	-	-	-	539.28	5,932.08
05.05.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m ³	539.28	20.47	11,038.06	-	-	-	-	-	539.28	11,038.06
05.05.06	NIVELACION EXTERIOR PATIO DE VEREDAS	m ²	1,150.00	4.99	5,738.50	-	-	-	-	-	1,150.00	5,738.50
05.05.07	AFIRMADO H=0.30 EN 2 CAPAS	m ²	1,150.00	28.34	32,591.00	-	-	-	-	-	1,150.00	32,591.00
05.05.08	LOSA DE CONCRETO FC=315KG/CM2	m ³	253.00	462.05	116,896.65	-	-	-	-	-	253.00	116,896.65
05.05.09	LOSA DE CONCRETO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m ²	180.28	49.59	7,948.29	-	-	-	-	-	180.28	7,948.29
05.05.10	LOSA DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2	Kg.	17,303.44	4.16	71,982.31	-	-	-	-	-	17,303.44	71,982.31
05.05.11	JUNTA DE DILATACION CON TECNOPORT E=1"	m.	728.55	3.55	2,596.35	-	-	-	-	-	728.55	2,596.35
05.06	INSTALACIONES SANITARIAS CONCRETO ARMADO				219,225.07							171,621.59
05.06.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m ²	95.03	3.53	335.46	95.03	335.46	95.03	335.46	95.03	95.03	335.46
05.06.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m ²	333.79	1.10	367.17	333.79	367.17	333.79	367.17	333.79	333.79	367.17
05.06.03	EXCAVACION DE ESTRUCTURAS PARA CIMENTACION	m ³	323.47	35.05	11,337.62	323.47	11,337.62	323.47	11,337.62	323.47	323.47	11,337.62
05.06.04	NIVELACION INTERIOR APISONADO PARA FALSO PISO PATIO Y VEREDAS	m ²	116.20	4.99	579.84	116.20	579.84	116.20	579.84	116.20	116.20	579.84
05.06.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m ³	199.27	40.79	8,128.22	199.27	8,128.22	199.27	8,128.22	199.27	199.27	8,128.22
05.06.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m ³	4.19	79.89	334.74	4.19	334.74	4.19	334.74	4.19	4.19	334.74
05.06.07	ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m ³	174.15	11.00	1,915.65	174.15	1,915.65	174.15	1,915.65	174.15	174.15	1,915.65
05.06.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m ³	174.15	20.47	3,564.85	174.15	3,564.85	174.15	3,564.85	174.15	174.15	3,564.85
05.06.09	SOLADO CONCRETO FC=100KG/CM2 H=4"	m ²	52.69	30.99	1,627.59	52.69	1,627.59	52.69	1,627.59	52.69	52.69	1,627.59
05.06.10	ZAPATAS, CONCRETO Fc=315 kg/cm2	m ³	3.91	475.25	1,858.23	3.91	1,858.23	3.91	1,858.23	3.91	3.91	1,858.23
05.06.11	ZAPATAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2	Kg.	262.92	4.16	1,093.75	262.92	1,093.75	262.92	1,093.75	262.92	262.92	1,093.75
05.06.12	COLUMNAS, CONCRETO Fc=315 kg/cm2	m ³	1.02	538.54	549.31	1.02	549.31	1.02	549.31	1.02	1.02	549.31
05.06.13	COLUMNAS, ENFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	15.59	58.33	909.36	15.59	909.36	15.59	909.36	15.59	15.59	909.36
05.06.14	COLUMNAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2	Kg.	843.26	4.16	3,507.96	843.26	3,507.96	843.26	3,507.96	843.26	843.26	3,507.96
05.06.15	VIGAS, CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m ³	0.73	527.05	384.75	0.73	384.75	0.73	384.75	0.73	0.73	384.75
05.06.16	VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	7.81	57.12	446.11	7.81	446.11	7.81	446.11	7.81	7.81	446.11
05.06.17	VIGAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2	Kg.	127.97	4.16	532.36	127.97	532.36	127.97	532.36	127.97	127.97	532.36
05.06.18	MURO DE CONCRETO Fc=315 kg/cm2	m ³	86.46	542.12	46,871.70	77.81	42,182.36	77.81	42,182.36	77.81	77.81	42,182.36
05.06.19	MURO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	955.06	69.30	66,185.66	859.56	59,567.51	859.56	59,567.51	859.56	859.56	59,567.51
05.06.20	MURO, ACERO Fy=4200 kg/cm2	Kg.	7,788.16	4.16	32,388.75	7,788.16	32,388.75	7,788.16	32,388.75	7,788.16	7,788.16	32,388.75
05.06.21	LOSA ALIGERADA, CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m ³	0.81	395.77	241.42	-	-	-	-	-	0.81	241.42
05.06.22	LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	7.00	48.93	342.51	-	-	-	-	-	7.00	342.51
05.06.23	LOSA ALIGERADA, ACERO Fy=4200 kg/cm2	Kg.	120.35	4.16	500.66	-	-	-	-	-	120.35	500.66
05.06.24	LOSA ALIGERADA, LADRILLO HUECO 15X30X30	Und.	59.00	3.23	190.57	-	-	-	-	-	59.00	190.57
05.06.25	LOSAS MACIZAS CONCRETO Fc=280 kg/cm2	m ³	24.65	464.44	11,448.45	-	-	-	-	-	24.65	11,448.45
05.06.26	LOSAS MACIZAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m ²	39.80	55.38	2,193.05	-	-	-	-	-	39.80	2,193.05
05.06.27	LOSAS MACIZAS, ACERO Fy=4200 kg/cm2	Kg.	2,485.54	4.16	10,381.45	-	-	-	-	-	2,485.54	10,381.45
05.06.28	MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M.1:4 E=1.5cm	m ²	17.07	65.28	1,114.33	-	-	-	-	-	17.07	1,114.33
05.06.29	LADRILLO PASTELERO	m ²	21.84	78.63	1,673.60	-	-	-	-	-	21.84	1,673.60
05.06.30	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS INTERIORES	m ²	302.95	27.10	8,208.95	-	-	-	-	-	302.95	8,208.95
05.07	SISTEMA DE AGUA FRIA CISTERNA, TANQUE ELEVADO				125,558.84							92,259.59
05.07.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m ²	39.60	3.53	139.79	39.60	139.79	39.60	139.79	39.60	39.60	139.79
05.07.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m ²	39.60	1.10	43.56	39.60	43.56	39.60	43.56	39.60	39.60	43.56
05.07.03	EXCAVACION DE ESTRUCTURAS PARA CIMENTACION	m ³	140.58	35.05	4,927.33	140.58	4,927.33	140.58	4,927.33	140.58	140.58	4,927.33
05.07.04	NIVELACION INTERIOR APISONADO PARA FALSO PISO PATIO Y VEREDAS	m ²	39.60	4.99	197.60	39.60	197.60	39.60	197.60	39.60	39.60	197.60
05.07.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m ³	53.28	40.79	2,173.29	53.28	2,173.29	53.28	2,173.29	53.28	53.28	2,173.29
05.07.06	ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m ³	122.22	11.00	1,344.42	122.22	1,344.42	122.22	1,344.42	122.22	122.22	1,344.42


Luis Alberto Tovar Morales
 C.I.P. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

JULIO - JULIO -
 SP. CHANAVILES
 INGENIERO CIVIL
 Ref: CIP N° 119009

09.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m ²	19.00	1.10	20.90	-	-	19.00	20.90	19.00	20.90	-	-
09.02	EXCAVACION PARA UNA ANTISOCAVAMIENTO	m ³	41.80	7.63	318.93	-	-	41.80	318.93	41.80	318.93	-	-
09.03	REFINE Y PERFILADO DE TALUD ZONA ENROCADO	m ³	108.30	5.08	550.16	-	-	108.30	550.16	108.30	550.16	-	-
09.04	EXTRACCION DE ROCA CON MAQUINARIA	m ³	182.50	27.50	4,488.75	-	-	182.50	4,488.75	182.50	4,488.75	-	-
09.05	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DE CANTERA-OBRA Dmin=0.8m	m ³	182.50	31.69	5,149.63	-	-	182.50	5,149.63	182.50	5,149.63	-	-
09.06	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE, Dmin=0.8m	m ³	62.70	16.90	1,059.63	-	-	62.70	1,059.63	62.70	1,059.63	-	-
09.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE, Dmin=0.8m	m ³	99.75	14.08	1,404.48	-	-	99.75	1,404.48	99.75	1,404.48	-	-
09.08	SUMINISTRO Y HABILITACION DE GEOTEXTIL TEJIDO 270 gr/cm ²	m ²	146.30	8.43	1,233.31	-	-	146.30	1,233.31	146.30	1,233.31	-	-
	COSTO DIRECTO												
	GASTOS GENERALES		12.30%	S/.	2,309,433.94		1,009,908.74		238,477.16		1,236,286.92		1,073,148.01
	UTILIDAD		6.00%	S/.	284,060.37		124,206.48		27,856.69		152,063.17		131,987.21
	SUB-TOTAL PRESUPUESTO			S/.	138,566.04		60,588.52		13,588.63		74,177.16		64,388.98
	AMORTIZACION			S/.	2,732,060.35		1,194,603.74		267,822.86		1,462,626.25		1,269,634.10
	TOTAL PRESUPUESTO (sin IGV)			S/.	2,732,060.35		1,194,603.74		267,822.86		1,462,626.25		1,269,634.10
	AVANCE DE SUBPRESUPUESTO (%)				100.00%		43.73%		9.81%		63.63%		46.47%


 Luis Alberto Avila Morillo
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

JORGE JIMENO
 ESPECIALISTAS EN OBRAS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N. 11999




VALORIZACIÓN N° 07


Abril 2018

002.- ARQUITECTURA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
 UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.
 CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
 FECHA: 30 de Abril del 2018


Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Sub Total S/.	Valorización anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Saldo a Valorizar	
						Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.
10	ARQUITECTURA				1,196,490.72		13,977.10	12,976.04		26,952.14			1,169,538.57
10.01	MUROS Y TABICOS DE ALBAÑILERIA				155,165.34		13,977.10	12,976.04		26,952.14			128,602.25
10.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5cm	m ²	2,376.92	65.28	155,165.34	214.11	13,977.10	12,585.98	406.91	26,563.08		1,970.01	128,602.25
10.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				155,913.81								155,913.81
10.02.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES Y CERCO PERIMETRICO	m ²	2,406.04	28.39	68,307.48	-	-	-	-	-	-	2,406.04	68,307.48
10.02.02	TARRAJEO EN MURO, INTERIOR	m ²	2,210.86	22.65	50,076.43	-	-	-	-	-	-	2,210.86	50,076.43
10.02.03	TARRAJEO DE COLUMNAS	m ²	531.46	33.72	17,920.83	-	-	-	-	-	-	531.46	17,920.83
10.02.04	TARRAJEO DE VIGAS	m ²	61.17	50.48	3,087.86	-	-	-	-	-	-	61.17	3,087.86
10.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES 1:5	m ²	48.43	12.31	596.17	-	-	-	-	-	-	48.43	596.17
10.02.06	TARRAJEO DE MESAS DE CONCRETO CON CEMENTO PULIDO BOLEADO EN SERVICIOS HIGIENICOS	m ²	11.50	34.61	398.02	-	-	-	-	-	-	11.50	398.02
10.02.07	TARRAJEO DE MESAS DE CONCRETO PULIDO, RECEPCION DE ALIMENTOS HIDROBIOLÓGICOS	m ²	32.40	34.61	1,121.36	-	-	-	-	-	-	32.40	1,121.36
10.02.08	TARRAJEO DE MESAS DE CONCRETO PULIDO, TARRAJEO PULIDO DE MANILUVIOS, LAVADO DE BOTAS, LAVADEROS, ETC	m ²	11.86	34.61	410.47	-	-	-	-	-	-	11.86	410.47
10.02.09	TARRAJEO EN ESCALERAS	m ²	63.97	37.16	2,377.13	-	-	-	-	-	-	63.97	2,377.13
10.02.10	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CISTERNA	m ²	164.70	27.10	4,463.37	-	-	-	-	-	-	164.70	4,463.37
10.02.11	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN TANQUE ELEVADO	m ²	179.60	36.28	6,464.69	-	-	-	-	-	-	179.60	6,464.69
10.03	CIELO RASO				46,317.71								46,317.71
10.03.01	CIELO RASO CON MEZCLA C-A 1:5	m ²	1,114.21	41.57	46,317.71	-	-	-	-	-	-	1,114.21	46,317.71
10.04	PISOS Y PAVIMENTOS				152,842.97								152,842.97
10.04.01	FALSO PISO E=2" DE CONCRETO 1:10	m ²	1,324.64	34.80	46,097.47	-	-	11.18	389.06	389.06	11.18	1,313.46	45,708.41
10.04.02	PISO DE CEMENTO PULIDO (CON FIBRAS DE ACERO DRAMIX, INC. JUNTAS DE DILATACION)	m ²	861.57	42.14	36,306.56	-	-	-	-	-	-	861.57	36,306.56
10.04.03	PISO FROTACHADO BRUÑO	m ²	71.75	27.76	1,991.78	-	-	-	-	-	-	71.75	1,991.78
10.04.04	PISO DE PORCELANATO 0.6X0.6m ANTIDESLIZANTE	m ²	345.50	73.07	25,245.69	-	-	-	-	-	-	345.50	25,245.69
10.04.05	PISO DE PORCELANATO 0.3X0.3m ANTIDESLIZANTE	m ²	22.75	62.07	1,412.09	-	-	-	-	-	-	22.75	1,412.09
10.04.06	VEREDA DE CONCRETO Fc=175 kg/cm2 E=4" FROT. Y BRUÑO	m ²	688.04	52.57	36,170.26	-	-	-	-	-	-	688.04	36,170.26
10.04.07	VEREDA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	156.00	36.02	5,619.12	-	-	-	-	-	-	156.00	5,619.12
10.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				43,466.81								43,466.81
10.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO RECTIFICADO DE COLOR 0.30X0.60m	m ²	269.44	93.62	25,224.97	-	-	-	-	-	-	269.44	25,224.97
10.05.02	CONTRAZOCALO SANITARIO RECTIFICADO DE COLOR 0.30X0.60m (H=0.10m)	m	222.27	19.97	4,438.73	-	-	-	-	-	-	222.27	4,438.73
10.05.03	CONTRAZOCALO SANITARIO S/COLOREAR H=10 cm, MEZCLA 1:2, E=1.5cm	m	230.95	19.26	4,448.10	-	-	-	-	-	-	230.95	4,448.10
10.05.04	CONTRAZOCALO S/COLOREAR H=30cm, MEZCLA 1:2, E=1.5cm	m	624.50	14.98	9,355.01	-	-	-	-	-	-	624.50	9,355.01
10.06	COBERTURAS				114,898.91								114,898.91


Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS


JORGE JULIO ESPINOZA AVILÉS
 INGENIERO CIVIL

000201

10.06.01	COBERTURA POLICARBONATO COLOR BLANCO E=6mm(INCLUYE ACCESORIOS,PROVISION Y COLOCACION)	m ²	470.31	75.50	35,508.41	-	-	-	-	470.31	35,508.41
10.06.02	COBERTURA LADRILLO PASTELERO 24X24 ASENTADO CON MEZCLA 1:5 2.5cm JUNTA 1:5 1.5cm	m ²	1,050.00	75.61	79,390.50	-	-	-	-	1,050.00	79,390.50
10.07	CARPINTERIA DE MADERA				33,788.93						
10.07.01	PUERTA SIMPLE VAIVEN CONTRAPLACADA E=45mm, TRIPLAY LUPUNA 6mm CON MARCO DE MADERA CEDRO 1/24"x4"	m ²	4.32	351.90	1,520.21	-	-	-	-	4.32	1,520.21
10.07.02	PUERTA SIMPLE CONTRAPLACADA E=45mm, TRIPLAY LUPUNA 6mm CON MARCO DE MADERA CEDRO 1/24"x4"	m ²	37.80	351.90	13,301.82	-	-	-	-	37.80	13,301.82
10.07.03	PUERTA SIMPLE CONTRAPLACADA CON BARRA DISCAPAC. E=45mm, TRIPLAY LUPUNA 6mm CON MARCO DE MADERA CEDRO 1/24"x4"	m ²	2.40	372.78	894.87	-	-	-	-	2.40	894.87
10.07.04	PUERTA SIMPLE RANURADA APANELADA DEMADERA, CON MARCO DE MADERA, CEDRO 1 1/2"x6"	m ²	4.80	546.34	2,622.43	-	-	-	-	4.80	2,622.43
10.07.05	PUERTA DOBLE RANURADA APANELADA DE MADERA, CON MARCO DE MADERA, CEDRO 1 1/2"x6"	Und.	9.60	664.91	6,383.14	-	-	-	-	9.60	6,383.14
10.07.06	PUERTA SIMPLE APANELADA DE MADERA, CON MARCO DE MADERA, CEDRO 1 1/2"x6"	m.	2.88	888.37	2,558.51	-	-	-	-	2.88	2,558.51
10.07.07	TABIQUE DE MALAMINE PARA BAÑOS Y VESTIDORES, E=18mm	m ²	24.08	154.72	3,725.66	-	-	-	-	24.08	3,725.66
10.07.08	PUERTA PARA TABIQUE DE MELAMINE PARA BAÑOS Y VESTIDORES, E=18mm	m ²	34.72	224.15	7,782.49	-	-	-	-	34.72	7,782.49
10.08	CARPINTERIA METALICA				137,803.36						137,803.36
10.08.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA 1.00x2.40m(INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	856.50	856.50	-	-	-	-	1.00	856.50
10.08.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA 0.80x2.10m(INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	828.00	828.00	-	-	-	-	1.00	828.00
10.08.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE ACERO 1.00x3.10m(INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	1,045.57	1,045.57	-	-	-	-	1.00	1,045.57
10.08.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE ACERO 1.20x2.50m(INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	954.71	954.71	-	-	-	-	1.00	954.71
10.08.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE 02 HOJAS DE ACERO 6.20x3.50m(INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	6,588.60	6,588.60	-	-	-	-	1.00	6,588.60
10.08.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO AL MUELLE 2 HOJAS DE ACERO 4.00x3.00m(INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	3,163.38	3,163.38	-	-	-	-	1.00	3,163.38
10.08.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA VAIVEN ALTO IMPACTO 1.80x2.40 (INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	11,573.01	11,573.01	-	-	-	-	1.00	11,573.01
10.08.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA VAIVEN ALTO IMPACTO 1.20x2.40 (INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	9,710.15	9,710.15	-	-	-	-	1.00	9,710.15
10.08.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA VAIVEN ALTO IMPACTO 1.40x2.40 (INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	10,874.43	10,874.43	-	-	-	-	1.00	10,874.43
10.08.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SIMPLE ALTO IMPACTO 0.80x2.40 (INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	8,778.70	8,778.70	-	-	-	-	1.00	8,778.70
10.08.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SIMPLE ALTO IMPACTO 1.00x2.40 (INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	9,244.43	9,244.43	-	-	-	-	1.00	9,244.43
10.08.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE ALTO IMPACTO 1.95x2.40 (INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	13,435.88	13,435.88	-	-	-	-	1.00	13,435.88
10.08.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE ALTO IMPACTO 1.80x2.40 (INC ACCESORIOS)	Und.	3.00	12,970.15	38,910.45	-	-	-	-	3.00	38,910.45
10.08.14	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"(Ver planos de detalles)	m.	48.06	124.81	5,998.37	-	-	-	-	48.06	5,998.37
10.08.15	PASAMANO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"(Ver planos de detalles)	m.	44.96	60.45	2,717.83	-	-	-	-	44.96	2,717.83



Lysis Alberto Avila Morales

 C.I.P. N° 84746

 SUPERVISOR DE OBRA


JORGE JULIO

 ESPINAN AVILES

 INGENIERO CIVIL

 R.C.I.P. N° 116093

10.08.16	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE EN MESADA DE RECEPCION DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS (INC MANDIL H=10cm, AMBOS LADOS)	m ²	32.40	285.58	9,252.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.40	9,252.79
10.08.17	TAPA METALICA CON PLANCHA DE FIERRO EN CISTERNA, INC TIRADOR, CANDADO Y ACCESORIOS(Ver planos de detalles)	Und.	2.00	290.36	580.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	580.72
10.08.18	TAPA METALICA CON PLANCHA DE FIERRO EN TANQUE ELEVADO INC TIRADOR, CANDADO Y ACCESORIOS(Ver planos de detalles)	Und.	2.00	290.36	580.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	580.72
10.08.19	ESCALERA DE METAL DE F°C° EN TANQUE SEPTICO(Ver planos de detalles)	Und.	1.00	386.98	386.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	386.98
10.08.20	ESCALERA DE METAL DE F°C° EN TANQUE ELEVADO(Va desde el 1er nivel hasta el T.E ver planos de detalles)	Und.	1.00	2,324.14	2,324.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	2,324.14
10.09.01	CARPINTERIA DE ALUMINIO VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES SUMISTRO E INSTALACION DE PUERTA SECCIONABLE	Und.	6.00	5,616.15	33,708.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	33,708.90
10.09.02	SUMISTRO E INSTALACION DE PUERTA SECCIONABLE ENROLLABLE 1.50x1.80m	Und.	1.00	4,918.15	4,918.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	4,918.15
10.09.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA ENROLLABLE 2.00x1.80m	Und.	5.00	2,304.81	11,524.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	11,524.05
10.09.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA VENTANA DE ALUMINIO Y CRISTAL LAMINADO 10mm	Und.	1.00	2,581.08	2,581.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	2,581.08
10.09.05	VENTANA DE ALUMINIO SEMIPESADO DE COLOR NATURAL, MALLA RACHEL Y CON VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6mm	m ²	10.82	477.72	5,168.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.82	5,168.93
10.09.06	VENTANA DE ALUMINIO SEMIPESADO DE COLOR NATURAL, MALLA RACHEL Y CON VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6mm	m ²	62.50	480.79	28,799.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.50	28,799.38
10.09.07	VENTANA DE ALUMINIO SEMIPESADO DE COLOR NATURAL, CON VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6mm	m ²	69.14	336.92	23,294.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.14	23,294.65
10.09.08	CRISTAL DE SEGURIDAD 10mm REFLEJANTE	m ²	1.35	453.72	612.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35	612.52
10.09.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO SIN BISEL EMPOTRADO EN PARED (e=3mm)	m ²	18.48	167.77	3,100.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.48	3,100.39
10.10.01	CERRAJERIA CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA, CON TIRADOR CERRADURA DE PERILLA EN PUERTAS CONTRAPLACADAS(SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES)	Pza.	34.00	75.84	2,578.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.00	2,578.56
10.10.03	BISAGRA CAPUCHINA DE 3"X3 1/2"	Und.	180.00	32.20	5,796.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	5,796.00
10.11.01	PINTURA EN MUROS INTERIORES CON EPOXICO	m ²	2,210.88	14.07	31,107.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,210.88	31,107.08
10.11.02	PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON EPOXICO	m ²	2,406.04	15.31	36,836.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,406.04	36,836.47
10.11.03	PINTURA EN COLUMNAS CON EPOXICO	m ²	531.46	15.31	8,136.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531.46	8,136.65
10.11.04	PINTURA EN VIGAS CON EPOXICO	m ²	61.17	15.96	976.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.17	976.27
10.11.05	PINTURA EN DERRAMES CON EPOXICO	m ²	48.43	15.31	741.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.43	741.46
10.11.06	PINTURA EN ESCALERAS CON EPOXICO	m ²	63.97	14.07	900.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.97	900.06
10.11.07	PINTURA EN CIELORRASO CON EPOXICO	m ²	1,114.21	16.11	17,949.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,114.21	17,949.92
10.11.08	PINTURA EN PISO CON EPOXICO	m ²	889.00	12.80	11,112.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	889.00	11,112.50
10.11.09	PINTURA PARA TANQUE ELEVADO CON EPOXICO	m ²	179.60	18.19	3,266.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.60	3,266.92
10.12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				29,892.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		29,892.77
10.12.01	INODORO BLANCO D'LOSA TERA NAC.+T.BAJO INC. ACCESORIOS	Pza.	19.00	238.00	4,522.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.00	4,522.00
10.12.02	URINARIO DE LOZA DE PICO BLANCO(INC. ACCESORIOS Y FLUXOMETRO)	Pza.	4.00	588.22	2,352.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	2,352.88
10.12.03	OVALIN (INC.ACCESORIOS)	Und.	18.00	79.00	1,422.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00	1,422.00
10.12.04	LAVATORIO CON PEDESTAL (INC.ACCESORIOS)	Pza.	3.00	85.00	255.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	255.00
10.12.05	GRIFERIA DE BRONCE CON TEMPORIZADOR AL MUEBLE(INC.ACCESORIOS)	Und.	32.00	185.90	5,948.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00	5,948.80


Alberto A. Ha Morillas
 CIP. N° 54 746
 SUPERVISOR DE OBRAS

10 DE JULIO
 ESPINAHAVILES
 INGENIERO CIVIL




VALORIZACIÓN N° 07

Abril 2018

003.- INSTALACIONES SANITARIAS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
 UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.
 CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
 FECHA: 30 de Abril del 2018


Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Sub Total S/.	Valorización anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Saldo a Valorizar	
						Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.
11	INSTALACIONES SANITARIAS				803,797.67								803,797.67
11.01	SISTEMA DE AGUA FRIA				36,656.20								36,656.20
11.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				309.76								309.76
11.01.01.01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS ML	m.	197.30	1.57	309.76							197.30	309.76
11.01.02	MOVIMIENTOS DE TIERRAS				5,559.91								5,559.91
11.01.02.01	EXCAV. DE ZANJA PARA TUBERIA	m.	197.30	11.68	2,304.46							197.30	2,304.46
11.01.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/TUBERIA	m.	197.30	2.13	420.25							197.30	420.25
11.01.02.03	CAMA DE APOYO E=0.10M	m.	197.30	7.37	1,454.10							197.30	1,454.10
11.01.02.04	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m.	197.30	7.00	1,381.10							197.30	1,381.10
11.01.03	SALIDAS DE AGUA FRIA				5,214.73								5,214.73
11.01.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP Ø 1/2"	Pto.	71.00	71.63	5,085.73							71.00	5,085.73
11.01.03.02	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP Ø 3/4"	Pto.	2.00	64.50	129.00							2.00	129.00
11.01.04	RED DE DISTRIBUCION				1,582.66								1,582.66
11.01.04.01	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRATUB PVC Ø=1/2" C-10	m.	5.00	12.99	62.95							5.00	62.95
11.01.04.02	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRATUB PVC Ø=3/4" C-10	m.	12.00	13.84	163.68							12.00	163.68
11.01.04.03	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRATUB PVC Ø=1" C-10	m.	3.30	12.28	40.52							3.30	40.52
11.01.04.04	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRATUB PVC Ø=1 1/2" C-10	m.	14.00	13.54	189.56							14.00	189.56
11.01.04.05	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRATUB PVC Ø=2" C-10	m.	23.00	14.69	337.87							23.00	337.87
11.01.04.06	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRATUB PVC Ø=2 1/2" C-10	m.	20.00	19.28	385.60							20.00	385.60
11.01.04.07	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRATUB PVC Ø=2 1/2" C-10 (T.E.-Cisterna)	m.	18.00	22.36	402.48							18.00	402.48
11.01.05	RED DE ALIMENTACION				2,106.88								2,106.88
11.01.05.01	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRATUB PVC Ø=2 1/2" C-10 (Solucion)	m.	6.00	19.28	115.68							6.00	115.68
11.01.05.02	SUM./INST. T/PRUEBA HIDRATUB HDPE Ø=2" C-10 (Cisterna-T.E)	m.	20.00	18.32	366.40							20.00	366.40
11.01.05.03	Sum./Inst./Prueba Hidraulica/Tuberia PVC C-10 1 1/2" (medidor-cisterna)	m.	120.00	13.54	1,624.80							120.00	1,624.80
11.01.06	ACCESORIOS				3,364.60								3,364.60
11.01.06.01	TEE PVC-SAP 1/2"	Und.	5.00	9.68	48.40							5.00	48.40
11.01.06.02	TEE PVC-SAP 3/4"	Und.	31.00	10.56	327.36							31.00	327.36
11.01.06.03	TEE PVC-SAP 1"	Und.	20.00	12.53	250.60							20.00	250.60
11.01.06.04	TEE PVC-SAP 1 1/2"	Und.	2.00	22.05	44.10							2.00	44.10
11.01.06.05	TEE PVC-SAP 2"	Und.	8.00	19.31	154.48							8.00	154.48
11.01.06.06	CODO PVC-SAP 1/2"	Und.	102.00	13.46	1,372.82							102.00	1,372.82
11.01.06.07	CODO PVC-SAP 3/4"	Und.	17.00	14.41	244.97							17.00	244.97
11.01.06.08	CODO PVC-SAP 1"	Und.	1.00	6.46	6.46							1.00	6.46
11.01.06.09	CODO PVC-SAP 2"	Und.	4.00	18.91	75.64							4.00	75.64
11.01.06.10	CODO PVC-SAP 2 1/2"	Und.	2.00	19.41	38.82							2.00	38.82
11.01.06.11	REDUCCION PVC SAP 3/4"-1/2"	Und.	39.00	11.26	439.14							39.00	439.14
11.01.06.12	REDUCCION PVC SAP 1"-3/4"	Und.	19.00	11.71	222.49							19.00	222.49
11.01.06.13	REDUCCION PVC SAP 1"-1/2"	Und.	3.00	5.96	17.88							3.00	17.88
11.01.06.14	REDUCCION PVC SAP 1 1/2"-1/2"	Und.	1.00	6.46	6.46							1.00	6.46


Luis Alberto Avila Morán
 CIP. N° 84 746
 SUPERVISOR DE OBRAS

000197


31 JULIO 2018

11.01.06.15	REDUCCION PVC SAP 1 1/2"-3/4"	Und.	1.00	6.76	6.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	6.76
11.01.06.16	REDUCCION PVC SAP 2 1/2"-1 1/2"	Und.	1.00	6.96	6.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	6.96
11.01.06.17	REDUCCION PVC SAP 2"-1/2"	Und.	5.00	12.96	64.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	64.80
11.01.06.18	TAPON DE PVC DE 2"	Und.	2.00	18.18	36.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	36.36
11.01.07	VALVULAS				5,752.45														5,752.45
11.01.07.01	VALVULA COMPUERTA 1/2" CON U"U°	Und.	24.00	91.17	2,188.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	2,188.08
11.01.07.02	VALVULA COMPUERTA 3/4" CON U"U°	Und.	2.00	102.11	204.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	204.22
11.01.07.03	VALVULA COMPUERTA 1" CON U"U°	Und.	4.00	115.61	462.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	462.44
11.01.07.04	VALVULA COMPUERTA 2" CON U"U°	Und.	3.00	238.69	716.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	716.07
11.01.07.05	MEDIDOR DE CAUDAL DE 1"	Und.	1.00	2,181.64	2,181.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	2,181.64
11.01.08	EQUIPOS DE BOMBEO				12,767.21														12,767.21
11.01.08.01	ELECTROBOMBA, Q=2.92 Lts/seg, Adt=23m, Pot.Aprox=2HP	Und.	2.00	1,717.55	3,435.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	3,435.10
11.01.08.02	EQUIPO Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLORACION-DESINFECTACION	Und.	1.00	3,522.05	3,522.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	3,522.05
11.01.08.03	VALVULA FLOTADORA DE 1 1/2"	Und.	1.00	99.68	99.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	99.68
11.01.08.04	VALVULA COMPUERTA 2" CON U"U°	Und.	2.00	238.69	477.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	477.38
11.01.08.05	VALVULA CHECK DE 2"	Und.	2.00	535.52	1,071.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	1,071.04
11.01.08.06	VALVULA DE PIE DE 2 1/2"	Und.	2.00	85.59	171.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	171.18
11.01.08.07	UNION UNIVERSAL DE 1/2"	Und.	2.00	10.26	20.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	20.52
11.01.08.08	UNION DRESSER 2"	Und.	2.00	151.76	303.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	303.52
11.01.08.09	UNION DRESSER 2 1/2"	Und.	4.00	169.76	679.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	679.04
11.01.08.10	CANASTILLA DE 2 1/2"	Und.	2.00	183.53	367.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	367.06
11.01.08.11	CODO PVC-SAP 2"	Und.	3.00	18.91	56.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	56.73
11.01.08.12	CODO PVC-SAP 2 1/2"	Und.	2.00	19.41	38.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	38.82
11.01.08.13	TEE PVC-SAP 2"	Und.	4.00	19.31	77.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	77.24
11.01.08.14	TAPON DE PVC DE 2"	Und.	3.00	18.18	54.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	54.54
11.01.08.15	ABRAZADERAS, SOPORTES Y COLGADORES 2"	Pza.	9.00	138.43	1,245.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00	1,245.87
11.01.08.16	ABRAZADERAS, SOPORTES Y COLGADORES 2 1/2"	Pza.	8.00	143.43	1,147.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00	1,147.44
11.02	SISTEMA DE AGUA SALADA				53,098.65														53,098.65
11.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m.	243.00	1.57	381.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.00	381.51
11.02.01.01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS ML	m.	243.00	1.57	381.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.00	381.51
11.02.02	MOVIMIENTOS DE TIERRAS				6,847.74														6,847.74
11.02.02.01	EXCAV. DE ZANJA P/TUBERIA	m.	243.00	11.68	2,838.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.00	2,838.24
11.02.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/TUBERIA	m.	243.00	2.13	517.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.00	517.69
11.02.02.03	CAMA DE APOYO E=0.10M	m.	243.00	7.37	1,790.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.00	1,790.91
11.02.02.04	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m.	243.00	7.00	1,701.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.00	1,701.00
11.02.03	SALIDAS DE AGUA SALADA				3,677.18														3,677.18
11.02.03.01	SALIDA DE AGUA SALADA 1/2"	Pto.	2.00	72.33	144.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	144.66
11.02.03.02	SALIDA DE AGUA SALADA 3/4"	Pto.	34.00	89.03	3,027.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.00	3,027.02
11.02.03.03	SALIDA DE AGUA SALADA 1 1/2"	Pto.	5.00	101.10	505.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	505.50
11.02.04	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA SALADA				2,930.47														2,930.47
11.02.04.01	SUM./INST./T/P/PRUEBA HIDRATUB PVC Ø 3/4" C-10	m.	120.00	13.64	1,636.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	1,636.80
11.02.04.02	SUM./INST./T/P/PRUEBA HIDRATUB PVC Ø 2" C-10	m.	25.00	14.69	367.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00	367.25
11.02.04.03	SUM./INST./T/P/PRUEBA HIDRATUB PVC Ø 3" C-10	m.	20.00	20.59	411.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	411.80
11.02.04.04	SUM./INST./T/P/PRUEBA HIDRATUB HDPE Ø 3" C-10 (T.E. Sistema)	m.	18.00	28.59	514.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00	514.62
11.02.05	RED DE ALIMENTACION				4,898.07														4,898.07
11.02.05.01	SUM./INST./T/P/PRUEBA HIDRATUB PVC Ø 2" C-10 (Colgada)	m.	2.00	21.22	42.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	42.44
11.02.05.02	SUM./INST./T/P/PRUEBA HIDRATUB PVC Ø 2 1/2" C-10 (Succion)	m.	6.00	19.28	115.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	115.68
11.02.05.03	SUM./INST./T/P/PRUEBA HIDRATUB PVC Ø 3" C-10	m.	32.00	20.59	658.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00	658.68
11.02.05.04	Sum./Inst./T/Prueba Hidra./Tub. HDPE Ø 2 1/2" C-10 Expuesta	m.	120.00	20.24	2,428.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	2,428.80
11.02.05.05	Sum./Inst./T/Prueba Hidra./Tub. HDPE Ø 2 1/2" C-10 Enterrada	m.	46.00	22.36	1,028.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.00	1,028.56
11.02.05.06	SUM./INST./T/P/PRUEBA HIDRA./TUB. HDPE Ø 2" C-10 (Cistern)	m.	20.00	18.32	366.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	366.40
11.02.05.07	SUM./INST./T/P/PRUEBA HIDRA./TUB. HDPE Ø 3" C-10 Captacion	m.	9.00	28.59	257.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00	257.31
11.02.06	ACCESORIOS				1,550.74														1,550.74
11.02.06.01	TEE PVC-SAP 3/4"	Und.	18.00	10.56	190.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00	190.08
11.02.06.02	TEE PVC-SAP 2"	Und.	14.00	18.31	270.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.00	270.34


Luis Alberto Ayala Murillo
 C.I.P. N° 84746
 SUPERVISOR DE O.B.A.

CSA CUBAN AVILES
 INGENIERO CIVIL

11.02.06.03	TEE PVC-SAP 2 1/2"	Und.	5.00	22.28	111.40	-	-	-	-	5.00	111.40
11.02.06.04	TEE PVC-SAP 3"	Und.	1.00	22.96	22.96	-	-	-	-	1.00	22.96
11.02.06.05	CODO PVC-SAP 1/2"	Und.	2.00	13.46	26.92	-	-	-	-	2.00	26.92
11.02.06.06	CODO PVC-SAP 3/4"	Und.	7.00	14.41	100.87	-	-	-	-	7.00	100.87
11.02.06.07	CODO PVC-SAP 3"	Und.	3.00	20.96	62.88	-	-	-	-	3.00	62.88
11.02.06.08	CODO PVC-SAP 2"	Und.	15.00	18.91	283.65	-	-	-	-	15.00	283.65
11.02.06.09	CODO PVC-SAP 2 1/2"	Und.	8.00	19.41	155.28	-	-	-	-	8.00	155.28
11.02.06.10	REDUCCION PVC SAP 2"-1 1/2"	Und.	5.00	8.36	41.80	-	-	-	-	5.00	41.80
11.02.06.11	REDUCCION PVC SAP 2"-3/4"	Und.	15.00	13.38	200.70	-	-	-	-	15.00	200.70
11.02.06.12	REDUCCION PVC SAP 2 1/2"-2"	Und.	2.00	14.66	29.32	-	-	-	-	2.00	29.32
11.02.06.13	TAPON DE PVC DE 2"	Und.	3.00	18.18	54.54	-	-	-	-	3.00	54.54
11.02.07	VALVULAS				3,069.35	-	-	-	-		3,069.35
11.02.07.01	VALVULA COMPUERTA 1/2" CON U"U"	Und.	2.00	91.17	182.34	-	-	-	-	2.00	182.34
11.02.07.02	VALVULA COMPUERTA 3/4" CON U"U"	Und.	15.00	102.11	1,531.65	-	-	-	-	15.00	1,531.65
11.02.07.03	VALVULA COMPUERTA 1 1/2" CON U"U"	Und.	5.00	174.91	874.55	-	-	-	-	5.00	874.55
11.02.07.04	VALVULA COMPUERTA 3" CON U"U"	Und.	1.00	480.81	480.81	-	-	-	-	1.00	480.81
11.02.08	EQUIPOS DE BOMBEO				29,743.59	-	-	-	-		29,743.59
11.02.08.01	EQUIPO DE BOMBEO AGUA SALADA 2.0 HP C/CLORADOR	Und.	2.00	2,183.65	4,367.30	-	-	-	-	2.00	4,367.30
11.02.08.02	CIACCESORIOS					-	-	-	-		
11.02.08.03	EQUIPO Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLORACION-DESINFECCION	Und.	1.00	3,522.05	3,522.05	-	-	-	-	1.00	3,522.05
11.02.08.04	VALVULA COMPUERTA 2" CON U"U"	Und.	2.00	238.88	477.38	-	-	-	-	2.00	477.38
11.02.08.05	VALVULA FLOTADORA DE 1 1/2"	Und.	2.00	99.68	199.36	-	-	-	-	2.00	199.36
11.02.08.06	VALVULA CHECK DE 2"	Und.	2.00	535.52	1,071.04	-	-	-	-	2.00	1,071.04
11.02.08.07	VALVULA DE PIE Y CANASTILLA DE SUCCION DE 2 1/2"	Und.	2.00	288.73	577.46	-	-	-	-	2.00	577.46
11.02.08.08	UNION UNIVERSAL DE 2"	Und.	2.00	37.12	74.24	-	-	-	-	2.00	74.24
11.02.08.09	UNION DRESSER 2"	Und.	2.00	151.76	303.52	-	-	-	-	2.00	303.52
11.02.08.10	CODO PVC-SAP 2"	Und.	4.00	169.78	679.04	-	-	-	-	4.00	679.04
11.02.08.11	CODO PVC-SAP 2 1/2"	Und.	3.00	18.91	56.73	-	-	-	-	3.00	56.73
11.02.08.12	TEE PVC-SAP 2"	Und.	2.00	19.41	38.82	-	-	-	-	2.00	38.82
11.02.08.13	TAPON DE PVC DE 2"	Und.	4.00	19.31	77.24	-	-	-	-	4.00	77.24
11.02.08.14	TAPON DE PVC DE 2"	Und.	3.00	18.18	54.54	-	-	-	-	3.00	54.54
11.02.08.15	Adquis. /Inst./Electrob. Autosebante, Q=3.10 Lts/seg. Act=22m. P	Und.	2.00	1,666.70	3,333.40	-	-	-	-	2.00	3,333.40
11.02.08.16	Adquis. /Inst./Equipo de Filtrado de 20 GPM	Und.	1.00	1,269.24	1,269.24	-	-	-	-	1.00	1,269.24
11.02.08.17	TUBERIA DE F"8" INC SOPORTES Y PINTADO	Und.	1.00	803.02	803.02	-	-	-	-	1.00	803.02
11.02.08.18	VALVULA COMPUERTA 2 1/2" CON U"U"	Und.	2.00	323.81	647.62	-	-	-	-	2.00	647.62
11.02.08.19	VALVULA CHECK DE 2 1/2"	Und.	2.00	408.93	813.86	-	-	-	-	2.00	813.86
11.02.08.20	VALVULA DE PIE Y CANASTILLA DE SUCCION DE 3"	Und.	1.00	317.59	317.59	-	-	-	-	1.00	317.59
11.02.08.21	UNION DRESSER 2 1/2"	Und.	2.00	169.78	339.52	-	-	-	-	2.00	339.52
11.02.08.22	UNION DRESSER 3"	Und.	3.00	159.76	479.28	-	-	-	-	3.00	479.28
11.02.08.23	CODO PVC-SAP 3"	Und.	4.00	19.41	77.64	-	-	-	-	4.00	77.64
11.02.08.24	CODO PVC-SAP 2 1/2"	Und.	4.00	20.96	83.84	-	-	-	-	4.00	83.84
11.02.08.25	TEE PVC-SAP 2 1/2"	Und.	4.00	22.28	89.12	-	-	-	-	4.00	89.12
11.02.08.26	TEE PVC-SAP 3"	Und.	1.00	22.96	22.96	-	-	-	-	1.00	22.96
11.02.08.27	TAPON DE PVC DE 2 1/2"	Und.	3.00	18.90	56.40	-	-	-	-	3.00	56.40
11.02.08.28	ABRAZADERA SOPORTES Y COLGADORES 2"	Pza.	9.00	138.43	1,245.87	-	-	-	-	9.00	1,245.87
11.02.08.29	ABRAZADERAS SOPORTES Y COLGADORES 2 1/2"	Und.	8.00	143.43	1,147.44	-	-	-	-	8.00	1,147.44
11.02.08.30	ABRAZADERAS SOPORTES Y COLGADORES DE 3"	Pza.	49.00	153.43	7,518.07	-	-	-	-	49.00	7,518.07
11.03	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				2,301.17	-	-	-	-		2,301.17
11.03.01	RED DE DRENAJE PLUVIAL	m.	83.00	9.59	1,222.93	-	-	-	-	83.00	1,222.93
11.03.01.01	SUM.E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 2"	m.	36.00	11.86	795.97	-	-	-	-	36.00	795.97
11.03.01.02	SUM.E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 3"				426.96	-	-	-	-		426.96
11.03.02	ACCESORIOS				1,078.24	-	-	-	-		1,078.24
11.03.02.01	SUM.E INST SUMIDERO BRONCE DE 2"	Und.	28.00	34.34	961.52	-	-	-	-	28.00	961.52
11.03.02.02	SUM.E INST. REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2"	Und.	8.00	9.97	78.76	-	-	-	-	8.00	78.76
11.03.02.03	SUM.E INST. REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 3"	Und.	3.00	12.32	36.96	-	-	-	-	3.00	36.96
11.04	DESAGUE Y VENTILACION				57,277.35	-	-	-	-		57,277.35



Luis Alberto Amila Mora

 CIP - N° 84745


 SUPERVISOR DE

JORGE JULIO

 ESPICHANAVALLS

 INGENIERO CIVIL

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
11.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				432.06				432.06
11.04.02	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS ML	m.	1.57	275.20	432.06				275.20
11.04.02.01	MOVIMIENTOS DE TIERRAS				8,123.60				8,123.60
11.04.02.02	EXCAV. DE ZANJA PARA TUBERIA	m.	11.68	275.20	3,214.34				3,214.34
11.04.02.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/TUBERIA	m.	2.13	275.20	586.18				586.18
11.04.02.04	CAMA DE APOYO E=0.10M	m.	7.37	275.20	2,028.22				2,028.22
11.04.02.05	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m.	7.00	275.20	1,926.40				1,926.40
11.04.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CAMAQUINA	m³	20.47	18.00	368.46				368.46
11.04.03	SALIDA DE DESAGUE				4,445.98				4,445.98
11.04.03.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2"	Pto.	55.80	44.00	2,455.20				2,455.20
11.04.03.02	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 3"	Pto.	81.01	5.00	305.05				305.05
11.04.03.03	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4"	Pto.	54.46	20.50	1,116.43				1,116.43
11.04.03.04	SALIDA DE VENTILACION DE 2"	Pto.	56.93	10.00	569.30				569.30
11.04.04	RED DE DERIVACION DE DESAGUE				9,317.71				9,317.71
11.04.04.01	SUM.E INST DE TUBERIA PVC-SAP 2"	m.	9.59	89.20	855.43				855.43
11.04.04.02	SUM.E INST DE TUBERIA PVC-SAP 3"	m.	11.86	42.00	498.12				498.12
11.04.04.03	SUM.E INST DE TUBERIA PVC-SAP 4"	m.	12.28	3.00	36.84				36.84
11.04.04.04	SUM.E INST DE MONTANTE PVC-SAP 2"	m.	9.59	28.00	268.52				268.52
11.04.04.05	SUM.E INST DE MONTANTE PVC-SAP 4"	m.	12.28	14.00	171.92				171.92
11.04.04.06	SUM.E INST DE TUBERIA PVC-SAL 2" VENTILACION	m.	54.41	23.00	1,251.43				1,251.43
11.04.04.07	SUM.E INST TUBERIA HDPE 4"(SUMIDERO MUELLE)	m.	27.32	140.00	3,824.80				3,824.80
11.04.04.08	SUM.E INST TUBERIA HDPE 3"	m.	16.92	22.00	372.24				372.24
11.04.04.09	TUBERIA PVC 3"-C-10 (IMPULSION A CAMARA DE BOMBEO)	m.	20.59	99.00	2,038.41				2,038.41
11.04.05	ACCESORIOS				7,565.48				7,565.48
11.04.05.01	SUM.E INST YEE PVC-SAP 3"	Und.	13.32	23.00	306.36				306.36
11.04.05.02	SUM.E INST YEE PVC-SAP 4"	Und.	21.56	3.00	64.68				64.68
11.04.05.03	SUM.E INST TEE SANITARIA PVC-SAP 2"	Und.	9.52	32.00	304.64				304.64
11.04.05.04	SUM.E INST CODO 45° SANITARIA PVC-SAP 2"	Und.	15.20	5.00	76.00				76.00
11.04.05.05	SUM.E INST CODO 45° SANITARIA PVC-SAP 3"	Und.	11.82	23.00	271.86				271.86
11.04.05.06	SUM.E INST CODO 45° SANITARIA PVC-SAP 4"	Und.	18.59	1.00	18.59				18.59
11.04.05.07	SUM.E INST. CODO 45° SANITARIA HDPE 4"	Und.	86.82	1.00	86.82				86.82
11.04.05.08	SUM.E INST. CODO 90° SANITARIA HDPE 3"	Und.	53.12	1.00	53.12				53.12
11.04.05.09	SUM.E INST YEE DOBLE SANITARIA PVC-SAP 2"	Und.	16.05	12.00	192.60				192.60
11.04.05.10	SUM.E INST YEE DOBLE SANITARIA PVC-SAP 3"	Und.	13.32	2.00	26.64				26.64
11.04.05.11	SUM.E INST YEE DOBLE SANITARIA PVC-SAP 4"	Und.	21.56	1.00	21.56				21.56
11.04.05.12	SUM.E INST YEE HDPE 4"	Und.	167.12	22.00	3,676.64				3,676.64
11.04.05.13	SUM.E INST YEE HDPE 3"	Und.	146.12	1.00	146.12				146.12
11.04.05.14	SUM.E INST SUMIDERO DE BRONCE 2"	Und.	34.34	3.00	103.02				103.02
11.04.05.15	SUM.E INST SUMIDERO DE BRONCE 3"	Und.	43.84	37.00	1,622.08				1,622.08
11.04.05.16	SUM.E INST REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2"	Und.	9.97	23.00	229.31				229.31
11.04.05.17	SUM.E INST REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 3"	Und.	12.32	15.00	184.80				184.80
11.04.05.18	SUM.E INST REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4"	Und.	30.14	6.00	180.84				180.84
11.04.06	CAMARA DE INSPECCION				8,356.70				8,356.70
11.04.06.01	CAJA DE REGISTRO DE 12"x24" CON TAPA DE CONCRETO	Und.	229.92	11.00	2,529.12				2,529.12
11.04.06.02	CAJA DE REGISTRO DE 24"x24" CON TAPA DE CONCRETO	Und.	279.45	1.00	279.45				279.45
11.04.06.03	SUM.E INST BUZON CON TAPA DE 1.20m DE DIAMETRO H=1.40m	Und.	1,288.13	1.00	1,288.13				1,288.13
11.04.06.04	CANALETAS METALICAS DE REJILLAS FIERRO PLATINA 1 1/4"x1/4" DE 0.30 DE ANCHO	m.	170.40	25.00	4,260.00				4,260.00
11.04.07	INSTALACIONES ESPECIALES				5,523.43				5,523.43
11.04.07.01	EQUIPAMIENTO DE TANQUE SEPTICO	Und.	2,032.41	1.00	2,032.41				2,032.41
11.04.07.02	Equipo de bombeo, 02 Bombas sumergibles Q=2.88 L/S; HDT=6.00m; Pot=1.0HP	Und.	1,745.51	2.00	3,491.02				3,491.02
11.04.08	ACCESORIOS DE CAMARAS				13,512.39				13,512.39
11.04.08.01	VALVULA MARIPOSA 3"	Und.	289.43	2.00	578.86				578.86
11.04.08.02	VALVULA COMPUERTA 3" CON U"U	Und.	480.81	1.00	480.81				480.81
11.04.08.03	VALVULA CHECK DE 3"	Und.	477.53	2.00	955.06				955.06



 Lic. Alberto A. ...


 CIP. No. 5473


 SUPERVISOR DE

Jorge Julio


 ESPERANZA


11.04.08.04	UNION DRESSER 3"	Und.	3.00	159.76	479.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	479.28
11.04.08.05	TEE F"3"	Und.	1.00	201.53	201.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	201.53
11.04.08.06	CODO F"3"	Und.	4.00	196.33	785.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	785.32
11.04.08.07	TUBERIA F"3"	Und.	3.00	217.53	652.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	652.59
11.04.08.08	ABRAZADERA, SOPORTES Y COLGADORES 3"	Pza.	10.00	153.43	1,534.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	1,534.30
11.04.08.09	ABRAZADERA, SOPORTES Y COLGADORES 4"	Pza.	48.00	163.43	7,844.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00	7,844.64
11.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES																					
11.05.01.01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS ML	m.	359.60	1.57	564.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359.60	564.57
11.05.02	MOVIMIENTOS DE TIERRAS	m.	359.60	11.88	10,645.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359.60	10,645.28
11.05.02.01	EXCAV. DE ZANJA PARA TUBERIA	m.	359.60	2.13	4,200.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359.60	4,200.13
11.05.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/TUBERIA	m.	359.60	7.37	765.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359.60	765.95
11.05.02.03	CAMA DE APOYO E=0.10M	m.	359.60	7.00	2,650.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359.60	2,650.25
11.05.02.04	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m ³	25.00	20.47	2,517.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00	2,517.20
11.05.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA				511.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		511.75
11.05.03	SALIDA DE DESAGUE	Pto.	9.00	61.01	1,747.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00	1,747.21
11.05.03.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 3"	Pto.	22.00	54.46	549.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	549.09
11.05.04	RED DE DERIVACION DE DESAGUE				1,198.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,198.12
11.05.04.01	SUM.E INST. DE TUBERIA PVC-SAL 2"	m.	7.00	9.59	67.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00	67.13
11.05.04.02	SUM.E INST. DE TUBERIA PVC-SAL 3"	m.	21.00	11.86	249.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00	249.06
11.05.04.03	SUM.E INST. DE TUBERIA PVC-SAL 4"	m.	34.00	12.28	417.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.00	417.52
11.05.04.04	SUM.E INST. DE TUBERIA PVC-SAL 6"	m.	3.00	26.83	80.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	80.49
11.05.04.05	SUM.E INST. TUBERIA HDPE 3" (IMPULSION) COLGADA	m.	120.00	23.26	2,791.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	2,791.20
11.05.04.06	SUM.E INST. TUBERIA HDPE 3" (DES. T.E)	m.	22.00	23.26	511.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	511.72
11.05.04.07	TUBERIA PVC 3"-C-10(IMPULSION ENTERRADA)	m.	230.00	20.59	4,735.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.00	4,735.70
11.05.04.08	TUBERIA DE PVC SAL 6" C-10 EMISOR	m.	65.00	30.50	1,982.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00	1,982.50
11.05.05 ACCESORIOS																					
11.05.05.01	SUM.E. INST. CODO 45° SANITARIA PVC-SAL 4"	Und.	1.00	12.48	12.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	12.48
11.05.05.02	SUM.E. INST. CODO 90° SANITARIA PVC-SAL 4"	Und.	6.00	11.63	69.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	69.78
11.05.05.03	SUM.E. INST. CODO 90° SANITARIA HDPE 3"	Und.	1.00	53.12	53.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	53.12
11.05.05.04	SUM.E. INST. TEE HDPE 3"	Und.	1.00	146.12	146.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	146.12
11.05.05.05	SUM.E. INST. SUMIDERO DE BRONCE 4"	Und.	22.00	50.09	1,101.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	1,101.98
11.05.06	CAMARA DE INSPECCION				54,048.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		54,048.45
11.05.06.01	CAJA DE REGISTRO DE 24"X24" CON TAPA DE CONCRETO	Und.	4.00	279.45	1,117.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	1,117.80
11.05.06.02	ACCESORIOS TRAMPA DE GRASAS	Und.	3.00	37.96	113.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	113.88
11.05.06.03	CANALETAS REJILLA FRD/FIBRA DE VIDRIO DE PLASTICO (REFORZADO) 0.30 DE ANCHO	m ²	120.60	437.95	52,816.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.60	52,816.77
11.05.07 INSTALACIONES ESPECIALES																					
11.05.07.01	Equipo de bombeo, 02 Bombas sumergibles Q=1.7 L/S; HDT=10m; Pot=1.5HP	Und.	2.00	1,745.51	3,491.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	3,491.02
11.05.07.02	Equipo de bombeo, 02 Bombas sumergibles Q=1.7 L/S; HDT=8m; Pot=1.5HP	Und.	2.00	1,745.51	3,491.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	3,491.02
11.05.07.03	Equipo de bombeo, 02 Bombas sumergibles Q=1.7 L/S; HDT=6m; Pot=1.0HP	Und.	2.00	1,745.51	3,491.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	3,491.02
11.05.07.04	Equipo de bombeo, 02 Bombas sumergibles Q=6 L/S; HDT=20m; Pot=6.0HP	Und.	2.00	7,444.66	14,889.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	14,889.32
11.05.08 ACCESORIOS																					
11.05.08.01	VALVULA MARIPOSA 2"	Und.	6.00	268.53	1,611.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	1,611.18
11.05.08.02	VALVULA MARIPOSA 6"	Und.	2.00	386.93	773.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	773.86
11.05.08.03	VALVULA COMPUERTA 3" CON U"O	Und.	1.00	480.81	480.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	480.81
11.05.08.04	VALVULA CHECK DE 2"	Und.	6.00	535.52	3,213.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	3,213.12
11.05.08.05	VALVULA CHECK DE 6"	Und.	2.00	972.53	1,945.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	1,945.06
11.05.08.06	UNION DRESSER 2"	Und.	9.00	151.76	1,365.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00	1,365.84
11.05.08.07	UNION DRESSER 6"	Und.	2.00	214.76	429.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	429.52
11.05.08.08	TEE PVC-SAL 2"	Und.	2.00	6.66	13.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	13.32
11.05.08.09	TEE PVC-SAL 3"	Und.	1.00	9.46	9.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	9.46


Luis Alberto Avila Morales
 C.I.P. N.º 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS


JORGE JULIO
 SUPERVISOR DE OBRAS

11.05.08.10	YEE PVC 6"	Und.	1.00	26.12	26.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	26.12
11.05.08.11	CODO PVC SAL 2"X90°	Pza.	11.00	279.84	279.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	279.84
11.05.08.12	CODO PVC SAL 6"X90°	Pza.	2.00	81.88	81.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	81.88
11.05.08.13	CODO PVC SAL 6"X45°	Pza.	3.00	81.42	81.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	81.42
11.05.08.14	REDUCCION DE PVC SAL DE 3"-2"	Und.	4.00	40.70	40.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	162.80
11.05.08.15	ABRAZADERAS,SOPORTES Y COLGADORES 3" EN MUELLE	Pza.	41.00	153.43	6,290.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.00	6,290.63
11.05.08.16	ABRAZADERAS,SOPORTES Y COLGADORES 3" EN T.E	Pza.	9.00	153.43	1,380.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00	1,380.87
	11.06 EMISOR SUBMARINO			531,729.88															531,729.88
11.06.01	OBRAS PRELIMINARES	m.	880.00	1,381.60	1,381.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880.00	1,381.60
11.06.01.01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS ML	m.	880.00	1,381.60	1,381.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880.00	1,381.60
11.06.02	MOVIMIENTOS DE TIERRAS	m³	20.00	550.00	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	550.00
11.06.02.01	ACOMODO DE ENCOCADO DE PROTECCION	m³	20.00	550.00	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	550.00
11.06.03	SUMINISTRO DE TUBERIA	m.	880.00	198,748.44	198,748.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880.00	198,748.44
11.06.03.01	SUM. E INST. DE TUBERIA LISA HDPEPECC-100 Dext. 160MM (6") PN-10	m.	880.00	25,801.60	25,801.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880.00	25,801.60
11.06.03.02	SUMINIST DE TUBERIA LISA HDPEPECC-100 Dext. 160MM (6") CON PERFORACIONES PARA USO DE DIFUSOR	m.	20.00	558.60	558.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	558.60
11.06.03.03	SUMINIST E INST DE LINEA AUXILIAR DE 90MM PARA MANIOBRA DE FLOTACION	m.	880.00	13,088.00	13,088.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880.00	13,088.00
11.06.03.04	ACCESORIOS SUMINISTRO DE TUBERIAS HDPE	Und.	2.00	3,579.74	3,579.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	3,579.74
11.06.03.05	LASTRE DE CONCRETO TIPO A SEPARACION DE 1.70 C/U	Und.	530.00	293.85	155,740.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530.00	155,740.50
11.06.04	TERMOFUSION	Und.	1.00	12,362.00	12,362.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	12,362.00
11.06.04.01	SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS DE 160MM PN-10	Und.	1.00	8,430.00	8,430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	8,430.00
11.06.04.02	SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS DE 80MM PN-10 (LINEAS 1.00 LINEAS AUXILIARES DE FLOTACION)	Und.	1.00	3,932.00	3,932.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	3,932.00
11.06.05	ULTRASONIDO-CONTROL DE CALIDAD	Und.	1.00	15,811.00	15,811.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	15,811.00
11.06.05.01	INSPECCION ULTRASONICA DE JUNTA	Und.	1.00	15,811.00	15,811.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	15,811.00
11.06.06	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO	m.	900.00	302,876.84	302,876.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	302,876.84
11.06.06.01	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO DE LINEA CONCRETO TIPO A	Und.	530.00	152,649.00	152,649.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530.00	152,649.00
11.06.06.02	FIJACION PRIMEROS METROS DE TUBERIA CON CONCRETO CICLOPEO	m³	6.00	89,893.30	89,893.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	89,893.30
11.06.06.03	PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA EMISOR SUBMARINO	Und.	1.00	8,776.92	8,776.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	8,776.92
11.06.06.04		Und.	1.00	51,557.62	51,557.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	51,557.62
COSTO DIRECTO				803,797.67	803,797.67														803,797.67
GASTOS GENERALES				98,867.11	98,867.11														98,867.11
UTILIDAD				48,227.86	48,227.86														48,227.86
SUB-TOTAL PRESUPUESTO				950,892.64	950,892.64														950,892.64
AMORTIZACION																			
TOTAL PRESUPUESTO (sin IGV)				950,892.64	950,892.64														950,892.64
AVANCE DE SUBPRESUPUESTO (%)				100.00%	100.00%														100.00%


Luis Alberto Amila Morán
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS


EDGARDO AVALOS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 19009



VALORIZACIÓN N° 07

Abril 2018

004.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
 UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.
 CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
 FECHA: 30 de Abril del 2018


Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Sub Total S/.	Valorización anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Saldo a Valorizar	
						Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSION				268,220.19								
12.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m.	359.66	1.57	2,518.67								268,220.19
12.01.02	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS ML	Glb.	1.00	1,954.00	584.67							359.66	2,518.67
12.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,954.00							1.00	584.67
12.02.01	EXCAV. DE ZANJA DE 0.50x0.60m. PARA INSTALACION DE DUCTOS	m.	359.66	11.68	6,923.15								1,954.00
12.02.02	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m.	359.66	7.00	4,200.83							359.66	6,923.15
12.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m ³	10.00	20.47	2,517.62							359.66	7,440.77
12.03	SALIDAS DE ILUMINACION				15,586.45								15,586.45
12.03.01	SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)	Pto.	180.00	72.87	13,116.60								13,116.60
12.03.02	SALIDA DE TECHO(CENTRO LUZ) C/CONDUIT	Und.	27.00	81.27	2,194.29								15,586.45
12.03.03	SALIDA PARA BRAQUETE (PARED)	Pto.	4.00	68.89	275.56								13,116.60
12.04	INTERRUPTORES				7,405.80								2,194.29
12.04.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	Pto.	35.00	76.77	2,686.95								2,686.95
12.04.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	Pto.	6.00	77.81	466.86								7,405.80
12.04.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE	Pto.	5.00	91.01	455.05								2,686.95
12.04.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION	Pto.	22.00	110.88	2,434.96								466.86
12.04.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE	Pto.	8.00	156.42	1,251.36								455.05
12.04.06	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 4 VIAS TOMACORRIENTES	Pto.	1.00	110.62	110.62								1,251.36
12.05	TOMACORRIENTES				7,024.05								110.62
12.05.01	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H=0.40 SNPT	Pto.	58.00	70.95	4,115.10								7,024.05
12.05.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA A PRUEBA DE AGUA H=0.40 SNPT	Pto.	15.00	70.95	1,064.25								4,115.10
12.05.03	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H=2.20 SNPT LUZ DE EMERGENCIA	Pto.	28.00	70.95	1,944.70								1,064.25
12.06	SALIDA DE DATA Y TELEFONIA				665.50								1,944.70
12.06.01	SALIDA PARA TELEFONIA	Pto.	6.00	66.55	399.30								665.50
12.06.02	SALIDA DE RED DE COMPUTOS	Pto.	4.00	66.55	266.20								399.30
12.07	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO				5,461.30								266.20
12.07.01	SALIDA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO INC. SENSOR DE HUMO	Und.	1.00	5,461.30	5,461.30								5,461.30
12.08	TUBERIAS DE PVC				12,605.26								1,844.70
12.08.01	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=20MM	m.	168.56	11.78	1,985.64								1,844.70
12.08.02	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=25MM	m.	40.11	12.08	484.53								1,985.64
12.08.03	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=35MM	m.	498.81	15.10	7,532.03								484.53
12.08.04	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=40MM	m.	20.20	19.58	396.52								7,532.03
12.08.05	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=45MM	m.	33.36	37.33	1,245.33								396.52
12.08.06	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=60MM	m.	13.85	33.02	457.33								1,245.33
12.08.07	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=100MM	m.	14.71	34.39	505.88								457.33
12.09	CABLES Y CONDUCTORES				25,199.43								505.88
12.09.01	CABLE NH-80-3-1x6mm ² -450/750V	m.	82.96	9.93	823.79								505.88

000191

[Signature]
Maris Alberto Anita Morales
 CIP: N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

[Signature]
ESPICHAN AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

12.08.02	CABLE NH-80, 3-1x10mm2, 450/750V	m.	40.11	13.43	538.68	-	-	-	-	-	40.11	538.68
12.08.03	CABLE NH-80, 3-1x16mm2, 450/750V	m.	157.90	17.76	2,804.30	-	-	-	-	-	157.90	2,804.30
12.08.04	CABLE NH-80, 3-1x25mm2, 450/750V	m.	165.13	24.93	4,116.69	-	-	-	-	-	165.13	4,116.69
12.08.05	CABLE NH-80, 3-1x35mm2, 450/750V	m.	195.98	33.24	6,514.38	-	-	-	-	-	195.98	6,514.38
12.08.06	CABLE NH-80, 3-1x70mm2, 450/750V	m.	6.25	60.95	380.94	-	-	-	-	-	6.25	380.94
12.08.07	CABLE NH-80, 3-1x120mm2, 450/750V	m.	13.85	97.79	1,354.39	-	-	-	-	-	13.85	1,354.39
12.08.08	CABLE NH-80, 2-1x10mm2, 450/750V	m.	88.80	10.58	937.39	-	-	-	-	-	88.80	937.39
12.08.09	CABLE NH-80, 1x6mm2(T), 450/750V	m.	82.96	6.53	541.73	-	-	-	-	-	82.96	541.73
12.08.10	CABLE NH-80, 1x10mm2(T), 450/750V	m.	630.25	7.73	4,871.83	-	-	-	-	-	630.25	4,871.83
12.08.11	CABLE NH-80, 1x16mm2(T), 450/750V	m.	27.11	9.22	249.95	-	-	-	-	-	27.11	249.95
12.08.12	CABLE NH-80, 1x25mm2(T), 450/750V	m.	11.69	73.06	73.06	-	-	-	-	-	11.69	73.06
12.08.13	CABLE NH-80, 1x35mm2(T), 450/750V	m.	13.85	14.05	194.59	-	-	-	-	-	13.85	194.59
12.08.14	CABLE N2XOH, 3-1x120 mm2, 0.6/1kV	m.	14.71	103.36	1,520.43	-	-	-	-	-	14.71	1,520.43
12.08.15	CABLE N2XOH, 1x35 mm2, 0.6/1kV	m.	14.71	18.85	277.28	-	-	-	-	-	14.71	277.28
12.10.01	BUZONES Y DUCTOS DE CONCRETO	Und.	3.00	1,288.13	3,864.39	-	-	-	-	-	3.00	3,864.39
12.10.02	DUCTO DE CONCRETO DE 0.60x0.60x0.70m	m.	18.00	118.14	2,090.52	-	-	-	-	-	18.00	2,090.52
12.11	TABLEROS DISTRIBUCION				24,163.75	-	-	-	-	-		24,163.75
12.11.01	TABLERO GENERAL TG	Und.	1.00	13,740.93	13,740.93	-	-	-	-	-	1.00	13,740.93
12.11.02	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1	Pza.	1.00	1,920.47	1,920.47	-	-	-	-	-	1.00	1,920.47
12.11.03	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2	Pza.	1.00	2,270.47	2,270.47	-	-	-	-	-	1.00	2,270.47
12.11.04	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3	Pza.	1.00	1,770.47	1,770.47	-	-	-	-	-	1.00	1,770.47
12.11.05	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-4	Pza.	1.00	1,120.47	1,120.47	-	-	-	-	-	1.00	1,120.47
12.11.06	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-5	Pza.	1.00	2,120.47	2,120.47	-	-	-	-	-	1.00	2,120.47
12.11.07	TABLERO DE DISTRIBUCION T D-CGE	Pza.	1.00	1,220.47	1,220.47	-	-	-	-	-	1.00	1,220.47
12.12	TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA FUERZA				14,867.77	-	-	-	-	-		14,867.77
12.12.01	TABLERO DE DISTRIBUCION T MQ-AF1	Und.	1.00	1,570.47	1,570.47	-	-	-	-	-	1.00	1,570.47
12.12.02	TABLERO DE DISTRIBUCION T MQ-AF2	Und.	1.00	8,570.47	8,570.47	-	-	-	-	-	1.00	8,570.47
12.12.03	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-EB	Und.	1.00	2,250.47	2,250.47	-	-	-	-	-	1.00	2,250.47
12.12.04	TABLERO DE DISTRIBUCION ST-B1	Und.	1.00	493.42	493.42	-	-	-	-	-	1.00	493.42
12.12.05	TABLERO DE DISTRIBUCION ST-B2	Und.	1.00	1,470.47	1,470.47	-	-	-	-	-	1.00	1,470.47
12.12.06	TABLERO DE DISTRIBUCION T-TRAF	Und.	1.00	512.47	512.47	-	-	-	-	-	1.00	512.47
12.13	TABLEROS DE CONTROL DE ELECTROBOMBAS				4,117.65	-	-	-	-	-		4,117.65
12.13.01	TABLERO ALTERNADOR PARA BOMBA AUTOCEBANTE 3HP	Und.	1.00	776.13	776.13	-	-	-	-	-	1.00	776.13
12.13.02	TABLERO ALTERNADOR PARA BOMBA CENTRIFUGA 2HP	Und.	1.00	776.13	776.13	-	-	-	-	-	1.00	776.13
12.13.03	TABLERO DE CONTROL PARA BOMBAS SUMERGIBLES 1.5HP	Und.	1.00	776.13	776.13	-	-	-	-	-	1.00	776.13
12.13.04	TABLERO DE CONTROL PARA BOMBAS SUMERGIBLES 1 HP	Und.	1.00	776.13	776.13	-	-	-	-	-	1.00	776.13
12.13.05	TABLERO DE CONTROL PARA BOMBAS SUMERGIBLES 10 HP	Und.	1.00	1,013.13	1,013.13	-	-	-	-	-	1.00	1,013.13
12.14	PUESIA A TIERRA				1,525.40	-	-	-	-	-		1,525.40
12.14.01	POZO DE PUESTA A TIERRA CON CEMENTO CONDUCTIVO MENOR O IGUAL A 5 OHM	Und.	1.00	1,525.40	1,525.40	-	-	-	-	-	1.00	1,525.40
12.15	ALUMBRADO EXTERIOR				32,035.58	-	-	-	-	-		32,035.58
12.15.01	POSTE DE CONCRETO DE 11 METROS	Und.	6.00	1,022.28	6,133.68	-	-	-	-	-	6.00	6,133.68
12.15.02	CRUZETA DE 1.50 METROS	Und.	1.00	220.80	220.80	-	-	-	-	-	1.00	220.80
12.15.03	REFLECTOR DE 400W VAPOR DE SODIO	Und.	6.00	529.93	3,179.58	-	-	-	-	-	6.00	3,179.58
12.15.04	DUCTO DE CONCRETO	m.	12.00	86.14	1,033.68	-	-	-	-	-	12.00	1,033.68
12.15.05	POSTE DE ACERO GALVANIZADO	Und.	8.00	968.80	7,734.40	-	-	-	-	-	8.00	7,734.40
12.15.06	PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO PARA LUMINARIA	Und.	8.00	371.56	2,972.48	-	-	-	-	-	8.00	2,972.48
12.15.07	REFLECTOR DE 70W VAPOR DE SODIO	Und.	8.00	1,345.16	10,761.28	-	-	-	-	-	8.00	10,761.28
12.16	EQUIPOS DE ILUMINACION CON PVC-P				24,164.18	-	-	-	-	-		24,164.18
12.16.01	ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2x36W	Und.	145.00	125.02	18,127.90	-	-	-	-	-	145.00	18,127.90
12.16.02	ARTEFACTO FLUORESCENTE LINEAL 2x36W	Und.	7.00	110.02	770.14	-	-	-	-	-	7.00	770.14
12.16.03	ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR HERMETICO 22W ALTO FACTOR DE ENERGIA	Und.	28.00	87.28	2,443.84	-	-	-	-	-	28.00	2,443.84



Kris Alberto Avila Morales

 CIP. N° 84746

 SUPERVISOR DE OBRAS


JOSE DE JULIO


 ESPINERAN AVILA S

 INGENIERO CIVIL

 Reg. CIP N° 119009

Item	Und.	26.00	108.55	2,822.30	2,822.30	26.00	108.55	2,822.30	26.00	108.55	2,822.30	26.00	108.55	2,822.30	26.00	108.55	2,822.30
12.16.04 LUZ DE EMERGENCIA	Und.	26.00	108.55	2,822.30	2,822.30	26.00	108.55	2,822.30	26.00	108.55	2,822.30	26.00	108.55	2,822.30	26.00	108.55	2,822.30
12.17.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2x36W C/CONDUIT	Und.	27.00	125.02	3,375.54	3,375.54	27.00	125.02	3,375.54	27.00	125.02	3,375.54	27.00	125.02	3,375.54	27.00	125.02	3,375.54
12.17.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE C/CONDUIT	Pto.	1.00	63.00	63.00	63.00	1.00	63.00	63.00	1.00	63.00	63.00	1.00	63.00	63.00	1.00	63.00	63.00
12.17.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE C/CONDUIT	Pto.	2.00	117.68	235.36	235.36	2.00	117.68	235.36	2.00	117.68	235.36	2.00	117.68	235.36	2.00	117.68	235.36
12.17.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE C/CONDUIT	Pto.	2.00	161.42	322.84	322.84	2.00	161.42	322.84	2.00	161.42	322.84	2.00	161.42	322.84	2.00	161.42	322.84
12.18.01 GRUPO ELECTROGENO 163KVA (INCLUYE TANQUE DE COMBUSTIBLE)	Und.	1.00	57,225.20	57,225.20	57,225.20	1.00	57,225.20	57,225.20	1.00	57,225.20	57,225.20	1.00	57,225.20	57,225.20	1.00	57,225.20	57,225.20
12.18.02 TANQUE DE COMBUSTIBLE E INSTALACION	Und.	1.00	16,778.40	16,778.40	16,778.40	1.00	16,778.40	16,778.40	1.00	16,778.40	16,778.40	1.00	16,778.40	16,778.40	1.00	16,778.40	16,778.40
13.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES	Km.	0.16	417.28	66.76	66.76	0.16	417.28	66.76	0.16	417.28	66.76	0.16	417.28	66.76	0.16	417.28	66.76
13.02.01 REPLANTEO TOPOGRAFICO DE REDES Y UBICACION DE ESTRUCTURAS	Km.	0.16	417.28	66.76	66.76	0.16	417.28	66.76	0.16	417.28	66.76	0.16	417.28	66.76	0.16	417.28	66.76
13.02.02 EXCAVACION	m³	102.30	101.93	15,395.88	15,395.88	102.30	101.93	15,395.88	102.30	101.93	15,395.88	102.30	101.93	15,395.88	102.30	101.93	15,395.88
13.02.03 EJECUCION DE CRUZADA	m³	9.60	158.14	1,518.14	1,518.14	9.60	158.14	1,518.14	9.60	158.14	1,518.14	9.60	158.14	1,518.14	9.60	158.14	1,518.14
13.02.04 COMPACTACION DE ZANJA	m²	83.00	37.10	3,450.30	3,450.30	83.00	37.10	3,450.30	83.00	37.10	3,450.30	83.00	37.10	3,450.30	83.00	37.10	3,450.30
13.03.01 CABLES Y CONDUCTORES	m.	23.00	22.44	516.12	516.12	23.00	22.44	516.12	23.00	22.44	516.12	23.00	22.44	516.12	23.00	22.44	516.12
13.03.02 ENTUBADO PVC-P 4"x3m	m.	485.00	52.38	24,366.70	24,366.70	485.00	52.38	24,366.70	485.00	52.38	24,366.70	485.00	52.38	24,366.70	485.00	52.38	24,366.70
13.03.03 TENDIDO DE CABLE N2XSy 50 mm2 C/CONFIG. AV-33	m.	13.00	52.57	683.41	683.41	13.00	52.57	683.41	13.00	52.57	683.41	13.00	52.57	683.41	13.00	52.57	683.41
13.03.04 SUBIDA DE CABLE N2XSy 50mm2 EN SAB	m.	90.00	228.61	20,574.90	20,574.90	90.00	228.61	20,574.90	90.00	228.61	20,574.90	90.00	228.61	20,574.90	90.00	228.61	20,574.90
13.04.01 TENDIDO DE CABLE N2XOH 300 mm2	m.	2.00	1,632.97	3,265.94	3,265.94	2.00	1,632.97	3,265.94	2.00	1,632.97	3,265.94	2.00	1,632.97	3,265.94	2.00	1,632.97	3,265.94
13.04.02 CABEZA DE TERMINAL	Kil	2.00	1,632.97	3,265.94	3,265.94	2.00	1,632.97	3,265.94	2.00	1,632.97	3,265.94	2.00	1,632.97	3,265.94	2.00	1,632.97	3,265.94
13.04.03 EJECUCION TERMINAL EXTERIOR	Kil	2.00	1,632.97	3,265.94	3,265.94	2.00	1,632.97	3,265.94	2.00	1,632.97	3,265.94	2.00	1,632.97	3,265.94	2.00	1,632.97	3,265.94
13.05.01 SUBESTACION AEREA BIPOSTE Y TRAFOMIX	Und.	3.00	1,309.16	3,927.48	3,927.48	3.00	1,309.16	3,927.48	3.00	1,309.16	3,927.48	3.00	1,309.16	3,927.48	3.00	1,309.16	3,927.48
13.05.02 IZAJE DE POSTES C.A.C 13/400	Und.	3.00	576.81	1,730.43	1,730.43	3.00	576.81	1,730.43	3.00	576.81	1,730.43	3.00	576.81	1,730.43	3.00	576.81	1,730.43
13.05.03 MONTAJE DE MEDIA LOZA C.A.V	Und.	1.00	546.81	546.81	546.81	1.00	546.81	546.81	1.00	546.81	546.81	1.00	546.81	546.81	1.00	546.81	546.81
13.05.04 MONTAJE DE PALOMILLA C.A.V	Und.	1.00	516.81	516.81	516.81	1.00	516.81	516.81	1.00	516.81	516.81	1.00	516.81	516.81	1.00	516.81	516.81
13.05.05 MONTAJE DE CRUCETA ASIMETRICA C.A.V	Und.	1.00	18,985.90	18,985.90	18,985.90	1.00	18,985.90	18,985.90	1.00	18,985.90	18,985.90	1.00	18,985.90	18,985.90	1.00	18,985.90	18,985.90
13.05.06 MONTAJE DE TRANSFORMADOR 250KVA	Und.	1.00	10,804.00	10,804.00	10,804.00	1.00	10,804.00	10,804.00	1.00	10,804.00	10,804.00	1.00	10,804.00	10,804.00	1.00	10,804.00	10,804.00
13.05.07 MONTAJE DE SECCIONADORES CUT OUT	Pza.	6.00	1,679.81	10,077.66	10,077.66	6.00	1,679.81	10,077.66	6.00	1,679.81	10,077.66	6.00	1,679.81	10,077.66	6.00	1,679.81	10,077.66
13.06.01 BUZONES	Und.	1.00	1,524.75	1,524.75	1,524.75	1.00	1,524.75	1,524.75	1.00	1,524.75	1,524.75	1.00	1,524.75	1,524.75	1.00	1,524.75	1,524.75
13.06.02 BUZON DE CONCRETO 1.0mx1.0mx1.0m	Und.	1.00	1,524.75	1,524.75	1,524.75	1.00	1,524.75	1,524.75	1.00	1,524.75	1,524.75	1.00	1,524.75	1,524.75	1.00	1,524.75	1,524.75
13.07.01 PUESTA A TIERRA	Und.	5.00	1,525.40	7,627.00	7,627.00	5.00	1,525.40	7,627.00	5.00	1,525.40	7,627.00	5.00	1,525.40	7,627.00	5.00	1,525.40	7,627.00
13.08.01 POZO PUESTA TIERRA	Und.	1.00	1,527.10	1,527.10	1,527.10	1.00	1,527.10	1,527.10	1.00	1,527.10	1,527.10	1.00	1,527.10	1,527.10	1.00	1,527.10	1,527.10
13.08.02 ACTIVIDADES FINALES	Und.	1.00	1,527.10	1,527.10	1,527.10	1.00	1,527.10	1,527.10	1.00	1,527.10	1,527.10	1.00	1,527.10	1,527.10	1.00	1,527.10	1,527.10
13.08.03 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	Und.	1.00	4,808.86	4,808.86	4,808.86	1.00	4,808.86	4,808.86	1.00	4,808.86	4,808.86	1.00	4,808.86	4,808.86	1.00	4,808.86	4,808.86
13.08.04 SEGURIDAD	Und.	1.00	4,808.86	4,808.86	4,808.86	1.00	4,808.86	4,808.86	1.00	4,808.86	4,808.86	1.00	4,808.86	4,808.86	1.00	4,808.86	4,808.86
13.09.01 ADQUISICION DE EQUIPOS DE MANIOBRA	Und.	1.00	245.64	245.64	245.64	1.00	245.64	245.64	1.00	245.64	245.64	1.00	245.64	245.64	1.00	245.64	245.64
13.09.02 REORDEN Y LIMPIEZA	m³	12.00	20.47	245.64	245.64	12.00	20.47	245.64	12.00	20.47	245.64	12.00	20.47	245.64	12.00	20.47	245.64
13.10.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m³	12.00	20.47	245.64	245.64	12.00	20.47	245.64	12.00	20.47	245.64	12.00	20.47	245.64	12.00	20.47	245.64
COSTO DIRECTO				395,182.34	395,182.34			395,182.34			395,182.34			395,182.34			395,182.34
GASTOS GENERALES				48,607.43	48,607.43			48,607.43			48,607.43			48,607.43			48,607.43
UTILIDAD				23,710.94	23,710.94			23,710.94			23,710.94			23,710.94			23,710.94
SUB-TOTAL PRESUPUESTO				467,500.71	467,500.71			467,500.71			467,500.71			467,500.71			467,500.71
AMORTIZACION				0.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TOTAL PRESUPUESTO (sin IGV)				467,500.71	467,500.71			467,500.71			467,500.71			467,500.71			467,500.71
AVANCE DE SUBPRESUPUESTO (%)				100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%


JOSE JULIO
ESPIHAN AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119029


LUIS ALBERTO AVILA NUÑEZ
CIP. N° 84745
SUPERVISOR DE OBRAS



VALORIZACIÓN N° 07

Abril 2018

005.- OBRAS DE MAR

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
 UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.
 CLIENTE: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
 FECHA: 30 de Abril del 2018

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Sub Total S/.	Valorización anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Saldo a Valorizar	
						Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.
14	OBRAS DE MAR				630,898.61		74,293.38		22,363.99		96,647.37		534,051.27
14.01	OBRAS PRELIMINARES				195,297.61		23,439.34		13,947.05		42,436.42		62,961.20
14.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN OBRAS DE MAR	m ²	908.40	3.09	2,806.96	908.40	2,806.96			908.40	2,806.96		
14.01.02	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO	Glb.	1.00	16,000.00	16,000.00	0.50	8,000.00			0.50	8,000.00		8,000.00
14.01.03	DESMTONTAJE DE POSTE DE ENERGIA EXISTENTE	Und.	2.00	195.81	391.22	2.00	391.22			2.00	391.22		
14.01.04	DESMTONTAJE DE SISTEMA DE DEFENSA DE MUELLE CON NEUMATICOS	m.	100.65	135.14	13,601.84	100.65	13,601.84			100.65	13,601.84		
14.01.05	DESMTONTAJE DE SISTEMA DE DEFENSA DE MUELLE CON JEBE TIPO D	m.	27.30	135.14	3,689.32	27.30	3,689.32			27.30	3,689.32		
14.01.06	PICADO DE LOSA DE CONCRETO	m ²	832.90	58.99	49,132.77			220.00	12,977.80	220.00	12,977.80		612.90
14.01.07	PICADO DE MURO DE CONCRETO-VIGAS DE CONCRETO	m ²	282.86	38.42	11,251.68								282.86
14.01.08	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO	m ³	39.88	16.15	644.06								39.88
14.01.09	DEMOLICION DE CONCRETO EN MUELLE PARA REFORZAMIENTO EBD N°01	m ³	10.92	225.88	2,466.81								10.92
14.01.10	ACARreo INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m ³	172.01	11.00	1,892.11			30.80	338.80	30.80	338.80		141.21
14.01.11	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m ³	172.01	20.47	3,521.04			30.80	630.48	30.80	630.48		141.21
14.02	OBRAS DE CONCRETO				94,102.55								94,102.55
14.02.01	COLOCADO PERNOS DE ANCLAJE 3/4"x22" CON ADITIVO	Und.	44.00	54.93	2,418.92								44.00
14.02.02	COLOCACION DE ADITIVO PARA CONCRETO VIEJO-LOSA DE CONCRETO	m ²	832.80	24.16	20,122.86								832.80
14.02.03	COLOCACION DE ADITIVO PARA CONCRETO VIEJO-MURO DE CONCRETO ZONA DE VIGAS	m ²	292.86	26.45	7,746.15								292.86
14.02.04	COLOCACION DE ADITIVO TRANSFORMADOR DE OXIDO LOSA DE PISO	m ²	826.60	8.25	6,819.45								826.60
14.02.05	COLOCACION DE ADITIVO TRANSFORMADOR DE OXIDO-MURO ZONAS VIGAS	m ²	292.86	9.27	2,714.81								292.86
14.02.06	COLOCACION DE MALLA DE ACERO DE REFUERZO PARA MURO DE CONCRETO-ZONA DE VIGA	m ²	292.86	34.75	10,176.89								292.86
14.02.07	PISO DE CONCRETO FC=280 KG/CM2	m ³	62.47	528.67	33,038.51								62.47
14.02.08	RECUBRIMIENTO DE CONCRETO FC=280 KG/CM2 EN MUROS Y VIGAS	m ³	21.96	503.96	11,066.96								21.96
14.03	SISTEMA DE DEFENSA				241,686.96								241,686.96
14.03.01	ESTRUCTURA DE MADERA PARA DEFENSA EN MUELLE NUEVO CON JEBE TIPO D	m.	27.30	1,827.78	49,898.39								27.30
14.03.02	ESTRUCTURA DE MADERA PARA DEFENSA ZONA DE PLATAFORMA BAJA	m.	31.20	1,215.59	37,926.41								31.20
14.03.03	SISTEMA DE DEFENSA REPOSICION DE JEBE TIPO D CON ABRAZADERA	Und.	38.00	713.60	27,116.80								38.00
14.03.04	SISTEMA DE DEFENSA CON 02 NEUMATICOS CADENA CON ABRAZADERA	m.	80.20	850.73	68,228.55								80.20
14.03.05	SISTEMA DE DEFENSA CON 01 NEUMATICO CADENA CON ABRAZADERA	m.	32.50	443.29	14,406.93								32.50

Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

JORGE JULIO
 ESPICHAN AVILA FS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 116093

000128



VALORIZACIÓN N° 07

Abril 2018

006.- EQUIPAMIENTO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
 UBICACIÓN: MARCONA - NASCA - ICA.
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
 CLIENTE: 30 de Abril del 2018

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Sub Total S/.	Valorización anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Saldo a Valorizar	
						Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.	Metrado	Parcial S/.
15	EQUIPAMIENTO				989,864.26	-	-	-	-	-	-	-	-
15.01	CAMARA FRIGORIFICA DE 5 TM	Und.	1.00	67,034.82	67,034.82	-	-	-	-	-	-	-	989,864.26
15.02	CAMARA FRIGORIFICA DE 10 TM	Und.	1.00	75,592.46	75,592.46	-	-	-	-	-	-	-	67,034.82
15.03	SUMINISTRO DE PRODUCTOR DE HIELO EN BLOQUES DE	Und.	1.00	636,896.46	636,896.46	-	-	-	-	-	-	-	75,592.46
15.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PARA ENFRIAM	Und.	1.00	20,230.22	20,230.22	-	-	-	-	-	-	-	636,896.46
15.05	EQUIPAMIENTO DE TAREAS PREVIAS	Und.	1.00	83,341.90	83,341.90	-	-	-	-	-	-	-	20,230.22
15.06	ACCESORIOS PARA TRANSPORTE Y ESTIBA	Und.	1.00	85,798.40	85,798.40	-	-	-	-	-	-	-	83,341.90
15.07	ACCESORIOS PARA PERSONAL OPERATIVO	und	1.00	20,970.00	20,970.00	-	-	-	-	-	-	-	85,798.40
16	MOBILIARIO				29,508.24	-	-	-	-	-	-	-	20,970.00
16.01	MOBILIARIO VARIOS	Glb.	1.00	29,508.24	29,508.24	-	-	-	-	-	-	-	29,508.24
COSTO DIRECTO					S/.	1,019,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,373.50
GASTOS GENERALES					S/.	125,382.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,382.94
UTILIDAD					S/.	61,162.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,162.41
SUB-TOTAL PRESUPUESTO					S/.	1,205,918.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,918.85
AMORTIZACIÓN					S/.	1,205,918.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,918.85
TOTAL PRESUPUESTO (sin IGV)					S/.	1,205,918.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,918.85
AVANCE DE SUBPRESUPUESTO (%)						100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

JOSE JULIO
 ESPACHAN AVILES
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 113053

Idus Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

000126

**ANEXO N° 02:
SUSTENTO DE METRADOS**




Luis Alberto Avila M.
CIP. N° 84745
SUPERVISOR DE OBRAS



JORGE JULIO
ESPICHAN AVILES
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 115003



SUSTENTO DE METRADOS PARA VALORIZACIÓN N° 07

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
Cliente: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
Lugar: MARCONA - NASCA - ICA.
Fecha: Abril 2018

01 OBRAS PRELIMINARES

Partida: 01.03 BAÑOS QUÍMICOS PARA EL PERSONAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	N° Veces	N° Elemt.				PARCIAL
1	Baños Portátiles	Mes	1	1				1.00

Partida: CERCO DE MALLA RASHELL CON MADERA ROLLIZO 01.04

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	N° Veces	N° Elemt.	LARGO (m)			PARCIAL
1	Cerco Perimetrico con Malla	m.	1	1	684.00			334.00

Partida: 01.05 AGUA PARA LA CONSTRUCCION

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	N° Veces	N° Elemt.				PARCIAL
1	Suministro de Agua	Mes	1	1				1.00

Partida: 01.08 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	N° Veces	N° Elemt.				PARCIAL
1	Suministro de Energía	Mes	1	1				1.00

Partida: FLETE TERRESTRE 01.09

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	N° Veces	N° Elemt.				PARCIAL
1	Flete Terrestre	Gib.	1	0.15				0.15

02 SEGURIDAD Y SALUD

Partida: 02.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	N° Veces	N° Elemt.				PARCIAL
1	Plan de Seguridad y Salud	Und.	1	0.12				0.12

Partida: 02.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	N° Veces	N° Elemt.				PARCIAL
1	EPP's Colectivo	Und.	1	0.12				0.12

Partida: 02.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	N° Veces	N° Elemt.				PARCIAL
1	EPP's Individual	Und.	1	0.12				0.12

Partida: 02.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	N° Veces	N° Elemt.				PARCIAL
1	Señalización Temporal de Seguridad	Und.	1	0.12				0.12

Partida: 02.05 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	N° Veces	N° Elemt.				PARCIAL
1	Repuesta ante emergencia	Und.	1	0.12				0.12

JOSÉ JULIO
 ESPINOZA AVILES
 INGENIERO CIVIL
 ID Nº 119009

Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS



SUSTENTO DE METRADOS PARA VALORIZACIÓN N° 07

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
Cliente: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDECOP.
Lugar: MARCONA - NASCA - ICA.
Fecha: Abril 2018
 03 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Partida: 03.01 RIEGO DEL AREA DE TRABAJO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	N° Veces	N° Elemt.	ÁREA (m ²)	PARCIAL
1	Riego del área de trabajo	m ²	1	1	394.41	394.41

Partida: 03.02 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	N° Veces	N° Elemt.	ÁREA (m ²)	PARCIAL
1	Limpieza General en obra	m ²	1	1	394.41	394.41

Partida: 03.03 PLAN DE CONTINGENCIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	N° Veces	N° Elemt.	PARCIAL
1	Plan de Cierre y Abandono	Und.	1	0.12	0.12

Partida: 03.04 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	N° Veces	N° Elemt.	PARCIAL
1	Inducción de concientización y educación Ambiental	Und.	1	0.12	0.12

Partida: 03.05 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	N° Veces	N° Elemt.	PARCIAL
1	Plan de Cierre y Abandono	Und.	1	0.12	0.12

Partida: 03.06 MEDIDA DE CONCIERTIZACIÓN Y EDUCACION AMBIENTAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	N° Veces	N° Elemt.	PARCIAL
1	Inducción de concientización y educación Ambiental	Und.	1	0.12	0.12

05 ESTRUCTURAS

Partida: 05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE


Partida: 05.03.06 FALSO PISO MEZCLA 1:8 E=4"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	ÁREA (m ²)	PARCIAL
	RECEPCIÓN	m2	19.72	19.72	
	DESCARGA	m2	22.13	22.13	
	TAREAS PREVIAS	m2	192.00	192.00	
	AREA DE SERVICIOS	m2	152.50	152.50	

Partida: 05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

Partida: 05.04.14 VIGAS, ACERO F^Y=4200 Kg/cm²

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	Ø	veces	N°elem.	Long. (m)	Cofcic.	PARCIAL
	ÁREA DE TAREAS PREVIAS	kg						
1V-3			Ø5/8"	2.00	6.00	15.00	1.56	280.80
			Ø1/4"	2.00	82.00	1.70	0.25	69.70
1V-2			Ø5/8"	3.00	4.00	14.55	1.56	272.38
			Ø5/8"	3.00	2.00	3.30	1.56	30.89
			Ø5/8"	3.00	2.00	2.20	1.56	20.59
			Ø5/8"	3.00	4.00	3.40	1.56	63.65
			Ø5/8"	3.00	2.00	3.20	1.56	29.95
			Ø5/8"	3.00	2.00	2.20	1.56	20.59
			Ø1/2"	3.00	2.00	13.20	1.00	79.20
			Ø3/8"	3.00	85.00	1.70	0.56	242.76


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

JORGE LUIS
 ESPINOZA AVILES
 INGENIERO CIVIL

SUSTENTO DE METRADOS PARA VALORIZACIÓN N° 07

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
 Cliente: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
 Lugar: MARCONA - NASCA - ICA.
 Fecha: Abril 2018

EJE 19 VOLADOS		Ø3/8"	2.00	3.00	4.15	0.56	13.94
temp		Ø1/4"	2.00	4.00	4.15	0.25	8.30
temp		Ø1/4"	2.00	6.00	0.90	0.25	2.70
longitudinales		Ø1/2"	4.00	1.00	13.30	1.00	53.20
		Ø1/2"	4.00	1.00	3.15	1.00	12.60
		Ø1/2"	4.00	1.00	2.65	1.00	10.60
		Ø1/2"	4.00	1.00	3.30	1.00	13.20

Partida: 05.04.21 LOSA ALIGERADA, LADRILLO HUECO 15X30X30

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	LARGO (m.)	ANCHO (m.)	ALTO (m.)	PARCIAL
	ÁREA DE TAREAS PREVIAS						
	Losa Aligerada, ladrillo	und					
				228.70	10.00		2.287.00

Partida: 05.04.25 LOSA MACIZA, CONCRETO f'c=210 kg/cm².

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	LARGO (m.)	ANCHO (m.)	ALTO (m.)	PARCIAL
	ÁREA DE TAREAS PREVIAS						
	maniluvios						
	losa		12	1.20	0.10	0.50	0.72
	muros		24	0.90	0.10	0.50	1.08

Partida: 05.04.26 LOSA MACIZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	LARGO (m.)	ANCHO (m.)	ALTO (m.)	PARCIAL
	ÁREA DE TAREAS PREVIAS						
	maniluvios						
	losa		24	1.20		0.10	2.88
	muros		12	1.20		0.50	7.20
			48	0.50		0.90	21.60

Partida: 05.04.27 LOSA MACIZA, ACERO FY=4200 Kg/cm²

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	Ø	veces	Nºelem.	Long.	Cofic.	PARCIAL
	ÁREA DE TAREAS PREVIAS	kg						
	maniluvios		Ø1/4"	12	6.00	0.50	0.25	9.00
			Ø1/4"	12	2.50	1.20	0.25	9.00
			Ø1/4"	24	4.50	0.50	0.25	13.50
			Ø1/4"	24	2.50	0.90	0.25	13.50

Partida: 05.07 SISTEMA DE AGUA CISTERNA - TANQUE ELEVADO

Partida: 05.07.15 MURO CISTERNA, CONCRETO Fc=315 kg/cm²

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	ÁREA (m.)			PARCIAL
	CISTERNA	M3					
	Cisterna de Agua Salada		1	2.180	2.700		5.89
	Cisterna de Agua Domestica		1	2.380	2.700		6.43

Partida: 05.07.16 MURO CISTERNA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PERIMETRO (m.)			PARCIAL
	CISTERNA						
	Cara Exterior - Cisterna		1	20.097	2.700		54.26
	Cara Interior - Cisterna de Agua Salada		1	12.600	2.500		31.50
	Cara Interior - Cisterna de Agua Domestica		1	10.500	2.500		26.25
	Cara Exterior - ducto ingreso a Tanque		2	3.800	0.650		4.94
	Cara Interior - ducto ingreso a Tanque		2	0.600	1.250		1.50
	Cara Interior - ducto ingreso a Tanque		2	1.800	0.850		3.06
	Cara Interior - ducto ingreso a Tanque		2	0.600	0.750		0.90



Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

JOSÉ JULIO
 ESPINOZA AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 119009



SUSTENTO DE METRADOS PARA VALORIZACIÓN N° 07

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
 Cliente: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
 Lugar: MARCONA - NASCA - ICA.
 Fecha: Abril 2018
 Partida: 05.07.17 MURO CISTERNA, ACERO $F_y=4200$ kg/cm²

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	Ø	veces	N°elem.	Long.	Cofic.	PARCIAL
	CISTERNA	kg						
	Fierros Vertical de $\phi 1/2"$			1	89.00	4.22	1.02	363.09
	Fierros Vertical de $\phi 1/2"$			1	89.00	4.04	1.02	366.75
	Corte A-A							
	Fierros Horizontales de $\phi 3/8"$			1	28.00	1.65	0.56	25.87
	Fierros Horizontales de $\phi 3/8"$			1	28.00	2.75	0.56	43.12
	Fierros Horizontales de $\phi 3/8"$			1	28.00	1.68	0.56	26.34
	Fierros Horizontales de $\phi 3/8"$			1	28.00	2.60	0.56	40.77
	Fierros Horizontales de $\phi 3/8"$			1	28.00	1.42	0.56	22.27
	Fierros Horizontales de $\phi 3/8"$			1	28.00	1.82	0.56	28.54
	Corte B-B							
	Fierros Horizontales de $\phi 3/8"$			1	28.00	5.10	0.56	79.97
	Fierros Horizontales de $\phi 3/8"$			1	28.00	2.67	0.56	41.87
	Fierros Horizontales de $\phi 3/8"$			1	28.00	2.70	0.56	42.34
	N-1							
	Fierros de $5/8"$			5	4.00	3.90	1.56	121.68
	Estribos de $3/8"$			5	19.00	0.75	0.56	39.90

Partida: 05.07.27 LOSA ALIGERADA, CONCRETO $F_c=210$ kg/cm²

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT			Coficiente	PARCIAL
	CUARTO DE CONTROL	M3					
	Paño 1		1		9.425	0.088	0.82

Partida: 05.07.28 LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT		ÁREA (m ²)		PARCIAL
	CUARTO DE CONTROL						
	Paño 1	1			9.430		9.43

Partida: 05.07.29 LOSA ALIGERADA, ACERO $F_y=4200$ kg/cm²

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	Ø	veces	N°elem.	Long.	Cofic.	PARCIAL
	CUARTO DE CONTROL	kg						
	Paño 1			1				
	Fierros de $3/8"$			1	10.00	2.97	0.56	16.63
	Fierros de $3/8"$			1	10.00	2.65	0.56	14.84
	Fierros de $3/8"$			1	2.00	1.85	0.56	2.07
	Fierros de $3/8"$			1	2.00	1.55	0.56	1.74
	Temperatura de $1/4"$			1	10.00	4.95	0.25	12.38
	En borde de ducto							0.00
	Fierros de $1/2"$			1	2.00	1.85	1.02	3.77

Partida: 05.07.30 LOSA ALIGERADA, LADRILLO HUECO 15X30X30

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT			Coficiente	PARCIAL
	CUARTO DE CONTROL	und					
	Paño 1		1		9.43	8.33	79.00

Partida: 09. PROTECCION CON ENROCADO

Partida: 09.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT		LARGO (m.)	ANCHO (m.)	ALTO (m.)	PARCIAL
	ZONA DE PROTECCION							
			1		19.00	1.00		19.00

Partida: 09.02 EXCAVACION PARA UÑA ANTISOCAVAMIENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT		LARGO (m.)	ANCHO (m.)	ÁREA (m ²)	PARCIAL
	ZONA DE PROTECCION							
			1		19.00		2.2	41.80



Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

JORGE JULIO
 ESPICHAN AVILES
 INGENIERO CIVIL



SUSTENTO DE METRADOS PARA VALORIZACIÓN N° 07

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
 Cliente: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
 Lugar: MARCONA - NASCA - ICA.
 Fecha: Abril 2018
 Partida: 05.04.16 MURO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	LARGO (m.)	ANCHO (m.)	ALTO (m.)	PARCIAL
	CERCO PERIMÉTRICO						
	F-L		2	27.800		0.43	23.91
			2	27.800		0.47	26.13
			2	27.800		4.65	258.54
			2	9.280		0.43	7.98
			2	9.280		0.47	8.72
			2	9.280		2.95	54.75

Partida: 05.04.17 MURO, ACERO F_y=4200 Kg/cm²

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	Ø	veces	N°elem.	Long.	Coefic.	PARCIAL
	CERCO PERIMÉTRICO	kg						
	F-L			2	111.000	5.150	1.56	1,783.55
				2	139.000	2.950	1.02	836.50
				1	139.000	3.640	1.02	516.08
				1	10.000	31.900	1.02	325.38
				1	20.000	31.900	1.02	650.76
				2	13.500	31.900	1.02	878.53
				1	6.000	31.900	1.02	195.23
				2	37.000	3.450	1.56	398.27
				2	46.000	2.950	1.02	276.83
				1	46.000	3.640	1.02	170.79
				1	7.000	11.000	1.02	78.54
				1	14.000	11.000	1.02	157.08
				2	13.500	11.000	1.02	302.94
				1	6.000	11.000	1.02	67.32
				2	37.000	2.850	1.56	329.00
				2	46.000	2.950	1.02	276.83
				1	46.000	3.640	1.02	170.79
				1	5.500	10.950	1.02	61.43
				1	11.000	10.950	1.02	122.86
				2	13.500	10.950	1.02	301.56
				1	6.000	10.950	1.02	67.01

Partida: 05.04.19 LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	AREA (m2.)	PARCIAL
	ÁREA DE TAREAS PREVIAS				
	Losa Aligerada, Encofrado y Desencofrado		2	6.50	13.00
			2	7.00	14.00
			2	7.00	14.00
			2	7.00	14.00
			2	1.25	2.50
			2	3.75	7.50
			2	19.20	38.40
			2	20.95	41.90
			2	20.95	41.90
			2	20.75	41.50

Partida: 05.04.20 LOSA ALIGERADA, ACERO F_y=4200 Kg/cm²

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	Ø	veces	N°elem.	Long.	Coefic.	PARCIAL
	ÁREA DE TAREAS PREVIAS	kg						
	EJE 7-10		Ø3/8"	2.00	11.00	4.20	0.56	51.74
	temp		Ø1/4"	2.00	18.00	4.20	0.25	37.80
	temp		Ø1/4"	2.00	17.00	4.65	0.25	39.53
	EJE 7-10 VOLADOS		Ø3/8"	2.00	11.00	1.40	0.56	17.25
	temp		Ø1/4"	2.00	19.00	1.40	0.25	13.30
	temp		Ø1/4"	2.00	6.00	4.65	0.25	13.95
	EJE 10-19		Ø3/8"	6.00	12.00	4.20	0.56	169.34
	temp		Ø1/4"	6.00	20.00	4.20	0.25	126.00
	temp		Ø1/4"	6.00	17.00	5.05	0.25	128.78
	EJE 10-19 VOLADOS		Ø3/8"	6.00	12.00	1.40	0.56	56.45
	temp		Ø1/4"	6.00	20.00	1.40	0.25	42.00
	temp		Ø1/4"	6.00	6.00	5.05	0.25	45.45
	EJE 19 VOLADOS		Ø3/8"	2.00	3.00	1.40	0.56	4.70
	temp		Ø1/4"	2.00	4.00	1.40	0.25	2.80
	temp		Ø1/4"	2.00	6.00	0.80	0.25	2.70

JULIO
 ESPINOZA AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 119009



Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS



SUSTENTO DE METRADOS PARA VALORIZACIÓN N° 07

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
 Cliente: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
 Lugar: MARCONA - NASCA - ICA.
 Fecha: Abril 2018

VA		Ø1/2"	1.00	4.00	13.60	1.00	54.40
		Ø1/4"	1.00	84.00	0.84	0.25	17.64
VA		Ø1/2"	2.00	4.00	24.90	1.00	199.20
		Ø1/4"	2.00	137.00	0.84	0.25	57.54
1V-1		Ø5/8"	3.00	6.00	25.95	1.56	728.68
		Ø1/2"	3.00	2.00	24.30	1.00	145.80
		Ø3/8"	3.00	134.00	1.70	0.56	382.70
AREA DE SERVICIOS							
EJE 20 - 1V-1							
1v-1		Ø5/8"	1.00	4.00	4.50	1.56	28.08
		Ø1/4"	1.00	24.00	1.30	0.25	7.80
		Ø5/8"	1.00	4.00	10.50	1.56	65.52
Estribos		Ø1/4"	3.00	24.00	1.30	0.25	23.40
VC		Ø1/2"	1.00	4.00	4.50	1.56	28.08
Estribos		Ø1/4"	1.00	24.00	1.30	0.25	7.80
EJE 21 - 1V-1		Ø5/8"	1.00	4.00	10.80	1.56	67.39
Estribos		Ø1/4"	3.00	24.00	1.30	0.25	23.40
VC		Ø1/2"	1.00	4.00	10.50	1.56	65.52
Estribos		Ø1/4"	3.00	24.00	1.30	0.25	23.40
EJE 23 - VC							0.00
1V-1		Ø5/8"	1.00	4.00	10.80	1.56	67.39
Estribos		Ø1/4"	3.00	24.00	1.30	0.25	23.40
VC		Ø1/2"	1.00	4.00	7.50	1.56	46.80
Estribos		Ø1/4"	2.00	24.00	1.30	0.25	15.60
EJE B* 1V-2		Ø5/8"	1.00	6.00	10.80	1.56	101.09
Estribos		Ø3/8"	2.00	24.00	1.30	0.56	34.94
EJE F* 1V-3		Ø5/8"	1.00	6.00	5.25	1.56	49.14
Estribos		Ø3/8"	2.00	24.00	1.30	0.56	34.94
VD		Ø1/2"	1.00	4.00	2.00	1.00	8.00
		Ø3/8"	1.00	2.00	2.00	0.56	2.24
Estribos		Ø1/4"	2.00	24.00	1.30	0.25	15.60
VC		Ø1/2"	1.00	4.00	3.70	1.00	14.80
Estribos		Ø1/4"	1.00	21.00	0.90	0.25	4.73
EJE F** 1V-3		Ø5/8"	1.00	6.00	5.25	1.56	49.14
Estribos		Ø3/8"	2.00	24.00	1.30	0.56	34.94
VD		Ø1/2"	1.00	4.00	2.00	1.00	8.00
		Ø3/8"	1.00	2.00	2.00	0.56	2.24
Estribos		Ø1/4"	2.00	24.00	1.30	0.25	15.60
VC		Ø1/2"	1.00	4.00	3.70	1.00	14.80
Estribos		Ø1/4"	1.00	21.00	0.90	0.25	4.73
EJE G* 1V-3		Ø5/8"	1.00	6.00	5.25	1.56	49.14
Estribos		Ø3/8"	1.00	24.00	1.30	0.56	17.47
VC		Ø1/2"	1.00	4.00	6.30	1.00	25.20
Estribos		Ø1/4"	1.00	21.00	0.90	0.25	4.73
EJE I* 1V-3		Ø5/8"	2.00	6.00	5.25	1.56	98.28
Estribos		Ø3/8"	2.00	24.00	1.30	0.56	34.94
EJE K* 1V-2		Ø5/8"	1.00	6.00	10.80	1.56	101.09
Estribos		Ø3/8"	2.00	24.00	1.30	0.56	34.94
VC		Ø1/2"	1.00	4.00	6.30	1.00	25.20
Estribos		Ø1/4"	1.00	21.00	0.90	0.25	4.73

Partida: 05.04.15 MURO, CONCRETO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	LARGO (m.)	ANCHO (m.)	ALTO (m.)	PARCIAL
	CERCO PERIMETRICO	M3					
F-L			1	27.800	0.430	2.7	32.28
			1	27.800	0.470	0.5	6.53
			1	27.800		1.59	44.20
			1	9.280	0.430	2.7	10.77
			1	9.280	0.470	0.5	2.18
			1	9.280		1.1	10.21



Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

JOSÉ JULIO
 ESPICHAN AVILES
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 119009



SUSTENTO DE METRADOS PARA VALORIZACIÓN N° 07

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
 Cliente: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
 Lugar: MARCONA - NASCA - ICA.
 Fecha: Abril 2018

Partida: 09.03 REFINE Y PEFLADO DE TALUD ZONA DE ENROCADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	LARGO (m.)	ANCHO (m.)	ALTO (m.)	PARCIAL
	ZONA DE PROTECCIÓN		1	19.00	1.00	5.70	108.30

Partida: 09.04 EXTRACCION DE ROCA CON MAQUINARIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	LARGO (m.)	ANCHO (m.)	ÁREA (m2)	PARCIAL
	ZONA DE PROTECCION						
	UÑA			19.00		2.2	62.75
	TALUD			19.00		3.5	99.75

Partida: 09.05 CARGUO Y TRANSPORTE DE ROCA DE CANTERA - OBRA DMIN=0.80 M

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	LARGO (m.)	ANCHO (m.)	ALTO (m.)	PARCIAL
	ZONA DE PROTECCION						
	VOLUMEN TOTAL						162.50

Partida: 09.06 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE, Dmin=0.8m

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	LARGO (m.)	ANCHO (m.)	ALTO (m.)	PARCIAL
	VOLUMEN TOTAL						62.70

Partida: 09.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE, Dmin=0.8m

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	LARGO (m.)	ANCHO (m.)	ALTO (m.)	PARCIAL
	VOLUMEN TOTAL						99.75

Partida: 09.08 SUMINISTRO Y HABILITACION DE GEOTEXTIL TEJIDO 270 gr/cm2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	LARGO (m.)	ANCHO (m.)	ALTO (m.)	PARCIAL
							146.30

05 ARQUITECTURA

Partida: 10.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

Partida: 10.01.01 MURO DE LADRILLO ARCILLA KK TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.5CM

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	N° ElemL	LARGO (m.)	ANCHO (m.)	ALTO (m.)	PARCIAL
	Eje 1"-1" Entre K-N		1		8.90		3.00	26.70
	Eje entre 2-2' Entre M-N		1		3.08		3.00	9.24
	Eje 2"-2" Entre K-M		1		4.00		3.00	12.00
	Eje 4'-4' Entre K-L		1		3.20		3.00	9.60
	Eje 5-5 Entre K-N		1		8.01		3.00	24.03
	Eje K-K Entre 1"-5		1		9.50		3.00	28.50
	Eje entre K-L Entre 2'-3		1		1.05		3.00	3.15
	Eje entre K-L Entre 1"-2"		1		5.35		3.00	16.05
	Eje M-M Entre 1"-5		1		9.50		3.00	28.50
	Eje entre N-N Entre 1"-2'		1		2.66		3.00	7.98
	Eje N-N Entre 2'-5		1		5.15		0.45	2.32
	CERCO PERIMÉTRICO							
	F-L		1		9.70		2.55	24.74

Partida: 10.04 PISOS Y PAVIMENTOS

Partida: 10.04.01 FALSO PISO E=2" DE CONCRETO 1:10

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	N° ElemL	LARGO (m.)	ANCHO (m.)	ALTO (m.)	PARCIAL
	Cuartos Bombas (Cisternas)	M2			2.40	4.66		11.18



Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

JOSÉ JULIO
 ESPICHAN AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 S.O. N° 10000



SUSTENTO DE METRADOS PARA VALORIZACIÓN N° 07

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA.
Cliente: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES.
Lugar: MARCONA - NASCA - ICA.
Fecha: Abril 2018

14 OBRAS EN MAR

Partida: 14.01 TRABAJOS PRELIMINARES

Partida: 14.01.06 PICADO DE LOSA DE CONCRETO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	N° Veces	N° Elemt.	LARGO (m.)	ANCHO (m.)	ALTO (m.)	PARCIAL
	Muelle Nuevo - cabezo	m ²						
			1	1	27.50	8.00		220.00

Partida: 14.01.10 ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	N° Veces	N° Elemt.	LARGO (m.)	ANCHO (m.)	ALTO (m.)	PARCIAL
	Muelle Nuevo - cabezo	m ³						
			1	1	27.50	8.00	0.10	22.00
							Esponjamiento:	1.40

Partida: 14.01.11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUO MANUAL Y VOLQUETE 15 M³

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	N° Veces	N° Elemt.	LARGO (m.)	ANCHO (m.)	ALTO (m.)	PARCIAL
	Muelle Nuevo - cabezo	m ³						
			1	1	27.50	8.00	0.10	22.00
							Esponjamiento:	1.40

Partida: 14.02 OBRAS DE CONCRETO

14.04 PLATAFORMA BAJA Y REFORZAMIENTO DE MUELLE PARA EBD N° 01

Partida: 14.04.01 CONCRETO EN VIGAS Y NUCLEO FC=280 KG/CM²

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	N° Veces	N° Elemt.	LARGO (m.)	ANCHO (m.)	ALTO (m.)	PARCIAL
	PLATAFORMA BAJA	m ²						
	VIGA VP-03- PLATAFORMA NUEVA		1	1	15.60	0.25	0.50	1.95

Partida: 14.04.02 VIGAS Y NUCLEO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	N° Veces	N° Elemt.	LARGO (m.)	ANCHO (m.)	ALTO (m.)	PARCIAL
	PLATAFORMA BAJA	m ²						
	VIGA VP-03- PLATAFORMA NUEVA		1	2	15.60		0.50	15.60


Partida: 14.04.03 VIGAS Y NUCLEO, ACERO FY=4200 Kg/cm²

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	Ø	veces	N°elem.	Long.	Coefic.	PARCIAL
	PLATAFORMA BAJA	KG						
	VIGA VP-03- PLATAFORMA NUEVA			2	2	17.40	1.58	109.97
				2	3	17.40	3.97	414.47
				2	3	17.40	3.97	414.47
				2	2	17.40	0.56	38.98
	Estribos			2	60	1.50	0.56	100.80

14.04 PILOTAJE


Partida: 14.05.05 TRANSPORTE DE PILOTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	N° Veces	N° Elemt.	LARGO (m.)	ANCHO (m.)	ALTO (m.)	PARCIAL
	PLATAFORMA BAJA	und						
			1	6				6.00



 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

JOSE YULIO
 ESPINOZA AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 119099

**ANEXO N° 03:
PANEL FOTOGRÁFICO**


Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS




JORGE JULIO
ESPINOSA AVILÉS
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 113009

PANEL FOTOGRÁFICO VALORIZACIÓN N°07

Partida 01.03: BAÑOS QUIMICOS.PARA EL PERSONAL

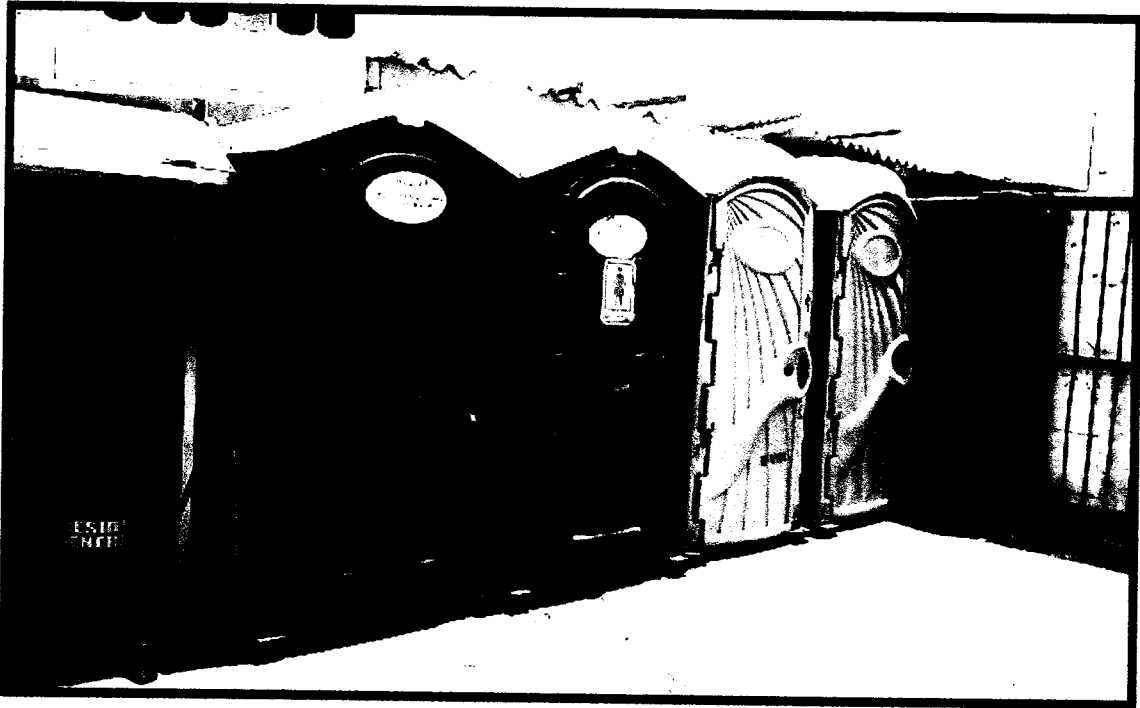


Partida 01.04: CERCO DE MALLA RASHELL CON MADERA ROLLIZO

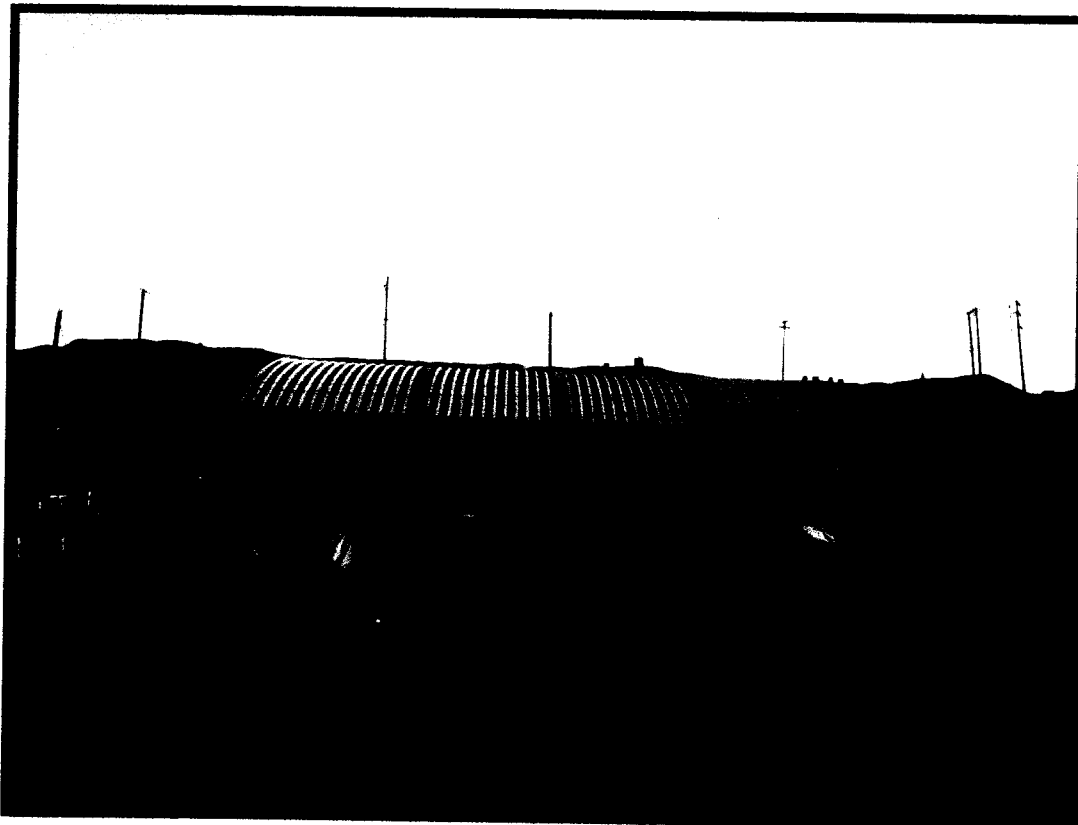

Luis Alberto Avila Morales
Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

Jorge Julio Espichan Avilés
JORGE JULIO
ESPICHAN AVILÉS
INGENIERO CIVIL


Partida 01.04: AGUA PARA LA CONSTRUCCION

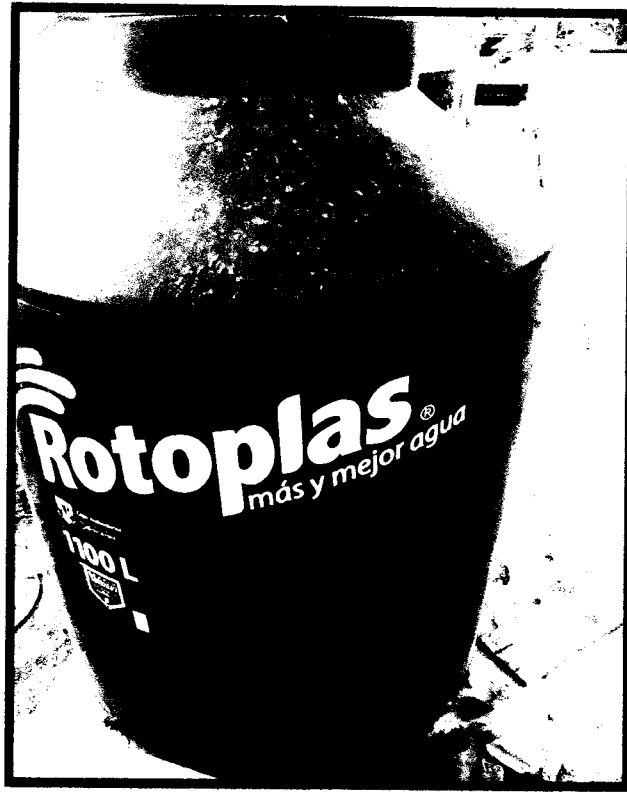


Partida 01.08 ENERGÍA ELECTRICA PROVISIONAL




ESPINOZA AVILLES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 119009

 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

Partida 01.09 FLETE TERRESTRE

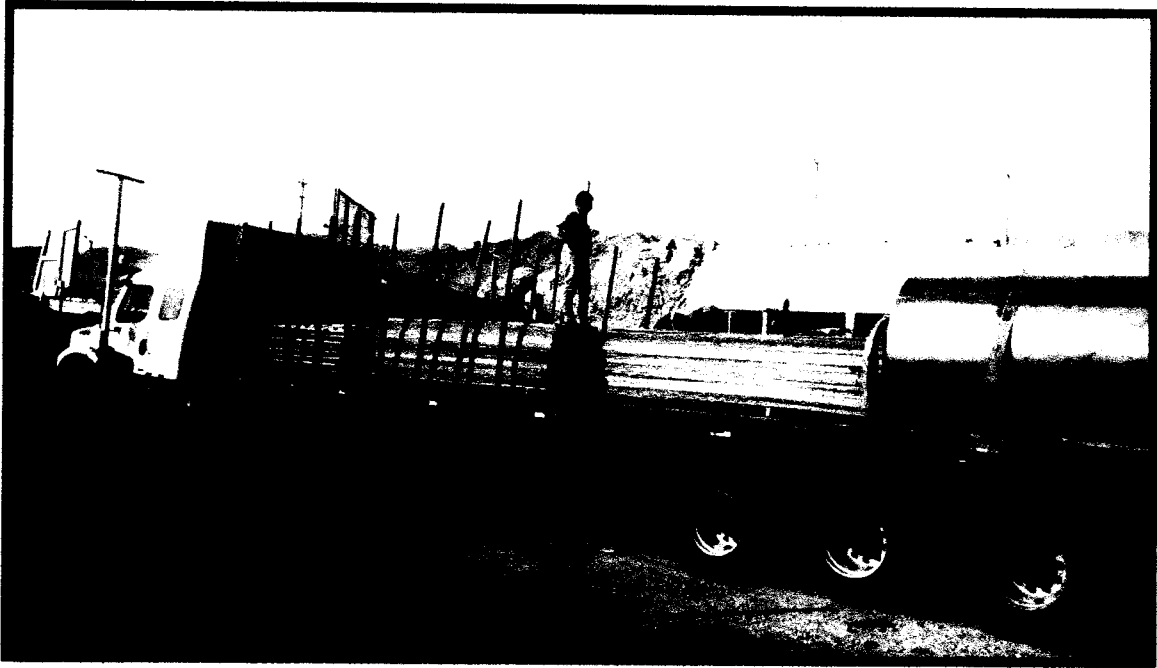



 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA


JORGE JULIO
ESPICHAN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

02. SEGURIDAD Y SALUD

02.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

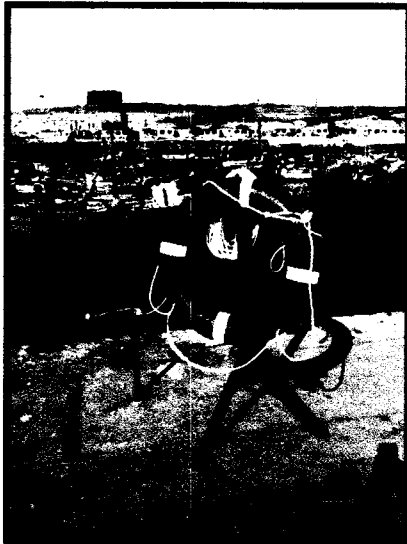


Luis Alberto Avila Morales
Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

Jorge Julio Espichanaviles
JORGE JULIO
ESPICHANAVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

02.05 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO




03 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL


03.06 MEDIDAS DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL



Concientización ambiental mediante letreros





Luis Alberto Avila Morales
Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS


JORGE JULIO
ESPICHÁN AVILA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

03.07 CARTEL DE MANEJO AMBIENTAL



03.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE BASURA

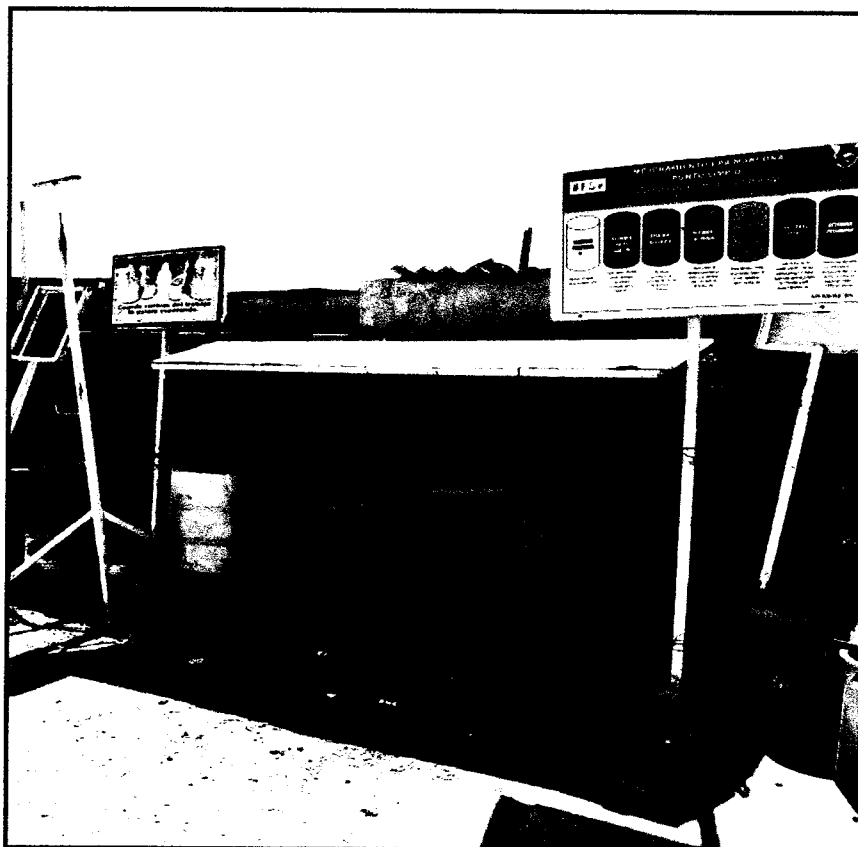


Luis Alberto Avila Morales
Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

Jorge Julio Espichán Avilés
JORGE JULIO
ESPICHÁN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Econ. CIP N° 119069


Partida 05.04: OBRAS DE CONCRETO ARMADO

Partida 05.04.13: VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

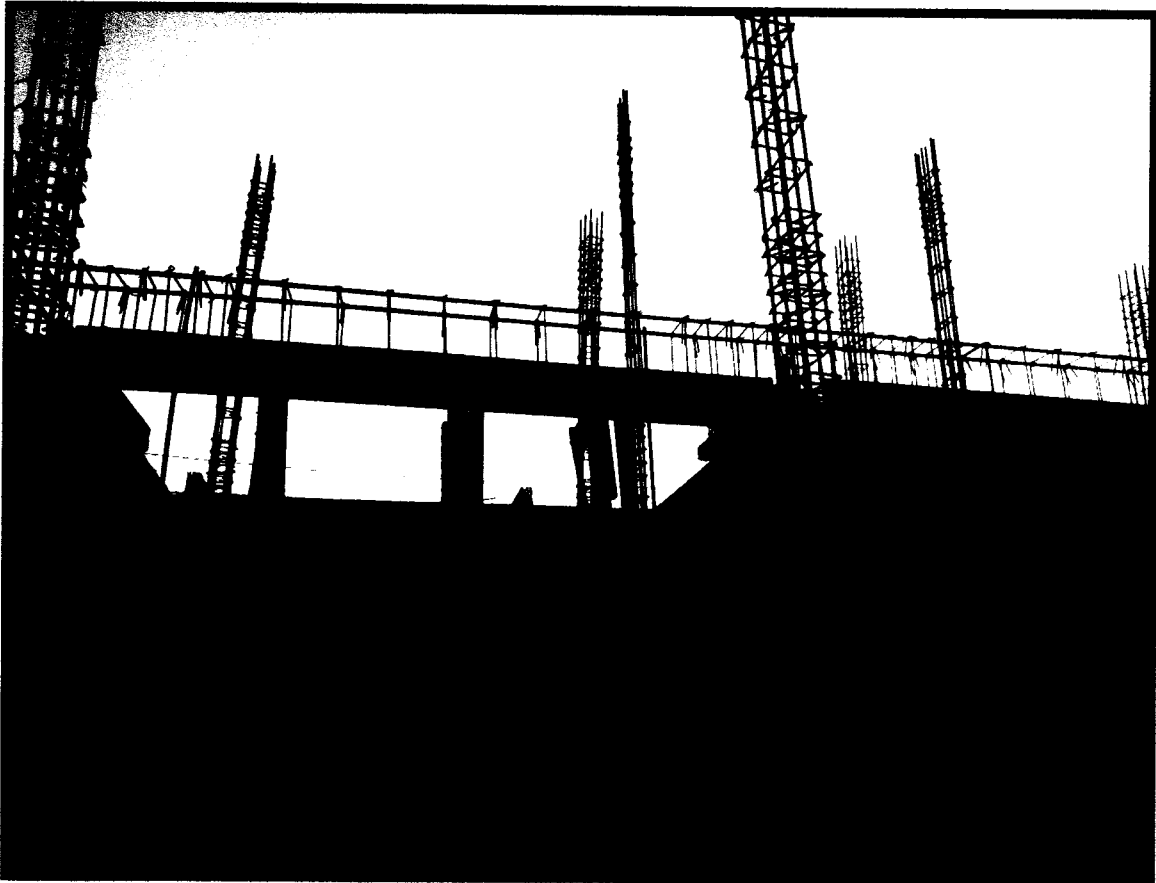

Partida 05.04.15: MURO, CONCRETO




Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS



JOSE JULIO
ESPICHAN AVILES
INGENIERO
Reg. CIP N° 18069


Partida 05.04.16: MURO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO



Partida 05.04.17: MURO, ACERO F'Y=4200 Kg/cm2




Lays Alberto Avila Morales
Lays Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA


Jorge Julio Espichán Avilés
Jorge Julio Espichán Avilés
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 119009

83

Partida 05.04.19: LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO




Partida 05.04.19: LOSA ALIGERADA, LADRILLO HUECO 15X30X30



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA


JULIO 84
ESPIZAN AVILA
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 119009


Partida 05.07.16: MURO CISTERNA, ENCOFRADO Y DEENCOFRADO

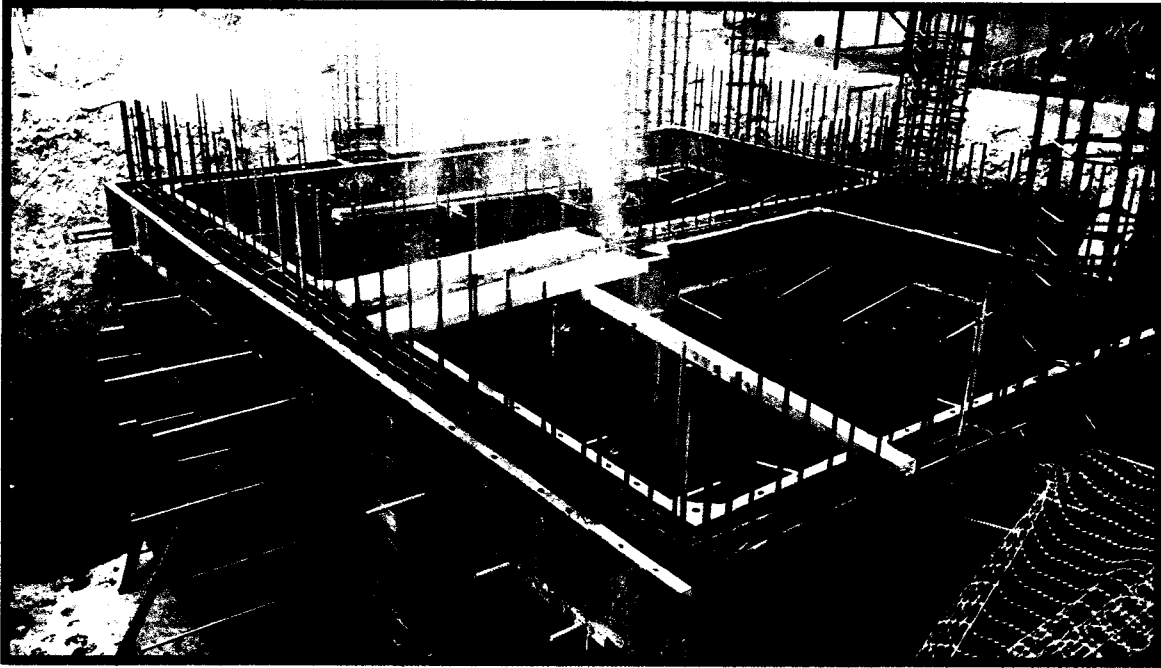

Partida 09. PROTECCION CON ENROCADO




Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA


JOSE JULIO
ESPIÑAN AVILÉS
85

Partida 09.02: EXCAVACION PARA UÑA ANTISOCAVAMIENTO




Partida 09.04: EXTRACCION DE ROCA CON MAQUINARIA



Luis Alberto Avila Morales
Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

Jorge Julio Espichan
Jorge Julio Espichan
CIP. N° 110000
SUPERVISOR DE OBRAS

Partida 09.05: CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DE CANTERA - OBRA
DMIN=0.80 M

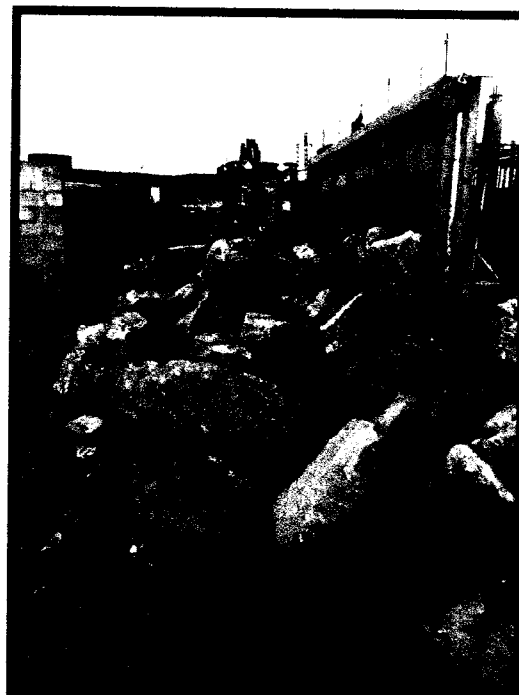


Partida 10.01: MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA




Luis Alberto Avila Morales
Luis Alberto Avila Morales
C.I.P. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA


Jose de Julio
JOSE DE JULIO
ESPINOSA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 119009


Partida 14.01.06: PICADO DE LOSA DE CONCRETO

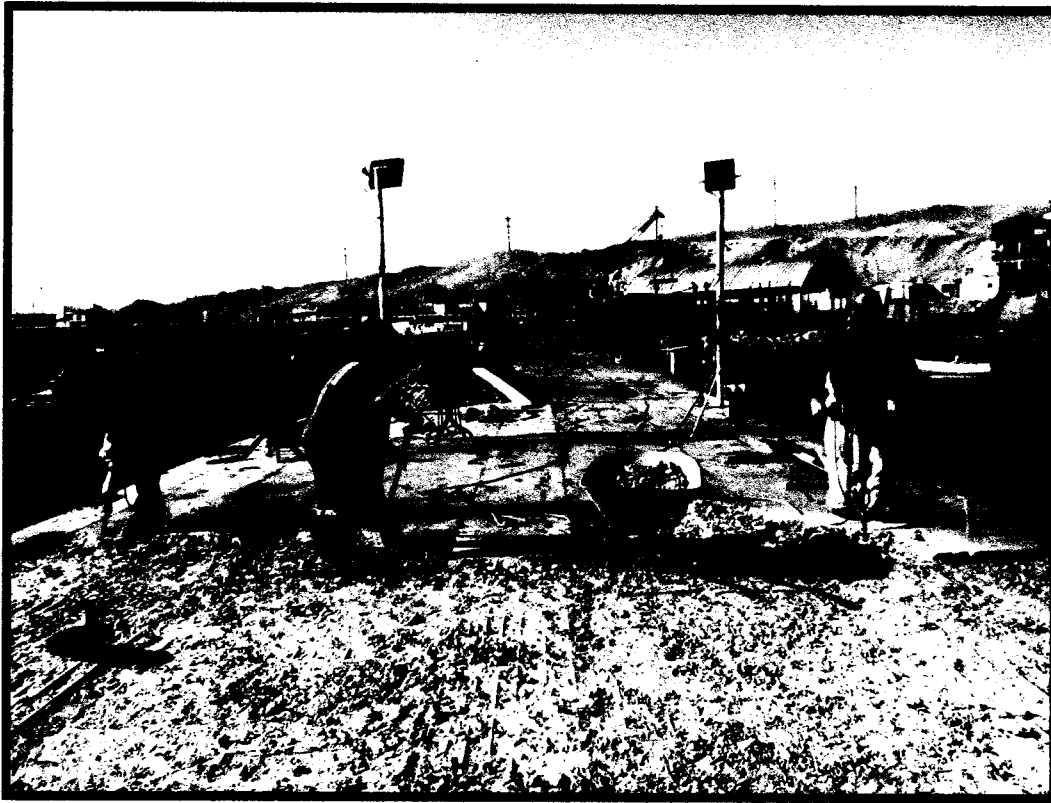


Partida 14.01.10: ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES





Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS


ESPINHAN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
R.C. CIP. N° 115009

**Partida 14.02.04: COLOCACION DE ADITIVO TRANSFORMADOR DE OXIDO
LOSA DE PISO**

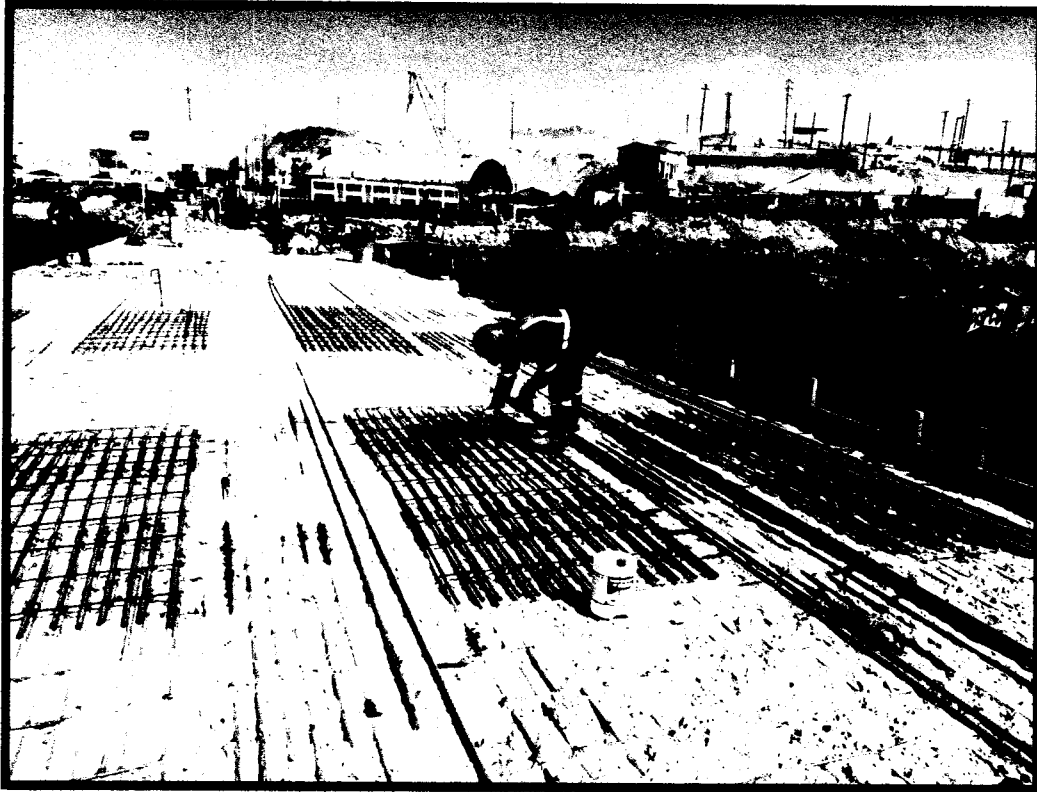

Partida 14.04.02: VIGAS Y NUCLEO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

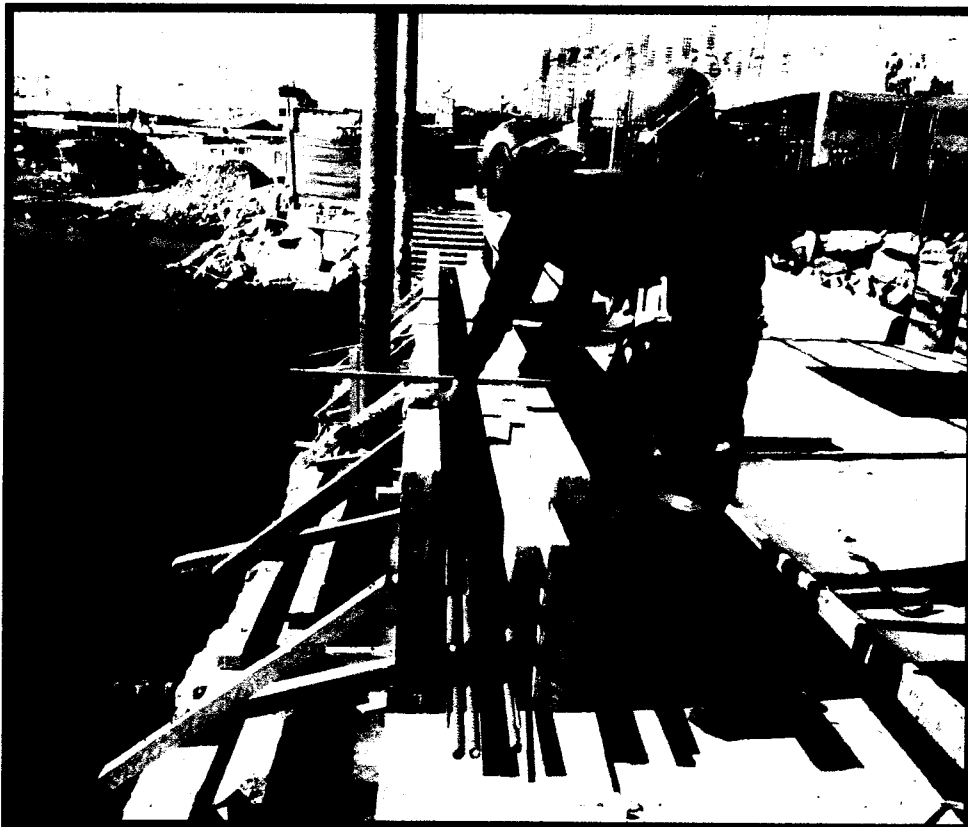




Luis Alberto Avila Morales
CIP. No 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

INGENIERO EN OBRAS
REG. CIP. No 1189


Partida 14.04.03: VIGAS Y NUCLEO, ACERO FY=4200 Kg/cm2





 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA


ESPICHAN AVILLA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 115009

**ANEXO N° 04:
CRONOGRAMA VALORIZADO
DE OBRA**

Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA



INGENIERO DE JULIO
EUSEBIO AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 119039

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVIDOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA
Ubicación: MARCONA - NAZCA - ICA
Fecha: Diciembre 2017
Cliente: FONDEPES

Table with columns: Item, Descripción, Unidad, Medido, P. Unit., Porcentaje, Oct 17, Nov 17, Dic 17, Ene 18, Feb 18, Mar 18, Abr 18, May 18, TOTAL. Rows include items like OBRAS PRELIMINARES, ALMACEN, OFICINA Y CASITA DE GUARDIANIA, etc.

Ing. Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAJAZA, REGION ICA

Ubicación: MARCONA - NAJAZA - ICA

Fecha: Diciembre 2017

Cliente: FONDERES

Unid	Intereso	P. Unit. %	Parcial \$	Oct 17 Parcial (\$)	Nov 17 Parcial (\$)	Dic 17 Parcial (\$)	Ene 18 Parcial (\$)	Feb 18 Parcial (\$)	Mar 18 Parcial (\$)	Abr 18 Parcial (\$)	May 18 Parcial (\$)	TOTAL
GERAS DE CARGAR TO ARMADO												
m ³	150.35	476.25	71,485.10	19,542.38	21,440.43	21,440.43	21,440.43	9,044.96				71,485.10
Kg	5,614.47	4.18	23,264.12	6,266.37	6,863.94	6,863.94	6,863.94	2,806.08				23,264.12
m ²	22.06	527.24	11,646.73	3,494.02	3,494.02	3,494.02	3,494.02	2,329.35				11,646.73
m ³	284.90	44.22	12,581.88	3,514.16	3,514.16	3,514.16	3,514.16	2,342.78				12,581.88
Kg	3,381.30	4.18	14,066.21	4,219.96	4,219.96	4,219.96	4,219.96	2,813.24				14,066.21
m ³	131.88	59.54	7,076.51	14,215.30	28,430.60	28,430.60	28,430.60	28,430.60				7,076.51
m ³	1,118.07	58.33	65,217.02	13,043.40	26,086.81	26,086.81	26,086.81	65,217.02				65,217.02
Kg	23,315.35	4.18	96,991.86	33,947.15	33,947.15	33,947.15	33,947.15	16,734.24				96,991.86
m ²	20.46	476.69	14,206.84	5,682.74	5,682.74	5,682.74	5,682.74	2,841.37				14,206.84
m ²	292.48	42.47	8,598.48	3,439.39	3,439.39	3,439.39	3,439.39	1,719.70				8,598.48
Kg	11,183.22	4.18	46,543.00	18,617.20	18,617.20	18,617.20	18,617.20	9,308.60				46,543.00
m ³	84.01	527.05	44,147.87	13,698.42	13,698.42	13,698.42	13,698.42	22,296.59				44,147.87
m ³	84.22	57.12	55,078.25	24,784.31	24,784.31	24,784.31	24,784.31	24,784.31				55,078.25
Kg	13,698.42	4.18	56,985.43	25,643.44	25,643.44	25,643.44	25,643.44	12,821.72				56,985.43
m ²	243.48	842.12	31,865.38	79,187.23	52,798.15	52,798.15	52,798.15	39,026.16				31,865.38
Kg	938.58	99.30	65,043.59	31,083.23	31,083.23	31,083.23	31,083.23	20,017.44				65,043.59
Kg	14,843.88	4.18	62,168.48	18,483.03	18,483.03	18,483.03	18,483.03	8,241.81				62,168.48
m ³	104.12	395.77	41,307.57	23,251.64	23,251.64	23,251.64	23,251.64	11,625.77				41,307.57
m ³	1,185.00	48.63	58,128.84	8,994.92	8,994.92	8,994.92	8,994.92	4,497.46				58,128.84
Kg	8,404.60	4.18	35,128.84	15,359.30	15,359.30	15,359.30	15,359.30	7,879.05				35,128.84
Unid	11,880.00	3.23	38,386.24	3,466.93	3,466.93	3,466.93	3,466.93	3,466.93				3,466.93
m ²	15.87	444.05	6,933.56	2,071.58	2,071.58	2,071.58	2,071.58	3,954.46				6,933.56
m ²	75.17	88.25	6,738.82	383.11	383.11	383.11	383.11	383.11				383.11
Kg	995.94	4.18	4,143.11	823.52	823.52	823.52	823.52	60.60				823.52
m ²	1.80	426.87	766.21	63.90	63.90	63.90	63.90	63.90				63.90
m ²	31.88	51.99	1,647.04	1,647.04	1,647.04	1,647.04	1,647.04	1,647.04				1,647.04
Kg	45.00	4.18	187.20	60.60	60.60	60.60	60.60	60.60				187.20
PATIO DE MANIOBRAS												
m ²	1,150.00	1.10	1,265.00									1,265.00
m ³	575.00	5.30	3,047.50									3,047.50
m ³	186.80	18.41	3,414.82									3,414.82
m ³	539.28	11.00	5,932.08									5,932.08
m ³	539.28	20.47	11,038.08									11,038.08
m ³	1,150.00	4.99	5,738.50									5,738.50
m ³	1,150.00	28.34	32,591.00									32,591.00
m ³	285.00	482.05	138,000.00									138,000.00
m ³	160.28	49.59	7,948.29									7,948.29
Kg	17,303.44	4.18	71,982.31									71,982.31
m ²	728.55	3.65	2,679.07									2,679.07
INSTALACIONE S SANITARIAS CONCRE TO ARMADO												
m ²	95.03	3.53	335.46									335.46
m ²	333.79	1.10	367.17									367.17
m ²	323.47	35.05	11,337.82									11,337.82
m ²	116.20	4.98	579.84									579.84
m ²	199.27	40.78	8,128.22									8,128.22
m ²	4.19	79.89	334.74									334.74
m ³	174.15	11.00	1,915.65									1,915.65
m ³	174.15	20.47	3,564.85									3,564.85
m ³	52.66	30.89	1,627.59									1,627.59
m ³	3.91	475.28	1,858.23									1,858.23
Kg	282.92	4.18	1,183.78									1,183.78
m ³	1.02	536.54	548.31									548.31
m ³	15.58	88.33	1,375.38									1,375.38
Kg	843.28	4.18	3,507.96									3,507.96
m ²	0.79	527.05	416.76									416.76
m ²	7.81	57.12	446.11									446.11
Kg	127.97	4.18	532.36									532.36
m ³	86.48	542.12	46,871.70									46,871.70
m ³	965.06	89.30	86,185.66									86,185.66
Kg	7,888.18	4.18	32,948.75									32,948.75
m ²	0.61	395.77	241.42									241.42
m ²	7.00	48.83	342.51									342.51
Kg	120.35	4.18	500.66									500.66


[Signature]
Ing. Alberto Valle Morúa
 CIP: N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE MAZCA, REGION ICA
Ubicación: MARCONA - NASCA - ICA
Fecha: Diciembre 2017

Cliente: FONDEFES

Mes	Unid	Descripción	Metodo	P. Unit. S/.	Parcial S/.	Oct 17 Parcial (S/.)	Nov 17 Parcial (S/.)	Dic 17 Parcial (S/.)	Ene 18 Parcial (S/.)	Feb 18 Parcial (S/.)	Mar 18 Parcial (S/.)	Abr 18 Parcial (S/.)	May 18 Parcial (S/.)	TOTAL
05.06.24	Und.	LOSA ALIGERADA, LADRILLO HUECO 15X30X30		56,00	3,23	190,57								190,57
05.06.25	m³	LOSAS MACIZAS CONCRETO Fc=280 KG/CM2		24,85	464,44	11,448,45								11,448,45
05.06.26	m³	LOSAS MACIZAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL		56,36	2,193,06	10,318,03								12,511,09
05.06.27	Kg.	LOSAS MACIZAS, ACERO Fy=4200 KG/CM2		4,16	10,391,45	42,824,20								54,215,65
05.06.28	m³	MUROS DE LADRILLO X.X. TIPO IV SOB. Mt 1.4 E=1.5 cm		17,07	65,28	1,114,33					1,114,33			1,114,33
05.06.29	m³	LADRILLO PASTELERO		21,84	78,93	1,673,60						1,673,60		1,673,60
05.06.30	m³	TARRAJÓN CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS INTERIORES		302,95	27,10	8,209,95						8,209,95		8,209,95
05.07		SISTEMA DE ALBERCA CISTERNA - TANQUE ELEVADO		125,558,84										
05.07.01	m²	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL		39,60	3,53	139,79								139,79
05.07.02	m³	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR		36,80	1,10	43,56								43,56
05.07.03	m³	EXCAVACION DE ESTRUCTURAS PARA CIMENTACION		140,58	35,05	4,927,33								4,927,33
05.07.04	m³	Nivelación interior apisonado para falso piso, patio y		36,80	4,98	187,60								187,60
05.07.05	m³	RELLENO CON MATERIAL PROPIO		43,26	40,79	1,713,29								1,713,29
05.07.06	m³	ACABEO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES		122,22	11,00	1,344,42								1,344,42
05.07.07	m³	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE O MAQUINA		222,22	20,47	2,501,84								2,501,84
05.07.08	m³	SOLADO CONCRETO Fc= 100 kg/cm2 Fm=4		39,60	30,99	1,233,24								1,233,24
05.07.09	m³	LOSA DE CIMENTACION CISTERNA - CONCRETO Fc=315 KG/CM2		32,12	486,89	15,703,15								15,703,15
05.07.10	m³	LOSA DE CIMENTACION, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO		42,18	83,92	2,679,27								2,679,27
05.07.11	m³	LOSA CIMENTACION - ACERO Fy=4200 KG/CM2		2,219,86	4,16	9,235,03								9,235,03
05.07.12	kg.	CONCRETO Fc=315 KG/CM2 - COLUMNAS TANQUE ELEVADO		14,02	584,11	7,908,82								7,908,82
05.07.13	kg.	CONCRETO Fc=315 KG/CM2 - COLUMNAS TANQUE ELEVADO		120,96	70,11	8,481,91								8,481,91
05.07.14	kg.	COLUMNAS TANQUE ELEVADO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO		3,601,92	4,16	14,983,98								14,983,98
05.07.15	m³	MURO CISTERNA CONCRETO Fc=315 KG/CM2		12,31	598,93	7,348,21								7,348,21
05.07.16	m³	MURO CISTERNA CONCRETO Fc=315 KG/CM2		122,41	56,05	6,961,06								6,961,06
05.07.17	m³	MURO CISTERNA, ACERO Fy=4200 KG/CM2		1,282,50	4,16	5,252,00								5,252,00
05.07.18	m³	MURO TANQUE ELEVADO CONCRETO Fc= 210 KG/CM2		9,85	531,30	5,233,31								5,233,31
05.07.19	m³	MURO TANQUE ELEVADO CONCRETO Fc= 210 KG/CM2		102,55	87,37	6,908,79								6,908,79
05.07.20	m³	MURO TANQUE ELEVADO CONCRETO Fc=315 KG/CM2		704,94	4,16	2,932,55				2,932,55				2,932,55
05.07.21	m³	VIGAS TANQUE ELEVADO CONCRETO Fc=315 KG/CM2		9,37	584,11	5,285,71				5,285,71				5,285,71
05.07.22	m³	VIGAS TANQUE ELEVADO CONCRETO Fc=315 KG/CM2		83,39	70,11	4,442,17				4,442,17				4,442,17
05.07.23	m³	VIGAS TANQUE ELEVADO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO		801,11	4,16	3,332,62				3,332,62				3,332,62
05.07.24	m³	LOSA MACISA TANQUE ELEVADO, CONCRETO Fc=210 KG/CM2 -		3,93	483,78	1,922,58				1,922,58				1,922,58
05.07.25	m³	LOSA MACISA TANQUE ELEVADO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO		19,87	82,40	1,227,41				1,227,41				1,227,41
05.07.26	m³	LOSA MACISA TANQUE ELEVADO, ACERO Fy=4200 KG/CM2		588,20	4,16	2,114,11				2,114,11				2,114,11
05.07.27	kg.	LOSA ALIGERADA, CONCRETO Fc=210 KG/CM2		0,82	395,77	324,83				324,83				324,83
05.07.28	m³	LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO		6,43	48,93	461,41				461,41				461,41
05.07.29	kg.	LOSA ALIGERADA, ACERO Fy=4200 kg/cm2		61,43	4,16	213,95				213,95				213,95
05.07.30	Und.	LOSA ALIGERADA, LADRILLO HUECO 15X30X30		78,00	3,23	255,17				255,17				255,17
06		ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA EN ZONA DE RECEPCION DE ALIMENTOS		96,341,84										
06.01	m²	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR		81,80	1,10	89,96			13,60	76,48				89,96
06.02	Und.	ESTRUCTURA METALICA EN PUENTE		1,00	24,379,03	24,379,03				19,603,22				24,379,03
06.03	kg.	PINTURA METALICA EN PUENTE (MANO DE OBRA)		9,583,18	4,32	41,399,25				6,276,85				41,399,25
06.04	m	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE CARPINTERIA METALICA		19,84	23,87	473,58				473,58				473,58
07		ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA EN ZONA DE RECEPCION DE ALIMENTOS		96,204,80										
07.01	m³	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR		237,00	1,10	260,70								260,70
07.02	Und.	ESTRUCTURA METALICA EN ZONA DE RECEPCION DE ALIMENTOS (MATERIALES)		1,00	45,483,55	45,483,55				45,483,55				45,483,55
07.03	kg.	ESTRUCTURA METALICA EN ZONA DE RECEPCION DE ALIMENTOS (MANO DE OBRA)		10,548,94	4,32	45,571,42				22,785,71				45,571,42
07.04	m³	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE CARPINTERIA METALICA		188,70	23,87	3,978,13				1,992,57				3,978,13
08		ESTRUCTURA METALICA EN ALMACEN DE REDES		14,982,21										
08.01	m³	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR		124,32	1,10	136,73								136,73
08.02	Und.	ESTRUCTURA METALICA EN ALMACEN DE REDES (MATERIALES)		1,00	6,451,27	6,451,27				6,451,27				6,451,27
08.03	kg.	ESTRUCTURA METALICA EN ALMACEN DE REDES (MANO DE OBRA)		995,50	4,32	4,300,96				4,300,96				4,300,96
08.04	m³	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE CARPINTERIA METALICA		31,17	23,87	744,03				744,03				744,03
08.05	Und.	ESTRUCTURA METALICA SUSPENDIDA EN INGRESO		1,00	2,749,60	2,749,60				2,749,60				2,749,60
09		PROTECCION CON ENCOFRADO		14,205,79										
09.01	m³	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR		19,00	1,10	20,90								20,90
09.02	m³	EXCAVACION PARA UNA ANTISOCAMIENTOS		41,60	7,63	318,63				318,63				318,63
09.03	m³	REFINE Y PERIFLADO DE TALUD ZONA ENROCADO		5,08	50,16	50,16				50,16				50,16
09.04	m³	EXTRACCION DE ROCA CON MAQUINARIA		182,50	27,60	4,988,75				4,988,75				4,988,75
09.05	kg.	CARGUJO Y TRANSPORTE DE ROCA - OBRA Dmin=0.8 m		182,50	31,69	5,149,63				5,149,63				5,149,63
09.06	m³	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE, Dmin=0.8 m		92,70	18,80	1,069,63				1,069,63				1,069,63


Ing. Alberto Avila Mofino
C.P. No 84745
SUPERVISOR DE OBRAS

JORGE JULIO
ESPINOZA AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. C.P. N° 119003

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA


Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE MAZCA, REGION ICA


Ubicación: MARCONA - HANCA - ICA

Fecha: Diciembre 2017

Cliente: FONDEPES

Item	Descripción	Und.	Metrado	P. Unit. \$.	Parcial \$.	Oct 17 Parcial (\$.)	Nov 17 Parcial (\$.)	Dic 17 Parcial (\$.)	Ene 18 Parcial (\$.)	Feb 18 Parcial (\$.)	Mar 18 Parcial (\$.)	Abr 18 Parcial (\$.)	May 18 Parcial (\$.)	TOTAL
09.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DQUE. Dmin=0.8 m	m ³	96.76	14.08	1,404.48				1,404.48					1,404.48
09.08	SUMINISTRO Y HABILITACION DE GEOTEXTIL TEJIDO 270 g/cm2	m ²	146.30	6.43	1,233.31				1,233.31					1,233.31
10.01	ARQUILLO CLORUA	m ²			1,196,403.72									
10.01	MUROS Y LABERES DE ALPANELERIA	m ²			159,188.34									
10.01.01	MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOBA M:1:1.4 E=1.5 cm	m ²	2,376.92	65.28	155,166.34			23,274.80	54,307.87					155,166.34
10.01.02	AL VESTIBULO EN MUROS Y LABERES	m ²			159,188.34									
10.02.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES Y CERCO PERIMETRICO	m ²	2,406.04	28.39	68,307.48				51,230.61					68,307.48
10.02.02	TARRAJEO EN MURO INTERIOR	m ²	2,210.88	22.65	50,076.43				37,657.32					50,076.43
10.02.03	TARRAJEO DE COLUMNAS	m ²	531.48	33.72	17,920.83				13,440.82					17,920.83
10.02.04	TARRAJEO DE VIGAS	m ²	81.17	50.46	3,087.86				2,315.90					3,087.86
10.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES 1:5	m ²	48.43	12.31	596.17				447.13					596.17
10.02.06	TARRAJEO DE MEGAS DE CONCRETO CON CEMENTO PULIDO BOLEADO EN SERVICIOS HIGIENICOS	m ²	11.50	34.61	398.02				288.52					398.02
10.02.07	TARRAJEO DE MEGAS DE CONCRETO PULIDO. RECEPCION DE ALIMENTOS HIDROBIOLÓGICOS	m ²	32.40	34.61	1,121.36				841.02					1,121.36
10.02.08	TARRAJEO DE MEGAS DE CONCRETO PULIDO. TARRAJEO PULIDO DE MANILLOS, LAVADO DE BOTAS, LAVADEROS, ETC.	m ²	11.86	34.61	410.47				307.65					410.47
10.02.09	TARRAJEO EN ESCALERAS	m ²	83.97	37.16	2,377.13				1,782.65					2,377.13
10.02.10	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CISTERNA	m ²	184.70	27.10	4,483.37				3,347.53					4,483.37
10.02.11	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN TANQUE ELEVADO	m ²	176.80	39.26	7,064.69				5,261.02					7,064.69
10.03	CIELO RASO	m ²			48,317.31									
10.03.01	CIELO RASO CON MEZCLA C.A. 1:5	m ²	1,114.21	41.57	46,317.71				46,317.71					46,317.71
10.04	PIKAS Y PAVIMENTOS	m ²			152,842.93									
10.04.01	FALSO PISO E=2" DE CONCRETO 1:10	m ²	1,324.84	34.80	46,097.47				46,097.47					46,097.47
10.04.02	PISO DE CEMENTO PULIDO (CON FIBRAS DE ACERO DRAMIX, INC. JUNTAS DE DILATACION)	m ²	861.57	42.14	36,308.56				36,308.56					36,308.56
10.04.03	PISO FROTACHADO BRUNADO	m ²	71.76	27.76	1,991.78				1,991.78					1,991.78
10.04.04	PISO DE PORCELANATO 0.6x0.6 m ANTILISUZANTE	m ²	346.50	73.07	25,245.69				25,245.69					25,245.69
10.04.05	PISO DE PORCELANATO 0.3x0.3 m ANTILISUZANTE	m ²	22.76	62.07	1,412.09				1,412.09					1,412.09
10.04.06	VEREDA DE CONCRETO F=175 kg/cm2 E=4" FROT. Y BRUNADO	m ²	688.04	52.57	36,170.28				36,170.28					36,170.28
10.04.07	VEREDA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	156.00	38.02	5,919.12				5,919.12					5,919.12
10.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	m ²			43,408.81									
10.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO RECTIFICADO DE COLOR 0.30X0.60m	m ²	289.44	83.62	25,224.97				25,224.97					25,224.97
10.05.02	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO RECTIFICADO DE COLOR 0.30X0.60m (H=10 cm)	m ²	222.27	19.87	4,438.79				4,438.79					4,438.79
10.05.03	CONTRAZOCALO SANITARIO S/COLORAR H=10 cm, MEZCLA 1:2, E=1.5 cm	m ²	230.06	19.26	4,448.10				4,448.10					4,448.10
10.05.04	CONTRAZOCALO S/COLORAR H=30 cm, MEZCLA 1:2, E=1.5 cm	m ²	624.50	14.98	9,355.01				9,355.01					9,355.01
10.06	COBERTURAS	m ²			114,898.91									
10.06.01	COBERTURA POLICARBONATO COLOR BLANCO E=6mm (INCLUYE ACCESORIOS, PROMISION Y COLOCACION)	m ²	470.31	75.60	35,508.41				35,508.41					35,508.41
10.06.02	COBERTURA LADRILLO PASTELERO 24x24 ASENTADO CON MEZCLA 1:5	m ²	1,060.00	75.61	79,390.50				79,390.50					79,390.50
10.07	CARPINTERIA DE MADERA	m ²			36,786.93									
10.07.01	PUERTA SIMPLE VALVEN CONTRAPLACADA E=45 mm, TRIPLAY LUPUNA 6 mm CON MARCO DE MADERA CEDRO 1 1/2" x 4"	m ²	4.32	351.90	1,520.21				1,520.21					1,520.21
10.07.02	PUERTA SIMPLE CONTRAPLACADA E=46 mm, TRIPLAY LUPUNA 6 mm CON MARCO DE MADERA CEDRO 1 1/2" x 4"	m ²	37.80	351.90	13,301.82				13,301.82					13,301.82
10.07.03	PUERTA SIMPLE CONTRAPLACADA CON BARRA DISCAPAC. E=45 mm, TRIPLAY LUPUNA 6 mm CON MARCO DE MADERA CEDRO 1 1/2" x 4"	m ²	2.40	372.78	894.67				894.67					894.67
10.07.04	PUERTA SIMPLE RANURADA APANELADA DE MADERA, CON MARCO DE MADERA, CEDRO 1 1/2" x 6"	m ²	4.80	546.34	2,622.43				2,622.43					2,622.43
10.07.05	PUERTA DOBLE RANURADA APANELADA DE MADERA, CON MARCO DE MADERA, CEDRO 1 1/2" x 6"	m ²	9.60	664.91	6,383.14				6,383.14					6,383.14
10.07.06	PUERTA SIMPLE APANELADA DE MADERA, CON MARCO DE MADERA, CEDRO 1 1/2" x 6"	m ²	2.88	888.37	2,568.51				2,568.51					2,568.51
10.07.07	TABIQUE DE MELAMINE PARA BAÑOS Y VESTIDORES, E= 18 mm	m ²	24.08	154.72	3,725.68				3,725.68					3,725.68
10.07.08	PUERTA PARA TABIQUE DE MELAMINE PARA BAÑOS Y VESTIDORES, E= 18 mm	m ²	34.72	224.15	7,782.49				7,782.49					7,782.49
10.08	CARPINTERIA METALICA	m ²			137,863.36									
10.08.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA 1.00 x 2.40 m (INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	866.50	866.50				866.50					866.50
10.08.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA 0.80 x 2.10 m (INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	828.00	828.00				828.00					828.00



Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA


JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA
 Ubicación: MARCONA - NAZCA - ICA
 Fecha: Diciembre 2017
 Cliente: FONDEFES

Item	Descripción	Unid.	Medido	P. Unit.	Oct 17	Nov 17	Dic 17	Ene 18	Feb 18	Mar 18	Abr 18	May 18	TOTAL
				\$/m	Parcial (\$)	Parcial (\$)	Parcial (\$)	Parcial (\$)	Parcial (\$)	Parcial (\$)	Parcial (\$)	Parcial (\$)	
10.08.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE ACERO 1.00x3.10 m (INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	1,045.57	1,045.57						1,045.57		1,045.57
10.08.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE ACERO 1.20x2.50 m (INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	954.71	954.71						954.71		954.71
10.08.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE 02 HOJAS DE ACERO 8.20x2.50 m (INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	6,598.60	6,598.60						6,598.60		6,598.60
10.08.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO AL MUELLE 2 HOJAS DE ACERO 4.00x3.00m (INC ACCES)	Und.	1.00	3,163.38	3,163.38						3,163.38		3,163.38
10.08.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA VAVEN ALTO IMPACTO 1.80 x 2.40 (INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	11,573.01	11,573.01						11,573.01		11,573.01
10.08.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA VAVEN ALTO IMPACTO 1.20 x 2.40 (INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	9,710.15	9,710.15						9,710.15		9,710.15
10.08.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA VAVEN ALTO IMPACTO 1.40 x 2.40 (INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	10,874.43	10,874.43						10,874.43		10,874.43
10.08.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SIMPLE ALTO IMPACTO 0.80 x 2.40 (INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	8,778.70	8,778.70						8,778.70		8,778.70
10.08.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SIMPLE ALTO IMPACTO 1.00 x 2.40 (INC ACCESORIOS)	Und.	1.00	9,244.43	9,244.43						9,244.43		9,244.43
10.08.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE ALTO IMPACTO 1.80x2.40m (INC ACCES)	Und.	1.00	13,435.88	13,435.88						13,435.88		13,435.88
10.08.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE ALTO IMPACTO 1.80x2.40 m (INC ACCESORIOS)	Und.	3.00	12,970.15	38,910.45						38,910.45		38,910.45
10.08.14	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" (Ver planos de detalles)	m	48.08	124.81	5,998.37						5,998.37		5,998.37
10.08.15	PASAMANO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" (Ver planos de detalles)	m	44.98	80.45	3,617.83						3,617.83		3,617.83
10.08.16	PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE EN MESA DE RECEPCION DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS (INC. MANEJO, HIT-DEM, AMBOS LADOS)	m ²	32.40	295.56	9,558.19						9,558.19		9,558.19
10.08.17	TAPA METALICA CON PLANCHA DE FIERRO EN CISTERNA, INC. TIRADOR, CANDADO Y ACCESORIOS (Ver planos de detalles)	Und.	2.00	290.36	580.72						580.72		580.72
10.08.18	TAPA METALICA CON PLANCHA DE FIERRO EN TANQUE ELEVADO, INC. TIRADOR, CANDADO Y ACCESORIOS (Ver planos de detalles)	Und.	2.00	290.36	580.72						580.72		580.72
10.08.19	ESCALERA DE METAL DE F3 EN TANQUE SEPTICO (Ver planos de detalles)	Und.	1.00	386.98	386.98						386.98		386.98
10.08.20	ESCALERA DE METAL DE F3 EN TANQUE ELEVADO (Ve desde el 1er nivel hasta el 1.º Ver planos de detalles)	Und.	1.00	2,324.14	2,324.14						2,324.14		2,324.14
10.09.01	CABALLEROS DE ALUMINIO VARIOS CRISTALES Y SUELOS	Und.	8.00	5,818.15	46,545.20						46,545.20		46,545.20
10.09.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SECCIONABLE 2.60 x 3.00 m	Und.	1.00	4,918.15	4,918.15						4,918.15		4,918.15
10.09.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SECCIONABLE 2.33 x 2.50 m	Und.	5.00	2,304.81	11,524.05						11,524.05		11,524.05
10.09.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA ENROLLABLE 1.50 x 1.80 m	Und.	1.00	2,581.08	2,581.08						2,581.08		2,581.08
10.09.05	VENTANA DE ALUMINIO Y CRISTAL LAMINADO 10 mm	m ²	10.82	477.72	5,168.93						5,168.93		5,168.93
10.09.06	VENTANA DE ALUMINIO SEMIPESADO DE COLOR NATURAL, MALLA RACHEL Y CON VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6mm	m ²	82.50	490.78	28,799.38						28,799.38		28,799.38
10.09.07	VENTANA DE ALUMINIO SEMIPESADO DE COLOR NATURAL CON VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 6mm	m ²	89.14	396.92	23,284.65						23,284.65		23,284.65
10.09.08	CRISTAL DE SEGURIDAD 10 mm REFLEJANTE	m ²	1.35	453.72	612.52						612.52		612.52
10.09.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO SIN BISEL EMPOTRADO EN PARED (e=3mm)	m ²	18.48	167.77	3,100.39						3,100.39		3,100.39
10.10.01	GERRAMERIA	Pza.	34.00	75.84	2,578.56						2,578.56		2,578.56
10.10.02	CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA, CON TIRADOR HIGIENICOS Y VESTIDORES)	Und.	8.00	57.84	462.72						462.72		462.72
10.10.03	BIBAGA CAPUCHINA DE 3" x 1/2"	Und.	180.00	32.20	5,796.00						5,796.00		5,796.00
10.11.01	PINTURA EN MUROS INTERIORES CON EPOXICO	m ²	2,210.88	14.07	31,107.08						31,107.08		31,107.08
10.11.02	PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON EPOXICO	m ²	2,406.04	15.31	36,836.47						36,836.47		36,836.47
10.11.03	PINTURA EN COLUMNAS CON EPOXICO	m ²	531.48	15.31	8,136.65						8,136.65		8,136.65
10.11.04	PINTURA EN VIGAS CON EPOXICO	m ²	61.17	15.96	978.27						978.27		978.27
10.11.05	PINTURA EN DERRAMES CON EPOXICO	m ²	48.43	16.31	790.66						790.66		790.66
10.11.06	PINTURA EN ESCALERAS CON EPOXICO	m ²	83.97	14.07	1,181.92						1,181.92		1,181.92
10.11.07	PINTURA EN CELORRASOS CON EPOXICO	m ²	1,114.21	16.11	17,949.92						17,949.92		17,949.92
10.11.08	PINTURA PARA TANQUE EPOXICO	m ²	889.00	12.50	11,112.50						11,112.50		11,112.50
10.12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	m ²	178.80	16.19	2,896.92						2,896.92		2,896.92
10.12.01	INODORO BLANCO DILOSA 1ra MAC. + T. BAJO INC. ACCESORIOS	Pza.	19.00	238.00	4,522.00						4,522.00		4,522.00


ALBERTO AVILA MONTIEL
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE MAZCA, REGION ICA
 Ubicación: MARCONA - MASCA - ICA
 Fecha Diciembre 2017
 Cliente: FONDERES

Item	Unid	Descripción	Material	P. Unid. \$/.	Parcial \$/.	Oct 17 Parcial (\$/.)	Nov 17 Parcial (\$/.)	Dic 17 Parcial (\$/.)	Ene 18 Parcial (\$/.)	Feb 18 Parcial (\$/.)	Mar 18 Parcial (\$/.)	Abr 18 Parcial (\$/.)	May 18 Parcial (\$/.)	TOTAL
10.12.02	Pza.	URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO	4.00	588.22	2,352.88									2,352.88
10.12.03	Und.	OVALIN (INC. ACCESORIOS)	18.00	70.00	1,260.00									1,260.00
10.12.04	Pza.	LAVATORIO CON PEDISTAL (INC. ACCESORIOS)	3.00	85.00	255.00									255.00
10.12.05	Und.	GRIFERIA DE BRONCE CON TEMPORIZADOR AL MUEBLE (INC. ACCESORIOS)	32.00	185.90	5,948.80									5,948.80
10.12.06	Und.	GRIFERIA DE BRONCE TIPO JARDIN DE BOLA (INC. ACCESORIOS)	11.00	89.90	1,008.90									1,008.90
10.12.07	Und.	GRIFERIA DE BRONCE TIPO CUELLO DE GANZO AL MUEBLE (INC. ACCESORIOS)	1.00	108.25	108.25									108.25
10.12.08	Und.	DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE (INC. ACCESORIOS)	9.00	123.85	1,114.65									1,114.65
10.12.09	Und.	ACCESORIOS PARA BAÑOS: DISPENSADOR LIQUIDO	16.00	75.42	1,206.72									1,206.72
10.12.10	Und.	JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO	9.00	15.00	135.00									135.00
10.12.11	Pza.	TOALLERO DE LOSA BLANCO	12.00	10.50	126.00									126.00
10.12.12	Und.	PORTARROLLOS DE LOSA BLANCA Y PAPELERA	18.00	72.90	1,312.20									1,312.20
10.12.13	Und.	ACCESORIOS PARA BAÑOS: BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 1" PARA DUCHA (INC. CORTINA PARA DUCHA)	11.00	68.07	698.77									698.77
10.12.14	Pza.	COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	97.00	73.12	7,092.84									7,092.84
10.12.15	Pza.	COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	86.00	45.71	2,568.76									2,568.76
10.13		OTROS			97,927.45									97,927.45
10.13.01	m ²	CORTINA DE TRASLAPE DE PVC (PROVISION Y COLOCACION)	6.93	382.37	3,238.96									3,238.96
10.13.02	Und.	PROTECCION DE BORDE DE PLATAFORMA	14.00	221.95	3,107.30									3,107.30
10.13.03	Und.	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRIGO RETRACTIL	7.00	2,760.09	19,320.63									19,320.63
10.13.04	m	COLOCACION DE REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN CANALETA	174.21	220.71	38,466.34									38,466.34
10.13.05	m	COLOCACION DE REJILLA DE ACERO GALVANIZADO EN CANALETA	64.96	131.84	8,570.27									8,570.27
10.13.06	m ²	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	3,155.28	1.79	5,647.85									5,647.85
10.13.07	m	BRUNAS SEGUN DETALLE	1,500.00	6.29	9,435.00									9,435.00
11		INSTALACIONES SANITARIAS			803,797.67									803,797.67
11.01		SISTEMA DE AGUA FRIA			39,698.20									39,698.20
11.01.01.01	m	TRAZO INVELACION Y REPLANTEO DE ZANIAS / M	197.30	1.57	309.76									309.76
11.01.02.01	m	EXCAV. DE ZANIA DE ZANIA PARA TUBERIA	197.30	11.68	2,304.46									2,304.46
11.01.02.03	m	REFINE Y NIVELACION DE ZANIA / TUBERIA	197.30	2.13	420.25									420.25
11.01.02.04	m	CAMA DE APOYO E=1.0M	197.30	7.37	1,454.10									1,454.10
11.01.03.01	m	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANIA	197.30	7.00	1,381.10									1,381.10
11.01.03.02	Pip.	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP Ø 1/2"	71.00	71.63	5,085.73									5,085.73
11.01.03.03	Pip.	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP Ø 3/4"	2.00	64.50	129.00									129.00
11.01.04.01	m	SUM./INST. /PRUEBA HIDRAJ /TUB. PVC Ø 1/2" C-10	5.00	12.58	62.95									62.95
11.01.04.02	m	SUM./INST. /PRUEBA HIDRAJ /TUB. PVC Ø 3/4" C-10	12.00	13.64	163.68									163.68
11.01.04.03	m	SUM./INST. /PRUEBA HIDRAJ /TUB. PVC Ø 1" C-10	3.30	12.26	40.52									40.52
11.01.04.04	m	SUM./INST. /PRUEBA HIDRAJ /TUB. PVC Ø 1 1/2" C-10	14.00	13.54	189.56									189.56
11.01.04.05	m	SUM./INST. /PRUEBA HIDRAJ /TUB. PVC Ø 2" C-10	23.00	14.69	337.87									337.87
11.01.04.06	m	SUM./INST. /PRUEBA HIDRAJ /TUB. PVC Ø 2 1/2" C-10	20.00	18.28	365.60									365.60
11.01.04.07	m	SUM./INST. /PRUEBA HIDRAJ /TUB. HDPE Ø 2 1/2" C-10 (T.E. - Sistema)	18.00	22.36	402.48									402.48
11.01.05.01	m	SUM./INST. /PRUEBA HIDRAJ /TUB. PVC Ø 2 1/2" C-10 (Succión)	6.00	18.28	115.68									115.68
11.01.05.02	m	SUM./INST. /PRUEBA HIDRAJ /TUB. HDPE Ø 2" C-10 (Sistema - T.E.)	20.00	18.32	366.40									366.40
11.01.05.03	m	Sum./Inst./Prueba Hidraulica/Tuberia PVC C-10 1 1/2" (medidor - sistema)	120.00	13.64	1,636.80									1,636.80
11.01.06.01	Und.	TEE PVC-SAP 1/2"	5.00	9.89	49.45									49.45
11.01.06.02	Und.	TEE PVC-SAP 3/4"	31.00	10.66	327.36									327.36
11.01.06.03	Und.	TEE PVC-SAP 1"	20.00	12.65	253.00									253.00
11.01.06.04	Und.	TEE PVC-SAP 1 1/2"	2.00	22.05	44.10									44.10
11.01.06.05	Und.	TEE PVC-SAP 2"	6.00	19.31	115.86									115.86
11.01.06.06	Und.	CODO PVC-SAP 1/2"	102.00	13.48	1,374.92									1,374.92
11.01.06.07	Und.	CODO PVC-SAP 3/4"	17.00	14.41	244.97									244.97
11.01.06.08	Und.	CODO PVC-SAP 1"	1.00	6.46	6.46									6.46
11.01.06.09	Und.	CODO PVC-SAP 2"	4.00	18.81	75.64									75.64
11.01.06.10	Und.	CODO PVC-SAP 3"	2.00	19.41	38.82									38.82
11.01.06.11	Und.	REDUCCION PVC SAP 3/4" - 1/2"	39.00	11.26	439.14									439.14
11.01.06.12	Und.	REDUCCION PVC SAP 1" - 3/4"	19.00	11.71	222.49									222.49
11.01.06.13	Und.	REDUCCION PVC SAP 1" - 1/2"	3.00	5.86	17.88									17.88

ESTUDIO TECNICO
 REVISADO POR:
 [Firma]

[Firma]
 Luis Alberto Añuña Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Obras: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA

Ubicación: MARCONA - NASCA - ICA

Fecha Diciembre 2017

Cliente: FONDERPES

Item	Descripción	Unid	Mercado	P. Unid. S/	Parcial S/	Oct 17 Parcial (S/)	Nov 17 Parcial (S/)	Dic 17 Parcial (S/)	Ene 18 Parcial (S/)	Feb 18 Parcial (S/)	Mar 18 Parcial (S/)	Abr 18 Parcial (S/)	May 18 Parcial (S/)	TOTAL
11.01.06.14	REDUCCION PVC SAP 1 1/2" - 1/2"	Unid.	1,00	6,46	6,46				6,46					6,46
11.01.06.15	REDUCCION PVC SAP 1 1/2" - 3/4"	Unid.	1,00	6,76	6,76				6,76					6,76
11.01.06.16	REDUCCION PVC SAP 2 1/2" - 1 1/2"	Unid.	1,00	6,96	6,96				6,96					6,96
11.01.06.17	REDUCCION PVC SAP 2" - 1/2"	Unid.	5,00	12,96	64,80				64,80					64,80
11.01.06.18	TAPON DE PVC DE 2"	Unid.	2,00	18,16	36,36				36,36					36,36
11.01.07.01	VALVULA COMPUERTA 1/2" CON U"U"	Unid.	24,00	91,17	2,188,08				2,188,08					2,188,08
11.01.07.02	VALVULA COMPUERTA 3/4" CON U"U"	Unid.	2,00	102,11	204,22				204,22					204,22
11.01.07.03	VALVULA COMPUERTA 1" CON U"U"	Unid.	4,00	115,61	462,44				462,44					462,44
11.01.07.04	VALVULA COMPUERTA 2" CON U"U"	Unid.	3,00	239,69	719,07				719,07					719,07
11.01.07.05	MEDIDOR DE CAUDAL DE 1"	Unid.	1,00	2,181,64	2,181,64				2,181,64					2,181,64
11.01.08.01	ELECTROBOMBA 0,5 2 82Lts/Seg. Adm=23 m. Pot. Aprox=2 HP	Unid.	2,00	1,717,55	3,435,10				3,435,10					3,435,10
11.01.08.02	EQUIPO Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLORACION -	Unid.	1,00	3,522,06	3,522,06				3,522,06					3,522,06
11.01.08.03	VALVULA FLOTADORA DE 1 1/2"	Unid.	1,00	99,88	99,88				99,88					99,88
11.01.08.04	VALVULA COMPUERTA 2" CON U"U"	Unid.	2,00	239,69	479,38				479,38					479,38
11.01.08.05	VALVULA CHECK DE 2"	Unid.	2,00	536,52	1,073,04				1,073,04					1,073,04
11.01.08.06	VALVULA DE PIE DE 2 1/2"	Unid.	2,00	86,69	173,38				173,38					173,38
11.01.08.07	UNION UNIVERSAL DE 1/2"	Unid.	2,00	10,26	20,52				20,52					20,52
11.01.08.08	UNION DRESSER 2"	Unid.	2,00	151,76	303,52				303,52					303,52
11.01.08.09	UNION DRESSER 2 1/2"	Unid.	4,00	166,76	667,04				667,04					667,04
11.01.08.10	CAMASTILLA DE 2 1/2"	Unid.	2,00	163,53	327,06				327,06					327,06
11.01.08.11	CODO PVC-SAP 2"	Unid.	3,00	18,91	56,73				56,73					56,73
11.01.08.12	CODO PVC-SAP 2 1/2"	Unid.	2,00	18,41	36,82				36,82					36,82
11.01.08.13	TEE PVC-SAP 2"	Unid.	4,00	18,31	73,24				73,24					73,24
11.01.08.14	TAPON DE PVC DE 2"	Unid.	3,00	16,16	48,48				48,48					48,48
11.01.08.15	ABRAZADERAS, SOPORTES Y COLGADORES 2"	Pza.	9,00	136,43	1,227,87				1,227,87					1,227,87
11.01.08.16	ABRAZADERAS, SOPORTES Y COLGADORES 2 1/2"	Unid.	8,00	143,43	1,147,44				1,147,44					1,147,44
11.02	SISTEMA DE AGUA SALADA				53,086,65									53,086,65
11.02.01.01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS / ML	m.	243,00	1,57	381,51				381,51					381,51
11.02.02.01	EXCAV. DE ZANJA P/TUBERIA	m.	243,00	11,66	2,832,18				2,832,18					2,832,18
11.02.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/TUBERIA	m.	243,00	2,15	523,15				523,15					523,15
11.02.02.03	CAMA DE APOYO EPO. 10CM	m.	243,00	7,37	1,790,91				1,790,91					1,790,91
11.02.02.04	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m.	243,00	7,00	1,701,00				1,701,00					1,701,00
11.02.03.01	SALIDA DE AGUA SALADA 1/2"	Pcb.	2,00	72,33	144,66				144,66					144,66
11.02.03.02	SALIDA DE AGUA SALADA 3/4"	Pcb.	34,00	86,03	2,925,02				2,925,02					2,925,02
11.02.03.03	SALIDA DE AGUA SALADA 1 1/2"	Pcb.	5,00	101,10	505,50				505,50					505,50
11.02.04.01	SUM./INST. T/PRUEDA HDRA/ TUB. PVC Ø 3/4" C-10	m.	120,00	13,64	1,636,80				1,636,80					1,636,80
11.02.04.02	SUM./INST. T/PRUEDA HDRA/ TUB. PVC Ø 2" C-10	m.	25,00	14,69	367,25				367,25					367,25
11.02.04.03	SUM./INST. T/PRUEDA HDRA/ TUB. PVC Ø 3" C-10	m.	20,00	20,56	411,20				411,20					411,20
11.02.04.04	SUM./INST. T/PRUEDA HDRA/ TUB. HDPE Ø 3" C-10. (T.E. - Chitema)	m.	18,00	28,59	514,62				514,62					514,62
11.02.05.01	SUM./INST. T/PRUEDA HDRA/ TUB. PVC Ø 2" C-10 (Cobajeda)	m.	2,00	21,22	42,44				42,44					42,44
11.02.05.02	SUM./INST. T/PRUEDA HDRA/ TUB. PVC Ø 2 1/2" C-10 (Succion)	m.	6,00	18,26	109,56				109,56					109,56
11.02.05.03	SUM./INST. T/PRUEDA HDRA/ TUB. PVC Ø 3" C-10	m.	32,00	20,59	658,88				658,88					658,88
11.02.05.04	Sum./Inst. T/Prueda Hidra./ Tub. HDPE Ø 2 1/2" C-10 Exposita (Captacion - Chitema)	m.	120,00	20,24	2,428,80				2,428,80					2,428,80
11.02.05.05	Sum./Inst. T/Prueda Hidra./ Tub. HDPE Ø 2 1/2" C-10 Enterrada (Captacion - Chitema)	m.	46,00	22,36	1,028,56				1,028,56					1,028,56
11.02.05.06	SUM./INST. T/PRUEDA HDRA/ TUB. HDPE Ø 2" C-10 (Chitema - T.E.)	m.	20,00	18,32	366,40				366,40					366,40
11.02.05.07	Sum./Inst. T/Prueda Hidra./ Tub. HDPE Ø 3" C-10 Captacion	m.	9,00	28,59	257,31				257,31					257,31
11.02.06.01	TEE PVC-SAP 3/4"	Unid.	18,00	10,56	190,08				190,08					190,08
11.02.06.02	TEE PVC-SAP 2"	Unid.	14,00	18,31	256,34				256,34					256,34
11.02.06.03	TEE PVC-SAP 2 1/2"	Unid.	5,00	22,26	111,30				111,30					111,30
11.02.06.04	TEE PVC-SAP 3"	Unid.	1,00	22,66	22,66				22,66					22,66
11.02.06.05	CODO PVC-SAP 1/2"	Unid.	2,00	13,46	26,92				26,92					26,92
11.02.06.06	CODO PVC-SAP 3/4"	Unid.	7,00	14,41	100,87				100,87					100,87
11.02.06.07	CODO PVC-SAP 2"	Unid.	3,00	20,96	62,88				62,88					62,88
11.02.06.08	CODO PVC-SAP 2"	Unid.	15,00	18,31	274,65				274,65					274,65

JOSE ALBERTO AVILA MORALES
ESP. EN PLANIFICACION

Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA



CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE MAZCA, REGION ICA
 Ubicación: MARCONA - NASCA - ICA
 Fecha Diciembre 2017
 Cliente: FONDERPES

Item	Descripción	Unid	Metro	P. Impl. \$/m	Parcial \$	Oct 17 Parcial (\$)	Nov 17 Parcial (\$)	Dic 17 Parcial (\$)	Ene 18 Parcial (\$)	Feb 18 Parcial (\$)	Mar 18 Parcial (\$)	Abr 18 Parcial (\$)	May 18 Parcial (\$)	TOTAL
11.02.08.09	CODO PVC-SAP 2 1/2"	Unid.	6.00	19.41	116.44									116.44
11.02.08.10	REDUCCION PVC SAP 2" - 1 1/2"	Unid.	5.00	6.30	31.50									31.50
11.02.08.11	REDUCCION PVC SAP 2" - 3/4"	Unid.	15.00	13.38	200.70									200.70
11.02.08.12	REDUCCION PVC SAP 2 1/2" - 2"	Unid.	2.00	14.98	29.96									29.96
11.02.08.13	TAPON DE PVC DE 2"	Unid.	3.00	18.18	54.54									54.54
11.02.07.01	VALVULA COMPUERTA 1/2" CON U"U"	Unid.	2.00	91.17	182.34									182.34
11.02.07.02	VALVULA COMPUERTA 3/4" CON U"U"	Unid.	15.00	102.11	1,531.65									1,531.65
11.02.07.03	VALVULA COMPUERTA 1 1/2" CON U"U"	Unid.	5.00	174.91	874.55									874.55
11.02.07.04	VALVULA COMPUERTA 3" CON U"U"	Unid.	1.00	480.81	480.81									480.81
11.02.08.01	EQUIPO DE BOMBEO AGUA SALADA 2.0 HP CICLORADOR	Unid.	2.00	2,183.65	4,367.30						2,183.65			4,367.30
11.02.08.02	C/ACCESORIOS	Unid.	1.00	3,522.05	3,522.05						1,761.03			3,522.05
11.02.08.03	EQUIPO Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLORACION - VALVULA COMPUERTA 2" CON U"U"	Unid.	2.00	238.89	477.78						238.89			477.78
11.02.08.04	VALVULA FLOTADORA DE 1 1/2"	Unid.	2.00	99.68	199.36						99.68			199.36
11.02.08.05	VALVULA CHECK DE 2"	Unid.	2.00	635.52	1,271.04						635.52			1,271.04
11.02.08.06	VALVULA DE PIE Y CANASTILLA DE SUCCION DE 2 1/2"	Unid.	2.00	286.73	573.46						286.73			573.46
11.02.08.07	UNION UNIVERSAL DE 2"	Unid.	2.00	37.12	74.24						37.12			74.24
11.02.08.08	UNION DRESSER 2"	Unid.	2.00	151.76	303.52						151.76			303.52
11.02.08.09	UNION DRESSER 2 1/2"	Unid.	4.00	169.76	679.04						339.52			679.04
11.02.08.10	CODO PVC-SAP 2"	Unid.	3.00	18.91	56.73						28.37			56.73
11.02.08.11	CODO PVC-SAP 2 1/2"	Unid.	2.00	19.41	38.82						19.41			38.82
11.02.08.12	TEE PVC-SAP 2"	Unid.	4.00	18.31	73.24						36.62			73.24
11.02.08.13	TAPON DE PVC DE 2"	Unid.	3.00	16.18	48.54						27.27			48.54
11.02.08.14	Adquisi./Inst./Remedio. Autosorbiente, Q= 3.10Lit/Seg, Adit=22 m, Pot. Aprox.=6.70 HP	Unid.	2.00	1,666.70	3,333.40						1,666.70			3,333.40
11.02.08.15	Adquisi./Inst./Equipo de Filtrado de 20 GPM	Unid.	1.00	2,286.24	2,286.24						634.62			2,286.24
11.02.08.16	EQUIPO Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLORACION - EQUIPO Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLORACION - VALVULA COMPUERTA 2 1/2" CON U"U"	Unid.	1.00	803.02	803.02						401.51			803.02
11.02.08.17	VALVULA CHECK DE 2 1/2"	Unid.	2.00	323.81	647.62						323.81			647.62
11.02.08.18	VALVULA CHECK DE 2 1/2"	Unid.	2.00	406.93	813.86						406.93			813.86
11.02.08.19	VALVULA DE PIE Y CANASTILLA DE SUCCION DE 3"	Unid.	1.00	317.58	317.58						158.80			317.58
11.02.08.20	UNION DRESSER 2 1/2"	Unid.	2.00	169.76	339.52						169.76			339.52
11.02.08.21	UNION DRESSER 3"	Unid.	3.00	169.76	509.28						239.84			509.28
11.02.08.22	CODO PVC-SAP 2 1/2"	Unid.	4.00	19.41	77.64						38.82			77.64
11.02.08.23	CODO PVC-SAP 3"	Unid.	4.00	20.96	83.84						41.92			83.84
11.02.08.24	TEE PVC-SAP 2 1/2"	Unid.	4.00	22.28	89.12						44.56			89.12
11.02.08.25	TEE PVC-SAP 3"	Unid.	1.00	22.96	22.96						11.48			22.96
11.02.08.26	TAPON DE PVC DE 2 1/2"	Unid.	3.00	16.80	50.40						26.20			50.40
11.02.08.27	ABRAZADERAS, SOPORTES Y COLGADORES 2"	Unid.	9.00	138.43	1,245.87						622.94			1,245.87
11.02.08.28	ABRAZADERAS, SOPORTES Y COLGADORES 2 1/2"	Pza	6.00	143.43	860.58						573.72			860.58
11.02.08.29	ABRAZADERAS, SOPORTES Y COLGADORES 3"	Pza	48.00	153.43	7,364.64						3,756.04			7,364.64
11.03	SISTEMA DE IRRIGACION PLUMIA				2,331.17									2,331.17
11.03.01.01	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 2"	m.	83.00	9.59	795.97						795.97			795.97
11.03.01.02	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 3"	m.	38.00	11.88	451.44						451.44			451.44
11.03.02.01	SUM. E INST. SUMIDERO RONCADO DE 2"	Unid.	28.00	34.34	961.52						961.52			961.52
11.03.02.02	SUM. E INST. REGISTRO RONCADO DE BRONCE 2"	Unid.	8.00	9.07	72.56						72.56			72.56
11.03.02.03	SUM. E INST. REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 3"	Unid.	3.00	12.32	36.96						36.96			36.96
11.04	DESARROLLO DE VENTILACION				6,277.35									6,277.35
11.04.01.01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS /ML	m.	275.20	1.67	459.58						459.58			459.58
11.04.02.01	EXCAV DE ZANJA PITUBERIA	m.	275.20	11.98	3,294.34						3,294.34			3,294.34
11.04.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PITUBERIA	m.	275.20	2.13	586.18						586.18			586.18
11.04.02.03	CAMPA DE APOYO Emj.10M.	m.	275.20	7.37	2,028.22						2,028.22			2,028.22
11.04.02.04	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m.	275.20	7.00	1,926.40						1,926.40			1,926.40
11.04.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m ³	18.00	20.47	368.46						368.46			368.46
11.04.03.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 3"	Pto.	44.00	56.80	2,499.20						1,227.60			2,499.20
11.04.03.02	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 3"	Pto.	5.00	81.01	405.05						162.53			405.05
11.04.03.03	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4"	Pto.	20.50	54.48	1,116.84						565.22			1,116.84
11.04.03.04	SALIDA DE VENTILACION DE 2"	Pto.	10.00	56.93	569.30						284.65			569.30

[Handwritten Signature]
 Luis Alberto Villanueva
 CIP No 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Obras: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA
 Ubicación: MARCONA - NASCA - ICA
 Fecha: Diciembre 2017

Cliente: FONDEPES

Item	Descripción	Unid	Metrodo	P. Unit. %	Parcial \$	Oct 17 Parcial (\$)	Nov 17 Parcial (\$)	Dic 17 Parcial (\$)	Ene 18 Parcial (\$)	Feb 18 Parcial (\$)	Mar 18 Parcial (\$)	Abr 18 Parcial (\$)	May 18 Parcial (\$)	TOTAL
11.04.04.01	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 2"	m.	89.20	9.59	855.43					855.43				855.43
11.04.04.02	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 3"	m.	42.00	11.96	498.12					498.12				498.12
11.04.04.03	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAP 4"	m.	3.00	12.28	36.84					36.84				36.84
11.04.04.04	SUM. E INST. DE MONTANTE PVC-SAP 2"	m.	28.00	9.59	266.52					266.52				266.52
11.04.04.05	SUM. E INST. DE MONTANTE PVC-SAP 4"	m.	14.00	12.28	171.92					171.92				171.92
11.04.04.06	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAL 2" VENTILACION	m.	23.00	54.41	1,251.43					1,251.43				1,251.43
11.04.04.07	SUM. E INST. TUBERIA HDPE 4" (SUMIDERO MUELLE)	m.	140.00	27.32	3,824.80					3,824.80				3,824.80
11.04.04.08	SUM. E INST. TUBERIA HDPE 3"	m.	22.00	16.92	372.24					372.24				372.24
11.04.04.09	TUBERIA PVC 3" - C-10 (IMPULSION A CAMARA DE BOMBEO)	m.	99.00	20.59	2,038.41					2,038.41				2,038.41
11.04.05.01	SUM. E INST. YEE PVC-SAP 3"	Und.	23.00	13.32	306.36					61.27	245.09			306.36
11.04.05.02	SUM. E INST. YEE PVC-SAP 4"	Und.	3.00	21.96	65.88					12.94	52.94			65.88
11.04.05.03	SUM. E INST. TEE SANITARIA PVC-SAP 2"	Und.	32.00	9.52	304.64					69.93	243.71			304.64
11.04.05.04	SUM. E INST. CODO 45° SANITARIA PVC-SAP 2"	Und.	3.00	15.20	45.60					15.20	30.40			45.60
11.04.05.05	SUM. E INST. CODO 45° SANITARIA PVC-SAP 3"	Und.	23.00	11.82	271.86					54.37	217.49			271.86
11.04.05.06	SUM. E INST. CODO 45° SANITARIA HDPE 4"	Und.	1.00	18.99	18.99					3.72	14.87			18.99
11.04.05.07	SUM. E INST. CODO 90° SANITARIA HDPE 4"	Und.	1.00	96.92	96.92					17.32	69.30			96.92
11.04.05.08	SUM. E INST. CODO 90° SANITARIA PVC-SAP 2"	Und.	12.00	53.12	637.44					10.62	42.50			637.44
11.04.05.09	SUM. E INST. YEE DOBLE SANITARIA PVC-SAP 2"	Und.	1.00	18.06	18.06					35.52	154.08			18.06
11.04.05.10	SUM. E INST. YEE DOBLE SANITARIA PVC-SAP 3"	Und.	2.00	13.32	26.64					6.33	21.31			26.64
11.04.05.11	SUM. E INST. YEE DOBLE SANITARIA PVC-SAP 4"	Und.	1.00	21.56	21.56					4.31	17.25			21.56
11.04.05.12	SUM. E INST. YEE HDPE 4"	Und.	22.00	167.12	3,678.64					735.33	2,943.31			3,678.64
11.04.05.13	SUM. E INST. TEE HDPE 3"	Und.	1.00	146.12	146.12					29.22	116.90			146.12
11.04.05.14	SUM. E INST. SUMIDERO DE BRONCE 2"	Und.	3.00	34.34	103.02					20.60	82.42			103.02
11.04.05.15	SUM. E INST. SUMIDERO DE BRONCE 3"	Und.	37.00	43.94	1,626.98					324.42	1,297.66			1,626.98
11.04.05.16	SUM. E INST. REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2"	Und.	23.00	9.97	229.31					45.96	183.45			229.31
11.04.05.17	SUM. E INST. REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 3"	Und.	15.00	12.32	184.80					36.96	147.84			184.80
11.04.05.18	SUM. E INST. REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4"	Und.	6.00	30.14	180.84					36.17	144.67			180.84
11.04.06.01	CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	Und.	11.00	228.92	2,518.12					2,528.12				2,528.12
11.04.06.02	CAJA DE REGISTRO DE 24" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	Und.	1.00	279.45	279.45					279.45				279.45
11.04.06.03	SUM. E INST. BUZON CON TAPA DE 1.20m DE DIAMETRO H=1.40m	Und.	1.00	1,288.13	1,288.13					1,288.13				1,288.13
11.04.06.04	CANALETAS METALICAS DE REJILLAS FIERRO PLATINA 1 1/4" X 1/4" DE 0.30 DE ANCHO	m.	25.00	170.40	4,260.00						4,260.00			4,260.00
11.04.07.01	EQUIPAMIENTO DE TANQUE SEPTICO	Und.	1.00	2,032.41	2,032.41							2,032.41		2,032.41
11.04.07.02	Equipo de bombeo, 02 Bombas sumergibles Q=2.88 L/S; HDI=6.00 m; Pot *1.0HP	Und.	2.00	1,746.51	3,491.02							3,491.02		3,491.02
11.04.08.01	VALVULA MARIPOSA 3"	Und.	2.00	289.43	578.86							578.86		578.86
11.04.08.02	VALVULA COMPUERTA 3" CON U"U	Und.	1.00	480.81	480.81							480.81		480.81
11.04.08.03	VALVULA CHECK DE 3"	Und.	2.00	477.53	955.06							955.06		955.06
11.04.08.04	UNION DRESSER 3"	Und.	3.00	159.76	479.28							479.28		479.28
11.04.08.05	TEE FGG 3"	Und.	1.00	201.53	201.53							201.53		201.53
11.04.08.06	CODO F.G. 3"	Und.	4.00	186.33	745.32							745.32		745.32
11.04.08.07	TUBERIA P-G 3"	Und.	3.00	217.53	652.59							652.59		652.59
11.04.08.08	ABRAZADERAS, SOPORTES Y COLGADORES 3"	Pza.	10.00	153.43	1,534.30							1,534.30		1,534.30
11.04.08.09	ABRAZADERAS, SOPORTES Y COLGADORES 4"	Pza.	48.00	163.43	7,844.64							7,844.64		7,844.64
11.05	REDE SUELO DE SABLE INDUSTRIAL			12,732.42										
11.05.01.01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 1 ML	m.	359.60	1.87	664.57									664.57
11.05.02.01	EXCAV DE ZANJA PTUBERIA	m.	359.60	11.68	4,200.13									4,200.13
11.05.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PTUBERIA	m.	359.60	2.13	765.96									765.96
11.05.02.03	CAMA DE AFOYO E=0.10M.	m.	359.60	7.37	2,650.26									2,650.26
11.05.02.04	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m.	359.60	7.00	2,517.20									2,517.20
11.05.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMAQUINA	m.	25.00	20.47	511.75									511.75
11.05.03.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 3"	Pto.	9.00	61.01	549.09									549.09
11.05.03.02	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4"	Pto.	22.00	54.48	1,198.12									1,198.12
11.05.04.01	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAL 2"	m.	7.00	9.59	67.13									67.13
11.05.04.02	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAL 3"	m.	21.00	11.96	249.06									249.06

[Firma]
 Lic. Alberto Anllia Morales
 C.I.P. N° 847416
 SUPERVISOR DE OBRAS

[Firma]
 OSWALDO JIMENEZ
 GERENTE GENERAL

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Otra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA

Ubicación: MARCONA - NUSCA - ICA

Fecha: Diciembre 2017

Cliente: FONDEPES

Item	Descripción	Unid	Metrado	P. Umk. S/.	Promedi S/.	Oct-17 Promedi (S/.)	Nov-17 Promedi (S/.)	Dic-17 Promedi (S/.)	Ene-18 Promedi (S/.)	Feb-18 Promedi (S/.)	Mar-18 Promedi (S/.)	Abr-18 Promedi (S/.)	May-18 Promedi (S/.)	TOTAL
11.05.04.03	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAL 4"	m.	34.00	12.28	417.82				208.78	208.78				417.52
11.05.04.04	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-SAL 6"	m.	3.00	26.83	80.49				40.25	40.25				80.49
11.05.04.05	SUM. E INST. DE TUBERIA HDPE 3" (IMPULSION) COLGADA	m.	120.00	23.28	2793.20				1,395.80	1,395.80				2,791.20
11.05.04.06	SUM. E INST. DE TUBERIA HDPE 3" (DES. T.E.)	m.	22.00	23.28	511.72				265.86	265.86				511.72
11.05.04.07	TUBERIA PVC 3" - C-10 (IMPULSION ENTERRADA)	m.	230.00	20.69	4,759.70				2,387.85	2,387.85				4,735.70
11.05.04.08	TUBERIA PVC SAL 6" C-10 EMISOR	m.	85.00	30.50	1,982.50				991.25	991.25				1,982.50
11.05.05.01	SUM. E INST. CODO 45° SANITARIA PVC-SAL 4"	Und.	1.00	12.48	12.48				6.24	6.24				12.48
11.05.05.02	SUM. E INST. CODO 90° SANITARIA PVC-SAL 4"	Und.	8.00	11.83	94.64				34.89	34.89				69.78
11.05.05.03	SUM. E INST. CODO 90° SANITARIA HDPE 3"	Und.	1.00	53.12	53.12				26.56	26.56				53.12
11.05.05.04	SUM. E INST. TEE HDPE 3"	Und.	1.00	148.12	148.12				73.06	73.06				148.12
11.05.05.05	SUM. E INST. SUMIDERO DE BRONCE 4"	Und.	22.00	50.09	1,101.98				550.99	550.99				1,101.98
11.05.06.01	CAJA DE REGISTRO DE 24" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	Und.	4.00	279.45	1,117.80				558.80	558.80				1,117.80
11.05.06.02	ACCESORIOS TRAMPA DE GRASAS	Und.	3.00	37.98	113.94				56.94	56.94				113.88
11.05.06.03	CANALLETAS REJILLA FRD (FIBRA DE VIDRIO DE PLASTICO REFORZADO) 0.30 DE ANCHO	m²	120.80	437.95	52,816.77				26,408.39	26,408.39				52,816.77
11.05.07.01	Equipo de bombeo, 02 Bombas sumergibles Q=1.7 L/S; HDT=10 m; Pot =1.5HP	Und.	2.00	1,745.51	3,491.02				1,745.51	1,745.51				3,491.02
11.05.07.02	Equipo de bombeo, 02 Bombas sumergibles Q=1.7 L/S; HDT=6 m; Pot =1.5HP	Und.	2.00	1,745.51	3,491.02				1,745.51	1,745.51				3,491.02
11.05.07.03	Equipo de bombeo, 02 Bombas sumergibles Q=1.7 L/S; HDT=6 m; Pot =1.0HP	Und.	2.00	1,745.51	3,491.02				1,745.51	1,745.51				3,491.02
11.05.07.04	Equipo de bombeo, 02 Bombas sumergibles Q=8 L/S; HDT=20 m; Pot =1.0HP	Und.	2.00	7,444.66	14,889.32				7,444.66	7,444.66				14,889.32
11.05.08.01	VALVULA MARIPOSA 2"	Und.	6.00	288.53	1,731.18				805.59	805.59				1,611.18
11.05.08.02	VALVULA MARIPOSA 6"	Und.	2.00	386.93	773.86				386.93	386.93				773.86
11.05.08.03	VALVULA COMPUERTA 3" CON LUT	Und.	1.00	480.81	480.81				240.41	240.41				480.81
11.05.08.04	VALVULA CHECK DE 2"	Und.	6.00	535.52	3,213.12				1,606.56	1,606.56				3,213.12
11.05.08.05	VALVULA CHECK DE 6"	Und.	2.00	972.53	1,945.06				972.53	972.53				1,945.06
11.05.08.06	UNION DRESSER 2"	Und.	9.00	151.76	1,365.84				682.92	682.92				1,365.84
11.05.08.07	UNION DRESSER 6"	Und.	2.00	214.78	429.52				214.78	214.78				429.52
11.05.08.08	TEE PVC-SAL 2"	Und.	2.00	6.98	13.97				6.98	6.98				13.97
11.05.08.09	TEE PVC-SAL 3"	Und.	1.00	9.48	9.48				4.73	4.73				9.46
11.05.08.10	TEE PVC 6"	Und.	1.00	28.12	28.12				13.06	13.06				26.12
11.05.08.11	CODO PVC SAL 2"X90°	Pzas.	11.00	25.44	279.84				139.92	139.92				279.84
11.05.08.12	CODO PVC SAL 6"X45°	Pzas.	2.00	40.94	81.88				40.94	40.94				81.88
11.05.08.13	REDUCCION DE PVC SAL DE 3"-2"	Und.	3.00	27.14	81.42				40.71	40.71				81.42
11.05.08.14	REDUCCION DE PVC SAL DE 3"-2"	Und.	4.00	40.70	162.80				81.40	81.40				162.80
11.05.08.15	ABRAZADERAS, SOPORTES Y COLGADORES 3" EN MUELLE	Pzas.	41.00	153.43	6,280.63				3,145.32	3,145.32				6,280.63
11.05.08.16	ABRAZADERAS, SOPORTES Y COLGADORES 3" EN T.E	Pzas.	9.00	153.43	1,380.87				690.44	690.44				1,380.87
11.06	ELABOR SUBMARINA				531,728.95									
11.06.01.01	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS / ML	m.	880.00	1.57	1,381.60				880.80	880.80				1,381.60
11.06.02.01	ACOMODO DE ENROSCADO DE PROTECCION	m³	20.00	27.50	550.00				275.00	275.00				550.00
11.06.03.01	SUM. E INST. DE TUBERIA LISA HDPE PECC-100 Dext. 180MM (8") PN-10	m.	880.00	29.32	25,801.60				12,900.80	12,900.80				25,801.60
11.06.03.02	SUMINIST. DE TUBERIA LISA HDPE PECC-100 Dext. 160 MM CON PERFORACIONES PARA USO DE DIFUSOR	m.	20.00	27.93	558.60				279.30	279.30				558.60
11.06.03.03	SUMINIST. E INST. DE LINEA AUXILIAR DE 90 MM PARA MANIOBRA DE FLOTACION	m.	880.00	14.86	13,068.80				6,634.00	6,634.00				13,068.80
11.06.03.04	ACCESORIOS SUMINISTRO DE TUBERIAS HDPE	Und.	2.00	1,789.87	3,579.74				1,789.87	1,789.87				3,579.74
11.06.03.05	LASTRE DE CONCRETO TIPO A SEPARACION DE 3.00M CU	Und.	530.00	293.85	155,740.50				77,870.25	77,870.25				155,740.50
11.06.04.01	SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS DE 160 MM PN-10	Und.	1.00	8,430.00	8,430.00									8,430.00
11.06.04.02	SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS DE 90 MM PN-10 (LINEAS AUXILIARES DE FLOTACION)	Und.	1.00	3,932.00	3,932.00									3,932.00
11.06.05.01	INSPECCION ULTRASONICA DE JUNTA	Und.	1.00	15,811.00	15,811.00									15,811.00
11.06.06.01	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO DE LINEA	m.	900.00	186.81	168,129.00				78,324.50	78,324.50				168,129.00
11.06.06.02	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO DE LASTRE DE CONCRETO TIPO A	Und.	530.00	166.81	89,869.30				44,948.65	44,948.65				89,869.30

[Firma]
ALBERTO ALVARADO
 C.I.P. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

[Firma]
 JULIO
 ALVARADO

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Obras MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA
 Ubicación: MARCONA - NAZCA - ICA
 Fecha: Diciembre 2017
 Cliente: FONDEPES

Item	Descripción	Unid	Metrado	P. Unit.	Parcial \$.	Oct 17	Nov 17	Dic 17	Ene 18	Feb 18	Mar 18	Abr 18	May 18	TOTAL
				\$.	\$.	Parcial (\$.)	Parcial (\$.)	Parcial (\$.)	Parcial (\$.)	Parcial (\$.)	Parcial (\$.)	Parcial (\$.)	Parcial (\$.)	Parcial (\$.)
11.06.06.03	FILACION PRIMEROS METROS DE TUBERIA CON CONCRETO CICLOPEO	m ³	6.00	1,462.82	8,776.92									8,776.92
11.06.06.04	PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA EMISOR SUBMARINO	Unid.	1.00	51,557.62	51,557.62									51,557.62
12.01.01	INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSION				2,042,231.10									2,042,231.10
12.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES:				2,438.69									2,438.69
12.01.01	TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS A LA OBRA	Gib.	1.00	1,954.00	1,954.00									1,954.00
12.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				8,924.14									8,924.14
12.02.02	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m ³	359.66	11.66	4,200.83									4,200.83
12.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIMAQUINA	m ³	10.00	20.47	204.70									204.70
12.03.01	SALIDAS DE DESEMBARCADERO				15,538.43									15,538.43
12.03.02	SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)	Pto.	180.00	72.87	13,116.60									13,116.60
12.03.03	SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) CONDUIT	Unid.	27.00	81.27	2,194.29									2,194.29
12.04.01	SALIDA PARA BRACQUETE (PARED)	Pto.	4.00	68.99	275.56									275.56
12.04.02	INTERRUPTORES				2,405.20									2,405.20
12.04.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	Pto.	35.00	76.77	2,686.95									2,686.95
12.04.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	Pto.	6.00	77.81	466.86									466.86
12.04.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE	Pto.	5.00	91.01	455.05									455.05
12.04.06	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION	Pto.	22.00	110.66	2,434.96									2,434.96
12.04.07	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE	Pto.	8.00	189.42	1,515.36									1,515.36
12.04.08	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 4 VIAS	Pto.	1.00	110.62	110.62									110.62
12.05.01	LOMACOSHIUS				3,034.05									3,034.05
12.05.02	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H=0.40 SNPT	Pto.	58.00	70.95	4,115.10									4,115.10
12.05.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA A PRUEBA DE AGUA H=0.40 SNPT	Pto.	15.00	70.95	1,064.25									1,064.25
12.05.04	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA H=2.20 SNPT LUZ DE EMERGENCIA	Pto.	26.00	70.95	1,844.70									1,844.70
12.06.01	SALIDAS DE DATA Y TELEFONIA				667.50									667.50
12.06.02	SALIDA PARA TELEFONIA	Pto.	6.00	66.55	399.30									399.30
12.06.03	SALIDA DE RED DE COMPUTOS	Pto.	4.00	66.55	266.20									266.20
12.07.01	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO				5,461.30									5,461.30
12.08.01	SALIDA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO INC. SENSOR DE HUMEDAD	Unid.	1.00	5,461.30	5,461.30									5,461.30
12.08.02	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=20mm	m	168.56	11.78	1,985.94									1,985.94
12.08.03	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=25mm	m	40.11	12.08	484.53									484.53
12.08.04	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=35mm	m	498.81	15.10	7,532.03									7,532.03
12.08.05	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=40mm	m	20.20	18.58	375.52									375.52
12.08.06	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=45mm	m	33.36	37.33	1,245.33									1,245.33
12.08.07	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=80mm	m	13.85	33.02	457.33									457.33
12.08.08	TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) D=100mm	m	14.71	34.39	506.88									506.88
12.09.01	CABLE NH-80, 3-1x6mm ² , 450/750V	m	82.96	8.93	740.79									740.79
12.09.02	CABLE NH-80, 3-1x10mm ² , 450/750V	m	40.11	13.43	538.68									538.68
12.09.03	CABLE NH-80, 3-1x16mm ² , 450/750V	m	157.90	17.76	2,804.30									2,804.30
12.09.04	CABLE NH-80, 3-1x25mm ² , 450/750V	m	165.13	24.93	4,116.89									4,116.89
12.09.05	CABLE NH-80, 3-1x35mm ² , 450/750V	m	195.98	33.24	6,514.38									6,514.38
12.09.06	CABLE NH-80, 3-1x70mm ² , 450/750V	m	6.25	80.95	506.94									506.94
12.09.07	CABLE NH-80, 3-1x120mm ² , 450/750V	m	13.85	97.79	1,354.39									1,354.39
12.09.08	CABLE NH-80, 1x6mm ² (T), 450/750V	m	86.60	10.50	909.30									909.30
12.09.09	CABLE NH-80, 1x10mm ² (T), 450/750V	m	54.73	6.53	357.39									357.39
12.09.10	CABLE NH-80, 1x16mm ² (T), 450/750V	m	630.25	7.73	4,871.83									4,871.83
12.09.11	CABLE NH-80, 1x25mm ² (T), 450/750V	m	27.11	9.22	249.85									249.85
12.09.12	CABLE NH-80, 1x35mm ² (T), 450/750V	m	6.25	11.89	73.08									73.08
12.09.13	CABLE NH-80, 1x50mm ² (T), 450/750V	m	13.85	14.05	194.59									194.59
12.09.14	CABLE NHXOH, 3-1x120mm ² , 0.6/1kV	m	14.71	103.36	1,520.43									1,520.43
12.09.15	CABLE NHXOH, 1x35mm ² , 0.6/1kV	m	14.71	18.85	277.28									277.28
12.10.01	BUZONES Y BUELOS DE CONCRETO				5,954.91									5,954.91
12.10.02	DUCTO DE CONCRETO DE 0.60x0.60x0.70m	Unid.	3.00	1,288.13	3,864.39									3,864.39
12.11.01	TABLEROS DE DISTRIBUCION				24,163.75									24,163.75
12.11.02	TABLERO GENERAL TG	Unid.	1.00	13,740.93	13,740.93									13,740.93
12.11.03	TABLERO DE DISTRIBUCION T.D.-1	Pza.	1.00	1,920.47	1,920.47									1,920.47
12.11.04	TABLERO DE DISTRIBUCION T.D.-2	Pza.	1.00	2,270.47	2,270.47									2,270.47

Supervisor de Obra
 Lic. Alberto Aquino Morales
 CIP. N.º 84246
 SUPERVISOR DE OBRA

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Obj: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA

Ubicación: MARCONA - NASCA - ICA

Fecha Diciembre 2017

Cliente: FONDEPES

Item	Descripción	Unid	Metrado	P. Unit. \$/	Parcial \$/	Oct-17 Parcial (\$/)	Nov-17 Parcial (\$/)	Dic-17 Parcial (\$/)	Ene-18 Parcial (\$/)	Feb-18 Parcial (\$/)	Mir-18 Parcial (\$/)	Abr-18 Parcial (\$/)	May-18 Parcial (\$/)	TOTAL
12.11.04	TABLERO DE DISTRIBUCION T.D.-3	Pza.	1.00	1,770.47	1,770.47							1,770.47		1,770.47
12.11.05	TABLERO DE DISTRIBUCION T.D.-4	Pza.	1.00	1,120.47	1,120.47							1,120.47		1,120.47
12.11.06	TABLERO DE DISTRIBUCION T.D.-5	Pza.	1.00	2,120.47	2,120.47							2,120.47		2,120.47
12.11.07	TABLERO DE DISTRIBUCION T.D.-CGE	Pza.	1.00	1,220.47	1,220.47							1,220.47		1,220.47
12.12.01	TABLERO DE DISTRIBUCION TMO-AF1	Und.	1.00	1,570.47	1,570.47							1,570.47		1,570.47
12.12.02	TABLERO DE DISTRIBUCION TMO-AF2	Und.	1.00	8,570.47	8,570.47							8,570.47		8,570.47
12.12.03	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-EB	Und.	1.00	2,250.47	2,250.47							2,250.47		2,250.47
12.12.04	TABLERO DE DISTRIBUCION ST-B1	Und.	1.00	483.42	483.42							483.42		483.42
12.12.05	TABLERO DE DISTRIBUCION ST-B2	Und.	1.00	1,470.47	1,470.47							1,470.47		1,470.47
12.12.06	TABLERO DE DISTRIBUCION T-TRAF	Und.	1.00	512.47	512.47							512.47		512.47
12.13.01	PANORAMA DE CONTROL DE ELECTROBOMBAS	Und.	1.00	4,117.65	4,117.65							4,117.65		4,117.65
12.13.01	TABLERO ALTERNADOR PARA BOMBA AUTOCEBANTE 3HP	Und.	1.00	776.13	776.13							776.13		776.13
12.13.02	TABLERO ALTERNADOR PARA BOMBA CENTRIFUGA 2HP	Und.	1.00	776.13	776.13							776.13		776.13
12.13.03	TABLERO DE CONTROL PARA BOMBAS SUMERGIBLES 1.6 HP	Und.	1.00	776.13	776.13							776.13		776.13
12.13.04	TABLERO DE CONTROL PARA BOMBAS SUMERGIBLES 1 HP	Und.	1.00	776.13	776.13							776.13		776.13
12.13.05	TABLERO DE CONTROL PARA BOMBAS SUMERGIBLES 10 HP	Und.	1.00	1,013.13	1,013.13							1,013.13		1,013.13
12.14	PUESTA A TIERRA	Und.	1.00	1,525.40	1,525.40							1,525.40		1,525.40
12.14.01	POZO PUESTA A TIERRA CON CEMENTO CONDUCTIVO MENOR O IGUAL 5 OHM	Und.	1.00	1,525.40	1,525.40							1,525.40		1,525.40
12.15	ALAMBADO EXTERIOR	Und.	8.00	1,022.26	8,178.08							8,178.08		8,178.08
12.15.01	POSTE DE CONCRETO DE 11 METROS	Und.	1.00	220.60	220.60							220.60		220.60
12.15.02	GRUETA DE 1.50 METROS	Und.	8.00	528.63	4,229.04							4,229.04		4,229.04
12.15.03	REFLECTOR DE 400W VAPOR DE SODIO	m.	12.00	86.14	1,033.68							1,033.68		1,033.68
12.15.04	DUCTO DE CONCRETO	Und.	8.00	966.80	7,734.40							7,734.40		7,734.40
12.15.05	POSTE DE ACERO GALVANIZADO	Und.	8.00	371.68	2,972.48							2,972.48		2,972.48
12.15.06	PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO PARA LUMINARIA	Und.	8.00	1,345.18	10,761.28							10,761.28		10,761.28
12.15.07	REFLECTOR DE 70W VAPOR DE SODIO	Und.	145.00	125.02	18,127.90							18,127.90		18,127.90
12.15.08	EQUIPOS DE ILUMINACION PVC-P	Und.	7.00	110.02	770.14							770.14		770.14
12.16.01	ARTEFACTO FLORESCENTE HERMETICO 2x38W	Und.	28.00	87.28	2,443.84							2,443.84		2,443.84
12.16.02	ARTEFACTO FLORESCENTE LINEAL 2x38W	Und.	28.00	108.55	3,039.40							3,039.40		3,039.40
12.16.03	ARTEFACTO FLORESCENTE CIRCULAR HERMETICO 22W ALTO FACTOR	Und.	27.00	125.02	3,375.54							3,375.54		3,375.54
12.16.04	LUZ DE EMERGENCIA	Und.	27.00	83.00	2,241.00							2,241.00		2,241.00
12.17	EQUIPOS DE ILUMINACION CON CONDUIT	Pie.	2.00	117.66	235.30							235.30		235.30
12.17.01	ARTIFACTO FLORESCENTE HERMETICO 2x38W C/CONDUIT	Pie.	2.00	181.42	362.84							362.84		362.84
12.17.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE C/CONDUIT	Pie.	1.00	17.00	17.00							17.00		17.00
12.17.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE C/CONDUIT	Pie.	2.00	161.42	322.84							322.84		322.84
12.17.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE C/CONDUIT	Pie.	1.00	57.225.20	57,225.20							57,225.20		57,225.20
12.18.01	GRUPO ELECTROGENO DE 120 KVA, 380/220V, 60HZ INCINSTALACION	Und.	1.00	16,778.40	16,778.40							16,778.40		16,778.40
12.18.02	TABLERO DE TRANSFERENCIA	Und.	1.00	16,778.40	16,778.40							16,778.40		16,778.40
13.01	INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIDA PENSIÓN	Km.	0.16	417.28	66.76				10.01	58.75				66.76
13.01.01	REPLANTEO TOPOGRAFICO DE REDES Y UBICACION DE ESTRUCTURAS	Km.	0.16	417.28	66.76				10.01	58.75				66.76
13.02	FUNDACION	m ³	102.30	101.93	10,427.44				1,564.12	8,863.32				10,427.44
13.02.01	APERTURA Y CIERRE DE ZANJA 0.6m x 1.10m	m ³	9.80	188.14	1,843.77				227.72	1,290.42				1,843.77
13.02.02	EJECUCION DE CRUZADA	m ²	93.00	37.10	3,450.30				517.55	2,932.75				3,450.30
13.02.03	COMPACTACION DE ZANJA	m ²	93.00	37.10	3,450.30				517.55	2,932.75				3,450.30
13.03	CABLES Y CONDUIT TORRES	m.	23.00	22.44	516.12				77.42	438.70				516.12
13.03.01	ENTUBADO PVC-P 4"x3m	m.	23.00	22.44	516.12				77.42	438.70				516.12
13.03.02	TENDIDO DE CABLE N2XSY 50mm2	m.	465.00	82.36	38,496.60				3,653.51	20,703.20				38,496.60
13.03.03	C/CONTRIB. AL-33	m.	13.00	52.57	683.41				102.51	580.90				683.41
13.03.04	SUBIDA DE CABLE N2XSY 50mm2 EN SAB	m.	90.00	228.51	20,565.90				3,055.24	17,488.67				20,565.90
13.04	CABLES DE TERMINAL	Kil	2.00	1,632.97	3,265.94				489.99	2,775.95				3,265.94
13.04.01	EJECUCION TERMINAL EXTERIOR	Und.	3.00	1,309.16	3,927.48				589.12	3,338.36				3,927.48
13.04.02	SUBESTACION AEREA RIBOSTE Y HPAFOMIK	Und.	3.00	576.81	1,730.43				269.56	1,470.87				1,730.43
13.05.01	IZAJE DE POSTES C.A.C 13400	Und.	1.00	546.81	546.81				82.02	464.79				546.81
13.05.02	MONTAJE DE MEDIA LOZA C.A.V	Und.	1.00	516.81	516.81				77.52	439.29				516.81
13.05.03	MONTAJE DE CRUCETA ASIMETRICA CAV	Und.	1.00	18,985.90	18,985.90				2,844.89	16,121.02				18,985.90
13.05.04	MONTAJE DE TRANSFORMADOR 250KV	Und.	1.00	19,504.00	19,504.00				1,590.80	9,013.40				19,504.00
13.05.05	MONTAJE DE TRAFOMIK	Und.	1.00	19,504.00	19,504.00				1,590.80	9,013.40				19,504.00

[Handwritten signature and stamp]
DR. ALBERTO ANTONIO MONTES
 CIP N.º 84746
 SUPERVISOR DE O.P.P.

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA


Obr: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA

Ubicación: MARCONA - NASCA - ICA

Fecha: Diciembre 2017

Cliente: FONDEPES

Item	Descripción	Und	Método	P. Unit.	Presup. Si.	Cut 17 Periodo (%)	Nov 17 Periodo (%)	Dic 17 Periodo (%)	Ene 18 Periodo (%)	Feb 18 Periodo (%)	Mar 18 Periodo (%)	Abr 18 Periodo (%)	May 18 Periodo (%)	TOTAL
13.06.07	MONTAJE DE SECCIONADORES CUT OUT	Pza.	8.00	1,879.81	15,038.48				1,511.85	6,598.01				10,077.86
13.06.08	BUZONES	Und.	1.00	1,524.75	1,524.75				228.71	1,296.04				1,524.75
13.07.01	POZO PUESTA A TIERRA	Und.	5.00	1,535.40	7,677.00				1,144.05	6,482.95				7,627.00
13.08.01	AGUIJAS FINALES	Und.	1.00	1,527.10	1,527.10				229.07	1,298.04				1,527.10
13.09.01	PROBES Y PUESTA EN SERVICIO	Und.	1.00	4,808.98	4,808.98				721.33	4,087.65				4,808.98
13.10.01	ADQUISICION DE EQUIPOS DE MANOBRAS	Und.	1.00	2,415.64	2,415.64				36.85	2,087.79				2,415.64
13.10.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m³	12.00	20.47	245.64									
13.10.03	OBRAS DE MAR	m³	12.00	20.47	245.64									
14.01.01	OBRAS PRELIMINARES	m³	12.00	20.47	245.64									
14.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN OBRAS DE MAR	m³	908.40	3.09	2,806.96	2,806.96							8,000.00	2,806.96
14.01.03	MOBILIZACION Y DESMOBILIZACION DE EQUIPO	Gib.	1.00	16,000.00	16,000.00	8,000.00								16,000.00
14.01.04	DESMONTAJE DE POSTE DE ENERGIA EXISTENTE	Und.	2.00	189.81	381.22	381.22								381.22
14.01.05	DESMONTAJE DE SISTEMA DE DEFENSA DE MUJELLE CON NEUMATICOS	m.	100.85	135.14	13,601.84	13,601.84								13,601.84
14.01.06	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA DEL SISTEMA DE DEFENSA	m.	27.30	135.14	3,689.32	3,689.32								3,689.32
14.01.07	CON JEBE TIPO D	m³	832.90	59.99	49,132.77	49,132.77								49,132.77
14.01.08	PICADO DE LOSA DE CONCRETO	m³	282.88	38.42	11,251.88	11,251.88								11,251.88
14.01.09	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO	m³	39.88	19.15	764.08	764.08								764.08
14.01.10	DEMOLICION DE CONCRETO EN MUJELLE PARA REFORZAMIENTO EBD	m³	10.92	229.88	2,498.61	2,498.61								2,498.61
14.01.11	ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m³	172.01	11.00	1,892.11	1,892.11								1,892.11
14.01.12	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m³	172.01	20.47	3,521.04	3,521.04								3,521.04
14.02.01	OBRAS DE CONCRETO	Und.	44.00	54.83	2,412.52	2,412.52								2,412.52
14.02.02	COLOCACION DE ADITIVO PARA CONCRETO VIEJO - LOSA DE	m³	832.90	24.16	20,122.86	20,122.86								20,122.86
14.02.03	COLOCACION DE ADITIVO PARA CONCRETO VIEJO - MURO DE	m³	282.86	28.45	7,948.15	7,948.15								7,948.15
14.02.04	CONCRETO ZONA DE VIGAS	m³	826.86	8.25	6,819.45	6,819.45								6,819.45
14.02.05	COLOCACION DE ADITIVO TRANSFORMADOR DE OXIDO-MURO ZONAS	m³	282.86	9.27	2,619.45	2,619.45								2,619.45
14.02.06	COLOCACION DE MALLA DE ACERO DE REFUERZO PARA MURO DE	m²	282.86	34.75	9,819.45	9,819.45								9,819.45
14.02.07	CONCRETO - ZONA DE VIGA	m³	62.47	528.87	33,038.51	33,038.51								33,038.51
14.02.08	RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F C=280 KG/CM2 EN MUROS Y VIGAS	m²	21.96	603.96	13,251.06	13,251.06								13,251.06
14.03.01	SISTEMA DE DEFENSA	m.	27.30	1,827.76	49,899.39	49,899.39								49,899.39
14.03.02	JEBE TIPO D	m³	31.20	1,215.69	37,928.41	37,928.41								37,928.41
14.03.03	ESTRUCTURA DE MADERA PARA DEFENSA, ZONA DE PLATAFORMA	Und.	36.00	713.60	25,690.41	25,690.41								25,690.41
14.03.04	SISTEMA DE DEFENSA REPOSICION DE JEBE TIPO D	m	90.20	860.73	77,618.95	77,618.95								77,618.95
14.03.05	SISTEMA DE DEFENSA CON 02 NEUMATICOS; CADENA CON	Und.	32.50	443.28	14,406.93	14,406.93								14,406.93
14.03.06	SISTEMA DE DEFENSA CON 01 NEUMATICO; CADENA CON ABRAZADERA	Und.	26.00	319.10	8,296.60	8,296.60								8,296.60
14.03.07	BITAS TIPO B-1	Und.	26.00	319.10	8,296.60	8,296.60								8,296.60
14.03.08	SARDINEL DE MADERA DE 12"x12"x18"	Und.	2.00	1,741.78	3,483.56	3,483.56								3,483.56
14.03.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PESANTE CAP. W=500 KG.	Und.	2.00	1,741.78	3,483.56	3,483.56								3,483.56
14.04.01	PILOTAJE	m³	7.93	622.09	4,931.17	4,931.17								4,931.17
14.04.02	CONCRETO VIGAS Y NUCLEO F=C=280 KG/CM2	m³	38.70	70.16	2,715.19	2,715.19								2,715.19
14.04.03	VIGAS Y NUCLEOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m³	1,298.12	4.18	5,425.26	5,425.26								5,425.26
14.04.04	CONCRETO EN ESCALERA F=C=280 KG/CM2	m³	1.41	523.91	740.51	740.51								740.51
14.04.05	CONCRETO EN ESCALERA F=C=280 KG/CM2	m³	7.70	89.28	687.23	687.23								687.23
14.04.06	ESCALERAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	Kg.	65.88	4.18	277.23	277.23								277.23
14.05.01	PILOTAJE	m³	7.35	591.91	4,350.54	4,350.54								4,350.54
14.05.02	CONCRETO F=C=350 KG/CM2 PARA PILOTES	m³	84.00	75.39	6,333.72	6,333.72								6,333.72
14.05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA PILOTES	Kg.	3,210.18	4.18	13,418.35	13,418.35								13,418.35
14.05.04	PILOTAJE AGERO F=C=4200 Kg/cm2	Und.	6.00	287.70	1,726.20	1,726.20								1,726.20
14.05.05	PIANTA PARA PILOTES	Und.	6.00	288.67	1,732.02	1,732.02								1,732.02
14.05.06	TRANSPORTE DE PILOTES	Und.	6.00	2,247.37	13,484.22	13,484.22								13,484.22
14.05.07	HINGADO DE PILOTE (INC. MOV. Y POSIC. PLANTILLA)	Und.	6.00	2,247.37	13,484.22	13,484.22								13,484.22
14.05.08	DESCARBEZADO DE PILOTAJE	Und.	6.00	142.91	857.46	857.46								857.46
14.06.01	CAPAZAL'S PREFABRICADOS	m³	4.13	510.23	2,107.25	2,107.25								2,107.25



TIPS Alberto Alvarado Morales

 C.F.P. N° 84746

 SUPERVISOR DE OBRA

JUNIO 10

 ESPICAN AVILES


 INGENIERO CIVIL


 Reg. CIP N° 119009

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA


Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA
 Ubicación: MARCONA - NUSCA - ICA
 Fecha: Diciembre 2017
 Cliente: FONDERPES


Item	Descripción	Unid.	Metrado	P. Unid.	Perceñal	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	TOTAL
			Unid.	Unid.	Si.	Perceñal (S/.)	Perceñal (S/.)	Perceñal (S/.)	Perceñal (S/.)	Perceñal (S/.)	Perceñal (S/.)	Perceñal (S/.)	Perceñal (S/.)	
14.06.02	ENCOFRADO Y DESENCORRADO NORMAL PARA CABEZAL	m ²	27.71	72.44	2,007.31							1,019.04	988.27	2,007.31
14.06.03	PREFABRICADO	Kg.	575.28	4.16	2,393.08							1,214.88	1,178.20	2,393.08
14.06.04	CABEZAL PREFABRICADO, ACERO Fy=4200 kg/cm ²	Und.	3.00	320.00	951.90							488.27	473.53	961.80
14.06.05	TRANSPORTE DE CABEZAL PREFABRICADO	Und.	3.00	1,559.95	4,876.85							2,374.10	2,502.75	4,876.85
14.07	LOSAS PRE FABRICADAS EN MATAFORMA PAVA	m ²	5.41	654.09	3,430.43							686.09	2,744.34	3,430.43
14.07.01	CONCRETO F'c=280 KG/CM ² PARA LOSAS PRE FABRICADAS	m ³	90.10	72.44	6,526.84							1,306.37	5,221.47	6,526.84
14.07.02	ENCOFRADO Y DESENCORRADO DE LOSAS PRE FABRICADAS	m ²	488.24	4.16	2,031.08							408.22	1,622.86	2,031.08
14.07.03	LOSAS PREFABRICADAS, ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM ²	Kg.	108.00	120.27	12,748.82							1,274.86	11,473.96	12,748.82
14.07.04	TRANSPORTE Y COLOCADO DE LOSA PREFABRICADA	Und.	1,218.55	78.19	96,578.16							9,657.82	86,920.34	96,578.16
14.07.05	COLOCACION DE ADITIVO MASILLA EPOXICA SUBMARINA	m ²			283,864.26									283,864.26
15	EQUIPAMIENTO	Und.	1.00	67,034.82	67,034.82									67,034.82
15.01	CAMARA FRIGORIFICA DE 5 TM	Und.	1.00	75,582.46	75,582.46									75,582.46
15.02	CAMARA FRIGORIFICA DE 10 TM	Und.	1.00	636,896.46	636,896.46									636,896.46
15.03	SUMINISTRO DE PRODUCTOR DE HIELO EN BLOQUES DE 10 TONDA	Und.	1.00	20,230.22	20,230.22									20,230.22
15.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PARA ENFRIAMIENTO DE AGUA PARA EL PRODUCTOR DE HIELO (ENFRIADOR DE AGUA 10 M3)	Und.	1.00	83,341.90	83,341.90									83,341.90
15.05	EQUIPAMIENTO DE TAREAS PREVIAS	Und.	1.00	85,798.40	85,798.40									85,798.40
15.06	ACCESORIOS PARA TRANSPORTE Y ESTIBA	Und.	1.00	20,970.00	20,970.00									20,970.00
15.07	ACCESORIOS PARA PERSONAL OPERATIVO	Und.	1.00	29,509.24	29,509.24									29,509.24
16	MOBILIARIO	Und.	1.00	29,509.24	29,509.24									29,509.24
16.01	MOBILIARIO VARIOS	Und.	1.00	29,509.24	29,509.24									29,509.24
	TOTAL COSTO DIRECTO			6,384,976.78	6,384,976.78	117,340.96	77,575.76	328,880.86	789,046.53	1,093,912.32	1,182,615.18	1,356,465.88	1,488,860.93	6,354,976.78
	GASTOS GENERALES			12.30%	781,862.14	14,434.01	9,547.82	40,446.89	93,436.52	130,846.31	143,001.87	166,844.03	183,105.29	781,862.14
	UTILIDAD			6.00%	381,298.61	7,040.98	4,654.55	19,731.65	45,578.79	63,928.74	68,756.91	81,307.33	96,319.56	381,298.61
	SUB-TOTAL				7,147,573.53	138,824.95	91,772.12	389,042.39	938,061.84	1,275,373.75	1,394,373.75	1,604,686.93	1,781,065.86	7,147,573.53
	IGV			18.00%	1,286,563.35	24,968.44	16,518.86	70,927.83	161,758.13	235,528.19	247,557.28	288,643.65	316,905.46	1,286,563.35
	PRESUPUESTO TOTAL				8,434,136.88	163,793.39	108,291.98	460,970.22	1,099,820.97	1,510,901.94	1,641,931.03	1,893,330.57	2,097,971.31	8,434,136.88
	TOTAL AVANCE ACUMULADO				163,793.39	163,793.39	163,793.39	163,793.39	163,793.39	163,793.39	163,793.39	163,793.39	163,793.39	163,793.39
	PORCENTAJE AVANCE PACIAL				1.94%	1.94%	1.94%	1.94%	1.94%	1.94%	1.94%	1.94%	1.94%	1.94%
	PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO				1.94%	1.94%	1.94%	1.94%	1.94%	1.94%	1.94%	1.94%	1.94%	1.94%


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA


 JORGE JULIO
 ESPICHAN AVILES
 INGENIERO CIVIL
 POC CIP N° 1150C9

**ANEXO N° 05:
CURVA DE AVANCE DE OBRA**


Luis Alberto Avila Morales
Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA


JORGE JULIO
ESPICHAN AVILES
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 115009




VALORIZACION N° 07 CURVA DE AVANCE DE OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA

UBICACIÓN: MARCONA - NAZCA - ICA

CONTRATISTA: P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.

SUPERVISION : CONSORCIO MESONES MURO

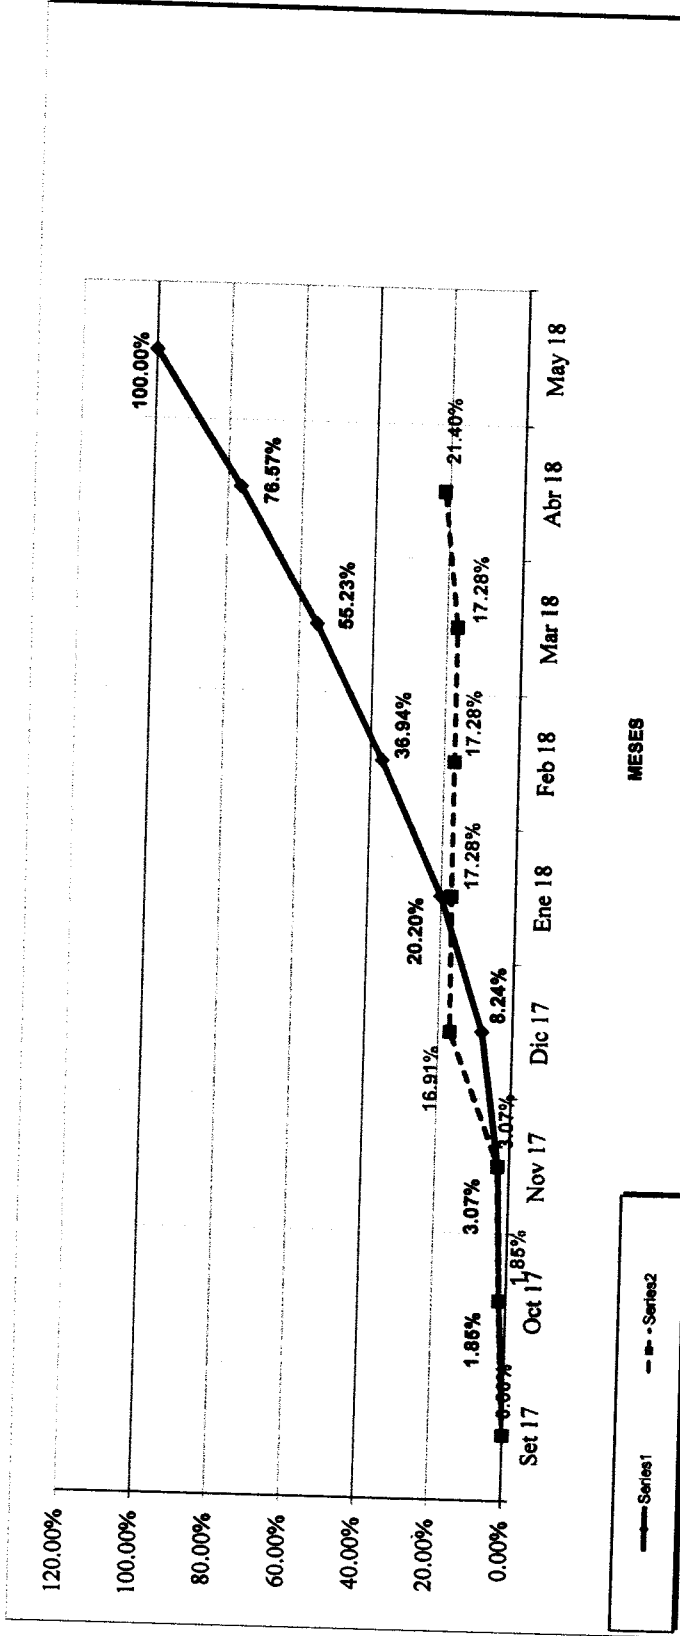

JOSE ALBERTO ABITIA MORALES
 ESP/IC - P. S. V. CONSTRUCTORES S.A.
 SUPERVISOR DE OBRA


Alberto Abitia Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA


	Set 17	Val. N° 01 Oct 17	Val. N° 02 Nov 17	Val. N° 03 Dic 17	Val. N° 04 Ene 18	Val. N° 05 Feb 18	Val. N° 06 Mar 18	Val. N° 07 Abr 18	Val. N° 08 May 18	TOTAL
TOTAL PROGRAMADO SIGV	0.00	138.824.66	91.772.13	389.042.39	898.661.84	1.258.489.97	1.375.373.75	1.604.686.92	1.761.085.86	7.517.937.52
AVAN. MENS. PROGRAMADO	0.00%	1.85%	1.22%	5.17%	11.98%	16.74%	18.29%	21.34%	23.43%	
AVAN. ACUM. PROGRAMADO	0.00	138.824.66	230.596.79	619.639.18	1.518.301.02	2.776.790.99	4.152.164.74	5.756.851.66	7.517.937.52	
AVAN. ACUM. PROGRAMADO	0.00%	1.85%	3.07%	8.24%	20.20%	36.94%	55.23%	76.57%	100.00%	
TOTAL VALORIZADO SIGV	0.00	138.824.66	91.772.13	1.040.648.68	2.778.227	0.00	0.00	309.716.74	1.608.744.48	
AVANCE MENSUAL VALORIZ.	0.00%	1.85%	1.22%	13.84%	0.37%	0.00%	0.00%	4.12%		
AVAN. ACUM. VALORIZADO	0.00	138.824.66	230.596.79	1.271.245.47	1.299.027.74	1.299.027.74	1.299.027.74	1.608.744.48		
AVANCE ACUM. VALORIZADO	0.00%	1.85%	3.07%	16.91%	17.28%	17.28%	17.28%	21.40%		


000144

**ANEXO N° 06:
INFORME DE SEGURIDAD**





Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS


JOSE M. ALONSO
ESPECIALISTA EN OBRAS
INGENIERO EN OBRAS



	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ABRIL 2018	
		Fecha: 30-04-18

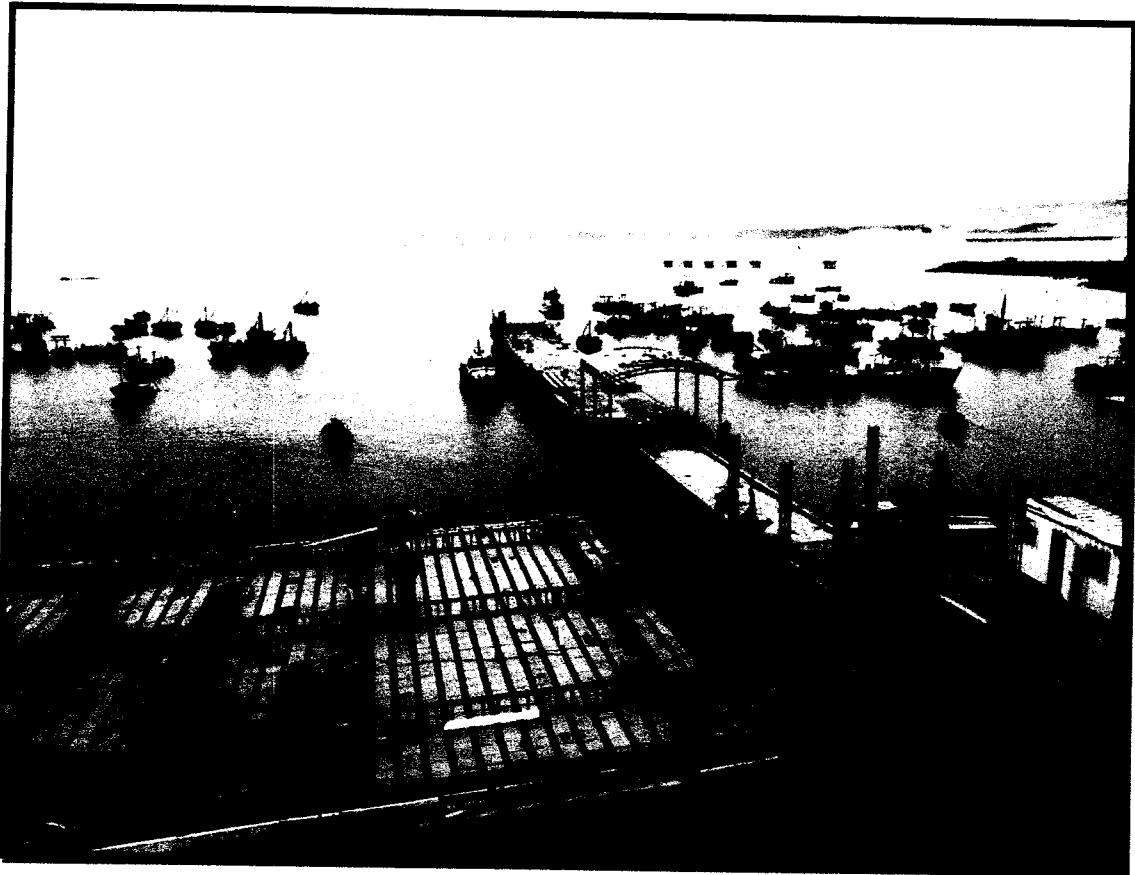**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE
MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA**





INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ABRIL 2018

Elaborado por:	Aprobado por:
 Johnny Beltran Gordillo Ing. de Seguridad y Medio Ambiente	 Jorge Espichan Avilés Residente de obra







Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA


	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	ABRIL 2018	Fecha: 30-04-18

RESUMEN EJECUTIVO ABRIL 2018

DATOS GENERALES		PERSONAL	CANT. MAXIMA ALCANZADA	CANT. MINIMA ALCANZADA
PERSONAL PSV CONSTRUCTORES EN OBRA	DIRECTO:		48	48
	INDIRECTO:		9	9
	Total		57	57
		PERSONAL	MENSUAL	ACUMULADO
HORAS HOMBRE TRABAJADAS	Trabajadores M.O. Directa (obreros)		9123.50	18945.40
	Trabajadores M.O. Indirecta (empleados)		1860.00	3923.01
	Total HH Trabajadas		10983.50	22868.41
HORAS HOMBRES DE CAPACITACION		MENSUAL	ACUMULADO	
Horas Hombres Capacitación EDS		402.17	617.84	
Horas Hombres Capacitaciones Específicas		78.50	130.25	
Total HH Capacitación		480.67	748.09	
ACCIDENTES/INCIDENTES		MENSUAL	ACUMULADO	
Accidente Fatales		0	0	
Accidentes incapacitantes		0	0	
Accidente leves STP		0	0	
Accidentes Vehiculares en tránsito		0	0	
Casi accidentes (Incidentes)		1	1	
Daños a la propiedad		0	0	
Incidente Ambiental		0	0	
Incidente con impacto social		0	0	
Días Perdidos		0	0	
Total eventos no deseados		1	1	
INDICADORES DE GESTION		MENSUAL	ACUMULADO	
INDICE MENSUAL DE CAPACITACION EDS		3.66	2.70	
INDICE MENSUAL DE CAPACITACION TOTAL (IC)		4.37	3.27	
INDICE DE FRECUENCIA (IF)		0	0	
INDICE DE GRAVEDAD		0	0	
INDICE DE ACCIDENTABILIDAD (IA)		0	0	


 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBR.



	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ABRIL 2018	
		Fecha: 30-04-18


CONTENIDO DEL INFORME


ITEM

- 1 Introducción
- 2 Objetivos del Informe
- 3 Descripción del Proyecto
- 4 Objetivos de Seguridad: Trazados vs Objetivos Alcanzados
- 5 Comité de Seguridad
- 6 Organigrama del Proyecto
- 7 Planificación de la Prevención
 - 7.1 Identificación de tareas Críticas
 - 7.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
 - 7.3 Permisos de Trabajo
 - 7.4 Análisis seguros de trabajo
 - 7.5 Reporte de Actos y Condiciones sub estándares
 - 7.6 Inspecciones de Seguridad
 - 7.7 Señalización Temporal de Seguridad
 - 7.8 Equipo de Protección personal
- 8 Entrenamiento y Capacitación
 - 8.1 Inducción de Ingreso
 - 8.2 Entrenamiento Diario de Seguridad (EDS)
 - 8.3 Capacitación Específica de Seguridad
 - 8.4 Motivación al Personal
- 9 Reporte de Eventos no deseados
- 10 Estadística de Prevención de Perdidas
 - 10.1 Personal del Proyecto
 - 10.2 Horas Hombres Trabajadas de Exposición a Riesgos
 - 10.3 Horas Hombres de Capacitación e índice de capacitación



 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA



	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	ABRIL 2018	Fecha: 30-04-18

10.3.1. Entrenamiento Diario de Seguridad y Capacitaciones específicas

10.4 Incidentes – Eventos no deseados

10.5 Índice de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad

11 Notificaciones de Riesgo

12 Salud e Higiene

12.1 Exámenes Médicos Ocupacionales

12.2 Prevención en Cero Alcohol

12.3 Protección Auditiva

12.4 Estacione de Emergencia

12.5 Habilitación de Módulos de agua para consumo y para lavado
De manos

12.6 Habilitación de Servicios Higiénicos

13 Gestión Ambiental en Obra



13.1 Gestión de Residuos Sólidos en Obra

13.2 Habilitación de Kit para Derrames


13.3 Habilitación de Bandejas Antiderrames

13.4 Mantenimiento de Equipos

13.5 Medidas de Concientización Ambiental


 Luis Alberto Avila Morales
C.I.P. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA


JORGE DE JULIO
ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ABRIL 2018	
		Fecha: 30-04-18

1. INTRODUCCIÓN

La Legislación vigente aporta una nueva concepción de la Prevención y Salud en el puesto de trabajo, ya que supone la implantación de toda una cultura de prevención, en todos los niveles de la Empresa, tendente a erradicar los riesgos que para la salud del trabajador pudiera ocasionar la actividad laboral, por lo que durante la ejecución de esta obra en el mes de abril se han tomado en cuenta las leyes vigentes y se priorizado la integridad física y psicológica del trabajador.

Se establecieron lineamientos de seguridad y salud que regirían en este proyecto, los mismos que se aplicaron para garantizar la seguridad y la salud de todo el personal de obra.

Este informe, brinda información cuantitativa y cualitativa de las actividades programadas y las tareas ejecutadas en la obra, que fue registrada con el uso de la documentación respectiva que fue propio del proyecto, aplicadas en el área de seguridad salud ocupacional.

Durante el mes de Enero se tuvo inconvenientes por motivos de problema social (eventos vandálicos y terroristas) lo que hizo que las actividades se paralizaran hasta su reanudación en el mes de Abril 2018.

JEFFERSON JULIO
 ESPINOZA ALVAREZ
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 119009

2. OBJETIVOS DEL INFORME

- ✓ Mostrar las acciones llevadas a cabo para el cumplimiento de los objetivos de seguridad contenidos dentro del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Mostrar los resultados de las acciones de PSV durante la Gestión de Seguridad, durante el periodo de Abril 2018.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La obra ejecutada consistió en el "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, región Ica"


4. OBJETIVOS DE SEGURIDAD: TRAZADOS vs ALCANZADOS

OBJETIVO	META	Indicador		Porcentaje del objetivo alcanzado
		Objetivo Trazado	Objetivo Alcanzado	
Aplicación de las Mejores Prácticas, Normas, Procedimientos y estándares de trabajo Seguro	Entrenamientos Diarios de Seguridad	Ratio >= 2,00	Ratio =	3.66 %
	Difusión del Plan de Seguridad	100 %	100%	100%
	3 Capacitaciones específicas Mensuales	100%	100%	100%
	Inducciones de Ingreso	Todo el personal	100%	100%
Cumplimiento de la Política Integrada de Gestión y al Plan de	Cumplim. Política "Cero Accidentes Incapacitantes"	Igual a 0	0 Accidentes Incapacitantes	100%



Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

Johnny Beltran Gordillo
 Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo


	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ABRIL 2018	
		Fecha: 30-04-18

Seguridad y Salud en el Trabajo para el Presente Proyecto	Minimización de enfermedades ocupacionales	Igual a 0	CERO Enf. Ocup.	100%
	Minimización de daños al medio ambiente	Menor a 0,8	0	100%

5. COMITÉ DE SEGURIDAD

Durante el mes de Abril 2018 se contó con un número variable entre 40 A 57 personas por lo que la conformación del comité de seguridad, por lo que se programó la conformación del comité de SST para el mes de Noviembre.

6. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO – PSV

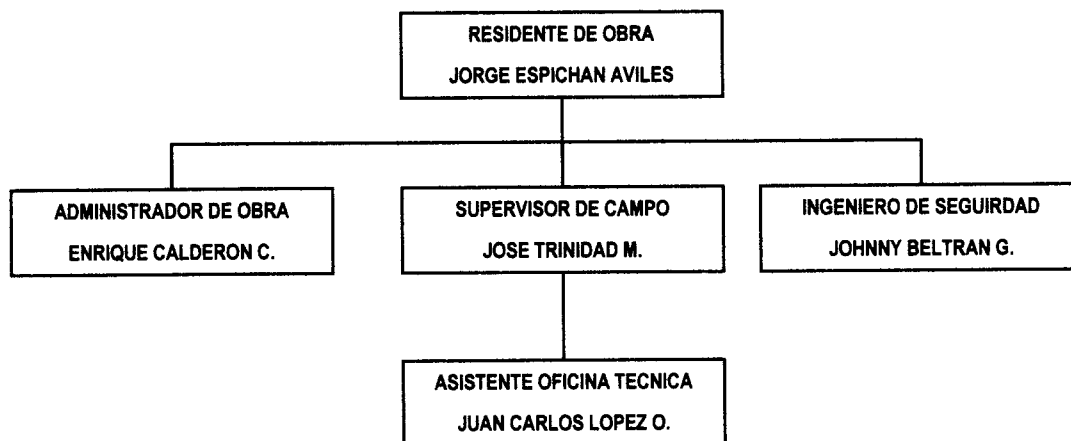

JORGE ESPICHAN AVILES
INGENIERO DE SEGURIDAD
Reg. CIP. Nº 119009

7. PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN

En todo programa de prevención diseñado para un proyecto u obra contempla los lineamientos, objetivos y las principales acciones a desarrollarse, con la finalidad de reducir o eliminar los riesgos que atentan contra la salud y seguridad de los trabajadores, eficiencia de los procesos y bienes de la Empresa.


7.1. Identificación de Tareas Críticas


Factores Determinantes para la Identificación

En el presente mes existieron diversos factores que influyen en la clasificación de una tarea como peligrosa.

Los trabajos críticos definidos en las actividades ejecutadas durante el mes de Abril 2018 fueron los siguientes:

- Trabajos con Maquinaria Pesada (excavadora)
- Trabajos de izaje con Grúa
- Trabajos en Caliente
- Trabajos en Altura
- Trabajos de obras civiles


Luis Alberto Avila Morales
CIP. Nº 84746
SUPERVISOR DE OBRA


Johnny Beltran Gordillo
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo
PSV Constructores S.A.

	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ABRIL 2018	Fecha: 30-04-18
--	---	-----------------

7.2. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Se utilizaron los formatos estándares de PSV para identificar los peligros y evaluar sus riesgos, el formato registro utilizado es el IPER.

Se tomó en consideración los riesgos presentados en los trabajos y la mejor forma de ejecutarlos y tomando énfasis en la seguridad salud y medio ambiente.

7.3. Permisos de Trabajo

Durante la ejecución del servicio PSV Constructores S.A. utilizó sus propios formatos estándares internos.

Los permisos fueron:

1. Permiso de Trabajo (Frio – Caliente)
2. Permiso de trabajo para Izaje con grúa
3. Permiso para trabajos en Altura

JOAQUÍN GONZÁLEZ
 ESPECIALISTA EN
 INGENIERÍA DE
 RIESGO, CIP N° 115009

7.4. Análisis Seguro de Trabajo (AST)

Los AST ayudan a controlar o reducir o eliminar los riesgos del trabajo mediante el estudio de cualquier tarea o trabajo para desarrollarlo de la manera más segura y efectiva.


El proceso de AST se aplicó en todas las tareas ejecutadas durante el desarrollo de las actividades en el mes de Abril, ya que como medida proactiva, el AST identifica y elimina las posibles pérdidas, asegurándose que se cuente con procedimientos, métodos, instructivos, etc. para diseñar, construir, mantener y operar equipos de manera segura.

Se utiliza el formato AST estándar del PSV, el mismo que se elaboraron para cada actividad realizada en obra, contando con las firmas correspondientes.

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)										PSV - SGI	
										Ver. 04 03-01-17	
PROYECTO / CONTRATO:										FECHA:	
ING. RESPONSABLE:					EMPRESA: PSV CONSTRUCTORES S.A. CONTRATISTA:						
ACTIVIDAD:										UBICACIÓN:	
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	EMPRESA	FIRMA	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	EMPRESA	FIRMA		
1					11						
2					12						
3					13						
4					14						
5					15						
6					16						
7					17						
8					18						
9					19						
10					20						

LISTA DE VERIFICACIÓN SETA (ASPECTOS BÁSICOS)		LISTA DE VERIFICACIÓN SETA (ASPECTOS BÁSICOS)	
PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES (ENCARGADO)		LÍNEA DE ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES	
¿Los trabajadores están capacitados y tienen todos los recursos necesarios?	SI/NO	¿Existen procedimientos?	SI/NO
¿Se ha proporcionado el material adecuado?	SI/NO	¿Límites de seguridad?	SI/NO
¿Conocemos el procedimiento para realizar el trabajo?	SI/NO	¿Clases?	SI/NO
¿Se han comunicado instrucciones claras y precisas a los trabajadores y se han cumplido?	SI/NO	¿Clases de riesgo?	SI/NO
¿Se han verificado y controlado los riesgos de la tarea a realizar?	SI/NO	¿Clases de riesgo?	SI/NO
¿Se cuenta con personal con conocimiento de primeros auxilios y de rescate?	SI/NO	¿Clases de riesgo?	SI/NO
¿Se cuenta con botiquín de primeros auxilios?	SI/NO	¿Clases de riesgo?	SI/NO
¿Se cuenta con casaca?	SI/NO	¿Clases de riesgo?	SI/NO
¿Se ha analizado o considerado los elementos de contingencia?	SI/NO	¿Clases de riesgo?	SI/NO
CONSIDERACIONES DE RIESGO EN GENERAL		CONSIDERACIONES DE RIESGO EN GENERAL	
¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de caída?	SI/NO	¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de caída?	SI/NO
¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de incendio?	SI/NO	¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de incendio?	SI/NO
¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de explosión?	SI/NO	¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de explosión?	SI/NO
¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de contaminación?	SI/NO	¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de contaminación?	SI/NO
¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de ruido?	SI/NO	¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de ruido?	SI/NO
¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de vibración?	SI/NO	¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de vibración?	SI/NO
¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de electricidad?	SI/NO	¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de electricidad?	SI/NO
¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de maquinaria?	SI/NO	¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de maquinaria?	SI/NO
¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de transporte?	SI/NO	¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de transporte?	SI/NO
¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de almacenamiento?	SI/NO	¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de almacenamiento?	SI/NO
¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de manipulación?	SI/NO	¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de manipulación?	SI/NO
¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de mantenimiento?	SI/NO	¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de mantenimiento?	SI/NO
¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de limpieza?	SI/NO	¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de limpieza?	SI/NO
¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de almacenamiento?	SI/NO	¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de almacenamiento?	SI/NO
¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de manipulación?	SI/NO	¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de manipulación?	SI/NO
¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de mantenimiento?	SI/NO	¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de mantenimiento?	SI/NO
¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de limpieza?	SI/NO	¿Se cuenta con medidas de control de riesgos de limpieza?	SI/NO

Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ABRIL 2018	
		Fecha: 30-04-18


ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)		CÓDIGO:			
EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES		DPA-MA-SST-FO-001-R0			
N	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	IMPACTOS AMBIENTALES	MEDIDAS DE PREVENCIÓN

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) Y COLECTIVA (EPC) NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD:

Corca <input type="checkbox"/> Casaca de seguridad <input type="checkbox"/> Lentes de seguridad <input type="checkbox"/> Uniforme de trabajo <input type="checkbox"/> Pijama de trabajo <input type="checkbox"/> Protección de pies <input type="checkbox"/>	Protección auditiva <input type="checkbox"/> Cartón de protección <input type="checkbox"/> Barboque <input type="checkbox"/> Protección de manos <input type="checkbox"/>	Delantal de cuero <input type="checkbox"/> Protector facial <input type="checkbox"/> Guantes de seguridad <input type="checkbox"/> Anillo de seguridad <input type="checkbox"/> Ocaso <input type="checkbox"/>	Línea de vida horizontal <input type="checkbox"/> Línea de vida vertical <input type="checkbox"/> Puntos de anclaje <input type="checkbox"/> Barandaje fijo (parámetro) <input type="checkbox"/> Monitores de torre <input type="checkbox"/> Escaleras <input type="checkbox"/>	Conos <input type="checkbox"/> Tacos <input type="checkbox"/> Señalización <input type="checkbox"/> Bómbos <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>
---	--	--	--	--

En su momento, si se requiere el presente Análisis de Trabajo Seguro, se van las condiciones requeridas como fundamentos de apoyo del trabajo.

FIRMA DEL ENCARGADO: _____ FIRMA DEL ING. RESPONSABLE: _____ FIRMA SSTMA: _____


 JOHNNY BELTRÁN GARDILLO
 ESPLEMAN ASESOR
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP Nº 110000


7.5. Reporte de Actos y Condiciones Sub estándares

PSV Constructores S.A. tiene claro que los accidentes no se producen por casualidad sino por causalidad esto quiere decir que los accidentes tienen una causa que los originó.

En base a esto se continúa el uso de esta herramienta en este proyecto para controlar en su causa inmediata los posibles eventos no deseados, si se controla los actos y condiciones sub estándares se ha podido controlar la materialización de mayores incidentes y accidentes.

En el desarrollo de las actividades durante el mes de Abril 2018 se tuvo una cantidad reportada de:

	2018	
	ACTO SUB ESTANDAR	CONDICION SUB ESTANDAR
ABRIL	15	18
TOTAL	15	18



 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. Nº 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

Todos los actos y condiciones detectadas se controlaron teniendo así un trabajo realizado con seguridad durante este mes de Abril 2018.


7.6. Inspecciones de Seguridad

Este proceso de verificación nos permitió detectar puntos de mejora referidos a los peligros derivados de condiciones inseguras, así como la formulación y ejecución de acciones destinadas a eliminarlos o corregirlos antes que estos causen lesiones.

La totalidad de las observaciones encontradas en cada inspección fueron **116** levantadas

	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	ABRIL 2018	Fecha: 30-04-18


INSPECCIONES ABRIL - Abril 2018				
TIPO DE INSPECCION	N° INSPECCIONES REALIZADAS	OBSERVACIONES ENCONTRADAS	OBSERVACIONES LEVANTADAS	OBSERVACIONES PENDIENTES
DIARIAS	20	5	5	0
SEMANALES	3	10	10	0
PLANIFICADAS	0	0	0	0
VEHICULOS/EQUIPOS	4	6	6	0
EXTINTORES	1	2	2	0
POR EL CLIENTE	0	0	0	0
TOTAL	28	23	23	0

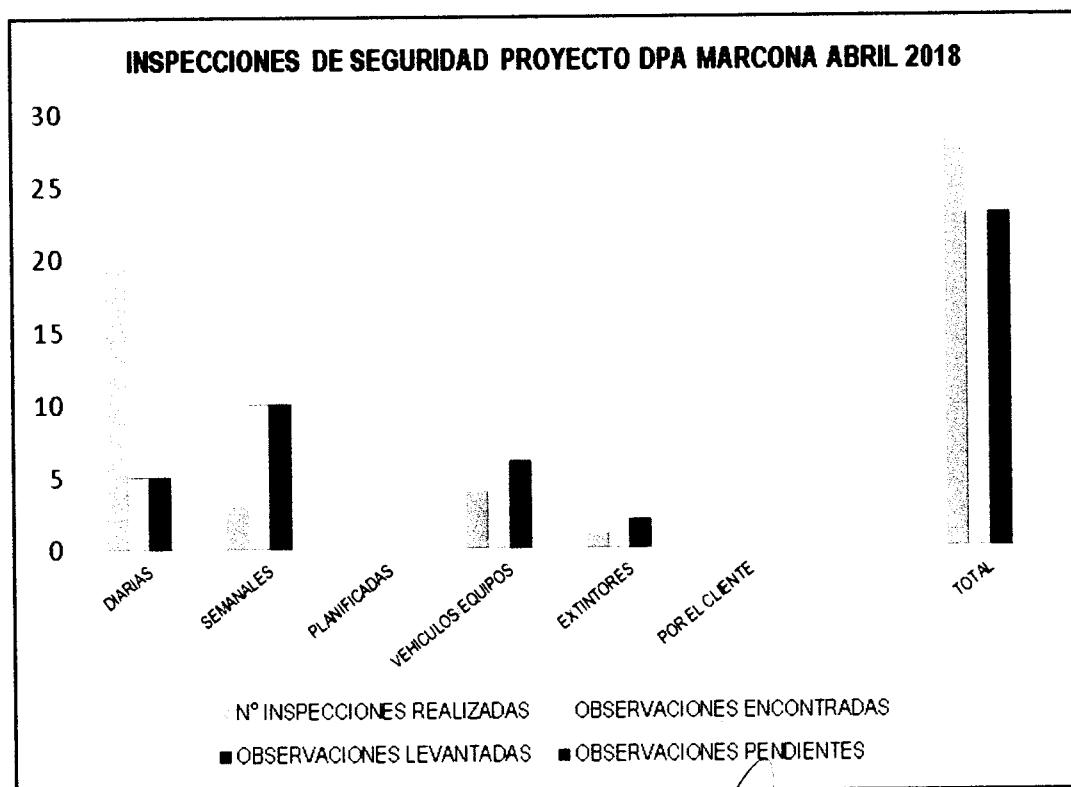

Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

JOHNNY BELTRAN GORDILLO
ESPECIALISTA EN PS
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 119009

117

	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ABRIL 2018	
		Fecha: 30-04-18


7.7. Señalización temporal de Seguridad

De acuerdo al Análisis de Riesgos determinado para las actividades de este proyecto se clasificó la señalización de seguridad y salud en el trabajo instalada y por instalar en obra, teniendo en cuenta las situaciones de emergencias previsibles y las medidas preventivas adoptadas.

Estas señalizaciones ponen de manifiesto la necesidad de:


- a) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones.
- b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.
- c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.
- d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

Durante el mes de abril 2018 se continuó con la señalización de acuerdo a las actividades realizadas.

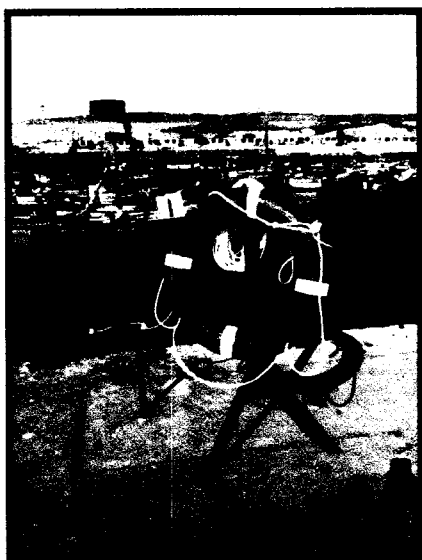




Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS


JOHNNY BELTRAN CORDOBA
 ESPICANAN AVILA ES
 INGENIERO CIVIL
 R.M. CIP. N° 119009

118

	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ABRIL 2018	
		Fecha: 30-04-18

7.8. Equipo de protección personal (EPP) y Colectiva (EPC)

EPP: El personal cuenta con Equipo de protección personal básico y específico adecuado a la actividad que realizan.



EPP específicos

EPC: Para la realización de las actividades se utilizaron equipos de protección colectiva lo que hizo que el personal pueda trabajar con mayor seguridad.




Equipo de protección Colectiva
(línea de vida)



Luís Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

Jorge Julio Espichan Arenas
INGENIERO EN S
Reg. CIP. N° 11111

Johnny Beltrán Cerdillo
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo
PST Constructores S.A.

	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ABRIL 2018	
		Fecha: 30-04-18


8. ENTRENAMIENTOS Y CAPACITACIONES

Dentro del programa de prevención diseñado para este servicio se contempló los siguientes lineamientos los cuales fueron aplicados durante el mes de Abril 2018:

8.1. Inducción de Ingreso

Se dio la correspondiente inducción de ingreso a todo el personal de PSV ingresante a este proyecto según formato/registro de Inducción de Ingreso.

Además se realizó la entrega del Manual de Inducción de PSV donde se encuentran todos los Reglamentos internos de PSV. a todo el personal reingresante y nuevo al proyecto.

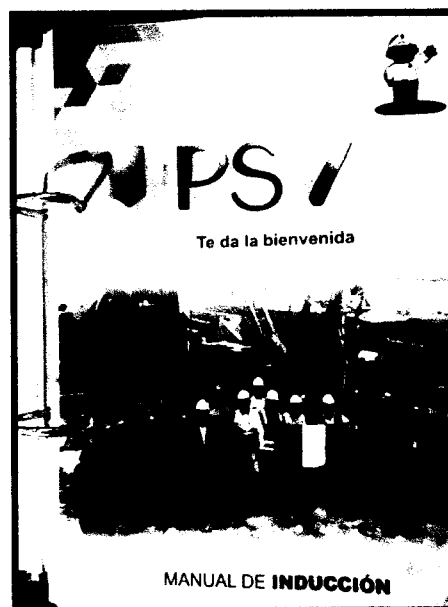

Manual de Inducción PSV

JOSÉ SE JUIHO
ESPICHÁN AVILA'S
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N.º 11003

8.2. Entrenamientos Diarios de Seguridad (EDS)

Un método probado que influye directamente en la disminución de los índices de frecuencia de accidentes, son los Entrenamientos Diarios de Seguridad que se imparte de manera diaria al personal antes de iniciar las actividades.

Durante el inicio de las actividades en el mes de Abril 2018 diariamente se impartieron EDS mediante la cual se concientizó al personal a la realización de un trabajo seguro, impartiendo temas referidos a los trabajos propios del proyecto a ejecutar así también aplicando la seguridad basada en el comportamiento.


PSV impartió los entrenamientos diarios de Seguridad antes del inicio de la jornada de trabajo según la programación establecida y de acuerdo a las actividades o sucesos presentados en el día a día de la ejecución de las actividades.

Cuadro de los Entrenamientos Diarios de Seguridad (EDS) impartidos por PSV:



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N.º 84746
SUPERVISOR DE OBRA

Johnny Beltran Gordillo
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo

	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ABRIL 2018	
		Fecha: 30-04-18


EDS – ABRIL 2018				
Fecha	Nombre de EDS	Nº PARTICIPANTES	TIEMPO (minutos)	Persona que Dicto Charla
02-04-18	SEGURIDAD EN LA REANUDACION DE LAS ACTIVIDADES	23	20	J BELTRAN/ J ESPICHAN
03-04-18	ACTITUD SEGURA DE TRABAJO	31	10	J BELTRAN
04-04-18	IMPORTANCIA Y ELABORACION DEL AST	30	10	J BELTRAN
05-04-18	ACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDARES	34	10	J BELTRAN
06-04-18	INCIDENTES Y ACCIDENTES	41	10	J BELTRAN
07-04-18	EL TRABAJADOR DEFENSIVO	43	10	J BELTRAN
08-04-18	RIESGOS ERGONOMICO (DESCARGA DE MATERIAL)	11	10	J BELTRAN
09-04-18	PELIGROS DEL USO DEL CELULAR EN EL TRABAJO	49	60	J BELTRAN
10-04-18	PARA QUE HAYA SEGURIDAD DEBE HABER ACTITUD POSITIVA	49	20	J ESPICHAN
11-04-18	INSTINTO DE PROTECCION	49	10	J TRINIDAD
12-04-18	ALEJESE DE LAS CARGAS SUSPENDIDAS	47	10	R MORILLAS
13-04-18	PROTEJAN SUS MANOS	49	15	E CALDERON
14-04-18	EXISTE EL EXCESO DE CONFIANZA	49	15	J BELTRAN
15-04-18	-----	0	0	-----
16-04-18	MATERIALES PELIGROSOS	46	20	J BELTRAN
17-04-18	SEGURIDAD CON LAS EXTENSIONES ELECTRICAS	54	20	M HUANCA
18-04-18	INSPECCION DE HERRAMIENTAS	46	15	L RUIZ
19-04-18	SE APRENDE DE LOS ERRORES	52	20	L CASTELLANOS
20-04-18	TRABAJO EN EQUIPO	46	20	J BELTRAN
21-04-18	EL APRESURAMIENTO EN EL TRABAJO	53	20	J BELTRAN
22-04-18	IZAJE DE CARGAS	7	10	J BELTRAN
23-04-18	ACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDARES	55	45	J BELTRAN
24-04-18	ORDEN Y LIMPIEZA	54	15	J BELTRAN
25-04-18	REPORTE DE INCIDENTES	55	15	J BELTRAN
26-04-18	RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA	55	20	J BELTRAN
27-04-18	SEGURIDAD EN ESCALERAS	54	15	J BELTRAN



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ABRIL 2018

121
Johny Beltran Gordillo
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo
PSV Constructoras S.A.

	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ABRIL 2018	
		Fecha: 30-04-18

28-04-18	DIFUSION DEL ACCIDENTE OCURRIDO - USO DE LENTES	55	30	J BELTRAN
29-04-18	PELIGROS Y RIESGOS	20	18	J BELTRAN
30-04-18	1 DE MAYO DIA DEL TRABAJADOR	30	54	J BELTRAN



Reunión de Reanudación de Actividades




Entrenamiento Diario de Seguridad

8.3. Capacitaciones Específicas de Seguridad


Se programaron capacitaciones al personal, de acuerdo a las actividades ejecutadas, las mismas que se detallan a continuación:

CAPACITACIONES ESPECIFICAS EN SEGURIDAD – ABRIL 2018				
Fecha	Nombre de EDS	Nº PARTICIPANTES	TIEMPO (minutos)	Persona que Dicto Charla
16-04-18	MSDS	38	60	J BELTRAN
30-04-18	ARNES DE SEGURIDAD	54	45	J BELTRAN

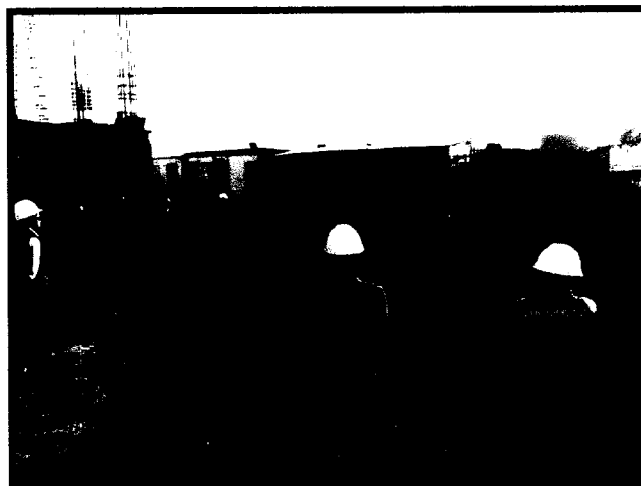


 JOHNNY BELTRAN GORDILLO
 INGENIERO EN SEGURIDAD
 RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

122


	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ABRIL 2018	
		Fecha: 30-04-18

Capacitación en Seguridad

8.4. Motivación al personal


Se realizaron reuniones de seguridad para motivar al personal en el reforzamiento en Seguridad y producción.

Se premió a los trabajadores mas seguros y productivos del mes.

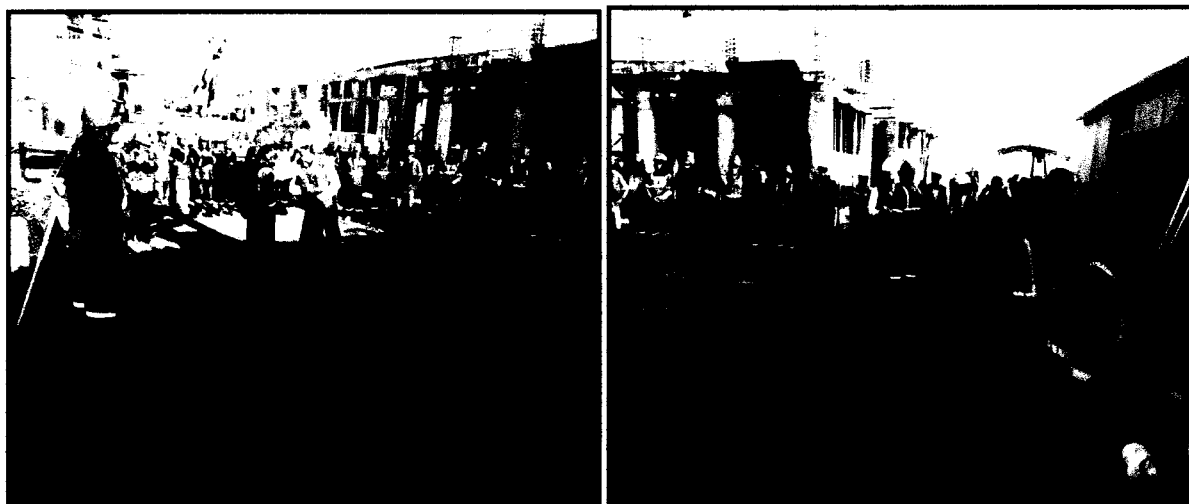

Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA


JOHNNY BELTRAN GORDILLO
 ESPANOL AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 119009

	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ABRIL 2018	
		Fecha: 30-04-18

9. REPORTE DE EVENTOS NO DESEADOS

Durante la realización de las actividades no se reportaron incidentes ni accidentes.

PIRAMIDE DE BIRD – “Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, región Ica”

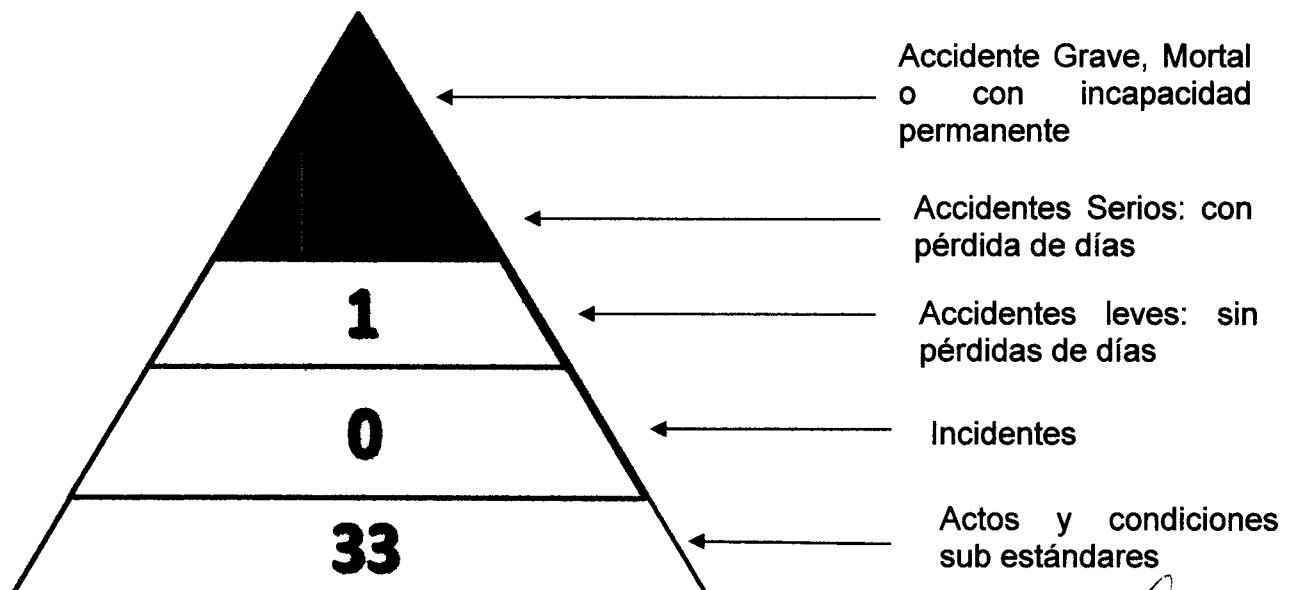


10. ESTADÍSTICA DE PREVENCIÓN

10.1. Personal del Proyecto


El personal manejado fue vital para este Proyecto, se tuvo la cantidad necesaria para la ejecución de las actividades.


En el siguiente cuadro se muestra la cantidad máxima del personal contratado para el servicio (Directos e Indirectos):

AÑO	MES	N° MÁXIMO DE TRABAJADORES MENSUAL		
		Directos	Indirectos	TOTAL
2018	ABRIL	48	09	57


Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA


Johnny Beltran Cordillo
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo


	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ABRIL 2018	
		Fecha: 30-04-18

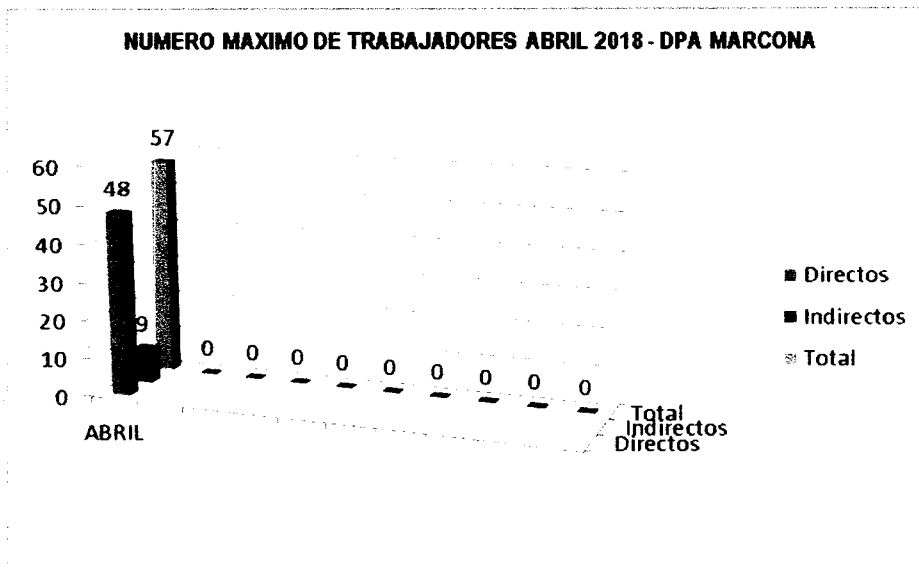



10.2. Horas Hombres Trabajadas de Exposición a riesgos

Durante el mes de Abril 2018 se emplearon las siguientes horas hombres que se muestran en el cuadro siguiente:

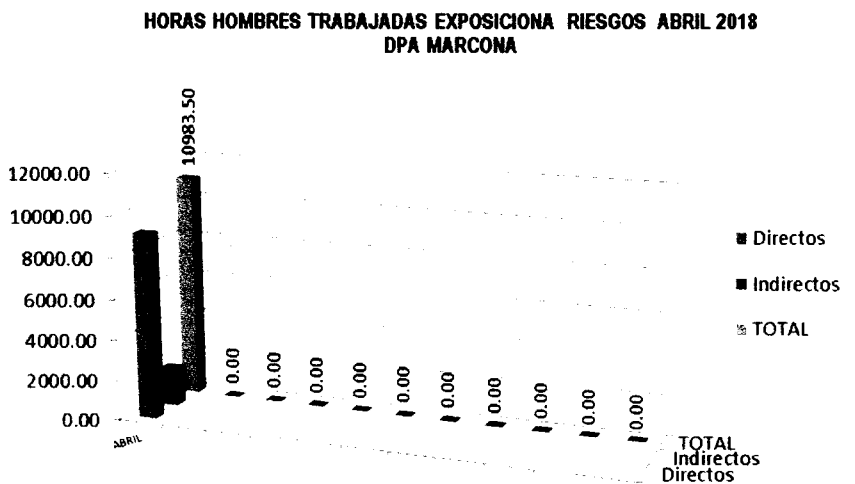
AÑO	MES	HORAS HOMBRES TRABAJADAS DE EXPOSICION AL RIESGO		
		Directos	Indirectos	TOTAL
2018	ABRIL	9123.50	1860.00	10983.50
TOTAL		9123.50	1860.00	10983.50




 ESPINOZA AVILA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 110


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

Johnny Beltran Gordillo
 Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo
 PSV Constructores S.A



	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ABRIL 2018	
		Fecha: 30-04-18


10.3. Horas Hombres de Capacitación e Índices de Capacitación


10.3.1. HH Entrenamientos Diarios de Seguridad (EDS) Y Capacitaciones Especificas

AÑO	MES	HHT MES	HHC EDS MES	HHC ESP MES	HHC TOTAL MES	IC EDS	IC TOTAL MES	IC META MES
2018	ABRIL	10983.50	402.17	78.50	480.67	3.66	4.37	2,00
TOTAL		10983.50	402.17	78.50	480.67	3.66	4.37	2,00


ÍNDICE DE CAPACITACIÓN TOTAL	4,37 %
-------------------------------------	--------

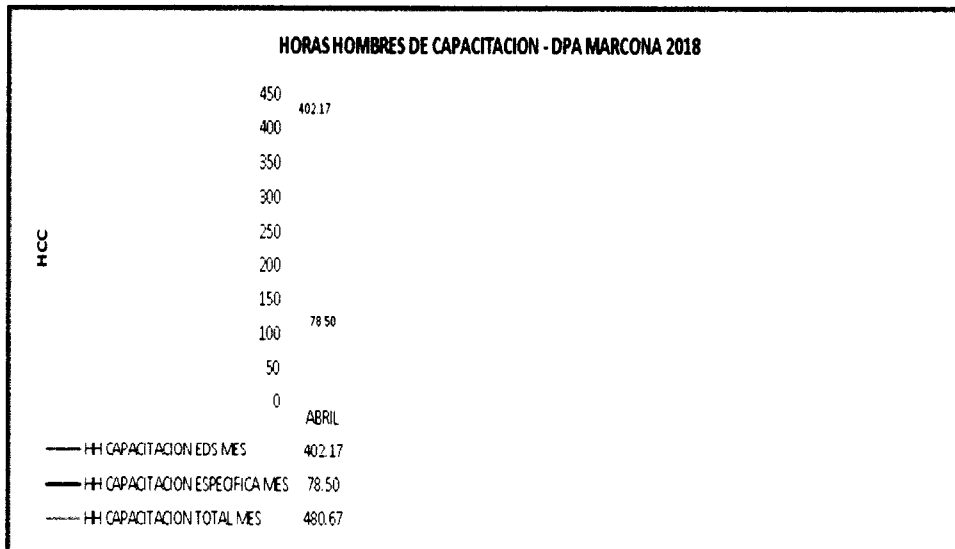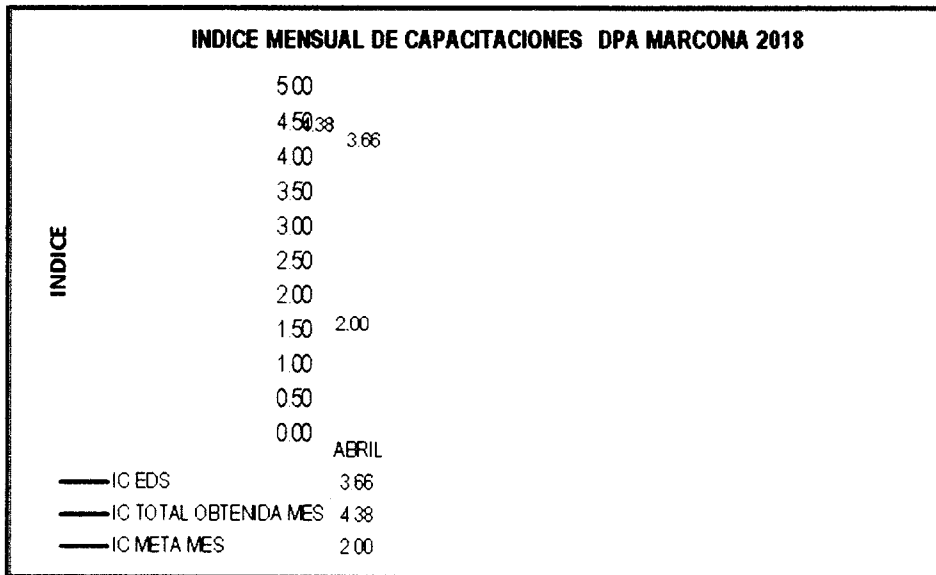


 ESTUDIO TÉCNICO
 ESTUDIOS AVIÉS
 INGENIERO CIVIL
 Matr. CIP. N° 119009


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

126
 Johnny Beltran Gordillo
 Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo
 PSV Constructores S.A.

	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	ABRIL 2018	Fecha: 30-04-18


Para obtener el índice total de capacitación se considera las horas hombres utilizadas en el EDS y de las capacitaciones específicas en seguridad impartidas los días lunes de cada semana, el cual nos dio como resultado un índice promedio durante el proyecto de **3.27 %**

10.4. Incidentes – Eventos no deseados

AÑO	MES	EVENTOS NO DESEADOS					
		Incidentes	Daños Materiales	Primeros Auxilios	Accidentes Leves	Accidentes CTP	Accidente Mortal
2018	ABRIL	0	0	0	1	0	0
TOTAL		0	0	0	1	0	0

10.5. Índice de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad


MES	N° DE ACC CTP	DIAS PERD.	HH TRAB.	HH TRAB ACUM. PROYECTO	INDICES					
					IF MES	IF PROY	IS MES	IS PROY	IA MES	IA PROY
ABRIL 2018	0	0	10983.50	22868.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	0	10983.50	22868.41	0,00	0,00		0,00		0,00

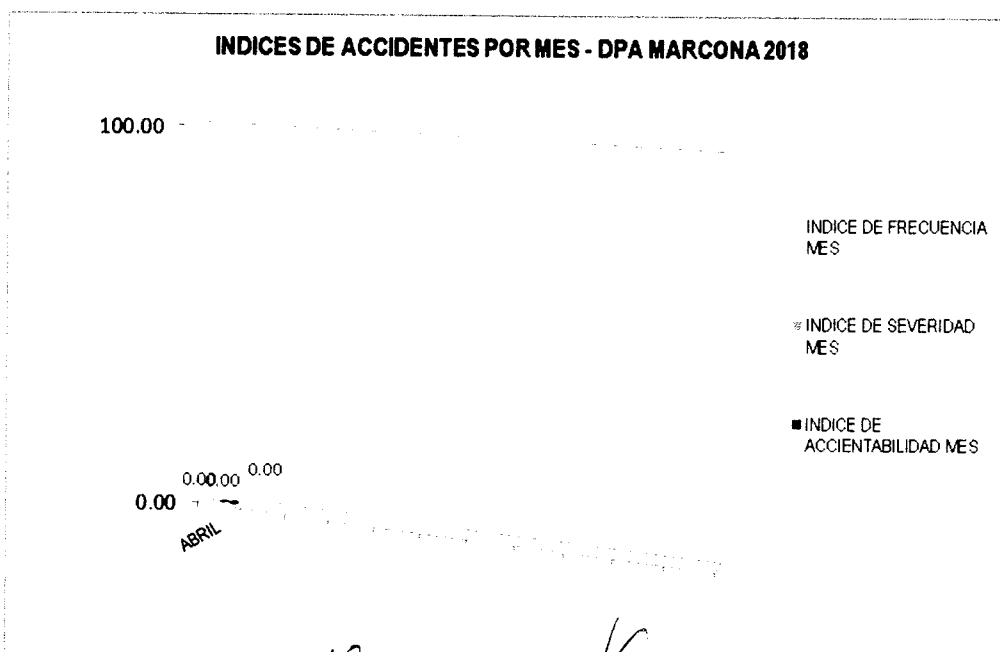



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

JULIO
ESPINAN AVILES
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 11000

127

	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ABRIL 2018	
		Fecha: 30-04-18

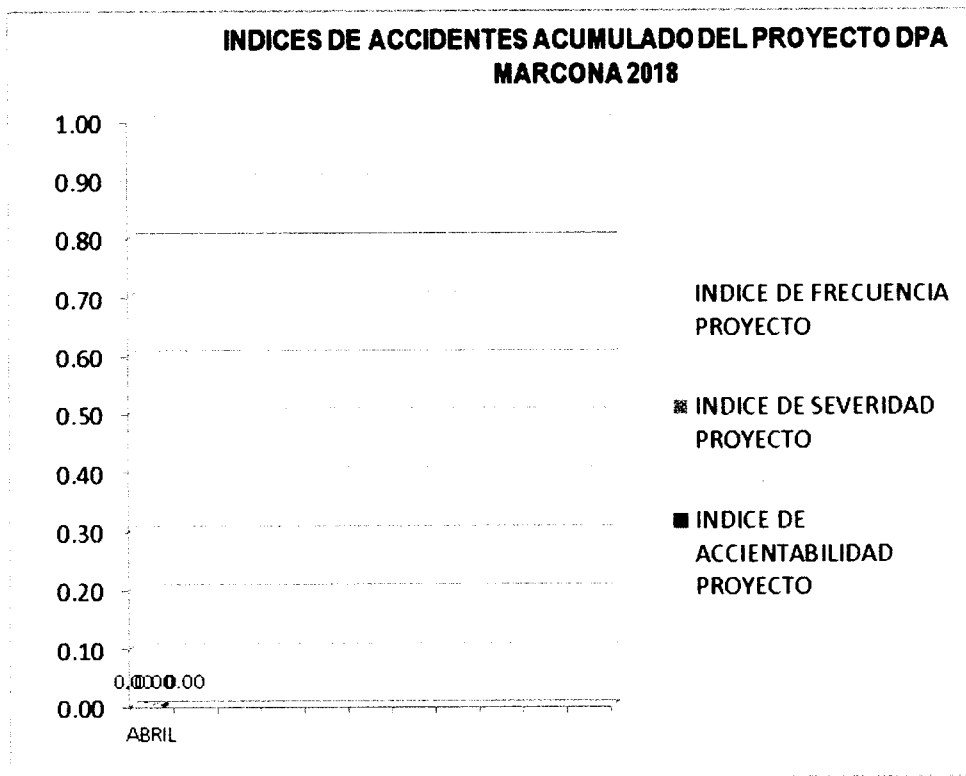


 ESPINOZA AVILA
 INGENIERO CIVIL

11. NOTIFICACIONES DE RIESGOS

Los actos sub-estándares son acciones realizadas por el trabajador o trabajadores, que generan una desviación negativa del estándar y que puede generar daños a personas, a terceros, a la propiedad, al proceso y al medio ambiente.

Durante el mes de Abril se observaron actos y condiciones sub-estándares lo cual pudo generar condiciones que contribuyen a un incidente/accidente.

Estos actos sub-estándares fueron inmediatamente corregidos, impartiendo la reinducción correspondiente al personal involucrado.

No se tuvo la necesidad de aplicar medidas, disciplinarias como: amonestaciones escritas, ya que el personal no incurrió a la reincidencia de las faltas.


12. SALUD E HIGIENE


12.1. EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL


A todo el personal designado a este Proyecto se le practicó el correspondiente examen médico verificando su APTO en el Certificado de Aptitud Médico ocupacional (CAMO), Cumpliendo así con el requisito legal de ingreso del personal a obra en actividades de Alto Riesgo..


12.2. PREVENCIÓN EN CERO ALCOHOL

Como medida preventiva de seguridad y salud durante el mes de abril se realizó la prueba de alcoholtest a todo el personal.


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA


 Johnny Beltran Gordillo
 Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo
 PSV Constructoras S.A.

	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ABRIL 2018	
		Fecha: 30-04-18

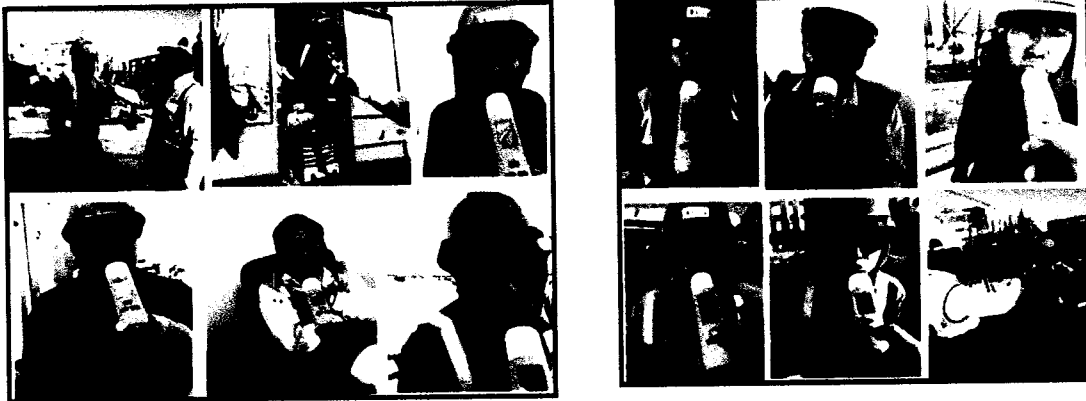

12.3. PROTECCIÓN AUDITIVA

Se habilitó a todo el personal de PSV protectores auditivos para la protección contra el ruido, a la vez se concientiza a través de charlas el uso adecuado de este EPP.

12.4. ESTACIONES DE EMERGENCIAS Y CAMILLAS DE RESCATE


En el área de trabajo se está mejorando la implementación de la estación de emergencias para poder dar respuesta ante una posible emergencia que pueda presentarse durante la ejecución de las actividades.




Handwritten signature:
 JOHNNY JULIO
 RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 PSV CONSTRUCTORES S.A.


12.5. HABILITACION DE MODULOS DE AGUA PARA CONSUMO Y PARA LAVADO DE MANOS


Para la prevención de la deshidratación y golpe de calor se habilitó en obra 02 módulos con cajas de agua para beber, así el personal podrá beber agua durante la realización de las actividades que realizan.

	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ABRIL 2018	
		Fecha: 30-04-18




Además considerando la higiene del personal, se habilitó un módulo con agua para lavado de manos, así el personal podrá ingerir sus alimentos con la salubridad correspondiente.

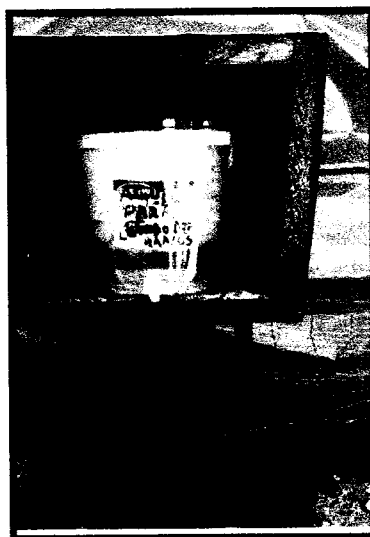




 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

12.6. HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS

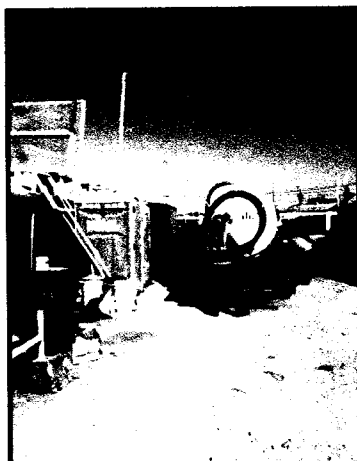PSV Constructores S.A. en este mes de abril cuenta con el servicio de DISAL habilitando baños portátiles en obra considerando a los cuales se les realiza el mantenimiento adecuado de 03 veces por semana.




 JOHNNY BELTRAN GORDILLO
 RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 PSV CONSTRUCTORES S.A.

	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ABRIL 2018	
		Fecha: 30-04-18

13. GESTION AMBIENTAL EN OBRA

La gestión Ambiental realizada en obra durante este mes de Abril se refleja en segregación de residuos, Habilitación del kit Para derrame, instalación de bandejas Antiderrame, Instalación del punto limpio para clasificación de residuos.

13.1. Gestión de Residuos Sólidos en Obra

Las actividades de instalación de facilidades, demolición, retiro de defensas del muelle, generaron diferentes tipos de residuos como inorgánicos, orgánicos, botellas de plástico y residuos no reaprovechables.

Estos residuos generados, segregados son almacenados temporalmente por **PSV CONSTRUCTORES S.A.**

Los escombros de la demolición fueron retirados en volquetes hacia un botadero autorizado por la Municipalidad de San Juan de Marcona.


Generación de Residuos Sólidos ABRIL 2018

TIPO DE RESIDUO	COLOR DE CONTENEDOR	CANTIDAD GENERADA Aproximada Kg	INSPECCION DE CONTENEDOR	FECHA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	ESTADO
PLASTICOS		11	Bueno	Diario	Evacuado
PAPEL, CARTON		11	Bueno	Diario	Evacuado
ORGANICOS		6	Bueno	Diario	Evacuado
VIDRIOS		0	Por Instalar	Mensual	-
METALICOS		350	Por Instalar	Mensual	Evacuado
GENERALES		30	Bueno	Diario	Evacuado
PELIGROSOS		0	Por Instalar	MENSUAL	-



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

131
Johnny Belson Gardillo
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo
PSV Constructores S.A.

	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ABRIL 2018	
		Fecha: 30-04-18

13.2. Habilitación del Kit para derrames

Como medida de respuesta inmediata frente a un evento de derrame de Hidrocarburos otro material peligroso o contaminante usado en obra y muelle se habilitó un Kit para derrame en obra.

Se cuenta en obra con una grúa la cual cuenta con su propio kit para derrames.



13.3. Instalación de Bandejas Antiderrames

Como medida de prevención a la contaminación ambiental todos los equipos (Motosoldadora) y Maquinarias (Grúa) así como el almacenamiento temporal de combustible cuentan con bandeja antiderrames.


13.4. Mantenimiento de Equipos

Como medida de prevención ambiental se realizó en campo el mantenimiento de la Grúa Fuchs designada a este proyecto, garantizando así el buen estado del equipo y la prevención la contaminación de aire, suelo y agua que interactúan en el desarrollo de las actividades del Mejoramiento de los Servicios Básicos del Desembarcadero Pesquero Artesanal San Juan de Marcona.

13.5. Medidas de Concientización Ambiental

Como medida de concientización ambiental durante este mes de Abril se realizaron:


- Instalación de letreros ambientales dentro de obra
- Instalación de letrero Ambiental Para la población
- Entrenamiento de concientización



Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA


*JOSÉ ANTONIO
 FERRER...*

132


	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ABRIL 2018	
		Fecha: 30-04-18





.....
Johnny Beltran Cardillo
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo
PST Constructores S.A


Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

**ANEXO N° 07:
INFORME DE ESPECIALIDAD
DE INSTALACIONES
ELECTRICAS**


 **Luis Alberto Avila Morales**
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS


 **INGENIERO CIVIL**
CIP. N° 119009

INFORME MENSUAL DE OBRA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA

ASUNTO: INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.

ESPECIALIDAD: INSTALACIONES ELECTRICAS

ESPECIALISTA: INGENIERO ABEL QUISPE PEREZ _ CIP 112864

FECHA: 30 de Abril del 2018


El presente informe tiene como objetivo dar a conocer la situación actual del proyecto en la especialidad de instalaciones eléctricas, teniendo en consideración las diversas coordinaciones con el Ingeniero Residente, el Ingeniero Supervisor y el Personal Técnico durante la visita de campo, Además de las reuniones convocadas en oficinas de FONDEPES, las mismas que se detallan continuación:


SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION


1. Respecto al Proyecto del Sistema de Utilización en Media Tensión, el 23-01-2018, FONDEPES responde nuestro RFI N° 04 con CARTA N° 00095-2018-FONDEPES/DIGENIPAA, donde menciona que la DIGENIPAA indica que se está reformulando el expediente de Media Tensión y que se entregará el respectivo expediente con la aprobación del concesionario.
2. En reunión del día 16-04-2018 en oficina de FONDEPES, se hizo la consulta a la entidad y nos informan que el expediente ya ha sido aprobado por el concesionario (Municipalidad) y que nos estarán haciendo la entrega formal a la brevedad.
3. Hasta la fecha no se puede iniciar los trabajos sobre el Sistema de Utilización en Media Tensión, ya que no existe respuesta formal por parte de la Entidad.

PROYECTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN BAJA TENSION


1. Con fecha 12-02-2018 se generó el RFI 10 sobre el expediente técnico de IIEE Baja tensión, mencionándose los puntos más críticos en referencia a las observaciones indicadas en el RFI N°05, las cuales implicarían cambios considerables en el expediente técnico de IIEE Baja tensión.
2. El Informe N° 012-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/RGYC de fecha 25 de Marzo del 2018, respecto a las consultas indicadas en el RFI-10, recomienda dar mejoras al expediente técnico y replantear conforme a las recomendaciones del especialista de PSV en la mayoría de sus puntos.
3. Así mismo, en reunión del día 16 de Abril 2018, en oficina de FONDEPES, se acordó que el expediente técnico de IIEE Baja tensión será replanteado conforme a los puntos indicados en dicha reunión y las consideraciones planteadas en otros DPAs. (entregadas vía correo al especialista de FONDEPES), tampoco se contó con la presencia de la supervisión en esta reunión.


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS


 Abel Hernan Quispe Perez
 INGENIERO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 112864

135

 ABEL HERNAN
 QUISPE PEREZ
 INGENIERO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 112864

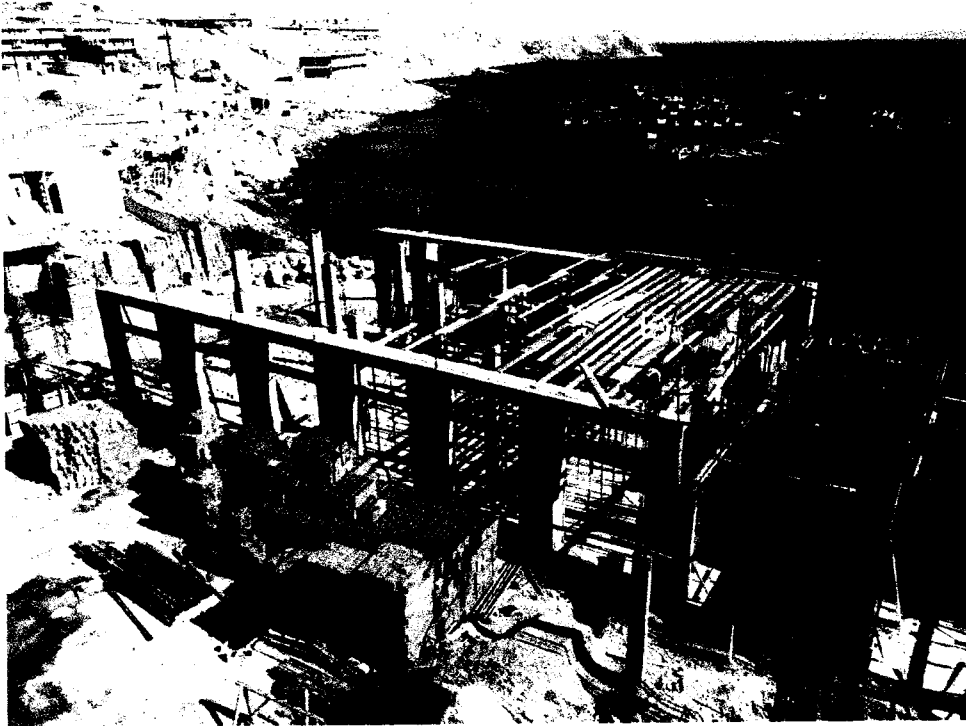4. Conforme a los puntos 1, 2 y 3 y teniendo programado el vaciado de la losa de tareas previas y cuarto de bombas, se solicita mediante cuaderno de Obra que la supervisión coordine con la Entidad FONDEPES para que indique fecha de entrega de estas mejoras y replanteos del expediente técnico o caso contrario confirme continuar con los planos contractuales, indicando que de continuar con los planos contractuales, la ejecución de futuros planos replanteados conllevará a diversas demoliciones.



INGENIERO
ESPECIALIZADO EN
INGENIERIA CIVIL
Reg. CIP. N° 112864

TECHO DE TAREAS PREVIAS CON IIEE CONTRACTUALES


5. En reunión del día 30-04-2018 en oficina de FONDEPES, se continuaron con las coordinaciones con el Ingeniero Ruben Yacolca de FONDEPES, sobre la actualización del expediente técnico de IIEE Baja tensión.
6. Conforme a lo acordado en la reunión del día 30-04-2018 en oficina de FONDEPES, se enviarán RFIs sobre planteamientos de nuevo ambiente para grupo electrógeno y la construcción de un sardinel en muelle para embeber las tuberías eléctricas.



INGENIERO
ESPECIALIZADO EN
INGENIERIA CIVIL
Reg. CIP. N° 84746

PLANTEAMIENTO DE AMBIENTE PARA GRUPO ELECTROGENO

INGENIERO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 112864

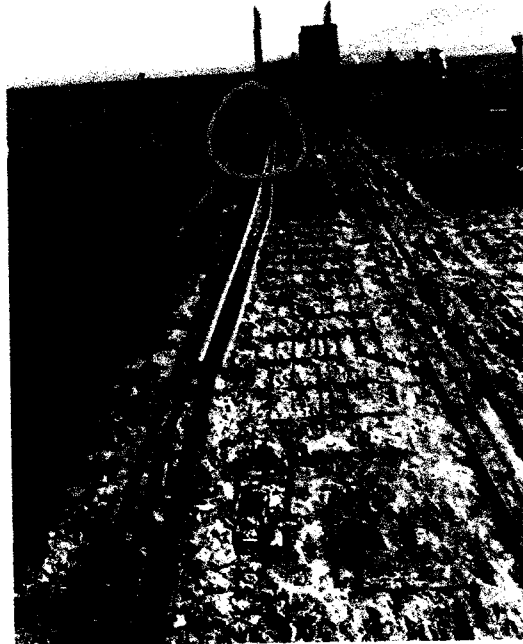

[Handwritten signature]
 INGENIERO EN ELECTRICIDAD
 REG. CIP. N° 112864

PLANTEAMIENTO DE SARDINEL PARA TUBERIAS

7. El ingeniero Ruben Yacolca de FONDEPES, estará enviando el replanteo de las IIEE en el muelle para que se considere antes del vaciado de piso.

PLANOS DE ARQUITECTURA Y SEGURIDAD

1. En reunión del día 30-04-2018 en oficina de FONDEPES, se reiteró la entrega de planos de seguridad y evacuación, necesarios para compatibilizar con la actualización del expediente técnico de IIEE Baja tensión, los mismos que servirán para el replanteo de las salidas de alarmas contra incendio y luces de emergencia, aun no se cuenta con fecha de entrega.
2. En reunión del día 30-04-2018 en oficina de FONDEPES, se reiteró a los especialistas de Arquitectura de FONDEPES actualizar la Arquitectura del DPA, considerando los planos de evacuación y seguridad, detalles solicitados por nuestro especialista de frío (CATRI), ubicación de cisterna, retiro de escalera en zona de frío, entre otros, hasta la fecha no se tiene respuesta.
3. En reunión del día 30-04-2018 en oficina de FONDEPES, se informó sobre el retiro de la cobertura existente en el muelle, solicitándonos se regularice mediante un RFI. Al respecto se coordinó con Ingeniero Ruben Yacolca de FONDEPES, quien analizará las respectivas modificaciones de las instalaciones eléctricas involucradas para la actualización del expediente técnico de IIEE Baja tensión.

[Handwritten signature]
 Lts Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OERA

[Handwritten signature]
 ABEL HERNAN
 QUISPE PEREZ
 INGENIERO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 112864



RETIRO DE COBERTURA EXISTENTE

SEGURIDAD EN EL TRABAJO


1. Se Informó al técnico electricista sobre las correcciones que debe hacer a las instalaciones eléctricas de la obra, tales como Tablero eléctrico de obra y las extensiones, las mismas que no cumplen las normas y el reglamento de seguridad.
2. Se informó al técnico electricista que no existe la línea a tierra y el Pozo a tierra, dándole las respectivas indicaciones para su respectiva construcción.
3. Las extensiones eléctricas deben contar con su respectivo interruptor diferencial y deben ser como mínimo Cable vulcanizado de 4x12 AWG.
4. La entidad tiene programado una visita del especialista de instalaciones eléctricas de FONDEPES y se inspeccionará lo mencionado en los puntos 1, 2 y 3.


Es todo cuanto tengo que informar sobre las coordinaciones y situación actual del DPA Marcona.



 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA



 ABEL HERNAN
 QUISPE PEREZ
 INGENIERO ELECTRICISTA
 Reg. CIP. N° 112864



 JOHNNY QUISPE
 COORDINADOR GENERAL
 SUPERVISOR DE OBRA



JOSÉ MARÍA
ESPINOZA
SUPERVISOR DE OBRAS

**ANEXO N° 08:
INFORME DE ESPECIALIDAD
DE INSTALACIONES
SANITARIAS**



 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. SANITARIA JUANA LILIANA GUILLEN ESPINOZA

CIP No 84824

INFORME N° 021-2018-JLGE

A: INGENIERO JORGE ESPICHAN
RESIDENTE DE OBRA - DPA MARCONA


ASUNTO: INFORME MENSUAL

FECHA: MARCONA, 30 de Abril de 2018


Tengo a bien dirigirme a Ud. Respeto a lo siguiente:


- 1.- en cuanto a la Vista técnica, se ha verificado el déficit de abastecimiento de agua potable: Cobertura baja, tiene 1 hora al día por zonas, cuando hay desabastecimiento compran a un camión cisterna de agua. Debido a ello con la finalidad de previsión se está viendo la necesidad de considerar una PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POR OSMOSIS INVERSA.
- 2.- Se ha enviado un correo al Ing. Omar Valdez proveedor de CATRI PERU sobre la solicitud de los puntos de drenaje en el la cámara de frio y el tanque salmuera con la finalidad realizar el planteamiento de trazar la red de drenaje en esa zona, ya que en el plano contractual no está definido el trazo del área de Frio.
- 3.-se ha enviado con Informe N° 20-2018-JLGE de 30 de abril, la observación sobre unos puntos de cambio de nivel, del cual no indican las cotas de entrada ni salidas en la tubería debiendo estar contempladas por ser necesario para verificar el drenaje. Se propone generar RFI.
4. En cuanto a los RFI generados en obra se solicita apoyo para hacer el seguimiento.


Atentamente,



JUANA LILIANA GUILLEN ESPINOZA
INGENIERA SANITARIA
CIP N° 84824




 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA





JORGE JULIO
ESPICHAN AVILA
INGENIERO CIVIL
Reg. D.P. N° 15000

140

**ANEXO N° 09:
INFORME DE ESPECIALIDAD
DE ESTRUCTURA**


 **Luis Alberto Avila Morales**
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA





INFORME TECNICO ESTRUCTURAL

PROYECTO DE OBRAS DE
RECONSTRUCCION DE LA
DESEMBARCADERO PESQUERO

MANUEL FRANCISCO
TENORIO CALDERON
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 98615

DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN
JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA,
REGION ICA


Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS


MANUEL FRANCISCO
TENORIO CALDERON
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 98615

Contenido

ANTECEDENTES	1
MEMORIA DESCRIPTIVA	2
ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA	7
OBJETIVO	10
ADMINISTRACIÓN	11
TAREAS PREVIAS	12
ZONA FRIO PARA EQUIPO FUTURO	¡Error! Marcador no definido.
ZONA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	13
ZONA DE MANIOBRAS	¡Error! Marcador no definido.
OBRAS COMPLEMENTARIAS	¡Error! Marcador no definido.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	17




Luis Alberto Avila Mendez

 Luis Alberto Avila Mendez

 CIP. N° 84746

 SUPERVISOR DE OBRAS



 JORGE QUIRO

 ESPALDAN AVILES

 INGENIERO CIVIL

 Reg. CIP N° 118000



 MANUEL FRANCISCO

 TENORIO CALDERON

 INGENIERO CIVIL

 Reg. CIP N° 98615






ANTECEDENTES

INTRODUCCIÓN

El Desembarcadero de Marcona, es una de las obras que el Gobierno Regional ha priorizado considerando los beneficios que significará para la provincia de Nasca y toda la región Ica, por ello, el viernes 29 de septiembre del 2017 en la provincia de Marcona, se firmó el acta de entrega del terreno para la ejecución de la obra, con la participación de los representantes de FONDEPES, la empresa contratista de Supervisión de obra y el Consorcio Mesones Muro, iniciándose su ejecución desde el día 30 de septiembre del 2017. El plazo de ejecución de la obra será de ocho meses, y beneficiará a más de 2000 pescadores artesanales del Puerto San Juan de Marcona. El desembarcadero tendrá modernas características y contará con todos los requisitos para su aprobación ante la comunidad sanitaria y poder salir al mercado nacional e internacional sin ningún problema.

El presente informe tiene como finalidad reflejar los resultados de la supervisión por parte de PSV Constructores S.A. dentro de la disciplina "Ingeniería Estructural" desarrollado durante la construcción "Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal, ubicada en la localidad de san juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, región Ica.



Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS


MANUEL FRANCISCO TENORIO CALDERON
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 98615


MANUEL FRANCISCO TENORIO CALDERON
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 98615



MEMORIA DESCRIPTIVA


OBJETIVO


El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones en la prestación de servicio del Desembarcadero Pesquero Artesanal San Juan de Marcona, a través del mejoramiento de su infraestructura de mar y tierra adecuada a la Norma Sanitaria 040, así como la implementación necesaria de equipos y el desarrollo de talleres de capacitación con la finalidad de satisfacer la demanda actual.


UBICACION

El distrito de San Juan de Marcona se encuentra ubicado en la costa sur del Perú a 530 kilómetros al sur de la ciudad de Lima, bajo las coordenadas 15° 21' 42.05" S, 75° 9' 59.84" W, a una altitud de 27 m.s.n.m.m. y 2009 km² de superficie. Pertenece a la provincia de Nazca, departamento de Ica, Región Ica. Limita por el norte con la provincia de Nazca; por el sur con la provincia de Caravelí (Arequipa); por el este con la provincia de Lucanas (Ayacucho) y por el oeste con el Océano Pacífico.

MANUEL FRANCISCO
TENORIO CALDERÓN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 98615


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS


 MANUEL FRANCISCO
 TENORIO CALDERÓN
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 98615

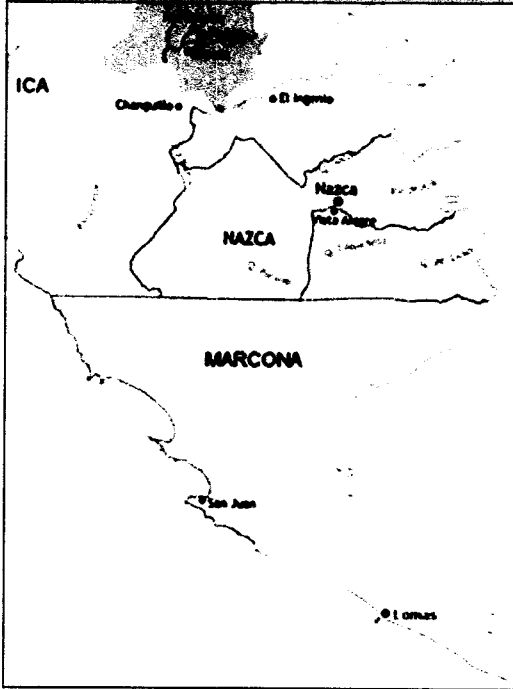

Ubicación Distrito de Marcona


Delimitación del Área:

POR EL FRENTE: (Lado Este) Con Carretera Asfaltada

POR LA DERECHA: (Lado Norte) Con el Océano Pacífico.

POR LA IZQUIERDA: (Lado Sur) Con Acanalado Botadero

POR EL FONDO: (Lado Oeste) Con el Océano Pacífico.

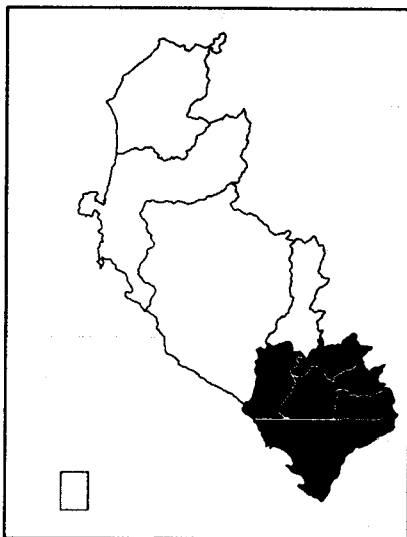

Luis Alberto Avila Morales
Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

JOSE JULIO ESTEBAN AVILES
JOSE JULIO ESTEBAN AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 11113

UBICACIÓN PROVINCIA DE NAZCA

Manuel Francisco Tenorio Calderon
MANUEL FRANCISCO TENORIO CALDERON
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 98615



UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL DESEMBARCADERO DE SAN JUAN DE MARCONA

GEOGRAFÍA

Se caracteriza principalmente por sus accidentes costeros comprendidas en sus amplias bahías, puntas y acantilados a largo de su litoral, dando forma a múltiples paisajes marinos y a una gran variedad de playas.



Luis Alberto Avila Morales
Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

Manuel Francisco Tenorio Calderon
MANUEL FRANCISCO
TENORIO CALDERON
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 98615

Manuel Francisco Tenorio Calderon
MANUEL FRANCISCO
TENORIO CALDERON
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 98615




Por otro lado, tenemos el desierto propio de la costa peruana con grandes pampas y cerros (el Huricangana con 1790 m. es el cerro más alto del litoral peruano) ricos en minerales metálicos y no metálicos, base de la economía del distrito.


CLIMA Y RELIEVE


El clima es cálido árido, con escasas precipitaciones. La temperatura máxima supera los 30 °C (Enero-Marzo) y la mínima de 16 °C en el mes de agosto. La temperatura promedio anual es de 18 °C a 23 °C. Durante cada cambio de estación se producen los fuertes vientos de arena y tierra llamados paracas. El relieve de Marcona se caracteriza por el desierto típico de la costa central y sur del Perú, hallándose mesetas, pampas y altos cerros; ricos en minerales como el hierro y cobre. Marcona tiene una gran riqueza marina a lo largo de su litoral; con amplias bahías, ensenadas y puntas, que dan forma a una gran variedad de playas.

HIDROGRAFÍA

El río Santa Lucía (En la quebrada de Jahuay) provee - a través de pozos- de agua potable a toda la ciudad de Marcona, el cual tiene sus orígenes en el distrito ayacuchano de Santa Lucía (Provincia de Lucanas) y discurre entre los límites de los departamentos de Ica y Arequipa hasta su desembocadura cerca del distrito de Lomas (Caravelí).


 Luis Alberto Avila Moral
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS


 Manuel Francisco Tenorio Calderón
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 98615


 MANUEL FRANCISCO
 TENORIO CALDERÓN
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 98615




VIAS DE ACCESO

Marcona cuenta con los puertos marítimos de San Juan y San Nicolás, un aeropuerto a tres kilómetros de la ciudad, acceso a la carretera Interoceánica (ruta del Sol ó 026) y la Panamericana Sur (Km. 483). Además de carretera afirmada a las diferentes playas de la localidad. Servicio interprovincial de buses y colectivos a las ciudades de Lima, Ica, Nazca y Arequipa.

Desde Lima hasta Marcona el viaje en bus dura aproximadamente 8 horas, tomar los buses que salen directo de noche (agencia de transportes Tepsa, Civa, América del Sur), otra opción es ir por la mañana hasta la ciudad de Ica, y luego tomar los buses que salen rumbo a Nazca (Soyuz, Flores, Cueva), el viaje dura 2 horas, finalmente en Nazca tomar las combis y colectivos que salen a cada hora hacia Marcona, los cuales le dejan en el mismo centro de la ciudad; el tiempo de viaje es de 1 hora.

NORMAS

Para el control estructural se considerara como base el artículo 25 del D.S.040-2001-PE "Normas Sanitarias para las actividades Pesqueras y Acuícolas" y la norma del Reglamento Nacional de Edificaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.




Luis Alberto Avila Morales

 Luis Alberto Avila Morales


 CIP. N° 84746

 SUPERVISOR DE OBRAS



 Manuel Francisco Tenorio Calderon

 CIP. N° 98615



 149

 MANUEL FRANCISCO

 TENORIO CALDERON

 INGENIERO CIVIL

 Reg. CIP N° 98615



ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA

CRITERIO DE ESTRUCTURACIÓN ARQUITECTÓNICA

La concepción del diseño del desembarcadero pesquero artesanal de marcona, está orientada hacia el Ordenamiento de las instalaciones en función al análisis de los procesos de "Desembarque" y "Manipuleo y Procesamiento" Artesanal y/o Semi-artesanal de recursos hidrobiológicos.

9.2 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCTO

El Flujo del Proceso del Producto en el DPA considera las variables que garantice la productividad económica de la actividad pesquera artesanal, dentro de la normatividad sanitaria establecida por el D.S. 040-2001-PE, involucrando a los actuales agentes que sustentan esta actividad económica, agentes ubicados geográficamente en la zona.

Teniendo en cuenta las actividades derivadas del proceso pesquero artesanal se puede agrupar en:

I.- Embarque y Desembarque: Que comprende:

- Embarque y desembarque en muelle artesanal de 113.56 ml de longitud.
- Traslado a muelle marginal de hielo para la conservación de los productos hidrobiológicos.
- Estibado de cajas en parihuelas con protección solar.





INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO DE LA
 LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE SETECIMA
 REGION ICA.


- Traslado a zona de Desembarque.
- Entrega de Cajas con Producto al Área de Procesamiento Primario.

II.- Manipuleo y Procesamiento de los recursos hidrobiológicos: Que comprende:

- Pesado de cajas con productos hidrobiológicos.
- Traslado a la sala de tareas previas.
- Descarga en la sala de tareas previas sobre mesas de lavado.
- Traslado de cajas a zona de lavado y almacenado
- Lavado de la producción hidrobiología con agua de mar.
- Eviscerado, limpieza y selección de los productos hidrobiológicos.
- Abastecimiento de hielo
- Estibados en cajas, embolsado, pesado y enfriado con hielo.
- Embarque en Camiones isotérmicos y/o almacenado en cámaras frigoríficas.
- Almacenamiento temporal de residuos orgánicos y embarque en vehículos.
- Limpieza y lavado de mesas de trabajo.
- Limpieza y lavado de la sala de procesos.



 LUIS ALBERTO AVILA MORALES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009


 MANUEL FRANCISCO
 TENORIO SALDERON
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 98615


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA



Flujograma de Procesos por Servicio

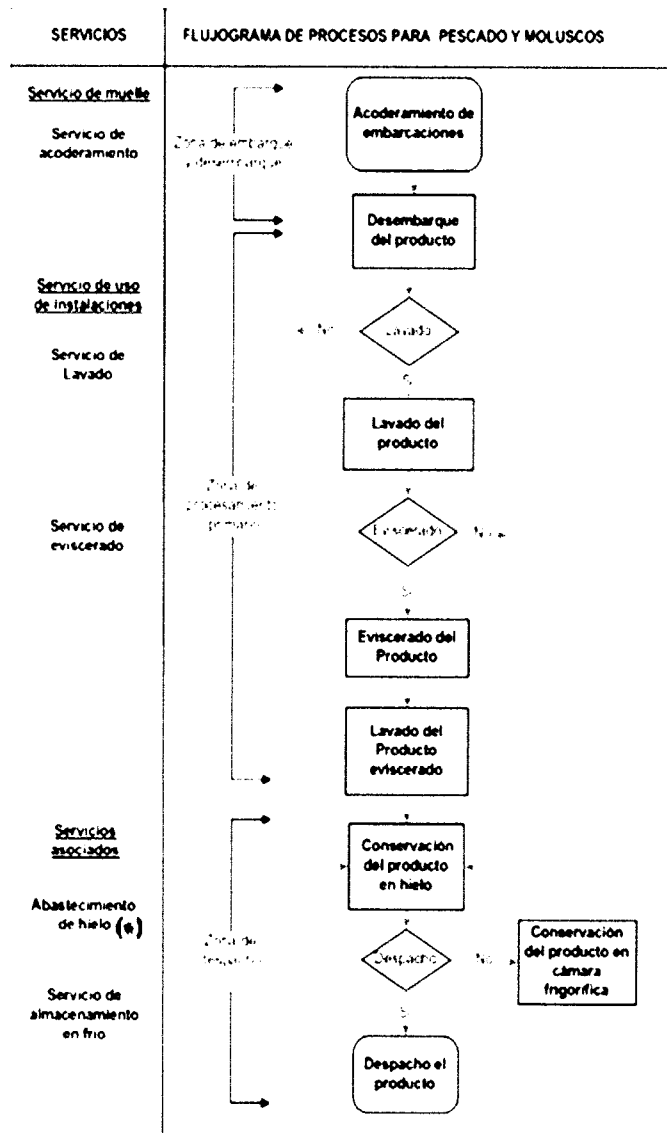

[Signature]
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009


[Signature]
 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

[Signature]
 MANUEL FRANCISCO
 TENORIO CALDERON
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 98615




OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo describir el estado general de las estructuras de las edificaciones y/o estructuras que integran el Nuevo DPA de Marcona, durante la construcción de los mismos.


MANUEL FRANCISCO
TENORIO CALDERON
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 98615


 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS


MANUEL FRANCISCO
TENORIO CALDERON
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 98615 **153**




ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN

La construcción está en proceso de elaboración, a la fecha se tiene la construcción de la cimentación, sobre-cimiento, columnas y muros de paredes, del primer piso

La construcción del edificio se viene desarrollando siguiendo lo siguiente:

- 1.- Parámetros indicados en las especificaciones técnicas.
- 2.- Dimensiones especificadas en los planos de ingeniería.
- 3.- Ubicación geográfica de los límites de la edificación, en base a las COORDENADAS – PUNTOS DE CONTROL AJUSTADOS aprobadas por el supervisor de obra en cuaderno de obra, hoja Nro. 022, de fecha 06/Nov/2017, asiento Nro. 050.

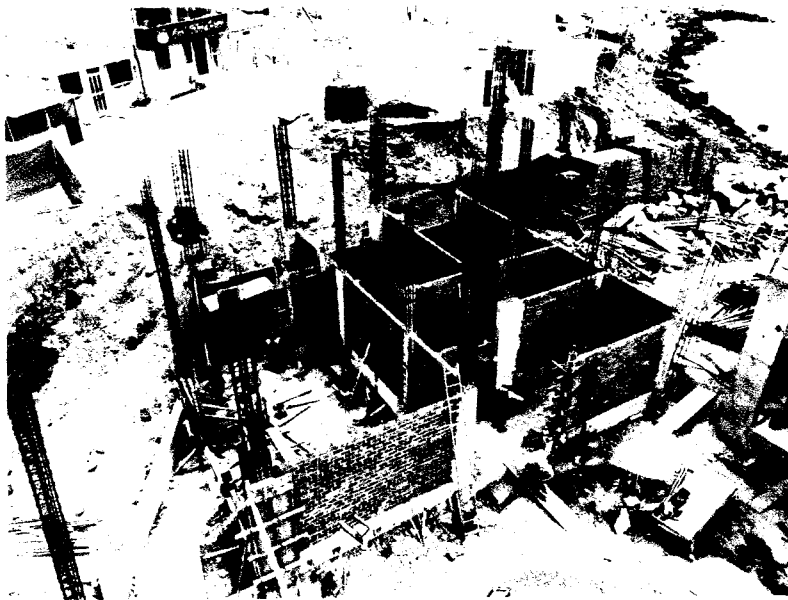

JOSE JULIO
ESPINOZA AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

MANUEL FRANCISCO
TENORIO SALDERON
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 98615




TAREAS PREVIAS.

DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN

La construcción del edificio siguió lo siguiente:

- 1.- Parámetros indicados en las especificaciones técnicas.
- 2.- Dimensiones especificadas en los planos de ingeniería.
- 3.- Ubicación geográfica de los límites de la edificación, en base a las COORDENADAS – PUNTOS DE CONTROL AJUSTADOS aprobadas por el supervisor de obra en cuaderno de obra, hoja Nro. 022, de fecha 06/Nov/2017, asiento Nro. 050.




 MANUEL FRANCISCO
 TENORIO CALDERON
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 98615


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS



ZONA DE SERVICIO, CISTERNA Y TANQUE ELEVADO.

DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN

La construcción del edificio siguió lo siguiente:

- 1.- Parámetros indicados en las especificaciones técnicas.
- 2.- Dimensiones especificadas en los planos de ingeniería.
- 3.- Ubicación geográfica de los límites de la edificación, en base a las COORDENADAS – PUNTOS DE CONTROL AJUSTADOS aprobadas por el supervisor de obra en cuaderno de obra, hoja Nro. 022, de fecha 06/Nov/2017, asiento Nro. 050.



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

MANUEL FRANCISCO
TENORIO CALDERON
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

MANUEL FRANCISCO
TENORIO CALDERON
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 98615




LOSA DEL DESEMBARCADERO

DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN

El mantenimiento de la losa del desembarcadero, se viene desarrollando siguiendo lo siguiente:

- 1.- Parámetros indicados en las especificaciones técnicas.
- 2.- Dimensiones especificadas en los planos de ingeniería y RFIs presentados a Supervisión.
- 3.- Ubicación geográfica de los límites de la edificación, en base a las COORDENADAS – PUNTOS DE CONTROL AJUSTADOS aprobadas por el supervisor de obra en cuaderno de obra, hoja Nro. 022, de fecha 06/Nov/2017, asiento Nro. 050.
- 4.- Se eliminó acero altamente corroído y reemplazo por acero corrugado nuevo, finalizándose con la aplicación del formador de óxido.

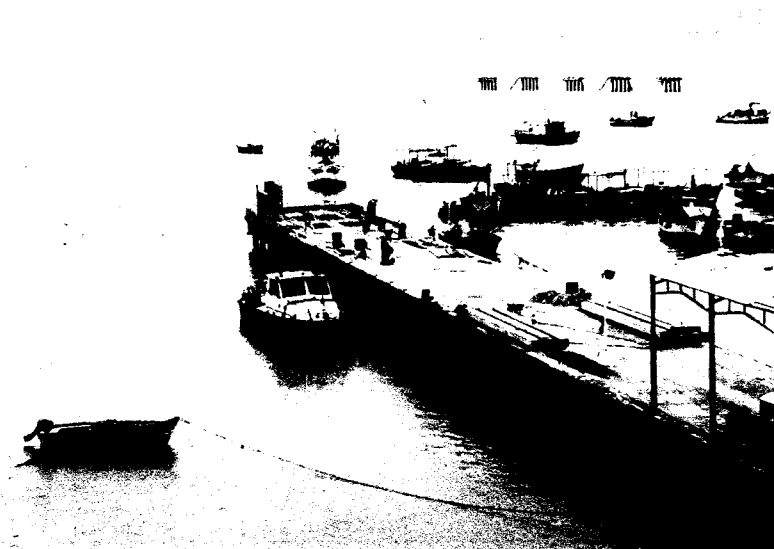

MANUEL FRANCISCO
TENORIO CALDERÓN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009



Luis Alberto Avila Mendez
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

MANUEL FRANCISCO
TENORIO CALDERÓN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 98615

157





PLATAFORMA BAJA – MARGEN IZQUIERDA

DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN


La construcción se está planificando desarrollarlo, siguiendo lo siguiente:


- 1.- Parámetros indicados en las especificaciones técnicas.
- 2.- Dimensiones especificadas en los planos de ingeniería.
- 3.- Ubicación geográfica de los límites de la edificación, en base a las COORDENADAS – PUNTOS DE CONTROL AJUSTADOS aprobadas por el supervisor de obra en cuaderno de obra, hoja Nro. 022, de fecha 06/Nov/2017, asiento Nro. 050.
- 4.- La reubicación del eje Nro III de la plataforma baja margen izquierda.
- 5.- Reubicación de cobertura.

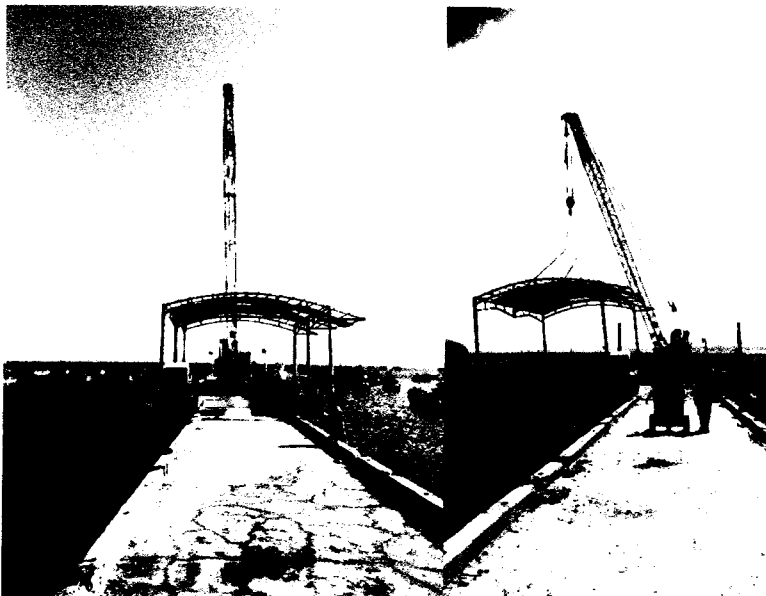


 JOSÉ JULIO
 CÁRDENAS AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 REG. Nº 119009




 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. Nº 84746
 SUPERVISOR DE OBRA


 MANUEL FRANCISCO
 TENORIO CALDERON
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP Nº 98615



ENROCADO


DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN


La construcción del enrocado, se viene desarrollando siguiendo lo siguiente:

- 1.- Parámetros indicados en las especificaciones técnicas.
- 2.- Dimensiones especificadas en los planos de ingeniería.
- 3.- Ubicación geográfica de los límites de la edificación, en base a las COORDENADAS – PUNTOS DE CONTROL AJUSTADOS aprobadas por el supervisor de obra en cuaderno de obra, hoja Nro. 022, de fecha 06/Nov/2017, asiento Nro. 050.



MANUEL FRANCISCO
TENORIO CALDERON
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 98615


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA


 MANUEL FRANCISCO
 TENORIO CALDERON
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 98615



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.



Las edificaciones cumplen con los requisitos de seguridad y servicio que marca lo señalado en las especificaciones del proyecto. Por lo que el suscrito Especialista en Ingeniería Estructural concluye que los edificios son seguros, por tanto, "se pueden seguir desarrollando las actividades de construcción según lo solicita el diseño".



[Handwritten signature]
JOSÉ ALBERTO AVILA MORALES
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 110000

[Handwritten signature]
José Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

[Handwritten signature]
MANUEL FRANCISCO
TENORIO CALDERON
INGENIERO CIVIL
Rég. CIP N° 91615
100

**ANEXO N° 10:
CARTA FIANZA DE FIEL
CUMPLIMIENTO**


 **Luis Alberto Avila Morales**
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

**CARTA FIANZA N° 1842201
FIEL CUMPLIMIENTO**

LIMA, 31 de agosto de 2017

Señores
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
RUC 20137921601
Av. Petit Thouars Nro. 115 - Cercado de Lima.
Presente.-

De nuestra consideración:

Por la presente, constituimos fianza para nuestro cliente P.S.V. **CONSTRUCTORES S.A.C.** hasta por la suma de **S/ 887,116.63 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISEIS CON 63/100 SOLES)**, siendo esta solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, y de realización automática a solo requerimiento de ustedes, para garantizar **EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2017-FONDEPES PRIMERA CONVOCATORIA - CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA"**. Código SNIP N° 278545.

Esta fianza tiene una vigencia de 271 días calendario, contados a partir del 05/09/2017 hasta las 12:00 hrs. del 02/06/2018, fecha de su vencimiento, pudiendo ser renovada a solicitud de la parte interesada y previa confirmación por escrito; quedando entendido que esta garantía no podrá exceder en ningún caso por ningún concepto la cantidad de **S/887,116.63**.

Es expresamente entendido, que cualquier solicitud de ejecución respecto a esta garantía, se realizará en estricta observancia de lo establecido en Código Civil y Código Procesal Civil, debiendo precisar que la misma deberá ser notificada notarialmente a nuestra Oficina ubicada en la Esquina de Javier Prado Este y Francisco Masías 370, Distrito de San Isidro - Lima, a la atención del Departamento de Cauciones.

Todas nuestras obligaciones con respecto a esta fianza cesarán pasado de décimo quinto día calendario posterior a la fecha de vencimiento de nuestra garantía, conforme lo dispone el artículo 1898° del Código Civil vigente.

Cualquier controversia respecto a esta fianza se someterá exclusivamente a los jueces y tribunales de la ciudad de Lima, Perú.

Atentamente,

La Positiva
Seguros y Reaseguros

La Positiva
Generales

RAFAEL ENCISO RIVIERA
GERENTE DE AFILIA

JUAN MANUEL PEÑA HENDERSON
GERENTE GENERAL

BOFICIO
DE NOTARÍA
INCORPORADO CIVIL
Don. C. ...



Con Certificación ISO 9001:2008 en nuestros
Procesos de Gestión para la Comercialización,
Suscripción, Emisión y Atención de los
Sinistros; SOAT, Vehículos, Asistencia Médica
y Servicios de Atención al Cliente.

Oficinas en: Arequipa - Cajamarca - Cuzco - Chiclayo - Chimbote - Huancayo - Ica - Iquitos - Piura - Pucallpa - Puno - Tacna - Trujillo

La Positiva Seguros y Reaseguros

Esq. Javier Prado Este y Francisco Masías Nro. 370, San Isidro, Lima - Perú


Tel.: (511) 211-0000 Fax: (511) 211-0011

www.lapositiva.com.pe

Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE ...

**ANEXO N° 11:
CARTA FIANZA BUEN MANEJO
DE ANTICIPO POR ADELANTO
DIRECTO**


 **Luis Alberto Avila Morales**
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS


INSTRUMENTO
ESPECIAL DE AVIACION
INSTRUMENTO CIVIL
DE AERONAVES

CARTA FIANZA N° 3000531-01
BUEN MANEJO DE ANTICIPO

LIMA, 05 de marzo de 2018

Señores
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
RUC 20137921601
Av. Petit Thouars Nro. 115 - Cercado de Lima.
Presente.-

FONDEPES RECEPCIÓN		NO IMPLICA CONFORMIDAD NI ACEPTACIÓN
Fecha:	Por:	
Hora:	N° Registro:	

De nuestra consideración:

Por la presente, constituimos fianza para nuestro cliente P.S.V. **CONSTRUCTORES S.A.C.** hasta por la suma de **S/733.831,36 (SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 36/100 SOLES)**, siendo esta solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, y de realización automática a solo requerimiento de ustedes, para garantizar **EL ADELANTO DIRECTO DEL CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2017-FONDEPES PRIMERA CONVOCATORIA - CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA". Código SNIP N° 278545.**

Esta fianza tiene una vigencia de 185 días calendario, contados a partir del 08/03/2018 hasta las 12:00 hrs. del 08/09/2018, fecha de su vencimiento, pudiendo ser renovada a solicitud de la parte interesada y previa confirmación por escrito; quedando entendido que esta garantía no podrá exceder en ningún caso por ningún concepto la cantidad de **S/733.831,36**.

Es expresamente entendido, que cualquier solicitud de ejecución respecto a esta garantía, se realizará en estricta observancia de lo establecido en Código Civil y Código Procesal Civil, debiendo precisar que la misma deberá ser notificada notarialmente a nuestra Oficina ubicada en la Esquina de Javier Prado Este y Francisco Masías 370, Distrito de San Isidro - Lima, a la atención del Departamento de Cauciones.

Todas nuestras obligaciones con respecto a esta fianza cesarán pasado de décimo quinto día calendario posterior a la fecha de vencimiento de nuestra garantía, conforme lo dispone el artículo 1898° del Código Civil vigente.

Cualquier controversia respecto a esta fianza se someterá exclusivamente a los jueces y tribunales de la ciudad de Lima, Perú.

Esta carta fianza renueva y sustituye para todos sus efectos a la carta fianza N° 3000531.

Atentamente,

La Positiva
Seguros Generales

RAFAEL ENCISO RIVERA
GERENTE DE ÁREA

La Positiva
Seguros Generales

JUAN MANUEL PEÑA HENDERSON
GERENTE GENERAL

JOSÉ JULIO
ESPINOZA AVILA S
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 115059



Con Certificación ISO 9001:2008 en nuestros
Procesos de Gestión para la Comercialización,
Suscripción, Emisión y Atención de los
Sinistros; SOAT, Vehículos, Asistencia Médica
y Servicios de Atención al Cliente.

Oficinas en: Arequipa - Cajamarca - Cuzco - Chiclayo - Chimbote - Huancayo - Ica - Iquitos - Piura - Pucallpa - Puno - Tacna - Trujillo



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE...


La Positiva Seguros y Reaseguros

Esq. Javier Prado Este y Francisco Masías Nro. 370, San Isidro, Lima - Perú

Tel.: (511) 211-0000 Fax: (511) 211-0011

www.lapositiva.com.pe

**ANEXO N° 12:
CARTA FIANZA BUEN MANEJO
DE ANTICIPO POR ADELANTO
DE MATERIALES**


 **Luis Alberto Avila Morales**
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 110009

La Positiva
Seguros

**CARTA FIANZA N° 30003281-01
BUEN MANEJO DE ANTICIPO**

LIMA, 10 de abril de 2018

Señores
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
RUC 20137921601
Av. Petit Thouars Nro. 115 - Cercado de Lima.
Presente.-

De nuestra consideración:

Por la presente, constituimos fianza para nuestro cliente P.S.V. CONSTRUCTORES S.A., hasta por la suma de S/1.467.662,75 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 75/100 SOLES), siendo esta solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, y de realización automática a solo requerimiento de ustedes, para garantizar EL ADELANTO DE MATERIALES DEL CONTRATO DERIVADO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2017-FONDEPES PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA". Código SNIP N° 178545.

Esta fianza tiene una vigencia de 184 días calendario, contando a partir del 20/04/2018 hasta las 12:00 hrs. del 20/10/2018, fecha de su vencimiento, pudiendo ser renovada a solicitud de la parte interesada y previa confirmación por escrito; quedando entendido que esta garantía no podrá exceder en ningún caso por ningún concepto la cantidad de S/1.467.662,75.

Es expresamente entendido, que cualquier solicitud de ejecución respecto a esta garantía, se realizará en estricta observancia de lo establecido en Código Civil y Código Procesal Civil, debiendo precisar que la misma deberá ser notificada únicamente a nuestra Oficina ubicada en la Esquina de Javier Prado Este y Francisco Masías 370, Distrito de San Isidro - Lima, a la atención del Departamento de Cauciones.

Todas nuestras obligaciones con respecto a esta fianza cesarán pasado de décimo quinto día calendario posterior a la fecha de vencimiento de nuestra garantía, conforme lo dispone el artículo 1898° del Código Civil vigente.

Cualquier controversia respecto a esta fianza se someterá exclusivamente a los jueces y tribunales de la ciudad de Lima - Perú.

Esta carta fianza renueva y sustituye para todos sus efectos a la carta fianza N° 30003281.

Atentamente,

La Positiva
Seguros Generales

RAFAEL ENCISO RIVERA
GERENTE DE ÁREA

La Positiva
Seguros Generales


JUAN MANUEL PEÑA HENDERSON
GERENTE GENERAL

La Positiva
Seguros Generales
Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE 1997

RODRIGUEZ JULIO
ESPINOZA AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 119059

**ANEXO N° 13:
SCTR DE PERSONAL**


 **Luis Alberto Avila Morale**
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OSM


CARLOS AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 110009

Pacífico EPS**Pacífico Seguros**

San Isidro, 26 de Marzo del 2018

CONSTANCIA N° 2843269Señores
PSV CONSTRUCTORES SA
Presente.-Ref.: **SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – SALUD Y PENSIÓN**

Estimados Señores:


Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha incluido la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Abril del 2018 al 30 de Abril del 2018 correspondiente a:

CONTRATO N° **66330** en SALUD y,
POLIZA N° **62041765** en PENSIÓN

para la siguiente relación de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. DOCUMENTO	INICIO DE COBERTURA
000001	ACEDO QUEREVALU JOSE JAVIER	03671895	01 de Abril del 2018
000002	ACHO AHUANARI ANDERSON	43689568	01 de Abril del 2018
000003	AGUILAR FUENTES GERARDO FREDY	09543198	01 de Abril del 2018
000004	AGUIRRE ARRIETA ANA JULIA	001633545	01 de Abril del 2018
000005	ALDANA ECCA JUAN VICTOR	42475416	01 de Abril del 2018
000006	ALMESTAR QUEREVALU PAUL MARTIN	76591066	01 de Abril del 2018
000007	ALTAMIRANO RAMOS FRANCISCO MARTIN	25654916	01 de Abril del 2018
000008	ANAYA GAMARRA LUIS ENRIQUE	46857266	01 de Abril del 2018
000009	ARISMENDIZ LOPEZ LAZARO JAVIER	03899428	01 de Abril del 2018
000010	ARMAS PINO MANOLITO	44066941	01 de Abril del 2018
000011	ASTO ARANGO JOSE ANTONIO	10092386	01 de Abril del 2018
000012	AVALOS CHERO EFRAIN LUIS	80219047	01 de Abril del 2018
000013	BECERRA ROJAS FRANKLIN	44291654	01 de Abril del 2018
000014	BENITES VERA RONAL DANIEL	45016959	01 de Abril del 2018
000015	BURGOS SERNAQUE FABIAN MIGUEL	46465571	01 de Abril del 2018
000016	CACERES AGUILAR HORTENCIA	44235751	01 de Abril del 2018
000017	CACERES CALLE JOSE RAUL	48584206	01 de Abril del 2018


Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OSRA

Pacífico EPS

Pacífico Seguros

000018	CALDERON COLCHADO ENRIQUE MANUEL	09515372	01 de Abril del 2018
000019	CAMPOS MATA CESAR	15681948	01 de Abril del 2018
000020	CANCHARI RAMOS CARLOS ENRIQUE	40283790	01 de Abril del 2018
000021	CARCAMO MADRID JULIAN MEMET	41002770	01 de Abril del 2018
000022	CARMONA VALDIVIA DARINKA LORENA	71486025	01 de Abril del 2018
000023	CASAS TRUJILLO JESUS ELISBAN	40503267	01 de Abril del 2018
000024	CASAS TRUJILLO JOSE CARLOS	46603814	01 de Abril del 2018
000025	CASTILLO ABRIL HENRY DANIEL	40399953	01 de Abril del 2018
000026	CATCOPARCO FLORES RAMON AUGUSTO	41557512	01 de Abril del 2018
000027	CHAMPI MAMANI PEDRO DANIEL	04647576	01 de Abril del 2018
000028	CHAPA QUEREVALU RAUL ENRIQUE	03853431	01 de Abril del 2018
000029	CHAVEZ ASUERO DANNY JOVANY	46083153	01 de Abril del 2018
000030	CHAVEZ QUIÑONEZ TITO WILER	42617677	01 de Abril del 2018
000031	CHAVEZ RAMIREZ JORGE ARMANDO	41025871	01 de Abril del 2018
000032	CHINCHAY MATA CARLOS PABLO	80090513	01 de Abril del 2018
000033	CHUNGA QUEREVALU WILFREDO	03853329	01 de Abril del 2018
000034	CHUZON CABREJOS JUAN ALBERTO	71304371	01 de Abril del 2018
000035	COCIOS VELIZ BENITO	18052554	01 de Abril del 2018
000036	CORDOVA HUAYA ROLDAN	05706385	01 de Abril del 2018
000037	CORNEJO FLORES SILVANO	41854193	01 de Abril del 2018
000038	CORNEJO PACHECO ROLY	46595611	01 de Abril del 2018
000039	CORREA SERNAQUE JORGE LUIS	02671115	01 de Abril del 2018
000040	CORREA SERNAQUE MANUEL JESUS	18190898	01 de Abril del 2018
000041	CRISOLOGO ESCOBEDO REYES MILIANO	10173845	01 de Abril del 2018
000042	CRISOLOGO RUIZ MARTIN INXIDOR	41131180	01 de Abril del 2018
000043	CRISOLOGO RUIZ VICTOR	19562373	01 de Abril del 2018
000044	CRUZALEGUI DAVILA WILDER	03503396	01 de Abril del 2018
000045	CUITO PARI JULIO CESAR	44523801	01 de Abril del 2018
000046	CULQUICHICON TERRONES RICHARD EDGAI	74816309	01 de Abril del 2018
000047	DE LA CRUZ VALERIO ANGEL FELIX	40542095	01 de Abril del 2018
000048	DONAYRE AHUMADA MAX OSCAR	70305723	01 de Abril del 2018
000049	ECHARRI SOTO ALBERTO EDUARDO	08838238	01 de Abril del 2018
000050	ESPICHAN AVILES JORGE JULIO	10323344	01 de Abril del 2018
000051	ESPINOZA MENDOZA OLMER CARLITOS	70918197	01 de Abril del 2018
000052	FACHIN JARAMILLO HUBERT ALFREDO	42469550	01 de Abril del 2018




Alberto Avila Morales
 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE ASESORIA

Pacífico EPS

Pacífico Seguros

000053	FIESTAS ECCA RUPERTO ELBER	43892222	01 de Abril del 2018
000054	FIESTAS GALAN LUIS ENRIQUE	43247742	01 de Abril del 2018
000055	FIESTAS GALAN MANUEL MEDARDO	03853617	01 de Abril del 2018
000056	FLORES TOCTO RICARDO	03132837	01 de Abril del 2018
000057	GALAN VITE HENRY ALEXANDER	45040289	01 de Abril del 2018
000058	GARCIA AVILA CESAR ANTENOR	32778754	01 de Abril del 2018
000059	GARCIA CHAPA JORGE MIGUEL	03696741	01 de Abril del 2018
000060	GARCIA PEREZ DEMETRIO	09099829	01 de Abril del 2018
000061	GARCIA RAMOS ZACARIAS	32760956	01 de Abril del 2018
000062	GARCIA SIESQUEN JULIO CESAR	75768713	01 de Abril del 2018
000063	GARCIA TRIGOSO VICTOR MARTIN	22092933	01 de Abril del 2018
000064	GASTELO BUSTAMANTE WALTER RONALD	16789136	01 de Abril del 2018
000065	GOMEZ GASPAR EFRAIN	09882095	01 de Abril del 2018
000066	GOMEZ GONZALES SIGFREDO	25490790	01 de Abril del 2018
000067	GOMEZ YPANAQUE MICHAEL JONATHAN	43325922	01 de Abril del 2018
000068	GUERRERO MOSQUITO ARTURO	03473278	01 de Abril del 2018
000069	GUTIERREZ FLORES DEMETRIO	29242003	01 de Abril del 2018
000070	HARO ESPINOZA PALU JAVEL	45993512	01 de Abril del 2018
000071	HEREDIA ESPINOZA IRWIN JAVIER	46836436	01 de Abril del 2018
000072	HUAMAN HUAMANÑAHUI JULIO CESAR	77464751	01 de Abril del 2018
000073	HUANCA MOTTA MANUEL JUAN	42605586	01 de Abril del 2018
000074	HUAPAYA SILVERIO MARIA DEL PILAR	03503685	01 de Abril del 2018
000075	HUAYTA PACAYA ERICK	62039339	01 de Abril del 2018
000076	IMAN CHAVEZ HILARIO	41194951	01 de Abril del 2018
000077	IMAN CHAVEZ REYES	80271027	01 de Abril del 2018
000078	INGA JUAREZ VICENTE	02859199	01 de Abril del 2018
000079	INGA PALACIOS JOSE ROBERTO	40543698	01 de Abril del 2018
000080	JUAREZ IMAN BALTAZAR	42716665	01 de Abril del 2018
000081	LANDACAY CORDOVA EDIL MIGUEL	77140715	01 de Abril del 2018
000082	LEAL VEGA GERSON	42990819	01 de Abril del 2018
000083	LLAMOCTANTA ACUÑA GREGORIO	16609233	01 de Abril del 2018
000084	LOPEZ GONZAGA JUAN JESUS	47391245	01 de Abril del 2018
000085	LOPEZ PEREZ PABLO EDUARDO	22090147	01 de Abril del 2018
000086	LUNA TALLEDO CESAR AUGUSTO	44861870	01 de Abril del 2018
000087	LUPUCHE MARTINEZ JOSE LUCIANO	03879384	01 de Abril del 2018


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

JULIO
 DRYAN AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 117009

Pacífico EPS

Pacífico Seguros

000088	MALQUI QUILCA ASUNCION JUAN	22100015	01 de Abril del 2018
000089	MANUYAMA AQUITUARI JUAN JOEL	41838996	01 de Abril del 2018
000090	MARIÑAS CASTILLO HEVER DAVID	45176451	01 de Abril del 2018
000091	MARQUEZ MARIN JHONER	05205696	01 de Abril del 2018
000092	MARTINEZ CHUNGA JOSE ANTONIO	03879223	01 de Abril del 2018
000093	MEDINA QUISPE MAURO JULIAN	30950216	01 de Abril del 2018
000094	MEDINA SICHA RONALD PELAGIO	70835887	01 de Abril del 2018
000095	MENDEZ ALVAREZ EUTEMIO CLAUDIO	25849840	01 de Abril del 2018
000096	MERCADO BORJA DIONICIO FELIX	08396626	01 de Abril del 2018
000097	MEZA ARMAS OSCAR VALENTIN	42958291	01 de Abril del 2018
000098	MILLONEZ ESPINOZA MANUEL AUGUSTO	06888774	01 de Abril del 2018
000099	MOLINA CHAHUA HILARIO	30418417	01 de Abril del 2018
000100	MONDALGO QUISPE ERNESTO MANUEL	06122385	01 de Abril del 2018
000101	MORALES PURIZACA JULIO ANTONIO	03490636	01 de Abril del 2018
000102	MUÑOZ SANCHEZ ARTURO	08972277	01 de Abril del 2018
000103	NAVARRO FLORES GERARDO	43848349	01 de Abril del 2018
000104	NUÑEZ SERNAQUE RIGOBERTO	03853789	01 de Abril del 2018
000105	OTERO FARFAN JIMMY CHARLEY	80297145	01 de Abril del 2018
000106	PACAYA IHUARAQUI OSWALDO ARON	80340607	01 de Abril del 2018
000107	PALINGINIS GOFFINI JONATHAN STEFAN	73240485	01 de Abril del 2018
000108	PANTA PERICHE JESÚS MARTÍN	74607903	01 de Abril del 2018
000109	PANTA QUEREVALU LUIS ENRIQUE	44690400	01 de Abril del 2018
000110	PATIÑO HUAYNA ROMULO SIMON	30426142	01 de Abril del 2018
000111	PAUCAR LIMA GUSTAVO VLADIMIR	45621207	01 de Abril del 2018
000112	PAULINI CISNEROS JUAN JOSE	47443199	01 de Abril del 2018
000113	PEREZ HERNANDEZ LEONARDO	05334424	01 de Abril del 2018
000114	PEREZ PISFIL FELIX ALEXANDER	46478523	01 de Abril del 2018
000115	PINEDA LITANO OSWALDO	42122018	01 de Abril del 2018
000116	PINTADO RAMIREZ INGRID ARLETTY	73667443	01 de Abril del 2018
000117	PRIETO GARCIA GINO TOMAS	41196589	01 de Abril del 2018
000118	QUEREVALU ANTON JOSE MANUEL	40056731	01 de Abril del 2018
000119	QUEREVALU PANTA JUAN JULIAN	44718799	01 de Abril del 2018
000120	QUIROZ PACHECO SANDRA THALIA	72499695	01 de Abril del 2018
000121	QUISPE CAMACHO JULIO CESAR	09934624	01 de Abril del 2018
000122	QUISPE HUAMANÑAHUI SANDY MITZI	75362569	01 de Abril del 2018



Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OPERACIONES

JULIO
2018
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 11000

Pacífico EPS

Pacífico Seguros

000123	QUISPE HUILLCA GILBERTO HUALBERTO	44627793	01 de Abril del 2018
000124	RAMIREZ CALLE MIGUEL HELENEN	70088290	01 de Abril del 2018
000125	RAMOS PEÑA JUAN CARLOS	42345697	01 de Abril del 2018
000126	RAMOS VILELA CARLOS ENRIQUE	03683352	01 de Abril del 2018
000127	RETO LISAMA CARLOS ALBERTO	32735140	01 de Abril del 2018
000128	RIVERA RIVEROS VICTOR FERNANDO	80295299	01 de Abril del 2018
000129	RIVERA VELA ROOSEVELT ROMMEL	70756112	01 de Abril del 2018
000130	ROMAN HURTADO JORGE LUIS	41392290	01 de Abril del 2018
000131	RUIZ FLORES LUIS	04314684	01 de Abril del 2018
000132	RUIZ MORALES MARVIN IVAN	46723824	01 de Abril del 2018
000133	RUIZ RAMIREZ BECQUER PAUL	45033564	01 de Abril del 2018
000134	RUIZ RUIZ FRANCISCO	17926207	01 de Abril del 2018
000135	RUMICHE SANDOVAL MIGUEL ENRIQUE	47495479	01 de Abril del 2018
000136	SALDARRIAGA OJEDA JESUS DAVID	41317671	01 de Abril del 2018
000137	SANCHEZ MUCUSHUA REIMER	44716380	01 de Abril del 2018
000138	SEGOVIA ALCAZAR LUIS EMILIO	42183504	01 de Abril del 2018
000139	SERRANO TRUEVAS MARTIN	41057353	01 de Abril del 2018
000140	SORIA MEJIA MAGDALENA ADELA	42433235	01 de Abril del 2018
000141	SUXE BURGA VICTOR ARSENIO	25751987	01 de Abril del 2018
000142	TIPISMANA LOPEZ BRYAN ALEXIS	47552133	01 de Abril del 2018
000143	TRINIDAD MENDOZA JOSE LUIS	73128173	01 de Abril del 2018
000144	TUME PANTA SANTOS ALBERTO	03901443	01 de Abril del 2018
000145	TUME QUEREVALU JOSE DANIEL	46910618	01 de Abril del 2018
000146	TUME VITE CARLOS ALBERTO	45597472	01 de Abril del 2018
000147	URIETA ALFARO YEINER ANDRES	001644907	01 de Abril del 2018
000148	VALDIVIA ROJAS JORGE VIDAL	10171182	01 de Abril del 2018
000149	VASQUEZ VASQUEZ LINO	02872727	01 de Abril del 2018
000150	VEGA JAIME JEAN CARLO	46334936	01 de Abril del 2018
000151	VEGAS FLORES GENARO ANTONIO	02777045	01 de Abril del 2018
000152	VELA TABORGA JORGE LUIS	43041686	01 de Abril del 2018
000153	VENTURO CAPILLO VICTOR ABRAHAN	45935818	01 de Abril del 2018
000154	VILLANUEVA CORNEJO WALTER RENEE	04627862	01 de Abril del 2018
000155	VILLANUEVA VIGO OSCAR MANUEL	46991567	01 de Abril del 2018
000156	VITE JACINTO BERNARDO	03851140	01 de Abril del 2018
000157	VITE PERICHE MAXIMO	03850510	01 de Abril del 2018



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE PSA


ESTADO CIVIL
CONYUGIO
1000 AVILA M
1000 AVILA M
1000 AVILA M

Pacífico EPS**Pacífico Seguros**


000158	VITE VILCHEZ DARWIN JAVIER	74752225	01 de Abril del 2018
000159	YARLEQUE MORAN CESAR AUGUSTO	43685127	01 de Abril del 2018
000160	YARLEQUE VALENCIA MARCOS ORLANDO	43653066	01 de Abril del 2018
000161	ZAMORA CHAVEZ PEDRO LUIS	02882455	01 de Abril del 2018

Sin otro particular , quedamos de ustedes

Atentamente,




CARLOS SILES
GERENTE



ANGEL ARMIJO HIDALGO
GERENTE



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA



CRISTIAN AVILES
INGENIERO CIVIL
RUC CIP N° 119000

Pacífico EPS**Pacífico Seguros**

San Isidro, 26 de Marzo del 2018

CONSTANCIA N° 2843255

Señores
PSV CONSTRUCTORES SA
 Presente.-

Ref.: **SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – SALUD Y PENSION**

Estimados Señores:


Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha incluido la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Abril del 2018 al 30 de Abril del 2018 correspondiente a:

CONTRATO N° **60666** en SALUD y,
POLIZA N° **62036427** en PENSIÓN

para la siguiente relación de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. DOCUMENTO	INICIO DE COBERTURA
000001	AGUINAGA VARGAS EDUARDO	47768294	01 de Abril del 2018
000002	ALARCON FERNANDEZ GARY JHONATAN	71307557	01 de Abril del 2018
000003	ALCAZAR OLAZABAL JUAN CARLOS	21552502	01 de Abril del 2018
000004	ALCAZAR OLAZABAL JUAN DANIEL	21558656	01 de Abril del 2018
000005	ALVA CUETO LUIS FERNANDO	06232631	01 de Abril del 2018
000006	AMAYA MEDINA FREDDY EDER	42039361	01 de Abril del 2018
000007	ARIAS CAPPELLETTI ALDO ALFREDO	09931447	01 de Abril del 2018
000008	AUCEJO SODERSTRONG NINO WILMER	80390918	01 de Abril del 2018
000009	BELTRAN GORDILLO JOHNNY FREDY	04644583	01 de Abril del 2018
000010	BOCA MEJIA FERNANDO ANTOLINO	32851507	01 de Abril del 2018
000011	BORDA CHAUCA MARCO ANTONIO	25490887	01 de Abril del 2018
000012	CARDENAS MAGIPO TONI	42464115	01 de Abril del 2018
000013	CARRANZA JARA FELIPE AMADO	18078473	01 de Abril del 2018
000014	CAYETANO FERNANDEZ RUBEN ALEX	48012203	01 de Abril del 2018
000015	CAYLLAHUA ROMERO ANTHONY RAFAEL	71741664	01 de Abril del 2018
000016	CHAMORRO MATAMOROS HENRY DAVID	45650073	01 de Abril del 2018
000017	CISNEROS CERDA MARCO ANTONIO	46265757	01 de Abril del 2018


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

Pacífico EPS

Pacífico Seguros

000018	CUZCANO SISNIEGAS ENZO FRANCO	44932099	01 de Abril del 2018
000019	DIAZ MEZA FELIX	48182970	01 de Abril del 2018
000020	DOÑEZ PINEDO ADOLFO	41885332	01 de Abril del 2018
000021	ESPEJO LLACAS VICTOR OSCAR	40390888	01 de Abril del 2018
000022	ESTRADA SALDARRIAGA CARLOS	40009350	01 de Abril del 2018
000023	FIGUEROA RODRIGUEZ PEPE JAVIER	32846563	01 de Abril del 2018
000024	FONTALVO TORRES JORDAN MAYRON	001286846	01 de Abril del 2018
000025	GARCIA QUIROZ ROBERT WALTER	32942511	01 de Abril del 2018
000026	GONGORA CCASANI FRANCISCO	20407859	01 de Abril del 2018
000027	GUERRERO HUACHO FRANCISCO JAVIER	09707660	01 de Abril del 2018
000028	GUILLEN ESPINOZA JUANA LILIANA	10055148	01 de Abril del 2018
000029	GUTIERREZ PAREDES GIANCARLO	40123482	01 de Abril del 2018
000030	GUZMAN ARAUJO CARLOS AGUSTIN	32932807	01 de Abril del 2018
000031	GUZMAN ARAUJO LUIS BELTRAN	08459321	01 de Abril del 2018
000032	HUAMAN QUINTANA JULIO CESAR	10193787	01 de Abril del 2018
000033	ILIZARBE VILCA OSCAR	20074303	01 de Abril del 2018
000034	ILIZARBE VILCA PABLO	10589180	01 de Abril del 2018
000035	ISUIZA ISUIZA EYSON	45872393	01 de Abril del 2018
000036	LANDA PINEDO ROGER AUGUSTO	00128562	01 de Abril del 2018
000037	LARA LLACAS JULIO RICARDO	41897444	01 de Abril del 2018
000038	LITANO PAZ PABLO	03473251	01 de Abril del 2018
000039	LLAGUARIMAY CHIPANA ANDRES	10696138	01 de Abril del 2018
000040	LOZANO REYES GILMER YOVANI	22717557	01 de Abril del 2018
000041	MANRIQUE GRANADOS CHRISTOPHER ERRIC	42704258	01 de Abril del 2018
000042	MEDINA TORRES EDWIN DAVID ALONSO	71449577	01 de Abril del 2018
000043	MEJIA HERNANDEZ KAREN ALEJANDRA	47349433	01 de Abril del 2018
000044	MERGILDO RODRIGUEZ ALIN	48357468	01 de Abril del 2018
000045	MEZA ARMAS ROGER MARCOS	42033855	01 de Abril del 2018
000046	MEZA HUARANCA MARIO	22087635	01 de Abril del 2018
000047	MIRANDA ARANDA FRANK JUNIOR	77437402	01 de Abril del 2018
000048	MONTALVAN PALOMINO MARCO ANTONIO	80095767	01 de Abril del 2018
000049	MONTALVO CARO RICARDO JESUS	09697282	01 de Abril del 2018
000050	MONTES PAJUELO ELVIRA	41044113	01 de Abril del 2018
000051	MONTOYA HERMOSA JAIME	47380345	01 de Abril del 2018
000052	MORILLAS OSTOLAZA ROLANDO ALBERTO	40254887	01 de Abril del 2018



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

JULIO
AVILES
ESP
INF
CIVIL
175

Pacífico EPS

Pacífico Seguros

000053	NORABUENA CASTRO EUFEMIO ERASMO	32813588	01 de Abril del 2018
000054	NUÑEZ SANGAMA JORGE LUIS	05390030	01 de Abril del 2018
000055	OROYA RAMOS JULIO GREGORIO	25808461	01 de Abril del 2018
000056	PARAGUAY MARREROS BERNARDINA MILEN	47874173	01 de Abril del 2018
000057	PAXI TITO RAFAEL TORIBIO	25428416	01 de Abril del 2018
000058	PEÑA FUENTES MARIO	06109501	01 de Abril del 2018
000059	PINEDA VASQUEZ ISRAEL ADHEMIR	10205712	01 de Abril del 2018
000060	PINEDO TORRES ADOLFO	00089899	01 de Abril del 2018
000061	PORTALINO SEGUNDO LUIS ALBERTO	06908284	01 de Abril del 2018
000062	QUISPE ANAMPA EDDYN SON OSWALDO	45589275	01 de Abril del 2018
000063	QUISPE PEREZ ABEL HERNAN	07892426	01 de Abril del 2018
000064	QUISPE QUISPE ALEX	46588803	01 de Abril del 2018
000065	QUISPE SANCHEZ SAYURI YASMIN	73081503	01 de Abril del 2018
000066	RAMIREZ VIDAL HELENEN REYNALDO	02822515	01 de Abril del 2018
000067	RENGIFO ALIAGA DIEGO ALEJANDRO	72694751	01 de Abril del 2018
000068	RIQUELME HUARCA ANTHONY WILLIAN	46790996	01 de Abril del 2018
000069	RODRIGUEZ VILLEGAS MAYRA ALEJANDRA	73768069	01 de Abril del 2018
000070	ROJAS ARIAS LEHI ENRIQUE	43533863	01 de Abril del 2018
000071	ROJAS COTRINA JULIO CESAR	09905680	01 de Abril del 2018
000072	ROJAS LOPEZ SMITH FRANKLIN	43528279	01 de Abril del 2018
000073	RUA NAJARRO EDGAR ZOCIMO	10233070	01 de Abril del 2018
000074	SUITO CARRASCO RENZO GUSTAVO	41749225	01 de Abril del 2018
000075	TIBURCIO VILCHEZ LUIS ALONSO	74231521	01 de Abril del 2018
000076	TOLENTINO TOLENTINO JHON JAIRO	74079194	01 de Abril del 2018
000077	TRILLO CHIRE LUIS ENRIQUE	46261612	01 de Abril del 2018
000078	URQUIZO MISARE RICARDO RICHARD	46635898	01 de Abril del 2018
000079	VALDIVIA ROJAS MENELAO TOBIT	41252192	01 de Abril del 2018
000080	VASQUEZ ROJAS LUIS AGAPITO	17963928	01 de Abril del 2018
000081	VEGA SEGURA JUAN JESUS	06589525	01 de Abril del 2018
000082	YOVERA LITANO WILMER ALEXANDER	41565719	01 de Abril del 2018
000083	ZAPATA FLORES JOSE ENRIQUE	72868851	01 de Abril del 2018

Sin otro particular , quedamos de ustedes

Atentamente,



Luis Alberto Avila Moral
CIP. N° 84748
SUPERVISOR DE OBRAS

JULIO
ESPINOZA AVILA
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 115005

Pacífico EPS

Pacífico Seguros

CARLOS SILES
GERENTE

ANGEL ARMIÑO HIDALGO
GERENTE



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

JORGE ROLDÁN
ESPECIALISTA EN
INGENIERÍA CIVIL
CON N° 123456

Pacífico EPS**Pacífico Seguros**

San Isidro, 03 de Abril del 2018

CONSTANCIA N° 2853153

Señores
PSV CONSTRUCTORES SA
 Presente.-

Ref.: **SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – SALUD Y PENSION**

Estimados Señores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha incluido la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Abril del 2018 al 30 de Abril del 2018 correspondiente a:

CONTRATO N° **66330** en SALUD y,
POLIZA N° **62041765** en PENSION


para la siguiente relación de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. DOCUMENTO	INICIO DE COBERTURA
000001	PADILLA FIGUEROA LORENZO SERAPIO	15957679	01 de Abril del 2018

Sin otro particular , quedamos de ustedes


Atentamente,




CARLOS SILES
GERENTE



ANGEL ARMIÑO HIDALGO
GERENTE



Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS



Jorge Arriño
 ESPECIALISTA AVIÉS
 INGENIERO CIVIL

Pacífico EPS**Pacífico Seguros**

San Isidro, 04 de Abril del 2018

CONSTANCIA N° 2854417Señores
PSV CONSTRUCTORES SA
Presente.-Ref.: **SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – SALUD Y PENSION**

Estimados Señores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha incluido la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Abril del 2018 al 30 de Abril del 2018 correspondiente a:

CONTRATO N° **66330** en SALUD y,
POLIZA N° **62041765** en PENSIÓN


para la siguiente relación de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. DOCUMENTO	INICIO DE COBERTURA
000001	ROJAS RAMOS JONNY ALBERTO	47219897	01 de Abril del 2018
000002	RONDON VALDIVIA ROLANDO ELIAS	46166658	01 de Abril del 2018

Sin otro particular , quedamos de ustedes


Atentamente,




CARLOS SILES
GERENTE



ANGEL ARMIÑO HIDALGO
GERENTE



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA


ANGEL ARMIÑO HIDALGO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 113009

Pacífico EPS**Pacífico Seguros**

San Isidro, 10 de Abril del 2018

CONSTANCIA N° 2858456

Señores
PSV CONSTRUCTORES SA
 Presente.-

Ref.: **SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – SALUD Y PENSION**

Estimados Señores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha incluido la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Abril del 2018 al 30 de Abril del 2018 correspondiente a:

CONTRATO N° 66330 en SALUD y,
POLIZA N° 62041765 en PENSION


para la siguiente relación de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra:


N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. DOCUMENTO	INICIO DE COBERTURA
000001	ANAMPA MURIANO EVER NOE	43802472	01 de Abril del 2018
000002	ESCUADERO HUAMANI ABRAHAN ISACC	70815925	01 de Abril del 2018
000003	RIVERA OBREGON OSWALDO ANDRES	48183630	01 de Abril del 2018
000004	RUIZ RUIZ JORGE LUIS	18901270	01 de Abril del 2018

Sin otro particular , quedamos de ustedes


Atentamente,




CARLOS SILES
 GERENTE



JOSÉ CARLOS
 ESPINOZA AVILES
 INGENIERO CIVIL
 R. N. 100000000



ANGEL ARMIÑO HIDALGO
 GERENTE



Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

Pacífico EPS**Pacífico Seguros**

San Isidro, 16 de Abril del 2018

CONSTANCIA N° 2862074

Señores
PSV CONSTRUCTORES SA
 Presente.-

Ref.: **SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – SALUD Y PENSION**

Estimados Señores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha incluido la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Abril del 2018 al 30 de Abril del 2018 correspondiente a:

CONTRATO N° **66330** en SALUD y,
POLIZA N° **62041765** en PENSION

para la siguiente relación de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra: DPA MARCONA



N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. DOCUMENTO	INICIO DE COBERTURA
000001	ALMEYDA SARA VIA WALTER	25736178	01 de Abril del 2018
000002	CERNA RUPAY GELACIO	22088647	01 de Abril del 2018


Proyecto/Obra: DPA YACILA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. DOCUMENTO	INICIO DE COBERTURA
000003	HERNANDEZ PALOMINO JOSE MANUEL	75798595	01 de Abril del 2018

Sin otro particular , quedamos de ustedes

Atentamente,


 **Luis Alberto Avila Morales**
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA


JOSE MANUEL HERNANDEZ PALOMINO
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

Pacífico EPS

Pacífico Seguros

CARLOS SILES
GERENTE

ANGEL ARMIÑO HIDALGO
GERENTE



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OPS

Pacífico EPS**Pacífico Seguros**

San Isidro, 05 de Abril del 2018

CONSTANCIA N° 2855158

Señores
PSV CONSTRUCTORES SA
 Presente.-

Ref.: **SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – SALUD Y PENSION**

Estimados Señores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha incluido la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Abril del 2018 al 30 de Abril del 2018 correspondiente a:

CONTRATO N° **66330** en SALUD y,
POLIZA N° **62041765** en PENSION

para la siguiente relación de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. DOCUMENTO	INICIO DE COBERTURA
000001	FRANCIA RAVINES DENIS JUAN MARTIN	72017481	01 de Abril del 2018
000002	MANUYAMA AQUITUARI LEWIS DEIVI	45458339	01 de Abril del 2018

Sin otro particular , quedamos de ustedes

Atentamente,



CARLOS SILES
GERENTE



ANGEL ARMIÑO HIDALGO
GERENTE



Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

ANGEL ARMIÑO HIDALGO
 INGENIERO CIVIL
 N° 119909

Pacífico EPS**Pacífico Seguros**

San Isidro, 12 de Abril del 2018

CONSTANCIA N° 2860705

Señores
PSV CONSTRUCTORES SA
 Presente.-

Ref.: **SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – SALUD Y PENSION**

Estimados Señores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha incluido la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Abril del 2018 al 30 de Abril del 2018 correspondiente a:

CONTRATO N° 66330 en SALUD y,
POLIZA N° 62041765 en PENSION


para la siguiente relación de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra:


N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. DOCUMENTO	INICIO DE COBERTURA
000001	ASTO ESPINOZA TEOFILO	08952892	01 de Abril del 2018
000002	LLAMCCAYA LLACSA ISAAC EDMUNDO	75925935	01 de Abril del 2018
000003	MARTINEZ REYES VICTOR HERNAN	09888767	01 de Abril del 2018

Sin otro particular , quedamos de ustedes


Atentamente,




CARLOS SILES
 GERENTE



ANGEL ARMIJO HIDALGO
 GERENTE



Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA



SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
 SALUD Y PENSION
 PACIFICO SEGUROS

Pacífico Salud EPS**Pacífico Vida**

San Isidro, 06 de Abril del 2018

CONSTANCIA N° 2856188

Señores
PSV CONSTRUCTORES SA
 Presente.-

Ref.: **SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – SALUD Y PENSION**

Estimados Señores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha incluido la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Abril del 2018 al 30 de Abril del 2018 correspondiente a:

CONTRATO N° 66330 en SALUD y,
POLIZA N° 62041765 en PENSION

para la siguiente relación de trabajadores declarados por vuestra empresa.

(Firma manuscrita)
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

Proyecto/Obra: ALBAÑIL

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. DOCUMENTO	INICIO DE COBERTURA
000004	GAMARRA CARBAJAL ALFREDO MIGUEL	22098159	01 de Abril del 2018
000007	QUISPE ANCCO LUIS BELTRAN	01296888	01 de Abril del 2018
000008	RODRIGUEZ GOMEZ BETO ISAIAS	10073294	01 de Abril del 2018

Proyecto/Obra: MANIOBRISTA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. DOCUMENTO	INICIO DE COBERTURA
000001	AURIS YNGA MIGUEL ANGEL	42243510	01 de Abril del 2018

Proyecto/Obra: PEON - AYUDANTE

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. DOCUMENTO	INICIO DE COBERTURA
000002	CARLOS LIMASCCA JUAN ALFREDO	43244335	01 de Abril del 2018
000005	IBARRA LEON EDUARDO LUIS ENRIQUE	74778995	01 de Abril del 2018

Proyecto/Obra: RESP. DE ALMACEN

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. DOCUMENTO	INICIO DE COBERTURA
000009	TOLEDO MEJIA WALTER LUIS	70388359	01 de Abril del 2018

Pacífico Salud EPS**Pacífico Vida**

Proyecto/Obra: SOLDADOR

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. DOCUMENTO	INICIO DE COBERTURA
000006	LLAMOCTANTA CORNEJO VICTOR ALONSO	47280776	01 de Abril del 2018

Proyecto/Obra: TOPOGRAFO


N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. DOCUMENTO	INICIO DE COBERTURA
000003	CRUZ MAMANI JORGE EDISON	45269594	01 de Abril del 2018

Sin otro particular , quedamos de ustedes


Atentamente,




CARLOS SILES
GERENTE
SCTR
PACIFICO SALUD





ANGEL ARMIJO HIDALGO
GERENTE
SEGURO CORPORATIVOS
PACIFICO VIDA



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE ...



**ANEXO N° 14:
CONSTANCIAS DE PAGOS DE
DERECHOS A SENCICO**


 **Luis Alberto Avila Morales**
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE...



Constancia de Pago


000063

Pago Varios - Formulario 1662



Número de orden : 282163443


RUC : 20112182021
Razón social : P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.
Periodo : 03/2018
Indicador de pago : 1 Tributo
Tributo : 7031 SENCICO
Importe pagado : S/. 4,140
Número de operación: 000146747132
Tipo de pago: Pago con cargo en cuenta de detracciones
Banco: NACION
Número de operación 00000000000461867273
Fecha de operación bancaria: 19/04/2018 10:50:41


 Luis Alberto Avila Morale
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS


INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

**ANEXO N° 15:
CONSTANCIAS DE PAGOS DE
DERECHOS A CONAFOVISER**



 **Luis Alberto Avila Morales**
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS


JUAN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 119009



Datos de la transferencia

Identificación	3702588
Estado	Procesado
Fecha	24/04/2018
Identificación origen	JENNY LOPEZ MASLUCAN 02:58:53
Identificación destino	MARIO PEÑA FUENTES 02:59:50
Concepto	CONAFOVICER MARZO 2018
Cuenta de origen	Cuenta Corriente Soles - 000503484725
Cantidad	S/. 4966.52
Cuenta de destino	00219300157291906814
Banco	BANCO CREDITO
Transferencia	No
Identificación	CONAFOVICER
RUC	RUC 20100816611
Dirección	PROL CANTAGALLO 670 INT PS3 LIMA
Cantidad	S/. 4966.52




 **Los Alberto Avila Morale**
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE APO


JULIO CESAR AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C. N.º 119029

**ANEXO N° 16:
CONSTANCIAS DE PAGOS DE
IMPUESTOS**

Los Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

ALBERTO AVILA MORALES
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN (LABORAL)

000059

Identificación de la Transacción

Número de orden: 776018550-49

Datos de la Declaración

RUC: 20112182021
 Nombre o Razón Social: P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.
 Documento: PLANILLA ELECTRÓNICA
 Periodo: 03/2018
 Rectificatoria: No
 Número de trabajadores: 261
 Número de pensionistas: 0
 P.Serv.Cuarta Categoría: 15
 P.Serv.Mod.Formativa: 15
 Personal Terceros: 0
 Regimenes Especiales: 0

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción


Número de orden: 776018550-49

Detalle de Tributos		
Tributos	Deuda	Pago
RENDA 5TA. CATEG. RETENCIONES	49,439	49,439
SSALUD +VIDA	1,070	1,070
SNP - LEY 19990	24,555	24,555
RENDA 4TA. CATEG. RETENCIONES	288	288
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	69,116	8,648
Totales	SI. 144,468	SI. 84,000

Detalle de Pago

Banco: NACION
 Num.Operación: 00000000000459894057
 Fecha de Pago: 2018-04-16 17:38:09


 Lya Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS


 JOSE DE JUAN
 ESP. ADMINISTRACION
 INGENIERO

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

000058

Identificación de la Transacción



Número de orden: 834721480-37
 Fecha: 2018-04-16 16:50:34

Datos de la Declaración

RUC: 20112182021
 Nombre o Razón Social: P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.
 Formulario: 0621-PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV
 Periodo: 03/2018
 Rectificatoria: No

Detalle de Tributos		
Tributos	Deuda	Pago
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA		0
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	52,319	0
Totales	SI. 52,319	SI. 0


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS


Verificación de Pagos por Formulario

RUC : 20112182021 - P.S.V.
 CONSTRUCTORES S.A.
 Formulario : 1662 - BOLETA DE PAGO
 - VIRTUAL
 Fecha de presentación : 19/04/2018
 Periodo : 201803
 Número de Orden en : 282158873
 Formulario

Monto Pagado

Casilla	Código - Descripción del Tributo	Importe
651	5210-ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	60540


Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS


 F. J. J. J. J.
 F. J. J. J. J.
 F. J. J. J. J.

Verificación de Pagos por Formulario

RUC : 20112182021 - P.S.V.
 CONSTRUCTORES S.A.
 Formulario : 1662 - BOLETA DE PAGO
 - VIRTUAL
 Fecha de presentación : 19/04/2018
 Periodo : 201803
 Número de Orden en Formulario : 282158872

Monto Pagado


Casilla	Código - Descripción del Tributo	Importe
651	3038-IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS	4884



Alberto Avila Morales
 Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS



[Signature]
 COMISARIO
 DE LA FISCALIA
 DE INGENIERIA CIVIL


Faint, mostly illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. Some fragments are visible, such as "CIP. N° 84746" and "SUPERVISOR DE OBRA".

 *Luis Alberto Avila Morales*
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

[Handwritten signature]

**ANEXO N° 17:
COPIA CUADERNO DE OBRA**


 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA


JOSE EMILIO
LOPEZ SAN AVILES
INGENIERO CIVIL
REG. PROF. N° 118009

CUADERNO DE OBRA

000053



099

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

RECIBIDO

02/04/2018

Punto N° 188 De P.E.C. Constructores S.A
 Asunto: Remediación de contaminación en DPA Mazona
 Se deja constancia que de acuerdo a las comisiones
 adquiridas por mi representada, las comisiones de seguridad
 a cargo de la policía nacional y la Intendencia del
 muelle por parte de los pescadores, el día de hoy
 02/04/2018 se ha procedido a comenzar con las
 actividades para la ejecución de la obra. Asimismo
 ante los Servicios del Superintendente Regional
 en la localidad de San Juan de Mazona, Distrito de
 Mazona, Provincia de Mazona, Región Tumbes por el nombre
 "Constructores P.E.C. S.A." para la remediación, executione
 62 días calendario, se ha comenzado a trabajar con
 materiales y determinar en la consideración de obra,
 que impliquen riesgos para personas en actividades
 de calidad, todo esto será evaluado y controlado
 como mejor convenga P.E.C. remediación.

JULIO
 ESTEBAN AVILES
 INGENIERO CIVIL
 N° 113019

02/04/2018

Punto N° 189

Asunto: Seguridad de demolición de Mazo por
 contaminación de edificios abandonados
 con fecha 30/01/2018 se procedió a una demolición
 a nivel controlado y se emitía como de punto

Luis Alberto Avila Morale
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

JULIO
 ESTEBAN AVILES
 INGENIERO CIVIL
 N° 113019
 198

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

De las instalaciones de la obra a cargo de la empresa...
y de las actividades de construcción...
entre la contratista y la supervisión de obra...
ante la que debe presentarse en el punto N° 120
del presente expediente.

En los días 22 y 23/04/2018 se realizaron reuniones convocadas por los representantes de la obra, a los representantes de la oficina de supervisión regional, por lo que, la comisión de obra, la contratista y el contratista, llegaron a la conclusión que debían reanudar las actividades para la ejecución de la obra y la obra más pronto sea el día viernes 27 de abril de 2018 con los recursos de la obra.

En fecha 01/04/2018 se conformó un comité de Seguridad por parte de la INPRA, la obra, el contratista, el DPA Alameda y el personal de la obra para el muelle, por lo tanto se reanuda la obra con los recursos de la obra.

El día 02/04/2018 se reanuda la obra con los recursos de la obra por lo que se reanuda la obra con los recursos de la obra, por lo tanto se reanuda la obra con los recursos de la obra, por lo tanto se reanuda la obra con los recursos de la obra.

Por lo tanto, se reanuda la obra con los recursos de la obra, por lo tanto se reanuda la obra con los recursos de la obra, por lo tanto se reanuda la obra con los recursos de la obra.

JORGE JULIO
ESPICHAN AVILES
INGENIERO RESIDENTE

Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

199
NOTARIA BENVENUTO
ESPICHAN AVILES

CUADERNO DE OBRA

02

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____



Asiento N° 190 D. Supervisa 02/04/18

El día de hoy después de verificar conjuntamente con el Ing. Residente que se vierte las garantías necesarias para reanudación de las actividades contando con la Presencia de la Palenavaciana se autoriza el Reanuncio de la obra después de 62 días de suspensión de las labores. Se le solicita presentar su Solicitud de Ampliación de Plazo al Contratista teniendo plazo a las indicadas en el Reglamento.

También se le comunica que de Acuerdo al Reglamento de la Ley de Contratación del Estado en su Artículo 153. Suspensión de plazo de ejecución, indica cuando se produzca eventos no atribuibles a las partes que originan la Paralización de la obra, estas pueden ocasionar la suspensión del Plazo de ejecución de la misma hasta la terminación de dicho evento, sin que ello suponga el incurrir en mayores gastos generales y costos.

Se firmo un Acta de Reanudación de obra N° 01 por parte de la Empresa ejecutante el Ing. Jorge Julio Espichán Avila y por parte de la Supervisión el Ing. Luis A. Avila Navale.

Se le recomienda al Ing. Residente el repellido de las firmas debido al estado acumulado en estas dos meses de Paralización. Presentar la Valuación Causapendiente al mes de Marzo cuyas metadas son cero debido a la Paralización.

[Signature]
 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
 JOSE LUIS AVILA NAVALE
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP. N° 84746

[Signature]
 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA
 ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

03

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

03/04/2018

Asiento N° 191

De PSV Constructores S.A.

Asunto: Respuesta al Asiento N° 190

Se comunica a la Supervisión que el artículo 153 refiere a una paralización conciliada y pactada entre la contratista y la entidad, que implica el retiro de la capacidad instalada por mutuo acuerdo, lo que no aplica en nuestro caso ya que la paralización fue intempestiva a un acto vandálico y terrorista que se tuvo que paralizar por falta de garantías de seguridad y la entidad concedora de la decisión nos tuvo en stand by hasta gestionar las garantías necesarias para la reanudación; el contratista siempre estuvo pendiente por las indicaciones para la reanudación con las garantías y en espera de un pronunciamiento de la entidad contratante.

JOSÉ JULIO
 ESPINÁN AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

04/04/2018

Asiento N° 192

De PSV Constructores S.A.

Asunto: Reconocimiento de Mayores Costos por reanudación de obra.

Se pone en conocimiento a la Supervisión que luego de la reanudación, se está evaluando los mayores costos por reanudación de obra post paralización de 62 días. Cabe decir, la paralización ha traído como consecuencia daños en los materiales existentes, daños

continúa →

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE



Lyís Alberto Avila Morales
 CIP. N° 64846
 SUPERVISOR DE OBRA

201

CUADERNO DE OBRA

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

en la estructuras habilitadas que implicas reproceso en estructura instaladas y habilitadas como por ejemplo armaduras de acero y encofrado habilitado y colocado, así mismo, hemos tenido equipo en stand by propio y alquilado, así como, personal administrativo permanente y de custodia, movilización, exámenes médicos, etc, todos estos mayores costos se está recuperando y será presentado un informe para diferenciarlo a lo que corresponde a los mayores gastos generales por su evolución y recomendación de pago.

[Signature]
 JOSÉ JULIO
 ESPINAN AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

04/04/2018
 Asiento N° 193

El Supervisor


Sobre los gastos generales se le comunica que la supervisión, da su opinión y la entidad se encargara de evaluar sobre los daños materiales la supervisión contratada que se esta haciendo el cambio de alambre de amarrar a las estibas, lijado de las fieras y aditivo antioxidante a las fieras, a su debido tiempo cuando se salite estas gastos se da su opinión de la supervisión.

Se le solicita la presencia de los profesionales afilados en caso contrario se le aplicara la Penalidad de Acuerdo a ley.

[Signature]
Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
 JOSÉ JULIO
 ESPINAN AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

CUADERNO DE OBRA

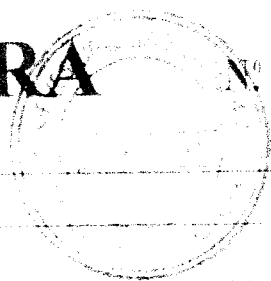

05

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

05/04/2018

Asiento N° 194

De PSV Constructores S.A.

Se le solicita a la Supervisión autorización para el fundido de concreto de cemento 1:10 + 30% PG en zona de administración.

Se realizan actividades de encastro de muros para Cisterna, colocación de acaro en pilotes y encastro, instalaciones electricas y sanitarias en zona de servicios.

Se realiza limpieza mecanica y quimica (aditivos) de estructura, cambio de alambre N°16 a estructura habilitada, excavación, acorreo y eliminación de material procedente de la ampliación que corresponde a un mayor metodo.

[Signature]
 JORGE JULIO
 ESPECIAL AVILES
 INSPECTOR CIVIL
 REG. Nº 12.9009

05/04/18

Asiento N 195

Del Superinsa

Se verifico los trabajos de encajado de muros para cisterna, instala ciones electricas y sanitarias en la zona de servicios encajado metalico de las muros para cisterna, se esta realizando la limpieza de estructura como el repellido cambio de alambre #16, aditivos en la estructura de la cisterna, se verifico el acorreo y eliminacion del material de la ampliacion ya establecida montada en el edificio Teniec

[Signature]
 Luis Alberto Azula Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
 JORGE JULIO
 ESPECIAL AVILES
 INSPECTOR CIVIL

CUADERNO DE OBRA

06

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

06/04/2018

Asiento N° 196 De PSV Constructoras S.A.
 Se solicita permiso a la Supervisión para el fundido de falso piso 1:8 mótoso en zona de servicios y fundido de concreto en muelle de cisterna con concreto tipo 315 Kg/cm².

Se le solicita a la supervisión autorización para el picado de losa de concreto en el muelle.

Se culmina con el encofrado de 03 pilotes.

Se realizan actividades de colocación de acero para viga de cimentación en zona de administración, colocación de encofrado de viga de cimentación y sobrecimiento en administración.

JOSÉ JULIO
 ESTICHANAVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. N° 119009

06/04/18

Asiento N° 197

Dl Supervisa

Se autoriza para el llenado de falso piso 1:8 en la zona de Servicios y el Variado de Concreto en las guías de la cisterna con un concreto de $f_c = 315 \text{ Kg/cm}^2$, también se está comenzando las trabajos el día de hoy con el picado de la losa de concreto en el muelle, en el área de Administración se está colocando de acero para viga de cimentación también el encofrado de los pilotes, se le solicita al Ing. Residente la presencia de los especialistas en estructura, eléctrico y sanitario.

Luis Alberto Avila Mora
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

ING. INSPECTOR


ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

07

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____



07/04/2018

Asiento N° 198 De PSV Constructores S.A.
 con carta N° 066-2018/PSV-CMM se presenta el
 Informe N° 012-2018/PSV-CMM Sustento de Ampliación
 de Plazo N° 02 a la Supervisión.

Se solicita a la Supervisión autorización para el
 fundido de concreto 350 Kg/cm² de 03 pilotes.
 Se realiza actividades de picado de losa concreta en
 el muelle, encofrado de viga de cimentación y sobrecimiento
 en zona de administración, excavación, acarreo y elimina-
 ción de material en sector ampliación N° 1.

JOSÉ JULIO
 ESPINOSA AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 REG. Nº 119009


07/04/18

Asiento N° 199

Nº Superviso

se continua con los trabajos de picado en la losa de concreto del
 muelle con Ratemadillo, en el área de administración se continua con
 el encofrado de la viga de cimentación y sobrecimiento, se autoriza el
 vaciado de concreto $f_c = 350 \text{ Kg/cm}^2$ de las 3 pilotes.

Se recibe la carta N° 066-2018/PSV-CMM donde solicitan la
 ampliación de plazo N° 02 la cual ha been evaluada por la Supervisión
 se continua con el acarreo, acarreo y eliminación en ampliación N° 1


 Luis Alberto Avila Moral
 CIP. Nº 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

JOSÉ JULIO
 ESPINOSA AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 REG. Nº 119009

CUADERNO DE OBRA

Nº 08

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____



09/04/2018

Asiento N° 200 De PSV Constructores S.A.
Se realizó el fundido de concreto 350 kg/cm² de
03 pilotes.

Se realiza actividades de desencofrado y curado de
muros de cisterna, picado de losa de concreto del
muelle, encofrado de fondo de viga en zona de servicios.

[Signature]
JOSÉ JULIO
ESPINOZA AVILÉS
INGENIERO CIVIL
R.P. CIP Nº 119009


09/04/2018

Asiento N° 201

Dl Supervisor

el día de hoy se presenta a FONDEPES con Carta N° 26-2018-CMM
la solicitud de Ampliación de Plazo de ejecución por PSV Contratista
Se realizó el vaciado de concreto f'c = 350 kg/cm² de 3 pilotes, no recomendando
el pagado continuo a las pilotes bajo responsabilidad del Contratista
de Cisternas con los mismos trabajos en caso de Administrativa

[Signature]
Luis Alberto Avila Morales
CIP. Nº 84746
SUPERVISOR DE OBRA



[Signature]
JOSÉ JULIO
ESPINOZA AVILÉS
INGENIERO CIVIL
R.P. CIP Nº 119009

CUADERNO DE OBRA


FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____



10/04/2018 Asiento 202 De PSV Constructores

Se realiza actividades de encofrado de viga de cimentación y sobrecimiento armado en sector administración; Encofrado de fondo de vigas, ejecución para amutación de escalera en sector de servicios; demolición de la superficie de la losa en el muelle; desencofrado de muros cisterna, se le coloca alquitran en el muro exterior de la cisterna para impermeabilizar, excavación acuseo y eliminación de material de la ampliación NO OL que corresponde aun mayor metrado.

JCH JULIO
ESPINOZAN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

10/04/18

Asiento N° 203

Dd Supervisor

Se verifico los trabajos que se estan realizando en el Area de Servicios como el encofrado de viga de cimentación y s/cimiento armado en el Area de Servicios se esta realizando el encofrado de fondo de vigas y excavación para cimentación de la escalera en la cisterna se esta realizando el desencofrado de muros de cisterna tambien se le coloca alquitran en el muro exterior de la cisterna para impermeabilizar en el muelle se continuan con la demolición de la superficie de la losa, se sigue el acuseo y eliminación del material de la Ampliación en con maquinaria.

Luis Alberto Azula Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

207

JCH JULIO
ESPINOZAN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

CUADERNO DE OBRA

10

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

11/04/2018

Asiento N° 204

De PSU Constructores S.A.

Se continúa con el encuentro de sobrecimiento en el sector de administración.

Se le solicita autorización al Supervisor para el fundido de concreto 315 Kg/m^2 para viga cimentación y sobrecimiento armado en sector Administración, fundido de concreto 210 Kg/m^2 para cimentación de cisterna en sector de servicios, fundido de concreto 350 Kg/m^2 para pilotes.

Se realizó actividades de encuentro de fondo de viga en sector de servicios y picado de losa en el cobazo nuevo; Trazo y replanteo para cimentación de la caseta de bombeo, picado para profundizar la losa en el muelle para cimentar la caseta de bombeo. Visita del Ing. Raúl Mora al DPA Morona. Encuentro de losado cisterna y colocación de acero.

PSU
ESPÍRITAN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 119009

11/04/18

Asiento N° 205

Del Supervisor

Se autoriza el Vaciado de Concreto $f_c = 315 \text{ Kg/m}^2$ Para viga de Cimentación y Sobrecimiento en el Área de Administración, Concreto $f_c = 210 \text{ Kg/m}^2$ Para Cimentación de muelle y $f_c = 350 \text{ Kg/m}^2$ Para Pilotes
al día de Hoy termino la visita al Ing. Raúl Mora jefe de obra de Fandepes

Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

N° 11

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

12/04/2018

Asiento N° 206 De PSU Constructoras S.A.
 Se solicita a la Supervisión autorización para el fundido de concreto 315 Kg/cm^2 para losa de cisterna Encotrado de sobrecimiento en secto Administración, encotrado de losa aligerada en Tercas Pivotes, picado de losa en cabeza nueva, colocación de armadura de muro en caseta de bombeo; compactación alrededor de cisterna con material de préstamo.

Demolición de cerco perimetrico en el frontis del DDA.

JUAN JULIO
 ESPINOSA AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

12/04/18

Asiento N° 207

D.D. Supervisa

el día de Hoy se realiza el vaciado de la losa de la cisterna con concreto $f'c = 315 \text{ Kg/cm}^2$ se le recomienda al cuadro respectivo se continúe con el encotrado de la losa aligerada en el area de Tercas Pivotes se le recomienda al Ins Residente respetar la altura que manda en el Pedido de obra

Se verifica la demolición del cerco perimetrico en el frontis del DDA, se esta rellorando con material de préstamo y compactandolo alrededor de la cisterna

Alberto Adán Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

N° 12

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

13/04/2018 Asiento N° 206 De PSU Constructores S.A.
 En el presupuesto contractual no esta considerado el
 encofrado de friso de losa del muelle, existe medida
 que debiera ser reemplazado, estas actividades
 generaran mayores metrados que seran cuantificado
 y valorizado.

Según el plano M-01 indica que el muelle tendra
 una pendiente de 0.52%, teniendo una cota de
 inicio en puente de +3.05 y fin de cabeza de +2.50,
 actualmente el muelle tiene pendientes variables, la
 cota de inicio de puente es de +3.13 y fin de puente de
 +2.57; la cota de inicio de cabeza antiguo es de
 +2.57 y fin de cabeza antiguo de +2.62, cota de inicio
 de cabeza nuevo es de +2.62 y fin de cabeza nuevo de
 +2.67; se le solicita a la Supervisión su pronuncia-
 miento y definir una pendiente e verias que el muelle,
 considerando que la capa de concreto nuevo no debria
 ser menor a 20 cm.

JOSÉ JULIO
 ESPICHAN AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009

13/04/2018

Asiento N° 207 De PSU Constructores S.A.

Asunto: Sobrecimiento en cueto de bombas.

En el plano E-21 según detalle 1, se aprecia un
 relleno de concreto (sobrecimiento) sin dimensiones de
 espesor de 0.13 (concho de ladrillo); se recomienda que
 la altura del relleno de concreto sea de 0.60 m.; se

ING. INSPECTOR

JOSÉ JULIO
 ESPICHAN AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 119009



Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

210

CUADERNO DE OBRA

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____



solicita a la supervisión su pronunciamiento y autorización para realizar el cambio.

[Signature]
 JOSE LUIS
 ESPICHAN AVILES
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 119009


13/04/18
 Asiento N° 208

Del Supervisor

Respecto a la solicitud en el asiento n° 206 por el Ing. Residente se va a hacer la consulta al Projectista de FONDEPES que de base el expediente tecnico se va a verificar sobre el encajado de pisa de la base de muelle y el cambio de armadura que deben ser reemplazadas.
 se acepta la recomendacion sobre el sobrecemento del Cuato de bambu a una $h = 0.60m$

[Signature]

 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA



[Signature]
 JOSE LUIS
 ESPICHAN AVILES
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 119009

CUADERNO DE OBRA

Nº

14

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

13/04/2018

Asunto Nº 209

De PSU Constructores S.A.

Asunto: Solado en muro de contención para cerco perimetrico. Para la amentación del muro de contención para el cerco perimetrico, no se esta considerando el fundido de solado 100 kg/cm², h = 4" ; esta partida es necesario su ejecución, por lo que genera un mayor metrado que será cuantificado y posteriormente valorizado, se le solicita a la Supervisión su autorización para la ejecución de dicha partida.

[Handwritten signature]
JULIO ESPINOSA AVILÉS
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N.º 119019

13/04/18

Asunto Nº 210

Del Supervisor

Al Revisar las Planas me se encuentra el solado que debería ir en las cimentaciones, se va hacer la consulta a FONDEPS por que esta genera mayor metrado la cual debere decidir. Se le solicita y reitera al Ing. Residente la presencia de las especialistas en obra bajo su responsabilidad.

[Handwritten signature]
Luis Alberto Avila Moral
CIP. N.º 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

[Handwritten signature]
JULIO ESPINOSA AVILÉS
INGENIERO CIVIL
REG. N.º 119019

CUADERNO DE OBRA

Nº 15

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____


13/04/2018


Asiento Nº 211 De PSU Constructores S.A.


Ajunta: Diseño estructural de muro de contención para
Cerca paramétrica.


En el expediente técnico no se detalla el diseño estructural del muro de contención; distribución de ceras, dimensiones.

En el plano P-02, en los cortes X-X, Y-Y, Z-Z se indica que el talón de equilibrio central de volteo no recibe la masa de relleno (lado exterior), muy al contrario lo que recibe la masa de relleno en el puntal y que esta quedando en la parte exterior. Se propone el diseño según gráfico siguiente:

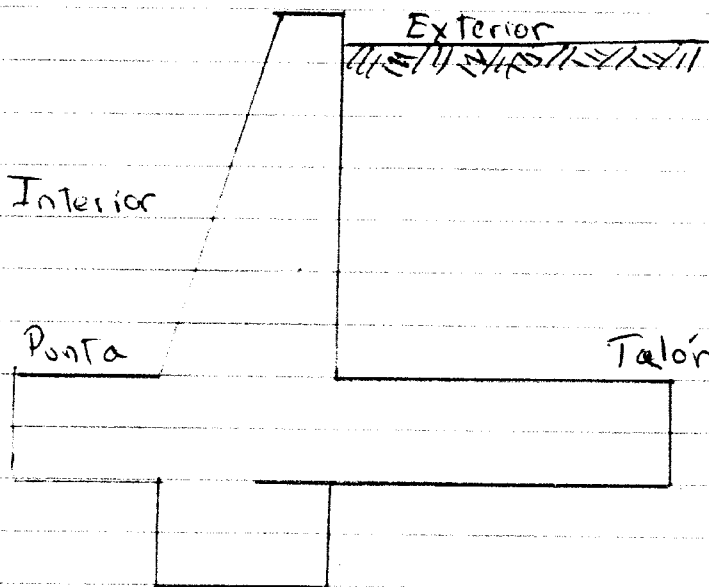


 ING. JUAN AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP Nº 119009


 Luis Alberto Avila Mora
 CIP. Nº 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS


 ING. JUAN AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP Nº 119009

CUADERNO DE OBRA

N°

16

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____


ENTIDAD EJECUTORA: _____

13/04/18

Asiento N° 212

El Supervisor

Con informe n° 028-2018/LAAM/S-S alcanza el plano del diseño estructural del Museo de Cantencos encartado en el expediente Técnico en digital encartado en las planas de estructura y obras de masonería con el Memo de Cálculo Marcans en el archivo Museo Cantencos Cero Marcans se le laminaron al ins. Arturo en forma verbal si hea el diseño del Cuel Cantencos que ni hea el diseño, se acepta el diseño del grafico se consulta al ins. Jose Paudo Coordinador de obra

 Luis Alberto Abitia Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

14/04/2018

Asiento N° 213


De PSV Constructores S.A.


Asunto: Ampliación de Plazo N° 01.

Con fecha 28/11/2017 se presento la carta N° 020-2017/PSV-CMM adjuntada al Informe N° 004-2017/PSV-CMM.


Sustento de Ampliación de Plazo N° 01, a la Supervisión. Hasta la fecha no existe pronunciamiento de la Entidad ni existe opinión de la Supervisión, por lo tanto, según se indica en el artículo 170, numeral 170.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, se considera ampliado el plazo solicitado.

Se le estará presentando al Supervisor la programación CPM correspondiente considerando los 06 días calendario de ampliación de plazo.


ING. INSPECTOR


Luis Alberto Abitia Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA
ING. SUPERVISOR 214

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

14/04/18

Asiento N° 214

D^a Supervisas

Se envia a FONDEPES el pedido de Ampliación de Plazo N° 01 con Carta N° 020-2017-CMM con fecha 30/11/17 estando como supervisor a Ing. Julio Cesar Quiroz Ayala, hasta la fecha no hay Pronunciamiento de FONDEPES

Se le reitera de nuevo al eng. Residente la Presencia de las especialistas que indica las bases como son: Estructurista, electrico y sanitario la cual no estan cumpliendo generando Penalidades de Acuerdo al Reglamento Nacional de Construcciones.

Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

14/04/2018

Asiento N° 215

De PSU Constructor SA.

Se presento a la Supervision el RFI N° 15 sobre la definicion de la resante del muelle.

Se continua con el picado de losa del muelle, colocacion de armadura para caseta de bombeo en muelle, encofrado de vigas prefabricadas para plataforma baja del muelle.

Asentado de lazo de cuatros de bomba, excavacion para cimentacion de muro de contencion, encofrado de losa aligerada en tareas previas, desmoldado de sobre cimienta en zona de administracion, excavacion, acarreo y eliminacion de material procedente de la ampliacion N° 1 para muro de contencion.

JULIO ESPINOZA AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Red. CIP N° 119009

Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

ING. INSPECTOR

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR 215

CUADERNO DE OBRA

18

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____


14/04/18

Asiento N° 216

D. J. Supermas

Se verificó los trabajos de picado de losa en el muelle, colocación de armadura para la loseta de bamba en el muelle, encajado de las vigas Prefabricadas para la plataforma baja del muelle, asentado de ledillo en el cuarte de bamba encajado metálico en el cue de Tareas Fijas, y colocación de zanja para el muro de contención.

Se envió a FONDERES con Carta N° 032-2018-CMM con fecha 16/04/18 para su sanción respectiva sobre la pasante del Muelle, se continúa con el trabajo de Alcanzo y eliminación del material con maquinaria procedente de la Ampliación C1.

 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

16/04/2018


Asiento N° 217


De PSV Constructores S.A.

Se presentó a la Supervisión el RFI 16: Solado para muro de contención y RFI 17: fisco (encastro) y armadura en losa de muelle.

Se realizaron actividades de Asentado de muro en sector de Administración, Habilitación y colocación de acero en viga invertida en Tareas Fijas, encastro de cemento corrido en zona de servicios, picado de losa en muelle, encastro de viga de plataforma baja del muelle, Asentado de ledillo en cuarte de bomba a control.

Excavación y eliminación de material para cimentación de muro de contención.


JUAN AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 119099


Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

216

CUADERNO DE OBRA

N°

19

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____


ENTIDAD EJECUTORA: _____

16/04/18

Asiento N° 218

OJ Supervisor

Se envió a FONDEPES la Consueta del Proyectista de las RFI 16 y 17 para su evaluación y Pronunciamiento ya que la ejecución de estas Partidas generará un Adicional de obra, la supervisión opina que si son necesarias estas Partidas su ejecución para dar cumplimiento a la malla trazada de la obra se compraba el detenimiento de la malla de la casa del Puerto Muelle con Carta N° 33-2018-CMM se envió a FONDEPES para su Pronunciamiento



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS


17/04/2018

Asiento N° 219


De PSV Constructores S.A.

Se presento a la Supervisión el RFI N° 18 planteando la no instalación de Rd de agua salada para Grifer en el muelle.

Se realizan actividades de encubrimiento de columnas en cisterna, asentado de muro de ladrillo en zona de administración y rehabilitación y colocación de acero para viga invertida en losa de taraca previa, picado de losa del muelle, asentado de ladrillo en cuartito de control, fundido el concreto para solado para cemento con de muro de contención eje F-L y Excavación para cimentación de muro de contención.



JUAN AVILÉS
INGENIERO CIVIL
R.F. CIP. N° 119009



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

ING INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR 217

CUADERNO DE OBRA

20

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____


17/04/18

Asiento N° 220

D. Supervisión

Se continúa con los trabajos de encajados de columnas en el sistema, asentado de rodillo en el área de Administraciones, se está colocando las áreas para la viga invertida en el aligerado de Tareas Puerias, se sigue con el picado de lasa en el muelle, se está variando la cante para cimentación en el yel-T de mano de Cimentación la sup. no autoriza el variado hasta que la entidad se pronuncie respecto a esta partida

Se envia a FONDEPES con Carta N° 034-2018-CNM sobre la consulta del Ing. Residente con RFI N° 18


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

17/04/2018

Asiento N° 221

De PSV Constructores S.A.

Asunto: Respuesta a los Asientos N° 210 y 214 de la Supervisión.

Los días 16 y 17/04/2018 estuvo presente en obra el Ing. especialista en Instalaciones Sanitarias.


El día 16/04/2018 se tuvo reuniones en la oficina de Fondapes en Lima nuestro Ing. especialista en instalaciones eléctricas con los Ing. especialistas de Fondapes.

Nuestros Ingenieros especialistas están realizando visitas periódicas a la obra y reuniones periódica en la ciudad de Lima con sus respectivos especialistas de Fondapes

continua →

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

INGENIERO ESPECIALISTA
 SUPERVISOR DE OBRA
 FONDEPES
 CIP. N° 112023

218

CUADERNO DE OBRA

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

En los gastos generales variable el costo de los especialistas de Instalaciones eléctrica y Sanitarias esta considerado por un periodo de tiempo de 1 mes, es decir con un porcentaje de participación de 12.5%, la participación de nuestros especialista entre visita a obra, reuniones con Fondos y Trabajo de Gabinete supera el 12.5%, el Trabajo de gabinete que han realizado los especialistas es la revisión del expediente, prueba de estos son los distintos RFI emitido y reuniones de coordinación con la entidad.

[Signature]
 JOSE JULIO
 SANCHEZ AVILES
 INGENIERO CIVIL
 REG. C. 17.118.005

17/04/18

Asiento N° 222

D^o Supervisor


Los días 16 y 17 de Abril se hizo presente la ing. Santarica a la obra hasta el momento las RFI presentados por la empresa ejecutante no llevan la firma de los especialistas ni informes y fotos de las reuniones que tienen en la ciudad de Lima, sobre el % de Presencia a se esta consultando al ing. Baudes via telefono ya que en las bases integradas dicen un 25% y en el expediente tecnico en gastos generales un 12.5%, me salamente el especialista es de Gabinete su función es estar en el campo.

habiendo transcurrido 08 dias no hay Presenciamiento de FONDEDES sobre la Ampliación de Plazo n° 2 solicitado por la empresa P.S.V

[Signature]
 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
 JOSE JULIO
 SANCHEZ AVILES
 INGENIERO CIVIL
 REG. C. 17.118.005

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

18/04/2018

Asiento N° 223

De PSV Constructores S.A.

Se continua con los Trabajos de excavación para cimentación de muro de contención, picado de losa de muelle, encofrado de columnas para tanque elevado, encofrado de caseta de bombeo en muelle, fundido de soldado para cimentación de muro de contención.

Se le solicita autorización a la Supervisión para el fundido de concreto en columnas para tanque elevado.

Se esta realizando excavación, acarreo y eliminación de material procedente de la ampliación 1.

JULIO ESPINHAN AVILES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 119009

18/04/18

Asiento N° 224

Del Supervisor

Se verifico los trabajos que se estan ejecutando en el muro de contención como la elevación de zanja y encofrado, en el muelle continuo con el picado de la losa, encofrado de columnas para el tanque elevado, se esta encofrando la caseta de bombeo en el muelle, se continúa el vaciado de concreto de las columnas que se encuentran ubicado en el tanque elevado, se continuo con la eliminación y acarreo de material procedente de la ampliación 01

Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA


ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

220

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

19/04/2018

Asiento N° 225 De PSV Constructores S.A.

Se realizan las actividades de zimado de cura para repata de muro de contención, excavación para cimentación de muro de contención, eliminación de material procedente de la excavación, picado de losa de muelle, encuentro de muros para caseta de bombeo en muelle.

Se le solicita a la Supervisión autorización para el fondo de flete por el costo de eguipo (cisterna).

[Handwritten signature]
JULIO
EN CIVILES
CIVIL
19009

19/04/2018

Asiento N° 226 De PSV Constructores S.A.

Asunto: Reemplazo de material en eje A9 eno parametrico.

Durante la excavación en el cerco parametrico eje A9, se ha encontrado material organico con presencia de basura, por lo que no es recomendable realizar la cimentación del cerco parametrico sobre dicho material; se recomienda realizar un reemplazo de material que consiste en realizar trabajo de excavación, acceco, eliminación de desmonte y relleno compactado con material de préstamo.

Se deja constancia a la Supervisión sobre la presencia del material encontrado y se solicita autorizar la ejecución del reemplazo de material, para posteriormente realizar la cimentación del cerco parametrico.

continuar →

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746 G. SUPERVISOR DE OBRAS

226

CUADERNO DE OBRA

000029

Nº 24


FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____



La ubicación del tramo del arco perimetrico corresponde a la amplitud 1, que son aproximadamente 18 m.

[Signature]
INGENIERO CIVIL
Reg. N.º 115006


19/04/18

Asiento N.º 227

Del Supervisor

Se comprueba la presencia de basura en el eje que da para la Playa del arco perimetrico, se recomienda reemplazar con material de puntamo y su respectiva compactación, se está trabajando con el armado de Arco para la zapata del muro de contención, eliminación de material de la ubicación, se continúa con el picado de la losa de muelle se anticipa el vaciado de concreto en el falso piso del muro de equipo

[Signature]
Luis Alberto Avila Morales
CIP. N.º 84746
SUPERVISOR DE OBRA



[Signature]
Luis Alberto Avila Morales
CIP. N.º 84746
SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
INGENIERO CIVIL
Reg. N.º 115006

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

N°
25

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

20/04/2018

Asiento N° 228

De PSV Constructores S.A.

- Con carta N° 077-2018/PSV-CHM se presenta a la Supervisión el resultado de laboratorio del Ensayo de Abrasión de la piedra que se usará para el ornecado exterior de la canteira del Cerro el Huevo, teniendo como resultado una piedra en el primer rango de calificación excelente a buena.
- Se le solicita autorización a la Supervisión para el fundido de solado en el segundo tramo de muro de contención.
- Se realiza actividades de encofrado de sobrecimiento en servicios, excavación para cimentación del tercer tramo de muro de contención, eliminación de material, encofrado de sobrecimiento en Administración.
- Se solicita autorización a la Supervisión el fundido de concreto en zapata de muro de contención, vigas prefabricada para plataforma baja del muelle y caseta de bombeo en muelle.

20/4/18

Asiento N° 229

Dl. Supervisa

Se verificó los trabajos del vacado del solado en el segundo tramo del muro de contención, encofrado de sobrecimiento en el área de Administración. Se autoriza el vacado de concreto de la zapata del muro de contención. También las vigas prefabricadas para la plataforma baja del muelle y de la caseta de bombeo del muelle.


ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

223

CUADERNO DE OBRA




FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

21/04/2018

Asiento N° 230 De PSV Constructoras S.A.
 ASUNTO: Autorización para fundido de solado y zapata en muro de contención.

Se solicita a la Supervisión autorización para el fundido de solado de tercer tramo de muro de contención y zapata del segundo tramo de muro de contención.



 INGENIERO
 DON ANTONIO AVILES
 INGENIERO CIVIL
 N° 111111111

21/04/18

Asiento N° 231

Pl Supervisor

Se autoriza el vaciado del solado y la zapata en muro de contención también el solado del tercer tramo y zapata del segundo tramo del muro de contención se continúa con el asentado de ladrillos y encajados de columnas en el Area de Administracion





 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

21/04/2018

Asiento N° 232


De PSV Constructoras S.A.

Asunto: Reunión de Coordinación de la especialidad de DISE. El día 16/04/2018 en las Oficinas de Fondipes en la ciudad de Lima se tuvo una reunión de coordinación en la especialidad de IEE, en donde se acordó que el expediente Técnica IEE bajo Tensión será replanteado



 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746 SUPERVISOR
 Continuar →

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE


 INGENIERO
 DON ANTONIO AVILES
 INGENIERO CIVIL
 N° 111111111

CUADERNO DE OBRA

27

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

confirme a los puntos indicados en dicha reunión y las consideraciones que se han planteado en los otros DPA's. Según Informe N° 012-2018-Fondepes/DIGENIPAA/RGYC en respuesta a las consultas al RFI N° 10, el proyectista recomienda una mejora en el Expediente Técnico.

Por lo expuesto anteriormente y teniendo programado el fondeo de concreto de los losas aligeradas de tercer nivel y Cigoto de control, solicitamos a la Supervisión coordine con la entidad para que se entregue estas mejoras y replanteo del expediente técnico en el más breve plazo posible o caso contrario confirme continuar con el expediente técnico contractual.

Cabe mencionar que de continuar con los pliegos contractuales, la ejecución de futuros cambios, mejoras y replanteo conllevará a realizar demoliciones, dando lugar a adicionales y/o mejoras metrados.

ING. JUAN AVILES
 INGENIERO CIVIL
 REG. N° 113005

Asiento N° 233

al Supervisor

Se va a comunicar a FONDEPES sobre la recomendación de una mejora en el expediente Técnico, se le solicita al Asistente Presentar las RFI con anticipación ya que lo está presentando a pocas días de su vencimiento.

ING. Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

28


FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

23/04/2018

Asiento N° 234 De PSU Constructoras S.A.

Asunto: Anclaje de armadura de columna de amarre en muro de contención.

En el Plano P-04 no se tiene especificado el detalle de anclaje de columnas de amarre en muro de contención, se propone el siguiente detalle:

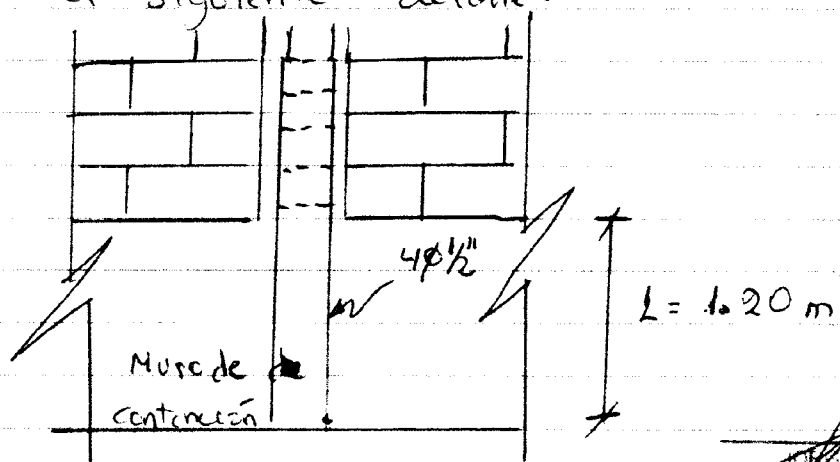

JULIO
 ESTEBAN AVILES
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 115009

23/04/18

Asiento N° 235

D.J. Supervisas

Se le indica al mg. Residente que se acepta lo que está proponiendo en las columnas de amarre en el muro de contención. Se le indica al mg. Residente el proceso constructivo para el vaciado de la base del muro de contención con los trabajos en las áreas de Administración y encafo de Aligado en la zona de Taras Prietas

Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

N° 29

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

23/04/2018

Asiento N° 236 De PSU Constructores S.A.

Asunto: Autorización para fundido de concreto.

Se solicita a la Supervisión autorización para el fundido de concreto en zapata del tercer tramo eje F-2 de muro de contención y losa aligerada en cuartos de control y columnas en zona de Administración.

[Handwritten signature]
 INGENIERO CIVIL
 SUPERVISOR DE OBRAS

23/04/2018

Asiento N° 237 De PSU Constructores S.A.

Asunto: Hincado de Pilotes.

En el plano OM-05 se indica la distribución de los pilotes para la nueva plataforma bajo lado Izquierda. Los pilotes del eje III se ubican en el talud del enrocado, se sugiere trasladar el eje III a una cierta distancia con donde el retiro de piedra no afecte la estabilidad del talud del enrocado; el retiro de roca donde se ubicará el eje III, no está considerado en el presupuesto contractual, es necesario realizar dicha actividad de retiro de rocas previo al hincado de los pilotes del eje III; se deja constancia a la Supervisión sobre esta actividad adicional a realizar y se solicita su pronunciamiento al respecto.

[Handwritten signature]
 INGENIERO CIVIL
 INGENIERO RESIDENTE

[Handwritten signature]
 Luis Alberto Avila Moran
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

[Handwritten signature]
 INGENIERO CIVIL
 SUPERVISOR DE OBRAS

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

N°

30

FECHA: MODALIDAD:

OBRA:

PROYECTO:

PROGRAMA:


ENTIDAD EJECUTORA:

23/04/18

Asiento N° 238

Dl Supervisor

Se está verificando la ubicación del Pilote en el eje III en la plataforma base y todo lo que se ubica en el talud del empujado se va a remechar a FONDEPES y de su opinión, la supervisión sugiere el traslado del eje III a una corta distancia para que no afecte la estabilidad del empujado, se está retirando tierras que se encuentran dentro del área donde se ubica el pilote, se va a verificar la distribución de la base alquedo del cuarte de Canal y el de la zapata del trazo para su autorización, en el suelo se está reemplazando las piezas del empujado que están en mal estado por unas nuevas.

 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

24/04/2018

Asiento N° 239


De PSV Constructores S.A.


Se realizan actividades de demolición de casas en la emplicación N° 1, excavación para cimentación de losapata de muro de contención eje F-2, fundido de columnas en zona de administración, fundido de concreto de losa aligerada en cuarto de control, encofrado de viga prefabricada para plataforma baja todo lo que se ubica en el talud del empujado, encofrado de losa aligerada en torreas previas.

Con carta N° 078 - 2018 / PSV - CMM se entregó a la supervisión el RFI N° 19.

Se solicita a la Supervisión autorización para el fundido de concreto en muro de contención.

ING. INSPECTOR

 JORGE AVILA
ESP. CIVIL
ING. PRESIDENTE

 Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA

Nº 31


FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

24/04/18

Asiento N° 240

Dl. Supervisar

Se verifica los trabajos de demolición de losas en la cimentación n° 1
 Trabajo de alaración para las cimentaciones de la zapata del muro
 de contención variado de tamaño de la losa aligerada en cuanto a
 cantales, encofrado de las vigas prefabricadas para la plataforma boy
 se autiza el fondo de cemento en el muro de contención, se continúan
 con los trabajos en la plataforma del muelle con el cambio de los fierros
 que se encuentran en mal estado


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

25/04/2018


Asiento N° 241

De PSV Constructores S.A.


Se realizan actividades de excavación para cimentación de
 muro de contención, acarreo y eliminación de material
 excedente, limpieza de zona de picado de muelle con aire
 a presión (uso de compresor), colocación de ladrillo en
 losa aligerada de torcas previas, estribado de columnas
 para soporte de tongue elevado, encofrado de foso de
 losa del muelle, encofrado de fondo de losa aligerada
 en torcas previas, encofrado de columnas en Administración
 Se solicita a la Supervisión autorización para el fondo de cen-
 tado muro de contención y columnas en zona de administración

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA




FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

25/04/18

Asiento N° 242

20 Supervisión

Se autoriza el Volado de concreto $f_c = 3154 \text{ kg/cm}^2$ para el muro de contención, se continúa con las elevaciones con una retroexcavadora para cimentación del muro de contención, se está limpiando el piso de la losa del muelle con una compresora, colocación de la dula de Techo $h = 120 \text{ cm}$ en el área de Torres Previas, encajado de columnas en el sector de Administración


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

26/04/2018

Asiento N° 243

PSV constructores S.A.


Se realizan actividades de encofrado de fiso en losa aligerada de torres previas, colocación de acero en vigas chetas y de temperatura en losa aligerada de Torres Previas, instalaciones eléctricas y sanitarias en losa aligerada Torres Previas, encofrado de fiso en losa de muelle, encofrado de muro de contención de cerco perimetrico, excavación, acarreo y eliminación de material para cimentación de muro de contención.

Se solicita a la supervisión autorización para el fundido de concreto en muro de contención.

Se solicita a la Supervisión autorización para inicio de las partidas correspondiente a la Protección de empedrado, se ha realizado el trabajo y replanteo, se cuenta con el equipo necesario y los roles a pie de talud para empezar la excavación para una antiscavamento.

ING. INSPECTOR

ING. PRESIDENTE


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS
 ING. SUPERVISOR

ING. PRESIDENTE
 ING. SUPERVISOR
 ING. INSPECTOR

CUADERNO DE OBRA

N°
33

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

26/04/18

Asiento N° 244

Dl. Supermusa

Se cita verificando los trabajos de encofrado de fuses en la losa aligerada de Tareas previas, colocación de acero en vigas y de temperatura también la parte eléctrica, encofrado de fuses en la losa de muelle, se cita a la parte de Protección de encofrado, también el vaciado de concreto en el muro de contención


 Luis Alberto Abila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA


27/04/2018

Asiento N° 245

De PSV Constructoras S.A.

Se realizan actividades de: encofrado de zapata de muro de contención, culminación del encofrado de losa aligerada de Tareas previas, colocación de acero en zapata de muro de contención, picado de losa de muelle, relleno compactado en cerco perimetrico, excavación para cimentación de muro de contención, relleno compactado en administración, se continua con los trabajos de excavación de otro antiseccionamiento y colocación y acomodo de rca en otro antiseccionamiento del dique para Protección de encofrado con geotextil notejdo 270g/m². Se solicita a la Supervisión autorización para el refino y perfilado de tolud en zona de encofrado. Se solicita a la Supervisión autorización para el fundido de zapata del 4to Tramo de muro de contención con carta N° 080-2018/PSV-CNM. Se presenta a la Supervisión el RFI N° 20.

ING. INSPECTOR


 ING. PRESIDENTE


 Luis Alberto Abila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

231

CUADERNO DE OBRA

34


FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

27/04/18

Asiento N° 246

Dl Supervisa

se verificó trabajos de colocación de la malla antisísmicamente del dique de protección de empujado, colocación al granel de malla tipo de 270 gr/m², encajado de zapata de muro de contención, colocación de acero en la zapata del muro de contención
 se autorga el vaciado de la zapata del 4° Tramo con $f_c = 315 \text{ kg/cm}^2$


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

28/04/2018


Asiento N° 246


De PSU Constructoras S.A.

se realizan actividades de: Aplicación de asfáltica Transfer-mader de oxido en losa del muelle en acero corroído; asentado de ladrillo en cerco perimetrico eje F-L, estabudo de columnas en cerco perimetrico eje F-L, encajado de pantalla de murado de contención; excavación, sacreo y eliminación de material proveniente de la excavación de murado de contención, relleno compactado con material de préstamo en administración, encajado de columnas para soporte de tenaje elevado, encajado de vigas y losa aligerada en área de servicios.

se solicita autorización de la supervisión para el inicio de la colocación y acomodo de roca en Talud de dique, se cuenta con las rocas y equipos para el correcto cumplimiento de la ejecución de los trabajos y geotextil neteado 270 gr/m².
 Aplicación de transformador de oxido en acero de losa Aligerada Torres Peñas.

ING. INSPECTOR


 ING. RESIDENTE
 10009


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR SUPERVISOR


232

9009

CUADERNO DE OBRA

35

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____




28/04/18

Asiento N° 244

De Supervision

Se verifico la aplicacion del aditivo transesterificado de cido en la losa del muelle en la malla q' estan oxidada; asentado de losido en el cerco perimetrico de acceso y eliminacion del material proveniente de la utonacion a las mallas del cerco perimetrico y malla de contencion, encajado de columnas q' sirven de soporte del tanque elevado, se autoriza la colocacion y armado de rebar en total previo tendido del grafolit


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS


28/04/2018


Asiento N° 248


De PSV Constructores S.A.


Asunto: Autorizacion para el fundido de concreto en losa aligerada en Tareas Previas.

Se solicita a la Supervision la autorizacion para el fundido de concreto de la losa aligerada en Tareas Previas, estando lista en su totalidad para recibir el concreto.


 SUPERVISOR DE OBRAS




 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS



 SUPERVISOR DE OBRAS

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: MODALIDAD:

OBRA:

PROYECTO:

PROGRAMA:


ENTIDAD EJECUTORA:

28/04/18

Asiento N° 249

Del Supervisor

Después de Revisar las instalaciones de tubería, encafitado, distribución del Acero se autoriza al Vicedirector Recomendando Primeric Variar Las Vigas después las Viguetas y Por último de Para


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OEP

28/04/2018


Asiento N° 250


De PSV Constructoras S.A.

Asunto: Recuperación de Armadura de Acero colocada.

Se esta realizando actividades de recuperación de armadura de acero colocada oxidados debido al lapso de tiempo de paralización de obra, esta actividad consiste en una limpieza mecánica eliminando resto de suciedad, grasa y exceso de óxido, quitando partículas de óxido que no estén firmemente adheridos con ayuda de un cepillo de acero, luego se aplica el aditivo Transformador de óxido con brecha, aplicando dos manos, siguiendo las recomendaciones del fabricante del aditivo.

Esta actividad antes descrita se realiza en todas las estructuras (acero corrugado) antes de realizar el fundido del concreto.


 ING. RESIDENTE



 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING SUPERVISOR 234

CUADERNO DE OBRA

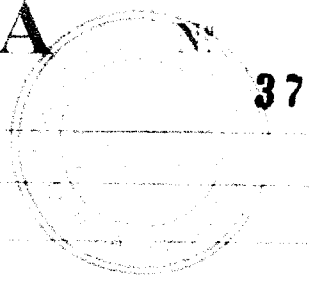

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____


PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

28/04/18
Asiento N° 251

El Supervisor

Se esta verificando el limpieza que se esta haciendo a las fieras con un cepillado y posteriormente el aditivo transfermeda, esto se realiza antes del vaciado de concreto en general


Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRA

28/04/2018

Asiento N° 252 De PSU Constructoras S.A.

Asunto: Reemplazo de armadura en losa de muelle.


En asiento N° 206 de fecha 13/04/2018, se deja constancia que en el presupuesto contractual no esta considerado el encofrado de fresa de losa de muelle y que existe armadura que debora ser reemplazada. Con fecha 16/04


En asiento N° 217 se deja constancia que se presenta a la Supervision el RFF N° 17 siendo el asunto encofrado de fresa y armadura del muelle, en donde se manifiesta que el acero corrugado encontrado al realizar el picado de la losa del muelle se encuentra en mal estado con perdida de seccion y que se debe reemplazar

El dia 26/04/2018 hubo la visita del Inje Estructural de Fondapes Juan Murguira, a quien se comunica la necesidad de realizar el reemplazo del acero corrugado en distintos sectores de la losa del muelle, debido

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE


Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746 SUPERVISOR DE OBRA


235

CUADERNO DE OBRA

Nº

38

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

al mal estado por el avanzado estado de oxidación con pérdida de sección e inclusive con la des-percepción total de la sección en algunos sectores, estando de acuerdo con nuestra recomendación.

habiente transcurrido más de 10 días de haber informado mediante Cuaderno de obra y RFI, sobre la necesidad de realizar el reemplazo de acero corrugado en diferentes sectores de la losa del muelle, que se ha encontrado en mal estado al momento de realizar el picado de losa de muelle, no se tiene respuesta alguna por parte de la Supervisión, Entidad y Proyectista.

Hasta la fecha se tiene 20 m. de muelle picado, resultando un área de 160m^2 picado, que se está en espera de realizar el fundido de concreto, cuya actividad no se puede ejecutar sin la autorización por parte de la entidad; la no ejecución de dicha actividad nos podría causar retrasos, una vez que se convierta en ruta crítica, generando ampliaciones de plazos que la Entidad deberá reconocer.



Luis Alberto Avila Morcillo
CIP. No 84746
SUPERVISOR DE OBRA

R.M. No 119009

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

236

CUADERNO DE OBRA

39

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____


PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

Asiento N° 253

Del Superinsas

La Superinsas puso de conocimiento con carta n° 033-2018 - CMM a FONDOPES sobre las RFI 16 y 17, como me heya respuesta se esta tomando la decisión con la empresa PSV reemplazar las piezas que se encuentran en mal estado por nuevas, hasta el momento ya se han colocado en redeses el cambio de las piezas en la actualidad faltan partidas para el vaciado de la losa del muelle




Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

29/04/2018


Asiento 254

De PSV Constructoras S.A.

Asunto: Trabajos de Movimiento de tierra en Ampliación I
Se deja constancia que se esta realizando trabajos de movimiento de tierra en la ampliación I que consiste en excavación, acarreo y elevación de material; el retiro de este material con presencia de basura es necesario para la armazón de la zona de Administración, Frio y muros de contención eje A-F, y debido a la presencia de basura no es apta para ser usado como material de relleno compactado propio. Estos trabajos de movimiento de tierra se tiene un avance de aproximadamente 95%. Estas actividades corresponde a un mayor método.



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

237

CUADERNO DE OBRA

N° 40

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____


ENTIDAD EJECUTORA: _____

29/04/18

Asiento N° 255

Dl. Supervisor

Se verifica la presencia de basura dentro del área de Ampliación el. se continúa con los trabajos de Acero y eliminación de material procedente de la demolición en la ampliación, estas partidas no están contempladas en el expediente técnico, estos trabajos se tiene que realizar debido que se encuentran dentro del área de Administrativa, Frio y curso de contención


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746
 SUPERVISOR DE OBRAS

30/04/2018


Asiento 256

De PSV Constructores S.A.

Se realizan actividades de encofrado de pantalla del muro de contención cuarto tramo, colocación de acero de refuerzo en muro de contención sin tramo, asentado de ladrillo del arco perimetrico de F-L, relleno compactado con material de préstamo en sector de administración, encofrado de columnas en administración, encofrado de columnas y losa aligerada en servicios, encofrado de columnas para soporte de tanque elevado, encofrado de talud, picado de losa de muelle. Se esta colocando editivo transformado de oxido en todos los aceros de refuerzos de todas las estructuras en donde existe presencia de oxido en los diferentes sectores: administración, tanques, servicios, etc.


ING INSPECTOR

ING. RESIDENTE


 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. N° 84746 RES
 SUPERVISOR DE OBRAS
 ING. SUPERVISOR

238

CUADERNO DE OBRA



41

FECHA: _____ MODALIDAD _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

30/04/18
Asiento N° 257

del Superinsan

Se verifico todo los trabajos que esta mencionando el ing. Residente en el asiento Anterior, se le comunico al ing Residente que el falso piso debe llevar una capa de afirmado de 15 cm. Como indica el expediente tecnico bajo su responsabilidad

30/04/2018

Asiento N° 258

DE PSV Constructores S.A.

Asunto: Excavación, acarreo y eliminación de material en ampliación 1.

Se ~~esta~~ realizado actividades de excavación, acarreo y eliminación de desmonte en el sector de ampliación quedando la excavación a la cota de cimentación de las estructuras que se construirá en dicho lugar. Estas actividades corresponde a un mayor metrado no previsto en el expediente tecnico que sera cuantificado y debidamente sustentado para su aprobación y pago respectivo. Esta actividad ha quedado concluida a la fecha.

ING. INSPECTOR
REG. CIP. N° 119009

ING. RESIDENTE
REG. CIP. N° 119009

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

42

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____



ENTIDAD EJECUTORA: _____

30/04/18

Asiento N° 259

Dl Superusas

El día de hoy se culminó con los trabajos de movimiento de tierra que se encuentran en la Ampliación de esta Partida no se encuentran en el expediente lo cual estamos generando un mayor metrado. Se le solicita al Ing. Residente presentar la Valorización correspondiente al mes de Abril en la fecha indicada en el Reglamento Nacional de Construcción



 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. No. 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

30/04/2018

Asiento N° 260

De PSV Constructores S.A.

Se presento a la Supervision el sustento de metrados de la valorización N° 07 correspondiente al mes de Abril 2018, las cantidades son las siguientes:

- | | | |
|---------|--|-----------------------|
| - 01.03 | Beños Químicos | 1 mes |
| - 01.04 | Cerca Perimetrica | 334 m. |
| - 01.05 | Agua para construcción | 1 mes |
| - 01.08 | Energía eléctrica provisional | 1 mes |
| - 01.09 | Flete Terrestre | 0.15 Gbb. |
| - 02.01 | Elaboración, implementación y adm. Plan de Seguridad | 0.12 und. |
| - 02.02 | Equipos de Protección Colectiva | 0.12 und. |
| - 02.03 | Equipo de Protección Individual | 0.12 und. |
| - 02.04 | Señalización Temporal de Seguridad | 0.12 und. |
| - 02.05 | Revisos para respuesta ante emergencia | 0.12 und. |
| - 03.01 | Riego del area de Trabajo | 334.41 m ² |

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE



 Luis Alberto Avila Morales
 CIP. No. 84746
 SUPERVISOR DE OBRA

240

CUADERNO DE OBRA

43

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

-03.02	Limpieza general de obra	394.41 m ²
-03.03	Plan de Contingencia	0.12 und.
-03.04	Plan de Seguimiento y Control	0.12 und.
-03.05	Plan de Cierre y Abandono	0.12 und.
-03.06	Medida de concientización y educación Amb.	0.12 und.
-05.03.06	Falso piso mezcla 1.8 e=4"	386.35 m ²
-05.04.14	Vigas, acero fy = 4,200 kg/cm ²	3,980.70 kg.
-05.04.15	Muro, concreto	106.17 m ³
-05.04.16	Muro, encofrado y desencofrado	380.04 m ²
-05.04.17	Muro, acero fy = 4,200 kg/cm ²	7,967.27 kg.
-05.04.19	Losa aligerada, encofrado y desencofrado	228.70 m ²
-05.04.20	Losa aligerada, acero fy = 4,200 kg/cm ²	866.33 kg.
-05.04.21	Losa aligerada, ladrillo hueco	2,287 und.
-05.04.25	Losa maciza, concreto f'c = 210 kg/cm ²	180 m ³
-05.04.26	Losa maciza, encofrado y desencofrado	3168 m ²
-05.04.27	Losa maciza, acero fy = 4,200 kg/cm ²	45.00 kg.
-05.07.15	Muro Cisterna, concreto f'c = 315 kg/cm ²	12.31 m ³
-05.07.16	Muro Cisterna, encofrado y desencofrado	122.41 m ²
-05.07.17	Muro Cisterna, acero fy = 4,200 kg/cm ²	1,262.50 kg.
-05.07.27	Losa aligerada, concreto 210 kg/cm ²	0.82 m ³
-05.07.28	Losa aligerada, encofrado y desencofrado	943 m ²
-05.07.29	Losa aligerada, fy = 4,200 kg/cm ²	51.43 kg.
-05.07.30	Losa aligerada, ladrillo hueco	79 und.
-09.01	Trazo y replanteo preliminar	19 m ²
-09.02	Excavación para una antiseccionamiento	41.80 m ³
-09.03	Refino y perfilado de toda zona excavada	108.30 m ³
-09.04	Extracción de roca con maquinaria	162.50 m ³
-09.05	cargue y Transporte de roca de cantera	162.50 m ³

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

Luis Alberto Avila Moral
CIP. No 84746SUPERVISOR DE
ING. SUPERVISOR

249


CUADERNO DE OBRA

000009

44


FECHA
LUGAR
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD EJECUTADA

- 09.06 Colocación y acomodo de roca en un dedique 62.70 m³
- 09.07 colocación y acomodo de roca en talud dedique 99.75
- 09.08 Suministro y habilitación de geotextil 220 gr/m² 146.30 m²
- 10.01.01 Muro de ladrillo avalla K-K Soga m=1.4 e=1.5m. 192.50 m²
- 10.04.01 Falso piso e=2" 11.18 m²
- 14.01.06 Picado losa de concreto 220.00 m²
- 14.01.10 Acarreo interno, material procedente de exc. 30.50 m³
- 14.01.11 Eliminación de material excedente 30.50 m³
- 14.02.04 Colocación de aditivo Transformador de xido 116.80 m²
- 14.04.01 Concreto con vigas y nucleos f=220 kg/m² 1.95 m³
- 14.04.02 Viga y nucleo encastrado y descastrado 15.60 m²
- 14.04.03 Viga y nucleo, acero fy=4,200 kg/cm² 1,078.65 kg.
- 14.05.05 Transporte de pilotes 6 und.




Anexo n° 261

El Supervisor y la Supervisión conjuntamente con el Ing. Residente están de Acuerdo con las medidas correspondiente al mes de Abril, la partida n° 14.02.04 no se está valorizando, la obra se encuentra atrozada teniendo un avance del 4.12% ejecutado y Acumulado a la fecha 21.40%. el Programa Acumulado es de 76.57%. Se le va a solicitar al Ing. Residente la Presentación de un Cronograma Acabado valorizado n° 02


Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
NO SUPERVISOR DE OBRAS



Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS


JORGE JULIO
ESPICHAN AVILLA

**ANEXO N° 18:
CONTRATO**



Luis Alberto Amila Morales
CIP. N° 34746
SUPERVISOR DE OBRAS



INGENIERO CIVIL
CIP. N° 119009



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

**CONTRATO N° 028-2017-FONDEPES
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA,
DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA"**

Conste por el presente documento, la contratación de la EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA", derivada de la Licitación Pública N° 002-2017-FONDEPES, que celebran de una parte:

- **EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES**, con RUC. N° 20137921601, con domicilio legal en Av. Petit Thouars N° 115, Cercado de Lima, Lima, debidamente representado por el Jefe de la Oficina General de Administración, el señor **JAVIER EDUARDO CHANG SERRANO**, identificado con DNI. N° 07209780; designado mediante Resolución Jefatural N° 044-2017-FONDEPES/J y con las facultades conferidas en materia de contrataciones mediante Resolución Jefatural N° 069-2017-FONDEPES/J de fecha 17 de noviembre de 2016, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y de la otra parte;
- La empresa **P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.**, con RUC N° 20112182021, con domicilio legal en Av. El Pinar N° 180 interior 104 Urbanización Chacarilla del Estanque en el Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, inscrita en la Partida N° 00378496, del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, debidamente representado por su Gerente General, el señor **MARIO PEÑA FUENTES** identificado con DNI. N° 06109501, según Poder Inscrito en el Asiento N° B00003 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**.

LA ENTIDAD y **EL CONTRATISTA** a quienes en forma conjunta se les denominará **LAS PARTES**, acuerdan en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 25 de agosto de 2017, el Comité de Selección adjudicó la buena pro de la Licitación Pública N° 002-2017 Primera Convocatoria para la EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA", a la empresa **P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente documento tiene por objeto la contratación de la EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA", bajo el Sistema de Precios Unitarios.

Luis Alberto Anillo Morales
CIP. N° 119009
SUPERVISOR DE OBRAS



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/. 8'871,166.29 (Ocho millones ochocientos setenta y un mil ciento sesenta y seis con 29/100 Soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en Soles, en periodos de valorización mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, **LA ENTIDAD** o **EL CONTRATISTA**, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**, **EL CONTRATISTA** tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria es de **doscientos cuarenta (240) días calendario**, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las bases.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para **LAS PARTES**.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía **EL CONTRATISTA** entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De Fiel Cumplimiento del Contrato: Por el monto de S/. 887,116.63 (Ochocientos ochenta y siete mil ciento dieciséis con 63/100 Soles), a través de la Carta Fianza N° 1842201 emitida por LA POSITIVA SEGUROS, monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA**

PSV CONSISTENTE S.A.
MARIO PENA FUENTES
SERENTE GENERAL




F. PANTA

RECEBIDO
SECRETARÍA DE
ADM. Y FINANZAS
FONDEPES
LIMA



A. CHANG



Luz Alberto Anila Morales
CIF 1080746
SUPERVISOR DE...



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un (1) adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes al inicio de la ejecución de la obra¹, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. **LA ENTIDAD** debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de **EL CONTRATISTA**. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelanto para materiales o insumos hasta por el 20% del monto del contrato original conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por **EL CONTRATISTA**.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de diez (10) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que **EL CONTRATISTA** pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.

Para tal efecto, **EL CONTRATISTA** debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de **EL CONTRATISTA** debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA


EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Por la naturaleza de la intervención no existen riesgos previsibles que pueda ocurrir durante la ejecución de las obras.

¹ El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico debe indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra debe indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

CONSTRUCTORES S.A.

MARICENIA FLORES
GERENTE GENERALMARICENIA FLORES
INGENIERO C. L.
Reg. CIP N° 119009Luis Alberto Amila Morales
CIP. N° 119746
SUPERVISOR DE OBRAS



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de **EL CONTRATISTA** es de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =	0.10 x Monto
	F x Plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: OTRAS PENALIDADES

LA ENTIDAD, conforme al artículo 134° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará a **EL CONTRATISTA** las siguientes penalidades:

PENALIDADES			
Nº	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por FONDEPES.	Uno por cinco mil (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor
2	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad.	Uno por cinco mil, (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor
3	RESIDENTE DE OBRA Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra.	Uno por cinco mil (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor





"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

4	CUADERNO DE OBRA Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, o cuando el cuaderno de obra no está in situ o no está al día.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor
5	PERDIDA DEL CUADERNO DE OBRA Si el contratista o su personal, pierde el cuaderno de obra.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor
6	EQUIPO MINIMO Cuando el contratista emplea equipos o maquinarias en obra no autorizadas previamente por el supervisor o cuando los equipos y maquinarias no cumplen con lo mínimo requerido en los presentes Términos de Referencia o cuando no presenta los equipos declarados en su propuesta técnica.	Dos por mil (2/1000) del monto del sub ítem por cada equipo que no cumpla con lo exigido en los TRD.	Según informe del Supervisor
7	MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRA No cuenta con los materiales necesarios en obra de acuerdo a su Calendario de Adquisición de Materiales.	Dos por mil (2/1000) del Monto del Contrato por ocurrencia	Según informe del Supervisor
8	POLIZA CONTRA TODO RIESGO - CAR Por cada día de atraso de no presentar la póliza.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor
9	PERSONAL PROPUESTO En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	1 UIT	Según informe del Supervisor.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 136 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de **LAS PARTES**, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

 CONST. E.S.S.A.
 MADIO PENAFARICANTES
 GERENTE GENERAL

 JOSÉ JULIO
 ESPINOZA AVILÉS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N. 111111111


P. AFARICIO

 Luis Alberto Amillo Morales
 CIP. N. 111111111
 SUPERVISOR



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de LAS PARTES del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

De acuerdo a lo establecido en el artículo 45° de la Ley, las controversias que surjan entre **LAS PARTES** sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de **LAS PARTES**. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

LAS PARTES acuerdan que todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante arbitraje institucional bajo la organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo a su Reglamento.

Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es menor o igual a 30 (treinta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de su presentación, el Tribunal Arbitral estará compuesto por árbitro único.

Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es mayor a 30 (treinta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de su presentación, el Tribunal Arbitral estará compuesto por tres árbitros.

PSV CONSTRUCTORES S.S.A.
MARIO PENA FUENTES
GERENTE GENERAL

PSV CONSTRUCTORES S.S.A.
MARIO PENA FUENTES
GERENTE GENERAL



J. CHANG



Las Albornoz Morales
CIP. N° 84748
SUPERVISOR DE OBRAS



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es indeterminable, el Tribunal Arbitral estará compuesto por tres árbitros.

LAS PARTES acuerdan que las actuaciones arbitrales se realizarán en los plazos establecidos, sin que el Tribunal Arbitral tenga facultad alguna para ampliarlos o modificarlos, no siendo posible que el Tribunal Arbitral haga uso de la facultad contenida en el numeral 4 del artículo 34 del Decreto Legislativo N° 1071.

El Laudo Arbitral emitido obligará a **LAS PARTES** y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutará como una sentencia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de **LAS PARTES** puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

LAS PARTES declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

- **DOMICILIO DE LA ENTIDAD:** Av. Petit Thouars N° 115, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.
- **DOMICILIO DEL CONTRATISTA:** Av. El Pinar N° 180 interior 104 Urbanización Chacarilla del Estanque en el Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima.

Correo electrónico: obras@psv.com.pe y mariopena@psv.com.pe

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de **LAS PARTES** debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, **LAS PARTES** lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los 15 días del mes de setiembre de 2017.

FONDEPES

LA ENTIDAD

PSV CONSTRUCTORES S.A.

MARIO PENAFUENTES
GERENTE GENERAL

"EL CONTRATISTA"

Luis Alberto Avila Morales
CIP. N° 84746
SUPERVISOR DE OBRAS
