



MEMORANDO N° 1945-2018-FONDEPES/DIGENIAA

CARGO

A : Sr. Javier Chang Serrano
Jefe de Oficina General de Administración

Asunto : Tramite VALORIZACION N° 07 DE OBRA MES DE ABRIL 2018 (1° Quincena)
"Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".

Referencia : a) CARTA N° 045-2018/. FONDEPES-AS320
b) CARTA N° 046-2018/. FONDEPES-AS32
c) CARTA N° 071-2018/. CONSORCIO SAN JOSE
d) INFORME N° 82-2018-AGH

FONDEPES OFIC. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
6 JUL 2018
CONSORCIO SAN JOSE RECIBIDO
11.40

Fecha : 06 JUL 2018

Me dirijo a Usted cordialmente, para informarle que la VALORIZACION N° 07, correspondientes a la 1° quincena del mes de abril 2018, a favor del Contratista CONSORCIO SAN JOSE, responsable de la ejecución de la obra de "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes", cabe indicar que la obra no registra avance producto de la aprobación del Adicional de Obra N° 01, por lo tanto el avance es 0.00% y la valorización es S/. 0.00 Soles

Esta Dirección emite la conformidad de la siguiente manera:

Valorización N° 07	:	S/.	0.00
I.G.V (18%)	:	S/.	0.00
TOTAL, A PAGAR	:	S/.	0.00
(Cero con 00/100 Soles) inc. IGV			

Sin otro en particular, hago propicio la oportunidad para expresarle el sentimiento de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

FONDEPES

Ing. Luis Alberto Barahera Quino
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola

LBQ/agh



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por el presente documento, que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, al suscribir la presente; da su conformidad para realizar el pago al Contratista CONSORCIO SAN JOSE encargada de la ejecución “**OPTIMIZACIÓN DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN TUMBES**” cuyo monto asciende a por concepto de **VALORIZACION N° 07** por la suma de **S/. 0.00 (Cero con 00/100 Soles) inc. IGV**. Por concepto de Valorización N° 07 de acuerdo a lo establecido en el CONTRATO N° 056-2017-FONDEPES.




Valorización N° 07	:	S/.	0.00
I.G.V (18%)	:	S/.	0.00
TOTAL, A PAGAR	:	S/.	0.00

Lima,

08 JUL 2018

FONDEPES

Ing. Luis Alberto Barbieri Quino
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola



INFORME N° 82 - 2018-AGH

A : **ING. LUIS A. BARBIERI QUINO**
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

ASUNTO : **VALORIZACION N° 07 DE OBRA MES DE ABRIL 2018 (1° Quincena)**
"Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".

REFERENCIA : a) CARTA N° 045-2018/. FONDEPES-AS32
b) CARTA N° 046-2018/. FONDEPES-AS32
c) CARTA N° 071-2018/. CONSORCIO SAN JOSE

FECHA : Lima, 04 de julio del 2018

Me dirijo a Usted, en relación a los documentos en referencia, remitida por el CONSORCIO MENDOZA & JSU encargadas de la Supervisión de la obra "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes" presento la valorización N° 07 de la obra que viene siendo ejecuta por el Consorcio San José, al respecto informo lo siguiente:

1. DATOS GENERALES

Obra : Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes.

Licitación : Adjudicación Simplificada N° 0029-2017-FONDEPES Primera Convocatoria.

Área Geográfica : 1

Ubicación : Localidad de Puerto Pizarro, distrito Tumbes, región Tumbes

Monto Referencial : S/. 1,627,021.54

Monto Contratado : S/. 1,607,074.41 con IGV
S/. 1,361,927.47 sin IGV

Adelanto Directo : No solicitado

Adelanto Materiales de obra : S/. 321,414.88 - en trámite

Plazo de Ejecución : 60 días calendarios

Contratista : **CONSORCIO SAN JOSE** (BEICON CONTRATISTA GENERALES SAC, SHEYSA CONTRATISTA SAC).

Representante Legal Residente de Obra : Betty Elizabeth Méndez Quispe

Contrato de Obra : Ing. Carlos Cotrina Orrego

Supervisión de Obra : CONTRATO N° 056-2017*FONDEPES

Representante Legal : **Consortio Mendoza & JSU**

Supervisor de Obra :

Contrato : Ing. Flor Guevara Bellodas

Fecha de Contrato : CONTRATO N° 057-2017*FONDEPES

Fecha de Contrato : 22-nov-17





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Entrega de Adel. Directo	: S/. 61,405.49 con IGV	12-dic-17
Entrega de Terreno	: 12-ene-17	
Inicio Contractual de obra	: 13-ene-17	
Ampliación de Plazo N.º 01	: Resolución de Secretaria General N° 040-2018-FONDEPES/SG	Denegada.
Ampliación de Plazo N.º 02	: Resolución de Secretaria General N° 045-2018-FONDEPES/SG	Denegada.
Ampliación de Plazo N.º 03	: Resolución de Secretaria General N° 049-2018-FONDEPES/SG	Aprobada.
Ampliación de Plazo N.º 04	: Resolución de Secretaria General N° 058-2018-FONDEPES/SG	Denegada.
Ampliación de Plazo N.º 05	: Resolución de Secretaria General N° 059-2018-FONDEPES/SG	Denegada.
Ampliación de Plazo N.º 06	: Resolución de Secretaria General N° 060-2018-FONDEPES/SG	Denegada.
Ampliación de Plazo N.º 07	: Resolución de Secretaria General N° 061-2018-FONDEPES/SG	Denegada.
Ampliación de Plazo N.º 08	: Resolución de Secretaria General N° 074-2018-FONDEPES/SG	Denegada.
Ampliación de Plazo N.º 09	: Resolución de Secretaria General N° 113-2018-FONDEPES/SG	Aprobada (60 d.c)
Ampliación de Plazo N.º 10	: Resolución de Secretaria General N° 114-2018-FONDEPES/SG	Aprobada (30 d.c)
Fin contractual de obra	: 17-jun-18	

2. ANTECEDENTES

- 2.1. Con fecha 21/11/2017 se consintió la adjudicación de la buena Pro del proceso de convocatoria con Nomenclatura AS-SM-29-2017-FONDEPES-1 para la contratación de la obra "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".
- 2.2. Con fecha 13/12/2017 se firma el CONTRATO N° 056-2017-FONDEPES de la obra "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".
- 2.3. Con fecha 15/12/2017 se firma el CONTRATO N° 057-2017-FONDEPES para la contratación del servicio de Supervisión de Obra "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".
- 2.4. Con fecha 12/01/2018 se hace la entrega del terreno para la ejecución de la obra "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- 2.5. Con fecha 13/01/2018 se da inicio al plazo contractual de la obra "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".
- 2.6. Mediante CARTA N° 045-2018/. FONDEPES-AS32 con fecha 20-abr-18 la Supervisión de obra presenta el informe de valorización N° 07 (proyectada solo por la supervisión) ante la Entidad dentro de los plazos establecidos Reglamento de la ley de contrataciones del Estado Aprobado mediante D.S N° 350-2015-EF Modificado por D.S N° 056-2017-EF de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 1341.
- 2.7. Mediante CARTA N° 046-2018/. FONDEPES-AS32 con fecha 20-abr-18 la Supervisión de obra presenta el informe quincenal de obra N° 07 de la obra "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".
- 2.8. Mediante CARTA N° 057-2018/. FONDEPES-AS32 con fecha 19-Jun-18 la Supervisión de obra presenta la valorización 07 presentada por el contratista consorcio San José mediante Carta N° 071-2018/ CONSORCIO SAN JOSE con fecha 11/06/2018 de la obra "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".

3. VALORIZACION N° 07

- 3.1. Mediante CARTA N° 045-2018/. FONDEPES-AS32 con fecha 20-abr-18 la Supervisión de obra presenta el informe de valorización N° 07 (proyectada solo por la supervisión) ante la Entidad dentro de los plazos establecidos Reglamento de la ley de contrataciones del Estado Aprobado mediante D.S N° 350-2015-EF Modificado por D.S N° 056-2017-EF de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 1341.
- 3.2. Mediante CARTA N° 057-2018/. FONDEPES-AS32 con fecha 19-Jun-18 la Supervisión de obra presenta la valorización 07 presentada por el contratista consorcio San José mediante Carta N° 071-2018/ CONSORCIO SAN JOSE con fecha 11/06/2018 de la obra "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".
- 3.3. Mediante Carta N° 046-2018/FONDEPES-AS32 con fecha 20-abr-18 la Supervisión de obra presenta el informe quincenal de obra N° 07 de la obra "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".





4. ASPECTOS LEGALES:

- 4.1. En la Cláusula Cuarta del se establece el procedimiento para dar trámite de pago a las valorizaciones en periodos quincenales, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases Integradas y en concordancia con lo establecido en el Art. 166° del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado Aprobado mediante D.S N° 350-2015-EF Modificado por D.S N° 056-2017-EF de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 1341.
- 4.2. En el Inciso 166.5 del art. 166° del RLCE, señala que los metrados de obra ejecutados se formulan y se valorizan conjuntamente con por el contratista y el Inspector y/o Supervisor y estos deberán ser presentados dentro del plazo establecido en reglamento.
- 4.3. En caso de retraso en el pago de las valorizaciones por razones imputables a la Entidad, el Contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244, 1245, 1246 del Código Civil, pero queda claro que la supervisión presentó dentro del plazo la valorización (hecha de parte), pero la contratista presenta recién su valorización a la supervisión el 11/06/2018, la supervisión mediante la CARTA N° 057-2018/. FONDEPES-AS32 con fecha 19-Jun-18 lo presenta a la entidad donde la valorización es concordante tanto por la supervisión como del contratista donde los dos concluyen que ese mes se valorizo S/. 0.00 soles. Producto de la aprobación del adicional de obra N° 01

5. ANALISIS:

5.1. DE LOS ANTECEDENTES:

- ✓ Mediante CARTA N° 045-2018/. FONDEPES-AS32 con fecha 20-abr-18 la Supervisión de obra presenta el informe de valorización N° 07 (**proyectada solo por la supervisión**) ante la Entidad dentro de los plazos establecidos Reglamento de la ley de contrataciones del Estado Aprobado mediante D.S N° 350-2015-EF Modificado por D.S N° 056-2017-EF de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 1341.
- ✓ Ahora bien, según lo descrito en el Inciso 166.5 del art. 166° del RLCE, señala que los metrados de obra ejecutados se formulan y se valorizan conjuntamente con por el contratista y el Inspector y/o Supervisor, por lo que para ser tramitada dicha valorización se requería que el contratista presente su valorización en conformidad a lo antes dispuesto.
- ✓ Con Carta N° 071-2018/ CONSORCIO SAN JOSE con fecha 11/06/2018 el consorcio San José presenta la Valorización N° 07 de la obra "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes". elevada a la entidad mediante CARTA N° 057-2018/. FONDEPES-AS32 con fecha 19-Jun-18, señala que la valorización presentada cumple con la documentación mínima necesaria.




“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
 “Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

- ✓ De acuerdo al TDR del Supervisor de Obra en Obligaciones de la supervisión donde indica lo siguiente:
Elaborar y/o revisar las valorizaciones del Contratista por obra ejecutada, sus recibos de pago y reajustes por mayor costo, según fórmulas que para el efecto figuran en el Contrato, siendo responsabilidad de LA SUPERVISIÓN cualquier error, defecto o irregularidad que pudieran tener dichos documentos.
- ✓ Mediante la referencia b), la Supervisión presenta el informe quincenal de obra N° 07, de la obra “Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes”.
- ✓ Habiendo verificado la Valorización N° 07, se ha encontrado que la planilla de metrados elaborada y suscrita por el Supervisor sustenta lo valorizado, por lo que el Supervisor determina que el monto a cancelar es de S/. 0.00 (Cero con 0/100 Soles) inc. IGV.

5.2. CONTROL ECONOMICO DEL CONTRATO

- ✓ VALORIZACION DEL CONTRATO PRINCIPAL:
 La valorización corresponde al mes de marzo del 2018 – segunda Quincena, con un avance acumulado real de 50.61% tan igual que la valorización N° 06 y donde se manifiesta que no existió avance alguno por la espera de la aprobación del Adicional N° 01, por lo tanto, la obra se encuentra atrasada en un 49.39%.
- ✓ RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA
 Luego de revisar la documentación que sustenta la Valorización de Obra N° 07 correspondiente al periodo de 01 al 15 de abril del 2018 presenta un avance real de 0.00% y un avance real acumulado de 50.61% con un avance acumulado de 100% del nuevo calendario la obra se encuentra atrasada en 49.39% atrasada.

Se aprueba la siguiente estructura de pago:

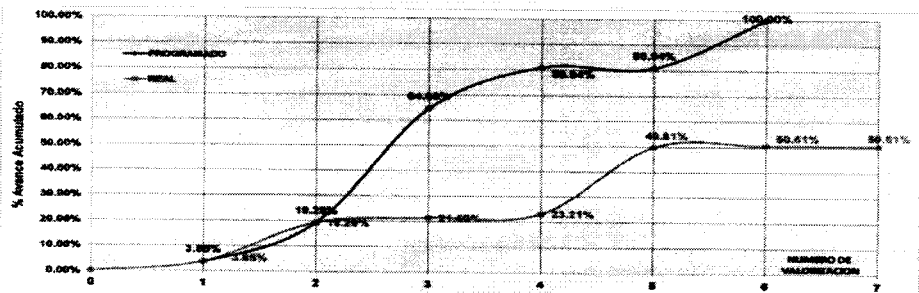

VALORIZACION	MES	AVANCE PROGRAMADO (Según Contrato)				AVANCE REAL			
		MONEDAS	%	MONEDAS	%	MONEDAS	%	MONEDAS	%
1	15-ene-18	82,400.85	3.86%	82,400.85	3.860%	82,400.85	3.86%	82,400.85	3.86%
2	31-ene-18	210,296.91	18.44%	202,696.46	19.29%	210,296.91	18.44%	202,696.46	19.29%
3	15-feb-18	618,321.89	48.40%	881,018.14	64.89%	36,104.30	2.21%	252,800.76	21.50%
4	28-feb-18	221,358.61	16.26%	1,102,376.75	80.94%	23,268.00	1.71%	316,068.76	23.21%
5	15-mar-18	0.00	0.00%	1,102,376.75	80.94%	382,263.93	28.60%	678,310.69	49.81%
6	19-mar-18	269,550.72	19.08%	1,381,827.47	100.00%	10,846.70	0.80%	699,257.39	50.61%
7	15-abr-18					0.00	0.00%	699,257.39	50.61%
TOTAL (Sin IG.V.)		1,381,827.48	100.00%					699,257.39	50.61%

Situación de la Obra : ATRASADA -49.39%



AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
 FONDEPES
 AV. PETIT THOUARS N° 115
 LIMA - PERU
 EXP. 15043



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO RIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente: FONCOPE

Contratista: Consorcio San Jose

Supervisión: Consorcio Mendez S. (S)

Sistema de Contratación: Precios Unitarios

Monto del Contrato con IGV: S/ 1'907,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018

Fecha término de obra: 13/03/2018

Plazo de Ejecución obra: 60 días calendario

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO Inicial (S/00v)	VA. ACUMULA. ACTUAL	VALORIZACION ACTUAL	VA. ACUMULA. ACTUAL	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
A VALORIZACION CONTRACTUAL						
ESTRUCTURA	529.174.67	379.746.26	0.00	379.746.26	71.76%	149.428.41
ARQUITECTURA	486.323.12	51.229.90	0.00	51.229.90	11.23%	408.093.22
INST. SANITARIAS	306.455.11	247.334.53	0.00	247.334.53	80.71%	59.120.58
INST. ELECTRICAS	69.974.98	10.946.70	0.00	10.946.70	15.64%	69.027.96
TOTAL (A)	1,391,927.47	689,267.38	0.00	689,267.38	50.81%	673,670.09
AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	50.81%	0.00%	50.81%		49.39%
B: REAJUSTE						
ESTRUCTURA		759.49	0.00	759.49		
ARQUITECTURA		204.92	0.00	204.92		
INST. SANITARIAS		209.84	0.00	209.84		
INST. ELECTRICAS		76.63	0.00	76.63		
TOTAL (B)		1,260.88	0.00	1,260.88		
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)		690,508.26	0.00	690,508.26		
C: DEDUCCIONES						
DE ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00		
DE ADELANTO MATERIALES		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (C)		0.00	0.00	0.00		
D: AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL A. DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AMORTIZACION DEL A. MATERIALES	321,414.88	2,189.34	0.00	2,189.34		319,225.54
TOTAL (D)	321,414.88	2,189.34	0.00	2,189.34		319,225.54
VALORIZACION NETA (VN=VB-C-D)		688,318.92	0.00	688,318.92		
E: RETENCIONES						
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
F: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)	1,391,927.47	688,318.92	0.00	688,318.92		673,608.55
EN I.G.V. (18% VN)	245,146.94	123,997.41	0.00	123,997.41		121,249.55
TOTAL (F)	1,637,074.41	812,316.33	0.00	812,316.33		794,858.08
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR			0.00			

Para el procesamiento de la valorización Quincenal de Obra N° 07 se realizo con los metrados conciliados por el contratista y la Supervisión.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

6. CONCLUSIONES:

De la revisión y evaluación efectuada, el suscrito encuentra conforme la Valorización N° 07, por el monto de S/. 0.00 (Cero con 0/100 Soles) inc. IGV. El Supervisor concluye que el avance de 0.00% y un avance real acumulado de 50.61% con un avance acumulado de 100% del nuevo calendario la obra se encuentra atrasada en 49.39% atrasada.

Cabe precisar, que la supervisión presento su informe y su valorización N° 07 dentro de los plazos establecidos Reglamento de la ley de contrataciones del Estado Aprobado mediante D.S N° 350-2015-EF Modificado por D.S N° 056-2017-EF de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 1341. Y en concordancia al el Inciso 166.5 del art. 166° del RLCE, señala que los metrados de obra ejecutados se formulan y se valorizan conjuntamente con por el contratista y el Inspector y/o Supervisor, por lo que para ser tramitada dicha valorización se requería que el contratista presente su valorización en conformidad a lo antes dispuesto. En consecuencia, mediante CARTA N° 057-2018/ FONDEPES-AS32 con fecha 19-Jun-18 la supervisión hace llegar Carta N° 071-2018/ CONSORCIO SAN JOSE, con fecha 11-jun-18 el consorcio San José presenta la Valorización N° 07 de la obra "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".

Asimismo, cabe mencionar que parte del retraso en la obra es en que la contratista incurre en el atraso producto de consultas en obras que estos han generado un Adicional de obra que está directamente vinculado con la mayoría de partidas contractuales, dicho adicional se recién fue aprobada el 18/05/2018 fuera del tiempo que corresponde dicha valorización.

7. RECOMENDACIONES:

En concordancia con el Art. 166° del RLCE y la cláusula Cuarta del CONTRATO N° 056-2017-FONDEPES, se recomienda realizar el pago de la Valorización N° 07 por el monto de S/. 0.00 (Cero con 00/100 Soles) inc. IGV a favor del CONSORCIO SAN JOSE.

Las Deducciones, penalidades y reajustes se calcularán en la Liquidación de Obra, para mayor orden y tener los Índices Unificados reales publicados en el Diario El Peruano.

Es todo cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

Visto el Informe, el Coordinador del Área de Obras Equipamiento y Mantenimiento de la DIGENIPAA que suscribe, lo hace suyo.

FONDEPES

Ing. Raúl A. Mpra Guillen
COORDINADOR DE OBRAS EQUIPAMIENTO
Y MANTENIMIENTO

100

100

100

100

PERU
Ministerio
de la Producción

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04743583

Usuario: pruz
Fecha: 04/07/2018
Hora: 15:11

**CARGO 01700-2018-FONDEPES/AOEM**

A: MORGAN LEON MAGALI
Asunto: CARTA N° 057-2018-FONDEPES-AS32
REMITE VALORIZACIÓN QUINCENAL DE OBRA N° 07 DEL ADICIONAL N° 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018 REF:
"OPTIMIZACION DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL DPA DE PUERTO PIZARRO - TUMBES"
Referencia: INFORME 00082-2018-FONDEPES/AGH
Fecha: 04/07/2018
Observación: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A OGA

Atentamente,

AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04743904

Usuario: **usuario_digenipaa3**

Fecha: **05/07/2018**

Hora: **10:21**



CARGO 00049-2018-FONDEPES/MML

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

Asunto: CARTA N° 057-2018-FONDEPES-AS32
REMITE VALORIZACIÓN QUINCENAL DE OBRA N° 07 DEL ADICIONAL N° 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018 REF:
"OPTIMIZACION DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL DPA DE PUERTO PIZARRO - TUMBES"

Referencia:

Fecha: 05/07/2018

Observación: SE DERIVA PARA TRAMITE DE PAGO DPA PUERTO PIZARRO S/ 0.00, VALORIZACIÓN 7, ADICIONAL 1.

Atentamente,

MORGAN LEON MAGALI





Fecha: 20/04/18

MEMORÁNDUM INTERNO N° 1689 - 201 - FONDEPES/ DIGENIPAA

Asunto: Canta #045/

Referencia: _____ Registro: 3006

Destino	Indicación	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	
OCI		OGAJ	23 ABR. 2018
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	koem.

FONDEPES
RELA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO
23 ABR. 2018
RECIBIDO
Hora: 8:40h

Observaciones: _____




Atentamente

Indicaciones:

- 01. Autorizado/Aprobado
- 02. Calificar/Evaluar
- 03. Informe
- 04. Proyectar resolución
- 05. Atención/Tramitación
- 06. Conocimiento y fines
- 07. Notificar al interesado
- 08. Reformular
- 09. Ayuda memoria
- 10. Coordinar
- 11. Opinión/Recomendación
- 12. Consolidar
- 13. Aclarar redacción
- 14. Implementar/Ejecutar
- 15. Preparar respuesta
- 16. Visación
- 17. Agregar a sus antecedentes
- 18. Archivo
- 19. Ampliar
- 20. Seguimiento

012





MEMORÁNDUM INTERNO N° 1383-201-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM

Asunto : Memo Interno N° 1689-2018-DIGENIPAA

Referencia : Registro: 3086

Destino	Indicación	Destino	Indicación

Observaciones:

Arg. Alejandro Galvez

Atentamente:



Indicaciones:

- 0.1. Autorizado/Aprobado
- 0.2. Calificar/Evaluar
- 0.3. Informe
- 0.4. Proyectar resolución
- 0.5. Atención/Tramitación
- 0.6. Conocimiento y fines
- 0.7. Notificar al interesado
- 0.8. Reformular
- 0.9. Ayuda memoria
- 10. Coordinar
- 11. Opinión/Recomendación
- 12. Consolidar
- 13. Aclarar redacción
- 14. Implementar/Ejecutar
- 15. Preparar respuesta
- 16. Visación
- 17. Agregar a sus antecedentes
- 18. Archivo
- 19. Ampliar
- 20. Seguimiento


013

Lima, 20 de abril del 2018

CARTA N° 045-2018/. FONDEPES-AS32

Señores:

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES
Av. Petit Thouars N°115 - Cercado de Lima
Lima.-




Atención : Arq. Alejandro Gálvez Hurtado.
Administrador de Contrato
Asunto : Valorización quincenal de obra N.º 07
Del 01 al 15 de abril del 2018.
Ref. : obra: Optimización de la sala de tareas previas
del desembarcadero Pesquero artesanal de
Puerto Pizarro, distrito de tumbes, provincia de
Tumbes, Región Tumbes"


De nuestra consideración:

Mediante la presente, tenemos el agrado de dirigimos a ustedes, con la finalidad de hacer entrega en un (1) original, y dos (02) copia y un (1) CD, la Valorización Quincenal de Obra N° 07 de la obra en referencia, correspondiente al periodo al periodo del 01 al 15 de abril de 2018.

Agradeciendo la atención a la presente y sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterarles los sentimientos de nuestra especial consideración.

Atentamente,

CONSORCIO MENDOZA & JSU

KATHERINE PIZARRO
REPRESENTANTE LEGAL

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	
	
2709816	
N° DOC:	00003086-2018
CLAVE:	9577
USUARIO:	dgalindo
FECHA Y HORA:	20/04/2018 17:11:09
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	



**VALORIZACIÓN QUINCENAL POR LA
SUPERVISION N° 07
(del 01 al 15 de abril)**


**“OPTIMIZACIÓN DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO
PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE
TUMBES, REGIÓN TUMBES”**

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07
DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA

OBRA: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES
 CLIENTE: FONDEPES
 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE
 SUPERVISION: CONSORCIO MENDOZA & JSU
 SIST. CONTRATISTA: PRECIOS UNITARIOS
 MONTO CONTRATO: S/. 1'607,074.41 con IGV.
 FECHA : DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

A. VALORIZACION CONTRACTUAL (V)	
ESTRUCTURA	0.00
ARQUITECTURA	0.00
INST. SANITARIAS	0.00
INST. ELECTRICAS	0.00
SUB - TOTAL	S/. 0.00
AVANCE REAL DE OBRA ACUMULADO	50.61%
AVANCE RE-PROGRAMADO ACUMULADO	64.69%
B. REAJUSTE (s)	
ESTRUCTURA	0.00
ARQUITECTURA	0.00
INST. SANITARIAS	0.00
INST. ELECTRICAS	0.00
SUB - TOTAL	0.00
MONTO DE LA VALORIZACION BRUTA (VB)	S/. 0.00
C. DEDUCCIONES	
De adelanto efectivo	0.00
De adelanto materiales	0.00
Total (C)	0.00
D. AMORTIZACIONES	
Amortización de Adelanto en Efectivo	0.00
Amortización de Adelanto de Materiales	0.00
Total (D)	0.00
MONTO DE LA VALORIZACION NETA (V.N)	S/. 0.00
Multa por Atraso de Obra (M)	0.00
E. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA SIN I.G.V.	
En Efectivo	0.00
En I.G.V. (18% VN)	0.00
MONTO TOTAL DE LA VALORIZACION CON I.G.V.	0.00
F. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	S/. 0.00

LUDY N. VICENTE BASSILIO

 SUPERVISOR DE OBRA

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Ciente : FONDOPEs

Contratista: Consorcio San Jose

Supervision: Consorcio Mendoza & JSU

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios


Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'607,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018

Fecha termino de obra: 13/03/2018

Plazo de Ejecucion obra: 60 días calendarios

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO Inicial (S/IGV)	VA. ACUMULA. ACTUAL	VALORIZACION ACTUAL	VA. ACUMULA. ACTUAL	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
ESTRUCTURA	529,174.87	379,746.26	0.00	379,746.26	71.76%	149,428.41
ARQUITECTURA	456,323.12	51,229.90	0.00	51,229.90	11.23%	405,093.22
INST. SANITARIAS	306,455.11	247,334.52	0.00	247,334.52	80.71%	59,120.59
INST. ELECTRICAS	69,974.56	10,946.70	0.00	10,946.70	15.64%	59,027.86
TOTAL (A)	1,361,927.47	689,257.38	0.00	689,257.38	50.61%	672,670.09
AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	50.61%	0.00%	50.61%		49.39%
B: REAJUSTE						
ESTRUCTURA		759.49	0.00	759.49		
ARQUITECTURA		204.92	0.00	204.92		
INST. SANITARIAS		209.84	0.00	209.84		
INST. ELECTRICAS		76.63	0.00	76.63		
TOTAL (B)		1,250.88	0.00	1,250.88		
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)		690,508.26	0.00	690,508.26		
C: DEDUCCIONES						
DE ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00		
DE ADELANTO MATERIALES		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (C)		0.00	0.00	0.00		
D: AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL A. DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AMORTIZACION DEL A. MATERIALES	321,414.88	2,189.34	0.00	2,189.34		319,225.54
TOTAL (D)	321,414.88	2,189.34	0.00	2,189.34		319,225.54
VALORIZACION NETA (VN=VB-C-D)		688,318.92	0.00	688,318.92		
E: RETENCIONES						
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL(E)		0.00	0.00	0.00		
F: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)	1,361,927.47	688,318.92	0.00	688,318.92		673,608.55
EN I.G.V. (18%*VN)	245,146.94	123,897.41	0.00	123,897.41		121,249.53
TOTAL (F)	1,607,074.41	812,216.33	0.00	812,216.33		794,858.08
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR			0.00			

LUCY N. VICENTE BASSILIO

 SUPERVISORA DE OBRA

RELACION DE VALORIZACIONES TRAMITADAS PARA PAGO

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Ciente : FONDOPES

Contratista: Consorcio San Jose

Supervision: Consorcio Mendoza & JSU

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios

Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'607,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018

Fecha termino de obra: 13/03/2018

Plazo de Ejecución obra: 60 dias calendarios

N°	VALORIZACIONES		REALISTE AUTORIZADO	DEDUCCIONES POR ADELANTOS		VALORIZACION BRUTA	AMORTIZACION DE ADELANTOS		VALORIZACION NETA		
	FECHA	MONTO V		R	DIRECTO		MATERIALES	DIRECTO	MATERIALES	EN EFECTIVO	I.G.V.
1	15-ene-18	52,400.55	104.80	0.00	0.00	52,505.35	0.00	0.00	52,505.35	9,450.96	61,956.31
2	31-ene-18	210,295.91	702.04	0.00	0.00	210,997.95	0.00	0.00	210,997.95	37,979.63	248,977.58
3	15-feb-18	30,104.30	61.37	0.00	0.00	30,165.67	0.00	0.00	30,165.67	5,429.82	35,595.49
4	28-feb-18	23,246.00	-733.01	0	0	22,512.99	0	0	22,512.99	4,052.34	26,565.33
5	15-mar-18	362,263.93	1,039.05	0	0	363,302.98	0	0	363,302.98	65,394.54	428,697.52
6	31-mar-18	10,946.70	76.63	0.00	0.00	11,023.33	0.00	2,189.34	8,833.99	1,590.12	10,424.11
7	15-abr-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		689,257.39	1,250.88	0.00	0.00	690,508.27	0.00	2,189.34	688,318.93	123,897.41	812,216.34

LUCY N. VICENTE BASSILO
Lucy Vicente Bassilo
SUPERVISOR DE OBRA

REINTEGRO AUTORIZADO POR REAJUSTE

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente : FONDOPE

Contratista: Consorcio San Jose

Supervision: Consorcio Mendoza & JSU

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios

Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'607,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018

Fecha termino de obra: 13/03/2018

Plazo de Ejecucion obra: 60 D.C.

Amplacion de Plazo N°03: 6 D.C.

Nueva fecha de termino 19/03/2018

Val. N°	MES	VALORIZACION		K-1	REINTEGRO		REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO	REINTEGRO NETO AUTORIZADO
		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		
FORMULA N°01 - ESTRUCTURA								
1	15-ene-18	52,354.03	52,400.55	0.002	104.71	104.80	104.80	104.80
2	31-ene-18	336,480.88	69,577.76	0.002	672.96	139.16	139.16	139.16
3	15-feb-18	133,574.61	29,521.29	0.002	267.15	59.04	59.04	59.04
4	28-feb-18	4,158.01	23,246.00	0.002	8.32	46.49	46.49	46.49
5	15-mar-18	2,807.35	0.00	0.002	5.21	0.00	0.00	0.00
6	19-mar-18	149,428.40	205,000.68	0.002	298.86	410.00	410.00	410.00
ACUMULADO ACTUAL		678,663.07	379,746.28		1,367.21	769.49	349.49	769.49
REINTEGRO ACUMULADO ANTERIOR								769.49
REINTEGRO ACTUAL								0.00

FORMULA N°02 - ARQUITECTURA								
1	15-ene-18	0.00	0.00	0.004	0.00	0.00	0.00	0.00
2	31-ene-18	38,878.35	21,726.89	0.004	155.51	86.91	86.91	86.91
3	15-feb-18	132,699.07	583.01	0.004	530.80	2.33	2.33	2.33
4	28-feb-18	69,806.06	0.00	0.004	279.22	0.00	0.00	0.00
5	15-mar-18	214,939.65	0.00	0.004	859.76	0.00	0.00	0.00
6	19-mar-18	405,093.22	28,920.00	0.004	1,620.37	115.68	115.68	115.68
ACUMULADO ACTUAL		466,323.12	61,229.90		3,445.66	204.92	204.92	204.92
REINTEGRO ACUMULADO ANTERIOR								204.92
REINTEGRO ACTUAL								0.00

FORMULA N°03 - INST. SANITARIAS								
1	15-ene-18	2,924.25	0.00	0.004	11.70	0.00	0.00	0.00
2	31-ene-18	296,341.20	118,991.26	0.004	1,185.36	475.97	209.84	209.84
3	15-feb-18	7,189.67	0.00	0.004	28.76	0.00	0.00	0.00
4	28-feb-18	0.00	0.00	0.004	0.00	0.00	0.00	0.00
5	15-mar-18	0.00	0.00	0.004	0.00	0.00	0.00	0.00
6	19-mar-18	59,120.61	128,343.24	0.004	236.48	513.37	0.00	0.00
ACUMULADO ACTUAL		366,575.73	247,334.60		1,462.30	999.34	209.84	209.84
REINTEGRO ACUMULADO ANTERIOR								209.84
REINTEGRO ACTUAL								0.00

FORMULA N°04 - INST. ELECTRICAS								
1	15-ene-18	0.00	0.00	0.007	0.00	0.00	0.00	0.00
2	31-ene-18	19,008.78	0.00	0.007	133.06	0.00	0.00	0.00
3	15-feb-18	22,656.91	0.00	0.007	158.60	0.00	0.00	0.00
4	28-feb-18	0.00	0.00	0.007	0.00	0.00	0.00	0.00
5	15-mar-18	28,308.87	0.00	0.007	198.16	0.00	0.00	0.00
6	19-mar-18	59,027.66	10,946.70	0.007	413.20	76.63	76.63	76.63
ACUMULADO ACTUAL		129,002.41	10,946.70		903.02	76.63	76.63	76.63
REINTEGRO ACUMULADO ANTERIOR								76.63
REINTEGRO ACTUAL								0.00

NOTA: Los Reajustes para las siguientes Valorizaciones se considera en la Liquidacion

LUCY N. VICENTE BASSILIO

 SUPERVISOR DE OBRA

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO . DISTRITO DE TUMBES , PROVINCIA DE TUMBES , REGION TUMBES
 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Contralista: Consorcio San Jose
 Supervision: Consorcio Mendoza & JSU
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios
 Monto del Contrato, con IGV: S/ 1.607.074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018
 Fecha Termino de obra: 13/03/2018
 Plazo de Ejecucion obra: 60 dias calendarios

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		UND	METRADO	P. U.	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
01	OBRA DE CONSTRUCCION DE LA OBRA															
01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES															
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES															
01.01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y CASITA DE GUARDIANA	m2	89.00	90.82	8,082.98	89.00	100.00%	8,082.98	100.00%	89.00	100.00%	8,082.98	100.00%	89.00	100.00%	0.00%
01.01.01.02	BAÑOS OLIMICOS PARA EL PERSONAL	m2	2.00	3,500.00	7,000.00	2.00	100.00%	7,000.00	100.00%	2.00	100.00%	7,000.00	100.00%	2.00	100.00%	0.00%
01.01.01.03	CERCO DE MALLA RASHELL CON MADERA ROLLIZO	m	115.00	21.49	2,471.35	115.00	100.00%	2,471.35	100.00%	115.00	100.00%	2,471.35	100.00%	115.00	100.00%	0.00%
01.01.01.04	CARTEL DE OBRA DE 2.40M X 3.60 M	pzb	1.00	1,441.51	1,441.51	1.00	100.00%	1,441.51	100.00%	1.00	100.00%	1,441.51	100.00%	1.00	100.00%	0.00%
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES															
01.01.02.01	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	m3	2.00	1,000.00	2,000.00	2.00	100.00%	2,000.00	100.00%	2.00	100.00%	2,000.00	100.00%	2.00	100.00%	0.00%
01.01.02.02	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	m3	2.00	800.00	1,600.00	2.00	100.00%	1,600.00	100.00%	2.00	100.00%	1,600.00	100.00%	2.00	100.00%	0.00%
01.01.03	REMOCCIONES															
01.01.03.01	DESMONTAJE DE COBERTURA METALICA	m2	384.27	14.78	5,679.51	384.27	100.00%	5,679.51	100.00%	384.27	100.00%	5,679.51	100.00%	384.27	100.00%	0.00%
01.01.03.02	DESMONTAJE DE PUERTAS	m2	30.51	4.99	152.24	30.51	100.00%	152.24	100.00%	30.51	100.00%	152.24	100.00%	30.51	100.00%	0.00%
01.01.03.03	DESMONTAJE DE VENTANAS	m2	1.00	5.48	5.48	1.00	100.00%	5.48	100.00%	1.00	100.00%	5.48	100.00%	1.00	100.00%	0.00%
01.01.03.04	RETIRO DE GARCIA DE CONTROL	pzb	1.00	72.11	72.11	1.00	100.00%	72.11	100.00%	1.00	100.00%	72.11	100.00%	1.00	100.00%	0.00%
01.01.03.05	DESMONTAJE DE CANALETA	m	120.19	3.16	379.80	120.19	100.00%	379.80	100.00%	120.19	100.00%	379.80	100.00%	120.19	100.00%	0.00%
01.01.03.06	REUBRICACION DE CAMARAS	und	2.00	598.37	1,196.74	2.00	100.00%	1,196.74	100.00%	2.00	100.00%	1,196.74	100.00%	2.00	100.00%	0.00%
01.01.03.07	RETIRO DE PRODUCTOR DE HIELO	und	1.00	1,542.43	1,542.43	1.00	100.00%	1,542.43	100.00%	1.00	100.00%	1,542.43	100.00%	1.00	100.00%	0.00%
01.01.04	DEMOLICIONES															
01.01.04.01	DEMOLICION DE CEMENTO Y SOBRECIMENTOS	m3	26.35	166.98	4,399.92	26.35	100.00%	4,399.92	100.00%	26.35	100.00%	4,399.92	100.00%	26.35	100.00%	0.00%
01.01.04.02	DEMOLICION DE MUROS DE ALBILERIA, M.C. COLUMNAS Y VIGAS	m3	11.30	142.70	1,612.51	11.30	100.00%	1,612.51	100.00%	11.30	100.00%	1,612.51	100.00%	11.30	100.00%	0.00%
01.01.04.03	DEMOLICION DE TECHOS DE CONCRETO	m3	0.90	142.70	128.43	0.90	100.00%	128.43	100.00%	0.90	100.00%	128.43	100.00%	0.90	100.00%	0.00%
01.01.04.04	DEMOLICION DE POZAS DE CONCRETO	m3	5.18	162.31	840.77	5.18	100.00%	840.77	100.00%	5.18	100.00%	840.77	100.00%	5.18	100.00%	0.00%
01.01.04.05	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	115.44	162.31	18,737.07	115.44	100.00%	18,737.07	100.00%	115.44	100.00%	18,737.07	100.00%	115.44	100.00%	0.00%
01.01.04.06	DEMOLICION DE CERCO DE CONCRETO TIPO UMI	m	60.90	15.74	1,273.37	60.90	100.00%	1,273.37	100.00%	60.90	100.00%	1,273.37	100.00%	60.90	100.00%	0.00%
01.01.04.07	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	m3	233.74	25.25	5,901.94	233.74	100.00%	5,901.94	100.00%	233.74	100.00%	5,901.94	100.00%	233.74	100.00%	0.00%
01.01.05	MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS															
01.01.05.01	TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	gb	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	100.00%	5,000.00	100.00%	1.00	100.00%	5,000.00	100.00%	1.00	100.00%	0.00%
01.01.05.02	FLETE TERRESTRE	gb	1.00	20,800.00	20,800.00	1.00	100.00%	20,800.00	100.00%	1.00	100.00%	20,800.00	100.00%	1.00	100.00%	0.00%
01.01.06	TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO															
01.01.06.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	554.75	2.19	1,214.90	554.75	100.00%	1,214.90	100.00%	554.75	100.00%	1,214.90	100.00%	554.75	100.00%	0.00%
01.01.06.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	554.75	0.86	477.09	554.75	100.00%	477.09	100.00%	554.75	100.00%	477.09	100.00%	554.75	100.00%	0.00%
01.02	SEGURIDAD Y SALUD															
01.02.01	ELABORACION DE PLANTEAMIENTO Y ADMINISTRACION DE PLANT DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJADOR	und	1.00	11,350.00	11,350.00	1.00	100.00%	11,350.00	100.00%	1.00	100.00%	11,350.00	100.00%	1.00	100.00%	0.00%
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	1.00	26,137.50	26,137.50	1.00	100.00%	26,137.50	100.00%	1.00	100.00%	26,137.50	100.00%	1.00	100.00%	0.00%
01.02.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	1.00	10,798.28	10,798.28	1.00	100.00%	10,798.28	100.00%	1.00	100.00%	10,798.28	100.00%	1.00	100.00%	0.00%
01.02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1.00	1,310.00	1,310.00	1.00	100.00%	1,310.00	100.00%	1.00	100.00%	1,310.00	100.00%	1.00	100.00%	0.00%
01.02.05	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	und	1.00	4,110.00	4,110.00	1.00	100.00%	4,110.00	100.00%	1.00	100.00%	4,110.00	100.00%	1.00	100.00%	0.00%

LUCY N. VICENTE BASSILIO
 NANCY VILLALBA
 SUPERVISOR DE OBRA

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADEO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Contralista: Consorcio San Jose
Supervision: Consorcio Mendoza & JSU
Sistema de Contratacion: Precios Unitarios
Monto del Contrato, con IGV: S/ 1'607,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018
Fecha termino de obra: 13/03/2018
Plazo de Ejecucion obra: 60 dias calendarios

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		UND	METRADO	P. U.	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
01.03	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL															
01.03.01	REGIO DEL AREA DE TRABAJO	m2	554.75	2.09	1,159.43	100.00%	554.75	1,159.43	100.00%	-	-	0.00%	554.75	1,159.43	100.00%	0.00%
01.03.02	PLAN DE CONTINGENCIA	und	1.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	1.00	2,000.00	100.00%	-	-	0.00%	1.00	2,000.00	100.00%	0.00%
01.03.03	PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	und	1.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	1.00	3,000.00	100.00%	-	-	0.00%	1.00	3,000.00	100.00%	0.00%
01.03.04	PLAN DE CIERRE Y ABANDONO	und	1.00	2,500.00	2,500.00	100.00%	1.00	2,500.00	100.00%	-	-	0.00%	1.00	2,500.00	100.00%	0.00%
01.03.05	MEDIDAS DE CONCIENCIACION Y EDUCACION AMBIENTAL	und	1.00	1,025.00	1,025.00	100.00%	1.00	1,025.00	100.00%	-	-	0.00%	1.00	1,025.00	100.00%	0.00%
01.03.06	CARTEL DE MANEJO AMBIENTAL DE 1.00 X 0.50m	und	4.00	200.00	800.00	100.00%	4.00	800.00	100.00%	-	-	0.00%	4.00	800.00	100.00%	0.00%
01.03.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR DE BASURA	und	4.00	300.00	1,200.00	100.00%	4.00	1,200.00	100.00%	-	-	0.00%	4.00	1,200.00	100.00%	0.00%
02	ESTRUCTURAS															
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS															
02.01.01	EXCAVACIONES															
02.01.01.01	EXCAVACION DE ESTRUCTURAS PARA CIMENTACION	m3	96.39	36.06	3,475.82	100.00%	96.39	3,475.82	100.00%	-	-	0.00%	96.39	3,475.82	100.00%	0.00%
02.01.02	CORTES															
02.01.02.01	CORTE MASIMO DE TERRENO A MAQUINA	m3	132.92	5.30	704.48	100.00%	132.92	704.48	100.00%	-	-	0.00%	132.92	704.48	100.00%	0.00%
02.01.03	RELLENOS															
02.01.03.01	RELLENO COMPACTADO CIMENTACION PREESTRIBADO ESPALDA	m3	48.55	61.02	2,962.52	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
02.01.03.02	RELLENO COMPACTADO CIMENTADO E=0.20m PARA PISOS	m2	397.74	14.83	5,888.48	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
02.01.04	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO															
02.01.04.01	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA PISOS	m2	653.05	3.36	2,194.25	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
02.01.04.02	NIVELACION Y COMPACTACION EN AREA FONDO DE CIMENTACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m2	95.88	4.95	474.61	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
02.01.05.01	ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	138.24	17.80	2,460.67	100.00%	138.24	2,460.67	100.00%	-	-	0.00%	138.24	2,460.67	100.00%	0.00%
02.01.06.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CAMAQUINA	m3	138.24	19.73	2,727.48	100.00%	138.24	2,727.48	100.00%	-	-	0.00%	138.24	2,727.48	100.00%	0.00%
02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE															
02.02.01	SOLADO															
02.02.01.01	SOLADO PARA ZAPATAS E=0.10m, f=100kg/cm2	m2	28.28	36.01	1,018.36	95.78%	27.08	975.15	95.78%	-	-	0.00%	27.08	975.15	95.78%	4.24%
02.02.02	CIMENTOS CORRIDOS															
02.02.02.01	CIMENTOS CORRIDOS CONCRETO 1:10 + 30% P. G.	m3	52.84	226.98	11,948.23	61.56%	32.40	7,355.24	61.56%	-	-	0.00%	32.40	7,355.24	61.56%	38.44%
02.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTACION	m2	178.11	57.28	10,202.14	77.28%	137.65	7,884.36	77.28%	-	-	0.00%	137.65	7,884.36	77.28%	22.72%
02.02.03	SOBRECIMENTOS															
02.02.03.01	SOBRECIMIENTO - CONCRETO 1:8 + 25% P.M.	m2	20.74	343.03	7,114.44	61.92%	12.84	4,405.19	61.92%	-	-	0.00%	12.84	4,405.19	61.92%	35.08%
02.02.03.02	SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	242.91	42.74	10,361.97	64.63%	157.00	6,710.35	64.63%	-	-	0.00%	157.00	6,710.35	64.63%	35.37%
02.02.04	FALSO PISO															
02.02.04.01	FALSO PISO E=0.10m-140 kg/cm2	m2	60.93	35.39	2,156.31	4.81%	2.93	103.69	4.81%	-	-	0.00%	2.93	103.69	4.81%	95.19%
02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO															
02.03.01	ZAPATAS															
02.03.01.01	ZAPATAS - CONCRETO 280 kg/cm2	m3	15.04	524.16	7,883.37	45.35%	6.82	3,574.77	45.35%	-	-	0.00%	6.82	3,574.77	45.35%	54.65%
02.03.01.02	ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	51.60	41.16	2,123.86	49.55%	25.57	1,052.47	49.55%	-	-	0.00%	25.57	1,052.47	49.55%	50.45%
02.03.01.03	ZAPATAS - ACERO Fy=4200 kg/cm2	kg	563.70	4.36	2,457.73	41.87%	236.00	1,028.96	41.87%	-	-	0.00%	236.00	1,028.96	41.87%	58.13%

LUCY N. VICENTE BASSHIO
Supervision de Obra

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO - DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - REGION TUMBES

Cliente: FONDOPEP
 Contratista: Consorcio San Jose
 Supervisor: Consorcio Mendoza & JSU
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios
 Monto del Contrato, con IGV: S/ 1'607,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018
 Fecha termino de obra: 13/03/2018
 Plazo de Ejecucion obra: 60 dias calendarios

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
		UND	METRADO	P.U.	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	
02.03.02	LOSAS DE PISO																
02.03.02.01	LOSAS DE PISO - CONCRETO 280 kg/m2	m3	128.46	563.67	71,281.71	61.98	34,936.27	49.01%	-	-	0.00%	61.98	34,936.27	49.01%	64.46	36,345.44	50.99%
02.03.02.02	LOSAS DE PISO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	86.82	41.16	3,655.83	43.53	1,791.78	49.01%	-	-	0.00%	43.53	1,791.78	49.01%	45.29	1,864.05	50.99%
02.03.02.03	LOSAS DE PISO - ACERO Fy=4200 kg/cm2	kg	3,273.38	4.36	14,271.94	1,604.33	6,994.90	49.01%	-	-	0.00%	1,604.33	6,994.90	49.01%	1,689.05	7,277.04	50.99%
02.03.03	COLUMNAS																
02.03.03.01	COLUMNAS - CONCRETO 280 kg/m2	m3	23.43	577.27	13,525.44	17.65	10,187.20	75.32%	-	-	0.00%	17.65	10,187.20	75.32%	5.78	3,338.24	24.68%
02.03.03.02	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	268.28	59.92	17,273.74	242.93	14,556.07	84.27%	-	-	0.00%	242.93	14,556.07	84.27%	45.35	2,717.67	15.73%
02.03.03.03	COLUMNAS - ACERO Fy=4200 kg/cm2	kg	5,080.42	4.36	22,150.63	4,020.77	17,530.56	79.14%	-	-	0.00%	4,020.77	17,530.56	79.14%	1,059.65	4,620.07	20.86%
02.03.04	VIGAS																
02.03.04.01	VIGAS - CONCRETO 210 kg/m2	m3	13.04	591.01	7,706.77	10.01	5,916.01	76.76%	-	-	0.00%	10.01	5,916.01	76.76%	3.03	1,790.76	23.24%
02.03.04.02	VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	147.40	58.86	8,675.96	113.15	6,660.00	76.76%	-	-	0.00%	113.15	6,660.00	76.76%	34.25	2,015.96	23.24%
02.03.04.03	VIGAS - ACERO Fy=4200 kg/cm2	kg	2,220.25	4.36	9,680.29	1,704.35	7,430.96	76.76%	-	-	0.00%	1,704.35	7,430.96	76.76%	515.90	2,249.33	23.24%
02.03.05	LOSAS																
02.03.05.01.01	LOSA ALBERADA - CONCRETO 210 kg/m2	m3	5.44	455.71	2,479.08	0.80	364.57	14.71%	-	-	0.00%	0.80	364.57	14.71%	4.64	2,114.49	85.29%
02.03.05.01.02	LOSA ALBERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	63.64	49.96	3,179.45	9.36	467.57	14.71%	-	-	0.00%	9.36	467.57	14.71%	54.28	2,711.89	85.29%
02.03.05.01.03	LOSA ALBERADA - ACERO Fy=4200 kg/cm2	kg	268.60	4.36	1,258.30	42.44	185.04	14.71%	-	-	0.00%	42.44	185.04	14.71%	246.16	1,073.25	85.29%
02.03.05.01.04	LOSA ALBERADA - LADRILLO HIECO 18x30x30	und	530.00	3.46	1,844.40	77.94	271.24	14.71%	-	-	0.00%	77.94	271.24	14.71%	452.06	1,573.16	85.29%
02.03.06	CANALETAS																
02.03.06.01	CANALETAS - CONCRETO 280 kg/m2	m3	15.24	624.62	9,519.21	3.72	2,323.59	24.41%	-	-	0.00%	3.72	2,323.59	24.41%	11.52	7,195.62	75.59%
02.03.06.02	CANALETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	132.05	46.68	6,164.09	32.23	1,504.62	24.41%	-	-	0.00%	32.23	1,504.62	24.41%	99.82	4,659.47	75.59%
02.03.06.03	CANALETAS - ACERO Fy=4200 kg/m2	kg	458.15	4.36	1,997.53	111.83	487.59	24.41%	-	-	0.00%	111.83	487.59	24.41%	346.32	1,509.95	75.59%
02.04	MANTENIMIENTO - REPARACION Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS																
02.04.01	MANTENIMIENTO DE TECHO DE TAREAS PREVIAS	m2	103.46	34.67	3,586.98	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	103.46	3,586.98	100.00%
02.04.02	REPARACION DE COLUMNAS DE TAREAS PREVIAS	m2	9.60	14.42	138.43	9.60	138.43	100.00%	-	-	0.00%	9.60	138.43	100.00%	-	-	0.00%
02.04.02.02	ENCAMIZADO DE COLUMNAS	m2	9.60	341.50	3,278.40	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	9.60	3,278.40	100.00%
02.04.03	REFORMAZO DE CERCO PERIMETRICO																
02.04.03.01	ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DE SOBRECIMIENTO EXISTENTE	m2	10.18	28.84	293.59	10.18	293.59	100.00%	-	-	0.00%	10.18	293.59	100.00%	-	-	0.00%
02.04.03.02	PERFORACION MANUAL L=30cmx4"	und	86.00	6.79	587.52	86.00	587.52	100.00%	-	-	0.00%	86.00	587.52	100.00%	-	-	0.00%
02.04.03.03	COLOCACION DE MORTERO ADHESIVO POR INYECCION L=30cm	und	86.00	10.66	938.08	86.00	938.08	100.00%	-	-	0.00%	86.00	938.08	100.00%	-	-	0.00%
02.04.03.04	COLOCACION DE ADITIVO CONCRETO NUEVO-ANTIUGO	m2	10.18	78.08	794.85	10.18	794.85	100.00%	-	-	0.00%	10.18	794.85	100.00%	-	-	0.00%
	COSTO DIRECTO				437,877.26		314,228.43		0.00		0.00		314,228.43			123,647.85	
	GASTOS GENERALES	15.50%			67,870.98		48,705.56		0.00		0.00		48,705.56			19,165.42	
	UTILIDADES	5.35%			23,426.43		16,811.27		0.00		0.00		16,811.27			6,615.16	
	SUB TOTAL				529,174.67		378,746.26		0.00		0.00		378,746.26			149,428.43	
	IGV	19%			99,251.44		68,354.33		0.00		0.00		68,354.33			26,897.12	
	TOTAL SUB PRESUPUESTO DE OBRA				624,426.11		448,100.59		0.00		0.00		448,100.59			176,325.55	
	PORCENTAJE DE AVANCE				100.00%		71.76%		0.00%		0.00%		71.76%			28.24%	

LUCYVA VICENTE BASTIEN
 SUPERVISOR DE OBRA

RELACION DE VALORIZACIONES TRAMITADAS PARA PAGO

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO , DISTRITO DE TUMBES , PROVINCIA DE TUMBES , REGION TUMBES

Cliente : FONDOPES

Contratista: Consorcio San Jose

Supervision: Consorcio Mendoza & JSU

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios


Monte del Contrato, con IGV: S/. 1'607,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018

Fecha termino de obra: 13/03/2018

Plazo de Ejecución obra: 60 días calendario

N°	VALORIZACIONES		REALISTE AUTORIZADO	DEDUCCIONES POR ADELANTOS		VALORIZACION BRUTA	AMORTIZACION DE ADELANTOS		VALORIZACION NETA		
	FECHA	MONTO V		DIRECTO	MATERIALES D		DIRECTO	MATERIALES A	EN EFECTIVO VN = VB - A	I.G.V.	TOTAL A PAGAR
1	15-ene-18	52,400.55	104.80	0.00	0.00	52,505.35	0.00	0.00	52,505.35	9,450.96	61,956.31
2	31-ene-18	210,295.91	702.04	0.00	0.00	210,997.95	0.00	0.00	210,997.95	37,979.63	248,977.58
3	15-feb-18	30,104.30	61.37	0.00	0.00	30,165.67	0.00	0.00	30,165.67	5,429.82	35,595.49
4	28-feb-18	23,246.00	-733.01	0	0	22,512.99	0	0	22,512.99	4,052.34	26,565.33
5	15-mar-18	362,263.93	1,039.05	0	0	363,302.98	0	0	363,302.98	65,394.54	428,697.52
6	31-mar-18	10,946.70	76.63	0.00	0.00	11,023.33	0.00	2,189.34	8,833.99	1,590.12	10,424.11
7	15-abr-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		689,257.39	1,250.88	0.00	0.00	690,508.27	0.00	2,189.34	688,318.93	123,897.41	812,216.33

LUCY N. VICENTE BASSAJO

 SUPERVISOR DE OBRA

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Obras: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO . DISTRITO DE TUMBES . PROVINCIA DE TUMBES . REGION TUMBES

Cliente : FUNDOPLES
 Contratista: Consorcio San Jose
 Supervision: Consorcio Mendoza & JSU
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios
 Monto del Contrato, con IGV. S/ 1'607.074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018
 Fecha de termino de obra: 13/03/2018
 Plazo de Ejecucion de obra: 60 dias calendario

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
		UND	METRADO	P.U.	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA																
03.01.01	MUROS DE LADRILLO KX TIPO IV SOGA M:11:4 E=1.5 cm	m2	361.84	74.91	27,105.43	246.44	18,460.82	68.11%	-	-	0.00%	246.44	18,460.82	68.11%	115.40	8,644.61	31.89%
03.01.02	ACERO Fy=200 kg/m2, REF MUROS	kg	103.50	4.36	451.26	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	103.50	451.26	100.00%
03.02	REVOCOS ENLUCIDOS Y MOLDURAS																
03.02.01	TARRAJEO RAYADO PRIMARIO, MORTERO CA 1:5	m2	125.04	22.50	2,813.40	23.56	530.10	18.84%	-	-	0.00%	23.56	530.10	18.84%	101.48	2,283.30	81.16%
03.02.02	TARRAJEO EN MUROS DE ALBANILERIA INTERIORES Y EXTERIORES E=1.5CM MEZCLA 1:5	m2	598.63	25.66	15,360.85	301.75	7,742.91	50.41%	-	-	0.00%	301.75	7,742.91	50.41%	296.88	7,617.94	49.59%
03.02.03	TARRAJEO EN MUROS DE CONCRETO	m2	107.47	25.66	2,757.68	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	107.47	2,757.68	100.00%
03.02.04	TARRAJEO DE COLUMNAS	m2	238.35	37.56	8,952.43	83.42	3,133.35	35.00%	-	-	0.00%	83.42	3,133.35	35.00%	154.93	5,819.08	65.00%
03.02.05	TARRAJEO DE VIGAS	m2	147.40	55.62	8,198.39	24.00	1,334.88	16.28%	-	-	0.00%	24.00	1,334.88	16.28%	123.40	6,863.51	83.72%
03.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES 1:5	m	138.12	12.93	1,785.89	15.00	193.95	10.86%	-	-	0.00%	15.00	193.95	10.86%	123.12	1,591.94	89.14%
03.02.07	BRUNAS SEGUN DETALLE (1 x 1 cm)	m	94.61	7.62	720.93	94.61	720.93	100.00%	-	-	0.00%	94.61	720.93	100.00%	-	-	0.00%
03.02.08	ACABADO DE CEMENTO PULIDO EN CANALETAS	m2	37.60	30.06	1,130.26	9.18	275.90	24.41%	-	-	0.00%	9.18	275.90	24.41%	28.42	854.36	75.59%
03.02.09	ACABADO DE CEMENTO PULIDO EN PISOS	m2	586.84	18.37	10,780.25	4.60	84.50	0.78%	-	-	0.00%	4.60	84.50	0.78%	582.24	10,695.75	99.32%
03.03	CIELO RASOS																
03.03.01	CIELO RASO CON MEZCLA CA 1:5	m2	63.64	46.07	2,931.89	4.60	211.92	7.23%	-	-	0.00%	4.60	211.92	7.23%	59.04	2,719.97	92.77%
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS																
03.04.01	CONTRAPISOS																
03.04.01.01	CONTRAPISO DE 40 mm	m2	45.76	30.86	1,412.15	4.60	141.96	10.05%	-	-	0.00%	4.60	141.96	10.05%	41.16	1,270.20	89.95%
03.04.02	PISOS																
03.04.02.01	PISO CERAMICO 20 x 40 ANTIDESLIZANTE - ALTO TRAFICO - COLOR	m2	16.02	57.27	917.47	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	16.02	917.47	100.00%
03.04.02.02	PISO E=5cm ACABADO PULIDO INC. BRUNADO	m2	18.76	35.84	672.36	4.60	164.86	24.52%	-	-	0.00%	4.60	164.86	24.52%	14.16	507.49	75.48%
03.04.02.03	VEREDA DE CONCRETO Fy=280kg/m2 E=15cm PULIDO Y BRUNADO INC. ENCOFRADO	m2	8.62	93.94	809.76	8.21	771.25	95.24%	-	-	0.00%	8.21	771.25	95.24%	0.41	38.52	4.76%
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS																
03.05.01	ZOCALOS																
03.05.01.01	ZOCALO DE CERAMICO 40x40	m2	125.04	61.60	7,702.46	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	125.04	7,702.46	100.00%
03.05.02	CONTRAZOCALOS																
03.05.02.01	CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO SANITARIO H=0.20m	m	29.49	42.30	1,247.43	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	29.49	1,247.43	100.00%
03.06	COBERTURAS EN TECHOS																
03.06.01	COBERTURAS																
03.06.01.01	COBERTURA DE TABLA DE PISO 30x30x30mm	m2	83.09	103.30	8,583.20	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	83.09	8,583.20	100.00%
03.06.01.02	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 24x24x0.8cm MEZCLA CA 1:5	m2	83.09	103.30	8,583.20	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	83.09	8,583.20	100.00%
03.06.02	FALSO TECHO																
03.07	CARPINTERIA DE MADERA																
03.07.01	PUERTAS																
03.07.01.01	PUERTA CONTRAPLACA CIMARCO DE MADERA 4"x2"	m2	10.71	304.71	3,263.44	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	10.71	3,263.44	100.00%
03.07.01.02	PUERTA CUBICULO SSIH, MELAMINE 18mm Y PERF ALUMINIO	m2	7.56	228.95	1,730.86	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	7.56	1,730.86	100.00%
03.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA																
03.08.01	VENTANAS																

LUCY N. VICENTE BASSILLO
 SUPERVISOR DE OBRA

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA Nº 07

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO - DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - REGION TUMBES
 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Cliente: FONJOPLES
 Contratista: Consorcio San Jose
 Supervision: Consorcio Mendoza & JSU
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios
 Monto del Contrato, con IGV: S/. 1.607.074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018
 Fecha de termino de obra: 13/03/2018
 Plazo de Ejecucion de obra: 60 dias calendarios

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		UND	METRADO	P.U.	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
03.08.01.01	VENTANA FIJA DE MALLA POLIPROPILENO C/ MARCO DE ALUMINIO	m2	32.22	126.61	4.079.37	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	32.22	4.079.37	100.00%
03.08.01.02	VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO 6mm C/ MARCO DE ALUMINIO	m2	29.27	244.16	7.146.56	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	29.27	7.146.56	100.00%
03.08.02	PUERTAS															
03.08.02.01	PUERTA DE MADERA ALABRADA 1.90x2.20m	pu	3.00	11.579.31	4.284.92	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	3.00	4.284.92	100.00%
03.08.02.02	PUERTA METALICA ALABRADA 1.90x2.20m	pu	4.00	6.573.31	26.459.07	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	4.00	26.459.07	100.00%
03.08.02.03	MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICAS	m2	40.00	31.79	1.271.60	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	40.00	1.271.60	100.00%
03.08.02.04	FABRICACION Y MONTAJE DE PUERTAS METALICAS	kg	1.363.04	9.98	13.603.14	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	1.363.04	13.603.14	100.00%
03.08.03	DIVISIONES DE ALUMINIO															
03.08.03.01	TABICQUERIA DE MELAMINE 18mm En SSI.HI.	m2	14.08	157.87	2.222.81	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	14.08	2.222.81	100.00%
03.08.04	ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES															
03.08.04.01	REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN CANALETAS A=U.30	m	63.98	181.05	11.583.58	15.62	2.827.55	24.41%	-	-	0.00%	15.62	2.827.55	48.36	8.756.03	75.59%
03.08.04.02	REJILLA DE ACERO GALVANIZADO EN CANALETAS A=0.30	m	7.52	106.63	801.11	1.84	195.55	24.41%	-	-	0.00%	1.84	195.55	5.68	605.56	75.59%
03.08.04.03	PERFIL T DE ALUMINIO PARA CAMBIO DE PISO	m	4.20	18.77	78.83	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	4.20	78.83	100.00%
03.09	CERRAJERIA															
03.09.01	BISAGRAS															
03.09.01.01	BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADA PESADA DE 4"4" EN PUERTA	pza	18.00	29.62	533.16	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	18.00	533.16	100.00%
03.09.01.02	BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADA PESADA DE 3"2" EN PUERTA	pza	12.00	25.72	308.64	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	12.00	308.64	100.00%
03.09.02	CERRADURA															
03.09.02.01	CERRADURA TIPO PESADA 2 GOLPES	pza	6.00	76.77	460.62	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	6.00	460.62	100.00%
03.09.02.02	CERROJO DE 3" ALUMINIO	pza	6.00	27.72	166.32	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	6.00	166.32	100.00%
03.09.03	ACCESORIOS DE CIERRE															
03.09.03.01	MANUA DE BRONCE 4" PARA PUERTAS	pza	6.00	32.72	196.32	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	6.00	196.32	100.00%
03.10	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES															
03.10.01	ESPEJOS															
03.10.01.01	ESPEJO EMPOTRADO COLOR PLATA 4mm	m2	7.05	194.31	1.369.89	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	7.05	1.369.89	100.00%
03.11	PINTURA															
03.11.01	PINTURA DE CIELOS RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES															
03.11.01.01	PINTURA EPOXICA EN CIELO RASO	m2	63.64	18.16	1.155.70	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	63.64	1.155.70	100.00%
03.11.01.02	PINTURA EPOXICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	284.37	17.36	4.936.66	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	284.37	4.936.66	100.00%
03.11.01.03	PINTURA EPOXICA EN VIGAS	m2	108.36	17.36	1.881.13	24.00	416.64	22.15%	-	-	0.00%	24.00	416.64	84.36	1.464.49	77.85%
03.11.01.04	PINTURA EPOXICA EN COLUMNAS	m2	187.48	17.36	3.254.65	83.42	1.448.21	44.50%	-	-	0.00%	83.42	1.448.21	104.06	1.806.44	55.50%
03.11.01.05	PINTURA EPOXICA EN MUROS DE CONCRETO	m2	81.10	17.36	1.407.90	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	81.10	1.407.90	100.00%
03.11.01.06	PINTURA EPOXICA EN PISOS	m2	328.02	14.44	4.736.61	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	328.02	4.736.61	100.00%
03.11.01.07	PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA EN ALTURA	m2	103.46	46.07	4.766.40	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	103.46	4.766.40	100.00%
03.11.01.08	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CERCO PERIMETRICO	m2	430.53	6.85	2.949.13	430.53	2.949.13	100.00%	-	-	0.00%	430.53	2.949.13	-	-	0.00%
03.11.02	PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS															
03.11.02.01	PINTURA EPOXICA EN PUERTAS METALICAS INC. ARENADO	m2	25.80	30.50	786.90	25.80	786.90	100.00%	-	-	0.00%	25.80	786.90	-	-	0.00%
03.12	OTROS															
03.12.01	MUEBLE CA. #10 cm ACABADO PULIDO	m2	7.41	360.48	2.671.16	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	7.41	2.671.16	100.00%
03.12.02	JUNTA DE DILATACION E=3mm CON SELLO ELASTOMERICO EN PISOS	m	175.20	6.56	1.149.31	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	175.20	1.149.31	100.00%
03.2.03	JUNTA DE DILATACION E=5mm CON POLIESTIRENO EXPANDIDO EN MUROS	m	80.00	6.80	528.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	80.00	528.00	100.00%

LUY N. VICENTE BASSILO
 SUPERVISOR DE OBRA

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES
 Cliente: FONDOPLES
 Contratista: Consorcio San Jose
 Supervision: Consorcio Mendoza & JSU
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios
 Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'607,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018
 Fecha de termino de obra: 13/03/2018
 Plazo de Ejecucion de obra: 60 dias calendario

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		UND	METRADO	P. U.	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
03.12.04	CORTINAS PVC DE BAÑO INC. BARRA ALUMINIO	pza	8.00	61.94	495.52	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	8.00	495.52	100.00%	
	TRABAJOS DE AVANCE DE OBRAS DE LA OBRA DE LA OBRA	m ²	7.50	6,000.00	45,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	7.50	45,000.00	100.00%	
	METRAJE DE TRABAJOS DE AVANCE DE OBRAS DE LA OBRA	m ²	0.00	1,500.00	0.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	0.00	0.00	100.00%	
	COSTO DIRECTO				377,594.64			42,391.31		0.00				335,203.34		
	GASTOS GENERALES	15.50%			58,527.17			6,570.65		0.00				51,956.52		
	UTILIDADES	5.35%			20,201.31			2,287.94		0.00				17,933.38		
	SUB TOTAL				456,323.12			51,228.90		0.00				405,093.24		
	IGV	18%			82,138.16			9,221.38		0.00				72,916.78		
	TOTAL SUB PRESUPUESTO DE OBRA				538,461.28			60,451.28		0.00				478,010.02		
	PORCENTAJE DE AVANCE				100.00%			11.23%		0.00%				88.77%		

LUCY N. VICENTE BASSILIO
Lucy Vicente Bassilio
 SUPERVISORA DE OBRA

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Contratista: Consorcio San Jose

Supervision: Consorcio Mendoza & JSU

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios

Moneto del Contrato, con IGV: \$/ 1'607.074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018
 Fecha de termino de obra: 13/03/2018
 Plazo de Ejecucion de obra: 60 dias calendarios

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
		UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
04.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS																
04.01.01.01	INODORO TANQUE BAJO	pza	6.00	437.07	2.622.42	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	6.00	2.622.42	100.00%	
04.01.01.02	URINARIO	pza	3.00	172.07	516.21	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	3.00	516.21	100.00%	
04.01.01.03	LAVATORIO	pza	12.00	127.07	1.524.84	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	12.00	1.524.84	100.00%	
04.01.01.04	DUCHA	pza	8.00	160.72	1.285.76	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	8.00	1.285.76	100.00%	
04.02	SISTEMA DE AGUA FRIA																
04.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA																
04.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 1 1/2" PVC SP	pto	29.00	74.01	2.146.29	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	29.00	2.146.29	100.00%	
04.02.01.02	SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 3/4" PVC SP	pto	1.00	98.25	98.25	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	1.00	98.25	100.00%	
04.02.02	RED DE DISTRIBUCION																
04.02.02.01	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 CIR DE 1/2"	m	42.90	12.98	556.84	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	42.90	556.84	100.00%	
04.02.02.02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 CIR DE 3/4"	m	11.75	12.30	144.53	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	11.75	144.53	100.00%	
04.02.02.03	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 CIR DE 1"	m	11.40	12.67	144.44	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	11.40	144.44	100.00%	
04.02.02.04	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 CIR DE 1 1/2"	m	4.05	13.93	56.42	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	4.05	56.42	100.00%	
04.02.03	RED DE ALIMENTACION																
04.02.03.01	EXCAVACION Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERIA	m	92.75	7.42	688.21	92.75	688.22	100.00%	-	-	0.00%	92.75	688.22	92.75	688.22	100.00%	
04.02.03.01.02	REFINE Y NIVELACION PRUBERIA	m	92.75	1.47	136.34	92.75	136.35	100.00%	-	-	0.00%	92.75	136.35	92.75	136.35	100.00%	
04.02.03.01.03	CAMA DE APOYO (E=0.10 m)	m	92.75	4.65	431.29	92.75	431.29	100.00%	-	-	0.00%	92.75	431.29	92.75	431.29	100.00%	
04.02.03.01.04	RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m3	7.73	72.86	563.21	7.73	563.21	100.00%	-	-	0.00%	7.73	563.21	7.73	563.21	100.00%	
04.02.03.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	0.97	19.73	19.14	0.97	19.14	100.00%	-	-	0.00%	0.97	19.14	0.97	19.14	100.00%	
04.02.04	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA																
04.02.04.01	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 3/4"	m	14.00	12.30	172.20	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	14.00	172.20	100.00%	
04.02.04.02	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1"	m	2.90	12.67	36.74	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	2.90	36.74	100.00%	
04.02.04.03	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/2"	m	79.20	13.93	1.103.26	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	79.20	1.103.26	100.00%	
04.02.04.04	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA																
04.02.04.01	CODO PVC SP 1/2"	und	66.00	7.60	501.60	17.00	129.20	25.76%	-	-	0.00%	17.00	129.20	17.00	129.20	25.76%	
04.02.04.02	CODO PVC SP 3/4"	und	6.00	10.07	60.36	2.00	20.14	40.00%	-	-	0.00%	2.00	20.14	2.00	20.14	40.00%	
04.02.04.03	CODO 45° PVC SP 3/4"	und	2.00	10.07	20.14	1.00	10.07	50.00%	-	-	0.00%	1.00	10.07	1.00	10.07	50.00%	
04.02.04.04	CODO PVC SP 1"	und	17.00	10.95	186.15	5.00	54.75	29.41%	-	-	0.00%	5.00	54.75	5.00	54.75	29.41%	
04.02.04.05	CODO PVC SP 1 1/2"	und	19.00	11.95	227.05	5.00	59.75	26.32%	-	-	0.00%	5.00	59.75	5.00	59.75	26.32%	
04.02.04.06	CODO 45° PVC SP 1 1/2"	und	2.00	11.95	23.90	1.00	11.95	50.00%	-	-	0.00%	1.00	11.95	1.00	11.95	50.00%	
04.02.04.07	TEE PVC SP 1/2"	und	4.00	8.13	32.52	1.00	8.13	25.00%	-	-	0.00%	1.00	8.13	1.00	8.13	25.00%	
04.02.04.08	TEE PVC SP 3/4"	und	7.00	9.01	63.07	2.00	18.02	28.57%	-	-	0.00%	2.00	18.02	2.00	18.02	28.57%	

LUCYIN VICENTE BASSILLO
Lucy Vicente Bassillo
 SUPERVISOR DE OBRA

027

027

V. VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente : FONDOPES

Contratista: Consorcio San Jose

Supervisor: Consorcio Mendoza & JSU

Monto del Contrato, con IGV: S/ 1'607.074,41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018
 Fecha de termino de obra: 13/03/2018
 Plazo de Ejecución de obra: 60 días calendario

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA			SALDO POR VALORIZAR			
		UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
04.02.04.06	TEE PVC SP 1"	und	9.00	10.01	90.09	3.00	30.03	33.33%	-	-	0.00%	3.00	30.03	33.33%	6.00	60.06	66.67%
04.02.04.10	TEE PVC SP 1 1/2"	und	2.00	10.51	21.02	1.00	10.51	50.00%	-	-	0.00%	1.00	10.51	50.00%	1.00	10.51	50.00%
04.02.04.11	REDUCCION PVC SP 3/4 A 1/2"	und	18.00	9.65	173.70	5.00	48.25	27.78%	-	-	0.00%	5.00	48.25	27.78%	13.00	125.45	72.22%
04.02.04.12	REDUCCION PVC SP 1" A 1/2"	und	7.00	10.15	71.05	2.00	20.30	28.57%	-	-	0.00%	2.00	20.30	28.57%	5.00	50.75	71.43%
04.02.04.13	REDUCCION PVC SP 1" A 3/4"	und	5.00	10.15	50.75	2.00	20.30	40.00%	-	-	0.00%	2.00	20.30	40.00%	3.00	30.45	60.00%
04.02.04.14	REDUCCION PVC SP 1 1/2 A 3/4"	und	2.00	10.15	20.30	1.00	10.15	50.00%	-	-	0.00%	1.00	10.15	50.00%	1.00	10.15	50.00%
04.02.04.15	REDUCCION PVC SP 1 1/2 A 1"	und	4.00	10.65	42.60	1.00	10.65	25.00%	-	-	0.00%	1.00	10.65	25.00%	3.00	31.95	75.00%
04.02.05	VALVULAS																
04.02.05.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 3/4"	und	1.00	88.80	88.80	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	88.80	100.00%
04.02.05.02	VALVULA ESFERICA DE Ø 1"	und	2.00	364.58	729.16	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	2.00	729.16	100.00%
04.02.05.03	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 1 1/2"	und	3.00	166.50	499.50	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	3.00	499.50	100.00%
04.02.05.04	LLAVE DRIEGO CIGRIFO DE Ø 3/4" EN CAJUELA DE CONCRETO EX=175.KGCM2	und	1.00	365.88	365.88	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	365.88	100.00%
04.02.06	PIEZAS VARIAS																
04.02.06.01	CAJA PARA VALVULA (MUCHO DE MAYAJUCA)	und	5.00	92.33	461.65	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	5.00	461.65	100.00%
04.02.07	EMPALMES Y PRUEBAS HIDRAULICAS																
04.02.07.01	EMPALME A LA RED EXISTENTE DE AGUA	und	1.00	98.59	98.59	1.00	98.59	100.00%	-	-	0.00%	1.00	98.59	100.00%	-	-	0.00%
04.02.07.02	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA	m	96.10	2.65	254.67	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	96.10	254.67	100.00%
04.02.07.03	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA ABIERTA	m	96.10	1.45	139.35	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	96.10	139.35	100.00%
04.03	SISTEMA DE AGUA SALADA																
04.03.01	SALIDAS DE AGUA SALADA																
04.03.01.01	SALIDA DE AGUA SALADA CON TUBERIA PVC - Ø 3/4"	pto	6.00	84.81	508.86	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	6.00	508.86	100.00%
04.03.01.02	SALIDA DE AGUA SALADA CON TUBERIA PVC - Ø 1 1/2"	pto	8.00	126.25	1,010.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	8.00	1,010.00	100.00%
04.03.02	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA SALADA																
04.03.02.01	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE Ø 3/4"	m	29.10	12.30	357.93	29.10	357.93	100.00%	-	-	0.00%	29.10	357.93	100.00%	-	-	0.00%
04.03.02.02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE Ø 1 1/2"	m	19.20	13.93	267.46	19.20	267.46	100.00%	-	-	0.00%	19.20	267.46	100.00%	-	-	0.00%
04.03.03	REDES DE ALIMENTACION DE AGUA SALADA																
04.03.03.01.01	EXCAVACION Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERIA	m	91.00	7.42	675.22	91.00	675.22	100.00%	-	-	0.00%	91.00	675.22	100.00%	-	-	0.00%
04.03.03.01.02	REFINE Y NIVELACION PITUBERIA	m	91.00	1.47	133.77	91.00	133.77	100.00%	-	-	0.00%	91.00	133.77	100.00%	-	-	0.00%
04.03.03.01.03	CAMA DE APOYO (E=0.10 m)	m	91.00	4.65	423.15	91.00	423.15	100.00%	-	-	0.00%	91.00	423.15	100.00%	-	-	0.00%
04.03.03.01.04	RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m3	7.58	72.86	552.28	7.58	552.28	100.00%	-	-	0.00%	7.58	552.28	100.00%	-	-	0.00%
04.03.03.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	0.95	19.73	18.74	0.95	18.74	100.00%	-	-	0.00%	0.95	18.74	100.00%	-	-	0.00%
04.03.03.02.01	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1"	m	15.00	12.67	190.05	15.00	190.05	100.00%	-	-	0.00%	15.00	190.05	100.00%	-	-	0.00%
04.03.03.02.02	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/2"	m	49.00	13.93	682.57	49.00	682.57	100.00%	-	-	0.00%	49.00	682.57	100.00%	-	-	0.00%
04.03.03.03.01	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/2"	m	27.00	13.93	376.11	27.00	376.11	100.00%	-	-	0.00%	27.00	376.11	100.00%	-	-	0.00%

WOLY N. VICENTE BASSILIO
 SUPERVISOR DE OBRA

028

02

V. VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente: FONDOPES
 Contratista: Consorcio San Jose
 Supervision: Consorcio Mendoza & JSU
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios
 Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'607.074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018
 Fecha de termino de obra: 13/03/2018
 Plazo de Ejecucion de obra: 60 dias calendarios

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		UND	METRADO	P.U.	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
04.03.04	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA SALADA															
04.03.04.01	CODO PVC SP 3/4"	und	30.00	10.07	302.10	80.56	26.67%	8.00	-	0.00%	8.00	80.56	26.67%	22.00	221.54	73.33%
04.03.04.02	CODO PVC SP 1"	und	4.00	10.95	43.80	10.95	25.00%	1.00	-	0.00%	1.00	10.95	25.00%	3.00	32.85	75.00%
04.03.04.03	CODO PVC SP 1 1/2"	und	35.00	11.95	418.25	107.55	25.71%	9.00	-	0.00%	9.00	107.55	25.71%	26.00	310.70	74.29%
04.03.04.04	TEE PVC SP 3/4"	und	6.00	9.01	54.06	18.02	33.33%	2.00	-	0.00%	2.00	18.02	33.33%	4.00	36.04	66.67%
04.03.04.05	TEE PVC SP 1"	und	4.00	10.01	40.04	10.01	25.00%	1.00	-	0.00%	1.00	10.01	25.00%	3.00	30.03	75.00%
04.03.04.06	TEE PVC SP 1 1/2"	und	18.00	10.51	189.18	52.55	27.78%	5.00	-	0.00%	5.00	52.55	27.78%	13.00	136.63	72.22%
04.03.04.07	REDUCCION PVC SP 1" A 3/4"	und	4.00	10.15	40.60	10.15	25.00%	1.00	-	0.00%	1.00	10.15	25.00%	3.00	30.45	75.00%
04.03.04.08	REDUCCION PVC SP 1 1/2" A 3/4"	und	2.00	10.15	20.30	10.15	50.00%	1.00	-	0.00%	1.00	10.15	50.00%	1.00	10.15	50.00%
04.03.04.09	REDUCCION PVC SP 1 1/2" A 1"	und	2.00	10.65	21.30	10.65	50.00%	1.00	-	0.00%	1.00	10.65	50.00%	1.00	10.65	50.00%
04.03.04.10	TAPON DE PVC DE 1"	und	2.00	19.29	38.58	19.29	50.00%	1.00	-	0.00%	1.00	19.29	50.00%	1.00	19.29	50.00%
04.03.05	VALVULAS															
04.03.05.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 3/4"	und	6.00	88.80	532.80	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	6.00	532.80	100.00%
04.03.05.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 1 1/2"	und	9.00	166.50	1,498.50	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	9.00	1,498.50	100.00%
04.03.06	PIEZAS VARIAS															
04.03.06.01	NICHO DE PROTECCION PARA VALVULA (AREA DE EXISTENTE)	und	6.00	92.33	553.98	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	6.00	553.98	100.00%
04.03.06.02	NICHO DE PROTECCION PARA VALVULA (AREA DE LAVADO)	und	16.00	92.33	1,477.28	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	16.00	1,477.28	100.00%
04.03.07	EMPALMES Y PRUEBAS HIDRAULICAS															
04.03.07.01	EMPALME A LA RED EXISTENTE DE AGUA SALADA	und	1.00	98.59	98.59	98.59	100.00%	1.00	-	0.00%	1.00	98.59	100.00%	-	-	0.00%
04.03.07.02	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA	m	27.00	2.65	71.55	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	27.00	71.55	100.00%
04.03.07.03	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA ABIERTA	m	27.00	1.45	39.15	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	27.00	39.15	100.00%
04.03.08	SISTEMA DE CLORACION (AGUA SALADA)															
04.04.01.01	EXCAVACION Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERIA	m3	3.21	31.52	101.18	101.18	100.00%	3.21	-	0.00%	3.21	101.18	100.00%	-	-	0.00%
04.04.01.02	REFINE Y NIVELACION TUBERIA	m	16.97	1.47	24.95	24.95	100.00%	16.97	-	0.00%	16.97	24.95	100.00%	-	-	0.00%
04.04.01.03	CAMA DE APOYO (E=0.10 m)	m	16.97	4.65	78.91	78.91	100.00%	16.97	-	0.00%	16.97	78.91	100.00%	-	-	0.00%
04.04.01.04	RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m	16.97	18.21	309.02	309.02	100.00%	16.97	-	0.00%	16.97	309.02	100.00%	-	-	0.00%
04.04.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	3.33	19.73	65.70	65.70	100.00%	3.33	-	0.00%	3.33	65.70	100.00%	-	-	0.00%
04.04.01.02.01	TUBERIA PIDRENAJE PLUVIAL PVC SAP Ø DE 3"	m	7.00	10.36	72.73	72.73	100.00%	7.00	-	0.00%	7.00	72.73	100.00%	-	-	0.00%
04.04.01.02.02	TUBERIA PIDRENAJE PLUVIAL PVC SAP Ø DE 4"	m	4.94	12.01	59.33	59.33	100.00%	4.94	-	0.00%	4.94	59.33	100.00%	-	-	0.00%
04.04.01.02.03	TUBERIA PIDRENAJE PLUVIAL PVC SAP Ø DE 6"	m	5.03	15.85	79.73	79.73	100.00%	5.03	-	0.00%	5.03	79.73	100.00%	-	-	0.00%
04.04.02	CAVALETA METALICA PIDRENAJE PLUVIAL EN TECHO															
04.04.02.01	SUM. E INST. DE CAVALETA PIDRENAJE PLUVIAL EN TECHO ANCHO = 0.20M INCLUIDOS ACCESORIOS	m	11.50	31.67	364.21	364.21	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	11.50	364.21	100.00%

LUQYN. VICENTE BASSILIO
Luqyn Vicente Bassilio
SUPERVISOR DE OBRA

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

OBRA: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente : FONDOPES
 Contratista: Consorcio San Jose
 Supervision: Consorcio Mendoza & JSU
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios
 Monto del Contrato, con IGV: S/ 1'607.074,41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018
 Fecha de termino de obra: 13/03/2018
 Plazo de Ejecucion de obra: 80 dias calendarios

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		UND	METRADO	P.U.	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
04.04.03	CAMARA DE INSPECCION															
04.04.03.01.01	CAJA DE 300 X 300 X 150 mm CAJA DE REG. PREFAB. 0.60M x 0.75M C/ TABA CONCRETO REFORZADO Y PROTECCION DE	und	1.00	140.49	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	140.49	100.00%
04.04.04	ESTRUCTURA DISIPADORA DE ENERGIA															
04.04.04.01	ESTRUCTURA DISIPADORA DE ENERGIA	und	1.00	600.00	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	600.00	100.00%
04.04.05	EMPALMES Y PRUEBAS HIDRAULICAS															
04.04.05.01	PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA EN RED PLUVIAL	m	9.97	1.18	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	11.76	100.00%
04.04.06	ACCESORIOS															
04.04.06.01	VALVULA CHECK BB. CIERRE RAPIDO AMORTIGUADO CON CLABETA DN R. P/EST. DISP. ENERGIA	und	1.00	958.51	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	958.51	100.00%
04.04.06.02	CODO PVC SAP DE 45° X 4°	und	1.00	36.25	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	36.25	100.00%
04.04.06.03	CAJA PVALVULAS 0.55MX0.80M. H=0.40M	und	1.00	446.54	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	446.54	100.00%
04.04.06.04	CODO PVC SAP DE 3°	und	4.00	28.35	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	113.40	100.00%
04.04.06.05	CODO PVC SAP DE 45° X 3°	und	2.00	28.35	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	56.70	100.00%
04.05	DESAGUE DOMESTICO Y VENTILACION															
04.05.01	SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION															
04.05.01.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL Ø DE 2"	pto	23.00	54.53	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	1.254.19	100.00%
04.05.01.02	SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL Ø DE 4"	pto	6.00	56.10	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	336.60	100.00%
04.05.01.03	SALIDA DE VENTILACION EN PVC SAL Ø DE 2"	pto	9.00	69.49	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	625.41	100.00%
04.05.02	REDES DE DESAGUE															
04.05.02.01	RED DE DESAGUE DE TUBERIA DE PVC - SAL Ø DE 2"	m	35.94	11.92	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	35.94	100.00%
04.05.02.02	RED DE DESAGUE DE TUBERIA DE PVC - SAL Ø DE 4"	m	30.42	12.01	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	30.42	100.00%
04.05.02.03	MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERIA PVC - SAL Ø DE 2"	m	36.15	14.24	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	36.15	100.00%
04.05.03	REDES COLECTORAS															
04.05.03.01.01	EXCAVACION Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERIA	m3	18.56	31.52	-	-	100.00%	18.56	585.01	-	-	100.00%	18.56	585.01	-	0.00%
04.05.03.01.02	REFINE Y NIVELACION PITUBERIA	m	42.82	1.47	-	-	100.00%	42.82	62.95	-	-	100.00%	42.82	62.95	-	0.00%
04.05.03.01.03	CAMA DE APOYO (E=0.10 m)	m	42.82	4.65	-	-	100.00%	42.82	199.11	-	-	100.00%	42.82	199.11	-	0.00%
04.05.03.01.04	RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m	42.82	18.21	-	-	100.00%	42.82	779.75	-	-	100.00%	42.82	779.75	-	0.00%
04.05.03.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	19.30	19.73	-	-	100.00%	19.30	380.79	-	-	100.00%	19.30	380.79	-	0.00%
04.05.03.02.01	RED COLECTORA CON TUBERIA DE PVC SAP Ø DE 4	m	42.82	12.01	-	-	100.00%	42.82	514.27	-	-	100.00%	42.82	514.27	-	0.00%
04.05.04	ACCESORIOS															
04.05.04.01	YEE PVC SAP DE 2" X 2"	und	19.00	2.12	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	19.00	100.00%
04.05.04.02	YEE PVC SAP DE 4" X 4"	und	3.00	34.47	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	103.41	100.00%
04.05.04.03	YEE PVC SAP DE 4" X 2"	und	8.00	34.17	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	273.36	100.00%
04.05.04.04	YEE DOBLE PVC SAP DE 4" X 4"	und	2.00	36.49	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	72.98	100.00%
04.05.04.05	CODO PVC SAP DE 45° X 2"	und	14.00	18.67	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	261.38	100.00%
04.05.04.06	CODO PVC SAP DE 45° X 4"	und	10.00	19.38	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	193.80	100.00%
04.05.04.07	CODO PVC SAP DE 90° X 2"	und	16.00	21.02	-	-	0.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	336.32	100.00%

LUCY N. VICENTE BASSILLO
Lucy Vicente Bassillo
SUPERVISOR DE OBRA

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente : FONDOPES

Contratista: Consorcio San José

Supervisor: Consorcio Mendoza & JSU

Sistema de Contratación: Precios Unitarios

Monto del Contrato, con IGV: S/ 1'607.074,41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018
 Fecha de término de obra: 13/03/2018
 Plazo de Ejecución de obra: 60 días calendario

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA			SALDO POR VALORIZAR		
		UND	METRADO	P.U.	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
04.05.04.08	TEE SANITARIA PVC SAP 2"	und	3.00	20.92	-	62.76	0.00%	-	-	0.00%	-	-	3.00	62.76	100.00%	
04.05.05	ADITAMENTOS VARIOS															
04.05.05.01	SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION	und	10.00	59.00	-	590.00	0.00%	-	-	0.00%	-	-	10.00	590.00	100.00%	
04.05.05.02	REGISTRO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION	und	3.00	66.50	-	199.50	0.00%	-	-	0.00%	-	-	3.00	199.50	100.00%	
04.05.05.03	REGISTRO DE BRONCE 4" PROVISION Y COLOCACION	und	5.00	67.81	-	339.05	0.00%	-	-	0.00%	-	-	5.00	339.05	100.00%	
04.05.05.04	SOMBRERO DE VENTILACION 2" PVC SAP	und	9.00	44.33	-	398.97	0.00%	-	-	0.00%	-	-	9.00	398.97	100.00%	
04.05.06	CAMARA DE INSPECCION															
04.05.06.01.01	CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	und	3.00	236.24	3.00	708.72	100.00%	3.00	708.72	100.00%	3.00	708.72	3.00	708.72	100.00%	
04.05.06.01.02	CAJA DE REGISTRO DE 24" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	und	4.00	287.02	4.00	1,148.08	100.00%	4.00	1,148.08	100.00%	4.00	1,148.08	4.00	1,148.08	100.00%	
04.05.07	EMPALMES Y PRUEBAS HIDRAULICAS															
04.05.07.01	PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA DE TUB. DESAGUE	m	107.38	1.71	-	183.62	0.00%	-	-	0.00%	-	-	107.38	183.62	100.00%	
04.06	DESAGUE INDUSTRIAL Y VENTILACION															
04.06.01	SALIDA DE DESAGUE INDUSTRIAL Y VENTILACION															
04.06.01.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL Ø DE 2"	pdo	14.00	54.53	-	763.42	0.00%	-	-	0.00%	-	-	14.00	763.42	100.00%	
04.06.02	REDES DE DESAGUE															
04.06.02.01	RED DE DESAGUE DE TUBERIA DE PVC - SAL Ø DE 2"	m	44.30	11.92	-	528.06	0.00%	-	-	0.00%	-	-	44.30	528.06	100.00%	
04.06.02.02	RED DE DESAGUE DE TUBERIA DE PVC - SAL Ø DE 4"	m	3.88	12.01	3.88	46.60	100.00%	3.88	46.60	100.00%	3.88	46.60	3.88	46.60	100.00%	
04.06.03	REDES COLECTORAS															
04.06.03.01.01	EXCAVACION Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERIA	m3	4.71	31.52	4.71	148.46	100.00%	4.71	148.46	100.00%	4.71	148.46	4.71	148.46	100.00%	
04.06.03.01.02	REFINE Y NIVELACION PIUBERIA	m	20.92	1.47	20.92	30.75	100.00%	20.92	30.75	100.00%	20.92	30.75	20.92	30.75	100.00%	
04.06.03.01.03	CAMA DE APOYO (E=0.10 m)	m	20.92	4.65	20.92	97.28	100.00%	20.92	97.28	100.00%	20.92	97.28	20.92	97.28	100.00%	
04.06.03.01.04	RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m	20.92	18.21	20.92	380.95	100.00%	20.92	380.95	100.00%	20.92	380.95	20.92	380.95	100.00%	
04.06.03.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	4.90	19.73	4.90	96.68	100.00%	4.90	96.68	100.00%	4.90	96.68	4.90	96.68	100.00%	
04.06.03.02.01	RED COLECTORA CON TUBERIA DE PVC SAP Ø DE 4	m	20.92	12.01	20.92	251.25	100.00%	20.92	251.25	100.00%	20.92	251.25	20.92	251.25	100.00%	
04.06.04	ACCESORIOS															
04.06.04.01	CODO PVC SAP DE 45" X 2"	und	12.00	18.67	-	224.04	0.00%	-	-	0.00%	-	-	12.00	224.04	100.00%	
04.06.04.02	CODO PVC SAP DE 45" X 4"	und	2.00	19.38	2.00	38.76	100.00%	2.00	38.76	100.00%	2.00	38.76	2.00	38.76	100.00%	
04.06.04.03	TEE SANITARIA PVC SAP 2"	und	2.00	20.92	-	41.84	0.00%	-	-	0.00%	-	-	2.00	41.84	100.00%	
04.06.05	CAMARA DE INSPECCION															
04.06.05.01.01	CAJA DE REGISTRO DE 24" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	und	6.00	287.02	6.00	1,722.12	100.00%	6.00	1,722.12	100.00%	6.00	1,722.12	6.00	1,722.12	100.00%	
04.06.06	EMPALMES Y PRUEBAS HIDRAULICAS															
04.06.06.01	PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA DE TUB. DESAGUE	m	69.10	1.71	69.10	118.16	100.00%	69.10	118.16	100.00%	69.10	118.16	69.10	118.16	100.00%	
04.06.07	PLANTA DE TRATAMIENTO															
04.06.07.01	PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE INDUSTRIAL INCLUIDO ACCESORIOS	gib	1.00	190,000.00	1.00	190,000.00	100.00%	1.00	190,000.00	100.00%	1.00	190,000.00	1.00	190,000.00	100.00%	

31

LUCY N. VICENTE BASSILLO
 SUPERVISOR DE OBRA

V. VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES
 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018
 Fecha de término de obra: 13/03/2018
 Plazo de Ejecución de obra: 60 días calendario

Cliente : FONDOPES
 Contratista: Consorcio San Jose
 Supervision: Consorcio Mendoza & JSU
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios
 Monto del Contrato, con IGV: S/ 1'607.074.41

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		UND	METRADO	P.U.	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
	COSTO DIRECTO				253,583.05			204,682.41			0.00	204,682.41			48,920.67	
	GASTOS GENERALES	15.50%			39,306.37			31,722.67			0.00	31,722.67			7,582.70	
	UTILIDADES	5.35%			13,568.69			10,949.44			0.00	10,949.44			2,617.26	
	SUB TOTAL				306,455.11			247,334.52			0.00	247,334.52			59,120.63	
	IGV		18%		55,161.92			44,520.21			0.00	44,520.21			10,641.71	
	TOTAL SUB PRESUPUESTO DE OBRA				361,617.03			291,854.73			0.00	291,854.73			69,762.34	
	PORCENTAJE DE AVANCE				100.00%			80.71%			0.00%	80.71%			19.29%	

LUCY N. VICENTE BASSILIO
Lucy Vicente Bassilio
 SUPERVISOR DE OBRA

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA Nº 07

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018
 OBRA: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente : FONDOPE
 Contratista: Consorcio San Jose
 Supervisor: Consorcio Mendoza & JSJ
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios
 Monto del Contrato, con IGV: S/ 1'607.074.41

Fecha inicio de obra: 13/01/2018
 Fecha termino de obra: 13/03/2018
 Plazo Ejecucion de obra: 60 dias calendarios

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL				VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR				VALORIZACION ACTUAL				VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL				SALDO POR VALORIZAR			
		UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	
05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS																				
05.01.01	CORTE, ROTURA Y RESANE DE PAVIMENTO	m	20.00	284.22	5,684.40	20.00	5,684.40	100.00%												0.00%	
05.01.02	EXCAVACION DE ZANJA DE 0.80 x 0.80, TERRENO SEMIRIGIDO	m	20.00	91.85	1,837.00	20.00	1,837.00	100.00%													0.00%
05.01.03	RELLENO COMPACTADO Y NIVELACION DE ZANJA 0.6 x 0.80 m, TERRENO SEMIRIGIDO	m	30.00	27.55	826.50	30.00	826.50	100.00%													0.00%
05.01.04	DUCTOS DE CONCRETO DE 2 VIAS	und	3.00	192.33	576.99	3.00	576.99	100.00%													0.00%
05.01.05	CINTA DE SEÑALIZACION	m	20.00	6.66	133.20	20.00	133.20	100.00%													0.00%
05.02	CANALIZACIONES ELECTRICAS																				
05.02.01	TUBERIA DE PVC-P Ø 20mm	m	293.58	12.14	3,564.06	-	-	0.00%													0.00%
05.02.02	TUBERIA DE PVC-P Ø 25mm	m	4.99	13.83	69.01	-	-	0.00%													0.00%
05.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC 3/4" (20mm) INC./ FIJACION CON CANAL UNIPOLAR Y CURVAS	m	172.52	23.64	4,078.37	-	-	0.00%													0.00%
05.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC 1/2" (15.5mm) INC./ FIJACION CON CANAL UNIPOLAR Y CURVAS	m	28.98	37.56	1,088.49	-	-	0.00%													0.00%
05.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC 1" (25mm) INC./ FIJACION CON CANAL UNIPOLAR Y CURVAS	m	25.31	28.43	719.56	-	-	0.00%													0.00%
05.03	CABLES ELECTRICOS ALIMENTADORES																				
05.03.01	CABLE ELECTRICOS N2G1 3-1x10mm2	m	26.25	15.80	414.75	-	-	0.00%													0.00%
05.03.02	CABLE ELECTRICOS N1X-90 10mm2	m	54.81	8.01	439.03	-	-	0.00%													0.00%
05.03.03	CABLE ELECTRICOS N1-90 10mm2	m	20.90	7.78	162.60	-	-	0.00%													0.00%
05.03.04	CABLE ELECTRICOS N1-80 6mm2	m	45.26	6.65	300.98	-	-	0.00%													0.00%
05.03.05	CABLE ELECTRICOS N1-80 4mm2	m	1,465.88	6.09	8,927.21	-	-	0.00%													0.00%
05.03.06	CABLE SUMERGIBLE 144 mm2	m	11.55	16.41	189.54	-	-	0.00%													0.00%
05.04	SALIDAS ELECTRICAS																				
05.04.01	SALIDA CENTRO DE LUZ EN TECHO EMPOTRADA	und	14.00	36.70	513.80	-	-	0.00%													0.00%
05.04.02	SALIDA CENTRO DE LUZ EN TECHO ADOSADO	und	36.00	37.20	1,339.20	-	-	0.00%													0.00%
05.04.03	SALIDA CENTRO DE LUZ EN PARED	und	6.00	36.70	220.20	-	-	0.00%													0.00%
05.04.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE EMPOTRADO	und	8.00	47.52	380.16	-	-	0.00%													0.00%
05.04.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE ADOSADO	und	3.00	49.02	147.06	-	-	0.00%													0.00%
05.04.06	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE CON PUESTA A TIERRA PRUEBA DE AGUA	und	11.00	65.18	716.98	-	-	0.00%													0.00%
05.05	LUMINARIAS																				
05.05.01	LUMINARIA HERMETICA P/ADOSAR 2x36 WATTS, IP 65, SIMILAR AL MODELO ARH	und	27.00	126.03	3,402.81	-	-	0.00%													0.00%
05.05.02	LUMINARIA HERMETICA P/ADOSAR 2x36 WATTS, IP 65, SIMILAR AL MODELO ARH + Kit de Emergencia	und	10.00	186.03	1,860.30	-	-	0.00%													0.00%
05.05.03	LUMINARIA HERMETICA P/ADOSAR 2x18 WATTS, IP 65, SIMILAR AL MODELO ARH	und	7.00	92.13	644.91	-	-	0.00%													0.00%
05.05.04	LUMINARIA HERMETICA P/ADOSAR 2x18 WATTS, IP 65, SIMILAR AL MODELO ARH + Kit de Emergencia	und	6.00	152.13	912.78	-	-	0.00%													0.00%
05.05.05	LUMINARIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR DE 70 WATTS C/ PASTORAL PS 1.001901.570	und	2.00	671.98	1,343.96	-	-	0.00%													0.00%
05.05.06	LUMINARIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR DE 150 WATTS C/ PASTORAL PS 1.001901.570	und	4.00	771.98	3,087.92	-	-	0.00%													0.00%

LUCY A. VICENTE BASSANO
 SUPERVISOR DE OBRA

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA Nº 07

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018
 Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES
 Cliente: FONDOPES

Contratista: Consorcio San José
 Supervisión: Consorcio Mendocza & JSU
 Sistema de Contratación: Precios Unitarios
 Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'607,074.41

Fecha inicio de obra: 13/01/2018
 Fecha término de obra: 13/03/2018
 Plazo Ejecución de obra: 60 días calendario

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL				VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
05.06	TABLEROS ELECTRICOS																
05.06.01	TABLERO GENERAL DE PROTECCION TGP	und	1.00	1,957.52	1,957.52	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	1,957.52	100.00%			
05.06.02	TABLERO DE DISTRIBUCION TAREAS PREVIAS (TD-TP)	und	1.00	2,886.02	2,886.02	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	2,886.02	100.00%			
05.06.03	TABLERO BOMBAS SUMIDERO TBS-01	und	1.00	2,287.02	2,287.02	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	2,287.02	100.00%			
05.07	PUESTA A TIERRA																
05.07.01	POZO DE PUESTA A TIERRA R < 15 OHMIOS	und	1.00	1,541.57	1,541.57	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	1,541.57	100.00%			
05.08	CAJAS DE PASE																
05.08.01	CAJA DE PASE DE PASE DE PASE CON TAPA CIEGA, TIPO PESADO 100 X 100 X 50 mm	und	12.00	32.02	384.24	-	-	0.00%	-	-	0.00%	12.00	384.24	100.00%			
05.08.02	CAJA DE PASE DE PASE DE PASE CON TAPA CIEGA, TIPO PESADO 200 X 200 X 100 mm	und	2.00	35.02	70.04	-	-	0.00%	-	-	0.00%	2.00	70.04	100.00%			
05.08.03	CAJA DE PASE DE POLYESTER, REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 135 X 120 mm	und	11.00	37.52	412.72	-	-	0.00%	-	-	0.00%	11.00	412.72	100.00%			
05.08.04	CAJA DE PASE DE POLYESTER, REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 180 X 135 X 141 mm	und	4.00	39.27	157.08	-	-	0.00%	-	-	0.00%	4.00	157.08	100.00%			
05.08.05	CAJA DE PASE DE POLYESTER, REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 270 X 180 X 171 mm	und	1.00	48.59	48.59	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	48.59	100.00%			
05.09	SISTEMA DE CONTROL																
05.09.01	BOYAS DE CONTROL DE NIVEL, incl. 10 mts cable sumergible	und	4.00	199.10	796.40	-	-	0.00%	-	-	0.00%	4.00	796.40	100.00%			
05.09.02	BANDEJA PORTABLE PARA BOYAS, SEGUN PLANO	und	1.00	279.02	279.02	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	279.02	100.00%			
05.10	PUESTA EN MARCHA																
05.10.01	PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA Y PUESTA EN SERVICIO	gib	1.00	3,500.00	3,500.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	3,500.00	100.00%			
	COSTO DIRECTO				57,901.98				9,058.08				9,058.08				48,843.90
	GASTOS GENERALES	15.50%			8,974.81				1,404.00				1,404.00				7,570.80
	UTILIDADES	5.36%			3,097.76				484.61				484.61				2,613.15
	SUB TOTAL				69,974.56				10,946.70				10,946.70				59,027.85
	IGV	18%			12,595.42				1,970.41				1,970.41				10,625.01
	TOTAL SUB PRESUPUESTO DE OBRA				82,569.98				12,917.11				12,917.11				69,652.86
	PORCENTAJE DE AVANCE				100.00%				15.64%				15.64%				84.36%

LUCY N. VICENTE BASSINIO
 SUPERVISOR DE OBRA

CURVA DE AVANCE DE OBRA

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Contratista: Consorcio San Jose


Supervision: Consorcio Mendoza & JSU

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios

Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'607,074.41

ZONA GEOGRAFICA 1

Fecha inicio de obra: 13/01/2018
 Fecha termino de obra: 13/03/2018
 Plazo Ejecucion de obra: 60 dias calendarios

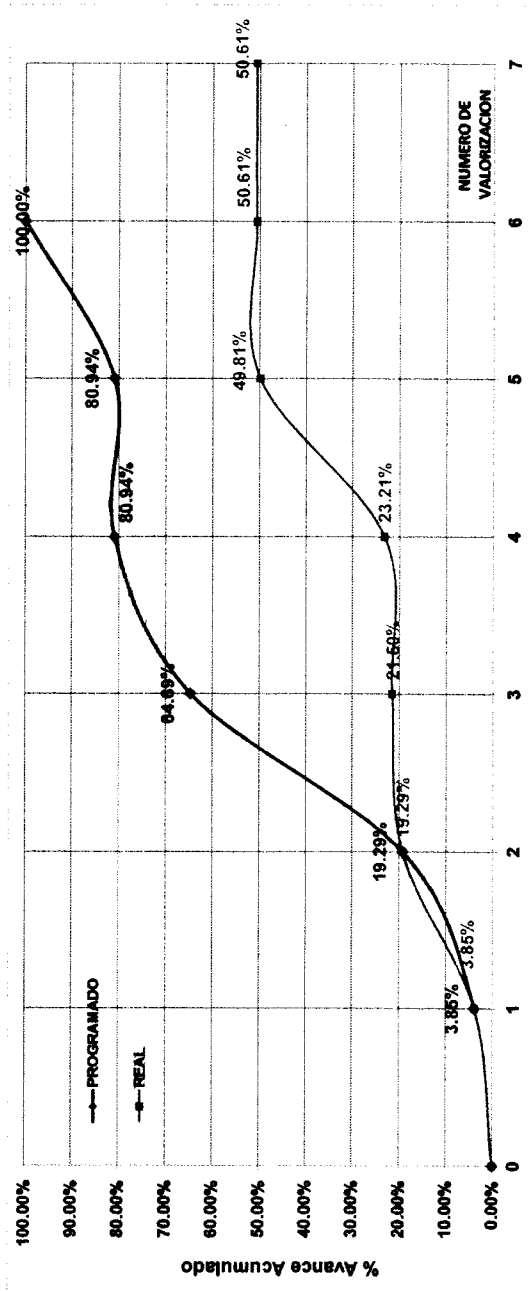

VALORIZACION	AVANCE PROGRAMADO (Nuevo Calendario)				AVANCE REAL			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
	S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
1 15-ene-18	52,400.55	3.85%	52,400.55	3.850%	52,400.55	3.85%	52,400.55	3.85%
2 31-ene-18	210,295.91	15.44%	262,696.46	19.29%	210,295.91	15.44%	262,696.46	19.29%
3 15-feb-18	618,321.69	45.40%	881,018.14	64.69%	30,104.30	2.21%	292,800.76	21.50%
4 28-feb-18	221,358.61	16.25%	1,102,376.75	80.94%	23,246.00	1.71%	316,046.76	23.21%
5 15-mar-18	0.00	0.00%	1,102,376.75	80.94%	362,263.93	26.60%	678,310.69	49.81%
6 19-mar-18	259,550.72	19.06%	1,361,927.47	100.00%	10,946.70	0.80%	689,257.39	50.61%
7 15-abr-18					0.00	0.00%	689,257.39	50.61%
TOTAL (Sin IGV.)	1,361,927.48	100.00%						

Situacion de la Obra : ATRASADA -49.39%

LUCY N. VICENTE/BASSILIO
Lucy N. Vicente Bassilio
 SUPERVISOR DE OBRA



PERÚ

Ministerio de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Fecha: 20/07/18

MEMORÁNDUM INTERNO Nº 1688 - 201 - FONDEPES / DIGENIPAA

Asunto

Costa #046/

Referencia

Registro : 3085

Destino	Indicación	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	
OCI		OGAJ	
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	<u>AOEM</u>

FONDEPES
AREA DE OBRAS EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO
23 ABR. 2018
RECIBIDO
Hora: 8:50 am

Observaciones:



Atentamente

Indicaciones:

- 01. Autorizado/Aprobado
- 02. Calificar/Evaluar
- 03. Informe
- 04. Proyectar resolución
- 05. Atención/Tramitación
- 06. Conocimiento y fines
- 07. Notificar al interesado
- 08. Reformular
- 09. Ayuda memoria
- 10. Coordinar
- 11. Opinión/Recomendación
- 12. Consolidar
- 13. Aclarar redacción
- 14. Implementar/Ejecutar
- 15. Preparar respuesta
- 16. Visación
- 17. Agregar a sus antecedentes
- 18. Archivo
- 19. Ampliar
- 20. Seguimiento

036

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper middle section of the page.



Small handwritten mark or signature at the bottom left of the page.




MEMORÁNDUM INTERNO N° 1386 -201 -FONDEPES / DIGENIPAA / AOEM


Asunto : Memo Interno N° 1688-2018- DIGENIPAA

Referencia : _____ Registro: 3085

Destino	Indicación	Destino	Indicación

Observaciones: Asf. Alejandro Galvez

Atentamente: 



Indicaciones:

- 0.1. Autorizado/Aprobado
- 0.2. Calificar/Evaluar
- 0.3. Informe
- 0.4. Proyectar resolución
- 0.5. Atención/Tramitación
- 0.6. Conocimiento y fines
- 0.7. Notificar al interesado
- 0.8. Reformular
- 0.9. Ayuda memoria
- 10. Coordinar
- 11. Opinión/Recomendación
- 12. Consolidar
- 13. Aclarar redacción
- 14. Implementar/Ejecutar
- 15. Preparar respuesta
- 16. Visación
- 17. Agregar a sus antecedentes
- 18. Archivo
- 19. Ampliar
- 20. Seguimiento

037

Lima, 20 de abril del 2018

CARTA N° 046-2018/FONDEPES-AS32

Señores:

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES

Av. Petit Thouars N°115 - Cercado de Lima

Lima.-

Atención : Arq. Alejandro Gálvez Hurtado.
Administrador de Contrato

Asunto : Informe Quincenal de Obra N° 07 correspondiente al periodo del 01 al 15 de abril.

Ref. : Contrato N° 056-2017-FONDEPES "Ejecución de la Obra "Optimización de la sala de tareas previas del desembarcadero Pesquero artesanal de Puerto Pizarro, distrito de tumbes, provincia de Tumbes, Región Tumbes"

De nuestra consideración:

Mediante la presente tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con la finalidad de hacer entrega en un (1) original y dos (2) copias y un CD, el Informe Quincenal de Obra N° 07 correspondiente al periodo del 01 al 15 de abril de la obra en referencia.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de nuestra especial consideración.

Atentamente,

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO




2709810

N° DOC:	00003085-2018
CLAVE:	6777
USUARIO:	dgalindo
FECHA Y HORA:	20/04/2018 17:08:46
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	

CONSORCIO MENDOZA & JSU

KATERINE D. JAVIERA OLIVAR REYES
REPRESENTANTE LEGAL





**INFORME QUINCENAL POR LA
SUPERVISIÓN N° 07
(DEL 01 AL 15 DE ABRIL)**

**“OPTIMIZACIÓN DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO
PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE
TUMBES, REGIÓN TUMBES”**

**CONSORCIO
MENDOZA & JSU**

**INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N° 07
(1 AL 15 DE ABRIL DE 2018)**

**Contrato Supervisión N°057-2017-
FONDEPES
Rev.:0
A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA
CONVOCATORIA**

**OBRA: "OPTIMIZACION DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO,
DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES"**

**INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N° 07
(01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018)**

CONSORCIO MENDOZA & JSU	INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N° 07 (1 AL 15 DE ABRIL DE 2018)	Contrato Supervisión N°057-2017- FONDEPES Rev.:0
		A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA CONVOCATORIA

I. DATOS GENERALES DE LA OBRA

Obra : "OPTIMIZACION DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES"

Ubicación

 Región : Tumbes

 Provincia : Tumbes

 Distrito : Tumbes

 Lugar : Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro

Entidad : FONDEPES

Coordinador de Obra : Arq. Alejandro Gálvez Hurtado

Proceso de selección del Contratista : A.S. N°0029-2017-FONDEPES; PRIMERA CONVOCATORIA

Contratista : CONSORCIO SAN JOSE

Sistema de Contratación : PRECIOS UNITARIOS

Contrato de Ejecución de la obra : N°057-2017-FONDEPES

Monto del Referencial, con IGV : S/. 1'627,021.54

Monto del Contrato, con IGV : S/. 1'607,074.41

Factor Referencial : 0.98774009

Plazo de Ejecución de la obra según contrato : 60 días calendarios

Entrega de terreno : 12 de enero del 2018

Inicio Contractual del Plazo de obra : 13 de enero del 2018

Termino Contractual del Plazo de obra : 13 de marzo del 2018

Nueva Fecha Termino del Plazo de obra : 19 de marzo del 2018

Adelanto Directo N°01 : No solicitado

Adelanto Materiales N°01 : En tramite

Avance real del 01 al 15 de abril del 2018 : **0.00%**

Avance real acumulado : **50.61%**

Avance reprogramado acumulado : **100.00%**

Situación de la obra : **49.39% ATRAZADA**

Supervisión de Obra : CONSORCIO MENDOZA & JSU

Jefe de Supervisión : Ing. Flor A. Guevara Bellodas

Proceso selección de Supervisión : A.S. N°0032-2017-FONDEPES; PRIMERA CONVOCATORIA

Contrato de Supervisión : N°057-2017-FONDEPES

Sistema de Contratación Supervisión : SUMA ALZADA

Monto del contrato de Supervisión con IGV : S/. 89,751.75

Plazo de Ejecución de la Prestación : 60 Días Calendarios

Lucy N. Vicente Basilio
LUCY N. VICENTE BASILIO

CONSORCIO MENDOZA & JSU	INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N° 07 (1 AL 15 DE ABRIL DE 2018)	Contrato Supervisión N°057-2017- FONDEPES Rev.:0
		A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA CONVOCATORIA

II. FICHA TECNICA DE LA OBRA

Nombre de la obra : "OPTIMIZACION DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES"

Entidad Contratante : FONDEPES

Modalidad de ejecución : contrata a precios unitarios

Monto del Contrato de Obra : S/.1'607,074.41

Ubicación

 Región : Tumbes

 Provincia : Tumbes

 Distrito : Tumbes

 Lugar : Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro

AMPLIACION DE PLAZO

Ampliación de plazo N°01 : DENEGADA

Ampliación de plazo N°02 : DENEGADA

Ampliación de plazo N°03 : DENEGADA

Ampliación de plazo N°04 : 6DC(RSGN°049-2018-FONDEPES/SG)

Ampliación de plazo N°05 : DENEGADA

Ampliación de plazo N°06 : DENEGADA

Ampliación de plazo N°07 : DENEGADA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE OBRA

ESTRUCTURAS	S/. 437,877.26
ARQUITECTURA	S/. 377,594.64
INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 253,583.05
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/. 57,901.99
COSTO DIRECTO	S/.1'126,956.94
GASTOS GENERALES (15.50%)	S/. 174,678.33
UTILIDADES (5.35%)	S/. 60,292.20
SUB TOTAL	S/.1'361,927.47
I.G.V. (18%)	S/. 245,146.94
TOTAL PRESUPUESTO	S/.1'607,074.41

042

LUCY VICENTE BASSILIO

SUPERVISOR DE OBRA

III. ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA

El avance físico real de la obra en el periodo del 01 al 15 de Abril del 2018 es de 0.00%, teniendo un avance real acumulado de 50.61%. El avance programado del nuevo calendario de este periodo es de 100%, por lo que la obra se encuentra atrasada respecto al programado en 49.39%.

IV. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA QUINCENA


En este periodo del 01 al 15 de abril, el contratista ejecutor no ha realizado actividades.

V. CUADRO DE AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO

VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO (Nuevo Calendario)				AVANCE REAL			
		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
		S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
1	15-ene-18	52,400.55	3.85%	52,400.55	3.850%	52,400.55	3.85%	52,400.55	3.85%
2	31-ene-18	210,295.91	15.44%	262,696.46	19.29%	210,295.91	15.44%	262,696.46	19.29%
3	15-feb-18	618,321.69	45.40%	881,018.14	64.69%	30,104.30	2.21%	292,800.76	21.50%
4	28-feb-18	221,358.61	16.25%	1,102,376.75	80.94%	23,246.00	1.71%	316,046.76	23.21%
5	15-mar-18	0.00	0.00%	1,102,376.75	80.94%	362,263.93	26.60%	678,310.69	49.81%
6	19-mar-18	259,550.72	19.06%	1,361,927.47	100.00%	10,946.70	0.80%	689,257.39	50.61%
7	15-abr-18					0.00	0.00%	689,257.39	50.61%
TOTAL (Sin IGV.)		1,361,927.48	100.00%						

Situación de la Obra : ATRASADA -49.39%

VI. CURVA "S"

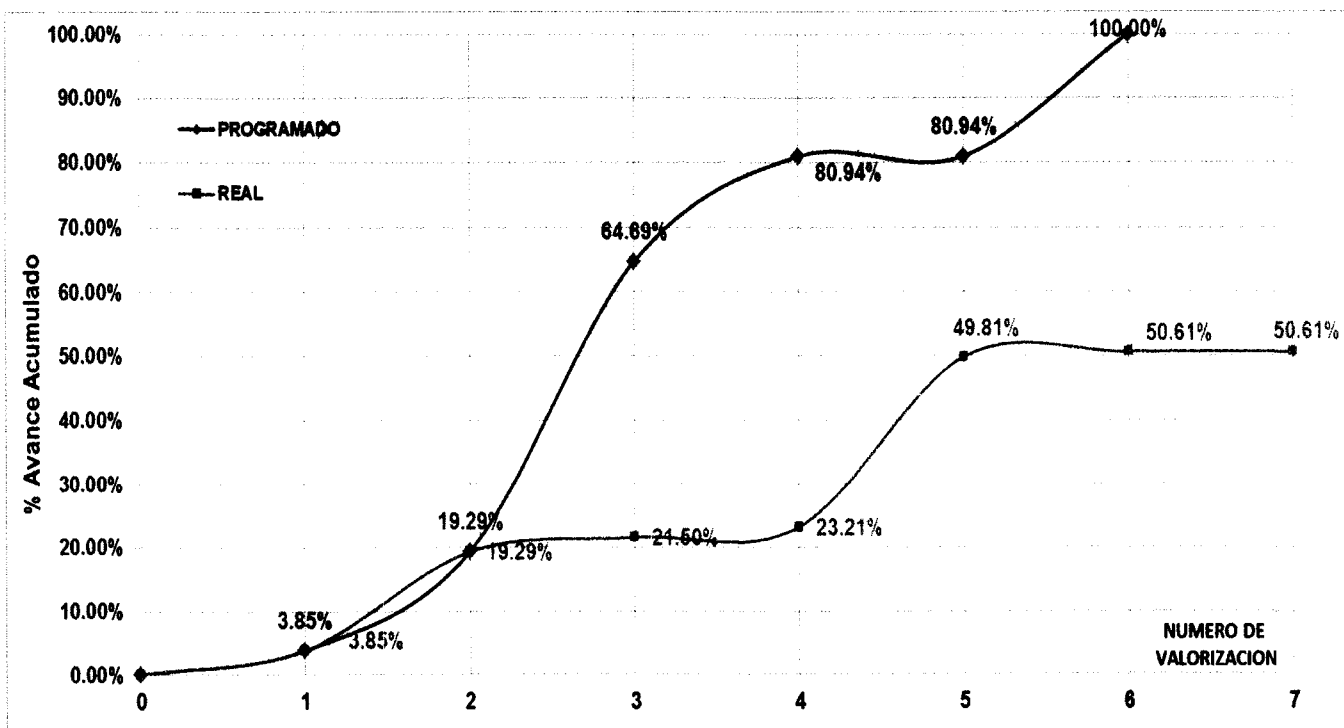

[Handwritten Signature]

CONSORCIO MENDOZA & JSU	INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N° 07 (1 AL 15 DE ABRIL DE 2018)	Contrato Supervisión N°057-2017- FONDEPES Rev.:0
		A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA CONVOCATORIA

VII. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE QUINCENA

Para la siguiente quincena se continuará con siguientes las actividades programas:

- Se continuarán con las actividades de Seguridad y salud, plan ambiental.
- Trabajos de movimiento de tierras
- Trabajos de concreto simple
- Trabajos de concreto armado
- Trabajos de mantenimiento reparación y reforzamiento de estructuras
- Trabajos de muros y tabiquería de albañilería
- Trabajos de revoques enlucidos y molduras
- Trabajos de cielo raso.
- Trabajos de pisos y pavimentos
- Trabajos de zócalo y contra zócalo
- Trabajos de Coberturas y techos
- Trabajos de vidrios , cristales y similares.
- Trabajo de pintura epóxica en estructuras metálica en altura.
- Trabajos en instalaciones sanitarias –aparatos sanitarios y accesorios.
- Trabajos de instalaciones sanitarias - sistema de agua fría
- Trabajos de instalaciones sanitarias – sistema de agua salada
- Trabajos de inst. sanitarias - sistema de drenaje pluvial
- Trabajos de inst. sanitarias - Desagüe doméstico y ventilación
- Trabajos de inst. sanitarias - Desagüe industrial y ventilación
- Trabajos de instalaciones eléctricas – movimiento de tierras.
- Trabajos de instalaciones eléctricas – canalizaciones eléctricas.
- Trabajos de instalaciones eléctricas – cables eléctricos alimentadores.
- Trabajos de instalaciones eléctricas – salidas eléctricas.
- Trabajos de instalaciones eléctricas – cajas de pase.
- Trabajos de instalaciones eléctricas – sistemas de control.

LUCY N. VICENTE BASSILIO

SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MENDOZA & JSU	INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N° 07 (1 AL 15 DE ABRIL DE 2018)	Contrato Supervisión N°057-2017- FONDEPES Rev.:0
		A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA CONVOCATORIA

VIII. REPORTE DE PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

➤ **REPORTE DE PERSONAL DE OBRA**

- **PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA EJECUTORA**

CANTIDAD	CARGO
01	RESIDENTE DE OBRA
01	ALMACENERO
01	MAESTRO DE OBRA
04	OPERARIOS
07	PEONES
01	GUARDIAN

- PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA SUPERVISORA

ITEM	CARGO
01	JEFE SUPERVISOR DE OBRA
01	SUPERVISOR DE SEGURIDAD

➤ **REPORTE DE EQUIPOS Y MAQUINARIA.**

CANT	DESCRIPCION
3	ROTOMARTILLO (3 GRANDES)
4	MOLADORAS (3 CHICAS Y 1 GRANDE)
2	TALADROS
2	SIERRAS CIRCULARES
1	TROZADORA
1	TROMPO

➤ **MATERIALES.**


CANT	DESCRIPCION
100 UN.	VARILLAS DE Ø 5/8
130 UN.	VARILLAS DE Ø 3/8
10 UN.	VARILLAS DE Ø ½
10 KG	CLAVOS 2"
15 KG	CLAVOS 3"
5 KG	CLAVOS 4"
10 KG	ALAMBRE N° 08
10 KG	ALAMBRE N° 16
2 MLL	LADRILLOS KK
200 BLS	CEMENTO TIPO V
20 UND	TUBOS DE DESAGUE 2"
8 UND.	TUBOS DE 4"
9 UND.	TUBOS DE ¾ "
½ KG	CLAVOS DE CEMENTO
12 M 3	PIEDRA CHANCADA
7 M3	ARENA
4 UND	LISTONES DE MADERA
10 UND	TABLAS MADERA
2 UND.	PLANCHAS DE TRIPLAY
02 UND.	SIKADUR GEL 32 - 5KG C/U-
08 UND.	MOLDES PARA PROBETAS DE CONCRETO.

LUCYD VICENTE BASSILO

CONSORCIO MENDOZA & JSU	INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N° 07 (1 AL 15 DE ABRIL DE 2018)	Contrato Supervisión N°057-2017- FONDEPES Rev.:0
		A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA CONVOCATORIA


IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico real de la obra en el periodo del 01 al 15 de Abril del 2018 es de 0.00 %, teniendo un avance real acumulado de 50.61%. Siendo el avance programado acumulado de 100.00%; por lo que la obra se encuentra atrasada respecto al programado en 49.39%. Situacional de la Obra: ATRASADA.
- Debemos indicar el nuevo plazo de termino de obra fue 19 de marzo del 2018, el contratista continua ejecutando la obra, tal situación de atraso de la obra es totalmente responsabilidad del Contratista, la Entidad podrá proceder conforme lo indicado en la cláusula del contrato N° 056 – 2017 – Fondepes Primera Convocatoria.
- Se recomienda al Contratista incrementar más cuadrillas de tal manera proceder con la ejecución de la obra y culminar la metas proyectadas.


LUCY N. VICENTE BASSILIO
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MENDOZA & JSU	INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N° 07 (1 AL 15 DE ABRIL DE 2018)	Contrato Supervisión N°057-2017- FONDEPES Rev.:0
		A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA CONVOCATORIA

X. PANEL FOTOGRAFICO

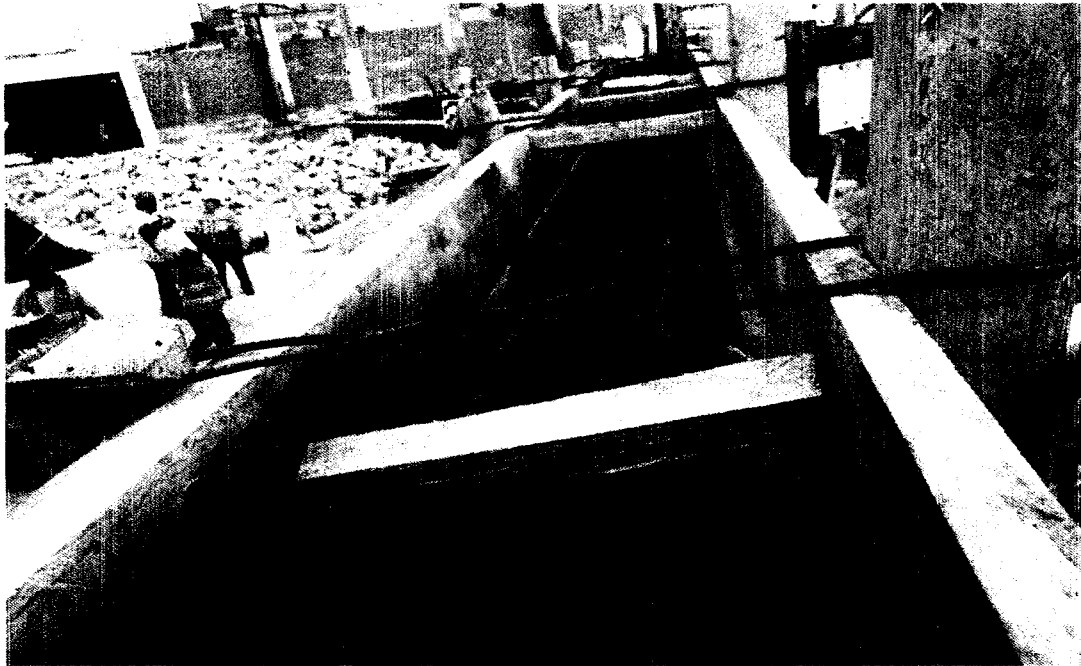

Fotografía N° 01 Se verifica el encofrado de las vigas en los muros de la PTAR.



Fotografía N°02 Se verifica la instalación de las tuberías de PVC de agua.

Lucy N. Vicente Bassilio
LUCY N. VICENTE BASSILIO

**CONSORCIO
MENDOZA & JSU**

**INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N° 07
(1 AL 15 DE ABRIL DE 2018)**

**Contrato Supervisión N°057-2017-
FONDEPES
Rev.:0
A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA
CONVOCATORIA**



Fotografía N° 03 Charlas diarias de seguridad en la Obra.



Fotografía N° 04 Se verifica la verticalidad del encofrado de las columnas del muro en servicios higiénicos .


**CONSORCIO
MENDOZA & JSU**

**INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N° 07
(1 AL 15 DE ABRIL DE 2018)**

**Contrato Supervisión N°057-2017-
FONDEPES
Rev.:0
A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA
CONVOCATORIA**



Fotografía N° 05 Se realiza el vaciado de concreto $f'c = 210\text{kg/cm}^2$ de las vigas de la PTAR.

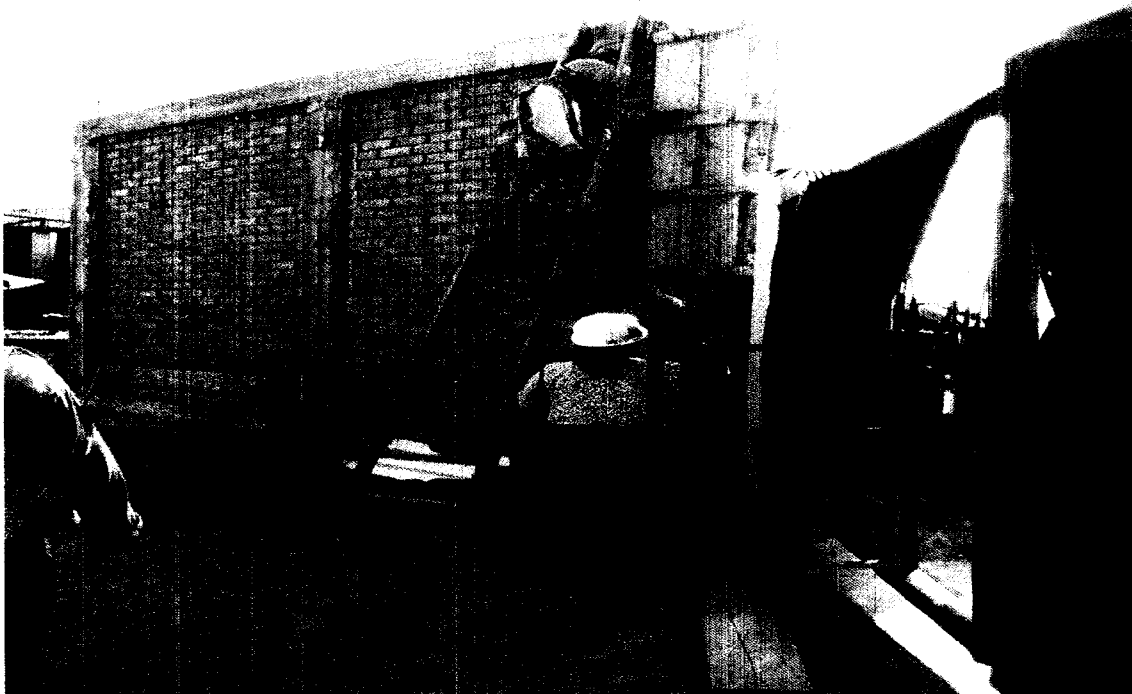

Fotografía N°06 La Supervisión verifica la verticalidad del encofrado de columnas



MEMORÁNDUM INTERNO N° 2255 -201-FONDEPES / DIGENIPAA / AOEM

Asunto : Memo Interno N° 2739-2018-DIGENIPAA

Referencia : _____ Registro: 4776

Destino	Indicación	Destino	Indicación

Observaciones: Arj. Alejandro Galvez

Atentamente:

[Handwritten signature]



Indicaciones:

- 0.1. Autorizado/Aprobado
- 0.2. Calificar/Evaluar
- 0.3. Informe
- 0.4. Proyectar resolución
- 0.5. Atención/Tramitación
- 0.6. Conocimiento y fines
- 0.7. Notificar al interesado
- 0.8. Reformular
- 0.9. Ayuda memoria
- 10. Coordinar
- 11. Opinión/Recomendación
- 12. Consolidar
- 13. Aclarar redacción
- 14. Implementar/Ejecutar
- 15. Preparar respuesta
- 16. Visación
- 17. Agregar a sus antecedentes
- 18. Archivo
- 19. Ampliar
- 20. Seguimiento

050



PERÚ

Ministerio de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Fecha: 19/06/18

MEMORÁNDUM INTERNO N° 2739 - 201 - FONDEPES / DIGENIPAA

Asunto : CARTA N°- 057- AS 32

Referencia : _____ Registro : 4776

Destino	Indicación	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	
OCI		OGAJ	
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	<u>Loen</u>
Observaciones: _____			

FONDEPES
 AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO
 19 JUN. 2018
RECIBIDO
 Registro: _____ Hora: _____

Atentamente



Indicaciones:

- 01. Autorizado/Aprobado
- 02. Calificar/Evaluar
- 03. Informe
- 04. Proyectar resolución
- 05. Atención/Tramitación
- 06. Conocimiento y fines
- 07. Notificar al interesado
- 08. Reformular
- 09. Ayuda memoria
- 10. Coordinar
- 11. Opinión/Recomendación
- 12. Consolidar
- 13. Aclarar redacción
- 14. Implementar/Ejecutar
- 15. Preparar respuesta
- 16. Visación
- 17. Agregar a sus antecedentes
- 18. Archivo
- 19. Ampliar
- 20. Seguimiento

051

Lima, 18 de junio del 2018


CARTA N° 057-2018/. FONDEPES-AS32

Señores:

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES

Av. Petit Thouars N°115 - Cercado de Lima

Lima.-




Atención : Arq. Alejandro Gálvez Hurtado.
Administrador de Contrato
Asunto : Valorización quincenal de obra N° 07
Del 01 al 15 de abril del 2018.
Ref. : (a) Carta N°071-2018-GG/CONSORCIO SAN JOSE
(b)Obra: Optimización de la sala de tareas
previas del desembarcadero Pesquero artesanal
de Puerto Pizarro, distrito de tumbes, provincia de
Tumbes, Región Tumbes"

De nuestra consideración:

Mediante la presente, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con la finalidad de hacer entrega en un (1) original y dos copias, de la Valorización Quincenal de Obra N°07 del periodo del 01 al 15 de abril del 2018, de la obra en referencia.

Agradeciendo la atención a la presente y sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterarles los sentimientos de nuestra especial consideración.

Atentamente,

CONSORCIO MENDOZA & JSU

KATHERINE D. YANARA CERVERA REYES
REPRESENTANTE LEGAL

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	
	
2731502	
N° DOC:	00004776-2018
CLAVE:	7057
USUARIO:	dgalindo
FECHA Y HORA:	19/06/2018 15:23:17
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	

052



INFORME DE LA VALORIZACION QUINCENAL

A : Arq. Alejandro Galvez Hurtado
Coordinador de Obra.

Del : Ing. Lucy Vicente Bassilio
Jefe de Supervisión Externa

Asunto : Valorización Quincenal de Obra N°07
Del periodo del 01 al 15 de Abril del 2018

Refer. : Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES,
REGION TUMBES".

Fecha : Lima, 15 de junio del 2018

Mediante la presente, tengo el agrado de dirigirnos a ustedes, con la finalidad de comunicar que el contratista ha presentado la Valorización Quincenal de Obra N°07 correspondiente al periodo 01 al 15 de Abril 2018.

A continuación se muestra el resumen de la presente Valorización:

A. VALORIZACION CONTRACTUAL (V)


<i>ESTRUCTURA</i>	<i>0.00</i>
<i>ARQUITECTURA</i>	<i>0.00</i>
<i>INST. SANITARIAS</i>	<i>0.00</i>
<i>INST. ELECTRICAS</i>	<i>0.00</i>
<i>SUB - TOTAL</i>	<i>S/. 0.00</i>

<i>AVANCE REAL DE OBRA ACUMULADO</i>	<i>50.61%</i>
<i>AVANCE RE-PROGRAMADO ACUMULADO</i>	<i>100.00%</i>

B. REAJUSTE (s)

<i>ESTRUCTURA</i>	<i>0.00</i>
<i>ARQUITECTURA</i>	<i>0.00</i>
<i>INST. SANITARIAS</i>	<i>0.00</i>
<i>INST. ELECTRICAS</i>	<i>0.00</i>
<i>SUB - TOTAL</i>	<i>0.00</i>

MONTO DE LA VALORIZACION BRUTA (VB) **S/. 0.00**


LUCY VICENTE BASSILIO
ING. CIVIL - Reg. 50538

C. DEDUCCIONES	
De adelanto efectivo	0.00
De adelanto materiales	0.00
	0.00
Total (C)	0.00
D. AMORTIZACIONES	
Amortización de Adelanto en Efectivo	0.00
Amortización de Adelanto de Materiales	0.00
	0.00
Total (D)	0.00
MONTO DE LA VALORIZACION NETA (V.N)	S/. 0.00
Multa por Atraso de Obra (M)	0.00
E. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA SIN I.G.V.	
En Efectivo	0.00
En I.G.V. (18% VN)	0.00
	0.00
MONTO TOTAL DE LA VALORIZACION CON I.G.V.	0.00
F. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	S/. 0.00

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- En el presente periodo del 01 al 15 de Abril del 2018 la obra presenta un avance físico de 0.00% y un avance acumulado de 50.61%. Con avance acumulado programado de 100.00% del nuevo calendario. La obra se encuentra atrasada en 49.39%.
- A la fecha el contratista viene incumpliendo con los términos contractuales, por lo que todo atraso es de toda responsabilidad del contratista, tal situación podría ser causal de resolución del contrato conforme al artículo N°135 del RLCE.
- Aprobado la Ampliación de plazo N°03 por 6 DC mediante RSGN°049-2018-FONDEPES/SG, la nueva fecha de término de obra fue el 19 de marzo 2018 y el contratista a la fecha continua ejecutando la obra.
- La Valorización Quincenal de Obra N°07 correspondiente al periodo 01 al 15 de Abril 2018, es de s/. 0.00 inc. IGV.
- Se recomienda a la Entidad realizar los pagos de las valorizaciones tramitadas, de tal manera el contratista executor cuente con liquidez y cumplir con sus obligaciones al más breve tiempo.

Es todo lo que informo a usted para su conocimiento y fines

Atentamente,


 LUCY VICENTE BASSILIO
 ING. CIVIL - Reg. 50538

CONSORCIO SAN JOSE

“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

Lima, 09 de 06 de 2018

Carta N° 071-2018- GG/CONSORCIO SAN JOSE

Señores:
Supervisión
CONSORCIO MENDOZA & JSU
Presente. -

Referencia: Obra: “OPTIMIZACIÓN DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN TUMBES”,

Asunto: Valorización N° 07


De mí especial consideración:

Mediante el presente me dirijo a ustedes para hacer llegar mis más cordiales saludos y a su vez para presentar nuestra Valorización N° 07 de la obra en mención

Sin otro en particular, me suscribo de Ud. Cordialmente.


Atentamente,

CONSORCIO SAN JOSE
Betty E. Méndez Quispe
BETTY E. MENDEZ QUISPE
REPRESENTANTE LEGAL




FICHA TECNICA DE LA OBRA

Obra	: "OPTIMIZACION DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES"
Ubicación	
Región	: Tumbes
Provincia	: Tumbes
Distrito	: Tumbes
Lugar	: Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro
Entidad	: FONOPES
Coordinador de Obra	: Arq. Alejandro Galvez Hurtado
Proceso de selección del Contratista	: A.S. N°0029-2017-FONDEPES; PRIMERA CONVOCATORIA
Contratista	: N°056-2017-FONDEPES
Sistema de Contratación	: PRECIOS UNITARIOS
Contrato de Ejecución de la obra	: N°057-2017-FONDEPES
Monto del Referencial, con IGV	: S/. 1'627,021.54
Monto del Contrato, con IGV	: S/. 1'607,074.41
Factor Referencial	: 0.98774009
Plazo de Ejecución según contrato	: 60 días calendarios
Entrega de terreno	: 12 de Enero del 2018
Inicio Contractual del Plazo de obra	: 13 de Enero del 2018
Termino Contractual del Plazo de obra	: 13 de Marzo del 2018
Adelanto Directo N°01	: No solicitado
Adelanto Materiales N°01	: Solicitado en Tramite
Supervisión de Obra	: CONSORCIO MENDOZA & JSU
Jefe de Supervisión	: Ing. Flor Angelica Guevara Bellodas
Proceso selección de Supervisión	: A.S. N°0032-2017-FONDEPES; PRIMERA CONVOCATORIA
Contrato de Supervisión	: N°057-2017-FONDEPES
Sistema de Contratación Supervisión	: SUMA ALZADA
Monto del contrato de Supervisión con IGV	: S/. 89,751.75
Plazo de Ejecución de la Prestación	: 60 Días Calendarios


 LUCY VICENTE BASSANO
 INGS. CIVIL - Reg. 50503

056

CONSORCIO SAN JOSE

BETTY E. MÉNDEZ QUIPE
 REPRESENTANTE LEGAL

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07
DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA

OBRA: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO , DISTRITO DE TUMBES ,
PROVINCIA DE TUMBES , REGION TUMBES
 CLIENTE: FONDEPES
 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE
 SUPERVISION: CONSORCIO MENDOZA & JSU
 SIST. CONTRATISTA: PRECIOS UNITARIOS
 MONTO CONTRATO: S/. 1'607,074.41 con IGV.
 FECHA : DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

A. VALORIZACION CONTRACTUAL (V)	
ESTRUCTURA	
ARQUITECTURA	0.00
INST. SANITARIAS	0.00
INST. ELECTRICAS	0.00
SUB - TOTAL	S/. 0.00
AVANCE REAL DE OBRA ACUMULADO	50.61%
AVANCE RE-PROGRAMADO ACUMULADO	64.69%
B. REAJUSTE (s)	
ESTRUCTURA	
ARQUITECTURA	0.00
INST. SANITARIAS	0.00
INST. ELECTRICAS	0.00
SUB - TOTAL	0.00
MONTO DE LA VALORIZACION BRUTA (VB)	S/. 0.00
C. DEDUCCIONES	
De adelanto efectivo	0.00
De adelanto materiales	0.00
Total (C)	0.00
D. AMORTIZACIONES	
Amortización de Adelanto en Efectivo	0.00
Amortización de Adelanto de Materiales	0.00
Total (D)	0.00
MONTO DE LA VALORIZACION NETA (V.N)	S/. 0.00
Multa por Atraso de Obra (M)	0.00
E. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA SIN I.G.V.	
En Efectivo	
En I.G.V. (18% VN)	0.00
MONTO TOTAL DE LA VALORIZACION CON I.G.V.	0.00
F. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	
	S/. 0.00


 LINA MENDOZA VICENTE BASSILIO
 INGENIERO CIVIL - Reg. 50338

CONSORCIO SAN JOSE

 BETTY E. MENDOZA QUISPE
 REPRESENTANTE LEGAL

057

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Ciente: FONDOPE

Contratista: Consorcio San Jose

Supervision: Consorcio Mendoza & JSU

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios


Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'607,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018

Fecha termino de obra: 13/03/2018

Plazo de Ejecucion obra: 60 días calendario

DESCRIPCION		MONTO CONTRATO Inicial (S/IGV)	VA. ACUMULA. ACTUAL	VALORIZACION ACTUAL	VA. ACUMULA. ACTUAL	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
A:	VALORIZACION CONTRACTUAL						
	ESTRUCTURA	529,174.67	379,746.26	0.00	379,746.26	71.76%	149,428.41
	ARQUITECTURA	456,323.12	51,229.90	0.00	51,229.90	11.23%	405,093.22
	INST. SANITARIAS	306,455.11	247,334.52	0.00	247,334.52	80.71%	59,120.59
	INST. ELECTRICAS	69,974.56	10,946.70	0.00	10,946.70	15.64%	59,027.86
	TOTAL (A)	1,361,927.47	689,257.38	0.00	689,257.38	50.61%	672,670.09
	AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	50.61%	0.00%	50.61%		49.39%
B:	REAJUSTE						
	ESTRUCTURA		303.00	0.00	303.00		
	ARQUITECTURA		89.24	0.00	89.24		
	INST. SANITARIAS		475.97	0.00	475.97		
	INST. ELECTRICAS		0.00	0.00	0.00		
	TOTAL (B)		868.21	0.00	868.21		
	VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)		690,125.59	0.00	690,125.59		
C:	DEDUCCIONES						
	DE ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00		
	DE ADELANTO MATERIALES		0.00	0.00	0.00		
	TOTAL (C)		0.00	0.00	0.00		
D:	AMORTIZACIONES						
	AMORTIZACION DEL A. DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	AMORTIZACION DEL A. MATERIALES	321414.88	74,865.26	0.00	74,865.26		246,549.62
	TOTAL (D)	321,414.88	74,865.26	0.00	74,865.26		246,549.62
	VALORIZACION NETA (VN=VB-C-D)		615,260.33	0.00	615,260.33		
E:	RETENCIONES						
	MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
	TOTAL(E)		0.00	0.00	0.00		
F:	MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
	EN EFECTIVO (VN-E)	1,361,927.47	615,260.33	0.00	615,260.33		746,667.14
	EN I.G.V. (18%*VN)	245,146.94	110,746.86	0.00	110,746.86		134,400.08
	TOTAL (F)	1,607,074.41	726,007.19	0.00	726,007.19		881,067.22
	TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR			0.00			


 LUCY NELDA VICENTE BASSILIO
 ABOGADO - REG. 30308

058

CONSORCIO SAN JOSE


 BETTY E. MENDOZ QUISPE
 REPRESENTANTE LEGAL

RELACION DE VALORIZACIONES TRAMITADAS PARA PAGO

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES
Cliente : FONDOPEPES
Contratista: Consorcio San Jose
Supervisor: Consorcio Mendoza & JSU
Sistema de Contratacion: Precios Unitarios
Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'807'074,41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018
Fecha termino de obra: 13/03/2018
Plazo de Ejecucion obra: 60 dias calendarios

Nº	FECHA	VALORIZACIONES		REAJUSTE AUTORIZADO		DEDUCCIONES POR ADELANTOS		VALORIZACION BRUTA		AMORTIZACION DE ADELANTOS		VALORIZACION NETA		
		V	R	DIRECTO	D	MATERIALES	DIRECTO	A	MATERIALES	EN EFECTIVO	IG.V.	TOTAL		
1	15-Ene-18	52,400.55	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	52,505.35	0.00	0.00	52,505.35	9,450.96	61,956.31	
2	31-Ene-18	210,295.91	702.04	0.00	0.00	0.00	0.00	210,997.95	0.00	0.00	210,997.95	37,979.63	248,977.58	
3	15-Feb-18	30,104.30	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00	30,165.67	0.00	0.00	30,165.67	5,429.82	35,595.49	
4	28-Feb-18	23,246.00	-733.01	0	0	0	0	22,512.99	0	0	22,512.99	4,052.34	26,565.33	
5	15-Mar-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	31-Mar-18	373,210.62	1,115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	374,326.30	0.00	74,865.26	299,461.04	53,902.99	353,364.03	
7	15-Abr-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL		689,257.39	1,250.88	0.00	0.00	0.00	0.00	690,508.26	0.00	74,965.26	615,543.00	110,815.74	726,007.19	

TOBYE BUNYUNBUNAW
PERSIWA ZEBONAW
ESOL NNS OCROSONO

LUCY VICENTE B.
VICENTE B. BASULLO

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07

DEL 01 AL 14 DE ABRIL DEL 2018

OPR: OPTIMIZACION DEL DESHARRACADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES
 Cliente : FONDOES
 Contratista: Consorcio San Jose
 Superintendente: Consorcio Mendoza & JSU
 Sistema de Contratacion: Precio Unitario
 Modelo del Contrato: con IGV - S/ 1'907/07/4.1

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018
 Fecha termino de obra: 13/02/2018
 Plazo de Ejecucion obra: 60 dias calendarios

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
		UNID	METRADO	P.U.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
02.03.02	LOSAS DE PISO																
02.03.02.01	LOSA DE PISO - CONCRETO 200 kg/m ²	m ³	128.48	863.87	71,281.71	61.98	34,936.27	48.01%	0.00%	0.00%	61.98	34,936.27	48.01%	64.48	36,345.44	50.99%	
02.03.02.02	LOSA DE PISO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	88.82	41.18	3,686.83	43.83	1,791.78	48.01%	0.00%	0.00%	43.83	1,791.78	48.01%	45.29	1,884.05	50.99%	
02.03.02.03	LOSAS DE PISO - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	3,273.38	4.36	14,271.84	1,804.33	6,984.90	48.01%	0.00%	0.00%	1,804.33	6,984.90	48.01%	1,859.05	7,277.04	50.99%	
02.03.03	COLUMNAS																
02.03.03.01	COLUMNAS - CONCRETO 200 kg/m ²	m ³	23.43	577.27	13,628.44	17.65	10,187.20	75.32%	0.00%	0.00%	17.65	10,187.20	75.32%	5.78	3,338.24	24.68%	
02.03.03.02	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	288.28	99.92	17,273.74	242.83	14,588.07	84.27%	0.00%	0.00%	242.83	14,588.07	84.27%	45.35	2,717.67	15.73%	
02.03.03.03	COLUMNAS - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	5,080.42	4.36	22,160.83	4,020.77	17,630.86	78.14%	0.00%	0.00%	4,020.77	17,630.86	78.14%	1,059.65	4,820.07	20.86%	
02.03.04	VIGAS																
02.03.04.01	VIGA - CONCRETO 210 kg/m ²	m ³	13.04	591.01	7,708.77	10.01	5,916.01	76.78%	0.00%	0.00%	10.01	5,916.01	76.78%	3.03	1,790.76	23.24%	
02.03.04.02	VIGA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	147.40	58.88	8,678.96	113.15	6,660.00	76.78%	0.00%	0.00%	113.15	6,660.00	76.78%	34.25	2,015.96	23.24%	
02.03.04.03	VIGA - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	2,220.25	4.36	9,680.28	1,704.35	7,430.86	76.78%	0.00%	0.00%	1,704.35	7,430.86	76.78%	515.90	2,249.33	23.24%	
02.03.05	LOSAS																
02.03.05.01	LOSA ALBERNIA - CONCRETO 210 kg/m ²	m ³	6.44	465.71	2,478.06	0.80	364.57	14.71%	0.00%	0.00%	0.80	364.57	14.71%	4.64	2,114.48	85.29%	
02.03.05.02	LOSA ALBERNIA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	63.64	49.86	3,178.43	9.36	467.57	14.71%	0.00%	0.00%	9.36	467.57	14.71%	54.28	2,711.89	85.29%	
02.03.05.03	LOSA ALBERNIA - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	288.80	4.36	1,258.30	42.44	186.04	14.71%	0.00%	0.00%	42.44	186.04	14.71%	246.16	1,073.25	85.29%	
02.03.06.01.04	LOSA ALBERNIA, LADRILLO HUECO 16X20X30	und	530.00	3.48	1,844.40	77.84	271.24	14.71%	0.00%	0.00%	77.84	271.24	14.71%	452.06	1,573.16	85.29%	
02.03.06.01	CAVALETAS - CONCRETO 200 kg/m ²	m ³	16.24	624.82	9,959.21	3.72	2,323.98	24.41%	0.00%	0.00%	3.72	2,323.98	24.41%	11.52	7,195.62	75.59%	
02.03.06.02	CAVALETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	132.05	48.66	6,184.09	32.23	1,504.82	24.41%	0.00%	0.00%	32.23	1,504.82	24.41%	99.82	4,689.47	75.59%	
02.03.06.03	CAVALETAS - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	468.18	4.36	1,997.53	111.83	487.69	24.41%	0.00%	0.00%	111.83	487.69	24.41%	346.32	1,509.95	75.59%	
02.04	MANTENIMIENTO DE TECHO DE TAREAS PREVIAS																
02.04.01	LIMPIEZA MANUAL CON ACTIVO REMOVEDOR DE OXIDO	m ²	103.46	34.67	3,586.96	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	103.46	3,586.96	100.00%	
02.04.02	REPARACION DE COLUMNAS DE TAREAS PREVIAS	m ²	9.80	14.42	138.43	9.80	138.43	100.00%	0.00%	0.00%	9.80	138.43	100.00%	-	-	0.00%	
02.04.02.01	ENCAMIZADO DE COLUMNAS	m ²	9.80	341.50	3,278.40	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	9.80	3,278.40	100.00%	
02.04.03	REFORZAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO																
02.04.03.01	ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DE BOMBACHEMIENTO EXISTENTE	m ²	10.18	28.84	293.89	10.18	293.89	100.00%	0.00%	0.00%	10.18	293.89	100.00%	-	-	0.00%	
02.04.03.02	PERSONAL MANUAL L-3000m ²	und	88.00	6.78	597.32	88.00	597.32	100.00%	0.00%	0.00%	88.00	597.32	100.00%	-	-	0.00%	
02.04.03.03	COLOCACION DE MORTERO ADHESIVO POR INYECCION L-300m	und	88.00	10.86	938.08	88.00	938.08	100.00%	0.00%	0.00%	88.00	938.08	100.00%	-	-	0.00%	
02.04.03.04	COLOCACION DE ADITIVO CONCRETO NUEVO-ANTIGUO	m ²	10.18	78.08	794.85	10.18	794.85	100.00%	0.00%	0.00%	10.18	794.85	100.00%	-	-	0.00%	
COSTO DIRECTO					437,877.38	314,229.43	283,589.46	100.00%	0.00%	0.00%	314,229.43	283,589.46	100.00%	149,428.43	268,987.12	100.00%	
GASTOS GENERALES UTILIDADES					67,870.88	48,708.86	19,165.42	0.00%	0.00%	0.00%	48,708.86	19,165.42	0.00%	6,515.16	28,987.12	100.00%	
SUB TOTAL					828,174.87	578,744.28	448,100.89	100.00%	0.00%	0.00%	578,744.28	448,100.89	100.00%	176,325.55	28,987.12	100.00%	
IGV					18%	88,281.44	448,100.89	71.78%	0.00%	0.00%	88,281.44	448,100.89	71.78%	28,987.12	28,987.12	100.00%	
TOTAL SUB PRESUPUESTO DE OBRA					634,426.11	634,426.11	634,426.11	100.00%	0.00%	0.00%	634,426.11	634,426.11	100.00%	176,325.55	28,987.12	100.00%	
PERCENTAJE DE AVANCE					100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	28.24%	28.24%	100.00%	

CONSORCIO SAN JOSE
 BETTY E. MENENDEZ QUIROPE
 REPRESENTANTE LEGAL

Luciano Basso
 LUCIANO BASSO
 INGENIERO CIVIL - Reg 66338

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07

DEL 01 AL 16 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DISEÑOBACADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES
 Cliente : FONDOES
 Contratista: Consorcio San Jose
 Supervision: Consorcio Mendoza & ISU
 Sistema de Contratacion: Precio Licitacion
 Monto del Contrato: con IGV: S/ 1'907'074,41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018
 Fecha termino de obra: 13/03/2018
 Plazo de Ejecucion obra: 60 dias calendario

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		UND	METRADO	P.U.	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
01.03.01	Plan de Manejo de Seguridad															
01.03.02	RIEGO DEL AREA DE TRABAJO	m2	564,75	2,09	1.199,43	564,75	1.199,43	100,00%	564,75	1.199,43	100,00%	564,75	1.199,43	100,00%	0,00%	0,00%
01.03.03	PLAN DE CONTINGENCIA	und	1,00	2.000,00	2.000,00	1,00	2.000,00	100,00%	1,00	2.000,00	100,00%	1,00	2.000,00	100,00%	0,00%	0,00%
01.03.04	PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	und	1,00	3.000,00	3.000,00	1,00	3.000,00	100,00%	1,00	3.000,00	100,00%	1,00	3.000,00	100,00%	0,00%	0,00%
01.03.05	MEDIDAS DE CONCIENTIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL	und	1,00	2.500,00	2.500,00	1,00	2.500,00	100,00%	1,00	2.500,00	100,00%	1,00	2.500,00	100,00%	0,00%	0,00%
01.03.06	CARTEL DE MANEJO AMBIENTAL DE 1,00 X 0,80m	und	1,00	1.028,00	1.028,00	1,00	1.028,00	100,00%	1,00	1.028,00	100,00%	1,00	1.028,00	100,00%	0,00%	0,00%
01.03.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR DE BASURA	und	4,00	200,00	800,00	4,00	800,00	100,00%	4,00	800,00	100,00%	4,00	800,00	100,00%	0,00%	0,00%
02.01.01	EXCAVACIONES															
02.01.01	EXCAVACION DE ESTRUCTURAS PARA CIMENTACION	m3	96,39	36,06	3.475,82	96,39	3.475,82	100,00%	96,39	3.475,82	100,00%	96,39	3.475,82	100,00%	0,00%	0,00%
02.01.02	CORTES															
02.01.02.01	CORTE BAJO DE TERRENO A MAQUINA	m3	132,82	5,30	704,48	132,82	704,48	100,00%	132,82	704,48	100,00%	132,82	704,48	100,00%	0,00%	0,00%
02.01.03	RELLENO															
02.01.03.01	RELLENO COMPACTADO GRANULAR PREPARADO 08/97/11	m3	48,55	61,02	2.962,52	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	48,55	2.962,52
02.01.03.02	RELLENO COMPACTADO CONTINUADO E-0.2m PARA PISOS	m2	397,74	14,83	5.898,48	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	397,74	5.898,48
02.01.04	NIVELACION INTERIOR Y ARBONADO															
02.01.04.01	NIVELACION INTERIOR Y ARBONADO PARA PISOS	m2	663,05	3,36	2.194,25	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	663,05	2.194,25
02.01.04.02	REVELACION Y GOMIFICACION EN AUMENTOS DE CIMENTACION	m2	99,88	4,85	474,61	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	99,88	474,61
02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE															
02.01.05.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE OMACUNA	m3	139,24	17,80	2.460,67	139,24	2.460,67	100,00%	139,24	2.460,67	100,00%	139,24	2.460,67	100,00%	0,00%	0,00%
02.02.01	CONCRETO PARA ZAPATAS															
02.02.01.01	CONCRETO PARA ZAPATAS E-0.10m, 0-100kg/m2	m2	28,28	36,01	1.019,36	27,06	975,15	96,76%	27,06	975,15	96,76%	27,06	975,15	96,76%	1,20	43,21
02.02.02	CIMENTOS CORRIDOS															
02.02.02.01	CIMENTOS CORRIDOS CONCRETO 1:1.0 - 30% F.O.	m3	62,64	226,98	11.948,23	32,40	7.365,24	61,56%	32,40	7.365,24	61,56%	32,40	7.365,24	61,56%	20,24	4.582,99
02.02.02.02	CIMENTOS CORRIDOS CONCRETO 1:1.0 - 30% F.O.	m2	178,11	67,28	10.502,14	137,65	7.884,36	77,28%	137,65	7.884,36	77,28%	137,65	7.884,36	77,28%	40,46	2.317,78
02.02.03	SOPRECAMENTOS															
02.02.03.01	SOPRECAMENTO CONCRETO 1:1.8 + 2% F.M.	m2	20,74	343,03	7.114,44	12,84	4.405,19	61,92%	12,84	4.405,19	61,92%	12,84	4.405,19	61,92%	7,90	2.709,25
02.02.03.02	SOPRECAMENTO CONCRETO 1:1.8 + 2% F.M.	m2	242,91	42,74	10.381,97	197,00	6.710,35	64,63%	197,00	6.710,35	64,63%	197,00	6.710,35	64,63%	85,91	3.671,62
02.02.04	FALSO PISO															
02.02.04.01	FALSO PISO E-0.10m, 0-100kg/m2	m2	60,93	35,39	2.166,31	2,93	103,89	4,81%	2,93	103,89	4,81%	2,93	103,89	4,81%	58,00	2.052,62
02.03.01	ZAPATAS															
02.03.01.01	ZAPATAS - CONCRETO 200 kg/m2	m3	18,04	924,16	7.863,37	6,82	3.674,77	46,36%	6,82	3.674,77	46,36%	6,82	3.674,77	46,36%	8,22	4.308,60
02.03.01.02	ZAPATAS - CONCRETO Y DEBENCORRADO	m2	61,80	41,16	2.123,86	26,57	1.052,47	49,89%	26,57	1.052,47	49,89%	26,57	1.052,47	49,89%	26,03	1.071,39
02.03.01.03	ZAPATAS - CERRO F-400 kg/m2	kg	663,70	4,36	2.487,23	236,00	1.028,98	41,87%	236,00	1.028,98	41,87%	236,00	1.028,98	41,87%	327,70	1.428,77

CONSORCIO SAN JOSE
 BETTY E. MENDOZA QUIROGA
 REPRESENTANTE LEGAL

Lucy Vicente R.
 REPRESENTANTE LEGAL
 No. CIVIL - Reg. 60538

OPERA: OPTIMIZACION DEL DESMARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES
 Cliente : FONCOPE
 Contratista: Consorcio San Jose
 Supervision: Consorcio Mendoza & JSU
 Sistema de Contratacion: Proceso Unificado
 Monto del Contrato: con IGV, S/., 1'607'074.41

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07

DEL 01 AL 14 DE ABRIL DEL 2018

Fecha de hilo de obra: 13/01/2018
 Fecha término de obra: 13/03/2018
 Plazo de Ejecución obra: 90 días calendario

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
		UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
01.01.01	ALMACEN ORIGINA Y CABLEA DE GUARABAYA	m2	89.00	90.82	8,082.88	89.00	8,082.88	100.00%	89.00	8,082.88	100.00%	89.00	8,082.88	100.00%	-	-	0.00%
01.01.02	BAÑOS QUINCOS PARA EL PERSONAL	mee	2.00	3,600.00	7,000.00	2.00	7,000.00	100.00%	2.00	7,000.00	100.00%	2.00	7,000.00	100.00%	-	-	0.00%
01.01.03	CERCO DE MALLA BARRILL CON MADERA ROLIZO	m	115.00	21.48	2,471.35	115.00	2,471.35	100.00%	115.00	2,471.35	100.00%	115.00	2,471.35	100.00%	-	-	0.00%
01.01.04	CANTEL DE OBRA DE 2.40M X 3.80 M	pza	1.00	1,441.51	1,441.51	1.00	1,441.51	100.00%	1.00	1,441.51	100.00%	1.00	1,441.51	100.00%	-	-	0.00%
01.01.05	INSTALACIONES PROVISIONALES	mee	2.00	2,000.00	2,000.00	2.00	2,000.00	100.00%	2.00	2,000.00	100.00%	2.00	2,000.00	100.00%	-	-	0.00%
01.01.06	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	mee	2.00	2,000.00	2,000.00	2.00	2,000.00	100.00%	2.00	2,000.00	100.00%	2.00	2,000.00	100.00%	-	-	0.00%
01.01.07	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	mee	2.00	2,000.00	2,000.00	2.00	2,000.00	100.00%	2.00	2,000.00	100.00%	2.00	2,000.00	100.00%	-	-	0.00%
01.01.08	RENOVIACIONES	mee	2.00	2,000.00	2,000.00	2.00	2,000.00	100.00%	2.00	2,000.00	100.00%	2.00	2,000.00	100.00%	-	-	0.00%
01.01.09	DESMONTAJE DE COBERTURA METALICA	m2	384.27	14.78	5,679.51	384.27	5,679.51	100.00%	384.27	5,679.51	100.00%	384.27	5,679.51	100.00%	-	-	0.00%
01.01.10	DESMONTAJE DE PUERTAS	m2	30.51	4.99	1,522.24	30.51	1,522.24	100.00%	30.51	1,522.24	100.00%	30.51	1,522.24	100.00%	-	-	0.00%
01.01.11	DESMONTAJE DE VENTANAS	m2	1.00	5.48	5.48	1.00	5.48	100.00%	1.00	5.48	100.00%	1.00	5.48	100.00%	-	-	0.00%
01.01.12	RETIRO DE GARCIA DE CONTROL	pza	1.00	72.11	72.11	1.00	72.11	100.00%	1.00	72.11	100.00%	1.00	72.11	100.00%	-	-	0.00%
01.01.13	DESMONTAJE DE CAVALIETA	m	120.19	3.16	379.80	120.19	379.80	100.00%	120.19	379.80	100.00%	120.19	379.80	100.00%	-	-	0.00%
01.01.14	REUBICACION DE CAVALIETA	und	2.00	998.37	1,996.74	2.00	1,996.74	100.00%	2.00	1,996.74	100.00%	2.00	1,996.74	100.00%	-	-	0.00%
01.01.15	RETIRO DE PRODUCTOR DE HIELO	und	1.00	1,542.43	1,542.43	1.00	1,542.43	100.00%	1.00	1,542.43	100.00%	1.00	1,542.43	100.00%	-	-	0.00%
01.01.16	DEMOICIONES	m3	28.35	166.86	4,399.82	28.35	4,399.82	100.00%	28.35	4,399.82	100.00%	28.35	4,399.82	100.00%	-	-	0.00%
01.01.17	DEMOICION DE CIMIENTO Y SOBRECIMENTOS	m3	11.30	142.70	1,612.51	11.30	1,612.51	100.00%	11.30	1,612.51	100.00%	11.30	1,612.51	100.00%	-	-	0.00%
01.01.18	DEMOICION DE Muros DE ALMAGRENA, ING GOLLUMAS Y	m3	0.90	128.43	128.43	0.90	128.43	100.00%	0.90	128.43	100.00%	0.90	128.43	100.00%	-	-	0.00%
01.01.19	DEMOICION DE TEJOS DE CONCRETO	m3	5.18	162.31	840.77	5.18	840.77	100.00%	5.18	840.77	100.00%	5.18	840.77	100.00%	-	-	0.00%
01.01.20	DEMOICION DE POZAS DE CONCRETO	m3	115.44	182.31	18,737.07	115.44	18,737.07	100.00%	115.44	18,737.07	100.00%	115.44	18,737.07	100.00%	-	-	0.00%
01.01.21	DEMOICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m	80.80	18.74	1,273.37	80.80	1,273.37	100.00%	80.80	1,273.37	100.00%	80.80	1,273.37	100.00%	-	-	0.00%
01.01.22	ELIMINACION DE CONCRETO TIPO UNI	m3	233.74	25.25	5,901.84	233.74	5,901.84	100.00%	233.74	5,901.84	100.00%	233.74	5,901.84	100.00%	-	-	0.00%
01.01.23	MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	gp	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	1.00	5,000.00	100.00%	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%
01.01.24	TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	gp	1.00	20,800.00	20,800.00	1.00	20,800.00	100.00%	1.00	20,800.00	100.00%	1.00	20,800.00	100.00%	-	-	0.00%
01.01.25	TRAZOS, NIVELAS Y REPLANTEO	m2	554.75	2.19	1,214.80	554.75	1,214.80	100.00%	554.75	1,214.80	100.00%	554.75	1,214.80	100.00%	-	-	0.00%
01.01.26	REFRANTES DURANTE EL PROCESO	m2	554.75	0.88	477.09	554.75	477.09	100.00%	554.75	477.09	100.00%	554.75	477.09	100.00%	-	-	0.00%
01.02.01	ELABORACION, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE PLAN DE	und	1.00	11,350.00	11,350.00	1.00	11,350.00	100.00%	1.00	11,350.00	100.00%	1.00	11,350.00	100.00%	-	-	0.00%
01.02.02	ASIGNACION DE MANTENIMIENTO AL TRABAJO	und	1.00	28,137.50	28,137.50	1.00	28,137.50	100.00%	1.00	28,137.50	100.00%	1.00	28,137.50	100.00%	-	-	0.00%
01.02.03	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	1.00	10,798.28	10,798.28	1.00	10,798.28	100.00%	1.00	10,798.28	100.00%	1.00	10,798.28	100.00%	-	-	0.00%
01.02.04	SEALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1.00	1,310.00	1,310.00	1.00	1,310.00	100.00%	1.00	1,310.00	100.00%	1.00	1,310.00	100.00%	-	-	0.00%
01.02.05	REGISTRO PARA REVISAR Y ANTE EMERGENCIAS EN	und	1.00	4,110.00	4,110.00	1.00	4,110.00	100.00%	1.00	4,110.00	100.00%	1.00	4,110.00	100.00%	-	-	0.00%
01.02.06	REGISTRO Y SALIDA DURANTE EL TRABAJO	und	1.00	4,110.00	4,110.00	1.00	4,110.00	100.00%	1.00	4,110.00	100.00%	1.00	4,110.00	100.00%	-	-	0.00%

CONSORCIO SAN JOSE
 REPRESENTANTE LEGAL

LUCY VICENTE B
 LUCY VICENTE BARRIOS
 MTC - C.M. - Reg. 56338

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07

DEL 01 AL 16 DE ABRIL DEL 2018

OBRA: OPTIMIZACION DEL DESBARRACADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES
 Cliente: FONDOPES
 Contratista: Consorcio San Jose
 Supervisor: Consorcio Mendoza & JSU
 Sistema de Contratacion: Precio Unitario
 Monto del Contrato, con IGV: S/ 1,907,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018
 Fecha de termino de obra: 13/03/2018
 Plazo de Ejecucion de obra: 60 dias calendarios

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
		UNID	METRADO	P.U.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
03.12.04	CORTINAS PVC DE BAÑO INC. BARRA ALUMINIC	PZA	8.00	01.94	485.52	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	8.00	485.52	100.00%
		MED	2.00	4,164.00	4,164.00	4,164.00	100%	4,164.00	4,164.00	100%	4,164.00	4,164.00	100%	7.00	42,702.00	104.69%	
		MED	7.00	3,500.00	24,420.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	7.00	24,420.00	104.69%
	COSTO DIRECTO				377,594.64			0.00			0.00						
	GASTOS GENERALES UTILIDADES				88,827.17			0.00			0.00						
					20,201.31			0.00			0.00						
	SUB TOTAL				486,523.12			81,228.90			0.00						
	IGV		18%		82,138.16			9,221.38			0.00						
	TOTAL SUB PRESUPUESTO DE OBRA				568,661.28			90,450.28			0.00						
	PORCENTAJE DE AVANCE				100.00%			11.23%			0.00%						
					405,093.24			72,916.78									
					478,010.02			88.77%									

CONSORCIO SAN JOSE
 BETTY E. MENDOZA QUISEPPE
 REPRESENTANTE LEGAL

Luis Vicente B.
 LUIS VICENTE BASCILIO
 ING. CIVIL - Reg. 6003a



VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

ORA OPTIMIZACION DEL DESEMBAICADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES
 Cliente: FONDOS
 Contrata: Contrato San Jose
 Supervisor: Contrato Mendoza & JSU
 Sistema de Contrata: Prenda Unilinas
 Monto del Contrato con IVA: S/ 1.907.074,41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018
 Fecha de termino de obra: 13/03/2018
 Plazo de Ejecucion de obra: 60 dias calendario

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		UND	METRADO	P.L.	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
03.08.01.01	MANTENIMIENTO DE MALLA POLIPROPILENO/ MARCO DE ALUMINIO	m2	32.22	126.61	4.078.37	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	32.22	4.078.37	100.00%
03.08.01.02	VENYATA PARA CORREDAZ DE VIDRIO TEMPORAL 8mm CON MARCO DE ALUMINIO	m2	28.27	244.16	7.146.56	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	28.27	7.146.56	100.00%
03.08.02	PUERTAS	m2	2.00	115.52.01	21.146.02	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	2.00	21.146.02	100.00%
03.08.02.03	MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICAS	m2	40.00	31.79	1.271.60	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	40.00	1.271.60	100.00%
03.08.02.04	FABRICACION Y MONTAJE DE PUERTAS METALICAS	kg	1.363.04	0.86	13.603.14	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.363.04	13.603.14	100.00%
03.08.03.01	TAQUERIA DE MELAMINE 18mm EN 88. HH.	m2	14.08	157.87	2.222.81	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	14.08	2.222.81	100.00%
03.08.04.01	RELLA DE FIBRA DE VIDRIO EN CAJALLETAS A40.30	m	63.98	181.05	11.583.56	15.62	24.41%	2.827.55	24.41%	0.00%	15.62	2.827.55	24.41%	48.36	8.756.03	75.59%
03.08.04.02	RELLA DE AGERO GALVANIZADO EN CAJALLETAS A40.30	m	7.52	108.53	801.11	1.84	24.41%	195.55	24.41%	0.00%	1.84	195.55	24.41%	5.68	605.56	75.59%
03.08.04.03	PERFIL T DE ALUMINIO PARA CAMBIO DE PISO	m	4.20	18.77	78.83	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	4.20	78.83	100.00%
03.09.01	BISAGRAS	pza	18.00	28.62	533.16	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	18.00	533.16	100.00%
03.09.01.02	BISAGRA DE AGERO ALUMINIZADA PESADO DE 4X4 EN PUERTA	pza	12.00	25.72	308.64	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	12.00	308.64	100.00%
03.09.02.01	CERRAJERA TIPO PESADO 3 BOLTES	pza	6.00	76.77	460.62	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	6.00	460.62	100.00%
03.09.02.02	CERRAJERO DE 5° ALUMINIO	pza	6.00	27.72	166.32	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	6.00	166.32	100.00%
03.09.03.01	MANILVA DE BRONCE 4 PARA PUERTAS	pza	6.00	32.72	196.32	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	6.00	196.32	100.00%
03.10.01	ESPEJO	m2	7.05	194.31	1.369.89	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	7.05	1.369.89	100.00%
03.11.01	PINTURA DE CIelos RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES	m2	63.64	18.16	1.155.70	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	63.64	1.155.70	100.00%
03.11.01.01	PINTURA EPOXICA EN CIELO RASO	m2	284.37	17.36	4.936.96	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	284.37	4.936.96	100.00%
03.11.01.02	PINTURA EPOXICA EN MUEBOS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	108.36	17.36	1.881.13	24.00	22.15%	416.64	22.15%	0.00%	24.00	416.64	22.15%	94.36	1.464.49	77.85%
03.11.01.03	PINTURA EPOXICA EN VIGAS	m2	187.46	17.36	3.254.65	63.42	44.63%	1.148.21	44.63%	0.00%	63.42	1.148.21	44.63%	124.04	2.106.44	55.36%
03.11.01.06	PINTURA EPOXICA EN MUEBOS DE CONCRETO	m2	81.10	17.36	1.407.60	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	81.10	1.407.60	100.00%
03.11.01.07	PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA EN ALTURA	m2	328.02	14.44	4.736.61	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	328.02	4.736.61	100.00%
03.11.01.08	PINTURA ATEX 2 MANOS EN CERCO PERIMETRICO	m2	430.53	8.85	3.804.13	430.53	100.00%	3.804.13	100.00%	0.00%	430.53	3.804.13	100.00%	430.53	3.804.13	100.00%
03.11.02.01	PINTURA EPOXICA EN PUERTAS METALICAS INC. ARENADO	m2	25.80	30.50	786.80	25.80	100.00%	786.80	100.00%	0.00%	25.80	786.80	100.00%	25.80	786.80	100.00%
03.12.01	MUEBLE 0.4 x 1.0 m ACABADO FLUIDO	m2	7.41	360.48	2.671.16	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	7.41	2.671.16	100.00%
03.12.02	UNIDAD DE DILATACION F-3m CON BIELLO ELASTOMERICO EN PUERTAS DE DILATACION F-3m CON POLIESTERNO EXPANDIDO EN MUEBOS	m	175.20	6.56	1.149.31	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	175.20	1.149.31	100.00%
03.12.03	MUEBOS	m	80.00	6.00	528.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	80.00	528.00	100.00%

CONSORCIO SAN JOSE
 REPRESENTANTE LEGAL

Rosy Vicente B
 REPRESENTANTE LEGAL

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07

DEL 01 AL 16 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBAZCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES
 Cliente : FONDOFOS
 Contratista: Concesionario San Jose
 Supervision: Concesionario Mendoza & JSU
 Sistema de Contratacion: Precio Unitario
 Monto del Contrato, con IGV: S/ 1'907'074,41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018
 Fecha de termino de obra: 13/03/2018
 Plazo de Ejecucion de obra: 60 días calendario

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
		UNID	METRADO	P.U.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
03.01.01	MURDO DE LADRILLO KK TIPO IV SODA M:1.14 E:1.8 cm	m2	361.84	74.91	27.105.43	246.44	19.480.82	68.11%	246.44	18.480.82	68.11%	115.40	8.644.61	31.89%	107.47	2.283.30	81.16%
03.01.02	ACERO F-4000 VIGA REF-MURDO	kg	103.50	4.36	451.28	-	-	0.00%	-	-	0.00%	103.50	451.28	100.00%	-	-	-
03.02.01	TARBALEO NAVADO PRIMARIO, MORTERO C.A.15	m2	126.04	22.50	2.813.40	23.56	530.10	18.64%	23.56	530.10	18.64%	101.48	2.283.30	81.16%	107.47	2.757.68	100.00%
03.02.02	TARBALEO EN MURDO DE ALBAESTERIA INTERIORES Y EXTERIORES EN BOM MEZCLA 1:3	m2	586.63	25.86	15.360.68	301.75	7.742.81	50.41%	301.75	7.742.81	50.41%	296.88	7.617.94	49.59%	107.47	2.757.68	100.00%
03.02.03	TARBALEO EN MURDO DE CONCRETO	m2	107.47	25.86	2.757.68	-	-	0.00%	-	-	0.00%	107.47	2.757.68	100.00%	-	-	-
03.02.04	TARBALEO DE COLUMNAS	m2	238.35	37.86	8.982.43	83.42	3.133.35	35.00%	83.42	3.133.35	35.00%	154.93	5.819.08	65.00%	107.47	2.757.68	100.00%
03.02.05	TARBALEO DE VIGAS	m2	147.40	55.62	8.186.39	24.00	1.334.88	16.28%	24.00	1.334.88	16.28%	123.40	6.863.51	83.72%	107.47	2.757.68	100.00%
03.02.06	VESTIDURA DE BARRILES 1:6	m	138.12	12.83	1.765.99	15.00	193.85	10.80%	15.00	193.85	10.80%	123.12	1.591.94	89.14%	107.47	2.757.68	100.00%
03.02.07	BRUJAS SEGUN DETALLE (1:1 cm)	m	94.61	7.62	720.93	84.61	720.93	100.00%	84.61	720.93	100.00%	28.42	854.36	75.59%	107.47	2.757.68	100.00%
03.02.08	ACABADO DE CEMENTO PULIDO EN CANILETAS	m2	37.80	30.06	1.130.28	8.18	275.80	24.41%	8.18	275.80	24.41%	592.24	10.885.75	99.22%	107.47	2.757.68	100.00%
03.02.09	ACABADO DE CEMENTO PULIDO EN PISOS	m2	566.84	18.37	10.380.25	4.80	84.50	0.76%	4.80	84.50	0.76%	592.24	10.885.75	99.22%	107.47	2.757.68	100.00%
03.03.01	CIELO PISO CON MEZCLA C.A.15	m2	63.64	46.07	2.931.89	4.80	211.92	7.23%	4.80	211.92	7.23%	59.04	2.719.97	92.77%	107.47	2.757.68	100.00%
03.04.01	PISO Y PANDALLOS	m2	45.78	30.86	1.412.15	4.80	141.96	10.05%	4.80	141.96	10.05%	41.16	1.270.20	89.95%	107.47	2.757.68	100.00%
03.04.02	CONTRAPISO DE 40 mm	m2	16.02	87.27	917.47	-	-	0.00%	-	-	0.00%	16.02	917.47	100.00%	-	-	-
03.04.03	PILO F-6mm ACABADO PULIDO INC. BRUJADO	m2	18.76	35.84	672.36	4.80	164.86	24.52%	4.80	164.86	24.52%	14.16	507.49	75.48%	107.47	2.757.68	100.00%
03.04.04	VEREDA DE CONCRETO F-2800/cm2 En Bom PULIDO Y BRUJADO INC. ENCOFRADO	m2	8.82	93.84	809.76	8.21	771.25	95.24%	8.21	771.25	95.24%	0.41	36.52	4.76%	107.47	2.757.68	100.00%
03.05.01	ZOCALOS	m2	125.04	61.80	7.702.40	-	-	0.00%	-	-	0.00%	125.04	7.702.40	100.00%	-	-	-
03.05.02	ZOCALOS DE CERAMICO 40x40	m2	28.49	42.30	1.247.43	-	-	0.00%	-	-	0.00%	28.49	1.247.43	100.00%	-	-	-
03.06.01	CONTRAZOCALOS	m	42.30	1.247.43	-	-	0.00%	-	-	0.00%	42.30	1.247.43	100.00%	-	-	-	
03.06.02	CONTRAZOCALOS CEMENTO PULIDO SANITARIO H=20m	m	83.09	103.30	8.583.20	-	-	0.00%	-	-	0.00%	83.09	8.583.20	100.00%	-	-	-
03.06.03	COBERTURAS	m2	494.88	11.24	5.559.16	-	-	0.00%	-	-	0.00%	494.88	5.559.16	100.00%	-	-	-
03.07.01	PUERTAS	m2	10.71	304.71	3.263.44	-	-	0.00%	-	-	0.00%	10.71	3.263.44	100.00%	-	-	-
03.07.02	PUERTA CONTRAPUERTA OVARO DE MADERA 4"x2"	m2	7.56	228.95	1.730.86	-	-	0.00%	-	-	0.00%	7.56	1.730.86	100.00%	-	-	-
03.08.01	VENTANAS	m2	10.71	304.71	3.263.44	-	-	0.00%	-	-	0.00%	10.71	3.263.44	100.00%	-	-	-

CONSORCIO SAN JOSE
 INGENIERO EN SISTEMAS DE CONSTRUCCION
 MONTAÑANA, 1000
 TUMBES, PERU

Lucy Vicente B.
 INGENIERA EN SISTEMAS DE CONSTRUCCION
 (ING. CIVIL - Reg. 58538)

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA Nº 07

DEL 01 AL 16 DE ABRIL DEL 2016

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO - DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - REGION TUMBES
 Cliente : FONDOPES
 Contratista: Consorcio San Jose
 Supervision: Consorcio Mendoza & JSU
 Sistema de Contratacion: Precio Unitarios
 Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'907,074.41

Fecha de inicio de obra: #####
 Fecha de termino de obra: #####
 Plazo de Ejecucion de obra: 60 dias calendario

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
		UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
04.06.07.01	PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE INDUSTRIAL INCLUIDO ACCESORIOS	gib	1.00	190,000.00	190,000.00	1.00	190,000.00	100.00%	-	0.00%	1.00	190,000.00	100.00%	-	-	0.00%	
	COSTO DIRECTO																
	GASTOS GENERALES																
	UTILIDADES																
	SUB TOTAL																
	IGV																
	TOTAL SUB PRESUPUESTO DE OBRA																
	PORCENTAJE DE AVANCE																

Lucy Vicuña B
 LUCY VICUÑA BARRERA
 INE - Reg. 60538

CONSORCIO SAN JOSE
Betty E. Mendez Quispe
 BETTY E. MENDEZ QUISPE
 REPRESENTANTE LEGAL

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA Nº 07

DEL 01 AL 16 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DISEÑARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARO. DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente: FONDOPEPS
 Contratista: Consorcio San Jose
 Supervisor: Consorcio Mendoza & JSU
 Sistema de Contratacion: Precio Unitario
 Monto del Contrato: con IGV: S/ 1'907.074.11

Fecha de inicio de obra: *****
 Fecha de termino de obra: *****
 Plazo de Ejecucion de obra: 60 dias calendarios

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA			SALDO POR VALORIZAR		
		UND	METRAJO	P.U.	METRAJO PARCIAL	METRAJO ANTERIOR	%	METRAJO PARCIAL	%	METRAJO ANTERIOR	%	METRAJO PARCIAL	%	METRAJO	PARCIAL	%
04.05.04.07	COODO PVC SAP DE 60' X 2"	und	16.00	21.02	336.32	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	16.00	336.32	100.00%		
04.05.04.08	TEE SANITARIA PVC SAP 2"	und	3.00	20.92	62.76	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	3.00	62.76	100.00%		
04.05.05.01	ADITAMENTOS VARIOS	und	10.00	98.00	580.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	10.00	580.00	100.00%		
04.05.05.02	REGISTRO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION	und	3.00	66.50	199.50	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	3.00	199.50	100.00%		
04.05.05.03	REGISTRO DE BRONCE 4" PROVISION Y COLOCACION	und	5.00	67.81	339.05	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	5.00	339.05	100.00%		
04.05.05.04	BOMBERO DE VENTILACION 2" PVC SAP	und	9.00	44.33	398.97	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	9.00	398.97	100.00%		
04.05.06	CAMARA DE INSPECCION	und	3.00	236.24	708.72	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	3.00	708.72	100.00%		
04.05.06.01.01	CALA DE REGISTRO DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	und	4.00	287.02	1,148.08	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	4.00	1,148.08	100.00%		
04.05.06.01.02	CALA DE REGISTRO DE 24" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	und	4.00	287.02	1,148.08	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	4.00	1,148.08	100.00%		
04.05.07	EMPALMES Y PRUEBAS HIDRAULICAS	m	107.38	1.71	183.62	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	107.38	183.62	100.00%		
04.06.01	REDES DE DESAQUE EN PVC SAL Ø DE 2"	pio	14.00	64.53	763.42	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	14.00	763.42	100.00%		
04.06.02	REDES DE DESAQUE	m	44.30	11.92	528.06	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	44.30	528.06	100.00%		
04.06.02.01	REDES DE DESAQUE DE TUBERIA DE PVC - SAL Ø DE 2"	m	3.88	12.01	46.80	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	3.88	46.80	100.00%		
04.06.02.02	REDES DE DESAQUE DE TUBERIA DE PVC - SAL Ø DE 4"	m	4.90	18.73	96.88	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	4.90	96.88	100.00%		
04.06.03	REDES COLECTORAS	m	4.71	31.62	148.46	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	4.71	148.46	100.00%		
04.06.03.01.01	EXCAVACION Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERIA	m	20.92	1.47	30.75	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	20.92	30.75	100.00%		
04.06.03.01.02	REPLIE Y NIVELACION PTUBERIA	m	20.92	4.96	97.28	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	20.92	97.28	100.00%		
04.06.03.01.03	CAMA DE ABOYO (E=0.10m)	m	20.92	18.21	380.95	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	20.92	380.95	100.00%		
04.06.03.01.04	RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m	4.90	18.73	96.88	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	4.90	96.88	100.00%		
04.06.03.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m	20.92	12.01	251.25	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	20.92	251.25	100.00%		
04.06.03.02.01	REO COLECTORA CON TUBERIA DE PVC SAP Ø DE 4	m	12.00	18.87	224.04	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	12.00	224.04	100.00%		
04.06.04	ACCESORIOS	und	2.00	19.38	38.76	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	2.00	38.76	100.00%		
04.06.04.01	COODO PVC SAP DE 48' X 4"	und	2.00	20.92	41.84	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	2.00	41.84	100.00%		
04.06.04.02	COODO PVC SAP DE 48' X 4"	und	2.00	20.92	41.84	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	2.00	41.84	100.00%		
04.06.04.03	TEE SANITARIA PVC SAP 2"	und	2.00	20.92	41.84	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	2.00	41.84	100.00%		
04.06.05	CAMARA DE INSPECCION	und	6.00	287.02	1,722.12	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	6.00	1,722.12	100.00%		
04.06.05.01.01	CALA DE REGISTRO DE 24" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	und	6.00	287.02	1,722.12	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	6.00	1,722.12	100.00%		
04.06.06	EMPALMES Y PRUEBAS HIDRAULICAS	m	89.10	1.71	118.16	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	89.10	118.16	100.00%		
04.06.06.01	PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA DE TUB DESAQUE	m	89.10	1.71	118.16	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	89.10	118.16	100.00%		
04.06.07	PLANTA DE TRATAMIENTO	m	89.10	1.71	118.16	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	89.10	118.16	100.00%		

CONSORCIO SAN JOSE
 BETTY MENDOZA QUISPE
 REPRESENTANTE LEGAL

Lucy Vicente B
 LUCY VICENTE BASSILO
 INGENIERA CIVIL - Reg. 50638

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07

DEL 01 AL 16 DE ABRIL DEL 2018

OPERA OPTIMIZACION DEL DESMARRACADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Ciente: FONDOPES
 Contratista: Consorcio San Jose
 Supervisor: Consorcio Mendoza & JSU
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios
 Monto del Contrato, con IGV: S/ 1'907.074.41

Fecha de inicio de obra: #####
 Fecha de termino de obra: #####
 Plazo de Ejecucion de obra: 60 dias calendario

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA			SALDO POR VALORIZAR			
		UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
04 04 03	CAMARA DE INSPECCION																
04 04 03 01 01	CAMA DE 300 X 300 X 150 METALICA DE REZO PERFORADA 0.8CM X 0.7MM C/ TABA CONCRETO REFORZADO PERFORACION DE VALVULA	und	1.00	140.48	140.48	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	140.48	100.00%	
04 04 04	ESTRUCTURA DISIPADORA DE ENERGIA																
04 04 04 01	ESTRUCTURA DISIPADORA DE ENERGIA	und	1.00	600.00	600.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	600.00	100.00%	
04 04 05	EMPALMES Y PROBAS HIDRAULICAS																
04 04 05 01	PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA EN RED PLUVIAL	m	9.97	1.18	11.76	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	600.00	100.00%	
04 04 06	ACCESORIOS																
04 04 06 01	VALVULA CHECK BIEN GIERRERABDO AMORTIGUADOS CON CLAPETA EN PZ DE 48" X 4"	und	1.00	986.51	986.51	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	986.51	100.00%	
04 04 06 02	CAMA PVALVULAS 0.65MM 80M. H=0.40M	und	1.00	36.25	36.25	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	36.25	100.00%	
04 04 06 03	CAMA PVALVULAS 0.65MM 80M. H=0.40M	und	1.00	446.54	446.54	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	446.54	100.00%	
04 04 06 04	CODO PVC 90° DE 48" X 3"	und	4.00	28.36	113.40	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	4.00	113.40	100.00%	
04 04 06 05	CODO PVC 90° DE 48" X 3"	und	2.00	28.36	56.70	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	2.00	56.70	100.00%	
04 05 01	REDES DE DESAGUE Y VENTILACION																
04 05 01 01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC 8" Ø DE 2"	pio	23.00	54.53	1,254.19	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	23.00	1,254.19	100.00%	
04 05 01 02	SALIDA DE DESAGUE EN PVC 8" Ø DE 2"	pio	6.00	56.10	336.60	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	6.00	336.60	100.00%	
04 05 01 03	SALIDA DE VENTILACION EN PVC 8" Ø DE 2"	pio	9.00	69.49	625.41	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	9.00	625.41	100.00%	
04 05 02	REDES DE DESAGUE																
04 05 02 01	REDO DE DESAGUE DE TUBERIA DE PVC - 8" Ø DE 2"	m	35.94	11.92	428.40	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	35.94	428.40	100.00%	
04 05 02 02	MONTANTE VVO VENTILACION CON TUBERIA PVC - 8" Ø DE 2"	m	30.42	12.01	365.34	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	30.42	365.34	100.00%	
04 05 03	REDES COLECTORAS																
04 05 03 01 01	EXCAVACION Y FIJADO DE ZANJA PARA TUBERIA	m3	18.56	31.82	588.01	18.56	588.01	100.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%
04 05 03 01 02	REFINIE Y ANIVELACION PROTECTORIA	m	42.82	1.47	62.85	42.82	62.85	100.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%
04 05 03 01 03	CAMA DE ASOTO (E=1.0 m)	m	42.82	4.65	198.11	42.82	198.11	100.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%
04 05 03 01 04	RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m	42.82	18.21	778.75	42.82	778.75	100.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%
04 05 03 01 05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	19.30	19.73	380.78	19.30	380.78	100.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%
04 05 03 02 01	RED COLECTORA CON TUBERIA DE PVC 8" Ø DE 4"	m	42.82	12.01	514.27	42.82	514.27	100.00%	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%
04 05 04	ACCESORIOS																
04 05 04 01	YEE PVC 90° DE 2" X 2"	und	19.00	2.12	40.28	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	19.00	40.28	100.00%	
04 05 04 02	YEE PVC 90° DE 4" X 4"	und	3.00	34.47	103.41	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	3.00	103.41	100.00%	
04 05 04 03	YEE DOBLE PVC 90° DE 4" X 4"	und	8.00	34.17	273.36	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	8.00	273.36	100.00%	
04 05 04 04	CODO PVC 90° DE 48" X 2"	und	2.00	38.48	72.96	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	2.00	72.96	100.00%	
04 05 04 05	CODO PVC 90° DE 48" X 4"	und	14.00	18.67	261.38	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	14.00	261.38	100.00%	
04 05 04 06	CODO PVC 90° DE 48" X 4"	und	10.00	19.36	193.80	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	10.00	193.80	100.00%	

CONSORCIO SAN JOSE
 REPRESENTANTE LEGAL

Lucy Vicente B
 LUCY VICENTE BASSILO
 ING. CIVIL - Reg. 58333

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA Nº 07

DEL 01 AL 16 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DISEÑARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente : FONDOS
 Contratista: Consorcio San Jose
 Supervisor: Consorcio Mendoza & JSU
 Sistema de Contratacion: Pliegos Unitarios
 Monto del Contrato, con IGV: S/ 1'907.074.41

Fecha de inicio de obra: #####
 Fecha de termino de obra: #####
 Plazo de Ejecucion de obra: 60 dias calendario

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
		UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
04.03.04	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA SALADA																
04.03.04.01	COO PVC ØP 3/4"	und	30.00	10.07	302.10	8.00	80.56	26.87%	8.00	80.56	26.87%	22.00	221.54	73.33%			
04.03.04.02	COO PVC ØP 1/2"	und	4.00	10.96	43.80	1.00	10.96	26.00%	1.00	10.96	26.00%	3.00	32.85	75.00%			
04.03.04.03	COO PVC ØP 1/2"	und	36.00	11.96	418.23	9.00	107.56	26.71%	9.00	107.56	26.71%	26.00	310.70	74.29%			
04.03.04.04	TEE PVC ØP 3/4"	und	8.00	9.01	54.06	2.00	18.02	33.33%	2.00	18.02	33.33%	4.00	36.04	66.67%			
04.03.04.05	TEE PVC ØP 1/2"	und	4.00	10.01	40.04	1.00	10.01	26.00%	1.00	10.01	26.00%	3.00	30.03	75.00%			
04.03.04.06	REDUCCION PVC ØP 1/2" A 3/4"	und	4.00	10.16	40.60	1.00	10.16	26.00%	1.00	10.16	26.00%	3.00	30.45	75.00%			
04.03.04.07	REDUCCION PVC ØP 1/2" A 1/2"	und	2.00	10.15	20.30	1.00	10.15	50.00%	1.00	10.15	50.00%	1.00	10.15	50.00%			
04.03.04.08	REDUCCION PVC ØP 1/2" A 1/2"	und	2.00	10.66	21.30	1.00	10.66	50.00%	1.00	10.66	50.00%	1.00	10.66	50.00%			
04.03.04.09	TAPON DE PVC DE 1"	und	2.00	19.29	38.58	1.00	19.29	50.00%	1.00	19.29	50.00%	1.00	19.29	50.00%			
04.03.05	VALVULAS																
04.03.05.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 3/4"	und	6.00	88.80	532.80	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	6.00	532.80	100.00%
04.03.05.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 1/2"	und	9.00	166.50	1,498.50	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	9.00	1,498.50	100.00%
04.03.06	PIEZAS VARIAS																
04.03.06.01	NCHO DE PROTECCION PARA VALVULA (AREA DE EVISCERADO)	und	6.00	92.33	553.98	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	6.00	553.98	100.00%
04.03.07	EMPALMES Y PRUEBAS HIDRAULICAS	und	16.00	92.33	1,477.28	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	16.00	1,477.28	100.00%
04.03.07.01	EMPALME A LA RED EXISTENTE DE AGUA SALADA	und	1.00	98.59	98.59	1.00	98.59	100.00%	1.00	98.59	100.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
04.03.07.02	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECTACION A ZANJA TAPADA	m	27.00	2.66	71.55	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	27.00	71.55	100.00%
04.03.07.03	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECTACION A ZANJA ABIERTA	m	27.00	1.45	39.15	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	27.00	39.15	100.00%
04.03.08	SISTEMA DE CLORACION (AGUA SALADA)																
04.03.08.01	SISTEMA DE CLORACION (AGUA SALADA)	gib	1.00	17,521.96	17,521.96	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	17,521.96	100.00%
04.04.01	REDES COLECTORAS																
04.04.01.01	EXCAVACION Y PISO DE ZANJA PARA TUBERIA	m3	3.21	31.62	101.18	3.21	101.18	100.00%	3.21	101.18	100.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
04.04.01.02	REFINIE Y NIVELACION PROTECTORA	m	16.97	1.47	24.95	16.97	24.95	100.00%	16.97	24.95	100.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
04.04.01.03	CANA DE ARBOVO (E=Ø 10 m)	m	16.97	4.86	78.91	16.97	78.91	100.00%	16.97	78.91	100.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
04.04.01.04	RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m	16.97	16.21	309.02	16.97	309.02	100.00%	16.97	309.02	100.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
04.04.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCESIVAMENTE	m3	3.33	18.73	65.70	3.33	65.70	100.00%	3.33	65.70	100.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
04.04.01.02.01	TUBERIA PORENUELE PLUVIAL PVC Ø 4" DE 3'	m	7.00	10.39	72.73	7.00	72.73	100.00%	7.00	72.73	100.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
04.04.01.02.02	TUBERIA PORENUELE PLUVIAL PVC Ø 4" DE 4'	m	4.94	12.01	59.33	4.94	59.33	100.00%	4.94	59.33	100.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
04.04.01.02.03	TUBERIA PORENUELE PLUVIAL PVC Ø 4" DE 5'	m	5.03	15.85	79.73	5.03	79.73	100.00%	5.03	79.73	100.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
04.04.02	CANALETAS METALICAS PORENUELE PLUVIAL EN TECHO																
04.04.02.01	SUBV. E INST. DE CANALETAS PORENUELE PLUVIAL EN TECHO ANCHO = 0.20M INCLUIDO ACCESORIOS	m	11.50	31.67	364.21	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	11.50	364.21	100.00%

CONSORCIO SAN JOSE
 REPRESENTANTE LEGAL

Lucy Vicente B.
 LUCY VICENTE BASSILLO
 ING. CIVIL - Reg. 05338

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA Nº 07

DEL 01 AL 16 DE ABRIL DEL 2018

OPERA OPTIMIZACION DEL DESMAMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO RIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

CLIENTE: FONDOS
 Contratista: Consorcio San Jose
 Supervisor: Consorcio Mendoza & JSU
 Sistema de Contratacion: Puestos Unidos
 Monto del Contrato: con IGV: S/ 1'907'074.41

Fecha de inicio de obra: #####
 Fecha de termino de obra: #####
 Plazo de Ejecucion de obra: 60 dias calendarios

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	PARCIAL	%
04.02.04.09	TEE PVC 90° 1 1/2"	und	9.00	10.01	90.08	3.00	30.03	33.33%								
04.02.04.10	TEE PVC 90° 1 1/2"	und	2.00	10.51	21.02	1.00	10.51	50.00%								
04.02.04.11	REDUCCION PVC 90° 3/4 A 1 1/2"	und	18.00	9.85	173.70	5.00	48.25	27.78%								
04.02.04.12	REDUCCION PVC 90° 1 A 1 1/2"	und	7.00	10.18	71.05	2.00	20.30	28.67%								
04.02.04.13	REDUCCION PVC 90° 1 A 3/4"	und	5.00	10.15	50.75	2.00	20.30	40.00%								
04.02.04.14	REDUCCION PVC 90° 1 1/2 A 3/4"	und	2.00	10.15	20.30	1.00	10.15	50.00%								
04.02.04.15	REDUCCION PVC 90° 1 1/2 A 1"	und	4.00	10.65	42.60	1.00	10.65	25.00%								
04.02.05	VALVULAS	und														
04.02.06.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 3/4"	und	1.00	88.80	88.80	-	-	0.00%								
04.02.06.02	VALVULA ESFERICA DE Ø 1"	und	2.00	364.88	729.76	-	-	0.00%								
04.02.06.03	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 1 1/2"	und	3.00	166.50	499.50	-	-	0.00%								
04.02.06.04	Llave DORADO GARRITO DE Ø 3/4 EN CAJUELA DE CONCRETO	und	1.00	365.88	365.88	-	-	0.00%								
04.02.06	PIEZAS VARIAS	und														
04.02.06.01	CAJA PARA VALVULA (Nicho de MAYOLICA)	und	5.00	92.33	461.65	-	-	0.00%								
04.02.07	EMPAQUES Y PRUEBAS HIDRAULICAS	und														
04.02.07.01	EMPAQUE A LA RED EXISTENTE DE AGUA	und	1.00	98.58	98.58	1.00	98.58	100.00%								
04.02.07.02	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECTACION A ZANJA TAPADA	m	96.10	2.65	254.67	-	-	0.00%								
04.02.07.03	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECTACION A ZANJA ABIERTA	m	96.10	1.45	139.35	-	-	0.00%								
04.03	SISTEMA DE ALIMENTACION SANITARIA															
04.03.01	SALIDAS DE AGUA SALADA															
04.03.01.01	SALIDA DE AGUA SALADA CON TUBERIA PVC - Ø 3/4"	plio	6.00	84.81	508.86	-	-	0.00%								
04.03.01.02	SALIDA DE AGUA SALADA CON TUBERIA PVC - Ø 1 1/2"	plio	8.00	126.26	1,010.00	-	-	0.00%								
04.03.02	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA SALADA															
04.03.02.01	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE Ø 3/4"	m	28.10	12.30	357.83	28.10	357.83	100.00%								
04.03.02.02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE Ø 1 1/2"	m	18.20	13.93	257.46	18.20	257.46	100.00%								
04.03.03	REDES DE ALIMENTACION DE AGUA SALADA															
04.03.03.01.01	EXCAVACION Y FICADO DE ZANJA PARA TUBERIA	m	91.00	7.42	675.22	91.00	675.22	100.00%								
04.03.03.01.02	REFINIE Y NIVELACION INTUBERIA	m	91.00	1.47	133.77	91.00	133.77	100.00%								
04.03.03.01.03	CAJA DE APOYO (E=Ø 10 m)	m	91.00	4.65	423.15	91.00	423.15	100.00%								
04.03.03.01.04	RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m3	7.88	72.88	582.28	7.88	582.28	100.00%								
04.03.03.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	0.95	18.73	18.74	0.95	18.74	100.00%								
04.03.03.02.01	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1"	m	15.00	12.87	190.05	15.00	190.05	100.00%								
04.03.03.02.02	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/2"	m	48.00	13.88	682.57	48.00	682.57	100.00%								
04.03.03.03.01	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/2"	m	27.00	13.93	376.11	27.00	376.11	100.00%								

CONSORCIO SAN JOSE
 SUPERVISOR GENERAL
 MENDOZA QUISPE
 REPRESENTANTE LEGAL

LUCY VICENTE BASSILIO
 M.G. CIVIL - Reg. 50538

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA Nº 07

DEL 01 AL 18 DE ABRIL DEL 2018

OBRA OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES
 Cliente: FONDOPES
 Contratista: Consorcio San Jose
 Supervisor: Consorcio Mendoza & JSU
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios
 Monto del Contrato: con IGV: S/ 1'907.074.41

Fecha de inicio de obra: #####
 Fecha de termino de obra: #####
 Plazo de Ejecucion de obra: 60 dias calendarios

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
		UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
04 01 01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																
04 01 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS																
04 01 01 01	INODORO Y ANQUE BAJO	psa	6,00	437,07	2.622,42	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	6,00	2.622,42	100,00%
04 01 01 03	URINARIO	psa	3,00	172,07	516,21	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	3,00	516,21	100,00%
04 01 01 04	LAVATORIO	psa	12,00	127,07	1.524,84	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	12,00	1.524,84	100,00%
04 02	SISTEMA DE AGUA FRIA	psa	8,00	180,72	1.286,76	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	8,00	1.286,76	100,00%
04 02 01	SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 1 1/2" PVC 8P	plp	29,00	74,01	2.146,29	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	29,00	2.146,29	100,00%
04 02 02	RED DE DISTRIBUCION	plp	1,00	96,25	96,25	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	96,25	100,00%
04 02 02 01	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 1/2"	m	42,90	12,96	556,84	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	42,90	556,84	100,00%
04 02 02 02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 3/4"	m	11,75	12,30	144,53	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	11,75	144,53	100,00%
04 02 02 03	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 1"	m	11,40	12,67	144,44	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	11,40	144,44	100,00%
04 02 03	RED DE ALIMENTACION	m	4,05	13,93	56,42	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	4,05	56,42	100,00%
04 02 03 01 01	EXCAVACION Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERIA	m	92,75	7,42	686,21	92,75	686,22	100,00%	-	-	0,00%	92,75	686,22	100,00%	-	-	0,00%
04 02 03 01 02	REFINE Y ANILACION PTUBERIA	m	92,75	1,47	136,34	92,75	136,35	100,00%	-	-	0,00%	92,75	136,35	100,00%	-	-	0,00%
04 02 03 01 04	RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAN. PROPIO	m3	7,73	72,96	563,21	7,73	563,21	100,00%	-	-	0,00%	7,73	563,21	100,00%	-	-	0,00%
04 02 03 01 06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	0,97	19,73	19,14	0,97	19,14	100,00%	-	-	0,00%	0,97	19,14	100,00%	-	-	0,00%
04 02 03 02 01	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 3/4"	m	14,00	12,30	172,20	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	14,00	172,20	100,00%
04 02 03 02 02	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1"	m	2,90	12,67	36,74	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	2,90	36,74	100,00%
04 02 03 02 03	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA	m	79,20	13,93	1.103,26	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	79,20	1.103,26	100,00%
04 02 04 01	CODDO PVC 8P 1/2"	und	66,00	7,60	501,60	17,00	129,20	26,78%	-	-	0,00%	17,00	129,20	26,78%	49,00	372,40	74,24%
04 02 04 03	CODDO PVC 8P 3/4"	und	6,00	10,07	60,36	2,00	20,14	40,00%	-	-	0,00%	2,00	20,14	40,00%	3,00	30,21	60,00%
04 02 04 04	CODDO PVC 8P 1"	und	17,00	10,95	186,15	5,00	54,75	28,41%	-	-	0,00%	5,00	54,75	28,41%	1,00	10,07	50,00%
04 02 04 06	CODDO 4P PVC 8P 1 1/2"	und	19,00	11,96	227,05	5,00	59,75	26,32%	-	-	0,00%	5,00	59,75	26,32%	14,00	167,30	73,68%
04 02 04 07	TEE PVC 8P 1/2"	und	2,00	11,96	23,90	1,00	11,96	50,00%	-	-	0,00%	1,00	11,96	50,00%	1,00	11,95	75,00%
04 02 04 08	TEE PVC 8P 3/4"	und	7,00	9,01	63,07	2,00	18,02	28,57%	-	-	0,00%	2,00	18,02	28,57%	5,00	45,05	71,43%

CONSORCIO SAN JOSE
 MENDOZA & JSU
 REPRESENTANTE LEGAL

Lucy Vicente B
 LUCY VICENTE BASSILIO
 ING. CIVIL - Reg. 50538

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA Nº 07

DEL 01 AL 16 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente : FONDOPES
 Contratista: Consorcio San Jose
 Supervision: Consorcio Mendoza & ISU
 Sistema de Contratacion: Precio Unitarios
 Monto del Contrato, con IGV: S/ 1'907,074.41

Fecha inicio de obra: 13/01/2018
 Fecha termino de obra: 13/03/2018
 Plazo Ejecucion de obra: 60 dias calendarios

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL				VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR				VALORIZACION ACTUAL				VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL				SALDO POR VALORIZAR	
		UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%		
05.05.06	LUMINARIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR DE 160 WATTS CI PASTORAL PA 1.007.907.579	und	4.00	771.98	3.087.92	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	4.00	3.087.92	100.00%		
05.06.01	TABLERO GENERAL DE PROTECCION TIP TABLERO ELECTRICOS	und	1.00	1.957.52	1.957.52	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	1.957.52	100.00%		
05.06.02	TABLERO DE DISTRIBUCION TAREAS PREVIAS TIO-TP	und	1.00	2.886.02	2.886.02	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	2.886.02	100.00%		
05.06.03	TABLERO BOMBAS SUMIDERO TBS-01	und	1.00	2.287.02	2.287.02	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	2.287.02	100.00%		
05.07.01	POZO DE PUESTA A TIERRA R x 19 OCHOS	und	1.00	1.541.57	1.541.57	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	1.541.57	100.00%		
05.08.01	CAJA DE PASE DE P399 CON TAPA CUERDA TIPO PESADO 100 X 100 x 50 mm	und	12.00	32.02	384.24	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	12.00	384.24	100.00%		
05.08.02	CAJA DE PASE DE POLYESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRO 135 X 135 X 129 mm	und	2.00	35.02	70.04	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	2.00	70.04	100.00%		
05.08.03	CAJA DE PASE DE POLYESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRO 160 X 135 X 141 mm	und	11.00	37.52	412.72	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	11.00	412.72	100.00%		
05.08.04	CAJA DE PASE DE POLYESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRO 270 X 160 X 171 mm	und	4.00	39.27	157.08	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	4.00	157.08	100.00%		
05.08.05	BOYAS DE CONTROL DE NIVEL, Incl 10 mts cable sumergible	und	1.00	48.59	48.59	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	48.59	100.00%		
05.09.01	BANDEJA PORTABLE PARA BOYAS SEGUIN PLANO	und	4.00	198.10	792.40	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	4.00	792.40	100.00%		
05.10.01	PREPARO DE ASCENDIMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA Y PUESTA EN SERVICIO	q/b	1.00	3.500.00	3.500.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	3.500.00	100.00%		
COSTO DIRECTO					87.901.89				87.901.89					87.901.89					
GASTOS GENERALES					8.974.81				8.974.81					8.974.81					
UTILIDADES					3.087.76				3.087.76					3.087.76					
SUB TOTAL					99.974.89				99.974.89					99.974.89					
IGV			18%		12.896.42				12.896.42					12.896.42					
TOTAL SUB PRESUPUESTO DE OBRA					112.871.31				112.871.31					112.871.31					
PORCENTAJE DE AVANCE					100.00%				100.00%					100.00%					

CONSORCIO SAN JOSE
 BETTY E. MENDEZ QUIROGA
 REPRESENTANTE LEGAL

Lucy Vicente Bassilio
 LUCY VICENTE BASSILIO
 ING. CIVIL - Reg. 50536

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA Nº 07

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES
 CIMA: FONDOS
 Contratista: Consorcio San Jose
 Supervision: Consorcio Mandosa & JSU
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios
 Monto del Contrato con IGV: S/ 1'807'074,41

Fecha inicio de obra: 13/01/2018
 Fecha termino de obra: 13/03/2018
 Plazo Ejecucion de obra: 60 dias calendarios

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL				VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR				VALORIZACION ACTUAL				VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL				SALDO POR VALORIZAR			
		UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	
06.01.01	RECONSTRUCCION DE TUBERIAS																				
06.01.02	CORTE ROTURA Y RESANE DE PAVIMENTO	m	20,00	284,22	5.684,40	20,00	5.684,40	100,00%													
06.01.03	EXCAVACION DE ZANJA DE 0,80 X 0,80, TERRENO SEMIRRASCOSO	m	20,00	91,85	1.837,00	20,00	1.837,00	100,00%													
06.01.04	RELLENO COMPACTADO Y NIVELACION DE ZANJA 0,3 X 0,60 m	m	30,00	27,85	828,50	30,00	828,50	100,00%													
06.01.05	DUCTOS DE CONCRETO DE 2 VIVAS	und	3,00	192,33	578,99	3,00	578,99	100,00%													
06.01.06	CANTA DE SEÑALIZACION	m	20,00	6,86	133,20	20,00	133,20	100,00%													
06.02.01	TUBERIA DE PVC-9 Ø 20mm	m	293,58	12,14	3.564,06			0,00%													
06.02.02	TUBERIA DE PVC-9 Ø 28mm	m	4,99	13,83	69,01			0,00%													
06.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT I/MC 3/4"	m	172,82	23,64	4.078,37			0,00%													
06.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT I/MC 1/2"	m	28,98	37,96	1.088,49			0,00%													
06.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT I/MC 1"	m	25,31	28,43	719,26			0,00%													
06.03.01	CABLE ELECTRICOS NXH-3-14/0mm2	m	28,28	15,80	414,75			0,00%													
06.03.02	CABLE ELECTRICOS NH-40 10mm2	m	54,81	8,01	439,03			0,00%													
06.03.03	CABLE ELECTRICOS NH-40 16mm2	m	20,90	7,78	162,60			0,00%													
06.03.04	CABLE ELECTRICOS NH-40 25mm2	m	45,28	6,85	300,98			0,00%													
06.03.05	CABLE ELECTRICOS NH-40 4mm2	m	1.465,88	6,09	8.927,21			0,00%													
06.03.06	CABLE SUMERGIBLE 4x4 mm2	m	11,55	16,41	189,54			0,00%													
06.04.01	SALIDA CENTRO DE LUZ EN TECHO EMPOTRADA	und	14,00	36,70	513,80			0,00%													
06.04.02	SALIDA CENTRO DE LUZ EN TECHO ADOSGADO	und	36,00	37,20	1.339,20			0,00%													
06.04.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE EMPOTRADO	und	6,00	36,70	220,20			0,00%													
06.04.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE EMPOTRADO	und	8,00	47,52	380,16			0,00%													
06.04.05	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE CON	und	3,00	48,02	147,06			0,00%													
06.04.06	PUERTA A TIERRA BRUENA DE AGUA	und	11,00	65,18	716,98			0,00%													
06.05.01	LUMINARIA HERMETICA P/ADOSAR 2x8 WATTS, IP 65, SIMILAR AL	und	27,00	128,03	3.402,81			0,00%													
06.05.02	LUMINARIA HERMETICA P/ADOSAR 2x8 WATTS, IP 65, SIMILAR AL	und	10,00	186,03	1.860,30			0,00%													
06.05.03	LUMINARIA HERMETICA P/ADOSAR 2x8 WATTS, IP 65, SIMILAR AL	und	7,00	92,13	644,91			0,00%													
06.05.04	MODELO AHI - Kit de Emergencia	und	6,00	132,13	912,78			0,00%													
06.05.05	PASTORAL PS 1.001.001.5.0	und	2,00	671,98	1.343,96			0,00%													

CONSORCIO SAN JOSE
 Consorcio San Jose
 Representante Legal

Lucy Vicente B.
 INGENIERA VICENTE BASSIMO
 ING. CIVIL - Reg. 20038

RESUMEN DE VALORIZACIONES
DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018
OBRA: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente : FONDOOPS
 Contratista: Consorcio San Jose
 Supervisor: Consorcio Mendoza & JSU
 Sistema de Contratacion: Proceso Unificado
 Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'607,074.41

Fecha inicio de obra:
 Fecha termino de obra:
 Plazo Ejecucion de obra:

13/01/2018
 13/03/2018
 60 dias calendarios

Item	Partida Descripcion	Presupuesto		VAL. 01		VAL. 02		VAL. 03		VAL. 04		VAL. 05		VAL. 06		VAL. 07		VAL. ACUM		SALDO	
		Parcial		Parcial		Parcial		Parcial		Parcial		Parcial		Parcial		Parcial		Parcial		Parcial	
01	ESTRUCTURA	437,877.26		43,359.99		57,573.65		24,428.04		19,235.42		0.00		199,632.34		0.00		314,228.44		123,847.82	
02	ARQUITECTURA	377,594.84		0.00		17,978.40		482.42		0.00		0.00		23,930.49		0.00		42,391.31		335,203.33	
03	INST. SANITARIAS	253,583.05		0.00		98,461.95		0.00		0.00		0.00		106,200.45		0.00		204,992.40		48,920.65	
04	INST. ELECTRICAS	57,901.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		9,058.09		0.00		9,058.09		48,843.90	
	COSTO DIRECTO	1,126,956.94		43,359.99		174,014.00		24,910.46		19,235.42		0.00		308,821.37		0.00		570,341.24		596,615.70	
	GASTOS GENERALES	174,078.33		6,720.80		28,972.17		3,891.12		2,981.48		0.00		47,867.31		0.00		88,402.89		89,275.44	
	UTILIDAD	60,292.20		2,319.76		8,309.75		1,332.72		1,029.08		0.00		16,521.94		0.00		30,513.26		29,775.94	
	SUBTOTAL	1,361,927.47		52,400.55		210,296.92		30,104.30		23,246.00		0.00		373,210.62		0.00		689,287.99		672,670.06	
	IMPUESTO (IGV)	18,000%		245,146.94		9,432.10		37,853.27		5,418.77		0.00		67,177.91		0.00		124,086.33		121,080.81	
	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	1,607,074.41		61,832.65		248,149.19		35,523.07		27,430.28		0.00		440,388.53		0.00		813,328.72		793,750.89	
	FORCENTAJE DE AVANCE	100%		3,85%		15,44%		2,21%		1,71%		0,00%		27,40%		0,00%		50,61%		48,39%	
	FORCENTAJE DE AVANCE ACUM.	100%		3,85%		19,29%		21,50%		23,21%		23,21%		50,61%		50,61%		50,61%		48,39%	

CONSORCIO SAN JOSE
 BETTY E. MENDOZA GUISPE
 REPRESENTANTE LEGAL

Luz Vicente B
 LUCY NELLY VICENTE BASSILIO
 INGENIERA CIVIL - Reg. 58533

REINTEGRO AUTORIZADO POR REAJUSTE

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente : FONDOPE

Contratista: Consorcio San Jose

Supervision: Consorcio Mendoza & JSU

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios

Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'607,074.41


Fecha inicio de obra: 13/01/2018


Fecha termino de obra: 13/03/2018

Plazo Ejecución de obra: 60 días calendario

Val. N°	MES	VALORIZACION		K-1	REINTEGRO		REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO	REINTEGRO NETO AUTORIZADO
		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		
FORMULA Nº01 - ESTRUCTURA								
1	15-Ene-18	52,354.03	52,400.55	0.002				
2	31-Ene-18	336,480.68	69,577.76	0.002	104.71	104.80	104.80	104.80
3	15-Feb-18	133,574.61	29,521.29	0.002	672.96	139.16	139.16	139.16
4	28-Feb-18	4,158.01	23,246.00	0.002	267.15	59.04	59.04	59.04
5	15-Mar-18	2,607.35	0.00	0.002	8.32	46.49	46.49	46.49
6	19-Mar-18	149,428.41	0.00	0.002	5.21	0.00	0.00	0.00
ACUMULADO ACTUAL		529,174.67	174,745.60	0.002	298.86	0.00	0.00	0.00
REINTEGRO ACUMULADO ANTERIOR					1,357.21	349.49	349.49	349.49
REINTEGRO ACTUAL								349.49
FORMULA Nº02 - ARQUITECTURA								
1	15-Ene-18	0.00	0.00	0.004				
2	31-Ene-18	38,878.35	21,726.89	0.004	0.00	0.00	0.00	0.00
3	15-Feb-18	132,699.07	583.01	0.004	155.51	86.91	86.91	86.91
4	28-Feb-18	69,806.06	0.00	0.004	530.80	2.33	2.33	2.33
5	15-Mar-18	214,939.65	0.00	0.004	279.22	0.00	0.00	0.00
6	19-Mar-18	405,093.22	0.00	0.004	859.76	0.00	0.00	0.00
ACUMULADO ACTUAL		456,323.12	22,309.90	0.004	1,620.37	0.00	0.00	0.00
REINTEGRO ACUMULADO ANTERIOR					3,445.66	89.24	89.24	89.24
REINTEGRO ACTUAL								89.24
FORMULA Nº03 - INST. SANITARIAS								
1	15-Ene-18	2,924.25	0.00	0.004				
2	31-Ene-18	296,341.20	118,991.26	0.004	-2.92	0.00	0.00	0.00
3	15-Feb-18	7,189.67	0.00	0.004	-296.34	-118.99	-296.34	-296.34
4	28-Feb-18	0.00	0.00	0.004	-7.19	0.00	-7.19	-7.19
5	15-Mar-18	0.00	0.00	0.004	0.00	0.00	0.00	0.00
6	19-Mar-18	59,120.59	0.00	0.004	0.00	0.00	0.00	0.00
ACUMULADO ACTUAL		306,455.12	118,991.26	0.004	236.48	0.00	0.00	0.00
REINTEGRO ACUMULADO ANTERIOR					-69.97	-118.99	-303.53	-303.53
REINTEGRO ACTUAL								-303.53
FORMULA Nº04 - INST. ELECTRICAS								
1	15-Ene-18	0.00	0.00	0.007				
2	31-Ene-18	19,008.78	0.00	0.007	0.00	0.00	0.00	0.00
3	15-Feb-18	22,656.91	0.00	0.007	171.08	0.00	0.00	0.00
4	28-Feb-18	0.00	0.00	0.007	203.91	0.00	0.00	0.00
5	15-Mar-18	28,308.87	0.00	0.007	0.00	0.00	0.00	0.00
6	19-Mar-18	59,027.86	0.00	0.007	198.16	0.00	0.00	0.00
ACUMULADO ACTUAL		69,974.55		0.007	413.20	0.00	0.00	0.00
REINTEGRO ACUMULADO ANTERIOR					986.35			
REINTEGRO ACTUAL								0.00

CONSORCIO SAN JOSE


BETTY S. MÉNDEZ QUISPE
 REPRESENTANTE LEGAL


LUCY VICENTE B.
 ING. CIVIL - Reg. 59538

FORMULAS POLINOMICAS

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES
 Cliente: FONDOPE
 Contratista: Consorcio San Jose
 Supervision: Consorcio Mendoza & JSU
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios
 Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'607,074.41
 ZONA GEOGRAFICA 1

Fecha inicio de obra: 13/01/2018
 Fecha termino de obra: 13/03/2018
 Plazo Ejecucion de obra: 60 días calendario

FORMULA POLINOMICA: ESTRUCTURAS

$$K = 0.174^{*}(Mr / Mo) + 0.117^{*}(Cr / Co) + 0.095^{*}(AAr / AAo) + 0.201^{*}(DMMr / DMMo) + 0.120^{*}(MFMr / MFMo) + 0.293^{*}(Ir / Io)$$

MONIBO	CODIGO	INDICE	ELEMENTO REPRESENTATIVO	INCIDENCIA		AGOSTO. 17			DICIEMBRE 17			ENERO 18	
				COEFIC	%	Io	Ir	K	Ir	K	Ir	K	
1	M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	0.174	100.000	580.90	580.90	0.174	582.52	0.174	582.52	0.174	582.52
2	C	23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	0.117	100.000	418.10	418.10	0.117	418.10	0.117	418.10	0.117	418.10
3	AA	2	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	0.095	61.053	474.70	491.28	0.097	497.78	0.098	497.78	0.098	497.78
		5	AGREGADO GRUESO		18.408	448.18	450.15		450.15		450.15		450.15
4	DMM	43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	0.201	38.947	715.43	724.34	0.203	722.03	0.201	722.03	0.201	722.03
		45	MADERA TERCIA DA PARA ENCOFRADO		7.463	322.01	324.93		322.55				
		30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)		74.129	462.48	466.75		462.02				
5	MFM	48	FLETE TERRESTRE	0.120	34.167	467.18	468.42	0.120	468.42	0.120	468.42	0.120	468.42
		49	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL		21.667	366.02	363.24		363.04				
6	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.293	100.000	444.64	442.30	0.291	442.87	0.292	442.87	0.292	442.87
COEFICIENTE DE REAJUSTE				K	1.000			1.002		1.002		1.002	
				K-1				0.002		0.002		0.002	

FORMULA POLINOMICA: ARQUITECTURA

$$K = 0.285^{*}(Mr / Mo) + 0.068^{*}(BALr / BALo) + 0.064^{*}(PTMr / PTMo) + 0.069^{*}(PCMr / PCMo) + 0.241^{*}(Dr / Do) + 0.295^{*}(Ir / Io)$$

MONIBO	CODIGO	INDICE	ELEMENTO REPRESENTATIVO	INCIDENCIA		AGOSTO. 17			DICIEMBRE 17			ENERO 18	
				COEFIC	%	Io	Ir	K	Ir	K	Ir	K	
1	M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	0.285	100.000	580.90	580.90	0.285	582.52	0.286	582.52	0.286	582.52
2	BAL	40	LOSETA	0.068	13.636	378.13	378.13	0.066	383.17	0.066	383.17	0.066	383.17
		17	ACERO DE CONSTRUCCION LISO		18.182	474.70	491.28		497.78				
3	PTM	43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	0.064	68.182	628.23	624.52	0.068	627.06	0.068	627.06	0.068	627.06
		58	PLANCHA DE ACERO LAC		28.125	715.43	724.34		722.03				
		65	TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO		40.625	468.11	510.72		513.92				
4	PCM	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	0.069	31.250	218.20	244.12	0.069	245.62	0.069	245.62	0.069	245.62
		54	PINTURA LATEX		27.536	292.36	293.24		290.85				
5	D	30	CEMENTO PORTLAND TIPO V	0.241	39.130	405.60	405.60	0.243	406.60	0.241	406.60	0.241	406.60
6	I	39	DOLAR (GENERAL PONDERADO)	0.295	100.000	418.10	418.10	0.293	418.10	0.294	418.10	0.294	418.10
COEFICIENTE DE REAJUSTE				K	1.000			1.004		1.004		1.004	
				K-1				0.004		0.004		0.004	

FORMULA POLINOMICA: INSTALACIONES SANITARIAS

$$K = 0.073^{*}(Mr / Mo) + 0.052^{*}(TACr / TACo) + 0.568^{*}(Dr / Do) + 0.307^{*}(Ir / Io)$$

MONIBO	CODIGO	INDICE	ELEMENTO REPRESENTATIVO	INCIDENCIA		AGOSTO. 17			DICIEMBRE 17			ENERO 18	
				COEFIC	%	Io	Ir	K	Ir	K	Ir	K	
1	M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	0.073	100.000	580.90	580.90	0.073	582.52	0.073	582.52	0.073	582.52
2	TAC	72	TUBERIA DE PVC PARA AGUA	0.052	48.077	416.90	426.06	0.053	424.54	0.053	424.54	0.053	424.54
		10	APARATO SANITARIO CON GRIFERIA		28.923	410.19	411.62		412.82				
3	D	30	CEMENTO PORTLAND TIPO I	0.568	25.000	465.71	465.71	0.573	475.73	0.567	475.73	0.567	475.73
4	I	39	DOLAR (GENERAL PONDERADO)	0.307	100.000	462.48	466.75	0.305	462.02	0.306	462.02	0.306	462.02
COEFICIENTE DE REAJUSTE				K	1.000			1.004		1.004		1.004	
				K-1				0.004		0.004		0.004	

FORMULA POLINOMICA: INSTALACIONES ELECTRICAS

$$K = 0.303^{*}(Mr / Mo) + 0.076^{*}(TCr / TCo) + 0.103^{*}(AAr / AAo) + 0.088^{*}(MTCr / MTCo) + 0.106^{*}(Dr / Do) + 0.324^{*}(Ir / Io)$$

MONIBO	CODIGO	INDICE	ELEMENTO REPRESENTATIVO	INCIDENCIA		AGOSTO. 17			DICIEMBRE 17			ENERO 18	
				COEFIC	%	Io	Ir	K	Ir	K	Ir	K	
1	M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	0.303	100.000	580.90	580.90	0.303	582.52	0.304	582.52	0.304	582.52
2	TC	19	CABLE NYY Y NKY	0.076	40.789	705.96	767.79	0.084	771.98	0.084	771.98	0.084	771.98
		65	TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO		59.211	216.20	244.12		245.82				
3	AA	10	APARATO SANITARIO CON GRIFERIA	0.103	12.621	410.19	411.62	0.103	412.82	0.103	412.82	0.103	412.82
		12	ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR		87.379	317.99	318.27		316.53				
4	MTC	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	0.088	35.227	292.36	293.24	0.088	290.85	0.089	290.85	0.089	290.85
		21	CEMENTO PORTLAND TIPO I		31.818	465.71	465.71		475.73				
5	D	29	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE	0.106	32.955	389.45	389.45	0.107	389.45	0.106	389.45	0.106	389.45
6	I	39	DOLAR	0.324	100.000	462.48	466.75	0.322	462.02	0.323	462.02	0.323	462.02
COEFICIENTE DE REAJUSTE				K	1.000			1.007		1.007		1.007	
				K-1				0.007		0.007		0.007	

CONSORCIO SAN JOSE

BETTY E. MENDEZ QUISEP
 REPRESENTANTE LEGAL

Ing. VICENTE BASSILIO
 Ing. CIVIL - Reg. 50500


CURVA DE AVANCE DE OBRA

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 07

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESMARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES
Contratista: Consorcio San Jose
Supervision: Consorcio Mendoza & JSU
Sistema de Contratacion: Precios Unitarios
Monto del Contrato con IGV: S/. 1'607,074,41
ZONA GEOGRAFICA 1

Fecha inicio de obra: 13/01/2018
Fecha termino de obra: 13/03/2018
Plazo Eleccion de obra: 60 dias calendarios

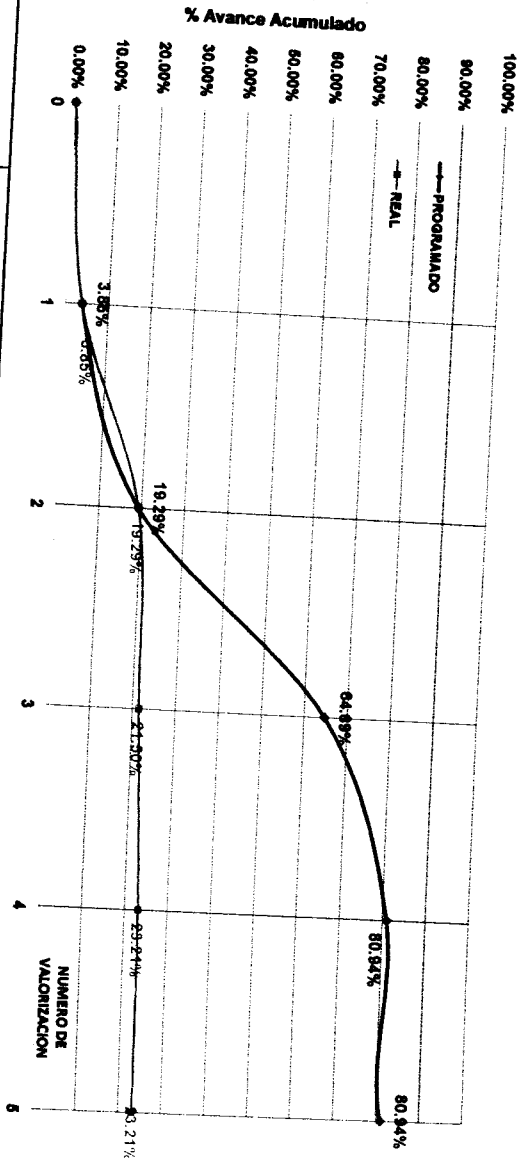

VALORIZACION	AVANCE PROGRAMADO (Nuevo Calendario)				AVANCE REAL				
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO		
	S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%	
1	15-Ene-18	52,400.55	3.85%	52,400.55	3.850%	52,400.55	3.85%	52,400.55	3.85%
2	31-Ene-18	210,295.91	15.44%	262,696.46	19.29%	210,295.91	15.44%	262,696.46	19.29%
3	15-Feb-18	618,321.89	45.40%	881,018.14	64.89%	30,104.30	2.21%	292,800.76	21.50%
4	28-Feb-18	221,358.61	16.25%	1,102,376.75	80.94%	23,246.00	1.71%	316,046.76	23.21%
5	15-Mar-18	0.00	0.00%	1,102,376.75	80.94%	0.00	0.00%	316,046.76	23.21%
6	19-Mar-18	259,550.70	19.09%	1,361,927.45	100.00%	373,210.82	27.40%	689,257.38	50.61%
7	15-Abr-18	0.00	0.00%	1,361,927.45	100.00%	0.00	0.00%	689,257.38	50.61%
TOTAL (Sin IGV.)		1,361,927.46	100.00%					689,257.38	50.61%

Situacion de la Obra : **ATRASADA -49.39%**

CONSORCIO SAN JOSE
 BETTY E. MENDEZ QUISPE
 REPRESENTANTE LEGAL

Lucy Vicente B
 LUCY VICTENTE BASSANO
 ING. CIVIL - Reg. 50539

RESUMEN DE METRADOS

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Ciente: FONDOPEP

Contratista: Consorcio San Jose

Supervision: Consorcio Mendoza & JSU

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios

Monio del Contrato, con IGV: S/. 1'807,074.41

Item	Descripción	TOTAL	
		Unid	Metrado
01	OPERAIONES FINALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.01	OPERAIONES PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES		
01.01.01.02	BAÑOS QUIMICOS PARA EL PERSONAL	mes	0.00
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES		
01.01.02.01	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	mes	0.00
01.01.02.02	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	mes	0.00
01.02	SEGURIDAD Y SALUD		
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	0.00
02	CONSTRUCCIONES		
02.02	OPERAIONES DE CONCRETO SIMPLE		
02.02.01	SOLADO		
02.02.01.01	SOLADO PARA ZAPATAS E=0.10m, fc=100kg/cm2	m2	0.00
02.02.02	CIMENTOS CORRIDOS		
02.02.02.01	CIMENTOS CORRIDOS CONCRETO 1:10 + 30% P.G.	m3	0.00
02.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTACION	m2	0.00
02.02.03	SOBRECIMENTOS		
02.02.03.01	SOBRECIMIENTO - CONCRETO 1:8 + 25% P.M.	m2	0.00
02.02.03.02	SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.00
02.03	OPERAIONES DE CONCRETO ARMADO		
02.03.01	ZAPATAS		
02.03.01.01	ZAPATAS - CONCRETO 280 kg/cm2	m3	0.00
02.03.01.02	ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.00
02.03.01.03	ZAPATAS - ACERO Fy=4200 kg/cm2	kg	0.00
02.03.03	COLUMNAS		
02.03.03.01	COLUMNAS - CONCRETO 280 kg/cm2	m3	0.00
02.03.03.02	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.00

CONSORCIO SAN JOSE

Betty E. Méndez Quispe
BETTY E. MÉNDEZ QUISPE
 REPRESENTANTE LEGAL

Luz Vicente B
LUCY VICENTE BASSILO
 INGENIERO CIVIL - REG. SUP. 8

078

SUSTENTO DE METRADOS

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente: FONDOPE

Contralista: Consorcio San Jose

Supervision: Consorcio Mendoza & JSU

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios

Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'607,074.41

Item	Descripción	Und	N° de elem.	Medidas			Sub Total	Total
				Largo	Ancho	Altura		
01	SEGURIDAD Y SALUD							
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES							
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES							
01.01.01.02	BAÑOS QUIMICOS PARA EL PERSONAL	mes	0.00				0.00	0.00
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES							
01.01.02.01	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	mes	0.00				0.00	0.00
01.01.02.02	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	mes	0.00				0.00	0.00
01.02	SEGURIDAD Y SALUD							
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	0.00				0.00	0.00
02	OBRAS DE CONCRETO							
02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
02.02.01	SOLADO							
02.02.01.01	SOLADO PARA ZAPATAS E=0.10m, fc=100kg/cm2	m2	0.00	0	0		0	0.00
02.02.02	CIMENTOS CORRIDOS							
02.02.02.01	CIMENTOS CORRIDOS CONCRETO 1:10 + 30% P.G.	m3	0.00	0	0	0	0	0.00
02.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTACION	m2	0.00	0	0	0	0	0.00
02.02.03	SOBRECIMENTOS							
02.02.03.01	SOBRECIMIENTO - CONCRETO 1:8 + 25% P.M. SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.00	4.82	0.2		0	0.00
02.02.03.02	SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.00	5.3	0.2		0	0.00
02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							
02.03.01	ZAPATAS							
02.03.01.01	ZAPATAS - CONCRETO 280 kg/cm2	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.03.01.02	ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0	0		0	0	0.00
02.03.01.03	ZAPATAS - ACERO Fy=4200 kg/cm2	kg	0.00	0.00			0.00	0.00
02.03.03	COLUMNAS							
02.03.03.01	COLUMNAS - CONCRETO 280 kg/cm2	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.03.03.02	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSORCIO SAN JOSE
[Firma]
BETTY E. MENDOZA GUILPE
 REPRESENTANTE LEGAL

079
[Firma]
LUCY NEIDA VICENTE BASSILO
 ING. CIVIL - Reg. 50573
