


**MEMORANDO N° 2627-2018-FONDEPES/DIGENIPAA**

**A** : Sr. Javier Chang Serrano  
Jefe de Oficina General de Administración

**Asunto** : Trámite VALORIZACION N° 12 DE OBRA MES DE JUNIO 2018 (2° Quincena)  
"Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".

**Referencia** : a) CARTA N° 072-2018/ FONDEPES-AS32  
b) CARTA N° 073-2018/ FONDEPES-AS32  
c) INFORME N° 100-2018-AGH

**Fecha** : 23 AGO 2018



Me dirijo a Usted cordialmente, para informarle que la VALORIZACION N° 12, correspondientes a la 2° quincena del mes de junio 2018, a favor del Contratista CONSORCIO SAN JOSE, responsable de la ejecución de la obra de "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes", el avance es 27.68% con un avance acumulado del 100.00% y la valorización es **S/. 359,773.08 (Trecientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Setenta y Siete con 08/100 Soles) inc. IGV.** Esta Dirección emite la conformidad de la siguiente manera:

Valorización N° 12	:	S/.	304,892.44
I.G.V (18%)	:	S/.	54,880.64
<b>TOTAL, A PAGAR</b>	:	<b>S/.</b>	<b>359,773.08</b>

(Trecientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Setenta y tres con 08/100 Soles) inc. IGV

Sin otro en particular, hago propicio la oportunidad para expresarle el sentimiento de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

**FONDEPES**  
ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO  
Director General de Inversión Pesquera Artesanal Acuicola

LBQ/agh



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

**CONFORMIDAD DE GASTO**

Conste por el presente documento, que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, al suscribir la presente; da su conformidad para realizar el pago al Contratista CONSORCIO SAN JOSE encargada de la ejecución "OPTIMIZACIÓN DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN TUMBES" cuyo monto asciende a por concepto de VALORIZACION N° 12 por la suma de **S/. 359,773.08 (Trecientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Setenta y tres con 08/100 Soles) inc. IGV.** Por concepto de Valorización N° 12 de acuerdo a lo establecido en el CONTRATO N° 056-2017-FONDEPES.



Valorización N° 12	:	S/.	304,892.44
I.G.V (18%)	:	S/.	54,880.64
<b>TOTAL, A PAGAR</b>	:	<b>S/.</b>	<b>359,773.08</b>

Lima, 23 AGO 2018


**FONDEPES**

ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO  
Director General de Inversión Pesquera  
Artesanal Acuicola



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

**INFORME N° 100 - 2018-AGH**

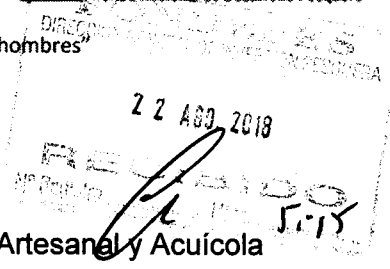

**A :** **ING. LUIS A. BARBIERI QUINO**  
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola

**ASUNTO :** **VALORIZACION N° 12 DE OBRA MES DE JUNIO 2018 (2° Quincena)**  
"Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".

**REFERENCIA :** a) CARTA N° 073-2018/. FONDEPES-AS32  
b) CARTA N° 072-2018/. FONDEPES-AS32

**FECHA :** Lima, 21 de agosto del 2018

Me dirijo a Usted, en relación a los documentos en referencia, remitida por el CONSORCIO MENDOZA & JSU encargada de la Supervisión de la obra "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes" presentó la valorización N° 12 de la obra que viene siendo ejecuta por el Consorcio San José, al respecto informo lo siguiente:

**1. DATOS GENERALES**

**Obra :** Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes.

**Licitación :** Adjudicación Simplificada N° 0029-2017-FONDEPES Primera Convocatoria.

**Área Geográfica :** 1

**Ubicación :** Localidad de Puerto Pizarro, distrito Tumbes, región Tumbes

**Monto Referencial :** S/. 1,627,021.54

**Monto Contratado :** S/. 1,607,074.41 con IGV  
S/. 1,361,927.47 sin IGV

**Adelanto Directo :** No solicitado

**Adelanto Materiales de obra :** S/. 321,414.88 - en trámite

**Plazo de Ejecución :** 60 días calendarios

**Contratista :** **CONSORCIO SAN JOSE** (BEICON CONTRATISTA GENERALES SAC, SHEYSA CONTRATISTA SAC).

**Representante Legal :** Betty Elizabeth Méndez Quispe

**Residente de Obra :** Ing. Carlos Cotrina Orrego

**Contrato de Obra :** CONTRATO N° 056-2017\*FONDEPES

**Supervisión de Obra :** **Consortio Mendoza & JSU**

**Representante Legal :** :

**Supervisor de Obra :** Ing. Flor Guevara Bellodas

**Contrato :** CONTRATO N° 057-2017\*FONDEPES

**Fecha de Contrato :** 22-nov-17

**Entrega de Adel. Directo :** S/. 61,405.49 con IGV 12-dic-17



*[Handwritten Signature]*  
ALEJANDRO VALVEZ HURTADO  
ARQUITECTO  
CAP. 1948



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

<b>Entrega de Terreno</b>	: 12-ene-17
<b>Inicio Contractual de obra</b>	: 13-ene-17
Ampliación de Plazo N.º 01	: Resolución de Secretaria General N° 040-2018-FONDEPES/SG Denegada.
Ampliación de Plazo N.º 02	: Resolución de Secretaria General N° 045-2018-FONDEPES/SG Denegada.
Ampliación de Plazo N.º 03	: Resolución de Secretaria General N° 049-2018-FONDEPES/SG Aprobada.
Ampliación de Plazo N.º 04	: Resolución de Secretaria General N° 058-2018-FONDEPES/SG Denegada.
Ampliación de Plazo N.º 05	: Resolución de Secretaria General N° 059-2018-FONDEPES/SG Denegada.
Ampliación de Plazo N.º 06	: Resolución de Secretaria General N° 060-2018-FONDEPES/SG Denegada.
Ampliación de Plazo N.º 07	: Resolución de Secretaria General N° 061-2018-FONDEPES/SG Denegada.
Ampliación de Plazo N.º 08	: Resolución de Secretaria General N° 074-2018-FONDEPES/SG Denegada.
Ampliación de Plazo N.º 09	: Resolución de Secretaria General N° 113-2018-FONDEPES/SG Aprobada (60 d.c)
Ampliación de Plazo N.º 10	: Resolución de Secretaria General N° 114-2018-FONDEPES/SG Aprobada (30 d.c)
Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01	: Resolución Jefatural N° 050-2018- FONDEPES/SG
Fin contractual de obra	: 17-jun-18



## 2. ANTECEDENTES

- 2.1. Con fecha 21/11/2017 se consintió la adjudicación de la buena Pro del proceso de convocatoria con Nomenclatura AS-SM-29-2017-FONDEPES-1 para la contratación de la obra "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".
- 2.2. Con fecha 13/12/2017 se firmó el CONTRATO N° 056-2017-FONDEPES de la obra "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".
- 2.3. Con fecha 15/12/2017 se firmó el CONTRATO N° 057-2017-FONDEPES para la contratación del servicio de Supervisión de Obra "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".
- 2.4. Con fecha 12/01/2018 se realizó la entrega del terreno para la ejecución de la obra "Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes".

  
ALEJANDRO GALVEZ HURTADO  
ARQUITECTO  
COP. 1848



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

- 2.5. Con fecha 13/01/2018 se da inicio al plazo contractual de la obra “Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes”.
- 2.6. Mediante CARTA N° 073-2018/. FONDEPES-AS32 con fecha 21-jun-18 la Supervisión de obra presentó a la Entidad el informe de valorización quincenal de obra N° 12 ante la Entidad fuera de los plazos UN (1) día de atraso según lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S N° 350-2015-EF modificado por D.S N° 056-2017-EF de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 1341.
- 2.7. Mediante CARTA N° 072-2018/. FONDEPES-AS32 con fecha 06-jul-18, la supervisión presenta su informe quincenal N° 12 de la obra “Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes”.

### 3. VALORIZACION N° 12

- 3.1. Mediante CARTA N° 073-2018/. FONDEPES-AS32 con fecha 06-jul-18 la Supervisión de obra presentó el informe de valorización N° 12 (proyectada solo por la supervisión) ante la Entidad fuera de los plazos UN (1) día de atraso según lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Aprobado mediante D.S. N° 350-2015-EF Modificado por D.S. N° 056-2017-EF de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 1341.
- 3.2. Mediante CARTA N° 072-2018/. FONDEPES-AS32 con fecha 06-jul-18, la supervisión presenta su informe quincenal N° 12 de la obra “Optimización de la sala de tareas previas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, región Tumbes”.

### 4. ASPECTOS LEGALES:

- 4.1. En la Cláusula Cuarta del Contrato se establece el procedimiento para dar trámite de pago a las valorizaciones en periodos quincenales, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases Integradas y en concordancia con lo establecido en el Art. 166° del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado Aprobado mediante D.S N° 350-2015-EF Modificado por D.S N° 056-2017-EF de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 1341.
- 4.2. En el Inciso 166.5 del art. 166° del RLCE, señala que los metrados de obra ejecutados se formulan y se valorizan conjuntamente con el contratista y el Inspector y/o Supervisor y estos deberán ser presentados dentro del plazo establecido en reglamento.
- 4.3. En caso de retraso en el pago de las valorizaciones por razones imputables a la Entidad, el Contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244,1245, 1246 del Código Civil.



  
ALEJANDRO GALVEZ MONTANO  
ARQUITECTO  
CAP. 9843



## 5. ANALISIS:

### 5.1. DE LOS ANTECEDENTES:

- ✓ Mediante CARTA N° 073-2018/. FONDEPES-AS32 con fecha 06-jul-18 la Supervisión de obra presenta el informe de valorización N° 12 ante la Entidad fuera de los plazos UN (1) día de atraso según lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 350-2015-EF Modificado por D.S N° 056-2017-EF de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 1341.
- ✓ De acuerdo al TDR del Supervisor de Obra en Obligación se indica lo siguiente:  
Elaborar y/o revisar las valorizaciones del Contratista por obra ejecutada, sus recibos de pago y reajustes por mayor costo, según fórmulas que para el efecto figuran en el Contrato, siendo responsabilidad de LA SUPERVISIÓN cualquier error, defecto o irregularidad que pudieran tener dichos documentos.
- ✓ Habiendo verificado la Valorización N° 12, se ha encontrado que la planilla de metrados elaborada y suscrita por el Supervisor sustenta lo valorizado, por lo que el Supervisor determinó que el monto a cancelar es de S/. 359,773.08 (Trecientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Setenta y tres con 08/100 Soles) inc. IGV.

### 5.2. CONTROL ECONOMICO DEL CONTRATO

- ✓ VALORIZACION DEL CONTRATO PRINCIPAL:  
La valorización corresponde al mes de junio del 2018 – segunda quincena, con un avance acumulado real de 100.00 %, frente a un avance acumulado programado de 100.00 % del nuevo calendario; sin embargo, en la valorización N° 12 la supervisión de obra manifiesta que existió un avance físico del 27.68 % durante la segunda quincena de junio llegando al 100% de los trabajos ejecutados.
- ✓ RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA  
Luego de revisar la documentación que sustenta la Valorización de Obra N° 12 correspondiente al periodo de 16 al 30 de junio del 2018 presentó un avance real de 27.68% y un avance real acumulado de 100.00% con un avance acumulado de 100%.
- ✓ ADELANTOS DE MATERIALES  
Luego de revisar la documentación que sustenta la Valorización de Obra N° 12 se verifica que la presente valorización se realizara la amortización de S/. 72,112.41 (Setenta y Dos Mil Ciento Doce con 41/100 soles), monto que cubre la totalidad del Adelanto de Materiales otorgado por la entidad.



A. E. M. D. R. C. GALVES MURTADO  
ARQUITECTO  
C.M.P. 9843

Se aprueba la siguiente estructura de pago:



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

**CURVA DE AVANCE DE OBRA**

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 12

DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente: FONDEPES

Contratista: Consorcio San Jose

Supervision: Consorcio Mendoza & JSU

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios

ZONA GEOGRAFICA: 1


Fecha de inicio de obra: 13/01/2018

Fecha termino de obra: 13/03/2018

Plazo de Ejecucion obra: 60 D.C.

Ampliacion de Plazo N°03: 6 D.C.

Nuevo fecha de termino: 19/03/2018

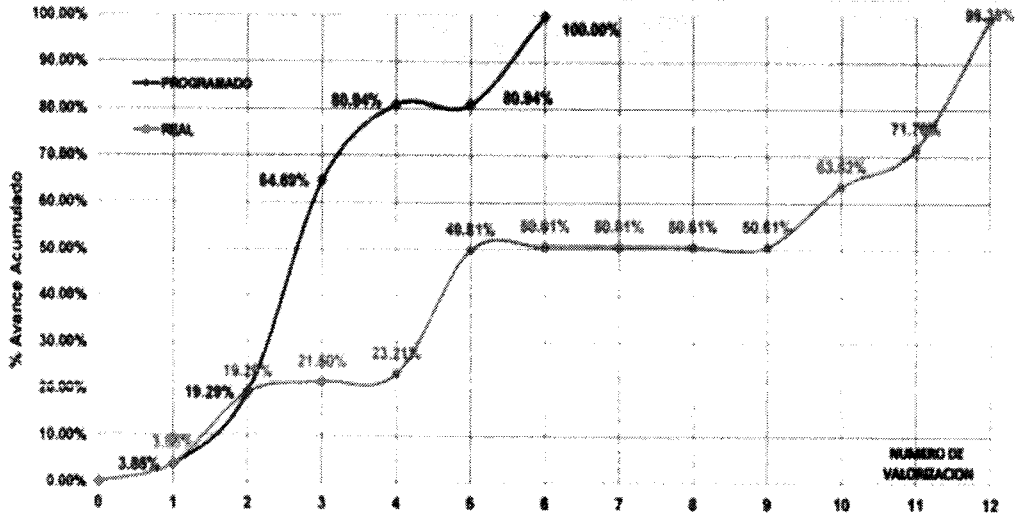

VALORIZACION	FECHA	AVANCE PROGRAMADO (Nuevo Calendario)				AVANCE REAL			
		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
		S/	%	S/	%	S/	%	S/	%
1	15-ene-18	52,400.55	3.85%	52,400.55	3.850%	52,400.55	3.85%	52,400.55	3.85%
2	31-ene-18	210,295.91	15.44%	262,696.46	19.29%	210,295.91	15.44%	262,696.46	19.29%
3	15-feb-18	618,321.69	45.40%	881,018.14	64.69%	30,104.30	2.21%	292,800.76	21.50%
4	28-feb-18	221,358.61	16.25%	1,102,376.75	80.94%	23,246.00	1.71%	316,046.76	23.21%
5	15-mar-18	0.00	0.00%	1,102,376.75	80.94%	362,263.93	26.60%	678,310.69	49.81%
6	19-mar-18	259,550.72	19.06%	1,361,927.47	100.00%	10,946.70	0.80%	689,257.39	50.61%
7	31-may-18					0.00	0.00%	689,257.39	50.61%
8	30-abr-18					0.00	0.00%	689,257.39	50.61%
9	15-may-18					0.00	0.00%	689,257.39	50.61%
10	31-may-18					175,804.38	12.91%	865,061.77	63.52%
11	15-jun-18					111,396.78	8.18%	976,458.55	71.70%
12	30-jun-18					377,004.85	27.68%	1,353,463.40	99.38%
TOTAL (Sin IGV.)		1,361,927.47	100.00%						

NOTA: El Deducitivo vinculante N°01 representa el 0.62%

Situacion de la Obra : CULMINADO

*[Signature]*  
ALEJANDRO GALVEZ HURTADO  
ARQUITECTO  
CAP. 9843



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 12**  
DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

**MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA**

OBRA: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES.  
 CLIENTE: FONDEPES  
 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE  
 SUPERVISION: CONSORCIO MENDOZA & JSU  
 SIST. CONTRATISTA: PRECIOS UNITARIOS  
 MONTO CONTRATO: S/. 1'807,074.41 con IGV.  
 FECHA : DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

<b>A. VALORIZACION CONTRACTUAL (V)</b>	
ESTRUCTURA	9,030.86
ARQUITECTURA	262,497.33
INST. SANITARIAS	49,045.35
INST. ELECTRICAS	58,431.31
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>S/. 377,904.85</b>
AVANCE REAL DE OBRA ACUMULADO	99.38%
AVANCE RE-PROGRAMADO ACUMULADO	100.00%
<b>B. REAJUSTE (a)</b>	
ESTRUCTURA	0.00
ARQUITECTURA	0.00
INST. SANITARIAS	0.00
INST. ELECTRICAS	0.00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>MONTO DE LA VALORIZACION BRUTA (VB)</b>	
	<b>S/. 377,904.85</b>
<b>C. DEDUCCIONES</b>	
De adelanto efectivo	0.00
De adelanto materiales	0.00
<b>Total (C)</b>	<b>0.00</b>
<b>D. AMORTIZACIONES</b>	
Amortización de Adelanto en Efectivo	0.00
Amortización de Adelanto de Materiales	72,112.41
<b>Total (D)</b>	<b>72,112.41</b>
<b>MONTO DE LA VALORIZACION NETA (V.N)</b>	
	<b>S/. 304,892.44</b>
<b>E. RETENCIONES</b>	
Multa por atraso de obra	0.00
<b>Total (E)</b>	<b>S/. 0.00</b>
<b>F. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA SIN I.G.V.</b>	
EN EFECTIVO (VN-E)	304,892.44
EN I.G.V. (18%)	54,880.64
<b>MONTO TOTAL DE LA VALORIZACION CON I.G.V.</b>	<b>359,773.08</b>
<b>MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>	<b>359,773.08</b>



*[Handwritten Signature]*  
ALEJANDRO GALVEZ MURTAO  
ARQUITECTO  
CNP. 9843

\* Los Reajustes se detallaron en la Liquidación

**NOTA:**

CONFORME A LA CLÁUSULA SETIMA DEL CONTRATO N°98-2017-FONDEPES

LA ENTIDAD debe efectuar la Retención de Fiel Cumplimiento.

Retención Fiel Cumplimiento 10% Monto Contratista:

180,707.44

inc. IGV.

Retención Fiel Cumplimiento 10% Adicional de obra NPD1:

21,706.01

inc. IGV.

**TOTAL A RETENER POR LA ENTIDAD**

**192,413.45**

**inc. IGV.**





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Cuadro de Control económico de todas las valorizaciones de la obra según el Coordinador de Obra:

VALORIZACIONES			REAJUSTE AUTORIZADO	EDUCCIONES POR ADELANTO		VALORIZACION BRUTA	AMORTIZACION DE ADELANTOS		VALORIZACION NETA			
Nº	FECHA	MONTO V	R	DIRECTO	MATERIALES D	VB=V+R-D	DIRECTO	MATERIALES A	EFECTIVO VN=VB-A	I.G.V.	MONTO RETENIDO 10%	TOTAL A PAGAR
1	15-Ene-18	52,400.55	104.80	0.00	0.00	52,505.35	0.00	0.00	52,505.35	9,450.96	59,478.05	61,956.31
2	31-Ene-18	210,295.91	702.04	0.00	0.00	210,997.95	0.00	0.00	210,997.95	37,979.63		248,977.58
3	15-Feb-18	30,104.30	61.37	0.00	0.00	30,165.67	0.00	0.00	30,165.67	5,429.82		35,595.49
4	28-Feb-18	23,246.00	-733.01	0.00	0.00	22,512.99	0.00	0.00	22,512.99	4,052.34		26,565.33
5	15-Mar-18	362,263.93	1,039.05	0.00	0.00	363,302.98	0.00	0.00	363,302.98	65,394.54	101,229.39	428,697.52
6	31-Mar-18	10,946.70	76.63	0.00	0.00	11,023.33	0.00	2,189.34	8,833.99	1,590.12		10,424.11
7	15-Abr-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8	30-Abr-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
9	15-May-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
10	31-May-18	175,804.38	0.00	0.00	0.00	175,804.38	0.00	175,804.38	0.00	0.00		0.00
11	15-Jun-18	111,396.78	0.00	0.00	0.00	111,396.78	22,279.36	89,117.42	89,117.42	16,041.14		105,158.56
12	30-Jun-18	377,004.85	0.00	0.00	0.00	377,004.85	72,112.41	304,892.44	304,892.44	54,880.64		359,773.08
	<b>TOTAL</b>	<b>1,353,463.40</b>	<b>1,250.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,354,714.28</b>	<b>0.00</b>	<b>272,385.49</b>	<b>1,082,328.79</b>	<b>194,819.19</b>	<b>160,707.44</b>	<b>1,277,147.98</b>



*[Signature]*  
ALEJANDRO GALVEZ HURTADO  
ARQUITECTO  
CAP. N.º 1



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

**6. CONCLUSIONES:**

De la revisión y evaluación efectuada, el suscrito encuentra conforme la Valorización N° 12, por el monto de S/. 359,773.08 (Trecientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Setenta y tres con 08/100 Soles) inc. IGV. El Supervisor concluye que el avance de 27.68% y un avance real acumulado de 100.00%.

Cabe precisar, que la supervisión presento su informe y su valorización N° 12 (proyectada solo por la supervisión) ante la Entidad fuera de los plazos UN (1) día de atraso según lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Aprobado mediante D.S. N° 350-2015-EF Modificado por D.S. N° 056-2017-EF de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 1341.


**7. RECOMENDACIONES:**

En concordancia con el Art. 166° del RLCE y la cláusula Cuarta del CONTRATO N° 056-2017-FONDEPES, se recomienda realizar el pago de la Valorización N° 12 por el monto de monto de S/. 359,773.08 (Trecientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Setenta y tres con 08/100 Soles) inc. IGV a favor del CONSORCIO SAN JOSE.

Las Deducciones, penalidades y reajustes se calcularán en la Liquidación de Obra, para mayor orden y tener los Índices Unificados reales publicados en el Diario El Peruano.

Es todo cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

  
ALEJANDRO GALVEZ HURTADO  
ARQUITECTO  
CAP. 9843

Visto el Informe, el Coordinador del Área de Obras Equipamiento y Mantenimiento de la DIGENIPAA que suscribe, lo hace suyo.

**FONDEPES**  
  
Ing. Paul A. Mora Guillen  
COORDINADOR DE OBRAS EQUIPAMIENTO  
Y MANTENIMIENTO

6819-66,086.81  
1746 5/293,686.24



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04762872

Usuario: pruz  
Fecha: 21/08/2018  
Hora: 16:09



**CARGO 02181-2018-FONDEPES/AOEM**

A: MORGAN LEON MAGALI

---

Asunto: CARTA N. 073-2018- FONDEPES- AS 32  
ASUNTO. VALORIZACIÓN QUINCENAL DE OBRA N 12 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO

---

Referencia: INFORME 00100-2018-FONDEPES/AGH

---

Fecha: 21/08/2018

---

Observación: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A OGA

---



**AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04763636

Usuario: usuario\_digenipaa3

Fecha: 22/08/2018

Hora: 16:17



### CARGO 00131-2018-FONDEPES/MML

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA  
Asunto: CARTA N. 073-2018- FONDEPES- AS 32  
ASUNTO. VALORIZACIÓN QUINCENAL DE OBRA N 12 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO


Referencia:

Fecha: 22/08/2018

Observación: SE DERIVA PARA TRAMITE DE PAGO VALORIZACI'N 12 DPA PUERTO PIZARRO S/ 359,773.08, CON CERTIFICACION 681 S/ 66,086.81 Y CERTIFICACION 1746 S/ 293,686.27. FUENTE 13

Atentamente,

MORGAN LEÓN MAGALI





**MEMORÁNDUM INTERNO N° 2529 -201 -FONDEPES / DIGENIPAA / AOEM**

Asunto : Memo Interno 3069-2018 / Digonipaa

Referencia : \_\_\_\_\_ Registro: \_\_\_\_\_

Destino	Indicación	Destino	Indicación

Observaciones: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Atentamente:

*AJ*



**Indicaciones:**

- 0.1. Autorizado/Aprobado
- 0.2. Calificar/Evaluar
- 0.3. Informe
- 0.4. Proyectar resolución
- 0.5. Atención/Tramitación
- 0.6. Conocimiento y fines
- 0.7. Notificar al interesado
- 0.8. Reformular
- 0.9. Ayuda memoria
- 10. Coordinar
- 11. Opinión/Recomendación
- 12. Consolidar
- 13. Aclarar redacción
- 14. Implementar/Ejecutar
- 15. Preparar respuesta
- 16. Visación
- 17. Agregar a sus antecedentes
- 18. Archivo
- 19. Ampliar
- 20. Seguimiento

**013**

Fecha: 06/07/18

MEMORÁNDUM INTERNO N° 3069 - 201 - FONDEPES/ DIGENIPAA

Asunto

Carta N° 072/

Referencia :

Registro :

Destino	Indicación	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	
OCI		OGAJ	
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	<u>AOEN</u>
Observaciones:			

**FONDEPES**  
ÁREA DE SISTEMAS DE COMANDAMIENTO Y MANEJO  
06 JUL. 2018  
5:26

Atentamente

**Indicaciones:**

- |                                |                          |                             |                          |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 01. Autorizado/Aprobado        | 02. Calificar/Evaluar    | 03. Informe                 | 04. Proyectar resolución |
| 05. Atención/Tramitación       | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular           |
| 09. Ayuda memoria              | 10. Coordinar            | 11. Opinión/Recomendación   | 12. Consolidar           |
| 13. Aclarar redacción          | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta      | 16. Visación             |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo              | 19. Ampliar                 | 20. Seguimiento          |

**014**

Lima, 06 de julio del 2018

**CARTA N° 072-2018/FONDEPES-AS32**

Señores:

**Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES**

Av. Petit Thouars N°115 - Cercado de Lima

Lima.-

Atención : Arq. Alejandro Gálvez Hurtado.  
Administrador de Contrato

Asunto : Informe Quincenal de Obra N° 12 correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio.

Ref. : Contrato N° 056-2017-FONDEPES "Ejecución de la Obra "Optimización de la sala de tareas previas del desembarcadero Pesquero artesanal de Puerto Pizarro, distrito de tumbes, provincia de Tumbes, Región Tumbes"

De nuestra consideración:


Mediante la presente tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con la finalidad de hacer entrega en un (1) original y dos (2) copias y un CD, el Informe Quincenal de Obra N° 12 correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de la obra en referencia.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para expresarles los sentimientos de nuestra especial consideración.


Atentamente,

CONSORCIO MENDOZA & JSU

*Katherine D. Jankara Olivar Reyes*  
KATHERINE D. JANKARA OLIVAR REYES  
REPRESENTANTE LEGAL



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO  
PESQUERO

	
2738119	
N° DOC:	00005238-2018
CLAVE:	9080
USUARIO:	usuario_alog@
FECHA Y HORA:	06/07/2018 15:59:39
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	

**CONSORCIO  
MENDOZA & JSU**

**INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N°12  
(16 AL 30 DE JUNIO DE 2018)**

**Contrato Supervisión N°057-2017-  
FONDEPES**

**Rev.:0**

**A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA  
CONVOCATORIA**

242

**OBRA: "OPTIMIZACION DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL  
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO,  
DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES"**

**INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION**

**(16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018)**

**LUCY N. VICENTE BASSILIO**

*Juan Vicente B*  
**SUPERVISOR DE OBRA**



**I. DATOS GENERALES DE LA OBRA**

Obra : "OPTIMIZACION DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES"

Entidad : FONDEPES

Coordinador de Obra : Arq. Alejandro Gálvez Hurtado

Proceso de selección del Contratista : A.S. N°0029-2017-FONDEPES; PRIMERA

Contratista : CONSORCIO SAN JOSE

Sistema de Contratación : PRECIOS UNITARIOS

Contrato de Ejecución de la obra : N°057-2017-FONDEPES

Monto del Referencial, con IGV : S/. 1'627,021.54

Monto del Contrato, con IGV : S/. 1'607,074.41

Factor Referencial : 0.98774009

Plazo de Ejecución de la obra según contrato : 60 días calendarios

Entrega de terreno : 12 de enero del 2018

Inicio Contractual del Plazo de obra : 13 de enero del 2018

Termino Contractual del Plazo de obra : 13 de marzo del 2018

Adelanto Directo N°01 : No solicitado

Adelanto Materiales N°01 : S/. 321,414.88

Ampliación de plazo N°01 : DENEGADA

Ampliación de plazo N°02 : DENEGADA

Ampliación de plazo N°03 : 6DC(RSGN°049-2018-FONDEPES/SG)

Ampliación de plazo N°04 : DENEGADA

Ampliación de plazo N°05 : DENEGADA

Ampliación de plazo N°06 : DENEGADA

Ampliación de plazo N°07 : DENEGADA

Ampliación de plazo N°08 : DENEGADA

Nueva Fecha Termino del Plazo de obra : 19 de marzo del 2018

% Avance Ejecutado quinc : 27.68 %

% Avance Ejecutado Acumulad quinc : 99.38 %

Saldo Corresponde al Deductivo N°01 : 0.62 %

Situación de la obra : CULMINADO

Adicional de Obra N°01, con IGV : S/.217,060.05 (R.J.N°050-2018-FONDEPES/J) - 16/05/2018

Situación del Adicional N°01 : CULMINADO

Deductivo Vinculante N°01, con IGV : S/.9,987.61 (R.J.N°050-2018-FONDEPES/J) -16/05/2018

Supervisión de Obra : CONSORCIO MENDOZA & JSU

Jefe de Supervisión : Lucy Nélide Vicente Bassilio

Proceso selección de Supervisión : A.S.N°0032-2017-FONDEPES;PRIMERA CONVOCATORIA

Contrato de Supervisión : N°057-2017-FONDEPES

Sistema de Contratación Supervisión : SUMA ALZADA

Monto del contrato de Supervisión con IGV : S/. 89,751.75

Plazo de Ejecución de la Prestación : 60 Días Calendarios

LUCY N. VICENTE BASSILIO  
*Lucy Vicente B*  
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MENDOZA & JSU	INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N°12 (16 AL 30 DE JUNIO DE 2018)	Contrato Supervisión N°057-2017- FONDEPES Rev.:0
		A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA CONVOCATORIA

## II. FICHA TECNICA DE LA OBRA

Nombre de la obra : "OPTIMIZACION DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES"

Entidad Contratante : FONDEPES

Modalidad de ejecución : contrata a precios unitarios

Monto del Contrato de Obra : S/.1'607,074.41

Ubicación

Región : Tumbes

Provincia : Tumbes

Distrito : Tumbes

Lugar : Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro

## RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE OBRA

ESTRUCTURAS	S/. 437,877.26
ARQUITECTURA	S/. 377,594.64
INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 253,583.05
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/. 57,901.99
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/.1'126,956.94</b>
GASTOS GENERALES (15.50%)	S/. 174,678.33
UTILIDADES (5.35%)	S/. 60,292.20
<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/.1'361,927.47</b>
I.G.V. (18%)	S/. 245,146.94
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>S/.1'607,074.41</b>

LUCY N. VICENTE BASSILIO  
*Lucy Vicente B*  
 SUPERVISOR DE OBRA

018

3

CONSORCIO MENDOZA & JSU	INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N°12 (16 AL 30 DE JUNIO DE 2018)	Contrato Supervisión N°057-2017- FONDEPES Rev.:0
		A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA CONVOCATORIA

### III. ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA

En el presente periodo la situación de la obra Contractual es CULMINADO el contratista logro avance real acumulado de 99.38%. Así mismo el 0.62% representa el deductivo vinculante N°01

Debemos indicar el nuevo termino de obra fue 19 de marzo del 2018, debido a la aprobación de la ampliación de plazo N°03 por 6 DC.

### OCURRENCIAS E INCIDENTES

- La Entidad mediante Resolución Jefatural N°050-2018-FONDEPES/J de fecha 16/05/2018 aprueba el Adicional de Obra N°01 por el monto de S/. 217,060.05 inc. IGV, y Deductivo Vinculante N°01 por el monto de S/. 9,987.61 inc IGV.
- La Entidad mediante Resolución de Secretaría General N°049-2018-FONDEPES/SG de fecha 22/03/2018 aprueba la ampliación de plazo N°03 por 6 días calendarios, por lo que la nueva fecha de término es el 19 de marzo del 2018.
- Las consultas realizadas por el Contratista fueron elevadas oportunamente al Proyectista para su respectivo pronunciamiento.
- Durante el desarrollo de la obra se revisó y evaluó permanentemente el almacenamiento adecuado de todos los materiales, equipos y herramientas a ser utilizados en la obra.
- Se solicitó al contratista la entrega oportuna de las pruebas de: la granulometría de los agregados, del diseño de mezcla del concreto a emplearse en obra, etc.
- Se controló que el Contratista cumpla con las normas de seguridad en obra.
- Se controló que se realicen las medidas de conservación ambiental exigidas en el Proyecto, la eliminación de los materiales excedentes se realicen según especificaciones técnicas y lugares debidamente autorizados.
- La supervisión realizo el control del avance físico de la obra con la Programación de obra del calendario acelerado
- Se recomendó al contratista tener especial cuidado en los procedimientos constructivos, teniendo siempre en cuenta de que se realicen dentro de lo establecido en el expediente así como en las normas que los puedan regir.

LUCYN. VICENTE BASSILIO  
*Lucy Vicente B*  
SUPERVISOR DE OBRA

**IV. METRADOS EJECUTADOS EN LA PRESENTE QUINCENA**

02.03.05.01	LOSAS ALIGERADAS CONVENCIONALES				-		
02.03.05.01.01	LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2	m3	5.44	0.80	4.64	5.44	
02.03.05.01.02	LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	63.64	9.36	54.28	63.64	
02.03.05.01.03	LOSA ALIGERADA - ACERO Fy=4200 kg/cm2	kg	288.60	42.44	246.16	288.60	
02.03.05.01.04	LOSA ALIGERADA, LADRILLO HUECO 15X30X30	und	530.00	77.94	452.06	530.00	
02.03.06	CANALETAS				-		
02.03.06.01	CANALETAS - CONCRETO 280 kg/cm2	m3	15.24	15.24	-	15.24	
02.03.06.02	CANALETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	132.05	132.05	-	132.05	
02.03.06.03	CANALETAS - ACERO Fy=4200 kg/cm2	kg	458.15	458.15	-	458.15	

03	ARQUITECTURA						
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA						
03.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				-		
03.02.01	TARRAJEO RAYADO PRIMARIO, MORTERO C:A 1:5	m2	125.04	23.56	101.48	125.04	
03.02.02	TARRAJEO EN MUROS DE ALBAÑILERIA INTERIORES Y EXTERIORES E=1.5CM MEZCLA 1:5	m2	598.63	538.78	59.85	598.63	
03.02.03	TARRAJEO EN MUROS DE CONCRETO	m2	107.47	13.11	94.36	107.47	
03.02.04	TARRAJEO DE COLUMNAS	m2	238.35	138.24	100.11	238.35	
03.02.05	TARRAJEO DE VIGAS	m2	147.40	51.06	96.34	147.40	
03.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES 1:5	m	138.12	15.00	123.12	138.12	
03.02.09	ACABADO DE CEMENTO PULIDO EN PISOS	m2	586.84	51.55	535.29	586.84	
03.03	CIELO RASOS				-		
03.03.01	CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5	m2	63.64	9.51	54.13	63.64	
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS				-		
03.04.01	CONTRAPISOS				-		
03.04.01.01	CONTRAPISO DE 40 mm	m2	45.76	9.51	36.25	45.76	
03.04.02	PISOS				-		
03.04.02.01	PISO CERAMICO 20 x 40 ANTIDESLIZANTE - ALTO TRAFICO -COLOR	m2	16.02	-	16.02	16.02	
03.06	COBERTURAS EN TECHOS				-		
03.06.01	COBERTURAS				-		
03.06.01.01	COBERTURA DE FIBRA VEGETAL 3mm (INC. CORREAS Y ACCESORIOS)	m2	393.37	-	393.37	393.37	
03.06.01.02	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO .24x.24x.03m,MEZCLA C:A 1:5	m2	83.09	-	83.09	83.09	
03.06.02	FALSO TECHO						

LUCY VICENTE BASSILO  
Supervisora de Obra

020

5

**CONSORCIO  
MENDOZA & JSU**

**INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N°12  
(16 AL 30 DE JUNIO DE 2018)**

**Contrato Supervisión N°057-2017-  
FONDEPES  
Rev.:0  
A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA  
CONVOCATORIA**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Acumulado	Valor Restante
03.08.02.01	FALSO CIELO RASO DE PVC	m2	404.08	-	404.08	404.08	-
03.07	CARPINTERIA DE MADERA				-		
03.08.03	DIVISIONES DE ALUMINIO				-		
03.08.03.01	TABQUERIA DE MELAMINE 18mm EN SS.HH.	m2	14.08	-	14.08	14.08	-
03.08.04	ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES				-		
03.08.04.01	REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN CANALETAS A=0.30	m	83.98	15.62	48.36	63.98	-
03.08.04.02	REJILLA DE ACERO GALVANIZADO EN CANALETAS A=0.30	m	7.52	1.84	5.68	7.52	-
03.08.04.03	PERFIL T DE ALUMINIO PARA CAMBIO DE PISO	m	4.20	-	4.20	4.20	-
03.10	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				-		
03.10.01	ESPEJOS				-		
03.10.01.01	ESPEJO EMPOTRADO COLOR PLATA 4mm	m2	7.05	-	7.05	7.05	-
03.11	PINTURA				-		
03.11.01	PINTURA DE CIELOS RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES				-		
03.11.01.01	PINTURA EPOXICA EN CIELO RASO	m2	63.64	-	63.64	63.64	-
03.11.01.02	PINTURA EPOXICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	284.37	-	284.37	284.37	-
03.11.01.03	PINTURA EPOXICA EN VIGAS	m2	108.36	24.00	84.36	108.36	-
03.11.01.04	PINTURA EPOXICA EN COLUMNAS	m2	187.48	83.42	104.06	187.48	-
03.11.01.05	PINTURA EPOXICA EN MUROS DE CONCRETO	m2	81.10	-	81.10	81.10	-
03.11.01.06	PINTURA EPOXICA EN PISOS	m2	328.02	-	328.02	328.02	-
03.11.01.07	PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA EN ALTURA	m2	103.46	-	103.46	103.46	-
03.11.02	PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS				-		
03.12	OTROS				-		
03.12.01	MUEBLE C.A. e=10 cm ACABADO PULIDO	m2	7.41	-	7.41	7.41	-
03.12.02	JUNTA DE DILATACION E=3cm CON SELLO ELASTOMERICO EN PISOS	m	175.20	-	175.20	175.20	-
03.12.03	JUNTA DE DILATACION E=3cm CON POLIESTIRENO EXPANDIDO EN MUROS	m	80.00	-	80.00	80.00	-
03.12.04	CORTINAS PVC DE BAÑO INC. BARRA ALUMINIO	pza	8.00	-	8.00	8.00	-
03.12.05	TINA DE LAVADO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.9 M3 (INC. SUM Y COL.)	und	7.00	-	7.00	7.00	-
03.12.06	MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 06 PERSONAS (INC. SUM Y COL.)	und	7.00	-	7.00	7.00	-

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Acumulado	Valor Restante
04	INSTALACIONES SANITARIAS						
04.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS						
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS						
04.01.01.01	INODORO TANQUE BAJO	pza	6.00	-	6.00	6.00	-

**LUIS N. VICENTE BASSILIO**  
*Luís Vicente Bassilio*  
**SUPERVISOR DE OBRA**

04.01.01.02	URINARIO	pza	3.00	-	3.00	3.00	-
04.01.01.03	LAVATORIO	pza	12.00	-	12.00	12.00	-
04.01.01.04	DUCHA	pza	8.00	-	8.00	8.00	-
04.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				-		
04.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA				-		
04.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 1/2" PVC SP	pto	29.00	-	29.00	29.00	-
04.02.01.02	SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 3/4" PVC SP	pto	1.00	-	1.00	1.00	-
04.02.05	VALVULAS				-		
04.02.05.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 3/4"	und	1.00	-	1.00	1.00	-
04.02.05.02	VALVULA ESFERICA DE Ø 1"	und	2.00	-	2.00	2.00	-
04.02.05.03	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 1 1/2"	und	3.00	-	3.00	3.00	-
04.02.05.04	LLAVE D/RIEGO C/GRIFO DE Ø 3/4" EN CAJUELA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2	und	1.00	-	1.00	1.00	-
04.02.06	PIEZAS VARIAS				-		
04.02.06.01	CAJA PARA VALVULA (NICHOS DE MAYOLICA)	und	5.00	-	5.00	5.00	-
04.03	SISTEMA DE AGUA SALADA				-		
04.03.01	SALIDAS DE AGUA SALADA				-		
04.03.01.01	SALIDA DE AGUA SALADA CON TUBERIA PVC - Ø 3/4"	pto	6.00	-	6.00	6.00	-
04.03.01.02	SALIDA DE AGUA SALADA CON TUBERIA PVC - Ø 1 1/2"	pto	8.00	-	8.00	8.00	-
04.03.03	REDES DE ALIMENTACION DE AGUA SALADA				-		
04.03.05	VALVULAS				-		
04.03.05.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 3/4"	und	6.00	-	6.00	6.00	-
04.03.05.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 1 1/2"	und	9.00	-	9.00	9.00	-
04.03.06	PIEZAS VARIAS				-		
04.03.06.01	NICHOS DE PROTECCION PARA VALVULA (AREA DE EVISCERADO)	und	6.00	-	6.00	6.00	-
04.03.06.02	NICHOS DE PROTECCION PARA VALVULA (AREA DE LAVADO)	und	16.00	-	16.00	16.00	-
04.03.08	SISTEMA DE CLORACION (AGUA SALADA)				-		
04.03.08.01	EQUIPO Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLORACION	glb	1.00	-	1.00	1.00	-
04.04	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				-		
04.04.01	REDES COLECTORAS				-		
04.04.02	CANAleta METALICA P/DRENAJE PLUVIAL EN TECHO				-		
04.04.02.01	SUM. E INST. DE CANAleta P/DRENAJE PLUVIAL EN TECHO ANCHO = 0.20M INCLUIDO ACCESORIOS	m	11.50	-	11.50	11.50	-
04.04.03	CAMARA DE INSPECCION				-		
04.04.04	ESTRUCTURA DISIPADORA DE ENERGIA				-		
04.04.04.01	ESTRUCTURA DISIPADORA DE ENERGIA	und	1.00	-	1.00	1.00	-
04.04.06	ACCESORIOS				-		
04.04.06.01	VALVULA CHECK BB, CIERRE RAPIDO AMORTIGUADO CON CLAPETA DN 8" P/EST. DISP.ENERGIA	und	1.00	-	1.00	1.00	022
04.05	DESAGUE DOMESTICO Y VENTILACION				-		
04.05.01	SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION				-		

- **LUJO N. VICENTE BASSILIO**  
- *Lujo Vicente Bassilio*  
SUPERVISOR DE OBRA

04.05.01.01	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC SAL Ø DE 2"	pto	23.00	-	23.00	23.00	-
04.05.01.02	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC SAL Ø DE 4"	pto	6.00	-	6.00	6.00	-
04.05.01.03	SALIDA DE VENTILACION EN PVC SAL Ø DE 2"	pto	9.00	-	9.00	9.00	-
04.05.05	ADITAMENTOS VARIOS				-		
04.05.05.01	SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION	und	10.00	-	10.00	10.00	-
04.05.05.02	REGISTRO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION	und	3.00	-	3.00	3.00	-
04.05.05.03	REGISTRO DE BRONCE 4" PROVISION Y COLOCACION	und	5.00	-	5.00	5.00	-
04.05.05.04	SOMBRERO DE VENTILACION 2" PVC SAP	und	9.00	-	9.00	9.00	-
04.05.07	EMPALMES Y PRUEBAS HIDRAULICAS				-		
04.05.07.01	PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA DE TUB. DESAGÜE	m	107.38	-	107.38	107.38	-
04.06	DESAGUE INDUSTRIAL Y VENTILACION				-		
04.06.01	SALIDA DE DESAGUE INDUSTRIAL Y VENTILACION				-		
04.06.01.01	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC SAL Ø DE 2"	pto	14.00	-	14.00	14.00	-
04.06.02	REDES DE DESAGUE				-		
04.06.02.01	RED DE DESAGÜE DE TUBERIA DE PVC - SAL Ø DE 2"	m	44.30	-	44.30	44.30	-

05	INSTALACIONES ELECTRICAS						
05.02	CANALIZACIONES ELECTRICAS				-		
05.02.01	TUBERIA DE PVC-P Ø 20mm	m	293.58	50.00	243.58	293.58	-
05.02.02	TUBERIA DE PVC-P Ø 25mm	m	4.99	-	4.99	4.99	-
05.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC 3/4" (20mm) INC./ FIJACION CON CANAL UNISTRUT Y CURVAS	m	172.52	-	172.52	172.52	-
05.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC 1 1/2" (35mm) INC./ FIJACION CON CANAL UNISTRUT Y CURVAS	m	28.98	-	28.98	28.98	-
05.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC 1" (25mm) INC./ FIJACION CON CANAL UNISTRUT Y CURVAS	m	25.31	-	25.31	25.31	-
05.03	CABLES ELECTRICOS ALIMENTADORES				-		
05.03.01	CABLE ELECTRICOS N2XH 3- 1x10mm2	m	26.25	-	26.25	26.25	-
05.03.02	CABLE ELECTRICO NHX-90 10mm2	m	54.81	-	54.81	54.81	-
05.03.03	CABLE ELECTRICO NH-80 10mm2	m	20.90	-	20.90	20.90	-
05.03.04	CABLE ELECTRICO NH-80 6mm2	m	45.26	-	45.26	45.26	-
05.03.05	CABLE ELECTRICO NH-80 4mm2	m	1,465.88	-	1,465.88	1,465.88	-
05.03.06	CABLE SUMERGIBLE 4x4 mm2	m	11.55	-	11.55	11.55	-
05.04	SALIDAS ELECTRICAS				-		
05.04.01	SALIDA CENTRO DE LUZ EN TECHO EMPOTRADA	und	14.00	-	14.00	14.00	-
05.04.02	SALIDA CENTRO DE LUZ EN TECHO ADOSADO	und	36.00	-	36.00	36.00	-

023  
LUCIANO VICENTE BASSILIO  
Vicente B  
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO  
MENDOZA & JSU

INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N°12  
(16 AL 30 DE JUNIO DE 2018)

Contrato Supervisión N°057-2017-  
FONDEPES  
Rev.:0

A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA  
CONVOCATORIA

05.04.03	SALIDA CENTRO DE LUZ EN PARED	und	6.00	-	6.00	6.00	-
05.04.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE EMPOTRADO	und	8.00	-	8.00	8.00	-
05.04.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE ADOSADO	und	3.00	-	3.00	3.00	-
05.04.06	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE CON PUESTA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA	und	11.00	-	11.00	11.00	-
05.05	LUMINARIAS				-		
05.05.01	LUMINARIA HERMETICA P/ADOSAR 2x36 WATTS, IP 65, SIMILAR AL MODELO ARH	und	27.00	-	27.00	27.00	-
05.05.02	LUMINARIA HERMETICA P/ADOSAR 2x36 WATTS, IP 65, SIMILAR AL MODELO ARH + Kit de Emergencia	und	10.00	-	10.00	10.00	-
05.05.03	LUMINARIA HERMETICA P/ADOSAR 2x18 WATTS, IP 65, SIMILAR AL MODELO ARH	und	7.00	-	7.00	7.00	-
05.05.04	LUMINARIA HERMETICA P/ADOSAR 2x18 WATTS, IP 65, SIMILAR AL MODELO ARH + Kit de Emergencia	und	6.00	-	6.00	6.00	-
05.05.05	LUMINARIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR DE 70 WATTS C/ PASTORAL PS 1.00/190/1.5"Ø	und	2.00	-	2.00	2.00	-
05.05.06	LUMINARIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR DE 150 WATTS C/ PASTORAL PS 1.00/190/1.5"Ø	und	4.00	-	4.00	4.00	-
05.06	TABLEROS ELECTRICOS				-		
05.06.01	TABLERO GENERAL DE PROTECCION TGP	und	1.00	-	1.00	1.00	-
05.06.02	TABLERO DE DISTRIBUCION TAREAS PREVIAS /ID-TP	und	1.00	-	1.00	1.00	-
05.06.03	TABLERO BOMBAS SUMIDERO TBS-01	und	1.00	-	1.00	1.00	-
05.08	CAJAS DE PASE				-		
05.08.01	CAJA DE PASE DE FoGo CON TAPA CIEGA, TIPO PESADO 100 x 100 x 50 mm	und	12.00	-	12.00	12.00	-
05.08.02	CAJA DE PASE DE FoGo CON TAPA CIEGA, TIPO PESADO 200 x 200 x 100 mm	und	2.00	-	2.00	2.00	-
05.08.03	CAJA DE PASE DE POLYESTER, REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 135 x 135 x 129 mm	und	11.00	-	11.00	11.00	-
05.08.04	CAJA DE PASE DE POLYESTER, REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 180 x 135 x 141 mm	und	4.00	-	4.00	4.00	-
05.08.05	CAJA DE PASE DE POLYESTER, REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 270 x 180 x 171 mm	und	1.00	-	1.00	1.00	-
05.09	SISTEMA DE CONTROL				-		
05.09.01	BOYAS DE CONTROL DE NIVEL, incl. 10 mts cable sumergible	und	4.00	-	4.00	4.00	-
05.09.02	BANDEJA PORTABLE PARA BOYAS, SEGÚN PLANO	und	1.00	-	1.00	1.00	-
05.10	PUESTA EN MARCHA				-		
05.10.01	PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA Y PUESTA EN SERVICIO	gib	1.00	-	1.00	1.00	-

LUCY N. VICENTE BASSILIO  
*Lucy Vicente B*  
SUPERVISOR DE OBRA



CONSORCIO MENDOZA & JSU	INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N°12 (16 AL 30 DE JUNIO DE 2018)	Contrato Supervisión N°057-2017- FONDEPES Rev.:0
		A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA CONVOCATORIA

## V. CUADRO DE AVANCE EJECUTADO –SUB PRESUPUESTOS CONTRACTUALES

La obra a la fecha tiene un avance real acumulado de 98.38%; por el cual el Contratista a Culminado la obra, con un saldo de 0.62% el cual corresponde al Deductivo vinculante N°01.

[REDACTED]								
A:	VALORIZACION CONTRACTUAL							
	ESTRUCTURA	529,174.87	511,679.73	9,030.86	520,710.59	98.40%	8,464.08	0.000
	ARQUITECTURA	456,323.12	193,825.80	262,497.32	456,323.12	100.00%		0.000
	INST. SANITARIAS	306,455.11	257,409.78	49,045.35	306,455.11	100.00%		0.000
	INST. ELECTRICAS	69,974.56	13,543.25	56,431.31	69,974.56	100.00%		0.000
	TOTAL (A)	1,361,927.47	876,458.64	377,004.85	1,363,463.39	99.38%	0.62%	0.00
	AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	71.70%	27.68%	99.38%			0.00%

## VI. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

### > REPORTE DE PERSONAL DE OBRA

- PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA EJECUTORA

[REDACTED]	
01	RESIDENTE DE OBRA
01	MAESTRO DE OBRA
03	OPERARIOS
07	PEONES
01	GUARDIAN
01	ALMACENERO

### - PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA SUPERVISORA

[REDACTED]	
01	JEFE SUPERVISOR DE OBRA
01	SUPERVISOR DE SEGURIDAD

### > REPORTE DE EQUIPOS Y MAQUINARIA.

3	ROTOMARTILLO ( 3 GRANDES)
4	MOLADORAS (3 CHICAS Y 1 GRANDE)
2	TALADROS
2	SIERRAS CIRCULARES
1	TROZADORA
1	TROMPO

LUCY N. VICENTE BASSILLO  
*Lucy Vicente*  
 SUPERVISOR DE OBRA

<b>CONSORCIO MENDOZA &amp; JSU</b>	<b>INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N°12 (16 AL 30 DE JUNIO DE 2018)</b>	<b>Contrato Supervisión N°057-2017- FONDEPES Rev.:0</b>
		<b>A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA CONVOCATORIA</b>


➤ **MATERIALES.**

100 UN.	VARILLAS DE Ø 5/8
130 UN.	VARILLAS DE Ø 3/8
10 UN.	VARILLAS DE Ø ½
10 KG	CLAVOS 2"
15 KG	CLAVOS 3"
5 KG	CLAVOS 4"
10 KG	ALAMBRE N° 08
10 KG	ALAMBRE N° 16
2 MLL	LADRILLOS KK
200 BLS	CEMENTO TIPO V
20 UND	TUBOS DE DESAGUE 2"
8 UND.	TUBOS DE 4"
9 UND.	TUBOS DE ½ "
½ KG	CLAVOS DE CEMENTO
12 M 3	PIEDRA CHANCADA
7 M3	ARENA
4 UND	LISTONES DE MADERA
10 UND	TABLAS MADERA
2 UND.	PLANCHAS DE TRIPLAY
02 UND.	SIKADUR GEL 32 - 5KG C/U-
06 UND.	MOLDES PARA PROBETAS DE CONCRETO.

**VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- El presente periodo del 16 al 30 de Junio el Contratista ha CULMINADO la obra principal con un avance físico real de 27.68%, teniendo un avance real acumulado de 99.38%, cabe indicar el saldo de 0.62% que representa el deductivo vinculante N°01.
- El nuevo termino de obra fue 19 de marzo del 2018, debido a la aprobación de la ampliación de plazo N°03 por 6 DC.
- Se recomienda al Contratista, realizar la limpieza de toda el área de la obra antes de su recepción

Atentamente.

LUCY N. VICENTE BASSILIO  
  
 SUPERVISOR DE OBRA

**CONSORCIO  
MENDOZA & JSU**

**INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N°12  
(16 AL 30 DE JUNIO DE 2018)**

**Contrato Supervisión N°057-2017-  
FONDEPES**

**Rev.:0**

**A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA  
CONVOCATORIA**

### **VIII. PANEL FOTOGRAFICO**



**Mejorando acabados**

**LUCY N. VICENTE BASSILAO**  
*Lucy Vicente*  
**SUPERVISOR DE OBRA**

**CONSORCIO  
MENDOZA & JSU**

**INFORME QUINCENAL DE SUPERVISION N°12  
(16 AL 30 DE JUNIO DE 2018)**

**Contrato Supervisión N°057-2017-  
FONDEPES**

**Rev.:0**

**A.S N°0032-2017-FONDEPES-PRIMERA  
CONVOCATORIA**



**Se han corregido algunos desperfectos de acabado**

**LUQY N. VICENTE BASSILIO**  
*Luqy Vicente B*  
**SUPERVISOR DE OBRA**



Colocación de puerta metálica doble hoja



Vaciado de concreto de piso

LUCY N. VICENTE BASSILIO  
*Lucy Vicente B*  
SUPERVISOR DE OBRA



PERÚ

**FONDEPES**

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Fecha: 09/07/18

**MEMORÁNDUM INTERNO N° 2528-201-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM**

Asunto

: Hemo Interno 3070-2018 Digenipaa

Referencia

Registro:

5237

Destino	Indicación	Destino	Indicación

Observaciones:

*Arg. Alejandro Galvez*

Atentamente:

*AG*



Indicaciones:

- 0.1. Autorizado/Aprobado
- 0.2. Calificar/Evaluar
- 0.3. Informe
- 0.4. Proyectar resolución
- 0.5. Atención/Tramitación
- 0.6. Conocimiento y fines
- 0.7. Notificar al interesado
- 0.8. Reformular
- 0.9. Ayuda memoria
- 10. Coordinar
- 11. Opinión/Recomendación
- 12. Consolidar
- 13. Aclarar redacción
- 14. Implementar/Ejecutar
- 15. Preparar respuesta
- 16. Visación
- 17. Agregar a sus antecedentes
- 18. Archivo
- 19. Ampliar
- 20. Seguimiento

**030**

Fecha: 06/07/18

MEMORÁNDUM INTERNO N° 3070 - 201 - FONDEPES / DIGENIPAA

Asunto: Carta #073/AS-32

Referencia : \_\_\_\_\_ Registro : 5237

Destino	Indicación	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	
OCI		OGAJ	
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	<u>AOEN.</u>

**FONDEPES**  
ARLA DE...  
06 JUL, 2018  
REGISTRO...  
5237

Observaciones: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Atentamente

**Indicaciones:**

- |                                |                          |                             |                          |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 01. Autorizado/Aprobado        | 02. Calificar/Evaluar    | 03. Informe                 | 04. Proyectar resolución |
| 05. Atención/Tramitación       | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular           |
| 09. Ayuda memoria              | 10. Coordinar            | 11. Opinión/Recomendación   | 12. Consolidar           |
| 13. Aclarar redacción          | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta      | 16. Visación             |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo              | 19. Ampliar                 | 20. Seguimiento          |

**031**



Lima, 06 de julio del 2018

**CARTA N° 073-2018/FONDEPES-AS32**

Señores:

**Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES**

Av. Petit Thouars N°115 - Cercado de Lima

Lima.-

Atención : Arq. Alejandro Gálvez Hurtado.

Administrador de Contrato

Asunto : Valorización Quincenal de Obra N°12 correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio – Elaborado por la supervisión

Ref. : Contrato N° 056-2017-FONDEPES "Ejecución de la Obra "Optimización de la sala de tareas previas del desembarcadero Pesquero artesanal de Puerto Pizarro, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, Región Tumbes"

De nuestra consideración:

Mediante la presente tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con la finalidad de comunicar que hasta la fecha el contratista de obra Consorcio San José no presenta la valorización quincenal de obra N° 12, por lo que esta supervisión en cumplimiento a los términos de referencia que forman parte del contrato de supervisión N°057-2017-FONDEPES, ha elaborado la valorización quincenal de obra N°12, la misma que hacemos entrega en un (1) original y dos (2) copias y CD.


Para que la presente valorización pueda ser tramitada y pagada, el contratista deberá presentar toda la documentación de obra que es de su responsabilidad.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de nuestra especial consideración.

Atentamente,

CONSORCIO MENDOZA & JSU

*Katherine D. Yanara Olivares Reyes*  
KATHERINE D. YANARA OLIVARES REYES  
REPRESENTANTE LEGAL



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO



2738114


N° DOC:	00005237-2018
CLAVE:	1933
USUARIO:	usuario_aleg9
FECHA Y HORA:	06/07/2018 16:54:01
TELEFONO:	2097700

www.fondepes.gob.pe

032



2528

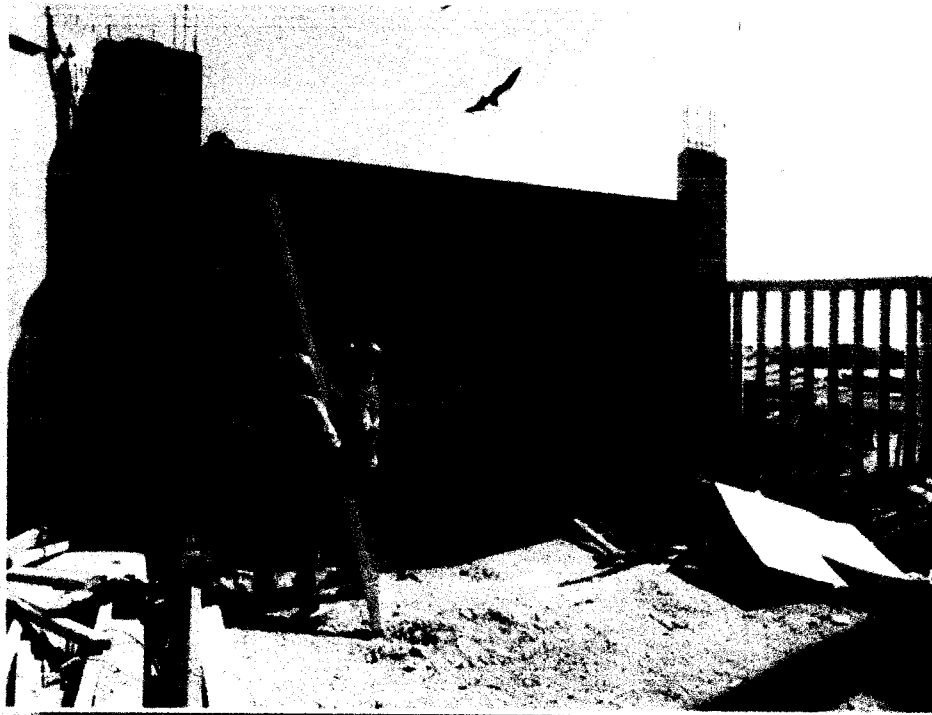

**VALORIZACION QUINCENAL POR LA  
SUPERVISION N° 12  
(DEL 16 AL 30 DE JUNIO)**

**"OPTIMIZACION DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS  
DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE  
FUERTO PLAZA, DISTRITO DE TUMBES,  
PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES"**

## FICHA TECNICA DE LA OBRA

Obra	: "OPTIMIZACION DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES"
Ubicación	
Región	: Tumbes
Provincia	: Tumbes
Distrito	: Tumbes
Lugar	: Desembarcadero Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro
Entidad	: FONOPES
Coordinador de Obra	: Arq. Alejandro Galvez Hurtado
Proceso de selección del Contratista	: A.S. N°0029-2017-FONDEPES; PRIMERA CONVOCATORIA
Contratista	: N°056-2017-FONDEPES
Sistema de Contratación	: PRECIOS UNITARIOS
Contrato de Ejecución de la obra	: N°057-2017-FONDEPES
Monto del Referencial, con IGV	: S/. 1'627,021.54
Monto del Contrato, con IGV	: S/. 1'607,074.41
Factor Referencial	: 0.98774009
Plazo de Ejecución según contrato	: 60 días calendarios
Entrega de terreno	: 12 de Enero del 2018
Inicio Contractual del Plazo de obra	: 13 de Enero del 2018
Termino Contractual del Plazo de obra	: 13 de Marzo del 2018
Adelanto Directo N°01	: No solicitado
Adelanto Materiales N°01 , con IGV	: S/. 321,414.88
Ampliación de plazo N°01	: DENEGADA
Ampliación de plazo N°02	: DENEGADA
Ampliación de plazo N°03	: DENEGADA
Ampliación de plazo N°04	: 6DC(RSGN°048-2018-FONDEPES/SG)
Ampliación de plazo N°05	: DENEGADA
Ampliación de plazo N°06	: DENEGADA
Ampliación de plazo N°07	: DENEGADA
Ampliación de plazo N°08	: DENEGADA
Nueva Fecha Termino del Plazo de obra	: 19 de marzo del 2018
Adicional de Obra N°01, con IGV	: S/.217,060.05 (R.J.N°050-2018-FONDEPES/J) -16/05/2018
Deductivo Vinculante N°01, con IGV	: S/.9,987.61 (R.J.N°050-2018-FONDEPES/J)
Supervisión de Obra	: CONSORCIO MENDOZA & JSU
Jefe de Supervisión	: Ing. Lucy Néilda Vicente Bassilio
Proceso selección de Supervisión	: A.S. N°0032-2017-FONDEPES; PRIMERA CONVOCATORIA
Contrato de Supervisión	: N°057-2017-FONDEPES
Sistema de Contratación Supervisión	: SUMA ALZADA
Monto del contrato de Supervisión con IGV	: S/. 89,751.75
Plazo de Ejecución de la Prestación	: 60 Días Calendarios

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 12**

DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

**MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA**

OBRA: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES  
 CLIENTE: FONDEPES  
 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE  
 SUPERVISION: CONSORCIO MENDOZA & JSU  
 SIST. CONTRATISTA: PRECIOS UNITARIOS  
 MONTO CONTRATO: S/. 1'807,074.41 con IGV.  
 FECHA : DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

<b>A. VALORIZACION CONTRACTUAL ( V )</b>	
ESTRUCTURA	9,030.86
ARQUITECTURA	262,497.33
INST. SANITARIAS	49,045.35
INST. ELECTRICAS	56,431.31
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>S/. 377,004.85</b>
AVANCE REAL DE OBRA ACUMULADO	99.38%
AVANCE RE-PROGRAMADO ACUMULADO	100.00%
<b>B. REAJUSTE (s)</b>	
ESTRUCTURA	0.00
ARQUITECTURA	0.00
INST. SANITARIAS	0.00
INST. ELECTRICAS	0.00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>MONTO DE LA VALORIZACION BRUTA ( VB )</b>	<b>S/. 377,004.85</b>
<b>C. DEDUCCIONES</b>	
De adelanto efectivo	0.00
De adelanto materiales	0.00
<b>Total ( C )</b>	<b>0.00</b>
<b>D. AMORTIZACIONES</b>	
Amortización de Adelanto en Efectivo	0.00
Amortización de Adelanto de Materiales	72,112.41
<b>Total ( D )</b>	<b>72,112.41</b>
<b>MONTO DE LA VALORIZACION NETA ( V.N )</b>	<b>S/. 304,892.44</b>
<b>E. RETENCIONES</b>	
Multa por atraso de obra	0.00
<b>Total ( E )</b>	<b>S/. 0.00</b>
<b>F. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA SIN I.G.V.</b>	
EN EFECTIVO (VN-E)	304,892.44
EN I.G.V. (18%)	54,880.64
<b>MONTO TOTAL DE LA VALORIZACION CON I.G.V.</b>	<b>359,773.08</b>
<b>MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>	

\* Los Reajustes se recalcularan en la Liquidacion

**NOTA:**

CONFORME A LA CLAUSULA SETIMA DEL CONTRATO N°056-2017-FONDEPES

LA ENTIDAD debe efectuar la Retencion de Fiel Cumplimiento.

Retencion Fiel Cumplimiento 10% Monto Contractual:

180,707.44

Inc. IGV.

Retencion Fiel Cumplimiento 10% Adicional de obra N°01:

21,706.01

Inc. IGV.

**TOTAL A RETENER POR LA ENTIDAD****182,413.45**

Inc. IGV.

LUCY N. VICENTE BASSILIO  
  
 SUPERVISOR DE OBRA

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 12**

DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cilente : FONDOPEP

Contratista: Consorcio San Jose

Supervision: Consorcio Mendoza & JSU

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios

Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'607,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018

Fecha termino de obra: 13/03/2018

Plazo de Ejecucion obra: 60 días calendarios

Amplacion de Plazo N°03: 6 D.C.

Nueva fecha de termino 19/03/2018

DESCRIPCION	MONTO COMPROMISADO (MONEDA)	VALORIZACION CONTRACTUAL	VALORIZACION BRUTA	VALORIZACION NETA	AVANCE FISICO DE OBRA	RETENCIONES	MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA
<b>A: VALORIZACION CONTRACTUAL</b>							
ESTRUCTURA	529,174.67	511,679.73	9,030.86	520,710.59	98.40%	8,464.08	0.004
ARQUITECTURA	456,323.12	193,825.80	262,497.33	456,323.13	100.00%		-0.006
INST. SANITARIAS	306,455.11	257,409.76	49,045.35	306,455.11	100.00%		0.000
INST. ELECTRICAS	69,974.56	13,543.25	56,431.31	69,974.56	100.00%		0.000
<b>TOTAL (A)</b>	<b>1,361,927.47</b>	<b>976,458.54</b>	<b>377,004.85</b>	<b>1,353,463.39</b>	<b>99.38%</b>	<b>0.62%</b>	<b>0.00</b>
<b>AVANCE FISICO DE OBRA</b>	<b>100.00%</b>	<b>71.70%</b>	<b>27.68%</b>	<b>99.38%</b>			<b>0.00%</b>
<b>B: REAJUSTE</b>							
ESTRUCTURA		759.49	0.00	759.49			
ARQUITECTURA		204.92	0.00	204.92			
INST. SANITARIAS		209.84	0.00	209.84			
INST. ELECTRICAS		76.63	0.00	76.63			
<b>TOTAL (B)</b>		<b>1,250.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.88</b>			
<b>VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)</b>		<b>977,709.42</b>	<b>377,004.85</b>	<b>1,354,714.27</b>			
<b>C: DEDUCCIONES</b>							
DE ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00			
DE ADELANTO MATERIALES		0.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>D: AMORTIZACIONES</b>							
AMORTIZACION DEL A. DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
AMORTIZACION DEL A. MATERIALES	272,385.49	200,273.08	72,112.41	272,385.49			0.00
<b>TOTAL (D)</b>	<b>272,385.49</b>	<b>200,273.08</b>	<b>72,112.41</b>	<b>272,385.49</b>			<b>0.00</b>
<b>VALORIZACION NETA (VN=VB-C-D)</b>		<b>777,436.34</b>	<b>304,892.44</b>	<b>1,082,328.78</b>			
<b>E: RETENCIONES</b>							
MULTA POR ATRASO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
<b>TOTAL(E)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>F: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>							
EN EFECTIVO (VN-E)	1,361,927.47	777,436.34	304,892.44	1,082,328.78			
EN I.G.V. (18%)	245,146.94	139,938.54	54,880.64	194,819.18			
<b>TOTAL (F)</b>	<b>1,607,074.41</b>	<b>917,374.88</b>	<b>359,773.08</b>	<b>1,277,147.96</b>			
<b>TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR</b>							

\* Los Reajustes se recalcularan en la Liquidacion

**NOTA:**


**CONFORME A LA CLAUSULA SETIMA DEL CONTRATO N°056-2017-FONDEPES**

**LA ENTIDAD debe efectuar la Retencion de Fiel Cumplimiento.**

Retencion Fiel Cumplimiento 10% Monto Contractual: 160,707.44 Inc. IGV.

Retencion Fiel Cumplimiento 10% Adicional de obra N°01: 21,706.01 Inc. IGV.

**TOTAL A RETENER POR LA ENTIDAD 182,413.45 Inc. IGV.**

LUCY N. VICENTE BASSILIO  
  
**SUPERVISOR DE OBRA**

# RELACION DE VALORIZACIONES TRAMITADAS PARA PAGO

DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente : FONDOPEDES

Contratista: Consorcio San Jose

Supervision: Consorcio Mendoza & JSU

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios

Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'607,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018  
 Fecha termino de obra: 13/03/2018  
 Plazo de Ejecución obra: 60 días calendararios  
 Ampliacion de Plazo Nº03: 6 D.C  
 Nueva fecha de termino: 19/03/2018

N°	VALORIZACIONES		RECURSOS AUTORIZADOS		DESGLOSAMIENTO POR ASPECTOS MATERIALES		VALORIZACION MATERIALES		VALORIZACIONES META		
	FECHA	MONTO	M	N	DIRECTO	INDIRECTO	MATERIALES	MATERIALES	MATERIALES	TOTAL	
1	15-ene-18	52,400.55	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,505.35	9,450.96	61,956.31
2	31-ene-18	210,295.91	702.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,997.95	37,979.63	248,977.58
3	15-feb-18	30,104.30	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,165.67	5,429.82	35,595.49
4	28-feb-18	23,246.00	-733.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,512.99	4,052.34	26,565.33
5	15-mar-18	362,263.93	1,039.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,302.98	65,394.54	428,697.52
6	31-mar-18	10,946.70	76.63	0.00	0.00	0.00	2,189.34	0.00	8,833.99	1,590.12	10,424.11
7	15-abr-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	30-abr-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	15-may-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	31-may-18	175,804.38	0.00	0.00	0.00	0.00	175,804.38	0.00	0.00	0.00	0.00
11	15-jun-18	111,396.78	0.00	0.00	0.00	0.00	22,279.36	0.00	89,117.42	16,041.14	105,158.56
12	30-jun-18	377,004.85	0.00	0.00	0.00	0.00	72,112.41	0.00	304,892.44	54,880.64	359,773.08

LUCY N. VICENTE BASSILLO  
*Lucy Vicente Bassillo*  
 SUPERVISOR DE OBRA

## RESUMEN AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO , DISTRITO DE TUMBES , PROVINCIA DE TUMBES , REGION TUMBES

Cliente : FONDOPE

Contratista: Consorcio San Jose

Supervision: Consorcio Mendoza & JSU

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018

Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'607,074.41


Fecha termino de obra: 13/03/2018

ADELANTO MATERIALES con IGV S/. 321,414.88

Nueva fecha de termino 19/03/2018

ADELANTO MATERIALES sin IGV S/. 272,385.49

VALORIZACIONES			AMORTIZACION	IMPORTE
VAL N°	DESCRIPCION	MONTO DE VALORIZACION S/.		
1	15-ene-18	52,400.55	0.00	272,385.49
2	31-ene-18	210,295.91	0.00	272,385.49
3	15-feb-18	30,104.30	0.00	272,385.49
4	28-feb-18	23,246.00	0.00	272,385.49
5	15-mar-18	362,263.93	0.00	272,385.49
6	31-mar-18	10,946.70	2,189.34	270,196.15
7	15-abr-18	0.00	0.00	270,196.15
8	30-abr-18	0.00	0.00	270,196.15
9	15-may-18	0.00	0.00	270,196.15
10	31-may-18	175,804.38	175,804.38	94,391.77
11	15-jun-18	111,396.78	22,279.36	72,112.41
12	30-jun-18	377,004.85	72,112.41	0.00
<b>SUB TOTALES S/.</b>		<b>1,353,463.39</b>	<b>272,385.49</b>	

  
**LUCY N. VICENTE BASSILIO**  
**SUPERVISOR DE OBRA**

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 12

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESMARCADERO PESQUERO ARTEBANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente: FONDOPES  
 Contratista: Consorcio San Jose  
 Supervision: Consorcio Invidia & JSU  
 Gerencia: Consorcio Arce y Utrero  
 Medio de Contrato, con EPF: SI. 1807/014.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018  
 Fecha termino de obra: 13/03/2018  
 Plazo de Ejecución obra: 60 días calendario  
 Ampliación de Plazo N°02: 0 D.C  
 Nueva fecha de termino: 19/03/2018

01 ESTRUCTURAS

ITEM	DESCRIPCION	PREMIO DE CONTRATISTA		VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL		VALORES POR VALORIZAR		DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	
		MON	%	MON	%	MON	%	MON	%	MON	%	MON	%
01	OBRA PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD												
01.01	OBRA PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES												
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES												
01.01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y CABAÑA DE GUARDIANA	m2		90.92	100.00%	9,062.99	100.00%	90.92	0.00%	9,062.99	100.00%	-	0.00%
01.01.01.02	BANCO QUIMICO PARA EL PERSONAL	mms		3,000.00	100.00%	7,000.00	100.00%	2.00	0.00%	7,000.00	100.00%	-	0.00%
01.01.01.03	SECHO DE MUELA MANEJO CON MADERA PULVERIZADA	m		21.46	100.00%	2,471.35	100.00%	116.09	0.00%	2,471.35	100.00%	-	0.00%
01.01.01.04	CARTEL DE OBRA DE 2.00M X 3.00 M	pas		1,441.51	100.00%	1,441.51	100.00%	1.00	0.00%	1,441.51	100.00%	-	0.00%
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES												
01.01.02.01	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	mms		2.00	100.00%	2,000.00	100.00%	2.00	0.00%	2,000.00	100.00%	-	0.00%
01.01.02.02	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	mms		900.00	100.00%	1,600.00	100.00%	2.00	0.00%	1,600.00	100.00%	-	0.00%
01.01.03	REACCIONES												
01.01.03.01	DEMONTAJE DE COBERTURA METALICA	m2		384.27	100.00%	5,670.51	100.00%	384.27	0.00%	5,670.51	100.00%	-	0.00%
01.01.03.02	DEMONTAJE DE PUERTAS	m2		30.51	100.00%	182.24	100.00%	30.51	0.00%	182.24	100.00%	-	0.00%
01.01.03.03	DEMONTAJE DE VENTANAS	m2		5.48	100.00%	5.48	100.00%	1.00	0.00%	5.48	100.00%	-	0.00%
01.01.03.04	RETIRO DE GARCIA DE CONTROL	pas		72.11	100.00%	72.11	100.00%	1.00	0.00%	72.11	100.00%	-	0.00%
01.01.03.05	DEMONTAJE DE CAMELETA	m		2.19	100.00%	379.89	100.00%	129.19	0.00%	379.89	100.00%	-	0.00%
01.01.03.06	REEMPLAZO DE CAMELETA	und		988.37	100.00%	1,186.74	100.00%	2.00	0.00%	1,186.74	100.00%	-	0.00%
01.01.03.07	RETIRO DE PRODUCTOR DE HIELO	und		1,942.43	100.00%	1,942.43	100.00%	1.00	0.00%	1,942.43	100.00%	-	0.00%
01.01.04	DEMOLICIONES												
01.01.04.01	DEMOLICION DE CEMENTO Y BORRORCIENTOS	m3		189.98	100.00%	4,399.82	100.00%	26.35	0.00%	4,399.82	100.00%	-	0.00%
01.01.04.02	DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA, INC COLUMNAS Y VIGAS	m3		142.70	100.00%	1,612.51	100.00%	11.30	0.00%	1,612.51	100.00%	-	0.00%
01.01.04.03	DEMOLICION DE TECHOS DE CONCRETO	m3		0.90	100.00%	128.43	100.00%	0.90	0.00%	128.43	100.00%	-	0.00%
01.01.04.04	DEMOLICION DE PISAS DE CONCRETO	m3		182.31	100.00%	940.77	100.00%	5.18	0.00%	940.77	100.00%	-	0.00%
01.01.04.05	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m3		182.31	100.00%	18,737.07	100.00%	116.44	0.00%	18,737.07	100.00%	-	0.00%
01.01.04.06	DEMOLICION DE CERCO DE CONCRETO TIPO UN	m		15.74	100.00%	1,273.37	100.00%	80.80	0.00%	1,273.37	100.00%	-	0.00%
01.01.04.07	ELIMINACION DE BOLSACONES	m3		26.29	100.00%	9,901.04	100.00%	233.74	0.00%	9,901.04	100.00%	-	0.00%
01.01.05	MOVILIZACION DE CIMENTADO, MAQUINARIAS Y SERVICIOS												
01.01.05.01	TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	gb		5,000.00	100.00%	5,000.00	100.00%	1.00	0.00%	5,000.00	100.00%	-	0.00%
01.01.05.02	FLETE TERRESTRE	gb		20,800.00	100.00%	20,800.00	100.00%	1.00	0.00%	20,800.00	100.00%	-	0.00%
01.01.06	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO												
01.01.06.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2		554.75	100.00%	1,214.90	100.00%	554.75	0.00%	1,214.90	100.00%	-	0.00%
01.01.06.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2		0.96	100.00%	477.09	100.00%	554.75	0.00%	477.09	100.00%	-	0.00%
01.02	SEGURIDAD Y SALUD												
01.02.01	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA TRABAJADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und		11,360.00	100.00%	11,360.00	100.00%	1.00	0.00%	11,360.00	100.00%	-	0.00%
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und		26,137.50	100.00%	26,137.50	100.00%	1.00	0.00%	26,137.50	100.00%	-	0.00%
01.02.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und		10,798.28	100.00%	10,798.28	100.00%	1.00	0.00%	10,798.28	100.00%	-	0.00%
01.02.04	SERIALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und		3,319.08	100.00%	3,319.08	100.00%	1.00	0.00%	3,319.08	100.00%	-	0.00%
01.02.05	EQUIPOS PARA RESERVA, PARTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	und		4,110.00	100.00%	4,110.00	100.00%	1.00	0.00%	4,110.00	100.00%	-	0.00%

VICENTE BASSILUS  
 Vicente Bassilus

0007

VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 12

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

OBRA: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente: FONDOPES  
Contratista: Constructor San Jose  
Supervisor: Constructor Mendocá & JSU  
Sistema de Contratación: Preciso Unitarios  
Módulo de Contrato, con FCV: SI, 1307,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018  
Fecha término de obra: 13/03/2018  
Plazo de Ejecución obra: 60 días calendario  
Ampliación de Plazo M33: 6 D.C  
Nueva fecha de término: 19/03/2018

01 ESTRUCTURAS

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	PRESUPUESTO CONTRACTUAL		VALORIZACION ACTUAL ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		VALORIZACION AGUIRREANA ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR		REDUCTIVO VINCULANTE M31	
			CANTIDAD	P.U.	MONEDARIO	%	MONEDARIO	%	MONEDARIO	%	MONEDARIO	%	MONEDARIO	%
01.03	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL													
01.03.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	m2	554.76	2.00	1,109.43	100.00%	1,109.43	100.00%	554.76	1,109.43	100.00%	-	-	0.00%
01.03.02	RIESGO DEL AREA DE TRAMADO	und	1.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	2,000.00	100.00%	1.00	2,000.00	100.00%	-	-	0.00%
01.03.03	PLAN DE CONTRINGENCIA	und	1.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	3,000.00	100.00%	1.00	3,000.00	100.00%	-	-	0.00%
01.03.04	PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	und	1.00	2,500.00	2,500.00	100.00%	2,500.00	100.00%	1.00	2,500.00	100.00%	-	-	0.00%
01.03.05	PLAN DE CIERRE Y ABANDONO	und	1.00	1,025.00	1,025.00	100.00%	1,025.00	100.00%	1.00	1,025.00	100.00%	-	-	0.00%
01.03.06	MEDIDAS DE CONCENTRACION Y EDUCACION AMBIENTAL	und	4.00	200.00	800.00	100.00%	800.00	100.00%	4.00	800.00	100.00%	-	-	0.00%
01.03.07	CARTIL DE MANEJO AMBIENTAL DE 130 X 80cm	und	4.00	300.00	1,200.00	100.00%	1,200.00	100.00%	4.00	1,200.00	100.00%	-	-	0.00%
02	ESTRUCTURAS													
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
02.01.01	EXCAVACIONES													
02.01.01.01	EXCAVACION DE ESTRUCTURAS PARA CIMENTACION	m3	96.39	36.06	3,475.62	100.00%	3,475.62	100.00%	96.39	3,475.62	100.00%	-	-	0.00%
02.01.01.02	CORTES	m3	132.92	5.30	704.48	100.00%	704.48	100.00%	132.92	704.48	100.00%	-	-	0.00%
02.01.03	RELLENOS	m3	48.56	61.02	2,962.62	100.00%	2,962.62	100.00%	48.56	2,962.62	100.00%	-	-	0.00%
02.01.03.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO SPMP.M.	m3	397.74	14.89	5,899.48	100.00%	5,899.48	100.00%	397.74	5,899.48	100.00%	-	-	0.00%
02.01.04	RELLENO INTERIOR Y ARBOZADO	m2	653.05	3.39	2,194.25	100.00%	2,194.25	100.00%	653.05	2,194.25	100.00%	-	-	0.00%
02.01.04.01	REVELACION INTERIOR Y ARBOZADO PARA Pisos	m2	96.88	4.95	474.61	100.00%	474.61	100.00%	96.88	474.61	100.00%	-	-	0.00%
02.01.04.02	REVELACION INTERIOR Y ARBOZADO PARA Pisos	m2	136.24	17.80	2,460.67	100.00%	2,460.67	100.00%	136.24	2,460.67	100.00%	-	-	0.00%
02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	136.24	19.73	2,727.48	100.00%	2,727.48	100.00%	136.24	2,727.48	100.00%	-	-	0.00%
02.01.05.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIMAQUINA	m3	136.24	19.73	2,727.48	100.00%	2,727.48	100.00%	136.24	2,727.48	100.00%	-	-	0.00%
02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE													
02.02.01	BOLAJEO	m2	28.28	36.01	1,018.36	100.00%	1,018.36	100.00%	28.28	1,018.36	100.00%	-	-	0.00%
02.02.01.01	BOLAJEO PARA ZAPATAS E=0.10m, s=100kg/m2	m2	28.28	36.01	1,018.36	100.00%	1,018.36	100.00%	28.28	1,018.36	100.00%	-	-	0.00%
02.02.02	CIMENTOS CORRIDOS	m3	52.84	228.88	11,948.23	100.00%	11,948.23	100.00%	52.84	11,948.23	100.00%	-	-	0.00%
02.02.02.01	CIMENTOS CORRIDOS CONCRETO 1:1:2 + 30% F.O.	m3	52.84	228.88	11,948.23	100.00%	11,948.23	100.00%	52.84	11,948.23	100.00%	-	-	0.00%
02.02.03	ENCOFRADO Y DEBENCOFRADO DE CIMENTACION	m2	178.11	57.28	10,202.14	100.00%	10,202.14	100.00%	178.11	10,202.14	100.00%	-	-	0.00%
02.02.03.01	ENCOFRADO Y DEBENCOFRADO DE CIMENTACION	m2	178.11	57.28	10,202.14	100.00%	10,202.14	100.00%	178.11	10,202.14	100.00%	-	-	0.00%
02.02.04	BOBICHIENTOS	m2	20.74	343.03	7,114.44	100.00%	7,114.44	100.00%	20.74	7,114.44	100.00%	-	-	0.00%
02.02.04.01	BOBICHIENTOS - CONCRETO 1:1 + 20% P.M.	m2	20.74	343.03	7,114.44	100.00%	7,114.44	100.00%	20.74	7,114.44	100.00%	-	-	0.00%
02.02.04.02	BOBICHIENTOS - ENCOFRADO Y DEBENCOFRADO	m2	242.81	42.74	10,381.97	100.00%	10,381.97	100.00%	242.81	10,381.97	100.00%	-	-	0.00%
02.02.04.03	BOBICHIENTOS - ENCOFRADO Y DEBENCOFRADO	m2	242.81	42.74	10,381.97	100.00%	10,381.97	100.00%	242.81	10,381.97	100.00%	-	-	0.00%
02.02.04.04	FALSO PISO	m2	60.83	35.39	2,158.31	100.00%	2,158.31	100.00%	60.83	2,158.31	100.00%	-	-	0.00%
02.02.04.05	FALSO PISO E=0.10m-140 kg/m2	m2	60.83	35.39	2,158.31	100.00%	2,158.31	100.00%	60.83	2,158.31	100.00%	-	-	0.00%
02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO													
02.03.01	ZAPATAS	m3	15.04	624.16	7,883.37	100.00%	7,883.37	100.00%	15.04	7,883.37	100.00%	-	-	0.00%
02.03.01.01	ZAPATAS - CONCRETO 300 kg/m2	m3	15.04	624.16	7,883.37	100.00%	7,883.37	100.00%	15.04	7,883.37	100.00%	-	-	0.00%
02.03.01.02	ZAPATAS - ENCOFRADO Y DEBENCOFRADO	m2	51.89	41.18	2,139.89	100.00%	2,139.89	100.00%	51.89	2,139.89	100.00%	-	-	0.00%
02.03.01.03	ZAPATAS - ACERO P=300 kg/m2	kg	583.70	4.39	2,467.73	100.00%	2,467.73	100.00%	583.70	2,467.73	100.00%	-	-	0.00%

LUY N VICENTE BASTIEN  
SUPERVISOR DE OBRA



VALORIZACION QUINCEVAL DE OBRA N° 12

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

OBRA: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Contratista: Concedio San Jose  
 Supervision: Concedio Mendoza & JSU  
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios  
 Monto del Contrato, con IGV: S/ 1'907,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018  
 Fecha termino de obra: 13/03/2018  
 Plazo de Ejecucion obra: 60 días calendario  
 Ampliacion de Plazo N°03: 6 D.C  
 Nueva fecha de termino: 19/03/2018

01 ESTRUCTURAS

ITEM	DESCRIPCION	UNID	PRESUPUESTO CONTRACTUAL		VALORIZACION AGILIZADA ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		VALORIZACION AGILIZADA ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR		DEBITIVO VINCULANTE N°01					
			MED	CANTIDAD	VALOR	%	MED	CANTIDAD	VALOR	%	MED	CANTIDAD	VALOR	%	MED	CANTIDAD	VALOR	%
02.03.02	LOSAS DE PISO																	
02.03.02.01	LOSAS DE PISO - CONCRETO 200 kg/m2	m3	126.40	983.07	71,281.71	100.00%	126.40	0.00%	71,281.71	100.00%	126.40	0.00%	-	-	-	-	-	-
02.03.02.02	LOSAS DE PISO - ENCOFRADO Y DESMOCADO	m2	88.82	41.18	3,665.83	100.00%	88.82	0.00%	3,665.83	100.00%	88.82	0.00%	-	-	-	-	-	-
02.03.02.03	LOSAS DE PISO - AZERO FUNDIDO kg/m2	kg	3,273.38	4.38	14,271.94	100.00%	3,273.38	0.00%	14,271.94	100.00%	3,273.38	0.00%	-	-	-	-	-	-
02.03.03	COLUMNAS																	
02.03.03.01	COLUMNAS - CONCRETO 200 kg/m2	m3	23.43	877.27	13,826.44	100.00%	23.43	0.00%	13,826.44	100.00%	23.43	0.00%	-	-	-	-	-	-
02.03.03.02	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESMOCADO	m2	288.28	98.92	17,273.74	100.00%	288.28	0.00%	17,273.74	100.00%	288.28	0.00%	-	-	-	-	-	-
02.03.03.03	COLUMNAS - AZERO FUNDIDO kg/m2	kg	5,880.42	4.38	22,180.83	100.00%	5,880.42	0.00%	22,180.83	100.00%	5,880.42	0.00%	-	-	-	-	-	-
02.03.04	VGAS																	
02.03.04.01	VGAS - CONCRETO 210 kg/m2	m3	13.04	881.01	7,708.77	100.00%	13.04	0.00%	7,708.77	100.00%	13.04	0.00%	-	-	-	-	-	-
02.03.04.02	VGAS - ENCOFRADO Y DESMOCADO	m2	147.40	68.86	8,876.98	100.00%	147.40	0.00%	8,876.98	100.00%	147.40	0.00%	-	-	-	-	-	-
02.03.04.03	VGAS - AZERO FUNDIDO kg/m2	kg	2,220.25	4.38	9,680.29	100.00%	2,220.25	0.00%	9,680.29	100.00%	2,220.25	0.00%	-	-	-	-	-	-
02.03.05	LOSAS																	
02.03.05.01	LOSAS ALIGERADAS CONVENCIONALES																	
02.03.05.01.01	LOSA ALBERADA - CONCRETO 210 kg/m2	m3	5.44	485.71	2,478.08	14.71%	5.44	85.29%	2,114.48	85.29%	5.44	85.29%	2,478.08	100.00%	-	-	-	-
02.03.05.01.02	LOSA ALBERADA - ENCOFRADO Y DESMOCADO	m2	83.84	48.98	3,178.45	14.71%	83.84	85.29%	2,711.88	85.29%	83.84	85.29%	3,178.45	100.00%	-	-	-	-
02.03.05.01.03	LOSA ALBERADA - AZERO FUNDIDO kg/m2	kg	288.89	4.38	1,258.39	14.71%	288.89	85.29%	1,878.38	85.29%	288.89	85.29%	1,258.39	100.00%	-	-	-	-
02.03.05.01.04	LOSA ALBERADA, LAMINADO MADERA 180x180	unid	830.00	3.48	1,844.40	14.71%	830.00	85.29%	1,878.16	85.29%	830.00	85.29%	1,844.40	100.00%	-	-	-	-
02.03.05	CANALETAS																	
02.03.05.01	CANALETAS - CONCRETO 200 kg/m2	m3	16.24	624.62	9,819.21	100.00%	16.24	0.00%	9,819.21	100.00%	16.24	0.00%	-	-	-	-	-	-
02.03.05.02	CANALETAS - ENCOFRADO Y DESMOCADO	m2	132.05	48.86	6,184.09	100.00%	132.05	0.00%	6,184.09	100.00%	132.05	0.00%	-	-	-	-	-	-
02.03.05.03	CANALETAS - AZERO FUNDIDO kg/m2	kg	468.15	4.38	1,987.83	100.00%	468.15	0.00%	1,987.83	100.00%	468.15	0.00%	-	-	-	-	-	-
02.04	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS																	
02.04.01	MANTENIMIENTO DE TECHO DE TAREAS PREVIAS																	
02.04.01.01	LIMPIEZA MANUAL CON ADITIVO REMOVEDOR DE OXIDO	m2	103.46	34.87	3,606.99	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
02.04.02	REPARACION DE COLUMNAS DE TAREAS PREVIAS																	
02.04.02.01	PRECIO MANUAL DE COLUMNAS	m2	9.80	14.42	138.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
02.04.02.02	REFORZAMIENTO DE COLUMNAS	m2	9.80	341.80	3,278.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
02.04.03	REFORZAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO																	
02.04.03.01	ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DE BORNENIMIENTO EXISTENTE	m2	10.18	28.84	293.89	100.00%	10.18	0.00%	293.89	100.00%	10.18	0.00%	-	-	-	-	-	-
02.04.03.02	PERFORACION MANUAL L-30mm	unid	88.00	6.79	597.82	100.00%	88.00	0.00%	597.82	100.00%	88.00	0.00%	-	-	-	-	-	-
02.04.03.03	COLOCACION DE MORTERO ADHESIVO POR INYECCION L-30mm	unid	88.00	10.80	950.08	100.00%	88.00	0.00%	950.08	100.00%	88.00	0.00%	-	-	-	-	-	-
02.04.03.04	COLOCACION DE ADITIVO CONCRETO NUEVO-ANTIGUO	m2	10.18	78.08	794.95	100.00%	10.18	0.00%	794.95	100.00%	10.18	0.00%	-	-	-	-	-	-
02.04.03.05	COSTO DIRECTO				437,877.28				7,472.79				430,873.47					
02.04.03.06	GASTOS GENERALES	15.50%			67,870.98				1,182.28				68,785.39					
02.04.03.07	UTILIDADES	5.35%			23,488.45				380.79				23,891.73					
02.04.03.08	PORCENTAJE DE AVANCE	10%			88,281.44				1,823.88				90,277.91					
TOTAL SUB PRESUPUESTO DE OBRA					624,426.11				10,896.42				614,438.98					
PORCENTAJE DE AVANCE					100.00%				1.71%				98.49%					
TOTAL					1,823.83				1,823.83				1,823.83					
TOTAL					9,987.81				9,987.81				9,987.81					
PORCENTAJE DE AVANCE					1.00%				0.00%				1.00%					

0009

041

LUCY VICENTE BASSILIP  
 SUPERVISOR DE OBRA

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA Nº 12**

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente: FONDOPEP  
 Contratista: Consorcio San Jose  
 Supervisor: Consorcio Mendoza & JSU  
 Sistema de Contratacion: Precise Unitarios  
 Monto del Contrato, con IGV: S/ 1'807,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018  
 Fecha termino de obra: 13/03/2018  
 Plazo de Ejecucion obra: 60 dias calendaricos  
 Aplicacion de Plazo N°03: S.D.C  
 Nueva fecha de termino: 16/03/2018

100.11

02 ARQUITECTURA

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL		VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR		
		UNID	METRADO	P.U.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL
03	ARQUITECTURA											
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA											
03.01.01	MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV BOGA M:1.14 E=1.5 cm	m2	361.64	74.91	27,105.43	68.11%	361.64	0.00%	27,105.43	100.00%	361.64	0.00%
03.01.02	ACERO F=4000 kg/m2 REF. MUROS	kg	103.50	4.36	451.26	100.00%	103.50	0.00%	451.26	100.00%	103.50	0.00%
03.02	REVOCOS ENLUCIDOS Y MOLDURAS											
03.02.01	TARRAJEO RAYADO PRIMARIO, MORTERO C/A 1:5	m2	125.04	22.50	2,813.40	16.64%	125.04	81.16%	2,813.40	100.00%	125.04	0.00%
03.02.02	TARRAJEO EN MUROS DE ALBAÑILERIA INTERIORES Y EXTERIORES REJILLA MEZCLA 1:2	m2	598.63	26.66	15,360.85	90.00%	598.63	10.00%	15,360.85	100.00%	598.63	0.00%
03.02.03	TARRAJEO EN MUROS DE CONCRETO	m2	107.47	26.66	2,877.68	13.11%	107.47	87.60%	2,877.68	100.00%	107.47	0.00%
03.02.04	TARRAJEO DE COLUMNAS	m2	238.35	37.56	8,952.43	58.00%	238.35	42.00%	8,952.43	100.00%	238.35	0.00%
03.02.05	TARRAJEO DE VIGAS	m2	147.40	65.62	9,638.43	34.64%	147.40	65.36%	9,638.43	100.00%	147.40	0.00%
03.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES 1:5	m	138.12	12.93	1,786.89	10.86%	138.12	89.14%	1,786.89	100.00%	138.12	0.00%
03.02.07	BRIANAS SEGUN DETALLE (1 x 1 cm)	m	94.61	7.62	720.83	100.00%	94.61	0.00%	720.83	100.00%	94.61	0.00%
03.02.08	ACABADO DE CEMENTO PULIDO EN CAÑALETAS	m2	37.60	30.06	1,130.26	100.00%	37.60	0.00%	1,130.26	100.00%	37.60	0.00%
03.02.09	ACABADO DE CEMENTO PULIDO EN PISOS	m2	588.84	18.37	10,780.25	8.76%	588.84	91.22%	10,780.25	100.00%	588.84	0.00%
03.03	CELO RASOS											
03.03.01	CELO RASO CON MEZCLA C/A 1:3	m2	63.64	46.07	2,931.89	14.94%	63.64	86.06%	2,931.89	100.00%	63.64	0.00%
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS											
03.04.01	CONTRAPISOS											
03.04.01.01	CONTRAPISO DE 40 mm	m2	45.76	30.86	1,412.15	20.76%	45.76	79.22%	1,412.15	100.00%	45.76	0.00%
03.04.02	PIBOS											
03.04.02.01	PIBO CERAMICO 20 x 40 ANTIDESLIZANTE - ALTO TRAFICO - COLOR	m2	16.02	67.27	917.47	0.00%	16.02	100.00%	917.47	100.00%	16.02	0.00%
03.04.02.02	PIBO E=5cm ACABADO PULIDO INC. BRUADO	m2	18.76	35.84	672.36	100.00%	18.76	0.00%	672.36	100.00%	18.76	0.00%
03.04.02.03	VEREDA DE CONCRETO F=200kg/m2 E=15cm PULIDO Y BRUADO INC. ENCOFRADO	m2	8.62	89.94	809.76	100.00%	8.62	0.00%	809.76	100.00%	8.62	0.00%
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS											
03.05.01	ZOCALOS											
03.05.01.01	ZOCALO DE CERAMICO 40x60	m2	125.04	61.60	7,702.46	100.00%	125.04	0.00%	7,702.46	100.00%	125.04	0.00%
03.05.02	CONTRAZOCALOS											
03.05.02.01	CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO SANITARIO H=0.20m	m	20.49	42.30	1,247.43	100.00%	20.49	0.00%	1,247.43	100.00%	20.49	0.00%
03.06	COBERTURAS EN TECHOS											
03.06.01	COBERTURAS											
03.06.01.01	COBERTURA DE FIBRA VEGETAL 3mm (INC. CORREAS Y ANCHOS)	m2	363.37	67.33	26,485.60	0.00%	363.37	100.00%	26,485.60	100.00%	363.37	0.00%
03.06.01.02	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 24x24x5cm MEZCLA C/A 1:5	m2	83.06	103.30	8,563.20	0.00%	83.06	100.00%	8,563.20	100.00%	83.06	0.00%
03.06.02	FALSO TECHO											
03.06.02.01	FALSO CELO RASO DE PVC	m2	404.06	112.64	45,475.16	0.00%	404.06	100.00%	45,475.16	100.00%	404.06	0.00%
03.07	CARPINTERIA DE MADERA											
03.07.01	PUERTAS											
03.07.01.01	PUERTA CONTRAPLACADA CAMARCO 6"x2"	m2	10.71	304.71	3,263.44	0.00%	10.71	0.00%	3,263.44	100.00%	10.71	0.00%
03.07.01.02	PUERTA CIERRELO 68.141. MELAMINE 18mm Y PERIF. ALUMINIO	m2	7.66	228.96	1,730.86	0.00%	7.66	0.00%	1,730.86	100.00%	7.66	0.00%

042

LUCY N. VICENTE BASSILIO  
 ALICIA VICENTE  
 SUPERVISOR DE OBRA

0010

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 12**

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO - DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - REGION TUMBES

Contratista: Consorcio San Jose  
 Supervisor: Consorcio Mirozoa & JSU  
 Sistema de Contratación: Precio Unitario  
 Monto del Contrato, con IGV: S/ 1'807,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018  
 Fecha término de obra: 13/03/2018  
 Plazo de Ejecución obra: 60 días calendario  
 Ampliación de Plazo (MOS): 6 D.C  
 Nueva fecha de término: 19/03/2018

100.11

**02 ARQUITECTURA**

ITEM	DESCRIPCION	PREVISIONES CONTRACTUAL		VALORACION ACTUAL		VALORACION ANTERIOR		VALORACION ACTUAL ANTERIOR		VALORACION ANTERIOR ANTERIOR		VALORACION ANTERIOR ANTERIOR			
		UNID	METRIDADO	P.A.	PARCIAL	METRIDADO	%	METRIDADO	%	METRIDADO	%	METRIDADO	%	METRIDADO	%
03.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA														
03.08.01	VENTANAS														
03.08.01.01	VENTANA FLUJA DE MALLA POLIPROPILENO C/ MARCO DE ALUMINIO	m2	32.22	126.61	4,079.37	32.22	0.00%	4,079.37	0.00%	32.22	0.00%	4,079.37	100.00%	0.00%	
03.08.01.02	VENTANA CORRIDA DE VIDRIO TEMPLADO 8mm C/ MARCO DE ALUMINIO	m2	29.27	244.16	7,146.56	29.27	0.00%	7,146.56	0.00%	29.27	0.00%	7,146.56	100.00%	0.00%	
03.08.02	PUERTAS														
03.08.02.01	PUERTA DE ALTO IMPACTO 2 HOJAS 1.68x2.28m	und	2.00	11,575.01	23,146.02	2.00	0.00%	23,146.02	0.00%	2.00	0.00%	23,146.02	100.00%	0.00%	
03.08.02.02	PUERTA METALICA ENROLLABLE MANUAL C/ CAJONERA 2.30x2.05m	und	5.00	6,203.81	31,419.05	5.00	0.00%	31,419.05	0.00%	5.00	0.00%	31,419.05	100.00%	0.00%	
03.08.02.03	MANUTENIMIENTO DE PUERTAS METALICAS	m2	40.00	31.79	1,271.60	40.00	100.00%	1,271.60	100.00%	40.00	100.00%	1,271.60	100.00%	0.00%	
03.08.02.04	FABRICACION Y MONTAJE DE PUERTAS METALICAS	kg	1,363.04	9.98	13,603.14	1,363.04	100.00%	13,603.14	100.00%	1,363.04	100.00%	13,603.14	100.00%	0.00%	
03.08.03	DIVISIONES DE ALUMINIO														
03.08.03.01	TABQUERIA DE MELAMINE 18mm EN 83.HH.	m2	14.08	157.87	2,222.81	14.08	0.00%	2,222.81	100.00%	14.08	100.00%	2,222.81	100.00%	0.00%	
03.08.04	ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES														
03.08.04.01	REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO EN CAJONETAS A=0.30	m	63.98	181.05	11,583.56	15.62	24.41%	2,827.55	24.41%	48.36	75.59%	11,583.56	100.00%	0.00%	
03.08.04.02	REJILLA DE ACERO GALVANIZADO EN CAJONETAS A=0.30	m	7.52	106.53	801.11	1.84	24.41%	195.55	24.41%	5.68	75.59%	801.11	100.00%	0.00%	
03.08.04.03	PERFIL T DE ALUMINIO PARA CAMBIO DE PISO	m	4.20	18.77	78.83	-	0.00%	-	0.00%	4.20	100.00%	78.83	100.00%	0.00%	
03.08.05	CERRAJERA														
03.08.05.01	BISAGRAS														
03.08.05.01.01	BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADA PESADO DE 4"X4" EN PUERTA	pza	18.00	29.62	533.16	18.00	0.00%	533.16	0.00%	18.00	100.00%	533.16	100.00%	0.00%	
03.08.05.01.02	BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADA PESADO DE 3"X2" EN PUERTA	pza	12.00	25.72	308.64	12.00	0.00%	308.64	0.00%	12.00	100.00%	308.64	100.00%	0.00%	
03.08.05.02	CERRADURA														
03.08.05.02.01	CERRADURA TIPO PESADA 3 OCUPOS	pza	6.00	76.77	460.62	6.00	0.00%	460.62	0.00%	6.00	100.00%	460.62	100.00%	0.00%	
03.08.05.02.02	CERROJO DE 5" ALUMINIO	pza	6.00	27.72	166.32	6.00	0.00%	166.32	0.00%	6.00	100.00%	166.32	100.00%	0.00%	
03.08.05.03	ACCESORIOS DE CIERRE														
03.08.05.03.01	MANILLA DE BRONCE 4" PARA PUERTAS	pza	6.00	32.72	196.32	6.00	0.00%	196.32	0.00%	6.00	100.00%	196.32	100.00%	0.00%	
03.10	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES														
03.10.01	ESPEJOS														
03.10.01.01	ESPEJO EMPOTRADO COLOR PLATA 4mm	m2	7.05	194.31	1,369.89	-	0.00%	-	0.00%	7.05	100.00%	1,369.89	100.00%	0.00%	
03.11	PINTURA														
03.11.01	PINTURA DE CIELOS RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES														
03.11.01.01	PINTURA EPOXICA EN CIELO RASO	m2	63.64	18.16	1,155.70	-	0.00%	-	0.00%	63.64	100.00%	1,155.70	100.00%	0.00%	
03.11.01.02	PINTURA EPOXICA EN Muros INTERIORES Y EXTERIORES	m2	284.37	17.36	4,936.86	-	0.00%	-	0.00%	284.37	100.00%	4,936.86	100.00%	0.00%	
03.11.01.03	PINTURA EPOXICA EN VIGAS	m2	108.36	17.36	1,881.13	24.00	22.15%	416.64	22.15%	84.36	77.85%	1,881.13	100.00%	0.00%	
03.11.01.04	PINTURA EPOXICA EN COLUMNAS	m2	187.46	17.36	3,254.85	83.42	44.50%	1,448.21	44.50%	104.05	55.50%	3,254.85	100.00%	0.00%	
03.11.01.05	PINTURA EPOXICA EN Muros DE CONCRETO	m2	81.10	17.36	1,407.80	-	0.00%	-	0.00%	81.10	100.00%	1,407.80	100.00%	0.00%	
03.11.01.06	PINTURA EPOXICA EN Pisos	m2	328.02	14.44	4,738.81	-	0.00%	-	0.00%	328.02	100.00%	4,738.81	100.00%	0.00%	
03.11.01.07	PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA EN ALTURA	m2	103.46	46.07	4,766.40	-	0.00%	-	0.00%	103.46	100.00%	4,766.40	100.00%	0.00%	
03.11.01.08	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CERCO PERIMETRICO	m2	430.53	6.86	2,948.13	430.53	100.00%	2,948.13	100.00%	430.53	100.00%	2,948.13	100.00%	0.00%	
03.11.02	PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS														
03.11.02.01	PINTURA EPOXICA EN PUERTAS METALICAS INC. ARENADO	m2	25.80	30.50	786.90	25.80	100.00%	786.90	100.00%	25.80	100.00%	786.90	100.00%	0.00%	

043

LUCY N. VICENTE BASTIEN  
 Lucy Vicent  
 SUPERVISOR DE OBRA

0011

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA Nº 12**

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO , DISTRITO DE TUMBES , PROVINCIA DE TUMBES , REGION TUMBES

Contratista: Consorcio San Jose  
 Supervisor: Consorcio Méndez & JSU  
 Sistema de Contratación: Precios Unitarios  
 Monto del Contrato, con IGV: S/ 1'807,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018  
 Fecha término de obra: 13/03/2018  
 Plazo de Ejecución obra: 60 días calendario  
 Ampliación de Plazo N°03: E.D.C.  
 Nueva fecha de término: 19/03/2018

100.11

02 ARQUITECTURA

ITEM	DESCRIPCION	PRELIMINARES CONTRACTUAL			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ANTERIOR			VALORIZACION ANTERIOR POR AVANCE			SALDO POR VALORIZAR		
		Unid	Metizado	P.U.	Metizado	Porcentaje	Porcentaje	Metizado	Porcentaje	Porcentaje	Metizado	Porcentaje	Porcentaje	Metizado	Porcentaje	Porcentaje
03.12	OTROS															
03.12.01	MUEBLE C.A. #10 cm ACABADO PULIDO	m2	7.41	390.48	2,871.16	-	0.00%	-	0.00%	7.41	2,871.16	100.00%	7.41	2,871.16	100.00%	0.00%
03.12.02	JUNTA DE DILATACION E-3cm CON BELLO ELASTOMERICO EN MURS	m	175.20	6.56	1,149.31	-	0.00%	-	0.00%	175.20	1,149.31	100.00%	175.20	1,149.31	100.00%	0.00%
03.12.03	JUNTA DE DILATACION E-3cm CON FOLESTRENO EXPANDIDO EN MURS	m	80.00	6.80	528.00	-	0.00%	-	0.00%	80.00	528.00	100.00%	80.00	528.00	100.00%	0.00%
03.12.04	COBERTURA PVC DE 200G/M2 INC. ANTERA ALUMINIO	RRR	8.00	83.94	496.52	-	0.00%	-	0.00%	8.00	496.52	100.00%	8.00	496.52	100.00%	0.00%
03.12.05	TINA DE LAVADO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.5MS (INC. SUMY COL.)	und	7.00	6,100.00	42,700.00	-	0.00%	-	0.00%	7.00	42,700.00	100.00%	7.00	42,700.00	100.00%	0.00%
03.12.06	MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 08 PERSONAS (INC. SUMY COL.)	und	7.00	3,500.00	24,500.00	-	0.00%	-	0.00%	7.00	24,500.00	100.00%	7.00	24,500.00	100.00%	0.00%
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>377,894.64</b>						<b>377,894.64</b>			<b>377,894.64</b>		<b>0.00</b>
	<b>GASTOS GENERALES</b>	15.50%			<b>58,627.17</b>	<b>199,295.44</b>		<b>24,885.74</b>		<b>33,627.45</b>	<b>86,527.17</b>		<b>33,627.45</b>	<b>86,527.17</b>		<b>0.00</b>
	<b>UTILIDADES</b>	5.35%			<b>20,291.31</b>	<b>8,590.62</b>		<b>11,638.69</b>		<b>11,638.69</b>	<b>20,291.31</b>		<b>11,638.69</b>	<b>20,291.31</b>		<b>0.00</b>
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>456,813.12</b>	<b>606,781.69</b>		<b>506,497.32</b>		<b>506,497.32</b>	<b>456,813.12</b>		<b>506,497.32</b>	<b>456,813.12</b>		<b>0.00</b>
	<b>IGV</b>	18%			<b>82,138.16</b>	<b>34,828.64</b>		<b>47,249.52</b>		<b>47,249.52</b>	<b>82,138.16</b>		<b>47,249.52</b>	<b>82,138.16</b>		<b>0.00</b>
	<b>TOTAL SUB PRESUPUESTO DE OBRA</b>				<b>538,951.28</b>	<b>228,714.44</b>		<b>308,746.84</b>		<b>308,746.84</b>	<b>538,951.28</b>		<b>308,746.84</b>	<b>538,951.28</b>		<b>0.00%</b>
	<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>				<b>100.00%</b>	<b>42.48%</b>		<b>57.52%</b>		<b>57.52%</b>	<b>100.00%</b>		<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>		<b>0.00%</b>

0912

**LUCIA VICENTE BASSILO**  
*Lucia Vicente Bassilo*  
**SUPERVISOR DE OBRA**

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA Nº 12**

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente: FONDOPE  
 Contratista: Consorcio San Jose  
 Supervisor: Consorcio Mendaza & JSU  
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios  
 Metodo del Contrato, con IGV: SI. 1907.074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018  
 Fecha termino de obra: 13/03/2018  
 Plazo de Ejecucion obra: 60 días calendario  
 Ampliacion de Plazo NPD: 6 D.C  
 Nueva fecha de termino: 19/03/2018

**03 INSTALACIONES SANITARIAS**

ITEM	DESCRIPCION	PROMEDIO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		UNID	METRADO	% I.I.	PARCIAL	METRADO	%	PARCIAL	METRADO	%	PARCIAL	METRADO	%	PARCIAL	METRADO	%
04	INSTALACIONES SANITARIAS															
04.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS															
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS															
04.01.01.01	INODORO TANQUE BAÑO	poza	6.00	437.07	2,622.42	-	0.00%	-	6.00	2,622.42	100.00%	6.00	2,622.42	100.00%	-	0.00%
04.01.01.02	URINARIO	poza	3.00	172.07	516.21	-	0.00%	-	3.00	516.21	100.00%	3.00	516.21	100.00%	-	0.00%
04.01.01.03	LAVATORIO	poza	12.00	127.07	1,524.84	-	0.00%	-	12.00	1,524.84	100.00%	12.00	1,524.84	100.00%	-	0.00%
04.01.01.04	DUCHA	poza	8.00	160.72	1,285.76	-	0.00%	-	8.00	1,285.76	100.00%	8.00	1,285.76	100.00%	-	0.00%
04.02	SISTEMA DE AGUA FRIA															
04.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA															
04.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 1/2" PVC SP	plb	20.00	74.01	2,146.29	-	0.00%	-	20.00	2,146.29	100.00%	20.00	2,146.29	100.00%	-	0.00%
04.02.01.02	SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 3/4" PVC SP	plb	1.00	96.25	96.25	-	0.00%	-	1.00	96.25	100.00%	1.00	96.25	100.00%	-	0.00%
04.02.02	RED DE DISTRIBUCION															
04.02.02.01	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 CIR DE 1/2"	m	42.90	12.96	556.84	42.90	100.00%	556.84	42.90	556.84	100.00%	42.90	556.84	100.00%	-	0.00%
04.02.02.02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 CIR DE 3/4"	m	11.75	12.30	144.53	11.75	100.00%	144.53	11.75	144.53	100.00%	11.75	144.53	100.00%	-	0.00%
04.02.02.03	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 CIR DE 1"	m	11.40	12.67	144.44	11.40	100.00%	144.44	11.40	144.44	100.00%	11.40	144.44	100.00%	-	0.00%
04.02.02.04	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 CIR DE 1 1/2"	m	4.05	13.93	56.42	4.05	100.00%	56.42	4.05	56.42	100.00%	4.05	56.42	100.00%	-	0.00%
04.02.03	RED DE ALIMENTACION															
04.02.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS															
04.02.03.01.01	EXCAVACION Y PROXIMO DE ZANJA PARA TUBERIA	m	92.75	7.42	688.21	92.75	100.00%	688.21	-0.00	-0.02	0.00%	92.75	688.21	100.00%	-	0.00%
04.02.03.01.02	REFINE Y NIVELACION TUBERIA	m	92.75	1.47	136.34	92.75	100.00%	136.34	-0.00	-	0.00%	92.75	136.34	100.00%	-	0.00%
04.02.03.01.03	CAMA DE APOYO (E=0.10 m)	m	92.75	4.65	431.29	92.75	100.00%	431.29	-	-	0.00%	92.75	431.29	100.00%	-	0.00%
04.02.03.01.04	RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m3	7.73	72.86	563.21	7.73	100.00%	563.21	-	-	0.00%	7.73	563.21	100.00%	-	0.00%
04.02.03.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXGENERA	m3	0.97	16.75	16.75	0.97	100.00%	16.75	-	-	0.00%	0.97	16.75	100.00%	-	0.00%
04.02.03.02	REDES DE ALIMENTACION															
04.02.03.02.01	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 3/4"	m	14.00	12.30	172.20	14.00	100.00%	172.20	-	-	0.00%	14.00	172.20	100.00%	-	0.00%
04.02.03.02.02	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1"	m	2.90	12.67	36.74	2.90	100.00%	36.74	-	-	0.00%	2.90	36.74	100.00%	-	0.00%
04.02.03.02.03	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/2"	m	79.20	13.93	1,103.26	79.20	100.00%	1,103.26	-	-	0.00%	79.20	1,103.26	100.00%	-	0.00%
04.02.04	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA															
04.02.04.01	CODO PVC SP 1/2"	und	66.00	7.60	501.60	66.00	100.00%	501.60	-	-	0.00%	66.00	501.60	100.00%	-	0.00%
04.02.04.02	CODO PVC SP 3/4"	und	5.00	10.07	50.35	5.00	100.00%	50.35	-	-	0.00%	5.00	50.35	100.00%	-	0.00%
04.02.04.03	CODO 45° PVC SP 3/4"	und	2.00	10.07	20.14	2.00	100.00%	20.14	-	-	0.00%	2.00	20.14	100.00%	-	0.00%
04.02.04.04	CODO PVC SP 1"	und	17.00	10.85	186.15	17.00	100.00%	186.15	-	-	0.00%	17.00	186.15	100.00%	-	0.00%
04.02.04.05	CODO PVC SP 1 1/2"	und	18.00	11.95	215.05	18.00	100.00%	215.05	-	-	0.00%	18.00	215.05	100.00%	-	0.00%
04.02.04.06	CODO 45° PVC SP 1 1/2"	und	2.00	11.95	23.90	2.00	100.00%	23.90	-	-	0.00%	2.00	23.90	100.00%	-	0.00%
04.02.04.07	TEE PVC SP 1/2"	und	4.00	8.13	32.52	4.00	100.00%	32.52	-	-	0.00%	4.00	32.52	100.00%	-	0.00%
04.02.04.08	TEE PVC SP 3/4"	und	7.00	9.01	63.07	7.00	100.00%	63.07	-	-	0.00%	7.00	63.07	100.00%	-	0.00%



**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA Nº 12**

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Obras: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Contratista: Consorcio San Jose  
 Cliente: FONDOPES  
 Supervision: Consorcio Maradoza & JSU  
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios  
 Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'607'074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018  
 Fecha termino de obra: 13/03/2018  
 Plazo de Ejecucion obra: 90 días calendario  
 Ampliacion de Plazo N°02: 6 D.C.  
 Nueva fecha de termino: 19/03/2018

**03 INSTALACIONES SANITARIAS**

ITEM	DESCRIPCION	MONTAJE DE CONSTRUCTIVA		VALORIZACION QUINCENAL ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		VALORIZACION QUINCENAL ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR		
		UNID	METRIDO	P.F.U.	PARCIAL	METRIDO	PARCIAL	%	METRIDO	PARCIAL	METRIDO	PARCIAL
04.02.04.09	TEE PVC Ø 1"	und	9.00	10.01	90.09	90.09	100.00%	90.09	90.09	100.00%	-	0.00%
04.02.04.10	TEE PVC Ø 1 1/2"	und	2.00	10.51	21.02	21.02	100.00%	21.02	21.02	100.00%	-	0.00%
04.02.04.11	REDUCCION PVC Ø 3/4 A 1/2"	und	18.00	9.65	173.70	173.70	100.00%	173.70	173.70	100.00%	-	0.00%
04.02.04.12	REDUCCION PVC Ø 1 A 1/2"	und	7.00	10.15	71.05	71.05	100.00%	71.05	71.05	100.00%	-	0.00%
04.02.04.13	REDUCCION PVC Ø 1 A 3/4"	und	5.00	10.15	50.75	50.75	100.00%	50.75	50.75	100.00%	-	0.00%
04.02.04.14	REDUCCION PVC Ø 1 1/2 A 3/4"	und	2.00	10.15	20.30	20.30	100.00%	20.30	20.30	100.00%	-	0.00%
04.02.04.15	REDUCCION PVC Ø 1 1/2 A 1"	und	4.00	10.65	42.60	42.60	100.00%	42.60	42.60	100.00%	-	0.00%
04.02.05	VALVULAS											
04.02.05.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 3/4"	und	1.00	88.80	88.80	88.80	100.00%	88.80	88.80	100.00%	-	0.00%
04.02.05.02	VALVULA ESFERICA DE Ø 1"	und	2.00	364.35	728.70	728.70	100.00%	728.70	728.70	100.00%	-	0.00%
04.02.05.03	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 1 1/2"	und	3.00	166.50	499.50	499.50	100.00%	499.50	499.50	100.00%	-	0.00%
04.02.05.04	LLAVE TORXO CARRIFO DE Ø 3/4" EN CAJUELA DE CONCRETO FERTILIZACION	und	1.00	365.88	365.88	365.88	100.00%	365.88	365.88	100.00%	-	0.00%
04.02.05	PIEZAS VARIAS											
04.02.05.01	CAJA PARA VALVULA (MOCHO DE MAYOLICA)	und	5.00	92.35	461.65	461.65	100.00%	461.65	461.65	100.00%	-	0.00%
04.02.07	EMPALMES Y PRUEBAS HIDRAULICAS											
04.02.07.01	EMPALME A LA RED EXISTENTE DE AGUA	und	1.00	98.59	98.59	98.59	100.00%	98.59	98.59	100.00%	-	0.00%
04.02.07.02	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA	m	98.10	254.87	254.87	254.87	100.00%	254.87	254.87	100.00%	-	0.00%
04.02.07.03	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA ABIERTA	m	98.10	145	139.35	139.35	100.00%	139.35	139.35	100.00%	-	0.00%
04.03	SISTEMA DE AGUA SALADA											
04.03.01	SALIDAS DE AGUA SALADA											
04.03.01.01	SALIDA DE AGUA SALADA CON TUBERIA PVC - Ø 3/4"	pfo	6.00	84.81	508.86	508.86	100.00%	508.86	508.86	100.00%	-	0.00%
04.03.01.02	SALIDA DE AGUA SALADA CON TUBERIA PVC - Ø 1 1/2"	pfo	8.00	128.25	1,010.00	1,010.00	100.00%	1,010.00	1,010.00	100.00%	-	0.00%
04.03.02	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA SALADA											
04.03.02.01	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC Ø 3/4"	m	38.10	12.30	367.89	367.89	100.00%	367.89	367.89	100.00%	-	0.00%
04.03.02.02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC Ø 1 1/2"	m	19.20	13.95	267.48	267.48	100.00%	267.48	267.48	100.00%	-	0.00%
04.03.03	REDES DE ALIMENTACION DE AGUA SALADA											
04.03.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
04.03.03.01.01	EXCAVACION Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERIA	m	91.00	7.42	675.22	675.22	100.00%	675.22	675.22	100.00%	-	0.00%
04.03.03.01.02	REFINE Y NIVELACION FTUBERIA	m	91.00	1.47	133.77	133.77	100.00%	133.77	133.77	100.00%	-	0.00%
04.03.03.01.03	CAJA DE APOYO (E=10 m)	m	91.00	4.65	423.15	423.15	100.00%	423.15	423.15	100.00%	-	0.00%
04.03.03.01.04	RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m3	7.56	72.86	552.28	552.28	100.00%	552.28	552.28	100.00%	-	0.00%
04.03.03.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	0.96	19.73	18.74	18.74	100.00%	18.74	18.74	100.00%	-	0.00%
04.03.03.02	REDES DE ALIMENTACION EN ZONA DE TAREAS PREVIAS INTERIORES											
04.03.03.02.01	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1"	m	15.00	12.67	190.05	190.05	100.00%	190.05	190.05	100.00%	-	0.00%
04.03.03.02.02	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/2"	m	48.00	13.93	682.57	682.57	100.00%	682.57	682.57	100.00%	-	0.00%

LUY N. VICENTE BASSILE  
 LUY VICENTE BASSILE  
 SUPERVISOR DE OBRAS

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA Nº 12**

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Obras: OPTIMIZACION DEL DESMARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente : FONDOPE  
 Contratista: Consorcio San Jose  
 Supervision: Consorcio Mendoza & JSU  
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios  
 Monto del Contrato, con IGV: S/ 1'807,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018  
 Fecha termino de obra: 13/03/2018  
 Plazo de Ejecucion obra: 60 días calendarios  
 Ampliacion de Plazo N°03: 6 D.C  
 Nueva fecha de termino: 19/03/2018

**03 INSTALACIONES SANITARIAS**

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACTIVA POR MATERIA			VALORIZACION ACTIVA POR ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR							
		UNID	METRADO	P.S.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%				
04.03.03.03	REDES DE ALIMENTACION EXTERIORES	m	27.00	13.93	376.11	27.00	376.11	100.00%			0.00%	27.00	376.11	100.00%			0.00%	
04.03.03.01	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/2"																	
04.03.04	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA SALADA																	
04.03.04.01	CODO PVC BP 3/4"	und	30.00	10.07	302.10	30.00	302.10	100.00%			0.00%	30.00	302.10	100.00%			0.00%	
04.03.04.02	CODO PVC BP 1"	und	4.00	10.95	43.80	4.00	43.80	100.00%			0.00%	4.00	43.80	100.00%			0.00%	
04.03.04.03	CODO PVC BP 1 1/2"	und	35.00	11.95	418.25	35.00	418.25	100.00%			0.00%	35.00	418.25	100.00%			0.00%	
04.03.04.04	TEE PVC BP 3/4"	und	6.00	9.01	54.06	6.00	54.06	100.00%			0.00%	6.00	54.06	100.00%			0.00%	
04.03.04.05	TEE PVC BP 1"	und	4.00	10.01	40.04	4.00	40.04	100.00%			0.00%	4.00	40.04	100.00%			0.00%	
04.03.04.06	TEE PVC BP 1 1/2"	und	18.00	10.51	189.18	18.00	189.18	100.00%			0.00%	18.00	189.18	100.00%			0.00%	
04.03.04.07	REDUCCION PVC BP 1" A 3/4"	und	4.00	10.15	40.60	4.00	40.60	100.00%			0.00%	4.00	40.60	100.00%			0.00%	
04.03.04.08	REDUCCION PVC BP 1 1/2" A 3/4"	und	2.00	10.15	20.30	2.00	20.30	100.00%			0.00%	2.00	20.30	100.00%			0.00%	
04.03.04.09	REDUCCION PVC BP 1 1/2" A 1"	und	2.00	10.85	21.30	2.00	21.30	100.00%			0.00%	2.00	21.30	100.00%			0.00%	
04.03.04.10	TAPON DE PVC DE 1"	und	2.00	19.29	38.58	2.00	38.58	100.00%			0.00%	2.00	38.58	100.00%			0.00%	
04.03.05	VALVULAS																	
04.03.05.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 3/4"	und	6.00	86.80	532.80	6.00	532.80	100.00%			0.00%	6.00	532.80	100.00%			0.00%	
04.03.05.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 1 1/2"	und	9.00	186.50	1,498.50	9.00	1,498.50	100.00%			0.00%	9.00	1,498.50	100.00%			0.00%	
04.03.06	PIEZAS VARIAS																	
04.03.06.01	NICHO DE PROTECCION PARA VALVULA (AREA DE ENVISPERADO)	und	6.00	92.33	553.98	6.00	553.98	100.00%			0.00%	6.00	553.98	100.00%			0.00%	
04.03.06.02	NICHO DE PROTECCION PARA VALVULA (AREA DE LAVADO)	und	16.00	92.33	1,477.28	16.00	1,477.28	100.00%			0.00%	16.00	1,477.28	100.00%			0.00%	
04.03.07	EMPALMES Y PRUEBAS HIDRAULICAS																	
04.03.07.01	EMPALME A LA RED EXISTENTE DE AGUA SALADA	und	1.00	96.59	96.59	1.00	96.59	100.00%			0.00%	1.00	96.59	100.00%			0.00%	
04.03.07.02	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECTACION A ZANJA TAPADA	m	27.00	2.85	71.55	27.00	71.55	100.00%			0.00%	27.00	71.55	100.00%			0.00%	
04.03.07.03	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECTACION A ZANJA ABIERTA	m	27.00	1.45	39.15	27.00	39.15	100.00%			0.00%	27.00	39.15	100.00%			0.00%	
04.03.08	SISTEMA DE CLORACION (AGUA SALADA)																	
04.03.08.01	EQUIPO Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLORACION	qib	1.00	17,521.96	17,521.96	1.00	17,521.96	100.00%			0.00%	1.00	17,521.96	100.00%			0.00%	
04.04	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL																	
04.04.01	REDES COLECTORAS																	
04.04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS																	
04.04.01.01.01	EXCAVACION Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERIA	m3	3.21	31.52	101.18	3.21	101.18	100.00%			0.00%	3.21	101.18	100.00%			0.00%	
04.04.01.01.02	REFINE Y INVELOCACION TUBERIA	m	16.97	1.47	24.95	16.97	24.95	100.00%			0.00%	16.97	24.95	100.00%			0.00%	
04.04.01.01.03	CAMA DE AFOFO (E=0.10 m)	m	16.97	4.65	78.91	16.97	78.91	100.00%			0.00%	16.97	78.91	100.00%			0.00%	
04.04.01.01.04	RELLENO Y COMPACTACION CON ESFUERZO Y MAT. PROPIO	m	16.97	16.21	309.02	16.97	309.02	100.00%			0.00%	16.97	309.02	100.00%			0.00%	
04.04.01.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	3.33	19.73	66.70	3.33	66.70	100.00%			0.00%	3.33	66.70	100.00%			0.00%	

0015

LUY N. VICENTE BASTIÑO  
 SUPERVISOR DE OBRA

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA Nº 12**

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente : FONDOPE  
 Contratista: Consorcio San Jose  
 Supervision: Consorcio Mendoza & JSU  
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios  
 Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'807,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018  
 Fecha termino de obra: 13/03/2018  
 Plazo de Ejecucion obra: 60 días calendarios  
 Aprobacion de Plazo (Nº): 6 D.C  
 Nueva fecha de termino: 18/03/2018

**03 INSTALACIONES SANITARIAS**

ITEM	DESCRIPCION	PROGRESO CONSTRUCTIVO			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		UNID	METRADO	%	UNID	METRADO	%	UNID	METRADO	%	UNID	METRADO	%	UNID	METRADO	%
04.04.01.02	INSTALACION DE TUBERIA COLECTORA															
04.04.01.02.01	TUBERIA PORENALE PLUVIAL PVC 849 Ø DE 3"	m	7.00	10.39	72.73	100.00%	7.00	100.00%	72.73	100.00%	72.73	100.00%	7.00	72.73	100.00%	-
04.04.01.02.02	TUBERIA PORENALE PLUVIAL PVC 849 Ø DE 4"	m	4.94	12.01	56.33	100.00%	4.94	100.00%	56.33	100.00%	56.33	100.00%	4.94	56.33	100.00%	-
04.04.01.02.03	TUBERIA PORENALE PLUVIAL PVC 849 Ø DE 6"	m	5.03	15.85	79.73	100.00%	5.03	100.00%	79.73	100.00%	79.73	100.00%	5.03	79.73	100.00%	-
04.04.02	CANALETAS METALICAS PORENALE PLUVIAL EN TECHO															
04.04.02.01	SIN TUBERIA DE CANALETAS PORENALE PLUVIAL EN TECHO ANCHO 0.120M INCLUIDO ACCESORIOS	m	11.50	31.67	364.21	100.00%	11.50	100.00%	364.21	100.00%	364.21	100.00%	11.50	364.21	100.00%	-
04.04.03	CAMARA DE INSPECCION															
04.04.03.01	CAJAS DE REGISTRO															
04.04.03.01.01	CAJA DE 300 X 300 X 180 mm CAJA DE REG. PREFAB. 0.80M X 0.78M, C/TAJAS LONGITUD. REFORZADO PROTECCION DE VALVULA	UND	1.00	140.49	140.49	100.00%	1.00	100.00%	140.49	100.00%	140.49	100.00%	1.00	140.49	100.00%	-
04.04.04	ESTRUCTURA DISIPADORA DE ENERGIA															
04.04.04.01	ESTRUCTURA DISIPADORA DE ENERGIA	UND	1.00	600.00	600.00	100.00%	1.00	100.00%	600.00	100.00%	600.00	100.00%	1.00	600.00	100.00%	-
04.04.05	EMPALMES Y PRIERAS HIDRAULICAS															
04.04.05.01	PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA EN RED PLUVIAL	m	9.97	1.18	11.76	100.00%	9.97	100.00%	11.76	100.00%	11.76	100.00%	9.97	11.76	100.00%	-
04.04.06	ACCESORIOS															
04.04.06.01	VALVULA CHECK BB. CERRIE RAPIDO AMORTIGUADO CON CLAPETA DN 6. DIEST. DISE. ENERGIA	UND	1.00	958.51	958.51	100.00%	1.00	100.00%	958.51	100.00%	958.51	100.00%	1.00	958.51	100.00%	-
04.04.06.02	CODO PVC 849 DE 4" X 4"	UND	1.00	36.25	36.25	100.00%	1.00	100.00%	36.25	100.00%	36.25	100.00%	1.00	36.25	100.00%	-
04.04.06.03	CAJA PAVALVULAS 0.55M X 0.80M, H=0.40M	UND	1.00	446.54	446.54	100.00%	1.00	100.00%	446.54	100.00%	446.54	100.00%	1.00	446.54	100.00%	-
04.04.06.04	CODO PVC 849 DE 3"	UND	4.00	28.35	113.40	100.00%	4.00	100.00%	113.40	100.00%	113.40	100.00%	4.00	113.40	100.00%	-
04.04.06.05	CODO PVC 849 DE 4" X 3"	UND	2.00	28.36	56.70	100.00%	2.00	100.00%	56.70	100.00%	56.70	100.00%	2.00	56.70	100.00%	-
04.05	DEBAGUE DOMESTICO Y VENTILACION															
04.05.01	SALIDA DE DESBAGUE Y VENTILACION															
04.05.01.01	SALIDA DE DESBAGUE EN PVC 849 Ø DE 2"	PHO	23.00	54.53	1,254.19	100.00%	23.00	100.00%	1,254.19	100.00%	1,254.19	100.00%	23.00	1,254.19	100.00%	-
04.05.01.02	SALIDA DE DESBAGUE EN PVC 849 Ø DE 4"	PHO	6.00	56.10	336.60	100.00%	6.00	100.00%	336.60	100.00%	336.60	100.00%	6.00	336.60	100.00%	-
04.05.01.03	SALIDA DE VENTILACION EN PVC 849 Ø DE 2"	PHO	9.00	625.41	625.41	100.00%	9.00	100.00%	625.41	100.00%	625.41	100.00%	9.00	625.41	100.00%	-
04.05.02	REDES DE DEBAGUE															
04.05.02.01	RED DE DEBAGUE DE TUBERIA DE PVC - 849 Ø DE 2"	m	35.94	11.92	428.40	100.00%	35.94	100.00%	428.40	100.00%	428.40	100.00%	35.94	428.40	100.00%	-
04.05.02.02	RED DE DEBAGUE DE TUBERIA DE PVC - 849 Ø DE 4"	m	30.42	12.01	365.34	100.00%	30.42	100.00%	365.34	100.00%	365.34	100.00%	30.42	365.34	100.00%	-
04.05.02.03	MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERIA PVC - 849 Ø DE 2"	m	36.15	14.24	514.78	100.00%	36.15	100.00%	514.78	100.00%	514.78	100.00%	36.15	514.78	100.00%	-
04.05.03	REDES COLECTORAS															
04.05.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS															
04.05.03.01.01	EXCAVACION Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERIA	m3	18.56	31.52	565.01	100.00%	18.56	100.00%	565.01	100.00%	565.01	100.00%	18.56	565.01	100.00%	-
04.05.03.01.02	REFINIR Y NIVELACION FITUBERIA	m	42.82	1.47	62.96	100.00%	42.82	100.00%	62.96	100.00%	62.96	100.00%	42.82	62.96	100.00%	-
04.05.03.01.03	CAMA DE APOYO (E=10 m)	m	42.82	4.65	198.11	100.00%	42.82	100.00%	198.11	100.00%	198.11	100.00%	42.82	198.11	100.00%	-
04.05.03.01.04	RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	m	42.82	18.21	779.75	100.00%	42.82	100.00%	779.75	100.00%	779.75	100.00%	42.82	779.75	100.00%	-
04.05.03.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	19.30	19.73	380.79	100.00%	19.30	100.00%	380.79	100.00%	380.79	100.00%	19.30	380.79	100.00%	-

LUIS N. VICENTE BARRALES  
 TITULAR GENERAL  
 SUPERVISOR DE OBRA



**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA Nº 12**

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

OBRA: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente : FONDOPEP  
 Contratista: Consorcio San Jose  
 Supervisor: Consorcio Mendoza & JSU  
 Sistema de Contratacion: Precios Limitados  
 Monto del Contrato, con IGV: S/ 1'907,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018  
 Fecha termino de obra: 19/03/2018  
 Plazo de Ejecucion obra: 60 dias calendarios  
 Ampliacion de Plazo NPD: 6 DC  
 Nueva fecha de termino: 19/03/2018

**03 INSTALACIONES SANITARIAS**

ITEM	DESCRIPCION	PROMEDIO CONTRACTUAL		VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR		
		UND	METRADO	P.U.	PARCIAL	METRADO	%	PARCIAL	METRADO	%	METRADO	PARCIAL
04.05.03.02	INSTALACION DE TUBERIA COLECTORA	m	42.82	12.01	514.27	100.00%	0.00%	42.82	100.00%	514.27	0.00%	0.00%
04.05.03.02.01	RED COLECTORA CON TUBERIA DE PVC S4P Ø DE 4											
04.05.04	ACCESORIOS											
04.05.04.01	YEE PVC S4P DE 2" X 2"	und	19.00	2.12	40.26	100.00%	0.00%	19.00	100.00%	40.26	0.00%	0.00%
04.05.04.02	YEE PVC S4P DE 4" X 4"	und	3.00	34.47	103.41	100.00%	0.00%	3.00	100.00%	103.41	0.00%	0.00%
04.05.04.03	YEE PVC S4P DE 4" X 2"	und	8.00	34.17	273.36	100.00%	0.00%	8.00	100.00%	273.36	0.00%	0.00%
04.05.04.04	YEE DOBLE PVC S4P DE 4" X 4"	und	2.00	36.49	72.98	100.00%	0.00%	2.00	100.00%	72.98	0.00%	0.00%
04.05.04.05	CODO PVC S4P DE 4" X 2"	und	14.00	18.67	261.38	100.00%	0.00%	14.00	100.00%	261.38	0.00%	0.00%
04.05.04.06	CODO PVC S4P DE 4" X 4"	und	10.00	19.38	193.80	100.00%	0.00%	10.00	100.00%	193.80	0.00%	0.00%
04.05.04.07	CODO PVC S4P DE Ø" X 2"	und	16.00	21.02	336.32	100.00%	0.00%	16.00	100.00%	336.32	0.00%	0.00%
04.05.04.08	TEE SANITARIA PVC S4P 2"	und	3.00	20.92	62.76	100.00%	0.00%	3.00	100.00%	62.76	0.00%	0.00%
04.05.05	ADITAMENTOS VARIOS											
04.05.05.01	SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION	und	10.00	56.00	560.00	100.00%	0.00%	10.00	100.00%	560.00	0.00%	0.00%
04.05.05.02	REGISTRO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION	und	3.00	66.50	199.50	100.00%	0.00%	3.00	100.00%	199.50	0.00%	0.00%
04.05.05.03	REGISTRO DE BRONCE 4" PROVISION Y COLOCACION	und	5.00	67.81	339.05	100.00%	0.00%	5.00	100.00%	339.05	0.00%	0.00%
04.05.05.04	SOMBRERO DE VENTILACION 2" PVC S4P	und	9.00	44.33	398.97	100.00%	0.00%	9.00	100.00%	398.97	0.00%	0.00%
04.05.06	CAMARA DE INSPECCION											
04.05.06.01	CAJAS DE REGISTRO											
04.05.06.01.01	CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	und	3.00	236.24	708.72	100.00%	0.00%	3.00	100.00%	708.72	0.00%	0.00%
04.05.06.01.02	CAJA DE REGISTRO DE 24" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	und	4.00	287.02	1,148.08	100.00%	0.00%	4.00	100.00%	1,148.08	0.00%	0.00%
04.05.07	EMPALMES Y PRUEBAS HIDRAULICAS											
04.05.07.01	PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRIENTA DE TUB. DESAGUE	m	107.36	1.71	183.62	100.00%	0.00%	107.36	100.00%	183.62	0.00%	0.00%
04.06	DESAGUE INDUSTRIAL Y VENTILACION											
04.06.01	SALIDA DE DESAGUE INDUSTRIAL Y VENTILACION											
04.06.01.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC S4L Ø DE 2"	pdo	14.00	54.63	763.42	100.00%	0.00%	14.00	100.00%	763.42	0.00%	0.00%
04.06.02	REDES DE DESAGUE											
04.06.02.01	RED DE DESAGUE DE TUBERIA DE PVC - S4L Ø DE 2"	m	44.30	11.92	528.06	100.00%	0.00%	44.30	100.00%	528.06	0.00%	0.00%
04.06.02.02	RED DE DESAGUE DE TUBERIA DE PVC - S4L Ø DE 4"	m	3.88	12.01	46.80	100.00%	0.00%	3.88	100.00%	46.80	0.00%	0.00%
04.06.03	REDES COLECTORAS											
04.06.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
04.06.03.01.01	EXCAVACION Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERIA	m3	4.71	31.52	148.46	100.00%	0.00%	4.71	100.00%	148.46	0.00%	0.00%
04.06.03.01.02	REFINIR Y NIVELACION P/TUBERIA	m	20.92	1.47	30.76	100.00%	0.00%	20.92	100.00%	30.76	0.00%	0.00%
04.06.03.01.03	CAMA DE APOYO (E=0.19 m)	m	20.92	4.65	97.28	100.00%	0.00%	20.92	100.00%	97.28	0.00%	0.00%
04.06.03.01.04	RELLENO Y COMBACTACION CON SQUIRO Y MAT. PROPIO	m	20.92	18.21	380.95	100.00%	0.00%	20.92	100.00%	380.95	0.00%	0.00%
04.06.03.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	4.90	19.73	96.68	100.00%	0.00%	4.90	100.00%	96.68	0.00%	0.00%
04.06.03.02	INSTALACION DE TUBERIA COLECTORA											
04.06.03.02.01	RED COLECTORA CON TUBERIA DE PVC S4P Ø DE 4	m	20.92	12.01	251.25	100.00%	0.00%	20.92	100.00%	251.25	0.00%	0.00%
04.06.04	ACCESORIOS											
04.06.04.01	CODO PVC S4P DE 4" X 2"	und	12.00	18.67	224.04	100.00%	0.00%	12.00	100.00%	224.04	0.00%	0.00%
04.06.04.02	CODO PVC S4P DE 4" X 4"	und	2.00	19.38	38.76	100.00%	0.00%	2.00	100.00%	38.76	0.00%	0.00%

VICENTE BASSANO  
 SUPERVISOR DE OBRA

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA Nº 12**

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Obras: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente : FONDOPES  
 Contratista: Consorcio San Jose  
 Supervision: Consorcio Mendoza & JSU  
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios  
 Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'807,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018  
 Fecha termino de obra: 13/03/2018  
 Plazo de Ejecucion obra: 60 dias calendarios  
 Ampliacion de Plazo Nº03: 6 D.C  
 Nueva fecha de termino: 19/03/2018

03 INSTALACIONES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL				VALORIZACION ACUMULADA INTERVEN				VALORIZACION ACTUAL				VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL				SALDO POR VALORIZAR				
		UNID	METRADO	VAL.	%	UNID	METRADO	VAL.	%	UNID	METRADO	VAL.	%	UNID	METRADO	VAL.	%	UNID	METRADO	VAL.	%	
04.06.04.03	TEE SANITARIA PVC SAP 2"	und	2.00	41.84	100.00%	2.00	41.84	100.00%	2.00	41.84	100.00%	0.00%	2.00	41.84	100.00%	0.00%						
04.06.05	CAMARA DE INSPECCION																					
04.06.05.01	CAJAS DE REGISTRO																					
04.06.05.01.01	CAJA DE REGISTRO DE 24" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	und	6.00	1,722.12	100.00%	6.00	1,722.12	100.00%	6.00	1,722.12	100.00%	0.00%	6.00	1,722.12	100.00%	0.00%						
04.06.06	EMPALMES Y PRUEBAS HIDRAULICAS																					
04.06.06.01	PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRIENTA DE TUB. DESAGUE	m	66.10	118.16	100.00%	66.10	118.16	100.00%	66.10	118.16	100.00%	0.00%	66.10	118.16	100.00%	0.00%						
04.06.07	PLANTA DE TRATAMIENTO																					
04.06.07.01	PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE INDUSTRIAL INCLUIDO ACCESORIOS	gb	1.00	190,000.00	100.00%	1.00	190,000.00	100.00%	1.00	190,000.00	100.00%	0.00%	1.00	190,000.00	100.00%	0.00%						
	<b>COSTO DIRECTO</b>			253,563.06			253,563.06			40,583.66				253,563.06								0.00
	<b>GASTOS GENERALES</b>		15.50%	39,306.37			33,014.81			6,290.46				39,306.37								0.00
	<b>UTILIDADES</b>		5.35%	13,564.89			11,386.46			2,177.23				13,564.89								0.00
	<b>SUB TOTAL</b>			306,434.31			307,968.79			49,047.35				306,434.31								0.00
	IGV		18%	55,158.17			46,333.79			8,823.16				55,158.17								0.00
	<b>TOTAL SUB PRESUPUESTO DE OBRA</b>			361,617.03			363,743.82			57,873.51				361,617.03								0.00
	<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>			100.00%			84.00%			16.00%				100.00%								0.00%

0018

LUCY N. VICENTE BASSO  
 SUPERVISOR DE OBRA

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 12**

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018  
 OBRA: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Contratista: Consorcio San Jose  
 Supervisor: Consorcio Mierzoza & JSJ  
 Sistema de Contratacion: Precojo Unitario  
 Monto del Contrato, con IGV: S/ 1'807,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018  
 Fecha termino de obra: 13/03/2018  
 Plazo de Ejecucion obra: 60 dias calendario  
 Ampliacion de Plazo N°03: 6 D.C  
 Nueva fecha de termino: 19/03/2018

**04 INSTALACIONES ELECTRICAS**

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL		VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR			
		UNID	METRADO	P.A.J.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%
05	INSTALACIONES ELECTRICAS												
05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
05.01.01	CORTE, ROTURA Y RESANE DE PAVIMENTO	m	20.00	284.22	5,684.40	20.00	5,684.40	100.00%	20.00	5,684.40	20.00	5,684.40	100.00%
05.01.02	EXCAVACION DE ZANJA DE 0.80 x 0.80, TERRENO SEMIROCOSO	m	20.00	91.85	1,837.00	20.00	1,837.00	100.00%	20.00	1,837.00	20.00	1,837.00	100.00%
05.01.03	RELLENO, COMPACTADO Y NIVELACION DE ZANJA 0.8 x 0.80 m, TERRENO SEMIROCOSO	m	30.00	27.55	828.50	30.00	828.50	100.00%	30.00	828.50	30.00	828.50	100.00%
05.01.04	DUCTOS DE CONCRETO DE 2 VAS	UND	3.00	182.33	578.99	3.00	578.99	100.00%	3.00	578.99	3.00	578.99	100.00%
05.01.05	CANTA DE SEÑALIZACION	m	20.00	6.85	133.20	20.00	133.20	100.00%	20.00	133.20	20.00	133.20	100.00%
05.02	CANALIZACIONES ELECTRICAS												
05.02.01	TUBERIA DE PVC-P Ø 25mm	m	283.58	12.14	3,564.06	50.00	607.00	17.03%	243.58	2,957.06	283.58	3,564.06	100.00%
05.02.02	TUBERIA DE PVC-P Ø 25mm	m	4.99	13.83	69.01	-	-	0.00%	4.99	69.01	4.99	69.01	100.00%
05.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IBC 3/4" (25mm) IBC/ FLUJACION CON CANAL UNISTRUT Y CURVAS	m	172.52	23.64	4,078.37	-	-	0.00%	172.52	4,078.37	172.52	4,078.37	100.00%
05.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IBC 1 1/2" (38mm) IBC/ FLUJACION CON CANAL UNISTRUT Y CURVAS	m	28.98	37.55	1,088.49	-	-	0.00%	28.98	1,088.49	28.98	1,088.49	100.00%
05.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IBC 1" (25mm) IBC/ FLUJACION CON CANAL UNISTRUT Y CURVAS	m	25.31	28.43	719.56	-	-	0.00%	25.31	719.56	25.31	719.56	100.00%
05.03	CABLES ELECTRICOS ALIMENTADORES												
05.03.01	CABLE ELECTRICOS NDH 3-1x10mm2	m	26.25	15.80	414.75	-	-	0.00%	26.25	414.75	26.25	414.75	100.00%
05.03.02	CABLE ELECTRICOS NHV-60 10mm2	m	54.81	8.01	439.03	-	-	0.00%	54.81	439.03	54.81	439.03	100.00%
05.03.03	CABLE ELECTRICOS NH-80 10mm2	m	20.90	7.78	162.60	-	-	0.00%	20.90	162.60	20.90	162.60	100.00%
05.03.04	CABLE ELECTRICOS NH-80 6mm2	m	45.28	6.85	300.98	-	-	0.00%	45.28	300.98	45.28	300.98	100.00%
05.03.05	CABLE ELECTRICOS NH-80 4mm2	m	1,465.88	8.09	8,827.21	-	-	0.00%	1,465.88	8,827.21	1,465.88	8,827.21	100.00%
05.03.06	CABLES EMERGENCIA 6x2-1mm2	WF	11.55	16.41	188.54	-	-	0.00%	11.55	188.54	11.55	188.54	100.00%
05.04	SALIDAS ELECTRICAS												
05.04.01	SALIDA CENTRO DE LUZ EN TECHO EMPOTRADA	UND	14.00	36.70	513.80	-	-	0.00%	14.00	513.80	14.00	513.80	100.00%
05.04.02	SALIDA CENTRO DE LUZ EN TECHO ADOSDADO	UND	36.00	37.20	1,339.20	-	-	0.00%	36.00	1,339.20	36.00	1,339.20	100.00%
05.04.03	SALIDA CENTRO DE LUZ EN PARED	UND	6.00	36.70	220.20	-	-	0.00%	6.00	220.20	6.00	220.20	100.00%
05.04.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE EMPOTRADO	UND	8.00	47.52	380.16	-	-	0.00%	8.00	380.16	8.00	380.16	100.00%
05.04.05	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE CON PUERTA TIERRA A PRUEBA DE AGUA	UND	3.00	49.02	147.06	-	-	0.00%	3.00	147.06	3.00	147.06	100.00%
05.04.06	LUMINARIAS												
05.05	LUMINARIAS HERMETICA P/ADOSAR 2x18 WATTS, IP 65, SIMILAR AL MODELO ANI	UND	27.00	128.03	3,452.81	-	-	0.00%	27.00	3,452.81	27.00	3,452.81	100.00%
05.05.01	LUMINARIA HERMETICA P/ADOSAR 2x18 WATTS, IP 65, SIMILAR AL MODELO ANI	UND	10.00	188.03	1,880.30	-	-	0.00%	10.00	1,880.30	10.00	1,880.30	100.00%
05.05.02	LUMINARIA HERMETICA P/ADOSAR 2x18 WATTS, IP 65, SIMILAR AL MODELO ANI	UND	7.00	92.13	644.91	-	-	0.00%	7.00	644.91	7.00	644.91	100.00%
05.05.03	LUMINARIA HERMETICA P/ADOSAR 2x18 WATTS, IP 65, SIMILAR AL MODELO ANI	UND	6.00	152.13	912.78	-	-	0.00%	6.00	912.78	6.00	912.78	100.00%
05.05.04	LUMINARIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR DE 70 WATTS C/ PASTORAL PS 1.00/1001.57g	UND	2.00	671.99	1,343.98	-	-	0.00%	2.00	1,343.98	2.00	1,343.98	100.00%

LUCY N. VICENTE BASSINIS  
 SUPERVISOR DE OBRA

**VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA Nº 12**

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente: FONDOPE  
 Contratista: Consorcio San Jose  
 Supervisor: Consorcio Mierozza & JSJ  
 Sistema de Contratacion: Precios Unitarios  
 Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'907,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018  
 Fecha termino de obra: 13/03/2018  
 Plazo de Ejecucion obra: 60 dias calendarios  
 Aplicacion de Plazo N°03: 6 D.C.  
 Nueva fecha de termino: 19/03/2018

**04 INSTALACIONES ELECTRICAS**

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		UND	METRADO	P.U.	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
05.05.06	LUMINARIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR DE 150 WATTS C/ PASTORAL PS 1.00/1901.579	UND	4.00	771.96	-	-	0.00%	4.00	3,087.92	100.00%	4.00	3,087.92	100.00%	-	-	0.00%
05.06	TABLEROS ELECTRICOS	UND	1.00	1,957.52	-	-	0.00%	1.00	1,957.52	100.00%	1.00	1,957.52	100.00%	-	-	0.00%
05.06.01	TABLERO GENERAL DE PROTECCION TOP	UND	1.00	2,866.02	-	-	0.00%	1.00	2,866.02	100.00%	1.00	2,866.02	100.00%	-	-	0.00%
05.06.02	TABLERO DE DISTRIBUCION TAREAS PREVIAS (TD-TP)	UND	1.00	2,287.02	-	-	0.00%	1.00	2,287.02	100.00%	1.00	2,287.02	100.00%	-	-	0.00%
05.06.03	TABLERO BOMBAS SUMINERO T85-01	UND	1.00	1,541.57	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	1,541.57	100.00%	-	-	0.00%
05.07	PUESTA A TIERRA	UND	1.00	384.24	-	-	0.00%	12.00	384.24	100.00%	12.00	384.24	100.00%	-	-	0.00%
05.07.01	POZO DE PUESTA A TIERRA R < 16 ORNOS	UND	12.00	32.02	-	-	0.00%	2.00	70.04	100.00%	2.00	70.04	100.00%	-	-	0.00%
05.08	CAJAS DE PASE	UND	2.00	35.02	-	-	0.00%	11.00	412.72	100.00%	11.00	412.72	100.00%	-	-	0.00%
05.08.01	CAJA DE PASE DE F655 CON TAPA CIEGA, TIPO PESADO 100 X 100 X 90 mm	UND	4.00	39.27	-	-	0.00%	4.00	157.08	100.00%	4.00	157.08	100.00%	-	-	0.00%
05.08.02	CAJA DE PASE DE F655 CON TAPA CIEGA, TIPO PESADO 200 X 200 X 100 mm	UND	1.00	48.59	-	-	0.00%	1.00	48.59	100.00%	1.00	48.59	100.00%	-	-	0.00%
05.08.03	CAJA DE PASE DE POLYESTER, REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 138 X 138 X 128 mm	UND	4.00	199.10	-	-	0.00%	4.00	798.40	100.00%	4.00	798.40	100.00%	-	-	0.00%
05.08.04	CAJA DE PASE DE POLYESTER, REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 180 X 138 X 141 mm	UND	1.00	279.02	-	-	0.00%	1.00	279.02	100.00%	1.00	279.02	100.00%	-	-	0.00%
05.08.05	CAJA DE PASE DE POLYESTER, REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 270 X 190 X 171 mm	UND	1.00	3,500.00	-	-	0.00%	1.00	3,500.00	100.00%	1.00	3,500.00	100.00%	-	-	0.00%
05.09	SISTEMA DE CONTROL	UND	1.00	67,981.99	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
05.09.01	BOYAS DE CONTROL DE NIVEL, Inc. 10 mm cable sumergible	UND	4.00	199.10	-	-	0.00%	4.00	798.40	100.00%	4.00	798.40	100.00%	-	-	0.00%
05.09.02	BANDEJA PORTABLE PARA BOYAS, SEGUN PLANO	UND	1.00	279.02	-	-	0.00%	1.00	279.02	100.00%	1.00	279.02	100.00%	-	-	0.00%
05.10	PUESTA EN MARCHA	UND	1.00	3,500.00	-	-	0.00%	1.00	3,500.00	100.00%	1.00	3,500.00	100.00%	-	-	0.00%
05.10.01	PROBANTE DE AISLAMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA Y PUESTA EN SERVICIO	UND	1.00	67,981.99	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
<b>COSTO DIRECTO</b>																
<b>GASTOS GENERALES</b>		15.50%			11,204.86			48,696.53			48,696.53			67,981.99		0.00%
<b>UTILIDADES</b>		5.35%			1,737.93			7,237.78			7,237.78			8,974.81		0.00%
<b>SUB TOTAL</b>					999.56			2,488.20			2,488.20			3,087.78		0.00%
<b>IGV</b>		18%			18,043.28			86,491.51			86,491.51			96,974.86		0.00%
<b>TOTAL SUB PRESUPUESTO DE OBRA</b>					2,437.79			10,167.64			10,167.64			12,696.42		0.00%
<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>					15,981.84			66,568.95			66,568.95			82,569.98		0.00%
					10.39%			96.39%			96.39%			100.00%		0.00%

0.20  
 LUCY N. VICENTE BASSILIO  
 SUPERVISOR DE OBRA

## RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBAJADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente: FONDOPES

Contratista: Consorcio San Jose

Supervisor: Consorcio Mendoza & JSU

Sistema de Contratación: Precios Unitarios

Monto del Contrato, con IGV: S/ 1,937,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018

Fecha término de obra: 13/03/2018

Plazo de Ejecución obra: 60 D.C.

Ampliación de Plazo MAX: 6 D.C.

Nueva fecha de término: 19/03/2018

Items	Porcentaje Pagar	VAL. C. Pagar	VAL. C. Pagar	VAL. C. Pagar	VAL. C. Pagar	VAL. C. Pagar	VAL. C. Pagar	VAL. C. Pagar	VAL. C. Pagar	VAL. C. Pagar	VAL. C. Pagar	VAL. C. Pagar	VAL. C. Pagar	VAL. C. Pagar	VAL. C. Pagar	VAL. C. Pagar	VAL. C. Pagar	RESUMEN DE VALORES		
																		Presupuesto	Presupuesto	
01 ESTRUCTURA		43,359.99	57,573.85	24,428.04	482.42	17,978.40	57,573.85	17,014.00	17,978.40	24,428.04	19,235.42	0.00	199,832.34	0.00	103,115.21	6,058.04	7,472.78	430,873.47	7,003.79	0.00
02 ARQUITECTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,980.49	0.00	36,018.21	81,976.92	217,209.21	377,594.84	0.00	0.00	
03 INST. SANITARIAS		0.00	98,491.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,200.46	0.00	6,339.80	1,997.18	40,563.96	253,563.05	0.00	0.00	
04 INST. ELECTRICAS		57,991.99	9,990	9,990	0.00	0.00	9,990	9,990	0.00	0.00	9,990	9,990	9,990	9,990	2,148.97	46,965.33	57,991.99	0.00	0.00	
COSTO DIRECTO		43,359.99	174,014.00	24,910.48	482.42	17,978.40	174,014.00	18,235.42	3,881.12	3,881.12	1,029.09	308,821.37	0.00	145,473.22	92,177.71	311,880.89	1,119,563.15	7,003.79	0.00	
GASTOS GENERALES	15.50%	6,720.80	26,972.17	3,681.12	0.00	0.00	47,887.31	0.00	0.00	0.00	22,548.35	0.00	0.00	14,287.55	48,353.96	173,562.74	1,085.59	0.00	0.00	
UTILIDAD	5.35%	2,319.78	9,909.75	1,332.71	0.00	0.00	16,521.94	0.00	0.00	0.00	7,782.81	0.00	0.00	4,931.50	16,899.91	59,917.49	374.70	0.00	0.00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>90,400.57</b>	<b>200,906.92</b>	<b>30,744.31</b>	<b>482.42</b>	<b>19,310.40</b>	<b>308,821.37</b>	<b>18,235.42</b>	<b>3,881.12</b>	<b>3,881.12</b>	<b>1,029.09</b>	<b>373,218.62</b>	<b>0.00</b>	<b>178,261.39</b>	<b>99,117.21</b>	<b>377,994.88</b>	<b>1,288,463.39</b>	<b>7,378.49</b>	<b>0.00</b>	
IMPUESTO (IGV)	18.00%	9,432.10	37,853.27	5,418.77	0.00	0.00	67,177.91	0.00	0.00	0.00	31,844.79	0.00	0.00	20,051.42	67,860.87	243,823.41	1,523.83	0.00	0.00	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE LA OBRA</b>		<b>99,832.67</b>	<b>238,760.19</b>	<b>36,163.08</b>	<b>482.42</b>	<b>19,310.40</b>	<b>448,218.69</b>	<b>18,235.42</b>	<b>3,881.12</b>	<b>3,881.12</b>	<b>1,029.09</b>	<b>508,216.61</b>	<b>0.00</b>	<b>207,106.37</b>	<b>129,168.63</b>	<b>444,855.75</b>	<b>1,432,286.79</b>	<b>8,902.62</b>	<b>0.00</b>	
PORCENTAJE DE AVANCE	100%	3.85%	15.44%	2.21%	1.71%	0.00%	27.40%	0.00%	0.00%	0.00%	12.91%	8.16%	27.85%	7.17%	27.85%	96.38%	0.62%	0.00%	0.00%	
PORCENTAJE DE AVANCE ACLIM.	100%	3.85%	19.29%	21.50%	23.21%	50.61%	50.61%	50.61%	50.61%	50.61%	50.61%	50.61%	50.61%	50.61%	50.61%	50.61%	50.61%	0.62%	0.00%	0.00%

0021

*LUCY N. VICENTE BASSIDO*  
**Lucy Vicente**  
SUPERVISOR DE OBRA

# REINTEGRO AUTORIZADO POR REAJUSTE

0022

DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente : FONDOPE

Contratista: Consorcio San Jose

Supervision: Consorcio Mendoza & JSU

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios

Monto del Contrato, con IGV: S/. 1'607,074.41

Fecha de inicio de obra: 13/01/2018

Fecha termino de obra: 13/03/2018

Plazo de Ejecucion obra: 60 D.C.

Ampliacion de Plazo N°03: 6 D.C.

Nueva fecha de termino: 19/03/2018

Val. N°	MES	VALORACION		K-1	REINTEGRO		REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO	REINTEGRO NETO AUTORIZADO
		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		
<b>FORMULA N°01 - ESTRUCTURA</b>								
1	15-ene-18	52,354.80	52,400.55	0.002	104.71	104.80	104.80	104.80
2	31-ene-18	336,480.88	69,577.76	0.002	672.96	139.16	139.16	139.16
3	15-feb-18	133,574.81	29,521.29	0.002	267.15	59.04	59.04	59.04
4	28-feb-18	4,158.81	23,246.00	0.002	8.32	46.49	46.49	46.49
5	15-mar-18	2,607.86	0.00	0.002	5.21	0.00	0.00	0.00
6	19-mar-18	149,428.40	205,000.68	0.002	298.86	410.00	410.00	410.00
REINTEGRO ACUMULADO ANTERIOR								789.49
REINTEGRO ACTUAL								0.00

<b>FORMULA N°02 - ARQUITECTURA</b>								
1	15-ene-18	0.00	0.00	0.004	0.00	0.00	0.00	0.00
2	31-ene-18	38,878.86	21,726.89	0.004	155.51	86.91	86.91	86.91
3	15-feb-18	132,899.87	583.01	0.004	530.80	2.33	2.33	2.33
4	28-feb-18	69,806.86	0.00	0.004	279.22	0.00	0.00	0.00
5	15-mar-18	214,939.86	0.00	0.004	859.76	0.00	0.00	0.00
6	19-mar-18	405,093.22	28,920.00	0.004	1,620.37	115.68	115.68	115.68
REINTEGRO ACUMULADO ANTERIOR								204.92
REINTEGRO ACTUAL								0.00

<b>FORMULA N°03 - INST. SANITARIAS</b>								
1	15-ene-18	2,924.26	0.00	0.004	11.70	0.00	0.00	0.00
2	31-ene-18	296,341.20	118,991.26	0.004	1,185.36	475.97	209.84	209.84
3	15-feb-18	7,189.87	0.00	0.004	28.76	0.00	0.00	0.00
4	28-feb-18	0.00	0.00	0.004	0.00	0.00	0.00	0.00
5	15-mar-18	0.00	0.00	0.004	0.00	0.00	0.00	0.00
6	19-mar-18	59,120.81	126,343.24	0.004	236.48	513.37	0.00	0.00
REINTEGRO ACUMULADO ANTERIOR								209.84
REINTEGRO ACTUAL								0.00

<b>FORMULA N°04 - INST. ELECTRICAS</b>								
1	15-ene-18	0.00	0.00	0.007	0.00	0.00	0.00	0.00
2	31-ene-18	19,008.78	0.00	0.007	133.06	0.00	0.00	0.00
3	15-feb-18	22,656.81	0.00	0.007	158.60	0.00	0.00	0.00
4	28-feb-18	0.00	0.00	0.007	0.00	0.00	0.00	0.00
5	15-mar-18	28,308.87	0.00	0.007	198.16	0.00	0.00	0.00
6	19-mar-18	59,027.86	10,946.70	0.007	413.20	76.63	76.63	76.63
ACUMULADO ACTUAL		129,002.41	10,946.70		903.02	76.63	76.63	76.63
REINTEGRO ACUMULADO ANTERIOR								76.63
REINTEGRO ACTUAL								0.00

Los Reajustes se recalculan en la Liquidacion

LUCY N. VICENTE BASSIUS 054  
*Lucy Vicente*  
 SUPERVISOR DE OBRA

# CURVA DE AVANCE DE OBRA

## VALORIZACION QUINCENAL DE OBRA N° 12

DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Obra: OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

Cliente : FONDOPES

Contratista: Consorcio San Jose

Supervision: Consorcio Mendoza & JSU

Sistema de Contratacion: Precios Unitarios

ZONA GEOGRAFICA 1


Fecha de inicio de obra: 13/01/2018

Fecha termino de obra: 13/03/2018

Plazo de Ejecucion obra: 60 D.C.

Ampliacion de Plazo N°03: 6 D.C.

Nueva fecha de termino: 19/03/2018

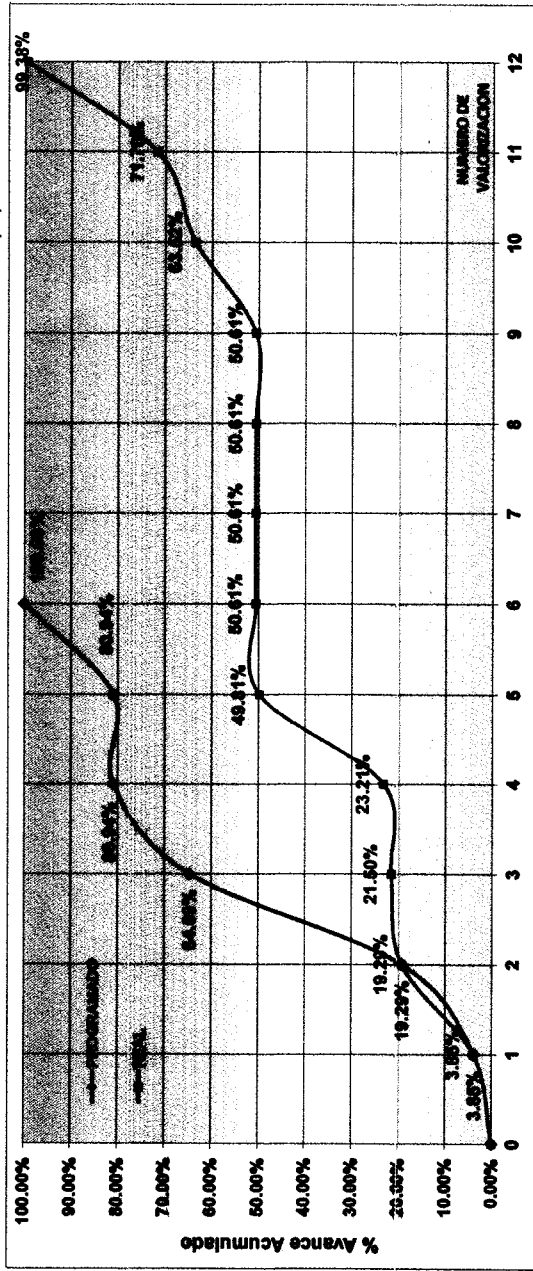

VALORIZACION	PERIODO 1		PERIODO 2		PERIODO 3		PERIODO 4		PERIODO 5		PERIODO 6		PERIODO 7		PERIODO 8		PERIODO 9		PERIODO 10		PERIODO 11		PERIODO 12	
	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR
1	15-ene-18	52,400.55	31-ene-18	210,295.91	15-feb-18	618,321.69	28-feb-18	221,358.61	15-mar-18	259,550.72	31-mar-18	1,361,927.47	15-abr-18		30-abr-18		15-may-18		31-may-18		15-jun-18		30-jun-18	
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
TOTAL (Sin IGV.)		1,361,927.47	100.00%																					

Situacion de la Obra : CULMINADO

NOTA: El Deductivo vinculante N°01 representa el 0.62%

LUCY N. VICENTE BASSILO  
*Lucy Vicente Bassilo*  
SUPERVISOR DE OBRA
