



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

MEMORANDO N° 2860 –2018-FONDEPES/DIGENIPAA



A: **TERESA ZENaida QUIROZ SILVA**
Jefa de la Oficina General de Administración

Asunto: **PAGO DE VALORIZACIÓN DE OBRA N°10 – AGOSTO 2018**
CONTRATO N° 038-2017-FONDEPES PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA,
DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA”

Referencia: **a) CARTA N°100-2018-CONS/AHJ/RL-MORRO SAMA**
b) INFORME N°93–2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/bvs

Fecha: **Lima, 13 SEP 2018**

Por medio de la presente, me dirijo a usted para saludarlo y manifestarle que, de acuerdo a lo indicado en la carta de la referencia a), el supervisor **ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA** encargado de la Supervisión de la Obra **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA”**; ha presentado la **VALORIZACION DE OBRA N°010** correspondiente al **CONTRATO N°038-2017-FONDEPES** con el contratista **CONSORCIO OBRAS**, integrado por las empresas **J.P.C. INGENIEROS S.A.C.** y **SOLUCIONES INTEGRALES EMDMAS S.A.C.**

Cabe destacar que el trámite de pago de la presente valorización se está financiando con la transferencia financiera a favor de FONDEPES en el marco de la continuidad de los Proyectos de inversión; con Resolución Ministerial N°217-2018-PRODUCE, de fecha 21 de mayo del 2018.

En vista de lo solicitado y tal como se indica en el Informe de la referencia b); se han cumplido con todos los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, el contrato, las bases integradas y demás documentos que forman parte integrante del expediente de contratación; por lo que esta Dirección concluye que **LA ENTIDAD** debe pagar la **Valorización N°10– agosto 2018** solicitada.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración.

Atentamente;



FONDEPES

Ing. Luis Alberto Barberi Quino
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal y Acuicola

FONDEPES
OFIC. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
13 SEP 2018
DOCUMENTO RECIBIDO
HORA: 2:10 FIRMA:

LABQ/RAMG/bvs



CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por el presente documento, que el director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, al suscribir la presente; da su conformidad para realizar el pago por concepto de **VALORIZACION DE OBRA N°10 - AGOSTO 2018** por la suma de **S/29,349.50 (Veintinueve Mil Trecientos Cuarenta y Nueve con 50/100 Soles)** incluido el IGV. a favor del contratista **CONSORCIO OBRAS**, integrado por las empresas **J.P.C. INGENIEROS S.A.C.** y **SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C.**, encargado de la Ejecución de Obra: “**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA**”, según **CONTRATO N°038-2017-FONDEPES**.

Lima,



FONDEPES

Ing. Luis Alberto Barboza Quino
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal y Acuícola



INFORME N°093-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/bvs

A: **ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO**
Director General de la DIGENIPAA

Asunto: **VALORIZACION DE OBRA N°10 (AGOSTO 2018) – CONSORCIO OBRAS (J.P.C. INGENIEROS S.A.C. y SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C.)**

CONTRATO N° 038-2017-FONDEPES PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

Referencia: **CARTA N°100-2018-CONS/AHJ/RL-MORRO SAMA**

Fecha: **Lima, 10 de septiembre de 2018**



Por medio de la presente, me dirijo a usted para saludarlo y manifestarle que, de acuerdo al documento de la referencia, el **ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA** encargado de la Supervisión de la Obra; ha presentado la **VALORIZACION DE OBRA N° 10** del contratista **CONSORCIO OBRAS**, integrado por las empresas **J.P.C. INGENIEROS S.A.C.** y **SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C.** encargado de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"; correspondiente al mes de agosto de 2018. Al respecto, debo manifestar lo siguiente:

ANTECEDENTES

1.1 Datos generales:

Proceso de Selección:	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2017-FONDEPES, derivada de la LICITACION PUBLICA N° 0004-2017-FONDEPES
Contrato de Obra:	CONTRATO N° 038-2017-FONDEPES
Fecha de Firma de Contrato:	02 DE NOVIEMBRE DE 2017
Supervisión de la Obra:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA
Sistema del Contrato:	PRECIOS UNITARIOS
Monto de Contrato:	S/ 3'680,960.43 (TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 43/100 SOLES)
Contratista Ejecución de Obra:	CONSORCIO OBRAS (J.P.C. INGENIEROS S.A.C. y SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C.)
Residente de Obra:	ING. OSCAR LUÍS LICOTA COAQUIRA
Contratista Supervisión de Obra:	ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
Supervisor de Obra:	ING. DAVID MANUEL VELA FARFÁN
Plazo de Obra:	75 (SETENTA Y CINCO) DIAS CALENDARIO
Fecha de Entrega de Terreno:	17 DE NOVIEMBRE DE 2017
Fecha de Inicio de Obra:	28 DE NOVIEMBRE DE 2017





Fecha de Término Contractual:	10 DE FEBRERO DE 2018
Fecha de Ampliación de Plazo N°4	01 DE JUNIO DEL 2018
Fecha Valorización N°010	30 DE AGOSTO DE 2018

- 1.2 Mediante **MEMORANDO N°1246-2017-FONDEPES/DIGENIPAA**, se aprueba el Expediente Técnico para la Ejecución del Saldo de Obra: **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA”**, con código **SNIP N°272805**, con un monto de inversión de **S/ 3'718,141.85 (Tres Millones Setecientos Dieciocho Mil Ciento Cuarenta y Uno con 85/100 Soles)**, con un **Plazo de Ejecución de 75 (Setenta y Cinco) días calendario**.
- 1.3 Con fecha 26 de octubre de 2017, se firma el **CONTRATO N° 035-2017-FONDEPES** con el **ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA** para la Supervisión del Saldo de Obra: **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA”**, bajo el sistema de Suma Alzada; por un monto total de **S/ 366,692.45 (Trescientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Dos con 45/100 Soles)** y por un **plazo total de 75 (Setenta y Cinco) días calendario**.
- 1.4 Con fecha 02 de noviembre de 2017, se firma el **CONTRATO N° 038-2017-FONDEPES** con el **CONSORCIO OBRAS**, integrado por las empresas **J.P.C. INGENIEROS S.A.C.** y **SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C.**; ganadores de la buena pro de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2017-FONDEPES**, derivada de la **LICITACION PUBLICA N° 0004-2017-FONDEPES** para la Ejecución del Saldo de Obra: **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA”**, bajo el sistema de Precios Unitarios; por un monto total de **S/ 3'680,960.43 (Tres Millones Seiscientos Ochenta Mil Novecientos Sesenta con 43/100 Soles)** y un **plazo total de 75 (Setenta y Cinco) días calendario**.
- 1.5 Con fecha 22 de febrero de 2018, se emite **RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°032-2018-FONDEPES/SG**, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N°01 por 25 (Veinticinco) días calendario al **CONTRATO N°38-2017FONDEPES**, con el que el **CONSORCIO OBRAS**, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.
- 1.6 Con fecha 27 de marzo de 2018, se emite **RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°052-2018-FONDEPES/SG**, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N°02 por 30 (Treinta) días calendario al **CONTRATO N°38-2017FONDEPES**, con el que el **CONSORCIO OBRAS**, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.
- 1.7 Con fecha 27 de abril de 2018, se emite **RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°071-2018-FONDEPES/SG**, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N°03 por 31 (Treinta y Un) días calendario al **CONTRATO N°38-2017FONDEPES**, con el que el **CONSORCIO OBRAS**, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.
- 1.8 Con fecha 28 de mayo de 2018, se emite **RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°087-2018-FONDEPES/SG**, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N°04





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

por 25 (Veinticinco) días calendario al CONTRATO N°38-2017FONDEPES, con el que el CONSORCIO OBRAS, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.

II. ANÁLISIS

2.1 La Cláusula Cuarta: Del Pago; se indica lo siguiente:

“**LA ENTIDAD** se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en Soles, en periodos de valorización mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, **LA ENTIDAD** o **EL CONTRATISTA**, según corresponda; se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de **treinta (30)** días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**; **EL CONTRATISTA** tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244°, 1245° y 1246° del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes (...)

2.2 El resumen de Valorización de Obra N°10, es el siguiente:

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 10

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

ENTIDAD : FONDEPES

SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA

CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS

FECHA : 31/08/2018

MONTO DEL CONTRATO SIN IGV : S/ 3.119.457,99

MONTO DEL CONTRATO CON IGV : S/ 3.680.960,43

CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	VAL. ACUM. ANTERIOR	VAL. ACTUAL	VAL. ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
TOTAL CONTRACTUAL SIN IGV	3.119.457,99				
VALORIZACION CONTRACTUALES SIN IGV		2.262.640,99	124.362,30	2.387.003,28	732.454,71
REAJUSTES		0,00	0,00	0,00	
VALORIZACION BRUTA		2.262.640,99	124.362,30	2.387.003,28	
AMORTIZACIONES					
DEL ADELANTO DIRECTO	311.945,80	226.284,11	12.436,23	238.700,34	73.245,46
DEL ADELANTO DE MATERIALES	623.891,52	308.358,55	87.053,61	395.412,16	228.479,36
TOTAL AMORTIZACIONES		534.622,66	99.489,84	634.112,50	
VALORIZACION NETA		1.728.018,33	24.872,46	1.752.890,78	
IGV (18%)	561.502,44	311.043,30	4.477,04	315.520,34	
TOTALES	3.680.960,43	2.039.061,63	29.349,50	2.068.411,12	
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA		72,53%	3,99%	78,52%	23,48%



Puntualizando que en lo que respecta a deducciones por cualquier concepto del marco contractual y del reglamento entre otras penalidades, estas se efectuarán en la liquidación de la obra.

005



III. CONCLUSIONES


- 1.1 El Supervisor de Obra **ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA**, ha remitido la **CARTA N° 100-2018-CONS/AHJ/RL-MORRO SAMA**, mediante la cual **remite la Valorización de Obra N° 10** correspondiente al mes de agosto de 2018, presentada por el contratista **CONSORCIO OBRAS**, integrado por las empresas **J.P.C. INGENIEROS S.A.C.** y **SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C.**, encargado de la ejecución de la obra: **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA”**. Asimismo, el Supervisor de Obra **ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA**, **solicita el pago de la Valorización de Obra N° 10** por el monto total **S/29,349.50 (Veintinueve Mil Trecientos Cuarenta y Nueve con 50/100 Soles) incluido el IGV**.
- 3.1 Se ha verificado la entrega del Informe Mensual del Supervisor presentado con la **CARTA N°100-2018-CONS/AHJ/RL-MORRO SAMA**, que se adjunta a la presenta valorización.

IV. RECOMENDACIONES

- 4.1 Cumplidos los todos requisitos establecidos, se recomienda que la **DIGENIPAA** otorgue la conformidad respectiva, para que **LA ENTIDAD** proceda al pago de la **Valorización de Obra N°10**, dentro de los plazos establecidos.
- 4.2 Cualquier error u omisión en la presente valorización se realizará en la liquidación de la ejecución de la obra

Es cuanto tengo que informar a Ud. para los fines que estime convenientes.

Atentamente;



BETTY VILLEGAS BOTELO
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 064243

Con la conformidad del Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento; pase el presente informe y los antecedentes, a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola; para su atención y trámite correspondiente.

FONDEPES


Ing. Raúl A. Mora Guillén
COORDINADOR DEL ÁREA DE OBRAS EQUIPAMIENTO
Y MANTENIMIENTO

006



PERÚ Ministerio de la Producción



FONDEPES Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04769692

Usuario: pruz
Fecha: 11/09/2018
Hora: 10:41



CARGO 02339-2018-FONDEPES/AOEM

A: MORGAN LEON MAGALI

Asunto: CARTA N° 100-2018-CONS-AHJ-RL-MORRO SAMA
REMITE VALORIZACIÓN N° 10 DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 ELABORADA POR ES SUPERVISION
REF: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA DE MORRO SAMA -TACNA"

Referencia: INFORME 00093-2018-FONDEPES/BVS


Fecha: 11/09/2018

Observación: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A OGA

Atentamente



AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04770680

Usuario: **usuario_digenipaa3**

Fecha: **13/09/2018**

Hora: **10:45**



CARGO 00156-2018-FONDEPES/MML

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

Asunto: CARTA N° 100-2018-CONS-AHJ-RL-MORRO SAMA
REMITE VALORIZACIÓN N° 10 DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 ELABORADA POR ES
SUPERVISION REF: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA DE MORRO SAMA -TACNA"


Referencia:

Fecha: 13/09/2018

Observación: SE DERIVA PARA TRAMITE DE PAGO VALORIZACIÓN 10, AGOSTO 2018-DPS MORRO SAMA S/ 29,349.50. CON
CERTIFICACIÓN 1028-FUENTE 13

Atentamente,

MORGAN LEON MAGALI





Fecha: 07/09/18

MEMORÁNDUM INTERNO N° 4168 - 201 - FONDEPES/ DIGENIPAA

Asunto : CARTA N° 100-2018-CONS/AHJ/RL-MORDO SAMÁ

Referencia : _____ Registro : 6971

Destino	Indicación	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	
OCI		OGAJ	
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	<u>AOEM</u>
Observaciones: _____			

FONDEPES
ARFA DE DIGENIPAA
07 SET. 2018
RECIBIDO
Registro: Hora: 53

Atentamente



Indicaciones

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 01. Autorizar/Aprobado | 02. Calificar/Evaluar | 03. Informe | 04. Proyectar resolución |
| 05. Atender | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular |
| 09. Ayuda memoria | 10. Coordinar | 11. Opinión/Recomendación | 12. Consolidar |
| 13. Aclarar redacción | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta | 16. Visación- |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo | 19. Ampliar | 20. Seguimiento |

009



PERÚ

Ministerio de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Fecha: 07/09/18

MEMORÁNDUM INTERNO N° 3370 -201 -FONDEPES / DIGENIPAA / AOEM

Asunto : Memo Interno N° 4168.2018 - DIGENIPAA

Referencia : _____ Registro: 6971

Destino	Indicación	Destino	Indicación

Observaciones: _____
Rug° Betty Villegas

Uyjes 10/9

Atentamente:



Indicaciones:

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 0.1. Autorizado/Aprobado | 0.2. Calificar/Evaluar | 0.3. Informe | 0.4. Proyectar resolución |
| 0.5. Atención/Tramitación | 0.6. Conocimiento y fines | 0.7. Notificar al interesado | 0.8. Reformular |
| 0.9. Ayuda memoria | 10. Coordinar | 11. Opinión/Recomendación | 12. Consolidar |
| 13. Aclarar redacción | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta | 16. Visación |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo | 19. Ampliar | 20. Seguimiento |



A.H.J.

- Consultorías y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:
- Obras de Edificaciones
 - Obras de Carreteras
 - Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
 - Obras de Electrificación
 - Obras Hidráulicas

Lima, 07 de setiembre de 2018

CARTA N°100-2018-CONS/AHJ/RL-MORRO SAMA

Señor Ingeniero;

LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO

Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

Fondo Nacional del Desarrollo Pesquero (FONDEPES)

Av. Petit Thouars N° 115 – Lima

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	
2760338	
N° DOC:	00006971-2018
CLAVE:	7680
USUARIO:	dgalindo
FECHA Y HORA:	07/09/2018 12:51:57
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	

ATENCIÓN : ING. BETTY VILLEGAS SOTELO
Coordinador de Obra

ASUNTO : VALORIZACIÓN N° 10 DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, ELABORADA POR ESTA SUPERVISION.


REFERENCIA : a) CONTRATO N° 035-2017-FONDEPES
b) SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA"

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, aprovecho la ocasión para saludarle muy cordialmente y a la vez presentarle la **VALORIZACIÓN N° 10 DE OBRA**, correspondiente al mes de agosto del año en curso; cabe indicar que esta supervisión ha elaborado esta valorización, para cumplir con nuestros términos de referencia y contrato, el contratista no presento y será comunicado por esta supervisión vía carta, para que presente los documentos faltantes tales como los pagos y/o tributos de SENCICO y CONAFOVICER, ESSALUD, FACTURA, ETC, para recién proceder el pago.

Sin otro particular, esperando la atención debida al presente documento me suscribo de usted, reiterándole las muestras de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,



ALEXANDER PRIMITIVO
HUERTAS JARA
DNI: 40431359
REPRESENTANTE LEGAL

Se adjunta:

- Valorización de obra +copias




A.H.J.

Consultorías y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:

- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas

**SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN
TACNA"**

**VALORIZACION MENSUAL Nº 10 DE OBRA
MES DE AGOSTO 2018**

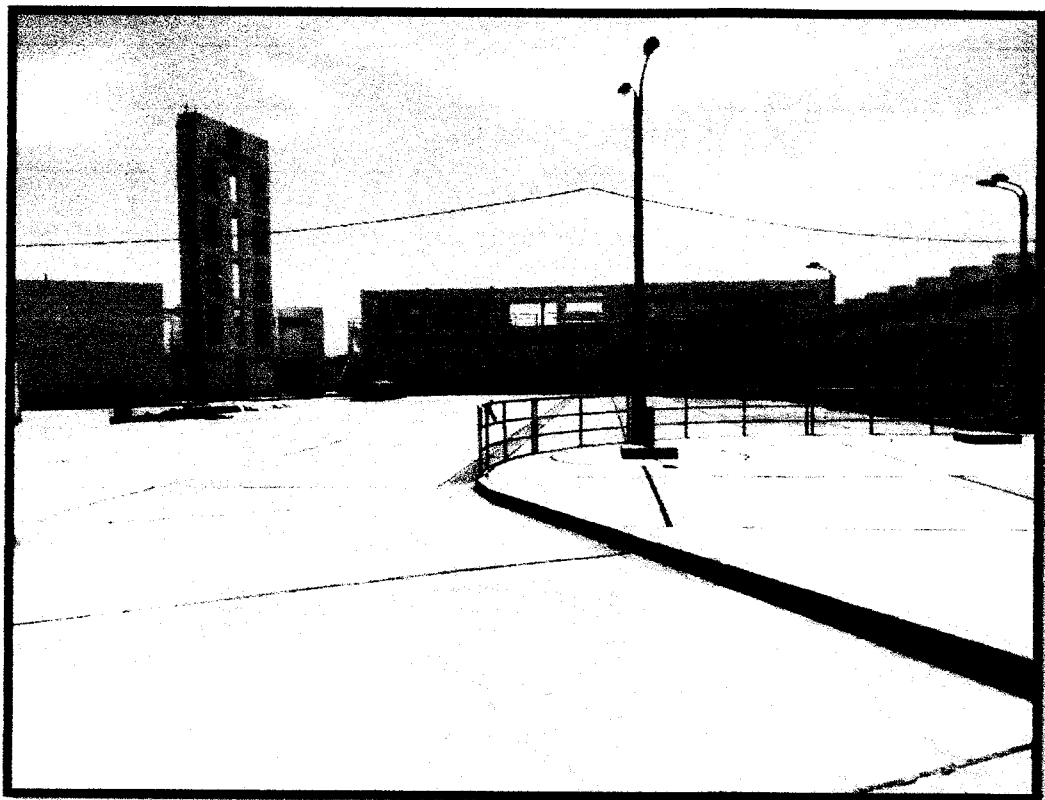

SUPERVISIÓN

ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA

012

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 10

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"
ENTIDAD : FONDEPES
SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS
FECHA : 31/08/2018

MONTO DEL CONTRATO SIN IGV : S/. 3.119.457,99
 MONTO DEL CONTRATO CON IGV : S/. 3.680.960,43

CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	VAL. ACUM. ANTERIOR	VAL. ACTUAL	VAL. ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
TOTAL CONTRACTUAL SIN IGV	3.119.457,99				
VALORIZACION CONTRACTUALES SIN IGV		2.262.640,99	124.362,30	2.387.003,28	732.454,71
REAJUSTES		0,00	0,00	0,00	
VALORIZACION BRUTA		2.262.640,99	124.362,30	2.387.003,28	
AMORTIZACIONES					
DEL ADELANTO DIRECTO	311.945,80	226.264,11	12.436,23	238.700,34	73.245,46
DEL ADELANTO DE MATERIALES	623.891,52	308.358,55	87.053,61	395.412,16	228.479,36
TOTAL AMORTIZACIONES		534.622,66	99.489,84	634.112,50	
VALORIZACION NETA		1.728.018,33	24.872,46	1.752.890,78	
I.G.V. (18%)	561.502,44	311.043,30	4.477,04	315.520,34	
TOTALES	3.680.960,43	2.039.061,63	29.349,50	2.068.411,12	
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA		72,53%	3,99%	76,52%	23,48%


 DAVID MANUEL VELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 104754


 ALEXANDER PRIMITIVO
 HUERTAS JARA
 DNI: 40431359
 REPRESENTANTE LEGAL

DAVID MANUEL VELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 104754

VALORIZACION DE OBRA N° 10

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

ENTIDAD : FONDEPES

SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA

CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS

FECHA : 31/08/2018

Monto Base	S/. 3.718.141,85	Supervisión	: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
Monto Contratado	S/. 3.680.960,43	Contratista	: CONSORCIO OBRAS
Fecha-Inicio de Obra	28/11/2017	SEGUN COSTO DIRECTO	
Plazo de Ejecución	75 días	Monto Valorizado del Mes	: S/. 104.682,07
Fecha-termino de Obra	10/02/2018	Monto Valorizado Acumulado	: S/. 2.009.262,02
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios	Monto-Saldo por Valorizar	: S/. 616.544,37

Ubicación	
Región	: TACNA
Departamento	: TACNA
Provincia	: TACNA
Lugar	: SAMA

N°	DESCRIPCION	AVANCES						SALDO	
		ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		Metrado	Valorizado
		%	Valorizado S/.	%	Valorizado S/.	%	Valorizado S/.		
01	SUB-PRESUPUESTO 01 ESTRUCTURAS	81,47%	931.057,22	2,01%	22.937,58	83,48%	953.994,80	16,52%	188.788,96
02	SUB-PRESUPUESTO 02 ARQUITECTURA	34,97%	108.813,47	25,98%	80.845,60	60,95%	189.659,07	39,05%	121.497,39
03	SUB-PRESUPUESTO 03 INSTALACIONES SANITARIAS	18,62%	15.695,96	1,07%	888,89	19,88%	16.584,85	80,32%	67.713,37
04	SUB-PRESUPUESTO 04 INSTALACIONES ELECTRICAS	50,90%	168.938,20	0,00%	0,00	50,90%	168.938,20	49,10%	162.980,75
05	SUB-PRESUPUESTO 05 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	90,00%	680.075,10	0,00%	0,00	90,00%	680.075,10	10,00%	75.583,90
	COSTO DIRECTO TOTAL		1.904.579,95		104.682,07		2.009.262,02		616.544,37
	GASTOS GENERALES (10.0 %)		190.458,00		10.468,21		200.926,20		61.654,44
	UTILIDAD (8.8%)		167.603,04		9.212,02		176.815,06		54.255,90
	SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO		2.262.640,99		124.362,30		2.387.003,28		732.454,71
	I.G.V. (18.0 %)		407.275,38		22.385,21		429.660,59		131.841,85
	TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO		2.669.916,36		146.747,51		2.816.663,87		864.296,56

Supervisión	: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
Contratista	: CONSORCIO OBRAS
Monto Valorizado del Mes	: S/. 104.682,07
Monto Valorizado Acumulado	: S/. 2.009.262,02
Monto-Saldo por Valorizar	: S/. 616.544,37

(Signature)
 ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI: 40431359

(Signature)
 DAVID MARTEL VELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 104754

04

VALORIZACION DE OBRA N° 10
 SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

ENTIDAD : FONDEPES
 SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS
 FECHA : 31/08/2018

Monto Base	S/. 3.718.141,85
Monto Contratado	S/. 3.680.960,43
Fecha-Inicio de Obra	28/11/2017
Plazo de Ejecución	75 días
Fecha-termino de Obra	10/02/2018
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios

Supervisión	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS	
SEGUN COSTO DIRECTO		
Monto Valorizado del Mes	S/. 22.937,58	2,01%
Monto Valorizado Acumulado	S/. 953.994,80	83,48%
Monto-Saldo por Valorizar	S/. 188.768,96	16,52%

Ubicación	
Región	TACNA
Departamento	TACNA
Provincia	TACNA
Lugar	SAMA

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto	%	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	
																	S/.
01.00	ESTRUCTURAS																
01.01	OBRAS PRELIMINARES																
01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	1.373,00	1,79	2.457,67	100%	2.457,67	0%	0,00	0%	1.373,00	2.457,67	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	1.373,00	1,22	1.675,06	100%	1.675,06	0%	0,00	0%	1.373,00	1.675,06	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB	1,00	1.500,00	1.500,00	100%	1.500,00	0%	0,00	0%	1,00	1.500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04	FLETE TERRESTRE	GLS	1,00	68.900,00	68.900,00	100%	68.900,00	0%	0,00	0%	1,00	68.900,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05	BANOS QUIMICOS PARA EL PERSONAL	GLS	1,00	600,00	600,00	100%	600,00	0%	0,00	0%	1,00	600,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06	CARTEL DE OBRA DE 2,40M x 3,60 M	poza	1,00	1.122,61	1.122,61	100%	1.122,61	0%	0,00	0%	1,00	1.122,61	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	SEGURIDAD Y SALUD																
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	1,00	319,50	319,50	100%	319,50	0%	0,00	0%	1,00	319,50	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	1,00	3.897,20	3.897,20	100%	3.897,20	0%	0,00	0%	1,00	3.897,20	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	und	1,00	1.700,00	1.700,00	95%	1.615,00	0%	0,00	0%	0,95	1.615,00	95%	0,00	0,00	0,05	85,00
01.03	DEMOLICIONES																
01.03.01	DEMOLICION DE POZA EXISTENTE	m3	6,35	181,11	1.150,05	100%	1.150,05	0%	0,00	0%	6,35	1.150,05	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE - SUB ESTACION	m3	1,51	181,11	273,48	100%	273,48	-100%	-1,51	-273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	273,48	
01.03.03	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTE - SUB ESTACION	m3	1,71	181,11	309,70	100%	309,70	0%	0,00	0%	1,71	309,70	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.04	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO - VARIOS	m3	7,67	201,25	1.543,59	100%	1.543,59	0%	0,00	0%	7,67	1.543,59	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.05	ESCARIFICADO DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE - MUELLE 02	m2	256,70	9,06	2.325,70	100%	2.325,70	0%	0,00	0%	256,70	2.325,70	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	DESMONTAJE																
01.04.01	DES MONTAJE DE BITAS Y CORNAMUSAS	und	28,00	28,04	813,16	100%	813,16	0%	0,00	0%	28,00	813,16	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02	DES MONTAJE DE BARANDAS METALICAS	m	189,69	7,00	1.327,83	100%	1.327,83	0%	0,00	0%	189,69	1.327,83	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03	DES MONTAJE DE PUERTAS DE MADERA	und	1,00	28,95	28,95	100%	28,95	0%	0,00	0%	1,00	28,95	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04	DES MONTAJE DE PUERTAS METALICAS	und	1,00	28,95	28,95	100%	28,95	0%	0,00	0%	1,00	28,95	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
01.05.01	EXCAVACION DE ZANJAS - SUB ESTACION	m3	10,54	30,51	321,58	100%	321,58	-100%	-10,54	-321,58	0%	0,00	0%	10,54	321,58		
01.05.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprior=30M	m3	34,72	24,41	847,52	100%	847,52	-100%	-34,72	-847,52	0%	0,00	0%	34,72	847,52		
01.05.03	CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprio = 5 km	m3	34,72	27,00	937,44	100%	937,44	-100%	-34,72	-937,44	0%	0,00	0%	34,72	937,44		

Alexander Primitivo Huertas Jara
 ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 DNI: 40431359
 REPRESENTANTE LEGAL

David Matos
 DAVID MATOS DEL VELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 ROL CIP N° 104754

VALORIZACION DE OBRA N° 10
 SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

OBRA : FONDEPES
 ENTIDAD : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 SUPERVISION : CONSORCIO OBRAS
 CONTRATISTA :
 FECHA : 31/08/2018

Supervisión	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS	
SEGUN COSTO DIRECTO		
Monto Valorizado del Mes	:	S/. 22.937,58
Monto Valorizado Acumulado	:	S/. 953.984,80
Monto-Saldo por Valorizar	:	S/. 188.788,96
		16,52%

Ubicación	
Región	: TACNA
Departamento	: TACNA
Provincia	: TACNA
Lugar	: SAMÁ

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO				
		Unid.	Metrado	P. Unitario S/.	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado	
																		S/.
01.06	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE																	
01.06.01	SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO HORMIGON	m2	18,09	36,01	651,42	100%	18,09	651,42	0%	0,00	0,00	100%	18,09	651,42	0%	0,00	0,00	
01.06.02	CONCRETO CICLOPEO MEZCLA 1:12 + 30% P.M.	m3	129,60	328,74	42.734,30	100%	129,60	42.734,30	0%	0,00	0,00	100%	129,60	42.734,30	0%	0,00	0,00	
01.06.03	GROUT CEMENTICIO	m3	0,17	7.998,13	1.348,14	59%	0,10	793,61	0%	0,00	0,00	59%	0,10	793,61	41%	0,07	555,53	
01.06.04	REPARACION DE LOSA EXISTENTE E=0,10m: CONCRETO Fc=315 kg/cm2, INC ACERO - PUENTE DE ADHERENCIA ACABADO SEMIPULIDO	m2	256,70	125,90	32.318,53	100%	256,70	32.318,53	0%	0,00	0,00	100%	256,70	32.318,53	0%	0,00	0,00	
01.07	OBRAS DE CONCRETO ARMADO																	
01.07.01	TANQUE DE 10 M3																	
01.07.01.01	TANQUE 10 M3 CONCRETO Fc=315 kg/cm2	m3	9,12	651,50	5.941,68	100%	9,12	5.941,68	0%	0,00	0,00	100%	9,12	5.941,68	0%	0,00	0,00	
01.07.01.02	TANQUE 10 M3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	62,24	91,07	5.668,20	100%	62,24	5.668,20	0%	0,00	0,00	100%	62,24	5.668,20	0%	0,00	0,00	
01.07.01.03	TANQUE 10 M3 ACERO GRADO 60 F C=4200 KG/CM2	kg	792,67	4,62	3.662,14	100%	792,67	3.662,14	0%	0,00	0,00	100%	792,67	3.662,14	0%	0,00	0,00	
01.07.02	CASETA DE BOMBEO																	
01.07.02.01	CASETA DE BOMBEO CONCRETO Fc=315 kg/cm2	m3	0,78	651,50	508,17	100%	0,78	508,17	0%	0,00	0,00	100%	0,78	508,17	0%	0,00	0,00	
01.07.02.02	CASETA DE BOMBEO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	9,14	91,07	832,38	100%	9,14	832,38	0%	0,00	0,00	100%	9,14	832,38	0%	0,00	0,00	
01.07.02.03	CASETA DE BOMBEO ACERO GRADO 60 F C=4200 KG/CM2	kg	63,16	4,62	291,80	100%	63,16	291,80	0%	0,00	0,00	100%	63,16	291,80	0%	0,00	0,00	
01.07.03	PEDESTALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS																	
01.07.03.01	PEDESTALES CONCRETO Fc=315 kg/cm2	m3	2,91	651,50	1.895,87	100%	2,91	1.895,87	0%	0,00	0,00	100%	2,91	1.895,87	0%	0,00	0,00	
01.07.03.02	PEDESTALES ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	30,22	56,21	1.698,67	100%	30,22	1.698,67	0%	0,00	0,00	100%	30,22	1.698,67	0%	0,00	0,00	
01.07.03.03	PEDESTALES ACERO GRADO 60 F C=4200 KG/CM2	kg	1.120,70	4,62	5.177,63	100%	1.120,70	5.177,63	0%	0,00	0,00	100%	1.120,70	5.177,63	0%	0,00	0,00	
01.07.04	COLUMNETAS DE ARRIOSTRE																	
01.07.04.01	COLUMNETAS DE ARRIOSTRE CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	1,54	614,66	946,58	100%	1,54	946,58	0%	0,00	0,00	100%	1,54	946,58	0%	0,00	0,00	
01.07.04.02	COLUMNETAS DE ARRIOSTRE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	24,60	51,96	1.278,22	100%	24,60	1.278,22	0%	0,00	0,00	100%	24,60	1.278,22	0%	0,00	0,00	
01.07.04.03	COLUMNETAS DE ARRIOSTRE ACERO GRADO 60 F C=4200 KG/CM2	kg	187,92	4,62	868,19	100%	187,92	868,19	0%	0,00	0,00	100%	187,92	868,19	0%	0,00	0,00	
01.07.05	BUQUETAS DE AMARRE																	
01.07.05.01	BUQUETAS DE AMARRE CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	0,42	614,66	258,16	100%	0,42	258,16	0%	0,00	0,00	100%	0,42	258,16	0%	0,00	0,00	
01.07.05.02	BUQUETAS DE AMARRE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	5,65	56,21	317,59	100%	5,65	317,59	0%	0,00	0,00	100%	5,65	317,59	0%	0,00	0,00	
01.07.05.03	BUQUETAS DE AMARRE ACERO GRADO 60 F C=4200 KG/CM2	kg	53,40	4,62	246,71	100%	53,40	246,71	0%	0,00	0,00	100%	53,40	246,71	0%	0,00	0,00	
01.07.06	RAMPAS DE ACCESO																	
01.07.06.01	RAMPAS DE ACCESO CONCRETO Fc=315 kg/cm2	m3	18,77	651,50	12.228,66	65%	17,92	11.674,88	0%	0,00	0,00	95%	17,92	11.674,88	5%	0,85	553,77	

DAVID MANUEL VELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 DNI: 40431359

ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 DNI: 40431359

VALORIZACION DE OBRA N° 10

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA REGION TACNA"
 ENTIDAD : FONDEPES
 SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS
 FECHA : 31/08/2018

Monto Base	S/. 3.718.141,85
Monto Contratado	S/. 3.680.960,43
Fecha-Inicio de Obra	28/11/2017
Plazo de Ejecución	75 días
Fecha-termino de Obra	10/02/2018
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios

Supervisión	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS	
SEGUN COSTO DIRECTO		
Monto Valorizado del Mes	S/. 22.937,58	2,01%
Monto Valorizado Acumulado	S/. 953.984,80	83,48%
Monto-Saldo por Valorizar	S/. 188.788,96	16,52%

Ubicación	
Región	: TACNA
Departamento	: TACNA
Provincia	: TACNA
Lugar	: SAMA

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCES ACTUAL			ACUMULADO			SALDO				
		Unid.	Metrado	P. Unitario S/.	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	
																		S/.
01.07.06.02	RAMPAS DE ACCESO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	34,50	56,21	1.939,25	100%	34,50	1.939,25	0%	0,00	0,00	100%	34,50	1.939,25	0%	0,00	0,01	
01.07.06.03	RAMPAS DE ACCESO, ACERO GRADO 60 FC=4200 KG/CM2	kg	2.447,53	4,62	11.307,59	100%	2.447,53	11.307,59	0%	0,00	0,00	100%	2.447,53	11.307,59	0%	0,00	0,00	
01.07.07	CANALIZACION - SUB ESTACION	m3	7,98	651,50	5.198,97	100%	7,98	5.198,97	-100%	-7,98	-5.198,97	0%	0,00	0,00	100%	7,98	5.198,97	
01.07.07.01	CANALIZACION - SUB ESTACION: CONCRETO f'c=315 kg/cm2	m3	32,36	91,07	2.947,03	100%	32,36	2.947,03	-100%	-32,36	-2.947,03	0%	0,00	0,00	100%	32,36	2.947,03	
01.07.07.02	CANALIZACION - SUB ESTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	695,96	4,62	3.215,34	100%	695,96	3.215,34	-100%	-695,96	-3.215,34	0%	0,00	0,00	100%	695,96	3.215,34	
01.07.07.03	CANALIZACION - SUB ESTACION: ACERO GRADO 60 FC=4200 KG/CM2	kg	695,96	4,62	3.215,34	100%	695,96	3.215,34	-100%	-695,96	-3.215,34	0%	0,00	0,00	100%	695,96	3.215,34	
01.08	ESTRUCTURAS METALICAS																	
01.08.01	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA COBERTURA 01	kg	5.188,00	9,82	50.946,16	94%	4.867,27	47.796,61	6%	320,73	3.149,55	100%	5.188,00	50.946,16	0%	0,00	0,00	
01.08.02	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA COBERTURA 02	kg	3.508,00	9,82	34.448,56	95%	3.331,11	32.711,50	5%	176,89	1.737,06	100%	3.508,00	34.448,56	0%	0,00	0,00	
01.08.03	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA COBERTURA 03	kg	10.487,00	9,82	102.982,34	89%	9.316,94	91.492,33	5%	500,00	4.910,00	94%	9.816,94	96.402,33	6%	670,06	6.580,01	
01.08.04	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA COBERTURA 04	kg	57.848,00	9,82	568.067,36	82%	47.281,82	464.111,03	0%	0,00	0,00	82%	47.281,82	464.111,03	18%	10.586,18	103.986,33	
01.08.05	PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE ARENADO	m2	2.469,18	29,09	72.601,18	19%	484,94	13.506,68	38%	950,00	27.597,50	57%	1.414,94	41.104,08	43%	1.084,24	31.497,10	
01.08.06	CANALETAS DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO ACABADO ALUZING	m	73,70	47,79	3.522,12	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%	73,70	3.522,12	
01.08.07	CORTE DE PERNOS DE ANCLAJE EXISTENTES	und	160,00	4,47	715,20	100%	160,00	715,20	-100%	-160,00	-715,20	0%	0,00	0,00	100%	160,00	715,20	
01.09	DEFENSA DE MUELLES																	
01.09.01	DEFENSA DE MUELLE TIPO 1 - CANALES DE ACERO	m	89,10	102,09	9.098,22	52%	46,65	4.762,81	0%	0,00	0,00	52%	46,65	4.762,81	48%	42,45	4.333,41	
01.09.02	ESTRUCTURA DE MADERA PARA DEFENSA DE MUELLE	m	839,15	66,71	55.140,55	69%	580,42	38.139,40	0%	0,00	0,00	69%	580,42	38.139,40	31%	258,73	17.001,15	
01.09.03	DEFENSA DE MUELLE - LLANTAS DE CAUCHO ARO 20	und	181,00	60,26	9.701,86	36%	57,32	3.453,86	0%	0,00	0,00	36%	57,32	3.453,86	64%	103,68	6.248,00	
COSTO DIRECTO TOTAL					1.142.783,78			931.057,22		22.937,58			953.984,80			188.788,96		
GASTOS GENERALES (10.0 %)					114.278,38			93.105,72		2.293,76			95.399,48			18.878,90		
UTILIDAD (8.6%)					100.564,97			81.933,04		2.018,51			83.951,54			16.613,43		
SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO					1.357.627,11			1.106.085,98		27.249,84			1.133.345,82			224.281,29		
I.S.V. (18.0 %)					244.372,88			199.087,28		4.904,97			204.002,25			40.370,63		
TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO					1.601.999,99			1.305.193,25		32.154,81			1.337.348,07			264.651,92		

Alexander Primitivo Huertas Jara
 ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 DNI: 40431359
 REPRESENTANTE LEGAL

VALORIZACION DE OBRA N° 10

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA REGION TACNA"

ENTIDAD : FONDEPES
 SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS
 FECHA : 31/08/2018

Monto Base	S/. 3.718.141,95
Monto Contratado	S/. 3.680.960,43
Fecha-Inicio de Obra	28/11/2017
Plazo de Ejecución	75 días
Fecha-termino de Obra	10/02/2018
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios

Supervisión	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS	
SEGUN COSTO DIRECTO	S/. 80.845,80	26,98%
Monto Valorizado del Mes	S/. 189.659,07	60,96%
Monto-Saldo por Valorizar	S/. 121.497,39	39,06%

Ubicación	TACNA
Región	TACNA
Departamento	TACNA
Provincia	TACNA
Lugar	SAMA

N°	DESCRIPCION	AVANCES										SALDO					
		PRESUPUESTO		ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		%		Metrado	Valorizado				
		Unid	Metrado	P. Unitario	Presupuesto	%	Valorizado	Metrado	Valorizado	%	Valorizado						
02.00	ARQUITECTURA																
02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA																
02.01.01	MURO DE LADRILLO KING KONG E=0,15m	m2	12,42	78,79	978,57	100%	12,42	978,57	0%	0,00	-	100%	12,42	978,57	0%	0,00	0,00
02.02	REVOCOS, ENLUCIDOS Y MOLDURAS																
02.02.01	TARRAJE EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA MEZCLA 1:5	m2	30,67	35,97	1.103,20	100%	30,67	1.103,20	0%	0,00	-	100%	30,67	1.103,20	0%	0,00	0,00
02.02.02	TARRAJE EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA MEZCLA 1:5	m2	14,11	35,97	507,54	100%	14,11	507,54	0%	0,00	-	100%	14,11	507,54	0%	0,00	0,00
02.02.03	VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO = 15 CM.	m	34,45	12,66	436,14	100%	34,45	436,14	0%	0,00	-	100%	34,45	436,14	0%	0,00	0,00
02.03	PISOS Y PAVIMENTOS																
02.03.01	PISO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE INC. PINTURA EPOXICA	m2	64,85	55,00	3.566,75	51%	33,00	1.815,00	0%	0,00	-	51%	33,00	1.815,00	49%	31,85	1.751,75
02.04	ACABADOS Y CONTRAZOCALOS																
02.04.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO DISEÑO SANITARIO, H= 10 cm	m	273,47	19,41	5.308,05	6%	15,00	291,15	0%	0,00	-	6%	15,00	291,15	85%	268,47	5.016,90
02.05	COBERTURAS																
02.05.01	POLICARBONATO COLOR BLANCO E=8mm (INCLUYE ACCESORIOS, PROVISION Y COLOCACION) - TIPO I	m2	1.766,02	83,39	146.434,51	33%	582,00	48.632,88	40%	700,00	56.373,00	73%	1.282,00	106.905,98	27%	474,02	39.528,53
02.06	CARPINTERIA METALICA																
02.06.01	PUERTA SECCIONABLE TIPO INDUSTRIAL (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION) 2,50 x 3,00m	und	12,00	5.618,15	67.417,80	33%	4,00	22.472,60	33%	4,00	22.472,60	67%	8,00	44.945,20	33%	4,00	22.472,60
02.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRIGO RETRACTIL	und	11,00	2.790,09	30.690,99	36%	4,00	11.160,36	0%	0,00	-	36%	4,00	11.160,36	64%	7,00	19.530,63
02.06.03	BARRANDA DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PASAMANO 2 1/2" - PARANTE DE 2x2, 1m	m	67,99	189,90	11.551,50	52%	35,25	5.988,98	0%	0,00	-	52%	35,25	5.988,98	48%	32,74	5.562,53
02.06.04	PUERTA METALICA CON PLANCHA DE ACERO A-36 DE 4mm, MARCO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" Y PERSIANA	m2	7,70	570,64	4.393,83	100%	7,70	4.393,83	0%	0,00	-	100%	7,70	4.393,83	0%	0,00	0,00
02.06.05	PUERTA METALICA PRS-1	m2	1,00	477,72	477,72	0%	0,00	0,00	0%	0,00	-	0%	0,00	0,00	100%	1,00	477,72
02.06.06	PERSIANA METALICA TIPO PERSIANA DE ACERO A-36 DE 1/8"	m2	0,25	1.119,24	279,81	0%	0,00	0,00	0%	0,00	-	0%	0,00	0,00	100%	0,25	279,81

DAVIDA ANTONIO VELAZQUEZ FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 R. O. N° 104154

ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 DNI: 40431359
 REPRESENTANTE LEGAL

VALORIZACION DE OBRA N° 10

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

ENTIDAD : FONDEPES
 SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS
 FECHA : 31/08/2018

Monto Base	S/. 3.718.141,85
Monto Contratado	S/. 3.690.960,43
Fecha-Inicio de Obra	28/11/2017
Plazo de Ejecución	75 días
Fecha-termino de Obra	10/02/2018
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios

Supervisión	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS	
SEGUN COSTO DIRECTO	S/. 80.845,60	26,98%
Monto Valorizado del Mes	S/. 189.689,07	60,96%
Monto Valorizado Acumulado	S/. 1.214.973,39	39,06%

Ubicación	TACNA
Región	TACNA
Departamento	TACNA
Provincia	SAMA
Lugar	SAMA

N°	DESCRIPCION	Unid.	PRESUPUESTO			AVANCES						SALDO				
			Metrado	P. Unitario	Presupuesto	ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		%	Valorizado			
						%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado			%	Metrado	Valorizado
02.06.07	VENTANA METALICA DE MALLA DE ACERO GALVANIZADO RECUBIERTA CON PVC	m2	14,52	117,88	1.711,62	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	14,52	1.711,62
02.07	CARPINTERIA DE ALUMINIO															
02.07.01	VENTANA DE ALUMINIO, CVIDRIO TEMPLADO	m2	1,08	168,00	181,44	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	1,08	181,44
02.08	CERRAJERIA															
02.08.01	CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA, CON TIRADOR	und	2,00	72,94	145,88	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	2,00	145,88
02.08.02	BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE DE 4"	pza	2,00	23,43	46,86	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	2,00	46,86
02.09	PINTURA															
02.09.01	PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES CON LATEX	m2	43,42	15,51	673,44	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	43,42	673,44
02.09.02	PINTURA EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES CON LATEX	m2	14,11	16,01	225,90	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	14,11	225,90
02.09.03	PINTURA EPOXICA EN CARPINTERIA METALICA INCLUYE ARENADO	m2	172,28	29,05	5.004,15	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	172,28	5.004,15
02.10	OTRO															
02.01.01	BIPAS METALICAS DE F" G" DE 6"	und	21,00	389,69	8.183,48	57%	12,00	4.876,28	0%	0,00	0,00	57%	12,00	4.876,28	9,00	3.507,21
02.01.02	LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL DE OBRA	GLB	1,00	500,00	500,00	30%	0,30	150,00	0%	0,00	0,00	30%	0,30	150,00	0,70	350,00
02.01.03	ACONDICIONAMIENTO DE CORNAVUSAS EXISTENTES	und	6,00	282,43	1.574,68	83%	5,00	1.312,15	0%	0,00	0,00	83%	5,00	1.312,15	1,00	262,43
02.01.04	ACONDICIONAMIENTO DE BARANDAS DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO EXISTENTE	m	185,25	58,76	9.710,09	51%	85,00	4.994,80	0%	0,00	0,00	51%	85,00	4.994,80	80,25	4.715,49
02.10.05	ESCALERA METALICA DE ALUMINIO	und	2,00	416,36	832,76	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	2,00	832,76
02.10.06	PROTECCION DE BORDE DE MESA DE CONCRETO	m	31,90	289,02	9.219,74	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	31,90	9.219,74
COSTO DIRECTO TOTAL					311.156,48		108.813,47	80.845,60		189.689,07		121.497,39				
GASTOS GENERALES (10.0 %)					31.115,65		10.881,35	8.084,56		18.965,91		12.149,74				
UTILIDAD (8.8%)					27.381,77		9.575,99	7.114,41		16.690,00		10.691,77				
SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO					369.653,87		129.270,40	96.044,67		225.314,98		144.338,90				
I.G.V. (18.0 %)					66.537,70		23.268,67	17.289,02		40.566,70		25.981,00				
TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO					436.191,57		162.539,07	113.332,60		266.871,67		170.319,90				

(Firma)
 ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 DNI: 40431359
 REPRESENTANTE LEGAL

VALORIZACION DE OBRA N° 10

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

ENTIDAD : FONDEPES

SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA

CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS

FECHA : 31/08/2018

Monto Base	S/. 3.718.141,85
Monto Contratado	S/. 3.690.960,43
Fecha-Inicio de Obra	28/11/2017
Plazo de Ejecución	75 días
Fecha-termino de Obra	10/02/2018
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios

Supervisión	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS	
SEGÚN COSTO DIRECTO		
Monto Valorizado del Mes	S/. 898,89	1,07%
Monto Valorizado Acumulado	S/. 16.594,86	19,60%
Monto-Saldo por Valorizar	S/. 67.713,37	80,32%

Ubicación	
Región	TACNA
Departamento	TACNA
Provincia	TACNA
Lugar	SAMA

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			AVANCES			ACUMULADO			SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado
03.00	INSTALACIONES SANITARIAS													
03.01	SISTEMA DE AGUA FRIA													
03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES													
03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA	m	18,00	0,82	14,76	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	14,76
03.01.02	SALIDAS	plc	1,00	52,09	52,09	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	52,09
03.01.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1"	und	1,00	96,34	96,34	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	96,34
03.01.03	VALVULAS													
03.01.03.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1"	m	18,00	19,20	345,60	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	345,60
03.01.04	TUBERIAS													
03.01.04.01	SUM.INSY. T/P/PRUEBA HIDRATUB PVC D=1" C-10	und	1,00	96,14	96,14	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	96,14
03.01.05	VARIOS													
03.01.05.01	NICHO Y TAPA DE MADERA PARA VALVULA EN PARED	und	4,00	329,40	1.305,60	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	1.305,60
03.01.06	CAJAS DE REGISTRO													
03.01.06.01	CAJA DE REGISTRO DE 12" x 24" FIBRA DE VIDRIO	m	26,00	14,46	376,48	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	376,48
03.01.07	TUBERIAS													
03.01.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL. 4"	und	2,00	1.154,24	2.308,48	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	2.308,48
03.01.08	CAJAS DE BOMBEO, CUARTO DE BOMBAS													
03.01.08.01	CAJAS DE BOMBEO, CUARTO DE BOMBAS	GLB	2,00	1.098,18	2.196,36	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	2.196,36
03.01.09	ACCESORIOS PARA BOMBAS CENTRIFUGAS													
03.01.09.01	LINEA DE IMPULSION	m	33,30	18,28	608,06	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	608,06
03.01.09.02	SUM.INSY. T/P/PRUEBA HIDRATUB PVC D=2" C-10 ADOSADO	m	9,30	16,76	155,87	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	155,87
03.01.10	CANALETAS													
03.01.10.01	EXCAVACION DE CANALETAS	m3	1,50	35,05	52,58	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	52,58
03.01.10.02	CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 EN CANALETAS	m3	0,30	65,52	19,66	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	19,66
03.01.10.03	COLOCACION DE REJILLA EN CANALETAS	m2	0,08	67,49	5,39	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	5,39
03.01.10.04	COLOCACION DE REJILLA EN CAULETA DE FIBRA DE VIDRIO	m2	0,23	437,95	100,73	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100,73
03.01.10.05	CANALETAS CON REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO	m	60,00	48,80	2.916,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	2.916,00
03.02	BOMBAS													
03.02.01	SUMINISTRO E INST. DE BOMBAS SUMERGIBLES 1 Hp. HDT=4,50m, Q=2,88	und	2,00	1.146,79	2.293,58	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	2.293,58
03.02.02	ACCESORIOS PARA BOMBAS SUMERGIBLES	und	2,00	346,00	692,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	692,00

DAVID MANUEL VELA FARRAN
INGENIERO CIVIL
DNI: 404313559

ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
DNI: 404313559

VALORIZACION DE OBRA N° 10


OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"
 ENTIDAD : FONDEPES
 SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS
 FECHA : 31/08/2018


Monto Base	S/. 3.718.141,85
Monto Contratado	S/. 3.680.960,43
Fecha-Inicio de Obra	28/11/2017
Plazo de Ejecución	75 días
Fecha-termino de Obra	10/02/2018
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios

Supervisión	: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
Contratista	: CONSORCIO OBRAS
SEGÚN COSTO DIRECTO	
Monto Valorizado del Mes	: S/. 898,89
Monto Valorizado Acumulado	: S/. 16.594,86
Monto-Saldo por Valorizar	: S/. 67.713,37
	: 1,07%
	: 19,68%
	: 80,32%

Ubicación	
Región	: TACNA
Departamento	: TACNA
Provincia	: TACNA
Lugar	: SAMA

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			AVANCES			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO			SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado
03.03	CASETA DE CAPTACION	GLB	1,00	579,23	579,23	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
03.03.01	RETIRO DE LA TUBERIA DE SUCCION DE 2,5" PVC	m	40,00	84,29	3.371,60	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
03.03.02	INSTALACION DE TUBERIA DE SUCCION HDPE 2,5" INCLUIDO ANCLAJE	m	1,00	622,66	622,66	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
03.03.03	ACCESORIOS DE LINEA DE SUCCION	und	1,00	888,89	888,89	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
03.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE PELO	und	1,00	888,89	888,89	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
03.04	RED DE DISTRIBUCION	und	1,00	888,89	888,89	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
03.04.01	VERIFICACION Y PUNTOS DE PRUEBA DE CALIDAD EN LAS REDES DE AGUA	GLB	1,00	1.600,00	1.600,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
03.05	SISTEMA DE TRATAMIENTO CLORACION-DESINFECCION	GLB	1,00	3.000,00	3.000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
03.05.01	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	GLB	1,00	3.000,00	3.000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
03.06	EMISOR SUBMARINO/AFLUENTES	GLB	1,00	500,00	500,00	100%	1,00	500,00	100%	1,00	500,00	100%	1,00	500,00	100%	1,00	500,00
03.06.01	EQUIPO DE BOMBEO	und	1,00	500,00	500,00	100%	1,00	500,00	100%	1,00	500,00	100%	1,00	500,00	100%	1,00	500,00
03.06.01.01	DES-MONTAJE Y RETIRO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE CON ARBOL	und	1,00	500,00	500,00	100%	1,00	500,00	100%	1,00	500,00	100%	1,00	500,00	100%	1,00	500,00
03.06.01.02	SUMINISTRO E INST. DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA Q=4.00 lps. HDT=	und	2,00	2.887,88	5.795,96	100%	2,00	5.795,96	100%	2,00	5.795,96	100%	2,00	5.795,96	100%	2,00	5.795,96
03.06.01.03	ACCESORIOS PARA ELECTROBOMBAS CENTRIFUGA	und	2,00	1.729,18	3.458,36	100%	2,00	3.458,36	100%	2,00	3.458,36	100%	2,00	3.458,36	100%	2,00	3.458,36
03.06.02	EMISOR	GLB	1,00	1.729,18	1.729,18	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
03.06.02.01	ULTRASONIDO - CONTROL DE CALIDAD	GLB	1,00	9.400,00	9.400,00	100%	1,00	9.400,00	100%	1,00	9.400,00	100%	1,00	9.400,00	100%	1,00	9.400,00
03.06.02.01.01	VERIFICACION DE LA INSPECCION ULTRASONICA DE JUNTA	GLB	1,00	9.400,00	9.400,00	100%	1,00	9.400,00	100%	1,00	9.400,00	100%	1,00	9.400,00	100%	1,00	9.400,00
03.06.02.02	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO	m	520,00	75,25	39.130,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
03.06.02.02.01	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO DE LINEA	m3	8,00	314,09	2.512,72	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
03.06.02.02.02	FIACION PRIMEROS METROS DE TUBERIA CON CONCRETO CICLOPEO	und	1,00	1.500,00	1.500,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
03.06.02.02.03	PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA EMISOR SUBMARINO	und	1,00	1.500,00	1.500,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
COSTO DIRECTO TOTAL					84.308,22			16.695,96			898,89			16.694,86			67.713,37
GASTOS GENERALES (10,0 %)					8.430,82			1.569,60			89,89			1.659,48			6.771,34
UTILIDAD (8,8%)					7.419,12			1.381,24			79,10			1.460,35			5.958,78
SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO					100.168,16			18.646,80			1.067,88			19.714,68			80.443,48
(G.V. (18,0 %))					18.028,47			3.358,42			192,22			3.548,64			14.479,83
TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO					118.186,63			22.003,22			1.260,10			23.263,32			94.923,31


 ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 DNE 40431359
 REPRESENTANTE LEGAL


 DAVID MANUEL VELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CP N° 04754

VALORIZACION DE OBRA N° 10

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

ENTIDAD : FONDEPES
 SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS
 FECHA : 31/08/2018

Monto Base	S/. 3.718.141,85
Monto Contratado	S/. 3.680.960,43
Fecha Inicio de Obra	29/11/2017
Plazo de Ejecución	75 días
Fecha Término de Obra	10/02/2018
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios

Supervisión	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS	
SEGUN COSTO DIRECTO		
Monto Valorizado del Mes	S/. 0,00	0,00%
Monto Valorizado Acumulado	S/. 0,00	0,00%
Monto-Saldo por Valorizar	S/. 162.980,75	49,10%

Ubicación	
Región	: TACNA
Departamento	: TACNA
Provincia	: TACNA
Lugar	: SAMA

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			AVANCES			ACUMULADO			SALDO				
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	
															S/.
04.06	BUZONES														
04.06.01	CAJA DE CONCRETO DE 0,90x0,90x0,70x0,15 CON TAPA	und	4,00	1.456,12	5.824,48	100%	4,00	5.824,48	0%	0,00	-	100%	4,00	5.824,48	0%
04.07	CABLES ALIMENTADORES														
04.07.01	CABLE N2XOH, 3-1x185mm2 + 1x185mm2, 0,6/1KV	m	22,05	207,32	4.571,41	94%	20,77	4.306,04	0%	0,00	-	94%	20,77	4.306,04	6%
04.07.02	CABLE N2XOH, 3-1x120mm2 + 1x120mm2, 0,6/1KV	m	16,80	130,93	2.194,56	0%	0,00	0,00	0%	0,00	-	0%	0,00	0,00	100%
04.07.03	CABLE N2XOH, 3-1x95mm2 + 1x95mm2, 0,6/1KV	m	56,70	106,64	6.046,49	91%	51,86	5.530,36	0%	0,00	-	91%	51,86	5.530,36	9%
04.07.04	CABLE N2XOH, 3-1x60mm2 + 1x60mm2, 0,6/1KV	m	53,18	60,19	3.200,90	0%	0,00	0,00	0%	0,00	-	0%	0,00	0,00	100%
04.07.05	CABLE N2XOH, 3-1x35mm2 + 1x35mm2, 0,6/1KV	m	123,90	46,82	5.813,39	81%	99,67	4.665,90	0%	0,00	-	81%	99,67	4.665,90	19%
04.07.06	CABLE N2XOH, 3-1x25mm2 + 1x25mm2, 0,6/1KV	m	215,25	36,77	7.914,74	75%	161,98	5.966,00	0%	0,00	-	75%	161,98	5.966,00	25%
04.07.07	CABLE N2XOH, 3-1x16mm2 + 1x16mm2, 0,6/1KV	m	327,60	27,32	8.950,03	67%	218,48	5.966,87	0%	0,00	-	67%	218,48	5.966,87	33%
04.07.08	CABLE N2XOH, 3-1x10mm2 + 1x10mm2, 0,6/1KV	m	75,81	18,70	1.417,65	0%	0,00	0,00	0%	0,00	-	0%	0,00	0,00	100%
04.07.09	CABLE N2XOH, 3-1x6mm2 + 1x6mm2, 0,6/1KV	m	294,00	14,64	4.304,16	0%	0,00	0,00	0%	0,00	-	0%	0,00	0,00	100%
04.07.10	CABLE N2XOH, 3-1x120mm2, 0,6/1KV	m	7,35	100,15	736,10	93%	6,83	684,02	0%	0,00	-	93%	6,83	684,02	7%
04.07.11	CABLE N2XOH, 3-1x60mm2, 0,6/1KV	m	198,45	47,29	9.384,70	76%	150,00	7.093,50	0%	0,00	-	76%	150,00	7.093,50	24%
04.07.12	CABLE N2XOH, 3-1x25mm2, 0,6/1KV	m	19,43	29,69	576,88	0%	0,00	0,00	0%	0,00	-	0%	0,00	0,00	100%
04.07.13	CABLE N2XOH, 3-1x18mm2, 0,6/1KV	m	36,75	22,71	834,59	0%	0,00	0,00	0%	0,00	-	0%	0,00	0,00	100%
04.07.14	CABLE N2XOH, 3-1x10mm2, 0,6/1KV	m	27,30	18,46	503,96	0%	0,00	0,00	0%	0,00	-	0%	0,00	0,00	100%
04.07.15	CABLE N2XOH, 3-1x8mm2, 0,6/1KV	m	32,82	15,44	502,11	0%	0,00	0,00	0%	0,00	-	0%	0,00	0,00	100%
04.07.16	CABLE N2XOH, 2-1x60mm2, 0,6/1KV	m	85,05	34,72	2.962,94	74%	62,76	2.179,03	0%	0,00	-	74%	62,76	2.179,03	26%
04.07.17	CABLE N2XOH, 2-1x35mm2, 0,6/1KV	m	53,56	28,20	1.510,11	0%	0,00	0,00	0%	0,00	-	0%	0,00	0,00	100%
04.07.18	CABLE N2XOH, 2-1x10mm2, 0,6/1KV	m	296,10	15,36	4.554,02	95%	280,00	4.306,40	0%	0,00	-	95%	280,00	4.306,40	5%
04.07.19	CABLE N2XOH, 2-1x8mm2, 0,6/1KV	m	119,70	13,42	1.606,37	0%	0,00	0,00	0%	0,00	-	0%	0,00	0,00	100%
04.07.20	CABLE N2XOH, 2-1x4mm2, 0,6/1KV	m	433,84	12,25	5.315,77	26%	111,58	1.366,66	0%	0,00	-	26%	111,58	1.366,66	74%
04.07.21	CABLE N2XOH, 2x62,5mm2, 0,6/1KV	m	90,96	11,43	1.039,67	0%	0,00	0,00	0%	0,00	-	0%	0,00	0,00	100%

DAVIDA MARCO VELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CPN N° 104754

ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 DNI: 40431359
 REPRESENTANTE LEGAL

VALORIZACION DE OBRA N° 10

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"
 ENTIDAD : FONDEPES
 SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS
 FECHA : 31/08/2018

Monto Base	S/ 3 718 141,85
Monto Contratado	S/ 3 680 960,43
Fecha Inicio de Obra	28/11/2017
Fecha de Ejecución	75 días
Fecha Término de Obra	10/02/2018
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios

Supervisión	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
Contratista	CONSORCIO OBRAS
SEGUN COSTO DIRECTO	
Monto Valorizado del Mes	S/ 0,00
Monto Valorizado Acumulado	S/ 0,00
Monto-Saldo por Valorizar	S/ 162.960,75
	48,10%

Ubicación	
Región	: TACNA
Departamento	: TACNA
Provincia	: TACNA
Lugar	: SAMA

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCES			ACUMULADO			SALDO				
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	
																		S/.
04.00	INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION																	
04.01	TRABAJO PRELIMINARES																	
04.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	GLB	1,00	500,00	500,00	100%	1,00	500,00	0%	0,00	0%	1,00	500,00	0%	0,00	0,00	0,00	
04.01.02	TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS A LA OBRA	GLB	1,00	249,62	249,62	100%	1,00	249,62	0%	0,00	0%	1,00	249,62	0%	0,00	0,00	0,00	
04.02	DEMOLICION																	
04.02.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO H=0,10m	m	126,00	0,87	109,62	100%	126,00	109,62	0%	0,00	0%	126,00	109,62	0%	0,00	0,00	0,00	
04.02.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO VEREDA DE CONCRETO	m3	6,24	129,37	807,27	100%	6,24	807,27	0%	0,00	0%	6,24	807,27	0%	0,00	0,00	0,00	
04.02.03	DEMOLICION DE BUZON DE CONCRETO EXISTENTE	m3	1,72	150,93	259,60	100%	1,72	259,60	0%	0,00	0%	1,72	259,60	0%	0,00	0,00	0,00	
04.03	DESMONTAJE																	
04.03.01	DESMONTAJE DE CABLES ELECTRICOS NYE EN TUBERIAS FORMANDO 4 FAS	m	420,00	1,46	613,20	100%	420,00	613,20	0%	0,00	0%	420,00	613,20	0%	0,00	0,00	0,00	
04.03.02	DESMONTAJE DE CABLES ELECTRICOS NYE EN TUBERIAS FORMANDO 4 FAS	m	62,69	1,26	78,36	100%	62,69	78,36	0%	0,00	0%	62,69	78,36	0%	0,00	0,00	0,00	
04.03.03	DESMONTAJE DE CABLES ELECTRICOS NYE EN TUBERIAS FORMANDO 2 FAS	m	368,00	0,89	327,52	100%	368,00	327,52	0%	0,00	0%	368,00	327,52	0%	0,00	0,00	0,00	
04.03.04	DESMONTAJE DE CABLES ELECTRICOS NYE EN TUBERIAS FORMANDO 2 FAS	m	435,95	0,78	340,04	100%	435,95	340,04	0%	0,00	0%	435,95	340,04	0%	0,00	0,00	0,00	
04.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS																	
04.04.01	EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL	m3	24,49	30,51	747,19	100%	24,49	747,19	0%	0,00	0%	24,49	747,19	0%	0,00	0,00	0,00	
04.04.02	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m3	21,97	47,58	1.045,33	100%	21,97	1.045,33	0%	0,00	0%	21,97	1.045,33	0%	0,00	0,00	0,00	
04.04.03	REPOSICION DE VEREDA 175 kg/cm2. E = 4" PULIDO Y BRUNADO, CON IMPEL	m3	6,24	557,84	3.480,92	100%	6,24	3.480,92	0%	0,00	0%	6,24	3.480,92	0%	0,00	0,00	0,00	
04.04.04	REPOSICION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m3	10,48	21,67	227,10	100%	10,48	227,10	0%	0,00	0%	10,48	227,10	0%	0,00	0,00	0,00	
04.05	SERVIOS DE PVC																	
04.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 3" INC CINTA SEÑALIZAC	m	282,65	11,78	3.329,62	100%	282,65	3.329,62	0%	0,00	0%	282,65	3.329,62	0%	0,00	0,00	0,00	
04.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC 1 1/4" Ø	m	295,00	43,40	12.803,00	100%	295,00	12.803,00	0%	0,00	0%	295,00	12.803,00	0%	0,00	0,00	0,00	
04.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC 1 1/2" Ø	m	170,00	46,66	7.932,20	100%	170,00	7.932,20	0%	0,00	0%	170,00	7.932,20	0%	0,00	0,00	0,00	

DAVID MANUEL VELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 R.º 9. CIP N° 104754

ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 DNI: 40431359
 REPRESENTANTE LEGAL

VALORIZACION DE OBRA N° 10

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

ENTIDAD : FONDEPES
 SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS
 FECHA : 31/08/2018

Monto Base	S/ 3.718.141,85
Monto Contratado	S/ 3.680.960,43
Fecha Inicio de Obra	28/11/2017
Plazo de Ejecución	75 días
Fecha término de Obra	10/02/2018
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios

Supervisión	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS	
SEGUN COSTO DIRECTO		
Monto Valorizado del Mes	S/ 0,00	0,00%
Monto Valorizado Acumulado	S/ 162.960,76	0,00%
Monto-Saldo por Valorizar		49,10%

Ubicación	
Región	: TACNA
Departamento	: TACNA
Provincia	: TACNA
Lugar	: SAMA

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCES ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
		Unid.	Metrado	P. Unitario S/.	Presupuesto S/.	%	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado
04.07.22	CABLE NH-80, 1x150mm2, 450/750V	m	8,40	46,08	386,90	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	386,90
04.07.23	CABLE NH-80, 1x50mm2, 450/750V	m	7,35	17,24	126,71	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	126,71
04.07.24	CABLE NH-80, 1x35mm2, 450/750V	m	87,83	13,88	1.219,08	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	1.219,08
04.07.25	CABLE NH-80, 1x25mm2, 450/750V	m	305,55	11,47	3.504,66	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	3.504,66
04.07.26	CABLE NH-80, 1x16mm2, 450/750V	m	177,45	9,15	1.623,67	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	1.623,67
04.07.27	CABLE NH-80, 1x10mm2, 450/750V	m	234,68	7,68	1.802,34	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	1.802,34
04.07.28	CABLE NH-80, 1x6mm2, 450/750V	m	1.339,24	6,53	8.745,24	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	8.745,24
04.07.29	CABLE NH-80, 1x4mm2, 450/750V	m	550,04	5,94	3.267,24	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	3.267,24
04.07.30	CABLE NH-80, 1x2,5mm2, 450/750V	m	39,14	5,55	217,23	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	217,23
04.07.31	CABLE NH-X-90, 3-1x10mm2(F) + 1x6mm2(N), 450/750V	m	11,80	16,40	193,52	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	193,52
04.07.32	CABLE NH-X-90, 3-1x6mm2(F) + 1x6mm2(N), 450/750V	m	139,69	12,59	1.758,70	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	1.758,70
04.08	TABLEROS GENERALES															
04.08.01	TABlero GENERAL TG	und	1,00	16.410,89	16.410,89	48%	7.877,23	0%	0,00	0%	0,00	48%	7.877,23	52%	0,52	8.533,66
04.08.02	TABlero DE TRANSFERENCIA 380-220 V	und	1,00	34.178,18	34.178,18	70%	23.924,73	0%	0,00	0%	0,00	70%	23.924,73	30%	0,30	10.253,45
04.08.03	TABlero NORMAL GENERAL TNG-01	und	1,00	10.396,24	10.396,24	65%	6.757,56	0%	0,00	0%	0,00	65%	6.757,56	35%	0,35	3.638,68
04.08.04	TABlero NORMAL GENERAL TNG-02	und	1,00	5.609,24	5.609,24	35%	1.963,23	0%	0,00	0%	0,00	35%	1.963,23	65%	0,65	3.646,01
04.08.05	TABlero EMERGENCIA GENERAL TGE-01	und	1,00	5.889,24	5.889,24	36%	2.081,23	0%	0,00	0%	0,00	36%	2.081,23	65%	0,65	3.828,01
04.08.06	TABlero CAMARA DE HIELO TE-CH	und	1,00	4.199,82	4.199,82	48%	2.015,82	0%	0,00	0%	0,00	48%	2.015,82	52%	0,52	2.183,80
04.08.07	TABlero MUELLE TM-01	und	1,00	2.114,62	2.114,62	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	1,00	2.114,62
04.08.08	TABlero BANCO DE CONDENSADORES TBC-TG	und	1,00	19.669,24	19.669,24	80%	15.735,39	0%	0,00	0%	0,00	80%	15.735,39	20%	0,20	3.933,85
04.09	TABLEROS DE DISTRIBUCION															
04.09.01	TABlero DE DISTRIBUCION TD-02	und	1,00	745,93	745,93	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	1,00	745,93
04.09.02	TABlero DE DISTRIBUCION TD-03	und	1,00	523,93	523,93	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	1,00	523,93
04.09.03	TABlero DE DISTRIBUCION TD-04	und	1,00	475,93	475,93	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	1,00	475,93

DAVID MANUEL YELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 104754

ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 DNI: 40431359
 REPP. ENTANTE. EGAL

VALORIZACION DE OBRA N° 10

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"
 ENTIDAD : FONDEPES
 SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS
 FECHA : 31/08/2018

Monto Base	S/ 3 716 141,85
Monto Contratado	S/ 3 680 960,43
Fecha Inicio de Obra	28/11/2017
Plazo de Ejecución	75 días
Fecha término de Obra	10/02/2018
Modalidad de Ejecución	Preces Unitarios

Supervisión	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS	
SEGUN COSTO DIRECTO		
Monto Valorizado del Mes	S/ 0,00	0,00%
Monto Valorizado Acumulado	S/ 0,00	0,00%
Monto-Saldo por Valorizar	S/ 182.980,75	48,10%

Ubicación			
Región	:	TACNA	
Departamento	:	TACNA	
Provincia	:	TACNA	
Lugar	:	SAMA	

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			AVANCES ACTUAL			AGUMULADO ANTERIOR			AGUMULADO			SALDO		
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado
04.09.04	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-06	und	1,00	1.292,24	1.292,24	80%	0,80	1.033,79	0%	0,00	0,00	80%	0,80	1.033,79	0,20	258,45
04.09.05	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-06	und	1,00	529,24	529,24	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	1,00	529,24
04.09.06	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-07	und	1,00	660,24	660,24	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	1,00	660,24
04.09.07	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-10	und	1,00	800,24	800,24	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	1,00	800,24
04.09.08	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-12	und	1,00	543,53	543,53	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	1,00	543,53
04.09.09	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-CAS	und	1,00	1.188,53	1.188,53	68%	0,68	808,20	0%	0,00	0,00	68%	0,68	808,20	0,32	380,33
04.09.10	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-SE	und	1,00	1.169,24	1.169,24	71%	0,71	830,16	0%	0,00	0,00	71%	0,71	830,16	0,29	339,08
04.09.11	TABLERO DE DISTRIBUCION STD-10	und	1,00	2.394,24	2.394,24	65%	0,65	1.556,26	0%	0,00	0,00	65%	0,65	1.556,26	0,35	837,98
04.10.01	TABLEROS DE CONTROL DE ELECTROBOMBAS	und	1,00	733,00	733,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	1,00	733,00
04.10.02	TABLERO DE DISTRIBUCION STD-TAH	und	1,00	733,00	733,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	1,00	733,00
04.11	GRUPO ELECTROGENO	und	1,00	36.342,40	36.342,40	65%	0,65	23.622,56	0%	0,00	0,00	65%	0,65	23.622,56	0,35	12.719,84
04.12	PUESTA A TIERRA	und	2,00	903,42	1.806,84	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	2,00	1.806,84
04.13.01	LUMINARIA Y ACCESORIOS EXTERIORES	und	23,00	216,14	4.971,22	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	23,00	4.971,22
04.14	LUMINARIA Y ACCESORIOS INTERIORES	und	1,00	75,01	75,01	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	1,00	75,01
04.14.01	LUMINARIA TIPO HERMETICAS 2x36 Watts	und	4,00	55,87	223,48	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	4,00	223,48
04.14.02	LUMINARIA TIPO HERMETICAS 2x36 Watts	und	6,00	55,87	446,96	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	6,00	446,96
04.14.03	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	und	11,00	111,93	1.231,23	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	11,00	1.231,23
04.14.04	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	und	1,00	40,63	40,63	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	1,00	40,63
04.14.05	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	und	1,00	50,63	50,63	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	1,00	50,63
04.14.06	LUZ DE EMERGENCIA	und	6,00	207,15	1.242,90	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	6,00	1.242,90

DAVID MANUEL VELA FARRAN
 INGENIERO CIVIL
 R.O.C.P.N° 104754

ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 DNI 40431359
 REPRESENTANTE LEGAL

VALORIZACION DE OBRA N° 10

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

ENTIDAD : FONDEPES

SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA

CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS


FECHA : 31/08/2018

Monto Base	S/. 3 718 141,85
Monto Contratado	S/. 3 680 960,43
Fecha Inicio de Obra	28/11/2017
Plazo de Ejecución	75 días
Fecha término de Obra	10/02/2018
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios

Supervisión	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS	
SEGUN COSTO DIRECTO		
Monto Valorizado del Mes	S/. 0,00	0,00%
Monto Valorizado Acumulado	S/. 0,00	0,00%
Monto-Saldo por Valorizar	S/. 162.860,76	49,10%

Ubicación	
Región	TACNA
Departamento	TACNA
Provincia	TACNA
Lugar	SAMA

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCES				SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto	ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		SALDO	
						%	Valorizado	%	Valorizado	%	Valorizado	%	Valorizado
04.14.08	PRUEBA DE AISLAMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA Y PUESTA EN SERV	GLB	1,00	3.500,00	3.500,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.500,00
04.15	TRANSFORMADORES EN BAJA TENSION												
04.15.01	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION SECO 75 KVA. 400/460 V. 3Ø 60 HZ. CON REJILLAS DE VENTILACION	und	1,00	17.824,25	17.824,25	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	17.824,25
04.15.02	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION SECO 50 KVA. 400/230 V. 3Ø 80 HZ. (CON REJILLAS DE VENTILACION	und	1,00	15.474,25	15.474,25	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.474,25
COSTO DIRECTO TOTAL				331.818,95			168.838,20		0,00		168.838,20		162.860,75
GASTOS GENERALES (10.0 %)				33.181,90			16.893,82		0,00		16.893,82		16.298,07
UTILIDAD (8.8 %)				29.208,87			14.866,56		0,00		14.866,56		14.342,31
SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO				394.319,72			200.698,58		0,00		200.698,58		193.621,13
I.G.V. (18.0 %)				70.877,55			36.125,75		0,00		36.125,75		34.651,80
TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO				465.297,28			236.824,33		0,00		236.824,33		228.472,93


 ALEXANDER PRIMITIVO
 HUERTAS JARA
 DNI: 40431359
 REPRESENTANTE LEGAL


 DAVID MANUEL VELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 104754

VALORIZACION DE OBRA N° 10

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"
 SUPERVISION : FONDEPES
 SUPERVISOR : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS
 FECHA : 31/08/2018

Monto Base	S/. 3.718.141,85
Monto Contratado	S/. 3.680.960,43
Fecha-Inicio de Obra	28/11/2017
Plazo de Ejecución	75 días
Fecha-termino de Obra	10/02/2018
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios

Supervisión	: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contratista	: CONSORCIO OBRAS	
SEGUN COSTO DIRECTO		
Monto Valorizado del Mes	: S/. 0,00	0,00%
Monto Valorizado Acumulado	: S/. 660.075,10	90,00%
Monto-Saldo por Valorizar	: S/. 76.563,90	10,00%

Ubicación	
Región	: TACNA
Departamento	: TACNA
Provincia	: TACNA
Lugar	: SAMA

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCES				SALDO					
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto	ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO					
						%	Valorizado	%	Valorizado	Metrado	Valorizado	%	Valorizado		
05.00	EQUIPAMIENTO														
05.01	UNIDAD FRIGORIFICA Y EQUIPAMIENTO EN AREA DE TAREAS PREVIAS	IGLB	1,00	765.639,00	765.639,00	90%	660.075,10	0%	0,00	90%	660.075,10	10%	0,10	75.563,90	
COSTO DIRECTO TOTAL				765.639,00			660.075,10		0,00		660.075,10			76.563,90	
GASTOS GENERALES (10.0%)				75.563,90			68.007,51		0,00		68.007,51			7.556,39	
UTILIDAD (6.8%)				66.496,23			59.846,81		0,00		59.846,81			6.649,82	
SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO				897.698,13			807.929,22		0,00		807.929,22			89.769,81	
I.G.V. (18.0%)				161.585,84			145.427,26		0,00		145.427,26			16.158,58	
TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO				1.059.284,98			953.356,48		0,00		953.356,48			109.928,80	


DAVID MANUEL VELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 104754



 ALEXANDER PRIMITIVO
 HUERTAS JARA
 DNI: 40431359
 REPRESENTANTE LEGAL

CRONOGRAMA EJECUTADO DE AVANCE FISICO DE LA OBRA

DESCRIPCION	TIEMPO												TOTALES
	28 - 31 NOVIEMBRE 3 Dias	1 - 31 DICIEMBRE 31 Dias	01 - 31 ENERO 31 Dias	01 - 28 FEBRERO 28 Dias	01 - 31 MARZO 31 Dias	01 - 30 ABRIL 30 Dias	01 - 31 MAYO 31 Dias	01 - 30 JUNIO 30 Dias	01 - 31 JULIO 31 Dias	01 - 31 AGOSTO 31 Dias	FIN		
COSTO DIRECTO TOTAL	S/ 85,265.51	S/ 873,431.96	S/ 840,153.24	S/ 77,891.37	S/ 4,082.90	S/ 7,642.47	S/ 12,045.50	S/ 4,067.00	S/ 0.00	S/ 104,692.07	S/ 2,625,806.39		
GASTOS GENERALES (10.0%)	S/ 8,526.55	S/ 87,343.20	S/ 84,015.32	S/ 7,789.14	S/ 408.29	S/ 764.25	S/ 1,204.55	S/ 406.70	S/ 0.00	S/ 10,468.21	S/ 262,580.64		
UTILIDAD (8.8%)	S/ 7,503.37	S/ 76,862.01	S/ 73,933.49	S/ 6,854.44	S/ 359.30	S/ 672.54	S/ 1,060.00	S/ 367.90	S/ 0.00	S/ 3,212.02	S/ 81,828.25		
SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO	S/ 101,295.43	S/ 1,037,637.17	S/ 998,102.05	S/ 92,534.95	S/ 4,850.49	S/ 9,079.26	S/ 14,310.05	S/ 4,831.60	S/ 0.00	S/ 124,382.30	S/ 3,130,417.41		
I.G.V. (18.0%)	S/ 18,233.18	S/ 186,774.69	S/ 179,659.37	S/ 16,655.29	S/ 873.09	S/ 1,634.27	S/ 2,575.81	S/ 889.69	S/ 0.00	S/ 22,385.21	S/ 403,900.00		
TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO	S/ 119,528.61	S/ 1,224,411.86	S/ 1,177,761.42	S/ 109,190.24	S/ 5,723.57	S/ 10,713.52	S/ 16,885.86	S/ 5,721.28	S/ 0.00	S/ 146,747.51	S/ 3,534,317.41		
PRESUPUESTO MENSUAL EJECUTADO	S/ 119,528.61	S/ 1,177,761.42	S/ 1,177,761.42	S/ 109,190.24	S/ 5,723.57	S/ 10,713.52	S/ 16,885.86	S/ 5,721.28	S/ 0.00	S/ 146,747.51	S/ 3,534,317.41		
% MENSUAL EJECUTADO	3.25%	33.28%	32.00%	2.97%	0.16%	0.29%	0.46%	0.15%	0.00%	3.99%	76.52%		
PRESUPUESTO ACUMULADO	S/ 119,528.61	S/ 1,343,940.47	S/ 2,521,700.89	S/ 2,630,892.12	S/ 2,638,616.70	S/ 2,847,329.22	S/ 2,864,216.08	S/ 2,869,916.37	S/ 2,869,916.37	S/ 2,869,916.37	S/ 2,869,916.37		
% ACUMULADO PROGRAMADO	0.65%	20.90%	54.22%	61.31%	62.60%	62.64%	62.64%	62.64%	62.64%	62.64%	62.64%		
% ACUMULADO EJECUTADO	3.25%	36.51%	68.51%	71.47%	71.63%	71.82%	72.36%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%		

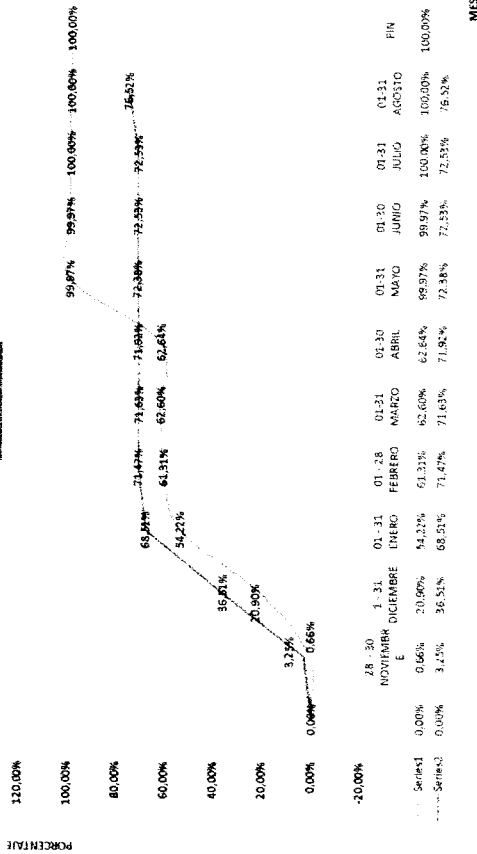CURVA MASA




DAVID MANUEL VELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 104754



ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 DNI: 40431359
 REPRESENTANTE LEGAL

I. Panel fotográfico



Fotografía N°01: Vista de izado y montaje de tijerales para estructuras metálicas.


DAVID MANUEL VELA FARFAN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 104754


ALEXANDER PRIMITIVO
HUERTAS JARA
DNI: 40431359
REPRESENTANTE LEGAL




S.H.J.

- Constatorias y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:
 - Obras de Edificaciones
 - Obras de Carreteras
 - Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
 - Obras de Electrificación
 - Obras Hidráulicas

11



Fotografía N°02: Visita de instalación de trampa de pelos en línea de succión de agua salada.

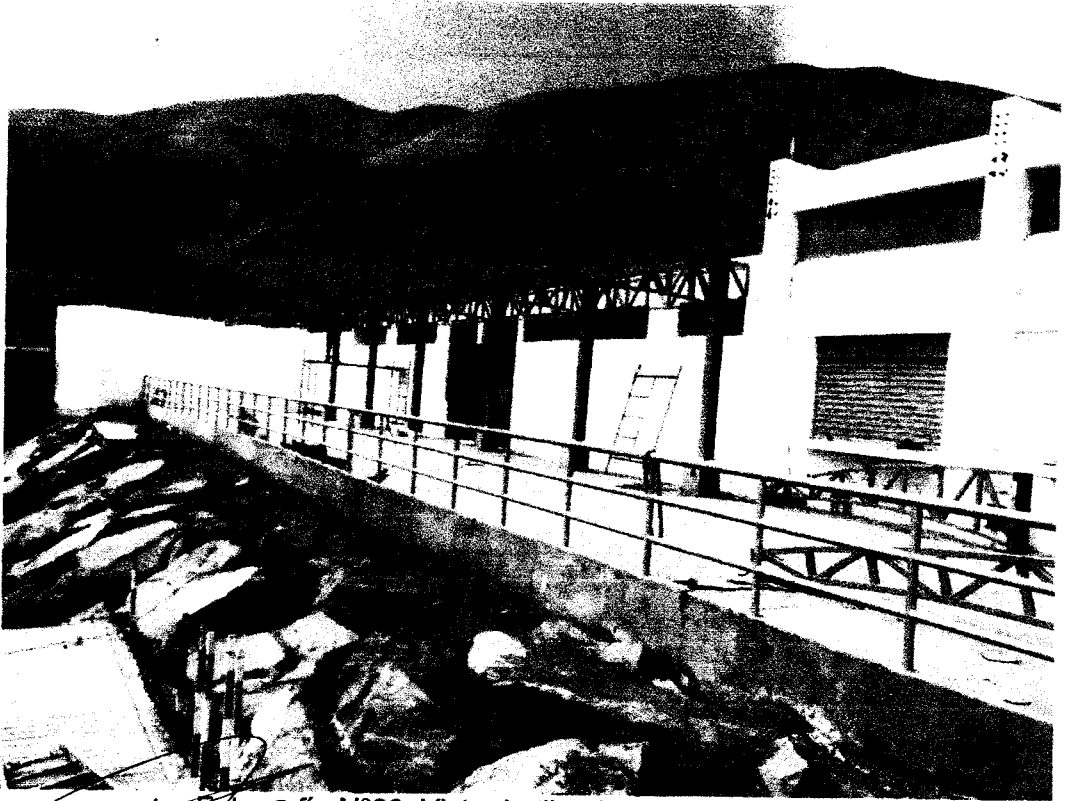

Fotografía N°03: Vista de tijerales tipo I montados.

DAVID MANUEL VELA FARFAN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 104754

ALEXANDER PRIMITIVO
HUERTAS JARA
DNI: 40431359
REPRESENTANTE LEGAL

030



Asociación de Ingenieros y Arquitectos de la Ingeniería

A.H.J.

Consultorías y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:


- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas

20



Fotografía N°04: Vista de montaje de estructura para cobertura tipo III.


DAVID MANUEL VELA FARFAN
INGENIERO CIVIL
DNI: 40431359


ALEXANDER PRIMITIVO
HUERTAS JARA
DNI: 40431359
REPRESENTANTE LEGAL




Asesoría e Ingeniería

A.H.J.

Consultoría y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:

- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas

21

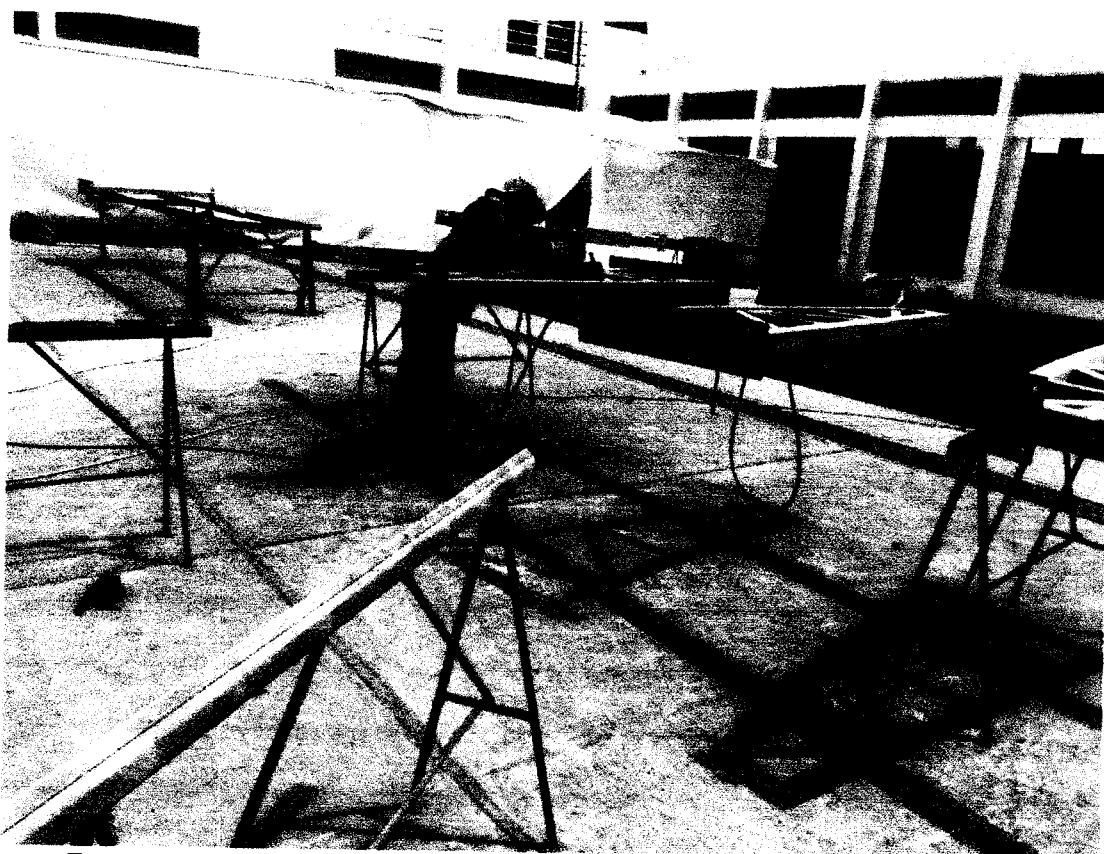

Fotografía N°05: Vista de trabajo de rectificación de estructuras metálicas.



Fotografía N°06: Zona de secado de pintura.

David Manuel Yela Farfan
 DAVID MANUEL YELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 104754

Alexander Primitivo Huertas Jara
 ALEXANDER PRIMITIVO
 HUERTAS JARA
 DNI: 40431359
 REPRESENTANTE LEGAL

032



Asesoría e Ingeniería

A.H.J.

Consultorias y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:

- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas

22



Fotografía N°07: Vista de instalación de pernos en pedestales de concreto ubicados en muelle 2 para estructura metálica de cobertura tipo IV.

DAVID MANUEL VELA FARFAN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 104754

ALEXANDER PRIMITIVO
HUERTAS JARA
DNI: 40431359
REPRESENTANTE LEGAL

033



A.H.J.


Consultorías y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:

- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas

23



Fotografía N°08: Vista de control de nivel horizontal y verticalidad de estructuras para cobertura tipo I.


DAVID MANUEL VELA FARFAN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 104754


ALEXANDER PRIMITIVO
HUERTAS JARA
DNI: 40431359
REPRESENTANTE LEGAL



Asociación de Ingenieros de la Ingeniería de Hidráulica y Saneamiento
A.H.J.


Consultoría y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:
- Obras de Edificación
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas

24



Fotografía N°09: Vista de trabajos de acople de tubería HDPE del adicional de obra.


DAVID MANUEL VELA FARFAN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 104754


ALEXANDER PRIMITIVO
HUERTAS JARA
DNI: 40431359
REPRESENTANTE LEGAL

035

II. Cuaderno de obra


CUADERNO DE OBRA



LUGAR: _____ MODALIDAD: _____
 AREA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____


ASIENTO N° 372: DEL SUPERVISOR 01/08/2018
 EN LA FECHA LA PRESENTE SUPERVISION TOMA CONOCIMIENTO DE
 LOS TRABAJOS QUE VIENEN SIENDO EJECUTADOS POR LA RESIDENCIA,
 SE INDICA ADEMAS QUE A LA FECHA NO HAN SIDO REPUESTOS
 LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE FILTRO RETIRADOS POR EL CENTRALISTA.
 SE RECUERDA QUE EL PLAZO ACTUAL DE EJECUCION SE ENCUENTRA
 VIGENTE AL 30/07/2018 SEGUN AMPLIACION DE PLAZO N° 08, POR
 TANTO LA EJECUCION SE ENCUENTRA BAJO POSIBILIDAD DE APLICACION
 DE PENALIDADES POR MORA.


 Ing. Juan Manuel Tito Pardo
 INGENIERO CIVIL
 REG. C. U. P. N° 10124


 INGENIERO CIVIL
 REG. C. U. P. N° 10124
 ING. SUPERVISOR

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE




CUADERNO DE OBRA N°



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 PARA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

Asiento N° 380 / Del Residente 06.08.18


Se comunica a la supervisión, de manera complementaria que se asienta en el Asiento N° 362, que el peso de la madera por cada unidad de defensa tipo 2, asciende a 447.8 Kg más el peso de 04 llantas de Aso 20 de Nylon es 86.5 Kg por cada uno, se remite a fin de los cálculos y fines que estime por conveniente la supervisión.


 OSCAR L. UCAY CHABARA
 INGENIERO CIVIL
 CEP 10280

ASIENTO N° 381: DEL SUPERVISOR 06/08/2018

EN LA FECHA LA PRESENTE SUPERVISION TOMA CONOCIMIENTO DE LO INDICADO POR EL RESIDENTE DE OBRA. SE INDICA ADEMÁS QUE SE RECIBE LA INFORMACION REFERENTE AL PESO DE LAS ESTRUCTURAS PARA LA CORRECCION DE 16 UNIDADES DE DEFENSAS DEL TIPO II CON LO CUAL SE PODRÁ PROCEDER A ELEVAR CONSULTA A LA CANTIDAD SOBRE EL SISTEMA DE ANCLAJE.


 OSCAR L. UCAY CHABARA
 INGENIERO CIVIL
 REG. C.I.P. N° 104754


 Oscar L. Ucay Chabara
 INGENIERO CIVIL
 REG. C.I.P. N° 104754

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

28

CUADERNO DE OBRA N°



A: _____ MODALIDAD: _____

PROYECTO: _____

GRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

Asiento N° 322; Del Residente de Obra 07.08.12

- 1° Prosiguen los trabajos en confección y pintado de estructuras metálicas; con sus respectivos detalles de seguridad.
- 2° Aún no se tiene respuesta sobre la consulta de aseguramiento de defensa de muelles; descrita en el Asiento 360 con fecha 25.07.12; por lo que continúa pendiente dicho punto.
- 3° Se continúa a la espera de la notificación de E.D. que autorice y mate el fraso del emisor submarino para hundimiento.

ASIENTO N° 303: DEL SUPERVISOR 07/08/2012

EN LA FECHA LA PRESENTE SUPERVISION TOMA CONOCIMIENTO DE LO INDICADO POR EL RESIDENTE DE OBRA.
SE VERIFICA QUE SE PROSIGUEN CON LOS TRABAJOS DE CONFECCION Y PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA MUELLES.
RESPECTO A LA RESOLUCION DE CONSULTA SOBRE DEFENSA DE MUELLES SE RECUERDA QUE EN ASIENTO 300 RECIBIEN SE COMPLETO LA INFORMACION PARA PODER ELEVAR LA CONSULTA A LA ENTIDAD.
RESPECTO A LA AUTORIZACION PARA HUNDIMIENTO DE EMISOR SUBMARINO SE VERIFICA QUE AÚN SE PROSIGUE A LA ESPERA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
David Manuel Vela Fortis
INGENIERO CIVIL
REG. C.I.P. N° 15493

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



LA: _____ MODALIDAD: _____

ECTO: _____

ERAMA: _____

DAD EJECUTORA: _____

Asiento N° 384 ; Del Residente de Obra 08.08.18

1° Continúan labores de fabricación de estructuras metálicas tipo I, II, III y IV ; así mismo se tienen frentes de Anclado y pintado

2° Se viene ejecutando los trabajos adicionales para los tubos y movimiento de tierra para el sistema de agua residual,

ASIENTO N° 385: DEL SUPERVISOR 08/08/2018

EN LA FECHA LA PRESENTE SUPERVISION TOMA CONOCIMIENTO DE LO INDICADO POR EL RESIDENTE DE OBRA,

SE VERIFICA QUE SE PROSIGUE CON LA REALIZACION DE TRABAJOS DE ANCLADO Y PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS,

ASIMISMO SE VERIFICA QUE SE VIENEN EJECUTANDO TRABAJOS CONTENIDOS EN EL ADICIONAL DE OBRA N° 01, RECORDÁNDOSE QUE DEBERAN CUMPLIRSE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN OBRA. SE INDICA QUE LOS TRABAJOS VIENEN SIENDO EJECUTADOS A RITMO LENTO, TANTO EN LO CONTRACTUAL COMO EN EL ADICIONAL DE OBRA; Y A LA FECHA NO SE HAN REPUESTO LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE FIJO QUE FUERON RETIRADOS.

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
UBICACION: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

Asiento N° 386 ; Del Residente de Obra 09.07.18

1° Continuar labores de fabricacion estructuras metalicas tipo I, II, III y IV ; con su respectivo arenado y pintado de dichas estructuras.

2° Se solicita la autorizacion a la supervision el inicio para las excavaciones en terreno natural y corte de piso en el patio de maniobras y asi continuar los trabajos de aguas residuales.

ASIENTO N° 387: DEL SUPERVISOR 07/08/2018

EN LA FECHA LA PRESENTE SUPERVISION HA TOMADO CONOCIMIENTO DE LO INDICADO POR EL RESIDENTE DE OBRA.

SE VERIFICA QUE SE PROSIGUE CON LOS TRABAJOS DE PINTADO Y ARENADO DE ESTRUCTURAS METALICAS, INDICANDOSE QUE EL RITMO ES MUY LENTO PARA SU REALIZACION, DEBIENDO IMPLEMENTARSE MAS CUADRIJAS.

SE AUTORIZA EL INICIO DE EXCAVACIONES Y CORTE DE PISOS DE CONCRETO SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL EXPEDIENTE TECNICO EN CUANTO A TRAZO Y PROFUNDIDAD. A SU VEZ SE INDICA QUE SE DEBERAN EJECUTAR RELLENOS COMPACTADOS Y ENSAYOS DEL CONCRETO A REFORZAR.

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA N°




HA: _____ MODALIDAD: _____
 RA: _____
 YECTO: _____
 GRAMA: _____
 DAD EJECUTORA: _____

Asiento N° 388 ; Del Residente de Obra 10.08.18

- 1° Prosiguen trabajos de fabricación y armado de las estructuras tipo I, II, III y III; con sus respectivos charlas de seguridad
- 2° Se continúa con el arte de las de concreto y las excavaciones de zanjas para las tuberías HDPE de 24"
- 3° Se continúa a la espera de la absolución de consulta respecto a la Depura de melés
- 4° Se continúa a la espera de la Resolución Directoral que emita DICAPI para reiniciar los trabajos del hundimiento de Emisa Subterránea.

ASIENTO N° 389 = DEL SUPERVISOR 10/08/2018
 EN LA FECHA LA PRESENTE SUPERVISION TOMA CONOCIMIENTO DE LO INDICADO POR EL RESIDENTE DE OBRA.
 SE VERIFICA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS INDICADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA, RECORDANDOSE QUE CUALQUIER MODIFICACION DEBE SER CONSULTADA Y APROBADA SEGUN CONDUCTO REGULAR.
 ASIMISMO SE VERIFICA QUE SE PROSIGUE A LA ESPERA YANNO DE ABSOLUCION DE CONSULTA COMO DE AUTORIZACION DE DICAPI. A LA FECHA NO SE REPONEN LOS EQUIPOS DE SISTEMA DE FIBRO RETIRADOS.


 ING. DAVID MANUEL VELA PAJÓN
 INGENIERO CIVIL
 REG. C.I.P. N° 10454


 ING. DAVID MANUEL VELA PAJÓN
 INGENIERO CIVIL
 REG. C.I.P. N° 10454

ING. INSPECTOR _____

ING. RESIDENTE _____

ING. SUPERVISOR _____

CUADERNO DE OBRA



LUGAR: _____ MODALIDAD: _____
 PARA: _____
 OBJETO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

Asiento N° 390 ; Del Residente de Obra 11.08.18


1° Se prosigue a la espera de la notificación de Resolución Directoral que anula y autoriza el cambio de trazo para el hundimiento del anclaje submarino.

2° Continúan los trabajos para el sistema de agua residual, preparándose las camas de apoyo; por lo que se espera la autorización de la supervisión a fin de iniciar el tendido de la tubería HDPE 2". Al respecto se informa a manera de propuesta que la tubería HDPE 2" se va exponer que va encima del espigón de roca se podría trasladar al pie del cerro perimetral por la parte exterior a fin de protegerlo al objeto y por ante el impacto de los neos que pudieran tener sobre dicha tubería.

ASIENTO N° 391: DEL SUPERVISOR 11/08/2018

EN LA FECHA LA PRESENTE SUPERVISION TOVA CONOCIMIENTO DE LO INDICADO POR EL RESIDENTE DE OBRA SE VERIFICA QUE A LA FECHA NO SE HA OBTENIDO NOTIFICACION DE AUTORIZACION DE DICAPI. RESPECTO A LA PROPUESTA DE MODIFICACION DEL TRAZO DE TUBERIA HDPE 2" SE SOLICITA PLANOS Y METRADOS DE LO PROPUUESTO, A FIN DE ELEVAR A ESPECIALISTAS Y A LA ENTIDAD PARA CONSULTA. A LA FECHA SIGUEN SIN REPONERSE EQUIPOS DEL SISTEMA DE FRIO PREVIAMENTE RETIRADOS POR EL CONTRATISTA.


 Ing. Juan Manuel Vela Perjan
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 1474


 Ing. Daniel Antonio Vela Perjan
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 1744

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

31/03

Nº



HA: _____ MODALIDAD: _____
 A: _____
 YECTO: _____
 GRAMA: _____
 DAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 422: DEL SUPERVISOR

31/03/2018

EN LA FECHA LA PRESENTE SUPERVISION TOMA CONOCIMIENTO
 DE LOS TRABAJOS QUE VIENEN SIENDO EJECUTADOS POR LA RESIDENCIA.
 SE SOLICITA AL RESIDENTE PRESENTAR SEGÚN LOS ACTUALIZADOS DEL
 PERSONAL TÉCNICO Y OBRERO, ASIMISMO COPIA DE CARTAS FIANZA Y
 GARANTIA VIGENTES.

SE INDICA QUE SE HA HECHO LLEGAR VIA CORREO ELECTRONICO ACLARACION


SOBRE INSTALACIONES ELECTRICAS REALIZADA POR EL ING. MARTIN ROJAS

JASQUEZ, ESPECIALISTA ELECTRICO DE FONDEPES, REFERIDA A:

04.14.01 LUMINARIAS TIPO HERMETICAS 2x36 WATTS



06.13.01 REFLECTOR DE 100 W (250W) LED IP-65

04.14.03 LUZ DE EMERGENCIA C/ACCESORIOS


 ING. SUPERVISOR

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE


 ING. RESIDENTE

 ING. SUPERVISOR
