




Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año del Dialogo y Reconciliación Nacional



**MEMORANDO N° 3571 - 2018-FONDEPES/DIGENIPAA**

**FONDEPES**  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
29 OCT 2018  
DOCUMENTO RECIBIDO  
HORA: 18:31 FIRMA:

**A : C.P.C. TERESA ZENaida QUIROZ SILVA**  
**Jefa de la Oficina General de Administración**

**Asunto : Trámite de Valorización de Obra N° 45,**  
Obra: "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque".

**Referencia : a) Carta N° 082-SUPER-SJOSE-2018**  
**b) INFORME N° 08-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/aomc**

**Fecha : Lima, 29 OCT 2018**

Me dirijo a usted cordialmente, a fin de remitirle la Valorización de Obra N° 45, a favor del contratista CONSORCIO SAN JOSÉ, responsable de la ejecución de la Obra: "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque", ya que cuenta con la conformidad de esta Dirección General, el mismo que deberá realizarse de la siguiente manera:

VALORIZACION DE OBRA N° 45		
DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
(Valorización de Obra N°45) Inc. IGV	S/. 27,585.87	
<b>TOTAL, A FACTURAR</b>		<b>S/. 27,585.87</b>

Son: Veintisiete Mil Quinientos Ochenta y Cinco con 87/100 Soles.

Sin otro particular, hago propicio la oportunidad para expresarle el sentimiento de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente:

**FONDEPES**

ING. LUIS ALBERTO ELVIRA QUINO  
Director General de Inversión Pesquera  
Artesanal Acuicola





Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año del Dialogo y Reconciliación Nacional

## CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por la presente que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola al suscribir la presente acta, da su conformidad para realizar el pago por el concepto de la VALORIZACIÓN DE OBRA N.º 45, correspondiente al mes de setiembre de 2018, equivalente a la suma de **S/. 27,585.87** (Veintisiete Mil Quinientos Ochenta y Cinco con 87/100 Soles), incluido IGV a favor del CONSORCIO SAN JOSÉ, encargado de la ejecución de la Obra: "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque, según CONTRATO N°082-2014-FONDEPES/OGA, del 24 de diciembre de 2014.

Lima, octubre 2018



FONDEPES

ING. LUIS ALBERTO BARRIÉRI QUINO  
Director General de Inversión Pesquera  
Artesanal Acuicola

002

LBQ/jjc



Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año del Dialogo y Reconciliación Nacional

**INFORME N° 08-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/JJC**

- A :** **ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO**  
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola
- ASUNTO :** **VALORIZACION DE OBRA N° 45 - MES DE SETIEMBRE 2018**, Obra: Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque", CONTRATO N° 082-2014-FONDEPES/OGA. Contratista: CONSORCIO SAN JOSE.
- REFERENCIA :** a) Carta N° 082-SUPER-SJOSE-2018  
b) Carta N° 067-2018-CSJ/CO
- FECHA :** Lima, 25 de octubre de 2018

Me dirijo a usted, en atención a los documentos de la referencia (a) y (b), mediante los cuales, la supervisión de la obra materia del asunto, remite la valorización N° 45, correspondiente al mes de setiembre de 2018 (ref. a), que fuera presentada por el contratista de obra (ref. b).

En relación a lo cual, hago de su conocimiento lo siguiente:

**I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

- |                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| Obra                               | : | "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque". |
| Licitación                         | : | Adjudicación de Menor Cuantía N° 38-2014-FONDEPES derivada de la Licitación Pública N° 004-2014-FONDEPES.   |
| Ubicación                          | : | Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región de Lambayeque.  |
| Sistema de Contratación            | : | Precios Unitarios   |
| Monto referencial                  | : | S/. 33 504 650.56   |
| Monto contratado                   | : | S/. 32 457 630.22 con IGV   |
|                                    |   | S/. 27 506 466.29 sin IGV   |
| Monto vigente                      | : | S/. 32 983 830.49 con IGV   |
| Adelanto directo                   | : | S/. 6 491 526.04 con IGV  |
| Plazo de ejecución de la obra      | : | 540 días calendario   |
| Nuevo plazo contractual vigente    | : | 1,360 días calendario   |
| Contratista principal              | : | CONSORCIO SAN JOSÉ (CHAVIN DE HUANTAR EIRL – CIVIS GLOBAL – SUCURSAL PERU – CORPORACIÓN ARIS SAC – CORPORACIÓN R&E SAC)                               |
| Representante legal Contratista    | : | Ing. Emiliano Isaac Trujillo Luna   |
| Residente de obra                  | : | Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros   |
| Representante legal de Supervisión | : | Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga  |
| Supervisor de obra                 | : | Ing. Isaías Jorge Alva Espinoza   |
| Contrato                           | : | CONTRATO N° 082-2014-FONDEPES/OGA   |
| Entrega de Adelanto Directo        | : | S/. 6 491 526.04 (Inc. IGV), Fecha: 09-ene-2015   |
| Fecha de Contrato                  | : | 24-dic-2014   |
| Entrega de Terreno                 | : | 14-ene-2015   |
| Inicio Contractual de Obra         | : | 15-ene-2015   |
| Inicio real de Obra                | : | 15-ene-2015   |
| Ampliación de plazo N° 01          | : | 29 días calendario  |
| Ampliación de plazo N° 02          | : | 31 días calendario (Denegada)   |
| Ampliación de plazo N° 03          | : | 47 días calendario (Denegada)   |



Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año del Dialogo y Reconciliación Nacional

Ampliación de plazo N° 04	: 32 días calendario
Ampliación de plazo N° 05	: 32 días calendario
Ampliación de plazo N° 06	: 12 días calendario
Ampliación de plazo N° 07	: 44 días calendario (Denegada)
Ampliación de plazo N° 08	: 74 días calendario (Denegada)
Ampliación de plazo N° 09	: 32 días calendario
Ampliación de plazo N° 10	: 30 días calendario
Ampliación de plazo N° 11	: 8 días calendario
Ampliación de plazo N° 12	: 8 días calendario
Ampliación de plazo N° 13	: 48 días calendario
Ampliación de plazo N° 14	: 11 días calendario
Ampliación de plazo N° 15	: 53 días calendario
Ampliación de plazo N° 16	: 60 días calendario
Ampliación de plazo N° 17	: 60 días calendario
Ampliación de plazo N° 18	: 60 días calendario
Ampliación de plazo N° 19	: 60 días calendario
Ampliación de plazo N° 20	: 38 días calendario
Ampliación de plazo N° 21	: 30 días calendario
Ampliación de plazo N° 22	: 15 días calendario
Ampliación de plazo N° 23	: 202 días calendario
Ampliación de plazo N° 24	: 60 días calendario
Adicional N° 01	: 326,464.23
Adicional N° 02	: 449,232.12
Deductivo Vinculado N° 01:	: 450,814.30
Adicional N° 03	: 86,170.63
Adicional N° 04	: 579,080.87
Deductivo Vinculado N°02	: - 446.29
Adicional N° 05	: 446,667.85
Deductivo Vinculado N°03	: -152,971.09
Adicional N° 06	: 1,377,727.34
Deductivo Vinculado N°04	: -242,094.96
Adicional N° 07	: 1'532,420.43
Deductivo Vinculado N°05	: 620,840.66
Adicional N° 08	: 960,977.20
Deductivo Vinculado N°06	: 479,845.97
Reducción de Prestación N° 01	: 2'065,875.97
Reducción de Prestación N° 02	: 11,230.00
Reducción de Prestación N° 03	: 418,002.69
Reducción de Prestación N° 04	: 479,845.97
Reducción de Prestación N° 05	: 1'054,073.06
Fin contractual de obra	: 07-jul-2016
Fecha Término Contrato Vigente	: 04-diciembre-2018



**II. ANTECEDENTES:**

2.1. Como consecuencia del otorgamiento de la Buena Pro de la AMC N°38-2014-FONDEPES. Derivada de la LP N° 004-2014-FONDEPES, FONDEPES y el CONSORCIO SAN JOSÉ (CHAVIN DE HUANTAR EIRL – CIVIS GLOBAL – SUCURSAL PERU – CORPORACIÓN ARIS SAC – CORPORACIÓN R&E SAC), suscribieron el 24 de diciembre del 2014 el CONTRATO N° 082-2014-FONDEPES/OGA, para la ejecución de la "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque", por el monto de S/. 32 457 630.22 (Treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil seiscientos treinta con 22/100 Nuevos soles), incluido IGV, bajo el sistema de precios unitarios y con el plazo de 540 días calendario.

004





Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año del Dialogo y Reconciliación Nacional

## 2.2. Con Referencia a Ampliaciones de Plazo y Vencimiento de Contrato Vigente:

- Con Resolución de Secretaria General N° 110-2015-FONDEPES/SG; se aprueba la ampliación de plazo N° 01 por 29 días calendario.
- Con Resolución de Secretaria General N° 126-2015-FONDEPES/SG; se deniega la ampliación de plazo N° 02 por 31 días calendario.
- Con Resolución de Secretaria General N° 204-2015-FONDEPES/SG; se deniega la ampliación de plazo N° 03 por 47 días calendario, se aprueba la ampliación de plazo parcial N° 02, por 31 días calendario.
- Con Resolución Jefatural N° 035-2016-FONDEPES/SG; se aprueba la ampliación de plazo, por la ejecución de la prestación adicional de obra N° 04, por 32 días calendario.
- Con Resolución de Secretaria General N° 061-2016-FONDEPES/SG; se aprueba la ampliación de plazo parcial N° 05 por 32 días calendario.
- Con Resolución de Secretaria General N° 073-2016-FONDEPES/SG; se aprueba la ampliación de plazo parcial N° 06 por 12 días calendario, siendo el nuevo termino de plazo contractual el 20 de octubre de 2016.
- Con Resolución de Secretaria General N° 087-2016-FONDEPES/SG; se deniega la ampliación de plazo N° 07 por 44 días calendario.
- Con Resolución de Secretaria General N° 097-2016-FONDEPES/SG; se deniega la ampliación de plazo N° 08 por 74 días calendario.
- Con Resolución de Secretaria General N° 120-2016-FONDEPES/SG; se otorga la ampliación de plazo parcial N° 09 por 32 días calendario, siendo la nueva fecha de término el 21 de noviembre de 2016.
- Con Resolución de Secretaria General N° 132-2016-FONDEPES/SG; se otorga la ampliación de plazo parcial N° 10 el 16/11/2016, por 30 días calendario. Fecha de término el 21 de diciembre de 2016.
- Con Resolución de Secretaria General N° 147-2016-FONDEPES/SG; se otorga la ampliación de plazo parcial N° 11, por 8 días calendario, con fecha de término el 29 de diciembre de 2016.
- Con Resolución de Secretaria General N° 002-2017-FONDEPES/SG; se aprueba la ampliación de plazo parcial N° 12, por 8 días calendario, siendo el nuevo término de obra el 06 de enero de 2017.
- Con Resolución de Secretaria General N° 006-2017-FONDEPES/SG; se aprueba la ampliación de plazo N° 13, por 48 días calendario, computados desde el 30 de diciembre de 2016 hasta la fecha de término el 23 de febrero de 2017.
- Con Resolución de Secretaria General N° 021-2017-FONDEPES/SG; se aprueba la ampliación de plazo N° 14, por 11 días calendario, computados desde el 24 de febrero de 2017 hasta la fecha de término el 06 de marzo de 2017.

005



Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año del Dialogo y Reconciliación Nacional

- Con Resolución de Secretaria General N° 031-2017-FONDEPES/SG; se aprueba la ampliación de plazo N° 15, por 53 días calendario, computados desde el 07 de marzo de 2017 hasta la fecha de término el 28 de abril de 2017.
- La solicitud de ampliación de plazo N° 16 por 60 días calendario quedo consentida, al no haberse pronunciado la Entidad dentro del plazo de ley, por la falta de opinión de la supervisión, cuyas actividades fueron suspendidas mediante acuerdo por Acta; quedando como nueva fecha de terminación de obra el 27 de junio el 23017.
- Con Resolución de Secretaria General N° 062-2017-FONDEPES/SG; se aprueba la ampliación de plazo N° 17, por 60 días calendario, computados desde el 28 de junio de 2017 hasta la fecha de término el 26 de agosto de 2017.
- Con Resolución de Secretaria General N° 094-2017-FONDEPES/SG; se aprueba la ampliación de plazo N° 18, por 60 días calendario, computados desde el 27 de agosto de 2017 hasta la fecha de término el 25 de octubre de 2017.
- Con Resolución de Secretaria General N° 119-2017-FONDEPES/SG; se aprueba la ampliación de plazo N° 19, por 60 días calendario, computados desde el 26 de octubre de 2017 hasta la fecha de término el 24 de diciembre de 2017.
- Con Resolución de Secretaria General N° 143-2017-FONDEPES/SG; se aprueba la ampliación de plazo N° 20, por 38 días calendario, computados desde el 25 de diciembre de 2017 hasta la fecha de término el 31 de enero del 2018.
- Con Resolución de Secretaria General N° 143-2017-FONDEPES/SG; se aprueba la ampliación de plazo N° 20, por 38 días calendario, computados desde el 25 de diciembre de 2017 hasta la fecha de término el 31 de enero del 2018.
- Mediante Resolución de Secretaria General N° 021-2018-FONDEPES/SG, se aprobó la ampliación de plazo parcial N° 21 por 30 días calendario, computados desde el 01 de febrero del 2018 hasta la fecha de término el 02 de marzo del 2018.
- Mediante Resolución de Secretaria General N° 047-2018-FONDEPES/SG, se aprobó la ampliación de plazo parcial N° 22 por 15 días calendario, computados desde el 03 de marzo del 2018 hasta la fecha de término el 17 de marzo del 2018.
- Mediante Resolución de Secretaria General N° 055-2018-FONDEPES/SG, se aprobó la ampliación de plazo parcial N° 23 por 202 días calendario, computados desde el 18 de marzo del 2018 hasta la fecha de término el 05 de octubre del 2018.
- Mediante Resolución de Secretaria General N° 178-2018-FONDEPES/SG, se aprobó la ampliación de plazo parcial N° 24 por 60 días calendario, computados desde el 06 de octubre de 2018 hasta la fecha de término el 04 de diciembre de 2018.

### 2.3. Valorización N°45 – mes de setiembre de 2018:

- 2.3.1 Mediante Carta N° 067-2018-CSJ/CO de fecha 30 de setiembre de 2018 el representante legal del contratista ejecutor de la obra, presenta a la supervisión de obra, la **valorización N° 45**, correspondiente al mes de setiembre de 2018.



Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año del Dialogo y Reconciliación Nacional

- 2.3.2 La supervisión de obra, recepciona el expediente de valorización N° 45, del contratista ejecutor, el 30 de setiembre de 2018. Mientras que con Carta N° 082-SUPER-SJOSE-2018 de fecha 05 de octubre de 2018, hace entrega a la Entidad de la mencionada valorización N° 45.
- 2.3.3 Conforme al informe técnico de la supervisión correspondiente al mes de setiembre 2018, en el ítem a) CONTENIDO: CONTROL DE AVANCE DE OBRA, en el inciso c) Cronograma de Avance de Obra y comentario específico, se hace referencia a un avance programado de 78.04%, mientras que el avance ejecutado de 61.87%, por lo la obra se encuentra atrasado de conformidad al cronograma vigente.

### III. ASPECTOS LEGALES:

- 3.1 Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017.
- 3.2 Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF; y sus modificaciones realizadas por Ley N° 29873 y el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, respectivamente, vigentes desde el 20 de setiembre de 2012.
- 3.3 En la cláusula cuarta del contrato se establece el procedimiento para dar trámite al pago de las valorizaciones, en concordancia con lo establecido en el Art. 197 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.
- 3.4 El Art. 197°, señala a su vez que la valorización debe ser ejecutada juntamente por el Supervisor y el Contratista.

### IV. ANÁLISIS:

- 4.01 Mediante Carta N° 067-2018-CSJ/CO de fecha 30 de setiembre de 2018, el contratista ejecutor de la obra presenta a la supervisión de obra la **Valorización N° 45** correspondiente al mes de setiembre 2018.
- 4.02 Mediante Carta N° 082-SUPER-SJOSE-2018, de fecha 05 de setiembre de 2018, la Supervisión de Obra, remite al FONDEPES la **Valorización N° 45**, correspondiente al mes de setiembre de 2018 y señala que la valorización presentada cumple con la documentación mínima necesaria.
- 4.03 Habiéndose procedido con la revisión de la **valorización N° 45** presentada por el contratista y dada como conforme por la Supervisión, se ha encontrado que se están valorizando los trabajos ejecutados en el periodo del mes de setiembre de 2018, mencionados en el Asiento N° 1880 (30.09.2018) del residente de obra, del cuaderno de obras. Se mencionan a continuación las partidas ejecutadas:
- 07.04.07 Maniobra de colocación e hincado de pilotes, vigas y losas: Puentes**
  - 07.04.07.01 Transporte de pilote
  - 07.04.07.03 Transporte de losa nervada
  - 07.04.07.06 Descabezado de pilotaje
  - 07.04.07.07 Colocación de viga transversal
  - 07.04.07.08 Colocación de losa nervada
- 4.04 Por lo tanto, se ha procedido a reformular la valorización con los metrados mencionados, con excepción de las partidas de concreto en núcleos y encofrado y desencofrado del núcleo, como corresponde.



Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año del Diálogo y Reconciliación Nacional

#### 4.1 Control Económico del Contrato:

##### 4.1.1 Valorización del Contrato Principal:

Según la Valorización de obra N° 45, correspondiente al mes de setiembre de 2018, se tiene:

✓ Avance acumulado real (físico)	:	61.87%.
✓ Avance acumulado programado	:	78.04%.
✓ Avance mensual – setiembre.2018	:	0.09%.
✓ $(61.87/78.04) \times 100 = 79.16\% < 80\%$	:	Atrasado (Artículo 205° del RLCE)

##### Artículo 205.- Demoras injustificadas en la Ejecución de la Obra

Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenará al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.

La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo precedente podrá ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. El nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reintegros.

Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor anotará el hecho en el cuaderno de obra e informará a la Entidad. Dicho retraso podrá ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra.

De otro lado, se menciona que el porcentaje de incidencia, considerando la aprobación del adicional N° 08 y deductivo vinculante N° 06 es de 11.74%, según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	MONTOS	PORCENTAJE DE INCIDENCIA		RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN RECTIFICATORIA
MONTO DEL CONTRATO (MC)	32,457,630.22				
AD 01 (RJ Nro. 280-2016-FONDEPES/J)	326,464.23	1.01	%	280-2015/J	
AD 02 (RJ Nro. 078-2016-FONDEPES/J RECT Nro. 098-2016)	449,232.12	1.38	%	078-2016/J	098-2016/J
DEDUCT VINC 01 (RJ Nro. 078-2016-FONDEPES/J)	450,814.30	-1.39	%		
AD 03 (RJ Nro. 093-2016-FONDEPES/J)	86,170.63	0.27	%	093-2016/J	
AD 04 (RJ Nro. 253-2016-FONDEPES/J)	579,080.87	1.78	%	253-2016/J	
DEDUCT VINC 02 (RJ Nro. 253-2016-FONDEPES/J)	446.29	0.000	%		
AD 05 (RJ Nro. 355-2016-FONDEPES/J RECT Nro. 011-2017)	446,667.85	1.38	%	355-2016/J	011-2017/J
DEDUCT VINC 03 (RJ Nro. 355-2016-FONDEPES/J)	152,971.09	-0.47	%		
AD 06 (RJ Nro. 370-2016-FONDEPES/J)	1,377,727.34	4.24	%	370-2016/J	
DEDUCT VINC 04 (RJ Nro. 370-2016-FONDEPES/J)	242,094.96	-0.75	%		
AD 07 (RJ Nro. 025-2018-FONDEPES/J)	1,532,420.43	4.72	%	025-2018/J	
DEDUCT VINC 05 (RJ Nro. 078-2016-FONDEPES/J)	620,840.66	-1.91	%		
AD 08 (RJ Nro. 031-2018-FONDEPES/J)	960,977.20	2.96	%	031-2018/J	
DEDUCT VINC 06 (RJ Nro. 031-201-FONDEPES/J)	479,845.97	-1.48	%		
<b>PORCENTAJE DE INCIDENCIA:</b>		<b>11.74</b>	<b>%</b>		

008



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año del Diálogo y Reconciliación Nacional

MES	FECHA		AVANCE FISICO PROGRAMADO		% DE AVANCE PROGRAMADO % DEL MES	% ACUMULADO	% AVANCE REAL % ACUMULADO REAL	AVANCE FISICO DEL MES (EJECUTADO)		AVANCE FISICO DEL MES (RESTRICIONADO)		CONSEJO DE OBRAS (RESTRICIONADO > 50%)	
	INICIO	FIN	AVANCE FISICO PROGRAMADO	AVANCE FISICO RESTRICIONADO				AVANCE FISICO DEL MES (EJECUTADO)	AVANCE FISICO DEL MES (RESTRICIONADO)	AVANCE FISICO DEL MES (EJECUTADO)	AVANCE FISICO DEL MES (RESTRICIONADO)		
ENERO	15/ENERO				0.0%	0.0%							
ENERO	15/01/2015	31/01/2015	S/ 244,008.19	S/ 244,008.19	0.0%	0.0%			S/ 359,299.22	S/ 359,299.22	1.30%	0.41%	OK
FEBRERO	10/02/2015	28/02/2015	S/ 689,347.98	S/ 640,766.16	2.5%	3.4%			S/ 913,989.12	S/ 913,989.12	2.02%	-0.10%	OK
MARZO	10/03/2015	31/03/2015	S/ 705,780.96	S/ 1,646,527.14	2.5%	5.9%			S/ 1,507,989.56	S/ 1,507,989.56	2.18%	5.48%	OK
ABRIL	10/04/2015	30/04/2015	S/ 739,441.42	S/ 2,384,978.56	2.8%	8.6%			S/ 925,171.16	S/ 2,432,157.74	3.3%	8.6%	OK
MAYO	10/05/2015	31/05/2015	S/ 688,371.48	S/ 3,071,350.04	2.5%	11.1%			S/ 1,503,222.22	S/ 3,168,889.98	2.7%	11.59%	OK
JUNIO	10/06/2015	30/06/2015	S/ 1,498,927.19	S/ 4,530,277.23	5.0%	16.4%			S/ 946,328.85	S/ 4,172,219.59	3.58%	15.17%	OK
JULIO	10/07/2015	31/07/2015	S/ 1,641,200.45	S/ 6,171,477.68	5.7%	21.4%			S/ 1,869,492.02	S/ 6,037,671.61	8.78%	21.96%	OK
AGOSTO	10/08/2015	31/08/2015	S/ 1,803,333.94	S/ 7,974,811.62	6.5%	28.9%			S/ 1,054,927.09	S/ 7,092,598.70	9.84%	25.76%	OK
SEPTIEMBRE	10/09/2015	30/09/2015	S/ 1,517,241.17	S/ 9,492,052.79	5.2%	34.5%			S/ 1,429,170.33	S/ 8,521,770.03	5.20%	30.98%	OK
OCTUBRE	10/10/2015	31/10/2015	S/ 1,450,340.32	S/ 10,942,392.11	5.2%	39.7%			S/ 1,265,746.48	S/ 9,787,516.51	4.67%	35.66%	OK
NOVIEMBRE	10/11/2015	30/11/2015	S/ 1,475,099.64	S/ 12,417,491.75	5.5%	45.1%			S/ 1,309,920.39	S/ 11,097,434.34	7.31%	42.97%	OK
DICIEMBRE	10/12/2015	31/12/2015	S/ 1,281,035.34	S/ 13,698,527.09	4.5%	49.6%			S/ 1,206,487.73	S/ 12,300,922.07	5.03%	48.02%	OK
ENERO	10/01/2016	31/01/2016	S/ 1,122,032.55	S/ 14,790,559.64	4.8%	53.7%			S/ 1,157,482.69	S/ 14,452,964.42	5.52%	53.54%	OK
FEBRERO	10/02/2016	28/02/2016	S/ 743,722.89	S/ 15,534,282.52	2.7%	56.4%			S/ 661,974.69	S/ 15,390,939.11	2.43%	55.96%	OK
MARZO	10/03/2016	31/03/2016	S/ 612,133.60	S/ 16,146,376.12	2.3%	58.7%			S/ 671,544.85	S/ 16,014,482.78	2.28%	58.22%	OK
ABRIL	10/04/2016	30/04/2016	S/ 1,480,547.84	S/ 17,626,923.96	5.3%	64.0%			S/ 2,405,410.06	S/ 18,269,892.82	8.67%	59.10%	OK
MAYO	10/05/2016	31/05/2016	S/ 760,533.23	S/ 18,387,457.19	2.6%	66.6%			S/ 671,514.42	S/ 18,373,544.24	0.73%	59.34%	OK
JUNIO	10/06/2016	30/06/2016	S/ 1,896,733.86	S/ 20,284,191.05	8.0%	74.6%			S/ 2,289,888.88	S/ 18,660,034.90	0.32%	60.53%	OK
JULIO	10/07/2016	31/07/2016	S/ 2,188,703.86	S/ 22,472,894.91	8.8%	83.4%			S/ 2,565,458.58	S/ 18,621,487.70	0.39%	61.52%	OK
AGOSTO	10/08/2016	31/08/2016	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 2,787,324.49	S/ 18,617,763.98	0.10%	60.63%	OK
SEPTIEMBRE	10/09/2016	30/09/2016	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
OCTUBRE	10/10/2016	31/10/2016	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
NOVIEMBRE	10/11/2016	30/11/2016	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
DICIEMBRE	10/12/2016	31/12/2016	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
ENERO	10/01/2017	31/01/2017	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
FEBRERO	10/02/2017	28/02/2017	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
MARZO	10/03/2017	31/03/2017	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
ABRIL	10/04/2017	30/04/2017	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
MAYO	10/05/2017	31/05/2017	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
JUNIO	10/06/2017	30/06/2017	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
JULIO	10/07/2017	31/07/2017	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
AGOSTO	10/08/2017	31/08/2017	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
SEPTIEMBRE	10/09/2017	30/09/2017	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
OCTUBRE	10/10/2017	31/10/2017	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
NOVIEMBRE	10/11/2017	30/11/2017	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
DICIEMBRE	10/12/2017	31/12/2017	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
ENERO	10/01/2018	31/01/2018	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
FEBRERO	10/02/2018	28/02/2018	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
MARZO	10/03/2018	31/03/2018	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
ABRIL	10/04/2018	30/04/2018	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
MAYO	10/05/2018	31/05/2018	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
JUNIO	10/06/2018	30/06/2018	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
JULIO	10/07/2018	31/07/2018	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
AGOSTO	10/08/2018	31/08/2018	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
SEPTIEMBRE	10/09/2018	30/09/2018	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
OCTUBRE	10/10/2018	31/10/2018	S/ 0.00	S/ 22,472,894.91	0.0%	83.4%			S/ 16,747,177.71	S/ 18,617,763.98	0.00%	60.63%	OK
TOTAL			S/ 27,894,466.29	S/ 27,894,466.29	100.0%	100.0%			S/ 17,018,302.26	S/ 17,018,302.26			



Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año del Dialogo y Reconciliación Nacional

- **Adelanto de Materiales:**  
No se ha solicitado adelanto de materiales
- **Adelanto directo:**  
Monto Adelanto Directo (Sin IGV) : S/. 5 501 293.26  
Fecha de pago : 09-ene-2015

**4.1.3 Resumen de Valorización de Obra:**

Luego de revisar la documentación que sustenta la **valorización de obra N° 45**, correspondiente al periodo del mes de setiembre de 2018, se aprueba con la siguiente estructura de pagos:

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N° 45 AL MES DE SETIEMBRE DEL 2018						
OBRA	:"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"					
PROPIETARIO:	FONDEPES					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JOSE					
SUPERVISIÓN:	CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA					
ING. RESIDENTE:	CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS					
ING. SUPERVISOR:	ISAÍAS JORGE ALVA ESPINOZA					
FECHA PPTO. BASE:	JUNIO 2014					
<b>MONTO DEL CONTRATO SIN IGV :</b>	<b>S/. 27,506,466.29</b>					
<b>MONTO DEL CONTRATO CON IGV :</b>	<b>S/. 32,457,630.22</b>					
CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	VAL. ACUM. ANTERIOR	VAL. ACTUAL	VAL. ACUM. ACTUAL	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
TOTAL CONTRACTUAL SIN IGV	27,506,466.29					
VALORIZACION CONTRACTUAL		16,994,420.11	23,972.12	17,018,392.23	61.87%	38.13%
	Avanc. Fisico	61.78%	0.09%	61.87%		
	Avanc. Program.	71.35%	6.69%	78.04%		
REAJUSTES		<b>901,490.51</b>	<b>4,696.78</b>	<b>906,187.29</b>		
VALORIZACION BRUTA		<b>17,895,910.62</b>	<b>28,668.90</b>	<b>17,924,579.52</b>		
AMORTIZACIONES		3,480,252.96	4,794.42	3,485,047.38		
DEDUCCION DE REAJUSTE POR ADELANTO DIRECTO		56,645.61	496.62	57,142.23		
DEL ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00		
TOTAL AMORTIZACIONES		<b>3,536,898.57</b>	<b>5,291.04</b>	<b>3,542,189.61</b>		
VALORIZACION NETA		14,359,012.05	23,377.86	14,382,389.91		
LG.V. (18%)	4,951,163.93	2,584,622.16	4,208.01	2,588,830.17		
<b>TOTALES</b>	<b>32,457,630.22</b>	<b>16,943,634.21</b>	<b>27,585.87</b>	<b>16,971,220.08</b>	<b>61.87%</b>	<b>38.13%</b>



Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año del Dialogo y Reconciliación Nacional

**V. CONCLUSIONES:**

- 5.1 De la evaluación efectuada al expediente de **valorización de obra N° 45**, presentada por el contratista ejecutor: **CONSORCIO SAN JOSÉ** y dada como conforme por la Supervisión de Obra: **Carlos Humberto Mendoza Picoaga**, ésta se encuentra conforme después de la revisión efectuada.
- 5.2 Habiéndose procedido con la revisión de la **valorización N° 45**, se ha encontrado que se están valorizando los trabajos ejecutados en el periodo del mes de setiembre de 2018, mencionados en el Asiento N° 1880 (30.09.2018) del residente de obra, del cuaderno de obra. Se mencionan a continuación la partida principal ejecutada:  
**07.04.07 Maniobra de colocación e hincado de pilotes, vigas y losas: Puentes**
- 5.3 El Contratista de acuerdo a su informe presentado a la Entidad, con CARTA N°082-SUPER-SJOSE-2018, concluye que el avance mensual del mes de setiembre de 2018 es de 0.09%. Teniendo un avance acumulado real (físico) de 61.87% y un avance acumulado proyectado de 78.04%.

**VI. RECOMENDACIONES**

6.1 De acuerdo al Artículo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y clausula cuarta del contrato, se recomienda el pago de la **Valorización de Obra N° 45** por el monto de **S/. 27,585.87** (Veintisiete mil quinientos ochenta y cinco con 87/100 soles).

**6.2 Resumen:**

Valorización N° 45	:	S/. 23,377.86
IGV	:	<u>S/. 4,208.01</u>
<b>Total, a Facturar</b>	:	<b>S/. 27,585.87</b>

Es todo cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

**ING. JOHN JAMANCA CARBAJAL**  
**CIP N.º 125665**

El coordinador del Área de Obras Equipamiento y Mantenimiento de la DIGENIPAA que suscribe, lo hace suyo.

**FONDEPES**  
  
**Ing. Paul A. Mpra Guillen**  
 COORDINADOR DE OBRAS EQUIPAMIENTO





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04790100

Usuario: usuario\_obras56

Fecha: 29/10/2018

Hora: 14:49



### CARGO 02801-2018-FONDEPES/AOEM

A: MORGAN LEON MAGALI

Asunto: CARTA N° 082-2018-SUPER-SJOSE-2018  
REMITE VALORIZACIÓN N° 45 - MES DE SETIEMBRE 2018 REF: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE-LAMBAYEQUE"

Referencia:


Fecha: 29/10/2018

Observación: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A OGA

Atentamente,



AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04790414

Usuario: usuario\_digenipaa3

Fecha: 29/10/2018

Hora: 17:59



### CARGO 00210-2018-FONDEPES/MML

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

---

Asunto: CARTA N° 082-2018-SUPER-SJOSE-2018  
REMITE VALORIZACIÓN N° 45 - MES DE SETIEMBRE 2018 REF: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE-LAMBAYEQUE"

---

Referencia:

---

Fecha: 29/10/2018

---

Observación: SE DERIVA PARA TRAMITE DE PAGO, VALORIZACIÓN 45, DPA SAN JOSÉ, SI/ 27,585.87, CON CERTIFICACIÓN 1745, FUENTE 13

---

Atentamente,

MORGAN LEON MAGALI



Fecha: 05/10/18

**MEMORÁNDUM INTERNO N° 4674 - 201 - FONDEPES/ DIGENIPAA**

Asunto

Conti #082/s Jose

Referencia

Registro :


7733

Destino	Indicación	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	
OCI		OGAJ	
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	

**FONDEPES**  
AREA DE OBRAS EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO  
05 OCT. 2018  
**RECIBIDO**  
Registro:.....Hora: 3:29

AOCN.

**Observaciones:**



Atentamente

015

**Indicaciones:**

- |                                |                          |                             |                          |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 01. Autorizado/Aprobado        | 02. Calificar/Evaluar    | 03. Informe                 | 04. Proyectar resolución |
| 05. Atención/Tramitación       | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular           |
| 09. Ayuda memoria              | 10. Coordinar            | 11. Opinión/Recomendación   | 12. Consolidar           |
| 13. Aclarar redacción          | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta      | 16. Visación             |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo              | 19. Ampliar                 | 20. Seguimiento          |



MEMORÁNDUM INTERNO N° 3979 -201 FONDEPES / DIGENIPAA / AOEM

Asunto: Memo Interno N° 4674-2018 - DIGENIPAA

Referencia: Registro: 7733

Destino	Indicación	Destino	Indicación

Observaciones: *Jey John Tamana*

*Recibido*  
22/10/18

Atentamente:

Indicaciones:

- |                                |                           |                              |                           |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 0.1. Autorizado/Aprobado       | 0.2. Calificar/Evaluar    | 0.3. Informe                 | 0.4. Proyectar resolución |
| 0.5. Atención/Tramitación      | 0.6. Conocimiento y fines | 0.7. Notificar al interesado | 0.8. Reformular           |
| 0.9. Ayuda memoria             | 10. Coordinar             | 11. Opinión/Recomendación    | 12. Con...                |
| 13. Aclarar redacción          | 14. Implementar/Ejecutar  | 15. Preparar respuesta       | 16. Visación              |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo               | 19. Ampliar                  | 20. Seguimiento           |





Lima, 05 de Octubre del 2018

Carta N°082-SUPER-SJOSE-2018

Señores.-  
**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES**

- Atención : **ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO**  
**DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA**
- Asunto : **VALORIZACION DE OBRA N°45- MES DE SEPTIEMBRE 2018** de la obra:  
"Construcción de Infraestructura Pesquera para consumo Humano Directo de San José Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque"
- Referencia : **Contrato N° 013-2016-FONDEPES/OGA.**  
Contratación del servicio de Consultoría para el saldo de la supervisión de la obra: "Construcción de Infraestructura Pesquera para consumo Humano Directo de San José Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque"  
: **CARTA N°067-2018-CSJ/CO**


De nuestra consideración:

La presente tiene por objeto dirigirme a usted, con la finalidad de presentar los documentos correspondientes a la **VALORIZACION DE OBRA N°45 - MES DE SEPTIEMBRE 2018** referido a la ejecución de la obra "**Construcción de infraestructura pesquera para consumo humano directo de San José, distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque Código SNIP N° 65958.**"

La valorización se ha procesado en conformidad con lo establecido en el Artículo 166° del RLCE, por lo que solicitamos a usted tramitar la documentación respectiva para, los fines consiguientes.

Sin otro en particular, quedamos de Ud.

ANEXAMOS 01 ORIGINAL Y 02 COPIAS

  
.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	
 2770892	
N° DOC:	00007733-2018
CLAVE:	5733
USUARIO:	dgalindo
FECHA Y HORA:	05/10/2018 10:27:15
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	

# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"



## VALORIZACION DE OBRA N°45 – SEPTIEMBRE 2018

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE

SUPERVISION: ING. CARLOS H. MENDOZA PICOAGA


### SEPTIEMBRE 2018

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595307

  
 JEFE DE SUPERVISION: ING. ISMAEL JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

# GENERALIDADES

  
.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

	<b>PERU</b>	Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	CONCURSO PUBLICO N°0001- 2016-FONDEPES CONTRATO N°013-2016- FONDEPES
--	-------------	--------------------------------	--	---

**a) CONTENIDO****GENERALIDADES**

- a) Índice o contenido
- b) Antecedente
- c) Datos generales de la obra

**CONTROL DE AVANCE DE OBRA**

- a). Descripción
- b) Avance físico de obra
- c) Cronograma de Avance De Obra y comentario específico

**CONTROL DE OBRA**

- a) Control de Campo
- b) Descripción de las ocurrencias técnicas realizadas en obra
- c) Control de calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos
- d) Pruebas de Calidad de agregados
- e) Diseño de Mezclas para los diferentes tipos de concreto
- f) Pruebas de Compactaciones o densidad de campo
- g) Pruebas hidráulicas en redes de desagüe, redes de agua, pruebas eléctricas, verificación de cumplimiento de especificaciones de electrobombas, limpieza y desinfección de sistemas, correcto funcionamiento de aparatos sanitarios, eléctricos, electrobombas y otros.
- h) Recursos Utilizados durante el mes
- i) Control de Supervisión en la Prevención de Riesgos (seguridad) y Control y supervisión ambiental informe de las actividades de supervisión ambiental realizadas durante el mes

**CONTROL ECONOMICO DE OBRA**

- a) Control de Valorizaciones
- b) Control de Adicionales de Obra y/o Deductivos
- c) Control de Vigencia de Cartas Fianzas

**CAMBIOS Y O MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL**


- a) Sustento Técnico y base Legal
- b) Planos y/o Esquemas


**RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES**

- a) Recomendaciones y Conclusiones de EL SUPERVISOR

**PANEL FOTOGRAFICO****COPIA DEL CUADERNO DE OBRA**

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717  
JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA



	<b>PERU</b>	Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	CONCURSO PUBLICO N°0001- 2016-FONDEPES CONTRATO N°013-2016- FONDEPES
--	-------------	--------------------------------	--	---

## b) ANTECEDENTES

El presente Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"; inscrito en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas con el Código N° 65958; es un proyecto de carácter social porque a través de la nueva infraestructura de este desembarcadero se podrá brindar productos hidrobiológicos de calidad a la población cumpliendo con la Norma Sanitaria D.S. 040-2001-PE, con la finalidad de crear y promover las capacidades y habilidades para coadyuvar al desarrollo sostenido e integral de la actividad pesquera artesanal.

Así mismo, este proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de Política Sectorial del Ministerio de la Producción principalmente dentro de los ejes estratégicos de la actividad pesquera, así como dentro de los planteamientos del Plan de Desarrollo concertado de la Región Lambayeque.

FONDEPES, ha convocado mediante la Modalidad de Concurso al Proceso de CP N° 001-2016-FONDEPES - Consultoría para Saldo de Supervisión, las misma que fue otorgada al Consultor Ing. **Carlos Humberto Mendoza Picoaga**, quien designo a su vez como Jefe de Supervisión al Ing. Miguel Eduardo Carranza Haro. A requerimiento de la Entidad, solicitaron al Consultor el cambio de Jefe de Supervisión, aprobándose el nombramiento como nuevo Jefe de Supervisión al Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza con CIP 10717, a partir del 07-10-2016

### MEMORIA DESCRIPTIVA

#### NOMBRE DEL PROYECTO

"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"

#### DATOS GENERALES

Razón Social : Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES.  
Domicilio Legal : Av. Petit Thouars N° 115 – 119 Lima  
RUC : 20137921601  
Teléfono : 7068500

#### UBICACIÓN DEL PROYECTO

El D.P.A de San José, El terreno propuesto para la construcción del DPA San José, se encuentra ubicado en la Provincia de Lambayeque, aproximadamente entre las coordenadas geográficas 6° 47' 54" latitud Sur y 79° 59' 30" longitud Oeste, aproximadamente a 600 m. al norte de las actuales instalaciones del Terminal Pesquero Municipal, en un área aproximada de 7,610.00 m<sup>2</sup>

#### 3.1.1 UBICACIÓN POLITICA

Región : Lambayeque  
Provincia : Lambayeque  
Distrito : San José  
Localidad : San José

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106505927

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

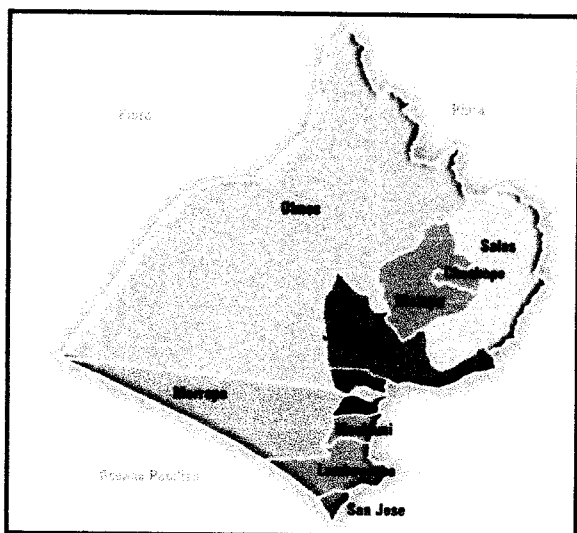
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717




### 3.1.2 LIMITES

Por el Norte : con el Distrito de Lambayeque  
 Por el Sur : con el distrito de Pimentel  
 Por el Este : con el Distrito de Lambayeque y Chiclayo  
 Por el Oeste : con el Océano Pacifico

Ilustración 1: Ubicación



CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

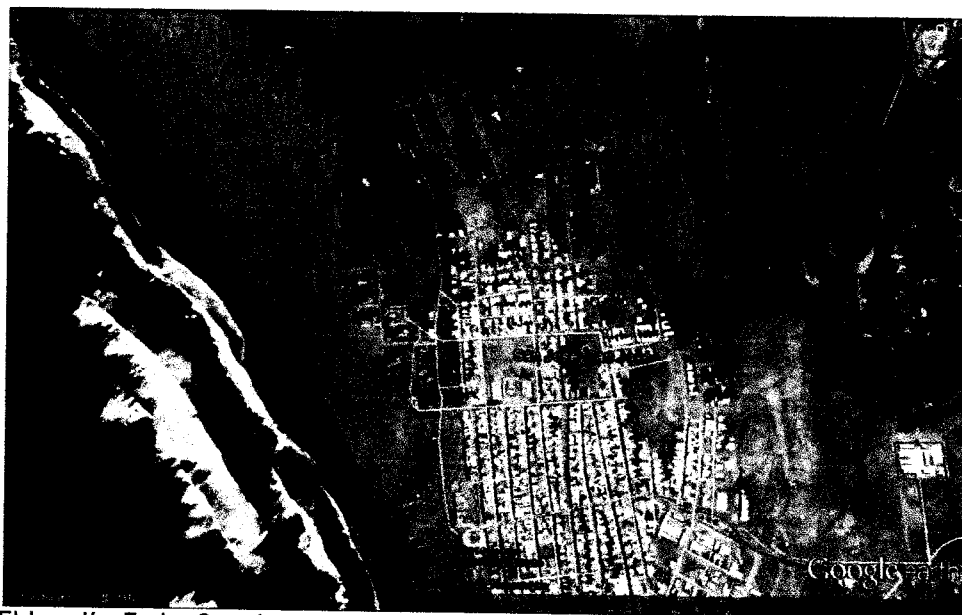
  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA



PERU

Ministerio  
de la ProducciónFondo Nacional de  
Desarrollo PesqueroCONCURSO PUBLICO N°0001-  
2018-FONDEPESCONTRATO N°013-2016-  
FONDEPES

Elaboración: Equipo Consultor

#### OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto busca como objetivo "Suficiente acceso a Recursos hidrobiológicos de Calidad que cumplan con la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (DS N° 040-2001-PE) en la Caleta de San José, Santa Rosa y Pimentel"

#### CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD

##### ACCESO

Por tierra se accede directamente a través de la carretera Panamericana Norte, a la altura del Km. 765, se toma un desvío de 11 km. de la ciudad de Chiclayo hacia la izquierda con dirección al mar, cuyo recorrido es a través de una vía asfaltada en regular estado de conservación hasta llegar al poblado de San José y de allí se prosigue un corto recorrido de 150 m. hasta llegar al Desembarcadero Pesquero Artesanal de San José.

##### DE LA TOPOGRAFIA


La topografía del terreno donde se ubicará el DPA San José es plana, presenta ligeras pendientes hacia el mar, siendo el suelo de constitución arenosa.

Para la ejecución de las obras en tierra: "Construcción De Infraestructura Pesquera Para Consumo Humano Directo De San José, Distrito De San José Provincia De Lambayeque, Región Lambayeque", se hace imprescindible construir un terraplén elevado, así como la vía de acceso que empalme con la vía existente en la población de San José.

##### CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA

El clima es uno de los factores ecológicos que más influye sobre el suelo, la flora y la fauna, logrando condicionar en la mayoría de las veces las adaptaciones de estos componentes a su ambiente, así como caracterizar ecológicamente las zonas en función a la temperatura y humedad; incluso influye sobre el tipo de actividades antrópicas se deben realizar en una región. Por ello, estudiar el clima dentro del enclave del proyecto no se fundamenta en la posibilidad de que éste sea afectado directa o indirectamente por la

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

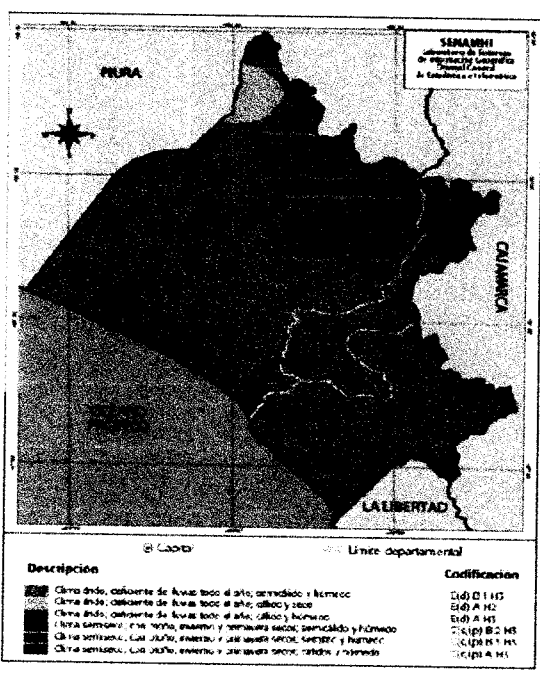
JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

realización o puesta en marcha del mismo, sino sobre el hecho de que el conocimiento de sus principales características da una idea de los procesos ecológicos que pueden acontecer en la zona.

Según el Mapa Climático del Perú establecido por R. Schroeder (1969), el clima que se encuentra en el área de influencia del proyecto es el CLIMA DE DESIERTO (BW), que corresponde a un clima sin lluvias (por lo regular), salvo en algunos eventos como la presencia del Fenómeno del Niño (el cual trae consigo lluvias que en ocasiones puede producir inundaciones llegando a generar grandes pérdidas económicas).

De igual modo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) a través de su Laboratorio de Información Geográfica, describe hasta seis tipos de climas en toda la región Lambayeque, correspondiéndole a la zona del proyecto: Clima árido; deficiente de lluvias todo el año; semicálido y húmedo con codificación: E(d) B'1 H3. (Ver Figura 4.2.)



**Figura 4.2. Clasificación Climática de la Región Lambayeque, según el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).**

Estas clasificaciones se encuentran acorde a la clasificación ambiental por eco regiones propuesta por A. Brack para el Perú, situando a gran parte de la zona occidental de la Región Lambayeque, en la eco región

**DESIERTO COSTERO.**

**Sismicidad**

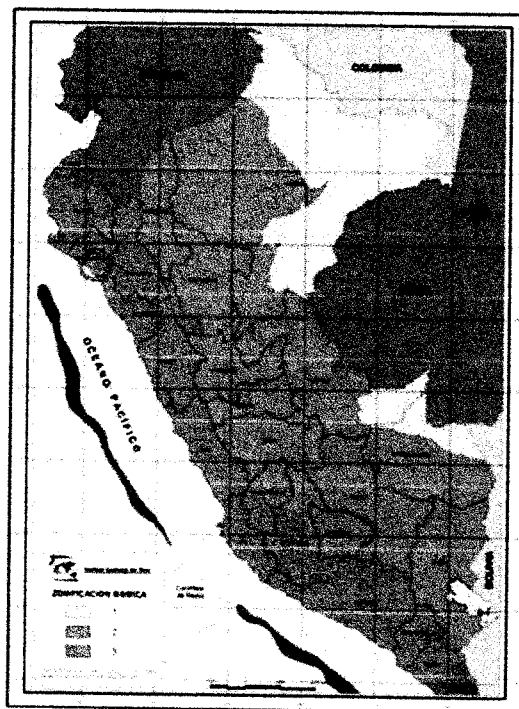
El área del proyecto, según el Mapa de Zonificación Sísmica propuesto en la Norma de Diseño Sismo resistente E 030 del Reglamento Nacional de Construcciones (1997) y el Mapa de distribución de máximas intensidades sísmicas observadas en el Perú elaborado por el instituto Geofísico del Perú, el Proyecto se encuentra dentro de la zona de sismicidad alta (zona 3) existiendo la posibilidad de que ocurran sismos de intensidades II y IV en la escala de Mercalli Modificada, según Ramírez, (2006).

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



**Figura 4.5. Mapa de Zonificación Sísmica de acuerdo a la Norma Técnica de Edificaciones E 030.**

Basándose en el Reglamento Nacional de Construcciones vigente, la zonificación correspondiente a la Provincia de Chiclayo, es una zona con sismicidad activa del presente siglo, con sismos superficiales 20 Km asociados con fallamiento superficial.

De acuerdo al mapa de Regionalización Sísmica del Perú mediante intensidades, preparado por el Instituto Geofísico del Perú en 1975, la zona se halla con sismicidad alta (zona 3), donde se puede esperar sismos con intensidades entre IX y más en la escala de Mercalli modificada.

#### TIEMPO DE EJECUCION


El tiempo para ejecutar la Obra será de 540 (Quinientos cuarenta) días calendarios.

#### PRESUPUESTO DE OBRA

El presupuesto general referencial de obra asciende a S/. 33,332,309.32 (Treinta y tres millones trescientos treinta y dos mil trescientos nueve con 32/100 Nuevos Soles).


OBRAS EN TIERRA-ESTRUCTURAS	3'612,743.16
OBRAS EN TIERRA-ARQUITECTURA	1'120,703.82
OBRAS EN TIERRA-INSTALACIONES ELECTRICAS	561,306.56

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA




MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

	<b>PERU</b>	Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	CONCURSO PUBLICO N°0001- 2016-FONDEPES CONTRATO N°013-2016- FONDEPES
---	-------------	--------------------------------	--	---

OBRAS EN TIERRA-INSTALACIONES SANITARIAS	1'115,124.70
MITIGACION AMBIENTAL	40,810.13
EQUIPAMIENTO	1'442,745.40
OBRAS EN MAR	14'986,247.01
PAVIMENTACION EXTERIOR	493,973.42
INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION	149,611.46
SEGURIDAD Y SALUD	16,500.80
=====	
TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO	
OBRAS CIVILES	23'539,766.46
Gastos generales (10%)	2'353,976.65
Utilidades (10%)	2'353,976.65
=====	
Sub total	28'247,719.76
IGV (18%)	5'084,589.56
=====	
Total de presupuesto	33'332,309.32

**PRESUPUESTO CONTRATADO.-**

01	<u>SUBPRESUPUESTO01 ESTRUCTURAS</u>	4,376,782.02
02	<u>SUBPRESUPUESTO02 ARQUITECTURA</u>	1,302,818.20
03	<u>SUBPRESUPUESTO03 INSTALACIONES ELECTRICAS</u>	662,518.87
04	<u>SUBPRESUPUESTO04 INSTALACIONES SANTARIAS</u>	1,280,862.15
05	<u>SUBPRESUPUESTO05 MITIGACION AMBIENTAL</u>	47,441.78
06	<u>SUBPRESUPUESTO06 EQUIPAMIENTO</u>	1,677,191.53
07	<u>SUBPRESUPUESTO07 OBRAS EN MAR</u>	17,421,512.15
08	<u>SUBPRESUPUESTO08 PAVIMENTACION EXTERIOR</u>	574,244.10
09	<u>SUBPRESUPUESTO09 INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION</u>	173,923.33
10	<u>SUBPRESUPUESTO10 SEGURIDAD Y SALUD</u>	19,182.18

TOTAL SIN IGV (S/.)	27,506,466.28
IGV (18%)	4,961,163.90
TOTAL PRESUPUESTO	32,467,630.22

**MODALIDAD DE EJECUCION**

El proyecto se ejecutara mediante la modalidad de Contrata, A Precios Unitarios

**VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS BÁSICOS**

En los presupuestos, se tendrá en cuenta que la presente memoria descriptiva, se complementan con los planos respectivos y con los metrados básicos en forma tal que las obras deben ser ejecutadas totalmente.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



PERU

Ministerio  
de la ProducciónFondo Nacional de  
Desarrollo PesqueroCONCURSO PUBLICO N°0001-  
2018-FONDEPESCONTRATO N°013-2018-  
FONDEPES

En caso de divergencia de interpretación, los planos tienen prioridad sobre el presupuesto y éstos tienen prioridad sobre las especificaciones y estos tienen prioridad sobre los metrados.

## DE LOS TRABAJOS QUE CONSIDERA EL PROYECTO

### BLOQUES A EJECUTAR CONSIDERADOS EN EL PROYECTO

La obra es ejecutada por el Consorcio San José, conformada por las empresas constructoras CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL – SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC Y CORPORACION R&S SAC. El proyecto integral en ejecución cuenta con las metas parciales consistentes en:

#### OBRAS EN TIERRA:

##### Bloque 1.-

Tanque Elevado Capacidad 36.22 m3

Agua Salada 21.00 m3

Agua Potable 15.22 m3

Cisterna de Agua Salada Cap.48.00 m3

Cisterna de Agua Potable Cap.33.00 m3

Cubículo de Limpieza

##### Bloque 2.-

Guardianía

Sub Estación Grupo Electrónico

Depósito de Residuos Peligrosos

Redes de Almacenes

Taller de Maestranza

Cafetería

##### Bloque 3.-

Vestidores de Hombres

Vestidores de Mujeres

Depósito de Residuos

Depósito de Limpieza

Servicios Higiénicos Hombres

Servicios Higiénicos Mujeres

Lavandería

Zona de Desinfección

##### Bloque 4.-

Zona de Tareas Previas

##### Bloque 5.-

Oficina de Control de Calidad

Pesaje de Control

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

027



PERU

Ministerio  
de la ProducciónFondo Nacional de  
Desarrollo PesqueroCONCURSO PUBLICO N°0001-  
2016-FONDEPESCONTRATO N°013-2016-  
FONDEPES

Almacén de Cajas  
Limpieza y Desinfección de Cajas

Bloque 6.-

Zona de Frio

Productor de Hielo en Bloques 20 Tn/día (02 Productores de 10 Tn/día c/u)

Cámara de Congelación de Hielo

Cámara de Refrigeración de 10 Tn (02 und)

Cuarto de Equipos de Refrigeración

Depósito de Carretas y Cubetas

Bloque 7.-

Oficina de Sindicato de Pescadores

Secretaría

Administración

Salón de Usos Múltiples

Servicios Higiénicos Públicos Hombres

Servicios Higiénicos Públicos Mujeres

Ingresos.-

Ingreso Principal a Patio de Maniobras

Caseta de Control

Ingreso Secundario a Muelle

Caseta de Control

Instalaciones e Infraestructuras.-

Tanque Séptico Doble

Filtro Biológico

Caseta de Emisor Submarino

Caseta de Bombeo

Pozo Séptico

Trampa de Grasa

Cámara de Rejas


Cisterna de Agua Potable Cap. 20.00 m3

Cercos Perimétricos


Defensa de Protección con Enrocado a Fachada Posterior

OBRAS EN MAR:

Puente de Acceso del Muelle 950.00 MI

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA


MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595907

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717





PERU

Ministerio  
de la ProducciónFondo Nacional de  
Desarrollo PesqueroCONCURSO PÚBLICO N°0001-  
2016-FONDEPES  
CONTRATO N°013-2016-  
FONDEPES

02 Plataformas Bajas  
Cabezo de Muelle Espigón 50.00 Ml.

#### UBICACIÓN, LÍMITES Y ACCESIBILIDAD DE LA ZONA:

El Desembarcadero Pesquero Artesanal San José, se encuentra ubicado en la Caleta San José (área rural), políticamente pertenece a la Región de Lambayeque, Provincia de Lambayeque, Distrito de San José, forma parte de la infraestructura de protección permanente a la capacidad productora de los pescadores de San José.

El Desembarcadero Pesquero Artesanal San José, tiene como límites:

Por el Norte : con el Distrito de Lambayeque  
 Por el Sur : con el distrito de Pimentel  
 Por el Este : con el Distrito de Lambayeque y Chiclayo  
 Por el Oeste : con el Océano Pacífico

El acceso al Desembarcadero Pesquero Artesanal San José directamente a través de la carretera Panamericana Norte, a la altura del Km. 765, se toma un desvío de 11 km. de la ciudad de Chiclayo hacia la izquierda con dirección al mar, cuyo recorrido es a través de una vía asfaltada en regular estado de conservación hasta llegar al poblado de San José y de allí se prosigue un corto recorrido de 150 m. hasta llegar al DPA de San José.

#### OBJETO


Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera, para promover y desarrollar una infraestructura básica y el equipamiento para el desarrollo de la pesca artesanal. Construcción de un Muelle, desembarcadero y otros tipos de desembarque para el buen funcionamiento del DPA.

Dentro de los Objetivos son los siguientes:


- Construcción de Zona de Embarque y Desembarque
- Construcción de Zona de Procesamiento Primario
- Construcción de Zona de Frío
- Construcción de Zona de Servicios Complementarios
- Construcción de Zona de Vestidores - Personal de Trabajo
- Construcción de Zona de Estacionamientos
- Construcción de Zona de Servicios y Mantenimientos
- Construcción de Zona Administrativa
- Construcción de Obras Complementarias

El proyecto busca como objetivo principal "Suficiente acceso a Recursos Hidrobiológicos de Calidad que cumplan con la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (DS N° 040-2001-PE) en la Caleta de San José, Santa Rosa y Pimentel"

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

**c) DATOS GENERALES DE LA OBRA**

Obra: "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, distrito de San José, Provincia de Lambayeque, región de Lambayeque"

Ubicación : San José/Lambayeque/Lambayeque

Contratista : Consorcio San José

Suscripción del Contrato : Contrato N° 082-2014-FONDEPES/OGA

Modalidad de Ejecución : Precios Unitarios

Residente : Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros

Consultora de Supervisión : Carlos Humberto Mendoza Picoaga

Jefe de Supervisión : Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza

Valor referencial : s/. 33'504,650.56 (inc. igv)

Monto contratado : s/. 32'457,630.22 (inc. igv)

Fecha entrega de terreno : 14/01/2015

Plazo inicial ejecución obra : 540 días calendarios

Fecha de inicio del plazo : 15/01/2015

Fecha término plazo inicial : 09/07/2016

Ampliación de plazo N° 01 : 29 días calendarios

Nueva fecha término plazo : 07/08/2016

Ampliación de plazo N° 02 : 31 días calendarios

Nueva fecha término plazo : 07/08/2016 - denegada

Ampliación de plazo N° 03 : 47 días calendarios

Nueva fecha término plazo : 07/08/2016 - denegada

Ampliación de plazo N° 04 : 32 días calendarios


Nueva fecha término plazo : 08/09/2016

Ampliación de plazo N° 05 : 32 días calendarios


Nueva fecha término plazo : 09/10/2016

Ampliación de plazo N° 06 : 12 días calendarios

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



PERU

Ministerio  
de la ProducciónFondo Nacional de  
Desarrollo PesqueroCONCURSO PUBLICO N°0001-  
2016-FONDEPESCONTRATO N°013-2016-  
FONDEPES

Nueva fecha término plazo : 20/10/2016  
 Ampliación de plazo N° 07 : 44 días calendarios  
 Nueva fecha término plazo : 20/10/2016 - denegada  
 Ampliación de plazo n° 08 : 74 días calendarios  
 Nueva fecha término plazo : 20/10/2016 - denegada  
 Ampliación de Plazo N°09 : 32 días calendarios  
 Nueva fecha término plazo : 21/11/2016  
 Ampliación de Plazo N°10 : 30 Días Calendario  
 Nueva Fecha de Término de Plazo: 21 de Diciembre del 2016  
 Ampliación de Plazo N°12 : 8 Días Calendario  
 Nueva Fecha de Término de Plazo : 06 de Enero del 2017  
 Ampliación de Plazo N°13 : 48 Días Calendario  
 Nueva Fecha de Término de Plazo : 23 de Febrero del 2017  
 Ampliación de Plazo N° 14: 11 Días Calendario  
 Nueva Fecha de Término de Plazo: 06 de Marzo del 2017  
 Ampliación de Plazo N° 15: 53 Días Calendario  
 Nueva Fecha de Término de Plazo: 28 de Abril del 2017  
 Ampliación de Plazo N° 16: 60 Días Calendario  
 Nueva Fecha de Término de Plazo: 27 de Junio del 2017  
 Ampliación de Plazo N° 17: 60 Días Calendario  
 Nueva Fecha de Término de Plazo: 26 de Julio del 2017  
 Ampliación de Plazo N° 18: 60 Días Calendario  
 Nueva Fecha de Término de Plazo: 25 de Octubre del 2017  
 Ampliación de Plazo N° 19: 60 Días Calendario  
 Nueva Fecha de Término de Plazo: 24 de Diciembre del 2017  
 Ampliación de Plazo N° 20: 38 Días Calendario  
 Nueva Fecha de Término de Plazo: 31 de Enero del 2018  
 Ampliación de Plazo N° 21: 30 Días Calendario

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595007

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

	<b>PERU</b>	Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	CONCURSO PUBLICO N°0001- 2016-FONDEPES CONTRATO N°013-2016- FONDEPES
--	-------------	--------------------------------	--	---

Nueva Fecha de Término de Plazo: 02 de Marzo del 2018  
 Ampliación de Plazo N° 22: 15 Días Calendario  
 Nueva Fecha de Término de Plazo: 17 de Marzo del 2018  
 Ampliación de Plazo N° 23: 202 Días Calendario  
 Nueva Fecha de Término de Plazo: 05 de Octubre del 2018

**DATOS DE EMPRESA CONTRATISTA**

RAZON SOCIAL : CONSORCIO SAN JOSE  
 REPRESENTANTE LEGAL : ING. EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA  
 RESIDENTE DE OBRA : ING. CARLOS 21/11/2016ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 REGISTRO CIP : N° 22858

**DATOS SUPERVISOR EXTERNO**

RAZON SOCIAL : CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGUA  
 JEFE DE SUPERVISIÓN : ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 REGISTRO CIP : N° 10717

**DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO.**

A la fecha se han Aprobado **23 AMPLIACIONES DE PLAZO**; las ampliaciones de plazo aprobadas son como sigue:

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 01 por 29 días, según Resolución de Secretaria General N°110-2015-FONDEPES/SG., de fecha 24.07.2015, nuevo plazo de termino 05-08-2016

Denegación de Ampliación de Plazo N° 02 por 31 días, según Resolución Jefatural N°126-2015-FONDEPES/SG., de fecha 03.09.2015.

Denegación de Ampliación de Plazo N° 03 por 47 días, según Resolución Jefatural N°204-2015-FONDEPES/SG., de fecha 22.12.2015.

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 04 por 32 días, según Resolución Jefatural N°035-2016-FONDEPES/SG., de fecha 21.03.2016.

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 05 por 32 días, según Resolución Jefatural N°061-2016-FONDEPES/SG., de fecha 25.04.2016.

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 06 por 12 días, según Resolución Jefatural N°073-2016-FONDEPES/SG., de fecha 19.05.2016.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

032



PERU

Ministerio  
de la ProducciónFondo Nacional de  
Desarrollo PesqueroCONCURSO PUBLICO N°0001-  
2016-FONDEPES  
CONTRATO N°013-2016-  
FONDEPES

Denegación de Ampliación de Plazo N° 07 por 44 días, según Resolución Jefatural N°087-2016-FONDEPES/SG., de fecha 21.06.2016.

Denegación de Ampliación de Plazo N° 08 por 74 días, según Resolución Jefatural N°097-2016-FONDEPES/SG., de fecha 25.07.2016.

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 09 por 32 días, según Resolución de Secretaria General N°120-2016-FONDEPES/SG., de fecha 13.10.2016, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 21-11-2016

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 10 por 30 días, según Resolución de Secretaria General N°132-2016-FONDEPES/SG., de fecha 29.11.2016, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 21-12-2016

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 11 por 08 días, según Resolución de Secretaria General N°147-2016-FONDEPES/SG., de fecha 28.12.2016, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 29-12-2016

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 12 por 08 días, según Resolución de Secretaria General N°002-2017-FONDEPES/SG., de fecha 04.01.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 06-01-2017

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 13 por 48 días, según Resolución de Secretaria General N°006-2017-FONDEPES/SG., de fecha 17.01.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 23-02-2017

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 14 por 11 días, según Resolución de Secretaria General N°021-2017-FONDEPES/SG., de fecha 22.02.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 06-03-2017

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 15 por 53 días, según Resolución de Secretaria General N° 031-2017-FONDEPES/SG., de fecha 26.03.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 28-04-2017

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 16 por 60 días, quedando consentida al no haberse pronunciado la Entidad dentro del plazo establecido en el RLCE, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 27-06-2017

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 17 por 60 días, según Resolución de Secretaria General N°062-2017-FONDEPES/SG., de fecha 05.07.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 26-07-2017

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 18 por 60 días, según Resolución de Secretaria General N°094-2017-FONDEPES/SG., de fecha 08.09.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 25-10-2017

Ampliación de Plazo N°19 por 60 días, según Resolución de Secretaria General N°0119-2017-FONDEPES/SG., de fecha 03.11.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 24-12-2017.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595937

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

	PERU	Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	CONCURSO PUBLICO N°0001-2016-FONDEPES CONTRATO N°013-2016-FONDEPES
--	------	-----------------------------	---------------------------------------	---

Ampliación de Plazo N°.20 por 38 días, según Resolución de Secretaria General N°0143-2017-FONDEPES/SG., de fecha .29.12.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 31-01-2018.

Ampliación de Plazo N°.21 por 30 días, según Resolución de Secretaria General N°021-2018-FONDEPES/SG., de fecha .12.02.2018, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 02-03-2018.

Ampliación de Plazo N°.22 por 15 días, según Resolución de Secretaria General N°047-2018-FONDEPES/SG., de fecha .15.03.2018, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 17-03-2018.

Ampliación de Plazo N°.23 por 202 días, según Resolución de Secretaria General N°055-2018-FONDEPES/SG., de fecha .02.04.2018, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 05-10-2018.

## DE LA SUPERVISION

Mediante contrato N°.070-2014-FONDEPES/OGA del 19-11-2014 la Entidad suscribe contrato de supervisión con el Consorcio San Francisco.

Con fecha 18-11-2015, La Entidad resuelve el contrato con el Supervisor a quien la Entidad envió previamente la Carta N°. 329-2016-FONDEPES-2015/SG del 16-11-2015 en la que le comunicaba al contratista de la Supervisión Consorcio SAN FRANCISCO la decisión de resolver el contrato "por el incumplimiento de obligaciones contractuales"

A partir del 19-11-2015 al 31-03-2016 se hace cargo del control de la obra el Ingeniero Víctor Huamán Landa con Registro CIP 60004, en calidad de INSPECTOR.

Se desconoce las formalidades de su contratación así como la causal de su cese.

A partir del 01-04-2016 al 20-07-2016 se hace cargo del control de la obra el Ingeniero Carlos Sanabria Esquiche con Registro CIP 73363, en calidad de INSPECTOR.

Igualmente se desconoce las formalidades de su contratación así como la causal de su cese.

Con fecha 19-07-2016 la Entidad suscribe con EL Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga el contrato N°.013-2016-FONDEPES/OGA para la supervisión del "Saldo de la obra Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José"

Inicialmente designa como Jefe de Supervisión al Ingeniero Miguel Carranza Haro con CIP 55000, quien ejerce hasta el 06-10-2016.

Por razones propias de la Entidad, esta, le comunica al Supervisor, el "cambio" del Jefe de Supervisión Ing.Miguel Carranza Haro

El Supervisor propone al Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza con Registro CIP 10717.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595307

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



PERU

Ministerio  
de la ProducciónFondo Nacional de  
Desarrollo PesqueroCONCURSO PÚBLICO N°0001-  
2016-FONDEPES  
CONTRATO N°013-2016-  
FONDEPES

Mediante Carta N°. 551-2016-FONDEPES/OGA del 06-10-2016, la Entidad *"aprueba el cambio de Jefe de Supervisión"* (...) *designando como nuevo Jefe de Supervisión al Ing. Isaías Jorge Alva Espinoza*.

A partir del 07-10-2016, el suscrito inicia las labores de control técnico de la obra hasta el 06 de Marzo del 2017. Fecha en que culmina el plazo de los servicios, teniendo en cuenta que hasta esa fecha se cubrieron los montos permisibles según el Reglamento para la prestación.

Sin embargo, la Entidad ha suscrito un Acta simple con la Supervisión (07-03-2017) en la que *"le comunica la suspensión temporal"* de los servicios, *"hasta la aprobación del adicional 07"*.

A partir del mes de Setiembre 2017, la Entidad comunica a la Supervisión la reanudación de los servicios, en base a que se nos concedió Ampliaciones plazo "automáticas" paralelamente a las ampliaciones concedidas al contratista de la obra.

Sin embargo, no se ha tenido en cuenta lo indicado en el Artículo 34.4 de la Ley de Contrataciones del Estado que expresa:

*"Asimismo, el Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios según corresponda. En este último supuesto, el monto hasta por el cual se pueden aprobar prestaciones adicionales de supervisión debe ser proporcional al incremento del monto de obra como máximo, no siendo aplicable para este caso el límite establecido en el numeral 34.2 del presente artículo"*

Los pagos no se vienen efectuando de acuerdo a lo indicado en el Artículo.

El incremento del monto del contrato (adicionales) no SUPERA el 15% a la fecha y por tanto ya se habría cubierto dicho monto de servicios, cuando los plazos de la prestación se han triplicado al plazo original (6 meses), lo que nos está **"Obligando"** a prestación de servicios sin conocimiento preciso del pago a percibir.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

035



PERU

Ministerio  
de la ProducciónFondo Nacional de  
Desarrollo PesqueroCONCURSO PÚBLICO N°001-  
2016-FONDEPES  
CONTRATO N°013-2016-  
FONDEPES**DE LOS ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA**

A la fecha se ha emitido las siguientes Resoluciones de Adicionales y Deductivos de Obra

**ADICIONALES.-**

Aprobación de Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 01 por S/. 326,464.23 nuevos soles, según Resolución Jefatural N°280-2015-FONDEPES/J., de fecha 04.09.2015, por mayor metrado en la Viga Puente (concreto y acero)

Aprobación de Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 02 por S/. 449,323.12 nuevos soles, según Resolución Jefatural N°078-2016-FONDEPES/J, de fecha 09.03.2016, por variación de la dimensión de la roca por otra de menores dimensiones y cambio de especificación,

Aprobación de Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 03 por S/. 86,170.63 nuevos soles, según Resolución Jefatural N°093-2016-FONDEPES/J., de fecha 22.03.2016, por "empalme de la vía de acceso a la plataforma", que origina a su vez un Deductivo vinculante N°.02

Aprobación de Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 04 (S/. 579,080.87 nuevos soles) "por mayores metrados en Tanque elevado, parapetos, cisterna, mayor metrado en capas de afirmado y en obras de mar: Aplicación de epóxico para unión de concreto nuevo con antiguo, así como partida nueva, fabricación de mesas de concreto, además de la aprobación del Deductivo Vinculante N° 02 (S/. 446.29 nuevos soles), "menor metrado de puertas de madera y menor metrado en puertas de madera", ambos fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N°253-2016-FONDEPES/J., de fecha 08.07.2016.

Aprobación de Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 05 (S/. 397,091.44 nuevos soles) por nuevas partidas y mayores metrados de Instalaciones Sanitarias, además de reducciones de obra sanitarias N°.03" la misma que ha sido aprobada mediante Resolución N°.355-2016-FONDEPES/J del 29-11-2016

Aprobación de Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 06 por S/.1'377,727.34 (inc. IGV) y Deductivo Vinculante N°.04 por S/. 242,094.96 (inc. IGV), mediante Resolución Jefatural N°.370-2016-FONDEPES/J del 29-12-2016, que corresponden a partidas nuevas de " Estructuras, Arquitectura e Instalaciones Eléctricas" así como mayores metrados del presupuesto contratado y Reducciones de obra que constituyen Deductivos vinculantes, según el siguiente detalle:

- Adicional N°.06 : Obras en Tierra : S/.1'091,070.91 (79%) (Ejecutables)
- Partidas Nuevas : S/. 577,067.10
- Mayores Metrados : S/. 514,903.81
- Adicional N°. 06 : Obras en Mar : S/. 285,756.46 (21%) (CONCLUIDA)

Aprobación del Expediente Técnico de Prestación Adicional N°07 por el monto de S/.1'532,420.43 (inc. IGV) y Deductivo Vinculante N°.05 por S/. 620,840.66 (inc. IGV), mediante Resolución Jefatural N°.025-2018-FONDEPES/J del 06-03-2018.

Aprobación del Expediente Técnico de Prestación Adicional N°08 por el monto de S/.960,977.20 (inc. IGV) y Deductivo Vinculante N°.06 por S/. 479,845.97 (inc. IGV), mediante Resolución Jefatural N°.031-2018-FONDEPES/J del 06-03-2018.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



### REDUCCIONES DE OBRA

En el trámite de aprobación de los menores metrados u otras partidas que no se van a ejecutar, se ha considerado el término "Reducciones de Obra", que finalmente resultan "Deductivos de Obra".

La ley y su reglamento siempre hacen mención de "Presupuestos deductivos" que pueden ser vinculantes o no, mas no utiliza el término "Reducción".

En ese sentido se han aprobado y/o se encuentran en vías de aprobación los siguientes:

Aprobación de Expediente Técnico de Reducción N° 01 (S/. 2'065,875.97 nuevos soles) "por menor metrado de pilotes y losas nervadas considerados en el presupuesto de obra". según Resolución Jefatural N°044-2016-FONDEPES/J., de fecha 05.04.2016.

Reducción de obra N° 02 (S/. 11,230.40 nuevos soles) por menor metrado de "mejoramiento de terreno con piedra over en la conformación de la subrasante" según Resolución Jefatural N°044-2016-FONDEPES/J., de fecha 05.04.2016.

Reducción de obra N° 03 que consiste "En la no ejecución de partidas de Estructuras, Arquitectura del presupuesto contractual" por (S/. 418,002.69)

El 19-10-2016 mediante Resolución de Secretaria General N°.122-2016—FONDEPES/SG se aprueba la Reducción de obra N°.03

Reducción de obra N° 04 que consiste "Reducción de uno de los dos productores de hielo considerado en el presupuesto" por S/.479,845.97

El 19-10-2016 mediante Resolución de Secretaria General N°.122-2016—FONDEPES/SG se aprueba la Reducción de obra N°.04

Reducción de obra N° 05 "barandas de Tubería de acero en puente y escalinatas del embarcadero" por (S/. 1'054,073.06)

El 19-10-2016 mediante Resolución de Secretaria General N°.122-2016—FONDEPES/SG se aprueba la Reducción de obra N°.05

### DEDUCTIVOS DE OBRA VINCULANTES.-

Estos Deductivos son resultado de un "comparativo" entre los metrados del presupuesto y los metrados realmente verificados y/o ejecutados.

Deductivo vinculante N°.01 por s/.450,814.30 según Resolución Jefatural N°078-2016-FONDEPES/J. por variación de la dimensión de la roca por otra de menores dimensiones y cambio de especificación,

Deductivo vinculante N°.02 por s/.446.29 según Resolución Jefatural N°253-2016-FONDEPES/J., de fecha 08.07.2016.

Deductivo vinculante N°.03 por S/.152,971.09 según Resolución Jefatural N°355-2016-FONDEPES/J., de fecha 29.11.2016.

Deductivo vinculante N°.04 por S/.242,094.96 según Resolución Jefatural N°370-2016-FONDEPES/J., de fecha 29.12.2016.

Deductivo vinculante N°.05 por S/.620,840.66 según Resolución Jefatural N°025-2018-FONDEPES/J., de fecha 29.12.2016.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



PERU

Ministerio  
de la ProducciónFondo Nacional de  
Desarrollo PesqueroCONCURSO PUBLICO N°0001-  
2016-FONDEPESCONTRATO N°013-2016-  
FONDEPES**PARTIDAS NUEVAS.-**

Dentro de los adicionales se ha considerado nuevas partidas que al no tener referencia con las partidas del presupuesto han originado nuevas partidas, nuevas especificaciones técnicas y nuevos precios (pactados) así como nuevas F.P:

**COMENTARIOS Y EVALUACION DE LO ACTUADO.-**

De lo tramitado y ejecutado a la fecha se ha podido verificar lo siguiente:

**Del Inicio de los Trabajos.-**

Se tiene entendido que el Expediente Técnico (en base al perfil) tuvo como referencia de ubicación de la infraestructura pesquera, coordenadas diferentes al actual, como consecuencia de la modificación, el inicio del muelle se vio diferido y advertido por el INC de estar el "inicio" dentro de "zona reservada".

Esta situación al parecer se origina cuando se solicitó autorización a la Capitanía de Puerto para iniciar los trabajos.

Lo cierto es que la ubicación original de la obra se desplazó 80.00 m. aproximadamente de la ubicación original.

**Durante los Trabajos.-**

Como se detalla líneas arriba durante el proceso constructivo se ha verificado numerosas deficiencias, tanto en los planos del proyecto, así como mayores y menores metrados que han originado adicionales, deductivos y "reducciones", así como numerosas omisiones que han originado nuevas partidas no consideradas originalmente en el presupuesto de obra.

Sin embargo, algunos presupuestos adicionales reflejan un superposición de especialidades, por ejemplo, (arquitectura + estructuras + otras especialidades), que no permiten una objetivación más precisa de la variación de cada una de las especialidades. Cada adicional ha debido tratarse individualmente respecto a determinada especialidad.

Sin embargo debe tenerse en cuenta lo considerado por la ley del reglamento de contrataciones del Estado **Responsabilidad de la Entidad.-** *"La Entidad es responsable frente al contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares"*

En lo que respecta al adicional N° .07, este se origina, debido a la constatación de roca en el fondo marino a partir de la progresiva 0+500 al 1+000, que no se puede determinar si es en toda el área del mar a esa profundidad o si es localizado.

De ser en toda el área adyacente, se tendría una omisión de quien elaboro el perfil y luego el expediente técnico, al no haber realizado los trabajos de sondaje o verificaciones batimétricas previas en el trazo del muelle, que hubieran podido identificar la presencia de roca en toda el área.

En cambio de haber efectuado esta verificación (demostrada) de la NO existencia de roca en dicho trazo, el hecho de haber determinado una nueva ubicación, (desplazamiento 80.00 m. más arriba de la ubicación original) habría originado este Adicional que podría atribuirse como caso fortuito.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

	<b>PERU</b>	Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	CONCURSO PUBLICO N°0001- 2016-FONDEPES
				CONTRATO N°013-2016- FONDEPES

A fines del mes de Octubre del 2017 un consultor externo inicio trabajos de sondajes en el fondo marino (José Atala).

En el mes de Diciembre del 2017 el Consultor Externo hizo entrega del Estudio de Mecánica de Suelos en el que determino los estratos por debajo del nivel de las aguas marinas hasta una profundidad de de 8-9m. a partir del nivel de la plataforma del muelle, recomendando sin embargo realizar pruebas diamantinas hasta una profundidad mínima de 20.00m. para definir con mayor precisión el tipo de suelo submarino predominante, y se recomendó así mismo realizar previamente una prueba de pilotaje con punta reforzada, lo que permitiría tener una aproximación del comportamiento del equipo de hincado.

El 31-01-2018, se constituyó en obra el Consultor Alberto Martínez Vargas, quien a nombre de Fondepes, realizo las pruebas de perforación diamantina en el tramo 0+500 al 1+000 y de acuerdo a los resultados, se complementaría definir el tipo de cimentación a adoptar en dicho tramo.

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10408205007  
CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717.

# CONTROL DE AVANCE DE OBRA



MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106395807



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



PERU

Ministerio  
de la ProducciónFondo Nacional de  
Desarrollo PesqueroCONCURSO PUBLICO N°0001-  
2016-FONDEPES  
CONTRATO N°013-2016-  
FONDEPES

## CONTROL DE AVANCE DE OBRA

### a). Descripción

El proyecto tiene como objetivo el de dar el "Suficiente acceso a Recursos hidrobiológicos de Calidad que cumplan con la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (DS N° 040-2001-PE) en la Caleta de San José, Santa Rosa y Pimentel".

La Entidad Contratante FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO, como resultado del proceso de selección de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES derivada de la Licitación Pública N° 004-2014-FONDEPES, encarga a la Empresa Contratista "CONSORCIO SAN JOSE", mediante Contrato de Ejecución de Obra N° 082-2014-FONDEPES/OGA la ejecución de la Obra "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION DE LAMBAYEQUE", de acuerdo a toda la documentación que conforman el Expediente Técnico contractual.

La entidad aprobó el expediente técnico original el cual a través de sus respectivas deficiencias tuvo lugar a la elaboración de adicionales de obra así como deductivos vinculantes, reducciones como también esto genera la ampliación de plazo respectiva.

Cabe precisar que, la potestad de la Entidad de ordenar la ejecución de prestaciones adicionales responde al reconocimiento de su calidad de garante del interés público en los contratos que celebra con los proveedores, para abastecerse de los bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de las funciones que le ha conferido la ley.

Es importante señalar que por deficiencia del expediente técnico se generara la necesidad de la aprobación de prestaciones adicionales de obra por parte de la Entidad, esto cuando los estudios que lo conforman (estudios de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental, etc.) presenten información incorrecta que no guarde relación con la realidad, precisando que la Entidad es responsable frente al contratista del contenido del expediente técnico en tanto forma parte de las Bases que han sido elaboradas por aquella y de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares, de conformidad con el primer párrafo del artículo 153 del Reglamento

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106505307

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

**b) Avance fisico de obra.**

Se anexa el avance fisico referente a la Valorización Contractual de Obra.

**c) Cronograma de Avance De Obra y comentario especifico**

**Comentario acerca del avance de Obra referente al Contractual de Obra-**

Al mes de Setiembre del 2018, se ha ejecutado el 61.87 %, contra un Avance Programado del 78.04 %, por lo tanto se encuentra al atrasada de acuerdo al cronograma vigente el cual será sincerado y presentado a la entidad la nueva programación correspondiente a la ampliación de plazo que correspondería al adicional por los trabajos de optimación que la entidad comunico en las cartas señaladas líneas arriba y que serán ejecutados cuando la entidad apruebe y autorice su ejecución mediante resolución.


Mes de Valorización	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado
Setiembre 2018 Valorización N° 45	78.04 %	61.87 %

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA  
.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA  
  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



# CONTROL DE OBRA

  
.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
.....  
RUC: 10106595807  
.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
.....  
RUC: 10106595807

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



	<b>PERU</b>	Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	CONCURSO PUBLICO N°0001- 2016-FONDEPES CONTRATO N°013-2016- FONDEPES
---	-------------	--------------------------------	--	---

## CONTROL DE OBRA

### a) Control de Campo

#### Del Contractual

Se realizaron las siguientes partidas con su respectivo metrado.

ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO
	<b>OBRAS EN MAR</b>		<b>SEPTIEMBRE</b>
<b>7.03</b>	<b>MUELLE DE ESPIGON L=950 m</b>		
<b>07.03.04</b>	<b>Nucleos llenados en situ</b>		
07.03.04.01	Concreto en Nucleos Fc'= 280 kg/cm <sup>2</sup>	m3	
07.03.04.02	Encofrado y desencofrado en Nucleos	m <sup>2</sup>	
07.03.04.03	Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm <sup>2</sup>	kg	
<b>07.03.05</b>	<b>Juntas Longitudinales y Transversales</b>		
07.03.05.01	Concreto en Viga Mandil Fc=280 Kg/cm <sup>2</sup>	m3	-
07.03.05.02	Encofrado y desencofrado en Viga Mandil	m <sup>2</sup>	-
07.03.05.03	Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm <sup>2</sup>	kg	-
<b>07.03.06</b>	<b>Sardineles llenados en situ</b>		
07.03.06.01	Concreto en Sardinel Fc=280 Kg/cm <sup>2</sup>	m3	
07.03.06.02	Encofrado y desencofrado en Sardineles	m <sup>2</sup>	
07.03.06.03	Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm <sup>2</sup>	kg	
<b>07.03.07</b>	<b>Losas Vaciadas in Situ</b>		
07.03.07.01	Concreto en Losas Fc=280 Kg/cm <sup>2</sup>	m3	
07.03.07.02	Encofrado y desencofrado en Losas	m <sup>2</sup>	
07.03.07.03	Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm <sup>2</sup>	kg	
<b>07.04</b>	<b>CABEZO L= 50.00 m</b>		
<b>07.04.07</b>	<b>Maniobra de Colocacion e Hincado de Pilotes, Vigas y Losas: Puentes</b>		
07.04.07.01	Transporte de Pilote	Und	22.00
07.04.07.02	Transporte de Viga Transversal	Und	-
07.04.07.03	Transporte de Losa Nervada	Und	12.00
07.04.07.06	Descabezado de Pilotaje	Und	22.00
07.04.07.07	Colocacion de Viga Transversal	Und	8.00
07.04.07.08	Colocacion de Losa Nervada	Und	12.00

### b) Descripción de las ocurrencias técnicas realizadas en obra

#### DEL CONTRACTUAL

Las ocurrencias de trámite técnico administrativo se anotaron en el Cuaderno de obra cuyas copias se adjunta al presente Informe

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

**c) Control de calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos**

Se están verificando la respectiva calidad de los materiales, las cuales serán requeridas en la recepción de Obra.

**d) Pruebas de Calidad de agregados.**

No se realizó adicionalmente ninguna otra prueba por no ser necesario

**e) Diseño de Mezclas para los diferentes tipos de concreto**

No se realizó adicionalmente ninguna otra prueba por no ser necesario

**f) Pruebas de Compactaciones o densidad de campo**

No se realizó adicionalmente ninguna otra prueba por no ser necesario

**g) Pruebas hidráulicas en redes de desagüe, redes de agua, pruebas eléctricas, verificación de cumplimiento de especificaciones de electrobombas, limpieza y desinfección de sistemas, correcto funcionamiento de aparatos sanitarios, eléctricos, electrobombas y otros.**

No se realizaron ninguna prueba por no ser necesarios.

Sin embargo, se viene verificando el buen funcionamiento de los aparatos sanitarios, eléctricos y electrobombas, periódicamente a fin de verificar su funcionalidad y buen estado

**h) Recursos Utilizados durante el mes**

**LISTA DE MAQUINAS Y EQUIPOS QUE SE VIENE UTILIZANDO EN OBRA**

GRUA TELESCOPICA GROVE	40 TN
GRUA ORUGA LINK BELT LS 108-B	40 TN
CARGADOR FRONTAL VOLVO L180C	
MINI CARGADOR BOT CAT S250 N°21	
COMPRESORA DE AIRE ATLAS	
ARENADORA	
TROMPO MEZCLADOR DE CONCRETO	
MOTOSOLDADORA MILLER 402D	

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595927

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



PERU

Ministerio  
de la ProducciónFondo Nacional de  
Desarrollo PesqueroCONCURSO PÚBLICO N°0001-  
2018-FONDEPESCONTRATO N°013-2018-  
FONDEPES**PERSONAL TECNICO Y OFICINA**

Ing. Residente de Obra : Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros  
Maestro de Obra : Jorge Luis Díaz Ruiz.

**PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR EN OBRA**

02 maniobristas de muelle  
03 operadores de máquinas  
02 soldadores  
06 peones  
02 vigilantes turno día  
02 vigilantes turno noche

**Personal Profesional a tiempo parcial en Obra - Lima**

01 Gerente de Proyecto : Ing. Julio César Incio Carrillo . Participación de 30%  
01 Administrador de Obra : Ing. Ludwig Benito Retamozo Martínez Participación de 30%  
01 Esp. en Metrados y Valorizaciones : Ing. Jhonny Alan Huamán Porlles Participación de 100%

**Personal Profesionales a tiempo Completo en Obra -Chiclayo**

01 Ing. Residente de Obra : Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros  
01 Asistente de Residente de Obra : Ing. Richard Javier Tapia Rosazza  
01 Esp. en Seguridad de Obra : Ing. Eddy Solano Espinoza Escalante  
01 Esp. en Metrados y Valorizaciones : Ing. Jhonny Alan Huamán Porlles (Lima-Obra)  
Maestro de Obra : Jorge Luis Díaz Ruiz.  
01 Secretaria

**Personal de la Supervisión**

01 Jefe de supervisión : Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza

- i) **Control de Supervisión en la Prevención de Riesgos (seguridad) y Control y supervisión ambiental informe de las actividades de supervisión ambiental realizadas durante el mes**

Se anexa lo correspondiente.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807


JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717


**INFORME MENSUAL DE  
SEGURIDAD, SALUD EN EL  
TRABAJO Y MEDIO  
AMBIENTE**

**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA  
CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ,  
DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE  
LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE".**

**SEPTIEMBRE – 2018**

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

 **FONDEPES**  
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

032

	INFORME MENSUAL N° 45	SEPTIEMBRE - 2018
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 1 de 17

### ÍNDICE

- 1. **DATOS DE LA OBRA.....2**
- 2. **INTRODUCCIÓN.....2**
- 3. **OBJETIVO .....2**
- 4. **ALCANCE .....2**
- 5. **ORGANIGRAMA .....3**
- 6. **SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .....3**
- 7. **SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL .....7**
- 8. **ESTADÍSTICAS SST.....12**
- 9. **REPORTE MENSUAL DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD  
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE: .....14**
- 10. **CONCLUSIONES: .....15**
- 11. **RECOMENDACIONES.....15**
- 12. **PANEL FOTOGRÁFICO: .....16**

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106393807

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

	INFORME MENSUAL N° 45	SEPTIEMBRE - 2018
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 2 de 17

033

### 1. DATOS DE LA OBRA:

“Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”.

**TIEMPO DE EJECUCIÓN** : 1,204 días.  
**FECHA DE INICIO** : 15 de Enero de 2015.

### 2. INTRODUCCIÓN:

Consortio San José, viene ejecutando la obra: “Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”, para lo cual se espera conseguir la máxima identificación y compromiso por parte de la Dirección y de todos los trabajadores con los principios de Seguridad, Salud en el Trabajo y Conservación del Medio Ambiente, cumpliendo así con el Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente elaborado para la obra.

### 3. OBJETIVO

Demostrar la gestión del Consortio San José, referente a Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente en el mes de Septiembre del 2018.

### 4. ALCANCE:

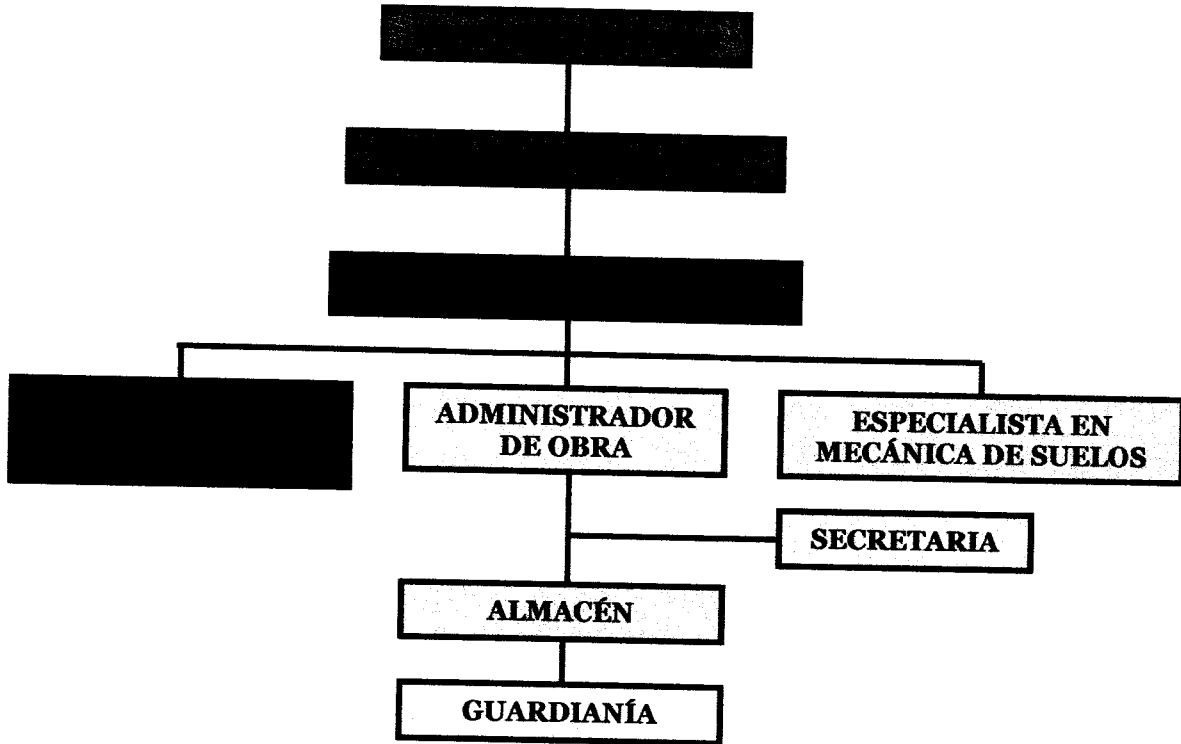
El presente informe plasma todas las actividades realizadas referentes a Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente en la Obra: “Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”.

  
 .....  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595807

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

034

**5. ORGANIGRAMA:**



**6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:**

**6.1. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:**

Aún no se conforma el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, por no contar con la cantidad necesaria para conformarla según Ley 29783.

**6.2. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**6.2.1. CUADRO ESTADÍSTICO DE CUMPLIMIENTO DE INSPECCIONES:**

CONSORCIO SAN JOSÉ		INSPECCIONES																					
"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"																							
MUELLE SAN JOSÉ - CHICLAYO																							
MES	HERRAM. MANUAL		HERRAM. ELECTE.		EXTINTORES		BOTIQUIN		CAMILLA		EPPs		ÁRNES		ANDAMIOS		VEHICULOS		GENERAL-OBRA		TOTAL MES	EFICIENCIA DE RESPUESTA	
	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.		MES	ACUM.
JULIO	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	420	100%	100%
AGOSTO	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	430	100%	100%
<b>TOTAL INSPECCIONES</b>	44		44		44		44		44		44		44		44		44		44				

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

MENDOZA PIGGAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

	INFORME MENSUAL N° 45	SEPTIEMBRE - 2018
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 4 de 17

### 6.3. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

CONSORCIO SAN JOSÉ		ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO				
OBRA:		"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"				
FRENTE DE TRABAJO:		MUELLE SAN JOSE - CHICLAYO				
Nº	FECHA DE GENERACION	CANTIDAD DE TRABAJADORES	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO	INSPECCION DE VEHICULOS	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR
1	01/09/2018	14	3	2	2	0
2	03/09/2018	14	2	2	1	0
3	04/09/2018	13	5	1	1	0
4	05/09/2018	13	5	3	1	0
5	06/09/2018	14	4	3	3	0
6	07/09/2018	10	3	1	2	0
7	08/09/2018	16	5	2	1	0
8	10/09/2018	12	3	2	2	0
9	11/09/2018	12	5	4	1	0
10	12/09/2018	11	3	3	1	0
11	13/09/2018	14	5	3	2	0
12	14/09/2018	14	3	3	1	0
13	15/09/2018	15	4	1	2	0
14	17/09/2018	11	2	2	1	0
15	18/09/2018	14	3	3	1	0
16	19/09/2018	13	3	3	2	0
17	20/09/2018	10	4	2	2	0
18	21/09/2018	13	3	2	1	0
19	22/09/2018	13	3	2	2	0
20	24/09/2018	13	3	2	1	0
21	25/09/2018	13	3	3	2	0
22	26/09/2018	14	4	3	2	0
23	27/09/2018	12	3	2	2	0
24	28/09/2018	12	3	1	1	1
25	29/09/2018	14	4	1	3	1
<b>TOTAL</b>			<b>88</b>	<b>56</b>	<b>40</b>	<b>2</b>

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



	INFORME MENSUAL N° 45	SEPTIEMBRE - 2018
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 5 de 17

**6.4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN**

**6.4.1. INDUCCIÓN**

En el presente mes de Septiembre no se realizó inducción a los trabajadores.

**6.4.2. CAPACITACIÓN**

En el presente mes Septiembre no se realizó capacitación a los trabajadores.

**6.4.3. CHARLA 10 MINUTOS**

En este mes se han desarrollado un total de 25 charlas de 10 minutos, teniendo un total de 54 horas hombres capacitados; abarcando temas de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente para el personal de campo y técnico, los mismos que se detallaron en el Cronograma Mensual de Reuniones Diarias.

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

037

CONSORCIO SAN JOSÉ		CRONOGRAMA MENSUAL DE REUNIONES DIARIAS						
2018	SEPTIEMBRE	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"						
N°	TEMA A EXPLICAR	TIPO DE REUNION	RESPONSABLE DE EJECUCION	FECHA	N° DE ASISTENTES	DURACION (min)	TOTAL HNC	HORA
1	El peligro de la rutina	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	01/09/2018	14	10	2	07:20 a.m.
2	La Honestidad	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	03/09/2018	14	10	2	07:20 a.m.
3	Los trabajadores que piensan evitan accidentes	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	04/09/2018	13	10	2	07:20 a.m.
4	Lesiones a los dedos, las manos y muñecas	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	05/09/2018	13	10	2	07:20 a.m.
5	No podemos ganarles a las máquinas	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	06/09/2018	14	10	2	07:20 a.m.
6	No hay por qué romperse la espalda	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	07/09/2018	10	10	2	07:20 a.m.
7	Todos fuimos un día trabajadores nuevos	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	08/09/2018	16	10	3	07:20 a.m.
8	Los ojos	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	10/09/2018	12	10	2	07:20 a.m.
9	Objetos que caen	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	11/09/2018	12	10	2	07:20 a.m.
10	Protección del cuerpo contra el cemento	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	12/09/2018	11	10	2	07:20 a.m.
11	Mantener limpio el sitio de trabajo	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	13/09/2018	14	10	2	07:20 a.m.
12	Seguridad con las extensiones eléctricas	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	14/09/2018	14	10	2	07:20 a.m.
13	Conservemos lo que tenemos	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	15/09/2018	15	10	3	07:20 a.m.
14	Los sabia pero..... Se me olvido	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	17/09/2018	11	10	2	07:20 a.m.
15	Guardas de seguridad	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	18/09/2018	14	10	2	07:20 a.m.
16	Procedimientos de trabajo en caliente	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	19/09/2018	13	10	2	07:20 a.m.
17	La Salud	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	20/09/2018	10	10	2	07:20 a.m.
18	Herramientas de mano	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	21/09/2018	13	10	2	07:20 a.m.
19	Seguridad con las escaleras	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	22/09/2018	13	10	2	07:20 a.m.
20	Prevención de lesiones de espalda	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	24/09/2018	13	10	2	07:20 a.m.
21	Andamios	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	25/09/2018	13	10	2	07:20 a.m.
22	Protección auditiva	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	26/09/2018	14	10	2	07:20 a.m.
23	Protección visual	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	27/09/2018	12	10	2	07:20 a.m.
24	Trabajos en andamios	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	28/09/2018	12	10	2	07:20 a.m.
25	Primeros auxilios y accidentes	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	29/09/2018	14	10	2	07:20 a.m.
<b>TOTAL</b>								



MENDOZA PICOGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10100393807



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717  
SEPTIEMBRE - 2018

	INFORME MENSUAL N° 45	SEPTIEMBRE - 2018
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 7 de 17

038

**7. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.**

Las actividades realizadas en el mes de Septiembre, se vienen ejecutando de acuerdo al cronograma de Actividades de Plan de Gestión Ambiental.

Para ejecutar estas actividades se vienen aplicando los respectivos documentos, procedimientos y permisos debidamente aprobados, que permitan implementar el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente durante la fase de ejecución de la Obra.


**7.1. COMPONENTES AMBIENTALES AFECTADOS PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES**


En el presente punto solamente mencionaremos los componentes ambientales afectados de manera negativa, producto de las diversas actividades ejecutadas en la etapa de construcción de la obra durante el mes de Septiembre, no considerando necesario efectuar una descripción detallada del estado de dichos componentes, pues dicho detalle ha sido elaborado en la respectiva Línea de base del proyecto. Por ello los componentes ambientales afectados son los siguientes:

- Aire
- Suelo
- Mar
- Entorno paisajístico
- Salud y seguridad de la población y trabajadores

**7.2. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN LOS COMPONENTES AMBIENTALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE:**

A continuación mostramos los impactos ambientales generados, producto de las diversas actividades ejecutadas en la fase de construcción de la obra, en el mes de Septiembre. En la intersección de la actividad ejecutada con el componente afectado se describirá dichos Impactos, las variables e indicadores afectados.

  
 .....  
 NENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595807

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

DENOMINACIÓN DEL IMPACTO	MEDIO AL QUE AFECTA	Carácter	IM: Magnitud	IS: Severidad	IE: Extensión	IP: Probabilidad	NRA: NIVEL DE RIESGO AMBIENTAL
Generación de partículas por el movimiento de maquinarias.	AIRE	-1	1	1	1	1	
Generación de partículas en suspensión por la demolición, preparado de concreto y actividades diversas.	AIRE	-1	1	1	1	1	
Generación de desechos sólidos por el descabezado de pilotes, preparado de concreto y actividades diversas.	MAR	-1	1	1	1	1	


**7.3 ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL FRENTE A LOS IMPACTOS GENERADOS:**

La estrategia de manejo ambiental, garantiza que la ejecución de las acciones y medidas de mitigación propuestas sean lo más objetivas y realistas posibles, a fin de que las posibles alteraciones que puedan producirse en el medio ambiente, encuentren una respuesta y sean minimizadas y/o mitigadas.

Las medidas ambientales de los impactos negativos generados por la ejecución de las actividades de la etapa de construcción de la obra sobre el medio ambiente, son planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, pero hay algunas medidas adicionales propuestas y ejecutadas durante el desarrollo de las actividades, necesarias para controlar, prevenir, evitar y/o compensar los impactos.

**7.4. ACTIVIDADES CONTROLADAS PROGRAMA DE MANEJO DE CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO:**

En las actividades ejecutadas durante el mes de Septiembre se han producido los siguientes impactos:

  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106395807

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

	INFORME MENSUAL N° 45	SEPTIEMBRE - 2018
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 9 de 17

040

- Generación de partículas por el movimiento de maquinarias y fuertes vientos en esta época de trabajo.
- Generación de partículas en suspensión por la preparación de concreto y actividades diversas.
- Generación de desechos sólidos por el descabezado de pilotes, preparado de concreto y actividades diversas.

Por otro lado, durante este mes se han efectuado eventualmente las siguientes medidas de control para reducir y mitigar los efectos de los impactos ambientales generados:


- a) Se cuenta con cilindros de colores para la segregación de los residuos sólidos.
- b) Rociado diario de agua, mediante camiones cisternas, en toda el área de trabajo, para disminuir la generación de polvo por efectos de los fuertes vientos en la zona.
- c) A cada frente de trabajo, se le entrega bolsas plásticas para que segreguen sus residuos sólidos producto de sus actividades.
- d) Se ha ejecutado la charla de inducción de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente a todo el personal que ha ingresado a la obra. Además de las charlas diarias (charla de 10 minutos) reiterándola importancia del orden y limpieza en su área de trabajo e identificar los colores de los tachos y segregar correctamente los residuos.


#### 7.5. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Durante la ejecución de las actividades en la obra, se han generado residuos sólidos producto de las diversas actividades, así como residuos sólidos domésticos producto de las diversas actividades propias de los trabajadores.

Para mitigar y controlar los impactos generados por la generación de los residuos sólidos se han ejecutado las siguientes actividades:

- Se continúa utilizando los lugares de acopio para el almacenamiento temporal de residuos sólidos dentro del área de la obra.

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

041

- Se implementó los cilindros que serán utilizados como depósitos de colores para el almacenamiento selectivo de residuos sólidos, de acuerdo al siguiente detalle:


Color del Cilindro	Características	Total Kg.
	Materiales metálicos, fierros, etc.	5
Azul	Material hecho de papel y cartón.	3
Blanco	Materiales donde su compuesto es de plástico.	2.5
Verde	Materiales de vidrios, botellas, etc.	0
Marrón	Restos de alimentos, Jardinería, etc.	3
Rojo	Materiales Peligrosos.	4
<b>TOTAL Kg.</b>		

## 7.6 REPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS

### a) REPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

CONSORCIO SAN JOSÉ	REPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS-RESTOS DE CONSTRUCCIÓN			
OBRA:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE			
FRENTE DE TRABAJO:	MUELLE DE SAN JOSE-CHICLAYO			
TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	ACUMULADO	OBSERVACIONES
Restos de alimentos	Kg.	3.0	18.0	Ninguna
Papel/Cartón	Kg.	3.0	18.0	Ninguna
Bolsas de papel pastificadas (Cemento, etc.)	Kg.	4.0	11.5	Ninguna
Plastico PVC (Botellas, tubos, envases y acrilicos)	Kg.	2.5	17.0	Ninguna
Tecknopor.	Kg.	1.0	2.5	Ninguna
Chatarra y cable eléctricos.	Kg.	5.0	203.0	Ninguna
Madera	Kg.	3.0	27.0	Ninguna
Residuos de vidrio/ ceramica.	Kg.	0.0	0.0	Ninguna
<b>TOTAL MES</b>				

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595897

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717  
SEPTIEMBRE - 2018


042

**b) REPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS**

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>REPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS SOLIDOS</b>			
<b>OBRA:</b>	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE			
<b>FRENTE DE TRABAJO:</b>	MUELLE DE SAN JOSE-CHICLAYO			
<b>TIPO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Recipientes de sustancias quimicas	Kg.	2.0	6.0	Ninguna
<b>TOTAL MES</b>				

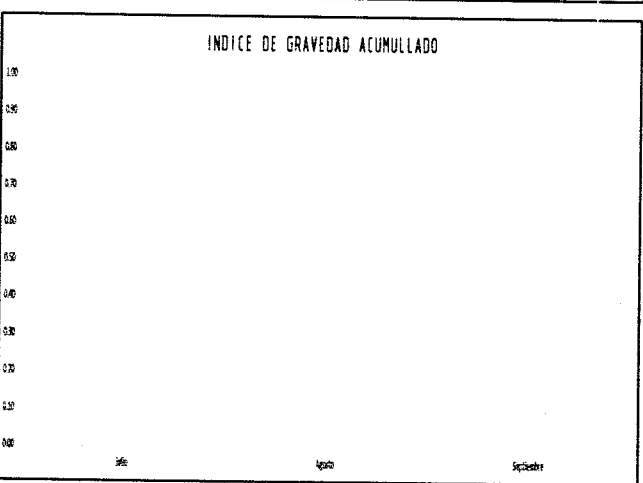
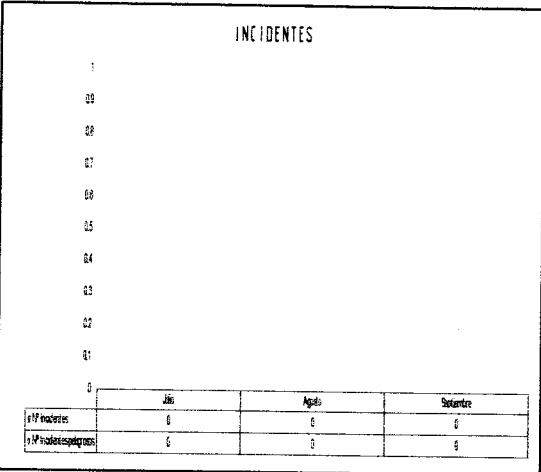

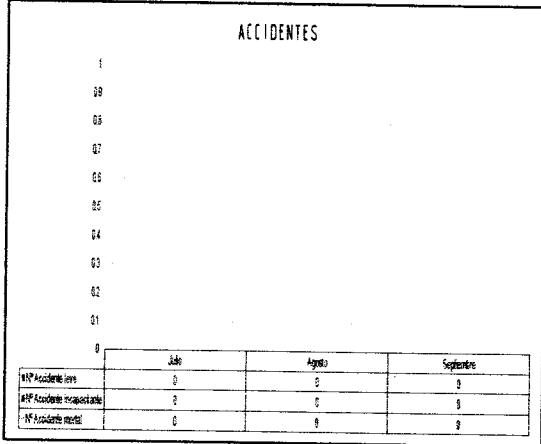
**8. ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>														
<b>OBRA:</b>	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE REGION LAMBAYEQUE"														
<b>Mes</b>	<b>N° trabajadores</b>	<b>N° Accidente mortal</b>	<b>N° Accidente leve</b>	<b>ACCIDENTE INCAPACITANTE</b>					<b>ENFERMEDAD OCUPACIONAL</b>						
				<b>N° Accidente incapacitante</b>	<b>Total horas hombre trabajadas</b>	<b>N° días perdidos</b>	<b>Índice frecuencia</b>	<b>Índice gravedad</b>	<b>Índice accidentabilidad</b>	<b>n° enfermedades ocupacionales</b>	<b>N° trabajadores expuestos al agente</b>	<b>Tasa de incidencia</b>	<b>N° trabajadores con cancer profesional</b>	<b>N° Incid. entes peligrosos</b>	<b>N° Incidentes</b>
Julio	16	0	0	0	2995.5	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0
Agosto	14	0	0	0	2992.5	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		0	0	0	5988	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0

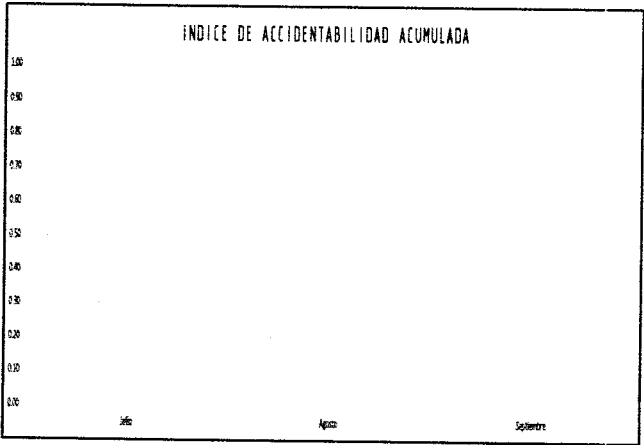
  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595397

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

<b>OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SST</b>	<b>Índice Prevención</b>	<b>Índice Gravedad</b>	<b>Índice Accidentabilidad</b>
--	--------------------------	------------------------	--------------------------------



Índice	Índice de Frecuencia Acumulada	Índice de Gravedad Acumulada	Índice de Accidentabilidad Acumulada	Índice de Prevención	Índice de Gravedad	Índice de Accidentabilidad
Julio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*[Signature]*  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595927

*[Signature]*  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717



**9.1. CÁLCULO ESTADÍSTICO DE ÍNDICE DE FRECUENCIA, ÍNDICE DE SEVERIDAD, ACCIDENTABILIDAD Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES:**

Para el cálculo del índice de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad se utilizaran las siguientes formulas según la NTE G 050.

Índice de Frecuencia Mensual	<b>IFm</b>	$\frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el mes X 200000}}{\text{Número horas trabajadas en el mes}}$
Índice de Gravedad Mensual	<b>IGm</b>	$\frac{\text{Días perdidos en el mes X 200000}}{\text{Número horas trabajadas en el mes}}$
Índice de Frecuencia Acumulado	<b>IFa</b>	$\frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el año X 200000}}{\text{Horas trabajadas en lo que va del año}}$
Índice de Gravedad Acumulado	<b>IGa</b>	$\frac{\text{Días perdidos en el año X 200000}}{\text{Horas trabajadas en lo que va del año}}$
Índice de Accidentabilidad	<b>IA</b>	$\frac{\text{IFa x IGa}}{200}$

	INFORME MENSUAL N° 45	SEPTIEMBRE - 2018
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 14 de 17

045

## 9. REPORTE MENSUAL DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

CONSORCIO SAN JOSÉ		REPORTE MENSUAL - SEPTIEMBRE 2018	
OBRA:		"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"	
FRENTE DE TRABAJO:		MUELLE DE SAN JOSE - CHICLAYO	
1	Cantidad de Trabajadores	14	Trabajadores
2	Dias Trabajados Sin Accidentes Incapacitantes	25	dias
3	Total Accidentes Sin Tiempo Perdido (Accidentes Leves)	0	Unidad
4	Total Accidentes Con Tiempo Perdido (Accidentes Graves)	0	Unidad
5	Total Dias Perdidos Por Accidentes Incapacitantes	0	dias
6	Total Accidentes Fatales Reportados	0	Unidad
7	Record Horas Mensual Sin Accidentes Incapacitantes	2754	Hrs
8	Record Horas Acumuladas Sin Accidentes Incapacitantes	5686.5	Hrs
9	Total Accidentes de Tránsito	0	Unidad
10	Total Accidentes con Daño Material	0	Unidad
11	Total Incidentes	0	Unidad
12	Total Derrames	0	Unidad
13	Total Enfermedades Ocupacionales Reportada	0	Unidad
ACTIVIDADES			
1	Charlas Diarias	54	Hrs Hombre
2	Capacitaciones	0	Hrs Hombre
3	Induccion Trabajador Nuevo	0	Hrs Hombre
4	Analisis de Trabajo Seguro	88	Unidad
5	Permiso Escrito Para Trabajador de Alto Riesgo	56	Unidad
6	Inspeccion Pre Operacional de Vehiculos	40	Unidad
7	Inspeccion Pre Operacional de Minicargador	2	Unidad
8	Selección de Residuos No Peligrosos- Punto Limpio	21.5	Kg.
9	Selección de Residuos Peligrosos- Punto Limpio	2.0	Kg.
10	Eliminacion Residuos No Peligrosos Acumukdo	297.0	Kg.

.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

.....  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

	INFORME MENSUAL N° 45	SEPTIEMBRE - 2018
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 15 de 17


046

**10. CONCLUSIONES**

- En este mes se tuvo cero incidentes y accidentes en obra, habiendo informado en su respectivo momento a la alta gerencia.
- En el presente mes se obtuvo como resultado cero en las pruebas de alcoholemia.
- En el presente mes no se reportó ningún tipo de derrames dentro de obra las que pudieran ocasionar contaminación alguna.
- Se viene ejecutando las inspecciones mensuales de seguridad y salud en el trabajo: botiquín, extintores, camilla, herramientas manuales, vehículos y equipos de protección personal.
- A cada frente de trabajo, se les entregó bolsas plásticas negras para que desechen los residuos generados durante su labor.

**11. RECOMENDACIONES**

- Cumplir con el cronograma semanal para continuar con la realización de las faenas de limpieza de toda la obra donde participan todo el personal obrero y técnico.
- Continuar con las pruebas de alcoholemia al inicio de los trabajos.
- Realizar el seguimiento de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo: botiquín, extintores, camilla, herramientas manuales, vehículos y equipos de protección personal.

  
 .....  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595907

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

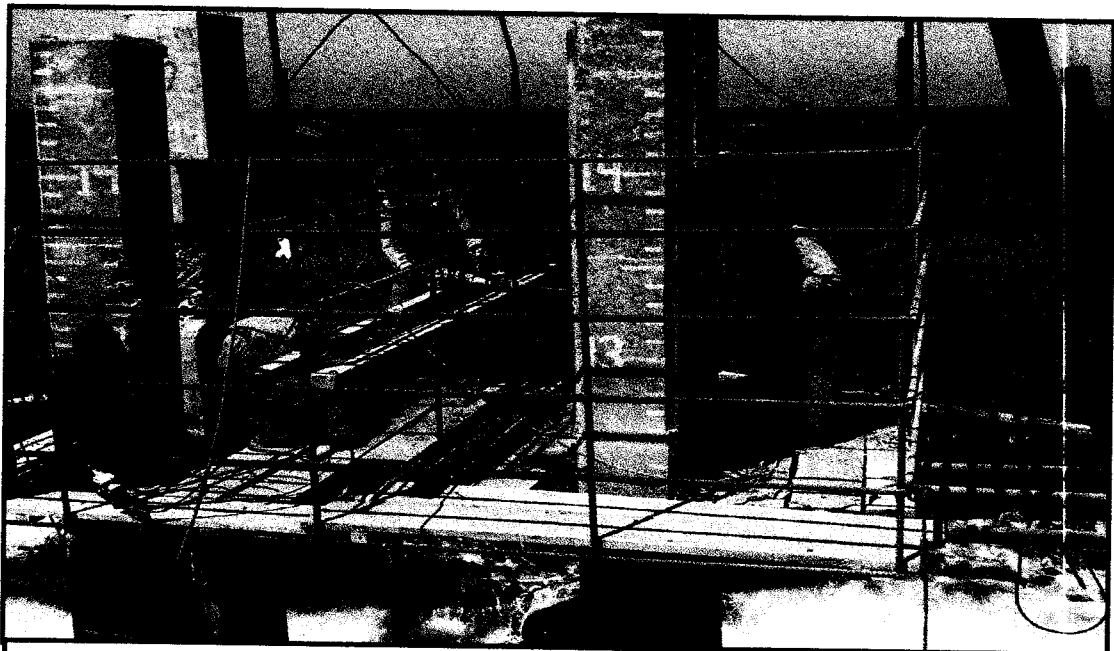
	INFORME MENSUAL N° 45	SEPTIEMBRE - 2018
<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>		
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 16 de 17

047

**12. PANEL FOTOGRÁFICO**



**Imagen N°01: Charlas diarias antes de iniciar las labores**




**Imagen N°02: Personal con su respectivo equipo de protección personal**

*[Signature]*  
 ESPINOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595807

*[Signature]*  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

048

	INFORME MENSUAL N° 45	SEPTIEMBRE - 2018
<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>		
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 17 de 17




**Imagen N°03: Punto de Reunión**



**Imagen N°04: Pruebas de alcoholemia**

  
.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. OIP N° 40717  
SEPTIEMBRE - 2018

# CONTROL ECONOMICO DE OBRA

  
.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

	<b>PERU</b>	Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	CONCURSO PUBLICO N°0001- 2016-FONDEPES CONTRATO N°013-2016- FONDEPES
---	-------------	--------------------------------	--	---

## CONTROL ECONOMICO DE OBRA

### a) Control de Valorizaciones

#### VALORIZACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL

Al mes de Setiembre del 2018, se está tramitando la Valorización N° 45 de los trabajos ejecutados acumulado al 61.87 %, presentando el siguiente detalle:

VALORIZ.	FECHA	VALORIZADO (Sin I.G.V.)
N° 01	Al 31 de Enero 2015	S/. 358,268.22
N° 02	Al 28 de Febrero 2015	S/. 555,717.9
N° 03	Al 31 de Marzo 2015	S/. 593,994.45
N° 04	Al 30 de Abril 2015	S/. 925,177.18
N° 05	Al 31 de Mayo 2015	S/. 753,732.22
N° 06	Al 30 de Junio 2015	S/. 985,329.63
N° 07	Al 31 de Julio 2015	S/. 1,865,453.02
N° 08	Al 31 de Agosto 2015	S/. 1,054,927.09
N° 09	Al 30 de Setiembre 2015	S/. 1,429,170.33
N° 10	Al 31 de Octubre 2015	S/. 1,285,746.48
N° 11	Al 30 de Noviembre 2015	S/. 2,011,031.83
N° 12	Al 31 de Diciembre 2015	S/. 1,389,920.39
N° 13	Al 31 de Enero 2016	S/. 1,517,495.69
N° 14	Al 29 de Febrero 2016	S/. 667,975.68

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595397

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717


	PERU	Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	CONCURSO PÚBLICO N°0001- 2016-FONDEPES CONTRATO N°013-2016- FONDEPES
---	------	--------------------------------	--	---

N° 15	Al 31 de Marzo 2016	S/. 621,544.65
N° 16	Al 30 de Abril 2016	S/. 240,541.06
N° 17	Al 31 de Mayo 2016	S/. 67,518.42
N° 18	Al 30 de Junio 2016	S/. 238,908.88
N° 19	Al 31 de Julio 2016	S/. 87,581.78
N° 20	Al 31 de Agosto 2016	S/. 26,733.49
N° 21	Al 30 de Setiembre 2016	S/. 54,654.58
N° 22	Al 31 de Octubre 2016	S/. 15,754.74
N° 23	Al 30 de Noviembre 2016	S/. 0.00
N° 24	Al 31 de Diciembre 2016	S/. 68,223.57
N° 25	Al 31 de Enero 2017	S/. 106,056.42
N° 26	Al 28 de Febrero 2017	S/. 11,543.86
N° 27	Al 31 de Marzo 2017	S/. 0.00
N° 28	Al 30 de Abril 2017	S/. 0.00
N° 29	Al 31 de Mayo 2017	S/. 0.00
N° 30	Al 30 de Junio 2017	S/. 0.00
N° 31	Al 31 de Julio 2017	S/. 0.00
N° 32	Al 31 de Agosto 2017	S/. 0.00
N° 33	Al 30 de Setiembre 2017	S/. 0.00
N° 34	Al 31 de Octubre 2017	S/. 0.00
N° 35	Al 30 de Noviembre 2017	S/. 0.00
N° 36	Al 31 de Diciembre 2017	S/. 0.00

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595997

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

  
ISAIAS JORGÉ ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



 <b>PERU</b>	<b>Ministerio de la Producción</b>	<b>Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero</b>	CONCURSO PUBLICO N°0001-2018-FONDEPES CONTRATO N°013-2018-FONDEPES
---	------------------------------------	--	---

N° 37	Al 31 de Enero 2018	S/. 0.00
N° 38	Al 28 de Febrero 2018	S/. 0.00
N° 39	Al 31 de Marzo 2018	S/. 3,091.79
N° 40	Al 30 de Abril 2018	S/. 0.00
N° 41	Al 31 de Mayo 2018	S/. 0.00
N° 43	Al 31 de Julio 2018	S/. 15,893.61
N° 44	Al 31 de Agosto 2018	S/. 16,519.87
N° 45	Al 30 de Setiembre 2018	S/. 23,972.12
<b>TOTAL VALORIZADO (SIN IGV)</b>		<b>S/. 17,018,392.26</b>

### REAJUSTE DE LA VALORIZACIÓN


VALORIZACIÓN N° 45	FECHA	K Reaj.	Reajuste
<b>SUB PRESUPUESTO N° 07</b> Obras en mar	Al 30 de Setiembre del 2018	K = 1.140	S/. 4,696.78
<b>TOTAL REAJUSTE (SIN IGV)</b>			<b>S/. 4,696.78</b>


### IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)


El I.G.V. afectado a la valorización efectuado por el Contratista a la fecha ha sido el siguiente:

VALORIZACIÓN	Fecha	I.G.V. (18%)
N° 01	Enero 2015	S/. 52,340.24

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

  
JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

	<b>PERU</b> Ministerio de la Producción	<b>Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero</b>	CONCURSO PUBLICO N°001- 2016-FONDEPES CONTRATO N°013-2016- FONDEPES
---	---	--	--

N° 02	Febrero 2015	S/. 84,616.98
N° 03	Marzo 2015	S/. 90,961.82
N° 04	Abril 2015	S/. 140,519.67
N° 05	Mayo 2015	S/. 112,936.03
N° 06	Junio 2015	S/. 149,774.68
N° 07	Julio 2015	S/. 281,792.27
N° 08	Agosto 2015	S/. 151,997.48
N° 09	Setiembre 2015	S/. 222,805.58
N° 10	Octubre 2015	S/. 191,982.90
N° 11	Noviembre 2015	S/. 305,679.20
N° 12	Diciembre 2015	S/. 223,850.66
N° 13	Enero 2016	S/. 239,496.48
N° 14	Febrero 2016	S/. 102,790.73
N° 15	Marzo 2016	S/. 98,684.70
N° 16	Abril 2016	S/. 37,075.22
N° 17	Mayo 2016	S/. 7,077.51
N° 18	Junio 2016	S/. 37,197.40
N° 19	Julio 2016	S/. 13,816.70
N° 20	Agosto 2016	S/. 4,192.57
N° 21	Setiembre 2016	S/. 8,563.49
N° 22	Octubre 2016	S/. 2,473.49
N° 23	Noviembre 2016	S/. 0.00
N° 24	Diciembre 2016	S/. 11,136.46
N° 25	Enero 2017	S/. 1,268.43
N° 26	Febrero 2017	S/. 1,299.00

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595897

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

N° 27	Marzo 2017	S/. 0.00
N° 28	Abril 2017	S/. 0.00
N° 29	Mayo 2017	S/. 0.00
N° 30	Junio 2017	S/. 0.00
N° 31	Julio 2017	S/. 0.00
N° 32	Agosto 2017	S/. 0.00
N° 33	Setiembre 2017	S/. 0.00
N° 34	Octubre 2017	S/. 0.00
N° 35	Noviembre 2017	S/. 0.00
N° 36	Diciembre 2017	S/. 0.00
N° 37	Enero 2018	S/. 0.00
N° 38	Febrero 2018	S/. 0.00
N° 39	Marzo 2018	S/. 240.74
N° 40	Abril 2018	S/. 0.00
N° 41	Mayo 2018	S/. 0.00
N° 42	Junio 2018	S/. 4,473.48
N° 43	Julio 2018	S/. 2,583.79,
N° 44	Agosto 2018	S/. 2,690.40
N° 45	Setiembre 2018	S/. 4,208.01
<b>TOTAL I.G.V.</b>		<b>S/. 2,588,830.17</b>

**VALORIZACIÓN TOTAL (INC. REAJUSTES, AMORTIZACIONES E IGV.)**

VALORIZACIÓN	Fecha	Valorizado (Inc. Reaj. ,
--------------	-------	-----------------------------

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

	<b>PERU</b>	Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	CONCURSO PUBLICO N°0001- 2016-FONDEPES CONTRATO N°013-2016- FONDEPES
--	-------------	--------------------------------	--	---

		Amortiz. e IGV)
N°01	Enero 2015	S/. 343,119.33
N°02	Febrero 2015	S/. 554,711.34
N°03	Marzo 2015	S/. 596,305.26
N°04	Abril 2015	S/. 921,184.50
N°05	Mayo 2015	S/. 740,358.43
N°06	Junio 2015	S/. 981,856.22
N°07	Julio 2015	S/. 1,847,304.88
N°08	Agosto 2015	S/. 996,427.93
N°09	Setiembre 2015	S/. 1,460,614.37
N°10	Octubre 2015	S/. 1,258,554.54
N°11	Noviembre 2015	S/. 2,003,897.00
N°12	Diciembre 2015	S/. 1,467,465.45
N°13	Enero 2016	S/. 1,570,032.48
N°14	Febrero 2016	S/. 673,850.35
N°15	Marzo 2016	S/. 646,933.03
N°16	Abril 2016	S/. 243,048.66
N°17	Mayo 2016	S/. 46,397.01
N°18	Junio 2016	S/. 243,849.64
N°19	Julio 2016	S/. 90,576.16
N°20	Agosto 2016	S/. 27,484.65
N°21	Setiembre 2016	S/. 56,138.41
N°22	Octubre 2016	S/. 16,215.11
N°23	Noviembre 2016	S/. 0.00
N°24	Diciembre 2016	S/. 73,005.66

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595907

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

	<b>PERU</b>	Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	CONCURSO PÚBLICO N°0001- 2016-FONDEPES CONTRATO N°013-2016- FONDEPES
--	-------------	--------------------------------	--	---

N°25	Enero 2017	S/. 8,315.26
N°26	Febrero 2017	S/. 8,515.65
N°27	Marzo 2017	S/. 0.00
N°28	Abril 2017	S/. 0.00
N°29	Mayo 2017	S/. 0.00
N°30	Junio 2017	S/. 0.00
N°31	Julio 2017	S/. 0.00
N°32	Agosto 2017	S/. 0.00
N°33	Setiembre 2017	S/. 0.00
N°34	Octubre 2017	S/. 0.00
N°35	Noviembre 2017	S/. 0.00
N°36	Diciembre 2017	S/. 0.00
N°37	Enero 2018	S/. 0.00
N°38	Febrero 2018	S/. 0.00
N°39	Marzo 2018	S/. 1,578.16
N° 40	Abril 2018	S/. 0.00
N° 41	Mayo 2018	S/. 0.00
N° 42	Junio 2018	S/. 29,326.14
N° 43	Julio 2018	S/. 16,938.20
N° 44	Agosto 2018	S/. 17,637.06
N° 45	Setiembre 2018	S/. 27,585.87
<b>TOTAL</b>		<b>S/. 16,971,220.08</b>

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106535997

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

	<b>PERU</b>	Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	CONCURSO PÚBLICO N°0001- 2016-FONDEPES CONTRATO N°013-2016- FONDEPES
---	-------------	--------------------------------	--	---


## b) Control de Adicionales de Obra y/o Deductivo

DESCRIPCIÓN	MONTO	PORCENTAJE DE INCIDENCIA	INCIDENCIA ACUMULADA
Monto contratado	32,457,630.22		
Adicional N° 01	326,464.23	1.01%	1.01%
Adicional N° 02	449,232.12	1.38%	
Deductivo Vinculado N° 01	-450,814.30	-1.39%	1.00%
Adicional N° 03	86,170.63	0.27%	1.27%
Adicional N° 04	579,080.87	1.78%	
Deductivo Vinculado N° 02	-446.29	0.00%	3.05%
Adicional N° 05	446,667.85	1.38%	
Deductivo Vinculado N° 03	-152,971.09	-0.47%	3.95%
Adicional N° 06	1,377,727.34	4.24%	
Deductivo Vinculado N° 4	-242,094.96	-0.75%	7.45%
Adicional N° 07	1,532,420.43	4.72%	12.17%
Deductivo Vinculado N° 5	-620,840.66	-1.91%	10.26%
Adicional N° 08	960,977.20	2.96%	13.22%


## c) Control de Vigencia de Cartas Fianzas

Se anexan las respectivas cartas fianzas vigentes

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO.DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE.-

SANTIAGO DE SURCO, 23-07-2018  
CARTA FIANZA N°: 0011-0380-9800211322-37  
VENCE EL: 07-08-2019

Señor/es:

★ FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración :

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0380-9800211322-37 por : S/57,863.50 (CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 50/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC

Vencimiento : 07-08-2018, a horas de 12 meridiano


Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 25-07-2016, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2019, a horas 12 meridiano.


Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo : el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
p.p.

★  
  
Katherine Alexandra Gotera Postigo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

  
Daniel Mesta Pinillos  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

RUC 20100130204



18072311

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

REFRENDO: 1759818072311  
S/ 57,863.50  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

UA011 - V3 - Junio 2007

S/57,863.50

BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO.DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE.-

SANTIAGO DE SURCO, 23-07-2018  
CARTA FIANZA N°: 0011-0380-9800207198-37  
VENCE EL: 07-08-2019

Señor/es:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración :

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0380-9800207198-37 por : S/8,618.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC.

Vencimiento : 07-08-2018, a horas de 12 meridiano

S/8,618.00


Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 10-12-2016, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2019, a horas 12 meridiano.


Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo : el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
p.p.

  
Katherine Alexandra Coter Postigo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Zmpresas Chacarilla

  
Daniel Mesia Phillips  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106535927

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717  
UAJ11 - V3 - Junio 2007



RUC 20100130204

REFRENDO: 1759818072312CLA0380G/19:33:24  
S/ 8,618.00

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106535927  
PARA CONFORMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909



BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO.DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE.-

SANTIAGO DE SURCO, 23-07-2018  
CARTA FIANZA N°: 0011-0962-9800023996-86  
VENCE EL: 07-08-2019 .

Señor/es:

★ FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración :

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0962-9800023996-86 por : S/32,647.00 (TREINTAIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC.

Vencimiento : 07-08-2018, a horas de 12 meridiano


Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 09-09-2015, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2019, a horas 12 meridiano.


Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo : el vencimiento de la misma.


La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
p.p.

★  
  
Katherine Alexandra Cotera Postigo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

  
Daniel Merla Pinillos  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



18072401

RUC 20100130204

REFRENDO: 1759818072401CLA0962F/10:27:49  
S/ 32,647.00

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

S/ 32,647.00

BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO.DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE.-

SANTIAGO DE SURCO, 23-07-2018  
CARTA FIANZA N°: 0011-0962-9800017155-87  
VENCE EL: 07-08-2019

Señor/es:

★ FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración :

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0962-9800017155-87 por : S/1,947,458.00 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC.

Vencimiento : 07-08-2018, a horas de 12 meridiano

S/1,947,458.00\*\*\*\*\*


Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 15-12-2014, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2019, a horas 12 meridiano.


Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo : el vencimiento de la misma.


La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
p.p.

  
Katherine Alexandra Cotera Postigo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

  
Daniel Mesia Pinillos  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

UA011 - V3 - Junio 2007



18072310

RUC 20100130204

REFRENDO: 1759818072310CLA0962E/18:56:53  
S/ 1,947,458.00

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

LIMA, 31 de Mayo del 2018

Carta Fianza No: 010469195-005 REF.: Carta Fianza No: 010469195-004 del 19/12/2014  
RENOVACION / MODIFICACION Con vencimiento: 15/06/2018

Señores: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES.

Por el presente documento, renovamos la fianza de la referencia con carácter de solidaria, irrevocable, incondicional, indivisible, de realización automática y con renuncia expresa al beneficio de excusión, a favor de ustedes.

Garantizando a: CONSORCIO SAN JOSE INTEGRADO POR: CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L., CORPORACION ARTIS S.A.C., CORPORACION R & E S.A.C.

Hasta la suma de: S/ \*\*\*\*\*1,298,305.21 \*UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO Y 21/100 SOLES

En respaldo de: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA No 038-2014-FONDEPES-DETERMINADA DE LA LICITACION PUBLICA No 004-2014-FONDEPES PRIMERA CONVOCATORIA-CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE.

Sírvase a tomar nota de que; a solicitud de nuestros garantizados, hemos procedido a:

Prorrogar el plazo de vencimiento hasta el 15 de Diciembre de 2018

Por efecto de este compromiso, el BANCO asume con sus fiados las responsabilidades en que éstos llegarán a incurrir, siempre que el monto de las mismas no exceda por ningún motivo la suma antes mencionada y que estén estrictamente vinculadas al cumplimiento de lo arriba indicado.


Dejamos claramente establecido que la presente CARTA FIANZA no podrá ser usada para operaciones comprendidas en la prohibición indicada en el inciso 5 del Artículo 217º de la ley 26702 "Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros"

Cualquier reclamo en virtud de esta garantía deberá ceñirse a lo estipulado por el Art. 1898 del Código Civil y deberá ser formulado por vía notarial, en el horario de atención al público y en nuestra oficina ubicada en:

JR. CARADAYA 543-547 PISO 6 - LIMA \*\*\*\*\*

Dejamos claramente expuesto que, si fuera el caso, el Banco podrá a su elección acogerse a la facultad concedida por el Art. 1237 del Código Civil,

En caso de ejecutarse la presente CARTA FIANZA, el pago será efectuado mediante cheque de gerencia emitido a la orden del beneficiario que el Banco pondrá a su disposición en domicilio antes indicado, el mismo que se le entregará contra devolución del original de la presente CARTA FIANZA. Queda establecido que de no señalarse el monto ejecutado, se entenderá que el requerimiento es por la suma total a la que asciende la presente garantía. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe, se entenderá como renuncia a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago aún cuando el plazo de vencimiento y/o ejecución de esta fianza no hubiese vencido.

  
ROBERTO VALDIZAN GARCIA  
Asistente Senior  
Procesamiento

FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO  
D. SCOTIABANK PERU

Atentamente,

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

ROBERTO ELGUEZ CARRAJA  
Servicios Wholesale Banking

FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO  
D. SCOTIABANK PERU

# CAMBIOS Y /O MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL

  
.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



PERU

Ministerio  
de la ProducciónFondo Nacional de  
Desarrollo PesqueroCONCURSO PÚBLICO N°0001-  
2016-FONDEPESCONTRATO N°013-2016-  
FONDEPESa) **SUSTENTO TECNICO Y BASE LEGAL**

Los informes presentados por esta supervisión están sujetos a la **LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO**.

**Artículo 159.-** Inspector o Supervisor de Obras Durante la ejecución de la obra, debe contarse, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona.

**Artículo 166.-** Valorizaciones y Metrados Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema

a suma alzada, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así obtenido se multiplica por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados, mientras que en el caso de las obras bajo el sistema de suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra. Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. El inspector o supervisor debe revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización. El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este párrafo, las Bases deben establecer el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.

**Artículo 170.-** Procedimiento de ampliación de plazo Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

	PERU	Ministerio de la Producción	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	CONCURSO PÚBLICO N°0001-2018-FONDEPES CONTRATO N°013-2018-FONDEPES
---	------	-----------------------------	---------------------------------------	---

dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista

**Artículo 176.- Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento (15%)** Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad, requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República. La determinación del referido porcentaje incluye los montos acumulados de los mayores metrados que no provengan de una variación del expediente técnico, en contratos a precios unitarios. En el caso de adicionales con carácter de emergencia la autorización de la Contraloría General de la República se emite previa al pago. La Contraloría General de la República cuenta con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo Responsabilidad, para emitir su pronunciamiento, el cual debe ser motivado en todos los casos. El referido plazo se computa a partir del día siguiente que la Entidad presenta la documentación sustentadora correspondiente

#### PRONUNCIAMIENTOS OSCE-RESPECTO A ADICIONALES DE OBRA Y AMPLIACIONES DE PLAZO


##### OPINIÓN N° 073-2014/DTN

Así, una Entidad puede ordenar al contratista la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando estas no se encuentran previstas en el expediente técnico ni en el contrato original y siempre que su ejecución resulte indispensable y/o necesaria para alcanzar la finalidad del contrato; debiendo, para ello, respetar los límites y condiciones antes señalados, y los procedimientos establecidos en los artículos 207 y 208 del Reglamento, según corresponda.


En este punto, es importante precisar que la potestad de ordenar la ejecución de prestaciones adicionales de obra ha sido conferida a la Entidad en reconocimiento de su calidad de garante del interés público, respondiendo, así, al ejercicio de una prerrogativa especial del Estado.

Adicionalmente, es importante considerar que las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándoles los presupuestos deductivos vinculados, superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad, requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República, la misma que debe emitir su pronunciamiento a través del procedimiento establecido en el tercer párrafo y siguientes del artículo 208 del Reglamento.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA



MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
JEFE DE SUPERVISION: Reg. QIR N° 10717  
ALVA ESPINOZA


066

OPINIÓN N° 001-2015/DTN

*En este punto, es importante precisar que, en caso la Entidad apruebe la ampliación del plazo de ejecución de obra, el contratista está obligado a presentar un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERTCPM correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas por la ampliación de plazo concedida, de conformidad con el sexto párrafo del artículo 201 del Reglamento. Sobre el particular, es importante precisar que este nuevo calendario tiene por finalidad adecuar el programa de ejecución de obra del contratista a la extensión del plazo de ejecución de obra originado por la aprobación de la ampliación del plazo.*

*De esta manera, además de detallar el procedimiento de ampliación del plazo, el artículo 201 del Reglamento establece que en caso la Entidad apruebe la ampliación del plazo, el contratista debe presentar un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT CPM correspondiente, considerando, para ello, solo las partidas afectadas por la ampliación del plazo concedida, con la finalidad de adecuar el programa de ejecución de obra al nuevo plazo para la ejecución de la obra.*

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA



.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

**b) PLANOS Y MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL**

- Debido a las incongruencias del expediente técnico elaborado y aprobado por FONDEPES, hubo el desplazamiento de la infraestructura con respecto al terreno.
- En tal sentido, el error de coordenadas de ubicación que genera la alteración nace en la elaboración del Perfil del Proyecto y por ende se arrastra en la elaboración del Expediente Técnico.
- Los planos se vienen modificando de acuerdo a los adicionales de obra, así como deductivos vinculantes o reducciones, los planos totales se presentaran en la liquidación de obra, anexado junto con el contratista.
- No obstante, es bueno indicar que todo Expediente Técnico que licita FONDEPES tiene una revisión por el área responsable de la Entidad en mención para efectos de su aprobación y sin duda que durante el proceso constructivo de obra se ha permitido verificar ausencia de algunas partidas que no se consideraron o surgieron a raíz de las absoluciones de consultas.
- Los adicionales aprobados hasta la fecha son ADICIONAL N° 01, ADICIONAL N° 02, ADICIONAL N° 03, ADICIONAL N° 04, ADICIONAL N° 05, ADICIONAL N° 06, ADICIONAL N°07, ADICIONAL N°08
- Los adicionales. reducciones y deductivos de obra que han sido aprobados han conllevado a la modificación de la ruta crítica, conllevando a las ampliaciones de plazo respectivamente.
- Los planos se vienen modificando de acuerdo a los adicionales de obra, así como deductivos vinculantes o reducciones, los planos totales se presentaran en la liquidación de obra.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA



MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807




ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ESPINOZA  
Reg. SIF N° 10717



# RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

  
.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807


  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Por lo anteriormente expuesto, y considerándose que la Valorización es un pago a cuenta y encontrándose **CONFORME** el monto a Facturar por el Contratista CONSORCIO SAN JOSE.

El monto a Facturar por el Contratista es:

Valorización Bruta de la Valorización N°45 del Contractual – SEPTIEMBRE 2018	S/. 23,972.12
Total Reajuste	S/. 4,696.78
Amortización por Adelanto Directo	S/. 4,794.42
Valorización Neta Sin IGV	S/. 23,377.86
IGV (18%)	S/. 4,208.01
Monto Facturable	S/. 27,585.87

  
 .....  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595807

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

# PANEL FOTOGRAFICO



MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

**PANEL FOTOGRAFICO**




Foto: Supervisor en área de elementos prefabricados (vigas, pilotes, losas)



Foto: Vista de instalación de losas laterales incluyendo acero de anclajes

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595907


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



Foto: Vista parcial del muelle hasta sector actual de avance (eje 127)



Foto: Pilotes prefabricados que serán instalados

  
.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807


  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



Foto: Inspección de trabajos de soldadura de parte de la Supervisión



Foto: Supervisión verificando izaje de viga prefabricada a ser instalada

  
.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595907

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717




Foto: Trabajo de instalación de viga en eje 127

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

COPIA DEL CUADERNO DE OBRA



MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106395807



# CUADERNO DE OBRA

Nº 64

076

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 1847 Del Supervisor 01/09/2018

El contratista está presentando los metrados de avance de la obra, respecto a trabajos correspondientes al presupuesto contractual como al adicional N° 07, los mismos que servirán de sustento de la autorización del mes de Agosto - 2018 de autorizar al contratista a realizar trabajos con autorización oficial a la fecha (Contractual + Adicional 07)

ISAÍAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

Asiento N° 1848 03-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

De solicitud autorización al supervisor de obra para el transporte de 02 pilotes de 45x45 y la viga transversal ubicado en el eje N° 125, estos trabajos comprenden al presupuesto contractual.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

Asiento N° 1849 Del Supervisor 03/09/2018

Se autoriza transportar pilotes y viga transversal prefabricados hacia los ejes del muelle que se viene trabajando, comprendidos dentro del presupuesto contractual

ISAÍAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

Asiento N° 1850 04-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

De solicitud autorización al supervisor de obra para el hincado del pilote vertical de 45x45 ubicado en el eje N° 125, después el respectivo dragado para la colocación de la viga transversal, estos trabajos comprenden al adicional N° 07 y presupuesto contractual.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ISAÍAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

093

# CUADERNO DE OBRA

Nº 65

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

077

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Acuerdo N° 1851 del supervisor 04/09/2018  
Se autoriza al contratista a realizar los trabajos que se  
pueden en el frente anterior.

Sin embargo se dejó constancia que los avances son lentos  
teniendo en cuenta que el adicional 07, viene siendo reformu-  
lado, no teniendo un informe integral a la fecha

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

Acuerdo N° 1852 05-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA  
Se solicita autorización al supervisor de obra para el transporte y colocación de  
02 losas numeradas Tipo IV comprendiente entre los ejes 124-125 como se muestra  
de los pilotes de 45x45 para el hundido de los pilotes inclinados en el núcleo  
del 124-125.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO  
Reg. CIP N° 22006

Acuerdo N° 1853 del supervisor 05/09/2018

Se autoriza al contratista a realizar los trabajos solicitados  
los mismos que corresponden al presupuesto contractual, se que  
pendiente la autorización integral de FONDEPES respecto a las  
modificaciones del adicional 07

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

Acuerdo N° 1854 06-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA  
Se comunica al supervisor de obra que a la fecha no podemos realizar los trabajos de  
07.03.05 JUSTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES y 07.03.07 LOSAS VAGADAS IN SITU a causa  
de no haber recibido la carta N° 702-2018-FONDEPES/DIGENIPAA por parte de FONDEPES don-  
de están adjuntando la memoria de cálculo estructural para el puente de acceso y el  
plano EP-07, la carta SN-2018-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 05/07/2018 donde se  
incluye adjunta documentos para la optimización del trazo de puente de acceso del

CONTINUAR

ING. INSPECTOR

CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
ING. RESIDENTE  
Reg. CIP N°

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL

094

# CUADERNO DE OBRA

Nº 66

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_ 078  
OBRA: \_\_\_\_\_  
PROYECTO: \_\_\_\_\_  
PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Viene Aconte N° 1854 06-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

muelle comprendidos entre los ejes 112 al 119 adjuntando el plano EP-08 y la carta N° 914-2018-FONDEPES/DIGENPAA donde la entidad adjunta documentos para la optimización del tramo de puente de acceso del muelle comprendidos entre los ejes 120 al 127 adjuntando el plano EP-09 y memoria de cálculo. Los costos mencionados líneas arriba y los planos EP-07, EP-08 y EP-09 obedecen a trabajos adicionales (PILOTES INCLINADOS) que serán ejecutados una vez la entidad apruebe el presupuesto, sin embargo comunicamos que por proceso constructivo se está interfiriendo con la ejecución de los trabajos contractuales y además son costosos según el menogranario actualizado vigente por esa razón dejamos como antecedentes que a la fecha se están generando atrasos en el cumplimiento de nuestro contrato por causas no atribuibles al contratista señalado en el artículo N° 201 del RLCE.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO CIVIL

Aconte N° 1855

Del Supervisor

06/09/2018

El contratista ha efectuado el recuento de hechos que se viene sucediendo respecto a las comunicaciones de la Entidad, respecto a la reunión del día 07, que se adoptaran a futuro, pero no oficializadas formalmente para que se pueda efectuar los trabajos de manera INTEGRAL.

José Alva

Aconte N° 1856 07-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA SAIAJES JORGE ALVA ESPINOZA

INGENIERO CIVIL

Se comunica al supervisor de obra que se aprueba un inventario de zona de trabajo lo cual ha ocasionado la penalización de los pontones de MANIOBRA DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS FUENTES hasta que condiciones climatológicas sean las óptimas para continuar con los trabajos sobre mar. La información respecto a este inventario comprende al AVISO ESPECIAL N° 56 emitido por la marina de guerra del Perú a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación.

José Alva

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

SAIAJES JORGE ALVA ESPINOZA

INGENIERO CIVIL

095

# CUADERNO DE OBRA

Nº 67

079

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Aviso N° 1857 del Supervisor 08/09/2018

En días anteriores se ha presentado variaciones significativas en el oleaje del mar, que por razones de seguridad, se ha restringido algunas maniobras.

Estas variaciones han sido confirmadas y comunicadas por la Marina de Guerra del Perú a todo el litoral.

Estamos a 30 días del vencimiento del plazo contractual, así que se haya aprobado las modificaciones del contrato 07

*[Signature]*

Aviso N° 1858 10-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA INGENIERO CIVIL

Se comunica al supervisor de obra que continúa el incremento de oleaje sobre la zona de trabajo lo cual ha ocasionado la paralización de las partidas de MANIOBRAS DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS PUENTES hasta que condiciones climatológicas sean las óptimas para continuar con los trabajos sobre mar.

La información respecto a este incremento corresponde al AVISO ESPECIAL N° 57 emitido por la marina de guerra del Perú a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ INGENIERO

Aviso N° 1859 del Supervisor

El incremento del oleaje y vientos significativos continúan a la fecha, lo que repercute en el avance de los trabajos, que vienen siendo limitados, al no oficializarse el nuevo Adicional que complementará el contrato 07

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 10717

Aviso N° 1860 13-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se comunica al supervisor de obra que continúa el incremento de oleaje sobre la zona de trabajo lo cual ha ocasionado la paralización de las partidas de MANIOBRAS DE COLOCACION

CONTINUA

ING. INSPECTOR

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CIP 10717 INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 22856

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 10717

# CUADERNO DE OBRA

Nº 68

080

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Vidua Arinto Nº 1860 13-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se HINCADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS Puentes hasta que condiciones climatológicas sean los óptimos para continuar con los trabajos sobre mar.

La información respecto a este invariente corresponde al aviso especial Nº 58 emitido por la marina de guerra del Perú a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO  
Reg. CIP Nº 10717

Acrevto Nº 1857 del Supervisor

Se mantienen las condiciones meteorológicas desde días anteriores, lo que viene restringiendo el avance de los trabajos limitados que viene realizando el contratista.

Teniendo en cuenta que el plazo contractual vence el 06/10/2018 dicho plazo se incrementará por las faltas anteriormente mencionadas.

Arinto Nº 1862 18-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

ISAÍAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 10717

Se solicita autorización al supervisor de obra para el transporte de 02 pilotes de 45x45 que será colocado en el eje Nº 126, estos trabajos corresponden al presupuesto contractual.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO  
Reg. CIP Nº 10717

Acrevto Nº 1863 del Supervisor

Se autoriza al contratista al transporte de pilotes que serán hincados en el eje 126.

Los trabajos que se viene realizando son difíciles, teniendo en cuenta que colateralmente deben ejecutarse trabajos complementarios en el muelle que por disposiciones legales no pueden realizarse, mientras no se presente con la autorización oficial.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO  
ING. RESIDENTE

ING. INSPECTOR

ISAÍAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO SUPERVISOR  
Reg. CIP Nº 10717

097

# CUADERNO DE OBRA

Nº 69

081

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Acuerdo N° 1864 20-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

se solicita autorización al supervisor de obra para el hinado del pilote vertical de 45x45 ubicado en el eje N° 126, después el respectivo desdoblado para la colocación de la viga transversal, estos trabajos comprenden el adicional 107 y presupuesto contractual.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

Acuerdo N° 1865 del supervisor 20/09/2018

se autoriza trabajos solicitados por el contratista.

En la fecha la supervisión hace entrega de la Carta U-079-SUPER-SJOSE-2018 en la que se solicita el pago de \$199,966.06 por conceptos de servicios por ampliaciones de plazo que se encuentran en proceso.

ISAÍAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

Acuerdo N° 1866 21-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

se solicita autorización al supervisor de obra para el transporte y colocación de 02 losos numerados Tipo II comprendente entre los ejes 125-126 con el traslado de 4 pilotes de 45x45 para el hinado de los pilotes verticales (02 und) en el eje 127 y (02 und) en el eje 128.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

Acuerdo N° 1867 del supervisor 21/09/2018

se autoriza al contratista ejecutar los trabajos solicitados en el acuerdo anterior.

se dejó constancia que los pilotes, vigas y losas prefabricadas hace tiempo, han visto comprometidos parcialmente el acero de suclape actualmente expuesto, razón por la cual se está exigiendo su limpieza superficial y adición de epóxicos que detengan el proceso de oxidación.

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE  
Reg. CIP N° 22858

ISAÍAS JORGE ALVA ESPINOZA  
ING. SUPERVISOR  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

088

# CUADERNO DE OBRA

Nº 70

082

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento Nº 1868 22-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita autorización al supervisor de obra para el desdoblado de pilotes del eje 127 y 128 como también el transporte y colocación de vigas en los ejes 127-128 como el vaciado de concreto.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 22868

Asiento Nº 1869 Del Supervisor 22/09/2018

Se autoriza al contratista realizar los trabajos policitados, adoptando las medidas de seguridad tanto de los equipos, así como la de los trabajadores con todas las medidas de seguridad en el desempeño de sus labores.

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 10717

Asiento Nº 1870 24-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA Reg. CIP Nº 10717

Se solicita autorización al supervisor de obra para el transporte y colocación de 02 lemas normales tipo IV comprendente entre los ejes 126-127 como el traslado de 2 pilotes de 45x45 para el hincado de los pilotes verticales en el eje 129, como traslado y colocación de la viga transversal en el eje 129.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 22868

Asiento Nº 1871 Del Supervisor 25/09/2018

Se autoriza trabajos policitados por el contratista, recomendando continuamente adoptar las medidas de seguridad del personal y equipos que vayan utilizándose.

A la fecha no se cuenta con el expediente oficial del Jefe de Obra que contenga todas las modificaciones del personal O.T. lo que viene influyendo en el desarrollo normal de los trabajos.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 22868  
ING. RESIDENTE

ING. INSPECTOR

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 10717

099

# CUADERNO DE OBRA

Nº 71

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_ 083

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento Nº 1872 26-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita autorización al supervisor de obra para el transporte e hincado de 02 pilotes inclinados de 45x45 para el núcleo entre los ejes 128-129 como su respectivo plano detallado, trabajos comprenden al adicional Nº 7 y presupuesto contractual.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 22658

Acepto Nº 1873 del Supervisor

Se autoriza los trabajos solicitados por el contratista en el Asiento anterior.

Se recibe una vez más que los trabajos vienen desarrollándose con lentitud, debido a la demora, en la aprobación del nuevo Adicional.

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL

Asiento Nº 1874 27-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA Reg. CIP Nº 10717

Se solicita autorización al supervisor de obra para el transporte e hincado de 02 pilotes inclinados de 45x45 para el núcleo entre los ejes 128-129 como su respectivo plano detallado, trabajos comprenden al adicional Nº 7 y presupuesto contractual.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 22658

Acepto Nº 1875

27/09/2018

Se autoriza al contratista a realizar los trabajos que solicita en el Asiento anterior.

Se deja constancia que a diez (10) días del vencimiento del plazo contractual, sin no hay PRONOVASIMIENTO oficial de FONDEPES, respecto al nuevo Adicional que complementará los trabajos en el HUELLE, de manera que se pueda avanzar la obra de manera ordenada y coherente.

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

Reg. CIP Nº 22658

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
ING. SUPERVISOR  
INGENIERO CIVIL

Reg. CIP Nº 10717

100



# CUADERNO DE OBRA

Nº 72  
084

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
OBRA: \_\_\_\_\_  
PROYECTO: \_\_\_\_\_  
PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asunto Nº 1876 28-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita autorización al supervisor de obra para el transporte e hincado de 04 pilotes inclinados de 45x45 pilote para el núcleo entre los ejes 126-127 como su respectivo desahogado, trabajos comprenden al adicional Nº 07 y presupuesto contractual.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO  
Reg. CIP Nº 12356 28/09/2018

Decreto N° 1877 del Supervisor  
Se autoriza realizar trabajos solicitados por el contratista, los mismos que corresponden al presupuesto contractual y/o al adicional 07.

Se viene adoptando las medidas de seguridad del personal en forma de los equipos que se viene utilizando.

Asunto Nº 1878 29-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita autorización al supervisor de obra para el ductado de los 02 pilotes hincado en el núcleo 126-127 como el ductado del los lotes remados comprendiente al mismo núcleo.

También se requiere autorización para el traslado e hincado de 02 pilotes verticales de 45x45 en el eje 130 con su respectiva colocación de mesa transversal, trabajos comprenden al adicional Nº 07 y presupuesto contractual.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO  
Reg. CIP Nº 12356

Decreto N° 1879 del Supervisor 29/09/2018

Se autoriza trabajos solicitados por el contratista, dejando constancia que desde que se aprobó el adicional 07 hasta la fecha no se ha podido realizar trabajos desde el eje 104 al 130 debido a la demora en la aprobación total de los trabajos a realizar en todo el Muelle, como consecuencia de las modificaciones.

ING. INSPECTOR

CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO  
Reg. CIP Nº 12356  
ING. RESIDENTE

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 10717

# CUADERNO DE OBRA

Nº 73

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_ 085

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Ambito nº 1880 30-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita autorización al supervisor de obra para el traslado de los lora remados entre los ejes 129-130 como también el traslado e hincado de 02 pilotes verticales correspondientes al eje 131 y como el desahogado y colocación de la riga transversal y los lora remados, correspondiente al mismo núcleo.

También se requiere autorización para el traslado e hincado de 02 pilotes verticales de 45x45 m en el eje 130 con su respectiva colocación de riga transversal, trabajos comprenden al adicional nº 07 y presupuesto contractual.

Se detallan los metrados convalidados con el supervisor de obra, correspondiente a la valoración contractual nº 45 - Setiembre del 2018, solicitando su trámite respectivo ante la entidad:

ITEM	DESCRIPCION
07	Obras en mar
07.04	Cabezo L=50.00m
07.04.07	Maniobra de colocación e hincado de pilotes, rigas y lora puntos
07.04.07.01	Transporte de pilote
07.04.07.03	Transporte de lora remada
07.04.07.06	Desahogado de pilotaje
07.04.07.07	Colocación de riga transversal
07.04.07.08	Colocación de lora remada

Así mismo se detallan los metrados convalidados con el supervisor de obra correspondiente a la valoración nº 07 del Adicional nº 07 - Setiembre del 2018, aprobado con resolución Jefatural nº 025-2018-FONDEPES/3, solicitando su trámite respectivo ante la entidad:

ITEM	DESCRIPCION
01.	Refuerzo de pilote con riel de 80 lb/yd
01.01	Obras en mar
01.01.01	Maniobra de colocación e hincado de pilotes, rigas y lora puntos
01.01.01.03	Hincado de pilote en suelo compacto

CARE DE ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CI

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

102

# CUADERNO DE OBRA

Nº 74

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

086

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_


Acuerdo N° 1881


del Supervisor

30/09/2018

El contratista está presentando un listado de partidas ceses pendientes al contrato principal, así como al Adicional 07 cuyos metros serán evaluados previamente antes de formular la valoración correspondiente.

Es indudable que la obra se encuentra ATRASADA, debido a la demora de la Entidad en definir y aprobar INTERESAMENTE los trabajos complementarios a realizar en el HUELLE, lo que permitirá un avance sostenido los trabajos hasta su totalidad.

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

# CONSORCIO SAN JOSE

CARTA N°067 - 2018 - CSJ/CO

San José, 30 de Setiembre del 2018

ATENCIÓN : **MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO**  
Ing. **ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
**SUPERVISOR DE OBRA**

**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

Recibido  
30/09/2018

ASUNTO : **ENTREGA DE VALORIZACIÓN N° 45 – SETIEMBRE 2018**

REFERENCIA : - **CONTRATO N°082-2014-FONDEPES/OGA**  
**ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N°004-2014-FONDEPES-DERIVADA DE**  
**LA LICITACIÓN PÚBLICA N°004-2014-FONDEPES/OGA**  
**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO**  
**HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE**  
**LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"**

Presente.-

Mediante la presente nos dirigimos a ustedes a fin de saludarlos y a la vez presentar la Valorización N°45 contractual de la Obra: "**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE**", así mismo solicitamos el pago respectivo, para lo cual adjuntamos los siguientes documentos:

- Ficha técnica
- Memoria descriptiva
- Resumen de Valorización N°45
- Valorización N°45
- Curva S
- Planilla de metrados valorizados
- Panel fotográfico
- Contrato de obra (copia)
- Acta de entrega de terreno (copia)
- Póliza de seguro complementario por trabajo de riesgo y salud
- Constancia de No estar inhabilitado para contratar con el estado
- Constancia de capacidad de libre contratación
- Carta Fianza correspondiente al Adelanto Directo
- Carta de fiel cumplimiento (copia)
- Contrato de consorcio (copia)
- Cuaderno de obra (copia)
- Rentas
- Planillas
- Pago a CONAFOVICER
- Pago a SENCICO
- Cuaderno de obra (copia)


Son 01 archivador original y 02 archivadores copia cada uno con folios  
Agradeciendo la atención que sirvan brindar a la presente quedamos de Uds.

Atentamente,

CONSORCIO SAN JOSE  
Emiliano Isaac Trujillo Luna  
Representante Legal Común

# CONSORCIO SAN JOSE


## VALORIZACIÓN N°45 CONSORCIO SAN JOSÉ



**OBRA: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"**

**LAMBAYEQUE – PERÚ**

**2018**

  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22658

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

# Ficha Técnica



CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 45 DE OBRA	Fecha: Setiembre - 2018
		Página: 1 de 15

**FICHA TÉCNICA**

**1. DATOS GENERALES**

Obra : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE".

Entidad a Convocante : FONDEPES

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

Sistema de Contratación : Precios Unitarios

Monto Referencial : S/. 33'504,650.56

Monto Contratado : S/. 32'457,630.22 (Inc. IGV)

Incidencia Porcentual Acumulada : 61.57%

Fecha de Valor Referencial : Junio 2014

Plazo de ejecución de la Obra : 1,360 días calendarios

Contratista Principal : CONSORCIO SAN JOSE

Representante legal : Ing. Emiliano Isaac Trujillo Luna

Licitación : Adjudicación de Menor Cuantía N° 38-2014-FONDEPES derivada de la Licitación Pública N° 004-2014-FONDEPES.

Contrato : CONTRATO N° 082-2014-FONDEPES/OGA

Entrega de terreno : 14 de Enero 2015

Inicio Contractual de obra : 15 de Enero 2015

Inicio Real de obra : 15 de Enero 2015


Fin Contractual de obra : 17 de Marzo del 2018

Entrega Adelanto Directo : S/. 6'491,526.04 (INC. IGV)  
(09 de Enero. del 2015)

Residente de Obra : Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros  
CIP. 22858

Supervisor de Obra : Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza  
CIP. 10717

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**2. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO EN OBRA**

Durante el desarrollo de los trabajos que contemplan la presente obra se utilizaran los siguientes equipos:

- 01 Grúa de 30 Ton.
- 01 Grúa de 65 Ton.
- 01 Martillo Delmag 25-32
- 01 Cargador Frontal
- 01 Camiones con Carreta
- 01 Mini cargador
- 01 Cisterna
- 02 Nivel de Ingeniero
- 02 Mira y Jalones
- 01 Teodolito
- 01 Mixer
- Herramientas manuales varias (lampas, picos, buggies).

**2.1 RELACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA**

Durante la ejecución de la obra el personal que laborará es el siguiente:


**2.1.1 Personal Profesional Propuesto**

- 01 Gerente de Proyecto : Ing. Julio César Incio Carrillo
- 01 Ing. Residente de Obra : Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros
- 01 Administrador de Obra : Ing. Ludwig Benito Retamozo Martínez
- 01 Asistente de Residente de Obra : Ing. Richard Javier Tapia Rosazza
- 01 Asistente de Residente de Obra : Ing. Jorge Antonio Vidal Navarrete
- 01 Especialista en Estructuras : Ing. Romer Iván Lovon Dávila
- 01 Esp. en Mecánica de Suelos : Ing. Fidel Juvenal Ramírez Aguilar
- 01 Esp. en Seguridad de Obra : Ing. Eddy Solano Espinoza Escalante
- 01 Especialista en Sanitarias : Ing. Chong Tang Julio Tay Wo
- 01 Esp. en Metrados y Valorizaciones : Ing. Jhonny Alan Huamán Porlles

**2.1.2 Personal Técnico**

- 01 Almacenero : Sr. Luis Saire Quilca
- 04 Guardianes : Sr. Santos Hipólito Muñoz Silva
- : Sr. Christian Alex Montalvo Valera
- : Sr. José Neiro Lozano Carrasco
- 01 Topógrafo : Sr. Jorge Luis Díaz Ruiz

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22358





CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 45 DE OBRA	Fecha: Setiembre - 2018
		Página: 3 de 15

- 01 Asistente de Ingeniería : Sr. Rojer Job Navarro Tello  
 01 Asistente Contable : Srta. Camani Lobaton María Elena

## 2.2 PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN

### 2.2.1 Personal Profesional

- 01 Jefe de supervisión : Ing. Isaías Jorge Alva Espinoza

## 3. DESARROLLO PORCENTUAL DEL AVANCE DE LA OBRA

**OBRA:** "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"

### 3.1.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LA ZONA:

Departamento : Lambayeque  
 Provincia : Lambayeque  
 Distrito : San José

El Desembarcadero Pesquero Artesanal San José, se encuentra ubicado en la Caleta San José (área rural), políticamente pertenece a la Región de Lambayeque, Provincia de Lambayeque, Distrito de San José, forma parte de la infraestructura de protección permanente a la capacidad productora de los pescadores de San José.

### 3.1.2 MONTO CONTRATADO (CON PRECIOS AL MES DE JUNIO 2014)

Monto	27'506,466.29
I.G.V. (18%)	4'951,163.93
Total	<b>S/. 32'457,630.22</b>

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

### 3.1.3 INICIO DE OBRA

- Con fecha 24 de diciembre se firmó el CONTRATO N°082-2014-FONDEPES/OGA entre FONDEPES y el CONSORCIO SAN JOSE.
- El adelanto directo se entregó con fecha 09 de enero del 2015


  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717


CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 45 DE OBRA	Fecha: Setiembre - 2018
		Página: 4 de 15

3. La entidad entregó expediente técnico con CARTA 008-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 07 de enero, el cual fue recepcionado el 07 de enero por el CONSORCIO SAN JOSE.
4. La entidad con CARTA 0012-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 8 de enero 2015, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el 09 de enero del 2015, comunicaron la designación de la supervisión del CONSORCIO SAN FRANCISCO, indicando que el Supervisor encargado es el Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia, y que iniciaba sus funciones el mismo día con que se emitió la carta, así mismo los datos para comunicación con el supervisor.
5. Con CARTA N° 0014-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 08 de enero, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el día 09 de enero notificaron la designación del representante de FONDEPES para el acto de entrega de terreno.
6. Con CARTA N° 0015-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 08 de enero, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el día 09 de enero, notificaron la entrega de terreno para el miércoles 14 de Enero del 2015, a horas 12:00.
7. El 09 de Enero del 2015 se realiza la recepción del Adelanto Directo.
8. El día 14 de Enero del 2015 se realizó la entrega del terreno, mediante acta entre el Supervisor de Obra, el Ing. Residente, representante de FONDEPES.
9. El 15 de Enero del 2015 se inició el plazo contractual para la obra.
10. Se recibió la resolución N° 025-2018-FONDEPES/J el día 09/03/2018 aprobando y autorizando la ejecución de la prestación del Adicional N°07 por tanto se da inicio a los trabajos de las partidas contractuales.
11. Con carta N° 702-2018-FONDEPES/DIGENIPAA la entidad nos alcanza el plano EP-07 y la memoria de cálculo del tramo comprendido entre el eje 104 y 111 con modificación del proceso constructivo que genera un atraso importante en la ejecución.
12. Con carta s/n -2018-FONDEPES/DIGENIPAA la entidad nos alcanza el plano EP-08 y la memoria de cálculo del tramo comprendido entre el eje 112 y 119 con modificación del proceso constructivo que genera un atraso importante en la ejecución.

#### 3.1.4 SITUACION ACTUAL:

Al mes de Setiembre del 2018, se ha ejecutado el 61.87 %, contra un Avance Programado del 78.04 %, por lo tanto se encuentra al atrasada de acuerdo al cronograma vigente el cual será sincerado y presentado a la entidad la nueva programación correspondiente a la ampliación de plazo que correspondería al adicional por los trabajos de optimación que la entidad comunico en las cartas señaladas líneas arriba y que serán ejecutados cuando la entidad apruebe y autorice su ejecución mediante resolución.

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 45 DE OBRA	Fecha: Setiembre - 2018
		Página: 5 de 15

Mes de Valorización	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado
Setiembre 2018		
Valorización N° 45	78.04 %	61.87 %

En el avance mensual se detalla lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	DETALLE
	<b>LOSAS EN MAS</b>		
<b>7.03</b>	<b>MUELLE DE ESPIGON L=950 m</b>		
<b>07.03.04</b>	<b>Nucleos llenados en situ</b>		
07.03.04.01	Concreto en Nucleos Fc'= 280 kg/cm2	m3	
07.03.04.02	Encofrado y desencofrado en Nucleos	m2	
07.03.04.03	Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm <sup>2</sup>	kg	
<b>07.03.05</b>	<b>Juntas Longitudinales y Transversales</b>		
07.03.05.01	Concreto en Viga Mandil Fc=280 Kg/cm2	m3	-
07.03.05.02	Encofrado y desencofrado en Viga Mandil	m2	-
07.03.05.03	Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm <sup>2</sup>	kg	-
<b>07.03.06</b>	<b>Sardineles llenados en situ</b>		
07.03.06.01	Concreto en Sardinel Fc=280 Kg/cm2	m3	
07.03.06.02	Encofrado y desencofrado en Sardineles	m2	
07.03.06.03	Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm <sup>2</sup>	kg	
<b>07.03.07</b>	<b>Losas Vaciadas in Situ</b>		
07.03.07.01	Concreto en Losas Fc=280 Kg/cm2	m3	
07.03.07.02	Encofrado y desencofrado en Losas	m2	
07.03.07.03	Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm <sup>2</sup>	kg	
<b>07.04</b>	<b>CABEZO L= 50.00 m</b>		
<b>07.04.07</b>	<b>Maniobra de Colocacion e Hincado de Pilotas, Vigas y Losas: Puentes</b>		
07.04.07.01	Transporte de Pilote	Und	22.00
07.04.07.02	Transporte de Viga Transversal	Und	-
07.04.07.03	Transporte de Losa Nervada	Und	12.00
07.04.07.06	Descabezado de Pilotaje	Und	22.00
07.04.07.07	Colocacion de Viga Transversal	Und	8.00
07.04.07.08	Colocacion de Losa Nervada	Und	12.00

### VALORIZACION DE OBRA N° 45 - SETIEMBRE 2018

#### 4. CONTROL ECONÓMICO DEL CONTRATO

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

#### 4.1 VALORIZACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL

Al mes de Setiembre del 2018, se está tramitando la Valorización N° 45 de los trabajos ejecutados acumulado al 61.87 %, presentando el siguiente detalle:

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

VALORIZ.	FECHA	VALORIZADO (Sin I.G.V.)
N° 01	Al 31 de Enero 2015	S/. 358,268.22
N° 02	Al 28 de Febrero 2015	S/. 555,717.9
N° 03	Al 31 de Marzo 2015	S/. 593,994.45
N° 04	Al 30 de Abril 2015	S/. 925,177.18
N° 05	Al 31 de Mayo 2015	S/. 753,732.22
N° 06	Al 30 de Junio 2015	S/. 985,329.63
N° 07	Al 31 de Julio 2015	S/. 1,865,453.02
N° 08	Al 31 de Agosto 2015	S/. 1,054,927.09
N° 09	Al 30 de Setiembre 2015	S/. 1,429,170.33
N° 10	Al 31 de Octubre 2015	S/. 1,285,746.48
N° 11	Al 30 de Noviembre 2015	S/. 2,011,031.83
N° 12	Al 31 de Diciembre 2015	S/. 1,389,920.39
N° 13	Al 31 de Enero 2016	S/. 1,517,495.69
N° 14	Al 29 de Febrero 2016	S/. 667,975.68
N° 15	Al 31 de Marzo 2016	S/. 621,544.65
N° 16	Al 30 de Abril 2016	S/. 240,541.06
N° 17	Al 31 de Mayo 2016	S/. 67,518.42
N° 18	Al 30 de Junio 2016	S/. 238,908.88
N° 19	Al 31 de Julio 2016	S/. 87,581.78
N° 20	Al 31 de Agosto 2016	S/. 26,733.49
N° 21	Al 30 de Setiembre 2016	S/. 54,654.58
N° 22	Al 31 de Octubre 2016	S/. 15,754.74
N° 23	Al 30 de Noviembre 2016	S/. 0.00
N° 24	Al 31 de Diciembre 2016	S/. 68,223.57
N° 25	Al 31 de Enero 2017	S/. 106,056.42
N° 26	Al 28 de Febrero 2017	S/. 11,543.86
N° 27	Al 31 de Marzo 2017	S/. 0.00
N° 28	Al 30 de Abril 2017	S/. 0.00
N° 29	Al 31 de Mayo 2017	S/. 0.00
N° 30	Al 30 de Junio 2017	S/. 0.00
N° 31	Al 31 de Julio 2017	S/. 0.00

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858



CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 45 DE OBRA	Fecha: Setiembre - 2018
		Página: 7 de 15

N° 32	Al 31 de Agosto 2017	S/. 0.00
N° 33	Al 30 de Setiembre 2017	S/. 0.00
N° 34	Al 31 de Octubre 2017	S/. 0.00
N° 35	Al 30 de Noviembre 2017	S/. 0.00
N° 36	Al 31 de Diciembre 2017	S/. 0.00
N° 37	Al 31 de Enero 2018	S/. 0.00
N° 38	Al 28 de Febrero 2018	S/. 0.00
N° 39	Al 31 de Marzo 2018	S/. 3,091.79
N° 40	Al 30 de Abril 2018	S/. 0.00
N° 41	Al 31 de Mayo 2018	S/. 0.00
N° 43	Al 31 de Julio 2018	S/. 15,893.61
N° 44	Al 31 de Agosto 2018	S/. 16,519.87
N° 45	Al 30 de Setiembre 2018	S/. 23,972.12
<b>TOTAL VALORIZADO (SIN IGV)</b>		<b>S/. 17,018,392.26</b>

#### 4.2 REAJUSTE DE LA VALORIZACIÓN

VALORIZACIÓN N° 45	FECHA	K Reaj.	Reajuste
<b>SUB PRESUPUESTO N° 07 Obras en mar</b>	Al 30 de Setiembre del 2018	K = 1.140	S/. 4,696.78
<b>TOTAL REAJUSTE (SIN IGV)</b>			<b>S/. 4,696.78</b>

#### 4.3 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)

El I.G.V. afectado a la valorización efectuado por el Contratista a la fecha ha sido el siguiente:


VALORIZACIÓN	Fecha	I.G.V. (18%)
N° 01	Enero 2015	S/. 52,340.24
N° 02	Febrero 2015	S/. 84,616.98
N° 03	Marzo 2015	S/. 90,961.82
N° 04	Abril 2015	S/. 140,519.67

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

ISAÍAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 45 DE OBRA	Fecha: Setiembre - 2018
		Página: 8 de 15

N° 05	Mayo 2015	S/. 112,936.03
N° 06	Junio 2015	S/. 149,774.68
N° 07	Julio 2015	S/. 281,792.27
N° 08	Agosto 2015	S/. 151,997.48
N° 09	Setiembre 2015	S/. 222,805.58
N° 10	Octubre 2015	S/. 191,982.90
N° 11	Noviembre 2015	S/. 305,679.20
N° 12	Diciembre 2015	S/. 223,850.66
N° 13	Enero 2016	S/. 239,496.48
N° 14	Febrero 2016	S/. 102,790.73
N° 15	Marzo 2016	S/. 98,684.70
N° 16	Abril 2016	S/. 37,075.22
N° 17	Mayo 2016	S/. 7,077.51
N° 18	Junio 2016	S/. 37,197.40
N° 19	Julio 2016	S/. 13,816.70
N° 20	Agosto 2016	S/. 4,192.57
N° 21	Setiembre 2016	S/. 8,563.49
N° 22	Octubre 2016	S/. 2,473.49
N° 23	Noviembre 2016	S/. 0.00
N° 24	Diciembre 2016	S/. 11,136.46
N° 25	Enero 2017	S/. 1,268.43
N° 26	Febrero 2017	S/. 1,299.00
N° 27	Marzo 2017	S/. 0.00
N° 28	Abril 2017	S/. 0.00
N° 29	Mayo 2017	S/. 0.00
N° 30	Junio 2017	S/. 0.00
N° 31	Julio 2017	S/. 0.00
N° 32	Agosto 2017	S/. 0.00
N° 33	Setiembre 2017	S/. 0.00
N° 34	Octubre 2017	S/. 0.00
N° 35	Noviembre 2017	S/. 0.00


  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 45 DE OBRA	Fecha: Setiembre - 2018
		Página: 9 de 15

N° 36	Diciembre 2017	S/. 0.00
N° 37	Enero 2018	S/. 0.00
N° 38	Febrero 2018	S/. 0.00
N° 39	Marzo 2018	S/. 240.74
N° 40	Abril 2018	S/. 0.00
N° 41	Mayo 2018	S/. 0.00
N° 42	Junio 2018	S/. 4,473.48
N° 43	Julio 2018	S/. 2,583.79,
N° 44	Agosto 2018	S/. 2,690.40
N° 45	Setiembre 2018	S/. 4,208.01
<b>TOTAL I.G.V.</b>		<b>S/. 2,588,830.17</b>


#### 4.4 VALORIZACIÓN TOTAL (INC. REAJUSTES, AMORTIZACIONES E IGV.)


VALORIZACIÓN	Fecha	Valorizado (Inc. Reaj. , Amortiz. e IGV)
N°01	Enero 2015	S/. 343,119.33
N°02	Febrero 2015	S/. 554,711.34
N°03	Marzo 2015	S/. 596,305.26
N°04	Abril 2015	S/. 921,184.50
N°05	Mayo 2015	S/. 740,358.43
N°06	Junio 2015	S/. 981,856.22
N°07	Julio 2015	S/. 1,847,304.88
N°08	Agosto 2015	S/. 996,427.93
N°09	Setiembre 2015	S/. 1,460,614.37
N°10	Octubre 2015	S/. 1,258,554.54
N°11	Noviembre 2015	S/. 2,003,897.00
N°12	Diciembre 2015	S/. 1,467,465.45
N°13	Enero 2016	S/. 1,570,032.48
N°14	Febrero 2016	S/. 673,850.35
N°15	Marzo 2016	S/. 646,933.03
N°16	Abril 2016	S/. 243,048.66

  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22358

CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 45 DE OBRA	Fecha: Setiembre - 2018
		Página: 10 de 15

N°17	Mayo 2016	S/. 46,397.01
N°18	Junio 2016	S/. 243,849.64
N°19	Julio 2016	S/. 90,576.16
N°20	Agosto 2016	S/. 27,484.65
N°21	Setiembre 2016	S/. 56,138.41
N°22	Octubre 2016	S/. 16,215.11
N°23	Noviembre 2016	S/. 0.00
N°24	Diciembre 2016	S/. 73,005.66
N°25	Enero 2017	S/. 8,315.26
N°26	Febrero 2017	S/. 8,515.65
N°27	Marzo 2017	S/. 0.00
N°28	Abril 2017	S/. 0.00
N°29	Mayo 2017	S/. 0.00
N°30	Junio 2017	S/. 0.00
N°31	Julio 2017	S/. 0.00
N°32	Agosto 2017	S/. 0.00
N°33	Setiembre 2017	S/. 0.00
N°34	Octubre 2017	S/. 0.00
N°35	Noviembre 2017	S/. 0.00
N°36	Diciembre 2017	S/. 0.00
N°37	Enero 2018	S/. 0.00
N°38	Febrero 2018	S/. 0.00
N°39	Marzo 2018	S/. 1,578.16
N° 40	Abril 2018	S/. 0.00
N° 41	Mayo 2018	S/. 0.00
N° 42	Junio 2018	S/. 29,326.14
N° 43	Julio 2018	S/. 16,938.20
N° 44	Agosto 2018	S/. 17,637.06
N° 45	Setiembre 2018	S/. 27,585.87
<b>TOTAL</b>		<b>S/. 16,971,220.08</b>

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858


  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717



CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 45 DE OBRA	Fecha: Setiembre - 2018
		Página: 11 de 15

## 5. ASPECTOS RELEVANTES DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA

1. Con fecha 24 de diciembre se firmó el CONTRATO N°082-2014-FONDEPES/OGA entre FONDEPES y el CONSORCIO SAN JOSE.
2. El adelanto directo se entregó con fecha 09 de enero del 2015.
3. La entidad entregó expediente técnico con CARTA 008-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 07 de enero, el cual fue recepcionado el 07 de enero por el CONSORCIO SAN JOSE.
4. La entidad con CARTA 0012-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 8 de enero 2015, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el 09 de enero del 2015, comunicaron la designación de la supervisión del CONSORCIO SAN FRANCISCO, indicando que el Supervisor encargado es el Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia, y que iniciaba sus funciones el mismo día con que se emitió la carta, así mismo los datos para comunicación con el supervisor.
5. Con CARTA N° 0014-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 08 de enero, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el día 09 de enero notificaron la designación del representante de FONDEPES para el acto de entrega de terreno.
6. Con CARTA N° 0015-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 08 de enero, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el día 09 de enero, notificaron la entrega de terreno para el miércoles 14 de Enero del 2015, a horas 12:00.
7. El 09 de Enero del 2015 se realiza la recepción del Adelanto Directo.
8. El día 14 de Enero del 2015 se realizó la entrega del terreno, mediante acta entre el Supervisor de Obra, el Ing. Residente, representante de FONDEPES.
9. El 15 de Enero del 2015 se inició el plazo contractual para la obra.
10. Con carta Notarial N°329-2015-FONDEPES/SG la Entidad resuelve contrato a la supervisión CONSORCIO SAN FRANCISCO, por lo que la entidad nombra al Ing. Víctor Ricardo Huamán Landa como Inspector de obra el cual cumplirá sus funciones a partir del 19 de Noviembre del 2015 para la continuidad de la obra.
11. La entidad firma el contrato N° 013-2016-FONDEPES con MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO por la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL SALDO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE" toma los servicios de consultoría para el saldo de supervisión de obra con contrato N° 013-2016-FONDEPES.
12. La entidad con carta N° 551-2016-FONDEPES/OGA aprueban el cambio de jefe de supervisión del servicio de consultoría para el SALDO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE designando como nuevo jefe de supervisión al Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza.


  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858


INFORME DPA SAN JOSÉ - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 45 DE OBRA	Fecha: Setiembre - 2018
		Página: 12 de 15

- 13. Con carta N° 415-2016-FONDEPES/DIGENIPAA la entidad nos solicita que se amortice las valorizaciones N°01 correspondiente al adicional N° 02, Valorización N°01 del adicional N° 04 y que el monto de dicha amortización será considerada en la Valorización contractual siguiente.
- 14. Con carta N° 026-2017-CSJ/CO de fecha 12/04/2017 se ingresó a FONDEPES el reiterativo sobre la aprobación del expediente técnico de la prestación adicional de obra y deductivo vinculante de media tensión, pese a que con carta N° 403-2016-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 27 de setiembre del 2016, la Entidad informó que ella sería quien realice la elaboración del expediente técnico de media tensión.
- 15. Con carta N° 027-2017-CSJ/CO de fecha 12/04/2017 se ingresó a FONDEPES el reiterativo sobre la aprobación del expediente técnico de la prestación adicional de obra y deductivo vinculante cambio de especificaciones técnicas (baranda), considerando que con carta N°349-2016-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 22 de agosto del 2016, se determinó que la Entidad sería quien realice la elaboración del expediente técnico de dicha prestación.
- 16. Con carta N° 028-2017-CSJ/CO de fecha 19/04/2017 se ingresó a FONDEPES la verificación del ajuste de la solución técnica del adicional N° 08 (PRODUCTOR DE HIELO EN BLOQUES DE 10TN/DÍA Y SU DEDUCTIVO VINCULANTE) respecto a la prestación principal, dando atención a la Carta N° 00072-2017-FONDEPES-DIGENIPAA.
- 17. Con carta N° 019-2017-CSJ/CO de fecha 17/03/2017 se ingresó a FONDEPES la solicitud de designación de un nuevo inspector y/o supervisor, ya que mediante asiento de cuaderno de obra N°1434 de fecha 06/03/2017 el supervisor de obra Ing. Isaías Jorge Alva Espinoza dio por finalizado su labor al término de su contrato.
- 18. Con carta N° 032-2017-CSJ/CO de fecha 10/05/2017 se ingresó a FONDEPES el Reiterativo a nuestra solicitud de designación de un nuevo inspector y/o supervisor, ya que la anterior carta del mismo asunto no tuvo respuesta, y a la fecha tampoco ésta carta tiene respuesta alguna.
- 19. Mediante Carta N°00119-2017-FONDEPES/DIGENIPAA recibida el 07/06/2017 la Entidad concluyó que el contrato de los servicios de supervisión de obra con el Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga, se encuentra vigente, puesto que no ha sido resuelto ni anulado.
- 20. Con fecha 20/10/2017 el Ing. Isaías Jorge Alva Espinoza reinició sus actividades como jefe de supervisión, ingresando a obra junto a su asistente de supervisión.
- 21. Con carta N°049-2018-FONDEPES/SG de fecha 06/03/2018 la entidad nos comunica de la Aprobación del Expediente técnico de la Prestación Adicional N°07, adjuntando la Resolución Jefatural N°025-2018-FONDEPES/J de fecha 06 de marzo del 2018, la cual resuelve aprobar el Expediente Técnico de la prestación adicional N°07.
- 22. Con carta N° 702-2018-FONDEPES/DIGENIPAA la entidad nos alcanza el plano EP-07 y la memoria de cálculo del tramo comprendido entre el eje 104 y 111 con modificación del proceso constructivo que genera un atraso importante en la ejecución.

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22358

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 45 DE OBRA	Fecha: Setiembre - 2018
		Página: 13 de 15


223

23. Con carta s/n -2018-FONDEPES/DIGENIPAA la entidad nos alcanza el plano EP-08 y la memoria de cálculo del tramo comprendido entre el eje 112 y 119 con modificación del proceso constructivo que genera un atraso importante en la ejecución.

23. Con carta 914 -2018-FONDEPES/DIGENIPAA la entidad nos alcanza el plano EP-09 y la memoria de cálculo del tramo comprendido entre el eje 112 y 119 con modificación del proceso constructivo que genera un atraso importante en la ejecución.

## 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Al mes de Setiembre del 2018, se ha ejecutado el 61.87 % del total del presupuesto contractual en la Valorización N° 45 acumulada, contra un Avance Programado de 78.04 % Acumulada. Debido a que el proceso constructivo ha sido modificado dando como consecuencia la prolongación del plazo de ejecución y generando atrasos sobre la programación.

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22958

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

# Memoria Descriptiva Valorizada



CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

**MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA VALORIZACIÓN N° 45**

**OBRA: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

El proyecto tiene como objetivo el de dar el "Suficiente acceso a Recursos hidrobiológicos de Calidad que cumplan con la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (DS N° 040-2001-PE) en la Caleta de San José, Santa Rosa y Pimentel".

Los metrados básicos son:

**07. OBRAS DE MAR**

**07.04.07 MANIOBRA DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS Puentes**

- 07.04.07.01 Transporte de Pilote
- 07.04.07.02 Transporte de Viga Transversal
- 07.04.07.03 Transporte de Losa Nervada


Consiste en trasladar el pilote prefabricado del patio de elaboración a la zona propia de trabajo, para ello se utilizará un camión plataforma y una grúa de 30 a 35 tn, el traslado implica el cuidado respectivo del pilote sin que sufra daño alguno, hasta posesionarlo en el área de su ubicación definitiva, todo ello de acuerdo a los planos y las Especificaciones Complementarias, es decir el Contratista proveerá y cumplirá con toda la tecnología necesaria a fin de garantizar un producto final seguro durable y garantizado.

**07.04.07.06 Descabezado de Pilotaje**

Consiste en el proceso de adecuar el pilote en su posición y condición final que le permita integrarse físicamente a todo el conjunto del concreto del embarcadero (Puente) a través de la correspondiente acción mecánica superior como se indica en los planos y en las Especificaciones Complementarias, es decir el Contratista proveerá y cumplirá con toda la tecnología necesaria a fin de garantizar un producto final seguro, durable y correcto

**07.04.07.07 Colocación de Viga Transversal**

Consiste en el proceso de transporte y colocación de Viga prefabricada en el Puente. Esta actividad se relaciona de manera estrecha con el producto final que debe seguir lo señalado en los planos, Especificaciones Complementarias, Especificaciones Específicas para ello se utiliza el personal, equipo, materiales, logística apropiada, con toda la tecnología necesaria a fin de garantizar un producto final seguro, durable y correcto


  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22658

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**07.04.07.08 Colocación de Losa Nervada**


CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 45 DE OBRA	Fecha: Setiembre - 2018
		Página: 15 de 15

Consiste en el proceso de transporte de la losa Tipo I, II, III, IV y V prefabricada, colocación de losa nervada, que vienen a ser sub partidas para la ejecución del total de la partida descrita. Esta actividad se relaciona de manera estrecha con el producto final que debe seguir lo señalado en los planos, Especificaciones Complementarias, Especificaciones para ello se utilizará el personal, equipo , materiales , logística apropiada es decir, con toda la tecnología necesaria a fin de garantizar un producto final seguro , durable y correcto

  
-----  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

# Resumen de Valorización N°45



CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

**RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N° 45  
AL MES DE SETIEMBRE DEL 2018**

**OBRA** : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

PROPIETARIO: FONDEPES  
 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE  
 SUPERVISIÓN: CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA  
 ING. RESIDENTE: CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 ING. SUPERVISOR: ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 FECHA PPTO. BASE : JUNIO 2014

**MONTO DEL CONTRATO SIN IGV :** S/. 27,506,466.29  
**MONTO DEL CONTRATO CON IGV :** S/. 32,457,630.22

CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	VAL. ACUM. ANTERIOR	VAL. ACTUAL	VAL. ACUM. ACTUAL	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
TOTAL CONTRACTUAL SIN IGV	27,506,466.29					
VALORIZACION CONTRACTUAL		16,994,420.11	23,972.12	17,018,392.23	61.87%	38.13%
	Avanc. Físico	61.78%	0.09%	61.87%		
	Avanc. Program.	71.35%	6.69%	78.04%		
REAJUSTES		<b>901,490.51</b>	<b>4,696.78</b>	<b>906,187.29</b>		
VALORIZACION BRUTA		<b>17,895,910.62</b>	<b>28,668.90</b>	<b>17,924,579.52</b>		
AMORTIZACIONES		3,480,252.96	4,794.42	3,485,047.38		
DEDUCCION DE REAJUSTE POR ADELANTO DIRECTO		56,645.61	496.62	57,142.23		
DEL ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00		
TOTAL AMORTIZACIONES		<b>3,536,898.57</b>	<b>5,291.04</b>	<b>3,542,189.61</b>		
VALORIZACION NETA		14,359,012.05	23,377.86	14,382,389.91		
I.G.V. (18%)	4,951,163.93	2,584,622.16	4,208.01	2,588,830.17		

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717



**CONSORCIO SAN JOSE**

**VALORIZACION DE OBRA N° 45 - SETIEMBRE 2018  
RESUMEN DE PAGO A ESPECIAR**

**OBRA** : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

**ENTIDAD EJECUTORA** : FONDEPES

**CONTRATISTA** : CONSORCIO SAN JOSE

**SUPERVISIÓN** : CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

**INGENIERO RESIDENTE** : CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS

**INGENIERO SUPERVISOR** : ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

**MODALIDAD DE EJECUCION** : A PRECIOS UNTARIOS

**MONTO REFERENCIAL** 33,504,650.56 INC. IGV


**MONTO CONTRATADO** 32,457,630.22 INC. IGV

ADELANTOS OTORGADOS	FECHA	MONTO C/IGV	MONTO SIN IGV	% PRESUPUESTO
1.- Adelanto Directo	09/01/2015	6,491,526.04	5,501,293.26	20.00%
2.- Adelanto de Materiales				
<b>TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO</b>		<b>6,491,526.04</b>	<b>5,501,293.26</b>	<b>20.00%</b>

**RESUMEN DE VALORIZACION AL MES DE SETIEMBRE DEL 2018**

DESCRIPCION	MONTO S/
<b>RESUMEN DE SUBTOTALES</b>	
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS	0.00
FORMULA 02 : ARQUITECTURA	0.00
FORMULA 03 : INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00
FORMULA 04 : INSTALACIONES SANITARIAS	0.00
FORMULA 05 : MITIGACION AMBIENTAL	0.00
FORMULA 06 : EQUIPAMIENTO	0.00
FORMULA 07 : OBRAS DE MAR	23,972.12
FORMULA 08 : PAVIMENTACION EXTERIOR	0.00
FORMULA 09 : INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION	0.00
FORMULA 10 : SEGURIDAD Y SALUD	0.00
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL</b>	<b>23,972.12</b>
FACTOR RELACION 1.000	23,972.12
<b>SUB-TOTAL VALORIZACION CONTRACTUAL</b>	<b>S/ 23,972.12</b>
<b>RESUMEN DE REAJUSTES</b>	
<b>(SE HA REAJUSTADO UTILIZANDO LOS INDICES UNIFICADOS PUBLICADO A LA FECHA - AGOSTO 2018)</b>	
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS Kr = 1.143	0.00
FORMULA 02 : ARQUITECTURA Kr = 1.139	0.00
FORMULA 03 : INSTALACIONES ELECTRICAS Kr = 1.149	0.00
FORMULA 04 : INSTALACIONES SANITARIAS Kr = 1.175	0.00
FORMULA 05 : MITIGACION AMBIENTAL Kr = 1.173	0.00
FORMULA 06 : EQUIPAMIENTO Kr = 1.178	0.00
FORMULA 07 : OBRAS DE MAR Kr = 1.140	4,696.78
FORMULA 08 : PAVIMENTACION EXTERIOR Kr = 1.089	0.00
FORMULA 09 : INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION Kr = 1.168	0.00
FORMULA 10 : SEGURIDAD Y SALUD Kr = 1.142	0.00
<b>REINTEGRO</b>	<b>4,696.78</b>
<b>DEDUCCIONES:</b>	
<b>- DEDUCCION DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DIRECTO</b>	
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS	0.00
FORMULA 02 : ARQUITECTURA	0.00
FORMULA 03 : INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00
FORMULA 04 : INSTALACIONES SANITARIAS	0.00
FORMULA 05 : MITIGACION AMBIENTAL	0.00
FORMULA 06 : EQUIPAMIENTO	0.00
FORMULA 07 : OBRAS DE MAR	496.62
FORMULA 08 : PAVIMENTACION EXTERIOR	0.00
FORMULA 09 : INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION	0.00
FORMULA 10 : SEGURIDAD Y SALUD	0.00
<b>DEDUCCION</b>	<b>496.62</b>
<b>VALORIZACION BRUTA (V.B.)</b>	<b>S/ 28,172.28</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>	
Amortización Adelantos Directos 20.00%	4,794.42
Amortización de Adelantos de materiales 0.00%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,794.42</b>
<b>VALORIZACION NETA (V.N.)</b>	<b>S/ 23,377.86</b>
<b>MONTO A FACTURAR Y PAGAR AL CONTRATISTA</b>	
IGV 18%(VN)	4,208.01
<b>TOTAL VN + IGV</b>	<b>S/ 27,585.87</b>

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

# Valorización

## N°45



CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

# CONSORCIO SAN JOSE

## RESUMEN GENERAL DE VALORIZACION DE OBRA N° 45- SEPTIEMBRE 2018

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

ENTIDAD : FONDEPES


CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE

FECHA : 30 DE SETIEMBRE DEL 2018

Residente	Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros
Supervisor	Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza
<b>SEGUN COSTO DIRECTO</b>	
Monto Valorizado del Mes	S/. 23,972.12
Monto Valorizado Acumulado	S/. 17,018,392.24
Monto-Saldo por Valorizar	S/. 10,488,074.05

Monto Base	S/. 33,504,860.56
Monto Contratado	S/. 32,457,630.22
Fecha-Inicio de Obra	15-ene-15
Plazo de Ejecución	1,158 Días Calendarios
Fecha-Termino de Obra	17-mar-18
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios

N°	DESCRIPCION	PARCIAL		ACUMULADO ANTERIOR		AVANCES		ACTUAL		ACUMULADO		SALDO	
		S/.	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado
01	SUB-PRESUPUESTO 01 ESTRUCTURAS	4,376,782.02	94.64%	4,142,352.10	0.00%	0.00	0.00%	4,142,352.10	94.64%	4,142,352.10	5.36%	234,428.92	5.36%
02	SUB-PRESUPUESTO 02 ARQUITECTURA	1,302,818.20	92.52%	1,205,394.04	0.00%	0.00	0.00%	1,205,394.04	92.52%	1,205,394.04	7.48%	97,424.16	7.48%
03	SUB-PRESUPUESTO 03 INSTALACIONES ELECTRICAS	652,518.87	38.60%	251,896.88	0.00%	0.00	0.00%	251,896.88	38.60%	251,896.88	81.40%	400,621.99	81.40%
04	SUB-PRESUPUESTO 04 INSTALACIONES SANITARIAS	1,280,852.15	83.58%	1,053,817.84	0.00%	0.00	0.00%	1,053,817.84	83.58%	1,053,817.84	16.42%	207,034.31	16.42%
05	SUB-PRESUPUESTO 05 MITIGACION AMBIENTAL	47,441.78	71.06%	33,714.06	0.00%	0.00	0.00%	33,714.06	71.06%	33,714.06	28.94%	13,727.72	28.94%
06	SUB-PRESUPUESTO 06 EQUIPAMIENTO	1,877,191.53	42.51%	712,941.50	0.00%	0.00	0.00%	712,941.50	42.51%	712,941.50	57.49%	984,250.03	57.49%
07	SUB-PRESUPUESTO 07 OBRAS EN MAR	17,421,512.15	51.73%	9,011,759.59	0.14%	23,972.12	0.14%	9,035,731.71	51.87%	9,035,731.71	48.13%	8,365,780.44	48.13%
08	SUB-PRESUPUESTO 08 PAVIMENTACION EXTERIOR	574,244.10	88.10%	563,361.88	0.00%	0.00	0.00%	563,361.88	88.10%	563,361.88	1.90%	10,882.22	1.90%
09	SUB-PRESUPUESTO 09 INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION	173,923.33	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	173,923.33	100.00%
10	SUB-PRESUPUESTO 10 SEGURIDAD Y SALUD	19,182.18	100.00%	19,182.18	0.00%	0.00	0.00%	19,182.18	100.00%	19,182.18	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL SIN IGV (S/.)</b>		<b>27,506,466.29</b>		<b>16,894,420.12</b>		<b>23,972.12</b>		<b>17,018,392.24</b>		<b>17,018,392.24</b>		<b>10,488,074.05</b>	

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22353

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**VALORIZACION DE OBRA N° 46 - SETIEMBRE 2016 (FORMULA 01 - ESTRUCTURAS)**

OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE

ENTIDAD : FONDEPES

CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE

FECHA : 30 DE SETIEMBRE DEL 2018

Monto Base S/. 33,504,650.56  
 Monto Contratado S/. 32,457,630.22  
 Fecha Inicio Obra 15-ene-15  
 Plazo de Ejecucion 1,158 Días C.  
 Fecha Final Obra 17-mar-18  
 Mod. de Ejecucion Precios Unitarios

Responsable Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros  
 Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza  
 SEGUN COSTO DIRECTO S/. 0.00 0.00%  
 Monto Valorizado del Mes S/. 3,563,313.88 94.64%  
 Monto Valorizado Acumulado S/. 20,144.18 5.36%  
 Monto-Saldado por Valorizar

Subsección : LAMBAYEQUE  
 Región : LAMBAYEQUE  
 Provincia : SAN JOSE  
 Distrito : SAN JOSE  
 Localidad : SAN JOSE

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
		Unid.	Metrado	P. Unitario	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.
<b>SUB-PRESUPUESTO 01</b>																
<b>01 ESTRUCTURAS</b>																
01.01	01.01.01	m2	600.00	28.72	100%	600.00	17,232.00	100%	0.00	0.00	100%	600.00	17,232.00	0%	0.00	0.00
01.01	01.01.02	und	2.00	1,134.14	100%	2.00	2,268.28	100%	0.00	0.00	100%	2.00	2,268.28	0%	0.00	0.00
01.01	01.01.03	m	491.50	13.18	33%	160.00	6,477.97	33%	0.00	0.00	33%	160.00	2,108.80	67%	331.50	4,369.17
01.01	01.01.04	mms	18.00	6,000.00	100%	18.00	108,000.00	100%	0.00	0.00	100%	18.00	108,000.00	0%	0.00	0.00
01.01	01.01.05	GLB	1.00	88,451.78	100%	1.00	88,451.78	100%	0.00	0.00	100%	1.00	88,451.78	0%	0.00	0.00
01.01	01.01.06	und	1.00	1,205.94	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	1,205.94
01.01	01.01.07	GLB	1.00	5,000.00	100%	1.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	100%	1.00	5,000.00	0%	0.00	0.00
01.01	01.01.08	GLB	1.00	9,400.00	100%	1.00	9,400.00	100%	0.00	0.00	100%	1.00	9,400.00	0%	0.00	0.00
01.01	01.01.09	GLB	1.00	36,800.00	100%	1.00	36,800.00	100%	0.00	0.00	100%	1.00	36,800.00	0%	0.00	0.00
<b>1.02 TRABAJOS PRELIMINARES</b>																
01.02	01.02.01	m2	6,749.50	0.69	100%	6,749.50	4,657.16	100%	0.00	0.00	100%	6,749.50	4,657.16	0%	0.00	0.00
01.02	01.02.02	m2	6,749.50	1.58	100%	6,749.50	10,664.21	100%	0.00	0.00	100%	6,749.50	10,664.21	0%	0.00	0.00
<b>1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>																
01.03	01.03.01	m3	11,138.33	4.56	100%	11,138.33	50,790.78	100%	0.00	0.00	100%	11,138.33	50,790.78	0%	0.00	0.00
01.03	01.03.02	m3	716.49	27.38	100%	716.49	19,617.50	100%	0.00	0.00	100%	716.49	19,617.50	0%	0.00	0.00
01.03	01.03.03	m2	6,776.00	23.60	100%	6,776.00	159,913.60	100%	0.00	0.00	100%	6,776.00	159,913.60	0%	0.00	0.00
01.03	01.03.04	m2	6,703.62	23.60	100%	6,703.62	159,205.43	100%	0.00	0.00	100%	6,703.62	159,205.43	0%	0.00	0.00
01.03	01.03.05	m2	6,632.01	23.60	100%	6,632.01	156,515.44	100%	0.00	0.00	100%	6,632.01	156,515.44	0%	0.00	0.00
01.03	01.03.06	m2	6,560.40	23.60	100%	6,560.40	154,825.44	100%	0.00	0.00	100%	6,560.40	154,825.44	0%	0.00	0.00
01.03	01.03.07	m2	6,488.02	15.99	100%	6,488.02	103,743.44	100%	0.00	0.00	100%	6,488.02	103,743.44	0%	0.00	0.00
01.03	01.03.08	m2	6,416.41	15.99	100%	6,416.41	102,598.40	100%	0.00	0.00	100%	6,416.41	102,598.40	0%	0.00	0.00
01.03	01.03.09	m2	6,344.03	15.99	100%	6,344.03	101,441.04	100%	0.00	0.00	100%	6,344.03	101,441.04	0%	0.00	0.00
01.03	01.03.10	m2	6,168.09	15.99	100%	6,168.09	98,627.76	100%	0.00	0.00	100%	6,168.09	98,627.76	0%	0.00	0.00
01.03	01.03.11	m2	5,929.43	20.12	100%	5,929.43	119,900.13	100%	0.00	0.00	100%	5,929.43	119,900.13	0%	0.00	0.00
01.03	01.03.12	m2	3,890.14	1.53	88%	3,436.26	5,257.48	88%	0.00	0.00	88%	3,436.26	5,257.48	12%	453.88	694.44
01.03	01.03.13	m3	12,809.08	14.38	100%	12,809.08	184,194.57	100%	0.00	0.00	100%	12,809.08	184,194.57	0%	0.00	0.00
01.03	01.03.14	m2	2,348.28	6.91	100%	2,348.28	16,227.31	100%	0.00	0.00	100%	2,348.28	16,227.31	0%	0.00	0.00
<b>01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>																
01.04	01.04.01	m3	545.35	22.71	100%	545.35	12,366.96	100%	0.00	0.00	100%	545.35	12,366.96	0%	0.79	17.94
01.04	01.04.01	m3	2.88	268.13	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	2.88	772.21
01.04	01.04.03	m2	7.27	32.18	100%	7.27	233.95	100%	0.00	0.00	100%	7.27	233.95	0%	0.00	0.00

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR				AVANCES ACTUAL				ACUMULADO				SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto \$/.	%	Metrado	Valorizado \$/.	%	Metrado	Valorizado \$/.	%	Metrado	Valorizado \$/.	%	Metrado	Valorizado \$/.	%	Metrado	Valorizado \$/.	
																					Metrado
01	SUB-PRESUPUESTO 01																				
01.04.01	ESTRUCTURAS																				
01.04.01.01	CONCRETO 1:10+30% P.G. PARA CIMENTOS CORRIDOS	m3	269.64	158.70	42,791.87	100%	269.64	42,791.87	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	269.64	42,791.87	0%	0.00	0.00	
01.04.01.02	ENCORRADO Y DESENCRADO DE CONCRETO 1:10+30% DE P.G. PARA CIMENTOS	m2	557.40	34.30	19,118.82	100%	557.40	19,118.82	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	557.40	19,118.82	0%	0.00	0.00	
01.04.05	SORBECHEMIENTOS																				
01.04.05.01	CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SORBECHEMIENTOS	m3	2.81	245.24	689.12	100%	2.81	689.12	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	2.81	689.12	0%	0.00	0.00	
01.04.05.02	ENCORRADO Y DESENCRADO PARA SORBECHEMIENTOS	m2	37.46	39.18	1,467.68	100%	37.46	1,467.68	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	37.46	1,467.68	0%	0.00	0.00	
01.04.06	DAJOS																				
01.04.06.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DAJOS	m3	1.32	388.90	513.35	100%	1.32	513.35	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	1.32	513.35	0%	0.00	0.00	
01.04.07	CAVALETTAS																				
01.04.07.01	CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2 PARA CANALETA	m3	29.28	289.39	8,473.34	100%	29.28	8,473.34	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	29.28	8,473.34	0%	0.00	0.00	
01.04.07.02	ENCORRADO Y DESENCRADO PARA CANALETAS	m2	399.05	23.17	9,245.99	100%	399.05	9,245.99	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	399.05	9,245.99	0%	0.00	0.00	
01.04.08	VEREDAS																				
01.04.08.01	CONCRETO EN VEREDAS F C=175 KG/CM2 E=47 INCI CAPA DE DESGASTE 1 CM	m2	343.48	48.43	16,634.74	62%	212.33	10,283.14	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	62%	212.33	10,283.14	38%	131.15	6,351.59	
01.04.08.02	CONCRETO EN SARDINELES SUMERGIDOS FC=175 KG/CM2	m3	5.49	297.48	1,633.17	49%	2.67	793.54	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	49%	2.67	793.54	51%	2.82	839.63	
01.04.08.03	ENCORRADO Y DESENCRADO NORMAL PARA VEREDAS	m2	52.28	28.33	1,481.09	75%	39.07	1,106.95	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	75%	39.07	1,106.95	25%	13.21	374.14	
01.04.09	LOSA DE CONCRETO SIMPLE																				
01.04.09.01	CONCRETO FC=175 KG/M2 E=47/10m	m2	842.07	48.76	41,059.33	82%	688.13	33,553.12	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	82%	688.13	33,553.12	18%	153.94	7,506.21	
01.04.09.02	ENCORRADO Y DESENCRADO EN LOSA DE CONCRETO	m2	198.42	27.14	5,385.12	30%	60.33	1,637.33	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	30%	60.33	1,637.33	70%	138.09	3,747.79	
01.04.10	RAMPAS																				
01.04.10.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN RAMPAS	m3	0.54	295.00	159.30	100%	0.54	159.30	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	0.54	159.30	0%	0.00	0.00	
01.04.10.02	ENCORRADO Y DESENCRADO EN RAMPAS	m2	1.20	25.32	30.38	100%	1.20	30.38	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.20	30.38	0%	0.00	0.00	
01.04.11	GRADERIAS																				
01.04.11.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN GRADERIAS	m3	0.74	308.42	228.23	100%	0.74	228.23	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	0.74	228.23	0%	0.00	0.00	
01.04.11.02	ENCORRADO Y DESENCRADO EN GRADERIAS	m2	2.78	25.32	70.39	100%	2.78	70.26	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	2.78	70.26	0%	0.00	0.13	
01.04.12	CURADO																				
01.04.12.01	CURADO DE CONCRETO	m2	1,588.58	1.72	2,732.36	100%	1,588.58	2,732.36	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1,588.58	2,732.36	0%	0.00	0.00	
01.04.13	SARDINEL PERALTADO																				
01.04.13.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA SARDINEL PERALTADO	m3	15.90	286.95	4,562.51	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	15.90	4,562.51	
01.04.13.02	ENCORRADO Y DESENCRADO PARA SARDINEL PERALTADO	m2	318.00	27.14	8,630.52	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	318.00	8,630.52	
01.04.13.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA SARDINEL PERALTADO	kg	10.74	3.73	40.06	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	10.74	40.06	
01.05	OBRAS DE CONCRETO DURADO																				
01.05.01	ZAPATAS																				
01.05.01.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	291.46	368.28	107,338.89	100%	291.46	107,338.89	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	291.46	107,338.89	0%	0.00	0.00	
01.05.01.02	ENCORRADO Y DESENCRADO NORMAL PARA ZAPATAS	m2	695.34	34.82	24,211.74	96%	668.94	23,292.49	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	96%	668.94	23,292.49	4%	26.40	919.25	
01.05.01.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS	kg	6,405.91	3.73	23,894.04	100%	6,405.91	23,894.04	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	6,405.91	23,894.04	0%	0.00	0.00	
01.05.02	LOSA DE CONCRETO RIGIDO																				
01.05.02.01	CONCRETO RIGIDO FC=280 KG/CM2 PATO DE MANOBRAS	m3	422.83	523.33	221,279.62	100%	422.83	221,279.62	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	422.83	221,279.62	0%	0.00	0.00	
01.05.02.02	CONCRETO RIGIDO FC=210 KG/CM2 AMBIENTES	m3	387.19	362.78	146,208.59	59%	229.66	87,907.55	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	59%	229.66	87,907.55	41%	157.53	60,301.04	
01.05.02.03	ENCORRADO Y DESENCRADO PARA CONCRETO RIGIDO	m2	144.08	38.58	5,558.61	100%	144.08	5,558.61	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	144.08	5,558.61	0%	0.00	0.00	
01.05.02.04	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA CONCRETO RIGIDO	kg	43,465.92	3.73	162,127.88	94%	40,746.40	151,984.07	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	94%	40,746.40	151,984.07	6%	2,719.52	10,143.81	
01.05.02.05	JUNTA TRANSVERSAL ACERO LISO 1/2"	m	343.20	14.92	5,120.54	86%	295.75	4,412.55	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	86%	295.75	4,412.55	14%	47.45	708.00	
01.05.02.06	JUNTA LONGITUDINAL ACERO LISO 3/4"	m	365.58	15.74	5,754.23	89%	325.04	5,116.05	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	89%	325.04	5,116.05	11%	40.55	638.18	
01.05.02.07	JUNTA DE DILATACION TERMICA ACERO LISO 1/2"	m	203.10	16.26	3,302.41	87%	177.45	2,885.34	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	87%	177.45	2,885.34	13%	25.65	417.07	
01.05.02.08	JUNTA DE DILATACION TERMICA ACERO LISO 3/4"	m	171.60	17.08	2,930.93	45%	77.64	1,326.16	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	45%	77.64	1,326.16	55%	93.96	1,604.77	
01.05.03	SARDINEL PERALTADO																				
01.05.03.01	CONCRETO EN SARDINELES F C=175 KG/CM2	m3	1.98	297.48	589.01	100%	1.98	589.01	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.98	589.01	0%	0.00	0.00	
01.05.03.02	ENCORRADO Y DESENCRADO PARA SARDINEL PERALTADO	m2	39.59	27.14	1,074.47	64%	25.48	691.42	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	64%	25.48	691.42	36%	14.11	383.05	
01.05.03.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA SARDINEL PERALTADO	kg	112.37	3.73	419.14	89%	99.59	371.47	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	89%	99.59	371.47	11%	12.78	47.67	

CARLOS ENRIQUE QUEROZ CISNEROS

INGENIERO CIVIL

ISAIAIS JORGE ALVA ESPINOZA

Reg. CIP N° 10717

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.
01	SUB-PRESUPUESTO 01																
01.05.04	VOAS DE CIMENTACION																
01.05.04.01	CONCRETO Fc=210 KG/CM2 PARANGAS DE CIMENTACION	m3	137.01	377.44	51,713.05	99%	135.27	51056.63	0%	0.00	0.00	99%	135.27	51,056.63	1%	1.74	656.42
01.05.04.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO NORMAL PARA VIGA DE CIMENTACION	m2	1,107.02	34.92	38,657.14	97%	1,074.95	37,537.36	0%	0.00	0.00	97%	1,074.95	37,537.36	3%	32.07	1,119.78
01.05.04.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VOAS DE CIMENTACION	kg	18,691.72	3.73	69,720.12	100%	18,691.72	69,720.12	0%	0.00	0.00	100%	18,691.72	69,720.12	0%	0.00	0.00
01.05.05	SORRECCION REFORZADO																
01.05.05.01	CONCRETO Fc=210 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO	m3	40.10	363.36	14,570.74	100%	40.10	14,570.74	0%	0.00	0.00	100%	40.10	14,570.74	0%	0.00	0.00
01.05.05.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO	m2	528.04	29.56	15,608.86	100%	528.04	15,608.86	0%	0.00	0.00	100%	528.04	15,608.86	0%	0.00	0.00
01.05.05.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO	kg	1,715.71	3.73	6,399.60	100%	1,715.71	6,399.58	0%	0.00	0.00	100%	1,715.71	6,399.58	0%	0.00	0.02
01.05.06	COLUMNAS																
01.05.06.01	CONCRETO Fc=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS	m3	117.81	409.47	48,239.66	100%	117.81	48,239.66	0%	0.00	0.00	100%	117.81	48,239.66	0%	0.00	0.00
01.05.06.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	1,356.58	40.06	54,344.59	100%	1,356.58	54,344.59	0%	0.00	0.00	100%	1,356.58	54,344.59	0%	0.00	0.00
01.05.06.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS	kg	26,365.27	3.73	98,342.46	100%	26,365.27	98,342.46	0%	0.00	0.00	100%	26,365.27	98,342.46	0%	0.00	0.00
01.05.07	COLUMNAS DE CONFIRMADO																
01.05.07.01	CONCRETO EN COLUMNAS DE CONFIRMADO Fc=175 KG/CM2	m3	12.62	359.05	4,531.21	100%	12.62	4,531.21	0%	0.00	0.00	100%	12.62	4,531.21	0%	0.00	0.00
01.05.07.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO NORMAL EN COLUMNAS DE CONFIRMADO	m2	218.01	48.66	10,608.37	100%	218.01	10,608.37	0%	0.00	0.00	100%	218.01	10,608.37	0%	0.00	0.00
01.05.07.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS DE CONFIRMADO	kg	2,313.94	3.73	8,631.00	100%	2,313.94	8,631.00	0%	0.00	0.00	100%	2,313.94	8,631.00	0%	0.00	0.00
01.05.08	VOAS																
01.05.08.01	CONCRETO Fc=210 KG/CM2 PARA VOAS	m3	176.20	414.13	72,959.71	83%	146.33	60,598.27	0%	0.00	0.00	83%	146.33	60,598.27	17%	29.87	12,371.44
01.05.08.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO NORMAL EN VOAS	m2	1,721.71	49.58	85,362.38	65%	1,120.08	55,533.39	0%	0.00	0.00	65%	1,120.08	55,533.39	35%	601.63	29,828.99
01.05.08.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VOAS	kg	21,991.26	3.73	82,027.40	100%	21,991.26	82,027.40	0%	0.00	0.00	100%	21,991.26	82,027.40	0%	0.00	0.00
01.05.09	VOAS DE CONFIRMADO																
01.05.09.01	CONCRETO EN VOAS DE CONFIRMADO Fc=175 KG/CM2	m3	2.30	337.18	775.51	100%	2.30	775.51	0%	0.00	0.00	100%	2.30	775.51	0%	0.00	0.00
01.05.09.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO NORMAL EN VOAS DE CONFIRMADO	m2	30.69	38.38	1,177.88	100%	30.69	1,177.88	0%	0.00	0.00	100%	30.69	1,177.88	0%	0.00	0.00
01.05.09.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VOAS DE CONFIRMADO	kg	301.55	3.73	1,124.78	100%	301.55	1,124.78	0%	0.00	0.00	100%	301.55	1,124.78	0%	0.00	0.00
01.05.10	DINTELES																
01.05.10.01	CONCRETO EN DINTELES Fc=175 KG/CM2	m3	4.76	276.50	1,316.14	16%	0.77	212.46	0%	0.00	0.00	16%	0.77	212.46	84%	3.99	1,103.68
01.05.10.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO NORMAL EN DINTELES	m2	66.58	48.66	3,239.78	15%	9.85	479.47	0%	0.00	0.00	15%	9.85	479.47	85%	56.73	2,760.31
01.05.10.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA DINTELES	kg	182.54	3.73	680.87	17%	31.18	116.30	0%	0.00	0.00	17%	31.18	116.30	85%	151.36	564.57
01.05.11	LOSA MACIZA																
01.05.11.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA Fc=210 KG/CM2	m3	2.63	414.13	1,089.16	100%	2.63	1,089.16	0%	0.00	0.00	100%	2.63	1,089.16	0%	0.00	0.00
01.05.11.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO NORMAL EN LOSA MACIZA	m2	7.50	49.58	371.85	100%	7.50	371.85	0%	0.00	0.00	100%	7.50	371.85	0%	0.00	0.00
01.05.11.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSA MACIZA	kg	424.12	3.73	1,581.97	100%	424.12	1,581.97	0%	0.00	0.00	100%	424.12	1,581.97	0%	0.00	0.00
01.05.12	LOSA ALBERADA																
01.05.12.01	CONCRETO EN LOSAS ALBERADAS Fc=210 KG/CM2	m3	134.83	380.51	51,304.16	100%	134.83	51,304.16	0%	0.00	0.00	100%	134.83	51,304.16	0%	0.00	0.00
01.05.12.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO PARA LOSAS ALBERADAS	m2	1,448.93	41.99	60,840.57	100%	1,448.93	60,840.57	0%	0.00	0.00	100%	1,448.93	60,840.57	0%	0.00	0.00
01.05.12.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS ALBERADAS	kg	10,051.77	3.73	37,493.10	93%	9,375.37	34,970.13	0%	0.00	0.00	93%	9,375.37	34,970.13	7%	676.40	2,522.97
01.05.12.04	LABILLO HUECO DE ARILLA 1530X30 CM PARA TECHO ALBERADO	unid	12,111.00	3.72	45,052.92	100%	12,111.00	45,052.92	0%	0.00	0.00	100%	12,111.00	45,052.92	0%	0.00	0.00
01.05.13	MANILLO																
01.05.13.01	CONCRETO EN MANILLO DE Fc=175 KG/CM2	m3	1.76	303.66	534.48	100%	1.76	534.48	0%	0.00	0.00	100%	1.76	534.48	0%	0.00	0.00
01.05.13.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO NORMAL EN MANILLO	m2	33.55	46.82	1,570.81	100%	33.55	1,570.81	0%	0.00	0.00	100%	33.55	1,570.81	0%	0.00	0.00
01.05.13.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA MANILLOS	kg	169.21	3.73	631.15	100%	169.21	631.15	0%	0.00	0.00	100%	169.21	631.15	0%	0.00	0.00
01.05.14	TANQUE CRISTERA																
01.05.14.01	CONCRETO EN TANQUE CRISTERA Fc=210 KG/CM2	m3	39.89	432.92	17,269.18	100%	39.89	17,269.18	0%	0.00	0.00	100%	39.89	17,269.18	0%	0.00	0.00
01.05.14.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO NORMAL PARA CRISTERA	m2	255.00	36.27	9,248.85	100%	255.00	9,248.85	0%	0.00	0.00	100%	255.00	9,248.85	0%	0.00	0.00
01.05.14.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA TANQUE CRISTERA	kg	4,297.36	3.73	16,029.15	86%	3,713.69	13,852.05	0%	0.00	0.00	86%	3,713.69	13,852.05	14%	583.67	2,177.11
01.05.15	TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE Y SALADA																
01.05.15.01	CONCRETO EN TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y SALADA Fc=210 KG/CM2	m3	21.17	462.52	9,791.55	100%	21.17	9,791.55	0%	0.00	0.00	100%	21.17	9,791.55	0%	0.00	0.00
01.05.15.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO NORMAL EN TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	m2	151.18	43.87	6,632.27	100%	151.18	6,632.27	0%	0.00	0.00	100%	151.18	6,632.27	0%	0.00	0.00
01.05.15.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y SA	kg	1,200.55	3.41	4,093.88	100%	1,200.55	4,093.88	0%	0.00	0.00	100%	1,200.55	4,093.88	0%	0.00	0.00

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCES ACTUAL			ACUMULADO			SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.
01	SUB-PRESUPUESTO 01																
01.05.16	ESTRUCTURAS																
01.05.16.01	TANQUE SEPTICO DESAGUE DOMESTICO																
01.05.16.02	CONCRETO EN TANQUE SEPTICO-DESAGUES DOMESTICOS E INDUSTRIALES FC-210	m3	8.23	367.94	3,028.15	100%	8.23	3,028.15	0%	0.00	0.00	0%	8.23	3,028.15	0%	0.00	0.00
01.05.16.03	ENCORRADO Y DESENCORRADO NORMAL PARA TANQUE SEPTICO-DESAGUES DOMESTICO	m2	44.82	38.58	1,729.16	100%	44.82	1,729.16	0%	0.00	0.00	0%	44.82	1,729.16	0%	0.00	0.00
01.05.17	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO TANQUE SEPTICO-DESAGUES DOMESTICOS E INDUSTRIALES	kg	463.19	3.73	1,727.70	100%	463.19	1,727.70	0%	0.00	0.00	0%	463.19	1,727.70	0%	0.00	0.00
01.05.17.01	CAMARA DE REJAS																
01.05.17.02	CONCRETO EN CAMARA DE REJAS FC-210 (KGCM2)	m3	2.62	42.92	1,124.25	76%	1.99	863.03	0%	0.00	0.00	0%	1.99	863.03	24%	0.63	271.22
01.05.17.03	ENCORRADO Y DESENCORRADO EN CAMARA DE REJAS	m2	25.77	36.27	934.68	52%	13.50	489.51	0%	0.00	0.00	0%	13.50	489.51	48%	12.27	446.17
01.05.18	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA CAMARA DE REJAS	kg	106.63	3.73	397.73	100%	106.63	397.73	0%	0.00	0.00	0%	106.63	397.73	0%	0.00	0.00
01.05.18.01	TRAMPA DE GRASA																
01.05.18.02	CONCRETO FC-210 (KGCM2) PARA TRAMPA DE GRASA	m3	3.76	385.82	1,450.68	84%	3.16	1,219.04	0%	0.00	0.00	0%	3.16	1,219.04	16%	0.60	231.65
01.05.18.03	ENCORRADO Y DESENCORRADO PARA TRAMPA DE GRASA	m2	29.34	47.67	1,398.64	100%	29.34	1,398.64	0%	0.00	0.00	0%	29.34	1,398.64	0%	0.00	0.00
01.05.19	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA TRAMPA DE GRASA	kg	167.11	3.93	656.74	100%	167.11	656.74	0%	0.00	0.00	0%	167.11	656.74	0%	0.00	0.00
01.05.19.01	EMBORS SUBMARINO																
01.05.19.02	CONCRETO FC-210 (KGCM2) PARA EMBORS SUBMARINO	m3	20.27	385.82	7,820.57	77%	15.54	5,993.71	0%	0.00	0.00	0%	15.54	5,993.71	23%	4.74	1,826.86
01.05.19.03	ENCORRADO Y DESENCORRADO PARA EMBORS SUBMARINO	m2	28.10	47.67	1,339.53	100%	28.10	1,339.53	0%	0.00	0.00	0%	28.10	1,339.53	0%	0.00	0.00
01.05.20	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA EMBORS SUBMARINO	kg	232.02	3.93	911.84	100%	232.02	911.84	0%	0.00	0.00	0%	232.02	911.84	0%	0.00	0.00
01.05.20.01	TRAMPA DE SOLIDOS																
01.05.20.02	CONCRETO FC-210 (KGCM2) PARA TRAMPA DE SOLIDOS	m3	7.77	403.59	3,136.89	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
01.05.20.03	ENCORRADO Y DESENCORRADO NORMAL PARA TRAMPA DE SOLIDOS	m2	15.40	43.87	675.60	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
01.05.21	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA TRAMPA DE SOLIDOS	kg	493.88	3.73	1,842.17	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
01.05.21.01	FILTRO BIOLÓGICO																
01.05.21.02	CONCRETO FC-210 (KGCM2) PARA FILTRO BIOLÓGICO	m3	18.93	433.18	8,200.10	100%	18.93	8,200.10	0%	0.00	0.00	0%	18.93	8,200.10	0%	0.00	0.00
01.05.21.03	ENCORRADO Y DESENCORRADO NORMAL PARA FILTRO BIOLÓGICO	m2	128.40	38.38	4,933.67	100%	128.40	4,933.67	0%	0.00	0.00	0%	128.40	4,933.67	0%	0.00	0.00
01.05.21.04	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA FILTRO BIOLÓGICO	kg	1,619.82	3.73	6,079.53	52%	946.13	3,529.07	0%	0.00	0.00	0%	946.13	3,529.07	48%	873.69	3,258.86
01.06	MUROS Y TABICADOS																
01.06.01	MURO DE SOGLA/LORLLO KK 18 HUECOS DE 8X14X24 CEMENTO-ARENA 1:3	m2	2,383.71	58.88	140,352.84	85%	2,026.33	119,310.29	0%	0.00	0.00	0%	2,026.33	119,310.29	15%	357.38	21,042.55
01.06.02	MURO DE CABEZA/LORLLO KK 18 HUECOS DE 8X14X24 CEMENTO-ARENA 1:3	m2	26.80	81.52	2,184.74	100%	26.80	2,184.74	0%	0.00	0.00	0%	26.80	2,184.74	0%	0.00	0.00
01.06.03	MURO DE CANTO/LORLLO KK 18 HUECOS DE 8X14X24 CEMENTO-ARENA 1:3	m2	48.90	46.41	2,269.45	100%	48.90	2,269.45	0%	0.00	0.00	0%	48.90	2,269.45	0%	0.00	0.00
01.07	VARIOS																
01.07.01	TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO FC-210 (KGCM2) 70x40x70mm	unf	2.00	496.60	993.20	100%	2.00	993.20	0%	0.00	0.00	0%	2.00	993.20	0%	0.00	0.00
01.07.02	TAPA METALICA DESMONTABLE PLATINA 1'X38"	unf	2.00	496.60	993.20	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
01.07.03	ESCALERA METALICA TIPO GATO HP=2.5MM	unf	3.00	556.60	1,669.80	67%	2.00	1,113.20	0%	0.00	0.00	0%	2.00	1,113.20	35%	1.00	556.60
01.07.04	ESCALERA METALICA TIPO GATO HP=2.00M	unf	2.00	516.60	1,033.20	100%	2.00	1,033.20	0%	0.00	0.00	0%	2.00	1,033.20	0%	0.00	0.00
01.07.05	ESCALERA METALICA TIPO GATO HP=1.20M	unf	1.00	3,517.40	3,517.40	100%	1.00	3,517.40	0%	0.00	0.00	0%	1.00	3,517.40	0%	0.00	0.00
01.08	FLETES																
01.08.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00	18,000.00	18,000.00	100%	1.00	18,000.00	0%	0.00	0.00	0%	1.00	18,000.00	0%	0.00	0.00
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>				<b>3,794,873.78</b>	<b>3,963,313.58</b>			<b>3,963,313.58</b>	<b>0.00</b>					<b>3,963,313.58</b>			<b>201,460.18</b>
<b>GASTOS GENERALES (8.25 %)</b>																	<b>16,636.96</b>
<b>UTILIDAD (8.00%)</b>																	<b>16,132.61</b>
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>																	<b>284,428.95</b>
<b>I.G.V. (18.0 %)</b>																	<b>42,197.39</b>
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>																	<b>276,627.54</b>
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (SEN IGV)</b>																	<b>294,428.95</b>
<b>I.G.V. (18.0 %)</b>																	<b>42,197.39</b>
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (CON IGV)</b>																	<b>276,627.54</b>

SAZAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CPN N° 10717



**VALORIZACION DE OBRA N° 45 - SETIEMBRE 2018 (FORMULA 02 - ARQUITECTURA)**

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"  
 ENTIDAD : FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 FECHA : 30 DE SETIEMBRE DEL 2018

Monto Base : S/. 33,504,650.56  
 Monto Contratado : S/. 32,457,630.22  
 Fecha Inicio Obra : 15-ene-15  
 Plazo de Ejecución : 1,158 Días C.  
 Fecha Final Obra : 17-mar-18  
 Mod. de Ejecución : Precios Unitarios

Residencia : Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros  
 Supervisor : Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza  
 SEGUN COSTO DIRECTO : S/. 0.00  
 Monto Valorizado del Mes : S/. 1,036,898.11  
 Monto Valorizado Acumulado : S/. 83,805.72  
 Mod. de Ejecución : 7.48%

Ubicación :  
 Región : LAMBAYEQUE  
 Provincia : LAMBAYEQUE  
 Distrito : SAN JOSE  
 Localidad : SAN JOSE

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR			ACTUAL			AVANCES			ACUMULADO			SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.
02	ARQUITECTURA																			
02.01.01	TARRAJEO Y ENLUCIDOS	m2	200.96	35.52	7,138.10	100%	200.96	7,138.10	0%	0.00	0.00	100%	200.96	7,138.10	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.01.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES	m2	764.05	29.87	22,822.17	85%	646.26	19,303.82	0%	0.00	0.00	85%	646.26	19,303.82	0%	0.00	0.00	117.79	3,518.36	
02.01.03	TARRAJEO EN MUROS / COLUMNAS INTERIORES CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTES	m2	1,564.13	29.88	46,736.20	100%	1,564.13	46,736.20	0%	0.00	0.00	100%	1,564.13	46,736.20	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.01.04	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES	m2	2,392.01	26.09	62,407.54	90%	2,146.14	55,992.81	0%	0.00	0.00	90%	2,146.14	55,992.81	0%	0.00	0.00	245.87	5,414.74	
02.01.05	TARRAJEO VIGAS MEZ. CA 1:1, E=1.5 CM	m2	1,761.52	29.04	51,154.54	71%	1,257.27	36,511.24	0%	0.00	0.00	71%	1,257.27	36,511.24	0%	0.00	0.00	504.25	14,643.30	
02.01.06	TARRAJEO DE DERRAMES MEZ 1:1, E=1.5 CM	m2	1,168.50	25.72	30,053.82	100%	1,168.50	30,053.82	0%	0.00	0.00	100%	1,168.50	30,053.82	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.01.07	VESTIDURA DE DERRAMES MEZ 1:1, E=1.5 CM	m	1,104.46	17.18	18,974.62	40%	439.39	7,548.72	0%	0.00	0.00	40%	439.39	7,548.72	0%	0.00	0.00	665.07	11,425.90	
02.01.08	TARRAJEO EN GRADAS 1:1, E=1.5 CM	m2	5.76	28.41	163.64	100%	5.76	163.64	0%	0.00	0.00	100%	5.76	163.64	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.01.09	BRUÑAS SIDIETALES	m	3,122.55	5.26	16,424.61	100%	3,122.55	16,424.61	0%	0.00	0.00	100%	3,122.55	16,424.61	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.02	CELO-RABOS	m2	1,533.61	34.57	53,016.90	100%	1,533.61	53,016.90	0%	0.00	0.00	100%	1,533.61	53,016.90	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.02.01	CIELORRASOS C/ MEZ 1:4, E=1.5 cm	m2	1,533.61	34.57	53,016.90	100%	1,533.61	53,016.90	0%	0.00	0.00	100%	1,533.61	53,016.90	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.03	PROBOS	m2	400.36	46.62	18,664.78	100%	400.36	18,664.78	0%	0.00	0.00	100%	400.36	18,664.78	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.03.01	CONTRAPISO DE Z'	m2	103.88	55.51	5,766.38	100%	103.88	5,766.38	0%	0.00	0.00	100%	103.88	5,766.38	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.03.02	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 30x30	m2	82.56	60.91	5,028.73	100%	82.56	5,028.73	0%	0.00	0.00	100%	82.56	5,028.73	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.03.03	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 40x40	m2	213.92	38.58	8,253.03	91%	194.71	7,511.91	0%	0.00	0.00	91%	194.71	7,511.91	0%	0.00	0.00	19.21	741.12	
02.03.04	PISO VINILICO	m2	7.27	31.71	230.53	100%	7.27	230.53	0%	0.00	0.00	100%	7.27	230.53	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.03.05	PISO DE CEMENTO PULIDO E=5CM	m2	156.75	32.22	5,050.49	100%	156.75	5,050.49	0%	0.00	0.00	100%	156.75	5,050.49	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.03.06	PISO CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE	m2	1,034.15	45.42	46,971.09	97%	1,006.66	45,722.42	0%	0.00	0.00	97%	1,006.66	45,722.42	0%	0.00	0.00	27.49	1,246.67	
02.03.07	PISO CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE Y ACABADO CON PINTURA EPOXICA	m2	1,034.15	45.42	46,971.09	97%	1,006.66	45,722.42	0%	0.00	0.00	97%	1,006.66	45,722.42	0%	0.00	0.00	27.49	1,246.67	
2.04	CONTRAZOCALOS	m	371.20	29.71	11,028.35	100%	371.20	11,028.35	0%	0.00	0.00	100%	371.20	11,028.35	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.04.01	CONTRAZOCALO SANITARIO CON PINTURA EPOXICA H=0.1 m	m	371.20	29.71	11,028.35	100%	371.20	11,028.35	0%	0.00	0.00	100%	371.20	11,028.35	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.04.02	CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO H=0.10 M	m	669.59	10.99	7,358.79	100%	669.59	7,358.79	0%	0.00	0.00	100%	669.59	7,358.79	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.04.03	CONTRAZOCALO DE MADERA (H=0.1 m)	m	143.26	14.45	2,070.11	100%	143.26	2,070.11	0%	0.00	0.00	100%	143.26	2,070.11	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.05	ZOCALOS	m2	133.85	80.07	10,717.37	100%	133.85	10,717.37	0%	0.00	0.00	100%	133.85	10,717.37	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.05.01	ZOCALO DE CERAMICO 3.00x3.00m	m2	133.85	80.07	10,717.37	100%	133.85	10,717.37	0%	0.00	0.00	100%	133.85	10,717.37	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.05.02	ZOCALO DE CERAMICA 40 X 40 CM	m2	48.17	83.22	4,008.71	71%	34.06	2,834.47	0%	0.00	0.00	71%	34.06	2,834.47	0%	0.00	0.00	14.11	1,174.23	
2.06	CUBIERTAS	m2	1,712.53	35.56	60,897.57	100%	1,712.53	60,897.57	0%	0.00	0.00	100%	1,712.53	60,897.57	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.06.01	COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO ONEZCLA	m2	1,712.53	35.56	60,897.57	100%	1,712.53	60,897.57	0%	0.00	0.00	100%	1,712.53	60,897.57	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.07	CARPINTERIA DE MADERA	m2	88.91	94.30	8,381.21	87%	77.31	7,290.33	0%	0.00	0.00	87%	77.31	7,290.33	0%	0.00	0.00	11.60	1,090.88	
02.07.01	PUERTA APANELADA DE MADERA	m2	28.80	110.09	3,170.59	100%	28.80	3,170.59	0%	0.00	0.00	100%	28.80	3,170.59	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.07.02	TABIQUE DE MELAMINE CON MARCO DE ALUMINIO PARA BARRIOS Y DIVISORES E=5CM	m2	9.60	63.81	612.58	100%	9.60	612.58	0%	0.00	0.00	100%	9.60	612.58	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.07.03	PUERTA DE MELAMINE	m2	9.60	63.81	612.58	100%	9.60	612.58	0%	0.00	0.00	100%	9.60	612.58	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.08	CARPINTERIA DE ALUMINIO	m2	9.60	63.81	612.58	100%	9.60	612.58	0%	0.00	0.00	100%	9.60	612.58	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858



N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR				AVANCES ACTUAL				ACUMULADO				SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	
<b>SUB-PRESUPUESTO 02</b>																					
02.08.01	VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO Y MALLA TIPO RACHEL	m2	136.14	168.10	23,221.33	92%	126.87	21,326.85	0%	0.00	0.00	92%	126.87	21,326.85	8%	11.27	1,894.49				
02.08.02	VENTANA ENROLLABLE DE ALUMINIO	m2	27.52	197.92	5,446.76	100%	27.52	5,446.76	0%	0.00	0.00	100%	27.52	5,446.76	0%	0.00	0.00				
02.08.03	VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TRANSPARENTE TEMPLADO DE 6mm.	m2	109.74	168.10	18,447.29	100%	109.74	18,447.29	0%	0.00	0.00	100%	109.74	18,447.29	0%	0.00	0.00				
02.08.04	PUERTA CORREDIZA 1.20X3.00M.	m2	3.24	583.52	1,890.60	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	3.24	1,890.60				
2.08	CARPINTERIA METALICA																				
02.08.01	PUERTA SISTEMA DE ALTO IMPACTO	m2	48.06	1,310.58	62,986.47	100%	48.06	62,986.47	0%	0.00	0.00	100%	48.06	62,986.47	0%	0.00	0.00				
02.08.02	PUERTA SECCIONABLE TIPO INDUSTRIAL	m2	48.30	1,118.06	54,002.30	100%	48.30	54,002.30	0%	0.00	0.00	100%	48.30	54,002.30	0%	0.00	0.00				
02.08.03	PUERTA METALICA CON MALLA	m2	10.26	287.20	2,946.67	100%	10.26	2,946.67	0%	0.00	0.00	100%	10.26	2,946.67	0%	0.00	0.00				
02.08.04	PORTON METALICO	m2	24.00	429.90	10,317.60	100%	24.00	10,317.60	0%	0.00	0.00	100%	24.00	10,317.60	0%	0.00	0.00				
2.1	CERRAJERIA																				
02.10.01	BISAGRA COLLAR DE AGERO	pza	10.00	40.22	402.20	100%	10.00	402.20	0%	0.00	0.00	100%	10.00	402.20	0%	0.00	0.00				
02.10.02	BISAGRA CAPUCHINA DE 5 1/2" X 5 1/2" METALICA INC. COLOC.	pza	12.00	19.03	228.36	50%	6.00	114.18	0%	0.00	0.00	50%	6.00	114.18	50%	6.00	114.18				
02.10.03	BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" ALUM. INC. COLOC.	pza	40.00	10.43	417.20	100%	40.00	417.20	0%	0.00	0.00	100%	40.00	417.20	0%	0.00	0.00				
02.10.04	BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" X 4" INC. COLOC.	pza	164.00	5.68	931.52	80%	132.00	749.76	0%	0.00	0.00	80%	132.00	749.76	20%	32.00	181.76				
02.10.05	BISAGRA ALUMINIZADA DE 1 1/2" X 1 1/2" INC. COLOC.	pza	40.00	4.46	179.20	100%	40.00	179.20	0%	0.00	0.00	100%	40.00	179.20	0%	0.00	0.00				
02.10.06	CERRADURA 8 GOLPES	pza	1.00	88.44	88.44	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	88.44				
02.10.07	CERRADURA DE 3 GOLPES	pza	32.00	63.29	2,025.28	88%	28.00	1,772.12	0%	0.00	0.00	88%	28.00	1,772.12	13%	4.00	253.16				
02.10.08	CERRADURA DE 2 GOLPES	pza	57.00	63.60	3,625.20	7%	4.00	254.40	0%	0.00	0.00	7%	4.00	254.40	93%	53.00	3,370.80				
2.11	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES																				
02.11.01	CRISTAL TEMPLADO E-8MM	p2	2,705.88	16.55	44,782.31	100%	2,705.88	44,782.31	0%	0.00	0.00	100%	2,705.88	44,782.31	0%	0.00	0.00				
02.11.02	ESPEJOS DE 4MM BISELAO EMPOTRADO	m2	10.41	6.06	63.08	100%	10.41	63.08	0%	0.00	0.00	100%	10.41	63.08	0%	0.00	0.00				
02.12	PINTURA																				
02.12.01	PINTURA LATEX EN CIELO RASO Y VIGAS	m2	2,360.43	31.98	75,486.55	63%	1,483.55	47,443.82	0%	0.00	0.00	63%	1,483.55	47,443.82	37%	876.88	28,042.73				
02.12.02	PINTURA CON EPOXICO EN CHERLOSAS Y VIGAS	m2	537.12	16.04	8,615.40	100%	537.12	8,615.40	0%	0.00	0.00	100%	537.12	8,615.40	0%	0.00	0.00				
02.12.03	PINTURA EPOXICA EN MUROS Y COLUMNAS	m2	1,216.32	11.88	14,449.88	100%	1,216.32	14,449.88	0%	0.00	0.00	100%	1,216.32	14,449.88	0%	0.00	0.00				
02.12.04	PINTURA LATEX EN MUROS Y COLUMNAS	m2	2,340.38	7.76	18,161.35	100%	2,340.38	18,161.34	0%	0.00	0.00	100%	2,340.38	18,161.34	0%	0.00	0.00				
02.12.05	PINTURA CON EPOXICO EN PUERTAS METALICAS	m2	223.08	19.55	4,361.21	100%	223.08	4,361.21	0%	0.00	0.00	100%	223.08	4,361.21	0%	0.00	0.00				
02.12.06	PINTURA AL DICO EN CARPINTERIA DE MADERA	m2	93.29	62.24	5,806.37	100%	93.29	5,806.37	0%	0.00	0.00	100%	93.29	5,806.37	0%	0.00	0.00				
2.13	VARIOS																				
02.13.01	PROTECCION DE BORDE DE PLATAFORMA	m	24.55	66.96	1,643.87	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	24.55	1,643.87				
02.13.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRIGO RETRACTIL	und	48.30	5,000.00	241,500.00	100%	48.30	241,500.00	0%	0.00	0.00	100%	48.30	241,500.00	0%	0.00	0.00				
02.13.03	CHAMALETA CON REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO REFORZADO	m	334.97	13.54	4,535.49	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	334.97	4,535.49				
02.13.04	CORTINA TRASLAPE DE PVC	m2	15.96	49.18	784.91	100%	15.96	784.91	0%	0.00	0.00	100%	15.96	784.91	0%	0.00	0.00				
02.13.05	JUNTAS DE DILATACION CON ASPALTO E-1"	m	768.15	6.00	4,608.90	67%	513.15	3,078.90	0%	0.00	0.00	67%	513.15	3,078.90	33%	255.00	1,530.00				
02.13.06	JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPOR E-1"	m	106.25	15.46	1,642.63	100%	106.25	1,642.63	0%	0.00	0.00	100%	106.25	1,642.63	0%	0.00	0.00				
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>					<b>1,120,703.82</b>			<b>1,036,896.11</b>		<b>0.00</b>				<b>1,036,896.11</b>			<b>83,806.72</b>				
<b>GASTOS GENERALES (8.25 %)</b>					<b>92,458.07</b>			<b>85,544.09</b>		<b>0.00</b>				<b>85,544.09</b>			<b>6,913.97</b>				
<b>UTILIDAD (8.00 %)</b>					<b>89,656.31</b>			<b>82,951.85</b>		<b>0.00</b>				<b>82,951.85</b>			<b>6,704.46</b>				
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					<b>1,302,818.20</b>			<b>1,205,394.05</b>		<b>0.00</b>				<b>1,205,394.05</b>			<b>97,424.15</b>				
<b>I.G.V. (18.0 %)</b>					<b>234,307.28</b>			<b>216,970.93</b>		<b>0.00</b>				<b>216,970.93</b>			<b>17,536.35</b>				
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					<b>1,537,125.48</b>			<b>1,422,364.98</b>		<b>0.00</b>				<b>1,422,364.98</b>			<b>114,960.50</b>				
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (SIN IGV)</b>					<b>1,302,818.20</b>			<b>1,205,394.05</b>		<b>0.00</b>				<b>1,205,394.05</b>			<b>97,424.15</b>				
<b>I.G.V. (18.0 %)</b>					<b>234,307.28</b>			<b>216,970.93</b>		<b>0.00</b>				<b>216,970.93</b>			<b>17,536.35</b>				
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (CON IGV)</b>					<b>1,537,125.48</b>			<b>1,422,364.98</b>		<b>0.00</b>				<b>1,422,364.98</b>			<b>114,960.50</b>				

CARLOS ENRIQUE QUIROZ GONZALEZ  
INGENIERO CIVIL  
C.O. CIVIL N° 2388-88

ISAÍAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

**VALORIZACION DE OBRA N° 45 - SETIEMBRE 2018 (FORMULA 03 - INSTALACIONES ELECTRICAS)**

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE

OBRA : FONDEPES  
 ENTIDAD : CONSORCIO SAN JOSE  
 CONTRATISTA : 30 DE SETIEMBRE DEL 2018

Monto Base : S/. 33,504,650.56  
 Monto Contratado : S/. 32,457,630.22  
 Fecha Inicio Obra : 15-ene-15  
 Plazo de Ejecución : 1,158 Días C.  
 Fecha Final Obra : 17-mar-18  
 Mod. de Ejecución : Precios Unitarios

Residente : Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros  
 Supervisor : Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza  
 SEGUN COSTO DIRECTO : S/. 0.00  
 Monto Valorizado del Mes : S/. 216,685.47  
 Monto Valorizado Acumulado : S/. 344,621.07  
 Monto-Salida por Valorizar : S/. 344,621.07

Ubicación : LAMBAYEQUE  
 Región : LAMBAYEQUE  
 Provincia : SAN JOSE  
 Distrito : SAN JOSE  
 Localidad : SAN JOSE

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCES ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
		Unid.	Metrado	P. Unitario	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.
03	SUB-PRESUPUESTO 03															
03.01	INSTALACIONES ELECTRICAS															
03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m	3,494.65		98%	3,424.32	4828.29	0%	0.00	0.00	98%	3,424.32	4,828.29	2%	70.33	59.17
03.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m	3,494.65	2.40	98%	3,424.32	8218.37	0%	0.00	0.00	98%	3,424.32	8,218.37	2%	70.33	168.79
03.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO															
03.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	793.12	27.38	73%	581.86	15931.22	0%	0.00	0.00	73%	581.86	15,931.22	27%	211.26	5,784.41
03.02.02	EXCAVACION DE ZANJA PARA RED DE TUBERIA	m3	549.42	48.08	71%	391.62	18829.16	0%	0.00	0.00	71%	391.62	18,829.16	29%	157.80	7,586.95
03.02.03	RELLENO DE ZANJAS Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	316.81	14.38	78%	247.30	3556.24	0%	0.00	0.00	78%	247.30	3,556.24	22%	69.51	999.48
03.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 15 M3															
03.03.01	SALIDA DE ILUMINACION	pto	229.00	19.47	100%	229.00	4458.63	0%	0.00	0.00	100%	229.00	4,458.63	0%	0.00	0.00
03.04	SALIDA PARA ALUMBRADO															
03.04.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR	pta	38.00	28.95	100%	38.00	1100.10	0%	0.00	0.00	100%	38.00	1,100.10	0%	0.00	0.00
03.04.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pta	14.00	31.61	100%	14.00	442.54	0%	0.00	0.00	100%	14.00	442.54	0%	0.00	0.00
03.04.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pta	5.00	32.76	100%	5.00	163.80	0%	0.00	0.00	100%	5.00	163.80	0%	0.00	0.00
03.04.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE COMUTACION	pta	2.00	26.36	100%	2.00	52.72	0%	0.00	0.00	100%	2.00	52.72	0%	0.00	0.00
03.05	SALIDA PARA TOMACORRIENTE															
03.05.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON UN TOMACORRIENTE	pta	116.00	25.63	100%	116.00	2973.08	0%	0.00	0.00	100%	116.00	2,973.08	0%	0.00	0.00
03.06	SALIDA DE FUERZA															
03.06.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR	pta	10.00	80.62	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	10.00	806.20
03.06.02	SALIDA PARA VOZ Y DATA	pta	4.00	13.19	100%	4.00	52.76	0%	0.00	0.00	100%	4.00	52.76	0%	0.00	0.00
03.07	EQUIPOS DE ILUMINACION															
03.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE RECT. PARA ADOSAR 2X36W	und	112.00	133.77	100%	112.00	14982.24	0%	0.00	0.00	100%	112.00	14,982.24	0%	0.00	0.00
03.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE CIRCULAR PARA ADOSAR 32W	und	21.00	109.67	100%	21.00	2303.07	0%	0.00	0.00	100%	21.00	2,303.07	0%	0.00	0.00
03.07.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAQUETE DE ILUMINACION	und	87.00	75.81	100%	87.00	6595.47	0%	0.00	0.00	100%	87.00	6,595.47	0%	0.00	0.00
03.07.04	SUMINISTRO DE POSTES DE C.A.C. DE 8 MT. CON SIMPLE PASTORAL CON EQUIPO DE ILM	und	116.00	1,073.59	47%	55.00	59047.45	0%	0.00	0.00	47%	55.00	59,047.45	53%	61.00	65,486.99
03.07.05	SUM. DE POSTES DE C.A.C. DE 8 MT. CON SIMPLE PASTORAL C/EQUIPO DE ILM. DE 200W	und	5.00	1,628.99	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	5.00	8,142.95
03.08	TABLETOS Y CUCHILLAS															
03.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 38 POLOS - TRIFASICO	und	7.00	399.03	100%	7.00	2793.21	0%	0.00	0.00	100%	7.00	2,793.21	0%	0.00	0.00
03.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 24 POLOS - TRIFASICO	und	4.00	360.73	100%	4.00	1442.92	0%	0.00	0.00	100%	4.00	1,442.92	0%	0.00	0.00
03.08.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO TORNILLO MONOF. 16 AMP.	und	36.00	42.60	86%	31.00	1320.60	0%	0.00	0.00	86%	31.00	1,320.60	14%	5.00	213.00
03.08.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO TORNILLO MONOF. 30 AMP.	und	7.00	42.60	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	7.00	298.20
03.08.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO TORNILLO TRIF. 16 AMP.	und	2.00	107.80	100%	2.00	323.40	0%	0.00	0.00	100%	2.00	323.40	0%	0.00	0.00
03.08.06	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO TORNILLO TRIF. 20 AMP.	und	3.00	107.80	33%	1.00	215.60	0%	0.00	0.00	33%	1.00	215.60	67%	4.00	431.20
03.08.07	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO TORNILLO TRIF. 30 AMP.	und	5.00	107.80	100%	5.00	107.80	0%	0.00	0.00	100%	5.00	107.80	0%	0.00	0.00
03.08.08	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO TORNILLO TRIF. 50 AMP.	und	1.00	107.80	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	107.80
03.08.09	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO TORNILLO TRIF. 60 AMP.	und	1.00	107.80	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	107.80
03.08.10	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO TORNILLO TRIF. 250 AMP.	und	1.00	359.51	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	359.51

INGENIERO CIVIL  
 TOPOGRAFIA  
 28-05-2018

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR				ACTUAL				ACUMULADO				SALDO		
		Unid.	Metro	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metro	Valorizado S/.	%	Metro	Valorizado S/.	%	Metro	Valorizado S/.	%	Metro	Valorizado S/.	%	Metro	Valorizado S/.
		03.08.11	SUB-PRESUPUESTO 03																	
03.08.12	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO TORNILLO TRIF. 300 AMP.	und	1.00	399.51	399.51	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	1.00	399.51	
03.08.13	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x2A - 30m	und	37.00	227.80	8,428.60	100%	37.00	8,428.60	0%	0.00	0.00	0%	37.00	8,428.60	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.09	INTERRUPTOR HORARIO	und	1.00	274.69	274.69	100%	1.00	274.69	0%	0.00	0.00	0%	1.00	274.69	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.09.01	TUBERIAS DE PVC	m	965.66	2.43	2,346.55	100%	965.66	2,346.55	0%	0.00	0.00	0%	965.66	2,346.55	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.09.02	TUBERIA TIPO PVC S&P D=15mm	m	526.50	3.28	1,726.92	100%	526.50	1,726.92	0%	0.00	0.00	0%	526.50	1,726.92	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.09.03	TUBERIA TIPO PVC S&P D=20mm	m	236.64	3.37	804.22	49%	118.10	398.00	0%	0.00	0.00	49%	118.10	398.00	0%	0.00	0.00	120.54	406.22	
03.09.04	TUBERIA TIPO PVC S&P D=25mm	m	95.88	18.87	1,809.26	100%	95.88	1,809.26	0%	0.00	0.00	0%	95.88	1,809.26	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.09.05	TUBERIA TIPO PVC S&P D=100mm	m	12.00	35.06	420.72	100%	12.00	420.72	0%	0.00	0.00	0%	12.00	420.72	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1	CABLES LSOH																			
03.10.01	CABLE 2-1x2.5mm2 LSOH	m	966.66	5.44	5,258.63	100%	966.66	5,258.63	0%	0.00	0.00	0%	966.66	5,258.63	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.10.02	CABLE 2-1x4.0mm2 + 1x2.50mm2 LSOH	m	103.10	9.80	1,010.38	100%	103.10	1,010.38	0%	0.00	0.00	0%	103.10	1,010.38	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.10.03	CABLE 2-1x4.0mm2 LSOH + 1x4.0mm2 LSOH	m	336.85	10.12	3,408.92	100%	336.85	3,408.92	0%	0.00	0.00	0%	336.85	3,408.92	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.10.04	CABLE 3-1x2.5mm2 + 1x2.5mm2 LSOH	m	1,034.85	8.96	9,272.26	1%	15.07	135.03	0%	0.00	0.00	1%	15.07	135.03	0%	0.00	0.00	1,019.78	9,137.23	
03.10.05	CABLE 3-1x4.0mm2 + 1x4.0mm2 LSOH	m	96.30	12.95	1,247.09	19%	18.00	233.10	0%	0.00	0.00	19%	18.00	233.10	0%	0.00	0.00	78.30	1,013.99	
03.10.06	CABLE 3-1x6.0mm2 + 1x4.0mm2 LSOH	m	6.55	15.37	100.67	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	6.55	100.67	
03.10.07	CABLE 3-1x6mm2+1x6mm2 LSOH	m	25.90	16.84	436.16	19%	4.92	82.85	0%	0.00	0.00	19%	4.92	82.85	0%	0.00	0.00	20.98	353.30	
3.11	CABLES NY																			
03.11.01	CABLE 2-1x4.0mm2 + 1x4.0mm2 NY	m	3.35	15.77	52.83	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	3.35	52.83	
03.11.02	CABLE 2-1x6mm2+1x6mm2 NY	m	213.50	21.77	4,647.90	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	213.50	4,647.90	
03.11.03	CABLE 2-1x10mm2+1x10mm2 NY	m	25.14	27.44	689.84	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	25.14	689.84	
03.11.04	CABLE 3-1x10mm2+1x10mm2 NY	m	95.00	332.16	31,555.20	100%	95.00	31,555.20	0%	0.00	0.00	0%	95.00	31,555.20	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.11.05	CABLE 3-1x6mm2+1x6mm2 NY	m	76.80	16.93	1,300.22	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	76.80	1,300.22	
03.11.06	CABLE 3-1x7.5mm2+1x7.5mm2 NY	m	98.60	198.31	19,553.37	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	98.60	19,553.37	
03.11.07	CABLE 3-1x17.5mm2 + 1x17.5mm2 NY	m	5.00	307.51	1,537.55	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	5.00	1,537.55	
03.11.08	CABLE 3-1x200mm2 + 300mm2 NY	m	10.00	429.31	4,293.10	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	10.00	4,293.10	
3.12	PUZOS																			
03.12.01	POZO PUESTA A TIERRA	und	3.00	992.21	2,976.63	100%	3.00	2,976.63	0%	0.00	0.00	0%	3.00	2,976.63	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.13	DISTRIBUCION DE ENERGIA																			
03.13.01	INSTALACION DE LINEAS DE MEDIA TENSION Y CONEXION A SUBESTACION	und	1.00	70,023.41	70,023.41	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	1.00	70,023.41	
03.13.02	INSTALACION DE CELDAS DE MEDIA TENSION CON EQUIPOS DE SECCIONAMIENTO Y PRO	und	1.00	42,580.19	42,580.19	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	1.00	42,580.19	
03.13.03	INSTALACION TRANSFORMADOR DE 200 KVA	und	1.00	40,307.87	40,307.87	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	1.00	40,307.87	
03.13.04	INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO BRW	und	1.00	57,531.62	57,531.62	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	1.00	57,531.62	
3.14	CAJAS DE PASE																			
03.14.01	SALIDA PARA CAJA DE PASE EN TECHO O PARED	pto	48.00	19.22	922.56	100%	48.00	922.56	0%	0.00	0.00	0%	48.00	922.56	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.14.02	CAJA DE PASE CUADRADA	und	31.00	29.70	920.70	100%	31.00	920.70	0%	0.00	0.00	0%	31.00	920.70	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.14.03	DUCTO DE CONCRETO DE 2 WAS	und	12.00	54.92	659.04	100%	12.00	659.04	0%	0.00	0.00	0%	12.00	659.04	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.15	PRUEBAS ELECTRICAS																			
03.15.01	PRUEBAS ELECTRICAS	und	1.00	4,379.02	4,379.02	100%	1.00	4,379.02	0%	0.00	0.00	0%	1.00	4,379.02	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>				<b>561,506.56</b>				<b>216,685.47</b>			<b>0.00</b>			<b>216,685.47</b>			<b>344,621.07</b>			
<b>GASTOS GENERALES (8.25 %)</b>				<b>46,307.79</b>				<b>17,876.55</b>			<b>0.00</b>			<b>17,876.55</b>			<b>28,431.24</b>			
<b>UTILIDAD (8.00%)</b>				<b>44,904.52</b>				<b>17,334.84</b>			<b>0.00</b>			<b>17,334.84</b>			<b>27,569.69</b>			
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>				<b>652,518.87</b>				<b>251,896.86</b>			<b>0.00</b>			<b>251,896.86</b>			<b>400,622.00</b>			
<b>I.G.V. (18.0 %)</b>				<b>117,453.40</b>				<b>45,341.43</b>			<b>0.00</b>			<b>45,341.43</b>			<b>72,111.96</b>			
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>				<b>769,972.27</b>				<b>297,238.29</b>			<b>0.00</b>			<b>297,238.29</b>			<b>472,733.96</b>			
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (SIN IGV)</b>				<b>652,518.87</b>				<b>251,896.86</b>			<b>0.00</b>			<b>251,896.86</b>			<b>400,622.00</b>			
<b>I.G.V. (18.0 %)</b>				<b>117,453.40</b>				<b>45,341.43</b>			<b>0.00</b>			<b>45,341.43</b>			<b>72,111.96</b>			
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (CON IGV)</b>				<b>769,972.27</b>				<b>297,238.29</b>			<b>0.00</b>			<b>297,238.29</b>			<b>472,733.96</b>			

SAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

VALORIZACION DE OBRA N° 45 - SETIEMBRE 2018 (FORMULA 04 - INSTALACIONES SANITARIAS)

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE

OBRA : FONDEPES  
ENTIDAD : CONSORCIO SAN JOSE  
FECHA : 30 DE SETIEMBRE DEL 2018

Monto Base S/. 33,504,650.56  
Monto Contratado S/. 32,457,630.22  
Fecha Inicio Obra 15-ene-15  
Fecha de Ejecución 1,158 Dias C.  
Fecha Final Obra 17-mar-18  
Mod. de Ejecución Precios Unitarios

Responsable Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros  
Supervisor Ing. Carlos Jorge Alva Espinoza  
SECCION COSTO DIRECTO : S/. 0.00  
Monto Valorizado del Mes : S/. 906,509.95  
Monto Valorizado Acumulado : S/. 178,094.03  
Monto-Saldo por Valorizar : S/. 178,094.03

Región : LAMBAYEQUE  
Provincia : LAMBAYEQUE  
Distrito : SAN JOSE  
Localidad : SAN JOSE

Table with columns: N°, DESCRIPCION, PRESUPUESTO (Unid., Metrado, P. Unitario, Presupuesto S/.), AVANCES (ACUMULADO ANTERIOR, ACTUAL, ACUMULADO), and SALDO (Metrado, Valorizado S/., %). Rows include items like SUB-PRESUPUESTO 04, INSTALACIONES SANITARIAS, SISTEMA DE DESAGUE DOMESTICO, etc.


CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
R.C. QUITO Nº 22858  
CARLOS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 10717


N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCES ACTUAL			SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.
04.01.06.03	SUB-PRESUPUESTO 04													
04.01.06.04	REGISTROS DE BRONCE CROMADO DE 2"	pza	1.00	19.31	19.31	100%	1.00	19.31	0%	0.00	0%	1.00	19.31	0%
04.01.06.05	REGISTROS DE BRONCE CROMADO 3"	pza	4.00	30.24	120.96	100%	4.00	120.96	0%	0.00	0%	4.00	120.96	0%
04.01.06.06	REGISTROS DE BRONCE CROMADO DE 4"	pza	11.00	24.48	269.28	100%	11.00	269.28	0%	0.00	0%	11.00	269.28	0%
04.01.06.07	TRAMPA TP PVC PARA DESAGUE DE 2"	und	43.00	9.93	426.99	35%	15.00	148.95	0%	0.00	0%	15.00	148.95	0%
04.01.07.01	CAMARA DE INSPECCION	und	14.00	15.97	223.58	100%	14.00	223.58	0%	0.00	0%	14.00	223.58	0%
04.01.07.02	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" C/TAPA DE CONCRETO	pza	8.00	156.97	1,255.76	100%	8.00	1,255.76	0%	0.00	0%	8.00	1,255.76	0%
04.01.08	CAJA DE REGISTRO DESAGUE 18" X 24" C/TAPA DE CONCRETO	pza	2.00	190.97	381.94	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	0%
04.01.08.01	EMPALME LIMPIEZA Y DESINFECCION	und	1.00	192.61	192.61	100%	1.00	192.61	0%	0.00	0%	1.00	192.61	0%
04.01.08.02	LIMPIEZA Y PRUEBA HIDRAULICAS DE RED DE DESAGUE	m	105.65	2.54	268.35	100%	105.65	268.35	0%	0.00	0%	105.65	268.35	0%
04.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES													
04.02.01.01	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	m2	468.30	2.40	1,123.92	26%	121.77	292.25	0%	0.00	0%	121.77	292.25	74%
04.02.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
04.02.02.02	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO	m3	328.09	30.75	10,088.77	27%	87.49	2,690.29	0%	0.00	0%	87.49	2,690.29	73%
04.02.02.03	RELLENO DE ZANJAS Y COMPACTADO	m3	185.20	48.08	8,904.42	25%	45.72	2,198.22	0%	0.00	0%	45.72	2,198.22	75%
04.02.02.04	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/TUB CAVAS	m2	468.30	1.51	707.13	26%	121.77	183.87	0%	0.00	0%	121.77	183.87	74%
04.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 15 M3	m3	185.71	14.38	2,670.51	29%	54.30	780.83	0%	0.00	0%	54.30	780.83	71%
04.02.03.01	SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION													
04.02.04	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL DE 2"	pbo	20.00	41.88	837.60	100%	20.00	837.60	0%	0.00	0%	20.00	837.60	0%
04.02.04.01	TUBERIAS DE DESAGUE													
04.02.04.02	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4"	m	1,123.37	14.09	15,826.28	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	0%
04.02.04.03	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 3"	m	4.39	13.61	59.75	100%	4.39	59.75	0%	0.00	0%	4.39	59.75	100%
04.02.05	ACCESORIOS DE REDES	m	29.94	12.73	381.14	100%	29.94	381.14	0%	0.00	0%	29.94	381.14	0%
04.02.05.01	YEE DE PVC SAL DE 3" A 2"	und	2.00	14.00	28.00	100%	2.00	28.00	0%	0.00	0%	2.00	28.00	0%
04.02.05.02	YEE DE PVC SAL DE 2" A 2"	und	7.00	12.60	88.20	100%	7.00	88.20	0%	0.00	0%	7.00	88.20	0%
04.02.05.03	CODO DE PVC SAL DE 2" X 90°	und	8.00	24.05	192.40	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	0%
04.02.05.04	ADITAMIENTOS VARIOS	und	23.00	22.28	512.44	100%	23.00	512.44	0%	0.00	0%	23.00	512.44	0%
04.02.06.01	SUMIDERO BRONCE CROMADO DE 4"	und	11.00	31.75	349.25	27%	3.00	95.25	0%	0.00	0%	3.00	95.25	73%
04.02.06.02	SUMIDERO BRONCE CROMADO DE 3"	und	1.00	18.95	18.95	100%	1.00	18.95	0%	0.00	0%	1.00	18.95	0%
04.02.06.03	SUMIDERO BRONCE CROMADO DE 2"	und	6.00	19.21	115.26	83%	5.00	96.05	0%	0.00	0%	5.00	96.05	17%
04.02.06.04	TRAMPA TP PVC 2"	und	20.00	15.97	319.40	50%	10.00	159.70	0%	0.00	0%	10.00	159.70	50%
04.02.07.01	CAMARA DE INSPECCION													
04.02.07.02	CAJA DE REGISTRO 18" X 24" C/TAPA DE CONCRETO	pza	12.00	190.97	2,291.64	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	0%
04.02.08	EMPALME LIMPIEZA Y DESINFECCION													
04.02.08.01	EMPALME A RED EXISTENTE DE ALCANTARILLADO	pza	11.00	156.97	1,726.67	100%	11.00	1,726.67	0%	0.00	0%	11.00	1,726.67	0%
04.02.08.02	LIMPIEZA Y PRUEBA HIDRAULICAS DE RED DE DESAGUE	und	1.00	192.61	192.61	100%	1.00	192.61	0%	0.00	0%	1.00	192.61	0%
04.03	SISTEMA DE AGUA FRIA	m	691.15	2.54	1,755.52	41%	285.72	725.72	0%	0.00	0%	285.72	725.72	59%
04.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES													
04.03.01.01	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	m	1,456.31	2.40	3,495.14	49%	707.63	1,698.31	0%	0.00	0%	707.63	1,698.31	51%
04.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
04.03.02.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES SANITARIAS	m	1,456.31	24.64	35,883.48	49%	707.63	17,436.00	0%	0.00	0%	707.63	17,436.00	51%
04.03.02.02	RELLENO DE ZANJAS Y COMPACTADO	m	42.28	61,572.79	2,617,299.48	49%	707.63	2,991,680.00	0%	0.00	0%	707.63	2,991,680.00	51%
04.03.02.03	REFINE Y NIVELACION ZANJA PARA TUBERIA	m	1,456.31	1.25	1,820.39	49%	707.63	884.54	0%	0.00	0%	707.63	884.54	51%
04.03.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 15 M3	m3	37.86	14.38	544.43	97%	36.80	529.18	0%	0.00	0%	36.80	529.18	3%
04.03.03	SALIDAS													
04.03.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC-SAP C-10 DE 1/2"	pbo	80.00	26.95	2,156.00	100%	80.00	2,156.00	0%	0.00	0%	80.00	2,156.00	0%
04.03.03.02	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC-SAP C-10 3/4"	pbo	6.00	36.02	216.12	100%	6.00	216.12	0%	0.00	0%	6.00	216.12	0%
04.03.04	REDES DE ALIMENTACION DE AGUA FRIA													

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP. N° 10717



N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR				AVANCES ACTUAL				ACUMULADO				SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	
																					Metrado
04.03.04.01	SUB-PRESUPUESTO 04																				
04.03.04.02	TUBERIA PVC C-10 DE 2 1/2"	m	11.32	19.79	224.02	44%	5.00	96.95	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	5.00	98.95	44%	5.00	98.95	
04.03.04.03	TUBERIA PVC C-10 DE 2"	m	96.94	15.85	1,536.50	100%	96.94	1,536.50	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	96.94	1,536.50	100%	96.94	1,536.50	
04.03.04.04	TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4"	m	18.24	11.30	206.11	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
04.03.04.05	TUBERIA PVC C-10 DE 1"	m	52.89	9.95	526.26	100%	52.89	526.26	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	52.89	526.26	100%	52.89	526.26	
04.03.04.06	TUBERIA PVC C-10 DE 3/4"	m	55.82	6.57	369.07	17%	9.47	66.01	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	9.47	66.01	17%	9.47	66.01	
04.03.04.07	TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"	m	1,019.71	6.52	6,648.51	27%	274.47	1,789.54	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	274.47	1,789.54	27%	274.47	1,789.54	
04.03.05	ACCESORIOS DE REDES	m	227.71	4.88	1,111.22	62%	140.94	687.79	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	140.94	687.79	62%	140.94	687.79	
04.03.05.01	CODO DE PVC DE 1/2"	und	105.00	3.92	411.60	91%	96.00	376.32	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	96.00	376.32	91%	96.00	376.32	
04.03.05.02	CODO DE PVC DE 3/4"	und	18.00	3.93	70.74	100%	18.00	70.74	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	18.00	70.74	100%	18.00	70.74	
04.03.05.03	CODO DE PVC DE 1"	und	2.00	4.18	8.36	100%	2.00	8.36	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	2.00	8.36	100%	2.00	8.36	
04.03.05.04	CODO DE PVC DE 1 1/4"	und	4.00	4.72	18.88	100%	4.00	18.88	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	4.00	18.88	100%	4.00	18.88	
04.03.05.05	CODO DE PVC DE 2"	und	4.00	5.33	21.32	100%	4.00	21.32	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	4.00	21.32	100%	4.00	21.32	
04.03.05.06	CODO DE PVC DE 2 1/2"	und	3.00	6.31	18.93	67%	2.00	12.62	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	2.00	12.62	67%	2.00	12.62	
04.03.05.07	TEE DE PVC DE 1/2"	und	13.00	3.92	50.96	69%	9.00	35.28	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	9.00	35.28	69%	9.00	35.28	
04.03.05.08	TEE DE PVC DE 3/4"	und	33.00	4.47	147.51	100%	33.00	147.51	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	33.00	147.51	100%	33.00	147.51	
04.03.05.09	REDUCCIONES DE PVC DE 2" - 1 1/2"	und	8.00	8.12	64.96	88%	7.00	56.84	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	7.00	56.84	88%	7.00	56.84	
04.03.05.10	REDUCCION DE PVC DE 2" - 1 1/4"	und	1.00	22.97	22.97	100%	1.00	22.97	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	1.00	22.97	100%	1.00	22.97	
04.03.05.11	REDUCCION DE PVC DE 1 1/2" - 1"	und	1.00	22.97	22.97	100%	1.00	22.97	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	1.00	22.97	100%	1.00	22.97	
04.03.05.12	REDUCCION DE PVC DE 1 1/2" - 3/4"	und	3.00	22.31	66.93	33%	1.00	22.31	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	1.00	22.31	33%	1.00	22.31	
04.03.05.13	REDUCCION DE PVC DE 1 1/2" - 1/2"	und	1.00	22.31	22.31	100%	1.00	22.31	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	1.00	22.31	100%	1.00	22.31	
04.03.05.14	REDUCCION DE PVC DE 1 1/4" - 1"	und	1.00	22.31	22.31	100%	1.00	22.31	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	1.00	22.31	100%	1.00	22.31	
04.03.05.15	REDUCCION DE PVC DE 1" - 3/4"	und	4.00	22.21	88.84	100%	4.00	88.84	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	4.00	88.84	100%	4.00	88.84	
04.03.05.16	REDUCCION DE PVC DE 1" - 1/2"	und	8.00	22.31	178.48	63%	5.00	111.55	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	5.00	111.55	63%	5.00	111.55	
04.03.05.17	REDUCCION DE PVC DE 2" - 3/4"	und	2.00	26.71	53.42	100%	2.00	53.42	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	2.00	53.42	100%	2.00	53.42	
04.03.05.18	REDUCCION DE PVC DE 2" - 1/2"	und	1.00	22.71	22.71	100%	1.00	22.71	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	1.00	22.71	100%	1.00	22.71	
04.03.05.19	REDUCCION DE PVC DE 3/4" - 1/2"	und	36.00	22.11	795.96	100%	36.00	795.96	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	36.00	795.96	100%	36.00	795.96	
04.03.06	LLAVES Y VALVULAS																				
04.03.06.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4"	und	15.00	233.08	3,496.20	100%	15.00	3,496.20	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	15.00	3,496.20	100%	15.00	3,496.20	
04.03.06.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 1/2"	und	3.00	88.74	266.22	100%	3.00	266.22	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	3.00	266.22	100%	3.00	266.22	
04.03.06.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 2"	und	1.00	309.67	309.67	100%	1.00	309.67	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	1.00	309.67	100%	1.00	309.67	
04.03.06.04	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 2"	und	1.00	141.16	141.16	100%	1.00	141.16	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	1.00	141.16	100%	1.00	141.16	
04.03.06.05	GRIFO DE RIEGO DE 3/4"	und	16.00	48.04	768.64	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
4.04	SISTEMA DE AGUA SALADA																				
04.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES																				
04.04.01.01	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	m	324.43	2.40	778.63	21%	67.60	162.24	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	67.60	162.24	21%	67.60	162.24	
04.04.02	SALIDA DE AGUA SALADA																				
04.04.02.01	SALIDA DE AGUA SALADA TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"	pto	48.00	26.95	1,293.60	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
04.04.03	REDES DE ALIMENTACION DE AGUA SALADA																				
04.04.03.01	TUBERIA PVC C-10 DE 3"	m	917.30	23.34	21,409.78	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
04.04.03.02	TUBERIA PVC C-10 DE 2 1/2"	m	9.75	19.79	192.95	57%	5.60	110.82	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	5.60	110.82	43%	5.60	110.82	
04.04.03.03	TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/2"	m	6.30	11.30	71.19	32%	2.00	22.60	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	2.00	22.60	32%	2.00	22.60	
04.04.03.04	TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4"	m	112.07	9.95	1,115.10	100%	112.07	1,115.10	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	112.07	1,115.10	100%	112.07	1,115.10	
04.04.03.05	TUBERIA PVC C-10 DE 1"	m	21.60	6.97	150.55	9%	2.00	13.94	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	2.00	13.94	9%	2.00	13.94	
04.04.03.06	TUBERIA PVC C-10 DE 3/4"	m	7.20	6.52	46.94	43%	3.10	20.21	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	3.10	20.21	43%	3.10	20.21	
04.04.03.07	TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"	m	7.20	4.88	35.14	33%	2.40	11.71	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	2.40	11.71	33%	2.40	11.71	
04.04.04	ACCESORIOS DE REDES																				
04.04.04.01	CRUZ DE PVC 1 1/4"	und	3.00	5.22	15.66	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
04.04.04.02	CRUZ DE PVC 3/4"	und	3.00	4.82	14.46	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
04.04.04.03	CRUZ DE PVC 1/2"	und	1.00	4.48	4.48	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
04.04.04.04	CRUZ DE PVC 1/2"	und	1.00	4.09	4.09	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
04.04.04.05	CODO DE PVC DE 3"	und	5.00	6.22	31.10	20%	1.00	6.22	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	1.00	6.22	20%	1.00	6.22	


  
**CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 228558


  
**SAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCES ACTUAL			ACUMULADO			SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.
<p style="text-align: center;"><b>ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA</b>  <b>INGENIERO CIVIL</b>  <b>Reg. CIP N° 10717</b></p>																	
<b>SUB-PRESUPUESTO 04</b>																	
04.04.04.06	CODO DE PVC DE 2 1/2"	und	3.00	6.31	18.93	33%	1.00	6.31	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	2.00	12.62
04.04.04.07	CODO DE PVC DE 1 1/2"	und	2.00	4.92	9.84	50%	1.00	4.92	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	1.00	4.92
04.04.04.08	CODO DE PVC DE 1 1/4"	und	10.00	4.72	47.20	100%	10.00	47.20	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.04.04.09	CODO DE PVC DE 1/2"	und	144.00	3.92	564.48	2%	3.00	11.76	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	552.72
04.04.04.10	TEE DE PVC DE 1 1/4"	und	3.00	5.12	15.36	100%	3.00	15.36	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.04.04.11	TEE DE PVC DE 1"	und	3.00	4.92	14.76	67%	2.00	9.84	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	1.00	4.92
04.04.04.12	TEE DE PVC DE 3/4"	und	1.00	4.47	4.47	100%	1.00	4.47	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.04.04.13	TEE DE PVC DE 1/2"	und	24.00	3.92	94.08	13%	3.00	11.76	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.04.04.14	REDUCCION DE PVC DE 1 1/2" - 1 1/4"	und	1.00	22.46	22.46	100%	1.00	22.46	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.04.04.15	REDUCCION DE PVC DE 1 1/4" - 1/2"	und	9.00	22.46	202.14	22%	2.00	44.92	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.04.04.16	REDUCCION DE PVC DE 1 1/4" - 1"	und	2.00	22.31	44.62	100%	2.00	44.62	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.04.04.17	REDUCCION DE PVC DE 1" - 3/4"	und	2.00	22.21	44.42	100%	2.00	44.42	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.04.04.18	REDUCCION DE PVC DE 3/4" - 1/2"	und	2.00	22.11	44.22	50%	1.00	22.11	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.04.06	LLAVES Y VALVULAS																
04.04.06.01	VALVULA COMPLETA DE BRONCE ROSCADA DE 3"	und	1.00	205.43	205.43	100%	1.00	205.43	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.04.06.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE 1/2"	und	48.00	214.04	10,273.92	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	48.00	10,273.92
04.04.06.03	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/4"	und	1.00	154.61	154.61	100%	1.00	154.61	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.04.06	ACCESORIOS																
04.04.06.01	ACCESORIOS PARA CASETA DE VALVULAS DE AGUA SALADA Y AGUA POTABLE	GLB	1.00	6,912.42	6,912.42	100%	1.00	6,912.42	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.04.07	PRUEBA HIDRAULICA																
04.04.07.01	PRUEBAS HIDROSTATICAS Y DE OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA FRIA Y DESI	m	1,081.42	3.17	3,428.10	18%	190.01	602.33	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	891.41	2,825.77
04.04.08	OTROS																
04.04.08.01	VIGUETAS DE ACERO 1/2"	m	54.56	43.26	2,360.27	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	54.56	2,360.27
04.05	EMISOR SUBMARINO																
04.05.01	SUMINISTRO DE TUBERIA LISA HDPE DE 6"	m	3,455.00	90.64	313,161.20	100%	3,455.00	313,161.20	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.05.01.01	SUMINISTRO DE TUBERIA LISA HDPE DE 6"	m	3,455.00	90.64	313,161.20	100%	3,455.00	313,161.20	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.05.01.02	SUMINISTRO DE TUBERIA LISA HDPE DE 6" CON PERFORACIONES	m	50.00	93.34	4,667.00	100%	50.00	4,667.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.05.01.03	ACCESORIOS SUMINISTRO DE TUBERIAS HDPE	GLB	1.00	2,709.70	2,709.70	100%	1.00	2,709.70	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.05.01.04	SUMINISTRO DE TUBERIA LISA HDPE PECC-100 Dext. 90mm LINEA AUXILIAR	m	5,901.94	47.57	280,755.29	100%	5,901.94	280,755.29	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.05.02	BALASTRO DE CONCRETO																
04.05.02.01	LASTRE DE CONCRETO DE 50 KG APPROX. TIPO I SEPARACION 4.50 mtrs. c/u	u	779.00	175.02	136,340.58	100%	779.00	136,340.58	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.05.03	TERMOFUSION																
04.05.03.01	SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS LISA HDPE 6"	GLB	1.00	18,097.67	18,097.67	100%	1.00	18,097.67	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.05.03.02	SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS DE 90mm PN-10 (LINEAS AUXILIARES DE FLOTACION)	GLB	1.00	4,800.00	4,800.00	100%	1.00	4,800.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.05.04	ULTRASONIDO - CONTROL DE CALIDAD																
04.05.04.01	INSPECCION ULTRASONICA DE JUNTA	GLB	1.00	12,000.00	12,000.00	100%	1.00	12,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.05.05	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO																
04.05.05.01	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO DE LINEA	GLB	1.00	7,689.60	7,689.60	100%	1.00	7,689.60	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.05.05.02	FIJACION PRIMEROS METROS DE TUBERIA CON CONCRETO	m3	5.00	576.00	2,880.00	100%	5.00	2,880.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.05.05.03	PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA EMISOR SUBMARINO	GLB	1.00	8,000.00	8,000.00	100%	1.00	8,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.05.06	EQUIPOS DE BOMBEO																
04.05.06.01	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 3HP, Q= 4.5 l/s	und	1.00	6,202.00	6,202.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.05.07	OBRAS COMPLEMENTARIAS																
04.05.07.01	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 6"	m	66.30	17.92	1,188.10	100%	66.30	1,188.10	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.05.07.02	BUZON DINT=1.20 M Hub=2.10 M Hub=1.60 M, CEMENTO	und	1.00	1,796.45	1,796.45	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.06	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																
04.06.01	APARATOS SANITARIOS																
04.06.01.01	INODORO LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO	und	14.00	284.50	3,983.00	100%	14.00	3,983.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.06.01.02	LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO	und	20.00	173.27	3,465.40	100%	20.00	3,465.40	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.06.01.03	URINARIO DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO	und	6.00	149.10	894.60	100%	6.00	894.60	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
04.06.01.04	DUCHAS GROMADAS DE CABEZA GERATORIA Y LLAVE MEZCLADORA	pzb	9.00	48.23	434.07	100%	9.00	434.07	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCES				SALDO									
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		Valorizado S/.							
						%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.					
04.06.01.05	<b>SUB-PRESUPUESTO D4</b>																		
04.06.02	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE, 1 POSA 21"X25" C/ACCESORIOS	pza	3.00	230.00	690.00	100%	3.00	690.00	0%	0.00	0.00	100%	3.00	690.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
04.06.02.01	ACCESORIOS SANITARIOS	pza	14.00	30.30	424.20	100%	14.00	424.20	0%	0.00	0.00	100%	14.00	424.20	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
04.06.02.02	PAPERERA DE LOZA DE COLOR DE 15 X 15	und	9.00	23.26	209.34	100%	9.00	209.34	0%	0.00	0.00	100%	9.00	209.34	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
04.06.02.03	MABONERA TIPO BOLA	pza	52.00	21.03	1,093.56	100%	52.00	1,093.56	0%	0.00	0.00	100%	52.00	1,093.56	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
04.06.03	<b>CONEXION A RED PUBLICA DE AGUA POTABLE</b>																		
04.06.03.01	CONEXION A RED PUBLICA DE AGUA POTABLE Depres=300 m TUB. 3"	m	300.00	24.19	7,257.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
04.06.03.02	ACCESORIOS DE CONEXION A RED PUBLICA DE AGUA POTABLE	GLB	1.00	1,809.20	1,809.20	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
04.06.03.03	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	m	300.00	2.40	720.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
04.06.03.04	EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES SANITARIAS	m	300.00	24.64	7,392.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
04.06.03.05	RELLENO DE ZANJA Y COMPACTADO	m	300.00	42.28	12,684.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
04.06.03.06	REFINE Y NIVELACION ZANJA PARA TUBERIA	m	300.00	1.25	375.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>					<b>1,084,604.00</b>			<b>906,509.95</b>			<b>0.00</b>			<b>906,509.95</b>					<b>178,094.05</b>
<b>GASTOS GENERALES (0.25 %)</b>					<b>89,479.83</b>			<b>74,787.07</b>			<b>0.00</b>			<b>74,787.07</b>					<b>14,692.76</b>
<b>UTILIDAD (0.00%)</b>					<b>86,768.32</b>			<b>72,520.80</b>			<b>0.00</b>			<b>72,520.80</b>					<b>14,247.52</b>
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					<b>1,260,852.15</b>			<b>1,053,817.82</b>			<b>0.00</b>			<b>1,053,817.82</b>					<b>207,034.31</b>
<b>I.G.V. (18.0 %)</b>					<b>226,953.39</b>			<b>189,687.21</b>			<b>0.00</b>			<b>189,687.21</b>					<b>37,266.18</b>
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					<b>1,487,805.54</b>			<b>1,243,505.03</b>			<b>0.00</b>			<b>1,243,505.03</b>					<b>244,300.49</b>
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (SIN IGV)</b>					<b>1,280,852.15</b>			<b>1,053,817.82</b>			<b>0.00</b>			<b>1,053,817.82</b>					<b>207,034.31</b>
<b>I.G.V. (18.0 %)</b>					<b>226,953.39</b>			<b>189,687.21</b>			<b>0.00</b>			<b>189,687.21</b>					<b>37,266.18</b>
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (CON IGV)</b>					<b>1,487,805.54</b>			<b>1,243,505.03</b>			<b>0.00</b>			<b>1,243,505.03</b>					<b>244,300.49</b>

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717



**VALORIZACION DE OBRA N° 45 - SETIEMBRE 2018 (FORMULA 05 - MITIGACION AMBIENTAL)**

OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE

ENTIDAD : FONDEPES

CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE

FECHA : 30 DE SETIEMBRE DEL 2018

Monto Base : S/. 33,504,650.56  
 Monto Contratado : S/. 32,457,430.22  
 Fecha Inicio Obra : 15-ene-15  
 Plazo de Ejecución : 1,158 Días C.  
 Fecha Final Obra : 17-mar-18  
 Med. de Ejecución : Precios Unitarios


Residente : Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros  
 Supervisor : Ing. Iñaki Jorge Alva Espinoza

SEGUIN COSTO DIRECTO  
 Monto Valorizado del Mes : S/. 0.00  
 Monto Valorizado Acumulado : S/. 29,001.33  
 Monto-Saldo por Valorizar : S/. 11,608.80

Ubicación :  
 Región : LAMBAYEQUE  
 Provincia : LAMBAYEQUE  
 Distrito : SAN JOSE  
 Localidad : SAN JOSE

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			AVANCES			ACUMULADO			SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	ACTUAL		ACUMULADO		SALDO				
						%	Valorizado S/.	%	Valorizado S/.	%	Valorizado S/.			
05	SUB-PRESUPUESTO 05													
5.01	MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00		1,745.00	100%	1,745.00	0%	0.00	100%	1,745.00	0%	0.00	0.00
5.02	MEDIDAS DE CONCIENCIACION Y EDUCACION AMBIENTAL	und	30.00	150.00	4,500.00	33%	1,500.00	0%	0.00	33%	1,500.00	67%	20.00	3,000.00
5.03	CARTEL DE MANEJO AMBIENTAL DE 1.00 X 0.90 DE PLANCHA GALVANIZADA	pp	8.00	500.15	4,001.20	75%	3,000.90	0%	0.00	75%	3,000.90	25%	2.00	1,000.30
5.04	INSTALACION PROVISIONAL DE LETRINA SANITARIA	und	20.00	300.00	6,000.00	90%	5,400.00	0%	0.00	90%	5,400.00	10%	2.00	800.00
5.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR DE BASURA	und	25.00	21.22	530.50	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	100%	25.00	530.50
5.06	SEMBRIO DE PLANTONES ORNAMENTALES Y ESPECIES FORESTALES	m2	280.00	23.85	6,678.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	100%	280.00	6,678.00
5.07	RECUPERACION DE AREAS VERDES AFECTADAS	m2	3,500.00	1.25	4,375.00	100%	3,500.00	0%	0.00	100%	3,500.00	0%	0.00	800.00
5.08	LIMPIEZA FINAL Y RECOLECCION DE RESIDUOS	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00	100%	5,000.00	0%	0.00	100%	5,000.00	0%	0.00	0.00
5.09	OPERACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00	100%	5,000.00	0%	0.00	100%	5,000.00	0%	0.00	0.00
5.1	PREVENCIÓN DE RIESGO DE TRABAJADORES EN EMERGENCIA	GLB	1.00	2,980.43	2,980.43	100%	2,980.43	0%	0.00	100%	2,980.43	0%	0.00	0.00
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>					<b>40,810.13</b>		<b>29,001.33</b>		<b>0.00</b>		<b>29,001.33</b>		<b>0.00</b>	<b>11,808.80</b>
GASTOS GENERALES (6.25 %)					3,265.84		2,392.61		0.00		2,392.61		0.00	974.23
UTILIDAD (8.00 %)					3,264.81		2,320.11		0.00		2,320.11		0.00	944.70
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					<b>47,441.78</b>		<b>33,714.05</b>		<b>0.00</b>		<b>33,714.05</b>		<b>0.00</b>	<b>13,727.73</b>
I.G.V. (18.0 %)					8,539.52		6,068.53		0.00		6,068.53		0.00	2,470.99
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					<b>55,981.30</b>		<b>39,782.58</b>		<b>0.00</b>		<b>39,782.58</b>		<b>0.00</b>	<b>16,198.72</b>
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (SIN IGV)</b>					<b>47,441.78</b>		<b>33,714.05</b>		<b>0.00</b>		<b>33,714.05</b>		<b>0.00</b>	<b>13,727.73</b>
I.G.V. (18.0 %)					8,539.52		6,068.53		0.00		6,068.53		0.00	2,470.99
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (CON IGV)</b>					<b>55,981.30</b>		<b>39,782.58</b>		<b>0.00</b>		<b>39,782.58</b>		<b>0.00</b>	<b>16,198.72</b>

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**VALORIZACION DE OBRA N° 45 - SETIEMBRE 2016 (FORMULA 06 - EQUIPAMIENTO)**

OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE  
 ENTIDAD : FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 FECHA : 30 DE SETIEMBRE DEL 2018

Residente: Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros  
 Supervisor: Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza  
**SEGUN COSTO DIRECTO**  
 Monto Valorizado del Mes : S/. 0.00  
 Monto Valorizado Acumulado : S/. 613,283.00  
 Monto-Saldo por Valorizar : S/. 829,462.40

Ubicación:  
 Región : LAMBAYEQUE  
 Provincia : LAMBAYEQUE  
 Distrito : SAN JOSE  
 Localidad : SAN JOSE

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			AVANCES ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
		Unid.	Metro	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Valorizado S/.	Metro	Valorizado S/.	%	Valorizado S/.	Metro	Valorizado S/.
06	<b>SUB-PRESUPUESTO 06</b>												
6.01	<b>EQUIPAMIENTO</b>												
06.01.01	EQUIPO DE FRIO												
06.01.02	SUMINISTRO DE CAMARA DE CONSERVACION DE HIELO 20 TN	und	2.00	68,370.00	136,740.00	100%	136,740.00	2.00	136,740.00	100%	2.00	136,740.00	
06.01.03	SUMINISTRO DE PRODUCTOR DE HIELO EN BLOQUES 20TN	GLB	2.00	349,805.70	699,611.40	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
06.01.04	SUMINISTRO DE CAMARA FRIGORIFICA DE 10 TN-18° C	und	1.00	61,479.00	61,479.00	100%	61,479.00	1.00	61,479.00	100%	1.00	61,479.00	
06.01.05	SUMINISTRO DE CAMARA FRIGORIFICA DE 10 TN 0° C	und	1.00	95,680.00	95,680.00	100%	95,680.00	1.00	95,680.00	100%	1.00	95,680.00	
6.02	SUMINISTRO DE ENFRUADOR DE AGUA +19°C	und	1.00	36,400.00	36,400.00	100%	36,400.00	1.00	36,400.00	100%	1.00	36,400.00	
06.02.01	<b>EQUIPAMIENTO TAREAS PREVIZAS</b>												
06.02.02	TINAS DE LAVADO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.9 M3 (INC. SUM. COL.)	und	8.00	6,500.00	52,000.00	100%	52,000.00	8.00	52,000.00	100%	8.00	52,000.00	
06.02.03	MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 06 PERS. (INC. SUM. COL.)	und	8.00	5,600.00	44,800.00	100%	44,800.00	8.00	44,800.00	100%	8.00	44,800.00	
06.03.01	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ESTIBA</b>												
06.03.02	CAJAS DE PLASTICO CAP. 40 KG (INC. SUM. COL.)	und	200.00	62.50	12,500.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
06.03.03	BALANZA ELECTRONICA CAP. 1000 KG (INC. SUM. COL.)	und	2.00	17,762.00	35,524.00	100%	35,524.00	2.00	35,524.00	100%	2.00	35,524.00	
06.03.04	TRANSPALETA MANUAL DE ACEREO GALVANIZADO 2.3 TM (INC. SUM.)	und	6.00	6,750.00	40,500.00	100%	40,500.00	6.00	40,500.00	100%	6.00	40,500.00	
06.03.05	TRACTOR DE REMOLQUE ELECTRICO CAPACIDAD 6 TN	und	1.00	110,160.00	110,160.00	100%	110,160.00	1.00	110,160.00	100%	1.00	110,160.00	
06.03.06	CARRETA DE REMOLQUE DE TIPO PLATAFORMA CON PARRILLA DE PROTECCION SOLAR DE ACERO INOXIDABLE CARGA 1 TN	und	12.00	4,490.00	53,880.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
6.04	<b>PARIHUELAS DE PLASTICO CAP. 1200 KG (INC. SUM. COL.)</b>	und	30.00	123.50	3,705.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
06.04.01	<b>ROPA DE TRABAJO OPERARIOS</b>												
06.04.02	ESTANTES PARA VESTUARIOS (INC. SUM. COL. ACC.)	und	100.00	150.00	15,000.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
6.05	<b>MOBILIARIO VARIOS</b>	und	30.00	250.00	7,500.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
06.05.01	SILLAS FEA	und	10.00	50.00	500.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
06.05.02	MESAS MELAMINE 200 X 100	und	1.00	1,200.00	1,200.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
06.05.03	ARMARIO 180 X 80 X 40	und	3.00	700.00	2,100.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
06.05.04	MESA DE PLASTICO C/JO 4 SILLAS	und	10.00	320.00	3,200.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
06.05.05	SILLON MECANICO C/BAZO	und	3.00	210.00	630.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
06.05.06	DEPOSITO DE RESIDUOS	und	10.00	350.00	3,500.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
06.05.07	BANQUETA DE 3 CUERPOS	und	20.00	250.00	5,000.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
06.05.08	ESCRITORIO EN L (1.20 X 0.70)	und	3.00	490.00	1,470.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
06.05.09	TELEVISORES	und	2.00	700.00	1,400.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
06.05.10	MODULO PARA TV	und	2.00	220.00	440.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
06.05.11	COMPUTADORAS	und	2.00	1,500.00	3,000.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
06.05.12	PANTALLA ERRAN	und	1.00	917.00	917.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
06.05.13	PROYECTOR	und	1.00	3,368.00	3,368.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
06.05.14	VENTILADOR	und	4.00	270.00	1,080.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
06.05.15	IMPRESORA MULTIFUNCION (IMP COP ESC)	und	1.00	480.00	480.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
06.05.16	PAX	und	1.00	421.00	421.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
06.05.17	TELEFONOS	und	4.00	80.00	320.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. COP N° 10717

INGENIEROS  
 QUIROGA  
 CARRERA

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR			AVANCES ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.
06.05.18	ARCHIVADOR 4 GAVETAS		4.00	500.00	2,000.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	4.00	2,000.00
06.05.19	EXTINTORES		14.00	360.00	5,040.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	14.00	5,040.00
06.05.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA		10.00	120.00	1,200.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	10.00	1,200.00
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>					<b>1,442,745.40</b>			<b>613,283.00</b>		<b>0.00</b>			<b>613,283.00</b>				<b>829,462.40</b>
GASTOS GENERALES (8.25 %)					119,026.50			50,595.85		0.00			50,595.85				66,430.65
UTILIDAD (6.00 %)					115,419.63			49,062.64		0.00			49,062.64				66,356.99
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					<b>1,677,191.53</b>			<b>712,941.49</b>		<b>0.00</b>			<b>712,941.49</b>				<b>944,250.04</b>
I.G.V. (18.0 %)					301,894.48			128,329.47		0.00			128,329.47				173,565.01
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					<b>1,979,086.01</b>			<b>841,270.96</b>		<b>0.00</b>			<b>841,270.96</b>				<b>1,117,815.05</b>
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (SIN IGV)</b>					<b>1,677,191.53</b>			<b>712,941.49</b>		<b>0.00</b>			<b>712,941.49</b>				<b>944,250.04</b>
I.G.V. (18.0 %)					301,894.48			128,329.47		0.00			128,329.47				173,565.01
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (CON IGV)</b>					<b>1,979,086.01</b>			<b>841,270.96</b>		<b>0.00</b>			<b>841,270.96</b>				<b>1,117,815.05</b>

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**VALORIZACION DE OBRA N° 45 - SETIEMBRE 2018 (FORMULA 07 - OBRAS DE MAR)**



OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE  
 ENTIDAD : FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 FECHA : 30 DE SETIEMBRE DEL 2018

Monto Base S/. 33.504.650,56  
 Monto Contratado S/. 32.457.630,22  
 Fecha Inicio Obra 15-ene-15  
 Plazo de Ejecución 1.158 Dias C.  
 Fecha Final Obra 17-mar-18  
 Mod. de Ejecución Precios Unitarios

Ingeniero Supervisor Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros  
 Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza  
 SEGÚN COSTO DIRECTO : S/. 20.421,18  
 Monto Valorizado del Mes : 0,14%  
 Monto Valorizado Acumulado : S/. 7.772.672,44  
 Monto-Saldo por Valorizar : S/. 7.213.874,56  
 : 51,87%  
 : 48,13%

Ubicación : LAMBAYEQUE  
 Región : LAMBAYEQUE  
 Provincia : LAMBAYEQUE  
 Distrito : SAN JOSE  
 Localidad : SAN JOSE

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCES				ACUMULADO				SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.
<b>SUB-PRESUPUESTO 07</b>																	
<b>07 OBRAS EN MAR</b>																	
<b>7.01 OBRAS PROVISIONALES</b>																	
07.01.01	IMPRESA DEL TERRENO	m2	4.200,00	0,38	1.596,00	100%	4.200,00	1.596,00	0%	0,00	0,00	100%	4.200,00	1.596,00	0%	0,00	0,00
07.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA	mes	12,00	1.707,32	20.487,04	58%	7,00	11.951,24	0%	0,00	0,00	58%	7,00	11.951,24	42%	5,00	8.536,60
07.01.03	LOSA PARA PREFABRICADOS	m2	300,00	118,07	35.421,00	100%	300,00	35.421,00	0%	0,00	0,00	100%	300,00	35.421,00	0%	0,00	0,00
07.01.04	PRUEBA DE CARGA	und	3,00	18.022,12	54.066,36	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%	3,00	54.066,36
07.01.05	IMPRESA FINAL DE OBRA	m2	4.200,00	0,91	3.822,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%	4.200,00	3.822,00
07.01.06	BONDALE MARINO	und	3,00	10.200,00	30.600,00	100%	3,00	30.600,00	0%	0,00	0,00	100%	3,00	30.600,00	0%	0,00	0,00
<b>7.02 OBRAS DE PROTECCION EN TIERRA</b>																	
07.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
07.02.01.01	CORTE DE MATERIAL ARENA EN LUNA DE ENROCADO	m3	807,30	2,89	2.333,68	97%	786,28	2.272,35	0%	0,00	0,00	97%	786,28	2.272,35	3%	21,22	61,33
07.02.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL ARENA EN LUNA DE ENROCADO	m3	1.067,92	14,38	15.356,69	85%	904,22	13.002,68	0%	0,00	0,00	85%	904,22	13.002,68	15%	163,70	2.354,01
07.02.02	ENROCADO DE PROTECCION DE TERRAPLEN																
07.02.02.01	SUMIY COLC. DE ROCA FILTRO A 50 KG	m3	1.116,25	60,23	67.231,74	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%	1.116,25	67.231,74
07.02.02.02	SUMIY Y COLC. DE ROCA CORAZA DE 8 T A 8 T	m3	1.950,00	70,53	137.533,50	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%	1.950,00	137.533,50
07.02.02.03	REMOCION DE ROCA CORAZA DE 8 T A 8 T EN CANTERA	m3	3.066,25	40,40	123.876,50	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%	3.066,25	123.876,50
<b>7.03 MUELLE DE ESPIGON LAMBAYEQUE II</b>																	
07.03.01	FABRICACION DE PLOTES DE CONCRETO																
07.03.01.01	CONCRETO EN PLOTES FC=400 KGCM2	m3	2.216,91	515,13	1.141.996,85	66%	1.469,26	756.859,90	0%	0,00	0,00	66%	1.469,26	756.859,90	34%	747,65	385.136,94
07.03.01.02	ENCORRADO Y DESCORRADO NORMAL DE PLOTES	m2	21.364,72	52,76	1.127.202,63	50%	10.713,50	565.244,26	0%	0,00	0,00	50%	10.713,50	565.244,26	50%	10.651,22	561.958,37
07.03.01.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGCM2	kg	464.193,61	3,93	1.824.280,89	75%	347.291,96	1.364.857,40	0%	0,00	0,00	75%	347.291,96	1.364.857,40	25%	116.901,65	459.423,48
07.03.02	FABRICACION DE VIGAS TRANSVERSALES																
07.03.02.01	CONCRETO EN VIGAS TRANSVERSALES FC=RRKGCM2	m3	417,90	468,48	195.777,79	100%	417,60	195.637,25	0%	0,00	0,00	100%	417,60	195.637,25	0%	0,30	140,54
07.03.02.02	ENCORRADO Y DESCORRADO DE VIGAS TRANSVERSALES	m2	3.871,14	42,19	163.323,40	100%	3.868,20	163.192,36	0%	0,00	0,00	100%	3.868,20	163.192,36	0%	2,94	124,04
07.03.02.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGCM2	kg	101.284,60	3,93	398.048,48	100%	101.284,10	398.046,51	0%	0,00	0,00	100%	101.284,10	398.046,51	0%	0,50	1,97
07.03.03	FABRICACION DE LOSAS NERVADAS EN MUELLE																
07.03.03.01	CONCRETO EN LOSAS NERVADAS FC=280 KGCM2	m3	1.071,05	468,48	501.765,50	86%	925,07	433.376,79	0%	0,00	0,00	86%	925,07	433.376,79	14%	145,98	68.388,71
07.03.03.02	ENCORRADO Y DESCORRADO DE LOSAS NERVADAS	m2	7.545,54	42,19	318.546,23	91%	6.852,30	286.254,74	0%	0,00	0,00	91%	6.852,30	286.254,74	9%	713,24	30.091,60
07.03.03.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGCM2	kg	246.786,59	3,93	969.871,30	100%	246.528,11	968.855,47	0%	0,00	0,00	100%	246.528,11	968.855,47	0%	258,48	1.015,83
07.03.04	MUELLOS LLENADOS EN SITU																
07.03.04.01	CONCRETO EN MUELLOS FC=280 KGCM2	m3	1.176,40	468,48	550.397,92	87%	1.154,17	537.227,12	0%	0,00	0,00	87%	1.154,17	537.227,12	13%	22,23	10.412,75
07.03.04.02	ENCORRADO Y DESCORRADO EN MUELLOS	m2	325,50	42,19	13.732,85	68%	221,65	9.351,27	0%	0,00	0,00	68%	221,65	9.351,27	32%	103,85	4.381,57
07.03.04.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGCM2	kg	11.104,97	3,93	43.642,53	100%	11.104,97	43.642,53	0%	0,00	0,00	100%	11.104,97	43.642,53	0%	0,00	0,00
07.03.05	JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES																
07.03.05.01	CONCRETO EN VIGA MANDE FC=280 KGCM2	m3	1.419,90	468,48	665.194,75	11%	153,53	71.925,79	0%	0,00	0,00	11%	153,53	71.925,79	89%	1.266,37	593.268,96
07.03.05.02	ENCORRADO Y DESCORRADO EN VIGA MANDE	m2	2.683,35	42,19	113.210,34	17%	451,01	19.028,11	0%	0,00	0,00	17%	451,01	19.028,11	83%	2.232,34	94.182,42
07.03.05.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGCM2	kg	330.460,88	3,93	1.298.711,26	7%	244.82,92	962.17,88	0%	0,00	0,00	7%	244.82,92	962.17,88	93%	305.977,96	1.202.493,38
07.03.06.01	CONCRETO EN SARDINEL FC=280 KGCM2	m3	148,23	468,48	69.442,79	28%	42,06	19.704,97	0%	0,00	0,00	28%	42,06	19.704,97	72%	106,17	49.737,82

  
**CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717  
  
**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCES ACTUAL			ACUMULADO			SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.
<b>SUB-PRESUPUESTO 07</b>																	
07.03.08.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO EN SARDINELES	m2	1,334.07	42.19	56,294.41	29%	385.57	16,267.07	0%	0.00	0.00	29%	385.57	16,267.07	71%	948.50	40,017.34
07.03.08.03	ACERO DE REFUERZO FY-4200 KGCM2	kg	9,825.34	3.93	38,613.59	90%	8805.94	34,607.34	0%	0.00	0.00	90%	8805.94	34,607.34	10%	1,019.40	4,006.24
07.03.07	LOSAS VACHADAS IN BITU																
07.03.07.01	CONCRETO EN LOSAS FC-280 KGCM2	m3	793.20	468.48	371,598.34	50%	393.12	184,168.86	0%	0.00	0.00	50%	393.12	184,168.86	50%	400.08	187,429.48
07.03.07.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO EN SARDINELES	m2	685.15	42.19	28,906.46	30%	208.78	8,808.43	0%	0.00	0.00	30%	208.78	8,808.43	70%	476.37	20,098.05
07.03.07.03	ACERO DE REFUERZO FY-4200 KGCM2	kg	151,388.29	3.93	594,955.98	45%	68228.29	268,137.18	0%	0.00	0.00	45%	68228.29	268,137.18	55%	93,160.00	326,816.80
<b>7.04 CABEZO L-48x48 M</b>																	
07.04.01	FABRICACION DE PLOTES DE CONCRETO																
07.04.01.01	CONCRETO EN PLOTES FC-380 KGCM2	m3	411.08	515.13	211,759.64	98%	402.58	207,381.04	0%	0.00	0.00	98%	402.58	207,381.04	2%	8.50	4,378.60
07.04.01.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO NORMAL PARA PLOTES	m2	3,279.81	52.76	173,042.78	74%	2430.80	127,721.41	0%	0.00	0.00	74%	2430.80	127,721.41	26%	859.01	45,321.37
07.04.01.03	ACERO DE REFUERZO FY-4200 KGCM2	kg	89,034.51	3.93	349,905.62	96%	85089.60	334,402.13	0%	0.00	0.00	96%	85089.60	334,402.13	4%	3,944.91	15,503.50
07.04.02	FABRICACION DE LOSAS TRANSVERSALES																
07.04.02.01	CONCRETO EN VIGAS TRANSVERSALES FC-280 KGCM2	m3	29.30	468.48	13,726.46	100%	29.30	13,726.46	0%	0.00	0.00	100%	29.30	13,726.46	0%	0.00	0.00
07.04.02.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO DE VIGAS TRANSVERSALES	m2	257.86	42.19	10,879.11	100%	257.86	10,879.11	0%	0.00	0.00	100%	257.86	10,879.11	0%	0.00	0.00
07.04.02.03	ACERO DE REFUERZO FY-4200 KGCM2	kg	7,094.46	3.93	27,881.23	100%	7090.80	27,866.84	0%	0.00	0.00	100%	7090.80	27,866.84	0%	3.66	14.38
07.04.03	FABRICACION DE LOSAS NERVADAS EN BUELE																
07.04.03.01	CONCRETO EN LOSAS NERVADAS FC-280 KGCM2	m3	86.80	468.48	40,664.06	95%	82.78	38,780.77	0%	0.00	0.00	95%	82.78	38,780.77	5%	4.02	1,883.29
07.04.03.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO DE LOSAS NERVADAS	m2	549.37	42.19	23,177.92	100%	549.37	23,177.92	0%	0.00	0.00	100%	549.37	23,177.92	0%	0.00	0.00
07.04.03.03	ACERO DE REFUERZO FY-4200 KGCM2	kg	22,817.55	3.93	89,672.97	100%	22817.55	89,672.97	0%	0.00	0.00	100%	22817.55	89,672.97	0%	0.00	0.00
07.04.04	NUCLEOS LLENADOS EN BITU																
07.04.04.01	CONCRETO EN NUCLEOS FC-280 KGCM2	m3	15.20	468.48	7,120.90	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	15.20	7,120.90
07.04.04.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO EN NUCLEOS	m2	32.00	42.19	1,350.08	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	32.00	1,350.08
07.04.04.03	ACERO DE REFUERZO FY-4200 KGCM2	kg	1,050.66	3.93	4,129.09	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1,050.66	4,129.09
07.04.05	BANTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES																
07.04.05.01	CONCRETO EN VIGA MANIL FC-280 KGCM2	m3	69.35	468.48	32,489.09	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	69.35	32,489.09
07.04.05.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO EN VIGA MANIL	m2	239.27	42.19	10,094.80	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	239.27	10,094.80
07.04.05.03	ACERO DE REFUERZO FY-4200 KGCM2	kg	13,550.38	3.93	53,252.99	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	13,550.38	53,252.99
07.04.06	LOSAS VACHADAS IN BITU																
07.04.06.01	CONCRETO EN LOSAS FC-280 KGCM2	m3	123.01	468.48	57,627.72	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	123.01	57,627.72
07.04.06.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO EN LOSAS	m2	337.08	42.19	14,246.72	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	337.08	14,246.72
07.04.06.03	ACERO DE REFUERZO FY-4200 KGCM2	kg	15,596.20	3.93	61,293.07	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	15,596.20	61,293.07
07.04.07	MANOBRAS DE COLOCACION E HINGADO DE PLOTES, VIGAS Y LOSAS PUENTES																
07.04.07.01	TRANSPORTE DE PLOTE	und	652.00	126.31	82,354.12	54%	354.00	44,713.74	3%	2,778.82	2,778.82	59%	376.00	47,492.56	42%	276.00	34,861.56
07.04.07.02	TRANSPORTE DE LOSA TRANSVERSAL	und	210.00	195.82	41,122.20	79%	166.00	32,506.12	0%	0.00	0.00	79%	166.00	32,506.12	21%	44.00	8,616.08
07.04.07.03	TRANSPORTE DE LOSA NERVADA	und	366.00	164.93	60,364.38	60%	218.00	35,954.74	3%	1,979.16	1,979.16	63%	230.00	37,933.90	37%	136.00	22,430.48
07.04.07.04	PLANTA PARA PLOTES	und	652.00	205.52	133,999.04	100%	652.00	133,999.04	0%	0.00	0.00	100%	652.00	133,999.04	0%	0.00	0.00
07.04.07.05	HINGADO DE PLOTE (INC. MOV. Y POSIC. PLANTILLA)	und	652.00	975.41	635,962.32	44%	288.00	280,918.08	0%	0.00	0.00	44%	288.00	280,918.08	56%	364.00	355,044.24
07.04.07.06	DESCABEZADO DE PLOTE	und	652.00	25.12	16,378.24	54%	354.00	8,992.48	3%	552.64	552.64	58%	376.00	9,445.12	42%	276.00	6,933.12
07.04.07.07	COLOCACION DE VIGA TRANSVERSAL	und	210.00	1,391.01	292,112.10	59%	124.00	172,485.24	4%	1,128.08	1,128.08	63%	132.00	183,613.32	37%	78.00	108,496.78
07.04.07.08	COLOCACION DE LOSA NERVADA	und	366.00	348.54	127,565.64	60%	218.00	75,981.72	3%	4,182.48	4,182.48	63%	230.00	80,164.20	37%	136.00	47,401.44
07.04.08	MANOBRAS DE COLOCACION E HINGADO DE PLOTES, VIGAS Y LOSAS CABEZO																
07.04.08.01	TRANSPORTE DE PLOTE	und	96.00	126.31	12,125.76	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	96.00	12,125.76
07.04.08.02	TRANSPORTE DE VIGA TRANSVERSAL	und	10.00	195.82	1,958.20	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	10.00	1,958.20
07.04.08.03	TRANSPORTE DE LOSA NERVADA	und	36.00	164.93	5,937.48	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	36.00	5,937.48
07.04.08.04	PLANTA PARA PLOTES	und	96.00	205.52	19,729.92	100%	96.00	19,729.92	0%	0.00	0.00	100%	96.00	19,729.92	0%	0.00	0.00
07.04.08.05	HINGADO DE PLOTE (INC. MOV. Y POSIC. PLANTILLA)	und	96.00	975.41	93,639.36	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	96.00	93,639.36
07.04.08.06	DESCABEZADO DE PLOTE	und	96.00	25.12	2,411.52	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	96.00	2,411.52
07.04.08.07	COLOCACION DE VIGA TRANSVERSAL	und	10.00	1,391.01	13,910.10	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	10.00	13,910.10
07.04.08.08	COLOCACION DE LOSA NERVADA	und	36.00	348.54	12,547.44	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	36.00	12,547.44
07.04.09	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN FUENTES Y CABEZO																
07.04.09.01	SUM. Y COLOC. SARDINELES DE MADERA PAF. SITACOS DE FUMIGOS	und	10.00	129.60	1,296.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	10.00	1,296.00
07.04.09.02	SUM. Y COLOC. DE BITAS METALICAS 38RT	und	8.00	488.69	3,909.52	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	8.00	3,909.52
07.04.09.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PESACANTOS CAP. w=500 KG	und	2.00	1,514.12	3,028.24	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	2.00	3,028.24

CARLOS QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
C. P. N.º 228 338

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCES				SALDO							
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	ACUMULADO ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
						%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.
<b>SUB-PRESUPUESTO 07</b>																	
07.04.08.04	FABRICACION DE PLOTES METALICOS H. PARANTES DE DEFENSA	m	768.00	279.22	214,440.96	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	768.00	214,440.96	
07.04.08.05	FABRICACION DE VIGAS METALICAS (CARGUEROS DE DEFENSA)	m	267.00	313.48	83,699.16	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	267.00	83,699.16	
07.04.08.06	SU MINISTRO Y COLOC. DE BLOCS DE LEBE HUECO DE 17X8 EN VIGA	B/LK	60.00	154.30	9,258.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	60.00	9,258.00	
07.04.08.07	ENCADO DE PARANTES METALICOS SECCION H (7X18)MM. INCL. TRANSP.	und	64.00	870.79	55,730.56	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	64.00	55,730.56	
07.04.08.08	MONTALE VIGAS HP70". LONG. CPARANTES, INCL. TRANSP.	m	267.00	44.89	11,985.63	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	267.00	11,985.63	
07.04.08.09	SU MINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSAS TIPO D	und	224.00	619.96	138,871.04	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	224.00	138,871.04	
07.04.08.10	BARANDAS DE TUBERIAS DE ACERO, EN PUENTE Y ESCALINATAS DE EMBARCADERO	m	6,145.00	183.71	1,128,897.95	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	6,145.00	1,128,897.95	
07.04.08.11	PAINTURA DE PARANTES Y VIGAS LONGITUDINALES EN DEFENSAS	m2	1,229.00	32.19	39,561.51	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	1,229.00	39,561.51	
07.04.08.12	COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM EN PLATAFORMA DE ACCESO	m2	300.00	115.87	34,761.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	300.00	34,761.00	
07.04.08.13	PERFIL CUADRADO DE ALUMINIO DE 1/2"	m	150.00	97.05	14,557.50	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	150.00	14,557.50	
07.04.08.14	PERFIL CIRCULAR DE ALUMINIO DE 40MM E=2.8MM	m	20.00	97.05	1,941.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	20.00	1,941.00	
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>					<b>14,996,247.01</b>			<b>7,752,051.28</b>			<b>20,621.18</b>			<b>7,772,672.46</b>		<b>7,213,574.56</b>	
<b>GASTOS GENERALES (8.25 %)</b>					<b>1,236,365.38</b>			<b>639,544.23</b>			<b>1,701.25</b>			<b>641,245.48</b>		<b>595,119.50</b>	
<b>UTILIDAD (8.00 %)</b>					<b>1,198,899.70</b>			<b>620,164.10</b>			<b>1,649.89</b>			<b>621,813.80</b>		<b>577,085.96</b>	
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					<b>17,421,512.15</b>			<b>9,011,759.89</b>			<b>23,972.12</b>			<b>9,035,731.72</b>		<b>8,385,780.42</b>	
<b>I.G.V. (18.0 %)</b>					<b>3,135,872.19</b>			<b>1,622,116.73</b>			<b>4,314.98</b>			<b>1,626,431.71</b>		<b>1,509,440.48</b>	
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					<b>20,557,384.34</b>			<b>10,633,876.62</b>			<b>28,287.10</b>			<b>10,662,163.43</b>		<b>9,895,220.90</b>	
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (SIN IGV)</b>					<b>17,421,512.15</b>			<b>9,011,759.89</b>			<b>23,972.12</b>			<b>9,035,731.72</b>		<b>8,385,780.42</b>	
<b>I.G.V. (18.0 %)</b>					<b>3,135,872.19</b>			<b>1,622,116.73</b>			<b>4,314.98</b>			<b>1,626,431.71</b>		<b>1,509,440.48</b>	
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (CON IGV)</b>					<b>20,557,384.34</b>			<b>10,633,876.62</b>			<b>28,287.10</b>			<b>10,662,163.43</b>		<b>9,895,220.90</b>	

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22633

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**VALORIZACION DE OBRA N° 45 - AGOSTO 2018 (FORMULA 08 - PAVIMENTACION EXTERIOR)**

OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE  
 ENTIDAD : FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 FECHA : 30 DE SETIEMBRE DEL 2018

Monto Base S/. 33,504,650.56  
 Monto Contratado S/. 32,457,630.22  
 Fecha Inicio Obra 15-ene-15  
 Plazo de Ejecucion 1,158 Días C.  
 Fecha Final Obra 17-mar-18  
 Mod. de Ejecucion Precios Unitarios

Residente Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros  
 Supervisor Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza  
 SEGUN COSTO DIRECTO  
 Monto Valorizado del Mes : S/. 484,612.37  
 Monto Valorizado Acumulado : S/. 9,361,04  
 Monto-Saldo por Valorizar : 98.10%  
 : 1.90%

Ubicacion  
 Region : LAMBAYEQUE  
 Provincia : LAMBAYEQUE  
 Distrito : SAN JOSE  
 Localidad : SAN JOSE

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCES ACTUAL			ACUMULADO			SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.
<b>SUB-PRESUPUESTO 08</b>																	
08	PAVIMENTO																
08.01	TRABAJOS PRELIMINARES																
08.01.01	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	m2	5,295.22	0.93	4,924.55	100%	5,295.22	4924.55									
08.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
08.02.01	CORTE DE TERRENO C/QUIPO	m3	2,116.35	3.92	8,296.09	100%	2,116.35	8296.09									
08.02.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	5,295.22	5.49	29,070.76	100%	5,295.22	29070.76									
08.02.03	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRA OVER DE 4" A 6" E=40 CM	m2	1,323.81	29.90	39,581.92	79%	1,050.00	31,395.00									
08.02.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	96.50	28.63	2,762.80	100%	96.50	2,762.72									
08.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 15 M3	m3	2,751.25	14.38	39,582.98	100%	2,751.25	39,582.98									
08.03	SUB BASE GRANULAR																
08.03.01	SUB - BASE DE 0.20 M.	m2	5,295.22	8.39	44,426.90	100%	5,295.22	44,426.90									
08.04	SUB BASE GRANULAR																
08.04.01	SUB BASE GRANULAR DE AFIRMADO E=15CM	m2	5,295.22	6.91	36,589.37	100%	5,295.22	36,589.37									
08.05	ASFALTO EN CALIENTE																
08.05.01	IMPRESION ASFALTICA	m2	5,295.22	4.80	25,417.06	100%	5,295.22	25,417.06									
08.05.02	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"	m2	5,295.22	44.23	234,207.58	100%	5,295.22	234,207.58									
08.05.03	REGO DE LIGA	m2	5,295.22	5.28	27,958.76	100%	5,295.22	27,958.76									
08.06	PINTURA																
08.06.01	PINTURA LINEA DISCONTINUA E=10CM	m2	151.29	5.31	803.35												
08.07	SEÑALIZACION																
08.07.01	SENALES PREVENTIVAS	und	5.00	37.07	185.35												
08.07.02	SENALES INFORMATIVAS	und	5.00	37.07	185.35												
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>																	
				693,973.42		484,612.37		484,612.37				484,612.37				9,361.04	
GASTOS GENERALES (8.25 %)				40,752.81		39,880.57		39,880.57				39,880.57				772.29	
UTILIDAD (8.00 %)				39,517.87		38,768.99		38,768.99				38,768.99				748.89	
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>																	
I.G.V. (18.0 %)				574,244.10		563,361.88		563,361.88				563,361.88				10,882.22	
TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO				1,033,653.94		1,017,405.14		1,017,405.14				1,017,405.14				1,958.80	
				677,608.04		664,767.02		664,767.02				664,767.02				12,841.02	
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (SUN IGV)</b>																	
I.G.V. (18.0 %)				574,244.10		563,361.88		563,361.88				563,361.88				10,882.22	
VALORIZACION CONTRACTUAL (CON IGV)				1,033,653.94		1,017,405.14		1,017,405.14				1,017,405.14				1,958.80	
				677,608.04		664,767.02		664,767.02				664,767.02				12,841.02	

INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP N° 22858  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP N° 10717



**VALORIZACION DE OBRA N° 45 - SETIEMBRE 2016 (FORMULA 09 - INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION)**

: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE

OBRA : FONDEPES

ENTIDAD : CONSORCIO SAN JOSE

FECHA : 30 DE SETIEMBRE DEL 2018

Monto Base : S/. 33,504,650.56  
 Monto Contratado : S/. 32,457,630.22  
 Fecha Inicio Obra : 15-ene-15  
 Plazo de Ejecución : 1,158 Días C.  
 Fecha Final Obra : 17-mar-18  
 Mod. de Ejecución : Precios Unitarios

Residente : Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros  
 Supervisor : Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza  
**SEGUN COSTO DIRECTO**  
 Monto Valorizado del Mes :  
 Monto Valorizado Acumulado : S/. 149,611.46  
 Monto-Saldo por Valorizar : 100.00%

Ubicación : LAMBAYEQUE  
 Región : LAMBAYEQUE  
 Provincia : SAN JOSE  
 Distrito : SAN JOSE  
 Localidad : SAN JOSE

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCES ACTUAL			SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.
09	SUB-PRESUPUESTO 09													
09.01	MEDIA TENSION													
09.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	und	1.00	2,372.52	2,372.52									
09.01.02	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	GLB	1.00	4,500.00	4,500.00									
09.01.03	PAGO DE CONEXION ELECTRONORTE	GLB	1.00	3,500.00	3,500.00									
09.02	SUMINISTRO DE MATERIALES													
09.02.01	POSTES, ACCESORIOS Y CRUCETAS	und	1.00	3,405.00	3,405.00									
09.02.02	CONDUCTORES DE ALUMINIO Y ACCESORIOS	GLB	1.00	1,104.46	1,104.46									
09.02.03	AISLADORES Y ACCESORIOS	GLB	1.00	1,726.54	1,726.54									
09.02.04	RETENIDAS Y ANCLAJE	GLB	1.00	638.08	638.08									
09.02.05	PUESTA A TIERRA	GLB	1.00	696.30	696.30									
09.02.06	TABLERO DE DISTRIBUCION	und	1.00	6,623.44	6,623.44									
09.02.07	SECCIONADOR Y ACCESORIOS	GLB	1.00	999.11	999.11									
09.02.08	TRANSFORMADORES Y SISTEMA DEMEDICION	GLB	1.00	10,045.00	10,045.00									
09.02.09	CONCRETO FC= 210 KG/CM2	m3	1.00	338.14	338.14									
09.02.10	CONDUCTOR N2 X SH Y ACCESORIOS	GLB	1.00	37,890.70	37,890.70									
09.02.11	SUB ESTACION ELECTRICA	GLB	1.00	45,455.88	45,455.88									
09.02.12	INSTALACION CABLE N2XSH	GLB	1.00	3.37	3.37									
09.03	MONTAJE ELECTROMECANICO	m	345.00	3.37	1,162.65									
09.03.01	OBRAS PRELIMINARES													
09.03.01.01	REPLANTEO TOPOGRAFICO DE LA LINEA Y UBICACION DE ESTRUCTURAS	m	2,400.00	1.20	2,880.00									
09.03.01.02	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA	GLB	1.00	8,000.00	8,000.00									
09.03.02	INSTALACIONES DE POSTES													
09.03.02.01	CAMION GRUA TRANSPORTE E IZAJE DE POSTES	est	3.00	205.06	615.18									
09.03.02.02	EXCAVACION HUECO PARA POSTE EN TERRENO NORMAL	und	3.00	82.59	247.77									
09.03.02.03	INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO Y AISLADORES	und	3.00	55.06	165.18									
09.03.02.04	CEMENTACION DE POSTE DE CONCRETO	und	3.00	157.32	471.96									
09.03.02.05	CONSTRUCCION DE SOLADO DE CONCRETO	und	3.00	55.06	165.18									
09.03.02.06	RECUBRIMIENTO DEL POSTE CON SUSTANCIA BITUMINOSA	und	3.00	23.53	70.59									
09.03.02.07	RECUBRIMIENTO DEL POSTE HASTA 3M CON SELLADOR IMPERMEABILIZANTE	und	3.00	34.03	102.09									
09.03.02.08	NUMERACION Y SEÑALIZACION DE POSTE	und	3.00	26.03	78.09									
09.03.03	INSTALACIONES RETENIDAS													
09.03.03.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA RETENIDA EN TERRENO NORMAL	und	2.00	55.06	110.12									
09.03.03.02	INSTALACION DE RETENIDA INC. RELLENO Y COMPACTACION	und	2.00	84.79	169.58									

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 R. O. C. CIP N° 10717

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 R. O. C. CIP N° 22855



N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCES ACTUAL				ACUMULADO ANTERIOR				ACUMULADO				SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	
																					Metrado
09	SUB-PRESUPUESTO 09																				
09.03.04	MEDIA TENSION																				
09.03.04.01	MONTAJE DE ARMADOS	und	1.00	273.97	273.97																
09.03.04.02	ARMADO PA-1	und	1.00	136.98	136.98																
09.03.04.03	ARMADO SE	und	1.00	382.75	382.75																
09.03.04.04	INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION, PROTECCION Y MEDICION	und	1.00	191.37	191.37																
09.03.05	MONTAJE DE CONDUCTORES																				
09.03.05.01	TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR AAAG 50 MM2/ FASE	m	280.00	2.55	714.00																
09.03.06	INSTALACION DE PUERTA A TIERRA																				
09.03.06.01	EXCAVACION DE HUECO PARA PUERTA A TIERRA EN TERRENO NORMAL	und	2.00	95.99	191.98																
09.03.06.02	INSTALACION DE PUERTA A TIERRA EN ESTRUCTURAS (INCLUYE RELLENO Y COMPACTACION)	und	2.00	382.75	765.50																
09.03.07	OBRAS CIVILES																				
09.03.07.01	EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.10X0.80 PARA INSTALACION DE DUCTOS	m	345.00	30.47	10512.15																
09.03.07.02	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m	345.00	4.11	1,417.95																
09.03.07.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	7.00	14.38	100.66																
09.03.08	MONTAJE DE TRANSFORMADOR																				
09.03.08.01	MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 300 KVA. INCLUYE TABLERO	und	1.00	765.49	765.49																
09.03.09	PRUEBAS Y PUERTA EN SERVICIO																				
09.03.09.01	PRUEBA Y PUERTA EN SERVICIO	m	450.00	0.96	432.00																
	<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>				<b>149,611.46</b>																
	<b>GASTOS GENERALES (8.25 %)</b>				<b>12,342.95</b>																
	<b>UTILIDAD (8.00 %)</b>				<b>11,968.92</b>																
	<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>				<b>179,923.33</b>																
	<b>I.G.V. (18.0 %)</b>				<b>31,306.20</b>																
	<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>				<b>205,229.53</b>																
	<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (SIN IGV)</b>				<b>179,923.33</b>																
	<b>I.G.V. (18.0 %)</b>				<b>31,306.20</b>																
	<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (CON IGV)</b>				<b>205,229.53</b>																
					<b>149,611.46</b>																
					<b>12,342.95</b>																
					<b>11,968.92</b>																
					<b>179,923.33</b>																
					<b>31,306.20</b>																
					<b>205,229.53</b>																
					<b>179,923.33</b>																
					<b>31,306.20</b>																
					<b>205,229.53</b>																
					<b>149,611.46</b>																
					<b>12,342.95</b>																
					<b>11,968.92</b>																
					<b>179,923.33</b>																
					<b>31,306.20</b>																
					<b>205,229.53</b>																
					<b>179,923.33</b>																
					<b>31,306.20</b>																
					<b>205,229.53</b>																

  
 CARLOS ENRIQUE QUROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**VALORIZACION DE OBRA N° 45 - SETIEMBRE 2018 (FORMULA 10 - SEGURIDAD Y SALUD)**

OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE  
 ENTIDAD : FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 FECHA : 30 DE SETIEMBRE DEL 2018

Monto Base : S/. 33,504,650.56  
 Monto Contratado : S/. 32,457,630.22  
 Fecha Inicio Obra : 15-ene-15  
 Plazo de Ejecución : 1,158 Días C.  
 Fecha Final Obra : 17-mar-18  
 Mod. de Ejecución : Precios Unitarios


Residente : Ing. Carlos Enrique Quiróz Cisneros  
 Supervisor : Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza

SEGN COSTO DIRECTO :  
 Monto Valorizado del Mes :  
 Monto Valorizado Acumulado : S/. 16,500.80  
 Monto-Saldo por Valorizar : 100.00%

Ubicación :  
 Región : LAMBAYEQUE  
 Provincia : LAMBAYEQUE  
 Distrito : SAN JOSE  
 Localidad : SAN JOSE

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			AVANCES			SALDO												
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO										
						%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.						
10	SUB-PRESUPUESTO 10																			
10.01	SEGURIDAD Y SALUD																			
10.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	7000.00	7,000.00	100%	1.00	7,000.00												
10.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	1.00	1,722.00	1,722.00	100%	1.00	1,722.00												
10.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	1.00	500.80	500.80	100%	1.00	500.80												
10.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1.00	832.00	832.00	100%	1.00	832.00												
10.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	8,000.00	8,000.00	100%	1.00	8,000.00												
10.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	und	1.00	648.00	648.00	100%	1.00	648.00												
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>					<b>16,500.80</b>			<b>16,500.80</b>												
GASTOS GENERALES (8.25 %)					1,361.32			1,361.32												
UTILIDAD (6.00 %)					1,320.06			1,320.06												
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					<b>19,182.18</b>			<b>19,182.18</b>												
I.G.V. (18.0 %)					3,452.79			3,452.79												
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					<b>22,634.97</b>			<b>22,634.97</b>												
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (SIN IGV)</b>					<b>19,182.18</b>			<b>19,182.18</b>												
I.G.V. (18.0 %)					3,452.79			3,452.79												
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (CON IGV)</b>					<b>22,634.97</b>			<b>22,634.97</b>												

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

# CONSORCIO SAN JOSE

## AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO - SETIEMBRE 2018

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

ENTIDAD : FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 RESIDENTE : CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 PLAZO CONTR. : 1,360 DIAS CALENDARIO  
 MODALIDAD : A PRECIOS UNITARIOS

FORMULA:

$$\text{AMORT} = A \times \text{VAL} / C$$

DONDE:

AMORT : Amortizacion por el Adelanto en Efectivo  
 A : Monto del Adelanto Directo Otorgado en Efectivo Sin IGV  
 V : Monto de la Valorización Mensual, incluye Factor Relación  
 C : Monto del Contrato Principal Sin IGV

SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 32,457,630.22 INC. IGV  
 SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 27,506,466.29 SIN IGV

PORCENTAJE DEL ADELANTO 20.00%

ADELANTO DIRECTO = 6,491,526.04 INC IGV  
 ADELANTO DIRECTO = 5,501,293.26 SIN IGV

No.	FECHA PAGO	ADEL. EFEC. CON IGV	ADEL. EFEC. SIN IGV	PORCENTAJE DEL ADELANTO
1	09/01/2015	6,491,526.04	5,501,293.26	20.00%

Valorizacion		Monto Valorizado	Adel. Otorg. (SIN IGV)	Porcentaje del Adelanto	Amortizacion AxVAL/C	Monto por Amortizar	Saldo a Amortizar
N°	Mes	a	c	d	e = a x d	f	g = f - e
VAL N° 1	ENERO	358,268.22	5,501,293.26	20.00%	71,653.64	5,501,293.26	5,429,639.62
VAL N° 2	FEBRERO	555,717.90	5,501,293.26	20.00%	111,143.58	5,501,293.26	5,318,496.04
VAL N° 3	MARZO	593,994.44	5,501,293.26	20.00%	118,798.89	5,501,293.26	5,199,697.15
VAL N° 4	ABRIL	925,177.18	5,501,293.26	20.00%	185,035.44	5,501,293.26	5,014,661.71
VAL N° 5	MAYO	753,732.22	5,501,293.26	20.00%	150,746.44	5,501,293.26	4,863,915.27
VAL N° 6	JUNIO	985,329.63	5,501,293.26	20.00%	197,065.93	5,501,293.26	4,666,849.34
VAL N° 7	JULIO	1,865,453.02	5,501,293.26	20.00%	373,090.60	5,501,293.26	4,293,758.74
VAL N° 8	AGOSTO	1,054,927.09	5,501,293.26	20.00%	210,985.42	5,501,293.26	4,082,773.32
VAL N° 9	SEPTIEMBRE	1,429,170.33	5,501,293.26	20.00%	285,834.07	5,501,293.26	3,796,939.25
VAL N° 10	OCTUBRE	1,285,746.48	5,501,293.26	20.00%	257,149.30	5,501,293.26	3,539,789.95
VAL N° 11	NOVIEMBRE	2,011,031.83	5,501,293.26	20.00%	402,206.37	5,501,293.26	3,137,583.58
VAL N° 12	DICIEMBRE	1,389,920.39	5,501,293.26	20.00%	277,984.08	5,501,293.26	2,859,599.50
VAL N° 13	ENERO	1,517,495.69	5,501,293.26	20.00%	303,499.14	5,501,293.26	2,556,100.36
VAL N° 14	FEBRERO	667,975.68	5,501,293.26	20.00%	133,595.14	5,501,293.26	2,422,505.22
VAL N° 15	MARZO	621,544.65	5,501,293.26	20.00%	124,308.93	5,501,293.26	2,298,196.29
VAL N° 16	ABRIL	240,541.06	5,501,293.26	20.00%	48,108.21	5,501,293.26	2,250,088.08
VAL N° 17	MAYO	67,518.42	5,501,293.26	20.00%	13,503.68	5,501,293.26	2,236,584.40
VAL N° 18	JUNIO	238,908.88	5,501,293.26	20.00%	47,781.78	5,501,293.26	2,188,802.62
VAL N° 19	JULIO	87,581.78	5,501,293.26	20.00%	17,516.36	5,501,293.26	2,171,286.26
VAL N° 20	AGOSTO	26,733.49	5,501,293.26	20.00%	5,346.70	5,501,293.26	2,165,939.56
VAL N° 21	SEPTIEMBRE	54,654.58	5,501,293.26	20.00%	10,930.92	5,501,293.26	2,155,008.64
VAL N°01 - ADICIONAL N°02	ABRIL	380,705.19	5,501,293.26		190,352.60	5,501,293.26	1,964,656.04
VAL N° 01 - ADICIONAL N°04	JULIO	423,756.53	5,501,293.26		211,878.27	5,501,293.26	1,752,777.77
VAL N° 22	OCTUBRE	15,754.74	5,501,293.26	20.00%	3,150.95	5,501,293.26	1,749,626.82
VAL N° 23	NOVIEMBRE	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	1,749,626.82
VAL N° 24	DICIEMBRE	68,223.57	5,501,293.26	20.00%	13,644.71	5,501,293.26	1,735,982.11
VAL N°01 - ADICIONAL N°05	DICIEMBRE	148,551.83	5,501,293.26		74,275.92	5,501,293.26	1,661,706.19
VAL N° 02 - ADICIONAL N°04	ENERO	35,933.20	5,501,293.26		35,933.20	5,501,293.26	1,625,772.99
VAL N° 25	ENERO	106,056.42	5,501,293.26	20.00%	106,056.42	5,501,293.26	1,519,716.57
VAL N° 01 - ADICIONAL N°06	ENERO	886,768.10	5,501,293.26		886,768.10	5,501,293.26	632,948.47

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO  
 Reg. CIP N° 22650

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL

# CONSORCIO SAN JOSE

## AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO - SETIEMBRE 2018

**OBRA** : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

**ENTIDAD** : FONDEPES  
**CONTRATISTA** : CONSORCIO SAN JOSE  
**RESIDENTE** : CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
**PLAZO CONTR.** : 1,360 DIAS CALENDARIO  
**MODALIDAD** : A PRECIOS UNITARIOS

**FORMULA:**

**AMORT = AxVAL/C**

**DONDE:**

**AMORT** : Amortizacion por el Adelanto en Efectivo  
**A** : Monto del Adelanto Directo Otorgado en Efectivo Sin IGV  
**V** : Monto de la Valorización Mensual, incluye Factor Relación  
**C** : Monto del Contrato Principal Sin IGV


**SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO** 32,457,630.22 INC. IGV  
**SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO** 27,506,466.29 SIN IGV


**PORCENTAJE DEL ADELANTO** 20.00%

**ADELANTO DIRECTO =** 6,491,526.04 INC IGV  
**ADELANTO DIRECTO =** 5,501,293.26 SIN IGV

No.	FECHA PAGO	ADEL. EFEC. CON IGV	ADEL. EFEC. SIN IGV	PORCENTAJE DEL ADELANTO
1	09/01/2015	6,491,526.04	5,501,293.26	20.00%

Valorización		Monto Valorizado	Adel. Otorg. (SIN IGV)	Porcentaje del Adelanto	Amortización AxVAL/C	Monto por Amortizar	Saldo a Amortizar
N°	Mes	a	c	d	e = a x d	f	g = f - e
VAL N° 26	FEBRERO	11,543.86	5,501,293.26	20.00%	2,308.77	5,501,293.26	630,639.70
VAL N° 02 - ADICIONAL N°06	FEBRERO	17,601.86	5,501,293.26		17,601.86	5,501,293.26	613,037.84
VAL N° 27	MARZO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL N° 28	ABRIL	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL N° 29	MAYO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL N° 30	JUNIO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL N° 31	JULIO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL N° 32	AGOSTO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL N° 33	SEPTIEMBRE	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL N° 34	OCTUBRE	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL N° 35	NOVIEMBRE	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL N° 36	DICIEMBRE	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL N° 37	ENERO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL N° 38	FEBRERO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL N° 01 - ADICIONAL N°08	MARZO	569,308.78	5,501,293.26	20.00%	113,861.76	5,501,293.26	499,176.08
VAL N° 39	MARZO	1,487.48	5,501,293.26	20.00%	297.50	5,501,293.26	498,878.58
VAL N° 01 - ADICIONAL N°07	MARZO	46,702.28	5,501,293.26	20.00%	9,340.46	5,501,293.26	489,538.12
VAL N° 02 - ADICIONAL N°07	ABRIL	12,810.45	5,501,293.26	20.00%	2,562.09	5,501,293.26	486,976.03
VAL N° 02 - ADICIONAL N°08	ABRIL	121,994.74	5,501,293.26	20.00%	24,398.95	5,501,293.26	462,577.08
VAL N°40	ABRIL	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	462,577.08
VAL N° 03 - ADICIONAL N°07	MAYO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	462,577.08
VAL N° 03 - ADICIONAL N°08	MAYO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	462,577.08
VAL N°41	MAYO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	462,577.08

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22000

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

# CONSORCIO SAN JOSE

00 189

## AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO - SETIEMBRE 2018

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

ENTIDAD : FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 RESIDENTE : CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 PLAZO CONTR. : 1,360 DIAS CALENDARIO  
 MODALIDAD : A PRECIOS UNITARIOS

FORMULA:

$$\text{AMORT} = A \times \text{VAL}/C$$

DONDE:

AMORT : Amortizacion por el Adelanto en Efectivo  
 A : Monto del Adelanto Directo Otorgado en Efectivo Sin IGV  
 V : Monto de la Valorización Mensual, incluye Factor Relación  
 C : Monto del Contrato Principal Sin IGV

SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 32,457,630.22 INC. IGV  
 SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 27,506,466.29 SIN IGV

PORCENTAJE DEL ADELANTO 20.00%


ADELANTO DIRECTO = 6,491,526.04 INC IGV  
 ADELANTO DIRECTO = 5,501,293.26 SIN IGV


No.	FECHA PAGO	ADEL. EFEC. CON IGV	ADEL. EFEC. SIN IGV	PORCENTAJE DEL ADELANTO
1	09/01/2015	6,491,526.04	5,501,293.26	20.00%

Valorización N°	Mes	Monto Valorizado a	Adel. Otorg. (SIN IGV) c	Porcentaje del Adelanto d	Amortización AxVAL/C e = a x d	Monto por Amortizar f	Saldo a Amortizar g = f - e
VAL N° 04 - ADICIONAL N°08	JUNIO	50,282.27	5,501,293.26	20.00%	10,056.45	5,501,293.26	452,520.63
VAL N° 04 - ADICIONAL N°07	JUNIO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	452,520.63
VAL N° 42	JUNIO	27,517.58	5,501,293.26	20.00%	5,503.52	5,501,293.26	447,017.11
VAL N° 05 - ADICIONAL N°08	JULIO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	447,017.11
VAL N° 05 - ADICIONAL N°07	JULIO	41,140.04	5,501,293.26	20.00%	8,228.01	5,501,293.26	438,789.10
VAL N° 43	JULIO	15,893.61	5,501,293.26	20.00%	3,178.72	5,501,293.26	435,610.38
VAL N° 06 - ADICIONAL N°08	AGOSTO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	435,610.38
VAL N° 06 - ADICIONAL N°07	AGOSTO	63,995.61	5,501,293.26	20.00%	12,799.12	5,501,293.26	422,811.26
VAL N° 44	AGOSTO	16,519.87	5,501,293.26	20.00%	3,303.97	5,501,293.26	419,507.29
VAL N° 07 - ADICIONAL N°08	SETIEMBRE	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	419,507.29
VAL N° 07 - ADICIONAL N°07	SETIEMBRE	64,373.77	5,501,293.26	20.00%	12,874.75	5,501,293.26	406,632.54
VAL N° 45	SETIEMBRE	23,972.12	5,501,293.26	20.00%	4,794.42	5,501,293.26	401,838.12
<b>SUBTOTAL</b>		<b>19,656,421.84</b>			<b>SUB TOTAL 5,099,455.14</b>		
		IGV 3,538,155.93			IGV 917,901.93		
		<b>23,194,577.77</b>			<b>6,017,357.07</b>		

AMORTIZACION DEL MES

S/. 4,794.42

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

153

## RESIDENCIA DE OBRA DEDUCCION DE REAJUSTE POR ADELANTO DIRECTO

OBRA	: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE				
CONTRATISTA	: CONSORCIO SAN JOSE				
CLIENTE	: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO				
MONTO OBRA	: 32,457,630.22	(con IGV)	27,506,466.29	Sin/IGV	
PLAZO	: 1,360 DIAS CALENDARIO				
UBICACIÓN	: SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE				
A. DIRECTO	: 6,491,526.04	(con IGV)	5,501,293.26	Sin/IGV	FECHA DE ENTREGA : 09/01/2015
A. MATERIALES	: NO SOLICITADO				
INICIO CONTRAC.	: 15/01/2015				

**DEDUCCION DE REAJUSTE POR ADELANTO DIRECTO QUE NO CORRESPONDE :**

Según la fórmula:

$$D = V * A / C (K / K_a - 1)$$

Valorización			Adelanto Directo	Mes de Reajuste**		Mes de entrega Adel.		Monto a Regularizar
Nº	Formula	Monto		Mes	K	Mes	Ka	
45.00	01	0.00	5,501,293.26	jun-18	1.143	ene-15	1.035	-
	02	0.00	5,501,293.26	jun-18	1.139	ene-15	1.023	-
	03	0.00	5,501,293.26	jun-18	1.149	ene-15	1.039	-
	04	0.00	5,501,293.26	jun-18	1.175	ene-15	1.036	-
	05	0.00	5,501,293.26	jun-18	1.173	ene-15	1.031	-
	06	0.00	5,501,293.26	jun-18	1.178	ene-15	1.050	-
	07	23,972.12	5,501,293.26	jun-18	1.140	ene-15	1.033	496.62
	08	0.00	5,501,293.26	jun-18	1.089	ene-15	1.027	-
	09	0.00	5,501,293.26	jun-18	1.168	ene-15	1.042	-
	10	0.00	5,501,293.26	jun-18	1.142	ene-15	1.029	-
			<b>5,501,293.26</b>	<b>PARCIAL</b>		<b>S/.</b>	<b>496.62</b>	
				<b>PARCIAL PAGADO</b>		<b>S/.</b>	<b>-</b>	
				<b>TOTAL A REGULARIZAR</b>		<b>S/.</b>	<b>496.62</b>	

**TOTAL REINTEGROS A REGULARIZAR (sin IGV) S/. 496.62**

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**RESIDENCIA DE OBRA  
FORMULAS POLINOMICAS**

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE

OBRA: CONSORCIO SAN JOSE  
 ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 MONTO OBRA: 32,457,630.22 (con IGV) 27,506,466.29 Sin IGV  
 PLAZO EJEC: 1,360 DIAS CALENDARIO  
 UBICACION: SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
 A. DIRECTO: 6,491,526.04 (con IGV) 5,501,293.26 Sin IGV  
 INICIO DE OBRA: 15/01/2015  
 FORMULAS DE ESTRUCTURAS

$$K = 0.007*(Ar / Mo) + 0.169*(Ir / Io) + 0.218*(MDr / MDa) + 0.078*(HBr / HBa) + 0.119*(AMr / AMa) + 0.089*(Ar / Ao) + 0.130*(Cr / Co)$$

Simb	TU	DESCRIPCION	Coef	%	Jun '14	Ene '15	Mar '15	Apr '15	May '15	Jun '15	Jul '15	Ago '15	Sep '15	Oct '15	Nov '15	Dic '15	K (Ene '15)	K (Mar '15)	K (Apr '15)	K (May '15)	K (Jun '15)	K (Jul '15)	K (Ago '15)	K (Sep '15)	K (Oct '15)	K (Nov '15)	K (Dic '15)		
M	47	MANO DE OBRA INC. LETES SOCIALES	0.207	100.000%	523.70	523.15	523.52	523.52	523.52	523.52	523.52	523.52	523.52	523.52	523.52	523.52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.169	100.000%	400.98	405.56	416.14	446.14	471.87	488.86	445.52	445.52	445.52	445.52	445.52	445.52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PA	02	AGREGADO GRUESO	0.187	3.209%	437.56	437.56	437.56	437.56	437.56	437.56	437.56	437.56	437.56	437.56	437.56	437.56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
DB	17	BLOQUE Y LADRILLO	0.087	32.184%	572.71	572.83	572.83	572.83	572.83	572.83	572.83	572.83	572.83	572.83	572.83	572.83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CH	23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	0.081	80.329%	387.37	411.34	411.34	411.34	411.34	411.34	411.34	411.34	411.34	411.34	411.34	411.34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PM	54	HERRAMIENTA MANUAL	0.074	19.072%	293.39	294.99	294.99	294.99	294.99	294.99	294.99	294.99	294.99	294.99	294.99	294.99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
AH	02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	0.097	50.000%	410.63	412.70	412.70	412.70	412.70	412.70	412.70	412.70	412.70	412.70	412.70	412.70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.000	100.000%	492.06	515.47	515.47	515.47	515.47	515.47	515.47	515.47	515.47	515.47	515.47	515.47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	


\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.


**FORMULA N° 52-ARQUITECTURA**

$$K = 0.328*(Ar / Mo) + 0.168*(Ir / Io) + 0.197*(PAr / PAa) + 0.087*(DBr / DBa) + 0.061*(CHr / CHa) + 0.074*(PMr / PMa) + 0.097*(Ar / Ao)$$

Simb	TU	DESCRIPCION	Coef	%	Jun '14	Ene '15	Mar '15	Apr '15	May '15	Jun '15	Jul '15	Ago '15	Sep '15	Oct '15	Nov '15	Dic '15	K (Ene '15)	K (Mar '15)	K (Apr '15)	K (May '15)	K (Jun '15)	K (Jul '15)	K (Ago '15)	K (Sep '15)	K (Oct '15)	K (Nov '15)	K (Dic '15)		
M	47	MANO DE OBRA INC. LETES SOCIALES	0.328	100.000%	523.70	523.15	523.52	523.52	523.52	523.52	523.52	523.52	523.52	523.52	523.52	523.52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.168	100.000%	400.98	405.56	416.14	446.14	471.87	488.86	445.52	445.52	445.52	445.52	445.52	445.52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PA	02	AGREGADO GRUESO	0.187	3.209%	437.56	437.56	437.56	437.56	437.56	437.56	437.56	437.56	437.56	437.56	437.56	437.56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
DB	17	BLOQUE Y LADRILLO	0.087	32.184%	572.71	572.83	572.83	572.83	572.83	572.83	572.83	572.83	572.83	572.83	572.83	572.83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CH	23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	0.081	80.329%	387.37	411.34	411.34	411.34	411.34	411.34	411.34	411.34	411.34	411.34	411.34	411.34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PM	54	HERRAMIENTA MANUAL	0.074	19.072%	293.39	294.99	294.99	294.99	294.99	294.99	294.99	294.99	294.99	294.99	294.99	294.99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
AH	02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	0.097	50.000%	410.63	412.70	412.70	412.70	412.70	412.70	412.70	412.70	412.70	412.70	412.70	412.70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.000	100.000%	492.06	515.47	515.47	515.47	515.47	515.47	515.47	515.47	515.47	515.47	515.47	515.47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

  
**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

  
**CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22353

**RESIDENCIA DE OBRA  
FORMULAS POLINOMICAS**

OBRA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE  
 EJECUTA CONSORCIO SAN JOSE  
 ENTIDAD FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 MONTO OBRA 32,457,630.72  
 PLAZO EJEC. 1.500 DIAS CALENDARIO  
 UBICACION SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
 A. DIRECTO 6,491,536.04  
 A. MATERIALES NO SOLICITADO  
 INICIO DE OBRA 15/01/2013

(con IGV) 27,506,466.29 Sin IGV  
 (con IGV) 5,501,293.26 Sin IGV

**FORMULA N° 03: INSTALACIONES ELECTRICAS.**

$$K = 0.172*(Mr / Mo) + 0.167*(Tr / To) + 0.129*(Mr / Me) + 0.113*(Pr / Pto) + 0.075*(Ar / Ao) + 0.108*(Dr / Do) + 0.115*(Dn / Dn) + 0.125*(Tr / Mo)$$

Simb	IU	DESCRIPCION	Coef	%	Jan '14	Ene '15	Feb '15	Mar '15	Abr '15	May '15	Jun '15	Jul '15	Ago '15	Sep '15	Oct '15	Nov '15	Dic '15	K (Ene '15)	K (Feb '15)	K (Mar '15)	K (Abr '15)	K (May '15)	K (Jun '15)	K (Jul '15)	K (Ago '15)	K (Sep '15)	K (Oct '15)	K (Nov '15)	K (Dic '15)		
M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	0.172	100.000%	523.70	523.15	523.52	523.89	524.26	524.63	525.00	525.37	525.74	526.11	526.48	526.85	527.22	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	
I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.167	100.000%	400.98	405.56	410.14	414.72	419.30	423.88	428.46	433.04	437.62	442.20	446.78	451.36	455.94	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169
M	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	0.129	100.000%	338.46	343.04	347.62	352.20	356.78	361.36	365.94	370.52	375.10	379.68	384.26	388.84	393.42	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
PA	05	AGREGADO GRUESO	0.113	1.770%	437.56	430.01	422.46	414.91	407.36	399.81	392.26	384.71	377.16	369.61	362.06	354.51	346.96	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
A	06	POSTE DE CONCRETO	0.075	96.230%	410.93	430.01	449.09	468.26	487.43	506.60	525.77	544.94	564.11	583.28	602.45	621.62	640.79	0.116	0.116	0.116	0.116	0.116	0.116	0.116	0.116	0.116	0.116	0.116	0.116	0.116	0.116
A	12	ALAMBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO	0.075	100.000%	892.79	859.65	826.51	793.37	760.23	727.09	693.95	660.81	627.67	594.53	561.39	528.25	495.11	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080
A	12	ARTIFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR	0.106	100.000%	299.22	315.26	331.30	347.34	363.38	379.42	395.46	411.50	427.54	443.58	459.62	475.66	491.70	0.112	0.112	0.112	0.112	0.112	0.112	0.112	0.112	0.112	0.112	0.112	0.112	0.112	0.112
D	49	DOLAR	0.115	100.000%	397.37	411.34	425.31	439.28	453.25	467.22	481.19	495.16	509.13	523.10	537.07	551.04	565.01	0.122	0.122	0.122	0.122	0.122	0.122	0.122	0.122	0.122	0.122	0.122	0.122	0.122	0.122
M	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	0.123	100.000%	248.68	268.53	288.38	308.23	328.08	347.93	367.78	387.63	407.48	427.33	447.18	467.03	486.88	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
			1.000														1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	


\*\* Requerjes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.


**FORMULA N° 04: INSTALACIONES SANITARIAS.**

$$K = 0.247*(Mr / Mo) + 0.167*(Tr / To) + 0.287*(Dn / Dno) + 0.236*(Tn / Tno) + 0.003*(Mn / Mno)$$

Simb	IU	DESCRIPCION	Coef	%	Jan '14	Ene '15	Feb '15	Mar '15	Abr '15	May '15	Jun '15	Jul '15	Ago '15	Sep '15	Oct '15	Nov '15	Dic '15	K (Ene '15)	K (Feb '15)	K (Mar '15)	K (Abr '15)	K (May '15)	K (Jun '15)	K (Jul '15)	K (Ago '15)	K (Sep '15)	K (Oct '15)	K (Nov '15)	K (Dic '15)		
M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	0.247	100.000%	523.70	523.15	523.52	523.89	524.26	524.63	525.00	525.37	525.74	526.11	526.48	526.85	527.22	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	
I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.167	100.000%	400.98	405.56	410.14	414.72	419.30	423.88	428.46	433.04	437.62	442.20	446.78	451.36	455.94	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169
DA	29	APPARATO SANITARIO CON GRUPERIA	0.287	6.200%	390.12	390.36	390.60	390.84	391.08	391.32	391.56	391.80	392.04	392.28	392.52	392.76	393.00	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
TV	72	TUBERIA DE PVC PARA AGUA	0.236	89.831%	397.37	411.34	425.31	439.28	453.25	467.22	481.19	495.16	509.13	523.10	537.07	551.04	565.01	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245
D	43	VALVULA DE FIERRO FUNDIDO NACIONAL	0.003	10.169%	370.39	390.84	411.29	431.74	452.19	472.64	493.09	513.54	533.99	554.44	574.89	595.34	615.79	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
			0.003	57.143%	655.15	672.00	688.85	705.70	722.55	739.40	756.25	773.10	789.95	806.80	823.65	840.50	857.35	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037
			1.000	42.857%	248.68	268.53	288.38	308.23	328.08	347.93	367.78	387.63	407.48	427.33	447.18	467.03	486.88	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029

\*\* Requerjes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

  
**CARLOS ENRIQUE QUIRCZ CISNEROS**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22356

  
**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717



**RESIDENCIA DE OBRA  
FORMULAS POLINOMICAS**

OBRA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE

EJECUTA CONSORCIO SAN JOSE (con IGV) 27,506,466.29 Sin/IV  
 ENTIDAD FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 32,457,630.22 Sin/IV  
 MONTO OBRA 1,360 DIAS CALENDARIO (con IGV) 5,501,293.26 Sin/IV  
 PLAZO EJEC. SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
 UBICACION A. MATERIALES NO SOLICITADO  
 INICIO DE OBRA 15/01/2015

**FORMULA Nº DE MITIGACION AMBIENTAL.**

$$K = 0.296*(Dr / Do) + 0.201*(Mr / Mo) + 0.167*(Ir / Io) + 0.076*(Ar / Ao) + 0.137*(Mr / Ms) + 0.123*(Pr / Ps)$$

Símb	U	DESCRIPCION	Coef	%	Jun '14	Jul '14	Agos '14	Sep '14	Oct '14	Nov '14	Dic '14	Ene '15	Feb '15	Mar '15	Abr '15	May '15	Jun '15	Jul '15	Ago '15	Sep '15	Oct '15	Nov '15	Dic '15	
D	25	DOLAR	0.296	100.000%	387.37	411.34	471.87	468.88	0.361	471.87	471.87	471.87	471.87	471.87	471.87	471.87	471.87	471.87	471.87	471.87	471.87	471.87	471.87	471.87
M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	0.201	100.000%	523.70	523.15	523.15	523.15	0.224	523.15	523.15	523.15	523.15	523.15	523.15	523.15	523.15	523.15	523.15	523.15	523.15	523.15	523.15	523.15
I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.167	100.000%	400.98	405.56	446.14	445.52	0.186	446.14	446.14	446.14	446.14	446.14	446.14	446.14	446.14	446.14	446.14	446.14	446.14	446.14	446.14	446.14
AT	05	AGREGADO FINO	0.076	100.000%	517.21	524.90	548.18	547.13	0.081	548.18	548.18	548.18	548.18	548.18	548.18	548.18	548.18	548.18	548.18	548.18	548.18	548.18	548.18	548.18
M	42	MADERA IMPORTADA PARA ENCOFRADO Y CARP.	0.137	100.000%	247.43	263.40	284.22	283.33	0.157	284.22	284.22	284.22	284.22	284.22	284.22	284.22	284.22	284.22	284.22	284.22	284.22	284.22	284.22	284.22
P	56	PLANCHAS DE ACERO LAC	0.123	100.000%	454.42	459.26	519.26	523.71	0.141	519.26	519.26	519.26	519.26	519.26	519.26	519.26	519.26	519.26	519.26	519.26	519.26	519.26	519.26	519.26
			<b>1.000</b>		<b>1.031</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>	

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

**FORMULA Nº DE EQUIPAMIENTO.**

$$K = 0.467*(Dr / Do) + 0.148*(Mr / Mo) + 0.167*(Ir / Io) + 0.0217*(Pr / Ps)$$

Símb	U	DESCRIPCION	Coef	%	Jun '14	Jul '14	Agos '14	Sep '14	Oct '14	Nov '14	Dic '14	Ene '15	Feb '15	Mar '15	Abr '15	May '15	Jun '15	Jul '15	Ago '15	Sep '15	Oct '15	Nov '15	Dic '15
D	25	DOLAR	0.467	100.000%	387.37	411.34	471.87	468.88	0.369	471.87	471.87	471.87	471.87	471.87	471.87	471.87	471.87	471.87	471.87	471.87	471.87	471.87	471.87
AM	10	APARATO SANITARIO CON GRUFERIA	0.149	99.329%	380.12	390.36	416.69	416.64	0.162	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69
I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.167	100.000%	655.15	672.00	726.59	726.59	0.011	726.59	726.59	726.59	726.59	726.59	726.59	726.59	726.59	726.59	726.59	726.59	726.59	726.59	726.59
M	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	0.217	100.000%	338.46	348.43	385.55	385.01	0.234	385.55	385.55	385.55	385.55	385.55	385.55	385.55	385.55	385.55	385.55	385.55	385.55	385.55	385.55
			<b>1.000</b>		<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 10717

RESIDENCIA DE OBRA
FORMULAS POLINOMICAS

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE

OBRA EJECUTA CONSORSIO SAN JOSE FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO MONTO OBRA 32,457,630.22 (con IDV) 27,506,446.29 SRI/IDV PLAZO EJEC. 1,360 DIAS CALENDARIO UBICACIÓN SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE (con IDV) 5,941,293.26 SRI/IDV A. DIRECTO NO. SOLICITADO INICIO DE OBRA 15/01/2015

FORMULA Nº 07: OBRAS EN MAR.

K = 0.271\*(Ar / Aa) + 0.254\*(Mr / Ma) + 0.187\*(Ir / Ia) + 0.099\*(MM / MMo) + 0.087\*(MAR / MAa) + 0.142\*(CDr / CDo)

Table with 10 columns: Simb, IU, DESCRIPCION, Coef, %, Jun '14, Ene '15, Mar '15, Abr '15, May '15, Jun '15, Jul '15, Ago '15, Set '15, K, Ir, K. Contains data for items AP, M, I, MM, MA, CD.

\*\* Regístrate Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

FORMULA Nº 08: PAVIMENTACION EXTERIOR.

K = 0.242\*(Ar / Aa) + 0.236\*(Mr / Ma) + 0.071\*(Ir / Ia) + 0.122\*(MAR / MAa) + 0.162\*(MDr / MDo)

Table with 10 columns: Simb, IU, DESCRIPCION, Coef, %, Jun '14, Ene '15, Mar '15, Abr '15, May '15, Jun '15, Jul '15, Ago '15, Set '15, K, Ir, K. Contains data for items A, M, I, MA, HA, MD.

\*\* Regístrate Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

CARLOS ENRIQUE GUIROZ CISNEROS INGENIERO CIVIL Reg. CIP Nº 22858

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA INGENIERO CIVIL Reg. CIP Nº 10717

**RESIDENCIA DE OBRA  
FORMULAS POLINOMICAS**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE

RECLUTA: CONSORCIO SAN JOSÉ (con IGV) 27,506,466.29 Sim/IGV  
 ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 31,457,680.22  
 MONTO OBRA: 1,360 DIAS CALENDARIO  
 PLAZO EJEC. SAN JOSÉ - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
 UBICACIÓN: 6,491,526.04 (con IGV) 5,501,299.26 Sim/IGV  
 A. DIRECTO  
 A. MATERIALES NO SOLICITADO  
 INICIO DE OBRA: 15/01/2015

**FORMULA Nº 09: INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION**

$$K = 0.199^{\text{Dólar}} + 0.059^{\text{Már}} + 0.179^{\text{Már}} + 0.088^{\text{Már}} + 0.167^{\text{Ir}} + 0.103^{\text{Már}} + 0.163^{\text{Már}} + 0.145^{\text{Már}} + 0.145^{\text{Már}} + 0.145^{\text{Már}}$$

Símb	IU	DESCRIPCIÓN	Coef	%	Jun '14	Ene '15	Már '15	Abr '15	May '15	Jun '15	Jul '15	Ago '15	Sep '15	Oct '15	Nov '15	Dic '15	K (Ene '15)	K (Már '15)	K (Abr '15)	K (May '15)	K (Jun '15)	K (Jul '15)	K (Ago '15)	K (Sep '15)	K (Oct '15)	K (Nov '15)	K (Dic '15)					
DH	23	DÓLAR	0.199	98.955%	387.37	411.34	471.87	469.85	478.04	479.59	461.37	483.02	483.02	483.02	483.02	483.02	1.042	1.145	1.145	1.156	1.160	1.168	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188				
MP	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	0.059	50.947%	655.15	672.00	726.59	721.99	718.80	720.10	725.34	732.59	732.59	732.59	732.59	732.59	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002				
A	11	POSTE DE CONCRETO	0.179	100.000%	410.93	430.01	464.29	463.83	467.17	468.04	468.88	472.19	472.19	472.19	472.19	472.19	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033				
M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	0.088	100.000%	206.95	220.85	254.20	255.08	257.63	258.13	258.99	262.52	262.52	262.52	262.52	262.52	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098				
I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.167	100.000%	400.98	523.15	582.52	582.52	582.52	582.52	582.52	582.52	582.52	582.52	582.52	582.52	0.186	0.186	0.186	0.186	0.186	0.186	0.186	0.186	0.186	0.186	0.186	0.186				
MA	49	AGREGADO GRUESO	0.163	4.909%	437.56	446.14	449.53	450.98	450.97	450.97	450.97	450.97	450.97	450.97	450.97	450.97	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008				
A	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.145	100.000%	400.98	400.98	400.98	294.12	298.88	298.88	298.88	298.88	298.88	298.88	298.88	298.88	0.186	0.186	0.186	0.186	0.186	0.186	0.186	0.186	0.186	0.186	0.186	0.186				
																	1.000	1.145	1.145	1.156	1.160	1.168	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188

\*\* Requesites Calculados con los (I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

**FORMULA Nº 10: SEGURIDAD Y SALUD**

$$K = 0.262^{\text{Dólar}} + 0.064^{\text{Dólar}} + 0.064^{\text{Dólar}} + 0.167^{\text{Ir}} + 0.167^{\text{Ir}} + 0.167^{\text{Ir}} + 0.167^{\text{Ir}} + 0.167^{\text{Ir}} + 0.167^{\text{Ir}}$$

Símb	IU	DESCRIPCIÓN	Coef	%	Jun '14	Ene '15	Már '15	Abr '15	May '15	Jun '15	Jul '15	Ago '15	Sep '15	Oct '15	Nov '15	Dic '15	K (Ene '15)	K (Már '15)	K (Abr '15)	K (May '15)	K (Jun '15)	K (Jul '15)	K (Ago '15)	K (Sep '15)	K (Oct '15)	K (Nov '15)	K (Dic '15)					
M	42	MAQUINARIA IMPORTADA PARA ENCF. Y CARPINT.	0.362	100.000%	247.43	263.40	284.22	283.33	285.22	285.07	285.36	285.93	285.93	285.93	285.93	285.93	0.416	0.416	0.416	0.416	0.416	0.416	0.416	0.416	0.416	0.416	0.416	0.416				
D	29	DÓLAR	0.064	100.000%	387.37	411.34	471.87	469.88	478.04	479.59	481.37	483.02	483.02	483.02	483.02	483.02	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080				
M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	0.303	100.000%	523.70	523.15	582.52	582.52	582.52	582.52	582.52	582.52	582.52	582.52	582.52	582.52	0.337	0.337	0.337	0.337	0.337	0.337	0.337	0.337	0.337	0.337	0.337					
I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.167	100.000%	400.98	405.56	446.14	445.52	445.51	447.10	448.81	449.40	449.40	449.40	449.40	449.40	0.187	0.187	0.187	0.187	0.187	0.187	0.187	0.187	0.187	0.187	0.187					
HM	37	herramienta manual	0.104	85.577%	293.39	294.99	304.11	304.20	304.54	303.74	305.61	305.79	305.79	305.79	305.79	305.79	0.092	0.092	0.092	0.092	0.092	0.092	0.092	0.092	0.092	0.092	0.092					
A	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	0.145	14.423%	338.46	346.43	365.55	365.01	368.85	368.82	368.00	368.15	368.15	368.15	368.15	368.15	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016				
																	1.000	1.125	1.124	1.127	1.130	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142

\*\* Requesites Calculados con los (I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 10717

## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

**OBRA :** CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE

**EJECUTA :** CONSORCIO SAN JOSE

**CLIENTE :** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

**MONTO OBRA :** 32,457,630.22 (con IGV) **RESIDENTE:** ING. CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS

**PLAZO EJEC. :** 1,360 DIAS CALENDARIO

**UBICACIÓN :** SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE


**A. DIRECTO :** 6,491,526.04 (sin IGV)


**A. MATERIALES :** NO SOLICITADO

**INICIO DE OBRA :** 15/01/2015

**CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:**

Nº	Mes	Velocidad (sin IGV)		K	K-1	Reajuste Programado		Reajuste Real		Reajuste Autorizado Acumulado	Reajuste a Reajustar a Pagar
		Programado	Ejecutado			Programado	Acumulado	Real	Acumulado		
01	ene-15	220,056.69	358,268.22	1.035	0.035	7,701.98	7,701.98	12,539.39	12,539.39	12,539.39	-
02	feb-15	624,191.19	551,600.21	1.042	0.042	26,216.03	33,918.01	23,167.21	35,706.60	23,167.21	-
03	mar-15	607,357.90	437,425.17	1.046	0.046	33,918.01	67,836.02	20,121.56	55,828.16	20,121.56	-
04	abr-15	407,069.32	371,440.48	1.047	0.047	19,132.26	86,968.28	17,457.70	73,285.86	17,457.70	-
05	may-15	238,246.77	51,780.65	1.050	0.050	11,912.34	98,880.62	2,589.03	75,874.89	2,589.03	-
06	jun-15	470,358.51	122,422.84	1.059	0.059	27,751.15	126,631.77	7,222.95	83,097.84	7,222.95	-
07	jul-15	369,272.00	411,556.30	1.054	0.054	19,940.69	146,572.46	22,224.04	105,321.88	22,224.04	-
08	ago-15	287,139.55	366,970.03	1.059	0.059	16,941.23	163,513.69	21,651.23	126,973.11	21,651.23	-
09	sep-15	177,026.26	128,428.32	1.058	0.058	10,267.52	173,781.21	7,448.84	134,421.95	7,448.84	-
10	oct-15	92,096.67	36,658.50	1.062	0.062	5,709.99	179,491.20	2,272.83	136,694.78	2,272.83	-
11	nov-15	297,800.06	240,969.49	1.071	0.071	21,143.80	200,635.00	17,108.83	153,803.61	17,108.83	-
12	dic-15	213,115.61	189,160.28	1.078	0.078	16,623.02	217,258.02	14,754.50	168,558.11	14,754.50	-
13	ene-16	86,200.65	294,220.43	1.088	0.088	7,761.66	225,019.68	25,891.40	194,449.51	25,891.40	-
14	feb-16	0.00	97,768.23	1.095	0.095	0.00	225,019.68	9,287.98	203,737.49	9,287.98	-
15	mar-16	0.00	186,087.64	1.084	0.084	0.00	225,019.68	15,631.36	219,368.85	15,631.36	-
16	abr-16	1,076.10	103,044.90	1.073	0.073	78.56	225,098.24	7,522.28	226,891.13	7,522.28	-
17	may-16	55,871.84	45,420.16	1.083	0.083	4,637.36	229,735.60	3,769.87	230,661.00	3,769.87	-
18	jun-16	1,868.45	123,764.24	1.080	0.080	149.48	229,885.08	9,901.14	240,562.14	9,901.14	-
19	jul-16	0.00	9,955.55	1.086	0.086	0.00	229,885.08	856.18	241,418.32	856.18	-
20	ago-16	0.00	0.00	1.089	0.089	0.00	229,885.08	0.00	241,418.32	0.00	-
21	sep-16	0.00	0.00	1.094	0.094	0.00	229,885.08	0.00	241,418.32	0.00	-
22	oct-16	0.00	-1,065.15	1.096	0.096	0.00	229,885.08	-102.25	241,316.07	-102.25	-
23	nov-16	0.00	0.00	1.098	0.098	0.00	229,885.08	0.00	241,316.07	0.00	-
24	dic-16	0.00	0.00	1.097	0.097	0.00	229,885.08	0.00	241,316.07	0.00	-
25	ene-17	0.00	16,455.56	1.097	0.097	0.00	229,885.08	1,598.13	242,914.20	1,598.13	-
26	feb-17	0.00	0.00	1.093	0.093	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	-
27	mar-17	0.00	0.00	1.095	0.095	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	-
28	abr-17	0.00	0.00	1.091	0.091	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	-
29	may-17	0.00	0.00	1.094	0.094	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	-

  
**CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 122866

  
**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE

EJECUTA : CONSORCIO SAN JOSE

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

MONTO OBRA : 32,457,630.22 (con IGV)

PLAZO EJEC. : 1,360 DIAS CALENDARIO

UBICACIÓN : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

A. DIRECTO : 6,491,526.04

A. MATERIALES : NO SOLICITADO

INICIO DE OBRA : 15/01/2015

27,506,466.29 (sin IGV)

RESIDENTE: ING. CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS

5,501,293.26 (sin IGV)

**CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:**

30	jun-17	0.00	0.00	1.096	0.096	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
31	jul-17	0.00	0.00	1.095	0.095	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
32	ago-17	0.00	0.00	1.103	0.103	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
33	sep-17	0.00	0.00	1.105	0.105	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
34	oct-17	0.00	0.00	1.106	0.106	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
35	nov-17	0.00	0.00	1.105	0.105	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
36	dic-17	0.00	0.00	1.108	0.108	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
37	ene-18	0.00	0.00	1.106	0.106	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
38	feb-18	0.00	0.00	1.123	0.123	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
39	mar-18	0.00	0.00	1.124	0.124	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
40	abr-18	0.00	0.00	1.122	0.122	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
41	may-18	0.00	0.00	1.127	0.127	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
42	jun-18	0.00	0.00	1.128	0.128	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
43	jul-18	0.00	0.00	1.130	0.130	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
44	ago-18	0.00	0.00	1.143	0.143	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
45	sep-18	0.00	0.00	1.143	0.143	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
46	oct-18	0.00	0.00	1.143	0.143	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
		<b>4,150,747.57</b>	<b>4,142,352.05</b>				<b>229,885.08</b>	<b>242,914.20</b>	<b>242,914.20</b>	<b>242,914.20</b>	<b>242,914.20</b>	<b>242,914.20</b>	<b>0.00</b>

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGÉ ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

**OBRA** : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE  
**EJECUTA** : CONSORCIO SAN JOSE  
**CLIENTE** : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**MONTO OBRA** : 32,457,630.22 (con IGV) RESIDENTE: ING. CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
**PLAZO EJEC.** : 1,360 DIAS CALENDARIO 27,506,466.29 (sin IGV)  
**UBICACIÓN** : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
**A. DIRECTO** : 6,491,526.04 5,501,293.26 (sin IGV)  
**A. MATERIALES** : NO SOLICITADO  
**INICIO DE OBRA** : 15/01/2015

**CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:**

Nº	Mes	Valoración (sin IGV)		K	K-1	Reajuste Programado		Reajuste Real		Reajuste Autorizado		Reajuste a Regularizar Pagado
		Programado	Ejecutado			Programado	Acumulado	Real	Acumulado	Autorizado	Acumulado	
01	ene-15	0.00	0.00	1.023	0.023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	feb-15	0.00	0.00	1.028	0.028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	mar-15	0.00	0.00	1.031	0.031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	abr-15	0.00	0.00	1.036	0.036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	may-15	0.00	0.00	1.034	0.034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	jun-15	0.00	0.00	1.047	0.047	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	jul-15	0.00	0.00	1.042	0.042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	ago-15	0.00	0.00	1.045	0.045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	sep-15	72,528.68	52,047.86	1.043	0.043	3,118.73	3,118.73	2,238.06	2,238.06	2,238.06	2,238.06	2,238.06
10	oct-15	79,809.68	82,184.62	1.048	0.048	3,830.86	6,949.59	3,944.86	6,182.92	3,944.86	6,182.92	3,944.86
11	nov-15	67,452.69	46,265.24	1.056	0.056	3,777.35	10,726.94	2,590.85	8,773.77	2,590.85	8,773.77	2,590.85
12	dic-15	69,242.63	70,638.99	1.060	0.060	4,154.56	14,881.50	4,238.34	13,012.11	4,238.34	13,012.11	4,238.34
13	ene-16	102,724.70	46,111.27	1.064	0.064	6,574.38	21,455.88	2,951.12	15,963.23	2,951.12	15,963.23	2,951.12
14	feb-16	174,354.33	291,522.69	1.069	0.069	12,030.45	33,486.33	20,115.07	36,078.30	20,115.07	36,078.30	20,115.07
15	mar-16	206,050.11	77,609.53	1.056	0.056	11,538.81	45,025.14	4,346.13	40,424.43	4,346.13	40,424.43	4,346.13
16	abr-16	102,334.85	60,626.99	1.057	0.057	5,833.09	50,858.23	3,455.74	43,880.17	3,455.74	43,880.17	3,455.74
17	may-16	340,167.99	102,193.07	1.062	0.062	21,090.42	71,948.65	6,335.97	50,216.14	6,335.97	50,216.14	6,335.97
18	jun-16	0.00	111,533.17	1.063	0.063	0.00	71,948.65	7,026.59	57,242.73	7,026.59	57,242.73	7,026.59
19	jul-16	0.00	47,530.13	1.083	0.083	0.00	71,948.65	3,945.00	61,187.73	3,945.00	61,187.73	3,945.00
20	ago-16	0.00	26,733.49	1.082	0.082	0.00	71,948.65	2,192.15	63,379.88	2,192.15	63,379.88	2,192.15
21	sep-16	0.00	54,654.58	1.085	0.085	0.00	71,948.65	4,645.64	68,025.52	4,645.64	68,025.52	4,645.64
22	oct-16	0.00	16,819.95	1.084	0.084	0.00	71,948.65	1,412.88	69,438.40	1,412.88	69,438.40	1,412.88
23	nov-16	0.00	0.00	1.086	0.086	0.00	71,948.65	0.00	69,438.40	0.00	69,438.40	0.00
24	dic-16	0.00	0.00	1.087	0.087	0.00	71,948.65	0.00	69,438.40	0.00	69,438.40	0.00
25	ene-17	0.00	85,994.40	1.078	0.078	0.00	71,948.65	5,147.56	74,585.96	5,147.56	74,585.96	5,147.56
26	feb-17	0.00	52,928.11	1.087	0.087	0.00	71,948.65	4,604.75	79,190.71	4,604.75	79,190.71	4,604.75
27	mar-17	0.00	0.00	1.086	0.086	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00
28	abr-17	0.00	0.00	1.079	0.079	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00
29	may-17	0.00	0.00	1.082	0.082	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

**RESIDENCIA DE OBRA  
CALCULO DE REAJUSTES**

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE

EJECUTA : CONSORCIO SAN JOSE

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

MONTO OBRA : 32,457,630.22 (con IGV)

PLAZO EJEC. : 1,360 DIAS CALENDARIO

UBICACIÓN : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

A. DIRECTO : 6,491,526.04

A. MATERIALES : NO SOLICITADO

INICIO DE OBRA : 15/01/2015

RESIDENTE: ING. CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS

27,506,466.29 (sin IGV)

5,501,293.26 (sin IGV)

**CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:**

30	jun-17	0.00	1.084	0.084	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
31	jul-17	0.00	1.084	0.084	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
32	ago-17	0.00	1.098	0.098	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
33	sep-17	0.00	1.101	0.101	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
34	oct-17	0.00	1.102	0.102	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
35	nov-17	0.00	1.100	0.100	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
36	dic-17	0.00	1.104	0.104	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
37	ene-18	0.00	1.104	0.104	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
38	feb-18	0.00	1.114	0.114	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
39	mar-18	0.00	1.117	0.117	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
40	abr-18	0.00	1.115	0.115	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
41	may-18	0.00	1.119	0.119	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
42	jun-18	0.00	1.119	0.119	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
43	jul-18	0.00	1.119	0.119	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
44	ago-18	0.00	1.139	0.139	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
45	sep-18	0.00	1.139	0.139	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
46	oct-18	0.00	1.139	0.139	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
		<b>1,214,665.66</b>			<b>1,205,394.09</b>	<b>71,948.65</b>	<b>79,190.71</b>	<b>79,190.71</b>	<b>79,190.71</b>	<b>79,190.71</b>	<b>79,190.71</b>	<b>0.00</b>

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

**OBRA :** CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE

**EJECUTA :** CONSORCIO SAN JOSE

**CLIENTE :** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

**MONTO OBRA :** 32,457,630.22 (con IGV) RESIDENTE: ING. CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS

**PLAZO EJEC. :** 1,360 DIAS CALENDARIO

**UBICACIÓN :** SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

**A. DIRECTO :** 6,491,526.04

**A. MATERIALES :** NO SOLICITADO


**INICIO DE OBRA :** 15/01/2015

27,506,466.29 (sin IGV)

5,501,293.26 (sin IGV)

**CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL :**

Nº	Mes	Valoración (sin IGV)		K	K-1	Reajuste Programado		Reajuste Real	Reajuste Autorizado		Reajuste a Pagar
		Programado	Ejecutado			Programado	Acumulado		Autorizado	Acumulado	
01	ene-15	0.00	0.00	1.041	0.041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	feb-15	0.00	0.00	1.050	0.050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	mar-15	0.00	0.00	1.054	0.054	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	abr-15	0.00	0.00	1.061	0.061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	may-15	0.00	0.00	1.068	0.068	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	jun-15	87,815.56	0.00	1.078	0.078	6,849.61	6,849.61	0.00	0.00	0.00	0.00
07	jul-15	9,529.63	0.00	1.079	0.079	752.84	7,602.45	0.00	0.00	0.00	0.00
08	ago-15	1,764.52	0.00	1.087	0.087	153.51	7,755.96	0.00	0.00	0.00	0.00
09	sep-15	0.00	12,684.05	1.084	0.084	0.00	7,755.96	1,065.46	1,065.46	1,065.46	1,065.46
10	oct-15	0.00	0.00	1.088	0.088	0.00	7,755.96	0.00	0.00	0.00	0.00
11	nov-15	0.00	0.00	1.102	0.102	0.00	7,755.96	0.00	0.00	0.00	0.00
12	dic-15	0.00	0.00	1.108	0.108	0.00	7,755.96	0.00	0.00	0.00	0.00
13	ene-16	0.00	0.00	1.116	0.116	0.00	7,755.96	0.00	0.00	0.00	0.00
14	feb-16	0.00	0.00	1.124	0.124	0.00	7,755.96	0.00	0.00	0.00	0.00
15	mar-16	0.00	80,455.85	1.105	0.105	0.00	7,755.96	8,447.86	8,447.86	8,447.86	8,447.86
16	abr-16	0.00	11,625.47	1.095	0.095	0.00	7,755.96	1,104.42	1,104.42	1,104.42	1,104.42
17	may-16	144,867.11	6,863.64	1.101	0.101	14,631.58	22,387.54	693.23	693.23	693.23	693.23
18	jun-16	162,946.04	1,155.71	1.099	0.099	16,131.66	38,519.20	114.42	114.42	114.42	114.42
19	jul-16	0.00	0.00	1.108	0.108	0.00	38,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20	ago-16	0.00	0.00	1.114	0.114	0.00	38,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21	sep-16	0.00	0.00	1.116	0.116	0.00	38,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22	oct-16	0.00	0.00	1.115	0.115	0.00	38,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00
23	nov-16	0.00	0.00	1.121	0.121	0.00	38,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00
24	dic-16	0.00	57,714.57	1.124	0.124	0.00	38,519.20	7,156.61	7,156.61	7,156.61	7,156.61
25	ene-17	0.00	5,782.71	1.113	0.113	0.00	38,519.20	8,563.45	8,563.45	8,563.45	8,563.45
26	feb-17	0.00	5,614.88	1.110	0.110	0.00	38,519.20	617.64	617.64	617.64	617.64
27	mar-17	0.00	0.00	1.111	0.111	0.00	38,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00
28	abr-17	0.00	0.00	1.107	0.107	0.00	38,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00
29	may-17	0.00	0.00	1.111	0.111	0.00	38,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30	jun-17	0.00	0.00	1.109	0.109	0.00	38,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 22858

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 10717



### RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

**OBRA** : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE  
**EJECUTA** : CONSORCIO SAN JOSE  
**CLIENTE** : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**MONTO OBRA** : 32,457,630.22 (con IGV)      **RESIDENTE:** ING. CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
**PLAZO EJEC.** : 1,360 DIAS CALENDARIO  
**UBICACIÓN** : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
**A. DIRECTO** : 6,491,526.04 (sim/IGV)  
**A. MATERIALES** : NO SOLICITADO  
**INICIO DE OBRA** : 15/01/2015

<b>CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:</b>												<b>251,896.86</b>		
31	jul-17	0.00	1.109	0.109	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-	0.00	-
32	ago-17	0.00	1.117	0.117	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-	0.00	-
33	sep-17	0.00	1.122	0.122	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-	0.00	-
34	oct-17	0.00	1.121	0.121	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-	0.00	-
35	nov-17	0.00	1.121	0.121	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-	0.00	-
36	dic-17	0.00	1.124	0.124	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-	0.00	-
37	ene-18	0.00	1.119	0.119	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-	0.00	-
38	feb-18	0.00	1.128	0.128	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-	0.00	-
39	mar-18	0.00	1.130	0.130	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-	0.00	-
40	abr-18	0.00	1.126	0.126	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-	0.00	-
41	may-18	0.00	1.137	0.137	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-	0.00	-
42	jun-18	0.00	1.138	0.138	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-	0.00	-
43	jul-18	0.00	1.140	0.140	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-	0.00	-
44	ago-18	0.00	1.149	0.149	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-	0.00	-
45	sep-18	0.00	1.149	0.149	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-	0.00	-
46	oct-18	0.00	1.149	0.149	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-	0.00	-
		<b>406,922.86</b>				<b>251,896.86</b>				<b>27,763.09</b>	<b>27,763.09</b>	<b>27,763.09</b>	<b>27,763.09</b>	<b>0.00</b>

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**RESIDENCIA DE OBRA  
CALCULO DE REAJUSTES**

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE

EJECUTA : CONSORCIO SAN JOSE

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

MONTO OBRA : 32,457,630.22 (con IGV)

PLAZO EJEC. : 1,360 DIAS CALENDARIO

UBICACIÓN : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

A. DIRECTO : 6,491,526.04

A. MATERIALES : NO SOLICITADO

INICIO DE OBRA : 15/01/2015

RESIDENTE: ING. CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS

27,506,466.29 (sin/IGV)

5,501,293.26 (sin/IGV)

**CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:**

Nº	Mes	Valoración (sin IGV)		K	K-1	Reajuste Programado		Reajuste Real		Reajuste Autorizado	Reajuste a Regularizar
		Programado	Ejecutado			Programado	Acumulado	Real	Acumulado		
01	ene-15	0.00	0.00	1.036	0.036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	feb-15	0.00	0.00	1.044	0.044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	mar-15	0.00	0.00	1.052	0.052	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	abr-15	0.00	0.00	1.057	0.057	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	may-15	0.00	0.00	1.064	0.064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	jun-15	206,761.99	364,049.90	1.078	0.078	16,127.44	16,127.44	28,395.89	28,395.89	28,395.89	28,395.89
07	jul-15	349,040.36	0.00	1.083	0.083	28,970.35	45,097.79	0.00	0.00	0.00	0.00
08	ago-15	381,189.12	40,692.15	1.092	0.092	35,069.40	80,167.19	3,743.68	3,743.68	3,743.68	3,743.68
09	sep-15	96,854.34	25,609.62	1.087	0.087	8,426.33	88,593.52	2,228.04	2,228.04	2,228.04	2,228.04
10	oct-15	19,575.65	107,837.21	1.095	0.095	1,859.69	90,453.21	10,244.53	10,244.53	10,244.53	10,244.53
11	nov-15	0.00	0.00	1.107	0.107	0.00	90,453.21	0.00	0.00	0.00	0.00
12	dic-15	0.00	376,102.59	1.113	0.113	0.00	90,453.21	42,499.59	42,499.59	42,499.59	42,499.59
13	ene-16	0.00	0.00	1.120	0.120	0.00	90,453.21	0.00	0.00	0.00	0.00
14	feb-16	0.00	0.00	1.133	0.133	0.00	90,453.21	0.00	0.00	0.00	0.00
15	mar-16	0.00	169,260.72	1.118	0.118	0.00	90,453.21	19,972.76	19,972.76	19,972.76	19,972.76
16	abr-16	0.00	9,796.18	1.102	0.102	0.00	90,453.21	999.21	999.21	999.21	999.21
17	may-16	0.00	14,312.96	1.109	0.109	0.00	90,453.21	1,560.11	1,560.11	1,560.11	1,560.11
18	jun-16	77,794.17	2,455.76	1.109	0.109	8,479.56	98,932.77	267.68	267.68	267.68	267.68
19	jul-16	0.00	13,013.22	1.116	0.116	0.00	98,932.77	1,509.53	1,509.53	1,509.53	1,509.53
20	ago-16	0.00	0.00	1.120	0.120	0.00	98,932.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21	sep-16	0.00	0.00	1.131	0.131	0.00	98,932.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22	oct-16	0.00	-0.06	1.133	0.133	0.00	98,932.77	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
23	nov-16	0.00	0.00	1.135	0.135	0.00	98,932.77	0.00	0.00	0.00	0.00
24	dic-16	0.00	0.00	1.134	0.134	0.00	98,932.77	1,408.21	1,408.21	1,408.21	1,408.21
25	ene-17	0.00	0.00	1.128	0.128	0.00	98,932.77	0.00	0.00	0.00	0.00
26	feb-17	0.00	179,821.40	1.121	0.121	0.00	98,932.77	-9,658.39	-9,658.39	-9,658.39	-9,658.39
27	mar-17	0.00	0.00	1.127	0.127	0.00	98,932.77	0.00	0.00	0.00	0.00
28	abr-17	0.00	0.00	1.124	0.124	0.00	98,932.77	0.00	0.00	0.00	0.00
29	may-17	0.00	0.00	1.129	0.129	0.00	98,932.77	0.00	0.00	0.00	0.00

*Carlos Enrique Quiroz Cisneros*  
**CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

**RESIDENCIA DE OBRA  
CALCULO DE REAJUSTES**

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE  
 EJECUTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 MONTO OBRA : 32,457,630.22 (con IGV)  
 PLAZO EJEC. : 1,360 DIAS CALENDARIO  
 UBICACIÓN : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
 A. DIRECTO : 6,491,526.04  
 A. MATERIALES : NO SOLICITADO  
 INICIO DE OBRA : 15/01/2015

RESIDENTE: ING. CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 27,506,466.29 (sin IGV)  
 5,501,293.26 (sin IGV)

**CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:**

30	jun-17	0.00	1.128	0.128	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
31	jul-17	0.00	1.127	0.127	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
32	ago-17	0.00	1.136	0.136	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
33	sep-17	0.00	1.137	0.137	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
34	oct-17	0.00	1.145	0.145	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
35	nov-17	0.00	1.143	0.143	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
36	dic-17	0.00	1.144	0.144	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
37	ene-18	0.00	1.141	0.141	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
38	feb-18	0.00	1.148	0.148	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
39	mar-18	0.00	1.152	0.152	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
40	abr-18	0.00	1.152	0.152	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
41	may-18	0.00	1.158	0.158	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
42	jun-18	0.00	1.162	0.162	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
43	jul-18	0.00	1.165	0.165	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
44	ago-18	0.00	1.175	0.175	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
45	sep-18	0.00	1.175	0.175	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
46	oct-18	0.00	1.175	0.175	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	1.00	-
		<b>1,131,215.63</b>			<b>98,932.77</b>		<b>103,170.83</b>		<b>103,170.83</b>		<b>103,170.83</b>	<b>103,170.83</b>	<b>0.00</b>

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**RESIDENCIA DE OBRA  
CALCULO DE REAJUSTES**

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE

EJECUTA : CONSORCIO SAN JOSE

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

MONTO OBRA : 32,457,630.22 (con IGV) 27,506,466.29 (sin IGV)

PLAZO EJEC. : 1,360 DIAS CALENDARIO

UBICACION : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

A. DIRECTO : 6,491,526.04 (sin IGV) 5,501,293.26 (sin IGV)

A. MATERIALES : NO SOLICITADO

INICIO DE OBRA : 15/01/2015

RESIDENTE: ING. CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS

**CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:**

Nº	Mes	FORMULA Nº 01: METITACION AMENSTRAL		K	K-A	Reajuste Programado		Reajuste Real		Reajuste Acumulado		Reajuste a Repetir	
		Programado	Ejecutado			Programado	Acumulado	Real	Acumulado	Acumulado	Pagado	Pagado	a Pagar
01	ene-15	7,326.02	0.00	1.031	0.031	227.11	227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	feb-15	21,614.00	0.00	1.042	0.042	907.79	1,134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	mar-15	5,035.94	0.00	1.048	0.048	241.73	1,376.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	abr-15	0.00	8,021.78	1.057	0.057	0.00	1,376.63	457.24	457.24	457.24	457.24	457.24	457.24
05	may-15	0.00	0.00	1.053	0.053	0.00	1,376.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	jun-15	0.00	0.00	1.062	0.062	0.00	1,376.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	jul-15	0.00	0.00	1.064	0.064	0.00	1,376.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	ago-15	0.00	0.00	1.073	0.073	0.00	1,376.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	sep-15	0.00	0.00	1.067	0.067	0.00	1,376.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	oct-15	0.00	0.00	1.068	0.068	0.00	1,376.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	nov-15	0.00	13,061.46	1.081	0.081	0.00	1,376.63	1,057.98	1,057.98	1,057.98	1,057.98	1,057.98	1,057.98
12	dic-15	0.00	0.00	1.086	0.086	0.00	1,376.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	ene-16	0.00	0.00	1.090	0.090	0.00	1,376.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	feb-16	0.00	0.00	1.091	0.091	0.00	1,376.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	mar-16	0.00	0.00	1.078	0.078	0.00	1,376.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	abr-16	0.00	0.00	1.077	0.077	0.00	1,376.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	may-16	0.00	0.00	1.106	0.106	0.00	1,376.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	jun-16	13,465.82	0.00	1.091	0.091	1,225.39	2,602.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	jul-16	0.00	0.00	1.091	0.091	0.00	2,602.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	ago-16	0.00	0.00	1.094	0.094	0.00	2,602.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	sep-16	0.00	0.00	1.111	0.111	0.00	2,602.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	oct-16	0.00	0.00	1.110	0.110	0.00	2,602.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	nov-16	0.00	0.00	1.112	0.112	0.00	2,602.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	dic-16	0.00	0.00	1.128	0.128	0.00	2,602.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	ene-17	0.00	0.00	1.127	0.127	0.00	2,602.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	feb-17	0.00	12,630.82	1.117	0.117	0.00	2,602.02	1,477.81	1,477.81	1,477.81	1,477.81	1,477.81	1,477.81
27	mar-17	0.00	0.00	1.130	0.130	0.00	2,602.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	abr-17	0.00	0.00	1.130	0.130	0.00	2,602.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
may-17		0.00	0.00	1.131	0.131	0.00	2,602.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 22958

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 10717

**RESIDENCIA DE OBRA  
CALCULO DE REAJUSTES**

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE

EJECUTA : CONSORCIO SAN JOSE

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

MONTO OBRA : 32,457,630.22 (con IGV) 27,506,466.29 (sin IGV)

PLAZO EJEC. : 1,360 DIAS CALENDARIO

UBICACIÓN : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

A. DIRECTO : 6,491,526.04 (sin IGV)

A. MATERIALES : NO SOLICITADO


INICIO DE OBRA : 15/01/2015


RESIDENTE: ING. CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS

**CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:**

30	jun-17	0.00	1.121	0.121	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03
31	jul-17	0.00	1.116	0.116	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03
32	ago-17	0.00	1.126	0.126	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03
33	sep-17	0.00	1.130	0.130	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03
34	oct-17	0.00	1.133	0.133	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03
35	nov-17	0.00	1.135	0.135	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03
36	dic-17	0.00	1.140	0.140	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03
37	ene-18	0.00	1.137	0.137	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03
38	feb-18	0.00	1.145	0.145	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03
39	mar-18	0.00	1.150	0.150	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03
40	abr-18	0.00	1.148	0.148	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03
41	may-18	0.00	1.159	0.159	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03
42	jun-18	0.00	1.160	0.160	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03
43	jul-18	0.00	1.163	0.163	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03
44	ago-18	0.00	1.173	0.173	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03
45	sep-18	0.00	1.173	0.173	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03
46	oct-18																	
		<b>47,441.78</b>	<b>33,714.06</b>		<b>2,602.02</b>		<b>2,993.03</b>		<b>2,993.03</b>		<b>2,993.03</b>		<b>2,993.03</b>		<b>2,993.03</b>		<b>2,993.03</b>	<b>0.00</b>

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22358

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**RESIDENCIA DE OBRA  
CALCULO DE REAJUSTES**

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE

EJECUTA : CONSORCIO SAN JOSE

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

MONTO OBRA : 32,457,630.22 (con IGV) RESIDENTE: ING. CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS

PLAZO EJEC. : 1,360 DIAS CALENDARIO

UBICACIÓN : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

A. DIRECTO : 6,491,526.04 (sin/IGV)

A. MATERIALES : NO SOLICITADO

INICIO DE OBRA : 15/01/2015

27,506,466.29 (sin/IGV)

5,501,293.26 (sin/IGV)

**CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:**

Nº	Mes	FORMULA Nº del EQUIPAMIENTO		K	K-1	Reajuste Programado		Reajuste Real		Reajuste Autorizado		Reajuste a Registrar	
		Programado	Ejecutado			Programado	Acumulado	Real	Acumulado	Autorizado	Acumulado	Pagado	Pendiente
01	ene-15	0.00	0.00	1.050	0.080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	feb-15	0.00	0.00	1.062	0.062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	mar-15	0.00	0.00	1.070	0.070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	abr-15	0.00	0.00	1.079	0.079	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	may-15	0.00	0.00	1.089	0.089	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	jun-15	0.00	0.00	1.093	0.093	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	jul-15	0.00	0.00	1.101	0.101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	ago-15	0.00	0.00	1.112	0.112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	sep-15	0.00	0.00	1.109	0.109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	oct-15	0.00	0.00	1.116	0.116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	nov-15	0.00	0.00	1.133	0.133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	dic-15	0.00	444,888.92	1.140	0.140	0.00	0.00	62,284.45	62,284.45	62,284.45	62,284.45	62,284.45	62,284.45
13	ene-16	0.00	547,425.56	1.150	0.150	0.00	0.00	82,113.83	144,398.28	82,113.83	144,398.28	82,113.83	82,113.83
14	feb-16	0.00	15,693.75	1.164	0.164	0.00	0.00	2,573.78	146,972.06	2,573.78	146,972.06	2,573.78	2,573.78
15	mar-16	0.00	0.00	1.148	0.148	0.00	0.00	0.00	146,972.06	0.00	146,972.06	0.00	0.00
16	abr-16	0.00	0.00	1.131	0.131	0.00	0.00	0.00	146,972.06	0.00	146,972.06	0.00	0.00
17	may-16	196,201.29	-259,953.36	1.142	0.142	27,860.58	27,860.58	-36,913.38	110,058.68	-36,913.38	146,972.06	0.00	0.00
18	jun-16	426,024.96	0.00	1.142	0.142	60,495.54	88,356.12	0.00	110,058.68	0.00	110,058.68	0.00	0.00
19	jul-16	241,667.03	17,082.88	1.140	0.140	33,833.38	122,189.50	2,391.60	112,450.28	2,391.60	112,450.28	2,391.60	2,391.60
20	ago-16	0.00	0.00	1.146	0.146	0.00	122,189.50	0.00	112,450.28	0.00	112,450.28	0.00	0.00
21	sep-16	0.00	0.00	1.157	0.157	0.00	122,189.50	0.00	112,450.28	0.00	112,450.28	0.00	0.00
22	oct-16	0.00	0.00	1.160	0.160	0.00	122,189.50	0.00	112,450.28	0.00	112,450.28	0.00	0.00
23	nov-16	0.00	0.00	1.165	0.165	0.00	122,189.50	0.00	112,450.28	0.00	112,450.28	0.00	0.00
24	dic-16	0.00	0.00	1.164	0.164	0.00	122,189.50	0.00	112,450.28	0.00	112,450.28	0.00	0.00
25	ene-17	0.00	152,196.25	1.155	0.155	0.00	122,189.50	-8,090.42	104,359.86	-8,090.42	104,359.86	-8,090.42	-8,090.42
26	feb-17	0.00	0.00	1.142	0.142	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	0.00
27	mar-17	0.00	0.00	1.148	0.148	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	0.00
28	abr-17	0.00	0.00	1.142	0.142	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	0.00
29	may-17	0.00	0.00	1.147	0.147	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	0.00

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 22353

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 10717

**RESIDENCIA DE OBRA  
CALCULO DE REAJUSTES**

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE  
 EJECUTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 MONTO OBRA : 32,457,630.22 (con IGV) RESIDENTE: ING. CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 PLAZO EJEC. : 1,360 DIAS CALENDARIO  
 UBICACIÓN : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
 A. DIRECTO : 6,491,526.04  
 A. MATERIALES : NO SOLICITADO  
 INICIO DE OBRA : 15/01/2015

RESIDENTE: ING. CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS


27,506,466.29 (sin IGV)


5,501,293.26 (sin IGV)

**CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:**

30	jun-17	0.00	1.149	0.149	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
31	jul-17	0.00	1.148	0.148	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
32	ago-17	0.00	1.149	0.149	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
33	sep-17	0.00	1.152	0.152	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
34	oct-17	0.00	1.153	0.153	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
35	nov-17	0.00	1.152	0.152	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
36	dic-17	0.00	1.151	0.151	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
37	ene-18	0.00	1.146	0.146	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
38	feb-18	0.00	1.157	0.157	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
39	mar-18	0.00	1.162	0.162	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
40	abr-18	0.00	1.160	0.160	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
41	may-18	0.00	1.172	0.172	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
42	jun-18	0.00	1.172	0.172	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
43	jul-18	0.00	1.178	0.178	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
44	ago-18	0.00	1.178	0.178	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
45	sep-18	0.00	1.178	0.178	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
46	oct-18	0.00	1.178	0.178	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
		<b>863,893.28</b>			<b>712,941.50</b>	<b>122,189.50</b>	<b>104,359.86</b>	<b>104,359.86</b>	<b>104,359.86</b>	<b>104,359.86</b>	<b>104,359.86</b>	<b>0.00</b>

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**RESIDENCIA DE OBRA  
CALCULO DE REAJUSTES**

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE

EJECUTA : CONSORCIO SAN JOSE

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

MONTO OBRA : 32,457,630.22 (con IGV)

PLAZO EJEC. : 1.360 DIAS CALENDARIO

UBICACIÓN : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

A. DIRECTO : 6,491,526.04

A. MATERIALES : NO SOLICITADO

INICIO DE OBRA : 15/01/2015

RESIDENTE: ING. CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS

27,506,466.29 (sin IGV)

5,501,293.26 (sin IGV)

**CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:**

Nº	Mes	Valorización (sin IGV)		K	K-1	Reajuste Programado		Reajuste Real		Reajuste Autorizado		Reajuste a Registrar	
		Programado	Ejecutado			Programado	Acumulado	Real	Acumulado	Autorizado	Acumulado	Pagado	Restante
01	ene-15	6,257.84	0.00	1.033	0.033	206.51	206.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	feb-15	42,245.81	4,117.69	1.041	0.041	1,732.08	1,938.59	168.83	168.83	168.83	168.83	168.83	168.83
03	mar-15	93,269.57	156,569.28	1.042	0.042	3,917.32	5,855.91	6,744.74	6,744.74	6,744.74	6,744.74	6,744.74	6,744.74
04	abr-15	331,372.10	540,919.37	1.036	0.036	11,929.40	17,785.31	19,473.10	26,217.84	19,473.10	26,217.84	19,473.10	19,473.10
05	may-15	448,124.71	701,951.57	1.035	0.035	15,684.36	33,469.67	24,568.30	50,786.14	24,568.30	50,786.14	24,568.30	24,568.30
06	jun-15	693,991.12	498,856.89	1.047	0.047	32,617.58	66,087.25	23,446.27	74,232.41	23,446.27	74,232.41	23,446.27	23,446.27
07	jul-15	913,358.46	1,453,896.72	1.026	0.026	23,747.32	89,834.57	37,801.31	112,033.72	37,801.31	112,033.72	37,801.31	37,801.31
08	ago-15	1,133,239.75	647,264.91	1.032	0.032	36,263.67	126,098.24	20,712.48	132,746.20	20,712.48	132,746.20	20,712.48	20,712.48
09	sep-15	1,170,831.88	1,210,400.48	1.031	0.031	36,295.79	162,394.03	37,522.41	170,268.61	37,522.41	170,268.61	37,522.41	37,522.41
10	oct-15	1,258,858.31	1,059,066.15	1.034	0.034	42,801.18	205,195.21	36,008.25	206,276.86	36,008.25	206,276.86	36,008.25	36,008.25
11	nov-15	1,109,806.89	1,701,871.34	1.042	0.042	46,611.89	251,807.10	71,478.60	277,755.46	71,478.60	277,755.46	71,478.60	71,478.60
12	dic-15	968,677.10	309,129.61	1.046	0.046	44,559.15	296,366.25	14,219.96	291,975.42	14,219.96	291,975.42	14,219.96	14,219.96
13	ene-16	931,107.21	489,857.87	1.054	0.054	50,279.79	346,646.04	26,452.32	318,427.74	26,452.32	318,427.74	26,452.32	26,452.32
14	feb-16	569,368.56	0.00	1.060	0.060	34,162.11	380,808.15	0.00	318,427.74	0.00	318,427.74	0.00	0.00
15	mar-16	406,083.48	0.00	1.047	0.047	19,085.92	399,894.07	0.00	318,427.74	0.00	318,427.74	0.00	0.00
16	abr-16	257,798.69	0.00	1.034	0.034	8,765.16	408,659.23	0.00	318,427.74	0.00	318,427.74	0.00	0.00
17	may-16	179,112.80	158,681.95	1.050	0.050	8,955.64	417,614.87	7,934.10	326,361.84	7,934.10	326,361.84	7,934.10	7,934.10
18	jun-16	78,433.78	0.00	1.049	0.049	3,843.26	421,458.13	0.00	326,361.84	0.00	326,361.84	0.00	0.00
19	jul-16	0.00	0.00	1.056	0.056	0.00	421,458.13	0.00	326,361.84	0.00	326,361.84	0.00	0.00
20	ago-16	0.00	0.00	1.061	0.061	0.00	421,458.13	0.00	326,361.84	0.00	326,361.84	0.00	0.00
21	sep-16	0.00	0.00	1.067	0.067	0.00	421,458.13	0.00	326,361.84	0.00	326,361.84	0.00	0.00
22	oct-16	0.00	0.00	1.069	0.069	0.00	421,458.13	0.00	326,361.84	0.00	326,361.84	0.00	0.00
23	nov-16	0.00	0.00	1.069	0.069	0.00	421,458.13	0.00	326,361.84	0.00	326,361.84	0.00	0.00
24	dic-16	0.00	0.00	1.070	0.070	0.00	421,458.13	0.00	326,361.84	0.00	326,361.84	0.00	0.00
25	ene-17	0.00	0.00	1.067	0.067	0.00	421,458.13	0.00	326,361.84	0.00	326,361.84	0.00	0.00
26	feb-17	0.00	47,757.22	1.060	0.060	0.00	421,458.13	1,065.43	327,427.27	1,065.43	327,427.27	1,065.43	1,065.43
27	mar-17	0.00	0.00	1.061	0.061	0.00	421,458.13	0.00	327,427.27	0.00	327,427.27	0.00	0.00
28	abr-17	4,443.08	0.00	1.051	0.051	226.60	421,684.73	0.00	327,427.27	0.00	327,427.27	0.00	0.00
29	may-17	0.00	0.00	1.057	0.057	0.00	421,684.73	0.00	327,427.27	0.00	327,427.27	0.00	0.00

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



**RESIDENCIA DE OBRA  
CALCULO DE REAJUSTES**

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE

EJECUTA : CONSORCIO SAN JOSE

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

MONTO OBRA : 32,457,630.22 (con IGV)

PLAZO EJEC. : 1,360 DIAS CALENDARIO

UBICACIÓN : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

A. DIRECTO : 6,491,526.04

A. MATERIALES : NO SOLICITADO

INICIO DE OBRA : 15/01/2015

RESIDENTE: ING. CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS

27,506,466.29 (sin/IGV)

5,501,293.26 (sin/IGV)

**CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:**

30	jun-17	0.00	0.00	1.062	0.062	0.00	421,684.73	0.00	327,427.27	0.00	327,427.27	0.00	-
31	jul-17	0.00	0.00	1.063	0.063	0.00	421,684.73	0.00	327,427.27	0.00	327,427.27	0.00	-
32	ago-17	0.00	0.00	1.076	0.076	0.00	421,684.73	0.00	327,427.27	0.00	327,427.27	0.00	-
33	sep-17	0.00	0.00	1.082	0.082	0.00	421,684.73	0.00	327,427.27	0.00	327,427.27	0.00	-
34	oct-17	0.00	0.00	1.083	0.083	0.00	421,684.73	0.00	327,427.27	0.00	327,427.27	0.00	-
35	nov-17	0.00	0.00	1.080	0.080	0.00	421,684.73	0.00	327,427.27	0.00	327,427.27	0.00	-
36	dic-17	7,977.12	0.00	1.085	0.085	678.06	422,362.79	0.00	327,427.27	0.00	327,427.27	0.00	-
37	ene-18	8,527.26	0.00	1.087	0.087	741.87	423,104.66	0.00	327,427.27	0.00	327,427.27	0.00	-
38	feb-18	24,304.57	0.00	1.115	0.115	2,795.03	425,899.69	0.00	327,427.27	0.00	327,427.27	0.00	-
39	mar-18	37,260.06	10,885.09	1.116	0.116	4,322.17	430,221.86	1,262.67	328,689.94	1,262.67	328,689.94	1,262.67	-
40	abr-18	27,169.19	0.00	1.114	0.114	3,097.29	433,319.15	0.00	328,689.94	0.00	328,689.94	0.00	-
41	may-18	38,144.96	0.00	1.120	0.120	4,577.40	437,896.55	0.00	328,689.94	0.00	328,689.94	0.00	-
42	jun-18	167,533.90	27,517.58	1.120	0.120	20,104.07	458,000.62	3,302.11	331,992.05	3,302.11	331,992.05	3,302.11	-
43	jul-18	67,261.42	15,893.61	1.122	0.122	8,205.89	466,206.51	1,939.02	333,931.07	1,939.02	333,931.07	1,939.02	-
44	ago-18	78,762.91	16,519.87	1.122	0.122	9,609.08	475,815.59	2,015.42	335,946.49	2,015.42	335,946.49	2,015.42	1,340.68
45	sep-18	1,839,775.57	23,972.12	1.140	0.140	257,568.58	733,384.17	3,356.10	339,302.59	3,356.10	339,302.59	3,356.10	3,356.10
46	oct-18	976,207.23	9,045,129.32			733,384.17		339,302.59		339,302.59		335,946.49	4,696.78
										<b>13,669,305.33</b>	<b>339,302.59</b>	<b>335,946.49</b>	<b>4,696.78</b>

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

**RESIDENCIA DE OBRA  
CALCULO DE REAJUSTES**

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE  
 EJECUTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 MONTO OBRA : 32,457,630.22 (con IGV) RESIDENTE: ING. CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 PLAZO EJEC. : 1,360 DÍAS CALENDARIO  
 UBICACIÓN : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
 A. DIRECTO : 6,491,526.04  
 A. MATERIALES : NO SOLICITADO  
 INICIO DE OBRA : 15/01/2015

**CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:**

Nº	Mes	Valoración (sin IGV)		K	K-1	Reajuste Programado		Reajuste Real		Reajuste Autorizado		Reajuste a Regularizar a Progr
		Programado	Ejecutado			Programado	Acumulado	Real	Acumulado	Autorizado	Acumulado	
01	ene-15	0.00	0.00	1.027	0.027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	feb-15	0.00	0.00	1.011	0.011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	mar-15	0.00	0.00	0.981	-0.019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	abr-15	0.00	0.00	0.999	-0.001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	may-15	0.00	0.00	1.003	0.003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	jun-15	0.00	0.00	1.009	0.009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	jul-15	0.00	0.00	1.013	0.013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	ago-15	0.00	0.00	1.018	0.018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	sep-15	0.00	0.00	1.016	0.016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	oct-15	0.00	0.00	1.019	0.019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	nov-15	0.00	0.00	1.030	0.030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	dic-15	0.00	0.00	1.037	0.037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	ene-16	0.00	136,792.44	1.044	0.044	0.00	0.00	6,018.87	6,018.87	6,018.87	6,018.87	6,018.87
14	feb-16	0.00	262,991.01	1.026	0.026	0.00	0.00	6,837.77	6,837.77	6,837.77	12,856.64	6,837.77
15	mar-16	0.00	108,130.91	1.011	0.011	0.00	0.00	1,189.44	1,189.44	1,189.44	14,046.08	1,189.44
16	abr-16	0.00	55,447.52	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,046.08	0.00
17	may-16	564,726.81	0.00	1.003	0.003	1,694.18	1,694.18	0.00	0.00	0.00	14,046.08	0.00
18	jun-16	0.00	0.00	1.003	0.003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,046.08	0.00
19	jul-16	0.00	0.00	1.005	0.005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,046.08	0.00
20	ago-16	0.00	0.00	1.007	0.007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,046.08	0.00
21	sep-16	0.00	0.00	1.013	0.013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,046.08	0.00
22	oct-16	0.00	0.00	1.015	0.015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,046.08	0.00
23	nov-16	0.00	0.00	1.018	0.018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,046.08	0.00
24	dic-16	0.00	0.00	1.018	0.018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,046.08	0.00
25	ene-17	0.00	0.00	1.012	0.012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,046.08	0.00
26	feb-17	0.00	0.00	1.008	0.008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,046.08	0.00
27	mar-17	0.00	0.00	1.011	0.011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,046.08	0.00
28	abr-17	0.00	0.00	1.010	0.010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,046.08	0.00
29	may-17	0.00	0.00	1.013	0.013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,046.08	0.00

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

DAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL

**RESIDENCIA DE OBRA  
CALCULO DE REAJUSTES**

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE

EJECUTA : CONSORCIO SAN JOSE

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

MONTO OBRA : 32,457,630.22 (con IGV)

PLAZO EJEC. : 1,560 DIAS CALENDARIO

UBICACIÓN : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

A. DIRECTO : 6,491,526.04

A. MATERIALES : NO SOLICITADO

INICIO DE OBRA : 15/01/2015

RESIDENTE: ING. CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS


27,506,466.29 (sin IGV)


5,501,293.26 (sin IGV)

**CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:**

30	jun-17	0.00	0.00	1.013	0.013	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
31	jul-17	0.00	0.00	1.009	0.009	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
32	ago-17	0.00	0.00	1.011	0.011	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
33	sep-17	0.00	0.00	1.020	0.020	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
34	oct-17	0.00	0.00	1.023	0.023	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
35	nov-17	0.00	0.00	1.026	0.026	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
36	dic-17	0.00	0.00	1.051	0.051	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
37	ene-18	0.00	0.00	1.048	0.048	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
38	feb-18	0.00	0.00	1.054	0.054	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
39	mar-18	0.00	0.00	1.057	0.057	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
40	abr-18	0.00	0.00	1.055	0.055	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
41	may-18	0.00	0.00	1.060	0.060	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
42	jun-18	0.00	0.00	1.061	0.061	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
43	jul-18	0.00	0.00	1.063	0.063	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
44	ago-18	0.00	0.00	1.089	0.089	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
45	sep-18	0.00	0.00	1.089	0.089	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
46	oct-18	0.00	0.00	1.089	0.089	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
		<b>564,726.81</b>	<b>563,361.88</b>			<b>1,694.18</b>		<b>14,046.08</b>		<b>14,046.08</b>		<b>14,046.08</b>	<b>0.00</b>

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

**RESIDENCIA DE OBRA  
CALCULO DE REAJUSTES**

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE  
 EJECUTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 MONTO OBRA : 32,457,630.22 (con IGV) 27,506,466.29 (sin/IGV)  
 PLAZO EJEC. : 1,360 DIAS CALENDARIO  
 UBICACIÓN : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
 A. DIRECTO : 6,491,526.04 5,501,293.26 (sin/IGV)  
 A. MATERIALES : NO SOLICITADO  
 INICIO DE OBRA : 15/01/2015

RESIDENTE: ING. CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS

**CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL :**

Nº	Mes	Valoración (abn 30V)		K	K-1	Reajuste Programado		Reajuste Autorizado		Reajuste a Regularizar	
		Programado	Ejecutado			Programado	Acumulado	Autorizado	Acumulado	Programado	Acumulado
01	ene-15	0.00	0.00	1.042	0.042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	feb-15	0.00	0.00	1.056	0.056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	mar-15	0.00	0.00	1.063	0.063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	abr-15	0.00	0.00	1.070	0.070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	may-15	0.00	0.00	1.080	0.080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	jun-15	0.00	0.00	1.088	0.088	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	jul-15	0.00	0.00	1.094	0.094	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	ago-15	0.00	0.00	1.105	0.105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	sep-15	0.00	0.00	1.101	0.101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	oct-15	0.00	0.00	1.108	0.108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	nov-15	0.00	0.00	1.124	0.124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	dic-15	0.00	0.00	1.135	0.135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	ene-16	0.00	0.00	1.145	0.145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	feb-16	0.00	0.00	1.159	0.159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	mar-16	0.00	0.00	1.143	0.143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	abr-16	0.00	0.00	1.123	0.123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	may-16	0.00	0.00	1.129	0.129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	jun-16	0.00	0.00	1.129	0.129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	jul-16	0.00	0.00	1.132	0.132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	ago-16	0.00	0.00	1.137	0.137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	sep-16	0.00	0.00	1.150	0.150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	oct-16	0.00	0.00	1.152	0.152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	nov-16	0.00	0.00	1.156	0.156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	dic-16	0.00	0.00	1.157	0.157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	ene-17	0.00	0.00	1.146	0.146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	feb-17	0.00	0.00	1.136	0.136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	mar-17	0.00	0.00	1.141	0.141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	abr-17	0.00	0.00	1.133	0.133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	may-17	0.00	0.00	1.139	0.139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10747

**RESIDENCIA DE OBRA  
CALCULO DE REAJUSTES**

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE

EJECUTA : CONSORCIO SAN JOSE

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

MONTO OBRA : 32,457,630.22 (con IGV) 27,506,466.29 (sin IGV)

PLAZO EJEC. : 1,360 DIAS CALENDARIO

UBICACIÓN : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

A. DIRECTO : 6,491,526.04

A. MATERIALES : NO SOLICITADO

INICIO DE OBRA : 15/01/2015

RESIDENTE: ING. CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS

**CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:**

30	jun-17	0.00	1.137	0.137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
31	jul-17	0.00	1.134	0.134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
32	ago-17	0.00	1.138	0.138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
33	sep-17	0.00	1.140	0.140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
34	oct-17	0.00	1.141	0.141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
35	nov-17	91,012.05	1.138	0.138	0.00	12,559.66	12,559.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
36	dic-17	82,911.27	1.139	0.139	0.00	11,524.67	11,524.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
37	ene-18	0.00	1.134	0.134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
38	feb-18	0.00	1.144	0.144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
39	mar-18	0.00	1.147	0.147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
40	abr-18	0.00	1.145	0.145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
41	may-18	0.00	1.156	0.156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
42	jun-18	0.00	1.158	0.158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
43	jul-18	0.00	1.160	0.160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
44	ago-18	0.00	1.168	0.168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
45	sep-18	0.00	1.168	0.168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
46	oct-18																			0.00
										<b>173,923.32</b>	<b>24,084.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIF N° 22858

  
 ISAIAS JÓRGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE

EJECUTA : CONSORCIO SAN JOSE

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

MONTO OBRA : 32,457,630.22 (con IGV)

PLAZO EJEC. : 1,360 DIAS CALENDARIO

UBICACIÓN : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

A. DIRECTO : 6,491,526.04

A. MATERIALES : NO SOLICITADO

INICIO DE OBRA : 15/01/2015


RESIDENTE: ING. CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS


27,506,466.29 (sin/IGV)

5,501,293.26 (sin/IGV)

**CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:**

Nº	Mes	Ejecutado		K	K-1	Reajuste Programado		Reajuste Real		Reajuste Autorizado		Reajuste a Reajustar a Pagar
		Programado	Ejecutado			Programado	Acumulado	Real	Acumulado	Autorizado	Acumulado	
01	ene-15	10,767.63	0.00	1.029	0.029	312.26	312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	feb-15	8,297.00	0.00	1.037	0.037	306.99	619.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	mar-15	117.55	0.00	1.041	0.041	4.82	624.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	abr-15	0.00	4,795.55	1.054	0.054	0.00	624.07	258.96	258.96	258.96	258.96	258.96
05	may-15	0.00	0.00	1.058	0.058	0.00	624.07	0.00	258.96	0.00	258.96	0.00
06	jun-15	0.00	0.00	1.072	0.072	0.00	624.07	0.00	258.96	0.00	258.96	0.00
07	jul-15	0.00	0.00	1.075	0.075	0.00	624.07	0.00	258.96	0.00	258.96	0.00
08	ago-15	0.00	0.00	1.079	0.079	0.00	624.07	0.00	258.96	0.00	258.96	0.00
09	sep-15	0.00	0.00	1.068	0.068	0.00	624.07	0.00	258.96	0.00	258.96	0.00
10	oct-15	0.00	0.00	1.081	0.081	0.00	624.07	0.00	258.96	0.00	258.96	0.00
11	nov-15	0.00	8,864.30	1.089	0.089	0.00	624.07	788.92	1,047.88	788.92	1,047.88	788.92
12	dic-15	0.00	0.00	1.094	0.094	0.00	624.07	0.00	1,047.88	0.00	1,047.88	0.00
13	ene-16	0.00	3,088.12	1.099	0.099	0.00	624.07	305.72	1,353.60	305.72	1,353.60	305.72
14	feb-16	0.00	0.00	1.104	0.104	0.00	624.07	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00
15	mar-16	0.00	0.00	1.096	0.096	0.00	624.07	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00
16	abr-16	0.00	0.00	1.087	0.087	0.00	624.07	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00
17	may-16	0.00	0.00	1.090	0.090	0.00	624.07	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00
18	jun-16	0.00	0.00	1.091	0.091	0.00	624.07	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00
19	jul-16	0.00	0.00	1.099	0.099	0.00	624.07	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00
20	ago-16	0.00	0.00	1.101	0.101	0.00	624.07	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00
21	sep-16	0.00	0.00	1.106	0.106	0.00	624.07	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00
22	oct-16	0.00	0.00	1.110	0.110	0.00	624.07	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00
23	nov-16	0.00	0.00	1.112	0.112	0.00	624.07	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00
24	dic-16	0.00	0.00	1.112	0.112	0.00	624.07	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00
25	ene-17	0.00	0.00	1.108	0.108	0.00	624.07	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00
26	feb-17	0.00	2,334.23	1.107	0.107	0.00	624.07	260.46	1,614.06	260.46	1,614.06	260.46
27	mar-17	0.00	0.00	1.111	0.111	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00
28	abr-17	0.00	0.00	1.109	0.109	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00
29	may-17	0.00	0.00	1.110	0.110	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 10717

**RESIDENCIA DE OBRA  
CALCULO DE REAJUSTES**

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE  
 EJECUTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 MONTO OBRA : 32,457,630.22 (con IGV)  
 PLAZO EJEC. : 1,360 DIAS CALENDARIO  
 UBICACIÓN : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
 A. DIRECTO : 6,491,526.04  
 A. MATERIALES : NO SOLICITADO  
 INICIO DE OBRA : 15/01/2015

RESIDENTE: ING. CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 27,906,466.29 (sin/IGV)  
 5,501,293.26 (sin/IGV)

**CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:**

30	jun-17	0.00	1.110	0.110	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-		
31	jul-17	0.00	1.109	0.109	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-		
32	ago-17	0.00	1.118	0.118	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-		
33	sep-17	0.00	1.120	0.120	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-		
34	oct-17	0.00	1.119	0.119	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-		
35	nov-17	0.00	1.119	0.119	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-		
36	dic-17	0.00	1.120	0.120	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-		
37	ene-18	0.00	1.120	0.120	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-		
38	feb-18	0.00	1.124	0.124	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-		
39	mar-18	0.00	1.125	0.125	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-		
40	abr-18	0.00	1.124	0.124	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-		
41	may-18	0.00	1.127	0.127	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-		
42	jun-18	0.00	1.127	0.127	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-		
43	jul-18	0.00	1.130	0.130	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-		
44	ago-18	0.00	1.142	0.142	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-		
45	sep-18	0.00	1.142	0.142	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-		
46	oct-18														
											<b>19,182.20</b>	<b>1,614.06</b>	<b>1,614.06</b>	<b>1,614.06</b>	<b>0.00</b>

\*\* Resjustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22856


  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

**OBRA** : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE  
**EJECUTA** : CONSORCIO SAN JOSE  
**CLIENTE** : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**MONTO OBRA** : 32,457,630.22 (con IGV) RESIDENTE: ING. CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
**PLAZO EJEC.** : 1,360 DIAS CALENDARIO 27,506,466.29 (sin IGV)  
**UBICACIÓN** : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
**A. DIRECTO** : 6,491,526.04 (sin IGV)  
**A. MATERIALES** : NO SOLICITADO 5,501,293.26 (sin IGV)  
**INICIO DE OBRA** : 15/01/2015

**CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:**

Nº	Mes	Programado		Ejecutado		Reserva Programada		Reserva Ejecutada		Reserva Autorizada		Reserva a Programar	
		Programado	Programado (sin IGV)	Ejecutado	Ejecutado (sin IGV)	Programado	Programado (sin IGV)	Ejecutado	Ejecutado (sin IGV)	Autorizada	Autorizada (sin IGV)	Programada	Programada (sin IGV)
01	ene-15	244,408.18		358,268.22		8,447.86		8,447.86		12,539.39		12,539.39	
02	feb-15	696,348.00		555,717.90		29,152.89		37,610.75		23,336.04		35,875.43	
03	mar-15	705,780.96		593,994.45		38,081.88		75,692.63		26,697.47		62,572.90	
04	abr-15	738,441.42		925,177.18		31,061.66		106,754.29		37,647.00		100,219.90	
05	may-15	686,371.48		753,732.22		27,596.70		134,350.99		27,157.33		127,377.23	
06	jun-15	1,458,927.18		985,329.63		83,345.78		217,696.77		59,065.11		186,442.34	
07	jul-15	1,641,200.45		1,865,453.02		73,411.20		291,107.97		60,025.35		246,467.69	
08	ago-15	1,803,332.94		1,054,927.09		88,427.81		379,535.78		46,107.39		292,575.08	
09	sep-15	1,517,241.16		1,429,170.33		58,108.37		437,644.15		50,502.81		343,077.89	
10	oct-15	1,450,340.31		1,285,746.48		54,201.72		491,845.87		52,470.47		395,548.36	
11	nov-15	1,475,059.64		2,011,031.83		71,533.04		563,378.91		93,025.18		488,573.54	
12	dic-15	1,251,035.34		1,389,920.39		65,336.73		628,715.64		137,996.84		626,570.38	
13	ene-16	1,122,032.56		1,517,495.69		64,615.83		693,331.47		143,733.26		770,303.64	
14	feb-16	743,722.89		667,975.68		46,192.56		739,524.03		38,814.60		809,118.24	
15	mar-16	612,133.59		621,544.65		30,624.73		770,148.76		49,587.55		858,705.79	
16	abr-16	361,209.64		240,541.06		14,676.81		784,825.57		13,081.65		871,787.44	
17	may-16	1,480,947.84		67,518.42		78,869.76		863,695.33		-16,620.10		855,167.34	
18	jun-16	760,533.22		238,908.88		90,324.89		954,020.22		17,309.83		872,477.17	
19	jul-16	241,667.03		87,581.78		33,833.38		987,853.60		8,702.31		881,179.48	
20	ago-16	0.00		26,733.49		0.00		987,853.60		2,192.15		883,371.63	
21	sep-16	0.00		54,654.58		0.00		987,853.60		4,645.64		888,017.27	
22	oct-16	0.00		15,754.74		0.00		987,853.60		1,310.62		889,327.89	
23	nov-16	0.00		0.00		0.00		987,853.60		0.00		889,327.89	
24	dic-16	0.00		68,223.57		0.00		987,853.60		8,564.82		897,892.71	
25	ene-17	0.00		106,056.42		0.00		987,853.60		7,218.72		905,111.43	
26	feb-17	0.00		11,543.86		0.00		987,853.60		-1,632.30		903,479.13	
27	mar-17	0.00		0.00		0.00		987,853.60		0.00		903,479.13	
28	abr-17	4,443.08		0.00		226.60		988,080.20		0.00		903,479.13	
29	may-17	0.00		0.00		0.00		988,080.20		0.00		903,479.13	
30	jun-17	0.00		0.00		0.00		988,080.20		0.00		903,479.13	

  
**CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22958

  
**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717





**RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 275-2018-INEI**

**ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018**

**ÁREAS GEOGRÁFICAS**

(Base : Julio 1992 = 100.0)

Cod.	1	2	3	4	5	6	Cod.	1	2	3	4	5	6
1	959.66	959.66	959.66	959.66	959.66	959.66	2	546.81	546.81	546.81	546.81	546.81	546.81
3	525.48	525.48	525.48	525.48	525.48	525.48	4	548.83	940.00	1036.18	590.75	365.28	756.52
5	453.45	216.30	425.00	604.07	(*)	623.21	6	928.00	928.00	928.00	928.00	928.00	928.00
7	672.83	672.83	672.83	672.83	672.83	672.83	8	885.16	885.16	885.16	885.16	885.16	885.16
9	252.23	252.23	252.23	252.23	252.23	252.23	10	414.57	414.57	414.57	414.57	414.57	414.57
11	239.37	239.37	239.37	239.37	239.37	239.37	12	320.72	320.72	320.72	320.72	320.72	320.72
13	1596.69	1596.69	1596.69	1596.69	1596.69	1596.69	14	284.81	284.81	284.81	284.81	284.81	284.81
17	621.60	671.52	704.00	855.53	791.87	871.64	16	354.83	354.83	354.83	354.83	354.83	354.83
19	772.71	772.71	772.71	772.71	772.71	772.71	18	330.04	330.04	330.04	330.04	330.04	330.04
21	476.04	423.68	449.56	438.28	449.56	414.76	20	1944.65	1944.65	1944.65	1944.65	1944.65	1944.65
23	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	439.25	22	367.30	367.30	367.30	367.30	367.30	367.30
27	466.82	466.82	466.82	466.82	466.82	466.82	24	243.29	243.29	243.29	243.29	243.29	243.29
31	378.47	378.47	378.47	378.47	378.47	378.47	26	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16	381.16
33	857.24	857.24	857.24	857.24	857.24	857.24	28	579.52	579.52	579.52	570.60	579.52	579.52
37	305.79	305.79	305.79	305.79	305.79	305.79	30	483.02	483.02	483.02	483.02	483.02	483.02
39	449.40	449.40	449.40	449.40	449.40	449.40	32	470.47	470.47	470.47	470.47	470.47	470.47
41	419.01	419.01	419.01	419.01	419.01	419.01	34	507.40	507.40	507.40	507.40	507.40	507.40
43	732.59	677.88	919.11	649.73	1123.51	896.96	38	427.32	955.92	867.52	573.30	(*)	648.49
45	328.06	328.06	328.06	328.06	328.06	328.06	40	383.17	443.38	445.69	352.36	272.89	331.41
47	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	42	285.93	285.93	285.93	285.93	285.93	285.93
49	302.20	302.20	302.20	302.20	302.20	302.20	44	385.69	385.69	385.69	385.69	385.69	385.69
51	350.57	350.57	350.57	350.57	350.57	350.57	46	484.15	484.15	484.15	484.15	484.15	484.15
53	806.68	806.68	806.68	806.68	806.68	806.68	48	369.15	369.15	369.15	369.15	369.15	369.15
55	498.78	498.78	498.78	498.78	498.78	498.78	50	649.27	649.27	649.27	649.27	649.27	649.27
57	391.72	391.72	391.72	391.72	391.72	391.72	52	310.53	310.53	310.53	310.53	310.53	310.53
59	243.79	243.79	243.79	243.79	243.79	243.79	54	408.28	408.28	408.28	408.28	408.28	408.28
61	267.84	267.84	267.84	267.84	267.84	267.84	56	542.19	542.19	542.19	542.19	542.19	542.19
65	253.41	253.41	253.41	253.41	253.41	253.41	60	295.99	295.99	295.99	295.99	295.99	295.99
69	389.45	327.82	428.87	488.52	269.39	451.51	62	472.19	472.19	472.19	472.19	472.19	472.19
71	652.95	652.95	652.95	652.95	652.95	652.95	64	348.21	348.21	348.21	348.21	348.21	348.21
73	553.51	553.51	553.51	553.51	553.51	553.51	66	737.81	737.81	737.81	737.81	737.81	737.81
77	333.21	333.21	333.21	333.21	333.21	333.21	68	289.65	289.65	289.65	289.65	289.65	289.65
							70	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25
							72	435.02	435.02	435.02	435.02	435.02	435.02
							78	490.54	490.54	490.54	490.54	490.54	490.54
							80	107.68	107.68	107.68	107.68	107.68	107.68

  
**CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 22858

  
**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 10717

**RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 164-2014-INEI**

**ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2014  
ÁREAS GEOGRÁFICAS  
(Base : Julio 1992 = 100,0)**

Cod.	2	3	4	5	6	Cod.	2	3	4	5	6	
01	822.23	822.23	822.23	822.23	822.23	02	492.06	492.06	492.06	492.06	492.06	
03	451.86	451.86	451.86	451.86	451.86	04	517.21	784.03	994.88	566.69	288.37	757.94
05	437.56	217.20	393.67	601.97	(*)	06	802.79	802.79	802.79	802.79	802.79	802.79
07	596.89	596.89	596.89	596.89	596.89	08	791.26	791.26	791.26	791.26	791.26	791.26
09	297.28	297.28	297.28	297.28	297.28	10	380.12	380.12	380.12	380.12	380.12	380.12
11	206.95	206.95	206.95	206.95	206.95	12	299.22	299.22	299.22	299.22	299.22	299.22
13	1704.06	1704.06	1704.06	1704.06	1704.06	14	265.60	265.60	265.60	265.60	265.60	265.60
17	572.71	675.70	745.82	870.92	655.82	16	352.48	352.48	352.48	352.48	352.48	352.48
19	671.44	671.44	671.44	671.44	671.44	18	273.70	273.70	273.70	273.70	273.70	273.70
21	452.04	339.42	354.74	428.12	354.74	20	2010.06	2010.06	2010.06	2010.06	2010.06	2010.06
23	368.10	368.10	368.10	368.10	368.10	22	367.30	367.30	367.30	367.30	367.30	367.30
27	603.25	603.25	603.25	603.25	603.25	24	244.38	244.38	244.38	244.38	244.38	244.38
31	376.62	376.62	376.62	376.62	376.62	26	359.86	359.86	359.86	359.86	359.86	359.86
33	722.38	722.38	722.38	722.38	722.38	28	527.74	527.74	512.73	527.74	527.74	527.74
37	293.39	293.39	293.39	293.39	293.39	30	387.37	387.37	387.37	387.37	387.37	387.37
39	400.98	400.98	400.98	400.98	400.98	32	468.30	468.30	468.30	468.30	468.30	468.30
41	374.03	374.03	374.03	374.03	374.03	34	588.88	588.88	588.88	588.88	588.88	588.88
43	655.15	577.59	797.19	621.08	806.95	38	410.63	894.55	844.07	543.68	(*)	685.08
45	313.47	313.47	313.47	313.47	313.47	40	367.06	390.18	430.02	292.80	272.89	331.41
47	498.10	498.10	498.10	498.10	498.10	42	247.43	247.43	247.43	247.43	247.43	247.43
49	248.68	248.68	248.68	248.68	248.68	44	348.81	348.81	348.81	348.81	348.81	348.81
51	295.54	295.54	295.54	295.54	295.54	46	473.29	473.29	473.29	473.29	473.29	473.29
53	909.33	909.33	909.33	909.33	909.33	48	338.46	338.46	338.46	338.46	338.46	338.46
55	488.01	488.01	488.01	488.01	488.01	50	595.80	595.80	595.80	595.80	595.80	595.80
57	356.22	356.22	356.22	356.22	356.22	52	280.14	280.14	280.14	280.14	280.14	280.14
59	205.23	205.23	205.23	205.23	205.23	54	373.45	373.45	373.45	373.45	373.45	373.45
61	255.93	255.93	255.93	255.93	255.93	56	454.42	454.42	454.42	454.42	454.42	454.42
65	244.20	244.20	244.20	244.20	244.20	60	295.99	295.99	295.99	295.99	295.99	295.99
69	389.45	327.82	428.87	503.40	289.39	62	410.93	410.93	410.93	410.93	410.93	410.93
71	554.71	554.71	554.71	554.71	554.71	64	319.97	319.97	319.97	319.97	319.97	319.97
73	465.18	465.18	465.18	465.18	465.18	66	547.43	547.43	547.43	547.43	547.43	547.43
77	281.29	281.29	281.29	281.29	281.29	68	256.20	256.20	256.20	256.20	256.20	256.20
						70	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25
						72	370.39	370.39	370.39	370.39	370.39	370.39
						78	439.30	439.30	439.30	439.30	439.30	439.30
						80	106.05	106.05	106.05	106.05	106.05	106.05

(\*) Sin Producción.

Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53 que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 164-2014-INEI.

  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

SE RESUELVE:

**Artículo 1.-** Dar por concluida la designación, por vencimiento de mandato, del señor Pablo Fernando Sarria Arenas, como miembro de la Comisión de Procedimientos Concursales, siendo el último día de ejercicio de sus funciones el 18 de setiembre de 2018, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Institución.

**Artículo 2.-** Designar al señor Carlos Alberto Rivera Salazar, como miembro de la Comisión de Procedimientos Concursales, con efectividad al 19 de setiembre de 2018.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVO GAGLIUFFI PIERCECHI  
Presidente del Consejo Directivo

1692979-3

### Designan miembro de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas

#### RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI N° 167-2018-INDECOPI/COD

Lima, 14 de setiembre de 2018

VISTOS:

El Informe N° 0168-2018/GRH, el Memorandum N° 1864-2018/GEL que adjunta el Informe N° 641-2018/GEL, el Informe N° 089-2018/GEG, y el Informe N° 100-2018/GEG; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme con lo establecido en el literal d) del artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), aprobada por el Decreto Legislativo N° 1033 y sus modificatorias, corresponde al Consejo Directivo de la Institución designar a los miembros de las Comisiones de las áreas de competencia y propiedad intelectual;

Que, de acuerdo con lo señalado en el literal c) del artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2009-PCM y sus modificatorias, el Consejo Directivo de la Institución se encuentra facultado para designar a los miembros de la Comisiones de las áreas de competencia y propiedad intelectual;

Que, de conformidad con lo prescrito en el literal a) del artículo 22 de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, el período de designación de los miembros de las Comisiones es de cinco (5) años, pudiendo ser designados por un período adicional;

Que, el literal c) del artículo 21 de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, señala que las comisiones del área de competencia se encuentran integradas por cuatro (4) miembros;

Que, mediante la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI N° 198-2013-INDECOPI/COD, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de setiembre de 2013, se designó al señor Luis Ricardo Quesada Oré, como miembro de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas;

Que, estando próximo a cumplirse el plazo de cinco (5) años de la designación del referido comisionado, y de acuerdo con los documentos de vistos, resulta pertinente efectuar la reconfirmación de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, a fin de que dicho órgano colegiado cuente con el número legal de integrantes previstos en la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI;

Que, el Consejo Directivo mediante Acuerdo N° 106-2018 del 13 de setiembre de 2018, con la opinión

favorable del Consejo Consultivo, ha acordado designar al señor Luis Ricardo Quesada Oré, como miembro de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, por un período adicional;

Con el visto bueno del Gerente General, de la Gerencia de Recursos Humanos, y de la Gerencia Legal; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1033 y sus modificatorias, y en cumplimiento de las funciones otorgadas mediante los literales f) y h) del numeral 7.3 del mismo cuerpo legislativo;

SE RESUELVE:

**Artículo Único.-** Designar al señor Luis Ricardo Quesada Oré, como miembro de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, por un período adicional, con efectividad al 19 de setiembre de 2018.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVO GAGLIUFFI PIERCECHI  
Presidente del Consejo Directivo

1692979-4

### INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

#### Aprueban Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de agosto de 2018

#### RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 275-2018-INEI

Lima, 17 de setiembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe N° 02-08-2018/DTIE, referido a los Índices Unificados de Precios para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de Agosto de 2018 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano; y,

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SE RESUELVE:

**Artículo 1.-** Aprobar los Índices Unificados de Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Agosto de 2018, que se indican en el cuadro siguiente:

ÁREAS GEOGRÁFICAS													
Cód.	1	2	3	4	5	6	Cód.	1	2	3	4	5	6
01	959,66	959,66	959,66	959,66	959,66	959,66	02	546,81	546,81	546,81	546,81	546,81	546,81
03	525,48	525,48	525,48	525,48	525,48	525,48	04	548,83	940,00	1036,18	590,75	365,28	756,52
05	453,45	216,30	425,00	604,07	(*)	623,21	06	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00
07	672,83	672,83	672,83	672,83	672,83	672,83	08	885,16	885,16	885,16	885,16	885,16	885,16
09	252,23	252,23	252,23	252,23	252,23	252,23	10	414,57	414,57	414,57	414,57	414,57	414,57
11	239,37	239,37	239,37	239,37	239,37	239,37	12	320,72	320,72	320,72	320,72	320,72	320,72
13	1596,69	1596,69	1596,69	1596,69	1596,69	1596,69	14	284,81	284,81	284,81	284,81	284,81	284,81
17	621,60	671,52	704,00	855,53	791,87	871,64	16	354,83	354,83	354,83	354,83	354,83	354,83
19	772,71	772,71	772,71	772,71	772,71	772,71	18	330,04	330,04	330,04	330,04	330,04	330,04
21	476,04	423,68	449,56	438,28	449,56	414,76	20	1944,65	1944,65	1944,65	1944,65	1944,65	1944,65
23	439,25	439,25	439,25	439,25	439,25	439,25	22	367,30	367,30	367,30	367,30	367,30	367,30
27	466,82	466,82	466,82	466,82	466,82	466,82	24	243,29	243,29	243,29	243,29	243,29	243,29
31	378,47	378,47	378,47	378,47	378,47	378,47	26	381,16	381,16	381,16	381,16	381,16	381,16
33	857,24	857,24	857,24	857,24	857,24	857,24	28	579,52	579,52	579,52	570,60	579,52	579,52
37	305,79	305,79	305,79	305,79	305,79	305,79	30	483,02	483,02	483,02	483,02	483,02	483,02
39	449,40	449,40	449,40	449,40	449,40	449,40	32	470,47	470,47	470,47	470,47	470,47	470,47
41	419,01	419,01	419,01	419,01	419,01	419,01	34	507,40	507,40	507,40	507,40	507,40	507,40
43	732,59	677,88	919,11	649,73	1123,51	896,96	38	427,32	955,92	867,52	573,30	(*)	648,49
45	328,06	328,06	328,06	328,06	328,06	328,06	40	383,17	443,38	445,69	352,36	272,89	331,41
47	602,11	602,11	602,11	602,11	602,11	602,11	42	285,93	285,93	285,93	285,93	285,93	285,93
49	302,20	302,20	302,20	302,20	302,20	302,20	44	385,69	385,69	385,69	385,69	385,69	385,69
51	350,57	350,57	350,57	350,57	350,57	350,57	46	484,15	484,15	484,15	484,15	484,15	484,15
53	806,68	806,68	806,68	806,68	806,68	806,68	48	369,15	369,15	369,15	369,15	369,15	369,15
55	498,78	498,78	498,78	498,78	498,78	498,78	50	649,27	649,27	649,27	649,27	649,27	649,27
57	391,72	391,72	391,72	391,72	391,72	391,72	52	310,53	310,53	310,53	310,53	310,53	310,53
59	243,79	243,79	243,79	243,79	243,79	243,79	54	408,28	408,28	408,28	408,28	408,28	408,28
61	267,64	267,64	267,64	267,64	267,64	267,64	56	542,19	542,19	542,19	542,19	542,19	542,19
65	253,41	253,41	253,41	253,41	253,41	253,41	60	295,99	295,99	295,99	295,99	295,99	295,99
69	389,45	327,82	428,87	488,52	269,39	451,51	62	472,19	472,19	472,19	472,19	472,19	472,19
71	652,95	652,95	652,95	652,95	652,95	652,95	64	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21
73	553,51	553,51	553,51	553,51	553,51	553,51	66	737,81	737,81	737,81	737,81	737,81	737,81
77	333,21	333,21	333,21	333,21	333,21	333,21	68	289,65	289,65	289,65	289,65	289,65	289,65
							70	218,25	218,25	218,25	218,25	218,25	218,25
							72	435,02	435,02	435,02	435,02	435,02	435,02
							78	490,54	490,54	490,54	490,54	490,54	490,54
							80	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68

(\*) Sin Producción

Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 260-2018-INEI.

**Artículo 2.-** Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1, comprende a los siguientes departamentos:

- Área 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín
- Área 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica
- Área 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali
- Área 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna
- Área 5 : Loreto
- Área 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

**Artículo 3.-** Los Índices Unificados de Precios, corresponden a los materiales, equipos, herramientas,

mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fletes.

Regístrese y comuníquese.

FRANCISCO COSTA APONTE  
Jefe (e)

1692916-1

**Aprueban Factores de Reajuste aplicables a obras de edificación correspondientes a las seis Áreas Geográficas para Obras del Sector Privado, producidas en el mes de agosto de 2018**

**RESOLUCIÓN JEFATURAL  
N° 276-2018-INEI**

Lima, 17 de setiembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto

Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, para uso del Sector Privado de la Construcción, deben elaborarse los Factores de Reajuste correspondientes a las obras de Edificación de las seis (6) Áreas Geográficas del país, aplicables a las obras en actual ejecución, siempre que sus contratos no estipulen modalidad distinta de reajuste;

# Curva S



CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22358



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717 186



# PLANILLA DE METRADOS



CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22088



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



**PARTIDAS VALORIZADAS - SETIEMBRE 2018**


**OBRA:**

**"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO  
DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"**

**FECHA:**

al 30/09/18

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	VALORADO
<b>7.03</b>	<b>MUELLE DE ESPIGON L=950 m</b>		
<b>07.03.04</b>	<b>Nucleos llenados en situ</b>		
07.03.04.01	Concreto en Nucleos Fc'= 280 kg/cm2	m3	
07.03.04.02	Encofrado y desencofrado en Nucleos	m2	
07.03.04.03	Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm <sup>2</sup>	kg	
<b>07.03.05</b>	<b>Juntas Longitudinales y Transversales</b>		
07.03.05.01	Concreto en Viga Mandil F'c=280 Kg/cm2	m3	-
07.03.05.02	Encofrado y desencofrado en Viga Mandil	m2	-
07.03.05.03	Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm <sup>2</sup>	kg	-
<b>07.03.06</b>	<b>Sardineles llenados en situ</b>		
07.03.06.01	Concreto en Sardinel F'c=280 Kg/cm2	m3	
07.03.06.02	Encofrado y desencofrado en Sardineles	m2	
07.03.06.03	Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm <sup>2</sup>	kg	
<b>07.03.07</b>	<b>Losas Vaciadas in Situ</b>		
07.03.07.01	Concreto en Losas F'c=280 Kg/cm2	m3	
07.03.07.02	Encofrado y desencofrado en Losas	m2	
07.03.07.03	Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm <sup>2</sup>	kg	
<b>07.04</b>	<b>CABEZO L= 50.00 m</b>		
<b>07.04.07</b>	<b>Maniobra de Colocacion e Hincado de Pilotes, Vigas y Losas: Puentes</b>		
07.04.07.01	Transporte de Pilote	Und	22.00
07.04.07.02	Transporte de Viga Transversal	Und	-
07.04.07.03	Transporte de Losa Nervada	Und	12.00
07.04.07.06	Descabezado de Pilotaje	Und	22.00
07.04.07.07	Colocacion de Viga Transversal	Und	8.00
07.04.07.08	Colocacion de Losa Nervada	Und	12.00

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. C.I.P. N° 22033

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. C.I.P. N° 10717

**PLANILLA DE METRADOS - DPA SAN JOSE**

**Obra :** "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"  
**Especialidad:** OBRAS DE MAR  
**Fecha :** Setiembre DEL 2018

Item	Elemento			Cantidad Elementos	Medidas			Subtotal	TOTAL
	Descripcion	Und	N° Veces		Longitud	Ancho	Altura		
<b>07.04.07</b>	<b>Maniobra de Colocacion e Hincado de Pilotes, Vigas y Losas Puentes</b>								
<b>07.04.07.01</b>	Transporte de Pilote	Und	1.00	22.00	-	-	-	22.00	<b>22.00</b>
<b>07.04.07.02</b>	Transporte de Viga Transversal	Und	1.00	12.00	-	-	-	12.00	<b>12.00</b>
<b>07.04.07.03</b>	Transporte de Losa Nervada	Und	1.00	22.00	-	-	-	22.00	<b>22.00</b>
<b>07.04.07.06</b>	Descabezado de Pilotaje	Und	1.00	22.00	-	-	-	22.00	<b>22.00</b>
<b>07.04.07.07</b>	Colocacion de Viga Transversal	Und	1.00	8.00	-	-	-	8.00	<b>8.00</b>
<b>07.04.07.08</b>	Colocacion de Losa Nervada	Und	1.00	12.00	-	-	-	12.00	<b>12.00</b>

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22856

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

# PANEL FOTOGRAFICO



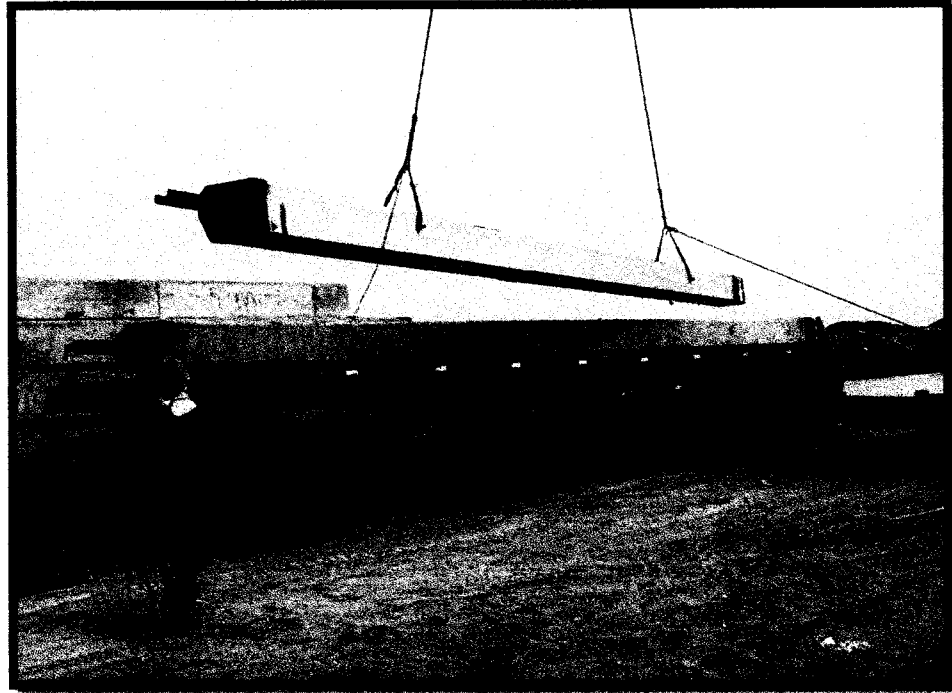
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858



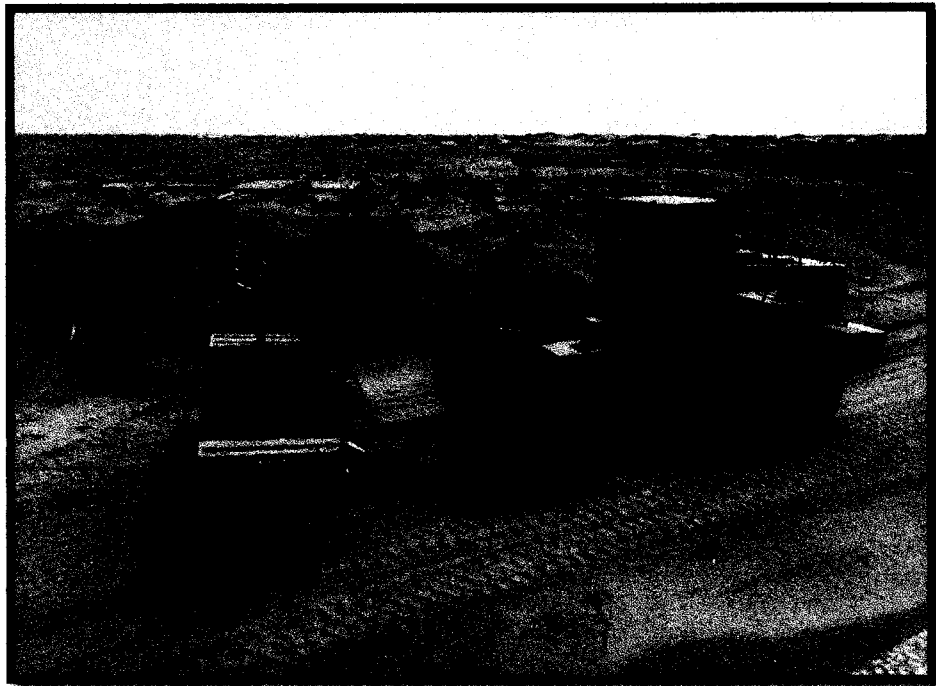
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717


**PANEL FOTOGRAFICO**


**OBRAS EN MAR**

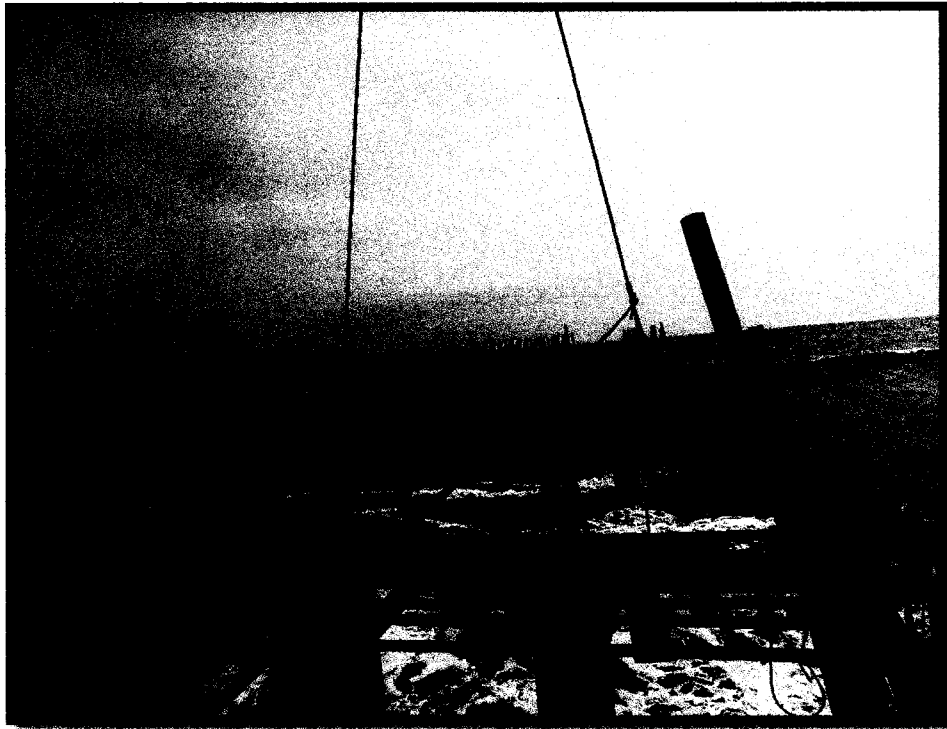


TRANSPORTE DE PREFBRICADOS (PILOTES, LOSAS NERVADAS Y VIGAS)




  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858


  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

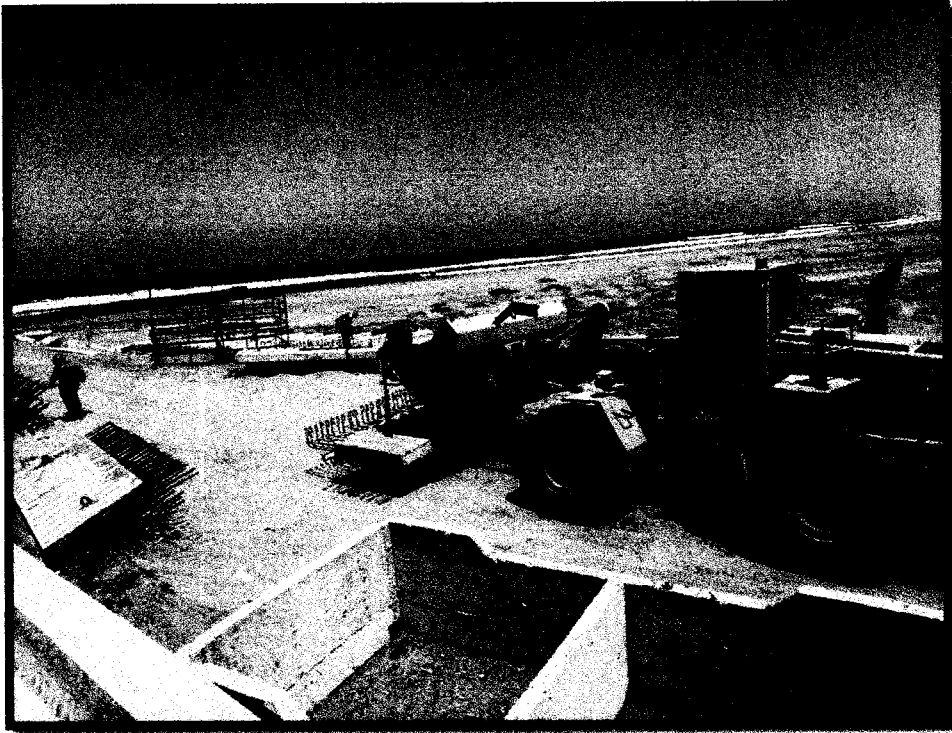


07.04.07.07 COLOCACION DE VIGAS TRANSVERSALES DEL EJE 121 AL 129.



  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



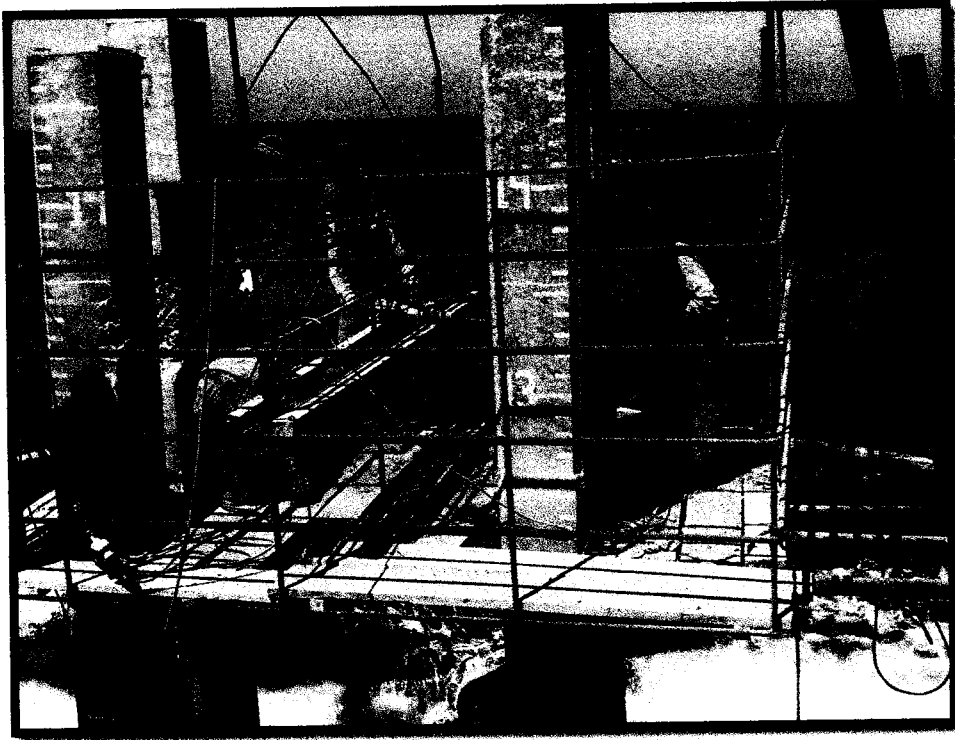
TRANSPORTE Y COLOCACION DE LOSAS NERVADAS DEL EJE 124 AL 129



  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22358


  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE 147  
DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

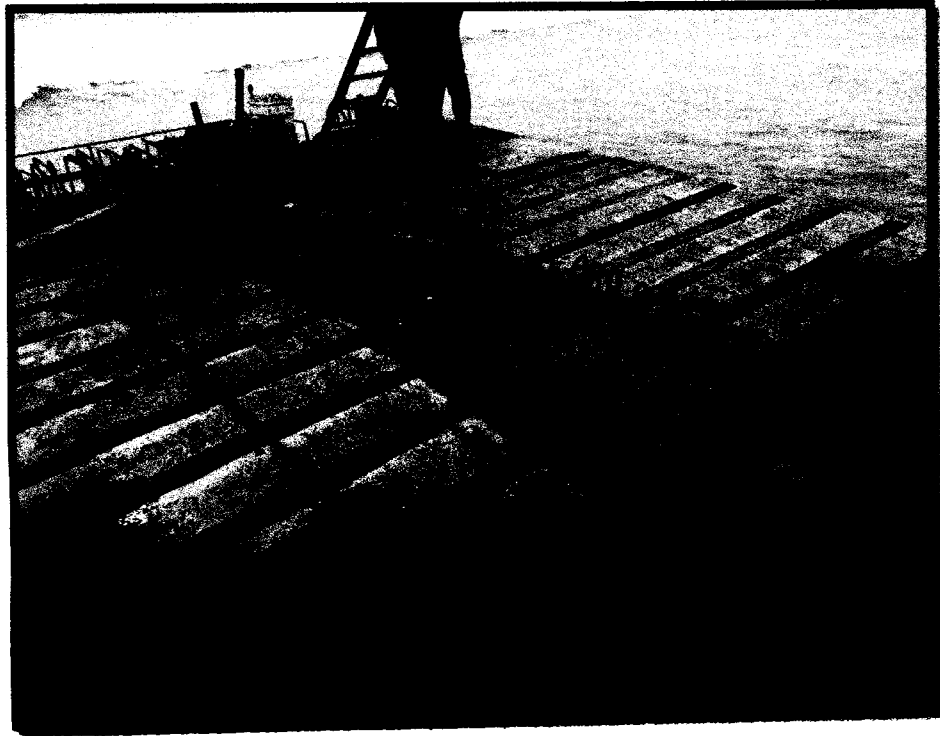


DESCABEZADO DE PILOTES



  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22638

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



CONCRETO, ENCOFRADO Y A CERO EN JUNTAS LONGITUDINALES HASTA EL EJE 126



ENCOFRADO DE SARDINEÑES ENTRE LOS EJES 112 -119

CONSORCIO SAN JOSE

E QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 22858

196

ISAIAS JORGE ALVA ESPINO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



# Contrato de obra (Copia)



CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

**CONTRATO N° 082-2014-FONDEPES/OGA**

**EJECUCION DE OBRA "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION DE LAMBAYEQUE"**

Conste por el presente documento, el contrato para la EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION DE LAMBAYEQUE", que celebra de una parte el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FONDEPES, en adelante se le denominará "LA ENTIDAD", con RUC N° 20137921601, con domicilio legal en avenida Petit Thouars N° 115, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima, representado por su Secretario General, Abog. **FERNANDO ALARCON DIAZ**, identificado con DNI N° 10507977, por delegación de facultades otorgadas mediante Resolución Jefatural N° 115-2013-FONDEPES/J; y de otra parte el **CONSORCIO SAN JOSE**, integrado por:

- a) **CHAVIN DE HUANTAR EIRL**, con RUC N° 20254813720, con domicilio en Av. Próceres de la Independencia 3634, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, quien participa en un porcentaje de 58%.
- b) **CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU**, con RUC N° 20552622171, con domicilio en Calle Pasaje Sucre 164, 2do piso, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, quien participa en un porcentaje de 40%.
- c) **CORPORACION ARIS SAC**, con RUC N° 20523320522, con domicilio en Av. Huarochirí N° 1109 Dpto. 301-Urbanización Mayorazgo, distrito de Ate Vitarte, provincia y departamento de Lima, quien participa en un porcentaje de 1%.
- d) **CORPORACION R&E SAC**, con RUC N° 20516966034, con domicilio en Calle 13 N° 148, Dpto. 201-Urbanización Carabaylo, distrito de Comas, provincia y departamento de Lima, quien participa en un porcentaje de 1%.



Con domicilio común del **CONSORCIO SAN JOSE** en la avenida Alameda del Corregidor N° 414, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, con su Representante Legal Común, Sr. **EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA**, identificado con DNI N° 32385946, en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 21.11.14, el Comité Especial Ad Hoc otorgó la Buena Pro de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 004-2014-FONDEPES para la contratación de la ejecución de la obra "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano directo de San José, distrito de San José, provincia de Lambayeque, Región de Lambayeque", al **CONSORCIO SAN JOSE**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano directo de San José, distrito de San José, provincia de Lambayeque, región de Lambayeque", conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CON SAN JOSE  
 Emiliano Isaac Trujillo Luna  
 Representante Legal Común  
  
 F. ALARCON  
  
 M. RODRIGUEZ  
  
 W. POMA

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a S/. 32, 457,630.22 (Treinta y Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Treinta con 22/100 Nuevos soles) incluido IGV, bajo el sistema de contratación de precios unitarios.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, en periodos de valorización mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases Integradas. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

**CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

El plazo de ejecución del presente contrato es de 540 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases Integradas.

**CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora<sup>1</sup> y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

**CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato<sup>2</sup>:
- a) S/. 1, 947,458.00, a través de la Carta Fianza N° 0011-0962-9800017155-87,

<sup>1</sup> La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

<sup>2</sup> En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

CONSORCIO SAN JOSE  
 Emiliano Isaac Trujillo Luna  
 Representante Legal Común





emitida por BBVA CONTINENTAL, cantidad que es equivalente al SEIS por ciento (6%) del monto del contrato original, con una vigencia desde el 15.12.14 hasta el 10.12.15, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

- b) S/. 1, 298,305.21, a través de la Carta Fianza N° 010469195 000, emitida por SCOTIABANK, cantidad que es equivalente al CUATRO por ciento (4%) del monto del contrato original, con una vigencia desde el 19.12.14 hasta el 15.12.15, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

**CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO<sup>3</sup>**

LA ENTIDAD otorgará UN ADELANTO DIRECTO por el 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días calendario siguientes A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO<sup>4</sup>, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos,<sup>5</sup> mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue EL ADELANTO en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

<sup>3</sup> Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

<sup>4</sup> En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

<sup>5</sup> De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

CONSORCIO SAN JOSE

Emiliano Isaac Trujillo Luna  
Representante Legal Común



F. ALARCÓN



M. RODRÍGUEZ



W. POMA



**CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS<sup>6</sup>**

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el 40% del monto del CONTRATO ORIGINAL<sup>7</sup>, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

La entrega del adelanto para materiales o insumos podrá ser solicitado por el Contratista durante el plazo contractual de la obra y en concordancia con el calendario de adquisición de materiales o insumos.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 07 días calendario, previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 días calendario, anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza emitida en los siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país cuya vigencia mínima será de tres (03) meses renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, conforme el artículo 162 del Reglamento, dicha carta deberá estar dirigida al FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO; y el comprobante de pago correspondiente (FACTURA).

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DE LA OBRA**

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

**CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

<sup>6</sup> En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

<sup>7</sup> En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

CONSORCIO SAN JOSE

Emiliano Isaac Trujillo Luna  
Representante Legal Común



F. ALARCÓN



M. RODRÍGUEZ



W. POMA



**CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

**CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

**F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

**OTRAS PENALIDADES:**

<b>Permanencia de la Residencia:</b>	
Por día de ausencia injustificada del Residente de obra	300 soles
<b>Permanencia del personal propuesto diferente al Residente de obra:</b>	
Por día de ausencia injustificada previo a ser requerida su presencia en obra por la Entidad o la supervisión	150 soles
<b>Cuaderno de obra:</b>	
Por hora de ausencia de cuaderno de obra (en la obra)	50 soles
Por día de retraso en el llenado del cuaderno de obra	50 soles
<b>Valorización de obra:</b>	
Por día de atraso en la entrega de valorizaciones de obra	200 soles

SORCIO SAN JOSE  
Emiliano Isaac Trujillo Luna  
Representante Legal Común





**CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>8</sup>**

1. Las partes acuerdan que las controversias que surjan sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785 y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley.
2. Las partes acuerdan que todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante arbitraje institucional bajo la organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo a su Reglamento.
  - a.- Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es menor o igual a 30 (treinta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de su presentación, el Tribunal Arbitral estará compuesto por árbitro único.
  - b.- Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es mayor a 30 (treinta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la de su presentación, el Tribunal Arbitral estará compuesto por tres árbitros.
  - c.- Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es indeterminable el Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros.

<sup>8</sup> De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

CONSORCIO SAN JOSE

Emiliano Isaac Trujillo Luna  
Representante Legal Común



F. ALANCON



R. RODRIGUEZ



W. POMA



3. Las partes acuerdan que las actuaciones arbitrales se realizarán en los plazos establecidos, sin que el Tribunal Arbitral tenga facultad alguna para ampliarlos o modificarlos, no siendo posible que el Tribunal Arbitral haga uso de la facultad contenida en el numeral 4 del artículo 34 del Decreto Legislativo N° 1071.
4. El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutará como una sentencia.
5. Para la interposición de recurso de anulación del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial las partes acuerdan que, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse.

**CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Avenida Petit Thouars N° 115, distrito Lima, provincia y departamento Lima.

DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: Avenida Alameda del Corregidor N° 414, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes, debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases Integradas, las propuestas técnico y económica, y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por cuadruplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los 24 días del mes de diciembre de 2014.



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
FONDEPE

FERNANDO ESCOBAR DIAZ

LA ENTIDAD

CONSORCIO SAN JOSE

Emiliano Isaac Trujillo Luna

Representante Legal Común  
EL CONTRATISTA



# Contrato de consorcio


(Copia)



CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717  
205



**CONTRATO**

**“CONSORCIO SAN JOSE”**

QUE CELEBRAN

CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.

CIVIS GLOBAL- SUCURSAL PERU

CORPORACION ARIS S.A.C.

CORPORACION R&E S.A.C.

EL PRESENTE DOCUMENTO  
NO HA SIDO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA.

Conste por el presente documento, el **CONTRATO DE CONSORCIO** que celebran las siguientes personas jurídicas empresariales:

- **CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.** con RUC N° 20254813720, con domicilio en Av. Próceres de la Independencia 3634, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima. Debidamente representado por su Representante Legal el Ing. **EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA**, Peruano, identificado con DNI N° 32385946, según poder que obra inscrito en la Partida Electrónica número: 01545353 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao;
- **CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU** con RUC N° 20552622171, debidamente representada por su Representante Legal, **FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ**, Identificado con C.E. N° 000996117, con domicilio en calle PASAJE SUCRE 164, 2º Piso, Distrito de Miraflores Provincia y departamento de Lima, según poderes inscritos la partida N° 13012604, del Registro de Personas Jurídicas de Lima;
- **CORPORACION ARIS S.A.C.** con RUC N° 20523320522, con domicilio en la Av. Huarochirí N° 1109 Dpto. 301 - Urb.

ING. JULIO GONZALEZ ROSQUERA  
REPRESENTANTE LEGAL

ING. FERRER ROXANA  
REPRESENTANTE GENERAL

CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU  
FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



- Mayorazgo (tranquera de Mayorazgo), Distrito de Ate Vitarte, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Representante Legal **JULIO CESAR VILAFRANCA MOSQUERA**, peruano, identificada con DNI N° 09753183; según Poder que obra inscrito en la Partida Electrónica Número: 12358699 en el Asiento N° A00001, del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao.
- **CORPORACION R&E S.A.C.** con RUC N° 20516966034, con domicilio en la Calle 13 N° 148, Dpto. 201 (ref. Cruce Av. El Maestro y Av. Metropolitan) - Urb. Carabayllo, Distrito de Comas, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Representante Legal **ROXANA GUERRERO CALLE**, peruana, identificada con DNI N° 09794994; según Poder que obra inscrito en la Partida Electrónica Número: 12052729 en el Asiento N° A00001, del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao.

A quienes en adelante se les denominará de manera conjunta, **LOS CONSORCIADOS**; que celebran el presente contrato bajo las disposiciones contenidas en las clausulas siguientes:

**PRIMERA.- CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL CONSORCIO**

**LOS CONSORCIADOS** están constituidos por personas Jurídicas de derecho privado, constituidas según los diversos regímenes empresariales y/o societarios que la legislación peruana reconoce como vigentes a la firma del presente contrato de consorcio, y las mismas que han decidido formar un consorcio de acuerdo a lo establecido en el artículo 445° y siguientes de la Ley General de Sociedades, con el objeto de prestarse mutua colaboración estando a sus porcentajes, en la licitación y desarrollo de la ejecución, habiendo obtenido la buena "Buena Pro" consentida, de la "ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES-DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 04-2014-FONDEPES- PRIMERA CONVOCATORIA".CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE, por el monto de S/32'457,630.22 (TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 22/100 NUEVOS SOLES)

De acuerdo a lo establecido por los artículos 438° y 445° de la Ley General de Sociedades, los **CONSORCIADOS** dejan constancia que el **CONTRATO** no genera la creación de una persona jurídica y acuerdan

OTARIO DE LIMA

CH: VIN D. JANTARER  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CORPORACION R&E S.A.C.  
ING. JULIO CESAR VILAFRANCA MOSQUERA  
GERENTE GENERAL

GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU  
FELIPE CARRASCOZA HERMANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



utilizar como denominación "CONSORCIO SAN JOSE", denominándose en el presente documento únicamente como CONSORCIO.

**SEGUNDA.- DOMICILIO LEGAL COMUN DEL CONSORCIO**

Los CONSORCIADOS, señalan como su domicilio legal común en la Avenida Alameda del Corregidor N° 414, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima-Perú, que será el domicilio del CONSORCIO.

**TERCERA.-PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN E INDIVIDUALIZACION DE OBLIGACIONES**

La participación de los CONSORCIADOS, tanto en la ejecución de la obra, aportes y responsabilidades que deberán asumir, será de acuerdo al siguiente detalle:

<p>OBLIGACIONES DE CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L 58.0%</p> <p>-Participar en la Ejecución de la Obra _____ 58.00%</p> <p>-Participar con apoyo logístico para la Obra _____ 58.00%</p> <p>-Responsable de elaboración de propuestas técnica y económica y aportación de profesionales a la obra _____ 0.00%</p>	
<p>OBLIGACIONES DE CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU 40.0%</p> <p>-Participar en la Ejecución de la Obra _____ 40.00%</p> <p>-Participar con apoyo logístico para la Obra. _____ 40.00%</p> <p>-Responsable de elaboración de propuestas técnica y económica y aportación de profesionales a la obra _____ 0.00%</p>	
<p>OBLIGACIONES DE CORPORACIÓN ARIS S.A.C. 1.00%</p> <p>-Participar en la Ejecución de la Obra _____ 1.00%</p> <p>-Participar con apoyo logístico para la Obra. _____ 1.00%</p> <p>-Responsable de elaboración de propuestas técnica y económica y aportación de profesionales a la obra _____ 100.00%</p>	
<p>OBLIGACIONES DE CORPORACIÓN R&amp;E S.A.C. 1.00%</p> <p>-Participar en la Ejecución de la Obra _____ 1.00%</p> <p>-Participar con apoyo logístico para la Obra. _____ 1.00%</p> <p>-Responsable de elaboración de propuestas técnica y económica y aportación de profesionales a la obra _____ 0.00%</p>	

TOTAL 100%.

ING. JUAN DONARIS S.A.C.  
INSTRUMENTACIÓN DE CONSTRUCCION  
ING. JULIO C. VILLAFRANCA MOSQUERA  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

INGENIERÍA R&E S.A.C.  
GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

CH. CIA HUANTAR E.I.R.L.  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU  
ING. FELIPE CARRASCO SAHERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

Se deja establecido que ningún CONSORCIADO podrá CEDER su posición contractual adquirida en el presente contrato a favor de ninguna persona natural o jurídica externa a los miembros del **CONSORCIO**, salvo que el **COMITÉ DE GERENCIA** apruebe dicha cesión. Sin aprobación por parte del **COMITÉ DE GERENCIA** no operará la cesión de posición contractual a externos.

**CUARTA.-DURACIÓN**


El plazo de duración del presente Contrato y, por ende del **CONSORCIO**, será el necesario para el cumplimiento de su objeto, es decir, aquel lapso requerido para la conclusión de LA OBRA u OBRAS, que se ejecuten como consecuencia de los contratos que se celebren con FONDEPES, y la liquidación debidamente consentida. En este sentido, la vigencia del presente Contrato se extenderá hasta que sea realizada y quede consentida la liquidación final del Contrato de LA OBRA que se celebrará con FONDEPES y, en general, hasta que sean cumplidas todas las obligaciones que hubieran asumido EL **CONSORCIO** para la ejecución de LA OBRA con cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, y hasta que se hayan hecho efectivos todos los créditos o derechos a favor de LOS **CONSORCIADOS**, que provengan del objeto del consorcio **San José**, debiendo interpretarse este plazo de la forma más amplia posible.

En caso de no obtenerse la buena pro de la obra que motiva la constitución del consorcio, el presente contrato quedara resuelto de pleno derecho con dicha situación.

**QUINTA.- COMITÉ DE GERENCIA**

Los integrantes del consorcio aceptan que el consorcio sea conducido por un Comité de Gerencia el cual se regirá por las siguientes disposiciones:

En el orden interno, el **CONSORCIO** se sujeta a la dirección de un **COMITÉ DE GERENCIA**, compuesto de 5 (cinco) miembros, designados 3 (tres) designados por **CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.**, y 2 (dos) designados por **CIVIL GLOBAL - SUCURSAL PERU**, pudiendo no obstante cada empresa designar un suplente para cada miembro designado. El nombramiento de los miembros del Comité y, en su caso, de sus suplentes, por las Empresas consorciadas tendrá, en principio,

  
 CORPORACIÓN R&E S.A.C.  
 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  
 S.A. JULIO C. VILLALBA MOSQUERA  
 GERENTE GENERAL LEGAL  
 REPRESENTANTE LEGAL  
  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL  
  
 CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General  
  
 CIVIL GLOBAL SUCURSAL PERU  
 FELIPE CARRASCO SAHERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



carácter indefinido, comunicándose entre ellas la identidad de los designados con anterioridad a la primera reunión de dicho Comité, o, en todo caso, en éste mismo, momento en el cual los concurrentes acreditarán a los demás su nombramiento; no obstante, podrán dichos miembros, o sus suplentes, ser sustituidos por sus respectivas empresas, bastando para ello la previa comunicación a las otras de la identidad del sustituido y de su sustituto antes del inicio de la reunión del Comité en que se haga efectivo el cambio.

Será misión del Comité de Gerencia, la Alta Dirección, Gestión y Gobierno del CONSORCIO.

Entre sus miembros el Comité designará un Presidente quien será Representante Legal Común del Consorcio, que dirigirá las reuniones del mismo, sin voto dirimente. También designará entre sus miembros un Secretario que levantará las actas de las sesiones que se celebren y que certificará con el visto bueno del Presidente. La designación del miembro del Comité de Gerencia que habrá de realizar las funciones de Presidente y Representante Legal Común del Consorcio estará reservada Al Ing. EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA identificado con DNI N° 32385946.

El Comité de Gerencia se reunirá en la forma periódica que por el mismo se acuerde, al menos una vez cada mes, y en las ocasiones extraordinarias que se consideren necesarias mediante la oportuna convocatoria formulada por el Representante Legal Común, mediante comunicación escrita, o fax nominal, o correo electrónico, a cada uno de los miembros del Comité con 5 (cinco) días hábiles de antelación al mismo, acompañando la Orden del Día correspondiente.

Asimismo, se reunirá a petición justificada, formulada por escrito por cualquiera de las Empresas miembro o por el Representante Legal Común, con 15 días calendarios de antelación, incluyendo en la petición el Orden del Día propuesto, en tal supuesto, recibida la solicitud, el Representante Legal Común procederá a la inmediata convocatoria del Comité, previa comunicación a las Empresas miembro del CONSORCIO (con indicación del Orden del Día) con una antelación mínima de 5 días calendarios a la fecha prevista para la celebración.

El Comité de Gerencia se entenderá válidamente constituido con el quórum de los consorciados asistentes llegue equivaie al 50% (cincuenta


CORPORACION RIS S.A.C.  
AGENCIAMIENTO DE CONSTRUCCION  
ING. JULIO C. VILLAFRANCA MOSQUERA  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION R.F.E.S.A.C.  
CH. VIN DE HUANTAR EL R.L.  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General


CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
FELIPE CARRASCO SAHERIVANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



por ciento) mas 1, en la primera convocatoria y, de ser el caso, con los asistentes que concurren en segunda convocatoria. Ante falta de quórum en la primera convocatoria, el cual debe constar en acta; la segunda convocatoria se llevara a cabo al tercer día útil de la primera convocatoria. Toda convocatoria deberá ser por escrito que permita constar su recepción por las Empresas miembro del Consorcio, se entenderán convocados a los representantes cuando se encuentre presente en la sesión del mismo, (titular o suplente) de las empresas consorciadas, en numero suficiente al quórum señalado, excluido el Representante Legal, salvo que este fuese representante en el Comité de alguna de dichas empresas.


  
 CORPORACIÓN ARIS S.A.C.  
 ADMINISTRACION  
 A.G. JULIO C. VILAFRANCA MOSQUERA  
 GERENTE GENERAL  
 REPRESENTANTE LEGAL

El Comité quedará también válidamente constituido, sin necesidad de convocatoria previa, siempre que estén presentes la totalidad de sus miembros y acepten por unanimidad la celebración de la sesión.

  
 CORPORACIÓN R.E.S.A.C.  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

De cada reunión o sesión del Comité de Gerencia quedara registrada en Acta, la cual deberá ser aprobada al término de las misma, o bien en la reunión siguiente, debiendo ser firmada por los miembros del Comité participantes.


Los miembros del Comité de Gerencia no percibirán retribución, sueldo, emolumento, dieta u otro concepto de índole similar, análoga o equivalente a cargo del **CONSORCIO**.

  
 CH'VIN DE TANTAR E.I.R.L.  
 ANTONIO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General

#### SEXTA.- FACULTADES DEL COMITÉ DE GERENCIA


El Comité de Gerencia tendrá todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto del **CONSORCIO**, enumerándose seguidamente, sin carácter limitativo, las siguientes:

- a) Señalar las políticas generales de actuación del **CONSORCIO** en relación con la obra que constituye su objeto, las relaciones con la Administración adjudicataria y los usuarios, y la ejecución de las obras precisas para la construcción y puesta en funcionamiento de la obra.
- b) Aprobar cualquier modificación de los presentes Estatutos para su presentación a las Empresas consorciadas en orden a la formalización de la modificación.


  
 CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
 FELIPE CARRASCOZA HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL


- c) Aclarar las dudas de interpretación de cualquier disposición de estos Estatutos que sea obligatoria para las Empresas miembro.
- d) Proponer los apoderamientos que se consideren necesarios, con indicación de las facultades que convengan.
- e) Aprobar el nombramiento y el cese de todo el personal técnico y administrativo que se juzgue necesario para el cumplimiento del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula siguiente.
- f) Autorizar la sustitución de las oficinas y las condiciones de su utilización, así como la clase y cantidad del espacio, del material y del personal situado en aquellas, en concordancia con las condiciones que imponga el propietario.
- g) Aprobar todos los informes, de la obra objeto del CONSORCIO.
- h) Aprobar y sancionar los programas de ejecución de la obra.
- i) Proponer las modificaciones del contrato de consorcio y sus ampliaciones y reformados, para que el contrato de consorcio sea modificado o ampliado por unanimidad de sus integrantes. Así también aprobar los presupuestos y sus modificatorias de cualquier contrato o subcontrato con proveedores relacionados con la ejecución de la obra.
- j) Evaluar y aprobar la gestión del Representante Legal Común, el balance y cuenta de resultados del CONSORCIO, así mismo aprobar la propuesta de distribución de utilidades.
- k) aprobar los presupuestos de todos los subcontratos, contratos de suministro y prestación de servicios y análogos relacionados con la ejecución de la obra
- l) Aprobar las compras de maquinaria.
- m) Aprobar el reembolso de los gastos realizados por cualquiera de las Empresas miembro, cuando la suma supere los S/5,000.00 cinco mil nuevos soles.
- n) Aprobar los posibles repartos de excedentes de fondos entre las Empresas consorciadas.



  
 CONSORCIO SAN JOSE S.A.C.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ING. JULIO C. VILLAFRAÑA MOSQUERA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CORPORACIÓN R&E S.A.C.  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL


  
 CH'VIN DE HUANAYE I.R.L.  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General

  
 CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
 FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL







- o) Establecer un programa de seguros en caso de ser necesario en virtud del contrato de obra.
- p) Estudiar, para su aprobación o no, la formalización de créditos o préstamos con entidades bancarias para atender las necesidades de financiación del **CONSORCIO** así como las garantías a prestar respecto de los mismos.
- q) Aprobar el plan de operaciones y el presupuesto de inversiones y costes de ejecución del contrato, así como las previsiones y peticiones de fondos y garantías.
- r) Aprobar los costes suplidos que pagará el **CONSORCIO** a las Empresas miembro por la prestación del personal, prestación de servicios, ejecución de trabajos, suministros y/o arrendamiento de maquinaria y equipos. (Son los costes que soporta el consorcio por el uso de personas u otras prestaciones de las empresas que lo conforman).
- s) Resolver los litigios que se puedan producir en el control y aceptación de las facturas de suplidos.
- t) Acordar la disolución y liquidación del **CONSORCIO**, aprobando el Balance Final del mismo.
- u) Cualquier otra que le sea atribuida conforme a los presentes Estatutos.

  
 CORPORACIÓN PERU S.A.C.  
 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  
 INGENIERO  
 ING. JUJO C. ALVARADO  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CORPORACIÓN PERU S.A.C.  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

  
 CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General

  
 CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
 FELIPE CARRASCO S. HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

#### SÉPTIMA. - FORMA DE ADOPTAR ACUERDOS

Los acuerdos se tomarán por unanimidad.

De no lograrse la unanimidad se volverá a reunir el Comité dentro de las cuarentiocho (48) horas siguientes, y si continúa sin lograrse la unanimidad, los acuerdos se tomaran por mayoría simple en la misma sesión.

Finalmente con el objeto de llevar adelante la ejecución del **CONSORCIO** y la buena relación que debe existir entre los **CONSORCIADOS**, las empresas miembro acuerdan que en el caso de las operaciones bancarias y financieras, estas serán ejercidas por un representante designado por **CHAVIN DE HUANTAR EIRL** y otro representante de **CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU**, del tal manera que sea conjunta la delegación de

poderes para este fin, debiendo ser uno de ellos el Representante Legal Común.

### OCTAVA.- REPRESENTANTE LEGAL COMÚN: DESIGNACIÓN Y FACULTADES

Los CONSORCIADOS designan como Representante Legal Común del CONSORCIO al Ing. EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA, identificado con DNI. N° 32385946, la cual queda designado y nombrado como tal, y es quien convocará a las juntas descritas en las cláusulas siguientes, y gozará de las demás facultades y atribuciones específicas de representación previstas en la presente cláusula, y que se detallan en los siguientes párrafos:

Precisándose que la designación y nombramiento del REPRESENTANTE LEGAL COMÚN del CONSORCIO, se efectúa por todo el plazo de ejecución y entrega de la obra, incluso hasta la liquidación final y entrega de la obra aunque hubiera expirado el plazo o la prórroga del presente contrato, y con la finalidad que pueda finiquitar todo aquello relacionado con la misma, con su avance, ejecución, liquidación y entrega, aunque no se hubiere acordado la prórroga o la renovación del plazo; asimismo hasta la liquidación del presente consorcio.

A su vez los CONSORCIADOS designan como sus representantes, quienes participaran en las sesiones o reuniones del Comité de Gerencia:

- CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU, designa a:

- (a) FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ, identificado con C.E. N° 000996117, domiciliado en calle GRIMALDO DEL SOLAR 219, MIRAFLORES - LIMA - LIMA, y
- (b) JUAN LUIS DIEZ ELORZA, identificado con C.E. N° 001090221, domiciliado en calle GRIMALDO DEL SOLAR 219, MIRAFLORES, LIMA.

- CHAVIN DE HUANTAR EIRL designa a:

- (a) EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA, identificado con DNI N° 32385946, domiciliado en Av. Próceres de la independencia N° 3634 San Juan de Lurigancho Lima - Lima;
- (b) LUDWIG BENITO RETAMOZO MARTINEZ, identificado con

CORPORACIÓN CIVIS S.A.C.  
CORPORACIÓN PERUANA DE CONSTRUCCIÓN  
ING. JULIO G. VILLAGRANCA MOSQUERA  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACIÓN CIVIS S.A.C.  
GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

CHAVIN DE HUANTAR EIRL  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU  
FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

DNI N° 41297246, domiciliado en Pasaje José Miguel Ríos 127, distrito de la Victoria, Lima - Lima.

(c) RICHARD JAVIER TAPIA ROSAZZA, identificado DNI N° 32404167, con domicilio en Calle San Agustín 748 - Cercado - Lima.

El Representante Legal Común del CONSORCIO, ejercerá las siguientes facultades:

**A) OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES:**

1. Representar al CONSORCIO ante todo tipo de instituciones publicas o privadas, funcionarios y autoridades judiciales, civiles, municipales, ministerio de trabajo, fiscales, administrativas, constitucionales, tributarias y aduaneras (SUNAT), registros públicos (SUANRP), INDECOPI, Cámaras de comercio, Defensoría del Pueblo, comerciales, de trabajo, judiciales, policiales y militares, con las facultades de presentar toda clase de recursos y reclamaciones, así como desistirse de ellos, junto con las facultades generales de mandato, representación y especiales contenidas en los Artículos 74, 75 y 77 del Código Procesal Civil. Tramitar la obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC) ante la autoridad respectiva, así como la baja del mismo cuando así corresponda.

2. Representar al CONSORCIO con amplias facultades para:

2.1. Facultades de Representación en Procesos Judiciales y Procedimientos Administrativos:

- 2.1.1. Representar al CONSORCIO en toda clase de procesos y procedimientos en los que sea parte la sociedad, incluyendo pero sin limitarse a los judiciales, prejudiciales, policiales, fiscales, arbitrales y administrativos, y ante cualquier autoridad pública o privada, en cualquier materia sea civil, comercial, laboral, tributaria, aduanera, penal, constitucional, contencioso administrativa u otra, con las facultades generales y las facultades especiales contenidas en los Artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil requeridos para disponer de derechos sustantivos y en consecuencia interponer, modificar y/o ampliar demandas, denuncias,

CONSORCIO DE LIMA

CONDOMINIO ARIS S.A.C.  
ING. J. J. VILAFRANCA  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

ING. J. J. VILAFRANCA  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACIÓN R & S S.A.C.

ING. GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

CH'VIN DE HUANTABAMBAS E.I.R.L.

ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ

FELIPE CARRASCO SHERMANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



CONDOMINIO EDIFICIO ARIS S.A.C.  
CONDOMINIO CONSTRUCCION  
R.K. JULIO C. VILLAFRANCA MOSQUERA  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION R&E S.A.C.  
GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

CH. VINCENTE MARTIN E.I.R.L.  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCCURSAL PERU  
FELIPE CARRASCO SHERVANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

recursos, reclamaciones y quejas, prestar instructiva, preventiva, testimoniales; presentar reconvencciones y contradicciones; deducir excepciones y/o defensas previas y contestarlas; contestar demandas, denuncias y reconvencciones; allanarse y/o reconocer la pretensión; dar reconocimiento personal; dar testimonio como parte o testigo; exhibir, reconocer y desconocer documentos; ofrecer, actuar y solicitar la actuación de toda clase de medios probatorios, pericias y cotejos así como oponerse, impugnar observar y/o tachar los ofrecidos por la parte contraria, documentos y testigos; interponer toda clase de medios impugnatorios y recursos de reposición, apelación, casación y nulidad en todas las instancias; solicitar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta; solicitar inspecciones judiciales; oponerse a la declaración de parte, a la exhibición, pericias e inspecciones judiciales; asistir e intervenir, como representante legal de la sociedad, en toda clase de audiencias, ya sean conciliatorias o de fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio, de pruebas y/o audiencias únicas, especiales y/o complementarias, inspecciones, diligencias y todo tipo de actos procesales, sean éstos de remate, administración de posesión, lanzamiento, embargos y/o saneamiento procesal; solicitar el desglose y entrega de certificados de depósitos judiciales, efectuar, delegados en virtud de una carta rogatoria encomendando acciones a ser adoptadas fuera de la jurisdicción del proceso; efectuar identificaciones; responder a interrogatorios; solicitar y aplicar toda clase de medidas preventivas y cautelares, inclusive innovativas y de no innovar y cualquier medida anticipada dentro y fuera del proceso, ampliarlas y/o modificarlas y/o sustituirlas y/o desistirse de las mismas; ofrecer y/o otorgar contra cautela (inclusive caución juratoria); nombrar órganos de auxilio judicial; prestar declaración de parte o testimonial. Asimismo, estará facultado para intervenir en procesos cualesquiera que afecten los intereses del consorcio, sea como intervención coadyuvante, litisconsorcial, excluyente principal, excluyente de propiedad de derecho preferente, o como sucesor

PIO DE LIMA

JORP... S.A.C.  
INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
ING. JULIO...  
VILLA PANCA MOSQUERA  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION RBE S.A.C.  
GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

CH... DE HUANTAR...  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU  
FELIPE CARRASCO SAHERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

procesal; solicitar la intervenci3n de un tercero para asegurar una pretensi3n futura o a manera de denuncia civil o de llamamiento posesorio.


Adicionalmente podr3, solicitar la acumulaci3n y desacumulaci3n de procesos; retirar consignaciones; ejecutar las sentencias y cobrar las costas y costos procesales; conciliar; transigir judicial o extrajudicialmente, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso; hacer abandono o renuncia de la instancia, solicitar la aclaraci3n, correcci3n y/o consulta de las resoluciones judiciales; participar en todo tipo de diligencias y actos de remate y subasta, sean judiciales o extrajudiciales, estando facultados para presentar propuestas y pujas para adjudicarse al interior de los mismos bienes muebles o inmuebles, presentar, depositar, consignar, cobrar y retirar oblajes y las sumas de dinero que correspondan al valor de la adjudicaci3n, as3 como endosar cheques para la adjudicaci3n de los bienes objeto de los mismos, ser adjudicatarios de la buena pro, tomar posesi3n de bienes, suscribir las actas correspondientes y pagar los honorarios del martillero; solicitar la inhibici3n y/o plantear la recusaci3n de jueces, fiscales, vocales y/o magistrados en general; y practicar todos los dem3s actos que fuesen necesarios para la tramitaci3n de los procesos y procedimientos, en general, realizar cualquier gesti3n que sea necesaria para defender los intereses de la sociedad en los mismos.


2.1.2. Participar e intervenir en procesos arbitrales, nacionales; as3 como intervenir en cualquier otro mecanismo alternativo de soluci3n de controversias, tales como conciliaci3n, mediaci3n, transacci3n, entre otros, teniendo para tal efecto las mismas facultades conferidas en el numeral 2.1.1. precedente y quedando facultado adem3s para conciliar judicial y extrajudicialmente, pudiendo disponer de las materias que se traten en las conciliaciones, transigir judicial y extrajudicialmente, presentar solicitudes de conciliaci3n, asistir a las respectivas audiencias y practicar todos los


demás actos que fueran necesarios, adoptar acuerdos conciliatorios; pudiendo asimismo someter a arbitraje, sea de derecho o de conciencia, las controversias en las que pueda verse involucrada la sociedad, suscribiendo el correspondiente convenio arbitral; designar al árbitro o árbitros y/o institución que hará las funciones de tribunal arbitral, presentar el formulario de sumisión correspondiente y/o pactar las reglas a las que se someterá el proceso correspondiente y/o disponer la ampliación del reglamento que tenga establecido la institución organizadora. Asimismo representar al **CONSORCIO** en procesos de conciliación y/o arbitraje, tanto Judicial como Extrajudicial, pudiendo disponer de los derechos que motiven dichos procedimientos y ante otras Entidades del Estado.-


2.2.- Cualquier otra decisión relevante para el funcionamiento del **CONSORCIO**, entendiéndose que lo referido a las cuentas Bancarias y los actos nombrados precedentemente, se trata de situaciones únicas y exclusivamente solidarias; de otro lado las deudas particulares de cada uno de los asociados sean pasadas presentes y futuras no afectan los recursos del **CONSORCIO** destinados a la ejecución de la presente obra existiendo, Intangibilidad, e inembargabilidad, ante cualquier circunstancia que no sea de caso exclusivo de LA OBRA.

3. Para tal Efecto el Representante Legal, podrá EJERCER, DELEGAR, REVOCAR, RENOVAR, SUSTITUIR Y REASUMIR TOTAL O PARCIALMENTE LAS FACULTADES Y PODERES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CLAÚSULA.
4. Dirigir las operaciones del **CONSORCIO**, siendo necesario, aprobación previa de los presupuestos del Comité de Gerencia, para celebrar contratos o subcontratos y actos comerciales propios del **CONSORCIO**.
5. Usar el sello del **CONSORCIO**, expedir la correspondencia, facsímil, correo electrónico, etc. Así como cuidar que la contabilidad este al día, haciendo las inspecciones del caso.

  
**CONSORCIO SAN JOSE S.A.**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ING. JULIO C. VILAFRAÑA MOSQUERA  
 GERENTE GENERAL  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**CORPORACIÓN INVERSA S.A.C.**  
 GERENTE GENERAL  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

  
**CAJ. VIN DE HUANTAYAN**  
 Gerente General  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General

  
**CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 FELIPE CARRASCOZA HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

COMITÉ DE LÍNEA

6. Dar cuenta al **CONSORCIO** de la marcha y estado de los negocios, así como de la recaudación, inversión, existencia de fondos que tenga a bien pedirle los **CONSORCIADOS**.
7. Presentar a tiempo oportuno a los **CONSORCIADOS** el estado financiero general y distribución de utilidades al momento de la liquidación y disolución definitiva del **CONSORCIO**.
8. Firmar los correspondientes contratos con la Entidad contratante, derivados del proceso de selección que motiva el presente contrato de consorcio.

CORPORACION ARIS S.A.C.  
AGENCIA DE ASISTENCIA Y ADMINISTRACION  
G. JULIO C. VILLAFRANCA MOSQUERA  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

Los **CONSORCIADOS** acuerdan que las facultades otorgadas al Representante Legal del **CONSORCIO**, podrán ser revocadas en el momento que los **CONSORCIADOS** lo decidan por acuerdo unánime.

Las facultades señaladas del Representante Legal señaladas en la presente clausula, tienen el carácter enumerativo mas no limitativo por cuanto en general el Representante Legal se encuentra facultado para celebrar cuanto acto sea necesario a efectos de ejecutar las acciones que disponga el Comité de Gerencia del presente Consorcio, o cuando así lo exijan la naturaleza de las circunstancias.

**NOVENA.- OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS:**

El manejo económico-financiero del **CONSORCIO** así como la gestión de los pagos y uso de cuentas bancarias será con firmas mancomunadas entre el Sr. **FELIPE CARRASCOSA HERNÁNDEZ**, identificado con C.E. N° 000996117, por **CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ**, y el Sr. **EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA**, identificado con D.N.I. 32385946 de acuerdo con los poderes y atribuciones que se señalan a continuación:

1. Ordenar y efectuar depósitos a la vista, a plazos, de ahorros o custodia, tanto en moneda nacional como extranjera.
2. Abrir y cerrar cuentas corrientes, ordenar depósitos, solicitar avances, trasferencias, girar con sobregiro en cuentas corrientes bancarias, así como otorgar cancelaciones y recibos en caso de sobregirarse en cuentas corrientes.
3. Retirar, vender, comprar valores.
4. Abrir, depositar, retirar y cancelar cuentas de ahorros.

CORPORACION R&E S.A.C.  
GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

CH. JIN DE HUANTAR E.I.R.L.  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU  
FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL





18. Otorgar cancelaciones y recibos, cobrar y prestar otorgando y firmando los contratos privados, minutas y escrituras públicas que correspondan.

19. Indistintamente cualquiera de los nombrados podrá Solicitar información respecto del estado y los movimientos de las cuentas que mantenga el **CONSORCIO** con las entidades bancarias que trabaje.

Los **CONSORCIADOS** acuerdan, no obstante lo anterior, que las facultades establecidas en los numerales 2, 4, 5, 6, 10, 14, 16, y 18, de esta cláusula Novena, **PODRAN SER EJERCIDAS INDIVIDUALMENTE** por el Representante Legal Común hasta por la suma de **S/. 5,000.00 (cinco mil nuevos soles)**.

Los **CONSORCIADOS** asimismo acuerdan, que la facultad establecida en numeral 19 de esta clausula Novena podrá ser ejercido individualmente por el Sr. **FELIPE CARRASCOSA HERNÁNDEZ** o el Sr. **EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA**.

**DÉCIMA.-RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE RESPONSABILIDAD**

Cada uno de los **CONSORCIADOS** se obliga a aportar al negocio todos los recursos y garantías necesarias para el desarrollo de la ejecución de la obra objeto del **CONTRATO** y del **CONSORCIO** de acuerdo a su porcentaje de participación establecido en la Cláusula Tercera, asumiendo responsabilidades en la misma proporción, excepto en lo recogido en la Cláusula Décimo Cuarta.

Se fija por las partes un fondo operativo de **TREINTA MIL NUEVOS SOLES**, que será aportado por las empresas **CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ (40%)**, y **CHAVIN DE HUANTAR EIRL (60%)** Para hacer frente a los gastos iniciales del **CONSORCIO** en la ejecución de la obra, cada una de las empresas se obliga a ingresar en la cuenta de ahorro que a tal efecto se apertura y en el plazo de quince días contados desde el acuerdo del Comité de Gerencia en que así se le exija, su parte correspondiente en el fondo operativo fijado en el presente artículo.

El **CONSORCIO** se regirá por un sistema de ingresos y gastos.

En todo caso, la política del **CONSORCIO** deberá atender a la autofinanciación a través de los medios habituales (fondo operativo,

**CORPORACIÓN R & E S.A.**  
ING. JULIO C. VILLATRANCA MOSQUERA  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

**CHAVIN DE HUANTAR EIRL**  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

**CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ**  
FELIPE CARRASCOSA HERNÁNDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

LIMA

cobro de los trabajos realizados y de los servicios prestados, y de cualquier otro del CONSORCIO sea cual sea su origen).

En el exclusivo supuesto de no ser suficientes los recursos obtenidos según el párrafo precedente, el Comité de Gerencia solicitará el apoyo financiero de las empresas asociadas, siempre de acuerdo a su porcentaje de participación, en los términos previstos en la presente disposición; igual régimen se aplicará con relación a las cartas fianza y las garantías, sea cual sea su naturaleza y fin, que deba aportar el CONSORCIO.

Los pagos, transferencias e ingresos del CONSORCIO se efectuarán a nombre de la misma, en las cuentas aperturadas en Bancos escogidos de común acuerdo.

Los fondos podrán ser retirados de las cuentas del CONSORCIO por cheques, órdenes o transferencias, mediante las firmas conjuntas de las personas autorizadas.

Las remesas de fondos que deban efectuar las Empresas miembro, se harán de forma que se ingresen en las cuentas del CONSORCIO dentro del plazo y por las cantidades solicitadas, en cuyo caso, dichas remesas no devengarán interés alguno. Si alguna de las Empresas no efectuase la aportación (de fondos o garantías a que viniera obligada, incurrirá en morosidad y sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 14 de este contrato, deberá abonar mensualmente a aquella de las otras empresas asociadas, que lo hubiera aportado por la morosa y durante el período de demora, un interés anual sobre las cantidades no ingresadas, o sobre el importe de la garantía no aportada, del 20% (veinte por ciento) la tasa de interés preferencial que esté vigente según las tablas máximas para este tipo de interés que fija el Banco Central de Reserva del Perú, incrementado en diez puntos porcentuales, eligiendo la cantidad mayor que resulte de la aplicación de uno u otro tipo de interés.

El Comité de Gerencia, aprobará, a propuesta del Representante Legal Común, una previsión financiera mensual que cubra un período de 4 (cuatro) meses. Dentro de esta previsión financiera se incluirá la aprobación de las peticiones de fondos a ingresar en las cuentas del CONSORCIO por parte de los consorciados. Estas peticiones serán hechas a las Empresas miembro por el Presidente del Comité de

GRACIA CRIS S.A.C.  
INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
ING. JOSE VILAFRANCA MOSQUERA  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION R&E S.  
ING. GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

CITIA IN DE HUANCABAMBA S.A.  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU  
FELIPE CARRASCO HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

Gerencia, con un preaviso mínimo de quince días calendarios. Salvo acuerdo en contrario entre las Empresas miembro, los ingresos de fondos, así como los reembolsos de éstos o de excedentes de tesorería, se harán siempre simultáneamente por las partes en la proporción fijada en la Cláusula Tercera de este contrato.

Para el cálculo de los ingresos que deban efectuar las respectivas empresas, se descontarán las cantidades de que sean acreedores, por facturas de servicios conformadas y vencidas, extinguiendo por compensación su crédito.

Los pagos de las facturas de servicios, una vez conformadas, se efectuarán dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de las mismas, salvo acuerdo distinto en el contrato o subcontrato respectivo. En caso de que la factura contuviera partidas erróneas o improcedentes se abonarán solamente las que sean correctas incorporándose, en su caso, dicha corrección, una vez realizada, a otra factura mensual. La conformidad tendrá lugar dentro de los 15 días siguientes a la fecha de recepción. En el supuesto de que el comité de Gerencia no aprobara por unanimidad los costes suplidos, se tomaran los acuerdos por mayoría simple. De no estar conforme el afectado podrá acudir al arbitraje, y si el laudo arbitral determinase ser conformes los suplidos, éstos devengarán el interés señalado en el párrafo tercero de este artículo, desde los quince días siguientes a la presentación de la factura.

En caso de que durante el período de duración del **CONSORCIO** existan disponibilidades en su tesorería, una vez abonadas a las Empresas miembro las cantidades que se les adeuden por el **CONSORCIO** por servicios, personal, suministros, alquileres, etc., estas disponibilidades deberán ser empleadas para el reembolso de los pagos y adelantos efectuados por las Empresas.

Después del reembolso total de esas sumas, y en caso de excedente de disponibilidad sobre las necesidades de tesorería de las obras, el **CONSORCIO**, mediante acuerdo unánime del Comité de Gerencia, podrá hacer las inversiones financieras que considere oportunas o proceder a su abono a los miembros del **CONSORCIO** como anticipo a cuenta. Las inversiones serán gestionadas por el propio Consorcio con el asesoramiento de las Empresas miembro.

COMPAÑIA ARIS S.A.C.  
INSTRUCION  
ING. JULIO C. VILLAFRANCA MOSQUERA  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION R & E S.A.  
GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

HUANTAR E.I.R.L.  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

SUCURSAL PERU  
FELIPE CARRASCO SHERMANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

Las Empresas miembro no emplearán dinero, propiedades o créditos del **CONSORCIO** con fines distintos al común. Asimismo, las partes no extenderán, aceptarán, endosarán o negociarán letras de cambio, pagarés, cartas-órdenes, cheques u otros efectos de giro y de comercio en nombre del Consorcio o los intereses relacionados con la misma para aliviar las cargas particulares de las Empresas que la integran.

### DÉCIMO PRIMERA.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La ejecución de las obras se sujetará a las siguientes reglas:

#### 11.1.- APORTACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.-

La maquinaria o equipo necesario para la ejecución de la obra, será fijado por el Comité de Gerencia. Las Empresas consorciadas podrán aportar su propia maquinaria en régimen de alquiler, o el **CONSORCIO** adquirirá o arrendará a terceros la que estime precisa.

En el primer caso -*aportación en alquiler por las Empresas consorciadas*- se procurará en la medida de lo posible, que las aportaciones de las Empresas sean proporcionales al porcentaje de participación, salvo que existan circunstancias especiales apreciadas por el Comité de Gerencia.

Además, en estos supuestos de aportación de la maquinaria por las Empresas miembro, será preceptivo:

- a) Inventariar la maquinaria aportada, indicando su precio con expresión de la Empresas propietaria de la máquina.
- b) Fijar el alquiler mensual para cada máquina, según los precios de mercado, que para tal efecto, apruebe el Comité de Gerencia y que se actualizarán el mes de Enero de cada año por acuerdo del Comité de Gerencia.
- c) Facturar dicho alquiler por todo el tiempo que medie desde el día que, previa petición, se produzca la llegada de la máquina a la obra hasta aquél en que la misma quede a disposición del parque originario. En caso de averías con duración igual o superior a 2 (DOS) días, el **CONSORCIO** no devengará el alquiler de los días que dure la avería.

U DE LIMA

CORPORACION ARI S.A.C.  
ING. JULIO C. LLAYFRANCA MOSQUERA  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION RAE S.A.C.  
ING. GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

CH. JIN DE I NTAR E.I.R.L.  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
FELIPE CARRASCOA HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

- d) La mano de obra de los maquinistas, gastos de mantenimiento, pequeñas reparaciones, piezas de desgaste y las averías derivadas de una mala utilización de la maquinaria, serán a cargo del **CONSORCIO**. El transporte de la maquinaria será por cuenta del **CONSORCIO**.

Las Empresas que aporten en propiedad máquinas al **CONSORCIO** asesorarán a éste acerca de los repuestos que deban mantener para el debido funcionamiento de las mismas y podrán aportar directamente, a precios no superiores a los de mercado, aquellos repuestos que no sean con cargo al alquiler. Las empresas se harán cargo al final del alquiler, a los precios de entrada en almacén, de aquellos repuestos que previamente hubiesen enviado o que se hubiesen comprado por parte del **CONSORCIO** para las máquinas de su propiedad.

El **CONSORCIO** se compromete a conservar la maquinaria en buen estado, durante el período de su utilización en obra.

Al término de las obras, la maquinaria, equipos, material, etc. propiedad del **CONSORCIO**, serán repartidos entre las empresas signatarias, de común acuerdo y a precios reales y conforme a la Cláusula Décima Octava.

**11.2- EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.-**

Las prestaciones objeto del **CONTRATO** serán ejecutadas por el **CONSORCIO** en alguna de las siguientes modalidades:

- a) Directamente por el **CONSORCIO**, con personal y medios propios de las Empresas o alquilados, y con el coste que resulte de su ejecución.
- b) Mediante distribución de prestaciones para ser ejecutadas por las Empresas que forman el **CONSORCIO** actuando individualmente con sus medios. En este caso, la Empresa que realice las distintas prestaciones objeto del **CONTRATO** deberá ejecutarlas a un precio fijo unitario que será acordado entre la Empresa ejecutante y el Comité de Gerencia.

Si más de una Empresa mostrara interés en la ejecución de alguna prestación, se adjudicará a la oferta más baja que se realice por las mismas. Estas ofertas se presentarán ante el Comité de Gerencia en sobre cerrado, en lugar y fecha que se indique previamente. La apertura de sobre se realizara en el mismo acto de la presentación y se procederá inmediatamente a su adjudicación por el Comité. En todo caso se

CORPORACION INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
 GORRACAMON RIVERA S.A.C.  
 INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
 G. JULIO E. VILLAFRANCA MOSQUERA  
 GERENTE GENERAL  
 REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

CHAVI HUANTAR E.I.R.L.  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General

CHAVIS GLOBAL SUCURSAL PERU  
 FELIPE CARRASCO SAHERMANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



procurará en la medida de lo posible, que las contrataciones de las Empresas sean proporcionales al porcentaje de participación, salvo que existan circunstancias especiales apreciadas por el Comité de Gerencia.

En cualquier caso, los contratos adjudicados a Empresas consorciadas se regirán por el contrato que sea aprobado previamente a la adjudicación por el Comité de Gerencia.

No podrá realizarse, bajo esta modalidad, prestación alguna que no le haya sido fijado previamente el precio unitario de ejecución. Salvo que fueran sumas menores a diez mil nuevos soles.

c) Mediante cesión de prestaciones objeto del **CONSORCIO**, subcontrato o destajo con terceros, a precios unitarios de ejecución con contrato o pedido formal del **CONSORCIO** al subcontratista o destajista.

La distribución de las prestaciones objeto del **CONSORCIO** a ejecutar, según cada modalidad, los plazos y períodos de ejecución, serán fijados por el Comité de Gerencia.

Las Empresas que forman el **CONSORCIO** tendrán derecho a tanteo frente a terceros, para la ejecución de las prestaciones objeto del **CONSORCIO** que se pretenden destajar o subcontratar, en igualdad de condiciones, técnicas, económicas y financieras.

### 11.3.- PROCEDIMIENTO DE COMPRAS.-

La determinación del procedimiento de compras será decidida por el Comité de Gerencia en función de las propuestas de cada una de las Empresas consorciadas, recogándose por escrito las determinaciones del sistema por el que se opte, en todo caso el procedimiento por el que se opte será de obligatorio cumplimiento para proceder a la firma de todas las facturas.

### DÉCIMO SEGUNDA.- PERSONAL Y OTROS SERVICIOS

El personal del **CONSORCIO** estará constituido por el procedente de las Empresas consorciadas de la misma, así como el contratado directamente por el **CONSORCIO**.

El Comité de Gerencia decidirá sobre la imputación de los gastos que se originen para el **CONSORCIO** por el traslado y estancia del personal de las Empresas miembro, siendo de cuenta de las mismas los devengos por

ING. JULIO C. VILLAFRANCA MOSQUERA  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACIÓN R&E S.A.C.

GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

CH'JIN' CUANTAR E.I.R.L.

ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CIVIL GLOBAL SOCI:IP:SA: PERÚ

FELIPE CARRASCO SAHERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



el personal propio que corresponda, así como los sueldos, jornales, cargas sociales, etc., del mismo personal.

Para el personal prestado al **CONSORCIO**, que pertenezca a la nómina de las Empresas miembro, se establecerá por el Comité de Gerencia una escala que regule los cargos que han de pasar éstas para cada categoría, escala que no se revisará.

En la medida de lo posible, la aportación de personal por las Empresas consorciadas será proporcional a la participación de cada una, salvo que existieran circunstancias especiales apreciadas por el Comité de Gerencia.

Se cargarán al **CONSORCIO** los costes diarios y los viáticos de los miembros del Comité de Gerencia que indispensablemente giren visitas a la obra.

#### DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES FINANCIERAS - BENEFICIOS Y TRAMITACION DE FIANZAS.

Los **CONSORCIADOS** acuerdan que tanto en las utilidades, gastos, costos, como en las pérdidas que arroje o genere el negocio, la participación de los contratantes será en forma siguiente: **CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ** 40.00% (cuarenta por ciento), **CHAVIN DE HUANTAR EIRL** 60.00% (sesenta por ciento).

Las empresas **CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ** y **CHAVIN DE HUANTAR EIRL** otorgarán las garantías y Cartas Fianzas necesarias para la ejecución de la obra en función del porcentaje anteriormente indicado, por lo que es de su responsabilidad las gestiones correspondientes oportunamente, responsabilizándose por la autenticidad de las mismas y de su presentación ante la entidad contratante.

El **CONSORCIO** soportará los gastos y cargas de toda naturaleza ocasionados por la ejecución de los trabajos, incluso los costes de los trabajos previos de elaboración de ofertas, pagos a profesionales y viajes para la presentación de la licitación, así como el coste de los avales provisionales y definitivos, con la sola excepción de los impuestos que graven directa o individualmente a las entidades que la componen.

CARRASCO SANCHEZ S.A.C.  
INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
D. CARLOS SANCHEZ  
GERENTE GENERAL  
D. J. JULIO VILLAFRANCA MOSQUERA  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION R & E S.A.  
GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

CHAVIN DE HUANTAR EIRL  
D. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU  
D. FELIPE CARRASCO SANCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Los beneficios serán determinados provisionalmente en el momento en que el Comité lo acuerde, y sólo serán definitivos cuando se haya procedido a la liquidación total del contrato, y de las obligaciones derivadas del mismo, tanto ante la Entidad concedente como ante terceros; hasta entonces toda cantidad que hubiera sido distribuida será considerada anticipo o entrega a cuenta, quedando la Empresa respectiva obligada a las devoluciones a que hubiere lugar.

CIERRA ACCIONES S.A.C.  
INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
ING. JOSE GERENTE GENERAL  
ING. GEMMA MOSQUERA REPRESENTANTE LEGAL

**DÉCIMO CUARTA.- RÉGIMEN TRIBUTARIO**

Los CONSORCIADOS convienen que, para los efectos tributarios, el CONTRATO deberá tener contabilidad independiente, acordando designar como OPERADOR TRIBUTARIO al propio CONSORCIO SAN JOSE , con RUC pendiente de asignar por la SUNAT tras la presentación del Contrato de Consorcio, en caso de ser adjudicatarios con la Buena Pro, debidamente representado por su Representante Legal el Sr. EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA , para todos los fines que demande la ejecución de LA OBRA contratada, siendo por consiguiente el encargado de llevar la contabilidad y realizar toda la tributación correspondiente de acuerdo a ley. Asimismo, el representante legal tiene la facultad para gestionar y obtener ante la SUNAT el Registro Único de Contribuyente y tramitación de facturas y otros comprobantes autorizados por la SUNAT.

CORPORACION RISE S.A.S.  
GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

**DÉCIMO QUINTA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN / CONCURSO DE ACREEDORES DE ALGUNA EMPRESA MIEMBRO DEL CONSORCIO.-**

**1.-Causas de extinción:**

El CONSORCIO podrá extinguirse por las siguientes causas:

- a).- Por la finalización de la obra para la cual fue constituido.
- b).- Por la resolución del contrato de obra objeto del CONSORCIO, o la imposibilidad física o jurídica de la ejecución de la obra que constituye su objeto.
- c).- Por el mutuo acuerdo de las empresas miembro ó por la no obtención de la buena pro materia de la constitución del consorcio.
- d).- Asimismo y a petición de las demás empresas asociadas podrá extinguirse el CONSORCIO, por el incumplimiento por cualquiera de las empresas miembros del CONSORCIO, de las clausulas previstas en este

DE HUANTAR P.I.R.L.  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
FELIPE CARRASCO SHERMANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL





contrato de consorcio y particularmente, la falta de aportación de dinero, equipos u otros bienes, garantías, o reembolso de anticipos percibidos a que estuviesen obligadas las empresas, cuando siendo requeridas para ello dejaren de hacerlo.

## 2.-Concurso de acreedores:

Si cualquiera de las Empresas miembro que conforman el **CONSORCIO** pretendiese declararse en situación de concurso voluntario, concurso ordinario, preventivo, disolución y liquidación, insolvencia o cualquier forma de cesación de pagos, deberá comunicarlo de forma fehaciente e inmediata a las demás Empresas miembro y al propio **CONSORCIO**, en todo caso, con al menos dos meses de antelación, a la presentación de la solicitud.

En tal caso, la Empresa miembro en la que concurran tales presupuestos se compromete a suscribir con el **CONSORCIO** los contratos y/o documentos que sean pertinentes en orden a:

- a) Preservar la estabilidad y viabilidad del **CONSORCIO**.
- b) Preservar el cumplimiento íntegro del **CONTRATO** con el cliente.
- c) Mantener la responsabilidad mancomunada frente al Cliente.
- d) Mantener los derechos y obligaciones entre las Empresas miembro, así como entre éstas y el propio **CONSORCIO**.
- e) Establecer las garantías o compensaciones de créditos y deudas en favor del **CONSORCIO** como consecuencia de la responsabilidad mancomunada a que se refiere la Cláusula 9 del presente contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el **CONSORCIO** se reserva, en todo caso, la facultad de excluir o separar a la Empresa miembro en la que concurran los presupuestos objetivos del concurso, así como el derecho de suscribir con ésta los contratos y/o documentos a que se refiere el párrafo anterior.

En el caso de que frente a cualquiera de las Empresas miembro que conforman el **CONSORCIO** se presentase por cualquier acreedor o persona legitimada, solicitud de Concurso Necesario, dicha Empresa miembro estará obligada:

INGENIERIA DE CONSTRUCCION  
CORPORACION ARIS S.A.C.  
ING. JULIO GONZALEZ FRANCA MOSQUERA  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION R&E S.A.C.  
GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

INGENIERIA DE CONSTRUCCION  
CORPORACION EARL  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
FELIPE CARRASCO HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

- a) A comunicarlo de forma fehaciente y de forma inmediata a las demás Empresas miembro y al **CONSORCIO**, una vez que tenga conocimiento de ello y, en todo caso, desde que haya sido emplazada para el trámite de audiencia.
- b) A suscribir los contratos y documentos a que se refiere el apartado anterior.


Asimismo, el **CONSORCIO** se reserva la facultad de excluir o separar de la misma a la Empresa miembro afectada por la solicitud de Concurso necesario en los mismos términos dispuestos en los párrafos anteriores.

#### DÉCIMO SEXTA.- EFECTOS DE LA EXTINCIÓN

Cuando el **CONSORCIO** se extinga por las causas indicadas en la letra d) del apartado primero de la Cláusula Décimo quinta, o alguna de las Empresas consorciadas estuviera incurso en dicha causa sin mediar extinción del **CONSORCIO**, la(s) empresa(s) incumplidora(s) perderá(n) el derecho a cualquier posible beneficio, y responderá(n) de la parte proporcional de pérdida que se produjera en el **CONSORCIO**, tanto de la originada hasta el momento en que se produjo el hecho de la exclusión como hasta la total extinción del **CONSORCIO**.

En estos mismos casos, la(s) empresa(s) que hubiera(n) asumido los derechos y obligaciones del **CONSORCIO** hasta el momento de dicha extinción continuará(n) realizando todos los cobros que correspondan al **CONSORCIO** y, solo una vez concluida o resuelta la obra y liquidado el **CONSORCIO**, se abonará a la(s) empresa(s) excluida(s) una cantidad igual a las aportaciones hechas por ésta(s), deducida la parte proporcional de pérdida que le(s) corresponda conforme a lo expuesto más arriba. En el caso de que la pérdida que haya de cargarse a la(s) empresa(s) excluida(s) exceda de su aportación al **CONSORCIO**, la(s) misma(s) deberá(n) abonar en el plazo de 30 días el exceso a la(s) empresa(s) que haya(n) continuado en la ejecución de la obra hasta el final de la misma, que será(n) la(s) única(s) que tendrá(n) derecho a los beneficios, si los hubieren desde el momento en que quede(n) excluida(s) la(s) empresa(s) incumplidora(s).

Asimismo, en tales casos se producirán los siguientes efectos adicionales, de modo automático:



CORPORACIÓN R & S.  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

CHAVIN DE H. TIAR E.I.R.L.  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
 FÉLIXE CARRASCO SHERMANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



a).- La(s) otra(s) empresa(s) podrán excluir a la(s) incursa en causa de extinción de toda participación futura en el **CONSORCIO**, haciéndose cargo de su participación;

b).- Continuar la(s) otra(s) empresa(s) la ejecución de los trabajos sola(s) o con nuevas Empresas a su elección, vinculando sus decisiones a la(s) incumplidora(s);

c).- Devolución inmediata por la(s) incumplidora/as de cualquier fondo por ella(s) retirado del **CONSORCIO** en concepto de anticipo o beneficio provisional;

d).- La Empresa(s) incursa(s) en causa de incumplimiento quedará(n) excluida(s) del Comité de Gerencia, dicho Comité continuará en adelante con los representantes de las empresas que continúen en el consorcio y de ser el caso con de la(s) otra(s) empresa(s) nuevas asociada(s), quedando al tiempo obligada(s) a concurrir al otorgamiento de cuantos documentos públicos o privados resulte menester suscribir para el funcionamiento del **CONSORCIO**, incluido el cese o nombramiento del Representante Legal, aún cuando la toma de decisiones al respecto corresponda en exclusiva a la(s) empresa(s) cumplidora(s);

e).- Los cobros a realizar desde el incumplimiento se realizarán por la(s) empresa(s) no incumplidora(s);

f).- En todo caso la(s) incumplidora(s) seguirá(n) respondiendo solidariamente frente a terceros y a la Propiedad de las obras de todas las obligaciones y responsabilidades derivadas de la ejecución del contrato y de las obras y trabajos de él derivados, y de cualesquiera otras actuaciones del **CONSORCIO**.

Además la(s) empresa(s) en situación de incumplimiento no podrá(n), retirar la maquinaria y elementos que hubiera aportado al común hasta que la(s) otra(s) empresa(s) declare(n) a su discreción no ser ya necesaria su utilización en obra.

No se considerará que incumple la empresa que en el momento de tener que efectuar una aportación, tenga créditos contra el **CONSORCIO** por cuantía superior a la aportación a realizar, y si estos créditos no alcanzaran el total del importe de dicha aportación, se le considera que incumple solamente por la diferencia.

CORPORACION R & E S.A.C.  
ING. JULIO C. VILLAFRANCA MOSQUERA  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL  
GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

CH'VIN HUANTAR P.I.R.L.  
ING. CARLOS TRUJILLO LUNA  
Gerente General  
CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
FELIPE CARRASCO HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



En los demás supuestos de extinción de derechos de un consorciado se procederá en cada caso a la liquidación, una vez cumplidas todas las obligaciones pendientes con terceros o la Propiedad de las obras.

**DECIMO SEPTIMA.- LIQUIDACIÓN DEL CONSORCIO**

La liquidación se llevará a efecto con propuesta del Comité de Gerencia y, si el CONSORCIO se hubiese disuelto por culpa o incumplimiento de una de las Empresas miembro o estando la misma incurrida en causa de incumplimiento conforme a lo previsto en las cláusulas 16 y 17 anteriores, la empresa que hubiese permanecido en la ejecución de la obra, realizará las funciones de liquidación dando en su momento el debido conocimiento a la otra parte para la efectividad de la liquidación.

Corresponde al Comité de Gerencia, durante el período de liquidación las funciones siguientes:

1. Llevar y custodiar los libros y correspondencia del CONSORCIO y velar por la integridad de su patrimonio.
2. Realizar las operaciones comerciales pendientes y las nuevas que sea necesario efectuar para la liquidación del CONSORCIO.
3. Percibir todas las cantidades y créditos pendientes al tiempo de iniciarse la liquidación.
4. Enajenar los bienes adquiridos para el CONSORCIO, de acuerdo con el procedimiento que se establece en el siguiente artículo de estos Estatutos.
5. Pagar a las Empresas miembro del CONSORCIO su cuota de participación en el patrimonio líquido resultante de la liquidación.
6. Ostentar la representación del CONSORCIO para el cumplimiento de las funciones precedentes.

El Comité de Gerencia quedará automáticamente disuelto una vez realizada la liquidación del Consorcio.

**DECIMO OCTAVA.- REPARTO DE BIENES**

Todos los bienes propiedad del CONSORCIO que figuren inventariados en su Activo al finalizar su empleo bien en las obras o bien en la prestación del servicio objeto del contrato serán repartidos entre las Empresas

CCORPORACION ARIS S.A.C.  
INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
ING. JULIO C. VILLAFRANCA MOSQUERA  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION R&E S.A.C.  
GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

CHIM DE I NTAR E.I.R.L  
ING. EMILIANO GONZALEZ LUNA  
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
FELIPE CARRASCOZA HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

miembro o vendidos a terceros, para lo cual se procederá del modo siguiente:

1.-El Presidente comunicará al Comité de Gerencia, y sus miembros a las Empresas respectivas, la relación de los bienes para los que va a finalizar el empleo y que, por lo tanto, ya no serán necesarios para los fines del **CONSORCIO**, y asimismo al valor residual contable por el que figuran en el Balance del **CONSORCIO**. Al recibir cada relación de bienes se convocará una reunión de los representantes que cada Empresa designe, que deberá celebrarse en un plazo no superior a un mes, para tratar y acordar su adjudicación a los socios.

2.-Antes de la reunión, los técnicos de los socios podrán comprobar el estado de los bienes, y la Jefatura de la Obra facilitará todo el historial preciso de su empleo en obra, ya que los bienes se entregarán al adjudicatario en el estado en que se encuentren al finalizar el trabajo en el **CONSORCIO** y sin realizarles reparación o acondicionamiento final alguno.

3.-En la fecha fijada para la reunión del Comité, cada socio entregará ineludiblemente en primer lugar y bajo sobre cerrado, al Secretario nombrado al efecto, un escrito manifestando que desea le sean adjudicados o no los bienes de que se trate, por el valor que especifica. Abiertos los escritos de los socios podrá ocurrir:

- a).-Que haya un solo socio interesado, al cual le será adjudicado el bien por el valor que se ha especificado.
- b).-Que haya más de un socio interesado, en cuyo caso se adjudicará al mejor postor.
- c).-Que no haya ningún socio interesado. En este caso, los bienes serán retenidos por el **CONSORCIO** y se ofrecerán en venta a terceros.

4.-Si transcurridos cuatro meses desde el final de los trabajos del **CONSORCIO** aún quedaran bienes en el mismo que no han sido adjudicados o vendidos, el Presidente formará lotes con estos bienes, con un valor residual similar para cada lote.

Dentro de los dos meses siguientes en una reunión del Comité, se adjudicarán a cada socio por el valor residual y mediante sorteo, lotes de bienes en proporción a su participación en el **CONSORCIO**.



INCORPORACION ARIS S.A.C.  
GERENTE GENERAL  
ING. JULIO C. VILLAFRANCA MOSQUERA  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION R&E S.A.C.

GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

CHAVIN DE HUANTAPE I.R.L.

ING. ENRIQUE TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CIVIC DE AL SUCURSAL PERÚ

FELIPE CARRASCOA HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

5.- A los socios que resulten adjudicatarios de los bienes, y al retirarlos, les será cargado el valor de adjudicación correspondiente contra su cuenta corriente de resultados, suplidos y aportaciones. Como estas cuentas deberán estar en todo momento equilibradas entre los socios, si fuera preciso para mantener el equilibrio, el adjudicatario deberá realizar la aportación que corresponda.

Cada socio deberá retirar del **CONSORCIO** los bienes a él adjudicados en un plazo no superior a un mes a partir de la adjudicación. Sin embargo, si por conveniencia de la Empresa adjudicataria, se prolongara el plazo de permanencia por encima del citado, se le pasará el cargo correspondiente, si procede, por estadía y el **CONSORCIO** no será responsable de su vigilancia.

Los gastos de traslado de los bienes a su nuevo destino serán a cargo de la Empresa adjudicataria si bien el **CONSORCIO** prestará en lo posible, sin cargo, la asistencia precisa para la carga y acondicionamiento necesarios para el transporte.

6.- Con independencia de la aplicación del procedimiento establecido anteriormente a todos los bienes en general, para aquellas piezas únicas y de gran valor que por ser equipos singulares no permitieran la formación de lotes, si no hay socios interesados en su adjudicación, el Comité de Gerencia, antes de su adquisición por el **CONSORCIO**, acordará el procedimiento para su liquidación en cada caso.

**DECIMO NOVENA.- ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN.**

Serán de cargo del **REPRESENTANTE LEGAL**, tras la disolución, y sus costos deberán ser aprobados por el Comité de Gerencia, los gastos que se originen respecto a la ubicación y atención del archivo de la documentación del **CONSORCIO**, una vez disuelto, hasta que, de acuerdo con la normativa legal aplicable al efecto, sea posible su destrucción e incluso antes de la citada disolución, en el caso del traslado a una de las Empresas de la documentación o trabajos pendientes por o con motivo del levantamiento de las instalaciones propias del **CONSORCIO**. Tales servicios pueden comprender el personal más idóneo que les atienda.

**VIGESIMA.- RÉGIMEN LEGAL**

El **CONTRATO** se rige por lo establecido en las cláusulas anteriores y en todo lo no previsto, por el Código Civil.

INGENIERIA  
LUNA

CONSTRUCCIONES ARIS S.A.C.  
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

INGENIERIA R & E S.A.C.  
ING. JULIO C. VILLAFRANCA MOSQUERA  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

HUANTAR B.I.R.L.  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CMS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
FELIPE CARRASCOA HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

Para todos los puntos regulados o no del presente contrato de consorcio y que tenga que ver con su aplicación y ejecución del acto jurídico emanado del consorcio, se aplicara en forma supletoria lo dispuesto por la Ley general de Sociedades en sus normas sobre contratos asociativos y en especial sobre el consorcio, además de las normas generales contractuales del código civil del Perú.

**VIGESIMO PRIMERA.- DOMICILIO DE LAS EMPRESAS DEL CONSORCIO**

Para todos los efectos del presente CONTRATO, las partes fijan sus domicilios en los señalados en la parte introductoria de este documento, lugar donde se dirigirá las comunicaciones o notificaciones, sean judiciales o extrajudiciales a que hubiere lugar.

**VIGESIMO SEGUNDA.- CONVENIO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL Y/O ARBITRAJE**

Cualquier eventual conflicto que sugiera o pudiera surgir como consecuencia de la interpretación y/o ejecución del presente contrato de consorcio, será resuelto mediante Conciliación Extrajudicial de modo optativo, y por Arbitraje, el cual se realizará de conformidad con los reglamentos de conciliación y arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima sometiendo las partes a sus respectivos estatutos para la conformación del tribunal arbitral así como la conducción del proceso que se genere, a costo del interesado.

**VIGESIMO TERCERA.- DE LA SUMISIÓN JUDICIAL.**

Para la solución de alguna controversia que deba discutirse en los tribunales del poder judicial, al margen de lo dispuesto en la anterior clausula, los consorciados se someten expresamente a la competencia de los jueces y tribunales del Perú provincia y departamento de Lima, con renuncia expresa a su propio fuero y domicilio, en caso de ser distintos.

**VIGESIMO CUARTA.- VALIDEZ DEL CONTRATO POR CLAUSULA NULA.**

Si en el presente contrato existe alguna disposición que sea o devenga en inexistente o nula por misterio de la ley, ésta no implicará una afectación de las demás disposiciones.

CORPORACIÓN R&E S.A.  
ING. JULIO C. VILLACABACA MOSQUERA  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

DE HUANTAR BURL  
ING. MILITIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU  
FELIPE CARRASCO SAHERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



**VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.**

El presente contrato únicamente podrá ser modificado parcial o íntegramente a través del concurso de todos los suscribientes. La solicitud de modificación deberá ser comunicada a LOS CONSORCIADOS por escrito dando un plazo no menor de 8 días hábiles, salvo acuerdo unánime que deba obviarse dicho plazo.

**VIGESIMA SEXTA.- DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.**

De producirse incumplimiento en las obligaciones pactadas en el presente contrato, la parte afectada por dicho incumplimiento podrá resolver el presente contrato, sin que la otra parte pueda exigir alguna compensación.

La comunicación sobre la decisión de resolver el contrato, deberá ser realizada vía carta notarial con cinco (5) días antes de que se produzca la resolución de contrato.

En señal de conformidad, las partes suscriben el contrato en Lima, a los Tres días (03) de Diciembre de 2014.

**CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.**  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General



**EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA**  
DNI N° 32385946  
Representante Legal  
**CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.**

**CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ**  
FELIPE CARRASCOSA HERNÁNDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



**FELIPE CARRASCOSA HERNÁNDEZ**  
C.E. 000996117  
Representante Legal  
**CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU**

**CORPORACION ARIS S.A.C.**  
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES  
ING. JULIO C. VILLAFRANCA MOSQUERA  
GERENTE GENERAL



**JULIO CESAR VILLAFRANCA MOSQUERA**  
DNI N° 09753183  
Representante Legal  
**CORPORACION ARIS S.A.C.**

**CORPORACION R&E S.A.C.**  
GUERRERO Y ROXANA  
GERENTE GENERAL



**ROBERTO GUERRERO CALLE**  
DNI N° 09794994  
Representante Legal  
**CORPORACION R&E S.A.C.**

**CERTIFICACIÓN AL DORSO**




CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN AL ANVERSO CORRESPONDEN A DON EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 32385946 QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L. SEGUN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA NUMERO 01545353 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA Y A DON FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ IDENTIFICADO CON CARNE DE EXTRANJERIA NUUMERO 000996117 QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU SEGUN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA NUMERO 13012604 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. DE LO QUE DOY FE. =====  
 SE LEGALIZAN LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO. =====  
 LIMA, 03 DE DICIEMBRE DE 2014. =====



DC

**JORGE F. ZULETA GUIMET**  
**NOTARIO DE LIMA**

CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN AL ANVERSO CORRESPONDEN A DON JULIO CESAR VILAFRANCA MOSQUERA IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 09753183 QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE CORPORACION ARIS S.A.C. SEGUN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA NUMERO 12758699 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA Y A DOÑA ROXANA GUERRERO CALLE IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 09794994 QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE CORPORACION R&E S.A.C. SEGUN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA NUMERO 12052729 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. DE LO QUE DOY FE. =====  
 SE LEGALIZAN LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO. =====  
 LIMA, 04 DE DICIEMBRE DE 2014. =====



DC

**JORGE F. ZULETA GUIMET**  
**NOTARIO DE LIMA**

# Acta de entrega de terreno (Copia)



CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22998



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

## ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

**OBRA** : "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque"

**PROCESO DE SELECCIÓN** : Adjudicación de Menor Cuantía Nº 38-2014-FONDEPES derivada de la Licitación Publica Nº 004-2014-FONDEPES

**UBICACIÓN** : Distrito : San José  
 Provincia : Lambayeque  
 Región : Lambayeque

**CONTRATISTA** : Consorcio San José

**SUPERVISION** : Consorcio San Francisco

**VALOR REFERENCIAL** : S/. 33'504,650.56

**MONTO CONTRATADO** : S/. 32'457,630.22

**PLAZO DE EJECUCION** : 540 días calendario

**MODALIDAD DE EJECUCION** : A PRECIOS UNITARIOS

**RESIDENTE DE OBRA** : Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros

**SUPERVISOR DE OBRA** : Ing. Gonzalo Francisco Caceras Valdivia

**COORDINADOR DE OBRA** : Ing. Gabino Abelardo López Rolando

Siendo la 13:00 horas del día miércoles 14 de enero del 2015, se reunieron en el lugar de la Obra a efectos de realizar la Entrega de Terreno donde se ejecutara la Obra: "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque", en representación del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES: el Coordinador de Obra Ing. Gabino Abelardo López Rolando con CIP Nº 78834; en representación de la Empresa Contratista CONSORCIO SAN JOSE el Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros con CIP Nº 22858; además en calidad de veedores invitados: el Sr. Macario Fiestas Fiestas Alcalde de la Municipalidad Distrital de San José y representantes de la población de San José.

Luego de reconocer el terreno donde se ejecutara la obra, se verifica que existe acceso libre al mismo para la circulación de vehículos y maquinaria del Contratista; el representante de la Empresa Contratista CONSORCIO SAN JOSE recibe el terreno sin observaciones.

En señal de conformidad los presentes suscriben la presente acta en un original y cuatro (04) copias.



**Gabino A. López Rolando**  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 78834

**Ing. Gabino Abelardo López Rolando**  
Coordinador de Obra  
FONDEPES



**CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS**  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

**Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros**  
Residente de Obra  
CONSORCIO SAN JOSE




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE

**Macario Fiestas Fiestas**  
ALCALDE

**Sr. Macario Fiestas Fiestas**  
Alcalde de la Municipalidad Distrital de San José  
VEEDOR INVITADO

# **Constancia de No estar inhabilitado para Contratar con el Estado (Copia)**

  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22088

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717 241



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasOrganismo Supervisor  
de las Contrataciones  
del Estado

Trámite N°. 2014-06129640-LIMA - 19/12/2014 11:23:03

**CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON  
EL ESTADO****N° 066919 - 2014**La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL **certifica** que:**CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L****NO** se encuentra **Inhabilitado** para contratar con el **Estado** al **19/12/2014****La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:****Entidad :** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**Proceso de Selección :** ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA. N° : 38-2014-FONDEPES**Modalidad :** PROCEDIMIENTO CLASICO**Monto :** S/. 32,457,630.22**Items :** 1

Lima a los diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil catorce

**Observaciones :**

NINGUNA

***Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:  
[www.osce.gob.pe](http://www.osce.gob.pe)******La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el  
SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)***



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasOrganismo Supervisor  
de las Contrataciones  
del Estado

Trámite N°. 2014-06126601-LIMA - 18/12/2014 17:28:55

**CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON  
EL ESTADO****N° 066799 - 2014**La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL **certifica** que:**CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU****NO** se encuentra **Inhabilitado** para contratar con el **Estado** al **18/12/2014**

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

**Entidad :** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**Proceso de Selección :** ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA. N° : 38-2014-FONDEPES**Modalidad :** PROCEDIMIENTO CLASICO**Monto :** S/. 32,457,630.22**Items :** 1

Lima a los dieciocho días del mes de Diciembre del dos mil catorce

**Observaciones :**

NINGUNA

***Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:  
[www.osce.gob.pe](http://www.osce.gob.pe)******La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el  
SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)***

00 098



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasOrganismo Supervisor  
de las Contrataciones  
del Estado

Trámite N°. 2014-06129635-LIMA - 19/12/2014 11:21:43

**CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON  
EL ESTADO****N° 066915 - 2014**La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL **certifica** que:**CORPORACION ARIS S.A.C.****NO** se encuentra **Inhabilitado** para contratar con el Estado al **19/12/2014**

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

**Entidad :** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**Proceso de Selección :** ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA. N° : 38-2014-FONDEPES**Modalidad :** PROCEDIMIENTO CLASICO**Monto :** S/. 32,457,630.22**Items :** 1

Lima a los diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil catorce

**Observaciones :**

NINGUNA

**Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:**  
**[www.osce.gob.pe](http://www.osce.gob.pe)****La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el**  
**SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)**





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasOrganismo Supervisor  
de las Contrataciones  
del Estado

Trámite N°. 2014-06129644-LIMA - 19/12/2014 11:24:29

**CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON  
EL ESTADO**

N° 066920 - 2014

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL **certifica** que:**CORPORACION R&E S.A.C.****NO** se encuentra **Inhabilitado** para contratar con el Estado al 19/12/2014

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

**Entidad :** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**Proceso de Selección :** ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA. N° : 38-2014-FONDEPES**Modalidad :** PROCEDIMIENTO CLASICO**Monto :** S/. 32,457,630.22**Items :** 1

Lima a los diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil catorce


**Observaciones :**

NINGUNA

**Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:**  
**[www.osce.gob.pe](http://www.osce.gob.pe)****La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el**  
**SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)**

# **Constancia de Capacidad de libre contratación**

**(Copia)**



CARLOS ENRIQUE QUIROZ CORDEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

00 095



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasOrganismo Supervisor  
de las Contrataciones  
del Estado

Trámite N°. 2014-06129625-LIMA - 19/12/2014 11:18:36

**CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN****N° 012600 - 2014**

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

**CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L, con:**

<b>Registro Nro:</b>	08058	<b>Cap Máx Cont.:</b>	S/. 125,000,000.00
<b>Vigencia:</b>	28/02/2015	<b>Dec. Record Obra N°:</b>	2014-5986356-LIMA (Fecha: 11/12/2014)

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :

**S/. 87,137,000.00**

(OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL Y 00/100Nuevos Soles )

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

<b>Entidad:</b>	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		
<b>Proceso de Selección :</b>	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES		
<b>Modalidad :</b>	PROCEDIMIENTO CLASICO		
<b>Monto :</b>	S/. 32,457,630.22	<b>Participación:</b>	58%
<b>Items :</b>	1		
<b>Obra :</b>	Construccion de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de San Jose, distrito de San Jose, provincia Lambayeque, Region Lamabayeque.		

Lima a los diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil catorce

Observaciones :

NINGUNA

**Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:**  
**[www.osce.gob.pe](http://www.osce.gob.pe)**

**La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el**  
**SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)**



246

00 094



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasOrganismo Supervisor  
de las Contrataciones  
del Estado

Trámite N°. 2014-06126595-LIMA - 18/12/2014 17:25:16

**CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN****N° 012580 - 2014**

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

**CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU, con:**

<b>Registro Nro:</b>	66429	<b>Cap Máx Cont.:</b>	S/. 456,733,000.00
<b>Vigencia:</b>	12/10/2015	<b>Dec. Record Obra N°:</b>	2014-5980148-LIMA (Fecha: 08/12/2014)

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :

**S/. 443,051,000.00**

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL Y 00/100Nuevos Soles )

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

<b>Entidad:</b>	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		
<b>Proceso de Selección :</b>	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES		
<b>Modalidad :</b>	PROCEDIMIENTO CLASICO		
<b>Monto :</b>	S/. 32,457,630.22	<b>Participación:</b>	40%
<b>Items :</b>	1		
<b>Obra :</b>	Ejecucion de la obra: Construccion de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de San Jose, distrito de San Jose, provincia Lambayeque, Region Lamabayeque.		

Lima a los dieciocho días del mes de Diciembre del dos mil catorce

Observaciones :

NINGUNA

**Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:**  
**[www.osce.gob.pe](http://www.osce.gob.pe)**

**La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)**



247



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasOrganismo Supervisor  
de las Contrataciones  
del Estado

Trámite N°. 2014-06129619-LIMA - 19/12/2014 11:17:04

**CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN****N° 012598 - 2014**

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

**CORPORACION ARIS S.A.C., con:**

<b>Registro Nro:</b>	22494	<b>Cap. Máx Cont.:</b>	S/. 2,125,460.00
<b>Vigencia:</b>	09/08/2015	<b>Dec. Record Obra N°:</b>	2014-5986504-LIMA (Fecha: 11/12/2014)

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :

**S/. 997,233.00**

(NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES Y 00/100Nuevos Soles )

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

<b>Entidad:</b>	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		
<b>Proceso de Selección :</b>	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES		
<b>Modalidad :</b>	PROCEDIMIENTO CLASICO		
<b>Monto :</b>	S/. 32,457,630.22	<b>Participación:</b>	1%
<b>Items :</b>	1		
<b>Obra :</b>	Construccion de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de San Jose, distrito de San Jose, provincia Lambayeque, Region Lamabayeque.		

Lima a los diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil catorce

Observaciones :

NINGUNA

**Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:**  
**[www.osce.gob.pe](http://www.osce.gob.pe)**

**La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el**  
**SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)**





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasOrganismo Supervisor  
de las Contrataciones  
del Estado

Trámite N°. 2014-06129631-LIMA - 19/12/2014 11:20:09

## CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN

### N° 012601 - 2014

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

CORPORACION R&amp;E S.A.C., con:

<b>Registro Nro:</b>	15743	<b>Cap Máx Cont.:</b>	S/. 2,771,960.00
<b>Vigencia:</b>	08/09/2015	<b>Dec. Record Obra N°:</b>	2014-5993087-LIMA (Fecha: 15/12/2014)

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :

**S/. 1,518,660.00**

(UN MILLON QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 00/100Nuevos Soles )

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

<b>Entidad:</b>	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		
<b>Proceso de Selección :</b>	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES		
<b>Modalidad :</b>	PROCEDIMIENTO CLASICO		
<b>Monto :</b>	S/. 32,457,630.22	<b>Participación:</b>	1%
<b>Items :</b>	1		
<b>Obra :</b>	Construccion de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de San Jose, distrito de San Jose, provincia Lambayeque, Region Lamabayeque.		

Lima a los diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil catorce

Observaciones :


NINGUNA

**Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:**  
**[www.osce.gob.pe](http://www.osce.gob.pe)**

**La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)**



# Carta fianza de adelanto directo



CARLOS ENRIQUE QUIROZ CORDEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22553



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO.DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE:-

SANTIAGO DE SURCO, 26-09-2018  
CARTA FIANZA N° 0011-0380-9800220828-32  
VENGE EL: 11-02-2019

Señor/es:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración:

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0380-9800220828-32 por S/550,000.00(QUINIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSORCIO SAN JOSE

Vencimiento : 14-10-2018, a horas 12 meridiano

Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 21-06-2017, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de : CONSORCIO SAN JOSE, conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC.

Al respecto, nos es grato comunicarles, que contando con la autorización previa por parte de ustedes, hemos procedido a : PRORROGAR su vencimiento hasta el 11-02-2019, a horas 12 meridiano y a REDUCIR el importe a S/515,000.00(QUINIENTOS QUINCE MIL Y 00/100 SOLES)

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo : el vencimiento y el importe

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. Republica de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Aterramente

BANCO CONTINENTAL  
p.p.

Carla Lozano Torres  
Sub Gerente  
Oficina Banca Empresas Chacarilla

Pamela Aza Santillan  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla


<b>FONDEPES RECEPCIÓN</b>	
Fecha:	9 1 OCT. 2018
Por:	
Hora:	N° Registro:
NO IMPLICA CONFORMIDAD NI ACEPTACION	

S/ 515,000.00\*\*\*\*





# Carta de fiel Cumplimiento (Copia)



CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22038



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO.DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE.-

SANTIAGO DE SURCO, 23-07-2018  
CARTA FIANZA N°: 0011-0962-9800017155-87  
VENCE EL: 07-08-2019

Señor/es:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración :

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0962-9800017155-87 por : S/1,947,458.00 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC.

Vencimiento : 07-08-2018, a horas de 12 meridiano


Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 15-12-2014, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2019, a horas 12 meridiano.

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo : el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
p.p.

  
Katherine Alexandra Cotera Postigo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

  
Daniel Mesia Pinillos  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla



18072310

RUC 20100130204

REFRENDO: 1759818072310CLA0962E/18:56:53  
S/ 1,947,458.00

UA011 - V3 - Junio 2007

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

S/1,947,458.00

BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO.DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE.-

SANTIAGO DE SURCO, 23-07-2018  
CARTA FIANZA N°: 0011-0962-9800023996-86  
VENCE EL: 07-08-2019

Señor/es:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración :

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0962-9800023996-86 por : S/32,647.00 (TREINTA DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC.

Vencimiento : 07-08-2018, a horas de 12 meridiano

Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 09-09-2015, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2019, a horas 12 meridiano.

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo : el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
p.p.

  
Katherine Alexandra Cotera Postigo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

  
Daniel Merla Pinillos  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla



18072401

RUC 20100130204

REFRENDO: 1759818072401CLA0962F/10:27:40  
S/ 32,647.00 254

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

S/ 32,647.00

BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO.DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE.

SANTIAGO DE SURCO, 23-07-2018  
CARTA FIANZA N°: 0011-0380-9800207198-37  
VENGE EL: 07-08-2019

Señor/es:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración:

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0380-9800207198-37 por : S/8,618.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC.

Vencimiento : 07-08-2018, a horas de 12 meridiano


Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 10-12-2016, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2019, a horas 12 meridiano.


Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo : el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
p.p.

  
Katherine Alexandra Coter Postigo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Zinpresas Chacarilla

  
Daniel Masía  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla



18072312

RUC 20100130204

REFRENDO: 1759818072312CLA0380G/19:33:24  
S/ 8,618.00

UA011 - V3 - Junio 2007

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

S/8,618.00



BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO.DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE.-

SANTIAGO DE SURCO, 23-07-2018  
GARTA FIANZA N°: 0011-0380-9800211322-37  
VENCE EL: 07-08-2019

Señor/es:

★ FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración:

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0380-9800211322-37 por : S/57,863.50 (CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 50/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC

Vencimiento : 07-08-2018, a horas de 12 meridiano


Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 25-07-2016, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2019, a horas 12 meridiano.

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo : el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
p.p.

★  
  
Katherine Alexandra Gotera Postigo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

  
Daniel Mesa Pinillos  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla



18072311

RUC 20100130204

REFRENDO: 1759818072311CLA0380F/19:01:19  
S/ 57,863.50

UA011 - V3 - Junio 2007

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

S/57,863.50

LIMA, 31 de Mayo del 2018

Carta Fianza No: 010469195-005 REF.: Carta Fianza No: 010469195-004 del 19/12/2014  
RENOVACION / MODIFICACION Con vencimiento: 15/06/2018


Señores: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES.

Por el presente documento, renovamos la fianza de la referencia con carácter de solidaria, irrevocable, incondicional, indivisible, de realización automática y con renuncia expresa al beneficio de excusión, a favor de ustedes.

Garantizando a: CONSORCIO SAN JOSE INTEGRADO POR: CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L., CORPORACION ARIS S.A.C., CORPORACION R & E S.A.C.

Hasta la suma de: S/ \*\*\*\*\*1.298.305.21 \*UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO Y 21/100 SOLES

En respaldo de: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA No 038-2014-FONDEPES-DETERMINADA DE LA LICITACION PUBLICA No 004-2014-FONDEPES PRIMERA CONVOCATORIA-CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE.



Por solicitud de nuestros garantizados, hemos procedido a: Prorrogar el plazo de vencimiento hasta el 15 de Diciembre de 2018.

Por efecto de este compromiso, el BANCO asume con sus fiados las responsabilidades en que éstos llegaran a incurrir, siempre que el monto de las mismas no exceda por ningún motivo la suma antes mencionada y que estén estrictamente vinculadas al cumplimiento de lo arriba indicado.

Dejamos claramente establecido que la presente CARTA FIANZA no podrá ser usada para operaciones comprendidas en la prohibición indicada en el inciso 5 del Artículo 217º de la ley 26702 "Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros"

Cualquier reclamo en virtud de esta garantía deberá ceñirse a lo estipulado por el Art. 1898 del Código Civil y deberá ser formulado por vía notarial, en el horario de atención al público y en nuestra oficina ubicada en:

JR. CARABAYA 543-547 PISO 6 - LIMA \*\*\*\*\*

Dejamos claramente expuesto que, si fuera el caso, el Banco podrá a su elección acogerse a la facultad concedida por el Art. 1237 del Código Civil.

En caso de ejecutarse la presente CARTA FIANZA, el pago será efectuado mediante cheque de gerencia emitido a la orden del beneficiario que el Banco pondrá a su disposición en domicilio antes indicado, el mismo que se le entregará contra devolución del original de la presente CARTA FIANZA. Queda establecido que de no señalarse el monto ejecutado, se entenderá que el requerimiento es por la suma total a la que asciende la presente garantía. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe, se entenderá como renuncia a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago aún cuando el plazo de vencimiento y/o ejecución de esta fianza no hubiese vencido.

*Roberto Valdizan Garcia*  
ROBERTO VALDIZAN GARCIA  
Asistente Senior  
Procesamiento

FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO  
p. SCOTIABANK PERU

Atentamente,

*Roberto Elgueta Carabajal*  
ROBERTO ELGUESTA CARBAJAL  
Jefe  
Servicios Wholesale Banking

FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO  
p. SCOTIABANK PERU

\* Para información sobre la emisión de esta CARTA FIANZA, puede visitar nuestra página web [www.scotiabank.com.pe](http://www.scotiabank.com.pe) o consultar a través de Banca Telefónica 311-8000 (Lima) y 0-801-1-8000 (Provincias).

# **Póliza de seguro complementario por trabajo de riesgo y salud**



CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22698



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

MP/2018/3595959



**CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO**

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Pensiones No. 7011510200116, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/09/2018 hasta el 30/09/2018, con las coberturas de Invalidez, Sobrevivencia y Sepelio según la ley N° 26790 y normas complementarias.


Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

**ASEGURADO(S)**

- 1 DNI 46549805 ALVAREZ SOTO JORGE WILTON
- 2 DNI 62637707 AREVALO VERGARAY JOSE YOWER
- 3 DNI 46709771 CAMACHO ROJAS CENIN
- 4 DNI 45927192 CASTILLO MIRANDA MARIO ANTONIO
- 5 DNI 42589975 CORONEL RAMIREZ JOSE WILSON
- 6 DNI 41067672 LLONTOP ACOSTA JUAN MANUEL
- 7 DNI 42344204 LOZANO CARRASCO EVER
- 8 DNI 44743366 LOZANO CARRASCO JOSE NEIRO
- 9 DNI 44634718 MEDINA SAAVEDRA JOSE ELMER
- 10 DNI 06241422 MUÑOZ CONDORI LEONIDAS VIDAL
- 11 DNI 48483417 NAVARRO TELLO ROJER JOB
- 12 DNI 73077436 REYES VILCHEZ JHUNIOR GIAMPIERE
- 13 DNI 44214246 RODAS MORI DANNY GABRIEL
- 14 DNI 10515950 ROJAS QUISPE ROMULO
- 15 DNI 10233838 RUBIO FLORES JULIO
- 16 DNI 47509013 RUBIO HUARCAYA JULIO CESAR
- 17 DNI 45406505 SAIRE QUILCA LUIS ANGEL
- 18 DNI 76763583 SANCHEZ GALAN AURORA LISBET
- 19 DNI 45412780 TASILLA CHUGNAS NOIVER

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.


28/08/2018 02:04:02 pm  
SUSAN GONZALES PACHECO

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.





ISAAC RAMIREZ MOLINA  
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO


La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).



CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22036

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.



SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIONES

NÚMERO DE PÓLIZA : 7011510200116

RECIBO : 97689924

CONDICIONES PARTICULARES

**Contratante** : CONSORCIO SAN JOSE  
**RUC** : 20600000439  
**Dirección Principal** : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,  
**Actividad** : 500004 - ACONDICIONAMIEN. DE EDIFICIOS  
**Colectivo Asegurado** : A NIVEL NACIONAL

**Inicio de Vigencia** : 01/02/2018      **Vencimiento** : 01/02/2019  
**Inicio de Vigencia Aplicación** : 01/09/2018      **Vencimiento de Aplicación** : 30/09/2018  
**Forma de Pago** : MENSUAL      **Último día de Pago** : 11/09/2018  
**Moneda** : SOLES  
**Fecha de Emisión** : 28/08/2018

IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
EMPLEADOS ALTO RIESGO	19	46537.92	0.65	302.50

**Prima Nota :** 302.50  
**Der.Emis. :** 9.08  
**Interés :** 0.00  
**IGV :** 56.08  
**Prima Total :** 367.66


El presente documento no constituye un comprobante de pago.

**Instrucciones de pago:**

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

**Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL**

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22003

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717



# MAPFRE

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLFs. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20418896915**  
**COMPROBANTE DE PAGO**  
0050 - 00103805

FECHA EMISION 01/09/2018

CANCELADO 01/09/2018

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

TIPO DOCUMENTO *RUC*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA : 7011510200116

MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2018	30/09/2018		<i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i>	<i>Escardo</i>
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 97689924</i>				
<i>Prima Comercial</i>				
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				<i>311.58</i>
<i>Importe Total</i>				<i>56.08</i>
<i>Son : Trescientos Sesenta Y Siete Y 66/100 Soles</i>				<i>S/ *****367.66</i>

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 12:31:50

ORIGINAL

RS 887- 99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16



# MAPFRE

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLFs. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20418896915**  
**COMPROBANTE DE PAGO**  
0050 - 00103805

FECHA EMISION 01/09/2018

CANCELADO 01/09/2018

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

TIPO DOCUMENTO *RUC*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA : 7011510200116

MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2018	30/09/2018		<i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i>	<i>Escardo</i>
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 97689924</i>				
<i>Prima Comercial</i>				
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				<i>311.58</i>
<i>Importe Total</i>				<i>56.08</i>
<i>Son : Trescientos Sesenta Y Siete Y 66/100 Soles</i>				<i>S/ *****367.66</i>

*[Signature]*  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22000

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 12:31:50


COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGY  
CORONA

262

RS 887- 99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Req. CIP N° 10717

MP/2018/3596453



### CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Pensiones No. 7011510200116, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/09/2018 hasta el 30/09/2018, con las coberturas de Invalidez, Supervivencia y Sepelio según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

#### ASEGURADO(S)

1 DNI	41220259	HUAMAN PORLLES JHONNY ALAN
2 DNI	40159757	LOVON DAVILA ROMER IVAN
3 DNI	32404167	TAPIA ROSAZZA RICHARD JAVIER
4 DNI	41755068	VIDAL NAVARRETE JORGE ANTONIO

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

28/08/2018 03:57:16 pm  
 , CONSORCIO SAN JOSE

ISAAC RAMIREZ MOLINA  
 UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22638

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.



SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIONES

NÚMERO DE PÓLIZA : 7011510200116 RECIBO : 97694000

CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE
RUC : 20600000439
Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,
Actividad : 500004 - ACONDICIONAMEN. DE EDIFICIOS
Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia : 01/02/2018 Vencimiento : 01/02/2019
Inicio de Vigencia Aplicación : 01/09/2018 Vencimiento de Aplicación : 30/09/2018
Forma de Pago : MENSUAL Último día de Pago : 11/09/2018
Moneda : SOLES
Fecha de Emisión : 28/08/2018

IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

Table with 5 columns: Categoría, Nro.Aseg., Monto Base, Tasa, Prima Resultante. Row: EMPLEADOS ALTO RIESGO, 4, 5000.00, 0.65, 32.50

Prima Neta : 32.50
Der.Emis. : 0.98
Interés : 0.00
IGV : 6.03
Prima Total : 39.51

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

Signature of Carlos Enrique Quiroz
CARLOS ENRIQUE QUIROZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 22008

Signature of Isaias Jorge Alva Espinoza
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 10717



# MAPFRE

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20418896915**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00103806

FECHA EMISION 01/09/2018

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

POLIZA : 7011510200116

MONEDA : *Soles*

CANCELADO 01/09/2018

TIPO DOCUMENTO *RUC*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2018	30/09/2018		<i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i>	<i>Escardo</i>
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ct Cancelacion Recibo 97694000</i>				
<i>Prima Comercial</i>				
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				33.48
<i>Importe Total</i>				6.03
<i>Son : Treinta Y Nueve Y 51/100 Soles</i>				S/ *****39.51

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 12:34:51

ORIGINAL

RS 007-99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2°, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4°, ART. 16



# MAPFRE

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20418896915**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00103806

FECHA EMISION 01/09/2018

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

POLIZA : 7011510200116

MONEDA : *Soles*

CANCELADO 01/09/2018

TIPO DOCUMENTO *RUC*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2018	30/09/2018		<i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i>	<i>Escardo</i>
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ct Cancelacion Recibo 97694000</i>				
<i>Prima Comercial</i>				
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				33.48
<i>Importe Total</i>				6.03
<i>Son : Treinta Y Nueve Y 51/100 Soles</i>				S/ *****39.51

*[Signature]*  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22658

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 12:34:51

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGV  
COPIA

RS 007-99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2°, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4°, ART. 16

*[Signature]*  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

**BBVA Continental**

CONSORCIO SAN JOSE

2018/09/01 00:06:04


**Pago de Instituciones****SU OPERACIÓN HA SIDO REALIZADA**


Número de Operación	578949-0
Operación	Pago de Instituciones
Usuario(s) que autoriza(n)	VANESSA ZAMUDIO LOARTE
Número de Cuenta de Cargo	0011-0962-0100002931
Nombre de la Entidad	MAPFRE SOLES
DNI/RUC/C. EXTRANJERIA	20600000439
Nombre	CONSORCIO SAN JOSE
Monto a cargar	407.17 SOLES
Monto Cargado	407.17 SOLES
Fecha / Hora de 1ra Firma	01/09/2018 - 10:10:20

**Detalle de Pagos**


CONCEPTO DE PAGO	Fec.Vcmto	Moneda	Importe
T02RE97689924	2018-09-01	SOLES	367.66
T02RE97694000	2018-09-01	SOLES	39.51

Estimado Cliente, su operación ha sido efectuada. Por favor, tome nota del Número de Operación.

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22658

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

MP/2018/3596494



**CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO**

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Pensiones No. 7011510200116, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/09/2018 hasta el 30/09/2018, con las coberturas de Invalidez, Sobrevivencia y Sepelio según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

**ASEGURADO(S)**  
1 DNI 46858107 TAVARA MENDOZA MIGUEL ESTEBAN

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

28/08/2018 04:05:59 pm  
, CONSORCIO SAN JOSE




ISAAC RAMIREZ MOLINA  
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22038  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.





SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIONES

NÚMERO DE PÓLIZA : 7011510200116

RECIBO : 97694397

CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE  
 RUC : 20600000439  
 Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,  
 Actividad : 500004 - ACONDICIONAMIENTOS DE EDIFICIOS  
 Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia : 01/02/2018      Vencimiento : 01/02/2019  
 Inicio de Vigencia Aplicación : 01/09/2018      Vencimiento de Aplicación : 30/09/2018  
 Forma de Pago : MENSUAL      Último día de Pago : 11/09/2018  
 Moneda : SOLES  
 Fecha de Emisión : 28/08/2018

IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
EMPLEADOS ALTO RIESGO	1	2500.00	0.65	16.25

Prima Nota : 20.00  
 Der.Emis. : 0.60  
 Interés : 0.00  
 IGV : 3.71  
**Prima Total : 24.31**


El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CORDEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIÁS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10747  
**268**



# MAPFRE

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20418896915**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00103799

FECHA EMISION 01/09/2018

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

POLIZA : 7011510200116 MONEDA : *Soles*

CANCELADO 01/09/2018

TIPO DOCUMENTO *RUC*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2018	30/09/2018		<i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i>	<i>Escardo</i>
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 97694397</i>				
<i>Prima Comercial</i>				20.60
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				3.71
<i>Importe Total</i>				S/ *****24.31
<i>Son : Veinticuatro Y 31/100 Soles</i>				

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 12:30:11

ORIGINAL

RS 007- 99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2°, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4°, ART. 16



# MAPFRE

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20418896915**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00103799

FECHA EMISION 01/09/2018

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

POLIZA : 7011510200116 MONEDA : *Soles*

CANCELADO 01/09/2018

TIPO DOCUMENTO *RUC*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2018	30/09/2018		<i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i>	<i>Escardo</i>
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 97694397</i>				
<i>Prima Comercial</i>				20.60
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				3.71
<i>Importe Total</i>				S/ *****24.31
<i>Son : Veinticuatro Y 31/100 Soles</i>				

*[Signature]*  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22698

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 12:30:11


COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGV  
COPIA

269

RS 007- 99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2°, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4°, ART. 16

*[Signature]*  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Req. CIP N° 10717

MP/2018/3596471



### CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Pensiones No. 7011510200116, a nombre de la empresa CONSORCIO SAN JOSE, con vigencia del 01/09/2018 hasta el 30/09/2018, con las coberturas de Invalidez, Supervivencia y Sepelio según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

#### ASEGURADO(S)

1 DNI	08606885	ESPINOZA ESCALANTE EDDY SOLANO
2 DNI	25760759	INCIO CARRILLO JULIO CESAR
3 DNI	07189499	JULIO TAY WO CHONG TANG
4 DNI	10425980	QUIROZ CISNEROS CARLOS ENRIQUE
5 DNI	07277987	RAMIREZ AGUILAR FIDEL JUVENAL
6 DNI	41297246	RETAMOZO MARTINEZ LUDWIG BENITO

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

28/08/2018 04:02:16 pm  
 , CONSORCIO SAN JOSE


ISAAC RAMIREZ MOLINA  
 UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22838

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.



**SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIONES**

NÚMERO DE PÓLIZA : 7011510200116

RECIBO : 97694307

**CONDICIONES PARTICULARES**

**Contratante** : CONSORCIO SAN JOSE  
**RUC** : 20600000439  
**Dirección Principal** : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,  
**Actividad** : 500004 - ACONDICIONAMEN. DE EDIFICIOS  
**Colectivo Asegurado** : CONSORCIO SAN JOSE

<b>Inicio de Vigencia</b> : 01/02/2018	<b>Vencimiento</b> : 01/02/2019
<b>Inicio de Vigencia Aplicación</b> : 01/09/2018	<b>Vencimiento de Aplicación</b> : 30/09/2018
<b>Forma de Pago</b> : MENSUAL	<b>Último día de Pago</b> : 11/09/2018
<b>Moneda</b> : SOLES	
<b>Fecha de Emisión</b> : 28/08/2018	

**IMPORTE DE LA DECLARACIÓN**

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
EMPLEADOS ALTO RIESGO	6	7000.00	0.65	45.50

<b>Prima Neta :</b>	45.50
<b>Der.Emis. :</b>	1.37
<b>Interés :</b>	0.00
<b>IGV :</b>	8.44
<b>Prima Total :</b>	55.31


El presente documento no constituye un comprobante de pago.


**Instrucciones de pago:**

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos. (Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

**Bancos:** BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717



# MAPFRE

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20418896915**  
**COMPROBANTE DE PAGO**  
0050 - 00103800

FECHA EMISION 01/09/2018

CANCELADO 01/09/2018

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

TIPO DOCUMENTO *RUC*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA : 7011510200116

MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2018	30/09/2018		<i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i>	<i>Escardo</i>
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ct Cancelacion Recibo 97694307</i>				
<i>Prima Comercial</i>				
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				46.87
<i>Importe Total</i>				8.44
<i>Son : Cincuenta Y Cinco Y 31/100 Soles</i>				S/ *****55.31

SERVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 12:35:49

ORIGINAL

RS 007- 99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2°, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4°, ART. 16



# MAPFRE

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20418896915**  
**COMPROBANTE DE PAGO**  
0050 - 00103800

FECHA EMISION 01/09/2018

CANCELADO 01/09/2018

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

TIPO DOCUMENTO *RUC*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA : 7011510200116

MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2018	30/09/2018		<i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i>	<i>Escardo</i>
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ct Cancelacion Recibo 97694307</i>				
<i>Prima Comercial</i>				
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				46.87
<i>Importe Total</i>				8.44
<i>Son : Cincuenta Y Cinco Y 31/100 Soles</i>				S/ *****55.31

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 20888

SERVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 12:35:49


COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGV  
COPIA

272

RS 007- 99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2°, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4°, ART. 16

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717




**SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD**
**NÚMERO DE PÓLIZA :** 7021800031751

**RECIBO :** 97688397

**CONDICIONES PARTICULARES**

**Contratante** : CONSORCIO SAN JOSE  
**RUC** : 20600000439  
**Dirección Principal** : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,  
**Actividad** : 500004 - ACONDICIONAMEN. DE EDIFICIOS  
**Colectivo Asegurado** : CONSORCIO SAN JOSE

**Inicio de Vigencia** : 19/03/2018      **Vencimiento** : 01/04/2019  
**Inicio de Vigencia Aplicación** : 01/09/2018      **Vencimiento de Aplicación** : 30/09/2018  
**Forma de Pago** : MENSUAL      **Último día de Pago** : 11/09/2018  
**Moneda** : SOLES  
**Fecha de Emisión** : 28/08/2018

**IMPORTES DE LA DECLARACIÓN**

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
TRABAJADORES ALTO RIESGO	1	930.00	0.65	6.05

**Prima Neta :** 20.00  
**Der.Emis. :** 0.00  
**Interés :** 0.00  
**IGV :** 3.60  
**Prima Total :** 23.60


El presente documento no constituye un comprobante de pago.

**Instrucciones de pago:**

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos. (Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

**Bancos:** BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ QUIROGA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

00 085



# MAPFRE

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

RUC 20517182673  
COMPROBANTE DE PAGO  
0050 - 00062018

FECHA EMISION 01/09/2018

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CONTRATO : 7021800031751

MONEDA : Soles

CANCELADO 01/09/2018

TIPO DOCUMENTO RUC

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	ASESOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2018	30/09/2018		1412-Peralta Fontis Jose Luis	Escardo
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 97688397</i>				
<i>Prima Comercial</i>				
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				20.00
<i>Importe Total</i>				3.60
<i>Son : Veintitres Y 60/100 Soles</i>				S/ *****23.60

SERVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 12:38:01

ORIGINAL

RS 007- 99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16



# MAPFRE

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

RUC 20517182673  
COMPROBANTE DE PAGO  
0050 - 00062018

FECHA EMISION 01/09/2018

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CONTRATO : 7021800031751

MONEDA : Soles

CANCELADO 01/09/2018

TIPO DOCUMENTO RUC

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	ASESOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2018	30/09/2018		1412-Peralta Fontis Jose Luis	Escardo
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 97688397</i>				
<i>Prima Comercial</i>				
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				20.00
<i>Importe Total</i>				3.60
<i>Son : Veintitres Y 60/100 Soles</i>				S/ *****23.60

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. C.I.P. N° 22533

SERVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 12:38:01

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGV  
COPIA

RS 007- 99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

276



MP/2018/3595711



### CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud No. 7021800031751, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/09/2018 hasta el 30/09/2018, con las coberturas de Salud por Trabajo de Riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

#### ASEGURADO(S)

1 DNI	08606885	ESPINOZA ESCALANTE EDDY SOLANO
2 DNI	25760759	INCIO CARRILLO JULIO CESAR
3 DNI	07189499	JULIO TAY WO CHONG TANG
4 DNI	10425980	QUIROZ CISNEROS CARLOS ENRIQUE
5 DNI	07277987	RAMIREZ AGUILAR FIDEL JUVENAL
6 DNI	41297246	RETAMOZO MARTINEZ LUDWIG BENITO

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

28/08/2018 12:43:05 pm  
 , CONSORCIO SAN JOSE


ISAAC RAMIREZ MOLINA  
 UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno


**SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD**
**NÚMERO DE PÓLIZA :** 7021800031751

**RECIBO :** 97688280

**CONDICIONES PARTICULARES**

**Contratante** : CONSORCIO SAN JOSE  
**RUC** : 20600000439  
**Dirección Principal** : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,  
**Actividad** : 500004 - ACONDICIONAMEN. DE EDIFICIOS  
**Colectivo Asegurado** : CONSORCIO SAN JOSE

**Inicio de Vigencia** : 19/03/2018      **Vencimiento** : 01/04/2019  
**Inicio de Vigencia Aplicación** : 01/09/2018      **Vencimiento de Aplicación** : 30/09/2018  
**Forma de Pago** : MENSUAL      **Último día de Pago** : 11/09/2018  
**Moneda** : SOLES  
**Fecha de Emisión** : 28/08/2018

**IMPORTES DE LA DECLARACIÓN**

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
TRABAJADORES ALTO RIESGO	6	5580.00	0.65	36.27

**Prima Neta :** 36.27  
**Der.Emis. :** 0.00  
**Interés :** 0.00  
**IGV :** 6.53  
**Prima Total :** 42.80


El presente documento no constituye un comprobante de pago.


**Instrucciones de pago:**

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos. (Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

**Bancos:** BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22668

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717



# MAPFRE

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20517182673**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00062019

FECHA EMISION 01/09/2018

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CONTRATO : 7021800031751 MONEDA : *Soles*

CANCELADO 01/09/2018

TIPO DOCUMENTO *RUC*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIENCIA	HASTA	ASESOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2018		30/09/2018	<i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i>	<i>Escardo</i>

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 97688280</i>	
<i>Prima Comercial</i>	36.27
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>	6.53
<i>Importe Total</i>	S/ *****42.80
<i>Son : Cuarenta Y Dos Y 80/100 Soles</i>	

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 12:38:50

ORIGINAL

RS 007-99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16



# MAPFRE

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20517182673**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00062019

FECHA EMISION 01/09/2018

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CONTRATO : 7021800031751 MONEDA : *Soles*

CANCELADO 01/09/2018

TIPO DOCUMENTO *RUC*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIENCIA	HASTA	ASESOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2018		30/09/2018	<i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i>	<i>Escardo</i>

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 97688280</i>	
<i>Prima Comercial</i>	36.27
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>	6.53
<i>Importe Total</i>	S/ *****42.80
<i>Son : Cuarenta Y Dos Y 80/100 Soles</i>	

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22868

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 12:38:50

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGV  
COPIA

RS 007-99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



CONSORCIO SAN JOSE

2018/09/01 00:32:37

## Pago de Instituciones

## SU OPERACIÓN HA SIDO REALIZADA


Número de Operación	593057-0
Operación	Pago de Instituciones
Usuario(s) que autoriza(n)	VANESSA ZAMUDIO LOARTE
Número de Cuenta de Cargo	0011-0962-0100002931
Nombre de la Entidad	MAPFRE SOLES
DNI/RUC/C. EXTRANJERIA	20600000439
Nombre	CONSORCIO SAN JOSE
Monto a cargar	66.40 SOLES
Monto Cargado	66.40 SOLES
Fecha / Hora de 1ra Firma	01/09/2018 - 10:33:33

## Detalle de Pagos

CONCEPTO DE PAGO	Fec.Vcmto	Moneda	Importe
T03RE97688397	2018-09-01	SOLES	23.60
T03RE97688280	2018-09-01	SOLES	42.80

Estimado Cliente, su operación ha sido efectuada. Por favor, tome nota del Número de Operación.

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22658

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

MP/2018/3595648



### CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud No. 7021800031751, a nombre de la empresa CONSORCIO SAN JOSE, con vigencia del 01/09/2018 hasta el 30/09/2018, con las coberturas de Salud por Trabajo de Riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.


#### ASEGURADO(S)


1 DNI	46549805	ALVAREZ SOTO JORGE WILTON
2 DNI	62637707	AREVALO VERGARAY JOSE YOWER
3 DNI	46709771	CAMACHO ROJAS CENIN
4 DNI	45927192	CASTILLO MIRANDA MARIO ANTONIO
5 DNI	42589975	CORONEL RAMIREZ JOSE WILSON
6 DNI	41067672	LLONTOP ACOSTA JUAN MANUEL
7 DNI	42344204	LOZANO CARRASCO EVER
8 DNI	44743366	LOZANO CARRASCO JOSE NEIRO
9 DNI	44634718	MEDINA SAAVEDRA JOSE ELMER
10 DNI	06241422	MUÑOZ CONDORI LEONIDAS VIDAL
11 DNI	48483417	NAVARRO TELLO ROJER JOB
12 DNI	73077436	REYES VILCHEZ JHUNIOR GIAMPIERE
13 DNI	44214246	RODAS MORI DANNY GABRIEL
14 DNI	10515950	ROJAS QUISPE ROMULO
15 DNI	10233838	RUBIO FLORES JULIO
16 DNI	47509013	RUBIO HUARCAYA JULIO CESAR
17 DNI	45406505	SAIRE QUILCA LUIS ANGEL
18 DNI	76763583	SANCHEZ GALAN AURORA LISBET
19 DNI	45412780	TASILLA CHUGNAS NOIVER

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

28/08/2018 12:31:00 pm

CONSORCIO SAN JOSE

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22856

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

MP/2018/3595648



ISAAC RAMIREZ MOLINA  
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

**La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).**

  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22006  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

**NOTA:** La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.



SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD

NÚMERO DE PÓLIZA : 7021800031751

RECIBO : 97687816

CONDICIONES PARTICULARES

**Contratante** : CONSORCIO SAN JOSE  
**RUC** : 20600000439  
**Dirección Principal** : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET.  
**Actividad** : 500004 - ACONDICIONAMEN. DE EDIFICIOS  
**Colectivo Asegurado** : CONSORCIO SAN JOSE

**Inicio de Vigencia** : 19/03/2018                      **Vencimiento** : 01/04/2019  
**Inicio de Vigencia Aplicación** : 01/09/2018                      **Vencimiento de Aplicación** : 30/09/2018  
**Forma de Pago** : MENSUAL                      **Último día de Pago** : 11/09/2018  
**Moneda** : SOLES  
**Fecha de Emisión** : 28/08/2018

IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
TRABAJADORES ALTO RIESGO	19	17670.00	0.65	114.86

**Prima Neta :** 114.86  
**Der.Emis. :** 0.00  
**Interés :** 0.00  
**IGV :** 20.67  
**Prima Total :** 135.53


El presente documento no constituye un comprobante de pago.


Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717



# MAPFRE

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20517182673**  
**COMPROBANTE DE PAGO**  
0050 - 00062021

FECHA EMISION 01/09/2018

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina Iera Etapa La Molina*

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CONTRATO : 7021800031751

MONEDA : *Soles*

CANCELADO 01/09/2018

TIPO DOCUMENTO *RUC*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	ASESOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2018	30/09/2018		<i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i>	<i>Escardo</i>
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 97687816</i>				
<i>Prima Comercial</i>				
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				<i>114.86</i>
<i>Importe Total</i>				<i>20.67</i>
<i>Son : Ciento Treinta Y Cinco Y 53/100 Soles</i>				<i>S/ *****135.53</i>

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 12:39:49

ORIGINAL

RS 007-99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2°, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4°, ART. 16



# MAPFRE

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20517182673**  
**COMPROBANTE DE PAGO**  
0050 - 00062021

FECHA EMISION 01/09/2018

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina Iera Etapa La Molina*

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CONTRATO : 7021800031751

MONEDA : *Soles*

CANCELADO 01/09/2018

TIPO DOCUMENTO *RUC*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	ASESOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2018	30/09/2018		<i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i>	<i>Escardo</i>
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 97687816</i>				
<i>Prima Comercial</i>				
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				<i>114.86</i>
<i>Importe Total</i>				<i>20.67</i>
<i>Son : Ciento Treinta Y Cinco Y 53/100 Soles</i>				<i>S/ *****135.53</i>

CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22358

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 12:39:49

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGV  
COPIA

RS 007-99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2°, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4°, ART. 16

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



MP/2018/3595677



### CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud No. 7021800031751, a nombre de la empresa CONSORCIO SAN JOSE, con vigencia del 01/09/2018 hasta el 30/09/2018, con las coberturas de Salud por Trabajo de Riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

#### ASEGURADO(S)

1 DNI	41220259	HUAMAN PORLLES JHONNY ALAN
2 DNI	40159757	LOVON DAVILA ROMER IVAN
3 DNI	32404167	TAPIA ROSAZZA RICHARD JAVIER
4 DNI	41755068	VIDAL NAVARRETE JORGE ANTONIO

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

28/08/2018 12:37:58 pm  
 , CONSORCIO SAN JOSE

ISAAC RAMIREZ MOLINA  
 UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno



**SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD**

NÚMERO DE PÓLIZA : 7021800031751

RECIBO : 97688150

**CONDICIONES PARTICULARES**

**Contratante** : CONSORCIO SAN JOSE  
**RUC** : 20600000439  
**Dirección Principal** : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,  
**Actividad** : 500004 - ACONDICIONAMEN. DE EDIFICIOS  
**Colectivo Asegurado** : CONSORCIO SAN JOSE

<b>Inicio de Vigencia</b> : 19/03/2018	<b>Vencimiento</b> : 01/04/2019
<b>Inicio de Vigencia Aplicación</b> : 01/09/2018	<b>Vencimiento de Aplicación</b> : 30/09/2018
<b>Forma de Pago</b> : MENSUAL	<b>Último día de Pago</b> : 11/09/2018
<b>Moneda</b> : SOLES	
<b>Fecha de Emisión</b> : 28/08/2018	

**IMPORTE DE LA DECLARACIÓN**

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
TRABAJADORES ALTO RIESGO	4	3720.00	0.65	24.18

<b>Prima Neta :</b>	24.18
<b>Der.Emis. :</b>	0.00
<b>Interés :</b>	0.00
<b>IGV :</b>	4.35
<b>Prima Total :</b>	28.53


El presente documento no constituye un comprobante de pago.


**Instrucciones de pago:**

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos. (Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

**Bancos:** BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22888

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717



# MAPFRE

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20517182673**  
**COMPROBANTE DE PAGO**  
0050 - 00062022

FECHA EMISION 01/09/2018  
CONTRATANTE : *Consortio San Jose*  
DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*  
ASEGURADO : *Consortio San Jose*  
CONTRATO : 7021800031751 MONEDA : *Soles*

CANCELADO 01/09/2018  
TIPO DOCUMENTO *RUC*  
NRO.DOCUMENTO : 20600000439  
CODIGO POSTAL : 12  
POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	ASESOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2018	30/09/2018	1412-Peralta Fontis Jose Luis		<i>Escardo</i>
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 97688150</i>				
<i>Prima Comercial</i>				24.18
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				4.35
<i>Importe Total</i>				S/ *****28.53
<i>Son : Veintiocho Y 53/100 Soles</i>				

SERVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 12:37:11

ORIGINAL

RS 007-99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16



# MAPFRE

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20517182673**  
**COMPROBANTE DE PAGO**  
0050 - 00062022

FECHA EMISION 01/09/2018  
CONTRATANTE : *Consortio San Jose*  
DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*  
ASEGURADO : *Consortio San Jose*  
CONTRATO : 7021800031751 MONEDA : *Soles*

CANCELADO 01/09/2018  
TIPO DOCUMENTO *RUC*  
NRO.DOCUMENTO : 20600000439  
CODIGO POSTAL : 12  
POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	ASESOR	OFICINA COMERCIAL
01/09/2018	30/09/2018	1412-Peralta Fontis Jose Luis		<i>Escardo</i>
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 97688150</i>				
<i>Prima Comercial</i>				24.18
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				4.35
<i>Importe Total</i>				S/ *****28.53
<i>Son : Veintiocho Y 53/100 Soles</i>				

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858


SERVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 12:37:11

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGV  
COPIA

RS 007-99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

# Rentas



CARLOS ENRIQUE OLMO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22000



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

## Identificación de la Transacción

Número de orden: 839483042-45  
 Fecha: 2018-09-18 10:26:50

## Datos de la Declaración


RUC: 20800000439  
 Nombre o Razón Social: CONSORCIO SAN JOSE  
 Formulario: 0621-PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV  
 Periodo: 08/2018  
 Rectificatoria: No


Detalle de Tributos		
Tributos	Deuda	Pago
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA		0 0
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA		0 0
Totales		SI. 0 SI. 0

NC: 18821718

PDTvs: 5.6

PDTvp: 202409

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**SUNAT**

DECLARACION

**PDT IGV-RENTA MENSUAL**

Periodo 08-2018

Copia para el  
Contribuyente (Pag. 1)

00 051

PAGO

**621**

RUC

20600000439

RAZON SOCIAL


CONSORCIO SAN JOSE

**IGV VENTAS**

		IGV CUENTA PROPIA				
		BASE		TRIBUTO		
G R A V A D A S	Ventas Netas	100	47,266	101	8,508	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103		
	Ventas asumidas por el estado	124		125		
	Desc. Concedidos y/o Dev. Ventas (Vta. asumidas por estado)	126		128		
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1.12.1, 12.3 y 12.4)	160		161		
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163		
	Exportaciones	Facturadas en el período	106			
		Embarcadas en el período	127			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		112			
	<b>Total</b>				<b>131</b>	<b>8,508</b>

**IGV COMPRAS**

			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
M A C I O N A L E S	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	107	66,537	108	11,977
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	Compras Netas	110		111	
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	113			
I M P O R T A D A	Destinadas a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	114		115	
	Destinadas a ventas gravadas y no gravadas	Compras Netas	116		117	
	Destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	119			
NO GRAVADAS	Internas	Compras Netas	120	164		
	Importadas	Compras Netas	122			
<b>TOTAL</b>					<b>178</b>	<b>11,977</b>
CREDITO FISCAL ESPECIAL					172	
OTROS CREDITOS					169	
OTROS CREDITOS IVAP					182	
Coeficiente			173			

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717


<b>SUNAT</b>		<b>PDT IGV-RENTA MENSUAL</b>	Copia para el
DECLARACION		Periodo: 08-2018	Contribuyente (Pag. 2)
PAGO	RUC	20600000439	
<b>621</b>	RAZON SOCIAL	CONSORCIO SAN JOSE	


**PAGOS A CUENTA DE RENTA**

<b>Impuesto a la renta 3ra categoría</b>			
Coeficiente - Art. 85° inc. a)		380	0.0000
Porcentaje - Art. 85° inc. b)		315	1.50
	BASE		TRIBUTO
Ingreso Neto	301	58,673	312 0

**RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES**

	MONTO DE RECIBOS		MONTO DE 4TA.		MONTO IES	
TOTAL	320		321		540	
Otras Retenciones indep.	547		322		541	

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22658

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**SUNAT**

PDT IGV-RENTA MENSUAL

Copia para el

DECLARACION

Periodo 08-2018

Contribuyente (Pag. 3)

PAGO

RUC

20600000439

621

RAZON SOCIAL

CONSORCIO SAN JOSE

**DETERMINACION DE LA DEUDA****IGV**

	IGV Cta. Propia	Imp.Vtas.Aroz Pilado
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140 (3,469)	353
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145 (197,536)	351
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184 (201,005)	352
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	171	
PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	168	
SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS	164	
RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	179	
RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	176	
SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS	165	
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR		347
PAGOS PREVIOS	185	342
INTERES MORATORIO	187	343
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	188 0	344
IMPORTE A PAGAR	189 0	345


**RENTA**


	Renta	
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	302	0
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	303	
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	304	0
RETENCIONES	326	
RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES	327	
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR	305	
IMP.TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N° 28424)	328	
OTROS CREDITOS PERMITIDOS POR LEY	306	
PAGOS PREVIOS	317	
INTERES MORATORIO	319	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	324	0
IMPORTE A PAGAR	307	0

**4TA CATEGORIA**

	4ta Categoria	IES
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	371	542
PAGOS PREVIOS	372	543
INTERES MORATORIO	374	545
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	375	546
IMPORTE A PAGAR	379	551

IMPORTE TOTAL A PAGAR: 0  
 EFECTIVO 0

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22338


  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717 292



<b>SUNAT</b>	<b>PDT IGV-RENTA MENSUAL</b>		Copia para el
DECLARACION	Periodo: 08-2018		Contribuyente (Pag. 4)
PAGO	RUC	20600000439	
<b>621</b>	RAZON SOCIAL	CONSORCIO SAN JOSE	

**IDENTIFICACION**

¿Régimen de Renta al que pertenece?	GENERAL
¿Se ha acogido a la Ley N° 27360 (Sector Agrario) y/o a la Ley N° 27460 (Acuicultura) y/o Ley N° 29972 (Cooperativas Agrarias).?	NO
Ubigeo	
Zona	
¿Ha realizado ventas no gravadas con IGV en los últimos 12 meses?	NO
¿Sus proveedores designados agentes de percepción le han efectuado percepciones del IGV?	NO
¿Sus clientes designados agentes de retención le han efectuado retenciones del IGV?	NO
¿Esta afecto al Impuesto a la venta del Arroz Pilado (IVAP)?	NO
¿Ha recibido Liq. compra por ventas y le han retenido por Imp. a la renta de 3ra. Cat.?	NO
¿Está exonerado del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas?	NO
¿La presente declaración rectifica o sustituye a otra?	NO
Declaración como socio coop. Agraria?	NO
¿Tiene Convenios de Estabilidad?	NO
Tasa IGV - Débito (%) :	

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**SUNAT**

**PDT IGV-RENTA MENSUAL**

Copia para el

DECLARACION

Periodo 08-2018

Contribuyente (Pag. 1)

PAGO

RUC

20600000439

621


RAZON SOCIAL

CONSORCIO SAN JOSE

**COEFICIENTE**


**COEFICIENTE SISTEMA A**

Impuesto determinado:	0
Ingresos Netos :	0
Coeficiente:	0

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22636

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

# Planillas



CARLOS ENRIQUE QUIROZ CORDERO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 22858



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 10717

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN (LABORAL)

Identificación de la Transacción

Número de orden: 777561999-01

Datos de la Declaración

RUC: 20600000439  
 Nombre o Razón Social: CONSORCIO SAN JOSE  
 Documento: PLANILLA ELECTRÓNICA  
 Período: 08/2018  
 Rectificatoria: No  
 Número de trabajadores: 25  
 Número de pensionistas: 0  
 P.Serv.Cuarta Categoría: 3  
 P.Serv.Mod.Formativa: 0  
 Personal Terceros: 0  
 Regímenes Especiales: 0

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN


Identificación de la Transacción


Número de orden: 777561999-01

Detalle de Tributos		
Tributos	Deuda	Pago
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	3,296	3,296
ESSALUD +VIDA	95	95
ESSALUD S.C.T.R	965	965
SNP - LEY 19990	5,544	5,544
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	57	57
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	6,283	6,283
<b>Totales</b>	<b>S/. 16,240</b>	<b>S/. 16,240</b>

Detalle de Pago

Banco: NACION  
 Num. Operación: 0000000000491509501  
 Fecha de Pago: 2018-09-12 12:51:50

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

R01: Trabajadores - Datos de Ingresos, Tributos y Aportes

RUC : 20600000438  
 Empleador : CONSORCIO SAN JOSE  
 Periodo : 06/2018  
 PDF Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

Documento de Identidad		Datos del Trabajador			Ingresos			Información declarada			Tributos y Aportes del Empleador	
Tipo	Número	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sit.	Devengado	Pagado	Descuentos	Tributos y aportes del Trabajador	Neto a pagar	Tributos y Aportes del Empleador	
01	46549805	ALVAREZ	SOTO	JORGE WILTON	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,094.89	3,094.89	0.00	340.77	2,754.12	262.63	
01	62637707	AREVALO	VERGARAY	JOSE YOWER	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,560.10	3,560.10	0.00	385.76	3,174.34	281.43	
01	46709771	CAMACHO	ROJAS	CENIN	ACTIVO O SUBSIDIADO	4,547.19	4,547.19	0.00	500.74	4,046.45	368.22	
01	44959823	CAMANI	LOBATON	MARIA ELENA	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,691.67	1,691.67	77.00	218.40	1,396.27	152.25	
01	45927192	CASTILLO	MIRANDA	MARIO ANTONIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,194.14	3,194.14	0.00	355.73	2,838.41	274.52	
01	42589775	CORONEL	RAMIREZ	JOSE WILSON	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,236.58	1,236.58	0.00	132.51	1,104.07	106.98	
01	08650685	ESPINOZA	ESCALANTE	EDDY SOLANO	ACTIVO O SUBSIDIADO	6,120.00	6,120.00	0.00	1,350.51	4,769.49	645.66	
01	41220259	HUAMAN	PORILLES	JHONNY ALAN	ACTIVO O SUBSIDIADO	5,800.00	5,800.00	189.00	1,516.23	4,094.77	522.00	
01	41067672	ILORTOP	ACOSTA	JUAN MANUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,986.28	3,986.28	0.00	430.01	3,556.27	310.83	
01	42344204	LOZANO	CARRASCO	EVER	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,201.20	3,201.20	0.00	340.33	2,860.87	246.60	
01	44743366	LOZANO	CARRASCO	JOSE NEIRO	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,515.84	2,515.84	0.00	265.76	2,250.08	188.88	
01	44634718	MEDINA	SAAYEDRA	JOSE ELMER	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,855.28	1,855.28	0.00	200.63	1,654.65	151.46	
01	74326764	MONTALVO	VALERA	CRISTHIAN ALEX	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	06241422	MUNOZ	CONDORI	LEONIDAS VIDAL	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,713.23	3,713.23	0.00	393.31	3,319.92	326.37	
01	49483417	NAVARRO	TELLO	ROJER JOB	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,500.00	3,500.00	0.00	594.47	2,905.53	369.25	
01	10425980	QUIROZ	CISNEROS	CARLOS ENRIQUE	ACTIVO O SUBSIDIADO	11,000.00	11,000.00	0.00	3,184.77	7,815.23	1,160.50	
01	73077436	REYES	VILCHEZ	JHUNOR GIAMPI	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,636.08	2,636.08	0.00	278.12	2,357.96	197.87	
01	44214246	RODAS	MORRI	DANNY GABRIEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,434.15	2,434.15	0.00	265.49	2,168.66	192.40	
01	10515950	ROJAS	QUISPE	ROMULO	ACTIVO O SUBSIDIADO	4,268.87	4,268.87	0.00	479.19	3,789.68	371.68	
01	10233838	RUBIO	FLORES	JULIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,989.63	2,989.63	0.00	38.07	2,951.56	224.61	
01	47509013	RUBIO	HUARCAYA	JULIO CESAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,248.64	3,248.64	0.00	330.87	2,917.77	267.11	
01	45406505	SAIRE	QUIJICA	LUIS ANGEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,751.72	3,751.72	0.00	402.13	3,349.59	290.58	
01	76763583	SANCHEZ	GALAN	AURORA LISBET	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,240.64	1,240.64	0.00	136.58	1,104.06	97.66	
01	45854197	TACO	TORRES	LUIS ENRIQUE	BAJA	1,917.35	1,917.35	0.00	210.68	1,706.67	152.31	
01	45412780	TASILLA	CHUGNAS	MOYER	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,084.72	3,084.72	0.00	339.52	2,745.20	261.56	
						84,588.20	84,588.20	266.00	12,690.58	71,897.62	7,423.36	



CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22838

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

R02: Trabajadores - Detalle de Ingresos

RUC: 20600000439

Employer: CONSORCIO SAN JOSE

Periodo: 08/2018

PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden:

Documento de Identidad		Datos del Trabajador		Detalle de los Ingresos												TOTAL INGRESOS	
Tipo	Número	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sit.	Ingresos		Beneficiaciones		Amortizaciones		Conceptos Varios		Otros Conceptos		Devengado	Pagado
						Devengado	Pagado	Devengado	Pagado	Devengado	Pagado	Devengado	Pagado	Devengado	Pagado		
01	46549805	ALVAREZ	SOTO	JORGE WILTON	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,585.65	1,585.65	396.55	396.55	376.14	376.14	406.05	406.05	330.50	330.50	3,094.89	3,094.89
01	62637707	AREVALO	VERGARAY	JOSE YOMER	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,929.20	1,929.20	443.46	443.46	420.63	420.63	429.01	429.01	337.80	337.80	3,560.10	3,560.10
01	46709771	CAMACHO	ROJAS	CENIN	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,556.63	2,556.63	581.78	581.78	520.13	520.13	484.99	484.99	403.66	403.66	4,547.19	4,547.19
01	44959823	CAMANI	LOBATON	MARIA ELENA	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,691.67	1,691.67									1,691.67	1,691.67
01	45927192	CASTILLO	MIRANDA	MARIO ANTONIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,773.47	1,773.47	409.34	409.34	388.27	388.27	389.26	389.26	233.80	233.80	3,194.14	3,194.14
01	42589975	CORONEL	RAMIREZ	JOSE WILSON	ACTIVO O SUBSIDIADO	643.25	643.25	152.52	152.52	144.67	144.67	160.94	160.94	135.20	135.20	1,236.58	1,236.58
01	08606885	ESPINOZA	ESCALARTE	EDDY SOLANO	ACTIVO O SUBSIDIADO	6,120.00	6,120.00									6,120.00	6,120.00
01	41220259	HUAMAN	PORLES	JHONNY ALAN	ACTIVO O SUBSIDIADO	5,800.00	5,800.00									5,800.00	5,800.00
01	41067672	LLONITOP	ACOSTA	JUAN MANUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,192.63	2,192.63	581.78	581.78	520.13	520.13	468.12	468.12	223.62	223.62	3,986.28	3,986.28
01	42344204	LOZANO	CARRASCO	EVER	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,658.50	1,658.50	396.55	396.55	376.14	376.14	405.17	405.17	364.84	364.84	3,201.20	3,201.20
01	44743366	LOZANO	CARRASCO	JOSE NEIRO	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,457.85	1,457.85	363.46	363.46	344.73	344.73	344.80	344.80	5.00	5.00	2,515.84	2,515.84
01	44634718	MEDINA	SAAVEDRA	JOSE ELMER	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,060.20	1,060.20	274.53	274.53	260.40	260.40	255.15	255.15	5.00	5.00	1,855.28	1,855.28
01	74326764	MONTALVO	VALERA	CRISTHIAN ALEX	BAJA	0.00	0.00									0.00	0.00
01	06241422	MUÑOZ	CONDORI	LEONIDAS VIDAL	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,139.20	2,139.20	443.46	443.46	420.63	420.63	424.14	424.14	285.80	285.80	3,713.23	3,713.23
01	48483417	NAVARRO	TELLO	ROJER JOB	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,500.00	3,500.00									3,500.00	3,500.00
01	10425980	QUIROZ	CISNEROS	CARLOS ENRIQUE	ACTIVO O SUBSIDIADO	11,000.00	11,000.00									11,000.00	11,000.00
01	73077436	REYES	VILCHEZ	JHUNIOR GIAMPI	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,526.75	1,526.75	381.30	381.30	361.67	361.67	361.36	361.36	5.00	5.00	2,636.08	2,636.08
01	44214246	RODAS	MORI	DANNY GABRIEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,200.16	1,200.16	295.06	295.06	279.87	279.87	300.46	300.46	358.60	358.60	2,434.15	2,434.15
01	10515950	ROJAS	QUISPE	ROMULO	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,348.63	2,348.63	581.78	581.78	520.13	520.13	478.97	478.97	339.36	339.36	4,268.87	4,268.87
01	10233838	RUBIO	FLORES	JULIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,801.50	1,801.50	358.11	358.11	339.69	339.69	339.81	339.81	150.52	150.52	2,989.63	2,989.63
01	47509013	RUBIO	HUARCAYA	JULIO CESAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,949.90	1,949.90	396.55	396.55	376.14	376.14	375.53	375.53	150.52	150.52	3,248.64	3,248.64
01	45406505	SAIRE	QUILCA	LUIS ANGEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,354.45	2,354.45	396.55	396.55	376.14	376.14	379.02	379.02	245.56	245.56	3,751.72	3,751.72
01	76763583	SANCHEZ	GALAN	AURORA LISBET	ACTIVO O SUBSIDIADO	714.72	714.72	169.37	169.37	160.66	160.66	159.69	159.69	36.20	36.20	1,240.64	1,240.64
01	45854197	TACCO	TORRES	LUIS ENRIQUE	BAJA	1,145.36	1,145.36	268.52	268.52	240.06	240.06	206.97	206.97	56.44	56.44	1,917.35	1,917.35
01	45412780	TASILLA	FLUGINAS	MOYER	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,585.65	1,585.65	396.55	396.55	376.14	376.14	405.18	405.18	321.20	321.20	3,084.72	3,084.72
						59,735.37	59,735.37	7,287.22	7,287.22	6,802.37	6,802.37	6,774.62	6,774.62	3,988.62	3,988.62	84,588.20	84,588.20

ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 1071298

R03: Trabajadores - Bases de Cálculo de Tributos y Aportes


RUC : 20600000439

Empresador : CONSORCIO SAN JOSE

Período : 06/2018

PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

Documento de Identidad		Datos del Trabajador										Bases de cálculo, Tributos y Aportes del Trabajador									
Tipo	Número	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sit.	B.C. ESSALUD	Aporte Seg. Regular	Bases ONP D.Ley 19990	Aportes D.Ley 19990	Bases ONP D.Ley 19990	Bases S.P.P.	Aportes SPP	Bases SCTR (ESSALUD)	Tasa (%)	Aporte SCTR (ESSALUD)	Bases SCTR Categoría	Base Renta Sta.	Impuesto a Renta Sta.	Otros emp.	EsSalud +Vida	
01	46549805	ALVAREZ	SOTO	JORGE WILTON	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,273.85	204.65	2,273.85	250.13	2,273.85	2,273.85	250.13	2,273.85	1.55	35.24	2,871.04	0.00	0.00	NO	5.00	
01	52637707	AREVALO	VERGARAY	JOSE YONER	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,667.60	240.08	2,667.60	346.79	3,490.27	3,490.27	346.79	3,490.27	1.55	41.35	3,313.29	0.00	0.00	NO	5.00	
01	46709771	CAMACHO	ROJAS	CENIN	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,490.27	314.32	3,490.27	453.74	3,490.27	3,490.27	453.74	3,490.27	1.55	54.10	4,244.40	0.00	0.00	NO	5.00	
01	44999823	CAMANI	LORATON	MARIA ELENA	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,691.67	152.25	1,691.67	169.17	1,691.67	1,691.67	169.17	1,691.67	0.00	0.00	1,691.67	0.00	0.00	NO	5.00	
01	45927192	CASTILLO	MIRANDA	MARIO ANTONIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,376.67	213.90	2,376.67	261.45	2,376.67	2,376.67	261.45	2,376.67	1.55	36.84	2,972.68	0.00	0.00	NO	5.00	
01	42589975	CORONEL	RAMIREZ	JOSE WILSON	ACTIVO O SUBSIDIADO	912.95	83.70	912.95	100.43	912.95	912.95	100.43	912.95	1.55	14.15	1,142.64	0.00	0.00	NO	5.00	
01	08606885	ESPINOZA	ESCALANTE	EDDY SOLANO	ACTIVO O SUBSIDIADO	6,120.00	550.80	6,120.00	795.60	6,120.00	6,120.00	795.60	6,120.00	1.55	94.86	6,120.00	554.91	0.00	NO	5.00	
01	41220259	HUAMAN	PORLIES	JHONNY ALAN	ACTIVO O SUBSIDIADO	5,800.00	522.00	5,800.00	580.00	5,800.00	5,800.00	580.00	5,800.00	0.00	0.00	7,800.00	846.91	SI	5.00		
01	41067672	LLONTOP	ACOSTA	JUAN MANUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,946.23	265.16	2,946.23	383.01	2,946.23	2,946.23	383.01	2,946.23	1.55	45.67	3,700.36	0.00	0.00	NO	5.00	
01	42344204	LOZANO	CARRASCO	EYER	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,337.40	210.37	2,337.40	303.86	2,337.40	2,337.40	303.86	2,337.40	1.55	36.23	2,934.59	0.00	0.00	NO	5.00	
01	44743366	LOZANO	CARRASCO	JOSE NEIRO	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,790.28	161.13	1,790.28	232.74	1,790.28	1,790.28	232.74	1,790.28	1.55	27.75	2,337.63	0.00	0.00	NO	5.00	
01	44634718	MEDINA	SAAVEDRA	JOSE ELMER	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,311.30	118.02	1,311.30	144.24	1,311.30	1,311.30	144.24	1,311.30	1.55	20.33	1,724.73	0.00	0.00	NO	5.00	
01	74326764	MONTALVO	VALERA	CRISTHIAN ALEX	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	NO	5.00		
01	06214122	MURCIZO	CONDORI	LEONIDAS VIDAL	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,825.60	254.30	2,825.60	310.83	2,825.60	2,825.60	310.83	2,825.60	1.55	43.80	3,471.29	0.00	0.00	NO	5.00	
01	48483417	NAVARRO	TELLO	ROJER JOB	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,500.00	315.00	3,500.00	455.00	3,500.00	3,500.00	455.00	3,500.00	1.55	54.25	3,500.00	139.47	NO	5.00		
01	10425980	QUIROZ	CISNEROS	CARLOS ENRIQUE	ACTIVO O SUBSIDIADO	11,000.00	990.00	11,000.00	1,430.00	11,000.00	11,000.00	1,430.00	11,000.00	1.55	170.50	12,200.00	1,754.77	SI	5.00		
01	73077436	REYES	VILCHEZ	JHUNIOR GIAMPIERE	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,875.50	168.80	1,875.50	243.82	1,875.50	1,875.50	243.82	1,875.50	1.55	29.07	2,449.72	0.00	0.00	NO	5.00	
01	44214246	RODAS	MORI	DANNY GABRIEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,823.64	164.13	1,823.64	237.07	1,823.64	1,823.64	237.07	1,823.64	1.55	28.27	2,253.25	0.00	0.00	NO	5.00	
01	10515950	ROJAS	QUIRSE	ROMULO	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,217.97	289.62	3,217.97	353.98	3,217.97	3,217.97	353.98	3,217.97	1.55	49.88	3,972.10	0.00	0.00	NO	5.00	
01	10233838	RUBIO	FLORES	JULIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,129.04	191.61	2,129.04	254.41	2,129.04	2,129.04	254.41	2,129.04	1.55	33.00	2,668.34	0.00	0.00	NO	5.00	
01	47509013	RUBIO	HUARCAYA	JULIO CESAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,312.60	208.13	2,312.60	289.62	2,312.60	2,312.60	289.62	2,312.60	1.55	35.85	2,909.79	0.00	0.00	NO	5.00	
01	45406505	SABRE	QUILCA	LUIS ANGEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,754.35	247.89	2,754.35	358.07	2,754.35	2,754.35	358.07	2,754.35	1.55	42.69	3,351.54	0.00	0.00	NO	5.00	
01	76763583	SANCHEZ	GALAN	AURORA LISBET	ACTIVO O SUBSIDIADO	900.83	83.70	900.83	117.11	900.83	900.83	117.11	900.83	1.55	13.96	1,347.45	0.00	0.00	NO	5.00	
01	45854197	TACO	TORRES	LUIS ENRIQUE	BAJA	1,443.72	129.93	1,443.72	187.68	1,443.72	1,443.72	187.68	1,443.72	1.55	22.38	1,791.78	0.00	0.00	NO	5.00	
01	45412780	TASILLA	CHUGNAS	NORVER	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,264.55	203.81	2,264.55	249.11	2,264.55	2,264.55	249.11	2,264.55	1.55	35.10	2,861.74	0.00	0.00	NO	5.00	
						69,766.02	6,289.10	42,649.82	5,544.49	24,987.16	24,987.16	2,673.75	62,274.35	35.65	965.27	83,430.03	3,296.06			95.00	

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

ROM: Trabajadores - Tributos, aportes y conceptos a cargo del trabajador


RUC : 20600000439

Empleador : CONSORCIO SAN JOSE

Periodo : 08/2018

PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

Documento de Identidad		Datos del Trabajador				S.P.P. Aportes							S.P.P. Seguro		S.N.P. D.Ley 19990 (ONP)		Imp. Renta Sta. categ.		CONAFOVICER		+Vida Seguro Accidentes (ESSALUD)
Tipo		Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sit	S.P.P. Aporte Obligatorio	S.P.P. Aporte Voluntario	S.P.P. Comisión	S.P.P. Seguro	S.N.P. D.Ley 19990 (ONP)	Imp. Renta Sta. categ.	CONAFOVICER	+Vida Seguro Accidentes (ESSALUD)								
01	46549805	ALVAREZ	SOTO	JORGE WILTON	ACTIVO O SUBSIDIADO	227.38	22.74	24.33	30.93			30.38	5.00								
01	62637707	AREVALO	VERGARAY	JOSE YOWER	ACTIVO O SUBSIDIADO					346.79	0.00	33.97	5.00								
01	46709771	CAMACHO	ROJAS	CENIN	ACTIVO O SUBSIDIADO					453.74	0.00	42.00	5.00								
01	4499823	CAMANI	LOBATON	MARIA ELENA	ACTIVO O SUBSIDIADO	169.17		26.22	23.01		0.00										
01	45927192	CASTILLO	MIRANDA	MARIO ANTONIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	237.67		25.43	32.31		0.00	31.54	5.00								
01	42589975	CORONEL	RAMIREZ	JOSE WILSON	ACTIVO O SUBSIDIADO	91.30		1.64	12.42		0.00	13.02	5.00								
01	08606885	ESPINOZA	ESCALANTE	EDDY SOLANO	ACTIVO O SUBSIDIADO					795.60	554.91										
01	41220259	HUAMAN	PORILLES	JHONNY ALAN	ACTIVO O SUBSIDIADO	580.00		10.44	78.88		846.91										
01	41067672	LUANTOP	ACOSTA	JUAN MANUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO					385.01	0.00	42.00	5.00								
01	42344204	LOZANO	CARRASCO	EVER	ACTIVO O SUBSIDIADO					303.86	0.00	31.47	5.00								
01	44743366	LOZANO	CARRASCO	JOSE NEIRO	ACTIVO O SUBSIDIADO					232.74	0.00	28.02	5.00								
01	44634718	MEDINA	SAVEDRA	JOSE ELMER	ACTIVO O SUBSIDIADO	131.13		14.04	17.82		0.00	19.53	5.00								
01	74326764	MONTALVO	VALERA	CRISTHIAN ALEX	BAJA					0.00	0.00	0.00									
01	06241422	MUÑOZ	CONDORI	LEONIDAS VIDAL	ACTIVO O SUBSIDIADO	282.56		5.07	38.44		0.00	33.97	5.00								
01	48483417	NAVARRO	TELLO	ROJER JOB	ACTIVO O SUBSIDIADO					455.00	139.47										
01	10425980	QUIROZ	CISNEROS	CARLOS ENRIQUE	ACTIVO O SUBSIDIADO					1,430.00	1,754.77										
01	73077436	REYES	VILCHEZ	JHUNOR GIAMPPIERE	ACTIVO O SUBSIDIADO					243.82	0.00	29.30	5.00								
01	44214246	RODAS	MORI	DANNY GABRIEL	ACTIVO O SUBSIDIADO					237.07	0.00	23.42	5.00								
01	10519950	ROJAS	QUISPE	ROMULO	ACTIVO O SUBSIDIADO	321.80		34.44	43.77		0.00	42.00	5.00								
01	10233838	RUBIO	FLORES	JULIO	ACTIVO O SUBSIDIADO					0.00	0.00	33.07	5.00								
01	47509013	RUBIO	HUARCAYA	JULIO CESAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	231.28		4.17	31.46		0.00	35.83	5.00								
01	45406505	SAIPE	QUILCA	LUIS ANGEL	ACTIVO O SUBSIDIADO					358.07	0.00	39.06	5.00								
01	76769583	SANCHEZ	GALAN	AURORA LISBET	ACTIVO O SUBSIDIADO					117.11	0.00	14.47	5.00								
01	45854197	TACO	TORRES	LUIS ENRIQUE	BAJA					187.68	0.00	18.00	5.00								
01	45412780	TASHILA	CHUGNAS	NORVER	ACTIVO O SUBSIDIADO	226.46		24.23	30.80		0.00	30.38	5.00								
						2,498.76	174.99	170.01	339.84	5,544.48	3,296.06	571.43	95.00								

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22008

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717



R05: Trabajadores - Tributos, aportes y conceptos a cargo del empleador

RUC: 20600000439

Empleador: CONSORCIO SAN JOSE

Periodo: 06/2018

PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden:

Documento de Identidad		Datos del Trabajador						Cód. Reg. Salud	ESSALUD Seguro de Salud	ESSALUD SCTR-Salud	S.P.P. Aporte voluntario
Tipo	Número	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sit.						
01	46549805	ALVAREZ	SOTO	JORGE WILTON	ACTIVO O SUBSIDIADO		00	204.65	35.24	22.74	
01	62637707	AREVALO	VERGARAY	JOSE YOWER	ACTIVO O SUBSIDIADO		00	240.08	41.35		
01	46709771	CAMACHO	ROJAS	CENIN	ACTIVO O SUBSIDIADO		00	314.12	54.10		
01	44999823	CAMANI	LOBATON	MARIA ELENA	ACTIVO O SUBSIDIADO		00	152.25			
01	45927192	CASTILLO	MIRANDA	MARIO ANTONIO	ACTIVO O SUBSIDIADO		00	213.90	36.84	23.78	
01	42589975	CORNEL	RAMIREZ	JOSE WILSON	ACTIVO O SUBSIDIADO		00	83.70	14.15	9.13	
01	08606885	ESPINOZA	ESCALANTE	EDDY SOLANO	ACTIVO O SUBSIDIADO		00	550.80	94.86		
01	41220259	HUAMAN	PORLLES	JHONNY ALAN	ACTIVO O SUBSIDIADO		00	522.00			
01	41067672	LLONTOP	ACOSTA	JUAN MANUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO		00	265.16	45.67		
01	42344204	LOZANO	CARRASCO	EVER	ACTIVO O SUBSIDIADO		00	210.37	36.23		
01	44743366	LOZANO	CARRASCO	JOSE NEIRO	ACTIVO O SUBSIDIADO		00	161.13	27.75		
01	44634718	MEDINA	SAAVEDRA	JOSE ELMER	ACTIVO O SUBSIDIADO		00	118.02	20.33	13.11	
01	74326764	MONTALVO	VALERA	CRISTHIAN ALEX	BAJA		00	0.00	0.00		
01	06241422	MUÑOZ	CONDORI	LEONIDAS VIDAL	ACTIVO O SUBSIDIADO		00	254.30	43.80	28.27	
01	48483417	NAVARRO	TELLO	ROJER JOB	ACTIVO O SUBSIDIADO		00	315.00	54.25		
01	10425980	QUIROZ	CISNEROS	CARLOS ENRIQUE	ACTIVO O SUBSIDIADO		00	990.00	170.50		
01	73077436	REYES	VILCHEZ	JHUNIOR GIAMPIERE	ACTIVO O SUBSIDIADO		00	168.80	29.07		
01	44214246	RODAS	MORI	DANNY GABRIEL	ACTIVO O SUBSIDIADO		00	164.13	28.27		
01	10515950	ROJAS	QUISPE	ROMULO	ACTIVO O SUBSIDIADO		00	289.62	49.88	32.18	
01	10233838	RUIBO	FLORES	JULIO	ACTIVO O SUBSIDIADO		00	191.61	33.00		
01	47509013	RUBIO	HUARCAYA	JULIO CESAR	ACTIVO O SUBSIDIADO		00	208.13	35.85	23.13	
01	45406505	SAIRE	QUILCA	LUIS ANGEL	ACTIVO O SUBSIDIADO		00	247.89	42.69		
01	76763583	SANCHEZ	GALAN	AURORA LISBET	ACTIVO O SUBSIDIADO		00	83.70	13.96		
01	45854197	TACO	TORRES	LUIS ENRIQUE	BAJA		00	129.93	22.38		
01	45412780	TASILLA	CHUGNAS	MORVER	ACTIVO O SUBSIDIADO		00	203.81	35.10	22.65	
								6,283.10	965.27	174.99	

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

R06: Trabajadores - Jornada Laboral


RUC : 2060000439

Empleador : CONSORCIO SAN JOSE

Periodo : 06/2018

PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

Documento de Identidad		Datos del Trabajador			Jornada Laboral			Horas Trabajadas			
Type	Número	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sit.	Días Laborados	Días Subsidiados	Días No Laborados	Horas ordinarias	Horas sobretiempo	Total horas
01	46549805	ALVAREZ	SOTO	JORGE WILTON	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	0	208:00	35:00	243:00
01	62637707	AREVALO	VERGARAY	JOSE YOWER	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	0	208:00		208:00
01	46709771	CAMACHO	ROJAS	CEMIN	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	0	208:00	31:00	239:00
01	44999823	CAMANI	LOBATON	MARIA ELENA	ACTIVO O SUBSIDIADO	30	0	1	200:00		200:00
01	45927192	CASTILLO	MIRANDA	MARIO ANTONIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	29	0	2	192:00	22:00	214:00
01	42589975	CORONEL	RAMIREZ	JOSE WILSON	ACTIVO O SUBSIDIADO	12	0	0	80:00	14:00	94:00
01	08606885	ESPINOZA	ESCALANTE	EDDY SOLANO	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	0	208:00		208:00
01	41220259	HUAMAN	PORILES	JHONNY ALAN	ACTIVO O SUBSIDIADO	30	0	1	100:00		100:00
01	41067672	LLONTOP	ACOSTA	JUAN MANUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	0	208:00	17:00	225:00
01	42344204	LOZANO	CARRASCO	EVER	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	0	208:00	35:00	243:00
01	44743366	LOZANO	CARRASCO	JOSE NEIRO	ACTIVO O SUBSIDIADO	29	0	2	192:00		192:00
01	44634718	MEDINA	SAAVEDRA	JOSE ELMER	ACTIVO O SUBSIDIADO	1	10	20	144:00		144:00
01	74326764	MONTALVO	VALERA	CRISTHIAN ALEX	BAJA	0	0	2			
01	06241472	MUÑOZ	CONDORI	LEONIDAS VIDAL	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	0	208:00	27:00	235:00
01	48483417	NAVARRO	TELLO	ROJER JOB	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	0	208:00		208:00
01	10425980	QUIROZ	CISNEROS	CARLOS ENRIQUE	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	0	104:00		104:00
01	73077436	REYES	VILCHEZ	JHUNIOR GIAMPHERE	ACTIVO O SUBSIDIADO	30	0	1	200:00		200:00
01	44214246	RODAS	MORI	DANNY GABRIEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	22	0	9	138:00	34:00	172:00
01	10515950	ROJAS	QUISPE	ROMULO	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	0	208:00	26:00	234:00
01	10233838	RUBIO	FLORES	JULIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	28	0	3	187:00	5:00	192:00
01	47509013	RUBIO	HUARCAYA	JULIO CESAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	0	208:00	5:00	213:00
01	45406505	SAIRE	QUILCA	LUIS ANGEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	0	208:00	12:00	220:00
01	76763583	SANCHEZ	GALAN	AURORA LISBET	ACTIVO O SUBSIDIADO	28	0	3	80:00		80:00
01	45854197	TACO	TORRES	LUIS ENRIQUE	BAJA	14	0	4	96:00	4:00	100:00
01	45412780	TASILLA	CHUGNAS	INOIVER	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	0	208:00	34:00	242:00
						656	10	48			

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 12000

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

R07: Trabajadores - Motivos de suspensión de labores


RUC : 20600000499

Empresador : CONSORCIO SAN JOSE

Periodo : 06/2018

PDY Familia Electrónica - PLABIE Número de Orden :

Datos del Trabajador		Apellidos		Nombres		Código	Descripción	Num. Días
Documento de Identidad		Paterno	Materno	Apellido	Materno			
Tipo	Número							
01	44999823	CAMANI	LOBATON	MARIA ELENA		07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	1
01	45927192	CASTILLO	MIRANDA	MARIO ANTONIO		07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	2
01	41220259	HUAMAN	PORLLES	JHONNY ALAN		07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	1
01	44743366	LOZANO	CARRASCO	JOSE NEIRO		07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	2
01	44634718	MEDINA	SAAVEDRA	JOSE ELMER		20	S.I. ENFERM/ACCIDENTE (20 PRIMEROS DIAS)	20
01	44634718	MEDINA	SAAVEDRA	JOSE ELMER		21	S.I. INCAP TEMPORAL (SUBSIDIADO)	10
01	74326764	MONTALVO	VALERA	CRISTHIAN ALEX		07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	2
01	73077436	REYES	VILCHEZ	JHUNIOR GIAMP		07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	1
01	44214246	RODAS	IMORI	DANNY GABRIEL		07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	9
01	10233838	RUIRO	FLORES	JULIO		07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	3
01	76763583	SANCHEZ	GALAN	AURORA LISBET		07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	3
01	45854197	TACO	TORRES	LUIS ENRIQUE		07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	4

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO  
 Reg. CIP N° 22006

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

R12: Rentas de Cuarta Categoría - Comprobantes de pago


RUC : 20600000439

Empleado : CONSORCIO SAN JOSE

Periodo : 08/2018

PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

Debitos del Prestador de Servicio		Documento de Identidad	Apellidos y Nombres	Tipo de Comprobante	Número de Serie	Número de Comprobante	Fecha de Emisión	Fecha de Pago	Monto de Comprobante	Ind.Retención Rta	Retención Renta	Retención Pension	Aporte Pensionario
Tipo	Número												
06	10756914361	SANCHEZ SANCHEZ MIRELLA BETZABETH	R.HONORARIO	E001	00000004	31/07/2018	02/08/2018	270.00	NO	0.00			
06	10756914361	SANCHEZ SANCHEZ MIRELLA BETZABETH	R.HONORARIO	E001	00000005	03/08/2018	03/08/2018	270.00	NO	0.00			
06	10324041678	TAPIA ROSAZZA RICHARD JAVIER	R.HONORARIO	E001	00000032	08/08/2018	08/08/2018	271.74	SI	21.74			
06	10324041678	TAPIA ROSAZZA RICHARD JAVIER	R.HONORARIO	E001	00000033	08/08/2018	08/08/2018	217.39	SI	17.39			
06	10324041678	TAPIA ROSAZZA RICHARD JAVIER	R.HONORARIO	E001	00000034	21/08/2018	27/08/2018	217.39	SI	17.39			
06	10468581073	TAVARA MENDOZA MIGUEL ESTEBAN	R.HONORARIO	E001	00000001	31/07/2018	02/08/2018	2,250.00	NO	0.00			
06	10468581073	TAVARA MENDOZA MIGUEL ESTEBAN	R.HONORARIO	E001	00000002	30/08/2018	31/08/2018	2,500.00	NO	0.00			
										56.52			
									5,996.52				
													0.00

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22006

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717  
 304

R15: Determinación de Deuda

RUC : 20600000439

Empleador : CONSORCIO SAN JOSE

Periodo : 08/2018

PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

Determinación de deuda	450	451	452	456	459	464	465	485	494	495	496	Renta 5ta.Cat. Retenciones
Base imponible			452	456	459	464	465	485	494	495	496	83,430
Impuesto resultante	410	411	412	416	413	414	415	415	414	415	415	3,296
Compensación	600											
Crédito EPS (Ley 26790)			602									
Crédito EPS Per. anterior			612									
Otras deduc.permit.Ley												0
Pagos previos	500	501	502	506	508	504	505	505	504	505	505	
Interés moratorio	700	701	702	706	708	704	705	705	704	705	705	
Saldo a pagar	710	711	712	716	713	714	715	715	714	715	715	3,296
Importe a pagar	800	801	802	806	803	804	805	805	804	805	805	3,296

Determinación de deuda	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	Renta 4ta.Cat. Retenciones	Asegure tu Pensión	Aporte al FCIMMS - LEY 29741
Base imponible			459	460	461	462	463	464	465	466	467	5,997	462	590
Impuesto resultante	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	57	422	591
Compensación	427													
Crédito EPS (Ley 26790)			408											
Crédito EPS Per. anterior			428											
Otras deduc.permit.Ley														
Pagos previos	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517		512	592
Interés moratorio	707	708	740	741	742	743	744	745	746	747	748		747	593
Saldo a pagar	717	718	743	744	745	746	747	748	749	750	751	57	747	594
Importe a pagar	807	808	809	810	811	814	815	816	817	818	819	57	814	595
IGV				812	813	814								

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 20717

# Pago a CONAFOVICER



CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22856



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

# BBVA Continental

CONSORCIO SAN JOSE

2018/09.12 23:54:00

## Consulta de Pagos Masivos

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0912001	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES	12/09/2018	17:54:27	0011-0962-0100002931
Abonos Enviados	Mancía de Cargo	Importe Inicialmente Informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	572.00	INMEDIATA		ABONOS OK

No. Movimiento de Cargo	000003102
Fecha y Hora de Ejecución	12/09/2018 - 17:54:27
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	572.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
<b>TOTAL CARGADO</b>	<b>572.00 - SOLES</b>

Ver contenido de la planilla

Relación de las cuentas de abono

Seq	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cont. Doc.	Situación
1		0011-0112-0200090836	CONAFOVICER	R -	20100816611	572.00		EDITH.ROMERO@CONAFOVICER.COM	0	ABONO CORRECTO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte
- E : Carnet de Extranjero
- M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de la operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino	
		Días hábiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/o festivo público
-Banco de Crédito -Sustabank -Banco de Comercio -Credicor -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca	Hasta las 11:30 a.m.	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil	A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil
	Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil
	Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	A partir de las 4:30 p.m. del siguiente día útil
-Citibank -Banco de la Nación	Hasta las 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 4:30 p.m. del siguiente día útil
	Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	

*[Firma]*  
**CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

**307**  
*[Firma]*  
**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

# Pago de SENCICO



CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22856



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



## Constancia de Pago

Pago Varios - Formulario 1662

Número de orden : 287811657

RUC : 20600000439  
Razón social : CONSORCIO SAN JOSE  
Periodo : 08/2018  
Indicador de pago : 1 Tributo  
Tributo : 7031 SENCICO  
Importe pagado : S/. 95  
Número de operación: 000155299743  
Tipo de pago: Pago con cargo en cuenta de deducciones  
Banco: NACION  
Número de operación 0000000000492996013  
Fecha de operación bancaria: 18/09/2018 10:28:14




CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

# Informe de especialistas



CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22333



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717 310

# **INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE**

**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA  
CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ,  
DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE  
LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE".**

**SEPTIEMBRE – 2018**



CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO  
Reg. CIP N° 22038

**CONSORCIO  
SAN JOSÉ**

**FONDEPES**  
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>INFORME MENSUAL N° 45</b>	<b>SEPTIEMBRE - 2018</b>
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	<b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Página 1 de 17</b>

00 029

## ÍNDICE

<b>1.</b>	<b>DATOS DE LA OBRA.....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>2</b>
<b>3.</b>	<b>OBJETIVO .....</b>	<b>2</b>
<b>4.</b>	<b>ALCANCE .....</b>	<b>2</b>
<b>5.</b>	<b>ORGANIGRAMA .....</b>	<b>3</b>
<b>6.</b>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .....</b>	<b>3</b>
<b>7.</b>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL .....</b>	<b>7</b>
<b>8.</b>	<b>ESTADÍSTICAS SST.....</b>	<b>12</b>
<b>9.</b>	<b>REPORTE MENSUAL DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE: .....</b>	<b>14</b>
<b>10.</b>	<b>CONCLUSIONES: .....</b>	<b>15</b>
<b>11.</b>	<b>RECOMENDACIONES.....</b>	<b>15</b>
<b>12.</b>	<b>PANEL FOTOGRÁFICO: .....</b>	<b>16</b>



CARLOS ENRIQUE QU ROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22608

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>INFORME MENSUAL N° 45</b>	<b>SEPTIEMBRE - 2018</b>
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	<b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Página 2 de 17</b>

028

### 1. DATOS DE LA OBRA:

“Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”.

**TIEMPO DE EJECUCIÓN :** 1,204 días.  
**FECHA DE INICIO :** 15 de Enero de 2015.

### 2. INTRODUCCIÓN:

Consortio San José, viene ejecutando la obra: “Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”, para lo cual se espera conseguir la máxima identificación y compromiso por parte de la Dirección y de todos los trabajadores con los principios de Seguridad, Salud en el Trabajo y Conservación del Medio Ambiente, cumpliendo así con el Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente elaborado para la obra.

### 3. OBJETIVO

Demostrar la gestión del Consorcio San José, referente a Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente en el mes de Septiembre del 2018.

### 4. ALCANCE:

El presente informe plasma todas las actividades realizadas referentes a Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente en la Obra: “Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”.

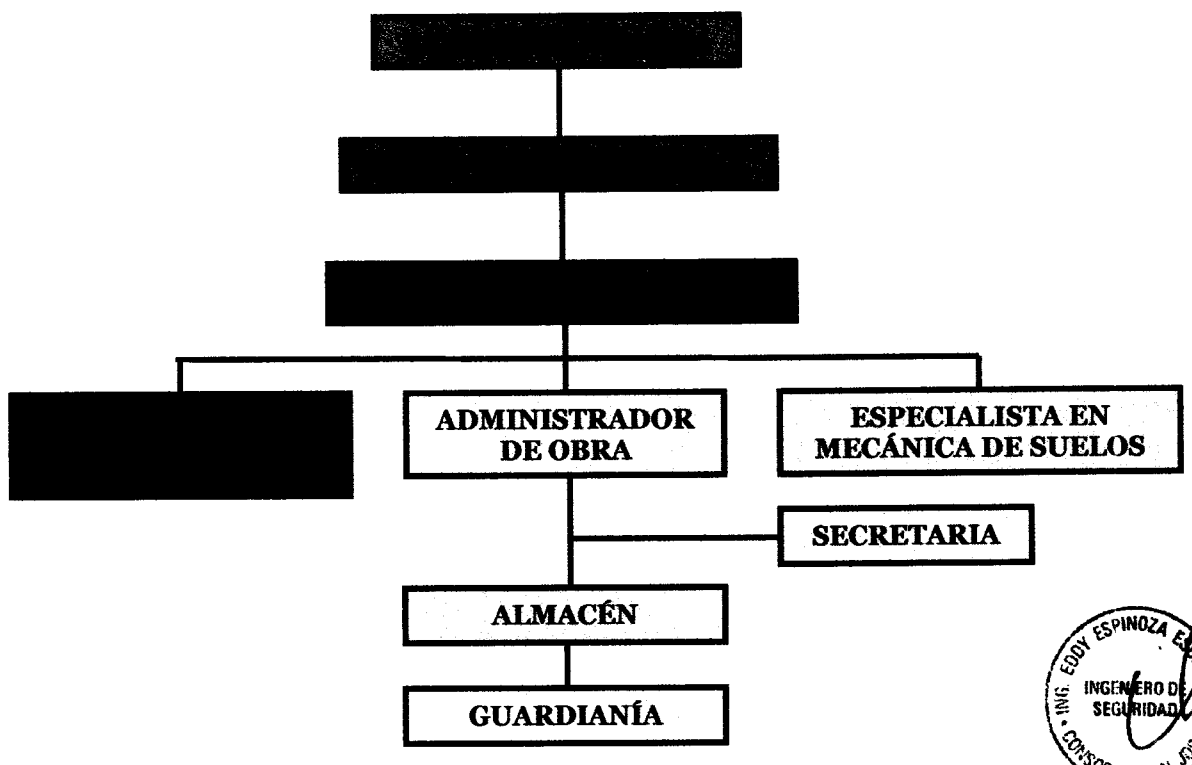
  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

  
 ING. EDDY ESPINOZA ESCOBAR  
 INGENIERO DE  
 SEGURIDAD  
 CONSORCIO SAN JOSÉ

00 027

**5. ORGANIGRAMA:**



**6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:**

**6.1. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:**

Aún no se conforma el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, por no contar con la cantidad necesaria para conformarla según Ley 29783.

**6.2. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**6.2.1. CUADRO ESTADÍSTICO DE CUMPLIMIENTO DE INSPECCIONES**

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNERO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22068

CONSORCIO SAN JOSÉ		INSPECCIONES																				EFICIENCIA DE RESPUESTA		
		"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"																						
MUELLE SAN JOSÉ - CHICLAYO																								
MES	HERRAMA MANUAL		HERRAMA ELECTR.		EXTINTORES		BOTIQUIN		CAMILLA		EPP's		ARNES		ANDAMIOS		VEHICULOS		GENERAL-OBRA		TOTAL MES	MES	ACUM.	
	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.				
JULIO	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	420	100%	100%	
AGOSTO	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	430	100%	100%	
<b>TOTAL INSPECCIONES</b>		44		44		44		44		44		44		44		44		44		44				

ISAIAS JOSE ALVA ESPINOZA

INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

00 026

### 6.3. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>		<b>ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO</b>				
<b>OBRA:</b>		<b>"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"</b>				
<b>FRENTE DE TRABAJO:</b>		<b>MUELLE SAN JOSE - CHICLAYO</b>				
<b>Nº</b>	<b>FECHA DE GENERACION</b>	<b>CANTIDAD DE TRABAJADORES</b>	<b>ANALISIS DE TRABAJO SEGURO</b>	<b>PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO</b>	<b>INSPECCION DE VEHICULOS</b>	<b>INSPECCION PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR</b>
1	01/09/2018	14	3	2	2	0
2	03/09/2018	14	2	2	1	0
3	04/09/2018	13	5	1	1	0
4	05/09/2018	13	5	3	1	0
5	06/09/2018	14	4	3	3	0
6	07/09/2018	10	3	1	2	0
7	08/09/2018	16	5	2	1	0
8	10/09/2018	12	3	2	2	0
9	11/09/2018	12	5	4	1	0
10	12/09/2018	11	3	3	1	0
11	13/09/2018	14	5	3	2	0
12	14/09/2018	14	3	3	1	0
13	15/09/2018	15	4	1	2	0
14	17/09/2018	11	2	2	1	0
15	18/09/2018	14	3	3	1	0
16	19/09/2018	13	3	3	2	0
17	20/09/2018	10	4	2	2	0
18	21/09/2018	13	3	2	1	0
19	22/09/2018	13	3	2	2	0
20	24/09/2018	13	3	2	1	0
21	25/09/2018	13	3	3	2	0
22	26/09/2018	14	4	3	2	0
23	27/09/2018	12	3	2	2	0
24	28/09/2018	12	3	1	1	0
25	29/09/2018	14	4	1	3	0
<b>TOTAL</b>			<b>88</b>	<b>56</b>	<b>40</b>	

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22658



<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>INFORME MENSUAL N° 45</b>	<b>SEPTIEMBRE - 2018</b>
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	<b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Página 5 de 17</b>

00 025

#### 6.4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

##### 6.4.1. INDUCCIÓN

En el presente mes de Septiembre no se realizó inducción a los trabajadores.

##### 6.4.2. CAPACITACIÓN


En el presente mes Septiembre no se realizó capacitación a los trabajadores.

##### 6.4.3. CHARLA 10 MINUTOS

En este mes se han desarrollado un total de 25 charlas de 10 minutos, teniendo un total de 54 horas hombres capacitados; abarcando temas de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente para el personal de campo y técnico, los mismos que se detallaron en el Cronograma Mensual de Reuniones Diarias.



  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717



024

CONSORCIO SAN JOSÉ		CRONOGRAMA MENSUAL DE REUNIONES DIARIAS						
N°	TEMA A EXPLICAR	TIPO DE REUNION	RESPONSABLE DE EJECUCION	FECHA	N° DE ASISTENTES	DURACION (MIN)	TOTAL HHC	HORA
	2018	SEPTIEMBRE	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"					
1	El peligro de la rutina	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	01/09/2018	14	10	2	07:20 a.m.
2	La Honestidad	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	03/09/2018	14	10	2	07:20 a.m.
3	Los trabajadores que piensan evitan accidentes	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	04/09/2018	13	10	2	07:20 a.m.
4	Lesiones a los dedos, las manos y muñecas	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	05/09/2018	13	10	2	07:20 a.m.
5	No podemos ganarle a las máquinas	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	06/09/2018	14	10	2	07:20 a.m.
6	No hay por qué romperse la espalda	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	07/09/2018	10	10	2	07:20 a.m.
7	Todos fuimos un día trabajadores nuevos	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	08/09/2018	16	10	3	07:20 a.m.
8	Los ojos	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	10/09/2018	12	10	2	07:20 a.m.
9	Objetos que caen	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	11/09/2018	12	10	2	07:20 a.m.
10	Protección del cuerpo contra el cemento	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	12/09/2018	11	10	2	07:20 a.m.
11	Mantener limpio el sitio de trabajo	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	13/09/2018	14	10	2	07:20 a.m.
12	Seguridad con las extensiones eléctricas	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	14/09/2018	14	10	2	07:20 a.m.
13	Conservemos lo que tenemos	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	15/09/2018	15	10	3	07:20 a.m.
14	Los sabia pero..... Se me olvido	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	17/09/2018	11	10	2	07:20 a.m.
15	Guardas de seguridad	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	18/09/2018	14	10	2	07:20 a.m.
16	Procedimientos de trabajo en caliente	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	19/09/2018	13	10	2	07:20 a.m.
17	La Salud	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	20/09/2018	10	10	2	07:20 a.m.
18	Herramientas de mano	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	21/09/2018	13	10	2	07:20 a.m.
19	Seguridad con las escaleras	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	22/09/2018	13	10	2	07:20 a.m.
20	Prevención de lesiones de espalda	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	24/09/2018	13	10	2	07:20 a.m.
21	Andamios	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	25/09/2018	13	10	2	07:20 a.m.
22	Protección auditiva	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	26/09/2018	14	10	2	07:20 a.m.
23	Protección visual	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	27/09/2018	12	10	2	07:20 a.m.
24	Trabajos en andamios	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	28/09/2018	12	10	2	07:20 a.m.
25	Primeros auxilios y accidentes	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	29/09/2018	14	10	2	07:20 a.m.
<b>TOTAL</b>								

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22006

*[Handwritten signature]*



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

SEPTIEMBRE - 2018

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>INFORME MENSUAL N° 45</b>	<b>SEPTIEMBRE - 2018</b>
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	<b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Página 7 de 17</b>

023

## 7. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

Las actividades realizadas en el mes de Septiembre, se vienen ejecutando de acuerdo al cronograma de Actividades de Plan de Gestión Ambiental.

Para ejecutar estas actividades se vienen aplicando los respectivos documentos, procedimientos y permisos debidamente aprobados, que permitan implementar el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente durante la fase de ejecución de la Obra.


### 7.1. COMPONENTES AMBIENTALES AFECTADOS PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES


En el presente punto solamente mencionaremos los componentes ambientales afectados de manera negativa, producto de las diversas actividades ejecutadas en la etapa de construcción de la obra durante el mes de Septiembre, no considerando necesario efectuar una descripción detallada del estado de dichos componentes, pues dicho detalle ha sido elaborado en la respectiva Línea de base del proyecto. Por ello los componentes ambientales afectados son los siguientes:

- Aire
- Suelo
- Mar
- Entorno paisajístico
- Salud y seguridad de la población y trabajadores

### 7.2. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN LOS COMPONENTES AMBIENTALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE:

A continuación mostramos los impactos ambientales generados, producto de las diversas actividades ejecutadas en la fase de construcción de la obra, en el mes de Septiembre. En la intersección de la actividad ejecutada con el componente afectado se describirá dichos Impactos, las variables e indicadores afectados.

  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



DENOMINACIÓN DEL IMPACTO	MEDIO AL QUE AFECTA	Carácter	IM: Magnitud	IS: Severidad	IE: Extensión	IP: Probabilidad	NRA: NIVEL DE RIESGO AMBIENTAL
Generación de partículas por el movimiento de maquinarias.	AIRE	-1	1	1	1	1	
Generación de partículas en suspensión por la demolición, preparado de concreto y actividades diversas.	AIRE	-1	1	1	1	1	
Generación de desechos sólidos por el descabezado de pilotes, preparado de concreto y actividades diversas.	MAR	-1	1	1	1	1	


**7.3 ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL FRENTE A LOS IMPACTOS GENERADOS:**


La estrategia de manejo ambiental, garantiza que la ejecución de las acciones y medidas de mitigación propuestas sean lo más objetivas y realistas posibles, a fin de que las posibles alteraciones que puedan producirse en el medio ambiente, encuentren una respuesta y sean minimizadas y/o mitigadas.

Las medidas ambientales de los impactos negativos generados por la ejecución de las actividades de la etapa de construcción de la obra sobre el medio ambiente, son planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, pero hay algunas medidas adicionales propuestas y ejecutadas durante el desarrollo de las actividades, necesarias para controlar, prevenir, evitar y/o compensar los impactos.

**7.4. ACTIVIDADES CONTROLADAS PROGRAMA DE MANEJO DE CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO:**

En las actividades ejecutadas durante el mes de Septiembre se han producido los siguientes impactos:

  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22036

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



CONSORCIO SAN JOSÉ	INFORME MENSUAL N° 45	SEPTIEMBRE - 2018
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 9 de 17

- Generación de partículas por el movimiento de maquinarias y fuertes vientos en esta época de trabajo.
- Generación de partículas en suspensión por la preparación de concreto y actividades diversas.
- Generación de desechos sólidos por el descabezado de pilotes, preparado de concreto y actividades diversas.

Por otro lado, durante este mes se han efectuado eventualmente las siguientes medidas de control para reducir y mitigar los efectos de los impactos ambientales generados:


- a) Se cuenta con cilindros de colores para la segregación de los residuos sólidos.
- b) Rociado diario de agua, mediante camiones cisternas, en toda el área de trabajo, para disminuir la generación de polvo por efectos de los fuertes vientos en la zona.
- c) A cada frente de trabajo, se le entrega bolsas plásticas para que segreguen sus residuos sólidos producto de sus actividades.
- d) Se ha ejecutado la charla de inducción de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente a todo el personal que ha ingresado a la obra. Además de las charlas diarias (charla de 10 minutos) reiterándola importancia del orden y limpieza en su área de trabajo e identificar los colores de los tachos y segregar correctamente los residuos.


#### 7.5. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Durante la ejecución de las actividades en la obra, se han generado residuos sólidos producto de las diversas actividades, así como residuos sólidos domésticos producto de las diversas actividades propias de los trabajadores.

Para mitigar y controlar los impactos generados por la generación de los residuos sólidos se han ejecutado las siguientes actividades:

- Se continúa utilizando los lugares de acopio para el almacenamiento temporal de residuos sólidos dentro del área de la obra.

  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



00 020

- Se implementó los cilindros que serán utilizados como depósitos de colores para el almacenamiento selectivo de residuos sólidos, de acuerdo al siguiente detalle:

Color del Cilindro	Características	Total Kg.
Azul	Materiales metálicos, fierros, etc.	5
	Material hecho de papel y cartón.	3
Blanco	Materiales donde su compuesto es de plástico.	2.5
Verde	Materiales de vidrios, botellas, etc.	0
Marrón	Restos de alimentos, Jardinería, etc.	3
Rojo	Materiales Peligrosos.	4
<b>TOTAL Kg.</b>		

## 7.6 REPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS

### a) REPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>REPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS-RESTOS DE CONSTRUCCION</b>			
<b>OBRA:</b>	<b>CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE</b>			
<b>FRENTE DE TRABAJO:</b>	<b>MUELLE DE SAN JOSE-CHICLAYO</b>			
TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	ACUMULADO	OBSERVACIONES
Restos de alimentos	Kg.	3.0	18.0	Ninguna
Papel/Cartón	Kg.	3.0	18.0	Ninguna
Bolsas de papel pastificadas (Cemento, etc.)	Kg.	4.0	11.5	Ninguna
Plastico PVC (Botellas, tubos, envases y acrilicos)	Kg.	2.5	17.0	Ninguna
Tecknopor.	Kg.	1.0	2.5	Ninguna
Chatarra y cable eléctricos.	Kg.	5.0	203.0	Ninguna
Madera	Kg.	3.0	27.0	Ninguna
Residuos de vidrio/ ceramica.	Kg.	0.0	0.0	Ninguna
<b>TOTAL MES</b>				

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



019

**b) REPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS**

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>REPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS SOLIDOS</b>			
<b>OBRA:</b>	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE			
<b>FRENTE DE TRABAJO:</b>	MUELLE DE SAN JOSE-CHICLAYO			
<b>TIPO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Recipientes de sustancias quimicas	Kg.	2.0	6.0	Ninguna
<b>TOTAL MES</b>				

**8. ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

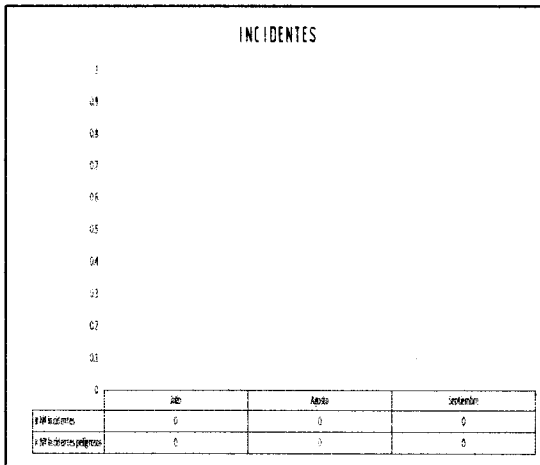

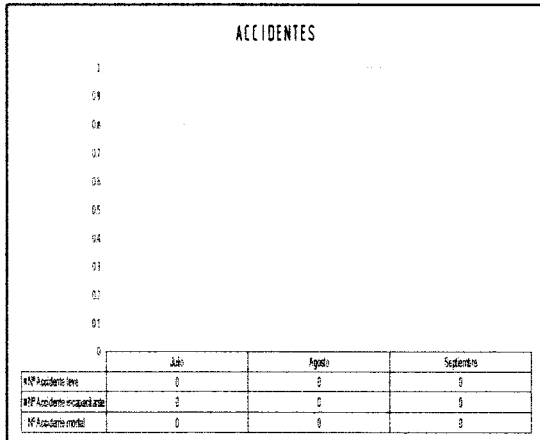
<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>														
<b>OBRA</b>	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE REGION LAMBAYEQUE"														
<b>Mes</b>	<b>N° trabajadores</b>	<b>N° Accidente mortal</b>	<b>N° Accidente leve</b>	<b>ACCIDENTE INCAPACITANTE</b>					<b>ENFERMEDAD OCUPACIONAL</b>						
				<b>N° Accidente incapacitante</b>	<b>Total horas hombre trabajadas</b>	<b>N° días perdidos</b>	<b>Índice frecuencia</b>	<b>Índice gravedad</b>	<b>Índice accidentabilidad</b>	<b>N° enfermedades ocupacionales</b>	<b>N° trabajadores o expuestos al agente</b>	<b>Tasa de incidencia</b>	<b>N° trabajadores con cancer profesional</b>	<b>N° Incidencias peligrosas</b>	<b>N° Incidencias</b>
Julio	16	0	0	0	2935.5	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0
Agosto	14	0	0	0	2932.5	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		0	0	0	5868	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0

ING. EDDY ESPINOZA ESPINOZA  
INGENIERO DE SEGURIDAD  
CONSORCIO SAN JOSÉ

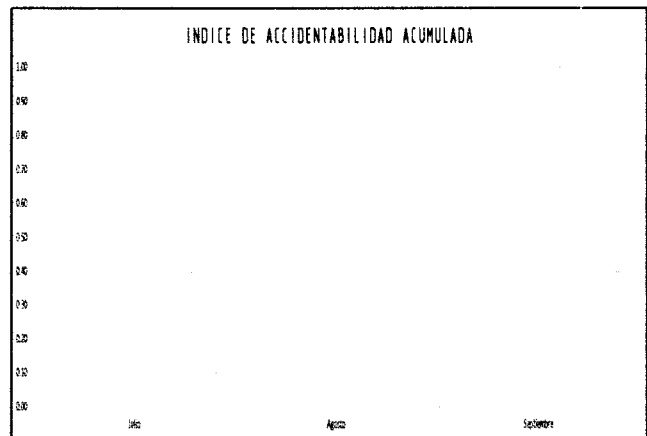
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

<b>OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SST</b>	<b>Indice Frecuencia</b>	<b>Indice gravedad</b>	<b>Indice accidentabilidad</b>
--	--------------------------	------------------------	--------------------------------



MES	INDICE DE FRECUENCIA	INDICE DE GRAVEDAD ACUMULADA	INDICE DE ACCIDENTABILIDAD ACUMULADA	INDICE DE FRECUENCIA ACUMULADA	INDICE DE GRAVEDAD ACUMULADA	INDICE DE ACCIDENTABILIDAD ACUMULADA
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. C.P. N° 22668

**ISAIAS JÓRGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717




017

**9.1. CÁLCULO ESTADÍSTICO DE ÍNDICE DE FRECUENCIA, ÍNDICE DE SEVERIDAD, ACCIDENTABILIDAD Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES:**

Para el cálculo del índice de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad se utilizaran las siguientes formulas según la NTE G 050.

Índice de Frecuencia Mensual	<b>IFm</b>	$\frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el mes X 200000}}{\text{Número horas trabajadas en el mes}}$
Índice de Gravedad Mensual	<b>IGm</b>	$\frac{\text{Días perdidos en el mes X 200000}}{\text{Número horas trabajadas en el mes}}$
Índice de Frecuencia Acumulado	<b>IFa</b>	$\frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el año X 200000}}{\text{Horas trabajadas en lo que va del año}}$
Índice de Gravedad Acumulado	<b>IGa</b>	$\frac{\text{Días perdidos en el año X 200000}}{\text{Horas trabajadas en lo que va del año}}$
Índice de Accidentabilidad	<b>IA</b>	$\frac{\text{IFa x IGa}}{200}$



  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22658

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717



## 9. REPORTE MENSUAL DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>		<b>REPORTE MENSUAL - SEPTIEMBRE 2018</b>	
<b>OBRA:</b>	"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"		
<b>FRENTE DE TRABAJO:</b>	<b>MUELLE DE SAN JOSE - CHICLAYO</b>		
1	Cantidad de Trabajadores	14	Trabajadores
2	Días Trabajados Sin Accidentes Incapacitantes	25	días
3	Total Accidentes Sin Tiempo Perdido (Accidentes Leves)	0	Unidad
4	Total Accidentes Con Tiempo Perdido (Accidentes Graves)	0	Unidad
5	Total Días Perdidos Por Accidentes Incapacitantes	0	días
6	Total Accidentes Fatales Reportados	0	Unidad
7	Record Horas Mensual Sin Accidentes Incapacitantes	2754	Hrs
8	Record Horas Acumuladas Sin Accidentes Incapacitantes	5686.5	Hrs
9	Total Accidentes de Tránsito	0	Unidad
10	Total Accidentes con Daño Material	0	Unidad
11	Total Incidentes	0	Unidad
12	Total Derrames	0	Unidad
13	Total Enfermedades Ocupacionales Reportada	0	Unidad
<b>ACTIVIDADES</b>			
1	Charlas Diarias	54	Hrs Hombre
2	Capacitaciones	0	Hrs Hombre
3	Induccion Trabajador Nuevo	0	Hrs Hombre
4	Analisis de Trabajo Seguro	88	Unidad
5	Permiso Escrito Para Trabajador de Alto Riesgo	56	Unidad
6	Inspeccion Pre Operacional de Vehiculos	40	Unidad
7	Inspeccion Pre Operacional de Minicargador	2	Unidad
8	Selección de Residuos No Peligrosos- Punto Limpio	21.5	Kg.
9	Selección de Residuos Peligrosos- Punto Limpio	2.0	Kg.
10	Eliminacion Residuos No Peligrosos Acumuldo	297.0	Kg.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22008

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



**10. CONCLUSIONES**


015

- En este mes se tuvo cero incidentes y accidentes en obra, habiendo informado en su respectivo momento a la alta gerencia.
- En el presente mes se obtuvo como resultado cero en las pruebas de alcoholemia.
- En el presente mes no se reportó ningún tipo de derrames dentro de obra las que pudieran ocasionar contaminación alguna.
- Se viene ejecutando las inspecciones mensuales de seguridad y salud en el trabajo: botiquín, extintores, camilla, herramientas manuales, vehículos y equipos de protección personal.
- A cada frente de trabajo, se les entregó bolsas plásticas negras para que desechen los residuos generados durante su labor.

**11. RECOMENDACIONES**

- Cumplir con el cronograma semanal para continuar con la realización de las faenas de limpieza de toda la obra donde participan todo el personal obrero y técnico.
- Continuar con las pruebas de alcoholemia al inicio de los trabajos.
- Realizar el seguimiento de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo: botiquín, extintores, camilla, herramientas manuales, vehículos y equipos de protección personal.

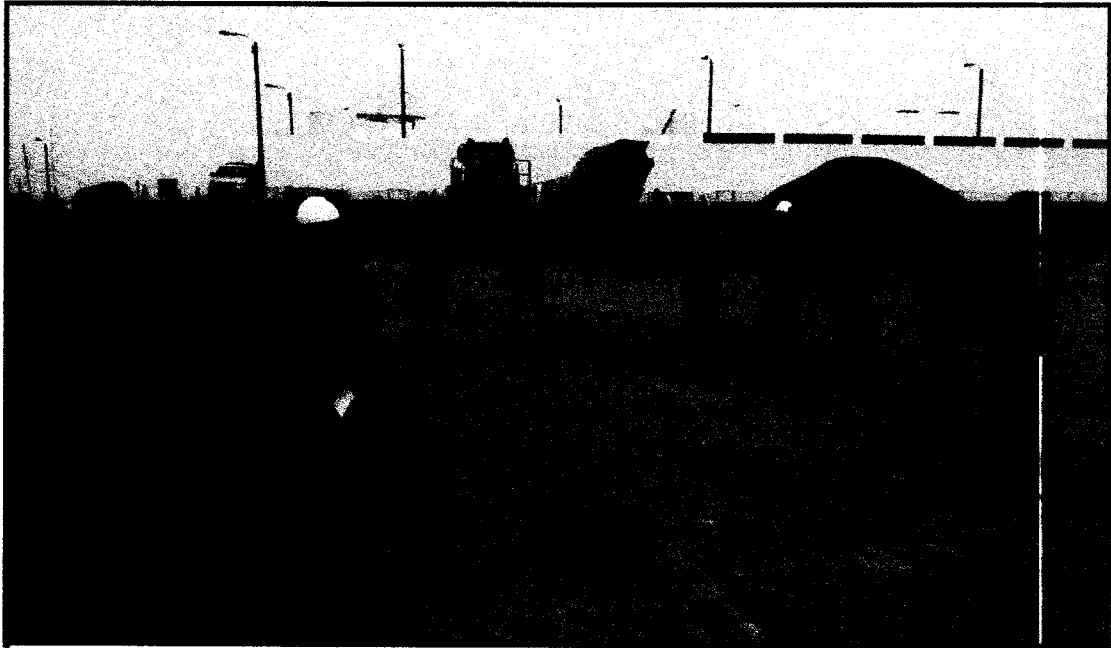


  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
 INGENIERO  
 Reg. CIP N° 22008

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**12. PANEL FOTOGRÁFICO**


00 014



**Imagen N°01: Charlas diarias antes de iniciar las labores**



**Imagen N°02: Personal con su respectivo equipo de protección personal**

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22008

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL







**Imagen N°03: Punto de Reunión**



**Imagen N°04: Pruebas de alcoholemia**

  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858


  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



# Cuaderno de obra (Copia)



CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22000



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

# CUADERNO DE OBRA

Nº 64

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_ 011

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 1847 Del Supervisor 01/09/2018

El contratista está presentando los metrados de avance de la obra, respecto a trabajos correspondientes al presupuesto contractual como al adicional N° 07, los mismos que servirán de sustento de la autorización del mes de Agosto - 2018 se autoriza al contratista a realizar trabajos con autorización oficial a la fecha (Contractual + Adicional 07)

*[Signature]*

Asiento N° 1848 03-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita autorización al supervisor de obra para el transporte de 02 pilotes de 45x45 y la viga transversal ubicado en el eje N° 125, estos trabajos comprenden al presupuesto contractual.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO  
Reg. CIP N° \_\_\_\_\_

Asiento N° 1849 Del Supervisor 03/09/2018

Se autoriza transportar pilotes y viga transversal prefabricados hacia los ejes del muelle que se viene trabajando, comprendidos dentro del presupuesto contractual

*[Signature]*

Asiento N° 1850 04-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita autorización al supervisor de obra para el hincado del pilote vertical de 45x45 ubicado en el eje N° 125, después el respectivo desahogado para la colocación de la viga transversal, estos trabajos comprenden al adicional N° 07 y presupuesto contractual.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO  
Reg. CIP N° \_\_\_\_\_  
ING. RESIDENTE

ING. INSPECTOR

ING. SUPERVISOR

# CUADERNO DE OBRA

Nº 65

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Activo N° 1851 del Supervisor 04/09/2018  
Se autoriza al contratista a realizar los trabajos que se  
pide en el plan de obras.  
Sin embargo se dejó constancia que los avances son lentos  
por lo que se pide que el contratista, viene siendo reformu-  
lado, no teniendo un informe integral a la fecha.

*[Handwritten signature]*

Activo N° 1852 05-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita autorización al supervisor de obra para el transporte y colocación de  
02 losas numeradas tipo IV correspondiente entre los ejes 124-125 como se muestra en el traslado  
de los pilotes de 45x45 para el hincado de los pilotes inclinados en el núcleo  
del 124-125.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO  
Reg. CIP N° 22036

Activo N° 1853 del Supervisor 05/09/2018

Se autoriza al contratista a realizar los trabajos solicitados  
las mismas que corresponden al presupuesto contractual, se que  
pendiente la autorización integral de FONDEPES respecto a las  
modificaciones del plan de obras.

*[Handwritten signature]*

Activo N° 1854 06-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se comunica al supervisor de obra que a la fecha no podemos realizar los trabajos de  
07.03.05 JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES y 07.03.07 LOSAS VAGADAS IN SITU a consecuen-  
cia de recibida la carta N° 702-2018-FONDEPES/DIGENIPAA por parte de FONDEPES don-  
de está adjuntando la memoria de cálculo estructural por el puente de acceso y el  
plano EP-07, la carta SN-2018-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 05/07/2018 donde se  
incluye adjunta documentos para la autorización del trazo de puente de acceso del

CONTINUAR

ING. INSPECTOR

CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
ING. RESIDENTE  
Reg. CIP N°

ING. SUPERVISOR

# CUADERNO DE OBRA

Nº 66

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_ 00 009

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Visto Acuerdo nº 1854 06-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

muelle comprendidos entre los ejes 112 al 119 adjuntando el plano EP-08 y la carta N° 914-2018-FONDERES/DIGENPAA donde la entidad adjunta documentos para la optimización del tramo de puente de acceso del muelle comprendidos entre los ejes 120 al 127 adjuntando el plano EP-09 y memoria de cálculo. Los cortes mencionados líneas arriba y los planos EP-07, EP-08 y EP-09 obedecen a trabajos adicionales (PILOTES INCLINADOS) Que serán ejecutados una vez la entidad apruebe el presupuesto, sin embargo comunicamos que por proceso constructivo se está interfiriendo con la ejecución de los trabajos contractuales y además son críticos según el cronograma actualizado vigente por esa razón dejamos como antecedente que a la fecha se están generando atrasos en el cumplimiento de nuestro contrato por causas no atribuibles al contratista señalado en el artículo N° 201 del PLCE.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO  
REG. CIP N° 24000

Acuerdo N° 1855 Del Supervisor

06/09/2018

El contratista ha efectuado el recuento de hechos que se viene sucediendo respecto a las comunicaciones de la Entidad, respecto a la Nautas del Acuerdo al 07, que se adoptaran a futuro, pero no oficializadas formalmente para que se pueda efectuar los trabajos de manera INTEGRAL.

Carlos Enrique Quiroz

Acuerdo N° 1856 07-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se comunica al supervisor de obra que se aprueba un instrumento del alaje sobre la zona de trabajo lo cual ha ocasionado la paralización de los pontidos de MANIOBRA DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS PUENTES hasta que condiciones climatológicas sean los óptimos para continuar con los trabajos sobre mar. La información respecto a este instrumento comprende al AVISO ESPECIAL N° 56 emitido por la marina de guerra del Perú a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación.

ING. INSPECTOR

CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
ING. RESIDENTE  
REG. CIP N° 22886

ING. SUPERVISOR



# CUADERNO DE OBRA

Nº 67

008

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Acto N° 1857 Del Supervisor 08/09/2018

En días anteriores se ha presentado variaciones significativas en el oleaje del mar, que por razones de seguridad, se ha restringido al pocas maniobras.

Estas variaciones han sido confirmadas y comunicadas por la Flota de Guerra del Perú a todo el litoral.

Estamos a 30 días del vencimiento del plazo contractual, así que se ha aprobado las modificaciones del contrato 09

Acto N° 1858 10-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se comunica al supervisor de obra que continúa el incremento de oleaje sobre la zona de trabajo lo cual ha ocasionado la paralización de los partidas de MANIOBRAS DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, UIGAS Y LOSAS PUENTES hasta que condiciones climatológicas sean las óptimas para continuar con los trabajos sobre mar.

La información respecto a este incremento corresponde al AVISO ESPECIAL N° 57 emitido por la Marina de Guerra del Perú a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
ING. TERC  
Reg. CIP 10/09/2018

Acto N° 1859 Del Supervisor

El incremento del oleaje y vientos significativos continúan a la fecha, lo que repercute en el avance de los trabajos, que vienen siendo limitados, al no oficializarse el nuevo Acto que complementará el contrato 09

Acto N° 1860 13-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se comunica al supervisor de obra que continúa el incremento de oleaje sobre la zona de trabajo lo cual ha ocasionado la paralización de los partidas de MANIOBRAS DE COLOCACION

CONTINUA

ING. INSPECTOR

CARLOS ENRIQUE QUIROZ C.I.C.  
INGENIERO EN TERC  
Reg. CIP N° 22858

ING. SUPERVISOR

333

# CUADERNO DE OBRA

Nº 68

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_ 007

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Orden Arzobispo N° 1860 13-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

El HINCADO DE FILOTES, VIGAS Y LOSAS Puentes hasta que condiciones climatológicas sean las óptimas para continuar con los trabajos sobre mar.

La información respecto a este movimiento corresponde al aviso n° 58 emitido por la marina de guerra del Perú a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO  
Reg. CIP N° 44/09/2018

Orden N° 1857 Del Supervisor

Se mantienen las condiciones meteorológicas desde días anteriores, lo que viene restringiendo el avance de los trabajos limitados que viene realizando el contratista.

Teniendo en cuenta que el plazo contractual vence el 06/10/2018 dicho plazo se incrementará por las faltas anteriormente mencionadas.

Orden N° 1862 18-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita autorización al supervisor de obra para el transporte de 02 pilotes de 45 X 45 que está colocado en el eje N° 126, estos trabajos corresponden al presupuesto contractual.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO  
Reg. CIP N° 19/09/2018

Orden N° 1863 Del Supervisor

Se autoriza al contratista el transporte de pilotes que serán hincados en el eje 126.

Los trabajos que se viene realizando son difíciles, teniendo en cuenta que colateralmente deben efectuarse trabajos complementarios en el muelle que por disposiciones se pudiesen no pueden realizarse, mientras no se presente con la autorización oficial.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ  
INGENIERO  
R.O.C. RESIDENTE

ING. INSPECTOR

ING. SUPERVISOR

# CUADERNO DE OBRA

Nº 69

006

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Anexo N° 1864 20-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita autorización al supervisor de obra para el hincado del pilote vertical de 45x45 ubicado en el eje N°126, después el respectivo desdoblado para la colocación de la viga transversal, estos trabajos comprenden el adicional 107 y presupuesto contractual.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO C  
Reg. CIP N° \_\_\_\_\_

Anexo N° 1865 del Supervisor 20/09/2018

Se autoriza trabajos solicitados por el contratista.  
En la fecha la supervisión hace entrega de la Carta U°079-SUPER-SJOC-2018 en la que se solicita el pago de \$199,966.06 por conceptos de servicios por ampliaciones de plazo que se encuentran en PAGOS

Anexo N° 1866 21-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita autorización al supervisor de obra para el transporte y colocación de 02 losos remados tipo IV comprendente entre los ejes 125-126 como el traslado de 4 pilotes de 45x45 para el hincado de los pilotes verticales (02 und) en el eje 127 y (02 und) en el eje 128.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO C  
Reg. CIP N° \_\_\_\_\_

Anexo N° 1867 del Supervisor 21/09/2018

Se autoriza al contratista ejecutar los trabajos solicitados en el Anexo anterior.

Se dejó constancia que los pilotes, vigas y fosas prefabricadas hace tiempo, han visto comprometidos parcialmente el acero de enlace actualmente expuesto, razón por la cual se está exigiendo su limpieza superficial y adición de epóxicos que detengan el proceso de oxidación.

ING. INSPECTOR

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
ING. RESIDENTE  
Reg. CIP N° 22858

ING. SUPERVISOR

# CUADERNO DE OBRA

Nº 70

0005

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento Nº 1868 22-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita autorización al supervisor de obra para el desdoblado de pilotes del eje 127 y 128 como también el transporte y colocación de vigas en los ejes 127-128 como el vaciado de concreto.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ C  
INGENIERO  
Reg. CIP Nº \_\_\_\_\_

Asiento Nº 1869

Del Supervisor

22/09/2018

Se autoriza al contratista realizar los trabajos solicitados, adoptando las medidas de seguridad tanto de los equipos, así como la de los trabajadores con todas las medidas de seguridad en el desempeño de sus labores.

Asiento Nº 1870

24-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita autorización al supervisor de obra para el transporte y colocación de 02 hornos numerados tipo IV comprendiente entre los ejes 126-127 como el traslado de 2 pilotes de 45x45 para el hincado de los pilotes verticales en el eje 129, desdoblado y colocación de la viga transversal en el eje 129.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 22858

Asiento Nº 1871

Del Supervisor

25/09/2018

Se autoriza trabajos solicitados por el contratista, recordando continuamente adoptar las medidas de seguridad del personal y equipos que vayan utilizando.

A la fecha no se cuenta con el expediente oficial del J. Licenciat que contenga todas las modificaciones del personal O.T. lo que viene influyendo en el desarrollo normal de los trabajos.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 22858  
ING. RESIDENTE

ING. INSPECTOR

ING. SUPERVISOR

# CUADERNO DE OBRA

Nº 71

004

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Acuerdo N° 1872 26-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita autorización al supervisor de obra para el transporte e hincado de 02 pilotes inclinados de 45X45 para el núcleo entre los ejes 128-129 como su respectivo desahogado, trabajos comprenden al adicional N° 07 y presupuesto contractual.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

Acuerdo N° 1873 del Supervisor

26/09/2018

Se autoriza los trabajos solicitados por el contratista en el acuerdo anterior.

Se recibe una vez más que los trabajos vienen desarrollándose por lentitud, debido a la demora, en la aprobación del nuevo adicional.

Acuerdo N° 1874 27-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita autorización al supervisor de obra para el transporte e hincado de 02 pilotes inclinados de 45X45 para el núcleo entre los ejes 128-129 como su respectivo desahogado, trabajos comprenden al adicional N° 07 y presupuesto contractual.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

Acuerdo N° 1875

27/09/2018

Se autoriza al contratista a realizar los trabajos que solicita en el acuerdo anterior.

Se deja constancia que a diez (10) días del vencimiento del plazo contractual, aún no hay pronunciamiento oficial de FONDEPE, respecto al nuevo adicional que complementará los trabajos en el HUELLE, de manera que se pueda avanzar la obra de manera ordenada y coherente.

ING. INSPECTOR

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
ING. RESIDENTE  
Reg. CIP N° 22858

ING. SUPERVISOR

# CUADERNO DE OBRA

Nº 72  
003

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
OBRA: \_\_\_\_\_  
PROYECTO: \_\_\_\_\_  
PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Anexo nº 1876 28-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita autorización al supervisor de obra para el transporte e hincado de 04 pilotes inclinados de 45x45 pilote para el núcleo entre los ejes 126-127 como su respectivo desahogado, trabajos comprenden al adicional nº 07 y punto contractual.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ C.  
INGENIERO  
Reg. CIP Nº 28/09/2018

Acuerdo N° 1877 del Supervisor

Se autoriza realizar trabajos solicitados por el contratista, los recursos que corresponden al presupuesto contractual y/o al adicional 07.

Se viene adoptando las medidas de seguridad del personal así como de los equipos que se viene utilizando

Anexo nº 1878 29-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita autorización al supervisor de obra para el ductado de los 02 pilotes hincados en el núcleo 126-127 como el traslado del los, horas remudas comprenden al mismo núcleo.

También se requiere autorización para el traslado e hincado de 02 pilotes verticales de 45x45 en el eje 130 con su respectiva colocación de riego horizontal, trabajos comprenden al adicional nº 07 y presupuesto contractual.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ C.  
INGENIERO  
Reg. CIP Nº 28/09/2018

Acuerdo N° 1879

del Supervisor

29/09/2018

Se autoriza trabajos solicitados por el contratista, dejando constancia que desde que se aprobó el adicional 07 hasta la fecha no se ha podido realizar trabajos desde el eje 104 al 130 debido a la demora en la aprobación total de los trabajos a realizar en todo el Muelle como consecuencia de las modificaciones

CARLOS ENRIQUE QUIROZ C.  
INGENIERO  
RESIDENTE  
Reg. CIP Nº 22858

ING. INSPECTOR

ING. SUPERVISOR

# CUADERNO DE OBRA

Nº 73

002

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Acuerdo nº 1880 30-09-2018 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita autorización al supervisor de obra para el traslado de los lora nomados entre los ejes 129-130 como también el traslado e hincado de 02 pilotes verticales correspondientes al eje 131 y con el desahogado y colocación de la riga transversal y los lora nomados, correspondiente al mismo núcleo.


También se requiere autorización para el traslado e hincado de 02 pilotes verticales de 45x45 m el eje 130 con su respectiva colocación de riga transversal, trabajos comprenden al adicional nº 07 y presupuesto contractual.

Se detallan los metrados convalidados con el supervisor de obra, correspondiente a la valoración obra contractual nº 45 - Setiembre del 2018, solicitando su trámite respectivo ante la entidad:

ITEM	DESCRIPCION
07	Obras en mar
07.04	Cableo L=50.00m
07.04.07	Maniobra de colocación e hincado de pilotes, rigas y lora puntos
07.04.07.01	Transporte de pilote
07.04.07.03	Transporte de lora nomada
07.04.07.06	Desahogado de pilotaje
07.04.07.07	Colocación de riga transversal
07.04.07.08	Colocación de lora nomada

Así mismo se detallan los metrados convalidados con el supervisor de obra correspondiente a la valoración nº 07 del Adicional nº 07 - Setiembre del 2018, aprobado con resolución Jefatural nº 025-2018-FONDEPES/S, solicitando su trámite respectivo ante la entidad:

ITEM	DESCRIPCION
01.	Refuerzo de pilote con riel de 80 lb/yd
01.01	Obras en mar
01.01.01	Maniobra de colocación e hincado de pilotes, rigas y lora puntos
01.01.01.03	Hincado de pilote en suelo compacto

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO C<sup>1</sup>  
 REG. CIP Nº 22506  
 ING. RESIDENTE

ING. INSPECTOR

ING. SUPERVISOR

# CUADERNO DE OBRA

Nº 74

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_ 001

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_


PROGRAMA: \_\_\_\_\_


ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Acuerdo N° 1881 del Supervisor 30/09/2018

El contratista está presentando un listado de partidas cosas pendientes al contrato principal, así como al adicional 07 cuyos metrados serán evaluados previamente antes de formular la valoración correspondiente.

Es indudable que la obra se encuentra ATRASADA, debido a la demora de la Entidad en definir y aprobar INTERSOLUCIÓN los trabajos complementarios a realizar en el MUELLE, lo que permitirá un avance sostenido los trabajos hasta su totalidad.



  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
ING. RESIDENTE

ING. INSPECTOR

ING. SUPERVISOR
