



MEMORANDO N° 4388-2018-FONDEPES/DIGENIPAA

A: TERESA ZENAI DA QUIROZ SILVA  
Jefa de la Oficina General de Administración

Asunto: PAGO DE VALORIZACIÓN DE OBRA N°5 DEL ADICIONAL N°1 DE OBRA-  
DE NOVIEMBRE 2018  
CONTRATO N° 038-2017-FONDEPES PARA LA EJECUCION DEL SALDO  
DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL  
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE  
MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION  
TACNA”

Referencia: a) CARTA N°176-2018-CONS/AHJ/RL-MORRO SAMA  
b) INFORME N°175 -2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/bvs

Fecha: Lima, ~~11~~ 12 DIC 2018

Por medio de la presente, me dirijo a usted para saludarlo y manifestarle que, de acuerdo a lo indicado en el asunto del presente documento, el contratista de Supervisión ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA, ha presentado la VALORIZACION DE OBRA N°05 DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA del contratista CONSORCIO OBRAS, integrado por las empresas J.P.C. INGENIEROS S.A.C. y SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C. encargado de la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA”; correspondiente mes de noviembre del 2018.

En vista de lo solicitado y tal como se indica en la Carta y el Informe de la referencia; se han cumplido con todos los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, su contrato, las bases integradas y demás documentos que forman parte integrante del expediente de contratación; por lo que esta Dirección concluye que LA ENTIDAD debe realizar el pago de la Valorización de Obra N° 05 del Adicional N° 01 de Obra, dentro de los plazos establecidos.

Cabe precisar que en caso el contratista CONSORCIO OBRAS incurriera en alguna falta que genere la aplicación de cualquiera de las penalidades previstas en su contrato o haya algún deductivo, los cálculos se realizarán en la liquidación final de obra.


Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración.

Atentamente;



FONDEPES

Ing. Luis Alberto Bardiari Quino  
Director General de Inversión  
Pesquera Artesanal Y Acuicola




LABQ/RAMG/bvs



## CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por el presente documento, que el director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, al suscribir la presente; da su conformidad para realizar el pago por concepto de **VALORIZACIÓN DE OBRA N°5 DEL ADICIONAL N°1 – mes de NOVIEMBRE 2018**, por la suma **S/. 14.498.03** incluido el IGV (Catorce Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho con 03/100 Soles), a favor del contratista **CONSORCIO OBRAS**, integrado por las empresas **J.P.C. INGENIEROS S.A.C.** y **SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C.**, encargado de la Ejecución de Obra: **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA”**, según **CONTRATO N°038-2017-FONDEPES**.

Lima, .....



**FONDEPES**

.....  
Ing Luis Alberto Barlieri Quino  
Director General de Inversión  
Pesquera Artesanal Y Acuicola



PERU Ministerio de la Producción



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04812574

Usuario: usuario\_digenipaa3

Fecha: 11/12/2018

Hora: 17:01



### CARGO 00262-2018-FONDEPES/MML

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

Asunto: CARTA N° 176-2018-CONS-AHJ-RL-MORRO SAMA  
REMITE VALORIZACIÓN N° 05 DEL ADICIONAL N| 01 DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018-ELABORADO POR ESTA SUPERVISION REF: DPA MORRO SAMA - TACNA


Referencia:

Fecha: 11/12/2018

Observación: SE DERIVA PARA TRAMITE RESPECTIVO, S/ 14,498.03 DPA MORRO SAMA, VALORIZACIÓN 05, ADICIONAL 1, CON CERTIFICACIÓN 1739. FUENTE 13

Atentamente,

MORGAN LEON MAGALI






**INFORME N°175-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/bvs**

A: **ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO**  
Director General de la DIGENIPAA

Asunto: **VALORIZACION DE OBRA N°05 DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA NOVIEMBRE 2018 – CONSORCIO OBRAS (J.P.C. INGENIEROS S.A.C. y SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C.) CONTRATO N° 038-2017-FONDEPES PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"**

Referencia: **CARTA N°176-2018-CONS/AHJ/RL-MORRO SAMA**

Fecha: **Lima, 7 de diciembre de 2018**



Por medio de la presente, me dirijo a usted para saludarlo y manifestarle que, de acuerdo al documento de la referencia, el **ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA** encargado de la Supervisión de la Obra; ha presentado la **VALORIZACION DE OBRA N° 05 DEL ADICIONAL N° 01 DE OBRA** del contratista **CONSORCIO OBRAS**, integrado por las empresas **J.P.C. INGENIEROS S.A.C. y SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C.** encargado de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"; correspondiente al mes de noviembre 2018. Al respecto, debo manifestar lo siguiente:

**ANTECEDENTES**

1.1 Datos generales:

Nombre del Proyecto:	<b>MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA</b>
Proceso de Selección:	<b>ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2017-FONDEPES, derivada de la LICITACION PUBLICA N° 0004-2017-FONDEPES</b>
Contrato de Obra:	<b>CONTRATO N° 038-2017-FONDEPES</b>
Fecha de Firma de Contrato:	<b>02 DE NOVIEMBRE DE 2017</b>
Sistema del Contrato:	<b>PRECIOS UNITARIOS</b>
Monto de Contrato:	<b>S/ 3'680,960.43 (TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 43/100 SOLES)</b>
Contratista Ejecución de Obra:	<b>CONSORCIO OBRAS (J.P.C. INGENIEROS S.A.C. y SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C.)</b>
Residente de Obra:	<b>ING. OSCAR LUÍS LICOTA COAQUIRA</b>
Contratista Supervisión de Obra:	<b>ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA</b>
Supervisor de Obra:	<b>ING. DAVID MANUEL VELA FARFÁN</b>
Plazo de Obra:	<b>75 (SETENTA Y CINCO) DIAS CALENDARIO</b>
Fecha de Entrega de Terreno:	<b>17 DE NOVIEMBRE DE 2017</b>
Fecha de Inicio de Obra:	<b>28 DE NOVIEMBRE DE 2017</b>





Fecha de Término Contractual:	<b>10 DE FEBRERO DE 2018</b>
Ampliación de Plazo N°01:	<b>25 DÍAS CALENDARIO</b>
Fecha de Término Ampliación de Plazo N°01:	<b>07 DE MARZO DE 2018</b>
Ampliación de Plazo N°02:	<b>30 DÍAS CALENDARIO</b>
Fecha de Término Ampliación de Plazo N°02:	<b>06 DE ABRIL DE 2018</b>
Ampliación de Plazo N°03:	<b>31 DÍAS CALENDARIO</b>
Fecha de Término Ampliación de Plazo N°3	<b>07 DE MAYO DEL 2018</b>
Ampliación de Plazo N°04:	<b>25 DÍAS CALENDARIO</b>
Fecha de Término Ampliación de Plazo N°4	<b>01 DE JUNIO DEL 2018</b>
Ampliación de Plazo N°05:	<b>7 DÍAS CALENDARIO</b>
Fecha de Término Ampliación de Plazo N°5	<b>08 DE JUNIO DEL 2018</b>
Ampliación de Plazo N°06:	<b>26 DÍAS CALENDARIO</b>
Fecha de Término Ampliación de Plazo N°6	<b>04 DE JULIO DEL 2018</b>
Ampliación de Plazo N°14:	<b>06 DÍAS CALENDARIO</b>
Fecha de Término Ampliación de Plazo N°14	<b>23 DE OCTUBRE DE 2018</b>
Ampliación de Plazo N°15:	<b>06 DÍAS CALENDARIO</b>
Fecha de Término Ampliación de Plazo N°15	<b>29 DE OCTUBRE DE 2018</b>

1.2 Mediante **MEMORANDO N°1246-2017-FONDEPES/DIGENIPAA**, se aprueba el Expediente Técnico para la Ejecución del Saldo de Obra: **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA”**, con código **SNIP N° 272805**, con un monto de inversión de **S/. 3'718,141.85 (Tres Millones Setecientos Dieciocho Mil Ciento Cuarenta y Uno con 85/100 Soles)**, con un Plazo de Ejecución de **75 (Setenta y Cinco) días calendario**.

1.3 Con fecha 26 de octubre de 2017, se firma el **CONTRATO N°035-2017-FONDEPES** con el **ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA** para la Supervisión del Saldo de Obra: **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA”**, bajo el sistema de Suma Alzada; por un monto total de **S/ 366,692.45 (Trescientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Dos con 45/100 Soles)** y por un plazo total de **75 (Setenta y Cinco) días calendario**.

1.4 Con fecha 02 de noviembre de 2017, se firma el **CONTRATO N°038-2017-FONDEPES** con el **CONSORCIO OBRAS**, integrado por las empresas **J.P.C. INGENIEROS S.A.C.** y **SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C.**; ganadores de la buena pro de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2017-FONDEPES**, derivada de la **LICITACION PUBLICA N° 0004-2017-FONDEPES** para la Ejecución del Saldo de Obra: **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA”**, bajo el sistema de Precios Unitarios; por un monto total de **S/ 3'680,960.43 (Tres Millones Seiscientos Ochenta Mil**





**Novcientos Sesenta con 43/100 Soles**) y un plazo total de **75 (Setenta y Cinco) días calendario** (en adelante, el “CONTRATO”).

- 1.5 Con fecha 22 de febrero de 2018, se emite la **RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 032-2018-FONDEPES/SG**, mediante la cual se aprueba la **Ampliación de Plazo N°01 por 25 (Veinticinco) días calendario** al CONTRATO.
- 1.6 Con fecha 27 de marzo de 2018, se emite la **RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 052-2018-FONDEPES/SG**, mediante la cual se aprueba la **Ampliación de Plazo N° 02 por 30 (Treinta) días calendario** al CONTRATO, considerando el plazo ya ampliado en la Ampliación de Plazo N° 1.
- 1.7 Con fecha 27 de abril de 2018, se emite **RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 071-2018-FONDEPES/SG**, mediante la cual se aprueba la **Ampliación de Plazo N° 03 por 31 (Treinta y Un) días calendario** al CONTRATO, considerando el plazo ya ampliado en la Ampliación de Plazo N° 1 y N° 2.
- 1.8 Con fecha 25 de mayo de 2018, se emite **RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 087-2018-FONDEPES/SG**, mediante la cual se aprueba la **Ampliación de Plazo N° 04 por 25 (Veinticinco) días calendario** al CONTRATO, considerando el plazo ya ampliado en la Ampliación de Plazo N° 1, N° 2 y N° 3.
- 1.9 Con fecha 20 de junio de 2018, se emite **RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 109-2018-FONDEPES/SG**, mediante la cual se aprueba la **Ampliación de Plazo N° 05 por 7 (Siete) días calendario** al CONTRATO, considerando el plazo ya ampliado en la Ampliación de Plazo N° 1, N° 2 N° 3 y N° 4.
- 1.10 Con fecha 04 de julio de 2018, se emite la **RESOLUCIÓN JEFATURAL N°71-2018-FONDEPES/J** donde se aprueba el expediente técnico de la prestación adicional de obra N°1 del CONTRATO, expediente que alcanza el monto de adicional N°1 S/441,324.99 y de deductivo N°1 S/65,347.58; siendo el nuevo monto contractual S/4,056,937.84 incluido IGV. Prestación Total del Adicional y Deductivo N°1 que asciende a la suma de S/375,977.41 soles con una incidencia total de 10.21%.
- 1.11 Con fecha 16 de julio de 2018, se emite **RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 131-2018-FONDEPES/SG**, mediante la cual se aprueba la **Ampliación de Plazo N° 06 por 26 (Veintiséis) días calendario** al CONTRATO, considerando el plazo ya ampliado en la Ampliación de Plazo N° 1, N° 2 N° 3, N° 4 y N°5.
- 1.12 Con fecha 04 de julio de 2018, se emite la **Carta N°232-2018-FONDEPES/SG** recepcionada el 04 de julio de 2018 por el contratista CONSORCIO OBRAS donde se adjunta la Resolución Jefatural N°071-2018-FONDEPES/J.
- 1.13 Con fecha 08 de agosto de 2018, se emite **RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 145-2018-FONDEPES/SG**, mediante la cual se **deniega** la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 07** (solicitud para la ejecución del expediente Adicional y Deductivo N°1) al CONTRATO.
- 1.14 Con fecha 21 de septiembre de 2018, se emite **RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°165-2018-FONDEPES/SG**, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N°09 por 34 (Treinta y cuatro) días calendario al CONTRATO N°38-



2017FONDEPES, con el que el CONSORCIO OBRAS, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.

- 1.15 Con fecha 22 de octubre de 2018, se emite RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°179-2018-FONDEPES/SG, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N°10 por 23 (Veintitrés) días calendario al CONTRATO N°38-2017FONDEPES, con el que el CONSORCIO OBRAS, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.
- 1.16 Con fecha 12 de noviembre de 2018, se emite RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°201-2018-FONDEPES/SG, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N°12 por 07 (Siete) días calendario al CONTRATO N°38-2017FONDEPES, con el que el CONSORCIO OBRAS, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.
- 1.17 Con fecha 12 de noviembre de 2018, se emite RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°202-2018-FONDEPES/SG, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N°13 por 07 (Siete) días calendario al CONTRATO N°38-2017FONDEPES, con el que el CONSORCIO OBRAS, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.
- 1.18 Con fecha 12 de noviembre de 2018, se emite RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°203-2018-FONDEPES/SG, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N°14 por 06 (Seis) días calendario al CONTRATO N°38-2017FONDEPES, con el que el CONSORCIO OBRAS, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.
- 1.19 Con fecha 27 de noviembre de 2018, se emite RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 211-2018-FONDEPES/SG, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N° 15 por 06 (Seis) días calendario al CONTRATO N°38-2017FONDEPES, con el que el CONSORCIO OBRAS, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.

## II. ANÁLISIS

- 2.1 La **Cláusula Cuarta: Del Pago**; se indica lo siguiente:

*“LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de valorización mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda; se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de **treinta (30)** días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.*

*En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD; EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244°, 1245° y 1246° del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes (...)*”

- 2.2 El resumen de Valorización de Obra N°05 del Adicional N°01 de Obra , es el siguiente:





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

**RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N°05 DE ADICIONAL DE OBRA N°01**

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"  
ENTIDAD : FONDEPES  
SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA  
CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS  
FECHA : 30/11/2018

02

MONTO DEL CONTRATO SIN IGV : S/. 374,004.23  
MONTO DEL CONTRATO CON IGV : S/. 441,324.98

TOTAL CONTRACTUAL SIN IGV	374,004.23				
VALORIZACION CONTRACTUALES SIN IGV		232,495.99	12,208.47	244,782.06	129,222.17
REAJUSTES		0.00	0.00	0.00	
AMORTIZACIONES					
DEL ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00	0.00
DEL ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
VALORIZACION META		232,495.99	12,208.47	244,782.06	
I.G.V. (18%)	67,320.76	41,848.21	2,211.56	44,060.77	
TOTALES	441,324.98	274,344.20	14,419.99	288,764.19	

Puntualizando que en lo que respecta a deducciones por cualquier concepto del marco contractual y del reglamento entre otras penalidades, estas se efectuarán en la liquidación de la obra.

**III. CONCLUSIONES**

3.1 El Supervisor de Obra ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA, ha remitido la CARTA N° 176-2018-CONS/AHJ/RL-MORRO SAMA, mediante la cual remite la Valorización de Obra N° 05 del adicional N°01 de obra, correspondiente al mes de noviembre del 2018, presentada por el contratista CONSORCIO OBRAS, integrado por las empresas J.P.C. INGENIEROS S.A.C. y SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C., encargado de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA". Asimismo, el Supervisor de Obra ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA, solicita el pago de la Valorización de Obra N° 05 del adicional N°01 de obra por el monto total de S/. 14.498.03 incluido el IGV (Catorce Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho con 03/100 Soles).

3.2 Se ha verificado que la presentación de la Valorización de Obra N°05 del adicional N°01 de obra correspondiente al mes de Noviembre del 2018 del contratista CONSORCIO OBRAS, integrado por las empresas J.P.C. INGENIEROS S.A.C. y SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C., ha cumplido con todos los requisitos







"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

establecidos en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, su contrato, las bases integradas y demás documentos que forman parte integrante del expediente de contratación

#### IV. RECOMENDACIONES

- 4.1 Cumplidos los todos requisitos establecidos, se recomienda que la **DIGENIPAA** otorgue la conformidad respectiva, para que **LA ENTIDAD** proceda al pago de la **Valorización de Obra N°05 del adicional N°01 de obra**, dentro de los plazos establecidos.
- 4.2 Cualquier error u omisión en la presente valorización se realizará en la liquidación de la ejecución de la obra

Es cuanto tengo que informar a Ud. para los fines que estime convenientes.

Atentamente;

Betty Villegas Sotelo  
CIP N°164243

Con la conformidad del Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento; pase el presente informe y los antecedentes, a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola; para su atención y trámite correspondiente.

**FONDEPES**

Ing. Paul A. Mora Guillén  
COORDINADOR DE OBRAS EQUIPAMIENTO  
Y MANTENIMIENTO



PERÚ Ministerio de la Producción



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"




04811754

Usuario: usuario\_obras56

Fecha: 10/12/2018

Hora: 18:01



### CARGO 03312-2018-FONDEPES/AOEM


A: MORGAN LEON MAGALI

Asunto: CARTA N° 176-2018-CONS-AHJ-RL-MORRO SAMA  
REMITE VALORIZACIÓN N° 05 DEL ADICIONAL N° 01 DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018-  
ELABORADO POR ESTA SUPERVISION REF: DPA MORRO SAMA - TACNA

Referencia:

Fecha: 10/12/2018

Observación: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A OGA



**ÁREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO**

Lima, 05 de Diciembre de 2018

**CARTA N°176-2018-CONS/AHJ/RL-MORRO SAMA**


Señor Ingeniero;

**LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO**

Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

Fondo Nacional del Desarrollo Pesquero (FONDEPES)

Av. Petit Thouars N° 115 – Lima



**ATENCIÓN : ING. BETTY VILLEGAS SOTELO**  
Coordinador de Obra

**ASUNTO : VALORIZACIÓN N° 05 DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, ELABORADA POR ESTA SUPERVISION.**


**REFERENCIA : a) CONTRATO N° 035-2017-FONDEPES**  
**b) SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA"**

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, aprovecho la ocasión para saludarle muy cordialmente y a la vez presentarle la **VALORIZACIÓN N° 05 DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA**, correspondiente al mes de noviembre del año en curso; cabe indicar que esta supervisión ha elaborado esta valorización, para cumplir con nuestros términos de referencia y contrato, el contratista no presento y será comunicado por esta supervisión vía carta, para que presente los documentos faltantes tales como los pagos y/o tributos de SENCICO y CONAFOVICER, ESSALUD, FACTURA, ETC, **para recién proceder el pago.**

Sin otro particular, esperando la atención debida al presente documento me suscribo de usted, reiterándole las muestras de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,



ALEXANDER HUERTAS JARA  
DNI 40031090  
REPRESENTANTE LEGAL

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO  
PESQUERO

	
2799171	
N° DOC:	00009912-2018
CLAVE:	4163
USUARIO:	dgalindo
FECHA Y HORA:	06/12/2018 16:33:24
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	

Se adjunta:

- Valorización de obra + 02copias + CD


**MEMORÁNDUM INTERNO N° 4767-201-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM**

Asunto : Memo Interno N° 6216-2018-DIGENIPAA

Referencia : \_\_\_\_\_ Registro: 9912

Destino	Indicación	Destino	Indicación
Observaciones: <u>Srta Betty Villegas</u>			

Atentamente:



**Indicaciones:**

- |                                |                           |                              |                           |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 0.1. Autorizado/Aprobado       | 0.2. Calificar/Evaluar    | 0.3. Informe                 | 0.4. Proyectar resolución |
| 0.5. Atención/Tramitación      | 0.6. Conocimiento y fines | 0.7. Notificar al interesado | 0.8. Reformular           |
| 0.9. Ayuda memoria             | 10. Coordinar             | 11. Opinión/Recomendación    | 12. Consolidar            |
| 13. Aclarar redacción          | 14. Implementar/Ejecutar  | 15. Preparar respuesta       | 16. Visación              |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo               | 19. Ampliar                  | 20. Seguimiento           |



Fecha: 06/12/18

MEMORANDUM INTERNO N° 6216 - 201 - FONDEPES/ DIGENIPAA

Asunto : CARTA N: 126 - / MONTE SANTI

Referencia : \_\_\_\_\_ Registro : 9912


Destino	Indicacion	Destino	Indicacion
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	
OCI		OGAJ	
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	

**FONDEPES**  
AREA DE OBRAS EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO  
06 DIC. 2018  
**RECIBIDO**  
Registro:..... Hora: C: 94

ABEM

Observaciones: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Atentamente



**Indicaciones:**

- |                                |                          |                             |                 |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 01. Autorizado/Aprobado        | 02. Calificar/Evaluar    | 03. Informe                 | 04. Proyectar   |
| 05. Atención/Tramitación       | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular  |
| 09. Ayuda memoria              | 10. Coordinar            | 11. Opinión/Recomendación   | 12. Consoliar   |
| 13. Aclarar redacción          | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta      | 16. Visación    |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo              | 19. Ampliar                 | 20. Seguimiento |

**SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL  
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE  
MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN  
TACNA"**

**INFORME DE VALORIZACIÓN N° 05 DE ADICIONAL DE OBRA N° 01  
NOVIEMBRE 2018**



**SUPERVISIÓN**

**ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA**

**RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N°05 DE ADICIONAL DE OBRA N°01**

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO  
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE  
TACNA, REGION TACNA" 02

ENTIDAD : FONDEPES

SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA


CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS


FECHA : 30/11/2018

MONTO DEL CONTRATO SIN IGV : S/. 374,004.23

MONTO DEL CONTRATO CON IGV : S/. 441,324.99

CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	VAL. ACUM. ANTERIOR	VAL. ACTUAL	VAL. ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
TOTAL CONTRACTUAL SIN IGV	374,004.23				
VALORIZACION CONTRACTUALES SIN IGV		232,495.59	12,286.47	244,782.06	129,222.17
REAJUSTES		0.00	0.00	0.00	
<b>VALORIZACION BRUTA</b>		<b>232,495.59</b>	<b>12,286.47</b>	<b>244,782.06</b>	
<b>AMORTIZACIONES</b>					
DEL ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00	0.00
DEL ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL AMORTIZACIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
VALORIZACION NETA		232,495.59	12,286.47	244,782.06	
I.G.V. (18%)	67,320.76	41,849.21	2,211.56	44,060.77	
<b>TOTALES</b>	<b>441,324.99</b>	<b>274,344.80</b>	<b>14,498.03</b>	<b>288,842.83</b>	
<b>PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA</b>		<b>62.16%</b>	<b>3.29%</b>	<b>65.45%</b>	<b>34.55%</b>

  
 ALEXANDER PRIMITIVO  
 HUERTAS JARA  
 DNI: 40431389  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 DAVID MANRIQUEZ VELA FARFAN  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CP 11/104754

**VALORIZACION N°05 DE ADICIONAL DE OBRA N°01  
RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR**

03

**OBRA** : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"  
**ENTIDAD** : FONDEPES  
**SUPERVISOR** : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA  
**CONTRATISTA** : CONSORCIO OBRAS  
**FECHA** : 30/11/2018

ADELANTOS OTORGADOS	FECHA	MONTO C/IGV	MONTO S/IGV	% PRESUPUESTO
1.- Adelanto Directo		0.00	0.00	0.00%
2.- Adelanto de Materiales		0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

DESCRIPCIÓN		MONTO S/.
<b>RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS</b>		
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS		0.00
FORMULA 02 : SISTEMA DE AGUA RESIDUAL		0.00
FORMULA 03 : EMISOR SUBMARINO		0.00
FORMULA 04 : OSMOSIS INVERSA		10,500.00
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>		<b>10,500.00</b>
GASTOS GENERALES 8.214000%		862.47
UTILIDADES 8.800000%		924.00
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL</b>		<b>12,286.47</b>
FACTOR DE RELACIÓN 1.000		12,286.47
<b>SUB-TOTAL VALORIZACION CONTRACTUAL</b>		<b>S/ 12,286.47</b>
<b>RESUMEN DE REAJUSTES</b>		
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS	Kr = 0.000	0.00
FORMULA 02 : SISTEMA DE AGUA RESIDUAL	Kr = 0.000	0.00
FORMULA 03 : EMISOR SUBMARINO	Kr = 0.000	0.00
FORMULA 04 : OSMOSIS INVERSA	Kr = 0.000	0.00
	<b>TOTAL REINTEGRO</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE REAJUSTE Y DEDUCCIONES</b>		<b>S/ 0.00</b>
<b>DEDUCCIONES:</b>		
<b>- DEDUCCION DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DIRECTO</b>		
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS		0.00
FORMULA 02 : SISTEMA DE AGUA RESIDUAL		0.00
FORMULA 03 : EMISOR SUBMARINO		0.00
FORMULA 05 : OSMOSIS INVERSA		0.00
	<b>TOTAL DECUCCION AD</b>	<b>0.00</b>
<b>- DEDUCCION DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DE MATERIALES</b>		
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS		0.00
FORMULA 02 : ARQUITECTURA		0.00
FORMULA 03 : INSTALACIONES SANITARIAS		0.00
FORMULA 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS		0.00
FORMULA 05 : EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO		0.00
	<b>TOTAL DEDUCCION AM</b>	<b>0.00</b>
<b>VALORIZACION BRUTA (V.B.)</b>		<b>S/ 12,286.47</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>		
Amortización del Adelanto Directo		S/ 0.00
Amortización del Adelanto de Materiales 20.00%		S/ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>S/ 0.00</b>
<b>VALORIZACION NETA (V.N.)</b>		<b>S/ 12,286.47</b>
IGV 18% (VN)		2,211.56
<b>MONTO TOTAL A FACTURAR Y PAGAR AL CONTRATISTA (VN + IGV)</b>		<b>14,498.03</b>

DAVID MANUEL DELA FARFAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. C. 10724

ALEXANDER PRIMITIVO  
HUERTAS JARA  
DNI 40431359  
REPRESENTANTE LEGAL



**VALORIZACION N°05 DE ADICIONAL DE OBRA N°01**


**OBRA** : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"  
**ENTIDAD** : FONDEPES  
**SUPERVISION** : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA  
**CONTRATISTA** : CONSORCIO OBRAS  
**FECHA** : 30/11/2018


Monto Base	S/. 441,324.99	Supervisión	: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
Monto Contratado	S/. 441,324.99	Contratista	: CONSORCIO OBRAS
Fecha-inicio de Obra	05/07/2018	<b>SEGÚN COSTO DIRECTO</b>	
Plazo de Ejecución	28 días	Monto Valorizado del Mes	S/. 10,500.00      3.29%
Fecha-termino de Obra	01/08/2018	Monto Valorizado Acumulado	S/. 209,190.41      65.45%
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios	Monto-Saldo por Valorizar	S/. 110,433.09      34.55%

<b>Ubicación</b>	
Región	: TACNA
Departamento	: TACNA
Provincia	: TACNA
Lugar	: SAMA

N°	DESCRIPCION	PARCIAL S/.	ACUMULADO ANTERIOR		AVANCES		ACUMULADO		BALDO	
			%	Valorizado S/.	%	Valorizado S/.	%	Valorizado S/.	%	Valorizado S/.
01	SUB-PRESUPUESTO 01 ESTRUCTURAS	31,874.29	58.17%	18,539.89	0.00%	0.00	18,539.89	41.83%	13,334.39	
02	SUB-PRESUPUESTO 02 SISTEMA DE AGUA RESIDUAL	65,552.29	53.12%	34,822.79	0.00%	0.00	34,822.79	46.88%	30,729.50	
03	SUB-PRESUPUESTO 03 EMISOR SUBMARINO	117,196.92	52.33%	61,327.72	0.00%	0.00	61,327.72	47.67%	55,869.20	
04	SUB-PRESUPUESTO 04 OSMOSIS INVERSA	105,000.00	80.00%	84,000.00	10.00%	10,500.00	84,500.00	10.00%	10,500.00	

<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>	<b>319,623.50</b>	<b>198,690.41</b>	<b>10,500.00</b>	<b>209,190.41</b>	<b>110,433.09</b>
<b>GASTOS GENERALES (8.214 %)</b>	<b>26,253.87</b>	<b>16,320.43</b>	<b>862.47</b>	<b>17,182.90</b>	<b>9,070.97</b>
<b>UTILIDAD (6.8%)</b>	<b>28,126.87</b>	<b>17,484.76</b>	<b>924.00</b>	<b>18,408.76</b>	<b>9,718.11</b>
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>	<b>374,004.24</b>	<b>232,495.69</b>	<b>12,286.47</b>	<b>244,782.06</b>	<b>129,222.18</b>
<b>I.G.V. (18.0 %)</b>	<b>67,320.76</b>	<b>41,849.21</b>	<b>2,211.56</b>	<b>44,060.77</b>	<b>23,259.99</b>
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>	<b>441,324.99</b>	<b>274,344.80</b>	<b>14,498.03</b>	<b>288,842.83</b>	<b>152,482.17</b>
		<b>62.15%</b>	<b>3.29%</b>	<b>65.45%</b>	<b>34.55%</b>

  
**ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA**  
 DNI: 40401669  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**DAVID MANUEL VELAZQUEZ**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 104754

**VALORIZACION N°05 DE ADICIONAL DE OBRA N°01**

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

ENTIDAD : FONDEPES  
 SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA  
 CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS  
 FECHA : 30/11/2018

Monto Base	S/. 441,324.99
Monto Contratado	S/. 441,324.99
Fecha-Inicio de Obra	06/07/2018
Plazo de Ejecución	28 días
Fecha-termino de Obra	01/08/2018
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios

Supervisión	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS	
<b>SEGUN COSTO DIRECTO</b>		
Monto Valorizado del Mes	S/. 0.00	0.00%
Monto Valorizado Acumulado	S/. 18,639.89	58.17%
Monto-Saldo por Valorizar	S/. 13,334.39	41.83%

Ubicación	
Región	TACNA
Departamento	TACNA
Provincia	TACNA
Lugar	SAMA

N°	DESCRIPCION	Unid.	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCES ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
			Metrado	P. Unitario	Presupuesto	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado
01	ESTRUCTURAS																
01.01	DEFENSA COMPLEMENTARIA EN MUELLE 2																
01.01.01	ESTRUCTURA DE MADERA PARA DEFENSA DE MUELLE	m	135.00	65.71	8,870.85	0%	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	135.00	8,870.85
01.01.02	DEFENSA DE MUELLE - LLANTAS DE CAUCHO ARO 20	und	30.00	116.26	3,487.80	0%	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	30.00	3,487.80
01.02	ESTRUCTURAS METALICAS																
01.02.01	INCREMENTO COLUMNA METALICA COBERTURA 04	kg	1,847.44	9.82	18,141.86	95%	17,234.75	95%	17,234.75	17,234.75	95%	17,234.75	17,234.75	95%	1,785.07	92.37	907.11
01.02.02	PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA. INCLUYE ARENADO	m2	47.29	28.05	1,373.77	95%	1,305.14	95%	1,305.14	1,305.14	95%	1,305.14	1,305.14	95%	44.93	2.36	66.63
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>					<b>31,874.29</b>		<b>18,639.89</b>		<b>18,639.89</b>		<b>18,639.89</b>		<b>18,639.89</b>		<b>13,334.39</b>		
<b>GASTOS GENERALES (6.214 %)</b>					<b>2,618.15</b>		<b>1,522.87</b>		<b>1,522.87</b>		<b>1,522.87</b>		<b>1,522.87</b>		<b>1,065.28</b>		
<b>UTILIDAD (8.6%)</b>					<b>2,804.84</b>		<b>1,831.51</b>		<b>1,831.51</b>		<b>1,831.51</b>		<b>1,831.51</b>		<b>1,173.43</b>		
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					<b>37,287.38</b>		<b>21,894.27</b>		<b>21,894.27</b>		<b>21,894.27</b>		<b>21,894.27</b>		<b>15,603.11</b>		
<b>I.G.V. (18.0 %)</b>					<b>6,713.53</b>		<b>3,904.97</b>		<b>3,904.97</b>		<b>3,904.97</b>		<b>3,904.97</b>		<b>2,808.56</b>		
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					<b>44,000.90</b>		<b>25,899.24</b>		<b>25,899.24</b>		<b>25,899.24</b>		<b>25,899.24</b>		<b>18,411.68</b>		

DAVID MANUEL VELA FARFAN  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 104754

ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA  
 DNI: 40401009  
 REPRESENTANTE LEGAL

**VALORIZACION N°05 DE ADICIONAL DE OBRA N°01**

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

ENTIDAD : FONDEPES

SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA

CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS


FECHA : 30/11/2018


Supervision	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS	
Monto Base	S/. 441,324.96	
Monto Contratado	S/. 441,324.96	
Fecha Inicio de Obra	08/07/2018	
Plazo de Ejecucion	28 dias	
Fecha Termina de Obra	01/08/2018	
Modalidad de Ejecucion	Precios Unitarios	

Supervision	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS	
SEGUN COSTO DIRECTO		
Monto Valorizado del Mes	S/. 0.00	0.00%
Monto Valorizado Acumulado	S/. 34,922.79	53.12%
Monto-Saldo por Valorizar	S/. 30,729.60	48.88%

Ubicación	TACNA		
Región	TACNA		
Departamento	TACNA		
Provincia	SAMA		
Lugar	SAMA		

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANZES				ACUMULADO ANTERIOR				ACUMULADO				BALDO			
		Unidad	Metrado	P. Unitario	Presupuesto	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	
																					S/.
02	SISTEMA DE AGUA RESIDUAL																				
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS																				
02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m	258.00	3.28	841.08	100%	258.00	841.08	0%	0.00	0.00	0%	258.00	841.08	0%	258.00	841.08	0%	0.00	0.00	0.00
02.01.02	EXCAV. DE ZANJAS P/TUBERIA	m	156.00	11.66	1,845.44	87%	136.83	1,598.17	0%	0.00	0.00	0%	136.83	1,598.17	87%	136.83	1,598.17	13%	21.17	247.27	247.27
02.01.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA HDPE	m	156.00	2.13	336.54	68%	106.83	227.55	0%	0.00	0.00	0%	106.83	227.55	68%	106.83	227.55	32%	51.17	108.99	108.99
02.01.04	PREPARACION CAMA DE APOYO (e=10cm)	m	156.00	7.22	1,140.76	69%	106.83	771.31	0%	0.00	0.00	0%	106.83	771.31	68%	106.83	771.31	32%	51.17	368.45	368.45
02.01.05	RELLENO COMPACTADO C/PLANCHA VIBRATORIA MANUAL	m	156.00	48.25	7,781.50	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	198.00	7,781.50	7,781.50
02.01.06	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO DIAMANTADO	m	317.00	1.13	358.21	82%	260.78	294.68	0%	0.00	0.00	0%	260.78	294.68	82%	260.78	294.68	18%	56.22	63.53	63.53
02.01.07	ROTURA DE CONCRETO DE LOSA DE PISO	m2	79.00	18.40	1,453.60	66%	52.16	959.67	0%	0.00	0.00	0%	52.16	959.67	66%	52.16	959.67	34%	26.84	463.93	463.93
02.01.08	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	m3	132.72	30.00	3,981.60	8%	10.43	312.94	0%	0.00	0.00	0%	10.43	312.94	8%	10.43	312.94	92%	122.29	3,668.66	3,668.66
02.01.09	REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO espesor = 0.15	m2	79.00	186.27	12,348.33	10%	6.28	1,294.54	0%	0.00	0.00	0%	6.28	1,294.54	10%	6.28	1,294.54	90%	70.72	11,050.79	11,050.79
02.01.10	FIJACION DE LA TUBERIA EXPUESTA CON CONCRETO CICLOPEO	m3	3.93	544.95	2,141.65	89%	3.50	1,909.94	0%	0.00	0.00	0%	3.50	1,909.94	89%	3.50	1,909.94	11%	0.43	231.71	231.71
02.02	TUBERIA																				
02.02.01	SUM. E INST. TUBERIA HDPE 2" ENTERRADA	m	156.00	71.84	11,350.72	87%	136.83	9,829.87	0%	0.00	0.00	0%	136.83	9,829.87	87%	136.83	9,829.87	13%	21.17	1,520.85	1,520.85
02.02.02	SUM. E INST. TUBERIA HDPE 2" EXPUESTA CUBIERTA CON CONCRETO CICLOPEO	m	100.00	71.84	7,184.00	88%	87.62	6,294.62	0%	0.00	0.00	0%	87.62	6,294.62	88%	87.62	6,294.62	12%	12.38	869.38	869.38
02.02.03	SERVICIO DE TERCOPUSION DE TUBERIAS DE HDPE DE 2"	m	256.00	3.72	959.76	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	256.00	959.76	959.76
02.03	SERVICIO DE TERCOPUSION DE TUBERIAS DE HDPE DE 2"																				
02.03.01	CONTROL DE CALIDAD																				
02.03.02	ULTRASONIDO - CONTROL DE CALIDAD																				
02.03.03	VERIFICACION DE LA INSPECCION ULTRASONICA DE JUNTA																				
02.03.04	PRUEBA DE NIVELACION																				
02.04	PRUEBA DE NIVELACION																				
02.04.01	PRUEBA DE NIVELACION P/DESAGUE	m	256.00	0.79	203.82	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	256.00	203.82	203.82

  
**ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA**  
 DNI: 40431389  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**DAVID MANUEL VELA FARFAN**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 104754

**VALORIZACION N°05 DE ADICIONAL DE OBRA N°01**


OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"  
 ENTIDAD : FONDEPES  
 SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA  
 CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS  
 FECHA : 30/11/2018


Monto Base	S/. 441,324.96
Monto Contratado	S/. 441,324.96
Fecha Inicio de Obra	05/07/2018
Plazo de Ejecución	28 días
Fecha Término de Obra	07/08/2018
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios

Supervisión	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS	
SEGUN COSTO DIRECTO	S/.	0.00%
Monto Valorizado del Mes	S/.	34,822.79
Monto Valorizado Acumulado	S/.	30,729.60
Monto-Balido por Valorizar	S/.	48.88%

Ubicación	TACNA
Región	TACNA
Departamento	TACNA
Provincia	TACNA
Lugar	SAMA

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		AVANCES				ACUMULADO		BALDO			
		Medrado	P. Unitario	Presupuesto	ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		Medrado	Valorizado	%	Medrado	Valorizado
					%	Valorizado	%	Valorizado					
Unidad		S/.	S/.	S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
02.05	PRUEBA HIDRAULICA												
02.05.01	PRUEBA HIDRAULICA PIDESAGUE	m	258.00	3.00	774.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00
02.06	EQUIPOS DE BOMBEO DE DESAGUE DOMESTICO												
02.06.01	SUM. E INST. ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES Q=3.00 LT/S POT=2.5HP HDT=21m	und	2.00	4,722.82	9,445.24	100%	9,445.24	0%	0.00	100%	9,445.24	0%	0.00
02.06.02	SUM. E INST. ACCESORIOS PARA BOMBA SUMERGIBLE Q=3.00 LT/S POT=2.5HP HDT=21m	GLB	1.00	1,043.18	1,043.18	100%	1,043.18	0%	0.00	100%	1,043.18	0%	0.00
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>				<b>65,562.20</b>			<b>34,822.79</b>		<b>34,822.79</b>		<b>30,729.60</b>		<b>30,729.60</b>
GASTOS GENERALES (8.214 %)				5,384.47			2,860.34		2,860.34		2,524.12		2,524.12
UTILIDAD (8.8%)				5,788.60			3,064.41		3,064.41		2,704.20		2,704.20
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>				<b>76,705.36</b>			<b>40,747.54</b>		<b>40,747.54</b>		<b>38,957.82</b>		<b>38,957.82</b>
I.G.V. (18.0 %)				13,808.96			7,334.56		7,334.56		6,472.41		6,472.41
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>				<b>90,512.33</b>			<b>48,082.10</b>		<b>48,082.10</b>		<b>42,430.23</b>		<b>42,430.23</b>

  
 DAVID MANUEL VELA BARFAN  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 104754

  
 ALEXANDER PRIMITIVO  
 HUERTAS JARA  
 DNI: 40421359  
 REPRESENTANTE LEGAL

04

**VALORIZACION N°05 DE ADICIONAL DE OBRA N°01**

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

ENTIDAD : FONDEPES

SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA

CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS

FECHA : 30/11/2018

Monto Base	S/ 441,324.99
Monto Contratado	S/ 441,324.99
Fecha-Inicio de Obra	05/07/2018
Plazo de Ejecución	28 días
Fecha-termino de Obra	07/08/2018
Modalidad de Ejecución	Procedo Unitarios

Supervisión	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS	
SEGUN COSTO DIRECTO	S/ 0.00	0.00%
Monto Valorizado del Mes	S/ 34,822.78	53.12%
Monto Valorizado Acumulado	S/ 30,729.80	46.85%

Ubicación	: TACNA		
Región	: TACNA		
Departamento	: TACNA		
Provincia	: TACNA		
Lugar	: SAMÁ		

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		AVANCES				SALDO											
		Unid.	Metrado	ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO											
				%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado							
02	SISTEMA DE AGUA RESIDUAL																		
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m	258.00	3.26	841.08	100%	258.00	841.08	0%	0.00	0.00	100%	258.00	841.08	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
02.01.02	EXCAV. DE ZANAS P/TUBERIA	m	158.00	11.88	1,845.44	87%	138.83	1,588.17	0%	0.00	0.00	87%	138.83	1,588.17	13%	21.17	247.27	247.27	247.27
02.01.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA HDPE	m	158.00	2.13	336.54	88%	106.83	227.55	0%	0.00	0.00	88%	106.83	227.55	32%	51.17	108.99	108.99	108.99
02.01.04	PREPARACION CAMA DE APOYO (e=10cm)	m	158.00	7.22	1,140.76	89%	106.83	771.31	0%	0.00	0.00	89%	106.83	771.31	32%	51.17	369.45	369.45	369.45
02.01.05	RELLENO COMPACTADO C/PLANCHA VIBRATORIA MANUAL	m	317.00	1.13	358.21	82%	260.78	294.88	0%	0.00	0.00	82%	260.78	294.88	16%	56.22	83.53	83.53	83.53
02.01.06	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO DIAMANTADO	m2	78.00	18.40	1,453.60	8%	52.18	959.87	0%	0.00	0.00	8%	52.18	959.87	34%	28.84	493.93	493.93	493.93
02.01.07	ROTURA DE CONCRETO DE LOSA DE PISO	m3	132.72	30.00	3,981.60	10%	10.43	312.84	0%	0.00	0.00	10%	10.43	312.84	92%	122.29	3,668.66	3,668.66	3,668.66
02.01.08	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	m2	78.00	158.27	12,345.33	89%	8.28	1,294.84	0%	0.00	0.00	89%	8.28	1,294.84	90%	70.72	11,050.79	11,050.79	11,050.79
02.01.09	REPOBICION DE LOSA DE CONCRETO espesor = 0.15	m3	3.93	544.95	2,141.65	87%	3.50	1,909.94	0%	0.00	0.00	87%	3.50	1,909.94	11%	0.43	231.71	231.71	231.71
02.01.10	FIJACION DE LA TUBERIA EXPUESTA CON CONCRETO CICLOPEO	m	158.00	71.84	11,350.72	87%	138.83	9,829.87	0%	0.00	0.00	87%	138.83	9,829.87	13%	21.17	1,520.85	1,520.85	1,520.85
02.02	TUBERIA	m	100.00	71.84	7,184.00	88%	87.62	6,294.82	0%	0.00	0.00	88%	87.62	6,294.82	12%	12.38	899.38	899.38	899.38
02.02.01	SUM. E INST. TUBERIA HDPE 2" ENTERRADA	m	258.00	3.72	959.76	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	258.00	959.76	959.76	959.76
02.02.02	SUM. E INST. TUBERIA HDPE 2" EXPUESTA CUBIERTA CON CONCRETO CICLOPEO	m	258.00	9.17	2,362.86	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	258.00	2,362.86	2,362.86	2,362.86
02.02.03	SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS DE HDPE DE 2"	m	258.00	0.79	203.82	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	203.82	203.82	203.82	203.82
02.03	ULTRASONIDO - CONTROL DE CALIDAD	m	258.00	0.79	203.82	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	203.82	203.82	203.82	203.82
02.03.01	VERIFICACION DE LA INSPECCION ULTRASONICA DE JUNTA	m	258.00	0.79	203.82	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	203.82	203.82	203.82	203.82
02.04	PRUEBA DE NIVELACION	m	258.00	0.79	203.82	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	203.82	203.82	203.82	203.82
02.04.01	PRUEBA DE NIVELACION P/DESAGUE	m	258.00	0.79	203.82	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	203.82	203.82	203.82	203.82

*(Firma)*  
**DAVID MANUEL VELA FARFAN**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 103754

*(Firma)*  
**ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA**  
 DNI: 40421339  
 REPRESENTANTE LEGAL

08

**VALORIZACION N°05 DE ADICIONAL DE OBRA N°01**

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTEBANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"  
 ENTIDAD : FONDEPES  
 SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA  
 CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS  
 FECHA : 30/11/2018

Monto Base	S/. 441,324.89
Monto Contratado	S/. 441,324.89
Fecha-Inicio de Obra	06/07/2018
Plazo de Ejecución	28 días
Fecha-Inicio de Obra	07/09/2018
Modalidad de Ejecución	Factor Unitarios

Supervisión	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS	
SEGUN COSTO DIRECTO	S/. 0.00	0.00%
Monto Valorizado del Mes	S/. 34,822.79	53.12%
Monto Valorizado Acumulado	S/. 30,729.60	46.88%

Ubicación	TACNA
Región	TACNA
Departamento	TACNA
Provincia	TACNA
Lugar	SAMA

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANZES				ACUMULADO		BALDO		
		Unidad	Metrado	P. Unitario	Presupuesto	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado
02.05	PRUEBA HIDRAULICA													
02.05.01	PRUEBA HIDRAULICA P/DEBAGUE	m	256.00	3.00	774.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	774.00
02.06	EQUIPOS DE BOMBEO DE DESAGUE DOMESTICO													
02.06.01	SUM. E INST. ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES Q=3.00 LT/S POT=2.5HP HDT=21m	und	2.00	4,722.82	9,445.24	100%	2.00	9,445.24	100%	2.00	9,445.24	0%	0.00	0.00
02.06.02	SUM. E INST. ACCESORIOS PARA BOMBA SUMERGIBLE Q=3.00 LT/S POT=2.5HP HDT=21m	GLB	1.00	1,043.18	1,043.18	100%	1.00	1,043.18	100%	1.00	1,043.18	0%	0.00	0.00
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>					<b>66,662.29</b>			<b>34,822.79</b>			<b>34,822.79</b>			<b>30,729.60</b>
<b>GASTOS GENERALES (8.214 %)</b>					<b>5,384.47</b>			<b>2,860.34</b>			<b>2,860.34</b>			<b>2,524.12</b>
<b>UTILIDAD (8.8%)</b>					<b>5,768.60</b>			<b>3,064.41</b>			<b>3,064.41</b>			<b>2,704.20</b>
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					<b>76,705.36</b>			<b>40,747.54</b>			<b>40,747.54</b>			<b>35,957.82</b>
<b>I.G.V. (18.0 %)</b>					<b>13,808.96</b>			<b>7,334.56</b>			<b>7,334.56</b>			<b>6,472.41</b>
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					<b>90,512.33</b>			<b>48,082.10</b>			<b>48,082.10</b>			<b>42,430.23</b>

DAVID MANUEL VELA FARFAN  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 104754

*Alexander Primitivo Huertas Jara*  
 ALEXANDER PRIMITIVO  
 HUERTAS JARA  
 DNI: 40431359  
 REPRESENTANTE LEGAL

**VALORIZACION N°05 DE ADICIONAL DE OBRA N°01**

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

ENTIDAD : FONDEPES  
 SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA  
 CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS  
 FECHA : 30/11/2018

Monto Base	S/. 441,324.99
Monto Contratado	S/. 441,324.99
Fecha-Inicio de Obra	06/07/2018
Plazo de Ejecución	28 días
Fecha-termino de Obra	07/09/2018
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios

Supervisión	: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
Contratista	: CONSORCIO OBRAS
<b>SEGUN COSTO DIRECTO</b>	
Monto Valorizado del Mes	: S/. 0.00
Monto Valorizado Acumulado	: S/. 61,327.72
Monto-Saldo por Valorizar	: S/. 55,997.20
	: 47.87%

Ubicación	
Región	: TACNA
Departamento	: TACNA
Provincia	: TACNA
Lugar	: SAMA

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			BALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado
04	EMISOR SUBMARINO																
04.01	SUMINISTRO DE TUBERIA																
04.01.01	SUM. E INST. DE TUBERIA LISA HDPE PECC-100 Dext. 160MM(6") PN-10	m	120.00	33.02	3,962.40	100%	120.00	3,962.40	0%	0.00	0%	120.00	3,962.40	0%	0.00	0.00	0.00
04.01.02	SUM. E INST. DE LINEA AUXILIAR DE 90MM PARA MANIOBRA DE FOTACION	m	120.00	16.53	1,983.60	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	120.00	1,983.60
04.01.03	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE TUBERIAS HDPE	GLB	1.00	1,326.00	100%	1.00	1,326.00	0%	0%	0.00	0%	1.00	1,326.00	0%	0.00	0.00	0.00
04.01.04	CONSTRUCCION E INST. LASTRE DE CONCRETO F c=280kg/cm2 TIPO II	Und	71.00	205.12	14,563.52	100%	71.00	14,563.52	0%	0.00	0%	71.00	14,563.52	0%	0.00	0.00	0.00
04.01.05	INSTALACION DE LASTRE	Und	378.00	66.82	25,257.96	26%	100.00	6,682.00	0%	0.00	0%	100.00	6,682.00	74%	278.00	18,575.96	0.00
04.02	TERMOFUSION																
04.02.01	SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS DE 160 MM PN-10	m	120.00	9.32	1,118.40	100%	120.00	1,118.40	0%	0.00	0%	120.00	1,118.40	0%	0.00	0.00	0.00
04.02.02	SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS DE 90 MM PN-10 (LINEAS 1.00 LINEAS AUXILIAR)	m	120.00	3.72	446.40	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	120.00	446.40
04.03	ULTRASONIDO - CONTROL DE CALIDAD																
04.03.01	VERIFICACION DE LA INSPECCION ULTRASONICA DE JUNTA	m	240.00	9.17	2,200.80	50%	120.00	1,100.40	0%	0.00	0%	120.00	1,100.40	50%	120.00	1,100.40	
04.04	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO																
04.04.01	TRASLADO VIA MARITIMA DE TUB. TERMOFUSIONADA DE "LA MECA" A DPA MORROSA	GLB	1.00	10,000.00	100%	1.00	10,000.00	0%	0%	0.00	0%	1.00	10,000.00	0%	0.00	0.00	0.00
04.04.02	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO DE LINEA MODIFICADO	m	640.00	75.25	48,160.00	47%	300.00	22,576.00	0%	0.00	0%	300.00	22,576.00	53%	340.00	25,585.00	
04.04.03	ELIACION PRIMEROS METROS DE TUBERIA CON CONCRETO CICLOPEO	m3	3.75	314.09	1,177.84	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	3.75	1,177.84
04.04.04	PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA EMISOR SUBMARINO MODIFICADO	GLB	1.00	7,000.00	7,000.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	1.00	7,000.00
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>					<b>117,196.92</b>		<b>61,327.72</b>		<b>0.00</b>		<b>61,327.72</b>		<b>55,997.20</b>		<b>4,589.10</b>		<b>4,916.48</b>
<b>GASTOS GENERALES (6.214 %)</b>					<b>9,826.55</b>		<b>5,037.46</b>		<b>0.00</b>		<b>5,037.46</b>		<b>0.00</b>		<b>4,916.48</b>		<b>0.00</b>
<b>UTILIDAD (6.8%)</b>					<b>10,313.33</b>		<b>5,396.84</b>		<b>0.00</b>		<b>5,396.84</b>		<b>0.00</b>		<b>5,396.84</b>		<b>0.00</b>
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					<b>137,136.80</b>		<b>71,762.02</b>		<b>0.00</b>		<b>71,762.02</b>		<b>65,374.78</b>		<b>11,767.46</b>		<b>77,142.24</b>
<b>I.G.V. (18.0 %)</b>					<b>24,684.62</b>		<b>12,917.16</b>		<b>0.00</b>		<b>12,917.16</b>		<b>11,767.46</b>		<b>0.00</b>		<b>11,767.46</b>
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					<b>161,821.43</b>		<b>84,679.18</b>		<b>0.00</b>		<b>84,679.18</b>		<b>77,142.24</b>		<b>11,767.46</b>		<b>88,909.70</b>

DAVID MANUEL VELA FARPAN  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP N° 104754

ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA  
 DNI 40431019  
 REPRESENTANTE LEGAL

**VALORIZACION N°05 DE ADICIONAL DE OBRA N°01**

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

ENTIDAD : FONDEPES

SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA

CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS

FECHA : 30/11/2018


Monto Base	S/. 441,324.99
Monto Contratado	S/. 441,324.99
Fecha-Inicio de Obra	05/07/2018
Plazo de Ejecución	28 días
Fecha-termino de Obra	01/09/2018
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios

Supervisión	: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
Contratista	: CONSORCIO OBRAS
<b>SEGÚN COSTO DIRECTO</b>	
Monto Valorizado del Mes	: S/. 10,500.00 10.00%
Monto Valorizado Acumulado	: S/. 94,500.00 90.00%
Monto-Saldo por Valorizar	: S/. 10,500.00 10.00%

<b>Ubicación</b>	
Región	: TACNA
Departamento	: TACNA
Provincia	: TACNA
Lugar	: SAMA

N°	DESCRIPCION	PRELUPUESTO		ACUMULADO ANTERIOR		AVANCES		ACUMULADO		SALDO						
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado		
															S/.	S/.
03	OSMOGOS INVERSA															
03.01	SUM. E INST. DE COMPONENTES Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE OS[GLB		1.00	105,000.00	105,000.00	80%	0.80	84,000.00	10%	0.10	10,500.00	90%	0.90	84,500.00	10%	10,500.00
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>				105,000.00				84,000.00			10,500.00			84,500.00		10,500.00
GASTOS GENERALES (8.214 %)				8,624.70				6,899.76			862.47			7,762.23		862.47
UTILIDAD (8.8%)				9,240.00				7,382.00			924.00			8,318.00		924.00
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>				122,864.70				98,291.76			12,286.47			110,578.23		12,286.47
I.G.V. (18.0 %)				22,115.65				17,682.52			2,211.56			19,904.08		2,211.56
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>				144,980.35				115,984.28			14,498.03			130,482.31		14,498.03

  
 DAVID MANUEL YELA PARFAN  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 104754


  
 ALEXANDER PRIMITIVO  
 HUERTAS JARA  
 DNI: 40431039  
 REPRESENTANTE LEGAL



**CRONOGRAMA EJECUTADO DE AVANCE FISICO DE LA OBRA**

DESCRIPCION	TIEMPO					TOTALES FIN
	JULIO 27 Dias	AGOSTO 31 Dias	SEPTIEMBRE 30 Dias	OCTUBRE 31 Dias	NOVIEMBRE 30 Dias	
COSTO DIRECTO TOTAL	S/. 316,123.50	S/. 3,500.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 319,623.50
GASTOS GENERALES (8.214 %)	S/. 25,968.38	S/. 287.49	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 26,255.87
UTILIDAD (8.8%)	S/. 27,818.87	S/. 308.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 28,126.87
SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO	S/. 369,908.75	S/. 4,095.49	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 374,004.24
I.G.V. (18.0 %)	S/. 66,563.57	S/. 737.19	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 67,300.76
TOTAL DE PRESUPUESTO PROGRAMADO	S/. 436,492.32	S/. 4,832.68	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 441,325.00
PRESUPUESTO MENSUAL EJECUTADO	S/. 933.95	S/. 164,422.13	S/. 6,230.37	S/. 82,768.34	S/. 14,498.03	S/. 164,422.13
% MENSUAL EJECUTADO	0.21%	41.79%	1.41%	18.76%	3.29%	65.45%
PRESUPUESTO ACUMULADO						
% ACUMULADO PROGRAMADO	0.00%	98.90%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
% ACUMULADO EJECUTADO	0.00%	0.21%	43.41%	62.16%	65.45%	65.45%

**CURVA MASA**

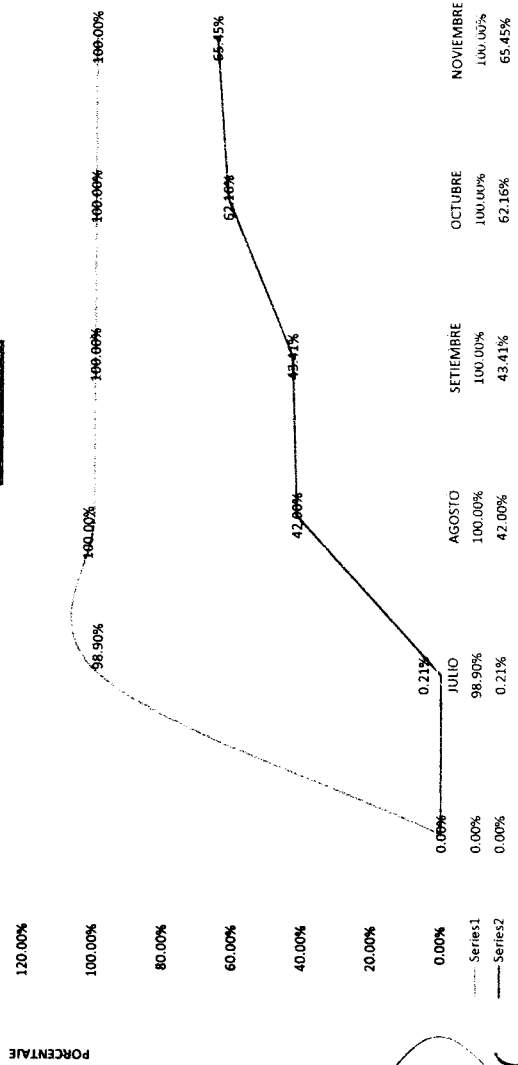

DAVID MANUEL VELA FARFAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754

ALEXANDER PRIMITIVO  
HUERTAS JARA  
DNI: 40431339  
REPRESENTANTE LEGAL





- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas


## I. Panel fotográfico



Fotografía N°01: Vista de canaleta excavada con tendido de tubería de PVC para ductería eléctrica.

  
DAVID MANUEL VELA PARFAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754


  
ALEXANDER PRIMITIVO  
HUERTAS JARA  
DNI: 40431089  
REPRESENTANTE LEGAL




Fotografía N°02: Vista de planta de ósmosis concluida.



Fotografía N°03: Vista de pisos y canaletas en subestación eléctrica.

  
DAVID MANUEL VELAZQUEZ FARFAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754


  
ALEXANDER PRIMITIVO  
HUERTAS JARA  
DNI: 40401369  
REPRESENTANTE LEGAL




ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.

Consultorias y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:  
- Obras de Edificaciones  
- Obras de Carreteras  
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado  
- Obras de Electrificación  
- Obras Hidráulicas

16

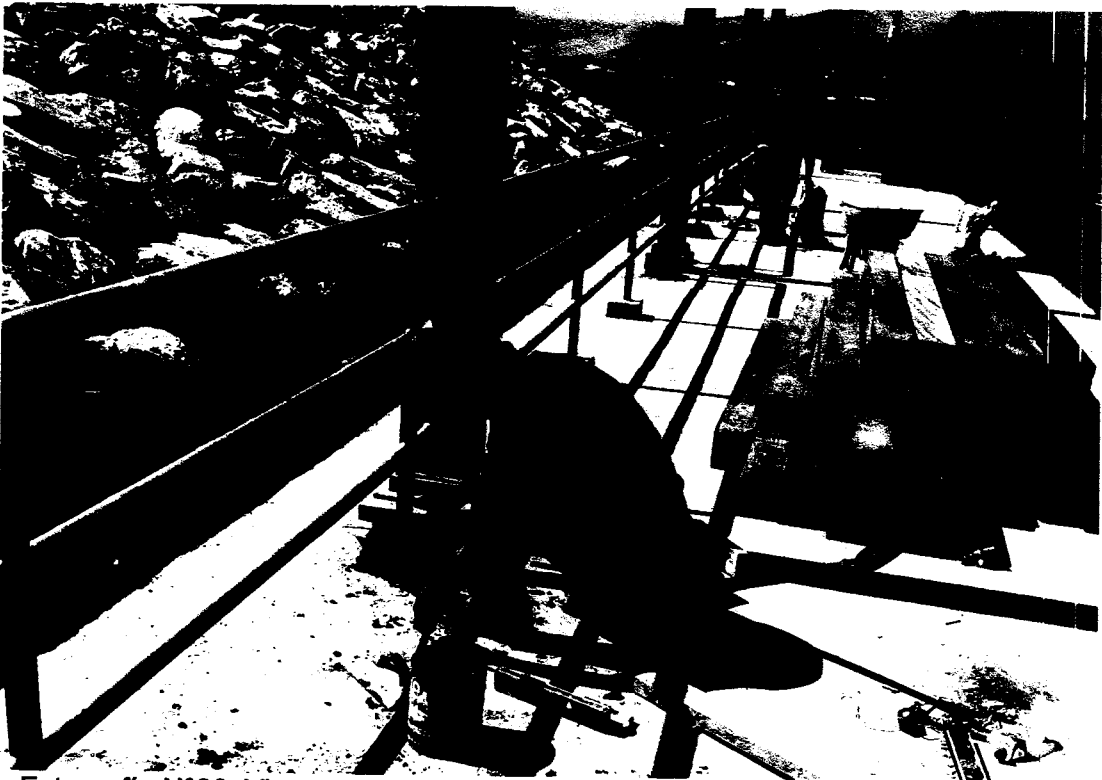

Fotografía N°06: Vista de resane de dados de concreto para barandas en muelle espigón.

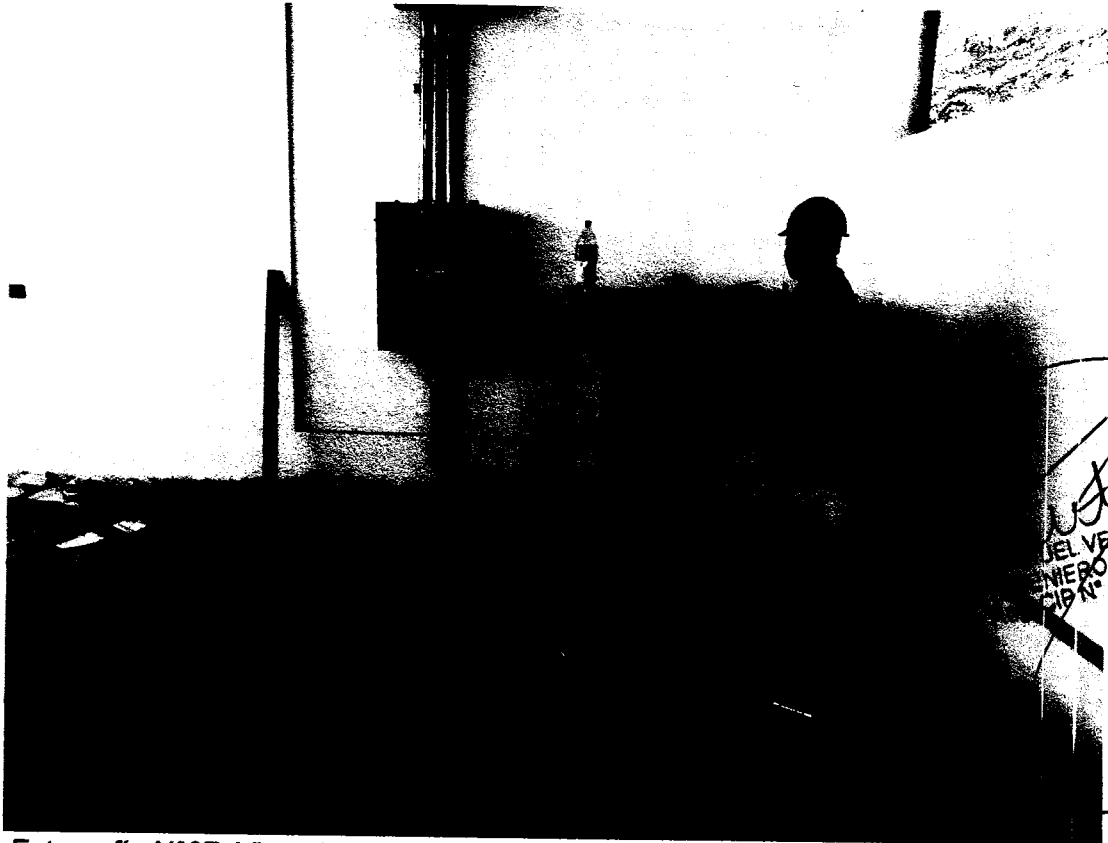

Fotografía N°07: Vista de instalación de tablero TECH y transformador en segundo nivel.

ALEXANDER PRIMITIVO  
HUERTAS JARA  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 104754


ALEXANDER PRIMITIVO  
HUERTAS JARA  
INGENIERO CIVIL  
REPRESENTANTE LEGAL



ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.

Consultorias y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:  
- Obras de Edificaciones  
- Obras de Carreteras  
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado  
- Obras de Electrificación  
- Obras Hidráulicas

17




Fotografía N°08: Vista de equipos instalados en segundo nivel para productor de hielo en bloques.



JELVEZATARFAN  
ABOGADO CIVIL  
P. N° 104754

Fotografía N°09: Vista de defensas de muelles instaladas en muelle marginal

ALEXANDER PRIMITIVO  
HUERTAS JARA  
DNI: 40431359  
REPRESENTANTE LEGAL



Fotografía N°04: Vista de trabajos de mejoramiento de tubería de succión de agua salada.




LYELA FARFAN  
INGENIERO CIVIL  
N° 104754

Asierrras  
Goberna  
Cobroza

*Alexander Huertas Jara*

ALEXANDER PRIMITIVO  
HUERTAS JARA  
DNI: 40431309  
REPRESENTANTE LEGAL

Fotografía N°05: Vista de instalación de tablero eléctrico en caseta de succión.

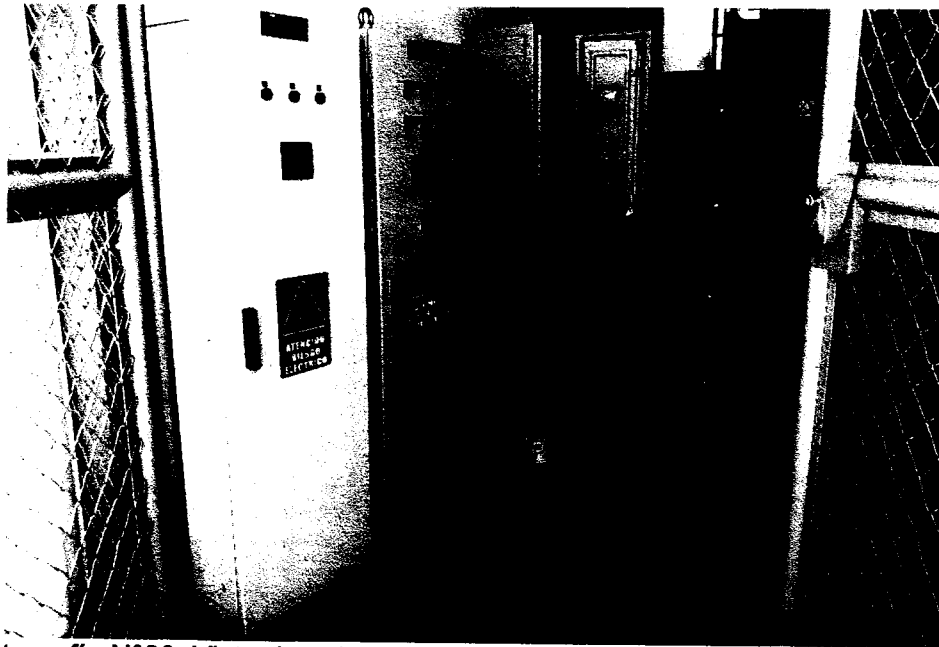

Fotografía N°09: Vista de colocación de gabinetes para tableros eléctricos en subestación.



Fotografía N°10: Vista de demolición de pisos para construcción de canaletas para ducterías eléctricas.

DAVID MANUEL VELA FARFAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754

ALEXANDER PRIMITIVO  
HUERTAS JARA  
DNI: 40421319  
REPRESENTANTE LEGAL




ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.


Consultorias y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:

- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas

19

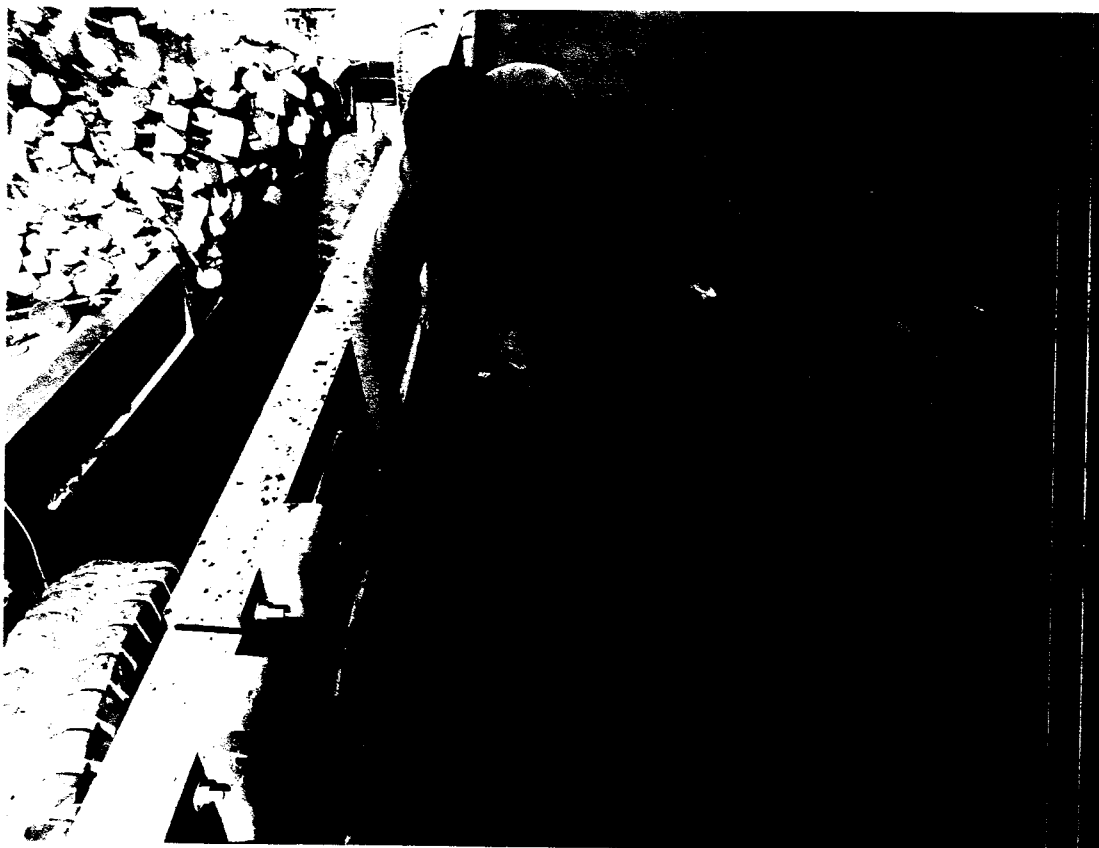

Fotografía N°11: Vista de trabajos de retiro de cornamusa existente.

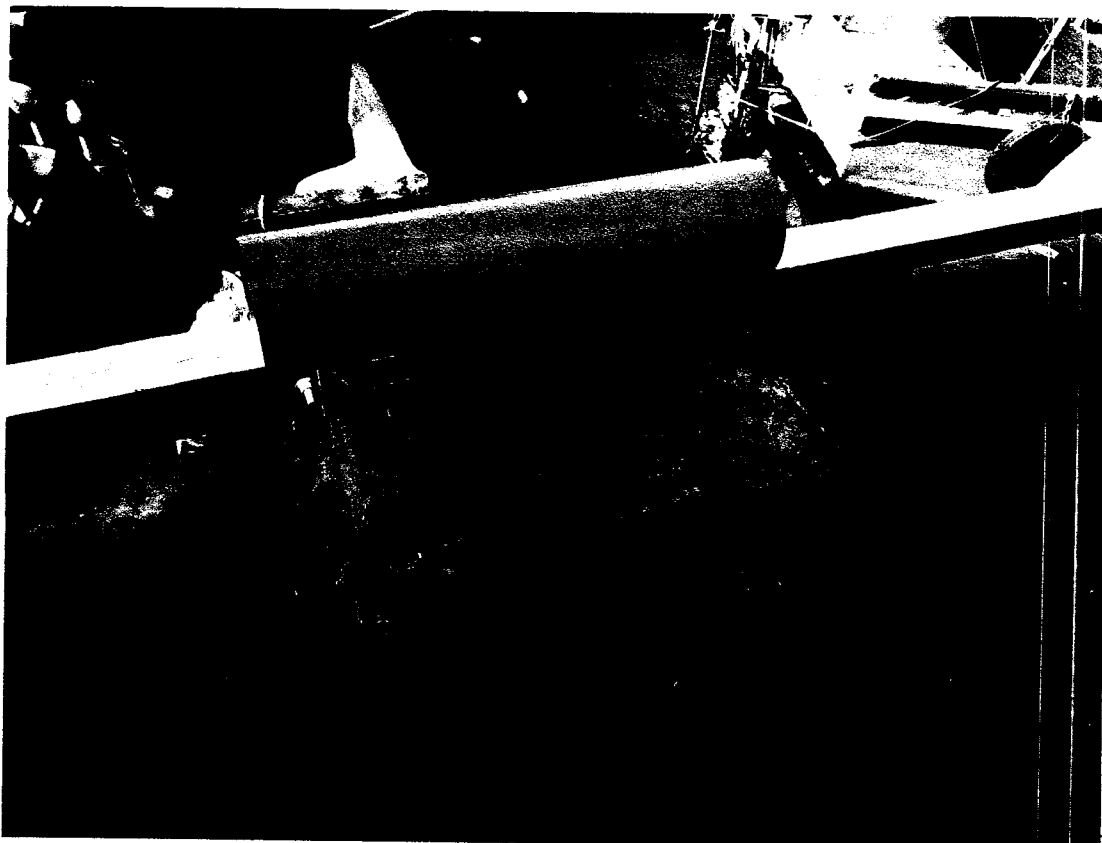

Fotografía N°12: Vista de instalación de bita en muelle marginal.

DAVID MANUEL VELA FARFAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10475

ALEXANDER PRIMITIVO  
HUERTAS JARA  
DNI: 40431339  
REPRESENTANTE LEGAL




FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
 OBRA: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 528 del Residente

02.11.18

1° Se comunica a la supervisión que se solicitó la presencia del Juez de Paz de Vila Vila, para la constatación de la baja afluencia al embarco y desembarco de productos hidrobiológicos y que es factible el retardo de labores del tendido y hundimiento del emisur submarino; lo cual se suscribe en el acta de constatación N° 15, en virtud al retraso ocasionado y el perjuicio no atribuible al contratista; es por ello que se solicita a la supervisión la autorización para la presentación del Expediente de ampliación de plazo N° 16 en virtud al Art. 169 y 170 del R.C.C.E. vigente"



  
 OSCAR L. LICOTA COAGUIRA  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP 10289

ASIENTO N° 529 DEL SUPERVISOR

02/11/2018

EN LA FECHA LA PRESENTE SUPERVISION TOMA CONOCIMIENTO DE LO INDICADO POR EL RESIDENTE DE OBRA.

SE VERIFICAN LAS CONDICIONES DE DISMINUCION DE AFLUENCIA DE LAS EMERSONES EN EL D.P.A. MOLINO SAMA, MAS SE INDICA QUE EN LOS DIAS PRECEDENTES SI SE HAN REALIZADO TRABAJOS DE TENDIDO DE EMISUR SUBMARINO POR LO CUAL DEBERA CUANTIFICAR LA CANTIDAD DE DIAS NECESARIOS PARA CULMINACION DE LOS TRABAJOS Y PRESENTAR AMPLIACION DE PLAZO SEGUN LO INDICADO POR LEY.

  
  
 OSCAR L. LICOTA COAGUIRA  
 INGENIERO CIVIL

# CUADERNO DE OBRA

60  
21

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
OBRA: \_\_\_\_\_  
PROYECTO: \_\_\_\_\_  
PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_



ASIENTO N° 522 DEL SUPERVISOR

05/11/2019

EN LA FECHA LA PRESENTE SUPERVISION TOMA CONOCIMIENTO DE LO INDICADO POR EL RESIDENTE DE OBRA.

SE INDICA QUE SE PROSIGUE CON LA EJECUCION DE TRABAJOS A RITMO LENTO Y SE RECUERDA QUE SE ENCUENTRA VENIDIO EL PLAZO DE EJECUCION.

EN LA FECHA SE HA PRODUCIDO UN ACCIDENTE LABORAL, POR TANTO DEBERÁ PRESENTAR INFORME DE INVESTIGACION DENTRO DE LAS 24 HRS SIGUIENTES DE ACUERDO A LEY N° 29783. SE SOLICITA ADENAS COPIA DE SCTR VIGENTE, SEGURO VIDA LEY, COPIAS DE PETAR Y ATS, REGISTROS DE ENTREGA DE EPP, EXAMENES MEDICO OBLIGACIONALES, ETC. ADENAS DEBERA IMPLEMENTARSE LA PRESENCIA DE SU ING. DE SEGURIDAD.



INSPECTOR

RESIDENTE

SUPERVISOR

# CUADERNO DE OBRA

52 22

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_


ASIENTO N° 514. DEL SUPERVISOR

12/11/2018

EN LA FECHA LA PRESENTE SUPERVISION TOMA CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS QUE VIENEN SIENDO EJECUTADOS.

SE HAN RECIBIDO LAS CARTAS N° 409, N° 405 Y N° 403 POR PARTE DE SODEPES, DONDE SE NOTIFICA LA APROBACION DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO N° 14, N° 13 Y N° 12 RESPECTIVAMENTE, POR LO CUAL SE SOLICITA PRESENTAR LOS CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS CORRESPONDIENTES SEGUN LOS PLAZOS ESTIPULADOS POR LEY. DEBERA ACELERARSE EL RITMO DE EJECUCION DE TRABAJOS.

SE VERIFICA QUE NO SE VIENEN LLEVANDO A CABO LOS PROCEDIMIENTOS MINIMOS DE SEGURIDAD. SE REITERA QUE DEBERAN PRESENTARSE DOCUMENTOS REFERENTES A LA GESTION DE CALIDAD EN OBRA.



RESIDENTE

SUPERVISOR

OF. PUCALLPA  
CAL ESQ. RAYMONDI/UCAYALI 699  
CALLARIA

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CONSTRUCTORA URANIO SAC

PRESENTE.

CALLERIA, 16-11-2018  
CARTA FIANZA N° 0011-0306-9800125872-86  
VENCE EL: 23-02-2019

Señor/es:

★ FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Ciudad

De nuestra consideración:

REF.: Carta Fianza Nro. 0011-0306-9800125872-86 por : S/432,402.04 (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS CON 04/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSTRUCTORA URANIO SAC - AVALADO - CONSORCIO OBRAS Conformado por:  
JPC INGENIEROS SAC 99%, SOLUCIONES INTEGRALES ENDEMAS SAC 1%.

Vencimiento : 23-11-2018, a horas de 12 meridiano

Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 15-11-2017, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de: CONSORCIO OBRAS. Al respecto, nos es grato comunicarle, que de acuerdo a la solicitud de nuestro (a) cliente (a) hemos procedido a PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 23-02-2019, a horas 12 meridiano.

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo : el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina OF. PUCALLPA ubicado en CAL ESQ. RAYMONDI/UCAYALI 699 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.


Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
P.P.

  
Walter Barrios Fonseca  
Gerente  
Oficina Pucallpa

  
Vanessa  
Ejecutivo Banca Empresas  
Oficina Pucallpa

S/432,402.04 \*\*\*\*\*



RUC 20100130204

REFERENC 216891811018000125872-86  
S/ 432 402 04

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO S/432,402.04 LLAMAR AL TELEFONO...

OF.PUCALLPA  
CAL ESQ.RAYMONDI/UCAYALI 699  
CALLARIA

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CONSTRUCTORA URANIO SAC

PRESENTE.-

CALLERIA, 10-11-2018  
CARTA FIANZA N°: 0011-0306-9800125805-86  
VENCE EL: 26-02-2019

Señor/es:

★ FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Ciudad

De nuestra consideración :

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0306-9800125805-86 por : S/115,927.94(CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 94/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSTRUCTORA URANIO SAC - AVALADO - CONSORCIO OBRAS Conformado por: JPC INGENIEROS SAC 99%, SOLUCIONES INTEGRALES EMDERAS SAC 1%.

Vencimiento : 26-11-2018, a horas de 12 meridiano


Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia la cual fue emitida el 09-11-2017, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de : CONSORCIO OBRAS. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 26-02-2019, a horas 12 meridiano.


Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo : el vencimiento de la misma.


La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina OF.PUCALLPA ubicado en CAL ESQ.RAYMONDI/UCAYALI 699 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
p.p.

  
Rolando Rivas Isla  
Ejecutivo Empresa  
Oficina Pucallpa

  
Vanessa Diaz Arenas  
Ejecutivo Banca Empresas  
Oficina Pucallpa



18111007

RUC 20100130204

REFRENDO: 2068918111007CCN0306B/11:37:47  
S/ 115,927.94

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 555-3909

# BBVA Continental

OF. PUCALLPA  
CAL. ESQ. RAYMONDI/UCAYALI 699  
CALLARÍA

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CONSTRUCTORA URANIO SAC

PRESENTE.-

CALLERÍA, 07-11-2018

CARTA FIANZA N°: [REDACTED]

VENCE EL: 04-02-2019

Señor/es:

★ FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Ciudad

De nuestra cuenta N° [REDACTED]

REF.: Carta Fianza N° [REDACTED]  
OCHO MIL SESENTA Y SEETE Y CINCO SOLES

Por cuenta de CONSTRUCTORA URANIO SAC

- AVALANTE CONSORCIO OBRAS Conformado por: JPC INGENIEROS SAC 99%, SOLUCIONES INTEGRADAS SAC 1%.

Vencimiento: 04-02-2019, a horas de 12 meridiano

Notamos que la Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 27-10-2017, por nosotros a favor de [REDACTED] en sus relaciones económicas a cargo de: CONSORCIO OBRAS. Al respecto nos es grato informarle que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a REPRORCIONAR el vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 04-02-2019, a horas 12 meridiano.

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo: el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina OF. PUCALLPA ubicada en CAL. ESQ. RAYMONDI/UCAYALI 699 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

★ Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL

P.D.

Mayra Luna Victoria  
Sub Gerente Oficina  
Oficina Pucallpa

Vanessa Diaz Arenas  
Ejecutivo Banca Empresas  
Oficina Pucallpa



18110707

RUC 20100130204

REFRENDO 2474918110707CCN0306-12-09-18  
S 368 097 00

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRYASE LLAMAR AL TELEFONO 6810111

**CERTIFICADO DE GARANTÍA**

La dirección de crédito y garantías de SECEX (con la que se encuentra a su disposición para confirmar/certificar esta garantía

**C.F. N° ENBO-12-2014**

De nuestra consideración:  
Señores:

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES**

OTORGAMOS por el presente documento garantía incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática al sólo requerimiento de valores como beneficiarios, a solicitud de CONSORCIO TACNA, integrado por TERRAS CRIOLLO Y CIA DE OBRAS S.A. SUCURSAL DEL PERU, TERRAK S.A.C.

Que se hará efectiva por el seguro garantizado de FIEL CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 05-2014-FONDEPES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA.

La presente garantía tiene una vigencia de 90 días contados a partir del día 07 de Octubre del 2014 hasta las 24:00 m. 07 de Enero del 2015 fecha de vencimiento por la suma de S/ 1,005,106.70\* (Un Millón Veinticinco Mil Ciento Cero y Seis Centésimos), sin que exista responsabilidad exceda el importe expresamente mencionado.

Renova y reactiva a la C.F. N° ENBO-12-2014 de fecha de 07 de Octubre del 2014. Su cumplimiento, pago y renovación se ajustará a lo establecido en el Ley de Contratación del Estado Decreto Legislativo N° 1071 y sus normas complementarias, modificatorias y ampliatorias.

SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Garantías, S.A. no se responsabiliza por el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios (15) días siguientes a los de su vencimiento, en concordancia con el artículo 1071 del Código Civil.

N° 028600

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

OFICINA DE  
CALLE RAYMONDIUCAYALI 699  
CALLAO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CONSTRUCTORA URAMO SAC

PRESENTE

CALLAO, 02-10-2018  
CARTA FIANZA N°: 0011-4999-0000129533-00  
VENGE EL: 20-01-2019

Señores:  
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Ciudad

De nuestra competencia

REF: CARTA FIANZA NRO. 0000129533-00 por S/37.598,00 (TREINTA Y SIETE MIL  
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES)

Por orden de CONSTRUCTORA URAMO SAC - AVALADO CONSORCIO URAS Concedido por:  
JPC INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES ENGENIA SAC SA

Vencimiento: 20-01-2019, a las 12 medianoche

Nota: La presente carta fianza, la cual fue emitida el 31-08-2018, se emitió a favor  
de CONSORCIO URAS a cargo de CONSORCIO URAS. Al respecto, nos  
es grato informar que el presente día se ha solicitado a la señora de nuestro  
FONDEPES la emisión de la presente Carta Fianza hasta el 20-01-2019, a las 12  
medianoche.

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, así como las vigentes  
al haberse modificado solo el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina  
OF. PUCALLPA ubicada en CAL RAYMONDIUCAYALI 699 o Sede Central, Unidad Operaciones  
Centralizadas en Av. República de Panamá 3065 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
D.P.



S/37,598.00\*\*\*\*\*



18100206

RUC 20100130204

REFRENDO: 2325518100206CCNG306A/11:04:32  
S/ 37.598.00

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909



San Isidro, 10 de Diciembre del 2018

**CONSTANCIA N° 3065615**

Señores  
**SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS SAC**  
Presente.-

Ref.: **SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – SALUD Y PENSION**

Estimados Señores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha incluido la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Diciembre del 2018 al 31 de Diciembre del 2018 correspondiente a:

**CONTRATO** N° **81881** en SALUD y,  
**POLIZA** N° **62055993** en PENSIÓN

para la siguiente relación de trabajadores declarados por vuestra empresa.

**Proyecto/Obra:**


N°	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. DOCUMENTO	INICIO DE COBERTURA
000001	CASTRO FUENTES PAOLA	00512526	01 de Diciembre del 2018
000002	DIAZ NARANJO ENZO JAVIER	143778181	01 de Diciembre del 2018
000003	ECHEGARAY MOLINA JAVIER ENRIQUE	15724093	01 de Diciembre del 2018
000004	GARCIA CIRIT DIOMEL ANTONIO	102936010	01 de Diciembre del 2018
000005	LICOTA COAQUIRA OSCAR LUIS	41759236	01 de Diciembre del 2018
000006	MARTEL MAZA MIGUEL ANGEL	06121654	01 de Diciembre del 2018
000007	QUIROZ PANDURO AUGUSTO CECILIO	00417843	01 de Diciembre del 2018
000008	QUIROZ PANDURO AUGUSTO CECILIO	26610824	01 de Diciembre del 2018
000009	ROMERO VIDAL DANIEL JULIAN	80283500	01 de Diciembre del 2018
000010	VELASCO CHAMBI JESUS	01777896	01 de Diciembre del 2018

Sin otro particular , quedamos de ustedes

Atentamente,


**Pacífico EPS**

**Pacífico Seguros**



---

**CARLOS SILES  
GERENTE**



---

**ANGEL ARMIJO HIDALGO  
GERENTE**

**FACTURA**      **N F02800206356**

**LIQUIDACION**      **N 8422474**
