



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

MEMORANDO N° 4640 -2018-FONDEPES/DIGENIPAA

CAI 10

A: **TERESA ZENaida QUIROZ SILVA**
Jefa de la Oficina General de Administración

Asunto: **PAGO DE VALORIZACIÓN DE OBRA N°13 -NOVIEMBRE 2018**
CONTRATO N° 038-2017-FONDEPES "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA
LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE
TACNA, REGION TACNA"

Referencia: a) CARTA N°174-2018-CONS/AHJ/RL-MORRO SAMA
b) INFORME N°174-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/bvs

Fecha: Lima, 18 DIC 2018

Por medio de la presente, me dirijo a usted para saludarlo y manifestarle que, de acuerdo a lo indicado en la carta de la referencia a), el supervisor **ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA** encargado de la Supervisión de la Obra "**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA**"; ha presentado la **VALORIZACION DE OBRA N°13** correspondiente al **CONTRATO N°038-2017-FONDEPES** con el contratista **CONSORCIO OBRAS**, integrado por las empresas **J.P.C. INGENIEROS S.A.C.** y **SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C.**

En vista de lo solicitado y tal como se indica en el Informe de la referencia b); se han cumplido con todos los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, el contrato, las bases integradas y demás documentos que forman parte integrante del expediente de contratación; por lo que esta Dirección concluye que **LA ENTIDAD** debe pagar la **Valorización N°13-NOVIEMBRE 2018** solicitada.


Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración.

Atentamente;



FONDEPES

Ing. Luis Alberto Barberi Quino
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola



LABQ/RAMG/bvs



CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por el presente documento, que el director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, al suscribir la presente; da su conformidad para realizar el pago por concepto de **VALORIZACION DE OBRA N°13 – NOVIEMBRE 2018** por la suma de **S/3,859.79 (Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve con 79/100 Soles)** incluido el IGV, a favor del contratista **CONSORCIO OBRAS**, integrado por las empresas **J.P.C. INGENIEROS S.A.C.** y **SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C.**, encargado de la Ejecución de Obra: **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA”**, según **CONTRATO N°038-2017-FONDEPES**.

Lima, **18 DIC 2018**



FONDEPES

.....
Ing. Luis Alberto Barbieri Quino
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola

LABQ/RAMG/bvs



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04810726

Usuario: prui
Fecha: 07/12/2018
Hora: 14:52




CARGO 03287-2018-FONDEPES/AOEM

A: MORGAN LEON MAGALI
Asunto: CARTA N° 174-2018-CONS-AHJ-RL-MORRO SAMA
REMITE VALORIZACIÓN N° 13 DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, ELABORADO POR ESTA SUPERVISION REF: DPA MORRO SAMA-TACNA
Referencia: INFORME 00174-2018-FONDEPES/BVS
Fecha: 07/12/2018
Observación: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A OGA

Atentamente,



AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



04816620

Usuario: usuario_digenipaa3

Fecha: 17/12/2018

Hora: 17:03



CARGO 00299-2018-FONDEPES/MML

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

Asunto: CARTA N° 174-2018-CONS-AHJ-RL-MORRO SAMA
REMITE VALORIZACIÓN N° 13 DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018,
ELABORADO POR ESTA SUPERVISION REF: DPA MORRO SAMA-TACNA


Referencia:

Fecha: 17/12/2018

Observación: SE DERIVA PARA TRAMITE CORRESPONDIENTE S/ 3,859.78 DPA MORRO SAMA VALORIZACIÓN 13
NOVIEMBRE 2018.

Atentamente,


MORGAN LEON MAGALI





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

INFORME N°174-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/DVS



A: **ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO**
Director General de la DIGENIPAA

Asunto: **VALORIZACION DE OBRA N°13 (NOVIEMBRE 2018) – CONSORCIO OBRAS (J.P.C. INGENIEROS S.A.C. y SOLUCIONES INTEGRALES EMDERAS S.A.C.)**
CONTRATO N° 038-2017-FONDEPES PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

Referencia: **CARTA N°174-2018**

Fecha: **Lima, 07 de diciembre de 2018**

Por medio de la presente, me dirijo a usted, Sr. Director General de acuerdo al documento de la referencia, el ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA encargado de la Supervisión de la Obra; ha solicitado que se emita un informe sobre el avance de la obra N° 13 del contratista **CONSORCIO OBRAS, INGENIEROS S.A.C. y SOLUCIONES INTEGRALES EMDERAS S.A.C.** de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"; correspondiente al presente, debo manifestar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1 Datos generales:

Proceso de Selección:	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2017-FONDEPES, derivada de la LICITACION PUBLICA N° 0004-2017-FONDEPES
Contrato de Obra:	CONTRATO N° 038-2017-FONDEPES
Fecha de Firma de Contrato:	02 DE NOVIEMBRE DE 2017
Supervisión de la Obra:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA
Sistema del Contrato:	PRECIOS UNITARIOS
Monto de Contrato:	S/ 3'680,960.43 (TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 43/100 SOLES)
Contratista Ejecución de Obra:	CONSORCIO OBRAS (J.P.C. INGENIEROS S.A.C. y SOLUCIONES INTEGRALES EMDERAS S.A.C.)
Residente de Obra:	ING. OSCAR LUÍS LICOTA COAQUIRA
Contratista Supervisión de Obra:	ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
Supervisor de Obra:	ING. DAVID MANUEL VELA FARFÁN
Plazo de Obra:	75 (SETENTA Y CINCO) DIAS CALENDARIO
Fecha de Entrega de Terreno:	17 DE NOVIEMBRE DE 2017
Fecha de Inicio de Obra:	28 DE NOVIEMBRE DE 2017





Fecha de Término Contractual:	10 DE FEBRERO DE 2018
Fecha de Ampliación de Plazo N°14	23 DE OCTUBRE DEL 2018
Fecha de Ampliación de Plazo N°15	29 DE OCTUBRE DEL 2018
Fecha Valorización N°013:	30 DE NOVIEMBRE DE 2018

- 1.2 Mediante **MEMORANDO N°1246-2017-FONDEPES/DIGENIPAA**, se aprueba el Expediente Técnico para la Ejecución del Saldo de Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"**, con código **SNIP N°272805**, con un monto de inversión de **S/ 3'718,141.85 (Tres Millones Setecientos Dieciocho Mil Ciento Cuarenta y Uno con 85/100 Soles)**, con un **Plazo de Ejecución de 75 (Setenta y Cinco) días calendario**.
- 1.3 Con fecha 26 de octubre de 2017, se firma el **CONTRATO N° 035-2017-FONDEPES** con el **ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA** para la Supervisión del Saldo de Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"**, bajo el sistema de Suma Alzada; por un monto total de **S/ 366,692.45 (Trescientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Dos con 45/100 Soles)** y por un **plazo total de 75 (Setenta y Cinco) días calendario**.
- 1.4 Con fecha 02 de noviembre de 2017, se firma el **CONTRATO N° 038-2017-FONDEPES** con el **CONSORCIO OBRAS**, integrado por las empresas **J.P.C. INGENIEROS S.A.C.** y **SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C.**; ganadores de la buena pro de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2017-FONDEPES**, derivada de la **LICITACION PUBLICA N° 0004-2017-FONDEPES** para la Ejecución del Saldo de Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"**, bajo el sistema de Precios Unitarios; por un monto total de **S/ 3'680,960.43 (Tres Millones Seiscientos Ochenta Mil Novecientos Sesenta con 43/100 Soles)** y un **plazo total de 75 (Setenta y Cinco) días calendario**.
- 1.5 Con fecha 22 de febrero de 2018, se emite **RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°032-2018-FONDEPES/SG**, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N°01 por 25 (Veinticinco) días calendario al **CONTRATO N°38-2017FONDEPES**, con el que el **CONSORCIO OBRAS**, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.
- 1.6 Con fecha 27 de marzo de 2018, se emite **RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°052-2018-FONDEPES/SG**, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N°02 por 30 (Treinta) días calendario al **CONTRATO N°38-2017FONDEPES**, con el que el **CONSORCIO OBRAS**, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.
- 1.7 Con fecha 27 de abril de 2018, se emite **RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°071-2018-FONDEPES/SG**, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N°03 por 31 (Treinta y Un) días calendario al **CONTRATO N°38-2017FONDEPES**, con el que el **CONSORCIO OBRAS**, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.





- 1.8 Con fecha 28 de mayo de 2018, se emite RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°087-2018-FONDEPES/SG, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N°04 por 25 (Veinticinco) días calendario al CONTRATO N°38-2017FONDEPES, con el que el CONSORCIO OBRAS, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.
- 1.9 Con fecha 21 de septiembre de 2018, se emite RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°165-2018-FONDEPES/SG, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N°09 por 34 (Treinta y cuatro) días calendario al CONTRATO N°38-2017FONDEPES, con el que el CONSORCIO OBRAS, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.
- 1.10 Con fecha 22 de octubre de 2018, se emite RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°179-2018-FONDEPES/SG, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N°10 por 23 (Veintitrés) días calendario al CONTRATO N°38-2017FONDEPES, con el que el CONSORCIO OBRAS, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.
- 1.11 Con fecha 12 de noviembre de 2018, se emite RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°201-2018-FONDEPES/SG, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N°12 por 07 (Siete) días calendario al CONTRATO N°38-2017FONDEPES, con el que el CONSORCIO OBRAS, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.
- 1.12 Con fecha 12 de noviembre de 2018, se emite RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°202-2018-FONDEPES/SG, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N°13 por 07 (Siete) días calendario al CONTRATO N°38-2017FONDEPES, con el que el CONSORCIO OBRAS, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.
- 1.13 Con fecha 12 de noviembre de 2018, se emite RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°203-2018-FONDEPES/SG, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N°14 por 06 (Seis) días calendario al CONTRATO N°38-2017FONDEPES, con el que el CONSORCIO OBRAS, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.
- 1.14 Con fecha 27 de noviembre de 2018, se emite RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 211-2018-FONDEPES/SG, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N° 15 por 06 (Seis) días calendario al CONTRATO N°38-2017FONDEPES, con el que el CONSORCIO OBRAS, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.

II. ANÁLISIS

2.1 La Cláusula Cuarta: Del Pago; se indica lo siguiente:

"LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de valorización mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda; se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD; EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244°, 1245° y 1246° del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes (...)"

2.2 El resumen de Valorización de Obra N°13, es el siguiente:



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 13

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA" 02
ENTIDAD : FONDEPES
SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS
FECHA : 30/11/2018

MONTO DEL CONTRATO SIN IGV : S/. 3,119,457.99
MONTO DEL CONTRATO CON IGV : S/. 3,859,795.43

TOTAL CONTRACTUAL SIN IGV	3,119,457.99				
VALORIZACION CONTRACTUALES SIN IGV		2,885,232.46	21,868.73	2,677,039.13	442,418.66
REAJUSTES		0.00	0.00	0.00	
AMORTIZACIONES					
DEL ADELANTO DIRECTO	311,946.89	288,823.29	2,180.67	287,703.92	44,241.66
DEL ADELANTO DE MATERIALES	623,891.52	625,278.54	18,355.05	541,631.59	82,259.93
VALORIZACION NETA					
IG.V. (18%)	581,502.44	335,567.87	588.78	338,186.65	
TOTAL	3,859,795.43	3,859,795.43	3,859.79	3,859,795.27	

Puntualizando que en lo que respecta a deducciones por cualquier concepto del marco contractual y del reglamento entre otras penalidades, estas se efectuarán en la liquidación de la obra.

III. CONCLUSIONES

El Supervisor de Obra ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA, ha remitido la CARTA N° 174-2018-CONS/AHJ/RL-MORRO SAMA, mediante la cual remite la Valorización de Obra N° 13 correspondiente al mes de noviembre de 2018, presentada por el contratista CONSORCIO OBRAS, integrado por las empresas J.P.C. INGENIEROS S.A.C. y SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C., encargado de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA". Asimismo, el Supervisor de Obra ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA, solicita el pago de la Valorización de Obra N° 13 por el monto total S/3,859.79 (Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve con 79/100 Soles) incluido el IGV.

3.1 Se ha verificado la entrega del Informe Mensual del Supervisor presentado con la CARTA N°174-2018-CONS/AHJ/RL-MORRO SAMA, que se adjunta a la presenta valorización.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

- 3.2 La Ampliación de Plazo N° 15 es la última aprobada con fecha final del 29 de octubre del 2018, sin embargo la obra se ha desarrollado de manera regular en el mes de noviembre por lo que han seguido facturando.
- 3.3 La CARTA N°174-2018-CONS/AHJ/RL-MORRO SAMA corresponde a la valorización N13 del mes de noviembre indicado en el asunto sin embargo en el cuerpo colocan que corresponde al mes de octubre lo cual sería un error de tipeo.

IV. RECOMENDACIONES

- 4.1 Cumplidos los todos requisitos establecidos, se recomienda que la DIGENIPAA otorgue la conformidad respectiva, para que LA ENTIDAD proceda al pago de la Valorización de Obra N°13, dentro de los plazos establecidos.
- 4.2 Cualquier error u omisión en la presente valorización se realizará en la liquidación de la ejecución de la obra

Es cuanto tengo que informar a Ud. para los fines que estime convenientes.

Atentamente;


Betty Villegas Sotelo
CIP N°164243

Con la conformidad del Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento; pase el presente informe y los antecedentes, a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola; para su atención y trámite correspondiente.

- FONDEPES

Raul A. Mora Guillen
COORDINADOR DE OBRAS EQUIPAMIENTO



ALEXANDER HUERTAS JARA
A.H.J.


Consultorías y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:

- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas

Lima, 05 de diciembre de 2018

CARTA Nº174-2018-CONS/AHJ/RL-MORRO SAMA

Señor Ingeniero;
LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola
Fondo Nacional del Desarrollo Pesquero (FONDEPES)
Av. Petit Thouars N° 115 – Lima



ATENCIÓN : ING. BETTY VILLEGAS SOTELO
Coordinador de Obra

ASUNTO : VALORIZACIÓN N° 13 DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, ELABORADA POR ESTA SUPERVISION.

REFERENCIA : a) CONTRATO N° 035-2017-FONDEPES
b) SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA"

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, aprovecho la ocasión para saludarle muy cordialmente y a la vez presentarle la **VALORIZACIÓN N° 13 DE OBRA**, correspondiente al mes de octubre del año en curso; cabe indicar que esta supervisión ha elaborado esta valorización, para cumplir con nuestros términos de referencia y contrato, el contratista no presento y será comunicado por esta supervisión vía carta, para que presente los documentos faltantes tales como los pagos y/o tributos de SENCICO y CONAFOVICER, ESSALUD, FACTURA, ETC, **para recién proceder el pago.**

Sin otro particular, esperando la atención debida al presente documento me suscribo de usted, reiterándole las muestras de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

ALEXANDER PRIMITIVO
HUERTAS JARA
DNI: 40431359
REPRESENTANTE LEGAL

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO

2799160	
N° DOC:	00009910-2018
CLAVE:	4047
USUARIO:	dgalindo
FECHA Y HORA:	06/12/2018 16:27:14
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	

Se adjunta:

- Valorización de obra + 02 copias + CD



MEMORÁNDUM INTERNO N° 4764 -201-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM


Asunto : Memo Interno N° 6222-2010-DIGENIPAA

Referencia : _____ Registro: 9910

Destino	Indicación	Destino	Indicación

Observaciones: Ley Betty Velasco

Atentamente:



Indicaciones:

- 0.1. Autorizado/Aprobado
- 0.2. Calificar/Evaluar
- 0.3. Informe
- 0.4. Proyectar resolución
- 0.5. Atención/Tramitación
- 0.6. Conocimiento y fines
- 0.7. Notificar al interesado
- 0.8. Reformular
- 0.9. Ayuda memoria
- 10. Coordinar
- 11. Opinión/Recomendación
- 12. Consolidar
- 13. Aclarar redacción
- 14. Implementar/Ejecutar
- 15. Preparar respuesta
- 16. Visación
- 17. Agregar a sus antecedentes
- 18. Archivo
- 19. Ampliar
- 20. Seguimiento



PERÚ

Ministerio de la Producción

FONDEPES
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Fecha: 06/12/18

MEMORANDUM INTERNO N° 6222 - 201 - FONDEPES/ DIGENIPAA

Asunto: CARTA N° 174 - CONS/AHS/RI - MORRO SMTA

Referencia: _____ Registro: 9910

Destino	Indicacion	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	
OCI		OGAJ	
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	<u>Aeen</u>
Observaciones: _____ _____ _____ _____			

FONDEPES
 AREA DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
 06 DIC. 2018
RECIBIDO
 Registro: _____ Hora: 5:58



Indicaciones:

- 01. Autorizado/Aprobado
- 02. Calificar/Evaluar
- 03. Informe
- 04. Proyectar
- 05. Atención/Tramitación
- 06. Conocimiento y fines
- 07. Notificar al interesado
- 08. Reformular
- 09. Ayuda memoria
- 10. Coordinar
- 11. Opinión/Recomendación
- 12. Consollar
- 13. Aclarar redacción
- 14. Implementar/Ejecutar
- 15. Preparar respuesta
- 16. Visación
- 17. Agregar a sus antecedentes
- 18. Archivo
- 19. Ampliar
- 20. Seguimiento



ALEXANDER HUERTAS JARA
A.H.J.

Consultorias y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:

- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas

01

**SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE
MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN
TACNA"**

**INFORME DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 13
NOVIEMBRE 2,018**



SUPERVISIÓN

ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 13

02

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

ENTIDAD : FONDEPES

SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA


CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS


FECHA : 30/11/2018

MONTO DEL CONTRATO SIN IGV : S/. 3,119,457.99

MONTO DEL CONTRATO CON IGV : S/. 3,680,960.43

CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	VAL. ACUM. ANTERIOR	VAL. ACTUAL	VAL. ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
TOTAL CONTRACTUAL SIN IGV	3,119,457.99				
VALORIZACION CONTRACTUALES SIN IGV		2,655,232.40	21,806.73	2,677,039.13	442,418.86
REAJUSTES		0.00	0.00	0.00	
VALORIZACION BRUTA		2,655,232.40	21,806.73	2,677,039.13	
AMORTIZACIONES					
DEL ADELANTO DIRECTO	311,945.80	265,523.25	2,180.67	267,703.92	44,241.88
DEL ADELANTO DE MATERIALES	623,891.52	525,276.54	16,355.05	541,631.59	82,259.93
TOTAL AMORTIZACIONES		790,799.79	18,535.72	809,335.51	
VALORIZACION NETA		1,864,432.61	3,271.01	1,867,703.62	
I.G.V. (18%)	561,502.44	335,597.87	588.78	336,186.65	
TOTALES	3,680,960.43	2,200,030.48	3,859.79	2,203,890.27	
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA		59.12%	0.79%	59.92%	14.19%


 ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 DNI: 4043135
 REPRESENTANTE LEGAL


 DAVID MANUEL VELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 104754

**VALORIZACION DE OBRA N° 13
RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR**

03

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"
ENTIDAD : FONDEPES
SUPERVISOR : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS
FECHA : 30/11/2018

ADELANTOS OTORGADOS	FECHA	MONTO C/IGV	MONTO S/IGV	% PRESUPUESTO
1.- Adelanto Directo	27/11/2017	368,096.04	311,945.80	10.00%
2.- Adelanto de Materiales	12/12/2017	736,192.00	623,891.52	20.00%
TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO		1,104,288.04	935,837.32	30.00%

RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS		MONTO S/
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS		1,658.44
FORMULA 02 : ARQUITECTURA		871.50
FORMULA 03 : INSTALACIONES SANITARIAS		0.00
FORMULA 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS		15,825.90
FORMULA 05 : EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO		0.00
COSTO DIRECTO TOTAL		18,355.84
GASTOS GENERALES 10.00%		1,835.58
UTILIDADES 8.800000%		1,615.31
SUB-TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL		21,806.73
FACTOR DE RELACION 1.000		21,806.73
SUB-TOTAL VALORIZACION CONTRACTUAL		S/ 21,806.73
RESUMEN DE REAJUSTES		MONTO S/
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS	Kr = 0.000	0.00
FORMULA 02 : ARQUITECTURA	Kr = 0.000	0.00
FORMULA 03 : INSTALACIONES SANITARIAS	Kr = 0.000	0.00
FORMULA 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS	Kr = 0.000	0.00
FORMULA 05 : EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Kr = 0.000	0.00
TOTAL REINTEGRO		0.00
TOTAL DE REAJUSTE Y DEDUCCIONES		S/ 0.00
DEDUCCIONES:		MONTO S/
- DEDUCCION DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DIRECTO		
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS		0.00
FORMULA 02 : ARQUITECTURA		0.00
FORMULA 03 : INSTALACIONES SANITARIAS		0.00
FORMULA 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS		0.00
FORMULA 05 : EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO		0.00
TOTAL DEDUCCION AD		0.00
- DEDUCCION DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DE MATERIALES		
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS		0.00
FORMULA 02 : ARQUITECTURA		0.00
FORMULA 03 : INSTALACIONES SANITARIAS		0.00
FORMULA 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS		0.00
FORMULA 05 : EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO		0.00
TOTAL DEDUCCION AM		0.00
VALORIZACION BRUTA (V.B.)		S/ 21,806.73
AMORTIZACIONES		MONTO S/
Amortización del Adelanto Directo		S/ 2,180.67
Amortización del Adelanto de Materiales 20.00%		S/ 16,355.05
TOTAL		S/ 18,535.72
VALORIZACION NETA (V.N.)		S/ 3,271.00
IGV 18% (VN)		588.78
MONTO TOTAL A FACTURAR Y PAGAR AL CONTRATISTA (VN + IGV)		S/ 3,859.78

(Signature)
DAVID MANUEL VELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 D.O. N° 104754

(Signature)
ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 DNI: 40431359
 REPRESENTANTE LEGAL

VALORIZACION DE OBRA N° 13

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

ENTIDAD : FONDEPES

SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA

CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS


FECHA : 30/11/2018

Monto Base	S/. 3,718,141.85
Monto Contratado	S/. 3,650,990.43
Fecha-Inicio de Obra	28/11/2017
Plazo de Ejecución	75 días
Fecha-termino de Obra	10/02/2018
Modalidad de Ejecución	Prestos Unitarios

Supervisión	: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
Contratista	: CONSORCIO OBRAS
SEGÚN COSTO DIRECTO	
Monto Valorizado del Mes	: S/. 1,668.44
Monto Valorizado Acumulado	: S/. 1,067,754.96
Monto-Saldo por Valorizar	: S/. 75,038.90
	0.16%
	93.43%
	8.67%

Ubicación	
Región	: TACNA
Departamento	: TACNA
Provincia	: TACNA
Lugar	: SAMA

N°	Descripción	CONSUMOS			MATERIALES			MANTENIMIENTO			OBRAS			VALORIZADO			SALDO					
		Unid.	Monto	%	Unid.	Monto	%	Unid.	Monto	%	Unid.	Monto	%	Unid.	Monto	%	Unid.	Monto	%			
01.00	ESTRUCTURAS																					
01.01	OBRAS PRELIMINARES																					
01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	1,373.00	100%		2,467.67	0%		0.00		0.00		0.00		0.00		1,373.00	2,467.67	0%		0.00	
01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	1,373.00	100%		1,975.06	0%		0.00		0.00		0.00		0.00		1,373.00	1,975.06	0%		0.00	
01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB	1.00	100%		1,500.00	0%		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00	1,500.00	0%		0.00	
01.01.04	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00	100%		68,900.00	0%		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00	68,900.00	0%		0.00	
01.01.05	BAÑOS QUIMICOS PARA EL PERSONAL	GLS	1.00	100%		600.00	0%		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00	600.00	0%		0.00	
01.01.06	CARTEL DE OBRA DE 2.40M x 3.60 M	peza	1.00	100%		1,122.61	0%		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00	1,122.61	0%		0.00	
01.02	SEGURIDAD Y SALUD																					
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	319.50	100%		319.50	0%		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00	319.50	0%		0.00	
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	3,897.20	100%		3,897.20	0%		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00	3,897.20	0%		0.00	
01.02.03	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	und	1,700.00	98%		1,700.00	5%		0.06		86.00		0.00		0.00		0.95	1,613.00	5%		86.00	
01.03	DEMOLICIONES																					
01.03.01	DEMOLICION DE POZA EXISTENTE	m3	6.35	100%		1,150.05	0%		0.00		0.00		0.00		0.00		6.35	1,150.05	0%		0.00	
01.03.02	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE - SUB ESTACION	m3	1.91	0%		273.48	0%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0%		0.00	
01.03.03	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTE - SUB ESTACION	m3	1.71	100%		309.70	0%		0.00		0.00		0.00		0.00		1.71	309.70	0%		0.00	
01.03.04	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO - VARIOS	m3	7.67	100%		1,543.59	0%		0.00		0.00		0.00		0.00		7.67	1,543.59	0%		0.00	
01.03.05	ESCALIFICADO DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE - MUELLE 02	m2	256.70	100%		2,325.70	0%		0.00		0.00		0.00		0.00		256.70	2,325.70	0%		0.00	
01.04	DEMONTAJE																					
01.04.01	DEMONTAJE DE BITAS Y CORNAMUSAS	und	28.04	100%		613.16	0%		0.00		0.00		0.00		0.00		28.04	613.16	0%		0.00	
01.04.02	DEMONTAJE DE BARRANDAS METALICAS	m3	189.69	100%		1,327.83	0%		0.00		0.00		0.00		0.00		189.69	1,327.83	0%		0.00	
01.04.03	DEMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA	und	1.00	100%		28.95	0%		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00	28.95	0%		0.00	
01.04.04	DEMONTAJE DE PUERTAS METALICAS	und	1.00	100%		28.95	0%		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00	28.95	0%		0.00	
01.05	MOVIMIENTO DE TIERRAS																					
01.05.01	EXCAVACION DE ZANJAS - SUB ESTACION	m3	10.54	0%		321.58	9%		1.00		30.51		0.00		0.00		0.00	9.54	30.51	9%		281.07
01.05.02	ARRABO DE MATERIAL EXCEDENTE Dpto=30M	m3	34.72	0%		847.52	0%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0%		0.00	
01.05.03	CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dpto. = SAMA	m3	34.72	0%		937.44	0%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0%		0.00	


 ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 DNI: 40431859
 REPRESENTANTE LEGAL

DAVID MANUEL VELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 R.O.C.P.N.º 04754

09

VALORIZACION DE OBRA N° 13

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

ENTIDAD : FONDEPES

SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA

CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS

FECHA : 30/11/2018

Monto Base	S/. 3,718,141.85
Monto Contratado	S/. 3,680,960.43
Fecha-Inicio de Obra	28/11/2017
Plazo de Ejecución	75 días
Fecha-Termino de Obra	10/02/2018
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios

Supervisión	: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
Contratista	: CONSORCIO OBRAS
SEGUN COSTO DIRECTO	
Monto Valorizado del Mes	: S/. 1,669.44
Monto Valorizado Acumulado	: S/. 1,047,724.86
Monto-Saldo por Valorizar	: S/. 75,068.80
	0.16%
	93.43%
	8.87%

Ubicación	
Región	: TACNA
Departamento	: TACNA
Provincia	: TACNA
Lugar	: SAMA

N°	DESCRIPCION	COMPLETADO			AVANZADO			ACUMULADO			SALDO			
		Unidad	Medida	%	Unidad	Medida	%	Unidad	Medida	%	Unidad	Medida	%	
01.06	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE													
01.06.01	SOLADO DE 4' MEZCLA 1:12 CEMENTO HORMIGON	m2	18.09	100%	651.42	0%	0.00	0.00	18.09	651.42	0%	0.00	0.00	
01.06.02	CONCRETO CICLOPEO MEZCLA 1:12 + 30% P.M.	m3	329.74	100%	42,734.30	0%	0.00	0.00	129.80	42,734.30	0%	0.00	0.00	
01.06.03	GROUT CEMENTICIO	m3	0.17	78%	1,349.14	0%	0.00	0.00	0.13	1,031.70	24%	0.04	317.45	
01.06.04	REPARACION DE LOSA EXISTENTE E=0.10m; CONCRETO Fc=315 kg/cm2, INC ACERO + PUENTE DE ADHERENCIA, ACABADO SEMIPULIDO	m2	266.70	100%	32,318.53	0%	0.00	0.00	266.70	32,318.53	0%	0.00	0.00	
01.07	OBRAS DE CONCRETO ARMADO													
01.07.01	TANQUE DE 10 M3													
01.07.01.01	TANQUE 10 M3; CONCRETO Fc=315 kg/cm2	m3	9.12	100%	5,941.88	0%	0.00	0.00	9.12	5,941.88	0%	0.00	0.00	
01.07.01.02	TANQUE 10 M3; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	62.24	100%	5,668.20	0%	0.00	0.00	62.24	5,668.20	0%	0.00	0.00	
01.07.01.03	TANQUE 10 M3; ACERO GRADO 60 F C=4200 KG/CM2	kg	792.87	100%	3,862.14	0%	0.00	0.00	792.87	3,862.14	0%	0.00	0.00	
01.07.02	CASETA DE BOMBEO													
01.07.02.01	CASETA DE BOMBEO; CONCRETO Fc=315 kg/cm2	m3	0.78	100%	508.17	0%	0.00	0.00	0.78	508.17	0%	0.00	0.00	
01.07.02.02	CASETA DE BOMBEO; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	9.14	100%	832.38	0%	0.00	0.00	9.14	832.38	0%	0.00	0.00	
01.07.02.03	CASETA DE BOMBEO; ACERO GRADO 60 F C=4200 KG/CM2	kg	63.16	100%	291.80	0%	0.00	0.00	63.16	291.80	0%	0.00	0.00	
01.07.03	PEDESTALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS													
01.07.03.01	PEDESTALES; CONCRETO Fc=315 kg/cm2	m3	2.91	100%	1,895.87	0%	0.00	0.00	2.91	1,895.87	0%	0.00	0.00	
01.07.03.02	PEDESTALES; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	30.22	100%	1,998.67	0%	0.00	0.00	30.22	1,998.67	0%	0.00	0.00	
01.07.03.03	PEDESTALES; ACERO GRADO 60 F Y=4200 KG/CM2	kg	1,120.70	100%	5,177.63	0%	0.00	0.00	1,120.70	5,177.63	0%	0.00	0.00	
01.07.04	COLUMNETAS DE ARRIOSTRE													
01.07.04.01	COLUMNETAS DE ARRIOSTRE; CONCRETO Fc=310 kg/cm2	m3	1.54	100%	946.58	0%	0.00	0.00	1.54	946.58	0%	0.00	0.00	
01.07.04.02	COLUMNETAS DE ARRIOSTRE; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	24.60	100%	1,278.22	0%	0.00	0.00	24.60	1,278.22	0%	0.00	0.00	
01.07.04.03	COLUMNETAS DE ARRIOSTRE; ACERO GRADO 60 F C=4200 KG/CM2	kg	187.92	100%	868.19	0%	0.00	0.00	187.92	868.19	0%	0.00	0.00	
01.07.05	TRAVESAOS DE AMARRE													
01.07.05.01	TRAVESAOS DE AMARRE; CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	0.42	100%	258.16	0%	0.00	0.00	0.42	258.16	0%	0.00	0.00	
01.07.05.02	TRAVESAOS DE AMARRE; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	5.65	100%	317.59	0%	0.00	0.00	5.65	317.59	0%	0.00	0.00	
01.07.05.03	TRAVESAOS DE AMARRE; ACERO GRADO 60 F C=4200 KG/CM2	kg	53.40	100%	246.71	0%	0.00	0.00	53.40	246.71	0%	0.00	0.00	
01.07.06	TRAMPAS DE ACCESO													
01.07.06.01	TRAMPAS DE ACCESO; CONCRETO Fc=315 kg/cm2	m3	18.77	100%	12,228.66	0%	0.00	0.00	18.77	12,228.66	0%	0.00	0.00	

DAVID MANUEL VELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 R.º CIP N° 104754

ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 DNI: 40481369

LEGAL

VALORIZACION DE OBRA N° 13

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

ENTIDAD : FONDEPES

SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA

CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS

FECHA : 30/11/2018

Monto Base	S/. 3,718,141.85
Monto Contratado	S/. 3,690,960.43
Fecha-Inicio de Obra	28/11/2017
Plazo de Ejecución	75 días
Fecha-Termino de Obra	10/02/2018
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios

Supervisión	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS	
SEGUN COSTO DIRECTO		
Monto Valorizado del Mes	S/. 1,658.44	0.15%
Monto Valorizado Acumulado	S/. 1,087,724.98	93.43%
Monto-Saldo por Valorizar	S/. 75,065.90	6.87%

Ubicación	
Región	TACNA
Departamento	TACNA
Provincia	TACNA
Lugar	SAMA

N°	Descripción	PRESUPUESTO				ANÁLISIS				ACUMULADO				SALDO		
		Materiales		Mano de Obra		Materiales		Mano de Obra		Materiales		Mano de Obra		Materiales	Mano de Obra	
		Unidad	Cantidad	%	Valor	Unidad	Cantidad	%	Valor	Unidad	Cantidad	%	Valor			
01.07.06.02	RAMPAS DE ACCESO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	34.50	96.21	1,939.25	100%	34.50	1,939.25	0%	0.00	0.00	100%	34.50	1,939.25	0%	0.00
01.07.06.03	RAMPAS DE ACCESO: ACERO GRADO 60 FC=4200 KG/CM2	kg	2,447.53	4.62	11,307.59	100%	2,447.53	11,307.59	0%	0.00	0.00	100%	2,447.53	11,307.59	0%	0.00
01.07.07	CANALIZACION - SUB ESTACION															
01.07.07.01	CANALIZACION - SUB ESTACION: CONCRETO Fc=315 kg/cm2	m3	7.98	651.50	6,196.97	0%	0.00	0.00	14%	1.10	716.65	14%	1.10	716.65	88%	4,482.32
01.07.07.02	CANALIZACION - SUB ESTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	32.36	91.07	2,947.03	0%	0.00	0.00	12%	4.00	364.28	12%	4.00	364.28	88%	2,582.75
01.07.07.03	CANALIZACION - SUB ESTACION: ACERO GRADO 60 FC=4200 KG/CM2	kg	885.96	4.82	3,215.34	0%	0.00	0.00	14%	100.00	462.00	14%	100.00	462.00	88%	2,753.34
01.08	ESTRUCTURAS METALICAS															
01.08.01	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA COBERTURA 01	kg	5,188.00	9.82	50,946.18	100%	5,188.00	50,946.18	0%	0.00	0.00	100%	5,188.00	50,946.18	0%	0.00
01.08.02	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA COBERTURA 02	kg	3,508.00	9.82	34,448.86	100%	3,508.00	34,448.86	0%	0.00	0.00	100%	3,508.00	34,448.86	0%	0.00
01.08.03	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA COBERTURA 03	kg	10,487.00	9.82	102,982.34	100%	10,487.00	102,982.34	0%	0.00	0.00	100%	10,487.00	102,982.34	0%	0.00
01.08.04	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA COBERTURA 04	kg	87,848.00	9.82	568,087.36	98%	84,748.18	837,827.13	0%	0.00	0.00	98%	84,748.18	837,827.13	5%	3,089.82
01.08.05	PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE ARENADO	m2	2,499.16	28.06	72,801.18	96%	2,397.91	69,859.29	0%	0.00	0.00	96%	2,397.91	69,859.29	4%	1,011.27
01.08.06	CANALETAS DE PLANCHAS DE ACERO GALVANIZADO ACABADO ALUZINC	m	73.70	47.79	3,822.12	75%	55.00	2,828.46	0%	0.00	0.00	75%	55.00	2,828.46	25%	18.70
01.08.07	CORTE DE PERNOS DE ANCLAJE EXISTENTES	und	180.00	4.47	718.20	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	180.00
01.08	DEFENSA DE MUELLES															
01.08.01	DEFENSA DE MUELLE TIPO 1 - CANALES DE ACERO	m	99.10	102.09	9,086.22	52%	46.85	4,782.81	0%	0.00	0.00	52%	46.85	4,782.81	48%	4,333.41
01.08.02	ESTRUCTURA DE MADERA PARA DEFENSA DE MUELLE	m	839.15	65.71	55,140.95	69%	580.42	38,139.40	0%	0.00	0.00	69%	580.42	38,139.40	31%	258.73
01.08.03	DEFENSA DE MUELLE - LLANTAS DE CAUCHO ARO 20	und	161.00	80.26	9,701.86	38%	57.32	3,453.86	0%	0.00	0.00	38%	57.32	3,453.86	64%	103.66

COSTO DIRECTO TOTAL	1,142,763.76	1,068,066.42	1,688.44	1,087,724.98	75,065.90
GASTOS GENERALES (10.0 %)	114,276.38	106,806.64	165.84	106,772.49	7,505.89
UTILIDAD (8.8%)	100,564.97	93,913.84	145.94	93,909.79	6,605.18
SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO	1,357,603.11	1,268,786.91	1,970.23	1,268,497.13	89,198.98
I.G.V. (18.0 %)	244,372.88	227,967.64	354.64	228,322.28	16,050.60
TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO	1,601,975.99	1,496,754.55	2,324.87	1,496,779.42	105,250.57

DAVID MANUEL VELA FARFAN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIPI Nº 104754

ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
DNI: 40431359
REPRESENTANTE LEGAL

8

VALORIZACION DE OBRA N° 13

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

ENTIDAD : FONDEPES

SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA


CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS


FECHA : 30/11/2018

Monto Base	S/. 3,716,141.85	Supervisión	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
Monto Contratado	S/. 3,690,990.43	Contratista	CONSORCIO OBRAS
Fecha-Inicio de Obra	28/11/2017	SEGUN COSTO DIRECTO	
Plazo de Ejecución	75 días	Monto Valorizado del Mes	S/. 18,366.84
Fecha-Termino de Obra	10/02/2018	Monto Valorizado Acumulado	S/. 2,263,399.99
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios	Monto-Saldo por Valorizar	S/. 372,406.44
			0.70%
			85.82%
			14.18%

Ubicación	
Región	TACNA
Departamento	TACNA
Provincia	TACNA
Lugar	SAMA

N°	DESCRIPCION	PARCIAL		ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		BALDO	
		%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto
01	SUB-PRESUPUESTO 01 ESTRUCTURAS	1.142,763.76	93.29%	1,096,096.42	0.15%	1,068.44	93.43%	1,067,724.86	6.57%	76,058.90	
02	SUB-PRESUPUESTO 02 ARQUITECTURA	311,158.46	83.80%	280,763.49	0.28%	871.50	84.08%	281,634.99	15.92%	49,321.47	
03	SUB-PRESUPUESTO 03 INSTALACIONES SANITARIAS	84,308.22	24.81%	20,746.89	0.00%	0.00	24.81%	20,746.89	75.39%	89,581.39	
04	SUB-PRESUPUESTO 04 INSTALACIONES ELECTRICAS	331,818.95	62.48%	207,362.21	4.77%	15,825.90	67.35%	223,218.11	32.75%	106,700.85	
05	SUB-PRESUPUESTO 05 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	759,639.00	90.00%	680,075.10	0.00%	0.00	90.00%	680,075.10	10.00%	76,563.90	
COSTO DIRECTO TOTAL		2,825,806.39		2,235,044.11		19,368.94		2,253,399.99		372,406.44	
GASTOS GENERALES (10.0 %)		262,560.64		223,804.41		1,835.66		225,339.99		37,240.64	
UTILIDAD (8.8%)		231,070.98		199,683.66		1,615.31		199,299.20		32,771.77	
SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO		3,119,497.99		2,655,232.40		21,808.73		2,677,038.13		442,418.86	
I.G.V. (18.0 %)		561,502.44		477,941.63		3,925.21		481,867.04		79,635.39	
TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO		3,680,999.43	95.12%	3,133,174.23	0.70%	25,733.94	85.82%	3,158,906.18	14.18%	522,054.25	


DAVID MANUEL VELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 104754


ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 DNI: 40431359
 REPRESENTANTE LEGAL

VALORIZACION DE OBRA N° 13

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"


ENTIDAD : FONDEPES
 SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS
 FECHA : 30/11/2016


Supervisión	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS	
REGION COSTO DIRECTO		
Monto Valorizado del ítem	S/. 0.00	0.00%
Monto Valorizado Acumulado	S/. 30,744.89	24.61%
Monto-Bando por Valorizar	S/. 123,891.33	75.39%

Supervisión	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS	
REGION COSTO DIRECTO		
Monto Valorizado del ítem	S/. 0.00	0.00%
Monto Valorizado Acumulado	S/. 30,744.89	24.61%
Monto-Bando por Valorizar	S/. 123,891.33	75.39%

Monto Base	S/. 3,718,141.95
Monto Contratado	S/. 3,680,980.43
Fecha-Inicio de Obra	28/11/2017
Plazo de Ejecución	76 días
Fecha-Inicio de Obra	10/02/2018
Modalidad de Ejecución	Proceso Unitario

C.C.P.	DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	VALORIZACION		COSTO DIRECTO		VALORIZACION		COSTO DIRECTO		VALORIZACION		COSTO DIRECTO		VALORIZACION		COSTO DIRECTO	
			%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto
03.01.01.01	INSTALACIONES SANITARIAS	m	18.00	0.02	14.76	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	14.76
03.01.01.01	TRAZADO PRELIMINAR	m	1.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA	m	1.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
03.01.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1"	md	1.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
03.01.03.01	VALVULAS	md	1.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
03.01.04.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROBCADA DE 1"	m	18.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
03.01.04.01	TUBERIAS	m	1.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
03.01.05.01	SUM.INST. TIPRUERA HIDRATUB PVC D=1" C-10	md	1.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
03.01.06.01	NICHO PARA DE MADERA PARA VALVULA EN PARED	md	1.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
03.01.06.01	CAJON DE BOMBEO	md	4.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
03.01.06.01	TUBERIA	m	28.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
03.01.07.01	CAMARA DE BOMBEO, CUANTO DE BOMBAS	md	2.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
03.01.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC GAL. 4"	md	2.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
03.01.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO BOMBEO Pumptp	md	2.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
03.01.09.01	ACCESORIOS PARA BOMBAS CENTRIFUGAS	md	0.15	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
03.01.09.01	LINEA DE IMPULSION	m	33.30	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
03.01.09.02	SUM.INST. TIPRUERA HIDRATUB PVC D=2" C-10 ADOBGADO	m	9.30	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
03.01.10.01	CANALETAS	md	1.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
03.01.10.01	EXCAVACION DE CANALETAS	md	1.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
03.01.10.02	CONCRETO PARA REJILLA EN CANALETAS	md	0.25	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
03.01.10.04	COLOCACION DE REJILLA EN CANALETAS DE FIBRA DE VIDRIO	md	0.25	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
03.01.10.05	CANALETAS CON REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO	md	60.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
03.02.01	MODIFICACION	md	2.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
03.02.01	SUMINISTRO E INST. DE BOMBAS SUMERGIBLES 1 Hp. HD7=4.50m. Q=2.85l	md	2.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
03.02.02	ACCESORIOS PARA BOMBAS SUMERGIBLES	md	2.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00


 DAVID MANUEL VELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 104754


 ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 DNI: 40431359
 REPRESENTANTE LEGAL

VALORIZACION DE OBRA N° 13

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

ENTIDAD : FONDERES
 SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS
 FECHA : 30/11/2018

Monto Base	S/. 3,718,141.85
Monto Contratado	S/. 3,680,980.43
Fecha-Inicio de Obra	28/11/2017
Plazo de Ejecución	75 días
Fecha-termino de Obra	10/02/2018
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios

Supervisión	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS	
SEGUN COSTO DIRECTO		
Monto Valorizado del Mes	S/. 0.00	0.00%
Monto Valorizado Acumulado	S/. 20,746.89	24.61%
Monto-Saldo por Valorizar	S/. 63,661.33	76.39%

Ubicación	
Región	TACNA
Departamento	TACNA
Provincia	TACNA
Lugar	SAMA

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			AVANZADO			ACTUAL			SALDO							
		Unid.	Cant.	Presupuesto	%	Unid.	Cant.	Presupuesto	%	Unid.	Cant.	Presupuesto	%	Unid.	Cant.	Presupuesto	%	
03.03	CABETA DE CAPATACION	GLB	1.00	579.23	100%	1.00	579.23	0%	0.00	0.00	100%	1.00	579.23	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
03.03.01	RETIRO DE LA TUBERIA DE SUCCION DE 2.5" PVC	m	40.00	84.28	88%	35.00	2,960.15	0%	0.00	0.00	88%	35.00	2,960.15	13%	5.00	421.45	0.00	0.00
03.03.02	INSTALACION DE TUBERIA DE SUCCION HDPE 2.5" INCLUIDO ANCLAJE	Und	1.00	622.86	100%	1.00	622.86	0%	0.00	0.00	100%	1.00	622.86	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
03.03.03	ACCESORIOS DE LINEA DE SUCCION	Und	1.00	898.89	100%	1.00	898.89	0%	0.00	0.00	100%	1.00	898.89	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
03.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE PELO	Und	1.00	898.89	100%	1.00	898.89	0%	0.00	0.00	100%	1.00	898.89	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
03.04	RED DE DISTRIBUCION	GLB	1.00	1,600.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	1,600.00	0.00	0.00
03.04.01	VERIFICACION Y PUNTOS DE PRUEBA DE CALIDAD EN LAS REDES DE AGUA	GLB	1.00	1,600.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	1,600.00	0.00	0.00
03.06	SISTEMA DE TRATAMIENTO CLORACION-DEINFECCION	GLB	1.00	3,000.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03.06.01	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE OSMOSIS INVER	GLB	1.00	3,000.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03.06	EMISOR SUBMARINO/AFUENTES	GLB	1.00	500.00	100%	1.00	500.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	500.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
03.06.01	EQUIPO DE BOMBEO	Und	1.00	500.00	100%	1.00	500.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	500.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
03.06.01.01	DESMONTAJE Y RETIRO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE CON ARBOL	Und	2.00	2,897.68	100%	2.00	5,795.36	0%	0.00	0.00	100%	2.00	5,795.36	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
03.06.01.02	SUMINISTRO E INST. DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA Q=4.00 lps. HDI	Und	1.00	1,728.18	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	1,728.18	0.00	0.00
03.06.01.03	ACCESORIOS PARA ELECTROBOMBAS CENTRIFUGA	GLB	1.00	1,728.18	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	1,728.18	0.00	0.00
03.06.02	EMISOR	GLB	1.00	9,400.00	100%	1.00	9,400.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	9,400.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
03.06.02.01	ULTRASONIDO - CONTROL DE CALIDAD	GLB	1.00	9,400.00	100%	1.00	9,400.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	9,400.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
03.06.02.01.01	VERIFICACION DE LA INSPECCION ULTRASONICA DE JUNTA	GLB	1.00	9,400.00	100%	1.00	9,400.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	9,400.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
03.06.02.02	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO	m	520.00	75.25	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	520.00	0.00	0.00
03.06.02.02.01	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO DE LINEA	m	8.00	314.06	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	8.00	0.00	0.00
03.06.02.02.02	FIJACION PRIMEROS METROS DE TUBERIA CON CONCRETO CICLOPEO	m3	1.00	1,500.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	1,500.00	0.00	0.00
03.06.02.02.03	PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA EMISOR SUBMARINO	Und	1.00	1,500.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	1,500.00	0.00	0.00

COSTO DIRECTO TOTAL	84,308.22	20,746.89	0.00	20,746.89	63,661.33
GASTOS GENERALES (10.0 %)	8,430.82	2,074.69	0.00	2,074.69	6,356.13
UTILIDAD (8.6%)	7,419.12	1,825.73	0.00	1,825.73	5,593.40
SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO	100,168.16	24,647.31	0.00	24,647.31	76,610.86
I.G.V. (18.0 %)	18,028.47	4,436.51	0.00	4,436.51	13,591.95
TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO	118,196.63	29,083.82	0.00	29,083.82	89,112.81

DAVID MAXUEL VELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 104754

(Signature)
 ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 D.N.I. 40431359
 REPRESENTANTE LEGAL

VALORIZACION DE OBRA N° 13

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE HORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

ENTIDAD : FONDEPES

SUPERVISOR : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA

CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS

FECHA : 30/11/2018

Monto Base	S/ 3,718,141.85
Monto Contratado	S/ 3,650,800.33
Fecha Inicio de Obra	28/11/2017
Plazo de Ejecución	75 días
Fecha Inicio de Obra	10/02/2018
Modalidad de Ejecución	Precio Unitario

Supervisión		ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contrata		CONSORCIO OBRAS	
Monto Valorado del Mes	S/ 971.80	0.26%	
Monto Valorado Acumulado	S/ 291,834.99	84.08%	
Monto Saldo por Valorar	S/ 48,871.47	13.52%	

Ubicación		TACNA	
Región		TACNA	
Departamento		TACNA	
Provincia		SAMA	
Lugar		SAMA	

Código	Descripción	Unidad	MONTOS		% VALORADO		% VALORADO		% VALORADO		% VALORADO	
			Valorado	Por Valorar	Valorado	Por Valorar	Valorado	Por Valorar	Valorado	Por Valorar		
02.00	ARQUITECTURA											
02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA	m2	12.42	78.79	978.57	100%	12.42	978.57	0%	0.00	978.57	0%
02.01.01	MURO DE LADRILLO KING KONG E=0.15m	m2	30.87	36.97	1,103.20	100%	30.87	1,103.20	0%	0.00	1,103.20	0%
02.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS	m2	14.11	36.97	507.64	100%	14.11	507.64	0%	0.00	507.64	0%
02.02.01	TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA MEZCLA 1:5	m2	34.46	12.86	436.14	100%	34.46	436.14	0%	0.00	436.14	0%
02.02.02	TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA MEZCLA 1:5	m	04.85	56.00	3,868.75	51%	33.00	1,815.00	0%	0.00	1,815.00	48%
02.02.03	VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO = 16 CM.	m	273.47	19.41	5,308.05	13%	35.00	679.35	0%	0.00	679.35	87%
02.03	PISOS Y PAVIMENTOS	m2	1,756.02	63.39	148,434.51	97%	1,711.10	142,688.63	0%	0.00	142,688.63	3%
02.03.01	PISO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE INC. PINTURA EPOXICA	m	12.00	5,816.15	67,417.80	100%	12.00	67,417.80	0%	0.00	67,417.80	0%
02.03.02	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	und	11.00	2,760.09	30,990.99	36%	4.00	11,180.36	0%	0.00	11,180.36	94%
02.04	CONTRAZOCALOS DE CEMENTO DIBERGO SANITARIO, H=10 cm	m	67.99	189.90	11,551.50	96%	65.25	11,085.98	0%	0.00	11,085.98	4%
02.06	COBERTURAS	m2	7.70	570.64	4,393.93	100%	7.70	4,393.93	0%	0.00	4,393.93	0%
02.06.01	POLICARBONATO COLOR BLANCO (INCLUDE ACCESORIOS, PROVISION Y COLOCACION) - TIPO I	und	11.00	2,760.09	30,990.99	36%	4.00	11,180.36	0%	0.00	11,180.36	94%
02.06.02	CARPINTERIA METALICA	m	67.99	189.90	11,551.50	96%	65.25	11,085.98	0%	0.00	11,085.98	4%
02.06.03	PUERTA BECCONABLE TIPO INDUSTRIAL (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION)	m2	7.70	570.64	4,393.93	100%	7.70	4,393.93	0%	0.00	4,393.93	0%
02.06.04	PUERTA METALICA CON PLANCHAS DE ACERO A-36 DE 4mm, MARCO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" Y FERRETA	m2	1.00	477.72	477.72	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%
02.06.05	PUERTA METALICA PRS-1	m2	0.25	1,119.24	279.81	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%
02.06.06	VENTANA METALICA TIPO PERSIANA DE PLANCHAS DE ACERO A-36 DE 1/8"	m2	0.25	1,119.24	279.81	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%

(Signature)
ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 DNI: 40431359
 REPRESENTANTE LEGAL

(Signature)
DAVID MANUEL VELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 104754

VALORIZACION DE OBRA N° 13

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

ENTIDAD : FONDEPES

SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA

CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS

FECHA : 30/11/2018

Monto Base	S/. 3,718,141.88
Monto Contratado	S/. 3,990,980.43
Fecha Inicio de Obra	28/11/2017
Plazo de Ejecución	75 días
Fecha Término de Obra	10/02/2018
Modalidad de Ejecución	Preços Unitarios

Supervisión	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS	
SEGUN COSTO DIRECTO	S/. 871.60	0.28%
Monto Valorizado del Mes	S/. 261,854.98	84.09%
Monto-Saldo por Valorizar	S/. 49,821.47	16.92%

Ubicación	TACNA		
Región	TACNA		
Departamento	TACNA		
Provincia	TACNA		
Lugar	SAMÁ		

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ANALISIS DE PRECIOS				ANALISIS DE VALORES				SALDO			
		Monto		%		Monto		%		Monto		%		Monto		%	
		Ud.	S/.	%	S/.	Ud.	S/.	%	S/.	Ud.	S/.	%	S/.	Ud.	S/.	%	
02.06.07	VENTANA METALICA DE MALLA DE ACERO GALVANIZADO RECUBIERTA CON PVC	m2	14.82	117.88	0%	1,711.92	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	14.82	100%	1,711.62
02.07	CARPINTERIA DE ALUMINIO																
02.07.01	VENTANA DE ALUMINIO. CAVIDRIO TEMPLADO	m2	1.08	168.00	0%	181.44	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	1.08	100%	181.44
02.08	CERRAJERIA																
02.08.01	CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA. CON TIRADOR	und	2.00	72.94	0%	145.88	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	2.00	100%	145.88
02.08.02	BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE DE 4"	pza	2.00	23.43	0%	46.86	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	2.00	100%	46.86
02.09	PINTURA																
02.09.01	PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES CON LATEX	m2	43.42	15.51	0%	673.44	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	43.42	100%	673.44
02.09.02	PINTURA EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES CON LATEX	m2	14.11	18.01	0%	225.90	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	14.11	100%	225.90
02.09.03	PINTURA EPOXICA EN CARPINTERIA METALICA INCLUYE ARENADO	m2	172.28	29.05	59%	5,004.15	17%	102.00	2,963.10	77%	30.00	871.50	132.00	3,834.60	23%	40.28	1,199.55
02.10	OTRO																
02.01.01	BITAS METALICAS DE F° G° DE 6"	und	21.00	389.89	71%	8,183.49	71%	15.00	5,845.35	0%	0.00	0.00	15.00	5,845.35	29%	6.00	2,338.14
02.01.02	LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL DE OBRA	GLB	1.00	500.00	30%	500.00	30%	0.30	150.00	0%	0.00	0.30	150.00	70%	0.70	350.00	
02.01.03	ACONDICIONAMIENTO DE CORNAMUBAS EXISTENTES	und	6.00	282.43	63%	1,574.58	63%	5.00	1,312.15	0%	0.00	5.00	1,312.15	17%	1.00	282.43	
02.01.04	ACONDICIONAMIENTO DE BARANDAS DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO EXISTENTE	m	185.25	58.78	85%	9,710.09	85%	140.00	8,228.40	0%	0.00	140.00	8,228.40	15%	25.25	1,483.69	
02.10.05	ESCALERA METALICA DE ALUMINIO	und	2.00	416.38	0%	832.76	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	2.00	100%	832.76
02.10.06	PROTECCION DE BORDE DE MESA DE CONCRETO	m	31.90	289.02	0%	9,219.74	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	31.90	100%	9,219.74
COSTO DIRECTO TOTAL					311,186.48			260,763.48			871.60			261,634.99			49,821.47
GASTOS GENERALES (10.0 %)					31,118.65			26,076.35			87.15			26,163.80			4,952.15
UTILIDAD (8.8%)					27,981.77			22,947.19			78.69			23,023.88			4,357.89
SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO					369,643.87			309,787.02			1,036.54			310,823.37			58,831.50
I.G.V. (16.0 %)					66,537.70			55,761.66			186.36			55,948.03			10,589.87
TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO					436,181.57			366,548.68			1,221.70			366,770.39			69,421.17

DAVID MANUEL VELA FARFAN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIPM 104754

ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
DNI: 40421359
REPRESENTANTE LEGAL

VALORIZACION DE OBRA N° 13

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTEBANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMÁ, DISTRITO DE SAMÁ, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"
 ENTIDAD : FONDEPES
 SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS
 FECHA : 30/11/2016

Monto Base	S/ 3,718,141.86
Monto Contratado	S/ 3,680,890.43
Fecha Inicio de Obra	28/11/2017
Pazo de Ejecución	75 días
Fecha Inicio de Obra	10/02/2013
Modalidad de Ejecución	Precio Unitario

Supervisión	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS	
SEGURO CONTRA DIRECTO		
Monto Valorado del Mes	S/ 0.00	0.00%
Monto Valorado Acumulado	S/ 168,790.88	33.79%
Monto-Saldo por Valorar		

Ubicación			
Región	:	TACNA	
Departamento	:	TACNA	
Provincia	:	TACNA	
Lugar	:	SAMA	

N°	Descripción	Unidad	MONTOS			%			VALORES											
			Presupuesto	Valorado	Porcentaje	Presupuesto	Valorado	%	Presupuesto	Valorado	%									
04.00	INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION																			
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES																			
04.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	GLB	1.00	500.00	100%	1.00	500.00	0%	1.00	500.00	0%	1.00	500.00	0%	1.00	500.00	0%	1.00	500.00	0%
04.01.02	TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS A LA OBRA	GLB	1.00	248.82	100%	1.00	248.82	0%	1.00	248.82	0%	1.00	248.82	0%	1.00	248.82	0%	1.00	248.82	0%
04.02	DEMOLICION																			
04.02.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO H=0.10m	m	126.00	0.87	100%	126.00	109.82	0%	126.00	109.82	0%	126.00	109.82	0%	126.00	109.82	0%	126.00	109.82	0%
04.02.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO-VEREDA DE CONCRETO	m ³	6.24	126.37	100%	6.24	807.27	0%	6.24	807.27	0%	6.24	807.27	0%	6.24	807.27	0%	6.24	807.27	0%
04.02.03	DEMOLICION DE BUZON DE CONCRETO EXISTENTE	m ³	1.72	156.93	100%	1.72	289.80	0%	1.72	289.80	0%	1.72	289.80	0%	1.72	289.80	0%	1.72	289.80	0%
04.03	DEMONTAJE																			
04.03.01	DEMONTAJE DE CABLES ELECTRICOS NY EN TUBERIAS FORMANDO 4 FASE	m	420.00	1.46	100%	420.00	613.20	0%	420.00	613.20	0%	420.00	613.20	0%	420.00	613.20	0%	420.00	613.20	0%
04.03.02	DEMONTAJE DE CABLES ELECTRICOS NY EN TUBERIAS FORMANDO 4 FASE	m	82.96	1.25	100%	82.96	78.96	0%	82.96	78.96	0%	82.96	78.96	0%	82.96	78.96	0%	82.96	78.96	0%
04.03.03	DEMONTAJE DE CABLES ELECTRICOS NY EN TUBERIAS FORMANDO 2 FASE	m	368.00	0.89	100%	368.00	327.82	0%	368.00	327.82	0%	368.00	327.82	0%	368.00	327.82	0%	368.00	327.82	0%
04.03.04	DEMONTAJE DE CABLES ELECTRICOS NY EN TUBERIAS FORMANDO 2 FASE	m	435.86	0.79	100%	435.86	340.04	0%	435.86	340.04	0%	435.86	340.04	0%	435.86	340.04	0%	435.86	340.04	0%
04.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS																			
04.04.01	EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL	m ³	24.48	30.51	100%	24.48	747.19	0%	24.48	747.19	0%	24.48	747.19	0%	24.48	747.19	0%	24.48	747.19	0%
04.04.02	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m ³	21.97	47.56	100%	21.97	1,046.33	0%	21.97	1,046.33	0%	21.97	1,046.33	0%	21.97	1,046.33	0%	21.97	1,046.33	0%
04.04.03	REPOSICION DE VEREDA 175 kg/m ² , E = 4", PULIDO Y BRUADO, CON IMPER	m ³	6.24	857.84	100%	6.24	3,486.92	0%	6.24	3,486.92	0%	6.24	3,486.92	0%	6.24	3,486.92	0%	6.24	3,486.92	0%
04.04.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIMAQUINA	m ³	10.48	21.87	100%	10.48	227.10	0%	10.48	227.10	0%	10.48	227.10	0%	10.48	227.10	0%	10.48	227.10	0%
04.06	TUBERIAS DE PVC																			
04.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 3" INC. CINTA SEÑALIZACI	m	282.85	11.79	100%	282.85	3,329.82	0%	282.85	3,329.82	0%	282.85	3,329.82	0%	282.85	3,329.82	0%	282.85	3,329.82	0%
04.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC 1 1/4" Ø	m	285.00	43.40	100%	285.00	12,803.00	0%	285.00	12,803.00	0%	285.00	12,803.00	0%	285.00	12,803.00	0%	285.00	12,803.00	0%
04.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC 1 1/2" Ø	m	170.00	46.86	100%	170.00	7,832.20	0%	170.00	7,832.20	0%	170.00	7,832.20	0%	170.00	7,832.20	0%	170.00	7,832.20	0%

David Manuel Vela Farfan
 DAVID MANUEL VELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 104754

Alexander Primitivo Huertas Jara
 ALEXANDER PRIMITIVO
 HUERTAS JARA
 DNI: 40431359
 REPRESENTANTE LEGAL

VALORIZACION DE OBRA N° 13

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE HORRO BAMA, DISTRITO DE BAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"
 ENTIDAD : FONORPEP
 SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS
 FECHA : 30/11/2018

Ubicación : TACNA
 Region : TACNA
 Departamento : TACNA
 Provincia : BAMA
 Lugar : BAMA

Supervisión : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 Contratación : CONSORCIO OBRAS
 Monto Contrato Directo : S/ 6.000
 Monto Valorado del Ítem : S/ 6.000
 Monto Valorado Acumulado : S/ 1.081.750,89
 Monto-Saldo por Valorizar : S/ 33.79%

Supervisión : 8/ 3.715.141,85
 Monto Contratado : S/ 3.880.980,43
 Fecha-Inicio de Obra : 28/11/2017
 Plazo de Ejecución : 76 días
 Fecha-Inicio de Obra : 02/02/2018
 Monto-Valorado de Obra : Precios Unitarios

Código	Descripción	Unidad	Monto			%			Monto	%	Monto	%
			Valorado	Acumulado	Saldo	Valorado	Acumulado	Saldo				
04.08.01	MIZONES	Und	4,00	1,488,12	5,824,48	100%	4,00	5,824,48	0%	0,00	0%	0,00
04.07	CABLE ALIMENTADORES											
04.07.01	CABLE NZXCH, 3-1x18mm ² + 1x18mm ² , 0,8/1V	m	22,05	207,32	4.871,41	84%	20,77	4.308,04	0%	0,00	0%	206,37
04.07.02	CABLE NZXCH, 3-1x120mm ² + 1x120mm ² , 0,8/1V	m	18,80	130,83	2.164,98	0%	0,00	0,00	100%	18,80	100%	2.164,98
04.07.03	CABLE NZXCH, 3-1x6mm ² + 1x6mm ² , 0,8/1V	m	98,70	108,84	8.046,49	91%	91,88	8.030,38	0%	0,00	0%	816,14
04.07.04	CABLE NZXCH, 3-1x6mm ² + 1x6mm ² , 0,8/1V	m	83,18	80,19	3.200,90	0%	0,00	0,00	100%	83,18	100%	3.200,90
04.07.05	CABLE NZXCH, 3-1x35mm ² + 1x35mm ² , 0,8/1V	m	123,90	48,92	8.913,36	81%	86,87	4.889,80	0%	0,00	0%	1.327,48
04.07.06	CABLE NZXCH, 3-1x25mm ² + 1x25mm ² , 0,8/1V	m	215,35	36,77	7.914,74	75%	181,88	8.088,00	0%	0,00	0%	1.688,74
04.07.07	CABLE NZXCH, 3-1x18mm ² + 1x18mm ² , 0,8/1V	m	327,80	27,82	8.980,00	87%	218,48	8.888,87	33%	109,12	2.881,18	1.688,74
04.07.08	CABLE NZXCH, 3-1x10mm ² + 1x10mm ² , 0,8/1V	m	78,81	18,70	1.417,60	0%	0,00	0,00	100%	78,81	100%	1.417,60
04.07.09	CABLE NZXCH, 3-1x6mm ² + 1x6mm ² , 0,8/1V	m	284,00	14,84	4.304,18	0%	0,00	0,00	100%	284,00	100%	4.304,18
04.07.10	CABLE NZXCH, 3-1x25mm ² , 0,8/1V	m	7,36	100,15	788,10	89%	6,83	884,02	0%	0,00	0%	82,09
04.07.11	CABLE NZXCH, 3-1x25mm ² , 0,8/1V	m	198,45	47,29	8.384,70	79%	180,00	7.083,90	0%	0,00	0%	2.291,20
04.07.12	CABLE NZXCH, 3-1x25mm ² , 0,8/1V	m	18,43	28,68	878,88	0%	0,00	0,00	100%	18,43	100%	878,88
04.07.13	CABLE NZXCH, 3-1x18mm ² , 0,8/1V	m	36,75	22,71	834,89	0%	0,00	0,00	100%	36,75	100%	834,89
04.07.14	CABLE NZXCH, 3-1x10mm ² , 0,8/1V	m	27,30	18,46	600,88	0%	0,00	0,00	100%	27,30	100%	600,88
04.07.15	CABLE NZXCH, 3-1x6mm ² , 0,8/1V	m	32,82	18,44	860,11	0%	0,00	0,00	100%	32,82	100%	860,11
04.07.16	CABLE NZXCH, 3-1x6mm ² , 0,8/1V	m	102,05	34,72	2.890,84	74%	82,78	2.179,03	0%	0,00	0%	773,91
04.07.17	CABLE NZXCH, 3-1x25mm ² , 0,8/1V	m	24,89	29,20	1.810,11	0%	0,00	0,00	100%	24,89	100%	1.810,11
04.07.18	CABLE NZXCH, 2-1x10mm ² , 0,8/1V	m	268,19	15,38	4.864,00	86%	280,00	4.308,40	0%	0,00	0%	247,62
04.07.19	CABLE NZXCH, 2-1x6mm ² , 0,8/1V	m	118,75	13,42	1.808,37	0%	0,00	0,00	100%	118,75	100%	1.808,37
04.07.20	CABLE NZXCH, 2x2,5mm ² , 0,8/1V	m	433,84	11,43	1.028,87	0%	0,00	0,00	100%	433,84	100%	1.028,87
04.07.21	CABLE NH-60, 1x18mm ² , 480/750V	m	7,36	17,24	128,71	0%	0,00	0,00	100%	7,36	100%	128,71
04.07.22	CABLE NH-60, 1x18mm ² , 480/750V	m	87,83	13,68	1.210,08	0%	0,00	0,00	100%	87,83	100%	1.210,08
04.07.23	CABLE NH-60, 1x18mm ² , 480/750V	m	308,88	11,47	3.804,88	0%	0,00	0,00	100%	308,88	100%	3.804,88
04.07.24	CABLE NH-60, 1x18mm ² , 480/750V	m	177,45	9,15	1.833,87	0%	0,00	0,00	100%	177,45	100%	1.833,87
04.07.25	CABLE NH-60, 1x18mm ² , 480/750V	m	234,98	7,88	1.802,34	0%	0,00	0,00	100%	234,98	100%	1.802,34
04.07.26	CABLE NH-60, 1x18mm ² , 480/750V	m	1.399,24	8,83	8.740,24	0%	0,00	0,00	100%	1.399,24	100%	8.740,24
04.07.27	CABLE NH-60, 1x18mm ² , 480/750V	m	860,04	8,84	3.987,24	0%	0,00	0,00	100%	860,04	100%	3.987,24
04.07.28	CABLE NH-60, 1x18mm ² , 480/750V	m	38,14	8,95	217,23	0%	0,00	0,00	100%	38,14	100%	217,23
04.07.29	CABLE NH-60, 1x18mm ² , 480/750V	m	11,80	18,40	183,82	0%	0,00	0,00	100%	11,80	100%	183,82
04.07.30	CABLE NH-60, 3-1x18mm ² (F) + 1x18mm ² (N), 480/750V	m	138,89	12,89	1.758,70	0%	0,00	0,00	100%	138,89	100%	1.758,70
04.08	TABLEROS GENERALES											
04.08.01	TABLEROS GENERALES TO	Und	1,00	16,410,89	16,410,89	48%	0,48	7,877,23	32%	0,32	5,251,48	3.282,18
04.08.02	TABLEROS DE TRANSFERENCIA 300x220 V	Und	1,00	34,178,18	34,178,18	70%	0,70	23,824,73	10%	0,10	3,417,62	8.835,64
04.08.03	TABLEROS NORMAL GENERAL TNS-01	Und	1,00	10,368,24	10,368,24	85%	0,85	8,787,86	18%	0,18	1,858,44	2.079,25
04.08.04	TABLEROS NORMAL GENERAL TNS-02	Und	1,00	8,909,24	8,909,24	3%	0,3%	1,993,23	46%	0,46	4,487,35	1.121,95
04.08.05	TABLEROS EMERGENCIA GENERAL TOE-01	Und	1,00	8,888,24	8,888,24	9%	0,36	2,081,23	0%	0,00	0,00	8,888,24
04.08.06	TABLEROS CAMARA DE HILO TE-CH	Und	1,00	4,199,82	4,199,82	46%	0,46	2,015,82	33%	0,33	1,343,88	859,62
04.08.07	TABLEROS MUELLE TM-01	Und	1,00	2,114,82	2,114,82	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	2,114,82
04.08.08	TABLEROS BANCO DE CONDENSADORES TBC-1G	Und	1,00	18,088,24	18,088,24	80%	0,80	15,785,38	0%	0,00	0,00	3.833,85

DAVID MANUEL VELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 104754

ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 DNI: 40481835C
 REPRESENTANTE LEGAL

VALORIZACION DE OBRA N° 13

SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO BAMA, DISTRITO DE BAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"

OBRA : FONDEB
 ENTIDAD : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 SUPERVISION : CONSORCIO OBRAS
 CONTRATISTA :
 FECHA : 30/11/2016

Monto Base	S/ 3.716.141,85
Monto Contratado	S/ 3.460.800,43
Fecha Inicio de Obra	28/11/2017
Plazo de Ejecucion	75 días
Fecha Final de Obra	10/02/2018
Modalidad de Ejecucion	Presio Unitario

Supervision	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Comitales	CONSORCIO OBRAS	
SEGURO CONTRA DIRECTO	S/ 0,00	0,00%
Monto Valorado del Mes	S/ 0,00	0,00%
Monto Valorado Acumulado	S/ 196.794,86	32,75%
Monto-Gasto por Valorizar	S/ 196.794,86	32,75%

Ubicacion	TACNA
Region	TACNA
Departamento	TACNA
Provincia	BAMA
Lugar	BAMA

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	%	Valor Unitario	%	Valor Total	%	Valor Unitario	%	Valor Total	%
04.09	TABLEROS DE DISTRIBUCION													
04.09.01	TABlero DE DISTRIBUCION TD-02	Und	1,00	746,93	746,93	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
04.09.02	TABlero DE DISTRIBUCION TD-09	Und	1,00	523,93	523,93	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
04.09.03	TABlero DE DISTRIBUCION TD-04	Und	1,00	476,93	476,93	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
04.09.04	TABlero DE DISTRIBUCION TD-08	Und	1,00	1.262,24	1.262,24	80%	1.033,79	20%	268,46	80%	1.033,79	20%	268,46	80%
04.09.05	TABlero DE DISTRIBUCION TD-06	Und	1,00	629,24	629,24	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
04.09.06	TABlero DE DISTRIBUCION TD-07	Und	1,00	660,24	660,24	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
04.09.07	TABlero DE DISTRIBUCION TD-10	Und	1,00	600,24	600,24	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
04.09.08	TABlero DE DISTRIBUCION TD-12	Und	1,00	843,93	843,93	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
04.09.09	TABlero DE DISTRIBUCION TD-04S	Und	1,00	1.168,93	1.168,93	66%	826,25	32%	342,68	66%	826,25	32%	342,68	66%
04.09.10	TABlero DE DISTRIBUCION TD-8E	Und	1,00	1.169,24	1.169,24	71%	830,18	29%	339,06	71%	830,18	29%	339,06	71%
04.09.11	TABlero DE DISTRIBUCION STD-10	Und	1,00	2.364,24	2.364,24	86%	1.926,26	14%	437,98	86%	1.926,26	14%	437,98	86%
04.10	TABLEROS DE CONTROL DE ELECTROCONSUMOS													
04.10.01	TABlero DE DISTRIBUCION STD-TAH	Und	1,00	733,00	733,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
04.10.02	TABlero DE DISTRIBUCION STD-CBD	Und	1,00	733,00	733,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
04.11	GRUPO ELECTROGENO													
04.11.01	GRUPO ELECTROGENO DE 30 KW, 71 KVA, 400V, 3P + N, 60Hz, 1800 RPM, POTENCIA STAND BY INC, TANQUE DE COMBUSTIBLE E INSTALACION	Und	1,00	36.342,40	36.342,40	85%	30.891,04	15%	5.451,36	85%	30.891,04	15%	5.451,36	85%
04.12	PUERTA A TIERRA													
04.12.01	POZO PUERTA A TIERRA CON CEMENTO CONDUCTIVO MENOR O IGUAL 10 CM	Und	2,00	909,42	1.818,84	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
04.13	LUMINARIA Y ACCESORIOS EXTERIORES													
04.13.01	REFLECTOR DE 250W LED IP 66	Und	23,00	216,14	4.971,22	45%	2.191,40	55%	2.779,82	45%	2.191,40	55%	2.779,82	45%
04.13.02	SORTE DE 3 E R V, TAMBORON/40MM (CALE Y OMENTACION PARA PANO INTERNAMENTE)	Und	1,00	2.991,66	2.991,66	80%	2.393,33	20%	598,33	80%	2.393,33	20%	598,33	80%
04.14	LUMINARIA TIPO HERMETICAS 200W VARIAS													
04.14.01	LUMINARIA TIPO HERMETICAS 200W VARIAS	Und	1,00	75,01	75,01	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
04.14.02	TOMACORRIENTE SIMPLE CAPUESTA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA	Und	4,00	56,97	227,88	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
04.14.03	TOMACORRIENTE DOBLE CAPUESTA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA	Und	6,00	56,97	341,82	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
04.14.04	PULADORES INDUSTRIALES PARA APERTURA DE PUERTAS ELECTRICAS	Und	11,00	111,95	1.231,45	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
04.14.05	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	Und	1,00	40,63	40,63	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
04.14.06	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	Und	1,00	50,63	50,63	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
04.14.07	LUZ DE EMERGENCIA	Und	1,00	207,19	207,19	1.242,90	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
04.14.08	PUERTA DE ABILAMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA Y PUERTA EN SERVICIO	Und	1,00	3.900,00	3.900,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
04.15	TRANSFORMADORES EN BAJA TENSION													
04.15.01	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION SECO 75 KVA, 400/230 V, 50 Hz, CON REJILLAS DE VENTILACION	Und	1,00	17.824,26	17.824,26	80%	14.266,40	20%	3.557,86	80%	14.266,40	20%	3.557,86	80%
04.15.02	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION SECO 30 KVA, 400/230 V, 50 Hz, CON REJILLAS DE VENTILACION	Und	1,00	15.474,26	15.474,26	80%	12.379,40	20%	3.094,86	80%	12.379,40	20%	3.094,86	80%

COSTO DIRECTO TOTAL	34.218,84	307.392,21	14.296,80	223.216,11	666.799,86
GASTOS GENERALES (10.0 %)	33,761,90	20,786,20	1,562,59	22,321,61	10,070,98
UTILIDAD (8.8%)	29,206,87	18,250,31	1,352,03	10,643,19	5,565,07
SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO	34,218,84	248,428,72	16,851,42	244,180,91	128,435,99
(10.0% (10.0 %))	70,977,05	44,346,75	3,364,21	47,732,06	23,241,59
TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO	44,295,89	292,775,47	20,215,63	291,912,97	151,677,58

DAVID MANUEL VELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 R99.01010104754

ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 DNI: 40431359
 REPRESENTANTE LEGAL

VALORIZACION DE OBRA N° 13


OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"
 ENTIDAD : FONDEPES
 SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
 CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS
 FECHA : 30/11/2018


Monto Base	S/. 3,718,141.85
Monto Contratado	S/. 3,880,980.43
Fecha-Inicio de Obra	28/11/2017
Plazo de Ejecución	75 días
Fecha-Término de Obra	10/02/2018
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios

Supervisión	: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
Contratista	: CONSORCIO OBRAS
SEGÚN COSTO DIRECTO	
Monto Valorizado del Mes	: S/. 0.00
Monto Valorizado Acumulado	: S/. 880,078.10
Monto-Saldo por Valorizar	: S/. 78,883.90

Ubicación	
Región	: TACNA
Departamento	: TACNA
Provincia	: TACNA
Lugar	: SAMA


N°	DESCRIPCION	ESTABLECIMIENTO				CONSORCIO OBRAS				AVANZADO				SALDO			
		Unid.	Moneda	P. Unidad	Presupuesto	%	Valorizado	%	Valorizado	%	Valorizado	%	Moneda	Valorizado			
06.00	EQUIPAMIENTO																
05.01	UNIDAD FRIGORIFICA Y EQUIPAMIENTO EN AREA DE TAREAS PREVIAS	GLB	1.00	755.839.00	755.839.00	90%	0.90	680,078.10	0%	0.00	0.00	90%	0.90	680,078.10	10%	0.10	78,883.90
COSTO DIRECTO TOTAL																	
GASTOS GENERALES (10.0 %)					755.839.00			680,078.10			0.00			680,078.10			78,883.90
UTILIDAD (8.8%)					66.486.23			58,846.61			0.00			58,846.61			6,649.62
SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO																	
I.G.V. (18.0 %)					887.899.13			807,929.22			0.00			807,929.22			89,789.91
TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO																	
TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO					1,089,284.99			983,366.48			0.00			983,366.48			108,928.60


 DAVID MANUEL VELA FARFAN
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 104754


 ALEXANDER PRIMITIVO
 HUERTAS JARA
 DNI: 40431359
 REPRESENTANTE LEGAL

CRONOGRAMA EJECUTADO DE AVANCE FISICO DE LA OBRA

	3 Dias	31 Dias	31 Dias	31 Dias	31 Dias	31 Dias	31 Dias	31 Dias	31 Dias	31 Dias	31 Dias	31 Dias	31 Dias	31 Dias	31 Dias	31 Dias	31 Dias	31 Dias	30 Dias	30 Dias	30 Dias	340 Dias						
MONTO DIRECTO TOTAL	S/. 85,285.81	S/. 873,431.98	S/. 840,103.24	S/. 77,891.37	S/. 4,082.90	S/. 7,842.47	S/. 12,045.90	S/. 4,087.00	S/. 0.00	S/. 104,882.07	S/. 154,230.11	S/. 1551,97489	S/. 18,385.84	S/. 1,626.89	S/. 1,616.31	S/. 21,808.75	S/. 21,808.75	S/. 3,925.21	S/. 3,925.21	S/. 15,300.87	S/. 15,300.87	S/. 219,298.84	S/. 100,304.48	S/. 100,304.48	S/. 21,731.84	S/. 21,731.84	S/. 82,399	
GASTOS GENERALES (10.0 %)	S/. 8,528.58	S/. 87,343.20	S/. 84,010.32	S/. 7,789.14	S/. 408.29	S/. 784.25	S/. 1,204.58	S/. 408.70	S/. 0.00	S/. 10,488.21	S/. 15,423.01	S/. 155,197.489	S/. 1,838.58	S/. 1,616.31	S/. 2,180.875	S/. 2,180.875	S/. 3,925.21	S/. 3,925.21	S/. 15,300.87	S/. 15,300.87	S/. 219,298.84	S/. 100,304.48	S/. 100,304.48	S/. 21,731.84	S/. 21,731.84	S/. 82,399		
UTILIDAD (8.9%)	S/. 7,593.37	S/. 78,682.01	S/. 73,835.49	S/. 6,654.44	S/. 359.30	S/. 672.54	S/. 1,050.00	S/. 357.90	S/. 0.00	S/. 9,212.02	S/. 13,572.25	S/. 13,572.25	S/. 1,626.89	S/. 1,616.31	S/. 21,808.75	S/. 21,808.75	S/. 3,925.21	S/. 3,925.21	S/. 15,300.87	S/. 15,300.87	S/. 219,298.84	S/. 100,304.48	S/. 100,304.48	S/. 21,731.84	S/. 21,731.84	S/		
SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	
L.O.V. (18.0 %)	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	
TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	
PRESUPUESTO MENSUAL EJECUTADO	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	
% MENSUAL EJECUTADO	3.89%	33.38%	33.90%	3.87%	0.19%	0.86%	0.49%	0.18%	0.00%	1.07%	1.61%	16.59%	0.89%	0.87%	11.79%	11.79%	11.79%	11.79%	11.79%	11.79%	11.79%	11.79%	11.79%	11.79%	11.79%	11.79%	11.79%	
PRESUPUESTO ACUMULADO	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	
% ACUMULADO PROGRAMADO	0.00%	28.81%	28.81%	31.11%	31.11%	32.97%	32.97%	32.97%	32.97%	32.97%	32.97%	32.97%	32.97%	32.97%	32.97%	32.97%	32.97%	32.97%	32.97%	32.97%	32.97%	32.97%	32.97%	32.97%	32.97%	32.97%	32.97%	32.97%
% ACUMULADO EJECUTADO	0.00%	3.89%	33.38%	33.90%	33.90%	33.90%	33.90%	33.90%	33.90%	33.90%	33.90%	33.90%	33.90%	33.90%	33.90%	33.90%	33.90%	33.90%	33.90%	33.90%	33.90%	33.90%	33.90%	33.90%	33.90%	33.90%	33.90%	33.90%

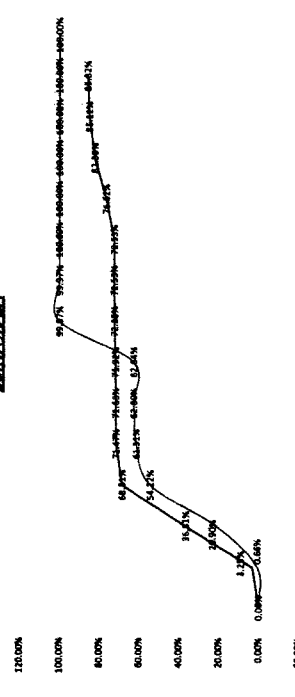

Fecha	% Ejecutado
28.11.2013	33.90%
30.11.2013	33.90%
01.12.2013	33.90%
03.12.2013	33.90%
05.12.2013	33.90%
07.12.2013	33.90%
09.12.2013	33.90%
11.12.2013	33.90%
13.12.2013	33.90%
15.12.2013	33.90%
17.12.2013	33.90%
19.12.2013	33.90%
21.12.2013	33.90%
23.12.2013	33.90%
25.12.2013	33.90%
27.12.2013	33.90%
29.12.2013	33.90%
31.12.2013	33.90%

DAVID MANUEL VELA FARFAN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 104754

ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
DNI: 40431359
REPRESENTANTE LEGAL



ALEXANDER HUERTAS JARA
A.H.J.

Consultorías y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en

- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas


17

I. Panel fotográfico



Fotografía N°01: Vista de canaleta excavada con tendido de tubería de PVC para ductería eléctrica.


DAVID MANDEL VELA FARFAN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 104754



ALEXANDER PRIMITIVO
HUERTAS JARA
DNI: 40431359
REPRESENTANTE LEGAL



ALEXANDER HUERTAS JARA
A.H.J.

Consultorías y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:
- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas


18




Fotografía N°02: Vista de planta de ósmosis concluida.




Fotografía N°03: Vista de pisos y canaletas en subestación eléctrica.


DAVID MANUEL VELAFARFAN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 104754




ALEXANDER PRIMITIVO
HUERTAS JARA
DNI: 40431359
REPRESENTANTE LEGAL

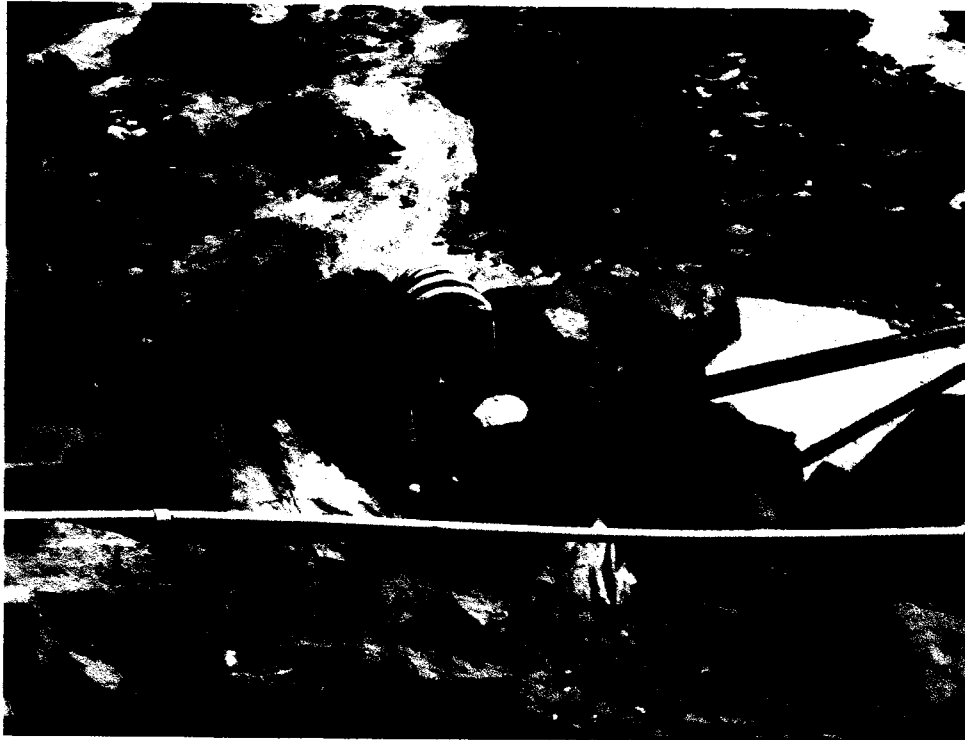

Fotografía N°04: Vista de trabajos de mejoramiento de tubería de succión de agua salada.





MANUEL VELA FARFAN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 104754


ALEXANDER PRIMITIVO
HUERTAS JARA
DN: 40431359
PRESENTANTE LEGAL

Fotografía N°05: Vista de instalación de tablero eléctrico en caseta de succión.




Fotografía N°06: Vista de resane de dados de concreto para barandas en muelle espigón.



Fotografía N°07: Vista de instalación de tablero TECH y transformador en segundo nivel.

DAVID MANUEL CARP...
INGENIERO...
Rég. ÚP N° 104754

ALEXANDER PRIMITIVO
HUERTAS JARA
DNI: 40431359
REPRESENTANTE LEGAL




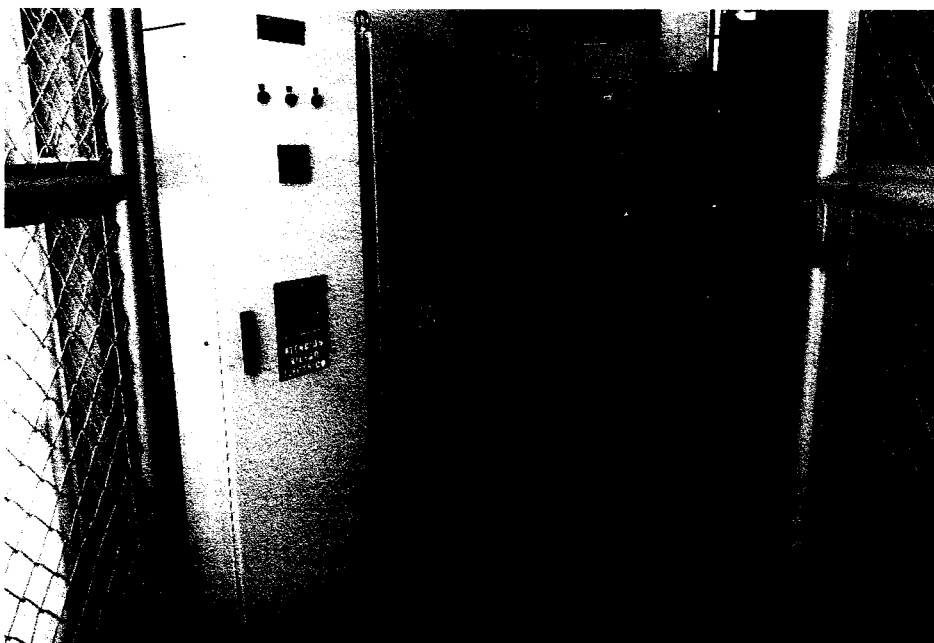
Fotografía N°08: Vista de equipos instalados en segundo nivel para productor de hielo en bloques.




Fotografía N°09: Vista de defensas de muelles instaladas en muelle marginal.


EL VELA FARFAN
ERO CIVIL
N° 104754


ALEXANDER PRIMITIVO
HUERTAS JARA
DNI: 40431359
REPRESENTANTE LEGAL




Fotografía N°09: Vista de colocación de gabinetes para tableros eléctricos en subestación.

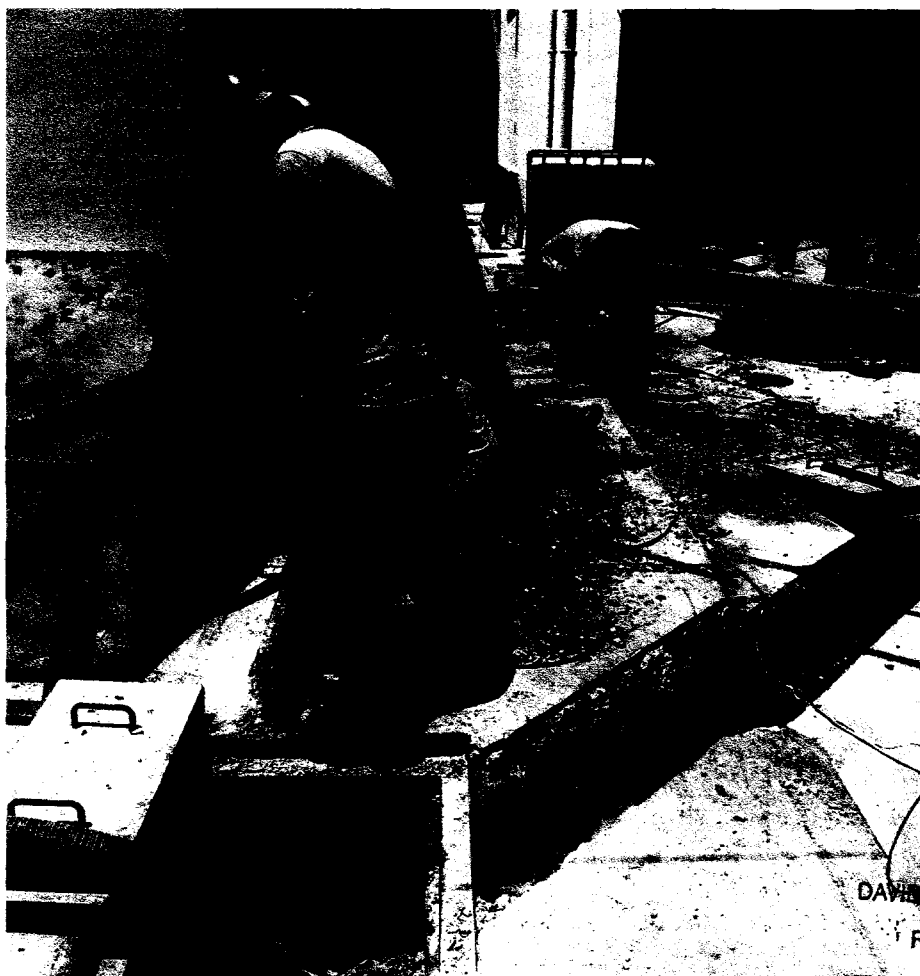

Fotografía N°10: Vista de demolición de pisos para construcción de canaletas para ducterías eléctricas.

DAVID MANUEL VELA FARFAN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIF N° 104754

ALEXANDER PRIMITIVO
HUERTAS JARA
DNI: 40421339
REPRESENTANTE LEGAL

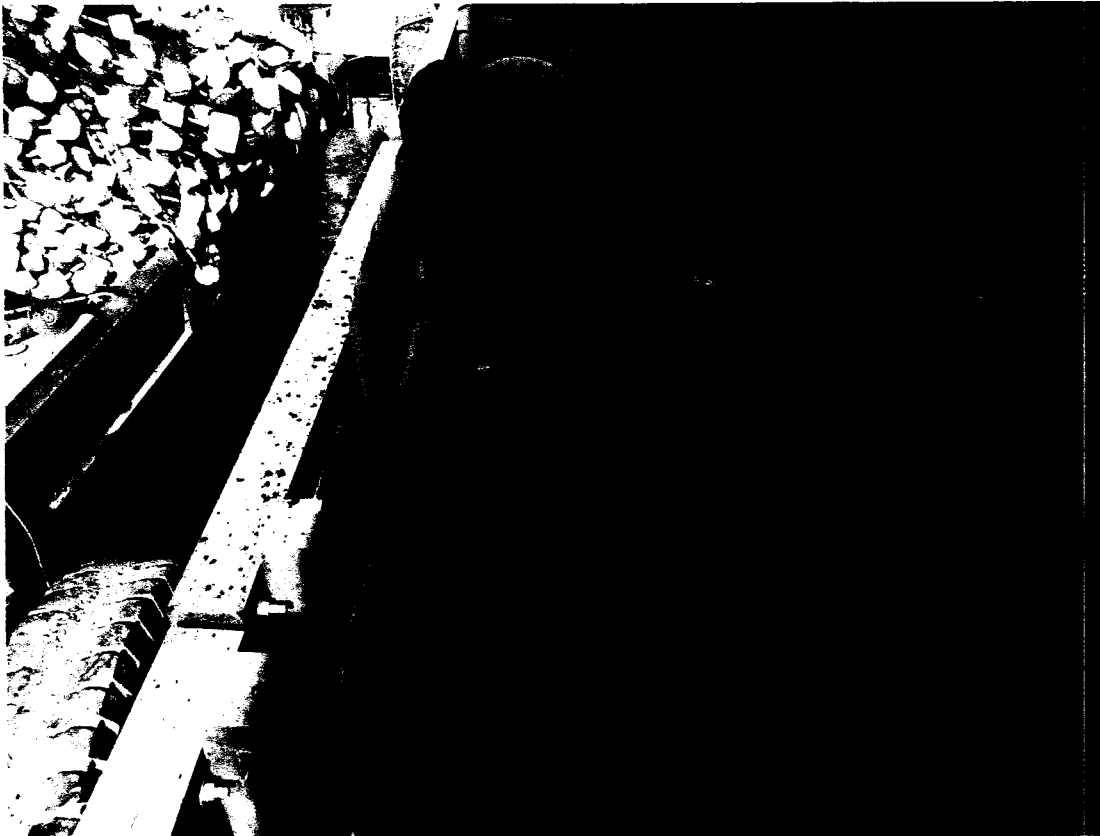

Fotografía N°11: Vista de trabajos de retiro de cornamusa existente.



Fotografía N°12: Vista de instalación de bita en muelle marginal.

DAVID MANUEL VELA FARFAN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 104754

ALEXANDER PRIMITIVO
HUERTAS JARA
DNI: 40431359
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

Asiento N° 528 del Residente

02.11.18

1º Se comunica a la supervisión que se solicitó la presencia del Juez de Paz de Vila Vila, para la constatación de la baja afluencia del embarco y desembarco de productos hidrobiológicos y que es factible el reinicio de labores del tendido y hundimiento del emisor submarino; lo cual se suscribe en el acta de constatación N° 15, en virtud al retraso ocasionado y el perjuicio no atribuible al contratista; es por ello que se solicita a la supervisión la autorización para la presentación del Expediente de ampliación de plazo N° 16 en virtud al Art. 169 y 170 del RLCU vigente"


OSCAR L. LUCOTA COORDINADOR
INGENIERO CIVIL
CIP 10290



ASIENTO N° 529 DEL SUPERVISOR

02/11/2018

EN LA FECHA LA PRESENTE SUPERVISION TOMA CONOCIMIENTO DE LO INDICADO POR EL RESIDENTE DE OBRA.

SE VERIFICAN LAS CONDICIONES DE DISMINUCION DE AFLUENCIA DE LAS EMISARACIONES EN EL D.P.A. MOLLO SAMÁ, MAS SE INDICA QUE EN LOS DIAS PRECEDENTES SI SE HAN REALIZADO TRABAJOS DE TENDIDO DE EMISOR SUBMARINO POR LO CUAL DEBERA CUANTIFICAR LA CANTIDAD DE DIAS NECESARIOS PARA CULMINACION DE LOS TRABAJOS Y PRESENTAR AMPLIACION DE PLAZO SEGUN LO INDICADO POR LEY.


OSCAR L. LUCOTA COORDINADOR
INGENIERO CIVIL
CIP 10290



SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA

46

25

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____


ASIENTO N° 532: DEL SUPERVISOR

05/11/2018

EN LA FECHA LA PRESENTE SUPERVISION TOMA CONOCIMIENTO DE LO INDICADO POR EL RESIDENTE DE OBRA.

SE INDICA QUE SE PROSIGUE CON LA EJECUCION DE TRABAJOS A RITMO LENTO Y SE RECUERDA QUE SE ENCUENTRA VENCIDO EL PLAZO DE EJECUCION.

EN LA FECHA SE HA PRODUCIDO UN ACCIDENTE LABORAL, POR TANTO DEBERÁ PRESENTAR INFORME DE INVESTIGACION DENTRO DE LAS 24 HRS SIGUIENTES DE ACUERDO A LEY N° 29783. SE SOLICITA ADEMAS COPIA DE SCTR VIGENTE, SEGURO VIDA LEY, COPIAS DE PETAR Y ATS, REGISTROS DE ENTREGA DE EPP, EXAMENES MEDICO OCUACIONALES, ETC. ADEMAS DEBERIA IMPLEMENTARSE LA PRESENCIA DE SU ING. DE SEGURIDAD.



INSPECTOR

RESIDENTE

SUPERVISOR

PA

CUADERNO DE OBRA

52

26

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____


ASIENTO N° 544 DEL SUPERVISOR

12/11/2018

EN LA FECHA LA PRESENTE SUPERVISION TOMA CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS QUE VIENEN SIENDO EJECUTADOS.

SE HAN RECIBIDO LAS CARTAS N° 402, N° 405 Y N° 403 POR PARTE DE FONDEPES, DONDE SE NOTIFICA LA APROBACION DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO N° 14, N° 13 Y N° 12 RESPECTIVAMENTE, POR LO CUAL SE SOLICITA PRESENTAR LOS CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS CORRESPONDIENTES SEGUN LOS PLAZOS ESTIPULADOS POR LEY. DEBERÁ ACELERARSE EL RITMO DE EJECUCION DE TRABAJOS.

SE VERIFICA QUE NO SE VIENEN LLEVANDO A CABO LOS PROCEDIMIENTOS MINIMOS DE SEGURIDAD. SE REITERA QUE DEBERAN PRESENTARSE DOCUMENTOS REFERENTES A LA GESTION DE CALIDAD EN OBRA.



RESIDENTE

SUPERVISOR



OF. PUCALLPA
 CAL. ESQ. RAYMONDI UCAYAL 699
 S. 368,097.00

Señores:
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN Y FOMENTO

Ciudad:
 De nuestra consideración:

REF: Carta Fianza Nro. 000125481-86 por : S/368,097.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES)

Por cuenta de: **CONSORCIO OBRAS URANIO SAC**
 AVALADO POR: **CONSORCIO OBRAS URANIO SAC** Conformado por: **JPC INGENIEROS SAC 99%, SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA S.A.S**

Vencimiento : 04-11-2019 a las 12 meridiano

Nos referimos a la solicitud de prórroga de la referida Carta Fianza Nro. 000125481-86 por : S/368,097.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES) emitida el 27-10-2017 por el agente a favor de **CONSORCIO OBRAS URANIO SAC** y en virtud de la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : **PRORROGAR** a partir de la fecha de la referida Carta Fianza hasta el 04-02-2019, a horas 12 meridiano.

Queda entendido que las condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina OF. PUCALLPA ubicada en CAL. ESQ. RAYMONDI UCAYAL 699 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente:
BANCO CONTINENTAL

[Signature]
 Naykol Luna Victoria
 Sub Gerente Oficina
 Oficina Pucallpa

[Signature]
 Verónica Díaz Arce
 Ejecutiva Banca
 Oficina Pucallpa

★
 S/368,097.00
 ★

18110707

RUC 20100130204

REFRENDO: 247491310707CCN0306H-12-39-45
 S/ 368,097.00

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0963

OF.PUCALLPA
CAL ESQ.RAYMONDI/UCAYALI 699
CALLARIA

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA
CONSTRUCTORA URANIO SAC

PRESENTE.-

CALLERIA, 10-11-2018
CARTA FIANZA N°: 0011-0306-9800125805-86
VENCE EL: 26-02-2019

Señor/es:

★ FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Ciudad

De nuestra consideración :

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0306-9800125805-86 por : S/115,927.94(CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 94/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSTRUCTORA URANIO SAC - AVALADO - CONSORCIO OBRAS Conformado por: JPC INGENIEROS SAC 99%, SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS SAC 1%.

Vencimiento : 26-11-2018, a horas de 12 meridiano


Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia la cual fue emitida el 09-11-2017, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de : CONSORCIO OBRAS. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 26-02-2019, a horas 12 meridiano.


Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo : el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina OF.PUCALLPA ubicado en CAL ESQ.RAYMONDI/UCAYALI 699 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente
BANCO CONTINENTAL
p.p.


Rolando Rivas Isla
Ejecutivo Empresa
Oficina Pucallpa


Vanessa Díaz Arenas
Ejecutivo Banca Empresas
Oficina Pucallpa



18111007

RUC 20100130204

REFRENDO: 206891811007CCN03068/11:37:41
S: 115,927.94

LAC 11 - Y3 - Junio 2017

OF.PUCALLPA
CAL ESQ.RAYMONDIUCAYALI 699
CALLARIA

**FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA
CONSTRUCTORA URANIO SAC**

PRESENTE.

CALLERIA 16-11-2018

CARTA FIANZA N° 0011-0306-9800125872-86

VENCE EL: 23-12-2018

Señor/es:



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Ciudad

De nuestra consideración :

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0306-9800125872-86 por : **S/432,402.04 (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS CON 04/100 SOLES)**

Por cuenta de : **CONSTRUCTORA URANIO SAC - AVALADO - CONSORCIO OBRAS** Conformado por **JPC INGENIEROS SAC 99%, SOLUCIONES INTEGRALES ENDEMAS SAC 1%.**

Vencimiento : **23-11-2018, a horas de 12 meridiano**

S/432,402.04

Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 15-11-2017, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de: **CONSORCIO OBRAS**. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiador(es) hemos procedido a: **PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 23-11-2018 a las 12 meridiano.**

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza se mantienen vigentes al haberse modificado solo : el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina OF.PUCALLPA ubicado en CAL ESQ.RAYMONDIUCAYALI 699 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.



Atentamente
BANCO CONTINENTAL
p.p.

Walter Barrios Fonseca
Gerente
Oficina Pucallpa

Vanessa
Ejecutivo
Oficina Pucallpa



16111006

RUC 20100133204

REFRENDO: 2068918111006CCN0306A/11:35:10

S/ 432.402.04



CERTIFICADO DE GARANTIA

La dirección electrónica: confirmaciones@secrex.com.pe se encuentra a su disposición para confirmar/certificar esta garantía

C. F. N° E1430-13-2014 * *

De nuestra consideración:
Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES * * * * *

OTORGAMOS por el presente documento garantía incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática al sólo requerimiento de ustedes como beneficiarios, a solicitud de **CONSORCIO TACNA**, integrado por **TORRES CAMARA Y CIA DE OBRAS S.A. SUCURSAL DEL PERU, TERRAK S.A.C.** * * * * *

Que se hará efectiva por el motivo garantizado de **FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** * * * * *
Correspondiente a **LICITACION PUBLICA N° 05-2014-FONDEPES EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA".** * * * * *

La presente Garantía tiene una vigencia de 90 días contados a partir de las 00:00 m. 10 de Octubre del 2018 hasta las 24:00 m. 07 de Enero del 2019 fecha de su vencimiento y por la suma de **S/*1,025,186.70***, (Un Millón Veinticinco Mil Ciento Ochenta y Seis con 70/100 Soles), sin que nuestra responsabilidad exceda el importe expresamente señalado.

Renueva y sustituye a la C.F. N° E1430-12-2014 de fecha de vencimiento 10/10/2018
Su requerimiento, pago y renovación se ajustará a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Legislativo No. 1017, su reglamento y normas complementarias, modificatorias y ampliatorias.


SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Garantías quedará liberada de toda responsabilidad si no se exigiera notarialmente el cumplimiento de la obligación dentro de los quince (15) días siguientes después de su vencimiento, en concordancia con el Artículo 1898 del Código Civil.

San Isidro, 27 de septiembre del 2018

N° 099600

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



CERTIFICADO DE GARANTIA

La dirección electrónica: confirmaciones@secrex.com.pe se encuentra a su disposición para confirmar/certificar esta garantía

C. F. N° E1772-12-2015 **

De nuestra consideración:
Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES * * * * *

OTORGAMOS por el presente documento garantía incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática al sólo requerimiento de ustedes como beneficiarios, a solicitud de CONSORCIO TACNA, integrado por TORRES CAMARA Y CIA DE OBRAS S.A. SUCURSAL DEL PERU, TERRAF S.A.C. * * * * *

Que se hará efectiva por el motivo garantizado de FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO * * * * *
Correspondiente a LICITACIÓN PÚBLICA N° 05-2014-FONDEPES EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA - ADICIONAL No. 09. * * * * *

La presente Garantía tiene una vigencia de 90 días contados a partir de las 00:00 m. 30 de Septiembre del 2018 hasta las 24:00 m. 28 de Diciembre del 2018 fecha de su vencimiento y por la suma de S/*30,842.99*, (Treinta Mil Ochocientos Cuarenta y Dos con 99/100 Soles), sin que nuestra responsabilidad exceda el importe expresamente señalado.


Renueva y sustituye a la C.F. N° E1772-11-2015 de fecha de vencimiento 30/09/2018
Su requerimiento, pago y renovación se ajustará a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Legislativo No. 1017, su reglamento y normas complementarias, modificatorias y ampliatorias.

SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Garantías quedará liberada de toda responsabilidad si no se exigiera notariamente el cumplimiento de la obligación dentro de los quince (15) días siguientes después de su vencimiento, en concordancia con el Artículo 1898 de Código Civil.

San Isidro, 21 de septiembre del 2018

Luis Alvaro Morales
Jefe de Oficina Ejecutiva
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



CERTIFICADO DE GARANTIA

La dirección electrónica: confirmaciones@secrex.com.pe se encuentra a su disposición para confirmar/certificar esta garantía

C. F. N° E1773-12-2015 * *

De nuestra consideración:
Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES *****

OTORGAMOS por el presente documento garantía incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática al solo requerimiento de ustedes como beneficiarios, a solicitud de **CONSORCIO TACNA** integrado por **TORRES CAMARA Y CIA DE OBRAS S.A. SUCURSAL DEL PERU, TEPERARI S.A.C.** *****

Que se hará efectiva por el motivo garantizado de **FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** *****
Correspondiente a LICITACION PUBLICA N° 14-014-FONDEPES EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MUSEO BARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORPO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA - ADICIONAL No. 05. *****

La presente Garantía tiene una vigencia de 90 días contados a partir de las 00:00 hrs. 30 de Septiembre del 2018 hasta las 24:00 hrs. 30 de diciembre del 2018 fecha de su vencimiento y por la suma de S/121,632.67* (veintiuno mil novecientos Treinta y Dos con 67/100 Soles), sin que nuestra responsabilidad exceda el importe contractualmente señalado.

Renueva y sustituye a la C.F. N° E1773-12-2015 de fecha de vencimiento 30/09/2018.
Su requerimiento, pago y renovación se ajustará a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Legislativo No. 1017, su reglamento y normas complementarias, modificatorias y ampliatorias.


SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Fianzas quedará liberada de toda responsabilidad si no se exigiera notalmente al cumplimiento de la obligación dentro de los quince (15) días siguientes después de su vencimiento, en concordancia con el Artículo 1895 del Código Civil.

Por Isidro, 31 de septiembre del 2018

[Handwritten signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten signature]
FIRMA AUTORIZADA

SECREX



CERTIFICADO DE GARANTIA

La dirección electrónica: confirmaciones@secrex.com.pe se encuentra a su disposición para confirmar/certificar esta garantía

C. F. N° E1468-12-2015 * *

De nuestra consideración:
Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

OTORGAMOS por el presente documento garantía incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática al sólo requerimiento de ustedes como beneficiarios, a solicitud de CONSORCIO TACNA, integrado por TORRES CAMARA Y CIA DE OBRAS S.A. SUCURSAL DEL PERU, TERRAF S.A.C.

Que se hará efectiva por el motivo garantado de FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Correspondiente a LICITACION PÚBLICA N° 05-2014-FONDEPES EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORROSAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA" ADICIONAL No. 06.

La presente Garantía tiene una vigencia de 90 días contados a partir de las 00:00 hrs. 19 de Septiembre del 2018 hasta las 24:00 hrs. 17 de Diciembre del 2018 fecha de su vencimiento y por la suma de S/*4,872.01* (Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Dos con 01/100 Soles), sin que nuestra responsabilidad exceda e imponer expresamente señalado


Renueva y sustituye a la C.F. NP E1468-12-2015 de fecha de vencimiento 19/09/2018
Su requerimiento, pago y renovación se ajustará a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Legislativo No. 1017, su reglamento y normas complementarias, modificatorias y ampliatorias.

SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Garantías quedará liberada de toda responsabilidad si no se exigiera notariamente el cumplimiento de la obligación dentro de los quince (15) días siguientes después de su vencimiento, en concordancia con el Artículo 1898 del Código Civil.

San Isidro, 10 de septiembre del 2018

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



CERTIFICADO DE GARANTIA

La dirección electrónica: confirmaciones@secrex.com.pe se encuentra a su disposición para confirmar/certificar esta garantía

C. F. N° E1467-12-2015 * *

De nuestra consideración:
Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES * * * * *

OTORGAMOS por el presente documento garantía incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática al sólo requerimiento de ustedes como beneficiarios, a solicitud de **CONSORCIO TACNA, integrado por TORRES CAMARA Y CIA DE OBRAS S.A. SUCURSAL DEL PERU, TERRAK S.A.C.** * * * * *

Que se hará efectiva por el motivo garantizado de **FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** * * * * *
Correspondiente a **LICITACIÓN PÚBLICA N° 05-2014-FONDEPES EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MOPRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA" ADICIONAL No. 05.** * * * * *

La presente Garantía tiene una vigencia de 90 días contados a partir de las 00:00 m. 19 de Septiembre del 2018 hasta las 24:00 m. 17 de Diciembre del 2018 fecha de su vencimiento y por la suma de **S/*24,690.83***, (Veinticuatro Mil Seiscientos Noventa con 83/100 Soles), sin que nuestra responsabilidad exceda el importe expresamente señalado.

Renueva y sustituye a la C.F. N° E1467-11-2015 de fecha de vencimiento 19/09/2018
Su requerimiento, pago y renovación se ajustará a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Legislativo No. 1017, su reglamento y normas complementarias, modificatorias y ampliatorias.

SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Garantías quedará liberada de toda responsabilidad si no se exigiera notarialmente el cumplimiento de la obligación dentro de los quince (15) días siguientes después de su vencimiento, en concordancia con el Artículo 1898 del Código Civil

San Isidro, 11 de septiembre de 2018

Luis Alayo Benites
Jefe de Operaciones

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

NP 096078



CERTIFICADO DE GARANTIA
La dirección electrónica: confirmaciones@secrex.com.pe se encuentra a su disposición para confirmar/certificar esta garantía

C. F. N° E1162-12-2015

De nuestra consideración:
Señores:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO * * * * *

OTORGAMOS por el presente documento garantía incondicional, solidaria, irrevocable, en beneficio de excusión y de realización automática al sólo requerimiento de ustedes como beneficiarios, a solicitud de CONSORCIO TACNA, integrado por TORRES CAMARA Y CIA DE OBRAS S.A. SUCURSAL DEL PERU, TERPAK S.A.C. * * * * *

Que se hará efectiva por el motivo garantizado de FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO correspondiente a LICITACION PÚBLICA N° 05-2014-FONDEPES EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADEPO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA-ADICIONAL DE OBRA Y DEDUCTIVO VINCULANTE No. 01 * * * * *

La presente Garantía tiene una vigencia de 90 días contados a partir de las 00:00 m. de Septiembre del 2018 hasta las 24:00 m. 17 de Diciembre del 2018 fecha de su vencimiento por la suma de S/*9,133.52* (Nueve Mil Ciento Treinta y Tres con 52/100 Soles), la cual nuestra responsabilidad exceda el importe expresamente señalado.

Renueva y sustituye a la C.F. N° E1162-11-2015 de fecha de vencimiento 19/09/2018
Su requerimiento, pago y renovación se ajustará a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Legislativo No. 1017, su reglamento y normas complementarias, modificatorias y ampliatorias.

SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Garantías quedará liberada de toda responsabilidad si no se exigiera notarialmente el cumplimiento de la obligación dentro de los quince (15) días siguientes después de su vencimiento, en concordancia con el Artículo 1895 del Código de Comercio.

San Isidro, 10 del mes de Septiembre del 2018

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

OFICINA
CALLE ESCOBARCAJAYALI 699
CALLERIA

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA
CONSTRUCTORA URANO SAC

PRESENTE-

CALLERIA, 02-10-2018
CARTA FIANZA N°: 0014-0308-0600129533-00
VENCE EL: 29-01-2019

Señor/es:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Ciudad

De nuestra consideración:

REF. : Carta Fianza Nro 0014-0308-0600129533-00 por : S/37,598.00 (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSTRUCTORA URANO SAC - AVALADO - CONSORCIO OBRAS Conformado por: JPC INGENIEROS SAC S.R.L. SOLUCIONES INTEGRALES ENDEMAS SAC 1%

Vencimiento: 29-01-2019, a horas de 12 medianoche

Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 31-07-2018, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones contractuales a cargo de : CONSORCIO OBRAS. Al respecto, nos es grato comunicarle que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) cliente(s) hemos procedido a : PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 29-01-2019, a horas 12 medianoche.

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo : el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina OF.PUCALLPA ubicada en CALLE ESCOBARCAJAYALI 699 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente
BANCO CONTINENTAL
p.p.

[Handwritten Signature]
Jorge Luis Domínguez
Ejecutivo Banca Empresas
Oficina Pucallpa

[Handwritten Signature]
Vanessa Díaz Arenas
Ejecutivo Banca Empresas
Oficina Pucallpa



S/37,598.00



18100206

RLC 20100130204

REFRENDO: 2325518100206CCNC306A:11-04-32

S. 37.598.00

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NFO ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 596-2019
