


"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



MEMORANDUM N° 1053 -2019-FONDEPES/DIGENIPAA

A : SRA. TERESA ZENAIDA QUIROZ SILVA  
Jefa de la Oficina General de Administración

ASUNTO : VALORIZACIÓN DE OBRA N°50

Obra : "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque"

Ubicación : San José - Lambayeque - Lambayeque

Proceso : Adjudicación de Menor Cuantía N°38-2014-FONDEPES

Contrato : 082-2014-FONDEPES/OGA

Contratista : CONSORCIO SAN JOSE

REFERENCIA : CARTA N° 019-SUPER-SJOSE-2019

FECHA : Lima, 13 MAR 2019


Tengo a bien dirigirme a usted, para remitir adjunto al presente la Valorización N°50 de la obra señalada en el asunto del rubro, correspondiente a los trabajos efectuados al 28 de Febrero de 2019 por la Empresa CONSORCIO SAN JOSE la misma que ha sido revisada por la Supervisión de obra, ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

Con la conformidad del Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola del FONDEPES, mediante INFORME N° 027-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/VHL, se solicita se sirva disponer a quien corresponda, se efectúe el trámite para efectuar el pago de la indicada valorización, en lo que respecta a deducciones por cualquier tipo de penalidades se efectuarán en la liquidación del contrato.

Atentamente,



FONDEPES  
Ing. Luis Alberto Barbieri Quino  
Director General de Inversión  
Pesquera Artesanal Y Acuicola



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la Impunidad"

## CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por la presente que el Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola al suscribir la presente acta, da su conformidad para realizar el Pago por el concepto de la VALORIZACION N° 50 por la suma de S/.154,389.51 ( Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Trescientos Ochenta Y Nueve Con 51/100 Soles) a favor de CONSORCIO SAN JOSE encargado de la ejecución de la Obra "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque", según contrato N°082-2014-FONDEPES/OGA.


173 MAR 2019



FONDEPES  
Ing. Luis Alberto Barberi Quino  
Director General de Inversión  
Pesquera Artesanal Y Acuicola



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la lucha contra la corrupción y la Impunidad"



**INFORME N° 027-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/VHL**

**A :** ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO  
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola

**ASUNTO :** VALORIZACIÓN DE OBRA N°50  
Obra : "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque"  
Ubicación : San José - Lambayeque - Lambayeque  
Proceso : Adjudicación de Menor Cuantía N°38-2014-FONDEPES  
Contrato : 082-2014-FONDEPES/OGA  
Contratista : CONSORCIO SAN JOSE

**REFERENCIA :** CARTA N° 019-SUPER-SJOSE-2019

**FECHA :** Lima,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual la Supervisión de Obra "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque" hace llegar la Valorización N°50 de la obra indicada en el asunto, correspondiente a los trabajos efectuados al 28 de Febrero de 2019 la misma que ha sido elaborada conjuntamente con el Contratista CONSORCIO SAN JOSE

Luego de efectuar la revisión de los cálculos, los mismos que fueron elaborados por el Supervisor de obra y el Contratista se obtuvo como resultado lo siguiente:



<b>A. VALORIZACION N°50 - CONTRACTUAL</b>		<b>SI.</b>	<b>135,028.26</b>
Estructuras en Tierra			-
Arquitectura			-
Ins. Eléctricas			-
Ins. Sanitarias			-
Mitigacion Ambiental			-
Equipamiento			-
Obras de Mar			135,028.26
Pavimentación Exterior			-
Inst. de Media Tensión			-
Seguridad y Salud			-
<b>B. GASTOS GENERALES Y UTILIDADES</b>		<b>SI.</b>	<b>0.00</b>
Gastos Generales	8.25%		-
Utilidades	8.00%		-
<b>C. AMORTIZACIONES</b>		<b>SI.</b>	<b>23,816.28</b>
Adelanto Directo			20,783.70
<b>DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE</b>			<b>3,032.58</b>
<b>D. REAJUSTES</b>		<b>SI.</b>	<b>19,626.59</b>
Total de reajustes (*)			19,626.59
<b>E. SUB TOTAL VALORIZACION</b>		<b>SI.</b>	<b>130,838.57</b>
Total Valorizado (A-C+D)			
I.G.V. (18%)			<b>23,550.94</b>
<b>F. TOTAL A FACTURAR VALORIZACION N°50</b>		<b>SI.</b>	<b>154,389.51</b>

Son: Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Trescientos Ochenta Y Nueve Con 51/100 Soles



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

**1.- ANALISIS:**

Continuación se adjunta un cuadro donde se incluyen los datos más representativos de la obra y las fechas en que se entregó la documentación, demostrando el cumplimiento según el Reglamento de Contrataciones del Estado.

Obra	:	Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque.
Entidad Licitante	:	FONDEPES
Proceso de convocatoria	:	Adjudicación de Menor Cuantía N° 38-2014-FONDEPES derivada de la Licitación Pública N° 004-2014-FONDEPES
Fecha del Presupuesto Base	:	01 de junio del 2014
Contrato de Obra	:	CONTRATO N° 082-2014- FONDEPES/OGA
Valor Referencial	:	S/. 33'504,650.56 incluye IGV
Presupuesto Contratado	:	S/.32'457,630.22 incluye IGV
Sistema de contratación	:	Precios unitarios
Adelanto Directo	:	S/. 6'491,526.04 incluye IGV
Adelanto para Materiales	:	S/. no solicitado
Contratista	:	Consortio San José
Residente de Obra	:	Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros
Plazo Contractual	:	540 días calendario
Fecha de Entrega de Terreno	:	14 de enero del 2015
Inicio del Plazo Contractual	:	15 de enero del 2015
Fin del Plazo Programado	:	09 de julio del 2016

**AMPLIACIONES DE PLAZO**

Ampliación de Plazo N° 01	:	29 días calendario
Ampliación de Plazo N° 02	:	Denegada
Ampliación de Plazo N° 03	:	Denegada
Ampliación de Plazo N° 04	:	32 días calendario
Ampliación de Plazo N° 05	:	32 días calendario
Ampliación de Plazo N° 06	:	12 días calendario
Ampliación de Plazo N° 07	:	Denegada
Ampliación de Plazo N° 08	:	Denegada
Ampliación de Plazo N° 09	:	32 días calendario
Ampliación de Plazo N° 10	:	30 días calendario
Ampliación de Plazo N° 11	:	08 días calendario
Ampliación de Plazo N° 12	:	08 días calendario
Ampliación de Plazo N° 13	:	48 días calendario
Ampliación de Plazo N° 14	:	11 días calendario
Ampliación de Plazo N° 15	:	53 días calendario
Ampliación de Plazo N° 16	:	60 días calendario
Ampliación de Plazo N° 17	:	60 días calendario
Ampliación de Plazo N° 18	:	60 días calendario
Ampliación de Plazo N° 19	:	60 días calendario
Ampliación de Plazo N° 20	:	38 días calendario
Ampliación de Plazo N° 21	:	30 días calendario
Ampliación de Plazo N° 22	:	15 días calendario
Ampliación de Plazo N° 23	:	202 días calendario
Ampliación de Plazo N° 24	:	60 días calendario
Ampliación de Plazo N° 25	:	30 días calendario
Ampliación de Plazo N° 26	:	Denegada
Ampliación de Plazo N° 27	:	35 días calendario
Ampliación de Plazo N° 28	:	102 días calendario
Nuevo fin de plazo ampliado	:	20 de mayo de 2019







"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

**ADICIONALES Y DEDUCTIVOS VINCULANTES:**

Adicional N° 01	:	326,464.23
Adicional N° 02	:	449,232.12
Deductivo Vinculado N° 01:	:	450,814.30
Adicional N° 03	:	86,170.63
Adicional N° 04	:	579,080.87
Deductivo Vinculado N°02	:	-446.29
Adicional N° 05	:	446,667.85
Deductivo Vinculado N°03	:	-152,971.09
Adicional N° 06	:	1,377,727.34
Deductivo Vinculado N°04	:	-242,094.96
Adicional N° 07	:	1'532,420.43
Deductivo Vinculado N°05	:	620,840.66
Adicional N° 08	:	960,977.20
Deductivo Vinculado N°06	:	479,845.97
Adicional N° 09	:	En trámite
Adicional N° 10	:	429,550.09
Deductivo Vinculante N° 08	:	-186,912.30
Adicional N° 11	:	507,464.86
Adicional N° 12	:	721,493.57
Deductivo Vinculante N° 09	:	-1'085,870.92

**REDUCCIONES DE OBRA**

Reducción de Obra N° 01	:	2'065,875.97
Reducción de Obra N° 02	:	11,230.40
Reducción de Obra N° 03	:	418,002.69
Reducción de Obra N° 04	:	479,845.97
Reducción de Obra N° 05	:	1'054,073.06
Fecha Término Contrato Vigente	:	07-febrero-2019

El suscrito, al haberse comprobado que el contratista ha cumplido con entregar lo indicado en los Términos de Referencia y en los plazos previstos, considera procedente el pago de la **VALORIZACIÓN N°50 - MES DE FEBRERO**. por tal razón se recomienda continuar con el respectivo trámite de pago, aclarando que el contratista Consorcio San José tiene ampliado las garantías que corresponden según el artículo 207° del RLCE. En lo que respecta a deducciones por cualquier concepto y otras penalidades se efectuarán en la liquidación de obra.

Es todo lo que cumpla en informar a usted,

Atentamente,

ING. VICTOR R. HUAMAN LANDA  
CIP N° 60004

La Coordinadora del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento que suscribe, hace suyo en todas sus partes el presente documento.

Ing. Badur Huamán Cornejo  
Coordinadora del Área de Obras,  
Equipamiento y Mantenimiento



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



04856809

Usuario: prui  
Fecha: 11/03/2019  
Hora: 16:09



### CARGO 00634-2019-FONDEPES/AOEM

A: MORGAN LEÓN MAGALI

Asunto: CARTA N° 019-SUPER-SJOSE-2019  
REMITE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 50 MES DE FEBRERO 2019 REF: DPA SAN JOSE

Referencia: INFORME 00027-2019-FONDEPES/VHL

Fecha: 11/03/2019

Observación: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A OGA



AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



04857049

Usuario: usuario\_digenipaa3

Fecha: 12/03/2019

Hora: 09:34



### CARGO 00073-2019-FONDEPES/MML

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

---

Asunto: CARTA N° 019-SUPER-SJOSE-2019  
REMITE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 50 MES DE FEBRERO 2019 REF: DPA SAN JOSE

---

Referencia:

---


Fecha: 12/03/2019

---

Observación: SE DERIVA PARA TRAMITE , S/ 154,389.51, DPA SAN JOSÉ, VALORIZACIÓN DE OBRA 50, PROVEEDOR CONSORCIO SAN JOSÉ, CONTRATO 82-2014.  
COORDINADOR ING. VICTOR HUAMÁN  
INFORME 24-2019/VHL

Atentamente,

MORGAN LEON MAGALI





PERÚ

Ministerio de la Producción



FONDEPES

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Fecha: 06/03/19

MEMORANDO INTERNO N° 923 -2019 -FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM

Asunto : Memo Interno N° 1607-2019- DIGENIPAA

Referencia : \_\_\_\_\_ Registro: 2107

Destino	Indicación	Destino	Indicación

Observaciones:

*Sup° Victor Huamán*

Atentamente,

Recibido  
06.03.19  
*WJP*  
04:20pm



Indicaciones:

- |                           |                          |                             |                          |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 01. Autorizado/ Aprobado  | 02. Calificar/ Evaluar   | 03. Informe                 | 04. Proyectar resolución |
| 05. Atención/ Tramitación | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular           |
| 09. Ayuda memoria         | 10. Coordinar            | 11. Opinión/ Recomend       | 12. Consolidar           |
| 13. Aclarar redacción     | 14. Implementar/ Ejecut  | 15. Preparar respuesta      | 16. Visación             |
| 17. Agregar a anteced     | 18. Archivar             | 19. Ampliar                 | 20. Seguimiento          |





Fecha: 06/03/19

**MEMORANDUM INTERNO N° 1607 -201 - FONDEPES/ DIGENIPAA**

Asunto : Carta N° 019-super s.jose- 2019

Referencia : \_\_\_\_\_ Registro : 2107

Destino	Indicacion	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	 0 * MAR. 2019
OCI		OGAJ	
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	NOEM
Observaciones: _____			
_____			
_____			
_____			

Atentamente



Indicaciones:

- |                                |                          |                             |                 |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 01. Autorizado/Aprobado        | 02. Calificar/Evaluar    | 03. Informe                 | 04. Proyectar   |
| 05. Atención/Tramitación       | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular  |
| 09. Ayuda memoria              | 10. Coordinar            | 11. Opinión/Recomendación   | 12. Consiliar   |
| 13. Aclarar redacción          | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta      | 16. Visación    |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo              | 19. Ampliar                 | 20. Seguimiento |

Lima, 05 de Marzo del 2019

**Carta N°019-SUPER-SJOSE-2019**

Señores.-

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES**

Atención : **ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO**  
**DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA**

Asunto : **VALORIZACION DE OBRA N°50- MES DE FEBRERO 2019** de la obra:  
"Construcción de Infraestructura Pesquera para consumo Humano Directo de San José Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque"

Referencia : **Contrato N° 013-2016-FONDEPES/OGA.**  
Contratación del servicio de Consultoría para el saldo de la supervisión de la obra: "Construcción de Infraestructura Pesquera para consumo Humano Directo de San José Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque"  
: **CARTA N°19-2019-CSJ/CO**

De nuestra consideración:

La presente tiene por objeto dirigirme a usted, con la finalidad de presentar los documentos correspondientes a la **VALORIZACION DE OBRA N°50 - MES DE FEBRERO 2019** referido a la ejecución de la obra "**Construcción de infraestructura pesquera para consumo humano directo de San José, distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque Código SNIP N° 65958.**"

El Informe contiene toda la documentación requerida en las Bases del contrato, así como en las cláusulas contractuales, por lo que solicitamos a usted tramitar la documentación respectiva para, los fines consiguientes.

La valorización se ha procesado en conformidad con lo establecido en el RLCE, por lo que solicitamos a usted tramitar la documentación respectiva para, los fines consiguientes.

Sin otro en particular, quedamos de Ud.

ANEXAMOS 01 ORIGINAL Y 02 COPIAS

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595907

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	
	
2840944	
N° DOC:	00002107-2019
CLAVE:	0227
USUARIO:	usuario_alog69
FECHA Y HORA:	05/03/2019 17:38:00
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	

001

## FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"



### VALORIZACION DE OBRA N°50 –


CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE

SUPERVISION: ING. CARLOS H. MENDOZA PICOAGA

**FEBRERO 2019**

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

  
 .....  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595807

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 JEFE DE SUPERVISION N°10317 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

# GENERALIDADES



003

**a) CONTENIDO**

**GENERALIDADES**

- a) Índice o contenido
- b) Antecedente
- c) Datos generales de la obra

**CONTROL DE AVANCE DE OBRA**

- a). Descripción
- b) Avance físico de obra
- c) Cronograma de Avance De Obra y comentario específico

**CONTROL DE OBRA**

- a) Control de Campo
- b) Descripción de las ocurrencias técnicas realizadas en obra
- c) Control de calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos
- d) Pruebas de Calidad de agregados
- e) Diseño de Mezclas para los diferentes tipos de concreto
- f) Pruebas de Compactaciones o densidad de campo
- g) Pruebas hidráulicas en redes de desagüe, redes de agua, pruebas eléctricas, verificación de cumplimiento de especificaciones de electrobombas, limpieza y desinfección de sistemas, correcto funcionamiento de aparatos sanitarios, eléctricos, electrobombas y otros.
- h) Recursos Utilizados durante el mes
- i) Control de Supervisión en la Prevención de Riesgos (seguridad) y Control y supervisión ambiental informe de las actividades de supervisión ambiental realizadas durante el mes

**CONTROL ECONOMICO DE OBRA**

- a) Control de Valorizaciones
- b) Control de Adicionales de Obra y/o Deductivos
- c) Control de Vigencia de Cartas Fianzas

**CAMBIOS Y O MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL**

- a) Sustento Técnico y base Legal
- b) Planos y/o Esquemas

**RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES**

- a) Recomendaciones y Conclusiones de EL SUPERVISOR


**PANEL FOTOGRAFICO**

**COPIA DEL CUADERNO DE OBRA**

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

  
.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

064

**b) ANTECEDENTES**

El presente Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE "; inscrito en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas con el Código N° 65958; es un proyecto de carácter social porque a través de la nueva infraestructura de este desembarcadero se podrá brindar productos hidrobiológicos de calidad a la población cumpliendo con la Norma Sanitaria D.S. 040-2001-PE, con la finalidad de crear y promover las capacidades y habilidades para coadyuvar al desarrollo sostenido e integral de la actividad pesquera artesanal.

Así mismo, este proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de Política Sectorial del Ministerio de la Producción principalmente dentro de los ejes estratégicos de la actividad pesquera, así como dentro de los planteamientos del Plan de Desarrollo concertado de la Región Lambayeque.

FONDEPES, ha convocado mediante la Modalidad de Concurso al Proceso de CP N° 001-2016-FONDEPES - Consultoría para Saldo de Supervisión, las misma que fue otorgada al Consultor Ing. **Carlos Humberto Mendoza Picoaga**, quien designo a su vez como Jefe de Supervisión al Ing. Miguel Eduardo Carranza Haro. A requerimiento de la Entidad, solicitaron al Consultor el cambio de Jefe de Supervisión, aprobándose el nombramiento como nuevo Jefe de Supervisión al Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza con CIP 10717, a partir del 07-10-2016

MEMORIA DESCRIPTIVA

NOMBRE DEL PROYECTO

"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"

DATOS GENERALES

Razón Social : Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES.  
Domicilio Legal : Av. Petit Thouars N° 115 – 119 Lima  
RUC : 20137921601  
Teléfono : 7068500

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El D.P.A de San José, El terreno propuesto para la construcción del DPA San José, se encuentra ubicado en la Provincia de Lambayeque, aproximadamente entre las coordenadas geográficas 6° 47' 54" latitud Sur y 79° 59' 30" longitud Oeste, aproximadamente a 600 m. al norte de las actuales instalaciones del Terminal Pesquero Municipal, en un área aproximada de 7,610.00 m2

3.1.1 UBICACIÓN POLITICA

Región : Lambayeque  
Provincia : Lambayeque  
Distrito : San José  
Localidad : San José

3.1.2 LIMITES

Por el Norte : con el Distrito de Lambayeque  
Por el Sur : con el distrito de Pimentel

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

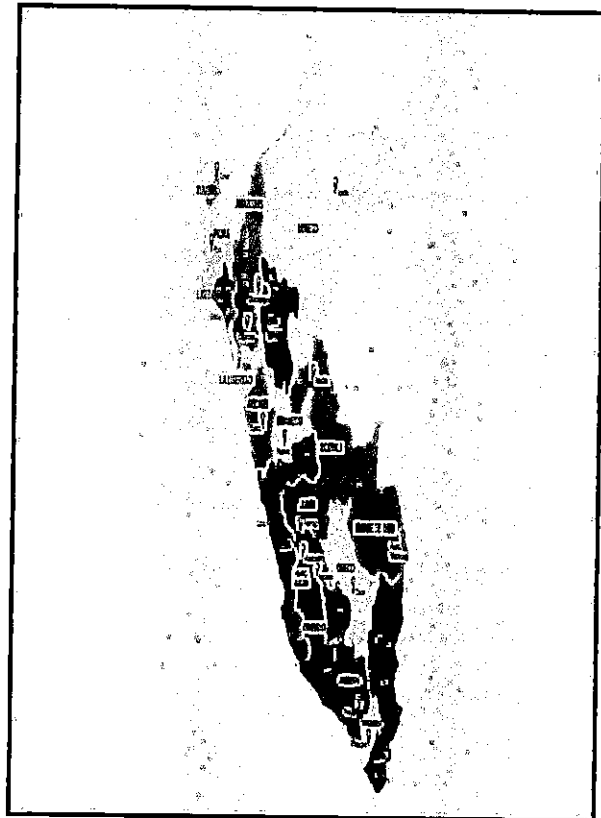
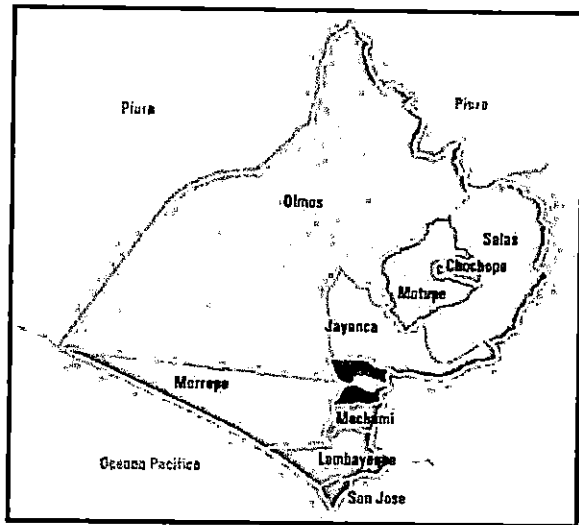
JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717


005


Por el Este : con el Distrito de Lambayeque y Chiclayo  
 Por el Oeste : con el Océano Pacífico

Ilustración 1: Ubicación



CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
 MENDOZA PICOAGA

  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106395897

  
 JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
 ISAIAS JORGE ALVAREZ ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

006



Elaboración: Equipo Consultor

### OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto busca como objetivo "Suficiente acceso a Recursos hidrobiológicos de Calidad que cumplan con la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (DS N° 040-2001-PE) en la Caleta de San José, Santa Rosa y Pimentel"

### CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD

#### ACCESO

Por tierra se accede directamente a través de la carretera Panamericana Norte, a la altura del Km. 765, se toma un desvío de 11 km. de la ciudad de Chiclayo hacia la izquierda con dirección al mar, cuyo recorrido es a través de una vía asfaltada en regular estado de conservación hasta llegar al poblado de San José y de allí se prosigue un corto recorrido de 150 m. hasta llegar al Desembarcadero Pesquero Artesanal de San José.

#### DE LA TOPOGRAFIA

La topografía del terreno donde se ubicará el DPA San José es plana, presenta ligeras pendientes hacia el mar, siendo el suelo de constitución arenosa.

Para la ejecución de las obras en tierra: "Construcción De infraestructura Pesquera Para Consumo Humano Directo De San José, Distrito De San José Provincia De Lambayeque, Región Lambayeque", se hace imprescindible construir un terraplén elevado, así como la vía de acceso que empalme con la vía existente en la población de San José.

#### CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA

El clima es uno de los factores ecológicos que más influye sobre el suelo, la flora y la fauna, logrando condicionar en la mayoría de las veces las adaptaciones de estos componentes a su ambiente, así como caracterizar ecológicamente las zonas en función a la temperatura y humedad; incluso influye sobre el tipo de actividades antrópicas se deben realizar en una región. Por ello, estudiar el clima dentro del enclave del proyecto no se fundamenta en la posibilidad de que éste sea afectado directa o indirectamente por la

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

007

realización o puesta en marcha del mismo, sino sobre el hecho de que el conocimiento de sus principales características da una idea de los procesos ecológicos que pueden acontecer en la zona.

Según el Mapa Climático del Perú establecido por R. Schroeder (1969), el clima que se encuentra en el área de influencia del proyecto es el CLIMA DE DESIERTO (BW), que corresponde a un clima sin lluvias (por lo regular), salvo en algunos eventos como la presencia del Fenómeno del Niño (el cual trae consigo lluvias que en ocasiones puede producir inundaciones llegando a generar grandes pérdidas económicas).

De igual modo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) a través de su Laboratorio de Información Geográfica, describe hasta seis tipos de climas en toda la región Lambayeque, correspondiéndole a la zona del proyecto: Clima árido; deficiente de lluvias todo el año; semicálido y húmedo con codificación: E(d) B'1 H3. (Ver Figura 4.2.)

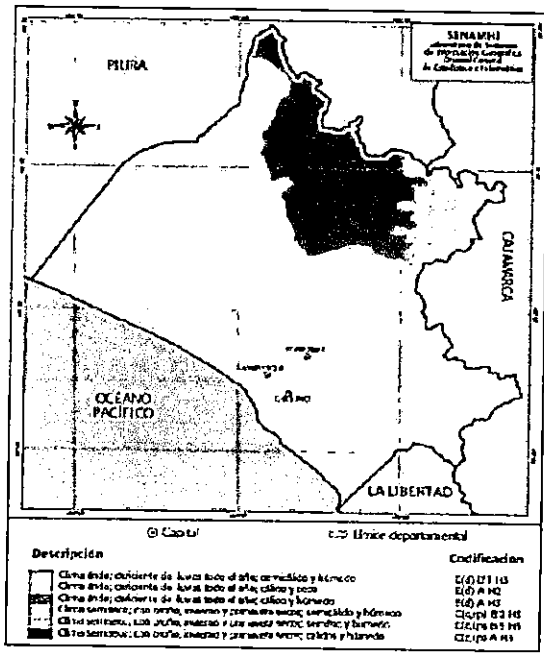


Figura 4.2. Clasificación Climática de la Región Lambayeque, según el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Estas clasificaciones se encuentran acorde a la clasificación ambiental por eco regiones propuesta por A. Brack para el Perú, situando a gran parte de la zona occidental de la Región Lambayeque, en la eco región


**DESIERTO COSTERO.**


**Sismicidad**

El área del proyecto, según el Mapa de Zonificación Sísmica propuesto en la Norma de Diseño Sismo resistente E 030 del Reglamento Nacional de Construcciones (1997) y el Mapa de distribución de máximas intensidades sísmicas observadas en el Perú elaborado por el instituto Geofísico del Perú, el Proyecto se encuentra dentro de la zona de sismicidad alta (zona 3) existiendo la posibilidad de que ocurran sismos de intensidades II y IV en la escala de Mercalli Modificada, según Ramírez, (2006).

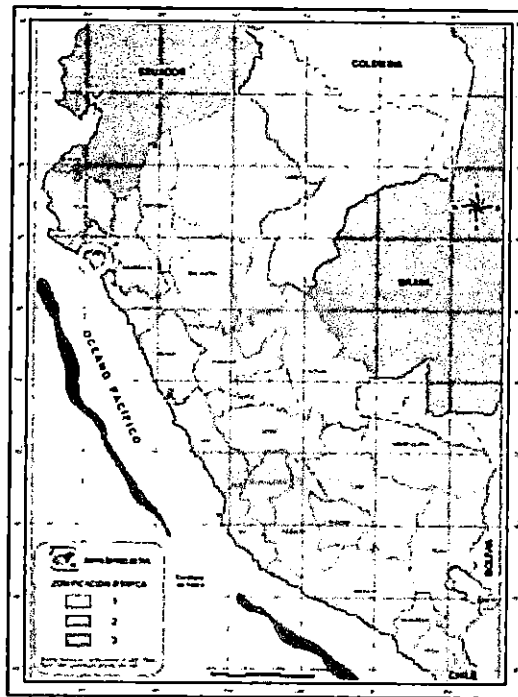
CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

02



**Figura 4.5. Mapa de Zonificación Sísmica de acuerdo a la Norma Técnica de Edificaciones E 030.**

Basándose en el Reglamento Nacional de Construcciones vigente, la zonificación correspondiente a la Provincia de Chiclayo, es una zona con sismicidad activa del presente siglo, con sismos superficiales 20 Km asociados con fallamiento superficial.

De acuerdo al mapa de Regionalización Sísmica del Perú mediante intensidades, preparado por el Instituto Geofísico del Perú en 1975, la zona se halla con sismicidad alta (zona 3), donde se puede esperar sismos con intensidades entre IX y más en la escala de Mercalli modificada.

**TIEMPO DE EJECUCION**

El tiempo para ejecutar la Obra será de 540 (Quinientos cuarenta) días calendarios.


**PRESUPUESTO DE OBRA**


El presupuesto general referencial de obra asciende a S/. 33,332,309.32 (Treinta y tres millones trescientos treinta y dos mil trescientos nueve con 32/100 Nuevos Soles).

OBRAS EN TIERRA-ESTRUCTURAS	3'612,743.16
OBRAS EN TIERRA-ARQUITECTURA	1'120,703.82
OBRAS EN TIERRA-INSTALACIONES ELECTRICAS	561,306.56

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106596807

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

009

OBRAS EN TIERRA-INSTALACIONES SANITARIAS	1'115,124.70
MITIGACION AMBIENTAL	40,810.13
EQUIPAMIENTO	1'442,745.40
OBRAS EN MAR	14'986,247.01
PAVIMENTACION EXTERIOR	493,973.42
INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION	149,611.46
SEGURIDAD Y SALUD	16,500.80
=====	
<b>TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO</b>	
OBRAS CIVILES	23'539,766.46
Gastos generales (10%)	2'353,976.65
Utilidades (10%)	2'353,976.65
-----	
Sub total	28'247,719.76
IGV (18%)	5'084,589.56
=====	
<b>Total de presupuesto</b>	<b>33'332,309.32</b>

**PRESUPUESTO CONTRATADO.-**

01	SUB-PRESUPUESTO 01 ESTRUCTURAS	4,376,782.02
02	SUB-PRESUPUESTO 02 ARQUITECTURA	1,302,818.20
03	SUB-PRESUPUESTO 03 INSTALACIONES ELECTRICAS	662,518.87
04	SUB-PRESUPUESTO 04 INSTALACIONES SANITARIAS	1,260,662.15
05	SUB-PRESUPUESTO 05 MITIGACION AMBIENTAL	47,441.78
06	SUB-PRESUPUESTO 06 EQUIPAMIENTO	1,677,191.53
07	SUB-PRESUPUESTO 07 OBRAS EN MAR	17,421,512.15
08	SUB-PRESUPUESTO 08 PAVIMENTACION EXTERIOR	574,244.10
09	SUB-PRESUPUESTO 09 INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION	173,923.33
10	SUB-PRESUPUESTO 10 SEGURIDAD Y SALUD	19,182.18

<b>TOTAL SIN IGV (S.)</b>	<b>27,506,466.29</b>
<b>IGV (18%)</b>	<b>4,961,163.930</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>32,467,630.22</b>

**MODALIDAD DE EJECUCION**


El proyecto se ejecutara mediante la modalidad de Contrata, A Precios Unitarios


**VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS BÁSICOS**

En los presupuestos, se tendrá en cuenta que la presente memoria descriptiva, se complementan con los planos respectivos y con los metrados básicos en forma tal que las obras deben ser ejecutadas totalmente.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

En caso de divergencia de interpretación, los planos tienen prioridad sobre el presupuesto y éstos tienen prioridad sobre las especificaciones y estos tienen prioridad sobre los metrados.

**DE LOS TRABAJOS QUE CONSIDERA EL PROYECTO**

**BLOQUES A EJECUTAR CONSIDERADOS EN EL PROYECTO**

La obra es ejecutada por el Consorcio San José, conformada por las empresas constructoras CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL – SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC Y CORPORACION R&S SAC. El proyecto integral en ejecución cuenta con las metas parciales consistentes en:

**OBRAS EN TIERRA:**

**Bloque 1.-**

Tanque Elevado Capacidad 36.22 m3

Agua Salada 21.00 m3

Agua Potable 15.22 m3

Cisterna de Agua Salada Cap.48.00 m3

Cisterna de Agua Potable Cap.33.00 m3

Cubículo de Limpieza

**Bloque 2.-**

Guardiana

Sub Estación Grupo Electrónico

Depósito de Residuos Peligrosos

Redes de Almacenes

Taller de Maestranza

Cafetería

**Bloque 3.-**

Vestidores de Hombres

Vestidores de Mujeres

Depósito de Residuos

Depósito de Limpieza

Servicios Higiénicos Hombres

Servicios Higiénicos Mujeres

Lavandería

Zona de Desinfección

**Bloque 4.-**

Zona de Tareas Previas

**Bloque 5.-**

Oficina de Control de Calidad

Pesaje de Control

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595607

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



M

Almacén de Cajas  
Limpieza y Desinfección de Cajas

Bloque 6.-  
Zona de Frio  
Productor de Hielo en Bloques 20 Tn/día (02 Productores de 10 Tn/día c/u)  
Cámara de Congelación de Hielo  
Cámara de Refrigeración de 10 Tn (02 und)  
Cuarto de Equipos de Refrigeración  
Depósito de Carretas y Cubetas

Bloque 7.-  
Oficina de Sindicato de Pescadores  
Secretaría  
Administración  
Salón de Usos Múltiples  
Servicios Higiénicos Públicos Hombres  
Servicios Higiénicos Públicos Mujeres

Ingresos.-  
Ingreso Principal a Patio de Maniobras  
Caseta de Control  
Ingreso Secundario a Muelle  
Caseta de Control

Instalaciones e Infraestructuras.-  
Tanque Séptico Doble  
Filtro Biológico  
Caseta de Emisor Submarino  
Caseta de Bombeo  
Pozo Séptico  
Trampa de Grasa  
Cámara de Rejas  
Cisterna de Agua Potable Cap. 20.00 m3  
Cercos Perimétricos  
Defensa de Protección con Enrocado a Fachada Posterior

OBRAS EN MAR:  
Puente de Acceso del Muelle 950.00 MI

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 1098339607

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

02 Plataformas Bajas  
Cabezo de Muelle Espigón 50.00 Ml.

**UBICACIÓN, LÍMITES Y ACCESIBILIDAD DE LA ZONA:**

El Desembarcadero Pesquero Artesanal San José, se encuentra ubicado en la Caleta San José (área rural), políticamente pertenece a la Región de Lambayeque, Provincia de Lambayeque, Distrito de San José, forma parte de la infraestructura de protección permanente a la capacidad productora de los pescadores de San José.

El Desembarcadero Pesquero Artesanal San José, tiene como límites:

- Por el Norte : con el Distrito de Lambayeque
- Por el Sur : con el distrito de Pimentel
- Por el Este : con el Distrito de Lambayeque y Chiclayo
- Por el Oeste : con el Océano Pacífico

El acceso al Desembarcadero Pesquero Artesanal San José directamente a través de la carretera Panamericana Norte, a la altura del Km. 765, se toma un desvío de 11 km. de la ciudad de Chiclayo hacia la izquierda con dirección al mar, cuyo recorrido es a través de una vía asfaltada en regular estado de conservación hasta llegar al poblado de San José y de allí se prosigue un corto recorrido de 150 m. hasta llegar al DPA de San José.

**OBJETO**

Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera, para promover y desarrollar una infraestructura básica y el equipamiento para el desarrollo de la pesca artesanal. Construcción de un Muelle, desembarcadero y otros tipos de desembarque para el buen funcionamiento del DPA.

Dentro de los Objetivos son los siguientes:

- Construcción de Zona de Embarque y Desembarque
- Construcción de Zona de Procesamiento Primario
- Construcción de Zona de Frío
- Construcción de Zona de Servicios Complementarios
- Construcción de Zona de Vestidores - Personal de Trabajo
- Construcción de Zona de Estacionamientos
- Construcción de Zona de Servicios y Mantenimientos
- Construcción de Zona Administrativa
- Construcción de Obras Complementarias

El proyecto busca como objetivo principal "Suficiente acceso a Recursos Hidrobiológicos de Calidad que cumplan con la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (DS N° 040-2001-PE) en la Caleta de San José, Santa Rosa y Pimentel"

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

**c) DATOS GENERALES DE LA OBRA**

Obra: "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, distrito de San José, Provincia de Lambayeque, región de Lambayeque"

Ubicación : San José/Lambayeque/Lambayeque

Contratista : Consorcio San José

Suscripción del Contrato : Contrato N° 082-2014-FONDEPES/OGA

Modalidad de Ejecución : Precios Unitarios

Residente : Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez

Consultora de Supervisión : Carlos Humberto Mendoza Picoaga

Jefe de Supervisión : Ing. Isaías Jorge Alva Espinoza

Valor referencial : s/. 33'504,650.56 (inc. igv)

Monto contratado : s/. 32'457,630.22 (inc. igv)

Fecha entrega de terreno : 14/01/2015

Plazo inicial ejecución obra : 540 días calendarios

Fecha de inicio del plazo : 15/01/2015

Fecha término plazo inicial : 09/07/2016

Ampliación de plazo N° 01 : 29 días calendarios

Nueva fecha término plazo : 07/08/2016

Ampliación de plazo N° 02 : 31 días calendarios

Nueva fecha término plazo : 07/08/2016 - denegada

Ampliación de plazo N° 03 : 47 días calendarios

Nueva fecha término plazo : 07/08/2016 - denegada

Ampliación de plazo N° 04 : 32 días calendarios

Nueva fecha término plazo : 08/09/2016

Ampliación de plazo N° 05 : 32 días calendarios

Nueva fecha término plazo : 09/10/2016


Ampliación de plazo N° 06 : 12 días calendarios

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA



MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106395807



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

14

- Nueva fecha término plazo* : 20/10/2016
- Ampliación de plazo N° 07* : 44 días calendarios
- Nueva fecha término plazo* : 20/10/2016 - denegada
- Ampliación de plazo n° 08* : 74 días calendarios
- Nueva fecha término plazo* : 20/10/2016 – denegada
- Ampliación de Plazo N°09* : 32 días calendarios
- Nueva fecha término plazo* : 21/11/2016
- Ampliación de Plazo N°10* : 30 Días Calendario
- Nueva Fecha de Término de Plazo:* 21 de Diciembre del 2016
- Ampliación de Plazo N°12* : 8 Días Calendario
- Nueva Fecha de Término de Plazo :* 06 de Enero del 2017
- Ampliación de Plazo N°13* : 48 Días Calendario
- Nueva Fecha de Término de Plazo :* 23 de Febrero del 2017
- Ampliación de Plazo N° 14:* 11 Días Calendario
- Nueva Fecha de Término de Plazo:* 06 de Marzo del 2017
- Ampliación de Plazo N° 15:* 53 Días Calendario
- Nueva Fecha de Término de Plazo:* 28 de Abril del 2017
- Ampliación de Plazo N° 16:* 60 Días Calendario
- Nueva Fecha de Término de Plazo:* 27 de Junio del 2017
- Ampliación de Plazo N° 17:* 60 Días Calendario
- Nueva Fecha de Término de Plazo:* 26 de Julio del 2017
- Ampliación de Plazo N° 18:* 60 Días Calendario
- Nueva Fecha de Término de Plazo:* 25 de Octubre del 2017
- Ampliación de Plazo N° 19:* 60 Días Calendario
- Nueva Fecha de Término de Plazo:* 24 de Diciembre del 2017
- Ampliación de Plazo N° 20:* 38 Días Calendario
- Nueva Fecha de Término de Plazo:* 31 de Enero del 2018
- Ampliación de Plazo N° 21:* 30 Días Calendario

*CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA*

*JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA*

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

12

*Nueva Fecha de Término de Plazo:* 02 de Marzo del 2018  
*Ampliación de Plazo N° 22:* 15 Días Calendario  
*Nueva Fecha de Término de Plazo:* 17 de Marzo del 2018  
*Ampliación de Plazo N° 23:* 202 Días Calendario  
*Nueva Fecha de Término de Plazo:* 05 de Octubre del 2018  
*Ampliación de Plazo N° 24::* 60 Días Calendario  
*Nueva Fecha de Término de Plazo:* 04 de Diciembre del 2018  
*Ampliación de Plazo N° 25::* 30 Días Calendario  
*Nueva Fecha de Término de Plazo:* 03 de Enero del 2019  
*Ampliación de Plazo N° 26::* Denegada  
*Ampliación de Plazo N° 27::* 35 Días Calendario  
*Nueva Fecha de Término de Plazo:* 07 de Febrero del 2019  
*Ampliación de Plazo N°28:* 102 Días Calendario  
*Nueva Fecha de Termino de Plazo:* 21 de Mayo del 2019

**DATOS DE EMPRESA CONTRATISTA**

**RAZON SOCIAL :** CONSORCIO SAN JOSE  
**REPRESENTANTE LEGAL :** ING. EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA  
**RESIDENTE DE OBRA :** ING. JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑÓNEZ  
**REGISTRO CIP :** N° 66335

**DATOS SUPERVISOR EXTERNO**

**RAZON SOCIAL :** CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGUA  
**JEFE DE SUPERVISIÓN :** ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
**REGISTRO CIP :** N° 10717

**CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

**JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

**DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO.**

A la fecha se han Aprobado **27 AMPLIACIONES DE PLAZO**; las ampliaciones de plazo aprobadas son como sigue:

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 01 por 29 días, según Resolución de Secretaría General N°110-2015-FONDEPES/SG., de fecha 24.07.2015, nuevo plazo de termino 05-08-2016

Denegación de Ampliación de Plazo N° 02 por 31 días, según Resolución Jefatural N°126-2015-FONDEPES/SG., de fecha 03.09.2015.

Denegación de Ampliación de Plazo N° 03 por 47 días, según Resolución Jefatural N°204-2015-FONDEPES/SG., de fecha 22.12.2015.

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 04 por 32 días, según Resolución Jefatural N°035-2016-FONDEPES/SG., de fecha 21.03.2016.

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 05 por 32 días, según Resolución Jefatural N°061-2016-FONDEPES/SG., de fecha 25.04.2016.

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 06 por 12 días, según Resolución Jefatural N°073-2016-FONDEPES/SG., de fecha 19.05.2016.

Denegación de Ampliación de Plazo N° 07 por 44 días, según Resolución Jefatural N°087-2016-FONDEPES/SG., de fecha 21.06.2016.

Denegación de Ampliación de Plazo N° 08 por 74 días, según Resolución Jefatural N°097-2016-FONDEPES/SG., de fecha 25.07.2016.

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 09 por 32 días, según Resolución de Secretaría General N°120-2016-FONDEPES/SG., de fecha 13.10.2016, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 21-11-2016


Aprobación de Ampliación de Plazo N° 10 por 30 días, según Resolución de Secretaría General N°132-2016-FONDEPES/SG., de fecha 29.11.2016, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 21-12-2016

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 11 por 08 días, según Resolución de Secretaría General N°147-2016-FONDEPES/SG., de fecha 28.12.2016, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 29-12-2016

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 12 por 08 días, según Resolución de Secretaría General N°002-2017-FONDEPES/SG., de fecha 04.01.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 06-01-2017


Aprobación de Ampliación de Plazo N° 13 por 48 días, según Resolución de Secretaría General N°006-2017-FONDEPES/SG., de fecha 17.01.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 23-02-2017

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA



MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

12

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 14 por 11 días, según Resolución de Secretaria General N°021-2017-FONDEPES/SG., de fecha .22.02.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 06-03-2017

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 15 por 53 días, según Resolución de Secretaria General N° 031-2017-FONDEPES/SG., de fecha 26.03.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 28-04-2017

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 16 por 60 días, quedando consentida al no haberse pronunciado la Entidad dentro del plazo establecido en el RLCE, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 27-06-2017

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 17 por 60 días, según Resolución de Secretaria General N°062-2017-FONDEPES/SG., de fecha 05.07.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 26-07-2017

Aprobación de Ampliación de Plazo N° 18 por 60 días, según Resolución de Secretaria General N°094-2017-FONDEPES/SG., de fecha .08.09.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 25-10-2017

Ampliación de Plazo N°.19 por 60 días, según Resolución de Secretaria General N°0119-2017-FONDEPES/SG., de fecha .03.11.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 24-12-2017.

Ampliación de Plazo N°.20 por 38 días, según Resolución de Secretaria General N°0143-2017-FONDEPES/SG., de fecha .29.12.2017, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 31-01-2018.

Ampliación de Plazo N°.21 por 30 días, según Resolución de Secretaria General N°021-2018-FONDEPES/SG., de fecha .12.02.2018, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 02 03 2018.

Ampliación de Plazo N°.22 por 15 días, según Resolución de Secretaria General N°047-2018-FONDEPES/SG., de fecha .15.03.2018, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 17-03-2018.


Ampliación de Plazo N°.23 por 202 días, según Resolución de Secretaria General N°055-2018-FONDEPES/SG., de fecha .02.04.2018, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 05-10-2018.


Ampliación de Plazo N°.24 por 60 días, según Resolución de Secretaria General N°0178-2018-FONDEPES/SG., de fecha .19.10.2018, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 04-12-2018

Ampliación de Plazo N°.25 por 30 días, según Resolución de Secretaria General N°225-2018-FONDEPES/SG., de fecha 10.12.2018, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 03-01-2019.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

Ampliación de Plazo N°.27 por 35 días, según Resolución de Secretaría General N°008-2019-FONDEPES/SG., de fecha 17.01.2018, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 07-02-2019.

Ampliación de Plazo N°.28 por 35 días, según Resolución de Secretaría General N°026-2019-FONDEPES/SG., de fecha 08.02.2019, siendo la nueva fecha de término del plazo de ejecución el 21-05-2019.

**DE LA SUPERVISION**

Mediante contrato N°.0/0-2014-FONDEPES/OGA del 19-11-2014 la Entidad suscribe contrato de supervisión con el Consorcio San Francisco.

Con fecha 18-11-2015, La Entidad resuelve el contrato con el Supervisor a quien la Entidad envió previamente la Carta N°. 329-2016-FONDEPES-2015/SG del 16-11-2015 en la que le comunicaba al contratista de la Supervisión Consorcio SAN FRANCISCO la decisión de resolver el contrato "por el incumplimiento de obligaciones contractuales"

A partir del 19-11-2015 al 31-03-2016 se hace cargo del control de la obra el Ingeniero Víctor Huamán Landa con Registro CIP 60004, en calidad de INSPECTOR.

Se desconoce las formalidades de su contratación así como la causal de su cese.

A partir del 01-04-2016 al 20-07-2016 se hace cargo del control de la obra el Ingeniero Carlos Sanabria Esquiche con Registro CIP 73363, en calidad de INSPECTOR.

Igualmente se desconoce las formalidades de su contratación así como la causal de su cese.

Con fecha 19-07-2016 la Entidad suscribe con EL Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga el contrato N°.013-2016-FONDEPES/OGA para la supervisión del "Saldo de la obra Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José"

Inicialmente designa como Jefe de Supervisión al Ingeniero Miguel Carranza Haro con CIP 55000, quien ejerce hasta el 06-10-2016.

Por razones propias de la Entidad, esta, le comunica al Supervisor, el "cambio" del Jefe de Supervisión Ing.Miguel Carranza Haro

El Supervisor propone al Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza con Registro CIP 10717.

Mediante Carta N°. 551-2016-FONDEPES/OGA del 06-10-2016, la Entidad "aprueba el cambio de Jefe de Supervisión" (...) designando como nuevo Jefe de Supervisión al Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza".

A partir del 07-10-2016, el suscrito inicia las labores de control técnico de la obra hasta el 06 de Marzo del 2017. Fecha en que culmina el plazo de los servicios, teniendo en cuenta que hasta esa fecha se cubrieron los montos permisibles según el Reglamento para la prestación.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106695907

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



Sin embargo, la Entidad ha suscrito un Acta simple con la Supervisión (07-03-2017) en la que *"se comunica la suspensión temporal"* de los servicios, *"hasta la aprobación del adicional 07"*.

A partir del mes de Setiembre 2017, la Entidad comunica a la Supervisión la reanudación de los servicios, en base a que se nos concedió Ampliaciones plazo "automáticas" paralelamente a las ampliaciones concedidas al contratista de la obra.

Sin embargo, no se ha tenido en cuenta lo indicado en el Artículo 34.4 de la Ley de Contrataciones del Estado que expresa:

*"Asimismo, el Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios según corresponda. En este último supuesto, el monto hasta por el cual se pueden aprobar prestaciones adicionales de supervisión debe ser proporcional al incremento del monto de obra como máximo, no siendo aplicable para este caso el límite establecido en el numeral 34.2 del presente artículo"*

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

.....  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

**DE LOS ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA**

A la fecha se ha emitido las siguientes Resoluciones de Adicionales y Deductivos de Obra

**ADICIONALES.-**

Aprobación de Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 01 por S/. 326,464.23 nuevos soles, según Resolución Jefatural N°280-2015-FONDEPES/J., de fecha 04.09.2015, por mayor metrado en la Viga Puente (concreto y acero)

Aprobación de Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 02 por S/. 449,323.12 nuevos soles, según Resolución Jefatural N°078-2016-FONDEPES/J, de fecha 09.03.2016, por variación de la dimensión de la roca por otra de menores dimensiones y cambio de especificación,

Aprobación de Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 03 por S/. 86,170.63 nuevos soles, según Resolución Jefatural N°093-2016-FONDEPES/J., de fecha 22.03.2016, por "empalme de la vía de acceso a la plataforma", que origina a su vez un Deductivo vinculante N°.02

Aprobación de Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 04 (S/. 579,080.87 nuevos soles) "por mayores metrados en Tanque elevado, parapetos, sistema, mayor metrado en capas de afirmado y en obras de mar. Aplicación de epóxico para unión de concreto nuevo con antiguo, así como partida nueva, fabricación de mesas de concreto, además de la aprobación del Deductivo Vinculante N° 02 (S/. 446.29 nuevos soles), "menor metrado de puertas de madera y menor metrado en puertas de madera", ambos fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N°253-2016-FONDEPES/J., de fecha 08.07.2016.

Aprobación de Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 05 (S/. 397,091.44 nuevos soles) por nuevas partidas y mayores metrados de Instalaciones Sanitarias, además de reducciones de obra sanitarias N°.03" la misma que ha sido aprobada mediante Resolución N°.355-2016-FONDEPES/J del 29-11-2016

Aprobación de Expediente Técnico de Prestación Adicional N° 06 por S/.1'377,727.34 (inc. IGV) y Deductivo Vinculante N°.04 por S/. 242,094.96 (inc. IGV), mediante Resolución Jefatural N°.370-2016-FONDEPES/J del 29-12-2016, que corresponden a partidas nuevas de "Estructuras, Arquitectura e Instalaciones Eléctricas" así como mayores metrados del presupuesto contratado y Reducciones de obra que constituyen Deductivos vinculantes, según el siguiente detalle:

- Adicional N°.06 : Obras en Tierra : S/.1'091,070.91 (79%) (Ejecutables)
- Partidas Nuevas : S/. 577,067.10
- Mayores Metrados : S/. 514,903.81
  
- Adicional N° . 06 : Obras en Mar : S/. 285,756.46 (21%) (CONCLUIDA)

Aprobación del Expediente Técnico de Prestación Adicional N°07 por el monto de S/.1'532,420.43 (inc. IGV) y Deductivo Vinculante N°.05 por S/. 620,840.66 (inc. IGV), mediante Resolución Jefatural N°.025-2018-FONDEPES/J del 06-03-2018.

Aprobación del Expediente Técnico de Prestación Adicional N°08 por el monto de S/.960,977.20 (inc. IGV) y Deductivo Vinculante N°.06 por S/. 479,845.97 (inc. IGV), mediante Resolución Jefatural N°.031-2018-FONDEPES/J del 06-03-2018.

Aprobación del Expediente Técnico de Prestación Adicional N°11 por el monto de S/.507,464.86 (inc. IGV) mediante Resolución Jefatural N°.001-2019-FONDEPES/J del 03-01-2019.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106695807

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

Aprobación del Expediente Técnico de Prestación Adicional N°12 por el monto de S/.721,493.57 (inc. IGV) y Deductivo Vinculante N°.09 por S/. 1,085,870.92 (inc. IGV), mediante Resolución Jefatural N°.001-2019-FONDEPES/J del 06-03-2018.

Aprobación del Expediente Técnico de Prestación Adicional N°10 por el monto de S/. 429,550.09 (incl. IGV) y su Deductivo Vinculante N°08 por S/. 186 912,30 (inc. IGV), mediante Resolución Jefatural N°025-2019-FONDEPES/J

**REDUCCIONES DE OBRA**

En el trámite de aprobación de los menores metrados u otras partidas que no se van a ejecutar, se ha considerado el término "Reducciones de Obra", que finalmente resultan "Deductivos de Obra".

La ley y su reglamento siempre hacen mención de "Presupuestos deductivos" que pueden ser vinculantes o no, mas no utiliza el término "Reducción".

En ese sentido se han aprobado y/o se encuentran en vías de aprobación los siguientes:

Aprobación de Expediente Técnico de Reducción N° 01 (S/. 2'065,875.97 nuevos soles) "por menor metrado de pilotes y losas nervadas considerados en el presupuesto de obra". según Resolución Jefatural N°044-2016-FONDEPES/J., de fecha 05.04.2016.

Reducción de obra N° 02 (S/. 11,230.40 nuevos soles) por menor metrado de "mejoramiento de terreno con piedra over en la conformación de la subrasante" según Resolución Jefatural N°044-2016-FONDEPES/J., de fecha 05.04.2016.

Reducción de obra N° 03 que consiste "En la no ejecución de partidas de Estructuras, Arquitectura del presupuesto contractual" por (S/. 418,002.69)

El 19-10-2016 mediante Resolución de Secretaria General N°.122-2016—FONDEPES/SG se aprueba la Reducción de obra N°.03

Reducción de obra N° 04 que consiste "Reducción de uno de los dos productores de hielo considerado en el presupuesto" por S/.479,845.97

El 19-10-2016 mediante Resolución de Secretaria General N°.122-2016—FONDEPES/SG se aprueba la Reducción de obra N°.04

Reducción de obra N° 05 "barandas de Tubería de acero en puente y escalinatas del embarcadero" por (S/. 1'054,073.06)

El 19-10-2016 mediante Resolución de Secretaria General N°.122-2016—FONDEPES/SG se aprueba la Reducción de obra N°.05

**DEDUCTIVOS DE OBRA VINCULANTES.-**


Estos Deductivos son resultado de un "comparativo" entre los metrados del presupuesto y los metrados realmente verificados y/o ejecutados.


Deductivo vinculante N°.01 por s/.450,814.30 según Resolución Jefatural N°078-2016-FONDEPES/J. por variación de la dimensión de la roca por otra de menores dimensiones y cambio de especificación,

Deductivo vinculante N°.02 por s/.446.29 según Resolución Jefatural N°253-2016-FONDEPES/J., de fecha 08.07.2016.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 19106605367

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

	<b>PERU</b> <b>Ministerio de la Producción</b>	<b>Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero</b>	CONCURSO PÚBLICO N°001-2016-FONDEPES CONTRATO N°013-2016-FONDEPES
---	---	--	--

Deductivo vinculante N°.03 por S/152,971.09 según Resolución Jefatural N°355-2016-FONDEPES/J., de fecha 29.11.2016.

Deductivo vinculante N°.04 por S/242,094.96 según Resolución Jefatural N°370-2016-FONDEPES/J., de fecha 29.12.2016.

Deductivo vinculante N°.05 por S/620,840.66 según Resolución Jefatural N°025-2018-FONDEPES/J., de fecha 29.12.2016.

#### **PARTIDAS NUEVAS.-**

Dentro de los adicionales se ha considerado nuevas partidas que al no tener referencia con las partidas del presupuesto han originado nuevas partidas, nuevas especificaciones técnicas y nuevos precios (pactados) así como nuevas F.P:

#### **COMENTARIOS Y EVALUACION DE LO ACTUADO.-**

De lo tramitado y ejecutado a la fecha se ha podido verificar lo siguiente:

##### **Del Inicio de los Trabajos.-**

Se tiene entendido que el Expediente Técnico (en base al perfil) tuvo como referencia de ubicación de la infraestructura pesquera, coordenadas diferentes al actual, como consecuencia de la modificación, el inicio del muelle se vio diferido y advertido por el INC de estar el "inicio" dentro de "zona reservada".

Esta situación al parecer se origina cuando se solicitó autorización a la Capitanía de Puerto para iniciar los trabajos.

Lo cierto es que la ubicación original de la obra se desplazó 80.00 m. aproximadamente de la ubicación original.

##### **Durante los Trabajos.-**


Como se detalla líneas arriba durante el proceso constructivo se ha verificado numerosas deficiencias, tanto en los planos del proyecto, así como mayores y menores metrados que han originado adicionales, deductivos y "reducciones", así como numerosas omisiones que han originado nuevas partidas no consideradas originalmente en el presupuesto de obra.

Sin embargo, algunos presupuestos adicionales reflejan un superposición de especialidades, por ejemplo, (arquitectura + estructuras + otras especialidades), que no permiten una objetivación más precisa de la variación de cada una de las especialidades. Cada adicional ha debido tratarse individualmente respecto a determinada especialidad.


Sin embargo debe tenerse en cuenta lo considerado por la ley del reglamento de contrataciones del Estado **Responsabilidad de la Entidad.-** *"La Entidad es responsable frente al contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares"*

En lo que respecta al adicional N°.07, este se origina, debido a la constatación de roca en el fondo marino a partir de la progresiva 0+500 al 1+000, que no se puede determinar si es en toda el área del mar a esa profundidad o si es localizado.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595397

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



PERU

Ministerio  
de la ProducciónFondo Nacional de  
Desarrollo PesqueroCONCURSO PÚBLICO N°0001-  
2016-FONDEPESCONTRATO N°013-2016-  
FONDEPES

De ser en toda el área adyacente, se tendría una omisión de quien elaboro el perfil y luego el expediente técnico, al no haber realizado los trabajos de sondaje o verificaciones batimétricas previas en el trazo del muelle, que hubieran podido identificar la presencia de roca en toda el área.


En cambio de haber efectuado esta verificación (demostrada) de la NO existencia de roca en dicho trazo, el hecho de haber determinado una nueva ubicación, (desplazamiento 80.00 m. más arriba de la ubicación original) habría originado este Adicional que podría atribuirse como caso fortuito.

A fines del mes de Octubre del 2017 un consultor externo inicio trabajos de sondajes en el fondo marino (José Atala).


En el mes de Diciembre del 2017 el Consultor Externo hizo entrega del Estudio de Mecánica de Suelos en el que determino los estratos por debajo del nivel de las aguas marinas hasta una profundidad de de 8-9m. a partir del nivel de la plataforma del muelle, recomendando sin embargo realizar pruebas diamantinas hasta una profundidad mínima de 20.00m. para definir con mayor precisión el tipo de suelo submarino predominante, y se recomendó así mismo realizar previamente una prueba de pilotaje con punta reforzada, lo que permitiría tener una aproximación del comportamiento del equipo de hincado.

El 31-01-2018, se constituyó en obra el Consultor Alberto Martínez Vargas, quien a nombre de Fondepes, realizo las pruebas de perforación diamantina en el tramo 0+500 al 1+000 y de acuerdo a los resultados, se complementaría definir el tipo de cimentación a adoptar en dicho tramo.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

  
.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 19106696907

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

CONTROL DE AVANCE DE  
OBRA

25

## CONTROL DE AVANCE DE OBRA

### a). Descripción

El proyecto tiene como objetivo el de dar el "Suficiente acceso a Recursos hidrobiológicos de Calidad que cumplan con la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (DS N° 040-2001-PE) en la Caleta de San José, Santa Rosa y Pimentel".


La Entidad Contratante FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO, como resultado del proceso de selección de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES derivada de la Licitación Pública N° 004-2014-FONDEPES, encarga a la Empresa Contratista "CONSORCIO SAN JOSE", mediante Contrato de Ejecución de Obra N° 082 2014 FONDEPES/OGA la ejecución de la Obra "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION DE LAMBAYEQUE", de acuerdo a toda la documentación que conforman el Expediente Técnico contractual.

La entidad aprobó el expediente técnico original el cual a través de sus respectivas deficiencias tuvo lugar a la elaboración de adicionales de obra así como deductivos vinculantes, reducciones como también esto genera la ampliación de plazo respectiva.


Cabe precisar que, la potestad de la Entidad de ordenar la ejecución de prestaciones adicionales responde al reconocimiento de su calidad de garante del interés público en los contratos que celebra con los proveedores, para abastecerse de los bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de las funciones que le ha conferido la ley.

Es importante señalar que por deficiencia del expediente técnico se generara la necesidad de la aprobación de prestaciones adicionales de obra por parte de la Entidad, esto cuando los estudios que lo conforman (estudios de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental, etc.) presenten información incorrecta que no guarde relación con la realidad, precisando que la Entidad es responsable frente al contratista del contenido del expediente técnico en tanto forma parte de las Bases que han sido elaboradas por aquella y de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares, de conformidad con el primer párrafo del artículo 153 del Reglamento

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 1070638337

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

026

**b) Avance físico de obra.**

Se anexa el avance físico referente a la Valorización Contractual de Obra.


**c) Cronograma de Avance De Obra y comentario específico**

**Comentario acerca del avance de Obra referente al Contractual de Obra-**


Al mes de Febrero del 2019, se ha ejecutado el 63.33 % acumulado, contra un Avance Programado acumulado del 68.79 %, por lo tanto se encuentra al atrasada de acuerdo al cronograma vigente, correspondiente a la ampliación de plazo Parcial N° 28 por 102 días calendarios motivada por la ejecución del saldo de los trabajos del adicional N°07, siendo sincerado y equilibrado el plazo de ejecución, siendo el nuevo termino de obra el día 20/05/2019

Mes de Valorización	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado
Febrero 2019 Valorización N° 50	68.79 %	63.33 %

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

  
 .....  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595807

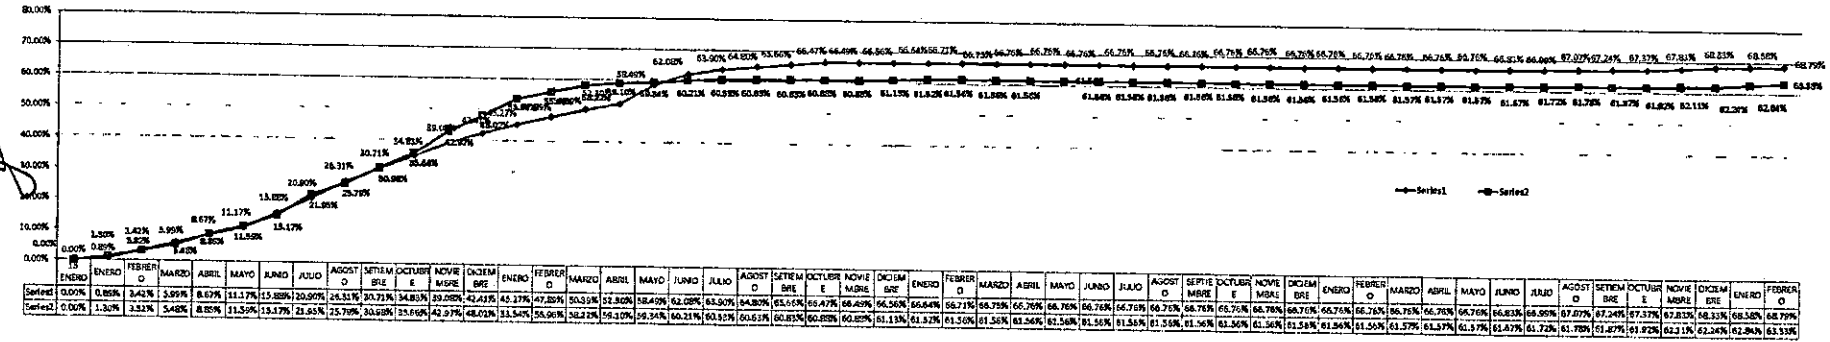
JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717



MEMORIA FICMOSA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 1016503897

### CONTROL DE AVANCE FISICO DE OBRA - CONTRACTUAL



MES	FECHA		AVANCE FISICO PROGRAMADO		% DE AVANCE PROGRAMADO		AVANCE PROGRAMADO REAL		PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO					BALANCE		
	RUCIO	FEI	AVANCE FISICO PROGRAMADO	AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO	% DEL MES	% ACUMULADO	% AVANCE PROGRAMADO REAL	% AVANCE REAL	AVANCE FISICO DEL MES (EJECUTADO)	AVANCE FISICO DEL MES (PROGRAMADO)	% AVANCE FISICO DEL MES (EJECUTADO)	% AVANCE FISICO DEL MES (PROGRAMADO)	AVANCE FISICO DEL MES (EJECUTADO)	AVANCE FISICO DEL MES (PROGRAMADO)	AVANCE FISICO DEL MES (EJECUTADO)	AVANCE FISICO DEL MES (PROGRAMADO)
16 ENERO					0.00%	0.00%										
ENERO	15/1/2016	31/01/2016	S/ 244.409,19	S/ 244.409,19	0.00%	0.00%										
FEBRERO	16/2/2016	28/02/2016	S/ 376.347,03	S/ 620.756,22	2.53%	3.42%			S/ 358.258,22	S/ 358.258,22	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MARZO	15/3/2016	31/03/2016	S/ 376.347,03	S/ 1.007.103,25	2.53%	6.95%			S/ 675.747,00	S/ 675.747,00	2.16%	2.16%	2.16%	2.16%	2.16%	2.16%
ABRIL	15/4/2016	30/04/2016	S/ 736.694,02	S/ 1.743.797,27	2.53%	11.47%			S/ 693.894,44	S/ 1.370.641,44	2.38%	2.38%	2.38%	2.38%	2.38%	2.38%
MAYO	15/5/2016	31/05/2016	S/ 688.371,48	S/ 2.432.168,75	2.53%	16.00%			S/ 625.177,19	S/ 1.995.818,63	2.38%	2.38%	2.38%	2.38%	2.38%	2.38%
JUNIO	15/6/2016	30/06/2016	S/ 1.297.593,65	S/ 3.729.762,40	4.72%	20.72%			S/ 793.732,22	S/ 2.789.550,85	2.74%	2.74%	2.74%	2.74%	2.74%	2.74%
JULIO	15/7/2016	31/07/2016	S/ 1.360.671,37	S/ 5.090.433,77	5.02%	25.74%			S/ 889.372,63	S/ 3.678.923,48	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%	3.58%
AGOSTO	15/8/2016	31/08/2016	S/ 1.498.638,07	S/ 6.589.071,84	5.02%	30.76%			S/ 1.695.453,02	S/ 5.374.376,50	5.78%	5.78%	5.78%	5.78%	5.78%	5.78%
SEPTIEMBRE	15/9/2016	30/09/2016	S/ 1.210.818,39	S/ 7.800.890,23	4.40%	35.16%			S/ 1.059.927,29	S/ 6.434.303,79	3.81%	3.81%	3.81%	3.81%	3.81%	3.81%
OCTUBRE	15/10/2016	31/10/2016	S/ 1.133.763,44	S/ 8.934.653,67	4.12%	39.28%			S/ 1.429.110,33	S/ 7.863.414,12	5.20%	5.20%	5.20%	5.20%	5.20%	5.20%
NOVIEMBRE	15/11/2016	30/11/2016	S/ 1.128.438,89	S/ 10.063.092,56	4.25%	43.53%			S/ 1.289.745,48	S/ 9.153.159,60	5.83%	5.83%	5.83%	5.83%	5.83%	5.83%
DICIEMBRE	15/12/2016	31/12/2016	S/ 1.128.438,89	S/ 11.191.531,45	3.33%	46.86%			S/ 2.011.931,63	S/ 11.165.091,23	7.31%	7.31%	7.31%	7.31%	7.31%	7.31%
ENERO	15/1/2017	31/01/2017	S/ 789.418,89	S/ 11.980.950,34	2.96%	49.82%			S/ 1.309.970,39	S/ 12.475.061,62	3.09%	3.09%	3.09%	3.09%	3.09%	3.09%
FEBRERO	15/2/2017	28/02/2017	S/ 221.945,90	S/ 12.202.896,24	2.82%	52.64%			S/ 1.837.695,83	S/ 14.312.757,45	2.43%	2.43%	2.43%	2.43%	2.43%	2.43%
MARZO	15/3/2017	31/03/2017	S/ 681.666,84	S/ 12.884.563,08	2.90%	55.54%			S/ 687.876,89	S/ 15.000.634,34	3.84%	3.84%	3.84%	3.84%	3.84%	3.84%
ABRIL	15/4/2017	30/04/2017	S/ 624.949,32	S/ 13.509.512,40	1.91%	57.45%			S/ 621.646,95	S/ 15.622.281,29	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%
MAYO	15/5/2017	31/05/2017	S/ 1.703.780,80	S/ 15.213.293,20	6.19%	63.64%			S/ 240.941,06	S/ 15.863.222,35	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%
JUNIO	15/6/2017	30/06/2017	S/ 967.604,53	S/ 16.180.897,73	3.69%	67.33%			S/ 67.818,42	S/ 16.931.040,77	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%
AGOSTO	15/8/2017	31/07/2017	S/ 600.178,88	S/ 16.781.076,61	1.92%	69.25%			S/ 239.809,88	S/ 17.170.850,65	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%
SEPTIEMBRE	15/9/2017	31/08/2017	S/ 246.237,70	S/ 17.027.314,31	0.90%	70.15%			S/ 67.681,79	S/ 17.847.532,44	0.37%	0.37%	0.37%	0.37%	0.37%	0.37%
OCTUBRE	15/10/2017	30/09/2017	S/ 233.369,10	S/ 17.260.683,41	0.88%	71.03%			S/ 26.733,49	S/ 18.114.265,93	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%
NOVIEMBRE	15/11/2017	31/10/2017	S/ 4.839,13	S/ 17.265.522,54	0.01%	71.04%			S/ 54.656,99	S/ 18.168.922,92	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
DICIEMBRE	15/12/2017	31/12/2017	S/ 21.024,17	S/ 17.286.546,71	0.07%	71.11%			S/ 19.754,74	S/ 18.188.677,66	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%
ENERO	15/1/2018	31/01/2018	S/ 20.245,87	S/ 17.306.792,58	0.07%	71.18%			S/ 89.223,97	S/ 18.277.901,63	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%
FEBRERO	15/2/2018	28/02/2018	S/ 21.024,17	S/ 17.327.816,75	0.08%	71.26%			S/ 108.656,42	S/ 18.386.558,05	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%
MARZO	15/3/2018	31/03/2018	S/ 8.922,87	S/ 17.336.739,62	0.03%	71.29%			S/ 11.543,00	S/ 18.400.101,05	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
ABRIL	15/4/2018	30/04/2018	S/ 4.461,44	S/ 17.341.201,06	0.02%	71.31%			S/ 0,00	S/ 18.400.101,05	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MAYO	15/5/2018	31/05/2018	S/ 0,00	S/ 17.341.201,06	0.00%	71.31%			S/ 0,00	S/ 18.400.101,05	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JUNIO	15/6/2018	30/06/2018	S/ 0,00	S/ 17.341.201,06	0.00%	71.31%			S/ 0,00	S/ 18.400.101,05	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AGOSTO	15/8/2018	31/07/2018	S/ 0,00	S/ 17.341.201,06	0.00%	71.31%			S/ 0,00	S/ 18.400.101,05	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SEPTIEMBRE	15/9/2018	30/09/2018	S/ 0,00	S/ 17.341.201,06	0.00%	71.31%			S/ 0,00	S/ 18.400.101,05	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OCTUBRE	15/10/2018	31/10/2018	S/ 0,00	S/ 17.341.201,06	0.00%	71.31%			S/ 0,00	S/ 18.400.101,05	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NOVIEMBRE	15/11/2018	30/11/2018	S/ 0,00	S/ 17.341.201,06	0.00%	71.31%			S/ 0,00	S/ 18.400.101,05	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DICIEMBRE	15/12/2018	31/12/2018	S/ 0,00	S/ 17.341.201,06	0.00%	71.31%			S/ 0,00	S/ 18.400.101,05	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENERO	15/1/2019	31/01/2019	S/ 85.835,10	S/ 17.427.036,16	0.24%	71.55%			S/ 35.710,92	S/ 18.435.712,07	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%
FEBRERO	15/2/2019	28/02/2019	S/ 85.835,10	S/ 17.512.871,26	0.24%	71.79%			S/ 164.208,84	S/ 18.599.920,91	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%
MARZO	15/3/2019	31/03/2019	S/ 69.604,41	S/ 17.582.475,67	0.25%	72.04%			S/ 155.026,28	S/ 18.754.947,19	0.49%	0.49%	0.49%	0.49%	0.49%	0.49%
ABRIL	15/4/2019	30/04/2019	S/ 433.318,61	S/ 18.015.794,28	1.65%	73.69%										
MAYO	15/5/2019	31/05/2019	S/ 2.075.818,10	S/ 20.091.612,38	7.65%	78.34%										
TOTAL			S/ 21.521.784,78		78.24%								S/ 17.618.782,42			
			S/ 27.608.488,30		100.00%											

Handwritten initials or signature.



PERU

Ministerio de la Producción

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

CONCURSO PUBLICO N°0001-2016-FONDEPES

CONTRATO N°013-2016-FONDEPES

### CONTROL DE OBRA

#### a) Control de Campo

#### Del Contractual

Se realizaron las siguientes partidas con su respectivo metrado.

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N° 50			
AL MES DE FEBRERO DEL 2019			
OBRA	: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"		
07	OBRAS EN MAR		
07.03.05	JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES		
07.03.05.01	CONCRETO EN VIGA MANDIL F'C=280 KG/CM2	m3	0.00
07.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA MANDIL	m2	62.85
07.03.05.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	4,006.62
07.03.06	SARDINELES LLENADOS IN SITU		
07.03.06.01	CONCRETO EN SARDINEL F'C=280 KG/CM2	m3	6.48
07.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES	m2	59.32
07.03.06.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	867.71
07.03.07	LOSAS VACIADAS IN SITU		
07.03.07.01	CONCRETO EN LOSAS F'C=280 KG/CM2	m3	0.00
07.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES	m2	48.18
07.03.07.03	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	15,229.74
07.04.07	MANIOBRA DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS PUENTES		
07.04.07.01	TRANSPORTE DE PILOTE	und	36.00
07.04.07.02	TRANSPORTE DE VIGA TRANSVERSAL	und	9.00

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595397

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

07.04.07.03	TRANSPORTE DE LOSA NERVADA	und	14.00
07.04.07.04	PUNTA PARA PILOTES	und	0.00
07.04.07.05	HINCADO DE PILOTE (INC. MOV. Y POSIC. PLANTILLA)	und	0.00
07.04.07.06	DESCABEZADO DE PILOTAJE	und	36.00
07.04.07.07	COLOCACION DE VIGA TRANSVERSAL	und	9.00
07.04.07.08	COLOCACION DE LOSA NERVADA	und	14.00

**b) Descripción de las ocurrencias técnicas realizadas en obra**

**DEL CONTRACTUAL**

Las ocurrencias de trámite técnico administrativo se anotaron en el Cuaderno de obra cuyas copias se adjunta al presente Informe

**c) Control de calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos**

Se están verificando la respectiva calidad de los materiales, las cuales serán requeridas en la recepción de Obra.

**d) Pruebas de Calidad de agregados.**

No se realizó adicionalmente ninguna otra prueba por no ser necesario

**e) Diseño de Mezclas para los diferentes tipos de concreto**

No se realizó adicionalmente ninguna otra prueba por no ser necesario

**f) Pruebas de Compactaciones o densidad de campo**

No se realizó adicionalmente ninguna otra prueba por no ser necesario

**g) Pruebas hidráulicas en redes de desagüe, redes de agua, pruebas eléctricas, verificación de cumplimiento de especificaciones de electrobombas, limpieza y desinfección de sistemas, correcto funcionamiento de aparatos sanitarios, eléctricos, electrobombas y otros.**

No se realizaron ninguna prueba por no ser necesarios.

Sin embargo, se viene verificando el buen funcionamiento de los aparatos sanitarios, eléctricos y electrobombas, periódicamente a fin de verificar su funcionalidad y buen estado

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

**h) Recursos Utilizados durante el mes**

**LISTA DE MAQUINAS Y EQUIPOS QUE SE VIENE UTILIZANDO EN OBRA**

- GRUA TELESCOPICA GROVE 40 TN
- GRUA ORUGA LINK BELT LS 108-B 40 TN
- CARGADOR FRONTAL VOLVO L180C
- MINI CARGADOR BOT CAT S250 N°21
- COMPRESORA DE AIRE ATLAS
- ARENADORA
- TROMPO MEZCLADOR DE CONCRETO
- MOTOSOLDADORA MILLER 402D

**PERSONAL TECNICO Y OFICINA**

- Ing. Residente de Obra : Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez
- Maestro de Obra : Jorge Luis Díaz Ruiz.

**PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR EN OBRA**

- 02 maniobristas de muelle
- 03 operadores de máquinas
- 02 soldadores
- 06 peones
- 02 vigilantes turno día
- 02 vigilantes turno noche


**Personal Profesional Propuesto**

- 01 Gerente de Proyecto : Ing. Julio César Incio Carrillo
- 01 Ing. Residente de Obra : Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez
- 01 Administrador de Obra : Ing. Ludwig Benito Retamozo Martínez
- 01 Asistente de Residente de Obra : Ing. Richard Javier Tapia Rosazza
- 01 Asistente de Residente de Obra : Ing. Jorge Antonio Vidal Navarrete
- 01 Especialista en Estructuras : Ing. Romer Iván Lovon Dávila
- 01 Esp. en Mecánica de Suelos : Ing. Fidel Juvenal Ramírez Aguiar
- 01 Esp. en Seguridad de Obra : Ing. Eddy Solano Espinoza Escalante
- 01 Especialista en Sanitarias : Ing. Chong Tang Julio Tay Wo

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

  
 .....  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106695807

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

01 Esp. en Metrados y Valorizaciones : Ing. Jhonny Alan Huamán Porlles

**Personal Técnico**

- 01 Almacenero : Sr. Luis Saire Quilca
- 04 Guardíanes : Sr. Santos Hipólito Muñoz Silva
- : Sr. Christian Alex Montalvo Valera
- : Sr. José Neiro Lozano Carrasco
- 01 Topógrafo : Sr. Jorge Luis Díaz Ruiz
- 01 Asistente de Ingeniería : Sr. Rojer Job Navarro Tello

**Personal de la Supervisión**

01 Jefe de supervisión : Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza

i) **Control de Supervisión en la Prevención de Riesgos (seguridad) y Control y supervisión ambiental informe de las actividades de supervisión ambiental realizadas durante el mes**

Se anexa lo correspondiente.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 10717

01 Topógrafo : Sr. Jorge Luis Díaz Ruiz

01 Asistente de Ingeniería : Sr. Rojer Job Navarro Tello


**Personal de la Supervisión**

01 Jefe de supervisión : Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza


- i) **Control de Supervisión en la Prevención de Riesgos (seguridad) y Control y supervisión ambiental informe de las actividades de supervisión ambiental realizadas durante el mes**

Se anexa lo correspondiente.

*CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA*

  
 .....  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595807

*JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA*


  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 10717

089

# **INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE**

**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA  
CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ,  
DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE  
LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"**

**FEBRERO – 2019**

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

**CONSORCIO  
SAN JOSÉ**

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

 **FONDEPES**  
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>INFORME MENSUAL N° 50</b>	<b>FEBRERO - 2019</b>
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	<b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Página 1 de 17</b>

34

**ÍNDICE**

**1. DATOS DE LA OBRA.....2**

**2. INTRODUCCIÓN.....2**

**3. OBJETIVO .....2**

**4. ALCANCE .....2**

**5. ORGANIGRAMA .....3**

**6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .....3**

**7. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL .....7**

**8. ESTADÍSTICAS SST.....12**

**9. REPORTE MENSUAL DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD  
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE .....14**

**10. CONCLUSIONES .....15**

**11. RECOMENDACIONES.....15**

**12. PANEL FOTOGRÁFICO .....16**

  
 .....  
**MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO**  
 RUC: 10106595807

  
**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
**INGENIERO CIVIL**  
 Reg. CIP N° 10717



<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>INFORME MENSUAL N° 50</b>	<b>FEBRERO - 2019</b>
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	<b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Página 2 de 17</b>

## 1. DATOS DE LA OBRA

“Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”

**TIEMPO DE EJECUCIÓN :** 1,204 días  
**FECHA DE INICIO :** 15 de FEBRERO de 2015

## 2. INTRODUCCIÓN


Consortio San José, viene ejecutando la obra: “Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”, para lo cual se espera conseguir la máxima identificación y compromiso por parte de la Dirección y de todos los trabajadores con los principios de Seguridad, Salud en el Trabajo y Conservación del Medio Ambiente, cumpliendo así con el Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente elaborado para la obra.

## 3. OBJETIVO

Demostrar la gestión del Consortio San José, referente a Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente en el mes de FEBRERO del 2019.

## 4. ALCANCE

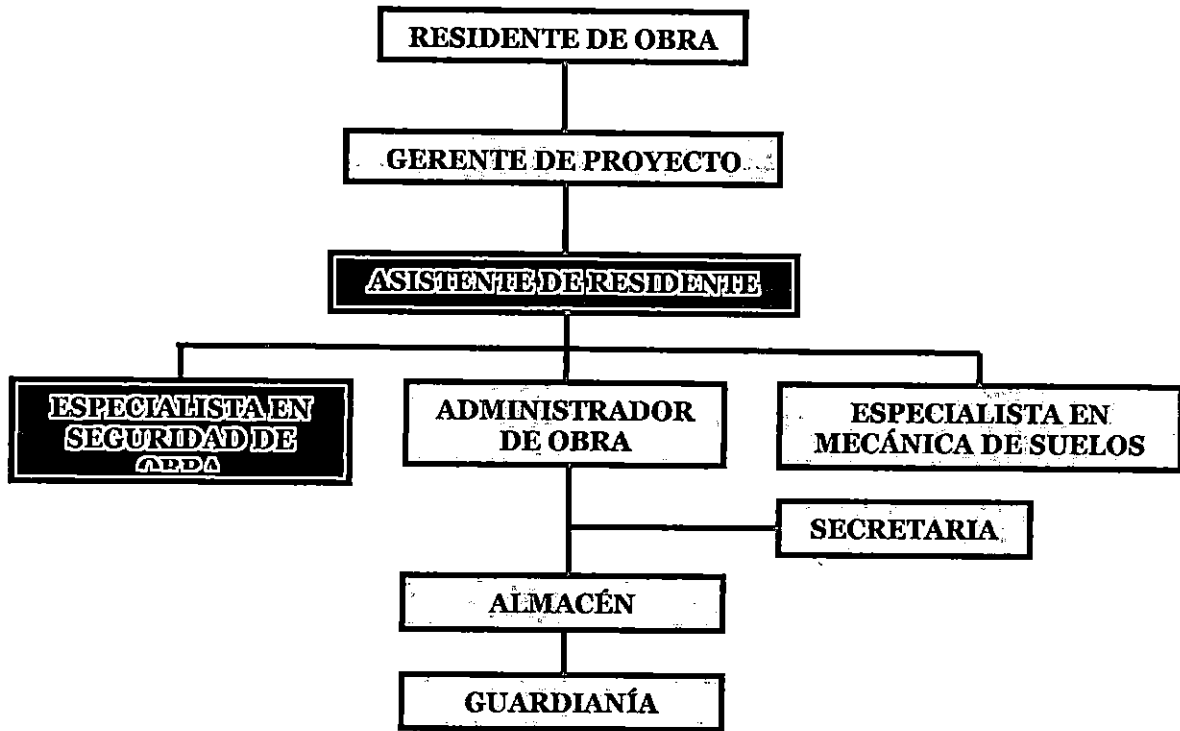
El presente informe plasma todas las actividades realizadas referentes a Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente en la Obra: “Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”.

  
 .....  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595807

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

36

**5. ORGANIGRAMA**



**6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL**

**6.1. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

CONSORCIO SAN JOSÉ		INSPECCIONES DE SEGURIDAD																					
OBRA:		"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"																					
FRENTE DE TRABAJO:		MUELLE SAN JOSÉ - CHICLAYO																					
MES	HERRAM. MANUAL		HERRAM. ELECTR.		EXTINTORES		BOTIQUIN		CAMILLA		EPPs		ARNES		ANDAMIOS		VEHICULOS		GENERAL-OBRA		TOTAL MES.	EFICIENCIA DE RESPUESTA	
	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.		MES	ACUM.
JULIO	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	10	100%	100%
AGOSTO	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	10	100%	100%
SEPTIEMBRE	1	44	1	44	1	44	1	44	1	44	1	44	1	44	1	44	1	44	1	44	10	100%	100%
OCTUBRE	1	45	1	45	1	45	1	45	1	45	1	45	1	45	1	45	1	45	1	45	10	100%	100%
NOVIEMBRE	1	46	1	46	1	46	1	46	1	46	1	46	1	46	1	46	1	46	1	46	10	100%	100%
DICIEMBRE	1	47	1	47	1	47	1	47	1	47	1	47	1	47	1	47	1	47	1	47	10	100%	100%
ENERO	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	10	100%	100%
FEBRERO	1	49	1	49	1	49	1	49	1	49	1	49	1	49	1	49	1	49	1	49	10	100%	100%
TOTAL INSPECCIONES	49		49		49		49		49		49		49		49		49		49		490		

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO


RUC: 10106995807


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

32

## 6.2. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>			<b>ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO</b>				
<b>OBRA:</b>			<b>"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"</b>				
<b>FRENTE DE TRABAJO:</b>			<b>MUELLE SAN JOSE - CHICLAYO</b>				
<b>Nº</b>	<b>FECHA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>N° DE TRABAJADORES</b>	<b>ANALISIS DE TRABAJO SEGURO</b>	<b>PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO</b>	<b>INSPECCION DE VEHICULOS</b>	<b>INSPECCION PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR</b>
1	01/02/2019	VIERNES	14	1	1	0	0
2	02/02/2019	SÁBADO	14	1	1	0	0
3	04/02/2019	LUNES	14	1	1	0	0
4	05/02/2019	MARTES	14	1	1	0	0
5	06/02/2019	MIÉRCOLES	14	1	1	0	0
6	07/02/2019	JUEVES	14	1	1	0	0
7	08/02/2019	VIERNES	14	1	1	0	0
8	09/02/2019	SÁBADO	14	1	1	0	0
9	11/02/2019	LUNES	14	1	1	0	0
10	12/02/2019	MARTES	14	1	1	0	0
11	13/02/2019	MIÉRCOLES	14	1	1	0	0
12	14/02/2019	JUEVES	14	1	1	0	0
13	15/02/2019	VIERNES	14	1	1	0	0
14	16/02/2019	SÁBADO	14	1	1	0	0
15	18/02/2019	LUNES	14	1	1	0	0
16	19/02/2019	MARTES	14	1	1	0	0
17	20/02/2019	MIÉRCOLES	14	1	1	0	0
18	21/02/2019	JUEVES	14	1	1	0	0
19	22/02/2019	VIERNES	14	1	1	0	0
20	23/02/2019	SÁBADO	14	1	1	0	0
21	25/02/2019	LUNES	14	1	1	0	0
22	26/02/2019	MARTES	14	1	1	0	0
23	27/02/2019	MIÉRCOLES	14	1	1	0	0
24	28/02/2019	JUEVES	14	1	1	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
 HERNANDEZ PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595807

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717  
 FEBRERO - 2019

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>INFORME MENSUAL N° 50</b>	<b>FEBRERO - 2019</b>
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	<b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Página 5 de 17</b>

38

**6.3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN**

**6.3.1. INDUCCIÓN**


En el presente mes de FEBRERO no hubo ingreso de personal nuevo en obra; por lo mismo no se realizó la inducción hombre – nuevo.

**6.3.2. CAPACITACIÓN**

En el presente mes FEBRERO no se realizó capacitación específica a los trabajadores.

**6.3.3. CHARLA 10 MINUTOS**

En este mes se han desarrollado un total de 24 charlas de 10 minutos, teniendo un total de 56 horas hombres capacitados; abarcando temas de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente para el personal de campo y técnico, los mismos que se detallaron en el Cronograma Mensual de Reuniones Diarias.




.....  
 TRINDOZARICONGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595807




ISAIÁS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

39

CONSORCIO SAN JOSÉ		FORMATO DE PROCEDIMIENTO						
CRONOGRAMA MENSUAL DE REUNIONES DIARIAS								
AÑO:	2019	MES:	FEBRERO					
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"							
FRENTE:	MUELLE SAN JOSÉ - CHICLAYO							
N°	TEMA A EXPLICAR	TIPO DE REUNION	RESPONSABLE DE ELECCION	FECHA	N° DE ASISTENTES	DURACION (Min)	TOTAL HHC	HORA
1	ORDEN Y LIMPIEZA	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	01/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
2	NO SOLO LAS CUERDAS DE LAS HORCAS SON PELIGROSAS	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	02/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
3	LOS PELIGROS EN MANEJO DE GASOLINA	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	04/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
4	VER PARA CREER	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	05/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
5	SEGURIDAD EN MOVIMIENTO	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	06/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
6	PROTECCIÓN PARA USTED	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	07/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
7	AL IR Y VENIR DEL TRABAJO	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	08/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
8	LA DISTRACCIÓN	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	09/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
9	LA SEGURIDAD EN LOS OJOS	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	11/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
10	OBJETOS QUE CAEN	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	12/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
11	USTED Y LA SEGURIDAD	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	13/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
12	LOS COLORES HABLAN	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	14/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
13	CONSERVEMOS LO QUE TENEMOS	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	15/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
14	TU PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	16/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
15	LOS ACCIDENTES NO SON CASUALES	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	18/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
16	REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONE SUBESTANDAR	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	19/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
17	MANTENGA SUS MANOS SIEMPRE LIMPIAS	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	20/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
18	¿CON LA BASURA QUIERES ACABAR? LAS 3R QUE TIENES QUE PRACTICAR	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	21/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
19	COMBATA EL MIEDO Y FRACASO	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	22/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
20	CONOCIMIENTOS ESENCIALE SPARA REALIZAR SOLDADURA	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	23/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
21	ORGULLO EN EL TRABAJO	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	25/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
22	¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL AGUA?	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	26/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
23	DIEZ FACTORES HUMANOS QUE CAUSAN ACCIDENTES	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	27/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
24	LOS INCIDENTES AVISAN	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	28/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
TOTAL							56	

  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106695807

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 FEBRERO 2019

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>INFORME MENSUAL N° 50</b>	<b>FEBRERO - 2019</b>
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	<b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Página 7 de 17</b>

40

**7. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Las actividades realizadas en el mes de FEBRERO, se vienen ejecutando de acuerdo al cronograma de Actividades de Plan de Gestión Ambiental.

Para ejecutar estas actividades se vienen aplicando los respectivos documentos, procedimientos y permisos debidamente aprobados, que permitan implementar el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente durante la fase de ejecución de la Obra.


**7.1. COMPONENTES AMBIENTALES AFECTADOS PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES**


En el presente punto solamente mencionaremos los componentes ambientales afectados de manera negativa, producto de las diversas actividades ejecutadas en la etapa de construcción de la obra durante el mes de FEBRERO, no considerando necesario efectuar una descripción detallada del estado de dichos componentes, pues dicho detalle ha sido elaborado en la respectiva Línea de base del proyecto. Por ello los componentes ambientales afectados son los siguientes:

- Aire
- Suelo
- Mar
- Entorno paisajístico
- Salud y Seguridad de la población y trabajadores

**7.2. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN LOS COMPONENTES AMBIENTALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO**

A continuación mostramos los impactos ambientales generados, producto de las diversas actividades ejecutadas en la fase de construcción de la obra, en el mes de FEBRERO. En la intersección de la actividad ejecutada con el componente afectado se describirá dichos Impactos, las variables e indicadores afectados.

  
 .....  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595807

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717  
 FEBRERO - 2019

DENOMINACIÓN DEL IMPACTO	MEDIO AL QUE AFECTA	Carácter	IM: Magnitud	IS: Severidad	IE: Extensión	IP: Probabilidad	NRA: NIVEL DE RIESGO AMBIENTAL
Generación de partículas por el movimiento de maquinarias.	AIRE	-1	1	1	1	1	-4
Generación de partículas en suspensión por la demolición, preparado de concreto y actividades diversas.	AIRE	-1	1	1	1	1	-4
Generación de desechos sólidos por el descabezado de pilotes, preparado de concreto y actividades diversas.	MAR	-1	1	1	1	1	-4

### 7.3 ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL FRENTE A LOS IMPACTOS GENERADOS


La estrategia de manejo ambiental, garantiza que la ejecución de las acciones y medidas de mitigación propuestas sean lo más objetivas y realistas posibles, a fin de que las posibles alteraciones que puedan producirse en el medio ambiente, encuentren una respuesta y sean minimizadas y/o mitigadas.

Las medidas ambientales de los impactos negativos generados por la ejecución de las actividades de la etapa de construcción de la obra sobre el medio ambiente, son planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, pero hay algunas medidas adicionales propuestas y ejecutadas durante el desarrollo de las actividades, necesarias para controlar, prevenir, evitar y/o compensar los impactos.

### 7.4. ACTIVIDADES CONTROLADAS PROGRAMA DE MANEJO DE CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO

En las actividades ejecutadas durante el mes de FEBRERO se han producido los siguientes impactos:

  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106399307

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>INFORME MENSUAL N° 50</b>	<b>FEBRERO - 2019</b>
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	<b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Página 9 de 17</b>

42

- Generación de partículas por el movimiento de maquinarias y fuertes vientos en esta época de trabajo.
- Generación de partículas en suspensión por la preparación de concreto y actividades diversas.
- Generación de desechos sólidos por el descabezado de pilotes, preparado de concreto y actividades diversas.

Por otro lado, durante este mes se han efectuado eventualmente las siguientes medidas de control para reducir y mitigar los efectos de los impactos ambientales generados:


- a) Se cuenta con cilindros de colores para la segregación de los residuos sólidos.
- b) Rociado diario de agua, mediante camiones cisternas, en toda el área de trabajo, para disminuir la generación de polvo por efectos de los fuertes vientos en la zona.
- c) A cada frente de trabajo, se le entrega bolsas plásticas para que segreguen sus residuos sólidos producto de sus actividades.
- d) Se ha ejecutado la charla de inducción de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente a todo el personal que ha ingresado a la obra. Además de las charlas diarias (charla de 10 minutos) reiterándola importancia del orden y limpieza en su área de trabajo e identificar los colores de los tachos y segregar correctamente los residuos.


#### **7.5. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**

Durante la ejecución de las actividades en la obra, se han generado residuos sólidos producto de las diversas actividades, así como residuos sólidos domésticos producto de las diversas actividades propias de los trabajadores.

Para mitigar y controlar los impactos generados por la generación de los residuos sólidos se han ejecutado las siguientes actividades:

- Se continúa utilizando los lugares de acopio para el almacenamiento temporal de residuos sólidos dentro del área de la obra.

  
**ISAIÁS JORGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

  
 MENDOZA PICAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595807



<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>INFORME MENSUAL N° 50</b>	<b>FEBRERO - 2019</b>
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	<b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Página 10 de 17</b>

43

- Se implementó los cilindros que serán utilizados como depósitos de colores para el almacenamiento selectivo de residuos sólidos, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>		<b>GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>	
<b>OBRA:</b>	<b>CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE</b>		
<b>FRENTE DE TRABAJO:</b>	<b>MUELLE DE SAN JOSE-CHICLAYO</b>		
<b>COLOR DEL CILINDRO</b>	<b>CARACTERISTICAS</b>	<b>TOTAL Kg.</b>	
<b>AMARILLO</b>	Materiales metalicos, fierros, etc.	<b>5.0</b>	
<b>AZUL</b>	Materiales hechos de papel y carton.	<b>9.0</b>	
<b>BLANCO</b>	Materiales donde su compuesto es de plastico.	<b>2.0</b>	
<b>VERDE</b>	Materiales de vidrio, ceramica y porcelanato.	<b>0.0</b>	
<b>MARRON</b>	Restos de alimentos, madera, jardineria, etc.	<b>10.0</b>	
<b>ROJO</b>	Recipientes de sustancias quimicas.	<b>2.0</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>28.0</b>	

## 7.6 REPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS

### 7.6.1. REPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>		<b>REPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS-RESTOS DE CONSTRUCCION</b>			
<b>OBRA:</b>	<b>CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE</b>				
<b>FRENTE DE TRABAJO:</b>	<b>MUELLE DE SAN JOSE-CHICLAYO</b>				
<b>TIPO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
Restos de alimentos	Kg.	4.0	42.0	Ninguna	
Papel/Cartón	Kg.	4.0	37.5	Ninguna	
Bolsas de papel pastificadas (Cemento, etc.)	Kg.	5.0	37.0	Ninguna	
Plastico PVC (Botellas, tubos, envases y acrilicos)	Kg.	2.0	29.0	Ninguna	
Technopor.	Kg.	0.0	2.5	Ninguna	
Chatarra y cable eléctricos.	Kg.	5.0	241.0	Ninguna	
Madera	Kg.	6.0	57.0	Ninguna	
Residuos de vidrio/ ceramica.	Kg.	0.0	0.0	Ninguna	
<b>TOTAL MES</b>		<b>26.0</b>	<b>446.0</b>		

44

**7.6.2. REPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS**

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>REPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS SOLIDOS</b>			
<b>OBRA:</b>	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE			
<b>PRENTE DE TRABAJO:</b>	MUELLE DE SAN JOSE-CHICLAYO			
<b>TIPO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Recipientes de sustancias quimicas	Kg.	2.0	14.0	Ninguna
<b>TOTAL MES</b>		<b>2.0</b>	<b>14.0</b>	

**8. ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>														
<b>MES:</b>	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE REGION LAMBAYEQUE"														
Mes	N° trabajadores	N° Accidente mortal	N° Accidente leve	ACCIDENTE INCAPACITANTE						ENFERMEDAD OCUPACIONAL				N° Incidentes peligrosos	N° Incidentes
				N° Accidente incapacitante	Total horas hombre trabajadas	N° días perdidos	Índice frecuencia	Índice gravedad	Índice accidentalidad	N° enfermedades ocupacionales	N° trabajadores expuestos al agente	Tasa de incidencia	N° trabajadores con cancer profesional		
Marzo	19	0	0	0	1692	0	0.00	0.00	0.00	0	19	0.00	0	0	0
Abril	12	0	0	0	1558	0	0.00	0.00	0.00	0	12	0.00	0	0	0
Mayo	6	0	0	0	1704	0	0.00	0.00	0.00	0	6	0.00	0	0	0
Junio	17	0	0	0	1642	0	0.00	0.00	0.00	0	17	0.00	0	0	0
Julio	16	0	0	0	2935.5	0	0.00	0.00	0.00	0	16	0.00	0	0	0
Agosto	14	0	0	0	2934.5	0	0.00	0.00	0.00	0	14	0.00	0	0	0
Septiembre	14	0	0	0	2754	0	0.00	0.00	0.00	0	14	0.00	0	0	0
Octubre	14	0	0	0	2926	0	0.00	0.00	0.00	0	14	0.00	0	0	0
Noviembre	14	0	0	0	2507.00	0	0.00	0.00	0.00	0	14	0.00	0	0	0
Diciembre	13	0	0	0	1692	0	0.00	0.00	0.00	0	13	0.00	0	0	0
Enero 2019	14	0	0	0	2502.00	0	0.00	0.00	0.00	0	14	0.00	0	0	0
Febrero 2019	14	0	0	0	2658.00	0	0.00	0.00	0.00	0	14	0.00	0	0	0


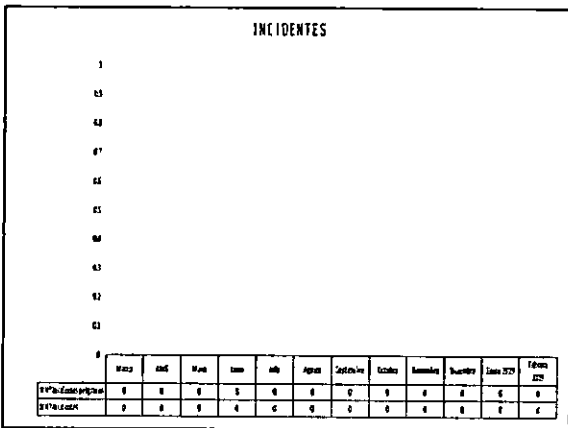

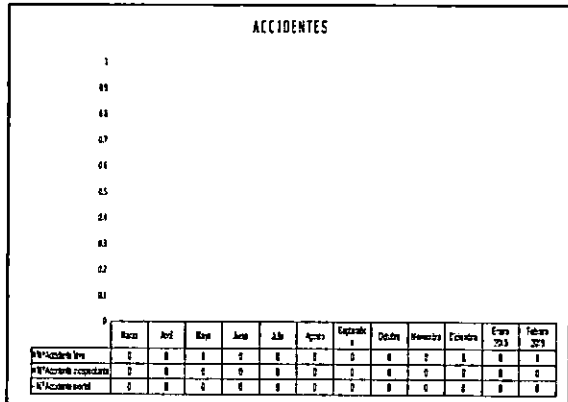
**INCIDENTE:** Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que estas solo requieren cuidados de primeros auxilios.  
**INCIDENTE PELIGROSO:** Suceso que potencialmente puede causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.  
**ACCIDENTE LEVE:** Suceso cuya lesión, genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.  
**ACCIDENTE INCAPACITANTE:** Suceso cuya lesión, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento.  
**ACCIDENTE MORTAL:** Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.  
**ENFERMEDAD OCUPACIONAL:** Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo.

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 70106595807


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717  
 FEBRERO - 2019


Set

RESULTADO ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SST	Índice Frecuencia	Índice gravedad	Índice accidentabilidad
	0.00	0.00	0.00



MES	INDICE DE FRECUENCIA	INDICE DE FRECUENCIA ACUMULADA	INDICE DE GRAVEDAD	INDICE DE GRAVEDAD ACUMULADA	INDICE DE ACCIDENTABILIDAD AD	INDICE DE ACCIDENTABILIDAD ACUMULADA
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



  
**MENDOZA PICURGA CARLOS HUMBERTO**  
 RUC: 10106695907

  
**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717  
**FEBRERO - 2019**

96

**8.1. CÁLCULO ESTADÍSTICO DE ÍNDICE DE FRECUENCIA, ÍNDICE DE SEVERIDAD, ACCIDENTABILIDAD Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES:**

Para el cálculo del índice de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad se utilizaran las siguientes formulas según la NTE G 050.

Índice de Frecuencia Mensual	<b>IFm</b>	$\frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el mes X 200000}}{\text{Número horas trabajadas en el mes}}$
Índice de Gravedad Mensual	<b>IGm</b>	$\frac{\text{Días perdidos en el mes X 200000}}{\text{Número horas trabajadas en el mes}}$
Índice de Frecuencia Acumulado	<b>IFa</b>	$\frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el año X 200000}}{\text{Horas trabajadas en lo que va del año}}$
Índice de Gravedad Acumulado	<b>IGa</b>	$\frac{\text{Días perdidos en el año X 200000}}{\text{Horas trabajadas en lo que va del año}}$
Índice de Accidentabilidad	<b>IA</b>	$\frac{\text{IFa x IGa}}{200}$


  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595807

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>INFORME MENSUAL N° 50</b>	<b>FEBRERO - 2019</b>
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	<b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Página 14 de 17</b>

## 9. REPORTE MENSUAL DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>		<b>REPORTE MENSUAL - FEBRERO 2019</b>	
<b>OBRA:</b>		"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"	
<b>FRENTE DE TRABAJO:</b>		MUELLE DE SAN JOSE - CHICLAYO	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>REPORTE</b>	<b>UNIDAD</b>
1	Cantidad de Trabajadores	14	Trabajadores
2	Dias Trabajados Sin Accidentes Incapacitantes	24	dias
3	Total Accidentes Sin Tiempo Perdido (Accidentes Leves)	0	Unidad
4	Total Accidentes Con Tiempo Perdido (Accidentes Graves)	0	Unidad
5	Total Dias Perdidos Por Accidentes Incapacitantes	0	días
6	Total Accidentes Fatales Reportados	0	Unidad
7	Record Horas Mensual Sin Accidentes Incapacitantes	2688.00	Hrs
8	Record Horas Acumuladas Sin Accidentes Incapacitantes	301550.00	Hrs
9	Total Accidentes de Tránsito	0	Unidad
10	Total Accidentes con Daño Material	0	Unidad
11	Total Incidentes	0	Unidad
12	Total Derrames	0	Unidad
13	Total Enfermedades Ocupacionales Reportada	0	Unidad
<b>ACTIVIDADES</b>			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>REPORTE</b>	<b>UNIDAD</b>
1	Charlas Diarias	56	Hrs Hombre
2	Capacitaciones	0	Hrs Hombre
3	Induccion Trabajador Nuevo	0	Hrs Hombre
4	Analisis de Trabajo Seguro	24	Unidad
5	Permiso Escrito Para Trabajador de Alto Riesgo	24	Unidad
6	Inspeccion Pre Operacional de Vehiculos	0	Unidad
7	Inspeccion Pre Operacional de Minicargador	0	Unidad
8	Selección de Residuos No Peligrosos- Punto Limpio	26.0	Kg.
9	Selección de Residuos Peligrosos- Punto Limpio	2.0	Kg.
10	Eliminación Residuos No Peligrosos Acumuldo	446.0	Kg.

  
**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>INFORME MENSUAL N° 50</b>	<b>FEBRERO - 2019</b>
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	<b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Página 15 de 17</b>


98

## 10. CONCLUSIONES

- En este mes se ha cumplido con el cronograma mensual de reuniones diarias y se ha expuesto temas de seguridad y medio ambiente en las charlas diarias antes de dar inicio a las labores.
- En este mes de FEBRERO no se produjo ningún tipo de incidente o accidente de trabajo.
- Se viene utilizando correctamente el equipo de protección personal durante los trabajos, con la supervisión constante de SSOMA.
- En el presente mes se obtuvo como resultado cero en las pruebas de alcoholemia.
- Se viene ejecutando las inspecciones mensuales de seguridad y salud en el trabajo: botiquín, extintores, camilla, herramientas manuales, vehículos y equipos de protección personal.
- Se han controlado aquellos aspectos ambientales generados en obra a fin de controlar los impactos con al suelo y aire.
- A cada frente de trabajo, se les entregó bolsas plásticas negras para que desechen los residuos generados durante su labor.
- Se ha cumplido con la disposición de los residuos sólidos según el código de colores.

## 11. RECOMENDACIONES

- Cumplir con el cronograma semanal para continuar con la realización de las faenas de limpieza de toda la obra donde participan todo el personal obrero y técnico.
- Continuar con las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo: botiquín, extintores, camilla, herramientas manuales, vehículos y equipos de protección personal.
- Para evitar la contaminación de suelo todos los residuos de construcción deben continuar almacenándose en el centro de acopio o almacenamiento temporal de residuos de donde se trasladaran a un botadero final.
- Recomendamos continuar con la segregación de los residuos sólidos inorgánicos y orgánicos, según el código de colores.

  
 .....  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106606807

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

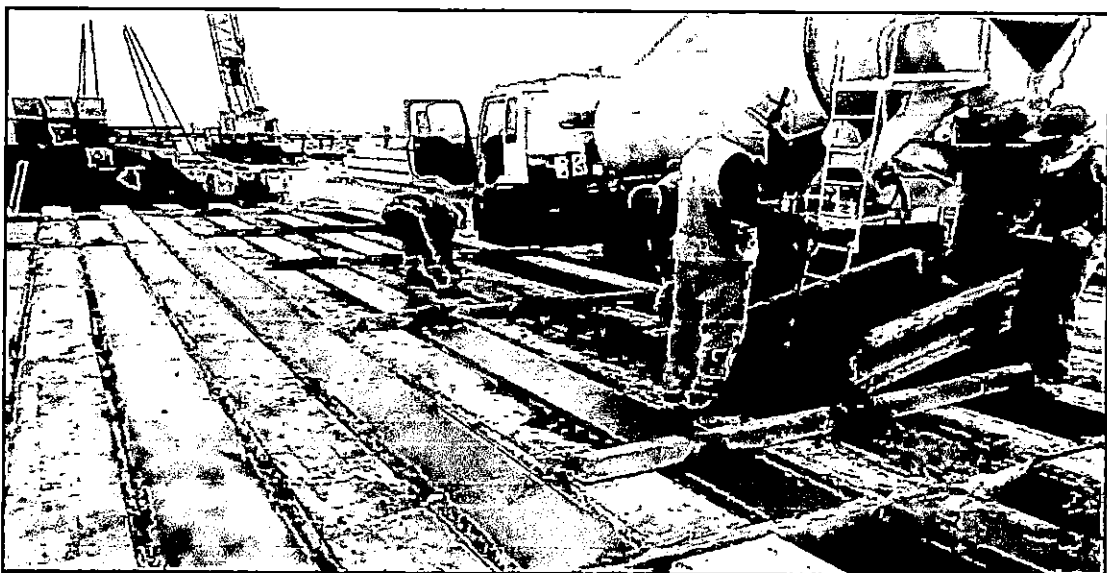
23

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>INFORME MENSUAL N° 50</b>	<b>FEBRERO - 2019</b>
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	<b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Página 16 de 17</b>


## 12. PANEL FOTOGRÁFICO




**Imagen N°01: Charlas diarias antes de iniciar las labores**



**Imagen N°02: Personal realizando trabajos con su respectivo equipo de protección personal**

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595937

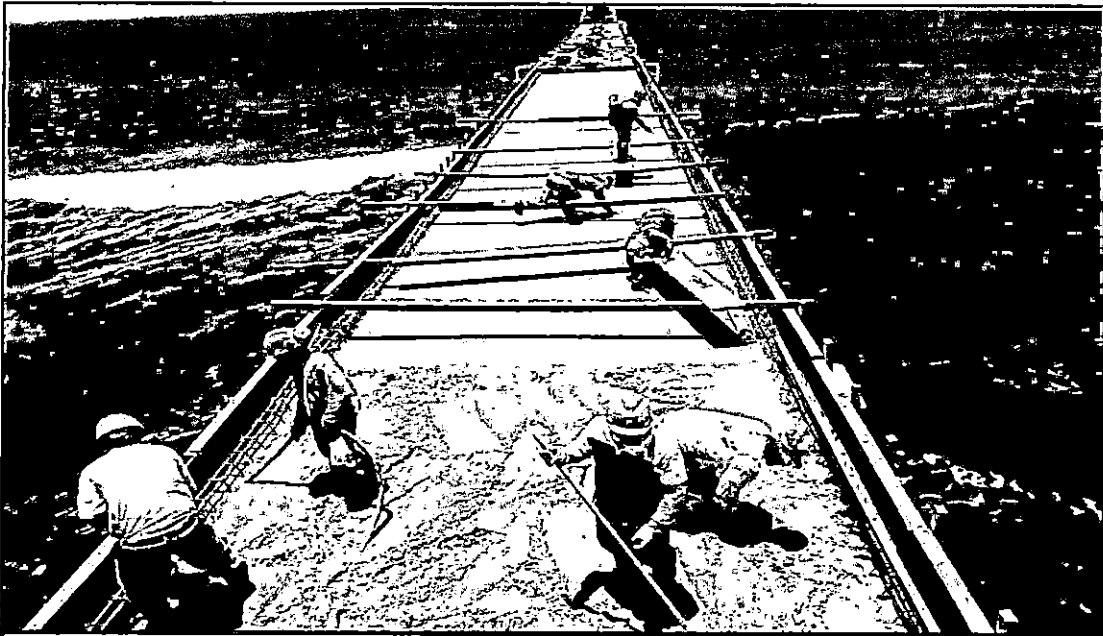
  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

50

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>INFORME MENSUAL N° 50</b>	<b>FEBRERO - 2019</b>
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	<b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Página 17 de 17</b>



**Imagen N°03: Personal realizando trabajos con su respectivo equipo de protección personal**



**Imagen N°04: Personal realizando trabajos con su respectivo equipo de protección personal**

*[Handwritten Signature]*  
**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

*[Handwritten Signature]*  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595307



CONTROL ECONOMICO DE OBRA

### CONTROL ECONOMICO DE OBRA

#### a) Control de Valorizaciones

Al mes de Febrero del 2019, se está tramitando la Valorización N° 50 de los trabajos ejecutados acumulado al 63.33 %, presentando el siguiente detalle:

VALORIZ.	FECHA	VALORIZADO (Sin I.G.V.)
N° 01	Al 31 de Enero 2015	S/. 358,268.22
N° 02	Al 28 de Febrero 2015	S/. 555,717.9
N° 03	Al 31 de Marzo 2015	S/. 593,994.45
N° 04	Al 30 de Abril 2015	S/. 925,177.18
N° 05	Al 31 de Mayo 2015	S/. 753,732.22
N° 06	Al 30 de Junio 2015	S/. 985,329.63
N° 07	Al 31 de Julio 2015	S/. 1,865,453.02
N° 08	Al 31 de Agosto 2015	S/. 1,054,927.09
N° 09	Al 30 de Setiembre 2015	S/. 1,429,170.33
N° 10	Al 31 de Octubre 2015	S/. 1,285,746.48
N° 11	Al 30 de Noviembre 2015	S/. 2,011,031.83
N° 12	Al 31 de Diciembre 2015	S/. 1,389,920.39
N° 13	Al 31 de Enero 2016	S/. 1,517,495.69
N° 14	Al 29 de Febrero 2016	S/. 667,975.68
N° 15	Al 31 de Marzo 2016	S/. 621,544.65
N° 16	Al 30 de Abril 2016	S/. 240,541.06
N° 17	Al 31 de Mayo 2016	S/. 67,518.42

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



PERU

Ministerio  
de la Producción

Fondo Nacional de  
Desarrollo Posquero

CONCURSO PUBLICO N°0001-  
2016-FONDEPES  
CONTRATO N°013-2016-  
FONDEPES

N° 18	Al 30 de Junio 2016	S/. 238,908.88
N° 19	Al 31 de Julio 2016	S/. 87,581.78
N° 20	Al 31 de Agosto 2016	S/. 26,733.49
N° 21	Al 30 de Setiembre 2016	S/. 54,654.58
N° 22	Al 31 de Octubre 2016	S/. 15,754.74
N° 23	Al 30 de Noviembre 2016	S/. 0.00
N° 24	Al 31 de Diciembre 2016	S/. 68,223.57
N° 25	Al 31 de Enero 2017	S/. 106,056.42
N° 26	Al 28 de Febrero 2017	S/. 11,543.86
N° 27	Al 31 de Marzo 2017	S/. 0.00
N° 28	Al 30 de Abril 2017	S/. 0.00
N° 29	Al 31 de Mayo 2017	S/. 0.00
N° 30	Al 30 de Junio 2017	S/. 0.00
N° 31	Al 31 de Julio 2017	S/. 0.00
N° 32	Al 31 de Agosto 2017	S/. 0.00
N° 33	Al 30 de Setiembre 2017	S/. 0.00
N° 34	Al 31 de Octubre 2017	S/. 0.00
N° 35	Al 30 de Noviembre 2017	S/. 0.00
N° 36	Al 31 de Diciembre 2017	S/. 0.00
N° 37	Al 31 de Enero 2018	S/. 0.00
N° 38	Al 28 de Febrero 2018	S/. 0.00
N° 39	Al 31 de Marzo 2018	S/. 3,091.79

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

34

N° 40	Al 30 de Abril 2018	S/. 0.00
N° 41	Al 31 de Mayo 2018	S/. 0.00
N° 43	Al 31 de Julio 2018	S/. 15,893.61
N° 44	Al 31 de Agosto 2018	S/. 16,519.87
N° 45	Al 30 de Setiembre 2018	S/. 23,972.12
N° 46	Al 31 de Octubre 2018	S/. 14,412.14
N° 47	Al 30 de Noviembre 2018	S/. 51,039.97
N° 48	Al 31 de Diciembre 2018	S/. 35,710.99
N° 49	Al 31 de Enero 2018	S/. 164,208.84
N° 50	Al 28 de Febrero 2018	S/. 135,028.26
<b>TOTAL VALORIZADO (SIN IGV)</b>		<b>S/.17,418,792.43</b>

**REAJUSTE DE LA VALORIZACIÓN**

VALORIZACIÓN N° 49	FECHA	K Reaj.	Reajuste
<b>SUB PRESUPUESTO N° 07</b>			
<b>Obras en mar</b>	Febrero del 2019	K = 1.149	S/. 19,626.59
<b>TOTAL REAJUSTE (SIN IGV)</b>			<b>S/. 19,626.59</b>


**IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)**


El I.G.V. afectado a la valorización efectuado por el Contratista a la fecha ha sido el siguiente:

VALORIZACIÓN	Fecha	I.G.V.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

  
 .....  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106695807

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717



PERU

Ministerio  
de la Producción


Fondo Nacional de  
Desarrollo Pesquero


CONCURSO PÚBLICO N°0001-  
2016-FONDEPES  
CONTRATO N°013-2016-  
FONDEPES

		(18%)
N° 01	Enero 2015	S/. 52,340.24
N° 02	Febrero 2015	S/. 84,616.98
N° 03	Marzo 2015	S/. 90,961.82
N° 04	Abril 2015	S/. 140,519.67
N° 05	Mayo 2015	S/. 112,936.03
N° 06	Junio 2015	S/. 149,774.68
N° 07	Julio 2015	S/. 281,792.27
N° 08	Agosto 2015	S/. 151,997.48
N° 09	Setiembre 2015	S/. 222,805.58
N° 10	Octubre 2015	S/. 191,982.90
N° 11	Noviembre 2015	S/. 305,679.20
N° 12	Diciembre 2015	S/. 223,850.66
N° 13	Enero 2016	S/. 239,496.48
N° 14	Febrero 2016	S/. 102,790.73
N° 15	Marzo 2016	S/. 98,684.70
N° 16	Abril 2016	S/. 37,075.22
N° 17	Mayo 2016	S/. 7,077.51
N° 18	Junio 2016	S/. 37,197.40
N° 19	Julio 2016	S/. 13,816.70
N° 20	Agosto 2016	S/. 4,192.57
N° 21	Setiembre 2016	S/. 8,563.49
N° 22	Octubre 2016	S/. 2,473.49
N° 23	Noviembre 2016	S/. 0.00
N° 24	Diciembre 2016	S/. 11,136.46

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



PERU


**Ministerio  
de la Producción**
**Fondo Nacional de  
Desarrollo Pasquero**


 CONCURSO PÚBLICO Nº001-  
2018-FONDEPES  
CONTRATO Nº013-2018-  
FONDEPES

Nº 25	Enero 2017	S/. 1,268.43
Nº 26	Febrero 2017	S/. 1,299.00
Nº 27	Marzo 2017	S/. 0.00
Nº 28	Abril 2017	S/. 0.00
Nº 29	Mayo 2017	S/. 0.00
Nº 30	Junio 2017	S/. 0.00
Nº 31	Julio 2017	S/. 0.00
Nº 32	Agosto 2017	S/. 0.00
Nº 33	Setiembre 2017	S/. 0.00
Nº 34	Octubre 2017	S/. 0.00
Nº 35	Noviembre 2017	S/. 0.00
Nº 36	Diciembre 2017	S/. 0.00
Nº 37	Enero 2018	S/. 0.00
Nº 38	Febrero 2018	S/. 0.00
Nº 39	Marzo 2018	S/. 240.74
Nº 40	Abril 2018	S/. 0.00
Nº 41	Mayo 2018	S/. 0.00
Nº 42	Junio 2018	S/. 4,473.48
Nº 43	Julio 2018	S/. 2,583.79,
Nº 44	Agosto 2018	S/. 2,690.40
Nº 45	Setiembre 2018	S/. 4,208.01
Nº 46	Octubre 2018	S/. 2,393.16
Nº 47	Noviembre 2018	S/. 8,495.28
Nº 48	Diciembre 2018	S/. 5,940.23

 CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

 JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

  
 .....  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595807

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 10717

75


N° 49	Enero 2019	S/. 27,496.40
N° 50	Febrero 2019	S/. 23,550.94
<b>TOTAL I.G.V.</b>		<b>S/. 2,656,706.19</b>


**VALORIZACIÓN TOTAL (INC. REAJUSTES, AMORTIZACIONES E IGV.)**

VALORIZACIÓN	Fecha	Valorizado (Inc. Reaj., Amortiz. e IGV)
N°01	Enero 2015	S/. 343,119.33
N°02	Febrero 2015	S/. 554,711.34
N°03	Marzo 2015	S/. 596,305.26
N°04	Abril 2015	S/. 921,184.50
N°05	Mayo 2015	S/. 740,358.43
N°06	Junio 2015	S/. 981,856.22
N°07	Julio 2015	S/. 1,847,304.88
N°08	Agosto 2015	S/. 996,427.93
N°09	Setiembre 2015	S/. 1,460,614.37
N°10	Octubre 2015	S/. 1,258,554.54
N°11	Noviembre 2015	S/. 2,003,897.00
N°12	Diciembre 2015	S/. 1,467,465.45
N°13	Enero 2016	S/. 1,570,032.48
N°14	Febrero 2016	S/. 673,850.35
N°15	Marzo 2016	S/. 646,933.03
N°16	Abril 2016	S/. 243,048.66

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10105595307

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

N°17	Mayo 2016	S/. 46,397.01
N°18	Junio 2016	S/. 243,849.64
N°19	Julio 2016	S/. 90,576.16
N°20	Agosto 2016	S/. 27,484.65
N°21	Setiembre 2016	S/. 56,138.41
N°22	Octubre 2016	S/. 16,215.11
N°23	Noviembre 2016	S/. 0.00
N°24	Diciembre 2016	S/. 73,005.66
N°25	Enero 2017	S/. 8,315.26
N°26	Febrero 2017	S/. 8,515.65
N°27	Marzo 2017	S/. 0.00
N°28	Abril 2017	S/. 0.00
N°29	Mayo 2017	S/. 0.00
N°30	Junio 2017	S/. 0.00
N°31	Julio 2017	S/. 0.00
N°32	Agosto 2017	S/. 0.00
N°33	Setiembre 2017	S/. 0.00
N°34	Octubre 2017	S/. 0.00
N°35	Noviembre 2017	S/. 0.00
N°36	Diciembre 2017	S/. 0.00
N°37	Enero 2018	S/. 0.00
N°38	Febrero 2018	S/. 0.00
N°39	Marzo 2018	S/. 1,578.16
N° 40	Abril 2018	S/. 0.00
N° 41	Mayo 2018	S/. 0.00

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717





PERU


Ministerio  
de la Producción

Fondo Nacional de  
Desarrollo Pasajero


CONCURSO PUBLICO Nº0001-  
2016-FONDEPES  
CONTRATO Nº013-2016-  
FONDEPES

Nº 42	Junio 2018	S/. 29,326.14
Nº 43	Julio 2018	S/. 16,938.20
Nº 44	Agosto 2018	S/. 17,637.06
Nº 45	Setiembre 2018	S/. 27,585.87
Nº 46	Octubre 2018	S/. 15,688.49
Nº 47	Noviembre 2018	S/. 55,691.27
Nº 48	Diciembre 2018	S/. 38,941.53
Nº 49	Enero 2019	S/. 180,254.16
Nº 50	Febrero 2019	S/. 154,389.51
<b>TOTAL</b>		<b>S/. 17,416,185.05</b>

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 10717

a) Control de Adicionales de Obra y/o Deductivo

DESCRIPCIÓN	MONTO	PORCENTAJE DE INCIDENCIA	INCIDENCIA ACUMULADA
Monto contratado	32,457,630.22		
Adicional N° 01	326,464.23	1.01%	1.01%
Adicional N° 02	449,232.12	1.38%	
Deductivo Vinculado N° 01	-450,814.30	-1.39%	1.00%
Adicional N° 03	86,170.63	0.27%	1.27%
Adicional N° 04	579,080.87	1.78%	
Deductivo Vinculado N° 02	-446.29	0.00%	3.05%
Adicional N° 05	446,667.85	1.38%	
Deductivo Vinculado N° 03	-152,971.09	-0.47%	3.95%
Adicional N° 06	1,377,727.34	4.24%	
Deductivo Vinculado N° 4	-242,094.96	-0.75%	7.45%
Adicional N° 07	1,532,420.43	4.72%	12.17%
Deductivo Vinculado N° 5	-620,840.66	-1.91%	10.26%
Adicional N° 08	960,977.20	2.96%	13.22%
Deductivo Vinculado N°06	-479,845.97	-1.48%	11.74%
Adicional N°11	507,464.86	1.56%	13.30%
Adicional N° 12 y Deductivo Vinculante N°09	-364,377.35	-1.12%	12.18%
Adicional N°10 y Deductivo Vinculante N°08	242,637.79	0.75	12.93%

b) Control de Vigencia de Cartas Fianzas

Se anexan las respectivas cartas fianzas vigentes

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



CARTA FIANZA N° 7101618181876-005

MAPFRE PERÚ

Fecha de inicio de Vigencia: 14 de enero del 2019  
Fecha de fin de Vigencia: 14 de julio del 2019

Tipo de contrato: CONSULTORIA  
Tipo de garantía: FIEL CUMPLIMIENTO  
MIRAFLORES, 02 DE ENERO DEL 2019

Señores

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Presente.-

De nuestra consideración

A solicitud de . . MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO ; con domicilio en JIRON CHAVIN DE HUANTAR NRO 348 URB ZARATE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA, con RUC Nro. 10106595807 otorgamos fianza irrevocable, solidaria, incondicionada, de realización automática y sin beneficio de excusión, a favor de ustedes hasta por la suma de S/ 45,706.04 ( CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS 04/100 SOLES ) para garantizar el cumplimiento, con arreglo al contrato DERIVADO DEL CONCURSO PUBLICO N°0001-2016-FONDEPES CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL SALDO DE SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE", CODIGO SNIP N°65958

Costo de la fianza:

Costo por periodo de emisión:	S/	525.00
Derecho de emisión:	S/	26.25
I.G.V.:	S/	99.23
Costo Total:	S/	650.48

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder en ningún caso y por ningún concepto la cantidad arriba indicada siendo su plazo de vigencia desde la fecha de inicio de vigencia arriba indicada y expirará automáticamente el 14 de julio del 2019, a las 12.00 horas del medio día, quedando nuestra compañía con posterioridad al vencimiento del término legal previsto por el Artículo 1898° del Código Civil liberado de toda responsabilidad, inclusive por actos y omisiones del fiado anteriores al a fecha de expiración de la Fianza.

Esta fianza podrá ser renovada por quien tenga legítimo interés.

Es expresamente entendido por nosotros, que esta fianza será ejecutada por ustedes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1898° del Código Civil, concordante con la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento vigente. La ejecución para ser considerada válida deberá comunicarse notarialmente a la Unidad de Caucciones y Fianzas ubicada en nuestra oficina principal sito en Av. 28 de Julio No. 873, Distrito de Miraflores, Provincia de Lima y Departamento de Lima.

Esta fianza se emite a solicitud del afianzado, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 318 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros - Ley Nro. 26702 y bajo las condiciones pactadas con esta empresa aseguradora.

Atentamente,

MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

JOSE ANTONIO GONZALEZ PONCE  
Director  
Unidad de Caucciones

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS  
Y REASEGUROS

PABLO JACKSON ALVARADO  
DIRECTOR TÉCNICO

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

000268

LIMA, 29 de Noviembre del 2018

Carta Fianza No: 010469195-006 REF: Carta Fianza No: 010469195-005 del 19/12/2014  
RENOVACION / MODIFICACION Con vencimiento: 15/12/2018

Señores: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES.

Por el presente documento, renovamos la fianza de la referencia con carácter de solidaria, irrevocable, incondicional, indivisible, de realización automática y con renuncia expresa al beneficio de excusión, a favor de ustedes.

Garantizando a: CONCORDIO SAN JOSE INTEGRADO POR CIVIS OJOJA-SUCURSAL PERU, CHAVIN DE NUANTAR E.I.R.L. Y CORPORACION ARIS S.A.C., CORPORACION R & E S.A.C.

Hasta la suma de: S/ 1.298.305,21 UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO Y 21/100 SOLES

En respaldo de: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA No 038-2014-FONDEPES-DETERMINACION DE LA LICITACION PUBLICA No 004-2014-FONDEPES-PRIMERA CONVOCATORIA-CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE.

Sírvase a tomar nota de que; a solicitud de nuestros garantizados, hemos procedido a:

Prorrogar el plazo de vencimiento hasta el 15 de Diciembre de 2019

Por efecto de este compromiso, el BANCO asume con sus fiados las responsabilidades en que éstos llegaran a incurrir, siempre que el monto de las mismas no exceda por ningún motivo la suma antes mencionada y que estén estrictamente vinculadas al cumplimiento de lo arriba indicado.


Dejamos claramente establecido que la presente CARTA FIANZA no podrá ser usada para operaciones comprendidas en la prohibición indicada en el inciso 5 del Artículo 217º de la ley 26702 "Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros"

Cualquier reclamo en virtud de esta garantía deberá ceñirse a lo estipulado por el Art. 1898 del Código Civil y deberá ser formulado por vía notarial, en el horario de atención al público y en nuestra oficina ubicada en:

JR. CAJAMAYTA 543-547 PISO 6 - LIMA \*\*\*\*\*


Dejamos claramente expuesto que, si fuera el caso, el Banco podrá a su elección acogerse a la facultad concedida por el Art. 1237 del Código Civil.

En caso de ejecutarse la presente CARTA FIANZA, el pago será efectuado mediante cheque de gerencia emitido a la orden del beneficiario que el Banco pondrá a su disposición en domicilio antes indicado, el mismo que se le entregará contra devolución del original de la presente CARTA FIANZA. Queda establecido que de no señalarse el monto ejecutado, se entenderá que el requerimiento es por la suma total a la que asciende la presente garantía. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe, se entenderá como renuncia a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago aún cuando el plazo de vencimiento y/o ejecución de esta fianza no hubiese vencido.

  
ROBERTO VALDIZAN GARCIA  
Asistente Senior  
Procesamiento

FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO  
D. SCOTIABANK PERU

Atentamente,

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
JEFE  
DEL SERVICIO DEL FUNCIONARIO  
D. SCOTIABANK PERU

\* Para información sobre la emisión de esta CARTA FIANZA, puede visitar nuestra página web [www.scotiabank.com.pe](http://www.scotiabank.com.pe) o consultar a través de Banca telefónica 311-8000 (Lima) y 0-801-1-6000 (Provincias)

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595897

00173316 009 5574 7046520773

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO.DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE.-

SANTIAGO DE SURCO, 23-07-2018  
CARTA FIANZA N°: 0011-0380-9800211322-37  
VENCE EL: 07-08-2019

Señor/es:

★ FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración :

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0380-9800211322-37 por : S/57,863.50 (CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 50/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC

Vencimiento : 07-08-2018, a horas de 12 meridiano


Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 25-07-2016, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2019, a horas 12 meridiano.


Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo : el vencimiento de la misma.


La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
p.p.

★  
  
Katharina Alexandra Gotera Postigo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

  
Daniel Mesa Pinillos  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

RUC 20100130204

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL - Junio 2007  
Reg. CIP N° 10717

REFRENDADO: 1759818072311CLA0380F/19:01:19  
S/ 57,863.50



18072311

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

S/57,863.50

BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO.DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE.-

SANTIAGO DE SURCO, 23-07-2018.  
CARTA FIANZA N°: 0011-0380-9800207198-37  
VENCÉ EL: 07-08-2019

Señor/es:

★ FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración :

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0380-9800207198-37 por : S/8,618.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC.

Vencimiento : 07-08-2018, a horas de 12 meridiano

S/8,618.00  
\*\*\*\*\*

Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 10-12-2016, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2019, a horas 12 meridiano.

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo : el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
p.p.

Katherine Alexandra Cotera Postigo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

Daniel Mesia Picoaga  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595987

RUC 20100130204



18072312

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

REFRENDO: 17596180712CEAO38005719:33:24  
S/ 8,618.00 INGENIERO CIVIL

Rep. CIP N° 10717

UNO - V3 - Junio 2007

BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO.DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE.-

SANTIAGO DE SURCO, 23-07-2018  
CARTA FIANZA N°: 0011-0962-9800023996-86  
VENGE EL: 07-08-2019

Señor/es:

★ FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración :

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0962-9800023996-86 por S/32,647.00 (TREINTA DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC.

Vencimiento : 07-08-2018, a horas de 12 meridiano

Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 09-09-2016, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2019, a horas 12 meridiano.

Queda entendiéndose que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
p.p.

★  
Katherine Alexandra Cotera Postigo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

Daniel Merla Pinillos  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106535507

RUC 20100130204



18072401

REFRENDO: 1759818072401  
S/ 32,647.00  
Reg. CIP N° 10717

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL

S/ 32,647.00\*\*\*\*\*

BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO.DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE.-

SANTIAGO DE SURCO, 23-07-2018  
CARTA FIANZA N°: 0011-0962-9800017155-87  
VENCE EL: 07-08-2019

Señor/es:

★ FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración :

REF. : Carta Fianza Nro.0011-0962-9800017155-87 por : S/1,947,458.00 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC.

Vencimiento : 07-08-2018, a horas de 12 meridiano

S/1,947,458.00\*\*\*\*\*


Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 15-12-2014, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a : PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2019, a horas 12 meridiano.


Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo : el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.


Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
p.p.

  
Katherine Alexandra Cotera Postigo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807  
RUC 20100130204

  
Daniel Mesia Finillos  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717 19 de mayo 2007



18072310

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

REFRENDO: 1759818072310CLA0962E/18:56:53  
S/ 1,947.458.00



CAMBIOS Y /O MODIFICACIONES AL  
PROYECTGO ORIGINAL

68

**a) SUSTENTO TECNICO Y BASE LEGAL**

*Los informes presentados por esta supervisión están sujetos a la LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO.*

*Artículo 159.- Inspector o Supervisor de Obras Durante la ejecución de la obra, debe contarse, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona.*

*Artículo 166.- Valorizaciones y Metrados Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista, a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así obtenido se multiplica por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados, mientras que en el caso de las obras bajo el sistema de suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra. Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. El inspector o supervisor debe revisar los metrados durante el período de aprobación de la valorización. El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este párrafo, las Bases deben establecer el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.*

*Artículo 170.- Procedimiento de ampliación de plazo Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno*

**CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

**JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

*dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista*

*Artículo 176.- Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento (15%) Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad, requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República. La determinación del referido porcentaje incluye los montos acumulados de los mayores metrados que no provengan de una variación del expediente técnico, en contratos a precios unitarios. En el caso de adicionales con carácter de emergencia la autorización de la Contraloría General de la República se emite previa al pago. La Contraloría General de la República cuenta con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo Responsabilidad, para emitir su pronunciamiento, el cual debe ser motivado en todos los casos. El referido plazo se computa a partir del día siguiente que la Entidad presenta la documentación sustentadora correspondiente*

**PRONUNCIAMIENTOS OSCE-RESPECTO A ADICIONALES DE OBRA Y AMPLIACIONES DE PLAZO**

**OPINIÓN N° 073-2014/DTN**

*Así, una Entidad puede ordenar al contratista la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando estas no se encuentran previstas en el expediente técnico ni en el contrato original y siempre que su ejecución resulte indispensable y/o necesaria para alcanzar la finalidad del contrato; debiendo, para ello, respetar los límites y condiciones antes señalados, y los procedimientos establecidos en los artículos 207 y 208 del Reglamento, según corresponda.*

*En este punto, es importante precisar que la potestad de ordenar la ejecución de prestaciones adicionales de obra ha sido conferida a la Entidad en reconocimiento de su calidad de garante del interés público, respondiendo, así, al ejercicio de una prerrogativa especial del Estado.*

*Adicionalmente, es importante considerar que las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándoles los presupuestos deductivos vinculados, superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad, requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República, la misma que debe emitir su pronunciamiento a través del procedimiento establecido en el tercer párrafo y siguientes del artículo 208 del Reglamento.*

**CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA**

**JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**

*[Signature]*  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 199896955807

*[Signature]*  
**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717


20

OPINIÓN N° 001-2015/DTN


*En este punto, es importante precisar que, en caso la Entidad apruebe la ampliación del plazo de ejecución de obra, el contratista está obligado a presentar un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERTCPM correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas por la ampliación de plazo concedida, de conformidad con el sexto párrafo del artículo 201 del Reglamento. Sobre el particular, es importante precisar que este nuevo calendario tiene por finalidad adecuar el programa de ejecución de obra del contratista a la extensión del plazo de ejecución de obra originado por la aprobación de la ampliación del plazo.*

*De esta manera, además de detallar el procedimiento de ampliación del plazo, el artículo 201 del Reglamento establece que en caso la Entidad apruebe la ampliación del plazo, el contratista debe presentar un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT CPM correspondiente, considerando, para ello, solo las partidas afectadas por la ampliación del plazo concedida, con la finalidad de adecuar el programa de ejecución de obra al nuevo plazo para la ejecución de la obra.*

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595907

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA


  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

18


**b) PLANOS Y MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL**

- Debido a las incongruencias del expediente técnico elaborado y aprobado por FONDEPES, hubo el desplazamiento de la infraestructura con respecto al terreno.
- En tal sentido, el error de coordenadas de ubicación que genera la alteración nace en la elaboración del Perfil del Proyecto y por ende se arrastra en la elaboración del Expediente Técnico.
- Los planos se vienen modificando de acuerdo a los adicionales de obra, así como deductivos vinculantes o reducciones, los planos totales se presentaran en la liquidación de obra, anexado junto con el contratista.
- No obstante, es bueno indicar que todo Expediente Técnico que licita FONDEPES tiene una revisión por el área responsable de la Entidad en mención para efectos de su aprobación y sin duda que durante el proceso constructivo de obra se ha permitido verificar ausencia de algunas partidas que no se consideraron o surgieron a raíz de las absoluciones de consultas.
- Los adicionales aprobados hasta la fecha son ADICIONAL N° 01, ADICIONAL N° 02, ADICIONAL N° 03, ADICIONAL N° 04, ADICIONAL N° 05, ADICIONAL N° 06, ADICIONAL N°07, ADICIONAL N°08, ADICIONAL N°11 Y 12, ADICIONAL N°10
- Los adicionales, reducciones y deductivos de obra que han sido aprobados han conllevado a la modificación de la ruta crítica, conllevando a las ampliaciones de plazo respectivamente.
- Los planos se vienen modificando de acuerdo a los adicionales de obra, así como deductivos vinculantes o reducciones, los planos totales se presentaran en la liquidación de obra.

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO  
MENDOZA PICOAGA

  
.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE  
ALVA ESPINOZA

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

# RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

23

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Por lo anteriormente expuesto, y considerándose que la Valorización es un pago a cuenta y encontrándose **CONFORME** el monto a Facturar por el Contratista CONSORCIO SAN JOSE.

El monto a Facturar por el Contratista es:

Valorización Bruta de la Valorización N°50 del Contractual – FEBRERO 2019	S/. 135,028.26
Total Reajuste	S/. 19,626.59
Amortización por Adelanto Directo	S/. 154,654.85
Deducción de Reajuste por Adelanto Directo	S/. 3,032.58
Total Amortizaciones	S/. 23,816.28
Valorización Neta Sin IGV	S/. 130,838.57
IGV (18%)	S/. 23,550.94
Monto Facturable	S/. 154,389.51

CONSULTOR: ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA

.....  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

JEFE DE SUPERVISION: ING. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

PANEL FOTOGRAFICO



PANEL FOTOGRAFICO



SUPERVISOR EN LOSA DEL MUELLE EJE- 163-164



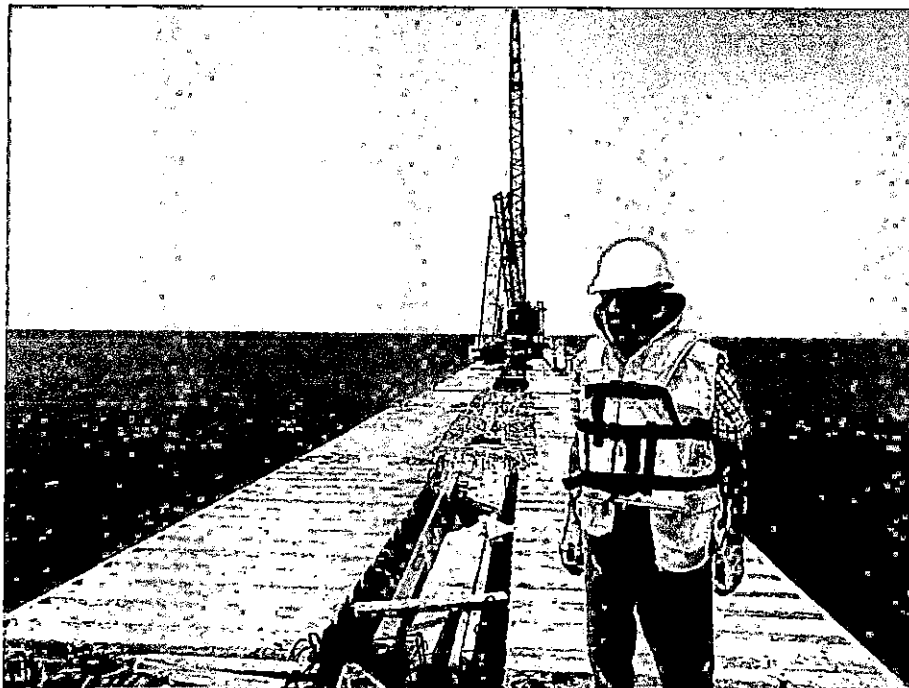
SUPERVISOR Y NUEVO RESIDENTE VERIFICANDO  
TRABAJOS EN SARDINEL DEL MUELLE

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



SUPERVISOR VERIFICANDO TRABAJOS



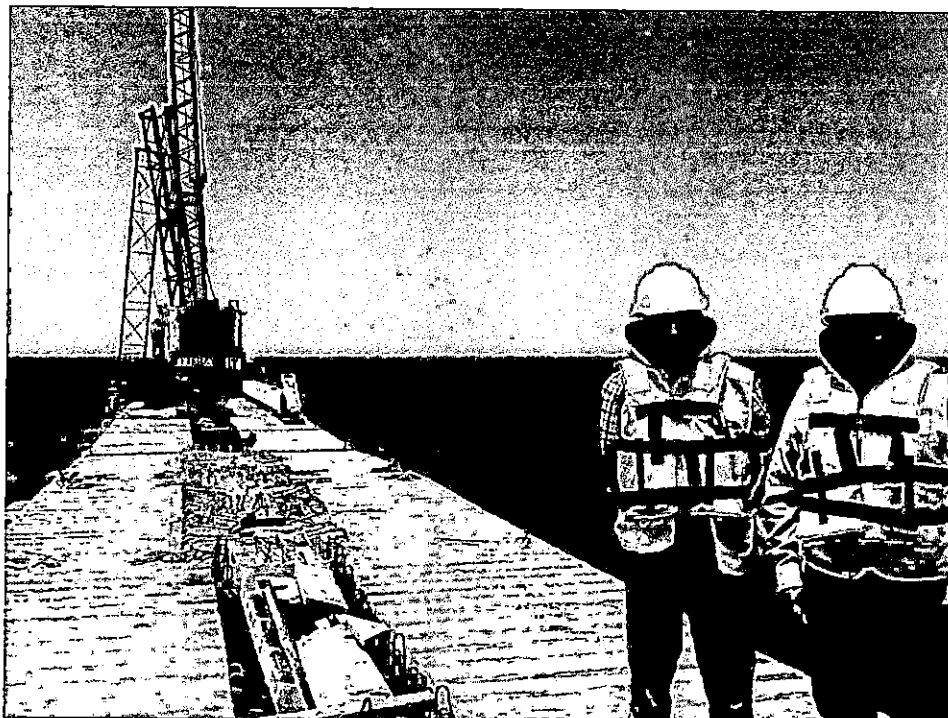
SUPERVISOR EN EJE 171, LA GRUA Y MARTILLO EN EJE 177

  
MENDOGA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



OTRA VISTA DEL EJE 171 AL 176



SUPERVISOR Y RESIDENTE (ING. FUENTES) EN INSPECCION DE TRABAJOS

*[Signature]*  
 .....  
 MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
 RUC: 10106595807

*[Signature]*  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717



SUPERVISOR Y RESIDENTE EN EJE 174 – 175, SE OBSERVA DESCABEZADO DE PILOTES DE REFORZAMIENTO



SUPERVISOR, RESIDENTE Y PERSONAL ENCARGADO DEL ADICIONAL 10, EN TRABAJOS DE REPLANTEO

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



REPLANTEO DE CABLES DEL ADICIONAL N° 10 A PARTIR DE LA SUBESTACION



COLOCACION DE HITOS DE REFERENCIA DE LOS PUNTOS INDICADOS EN PLANOS

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595897

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717




CONTINUACION DE TRABAJOS DE REPLANTEO DE TRAZO DE CABLES



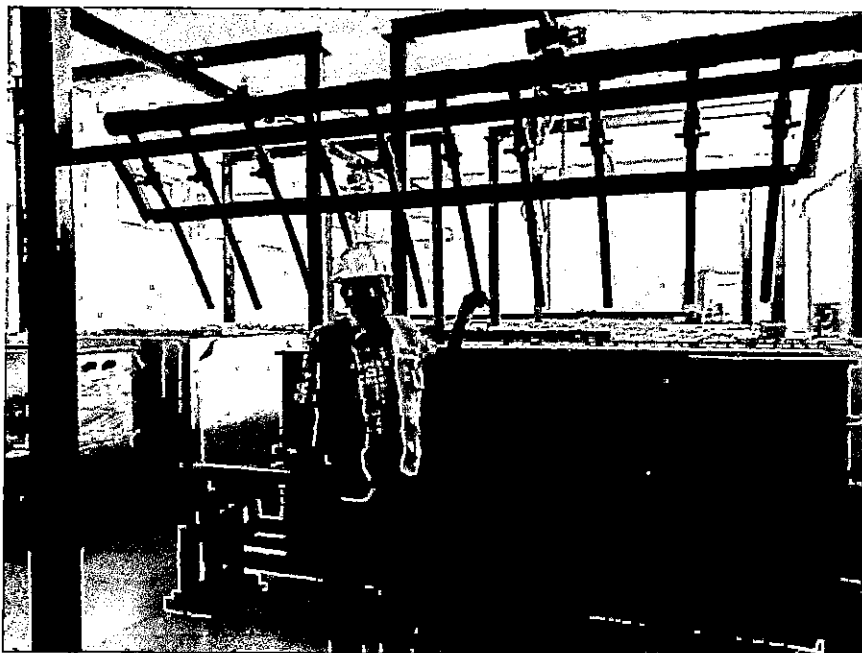
OTRA VISTA DEL REPLANTEO DE CABLES AEROS Y SUBTERRANEOS  
CORRESPONDIENTES AL ADICIONAL N°.10

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 19106595907

  
ISAIAS JORGÉ ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 10717



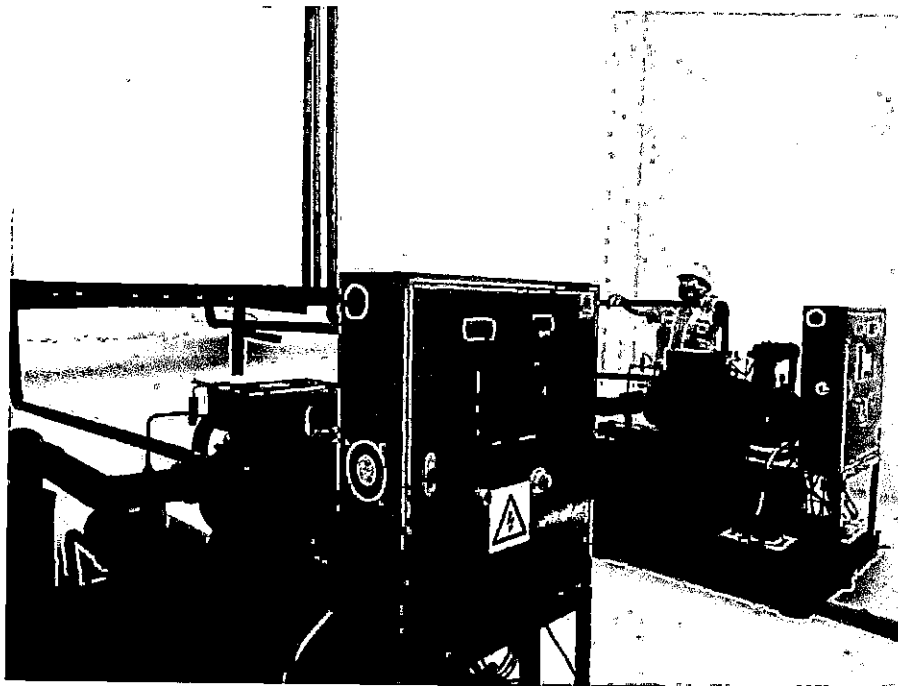
VISTA DEL INTERIOR DONDE SE INSTALA LOS PRODUCTORES DE HIELO, FALTA CONCLUIR LOS TRABAJOS



OTRA VISTA DE LOS PRODUCTORES DE HIELO DE 10 T.

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595907


  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



GENERADORES DE CORRIENTE CON SALIDA AL EXTERIOR QUE FALTA SER APROBADO OFICIALMENTE POR LA ENTIDAD

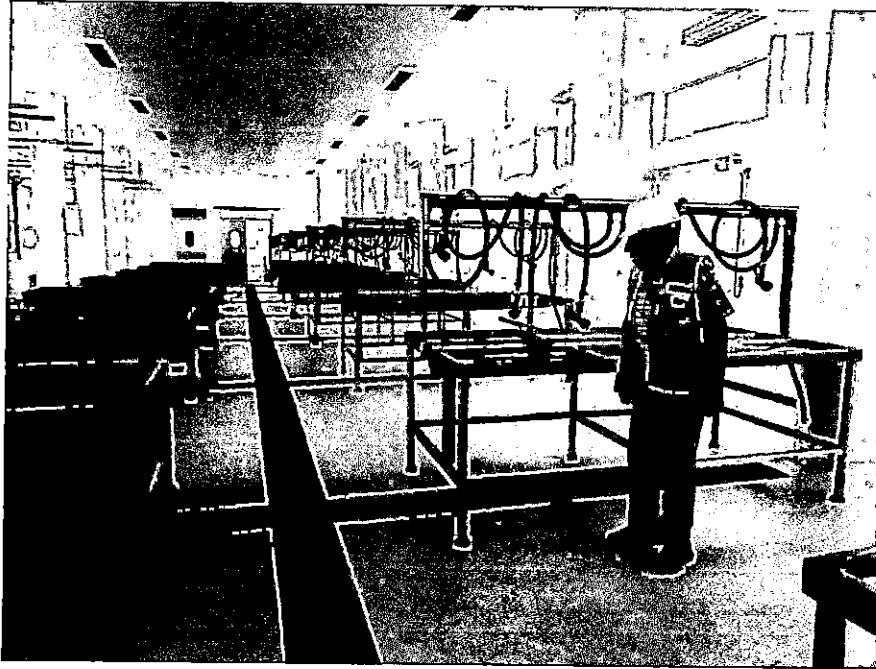


VISTA DEL "AREA DE TAREAS PREVIAS" EN DONDE SE EFECTUARÁ LAS TAREAS DE LIMPIEZA DE LA PRODUCCION DE LA PESCA

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595307

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717






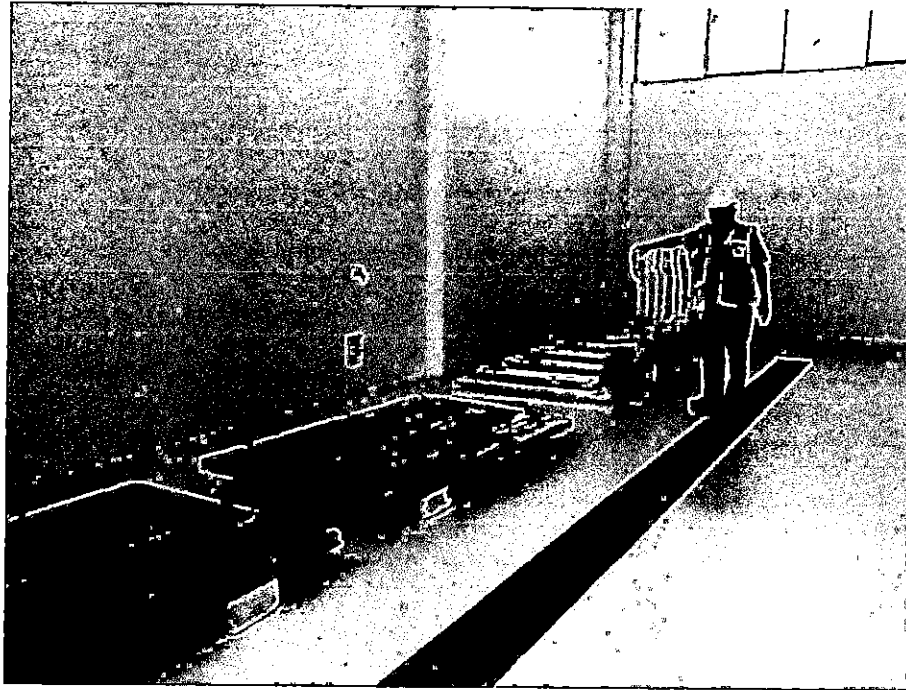
OTRA VISTA DE LA MISMA "AREA DE TAREAS PREVIAS"



VISTA DE LAS CAMARAS FRIGORIFICAS Y DE CONSERVACION DE HIELO

  
MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595887

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



VISTA DEL AMBIENTE DE "DEPOSITO DE CARRETAS"



VISTA DEL CORREDOR ENTRE LAS CAMARAS FRIGORIFICAS  
Y LOS PRODUCTORES DE HIELO

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO  
RUC: 10106595807

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

8

COPIA DEL CUADERNO DE OBRA

CITADIANO DE OBRAS

FECHA: \_\_\_\_\_ LOCALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_


PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_


Mm Asepto N° 2048 31-01-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA

07.03	Malla de epigón		
07.03.04	Muelles blindados en malla		
07.03.04.04	Concreto en muelles f'c = 280 kg/cm <sup>2</sup> + aditivo	m <sup>3</sup>	113.89
07.03.05	Juntas longitudinales y transversales		
07.03.05.04	Concreto en vigas rondel f'c = 280 kg/cm <sup>2</sup> + aditivo	m <sup>3</sup>	27.72
07.03.05.05	Acera de refuerzo f'c = 4200 kg/cm <sup>2</sup> - correa piloto	m <sup>3</sup>	936.21
07.03.07	Lons vuados en malla		
07.03.07.04	Concreto en forma f'c = 280 kg/cm <sup>2</sup> + aditivo	m <sup>3</sup>	120.80
07.07.07	Marcado de colocación e hincado de pilotes puz y lons		
07.07.07.11	Pinta para pilotes, solo cone	md	28.00

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

Asepto N° 2049 Del Supervisor 3/02/2019


Se recepcionan los metrados de avance de la obra principal, así como los valores de los 01 de las Adiciones 11 y 12.  
 Se procederá a la formulación de los valores pendientes a fin de tramitar las en los plazos y formalidades establecidos en la ley y su reglamento.

  
 ING SUPERVISOR

Asepto N° 2050 01-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado e hincado de 02 pilotes inclinados de 45 x 45 m en el mismo eje 166-167 lado andrú, trabajos que corresponden al adicional n° 07.

ING. INSPECTOR

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

ING SUPERVISOR

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2051 Del Supervisor 01/02/2019

Se autoriza al Contratista realizar los trabajos solicitados en el asiento anterior, correspondientes al adicional 07.

En forma simultanea debe ejecutarse los trabajos de hincado de los pilotes de reforzamiento.

Se viene adoptando las medidas de seguridad en el transporte de equipos y materiales para el hincado.

*Carlos Enrique Quiroz Cisneros*

Asiento N° 2052 02-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el fortalecimiento e hincado de 02 pilotes inclinados de 45x45 m en el núcleo eje 166-167 lado izquierdo trabajos que corresponden al adicional N°07, de igual manera dar inicio al empinado para el núcleo eje 168-169 trabajos del adicional N°11.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

Asiento N° 2053 Del Supervisor 02/02/2019

Se autoriza ejecutar los trabajos solicitados por el Contratista en el asiento anterior.

Se ven pocos trabajos que se viene realizando por el exceso de del núcleo entre ejes 168-169, para proceder al variado.

Este trabajo corresponde al adicional N° 11

*Carlos Enrique Quiroz Cisneros*

Asiento N° 2054 03-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el empinado, colocación de arena y variado de concreto  $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$  para los núcleos 166-167 y 168-169 que corresponden al adicional N°11 y 12.

ING. INSPECTOR


*Carlos Enrique Quiroz Cisneros*  
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

ING. SUPERVISOR

FECHA: \_\_\_\_\_ MODAL D-3 \_\_\_\_\_  
 OBRA: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Acuerdo N° 2055 del Supervisor 03/02/2019

Se autoriza al contratista la ejecución de los trabajos de instalación de un fierro el encofrado y acero de refuerzo en los núcleos entre ejes 166-167 y 168-169, como pendientes al adicional N° 11.



Acuerdo N° 2056 04-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA


Se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado e hinchado de 02 pilotes inclinados de 45x45 m el núcleo eje 163 y 164 lado derecho, trabajos que corresponde al adicional N° 07.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

Acuerdo N° 2057 del Supervisor 04/02/2019

Se autoriza al contratista transportar de dos (2) pilotes de concreto prefabricados que serán instalados en forma inclinados en el núcleo entre ejes 163-164, lado derecho, como pendientes al adicional 07.

El concreto a utilizarse será premezclado.



Acuerdo N° 2058 05-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado e hinchado de 02 pilotes inclinados de 45x45 m el núcleo eje 163 y 164 lado izquierdo, trabajos que corresponde al adicional N° 07.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

ING. INSPECTOR


ING. SUPERVISOR

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
 OBRA: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Año 2019 N° 2059 del Supervisor 05/02/2019

Se autoriza al contratista realizar el forapunto de dos (2) pilotes que serán hincados en forma inclinada entre ejes 163-164, lado izquierdo.

Dichos trabajos pertenecen al Adicional 07.



Año 2019 N° 2060 06-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se comunico al supervisor de obra que el día de hoy se recibió la carta N° 013-SUPER-5305E-2019 por parte de su representada desde sus adjuntos la carta N° 151-2019-FONDEPES/DIGENIPAA donde la entidad abreva nuestras consultas solicitadas mediante oficio de obra en el oficio N° 2012 del residente, comunicando lo siguiente:

Para los pilotes entre los ejes 136 al 168 se forarón como mínimo un volar de empalmamiento efectivo de 3.20m el cual permaneció constante.

En el monitoreo mediante los protocolos de periodo, a partir del eje 166 se muestra empalmamientos de 2.80m manteniéndose la tendencia hasta el final del puente de obra, curado a ello el efecto de la exhibición por el incremento de la altura libre de los pilotes conforme se avanza por adelante.

En su virtud, a partir del eje 168 se recomienda reforzar el punto de curso empleando pilotes inclinados de refuerzo necesario desde la junta de los pocos libros, similares al empleo de entre el eje 108 al 135.

En relación con lo anteriormente expuesto se considera proceja con el trámite correspondiente en concordancia con el artículo 207 del EICE y se formalice el procedimiento para las prestaciones respectivas.

Ante las aclaraciones de nuestra consulta por parte de la entidad y en cumplimiento al artículo N° 207, comunicamos al supervisor de obra la necesidad de tramitar la ejecución de una nueva prestación adicional correspondiente al reforzamiento de pilotes ubicado del eje 168 al 207, agregando que su representada no será la responsable en la elaboración

ING. INSPECTOR

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. QIP N° 22858

ING. SUPERVISOR

CONTINUA

# CUADERNO DE OBRA

90

41

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Viene Asiento n° 2060 06-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se dicho expediente por considerar la naturaleza y complejidad que tiene dicho expediente. Por lo tanto los trabajos a partir del eje 169 en adelante se ejecutarán por etapas para que la entidad no alcance los detalles de cómo se continuará los trabajos sobre el puente sobre el eje 201.

Asiento n° 2061 06-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

Comunicó al supervisor de obra que se recibió la carta n° 135-2019-FONDEPES/DIGENIPAA donde la entidad aprueba el cambio del ingeniero residente de obra, estableciendo que el propietario propuso al Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quinones con CIP N° 66335 en pliego con el monto máximo del artículo 185 del reglamento aprobado por decreto supremo n° 184-2018-EF y sus modificaciones realizadas por ley n° 29873 y decreto ley n° 138-2012-EF quien cumplirá sus funciones a partir del 07/02/2019.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

Asiento N° 2062 Del Supervisor

Asimismo comunicó la Entidad al propietario por todos los cambios similares al aprobado entre ejes 104-135, a partir del eje 169 será necesario que en tiempo oportuno la Entidad autorice formalmente dicha modificación.

El Ing. Oswaldo Fuentes Quinones reemplazará al Residente actual Ing. Quiroz a partir de mañana

Carlos Quiroz

Asiento N° 2063 07-02-2019 Del Residente de Obra

El suscrito Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quinones con CIP N° 66335 asumirá a partir de esta fecha la responsabilidad como residente de obra en la ejecución de la obra denominada "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE".

JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR



# CUADERNO DE OBRA

91

42

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2064 Del Supervisor 07/02/2019

En base a la comunicación de la Entidad, respecto al cambio de Residente, el Ing° Fuentes asumirá el cargo a partir de la fecha. De alguna forma, ambos profesionales deben coordinar acciones teniendo en cuenta que la obra se encuentra al 70% de avance aproximadamente.

*[Signature]*

Asiento N° 2065 08-02-2019 Del Residente de Obra

Se solicita al Supervisor de obra la autorización para la colocación de acero y encofrado de juntas longitudinales del eje 137-142 que corresponden a trabajos contractuales.

También se comunica que se recibió por parte de la entidad la aprobación en parte de nuestra solicitud de ampliación de plazo N° 28 con resolución N° 026-2019-FONDEPES/EG donde el nuevo plazo contractual es el día 21 de mayo del 2019.

*[Signature]*  
JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 66335

Asiento N° 2066 Del Supervisor 08/02/2019

Se autoriza al contratista efectuar los trabajos de encofrado y colocación de acero de las juntas longitudinales entre ejes 137-142 correspondiente a los trabajos contractuales de aprobación de plazo N° 28, siendo la nueva fecha de vencimiento el 21/05/2019 (102 días).

*[Signature]*

Asiento N° 2067 09-02-2019 Del Residente de obra

Se solicita al Supervisor de obra la autorización para el vaciado de concreto  $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$  + acelerante para las juntas longitudinales eje 137-142 que corresponden al adicional N° 12.

*[Signature]*  
JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 66335

*[Signature]*  
JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 66335

ING. INSPECTOR

ING. SUPERVISOR

Continúa

# CUADRÓN DE OBRAS

FECHA: MODALIDAD:

OBRA:

PROYECTO:

PROGRAMA:

ENTIDAD EJECUTORA:

Viene Asiento N° 2067

09-02-2019

Del Residente de obra

Tambien comunicamos que se recibió la carta N° 014-SUPER-SJ05E-2019

por parte de su representada donde nos señalan que se ha aprobado el ca

lendario de avance de obra por la ampuación de plazo N° 27.

Tambien reiteramos que a la fecha no se está ejecutando los trabajos de hncado

de pilotes desde el eje 169 ya que a la fecha está en consulta castento 2016

del residente) sobre los resultados que se tiene en la penetración actual de

los pilotes y que acuerdes se tendría que tomar, quere decir si continuamos

con el modelamiento señalado en los planos EM03' y EM04' alcanzado en el

expediente adicional N° 11 donde se observa que ya no hay pilotes de reforzami

to como se vino realizando hasta el eje 135 por falta de empotramiento.

La entidad debere de alanzar los detalles que absuetno nuestra consulta y

que su respuesta o absolucion sea al mas minimo plazo ya que la demora

podria generar atrasos no atribuibles al contratista sabiendo ademas que esto

genera la necesidad de una nueva prestación adicional.

Asiento N° 2068

Del Residente

09/02/2019

Por relación a la nueva modificación con respecto a la adición de nuevos pilotes en las unidades a partir del eje 169 hasta el eje 135, para verificar que la Entidad cuente el plano actualizado para el caso de trabajos adicionales form por donde a fin de que su ejecución pueda realizarse con un procedimiento la prestación adicional.

Muchas gracias en lo posible el Gerente de obra debe continuar con los trabajos autorizados en la adición 11 y 12, así como del contrato principal y adición N° 07

ING. INSPECTOR

JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 66335

ING. SUPERVISOR

*[Handwritten signature]*

# CUADERNO DE OBRA

93  
N° 44

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_


PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2069 11-02-2019 Del Residente de obra

Se solicita autorización al supervisor de obra para iniciar con los trabajos de colocación de acero sobre la losa in situ desde el eje 136 al 143, correspondiente a los trabajos contractuales que corresponde a trabajos contractuales.

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUÍÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 66335


Asiento N° 2070 Del Supervisor 11/02/2019

Se autoriza al contratista iniciar los trabajos de colocación del acero en la losa a variar in situ entre los ejes 136 al 143. Dichos trabajos corresponden a trabajos suministrados en el expediente contractual.

El acero instalado debe estar libre de oxidación superficial, para cumplir con el menor refuerzo.

Asiento N° 2071 12-02-2019 Del Residente de obra


Se solicita autorización al supervisor de obra para el vaciado de concreto  $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$  + acelerante para la losa in situ desde el eje 136-143 trabajos correspondiente al adicional N° 12.

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUÍÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 66335

Asiento N° 2072 Del Supervisor 12/02/2019


Antes de iniciar la colocación del acero de la losa entre los ejes 136 al 143, concordantes con lo indicado en los planos del proyecto, se autoriza al contratista a efectuar el vaciado de dicho elemento estructural.

El concreto a utilizarse será con grampa con material premezclado.

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUÍÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 66335

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

  
ING. SUPERVISOR

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2073 13-02-2019 Del Residente de obra  
se solicita autorización al supervisor de obra para la colocación de acero y encofrado de juntas longitudinales entre los ejes 144-151 que corresponden a los trabajos contractuales.

*Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez*  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 66335

Asiento N° 2074 Del Supervisor 13/02/2019  
se autoriza al contratista la colocación del acero y encofrado de las juntas longitudinales entre los ejes 144-151 de los trabajos contractuales.

Conforme indica FONDEPES en su carta N° 57-2019-FONDEPES, a partir del eje 166, se volverá a reforzar el muelle, con los siguientes detalles de reforzamiento.

Asiento N° 2075 14-02-2019 Del Residente de obra  
se comunica al Supervisor de obra que se recibió la carta N° 071-2019-FONDEPES/EG por parte de FONDEPES donde nos aprueba y autoriza la ejecución del expediente técnico de la prestación adicional N° 10 por el monto de S/ 429,550.09 inc. IGV y su deductivo vinculante de S/ 186,912.30 inc. IGV para la electrificación del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de San José, siendo su plazo de ejecución 75 días calendario.

*Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez*  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 66335

Asiento N° 2076 Del Supervisor 14/02/2019  
Habiendo recibido la comunicación de FONDEPES, acerca de la aprobación del Adicional N° 10, al contratista deberá iniciar los trabajos correspondientes, teniendo en cuenta que el plazo para su ejecución es de 75 días calendario.

ING. INSPECTOR

*Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez*  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 66335

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRAS

95

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
 OBRA: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2017 15-02-2019 Del Residente de Obra  
 Se solicita autorización al supervisor de obra para la habilitación y colocación del acero correspondiente a la losa a vaciar in situ correspondientes entre los ejes 144-151 que corresponden a los trabajos contractuales.

Asiento N° 2018 Del Residente de Obra  
 De autorizar la ejecución de trabajos que consisten en la colocación de losa de concreto armado en los ejes 144-151, que pertenecen a los trabajos contractuales.  
 15/02/2019

Asiento N° 2019 16-02-2019 Del Residente de Obra  
 Se solicita autorización al supervisor de obra para continuar con la habilitación y colocación del acero correspondiente a la losa a vaciar in situ como también el encofrado de los cantos correspondientes entre los ejes 144-151 que corresponden a los trabajos contractuales.

Asiento N° 2020 Del Residente de Obra  
 De autorizar la ejecución de trabajos que consisten en la colocación de losa de concreto armado en los ejes 144-151, que pertenecen a los trabajos contractuales.  
 16/02/2019

ING. INSPECTOR

JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

ING. SUPERVISOR

*[Handwritten signature]*

CUADERNO DE OBRA

47

96

MODALIDAD:

FECHA:

OBRA:

PROYECTO:

PROGRAMA:

ENTIDAD EJECUTORA:

Asiento N° 2081

17 - 02 - 2019

Del Residente de obra

Se solicita autorización al supervisor de obra para realizar el vacado de concreto  $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$  + aditivo olerante para la losa in situ correspondiente entre los ejes 144-151, dichas tréjas corresponden al adicional N° 12.

Asiento N° 2082

Del Jefe de obra

17/02/2019

Trámites de verificación de la colocación del acero y seguridad del vacado de concreto, se autoriza al jefe de obra para que se realice el vacado de concreto  $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$  + aditivo olerante para la losa in situ correspondiente entre los ejes 144-151, dichas tréjas corresponden al adicional N° 12.

JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

Asiento N° 2083

18 - 02 - 2019

Del Residente de obra

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado e hundido de 02 pilotes verticales de  $45 \times 45$  para el eje F0 tréjas correspondientes al presupuesto contractual y al adicional N° 07.

Asiento N° 2084

Del Jefe de obra

18/02/2019

Trámites de verificación de la colocación del acero y seguridad del vacado de concreto, se autoriza al jefe de obra para que se realice el vacado de concreto  $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$  + aditivo olerante para la losa in situ correspondiente entre los ejes 144-151, dichas tréjas corresponden al adicional N° 12.

JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

ING. INSPECTOR

JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335  
ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

[Handwritten signature]

Trámites de verificación de la colocación del acero y seguridad del vacado de concreto, se autoriza al jefe de obra para que se realice el vacado de concreto  $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$  + aditivo olerante para la losa in situ correspondiente entre los ejes 144-151, dichas tréjas corresponden al adicional N° 12.

# CUADERNO DE OBRA

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento Nº 2085 19-02-2019 Del Residente de obra

se solicita al supervisor de obra la autorización para el descabezado de 02 pilotes eje 170. Transporte y colocación de viga eje 170 con su respectivo concreto, trabajos correspondientes al presupuesto contractual.

Asiento Nº 2086 del supervisor 19/02/2019

Se autoriza al contratista ejecutar los trabajos solicitados en el asiento anterior.

Se está verificando el lijado de los elementos prefabricados que deben ajustarse con las nuevas estructuras.

*Julio Oswaldo Fuentes Quinonez*  
JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 66335

*Julio Oswaldo Fuentes Quinonez*

Asiento Nº 2087 20-02-2019 Del Residente de obra

Se solicita al supervisor de obra elevar a la entidad nuestras siguientes CONSULTAS referentes a la aprobación de la prestación adicional Nº 11 y 12. Punto Nº 01

En la resolución Jefatural Nº 001-2019-FONDEPES/J recibida el día 03/01/2019 adjuntaron el informe Nº 021-2018-FONDEPES/DIGENIPRA/HEP/VRHL, donde su contenido de título siguiente dice:

### 4.2 JUSTIFICACION TÉCNICA

c. se advierte que el plano de INSTALACIONES SANITARIAS ISM-02 del modelo la ubicación del cabezo y la plataforma baja, difieren respecto a los planos de las especialidades descritas anteriormente. Asimismo, en los planos EP-05, EM-01 y AM-03 la plataforma baja no incluye detalle de la losa de la plataforma baja. Debido a que un análisis integral para el cabezo y la plataforma baja requieren mayor tiempo, no se ha considerado como parte del alcance del presente expediente.

*Julio Oswaldo Fuentes Quinonez*  
JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 66335

Continúa

ING. INSPECTOR

*Julio Oswaldo Fuentes Quinonez*  
JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 66335

ING. SUPERVISOR

# CUADERNO DE OBRAS

49

98

MODALIDAD:

FECHA:

OBRA:

PROYECTO:

PROGRAMA:

ENTIDAD EJECUTORA:

Viene Resorte N° 2087

20-02-2019

Del Residente de obra

Además la entidad adjunta dentro del expediente adicional N° 11 el plano EM-04 con folio 0360 donde se puede observar solo la planta del cabezo desde el eje 211 al 220 y la plataforma baja desde el eje 200 al eje 210 (Paralelo al moeile tipo puente).

Por lo tanto hacemos la consulta respecto a que elementos estructurales se utilizará para la plataforma baja, los cuales deberá tener todos los detalles para su ejecución como es la urg losa in situ y otro elemento prefabricado necesario para su construcción, ya que en el expediente confo

tal no tiene plano de detalle y como consecuencia no tiene presupuesto se entiende que dicha estructura tiene un fin especial por lo tanto la entidad deberá resolver nuestra consulta para su ejecución.

Punto N° 02

La entidad deberá de definir si existe alguna vortación en la construcción en el moeile tipo cabezo del eje 211 al 220 como pilotes de reforzamiento o se va a ejecutar como está mencionado en los planos estructurales EM-01 (Solo CABEZO) a ello queremos señalar que tampoco existe detalle por las losas nervadas tipo L-1 y L-11 las cuales son necesarias para su ejecución. Por los puntos expuestos solicito a usted compare a la entidad mediante carta nuestras consultas serotadas líneas arriba para su subsunción dentro del plazo que estipula el RLCE art. 196.

JULIO OSWALDO  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 66335

Estación N° 2088

20-02-2019

Del Residente de obra

Se comuto al supervisor de obra que a la fecha no recibimos respuesta

por parte de la entidad correspondiente a nuestra carta N° 044-2018-

CS/10 de fecha 08/06/2018 donde damos atencion a la carta N° 616-2018-Resdtes/

ING. INSPECTOR

JULIO OSWALDO  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 66335

JULIO OSWALDO  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 66335

ING. SUPERVISOR

Confianza



# CADERNO DE OBRA

Nº 50

99

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_


PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Viene Asiento Nº 2088 20-02-2019 Del Residente de obra  
DISEÑAR de tal manera que alcanzamos los planos y especificación con las modificaciones necesarias para el funcionamiento correcto de los productores de hielo motivada por el espacio reducido que se tiene en la zona destinada para producir hielo (modulo B).


En la carta de la referencia la entidad comunica al supervisor de obra, que estén de acuerdo con las alternativas de solución coordinadas con el Ing. Raúl Flores Vilca en la variación del camil de la grúa de transporte de los moldes de hielo así como la nueva ubicación de los condensadores por lo que a solicitud de la entidad alcanzamos la documentación necesaria para su aprobación y trámite ante la entidad, solicitud que a la fecha no ha sido atendida, por esa razón solicitamos reiterar a la entidad dar atención.

  
.....  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 66335


Asiento Nº 2089 del Señor Nº 20/02/2019

En relación a la autorización Nº 2087, se le comunica al contratista que por su naturaleza, requiere la opinión del proyectista, por lo que se comunicara a la Entidad para la atención correspondiente dentro del plazo establecido en el reglamento de la L.C.E.

En cuanto a lo anotado en el asiento 2088, el contratista está alcanzando la documentación necesaria para aprobar en definitiva la nueva distribución de los equipos generadores de los productores de hielo, que por razones de espacio y funcionalidad, se ha distribuido de manera más coherente, a fin de que los equipos funcionen adecuadamente.

  
.....  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 66335  
ING. RESIDENTE

ING. INSPECTOR

  
ING. SUPERVISOR

# CUADERNO DE OBRA


01

100


FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
OBRA: \_\_\_\_\_  
PROYECTO: \_\_\_\_\_  
PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2090 21-02-2019 Del Residente de obra

El suscrito indica que en referencia al asiento N° 2076 del supervisor de fecha 14/02/2019 en el que indica que se debería iniciar con los trabajos del adicional N° 10, teniendo en cuenta que el plazo para la ejecución es de 75 días calendario, se indica que se requiere contar con la autorización de inicio de obra y la participación de electrónicamente S.A y otros requisitos que a la fecha la entidad no ha remitido a mi representada, por lo que el inicio de ejecución de dicho adicional no ha sido definido aún. Se solicita a la supervisión la autorización para realizar el transporte, colocación y vaciado de unión viga pilote en el eje 171 y colocación de losa en el eje 170 - 171.

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUÍNEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335


Asiento N° 2091 21/02/2019 Del supervisor  
El contratista debe coordinar con la Entidad y la empresa prestadora del servicio de Chichas, las autorizaciones previas para definir la fecha de inicio del plazo (75 días), así como con la Municipalidad de San José en lo concerniente a las distancias mínimas que deben garantizarse entre los muros portos y las pircas y cercas.




Asiento N° 2092 22-02-2019 Del Residente de obra  
Se comunica al supervisor de obra que se ingresó a la entidad la Carta N° 017-2019-CS/CO donde solicitamos la documentación para dar inicio a la ejecución de la prestación adicional N° 10 - Media Tenston,

CONTINUA

ING. INSPECTOR

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUÍNEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335


  
ING. SUPERVISOR

# CUADERNO DE OBRA


101  
02

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
OBRA: \_\_\_\_\_  
PROYECTO: \_\_\_\_\_  
PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Viene Asiento N° 2092 22-02-2019 Del Residente de obra  
documentación que no es responsabilidad de su representada gestionar y  
que marcarán el hito para el inicio de dicho adicional, lo que como  
nicamos a la supervisión que a la fecha no se puede ejecutar dicha pres-  
tación adicional hasta que la entidad cumpla con alcanzar la documentación  
solicitada por la entidad prestadora de servicio Electromite S.A.  
se solicita al supervisor de obra la autorización para el descubrimiento de  
02 pilotes eje 172, transporte y colocación de viga eje 172 con su respectivo  
concreto, trabajos correspondientes al presupuesto contractual.


  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335


Asiento N° 2093 Del Supervisor 22/02/2019  
Como se ha anotado en el asiento anterior, el contratista debe  
efectuar las coordinaciones respectivas para que pueda iniciar  
los trabajos del adicional N° 10. Electro Norte debe nombrar su  
inspector y/o coordinador, para que pueda iniciarse los trabajos  
una vez que el contratista puede ir efectuando el "replanteo" del  
trazo, para efectuar cualquier consulta previa.



Asiento N° 2094 23-02-2019 Del Residente de obra  
Se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado, hincado  
y descubrimiento de 02 pilotes en el eje 173, así como el transporte y coloca-  
ción de losa en el eje 171-172 y el vaciado de onión viga pilote en el  
eje 173, trabajos correspondientes al presupuesto contractual y al adicional  
N° 07.

ING. INSPECTOR

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

  
ING. SUPERVISOR

# CUADERNO DE OBRA

Nº 03

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
 OBRA: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2095 Del Supervisor 23/02/2019

Se autoriza al contratista efectuar los trabajos solicitados en el asiento anterior.

El concreto utilizado es promezclado y transportado en HIXOR, sin embargo debe poseerse las muestras del concreto utilizado en el vaciado por los cuilicis perpendiculares.

*[Signature]*  
 Julio Oswaldo Fuentes Quinonez

Asiento N° 2096 24-02-2019 Del Residente de Obra  
 se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado e hincado de 02 pilotes en el eje 174 correspondientes al presupuesto con contractual y al adicional N° 04, también el traslado y colocación de losas en los ejes 172-173 y el vaciado de unión viga pilote en el eje 174. Asimismo se informa que a la fecha no tenemos indicación alguna de parte de la entidad para dar inicio a la ejecución del adicional N° 10.

*[Signature]*  
 JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

Asiento N° 2097 Del Supervisor 24/02/2019

Se autoriza al contratista efectuar los trabajos solicitados en el asiento anterior, por mismos que poseen pendientes tanto al contratista principal como al adicional N° 07.

*[Signature]*  
 Julio Oswaldo Fuentes Quinonez

Asiento N° 2098 25-02-2019 Del Residente de obra  
 Se solicita al Supervisor de obra la autorización para el transporte y colocación de losa nervada en el eje 173-174 que corresponde a los trabajos contractuales con contrato el transporte e hincado pilotes de 45x45 en el eje 175 y 176 que corresponden al adicional N° 07.

*[Signature]*  
 JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

# CUADERNO DE OBRA

N° 04

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Acuerdo N° 2094 del Supervisor 25/02/2019

Se autoriza al contratista realizar el transporte y colocación de la losa nervada entre los ejes 173-174, considerado en el presupuesto contractual.

Por mismo se permite transporte e hincado de dos (2) pilotes para los ejes 175-176 del adicional N° 07

Asiento N° 2100 26-02-2019 Del Residente de obra

Se solicita al Supervisor de obra la autorización para el desahogado de 04 pilotes para los ejes 175 y 176, también el transporte y colocación de viga eje 175 y 176, y el vacado de concreto unión viga pilote eje 175 y 176.

JULIO OSVALDO FUENTES QUÍNEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

Acuerdo N° 2101 del Supervisor 26/02/2019

Se autoriza al Contratista realizar los trabajos de desahogado de cuatro (4) pilotes entre ejes 175 al 176.

Por mismo el transporte y colocación de la viga eje entre ejes 175-176 y el posterior vacado del concreto por mezclado en unión viga-pilote entre ejes 175-176

Asiento N° 2102 27-02-2019 Del Residente de obra

Se solicita al Supervisor de obra la autorización para el transporte y colocación de losa nervada entre los ejes 175-176 como también el transporte, hincado y desahogado de pilotes eje 177, transporte y colocación de viga eje 177, con su respectivo vacado de unión viga pilote eje 177, trabajos correspondientes al adicional N° 07 y contractual.

ING INSPECTOR

JULIO OSVALDO FUENTES QUÍNEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

ING. SUPERVISOR

# CUADERNO DE OBRA

N° 005

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Anexo N° 2403 Del Informe 27/02/2019

Se solicita al contratista a efectuar los trabajos pluviales en el recinto anterior, trabajos que fueron pendientes al fin de la obra contractual finis al adicional N° 02.

Se ha sostenido una reunión con el personal del contratista que realizara los trabajos del Adicional N° 10, con el fin de realizar el trabajo preliminar

Informe N° 2104 28-02-2019 Del Residente de Obra José G. G.

Se comunico al supervisor de obra que se recibió la carta N° 017-2019-SSJSE-2019 por parte de la supervisión donde adjuntan la carta N° 242-2019-FONDEPES/DIGEN/PAI donde la entidad adjunta una memoria de cálculo entre los ejes 160-167 para el puente de acceso concluyendo que no será necesario colocar pilotes de reforzamiento desde el eje 136 al 167 y a partir del eje 168 se reforzaran los tramos con pilotes inclinados (1:4) de 45x45cm que se conectarán a las juntas de los puentes libres con empotramientos mínimos variables dentro de un rango referido a los estudios complementarios y de los monitoreos verificados a partir del eje 167, por lo que la entidad considera de vital importancia continuar con la ejecución del puente de acceso, por consiguiente ante esta necesidad para alcanzar la meta del proyecto se recomienda proceder en concordancia con el artículo 207 del RLCE y formalizar el procedimiento para la prestación adicional de obra respectiva. Por lo tanto después de ser absueltas las consultas y como lo señala la misma entidad damos cumplimiento al artículo N° 207, y comunicamos al supervisor de obra la necesidad de tramitar un nuevo expediente de prestación adicional correspondiente al reforzamiento de pilotes inclinados del eje 168 al 207 como señala la carta N° 242-2019-FONDEPES/DIGEN/PAI, otorgando de mi representada no será la responsable en la elaboración de dicho expediente por considerar la naturaleza y complejidad que tiene dicho expediente.

ING. INSPECTOR

Julio Oswaldo Fuentes Quínez  
JULIO OSWALDO FUENTES QUÍNEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 66335

José G. G.  
ING. SUPERVISOR

continúa →

# CUADERNO DE OBRA

105  
UB

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Viene Asiento N° 2105 . 28-02-2019 Del Residente de obra

07.03 Muelle de Espigon L: 950.00m

07.03.04 Nucleos llenados in situ

07.03.04.04 Concreto en núcleos  $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$  + Aditivo aerante 35.52m<sup>3</sup>

07.03.05 Juntas longitudinales y transversales

07.03.05.04 Concreto en viga mandil  $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$  + Aditivo aerante 27.72m<sup>3</sup>

07.03.07 Juntas vacadas in situ

07.03.07.04 Concreto en lasas  $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$  + Aditivo aerante 90.60m<sup>3</sup>

JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

Asiento N° 2406 Del Superintendente 28/02/2019

Con relación a lo anotado en el asiento N° 2104 del contratista, el contratista continuara los trabajos puntuales de bricados de pilotes, a los que se sumaran el bricado adicional de pilotes inclinados de 16 por eje, a partir del eje 161, conforme a los planos entre los ejes 104 al 135.

La Entidad se encargara de formular el Adicional complementario a fin de oficializar dicha modificación.

Se recibe el reporte de los metros de avance de obra correspondientes al contrato principal (Val 50); al adicional 07 (Val 12); Adicional 11 (Val 02) y Adicional 12 (Val 02).

En base a dichos reportes se procederá a la formulación de las valorizaciones correspondientes, las cuales se tramitarán ante la Entidad dentro de los plazos y formalidades establecidas en el artículo 197° del RLCTE.

ING. INSPECTOR

JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

ING. SUPERVISOR

# CONSORCIO SAN JOSE

CARTA N°019 - 2019 - CSJ/CO

San José, 28 de Febrero del 2019

**ATENCIÓN** : **MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO**  
**Ing. ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
**SUPERVISOR DE OBRA**

**ASUNTO** : **ENTREGA DE VALORIZACIÓN N° 50 – FEBRERO 2019**

**REFERENCIA** : **- CONTRATO N°082-2014-FONDEPES/OGA**  
**ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N°004-2014-FONDEPES-DERIVADA DE**  
**LA LICITACIÓN PÚBLICA N°004-2014-FONDEPES/OGA**  
**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO**  
**HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE**  
**LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"**

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

Recibido 28/02/2019

Presente.-

Mediante la presente nos dirigimos a ustedes a fin de saludarlos y a la vez presentar la Valorización N° 50 contractual de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE", así mismo solicitamos el pago respectivo, para lo cual adjuntamos los siguientes documentos:

- Ficha técnica
- Memoria descriptiva
- Resumen de Valorización N°50
- Valorización N°50
- Curva S
- Planilla de metrados valorizados
- Panel fotográfico
- Contrato de obra (copia)
- Acta de entrega de terreno (copia)
- Póliza de seguro complementario por trabajo de riesgo y salud
- Constancia de No estar inhabilitado para contratar con el estado
- Constancia de capacidad de libre contratación
- Carta Fianza correspondiente al Adelanto Directo
- Carta de fiel cumplimiento (copia)
- Contrato de consorcio (copia)
- Cuaderno de obra (copia)
- Rentas
- Planillas
- Pago a CONAFOVICER
- Cuaderno de obra (copia)

Son 01 archivador original y 02 copia cada uno con folios  
Agradeciendo la atención que sirvan brindar a la presente quedamos de Uds

Atentamente,

CONSORCIO SAN JOSE

Emiliano Isaac Trujillo Luna  
Representante Legal Conjoint

Av. Alameda del Corregidor N°414/Lima-Lima-La Molina  
Teléf.: 349-3170



# CONSORCIO SAN JOSÉ

## VALORIZACIÓN N° 50 CONSORCIO SAN JOSÉ



**OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE  
SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE  
LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE”**

**LAMBAYEQUE – PERÚ**

**2019**

# **Ficha Técnica**

## FICHA TÉCNICA

### 1. DATOS GENERALES

Obra	: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE".
Entidad a Convocante	: FONDEPES
Fuente de Financiamiento	: Recursos Ordinarios
Sistema de Contratación	: Precios Unitarios
Monto Referencial	: S/. 33'504,650.56
Monto Contratado	: S/. 32'457,630.22 (Inc. IGV)
Incidencia Porcentual Acumulada	: 61.57%
Fecha de Valor Referencial	: Junio 2014
Plazo de ejecución de la Obra	: 1,360 días calendarios
Contratista Principal	: CONSORCIO SAN JOSE
Representante legal	: Ing. Emiliano Isaac Trujillo Luna
Licitación	: Adjudicación de Menor Cuantía N° 38-2014-FONDEPES derivada de la Licitación Pública N° 004-2014-FONDEPES.
Contrato	: CONTRATO N° 082-2014-FONDEPES/OGA
Entrega de terreno	: 14 de Enero 2015
Inicio Contractual de obra	: 15 de Enero 2015
Inicio Real de obra	: 15 de Enero 2015
Fin Contractual de obra	: 17 de Marzo del 2018
Ampliación de Plazo Acumulado	: 301 Días calendarios
Nueva Fecha Contractual de obra	: 03 de Enero del 2018
Entrega Adelanto Directo	: S/. 6'491,526.04 (INC. IGV) (09 de Enero. del 2015)
Residente de Obra	: Ing. Julio O. Fuentes Quiñonez CIP. 66335
Supervisor de Obra	: Ing. Isaías Jorge Alva Espinoza CIP. 10717

  
 JULIO OSVALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

## 2. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

Durante el desarrollo de los trabajos que contemplan la presente obra se utilizarán los siguientes equipos:

- 01 Grúa de 30 Ton.
- 01 Grúa de 65 Ton.
- 01 Martillo Delmag 25-32
- 01 Cargador Frontal
- 01 Camion con Carreta
- 01 Mini cargador
- 01 Cisterna
- 02 Nivel de Ingeniero
- 02 Mira y Jalones
- 01 Teodolito
- 01 Mixer
- Herramientas manuales varias (lampas, picos, buggies).

### 2.1 RELACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA


Durante la ejecución de la obra el personal que laborará es el siguiente:

#### **2.1.1 Personal Profesional Propuesto**

- 01 Gerente de Proyecto : Ing. Julio César Incio Carrillo
- 01 Ing. Residente de Obra : Ing. Julio O. Fuentes Quiñonez
- 01 Administrador de Obra : Ing. Ludwig Benito Retamozo Martínez
- 01 Asistente de Residente de Obra : Ing. Richard Javier Tapia Rosazza
- 01 Asistente de Residente de Obra : Ing. Jorge Antonio Vidal Navarrete
- 01 Especialista en Estructuras : Ing. Romer Iván Lovon Dávila
- 01 Esp. en Mecánica de Suelos : Ing. Fidel Juvenal Ramírez Aguilar
- 01 Esp. en Seguridad de Obra : Ing. Eddy Solano Espinoza Escalante
- 01 Especialista en Sanitarias : Ing. Chong Tang Julio Tay Wo
- 01 Esp. en Metrados y Valorizaciones : Ing. Jhonny Alan Huamán Porlles

#### **2.1.2 Personal Técnico**

- 01 Almacenero : Sr. Luis Saire Quilca
- 04 Guardianes : Sr. Santos Hipólito Muñoz Silva
- : Sr. Christian Alex Montalvo Valera
- : Sr. José Neiro Lozano Carrasco

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

01 Topógrafo : Sr. Jorge Luis Díaz Ruiz  
01 Asistente de Ingeniería : Sr. Rojer Job Navarro Tello  
01 Asistente Contable : Srta. Camani Lobaton María Elena

## 2.2 PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN

### 2.2.1 Personal Profesional

01 Jefe de supervisión : Ing. Isaiás Jorge Alva Espinoza

## 3. DESARROLLO PORCENTUAL DEL AVANCE DE LA OBRA

**OBRA:** "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"


### 3.1.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LA ZONA:

Departamento : Lambayeque  
Provincia : Lambayeque  
Distrito : San José

El Desembarcadero Pesquero Artesanal San José, se encuentra ubicado en la Caleta San José (área rural), políticamente pertenece a la Región de Lambayeque, Provincia de Lambayeque, Distrito de San José, forma parte de la infraestructura de protección permanente a la capacidad productora de los pescadores de San José.

### 3.1.2 MONTO CONTRATADO (CON PRECIOS AL MES DE JUNIO 2014)


Monto	27'506,466.29
I.G.V. (18%)	4'951,163.93
Total	<u>SI. 32'457,630.22</u>

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

### 3.1.3 INICIO DE OBRA

1. Con fecha 24 de diciembre se firmó el CONTRATO N°082-2014-FONDEPES/OGA entre FONDEPES y el CONSORCIO SAN JOSE.


2. El adelanto directo se entregó con fecha 09 de enero del 2015


  
ISAIÁS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

INFORME DPA SAN JOSE – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 50 DE OBRA	Fecha: Febrero - 2019
		Página: 4 de 18

3. La entidad entrego expediente técnico con CARTA 008-2015-FOPNDEPES/DIGENIPAA de fecha 07 de enero, el cual fue recepcionado el 07 de enero por el CONSORCIO SAN JOSE.
4. La entidad con CARTA 0012-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 8 de enero 2015, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el 09 de enero del 2015, comunicaron la designación de la supervisión del CONSORCIO SAN FRANCISCO, indicando que el Supervisor encargado es el Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia, y que iniciaba sus funciones el mismo día con que se emitió la carta, así mismo los datos para comunicación con el supervisor.
5. Con CARTA N° 0014-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 08 de enero, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el día 09 de enero notificaron la designación del representante de FONDEPES para el acto de entrega de terreno.
6. Con CARTA N° 0015-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 08 de enero, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el día 09 de enero, notificaron la entrega de terreno para el miércoles 14 de Enero del 2015, a horas 12:00.
7. El 09 de Enero del 2015 se realiza la recepción del Adelanto Directo.
8. El día 14 de Enero del 2015 se realizó la entrega del terreno, mediante acta entre el Supervisor de Obra, el Ing. Residente, representante de FONDEPES.
9. El 15 de Enero del 2015 se inició el plazo contractual para la obra.
10. Se recibió la resolución N° 025-2018-FONDEPES/J el día 09/03/2018 aprobando y autorizando la ejecución de la prestación del Adicional N°07 por tanto se da inicio a los trabajos de las partidas contractuales.
11. Con carta N° 702-2018-FONDEPES/DIGENIPAA la entidad nos alcanza el plano EP-07 y la memoria de cálculo del tramo comprendido entre el eje 104 y 111 con modificación del proceso constructivo que genera un atraso importante en la ejecución.
12. Con carta s/n -2018-FONDEPES/DIGENIPAA la entidad nos alcanza el plano EP-08 y la memoria de cálculo del tramo comprendido entre el eje 112 y 119 con modificación del proceso constructivo que genera un atraso importante en la ejecución.
13. Con carta 1098-2018-FONDEPES/DIGENIPAA la entidad nos alcanza el plano EP-10 y la memoria de cálculo del tramo comprendido entre el eje 129 y 135 con modificación del proceso constructivo que genera un atraso importante en la ejecución.
14. Se recibió por parte de la entidad la carta N° 360-2018-FONDEPES/SG donde nos adjuntan la resolución de Secretaria General N° 178-2018-FONDEPES/SG donde nos aprueban nuestra solicitud de ampliación de plazo por 60 días calendarios por causas no atribuibles al contratista siendo la nueva fecha contractual el día **04 de Diciembre del 2018**.
15. Se recibió por parte de la entidad la carta N° 451-2018-FONDEPES/SG donde nos adjuntan la resolución de Secretaria General N° 225-2018-FONDEPES/SG donde nos aprueban parte de nuestra solicitud de ampliación de plazo por 30 días calendarios por causas no atribuibles al contratista siendo la nueva fecha contractual el día **03 de Enero del 2018**.

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

INFORME DPA SAN JOSE – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

16. Se recibió la carta N° 014-2018-FONDEPES/DIGENIPAA donde la entidad nos aprueba el calendario actualizado correspondiente a la ampliación de plazo parcial N°25 aprobada por 30 días calendarios siendo el nuevo plazo contractual el **03 de enero del 2018**.
17. -Se recibió la carta N° 002-2019-FONDEPES/GG de fecha 02/12/2019 donde nos adjuntan la resolución Jefatural N°001-2019-FONDEPES/J donde la entidad resuelve APROBAR y AUTORIZAR la ejecución del Expediente Técnico de prestación Adicional N°11 por mayores metros y prestación adicional N°12 por partidas nuevas.
18. Se recibió la carta N° 135-2019-FONDEPES/DIGENIPAA por parte de la entidad donde nos aprueban el cambio de Ingeniero Residente de Obra, estableciéndose como el profesional propuesto al Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñones con CIP N° 66335.
19. Se recibió la carta N° 062-2019-FONDEPES/GG por parte de la entidad donde nos adjuntan la resolución de Gerencia General N° 026-2019-FONDEPES/GG el día 08/02/19 donde nos aprueban nuestra solicitud de ampliación de plazo por 102 días calendarios siendo la nueva fecha contractual el día 20 de mayo del 2019.

### 3.1.4 SITUACIÓN ACTUAL:

Al mes de Febrero del 2019, se ha ejecutado el 63.33 % acumulado, contra un Avance Programado acumulado del 68.79 %, por lo tanto se encuentra al atrasada de acuerdo al cronograma vigente, correspondiente a la ampliación de plazo Parcial N° 28 por 102 días calendarios motivada por la ejecución del saldo de los trabajos del adicional N°07, siendo sincerado y equilibrado el plazo de ejecución, siendo el nuevo termino de obra el día 20/05/2019

Mes de Valorización	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado
Febrero 2019 Valorización N° 50	68.79 %	63.33 %

En el avance mensual se detalla lo siguiente:

*Julio Oswaldo Fuentes Quiñones*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 66335

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N° 50 AL MES DE FEBRERO DEL 2019			
OBRA	: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"		
07	OBRAS EN MAR		
07.03.05	JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES		
07.03.05.01	CONCRETO EN VIGA MANDIL FC=280 KG/CM2	m3	0.00

*Isaias Jorge Alva Espinoza*  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

07.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA MANDIL	m2	62.85
07.03.05.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	4,006.62
07.03.06	SARDINELES LLENADOS IN SITU		
07.03.06.01	CONCRETO EN SARDINEL FC=280 KG/CM2	m3	6.48
07.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES	m2	59.32
07.03.06.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	867.71
07.03.07	LOSAS VACIADAS IN SITU		
07.03.07.01	CONCRETO EN LOSAS FC=280 KG/CM2	m3	0.00
07.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES	m2	48.18
07.03.07.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	15,229.74
07.04.07	MANIOBRA DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS PUENTES		
07.04.07.01	TRANSPORTE DE PILOTE	und	36.00
07.04.07.02	TRANSPORTE DE VIGA TRANSVERSAL	und	9.00
07.04.07.03	TRANSPORTE DE LOSA NERVADA	und	14.00
07.04.07.04	PUNTA PARA PILOTES	und	0.00
07.04.07.05	HINCADO DE PILOTE (INC. MOV. Y POSIC. PLANTILLA)	und	0.00
07.04.07.06	DESCABEZADO DE PILOTAJE	und	36.00
07.04.07.07	COLOCACION DE VIGA TRANSVERSAL	und	9.00
07.04.07.08	COLOCACION DE LOSA NERVADA	und	14.00


### VALORIZACION DE OBRA N° 50 – FEBRERO 2019

#### 4. CONTROL ECONOMICO DEL CONTRATO

##### 4.1 VALORIZACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL


Al mes de Febrero del 2019, se está tramitando la Valorización N° 50 de los trabajos ejecutados acumulado al 63.33 %, presentando el siguiente detalle:

VALORIZ.	FECHA	VALORIZADO (Sin I.G.V.)
N° 01	Al 31 de Enero 2015	S/. 358,268.22
N° 02	Al 28 de Febrero 2015	S/. 555,717.9
N° 03	Al 31 de Marzo 2015	S/. 593,994.45
N° 04	Al 30 de Abril 2015	S/. 925,177.18
N° 05	Al 31 de Mayo 2015	S/. 753,732.22
N° 06	Al 30 de Junio 2015	S/. 985,329.63
N° 07	Al 31 de Julio 2015	S/. 1,865,453.02
N° 08	Al 31 de Agosto 2015	S/. 1,054,927.09

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335



N° 09	Al 30 de Setiembre 2015	S/. 1,429,170.33
N° 10	Al 31 de Octubre 2015	S/. 1,285,746.48
N° 11	Al 30 de Noviembre 2015	S/. 2,011,031.83
N° 12	Al 31 de Diciembre 2015	S/. 1,389,920.39
N° 13	Al 31 de Enero 2016	S/. 1,517,495.69
N° 14	Al 29 de Febrero 2016	S/. 667,975.68
N° 15	Al 31 de Marzo 2016	S/. 621,544.65
N° 16	Al 30 de Abril 2016	S/. 240,541.06
N° 17	Al 31 de Mayo 2016	S/. 67,518.42
N° 18	Al 30 de Junio 2016	S/. 238,908.88
N° 19	Al 31 de Julio 2016	S/. 87,581.78
N° 20	Al 31 de Agosto 2016	S/. 26,733.49
N° 21	Al 30 de Setiembre 2016	S/. 54,654.58
N° 22	Al 31 de Octubre 2016	S/. 15,754.74
N° 23	Al 30 de Noviembre 2016	S/. 0.00
N° 24	Al 31 de Diciembre 2016	S/. 68,223.57
N° 25	Al 31 de Enero 2017	S/. 106,056.42
N° 26	Al 28 de Febrero 2017	S/. 11,543.86
N° 27	Al 31 de Marzo 2017	S/. 0.00
N° 28	Al 30 de Abril 2017	S/. 0.00
N° 29	Al 31 de Mayo 2017	S/. 0.00
N° 30	Al 30 de Junio 2017	S/. 0.00
N° 31	Al 31 de Julio 2017	S/. 0.00
N° 32	Al 31 de Agosto 2017	S/. 0.00
N° 33	Al 30 de Setiembre 2017	S/. 0.00
N° 34	Al 31 de Octubre 2017	S/. 0.00
N° 35	Al 30 de Noviembre 2017	S/. 0.00
N° 36	Al 31 de Diciembre 2017	S/. 0.00
N° 37	Al 31 de Enero 2018	S/. 0.00
N° 38	Al 28 de Febrero 2018	S/. 0.00
N° 39	Al 31 de Marzo 2018	S/. 3,091.79
N° 40	Al 30 de Abril 2018	S/. 0.00

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

N° 41	Al 31 de Mayo 2018	S/. 0.00
N° 43	Al 31 de Julio 2018	S/. 15,893.61
N° 44	Al 31 de Agosto 2018	S/. 16,519.87
N° 45	Al 30 de Setiembre 2018	S/. 23,972.12
N° 46	Al 31 de Octubre 2018	S/. 14,412.14
N° 47	Al 30 de Noviembre 2018	S/. 51,039.97
N° 48	Al 31 de Diciembre 2018	S/. 35,710.99
N° 49	Al 31 de Enero 2018	S/. 164,208.84
N° 50	Al 28 de Febrero 2018	S/. 135,028.26
<b>TOTAL VALORIZADO (SIN IGV)</b>		<b>S/.17,418,792.43</b>

#### 4.2 REAJUSTE DE LA VALORIZACIÓN

VALORIZACIÓN N° 49	FECHA	K Reaj.	Reajuste
<b>SUB PRESUPUESTO N° 07</b> Obras en mar	Febrero del 2019	K = 1.149	S/. 19,626.59
<b>TOTAL REAJUSTE (SIN IGV)</b>			<b>S/. 19,626.59</b>


#### 4.3 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)


El I.G.V. afectado a la valorización efectuado por el Contratista a la fecha ha sido el siguiente:

VALORIZACIÓN	Fecha	I.G.V. (18%)
N° 01	Enero 2015	S/. 52,340.24
N° 02	Febrero 2015	S/. 84,616.98
N° 03	Marzo 2015	S/. 90,961.82
N° 04	Abril 2015	S/. 140,519.67
N° 05	Mayo 2015	S/. 112,936.03
N° 06	Junio 2015	S/. 149,774.68
N° 07	Julio 2015	S/. 281,792.27
N° 08	Agosto 2015	S/. 151,997.48

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

N° 09	Setiembre 2015	S/. 222,805.58
N° 10	Octubre 2015	S/. 191,982.90
N° 11	Noviembre 2015	S/. 305,679.20
N° 12	Diciembre 2015	S/. 223,850.66
N° 13	Enero 2016	S/. 239,496.48
N° 14	Febrero 2016	S/. 102,790.73
N° 15	Marzo 2016	S/. 98,684.70
N° 16	Abril 2016	S/. 37,075.22
N° 17	Mayo 2016	S/. 7,077.51
N° 18	Junio 2016	S/. 37,197.40
N° 19	Julio 2016	S/. 13,816.70
N° 20	Agosto 2016	S/. 4,192.57
N° 21	Setiembre 2016	S/. 8,563.49
N° 22	Octubre 2016	S/. 2,473.49
N° 23	Noviembre 2016	S/. 0.00
N° 24	Diciembre 2016	S/. 11,136.46
N° 25	Enero 2017	S/. 1,268.43
N° 26	Febrero 2017	S/. 1,299.00
N° 27	Marzo 2017	S/. 0.00
N° 28	Abril 2017	S/. 0.00
N° 29	Mayo 2017	S/. 0.00
N° 30	Junio 2017	S/. 0.00
N° 31	Julio 2017	S/. 0.00
N° 32	Agosto 2017	S/. 0.00
N° 33	Setiembre 2017	S/. 0.00
N° 34	Octubre 2017	S/. 0.00
N° 35	Noviembre 2017	S/. 0.00
N° 36	Diciembre 2017	S/. 0.00
N° 37	Enero 2018	S/. 0.00
N° 38	Febrero 2018	S/. 0.00
N° 39	Marzo 2018	S/. 240.74

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335


  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

N° 40	Abril 2018	S/. 0.00
N° 41	Mayo 2018	S/. 0.00
N° 42	Junio 2018	S/. 4,473.48
N° 43	Julio 2018	S/. 2,583.79,
N° 44	Agosto 2018	S/. 2,690.40
N° 45	Setiembre 2018	S/. 4,208.01
N° 46	Octubre 2018	S/. 2,393.16
N° 47	Noviembre 2018	S/. 8,495.28
N° 48	Diciembre 2018	S/. 5,940.23
N° 49	Enero 2019	S/.27,496.40
N° 50	Febrero 2019	S/.23,550.94
<b>TOTAL I.G.V.</b>		<b>S/. 2,656,706.19</b>


**4.4 VALORIZACIÓN TOTAL (INC. REAJUSTES, AMORTIZACIONES E IGV.)**

VALORIZACIÓN	Fecha	Valorizado (Inc. Reaj. , Amortiz. e IGV)
N°01	Enero 2015	S/. 343,119.33
N°02	Febrero 2015	S/. 554,711.34
N°03	Marzo 2015	S/. 596,305.26
N°04	Abril 2015	S/. 921,184.50
N°05	Mayo 2015	S/. 740,358.43
N°06	Junio 2015	S/. 981,856.22
N°07	Julio 2015	S/. 1,847,304.88
N°08	Agosto 2015	S/. 996,427.93
N°09	Setiembre 2015	S/. 1,460,614.37
N°10	Octubre 2015	S/.1,258,554.54
N°11	Noviembre 2015	S/.2,003,897.00
N°12	Diciembre 2015	S/.1,467,465.45
N°13	Enero 2016	S/. 1,570,032.48
N°14	Febrero 2016	S/. 673,850.35
N°15	Marzo 2016	S/. 646,933.03

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

N°16	Abril 2016	S/. 243,048.66
N°17	Mayo 2016	S/. 46,397.01
N°18	Junio 2016	S/. 243,849.64
N°19	Julio 2016	S/. 90,576.16
N°20	Agosto 2016	S/. 27,484.65
N°21	Setiembre 2016	S/. 56,138.41
N°22	Octubre 2016	S/. 16,215.11
N°23	Noviembre 2016	S/. 0.00
N°24	Diciembre 2016	S/. 73,005.66
N°25	Enero 2017	S/. 8,315.26
N°26	Febrero 2017	S/. 8,515.65
N°27	Marzo 2017	S/. 0.00
N°28	Abril 2017	S/. 0.00
N°29	Mayo 2017	S/. 0.00
N°30	Junio 2017	S/. 0.00
N°31	Julio 2017	S/. 0.00
N°32	Agosto 2017	S/. 0.00
N°33	Setiembre 2017	S/. 0.00
N°34	Octubre 2017	S/. 0.00
N°35	Noviembre 2017	S/. 0.00
N°36	Diciembre 2017	S/. 0.00
N°37	Enero 2018	S/. 0.00
N°38	Febrero 2018	S/. 0.00
N°39	Marzo 2018	S/. 1,578.16
N° 40	Abril 2018	S/. 0.00
N° 41	Mayo 2018	S/. 0.00
N° 42	Junio 2018	S/. 29,326.14
N° 43	Julio 2018	S/. 16,938.20
N° 44	Agosto 2018	S/. 17,637.06
N° 45	Setiembre 2018	S/. 27,585.87
N° 46	Octubre 2018	S/. 15,688.49


  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

  
 ISAIAS JORGE SILVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

N° 47	Noviembre 2018	S/. 55,691.27
N° 48	Diciembre 2018	S/. 38,941.53
N° 49	Enero 2019	S/. 180,254.16
N° 50	Febrero 2019	S/. 154,389.51
<b>TOTAL</b>		<b>S/. 17,416,185.05</b>

### 5. ASPECTOS RELEVANTES DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA

1. Con fecha 24 de diciembre se firmó el CONTRATO N°082-2014-FONDEPES/OGA entre FONDEPES y el CONSORCIO SAN JOSE.
2. El adelanto directo se entregó con fecha 09 de enero del 2015.
3. La entidad entregó expediente técnico con CARTA 008-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 07 de enero, el cual fue recepcionado el 07 de enero por el CONSORCIO SAN JOSE.
4. La entidad con CARTA 0012-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 8 de enero 2015, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el 09 de enero del 2015, comunicaron la designación de la supervisión del CONSORCIO SAN FRANCISCO, indicando que el Supervisor encargado es el Ing. Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia, y que iniciaba sus funciones el mismo día con que se emitió la carta, así mismo los datos para comunicación con el supervisor.
5. Con CARTA N° 0014-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 08 de enero, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el día 09 de enero notificaron la designación del representante de FONDEPES para el acto de entrega de terreno.
6. Con CARTA N° 0015-2015-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 08 de enero, recepcionado por el CONSORCIO SAN JOSE el día 09 de enero, notificaron la entrega de terreno para el miércoles 14 de Enero del 2015, a horas 12:00.
7. El 09 de Enero del 2015 se realiza la recepción del Adelanto Directo.
8. El día 14 de Enero del 2015 se realizó la entrega del terreno, mediante acta entre el Supervisor de Obra, el Ing. Residente, representante de FONDEPES.
9. El 15 de Enero del 2015 se inició el plazo contractual para la obra.
10. Con carta Notarial N°329-2015-FONDEPES/SG la Entidad resuelve contrato a la supervisión CONSORCIO SAN FRANCISCO, por lo que la entidad nombra al Ing. Víctor Ricardo Huamán Landa como Inspector de obra el cual cumplirá sus funciones a partir del 19 de Noviembre del 2015 para la continuidad de la obra.
11. La entidad firma el contrato N° 013-2016-FONDEPES con MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO por la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL SALDO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE


  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335


  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 50 DE OBRA	Fecha: Febrero - 2019
		Página: 13 de 18

LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE" toma los servicios de consultoría para el saldo de supervisión de obra con contrato N° 013-2016-FONDEPES.

12. La entidad con carta N° 551-2016-FONDEPES/OGA aprueban el cambio de jefe de supervisión del servicio de consultoría para el SALDO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE designando como nuevo jefe de supervisión al Ing. Isaías Jorge Alva Espinoza.
13. Con carta N° 415-2016-FONDEPES/DIGENIPAA la entidad nos solicita que se amortice las valorizaciones N°01 correspondiente al adicional N° 02, Valorización N°01 del adicional N° 04 y que el monto de dicha amortización será considerada en la Valorización contractual siguiente.
14. Con carta N° 026-2017-CSJ/CO de fecha 12/04/2017 se ingresó a FONDEPES el reiterativo sobre la aprobación del expediente técnico de la prestación adicional de obra y deductivo vinculante de media tensión, pese a que con carta N° 403-2016-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 27 de setiembre del 2016, la Entidad informó que ella sería quien realice la elaboración del expediente técnico de media tensión.
15. Con carta N° 027-2017-CSJ/CO de fecha 12/04/2017 se ingresó a FONDEPES el reiterativo sobre la aprobación del expediente técnico de la prestación adicional de obra y deductivo vinculante cambio de especificaciones técnicas (baranda), considerando que con carta N°349-2016-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 22 de agosto del 2016, se determinó que la Entidad sería quien realice la elaboración del expediente técnico de dicha prestación.
16. Con carta N° 028-2017-CSJ/CO de fecha 19/04/2017 se ingresó a FONDEPES la verificación del ajuste de la solución técnica del adicional N° 08 (PRODUCTOR DE HIELO EN BLOQUES DE 10TN/DÍA Y SU DEDUCTIVO VINCULANTE) respecto a la prestación principal, dando atención a la Carta N° 00072-2017-FONDEPES-DIGENIPAA.
17. Con carta N° 019-2017-CSJ/CO de fecha 17/03/2017 se ingresó a FONDEPES la solicitud de designación de un nuevo inspector y/o supervisor, ya que mediante asiento de cuaderno de obra N°1434 de fecha 06/03/2017 el supervisor de obra Ing. Isaías Jorge Alva Espinoza dio por finalizado su labor al término de su contrato.
18. Con carta N° 032-2017-CSJ/CO de fecha 10/05/2017 se ingresó a FONDEPES el Reiterativo a nuestra solicitud de designación de un nuevo inspector y/o supervisor, ya que la anterior carta del mismo asunto no tuvo respuesta, y a la fecha tampoco ésta carta tiene respuesta alguna.
19. Mediante Carta N°00119-2017-FONDEPES/DIGENIPAA recibida el 07/06/2017 la Entidad concluyó que el contrato de los servicios de supervisión de obra con el Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga, se encuentra vigente, puesto que no ha sido resuelto ni anulado.
20. Con fecha 20/10/2017 el Ing. Isaías Jorge Alva Espinoza reinició sus actividades como jefe de supervisión, ingresando a obra junto a su asistente de supervisión.
21. Con carta N°049-2018-FONDEPES/SG de fecha 06/03/2018 la entidad nos comunicó de la Aprobación del Expediente técnico de la Prestación Adicional N°07, adjuntando la Resolución

  
 JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335


  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717  
 INFORME DPA SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 50 DE OBRA	Fecha: Febrero - 2019
		Página: 14 de 18

- Jefatural N°025-2018-FONDEPES/J de fecha 06 de marzo del 2018, la cual resuelve aprobar el Expediente Técnico de la prestación adicional N°07.
22. Con carta N° 702-2018-FONDEPES/DIGENIPAA la entidad nos alcanza el plano EP-07 y la memoria de cálculo del tramo comprendido entre el eje 104 y 111 con modificación del proceso constructivo que genera un atraso importante en la ejecución.
23. Con carta s/n -2018-FONDEPES/DIGENIPAA la entidad nos alcanza el plano EP-08 y la memoria de cálculo del tramo comprendido entre el eje 112 y 119 con modificación del proceso constructivo que genera un atraso importante en la ejecución.
23. Con carta 914 -2018-FONDEPES/DIGENIPAA la entidad nos alcanza el plano EP-09 y la memoria de cálculo del tramo comprendido entre el eje 120 y 128 con modificación del proceso constructivo que genera un atraso importante en la ejecución.
24. Con carta 1098-2018-FONDEPES/DIGENIPAA la entidad nos alcanza el plano EP-10 y la memoria de cálculo del tramo comprendido entre el eje 129 y 135 con modificación del proceso constructivo que genera un atraso importante en la ejecución.
25. Se recibió por parte de la entidad la carta N° 360-2018-FONDEPES/SG donde nos adjuntan la resolución de Secretaria General N° 178-2018-FONDEPES/SG donde nos aprueban nuestra solicitud de ampliación de plazo por 60 días calendarios por causas no atribuibles al contratista siendo la nueva fecha contractual el día **04 de Diciembre del 2018**.
26. Con carta -083-2018-CSJ/CO la contratista presenta al supervisor de obra la solicitud de Ampliación de Plazo parcial N° 25 por 60 días calendarios para que lo trámite ante la entidad dentro de los plazos que estipula el RLCE.
27. Se recibió por parte de la entidad la carta N° 451-2018-FONDEPES/SG donde nos adjuntan la resolución de Secretaria General N° 225-2018-FONDEPES/SG donde nos aprueban parte de nuestra solicitud de ampliación de plazo por 30 días calendarios por causas no atribuibles al contratista siendo la nueva fecha contractual el día **03 de Enero del 2018**.
29. Se recibió la carta N° 002-2019-FONDEPES/GG de fecha 02/12/2019 donde nos adjuntan la resolución Jefatural N°001-2019-FONDEPES/J donde la entidad resuelve APROBAR y AUTORIZAR la ejecución del Expediente Técnico de prestación Adicional N°11 por mayores metrados y prestación adicional N°12 por partidas nuevas.
30. A la fecha se está tramitando la ampliación de plazo N°28 correspondiente al plazo necesario a la culminación del saldo de los trabajos contractuales y adicional N°07 motivada por la demora en la aprobación del expediente adicional N°11 Y 12.
31. Se recibió la carta N° 135-2019-FONDEPES/DIGENIPAA por parte de la entidad donde nos aprueban el cambio de Ingeniero Residente de Obra, estableciéndose como el profesional propuesto al Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñones con CIP N° 66335.
32. Se recibió la carta N° 062-2019-FONDEPES/GG por parte de la entidad donde nos adjuntan la resolución de Gerencia General N° 026-2019-FONDEPES/GG el día 08/02/19 donde nos

  
**ISAÍAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

INFORME DPA SAN JOSE – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

  
**JULIO OSWALDO**  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335




CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 50 DE OBRA	Fecha: Febrero - 2019
		Página: 15 de 18

aprueban nuestra solicitud de ampliación de plazo por 102 días calendarios siendo la nueva fecha contractual el **día 20 de mayo del 2019**.

**6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Al mes de Febrero del 2019, se ha ejecutado el 63.33 % del total del presupuesto contractual en la Valorización N° 50 acumulada, contra un Avance Programado de 68.79 % Acumulada. Debido a que el proceso constructivo ha sido modificado dando como consecuencia la prolongación del plazo de ejecución y generando atrasos sobre la programación.

  
-----  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717


# Memoria

# Descriptiva

# Valorizada



JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 50 DE OBRA	Fecha: Febrero - 2019
		Página: 16 de 18

## MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA VALORIZACIÓN N° 50- FEBRERO 2019

**OBRA: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"**

### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo el de dar el "Suficiente acceso a Recursos hidrobiológicos de Calidad que cumplan con la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (DS N° 040-2001-PE) en la Caleta de San José, Santa Rosa y Pimentel".

Los metrados básicos son:

#### **07. OBRAS DE MAR**

**07.03 MUELLE DE ESPIGON L=950.00 M**

**07.03.04 NUCLEOS LLENADOS EN SITU**

**07.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN NUCLEOS**

Consiste en la conformación de las formas que en el proceso constructivo permitirán elaborar el concreto según las indicaciones de los planos, a sus requisitos técnicos y a los indicados en las Especificaciones Complementarias. Se incluye en esta partida el correspondiente desencofrado, dejando la superficie del concreto completamente libre de elementos orgánicos, de acero, alambres, etc. a fin de evitar la oxidación prematura del acero estructural o el inicio de la destrucción progresiva del concreto por acción del ambiente marino.

**07.03.06 SARDINELES LLENADOS IN SITU**


**07.03.06.01 CONCRETO EN SARDINEL F'C=280 KG/CM<sup>2</sup>**

Ver ITEM 07.03.04.01

**07.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES**

Ver ITEM 07.03.04.02


**07.03.06.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM<sup>2</sup>**

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

El acero especificado en los planos en base de su carga de fluencia debiendo satisfacer además las siguientes condiciones.

Para el acero de esfuerzo de carga de fluencia es de 4,200 Kg/cm<sup>2</sup>, obteniendo mediante torsionado en frío o directamente de acería:

- Corrugaciones de acuerdo a la norma ASTM A 615.
- Carga de rotura mínima 5.900 Kg/cm<sup>2</sup>.

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg CIP N° 10717

INFORME DPA SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 50 DE OBRA	Fecha: Febrero - 2019
		Página: 17 de 18

- Elongación en 20 cm. mínimo 8%  
Las mallas de acero soldado deberán ser formadas mediante el soldado eléctrico de alambre perfilado de acero. En todo caso debe satisfacer la norma ASTM A 185.

### 07.03.07 LOSAS VACIADAS IN SITU

#### 07.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS

Ver ITEM 07.03.04.02

#### 07.03.07.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2

Ver ITEM 07.03.06.03


### 07.04.07 MANIOBRA DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS PUNTES

#### 07.04.07.01 TRANSPORTE DE PILOTE

Consiste en trasladar el pilote prefabricado del patio de elaboración a la zona propia de trabajo, para ello se utilizará un camión plataforma y una grúa de 30 ò 35 tn, el traslado implica el cuidado respectivo del pilote sin que sufra daño alguno , hasta posesionarlo en el área de su ubicación definitiva, todo ello de acuerdo a los planos y las Especificaciones Complementarias , es decir el Contratista proveerá y cumplirá con toda la tecnología necesaria a fin de garantizar un producto final seguro durable y garantizado.

#### 07.04.07.03 TRANSPORTE DE LOSA NERVADA

VER ITEM 07.04.07.01


  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

#### 07.04.07.06 DESCABEZADO DE PILOTAJE

Consiste en el proceso de adecuar el pilote en su posición y condición final que le permita integrarse físicamente a todo el conjunto del concreto del embarcadero (Puente) a través de la correspondiente acción mecánica superior como se indica en los planos y en las Especificaciones Complementarias, es decir el Contratista proveerá y cumplirá con toda la tecnología necesaria a fin de garantizar un producto final seguro, durable y correcto.

#### 07.04.07.08 COLOCACIÓN DE LOSA NERVADA


Consiste en el proceso de transporte de la losa Tipo I, II, III, IV y V prefabricada, colocación de losa nervada, que vienen a ser sub partidas para la ejecución del total de la partida descrita. Al efecto se detallará cada sub. partida, debiendo ponderarse el impacto económico por parte del supervisor al inicio de la obra tomando como base de cálculo la ponderación resultante del análisis de precios del Proyecto , esta actividad se relaciona de manera estrecha con el producto final que debe seguir lo señalado en los planos , Especificaciones Complementarias, Especificaciones Específicas y cumpliendo la normatividad vigente, para ello el Contratista utilizará el personal, equipo , materiales , logística apropiada es decir el Contratista proveerá y cumplirá con toda la tecnología necesaria a fin de garantizar un producto final seguro , durable y correcto

  
 ISAIAS JORCOZ ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

CONSORCIO SAN JOSE	Informe Mensual de Valorización N° 50 DE OBRA	Fecha: Febrero - 2019
		Página: 18 de 18


Estas losas prefabricadas deben soportar la carga una grúa de 30 toneladas en el proceso de hincado de pilotes. Las características estructurales están definidas en los planos y en las Especificaciones complementarias.

En cuanto al transporte consiste en trasladar la losa prefabricada del patio de elaboración a la zona propia de trabajo, para ello se utilizará un camión plataforma y una grúa de 30 a 35 tn, el traslado implica el cuidado respectivo de la losa sin que sufra daño alguno, hasta posesionarla en el área de su ubicación definitiva, todo ello de acuerdo a los planos del Proyecto a las Especificaciones Complementarias, es decir el Contratista proveerá y cumplirá con toda la tecnología necesaria a fin de garantizar un producto final seguro durable y garantizado.


  
-----  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUÍÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335


---

INFORME DPA SAN JOSE – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

# Resumen de Valorización N°50 - Febrero

  
-----  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

**RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N° 50  
AL MES DE FEBRERO DEL 2019**


OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

PROPIETARIO: FONDEPES  
 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE  
 SUPERVISIÓN: CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA  
 ING. RESIDENTE: JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
 ING. SUPERVISOR: ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 FECHA PPTO. BASE : JUNIO 2014

MONTO DEL CONTRATO SIN IGV : S/. 27,506,466.29  
 MONTO DEL CONTRATO CON IGV : S/. 32,457,630.22

CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	VAL. ACUM. ANTERIOR	VAL. ACTUAL	VAL. ACUM. ACTUAL	% AVANCE	SAIDO POR VALORIZAR
TOTAL CONTRACTUAL SIN IGV	27,506,466.29					
VALORIZACION CONTRACTUAL		17,283,764.17	135,028.26	17,418,792.43	63.33%	36.67%
	Avanc. Fisico	62.84%	0.49%	63.33%		
	Avanc. Program.	68.58%	0.22%	68.79%		
REAJUSTES		946,131.11	19,626.59	965,757.70		
VALORIZACION BRUTA		18,229,895.28	154,654.85	18,384,550.13		
AMORTIZACIONES		3,538,121.77	20,783.70	3,558,905.47		
DEDUCCION DE REAJUSTE POR ADELANTO DIRECTO		63,133.22	3,032.58	66,165.80		
DEL ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00		
TOTAL AMORTIZACIONES		3,601,254.99	23,816.28	3,625,071.27		
VALORIZACION NETA		14,628,640.29	130,838.57	14,759,478.86		
I.G.V. (18%)	4,951,163.93	2,633,155.25	23,550.94	2,656,706.19		
<b>TOTALES</b>	<b>32,457,630.22</b>	<b>17,261,795.54</b>	<b>154,389.51</b>	<b>17,416,185.05</b>	<b>63.33%</b>	<b>36.67%</b>

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

## CONSORCIO SAN JOSE

### VALORIZACION DE OBRA N° 50 - FEBRERO 2019 RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

ENTIDAD EJECUTORA : FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 SUPERVISIÓN : CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA  
 INGENIERO RESIDENTE : JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO SUPERVISOR : ISAÍAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 MODALIDAD DE EJECUCION : A PRECIOS UNTARIOS


MONTO REFERENCIAL 33,504,650.56 INC. IGV  
 MONTO CONTRATADO 32,457,630.22 INC. IGV

ADELANTOS OTORGADOS	FECHA	MONTO C/IGV	MONTO S/IGV	% PRESUPUESTO
1.- Adelanto Directo	09/01/2015	6,491,526.04	5,501,293.26	20.00%
2.- Adelanto de Materiales				
<b>TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO</b>		<b>6,491,526.04</b>	<b>5,501,293.26</b>	<b>20.00%</b>

#### RESUMEN DE VALORIZACION AL MES DE FEBRERO DEL 2019

DESCRIPCION	MONTO S/.
<b>RESUMEN DE SUBTOTALES</b>	
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS	0.00
FORMULA 02 : ARQUITECTURA	0.00
FORMULA 03 : INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00
FORMULA 04 : INSTALACIONES SANITARIAS	0.00
FORMULA 05 : MITIGACION AMBIENTAL	0.00
FORMULA 06 : EQUIPAMIENTO	0.00
FORMULA 07 : OBRAS DE MAR	135,028.26
FORMULA 08 : PAVIMENTACION EXTERIOR	0.00
FORMULA 09 : INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION	0.00
FORMULA 10 : SEGURIDAD Y SALUD	0.00
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL</b>	<b>135,028.26</b>
FACTOR RELACION 1.000	135,028.26
<b>SUB-TOTAL VALORIZACION CONTRACTUAL</b>	<b>S/. 135,028.26</b>
<b>RESUMEN DE REAJUSTES</b>	
<b>(SE HA REAJUSTADO UTILIZANDO LOS INDICES UNIFICADOS PUBLICADO A LA FECHA -ENERO 2019)</b>	
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS Kr = 1.154	0.00
FORMULA 02 : ARQUITECTURA Kr = 1.144	0.00
FORMULA 03 : INSTALACIONES ELECTRICAS Kr = 1.155	0.00
FORMULA 04 : INSTALACIONES SANITARIAS Kr = 1.181	0.00
FORMULA 05 : MITIGACION AMBIENTAL Kr = 1.193	0.00
FORMULA 06 : EQUIPAMIENTO Kr = 1.194	0.00
FORMULA 07 : OBRAS DE MAR Kr = 1.149	19,626.59
FORMULA 08 : PAVIMENTACION EXTERIOR Kr = 1.124	0.00
FORMULA 09 : INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION Kr = 1.184	0.00
FORMULA 10 : SEGURIDAD Y SALUD Kr = 1.151	0.00
<b>REINTEGRO</b>	<b>19,626.59</b>
<b>DEDUCCIONES:</b>	
<b>- DEDUCCION DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DIRECTO</b>	
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS	0.00
FORMULA 02 : ARQUITECTURA	0.00
FORMULA 03 : INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00
FORMULA 04 : INSTALACIONES SANITARIAS	0.00
FORMULA 05 : MITIGACION AMBIENTAL	0.00
FORMULA 06 : EQUIPAMIENTO	0.00
FORMULA 07 : OBRAS DE MAR	3,032.58
FORMULA 08 : PAVIMENTACION EXTERIOR	0.00
FORMULA 09 : INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION	0.00
FORMULA 10 : SEGURIDAD Y SALUD	0.00
<b>DEDUCCION</b>	<b>3,032.58</b>
<b>VALORIZACION BRUTA (V.B.)</b>	<b>S/. 151,622.27</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>	
Amortización Adelantos Directos 20.00%	20,783.70
Amortización de Adelantos de materiales 0.00%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,783.70</b>
<b>VALORIZACION NETA (V.N.)</b>	<b>S/. 130,838.57</b>
<b>MONTO A FACTURAR Y PAGAR AL CONTRATISTA</b>	
IGV 18%(VN)	23,550.94
<b>TOTAL VN + IGV</b>	<b>S/. 154,389.51</b>

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

  
 ISAÍAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717



# **Valorización**

## **Nº 50 - Febrero**

# CONSORCIO SAN JOSE


## RESUMEN GENERAL DE VALORIZACION DE OBRA N° 50 - FEBRERO 2019


**OBRA** : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"  
**ENTIDAD** : FONDEPES  
**CONTRATISTA** : CONSORCIO SAN JOSE  
**FECHA** : FEBRERO DEL 2019

Monto Base	S/. 33,504,650.56	Residente	Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez
Monto Contratado	S/. 32,457,630.22	Supervisor	Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza
Fecha-Inicio de Obra	15-ene-15	<b>SEGÚN COSTO DIRECTO</b>	
Plazo de Ejecución	1,587 Días Calendarios	Monto Valorizado del Mes	: S/. 135,028.26 0.49%
Fecha-termino de Obra	20-may-18	Monto Valorizado Acumulado	: S/. 17,383,081.45 63.20%
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios	Monto-Saldo por Valorizar	: S/. 10,123,384.84 36.80%

<b>Ubicación</b>	
Región	: LAMBAYEQUE
Provincia	: LAMBAYEQUE
Distrito	: SAN JOSE
Localidad	: SAN JOSE

N°	DESCRIPCION	PARCIAL S/.	AVANCES											
			ACUMULADO ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
			%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.
01	SUB-PRESUPUESTO 01 ESTRUCTURAS	4,376,782.02	94.84%		4,142,352.10	0.00%		0.00	94.84%		4,142,352.10	5.38%		234,429.92
02	SUB-PRESUPUESTO 02 ARQUITECTURA	1,302,818.20	92.52%		1,205,394.04	0.00%		0.00	92.52%		1,205,394.04	7.48%		97,424.16
03	SUB-PRESUPUESTO 03 INSTALACIONES ELECTRICAS	852,518.87	38.60%		251,898.88	0.00%		0.00	38.60%		251,898.88	61.40%		400,621.09
04	SUB-PRESUPUESTO 04 INSTALACIONES SANITARIAS	1,260,852.15	83.58%		1,053,817.84	0.00%		0.00	83.58%		1,053,817.84	18.42%		207,034.31
05	SUB-PRESUPUESTO 05 MITIGACION AMBIENTAL	47,441.78	71.08%		33,714.06	0.00%		0.00	71.06%		33,714.06	28.94%		13,727.72
06	SUB-PRESUPUESTO 06 EQUIPAMIENTO	1,877,181.53	42.51%		712,941.50	0.00%		0.00	42.51%		712,941.50	67.49%		964,250.03
07	SUB-PRESUPUESTO 07 OBRAS EN MAR	17,421,512.15	53.18%		9,285,392.66	0.78%		135,028.26	53.96%		9,400,420.92	48.04%		8,021,091.23
08	SUB-PRESUPUESTO 08 PAVIMENTACION EXTERIOR	574,244.10	98.10%		563,361.88	0.00%		0.00	98.10%		563,361.88	1.90%		10,882.22
09	SUB-PRESUPUESTO 09 INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION	173,923.33	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	100.00%		173,923.33
10	SUB-PRESUPUESTO 10 SEGURIDAD Y SALUD	19,182.18	100.00%		19,182.18	0.00%		0.00	100.00%		19,182.18	0.00%		0.00
<b>TOTAL SIN IGV (S/.)</b>		<b>27,506,468.29</b>			<b>17,348,053.19</b>			<b>135,028.26</b>			<b>17,383,081.45</b>			<b>10,123,384.84</b>

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**VALORIZACION DE OBRA N° 50 - FEBRERO 2019 (FORMULA 01 - ESTRUCTURAS)**

OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE  
 ENTIDAD : FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 FECHA : FEBRERO DEL 2019

Monto Base	S/. 33,504,650.56
Monto Contratado	S/. 32,457,630.22
Fecha Inicio Obra	15-ene-15
Plazo de Ejecución	1,587 Días C.
Fecha Final Obra	20-may-19
Mod. de Ejecución	Precios Unitarios

Residente	Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quinonez		
Supervisor	Ing. Isafos Jorge Alva Espinoza		
<b>SEGÚN COSTO DIRECTO</b>			
Monto Valorizado del Mes	S/. 0.00	0.00%	
Monto Valorizado Acumulado	S/. 3,563,313.58	94.64%	
Monto-Saldo por Valorizar	S/. 201,660.18	5.36%	

<b>Ubicación</b>	
Región	: LAMBAYEQUE
Provincia	: LAMBAYEQUE
Distrito	: SAN JOSE
Localidad	: SAN JOSE

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR		AVANCES ACTUAL		ACUMULADO		SALDO		
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizada S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.
01	SUB-PRESUPUESTO 01 ESTRUCTURAS													
01.01	OBRAS PROVISIONALES													
01.01.01	OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANA	m2	600.00	28.72	17,232.00									
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20M X 3.60M.	und	2.00	1,134.14	2,268.28	100%	600.00	17232.00	0%	0.00	0.00	100%	600.00	17,232.00
01.01.03	CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DE OBRA	m	491.50	13.18	6,477.97	33%	2.00	2268.28	0%	0.00	0.00	100%	2.00	2,268.28
01.01.04	GUARDIANA EN OBRA	mes	18.00	6,000.00	108,000.00	100%	160.00	2108.80	0%	0.00	0.00	33%	160.00	2,108.80
01.01.05	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	GLB	1.00	88,451.78	88,451.78	100%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	18.00	108,000.00
01.01.06	POZO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	und	1.00	1,205.94	1,205.94	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	1,205.94
01.01.07	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00	100%	1.00	5000.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
01.01.08	ELECTRICIDAD PARA LA CONSTRUCCION	GLB	1.00	9,400.00	9,400.00	100%	1.00	9400.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	9,400.00
01.01.09	PLAN DE CONTINGENCIA	GLB	1.00	36,800.00	36,800.00	100%	1.00	36800.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	36,800.00
1.02	TRABAJOS PRELIMINARES													
1.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	6,749.50	0.69	4,657.16	100%	6,749.50	4657.16	0%	0.00	0.00	100%	6,749.50	4,657.16
1.02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	6,749.50	1.58	10,664.21	100%	6,749.50	10664.21	0%	0.00	0.00	100%	6,749.50	10,664.21
1.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
01.03.01	EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA	m3	11,138.33	4.56	50,790.78	100%	11,138.33	50790.78	0%	0.00	0.00	100%	11138.33	50,790.78
01.03.02	EXCAVACION DE ZANJA EN FORMA MANUAL	m3	716.49	27.38	19,617.50	100%	716.49	19617.50	0%	0.00	0.00	100%	716.49	19,617.50
01.03.03	MEJORAMIENTO CON PIEDRA OVER DE E+6" A 8" HASTA NIVEL +2.25	m2	6,776.00	23.60	159,913.60	100%	6,776.00	159913.60	0%	0.00	0.00	100%	6776.00	159,913.60
01.03.04	MEJORAMIENTO CON PIEDRA OVER DE E+6" A 8" HASTA NIVEL +2.50	m2	6,703.62	23.60	158,205.43	100%	6,703.62	158205.43	0%	0.00	0.00	100%	6703.62	158,205.43
01.03.05	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRA OVER DE 4" A 6" HASTA NIVEL +2.75	m2	6,632.01	23.60	156,515.44	100%	6,632.01	156515.44	0%	0.00	0.00	100%	6632.01	156,515.44
01.03.06	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRA OVER DE 4" A 6" HASTA NIVEL +3.00	m2	6,560.40	23.60	154,825.44	100%	6,560.40	154825.44	0%	0.00	0.00	100%	6560.40	154,825.44
01.03.07	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON AFIRMADO HASTA NIVEL +3.25	m2	6,488.02	15.99	103,743.44	100%	6,488.02	103743.44	0%	0.00	0.00	100%	6488.02	103,743.44
01.03.08	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON AFIRMADO HASTA NIVEL +3.50	m2	6,416.41	15.99	102,598.40	100%	6,416.41	102598.40	0%	0.00	0.00	100%	6416.41	102,598.40
01.03.09	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON AFIRMADO HASTA NIVEL +3.75	m2	6,344.03	15.99	101,441.04	100%	6,344.03	101441.04	0%	0.00	0.00	100%	6344.03	101,441.04
01.03.10	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON AFIRMADO HASTA NIVEL +4.00	m2	6,168.09	15.99	98,627.76	100%	6,168.09	98627.76	0%	0.00	0.00	100%	6168.09	98,627.76
01.03.11	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON AFIRMADO HASTA NIVEL +4.35	m2	5,929.43	20.12	119,300.13	100%	5,929.43	119300.13	0%	0.00	0.00	100%	5929.43	119,300.13
01.03.12	NIVELACION INTERIOR AFISONADO MANUAL	m2	3,890.14	1.53	5,951.91	88%	3,436.26	5257.48	0%	0.00	0.00	100%	3890.14	5,951.91
01.03.13	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 15 M3	m3	12,809.08	14.38	184,194.57	100%	12,809.08	184194.57	0%	0.00	0.00	88%	3436.26	5,257.48
01.03.14	BASE GRANULAR DE AFIRMADO E=15CM	m2	2,348.38	6.91	16,227.31	100%	2,348.38	16227.31	0%	0.00	0.00	100%	2348.38	16,227.31
01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE													
01.04.01	SOLADO													
01.04.01.01	SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON	m2	545.56	22.71	12,384.90	100%	544.56	12366.96	0%	0.00	0.00	100%	544.56	12,366.96
01.04.02	FALSA ZAPATA													
01.04.02.01	FALSA ZAPATA CONCRETO FC=140 KG/CM2 + 25%PM	m3	2.88	268.13	772.21	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
01.04.03	FALSO PISO													
01.04.03.01	FALSO PISO DE CONCRETO 1:10 E=10cm	m2	7.27	32.18	233.95	100%	7.27	233.95	0%	0.00	0.00	100%	7.27	233.95

REGR  
 INGENIERO CIVIL  
 N° 10717

JOSE OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 65335

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCES												
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	ACUMULADO ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO			
						%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	
	SUB-PRESUPUESTO 01																	
01	ESTRUCTURAS																	
01.04.04	CIEMENTOS CORRIDOS																	
01.04.04.01	CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIEMENTOS CORRIDOS	m3	269.64	158.70	42,791.87	100%	269.64	42,791.87	0%	0.00	0.00	100%	269.64	42,791.87	0%	0.00	0.00	
01.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CONCRETO 1:10 + 30 % DE P.G. PARA CIEMENTOS	m2	557.40	34.30	19,118.82	100%	557.40	19,118.82	0%	0.00	0.00	100%	557.40	19,118.82	0%	0.00	0.00	
01.04.05	SOBRECIMENTOS																	
01.04.05.01	CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMENTOS	m3	2.81	245.24	689.12	100%	2.81	689.12	0%	0.00	0.00	100%	2.81	689.12	0%	0.00	0.00	
01.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m2	37.46	39.18	1,467.68	100%	37.46	1,467.68	0%	0.00	0.00	100%	37.46	1,467.68	0%	0.00	0.00	
01.04.06	DADOS																	
01.04.06.01	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS	m3	1.32	388.90	513.35	100%	1.32	513.35	0%	0.00	0.00	100%	1.32	513.35	0%	0.00	0.00	
01.04.07	CANALETAS																	
01.04.07.01	CONCRETO SIMPLE DE F'c=175 KG/CM2 PARA CANALETA	m3	29.28	289.39	8,473.34	100%	29.28	8,473.34	0%	0.00	0.00	100%	29.28	8,473.34	0%	0.00	0.00	
01.04.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CANALETAS	m2	399.05	23.17	9,245.99	100%	399.05	9,245.99	0%	0.00	0.00	100%	399.05	9,245.99	0%	0.00	0.00	
01.04.08	VEREDAS																	
01.04.08.01	CONCRETO EN VEREDAS F'c=175 KG/CM2 E=4", INC/ CAPA DE DESGASTE 1 CM	m2	343.48	48.43	16,634.74	62%	212.33	10,283.14	0%	0.00	0.00	62%	212.33	10,283.14	38%	131.15	6,351.59	
01.04.08.02	CONCRETO EN SARDINELES SUMERGIDOS F'c=175 KG/CM2	m3	5.49	297.48	1,633.17	49%	2.67	793.54	0%	0.00	0.00	49%	2.67	793.54	51%	2.62	839.63	
01.04.08.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VEREDAS	m2	52.28	28.33	1,481.05	75%	39.07	1,106.95	0%	0.00	0.00	75%	39.07	1,106.95	25%	13.21	374.14	
01.04.09	LOSA DE CONCRETO SIMPLE																	
01.04.09.01	CONCRETO PC=175 kg/cm2 E=0.10m.	m2	842.07	48.76	41,059.33	82%	688.13	33,553.12	0%	0.00	0.00	82%	688.13	33,553.12	18%	153.94	7,506.21	
01.04.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE CONCRETO	m2	198.42	27.14	5,385.12	30%	60.33	1,637.33	0%	0.00	0.00	30%	60.33	1,637.33	70%	138.09	3,747.79	
01.04.10	RAMPAS																	
01.04.10.01	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 EN RAMPAS	m3	0.54	295.00	159.30	100%	0.54	159.30	0%	0.00	0.00	100%	0.54	159.30	0%	0.00	0.00	
01.04.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS	m2	1.20	25.32	30.38	100%	1.20	30.38	0%	0.00	0.00	100%	1.20	30.38	0%	0.00	0.00	
01.04.11	GRADERIAS																	
01.04.11.01	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 EN GRADERIAS	m3	0.74	308.42	228.23	100%	0.74	228.23	0%	0.00	0.00	100%	0.74	228.23	0%	0.00	0.00	
01.04.11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIAS	m2	2.78	25.32	70.39	100%	2.78	70.26	0%	0.00	0.00	100%	2.78	70.26	0%	0.00	0.00	
01.04.12	CURADO																	
01.04.12.01	CURADO DE CONCRETO	m2	1,588.58	1.72	2,732.36	100%	1,588.58	2,732.36	0%	0.00	0.00	100%	1,588.58	2,732.36	0%	0.00	0.00	
01.04.13	SARDINEL PERALTADO																	
01.04.13.01	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 PARA SARDINEL PERALTADO	m3	15.90	286.95	4,562.51	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	15.90	4,562.51	
01.04.13.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL PERALTADO	m2	318.00	27.14	8,630.52	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	318.00	8,630.52	
01.04.13.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA SARDINEL PERALTADO	kg	10.74	3.73	40.06	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	10.74	40.06	
01.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO																	
01.05.01	ZAPATAS																	
01.05.01.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	291.46	368.28	107,338.89	100%	291.46	107,338.89	0%	0.00	0.00	100%	291.46	107,338.89	0%	0.00	0.00	
01.05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS	m2	695.34	34.82	24,211.74	96%	668.94	23,292.49	0%	0.00	0.00	96%	668.94	23,292.49	4%	26.40	919.25	
01.05.01.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS	kg	6,405.91	3.73	23,894.04	100%	6,405.91	23,894.04	0%	0.00	0.00	100%	6,405.91	23,894.04	0%	0.00	0.00	
01.05.02	LOSA DE CONCRETO RIGIDO																	
01.05.02.01	CONCRETO RIGIDO F'c=280 KG/CM2 PATIO DE MANIOBRAS	m3	422.83	523.33	221,279.62	100%	422.83	221,279.62	0%	0.00	0.00	100%	422.83	221,279.62	0%	0.00	0.00	
01.05.02.02	CONCRETO RIGIDO F'c=210 KG/CM2 AMBIENTES	m3	387.19	382.78	148,208.59	59%	229.66	87,907.55	0%	0.00	0.00	59%	229.66	87,907.55	41%	157.53	60,301.04	
01.05.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CONCRETO RIGIDO	m2	144.08	38.58	5,558.61	100%	144.08	5,558.61	0%	0.00	0.00	100%	144.08	5,558.61	0%	0.00	0.00	
01.05.02.05	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA CONCRETO RIGIDO	kg	43,465.92	3.73	162,127.88	94%	40,746.40	151,984.07	0%	0.00	0.00	94%	40,746.40	151,984.07	6%	2,719.52	10,143.81	
01.05.02.06	JUNTA TRANSVERSAL ACERO LISO 1/2"	m	343.20	14.92	5,120.54	86%	295.75	4,412.55	0%	0.00	0.00	86%	295.75	4,412.55	14%	47.45	708.00	
01.05.02.07	JUNTA LONGITUDINAL ACERO LISO 3/4"	m	365.58	15.74	5,754.23	89%	325.04	5,116.05	0%	0.00	0.00	89%	325.04	5,116.05	11%	40.55	638.18	
01.05.02.08	JUNTA DE DILATACION TERMOACERO LISO 1/2"	m	203.10	16.26	3,302.41	87%	177.45	2,885.34	0%	0.00	0.00	87%	177.45	2,885.34	13%	25.65	417.07	
01.05.03	SARDINEL PERALTADO																	
01.05.03.01	CONCRETO EN SARDINELES F'c=175 KG/CM2	m3	1.98	297.48	589.01	100%	1.98	589.01	0%	0.00	0.00	100%	1.98	589.01	0%	0.00	0.00	
01.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL PERALTADO	m2	39.59	27.14	1,074.47	64%	25.48	691.42	0%	0.00	0.00	64%	25.48	691.42	36%	14.11	383.05	
01.05.03.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA SARDINEL PERALTADO	kg	112.37	3.73	419.14	89%	99.59	371.47	0%	0.00	0.00	89%	99.59	371.47	11%	12.78	47.67	

Reg. Ch. 1077  
 INGENIERO CIVIL  
 ALVARO ALVAREZ  
 INGENIERO CIVIL

INGENIERO CIVIL  
 OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
 Reg. CIPN 6745

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCES												
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	ACUMULADO ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO			
						%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	
	SUB-PRESUPUESTO 01																	
01	ESTRUCTURAS																	
01.05.04	VIGAS DE CIMENTACION																	
01.05.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARAVIGAS DE CIMENTACION	m3	137.01	377.44	51,713.05	99%	135.27	51056.63	0%	0.00	0.00	99%	135.27	51,056.63	1%	1.74	656.42	
01.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGA DE CIMENTACION	m2	1,107.02	34.92	38,657.14	97%	1,074.95	37537.36	0%	0.00	0.00	97%	1,074.95	37,537.36	3%	32.07	1,119.78	
01.05.04.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS DE CIMENTACION	kg	18,691.72	3.73	69,720.12	100%	18,691.72	69,720.12	0%	0.00	0.00	100%	18,691.72	69,720.12	0%	0.00	0.00	
01.05.05	SOBRECIMIENTO REFORZADO																	
01.05.05.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO	m3	40.10	363.36	14,570.74	100%	40.10	14,570.74	0%	0.00	0.00	100%	40.10	14,570.74	0%	0.00	0.00	
01.05.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO	m2	528.04	29.56	15,608.86	100%	528.04	15,608.86	0%	0.00	0.00	100%	528.04	15,608.86	0%	0.00	0.00	
01.05.05.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO	kg	1,715.71	3.73	6,399.60	100%	1,715.71	6,399.58	0%	0.00	0.00	100%	1,715.71	6,399.58	0%	0.00	0.00	
01.05.06	COLUMNAS																	
01.05.06.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS	m3	117.81	409.47	48,239.66	100%	117.81	48,239.66	0%	0.00	0.00	100%	117.81	48,239.66	0%	0.00	0.00	
01.05.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	1,356.58	40.06	54,344.59	100%	1,356.58	54,344.59	0%	0.00	0.00	100%	1,356.58	54,344.59	0%	0.00	0.00	
01.05.06.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS	kg	26,365.27	3.73	98,342.46	100%	26,365.27	98,342.46	0%	0.00	0.00	100%	26,365.27	98,342.46	0%	0.00	0.00	
01.05.07	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO																	
01.05.07.01	CONCRETO EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO FC=175 KG/CM2	m3	12.62	359.05	4,531.21	100%	12.62	4,531.21	0%	0.00	0.00	100%	12.62	4,531.21	0%	0.00	0.00	
01.05.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m2	218.01	48.66	10,608.37	100%	218.01	10,608.37	0%	0.00	0.00	100%	218.01	10,608.37	0%	0.00	0.00	
01.05.07.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	kg	2,313.94	3.73	8,631.00	100%	2,313.94	8,631.00	0%	0.00	0.00	100%	2,313.94	8,631.00	0%	0.00	0.00	
01.05.08	VIGAS																	
01.05.08.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA VIGAS	m3	176.20	414.13	72,969.71	83%	146.33	60,598.27	0%	0.00	0.00	83%	146.33	60,598.27	17%	29.87	12,371.44	
01.05.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2	1,721.71	49.58	85,362.38	65%	1,120.08	55,533.39	0%	0.00	0.00	65%	1,120.08	55,533.39	35%	601.63	29,828.99	
01.05.08.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS	kg	21,991.26	3.73	82,027.40	100%	21,991.26	82,027.40	0%	0.00	0.00	100%	21,991.26	82,027.40	0%	0.00	0.00	
01.05.09	VIGAS DE CONFINAMIENTO																	
01.05.09.01	CONCRETO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO FC=175 KG/CM2	m3	2.30	337.18	775.51	100%	2.30	775.51	0%	0.00	0.00	100%	2.30	775.51	0%	0.00	0.00	
01.05.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	30.69	38.38	1,177.88	100%	30.69	1,177.88	0%	0.00	0.00	100%	30.69	1,177.88	0%	0.00	0.00	
01.05.09.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO	kg	301.55	3.73	1,124.78	100%	301.55	1,124.78	0%	0.00	0.00	100%	301.55	1,124.78	0%	0.00	0.00	
01.05.10	DINTELES																	
01.05.10.01	CONCRETO EN DINTELES FC=175 KG/CM2	m3	4.76	276.50	1,316.14	16%	0.77	212.46	0%	0.00	0.00	16%	0.77	212.46	84%	3.99	1,103.68	
01.05.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN DINTELES	m2	66.58	48.66	3,239.78	15%	9.85	479.47	0%	0.00	0.00	15%	9.85	479.47	85%	56.73	2,760.31	
01.05.10.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA DINTELES	kg	182.54	3.73	680.67	17%	31.18	116.30	0%	0.00	0.00	17%	31.18	116.30	83%	151.36	564.57	
01.05.11	LOSA MACIZA																	
01.05.11.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA FC=210 KG/CM2	m3	2.63	414.13	1,089.16	100%	2.63	1,089.16	0%	0.00	0.00	100%	2.63	1,089.16	0%	0.00	0.00	
01.05.11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA MACIZA	m2	7.50	49.58	371.85	100%	7.50	371.85	0%	0.00	0.00	100%	7.50	371.85	0%	0.00	0.00	
01.05.11.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSA MACIZA	kg	424.12	3.73	1,581.97	100%	424.12	1,581.97	0%	0.00	0.00	100%	424.12	1,581.97	0%	0.00	0.00	
01.05.12	LOSA ALIGERADA																	
01.05.12.01	CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS FC=210 KG/CM2	m3	134.83	380.51	51,304.16	100%	134.83	51,304.16	0%	0.00	0.00	100%	134.83	51,304.16	0%	0.00	0.00	
01.05.12.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS	m2	1,448.93	41.99	60,840.57	100%	1,448.93	60,840.57	0%	0.00	0.00	100%	1,448.93	60,840.57	0%	0.00	0.00	
01.05.12.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS ALIGERADAS	kg	10,051.77	3.73	37,493.10	93%	9,375.37	34,970.13	0%	0.00	0.00	93%	9,375.37	34,970.13	7%	676.40	2,522.97	
01.05.12.04	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO	und	12,111.00	3.72	45,052.92	100%	12,111.00	45,052.92	0%	0.00	0.00	100%	12,111.00	45,052.92	0%	0.00	0.00	
01.05.13	MANILUVIO																	
01.05.13.01	CONCRETO EN MANILUVIO DE FC=175 KG/CM2	m3	1.76	303.68	534.48	100%	1.76	534.48	0%	0.00	0.00	100%	1.76	534.48	0%	0.00	0.00	
01.05.13.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MANILUVIO	m2	33.55	46.82	1,570.81	100%	33.55	1,570.81	0%	0.00	0.00	100%	33.55	1,570.81	0%	0.00	0.00	
01.05.13.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA MANILUVIOS	kg	169.21	3.73	631.15	100%	169.21	631.15	0%	0.00	0.00	100%	169.21	631.15	0%	0.00	0.00	
01.05.14	TANQUE CISTERNA																	
01.05.14.01	CONCRETO EN TANQUE CISTERNA FC=210 KG/CM2	m3	39.89	432.92	17,269.18	100%	39.89	17,269.18	0%	0.00	0.00	100%	39.89	17,269.18	0%	0.00	0.00	
01.05.14.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CISTERNA	m2	255.00	36.27	9,248.65	100%	255.00	9,248.65	0%	0.00	0.00	100%	255.00	9,248.65	0%	0.00	0.00	
01.05.14.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA TANQUE CISTERNA	kg	4,297.36	3.73	16,029.15	86%	3,713.69	13,852.05	0%	0.00	0.00	86%	3,713.69	13,852.05	14%	583.67	2,177.11	
01.05.15	TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE Y SALADA																	
01.05.15.01	CONCRETO EN TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y SALADA FC=210 KG/CM2	m3	21.17	462.52	9,791.55	100%	21.17	9,791.55	0%	0.00	0.00	100%	21.17	9,791.55	0%	0.00	0.00	
01.05.15.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y SALADA	m2	151.18	43.87	6,632.27	100%	151.18	6,632.27	0%	0.00	0.00	100%	151.18	6,632.27	0%	0.00	0.00	
01.05.15.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y SALADA	kg	1,200.55	3.41	4,093.88	100%	1,200.55	4,093.88	0%	0.00	0.00	100%	1,200.55	4,093.88	0%	0.00	0.00	

ISAFAS - ORGANIZACION INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP N° 10717

JUDITH OSWALDO  
 FUENTES QUINONES  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP N° 10715

Nº	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ACUMULADO ANTERIOR		AVANCES			SALDO																
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	ACTUAL			ACUMULADO														
									%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.									
SUB-PRESUPUESTO 01																										
01	ESTRUCTURAS																									
01.05.16	TANQUE SEPTICO DESAGUE DOMESTICO																									
01.05.16.01	CONCRETO EN TANQUE SEPTICO-DESAGUES DOMESTICOS E INDUSTRIALES FC= 210	m3	8.23	367.94	3,028.15	100%	8.23	3028.15																		
01.05.16.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL PARA TANQUE SEPTICO-DESAGUES DOME	m2	44.82	38.58	1,729.16	100%	44.82	1729.16	0%	0.00	0.00	100%	8.23	3,028.15	0%	0.00										
01.05.16.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO TANQUE SEPTICO-DESAGUES DOMESTICOS E IN	kg	463.19	3.73	1,727.70	100%	463.19	1727.70	0%	0.00	0.00	100%	44.82	1,729.16	0%	0.00										
01.05.17	CAMARA DE REJAS																									
01.05.17.01	CONCRETO EN CAMARA DE REJAS FC= 210 KG/CM2	m3	2.62	432.92	1,134.25	76%	1.99	863.03	0%	0.00	0.00	100%	463.19	1,727.70	0%	0.00										
01.05.17.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN CAMARA DE REJAS	m2	25.77	36.27	934.68	52%	13.50	489.51	0%	0.00	0.00	76%	1.99	863.03	24%	0.63										
01.05.17.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA CAMARA DE REJAS	kg	106.63	3.73	397.73	100%	106.63	397.73	0%	0.00	0.00	52%	13.50	489.51	48%	12.27										
01.05.18	TRAMPA DE GRASA																									
01.05.18.01	CONCRETO FC= 210 KG/CM2 PARA TRAMPA DE GRASA	m3	3.76	385.82	1,450.68	84%	3.16	1219.04	0%	0.00	0.00	100%	106.63	397.73	0%	0.00										
01.05.18.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO PARA TRAMPA DE GRASA	m2	29.34	47.67	1,398.64	100%	29.34	1398.64	0%	0.00	0.00	84%	3.16	1,219.04	16%	0.60										
01.05.18.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA TRAMPA DE GRASA	kg	167.11	3.93	656.74	100%	167.11	656.74	0%	0.00	0.00	100%	29.34	1,398.64	0%	0.00										
01.05.19.01	CONCRETO FC= 210 KG/CM2 PARA EMISOR SUBMARINO	m3	20.27	385.82	7,820.57	77%	15.54	5993.71	0%	0.00	0.00	100%	167.11	656.74	0%	0.00										
01.05.19.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO PARA EMISOR SUBMARINO	m2	28.10	47.67	1,339.53	100%	28.10	1339.53	0%	0.00	0.00	77%	15.54	5,993.71	23%	4.74										
01.05.19.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA EMISOR SUBMARINO	kg	232.02	3.93	911.84	100%	232.02	911.84	0%	0.00	0.00	100%	28.10	1,339.53	0%	0.00										
01.05.20	TRAMPA DE SOLIDOS																									
01.05.20.01	CONCRETO FC= 210 KG/CM2 PARA TRAMPA DE SOLIDOS	m3	7.77	403.59	3,135.89	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	7.77										
01.05.20.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL PARA TRAMPA DE SOLIDOS	m2	15.40	43.67	675.60	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	15.40										
01.05.20.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA TRAMPA DE SOLIDOS	kg	493.88	3.73	1,842.17	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	493.88										
01.05.21.01	CONCRETO FC= 210 KG/CM2 PARA FILTRO BIOLÓGICO	m3	18.93	433.18	8,200.10	100%	18.93	8200.10	0%	0.00	0.00	100%	15.40	675.60	0%	0.00										
01.05.21.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL PARA FILTRO BIOLÓGICO	m2	128.40	38.58	4,953.67	100%	128.40	4953.67	0%	0.00	0.00	100%	18.93	8,200.10	0%	0.00										
01.05.21.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA FILTRO BIOLÓGICO	kg	1,619.82	3.73	6,787.93	52%	946.13	3529.07	0%	0.00	0.00	100%	128.40	4,953.67	0%	0.00										
01.06	MUROS Y TABIQUES																									
01.06.01	MURO DE SOGA LADRILLO KK 18 HUECOS DE 8X14X24 CEMENTO-ARENA 1:4, E=1.5 cm	m2	2,383.71	58.88	140,352.84	85%	2,026.33	119,310.29	0%	0.00	0.00	52%	946.13	3,529.07	48%	873.69										
01.06.02	MURO DE CABEZA LADRILLO KK 18 HUECOS DE 8X14X24 CEMENTO-ARENA 1:4, E=1.5 cm	m2	26.80	81.52	2,184.74	100%	26.80	2184.74	0%	0.00	0.00	85%	2,026.33	119,310.29	15%	357.38										
01.06.03	MURO DE CANTO LADRILLO KK 18 HUECOS DE 8X14X24 CEMENTO-ARENA 1:4, E=1.5 cm	m2	48.90	46.41	2,269.45	100%	48.90	2269.45	0%	0.00	0.00	100%	26.80	2,184.74	0%	0.00										
01.07	VARIOS																									
01.07.01	TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO FC=210 KG/CM2 0.70x0.70m	und	2.00	496.60	993.20	100%	2.00	993.20	0%	0.00	0.00	100%	48.90	2,269.45	0%	0.00										
01.07.02	TAPA METALICA DESMONTABLE PLATINA 1'X3/8"	und	2.00	496.60	993.20	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	2.00	993.20	0%	0.00										
01.07.03	ESCALERA METALICA TIPO GATO H=2.50M	und	3.00	556.60	1,669.80	67%	2.00	1113.20	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	2.00										
01.07.04	ESCALERA METALICA TIPO GATO H=2.00M	und	2.00	516.60	1,033.20	100%	2.00	1033.20	0%	0.00	0.00	67%	2.00	1,113.20	33%	1.00										
01.07.05	ESCALERA METALICA TIPO GATO H=1.20M	und	1.00	3,517.40	3,517.40	100%	1.00	3517.40	0%	0.00	0.00	100%	2.00	1,033.20	0%	0.00										
01.08	FLETES																									
01.08.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00	18,000.00	18,000.00	100%	1.00	18000.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	3,517.40	0%	0.00										
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>																										
GASTOS GENERALES (8.25 %)															3,764,973.78			3,563,313.58								
UTILIDAD (8.00%)															310,610.34			293,973.37			0.00		3,563,313.58			201,660.18
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>															4,376,782.02			4,142,352.04			0.00		4,142,352.04			16,636.96
I.G.V. (18.0 %)															787,820.76			745,623.37			0.00		745,623.37			16,132.81
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>															5,164,602.78			4,887,975.41			0.00		4,887,975.41			234,429.95
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (SIN IGV)</b>															787,820.76			745,623.37			0.00		745,623.37			42,197.39
I.G.V. (18.0 %)															4,376,782.02			4,142,352.04			0.00		4,142,352.04			276,627.34
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (CON IGV)</b>															5,164,602.78			4,887,975.41			0.00		4,887,975.41			276,627.34

REG. CIP N° 10747  
 REG. CIP N° 66335  
 REG. CIP N° 66335

SALES JORGE ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL

## VALORIZACION DE OBRA N° 50 - FEBRERO 2019 (FORMULA 02 - ARQUITECTURA)

**OBRA** : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"  
**ENTIDAD** : FONDEPES  
**CONTRATISTA** : CONSORCIO SAN JOSE  
**FECHA** : FEBRERO DEL 2019

Monto Base	S/. 33,504,650.56
Monto Contratado	S/. 32,457,630.22
Fecha Inicio Obra	15-ene-15
Plazo de Ejecución	1,587 Días C.
Fecha Final Obra	20-may-19
Mod. de Ejecución	Precios Unitarios

Residente	Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez		
Supervisor	Ing. Isafas Jorge Alva Espinoza		
<b>SEGÚN COSTO DIRECTO</b>			
Monto Valorizado del Mes	S/. 0.00	0.00%	
Monto Valorizado Acumulado	S/. 1,036,898.11	92.52%	
Monto-Saldo por Valorizar	S/. 83,805.72	7.48%	

<b>Ubicación</b>	
Región	: LAMBAYEQUE
Provincia	: LAMBAYEQUE
Distrito	: SAN JOSE
Localidad	: SAN JOSE

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCES													
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	ACUMULADO ANTERIOR				ACTUAL				ACUMULADO				SALDO	
						%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.		
	<b>SUB-PRESUPUESTO 02</b>																		
	ARQUITECTURA																		
2.01	TARRAJEO Y ENLUCIDOS																		
02.01.01	TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO CON CA, 1.5																		
02.01.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES	m2	200.96	35.52	7,138.10	100%	200.96	7,138.10	0%	0.00	0.00	100%	200.96	7,138.10	0%	0.00	0.00		
02.01.03	TARRAJEO EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTES	m2	764.05	29.87	22,822.17	85%	646.26	19,303.82	0%	0.00	0.00	85%	646.26	19,303.82	15%	117.79	3,518.36		
02.01.04	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES	m2	1,564.13	29.88	46,736.20	100%	1,564.13	46,736.20	0%	0.00	0.00	100%	1,564.13	46,736.20	0%	0.00	0.00		
02.01.05	TARRAJEO VIGAS MEZ. CA 1.5, E=1.5 CM	m2	2,392.01	26.09	62,407.54	90%	2,146.14	55,992.81	0%	0.00	0.00	90%	2,146.14	55,992.81	10%	245.87	6,414.74		
02.01.06	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS	m2	1,761.52	29.04	51,154.54	71%	1,257.27	36,511.24	0%	0.00	0.00	71%	1,257.27	36,511.24	29%	504.25	14,643.30		
02.01.07	VESTIDURA DE DERRAMES MEZ 1.5, E=1.5 cm	m	1,168.50	25.72	30,053.82	100%	1,168.50	30,053.82	0%	0.00	0.00	100%	1,168.50	30,053.82	0%	0.00	0.00		
02.01.08	TARRAJEO EN GRADAS 1.5, E=1.5 CM	m	1,104.46	17.18	18,974.62	40%	439.39	7,548.72	0%	0.00	0.00	40%	439.39	7,548.72	60%	665.07	11,425.90		
02.01.09	BRUÑAS S/DETALLES	m2	5.76	28.41	163.64	100%	5.76	163.64	0%	0.00	0.00	100%	5.76	163.64	0%	0.00	0.00		
02.01.10	CIELO-RASOS	m	3,122.55	5.26	16,424.61	100%	3,122.55	16,424.61	0%	0.00	0.00	100%	3,122.55	16,424.61	0%	0.00	0.00		
02.02.01	CIELORRASOS C/MEZ 1.4, E=1.5 cm	m2	1,533.61	34.57	53,016.90	100%	1,533.61	53,016.90	0%	0.00	0.00	100%	1,533.61	53,016.90	0%	0.00	0.00		
02.03.01	PISOS																		
02.03.02	CONTRAPISO DE Z.																		
02.03.03	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 30x30	m2	400.36	46.62	18,664.78	100%	400.36	18,664.78	0%	0.00	0.00	100%	400.36	18,664.78	0%	0.00	0.00		
02.03.04	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 40x40	m2	103.88	55.51	5,766.38	100%	103.88	5,766.38	0%	0.00	0.00	100%	103.88	5,766.38	0%	0.00	0.00		
02.03.05	PISO VINILICO	m2	82.56	60.91	5,028.73	100%	82.56	5,028.73	0%	0.00	0.00	100%	82.56	5,028.73	0%	0.00	0.00		
02.03.06	PISO DE CEMENTO PULIDO E=5CM	m2	213.92	38.58	8,253.03	91%	194.71	7,511.91	0%	0.00	0.00	91%	194.71	7,511.91	9%	19.21	741.12		
02.03.07	PISO CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE	m2	7.27	31.71	230.53	100%	7.27	230.53	0%	0.00	0.00	100%	7.27	230.53	0%	0.00	0.00		
02.03.08	PISO CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE Y ACABADO CON PINTURA EPOXICA	m2	156.75	32.22	5,050.49	100%	156.75	5,050.49	0%	0.00	0.00	100%	156.75	5,050.49	0%	0.00	0.00		
2.04	CONTRAZOCALOS																		
02.04.01	CONTRAZOCALO SANITARIO CON PINTURA EPOXICA H=0.1m.	m	1,034.15	45.42	46,971.09	97%	1,006.66	45,722.42	0%	0.00	0.00	97%	1,006.66	45,722.42	3%	27.49	1,248.67		
02.04.02	CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO H =0. 10 M	m	371.20	29.71	11,028.35	100%	371.20	11,028.35	0%	0.00	0.00	100%	371.20	11,028.35	0%	0.00	0.00		
02.04.03	CONTRAZOCALO DE MADERA (H=0.1 m.)	m	669.59	10.99	7,358.79	100%	669.59	7,358.79	0%	0.00	0.00	100%	669.59	7,358.79	0%	0.00	0.00		
2.05	ZOCALOS																		
02.05.01	ZOCALO DE CERAMICO 0.30x0.30m.																		
02.05.02	ZOCALO DE CERAMICA 40 X 40 CM	m2	143.26	14.45	2,070.11	100%	143.26	2,070.11	0%	0.00	0.00	100%	143.26	2,070.11	0%	0.00	0.00		
2.06	CUBIERTAS																		
02.06.01	CUBIERTAS	m2	48.17	83.22	4,008.71	71%	34.06	2,834.47	0%	0.00	0.00	71%	34.06	2,834.47	29%	14.11	1,174.23		
2.07	COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CMEZCLA																		
02.07.01	COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CMEZCLA	m2	1,712.53	35.56	60,897.57	100%	1,712.53	60,897.57	0%	0.00	0.00	100%	1,712.53	60,897.57	0%	0.00	0.00		
2.07	CARPINTERIA DE MADERA																		
02.07.01	CARPINTERIA DE MADERA																		
02.07.02	PUERTA APANELADA DE MADERA	m2	88.91	94.30	8,384.21	87%	77.31	7,290.33	0%	0.00	0.00	87%	77.31	7,290.33	13%	11.60	1,093.88		
02.07.03	TABIQUE DE MELAMINE CON MARCO DE ALUMINIO PARA BAÑOS Y VESTIDORES E=5CM	m2	28.80	110.09	3,170.59	100%	28.80	3,170.59	0%	0.00	0.00	100%	28.80	3,170.59	0%	0.00	0.00		
2.08	CARPINTERIA DE ALUMINIO																		
02.08.01	CARPINTERIA DE ALUMINIO	m2	9.60	63.81	612.58	100%	9.60	612.58	0%	0.00	0.00	100%	9.60	612.58	0%	0.00	0.00		

JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP N° 86335





**VALORIZACION DE OBRA N° 50 - FEBRERO 2019 (FORMULA 03 - INSTALACIONES ELECTRICAS)**

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"  
 ENTIDAD : FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 FECHA : FEBRERO DEL 2019

Monto Base	S/. 33,504,650.56
Monto Contratado	S/. 32,457,630.22
Fecha Inicio Obra	15-ene-15
Plazo de Ejecución	1,587 Días C.
Fecha Final Obra	20-may-19
Mod. de Ejecución	Precios Unitarios

Residente	Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiroz		
Supervisor	Ing. Isalas Jorge Alva Espinoza		
<b>SEGÚN COSTO DIRECTO</b>			
Monto Valorizado del Mes	S/. 0.00	0.00%	
Monto Valorizado Acumulado	S/. 216,685.47	38.60%	
Monto-Saldo por Valorizar	S/. 344,621.07	61.40%	

<b>Ubicación</b>	
Región	: LAMBAYEQUE
Provincia	: LAMBAYEQUE
Distrito	: SAN JOSE
Localidad	: SAN JOSE

Reg. CIP N° 101

Ing. J. OSWALDO FUENTES QUIROZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR		AVANCES				ACUMULADO		SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	ACTUAL		%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	
									Metrado	Valorizado S/.							
	SUB-PRESUPUESTO 03																
	INSTALACIONES ELECTRICAS																
	TRABAJOS PRELIMINARES																
03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m	3,494.65	1.41	4,927.46	98%	3,424.32	4828.29	0%	0.00	0.00	98%	3424.32	4,828.29	2%	70.33	99.17
03.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	m	3,494.65	2.40	8,387.16	98%	3,424.32	8218.37	0%	0.00	0.00	98%	3424.32	8,218.37	2%	70.33	168.79
03.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
03.02.02	EXCAVACION DE ZANJA PARA RED DE TUBERIA	m3	793.12	27.38	21,715.63	73%	581.86	15931.22	0%	0.00	0.00	73%	581.86	15,931.22	27%	211.26	5,784.41
03.02.03	RELLENO DE ZANJAS Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	549.42	48.08	26,416.11	71%	391.62	18829.16	0%	0.00	0.00	71%	391.62	18,829.16	29%	157.80	7,586.95
03.03.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 15 M3	m3	316.81	14.38	4,555.73	78%	247.30	3556.24	0%	0.00	0.00	78%	247.30	3,556.24	22%	69.51	999.48
03.03.02	SALIDA DE ILUMINACION																
03.03.03	SALIDA PARA ALUMBRADO	pto	229.00	19.47	4,458.63	100%	229.00	4458.63	0%	0.00	0.00	100%	229.00	4,458.63	0%	0.00	0.00
03.04.01	SALIDA DE INTERRUPTOR																
03.04.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pza	38.00	28.95	1,100.10	100%	38.00	1100.10	0%	0.00	0.00	100%	38.00	1,100.10	0%	0.00	0.00
03.04.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pza	14.00	31.61	442.54	100%	14.00	442.54	0%	0.00	0.00	100%	14.00	442.54	0%	0.00	0.00
03.04.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE	pto	5.00	32.76	163.80	100%	5.00	163.80	0%	0.00	0.00	100%	5.00	163.80	0%	0.00	0.00
03.05.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE	pza	2.00	26.36	52.72	100%	2.00	52.72	0%	0.00	0.00	100%	2.00	52.72	0%	0.00	0.00
03.05.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON L/T PLASMA	pza	116.00	25.63	2,973.08	100%	116.00	2973.08	0%	0.00	0.00	100%	116.00	2,973.08	0%	0.00	0.00
03.06.01	SALIDA DE FUERZA																
03.06.02	SALIDA DE FUERZA	pto	10.00	80.62	806.20	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
03.07.01	EQUIPOS DE ILUMINACION	pto	4.00	13.19	52.76	100%	4.00	52.76	0%	0.00	0.00	100%	4.00	52.76	0%	0.00	0.00
03.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE RECT. PARA ADOSAR 2X35W	und	112.00	133.77	14,982.24	100%	112.00	14982.24	0%	0.00	0.00	100%	112.00	14,982.24	0%	0.00	0.00
03.07.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE CIRCULAR PARA ADOSAR 32W	und	21.00	109.67	2,303.07	100%	21.00	2303.07	0%	0.00	0.00	100%	21.00	2,303.07	0%	0.00	0.00
03.07.04	SUMINISTRO DE POSTES DE C.A.C. DE 8 MT. CON SIMPLE PASTORAL CON EQUIPO DE ILUM.	und	87.00	75.81	6,595.47	100%	87.00	6595.47	0%	0.00	0.00	100%	87.00	6,595.47	0%	0.00	0.00
03.07.05	SUM. DE POSTES DE C.A.C. DE 8 MT. CON SIMPLE PASTORAL C/EQUIPO DE ILUM. DE 250W	und	116.00	1,073.59	124,536.44	47%	55.00	59047.45	0%	0.00	0.00	47%	55.00	59,047.45	53%	61.00	65,488.99
03.08.01	TABLEROS Y CUCHILLAS																
03.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 36 POLOS - TRIFASICO	und	7.00	399.03	2,793.21	100%	7.00	2793.21	0%	0.00	0.00	100%	7.00	2,793.21	0%	0.00	0.00
03.08.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 24 POLOS - TRIFASICO	und	4.00	360.73	1,442.92	100%	4.00	1442.92	0%	0.00	0.00	100%	4.00	1,442.92	0%	0.00	0.00
03.08.04	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TIPO TORNILLO MONOF. 16 AMP.	und	36.00	42.60	1,533.60	86%	31.00	1320.60	0%	0.00	0.00	86%	31.00	1,320.60	14%	5.00	213.00
03.08.05	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TIPO TORNILLO TRIF. 15 AMP.	und	7.00	42.60	298.20	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	7.00	298.20
03.08.06	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TIPO TORNILLO TRIF. 20 AMP.	und	2.00	107.80	215.60	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	2.00	215.60
03.08.07	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TIPO TORNILLO TRIF. 30 AMP.	und	3.00	107.80	323.40	100%	3.00	323.40	0%	0.00	0.00	100%	3.00	323.40	0%	0.00	0.00
03.08.08	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TIPO TORNILLO TRIF. 40 AMP.	und	6.00	107.80	646.80	33%	2.00	215.60	0%	0.00	0.00	33%	2.00	215.60	67%	4.00	431.20
03.08.09	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TIPO TORNILLO TRIF. 50 AMP.	und	1.00	107.80	107.80	100%	1.00	107.80	0%	0.00	0.00	100%	1.00	107.80	0%	0.00	0.00
03.08.10	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TIPO TORNILLO TRIF. 60 AMP.	und	1.00	107.80	107.80	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	107.80
					359.51	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	359.51

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR		AVANCES			ACUMULADO		SALDO					
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	ACTUAL			%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	
									%	Metrado	Valorizado S/.							
	SUB-PRESUPUESTO 03																	
03.08.11	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO TORNILLO TRIF. 300 AMP.	und	1.00	389.51	389.51	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	389.51	
03.08.12	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A - 30m	und	37.00	227.80	8,428.60	100%	37.00	8428.60	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	
03.08.13	INTERRUPTOR HORARIO	und	1.00	274.69	274.69	100%	1.00	274.69	0%	0.00	0.00	100%	37.00	8,428.60	0%	0.00	0.00	
1.09	TUBERIAS DE PVC	und	1.00	274.69	274.69	100%	1.00	274.69	0%	0.00	0.00	100%	1.00	274.69	0%	0.00	0.00	
03.09.01	TUBERIA TIPO PVC SAP D=15mm	m	965.66	2.43	2,346.55	100%	965.66	2346.55	0%	0.00	0.00	100%	965.66	2,346.55	0%	0.00	0.00	
03.09.02	TUBERIA TIPO PVC SAP D=20mm	m	526.50	3.28	1,726.92	100%	526.50	1726.92	0%	0.00	0.00	100%	526.50	1,726.92	0%	0.00	0.00	
03.09.03	TUBERIA TIPO PVC SAP D=25mm	m	239.64	3.37	804.22	49%	118.10	398.00	0%	0.00	0.00	49%	118.10	398.00	51%	120.54	406.22	
03.09.04	TUBERIA TIPO PVC SAP D=50mm	m	95.88	18.87	1,809.26	100%	95.88	1809.26	0%	0.00	0.00	100%	95.88	1,809.26	0%	0.00	0.00	
03.09.05	TUBERIA TIPO PVC SAP D=100mm	m	12.00	35.06	420.72	100%	12.00	420.72	0%	0.00	0.00	100%	12.00	420.72	0%	0.00	0.00	
3.1	CABLE 8 LSOH	m	966.66	5.44	5,258.63	100%	966.66	5258.63	0%	0.00	0.00	100%	966.66	5,258.63	0%	0.00	0.00	
03.10.01	CABLE 2-1x2.5mm2 LSOH	m	103.10	9.80	1,010.38	100%	103.10	1010.38	0%	0.00	0.00	100%	103.10	1,010.38	0%	0.00	0.00	
03.10.02	CABLE 2-1x4.0mm2 LSOH + 1x4.0mm2 LSOH	m	336.85	10.12	3,408.92	100%	336.85	3408.92	0%	0.00	0.00	100%	336.85	3,408.92	0%	0.00	0.00	
03.10.03	CABLE 2-1x4.0mm2 LSOH + 1x4.0mm2 LSOH	m	1,034.85	8.96	9,272.26	1%	15.07	135.03	0%	0.00	0.00	1%	15.07	135.03	99%	1,019.78	9,137.23	
03.10.04	CABLE 3-1x2.5mm2 + 1x2.5mm2 LSOH	m	6.55	15.37	100.67	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	6.55	100.67	
03.10.05	CABLE 3-1x4.0mm2 + 1x4.0mm2 LSOH	m	25.90	16.84	436.16	19%	4.92	82.85	0%	0.00	0.00	19%	4.92	82.85	81%	20.98	353.30	
03.10.06	CABLE 3-1x6mm2 + 1x6mm2 LSOH	m	3.35	15.77	52.83	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	3.35	52.83	
03.10.07	CABLE 3-1x10mm2 + 1x10mm2 NYY	m	213.50	21.77	4,647.90	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	213.50	4,647.90	
03.11	CABLES NYY	m	25.14	27.44	689.84	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	25.14	689.84	
03.11.01	CABLE 2-1x4.0mm2 + 1x4.0mm2 NYY	m	95.00	332.16	31,555.20	100%	95.00	31,555.20	0%	0.00	0.00	100%	95.00	31,555.20	0%	0.00	0.00	
03.11.02	CABLE 2-1x6mm2 + 1x6mm2 NYY	m	76.80	16.93	1,300.22	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	76.80	1,300.22	
03.11.03	CABLE 2-1x10mm2 + 1x10mm2 NYY	m	98.60	198.31	19,553.37	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	98.60	19,553.37	
03.11.04	CABLE 3-1x6mm2 + 1x6mm2 NYY	m	5.00	307.51	1,537.55	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	5.00	1,537.55	
03.11.05	CABLE 3-1x75mm2 + 1x75mm2 NYY	m	10.00	429.31	4,293.10	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	10.00	4,293.10	
03.11.06	CABLE 3-1x175mm2 + 1x175mm2/T NYY	m	3.00	992.21	2,976.63	100%	3.00	2,976.63	0%	0.00	0.00	100%	3.00	2,976.63	0%	0.00	0.00	
03.11.07	CABLE 3-1x300mm2 + 300mm2/T NYY	m	1.00	70,023.41	70,023.41	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	70,023.41	
3.12	PUESTA A TIERRA	und	3.00	992.21	2,976.63	100%	3.00	2,976.63	0%	0.00	0.00	100%	3.00	2,976.63	0%	0.00	0.00	
03.12.01	POZO PUESTA A TIERRA	und	1.00	42,580.19	42,580.19	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	42,580.19	
03.13	DISTRIBUCION DE ENERGIA	und	1.00	40,307.87	40,307.87	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	40,307.87	
03.13.01	INSTALACION DE LINEAS DE MEDIA TENSION Y CONEXION A SUBESTACION	und	1.00	57,531.62	57,531.62	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	57,531.62	
03.13.02	INSTALACION DE CELDAS DE MEDIA TENSION CON EQUIPOS DE SECCIONAMIENTO Y PRO	und	1.00	48.00	19.22	922.56	100%	48.00	922.56	0%	0.00	0.00	100%	48.00	922.56	0%	0.00	0.00
03.13.03	INSTALACION TRANSFORMADOR DE 200 KVA	und	1.00	40,307.87	40,307.87	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	40,307.87	
03.13.04	INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO 80KW	und	1.00	57,531.62	57,531.62	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	57,531.62	
3.14	CAJAS DE PASE	und	1.00	48.00	19.22	922.56	100%	48.00	922.56	0%	0.00	0.00	100%	48.00	922.56	0%	0.00	0.00
03.14.01	SALIDA PARA CAJA DE PASE EN TECHO O PARED	pto	48.00	19.22	922.56	100%	48.00	922.56	0%	0.00	0.00	100%	48.00	922.56	0%	0.00	0.00	
03.14.02	CAJA DE PASE CUADRADA	und	31.00	29.70	920.70	100%	31.00	920.70	0%	0.00	0.00	100%	31.00	920.70	0%	0.00	0.00	
03.14.03	DUCTO DE CONCRETO DE 2 VIAS	und	12.00	54.92	659.04	100%	12.00	659.04	0%	0.00	0.00	100%	12.00	659.04	0%	0.00	0.00	
3.15	PRUEBAS ELECTRICAS	und	1.00	4,379.02	4,379.02	100%	1.00	4,379.02	0%	0.00	0.00	100%	1.00	4,379.02	0%	0.00	0.00	
03.15.01	PRUEBAS ELECTRICAS	und	1.00	4,379.02	4,379.02	100%	1.00	4,379.02	0%	0.00	0.00	100%	1.00	4,379.02	0%	0.00	0.00	
COSTO DIRECTO TOTAL					561,306.56			216,685.47		0.00			216,685.47					344,621.07
GASTOS GENERALES (8.25 %)					46,307.79			17,876.55		0.00			17,876.55					28,431.24
UTILIDAD (8.00%)					44,904.52			17,334.84		0.00			17,334.84					27,569.69
SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO					652,518.87			251,896.86		0.00			251,896.86					400,622.00
I.G.V. (18.0 %)					117,453.40			45,341.43		0.00			45,341.43					72,111.96
TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO					769,972.27			297,238.29		0.00			297,238.29					472,733.96
VALORIZACION CONTRACTUAL (SIN IGTV)					652,518.87			251,896.86		0.00			251,896.86					400,622.00
I.G.V. (18.0 %)					117,453.40			45,341.43		0.00			45,341.43					72,111.96
VALORIZACION CONTRACTUAL (CON IGTV)					769,972.27			297,238.29		0.00			297,238.29					472,733.96

Reg. CIP N° 10111

JEFE DE OFICINA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 60335

**VALORIZACION DE OBRA N° 50 - FEBRERO 2019 (FORMULA 04 - INSTALACIONES SANITARIAS)**

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"  
 ENTIDAD : FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 FECHA : FEBRERO DEL 2019

Monto Base	S/. 33,504,650.56
Monto Contratado	S/. 32,457,630.22
Fecha Inicio Obra	15-ene-15
Plazo de Ejecución	1,587 Días C.
Fecha Final Obra	20-may-19
Mod. de Ejecución	Precios Unitarios

Residente	Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez		
Supervisor	Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza		
<b>SEGÚN COSTO DIRECTO</b>			
Monto Valorizado del Mes	S/. 0.00	0.00%	
Monto Valorizado Acumulado	S/. 906,509.95	83.58%	
Monto-Saldo por Valorizar	S/. 178,094.03	16.42%	

<b>Ubicación</b>	
Región	: LAMBAYEQUE
Provincia	: LAMBAYEQUE
Distrito	: SAN JOSE
Localidad	: SAN JOSE

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR		AVANCES				ACUMULADO		SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	ACTUAL		%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	
									Valorizado S/.	%							
<b>SUB-PRESUPUESTO 04</b>																	
<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>																	
04	SISTEMA DE DESAGUE DOMESTICO																
04.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES																
04.01.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO																
04.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m2	81.95	2.40	196.68	100%	81.95	196.68	0%	0.00	0.00	100%	81.95	196.68	0%	0.00	0.00
04.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO	m3	57.02	30.75	1,753.37	100%	57.02	1,753.37	0%	0.00	0.00	100%	57.02	1,753.37	0%	0.00	0.00
04.01.02.02	RELLENO DE ZANJAS Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	40.00	48.08	1,923.20	100%	40.00	1,923.20	0%	0.00	0.00	100%	40.00	1,923.20	0%	0.00	0.00
04.01.02.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/TUB CAJAS Y BUZONES	m2	81.95	1.51	123.74	100%	81.95	123.74	0%	0.00	0.00	100%	81.95	123.74	0%	0.00	0.00
04.01.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 15 M3	m3	22.15	14.38	318.52	100%	22.15	318.52	0%	0.00	0.00	100%	22.15	318.52	0%	0.00	0.00
04.01.03	SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION																
04.01.03.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL DE 4"	pto	14.00	44.02	616.28	100%	14.00	616.28	0%	0.00	0.00	100%	14.00	616.28	0%	0.00	0.00
04.01.03.02	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL DE 3"	pto	5.00	49.64	297.84	100%	5.00	297.84	0%	0.00	0.00	100%	5.00	297.84	0%	0.00	0.00
04.01.03.03	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL DE 2"	pto	30.00	41.88	1,256.40	100%	30.00	1,256.40	0%	0.00	0.00	100%	30.00	1,256.40	0%	0.00	0.00
04.01.03.04	SALIDA DE VENTILACION PVC SAL DE 2"	pto	43.00	35.60	1,539.40	35%	15.00	537.00	0%	0.00	0.00	35%	15.00	537.00	65%	28.00	1,002.40
04.01.04	TUBERIAS DE DESAGUE																
04.01.04.01	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 6"	m	68.40	17.92	1,225.73	42%	28.66	513.59	0%	0.00	0.00	42%	28.66	513.59	58%	39.74	712.14
04.01.04.02	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4"	m	165.91	14.09	2,336.26	100%	165.91	2,336.26	0%	0.00	0.00	100%	165.91	2,336.26	0%	0.00	0.00
04.01.04.03	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 3"	m	34.82	13.61	473.90	91%	31.85	433.48	0%	0.00	0.00	91%	31.85	433.48	9%	2.97	40.42
04.01.04.04	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 2"	m	65.93	12.73	839.29	100%	65.93	839.29	0%	0.00	0.00	100%	65.93	839.29	0%	0.00	0.00
04.01.04.05	TUBERIA DE VENTILACION PVC SAL DE 2"	m	30.00	16.70	501.00	100%	30.00	501.00	0%	0.00	0.00	100%	30.00	501.00	0%	0.00	0.00
04.01.05	ACCESORIOS DE REDES																
04.01.05.01	YEE DE PVC SAL DE 4" A 4"	und	26.00	16.70	434.20	77%	20.00	334.00	0%	0.00	0.00	77%	20.00	334.00	23%	6.00	100.20
04.01.05.02	YEE DE PVC SAL DE 4" A 3"	und	4.00	16.60	66.40	100%	4.00	66.40	0%	0.00	0.00	100%	4.00	66.40	0%	0.00	0.00
04.01.05.03	YEE DE PVC SAL DE 4" A 2"	und	21.00	16.20	340.20	100%	21.00	340.20	0%	0.00	0.00	100%	21.00	340.20	0%	0.00	0.00
04.01.05.04	YEE DE PVC SAL DE 3" A 3"	und	4.00	14.60	58.40	100%	4.00	58.40	0%	0.00	0.00	100%	4.00	58.40	0%	0.00	0.00
04.01.05.05	YEE DE PVC SAL DE 3" A 2"	und	3.00	14.00	182.00	100%	3.00	182.00	0%	0.00	0.00	100%	3.00	182.00	0%	0.00	0.00
04.01.05.06	YEE DE PVC SAL DE 2" A 2"	und	3.00	12.60	37.80	100%	3.00	37.80	0%	0.00	0.00	100%	3.00	37.80	0%	0.00	0.00
04.01.05.07	CODO DE PVC SAL DE 4"X45°	und	8.00	24.05	192.40	100%	8.00	192.40	0%	0.00	0.00	100%	8.00	192.40	0%	0.00	0.00
04.01.05.08	CODO DE PVC SAL DE 3"X45°	und	2.00	22.78	45.56	100%	2.00	45.56	0%	0.00	0.00	100%	2.00	45.56	0%	0.00	0.00
04.01.05.09	CODO DE PVC SAL DE 2"X45°	und	34.00	22.28	757.52	100%	34.00	757.52	0%	0.00	0.00	100%	34.00	757.52	0%	0.00	0.00
04.01.05.10	CODO DE PVC SAL DE 3"X90°	und	13.00	22.78	296.14	100%	13.00	296.14	0%	0.00	0.00	100%	13.00	296.14	0%	0.00	0.00
04.01.05.11	CODO DE PVC SAL DE 2"X90°	und	56.00	22.78	1,247.68	100%	56.00	1,247.68	0%	0.00	0.00	100%	56.00	1,247.68	0%	0.00	0.00
04.01.05.12	TEE DE PVC SAL DE 4"	und	14.00	24.28	339.92	50%	7.00	169.96	0%	0.00	0.00	50%	7.00	169.96	50%	7.00	169.96
04.01.05.13	TEE DE PVC SAL DE 2"	und	18.00	22.38	402.84	100%	18.00	402.84	0%	0.00	0.00	100%	18.00	402.84	0%	0.00	0.00
04.01.05.14	REDUCCION DE PVC 4" X 2"	und	14.00	24.58	344.12	7%	1.00	24.58	0%	0.00	0.00	7%	1.00	24.58	93%	13.00	319.54
04.01.05.15	REDUCCION DE PVC 3" X 2"	und	6.00	23.21	139.26	100%	6.00	139.26	0%	0.00	0.00	100%	6.00	139.26	0%	0.00	0.00
04.01.06	ADITAMIENTOS VARIOS																
04.01.06.01	SUMIDERO BRONCE CROMADO DE 3"	und	3.00	18.95	56.85	100%	3.00	56.85	0%	0.00	0.00	100%	3.00	56.85	0%	0.00	0.00
04.01.06.02	SUMIDERO BRONCE CROMADO DE 2"	und	4.00	19.21	76.84	100%	4.00	76.84	0%	0.00	0.00	100%	4.00	76.84	0%	0.00	0.00

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCES											SALDO	
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	ACUMULADO ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			%	Metrado	Valorizado S/.	
						%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.				
<b>SUB-PRESUPUESTO 04</b>																		
04.01.06.03	REGISTROS DE BRONCE CROMADO DE 2"	pza	1.00	19.31	19.31	100%	1.00	19.31	0%	0.00	0.00	100%	1.00	19.31	0%	0.00	0.00	
04.01.06.04	REGISTROS DE BRONCE CROMADO 3"	pza	4.00	30.24	120.96	100%	4.00	120.96	0%	0.00	0.00	100%	4.00	120.96	0%	0.00	0.00	
04.01.06.05	REGISTROS DE BRONCE CROMADO DE 4"	pza	11.00	24.48	269.28	100%	11.00	269.28	0%	0.00	0.00	100%	11.00	269.28	0%	0.00	0.00	
04.01.06.06	SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2"	pza	43.00	9.93	426.99	35%	15.00	148.95	0%	0.00	0.00	100%	11.00	269.28	0%	0.00	0.00	
04.01.06.07	TRAMPA "P" PVC PARA DESAGUE DE 2"	und	14.00	15.97	223.58	100%	14.00	223.58	0%	0.00	0.00	35%	15.00	148.95	65%	28.00	278.04	
04.01.07	<b>CAMARA DE INSPECCION</b>											100%	14.00	223.58	0%	0.00	0.00	
04.01.07.01	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" C/TAPA DE CONCRETO	pza	8.00	156.97	1,255.76	100%	8.00	1,255.76	0%	0.00	0.00	100%	8.00	1,255.76	0%	0.00	0.00	
04.01.07.02	CAJA DE REGISTRO DESAGUE 18" X 24" C/TAPA DE CONCRETO	pza	2.00	190.97	381.94	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	8.00	1,255.76	0%	0.00	0.00	
04.01.08	<b>EMPALMES, LIMPIEZA Y DESINFECCION</b>											0%	0.00	0.00	100%	2.00	381.94	
04.01.08.01	EMPALME A RED EXISTENTE DE ALCANTARILLADO	und	1.00	192.61	192.61	100%	1.00	192.61	0%	0.00	0.00	100%	1.00	192.61	0%	0.00	0.00	
04.01.08.02	LIMPIEZA Y PRUEBA HIDRAULICAS DE RED DE DESAGUE	m	105.65	2.54	268.35	100%	105.65	268.35	0%	0.00	0.00	100%	105.65	268.35	0%	0.00	0.00	
4.02	<b>SISTEMA DE DESAGUE INDUSTRIAL</b>											100%	105.65	268.35	0%	0.00	0.00	
04.02.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>											100%	105.65	268.35	0%	0.00	0.00	
04.02.01.01	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	m2	468.30	2.40	1,123.92	26%	121.77	292.25	0%	0.00	0.00	26%	121.77	292.25	74%	346.53	831.67	
04.02.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>											100%	105.65	268.35	0%	0.00	0.00	
04.02.02.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO	m3	328.09	30.75	10,088.77	27%	87.49	2,690.29	0%	0.00	0.00	27%	87.49	2,690.29	73%	240.60	7,398.48	
04.02.02.02	RELLENO DE ZANJAS Y COMPACTADO	m3	185.20	48.08	8,904.42	25%	45.72	2,198.22	0%	0.00	0.00	25%	45.72	2,198.22	75%	139.48	6,706.20	
04.02.02.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/TUB CAJAS	m2	468.30	1.51	707.13	26%	121.77	183.87	0%	0.00	0.00	26%	121.77	183.87	74%	346.53	523.26	
04.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 15 M3	m3	185.71	14.38	2,670.51	29%	54.30	780.83	0%	0.00	0.00	29%	54.30	780.83	71%	131.41	1,889.68	
04.02.03	<b>SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION</b>											100%	105.65	268.35	0%	0.00	0.00	
04.02.03.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL DE 2"	pto	20.00	41.88	837.60	100%	20.00	837.60	0%	0.00	0.00	100%	20.00	837.60	0%	0.00	0.00	
04.02.04	<b>TUBERIAS DE DESAGUE</b>											100%	105.65	268.35	0%	0.00	0.00	
04.02.04.01	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4"	m	1,123.37	14.09	15,828.28	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1,123.37	15,828.28	
04.02.04.02	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 3"	m	4.39	13.61	59.75	100%	4.39	59.75	0%	0.00	0.00	100%	4.39	59.75	0%	0.00	0.00	
04.02.04.03	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 2"	m	29.94	12.73	381.14	100%	29.94	381.14	0%	0.00	0.00	100%	29.94	381.14	0%	0.00	0.00	
04.02.05	<b>ACCESORIOS DE REDES</b>											100%	105.65	268.35	0%	0.00	0.00	
04.02.05.01	YEE DE PVC SAL DE 3" A 2"	und	2.00	14.00	28.00	100%	2.00	28.00	0%	0.00	0.00	100%	2.00	28.00	0%	0.00	0.00	
04.02.05.02	YEE DE PVC SAL DE 2" A 2"	und	7.00	12.60	88.20	100%	7.00	88.20	0%	0.00	0.00	100%	7.00	88.20	0%	0.00	0.00	
04.02.05.03	CODO DE PVC SAL DE 4"X45°	und	8.00	24.05	192.40	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	8.00	192.40	
04.02.05.04	CODO DE PVC SAL DE 2"X90°	und	23.00	22.28	512.44	100%	23.00	512.44	0%	0.00	0.00	100%	23.00	512.44	0%	0.00	0.00	
04.02.06	<b>ADITAMIENTOS VARIOS</b>											100%	105.65	268.35	0%	0.00	0.00	
04.02.06.01	SUMIDERO BRONCE CROMADO DE 4"	und	11.00	31.75	349.25	27%	3.00	95.25	0%	0.00	0.00	27%	3.00	95.25	73%	8.00	254.00	
04.02.06.02	SUMIDERO BRONCE CROMADO DE 3"	und	1.00	18.95	18.95	100%	1.00	18.95	0%	0.00	0.00	100%	1.00	18.95	0%	0.00	0.00	
04.02.06.03	SUMIDERO BRONCE CROMADO DE 2"	und	6.00	19.21	115.26	83%	5.00	96.05	0%	0.00	0.00	83%	5.00	96.05	17%	1.00	19.21	
04.02.06.04	TRAMPA "P" PVC 2"	und	20.00	15.97	319.40	50%	10.00	159.70	0%	0.00	0.00	50%	10.00	159.70	50%	10.00	159.70	
04.02.07	<b>CAMARA DE INSPECCION</b>											100%	105.65	268.35	0%	0.00	0.00	
04.02.07.01	CAJA DE REGISTRO 18" X 24" C/TAPA DE CONCRETO	pza	12.00	190.97	2,291.64	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	12.00	2,291.64	
04.02.07.02	CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" C/TAPA DE CONCRETO	pza	11.00	156.97	1,726.67	100%	11.00	1,726.67	0%	0.00	0.00	100%	11.00	1,726.67	0%	0.00	0.00	
04.02.08	<b>EMPALMES, LIMPIEZA Y DESINFECCION</b>											100%	105.65	268.35	0%	0.00	0.00	
04.02.08.01	EMPALME A RED EXISTENTE DE ALCANTARILLADO	und	1.00	192.61	192.61	100%	1.00	192.61	0%	0.00	0.00	100%	1.00	192.61	0%	0.00	0.00	
04.02.08.02	LIMPIEZA Y PRUEBA HIDRAULICAS DE RED DE DESAGUE	m	691.15	2.54	1,755.52	41%	285.72	725.72	0%	0.00	0.00	41%	285.72	725.72	59%	405.44	1,029.80	
4.03	<b>SISTEMA DE AGUA FRIA</b>											100%	105.65	268.35	0%	0.00	0.00	
04.03.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>											100%	105.65	268.35	0%	0.00	0.00	
04.03.01.01	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	m	1,456.31	2.40	3,495.14	49%	707.63	1,698.31	0%	0.00	0.00	49%	707.63	1,698.31	51%	748.68	1,796.83	
04.03.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>											100%	105.65	268.35	0%	0.00	0.00	
04.03.02.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES SANITARIAS	m	1,456.31	24.64	35,883.48	49%	707.63	17,436.00	0%	0.00	0.00	49%	707.63	17,436.00	51%	748.68	18,447.48	
04.03.02.02	RELLENO DE ZANJAS Y COMPACTADO	m	1,456.31	42.28	61,572.79	49%	707.63	29,918.60	0%	0.00	0.00	49%	707.63	29,918.60	51%	748.68	31,654.19	
04.03.02.03	REFINE Y NIVELACION ZANJA PARA TUBERIA	m	1,456.31	1.25	1,820.39	49%	707.63	884.54	0%	0.00	0.00	49%	707.63	884.54	51%	748.68	935.85	
04.03.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 15 M3	m3	37.86	14.38	544.43	97%	36.80	529.18	0%	0.00	0.00	97%	36.80	529.18	3%	1.06	15.24	
04.03.03	<b>SALIDAS</b>											100%	105.65	268.35	0%	0.00	0.00	
04.03.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC-SAP C-10 DE 1/2"	pto	80.00	26.95	2,156.00	100%	80.00	2,156.00	0%	0.00	0.00	100%	80.00	2,156.00	0%	0.00	0.00	
04.03.03.02	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC-SAP C-10 3/4"	pto	6.00	36.02	216.12	100%	6.00	216.12	0%	0.00	0.00	100%	6.00	216.12	0%	0.00	0.00	
04.03.04	<b>REDES DE ALIMENTACION DE AGUA FRIA</b>											100%	105.65	268.35	0%	0.00	0.00	

ISAIAS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

JULIO OSWALDO  
 JEFES DE DIVISION  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 63135

SAIAS JOY  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR		AVANCES			ACUMULADO		SALDO				
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	ACTUAL		%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	
									%	Metrado							Valorizado S/.
<b>SUB-PRESUPUESTO 04</b>																	
04.03.04.01	TUBERIA PVC C-10 DE 2 1/2"																
04.03.04.02	TUBERIA PVC C-10 DE 2"	m	11.32	19.79	224.02	44%	5.00	99.95	0%	0.00	0.00	44%	5.00	99.95	56%	6.32	125.07
04.03.04.03	TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/2"	m	96.94	15.85	1,536.50	100%	96.94	1536.50	0%	0.00	0.00	100%	96.94	1,536.50	0%	0.00	0.00
04.03.04.04	TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4"	m	18.24	11.30	206.11	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	18.24	206.11
04.03.04.05	TUBERIA PVC C-10 DE 1"	m	52.89	9.95	526.26	100%	52.89	526.26	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	52.89	526.26
04.03.04.06	TUBERIA PVC C-10 DE 3/4"	m	55.82	6.97	389.07	17%	9.47	66.01	0%	0.00	0.00	100%	52.89	526.26	0%	0.00	0.00
04.03.04.07	TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"	m	1,019.71	6.52	6,648.51	27%	274.47	1,789.54	0%	0.00	0.00	17%	9.47	66.01	83%	46.35	323.06
04.03.05	ACCESORIOS DE REDES	m	227.71	4.88	1,111.22	62%	140.94	687.79	0%	0.00	0.00	27%	274.47	1,789.54	73%	745.24	4,858.96
04.03.05.01	CODO DE PVC DE 1/2"																
04.03.05.02	CODO DE PVC DE 3/4"	und	105.00	3.92	411.60	91%	96.00	376.32	0%	0.00	0.00	91%	96.00	376.32	9%	9.00	35.28
04.03.05.03	CODO DE PVC DE 1"	und	18.00	3.93	70.74	100%	18.00	70.74	0%	0.00	0.00	100%	18.00	70.74	0%	0.00	0.00
04.03.05.04	CODO DE PVC DE 1 1/4"	und	2.00	4.18	8.36	100%	2.00	8.36	0%	0.00	0.00	100%	2.00	8.36	0%	0.00	0.00
04.03.05.05	CODO DE PVC DE 2"	und	4.00	4.72	18.88	100%	4.00	18.88	0%	0.00	0.00	100%	4.00	18.88	0%	0.00	0.00
04.03.05.06	CODO DE PVC DE 2 1/2"	und	4.00	5.33	21.32	100%	4.00	21.32	0%	0.00	0.00	100%	4.00	18.88	0%	0.00	0.00
04.03.05.07	TEE DE PVC DE 1/2"	und	3.00	6.31	18.93	67%	2.00	12.62	0%	0.00	0.00	100%	4.00	21.32	0%	0.00	0.00
04.03.05.08	TEE DE PVC DE 3/4"	und	13.00	3.92	50.96	69%	9.00	35.28	0%	0.00	0.00	67%	2.00	12.62	33%	1.00	6.31
04.03.05.09	TEE DE PVC DE 1 1/2"	und	33.00	4.47	147.51	100%	33.00	147.51	0%	0.00	0.00	69%	9.00	35.28	31%	4.00	15.68
04.03.05.10	REDUCCIONES DE PVC DE 2" - 1 1/2"	und	8.00	8.12	64.96	88%	7.00	56.84	0%	0.00	0.00	100%	33.00	147.51	0%	0.00	0.00
04.03.05.11	REDUCCION DE PVC DE 2" - 1 1/4"	und	1.00	22.97	22.97	100%	1.00	22.97	0%	0.00	0.00	88%	7.00	56.84	13%	1.00	8.12
04.03.05.12	REDUCCION DE PVC DE 1 1/2" - 1"	und	1.00	22.97	22.97	100%	1.00	22.97	0%	0.00	0.00	100%	1.00	22.97	0%	0.00	0.00
04.03.05.13	REDUCCION DE PVC DE 1 1/2" - 3/4"	und	3.00	22.39	67.17	100%	3.00	67.17	0%	0.00	0.00	100%	1.00	22.97	0%	0.00	0.00
04.03.05.14	REDUCCION DE PVC DE 1 1/2" - 1/2"	und	1.00	22.31	22.31	100%	1.00	22.31	0%	0.00	0.00	100%	3.00	67.17	0%	0.00	0.00
04.03.05.15	REDUCCION DE PVC DE 1 1/4" - 1"	und	3.00	22.31	66.93	33%	1.00	22.31	0%	0.00	0.00	33%	1.00	22.31	67%	2.00	44.62
04.03.05.16	REDUCCION DE PVC DE 1" - 3/4"	und	1.00	22.31	22.31	100%	1.00	22.31	0%	0.00	0.00	100%	1.00	22.31	0%	0.00	0.00
04.03.05.17	REDUCCION DE PVC DE 1" - 1/2"	und	4.00	22.21	88.84	100%	4.00	88.84	0%	0.00	0.00	100%	1.00	22.31	0%	0.00	0.00
04.03.05.18	REDUCCION DE PVC DE 2" - 3/4"	und	8.00	22.31	178.48	63%	5.00	111.55	0%	0.00	0.00	100%	4.00	88.84	0%	0.00	0.00
04.03.05.19	REDUCCION DE PVC DE 2" - 1/2"	und	2.00	26.71	53.42	100%	2.00	53.42	0%	0.00	0.00	63%	5.00	111.55	38%	3.00	66.93
04.03.05.20	REDUCCION DE PVC DE 3/4" - 1/2"	und	1.00	22.71	22.71	100%	1.00	22.71	0%	0.00	0.00	100%	2.00	53.42	0%	0.00	0.00
04.03.06	LLAVES Y VALVULAS	und	36.00	22.11	795.96	100%	36.00	795.96	0%	0.00	0.00	100%	1.00	22.71	0%	0.00	0.00
04.03.06.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4"	und	15.00	233.08	3,496.20	100%	15.00	3,496.20	0%	0.00	0.00	100%	36.00	795.96	0%	0.00	0.00
04.03.06.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 1/2"	und	3.00	88.74	266.22	100%	3.00	266.22	0%	0.00	0.00	100%	15.00	3,496.20	0%	0.00	0.00
04.03.06.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 2"	und	1.00	309.67	309.67	100%	1.00	309.67	0%	0.00	0.00	100%	3.00	266.22	0%	0.00	0.00
04.03.06.04	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 2"	und	1.00	141.16	141.16	100%	1.00	141.16	0%	0.00	0.00	100%	1.00	309.67	0%	0.00	0.00
04.03.06.05	GRIFO DE RIEGO DE 3/4"	und	1.00	141.16	141.16	100%	1.00	141.16	0%	0.00	0.00	100%	1.00	141.16	0%	0.00	0.00
04.04	SISTEMA DE AGUA SALADA	und	16.00	48.04	768.64	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	16.00	768.64
04.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES																
04.04.01.01	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	m	324.43	2.40	778.63	21%	67.60	162.24	0%	0.00	0.00	21%	67.60	162.24	79%	256.83	616.39
04.04.02	SALIDA DE AGUA SALADA																
04.04.02.01	SALIDA DE AGUA SALADA TUBERIA PVC-SAP C-10 DE 1/2"	pta	48.00	26.95	1,293.60	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	48.00	1,293.60
04.04.03	REDES DE ALIMENTACION DE AGUA SALADA																
04.04.03.01	TUBERIA PVC C-10 DE 3"	m	917.30	23.34	21,409.78	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	917.30	21,409.78
04.04.03.02	TUBERIA PVC C-10 DE 2 1/2"	m	9.75	19.79	192.95	57%	5.60	110.82	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	43%	4.15	82.13
04.04.03.03	TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/2"	m	6.30	11.30	71.19	32%	2.00	22.60	0%	0.00	0.00	57%	5.60	110.82	68%	4.30	48.59
04.04.03.04	TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4"	m	112.07	9.95	1,115.10	100%	112.07	1,115.10	0%	0.00	0.00	32%	2.00	22.60	0%	0.00	0.00
04.04.03.05	TUBERIA PVC C-10 DE 1"	m	21.60	6.97	150.55	9%	2.00	13.94	0%	0.00	0.00	100%	112.07	1,115.10	0%	0.00	0.00
04.04.03.06	TUBERIA PVC C-10 DE 3/4"	m	7.20	6.52	46.94	43%	3.10	20.21	0%	0.00	0.00	9%	2.00	13.94	91%	19.60	136.61
04.04.03.07	TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"	m	7.20	4.88	35.14	33%	2.40	11.71	0%	0.00	0.00	43%	3.10	20.21	57%	4.10	26.73
04.04.04	ACCESORIOS DE REDES																
04.04.04.01	CRUZ DE PVC 1 1/4"	und	3.00	5.22	15.66	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	33%	2.40	11.71	67%	4.80	23.42
04.04.04.02	CRUZ DE PVC 1"	und	3.00	4.82	14.46	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	3.00	15.66
04.04.04.03	CRUZ DE PVC 3/4"	und	1.00	4.48	4.48	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	3.00	14.46
04.04.04.04	CRUZ DE PVC 1/2"	und	1.00	4.09	4.09	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	4.48
04.04.04.05	CODO DE PVC DE 3"	und	5.00	6.22	31.10	20%	1.00	6.22	0%	0.00	0.00	20%	1.00	6.22	80%	4.00	24.88

INGENIERO CIVIL  
REG. CIP N° 65335

INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO						AVANCES						SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	ACUMULADO ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO					
						%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.
<b>SUB-PRESUPUESTO 04</b>																	
04.04.04.08	CODO DE PVC DE 2 1/2"	und	3.00	6.31	18.93	33%	1.00	6.31	0%	0.00	0.00	33%	1.00	6.31	67%	2.00	12.62
04.04.04.07	CODO DE PVC DE 1 1/2"	und	2.00	4.92	9.84	50%	1.00	4.92	0%	0.00	0.00	50%	1.00	4.92	50%	1.00	4.92
04.04.04.08	CODO DE PVC DE 1 1/4"	und	10.00	4.72	47.20	100%	10.00	47.20	0%	0.00	0.00	100%	10.00	47.20	0%	0.00	0.00
04.04.04.09	CODO DE PVC DE 1/2"	und	144.00	3.92	564.48	2%	3.00	11.76	0%	0.00	0.00	2%	3.00	11.76	98%	141.00	552.72
04.04.04.10	TEE DE PVC DE 1 1/4"	und	3.00	5.12	15.36	100%	3.00	15.36	0%	0.00	0.00	100%	3.00	15.36	0%	0.00	0.00
04.04.04.11	TEE DE PVC DE 1"	und	3.00	4.92	14.76	67%	2.00	9.84	0%	0.00	0.00	67%	2.00	9.84	33%	1.00	4.92
04.04.04.12	TEE DE PVC DE 3/4"	und	1.00	4.47	4.47	100%	1.00	4.47	0%	0.00	0.00	100%	1.00	4.47	0%	0.00	0.00
04.04.04.13	TEE DE PVC DE 1/2"	und	24.00	3.92	94.08	13%	3.00	11.76	0%	0.00	0.00	13%	3.00	11.76	88%	21.00	82.32
04.04.04.14	REDUCCION DE PVC DE 1 1/2" - 1 1/4"	und	1.00	22.46	22.46	100%	1.00	22.46	0%	0.00	0.00	100%	1.00	22.46	0%	0.00	0.00
04.04.04.15	REDUCCION DE PVC DE 1 1/4" - 1/2"	und	9.00	22.46	202.14	22%	2.00	44.92	0%	0.00	0.00	22%	2.00	44.92	78%	7.00	157.22
04.04.04.16	REDUCCION DE PVC DE 1 1/4" - 1"	und	2.00	22.31	44.62	100%	2.00	44.62	0%	0.00	0.00	100%	2.00	44.62	0%	0.00	0.00
04.04.04.17	REDUCCION DE PVC DE 1" - 3/4"	und	2.00	22.21	44.42	100%	2.00	44.42	0%	0.00	0.00	100%	2.00	44.42	0%	0.00	0.00
04.04.04.18	REDUCCION DE PVC DE 3/4" - 1/2"	und	2.00	22.11	44.22	50%	1.00	22.11	0%	0.00	0.00	50%	1.00	22.11	50%	1.00	22.11
04.04.05	LLAVES Y VALVULAS	und	1.00	205.43	205.43	100%	1.00	205.43	0%	0.00	0.00	100%	1.00	205.43	0%	0.00	0.00
04.04.05.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 3"	und	48.00	214.04	10,273.92	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	205.43	0%	0.00	0.00
04.04.05.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE 1/2"	und	1.00	154.61	154.61	100%	1.00	154.61	0%	0.00	0.00	100%	1.00	154.61	0%	0.00	0.00
04.04.05.03	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/4"	und	1.00	154.61	154.61	100%	1.00	154.61	0%	0.00	0.00	100%	1.00	154.61	0%	0.00	0.00
04.04.06	ACCESORIOS	und	1.00	154.61	154.61	100%	1.00	154.61	0%	0.00	0.00	100%	1.00	154.61	0%	0.00	0.00
04.04.06.01	ACCESORIOS PARA CASETA DE VALVULAS DE AGUA SALADA Y AGUA POTABLE	GLB	1.00	6,912.42	6,912.42	100%	1.00	6,912.42	0%	0.00	0.00	100%	1.00	6,912.42	0%	0.00	0.00
04.04.07	PRUEBA HIDRAULICA	GLB	1.00	6,912.42	6,912.42	100%	1.00	6,912.42	0%	0.00	0.00	100%	1.00	6,912.42	0%	0.00	0.00
04.04.07.01	PRUEBAS HIDROSTATICAS Y DE OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA FRIA Y DESM	m	1,081.42	3.17	3,428.10	18%	190.01	602.33	0%	0.00	0.00	18%	190.01	602.33	82%	891.41	2,825.77
04.04.08	OTROS	m	54.56	43.26	2,360.27	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	54.56	2,360.27
04.04.08.01	VIGUETAS DE ACERO 1/2"	m	54.56	43.26	2,360.27	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	54.56	2,360.27
04.05	EMISOR SUBMARINO	GLB	1.00	2,709.70	2,709.70	100%	1.00	2,709.70	0%	0.00	0.00	100%	1.00	2,709.70	0%	0.00	0.00
04.05.01	SUMINISTRO DE TUBERIAS	GLB	1.00	2,709.70	2,709.70	100%	1.00	2,709.70	0%	0.00	0.00	100%	1.00	2,709.70	0%	0.00	0.00
04.05.01.01	SUMINISTRO DE TUBERIA LISA HDPE DE 6"	m	3,455.00	90.64	313,161.20	100%	3,455.00	313,161.20	0%	0.00	0.00	100%	3,455.00	313,161.20	0%	0.00	0.00
04.05.01.02	SUMINISTRO DE TUBERIA LISA HDPE DE 6" CON PERFORACIONES	m	50.00	93.34	4,667.00	100%	50.00	4,667.00	0%	0.00	0.00	100%	50.00	4,667.00	0%	0.00	0.00
04.05.01.03	ACCESORIOS SUMINISTRO DE TUBERIAS HDPE	GLB	1.00	2,709.70	2,709.70	100%	1.00	2,709.70	0%	0.00	0.00	100%	1.00	2,709.70	0%	0.00	0.00
04.05.01.04	SUMINISTRO DE TUBERIA LISA HDPE PECC-100 Dext. 90mm LINEA AUXILIAR PARA MANIOBRA DE FLOTACION	m	5,901.94	47.57	280,755.29	100%	5,901.94	280,755.29	0%	0.00	0.00	100%	5,901.94	280,755.29	0%	0.00	0.00
04.05.02	BALASTRO DE CONCRETO	u	779.00	175.02	136,340.58	100%	779.00	136,340.58	0%	0.00	0.00	100%	779.00	136,340.58	0%	0.00	0.00
04.05.02.01	LASTRE DE CONCRETO DE 50 KG APROX. TIPO I SEPARACION 4.50 mtrs. c/u	u	779.00	175.02	136,340.58	100%	779.00	136,340.58	0%	0.00	0.00	100%	779.00	136,340.58	0%	0.00	0.00
04.05.03	TERMOFUSION	GLB	1.00	18,097.67	18,097.67	100%	1.00	18,097.67	0%	0.00	0.00	100%	1.00	18,097.67	0%	0.00	0.00
04.05.03.01	SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS LISA HDPE 6"	GLB	1.00	4,800.00	4,800.00	100%	1.00	4,800.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	4,800.00	0%	0.00	0.00
04.05.03.02	SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS DE 90mm PN-10 (LINEAS AUXILIARES DE FLOTACION)	GLB	1.00	4,800.00	4,800.00	100%	1.00	4,800.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	4,800.00	0%	0.00	0.00
04.05.04	ULTRASONIDO - CONTROL DE CALIDAD	GLB	1.00	12,000.00	12,000.00	100%	1.00	12,000.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	12,000.00	0%	0.00	0.00
04.05.04.01	INSPECCION ULTRASONICA DE JUNTA	GLB	1.00	12,000.00	12,000.00	100%	1.00	12,000.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	12,000.00	0%	0.00	0.00
04.05.05	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO	GLB	1.00	7,689.60	7,689.60	100%	1.00	7,689.60	0%	0.00	0.00	100%	1.00	7,689.60	0%	0.00	0.00
04.05.05.01	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO DE LINEA	GLB	1.00	7,689.60	7,689.60	100%	1.00	7,689.60	0%	0.00	0.00	100%	1.00	7,689.60	0%	0.00	0.00
04.05.05.02	FIJACION PRIMEROS METROS DE TUBERIA CON CONCRETO	m3	5.00	576.00	2,880.00	100%	5.00	2,880.00	0%	0.00	0.00	100%	5.00	2,880.00	0%	0.00	0.00
04.05.05.03	PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA EMISOR SUBMARINO	GLB	1.00	8,000.00	8,000.00	100%	1.00	8,000.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	8,000.00	0%	0.00	0.00
04.05.06	EQUIPOS DE BOMBEO	und	1.00	6,202.00	6,202.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	6,202.00
04.05.06.01	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 3HP, Q= 4.5 l/s	und	1.00	6,202.00	6,202.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	6,202.00
04.05.07	OBRAS COMPLEMENTARIAS	und	1.00	1,796.45	1,796.45	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	1,796.45
04.05.07.01	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 6"	m	66.30	17.92	1,188.10	100%	66.30	1,188.10	0%	0.00	0.00	100%	66.30	1,188.10	0%	0.00	0.00
04.05.07.02	BUZON Dint=1.20 M Hsup=2.10 M Htub=1.60 M, CEMENTO	und	1.00	1,796.45	1,796.45	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	1,796.45
04.06	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	und	1.00	1,796.45	1,796.45	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	1,796.45
04.06.01	APARATOS SANITARIOS	und	1.00	1,796.45	1,796.45	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	1,796.45
04.06.01.01	INODORO LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO	und	14.00	284.50	3,983.00	100%	14.00	3,983.00	0%	0.00	0.00	100%	14.00	3,983.00	0%	0.00	0.00
04.06.01.02	LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO	und	20.00	173.27	3,465.40	100%	20.00	3,465.40	0%	0.00	0.00	100%	20.00	3,465.40	0%	0.00	0.00
04.06.01.03	URINARIO DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO	und	6.00	149.10	894.60	100%	6.00	894.60	0%	0.00	0.00	100%	6.00	894.60	0%	0.00	0.00
04.06.01.04	DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA	pza	9.00	48.23	434.07	100%	9.00	434.07	0%	0.00	0.00	100%	9.00	434.07	0%	0.00	0.00

FUNDACION SALDO  
 FUNDACION QUINONES  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP N° 66395

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			AVANCES						SALDO						
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		%	Metrado	Valorizado S/.			
						%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.						
<b>SUB-PRESUPUESTO 04</b>																	
04.06.01.05	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POSA 21"x25" C/ACCESORIOS	pza	3.00	230.00	690.00	100%	3.00	690.00	0%	0.00	0.00	100%	3.00	690.00	0%	0.00	0.00
04.06.02	ACCESORIOS SANITARIOS																
04.06.02.01	PAPELERA DE LOZA DE COLOR DE 15 X 15	pza	14.00	30.30	424.20	100%	14.00	424.20	0%	0.00	0.00	100%	14.00	424.20	0%	0.00	0.00
04.06.02.02	JABONERA TIPO BOLA	und	9.00	23.26	209.34	100%	9.00	209.34	0%	0.00	0.00	100%	9.00	209.34	0%	0.00	0.00
04.06.02.03	INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	pza	52.00	21.03	1,093.56	100%	52.00	1,093.56	0%	0.00	0.00	100%	52.00	1,093.56	0%	0.00	0.00
04.06.03	CONEXION A RED PUBLICA DE AGUA POTABLE																
04.06.03.01	CONEXION A RED PUBLICA DE AGUA POTABLE Daprox=300 m TUB. 3"	m	300.00	24.19	7,257.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	300.00	7,257.00
04.06.03.02	ACCESORIOS DE CONEXION A RED PUBLICA DE AGUA POTABLE	GLB	1.00	1,809.20	1,809.20	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	1,809.20
04.06.03.03	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	m	300.00	2.40	720.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	300.00	720.00
04.06.03.04	EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES SANITARIAS	m	300.00	24.64	7,392.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	300.00	7,392.00
04.06.03.05	RELLENO DE ZANJA Y COMPACTADO	m	300.00	42.28	12,684.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	300.00	12,684.00
04.06.03.06	REFINE Y NIVELACION ZANJA PARA TUBERIA	m	300.00	1.25	375.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	300.00	375.00
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>																	
GASTOS GENERALES (6.25 %)					1,084,604.00			906,509.95			0.00			906,509.95			178,094.03
UTILIDAD (8.00%)					89,479.83			74,787.07			0.00			74,787.07			14,692.76
					86,768.32			72,520.80			0.00			72,520.80			14,247.52
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>																	
I.G.V. (18.0 %)					1,260,852.15			1,053,817.82			0.00			1,053,817.82			207,034.31
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					226,953.39			189,687.21			0.00			189,687.21			37,266.18
					1,487,805.54			1,243,505.03			0.00			1,243,505.03			244,300.49
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (SIN IGV)</b>																	
I.G.V. (18.0 %)					1,260,852.15			1,053,817.82			0.00			1,053,817.82			207,034.31
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (CON IGV)</b>					226,953.39			189,687.21			0.00			189,687.21			37,266.18
					1,487,805.54			1,243,505.03			0.00			1,243,505.03			244,300.49

ISAIAS JORGE ALBA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

## VALORIZACION DE OBRA N° 50 - FEBRERO 2019 (FORMULA 05 - MITIGACION AMBIENTAL)

**OBRA** : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"  
**ENTIDAD** : FONDEPES  
**CONTRATISTA** : CONSORCIO SAN JOSE  
**FECHA** : FEBRERO DEL 2019

Monto Base	S/. 33,504,650.56
Monto Contratado	S/. 32,457,630.22
Fecha Inicio Obra	15-ene-15
Plazo de Ejecución	1,587 Días C.
Fecha Final Obra	20-may-19
Mod. de Ejecución	Precios Unitarios

<b>Residente</b>	Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez		
<b>Supervisor</b>	Ing. Isafas Jorge Alva Espinoza		
<b>SEGÚN COSTO DIRECTO</b>			
Monto Valorizado del Mes	S/. 0.00	0.00%	
Monto Valorizado Acumulado	S/. 29,001.33	71.06%	
Monto-Saldo por Valorizar	S/. 11,808.80	28.94%	

<b>Ubicación</b>	
Región	: LAMBAYEQUE
Provincia	: LAMBAYEQUE
Distrito	: SAN JOSE
Localidad	: SAN JOSE

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR		AVANCES			ACUMULADO		SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	ACTUAL		%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.
									Metrado	Valorizado S/.						
<b>SUB-PRESUPUESTO 05</b>																
	MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL															
	MEDIDAS DE CONCIENTIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL	GLB	1.00	1,745.00	1,745.00	100%	1.00	1,745.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	1,745.00	0%	0.00
	CARTEL DE MANEJO AMBIENTAL DE 1.00 X 0.50 DE PLANCHA GALVANIZADA	und	30.00	150.00	4,500.00	33%	10.00	1,500.00	0%	0.00	0.00	33%	10.00	1,500.00	67%	20.00
	INSTALACION PROVISIONAL DE LETRINA SANITARIA	pto	8.00	500.15	4,001.20	75%	6.00	3,000.90	0%	0.00	0.00	75%	6.00	3,000.90	25%	2.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR DE BASURA	und	20.00	300.00	6,000.00	90%	18.00	5,400.00	0%	0.00	0.00	90%	18.00	5,400.00	10%	2.00
	SEMBRIO DE PLANTONES ORNAMENTALES Y ESPECIES FORESTALES	und	25.00	21.22	530.50	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	25.00
	RECUPERACION DE AREAS VERDES AFECTADAS	m2	280.00	23.85	6,678.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	280.00
	LIMPIEZA FINAL Y RECOLECCION DE RESIDUOS	m2	3,500.00	1.25	4,375.00	100%	3,500.00	4,375.00	0%	0.00	0.00	100%	3,500.00	4,375.00	0%	0.00
	OPERACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00	100%	1.00	5,000.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	5,000.00	0%	0.00
	CONTROL DEL RUIDO	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00	100%	1.00	5,000.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	5,000.00	0%	0.00
	PREVENCIÓN DE RIESGO DE TRABAJADORES EN EMERGENCIA	GLB	1.00	2,980.43	2,980.43	100%	1.00	2,980.43	0%	0.00	0.00	100%	1.00	2,980.43	0%	0.00
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>																
GASTOS GENERALES (8.25 %)					40,810.13			29,001.33			0.00			29,001.33		11,808.80
UTILIDAD (8.00 %)					3,366.84			2,392.61			0.00			2,392.61		974.23
					3,264.91			2,320.11			0.00		2,320.11		944.70	
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>																
I.G.V. (18.0 %)					47,441.78			33,714.05			0.00			33,714.05		13,727.73
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					8,539.52			6,068.53			0.00			6,068.53		2,470.99
					55,981.30			39,782.58			0.00			39,782.58		16,198.72
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (SIN IGV)</b>																
I.G.V. (18.0 %)					47,441.78			33,714.05			0.00			33,714.05		13,727.73
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (CON IGV)</b>					8,539.52			6,068.53			0.00			6,068.53		2,470.99
					55,981.30			39,782.58			0.00			39,782.58		16,198.72

INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 68335



**VALORIZACION DE OBRA N° 50 -FEBRERO 2019 (FORMULA 06 - EQUIPAMIENTO)**

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"  
 ENTIDAD : FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 FECHA : FEBRERO DEL 2019

Monto Base	S/. 33,504,650.56
Monto Contratado	S/. 32,457,630.22
Fecha Inicio Obra	15-ene-15
Plazo de Ejecución	1,587 Días C.
Fecha Final Obra	20-may-19
Mod. de Ejecución	Precios Unitarios

Residente	Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quifonez		
Supervisor	Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza		
<b>SEGÚN COSTO DIRECTO</b>			
Monto Valorizado del Mes	S/. 0.00	0.00%	
Monto Valorizado Acumulado	S/. 613,283.00	42.51%	
Monto-Saldo por Valorizar	S/. 829,462.40	57.49%	

<b>Ubicación</b>	
Región	: LAMBAYEQUE
Provincia	: LAMBAYEQUE
Distrito	: SAN JOSE
Localidad	: SAN JOSE

ISAIAZ JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR		AVANCES ACTUAL			ACUMULADO		SALDO				
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.
<b>SUB-PRESUPUESTO 06</b>																	
<b>EQUIPAMIENTO</b>																	
<b>EQUIPO DE FRIO</b>																	
06.01.01	SUMINISTRO DE CAMARA DE CONSERVACION DE HIELO 20 TN	und	2.00	68,370.00	136,740.00	100%	2.00	136,740.00	0%	0.00	0.00	100%	2.00	136,740.00	0%	0.00	0.00
06.01.02	SUMINISTRO DE PRODUCTOR DE HIELO EN BLOQUES 20TN	GLB	2.00	349,805.70	699,611.40	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	2.00	136,740.00	0%	0.00	0.00
06.01.03	SUMINISTRO DE CAMARA FRIGORIFICA DE 10 TN-18° C	und	1.00	61,479.00	61,479.00	100%	1.00	61,479.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	2.00	699,611.40
06.01.04	SUMINISTRO DE CAMARA FRIGORIFICA DE 10 TN 0° C	und	1.00	95,680.00	95,680.00	100%	1.00	95,680.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	61,479.00	0%	0.00	0.00
06.01.05	SUMINISTRO DE ENFRIADOR DE AGUA +15°C	und	1.00	36,400.00	36,400.00	100%	1.00	36,400.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	95,680.00	0%	0.00	0.00
<b>EQUIPAMIENTO TAREAS PREVIAS</b>																	
06.02.01	TINAS DE LAVADO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.9 M3 (INC. SUM. COL.)	und	8.00	5,500.00	52,000.00	100%	8.00	52,000.00	0%	0.00	0.00	100%	8.00	52,000.00	0%	0.00	0.00
06.02.02	MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 06 PERS. (INC. SUM. COL.)	und	8.00	5,600.00	44,800.00	100%	8.00	44,800.00	0%	0.00	0.00	100%	8.00	44,800.00	0%	0.00	0.00
<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ESTIBA</b>																	
06.03.01	CAJAS DE PLASTICO CAP. 40 KG (INC. SUM. COL.)	und	200.00	62.50	12,500.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	200.00	12,500.00
06.03.02	BALANZA ELECTRONICA CAP. 1000 KG (INC. SUM. COL.)	und	2.00	17,762.00	35,524.00	100%	2.00	35,524.00	0%	0.00	0.00	100%	2.00	35,524.00	0%	0.00	0.00
06.03.03	TRANSPALETA MANUAL DE ACERO GALVANIZADO 2.3 TM (INC. SUM.)	und	6.00	6,750.00	40,500.00	100%	6.00	40,500.00	0%	0.00	0.00	100%	6.00	40,500.00	0%	0.00	0.00
06.03.04	TRACTOR DE REMOLQUE ELECTRICO CAPACIDAD 6 TN	und	1.00	110,160.00	110,160.00	100%	1.00	110,160.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	110,160.00	0%	0.00	0.00
06.03.05	CARRETA DE REMOLQUE DE TIPO PLATAFORMA CON PARRILLA DE PROTECCION SOLAR DE ACERO INOXIDABLE CARGA 1 TN	und	12.00	4,490.00	53,880.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	12.00	53,880.00	0%	0.00	0.00
06.03.06	PARIHUELAS DE PLASTICO CAP. 1200 KG (INC. SUM. COL.)	und	30.00	123.50	3,705.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	30.00	3,705.00
<b>ROPA DE TRABAJO OPERARIOS</b>																	
06.04.01	ROPA DE TRABAJO OPERARIOS	und	100.00	150.00	15,000.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	100.00	15,000.00
06.04.02	ESTANTES PARA VESTUARIOS (INC. SUM. COL. ACC.)	und	30.00	250.00	7,500.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	30.00	7,500.00
<b>MOBILIARIO VARIOS</b>																	
06.05.01	SILLAS FIJA	und	10.00	50.00	500.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	10.00	500.00
06.05.02	MESAS MELAMINE 200 X 100	und	1.00	1,200.00	1,200.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	1,200.00
06.05.03	ARMARIO 180 X 80 X 40	und	3.00	700.00	2,100.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	3.00	2,100.00
06.05.04	MESA DE PLASTICO C/GO 4 SILLAS	und	10.00	320.00	3,200.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	10.00	3,200.00
06.05.05	SILLON MECANICO C/BRAZO	und	3.00	210.00	630.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	3.00	630.00
06.05.06	DEPOSITO DE RESIDUOS	und	10.00	350.00	3,500.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	10.00	3,500.00
06.05.07	BANQUETA DE 3 CUERPOS	und	20.00	250.00	5,000.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	20.00	5,000.00
06.05.08	ESCRITORIO EN L (1.50 X 0.70)	und	3.00	490.00	1,470.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	3.00	1,470.00
06.05.09	TELEVISORES	und	2.00	700.00	1,400.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	2.00	1,400.00
06.05.10	MODULO PARA TV	und	2.00	220.00	440.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	2.00	440.00
06.05.11	COMPUTADORAS	und	2.00	1,500.00	3,000.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	2.00	3,000.00
06.05.12	PANTALLA EKRAIN	und	1.00	917.00	917.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	917.00
06.05.13	PROYECTOR	und	1.00	3,368.00	3,368.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	3,368.00
06.05.14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ( IMP COP ESC)	und	1.00	480.00	480.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	480.00
06.05.15	FAX	und	1.00	421.00	421.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	421.00
06.05.16	TELEFONOS	und	4.00	80.00	320.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	4.00	320.00

JULIO OSWALDO FUENTES QUIFONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR				AVANCES ACTUAL				ACUMULADO				SALDO		
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.
06.05.18	ARCHIVADOR 4 GAVETAS	und	4.00	500.00	2,000.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
06.05.19	EXTINTORES	und	14.00	360.00	5,040.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
06.05.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA	und	10.00	120.00	1,200.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
	<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>				<b>1,442,745.40</b>															
	GASTOS GENERALES (8.25 %)				119,026.50			613,283.00						0.00						613,283.00
	UTILIDAD (8.00 %)				115,419.63			49,062.64						0.00						50,595.85
	<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>				<b>1,677,191.53</b>			<b>712,941.49</b>						0.00						<b>712,941.49</b>
	IGV. (18.0 %)				301,894.48			128,228.47						0.00						128,228.47
	<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>				<b>1,979,086.01</b>			<b>841,270.96</b>						0.00						<b>841,270.96</b>
	<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (SIN IGV)</b>				<b>1,677,191.53</b>			<b>712,941.49</b>						0.00						<b>712,941.49</b>
	IGV. (8.0 %)				301,894.48			128,228.47						0.00						128,228.47
	<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (CON IGV)</b>				<b>1,979,086.01</b>			<b>841,270.96</b>						0.00						<b>841,270.96</b>
	<b>SUB-TOTAL VALORIZACION CONTRACTUAL</b>				<b>1,979,086.01</b>			<b>841,270.96</b>						0.00						<b>841,270.96</b>
	IGV. (18.0 %)				356,235.28			143,429.78						0.00						143,429.78
	<b>TOTAL VALORIZACION CONTRACTUAL</b>				<b>2,335,321.29</b>			<b>984,700.74</b>						0.00						<b>984,700.74</b>
	IGV. (8.0 %)				186,825.70			75,528.07						0.00						75,528.07
	<b>TOTAL VALORIZACION CONTRACTUAL (CON IGV)</b>				<b>2,522,147.00</b>			<b>1,060,228.81</b>						0.00						<b>1,060,228.81</b>

ISAIA SANCHEZ ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

*Julio Oswaldo Fuentes Quinonez*  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

**VALORIZACION DE OBRA N° 50 - FEBRERO 2019 (FORMULA 07 - OBRAS DE MAR)**

OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE  
 ENTIDAD : FONDEFES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 FECHA : FEBRERO DEL 2019

Monto Base	S/. 33,504,650.56
Monto Contratado	S/. 32,457,630.22
Fecha Inicio Obra	15-ene-15
Plazo de Ejecución	1,587 Días C.
Fecha final Obra	20-may-19
Mod. de Ejecución	Precios Unitarios

Residente	Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez		
Supervisor	Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza		
<b>SEGÚN COSTO DIRECTO</b>			
Monto Valorizado del Mes	:	S/. 114,153.34	0.78%
Monto Valorizado Acumulado	:	S/. 8,117,102.72	54.16%
Monto-Saldo por Valorizar	:	S/. 6,869,144.30	45.84%

<b>Ubicación</b>	
Región	: LAMBAYEQUE
Provincia	: LAMBAYEQUE
Distrito	: SAN JOSE
Localidad	: SAN JOSE

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR				AVANCES				ACUMULADO				SALDO	
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado	S/.	%	ACTUAL		%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	
											Metrado	Valorizado S/.							
<b>SUB-PRESUPUESTO 07</b>																			
07	OBRAS EN MAR																		
7.01	OBRAS PROVISIONALES																		
07.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	4,200.00	0.38	1,596.00	100%	4200.00	1596.00	0%	0.00	0.00	100%	4200.00	1,596.00	0%	0.00	0.00		
07.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA	mes	12.00	1,707.32	20,487.84	58%	7.00	11951.24	0%	0.00	0.00	58%	7.00	11,951.24	42%	5.00	8,536.60		
07.01.03	LOSA PARA PREFABRICADOS	m2	300.00	118.07	35,421.00	100%	300.00	35,421.00	0%	0.00	0.00	100%	300.00	35,421.00	0%	0.00	0.00		
07.01.04	PRUEBA DE CARGA	und	3.00	18,022.12	54,066.36	67%	2.00	36,044.24	0%	0.00	0.00	67%	2.00	36,044.24	33%	1.00	18,022.12		
07.01.05	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	4,200.00	0.91	3,822.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	4,200.00	3,822.00		
07.01.06	SONDAJE MARINO	und	3.00	10,200.00	30,600.00	100%	3.00	30,600.00	0%	0.00	0.00	100%	3.00	30,600.00	0%	0.00	0.00		
7.02	OBRAS DE PROTECCION EN TIERRA																		
07.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
07.02.01.01	CORTE DE MATERIAL ARENA, EN LUNA DE ENROCADO	m3	807.50	2.89	2,337.68	97%	786.28	2,272.35	0%	0.00	0.00	97%	786.28	2,272.35	3%	21.22	61.33		
07.02.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL ARENA, EN LUNA DE ENROCADO	m3	1,067.92	14.38	15,356.69	85%	904.22	13,002.68	0%	0.00	0.00	85%	904.22	13,002.68	15%	163.70	2,354.01		
07.02.02	ENROCADO DE PROTECCION DE TERRAPLEN																		
07.02.02.01	SUM.Y COLC. DE ROCA FILTRO > A 50 KG	m3	1,116.25	60.23	67,231.74	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1,116.25	67,231.74		
07.02.02.02	SUM. Y COLC. DE ROCA CORAZA DE BT A 9T	m3	1,950.00	70.53	137,533.50	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1,950.00	137,533.50		
07.02.02.03	REMOCION DE ROCA CORAZA DE BT A 9T EN CANTERA	m3	3,066.25	40.40	123,876.50	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	3,066.25	123,876.50		
7.03	BUELLE DE ESPIGON L=950.00 M																		
07.03.01	FABRICACION DE PILOTES DE CONCRETO																		
07.03.01.01	CONCRETO EN PILOTES FC=350 KGCM2	m3	2,216.91	515.13	1,141,996.85	66%	1,469.26	756,859.90	0%	0.00	0.00	66%	1,469.26	756,859.90	34%	747.65	385,136.94		
07.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE PILOTES	m2	21,364.72	52.76	1,127,202.63	50%	10,713.50	565,244.26	0%	0.00	0.00	50%	10,713.50	565,244.26	50%	10,651.22	561,958.37		
07.03.01.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGCM2	kg	464,193.61	3.93	1,824,280.69	75%	347,291.96	1,364,857.40	0%	0.00	0.00	75%	347,291.96	1,364,857.40	25%	116,901.65	459,423.48		
07.03.02	FABRICACION DE VIGAS TRANSVERSALES																		
07.03.02.01	CONCRETO EN VIGAS TRANSVERSALES FC=280 KGCM2	m3	417.90	468.48	195,777.79	100%	417.80	195,637.25	0%	0.00	0.00	100%	417.60	195,637.25	0%	0.30	140.54		
07.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS TRANSVERSALES	m2	3,871.14	42.19	163,323.40	100%	3,868.20	163,199.36	0%	0.00	0.00	100%	3,868.20	163,199.36	0%	2.94	124.04		
07.03.02.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGCM2	kg	101,284.60	3.93	398,048.48	100%	101,284.10	398,048.51	0%	0.00	0.00	100%	101,284.10	398,048.51	0%	0.50	1.97		
07.03.03	FABRICACION DE LOSAS NERVADAS EN MUELLE																		
07.03.03.01	CONCRETO EN LOSAS NERVADAS FC=280 KGCM2	m3	1,071.05	468.48	501,765.50	86%	925.07	433,376.79	0%	0.00	0.00	86%	925.07	433,376.79	14%	145.98	68,388.71		
07.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS NERVADAS	m2	7,545.54	42.19	318,346.33	91%	6832.30	288,254.74	0%	0.00	0.00	91%	6832.30	288,254.74	9%	713.24	30,091.60		
07.03.03.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGCM2	kg	246,786.59	3.93	969,871.30	100%	246,528.11	968,855.47	0%	0.00	0.00	100%	246,528.11	968,855.47	0%	258.48	1,015.83		
07.03.04	NUCLEOS LLENADOS EN BITU																		
07.03.04.01	CONCRETO EN NUCLEOS FC=280 KGCM2	m3	176.40	468.48	82,639.87	87%	154.17	72,227.12	0%	0.00	0.00	87%	154.17	72,227.12	13%	22.23	10,412.75		
07.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN NUCLEOS	m2	325.50	42.19	13,732.85	100%	325.50	13,732.70	0%	0.00	0.00	100%	325.50	13,732.70	0%	0.00	0.14		
07.03.04.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGCM2	kg	11,104.97	3.93	43,642.53	100%	11,104.97	43,642.53	0%	0.00	0.00	100%	11,104.97	43,642.53	0%	0.00	0.00		
07.03.05	JUNTA LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES																		
07.03.05.01	CONCRETO EN VIGA MANDIL FC=280 KGCM2	m3	1,419.90	468.48	665,194.75	11%	153.53	71,925.79	0%	0.00	0.00	11%	153.53	71,925.79	89%	1,266.37	593,268.96		
07.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA MANDIL	m2	2,683.35	42.19	113,210.54	17%	451.01	19,028.11	2%	62.85	2,651.64	19%	513.86	21,679.75	81%	2,169.49	91,530.78		
07.03.05.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGCM2	kg	330,460.88	3.93	1,298,711.26	7%	244,82.92	962,17.88	1%	4,006.62	15,745.02	9%	28,489.54	111,963.90	91%	301,971.34	1,186,747.37		
07.03.06	SARDINELES LLENADOS EN BITU																		
07.03.06.01	CONCRETO EN SARDINEL FC=280 KGCM2	m3	148.23	468.48	69,442.79	37%	55.08	25,804.58	4%	6.48	3,035.75	42%	61.56	28,840.33	58%	86.67	40,602.46		

JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 69335


ISAÍAS JORGE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR				AVANCES				SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado	S/.	ACTUAL				SALDO			
										%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado
<b>SUB-PRESUPUESTO 07</b>																	
07.03.08.07	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN SARDNELES	m2	1,334.07	42.19	56,284.41	38%	504.22	21272.92	4%	59.32	2,502.71	42%	563.54	23,775.63	58%	770.53	32,508.79
07.03.08.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	9,825.34	3.93	38,613.59	91%	8957.63	35203.49	9%	867.71	3,410.10	100%	9825.34	38,613.59	0%	0.00	0.00
07.03.07.01	CONCRETO EN LOSAS FC=280 KG/CM2	m3	793.20	468.48	371,598.34	50%	393.12	184168.86	0%	0.00	0.00	50%	393.12	184,168.86	50%	400.08	187,429.48
07.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN SARDNELES	m2	685.15	42.19	28,906.48	40%	273.02	11518.71	7%	48.18	2,032.71	47%	321.20	13,551.42	53%	363.95	15,355.05
07.03.07.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	151,388.29	3.93	594,955.98	57%	86301.86	339166.31	10%	15,229.74	59,852.89	67%	101531.60	399,019.19	33%	49,856.69	195,936.79
7.04	CABEZO L=30.90 M																
07.04.01	FABRICACION DE PILOTES DE CONCRETO																
07.04.01.01	CONCRETO EN PILOTES FC=350 KG/CM2	m3	411.08	515.13	211,759.64	98%	402.58	207381.04	0%	0.00	0.00	98%	402.58	207,381.04	2%	8.50	4,378.60
07.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL PARA PILOTES	m2	3,279.81	52.76	173,042.78	74%	2420.80	127721.41	0%	0.00	0.00	74%	2420.80	127,721.41	26%	859.01	45,321.37
07.04.01.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	89,034.51	3.93	349,905.62	96%	85089.60	334402.13	0%	0.00	0.00	96%	85089.60	334,402.13	4%	3,944.91	15,503.50
07.04.02.01	CONCRETO EN VIGAS TRANSVERSALES FC=280 KG/CM2	m3	29.30	468.48	13,726.46	100%	29.30	13726.46	0%	0.00	0.00	100%	29.30	13,726.46	0%	0.00	0.00
07.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE VIGAS TRANSVERSALES	m2	257.86	42.19	10,879.11	100%	257.86	10879.11	0%	0.00	0.00	100%	257.86	10,879.11	0%	0.00	0.00
07.04.02.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	7,094.46	3.93	27,881.23	100%	7090.80	27866.84	0%	0.00	0.00	100%	7090.80	27,866.84	0%	3.66	14.38
07.04.03.01	CONCRETO EN LOSAS NERVADAS FC=280 KG/CM2	m3	86.80	468.48	40,664.06	95%	82.78	38766.77	0%	0.00	0.00	95%	82.78	38,780.77	5%	4.02	1,883.29
07.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE LOSAS NERVADAS	m2	549.37	42.19	23,177.92	100%	549.37	23177.92	0%	0.00	0.00	100%	549.37	23,177.92	0%	0.00	0.00
07.04.03.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	22,817.55	3.93	89,672.97	100%	22817.55	89672.97	0%	0.00	0.00	100%	22817.55	89,672.97	0%	0.00	0.00
07.04.04.01	CONCRETO EN NUCLEOS FC=280 KG/CM2	m3	15.20	468.48	7,120.90	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	15.20	7,120.90
07.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN NUCLEOS	m2	32.00	42.19	1,350.08	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	32.00	1,350.08
07.04.04.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	1,050.66	3.93	4,129.09	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1,050.66	4,129.09
07.04.05	JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES																
07.04.05.01	CONCRETO EN VIGA MANDL FC=280 KG/CM2	m3	69.35	468.48	32,489.09	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	69.35	32,489.09
07.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN VIGA MANDL	m2	239.27	42.19	10,094.80	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	239.27	10,094.80
07.04.05.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	13,550.38	3.93	53,252.99	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	13,550.38	53,252.99
07.04.06.01	CONCRETO EN LOSAS FC=280 KG/CM2	m3	123.01	468.48	57,627.72	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	123.01	57,627.72
07.04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN LOSAS	m2	337.68	42.19	14,246.72	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	337.68	14,246.72
07.04.06.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	15,596.20	3.93	61,293.07	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	15,596.20	61,293.07
07.04.07	MANOBRAS DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS PUESTOS																
07.04.07.01	TRANSPORTE DE PILOTE	und	652.00	126.31	82,354.12	77%	502.00	63407.62	6%	36.00	4,547.16	83%	538.00	67,954.78	17%	114.00	14,399.34
07.04.07.02	TRANSPORTE DE VIGA TRANSVERSAL	und	210.00	195.82	41,122.20	80%	168.00	32897.76	4%	9.00	1,762.38	84%	177.00	34,660.14	16%	33.00	6,462.06
07.04.07.03	TRANSPORTE DE LOSA NERVADA	und	366.00	164.93	60,364.38	80%	294.00	48489.42	4%	14.00	2,309.02	84%	308.00	50,798.44	16%	58.00	9,565.94
07.04.07.04	PUNTA PARA PILOTES	und	652.00	205.52	133,999.04	100%	652.00	133999.04	0%	0.00	0.00	100%	652.00	133,999.04	0%	0.00	0.00
07.04.07.05	HINCADO DE PILOTE (INC. MOV. Y POSIC. PLANTILLA)	und	652.00	975.41	635,967.32	44%	289.00	280918.08	0%	0.00	0.00	44%	289.00	280,918.08	56%	364.00	355,049.24
07.04.07.06	COLOCACION DE VIGA TRANSVERSAL	und	652.00	25.12	16,378.24	77%	502.00	12610.24	6%	36.00	904.32	83%	538.00	13,514.56	17%	114.00	2,863.68
07.04.07.07	COLOCACION DE LOSA NERVADA	und	210.00	1,391.01	292,112.10	80%	168.00	233689.68	4%	9.00	12,519.09	84%	177.00	246,208.77	16%	33.00	45,903.33
07.04.08	MANOBRAS DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS PUESTOS																
07.04.08.01	TRANSPORTE DE PILOTE	und	366.00	348.54	127,565.64	80%	294.00	102470.76	4%	14.00	4,879.56	84%	308.00	107,350.32	16%	58.00	20,215.32
07.04.08.02	TRANSPORTE DE VIGA TRANSVERSAL	und	96.00	126.31	12,125.76	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	96.00	12,125.76
07.04.08.03	TRANSPORTE DE LOSA NERVADA	und	10.00	195.82	1,958.20	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	10.00	1,958.20
07.04.08.04	PUNTA PARA PILOTES	und	36.00	164.93	5,937.48	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	36.00	5,937.48
07.04.08.05	HINCADO DE PILOTE (INC. MOV. Y POSIC. PLANTILLA)	und	96.00	205.52	19,729.92	100%	96.00	19729.92	0%	0.00	0.00	100%	96.00	19,729.92	0%	0.00	0.00
07.04.08.06	DESCABEZADO DE PILOTE	und	96.00	975.41	93,639.36	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	96.00	93,639.36
07.04.08.07	COLOCACION DE VIGA TRANSVERSAL	und	10.00	25.12	2,411.52	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	10.00	2,411.52
07.04.08.08	COLOCACION DE LOSA NERVADA	und	10.00	1,391.01	13,910.10	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	10.00	13,910.10
07.04.09	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTES Y CABEZOS																
07.04.09.01	SUM. Y COLOC. SARDNELES DE MADERA 8"X8", SITACOS DE 8"X8"X2"	und	10.00	129.60	1,296.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	10.00	1,296.00
07.04.09.02	SUM. Y COLOC. DE BITAS METALICAS 30BRT	und	8.00	488.69	3,909.52	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	8.00	3,909.52
07.04.09.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PESCANTE CAP. W=500 KG	und	2.00	1,514.12	3,028.24	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	2.00	3,028.24

INGENIERO CIVIL  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

ISAIAS JORGE PAVES ANDAZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR				AVANCES				SALDO				
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	S/.	%	ACTUAL			ACUMULADO				
											Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%		
<b>SUB-PRESUPUESTO 07</b>																		
07.04.00.04	FABRICACION DE PIOTES METALICOS H. PARANTES DE DEFENSA	m	768.00	279.22	214,440.96	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	768.00	214,440.96	
07.04.00.05	FABRICACION DE VIGAS METALICAS (LARGUEROS DE DEFENSA)	m	267.00	313.48	83,699.16	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	267.00	83,699.16	
07.04.00.06	SUMINISTRO Y COLOC. DE BLOCS DE JEBS HUECO DE 17X18 EN VIGA	BLK	60.00	154.30	9,258.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	60.00	9,258.00	
07.04.00.07	ENCAJE DE PARANTES METALICOS SECCION H 80X80X6MM, INCL. TRANSP.	und	64.00	870.79	55,730.56	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	64.00	55,730.56	
07.04.00.08	MONTAJE VIGAS H(17X18), LONG. C/PARANTES, INCL. TRANSP.	m	267.00	44.69	11,985.63	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	267.00	11,985.63	
07.04.00.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSAS TIPO D	und	224.00	619.96	138,871.04	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	224.00	138,871.04	
07.04.00.10	BARANDAS DE TUBERIAS DE ACERO, EN PUENTE Y ESCALINATAS DE EMBARCADERO	m	6,145.00	183.71	1,128,897.95	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	6,145.00	1,128,897.95	
07.04.00.11	PINTURA DE PARANTES Y VIGAS LONGITUDINALES EN DEFENSAS	m <sup>2</sup>	1,229.00	32.19	39,561.51	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	1,229.00	39,561.51	
07.04.00.12	COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM EN PLATAFORMA DE ACCESO	m <sup>2</sup>	300.00	115.87	34,761.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	300.00	34,761.00	
07.04.00.13	PERFIL CUADRADO DE ALUMINO DE 1/2"	m	150.00	97.05	14,557.50	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	150.00	14,557.50	
07.04.00.14	PERFIL CIRCULAR DE ALUMINO DE D=40 MM E=2.60M	m	20.00	97.05	1,941.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	100%	20.00	1,941.00	
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>																		
GASTOS GENERALES (8.25 %)					14,986,247.01			8,000,949.38			116,153.34			8,117,102.72			8,669,144.30	
UTILIDAD (8.00 %)					1,236,365.38			660,078.33			9,582.65			669,660.97			668,704.40	
					1,198,899.76			640,075.95			9,292.27			649,368.22			549,531.54	
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>																		
I.G.V. (18.0 %)					17,421,512.15			9,301,103.66			135,028.26			9,436,131.91			7,985,380.24	
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					3,135,872.19			1,674,198.66			24,305.09			1,698,503.74			1,437,368.44	
					20,557,384.34			10,975,302.32			159,333.35			11,134,635.65			9,422,748.68	
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (SIN IGV)</b>																		
I.G.V. (18.0 %)					17,421,512.15			9,301,103.66			135,028.26			9,436,131.91			7,985,380.24	
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (CON IGV)</b>					3,135,872.19			1,674,198.66			24,305.09			1,698,503.74			1,437,368.44	
					20,557,384.34			10,975,302.32			159,333.35			11,134,635.65			9,422,748.68	

  
 J. QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

**VALORIZACION DE OBRA N° 50 - FEBRERO 2019 (FORMULA 08 - PAVIMENTACION EXTERIOR)**

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"  
 ENTIDAD : FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 FECHA : FEBRERO DEL 2019


Monto Base S/. 33,504,650.56  
 Monto Contratado S/. 32,457,630.22  
 Fecha Inicio Obra 15-ene-15  
 Días de Ejecución 1,587 Días C.  
 Fecha Fin Obra 20-may-19  
 Mod. de Ejecución Precios Unitarios

Residente Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez  
 Supervisor Ing. Isafas Jorge Alva Espinoza

**SEGÚN COSTO DIRECTO**  
 Manto Valorizado del Mes :  
 Monto Valorizado Acumulado : S/. 484,612.37 98.10%  
 Monto-Saldo por Valorizar : S/. 9,361.04 1.90%

**Ubicación**  
 Región : LAMBAYEQUE  
 Provincia : LAMBAYEQUE  
 Distrito : SAN JOSE  
 Localidad : SAN JOSE

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCES						SALDO						
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	ACUMULADO ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO		%	Metrado	Valorizado S/.		
						%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado				Valorizado S/.	
08	<b>SUB-PRESUPUESTO 08</b>																	
	PAVIMENTO																	
8.01	TRABAJOS PRELIMINARES																	
08.01.01	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO																	
8.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m2	5,295.22	0.93	4,924.55	100%	5,295.22	4924.55				100%	5295.22	4,924.55				
08.02.01	CORTE DE TERRENO C/EQUIPO	m3	2,116.35	3.92	8,296.09	100%	2,116.35	8296.09										
08.02.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	5,295.22	5.49	29,070.76	100%	5,295.22	29070.76				100%	2116.35	8,296.09				
08.02.03	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRA OVER DE 4" A 6" E=48 CM	m2	1,323.81	23.90	39,581.92	79%	1,050.00	31395.00				100%	5295.22	29,070.76				
08.02.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	96.50	26.63	2,762.80	100%	96.50	2762.72				79%	1050.00	31,395.00	21%	273.81	8,186.92	
08.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 15 M3	m3	2,751.25	14.38	39,562.98	100%	2,751.25	39562.98				100%	96.50	2,762.72	0%	0.00	0.07	
8.03	SUB BASE GRANULAR																	
08.03.01	SUB - BASE DE 0.20 M.																	
8.04	BASE GRANULAR	m2	5,295.22	8.39	44,426.90	100%	5,295.22	44426.90										
08.04.01	BASE GRANULAR DE AFIRMADO E=15CM												100%	5,295.22	44,426.90			
8.05	ASFALTO EN CALIENTE	m2	5,295.22	6.91	36,589.97	100%	5,295.22	36589.97										
08.05.01	IMPRIMACION ASFALTICA												100%	5295.22	36,589.97			
08.05.02	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"	m2	5,295.22	4.80	25,417.06	100%	5,295.22	25417.06										
08.05.03	RIEGO DE LIGA	m2	5,295.22	44.23	234,207.58	100%	5,295.22	234207.58					100%	5295.22	25,417.06			
8.06	PINTURA	m2	5,295.22	5.28	27,958.76	100%	5,295.22	27958.76										
08.06.01	PINTURA LINEA DISCONTINUA E=10CM												100%	5295.22	27,958.76			
8.07	SEÑALIZACION	m2	151.29	5.31	803.35													
08.07.01	SEÑALES PREVENTIVAS																	
08.07.02	SEÑALES INFORMATIVAS	und	5.00	37.07	185.35									100%	151.29	803.35		
		und	5.00	37.07	185.35									100%	5.00	185.35		
	<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>				<b>493,973.42</b>			<b>484,612.37</b>										
	GASTOS GENERALES (8.25 %)				40,752.81			39,980.52										
	UTILIDAD (8.00 %)				39,517.87			38,768.99										
	<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>				<b>574,244.10</b>			<b>563,361.88</b>										
	I.G.V. (18.0 %)				103,363.94			101,405.14										
	<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>				<b>677,608.04</b>			<b>664,767.02</b>										
	<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (SIN IGV)</b>				<b>574,244.10</b>			<b>563,361.88</b>										
	I.G.V. (18.0 %)				103,363.94			101,405.14										
	<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (CON IGV)</b>				<b>677,608.04</b>			<b>664,767.02</b>										

  
**JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP N° 107

**VALORIZACION DE OBRA N° 50 - FEBRERO 2019 (FORMULA 09 - INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION)**

OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE'  
 ENTIDAD : FONDECOS  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 FECHA : FEBRERO DEL 2019

Monto Base	S/. 33,504,650.56
Monto Contratado	S/. 32,457,630.22
Fecha Inicio Obra	15-ene-15
Plazo de Ejecución	1,587 Días C.
Fecha Final Obra	20-may-19
Mod. de Ejecución	Precios Unitarios

Residente	Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez
Supervisor	Ing. Isaias Jorge Alva Espinoza
<b>SEGÚN COSTO DIRECTO</b>	
Monto Valorizado del Mes	:
Monto Valorizado Acumulado	:
Monto-Saldo por Valorizar	S/. 149,611.46 100.00%

<b>Ubicación</b>	
Región	: LAMBAYEQUE
Provincia	: LAMBAYEQUE
Distrito	: SAN JOSE
Localidad	: SAN JOSE

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCES						SALDO				
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		%	Metrado	Valorizado S/.		
						%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.					
09	SUB-PRESUPUESTO 09															
	09.01 MEDIA TENSION															
	09.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES															
09.01.01	CARTEL DE OBRA	und	1.00	2,372.52	2,372.52											
09.01.02	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	GLB	1.00	4,500.00	4,500.00											
09.01.03	PAGO DE CONEXION ELECTRONORTE	GLB	1.00	3,500.00	3,500.00											
09.02	SUMINISTRO DE MATERIALES															
09.02.01	POSTES, ACCESORIOS Y CRUCETAS	und	1.00	3,405.60	3,405.60											
09.02.02	CONDUCTORES DE ALUMINIO Y ACCESORIOS	GLB	1.00	1,104.46	1,104.46											
09.02.03	AISLADORES Y ACCESORIOS	GLB	1.00	1,728.54	1,728.54											
09.02.04	RETENIDAS Y ANCLAJE	GLB	1.00	638.68	638.68											
09.02.05	PUESTA A TIERRA	GLB	1.00	688.30	688.30											
09.02.06	TABLERO DE DISTRIBUCION	und	1.00	6,823.44	6,823.44											
09.02.07	SECCIONADOR Y ACCESORIOS	GLB	1.00	999.11	999.11											
09.02.08	TRANSFORMADORES Y SISTEMA DEMEDICION	GLB	1.00	10,045.00	10,045.00											
09.02.09	CONCRETO FC= 210 KG/CM2	m3	1.00	338.64	338.64											
09.02.10	CONDUCTOR N2 X 5H Y ACCESORIOS	GLB	1.00	37,890.70	37,890.70											
09.02.11	SUB ESTACION ELECTRICA	GLB	1.00	45,455.88	45,455.88											
09.02.12	INSTALACION CABLE N2X5H	m	345.00	3.37	1,162.65											
09.03	MONTAJE ELECTROMECANICO															
09.03.01	OBRAS PRELIMINARES															
09.03.01.01	REPLANTEO TOPOGRAFICO DE LA LINEA Y UBICACION DE ESTRUCTURAS	m	2,400.00	1.20	2,880.00											
09.03.01.02	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA	GLB	1.00	8,000.00	8,000.00											
09.03.02	INSTALACIONES DE POSTES															
09.03.02.01	CAMION GRUA TRANSPORTE E IZAJE DE POSTES	est	3.00	205.06	615.18											
09.03.02.02	EXCAVACION HUECO PARA POSTE EN TERRENO NORMAL	und	3.00	82.69	247.77											
09.03.02.03	INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO Y AISLADORES	und	3.00	55.06	165.18											
09.03.02.04	CIMENTACION DE POSTE DE CONCRETO	und	3.00	157.32	471.96											
09.03.02.05	CONSTRUCCION DE SOLADO DE CONCRETO	und	3.00	55.06	165.18											
09.03.02.06	RECUBRIMIENTO DEL POSTE CON SUSTANCIA BITUMINOSA	und	3.00	23.53	70.59											
09.03.02.07	RECUBRIMIENTO DEL POSTE HASTA 3M CON SELLADOR IMPERMEABILIZANTE	und	3.00	34.03	102.09											
09.03.02.08	NUMERACION Y SEÑALIZACION DE POSTE	und	3.00	28.03	84.09											
09.03.03	INSTALACIONES RETENIDAS															
09.03.03.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA RETENIDA EN TERRENO NORMAL	und	2.00	55.06	110.12											
09.03.03.02	INSTALACION DE RETENIDA INC. RELLENO Y COMPACTACION	und	2.00	84.79	169.58											

Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP N° 66333

ISAKS JOSE SALVADOR ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10711

DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCES						SALDO					
	Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	ACUMULADO ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO					
					%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.			
<b>SUB-PRESUPUESTO 09</b>																
09.03.04.01 MEDIA TENSION																
09.03.04.01 MONTAJE DE ARMADOS																
09.03.04.01 ARMADO PM-1	und	1.00	273.97	273.97												
09.03.04.02 ARMADO PA-1	und	1.00	138.88	138.88												
09.03.04.03 ARMADO SE	und	1.00	382.75	382.75									100%	1.00	273.97	
09.03.04.04 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION, PROTECCION Y MEDICION	und	1.00	191.37	191.37									100%	1.00	138.88	
09.03.05 MONTAJE DE CONDUCTORES	und	1.00	191.37	191.37									100%	1.00	382.75	
09.03.05.01 TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR AAAC 50 MM2/ FASE	m	280.00	2.55	714.00									100%	1.00	191.37	
09.03.06 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA																
09.03.06.01 EXCAVACION DE HUECO PARA PUESTA A TIERRA, EN TERRENO NORMAL	und	2.00	95.69	191.38									100%	280.00	714.00	
09.03.06.02 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN ESTRUCTURAS (INCLUYE RELLENO Y COMPACTACION)	und	2.00	382.75	765.50									100%	2.00	191.38	
09.03.07 OBRAS CIVILES																
09.03.07.01 EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.10X0.60 PARA INSTALACION DE DUCTOS	m	345.00	30.47	10,512.15									100%	2.00	765.50	
09.03.07.02 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	m	345.00	4.11	1,417.95									100%	345.00	10,512.15	
09.03.07.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	7.00	14.38	100.66									100%	345.00	1,417.95	
09.03.08 MONTAJE DE TRANSFORMADOR																
09.03.08.01 MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 300 KVA, INCLUYE TABLERO	und	1.00	765.49	765.49									100%	7.00	100.66	
09.03.09 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO																
09.03.09.01 PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO	m	450.00	0.98	432.00									100%	1.00	785.49	
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>																
GASTOS GENERALES (8.25 %)				149,611.46												
UTILIDAD (8.00 %)				12,342.95												
				11,968.92												149,611.46
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>																12,342.95
I.G.V. (18.0 %)				173,923.33												
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>				31,306.20												173,923.33
				205,229.53												31,306.20
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (SIN IGV)</b>																205,229.53
I.G.V. (18.0 %)				173,923.33												
				31,306.20												173,923.33
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (CON IGV)</b>																31,306.20
				205,229.53												205,229.53

JOSÉ OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335



**VALORIZACION DE OBRA N° 50 - FEBRERO 2019 (FORMULA 10 - SEGURIDAD Y SALUD)**

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"  
 ENTIDAD : FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 FECHA : FEBRERO DEL 2019

Monto Base	S/. 33,504,650.56
Monto Contratado	S/. 32,457,630.22
Fecha Inicio Obra	15-ene-15
Plazo de Ejecución	1,587 Días C.
Fecha Final Obra	20-may-19
Mod. de Ejecución	Precios Unitarios

Residente	Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez.		
Supervisor	Ing. Isafas Jorge Alva Espinoza		
<b>SEGÚN COSTO DIRECTO</b>			
Monto Valorizado del Mes	:		
Monto Valorizado Acumulado	:	S/. 16,500.80	100.00%
Monto-Saldo por Valorizar	:		

<b>Ubicación</b>	
Región	: LAMBAYEQUE
Provincia	: LAMBAYEQUE
Distrito	: SAN JOSE
Localidad	: SAN JOSE

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			AVANCES						SALDO						
		Unid.	Metrado	P. Unitario	Presupuesto S/.	ACUMULADO ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO		SALDO			
						%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.
	<b>SUB-PRESUPUESTO 10</b>																
10	SEGURIDAD Y SALUD																
10.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	7000.00	7,000.00	100%	1.00	7,000.00				100%	1.00	7,000.00			
10.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	1.00	1722.00	1,722.00	100%	1.00	1,722.00				100%	1.00	1,722.00			
10.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	1.00	500.80	500.80	100%	1.00	500.80				100%	1.00	500.80			
10.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1.00	632.00	632.00	100%	1.00	632.00				100%	1.00	632.00			
10.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	6000.00	6,000.00	100%	1.00	6,000.00				100%	1.00	6,000.00			
10.08	RECURSOS PARA RESPUESRAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	und	1.00	648.00	648.00	100%	1.00	648.00				100%	1.00	648.00			
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>					<b>16,500.80</b>			<b>16,500.80</b>						<b>16,500.80</b>			
GASTOS GENERALES (8.25 %)					1,361.32			1,361.32						1,361.32			
UTILIDAD (8.00 %)					1,320.06			1,320.06						1,320.06			
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					<b>19,182.18</b>			<b>19,182.18</b>						<b>19,182.18</b>			
I.G.V. (18.0 %)					3,452.79			3,452.79						3,452.79			
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					<b>22,634.97</b>			<b>22,634.97</b>						<b>22,634.97</b>			
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (SIN IG V)</b>					<b>19,182.18</b>			<b>19,182.18</b>						<b>19,182.18</b>			
I.G.V. (18.0 %)					3,452.79			3,452.79						3,452.79			
<b>VALORIZACION CONTRACTUAL (CON IG V)</b>					<b>22,634.97</b>			<b>22,634.97</b>						<b>22,634.97</b>			

ISMAEL JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

# CONSORCIO SAN JOSE

## AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO - FEBRERO 2019

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

ENTIDAD : FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 RESIDENTE : JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
 PLAZO CONTR. : 1,587 DIAS CALENDARIO  
 MODALIDAD : A PRECIOS UNITARIOS

FORMULA:

$$AMORT = A \times VAL / C$$

DONDE:

AMORT : Amortización por el Adelanto en Efectivo  
 A : Monto del Adelanto Directo Otorgado en Efectivo Sin IGV  
 V : Monto de la Valorización Mensual, incluye Factor Relación  
 C : Monto del Contrato Principal Sin IGV

SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 32,457,630.22 INC. IGV  
 SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 27,506,466.29 SIN IGV

PORCENTAJE DEL ADELANTO 20.00%

ADELANTO DIRECTO = 6,491,526.04 INC IGV  
 ADELANTO DIRECTO = 5,501,293.26 SIN IGV

No.	FECHA PAGO	ADEL. EFEC. CON IGV	ADEL. EFEC. SIN IGV	PORCENTAJE DEL ADELANTO
1	09/01/2015	6,491,526.04	5,501,293.26	20.00%

Valorización		Monto Valorizado	Adel. Otorg. (SIN IGV)	Porcentaje del Adelanto	Amortización AxVAL/C	Monto por Amortizar	Saldo a Amortizar
Nº	Mes	a	c	d	e = a x d	f	g = f - e
VAL Nº 1	ENERO	358,268.22	5,501,293.26	20.00%	71,653.64	5,501,293.26	5,429,639.62
VAL Nº 2	FEBRERO	555,717.90	5,501,293.26	20.00%	111,143.58	5,501,293.26	5,318,496.04
VAL Nº 3	MARZO	593,994.44	5,501,293.26	20.00%	118,798.89	5,501,293.26	5,199,697.15
VAL Nº 4	ABRIL	925,177.18	5,501,293.26	20.00%	185,035.44	5,501,293.26	5,014,661.71
VAL Nº 5	MAYO	753,732.22	5,501,293.26	20.00%	150,746.44	5,501,293.26	4,863,915.27
VAL Nº 6	JUNIO	985,329.63	5,501,293.26	20.00%	197,065.93	5,501,293.26	4,666,849.34
VAL Nº 7	JULIO	1,865,453.02	5,501,293.26	20.00%	373,090.60	5,501,293.26	4,293,758.74
VAL Nº 8	AGOSTO	1,054,927.09	5,501,293.26	20.00%	210,985.42	5,501,293.26	4,082,773.32
VAL Nº 9	SEPTIEMBRE	1,429,170.33	5,501,293.26	20.00%	285,834.07	5,501,293.26	3,796,939.25
VAL Nº 10	OCTUBRE	1,285,746.48	5,501,293.26	20.00%	257,149.30	5,501,293.26	3,539,789.95
VAL Nº 11	NOVIEMBRE	2,011,031.83	5,501,293.26	20.00%	402,206.37	5,501,293.26	3,137,583.58
VAL Nº 12	DICIEMBRE	1,389,920.39	5,501,293.26	20.00%	277,984.08	5,501,293.26	2,859,599.50
VAL Nº 13	ENERO	1,517,495.69	5,501,293.26	20.00%	303,499.14	5,501,293.26	2,556,100.36
VAL Nº 14	FEBRERO	667,975.68	5,501,293.26	20.00%	133,595.14	5,501,293.26	2,422,505.22
VAL Nº 15	MARZO	621,544.85	5,501,293.26	20.00%	124,308.93	5,501,293.26	2,298,196.29
VAL Nº 16	ABRIL	240,541.06	5,501,293.26	20.00%	48,108.21	5,501,293.26	2,250,088.08
VAL Nº 17	MAYO	67,518.42	5,501,293.26	20.00%	13,503.68	5,501,293.26	2,236,584.40
VAL Nº 18	JUNIO	238,908.88	5,501,293.26	20.00%	47,781.78	5,501,293.26	2,188,802.62
VAL Nº 19	JULIO	87,581.78	5,501,293.26	20.00%	17,516.36	5,501,293.26	2,171,286.26
VAL Nº 20	AGOSTO	26,733.49	5,501,293.26	20.00%	5,346.70	5,501,293.26	2,165,939.56
VAL Nº 21	SEPTIEMBRE	54,654.58	5,501,293.26	20.00%	10,930.92	5,501,293.26	2,155,008.64
VAL Nº 01 - ADICIONAL Nº 02	ABRIL	380,705.19	5,501,293.26		190,352.60	5,501,293.26	1,964,656.04
VAL Nº 01 - ADICIONAL Nº 04	JULIO	423,756.53	5,501,293.26		211,878.27	5,501,293.26	1,752,777.77
VAL Nº 22	OCTUBRE	15,754.74	5,501,293.26	20.00%	3,150.95	5,501,293.26	1,749,626.82
VAL Nº 23	NOVIEMBRE	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	1,749,626.82
VAL Nº 24	DICIEMBRE	68,223.57	5,501,293.26	20.00%	13,644.71	5,501,293.26	1,735,982.11
VAL Nº 01 - ADICIONAL Nº 05	DICIEMBRE	148,551.83	5,501,293.26		74,275.92	5,501,293.26	1,661,706.19
VAL Nº 02 - ADICIONAL Nº 04	ENERO	35,933.20	5,501,293.26		35,933.20	5,501,293.26	1,625,772.99
VAL Nº 25	ENERO	106,056.42	5,501,293.26	20.00%	106,056.42	5,501,293.26	1,519,716.57

ISAÍAS JOSÉ ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 10717

JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 66335

# CONSORCIO SAN JOSE

## AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO - FEBRERO 2019

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

ENTIDAD : FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 RESIDENTE : JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
 PLAZO CONTR. : 1,587 DIAS CALENDARIO  
 MODALIDAD : A PRECIOS UNITARIOS

FORMULA:

$$\text{AMORT} = \text{AxVAL/C}$$

DONDE:

AMORT : Amortizacion por el Adelanto en Efectivo  
 A : Monto del Adelanto Directo Otorgado en Efectivo Sin IG  
 V : Monto de la Valorización Mensual, incluye Factor Relación  
 C : Monto del Contrato Principal Sin IG

SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 32,457,630.22 INC. IG  
 SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 27,506,466.29 SIN IG


PORCENTAJE DEL ADELANTO 20.00%

ADELANTO DIRECTO = 6,491,526.04 INC IG  
 ADELANTO DIRECTO = 5,501,293.26 SIN IG

No.	FECHA PAGO	ADEL. EFEC. CON IG	ADEL. EFEC. SIN IG	PORCENTAJE DEL ADELANTO
1	09/01/2015	6,491,526.04	5,501,293.26	20.00%

Valorización		Monto Valorizado a	Adel. Otorg. (SIN IG) c	Porcentaje del Adelanto d	Amortización AxVAL/C e= a x d	Monto por Amortizar f	Saldo a Amortizar g= f - e
Nº	Mes						
VAL Nº 01 - ADICIONAL Nº06	ENERO	886,768.10	5,501,293.26		886,768.10	5,501,293.26	632,948.47
VAL Nº 26	FEBRERO	11,543.86	5,501,293.26	20.00%	2,308.77	5,501,293.26	630,639.70
VAL Nº 02 - ADICIONAL Nº06	FEBRERO	17,601.86	5,501,293.26		17,601.86	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 27	MARZO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 28	ABRIL	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 29	MAYO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 30	JUNIO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 31	JULIO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 32	AGOSTO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 33	SEPTIEMBRE	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 34	OCTUBRE	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 35	NOVIEMBRE	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 36	DICIEMBRE	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 37	ENERO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 38	FEBRERO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	613,037.84
VAL Nº 01 - ADICIONAL Nº08	MARZO	569,308.78	5,501,293.26	20.00%	113,861.76	5,501,293.26	499,176.08
VAL Nº 39	MARZO	1,487.48	5,501,293.26	20.00%	297.50	5,501,293.26	498,878.58
VAL Nº 01 - ADICIONAL Nº07	MARZO	46,702.28	5,501,293.26	20.00%	9,340.46	5,501,293.26	489,538.12
VAL Nº 02 - ADICIONAL Nº07	ABRIL	12,810.45	5,501,293.26	20.00%	2,562.09	5,501,293.26	486,976.03
VAL Nº 02 - ADICIONAL Nº08	ABRIL	121,994.74	5,501,293.26	20.00%	24,398.95	5,501,293.26	462,577.08
VAL Nº40	ABRIL	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	462,577.08
VAL Nº 03 - ADICIONAL Nº07	MAYO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	462,577.08
VAL Nº 03 - ADICIONAL Nº08	MAYO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	462,577.08

ISAIAS JOSE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 10717

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 66335

# CONSORCIO SAN JOSE

## AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO - FEBRERO 2019

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

ENTIDAD : FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 RESIDENTE : JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
 PLAZO CONTR. : 1,587 DIAS CALENDARIO  
 MODALIDAD : A PRECIOS UNITARIOS

FORMULA:

$$\text{AMORT} = \text{AxVAL/C}$$

DONDE:

AMORT : Amortizacion por el Adelanto en Efectivo  
 A : Monto del Adelanto Directo Otorgado en Efectivo Sin IG  
 V : Monto de la Valorización Mensual, incluye Factor Relación  
 C : Monto del Contrato Principal Sin IG

SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 32,457,630.22 INC. IG  
 SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 27,506,466.29 SIN IG

PORCENTAJE DEL ADELANTO 20.00%

ADELANTO DIRECTO = 6,491,526.04 INC IG  
 ADELANTO DIRECTO = 5,501,293.26 SIN IG

No.	FECHA PAGO	ADEL. EFEC. CON IG	ADEL. EFEC. SIN IG	PORCENTAJE DEL ADELANTO
1	09/01/2015	6,491,526.04	5,501,293.26	20.00%

Valorizacion		Monto Valorizado	Adel. Otorg. (SIN IG)	Porcentaje del Adelanto	Amortizacion AxVAL/C	Monto por Amortizar	Saldo a Amortizar
Nº	Mes	a	c	d	e= a x d	f	g= f - e
VAL Nº41	MAYO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	462,577.08
VAL Nº 42	JUNIO	27,517.58	5,501,293.26	20.00%	5,503.52	5,501,293.26	457,073.56
ADICIONAL Nº08	JUNIO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	457,073.56
VAL Nº 04 - ADICIONAL Nº07	JUNIO	50,282.27	5,501,293.26	20.00%	10,056.45	5,501,293.26	447,017.11
VAL Nº 43	JULIO	15,893.61	5,501,293.26	20.00%	3,178.72	5,501,293.26	443,838.39
VAL Nº 05 - ADICIONAL Nº08	JULIO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	443,838.39
VAL Nº 05 - ADICIONAL Nº07	JULIO	41,140.04	5,501,293.26	20.00%	8,228.01	5,501,293.26	435,610.38
VAL Nº 44	AGOSTO	16,519.87	5,501,293.26	20.00%	3,303.97	5,501,293.26	432,306.41
VAL Nº 06 - ADICIONAL Nº08	AGOSTO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	432,306.41
VAL Nº 06 - ADICIONAL Nº07	AGOSTO	63,995.61	5,501,293.26	20.00%	12,799.12	5,501,293.26	419,507.29
VAL Nº 07 - ADICIONAL Nº08	SETIEMBRE	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	419,507.29
VAL Nº 07 - ADICIONAL Nº07	SETIEMBRE	64,373.77	5,501,293.26	20.00%	12,874.75	5,501,293.26	406,632.54
VAL Nº 45	SETIEMBRE	23,972.12	5,501,293.26	20.00%	4,794.42	5,501,293.26	401,838.12
VAL Nº 08 - ADICIONAL Nº08	OCTUBRE	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	401,838.12
VAL Nº 08 - ADICIONAL Nº07	OCTUBRE	46,904.74	5,501,293.26	20.00%	9,380.95	5,501,293.26	392,457.17
VAL Nº 46	OCTUBRE	14,412.14	5,501,293.26	20.00%	2,882.43	5,501,293.26	389,574.74
VAL Nº 09 - ADICIONAL Nº08	NOVIEMBRE	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	389,574.74
VAL Nº 09 - ADICIONAL Nº07	NOVIEMBRE	88,597.84	5,501,293.26	20.00%	17,719.57	5,501,293.26	371,855.17

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 10717

JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 66335

# CONSORCIO SAN JOSE

## AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO - FEBRERO 2019

OBRA : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

ENTIDAD : FONDEPES  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 RESIDENTE : JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
 PLAZO CONTR. : 1,587 DIAS CALENDARIO  
 MODALIDAD : A PRECIOS UNITARIOS

FORMULA:

$$AMORT = A \times VAL / C$$

DONDE:

AMORT : Amortización por el Adelanto en Efectivo  
 A : Monto del Adelanto Directo Otorgado en Efectivo Sin IGV  
 V : Monto de la Valorización Mensual, incluye Factor Relación  
 C : Monto del Contrato Principal Sin IGV

SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 32,457,630.22 INC. IGV  
 SALDO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 27,506,466.29 SIN IGV

PORCENTAJE DEL ADELANTO 20.00%

ADELANTO DIRECTO = 6,491,526.04 INC IGV  
 ADELANTO DIRECTO = 5,501,293.26 SIN IGV

*Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

No.	FECHA PAGO	ADEL. EFEC. CON IGV	ADEL. EFEC. SIN IGV	PORCENTAJE DEL ADELANTO
1	09/01/2015	6,491,526.04	5,501,293.26	20.00%

Valorización		Monto Valorizado	Adel. Otorg. (SIN IGV)	Porcentaje del Adelanto	Amortización AxVAL/C	Monto por Amortizar	Saldo a Amortizar
N°	Mes	a	c	d	e = a x d	f	g = f - e
VAL N° 47	NOVIEMBRE	51,039.97	5,501,293.26	20.00%	10,207.99	5,501,293.26	361,647.18
VAL N° 10 - ADICIONAL N°08	DICIEMBRE	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	361,647.18
VAL N° 10 - ADICIONAL N°07	DICIEMBRE	88,597.84	5,501,293.26	20.00%	17,719.57	5,501,293.26	343,927.61
VAL N° 48	DICIEMBRE	35,710.99	5,501,293.26	20.00%	7,142.20	5,501,293.26	336,785.41
VAL N° 11 - ADICIONAL N°07	ENERO	104,232.76	5,501,293.26	20.00%	20,846.55	5,501,293.26	315,938.86
VAL N° 11 - ADICIONAL N°08	ENERO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	315,938.86
VAL N° 49	ENERO	164,208.84	5,501,293.26	20.00%	32,841.77	5,501,293.26	283,097.09
VAL N° 01 - ADICIONAL N°11	ENERO	327,525.81	5,501,293.26	20.00%	65,505.16	5,501,293.26	217,591.93
VAL N° 01 - ADICIONAL N°12	ENERO	219,831.21	5,501,293.26	20.00%	43,966.24	5,501,293.26	173,625.69
VAL N° 12 - ADICIONAL N°07	FEBRERO	93,809.48	5,501,293.26	20.00%	18,761.90	5,501,293.26	154,863.79
VAL N° 12 - ADICIONAL N°08	FEBRERO	0.00	5,501,293.26	20.00%	0.00	5,501,293.26	154,863.79
VAL N° 50	FEBRERO	103,918.49	5,501,293.26	20.00%	20,783.70	5,501,293.26	134,080.09
VAL N° 02 - ADICIONAL N°11	FEBRERO	21,396.82	5,501,293.26	20.00%	4,279.36	5,501,293.26	129,800.73
VAL N° 02 - ADICIONAL N°12	FEBRERO	87,768.74	5,501,293.26	20.00%	17,553.75	5,501,293.26	112,246.98
SUBTOTAL		20,207,580.38		SUB TOTAL	5,389,046.28		
		IGV 3,637,364.47		IGV 970,028.33			
		23,844,944.85		6,359,074.61			

AMORTIZACION DEL MES

SI. 20,783.70

*Isaias Jorge Alva Espinoza*  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

## RESIDENCIA DE OBRA DEDUCCION DE REAJUSTE POR ADELANTO DIRECTO

OBRA	: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE				
CONTRATISTA	: CONSORCIO SAN JOSE				
CLIENTE	: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO				
MONTO OBRA	: 32,457,630.22	(con IGV)	27,506,466.29	Sin/IGV	
PLAZO	: 1,587 DIAS CALENDARIO				
UBICACIÓN	: SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE				
A. DIRECTO	: 6,491,526.04	(con IGV)	5,501,293.26	Sin/IGV	FECHA DE ENTREGA: 09/01/2015
A. MATERIALES	: NO SOLICITADO				
INICIO CONTRAC.	: 15/01/2015				

### DEDUCCION DE REAJUSTE POR ADELANTO DIRECTO QUE NO CORRESPONDE :

Según la fórmula:


$$D = V * A / C (K / K_a - 1)$$

Nº	Valorización		Adelanto Directo	Mes de Reajuste**		Mes de entrega Adel.		Monto a Regularizar
	Formula	Monto		Mes	K	Mes	Ka	
45.00	01	0.00	5,501,293.26	feb-19	1.154	ene-15	1.035	-
	02	0.00	5,501,293.26	feb-19	1.144	ene-15	1.023	-
	03	0.00	5,501,293.26	feb-19	1.155	ene-15	1.039	-
	04	0.00	5,501,293.26	feb-19	1.181	ene-15	1.036	-
	05	0.00	5,501,293.26	feb-19	1.193	ene-15	1.031	-
	06	0.00	5,501,293.26	feb-19	1.194	ene-15	1.050	-
	07	135,028.26	5,501,293.26	feb-19	1.149	ene-15	1.033	3,032.58
	08	0.00	5,501,293.26	feb-19	1.124	ene-15	1.027	-
	09	0.00	5,501,293.26	feb-19	1.184	ene-15	1.042	-
	10	0.00	5,501,293.26	feb-19	1.151	ene-15	1.029	-
			5,501,293.26					
						<b>PARCIAL</b>	<b>S/. 3,032.58</b>	
						<b>PARCIAL PAGADO</b>	<b>S/.</b>	<b>-</b>
						<b>TOTAL A REGULARIZAR</b>	<b>S/. 3,032.58</b>	

**TOTAL REINTEGROS A REGULARIZAR (sin IGV)**

**S/. 3,032.58**

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**RESIDENCIA DE OBRA  
FORMULAS POLINOMICAS**

OBRA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LANARQUE, REGION LAMARQUE  
 ENTIDAD CONSORCIO SAN JOSE  
 MONTO OBRA FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 PLAZO EJEC. 31.05.2015  
 UBICACION SAN JOSE - LAMARQUE - LAMARQUE  
 A. DIRECTO NO SOLICITADO  
 A. MATERIALES 15/01/2015  
 ESCRIBIDA EN: ESTRUCTURAS

(con 10V) 71,506,466.29 SIB/10V

(con 10V) 5,401,231.26 SIB/10V

$$K = 0.297 \cdot (Qr / Ms) + 0.159 \cdot (Qr / Iq) + 0.218 \cdot (Qdr / Imd) + 0.078 \cdot (Hr / Hb) + 0.119 \cdot (Ar / Am) + 0.087 \cdot (Ar / Ao) + 0.120 \cdot (Qr / Co)$$

Simb	IU	DESCRIPCION	Coef	%	Jun '14	Ene '15	Feb '15	Mar '15	Ago '18	Set '18	Oct '18	Nov '18	Dic '18	Ene '19	Feb '19	K
47	M	MANO DE OBRA INC. LETRES SOCIALES	0.207	100.000%	523.70	523.15	409.58	409.58	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	0.238
48	I	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.169	100.000%	409.58	405.56	397.37	411.34	449.40	450.26	450.26	451.18	452.00	452.29	452.29	0.190
49	PA	SOLAR	0.218	6.422%	248.68	248.68	248.68	248.68	248.68	248.68	248.68	248.68	248.68	248.68	248.68	0.018
50	DB	MAGNANIMA Y EQUIPO IMPORTADO	0.078	25.641%	572.71	572.83	572.71	572.83	572.71	572.83	572.71	572.83	572.71	572.83	572.71	0.255
51	DS	BLOQUE Y LADRILLO	0.119	74.359%	410.63	412.70	410.63	412.70	410.63	412.70	410.63	412.70	410.63	412.70	410.63	0.061
52	AM	AGREGADO GRUESO	0.089	28.655%	655.15	655.15	655.15	655.15	655.15	655.15	655.15	655.15	655.15	655.15	655.15	0.075
53	A	MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CABO.	0.120	100.000%	492.06	492.06	492.06	492.06	492.06	492.06	492.06	492.06	492.06	492.06	492.06	0.100
54	C	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	0.087	100.000%	395.70	395.70	395.70	395.70	395.70	395.70	395.70	395.70	395.70	395.70	395.70	0.143
			<b>1.000</b>		<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.143</b>
					<b>K (Ene '15)</b>	<b>K (Ene '15)</b>	<b>K (Ene '15)</b>	<b>K (Ene '15)</b>	<b>K (Ago '18)</b>	<b>K (Set '18)</b>	<b>K (Oct '18)</b>	<b>K (Nov '18)</b>	<b>K (Dic '18)</b>	<b>K (Ene '19)</b>	<b>K (Feb '19)</b>	<b>1.154</b>

\*\* Reglas Calculadas con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

**FORMULA N° 02: ARQUITECTURA**

$$K = 0.326 \cdot (Mr / Mo) + 0.168 \cdot (Ir / Io) + 0.187 \cdot (Pr / Pa) + 0.097 \cdot (Dr / DBo) + 0.081 \cdot (Ch / ChO) + 0.074 \cdot (Pm / Pmo) + 0.097 \cdot (Ar / Ao)$$

Simb	IU	DESCRIPCION	Coef	%	Jun '14	Ene '15	Feb '15	Mar '15	Ago '18	Set '18	Oct '18	Nov '18	Dic '18	Ene '19	Feb '19	K
47	M	MANO DE OBRA INC. LETRES SOCIALES	0.326	100.000%	523.70	523.15	409.58	409.58	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	0.375
48	I	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.168	3.209%	409.58	405.56	397.37	411.34	449.40	450.26	450.26	451.18	452.00	452.29	452.29	0.189
49	PA	AGREGADO GRUESO	0.197	86.791%	410.63	412.70	410.63	412.70	410.63	412.70	410.63	412.70	410.63	412.70	410.63	0.006
50	DB	POSTE DE CONCRETO	0.087	21.184%	572.71	572.83	572.71	572.83	572.71	572.83	572.71	572.83	572.71	572.83	572.71	0.208
51	DS	BLOQUE Y LADRILLO	0.087	67.818%	397.37	397.37	397.37	397.37	397.37	397.37	397.37	397.37	397.37	397.37	397.37	0.030
52	AM	CEMENTO PORTLAND TIPO V	0.081	19.672%	293.39	293.39	293.39	293.39	293.39	293.39	293.39	293.39	293.39	293.39	293.39	0.075
53	A	HERRAMIENTA MANUAL	0.074	50.000%	410.63	412.70	410.63	412.70	410.63	412.70	410.63	412.70	410.63	412.70	410.63	0.041
54	PH	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	0.097	100.000%	492.06	492.06	492.06	492.06	492.06	492.06	492.06	492.06	492.06	492.06	492.06	0.039
			<b>1.000</b>		<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.141</b>
					<b>K (Ene '15)</b>	<b>K (Ene '15)</b>	<b>K (Ene '15)</b>	<b>K (Ene '15)</b>	<b>K (Ago '18)</b>	<b>K (Set '18)</b>	<b>K (Oct '18)</b>	<b>K (Nov '18)</b>	<b>K (Dic '18)</b>	<b>K (Ene '19)</b>	<b>K (Feb '19)</b>	<b>1.144</b>

\*\* Reglas Calculadas con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

*Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335





**RESIDENCIA DE OBRA  
FORMULAS POLINOMICAS**

OBRA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LANUAYEQUE, REGION LAMAYEQUE

EJECUTA CONSORCIO SAN JOSE Sem/OV  
 MONTO OBRA FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (en IOV) 27,506,466.29 Sem/OV  
 PLAZO OBRA 32.47/60.21  
 UBICACION 1,587 DIAS CALENDARIO (en IOV)  
 A. DIRECTO SAN JOSE - LANUAYEQUE - LAMAYEQUE (en IOV) 5,501,293.26 Sem/OV  
 INICIO DE OBRA NO SOLICITADO  
 15/07/2015

**FORMULA Nº 05: MITIGACION AMBIENTAL**

$$K = 0.290 \cdot (Dr / Do) + 0.201 \cdot (Mr / Mo) + 0.187 \cdot (Tr / To) + 0.076 \cdot (Ar / Ao) + 0.137 \cdot (Wr / Wo) + 0.123 \cdot (Pr / Po)$$

Simb	IU	DESCRIPCION	Coef	%	Jun '14	Ene '15	Feb '15	Mar '15	Abr '15	May '15	Jun '15	Jul '15	Ago '15	Sep '15	Oct '15	Nov '15	Dic '15	Ene '16	Feb '16	K
D	29	DOLAR	0.296	100.000%	397.37	411.34	433.02	468.87	490.47	523.15	572.11	602.11	622.11	630	637.53	642.24	648.56	653.29	658.32	0.374
M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	0.201	100.000%	523.70	523.15	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	0.230
I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.167	100.000%	400.58	405.58	448.40	450.26	450.26	450.26	450.26	450.26	450.26	450.26	450.26	450.26	450.26	450.26	450.26	0.188
AT	05	AGREGADO FINO	0.076	100.000%	517.21	524.90	548.83	550.37	551.14	551.14	551.14	551.14	551.14	551.14	551.14	551.14	551.14	551.14	551.14	0.082
M	42	MADERA IMPORTADA PARA ENCORADO Y CARP.	0.137	100.000%	247.43	263.40	285.80	288.82	287.76	287.76	287.76	287.76	287.76	287.76	287.76	287.76	287.76	287.76	287.76	0.160
P	56	PLANCHAS DE ACERO LAC	0.123	100.000%	454.42	459.26	542.19	545.88	579.66	591.47	591.47	591.47	591.47	591.47	591.47	591.47	591.47	591.47	591.47	0.159
			1.000			K (Ene '15)	K (Ago '15)	K (Sep '15)	K (Oct '15)	K (Nov '15)	K (Dic '15)	K (Ene '16)	K (Feb '16)	K (Mar '16)	K (Abr '16)	K (May '16)	K (Jun '16)	K (Jul '16)	K (Ago '16)	1.183


\*\* Requerite Calculado con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.


**FORMULA Nº 06: EQUIPAMIENTO**

$$K = 0.467 \cdot (Dr / Do) + 0.449 \cdot (Mr / Mo) + 0.187 \cdot (Tr / To) + 0.0217 \cdot (Wr / Wo)$$

Simb	IU	DESCRIPCION	Coef	%	Jun '14	Ene '15	Feb '15	Mar '15	Abr '15	May '15	Jun '15	Jul '15	Ago '15	Sep '15	Oct '15	Nov '15	Dic '15	Ene '16	Feb '16	K
D	29	DOLAR	0.467	100.000%	397.37	411.34	433.02	468.87	490.47	523.15	572.11	602.11	622.11	630	637.53	642.24	648.56	653.29	658.32	0.590
AM	10	APARATO SANITARIO CON GRIFERIA	0.149	99.323%	390.11	390.36	413.87	413.86	414.54	414.47	414.47	414.47	414.47	414.47	414.47	414.47	414.47	414.47	414.47	0.168
I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.167	6.710%	655.15	672.00	732.69	744.41	748.42	751.45	751.45	751.45	751.45	751.45	751.45	751.45	751.45	751.45	751.45	0.011
M	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	0.217	100.000%	338.46	348.43	368.15	372.23	370.72	371.13	371.13	371.13	371.13	371.13	371.13	371.13	371.13	371.13	371.13	0.188
			1.000			K (Ene '15)	K (Ago '15)	K (Sep '15)	K (Oct '15)	K (Nov '15)	K (Dic '15)	K (Ene '16)	K (Feb '16)	K (Mar '16)	K (Abr '16)	K (May '16)	K (Jun '16)	K (Jul '16)	K (Ago '16)	1.184

\*\* Requerite Calculado con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

  
**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 10717

  
**JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 66335

**RESUMEN DE OBRA  
FORMULAS POLINOMICAS**

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYÈQUE, REGIÓN LAMBAYÈQUE

OBRA: CONSORCIO SAN JOSÉ  
 ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 MONTO OBRA: 34.977.630,33 (com IOV) 21.506.466,29 Sin IOV  
 PLAZO EJEC: 1.587 DIAS CALENDARIO  
 UBICACIÓN: SAN JOSÉ - LAMBAYÈQUE - LAMBAYÈQUE (com IOV) 5.301.293,16 Sin IOV  
 A. DIRECTO: NO SOLICITADO  
 A. MATERIALES: NO SOLICITADO  
 INICIO DE OBRA: 15/01/2015

FORMULA Nº 07: OBRAS EN MAR.

$$K = 0.271*(Ar / Aa) + 0.254*(Mr / Mo) + 0.167*(Ir / Io) + 0.0695*(Mhr / MHo) + 0.087*(Mr / Mo) + 0.142*(CDr / CDo)$$

Simb	IU	DESCRIPCIÓN	Coef	%	Jun '14	Ene '15	Ago '15	Ene '16	Oct '16	Nov '16	Dic '16	Ene '17	Feb '17	K
AP	02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	0.271	96.155%	515.47	515.47	515.47	515.47	515.47	515.47	515.47	515.47	515.47	0.300
M	54	PIRITURA LATEX	0.005	1.815%	372.35	372.35	372.35	372.35	372.35	372.35	372.35	372.35	372.35	0.005
I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.167	100.000%	523.15	523.15	523.15	523.15	523.15	523.15	523.15	523.15	523.15	0.167
MH	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	0.099	31.313%	400.98	400.98	400.98	400.98	400.98	400.98	400.98	400.98	400.98	0.099
MA	05	AGREGADO GRISES	0.067	68.687%	398.46	398.46	398.46	398.46	398.46	398.46	398.46	398.46	398.46	0.067
CD	23	MAQUINARIA PARA ENCOR. Y CARP.	0.142	52.731%	240.69	240.69	240.69	240.69	240.69	240.69	240.69	240.69	240.69	0.142
	29	CEMENTO PORTLAND TIPO V	0.029	83.503%	437.32	437.32	437.32	437.32	437.32	437.32	437.32	437.32	437.32	0.029
	29	DÓLAR	1.000	16.197%	368.10	368.10	368.10	368.10	368.10	368.10	368.10	368.10	368.10	1.000
					397.37	411.34	433.25	449.42	465.59	481.76	497.93	514.10	530.27	1.122
					K (Ene '15)		K (Ago '15)		K (Oct '16)		K (Nov '16)		K (Dic '16)	
					1.140	1.144	1.148	1.153	1.157	1.162	1.167	1.172	1.177	1.182
					K (Ene '19)		K (Ene '19)		K (Ene '19)		K (Ene '19)		K (Ene '19)	
					1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.


**FORMULA Nº 08: PAVIMENTACION EXTERIOR.**

$$K = 0.242*(Ar / Aa) + 0.228*(Mr / Mo) + 0.071*(Ir / Io) + 0.487*(Mhr / MHo) + 0.182*(CDr / CDo)$$

Simb	IU	DESCRIPCIÓN	Coef	%	Jun '14	Ene '15	Ago '15	Ene '16	Oct '16	Nov '16	Dic '16	Ene '17	Feb '17	K
A	13	ASfalto	0.242	100.000%	1704.06	1704.06	1704.06	1704.06	1704.06	1704.06	1704.06	1704.06	1704.06	0.242
M	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	0.236	100.000%	248.60	248.60	248.60	248.60	248.60	248.60	248.60	248.60	248.60	0.236
I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.167	100.000%	400.98	400.98	400.98	400.98	400.98	400.98	400.98	400.98	400.98	0.167
MH	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	0.071	100.000%	523.15	523.15	523.15	523.15	523.15	523.15	523.15	523.15	523.15	0.071
MA	02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	0.122	1.639%	492.06	492.06	492.06	492.06	492.06	492.06	492.06	492.06	492.06	0.122
MD	29	HORMIGON	0.162	98.361%	410.63	410.63	410.63	410.63	410.63	410.63	410.63	410.63	410.63	0.162
	29	DÓLAR	1.000	7.407%	397.37	397.37	397.37	397.37	397.37	397.37	397.37	397.37	397.37	1.000
	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	0.154	92.553%	338.46	338.46	338.46	338.46	338.46	338.46	338.46	338.46	338.46	0.154
					K (Ene '15)		K (Ago '15)		K (Oct '16)		K (Nov '16)		K (Dic '16)	
					1.028	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.028
					K (Ene '19)		K (Ene '19)		K (Ene '19)		K (Ene '19)		K (Ene '19)	
					1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

  
**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg CIP Nº 10717

  
**JULIO OSWALDO FUENTES QUÍÑEZ**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 66335

**RESIDENCIA DE OBRA  
FORMULAS POLINOMICAS**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LANGAYEQUE, REGIÓN LAMAYEQUE

EJECUTA: CONSORCIO SAN JOSÉ  
 ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 MONTO OBRA: 32.457.630,12 S/100V  
 PLAZO EFEC: 1.587 DIAS CALENDARIO  
 UBICACIÓN: SAN JOSÉ - LANGAYEQUE - LANGAYEQUE  
 A. DIRECTO: 6.691.526,04 S/100V  
 A. MATERIALES: NO SOLICITADO  
 INICIO DE OBRA: 15/01/2015

FORMULA Nº 09: INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSION

$$K = 0.199 \cdot (DMR / DMG) + 0.059 \cdot (MPR / NPG) + 0.179 \cdot (Ar / Ao) + 0.008 \cdot (Mr / Mo) + 0.167 \cdot (Ir / Io) + 0.163 \cdot (MAR / MAO) + 0.145 \cdot (Ar / Ao)$$

Simb	IU	DESCRIPCION	Coef	%	To	Jun '14	Ir	Eme '15	Agó '18	Set. '18	Ir	Oct. '18	Nov '18	Eme '19	Ir	Feb '19	K	K (Feb '19)
DN	39	DÓLAR	0.199	96.995%	397.37	411.34	486.67	486.67	483.02	486.67	490.47	490.47	497.53	483.58	483.58	483.58	0.249	0.249
MP	43	MADERA NACIONAL PARA ENCEP. Y CARPINT.	0.059	1.006%	655.15	672.00	744.41	744.41	732.59	744.41	749.42	749.42	751.45	751.45	751.45	751.45	0.002	0.002
M	47	MADERA IMPORTADA PARA ENCEP. Y CARPINT.	0.064	50.647%	338.45	348.43	372.23	372.23	359.15	372.23	370.70	370.70	371.13	371.13	369.86	369.86	0.033	0.033
M	47	MANO DE OBRERA INC. LEYES SOCIALES	0.167	49.153%	410.93	430.01	488.31	488.31	472.18	488.31	487.38	487.38	471.68	471.68	469.93	469.93	0.033	0.033
M	47	MANO DE OBRERA INC. LEYES SOCIALES	0.167	100.000%	206.95	220.85	259.37	259.37	239.37	259.37	242.05	242.05	244.87	244.87	243.89	243.89	0.311	0.311
T	39	ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.163	100.000%	523.70	523.15	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	600.40	0.101	0.101
MA	05	AGREGADO GRUESO	0.163	4.908%	400.98	405.56	465.56	465.56	449.40	465.56	465.56	465.56	465.56	465.56	465.56	465.56	0.008	0.008
A	39	ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.145	100.000%	400.98	405.56	465.56	465.56	449.40	465.56	465.56	465.56	465.56	465.56	465.56	465.56	0.194	0.194
			<b>1.000</b>			<b>1.042</b>	<b>1.160</b>	<b>1.172</b>	<b>1.187</b>	<b>1.184</b>	<b>1.187</b>	<b>1.184</b>	<b>1.184</b>	<b>1.184</b>	<b>1.184</b>	<b>1.184</b>	<b>1.184</b>	<b>1.184</b>

\*\* Requisitos Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

FORMULA Nº 10: SEGURIDAD Y SALUD

$$K = 0.362 \cdot (Mr / Mo) + 0.064 \cdot (Dr / Do) + 0.303 \cdot (Mr / Mo) + 0.167 \cdot (Ir / Io) + 0.104 \cdot (MAR / MAO)$$

Simb	IU	DESCRIPCION	Coef	%	To	Jun '14	Ir	Eme '15	Agó '18	Set. '18	Ir	Oct. '18	Nov '18	Eme '19	Ir	Feb '19	K	K (Feb '19)
M	42	MADERA IMPORTADA PARA ENCEP. Y CARPINT.	0.362	100.000%	247.43	253.40	285.92	285.92	285.92	285.92	285.92	285.92	285.92	285.92	285.92	285.92	0.422	0.422
D	29	DÓLAR	0.064	100.000%	397.37	411.34	486.67	486.67	483.02	486.67	490.47	490.47	497.53	483.58	483.58	483.58	0.091	0.091
M	47	MANO DE OBRERA INC. LEYES SOCIALES	0.303	100.000%	523.70	523.15	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	602.11	600.40	600.40	0.347	0.347
I	39	ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.167	100.000%	400.98	405.56	465.56	465.56	449.40	465.56	465.56	465.56	465.56	465.56	465.56	465.56	0.189	0.189
MA	05	AGREGADO GRUESO	0.104	85.577%	293.39	293.39	348.46	348.46	348.46	348.46	348.46	348.46	348.46	348.46	348.46	348.46	0.097	0.097
			<b>1.000</b>			<b>1.029</b>	<b>1.145</b>	<b>1.145</b>	<b>1.145</b>	<b>1.145</b>	<b>1.145</b>	<b>1.145</b>	<b>1.145</b>	<b>1.145</b>	<b>1.145</b>	<b>1.145</b>	<b>1.145</b>	<b>1.145</b>

\*\* Requisitos Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 10717

*Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 66335

## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

**OBRA :** CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE  
**EJECUTA :** CONSORCIO SAN JOSE  
**CLIENTE :** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**MONTO OBRA :** 32,457,630.22 (con IGV) 27,506,466.29 (sin IGV) **RESIDENTE:** ING. JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
**PLAZO EJEC. :** 1,587 DIAS CALENDARIO  
**UBICACIÓN :** SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
**A. DIRECTO :** 6,491,526.04 5,501,293.26 (sin IGV)  
**A. MATERIALES :** NO SOLICITADO  
**INICIO DE OBRA :** 15/01/2015

### CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL :

#### FORMULA N° 01: ESTRUCTURAS

N°	Mes	Valorización (sin IGV)		K	K-1	Reajuste Programado		Reajuste Real		Reajuste Autorizado		Reajuste a Regularizar	
		Programado	Ejecutado			Programado	Acumulado	Real	Acumulado	Autorizado	Acumulado	Pagado	a Pagar
01	ene-15	220,056.69	358,268.22	1.035	0.035	7,701.98	7,701.98	12,539.39	12,539.39	12,539.39	12,539.39	12,539.39	-
02	feb-15	624,191.19	551,600.21	1.042	0.042	26,216.03	33,918.01	23,167.21	35,706.60	23,167.21	35,706.60	23,167.21	-
03	mar-15	607,357.90	437,425.17	1.046	0.046	33,918.01	67,836.02	20,121.56	55,828.16	20,121.56	55,828.16	20,121.56	-
04	abr-15	407,069.32	371,440.48	1.047	0.047	19,132.26	86,968.28	17,457.70	73,285.86	17,457.70	73,285.86	17,457.70	-
05	may-15	238,246.77	51,780.65	1.050	0.050	11,912.34	98,880.62	2,589.03	75,874.89	2,589.03	75,874.89	2,589.03	-
06	jun-15	470,358.51	122,422.84	1.059	0.059	27,751.15	126,631.77	7,222.95	83,097.84	7,222.95	83,097.84	7,222.95	-
07	jul-15	369,272.00	411,556.30	1.054	0.054	19,940.69	146,572.46	22,224.04	105,321.88	22,224.04	105,321.88	22,224.04	-
08	ago-15	287,139.55	366,970.03	1.059	0.059	16,941.23	163,513.69	21,651.23	126,973.11	21,651.23	126,973.11	21,651.23	-
09	sep-15	177,026.26	128,428.32	1.058	0.058	10,267.52	173,781.21	7,448.84	134,421.95	7,448.84	134,421.95	7,448.84	-
10	oct-15	92,096.67	36,658.50	1.062	0.062	5,709.99	179,491.20	2,272.83	136,694.78	2,272.83	136,694.78	2,272.83	-
11	nov-15	297,800.06	240,969.49	1.071	0.071	21,143.80	200,635.00	17,108.83	153,803.61	17,108.83	153,803.61	17,108.83	-
12	dic-15	213,115.61	189,160.28	1.078	0.078	16,623.02	217,258.02	14,754.50	168,558.11	14,754.50	168,558.11	14,754.50	-
13	ene-16	88,200.65	294,220.43	1.088	0.088	7,761.66	225,019.68	25,891.40	194,449.51	25,891.40	194,449.51	25,891.40	-
14	feb-16	0.00	97,768.23	1.095	0.095	0.00	225,019.68	9,287.98	203,737.49	9,287.98	203,737.49	9,287.98	-
15	mar-16	0.00	186,087.64	1.084	0.084	0.00	225,019.68	15,631.36	219,368.85	15,631.36	219,368.85	15,631.36	-
16	abr-16	1,076.10	103,044.90	1.073	0.073	78.56	225,098.24	7,522.28	226,891.13	7,522.28	226,891.13	7,522.28	-
17	may-16	55,871.84	45,420.16	1.083	0.083	4,637.36	229,735.60	3,769.87	230,661.00	3,769.87	230,661.00	3,769.87	-
18	jun-16	1,868.45	123,764.24	1.080	0.080	149.48	229,885.08	9,901.14	240,562.14	9,901.14	240,562.14	9,901.14	-
19	jul-16	0.00	9,955.55	1.086	0.086	0.00	229,885.08	856.18	241,418.32	856.18	241,418.32	856.18	-
20	ago-16	0.00	0.00	1.089	0.089	0.00	229,885.08	0.00	241,418.32	0.00	241,418.32	0.00	-
21	sep-16	0.00	0.00	1.094	0.094	0.00	229,885.08	0.00	241,418.32	0.00	241,418.32	0.00	-
22	oct-16	0.00	-1,065.15	1.096	0.096	0.00	229,885.08	-102.25	241,316.07	-102.25	241,316.07	-102.25	-
23	nov-16	0.00	0.00	1.098	0.098	0.00	229,885.08	0.00	241,316.07	0.00	241,316.07	0.00	-
24	dic-16	0.00	0.00	1.097	0.097	0.00	229,885.08	0.00	241,316.07	0.00	241,316.07	0.00	-
25	ene-17	0.00	16,475.56	1.097	0.097	0.00	229,885.08	1,598.13	242,914.20	1,598.13	242,914.20	1,598.13	-
26	feb-17	0.00	0.00	1.093	0.093	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-

ISAIAS JORGE ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Paq. CIP N° 10717


JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Paq. CIP N° 66335

## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

**OBRA** : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE  
**EJECUTA** : CONSORCIO SAN JOSE  
**CLIENTE** : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**MONTO OBRA** : 32,457,630.22 (con IGV) 27,506,466.29 (sin IGV) **RESIDENTE:** ING. JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
**PLAZO EJEC.** : 1,587 DIAS CALENDARIO  
**UBICACIÓN** : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
**A. DIRECTO** : 6,491,526.04 5,501,293.26 (sin IGV)  
**A. MATERIALES** : NO SOLICITADO  
**INICIO DE OBRA** : 15/01/2015

### CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:

27	mar-17	0.00	0.00	1.095	0.095	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
28	abr-17	0.00	0.00	1.091	0.091	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
29	may-17	0.00	0.00	1.094	0.094	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
30	jun-17	0.00	0.00	1.096	0.096	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
31	jul-17	0.00	0.00	1.095	0.095	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
32	ago-17	0.00	0.00	1.103	0.103	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
33	sep-17	0.00	0.00	1.105	0.105	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
34	oct-17	0.00	0.00	1.106	0.106	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
35	nov-17	0.00	0.00	1.105	0.105	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
36	dic-17	0.00	0.00	1.108	0.108	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
37	ene-18	0.00	0.00	1.106	0.106	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
38	feb-18	0.00	0.00	1.123	0.123	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
39	mar-18	0.00	0.00	1.124	0.124	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
40	abr-18	0.00	0.00	1.122	0.122	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
41	may-18	0.00	0.00	1.127	0.127	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
42	jun-18	0.00	0.00	1.128	0.128	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
43	jul-18	0.00	0.00	1.130	0.130	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
44	ago-18	0.00	0.00	1.143	0.143	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
45	sep-18	0.00	0.00	1.149	0.149	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
46	oct-18	0.00	0.00	1.151	0.151	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
47	nov-18	0.00	0.00	1.151	0.151	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
48	dic-18	0.00	0.00	1.151	0.151	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
49	ene-19	0.00	0.00	1.151	0.151	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
50	feb-19	0.00	0.00	1.151	0.151	0.00	229,885.08	0.00	242,914.20	0.00	242,914.20	0.00	-
		<b>4,150,747.57</b>	<b>4,142,352.05</b>			<b>229,885.08</b>		<b>242,914.20</b>	<b>242,914.20</b>	<b>242,914.20</b>	<b>242,914.20</b>	<b>0.00</b>	

  
 JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

ISAIAS JOSE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE

EJECUTA : CONSORCIO SAN JOSE

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

MONTO OBRA : 32,457,630.22 (con IGV) 27,506,466.29 (sin/IGV)

RESIDENTE: ING. JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ

PLAZO EJEC. : 1,587 DIAS CALENDARIO

UBICACIÓN : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

MATERIALES : NO SOLICITADO 5,501,293.26 (sin/IGV)

INICIO DE OBRA : 15/01/2015

### CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:

#### FORMULA Nº 02: ARQUITECTURA

Nº	Mes	Valorización (sin IGV)		K	K-1	Reajuste Programado		Reajuste Real		Reajuste Autorizado		Reajuste a Regularizar	
		Programado	Ejecutado			Programado	Acumulado	Real	Acumulado	Autorizado	Acumulado	Pagado	a Pagar
		01	ene-15			0.00	0.00	1.023	0.023	0.00	0.00	0.00	0.00
02	feb-15	0.00	0.00	1.028	0.028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
03	mar-15	0.00	0.00	1.031	0.031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
04	abr-15	0.00	0.00	1.036	0.036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
05	may-15	0.00	0.00	1.034	0.034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
06	jun-15	0.00	0.00	1.047	0.047	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
07	jul-15	0.00	0.00	1.042	0.042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
08	ago-15	0.00	0.00	1.045	0.045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
09	sep-15	72,528.68	52,047.86	1.043	0.043	3,118.73	3,118.73	2,238.06	2,238.06	2,238.06	2,238.06	2,238.06	-
10	oct-15	79,809.68	82,184.62	1.048	0.048	3,830.86	6,949.59	3,944.86	6,182.92	3,944.86	6,182.92	3,944.86	-
11	nov-15	67,452.69	46,265.24	1.056	0.056	3,777.35	10,726.94	2,590.85	8,773.77	2,590.85	8,773.77	2,590.85	-
12	dic-15	69,242.63	70,638.99	1.060	0.060	4,154.56	14,881.50	4,238.34	13,012.11	4,238.34	13,012.11	4,238.34	-
13	ene-16	102,724.70	46,111.27	1.064	0.064	6,574.38	21,455.88	2,951.12	15,963.23	2,951.12	15,963.23	2,951.12	-
14	feb-16	174,354.33	291,522.69	1.069	0.069	12,030.45	33,486.33	20,115.07	36,078.30	20,115.07	36,078.30	20,115.07	-
15	mar-16	206,050.11	77,609.53	1.056	0.056	11,538.81	45,025.14	4,346.13	40,424.43	4,346.13	40,424.43	4,346.13	-
16	abr-16	102,334.85	60,626.99	1.057	0.057	5,833.09	50,858.23	3,455.74	43,880.17	3,455.74	43,880.17	3,455.74	-
17	may-16	340,167.99	102,193.07	1.062	0.062	21,090.42	71,948.65	6,335.97	50,216.14	6,335.97	50,216.14	6,335.97	-
18	jun-16	0.00	111,533.17	1.063	0.063	0.00	71,948.65	7,026.59	57,242.73	7,026.59	57,242.73	7,026.59	-
19	jul-16	0.00	47,530.13	1.083	0.083	0.00	71,948.65	3,945.00	61,187.73	3,945.00	61,187.73	3,945.00	-
20	ago-16	0.00	26,733.49	1.082	0.082	0.00	71,948.65	2,192.15	63,379.88	2,192.15	63,379.88	2,192.15	-
21	sep-16	0.00	54,654.58	1.085	0.085	0.00	71,948.65	4,645.64	68,025.52	4,645.64	68,025.52	4,645.64	-
22	oct-16	0.00	16,819.95	1.084	0.084	0.00	71,948.65	1,412.88	69,438.40	1,412.88	69,438.40	1,412.88	-
23	nov-16	0.00	0.00	1.086	0.086	0.00	71,948.65	0.00	69,438.40	0.00	69,438.40	0.00	-
24	dic-16	0.00	0.00	1.087	0.087	0.00	71,948.65	0.00	69,438.40	0.00	69,438.40	0.00	-
25	ene-17	0.00	65,994.40	1.078	0.078	0.00	71,948.65	5,147.56	74,585.96	5,147.56	74,585.96	5,147.56	-
26	feb-17	0.00	52,928.11	1.087	0.087	0.00	71,948.65	4,604.75	79,190.71	4,604.75	79,190.71	4,604.75	-

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 10717

JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 66335

## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

**OBRA** : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE  
**EJECUTA** : CONSORCIO SAN JOSE  
**CLIENTE** : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**MONTO OBRA** : 32,457,630.22 (con IGV) 27,506,466.29 (sin/IGV) **RESIDENTE:** ING. JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
**PLAZO EJEC.** : 1,587 DIAS CALENDARIO  
**UBICACIÓN** : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
**A. DIRECTO** : 6,491,526.04 5,501,293.26 (sin/IGV)  
**A. MATERIALES** : NO SOLICITADO  
**INICIO DE OBRA** : 15/01/2015

### CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL :

27	mar-17	0.00	0.00	1.086	0.086	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
28	abr-17	0.00	0.00	1.079	0.079	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
29	may-17	0.00	0.00	1.082	0.082	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
30	jun-17	0.00	0.00	1.084	0.084	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
31	jul-17	0.00	0.00	1.084	0.084	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
32	ago-17	0.00	0.00	1.098	0.098	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
33	sep-17	0.00	0.00	1.101	0.101	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
34	oct-17	0.00	0.00	1.102	0.102	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
35	nov-17	0.00	0.00	1.100	0.100	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
36	dic-17	0.00	0.00	1.104	0.104	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
37	ene-18	0.00	0.00	1.104	0.104	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
38	feb-18	0.00	0.00	1.114	0.114	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
39	mar-18	0.00	0.00	1.117	0.117	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
40	abr-18	0.00	0.00	1.115	0.115	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
41	may-18	0.00	0.00	1.119	0.119	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
42	jun-18	0.00	0.00	1.119	0.119	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
43	jul-18	0.00	0.00	1.119	0.119	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
44	ago-18	0.00	0.00	1.139	0.139	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
45	sep-18	0.00	0.00	1.139	0.139	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
46	oct-18	0.00	0.00	1.141	0.141	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
47	nov-18	0.00	0.00	1.141	0.141	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
48	dic-18	0.00	0.00	1.141	0.141	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
49	ene-19	0.00	0.00	1.141	0.141	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
50	feb-19	0.00	0.00	1.141	0.141	0.00	71,948.65	0.00	79,190.71	0.00	79,190.71	0.00	-
		<b>1,214,665.66</b>	<b>1,205,394.09</b>				<b>71,948.65</b>		<b>79,190.71</b>		<b>79,190.71</b>		<b>0.00</b>

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 68335

## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE

EJECUTA : CONSORCIO SAN JOSE

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

MONTO OBRA : 32,457,630.22 (con IGV) 27,506,466.29 (sin/IGV)

RESIDENTE: ING. JULIO OSWALDO FUENTES QUITÑONEZ

DURAZO EJEC. : 1,587 DIAS CALENDARIO

UBICACIÓN : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

MONTOS DIRECTO : 6,491,526.04 5,501,293.26 (sin/IGV)

ESTADO MATERIALES : NO SOLICITADO

INICIO DE OBRA : 15/01/2015

### CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:

#### FORMULA N° 03: INSTALACIONES ELECTRICAS

Valorización (sin IGV)				K	K-1	Reajuste Programado		Reajuste Real		Reajuste Autorizado		Reajuste a Regularizar	
N°	Mes	Programado	Ejecutado			Programado	Acumulado	Real	Acumulado	Autorizado	Acumulado	Pagado	a Pagar
01	ene-15	0.00	0.00	1.041	0.041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
02	feb-15	0.00	0.00	1.050	0.050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
03	mar-15	0.00	0.00	1.054	0.054	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
04	abr-15	0.00	0.00	1.061	0.061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
05	may-15	0.00	0.00	1.068	0.068	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
06	jun-15	87,815.56	0.00	1.078	0.078	6,849.61	6,849.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
07	jul-15	9,529.63	0.00	1.079	0.079	752.84	7,602.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
08	ago-15	1,764.52	0.00	1.087	0.087	153.51	7,755.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
09	sep-15	0.00	12,684.05	1.084	0.084	0.00	7,755.96	1,065.46	1,065.46	1,065.46	1,065.46	1,065.46	-
10	oct-15	0.00	0.00	1.088	0.088	0.00	7,755.96	0.00	1,065.46	0.00	1,065.46	0.00	-
11	nov-15	0.00	0.00	1.102	0.102	0.00	7,755.96	0.00	1,065.46	0.00	1,065.46	0.00	-
12	dic-15	0.00	0.00	1.108	0.108	0.00	7,755.96	0.00	1,065.46	0.00	1,065.46	0.00	-
13	ene-16	0.00	0.00	1.116	0.116	0.00	7,755.96	0.00	1,065.46	0.00	1,065.46	0.00	-
14	feb-16	0.00	0.00	1.124	0.124	0.00	7,755.96	0.00	1,065.46	0.00	1,065.46	0.00	-
15	mar-16	0.00	80,455.85	1.105	0.105	0.00	7,755.96	8,447.86	9,513.32	8,447.86	9,513.32	8,447.86	-
16	abr-16	0.00	11,625.47	1.095	0.095	0.00	7,755.96	1,104.42	10,617.74	1,104.42	10,617.74	1,104.42	-
17	may-16	144,863.31	6,863.64	1.101	0.101	14,631.58	22,387.54	693.23	11,310.97	693.23	11,310.97	693.23	-
18	jun-16	162,946.04	1,155.71	1.099	0.099	16,131.66	38,519.20	114.42	11,425.39	114.42	11,425.39	114.42	-
19	jul-16	0.00	0.00	1.108	0.108	0.00	38,519.20	0.00	11,425.39	0.00	11,425.39	0.00	-
20	ago-16	0.00	0.00	1.114	0.114	0.00	38,519.20	0.00	11,425.39	0.00	11,425.39	0.00	-
21	sep-16	0.00	0.00	1.116	0.116	0.00	38,519.20	0.00	11,425.39	0.00	11,425.39	0.00	-
22	oct-16	0.00	0.00	1.115	0.115	0.00	38,519.20	0.00	11,425.39	0.00	11,425.39	0.00	-
23	nov-16	0.00	0.00	1.121	0.121	0.00	38,519.20	0.00	11,425.39	0.00	11,425.39	0.00	-
24	dic-16	0.00	57,714.57	1.124	0.124	0.00	38,519.20	7,156.61	18,582.00	7,156.61	18,582.00	7,156.61	-
25	ene-17	0.00	75,782.71	1.113	0.113	0.00	38,519.20	8,563.45	27,145.45	8,563.45	27,145.45	8,563.45	-
26	feb-17	0.00	5,614.88	1.110	0.110	0.00	38,519.20	617.64	27,763.09	617.64	27,763.09	617.64	-

ISAIAS JORGE FUENTES QUITÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

JULIO OSWALDO FUENTES QUITÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. SIFIAN N° 6333

F-  
 - CO  
 - CO



## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

**OBRA :** CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE  
**EJECUTA :** CONSORCIO SAN JOSE  
**CLIENTE :** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**MONTO OBRA :** 32,457,630.22 (con IGV) 27,506,466.29 (sin IGV) **RESIDENTE:** ING. JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
**PLAZO EJEC. :** 1,587 DIAS CALENDARIO  
**UBICACION :** SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
**T. DIRECTO :** 6,491,526.04 5,501,293.26 (sin IGV)  
**MATERIALES :** NO SOLICITADO  
**INICIO DE OBRA :** 15/01/2015

### CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:

27	mar-17	0.00	0.00	1.111	0.111	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-
28	abr-17	0.00	0.00	1.107	0.107	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-
29	may-17	0.00	0.00	1.111	0.111	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-
30	jun-17	0.00	0.00	1.109	0.109	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-
31	jul-17	0.00	0.00	1.109	0.109	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-
32	ago-17	0.00	0.00	1.117	0.117	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-
33	sep-17	0.00	0.00	1.122	0.122	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-
34	oct-17	0.00	0.00	1.121	0.121	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-
35	nov-17	0.00	0.00	1.121	0.121	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-
36	dic-17	0.00	0.00	1.124	0.124	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-
37	ene-18	0.00	0.00	1.119	0.119	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-
38	feb-18	0.00	0.00	1.128	0.128	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-
39	mar-18	0.00	0.00	1.130	0.130	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-
40	abr-18	0.00	0.00	1.126	0.126	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-
41	may-18	0.00	0.00	1.137	0.137	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-
42	jun-18	0.00	0.00	1.138	0.138	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-
43	jul-18	0.00	0.00	1.140	0.140	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-
44	ago-18	0.00	0.00	1.149	0.149	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-
45	sep-18	0.00	0.00	1.151	0.151	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-
46	oct-18	0.00	0.00	1.154	0.154	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-
47	nov-18	0.00	0.00	1.154	0.154	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-
48	dic-18	0.00	0.00	1.154	0.154	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-
49	ene-19	0.00	0.00	1.154	0.154	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-
50	feb-19	0.00	0.00	1.154	0.154	0.00	38,519.20	0.00	27,763.09	0.00	27,763.09	0.00	-
		<b>406,922.86</b>	<b>251,896.88</b>			<b>38,519.20</b>		<b>27,763.09</b>		<b>27,763.09</b>		<b>27,763.09</b>	<b>0.00</b>

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

ISAIAS JOSE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

**OBRA** : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE  
**EJECUTA** : CONSORCIO SAN JOSE  
**CLIENTE** : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**MONTO OBRA** : 32,457,630.22 (con IGV) 27,506,466.29 (sin IGV) RESIDENTE: ING. JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
**PLAZO EJEC.** : 1,587 DIAS CALENDARIO  
**UBICACIÓN** : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
**MATERIALIALES** : NO SOLICITADO  
**INICIO DE OBRA** : 15/01/2015

ISAIAAS OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

### CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:

#### FORMULA N° 04: INSTALACIONES SANITARIAS

N°	Mes	Valorización (sin IGV)		K	K-1	Reajuste Programado		Reajuste Real		Reajuste Autorizado		Reajuste a Regularizar	
		Programado	Ejecutado			Programado	Acumulado	Real	Acumulado	Autorizado	Acumulado	Pagado	a Pagar
		01	ene-15			0.00	0.00	1.036	0.036	0.00	0.00	0.00	0.00
02	feb-15	0.00	0.00	1.044	0.044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
03	mar-15	0.00	0.00	1.052	0.052	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
04	abr-15	0.00	0.00	1.057	0.057	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
05	may-15	0.00	0.00	1.064	0.064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
06	jun-15	206,761.99	364,049.90	1.078	0.078	16,127.44	16,127.44	28,395.89	28,395.89	28,395.89	28,395.89	28,395.89	-
07	jul-15	349,040.36	0.00	1.083	0.083	28,970.35	45,097.79	0.00	28,395.89	0.00	28,395.89	0.00	-
08	ago-15	381,189.12	40,692.15	1.092	0.092	35,069.40	80,167.19	3,743.68	32,139.57	3,743.68	32,139.57	3,743.68	-
09	sep-15	96,854.34	25,609.62	1.087	0.087	8,426.33	88,593.52	2,228.04	34,367.61	2,228.04	34,367.61	2,228.04	-
10	oct-15	19,575.65	107,837.21	1.095	0.095	1,859.69	90,453.21	10,244.53	44,612.14	10,244.53	44,612.14	10,244.53	-
11	nov-15	0.00	0.00	1.107	0.107	0.00	90,453.21	0.00	44,612.14	0.00	44,612.14	0.00	-
12	dic-15	0.00	376,102.59	1.113	0.113	0.00	90,453.21	42,499.59	87,111.73	42,499.59	87,111.73	42,499.59	-
13	ene-16	0.00	0.00	1.120	0.120	0.00	90,453.21	0.00	87,111.73	0.00	87,111.73	0.00	-
14	feb-16	0.00	0.00	1.133	0.133	0.00	90,453.21	0.00	87,111.73	0.00	87,111.73	0.00	-
15	mar-16	0.00	169,260.72	1.118	0.118	0.00	90,453.21	19,972.76	107,084.49	19,972.76	107,084.49	19,972.76	-
16	abr-16	0.00	9,796.18	1.102	0.102	0.00	90,453.21	999.21	108,083.70	999.21	108,083.70	999.21	-
17	may-16	0.00	14,312.96	1.109	0.109	0.00	90,453.21	1,560.11	109,643.81	1,560.11	109,643.81	1,560.11	-
18	jun-16	77,790.00	2,455.76	1.109	0.109	8,479.56	98,932.77	267.68	109,911.49	267.68	109,911.49	267.68	-
19	jul-16	0.00	13,013.22	1.116	0.116	0.00	98,932.77	1,509.53	111,421.02	1,509.53	111,421.02	1,509.53	-
20	ago-16	0.00	0.00	1.120	0.120	0.00	98,932.77	0.00	111,421.02	0.00	111,421.02	0.00	-
21	sep-16	0.00	0.00	1.131	0.131	0.00	98,932.77	0.00	111,421.02	0.00	111,421.02	0.00	-
22	oct-16	0.00	-0.06	1.133	0.133	0.00	98,932.77	-0.01	111,421.01	-0.01	111,421.01	-0.01	-
23	nov-16	0.00	0.00	1.135	0.135	0.00	98,932.77	0.00	111,421.01	0.00	111,421.01	0.00	-
24	dic-16	0.00	10,509.00	1.134	0.134	0.00	98,932.77	1,408.21	112,829.22	1,408.21	112,829.22	1,408.21	-
25	ene-17	0.00	0.00	1.128	0.128	0.00	98,932.77	0.00	112,829.22	0.00	112,829.22	0.00	-
26	feb-17	0.00	-79,821.40	1.121	0.121	0.00	98,932.77	-9,658.39	103,170.83	-9,658.39	103,170.83	-9,658.39	-

JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

F. Fuentes  
 Q. Quiñonez

## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

**OBRA** : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE  
**EJECUTA** : CONSORCIO SAN JOSE  
**CLIENTE** : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**MONTO OBRA** : 32,457,630.22 (con IGV) 27,506,466.29 (sin/IGV) **RESIDENTE:** ING. JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
**PLAZO EJEC.** : 1,587 DIAS CALENDARIO  
**UBICACIÓN** : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
**DIRECTO** : 6,491,526.04 5,501,293.26 (sin/IGV)  
**MATERIALES** : NO SOLICITADO  
**INICIO DE OBRA** : 15/01/2015

### CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL :

27	mar-17	0.00	0.00	1.127	0.127	0.00	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
28	abr-17	0.00	0.00	1.124	0.124	0.00	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
29	may-17	0.00	0.00	1.129	0.129	0.00	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
30	jun-17	0.00	0.00	1.128	0.128	0.00	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
31	jul-17	0.00	0.00	1.127	0.127	0.00	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
32	ago-17	0.00	0.00	1.136	0.136	0.00	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
33	sep-17	0.00	0.00	1.137	0.137	0.00	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
34	oct-17	0.00	0.00	1.145	0.145	0.00	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
35	nov-17	0.00	0.00	1.143	0.143	0.00	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
36	dic-17	0.00	0.00	1.144	0.144	0.00	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
37	ene-18	0.00	0.00	1.141	0.141	0.00	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
38	feb-18	0.00	0.00	1.148	0.148	0.00	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
39	mar-18	0.00	0.00	1.152	0.152	0.00	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
40	abr-18	0.00	0.00	1.152	0.152	0.00	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
41	may-18	0.00	0.00	1.158	0.158	0.00	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
42	jun-18	0.00	0.00	1.162	0.162	0.00	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
43	jul-18	0.00	0.00	1.165	0.165	0.00	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
44	ago-18	0.00	0.00	1.175	0.175	0.00	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
45	sep-18	0.00	0.00	1.181	0.181	0.00	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
46	oct-18	0.00	0.00	1.182	0.182	0.00	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
47	nov-18	0.00	0.00	1.182	0.182	0.00	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
48	dic-18	0.00	0.00	1.182	0.182	0.00	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
49	ene-19	0.00	0.00	1.181	0.181	0.00	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
50	feb-19	0.00	0.00	1.181	0.181	0.00	98,932.77	0.00	103,170.83	0.00	103,170.83	0.00	-
		<b>1,131,215.63</b>	<b>1,053,817.85</b>			<b>98,932.77</b>		<b>103,170.83</b>		<b>103,170.83</b>		<b>103,170.83</b>	<b>0.00</b>

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

ISAIAS JOSE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335


## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

**OBRA** : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE  
**EJECUTA** : CONSORCIO SAN JOSE  
**CLIENTE** : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**MONTO OBRA** : 32,457,630.22 (con IGTV) 27,506,466.29 (sin/IGTV) RESIDENTE: ING. JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
**PLAZO EJEC.** : 1,587 DIAS CALENDARIO  
**UBICACIÓN** : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
**A. DIRECTO** : 6,491,526.04 5,501,293.26 (sin/IGTV)  
**A. MATERIALES** : NO SOLICITADO  
**INICIO DE OBRA** : 15/01/2015

### CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL :

#### FORMULA Nº 05: MITIGACION AMBIENTAL

Valorización (sin IGTV)				K	K-1	Reajuste Programado		Reajuste Real		Reajuste Autorizado		Reajuste a Regularizar	
Nº	Mes	Programado	Ejecutado			Programado	Acumulado	Real	Acumulado	Autorizado	Acumulado	Pagado	a Pagar
01	ene-15	7,326.02	0.00	1.031	0.031	227.11	227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
02	feb-15	21,614.00	0.00	1.042	0.042	907.79	1,134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
03	mar-15	5,035.94	0.00	1.048	0.048	241.73	1,376.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
04	abr-15	0.00	8,021.78	1.057	0.057	0.00	1,376.63	457.24	457.24	457.24	457.24	457.24	-
05	may-15	0.00	0.00	1.053	0.053	0.00	1,376.63	0.00	457.24	0.00	457.24	0.00	-
06	jun-15	0.00	0.00	1.062	0.062	0.00	1,376.63	0.00	457.24	0.00	457.24	0.00	-
07	jul-15	0.00	0.00	1.064	0.064	0.00	1,376.63	0.00	457.24	0.00	457.24	0.00	-
08	ago-15	0.00	0.00	1.073	0.073	0.00	1,376.63	0.00	457.24	0.00	457.24	0.00	-
09	sep-15	0.00	0.00	1.067	0.067	0.00	1,376.63	0.00	457.24	0.00	457.24	0.00	-
10	oct-15	0.00	0.00	1.068	0.068	0.00	1,376.63	0.00	457.24	0.00	457.24	0.00	-
11	nov-15	0.00	13,061.46	1.081	0.081	0.00	1,376.63	1,057.98	1,515.22	1,057.98	1,515.22	1,057.98	-
12	dic-15	0.00	0.00	1.086	0.086	0.00	1,376.63	0.00	1,515.22	0.00	1,515.22	0.00	-
13	ene-16	0.00	0.00	1.090	0.090	0.00	1,376.63	0.00	1,515.22	0.00	1,515.22	0.00	-
14	feb-16	0.00	0.00	1.091	0.091	0.00	1,376.63	0.00	1,515.22	0.00	1,515.22	0.00	-
15	mar-16	0.00	0.00	1.078	0.078	0.00	1,376.63	0.00	1,515.22	0.00	1,515.22	0.00	-
16	abr-16	0.00	0.00	1.077	0.077	0.00	1,376.63	0.00	1,515.22	0.00	1,515.22	0.00	-
17	may-16	0.00	0.00	1.106	0.106	0.00	1,376.63	0.00	1,515.22	0.00	1,515.22	0.00	-
18	jun-16	13,465.88	0.00	1.091	0.091	1,225.39	2,602.02	0.00	1,515.22	0.00	1,515.22	0.00	-
19	jul-16	0.00	0.00	1.091	0.091	0.00	2,602.02	0.00	1,515.22	0.00	1,515.22	0.00	-
20	ago-16	0.00	0.00	1.094	0.094	0.00	2,602.02	0.00	1,515.22	0.00	1,515.22	0.00	-
21	sep-16	0.00	0.00	1.111	0.111	0.00	2,602.02	0.00	1,515.22	0.00	1,515.22	0.00	-
22	oct-16	0.00	0.00	1.110	0.110	0.00	2,602.02	0.00	1,515.22	0.00	1,515.22	0.00	-
23	nov-16	0.00	0.00	1.112	0.112	0.00	2,602.02	0.00	1,515.22	0.00	1,515.22	0.00	-
24	dic-16	0.00	0.00	1.128	0.128	0.00	2,602.02	0.00	1,515.22	0.00	1,515.22	0.00	-
25	ene-17	0.00	0.00	1.127	0.127	0.00	2,602.02	0.00	1,515.22	0.00	1,515.22	0.00	-
26	feb-17	0.00	12,630.82	1.117	0.117	0.00	2,602.02	1,477.81	2,993.03	1,477.81	2,993.03	1,477.81	-

  
**JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 66335

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP Nº 10717

109

## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

**OBRA** : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE  
**EJECUTA** : CONSORCIO SAN JOSE  
**CLIENTE** : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**MONTO OBRA** : 32,457,630.22 (con IGV) 27,506,466.29 (sin IGV) **RESIDENTE:** ING. JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
**PLAZO EJEC.** : 1,587 DIAS CALENDARIO  
**UBICACIÓN** : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
**A. DIRECTO** : 6,491,526.04 5,501,293.26 (sin IGV)  
**A. MATERIALES** : NO SOLICITADO  
**INICIO DE OBRA** : 15/01/2015

### CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:

27	mar-17	0.00	0.00	1.130	0.130	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	-
28	abr-17	0.00	0.00	1.130	0.130	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	-
29	may-17	0.00	0.00	1.131	0.131	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	-
30	jun-17	0.00	0.00	1.121	0.121	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	-
31	jul-17	0.00	0.00	1.116	0.116	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	-
32	ago-17	0.00	0.00	1.126	0.126	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	-
33	sep-17	0.00	0.00	1.130	0.130	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	-
34	oct-17	0.00	0.00	1.133	0.133	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	-
35	nov-17	0.00	0.00	1.135	0.135	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	-
36	dic-17	0.00	0.00	1.140	0.140	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	-
37	ene-18	0.00	0.00	1.137	0.137	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	-
38	feb-18	0.00	0.00	1.145	0.145	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	-
39	mar-18	0.00	0.00	1.150	0.150	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	-
40	abr-18	0.00	0.00	1.148	0.148	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	-
41	may-18	0.00	0.00	1.159	0.159	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	-
42	jun-18	0.00	0.00	1.160	0.160	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	-
43	jul-18	0.00	0.00	1.163	0.163	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	-
44	ago-18	0.00	0.00	1.173	0.173	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	-
45	sep-18	0.00	0.00	1.179	0.179	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	-
46	oct-18	0.00	0.00	1.179	0.179	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	-
47	nov-18	0.00	0.00	1.179	0.179	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	-
48	dic-18	0.00	0.00	1.179	0.179	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	-
49	ene-19	0.00	0.00	1.179	0.179	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	-
50	feb-19	0.00	0.00	1.179	0.179	0.00	2,602.02	0.00	2,993.03	0.00	2,993.03	0.00	-
		<b>47,441.78</b>	<b>33,714.06</b>			<b>2,602.02</b>		<b>2,993.03</b>		<b>2,993.03</b>		<b>2,993.03</b>	<b>0.00</b>

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

ISAIAS JORGE ALVARO ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

**OBRA :** CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE  
**EJECUTA :** CONSORCIO SAN JOSE  
**CLIENTE :** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**MONTO OBRA :** 32,457,630.22 (con IGV) 27,506,466.29 (sin/IGV) **RESIDENTE:** ING. JULIO OSWALDO FUENTES QUITÑONEZ  
**PLAZO EJEC. :** 1,587 DIAS CALENDARIO  
**UBICACIÓN :** SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
**MATERIAL DIRECTO :** 6,491,526.04 5,501,293.26 (sin/IGV)  
**MATERIALES :** NO SOLICITADO  
**INICIO DE OBRA :** 15/01/2015

**CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:**

**FÓRMULA Nº 06: EQUIPAMIENTO**

Valorización (sin IGV)		K	K-1	Reajuste Programado		Reajuste Real		Reajuste Autorizado		Reajuste a Regularizar			
Nº	Mes			Programado	Ejecutado	Programado	Acumulado	Real	Acumulado	Autorizado	Acumulado	Pagado	a Pagar
01	ene-15	0.00	0.00	1.050	0.050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
02	feb-15	0.00	0.00	1.062	0.062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
03	mar-15	0.00	0.00	1.070	0.070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
04	abr-15	0.00	0.00	1.079	0.079	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
05	may-15	0.00	0.00	1.089	0.089	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
06	jun-15	0.00	0.00	1.093	0.093	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
07	jul-15	0.00	0.00	1.101	0.101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
08	ago-15	0.00	0.00	1.112	0.112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
09	sep-15	0.00	0.00	1.109	0.109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
10	oct-15	0.00	0.00	1.116	0.116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
11	nov-15	0.00	0.00	1.133	0.133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
12	dic-15	0.00	444,888.92	1.140	0.140	0.00	0.00	62,284.45	62,284.45	62,284.45	62,284.45	62,284.45	-
13	ene-16	0.00	547,425.56	1.150	0.150	0.00	0.00	82,113.83	144,398.28	82,113.83	144,398.28	82,113.83	-
14	feb-16	0.00	15,693.75	1.164	0.164	0.00	0.00	2,573.78	146,972.06	2,573.78	146,972.06	2,573.78	-
15	mar-16	0.00	0.00	1.148	0.148	0.00	0.00	0.00	146,972.06	0.00	146,972.06	0.00	-
16	abr-16	0.00	0.00	1.131	0.131	0.00	0.00	0.00	146,972.06	0.00	146,972.06	0.00	-
17	may-16	196,201.29	-259,953.36	1.142	0.142	27,860.58	27,860.58	-36,913.38	110,058.68	-36,913.38	110,058.68	-36,913.38	-
18	jun-16	426,024.96	0.00	1.142	0.142	60,495.54	88,356.12	0.00	110,058.68	0.00	110,058.68	0.00	-
19	jul-16	241,667.03	17,082.88	1.140	0.140	33,833.38	122,189.50	2,391.60	112,450.28	2,391.60	112,450.28	2,391.60	-
20	ago-16	0.00	0.00	1.146	0.146	0.00	122,189.50	0.00	112,450.28	0.00	112,450.28	0.00	-
21	sep-16	0.00	0.00	1.157	0.157	0.00	122,189.50	0.00	112,450.28	0.00	112,450.28	0.00	-
22	oct-16	0.00	0.00	1.160	0.160	0.00	122,189.50	0.00	112,450.28	0.00	112,450.28	0.00	-
23	nov-16	0.00	0.00	1.165	0.165	0.00	122,189.50	0.00	112,450.28	0.00	112,450.28	0.00	-
24	dic-16	0.00	0.00	1.164	0.164	0.00	122,189.50	0.00	112,450.28	0.00	112,450.28	0.00	-
25	ene-17	0.00	-52,196.25	1.155	0.155	0.00	122,189.50	-8,090.42	104,359.86	-8,090.42	104,359.86	-8,090.42	-
26	feb-17	0.00	0.00	1.142	0.142	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-

INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 10717

JULIO OSWALDO FUENTES QUITÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 86335

## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

**OBRA** : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE  
**EJECUTA** : CONSORCIO SAN JOSE  
**CLIENTE** : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**MONTO OBRA** : 32,457,630.22 (con IGV) 27,506,466.29 (sin IGV) RESIDENTE: ING. JULIO OSWALDO FUENTES QUITÑONEZ  
**PLAZO EJEC.** : 1,587 DIAS CALENDARIO  
**UBICACIÓN** : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
**A. DIRECTO** : 6,491,526.04 5,501,293.26 (sin IGV)  
**A. MATERIALES** : NO SOLICITADO  
**INICIO DE OBRA** : 15/01/2015

### CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL :

27	mar-17	0.00	0.00	1.148	0.148	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
28	abr-17	0.00	0.00	1.142	0.142	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
29	may-17	0.00	0.00	1.147	0.147	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
30	jun-17	0.00	0.00	1.149	0.149	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
31	jul-17	0.00	0.00	1.148	0.148	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
32	ago-17	0.00	0.00	1.149	0.149	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
33	sep-17	0.00	0.00	1.152	0.152	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
34	oct-17	0.00	0.00	1.153	0.153	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
35	nov-17	0.00	0.00	1.152	0.152	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
36	dic-17	0.00	0.00	1.151	0.151	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
37	ene-18	0.00	0.00	1.146	0.146	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
38	feb-18	0.00	0.00	1.157	0.157	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
39	mar-18	0.00	0.00	1.162	0.162	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
40	abr-18	0.00	0.00	1.160	0.160	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
41	may-18	0.00	0.00	1.172	0.172	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
42	jun-18	0.00	0.00	1.172	0.172	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
43	jul-18	0.00	0.00	1.178	0.178	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
44	ago-18	0.00	0.00	1.178	0.178	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
45	sep-18	0.00	0.00	1.186	0.186	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
46	oct-18	0.00	0.00	1.189	0.189	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
47	nov-18	0.00	0.00	1.189	0.189	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
48	dic-18	0.00	0.00	1.189	0.189	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
49	ene-19	0.00	0.00	1.189	0.189	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
50	feb-19	0.00	0.00	1.189	0.189	0.00	122,189.50	0.00	104,359.86	0.00	104,359.86	0.00	-
		<b>863,893.28</b>	<b>712,941.50</b>				<b>122,189.50</b>	<b>104,359.86</b>	<b>104,359.86</b>	<b>104,359.86</b>	<b>104,359.86</b>	<b>0.00</b>	

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

ISAFS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717  
 OBRA ALVA ESPINOZA

JULIO OSWALDO FUENTES QUITÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

**OBRA :** CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE  
**EJECUTA :** CONSORCIO SAN JOSE  
**CLIENTE :** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**MONTO OBRA :** 32,457,630.22 (con IGV) 27,506,466.29 (sin/IGV) **RESIDENTE:** ING. JULIO OSWALDO FUENTES QUITÑONEZ  
**PLAZO EJEC. :** 1,587 DIAS CALENDARIO  
**UBICACIÓN :** SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
**A. DIRECTO :** 6,491,526.04 5,501,293.26 (sin/IGV)  
**A. MATERIALES :** NO SOLICITADO  
**INICIO DE OBRA :** 15/01/2015

### CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL :

#### FORMULA Nº 07: OBRAS EN MAR

Valorización (sin IGV)				K	K-1	Reajuste Programado		Reajuste Real		Reajuste Autorizado		Reajuste a Regularizar	
Nº	Mes	Programado	Ejecutado			Programado	Acumulado	Real	Acumulado	Autorizado	Acumulado	Pagado	a Pagar
01	ene-15	6,257.84	0.00	1.033	0.033	206.51	206.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
02	feb-15	42,245.81	4,117.69	1.041	0.041	1,732.08	1,938.59	168.83	168.83	168.83	168.83	168.83	-
03	mar-15	93,269.57	156,569.28	1.042	0.042	3,917.32	5,855.91	6,575.91	6,744.74	6,575.91	6,744.74	6,575.91	-
04	abr-15	331,372.10	540,919.37	1.036	0.036	11,929.40	17,785.31	19,473.10	26,217.84	19,473.10	26,217.84	19,473.10	-
05	may-15	448,124.71	701,951.57	1.035	0.035	15,684.36	33,469.67	24,568.30	50,786.14	24,568.30	50,786.14	24,568.30	-
06	jun-15	533,014.59	498,856.89	1.047	0.047	25,051.69	58,521.36	23,446.27	74,232.41	23,446.27	74,232.41	23,446.27	-
07	jul-15	652,829.39	1,453,896.72	1.026	0.026	16,973.56	75,494.92	37,801.31	112,033.72	37,801.31	112,033.72	37,801.31	-
08	ago-15	816,602.88	647,264.91	1.032	0.032	26,131.29	101,626.21	20,712.48	132,746.20	20,712.48	132,746.20	20,712.48	-
09	sep-15	864,409.10	1,210,400.48	1.031	0.031	26,796.68	128,422.89	37,522.41	170,268.61	37,522.41	170,268.61	37,522.41	-
10	oct-15	942,221.44	1,059,066.15	1.034	0.034	32,035.53	160,458.42	36,008.25	206,276.86	36,008.25	206,276.86	36,008.25	-
11	nov-15	803,384.11	1,701,871.34	1.042	0.042	33,742.13	194,200.55	71,478.60	277,755.46	71,478.60	277,755.46	71,478.60	-
12	dic-15	633,111.21	309,129.61	1.046	0.046	29,123.12	223,323.67	14,219.96	291,975.42	14,219.96	291,975.42	14,219.96	-
13	ene-16	595,541.32	489,857.87	1.054	0.054	32,159.23	255,482.90	26,452.32	318,427.74	26,452.32	318,427.74	26,452.32	-
14	feb-16	547,591.56	0.00	1.060	0.060	32,855.49	288,338.39	0.00	318,427.74	0.00	318,427.74	0.00	-
15	mar-16	480,606.83	0.00	1.047	0.047	22,588.52	310,926.91	0.00	318,427.74	0.00	318,427.74	0.00	-
16	abr-16	421,538.35	0.00	1.034	0.034	14,332.30	325,259.21	0.00	318,427.74	0.00	318,427.74	0.00	-
17	may-16	401,945.76	158,681.95	1.050	0.050	20,097.29	345,356.50	7,934.10	326,361.84	7,934.10	326,361.84	7,934.10	-
18	jun-16	305,707.89	0.00	1.049	0.049	14,979.66	360,336.16	0.00	326,361.84	0.00	326,361.84	0.00	-
19	jul-16	258,511.87	0.00	1.056	0.056	14,476.66	374,812.82	0.00	326,361.84	0.00	326,361.84	0.00	-
20	ago-16	248,297.78	0.00	1.061	0.061	15,146.16	389,958.98	0.00	326,361.84	0.00	326,361.84	0.00	-
21	sep-16	235,388.41	0.00	1.067	0.067	15,771.00	405,729.98	0.00	326,361.84	0.00	326,361.84	0.00	-
22	oct-16	223,636.88	0.00	1.069	0.069	15,430.94	421,160.92	0.00	326,361.84	0.00	326,361.84	0.00	-
23	nov-16	4,069.85	0.00	1.069	0.069	280.77	421,441.69	0.00	326,361.84	0.00	326,361.84	0.00	-
24	dic-16	21,024.17	0.00	1.070	0.070	1,471.69	422,913.38	0.00	326,361.84	0.00	326,361.84	0.00	-
25	ene-17	20,345.97	0.00	1.067	0.067	1,363.18	424,276.56	0.00	326,361.84	0.00	326,361.84	0.00	-
26	feb-17	21,024.17	17,757.22	1.060	0.060	1,261.45	425,538.01	1,065.43	327,427.27	1,065.43	327,427.27	1,065.43	-

ISAIAS JOSE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 10717

JULIO OSWALDO FUENTES QUITÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 10717



## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

**OBRA :** CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE  
**EJECUTA :** CONSORCIO SAN JOSE  
**CLIENTE :** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**MONTO OBRA :** 32,457,630.22 (con IGV) 27,506,466.29 (sin/IGV) **RESIDENTE:** ING. JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
**PLAZO EJEC. :** 1,587 DIAS CALENDARIO  
**UBICACIÓN :** SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
**A. DIRECTO :** 6,491,526.04 5,501,293.26 (sin/IGV)  
**A. MATERIALES :** NO SOLICITADO  
**INICIO DE OBRA :** 15/01/2015

### CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:

27	mar-17	8,922.98	0.00	1.061	0.061	544.30	426,082.31	0.00	327,427.27	0.00	327,427.27	0.00	-
28	abr-17	4,443.08	0.00	1.051	0.051	226.60	426,308.91	0.00	327,427.27	0.00	327,427.27	0.00	-
29	may-17	0.00	0.00	1.057	0.057	0.00	426,308.91	0.00	327,427.27	0.00	327,427.27	0.00	-
30	jun-17	0.00	0.00	1.062	0.062	0.00	426,308.91	0.00	327,427.27	0.00	327,427.27	0.00	-
31	jul-17	0.00	0.00	1.063	0.063	0.00	426,308.91	0.00	327,427.27	0.00	327,427.27	0.00	-
32	ago-17	0.00	0.00	1.076	0.076	0.00	426,308.91	0.00	327,427.27	0.00	327,427.27	0.00	-
33	sep-17	0.00	0.00	1.082	0.082	0.00	426,308.91	0.00	327,427.27	0.00	327,427.27	0.00	-
34	oct-17	0.00	0.00	1.083	0.083	0.00	426,308.91	0.00	327,427.27	0.00	327,427.27	0.00	-
35	nov-17	0.00	0.00	1.080	0.080	0.00	426,308.91	0.00	327,427.27	0.00	327,427.27	0.00	-
36	dic-17	0.00	0.00	1.085	0.085	0.00	426,308.91	0.00	327,427.27	0.00	327,427.27	0.00	-
37	ene-18	0.00	0.00	1.087	0.087	0.00	426,308.91	0.00	327,427.27	0.00	327,427.27	0.00	-
38	feb-18	0.00	0.00	1.115	0.115	0.00	426,308.91	0.00	327,427.27	0.00	327,427.27	0.00	-
39	mar-18	0.00	19,885.09	1.116	0.116	0.00	426,308.91	1,262.67	328,689.94	1,262.67	328,689.94	1,262.67	-
40	abr-18	0.00	0.00	1.114	0.114	0.00	426,308.91	0.00	328,689.94	0.00	328,689.94	0.00	-
41	may-18	0.00	0.00	1.120	0.120	0.00	426,308.91	0.00	328,689.94	0.00	328,689.94	0.00	-
42	jun-18	19,065.00	27,517.58	1.120	0.120	2,287.80	428,596.71	3,302.11	331,992.05	3,302.11	331,992.05	3,302.11	-
43	jul-18	42,308.56	15,893.61	1.122	0.122	5,161.64	433,758.35	1,939.02	333,931.07	1,939.02	333,931.07	1,939.02	-
44	ago-18	22,592.61	16,519.87	1.122	0.122	2,756.30	436,514.65	2,015.42	335,946.49	2,015.42	335,946.49	2,015.42	-
45	sep-18	47,815.16	23,972.12	1.144	0.144	6,885.38	443,400.03	3,451.99	339,398.48	3,451.99	339,398.48	3,451.99	-
46	oct-18	34,058.68	14,412.14	1.146	0.146	4,972.57	448,372.60	2,104.17	341,502.65	2,104.17	341,502.65	2,104.17	-
47	nov-18	37,185.11	51,039.97	1.153	0.153	5,689.32	454,061.92	7,809.12	349,311.77	7,809.12	349,311.77	7,809.12	-
48	dic-18	54,673.92	35,710.99	1.152	0.152	8,310.44	462,372.36	5,428.07	354,739.84	5,428.07	354,739.84	5,428.07	-
49	ene-19	66,933.20	164,208.84	1.149	0.149	9,973.05	472,345.41	24,467.12	379,206.96	24,467.12	379,206.96	24,959.74	(492.62)
50	feb-19	59,966.23	135,028.26	1.149	0.149	8,934.97	481,280.38	20,119.21	399,326.17	20,119.21	399,326.17		20,119.21
		<b>10,290,070.38</b>	<b>9,445,529.52</b>			<b>462,372.36</b>		<b>354,739.84</b>		<b>354,739.84</b>		<b>354,739.84</b>	<b>19,626.59</b>

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335


## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

**OBRA :** CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE  
**EJECUTA :** CONSORCIO SAN JOSE  
**CLIENTE :** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**MONTO OBRA :** 32,457,630.22 (con IGV) 27,506,466.29 (sin IGV) **RESIDENTE:** ING. JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
**PLAZO EJEC. :** 1,587 DIAS CALENDARIO  
**UBICACIÓN :** SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
**A. DIRECTO :** 6,491,526.04 5,501,293.26 (sin IGV)  
**A. MATERIALES :** NO SOLICITADO  
**INICIO DE OBRA :** 15/01/2015

### CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:

#### FORMULA Nº 08: PAVIMENTACION EXTERIOR

Valorización (sin IGV)				K	K-1	Reajuste Programado		Reajuste Real		Reajuste Autorizado		Reajuste a Regularizar	
Nº	Mes	Programado	Ejecutado			Programado	Acumulado	Real	Acumulado	Autorizado	Acumulado	Pagado	a Pagar
01	ene-15	0.00	0.00	1.027	0.027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
02	feb-15	0.00	0.00	1.011	0.011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
03	mar-15	0.00	0.00	0.981	-0.019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
04	abr-15	0.00	0.00	0.999	-0.001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
05	may-15	0.00	0.00	1.003	0.003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
06	jun-15	0.00	0.00	1.009	0.009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
07	jul-15	0.00	0.00	1.013	0.013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
08	ago-15	0.00	0.00	1.018	0.018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
09	sep-15	0.00	0.00	1.016	0.016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
10	oct-15	0.00	0.00	1.019	0.019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
11	nov-15	0.00	0.00	1.030	0.030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
12	dic-15	0.00	0.00	1.037	0.037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
13	ene-16	0.00	136,792.44	1.044	0.044	0.00	0.00	6,018.87	6,018.87	6,018.87	6,018.87	6,018.87	-
14	feb-16	0.00	262,991.01	1.026	0.026	0.00	0.00	6,837.77	12,856.64	6,837.77	12,856.64	6,837.77	-
15	mar-16	0.00	108,130.91	1.011	0.011	0.00	0.00	1,189.44	14,046.08	1,189.44	14,046.08	1,189.44	-
16	abr-16	0.00	55,447.52	1.000	0.000	0.00	0.00	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
17	may-16	564,726.81	0.00	1.003	0.003	1,694.18	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
18	jun-16	0.00	0.00	1.003	0.003	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
19	jul-16	0.00	0.00	1.005	0.005	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
20	ago-16	0.00	0.00	1.007	0.007	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
21	sep-16	0.00	0.00	1.013	0.013	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
22	oct-16	0.00	0.00	1.015	0.015	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
23	nov-16	0.00	0.00	1.018	0.018	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
24	dic-16	0.00	0.00	1.018	0.018	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
25	ene-17	0.00	0.00	1.012	0.012	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
26	feb-17	0.00	0.00	1.008	0.008	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-
27	mar-17	0.00	0.00	1.011	0.011	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-

  
**JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE

EJECUTA : CONSORCIO SAN JOSE  
 CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 MONTO OBRA : 32,457,630.22 (con IGV)  
 PLAZO EJE. : 1,587 DIAS CALENDARIO  
 UBICACIÓN : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
 A. DIRECTO : 6,491,526.04  
 A. MATERIALES : NO SOLICITADO  
 INICIO DE OBRA : 15/01/2015

RESIDENTE: ING. JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ


27,506,466.29 (sin IGV)

5,501,293.26 (sin IGV)

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:**

28	abr-17	0.00	1.010	0.010	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-	
29	may-17	0.00	1.013	0.013	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-	
30	jun-17	0.00	1.013	0.013	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-	
31	jul-17	0.00	1.009	0.009	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-	
32	ago-17	0.00	1.011	0.011	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-	
33	sep-17	0.00	1.020	0.020	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-	
34	oct-17	0.00	1.023	0.023	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-	
35	nov-17	0.00	1.026	0.026	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-	
36	dic-17	0.00	1.051	0.051	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-	
37	ene-18	0.00	1.048	0.048	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-	
38	feb-18	0.00	1.054	0.054	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-	
39	mar-18	0.00	1.057	0.057	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-	
40	abr-18	0.00	1.055	0.055	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-	
41	may-18	0.00	1.060	0.060	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-	
42	jun-18	0.00	1.061	0.061	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-	
43	jul-18	0.00	1.063	0.063	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-	
44	ago-18	0.00	1.089	0.089	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-	
45	sep-18	0.00	1.102	0.102	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-	
46	oct-18	0.00	1.111	0.111	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-	
47	nov-18	0.00	1.111	0.111	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-	
48	dic-18	0.00	1.124	0.124	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-	
49	ene-19	0.00	1.124	0.124	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-	
50	feb-19	0.00	1.124	0.124	0.00	1,694.18	0.00	14,046.08	0.00	14,046.08	0.00	-	
		<b>564,726.81</b>	<b>563,361.88</b>	<b>1,694.18</b>	<b>14,046.08</b>	<b>14,046.08</b>	<b>14,046.08</b>	<b>14,046.08</b>	<b>14,046.08</b>	<b>14,046.08</b>	<b>14,046.08</b>	<b>14,046.08</b>	<b>0.00</b>

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE

EJECUTA : CONSORCIO SAN JOSE

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

MONTO OBRA : 32,457,630.22 (con IGV) 27,506,466.29 (sin IGV)

RESIDENTE: ING. JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ

PLAZO EJEC. : 1,587 DIAS CALENDARIO

UBICACION : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

A. DIRECTO : 6,491,526.04

5,501,293.26 (sin IGV)


A. MATERIALES : NO SOLICITADO

INICIO DE OBRA : 15/01/2015

**CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:**

### FORMULA Nº 09: INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION

No	Mes	Valorización (sin IGV)	Ejecutado	K		Reajuste Programado		Reajuste Real		Reajuste Autorizado		Reajuste a Regularizar a Pagar	
				K	K-1	Programado	Acumulado	Real	Acumulado	Autorizado	Acumulado	Pagado	
01	ene-15	0.00	0.00	1.042	0.042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	feb-15	0.00	0.00	1.056	0.056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	mar-15	0.00	0.00	1.063	0.063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	abr-15	0.00	0.00	1.070	0.070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	may-15	0.00	0.00	1.080	0.080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	jun-15	0.00	0.00	1.088	0.088	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	jul-15	0.00	0.00	1.094	0.094	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	ago-15	0.00	0.00	1.105	0.105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	sep-15	0.00	0.00	1.101	0.101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	oct-15	0.00	0.00	1.108	0.108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	nov-15	0.00	0.00	1.124	0.124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	dic-15	0.00	0.00	1.135	0.135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	ene-16	0.00	0.00	1.145	0.145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	feb-16	0.00	0.00	1.159	0.159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	mar-16	0.00	0.00	1.143	0.143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	abr-16	0.00	0.00	1.123	0.123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	may-16	0.00	0.00	1.129	0.129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	jun-16	0.00	0.00	1.129	0.129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	jul-16	0.00	0.00	1.132	0.132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	ago-16	0.00	0.00	1.137	0.137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	sep-16	0.00	0.00	1.150	0.150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	oct-16	0.00	0.00	1.152	0.152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	nov-16	0.00	0.00	1.156	0.156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	dic-16	0.00	0.00	1.157	0.157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	ene-17	0.00	0.00	1.146	0.146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	feb-17	0.00	0.00	1.136	0.136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
**JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 66335

ISAIAS JORGE ALVAREZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 10717



## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE

EJECUTA : CONSORCIO SAN JOSE

CLIENTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

MONTO OBRA : 32,457,630.22 (con IGV)

PLAZO EJEC. : 1,587 DIAS CALENDARIO

UBICACIÓN : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

A. DIRECTO : 6,491,526.04

A. MATERIALES : NO SOLICITADO

INICIO DE OBRA : 15/01/2015

27,506,466.29 (sin/IGV)


RESIDENTE: ING. JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ

5,501,293.26 (sin/IGV)

### CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL:

#### FORMULA Nº 10: SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Mes	Valorización (sin IGV)		K	K-1	Reajuste Programado		Reajuste Real		Reajuste Autorizado		Reajuste a Regularizar	
		Programado	Ejecutado			Programado	Acumulado	Real	Acumulado	Autorizado	Acumulado	Pagado	a Pagar
01	ene-15	10,767.63	0.00	1.029	0.029	312.26	312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	feb-15	8,297.00	0.00	1.037	0.037	306.99	619.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	mar-15	117.55	0.00	1.041	0.041	4.82	624.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	abr-15	0.00	4,795.55	1.054	0.054	0.00	624.07	258.96	258.96	258.96	258.96	258.96	258.96
05	may-15	0.00	0.00	1.058	0.058	0.00	624.07	0.00	258.96	0.00	258.96	0.00	0.00
06	jun-15	0.00	0.00	1.072	0.072	0.00	624.07	0.00	258.96	0.00	258.96	0.00	0.00
07	jul-15	0.00	0.00	1.075	0.075	0.00	624.07	0.00	258.96	0.00	258.96	0.00	0.00
08	ago-15	0.00	0.00	1.079	0.079	0.00	624.07	0.00	258.96	0.00	258.96	0.00	0.00
09	sep-15	0.00	0.00	1.058	0.068	0.00	624.07	0.00	258.96	0.00	258.96	0.00	0.00
10	oct-15	0.00	0.00	1.081	0.081	0.00	624.07	0.00	258.96	0.00	258.96	0.00	0.00
11	nov-15	0.00	8,864.30	1.089	0.089	0.00	624.07	788.92	1,047.88	788.92	1,047.88	788.92	788.92
12	dic-15	0.00	0.00	1.094	0.094	0.00	624.07	0.00	1,047.88	0.00	1,047.88	0.00	0.00
13	ene-16	0.00	3,088.12	1.099	0.099	0.00	624.07	305.72	1,353.60	305.72	1,353.60	305.72	305.72
14	feb-16	0.00	0.00	1.104	0.104	0.00	624.07	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00
15	mar-16	0.00	0.00	1.096	0.096	0.00	624.07	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00
16	abr-16	0.00	0.00	1.087	0.087	0.00	624.07	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00
17	may-16	0.00	0.00	1.090	0.090	0.00	624.07	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00
18	jun-16	0.00	0.00	1.091	0.091	0.00	624.07	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00
19	jul-16	0.00	0.00	1.099	0.099	0.00	624.07	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00
20	ago-16	0.00	0.00	1.101	0.101	0.00	624.07	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00
21	sep-16	0.00	0.00	1.106	0.106	0.00	624.07	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00
22	oct-16	0.00	0.00	1.110	0.110	0.00	624.07	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00
23	nov-16	0.00	0.00	1.112	0.112	0.00	624.07	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00
24	dic-16	0.00	0.00	1.112	0.112	0.00	624.07	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00
25	ene-17	0.00	0.00	1.108	0.108	0.00	624.07	0.00	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00
26	feb-17	0.00	2,434.23	1.107	0.107	0.00	624.07	260.46	1,614.06	260.46	1,614.06	260.46	260.46

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 66335

ISAIAS JORGE LOPINHOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 10717

## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

**OBRA** : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE  
**EJECUTA** : CONSORCIO SAN JOSE  
**CLIENTE** : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**MONTO OBRA** : 32,457,630.22 (con IGV) 27,506,466.29 (sin/IGV) **RESIDENTE:** ING. JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
**PLAZO EJEC.** : 1,587 DIAS CALENDARIO  
**UBICACIÓN** : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
**A. DIRECTO** : 6,491,526.04 5,501,293.26 (sin/IGV)  
**A. MATERIALES** : NO SOLICITADO  
**INICIO DE OBRA** : 15/01/2015

### CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL :

27	mar-17	0.00	0.00	1.111	0.111	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-
28	abr-17	0.00	0.00	1.109	0.109	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-
29	may-17	0.00	0.00	1.110	0.110	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-
30	jun-17	0.00	0.00	1.110	0.110	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-
31	jul-17	0.00	0.00	1.109	0.109	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-
32	ago-17	0.00	0.00	1.118	0.118	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-
33	sep-17	0.00	0.00	1.120	0.120	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-
34	oct-17	0.00	0.00	1.119	0.119	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-
35	nov-17	0.00	0.00	1.119	0.119	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-
36	dic-17	0.00	0.00	1.120	0.120	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-
37	ene-18	0.00	0.00	1.120	0.120	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-
38	feb-18	0.00	0.00	1.124	0.124	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-
39	mar-18	0.00	0.00	1.125	0.125	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-
40	abr-18	0.00	0.00	1.124	0.124	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-
41	may-18	0.00	0.00	1.127	0.127	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-
42	jun-18	0.00	0.00	1.127	0.127	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-
43	jul-18	0.00	0.00	1.130	0.130	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-
44	ago-18	0.00	0.00	1.142	0.142	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-
45	sep-18	0.00	0.00	1.145	0.145	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-
46	oct-18	0.00	0.00	1.148	0.148	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-
47	nov-18	0.00	0.00	1.148	0.148	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-
48	dic-18	0.00	0.00	1.151	0.151	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-
49	ene-19	0.00	0.00	1.151	0.151	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-
50	feb-19	0.00	0.00	1.151	0.151	0.00	624.07	0.00	1,614.06	0.00	1,614.06	0.00	-
		<b>19,182.18</b>	<b>19,182.20</b>			<b>624.07</b>		<b>1,614.06</b>		<b>1,614.06</b>		<b>1,614.06</b>	<b>0.00</b>

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

ISAÍAS JORGE ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 10717

JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP Nº 66335

## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

**OBRA** : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE  
**EJECUTA** : CONSORCIO SAN JOSE  
**CLIENTE** : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**MONTO OBRA** : 32,457,630.22 (con IGV) 27,506,466.29 (sin/IGV) **RESIDENTE:** ING. JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
**PLAZO EJEC.** : 1,587 DIAS CALENDARIO  
**UBICACIÓN** : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
**A. DIRECTO** : 6,491,526.04 5,501,293.26 (sin/IGV)  
**A. MATERIALES** : NO SOLICITADO  
**INICIO DE OBRA** : 15/01/2015

### CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL :

RESUMEN											
Nº	Mes	Valorización (sin IGV)		Reajuste Programado		Reajuste Real		Reajuste Autorizado		Reajuste a Regularizar	
		Programado	Ejecutado	Programado	Acumulado	Real	Acumulado	Autorizado	Acumulado	Pagado	a Regularizar
01	ene-15	244,408.18	358,268.22	8,447.86	8,447.86	12,539.39	12,539.39	12,539.39	12,539.39	12,539.39	0.00
02	feb-15	696,348.00	555,717.90	29,162.89	37,610.75	23,336.04	35,875.43	23,336.04	35,875.43	23,336.04	0.00
03	mar-15	705,780.96	593,994.45	38,081.88	75,692.63	26,697.47	62,572.90	26,697.47	62,572.90	26,697.47	0.00
04	abr-15	738,441.42	925,177.18	31,061.66	106,754.29	37,647.00	100,219.90	37,647.00	100,219.90	37,647.00	0.00
05	may-15	686,371.48	753,732.22	27,596.70	134,350.99	27,157.33	127,377.23	27,157.33	127,377.23	27,157.33	0.00
06	jun-15	1,297,950.65	985,329.63	75,779.89	210,130.88	59,065.11	186,442.34	59,065.11	186,442.34	59,065.11	0.00
07	jul-15	1,380,671.38	1,865,453.02	66,637.44	276,768.32	60,025.35	246,467.69	60,025.35	246,467.69	60,025.35	0.00
08	ago-15	1,486,696.07	1,054,927.09	78,295.43	355,063.75	46,107.39	292,575.08	46,107.39	292,575.08	46,107.39	0.00
09	sep-15	1,210,818.38	1,429,170.33	48,609.26	403,673.01	50,502.81	343,077.89	50,502.81	343,077.89	50,502.81	0.00
10	oct-15	1,133,703.44	1,285,746.48	43,436.07	447,109.08	52,470.47	395,548.36	52,470.47	395,548.36	52,470.47	0.00
11	nov-15	1,168,636.86	2,011,031.83	58,663.28	505,772.36	93,025.18	488,573.54	93,025.18	488,573.54	93,025.18	0.00
12	dic-15	915,469.45	1,389,920.39	49,900.70	555,673.06	137,996.84	626,570.38	137,996.84	626,570.38	137,996.84	0.00
13	ene-16	786,466.67	1,517,495.69	46,495.27	602,168.33	143,733.26	770,303.64	143,733.26	770,303.64	143,733.26	0.00
14	feb-16	721,945.89	667,975.68	44,885.94	647,054.27	38,814.60	809,118.24	38,814.60	809,118.24	38,814.60	0.00
15	mar-16	686,656.94	621,544.65	34,127.33	681,181.60	49,587.55	858,705.79	49,587.55	858,705.79	49,587.55	0.00
16	abr-16	524,949.30	240,541.06	20,243.95	701,425.55	13,081.65	871,787.44	13,081.65	871,787.44	13,081.65	0.00
17	may-16	1,703,780.80	67,518.42	90,011.41	791,436.96	-16,620.10	855,167.34	-16,620.10	855,167.34	-16,620.10	0.00
18	jun-16	987,806.83	238,908.88	101,461.29	892,898.25	17,309.83	872,477.17	17,309.83	872,477.17	17,309.83	0.00
19	jul-16	500,178.90	87,581.78	48,310.04	941,208.29	8,702.31	881,179.48	8,702.31	881,179.48	8,702.31	0.00
20	ago-16	248,297.78	26,733.49	15,146.16	956,354.45	2,192.15	883,371.63	2,192.15	883,371.63	2,192.15	0.00
21	sep-16	235,388.10	54,654.58	15,771.00	972,125.45	4,645.64	888,017.27	4,645.64	888,017.27	4,645.64	0.00
22	oct-16	223,636.87	15,754.74	15,430.94	987,556.39	1,310.62	889,327.89	1,310.62	889,327.89	1,310.62	0.00
23	nov-16	4,069.19	0.00	280.77	987,837.16	0.00	889,327.89	0.00	889,327.89	0.00	0.00
24	dic-16	21,024.17	68,223.57	1,471.69	989,308.85	8,564.82	897,892.71	8,564.82	897,892.71	8,564.82	0.00
25	ene-17	20,345.97	106,056.42	1,363.18	990,672.03	7,218.72	905,111.43	7,218.72	905,111.43	7,218.72	0.00
26	feb-17	21,024.17	11,543.86	1,261.45	991,933.48	-1,632.30	903,479.13	-1,632.30	903,479.13	-1,632.30	0.00
27	mar-17	8,922.98	0.00	544.30	992,477.78	0.00	903,479.13	0.00	903,479.13	0.00	0.00

ISAIAS JESUS ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

177



## RESIDENCIA DE OBRA CALCULO DE REAJUSTES

**OBRA** : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE  
**EJECUTA** : CONSORCIO SAN JOSE  
**CLIENTE** : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**MONTO OBRA** : 32,457,630.22 (con IGV) 27,506,466.29 (sin/IGV) **RESIDENTE:** ING. JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
**PLAZO EJEC.** : 1,587 DIAS CALENDARIO  
**UBICACIÓN** : SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE  
**A. DIRECTO** : 6,491,526.04 5,501,293.26 (sin/IGV)  
**A. MATERIALES** : NO SOLICITADO  
**INICIO DE OBRA** : 15/01/2015

**CALCULO DEL REAJUSTE TOTAL :**

28	abr-17	4,443.08	0.00	226.60	992,704.38	0.00	903,479.13	0.00	903,479.13	0.00	0.00
29	may-17	0.00	0.00	0.00	992,704.38	0.00	903,479.13	0.00	903,479.13	0.00	0.00
30	jun-17	0.00	0.00	0.00	992,704.38	0.00	903,479.13	0.00	903,479.13	0.00	0.00
31	jul-17	0.00	0.00	0.00	992,704.38	0.00	903,479.13	0.00	903,479.13	0.00	0.00
32	ago-17	0.00	0.00	0.00	992,704.38	0.00	903,479.13	0.00	903,479.13	0.00	0.00
33	sep-17	0.00	0.00	0.00	992,704.38	0.00	903,479.13	0.00	903,479.13	0.00	0.00
34	oct-17	0.00	0.00	0.00	992,704.38	0.00	903,479.13	0.00	903,479.13	0.00	0.00
35	nov-17	0.00	0.00	0.00	992,704.38	0.00	903,479.13	0.00	903,479.13	0.00	0.00
36	dic-17	0.00	0.00	0.00	992,704.38	0.00	903,479.13	0.00	903,479.13	0.00	0.00
37	ene-18	0.00	0.00	0.00	992,704.38	0.00	903,479.13	0.00	903,479.13	0.00	0.00
38	feb-18	0.00	0.00	0.00	992,704.38	0.00	903,479.13	0.00	903,479.13	0.00	0.00
39	mar-18	0.00	10,885.09	0.00	992,704.38	1,262.67	904,741.80	1,262.67	904,741.80	1,262.67	0.00
40	abr-18	0.00	0.00	0.00	992,704.38	0.00	904,741.80	0.00	904,741.80	0.00	0.00
41	may-18	0.00	0.00	0.00	992,704.38	0.00	904,741.80	0.00	904,741.80	0.00	0.00
42	jun-18	19,065.00	27,517.58	2,287.80	994,992.18	3,302.11	908,043.91	3,302.11	908,043.91	3,302.11	0.00
43	jul-18	42,308.56	15,893.61	7,479.89	997,835.57	17,599.16	894,322.79	17,599.16	894,322.79	17,599.16	0.00
44	ago-18	22,592.61	16,519.87	2,756.30	1,000,591.87	2,015.42	896,338.21	2,015.42	896,338.21	2,015.42	0.00
45	sep-18	47,815.16	23,972.12	6,885.38	1,007,477.25	3,451.99	899,790.20	3,451.99	899,790.20	3,451.99	0.00
46	oct-18	34,058.68	14,412.14	4,972.57	1,012,449.82	2,104.17	901,894.37	2,104.17	901,894.37	2,104.17	0.00
47	nov-18	37,185.11	51,039.97	8,310.44	1,020,457.39	7,809.12	925,363.63	7,809.12	925,363.63	7,809.12	0.00
48	dic-18	102,115.70	35,039.97	1,028,767.83	1,028,767.83	5,428.07	930,791.70	5,428.07	930,791.70	5,428.07	0.00
49	ene-19	66,933.20	164,208.84	0.00	1,038,740.88	24,467.12	955,258.82	24,467.12	955,258.82	24,959.74	-492.62
50	feb-19	59,966.23	164,208.84	0.00	1,047,675.85	20,119.21	975,378.03	20,119.21	975,378.03	0.00	20,119.21
		<b>18,796,274.16</b>	<b>17,456,699.59</b>	<b>2,054,164.59</b>		<b>991,038.17</b>		<b>991,038.17</b>		<b>971,411.58</b>	<b>19,626.59</b>

**TOTAL REAJUSTES (sin IGV) \*\***

**S/. 19,626.59**

\*\* Reajustes Calculados con los I.U. del mes anterior al mes de la Valorización.

S. JOSE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

Funciones de OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y sus modificatorias;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Aprobar la difusión del Proyecto del Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios, presentado por Salaverry Terminal Internacional S.A.

**Artículo 2°.-** Autorizar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano" y disponer que la misma, así como el contenido del Proyecto del Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios, presentado por Salaverry Terminal Internacional S.A., sean publicados y difundidos en el Portal Institucional del OSITRAN y en el Portal Web de la Entidad Prestadora.

**Artículo 3°.-** Otorgar un plazo de quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente

de la publicación en el Diario Oficial "El Peruano", para que los usuarios e interesados remitan por escrito al OSITRAN, en su sede ubicada en Calle Los Negocios N° 182 - Surquillo o por medio electrónico a usuarios@ositran.gob.pe, sus comentarios o sugerencias al Proyecto de Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios de Salaverry Terminal Internacional S.A.

**Artículo 4°.-** Notificar la presente resolución a la entidad prestadora Salaverry Terminal Internacional S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANGELA ARRESCURRENAGA SANTISTEBAN  
 Gerente de Atención al Usuario (e)

1741902-1

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL

Reg. CIP N° 10717

**ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**



**Índices Unificados de Precios para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de enero de 2019**

**RESOLUCIÓN JEFATURAL  
 N° 055-2019-INEI**

Lima, 15 de febrero de 2019

**CONSIDERANDO:**

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley,

dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe N° 02-01-2019/DTIE, referido a los Índices Unificados de Precios para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de Enero de 2019 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Aprobar los Índices Unificados de Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Enero de 2019, que se indican en el cuadro siguiente:

ÁREAS GEOGRÁFICAS													
Cód.	1	2	3	4	5	6	Cód.	1	2	3	4	5	6
01	968,23	968,23	968,23	968,23	968,23	968,23	02	556,57	556,57	556,57	556,57	556,57	556,57
03	537,43	537,43	537,43	537,43	537,43	537,43	04	558,32	945,43	1052,91	591,91	591,91	591,91
05	449,59	215,77	428,70	602,26	(*)	632,32	06	929,11	929,11	929,11	929,11	929,11	929,11
07	673,74	673,74	673,74	673,74	673,74	673,74	08	885,84	885,84	885,84	885,84	885,84	885,84
09	280,91	280,91	280,91	280,91	280,91	280,91	10	430,82	430,82	430,82	430,82	430,82	430,82
11	246,76	246,76	246,76	246,76	246,76	246,76	12	324,16	324,16	324,16	324,16	324,16	324,16
13	1792,19	1792,19	1792,19	1792,19	1792,19	1792,19	14	284,81	284,81	284,81	284,81	284,81	284,81
17	622,16	670,56	709,77	839,38	781,29	882,02	16	354,83	354,83	354,83	354,83	354,83	354,83
19	777,23	777,23	777,23	777,23	777,23	777,23	18	330,49	330,49	330,49	330,49	330,49	330,49
21	476,04	423,68	449,56	438,28	449,56	418,38	20	2185,03	2185,03	2185,03	2185,03	2185,03	2185,03
23	439,25	439,25	439,25	439,25	439,25	439,25	22	367,30	367,30	367,30	367,30	367,30	367,30
27	474,61	474,61	474,61	474,61	474,61	474,61	24	241,15	241,15	241,15	241,15	241,15	241,15
31	382,52	382,59	382,59	382,59	382,59	382,59	26	382,14	382,14	382,14	382,14	382,14	382,14
33	864,11	864,11	864,11	864,11	864,11	864,11	28	589,21	589,21	589,21	577,86	589,21	589,21
37	319,30	319,30	319,30	319,30	319,30	319,30	30	489,58	489,58	489,58	489,58	489,58	489,58
39	452,29	452,29	452,29	452,29	452,29	452,29	32	469,40	469,40	469,40	469,40	469,40	469,40
41	424,61	424,61	424,61	424,61	424,61	424,61	34	492,75	492,75	492,75	492,75	492,75	492,75
43	751,39	690,11	928,82	661,19	1162,77	892,60	38	427,70	953,02	866,12	571,43	(*)	657,48
45	330,19	330,19	330,19	330,19	330,19	330,19	40	394,58	450,25	443,25	354,64	272,89	331,41
47	600,40	600,40	600,40	600,40	600,40	600,40	42	288,18	288,18	288,18	288,18	288,18	288,18
49	309,88	309,88	309,88	309,88	309,88	309,88	44	385,72	385,72	385,72	385,72	385,72	385,72
51	350,73	350,73	350,73	350,73	350,73	350,73	46	461,58	461,58	461,58	461,58	461,58	461,58
53	863,63	863,63	863,63	863,63	863,63	863,63	48	369,95	369,95	369,95	369,95	369,95	369,95
55	508,77	508,77	508,77	508,77	508,77	508,77	50	660,22	660,22	660,22	660,22	660,22	660,22
57	416,22	416,22	416,22	416,22	416,22	416,22	52	319,32	319,32	319,32	319,32	319,32	319,32

JULIO OSWALDO  
 GERENTE GENERAL  
 Reg. CIP N° 62805

ÁREAS GEOGRÁFICAS													
Cód.	1	2	3	4	5	6	Cód.	1	2	3	4	5	6
59	243,79	243,79	243,79	243,79	243,79	243,79	54	432,39	432,39	432,39	432,39	432,39	432,39
61	272,11	272,11	272,11	272,11	272,11	272,11	56	585,86	585,86	585,86	585,86	585,86	585,86
65	260,27	260,27	260,27	260,27	260,27	260,27	60	295,99	295,99	295,99	295,99	295,99	295,99
69	389,45	327,82	428,87	488,52	269,39	451,51	62	469,93	469,93	469,93	469,93	469,93	469,93
71	663,87	663,87	663,87	663,87	663,87	663,87	64	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21
73	553,34	553,34	553,34	553,34	553,34	553,34	66	721,69	721,69	721,69	721,69	721,69	721,69
77	338,48	338,48	338,48	338,48	338,48	338,48	68	269,93	269,93	269,93	269,93	269,93	269,93
							70	218,25	218,25	218,25	218,25	218,25	218,25
							72	431,72	431,72	431,72	431,72	431,72	431,72
							78	499,05	499,05	499,05	499,05	499,05	499,05
							80	108,76	108,76	108,76	108,76	108,76	108,76

(\*) Sin Producción

Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 046-2019-INEI.

**Artículo 2.-** Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1, comprende a los siguientes departamentos:

Área 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín

Área 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica

Área 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali

Área 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna

Área 5 : Loreto

Área 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

**Artículo 3.-** Los Índices Unificados de Precios, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fletes.

Regístrese y comuníquese.

FRANCISCO COSTAAPONTE

Jefe (e)

1742073-1

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA

INGENIERO CIVIL

Reg. CIP N° 10717

**Aprueban Factores de Reajuste que debe aplicarse a las obras de edificación, correspondiente a las seis Áreas Geográficas para las Obras del Sector Privado, producidas en el mes de enero de 2019**

**RESOLUCIÓN JEFATURAL  
N° 056-2019-INEI**

Lima, 15 de febrero de 2019

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, para uso del Sector Privado de la Construcción, deben elaborarse los Factores de Reajuste correspondientes a las obras de Edificación de las seis

(6) Áreas Geográficas del país, aplicables a las obras en actual ejecución, siempre que sus contratos no estipulen modalidad distinta de reajuste;

Que, para tal efecto, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe N° 02-01-2019/DTIE, referido a los Factores de Reajuste para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al período del 1 al 31 de Enero de 2019 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural pertinente, así como disponer su publicación en el diario oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SE RESUELVE:

JULIO OSWALDO


FUENTES QUÍNEZ


INGENIERO CIVIL

**Artículo 1.-** Aprobar los Factores de Reajuste que debe aplicarse a las obras de edificación, correspondiente a las seis (6) Áreas Geográficas para las Obras del Sector Privado, derivados de la variación de precios de todos los elementos que intervienen en el costo de dichas obras, producidas en el período del 1 al 31 de Enero de 2019, según se detalla en el cuadro siguiente:

ÁREAS GEOGRÁFICAS No.	OBRAS DE EDIFICACIÓN											
	Edificación de 1 y 2 Pisos			Edificación de 1 y 2 Pisos			Edificación de 3 y 4 Pisos			Edificación de 3 y 4 Pisos		
	(Terminada)			(Casco Vestido)			(Terminada)			(Casco Vestido)		
	M.O.	Resto Elem.	Total	M.O.	Resto Elem.	Total	M.O.	Resto Elem.	Total	M.O.	Resto Elem.	Total
1	0,9992	1,0001	0,9993	0,9991	0,9990	0,9981	0,9992	0,9998	0,9990	0,9990	0,9990	0,9980
2	0,9992	1,0006	0,9998	0,9991	0,9995	0,9986	0,9993	0,9999	0,9992	0,9990	0,9993	0,9983
3	0,9993	1,0011	1,0004	0,9992	1,0009	1,0001	0,9993	1,0007	1,0000	0,9991	1,0004	0,9995
4	0,9992	0,9997	0,9989	0,9991	0,9990	0,9981	0,9992	0,9996	0,9988	0,9990	0,9988	0,9978
5	0,9992	1,0007	0,9999	0,9991	1,0005	0,9996	0,9993	1,0005	0,9998	0,9990	1,0001	0,9991
6	0,9992	1,0011	1,0003	0,9991	1,0009	1,0000	0,9993	1,0009	1,0002	0,9990	1,0006	0,9996

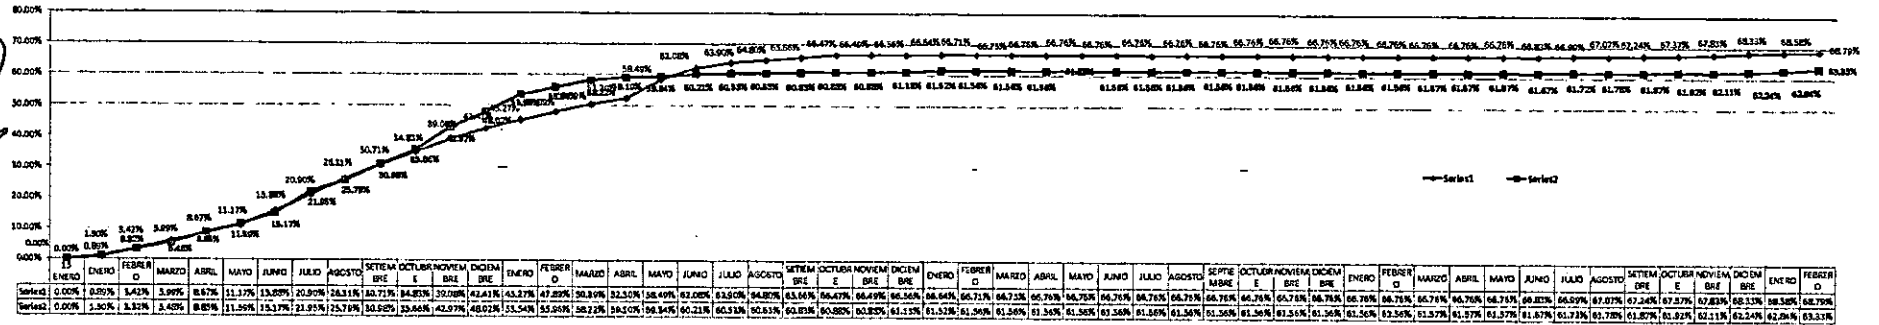
# Curva S

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335


  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

CONTROL DE AVANCE FISICO DE OBRA - GENERAL



# Planilla de metrados valorizados




JULIO OSVALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

**RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N° 50  
AL MES DE FEBRERO DEL 2019**

OBRA	: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"		
07	<b>OBRAS EN MAR</b>		
07.03.05	<b>JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES</b>		
07.03.05.01	CONCRETO EN VIGA MANDIL F'c=280 KG/CM2	m3	0.00
07.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA MANDIL	m2	62.85
07.03.05.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	4,006.62
07.03.06	<b>SARDINELES LLENADOS IN SITU</b>		
07.03.06.01	CONCRETO EN SARDINEL F'c=280 KG/CM2	m3	6.48
07.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES	m2	59.32
07.03.06.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	867.71
07.03.07	<b>LOSAS VACIADAS IN SITU</b>		
07.03.07.01	CONCRETO EN LOSAS F'c=280 KG/CM2	m3	0.00
07.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES	m2	48.18
07.03.07.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	15,229.74
07.04.07	<b>MANIOBRA DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS PUENTES</b>		
07.04.07.01	TRANSPORTE DE PILOTE	und	36.00
07.04.07.02	TRANSPORTE DE VIGA TRANSVERSAL	und	9.00
07.04.07.03	TRANSPORTE DE LOSA NERVADA	und	14.00
07.04.07.04	PUNTA PARA PILOTES	und	0.00
07.04.07.05	HINCADO DE PILOTE (INC. MOV. Y POSIC. PLANTILLA)	und	0.00
07.04.07.06	DESCABEZADO DE PILOTAJE	und	36.00
07.04.07.07	COLOCACION DE VIGA TRANSVERSAL	und	9.00
07.04.07.08	COLOCACION DE LOSA NERVADA	und	14.00

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

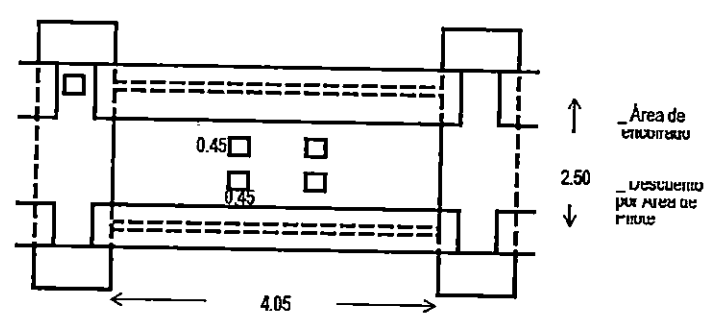





PLANILLA DE METRADOS-PUENTE DE ACCESO / CONCRETO- ENCOFRADO

Obra : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE\*

Sub ppto: OBRAS EN MAR

Fecha : FEBRERO DEL 2019

170

Item	Descripción	Unidad	N° Veces	Cant. Elem.	Medidas			Total x Tramo	
					Longitud	Ancho	Altura		
07 07.03 07.03.04	OBRAS EN MAR MUELLE DE ESPIGON L=950.00 M NUCLEOS LLENADOS EN SITU								
07.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN NUCLEOS	m2						27.95	
			3.000	1.000	4.050	2.500		30.38	
			0.000	-0.000	0.400	0.400		-2.40	
07.03.05	JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES								
07.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA MANDIL	m2						20.95	
	 Encofrado y Desencofrado A		1.000	7.000	4.550	0.900		28.67	
	 Encofrado y Desencofrado B		2.000	6.000	0.450	0.275		1.49	
	 Encofrado y Desencofrado C		1.000	2.000	4.200	0.275		2.31	
	 Encofrado y Desencofrado D		2.000	2.000	0.700	0.275		0.77	
TOTAL POR VIGA MANDIL LLENADO (m3) X TRAMOS DE 8 EJES									
CONCRETO TOTAL VIGA MANDIL (m3) x 1 DEL EJE 136 AL 159									
					62.85				
07.03.06 07.03.06.01	SARDINELES LLENADOS IN SITU CONCRETO EN SARDINEL F'c=280 KG/CM2	m3						3.24	
			1.000	2.000	35.950			3.24	
TOTAL PARA SARDINEL (m3) X TRAMOS DE 8 EJES									
CONCRETO TOTAL SARDINEL (m3) x 1 DEL EJE 136 AL 159									
					0.48				

ISAIAS JOSE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335





**PLANILLA DE METRADOS-PUENTE DE ACCESO / CONCRETO- ENCOFRADO**


Obra : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE\*

Sub ppto: OBRAS EN MAR

Fecha : FEBRERO DEL 2019

169

Item	Descripción	Unidad	N° Veces	Cant. Elem.	Medidas			Total x Tramo					
					Longitud	Ancho	Altura						
07.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES  	m2						29.66					
								A	1.000	2.000	35.950	0.210	15.10
								B	1.000	2.000	35.950	0.200	14.38
								C	2.000	2.000	Area	0.045	0.18
								TOTAL PARA SARDINEL (m2) X TRAMOS DE 8 EJES					
CONCRETO TOTAL SARDINEL (m2) x / DEL EJE 136 AL 159								59.32					
07.03.07	LOSAS VACIADAS IN SITU												
07.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA  	m2						16.06					
								A	1.000	2.000	35.950	0.200	14.38
								B	1.000	2.000	4.200	0.200	1.68
TOTAL PARA SARDINEL (m2) X TRAMOS DE 8 EJES													
CONCRETO TOTAL SARDINEL (m2) x / DEL EJE 136 AL 159								48.18					










  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335


  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717


**PLANTILLA DE METRADOS-PUENTE DE ACCESO / ACERO DE REFUERZO**

Obra: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE  
 Subppto: OBRAS EN MAR  
 Fecha: FEBRERO DEL 2019

168

Item	Descripcion	Longitud	# Varillas	Cant. Elem.	Longitudes x Ø de Barra						
					1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	
07	<b>OBRAS DE MAR</b>										
07.03.05 07.03.05.03	<b>JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2</b>										
	Para Eje 56 - 207: - Acero longitudinal										
	 Traslape 4.05 a	40.50	4.00	1.00							162.00
	 b	2.00	3.00	2.00							12.00
	 c	13.50	3.00	2.00							81.00
	- Acero transversal:										
	 4.70	4.70	4.00	8.00							150.40
	 4.70	4.70	2.00	8.00							75.20
	Peso en kilogramos, por metro lineal				0.25	0.56	0.99	1.55	2.24	3.97	
	Longitud total por diámetro, en metros lineales				0.00	0.00	0.00	0.00	330.20	150.40	
	Total en kilogramos por diámetro				0.00	0.00	0.00	0.00	738.00	597.54	
	<b>TOTAL POR JUNTAS LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL (Kg)</b>										1,335.54
	<b>CANTIDAD JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES POR TRAMO DE 8 EJES</b>										1.00
	<b>ACERO TOTAL VIGA MANDIL(m3) x / DEL EJE 136 AL 159</b>										4,086.62
07.03.06 07.03.06.03	<b>SARDINELES LLENADOS IN SITU ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2</b>										
	 Acero Longitudinal	40.50	3.00	1.00				121.50			
	 Estribos	1.04	1.00	245.00		254.80					
	Peso en kilogramos, por metro lineal				0.25	0.56	0.99	1.55	2.24	3.97	
	Longitud total por diámetro, en metros lineales				0.00	254.80	121.50	0.00	0.00	0.00	
	Total en kilogramos por diámetro				0.00	142.69	120.77	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL POR SARDINEL LLENADO IN SITU (Kg)</b>										263.46
	<b>CANTIDAD SARDINELES POR TRAMO DE 8 EJES</b>										2.00
	<b>ACERO TOTAL SARDINEL(KG) x / DEL EJE 136 AL 159</b>										867.71
07.03.07 07.03.07.03	<b>LOSAS VACIADAS IN SITU ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2</b>										
	 Acero Longitudinal	40.50	18.00	1.00							729.00
	 3.00	3.00	15.00	7.00							315.00

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717


## PLANILLA DE METRADOS - DPA SAN JOSE


Obra : "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"

Especialidad: OBRAS DE MAR

Fecha : FEBRERO DEL 2019

Item	Elemento			Cantidad Elementos	Medidas			Subtotal	TOTAL
	Descripcion	Und	N° Veces		Longitud	Ancho	Alfura		
07.04.07	Maniobra de Colocacion e Hincado de Pilotes, Vigas y Losas Puentes								
07.04.07.01	Transporte de Pilote	Und	1.00	36.00	-	-	-	36.00	36.00
	Del eje 170 al 177 + NUCLEO 163-164 Y 166-167								
07.04.07.02	Transporte de Viga Transversal	Und	1.00	9.00	-	-	-	9.00	9.00
	Del eje 170 al 177								
07.04.07.03	Transporte de Losa Nervada	Und	1.00	14.00	-	-	-	14.00	14.00
	Del eje 170 al 177								
07.04.07.06	Descabezado de Pilotaje	Und	1.00	36.00	-	-	-	36.00	36.00
	Del eje 170 al 177 + NUCLEO 163-164 Y 166-167								
07.04.07.07	Colocacion de Viga Transversal	Und	1.00	9.00	-	-	-	9.00	9.00
	Del eje 170 al 177								
07.04.07.08	Colocacion de Losa Nervada	Und	1.00	14.00	-	-	-	14.00	14.00
	Del eje 170 al 177								

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

**PLANILLA DE METRADOS-PUENTE DE ACCESO / ACERO DE REFUERZO**

Obra: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE  
 Subpto: OBRAS EN MAR  
 Fecha: FEBRERO DEL 2019

166

Item	Descripcion	Longitud	# Varillas	Cant. Elem.	Longitudes x Ø de Barra					
					1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
	<p>Acero Transversal</p> <p>0.25   4.10   0.25</p> <p>07 06 05 04 03 02 01</p> <p>23 unid. 23 unid. 23 unid. 23 unid. 23 unid. 23 unid. 23 unid.</p>	4.60	23.00	7.00					740.60	
	<p>3.00</p> <p>07 06 05 04 03 02 01</p> <p>22 unid. 22 unid. 22 unid. 22 unid. 22 unid. 22 unid. 22 unid.</p> <p>0.30   4.10   0.30</p> <p>En cada extremo de tramo de 8 ejes</p>	3.00 En extremos: 3.00	22.00 2.00	7.00 1.00					462.00 6.00	
		4.70	2.00	2.00					18.80	
Peso en kilogramos, por metro lineal					0.25	0.56	0.99	1.55	2.24	3.97
Longitud total por diámetro, en metros lineales					0.00	0.00	0.00	0.00	2,271.40	0.00
Total en kilogramos por diámetro					0.00	0.00	0.00	0.00	5,076.58	0.00
TOTAL POR LOSA LLENADA IN SITU (Kg)					5,076.58					
CANTIDAD DE LOSAS IN SITU EN TRAMO DE 8 EJES					1.00					
ACERO TOTAL, LOSA VACIADA INSITU (KG) x 1 DEL EJE 136 AL 199					15,229.74					

JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

# **Panel Fotográfico**

**PANEL FOTOGRAFICO – FEBRERO 2019**

164

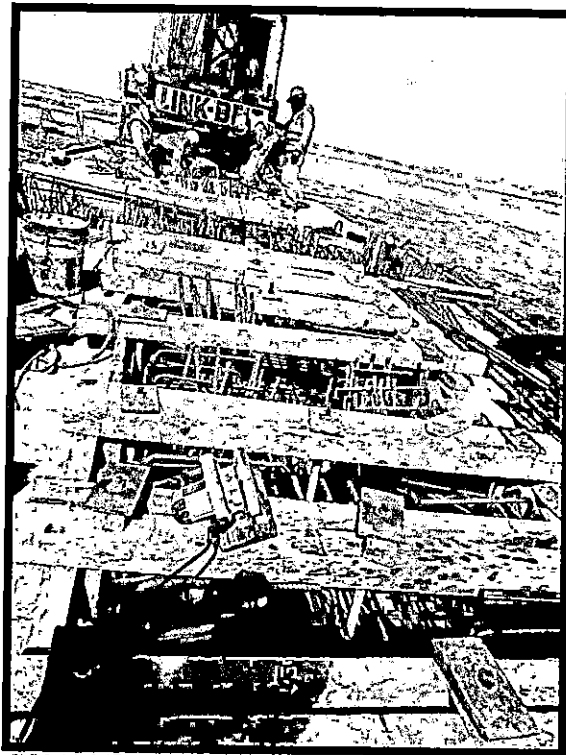
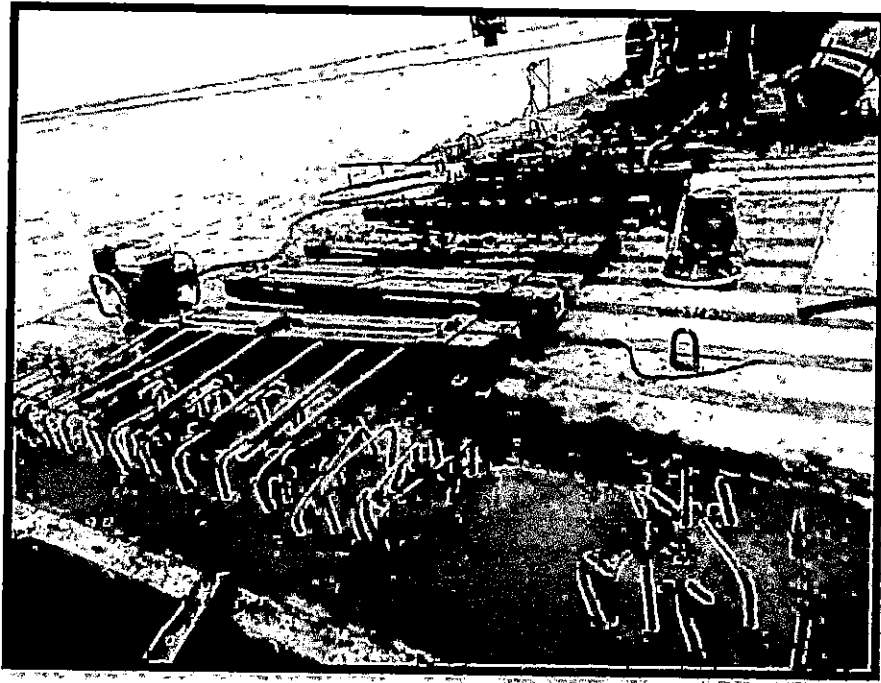
**OBRAS EN MAR**


**07.03.04 NUCLEOS LLENADOS EN SITU.**

07.03.04.01 Concreto en Núcleos  $F_c'=280\text{kg/cm}^2$ .

07. 03.04.02 Encofrado y desencofrado en Núcleos.

07. 03.04.03 Acero de refuerzo  $F_y'= 4200\text{kg/cm}^2$ .



  
SAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

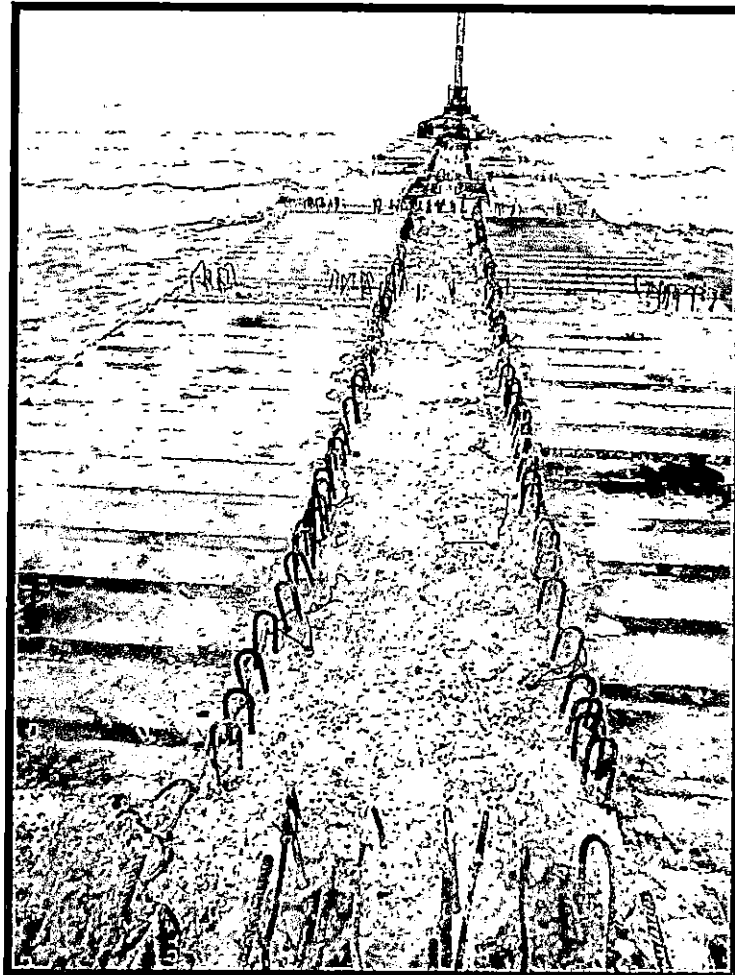


**07.03.05 JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES.**

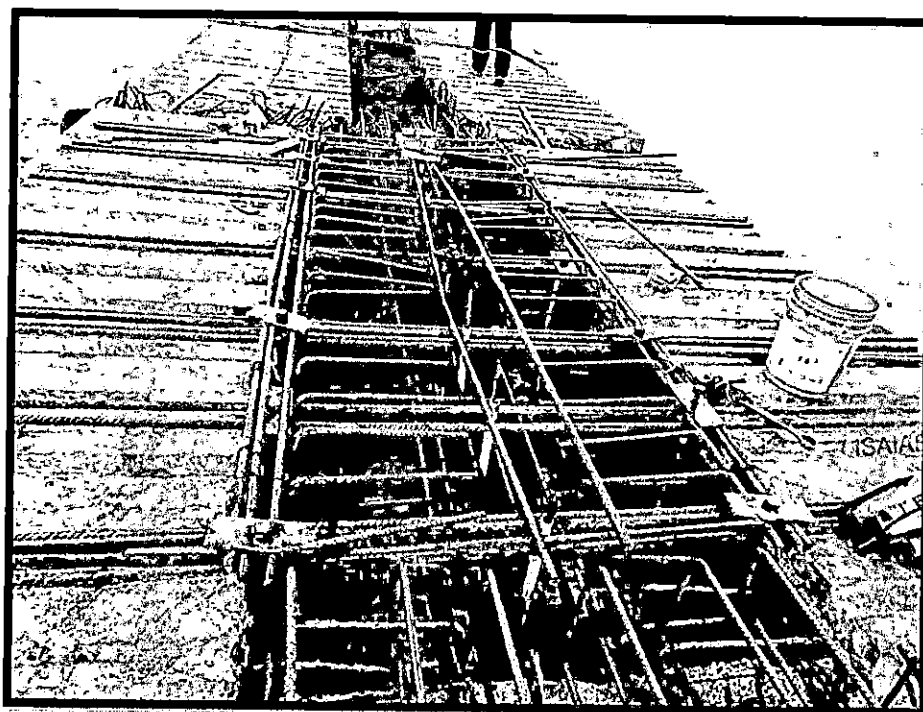
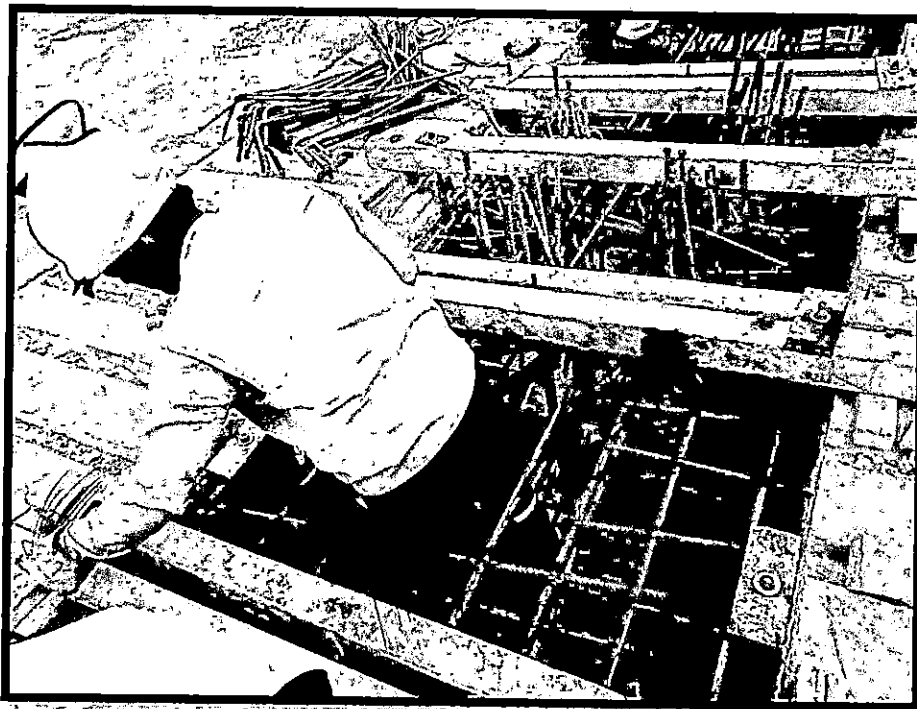
07.03.05.01 Concreto en Viga mandil  $F_c' = 280 \text{ kg/cm}^2$ .

07.03.05.02 Encofrado y desencofrado en viga mandil.


07.03.05.03 Acero de refuerzo  $F_y' = 4200 \text{ kg/cm}^2$ .



  
JAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717



  
JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

  
JULIO OSVALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

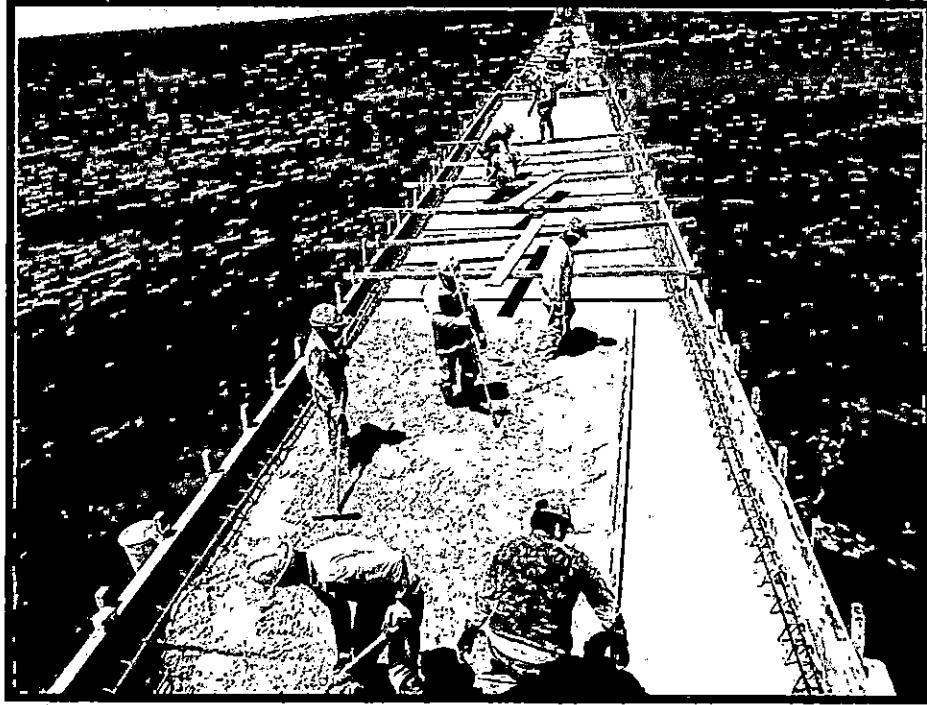


**07.03.07 LOSAS VACIADAS IN SITU.**

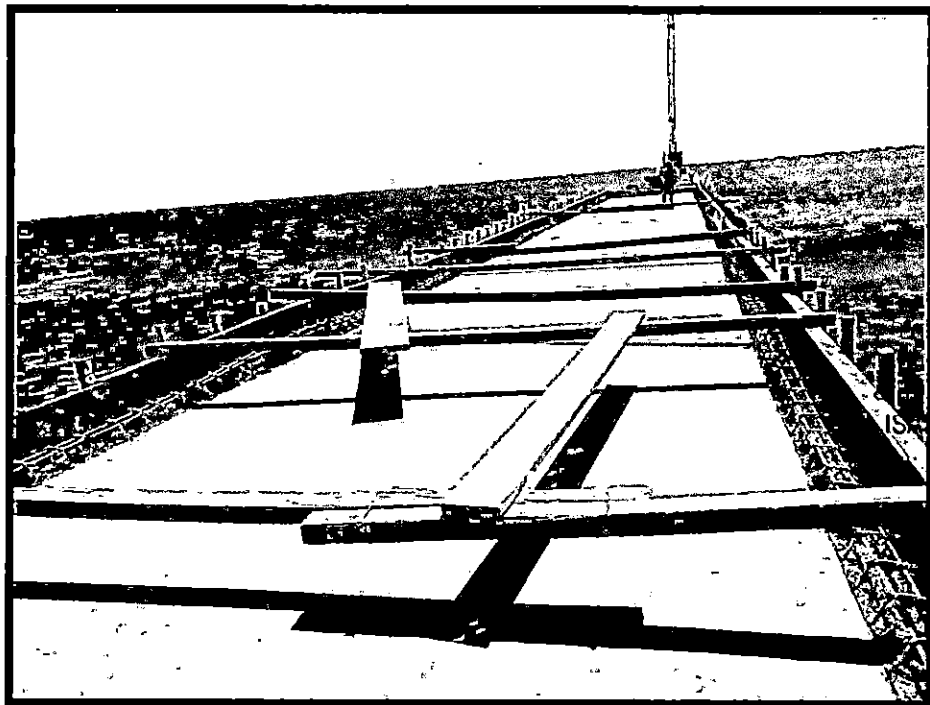
07.03.07.01 Concreto en Losas  $F_c' = 280\text{kg/cm}^2$ .

07.03.07.02 Encofrado y desencofrado en Losas.

07.03.07.03 Acero de refuerzo  $F_y' = 4200\text{kg/cm}^2$ .

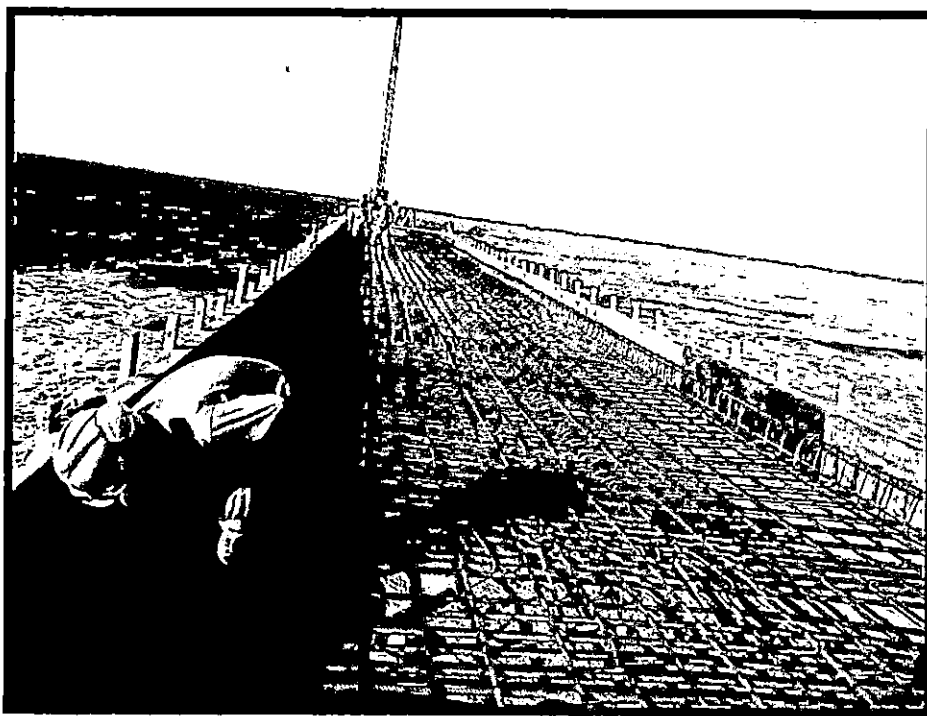


Concreto en Losa (Eje 136 al 151)



JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717


JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335



Encofrado de Losa (Eje 136 al 151)

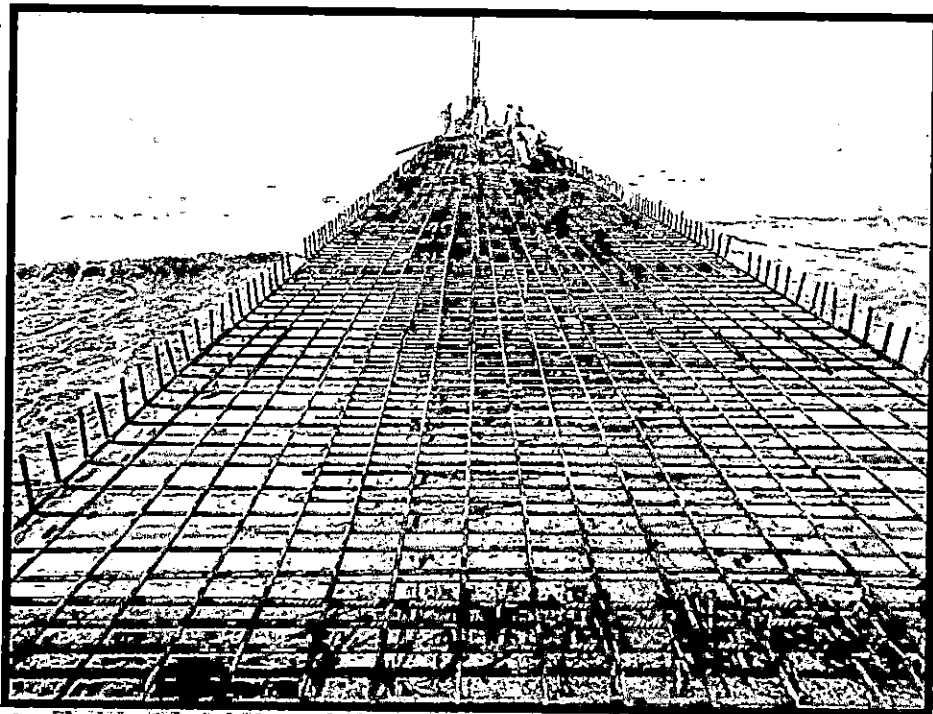



  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717


  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335



Acero  $F_y' = 4200 \text{ Kg/cm}^2$  en Losa (Eje 136 al 151)



  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

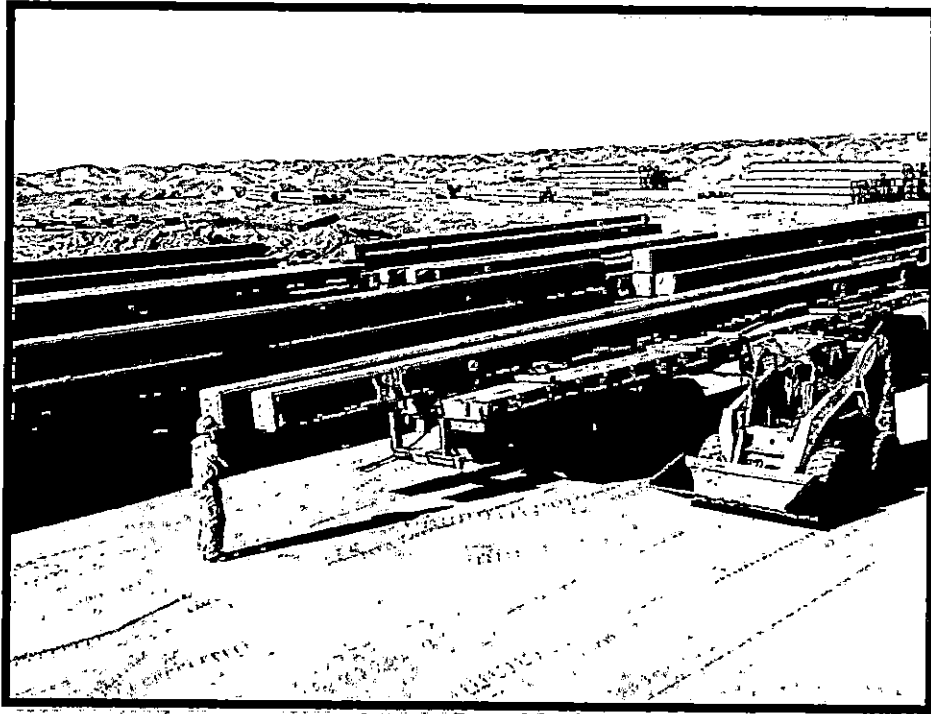
"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE,  
DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"  
07.04.07 MANIOBRA DE COLOCACION E HINCADO DE PILOTES, VIGAS Y LOSAS  
PUENTES.

158

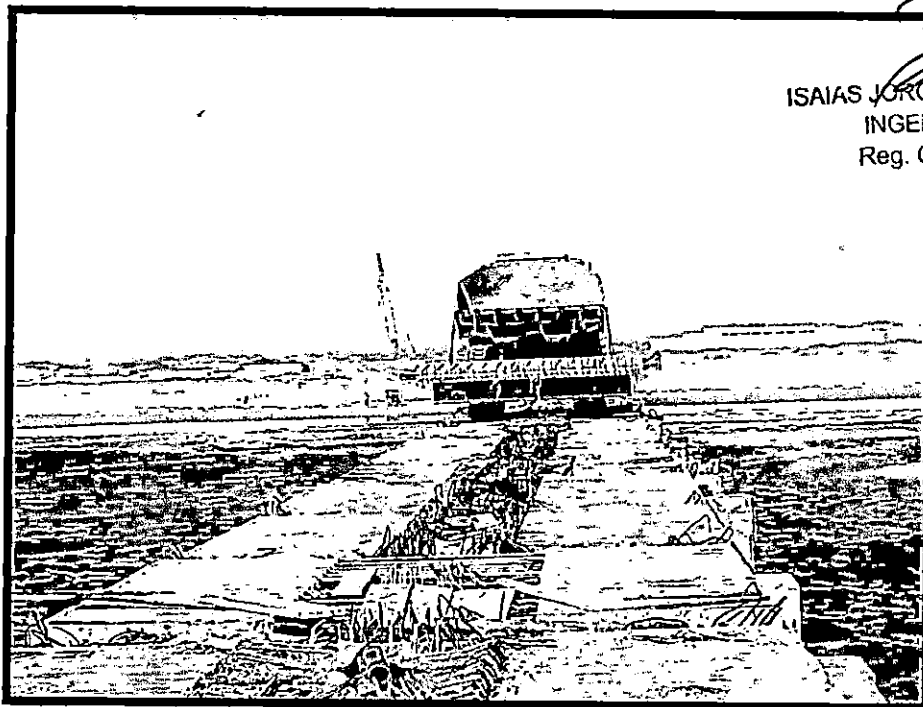
07.04.07.01 Transporte de pilote.

07.04.07.01 Transporte de Viga transversal.

07.04.07.01 Transporte de Losa Nervada.



TRANSPORTE DE PREFBRICADOS (PILOTES)

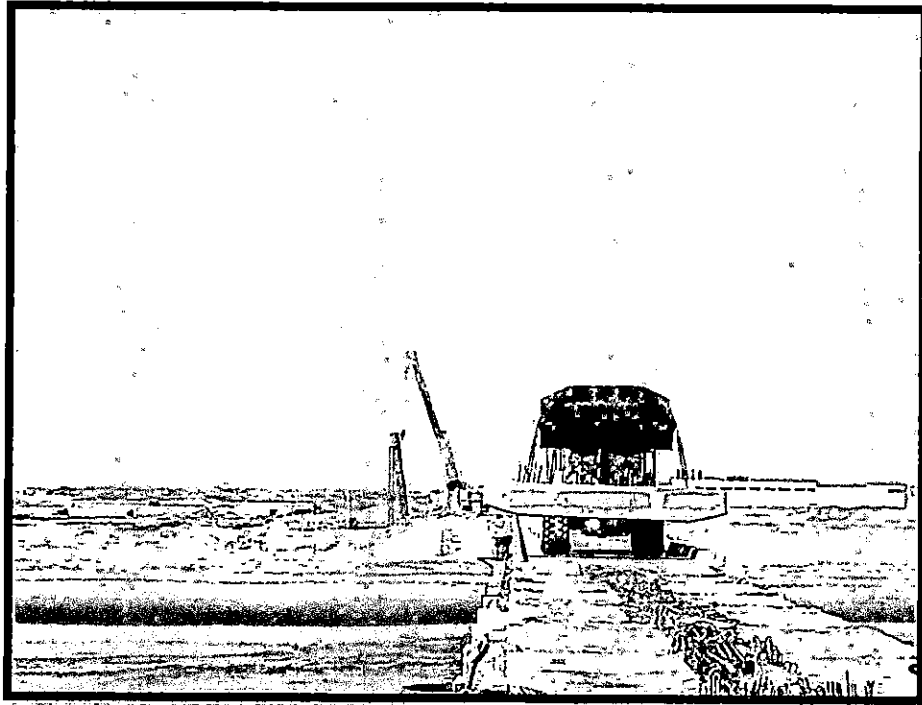


ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

TRANSPORTE DE PREFBRICADOS (LOSAS NERVADAS)

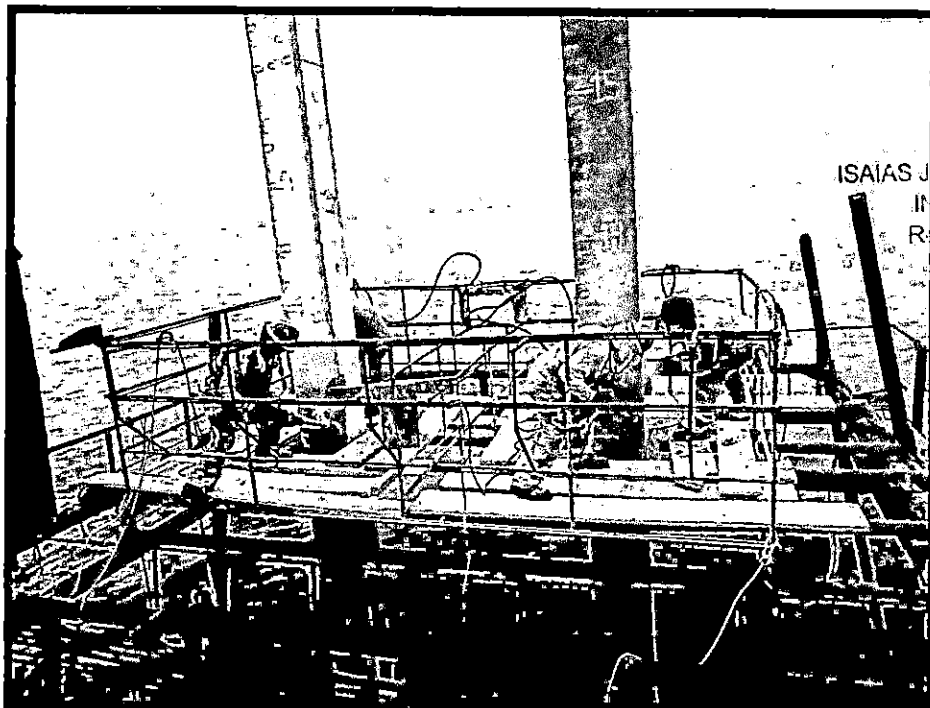
CONSORCIO SAN JOSE

JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

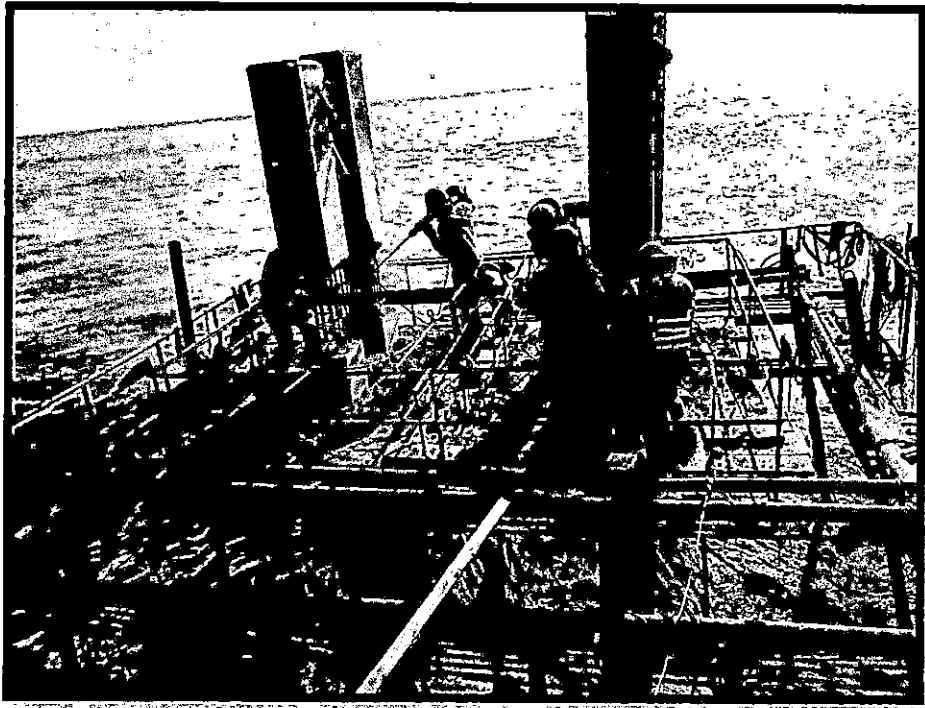


TRANSPORTE DE PREFBRICADOS (VIGAS)

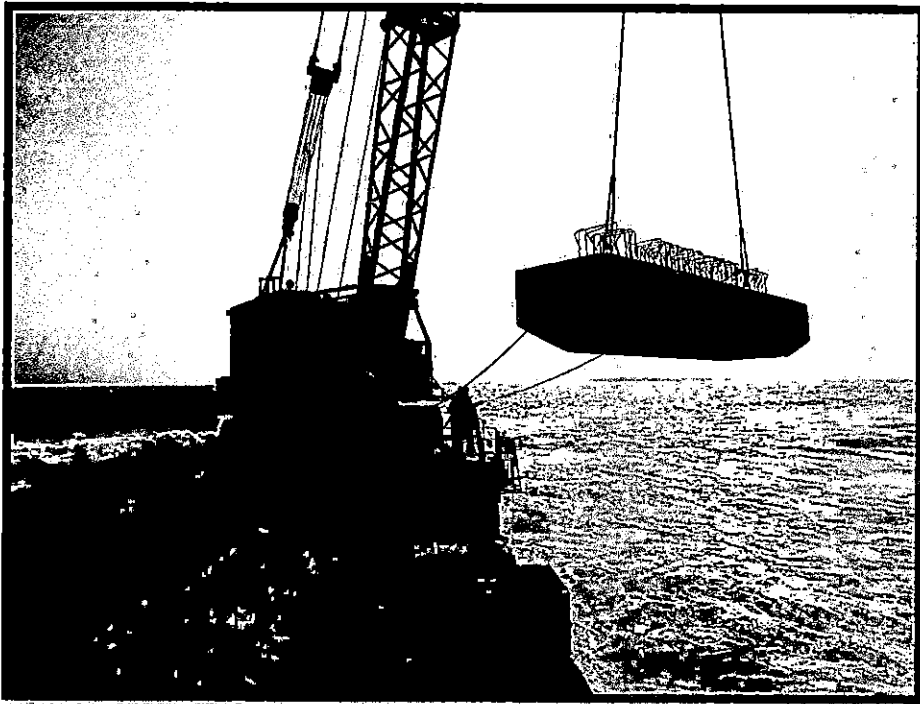
07.04.07.06 DESCABEZADO DE PILOTAJE (ENTRE EJES 170 Y 177).




ISAÍAS J. ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

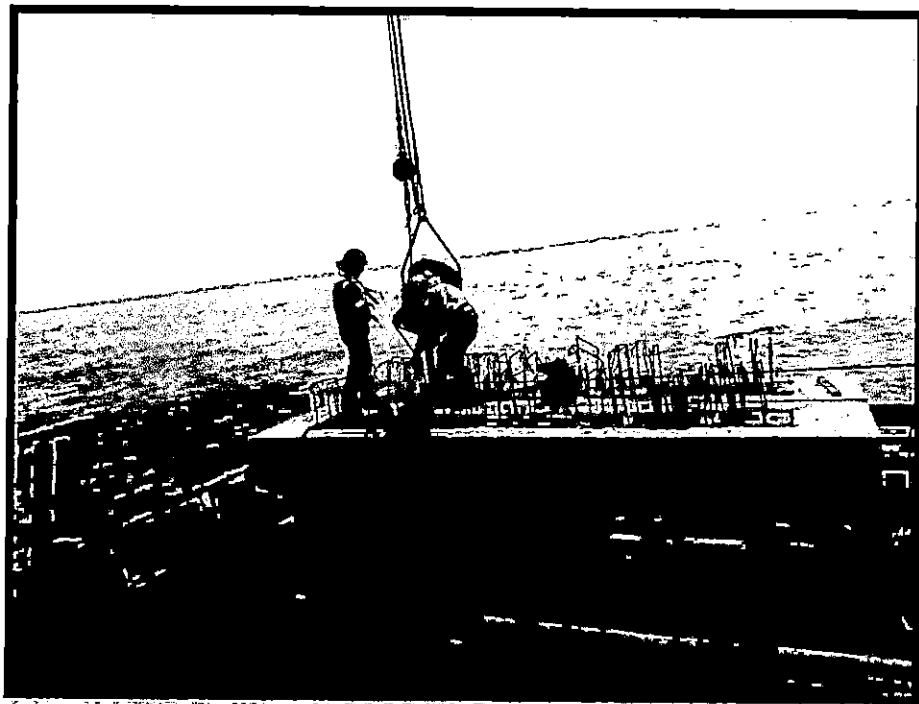
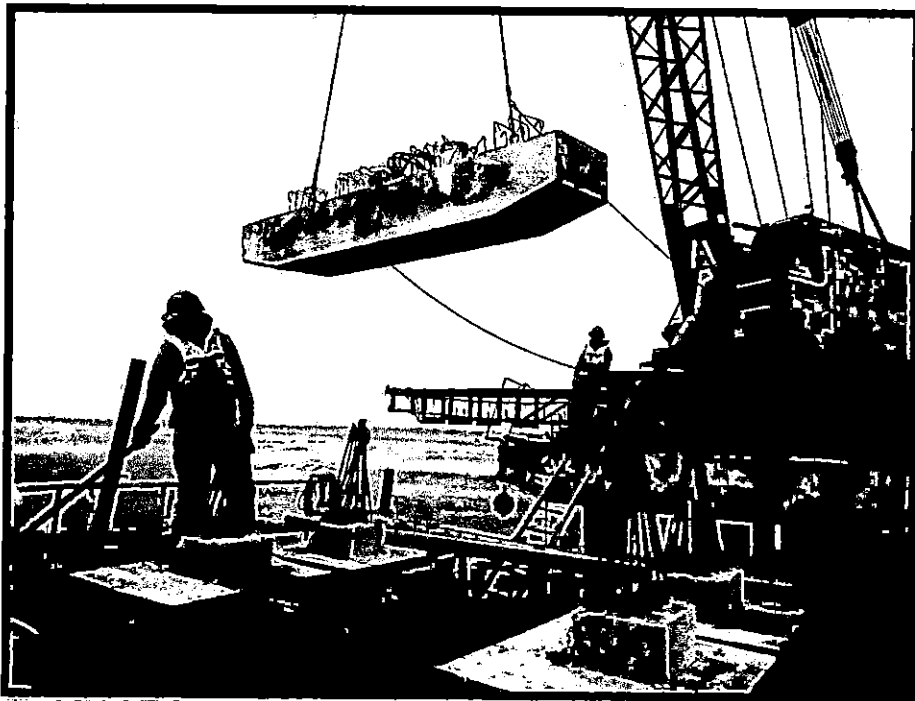


07.04.07.07 COLOCACION DE VIGAS TRANSVERSALES DEL EJE 170 AL 177.




  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

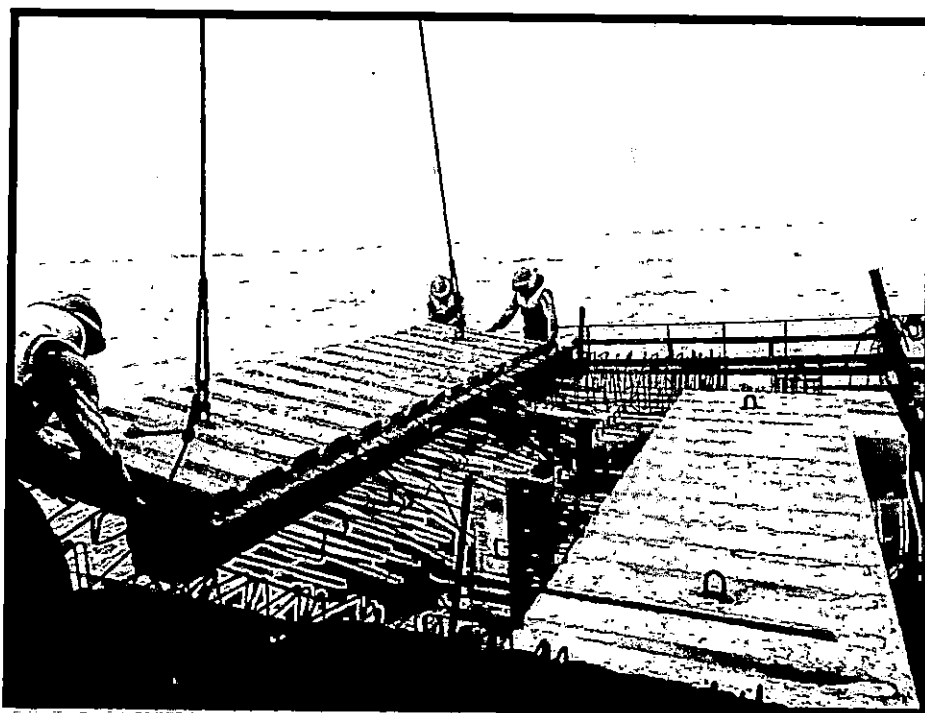


  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717


  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335




07.04.07.08 COLOCACION DE LOSAS NERVADAS (ENTRE EJES 170 Y 177).



CONSORCIO SAN JOSE

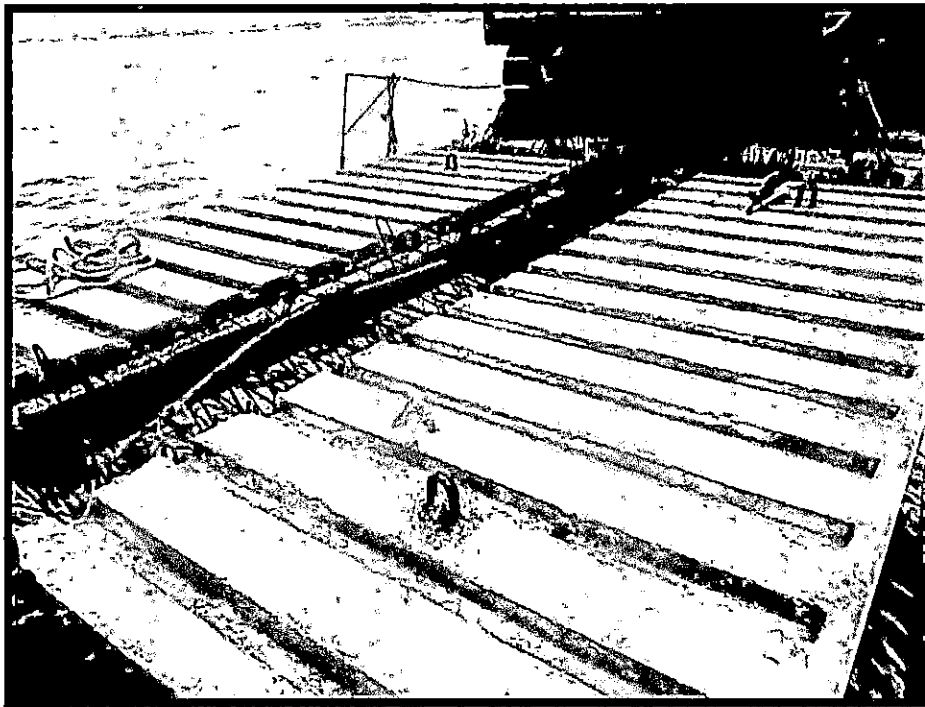
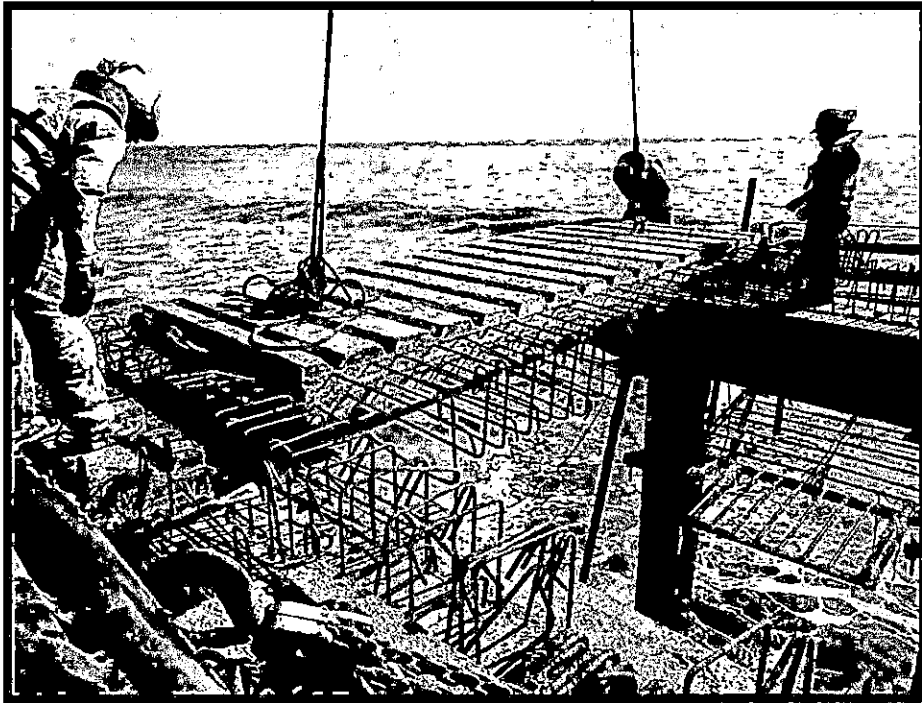
  
ISAIAS JOSE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717


  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335




"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE,  
DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"

153



  
ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

**Contrato de  
obra  
(Copia)**

**CONTRATO N° 082-2014-FONDEPES/OGA**

**EJECUCION DE OBRA "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION DE LAMBAYEQUE"**

Conste por el presente documento, el contrato para la EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION DE LAMBAYEQUE", que celebra de una parte el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FONDEPES, en adelante se le denominará "LA ENTIDAD", con RUC N° 20137921601, con domicilio legal en avenida Petit Thouars N° 115, distrito de Lima, provincia y departamento de Lima, representado por su Secretario General, Abog. FERNANDO ALARCON DIAZ, identificado con DNI N° 10507977, por delegación de facultades otorgadas mediante Resolución Jefatural N° 115-2013-FONDEPES/J; y de otra parte el **CONSORCIO SAN JOSE**, integrado por:

- a) **CHAVIN DE HUANTAR EIRL**, con RUC N° 20254813720, con domicilio en Av. Próceres de la Independencia 3634, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, quien participa en un porcentaje de 58%.
- b) **CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU**, con RUC N° 20552622171, con domicilio en Calle Pasaje Sucre 164, 2do piso, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, quien participa en un porcentaje de 40%.
- c) **CORPORACION ARIS SAC**, con RUC N° 20523320522, con domicilio en Av. Huarochirí N° 1109 Dpto. 301-Urbanización Mayorazgo, distrito de Ate Vitarte, provincia y departamento de Lima, quien participa en un porcentaje de 1%.
- d) **CORPORACION R&E SAC**, con RUC N° 20516966034, con domicilio en Calle 13 N° 148, Dpto. 201-Urbanización Carabayllo, distrito de Comas, provincia y departamento de Lima, quien participa en un porcentaje de 1%.

Con domicilio común del **CONSORCIO SAN JOSE** en la avenida Alameda del Corregidor N° 414, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, con su Representante Legal Común, Sr. **EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA**, identificado con DNI N° 32385946, en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 21.11.14, el Comité Especial Ad Hoc otorgó la Buena Pro de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 004-2014-FONDEPES para la contratación de la ejecución de la obra "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano directo de San José, distrito de San José, provincia de Lambayeque, Región de Lambayeque", al **CONSORCIO SAN JOSE**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano directo de San José, distrito de San José, provincia de Lambayeque, región de Lambayeque", conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CONSORCIO SAN JOSE  
Emiliano Isaac Trujillo Luna  
Representante Legal Común





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
 "Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a S/. 32, 457,630.22 (Treinta y Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Treinta con 22/100 Nuevos soles) incluido IGV, bajo el sistema de contratación de precios unitarios.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, en periodos de valorización mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases Integradas. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes:

**CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

El plazo de ejecución del presente contrato es de 540 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases Integradas.

**CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora<sup>1</sup> y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

**CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato<sup>2</sup>:
- a) S/. 1, 947,458.00, a través de la Carta Fianza N° 0011-0962-9800017155-87,

<sup>1</sup> La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

<sup>2</sup> En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

CONSORCIO SAN JOSE  
 Emiliano Isaac Trujillo Luna  
 Representante Legal Común

F. ALARCÓN

M. RODRIGUEZ

W. POMA



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
 "Año de la Promoción de la industria Responsable y del Compromiso Climático"

emitida por BBVA CONTINENTAL, cantidad que es equivalente al SEIS por ciento (6%) del monto del contrato original, con una vigencia desde el 15.12.14 hasta el 10.12.15, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

b) S/. 1, 298,305.21, a través de la Carta Fianza N° 010469195 000, emitida por SCOTIABANK, cantidad que es equivalente al CUATRO por ciento (4%) del monto del contrato original, con una vigencia desde el 19.12.14 hasta el 15.12.15, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final:

**CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO<sup>3</sup>**

LA ENTIDAD otorgará UN ADELANTO DIRECTO por el 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días calendario siguientes A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO<sup>4</sup>, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos,<sup>5</sup> mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue EL ADELANTO en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

<sup>3</sup> Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

<sup>4</sup> En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

<sup>5</sup> De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

CONSORCIO SAN JOSE  
 Emiliano Isaac Trujillo Luna  
 Representante Legal Común





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la industria Responsable y del Compromiso Climático"

**CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS<sup>6</sup>**

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el 40% del monto del CONTRATO ORIGINAL<sup>7</sup>, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

La entrega del adelanto para materiales o insumos podrá ser solicitado por el Contratista durante el plazo contractual de la obra y en concordancia con el calendario de adquisición de materiales o insumos.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 07 días calendario, previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 días calendario, anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza emitida en los siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país cuya vigencia mínima será de tres (03) meses renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, conforme el artículo 162 del Reglamento; dicha carta deberá estar dirigida al FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO; y el comprobante de pago correspondiente (FACTURA).

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DE LA OBRA**

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

**CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

<sup>6</sup> En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

<sup>7</sup> En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

CONSORCIO SAN JOSE

Emiliano Isaac Trujillo Luna  
Representante Legal Común

SECRETARÍA GENERAL  
F. A. ARCON

OFICINA GENERAL DE ASesorIA JURIDICA  
M. RODRIGUEZ

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
W. POMA

**CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

**CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

**F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

**OTRAS PENALIDADES:**

Permanencia de la Residencia: Por día de ausencia injustificada del Residente de obra	300 soles
Permanencia del personal propuesto diferente al Residente de obra: Por día de ausencia injustificada previo a ser requerida su presencia en obra por la Entidad o la supervisión	150 soles
Cuaderno de obra: Por hora de ausencia de cuaderno de obra (en la obra) Por día de retraso en el llenado del cuaderno de obra	50 soles 50 soles
Valorización de obra: Por día de atraso en la entrega de valorizaciones de obra	200 soles

CONSORCIO SAN JOSE

Emiliano Isaac Trujillo Luján  
Representante Legal Común



E. ALARCÓN



M. RODRIGUEZ



W. ROMA



**CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Quando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>8</sup>**

1. Las partes acuerdan que las controversias que surjan sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785 y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley.
2. Las partes acuerdan que todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante arbitraje institucional bajo la organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo a su Reglamento.
  - a.- Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es menor o igual a 30 (treinta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de su presentación, el Tribunal Arbitral estará compuesto por árbitro único.
  - b.- Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es mayor a 30 (treinta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la de su presentación, el Tribunal Arbitral estará compuesto por tres árbitros.
  - c.- Si la controversia señalada en la solicitud o demanda arbitral es indeterminable el Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros.

<sup>8</sup> De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

CONSORCIO SAN JOSE

Emiliano Isaac Trujillo Luna  
Representante Legal Común





- 3. Las partes acuerdan que las actuaciones arbitrales se realizarán en los plazos establecidos, sin que el Tribunal Arbitral tenga facultad alguna para ampliarlos o modificarlos, no siendo posible que el Tribunal Arbitral haga uso de la facultad contenida en el numeral 4 del artículo 34 del Decreto Legislativo N° 1071.
- 4. El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutará como una sentencia.
- 5. Para la interposición de recurso de anulación del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial las partes acuerdan que, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse.

**CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Avenida Petit Thouars N° 115, distrito Lima, provincia y departamento Lima.

DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: Avenida Alameda del Corregidor N° 414, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes, debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases Integradas, las propuestas técnico y económica, y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por cuadruplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los 24 días del mes de diciembre de 2014.




FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
FONDEPES  
FERNANDO ALVARADO DIAZ  
LA ENTIDAD

CONSORCIO SAN JOSE  
Emiliano Isaac Trujillo Luna  
Representante Legal Común  
EL CONTRATISTA

# **Contrato de consorcio**

**(Copia)**



CONTRATO

“CONSORCIO SAN JOSE”

QUE CELEBRAN

CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.

CIVIS GLOBAL- SUCURSAL PERU

CORPORACION ARIS S.A.C.

CORPORACION R&E S.A.C.

EL PRESENTE DOCUMENTO  
NO HA SIDO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA.

ING. FERRERO CALLE ROXANA  
REPRESENTANTE LEGAL

Conste por el presente documento, el CONTRATO DE CONSORCIO que celebran las siguientes personas jurídicas empresariales:

- CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L. con RUC N° 20254813720, con domicilio en Av. Próceres de la Independencia 3634, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima. Debidamente representado por su Representante Legal el Ing. EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA, Peruano, identificado con DNI N° 32385946, según poder que obra inscrito en la Partida Electrónica número: 01545353 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao;
- CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU con RUC N° 20552622171, debidamente representada por su Representante Legal, FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ, Identificado con C.E. N° 000996117, con domicilio en calle PASAJE SUCRE 164, 2º Piso, Distrito de Miraflores Provincia y departamento de Lima, según poderes inscritos la partida N° 13012604, del Registro de Personas Jurídicas de Lima;
- CORPORACION ARIS S.A.C. con RUC N° 20523320522, con domicilio en la Av. Huarochirí N° 1109 Dpto. 301 - Urb.

ING. FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION R&E

CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU  
FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL




- Mayorazgo (tranquera de Mayorazgo), Distrito de Ate Vitarte, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Representante Legal JULIO CESAR VILLAFRANCA MOSQUERA, peruano, identificada con DNI N° 09753183; según Poder que obra inscrito en la Partida Electrónica Número: 12358699 en el Asiento N° A00001, del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao.
- CORPORACION R&E S.A.C. con RUC N° 20516966034, con domicilio en la Calle 13 N° 148, Dpto. 201 (ref. Cruce Av. El Maestro y Av. Metropolitan) - Urb. Carabayllo, Distrito de Comas, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Representante Legal ROXANA GUERRERO CALLE, peruana, identificada con DNI N° 09794994; según Poder que obra inscrito en la Partida Electrónica Número: 12052729 en el Asiento N° A00001, del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao.


A quienes en adelante se les denominará de manera conjunta, LOS CONSORCIADOS; que celebran el presente contrato bajo las disposiciones contenidas en las cláusulas siguientes:


PRIMERA.- CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL CONSORCIO

LOS CONSORCIADOS están constituidos por personas Jurídicas de derecho privado, constituidas según los diversos regímenes empresariales y/o societarios que la legislación peruana reconoce como vigentes a la firma del presente contrato de consorcio, y las mismas que han decidido formar un consorcio de acuerdo a lo establecido en el artículo 445° y siguientes de la Ley General de Sociedades, con el objeto de prestarse mutua colaboración estando a sus porcentajes, en la licitación y desarrollo de la ejecución, habiendo obtenido la buena "Buena Pro" consentida, de la "ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES-DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 04-2014-FONDEPES- PRIMERA CONVOCATORIA".CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE, por el monto de S/32'457,630.22 (TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 22/100 NUEVOS SOLES)

De acuerdo a lo establecido por los artículos 438° y 445° de la Ley General de Sociedades, los CONSORCIADOS dejan constancia que el CONTRATO no genera la creación de una persona jurídica y acuerdan

  
 CORPORACION R&E S.A.C.  
 INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
 MCG. JULIO CESAR VILLAFRANCA MOSQUERA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

  
 CH: JM DE HUANTARCA  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General

  
 CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU  
 FELIPE CARRASCO HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



utilizar como denominación "CONSORCIO SAN JOSE", denominándose en el presente documento únicamente como CONSORCIO.

**SEGUNDA.- DOMICILIO LEGAL COMUN DEL CONSORCIO**


Los CONSORCIADOS, señalan como su domicilio legal común en la Avenida Alameda del Corregidor N° 414, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima-Perú, que será el domicilio del CONSORCIO.


**TERCERA.-PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN E INDIVIDUALIZACION DE OBLIGACIONES**


La participación de los CONSORCIADOS, tanto en la ejecución de la obra, aportes y responsabilidades que deberán asumir, será de acuerdo al siguiente detalle:


<p>OBLIGACIONES DE CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L. 58.0%</p> <p>-Participar en la Ejecución de la Obra _____ 58.00%</p> <p>-Participar con apoyo logístico para la Obra _____ 58.00%</p> <p>-Responsable de elaboración de propuestas técnica y económica y aportación de profesionales a la obra _____ 0.00%</p>	
<p>OBLIGACIONES DE CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU 40.0%</p> <p>-Participar en la Ejecución de la Obra _____ 40.00%</p> <p>-Participar con apoyo logístico para la Obra. _____ 40.00%</p> <p>-Responsable de elaboración de propuestas técnica y económica y aportación de profesionales a la obra _____ 0.00%</p>	
<p>OBLIGACIONES DE CORPORACIÓN ARIS S.A.C. 1.00%</p> <p>-Participar en la Ejecución de la Obra _____ 1.00%</p> <p>-Participar con apoyo logístico para la Obra. _____ 1.00%</p> <p>-Responsable de elaboración de propuestas técnica y económica y aportación de profesionales a la obra _____ 100.00%</p>	
<p>OBLIGACIONES DE CORPORACIÓN R&amp;E S.A.C. 1.00%</p> <p>-Participar en la Ejecución de la Obra _____ 1.00%</p> <p>-Participar con apoyo logístico para la Obra. _____ 1.00%</p> <p>-Responsable de elaboración de propuestas técnica y económica y aportación de profesionales a la obra _____ 0.00%</p>	

TOTAL 100%.

  
 CORPORACIÓN ARIS S.A.C.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 F. CABASCOSA HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CORPORACIÓN R&E S.A.C.  
 GERENTE GENERAL  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

  
 CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.  
 GERENTE GENERAL  
 EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General

  
 CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 FELIPE CABASCOSA HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

Se deja establecido que ningún CONSORCIADO podrá CEDER su posición contractual adquirida en el presente contrato a favor de ninguna persona natural o jurídica externa a los miembros del CONSÓRCIO, salvo que el COMITÉ DE GERENCIA apruebe dicha cesión. Sin aprobación por parte del COMITÉ DE GERENCIA no operará la cesión de posición contractual a externos.

CUARTA.-DURACIÓN

El plazo de duración del presente Contrato y, por ende del CONSORCIO, será el necesario para el cumplimiento de su objeto, es decir, aquel lapso requerido para la conclusión de LA OBRA u OBRAS, que se ejecuten como consecuencia de los contratos que se celebren con FONDEPES, y la liquidación debidamente consentida. En este sentido, la vigencia del presente Contrato se extenderá hasta que sea realizada y quede consentida la liquidación final del Contrato de LA OBRA que se celebrará con FONDEPES y, en general, hasta que sean cumplidas todas las obligaciones que hubieran asumido EL CONSORCIO para la ejecución de LA OBRA con cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, y hasta que se hayan hecho efectivos todos los créditos o derechos a favor de LOS CONSORCIADOS, que provengan del objeto del consorcio San José, debiendo interpretarse este plazo de la forma más amplia posible.

En caso de no obtenerse la buena pro de la obra que motiva la constitución del consorcio, el presente contrato quedara resuelto de pleno derecho con dicha situación.

QUINTA.- COMITÉ DE GERENCIA

Los integrantes del consorcio aceptan que el consorcio sea conducido por un Comité de Gerencia el cual se regirá por las siguientes disposiciones:

En el orden interno, el CONSORCIO se sujeta a la dirección de un COMITÉ DE GERENCIA, compuesto de 5 (cinco) miembros, designados 3 (tres) designados por CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L., y 2 (dos) designados por CIVIL GLOBAL - SUCURSAL PERU, pudiendo no obstante cada empresa designar un suplente para cada miembro designado. El nombramiento de los miembros del Comité y, en su caso, de sus suplentes, por las Empresas consorciadas tendrá, en principio,

ASOCIACIÓN RIE S.A.C.  
INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN  
N.O. JUAN GUILLERMO ROSQUERA  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACIÓN R&E S.A.C.  
GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

CIVIL GLOBAL SUCURSAL PERU  
HELENE CARACASCOSA HERNÁNDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

carácter indefinido, comunicándose entre ellas la identidad de los designados con anterioridad a la primera reunión de dicho Comité, o, en todo caso, en éste mismo, momento en el cual los concurrentes acreditarán a los demás su nombramiento; no obstante, podrán dichos miembros, o sus suplentes, ser sustituidos por sus respectivas empresas, bastando para ello la previa comunicación a las otras de la identidad del sustituido y de su sustituto antes del inicio de la reunión del Comité en que se haga efectivo el cambio.

Será misión del Comité de Gerencia, la Alta Dirección, Gestión y Gobierno del CONSORCIO.

Entre sus miembros el Comité designará un Presidente quien será Representante Legal Común del Consorcio, que dirigirá las reuniones del mismo, sin voto dirimente. También designará entre sus miembros un Secretario que levantará las actas de las sesiones que se celebren y que certificará con el visto bueno del Presidente. La designación del miembro del Comité de Gerencia que habrá de realizar las funciones de Presidente y Representante Legal Común del Consorcio estará reservada Al Ing. EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA identificado con DNI N° 32385946.

El Comité de Gerencia se reunirá en la forma periódica que por el mismo se acuerde, al menos una vez cada mes, y en las ocasiones extraordinarias que se consideren necesarias mediante la oportuna convocatoria formulada por el Representante Legal Común, mediante comunicación escrita, o fax nominal, o correo electrónico, a cada uno de los miembros del Comité con 5 (cinco) días hábiles de antelación al mismo, acompañando la Orden del Día correspondiente.

Asimismo, se reunirá a petición justificada, formulada por escrito por cualquiera de las Empresas miembro o por el Representante Legal Común, con 15 días calendarios de antelación, incluyendo en la petición el Orden del Día propuesto, en tal supuesto, recibida la solicitud, el Representante Legal Común procederá a la inmediata convocatoria del Comité, previa comunicación a las Empresas miembro del CONSORCIO (con indicación del Orden del Día) con una antelación mínima de 5 días calendarios a la fecha prevista para la celebración.

El Comité de Gerencia se entenderá válidamente constituido con el quórum de los consorciados asistentes llegue equivale al 50% (cincuenta



ING. JULIO G. VALLEJANO ROSQUERA  
GERENTE GENERAL  
CORPORACIÓN R&E S.A.C.  
CORPORACIÓN R&E S.A.C.  
GERENTE GENERAL

ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General  
CORPORACIÓN R&E S.A.C.  
CORPORACIÓN R&E S.A.C.

CH. VIN DE HUANTAR & LRL  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

FELIPE CARRASCO SHERMANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ





- c) Aclarar las dudas de interpretación de cualquier disposición de estos Estatutos que sea obligatoria para las Empresas miembro.
- d) Proponer los apoderamientos que se consideren necesarios, con indicación de las facultades que convengan.
- e) Aprobar el nombramiento y el cese de todo el personal técnico y administrativo que se juzgue necesario para el cumplimiento del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula siguiente.
- f) Autorizar la sustitución de las oficinas y las condiciones de su utilización, así como la clase y cantidad del espacio, del material y del personal situado en aquellas, en concordancia con las condiciones que imponga el propietario.
- g) Aprobar todos los informes, de la obra objeto del CONSORCIO.
- h) Aprobar y sancionar los programas de ejecución de la obra.
- i) Proponer las modificaciones del contrato de consorcio y sus ampliaciones y reformados, para que el contrato de consorcio sea modificado o ampliado por unanimidad de sus integrantes. Así también aprobar los presupuestos y sus modificatorias de cualquier contrato o subcontrato con proveedores relacionados con la ejecución de la obra.
- j) Evaluar y aprobar la gestión del Representante Legal Común, el balance y cuenta de resultados del CONSORCIO, así mismo aprobar la propuesta de distribución de utilidades.
- k) aprobar los presupuestos de todos los subcontratos, contratos de suministro y prestación de servicios y análogos relacionados con la ejecución de la obra
- l) Aprobar las compras de maquinaria.
- m) Aprobar el reembolso de los gastos realizados por cualquiera de las Empresas miembro, cuando la suma supere los S/5,000.00 cinco mil nuevos soles.
- n) Aprobar los posibles repartos de excedentes de fondos entre las Empresas consorciadas.

ING. OSCAR A. ARIS S.A.C.  
INGENIERO EN CONSTRUCCION  
ING. JULIO C. VILLAFRAGA MODOBERA  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION RBE S.A.C.


GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL


CH'VIN DE HUAMARCA I.R.L.  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General


CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
FELIPE CARRASCO S. HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL




- o) Establecer un programa de seguros en caso de ser necesario en virtud del contrato de obra.
- p) Estudiar, para su aprobación o no, la formalización de créditos o préstamos con entidades bancarias para atender las necesidades de financiación del CONSORCIO así como las garantías a prestar respecto de los mismos.
- q) Aprobar el plan de operaciones y el presupuesto de inversiones y costes de ejecución del contrato, así como las previsiones y peticiones de fondos y garantías.
- r) Aprobar los costes suplidos que pagará el CONSORCIO a las Empresas miembro por la prestación del personal, prestación de servicios, ejecución de trabajos, suministros y/o arrendamiento de maquinaria y equipos. (Son los costes que soporta el consorcio por el uso de personas u otras prestaciones de las empresas que lo conforman).
- s) Resolver los litigios que se puedan producir en el control y aceptación de las facturas de suplidos.
- t) Acordar la disolución y liquidación del CONSORCIO, aprobando el Balance Final del mismo.
- u) Cualquier otra que le sea atribuida conforme a los presentes Estatutos.

  
 ROBERTO CORDERO S.A.C.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 I.C.G. JULIO G. VILLALBA ROSQUERA  
 REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACIÓN R&E S.A.C.  
  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.  
  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
  
 FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

#### SÉPTIMA.- FORMA DE ADOPTAR ACUERDOS

Los acuerdos se tomarán por unanimidad.

De no lograrse la unanimidad se volverá a reunir el Comité dentro de las cuarentiocho (48) horas siguientes, y si continúa sin lograrse la unanimidad, los acuerdos se tomaran por mayoría simple en la misma sesión.

Finalmente con el objeto de llevar adelante la ejecución del CONSORCIO y la buena relación que debe existir entre los CONSORCIADOS, las empresas miembro acuerdan que en el caso de las operaciones bancarias y financieras, estas serán ejercidas por un representante designado por CHAVIN DE HUANTAR EIRL y otro representante de CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU, del tal manera que sea conjunta la delegación de

poderes para este fin, debiendo ser uno de ellos el Representante Legal Común.

**OCTAVA.- REPRESENTANTE LEGAL COMÚN: DESIGNACIÓN Y FACULTADES**

Los CONSORCIADOS designan como Representante Legal Común del CONSORCIO al Ing. EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA, identificado con DNI. N° 32385946, la cual queda designado y nombrado como tal, y es quien convocará a las juntas descritas en las cláusulas siguientes, y gozará de las demás facultades y atribuciones específicas de representación previstas en la presente cláusula, y que se detallan en los siguientes párrafos:

Precisándose que la designación y nombramiento del REPRESENTANTE LEGAL COMÚN del CONSORCIO, se efectúa por todo el plazo de ejecución y entrega de la obra, incluso hasta la liquidación final y entrega de la obra aunque hubiera expirado el plazo o la prórroga del presente contrato, y con la finalidad que pueda finiquitar todo aquello relacionado con la misma, con su avance, ejecución, liquidación y entrega, aunque no se hubiere acordado la prórroga o la renovación del plazo; asimismo hasta la liquidación del presente consorcio.

A su vez los CONSORCIADOS designan como sus representantes, quienes participaran en las sesiones o reuniones del Comité de Gerencia:

- CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERÚ, designa a:

(a) FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ, identificado con C.E. N° 000996117, domiciliado en calle GRIMALDO DEL SOLAR 219, MIRAFLORES - LIMA - LIMA, y

(b) JUAN LUIS DIEZ ELORZA, identificado con C.E. N° 001090221, domiciliado en calle GRIMALDO DEL SOLAR 219, MIRAFLORES, LIMA.

- CHAVIN DE HUANTAR EIRL designa a:

(a) EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA, identificado con DNI N° 32385946, domiciliado en Av. Próceres de la independencia N° 3634 San Juan de Lurigancho Lima - Lima;

(b) LUDWIG BENITO RETAMOZO MARTINEZ, identificado con

CORPORACION PERU S.A.C.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ING. JOSE ALBERTO MORALES  
 REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION PERU S.A.C.  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

CHAVIN DE HUANTAR EIRL  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU  
 FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

DNI N° 41297246, domiciliado en Pasaje José Miguel Ríos 127, distrito de la Victoria, Lima - Lima.

(c) RICHARD JAVIER TAPIA ROSAZZA, identificado DNI N° 32404167, con domicilio en Calle San Agustín 748 - Cercado-Lima.

El Representante Legal Común del CONSORCIO, ejercerá las siguientes facultades:

**A) OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES:**

1. Representar al CONSORCIO ante todo tipo de instituciones publicas o privadas, funcionarios y autoridades judiciales, civiles, municipales, ministerio de trabajo, fiscales, administrativas, constitucionales, tributarias y aduaneras (SUNAT), registros públicos (SUANRP), INDECOPI, Cámaras de comercio, Defensoría del Pueblo, comerciales, de trabajo, judiciales, policiales y militares, con las facultades de presentar toda clase de recursos y reclamaciones, así como desistirse de ellos, junto con las facultades generales de mandato, representación y especiales contenidas en los Artículos 74, 75 y 77 del Código Procesal Civil. Tramitar la obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC) ante la autoridad respectiva, así como la baja del mismo cuando así corresponda.

2. Representar al CONSORCIO con amplias facultades para:

2.1. Facultades de Representación en Procesos Judiciales y Procedimientos Administrativos:

2.1.1. Representar al CONSORCIO en toda clase de procesos y procedimientos en los que sea parte la sociedad, incluyendo pero sin limitarse a los judiciales, prejudiciales, policiales, fiscales, arbitrales y administrativos, y ante cualquier autoridad pública o privada, en cualquier materia sea civil, comercial, laboral, tributaria, aduanera, penal, constitucional, contencioso administrativa u otra, con las facultades generales y las facultades especiales contenidas en los Artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil requeridos para disponer de derechos sustantivos y en consecuencia interponer, modificar y/o ampliar demandas, denuncias,

MOD. DE LA LEY

CORPORACIÓN R & S S.A.C.  
SOCIETAT PROTECTORA

N.º. J. LIP. C. VILLAFRANCA ROSQUERA  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACIÓN R & S S.A.C.

GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

CHI VIN DE HUANTAR E.I.R.L.


ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General


CIVIS GLOBAL SUICURSAL PERÚ


FELIPE CARRASCO SHERMAN  
REPRESENTANTE LEGAL


recursos, reclamaciones y quejas, prestar instructiva, preventiva, testimoniales; presentar reconvencciones y contradicciones; deducir excepciones y/o defensas previas y contestarlas; contestar demandas, denuncias y reconvencciones; allanarse y/o reconocer la pretensión; dar reconocimiento personal; dar testimonio como parte o testigo; exhibir, reconocer y desconocer documentos; ofrecer, actuar y solicitar la actuación de toda clase de medios probatorios, pericias y cotejos así como oponerse, impugnar observar y/o tachar los ofrecidos por la parte contraria, documentos y testigos; interponer toda clase de medios impugnatorios y recursos de reposición, apelación, casación y nulidad en todas las instancias; solicitar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta; solicitar inspecciones judiciales; oponerse a la declaración de parte, a la exhibición, pericias e inspecciones judiciales; asistir e intervenir, como representante legal de la sociedad, en toda clase de audiencias, ya sean conciliatorias o de fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio, de pruebas y/o audiencias únicas, especiales y/o complementarias, inspecciones, diligencias y todo tipo de actos procesales, sean éstos de remate, administración de posesión, lanzamiento, embargos y/o saneamiento procesal; solicitar el desglose y entrega de certificados de depósitos judiciales, efectuar, delegados en virtud de una carta rogatoria encomendando acciones a ser adoptadas fuera de la jurisdicción del proceso; efectuar identificaciones; responder a interrogatorios; solicitar y aplicar toda clase de medidas preventivas y cautelares, inclusive innovativas y de no innovar y cualquier medida anticipada dentro y fuera del proceso, ampliarlas y/o modificarlas y/o sustituirlas y/o desistirse de las mismas; ofrecer y/o otorgar contra cautela (inclusive caución juratoria); nombrar órganos de auxilio judicial; prestar declaración de parte o testimonial. Asimismo, estará facultado para intervenir en procesos cualesquiera que afecten los intereses del consorcio, sea como intervención coadyuvante, litisconsorcial, excluyente principal, excluyente de propiedad de derecho preferente, o como sucesor



  
 D. VILLAFRAÑA MOSQUERA  
 GERENTE GENERAL  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 N.º 107 JULIO C. VILLAFRAÑA MOSQUERA  
 GERENTE GENERAL  
 REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACIÓN R&E S.A.C.  
  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

  
 CH. INDEHERITAR E.I.R.L.  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General

  
 CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERU  
 FELIPE CARRASCOZA HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

procesal; solicitar la intervención de un tercero para asegurar una pretensión futura o a manera de denuncia civil o de llamamiento posesorio.

Adicionalmente podrá, solicitar la acumulación y desacumulación de procesos; retirar consignaciones; ejecutar las sentencias y cobrar las costas y costos procesales; conciliar; transigir judicial o extrajudicialmente, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso; hacer abandono o renuncia de la instancia, solicitar la aclaración, corrección y/o consulta de las resoluciones judiciales; participar en todo tipo de diligencias y actos de remate y subasta, sean judiciales o extrajudiciales, estando facultados para presentar propuestas y pujas para adjudicarse al interior de los mismos bienes muebles o inmuebles, presentar, depositar, consignar, cobrar y retirar oblates y las sumas de dinero que correspondan al valor de la adjudicación, así como endosar cheques para la adjudicación de los bienes objeto de los mismos, ser adjudicatarios de la buena pro, tomar posesión de bienes, suscribir las actas correspondientes y pagar los honorarios del martillero; solicitar la inhibición y/o plantear la recusación de jueces, fiscales, vocales y/o magistrados en general; y practicar todos los demás actos que fuesen necesarios para la tramitación de los procesos y procedimientos, en general, realizar cualquier gestión que sea necesaria para defender los intereses de la sociedad en los mismos.

2.1.2. Participar e intervenir en procesos arbitrales, nacionales; así como intervenir en cualquier otro mecanismo alternativo de solución de controversias, tales como conciliación, mediación, transacción, entre otros, teniendo para tal efecto las mismas facultades conferidas en el numeral 2.1.1. precedente y quedando facultado además para conciliar judicial y extrajudicialmente, pudiendo disponer de las materias que se traten en las conciliaciones, transigir judicial y extrajudicialmente, presentar solicitudes de conciliación, asistir a las respectivas audiencias y practicar todos los

BO DE LINA  
CORPORACIÓN R&E S.A.C.  
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  
ING. JULIO G. VILLAFRANCA MOSQUERA  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACIÓN R&E S.A.C.  
GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL


CH'VIN DE HUANTAR, E.I.R.L.  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General


CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
FELIPE CARRASCOA HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL


demás actos que fueran necesarios, adoptar acuerdos conciliatorios; pudiendo asimismo someter a arbitraje, sea de derecho o de conciencia, las controversias en las que pueda verse involucrada la sociedad, suscribiendo el correspondiente convenio arbitral; designar al árbitro o árbitros y/o institución que hará las funciones de tribunal arbitral, presentar el formulario de sumisión correspondiente y/o pactar las reglas a las que se someterá el proceso correspondiente y/o disponer la ampliación del reglamento que tenga establecido la institución organizadora. Asimismo representar al CONSORCIO en procesos de conciliación y/o arbitraje, tanto Judicial como Extrajudicial, pudiendo disponer de los derechos que motiven dichos procedimientos y ante otras Entidades del Estado.-


2.2.- Cualquier otra decisión relevante para el funcionamiento del CONSORCIO, entendiéndose que lo referido a las cuentas Bancarias y los actos nombrados precedentemente, se trata de situaciones únicas y exclusivamente solidarias; de otro lado las deudas particulares de cada uno de los asociados sean pasadas presentes y futuras no afectan los recursos del CONSORCIO destinados a la ejecución de la presente obra existiendo, Intangibilidad, e inembargabilidad, ante cualquier circunstancia que no sea de caso exclusivo de LA OBRA.

3. Para tal Efecto el Representante Legal, podrá EJERCER, DELEGAR, REVOCAR, RENOVAR, SUSTITUIR Y REASUMIR TOTAL O PARCIALMENTE LAS FACULTADES Y PODERES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CLAÚSULA.
4. Dirigir las operaciones del CONSORCIO, siendo necesario, aprobación previa de los presupuestos del Comité de Gerencia, para celebrar contratos o subcontratos y actos comerciales propios del CONSORCIO.
5. Usar el sello del CONSORCIO, expedir la correspondencia, facsímil, correo electrónico, etc. Así como cuidar que la contabilidad este al día, haciendo las inspecciones del caso.

  
 JULIO C. VILLABLANCA MOSQUERA  
 GERENTE GENERAL  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

  
 EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General

  
 FELIPE CARRASCOZA HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

6. Dar cuenta al CONSORCIO de la marcha y estado de los negocios, así como de la recaudación, inversión, existencia de fondos que tenga a bien pedirle los CONSORCIADOS.
7. Presentar a tiempo oportuno a los CONSORCIADOS el estado financiero general y distribución de utilidades al momento de la liquidación y disolución definitiva del CONSORCIO.
8. Firmar los correspondientes contratos con la Entidad contratante, derivados del proceso de selección que motiva el presente contrato de consorcio.

Los CONSORCIADOS acuerdan que las facultades otorgadas al Representante Legal del CONSORCIO, podrán ser revocadas en el momento que los CONSORCIADOS lo decidan por acuerdo unánime.


Las facultades señaladas del Representante Legal señaladas en la presente cláusula, tienen el carácter enumerativo mas no limitativo por cuanto en general el Representante Legal se encuentra facultado para celebrar cuanto acto sea necesario a efectos de ejecutar las acciones que disponga el Comité de Gerencia del presente Consorcio, o cuando así lo exijan la naturaleza de las circunstancias.


#### NOVENA.- OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS:


El manejo económico-financiero del CONSORCIO así como la gestión de los pagos y uso de cuentas bancarias será con **firmas mancomunadas** entre el Sr. FELIPE CARRASCOSA HERNÁNDEZ, identificado con C.E. N° 000996117, por CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ, y el Sr. EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA, identificado con D.N.I. 32385946 de acuerdo con los poderes y atribuciones que se señalan a continuación:

1. Ordenar y efectuar depósitos a la vista, a plazos, de ahorros o custodia, tanto en moneda nacional como extranjera.
2. Abrir y cerrar cuentas corrientes, ordenar depósitos, solicitar avances, transferencias, girar con sobregiro en cuentas corrientes bancarias, así como otorgar cancelaciones y recibos en caso de sobregirarse en cuentas corrientes.
3. Retirar, vender, comprar valores.
4. Abrir, depositar, retirar y cancelar cuentas de ahorros.



  
 CORPORACIÓN R&E S.A.C.  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

  
 CH'IN DE HUAMARCA E.I.R.L.  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General

  
 CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
 FELIPE CARRASCOZA HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

5. Girar, endosar, y cobrar cheques, así como cualquier otro documento comprobatorio o de deuda.
6. Aceptar, reacceptar, girar, renovar, endosar, descontar, cobrar, afianzar, preñar, protestar letras de cambio, vales, pagarés, giros, certificados, pólizas, documentos de embarque de almacén, warrant, y cualquier otro documento mercantil, bancario o civil.
7. Descontar adelantos sobre letras de cambio, pagarés, y otros documentos comprobatorios de deuda.
8. Alquilar, operar y cerrar cajas de seguridad.
9. Dar en custodia objetos de valor, documentos o valores,
10. Contratar seguros y endosar pólizas.
11. Solicitar toda clase de créditos directos con o sin garantía prendaria o hipotecaria.
12. Solicitar préstamos hipotecarios y prendarios y en relación con ellos aceptar títulos valores, suscribir instrumentos hipotecarios y prendarios tanto en moneda nacional como extranjera.
13. Otorgar avales, fianzas y otras garantías.
14. Solicitar la emisión, aviso y negociación de cartas de crédito, a la vista o a plazo, de acuerdo con los usos internacionales, tanto en moneda extranjera como nacional.
15. Comprar, vender acciones, bonos, pagarés, certificados de depósito negociables o no negociables, tanto en moneda nacional como extranjera.
16. Ordenar pagos y cobros.
17. Celebrar contratos de compra venta y cualquier acto de enajenación y gravamen de bienes muebles o inmuebles, asimismo podrá celebrar contratos de arrendamiento, de arrendamiento financiero sobre bienes muebles e inmuebles, para lo cual esta facultado para firmar los contratos privados minutas y escrituras públicas que correspondan para tal fin.

18. Otorgar cancelaciones y recibos, cobrar y prestar otorgando y firmando los contratos privados, minutas y escrituras públicas que correspondan.

19. Indistintamente cualquiera de los nombrados podrá Solicitar información respecto del estado y los movimientos de las cuentas que mantenga el CONSORCIO con las entidades bancarias que trabaje.

Los CONSORCIADOS acuerdan, no obstante lo anterior, que las facultades establecidas en los numerales 2, 4, 5, 6, 10, 14, 16, y 18, de esta cláusula Novena, PODRAN SER EJERCIDAS INDIVIDUALMENTE por el Representante Legal Común hasta por la suma de S/. 5,000.00 (cinco mil nuevos soles).

Los CONSORCIADOS asimismo acuerdan, que la facultad establecida en numeral 19 de esta cláusula Novena podrá ser ejercido individualmente por el Sr. FELIPE CARRASCOSA HERNÁNDEZ o el Sr. EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA.

#### DÉCIMA.- RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE RESPONSABILIDAD

Cada uno de los CONSORCIADOS se obliga a aportar al negocio todos los recursos y garantías necesarias para el desarrollo de la ejecución de la obra objeto del CONTRATO y del CONSORCIO de acuerdo a su porcentaje de participación establecido en la Cláusula Tercera, asumiendo responsabilidades en la misma proporción, excepto en lo recogido en la Cláusula Décimo Cuarta.

Se fija por las partes un fondo operativo de TREINTA MIL NUEVOS SOLES, que será aportado por las empresas CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ (40%), y CHAVIN DE HUANTAR EIRL (60%) Para hacer frente a los gastos iniciales del CONSORCIO en la ejecución de la obra, cada una de las empresas se obliga a ingresar en la cuenta de ahorro que a tal efecto se apertura y en el plazo de quince días contados desde el acuerdo del Comité de Gerencia en que así se le exija, su parte correspondiente en el fondo operativo fijado en el presente artículo.

El CONSORCIO se registrará por un sistema de ingresos y gastos.

En todo caso, la política del CONSORCIO deberá atender a la autofinanciación a través de los medios habituales (fondo operativo,

CORPORACIÓN R&E S.A.C.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 INA. JULIO C. VILLALBA MOSQUERA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

CHAVIN DE HUANTAR EIRL  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
 FELIPE CARRASCOSA HERNÁNDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



Gerencia, con un preaviso mínimo de quince días calendarios. Salvo acuerdo en contrario entre las Empresas miembro, los ingresos de fondos, así como los reembolsos de éstos o de excedentes de tesorería, se harán siempre simultáneamente por las partes en la proporción fijada en la Cláusula Tercera de este contrato.

Para el cálculo de los ingresos que deban efectuar las respectivas empresas, se descontarán las cantidades de que sean acreedores, por facturas de servicios conformadas y vencidas, extinguiendo por compensación su crédito.

Los pagos de las facturas de servicios, una vez conformadas, se efectuarán dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de las mismas, salvo acuerdo distinto en el contrato o subcontrato respectivo. En caso de que la factura contuviera partidas erróneas o improcedentes se abonarán solamente las que sean correctas incorporándose, en su caso, dicha corrección, una vez realizada, a otra factura mensual. La conformidad tendrá lugar dentro de los 15 días siguientes a la fecha de recepción. En el supuesto de que el comité de Gerencia no aprobara por unanimidad los costes suplidos, se tomaran los acuerdos por mayoría simple. De no estar conforme el afectado podrá acudir al arbitraje, y si el laudo arbitral determinase ser conformes los suplidos, éstos devengarán el interés señalado en el párrafo tercero de este artículo, desde los quince días siguientes a la presentación de la factura.

En caso de que durante el período de duración del CONSORCIO existan disponibilidades en su tesorería, una vez abonadas a las Empresas miembro las cantidades que se les adeuden por el CONSORCIO por servicios, personal, suministros, alquileres, etc., estas disponibilidades deberán ser empleadas para el reembolso de los pagos y adelantos efectuados por las Empresas.

Después del reembolso total de esas sumas, y en caso de excedente de disponibilidad sobre las necesidades de tesorería de las obras, el CONSORCIO, mediante acuerdo unánime del Comité de Gerencia, podrá hacer las inversiones financieras que considere oportunas o proceder a su abono a los miembros del CONSORCIO como anticipo a cuenta. Las inversiones serán gestionadas por el propio Consorcio con el asesoramiento de las Empresas miembro.

COOPERATIVA ARIS S.A.C.  
INSTRUMENTO DE CONSTRUCCION  
N.º JULIO C. VILLAFRANCA MOSQUERA  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION R&E S.A.C.  
GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

CHAVIN DE HUANTAR EIRL  
ING. DOMINGO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

EMISORAS SUCURSAL PERU  
FELIPE CARRASCOZA HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



- d) La mano de obra de los maquinistas, gastos de mantenimiento, pequeñas reparaciones, piezas de desgaste y las averías derivadas de una mala utilización de la maquinaria, serán a cargo del CONSORCIO. El transporte de la maquinaria será por cuenta del CONSORCIO.

Las Empresas que aporten en propiedad máquinas al CONSORCIO asesorarán a éste acerca de los repuestos que deban mantener para el debido funcionamiento de las mismas y podrán aportar directamente, a precios no superiores a los de mercado, aquellos repuestos que no sean con cargo al alquiler. Las empresas se harán cargo al final del alquiler, a los precios de entrada en almacén, de aquellos repuestos que previamente hubiesen enviado o que se hubiesen comprado por parte del CONSORCIO para las máquinas de su propiedad.

El CONSORCIO se compromete a conservar la maquinaria en buen estado, durante el período de su utilización en obra.


Al término de las obras, la maquinaria, equipos, material, etc. propiedad del CONSORCIO, serán repartidos entre las empresas signatarias, de común acuerdo y a precios reales y conforme a la Cláusula Décima Octava.


11.2- EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.-


Las prestaciones objeto del CONTRATO serán ejecutadas por el CONSORCIO en alguna de las siguientes modalidades:


- a) Directamente por el CONSORCIO, con personal y medios propios de las Empresas o alquilados, y con el coste que resulte de su ejecución.
- b) Mediante distribución de prestaciones para ser ejecutadas por las Empresas que forman el CONSORCIO actuando individualmente con sus medios. En este caso, la Empresa que realice las distintas prestaciones objeto del CONTRATO deberá ejecutarlas a un precio fijo unitario que será acordado entre la Empresa ejecutante y el Comité de Gerencia.

Si más de una Empresa mostrara interés en la ejecución de alguna prestación, se adjudicará a la oferta más baja que se realice por las mismas. Estas ofertas se presentarán ante el Comité de Gerencia en sobre cerrado, en lugar y fecha que se indique previamente. La apertura de sobre se realizara en el mismo acto de la presentación y se procederá inmediatamente a su adjudicación por el Comité. En todo caso se

  
 CORPORACIÓN JUAN R. E. S.A.C.  
 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  
 AG. JULIO C. VILLAFRANCA ROSQUERA  
 GERENTE GENERAL  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CORPORACIÓN JUAN R. E. S.A.C.  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

  
 CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.  
 ING. EMILIANO FRUJILLO LUNA  
 Gerente General

  
 CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
 FELIPE CARRASCOSA HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



procurará en la medida de lo posible, que las contrataciones de las Empresas sean proporcionales al porcentaje de participación, salvo que existan circunstancias especiales apreciadas por el Comité de Gerencia.

En cualquier caso, los contratos adjudicados a Empresas consorciadas se registrarán por el contrato que sea aprobado previamente a la adjudicación por el Comité de Gerencia.

No podrá realizarse, bajo esta modalidad, prestación alguna que no le haya sido fijado previamente el precio unitario de ejecución. Salvo que fueran sumas menores a diez mil nuevos soles.

c) Mediante cesión de prestaciones objeto del CONSORCIO, subcontrato o destajo con terceros, a precios unitarios de ejecución con contrato o pedido formal del CONSORCIO al subcontratista o destajista.

La distribución de las prestaciones objeto del CONSORCIO a ejecutar, según cada modalidad, los plazos y períodos de ejecución, serán fijados por el Comité de Gerencia.

Las Empresas que forman el CONSORCIO tendrán derecho a tanteo frente a terceros, para la ejecución de las prestaciones objeto del CONSORCIO que se pretenden destajar o subcontratar, en igualdad de condiciones, técnicas, económicas y financieras.


### 11.3.- PROCEDIMIENTO DE COMPRAS.-


La determinación del procedimiento de compras será decidida por el Comité de Gerencia en función de las propuestas de cada una de las Empresas consorciadas, recogándose por escrito las determinaciones del sistema por el que se opte, en todo caso el procedimiento por el que se opte será de obligatorio cumplimiento para proceder a la firma de todas las facturas.


### DÉCIMO SEGUNDA.- PERSONAL Y OTROS SERVICIOS


El personal del CONSORCIO estará constituido por el procedente de las Empresas consorciadas de la misma, así como el contratado directamente por el CONSORCIO.

El Comité de Gerencia decidirá sobre la imputación de los gastos que se originen para el CONSORCIO por el traslado y estancia del personal de las Empresas miembro, siendo de cuenta de las mismas los devengos por

  
 CORPORACION VERIS S.A.C.  
 NORMA Y CONSTRUCCION  
 ING. JULIO C. VILLAFRANCA ROSQUERA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CORPORACION R&E S.A.C.  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

  
 CH. JUAN DE HUANTAPE I.R.L.  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General

  
 CIVIC GLOBAL SUCURSAL PERU  
 FELIPE CARRASCO SHERMANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL







Los beneficios serán determinados provisionalmente en el momento en que el Comité lo acuerde, y sólo serán definitivos cuando se haya procedido a la liquidación total del contrato, y de las obligaciones derivadas del mismo, tanto ante la Entidad concedente como ante terceros; hasta entonces toda cantidad que hubiera sido distribuida será considerada anticipo o entrega a cuenta, quedando la Empresa respectiva obligada a las devoluciones a que hubiere lugar.

INFORMACIÓN S.A.C.  
 GERENTE GENERAL  
 N.º 3000  
 FELIPE CARRASCO HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

#### DÉCIMO CUARTA.- RÉGIMEN TRIBUTARIO

Los CONSORCIADOS convienen que, para los efectos tributarios, el CONTRATO deberá tener contabilidad independiente, acordando designar como OPERADOR TRIBUTARIO al propio CONSORCIO SAN JOSE , con RUC pendiente de asignar por la SUNAT tras la presentación del Contrato de Consorcio, en caso de ser adjudicatarios con la Buena Pro, debidamente representado por su Representante Legal el Sr. EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA , para todos los fines que demande la ejecución de LA OBRA contratada, siendo por consiguiente el encargado de llevar la contabilidad y realizar toda la tributación correspondiente de acuerdo a ley. Asimismo, el representante legal tiene la facultad para gestionar y obtener ante la SUNAT el Registro Único de Contribuyente y tramitación de facturas y otros comprobantes autorizados por la SUNAT.

INCORPORACIÓN R&E S.A.C.  
 GERENTE GENERAL  
 GUERRERO CALLE ROXANA

#### DÉCIMO QUINTA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN / CONCURSO DE ACREEDORES DE ALGUNA EMPRESA MIEMBRO DEL CONSORCIO.-

##### 1.-Causas de extinción:

El CONSORCIO podrá extinguirse por las siguientes causas:

- a).- Por la finalización de la obra para la cual fue constituido.
- b).- Por la resolución del contrato de obra objeto del CONSORCIO, o la imposibilidad física o jurídica de la ejecución de la obra que constituye su objeto.
- c).- Por el mutuo acuerdo de las empresas miembro ó por la no obtención de la buena pro materia de la constitución del consorcio.
- d).- Asimismo y a petición de las demás empresas asociadas podrá extinguirse el CONSORCIO, por el incumplimiento por cualquiera de las empresas miembros del CONSORCIO, de las cláusulas previstas en este

CI... DE HUANTAR...  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
 FELIPE CARRASCO HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



contrato de consorcio y particularmente, la falta de aportación de dinero, equipos u otros bienes, garantías, o reembolso de anticipos percibidos a que estuviesen obligadas las empresas, cuando siendo requeridas para ello dejaren de hacerlo.

## 2.-Concurso de acreedores:

Si cualquiera de las Empresas miembro que conforman el CONSORCIO pretendiese declararse en situación de concurso voluntario, concurso ordinario, preventivo, disolución y liquidación, insolvencia o cualquier forma de cesación de pagos, deberá comunicarlo de forma fehaciente e inmediata a las demás Empresas miembro y al propio CONSORCIO, en todo caso, con al menos dos meses de antelación, a la presentación de la solicitud.

En tal caso, la Empresa miembro en la que concurran tales presupuestos se compromete a suscribir con el CONSORCIO los contratos y/o documentos que sean pertinentes en orden a:

- a) Preservar la estabilidad y viabilidad del CONSORCIO.
- b) Preservar el cumplimiento íntegro del CONTRATO con el cliente.
- c) Mantener la responsabilidad mancomunada frente al Cliente.
- d) Mantener los derechos y obligaciones entre las Empresas miembro, así como entre éstas y el propio CONSORCIO.
- e) Establecer las garantías o compensaciones de créditos y deudas en favor del CONSORCIO como consecuencia de la responsabilidad mancomunada a que se refiere la Cláusula 9 del presente contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONSORCIO se reserva, en todo caso, la facultad de excluir o separar a la Empresa miembro en la que concurran los presupuestos objetivos del concurso, así como el derecho de suscribir con ésta los contratos y/o documentos a que se refiere el párrafo anterior.


En el caso de que frente a cualquiera de las Empresas miembro que conforman el CONSORCIO se presentase por cualquier acreedor o persona legitimada, solicitud de Concurso Necesario, dicha Empresa miembro estará obligada:

INVERSIÓN EN ARIS S.A.C.  
CORPORACIÓN  
ING. JULIO G. NÚÑEZ ROSA MOSQUERA  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACIÓN R&E S.A.C.  
GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA DE HUANTAR S.A.R.L.  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente General

OWIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
FELIPE CARRASCO SAHERMANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
 CORPORACION R & E S.A.S.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ING. JULIO G. VILLARBANCA MOSQUERA  
 GERENTE GENERAL

- a) A comunicarlo de forma fehaciente y de forma inmediata a las demás Empresas miembro y al CONSORCIO, una vez que tenga conocimiento de ello y, en todo caso, desde que haya sido emplazada para el trámite de audiencia.
- b) A suscribir los contratos y documentos a que se refiere el apartado anterior.

Asimismo, el CONSORCIO se reserva la facultad de excluir o separar de la misma a la Empresa miembro afectada por la solicitud de Concurso necesario en los mismos términos dispuestos en los párrafos anteriores.

**DÉCIMO SEXTA.- EFECTOS DE LA EXTINCIÓN**

Cuando el CONSORCIO se extinga por las causas indicadas en la letra d) del apartado primero de la Cláusula Décimo quinta, o alguna de las Empresas consorciadas estuviera incurso en dicha causa sin mediar extinción del CONSORCIO, la(s) empresa(s) incumplidora(s) perderá(n) el derecho a cualquier posible beneficio, y responderá(n) de la parte proporcional de pérdida que se produjera en el CONSORCIO, tanto de la originada hasta el momento en que se produjo el hecho de la exclusión como hasta la total extinción del CONSORCIO.

En estos mismos casos, la(s) empresa(s) que hubiera(n) asumido los derechos y obligaciones del CONSORCIO hasta el momento de dicha extinción continuará(n) realizando todos los cobros que correspondan al CONSORCIO y, solo una vez concluida o resuelta la obra y liquidado el CONSORCIO, se abonará a la(s) empresa(s) excluida(s) una cantidad igual a las aportaciones hechas por ésta(s), deducida la parte proporcional de pérdida que le(s) corresponda conforme a lo expuesto más arriba. En el caso de que la pérdida que haya de cargarse a la(s) empresa(s) excluida(s) exceda de su aportación al CONSORCIO, la(s) misma(s) deberá(n) abonar en el plazo de 30 días el exceso a la(s) empresa(s) que haya(n) continuado en la ejecución de la obra hasta el final de la misma, que será(n) la(s) única(s) que tendrá(n) derecho a los beneficios, si los hubieren desde el momento en que quede(n) excluida(s) la(s) empresa(s) incumplidora(s).

Asimismo, en tales casos se producirán los siguientes efectos adicionales, de modo automático:

CORPORACION R & E S.A.S.  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
 FELIPE CARRASCOA HERMANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



a).- La(s) otra(s) empresa(s) podrán excluir a la(s) incursa en causa de extinción de toda participación futura en el CONSORCIO, haciéndose cargo de su participación;

b).- Continuar la(s) otra(s) empresa(s) la ejecución de los trabajos sola(s) o con nuevas Empresas a su elección, vinculando sus decisiones a la(s) incumplidora(s);

c).- Devolución inmediata por la(s) incumplidora/as de cualquier fondo por ella(s) retirado del CONSORCIO en concepto de anticipo o beneficio provisional;


d).- La Empresa(s) incursa(s) en causa de incumplimiento quedará(n) excluida(s) del Comité de Gerencia, dicho Comité continuará en adelante con los representantes de las empresas que continúen en el consorcio y de ser el caso con de la(s) otra(s) empresa(s) nuevas asociada(s), quedando al tiempo obligada(s) a concurrir al otorgamiento de cuantos documentos públicos o privados resulte menester suscribir para el funcionamiento del CONSORCIO, incluido el cese o nombramiento del Representante Legal, aún cuando la toma de decisiones al respecto corresponda en exclusiva a la(s) empresa(s) cumplidora(s);


e).- Los cobros a realizar desde el incumplimiento se realizarán por la(s) empresa(s) no incumplidora(s);

f).- En todo caso la(s) incumplidora(s) seguirá(n) respondiendo solidariamente frente a terceros y a la Propiedad de las obras de todas las obligaciones y responsabilidades derivadas de la ejecución del contrato y de las obras y trabajos de él derivados, y de cualesquiera otras actuaciones del CONSORCIO.

Además la(s) empresa(s) en situación de incumplimiento no podrá(n), retirar la maquinaria y elementos que hubiera aportado al común hasta que la(s) otra(s) empresa(s) declare(n) a su discreción no ser ya necesaria su utilización en obra.

No se considerará que incumple la empresa que en el momento de tener que efectuar una aportación, tenga créditos contra el CONSORCIO por cuantía superior a la aportación a realizar, y si estos créditos no alcanzaran el total del importe de dicha aportación, se le considera que incumple solamente por la diferencia.

  
 CORPORACIÓN ARIS S.A.C.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ING. JULIO G. VILLAFRAÑA MOSQUERA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CORPORACIÓN R&E S.A.C.  
 GERENTE GENERAL  
 GUERRERO CALLE ROXANA

  
 CH'VIN DE HUANTAR B.I.R.L.  
 GERENTE G.  
 INGENIERO TRUJILLO LUNA  
 GERENTE G.  
 CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
 FELIPE CARRASCOZA HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



miembro o vendidos a terceros, para lo cual se procederá del modo siguiente:

1.-El Presidente comunicará al Comité de Gerencia, y sus miembros a las Empresas respectivas, la relación de los bienes para los que va a finalizar el empleo y que, por lo tanto, ya no serán necesarios para los fines del CONSORCIO, y asimismo al valor residual contable por el que figuran en el Balance del CONSORCIO. Al recibir cada relación de bienes se convocará una reunión de los representantes que cada Empresa designe, que deberá celebrarse en un plazo no superior a un mes, para tratar y acordar su adjudicación a los socios.

2.-Antes de la reunión, los técnicos de los socios podrán comprobar el estado de los bienes, y la Jefatura de la Obra facilitará todo el historial preciso de su empleo en obra, ya que los bienes se entregarán al adjudicatario en el estado en que se encuentren al finalizar el trabajo en el CONSORCIO y sin realizarles reparación o acondicionamiento final alguno.

3.-En la fecha fijada para la reunión del Comité, cada socio entregará ineludiblemente en primer lugar y bajo sobre cerrado, al Secretario nombrado al efecto, un escrito manifestando que desea le sean adjudicados o no los bienes de que se trate, por el valor que especifica. Abiertos los escritos de los socios podrá ocurrir:

a).-Que haya un solo socio interesado, al cual le será adjudicado el bien por el valor que se ha especificado.

b).-Que haya más de un socio interesado, en cuyo caso se adjudicará al mejor postor.

c).-Que no haya ningún socio interesado. En este caso, los bienes serán retenidos por el CONSORCIO y se ofrecerán en venta a terceros.

4.-Si transcurridos cuatro meses desde el final de los trabajos del CONSORCIO aún quedaran bienes en el mismo que no han sido adjudicados o vendidos, el Presidente formará lotes con estos bienes, con un valor residual similar para cada lote.

Dentro de los dos meses siguientes en una reunión del Comité, se adjudicarán a cada socio por el valor residual y mediante sorteo, lotes de bienes en proporción a su participación en el CONSORCIO.



PROCESION ARIS S.A.C.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ROSQUERA  
 N.º JULIO  
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO R & E S.A.C.

GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.

AGENCIARIO TRUJILLO LUNA  
 Gerente G. n.º 31

CIVIL - DE LA SUCCURSAL PERÚ

FELIPE CARRASCO SHERVAREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

5.- A los socios que resulten adjudicatarios de los bienes, y al retirarlos, les será cargado el valor de adjudicación correspondiente contra su cuenta corriente de resultados, suplidos y aportaciones. Como estas cuentas deberán estar en todo momento equilibradas entre los socios, si fuera preciso para mantener el equilibrio, el adjudicatario deberá realizar la aportación que corresponda.

Cada socio deberá retirar del CONSORCIO los bienes a él adjudicados en un plazo no superior a un mes a partir de la adjudicación. Sin embargo, si por conveniencia de la Empresa adjudicataria, se prolongara el plazo de permanencia por encima del citado, se le pasará el cargo correspondiente, si procede, por estadía y el CONSORCIO no será responsable de su vigilancia.

Los gastos de traslado de los bienes a su nuevo destino serán a cargo de la Empresa adjudicataria si bien el CONSORCIO prestará en lo posible, sin cargo, la asistencia precisa para la carga y acondicionamiento necesarios para el transporte.


6.- Con independencia de la aplicación del procedimiento establecido anteriormente a todos los bienes en general, para aquellas piezas únicas y de gran valor que por ser equipos singulares no permitieran la formación de lotes, si no hay socios interesados en su adjudicación, el Comité de Gerencia, antes de su adquisición por el CONSORCIO, acordará el procedimiento para su liquidación en cada caso.


#### DECIMO NOVENA.- ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN.


Serán de cargo del REPRESENTANTE LEGAL, tras la disolución, y sus costos deberán ser aprobados por el Comité de Gerencia, los gastos que se originen respecto a la ubicación y atención del archivo de la documentación del CONSORCIO, una vez disuelto, hasta que, de acuerdo con la normativa legal aplicable al efecto, sea posible su destrucción e incluso antes de la citada disolución, en el caso del traslado a una de las Empresas de la documentación o trabajos pendientes por o con motivo del levantamiento de las instalaciones propias del CONSORCIO. Tales servicios pueden comprender el personal más idóneo que les atienda.

#### VIGESIMA.- RÉGIMEN LEGAL

El CONTRATO se rige por lo establecido en las cláusulas anteriores y en todo lo no previsto, por el Código Civil.

  
 JUAN CARLOS ARIS S.A.C.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 VICE JULIO S. VILLAFRANCA MOSQUERA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 GERENTE GENERAL

  
 EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General

  
 CNMS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
 FELIPE CARRASCOA HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

Para todos los puntos regulados o no del presente contrato de consorcio y que tenga que ver con su aplicación y ejecución del acto jurídico emanado del consorcio, se aplicara en forma supletoria lo dispuesto por la Ley general de Sociedades en sus normas sobre contratos asociativos y en especial sobre el consorcio, además de las normas generales contractuales del código civil del Perú.

VIGESIMO PRIMERA. - DOMICILIO DE LAS EMPRESAS DEL CONSORCIO

Para todos los efectos del presente CONTRATO, las partes fijan sus domicilios en los señalados en la parte introductoria de este documento, lugar donde se dirigirá las comunicaciones o notificaciones, sean judiciales o extrajudiciales a que hubiere lugar.

VIGESIMO SEGUNDA. - CONVENIO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL Y/O ARBITRAJE

Cualquier eventual conflicto que sugiera o pudiera surgir como consecuencia de la interpretación y/o ejecución del presente contrato de consorcio, será resuelto mediante Conciliación Extrajudicial de modo optativo, y por Arbitraje, el cual se realizará de conformidad con los reglamentos de conciliación y arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima sometiéndose las partes a sus respectivos estatutos para la conformación del tribunal arbitral así como la conducción del proceso que se genere, a costo del interesado.

VIGESIMO TERCERA. - DE LA SUMISIÓN JUDICIAL.

Para la solución de alguna controversia que deba discutirse en los tribunales del poder judicial, al margen de lo dispuesto en la anterior clausula, los consorciados se someten expresamente a la competencia de los jueces y tribunales del Perú provincia y departamento de Lima, con renuncia expresa a su propio fuero y domicilio, en caso de ser distintos.

VIGESIMO CUARTA. - VALIDEZ DEL CONTRATO POR CLAUSULA NULA.

Si en el presente contrato existe alguna disposición que sea o devenga en inexistente o nula por misterio de la ley, ésta no implicará una afectación de las demás disposiciones.

REPÚBLICA DEL PERÚ  
CORPORACIÓN ARIS S.A.C.  
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS  
R.O. JULIO GARCÍA HERNÁNDEZ  
R.O. JULIO GARCÍA HERNÁNDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACIÓN R&E S.A.S.  
GUERRERO CALLE ROXANA  
GERENTE GENERAL

IN DE HUANTAR BARRIL  
ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
Gerente G. / sra

CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
FELIPE CARRASCOA HERNÁNDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL





**VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.**

El presente contrato únicamente podrá ser modificado parcial o íntegramente a través del concurso de todos los suscribientes. La solicitud de modificación deberá ser comunicada a LOS CONSORCIADOS por escrito dando un plazo no menor de 8 días hábiles, salvo acuerdo unánime que deba obviarse dicho plazo.

**VIGESIMA SEXTA.- DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.**

De producirse incumplimiento en las obligaciones pactadas en el presente contrato, la parte afectada por dicho incumplimiento podrá resolver el presente contrato, sin que la otra parte pueda exigir alguna compensación.


La comunicación sobre la decisión de resolver el contrato, deberá ser realizada vía carta notarial con cinco (5) días antes de que se produzca la resolución de contrato.

En señal de conformidad, las partes suscriben el contrato en Lima, a los Tres días (03) de Diciembre de 2014.

CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.  
  
 ING. EMILIANO TRUJILLO LUNA  
 Gerente General



EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA  
 DNI N° 32385946  
 Representante Legal  
 CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L.


CIVIS GLOBAL SUCURSAL PERÚ  
  
 FELIPE CARRASCOSA HERNÁNDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL





FELIPE CARRASCOSA HERNÁNDEZ  
 C.E. 000996117  
 Representante Legal  
 CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU

CORPORACION ARIS S.A.C.  
 INGENIERIA Y CONSTRUCCION  
  
 G. JULIO C. VILAFRANCA MOSQUERA  
 GERENTE GENERAL  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 JULIO CESAR VILAFRANCA MOSQUERA  
 DNI N° 09753183  
 Representante Legal  
 CORPORACION ARIS S.A.C.



CORPORACIÓN R&E S.A.C.  
  
 GUERRERO CALLE ROXANA  
 ROXANA GUERRERO CALLE  
 DNI N° 09794994  
 Representante Legal  
 CORPORACION R&E S.A.C.



**CERTIFICACIÓN AL DORSO** 

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN AL ANVERSO  
 CORRESPONDEN A DON EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA IDENTIFICADO  
 CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 32385946 QUIEN  
 ACTUA EN REPRESENTACION DE CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L. SEGUN  
 FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA NUMERO 01545353 DEL REGISTRO  
 DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA Y A DON FELIPE CARRASCO  
 HERNANDEZ IDENTIFICADO CON CARNE DE EXTRANJERIA NUMERO  
 000996117 QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE CIVIS GLOBAL -  
 SUCURSAL PERU SEGUN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA NUMERO  
 13012604 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. DE LO QUE DOY  
 FE. =====


SE LEGALIZAN LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO.  
 LIMA, 03 DE DICIEMBRE DE 2014. =====



PC  
**JORGE F. ZULETA GUINET**  
**NOTARIO DE LIMA**

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN AL ANVERSO  
 CORRESPONDEN A DON JULIO CESAR VILLAFRANCA MOSQUERA  
 IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO  
 09753183 QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE CORPORACION ARIS  
 S.A.C. SEGUN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA NUMERO 12758699  
 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA Y A DOÑA ROXANA  
 GUERRERO CALLE IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE  
 IDENTIDAD NUMERO 09794994 QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE  
 CORPORACION R&E S.A.C. SEGUN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA  
 NUMERO 12052729 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA DE LO  
 QUE DOY FE. =====

SE LEGALIZAN LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO  
 LIMA, 04 DE DICIEMBRE DE 2014. =====



PC  
**JORGE F. ZULETA GUINET**  
**NOTARIO DE LIMA**

**Acta de  
entrega de  
terreno  
(Copia)**

# ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

110

**OBRA** : "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque"

**PROCESO DE SELECCIÓN** : Adjudicación de Menor Cuantía N° 38-2014-FONDEPES derivada de la Licitación Pública N° 004-2014-FONDEPES

**UBICACIÓN** : Distrito : San José  
Provincia : Lambayeque  
Región : Lambayeque

**CONTRATISTA** : Consorcio San José

**SUPERVISION** : Consorcio San Francisco

**VALOR REFERENCIAL** : S/. 33'504,650.56

**MONTO CONTRATADO** : S/. 32'457,630.22

**PLAZO DE EJECUCION** : 540 días calendario

**MODALIDAD DE EJECUCION** : A PRECIOS UNITARIOS

**RESIDENTE DE OBRA** : Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros


**SUPERVISOR DE OBRA** : Ing. Gonzalo Francisco Caceras Valdivia

**COORDINADOR DE OBRA** : Ing. Gabino Abelardo López Rolando

Siendo la 13:00 horas del día miércoles 14 de enero del 2015, se reunieron en el lugar de la Obra a efectos de realizar la Entrega de Terreno donde se ejecutara la Obra: "Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque", en representación del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES: el Coordinador de Obra Ing. Gabino Abelardo López Rolando con CIP N° 78834; en representación de la Empresa Contratista CONSORCIO SAN JOSE el Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros con CIP N° 22858; además en calidad de veedores invitados: el Sr. Macario Fiestas Fiestas Alcalde de la Municipalidad Distrital de San José y representantes de la población de San José.

Luego de reconocer el terreno donde se ejecutara la obra, se verifica que existe acceso libre al mismo para la circulación de vehículos y maquinaria del Contratista; el representante de la Empresa Contratista CONSORCIO SAN JOSE recibe el terreno sin observaciones.


En señal de conformidad los presentes suscriben la presente acta en un original y cuatro (04) copias.



---

Gabino A. López Rolando  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 78834

Ing. Gabino Abelardo López Rolando  
Coordinador de Obra  
FONDEPES



---

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

Ing. Carlos Enrique Quiroz Cisneros  
Residente de Obra  
CONSORCIO SAN JOSE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ  
LABORATORIO  


---

Macario Fiestas Fiestas  
ALCALDE

Sr. Macario Fiestas Fiestas  
Alcalde de la Municipalidad Distrital de San José  
VEEDOR INVITADO

**Constancia de No  
estar inhabilitado  
para Contratar  
con el Estado**

**(Copia)**



**PERÚ**

**Ministerio  
de Economía y Finanzas**

107

Trámite Nº. 2014-06129640-LIMA - 19/12/2014 11:23:03

**CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO**

**Nº 066919 - 2014**

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

**CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L**

**NO** se encuentra **Inhabilitado** para contratar con el Estado al 19/12/2014

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

**Entidad :** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

**Proceso de Selección :** ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA. Nº : 38-2014-FONDEPES

**Modalidad :** PROCEDIMIENTO CLASICO

**Monto :** S/. 32,457,630.22

**Items :** 1

Lima a los diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil catorce

**Observaciones :**

NINGUNA

***Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:  
www.osce.gob.pe***

***La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el  
SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)***





106

Trámite N°. 2014-06126601-LIMA - 18/12/2014 17:28:55

**CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO**

**N° 066799 - 2014**

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

**CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU**

**NO** se encuentra Inhabilitado para contratar con el Estado al 18/12/2014

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

Entidad : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Proceso de Selección : ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA. N° : 38-2014-FONDEPES

Modalidad : PROCEDIMIENTO CLASICO

Monto : S/. 32,457,630.22

Items : 1

Lima a los dieciocho días del mes de Diciembre del dos mil catorce

Observaciones :

NINGUNA

**Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:  
[www.osce.gob.pe](http://www.osce.gob.pe)**

**La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el  
SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)**







PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

105

Trámite N°. 2014-06129635-LIMA - 19/12/2014 11:21:43

**CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON  
EL ESTADO**

N° 066915 - 2014

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

**CORPORACION ARIS S.A.C.****NO se encuentra Inhabilitado para contratar con el Estado al 19/12/2014**

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

**Entidad :** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**Proceso de Selección :** ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA. N° : 38-2014-FONDEPES**Modalidad :** PROCEDIMIENTO CLASICO**Monto :** S/. 32,457,630.22**Items :** 1

Lima a los diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil catorce

**Observaciones :**

NINGUNA

***Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:  
[www.osce.gob.pe](http://www.osce.gob.pe)******La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el  
SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)***



PERU

Ministerio  
de Economía y Finanzas

104

Trámite N°. 2014-06129644-LIMA - 19/12/2014 11:24:29

## CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

N° 066920 - 2014

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

**CORPORACION R&E S.A.C.**

**NO** se encuentra **Inhabilitado** para contratar con el Estado al 19/12/2014

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

**Entidad :** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

**Proceso de Selección :** ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA. N° : 38-2014-FONDEPES

**Modalidad :** PROCEDIMIENTO CLASICO

**Monto :** S/. 32,457,630.22

**Items :** 1

Lima a los diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil catorce

**Observaciones :**

NINGUNA

**Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:**  
[www.osce.gob.pe](http://www.osce.gob.pe)

**La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)**



# **Constancia de Capacidad de libre contratación**

**(Copia)**



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Trámite Nº. 2014-06129625-LIMA - 19/12/2014 11:18:36

**CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN**

Nº 012600 - 2014

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L, con:

Registro Nro:	08058	Cap Máx Cont.:	S/. 125,000,000.00
Vigencia:	28/02/2015	Dec. Record Obra Nº:	2014-5986356-LIMA (Fecha: 11/12/2014)

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :

**S/. 87,137,000.00**

(OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL Y 00/100Nuevos Soles )

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Proceso de Selección : ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 38-2014-FONDEPES

Modalidad : PROCEDIMIENTO CLASICO

Monto : S/. 32,457,630.22 Participación: 58%

Items : 1

Obra : Construccion de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de San Jose, distrito de San Jose, provincia Lambayeque, Region Lamabayeque.

Lima a los diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil catorce

Observaciones :

NINGUNA

**Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:**  
**[www.osce.gob.pe](http://www.osce.gob.pe)**

**La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el**  
**SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)**



156  
101

PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Trámite N°. 2014-06126595-LIMA - 18/12/2014 17:25:16

**CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN**

N° 012580 - 2014

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

CIVIS GLOBAL - SUCURSAL PERU, con:

Registro Nro: 66429 Cap Máx Cont.: S/. 456,733,000.00  
Vigencia: 12/10/2015 Dec. Record Obra N°: 2014-5980148-LIMA (Fecha: 08/12/2014)

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :

**S/. 443,051,000.00**

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL Y 00/100Nuevos Soles )

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
Proceso de Selección: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES  
Modalidad: PROCEDIMIENTO CLASICO  
Monto: S/. 32,457,630.22 Participación: 40%  
Items: 1  
Obra: Ejecucion de la obra: Construccion de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de San Jose, distrito de San Jose, provincia Lambayeque, Region Lamabayeque.

Lima a los dieciocho días del mes de Diciembre del dos mil catorce

Observaciones :

NINGUNA

**Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:**  
**[www.osce.gob.pe](http://www.osce.gob.pe)**

**La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales).**





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

100

Trámite N°. 2014-06129619-LIMA - 19/12/2014 11:17:04

**CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN****N° 012598 - 2014**

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

**CORPORACION ARIS S.A.C., con:**

<b>Registro Nro:</b>	22494	<b>Cap Máx Cont.:</b>	S/. 2,125,460.00
<b>Vigencia:</b>	09/08/2015	<b>Dec. Record Obra N°:</b>	2014-5986504-LIMA (Fecha: 11/12/2014)

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :

**S/. 997,233.00**

(NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES Y 00/100Nuevos Soles )

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

<b>Entidad:</b>	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		
<b>Proceso de Selección :</b>	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES		
<b>Modalidad :</b>	PROCEDIMIENTO CLASICO		
<b>Monto :</b>	S/. 32,457,630.22	<b>Participación:</b>	1%
<b>Items :</b>	1		
<b>Obra :</b>	Construccion de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de San Jose, distrito de San Jose, provincia Lambayeque, Region Lamabayeque.		

Lima a los diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil catorce

**Observaciones :**

NINGUNA

**Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:**  
**[www.osce.gob.pe](http://www.osce.gob.pe)**

**La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el**  
**SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)**





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Trámite N°. 2014-06129631-LIMA - 19/12/2014 11:20:09

**CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN****N° 012601 - 2014**

La SUB DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN REGISTRAL certifica que:

**CORPORACION R&E S.A.C., con:****Registro Nro:** 15743**Cap Máx Cont.:** S/. 2,771,960.00**Vigencia:** 08/09/2015**Dec. Record Obra N°:** 2014-5993087-LIMA (Fecha: 15/12/2014)

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :

**S/. 1,518,660.00**

(UN MILLON QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 00/100Nuevos Soles )

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

**Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**Proceso de Selección :** ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 38-2014-FONDEPES**Modalidad :** PROCEDIMIENTO CLASICO**Monto :** S/. 32,457,630,22 **Participación:** 1%**Ítems :** 1**Obra :** Construccion de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de San Jose, distrito de San Jose, provincia Lambayeque, Region Lambayeque.

Lima a los diecinueve días del mes de Diciembre del dos mil catorce

**Observaciones :**

NINGUNA

**Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:**  
**[www.osce.gob.pe](http://www.osce.gob.pe)****La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)**

# **Póliza de seguro complementario por trabajo de riesgo y salud**



MP/2019/3867906

**CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO**

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Pensiones No. 7011510200116, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/02/2019 hasta el 28/02/2019, con las coberturas de Invalidez, Sobrevivencia y Sépelio según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

**ASEGURADO(S)**

1 DNI	08606885	ESPINOZA ESCALANTE EDDY SOLANO
2 DNI	41220259	HUAMAN PORLLES JHONNY ALAN
3 DNI	48483417	NAVARRO TELLO ROJER JOB
4 DNI	10425980	QUIROZ CISNEROS CARLOS ENRIQUE

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

02/02/2019 12:10:33 pm  
CONSORCIO SAN JOSE



ISAAC RAMIREZ MOLINA  
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

**La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).**

**NOTA:** La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

## SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIONES

NÚMERO DE PÓLIZA : 7011510200116

RECIBO : 102158978

## CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE  
 RUC : 20600000439  
 Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,  
 Actividad : 500004 - ACONDICIONAMEN. DE EDIFICIOS  
 Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia : 01/02/2019      Vencimiento : 01/02/2020  
 Inicio de Vigencia Aplicación : 01/02/2019      Vencimiento de Aplicación : 28/02/2019  
 Forma de Pago : MENSUAL      Último día de Pago : 12/02/2019  
 Moneda : SOLES  
 Fecha de Emisión : 02/02/2019

## IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
EMPLEADOS ALTO RIESGO	4	26100.00	0.65	169.65

Prima Neta :	169.65
Der.Emis. :	5.09
Interés :	0.00
IGV :	31.46
<b>Prima Total :</b>	<b>206.20</b>

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

**Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL**

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

095

**MAPFRE**
 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
 AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20418896915**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00151965

FECHA EMISION 08/02/2019

CANCELADO 08/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*TIPO DOCUMENTO *RUC*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina Iera Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA : 7011510200116

MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/02/2019	28/02/2019		1412-Peralta Fontis Jose Luis	Escardo
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 102158978</i>				
<i>Prima Comercial</i>				174.74
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				31.46
<i>Importe Total</i>				S/ *****206.20
<i>Son : Doscientos Seis Y 20/100 Soles</i>				

 SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
 EMITIDO POR: INTBBVA 08:54:18

ORIGINAL

RS 007-99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16

**MAPFRE**
 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
 AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20418896915**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00151965

FECHA EMISION 08/02/2019

CANCELADO 08/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*TIPO DOCUMENTO *RUC*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina Iera Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA : 7011510200116

MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :


DESDE	VIGENCIA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/02/2019	28/02/2019		1412-Peralta Fontis Jose Luis	Escardo
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 102158978</i>				
<i>Prima Comercial</i>				174.74
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				31.46
<i>Importe Total</i>				S/ *****206.20
<i>Son : Doscientos Seis Y 20/100 Soles</i>				

 SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
 EMITIDO POR: INTBBVA 08:54:18

 COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGV  
 COPIA

RS 007-99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16

MP/2019/3863005



### CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud No. 7021800031751, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/02/2019 hasta el 28/02/2019, con las coberturas de Salud por Trabajo de Riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

#### ASEGURADO(S)

1 DNI	48300296	ACOSTA GALAN AUGUSTO ALEXANDER
2 DNI	46549805	ALVAREZ SOTO JORGE WILTON
3 DNI	62637707	AREVALO VERGARAY JOSE YOWER
4 DNI	76801219	CALUA CHILON JOSE EDILBERTO
5 DNI	46709771	CAMACHO ROJAS CENIN
6 DNI	42589975	CORONEL RAMIREZ JOSE WILSON
7 DNI	46569170	IPANAQUE ACOSTA LUIS HUMBERTO
8 DNI	41067672	LLONTOP ACOSTA JUAN MANUEL
9 DNI	42344204	LOZANO CARRASCO EVER
10 DNI	44743366	LOZANO CARRASCO JOSE NEIRO
11 DNI	06241422	MUÑOZ CONDORI LEONIDAS VIDAL
12 DNI	44214246	RODAS MORI DANNY GABRIEL
13 DNI	10515950	ROJAS QUISPE ROMULO
14 DNI	47509013	RUBIO HUARCAYA JULIO CESAR
15 DNI	45406505	SAIRE QUILCA LUIS ANGEL
16 DNI	76763583	SANCHEZ GALAN AURORA LISBET
17 DNI	42543130	SOLAR HUAROTO JERRY EDGAR
18 DNI	45854197	TACO TORRÉS LUIS ENRIQUE
19 DNI	45412780	TASILLA CHUGNAS NOIVER
20 DNI	70803088	TERRONES ALDAMAS LUIS ALBERTO
21 DNI	45790258	TERRONES HERRERA MARCO ANTONIO



Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

31/01/2019 06:15:30 pm

CONSORCIO SAN JOSE

**NOTA:** La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

MP/2019/3863005


 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

ISAAC RAMIREZ MOLINA  
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).



**NOTA:** La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.



**SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD**

NÚMERO DE PÓLIZA : 7021800031751

RECIBO : 102088747

**CONDICIONES PARTICULARES**

**Contratante** : CONSORCIO SAN JOSE  
**RUC** : 20600000439  
**Dirección Principal** : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,  
**Actividad** : 500004 - ACONDICIONAMIENTOS DE EDIFICIOS  
**Colectivo Asegurado** : CONSORCIO SAN JOSE

<b>Inicio de Vigencia</b>	: 19/03/2018	<b>Vencimiento</b>	: 01/04/2019
<b>Inicio de Vigencia Aplicación</b>	: 01/02/2019	<b>Vencimiento de Aplicación</b>	: 28/02/2019
<b>Forma de Pago</b>	: MENSUAL	<b>Último día de Pago</b>	: 11/02/2019
<b>Moneda</b>	: SOLES		
<b>Fecha de Emisión</b>	: 31/01/2019		

**IMPORTE DE LA DECLARACIÓN**

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
TRABAJADORES ALTO RIESGO	21	41029.72	0.65	266.69

<b>Prima Neta :</b>	266.69
<b>Der.Emis. :</b>	0.00
<b>Interés :</b>	0.00
<b>IGV :</b>	48.00
<b>Prima Total :</b>	314.69

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

**Instrucciones de pago:**

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos. (Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

**Bancos:** BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

**MAPFRE**
 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD  
 AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20517182673**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00090111

FECHA EMISION 08/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*ASEGURADO : *A Nivel Nacional*CONTRATO : 7021800031751 MONEDA : *Soles*

CANCELADO 08/02/2019

TIPO DOCUMENTO *RUC*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	ASESOR	OFICINA COMERCIAL
01/02/2019	28/02/2019		1412-Peralta Fontis Jose Luis	Escardo
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ct Cancelacion Recibo 102088747</i>				
<i>Prima Comercial</i>				266.69
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				48.00
<i>Importe Total</i>				S/ *****314.69
<i>Son : Trescientos Catorce Y 69/100 Soles</i>				

 SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
 EMITIDO POR: INTBBVA 08:47:21

ORIGINAL

RS 007-99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16

**MAPFRE**
 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD  
 AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20517182673**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00090111

FECHA EMISION 08/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*ASEGURADO : *A Nivel Nacional*CONTRATO : 7021800031751 MONEDA : *Soles*

CANCELADO 08/02/2019

TIPO DOCUMENTO *RUC*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	ASESOR	OFICINA COMERCIAL
01/02/2019	28/02/2019		1412-Peralta Fontis Jose Luis	Escardo
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ct Cancelacion Recibo 102088747</i>				
<i>Prima Comercial</i>				266.69
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				48.00
<i>Importe Total</i>				S/ *****314.69
<i>Son : Trescientos Catorce Y 69/100 Soles</i>				

 SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
 EMITIDO POR: INTBBVA 08:47:21

 COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGV  
 COPIA


**BBVA** Continental

CONSORCIO SAN JOSE

2019/02/08 05:59:31

**Pago de Instituciones****SU OPERACIÓN HA SIDO REALIZADA**

Número de Operación	371750-0
Operación	Pago de Instituciones
Usuario(s) que autoriza(n)	VANESSA ZAMUDIO LOARTE
Número de Cuenta de Cargo	0011-0962-0100002931
Nombre de la Entidad	MAPFRE SOLES
DNI/RUC/C. EXTRANJERIA	20600000439
Nombre	CONSORCIO SAN JOSE
Monto a cargar	520.89 SOLES
Monto Cargado	520.89 SOLES
Fecha / Hora de 1ra Firma	08/02/2019 - 16:00:41

**Detalle de Pagos**

CONCEPTO DE PAGO	Fec.Vcmto	Moneda	Importe
T03RE102088747	2019-02-01	SOLES	314.69
T02RE102158978	2019-02-01	SOLES	206.20

Estimado Cliente, su operación ha sido efectuada. Por favor, tome nota del Número de Operación.



MP/2019/3867831

**CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO**

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Pensiones No. 7011510200116, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/02/2019 hasta el 28/02/2019, con las coberturas de Invalidez, Supervivencia y Sepelio según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

**ASEGURADO(S)**

1 DNI	48300296	ACOSTA GALAN AUGUSTO ALEXANDER
2 DNI	46549805	ALVAREZ SOTO JORGE WILTON
3 DNI	62637707	AREVALO VERGARAY JOSE YOWER
4 DNI	76801219	CALUA CHILON JOSE EDILBERTO
5 DNI	46709771	CAMAACHU ROJAS CENIN
6 DNI	42589975	CORONEL RAMIREZ JOSE WILSON
7 DNI	46569170	IPANAQUE ACOSTA LUIS HUMBERTO
8 DNI	41067672	LLONTOPI ACOSTA JUAN MANUEL
9 DNI	42344204	LOZANO CARRASCO EVER
10 DNI	44743366	LOZANO CARRASCO JOSE NEIRO
11 DNI	06241422	MUÑOZ CONDORI LEONIDAS VIDAL
12 DNI	44214246	RODAS MORI DANNY GABRIEL
13 DNI	10515950	ROJAS QUISPE ROMULO
14 DNI	47509013	RUBIO HUARCAYA JULIO CESAR
15 DNI	45406505	SAIRE QUILCA LUIS ANGEL
16 DNI	76763583	SANCHEZ GALAN AURORA LISBET
17 DNI	42543130	SOLAR HUAROTO JERRY EDGAR
18 DNI	45854197	TACO TORRES LUIS ENRIQUE
19 DNI	45412780	TASILLA CHUGNAS NOIVER
20 DNI	70803088	TERRONES ALDAMAS LUIS ALBERTO
21 DNI	45790258	TERRONES HERRERA MARCO ANTONIO


Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

02/02/2019 11:09:16 am

SUSAN GONZALES PACHECO

**NOTA:** La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

MP/2019/3867831



ISAAC RAMIREZ MOLINA  
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

**La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).**



**NOTA:** La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

## SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIONES

NÚMERO DE PÓLIZA : 7011510200116

RECIBO : 102157371

## CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE  
 RUC : 20600000439  
 Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,  
 Actividad : 500004 - ACONDICIONAMEN. DE EDIFICIOS  
 Colectivo Asegurado : A NIVEL NACIONAL

Inicio de Vigencia	: 01/02/2019	Vencimiento	: 01/02/2020
Inicio de Vigencia Aplicación	: 01/02/2019	Vencimiento de Aplicación	: 28/02/2019
Forma de Pago	: MENSUAL	Último día de Pago	: 12/02/2019
Moneda	: SOLES		
Fecha de Emisión	: 02/02/2019		

## IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
EMPLEADOS ALTC RIESGO	21	41029.72	0.65	266.69

Prima Neta :	266.69
Der.Emis. :	8.00
Interés :	0.00
IGV :	49.44
<b>Prima Total :</b>	<b>324.13</b>

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado, directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

**MAPFRE**
 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
 AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - T.L.F.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20418896915**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00151964

FECHA EMISION 08/02/2019

CANCELADO 08/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*TIPO DOCUMENTO *RUC*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina Iera Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA : 7011510200116

MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/02/2019	28/02/2019		1412-Peralta Fontis Jose Luis	Escardo
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ct Cancelacion Recibo 102157371</i>				
<i>Prima Comercial</i>				274.69
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				49.44
<i>Importe Total</i>				S/ *****324.13
<i>Son : Trescientos Veinticuatro Y 13/100 Soles</i>				

 SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
 EMITIDO POR: INTBBVA 08:53:11

ORIGINAL

RS 007- 99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16

**MAPFRE**
 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
 AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - T.L.F.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20418896915**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00151964

FECHA EMISION 08/02/2019

CANCELADO 08/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*TIPO DOCUMENTO *RUC*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina Iera Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA : 7011510200116

MONEDA : *Soles*


POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/02/2019	28/02/2019		1412-Peralta Fontis Jose Luis	Escardo
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ct Cancelacion Recibo 102157371</i>				
<i>Prima Comercial</i>				274.69
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				49.44
<i>Importe Total</i>				S/ *****324.13
<i>Son : Trescientos Veinticuatro Y 13/100 Soles</i>				

 SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
 EMITIDO POR: INTBBVA 08:53:11

 COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGV  
 COPIA

MP/2019/3863037

**CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO**

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud No. 7021800031751; a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/02/2019 hasta el 28/02/2019, con las coberturas de Salud por Trabajo de Riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

**ASEGURADO(S)**

1 DNI	08606885	ESPINOZA ESCALANTE EDDY SOLANO
2 DNI	41220259	HUAMAN PORLLES JHONNY ALAN
3 DNI	48483417	NAVARRO TELLO ROJER JOB
4 DNI	10425980	QUIROZ CISNEROS CARLOS ENRIQUE

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.




31/01/2019 06:19:55 pm  
CONSORCIO SAN JOSE

.....  
ISAAC RAMIREZ MOLINA  
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

**La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).**

**NOTA:** La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.



## SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD

NÚMERO DE PÓLIZA : 7021800031751

RECIBO : 102090097

## CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSÉ  
 RUC : 20600000439  
 Dirección.Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB-LA MOLINA 1ERA ET,  
 Actividad : 500004 - ACONDICIONAMIEN. DE EDIFICIOS  
 Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia : 19/03/2018                      Vencimiento : 01/04/2019  
 Inicio de Vigencia Aplicación : 01/02/2019                      Vencimiento de Aplicación : 28/02/2019  
 Forma de Pago : MENSUAL                      Último día de Pago : 11/02/2019  
 Moneda : SOLES  
 Fecha de Emisión : 31/01/2019

## IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
TRABAJADORES ALTO RIESGO	4	26100.00	0.65	169.65

Prima Neta : 169.65  
 Der.Emis. : 0.00  
 Interés : 0.00  
 IGV : 30.54  
**Prima Total : 200.19**

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

**MAPFRE**

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20517182673**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00090110

FECHA EMISION 08/02/2019

CANCELADO 08/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*TIPO DOCUMENTO *RUC*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *A Nivel Nacional*

CODIGO POSTAL : 12

CONTRATO : 7021800031751

MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	ASESOR	OFICINA COMERCIAL
01/02/2019	28/02/2019		<i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i>	<i>Escardo</i>
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 102090097</i>				
<i>Prima Comercial</i>				<i>169.65</i>
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				<i>30.54</i>
<i>Importe Total</i>				<i>S/ *****200.19</i>
<i>Son : Doscientos Y 19/100 Soles</i>				

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 08:49:29

ORIGINAL

RS 007- 99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16

**MAPFRE**

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20517182673**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00090110

FECHA EMISION 08/02/2019

CANCELADO 08/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*TIPO DOCUMENTO *RUC*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *A Nivel Nacional*

CODIGO POSTAL : 12

CONTRATO : 7021800031751

MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	ASESOR	OFICINA COMERCIAL
01/02/2019	28/02/2019		<i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i>	<i>Escardo</i>
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 102090097</i>				
<i>Prima Comercial</i>				<i>169.65</i>
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				<i>30.54</i>
<i>Importe Total</i>				<i>S/ *****200.19</i>
<i>Son : Doscientos Y 19/100 Soles</i>				

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 08:49:29

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGV  
COPIA

**BBVA Continental**

CONSORCIO SAN JOSE

2019/02/08 05:57:54

**Pago de Instituciones****SU OPERACIÓN HA SIDO REALIZADA**

<b>Número de Operación</b>	371046-0
<b>Operación</b>	Pago de Instituciones
<b>Usuario(s) que autoriza(n)</b>	VANESSA ZAMUDIO LOARTE
<b>Número de Cuenta de Cargo</b>	0011-0962-0100002931
<b>Nombre de la Entidad</b>	MAPFRE SOLES
<b>DNI/RUC/C. EXTRANJERIA</b>	20600000439
<b>Nombre</b>	CONSORCIO SAN JOSE
<b>Monto a cargar</b>	524.32 SOLES
<b>Monto Cargado</b>	524.32 SOLES
<b>Fecha / Hora de 1ra Firma</b>	08/02/2019 - 15:58:55

**Detalle de Pagos**

<b>CONCEPTO DE PAGO</b>	<b>Fec.Vcmto</b>	<b>Moneda</b>	<b>Importe</b>
T03RE102090097	2019-02-01	SOLES	200.19
T02RE102157371	2019-02-01	SOLES	324.13

Estimado Cliente, su operación ha sido efectuada. Por favor, tome nota del Número de Operación.



MP/2019/3867915

**CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO**

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Pensiones No. 7011510200116, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/02/2019 hasta el 28/02/2019, con las coberturas de Invalidez, Supervivencia y Sepelio según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

**ASEGURADO(S)**

1 DNI	07277987	RAMIREZ AGUILAR FIDEL JUVENAL
2 DNI	41297246	RETAMOZO MARTINEZ LUDWIG BENITO
3 DNI	32404167	TAPIA ROSAZZA RICHARD JAVIER

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

02/02/2019 12:13:40 pm  
. CONSORCIO SAN JOSE



ISAAC RAMIREZ MOLINA  
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

**La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).**

**NOTA:** La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

## SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIONES

NÚMERO DE PÓLIZA : 7011510200116

RECIBO : 102158989

## CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE  
 RUC : 2060000439  
 Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET.  
 Actividad : 500004 - ACONDICIONAMEN. DE EDIFICIOS  
 Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia	: 01/02/2019	Vencimiento	: 01/02/2020
Inicio de Vigencia Aplicación	: 01/02/2019	Vencimiento de Aplicación	: 28/02/2019
Forma de Pago	: MENSUAL	Último día de Pago	: 12/02/2019
Moneda	: SOLES		
Fecha de Emisión	: 02/02/2019		

## IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
EMPLEADOS ALTO RIESGO	3	4000.00	0.65	26.00

Prima Neta :	26.00
Der.Emis. :	0.78
Interés :	0.00
IGV :	4.82
<b>Prima Total :</b>	<b>31.60</b>

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

**Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL**

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.



# MAPFRE

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

RUC 20418896915 <sup>079</sup>  
COMPROBANTE DE PAGO  
0050 - 00151963

FECHA EMISION 08/02/2019

CANCELADO 08/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

TIPO DOCUMENTO : RUC

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA : 7011510200116

MONEDA : Soles

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/02/2019	28/02/2019		1412-Peralta Fontis Jose Luis	Escardo
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 102158989</i>				
<i>Prima Comercial</i>				26.78
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				4.82
<i>Importe Total</i>				S/ *****31.60
<i>Son : Treinta Y Un Y 60/100 Soles</i>				

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 08:52:07

ORIGINAL

RS 007-99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16



# MAPFRE

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

RUC 20418896915  
COMPROBANTE DE PAGO  
0050 - 00151963

FECHA EMISION 08/02/2019

CANCELADO 08/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

TIPO DOCUMENTO : RUC

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA : 7011510200116

MONEDA : Soles

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/02/2019	28/02/2019		1412-Peralta Fontis Jose Luis	Escardo
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 102158989</i>				
<i>Prima Comercial</i>				26.78
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				4.82
<i>Importe Total</i>				S/ *****31.60
<i>Son : Treinta Y Un Y 60/100 Soles</i>				

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 08:52:07

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGV  
COPIA

RS 007-99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16

MP/2019/3863077

**CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO**

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía; bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud No. 7021800031751, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/02/2019 hasta el 28/02/2019, con las coberturas de Salud por Trabajo de Riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

**ASEGURADO(S)**

1 DNI	07277987	RAMIREZ AGUILAR FIDEL JUVENAL
2 DNI	41297246	RETAMOZO MARTINEZ LUDWIG BENITO
3 DNI	32404167	TAPIA ROSAZZA RICHARD JAVIER

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.


31/01/2019 06:25:38 pm  
, CONSORCIO SAN JOSE



ISAAC RAMIREZ MOLINA  
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

**La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).**

**NOTA:** La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.



## SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD

NÚMERO DE PÓLIZA : 7021800031751

RECIBO : 102091915

## CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE  
 RUC : 20600000439  
 Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,  
 Actividad : 500004 - ACONDICIONAMEN. DE EDIFICIOS  
 Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia	: 19/03/2018	Vencimiento	: 01/04/2019
Inicio de Vigencia Aplicación	: 01/02/2019	Vencimiento de Aplicación	: 28/02/2019
Forma de Pago	: MENSUAL	Último día de Pago	: 11/02/2019
Moneda	: SOLES		
Fecha de Emisión	: 31/01/2019		

## IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
TRABAJADORES ALTO RIESGO	3	4000.00	0.65	26.00

Prima Neta :	26.00
Der.Emis. :	0.00
Interés :	0.00
IGV :	4.68
<b>Prima Total :</b>	<b>30.68</b>

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.



# MAPFRE

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLFS. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20517182673**  
**COMPROBANTE DE PAGO**  
0050 - 00090109

076

FECHA EMISION 08/02/2019

CANCELADO 08/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

TIPO DOCUMENTO *RUC*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *A Nivel Nacional*

CODIGO POSTAL : 12

CONTRATO : 7021800031751

MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	ASESOR	OFICINA COMERCIAL
01/02/2019	28/02/2019	1412-Peralta Fontis Jose Luis		Escardo
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 102091915</i>				
<i>Prima Comercial</i>				26.00
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				4.68
<i>Importe Total</i>				S/ *****30.68
<i>Son : Treinta Y 68/100 Soles</i>				

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 08:50:29

ORIGINAL

RS 007-99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16



# MAPFRE

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLFS. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20517182673**  
**COMPROBANTE DE PAGO**  
0050 - 00090109

FECHA EMISION 08/02/2019

CANCELADO 08/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

TIPO DOCUMENTO *RUC*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *A Nivel Nacional*

CODIGO POSTAL : 12

CONTRATO : 7021800031751

MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	ASESOR	OFICINA COMERCIAL
01/02/2019	28/02/2019	1412-Peralta Fontis Jose Luis		Escardo
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 102091915</i>				
<i>Prima Comercial</i>				26.00
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				4.68
<i>Importe Total</i>				S/ *****30.68
<i>Son : Treinta Y 68/100 Soles</i>				

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 08:50:29

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGV  
COPIA

RS 007-99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16

**BBVA Continental**

CONSORCIO SAN JOSE

2019/02/08 05:55:59

**Pago de Instituciones****SU OPERACIÓN HA SIDO REALIZADA**

<b>Número de Operación</b>	370448-0
<b>Operación</b>	Pago de Instituciones
<b>Usuario(s) que autoriza(n)</b>	VANESSA ZAMUDIO LOARTE
<b>Número de Cuenta de Cargo</b>	0011-0962-0100002931
<b>Nombre de la Entidad</b>	MAPFRE SOLES
<b>DNI/RUC/C. EXTRANJERIA</b>	20600000439
<b>Nombre</b>	CONSORCIO SAN JOSE
<b>Monto a cargar</b>	62.28 SOLES
<b>Monto Cargado</b>	62.28 SOLES
<b>Fecha / Hora de 1ra Firma</b>	08/02/2019 - 15:57:18

**Detalle de Pagos**

CONCEPTO DE PAGO	Fec.Vcmto	Moneda	Importe
T03RE102091915	2019-02-01	SOLES	30.68
T02RE102158989	2019-02-01	SOLES	31.60

Estimado Cliente, su operación ha sido efectuada. Por favor, tome nota del Número de Operación.

MP/2019/3886087

**CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO**

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **CONSORCIO VIAL VES** bajo la Póliza de Pensiones No. 7011800119287 y contrato de Salud No. 7021800133647, con vigencia del 01/02/2019 hasta el 28/02/2019, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

**ASEGURADO(S)**  
1 DNI 40709180 CALSIN APAZA D ENILSON GEOVANNI

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

13/02/2019 05:54:45 pm  
HARO JESUS, YANINA



.....  
ISAAC RAMIREZ MOLINA  
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

**La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).**

**NOTA:** La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.



## SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD

NÚMERO DE PÓLIZA : 7021800031751

RECIBO : 102469871

## CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE  
 RUC : 20600000439  
 Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,  
 Actividad : 500004 - ACONDICIONAMEN. DE EDIFICIOS  
 Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia	: 19/03/2018	Vencimiento	: 01/04/2019
Inicio de Vigencia Aplicación	: 01/02/2019	Vencimiento de Aplicación	: 28/02/2019
Forma de Pago	: MENSUAL	Último día de Pago	: 24/02/2019
Moneda	: SOLES		
Fecha de Emisión	: 14/02/2019		

## IMPORTE DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
TRABAJADORES ALTO RIESGO	1	1000.00	0.65	6.50

Prima Neta :	20.00
Der.Emis. :	0.00
Interés :	0.00
IGV :	3.60
<b>Prima Total :</b>	<b>23.60</b>

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos.(Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

**Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVA CONTINENTAL**

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.

**MAPFRE**
 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD  
 AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20517182673**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00091133

FECHA EMISION 15/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina Iera Etapa La Molina*ASEGURADO : *A Nivel Nacional*

CONTRATO : 7021800031751

MONEDA : *Soles*

CANCELADO 15/02/2019

TIPO DOCUMENTO *RUC*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	ASESOR	OFICINA COMERCIAL
01/02/2019	28/02/2019	1412-Peralta Fontis Jose Luis		Escardo
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 102469871</i>				
<i>Prima Comercial</i>				20.00
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				3.60
<i>Importe Total</i>				S/ *****23.60
<i>Son : Veintitres Y 60/100 Soles</i>				

 SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
 EMITIDO POR: INTBBVA 08:27:28

ORIGINAL

RS 007- 99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16

**MAPFRE**
 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD  
 AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20517182673**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

0050 - 00091133

FECHA EMISION 15/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina Iera Etapa La Molina*ASEGURADO : *A Nivel Nacional*

CONTRATO : 7021800031751

MONEDA : *Soles*

CANCELADO 15/02/2019

TIPO DOCUMENTO *RUC*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

CODIGO POSTAL : 12

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	ASESOR	OFICINA COMERCIAL
01/02/2019	28/02/2019	1412-Peralta Fontis Jose Luis		Escardo
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 102469871</i>				
<i>Prima Comercial</i>				20.00
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				3.60
<i>Importe Total</i>				S/ *****23.60
<i>Son : Veintitres Y 60/100 Soles</i>				

 SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
 EMITIDO POR: INTBBVA 08:27:28

 COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGY  
 COPIA

**CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO**

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, bajo la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Pensiones No. 7011510200116, a nombre de la empresa **CONSORCIO SAN JOSE**, con vigencia del 01/02/2019 hasta el 28/02/2019, con las coberturas de Invalidez, Supervivencia y Sepelio según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

**ASEGURADO(S)**

1 DNI 06712579 FUENTES QUIÑONEZ JULIO OSWALDO

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

14/02/2019 09:43:17 am  
, CONSORCIO SAN JOSE



.....  
ISAAC RAMIREZ MOLINA  
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

**La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).**

**NOTA:** La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

## SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIONES

NÚMERO DE PÓLIZA : 7011510200116

RECIBO : 102469610

## CONDICIONES PARTICULARES

Contratante : CONSORCIO SAN JOSE  
 RUC : 20600000439  
 Dirección Principal : DEL CORREGIDOR NRO 414 URB LA MOLINA 1ERA ET,  
 Actividad : 500004 - ACONDICIONAMIEN. DE EDIFICIOS  
 Colectivo Asegurado : CONSORCIO SAN JOSE

Inicio de Vigencia : 01/02/2019      Vencimiento : 01/02/2020  
 Inicio de Vigencia Aplicación : 01/02/2019      Vencimiento de Aplicación : 28/02/2019  
 Forma de Pago : MENSUAL      Último día de Pago : 24/02/2019  
 Moneda : SOLES  
 Fecha de Emisión : 14/02/2019

## IMPORTES DE LA DECLARACIÓN

Categoría	Nro.Aseg.	Monto Base	Tasa	Prima Resultante
EMPLEADOS ALTO RIESGO	1	1000.00	0.65	6.50

Prima Neta : 20.00  
 Der.Emis. : 0.60  
 Interés : 0.00  
 IGV : 3.71  
**Prima Total : 24.31**

El presente documento no constituye un comprobante de pago.

Instrucciones de pago:

Todas las primas correspondientes a esta póliza deberán pagarse por adelantado directamente en nuestras oficinas o en las agencias de los bancos. (Pago en bancos al día siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP, SCOTIABANK, INTERBANK, BBVÁ CONTINENTAL

Para efectuar el pago en ventanilla del banco, el Cliente deberá indicar que va a realizar un pago a la Cuenta "MAPFRE SOLES" y brindar su número de RUC y Recibo como contratante de la Póliza.



# MAPFRE

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

069

**RUC 20418896915**  
**COMPROBANTE DE PAGO**  
0050 - 00153729

FECHA EMISION 15/02/2019

CANCELADO 15/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

TIPO DOCUMENTO *RUC*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL. : 12

POLIZA : 7011510200116

MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/02/2019	28/02/2019		<i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i>	<i>Escardo</i>
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 102469610</i>				
<i>Prima Comercial</i>				20.60
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				3.71
<i>Importe Total</i>				S/ *****24.31
<i>Son : Veinticuatro Y 31/100 Soles</i>				

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 12:40:16

ORIGINAL

RS 007- 99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16



# MAPFRE

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
AV. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161 FAX 213-9144

**RUC 20418896915**  
**COMPROBANTE DE PAGO**  
0050 - 00153729

FECHA EMISION 15/02/2019

CANCELADO 15/02/2019

CONTRATANTE : *Consortio San Jose*

TIPO DOCUMENTO *RUC*

DIRECCION : *Alameda Del Corregidor Nro 414 Urb La Molina 1era Etapa La Molina*

NRO.DOCUMENTO : 20600000439

ASEGURADO : *Consortio San Jose*

CODIGO POSTAL. : 12

POLIZA : 7011510200116

MONEDA : *Soles*

POLIZA GRUPO NRO :

DESDE	VIGENCIA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/02/2019	28/02/2019		<i>1412-Peralta Fontis Jose Luis</i>	<i>Escardo</i>
CONCEPTO				IMPORTE
<i>Ci Cancelacion Recibo 102469610</i>				
<i>Prima Comercial</i>				20.60
<i>Impuesto Gral. A Las Ventas</i>				3.71
<i>Importe Total</i>				S/ *****24.31
<i>Son : Veinticuatro Y 31/100 Soles</i>				

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE:  
EMITIDO POR: INTBBVA 12:40:16

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL IGV  
COPIA

RS 007- 99 / SUNAT INC. F DEL ART. 2º, INC. B NUMERAL 6.1 ART. 4º, ART. 16



CONSORCIO SAN JOSE

## Pago de Instituciones

2019/02/15 07:34:59

**SU OPERACIÓN HA SIDO REALIZADA**

Número de Operación	240130-0
Operación	Pago de Instituciones
Usuario(s) que autoriza(n)	VANESSA ZAMUDIO LOARTE
Número de Cuenta de Cargo	0011-0962-0100002931
Nombre de la Entidad	MAPFRE SOLES
DNI/RUC/C. EXTRANJERIA	20600000439
Nombre	CONSORCIO SAN JOSE
Monto a cargar	47.91 SOLES
Monto Cargado	47.91 SOLES
Fecha / Hora de 1ra Firma	15/02/2019 - 17:35:49

## Detalle de Pagos

CONCEPTO DE PAGO	Fec. Vcmto	Moneda	Importe
T02RE102469610	2019-02-01	SOLES	24.31
T03RE102469871	2019-02-01	SOLES	23.60

Estimado Cliente, su operación ha sido efectuada. Por favor, tome nota del Número de Operación.

# **Carta fianza de adelanto directo**

BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO. DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE

SANTIAGO DE SURCO, 25-01-2019  
CARTA FIANZA N° 0011-0380-9800220828-32  
VENGE EL: 11-06-2019

Señor/es:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración

REF.: Carta Fianza Nro. 0011-0380-9800220828-32 por S/515,000.00 (QUINIENTOS QUINCE MIL CON 00/100 SOLES)

Por cuenta de: CONSORCIO SAN JOSE

Vencimiento: 11-02-2019, a horas 12 meridiano

S/ 398,400.00

Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 21-06-2017, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de CONSORCIO SAN JOSE, conformado por: CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC.

Al respecto, nos es grato comunicarle, que contando con la autorización previa por parte de ustedes, hemos procedido a PRORROGAR su vencimiento hasta el 11-06-2019, a horas 12 meridiano y a REDUCIR el importe a S/398,400.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES)

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo el vencimiento y el importe.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente

BANCO CONTINENTAL  
p.p.

Carla Lozano Torres  
Su Gerente BE  
Banco Empresas Chacarilla





**Carta de fiel  
Cumplimiento  
(Copia)**

LIMA, 29 de Noviembre del 2018 064

Carta Fianza No: 010469195-006 REF: Carta Fianza No: 010469195-005 del 19/12/2014  
RENOVACION / MODIFICACION Con vencimiento: 15/12/2018

Señores: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEFES.

Por el presente documento, renovamos la fianza de la referencia con caracter de solidaria, irrevocable, incondicional, indivisible, de realización automática y con renuncia expresa al beneficio de excusión, a favor de ustedes.

Garantizando a: CONSORCIO SAN JOSE INTEGRADO POR: CIVTS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CHAVIN DE HUANTAK S.A.C., CORPORACION REIS S.A.C., CORPORACION R & E S.A.C.

Hasta la suma de S/ 5.544.298,305/21 (CINCO MIL CINCOCENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO Y 21/100 SOLES)

En respaldo de: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 038-2014-FONDEFES-DETERMINADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 004-2014-FONDEFES PRIMERA CONVOCATORIA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE.

Sírvase a tomar nota de que a solicitud de nuestros garantizados, hemos procedido a: Prolongar el plazo de vencimiento hasta el 15 de Diciembre de 2018.

Por efecto de este compromiso, el BANCO asume con sus fiados las responsabilidades en que éstos llegaran a incurrir, siempre que el monto de las mismas no exceda por ningún motivo la suma antes mencionada y que estén estrictamente vinculadas al cumplimiento de lo arriba indicado.

Dejamos claramente establecido que la presente CARTA FIANZA no podrá ser usada para operaciones comprendidas en la prohibición indicada en el inciso 5 del Artículo 217° de la ley 26702 "Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros".

Cualquier reclamo en virtud de esta garantía deberá cenirse a lo estipulado por el Art. 1898 del Código Civil y deberá ser formulado por vía notarial, en el horario de atención al público y en nuestra oficina ubicada en:

JR. CARADAYA 543-547 Pisos - LIMA \*\*\*\*\*


Dejamos claramente expuesto que, si fuera el caso, el Banco podrá a su elección acogerse a la facultad concedida por el Art. 1237 del Código Civil.

En caso de ejecutarse la presente CARTA FIANZA, el pago será efectuado mediante cheque de gerencia emitido a la orden del beneficiario que el Banco pondrá a su disposición en domicilio antes indicado, el mismo que se le entregará contra devolución del original de la presente CARTA FIANZA. Queda establecido que de no señalarse el monto ejecutado, se entenderá que el requerimiento es por la suma total a la que asciende la presente garantía. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe, se entenderá como renuncia a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago aun cuando el plazo de vencimiento y/o ejecución de esta fianza, no hubiese vencido.

  
ROBERTO VALDIZAN GARCIA  
Asistente Senior  
Procesamiento

FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO  
SCOTTIBANK PERU

Atentamente,

  
OSCAR ELGUERA CARBAJAL  
FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL FUNCIONARIO  
SCOTTIBANK PERU

Para información sobre la emisión de esta CARTA FIANZA puede visitar nuestra página web [www.scotiabank.com.pe](http://www.scotiabank.com.pe) o consultar a través de Banca (telfonía 311-8000 (Lima) / 70-801-1-6000 (Provincias)).

BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO. DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE.

SANTIAGO DE SURCO, 23-07-2018.  
CARTA FIANZA N°: 0011-0962-9800017155-87  
VENCE EL: 07-08-2019

Señor/es:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad:

De nuestra consideración:

REF.: Carta Fianza Nro. 0011-0962-9800017155-87 por: S/1,947,458.00 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES)

Por cuenta de: CONSORCIO SAN JOSE conformado por CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC.

Vencimiento: 07-08-2018, a horas de 12 meridiano

S/1,947,458.00\*\*...\*

Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 15-12-2014, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de CONSORCIO SAN JOSE conformado por CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2019, a horas 12 meridiano.

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
d.p.

  
Katherine Alexandra Cotera Póstigo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

  
Daniel Mesa Pinillos  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla



18072310

RUC 20100130204

REFRENDO: 1759818072310CLA0962E/18:56:53  
S/ 1,947,458.00

UA011 - V3 - Junio 2007

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO. DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE

SANTIAGO DE SURCO, 23-07-2018  
CARTA FIANZA N°: 0011-0962-9800023996-86  
VENGE EL: 07-08-2019

Señor/es:

★ FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración

REF : Carta Fianza Nro.0011-0962-9800023996-86 por S/32,647.00 (TREINTA DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC.

Vencimiento : 07-08-2018 a horas de 12 meridiano

\*  
\*\*\*\*\*  
S/ 32,647.00


Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 09-09-2015, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de CONSORCIO SAN JOSE conformado por CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2019, a horas 12 meridiano.


Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
p.p.

★  
  
Katherine Alexandra Cotera Postigo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

  
Daniel Merla Pinillos  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla



18072401

RUC 20100130204

REFRENDO: 1759818072401CLA0962F/10:27:49  
S/ 32,647.00

UA011 - V3 - Junio 2007

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909



BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO. DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE

SANTIAGO DE SURCO, 23-07-2018

CARTA FIANZA N° 0011-0380-9800207198-37

VENCE EL 07-08-2019

Señor/es:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad:

De nuestra consideración:

REF : Carta Fianza Nro.0011-0380-9800207198-37 por : S/8,618.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 SOLES)

Por cuenta de : CONSORCIO SAN JOSE conformado por CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC.

Vencimiento : 07-08-2018, a horas de 12 meridiano

S/8,618.00

Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 10-12-2016, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de CONSORCIO SAN JOSE conformado por CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2019, a horas 12 meridiano.

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
p.p.

Katherine Alexandra Cotera Postigo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

Daniel Masle Durrillo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla



18072312

RUC 20100130204

REFRENDO: 1759818072312CLA0380G/19:33:24  
S/ 8,618.00

UA011 - V3 - Junio 2007

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

BE CHACARILLA  
AV. PRIMAVERA 1050  
STGO. DE SURCO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
CHAVIN DE HUANTAR EIRL

PRESENTE.

SANTIAGO DE SURCO, 23-07-2018  
CARTA FIANZA N° 0011-0380-9800211322-37  
VENCE EL: 07-08-2019

Señor/es:

★ FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Ciudad

De nuestra consideración:

REF.: Carta Fianza Nro. 0011-0380-9800211322-37 por S/57,863.50 (CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 50/100 SOLES)

Por cuenta de: CONSORCIO SAN JOSE conformado por CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC

Vencimiento: 07-08-2019, a horas de 12 meridiano

S/57,863.50 \*\*\*\*\*


Nos referimos a la Carta Fianza de la referencia, la cual fue emitida el 25-07-2016, por nosotros a favor de ustedes, garantizando obligaciones económicas a cargo de CONSORCIO SAN JOSE conformado por CHAVIN DE HUANTAR EIRL, CIVIS GLOBAL-SUCURSAL PERU, CORPORACION ARIS SAC y CORPORACION R&E SAC. Al respecto, nos es grato comunicarles, que de acuerdo a la solicitud de nuestro(s) fiado(s) hemos procedido a PRORROGAR el plazo de vencimiento de la referida Carta Fianza hasta el 07-08-2019, a horas 12 meridiano.

Queda entendido que las demás condiciones estipuladas en nuestra Carta Fianza, se mantienen vigentes al haberse modificado solo el vencimiento de la misma.

La solicitud de ejecución de esta carta fianza deberá dirigirse por vía notarial a nuestra oficina BE CHACARILLA ubicado en AV. PRIMAVERA 1050 o Sede Central, Unidad Operaciones Centralizadas en Av. República de Panamá 3055 - San Isidro.

★ Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente  
BANCO CONTINENTAL  
p.p.

  
Katharina Alexandra Gotera Postigo  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla

  
Daniel Mesa Pinillos  
Ejecutivo Banca Empresas  
Banca Empresas Chacarilla



18072311

RUC 201001:0204

REFRENDO: 1759818072311CLA0380F/19:01:19  
S/ 57,863.50

UA011 - V3 - Junio 2007

PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 595-0909

# Rentas

058

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621  
 Número de Orden : 914927520  
 Fecha de presentación : 15/02/2019

Datos de la Declaración:

RUC : 20600000439  
 Nombre o Razón Social : CONSORCIO SAN JOSE  
 Período : 201901  
 Semana : 0  
 Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
<b>Total a Pagar</b>	<b>S/. 0</b>	<b>S/. 0</b>

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Período	Tributos	Deuda
201901	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
201901	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0



<b>SUNAT</b> <b>DECLARACIÓN PAGO</b>  <b>0621</b>	<b>PDT IGV - RENTA MENSUAL</b>			Copia para el contribuyente (Pag 1)
	RUC	20600000439		
	Razón Social	CONSORCIO SAN JOSE		Periodo
	Número de Orden	914927520	Fecha de Presentación	201901
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	15/02/2019 Soles

057

**IGV VENTAS**

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	0.00	101	0.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones				
	Facturadas en el período	106			
	Embarcadas en el período	127			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
<b>Total</b>				<b>131</b>	<b>0.00</b>

**IGV COMPRAS**

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacional	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	146,721.00	108	26,410.00
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
Importadas	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	1,120.00		
Compras importadas no gravadas	122				
<b>CRÉDITO FISCAL ESPECIAL</b>				178	26,410.00
<b>OTROS CRÉDITOS</b>				172	
<b>COEFICIENTE</b>				169	
		173			

**IVAP**

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

**RENTA**

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

<b>SUNAT</b> <b>DECLARACION PAGO</b>  <b>0621</b>	<b>PDT IGV - RENTA MENSUAL</b>				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20600000439			
	Razón Social	CONSORCIO SAN JOSE			
	Número de Orden	914927520	Fecha de Presentación	15/02/2019	

056

**DETERMINACIÓN DE LA DEUDA**

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	-26,410.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Periodo anterior	145	171,645.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-188,055.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el periodo	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el periodo	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
<b>Sub Total</b>	<b>681</b>	<b>0.00</b>	<b>683</b>		<b>682</b>	<b>0.00</b>
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		318	0.00
<b>Total deuda tributaria</b>	<b>188</b>	<b>0.00</b>	<b>344</b>		<b>324</b>	<b>0.00</b>

# Planillas

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN (LABORAL)

Identificación de la Transacción

Número de orden: 778977123-14

Datos de la Declaración

RUC: 20600000439  
 Nombre o Razón Social: CONSORCIO SAN JOSE  
 Documento: PLANILLA ELECTRÓNICA  
 Periodo: 01/2019  
 Rectificatoria: No  
 Número de trabajadores: 28  
 Número de pensionistas: 0  
 P.Serv.Cuarta Categoría: 3  
 P.Serv.Mod.Formativa: 0  
 Personal Terceros: 0  
 Regímenes Especiales: 0

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden: 778977123-14

Detalle de Tributos

Tributos	Deuda	Pago
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	2,471	2,471
ESSALUD +VIDA	120	120
SNP - LEY 19990	6,151	6,151
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	12	12
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	7,385	7,385
Totales	S/. 16,139	S/. 16,139

Detalle de Pago

Banco: BBVA BANCO CONTINENTAL  
 Num.Operación: 000000000000000003590  
 Fecha de Pago: 2019-02-15 08:39:02

R01: Trabajadores - Datos de Ingresos, Tributos y Aportes

RUC : 2060000439

Empleador : CONSORCIO SAN JOSE

Periodo : 01/2019

PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

Datos del Trabajador						Información declarada					
Documento de Identidad	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sit.	Ingresos		Descuentos	Tributos y aportes del	Neto a pagar	Tributos y Aportes del	
Tipo	Número				Devengado	Pagado					
01	46953597	ACOSTA	HUANILA	JOSE LUIS	BAJA	526.64	526.64	0.00	63.37	463.27	114.22
01	48300296	ACOSTA	GALAN	AUGUSTO ALEXANDER	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,369.35	1,369.35	0.00	148.66	1,220.69	117.10
01	46549805	ALVAREZ	SOTO	JORGE WILTON	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,893.78	3,893.78	0.00	446.98	3,446.80	328.98
01	62637707	AREVALO	VERGARAY	JOSE YOWER	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,724.30	3,724.30	0.00	418.39	3,305.91	289.69
01	76801219	CALUA	CHILON	JOSE EDILBERTO	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,160.67	3,160.67	0.00	350.27	2,810.40	242.19
01	46709771	CAMACHO	ROJAS	CENIN	ACTIVO O SUBSIDIADO	4,828.17	4,828.17	0.00	550.79	4,277.38	382.71
01	42589975	CORONEL	RAMIREZ	JOSE WILSON	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,244.83	3,244.83	0.00	348.65	2,896.18	273.85
01	08606885	ESPINOZA	ESCALANTE	EDDY SOLANO	ACTIVO O SUBSIDIADO	4,713.33	4,713.33	0.00	933.79	3,779.54	502.20
01	41220259	HUAMAN	PORLLES	JHONNY ALAN	ACTIVO O SUBSIDIADO	5,800.00	5,800.00	213.00	1,180.25	4,406.75	594.80
01	46569170	IPANAQUE	ACOSTA	LUIS HUMBERTO	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,213.27	3,213.27	0.00	356.52	2,856.75	246.52
01	41067672	LLONTOP	ACOSTA	JUAN MANUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	4,369.27	4,369.27	0.00	492.28	3,876.99	342.20
01	42344204	LOZANO	CARRASCO	EVER	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,295.25	3,295.25	0.00	364.02	2,931.23	251.71
01	44743366	LOZANO	CARRASCO	JOSE NEIRO	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,735.21	2,735.21	0.00	300.22	2,434.99	205.47
01	06241422	MUÑOZ	CONDORI	LEONIDAS VIDAL	ACTIVO O SUBSIDIADO	4,325.53	4,325.53	0.00	474.28	3,851.25	372.07
01	48483417	NAVARRO	TELLO	ROJER JOB	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,572.92	3,572.92	0.00	607.56	2,965.36	464.56
01	10425980	QUIROZ	CISNEROS	CARLOS ENRIQUE	ACTIVO O SUBSIDIADO	11,000.00	11,000.00	0.00	2,925.22	8,074.78	1,035.50
01	73077436	REYES	VILCHEZ	JHUNIOR GIAMPIERE	BAJA	575.46	575.46	0.00	69.13	506.33	110.16
01	44214246	RODAS	MORI	DANNY GABRIEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,914.04	1,914.04	0.00	214.38	1,699.66	147.26
01	10515950	ROJAS	QUISPE	ROMULO	ACTIVO O SUBSIDIADO	4,650.87	4,650.87	0.00	542.96	4,107.91	403.23
01	10233838	RUBIO	FLORES	JULIO	BAJA	1,330.69	1,330.69	0.00	21.00	1,309.69	114.66
01	47509013	RUBIO	HUARCAYA	JULIO CESAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,284.02	3,284.02	0.00	347.82	2,936.20	270.50
01	45406505	SAIRE	QUILCA	LUIS ANGEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,988.98	3,988.98	0.00	439.15	3,549.83	297.50
01	76763583	SANCHEZ	GALAN	AURORA LISBET	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,129.96	2,129.96	0.00	241.64	1,888.32	161.53
01	42543130	SOLAR	HUAROTO	JERRY EDGAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,703.66	2,703.66	0.00	322.84	2,380.82	234.99
01	45854197	TACO	TORRES	LUIS ENRIQUE	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,562.41	2,562.41	0.00	288.27	2,274.14	198.43
01	45412780	TASILLA	CHUGNAS	NOIVER	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,080.28	3,080.28	0.00	351.67	2,728.61	260.54
01	45790258	TERRONES	HERRERA	MARCO ANTONIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,150.14	3,150.14	0.00	337.79	2,812.35	265.19
01	70803088	TERRONES	ALDAMAS	LUIS ALBERTO	ACTIVO O SUBSIDIADO	4,667.75	4,667.75	0.00	567.22	4,100.53	399.62
						97,810.78	97,810.78	213.00	13,705.12	83,892.66	8,627.38

R02: Trabajadores - Detalle de Ingresos

RUC : 2060000439  
 Empleador : CONSORCIO SAN JOSE  
 Periodo : 01/2019  
 PDT Planilla Electrónica - PLAME      Número de Orden :

Datos del Trabajador						Detalle de los Ingresos										TOTAL INGRESOS	
Documento de Identidad	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sit.	Ingresos		Bonificaciones		Gratificaciones-Aguinaldos		Conceptos Varios		Otros Conceptos		Devengado	Pagado	
Tipo	Número				Devengado	Pagado	Devengado	Pagado	Devengado	Pagado	Devengado	Pagado	Devengado	Pagado	Devengado	Pagado	
01	46953597	ACOSTA	HUANILA	JOSE LUIS	BAJA												
01	48300296	ACOSTA	GALAN	AUGUSTO ALEXANDER	ACTIVO O SUBSIDIADO	299.82	299.82	61.57	61.57	42.76	42.76	69.39	69.39	53.10	53.10	526.64	526.64
01	46549805	ALVAREZ	SOTO	JORGE WILTON	ACTIVO O SUBSIDIADO	759.98	759.98	153.92	153.92	106.89	106.89	156.78	156.78	191.78	191.78	1,369.35	1,369.35
01	62637707	AREVALO	VERGARAY	JOSE YOWER	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,167.69	2,167.69	446.78	446.78	310.26	310.26	442.95	442.95	526.10	526.10	3,893.78	3,893.78
01	76801219	CALUIA	CHILON	JOSE EDILBERTO	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,160.43	2,160.43	446.78	446.78	310.26	310.26	433.88	433.88	372.95	372.95	3,724.30	3,724.30
01	46709771	CAMACHO	ROJAS	CENIN	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,790.92	1,790.92	400.19	400.19	277.91	277.91	403.67	403.67	287.98	287.98	3,160.67	3,160.67
01	42589975	CORONEL	RAMIREZ	JOSE WILSON	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,860.77	2,860.77	594.04	594.04	388.26	388.26	498.42	498.42	486.68	486.68	4,828.17	4,828.17
01	08606885	ESPINOZA	ESCALANTE	EDDY SOLANO	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,790.92	1,790.92	400.19	400.19	277.91	277.91	410.87	410.87	364.94	364.94	3,244.83	3,244.83
01	41220259	HUAMAN	PORLLES	JHONNY ALAN	ACTIVO O SUBSIDIADO	4,713.33	4,713.33									4,713.33	4,713.33
01	46569170	IPANAQUE	ACOSTA	LUIS HUMBERTO	ACTIVO O SUBSIDIADO	5,800.00	5,800.00									5,800.00	5,800.00
01	41067672	LLONTOP	ACOSTA	JUAN MANUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,790.92	1,790.92	400.19	400.19	277.91	277.91	408.17	408.17	336.08	336.08	3,213.27	3,213.27
01	42344204	LOZANO	CARRASCO	EVER	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,504.77	2,504.77	594.04	594.04	388.26	388.26	489.60	489.60	392.60	392.60	4,369.27	4,369.27
01	44743366	LOZANO	CARRASCO	JOSE NEIRO	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,819.78	1,819.78	369.40	369.40	256.53	256.53	384.74	384.74	464.80	464.80	3,295.25	3,295.25
01	06241422	MUÑOZ	CONDORI	LEONIDAS VIDAL	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,629.65	1,629.65	378.50	378.50	262.85	262.85	366.21	366.21	98.00	98.00	2,735.21	2,735.21
01	48483417	NAVARRO	TELLO	ROJER JOB	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,587.69	2,587.69	446.78	446.78	310.26	310.26	443.96	443.96	536.84	536.84	4,325.53	4,325.53
01	10425980	QUIROZ	CISNEROS	CARLOS ENRIQUE	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,572.92	3,572.92									3,572.92	3,572.92
01	73077436	REYES	VILCHEZ	JHUNIOR GIAMPIERE	BAJA	11,000.00	11,000.00									11,000.00	11,000.00
01	44214246	RODAS	MORI	DANNY GABRIEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	360.75	360.75	76.96	76.96	53.45	53.45	79.30	79.30	5.00	5.00	575.46	575.46
01	10515950	ROJAS	QUISPE	ROMULO	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,052.52	1,052.52	223.39	223.39	155.13	155.13	217.45	217.45	265.55	265.55	1,914.04	1,914.04
01	10233838	RUBIO	FLORES	JULIO	BAJA	2,668.77	2,668.77	594.04	594.04	388.26	388.26	499.68	499.68	500.12	500.12	4,650.87	4,650.87
01	47509013	RUBIO	HUARCAYA	JULIO CESAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	846.38	846.38	142.54	142.54	98.98	98.98	140.69	140.69	102.10	102.10	1,330.69	1,330.69
01	45406505	SAIRE	QUILCA	LUIS ANGEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,017.00	2,017.00	400.19	400.19	277.91	277.91	386.52	386.52	202.40	202.40	3,284.02	3,284.02
01	76763583	SANCHEZ	GALAN	AURORA LISBET	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,549.77	2,549.77	400.19	400.19	277.91	277.91	390.13	390.13	370.98	370.98	3,988.98	3,988.98
01	42543130	SOLAR	HUAROTO	JERRY EDGAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,121.06	1,121.06	267.37	267.37	185.67	185.67	271.62	271.62	284.24	284.24	2,129.96	2,129.96
01	45854197	TACO	TORRES	LUIS ENRIQUE	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,443.17	1,443.17	343.31	343.31	238.42	238.42	334.00	334.00	344.76	344.76	2,703.66	2,703.66
01	45412780	TASILLA	CHUGNAS	NOVER	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,490.05	1,490.05	342.72	342.72	224.00	224.00	274.32	274.32	231.32	231.32	2,562.41	2,562.41
01	45790258	TERRONES	HERRERA	MARCO ANTONIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,729.99	1,729.99	384.80	384.80	267.22	267.22	391.05	391.05	307.22	307.22	3,080.28	3,080.28
01	70803088	TERRONES	ALDAMAS	LUIS ALBERTO	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,790.92	1,790.92	400.19	400.19	277.91	277.91	402.76	402.76	278.36	278.36	3,150.14	3,150.14
						2,755.95	2,755.95	446.78	446.78	310.26	310.26	454.03	454.03	700.73	700.73	4,667.75	4,667.75
						67,075.92	67,075.92	8,714.86	8,714.86	5,965.18	5,965.18	8,350.19	8,350.19	7,704.63	7,704.63	97,810.78	97,810.78

R03: Trabajadores - Bases de Cálculo de Tributos y Aportes

RUC : 20600000439  
 Empleador : CONSORCIO SAN JOSE  
 Periodo : 01/2019

PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

Datos del Trabajador						Base de cálculo, Tributos y Aportes del Trabajador											
Documento de Identidad	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sit.	B.C. ESSALUD	Aporte Seg. Regular	Base ONP D.Ley 19990	Aporte ONP D.Ley 19990	Base S.P.P.	Aportes SPP	Tasa (%)	Base Renta Sta. Categoría	Impuesto a Renta Sta.	Otros emp.	EsSalud +Vida		
01	46953597	ACOSTA	HUANILA	JOSE LUIS	BAJA												
01	48300296	ACOSTA	GALAN	AUGUSTO ALEXANDER	ACTIVO O SUBSIDIADO	405.64	83.70					481.05	0.00	NO	5.00		
01	46549805	ALVAREZ	SOTO	JORGE WILTON	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,038.96	93.51					1,038.96	114.29	0.00	NO	5.00	
01	62637707	AREVALO	VERGARAY	JOSE YOWER	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,994.67	269.52					2,994.67	329.41	0.00	NO	5.00	
01	76801219	CALUA	CHILON	JOSE EDILBERTO	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,890.75	260.17	2,890.75		375.80			0.00	NO	5.00		
01	46709771	CAMACHO	ROJAS	CENIN	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,396.98	215.73	2,396.98		311.61			0.00	NO	5.00		
01	42589975	CORONEL	RAMIREZ	JOSE WILSON	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,836.51	345.29	3,836.51		498.75			0.00	NO	5.00		
01	08606885	ESPINOZA	ESCALANTE	EDDY SOLANO	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,473.94	222.65					2,473.94	272.13	0.00	NO	5.00	
01	41220259	HUAMAN	PORLLES	JHONNY ALAN	ACTIVO O SUBSIDIADO	4,713.33	424.20	4,713.33		612.73			0.00	NO	5.00		
01	46569170	IPANAQUE	ACOSTA	LUIS HUMBERTO	ACTIVO O SUBSIDIADO	5,800.00	522.00					5,800.00	580.00	0.00	NO	5.00	
01	41067672	LLONTOP	ACOSTA	JUAN MANUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,445.08	220.06	2,445.08		317.86			0.00	NO	5.00		
01	42344204	LOZANO	CARRASCO	EVER	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,386.43	304.78	3,386.43		440.24			0.00	NO	5.00		
01	44743366	LOZANO	CARRASCO	JOSE NEIRO	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,502.80	225.25	2,502.80		325.36			0.00	NO	5.00		
01	06241422	MUÑOZ	CONDORI	LEONIDAS VIDAL	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,032.59	182.93	2,032.59		264.24			0.00	NO	5.00		
01	48483417	NAVARRO	TELLO	ROJER JOB	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,425.41	308.29					3,425.41	376.80	0.00	NO	5.00	
01	10425980	QUIROZ	CISNEROS	CARLOS ENRIQUE	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,572.92	321.56	3,572.92		464.48			0.00	NO	5.00		
01	73077436	REYES	VILCHEZ	JHUNIOR GIAMPIERE	BAJA	11,000.00	990.00	11,000.00		1,430.00			0.00	NO	5.00		
01	44214246	RODAS	MORI	DANNY GABRIEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	432.90	83.70	432.90		56.28			0.00	NO	5.00		
01	10515950	ROJAS	QUISPE	ROMULO	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,466.01	131.94	1,466.01		190.58			0.00	NO	5.00		
01	10233838	RUBIO	FLORES	JULIO	BAJA	3,657.95	329.22						0.00	NO	5.00		
01	47509013	RUBIO	HUARCAYA	JULIO CESAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	980.01	88.20					3,657.95	402.38	0.00	NO	5.00	
01	45406505	SAIRE	QUILCA	LUIS ANGEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,440.28	219.63					2,440.28	268.44	0.00	NO	5.00	
01	76763583	SANCHEZ	GALAN	AURORA LISBET	ACTIVO O SUBSIDIADO	3,011.53	271.04	3,011.53		391.50			0.00	NO	5.00		
01	42543130	SOLAR	HUAROTO	JERRY EDGAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,650.97	148.59	1,650.97		214.63			0.00	NO	5.00		
01	45854197	TACO	TORRES	LUIS ENRIQUE	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,076.50	186.89					2,076.50	228.42	0.00	NO	5.00	
01	45412780	TASILLA	CHUGNAS	NOIVER	ACTIVO O SUBSIDIADO	1,973.89	177.65	1,973.89		256.61			0.00	NO	5.00		
01	45790258	TERRONES	HERRERA	MARCO ANTONIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,340.86	210.68					2,340.86	257.48	0.00	NO	5.00	
01	70803088	TERRONES	ALDAMAS	LUIS ALBERTO	ACTIVO O SUBSIDIADO	2,387.36	214.86					2,387.36	262.60	0.00	NO	5.00	
						3,701.07	333.10					3,701.07	407.11	0.00	NO	5.00	
						81,035.34	7,385.14	47,312.69		6,150.67			32,742.64	3,543.68	0.00	NO	120.00
													91,161.75	2,470.87			

R04: Trabajadores - Tributos, aportes y conceptos a cargo del trabajador

RUC : 2060000439

Empleador : CONSORCIO SAN JOSE

Periodo : 01/2019

PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

Datos del Trabajador						S.P.P. Aporte Obligatorio	S.P.P. Aporte Voluntario	S.P.P. Comisión	S.P.P. Seguro	S.N.P. D.Ley 19990 (DNP)	Imp. Renta 5ta.categ.	CONAFOVICER	+Vida Seguro Accidentes (ESSALUD)
Documento de Identidad	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sit.									
01	46953597	ACOSTA	HUANILA	JOSE LUIS	BAJA								
01	48300296	ACOSTA	GALAN	AUGUSTO ALEXANDER	ACTIVO O SUBSIDIADO	40.56	4.06	1.54	5.48		0.00	6.73	5.00
01	46549805	ALVAREZ	SOTO	JORGE WILTON	ACTIVO O SUBSIDIADO	103.90	10.39	1.87	14.03		0.00	13.47	5.00
01	62637707	AREVALO	VERGARAY	JOSE YOWER	ACTIVO O SUBSIDIADO	299.47	29.94	32.06	40.42		0.00	40.09	5.00
01	76801219	CALUA	CHILON	JOSE EDILBERTO	ACTIVO O SUBSIDIADO					375.80	0.00	37.59	5.00
01	46709771	CAMACHO	ROJAS	CENIN	ACTIVO O SUBSIDIADO					311.61	0.00	33.66	5.00
01	42589975	CORONEL	RAMIREZ	JOSE WILSON	ACTIVO O SUBSIDIADO	247.39	24.74	4.46	33.40	498.75	0.00	47.04	5.00
01	08606885	ESPINOZA	ESCALANTE	EDDY SOLANO	ACTIVO O SUBSIDIADO						0.00	33.66	5.00
01	41220259	HUAMAN	PORLLES	JHONNY ALAN	ACTIVO O SUBSIDIADO	580.00		10.44	78.30	612.73	321.06		
01	46569170	IPANAQUE	ACOSTA	LUIS HUMBERTO	ACTIVO O SUBSIDIADO						511.51		
01	41067672	LLONTOP	ACOSTA	JUAN MANUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO					317.86	0.00	33.66	5.00
01	42344204	LOZANO	CARRASCO	EVER	ACTIVO O SUBSIDIADO					440.24	0.00	47.04	5.00
01	44743366	LOZANO	CARRASCO	JOSE NEIRO	ACTIVO O SUBSIDIADO					325.36	0.00	33.66	5.00
01	06241422	MUÑOZ	CONDORI	LEONIDAS VIDAL	ACTIVO O SUBSIDIADO	342.54	34.26	6.16	46.23	264.24	0.00	30.98	5.00
01	48483417	NAVARRO	TELLO	ROJER JOB	ACTIVO O SUBSIDIADO						0.00	40.09	5.00
01	10425980	QUIROZ	CISNEROS	CARLOS ENRIQUE	ACTIVO O SUBSIDIADO					464.48	143.08		
01	73077436	REYES	VILCHEZ	JHUNIOR GIAMPIERE	BAJA					1,430.00	1,495.22		
01	44214246	RODAS	MORI	DANNY GABRIEL	ACTIVO O SUBSIDIADO					56.28	0.00	7.85	5.00
01	10515950	ROJAS	QUISPE	ROMULO	ACTIVO O SUBSIDIADO	365.79	36.59	39.15	49.39	190.58	0.00	18.80	5.00
01	10233838	RUBIO	FLORES	JULIO	BAJA						0.00	47.04	5.00
01	47509013	RUBIO	HUARCAYA	JULIO CESAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	244.03	24.41	4.39	32.94		0.00	16.00	5.00
01	45406505	SAIRE	QUILCA	LUIS ANGEL	ACTIVO O SUBSIDIADO						0.00	37.05	5.00
01	76763583	SANCHEZ	GALAN	AURORA LISBET	ACTIVO O SUBSIDIADO					391.50	0.00	42.65	5.00
01	42543130	SOLAR	HUAROTO	JERRY EDGAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	207.66	20.76	35.10	28.03	214.63	0.00	22.01	5.00
01	45854197	TACO	TORRES	LUIS ENRIQUE	ACTIVO O SUBSIDIADO						0.00	26.29	5.00
01	45412780	TASILLA	CHUGNAS	NOIVER	ACTIVO O SUBSIDIADO	234.08	23.40	25.04	31.61	256.61	0.00	26.66	5.00
01	45790258	TERRONES	HERRERA	MARCO ANTONIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	238.73	23.87	4.30	32.23		0.00	32.54	5.00
01	70803088	TERRONES	ALDAMAS	LUIS ALBERTO	ACTIVO O SUBSIDIADO	370.11	37.00	62.55	49.97		0.00	33.66	5.00
						3,274.26	269.42	227.06	442.03	6,150.67	2,470.87	750.81	120.00



R05: Trabajadores - Tributos, aportes y conceptos a cargo del empleador

RUC : 2060000439

Empleador : CONSORCIO SAN JOSE

Periodo : 01/2019

PDT Planilla Electrónica - PLAME

Número de Orden :

Datos del Trabajador										
Documento de Identidad	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sit.	Cód. Reg. Salud	ESSALUD Seguro de Salud	E.P.S. SCTR-Salud	S.P.P. Aporte voluntario	COMPAÑIA SCTR Pensión	
Tipo	Número									
01	46953597	ACOSTA	HUANILA	JOSE LUIS	BAJA					
01	48300296	ACOSTA	GALAN	AUGUSTO ALEXANDER	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	83.70	13.23	4.06	13.23
01	46549805	ALVAREZ	SOTO	JORGE WILTON	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	93.51	6.60	10.39	6.60
01	62637707	AREVALO	VERGARAY	JOSE YOWER	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	269.52	14.76	29.94	14.76
01	76801219	CALUA	CHILON	JOSE EDILBERTO	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	260.17	14.76		14.76
01	46709771	CAMACHO	ROJAS	CENIN	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	215.73	13.23		13.23
01	42589975	CORONEL	RAMIREZ	JOSE WILSON	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	345.29	18.71		18.71
01	08606885	ESPINOZA	ESCALANTE	EDDY SOLANO	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	222.65	13.23	24.74	13.23
01	41220259	HUAMAN	PORLLES	JHONNY ALAN	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	424.20	39.00		39.00
01	46569170	IPANAQUE	ACOSTA	LUIS HUMBERTO	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	522.00	36.40		36.40
01	41067672	LLONTOP	ACOSTA	JUAN MANUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	220.06	13.23		13.23
01	42344204	LOZANO	CARRASCO	EVER	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	304.78	18.71		18.71
01	44743366	LOZANO	CARRASCO	JOSE NEIRO	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	225.25	13.23		13.23
01	06241422	MUÑOZ	CONDORI	LEONIDAS VIDAL	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	182.93	11.27		11.27
01	48483417	NAVARRO	TELLO	ROJER JOB	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	308.29	14.76	34.26	14.76
01	10425980	QUIROZ	CISNEROS	CARLOS ENRIQUE	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	321.56	71.50		71.50
01	73077436	REYES	VILCHEZ	JHUNIOR GIAMPIERE	BAJA	00	990.00	22.75		22.75
01	44214246	RODAS	MORI	DANNY GABRIEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	83.70	13.23		13.23
01	10515950	ROJAS	QUISPE	ROMULO	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	131.94	7.66		7.66
01	10233838	RUBIO	FLORES	JULIO	BAJA	00	329.22	18.71	36.59	18.71
01	47509013	RUBIO	HUARCAYA	JULIO CESAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	88.20	13.23		13.23
01	45406505	SAIRE	QUILCA	LUIS ANGEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	219.63	13.23	24.41	13.23
01	76763583	SANCHEZ	GALAN	AURORA LISBET	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	271.04	13.23		13.23
01	42543130	SOLAR	HUAROTO	JERRY EDGAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	148.59	6.47		6.47
01	45854197	TACO	TORRES	LUIS ENRIQUE	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	186.89	13.67	20.76	13.67
01	45412780	TASILLA	CHUGNAS	NOIVER	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	177.65	10.39		10.39
01	45790258	TERRONES	HERRERA	MARCO ANTONIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	210.68	13.23	23.40	13.23
01	70803088	TERRONES	ALDAMAS	LUIS ALBERTO	ACTIVO O SUBSIDIADO	00	214.86	13.23	23.87	13.23
							333.10	14.76	37.00	14.76
							7,385.14	486.41	269.42	486.41

RUC : 20600000439

Empleador : CONSORCIO SAN JOSE

Periodo : 01/2019

PDT Planilla Electrónica - PLAME

Número de Orden :

Datos del Trabajador						Jornada Laboral			Horas Trabajadas		
Documento de Identidad	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sit.	Días Laborados	Días Subsidiados	Días No Laborados	Horas ordinarias	Horas sobretiempo	Total horas	
01	46953597	ACOSTA	HUANILA	JOSE LUIS	BAJA						
01	48300296	ACOSTA	GALAN	AUGUSTO ALEXANDER	ACTIVO O SUBSIDIADO	9	0	32:00	5:00	37:00	
01	46549805	ALVAREZ	SOTO	JORGE WILTON	ACTIVO O SUBSIDIADO	11	0	80:00	14:00	94:00	
01	62637707	AREVALO	VERGARAY	JOSE YOWER	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	208:00	38:00	246:00	
01	76801219	CALUA	CHILON	JOSE EDILBERTO	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	208:00	29:00	237:00	
01	46709771	CAMACHO	ROJAS	CENIN	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	208:00	8:00	216:00	
01	42589975	CORONEL	RAMIREZ	JOSE WILSON	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	208:00	31:00	239:00	
01	08606885	ESPINOZA	ESCALANTE	EDDY SOLANO	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	208:00	32:00	240:00	
01	41220259	HUAMAN	PORLLES	JHONNY ALAN	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	144:00		144:00	
01	46569170	IPANAQUE	ACOSTA	LUIS HUMBERTO	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	200:00		200:00	
01	41067672	LLONTOP	ACOSTA	JUAN MANUEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	208:00	29:00	237:00	
01	42344204	LOZANO	CARRASCO	EVER	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	208:00	24:00	232:00	
01	44743366	LOZANO	CARRASCO	JOSE NEIRO	ACTIVO O SUBSIDIADO	29	0	192:00	35:00	227:00	
01	06241422	MUÑOZ	CONDORI	LEONIDAS VIDAL	ACTIVO O SUBSIDIADO	30	0	192:00	5:00	197:00	
01	48483417	NAVARRO	TELLO	ROJER JOB	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	208:00	39:00	247:00	
01	10425980	QUIROZ	CISNEROS	CARLOS ENRIQUE	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	208:00	4:00	212:00	
01	73077436	REYES	VILCHEZ	JHUNIOR GIAMPIERE	BAJA	31	0	208:00		208:00	
01	44214246	RODAS	MORI	DANNY GABRIEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	18	0	40:00		40:00	
01	10515950	ROJAS	QUISPE	ROMULO	ACTIVO O SUBSIDIADO	16	0	104:00	19:00	123:00	
01	10233838	RUBIO	FLORES	JULIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	208:00	32:00	240:00	
01	47509013	RUBIO	HUARCAYA	JULIO CESAR	BAJA	16	0	74:00		74:00	
01	45406505	SAIRE	QUILCA	LUIS ANGEL	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	208:00	5:00	213:00	
01	76763583	SANCHEZ	GALAN	AURORA LISBET	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	208:00	9:00	217:00	
01	42543130	SOLAR	HUAROTO	JERRY EDGAR	ACTIVO O SUBSIDIADO	28	0	124:00	26:00	150:00	
01	45854197	TACO	TORRES	LUIS ENRIQUE	ACTIVO O SUBSIDIADO	29	0	159:32	29:00	188:32	
01	45412780	TASILLA	CHUGNAS	NOIVER	ACTIVO O SUBSIDIADO	17	0	120:00	12:00	132:00	
01	45790258	TERRONES	HERRERA	MARCO ANTONIO	ACTIVO O SUBSIDIADO	30	0	32:00	8:00	40:00	
01	70803088	TERRONES	ALDAMAS	LUIS ALBERTO	ACTIVO O SUBSIDIADO	31	0	208:00	23:00	231:00	
						31	0	208:00	49:00	257:00	
						760	0			7	

R07: Trabajadores - Motivos de suspensión de labores

RUC : 2060000439

Empleador : CONSORCIO SAN JOSE

Período : 01/2019

PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

Datos del Trabajador				Motivos de			
Documento de Identidad		Apellido	Apellido	Nombres	Código	Descripción	Num. Días
Tipo	Número						
01	42344204	LOZANO	CARRASCO	EVER	07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	2
01	44743366	LOZANO	CARRASCO	JOSE NEIRO	07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	1
01	76763583	SANCHEZ	GALAN	AURORA LISBET	07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	3
01	45412780	TASILLA	CHUGNAS	NOIVER	07	S.P. FALTA NO JUSTIFICADA	1

R12: Rentas de Cuarta Categoría - Comprobantes de pago

RUC : 2060000439  
 Empleador : CONSORCIO SAN JOSE  
 Periodo : 01/2019  
 PDT Planilla Electrónica - PLAME      Número de Orden :

Datos del Prestador de Servicio			Tipo de Comprobante	Número de Serie	Número de Comprobante	Fecha de Emisión	Fecha de Pago	Monto de Comprobante	Ind.Retención Rta	Retención Renta	Retención Pension	Aporte Pensionario
Documento de Identidad												
Tipo	Número	Apellidos y Nombres										
06	10610067781	GALAN CHAVEZ ESTEPHANY GRISEL	R.HONORARIO	E001	00000005	31/01/2019	31/01/2019	405.00	NO	0.00		
06	10408878972	SANTISTEBAN JACINTO CARLOS MARIANO	R.HONORARIO	E001	00000032	16/01/2019	16/01/2019	200.00	NO	0.00		
06	10408878972	SANTISTEBAN JACINTO CARLOS MARIANO	R.HONORARIO	E001	00000033	29/01/2019	29/01/2019	150.00	NO	0.00		
06	10324041678	TAPIA ROSAZZA RICHARD JAVIER	R.HONORARIO	E001	00000051	18/01/2019	18/01/2019	146.74	SI	11.74		
								961.74		11.74		0.00

R15: Determinación de Deuda

RUC : 20600000439

Empleador : CONSORCIO SAN JOSE

Periodo : 01/2019

PDT Planilla Electrónica - PLAME Número de Orden :

Determinación de deuda		Imp.Extraord. Solidaridad		Sistema Nac. Pensiones D.L.19990		ESSALUD Seguro Regular Trabajadores		ESSALUD Seguro Agrario /Acuic.		Fondo Derechos Sociales Artista		ESSALUD +Vida		Renta 5ta.Cat. Retenciones
Base Imponible	450		451	47,313	452	81,035	456		453		454	120	455	91,162
Impuesto resultante	410		411	6,151	412	7,385	416		413		414	120	415	2,471
Compensación	600													
Crédito EPS (Ley 26790)					602									
Crédito EPS Per.anterior					612									
Otras deduc.permit.Ley														
Pagos previos	500		501		502		506		503		504		605	0
Interés moratorio	700		701		702		706		703		704		705	
Saldo a pagar	710		711	6,151	712	7,385	716		713		714	120	715	2,471
Importe a pagar	800		801	6,151	802	7,385	806		803		804	120	805	2,471

Determinación de deuda		Contrib. Solidaria Asist. Previsional		ESSALUD Seguro Trab. Pesq.		ESSALUD Seguro Regular Pensionistas		ESSALUD S.C.T.R.		Renta 4ta.Cat. Retenciones		Asegura tu Pensión		Aporte al FCJMMMS - LEY 29741
Base Imponible	457		458		459		460		461	902	462		590	
Impuesto resultante	417		418		419		420		421	12	422		591	
Compensación	427													
Crédito EPS (Ley 26790)			408											
Crédito EPS Per.anterior			428											
Otras deduc.permit.Ley														
Pagos previos	507		508		509		510		511		512		592	
Interés moratorio	707		708		740		741		742				593	
Saldo a pagar	717		718		743		744		745	12	747		594	
Importe a pagar	807		808		809		810		811	12	814		595	
IGV							812							

**Pago a**  
**CONAFOVICER**



Consulta de Pagos Masivos

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0211001	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES	11/02/2019	17:29:54	0011-0962-0100002931
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente Informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	751.00	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000003577
Fecha y Hora de Ejecución	11/02/2019 - 17:29:54
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	751.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
<b>TOTAL CARGADO</b>	<b>751.00 - SOLES</b>

Ver contenido de la planilla

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
1	0011-0112-0200090836			CONAROVICER	R - 20100816611	751.00			0	ABONO CORRECTO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte
- E : Carnet de Extranjería
- M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino	
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público
-Banco de Crédito -Scotiabank -Banco de Comercio -Crediscuía -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca	Hasta las 11:30 a.m.  Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.  Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil  A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil  A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	
-Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana -CCMAC Cusco -CMAC Huancayo -CMAC Tacna	Hasta las 1:45 p.m.  Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil  A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	
-Citibank -Banco de la Nación			A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil  A partir de las 4:30 p.m. del siguiente día útil

# **Informe de Especialista**



# INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA  
CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ,  
DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE  
LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"

FEBRERO – 2019



*Julio Oswaldo*  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 66335

CONSORCIO  
SAN JOSÉ  
ISAIRIO JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 10717

 **FONDEPES**  
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>INFORME MENSUAL N° 50</b>	<b>FEBRERO - 2019</b>
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	<b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Página 1 de 17</b>

040

**ÍNDICE**

**1. DATOS DE LA OBRA.....2**

**2. INTRODUCCIÓN.....2**

**3. OBJETIVO .....2**

**4. ALCANCE .....2**

**5. ORGANIGRAMA .....3**

**6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .....3**

**7. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL .....7**

**8. ESTADÍSTICAS SST.....12**

**9. REPORTE MENSUAL DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD  
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE .....14**

**10. CONCLUSIONES .....15**

**11. RECOMENDACIONES.....15**

**12. PANEL FOTOGRÁFICO .....16**



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>INFORME MENSUAL N° 50</b>	<b>FEBRERO - 2019</b>
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	<b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Página 2 de 17</b>

039

### 1. DATOS DE LA OBRA

“Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”

**TIEMPO DE EJECUCIÓN** : 1,204 días  
**FECHA DE INICIO** : 15 de FEBRERO de 2015

### 2. INTRODUCCIÓN


Consortio San José, viene ejecutando la obra: “Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”, para lo cual se espera conseguir la máxima identificación y compromiso por parte de la Dirección y de todos los trabajadores con los principios de Seguridad, Salud en el Trabajo y Conservación del Medio Ambiente, cumpliendo así con el Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente elaborado para la obra.


### 3. OBJETIVO

Demostrar la gestión del Consorcio San José, referente a Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente en el mes de FEBRERO del 2019.

### 4. ALCANCE

El presente informe plasma todas las actividades realizadas referentes a Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente en la Obra: “Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”.

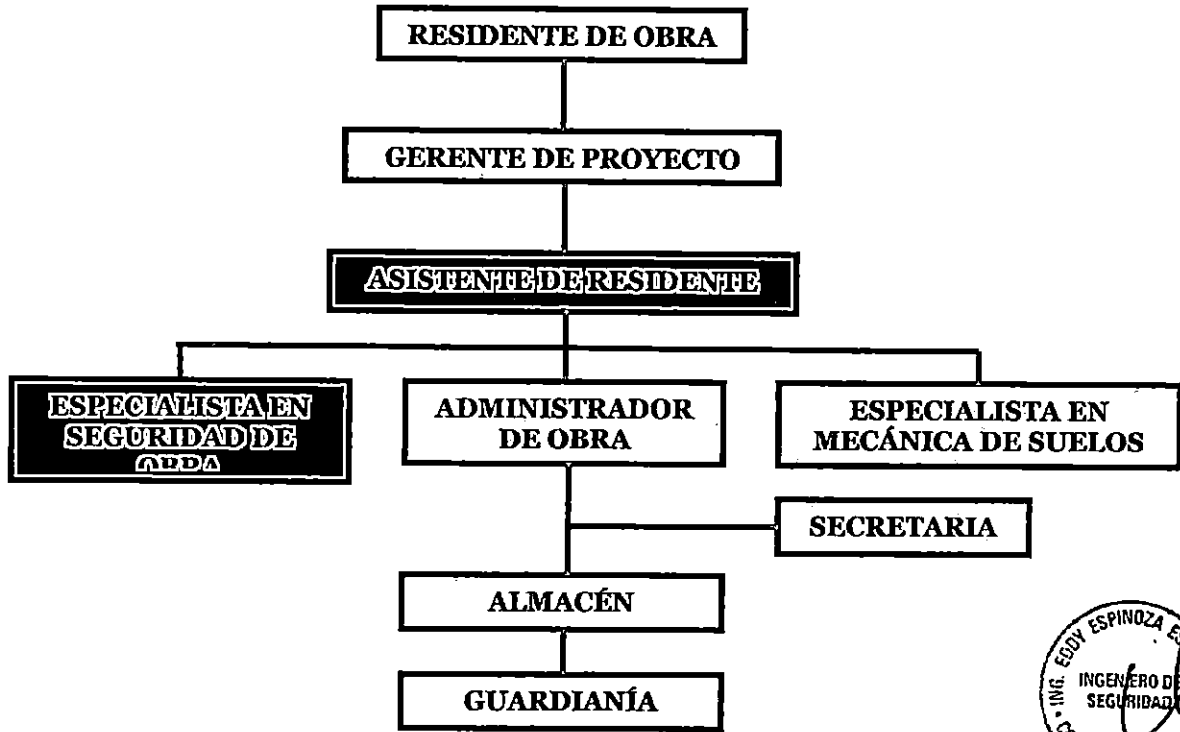
  
**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

  
**JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335



038

**5. ORGANIGRAMA**



**6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL**

**6.1. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

CONSORCIO SAN JOSÉ		INSPECCIONES DE SEGURIDAD																					
OBRA:		"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"																					
FRENTE DE TRABAJO:		MUELLE SAN JOSÉ - CHICLAYO																					
MES	HERRAM. MANUAL		HERRAM. ELECTR.		EXTINTORES		BOTQUIN		CAMILLA		EPPs		ÁRNES		ANDAMIOS		VEHICULOS		GENERAL-OBRA		TOTAL MES	EFICIENCIA DE RESPUESTA	
	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.		MES	ACUM.
JULIO	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	10	100%	100%
AGOSTO	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	10	100%	100%
SEPTIEMBRE	1	44	1	44	1	44	1	44	1	44	1	44	1	44	1	44	1	44	1	44	10	100%	100%
OCTUBRE	1	45	1	45	1	45	1	45	1	45	1	45	1	45	1	45	1	45	1	45	10	100%	100%
NOVIEMBRE	1	46	1	46	1	46	1	46	1	46	1	46	1	46	1	46	1	46	1	46	10	100%	100%
DICIEMBRE	1	47	1	47	1	47	1	47	1	47	1	47	1	47	1	47	1	47	1	47	10	100%	100%
ENERO	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	10	100%	100%
FEBRERO	1	49	1	49	1	49	1	49	1	49	1	49	1	49	1	49	1	49	1	49	10	100%	100%
<b>TOTAL INSPECCIONES</b>		49		49		49		49		49		49		49		49		49		49			490

JULIO OSWALDO FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

037

**6.2. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO**

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>			<b>ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO</b>				
<b>OBRA:</b>			<b>"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"</b>				
<b>FRENTE DE TRABAJO:</b>			<b>MUELLE SAN JOSE - CHICLAYO</b>				
<b>Nº</b>	<b>FECHA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>N° DE TRABAJADORES</b>	<b>ANALISIS DE TRABAJO SEGURO</b>	<b>PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO</b>	<b>INSPECCION DE VEHICULOS</b>	<b>INSPECCION PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR</b>
1	01/02/2019	VIERNES	14	1	1	0	0
2	02/02/2019	SÁBADO	14	1	1	0	0
3	04/02/2019	LUNES	14	1	1	0	0
4	05/02/2019	MARTES	14	1	1	0	0
5	06/02/2019	MIÉRCOLES	14	1	1	0	0
6	07/02/2019	JUEVES	14	1	1	0	0
7	08/02/2019	VIERNES	14	1	1	0	0
8	09/02/2019	SÁBADO	14	1	1	0	0
9	11/02/2019	LUNES	14	1	1	0	0
10	12/02/2019	MARTES	14	1	1	0	0
11	13/02/2019	MIÉRCOLES	14	1	1	0	0
12	14/02/2019	JUEVES	14	1	1	0	0
13	15/02/2019	VIERNES	14	1	1	0	0
14	16/02/2019	SÁBADO	14	1	1	0	0
15	18/02/2019	LUNES	14	1	1	0	0
16	19/02/2019	MARTES	14	1	1	0	0
17	20/02/2019	MIÉRCOLES	14	1	1	0	0
18	21/02/2019	JUEVES	14	1	1	0	0
19	22/02/2019	VIERNES	14	1	1	0	0
20	23/02/2019	SÁBADO	14	1	1	0	0
21	25/02/2019	LUNES	14	1	1	0	0
22	26/02/2019	MARTES	14	1	1	0	0
23	27/02/2019	MIÉRCOLES	14	1	1	0	0
24	28/02/2019	JUEVES	14	1	1	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335



<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>INFORME MENSUAL N° 50</b>	<b>FEBRERO - 2019</b>
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	<b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Página 5 de 17</b>

033

### 6.3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

#### 6.3.1. INDUCCIÓN

En el presente mes de FEBRERO no hubo ingreso de personal nuevo en obra; por lo mismo no se realizó la inducción hombre – nuevo.

#### 6.3.2. CAPACITACIÓN

En el presente mes FEBRERO no se realizó capacitación específica a los trabajadores.

#### 6.3.3. CHARLA 10 MINUTOS

En este mes se han desarrollado un total de 24 charlas de 10 minutos, teniendo un total de 56 horas hombres capacitados; abarcando temas de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente para el personal de campo y técnico, los mismos que se detallaron en el Cronograma Mensual de Reuniones Diarias.



ISAIAS VA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

035

CONSORCIO SAN JOSÉ		FORMATO DE PROCEDIMIENTO						
CRONOGRAMA MENSUAL DE REUNIONES DIARIAS								
AÑO:	2019	MES:	FEBRERO					
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"							
FRENTE:	MUELLE SAN JOSÉ - CHICLAYO							
N°	TEMA A EXPLICAR	TIPO DE REUNION	RESPONSABLE DE EJECUCION	FECHA	N° DE ASISTENTES	DURACION (MIN)	TOTAL HHC	HORA
1	ORDEN Y LIMPIEZA	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	01/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
2	NO SOLO LAS CUERDAS DE LAS HORCAS SON PELIGROSAS	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	02/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
3	LOS PELIGROS EN MANEJO DE GASOLINA	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	04/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
4	VER PARA CREER	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	05/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
5	SEGURIDAD EN MOVIMIENTO	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	06/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
6	PROTECCIÓN PARA USTED	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	07/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
7	AL IR Y VENIR DEL TRABAJO	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	08/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
8	LA DISTRACIÓN	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	09/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
9	LA SEGURIDAD EN LOS OJOS	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	11/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
10	OBJETOS QUE CAEN	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	12/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
11	USTED Y LA SEGURIDAD	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	13/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
12	LOS COLORES HABLAN	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	14/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
13	CONSERVEMOS LO QUE TENEMOS	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	15/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
14	TU PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	16/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
15	LOS ACCIDENTES NO SON CASUALES	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	18/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
16	REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONE SUBESTANDAR	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	19/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
17	MANTENGA SUS MANOS SIEMPRE LIMPIAS	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	20/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
18	¿CON LA BASURA QUIERES ACABAR? LAS 3R QUE TIENES QUE PRACTICAR	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	21/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
19	COMBATA EL MIEDO Y FRACASO	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	22/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
20	CONOCIMIENTOS ESENCIALE SPARA REALIZAR SOLDADURA	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	23/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
21	ORGULLO EN EL TRABAJO	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	25/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
22	¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL AGUA?	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	26/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
23	DIEZ FACTORES HUMANOS QUE CAUSAN ACCIDENTES	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	27/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
24	LOS INCIDENTES AVISAN	REUNION DIARIA (Charla de 10 min.)	EDDY ESPINOZA ESCALANTE	28/02/2019	14	10	2	07:20 a.m.
<b>TOTAL:</b>							56	

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335



<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>INFORME MENSUAL N° 50</b>	<b>FEBRERO - 2019</b>
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	<b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Página 7 de 17</b>

034

## 7. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Las actividades realizadas en el mes de FEBRERO, se vienen ejecutando de acuerdo al cronograma de Actividades de Plan de Gestión Ambiental.

Para ejecutar estas actividades se vienen aplicando los respectivos documentos, procedimientos y permisos debidamente aprobados, que permitan implementar el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente durante la fase de ejecución de la Obra.

### 7.1. COMPONENTES AMBIENTALES AFECTADOS PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

En el presente punto solamente mencionaremos los componentes ambientales afectados de manera negativa, producto de las diversas actividades ejecutadas en la etapa de construcción de la obra durante el mes de FEBRERO, no considerando necesario efectuar una descripción detallada del estado de dichos componentes, pues dicho detalle ha sido elaborado en la respectiva Línea de base del proyecto. Por ello los componentes ambientales afectados son los siguientes:

- Aire
- Suelo
- Mar
- Entorno paisajístico
- Salud y Seguridad de la población y trabajadores



### 7.2. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN LOS COMPONENTES AMBIENTALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO

A continuación mostramos los impactos ambientales generados, producto de las diversas actividades ejecutadas en la fase de construcción de la obra, en el mes de FEBRERO. En la intersección de la actividad ejecutada con el componente afectado se describirá dichos Impactos, las variables e indicadores afectados.

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 107117

JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335



DENOMINACIÓN DEL IMPACTO	MEDIO AL QUE AFECTA	Carácter	IM: Magnitud	IS: Severidad	IE: Extensión	IP: Probabilidad	NRA: NIVEL DE RIESGO AMBIENTAL
Generación de partículas por el movimiento de maquinarias.	AIRE	-1	1	1	1	1	-4
Generación de partículas en suspensión por la demolición, preparado de concreto y actividades diversas.	AIRE	-1	1	1	1	1	-4
Generación de desechos sólidos por el descabezado de pilotes, preparado de concreto y actividades diversas.	MAR	-1	1	1	1	1	-4

**7.3 ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL FRENTE A LOS IMPACTOS GENERADOS**

La estrategia de manejo ambiental, garantiza que la ejecución de las acciones y medidas de mitigación propuestas sean lo más objetivas y realistas posibles, a fin de que las posibles alteraciones que puedan producirse en el medio ambiente, encuentren una respuesta y sean minimizadas y/o mitigadas.

Las medidas ambientales de los impactos negativos generados por la ejecución de las actividades de la etapa de construcción de la obra sobre el medio ambiente, son planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, pero hay algunas medidas adicionales propuestas y ejecutadas durante el desarrollo de las actividades, necesarias para controlar, prevenir, evitar y/o compensar los impactos.

**7.4. ACTIVIDADES CONTROLADAS PROGRAMA DE MANEJO DE CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO**

En las actividades ejecutadas durante el mes de FEBRERO se han producido los siguientes impactos:

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335



CONSORCIO SAN JOSÉ	INFORME MENSUAL N° 50	FEBRERO - 2019
	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	
	ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Página 9 de 17

032

- Generación de partículas por el movimiento de maquinarias y fuertes vientos en esta época de trabajo.
- Generación de partículas en suspensión por la preparación de concreto y actividades diversas.
- Generación de desechos sólidos por el descabezado de pilotes, preparado de concreto y actividades diversas.

Por otro lado, durante este mes se han efectuado eventualmente las siguientes medidas de control para reducir y mitigar los efectos de los impactos ambientales generados:


- a) Se cuenta con cilindros de colores para la segregación de los residuos sólidos.
- b) Rociado diario de agua, mediante camiones cisternas, en toda el área de trabajo, para disminuir la generación de polvo por efectos de los fuertes vientos en la zona.
- c) A cada frente de trabajo, se le entrega bolsas plásticas para que segreguen sus residuos sólidos producto de sus actividades.
- d) Se ha ejecutado la charla de inducción de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente a todo el personal que ha ingresado a la obra. Además de las charlas diarias (charla de 10 minutos) reiterándola importancia del orden y limpieza en su área de trabajo e identificar los colores de los tachos y segregar correctamente los residuos.


#### 7.5. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS


Durante la ejecución de las actividades en la obra, se han generado residuos sólidos producto de las diversas actividades, así como residuos sólidos domésticos producto de las diversas actividades propias de los trabajadores.

Para mitigar y controlar los impactos generados por la generación de los residuos sólidos se han ejecutado las siguientes actividades:

- Se continúa utilizando los lugares de acopio para el almacenamiento temporal de residuos sólidos dentro del área de la obra.

  
 ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335



- Se implementó los cilindros que serán utilizados como depósitos de colores para el almacenamiento selectivo de residuos sólidos, de acuerdo al siguiente detalle:

CONSORCIO SAN JOSÉ		<b>GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>	
<b>OBRA:</b>	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE		
<b>FRENTE DE TRABAJO:</b>	MUELLE DE SAN JOSE-CHICLAYO		
<b>COLOR DEL CILINDRO</b>	<b>CARACTERISTICAS</b>	<b>TOTAL Kg.</b>	
<b>AMARILLO</b>	Materiales metalicos, fierros, etc.	<b>5.0</b>	
<b>AZUL</b>	Materiales hechos de papel y carton.	<b>9.0</b>	
<b>BLANCO</b>	Materiales donde su compuesto es de plastico.	<b>2.0</b>	
<b>VERDE</b>	Materiales de vidrio, ceramica y porcelanato.	<b>0.0</b>	
<b>MARRON</b>	Restos de alimentos, madera, jardineria, etc.	<b>10.0</b>	
<b>ROJO</b>	Recipientes de sustancias quimicas.	<b>2.0</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>28.0</b>	

## 7.6 REPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS

### 7.6.1. REPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS



CONSORCIO SAN JOSÉ		<b>REPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS-RESTOS DE CONSTRUCCION</b>			
<b>OBRA:</b>	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE				
<b>FRENTE DE TRABAJO:</b>	MUELLE DE SAN JOSE-CHICLAYO				
<b>TIPO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
Restos de alimentos	Kg.	4.0	42.0	Ninguna	
Papel/Cartón	Kg.	4.0	37.5	Ninguna	
Bolsas de papel pastificadas (Cemento, etc.)	Kg.	5.0	37.0	Ninguna	
Plastico PVC (Botellas, tubos, envases y acrilicos)	Kg.	2.0	29.0	Ninguna	
Tecknopor.	Kg.	0.0	2.5	Ninguna	
Chatarra y cable eléctricos.	Kg.	5.0	241.0	Ninguna	
Madera	Kg.	6.0	57.0	Ninguna	
Residuos de vidrio/ ceramica.	Kg.	0.0	0.0	Ninguna	
<b>TOTAL MES</b>		<b>26.0</b>	<b>446.0</b>		

ISAIA JOSE DE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

030


**7.6.2. REPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS**

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>REPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS SOLIDOS</b>			
<b>OBRA:</b>	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE			
<b>FRENTE DE TRABAJO:</b>	MUELLE DE SAN JOSE-CHICLAYO			
<b>TIPO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Recipientes de sustancias quimicas	Kg.	2.0	14.0	Ninguna
<b>TOTAL MES</b>		<b>2.0</b>	<b>14.0</b>	

**8. ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>		<b>ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>														
<b>OBRA:</b>		*CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE REGION LAMBAYEQUE*														
Mes	N° trabajadores	N° Accidente mortal	N° Accidente leve	ACCIDENTE INCAPACITANTE						ENFERMEDAD OCUPACIONAL					N° incidentes peligrosos	N° accidentes
				N° Accidente incapacitante	Total horas hombre trabajadas	N° días perdidos	Índice frecuencia	Índice gravedad	Índice accidentabilidad	N° enfermedades ocupacionales	N° trabajadores expuestos al agente	Tasa de incidencia	N° trabajadores con carnet profesional			
Marzo	19	0	0	0	2691	0	0.00	0.00	0.00	0	19	0.00	0	0	0	
Abril	12	0	0	0	1533	0	0.00	0.00	0.00	0	12	0.00	0	0	0	
Mayo	6	0	0	0	674	0	0.00	0.00	0.00	0	6	0.00	0	0	0	
Junio	17	0	0	0	2540	0	0.00	0.00	0.00	0	17	0.00	0	0	0	
Julio	16	0	0	0	2335	0	0.00	0.00	0.00	0	16	0.00	0	0	0	
Agosto	14	0	0	0	2324	0	0.00	0.00	0.00	0	14	0.00	0	0	0	
Septiembre	14	0	0	0	1751	0	0.00	0.00	0.00	0	14	0.00	0	0	0	
Octubre	14	0	0	0	2926	0	0.00	0.00	0.00	0	14	0.00	0	0	0	
Noviembre	14	0	0	0	2577.00	0	0.00	0.00	0.00	0	14	0.00	0	0	0	
Diciembre	13	0	0	0	1690	0	0.00	0.00	0.00	0	13	0.00	0	0	0	
Enero 2019	14	0	0	0	2500.00	0	0.00	0.00	0.00	0	14	0.00	0	0	0	
Febrero 2019	14	0	0	0	2628.00	0	0.00	0.00	0.00	0	14	0.00	0	0	0	

**INCIDENTE:** Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que estas solo requieren cuidados de primeros auxilios.  
**INCIDENTE PELIGROSO:** Suceso que potencialmente puede causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.  
**ACCIDENTE LEVE:** Suceso cuya lesión, genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.  
**ACCIDENTE INCAPACITANTE:** Suceso cuya lesión, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento.  
**ACCIDENTE MORTAL:** Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.  
**ENFERMEDAD OCUPACIONAL:** Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo.


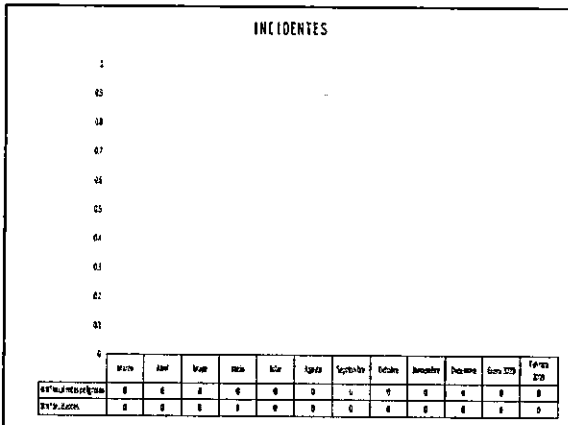

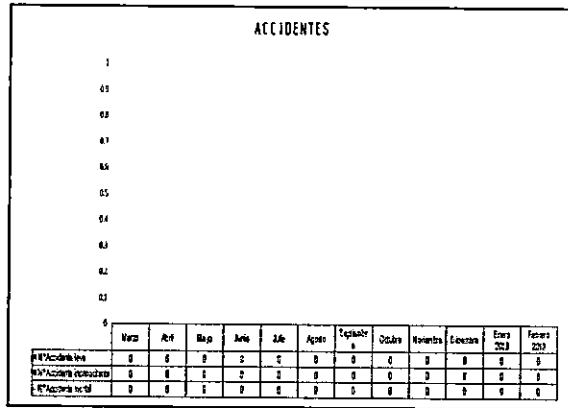
  
 ISAIAS JOSÉ ALVA ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUIÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335




**RESULTADO ESTADÍSTICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

<b>OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SST</b>	<b>Índice Frecuencia</b> 0.00	<b>Índice gravedad</b> 0.00	<b>Índice accidentalidad</b> 0.00
--	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------



MES	INDICE DE FRECUENCIA	INDICE DE FRECUENCIA ACUMULADA	INDICE DE GRAVEDAD	INDICE DE GRAVEDAD ACUMULADA	INDICE DE ACCIDENTABILIDAD	INDICE DE ACCIDENTABILIDAD ACUMULADA
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335



**8.1. CÁLCULO ESTADÍSTICO DE ÍNDICE DE FRECUENCIA, ÍNDICE DE SEVERIDAD, ACCIDENTABILIDAD Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES:**

Para el cálculo del índice de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad se utilizaran las siguientes formulas según la NTE G 050.

Índice de Frecuencia Mensual	<b>IFm</b>	$\frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el mes X 200000}}{\text{Número horas trabajadas en el mes}}$
Índice de Gravedad Mensual	<b>IGm</b>	$\frac{\text{Días perdidos en el mes X 200000}}{\text{Número horas trabajadas en el mes}}$
Índice de Frecuencia Acumulado	<b>IFa</b>	$\frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el año X 200000}}{\text{Horas trabajadas en lo que va del año}}$
Índice de Gravedad Acumulado	<b>IGa</b>	$\frac{\text{Días perdidos en el año X 200000}}{\text{Horas trabajadas en lo que va del año}}$
Índice de Accidentabilidad	<b>IA</b>	$\frac{\text{IFa x IGa}}{200}$



ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

027

**9. REPORTE MENSUAL DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE**

CONSORCIO SAN JOSÉ		REPORTE MENSUAL - FEBRERO 2019	
<b>OBRA:</b>		"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE"	
<b>FRENTE DE TRABAJO:</b>		MUELLE DE SAN JOSE - CHICLAYO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	REPORTE	UNIDAD
1	Cantidad de Trabajadores	14	Trabajadores
2	Dias Trabajados Sin Accidentes Incapacitantes	24	dias
3	Total Accidentes Sin Tiempo Perdido (Accidentes Leves)	0	Unidad
4	Total Accidentes Con Tiempo Perdido (Accidentes Graves)	0	Unidad
5	Total Dias Perdidos Por Accidentes Incapacitantes	0	dias
6	Total Accidentes Fatales Reportados	0	Unidad
7	Record Horas Mensual Sin Accidentes Incapacitantes	2688.00	Hrs
8	Record Horas Acumuladas Sin Accidentes Incapacitantes	301550.00	Hrs
9	Total Accidentes de Tránsito	0	Unidad
10	Total Accidentes con Daño Material	0	Unidad
11	Total Incidentes	0	Unidad
12	Total Derrames	0	Unidad
13	Total Enfermedades Ocupacionales Reportada	0	Unidad
ACTIVIDADES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	REPORTE	UNIDAD
1	Charlas Diarias	56	Hrs Hombre
2	Capacitaciones	0	Hrs Hombre
3	Induccion Trabajador Nuevo	0	Hrs Hombre
4	Analisis de Trabajo Seguro	24	Unidad
5	Permiso Escrito Para Trabajador de Alto Riesgo	24	Unidad
6	Inspeccion Pre Operacional de Vehiculos	0	Unidad
7	Inspeccion Pre Operacional de Minicargador	0	Unidad
8	Selección de Residuos No Peligrosos- Punto Limpio	26.0	Kg.
9	Selección de Residuos Peligrosos- Punto Limpio	2.0	Kg.
10	Eliminación Residuos No Peligrosos Acumuldo	446.0	Kg.

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335



<b>CONSORCIO SAN JOSÉ</b>	<b>INFORME MENSUAL N° 50</b>	<b>FEBRERO - 2019</b>
	<b>INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE</b>	
	<b>ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Página 15 de 17</b>


026


## 10. CONCLUSIONES

- En este mes se ha cumplido con el cronograma mensual de reuniones diarias y se ha expuesto temas de seguridad y medio ambiente en las charlas diarias antes de dar inicio a las labores.
- En este mes de FEBRERO no se produjo ningún tipo de incidente o accidente de trabajo.
- Se viene utilizando correctamente el equipo de protección personal durante los trabajos, con la supervisión constante de SSOMA.
- En el presente mes se obtuvo como resultado cero en las pruebas de alcoholemia.
- Se viene ejecutando las inspecciones mensuales de seguridad y salud en el trabajo: botiquín, extintores, camilla, herramientas manuales, vehículos y equipos de protección personal.
- Se han controlado aquellos aspectos ambientales generados en obra a fin de controlar los impactos con al suelo y aire.
- A cada frente de trabajo, se les entregó bolsas plásticas negras para que desechen los residuos generados durante su labor.
- Se ha cumplido con la disposición de los residuos sólidos según el código de colores.

## 11. RECOMENDACIONES

- Cumplir con el cronograma semanal para continuar con la realización de las faenas de limpieza de toda la obra donde participan todo el personal obrero y técnico.
- Continuar con las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo: botiquín, extintores, camilla, herramientas manuales, vehículos y equipos de protección personal.
- Para evitar la contaminación de suelo todos los residuos de construcción deben continuar almacenándose en el centro de acopio o almacenamiento temporal de residuos de donde se trasladaran a un botadero final.
- Recomendamos continuar con la segregación de los residuos sólidos inorgánicos y orgánicos, según el código de colores.

  
**ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 10717

  
**JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

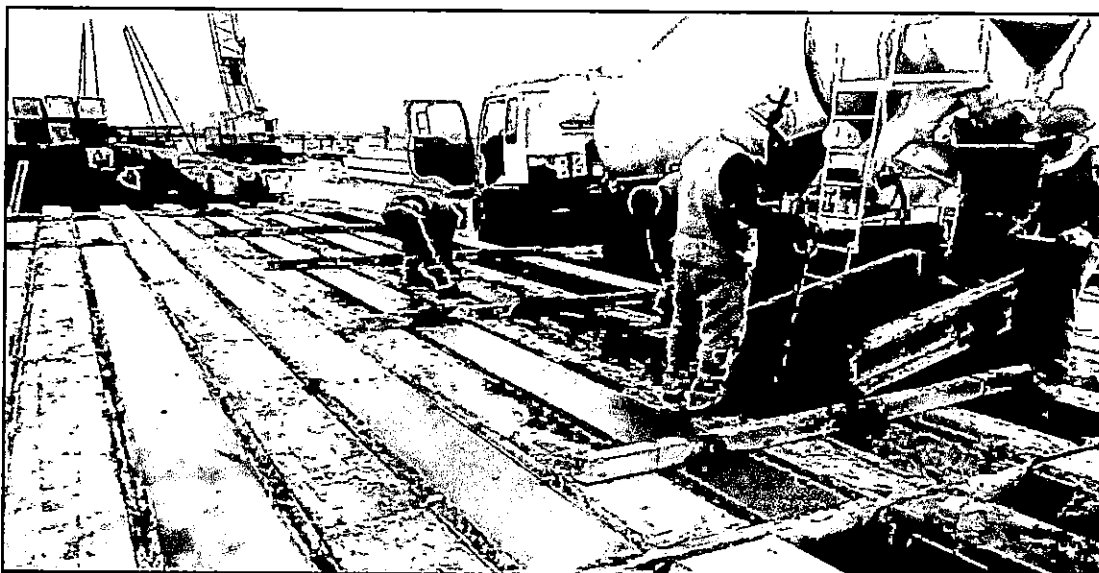




**12. PANEL FOTOGRÁFICO**



**Imagen N°01: Charlas diarias antes de iniciar las labores**



**Imagen N°02: Personal realizando trabajos con su respectivo equipo de protección personal**

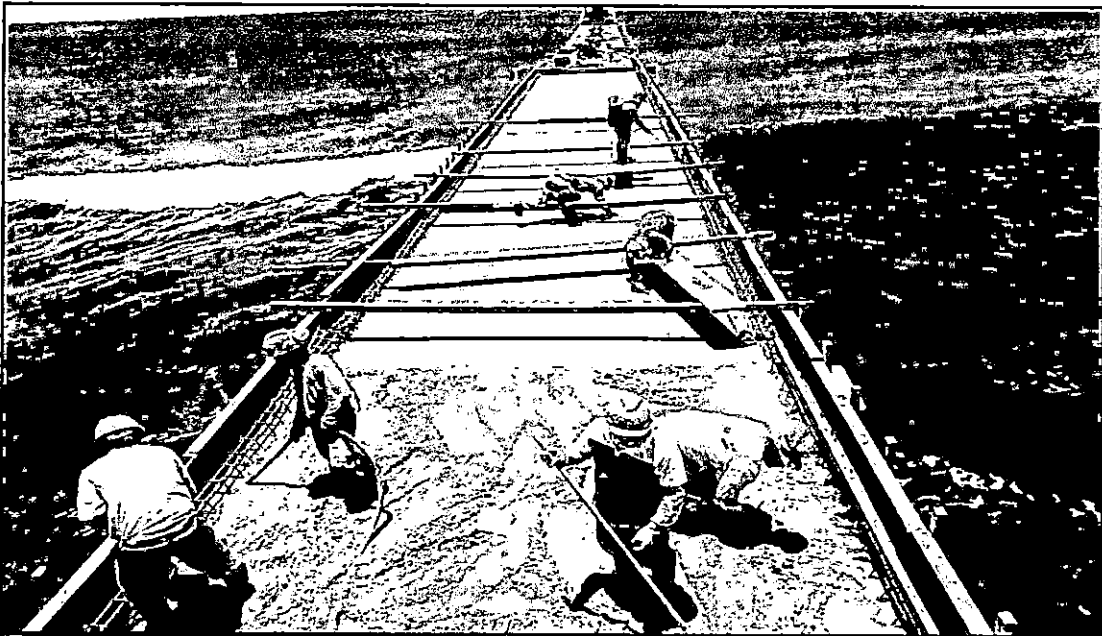
*Isaias*  
ISAIAS JOSE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

*Julio*  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335





**Imagen N°03: Personal realizando trabajos con su respectivo equipo de protección personal**



**Imagen N°04: Personal realizando trabajos con su respectivo equipo de protección personal**

ISAIAS JORGE ALVA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 10717

JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335



**Cuaderno  
de obra  
(Copia)**

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

022

OBRA: \_\_\_\_\_


PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Man. Añeto N° 2048                      31-01-2019                      DEL RESIDENTE DE OBRA


07.03	Malla de espigón		
07.03.04	Nuevos bloques en obra		
07.03.04.04	Concreto en nuevos $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2 + \text{aditivo}$	m <sup>3</sup>	113.87
07.03.05	Juntas longitudinales y transversales		
07.03.05.04	Concreto en vigas mandil $f_c = 280 \text{ kg/m}^2 + \text{aditivo}$	m <sup>3</sup>	27.72
07.03.05.05	Acera de refuerzo $e_1 = 4200 \text{ kg/m}^2$ - carriles pilotes	m <sup>2</sup>	936.21
07.03.07	Losa vaciada en obra		
07.03.07.04	Concreto en losa $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2 + \text{aditivo}$	m <sup>3</sup>	120.80
07.07.07	Mano de obra e insumos de pilotes, vigas y losa		
07.07.07.11	Punta para pilotes, solo con	und	28.00

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

Añeto N° 2049                      Del Supervisor

31/02/2019


Se recepcionan los metrados de avance de la obra principal, así como los valores de los N° 01 de las fracciones 11 y 12. Se procederá a la formulación de los valorizaciones correspondientes a fin de tramitar las en los plazos y formalidades establecidos en la ley y su reglamento.

  
 J. A. H. C.

Añeto N° 2050                      01-02-2019                      DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado e hincado de 02 pilotes inclinados de 45 x 45 m al número 166-167 lado sur, trabajos que corresponden al adicional N° 07.

ING. INSPECTOR

  
 CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 22858

  
 ING. SUPERVISOR

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Acuerdo N° 2051 Del Supervisor 01/02/2019

Se autoriza al contratista a realizar los trabajos policiales en el frente superior, correspondiente al adicional 07.

En forma simultanea debe ejecutarse los trabajos de hincado de los pilotes de reforzamiento.

Se viene adoptando las medidas de seguridad en el transporte de equipos y materiales para el hincado.

*Carlos Enrique Quiroz Cisneros*

Acuerdo N° 2052 02-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado e hincado de 02 pilotes inclinados de 45x45 m al núcleo eje 166-167 lado izquierdo, trabajos que corresponden al adicional N°07, de igual manera dar inicio al mejorado por el núcleo eje 168-169 trabajos del adicional N°11.

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

Acuerdo N° 2053 Del Supervisor 02/02/2019

Se autoriza ejecutar los trabajos policiales por el contratista en el frente superior.

de los pocos trabajos que se viene realizando por el escorrido del núcleo entre ejes 168-169, para proceder al variado.

Este trabajo corresponde al adicional N°11

*Carlos Enrique Quiroz Cisneros*

Acuerdo N° 2054 03-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el mejorado, colocación de arena y variado de concreto  $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$  para los núcleos 166-167 y 168-169 que corresponden al adicional N°11 y 12.

ING. INSPECTOR

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

ING. SUPERVISOR

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_


PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_


Acuerdo N° 2055 del 03/02/2019

Se autoriza al contratista la ejecución de los trabajos de colocación de un fierro el encofrado y acero de refuerzo en los muros entre ejes 166-167 y 168-169, correspondientes al adicional N° 11.



Acuerdo N° 2056 04-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado e armado de 02 pilotes inclinados de 45x45 m el núcleo eje 163 y 164 lado derecho, trabajos que corresponden al adicional N° 07.




CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

Acuerdo N° 2057 del 04/02/2019


Se autoriza al contratista transportar de dos (2) pilotes de concreto prefabricados que serán instalados en forma inclinada en el núcleo entre ejes 163-164, lado derecho, correspondientes al adicional 07.

El concreto a utilizarse será premezclado.




Acuerdo N° 2058 05-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado e armado de 02 pilotes inclinados de 45x45 m el núcleo eje 163 y 164 lado izquierdo, trabajos que corresponden al adicional N° 07.



CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 22858

ING. INSPECTOR



ING. SUPERVISOR

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_


PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Año 2019 N° 2059 del Supervisor 05/02/2019

de autorización al contratista realizar el transporte de dos (2) pilotes que serán hincados en forma inclinada entre ejes 163-164, lado izquierdo.

Dichos trabajos pertenecen al Adicional 07.



Año 2019 N° 2060 06-02-2019 DEL RESIDENTE DE OBRA

Se comunico al supervisor de obra que el día de hoy se recibió la carta N° 013-SUPER-SJOSE-2019 por parte de su representada desde no obstante la carta N° 151-2019-FONDECES(DIAGEN/PAA donde lo peticionamos nuestras consultas solicitadas mediante cuaderno de obra en el punto N° 2012 del residente, comunicando lo siguiente:

Para los pilotes entre los ejes 136 al 168 se fijará como mínimo un valor de espesor mínimo efectivo de 3.20m el cual permanezca constante.

en el momento mediante los protocolos de proceso, a partir del eje 166 se muestra empotramiento de 2.80m manteniendo la distancia hasta el final del puente de obra, cuando a ello el efecto de la vibración por el incremento de la altura libre de los pilotes conforme se avanza por dentro.

en su sentido, a partir del eje 168 se recomienda reforzar el puente de obra empleando pilotes inclinados de refuerzo necesario desde la junta de los pares libres, siendo el empleo de entre el eje 168 al 135.

En relación con lo anteriormente expuesto se considera proceder con el trámite correspondiente en concordancia con el artículo 207 del R.C.E. y se formalice el procedimiento para las prestaciones respectivas.

Ante las abstracciones de nuestras consultas por parte de la entidad y en cumplimiento al artículo N° 207, comunicamos al supervisor de obra la necesidad de fijar el espesor de una nueva prestación adicional correspondiente al reforzamiento de pilotes inclinados del eje 168 al 207, indicando que su representada no será la responsable en la elaboración

ING. INSPECTOR

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. QIP N° 22858

ING. SUPERVISOR

SECRETARIA DE OBRAS

REGION: BOGOTÁ

OBRA:

PROYECTO:

PROGRAMA:

ENTIDAD EJECUTORA:

Nota Análisis n° 2060

06-02-2019

DEL RESIDENTE DE OBRA

A dicho expediente por considerar la naturaleza y complejidad que tiene dicho expediente. Por lo tanto los trabajos a partir del ej 169 en adelante se gestionarán por separado para que la entidad por su parte con los detalles de como se conforman los trabajos sobre el punto del ej 207.

Análisis n° 2061

06-02-2019

DEL RESIDENTE DE OBRA

Comunico al momento de dar que se recibio la carta n° 135-2019-P00000001-DIGEN/PAO Reg. CIP N° 22858 INGENIERO CIVIL CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS donde lo mismo opuso el cambio del programa pendiente de dar, indicando que el programa el presente en el Ing Julio Oswaldo Fuentes Quiroz con CIP N° 66395 cmpliendo con el punto primero del artículo 185 del reglamento opuesto por donde el programa n° 184-2018-EF y sus modificaciones realizadas por los n° 20823 y 20820 en punto n° 132-2012-EF que en carta n° 135-2019-P00000001-DIGEN/PAO

Acuerdo n° 2062

Del Residente

Reg. CIP N° 22858 / 2019

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CISNEROS INGENIERO CIVIL

Revisado por la Entidad y se permitieron con los puntos. Se revisó el punto primero de la Entidad autorizada para hacer modificaciones. Para que se permita que en punto primero de la Entidad autorizada para hacer modificaciones. En los puntos Fuentes Quiroz con CIP N° 66395 cmpliendo con los puntos de man...

Hsiento n° 2063

07-02-2019

Del Residente de obra

El suscrito Ing. Julio Oswaldo Fuentes Quiroz con CIP N° 66395 asume a partir de esta fecha la responsabilidad como residente de obra en la ejecución de la obra denominada "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE".

FUENTES QUINONES OSWALDO INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 66395

ING. RESIDENTE

ING. INSPECTOR

ING. SUPERVISOR



FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2064 Del Supervisor 07/02/2019

En base a la comunicación de la Entidad, respecto al cambio de Residente, el Ing. Fuentes asumió el cargo a partir de la fecha. De alguna forma, ambos profesionales deben coordinar acciones tendientes en cuanto que la obra se encuentre al 70% de avance aproximadamente.

*José H. C.*

Asiento N° 2065 08-02-2019 Del Residente de Obra

Se solicita al Supervisor de obra la autorización para la colocación de acero y encofrado de Juntas longitudinales del eje 137-142 que corresponden a trabajos contractuales.

También se comunica que se recibió por parte de la entidad la aprobación en parte de nuestra solicitud de ampliación de plazo N° 28 con resolución N° 026-2019-FONDEPES/EG donde el nuevo plazo contractual es el día 21 de mayo del 2019.

*Julio Oswaldo Fuentes Quínez*  
.....  
JULIO OSWALDO FUENTES QUÍNEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

Asiento N° 2066 Del Supervisor 08/02/2019

Se autoriza al contratista efectuar los trabajos de encofrado y colocación de acero de las juntas longitudinales entre ejes 137-142 correspondiente a los trabajos contractuales. Se aprobó ampliación de plazo N° 28, siendo la nueva fecha de vencimiento el 21/05/2019 (102 días).

*José H. C.*

Asiento N° 2067 09-02-2019 Del Residente de obra

Se solicita al Supervisor de obra la autorización para el vaciado de concreto  $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$  + acelerante para las Juntas longitudinales eje 137-142 que corresponden al adicional N° 12.

*Julio Oswaldo Fuentes Quínez*  
.....  
JULIO OSWALDO FUENTES QUÍNEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

*Julio Oswaldo Fuentes Quínez*  
.....  
JULIO OSWALDO FUENTES QUÍNEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335


ING. INSPECTOR

ING. SUPERVISOR

Continúa


FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
 OBRA: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_


Viene Asiento N° 2067      09-02-2019      Del Residente de obra  
 También comunicamos que se recibió la carta N° 014-SUPER-SJOSE-2019 por parte de su representante donde nos señalan que se ha aprobado el calendario de avance de obra por la ampliación de plazo N° 27.  
 También reiteramos que a la fecha no se está ejecutando los trabajos de hincado de pilotes desde el eje 169 ya que a la fecha está en consulta Casiento 2046 del residente) sobre los resultados que se tiene en la penetración actual de los pilotes y que acciones se tendría que tomar, quiere decir si continuamos con el modelamiento señalado en los planos EMO3' y EMO4' alcanzado en el expediente adicional N° 11 donde se observa que ya no hay pilotes de reforzamiento como se vino realizando hasta el eje 135 por falta de empotramiento. La entidad deberá de alcanzar los detalles que absuelva nuestra consulta y que su respuesta o absolución sea al más mínimo plazo ya que la demora podría generar atrasos no atribuibles al contratista sabiendo además que esto genera la necesidad de una nueva prestación adicional.

  
 JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

Asiento N° 2068      Del Japonés      09/02/2019  
 En relación a la nueva modificación con respecto a la adición de nuevos pilotes inclinados a partir del eje 169 hasta el final; será necesario que la Entidad envíe el plano modificado así como el presupuesto adicional para poder emitir a fin de que su ejecución pueda realizarse una vez formalizado la prestación adicional.  
 Mientras tanto en lo posible el contratista deberá continuar con los trabajos autorizados en los adicionales 11 y 12; así como del contrato principal y adicional 07.

ING. INSPECTOR

  
 JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335  
 ING. RESIDENTE

  
 ING. SUPERVISOR

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_


PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2069                      11-02-2019                      Del Residente de obra


Se solicita autorización al supervisor de obra para iniciar con los trabajos de colocación de acero sobre la losa in situ desde el eje 136 al 143, correspondiente a los trabajos contractuales que corresponde a trabajos contractuales.

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUÍÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg CIP N° 66335

Asiento N° 2070                      Del Supervisor                      11/02/2019


Se autoriza al contratista iniciar los trabajos de colocación del acero en la losa a variar in situ entre los ejes 136 al 143. Dichos trabajos corresponden a trabajos considerados en el expediente contractual.

El acero instalado debe estar libre de óxido superficial, para cumplir con el nuevo refuerzo.



Asiento N° 2071                      12-02-2019                      Del Residente de obra

Se solicita autorización al supervisor de obra para el vaciado de concreto  $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$  + acelerante para la losa in situ desde el eje 136-143 trabajos correspondiente al adicional N° 12.


  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUÍÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg CIP N° 66335

Asiento N° 2072                      Del Supervisor                      12/02/2019

Después de revisar la colocación del acero de la losa entre los ejes 136 al 143, concordantes con lo indicado en los planos del proyecto, se autoriza al contratista a efectuar el vaciado de dicho elemento estructural.

El concreto a utilizar, será como siempre con material premezclado.

  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUÍÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg CIP N° 66335



ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2073 13-02-2019 Del Residente de obra

Se solicita autorización al supervisor de obra para la colocación de acero y encofrado de juntas longitudinales entre los ejes 144-151 que corresponden a los trabajos contractuales.

*Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez*  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 66335

Asiento N° 2074 Del Supervisor 13/02/2019

Se autoriza al contratista la colocación del acero y encofrado de las juntas longitudinales entre los ejes 144-151 de los trabajos contractuales.

De conformidad con el informe FONDEPES en su carta N° 071-2019-FONDEPES, a partir del eje 166, se volverá a reforzar el muelle, de acuerdo a los planos de reforzamiento.

Asiento N° 2075 14-02-2019 Del Residente de obra

Se comunica al Supervisor de obra que se recibió la carta N° 071-2019-FONDEPES/EG por parte de FONDEPES donde nos aprueba y autoriza la ejecución del expediente técnico de la prestación adicional N° 10 por el monto de S/ 429,550.09 inc. IGV y su deductivo vinculante de S/ 186,912.30 inc. IGV para la electrificación del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de San José, siendo su plazo de ejecución 75 días calendario.

*Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez*  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 66335

Asiento N° 2076 Del Supervisor 14/02/2019

Habiendo recibido la comunicación de FONDEPES, acerca de la aprobación del adicional N° 10, el contratista deberá iniciar los trabajos correspondientes, teniendo en cuenta que el plazo para su ejecución es de 75 días calendario.

*Julio Oswaldo Fuentes Quiñonez*  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
RESIDENTE  
Reg CIP N° 66335


ING. INSPECTOR

ING. SUPERVISOR


FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
OBRA: \_\_\_\_\_  
PROYECTO: \_\_\_\_\_  
PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2077      15-02-2019      Del Residente de Obra  
Se solicita autorización al supervisor de obra para la habilitación y colocación del acero correspondiente a la losa a vaciar in situ correspondientes entre los ejes 144-151 que corresponden a los trabajos contractuales.

Asiento N° 2078      Del Supervisor      15/02/2019

  
JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

Se autoriza al contratista efectuar los trabajos de habilitación del acero de refuerzo que corresponde a la losa ubicada entre los ejes 144-151, que pertenecen a los trabajos contractuales.





Asiento N° 2079      16-02-2019      Del Residente de Obra  
Se solicita autorización al supervisor de obra para continuar con la habilitación y colocación del acero correspondiente a la losa a vaciar in situ como también el encofrado de los cantos correspondientes entre los ejes 144-151 que corresponden a los trabajos contractuales.

Asiento N° 2080      Del Supervisor      16/02/2019

Se autoriza al contratista efectuar los trabajos de habilitación y colocación del acero a la losa ubicada entre los ejes 144-151 que corresponde. Así mismo se autoriza a colocar el encofrado de los cantos de la losa (terdineles).

ING. INSPECTOR

  
JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

  
ING. SUPERVISOR

# CUADERNO DE OBRA

012  
47

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2081 17-02-2019 Del Residente de obra

Se solicita autorización al supervisor de obra para realizar el vaciado de concreto  $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$  + aditivo acelerante para la losa in situ correspondiente entre los ejes 144-151, dichos trabajos corresponden al adicional N° 12.

Asiento N° 2082 Del Supervisor 17/02/2019

Después de verificar la colocación del acero y seguridad del encofrado, se autoriza al contratista a efectuar el vaciado de la losa ubicada entre ejes 144-151, con concreto premezclado  $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$ .  
Se deberá tomar muestras del concreto utilizado.

JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

Asiento N° 2083 18-02-2019 Del Residente de obra

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado e hincado de 02 pilotes verticales de 45x45 para el eje 170 trabajos correspondientes al presupuesto contractual y al adicional N° 07.

Asiento N° 2084 Del Supervisor 18/02/2019

Se autoriza al contratista realizar los trabajos policínicos en el asiento anterior.

Se deja constancia que los pilotes reforzados inclinados colocados entre los ejes 104-135, han sido concluidos al 100%.

El contratista sigue ejecutando trabajos correspondientes al presupuesto contractual, así como los del adicional N° 07.

JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335  
ING. RESIDENTE

ING. INSPECTOR

ING. SUPERVISOR

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2085 19-02-2019 Del Residente de obra

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el descabezado de 02 pilotes eje 170. Transporte y colocación de viga eje 170 con su respectivo concreto, trabajos correspondientes al presupuesto contractual.

Asiento N° 2086 Del Supervisor 19/02/2019

Se autoriza al contratista ejecutar los trabajos solicitados en el asiento anterior.

Se está verificando el listado de los fierros de refuerzo de los elementos prefabricados que deben ajustarse con las nuevas estructuras.

JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 66335

José José

Asiento N° 2087 20-02-2019 Del Residente de obra

Se solicita al supervisor de obra elevar a la entidad nuestras siguientes CONSULTAS referentes a la aprobación de la prestación adicional N° 11 y 12. Punto N° 01

En la resolución Jefatural N° 001-2019-FONDEPES/J recibida el día 03/01/2019 adjuntaron el informe N° 021-2018-FONDEPES/DIGENIPRA/HEP/VRHL, donde su contenido de título siguiente dice:

4.2 JUSTIFICACION TÉCNICA

c. se advierte que el plano de INSTALACIONES SANITARIAS ISM-02 del muelle la ubicación del cabezo y la plataforma baja, difieren respecto a los planos de las especialidades descritas anteriormente. Asimismo, en los planos EP-05, EM-01 y AM-03 la plataforma baja no incluye detalle de la losa de la plataforma baja. Debido a que un análisis integral para el cabezo y la plataforma baja requieren mayor tiempo, no se ha considerado como parte del alcance del presente expediente.

ING. INSPECTOR

JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 66335

JULIO OSWALDO FUENTES QUINONEZ INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 66335

JRG. SUPERVISOR

Continúa

# CUADERNO DE OBRA

010

48

MODALIDAD:

FECHA:

OBRA:

PROYECTO:

PROGRAMA:

ENTIDAD EJECUTORA:

Viene Resorte N° 2087

20-02-2019

Del Residente de obra

Además la entidad adjunta dentro del expediente adicional N° 11 el plano EM-04 con folio 060 donde se puede observar solo la planta del cobizo desde el eje 211 al 220 y la plataforma baja desde el eje 200 al eje 210 (Paralelo al muelle tipo puente).

Por lo tanto hacemos la consulta respecto a que elementos estructurales se utilizara para la plataforma baja, los cuales debera tener todos los detalles para su ejecución como es la viga losa in situ y otro elemento prefabricado necesario para su construcción, ya que en el expediente con folio no tiene plano de detalle y como consecuencia no tiene presupuesto se entiende que dicha estructura tiene un fin especial por lo tanto la entidad debera resolver nuestra consulta para su ejecución.

Punto N° 02

La entidad debera de definir si existe alguna varación en la estructura en el muelle tipo cobizo del eje 211 al 220 como pilotes de reforzamiento o se va a ejecutar como esta mencionado en los planos controlados EM-01 (Solo Cabezó) a ello queremos señalar que tampoco existe detalle para las losas nervadas tipo L-1 y L-11 las cuales son necesarias para su ejecución. Por los puntos expuestos solicito a usted compare a la entidad mediante carta nuestros consultas serodadas líneas arriba para su absolución dentro del plazo que estipula el RLCE art. 196.

JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

ING. INSPECTOR

JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

JULIO OSWALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

ING. SUPERVISOR

Contador

Resorte N° 2088 20-02-2019 Del Residente de obra  
Se comunique al supervisor de obra que a la fecha no recibimos respuesta por parte de la entidad correspondiente a nuestra carta N° 044-2018- CS/10 de fecha 08/06/2018 donde damos a conocer a la carta N° 616-2018-Resortes/



# LIBRO DE OBRA

009  
Nº 50

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_


PROYECTO: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Viene Asiento Nº 2088 20-02-2019 Del Residente de obra  
DISEÑAR de tal manera que alcanzamos los planos y especificación con  
las modificaciones necesarias para el funcionamiento correcto de los producto  
res de hielo motivada por el espacio reducido que se tiene en la zona  
destinada para producir hielo (modulo B).


En la carta de la referencia la entidad comunica al supervisor de obra,  
que están de acuerdo con las alternativas de solución coordinadas con el  
Ing. Raúl Flores Vilca en la variación del carril de la grúa de transporte de  
los moldes de hielo así como la nueva ubicación de los condensadores por  
lo que a solicitud de la entidad alcanzamos la documentación necesaria para  
su aprobación y trámite ante la entidad, solicitud que a la fecha no ha sido  
atendida, por esa razón solicitamos reiterar a la entidad dar atención.

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUÍÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP Nº 66335

Asiento Nº 2089 Del Super N.º 20/02/2019

En relación a la autorización Nº 2087, se le comunica al contratista  
que por su naturaleza, requiere la opinión del proyectista, por lo  
que se comunicara a la Entidad para la atención correspondiente  
dentro del plazo establecido en el reglamento de la L.C.E.

En cuanto a lo anotado en el asiento 2088, el contratista  
está alcanzando la documentación necesaria para aprobar  
en definitiva la nueva distribución de los equipos comple-  
mentarios de los productos de hielo, que por razones de  
espacio y funcionalidad, se ha distribuido de manera  
más coherente a fin de que los equipos funcionen adecua-  
damente.

  
JULIO OSWALDO  
FUENTES QUÍÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP. Nº 66335  
ING. RESIDENTE

ING. INSPECTOR

  
ING. SUPERVISOR

# CUADERNO DE OBRA

MODALIDAD:

FECHA:

OBRA:

PROYECTO:

PROGRAMA:

ENTIDAD EJECUTORA:

Asiento N° 2090  
Del Residente de Obra

21-02-2019

El suscrito indica que en referencia al asiento n° 2016 del supervisor de fecha 14/02/2019 en el que indica que se debería iniciar con los trabajos del adicional n° 10 teniendo en cuenta que el plazo para la ejecución es de 75 días calendario, se indica que se requiere con la autorización de iniciar obra y la participación de electricista S.A y otros requisitos que a la fecha la entidad no ha remitido a mi representación, por lo que el inicio de ejecución se suspende a mi representación, por lo que el inicio de ejecución de dicho adicional no ha sido definido aún.

Se solicita a la supervisión la autorización para realizar el trabajo de colocación y vacado de unión viga pilote en el eje 171 y colón de losa en el eje 170 - 171

JUAN CARLOS QUINONES  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 68335

21/02/2019

Del Supervisor

Asiento N° 2091

El contratista debe producir con la Entidad, la supervisión y al Comité de Obra, los antecedentes necesarios para definir la lista de inicio del plazo (trabajo), así como con la lista de inicio de plazo en lo concerniente a los trabajos necesarios que deben producirse en los trabajos prescriptos en el contrato n° 017-2019-CS/CO donde se indican los documentos para dar inicio a la ejecución de la prestación adicional n° 10 - Media Tensión, para dar

Juan Carlos Quinones

22-02-2019 Del Residente de Obra

Asiento N° 2092

Se comunica al supervisor de obra que se ingresó a la entidad la

Carta N° 017-2019-CS/CO donde se indican los documentos para dar

inicio a la ejecución de la prestación adicional n° 10 - Media Tensión,

JUAN CARLOS QUINONES  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 68335

ING. SUPERVISOR

ENTIDAD EJECUTORA

# CUADERNO DE OBRA

FECHA MODALIDAD

OBRA

PROYECTO

PROGRAMA

ENTIDAD EJECUTORA

Viene Plazento N° 2092 23-02-2019 Del Residente de obra  
 documentación que no es responsabilidad de su representación gestiona y  
 que migraron el tipo para el inicio de dicho Edificio, por lo que como  
 rizados a la supervisión que a la fecha no se puede ejecutar dicha pro-  
 tación adicional hasta que la entidad cumpla con alcanzar la documentación  
 solicitada por la entidad prestadora de servicio Electromore S.A.  
 se solicita al supervisor de obra la autorización para el descabezado de  
 02 pilotes eje 172, transporte y colocación de viga eje 172 con su respectivo  
 concreto, trabajos correspondientes al presupuesto contractual.

*[Firma]*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 65335  
 22/03/2019

Acuerdo N° 2093 Del Supervisor

Como se ha anunciado en el escrito anterior, el presente debe  
 ejecutarse los procedimientos de pruebas para que pueda iniciar  
 por el área de del personal N° 10. Electro Norte debe haber por  
 sus pruebas y/o por dividir, para que pueda iniciarse los trabajos  
 una vez más el personal puede ir efectuando el replanteo del  
 trazo, para efectuar cualquier prueba.

*[Firma]*

Exhorta N° 2094 23-02-2019 Del Residente de obra

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado, anexo  
 y descabezado de 02 pilotes en el eje 173, así como el transporte y coloca-  
 ción de losa en el eje 171-172 y el vaciado de unión viga pilote en el  
 eje 173, trabajos correspondientes al presupuesto contractual y al adicional  
 N° 07.

*[Firma]*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 65335

ING. INSPECTOR

*[Firma]*  
 ING. SUPERVISOR

# CUADERNO DE OBRA

N° 03

FECHA \_\_\_\_\_ MODALIDAD \_\_\_\_\_

OBRA. \_\_\_\_\_

PROYECTO \_\_\_\_\_

PROGRAMA \_\_\_\_\_

ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Asiento N° 2091 del Supervisor 23/02/2019

Se autoriza al contratista efectuar los trabajos solicitados en el asiento anterior.

El concreto utilizado es proporcionado y transportado en HICOR, sin embargo debe poseer las muestras de concreto utilizadas en el vaciado para los análisis pendientes.

*[Firma]*

Asiento N° 2096 24-02-2019 del Residente de Obra

Se solicita al supervisor de obra la autorización para el traslado e hincado de 02 pilotes en el eje 174 correspondientes al presupuesto con actual y al adicional N° 07, también el traslado y colocación de losas en los ejes 172-173 y el vaciado de unión viga pilote en el eje 174. Asimismo se informa que a la fecha no tenemos indicaciones alguna de parte de la entidad para dar inicio a la ejecución del adicional N° 10.

*[Firma]*  
JULIO OSVALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

Asiento N° 2097 del Supervisor 24/02/2019

Se autoriza al contratista efectuar los trabajos solicitados en el asiento anterior, los mismos que poseen pendientes tanto al contratista principal como al adicional N° 07.

*[Firma]*

Asiento N° 2098 25-02-2019 del Residente de obra

Se solicita al Supervisor de obra la autorización para el transporte y colocación de losa nervada en el eje 173-174 que corresponde a los trabajos contractuales como también el transporte e hincado pilotes de 45x45 en el eje 173 y 176 que corresponden al adicional N° 07.

*[Firma]*  
JULIO OSVALDO  
FUENTES QUINONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

# CUADERNO DE OBRA

005  
04

FECHA ..... MODALIDAD.....  
OBRA.....  
PROYECTO.....  
PROGRAMA.....  
ENTIDAD EJECUTORA:.....

Acuerdo N° 2093 del Supervisor 25/02/2019  
Se autoriza al contratista realizar el transporte y colocación de la losa nervada entre los ejes 173-174, considerado en el presupuesto contractual.  
Por mismo se aprueba transporte e hincado de dos (2) pilotes para los ejes 175-176 del adicional N° 07

*[Signature]*  
JACO FLORES

Asiento N° 2100 25-02-2019 Del Residente de obra  
Se solicita al Supervisor de obra la autorización para el desderezado de 04 pilotes para los ejes 175 y 176, también el transporte y colocación de viga eje 175 y 176, y el vacado de concreto unión viga pilote eje 175 y 176.

*[Signature]*  
JULIO OSWALDO FUENTES QUINCNEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

Acuerdo N° 2101 del Supervisor 26/02/2019  
Se autoriza al contratista realizar los trabajos de desderezado de cuatro (4) pilotes entre ejes 175 al 176.  
Por mismo el transporte y colocación de la viga eje entre ejes 175-176 y el posterior vacado del concreto por unificado en unión viga-pilote entre ejes 175-176

*[Signature]*  
JACO FLORES

Asiento N° 2102 27-02-2019 Del Residente de obra  
Se solicita al Supervisor de obra la autorización para el transporte y colocación de losa nervada entre los ejes 175-176 como también el transporte, hincado y desderezado de pilotes eje 177, transporte y colocación de viga eje 177, con su respectivo vacado de unión viga pilote eje 177, trabajos correspondientes al adicional N° 07 y contractual.

ING INSPECTOR

*[Signature]*  
JULIO OSWALDO FUENTES QUINCNEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 66335

*[Signature]*  
ING SUPERVISOR

# CUADERNO DE OBRA

1002  
005

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
OBRA: \_\_\_\_\_  
PROYECTO: \_\_\_\_\_  
PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Acuerdo U' 2403 Del Supervisor 27/02/2019


Se autoriza al contratista a efectuar los trabajos pólizas los en el recinto anterior, trabajos que forme parte tanto al presupuesto contractual como al adicional U' 02.


Se ha postulado una reunión con el personal del contratista que realizará los trabajos del presupuesto U' 10, con el fin de realizar el trabajo preliminar

Asiento N° 2104 28-02-2019 Del Residente de obra

Se comunicó al supervisor de obra que se recibió la carta N° 017-2019-FOSE-2019 por parte de la supervisión donde adjuntan la carta N° 242-2019-FONDEPES/DISEÑOS donde la entidad adjunta una memoria de cálculo entre los ejes 160-164 para el puente de acceso concluyendo que no será necesario colocar pilotes de reforzamiento desde el eje 136 al 164 y a partir del eje 168 se reforzará los tramos con pilotes inclinados (1:4) de 45x45cm que se conectarán a las juntas de los paños libres con empotramientos mínimos variables dentro de un rango referido a los estudios complementarios y de los monitoreos verificados a partir del eje 164 por lo que la entidad considera de vital importancia continuar con la ejecución del puente de acceso, por consiguiente, ante esta necesidad para alcanzar la meta del proyecto, se recomienda proceder en concordancia con el artículo 207 del RLCE y formalizar el procedimiento para la prestación adicional de obra respectiva por lo tanto después de ser absueltas las consultas y como lo señala la misma entidad damos cumplimiento al artículo N° 207 y comunicamos al supervisor de obra la necesidad de tramitar un nuevo expediente de prestación adicional correspondiente al reforzamiento de pilotes inclinados del eje 168 al 207 como señala la carta N° 242-2019-FONDEPES/DISEÑOS, añadiendo que mi representada no será la responsable en la elaboración de dicho expediente por considerar la naturaleza y complejidad que tiene dicho expediente

ING. INSPECTOR

  
JULIO OSVALDO  
FUENTES QUIÑONEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 56335

  
ING. SUPERVISOR



SECCION  
OBRA  
PROYECTO  
PROGRAMA  
ENTIDAD EJECUTORA

Vigencia Contrato N° 2105 28-02-2019 Del Contrato de Obra

01.03	Alcance de Obra	1.950 m <sup>2</sup>
01.03.04	Muros de mampostería	
01.03.01	Muros de mampostería de 20 cm de espesor	3.520 m <sup>2</sup>
01.03.05	Trabajos de acabados y pinturas	
01.03.05.04	Concreto en masa modelado de 280 kg/m <sup>3</sup> de aditivos	2772 m <sup>3</sup>
01.03.04	Muros de mampostería	
01.03.04.04	Muros de mampostería de 20 cm de espesor	

*Julio Oswaldo Fuentes Quíñonez*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUÍÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

Atención N° 2406 Del Superintendente 28/02/2019

Se le solicita a los contratistas en el contrato N° 2104 del contratista, el contratista, continuar los trabajos contractuales de limpieza de peñales, a los que se sumará el trabajo adicional de peñales incluidos de referencia a partir del eje 161, conforme a los planos entre los ejes 104 al 135.

La Entidad se encargará de formular el Adicional complementario a fin de oficializar dicha modificación.

Se recibe el reporte de los metros de avance de obra correspondientes al contrato principal (Val 50); al adicional 07 (Val 12); Adicional 11 (Val 02) y Adicional 12 (Val 02).

En base a dichos metros se procederá a la formulación de los valores punitivos por mora, los que se tramitarán ante la Entidad dentro de los plazos y formalidades establecidos en el artículo 197° del RLCG.

*Julio Oswaldo Fuentes Quíñonez*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUÍÑONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

*Carlos Hill*  
 CARLOS HILL  
 SUPERINTENDENTE



# CUADERNO DE OBRA

08

FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
 OBRA: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

Viene Asiento N° 2105	28-02-2019	Del Residente de obra
01.03	Módulo de Espigón L: 950.00 m	
07.03.04	Módulos Armados in situ	
01.03.04.01	Concreto en vigas de $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$ + Aditivo orgánico	30.52 m <sup>3</sup>
01.03.05	Juntes longitudinales y transversales	
07.03.05.04	Concreto en viga model. $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$ + Aditivo orgánico	27.72 m <sup>3</sup>
01.03.06	Acabos vacados in situ	
01.03.06.01	Concreto en losas $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$ + Aditivo orgánico	90.50 m <sup>3</sup>

*Julio Oswaldo Fuentes Quinonez*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

Asiento N° 2406 Del Supervisor 28/02/2019  
 Con relación a lo anotado en el asiento N° 2104 del contratista, el contratista continuará los trabajos estructurales de bricados de pilotes, a los que se formará el bricado adicional de pilotes inclinados de  $45^\circ$  por permitir el perfil del eje 161, conforme a los aprobados entre los ejes 104 al 135.  
 La Entidad se encargará de formular el Adicional complementario a fin de oficializar dicha modificación.  
 Se recibe el reporte de los metrados de avance de obra correspondientes al contrato principal (Val 50); al adicional 07 (Val 12); Adicional 11 (Val 02) y Adicional 12 (Val 02).  
 En base a dichos metrados se procederá a la formulación de los valorizaciones correspondientes, las cuales se tramitarán ante la Entidad dentro de los plazos y formalidades establecidas en el artículo 197° del RLCC.

ING INSPECTOR

*Julio Oswaldo Fuentes Quinonez*  
 JULIO OSWALDO  
 FUENTES QUINONEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 66335

*Ing. Supervisor*  
 ING. SUPERVISOR
