



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

**MEMORANDO N° 1189 -2019-FONDEPES/DIGENIPAA**



A: **TERESA ZENaida QUIROZ SILVA**  
Jefa de la Oficina General de Administración

Asunto: **PAGO DE VALORIZACIÓN DE OBRA N°8 DEL ADICIONAL N°1 DE OBRA-  
DE FEBRERO 2019  
CONTRATO N° 038-2017-FONDEPES PARA LA EJECUCION DEL SALDO  
DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL  
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE  
MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION  
TACNA"**

Referencia: a) CARTA N°021-2019-CONS/AHJ/RL-MORRO SAMA  
b) INFORME N°046 -2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/bvs

Fecha: **Lima, 20 MAR 2019**

Por medio de la presente, me dirijo a usted para saludarlo y manifestarle que, de acuerdo a lo indicado en el asunto del presente documento, el contratista de Supervisión **ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA**, ha presentado la **VALORIZACION DE OBRA N°08 DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA** del contratista **CONSORCIO OBRAS**, integrado por las empresas **J.P.C. INGENIEROS S.A.C.** y **SOLUCIONES INTEGRALES EMDERAS S.A.C.** encargado de la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"**; correspondiente mes de febrero del 2019, se realizan recomendaciones para que sea el Órgano Encargado de la Gestión Administrativa de los Contratos quien analice el pago efectivo de las valorizaciones del presente contrato.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración.

Atentamente;



LABQ/BHC/bvs

**FONDEPES**

Ing. Luis Alberto Barvieri Quino  
Director General de Inversión  
Pesquera Artesanal Y Acuicola





## CONFORMIDAD DE GASTO

Conste por el presente documento, que el director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, al suscribir la presente; da su conformidad para realizar el pago por concepto de **VALORIZACIÓN DE OBRA N°8 DEL ADICIONAL N°1 – mes de FEBRERO 2019**, por la suma **S/. 50,089.49 incluido el IGV (CINCUENTA MIL OCHENTA Y NUEVE CON 49/100 SOLES)**, a favor del contratista **CONSORCIO OBRAS**, integrado por las empresas **J.P.C. INGENIEROS S.A.C.** y **SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C.**, encargado de la Ejecución de Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"**, según **CONTRATO N°038-2017-FONDEPES**.

Lima, ...**2.0**.MAR 2019



FONDEPES

Ing. Luis Alberto Barbieri Quino  
Director General de Inversión  
Pesquera Artesanal Y Acuicola

LABQ/BHC/bvs



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



04858665

Usuario: pruz  
Fecha: 14/03/2019  
Hora: 14:57



### CARGO 00698-2019-FONDEPES/AOEM

A: MORGAN LEON MAGALI

Asunto: CARTA N° 21-2019-CONS-AHJ-RL-MORRO SAMA  
REMITE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 08 DEL ADICIONAL N° 01 MES DE FEBRERO 2019 ELABORADO POR LA SUPERVISION REF: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA DE MORRO SAMA - TACNA

Referencia: INFORME 00046-2019-FONDEPES/BVS

Fecha: 14/03/2019

Observación: SE ADJUNTA PROYECTO DE MEMO A OGA



Atentamente  
*[Handwritten Signature]*

AREA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Lucha contra la corrupción y la impunidad"



04860273

Usuario: usuario\_digenipaa3  
Fecha: 18/03/2019  
Hora: 15:48



### CARGO 00105-2019-FONDEPES/MML

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

---

Asunto: CARTA N° 21-2019-CONS-AHJ-RL-MORRO SAMA  
REMITE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 08 DEL ADICIONAL N° 01 MES DE FEBRERO 2019 ELABORADO POR LA SUPERVISION REF: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA DE MORRO SAMA - TACNA

---

Referencia:

---

Fecha: 18/03/2019


---

Observación: SE DERIVA PARA CONTINUAR TRAMITE CORRESPONDIENTE SEGÚN INFORME 46-2019/FONDEPES/AOEM/BVS. DPA MORRO SAMA. ADICIONAL 1, VALORIZACIÓN 8.

---


Ateptamente,

MORGAN LEON MAGALI





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"



**INFORME N°046-2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/bvs**

A: **ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO**  
Director General de la DIGENIPAA

Asunto: **VALORIZACION DE OBRA N°08 DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA FEBRERO 2019 – CONSORCIO OBRAS (J.P.C. INGENIEROS S.A.C. y SOLUCIONES INTEGRALES EMDERAS S.A.C.) CONTRATO N° 038-2017-FONDEPES PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"**

Referencia: **CARTA N°021-2019-CONS/AHJ/RL-MORRO SAMA**

Fecha: **Lima, 13 de marzo de 2019**

Por medio de la presente, me dirijo a usted para saludarlo y manifestarle que, de acuerdo al documento de la referencia, el **ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA** encargado de la Supervisión de la Obra; ha presentado la **VALORIZACION DE OBRA N° 08 DEL ADICIONAL N° 01 DE OBRA** del contratista **CONSORCIO OBRAS**, integrado por las empresas **J.P.C. INGENIEROS S.A.C. y SOLUCIONES INTEGRALES EMDERAS S.A.C.** encargado de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"; correspondiente al mes de febrero 2019. Al respecto, debo manifestar lo siguiente:

**ANTECEDENTES**

Datos generales:



Nombre del Proyecto:	<b>MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA</b>
Proceso de Selección:	<b>ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2017-FONDEPES, derivada de la LICITACION PUBLICA N° 0004-2017-FONDEPES</b>
Contrato de Obra:	<b>CONTRATO N° 038-2017-FONDEPES</b>
Fecha de Firma de Contrato:	<b>02 DE NOVIEMBRE DE 2017</b>
Sistema del Contrato:	<b>PRECIOS UNITARIOS</b>
Monto de Contrato:	<b>S/ 3'680,960.43 (TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 43/100 SOLES)</b>
Contratista Ejecución de Obra:	<b>CONSORCIO OBRAS (J.P.C. INGENIEROS S.A.C. y SOLUCIONES INTEGRALES EMDERAS S.A.C.)</b>
Residente de Obra:	<b>ING. OSCAR LUÍS LICOTA COAQUIRA</b>
Contratista Supervisión de Obra:	<b>ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA</b>
Supervisor de Obra:	<b>ING. DAVID MANUEL VELA FARFÁN</b>
Plazo de Obra:	<b>75 (SETENTA Y CINCO) DIAS CALENDARIO</b>
Fecha de Entrega de Terreno:	<b>17 DE NOVIEMBRE DE 2017</b>
Fecha de Inicio de Obra:	<b>28 DE NOVIEMBRE DE 2017</b>



Fecha de Término Contractual:	<b>10 DE FEBRERO DE 2018</b>
Ampliación de Plazo N°01:	<b>25 DÍAS CALENDARIO</b>
Fecha de Término Ampliación de Plazo N°01:	<b>07 DE MARZO DE 2018</b>
Ampliación de Plazo N°02:	<b>30 DÍAS CALENDARIO</b>
Fecha de Término Ampliación de Plazo N°02:	<b>06 DE ABRIL DE 2018</b>
Ampliación de Plazo N°03:	<b>31 DÍAS CALENDARIO</b>
Fecha de Término Ampliación de Plazo N°3	<b>07 DE MAYO DEL 2018</b>
Ampliación de Plazo N°04:	<b>25 DÍAS CALENDARIO</b>
Fecha de Término Ampliación de Plazo N°4	<b>01 DE JUNIO DEL 2018</b>
Ampliación de Plazo N°05:	<b>7 DÍAS CALENDARIO</b>
Fecha de Término Ampliación de Plazo N°5	<b>08 DE JUNIO DEL 2018</b>
Ampliación de Plazo N°06:	<b>26 DÍAS CALENDARIO</b>
Fecha de Término Ampliación de Plazo N°6	<b>04 DE JULIO DEL 2018</b>
Ampliación de Plazo N°14:	<b>06 DÍAS CALENDARIO</b>
Fecha de Término Ampliación de Plazo N°14	<b>23 DE OCTUBRE DE 2018</b>
Ampliación de Plazo N°15:	<b>06 DÍAS CALENDARIO</b>
Fecha de Término Ampliación de Plazo N°15	<b>29 DE OCTUBRE DE 2018</b>

1.2 Mediante **MEMORANDO N°1246-2017-FONDEPES/DIGENIPAA**, se aprueba el Expediente Técnico para la Ejecución del Saldo de Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"**, con código SNIP N° 272805, con un monto de inversión de **S/ 3'718,141.85 (Tres Millones Setecientos Dieciocho Mil Ciento Cuarenta y Uno con 85/100 Soles)**, con un Plazo de Ejecución de **75 (Setenta y Cinco) días calendario**.

1.3 Con fecha 26 de octubre de 2017, se firma el **CONTRATO N°035-2017-FONDEPES** con el **ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA** para la Supervisión del Saldo de Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"**, bajo el sistema de Suma Alzada; por un monto total de **S/ 366,692.45 (Trescientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Dos con 45/100 Soles)** y por un plazo total de **75 (Setenta y Cinco) días calendario**.

1.4 Con fecha 02 de noviembre de 2017, se firma el **CONTRATO N°038-2017-FONDEPES** con el **CONSORCIO OBRAS**, integrado por las empresas **J.P.C. INGENIEROS S.A.C.** y **SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C.**; ganadores de la buena pro de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2017-FONDEPES**, derivada de la **LICITACION PUBLICA N° 0004-2017-FONDEPES** para la Ejecución del Saldo de Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"**, bajo el sistema de Precios Unitarios; por un monto total de **S/ 3'680,960.43 (Tres Millones Seiscientos Ochenta Mil**





**Novcientos Sesenta con 43/100 Soles)** y un plazo total de **75 (Setenta y Cinco) días calendario** (en adelante, el "CONTRATO").

- 1.5 Con fecha 22 de febrero de 2018, se emite la **RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 032-2018-FONDEPES/SG**, mediante la cual se aprueba la **Ampliación de Plazo N°01 por 25 (Veinticinco) días calendario** al CONTRATO.
- 1.6 Con fecha 27 de marzo de 2018, se emite la **RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 052-2018-FONDEPES/SG**, mediante la cual se aprueba la **Ampliación de Plazo N° 02 por 30 (Treinta) días calendario** al CONTRATO, considerando el plazo ya ampliado en la Ampliación de Plazo N° 1.
- 1.7 Con fecha 27 de abril de 2018, se emite **RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 071-2018-FONDEPES/SG**, mediante la cual se aprueba la **Ampliación de Plazo N° 03 por 31 (Treinta y Un) días calendario** al CONTRATO, considerando el plazo ya ampliado en la Ampliación de Plazo N° 1 y N° 2.
- 1.8 Con fecha 25 de mayo de 2018, se emite **RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 087-2018-FONDEPES/SG**, mediante la cual se aprueba la **Ampliación de Plazo N° 04 por 25 (Veinticinco) días calendario** al CONTRATO, considerando el plazo ya ampliado en la Ampliación de Plazo N° 1, N° 2 y N° 3.
- 1.9 Con fecha 20 de junio de 2018, se emite **RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 109-2018-FONDEPES/SG**, mediante la cual se aprueba la **Ampliación de Plazo N° 05 por 7 (Siete) días calendario** al CONTRATO, considerando el plazo ya ampliado en la Ampliación de Plazo N° 1, N° 2 N° 3 y N° 4.
- 1.10 Con fecha 04 de julio de 2018, se emite la **RESOLUCIÓN JEFATURAL N°71-2018-FONDEPES/J** donde se aprueba el expediente técnico de la prestación adicional de obra N°1 del CONTRATO, expediente que alcanza el monto de adicional N°1 S/441,324.99 y de deductivo N°1 S/65,347.58; siendo el nuevo monto contractual S/4,056,937.84 incluido IGV. Prestación Total del Adicional y Deductivo N°1 que asciende a la suma de S/375,977.41 soles con una incidencia total de 10.21%.
- 1.11 Con fecha 16 de julio de 2018, se emite **RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 131-2018-FONDEPES/SG**, mediante la cual se aprueba la **Ampliación de Plazo N° 06 por 26 (Veintiséis) días calendario** al CONTRATO, considerando el plazo ya ampliado en la Ampliación de Plazo N° 1, N° 2 N° 3, N° 4 y N°5.
- 1.12 Con fecha 04 de julio de 2018, se emite la **Carta N°232-2018-FONDEPES/SG** recepcionada el 04 de julio de 2018 por el contratista CONSORCIO OBRAS donde se adjunta la Resolución Jefatural N°071-2018-FONDEPES/J.
- 1.13 Con fecha 08 de agosto de 2018, se emite **RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 145-2018-FONDEPES/SG**, mediante la cual se **deniega** la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 07** (solicitud para la ejecución del expediente Adicional y Deductivo N°1) al CONTRATO.
- 1.14 Con fecha 21 de septiembre de 2018, se emite **RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°165-2018-FONDEPES/SG**, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N°09 por 34 (Treinta y cuatro) días calendario al CONTRATO N°38-



2017FONDEPES, con el que el CONSORCIO OBRAS, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.

- 1.15 Con fecha 22 de octubre de 2018, se emite RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°179-2018-FONDEPES/SG, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N°10 por 23 (Veintitrés) días calendario al CONTRATO N°38-2017FONDEPES, con el que el CONSORCIO OBRAS, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.
- 1.16 Con fecha 12 de noviembre de 2018, se emite RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°201-2018-FONDEPES/SG, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N°12 por 07 (Siete) días calendario al CONTRATO N°38-2017FONDEPES, con el que el CONSORCIO OBRAS, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.
- 1.17 Con fecha 12 de noviembre de 2018, se emite RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°202-2018-FONDEPES/SG, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N°13 por 07 (Siete) días calendario al CONTRATO N°38-2017FONDEPES, con el que el CONSORCIO OBRAS, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.
- 1.18 Con fecha 12 de noviembre de 2018; se emite RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°203-2018-FONDEPES/SG, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N°14 por 06 (Seis) días calendario al CONTRATO N°38-2017FONDEPES, con el que el CONSORCIO OBRAS, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.



- 1.19 Con fecha 27 de noviembre de 2018, se emite RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° 211-2018-FONDEPES/SG, mediante la cual se aprueba la Ampliación de Plazo N° 15 por 06 (Seis) días calendario al CONTRATO N°38-2017FONDEPES, con el que el CONSORCIO OBRAS, tiene a su cargo la Ejecución del Saldo de Obra.

El supervisor mediante Asiento de Cuaderno de obra tomo N°4 de fecha 30.10.18, anota que ha culminado el plazo de ejecución de la obra y no existiendo causal de atraso se procederá a elaborar informe por término del plazo contractual de ejecución, así como la aplicación de penalidades por atraso.

- 1.21 Mediante Carta N°1295-208-FONDEPES/DIGENIPAA de fecha 20.11.18, la Entidad comunica al contratista que se encuentra inmerso en penalidades bajo el Artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que se le exhorta a culminar la obra antes del plazo de culminación máxima bajo apercibimiento de poder resolver el contrato.
- 1.22 Mediante Carta N°157-2018-CONS/AHJ/RL-MORRO SAMA, el supervisor indica la fecha de máxima penalidad por plazo de culminación, siendo el 17.12.18 el último día para concluir con los trabajos hasta alcanzar la penalidad máxima (50 días calendario según informe del supervisor)
- 1.23 Mediante Carta N°001-2019-CONS/AHJ/RL-MORRO SAMA, de fecha 16.01.19 la supervisión remite el informe quincenal de obra, comunicando;
  - Falta de procedimientos de seguridad y salud ocupacional en el frente de trabajo.
  - Falta de personal especialista en campo.
  - Observaciones en cuanto a la ejecución de los trabajos.
  - Ritmo lento en la culminación de los trabajos.
  - Flotación de un tramo de tubería HDPE del emisor submarino, evidenciando la



incorrecta ejecución de la instalación ejecutada con anterioridad

- 1.24 Mediante Carta N°024-2019-CONS/AHJ/RL-MORRO SAMA, de fecha 04.03.19 la supervisión remite el informe mensual de obra, comunicando;
- Falta de procedimientos de seguridad y salud ocupacional en el frente de trabajo.
  - Falta de personal especialista en campo.
  - La obra se encuentra atrasada en un porcentaje de 9.82%, mientras que el adicional de obra N01 se encuentra atrasada en un porcentaje de 23.20%
  - El contratista no ha cumplido con levantar las observaciones realizadas a los trabajos ejecutados.
  - El contratista no ha culminado las adquisiciones pendientes para el término de obra.
  - No se autorizara la preparación de concreto hasta la presentación de los certificados de rotura de briquetas de elementos de concretos vaciados en el último mes.

## II. ANÁLISIS

- 2.1 La **Cláusula Cuarta: Del Pago**; es la que se toma para el informe de pago de valorización del mes de enero 2019, donde se indica lo siguiente:  
*"LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de valorización mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda; se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD; EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244°, 1245° y 1246° del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes (...)"*
- 2.3 **Se coordinó con el Área Jurídica de la Entidad y se determinó que sea el Órgano Encargado de la Gestión Administrativa de los Contratos quien analice el pago efectivo de las valorizaciones del presente contrato.**
- 2.2 El resumen de Valorización de Obra N°08 del Adicional N°01 de Obra , es el siguiente:





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

**RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N°08 DE ADICIONAL DE OBRA N°01**

02

**OBRA:** SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"  
**ENTIDAD:** FONDEPES  
**SUPERVISION:** ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA  
**CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS  
**FECHA:** 28/02/2019

**MONTO DEL CONTRATO SIN IGV:** S/. 374,004.23  
**MONTO DEL CONTRATO CON IGV:** S/. 441,324.99

CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	VAL. ACUM. ANTERIOR	VAL. ACTUAL	VAL. ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
TOTAL CONTRACTUAL SIN IGV	374,004.23				
VALORIZACION CONTRACTUALES SIN IGV		244,782.06	42,448.72	287,230.78	86,773.45
REAJUSTES		0.00	0.00	0.00	
AMORTIZACIONES					
DEL ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00	0.00
DEL ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AMORTIZACIONES DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00	
VALORIZACION NETA		244,782.06	42,448.72	287,230.78	
I.G.V. (18%)	67,320.76	44,060.77	7,640.77	51,701.54	
<b>TOTALES</b>	<b>441,324.99</b>	<b>288,842.83</b>	<b>50,089.49</b>	<b>338,932.32</b>	
Porcentaje de Avance (Cierre)		05.45%	11.35%	76.80%	23.20%



*Puntualizando que en lo que respecta a deducciones por cualquier concepto del marco contractual y del reglamento entre otras penalidades, estas se efectuarán en la liquidación de la obra.*

**III. CONCLUSIONES**

**3.1** El Supervisor de Obra ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA, ha remitido la CARTA N° 021-2019-CONS/AHJ/RL-MORRO SAMA, mediante la cual remite la Valorización de Obra N° 08 del adicional N°01 de obra, correspondiente al mes de febrero del 2019, presentada por el contratista CONSORCIO OBRAS, integrado por las empresas J.P.C. INGENIEROS S.A.C. y SOLUCIONES INTEGRALES EMDERAS S.A.C., encargado de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA". Asimismo, el Supervisor de Obra ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA, solicita el pago de la Valorización de Obra N° 08 del adicional N°01 de obra por el monto total de S/. 50,089.49 incluido el IGV (CINCUENTA MIL OCHENTA Y NUEVE CON 49/100 SOLES).

1.1 Se debe tomar en cuenta que el contratista se encuentra inmerso en penalidades, por lo que se describe el cuadro al cierre de enero 2019 de las penalidades incurridas:

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

<b>Penalidad por mora en ejecución de la prestación</b>	<b>S/.405,693.78</b>
<b>Seguridad de obra y señalización – noviembre</b>	<b>S/.128.66</b>
<b>Seguridad de obra y señalización – enero</b>	<b>S/.298.03</b>
<b>Residente de obra – diciembre / enero</b>	<b>S/.366.29</b>
<b>Cuaderno de obra – enero</b>	<b>S/.7,450.87</b>
<b>Póliza CAR – enero</b>	<b>S/.7,450.87</b>
<b>TOTAL PENALIDADES</b>	<b>S/.421,388.5</b>

3.3 El contratista deberá asumir las obligaciones en lo que refiere al Artículo 161 del Reglamento relacionado a las obligaciones que tiene respecto al atraso en la finalización de la obra.

3.4 El contratista debe cumplir con presentar la póliza CAR vigente y la actualización de las cartas fianzas del proyecto antes del pago de cualquier valorización.

3.5 El Órgano Encargado de la Gestión Administrativa de los Contratos deberá analizar y cursar los respectivos informes para solicitar al contratista los documentos que tengan pendientes y así poder cumplir el contrato que posee con la Entidad.

#### **IV. RECOMENDACIONES**

- 4.1 Tomar en cuenta el resumen de penalidades que el contratista se encuentra inmerso para proceder con cualquier pago.
- 4.2 Se recomienda a OGA solicitar la póliza CAR y fianzas correspondientes por vía notarial.
- 4.3 Cualquier error u omisión en la presente valorización se realizará en la liquidación de la ejecución de la obra

Es cuanto tengo que informar a Ud. para los fines que estime convenientes.

Atentamente;

  
Betty Villegas Sotelo  
CIP N°164243

Con la conformidad del Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento; pase el presente informe y los antecedentes, a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola; para su atención y trámite correspondiente.

**FONDEPES**  
  
Ing° Badur Huamán Cornejo  
COORDINADORA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO  
Y MANTENIMIENTO



ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.

Consultorías y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:  
- Obras de Edificaciones  
- Obras de Carreteras  
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado  
- Obras de Electrificación  
- Obras Hidráulicas

Lima, Perú, 04 de 2019.

**CARTA N°021-2019-CONS/AHJ/RL-MORRO SAMA**

Señor Ingeniero;

**LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO**

Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola  
Fondo Nacional del Desarrollo Pesquero (FONDEPES)

Av. Petit Thouars N° 115 – Lima

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	
	
2839904	
N° DOC:	00002020-2019
CLAVE:	1587
USUARIO:	usuario_alog69
FECHA Y HORA:	04/03/2019 16:07:21
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	

**ATENCIÓN : ING. BETTY VILLEGAS SOTELO**  
Coordinador de Obra

**ASUNTO : VALORIZACIÓN DE OBRA N° 08 DEL ADICIONAL N°01 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, ELABORADA POR ESTA SUPERVISIÓN.**

**REFERENCIA : a) CONTRATO N° 035-2017-FONDEPES**  
**b) SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA"**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle muy cordialmente y a la vez presentarle la **VALORIZACIÓN N° 08 DEL ADICIONAL N°01 DE OBRA**, correspondiente al mes de febrero del año en curso; cabe indicar que esta supervisión ha elaborado esta valorización, para cumplir con nuestros términos de referencia y contrato, el contratista no presento y será comunicado por esta supervisión vía carta, para que presente los documentos faltantes tales como los pagos y/o tributos de SENCICO y CONAFOVICER, ESSALUD, FACTURA, ETC, **para recién proceder el pago.**

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterándole las muestras de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

  
ALEXANDER PRIMITIVO  
HUERTAS JARA  
DNI: 40431359  
REPRESENTANTE LEGAL

Se adjunta:

- Valorización de obra + 02copias + CD



Fecha: 05/03/19

MEMORANDO INTERNO N° 811 -2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM

Asunto : Memo Interno 14PP-2019 Digenipaa

Referencia : \_\_\_\_\_ Registro: \_\_\_\_\_

Destino	Indicación	Destino	Indicación

Observaciones:

*Ing<sup>o</sup> Betty Villegas*

*[Signature]*

Atentamente,



Indicaciones:

- |                           |                          |                             |                          |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 01. Autorizado/ Aprobado  | 02. Calificar/ Evaluar   | 03. Informe                 | 04. Proyectar resolución |
| 05. Atención/ Tramitación | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular           |
| 09. Ayuda memoria         | 10. Coordinar            | 11. Opinión/ Recomend       | 12. Consolidar           |
| 13. Aclarar redacción     | 14. Implementar/ Ejecut  | 15. Preparar respuesta      | 16. Visación             |
| 17. Agregar a anteced     | 18. Archivo              | 19. Ampliar                 | 20. Seguimiento          |



PERÚ

Ministerio de la Producción



**FONDEPES**

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Fecha:

04/03/19

**MEMORANDUM INTERNO N° 1499 - 201 - FONDEPES/ DIGENIPAA**

Asunto

: Carta N° 021-2019 / Morrosame

Referencia

Registro :

2020

Destino	Indicacion	Destino	Indicación
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	
OCI		OGAJ	
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	NOEM

Observaciones:


**FONDEPES**

AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

04 MAR. 2019

RECEBIDO

Atentamente



Indicaciones:

- |                                |                          |                             |                 |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 01. Autorizado/Aprobado        | 02. Calificar/Evaluar    | 03. Informe                 | 04. Proyectar   |
| 05. Atención/Tramitación       | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular  |
| 09. Ayuda memoria              | 10. Coordinar            | 11. Opinión/Recomendación   | 12. Consollar   |
| 13. Aclarar redacción          | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta      | 16. Visación    |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo              | 19. Ampliar                 | 20. Seguimiento |



ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.

Consultarías y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:


- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas

01

**SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL  
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE  
MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN  
TACNA"**

**INFORME DE VALORIZACIÓN N°08 DE ADICIONAL DE OBRA N° 01**

**FEBRERO 2019**

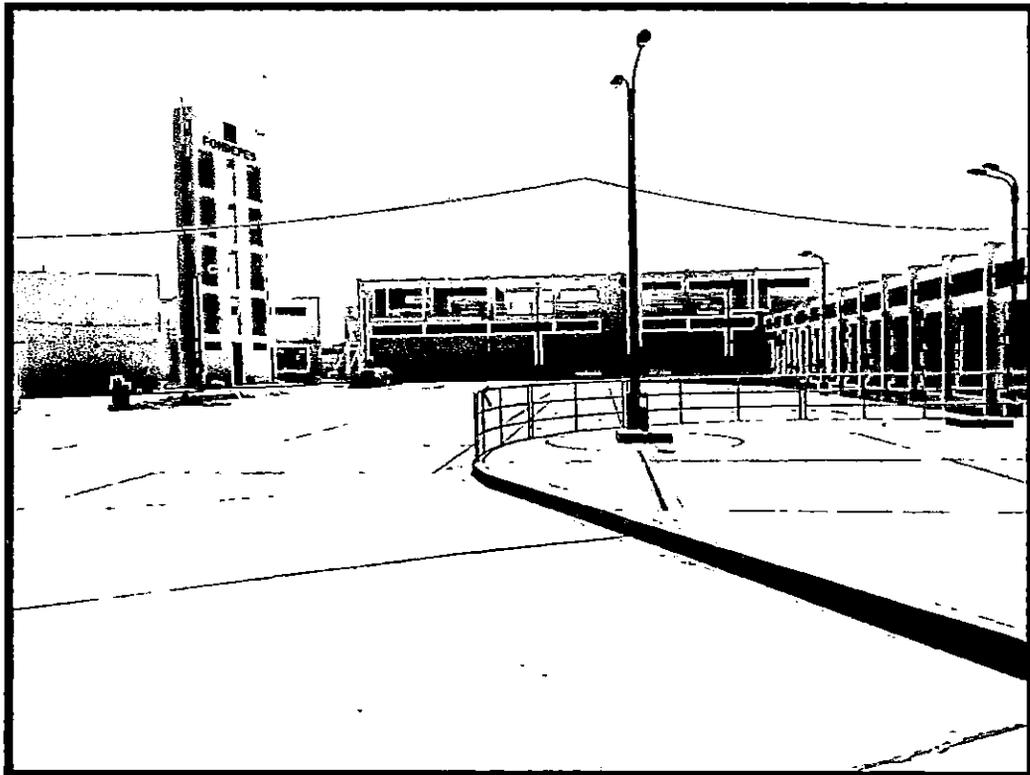

**SUPERVISIÓN**

**ING. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA**

**RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N°08 DE ADICIONAL DE OBRA N°01**

02

**OBRA** : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO  
ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE  
TACNA, REGION TACNA"  
**ENTIDAD** : FONDEPES  
**SUPERVISION** : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA  
**CONTRATISTA** : CONSORCIO OBRAS  
**FECHA** : 28/02/2019

**MONTO DEL CONTRATO SIN IGV** : S/. 374,004.23  
**MONTO DEL CONTRATO CON IGV** : S/. 441,324.99

CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	VAL ACUM. ANTERIOR	VAL ACTUAL	VAL ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
TOTAL CONTRACTUAL SIN IGV	374,004.23				
VALORIZACION CONTRACTUALES SIN IGV		244,782.06	42,448.72	287,230.78	86,773.45
REAJUSTES		0.00	0.00	0.00	
VALORIZACION BRUTA		244,782.06	42,448.72	287,230.78	
AMORTIZACIONES					
DEL ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00	0.00
DEL ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AMORTIZACIONES		0.00	0.00	0.00	
VALORIZACION NETA		244,782.06	42,448.72	287,230.78	
I.G.V. (18%)	67,320.76	44,060.77	7,640.77	51,701.54	
TOTALES	441,324.99	288,842.83	50,089.49	338,932.32	
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA		65.45%	11.35%	76.80%	23.20%

  
DAVID MANUEL VALA FARFAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754

**VALORIZACION N°08 DE ADICIONAL DE OBRA N°01  
RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR**

03

**OBRA** : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"  
**ENTIDAD** : FONDEPES  
**SUPERVISOR** : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA  
**CONTRATISTA** : CONSORCIO OBRAS  
**FECHA** : 28/02/2019

ADELANTOS OTORGADOS	FECHA	MONTO C/IGV	MONTO S/IGV	% PRESUPUESTO
1.- Adelanto Directo		0.00	0.00	0.00%
2.- Adelanto de Materiales		0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

VALORIZACION N°08 DE ADICIONAL DE OBRA N°01 (FEBRERO 2019)		
DESCRIPCIÓN		MONTO S/.
<b>RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS</b>		
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS		3,487.80
FORMULA 02 : SISTEMA DE AGUA RESIDUAL		203.82
FORMULA 03 : EMISOR SUBMARINO		32,585.00
FORMULA 04 : OSMOSIS INVERSA		0.00
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>		<b>36,276.62</b>
GASTOS GENERALES 8.214000%		2,979.76
UTILIDADES 8.800000%		3,192.34
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL</b>		<b>42,448.72</b>
FACTOR DE RELACIÓN 1.000		<b>42,448.72</b>
<b>SUB-TOTAL VALORIZACION CONTRACTUAL</b>		<b>S/ 42,448.72</b>
<b>RESUMEN DE REAJUSTES</b>		
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS	Kr = 0.000	0.00
FORMULA 02 : SISTEMA DE AGUA RESIDUAL	Kr = 0.000	0.00
FORMULA 03 : EMISOR SUBMARINO	Kr = 0.000	0.00
FORMULA 04 : OSMOSIS INVERSA	Kr = 0.000	0.00
	<b>TOTAL REINTEGRO</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE REAJUSTE Y DEDUCCIONES</b>		<b>S/ 0.00</b>
<b>DEDUCCIONES:</b>		
<b>- DEDUCCION DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DIRECTO</b>		
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS		0.00
FORMULA 02 : SISTEMA DE AGUA RESIDUAL		0.00
FORMULA 03 : EMISOR SUBMARINO		0.00
FORMULA 05 : OSMOSIS INVERSA		0.00
	<b>TOTAL DECUCCION AD</b>	<b>0.00</b>
<b>- DEDUCCION DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DE MATERIALES</b>		
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS		0.00
FORMULA 02 : ARQUITECTURA		0.00
FORMULA 03 : INSTALACIONES SANITARIAS		0.00
FORMULA 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS		0.00
FORMULA 05 : EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO		0.00
	<b>TOTAL DEDUCCION AM</b>	<b>0.00</b>
<b>VALORIZACION BRUTA (V.B.)</b>		<b>S/ 42,448.72</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>		
Amortización del Adelanto Directo		S/ 0.00
Amortización del Adelanto de Materiales 20.00%		S/ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>S/ 0.00</b>
<b>VALORIZACION NETA (V.N.)</b>		<b>S/ 42,448.72</b>
IGV 18% (VN)		7,640.77
<b>MONTO TOTAL A FACTURAR Y PAGAR AL CONTRATISTA (VN + IGV)</b>		<b>S/ 50,089.49</b>

  
**DAVID MANUEL VELA FARFAN**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 104754

### VALORIZACION N°08 DE ADICIONAL DE OBRA N°01

**OBRA** : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"  
**ENTIDAD** : FONDEPES  
**SUPERVISION** : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA  
**CONTRATISTA** : CONSORCIO OBRAS  
**FECHA** : 28/02/2019

Monto Base	S/. 441,324.99	Supervisión	: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA		
Monto Contratado	S/. 441,324.99	Contratista	: CONSORCIO OBRAS		
Fecha-Inicio de Obra	05/07/2018	<b>SEGÚN COSTO DIRECTO</b>			
Plazo de Ejecución	28 días	Monto Valorizado del Mes	S/. 36,276.62	11.35%	
Fecha-termino de Obra	01/08/2018	Monto Valorizado Acumulado	S/. 245,467.03	76.80%	
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios	Monto-Saldo por Valorizar	S/. 74,156.47	23.20%	

<b>Ubicación</b>		
Región	:	TACNA
Departamento	:	TACNA
Provincia	:	TACNA
Lugar	:	SAMA

N°	DESCRIPCION	AVANCES							SALDO	
		PARCIAL S/.	ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		%	Valorizado
			%	Valorizado S/.	%	Valorizado S/.	%	Valorizado S/.		
01	SUB-PRESUPUESTO 01 ESTRUCTURAS	31,874.29	58.17%	18,539.89	10.94%	3,487.80	69.11%	22,027.69	30.89%	9,846.59
02	SUB-PRESUPUESTO 02 SISTEMA DE AGUA RESIDUAL	65,552.29	53.12%	34,822.79	0.31%	203.82	53.43%	35,026.61	46.57%	30,525.68
03	SUB-PRESUPUESTO 03 EMISOR SUBMARINO	117,196.92	52.33%	61,327.72	27.80%	32,585.00	80.13%	93,912.72	19.87%	23,284.20
04	SUB-PRESUPUESTO 04 OSMOSIS INVERSA	105,000.00	90.00%	94,500.00	0.00%	0.00	90.00%	94,500.00	10.00%	10,500.00

<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>	<b>319,623.50</b>	<b>209,190.41</b>	<b>36,276.62</b>	<b>245,467.03</b>	<b>74,156.47</b>
GASTOS GENERALES (8.214 %)	26,253.87	17,182.90	2,979.76	20,162.66	6,091.21
UTILIDAD (8.8%)	28,126.87	18,408.76	3,192.34	21,601.10	6,525.77
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>	<b>374,004.24</b>	<b>244,782.06</b>	<b>42,448.72</b>	<b>287,230.78</b>	<b>86,773.45</b>
I.G.V. (18.0 %)	67,320.76	44,080.77	7,640.77	51,701.54	15,619.22
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>	<b>441,324.99</b>	<b>288,862.83</b>	<b>50,089.49</b>	<b>338,932.33</b>	<b>102,392.67</b>

DAVID ANTONIO VEDA FARFAN  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. C.P.N.º 104754

OF

**VALORIZACION N°08 DE ADICIONAL DE OBRA N°01**

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"  
 ENTIDAD : FONDEPES  
 SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA  
 CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS  
 FECHA : 28/02/2019

Monto Base	S/. 441,324.99
Monto Contratado	S/. 441,324.99
Fecha-Inicio de Obra	05/07/2018
Plazo de Ejecución	28 días
Fecha-termino de Obra	01/08/2018
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios

Supervisión	: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
Contratista	: CONSORCIO OBRAS
<b>SEGÚN COSTO DIRECTO</b>	
Monto Valorizado del Mes	: S/. 3,487.80 10.84%
Monto Valorizado Acumulado	: S/. 22,027.89 89.11%
Monto-Saldo por Valorizar	: S/. 9,848.59 30.89%

<b>Ubicación</b>	
Región	: TACNA
Departamento	: TACNA
Provincia	: TACNA
Lugar	: SAMA

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCES						SALDO					
		Unid.	Metrado	P. Unitario S/.	Presupuesto S/.	ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		%	Metrado	Valorizado			
						%	Metrado S/.	Valorizado S/.	%	Metrado S/.	Valorizado S/.						
01	ESTRUCTURAS																
01.01	DEFENSA COMPLEMENTARIA EN MUELLE 2																
01.01.01	ESTRUCTURA DE MADERA PARA DEFENSA DE MUELLE	m	135.00	65.71	8,870.85	0%	0.00	0.00	0%	0.00	-	0%	0.00	0.00	100%	135.00	8,870.85
01.01.02	DEFENSA DE MUELLE - LLANTAS DE CAUCHO ARO 20	und	30.00	116.28	3,487.80	0%	0.00	0.00	100%	30.00	3,487.80	100%	30.00	3,487.80	0%	0.00	0.00
01.02	ESTRUCTURAS METALICAS																
01.02.01	INCREMENTO COLUMNA METALICA COBERTURA 04	kg	1,847.44	9.82	18,141.89	95%	1755.07	17,234.75	0%	0.00	-	95%	1,755.07	17,234.75	8%	92.37	907.11
01.02.02	PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE ARENADO	m2	47.29	29.05	1,373.77	95%	44.93	1,305.14	0%	0.00	-	95%	44.93	1,305.14	8%	2.36	68.83

<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>		<b>31,874.29</b>	<b>18,539.89</b>	<b>3,487.80</b>	<b>22,027.89</b>	<b>9,848.59</b>
GASTOS GENERALES (6.214 %)		2,818.16	1,522.87	288.49	1,809.35	808.80
UTILIDAD (8.8%)		2,804.94	1,631.51	308.93	1,939.44	868.50
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>		<b>37,297.39</b>	<b>21,694.27</b>	<b>4,081.21</b>	<b>25,776.68</b>	<b>11,521.89</b>
I.G.V. (18.0 %)		6,713.53	3,904.97	734.62	4,639.59	2,073.84
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>		<b>44,010.90</b>	<b>25,599.24</b>	<b>4,815.83</b>	<b>30,415.07</b>	<b>13,595.83</b>

DAVID DEL PUERTO VELA FARFAN  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 104754

**VALORIZACION N°08 DE ADICIONAL DE OBRA N°01**

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"  
 ENTIDAD : FONDEPES  
 SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA  
 CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS  
 FECHA : 28/02/2018

Monte Base	S/. 441,324.89
Monte Contratado	S/. 441,324.89
Fecha-inicio de Obra	05/07/2018
Plazo de Ejecución	28 días
Fecha-termino de Obra	01/08/2018
Modalidad de Ejecución	Precio Unitario

Supervisión	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS	
<b>SEGUN COSTO DIRECTO</b>		
Monto Valorizado del Mes	S/. 203.82	0.31%
Monto Valorizado Acumulado	S/. 35,028.61	53.43%
Monto-Saldo por Valorizar	S/. 30,825.68	46.57%

<b>Ubicación</b>	
Región	TACNA
Departamento	TACNA
Provincia	TACNA
Lugar	SAMA

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			AVANCES						SALDO						
		Unid.	Metrado	P. Unitario S/.	Presupuesto S/.	ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		%	Metrado	Valorizado			
						%	Metrado S/.	Valorizado S/.	%	Metrado S/.	Valorizado S/.						
02	SISTEMA DE AGUA RESIDUAL																
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m	288.00	3.28	841.08	100%	288.00	841.08	0%	0.00	-	100%	288.00	841.08	0%	0.00	0.00
02.01.02	EXCAV. DE ZANJAS P/TUBERIA	m	188.00	11.88	1,845.44	87%	138.83	1,588.17	0%	0.00	-	87%	138.83	1,588.17	13%	21.17	247.27
02.01.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA HDPE	m	188.00	2.13	336.54	68%	108.83	227.55	0%	0.00	-	68%	108.83	227.55	32%	51.17	108.99
02.01.04	PREPARACION CAMA DE APOYO (s=10cm)	m	188.00	7.22	1,140.78	68%	108.83	771.31	0%	0.00	-	68%	108.83	771.31	32%	51.17	369.45
02.01.05	RELLENO COMPACTADO C/PLANCHA VIBRATORIA MANUAL	m	158.00	48.25	7,781.50	0%	0.00	0.00	0%	0.00	-	0%	0.00	0.00	100%	158.00	7,781.50
02.01.06	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO DIAMANTADO	m	317.00	1.13	358.21	82%	260.78	294.88	0%	0.00	-	82%	260.78	294.88	18%	58.22	83.53
02.01.07	ROTURA DE CONCRETO DE LOSA DE PISO	m2	79.00	18.40	1,453.60	66%	52.18	959.67	0%	0.00	-	66%	52.18	959.67	34%	28.84	483.93
02.01.08	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	m3	132.72	30.00	3,981.60	6%	10.43	312.94	0%	0.00	-	6%	10.43	312.94	82%	122.29	3,688.66
02.01.09	REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO espesor = 0.15	m2	79.00	156.27	12,345.33	10%	8.28	1,294.54	0%	0.00	-	10%	8.28	1,294.54	90%	70.72	11,050.79
02.01.10	FIJACION DE LA TUBERIA EXPUESTA CON CONCRETO CICLOPEO	m3	3.93	644.85	2,141.65	89%	3.50	1,809.94	0%	0.00	-	89%	3.50	1,809.94	11%	0.43	231.71
02.02	TUBERIA																
02.02.01	SUM. E INST. TUBERIA HDPE 2" ENTERRADA	m	168.00	71.84	11,350.72	87%	138.83	9,828.87	0%	0.00	-	87%	138.83	9,828.87	13%	21.17	1,520.65
02.02.02	SUM. E INST. TUBERIA HDPE 2" EXPUESTA CUBIERTA CON CONCRETO CICLOPEO	m	100.00	71.84	7,184.00	88%	87.82	6,294.62	0%	0.00	-	88%	87.82	6,294.62	12%	12.39	889.39
02.02.03	SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS DE HDPE DE 2"	m	258.00	3.72	959.78	0%	0.00	0.00	0%	0.00	-	0%	0.00	0.00	100%	258.00	959.78
02.03	ULTRASONIDO - CONTROL DE CALIDAD																
02.03.01	VERIFICACION DE LA INSPECCION ULTRASONICA DE JUNTA	m	258.00	9.17	2,365.86	0%	0.00	0.00	0%	0.00	-	0%	0.00	0.00	100%	258.00	2,365.86
02.04	PRUEBA DE NIVELACION																
02.04.01	PRUEBA DE NIVELACION P/DESAGUE	m	258.00	0.78	203.82	0%	0.00	0.00	100%	258.00	203.82	100%	258.00	203.82	0%	0.00	0.00

DAVID J. VILLAVELA FARRAN  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 104754

88

**VALORIZACION N°08 DE ADICIONAL DE OBRA N°01**

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"  
 ENTIDAD : FONDEPES  
 SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA  
 CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS  
 FECHA : 28/02/2019

Monto Base	S/. 441,324.89
Monto Contratado	S/. 441,324.89
Fecha-Inicio de Obra	05/07/2018
Plazo de Ejecución	28 días
Fecha-termino de Obra	01/08/2018
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios

Supervisión	: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
Contratista	: CONSORCIO OBRAS
<b>SEGUN COSTO DIRECTO</b>	
Monto Valorizado del Mes	: S/. 203.82 0.31%
Monto Valorizado Acumulado	: S/. 35,026.61 53.43%
Monto-Saldo por Valorizar	: S/. 30,525.68 46.57%

Ubicación	:	TACNA
Región	:	TACNA
Departamento	:	TACNA
Provincia	:	TACNA
Lugar	:	SAMA

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			AVANCES									SALDO				
		Unid.	Metrado	P. Unitario S/.	Presupuesto S/.	ACUMULADO ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			%	Metrado	Valorizado	
						%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.				
02.05	PRUEBA HIDRAULICA																	
02.05.01	PRUEBA HIDRAULICA P/DESAGUE	m	258.00	3.00	774.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	-	0%	0.00	0.00	100%	258.00	774.00	
02.06	EQUIPOS DE BOMBEO DE DESAGUE DOMESTICO																	
02.06.01	SUM. E INST. ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES Q=3.00 LT/S POT=2.5HP HDT=21m	und	2.00	4,722.82	9,445.24	100%	2.00	9,445.24	0%	0.00	-	100%	2.00	9,445.24	0%	0.00	0.00	
02.06.02	SUM. E INST. ACEBORIOS PARA BOMBA SUMERGIBLE Q=3.00 LT/S POT=2.5HP HDT=21m	GLB	1.00	1,043.18	1,043.18	100%	1.00	1,043.18	0%	0.00	-	100%	1.00	1,043.18	0%	0.00	0.00	
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>					<b>65,662.28</b>		<b>34,822.79</b>		<b>203.82</b>		<b>35,026.61</b>		<b>30,525.68</b>					
GASTOS GENERALES (8.214 %)					5,384.47		2,880.34		16.74		2,877.09		2,507.38					
UTILIDAD (8.8%)					5,788.60		3,064.41		17.84		3,082.34		2,688.28					
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					<b>76,705.36</b>		<b>40,747.54</b>		<b>238.60</b>		<b>40,986.04</b>		<b>35,719.32</b>					
I.G.V. (18.0 %)					13,806.98		7,334.66		42.93		7,377.49		6,429.48					
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					<b>90,512.33</b>		<b>48,082.10</b>		<b>281.43</b>		<b>48,363.53</b>		<b>42,148.80</b>					

DAVID MANUEL VELAZQUEZ FARFAN  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. C.P. N° 104754

08

**VALORIZACION N°08 DE ADICIONAL DE OBRA N°01**

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"  
 ENTIDAD : FONDEPES  
 SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA  
 CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS  
 FECHA : 28/02/2018

Monto Base	S/. 441,324.99
Monto Contratado	S/. 441,324.99
Fecha-Inicio de Obra	05/07/2018
Plazo de Ejecución	28 días
Fecha-termino de Obra	01/08/2018
Modalidad de Ejecución	Presios Unitarios

Supervisión	: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
Contratista	: CONSORCIO OBRAS
<b>SEGÚN COSTO DIRECTO</b>	
Monto Valorizado del Mes	: S/. 32,685.00 27.80%
Monto Valorizado Acumulado	: S/. 93,912.72 80.13%
Monto-Saldo por Valorizar	: S/. 23,284.20 19.87%

<b>Ubicación</b>	
Región	: TACNA
Departamento	: TACNA
Provincia	: TACNA
Lugar	: SAMA

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCES									SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unitario S/.	Presupuesto S/.	ACUMULADO ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			%	Metrado	Valorizado	
						%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.				
04	EMISOR SUBMARINO																	
04.01	SUMINISTRO DE TUBERIA																	
04.01.01	SUM. E INST. DE TUBERIA LISA HDPE PECC-100 Dext. 169MM(6") PN-10	m	120.00	33.02	3,962.40	100%	120.00	3,962.40	0%	0.00	-	100%	120.00	3,962.40	0%	0.00	0.00	
04.01.02	SUM. E INST. DE LINEA AUXILIAR DE 80MM PARA MANIOBRA DE FLOTACION	m	120.00	18.53	1,893.60	0%	0.00	0.00	0%	0.00	-	0%	0.00	0.00	100%	120.00	1,893.60	
04.01.03	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE TUBERIAS HDPE	GLB	1.00	1,326.00	1,326.00	100%	1.00	1,326.00	0%	0.00	-	100%	1.00	1,326.00	0%	0.00	0.00	
04.01.04	CONSTRUCCION E INST. LASTRE DE CONCRETO F'c=280Kg/cm2 TIPO II	und	71.00	205.12	14,563.52	100%	71.00	14,563.52	0%	0.00	-	100%	71.00	14,563.52	0%	0.00	0.00	
04.01.05	INSTALACION DE LASTRE	und	378.00	68.62	26,257.98	26%	100.00	6,862.00	0%	0.00	-	26%	100.00	6,862.00	74%	278.00	18,575.98	
04.02	TERMOFUSION																	
04.02.01	SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS DE 160 MM PN-10	m	120.00	9.32	1,118.40	100%	120.00	1,118.40	0%	0.00	-	100%	120.00	1,118.40	0%	0.00	0.00	
04.02.02	SERVICIO DE TERMOFUSION DE TUBERIAS DE 80 MM PN-10 (LINEAS 1.00 LINEAS AUXILIAR)	m	120.00	3.72	446.40	0%	0.00	0.00	0%	0.00	-	0%	0.00	0.00	100%	120.00	446.40	
04.03	ULTRASONIDO - CONTROL DE CALIDAD																	
04.03.01	VERIFICACION DE LA INSPECCION ULTRASONICA DE JUNTA	m	240.00	9.17	2,200.80	50%	120.00	1,100.40	0%	0.00	-	50%	120.00	1,100.40	50%	120.00	1,100.40	
04.04	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO																	
04.04.01	TRASLADO VIA MARITIMA DE TUB. TERMOFUSIONADA DE "LA MECA" A DPA MORROSA	GLB	1.00	10,000.00	10,000.00	100%	1.00	10,000.00	0%	0.00	-	100%	1.00	10,000.00	0%	0.00	0.00	
04.04.02	LANZAMIENTO Y HUNDIMIENTO DE LINEA MODIFICADO	m	840.00	75.25	48,180.00	47%	300.00	22,675.00	53%	340.00	25,565.00	100%	840.00	48,180.00	0%	0.00	0.00	
04.04.03	FIJACION PRIMEROS METROS DE TUBERIA CON CONCRETO CICLOPEO	m3	3.75	314.09	1,177.84	0%	0.00	0.00	0%	0.00	-	0%	0.00	0.00	100%	3.75	1,177.84	
04.04.04	PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA EMISOR SUBMARINO MODIFICADO	GLB	1.00	7,000.00	7,000.00	0%	0.00	0.00	100%	1.00	7,000.00	100%	1.00	7,000.00	0%	0.00	0.00	
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>					<b>117,196.92</b>		<b>61,327.72</b>		<b>32,685.00</b>		<b>93,912.72</b>		<b>23,284.20</b>					
<b>GASTOS GENERALES (8.214 %)</b>					<b>8,626.55</b>		<b>5,037.48</b>		<b>2,678.53</b>		<b>7,713.99</b>		<b>1,912.58</b>					
<b>UTILIDAD (8.8%)</b>					<b>10,313.33</b>		<b>5,399.84</b>		<b>2,867.48</b>		<b>8,254.32</b>		<b>2,049.01</b>					
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					<b>137,136.80</b>		<b>71,762.02</b>		<b>38,129.01</b>		<b>109,891.03</b>		<b>27,245.77</b>					
<b>I.G.V. (18.0 %)</b>					<b>24,684.82</b>		<b>12,917.16</b>		<b>6,883.22</b>		<b>18,760.39</b>		<b>4,904.24</b>					
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					<b>161,821.43</b>		<b>84,679.18</b>		<b>44,992.23</b>		<b>128,671.42</b>		<b>32,150.01</b>					

DAVID MENDOZA VELA CARPAN  
 INGENIERO CIVIL  
 Ref. CIP N° 104754

8

**VALORIZACION N°08 DE ADICIONAL DE OBRA N°01**

OBRA : SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"  
 ENTIDAD : FONDEPES  
 SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA  
 CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS  
 FECHA : 29/02/2019

Monto Base	S/. 441,324.99
Monto Contratado	S/. 441,324.99
Fecha-Inicio de Obra	05/07/2018
Plazo de Ejecución	28 días
Fecha-termino de Obra	01/08/2018
Modalidad de Ejecución	Precios Unitarios

Supervisión	: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA
Contralista	: CONSORCIO OBRAS
<b>SEGÚN COSTO DIRECTO</b>	
Monto Valorizado del Mes	: S/. 0.00 0.00%
Monto Valorizado Acumulado	: S/. 94,600.00 90.00%
Monto-Saldo por Valorizar	: S/. 10,600.00 10.00%

<b>Ubicación</b>	
Región	: TACNA
Departamento	: TACNA
Provincia	: TACNA
Lugar	: SAMA

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCES						SALDO					
		Unid.	Metrado	P. Unitario S/.	Presupuesto S/.	ACUMULADO ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO					
						%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.			
03	OSMOSIS INVERSA																
03.01	SUM. E INST. DE COMPONENTES Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE OS	GLB	1.00	105,000.00	105,000.00	90%	0.90	94,600.00	0%	0.00	-	90%	0.90	94,600.00	10%	0.10	10,600.00


<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>				<b>105,000.00</b>			<b>94,600.00</b>		<b>0.00</b>			<b>94,600.00</b>		<b>10,600.00</b>
<b>GASTOS GENERALES (8.214 %)</b>				<b>8,624.70</b>			<b>7,782.23</b>		<b>0.00</b>			<b>7,782.23</b>		<b>882.47</b>
<b>UTILIDAD (8.8%)</b>				<b>9,240.00</b>			<b>8,316.00</b>		<b>0.00</b>			<b>8,316.00</b>		<b>924.00</b>
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>				<b>122,864.70</b>			<b>110,678.23</b>		<b>0.00</b>			<b>110,678.23</b>		<b>12,286.47</b>
<b>I.G.V. (18.0 %)</b>				<b>22,115.65</b>			<b>19,904.08</b>		<b>0.00</b>			<b>19,904.08</b>		<b>2,211.58</b>
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO</b>				<b>144,980.35</b>			<b>130,482.31</b>		<b>0.00</b>			<b>130,482.31</b>		<b>14,498.03</b>

DAVID MANUEL VELA PARRAFAN  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CP N° 104754

09

**CRONOGRAMA EJECUTADO DE AVANCE FISICO DE LA OBRA**

DESCRIPCION		TIEMPO								TOTALES
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	FIN
		27 Días	31 Días	30 Días	31 Días	30 Días	31 Días	31 Días	28 Días	239 Días
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>		S/. 318,123.60	S/. 3,600.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 36,276.62	S/. 319,623.60
GASTOS GENERALES (8.214 %)	8.214%	S/. 26,066.38	S/. 287.49	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 2,978.78	
UTILIDAD (8.8%)	8.800%	S/. 27,816.87	S/. 308.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 3,182.34	
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>		S/. 369,908.76	S/. 4,095.49	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 42,448.72	
I.G.V. (18.0 %)	18.00%	S/. 66,583.57	S/. 737.19	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 7,640.77	
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO PROGRAMADO</b>		S/. 436,492.32	S/. 4,832.68	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 441,325.00
PRESUPUESTO MENSUAL EJECUTADO		S/. 933.88	S/. 184,422.13	S/. 6,230.37	S/. 82,788.34	S/. 14,488.03	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 60,089.48	
% MENSUAL EJECUTADO		0.21%	41.78%	1.41%	18.75%	3.29%	0.00%	0.00%	11.35%	78.80%
<b>PRESUPUESTO ACUMULADO</b>										
% ACUMULADO PROGRAMADO	0.00%	99.90%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
% ACUMULADO EJECUTADO	0.00%	0.21%	42.00%	43.41%	62.16%	65.45%	65.45%	65.45%	76.80%	

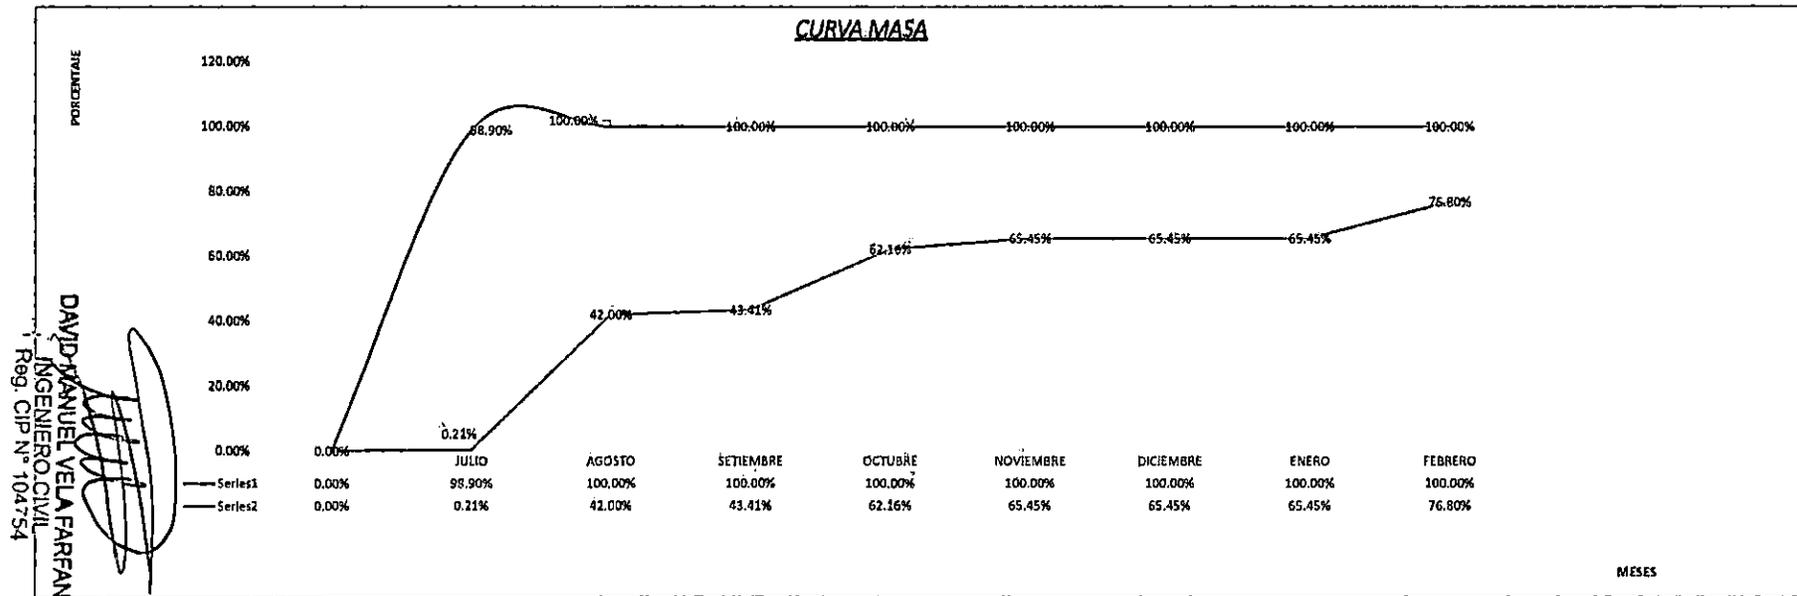




ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.

Consultorías y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:

- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas

11

## I. Panel fotográfico

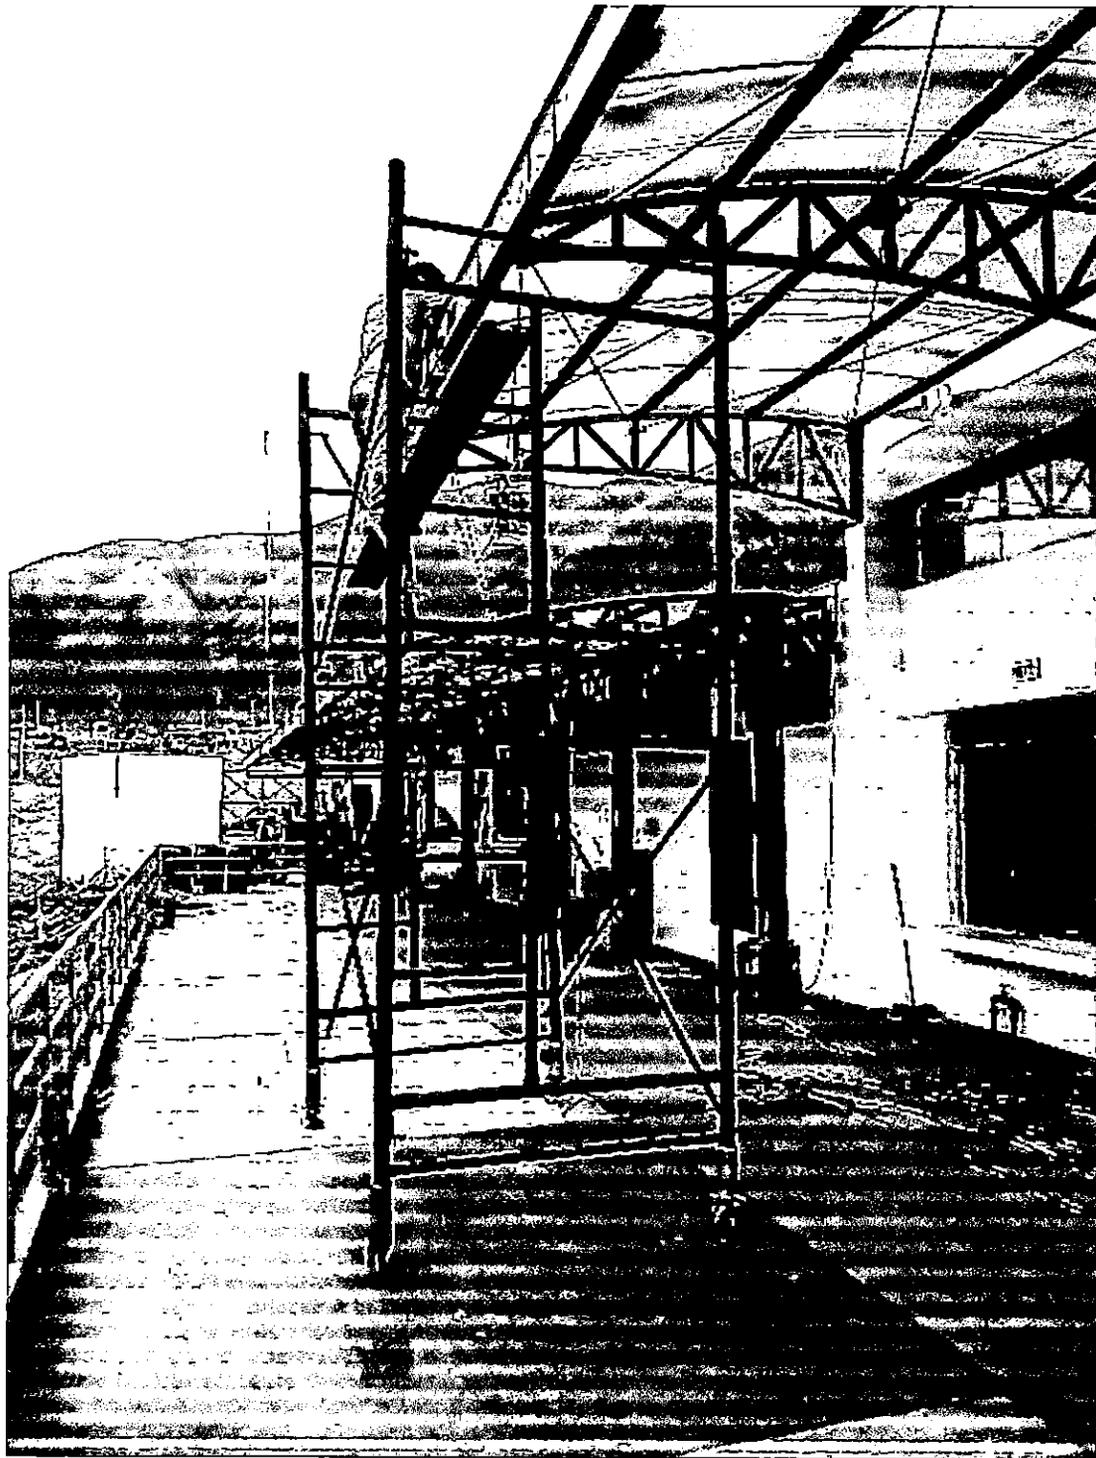

Fotografía N°01: Vista de operario levantado observaciones a canaleta de drenaje pluvial de coberturas.

  
DAVID MANRIQUE VELAZQUEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754



ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.

- Consultorias y Ejecución de Obras Públicas y Privadas etc
- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas

12



Fotografía N°02: Vista de inspección de obra por parte de FONDEPES.



Fotografía N°03: Vista de operarios soldadores realizando la confección de anclaje para poste de fibra de vidrio.

  
DAVID MANUEL VELA CARPAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754




ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.

Consultoras y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:

- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas

13

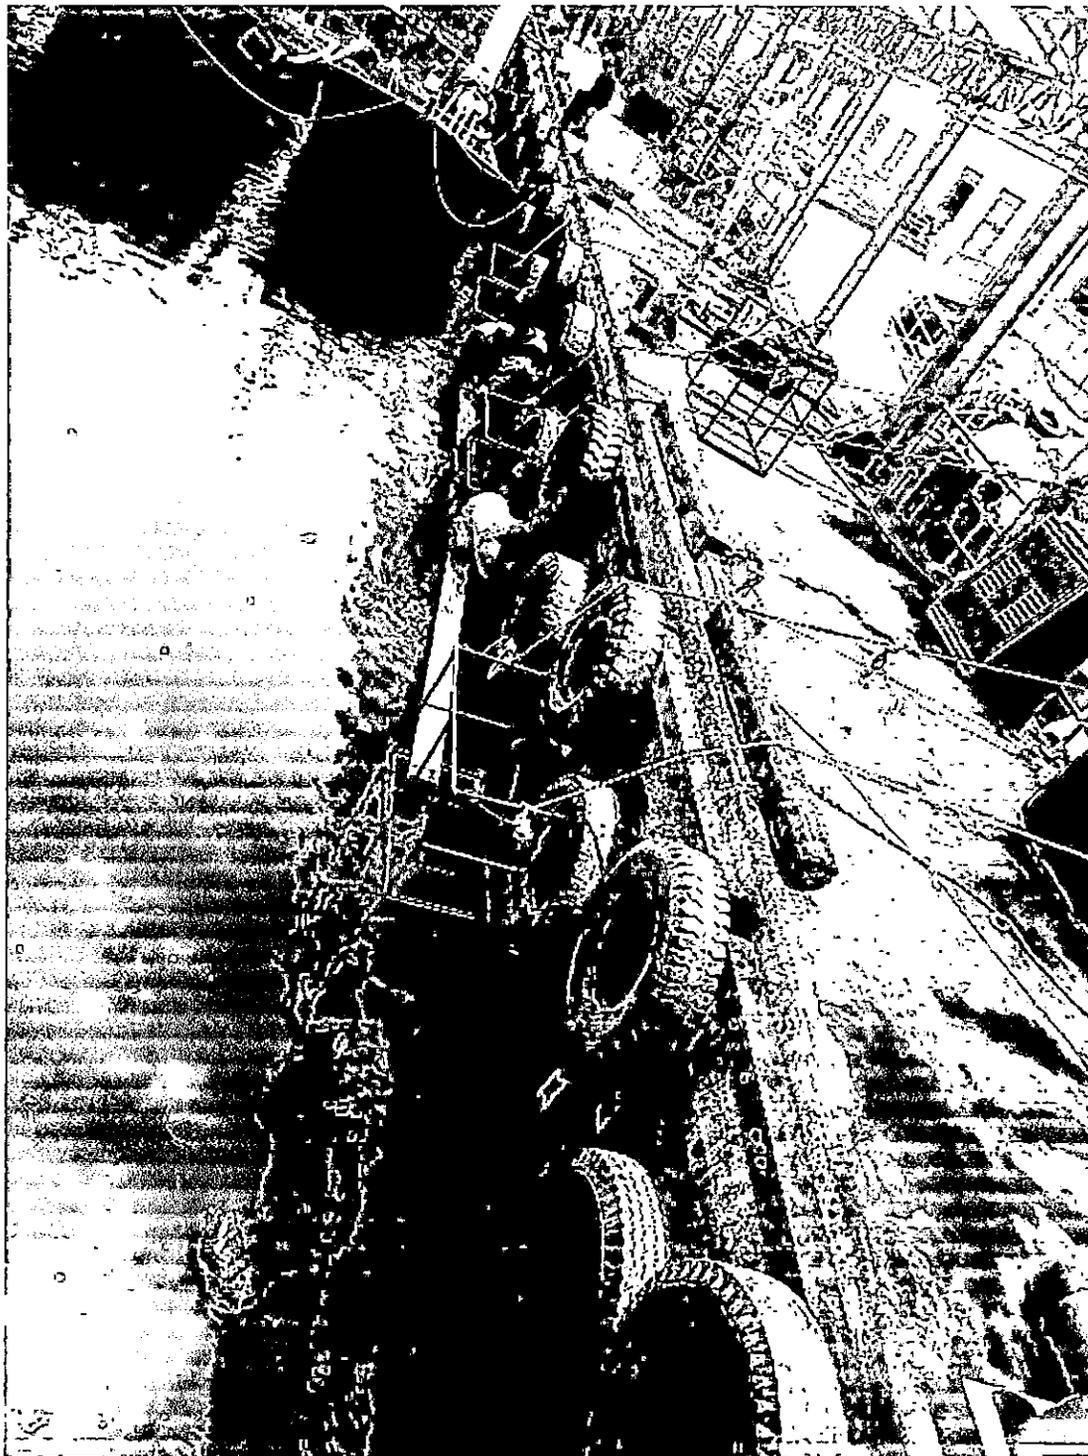

Fotografía N°04: Vista de defensa de muelle 01.

  
DAVID MANUEL VELA FARFAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 19475A




ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.

Consultoría y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:

- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas

14

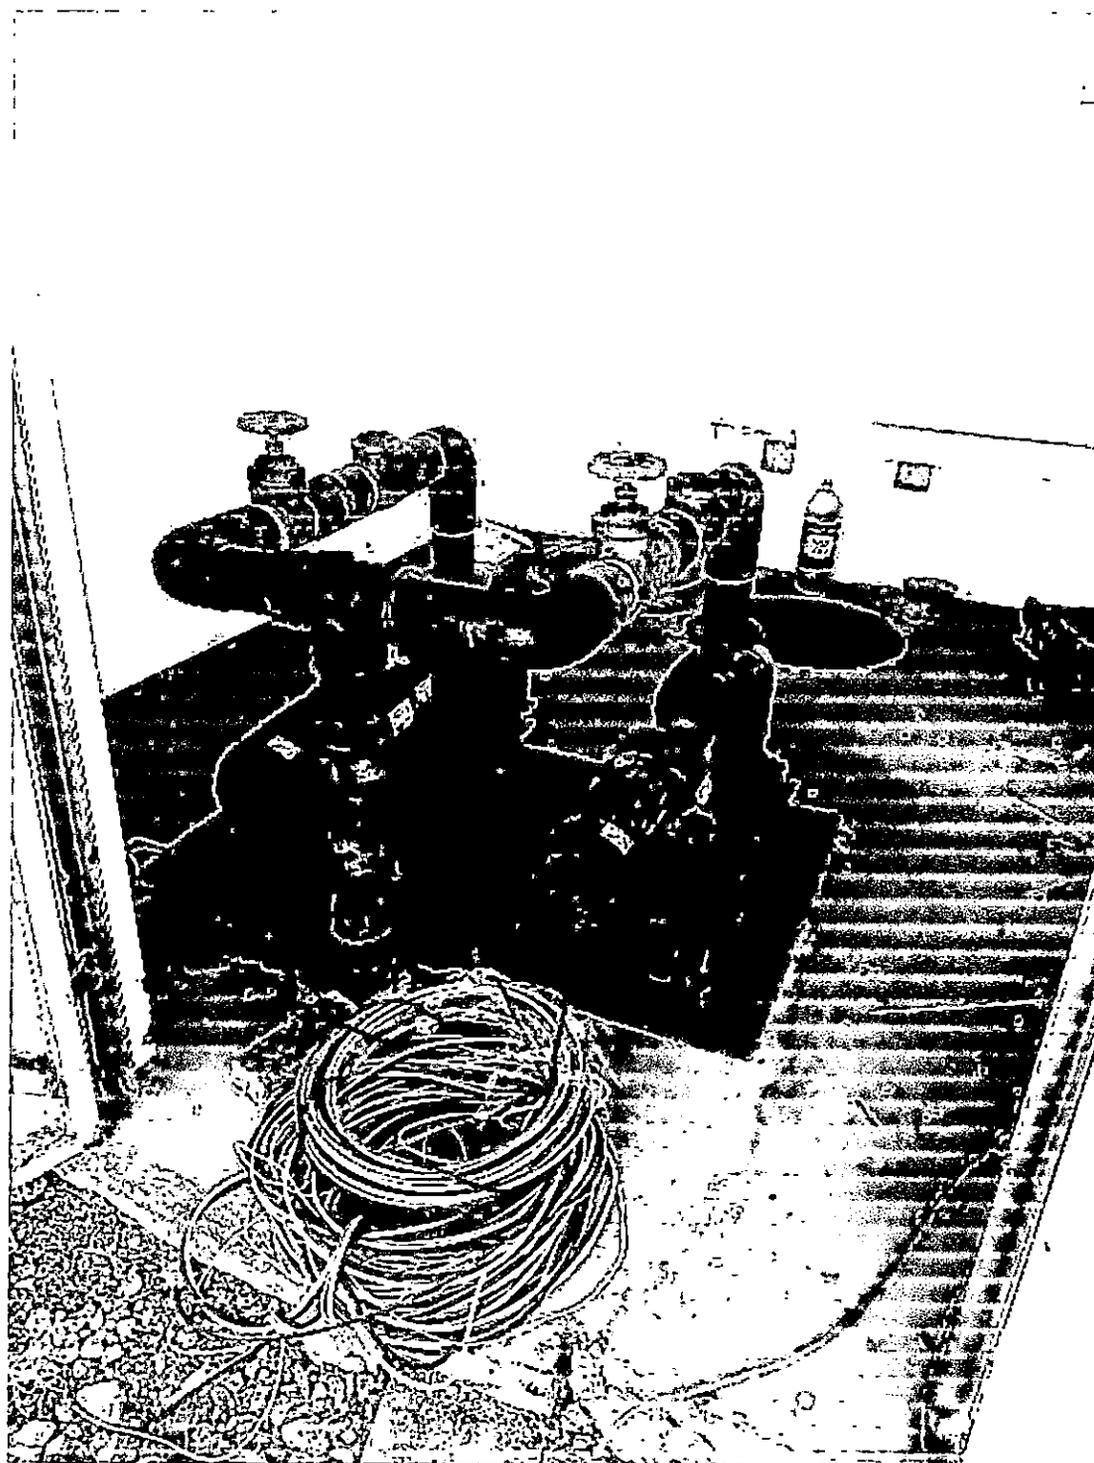

Fotografía N°05: Vista de estado de bombas centrífugas para emisor submarino cuyo árbol hidráulico se encuentra observado por no cumplir con especificaciones técnicas del proyecto.


  
DAVID MANUEL VELA PARFAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754




ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.

Consultorias y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:  
- Obras de Edificaciones  
- Obras de Carreteras  
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado  
- Obras de Electrificación  
- Obras Hidráulicas

16

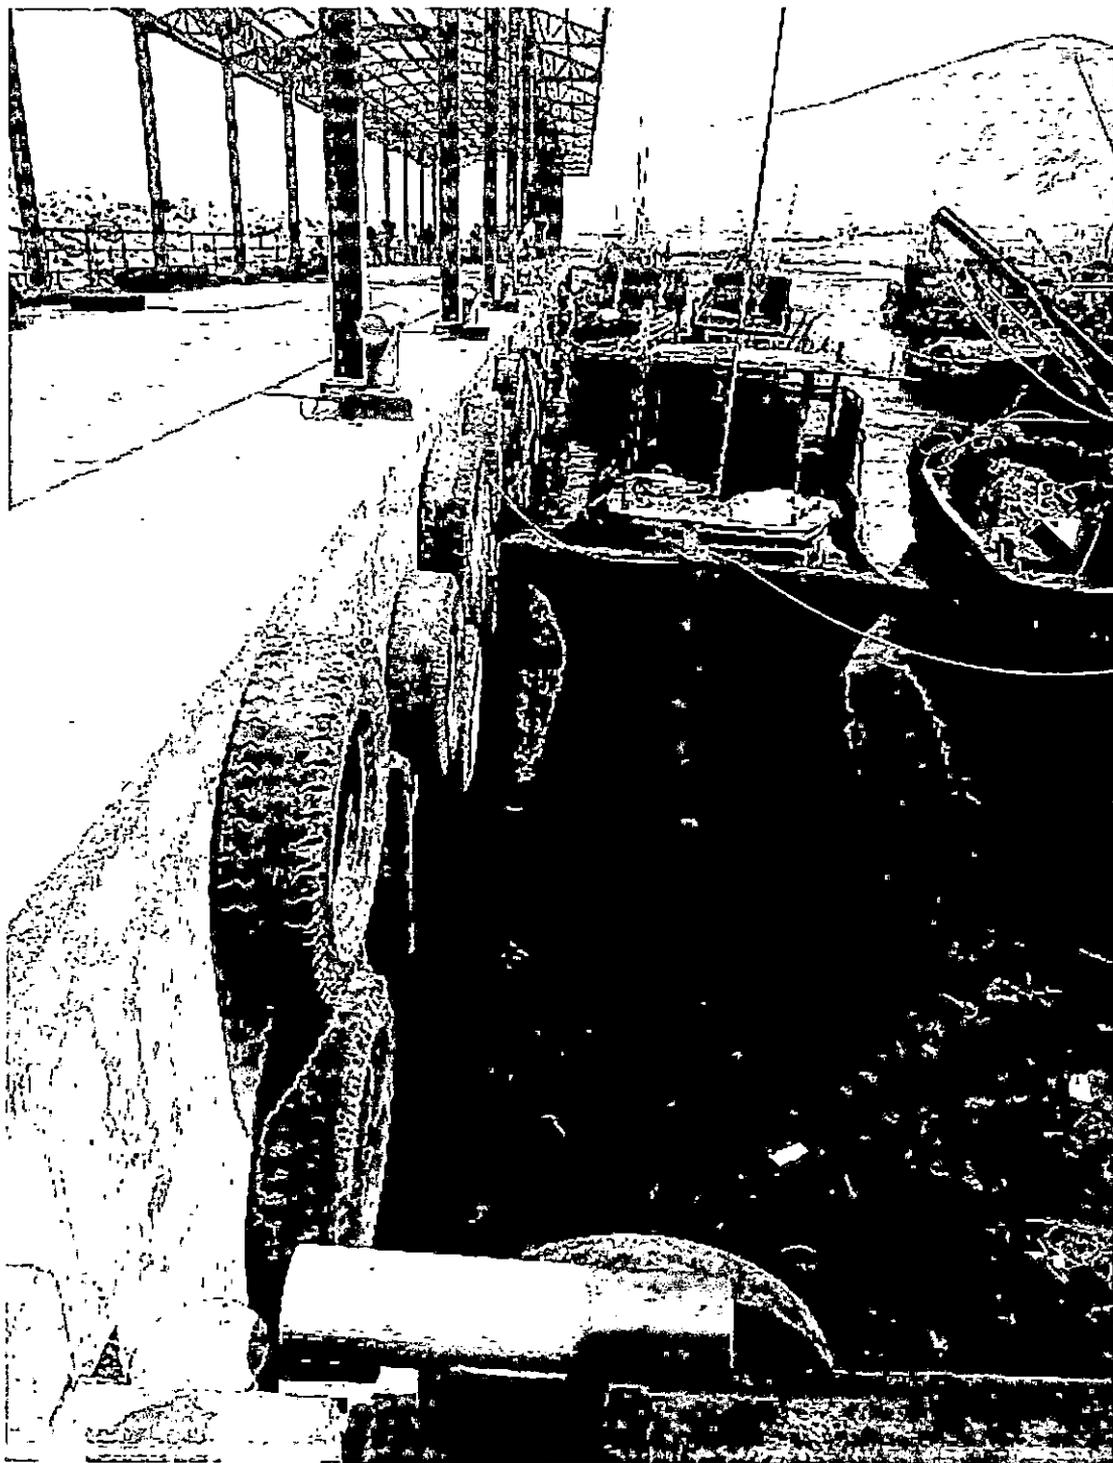

Fotografía N°06: Vista de defensa de muelle 2.

  
DAVID MANUEL VELA FARFAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754



ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.

Consultoría y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:

- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas

16



Fotografía N°07: Vista de instalación de tuberías Conduit en muelle 1.


  
DAVID MANUEL VELA FARFAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754



ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.

Consultorías y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:  
- Obras de Edificaciones  
- Obras de Carreteras  
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado  
- Obras de Electrificación  
- Obras Hidráulicas

17

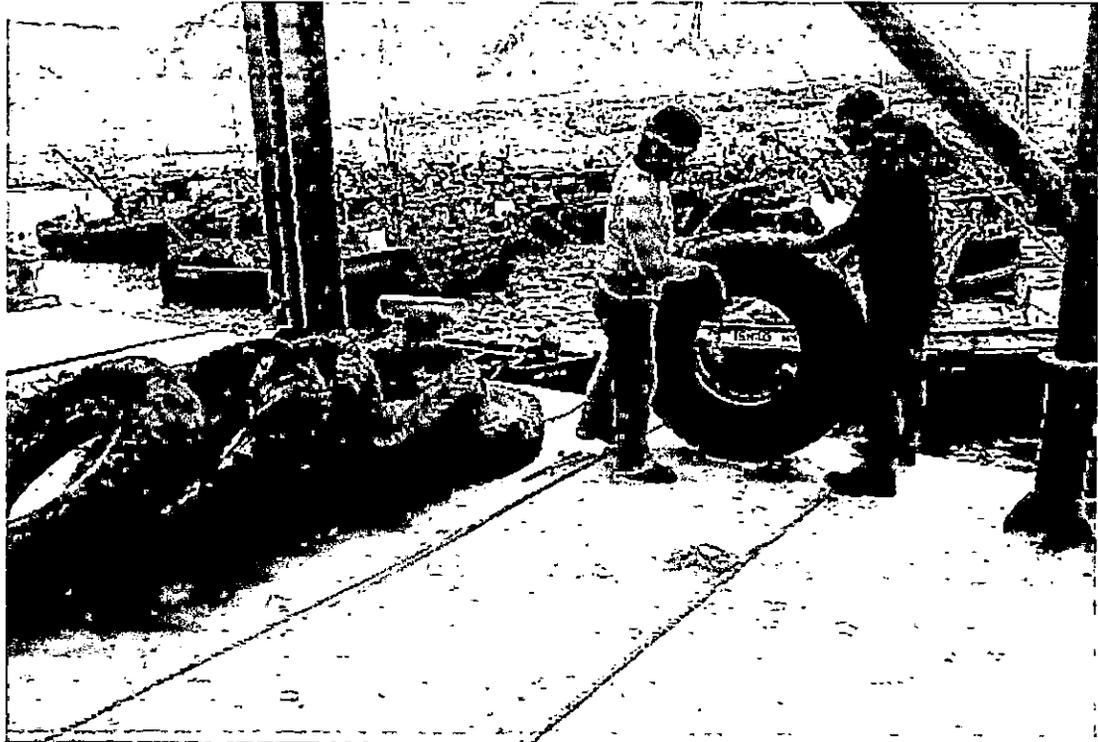

Fotografía N°08: Vista de colocación de llantas para defensa de muelles.



Fotografía N°09: Vista de personal operario realizando instalación de rejilla frente a cámara frigorífica de 5 ton.

  
DAVID MANUEL VELA FARFAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754



ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.

Consultorías y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:

- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas

18



Fotografía N°10: Vista de personal operario colocando cables para iluminación de muelles.

  
DAVID MANUEL VELA FARFAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754




ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.

Consultoría y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:

- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas

19

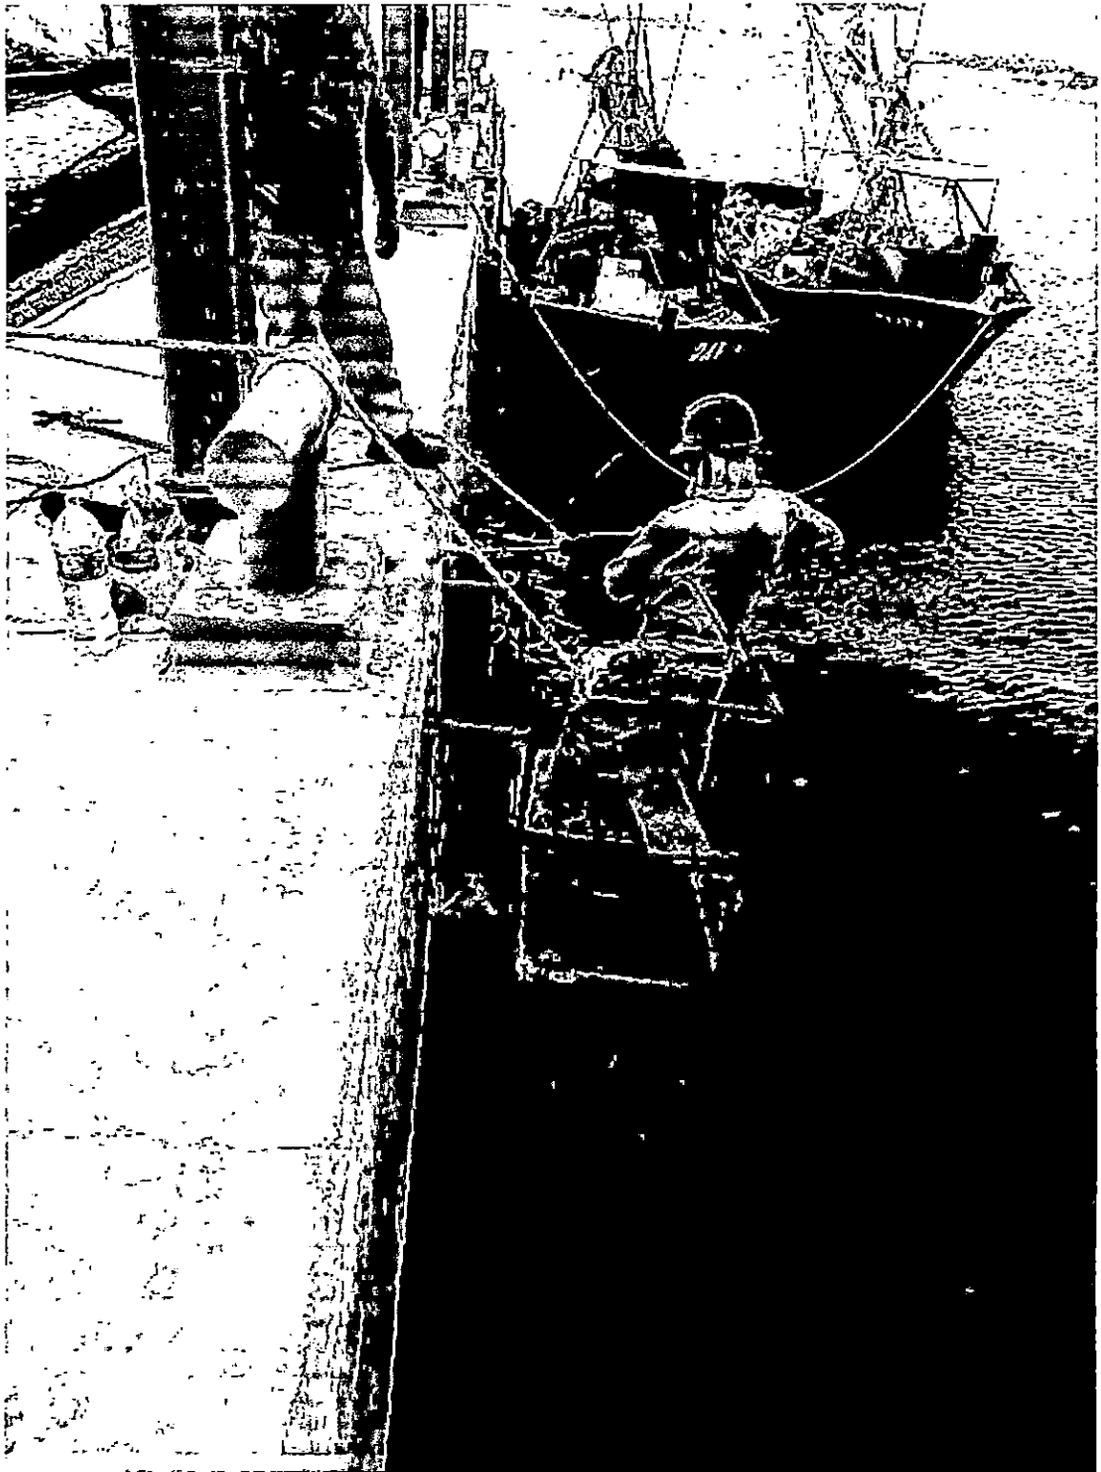

Fotografía N°11: Vista de operario realizando perforaciones en mandil de muelle 2 para instalación de defensas.

  
DAVID MANUEL VELA FARFAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754




ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.


Consultoras y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:

- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas

10

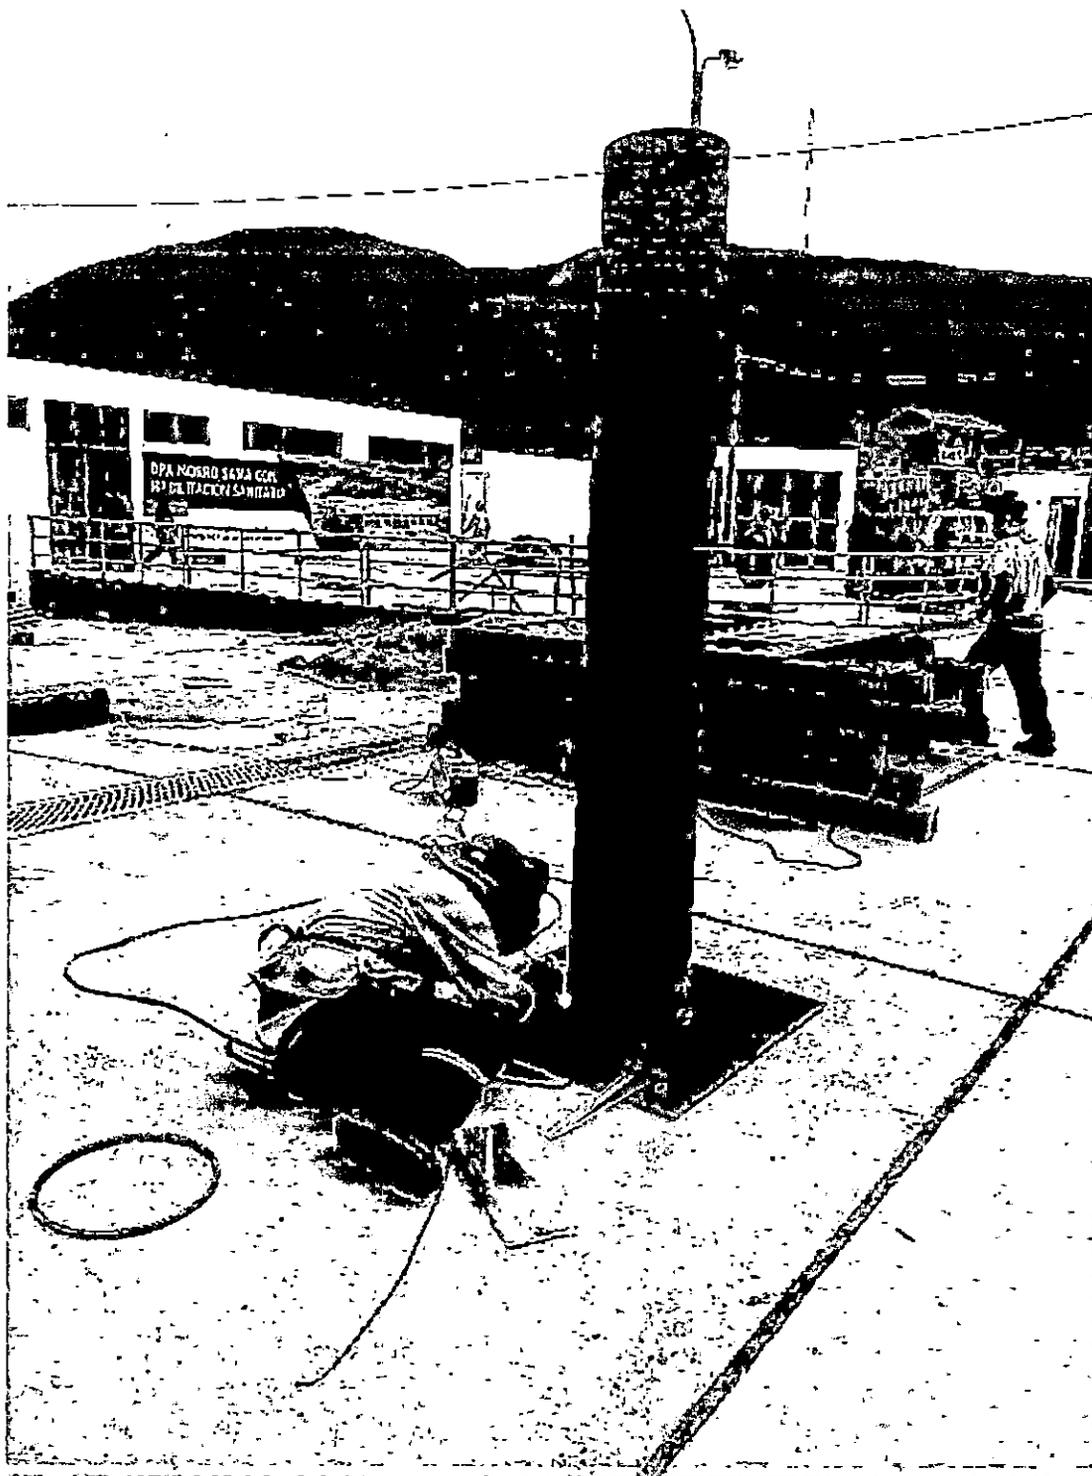

Fotografía N°12: Vista de base metálica para poste de fibra de vidrio.

  
DAVID MAMMUEL VELAZQUEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754




ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.

Consultoría y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:  
- Obras de Edificaciones  
- Obras de Carreteras  
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado  
- Obras de Electrificación  
- Obras Hidráulicas

21



Fotografía N°13: Vista de personal realizando cableados eléctricos.


  
DAVID MANDEL VELA FARFAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754




ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.

Consultoría y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:  
- Obras de Edificaciones  
- Obras de Carreteras  
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado  
- Obras de Electrificación  
- Obras Hidráulicas

22

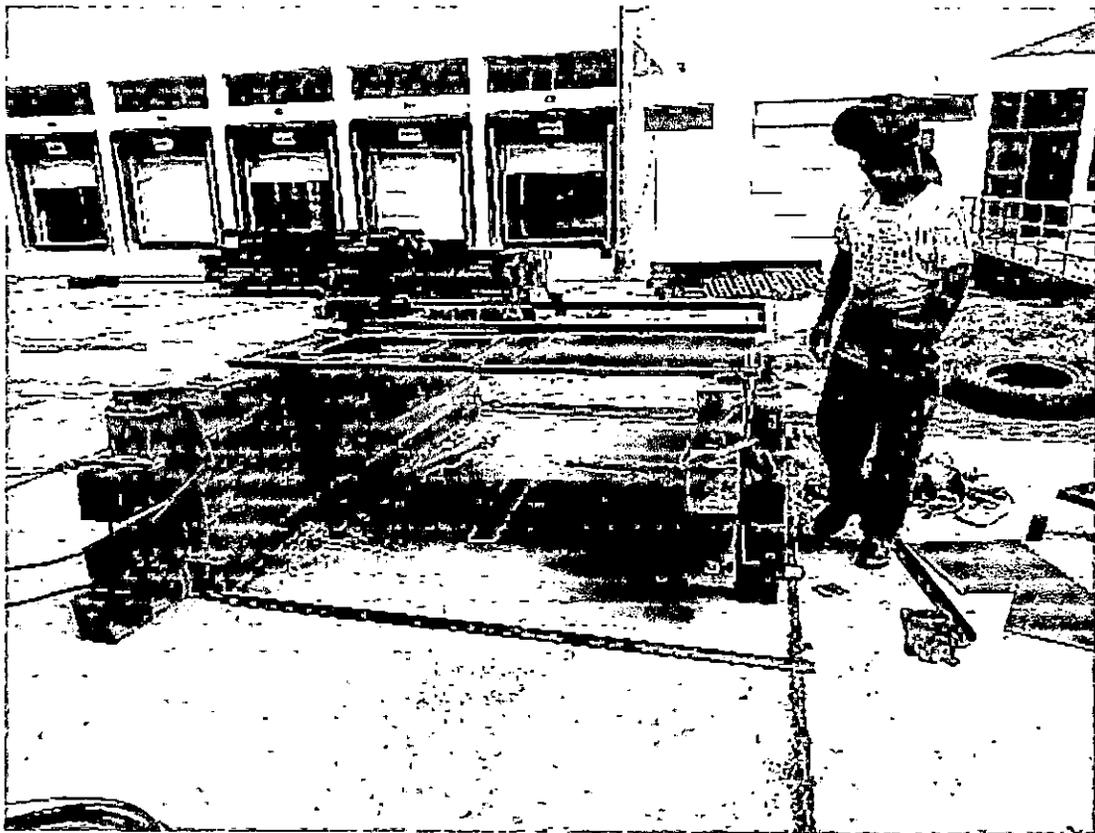

Fotografía N°14: Vista de confección de puertas metálicas.

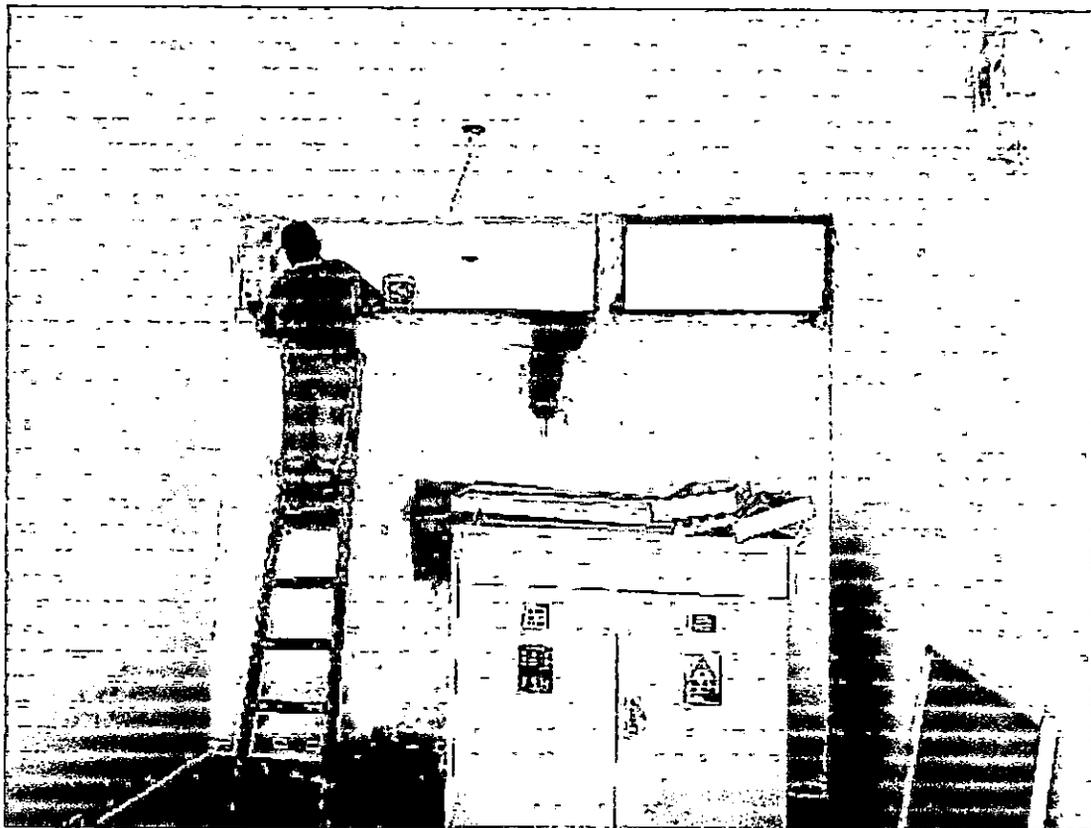

Fotografía N°15: Vista de personal resanando pintura en vanos


  
DAVID MANUEL VELA FARFÁN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754



ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.

Consultoría y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:  
- Obras de Edificaciones  
- Obras de Carreteras  
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado  
- Obras de Electrificación  
- Obras Hidráulicas

23

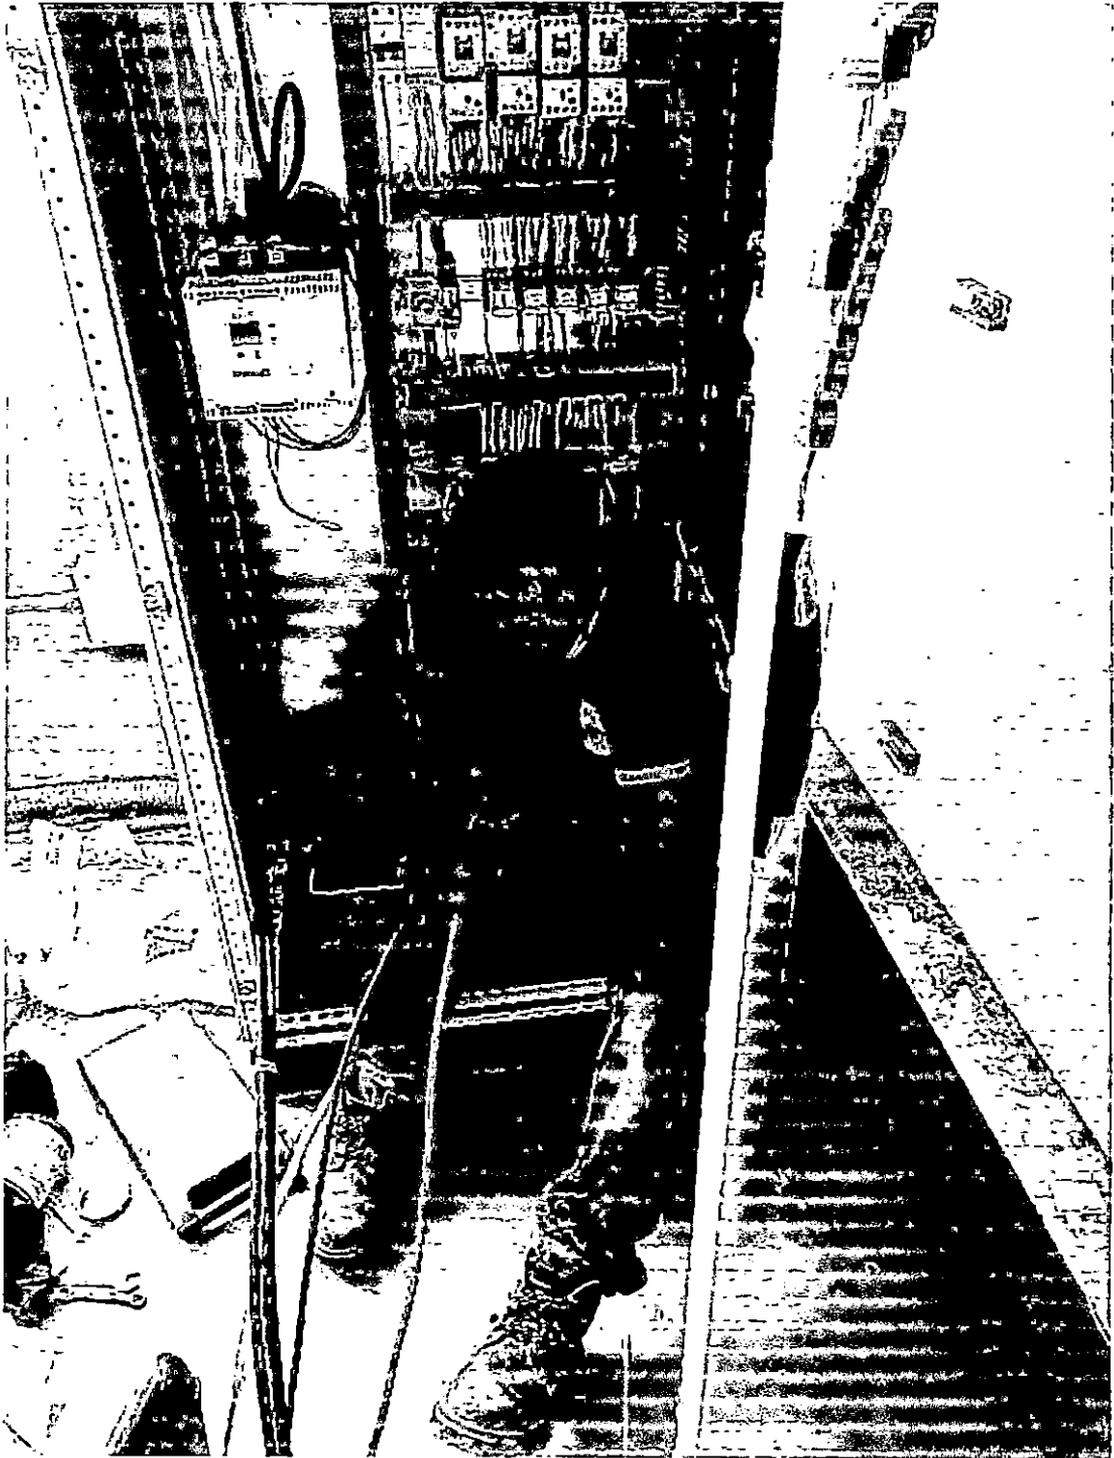

Fotografía N°16: Vista de trabajos eléctricos en tablero de productor de hielo en bloques.


  
DAVID MANUEL VELA PARFÁN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754



ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.


Consultoría y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:  
- Obras de Edificaciones  
- Obras de Carreteras  
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado  
- Obras de Electrificación  
- Obras Hidráulicas

24

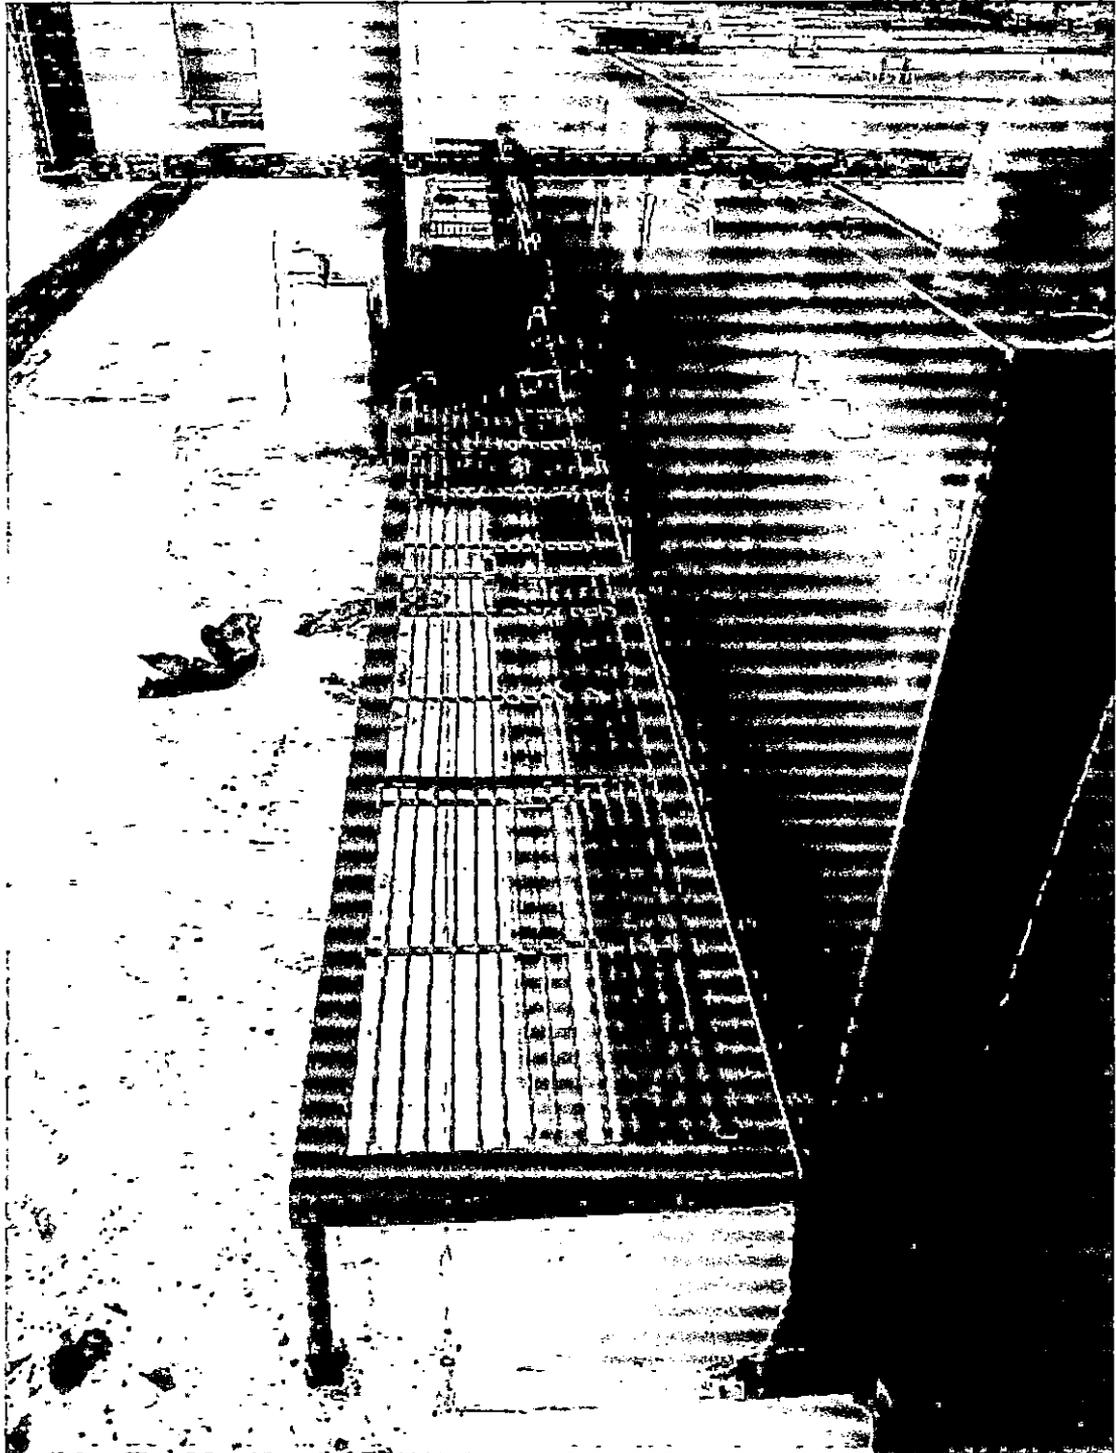


Fotografía N°17: Vista de pasarela junto a tanque de acero inoxidable que se encuentra observada por no corresponder a lo planteado en el proyecto.


  
DAVID MANUEL VELA FARPÁN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754

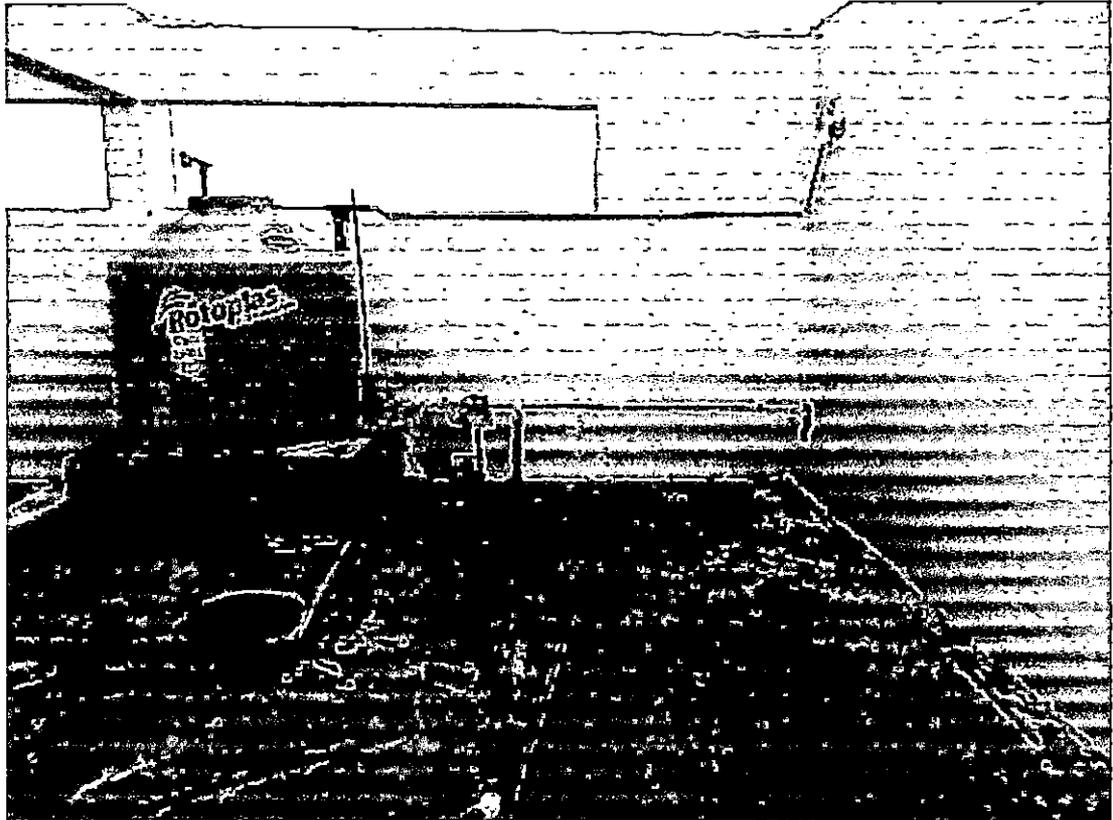

Fotografía N°18: Vista de tanque de 2500 lt para producción de hielo.

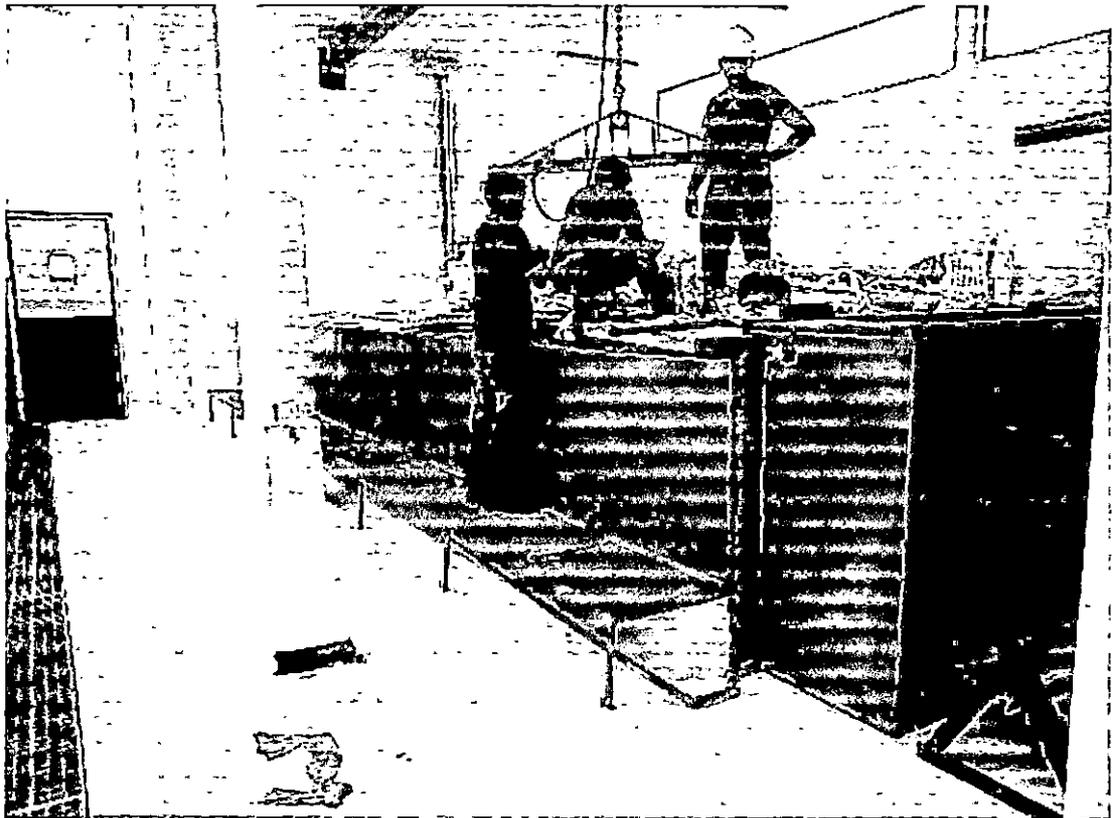

Fotografía N°19: Vista de personal produciendo salmuera para tina de acero en área de frío.


  
DAVID MIGUEL VELA FARFAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754



ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.

Consultorías y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:  
- Obras de Edificaciones  
- Obras de Carreteras  
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado  
- Obras de Electrificación  
- Obras Hidráulicas

26

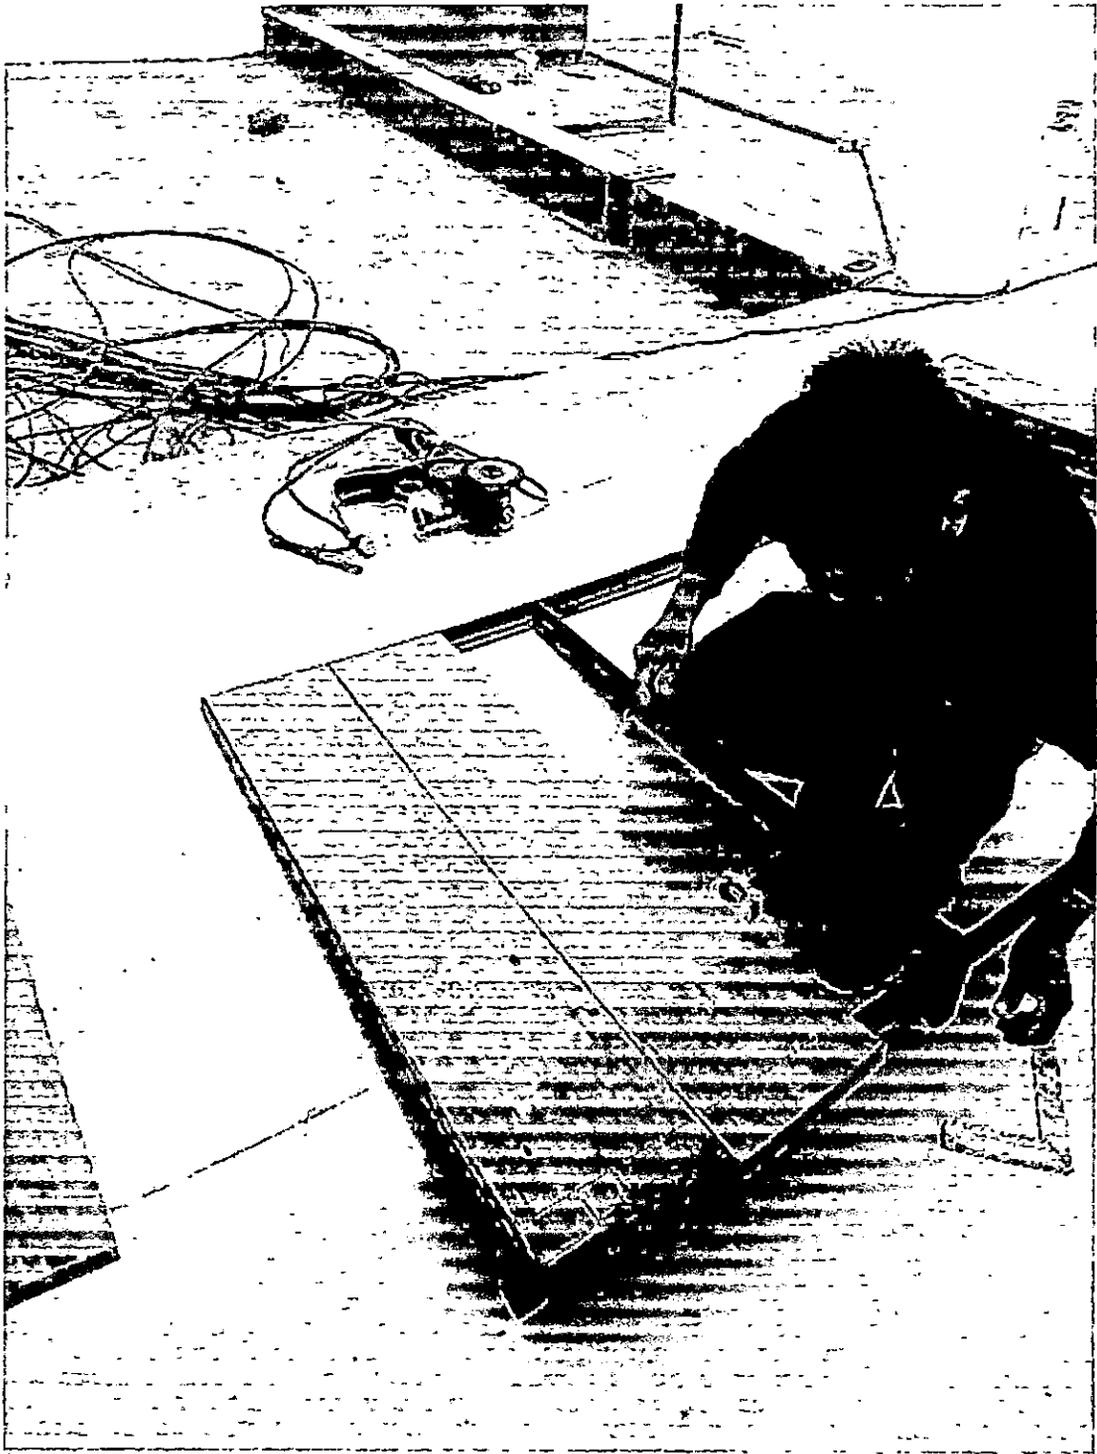

Fotografía N°20: Vista de confección de mesa de volteador de boques de hielo que se encuentra observada por no corresponder a las especificaciones del proyecto.


  
DAVID MANUEL VELA FARFAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754




ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.

Consultorias y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:  
- Obras de Edificaciones  
- Obras de Carreteras  
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado  
- Obras de Electrificación  
- Obras Hidráulicas

24

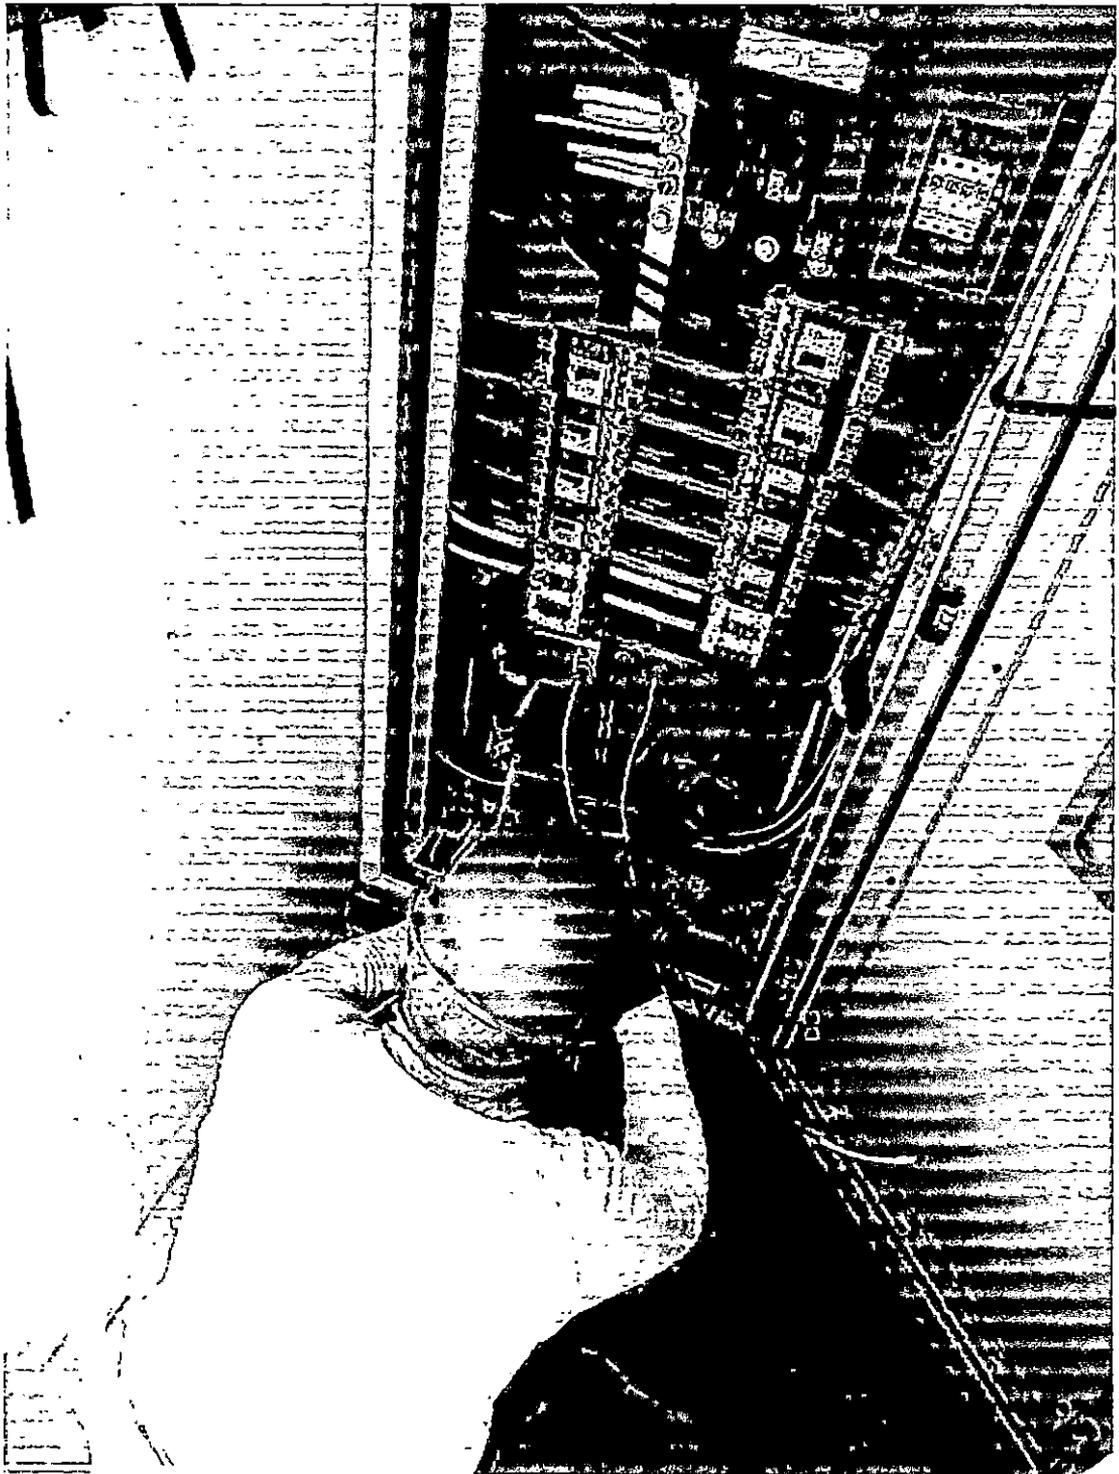

Fotografía N°21: Vista de operario realizando conexiones eléctricas.

  
DAVID MANUEL VELA FARFAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754




ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.


Consultorías y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:

- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas

28

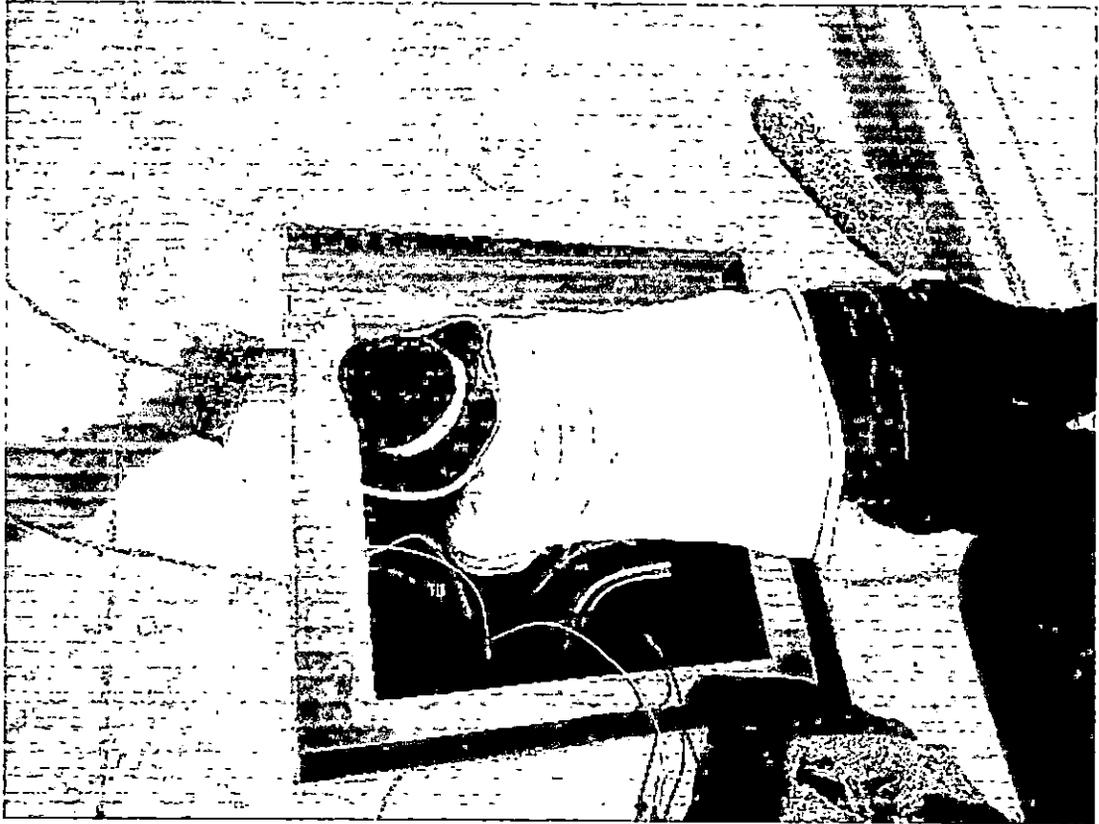


Fotografía N°22: Vista de trabajos de cableado en buzones eléctricos.

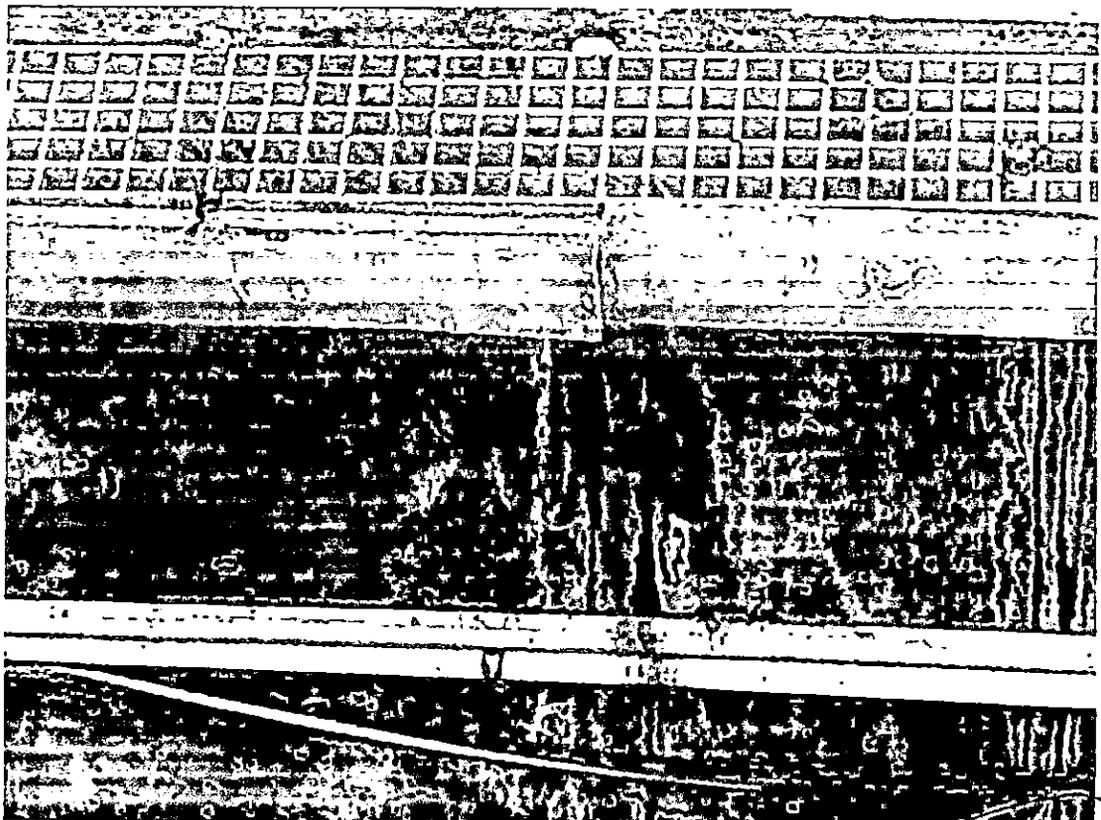


Fotografía N°23: Vista de canaleta de fibra de vidrio observada


  
DAVID MANUEL VELA FARFAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754

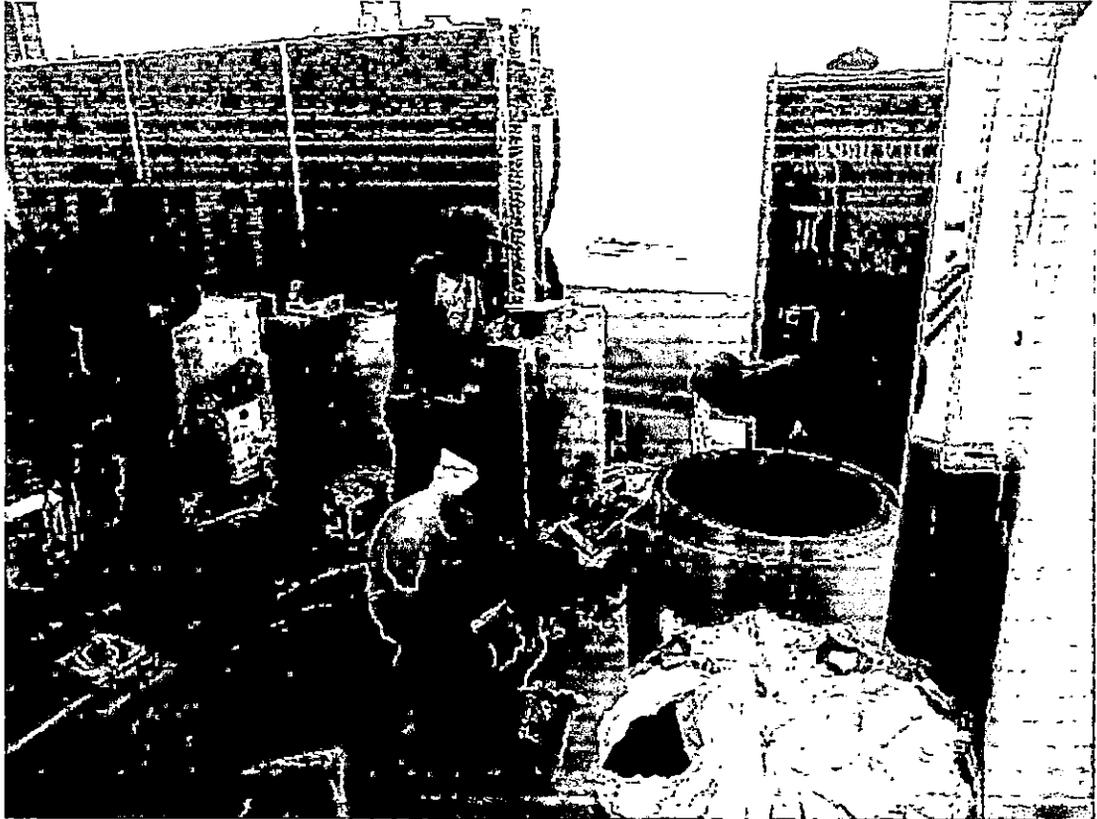

Fotografía N°24: Vista de trabajos en cuarto de máquinas de segundo nivel.

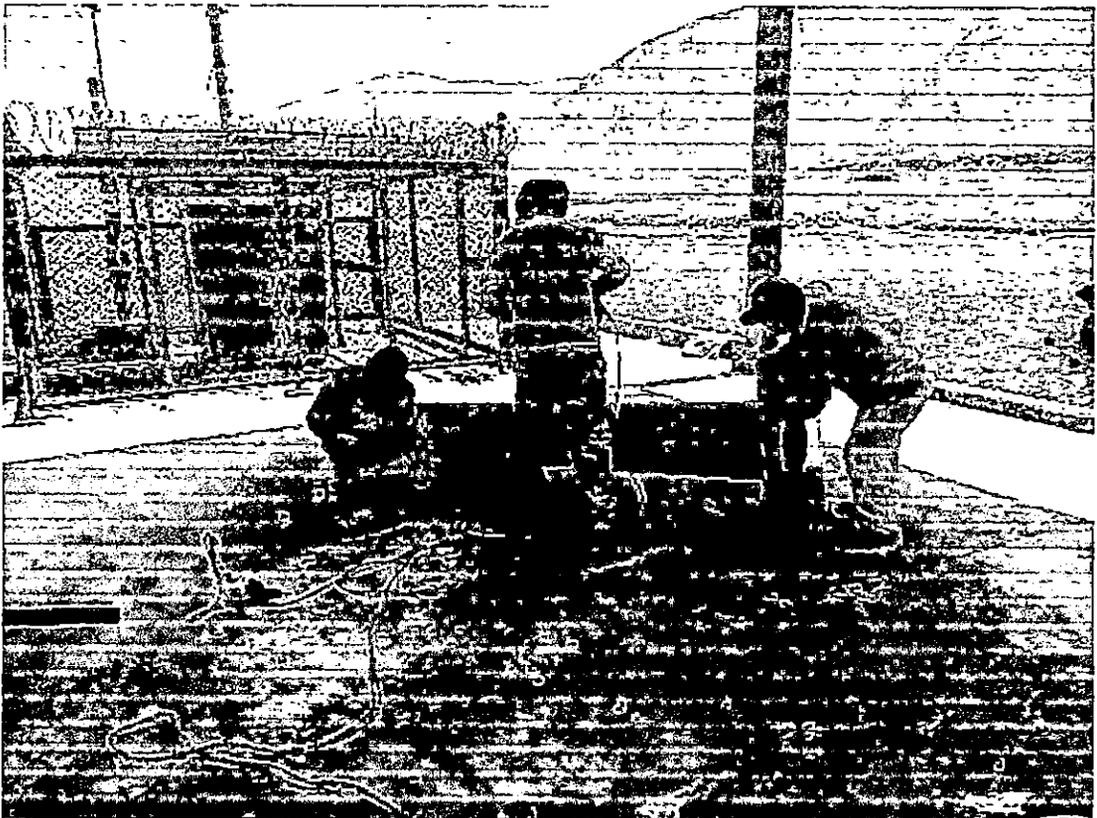

Fotografía N°25: Vista de preparación de poste de fibra de vidrio previo a izaje


  
DAVID MANUEL VELA FARFAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754



- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas



Fotografía N°26: Vista de operario desmontando árbol hidráulico de cuarto de bombas en emisor submarino por no cumplir con la especificación.


  
DAVID MANUEL VELA FARFÁN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754




ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.

Consultoría y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:  
- Obras de Edificaciones  
- Obras de Carreteras  
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado  
- Obras de Electrificación  
- Obras Hidráulicas

31

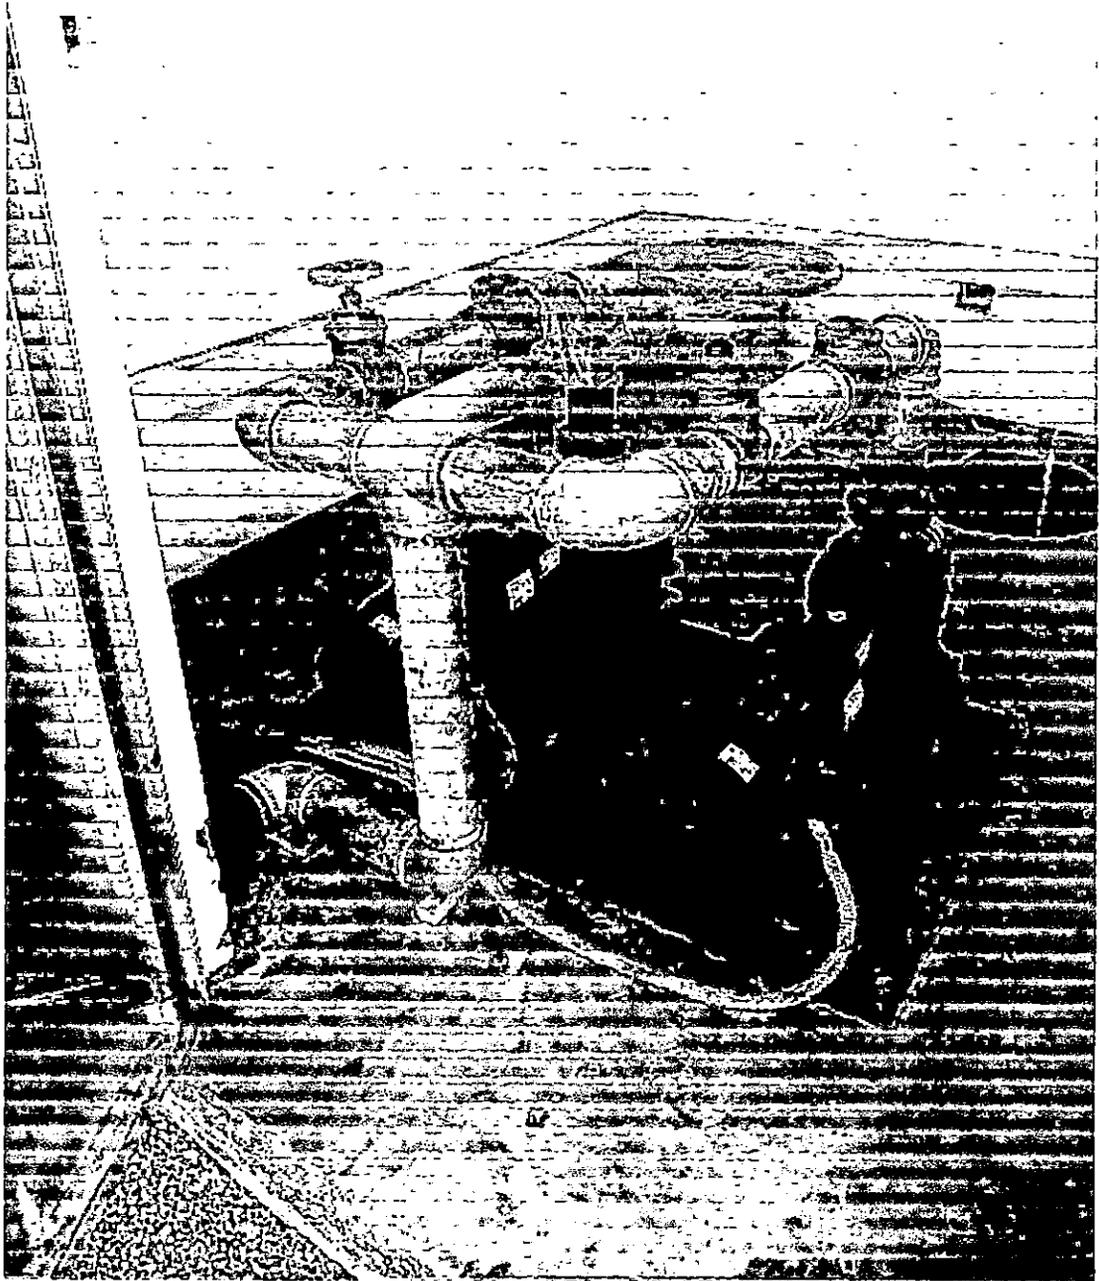

Fotografía N°27: Vista de árbol hidráulico reinstalado en cuarto de bombas de emisor submarino.

  
DAVID MANUEL VELA FARFÁN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754




ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.

Consultoría y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en  
- Obras de Edificaciones  
- Obras de Carreteras  
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado  
- Obras de Electrificación  
- Obras Hidráulicas


32



Fotografía N°28: Vista de pruebas de presión en sistema de enfriamiento.

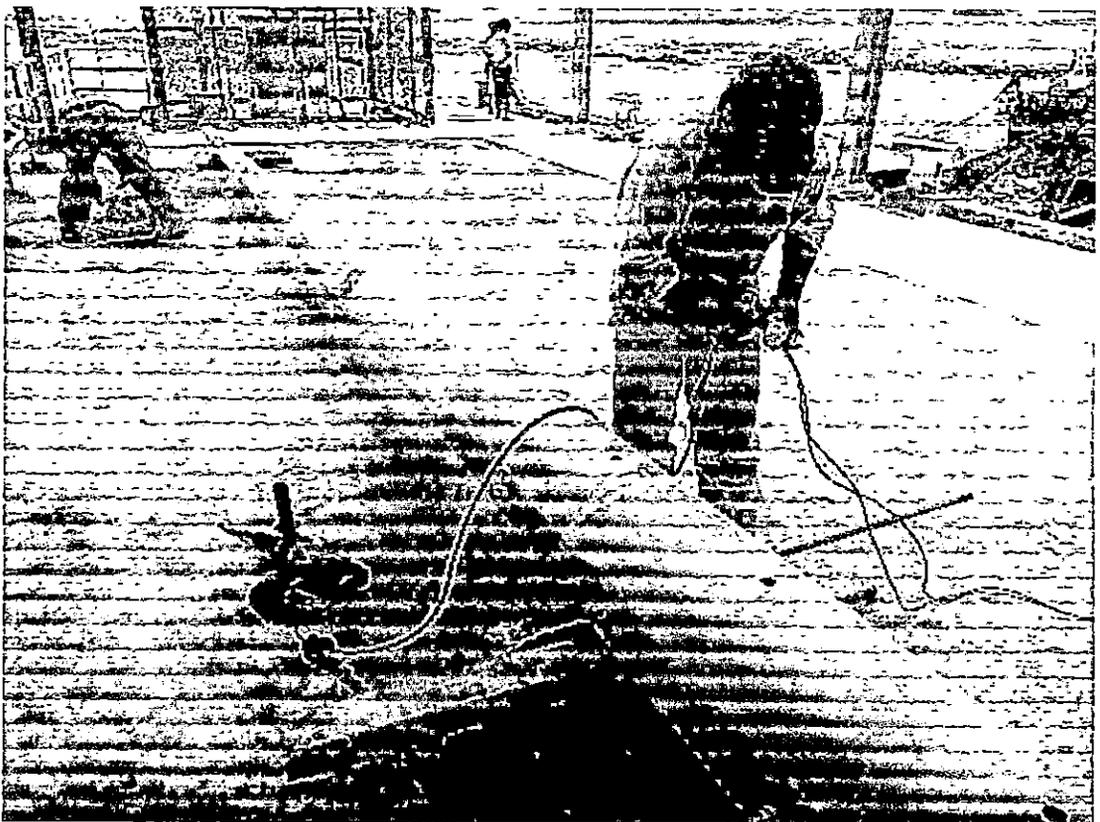

Fotografía N°29: Vista de trabajos de instalación de poste de fibra de vidrio en base metálica.

  
DAVID MANUEL VELAZQUEZ PARFAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754



Fotografía N°30: Vista de pintado de base de concreto en segundo nivel.



Fotografía N°31: Vista de resane de pedestales de concreto para coberturas.

  
DAVID MANUEL VELA FARFAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754



ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.

Consultoría y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:

- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas

34



Fotografía N°32: Vista de llenado de gas enfriador en equipos de frío.


DAVID MANUEL VELA FARFAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754




ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.

Consultorías y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:  
- Obras de Edificaciones  
- Obras de Carreteras  
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado  
- Obras de Electrificación  
- Obras Hidráulicas

35

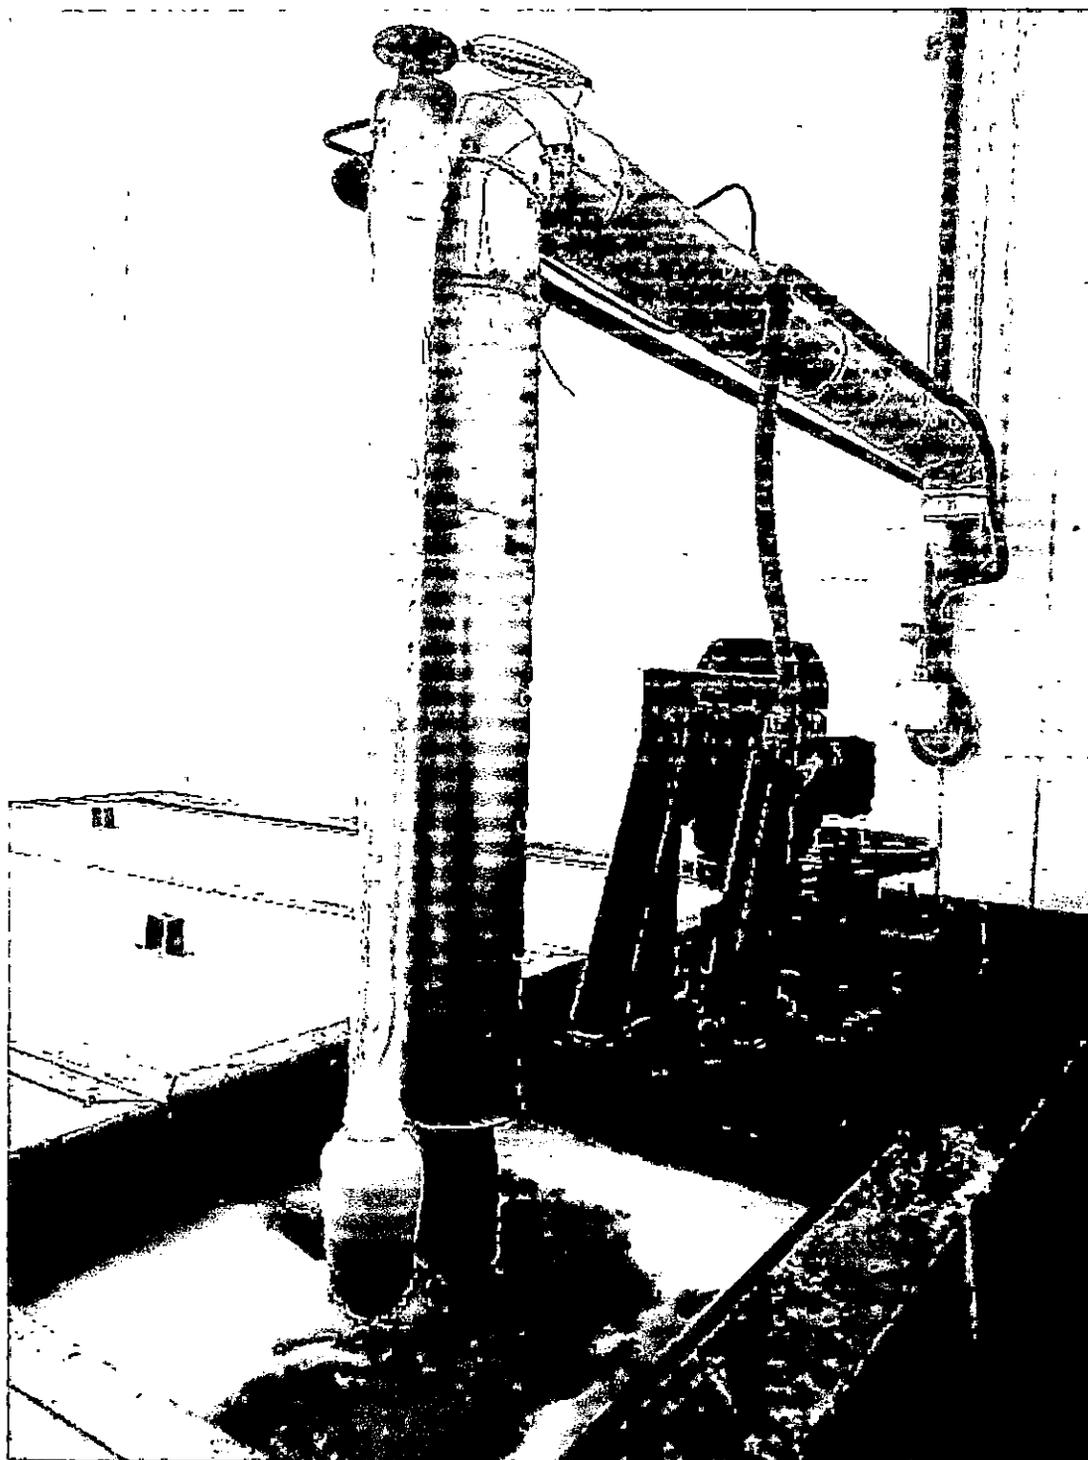

Fotografía N°33: Vista de proceso de pruebas de poza de producción de hielo en bloques.


  
DAVID MANUEL VELA FARFÁN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754



- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas



Fotografía N°34: Vista de reparación de canaletas de fibra de vidrio.

  
DAVID MANUEL VELA PARFAN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 104754

# CARGO

**CARTA N°002-2019 /AHJ/JS-MORRO SAMA**

Sama, 08 de Febrero del 2019

Señores:

**CONSORCIO OBRAS**

Av. Oscar R. Benavides 679, Conjunto Residencial Centro  
Colonial Dpto 504, Cercado de Lima

**ASUNTO : PRESENTACION DE DOCUMENTACION Y TRABAJOS PENDIENTES**

**REFERENCIA : a) CONTRATO N° 03B-2017-FONDEPES**

*De mi mayor consideración:*

Me dirijo a usted, para comunicarle que a la fecha, estando aún en ejecución por parte de vuestra representada el SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA", se observa que se tiene pendiente la entrega de información diversa que ha venido siendo solicitada tanto verbalmente como mediante cuaderno de obra, referida al control administrativo, seguridad y de calidad de la obra, así como a adquisiciones pendientes, ello en vista de que se encuentra próximo la finalización de los trabajos.

A continuación procedo a detallar la documentación antes mencionada, misma que deberá corresponder a todo el proceso de ejecución de la obra desde el 28 de Noviembre del 2017 a la fecha:

- Relación de personal técnico y obrero y SCTR respectivo.
- Actas de entrega de EPP al personal técnico y obrero.
- Copia de charlas de seguridad realizadas a la fecha.
- Fichas técnicas y hojas MSDS de todos los materiales adquiridos.
- Póliza contra todo riesgo (CAR).
- Copia de contratos de personal clave propuesto o cuyo fue aceptado.
- Copia de protocolos de prueba y ensayos realizados.
- Copia de inventario de materiales que deberán ser internados a la entidad provenientes de desmontajes (puertas y cables eléctricos principalmente).
- Copia de certificados de garantía de los equipos instalados y sus respectivos manuales de operación y mantenimiento.
- Planas de replanteo de las áreas donde se han concluido los trabajos.
- Fichas técnicas de materiales a adquirir, cuyas especificaciones técnicas y cantidades se adjuntan a la presente carta.

La falta de presentación de la documentación anteriormente descrita constituye incumplimiento contractual a lo contenido en la cláusula décimo séptima del Contrato de

Recibido  
08-02-19  
[Firma]

38


II. Cuaderno de Obra

CUADERNO DE OBRA




FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
 OBRA: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

ASIENTO N° 656: DEL SUPERVISOR 18/02/2019  
 SE SEÑALA QUE EN LA FECHA NO SE HA PRESENTADO EN OBRA EL RESIDENTE DE OBRA NI SE VIENE LLENANDO EL CUADERNO DE OBRA. SE PROSIGUE CON LA REALIZACIÓN DE CARGANDO CABLEADO EN DUCTOS Y COMUNICACION DE TABLEROS DIFERENCIADOS. SE INDICA ANOMALIA QUE DEBE RESOLVERSE LAS DEFICIENCIAS EN LA INSTALACION DE CAJALLETAS AL FINAL DE VÍCILO.



ASIENTO N° 657: DEL SUPERVISOR 19/02/2019  
 SE SEÑALA QUE EN LA FECHA NO SE HA PRESENTADO EN OBRA EL RESIDENTE DE OBRA NI SE VIENE LLENANDO EL CUADERNO DE OBRA. SE VIENE REALIZANDO PUEBLES DE PUNTO EN ZONA DE BUDGESTORES DEBERÁNSE ADECUAR LAS INSTALACIONES. SE DEBE RETIRAR EL PLASTICO PROTECTOR DE POLICARBONATO DE COBERTURAS. SE VIENE REALIZANDO PRUEBAS DEL SISTEMA DE PRODUCTOR DE HIELO EN BLOQUES.



ASIENTO N° 658: DEL SUPERVISOR 20/02/2019  
 SE SEÑALA QUE EN LA FECHA NO SE HA PRESENTADO EN OBRA EL RESIDENTE DE OBRA NI SE VIENE LLENANDO EL CUADERNO DE OBRA. SE PROSIGUE CON LA INSTALACION DE BASE METALICA PARA POSTE DE FIBRA DE VIDRIO. SE PETIERA AL CONTRATISTA QUE DEBE ACELERAR EL RITMO DE TRABAJO A FIN DE CULMINAR LOS TRABAJOS LO ANTES POSIBLE.



INSPECTOR \_\_\_\_\_ RESIDENTE \_\_\_\_\_ SUPERVISOR \_\_\_\_\_

Grafica

## CUADERNO DE OBRA



FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
 OBRA: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

ASIENTO N° 533 DEL SUPERVISOR 14/02/2019

SE SEÑALA QUE EN LA FECHA NO SE HA PRESENTADO EN OBRA EL RESIDENTE DE OBRA NI SE VIENE LLEVANDO EL CUADERNO DE OBRA. CALIA FECHA SE PROSIGUE CON EL CABLEADO ELÉCTRICO ASIMISMO SE VIENE REALIZANDO LA COMISSION DE CORTAS INSTALADAS EN LINEA VINCIONAL. SE PETICIONA AL CONTRATISTA QUE SE REQUIERE LA PRESENTACION DE CRONOGRAMA PARA CALMIACION DE LOS TRABAJOS.

*[Signature]*  
 INGENIERO CIVIL  
 81100001

ASIENTO N° 54 DEL SUPERVISOR 15/02/2019


SE SEÑALA QUE EN LA FECHA NO SE HA PRESENTADO EN OBRA EL RESIDENTE DE OBRA NI SE VIENE LLEVANDO EL CUADERNO DE OBRA. SE PROSIGUE CON LA REPARACION DE LAS CAJAS DE BOMBEO EN COBERTURAS, INSTALACIONES EN TABLERO DE PRODUCTOR DE HILO EN PLANCHAS, PUERTAS DE EGRESO DE FILO, INSTALACION DE SALMUERA, CARICA DE ELECTRODOS DIVERSOS, E INSTALACION EN TABLERO DE POMPAS DEL EMISOR SUBMARINO.

*[Signature]*  
 INGENIERO CIVIL  
 81100001

ASIENTO N° 55 DEL SUPERVISOR 16/02/2019

SE SEÑALA QUE EN LA FECHA NO SE HA PRESENTADO EN OBRA EL RESIDENTE DE OBRA NI SE VIENE LLEVANDO EL CUADERNO DE OBRA. SE INDICA AL CONTRATISTA QUE DEBERA REQUERIR DE MANERA INMEDIATA LA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ACUMULADO EN PATIO DE MANIOBRAS. SE PETICIONA AL CONTRATISTA QUE DEBERA RETIRAR LA MESA DE VOLTEO DE MADERA INSTALADA PARA INSTALAR UNA DE ACERO INUNDABLE.

*[Signature]*  
 INGENIERO CIVIL  
 81100001



  
 \_\_\_\_\_  
 INSPECTOR                      RESIDENTE                      SUPERVISOR  
*Grafines*

# CUADERNO DE OBRA




FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
 OBRA: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

ASIENTO N° 650: DEL SUPERVISOR

11/02/2019


SE SEÑALA QUE EN LA FECHA NO SE HA PRESENTADO EN OBRA EL RESIDENTE DE OBRA NI SE VIENE LLEVANDO EL CUADERNO DE OBRA. EN LA FECHA SE VIENE REALIZANDO LA CORRECCION DE CANALLETAS DE PAVIMENTO PLUVIAL EN DEFENSAS, REPARACION DE SOLDADURA DE OI BITA, LIMPIEZA DE CANALLETAS DE FIRMA DE VIDRIO, REPARACION DE BORDES DE Cajas DE CONCRETO, Y FABRICACION DE MESA DE VOLTEO DE BLOQUES DE HIELO.



ASIENTO N° 651: DEL SUPERVISOR

12/02/2019



SE SEÑALA QUE EN LA FECHA NO SE HA PRESENTADO EN OBRA EL RESIDENTE DE OBRA NI SE VIENE LLEVANDO EL CUADERNO DE OBRA. EN LA FECHA SE PROSIGUE CON EL RESANE DE RAZONES DE CONCRETO, INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS, CORRECCION DE CANALLETAS PLUVIALES, INSTALACION DE DEFENSAS EN MUELLE ESPERON, LIMPIEZA DE CANALLETAS DE FIRMA DE VIDRIO, Y CORRECCION DE BASE PARA POSTE DE FIRMA DE VIDRIO.



ASIENTO N° 652: DEL SUPERVISOR

13/02/2019

SE SEÑALA QUE EN LA FECHA NO SE HA PRESENTADO EL RESIDENTE DE OBRA NI SE VIENE LLEVANDO EL CUADERNO DE OBRA. SE INDICA QUE SE HA DESTINADO LA MESA DE VOLTEO POR NO CORRESPONDERA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. TAMBIEN SE INDICA QUE SE HA OBSERVADO LA INSTALACION DE CANALLETAS DE FIRMA DE VIDRIO, REQUIERENDOSE SU CORRECCION. SE PROSIGUE CON LA INSTALACION DE DEFENSAS DE MUELLES.



INSPECTOR

RESIDENTE

SUPERVISOR

*Grafosa*


# CUADERNO DE OBRA



FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
 OBRA: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_


ASIENTO N° 677: DEL SUPERVISOR 01/02/2019

SE SEÑALA QUE EN LA FECHA NO SE HA PRESENTADO EN OBRA EL RESIDENTE DE OBRA NI SE VIENE LLENANDO EL CUADERNO DE OBRA. SE PROSIGUE CON LA INSTALACION DE DEFENSAS EN NUEVE ESPIGON, COLOCACION DE BASE PARA PUESTO DE FIBRA DE VIDRIO, CARLEADO ELECTRICO, INSTALACION DE PASARELA METALICA EN OBRA DE TIPO, TRABAJOS DE CONEXIONES EN TABLERO DE PRODUCTOR DE HIELO EN BLOQUES Y RESANES DE MUROS DIVERSOS.

  
 D. Daniel Montalvo Lopez  
 INGENIERO CIVIL  
 INSCRIPCIÓN N° 10000


ASIENTO N° 678: DEL SUPERVISOR 08/02/2019

SE SEÑALA QUE EN LA FECHA NO SE HA PRESENTADO EN OBRA EL RESIDENTE DE OBRA NI SE VIENE LLENANDO EL CUADERNO DE OBRA. SE INDICA QUE SE HA ENTREGADO AL CONTRATISTA LA CARTA N° 02-2019/ANJ/JS-MODULO SANTA RENEE DE SOLICITA DOCUMENTACION DIVERSA AL CONTRATISTA ASI COMO CORRECCION DE DIVERSOS TRABAJOS OBSERVADOS. SE PROSIGUEN CON TRABAJOS DE CARLEADO ELECTRICO.

  
 D. Daniel Montalvo Lopez  
 INGENIERO CIVIL  
 INSCRIPCIÓN N° 10000

ASIENTO N° 679: DEL SUPERVISOR 09/02/2019

SE SEÑALA QUE EN LA FECHA NO SE HA PRESENTADO EN OBRA EL RESIDENTE DE OBRA NI SE VIENE LLENANDO EL CUADERNO DE OBRA. SE INDICA QUE SE OBSERVA LA PASARELA INSTALADA JUNTO A MURO METALICA PARA PRODUCTOR DE HIELO EN BLOQUES POR NO ESTAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN EXPECIENTES TECNICO. SE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR DOCUMENTOS DE CALIDAD A LA BREVEDAD.

  
 D. Daniel Montalvo Lopez  
 INGENIERO CIVIL  
 INSCRIPCIÓN N° 10000

\_\_\_\_\_  
 INSPECTOR RESIDENTE SUPERVISOR






# CUADERNO DE OBRA



FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
OBRA: \_\_\_\_\_  
PROYECTO: \_\_\_\_\_  
PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_


ASIENTO N° 644 : DEL SUPERVISOR 07/02/2019

SE SEÑALA QUE EN LA FECHA NO SE HA PRESENTADO EN OBRA EL RESIDENTE DE OBRA NI SE VIENE LLENANDO EL CUADERNO DE OBRA. SE VIENE REALIZANDO EL CARGADO ELÉCTRICO EN ÁREA DE MUELLES, INSTALACION DE DEFENSAS EN MUELLE 02, CONSTRUCCION DE CANA LETA FRENTE A CANA ELÉCTRICA, FABRICACION DE PUERTAS METALICAS E INSTALACION DE TUBERIAS CONDUIT EN MUELLE 01. SE SOLICITA AL CONTRATISTA CORREGIR LA INSTALACION DE CABLES DE FIBRA DE VIDRIO.




ASIENTO N° 645 : DEL SUPERVISOR 07/02/2019

SE SEÑALA QUE EN LA FECHA NO SE HA PRESENTADO EN OBRA EL RESIDENTE DE OBRA NI SE VIENE LLENANDO EL CUADERNO DE OBRA. SE INDICA AL CONTRATISTA QUE DEBEA PRESENTAR VALORIZACION E INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SE PROSIGUE CON LA FABRICACION DE PUERTAS DE METAL, FABRICACION DE BASE METALICA PARA POSTES DE FIBRA DE VIDRIO, INSTALACION DE DEFENSAS EN MUELLE 02 Y ROTURA DE CONCRETO BARRA BASE DE POSTE DE FIBRA DE VIDRIO.



ASIENTO N° 646 : DEL SUPERVISOR 06/02/2019

SE SEÑALA QUE EN LA FECHA NO SE HA PRESENTADO EN OBRA EL RESIDENTE DE OBRA NI SE VIENE LLENANDO EL CUADERNO DE OBRA. SE INDICA AL CONTRATISTA QUE DEBEA REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DEL FREENTE DE TRABAJO, ASIMISMO DEBEA INCREMENTAR CUADRIAS DE TRABAJOS A FIN DE CONCLUIR CON LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.



\_\_\_\_\_  
INSPECTOR RESIDENTE SUPERVISOR  
Grafiosa



ALEXANDER HUERTAS JARA  
A.H.J.

- Consultorías y Ejecución de Obras Públicas y Privadas en:
- Obras de Edificaciones
- Obras de Carreteras
- Obras de Saneamiento de Agua y Alcantarillado
- Obras de Electrificación
- Obras Hidráulicas

43

# CUADERNO DE OBRA



FECHA: \_\_\_\_\_ MODALIDAD: \_\_\_\_\_  
 OBRA: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_

ASIENTO N° 641: DEL SUPERVISOR 31/01/2019

SE RECORDA QUE EN LA FECHA NO SE HA PRESENTADO EN OBRA EL RESIDENTE DE OBRA NI SE VIENE REALIZANDO EL LLENADO DEL CUADERNO DE OBRA. SE HA ENTREGADO LA CARTA N° 01-2019/ANT/TS-MDRO CARTA FONDS SE SOLICITA OTORGAR ACCESO FORMALMENTE AL CUADERNO DE OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN. SE DEBERÁ PRESENTAR LOS METRILADOS EJECUTADOS EN EL PRESENTE DESPUÉS DE SU REVISIÓN.

*[Signature]*  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. 10000

ASIENTO N° 642: DEL SUPERVISOR 01/02/2019

SE RECORDA QUE EN LA FECHA NO SE HA PRESENTADO EN OBRA EL RESIDENTE DE OBRA NI REALIZANDO EL LLENADO DEL CUADERNO DE OBRA. SE HA TENIDO LA VISITA DE DIRECTIVOS DE FONDERES. SE VIENE EJECUTANDO EL MONTAJE DE OBEJUNTA DE MUEBLE DE CONEXION DE BASE PARA POSTE DE FIBRA DE VIDRIO, CABLEADO ELECTRICO E INSTALACION DE PUNTO DE AGUA EN SEGUNDO NIVEL.

*[Signature]*  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. 10000

ASIENTO N° 643: DEL SUPERVISOR 02/02/2019

SE RECORDA QUE EN LA FECHA NO SE HA PRESENTADO EN OBRA EL RESIDENTE DE OBRA NI SE VIENE LLENANDO EL CUADERNO DE OBRA. SE VIENE REALIZANDO LA LIMPIEZA DEL PATIO DE MANIOBRAS, CABLEADO ELECTRICO, FABRICACION DE PUERTAS METALICAS, FABRICACION DE BASE PARA POSTE DE FIBRA DE VIDRIO. SE INDICA AL CONTRATISTA QUE DEBERA ACCELERAR EL RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

*[Signature]*  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. 10000

INSPECTOR

RESIDENTE

SUPERVISOR

*[Signature]*
