

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CARGO

MEMORANDUM N° 1434-2019-FONDEPES/DIGENIPAA

A : **Sra. Teresa Zenaida Quiroz Silvia**
Jefe de la Oficina General de Administración

ASUNTO : **VALORIZACION DE OBRA N° 02**
Obra: "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"
Contrato: N° 001-2019-FONDEPES

REFERENCIA: a) INFORME N° 046-2019-FONDEPES/ACS
b) Carta N° 020-2019-ECH-SUP

FECHA : Lima, 25 de marzo de 2019


Tengo a bien dirigirme a su despacho, para remitir adjunto al presente, la Valorización N° 02 de la obra del asunto, correspondiente a los trabajos efectuados del 15 al 28 de febrero del presente, por la empresa CONSORCIO MAYES, la misma que ha sido revisada por la Supervisión de obra.

Con la conformidad del coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola de FONDEPES, mediante Informe N° 046-2019-FONDEPES/ACS, se solicita se sirva disponer a quien corresponda, se efectúe el trámite para efectuar el pago de la indicada valorización.

Atentamente,



FONDEPES
Ing. Luis Alberto Barberi Quino
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola



LBQ/acs

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

ACTA DE CONFORMIDAD

Conste por la presente, que la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola, al suscribir la presente Acta, da su conformidad a favor del contratista CONSORCIO MAYES, encargada de la ejecución de la Obra " NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA", cuyo monto asciende a **S/ 78,421.58 (Setenta y ocho mil cuatrocientos veintiuno con 58/100 soles)** por concepto de pago de Valorización N° 02, de acuerdo a lo establecido en el Contrato N° 001-2019-FONDEPES a favor del CONSORCIO MAYES.

Monto a pagar desagregado:

VALORIZACION N° 02		
DESCRIPCION	Parcial	Total
(Valorización del periodo – Amortización) Inc. IGV	78,421.58	
(Reajustes) Inc. IGV	0.00	
TOTAL A FACTURAR		78,421.58

Son: Setenta y ocho mil cuatrocientos veintiuno con 58/100 soles, Incl. IGV.

Lima,



FONDEPES

Ing. Luis Alberto Barbieri Quino
Director General de Inversión
Pesquera Artesanal Y Acuicola



PERÚ Ministerio de la Producción



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



04863832

Usuario: usuario_digenipaa3

Fecha: 22/03/2019

Hora: 14:58



CARGO 00124-2019-FONDEPES/MML

A: DIRECCION GENERAL INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA

Asunto: CARTA N° 020-2019
REMITE VALORIZACIÓN N° 02 REF: NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA


Referencia:

Fecha: 22/03/2019

Observación: SE DERIVA EL PRESENTE INFORME N°46-2019/FONDEPES/ACS, DE FECHA 21/03/2019, PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN DICHO INFORME DEL DPA PUCUSANA, VALORIZACIÓN 2, CERCO PERIMÉTRICO. PROVEEDOR CONSORCIO MAYES, CONTRATO 001-2019. COORDINADOR ING. ALVARO CORNEJO

Atentamente,

MORGAN LEON MAGALI



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

INFORME N° 046 - 2019-FONDEPES/ACS

A : Ing. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO.
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola

ASUNTO : VALORIZACION N° 02
Obra: "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"
Contrato: 001-2019-FONDEPES

REFERENCIA: Carta N° 020-2019-ECH-SUP

FECHA : Lima, 21 de marzo de 2019

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual el Jefe de Supervisor de obra, Ing. Enrique Chamocho Aponte, hace llegar la valorización N° 02 de la obra del asunto, correspondiente a los trabajos efectuados entre el 15 al 28 de febrero del presente, la misma que ha sido elaborada conjuntamente con el Contratista CONSORCIO MAYES y la Supervisión.

Luego de efectuar la revisión de los cálculos, los mismos que fueron elaborados por el Supervisor de obra, se obtuvo como resultado lo siguiente:

A. VALORIZACION N° 02 (contractual)		66,454.50
Obras Provisionales y Trabajos Preliminares		
Estructuras En Tierra	45,617.09	
Arquitectura	20,837.41	
Instalaciones sanitarias	0.00	
Instalaciones eléctricas	0.00	
otros	0.00	
B. GASTOS GENERALES Y UTILIDADES		18,362.70
Gastos Generales	19.13%	12,714.07
Utilidades	8.5%	5,648.63
C. AMORTIZACIONES		0.00
Adelanto Directo		0.00
Adelanto de Materiales		0.00
D. REAJUSTES		0.00
Total de reajustes (*)		0.00
E. SUB TOTAL VALORIZACIÓN N° 02		84,817.20
Total Valorización (A+B-C+D)		
I.G.V. (18%)		15,267.10
F. TOTAL INCL. I.G.V.		100,084.30
G. RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO		21,662.72
H. TOTAL A FACTURAR VALORIZACIÓN N° 02 (F-G)		78,421.58

Son: Setenta y ocho mil cuatrocientos veintiuno con 58/100 soles, Incl. IGV.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

ANALISIS

A continuación, se adjunta un cuadro donde se incluyen los datos más representativos de la obra y las fechas en que se entregó la documentación, demostrando el cumplimiento de los TDR.

FICHA TECNICA DE OBRA			
PROYECTO	:	"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"	
ENTIDAD	:	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)	
MODALIDAD	:	CONTRATO A SUMA ALZADA	
CONTRATISTA	:	CONSORCIO MAYES	
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO	:	ALEJANDRO SIU TRUJILLO	
PROCESO	:	ADJUDICACION SIMPLICADA N° 022-2018 - FONDEPES	
CONTRATO	:	N° 001 - 2019 - FONDEPES	
SUPERVISOR DE OBRA	:	Ing. Enrique Antonio CHAMOCHUMBI APONTE	
RESIDENTE DE OBRA	:	Ing. Guillermo SIU TRUJILLO	
PRESUPUESTO BASE	:	S/. 438,346.20	Inc. IGV
PRESUPUESTO OFERTADO	:	S/. 438,346.20	Inc. IGV
PRESUPUESTO CONTRATADO	:	S/. 433,254.35	Inc. IGV
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	:	10-Ene-19	
PLAZO CONTRACTUAL	:	60 DIAS	
FECHA ENTREGA DE TERRENO	:	11-Jul-17	
FECHA INICIO DE OBRA	:	29-Ene-19	
INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	:	29-Ene-19	
FECHA TERMINO CONT. DE OBRA	:	29-Mar-19	
DURACION TOTAL DE LA OBRA	:	60 DIAS	
VALORIZACION N° 01	:	S/. 144,836.95	33.43%


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El suscrito, al haberse comprobado que el contratista ha cumplido con entregar lo indicado en los términos de referencia y su contrato, considera procedente el pago de lo correspondiente a los trabajos efectuados entre el 15 al 28 de febrero del presente, por tal razón se recomienda continuar con el respectivo trámite de pago, **aclarando que en lo que respecta a deducciones por cualquier concepto y otras penalidades se efectuarán en la liquidación de obra**, se deberá considerar que esta valorización fue presentada el día 20.03.2019 por el Contratista a la Supervisión, y la Supervisión a la Entidad el día 21.03.2019 por tal motivo, cuenta con penalidad por parte de la Supervisión.

Sin otro particular, quedo de usted.


Ing. Alvaro Martin Cornejo Soto
Coordinador de Obra

Con la conformidad del Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento; pase el presente informe y los antecedentes, a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola; para su atención y trámite correspondiente.


Ing. Badur Huaman Comejo
COORDINADORA DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO

CHAMOCHUMBI APONTE ENRIQUE ANTONIO

ING° CIVIL

CONSULTORIA Y SUPERVISION

Av. Arica N° 795 San Miguel - Lima 32

Tlf 949430962 e-mail: echamochumbi@yahoo.com

Lima, 20 de Marzo del 2019

CARTA N°020-2019-ECH-SUP

Sr. Ing. Luis Alberto Barbieri Quino

DIRECTOR GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA


Asunto: Valorización N°02

Referencia: Supervisión de Obra "Nuevo cerco Perimétrico del Centro de Esquero de Pucusana, Distrito de Pucusana, Provincia de Lima"

Previo a un cordial saludo y en calidad de Supervisor de la Obra descrita en la referencia, alcanzo el Informe de Valorización N°2 de la empresa Contratista CONSORCIO MAYES, responsables de la ejecución de la Obra "Nuevo cerco Perimétrico del Centro de Esquero de Pucusana, Distrito de Pucusana, Provincia de Lima", que sustenta la Valorización que a continuación se detalla.

VALORIZACION DEL MES (23.10%)	=	S/. 84,817.20
IGV (18%)	=	S/. 15,267.10
RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO	=	<u>S/. 21,662.72</u>
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA	=	S/. 78,421.58

Muy Atentamente,


ENRIQUE ANTONIO
CHAMOCHUMBI APONTE
INGENIERO CIVIL
C.I. N° 48800

Ing° Enrique Chamochumbi Aponte
Supervisor de Obra

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	
	
2848989	
N° DOC:	00002679-2019
CLAVE:	6533
USUARIO:	usuario_alog69
FECHA Y HORA:	21/03/2019 11:37:46
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	

FONDEPES	
DIRECCION GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL ACUICOLA	
21 MAR. 2019	
RECIBIDO	
N° Registro	Hora: 12:20



Fecha: 21/03/19

MEMORANDO INTERNO N° 1148 -2019-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM

Asunto : Memo Interno 2014-2019 Digenipaa

Referencia : _____ Registro: _____

Destino	Indicación	Destino	Indicación

Observaciones:

Jug. Álvaro Consejo

Atentamente,



Indicaciones:

- | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 01. Autorizado/ Aprobado | 02. Calificar/ Evaluar | 03. Informe | 04. Proyectar resolución |
| 05. Atención/ Tramitación | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular |
| 09. Ayuda memoria | 10. Coordinar | 11. Opinión/ Recomend | 12. Consolidar |
| 13. Aclarar redacción | 14. Implementar/ Ejecut | 15. Preparar respuesta | 16. Visación |
| 17. Agregar a anteced | 18. Archivo | 19. Ampliar | 20. Seguimiento |



Fecha: 21/03/19

MEMORANDUM INTERNO N° 2094 - 201 - FONDEPES/ DIGENIPAA

Asunto : Carta N° 020 - 2019 - SUP

Referencia : _____ Registro : 2679

Destino	Indicacion	Destino	Indicacion
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	
OCI		OGAJ	
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	

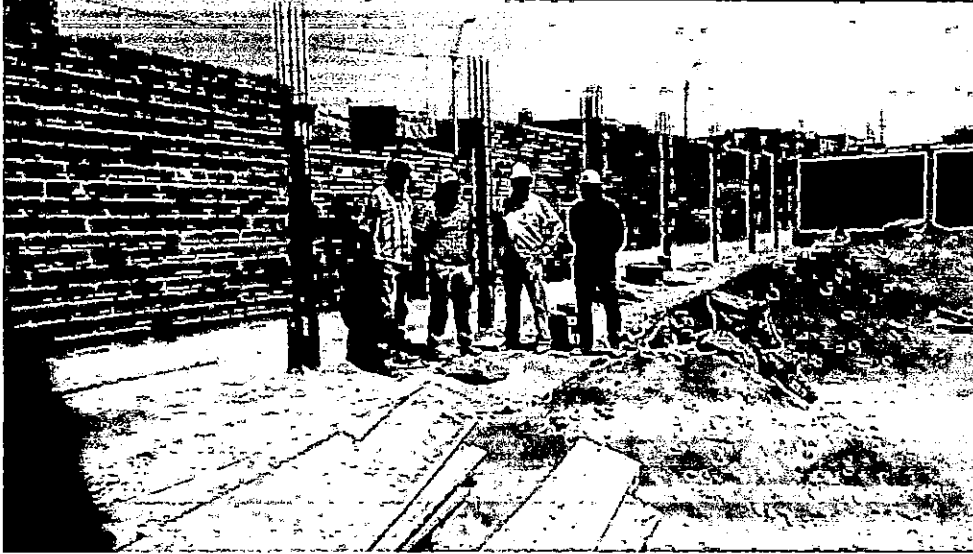
Observaciones: _____



Indicaciones:

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 01. Expediente Aprobado | 02. Calificar/Evaluar | 03. Informe | 04. Proyectar |
| 05. Atención/Tramitación | 05. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular |
| 09. Ayuda memoria | 10. Coordinar | 11. Opinión/Recomendación | 12. Consollar |
| 13. Aclarar redacción | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta | 16. Visación |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo | 19. Ampliar | 20. Seguimiento |

INFORME AVANCE DE OBRA N°02



OBRA :


"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA".

SOLICITADO : FONDEPES

UBICACIÓN :
• DISTRITO : PUCUSANA
• PROVINCIA : LIMA
• REGIÓN : LIMA

ELABORADO : Ing. Enrique CHAMOCHUMBI APONTE
(SUPERVISOR)

FECHA : MARZO 2019


FONDEPES
INGENIERO CIVIL
UNAF N° 48988

CHAMOCHUMBI APONTE ENRIQUE ANTONIO

ING° CIVIL RNP C1196 Consultoría


Av. Arica N°795 San Miguel Lima 32

949430962, email: echamochumbi@yahoo.com

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO

- 1 **CAPITULO I.- GENERALIDADES.**
 - 1.1 Datos Generales de Obra
 - 1.2 UBICACIÓN DE LA OBRA
 - 1.3 Descripción del proyecto METAS:
- 2 **CAPITULO II.- CONTROL ADMINISTRATIVO.**
 - 2.1 Instalación de Medio de Comunicación en Obra.
 - 2.2 Licencia de construcción de la Municipalidad distrital De Sachaca
 - 2.3 Implementación de Medidas de Seguridad a Trabajadores
 - 2.4 Personal de Obra y Personal Administrativo
 - 2.5 Personal de Obra y Personal Administrativo del Contratista
- 3 **CAPITULO III.- CONTROL DE AVANCE DE OBRA.**
 - 3.1 Control de Avance Físico
 - 3.1.1 Programación de Obra
 - 3.1.2 Descripción de los Trabajos Realizados en el Periodo
 - 3.1.3 Porcentaje de Avance Real del Periodo y Porcentaje de Avance Acumulado.
 - 3.1.4 Control de CARTAS FIANZAS.
 - 3.1.5 CONTROL DE AMORTIZACIONES
 - 3.1.6 Pólizas de Seguro: Vigencia
 - 3.2 Actitud y/o Voluntad del Contratista
 - 3.2.1 Comentarios Sobre Materiales existen en Obra
- 4 **CAPITULO IV.- CONTROL TÉCNICO DE OBRA.**
 - 4.1 Control de Pruebas Previas de Materiales
 - 4.2 Obras Provisionales.
 - 4.2.1 Cartel de Obra
 - 4.2.2 Oficina del Supervisor, Oficina Residente, almacén, SS.HH., Comedor y Vestuario para



ENRIQUE APONTE CHAMO CHUMBI
ING. CIVIL RNP C1196
AV. ARICA N° 795 SAN MIGUEL LIMA 32
949430962

CHAMOCHUMBI APONTE ENRIQUE ANTONIO


ING° CIVIL RNP C1196 Consultoría

Av. Arica N°795 San Miguel Lima 32

949430962, email: echamochumbi@yahoo.com

Trabajadores.

- 4.3 Control Técnico de la Calidad de los Trabajos.
- 4.4 Control de calidad del concreto
 - 4.4.1 Mano de Obra
 - 4.4.2 Equipo y Herramientas
- 5 CAPITULO V.- CONSULTAS REFERIDAS AL PROYECTO. (En el Periodo)
- 6 CAPITULO VI.- ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO.
- 7 CAPITULO VII.- ANOTACIONES MAS IMPORTANTES DEL CUADERNO DE OBRA Y CARTAS CURSADAS EN EL PERIODO
- 8 CAPITULO VIII.- VISITAS.
- 9 CAPITULO IX.- MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL.
- 10 CAPITULO X.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD G-050
- 11 CAPITULO XI.- DE LA SUPERVISIÓN.
 - 11.1 Materiales y Equipo
 - 11.2 Pagos a la Supervisión
- 12 CAPITULO XII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
- 13 CAPITULO XIII.- ANEXOS.



ENRIQUE ANTONIO
CHAMOCHUMBI APONTE
2000

CHAMOCHUMBI APONTE ENRIQUE ANTONIO

ING° CIVIL RNP C1196 Consultoría


Av. Arica N°795 San Miguel Lima 32

949430962, email: echamochumbi@yahoo.com

1 CAPITULO I.- GENERALIDADES.

1.1 DATOS GENERALES DE OBRA

PROYECTO	:	"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"		
ENTIDAD	:	(FONDEPES)		
MODALIDAD	:	CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS		
CONTRATISTA	:	CONSORCIO MAYES		
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO	:	ALEJANDRO SIU TRUJILLO		
PROCESO	:	ADJUDICACION SIMPLICADA N° 022-2018 - FONDEPES		
CONTRATO	:	N° 001 - 2019 - FONDEPES		
SUPERVISOR DE OBRA	:	Ing. Enrique Antonio CHAMOCHUMBI APONTE		
RESIDENTE DE OBRA	:	Ing. Guillermo SIU TRUJILLO		
PRESUPUESTO BASE	:	S/.	438,346.20	Inc. IGV
PRESUPUESTO OFERTADO	:	S/.	438,346.20	Inc. IGV
PRESUPUESTO CONTRATADO	:	S/.	433,254.35	Inc. IGV
FACTOR DE RELACION	:		0.98838395	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	:		10-Ene-19	
PLAZO CONTRACTUAL	:		60 DIAS	
FECHA ENTREGA DE TERRENO	:		18 de Enero del 2019	
FECHA INICIO DE OBRA	:		29-Ene-19	
INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	:		29-Ene-19	
FECHA TÉRMINO CONT. DE OBRA	:		29-Mar-19	
PARALIZACIÓN DE OBRA	:		NO SE TUVO	
REINICIO DE OBRA	:		NO SE TUVO	
AMPLIACION DE PLAZO N°01	:		DIAS	
TOTAL DE AMPLIACION DE PLAZO	:		DIAS	
DURACION TOTAL DE LA OBRA	:		60 DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION	:		29-Mar-19	
VALORIZACION N° 01	:	S/.	124,185.73	33.82%
VALORIZACIÓN N°02	:	S/.	84,817.20	23.10%
RETENCION ACUM DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	:		43,325.44	
REAJUSTE	:	S/.	-	Ninguno
REINTEGROS	:	S/.	-	Ninguno
INTERESES	:	S/.	-	Ninguno
MORAS POR DEMORA EN FIRMA DE CONTRATO	:	S/.	-	Ninguno
MAYORES GASTOS GENERALES	:	S/.	-	Ninguno
MULTAS POR ATRAZO DE OBRA	:	S/.	-	Ninguno
FECHA: ACTA DE ENTREGA DE OBRA	:		___ / ___ / ___	
ADELANTO DIRECTO	:	S/.	-	No se solicito
ADELANTO PARA MATERIALES	:	S/.	-	No se solicito
DEL TOTAL FINANCIADO:				
MONTO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO	:	S/.	433,254.35	(MC)
MONTO TOTAL FINANCIADO = MC + TPA	:	S/.	433,254.35	(MTF)
AVANCE REAL ACUMULADO	:		56.92 %	
AVANCE PROGRAMADO	:		57.83 %	


ENRIQUE ANTONIO CHAMOCHUMBI APONTE

CHAMOCHUMBI APONTE ENRIQUE ANTONIO

ING° CIVIL RNP C1196 Consultoría

Av. Arica N°795 San Miguel Lima 32

949430962, email: echamochumbi@yahoo.com

ESTADO DE LA OBRA

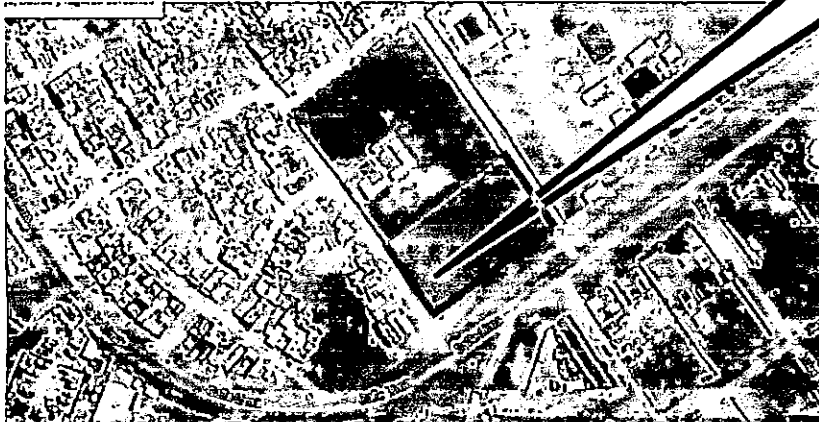
: ATRASADA! En 0.91 %

1.2 UBICACIÓN DE LA OBRA

UBICACIÓN :

- DISTRITO : PUCUSANA
- PROVINCIA : LIMA
- REGIÓN : LIMA

PERIMETRO DONDE SE
CONSTRUYE NUEVO
CERCO PERIMETRICO



1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO METAS:

PROYECTO: "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"

UBICACIÓN: DISTRITO DE PUCUSANA - LIMA - LIMA

[Handwritten signature]
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

ITEM	DESCRIPCION
001	CONSTRUCCION DEL CERCO.: 1er Tramo 63.97 ml aprox. 2do Tramo 66.10 ml aprox 3er Tramo 103.74 ml aprox Total, Longitud del Cerco: 233.81 ml aprox.

CHAMOCHUMBI APONTE ENRIQUE ANTONIO

ING° CIVIL RNP C1196 Consultoría

Av. Arica N°795 San Miguel Lima 32

949430962, email: echamochumbi@yahoo.com

2 CAPITULO II.- CONTROL ADMINISTRATIVO.

2.1 INSTALACIÓN DE MEDIO DE COMUNICACIÓN EN OBRA.

En obra, se cuenta con comunicación mediante teléfonos celulares, también de Internet WI FI.

2.2 LICENCIA DE CERCO PERIMETRICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

Se cuenta con Resolución de Licencia de Edificación N° 001-2019-GDU/MDP EXP.N 33-000950-008-2019.

Uso: Local Comercial

Zonificación: E2

Pisos: 01 pisos

Vigencia: 36 Meses

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO

2.3 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD A TRABAJADORES

La supervisión, realiza un seguimiento de la implementación de medidas de seguridad que desarrolla la Empresa a los trabajadores en Obra y supervisa el cumplimiento el plan de seguridad y salud en el trabajo vigente.

CERCO PERIMETRICO

- Con fecha 10 de Enero del 2019, se firma Contrato N° 001-2019-FONDEPES, como consecuencia de la Adjudicación Simplificada N°022-2018-FONDEPES Primera Convocatoria, entre FONDEPES y EL CONSORCIO MAYES.
- Con Fecha 18 de Enero del 2019, se realiza la entrega de terreno por parte de la Entidad (FONDEPES), a la empresa Contratista (CONSORCIO MAYES)
- Con fecha 28 de Enero 2019, FONDEPES le hizo entrega al Contratista con Carta N°108-2019 FONDEPES/DIGENIPAA la presentación del Supervisor de Obra
- Por lo descrito, quedo establecida la fecha de Inicio Contractual, para el 29 de enero del 2019.
- El Contratista inicia los trabajos en Obra el día 06 de Febrero del 2019, tal como consta en el Cuaderno de Obra N°01, página 04, Asiento N°02

EL INGENIERO EN CIVIL ENRIQUE APONTE CHAMOCHO

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES

CHAMOCHUMBI APONTE ENRIQUE ANTONIO

ING° CIVIL RNP C1196 Consultoría

Av. Arica N°795 San Miguel Lima 32

949430962, email: echamochumbi@yahoo.com

Con fecha 06 de Febrero del 2019, el Contratista inicia habilitación de ambientes para oficina, almacén y ss.hh.

Con fecha 07 de Febrero del 2019 se inicia las partidas de trazo y replanteo, aprobado por la Supervisión en la misma fecha, tal como consta en el Asiento N°04 del cuaderno de Obra.

Con fecha 08 de Febrero del 2019, el Contratista inicia labores de Cerco Provisional con parantes y malla raschell.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Con fecha 08 de Febrero del 2019, ingresa una máquina retroexcavadora e inicia las excavaciones de zanjas para cimientos.

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

Con fecha 14 de Febrero se inicia vaciado de Cimientos con Concreto 1:10 + 30% Piedra Grande.

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

En el presente periodo se inicia los trabajos en elementos de Concreto armado, como Acero en Zapatas, encofrados de columnas y vigas, así como vaciados de Zapatas y Columnas.

ARQUITECTURA

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

En el presente periodo se inicia los trabajos de muro de ladrillo KING KONG Tipo Caravista.

Personal de Obra y Personal Administrativo

La supervisión cuenta con el personal para obra y es el siguiente:

JEFE DE SUPERVISION


ING. ENRIQUE ANTONIO CHAMOCHUMBI APONTE

Cuyas presencias en Obra es permanente.

2.4 PERSONAL DE OBRA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATISTA

La supervisión verifico el plantel profesional propuesto para obra y el personal de apoyo en obra, es el siguiente:

Cargo	Profesional Aprobado
RESIDENTE DE OBRA	ING° GUILLERMO SIU TRUJILLO
MAESTRO DE OBRA	GUSTAVO CHACON


ENRIQUE ANTONIO
CHAMOCHUMBI APONTE
INGENIERO CIVIL

3 CAPITULO III- CONTROL DE AVANCE DE OBRA.

3.1 CONTROL DE AVANCE FÍSICO

3.1.1 PROGRAMACIÓN DE OBRA

- El Contratista entregó el Calendario adecuado a la fecha real de inicio contractual, sin embargo falta regularizar la firma del Representante Legal.

CHAMOCHUMBI APONTE ENRIQUE ANTONIO

ING° CIVIL RNP C1196 Consultoría

Av. Arica N°795 San Miguel Lima 32

949430962, email: echamochumbi@yahoo.com

3.1.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO

ITEM	DESCRIPCION PARTIDA	SEGUN EXPEDIENTE TECNICO VALORIZACION		
		UND	METRADO	VANACE ACTU METRADO
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD			
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES			
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES			
01.01.01.01	OFICINA PARA CONTRATISTA Y SUPERVISION	m2	12.00	0.00
01.01.01.02	ALMACEN DE OBRA	m2	8.00	0.00
01.01.01.03	CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASHEL	m	247.04	0.00
01.01.01.04	ALQUILER BAÑOS QUIMICOS INC. INSTALACION Y OPERACION	mes	2.00	0.75
01.01.01.05	CARTEL DE OBRA	und	1.00	0.00
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES			
01.01.02.01	AGUA PARA OBRA	mes	2.00	0.00
01.01.03	TRABAJOS PRELIMINARES			
01.01.03.01	LIMPIEZA DEL TERRENO CON EQUIPO	m2	725.11	0.00
01.01.03.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	gb	1.00	0.50
01.01.03.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	est	1.00	0.00
01.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO			
01.01.04.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	235.37	35.37
01.01.05	TRANSPORTE HORIZONTAL PARA MATERIALES			
01.01.05.01	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIALES	rem	8.00	2.00
01.01.06	SEGURIDAD Y SALUD			
01.01.06.01	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	und	1.00	0.00
02	ESTRUCTURAS			
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
02.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL	m3	5.04	0.00
02.01.02	EXCAVACION PARA CIMENTOS HASTA 1.35 m. TERRENO NORMAL	m3	219.37	0.00
02.01.03	EXCAVACION PARA VEREDAS	m3	31.32	0.00
02.02	RELLENOS			
02.02.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	42.11	12.11
02.02.02	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL	m2	164.60	64.60
02.02.03	CONFORMACION DE SUB-BASE PARA VEREDAS	m2	232.00	0.00
02.02.04	AFIRMADO COMPACTADO PARA VEREDAS	m3	23.42	0.00
02.02.05	ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL CON EQUIPO	m3	213.63	40.00
02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
02.03.01	CIMENTO CORRIDO			
02.03.01.01	CONCRETO CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% P.G.	m3	164.42	32.00
02.03.02	SOBRECIMENTOS			
02.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m2	200.07	160.61
02.03.02.02	CONCRETO SOBRECIMENTOS MEZCLA 1:8. CEMENTO-HORMIGON + 25% P.M.	m3	20.01	16.06
02.03.03	PISOS Y PAVIMENTOS			
02.03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS	m2	23.09	0.00
02.03.03.02	CONCRETO fc=175 kg/cm2 PARA VEREDA	m3	25.97	0.00
02.03.04	SOLIDOS			
02.03.04.01	SOLADO PARA CIMENTACIONES E=2" MEZCLA 1:2	m2	164.58	0.00
02.04	CONCRETO ARMADO			
02.04.01	ZAPATAS			
02.04.01.01	ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS	kg	82.30	0.00
02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	0.48	0.00
02.04.01.03	CONCRETO fc= 175 kg/cm2 EN ZAPATAS	m3	2.16	1.16
02.04.02	COLUMNAS DE CERCO			
02.04.02.01	ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS DE CERCO	kg	3,552.78	0.00
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS DE CERCO	m2	246.47	194.85
02.04.02.03	CONCRETO EN COLUMNAS DE CERCO fc= 175 kg/cm2	m3	19.08	9.64
02.04.03	COLUMNAS PARA EL PORTON			
02.04.03.01	ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS PARA PORTON	kg	222.08	172.08
02.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS DE PORTON	m2	11.04	0.00
02.04.03.03	CONCRETO EN COLUMNAS PARA PORTON fc= 175 kg/cm2	m3	0.99	0.00
02.04.04	VIGAS			
02.04.04.01	ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE AMARRE	kg	1,387.22	693.61
02.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE AMARRE	m2	145.56	29.11
02.04.04.03	CONCRETO fc= 175 kg/cm2 EN VIGAS DE AMARRE	m3	15.01	0.00
02.04.05	PISO DE INGRESO, e= 0.10 m			
02.04.05.01	ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PISO DE INGRESO	kg	321.36	0.00
02.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISO DE INGRESO	m2	2.61	0.00
02.04.05.03	CONCRETO fc= 175 kg/cm2 EN PISO DE INGRESO	m3	4.13	0.00
03	ARQUITECTURA			
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA			
03.01.01	MURO DE LADRILLO DE ARCILLA KING KONG - TIPO CARAVISTA	m2	390.14	265.30
03.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS			
03.02.01	TARRAJEO EN VIGAS CA 1.5, e= 1.5 cm	m2	195.07	0.00
03.02.02	TARRAJEO EN COLUMNAS CA 1.5, e= 1.5 cm	m2	264.72	0.00
03.02.03	TARRAJEO ZOCALOS CA 1.5, e= 1.5 cm	m2	200.07	0.00
03.02.04	JUNTAS SISNICAS e=3 cm	m	108.75	0.00
03.02.05	JUNTAS ASPALTICAS EN VEREDAS e= 1"	m	230.89	0.00
03.02.06	JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS e= 1" c/5.00 m	m	44.00	0.00
03.02.07	BRUÑA EN VEREDAS	m	440.65	0.00
03.02.08	BRUÑAS EN PISO DE INGRESO	m	28.70	0.00
03.03	CUBIERTAS			
03.03.01	LADRILLO PASTELERO 24x24 CM PARA CERCO	m	200.07	0.00
03.04	CARPINTERIA METALICA			
03.04.01	PORTON METALICO 2.77 m x 6.35 m. DOS HOJAS PIVOTANTE CON TUBO DE 2" CON PUERTA DE INGRESO PEATONAL INC. PINTURA ANTICORROSIVA	und	1.00	0.50
03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETINA Y ALAMBRE DE PUAS DE SEGURIDAD SOBRE MURO NUEVO (h=0.55m).	m	230.03	0.00
03.05	PINTURA			
03.05.01	PINTURA DE VIGAS, COLUMNAS Y ZOCALOS	m2	659.85	0.00

[Handwritten Signature]
ENRIQUE ANTONIO APONTE CHAMOCHUMBI
 CONSULTOR CIVIL

CHAMOCHUMBI APONTE ENRIQUE ANTONIO

ING° CIVIL RNP C1196 Consultoría

Av. Arica N°795 San Miguel Lima 32

949430962, email: echamochumbi@yahoo.com

CRONOGRAMA VALORIZADO ADECUADO A LA FECHA DE INICIO CONTRACTUAL**CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA**

OBRA:	"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"
EJECUTOR	CONSORCIO MAYES
PLAZO	60 DIAS

Descripción	Und.	Costo Base			29-ene-19	13-feb-19	28-feb-19	15-mar-19	Totales
		Matrado	Precio (S/)	Parcial (S/)	AL 12-feb-19	AL 27-feb-19	AL 14-mar-19	AL 29-mar-19	
COSTO DIRECTO				287,674.52	84,057.50	82,312.85	57,680.39	63,623.78	287,674.52
GASTOS GENERALES (19.13%)		0.19131986	55,037.85	16,081.87	15,748.08	11,035.40	12,172.49		55,037.85
UTILIDAD (10.00%)			28,767.45	8,405.75	8,231.29	5,768.04	6,362.38		28,767.45
SUB TOTAL			371,479.82	108,545.12	106,292.22	74,483.83	82,158.65		371,479.82
IGV (18%)			66,866.38	19,538.13	19,132.60	13,407.09	14,788.56		66,866.38
PRESUPUESTO TOTAL OBRA			438,346.20	128,083.25	125,424.82	87,890.92	96,947.21		438,346.20
AVANCE PARCIAL					29.22%	28.61%	20.05%	22.12%	100.00%
AVANCE ACUMULADO				100.00%	29.22%	57.83%	77.88%	100.00%	

3.1.3 PORCENTAJE DE AVANCE REAL DEL PERIODO Y PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO.**3.1.3.1 LA PROGRAMACIÓN PERT-CPM Y CRONOGRAMA VALORIZADO, AVANCE FÍSICO (PROGRAMADO VS REAL) - EXPEDIENTE TECNICO CONTRACTUAL.**

OBRA	AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		ESTADO DE LA OBRA
	Actual %	Acumul. %	Actual %	Acumul. %	
NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA	28.61	57.83	23.10	56.92	La Obra se encuentra Atrasada 0.91 %

- La obra tiene un avance programado acumulado a la fecha del **57.83 %** y un avance real acumulado **56.92 %**, por lo cual se tiene un ligero retraso de **0.91 %**.

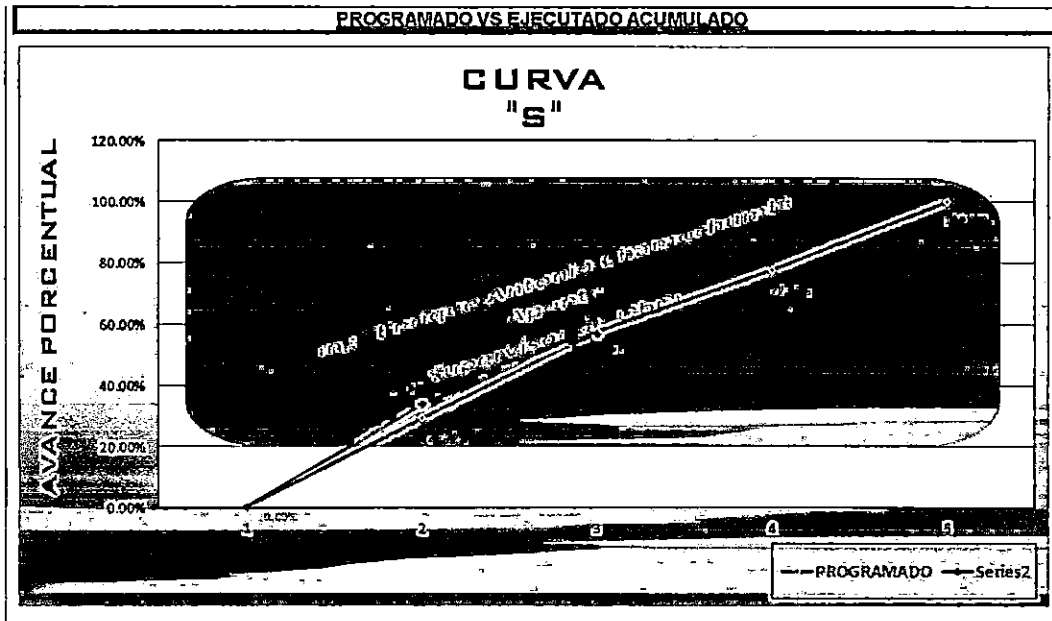
CHAMOCHUMBI APONTE ENRIQUE ANTONIO

ING° CIVIL RNP C1196 Consultoría

Av. Arica N°795 San Miguel Lima 32


949430962, email: echamochumbi@yahoo.com

3.1.3.2 CURVA "S" DE COMPARACION DEL AVANCE PROGRAMADO VS. AVANCE EJECUTADO-EXPEDIENTE TECNICO CONTRACTUAL



CUADROS DEL PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO REPROGRAMADO VS EJECUTADO

CONTRACTUAL					REAL				
MES	MONTOS TOTAL (S/ QV)		AVANCE PORCENTUAL		MES	MONTOS TOTAL (S/ QV)		AVANCE PORCENTUAL	
	PARCIAL S.	ACUMULADO S.	PARCIAL %	ACUMULADO %		PARCIAL S.	ACUMULADO S.	PARCIAL %	ACUMULADO %
29-ene-19	0.00	0.00	0.00%	0.00%	29-ene-19	-	0.00	0.00%	0.00%
12-feb-19	123,083.25	123,083.25	29.22%	29.22%	12-feb-19	144,836.95	144,836.95	33.43%	33.43%
27-feb-19	125,424.82	253,508.07	23.61%	57.83%	27-feb-19				
14-mar-19	87,890.92	341,398.99	20.05%	77.88%	14-mar-19				
29-mar-19	95,947.21	433,346.20	22.12%	100.00%	29-mar-19				
TOTAL	433,346.20		100.00%		TOTAL	144,836.95		33.43%	


ENRIQUE ANTONIO CHAMOCHUMBI APONTE
 INGENIERO EN CIVIL
 R.N.P. N° 111111

Sobre Amortizaciones:

Concepto	N° Carta Fianza	Importe S/.	Fecha De Emisión	Vigencia Hasta	Fecha de Renovación	Condición
FIEL CUMPLIMIENTO		Retención 10% hasta la mitad de las Valorizaciones (Micro y/o pequeña empresa)				Vigente
ADELANTO DIRECTO		NO SOLICITADO, NO CORRESPONDE				
ADELANTO DE MATERIALES		NO SOLICITADO, NO CORRESPONDE				

CHAMOCHUMBI APONTE ENRIQUE ANTONIO

ING° CIVIL RNP C1196 Consultoría

Av. Arica N°795 San Miguel Lima 32

949430962, email: echamochumbi@yahoo.com

3.1.4 CONTROL DE AMORTIZACIONES

RESUMEN DE VALORIZACION N°- 02			
CORRESPONDIENTE MARZO DEL 2019			
CLIENTE	: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		
OBRA	: "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA REGION DE LIMA"		
EJECUTA	: CONSORCIO MAYES		
FECHA	: ENERO DEL 2019		
	TOTAL PRESUPUESTADO CONTRATADO (SIN IGV)	SI.	367,164.70
	IGV (18%)	SI.	66,089.65
	TOTAL PRESUPUESTADO CONTRATADO	SI.	433,254.35
	FACTOR DE RELACION FR=1.0000		0.9884
	TOTAL MOTO CONTRATADO	SI.	428,221.65
A	VALORIZACION BRUTA DEL MES		
	VALORIZACION PRESENTE MES	SI.	66,454.50
	TOTAL VALORIZACION BRUTA DEL MES	SI.	66,454.50
B	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD		
	Gastos Generales	19.13%	SI. 12,714.07
	Utilidad	10.00%	SI. 5,648.63
	TOTAL GG. Y UTILIDAD	SI.	18,362.70
C	OTROS		
	TOTAL OTROS	SI.	-
D	VALORIZACION NETA TOTAL		
		SI.	84,817.20
E	IGV		
		SI.	15,267.10
F	TOTAL		
		SI.	100,084.30
G	FACTOR DE RELACION Fr= 1.0000		
H	TOTAL MONTO BRUTO		
		SI.	100,084.30
I	AMORTIZACION		
	AMORTIZACION POR EL ADELANTO DIRECTO 10%	SI.	-
	AMORTIZACION POR EL ADELANTO DE MATERIALES 20%	SI.	-
J	TOTAL MONTO A CANCELAR		
		SI.	100,084.30
K	% AVANCE PORCENTUAL	%	23.37%
SON:	SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 95/100 SOLES. (INC. IGV)		
		SI.	100,084.30
L	RETENCION DEL FIEL CUMPLIMIENTO (10.00%)		
		SI.	21,662.72
TOTAL A PAGAR:			
	SON: SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VENTILLO CON 58/100 SOLES. (INC. IGV).		SI. 78,421.58

ENRIQUE APONTE
 CHAMOCHUMBI
 CONSULTOR

CHAMOCHUMBI APONTE ENRIQUE ANTONIO

ING° CIVIL RNP C1196 Consultoría

Av. Arica N°795 San Miguel Lima 32

949430962, email: echamochumbi@yahoo.com

3.1.5 COMENTARIOS SOBRE MATERIALES EXISTENTES EN OBRA

El Contratista en el mes adquirió agregados (Hormigón), acero, Cemento Tipo V, así como materiales para el cerco provisional, también Ladrillos KIN KONG caravista, agregados como arena gruesa y piedra chancada para la fabricación de Concreto,

4 CAPITULO IV.- CONTROL TÉCNICO DE OBRA.

4.1 CONTROL DE PRUEBAS PREVIAS DE MATERIALES Y EQUIPOS

A la fecha se han solicitados los siguientes ensayos o pruebas:

- Diseños de Mezcla para Concreto de Zapatas, Columnas y Vigas
- Análisis granulométrico de Agregados
- Análisis químico del agua a utilizar para la fabricación de concreto y asentado de ladrillo.
- Análisis de compresión de ladrillo f'm y f'b.

4.2 OBRAS PROVISIONALES.

4.2.1 CARTEL DE OBRA

Se cuenta con 01 cartel de obra instalados. En zona colindante con la Av principal de acceso a Pucusana.

4.2.2 ALMACÉN, OFICINA, CASETA DE GUARDIANIA.

A la fecha se cuenta con estas instalaciones como se observa en los metrados. Se emplea temporalmente el local contiguo existente de FONDEPES, como almacén.

4.3 CONTROL TÉCNICO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

Se realiza el control técnico de todos los trabajos y procesos constructivos.

4.4 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO

En el presente periodo se iniciaron, asentado de ladrillo caravista, se exigió la utilización de mechas de alambre N°08 en el encuentro de columnas con muros de albañilería, para garantizar un buen confinamiento, así mismo se iniciaron los vaciados de concreto en Zapatas y Columnas, llevando un control de los materiales empleados así como de la proporción para la fabricación del concreto fabricado en campo.

4.4.1 MANO DE OBRA

En el periodo se inició el uso de mano de obra calificada por parte de la contratista, se contó en promedio a la fecha en el presente periodo.

ENRIQUE ANTONIO APONTE
ING. CIVIL
RNP C1196

CHAMOCHUMBI APONTE ENRIQUE ANTONIO

ING° CIVIL RNP C1196 Consultoría

Av. Arica N°795 San Miguel Lima 32

949430962, email: echamochumbi@yahoo.com

4.4.2 EQUIPO Y HERRAMIENTAS

El contratista cuenta con equipos y herramientas operativas tales como:

- 01 camiones Cisterna
- 01 retroexcavadora (trabajo mínimo)
- 01 mezcladora de 9p3.

5 CAPITULO V.- CONSULTAS REFERIDAS AL PROYECTO. (EN EL PERIODO)

A la fecha se han absuelto las consultas realizadas por el Contratista en Obra, como los alineamientos de los muros laterales (Oeste, este), que generó un incremento en la longitud tramo frontal del cerco perimétrico en casi 2metros, que será asumido por el Contratista.

Igualmente se decidió correr el portón de Ingreso ya que chocaba con un poste de energía eléctrica ubicado en el exterior.

6 CAPITULO VI. - ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO,

Adicionales:

No hubo en el presente periodo

Ampliación de plazo:

No hubo en el presente periodo

7 CAPITULO VII.- ANOTACIONES MAS IMPORTANTES DEL CUADERNO DE OBRA Y CARTAS CURSADAS EN EL PERIODO

ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA: ENERO 2019

CUADERNO DE OBRA N°01

Entre los Asientos más importantes, podemos indicar:

-Se solicitó los diseños de mezcla para el Concreto, análisis granulométrico de agregados, análisis químico del agua, análisis de compresión de las unidades de albañilería (Ladrillo Tipo IV), f'm y f'b.

-Se aprobó el trazo

-Se autorizó excavación y vaciado de solados, así como cimientos.

-Se autorizó vaciados de sobrecimientos, asentado de ladrillo, vaciado de columnas,

- Se solicitó alcanzar los metrados ejecutados en el periodo

ENTRONS
CHAMOCHUMBI A PONENTE
2019.01.15

CHAMOCHUMBI APONTE ENRIQUE ANTONIO

ING° CIVIL RNP C1196 Consultoría

Av. Arica N°795 San Miguel Lima 32

949430962, email: echamochumbi@yahoo.com

DE LAS CARTAS E INFORMES EMITIDAS Y RECIBIDAS EN EL PERIODO:

EMITIDAS:

No fue necesario y no hubo

RECIBIDAS:

No fue necesario y no hubo

8 CAPITULO VIII.- VISITAS.

Durante el presente periodo tuvimos la visita en Obra de diferentes autoridades de la Entidad como el Coordinador Ing° Álvaro Cornejo dejando aportes y sugerencias muy importantes para la Obra.

9 CAPITULO IX.- MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL.

Se han tomado en cuenta todos los aspectos ambientales para ser considerados en la ejecución de Obras


10 CAPITULO X.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD G-050

Se supervisa el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes.

11 CAPITULO XI.- DE LA SUPERVISIÓN.

11.1 MATERIALES Y EQUIPO

- Se cuenta con Computadoras, impresora multifuncional.
- Oficina en Obra
- Cámara digital fotográfica y video.
- Útiles de Escritorio propios, etc.
- EPPs.



ENRIQUE APONTE
CHAMOCHUMBI
ING° CIVIL RNP C1196
AV. ARICA N° 795 SAN MIGUEL LIMA 32
TEL: 949430962

CHAMOCHUMBI APONTE ENRIQUE ANTONIO


ING° CIVIL RNP C1196 Consultoría

Av. Arica N°795 San Miguel Lima 32

949430962, email: echamochumbi@yahoo.com

11.2 PAGOS A LA SUPERVISIÓN

A la fecha ya se tramita el Pago N°01, de acuerdo a la Orden de Servicio N°000251, correspondiente al 40% del monto, estando a la espera de su cancelación, estamos próximos a entregar nuestra 2da Factura



N°	PERIODO	MONTO S/.
	40%	12,000.00
2	40%	12,000.00
3	20%	6,000.00
TOTAL	100%	30,000.00

CUADRO DE PAGOS

12 CAPITULO XII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conclusiones:

A la fecha se tiene un avance real ligeramente atrasado con respecto a lo programado que podemos apreciar en el cuadro siguiente:

OBRA	AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		ESTADO DE LA OBRA
	Actual %	Acumul. %	Actual %	Acumul %	
NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA	28.61	57.83	23.10	56.92	La Obra se encuentra Atrasada 0.91 %

ENRIQUE ANTONIO
CHAMOCHUMBI APONTE
ING° CIVIL RNP C1196

Se recomienda:

Al Contratista debe acelerar con el ritmo de trabajo, ya que debido a los trabajadores del sindicato de Construcción civil hubieron ligeras paralizaciones que mermaron ligeramente el avance normal en Obra, se debe continuar con el cumplimiento de las Normas de seguridad y medio ambientales, así como llevar un control de las muestras de concreto que se tomen en Obra de Zapatas, Columnas y vigas.

CHAMOCHUMBI APONTE ENRIQUE ANTONIO


ING° CIVIL RNP C1196 Consultoría

Av. Arica N°795 San Miguel Lima 32

949430962, email: echamochumbi@yahoo.com

A la Entidad cumplir con los pagos al Contratista y la Supervisión para no entorpecer el normal desarrollo de la obra y no afectar el avance por falta de liquidez de ambas partes.

Muy Atentamente,



ENRIQUE ANTONIO
CHAMOCHUMBI APONTE
ING° ENRIQUE CHAMOCHUMBI APONTE
Jefe de Supervisión de Obra

Ing° Enrique Chamochumbi Aponte
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

Lima, marzo del 2019.

CARTA N° 003-2019-R.O/FONDEPES/GST

A: : ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO
DIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES PESQUERAS ARTESANAL Y ACUICOLA

DE : Ing. ALEJANDRO SIU TRUJILLO
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO MAYES

ASUNTO VALORIZACION DE OBRA N° 02

REF. : (a) OBRA: "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA".

FECHA : LIMA, Marzo del 2019.

Es grato dirigirme a Usted con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y a la vez hacerle llegar a Ud. el Informe de Valorización N° 02 del Consorcio mayes de la Obra. "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA". Que sustenta lo que a continuación se solicita la valorización del mes de febrero:

VALORIZACION DEL MES (23.10 %)	= S/. 84,817.20
IGV (18%VN)	= S/. 15,267.10
RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO	= S/. 21,662.72
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA	= S/. 78,421.58



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	
 2848239	
N° DOC:	00002618-2019
CLAVE:	8040
USUARIO	usuario_slog69
FECHA Y HORA:	20/03/2019 12:57:48
TELEFONO:	2097700
www.fondepes.gob.pe	

Atentamente,

[Signature]
 Ing. Alejandro Siu Trujillo
 CIP. 132356

[Signature]
 DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PESQUERAS ARTESANAL Y ACUICOLA
 20/03/2019



Fecha: 20/03/19

MEMORANDO INTERNO N° 1145 -2019 -FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM

Asunto : M.J. 1996-2019-DIGENIPAA

Referencia : Registro: 2618

Destino	Indicación	Destino	Indicación

Observaciones:

José Alberto Cornejo

Atentamente,



Indicaciones:

- 01. Autorizado/ Aprobado
- 02. Calificar/ Evaluar
- 03. Informe
- 04. Proyectar resolución
- 05. Atención/ Tramitación
- 06. Conocimiento y fines
- 07. Notificar al interesado
- 08. Reformular
- 09. Ayuda memoria
- 10. Coordinar
- 11. Opinión/ Recomend
- 12. Consolidar
- 13. Aclarar redacción
- 14. Implementar/ Ejecut
- 15. Preparar respuesta
- 16. Visación
- 17. Agregar a anteced
- 18. Archivo
- 19. Ampliar
- 20. Seguimiento

Lima, marzo del 2019.

CARTA N° 003-2019-R.O/FONDEPES/GST

A: : ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO
DIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES PESQUERAS ARTESANAL Y ACUICOLA

DE : Ing. ALEJANDRO SIU TRUJILLO
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO MAYES

ASUNTO VALORIZACION DE OBRA N° 02

REF. : (a) OBRA: "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA".

FECHA : LIMA, Marzo del 2019.


Es grato dirigirme a Usted con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y a la vez hacerle llegar a Ud. el Informe de Valorización N° 02 del Consorcio mayes de la Obra. "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA". Que sustenta lo que a continuación se solicita la valorización del mes de febrero:


VALORIZACION DEL MES (23.10 %)	= S/. 84,817.20
IGV (18%VN)	= S/. 15,267.10
RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO	= S/. 21,662.72

=====

TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA = S/. 78,421.58

Atentamente,


Ing. Alejandro Siu Trujillo
CIP. 132356


ENRIQUE ANTONIO
TAMOCHUM APONTE
22/03/2019


CONSORCIO MAYES

CARTA N° 005-2019-R.L/FONDEPES/AST


Señor:
ING. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINØ
DIRECTOR GENERAL DE INVERSION PESQUERA ARTESANAL Y ACUICOLA.
DE : ALEJANDRO SIU TRUJILLO
Representante Común del CONSORCIO MAYES
ASUNTO : CUENTA CCI Y CUENTA DE DETRACCION.
REF. : (a) OBRA: "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE
ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA,
PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA".
FECHA : LIMA, 13 de Marzo del 2019.

Es grato dirigirme a Usted con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y a la vez hacerle llegar a Ud LA CUENTA CCI. EN SOLES 011-210-000200849215-25 (BANCO CONTINENTAL) Y LA CUENTA DE DETRACCION 00481079462 DEL BANCO DE LA NACION del CONSORCIO MAYES de la Obra. "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA", la cual esta descrita en el CONTRATO 001-2019-FONDEPS.

Sin otro particular , quedo a Ud.

CONSORCIO MAYES

REPRESENTANTE LEGAL COMUN
Ing. ALEJANDRO SIU TRUJILLO
DNI: 22512946

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO

	
2844753	
N° DOC:	00002310-2019
CLAVE:	1540
USUARIO	usuario_alog69
FECHA Y HORA:	13/03/2019 16:59:51
TELEFONO	2097700

www.fondepes.gob.pe

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO





PROYECTO .

***'NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE
ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO
DE PUCUSANA, PROVINCIA DE PUCUSANA, PROVINCIA
LIMA, REGION LIMA'***

VALORIZACION DE OBRA N°02

MODALIDAD . CONTRATO
FINANCIA . FONDEPES.
LUGAR . PUCUSANA
DISTRITO . PUCUSANA
PROVINCIA . LIMA
REGION . LIMA.

MARZO - 2019



Guillermo Bui Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 67322
RESIDENTE DE OBRA

"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA".

1. CARATULA

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO





PROYECTO.

***'NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE
ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO
DE PUCUSANA, PROVINCIA DE PUCUSANA, PROVINCIA
LIMA, REGION LIMA'***

VALORIZACION DE OBRA N°02

MODALIDAD . CONTRATO
FINANCIA . FONDEPES.
LUGAR . PUCUSANA
DISTRITO . PUCUSANA
PROVINCIA . LIMA
REGION . LIMA.

MARZO - 2019


.....
 **Guillermo Stu Trujillo**
INGENIERO CIVIL
O.P. 87322
RESIDENTE DE OBRAS

*NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA*.

2. ÍNDICE (DETALLE UBICACIÓN Y PÁGINAS).



“NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO
DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE PUCUSANA,
PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA”

ÍNDICE – INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA


- 01. CARATULA
- 02. ÍNDICE (DETALLE UBICACIÓN Y PÁGINAS).
- 03. INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA
 - 03.01 INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA
- 04. VALORIZACIÓN DE OBRA
 - 04.01 FICHA TÉCNICA
 - 04.02 RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN
 - 04.03 METRADOS DE CAMPO
 - 04.04 VALORIZACIÓN MENSUAL
 - 04.05 CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRAS SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO
VS EJECUCIÓN DE OBRAS CURVAS “S”
 - 04.06 REAJUSTES
 - 04.07 DEDUCCION – REINTEGRO DE REAJUSTES
 - 04.08 AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DIRECTO
 - 04.09 AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE MATERIALES
 - 04.10 CARTA FIANZA POR FIEL CUMPLIMIENTO
 - 04.11 PENALIDADES CUENTAS DEL PERIODO
 - 04.12 CONTROL DE LA VALORIZACIÓN
 - 04.13 CONTROL DE AVANCE DE OBRA
 - 04.14 CALENDARIO VALORIZADO VIGENTE
- 05. DOCUMENTOS TÉCNICOS – ADMINISTRATIVOS:
 - 05.01 COPIA DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
 - 05.02 COPIA DE CONTRATO DEL CONSORCIO
 - 05.03 COPIA DE REGISTRO DE EJECUCIÓN DE OBRA
 - 05.04 CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER

"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO
DE PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA PROVINCIA DE PUCUSANA
PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA"

- 05.05 COPIA DE DNI FEDEATEADO DEL REPRESENTANTE LEGAL
- 05.06 COPIA DE CUADERNO DE OBRA
- 05.07 COPIA DE PAGO SENCICO
- 05.08 COPIA DE VOUCHER DE PAGO (CONAFOVICER)
- 05.09 COPIA DE PDT
- 05.10 CONTROL DE CALIDAD
- 05.11 COPIA DEL CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA.

06. ANEXOS

- 06.01 COPIA DE CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE DE OBRA
- 06.02 PANEL FOTOGRÁFICO DE LA OBRA
- 06.03 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
- 06.04 INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
- 06.05 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
- 06.06 SEGURO DE VIDA LEY TRABAJADORES
- 06.07 SEGURO POLIZA DE SEGURO DE CONSTRUCCIÓN
- 06.08 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – SALUD Y PENSIÓN



"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA".

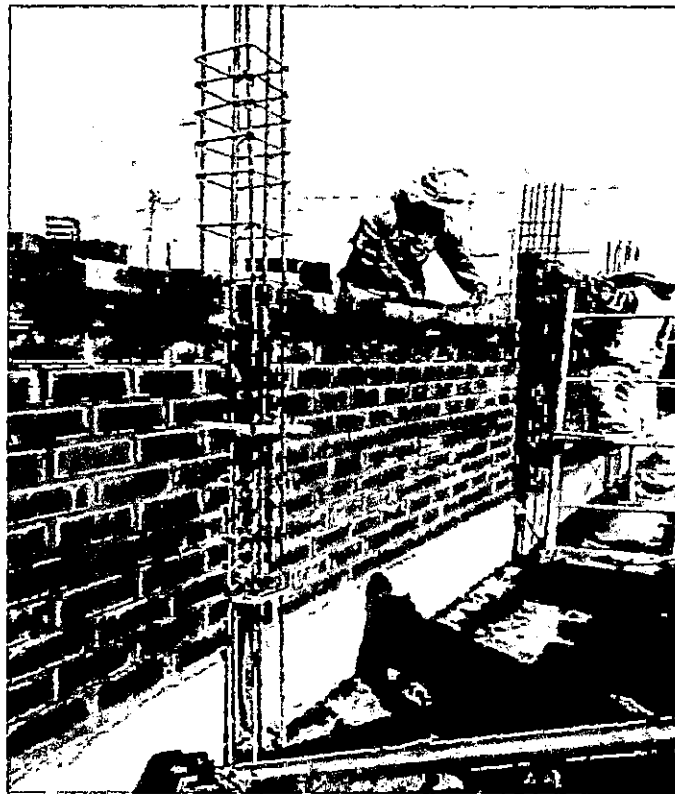
3. INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA

"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA".

**03.01 INFORME DE
RESIDENTE DE OBRA**

INFORME DE RESIDENTE DE OBRA N° 002

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
(FONDEPES)



OBRA: "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA".

FEBRERO DEL 2019



Guillermo Siu Trujillo
INGENIERO CIVIL
GIP: 87322
RESIDENTE DE OBRA

Lima, marzo del 2019.

Lima, Febrero del 2019.

INFORME N° 002-2019-R.O/FONDEPES/GST

A: : ALEJANDRO SIU TRUJILLO
Representante Común del CONSORCIO MAYES

DE : Ing. GUILLERMO SIU TRUJILLO
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO VALORIZACION DE OBRA N° 02

REF. : (a) OBRA: "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA".

FECHA : LIMA, Marzo del 2019.

Es grato dirigirme a Usted con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y a la vez hacerle llegar a Ud. el Informe de Valorización N° 02 del Consorcio mayes de la Obra. "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA". Que sustenta lo que a continuación se solicita:

VALORIZACION DEL MES (23.10 %)	= S/. 84,817.20
IGV (18%VN)	= S/. 15,267.10
RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO	= S/. 21,662.72
	=====
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA	= S/. 78,421.58

Atentamente,




**INFORME DE RESIDENTE DE OBRA N° 002
VALORIZACION N°002**

INDICE

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

1.01 Datos generales de la Obra

1.02 Avance de Obra

1.3 Generalidades

1.4 Ubicación de la obra

1.5 Antecedentes

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO:

3. PARTIDAS EJECUTADAS EN EL MES VALORIZADO:

3.01 Frentes de trabajo.

3.02 Ocurrencias dificultades y soluciones en obra.

3.03 Comentarios y sugerencias

4. CONTROL ADMINISTRATIVO

4.01 Inscripción de planilla de obra.

4.02 Implementación de medidas de seguridad

4.03 Implementación de botiquín

4.04 Personal Empleado en obra

4.05 Equipos Y Herramientas empleados en obra

5. MANEJO Y CONTROL DE OBRA:

5.1 Aspectos Técnicos.

5.2 Desarrollo de la Obra

6. VALORIZACIÓN Y CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA.

7. DOCUMENTO TRAMITADA.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

8.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


 **Guillermo Su Trujillo**
INGENIERO CIVIL
CIP: 67322
RESIDENTE DE OBRA

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

1.01- Datos generales de la obra.



A continuación, se presenta las fichas de resumen y descripción:

1.02- AVANCE DE LA OBRA:

Se presenta independientemente el siguiente resumen del avance mensual.

FICHA TECNICA DE OBRA

PROYECTO	:	"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"		
ENTIDAD	:	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)		
MODALIDAD	:	CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS		
CONTRATISTA	:	CONSORCIO MAYES		
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO	:	ALEJANDRO SIU TRUJILLO		
PROCESO	:	ADJUDICACION SIMPLICADA N° 022-2018 - FONDEPES		
CONTRATO	:	N° 001 - 2019 - FONDEPES		
SUPERVISOR DE OBRA	:	Ing. Enrique Antonio CHAMOCHUMBI APONTE		
RESIDENTE DE OBRA	:	Ing. Guillermo SIU TRUJILLO		
PRESUPUESTO BASE	:	S/.	438,346.20	Inc. IGV
PRESUPUESTO OFERTADO	:	S/.	438,346.20	Inc. IGV
PRESUPUESTO CONTRATADO	:	S/.	433,254.35	Inc. IGV
FACTOR DE RELACION	:	0.98838395		
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	:	10-Ene-19		
PLAZO CONTRACTUAL	:	60 DIAS		
FECHA ENTREGA DE TERRENO	:	18-Ene-19		
FECHA INICIO DE OBRA	:	29-Ene-19		
INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	:	29-Ene-19		
FECHA TERMINO CONT. DE OBRA	:	29-Mar-19		
PARALIZACIÓN DE OBRA	:	NO SE TUVO		
REINICIO DE OBRA	:	NO SE TUVO		
AMPLIACION DE PLAZO N°01	:	DIAS		
TOTAL DE AMPLIACION DE PLAZO	:	DIAS		
DURACION TOTAL DE LA OBRA	:	60 DIAS		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	:	29-Mar-19		
VALORIZACION N° 02	:	S/.	100,084.30	23.10%
RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	:	S/.	43,325.44	(Fondo de Garantia de Fiel Cumplim.)
REAJUSTE	:	S/.	-	Ninguno
REINTEGROS	:	S/.	-	Ninguno
INTERESES	:	S/.	-	Ninguno
MORAS POR DEMORA EN FIRMA DE CONTRATO	:	S/.	-	Ninguno
MAYORES GASTOS GENERALES	:	S/.	-	Ninguno
MULTAS POR ATRAZO DE OBRA	:	S/.	-	Ninguno
FECHA: ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES	:	01-Mar-18		
ADELANTO DIRECTO	:	S/.	-	No se solicito
ADELANTO PARA MATERIALES	:	S/.	-	No se solicito
<u>DEL TOTAL FINANCIADO:</u>				
MONTO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO	:	S/.	433,254.35 (MC)	
MONTO DEL PRESUPUESTO ADICIONAL (A)	:	S/.	-	NINGUNO A LA FECHA


 Guillermo Siu Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRA

PRESUPUESTO DEDUCTIVO (D)	:	S/.	- NINGUNO A LA FECHA
TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL (TPA = A - D)	:	S/.	- NINGUNO A LA FECHA
MONTO TOTAL FINANCIADO = MC + TPA	:	S/.	433,254.35 (MTF)

DEL PRESUPUESTO

1. La obra a la fecha se encuentra con un avance físico mensual de 33.43 % en el mes de Febrero, correspondiente a la primera valorización, periodo de ejecución del, 29 de enero de 2019 al, 12 de Febrero de 2019, las partidas valorizadas se encuentran detalladas de la siguiente manera.

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 2. Avance ejecutado en el mes | : | 23.10 % |
| 3. Avance programado en el mes | : | 28.61 % |
| 4. Avance ejecutado acumulado | : | 56.53 % |
| 5. Avance programado acumulado | : | 57.83 % |
| 6. Situación actual de la obra | : | De los porcentajes se deduce que la obra se Encuentra ATRASADA en un 1.30%. |

1.03- GENERALIDADES:

La Información quincenal de la obra: **" NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"**, es correspondiente del 13 de FEBRERO del 2019 al 27 de febrero del 2019, el ejecutor es El consorcio Mayes y se realiza por la modalidad de Contrata- a precios unitarios, el presupuesto de Obra asciende a S/. 43,3254.35. (Son: cuatrocientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y cuatro con 35/100 Soles), con un plazo de ejecución de obra de 60 días calendarios.

1.04- UBICACIÓN DE LA OBRA:

UBICACIÓN:

La Obra se encuentra ubicada en la localidad de Pucusana Distrito de Pucusana, Provincia de Lima y Región Lima.

Región	:	Lima
Departamento	:	Lima
Provincia	:	Lima
Distrito	:	Pucusana
Localidad	:	Pucusana

1.05- ANTECEDENTES:

El FONDEPES, como parte de su plan de inversiones Ejecutara la obra denominado **"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"**, Con La presente Ejecución de obra Se pretende mejorar la calidad de vida de los pobladores, dotando con una mejor seguridad, con objetivo de brindar una mejor seguridad a los usuarios del pesquero del distrito de Pucusana.

Por lo que se planteado las alternativas de solución brindando La ejecución de la obra:

"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA".

El fondo nacional de desarrollo pesquero, mediante licitación Pública Nacional N° 22-2018-FONDEPES.PRIMERA CONVOCATORIA realizo la selección de la empresa contratista que cumpla con el lineamiento exigido, siendo el postor adjudicado con la buena pro la empresa "CONSORCIO MAYES". Una vez concedida el otorgamiento de la buena pro, se celebró el contrato de ejecución de la obra: "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA", con fecha 10 de Enero del 2019 entre el fondo nacional de desarrollo pesquero y el consorcio mayes, por el monto de S/. 433,254.35 (Son: cuatrocientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y cuatro con 35/100 Soles), Incluido El Impuesto General A Las Ventas (IGV.)

2.- OBJETIVOS DEL PROYECTO:

El Objetivo del proyecto es la construcción del cerco perimétrico del Centro de Entrenamiento Pesquero de Pucusana a fin de darle seguridad al espacio del terreno que queda de dicho inmueble. Este lote queda pertenece a la localidad de Pucusana, Distrito de Pucusana, Provincia de Lima, Región Lima.

La obra contiene las siguientes partidas a ejecutarse:

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

OBRA:	"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"
FINANCIA	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
EJECUTA	CONSORCIO MAYES

ITEM	DESCRIPCION PARTIDA	SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO				S/. TOTAL
		UND	METRADO	S/. PRECIOS	S/. PARCIAL	
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD					
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES					
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES					
01.01.01.01	OFICINA PARA CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN	m2	12.00	281.96	3,383.52	3,383.52
01.01.01.02	ALMACEN DE OBRA	m2	8.00	282.99	2,263.92	2,263.92
01.01.01.03	CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL	m	247.04	31.12	7,687.88	7,687.88
01.01.01.04	ALQUILER BAÑOS QUIMICOS INC. INSTALACION Y OPERACIÓN	mes	2.00	362.37	724.74	724.74
01.01.01.05	CARTEL DE OBRA	und	1.00	740.51	740.51	740.51
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES					
01.01.02.01	AGUA PARA OBRA	mes	2.00	2,168.18	4,336.36	4,336.36
01.01.03	TRABAJOS PRELIMINARES					
01.01.03.01	LIMPIEZA DEL TERRENO CON EQUIPO	m2	726.11	1.70	1,234.39	1,234.39
01.01.03.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	gib	1.00	601.16	601.16	601.16

01.01.03.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	est	1.00	6,060.30	6,060.30	6,060.30
01.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO					
01.01.04.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	235.37	2.99	703.76	703.76
01.01.05	TRANSPORTE HORIZONTAL PARA MATERIALES					
01.01.05.01	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIALES	sem	8.00	102.47	819.76	819.76
01.01.06	SEGURIDAD Y SALUD					
01.01.06.01	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	und	1.00	9,894.00	9,894.00	9,894.00
02	ESTRUCTURAS					
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
02.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL	m3	5.04	18.74	94.45	94.45
02.01.02	EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.35 m. TERRENO NORMAL	m3	219.37	37.46	8,217.60	8,217.60
02.01.03	EXCAVACION PARA VEREDAS	m3	31.32	37.46	1,173.25	1,173.25
02.02	RELLENOS					
02.02.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	42.11	40.57	1,708.40	1,708.40
02.02.02	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL	m2	164.60	2.75	452.65	452.65
02.02.03	CONFORMACION DE SUB-BASE PARA VEREDAS	m2	232.00	0.84	194.88	194.88
02.02.04	AFIRMADO COMPACTADO PARA VEREDAS	m3	28.42	97.73	2,777.49	2,777.49
02.02.05	ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL CON EQUIPO	m3	213.63	32.09	6,855.39	6,855.39
02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					
02.03.01	CIMIENTO CORRIDO					
02.03.01.01	CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% P.G.	m3	164.42	227.26	37,366.09	37,366.09
02.03.02	SOBRECIMENTOS					
02.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m2	200.07	57.54	11,512.03	11,512.03
02.03.02.02	CONCRETO SOBRECIMENTOS MEZCLA 1:8, CEMENTO- HORMIGON + 25% P.M.	m3	20.01	265.18	5,306.25	5,306.25
02.03.03	PISOS Y PAVIMENTOS					
02.03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS	m2	23.09	53.51	1,235.55	1,235.55
02.03.03.02	CONCRETO $f_c=175$ kg/cm ² PARA VEREDA	m3	25.97	382.63	9,936.90	9,936.90
02.03.04	SOLADOS					
02.03.04.01	SOLADO PARA CIMENTACIONES E=2" MEZCLA 1:2	m2	164.58	45.26	7,448.89	7,448.89
02.04	CONCRETO ARMADO					
02.04.01	ZAPATAS					
02.04.01.01	ACERO $f_y= 4200$ kg/cm ² GRADO 60 EN ZAPATAS	kg	82.30	4.69	385.99	385.99
02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	6.48	63.15	409.21	409.21
02.04.01.03	CONCRETO $f_c= 175$ kg/cm ² EN ZAPATAS	m3	2.16	363.39	784.92	784.92
02.04.02	COLUMNAS DE CERCO					
02.04.02.01	ACERO $f_y= 4200$ kg/cm ² GRADO 60 EN COLUMNAS DE CERCO	kg	3,552.78	4.66	16,555.95	16,555.95
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS DE CERCO	m2	246.47	63.05	15,539.93	15,539.93
02.04.02.03	CONCRETO EN COLUMNAS DE CERCO $f_c= 175$ kg/cm ²	m3	19.08	411.09	7,843.60	7,843.60
02.04.03	COLUMNAS PARA EL PORTON					
02.04.03.01	ACERO $f_y= 4200$ kg/cm ² GRADO 60 EN COLUMNAS PARA PORTON	kg	222.08	4.69	1,041.56	1,041.56
02.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS DE PORTON	m2	11.04	81.86	903.73	903.73
02.04.03.03	CONCRETO EN COLUMNAS PARA PORTON $f_c= 175$ kg/cm ²	m3	0.99	476.69	471.92	471.92

02.04.04	VIGAS					
02.04.04.01	ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE AMARRE	kg	1,387.22	4.69	6,506.06	6,506.06
02.04.04.02	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE AMARRE	m2	145.56	67.00	9,752.52	9,752.52
02.04.04.03	CONCRETO fc= 175 kg/cm2 EN VIGAS DE AMARRE	m3	15.01	385.58	5,787.56	5,787.56
02.04.05	PISO DE INGRESO, e= 0.10 m					
02.04.05.01	ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PISO DE INGRESO	kg	321.36	4.66	1,497.54	1,497.54
02.04.05.02	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO EN PISO DE INGRESO	m2	2.61	53.51	139.66	139.66
02.04.05.03	CONCRETO fc= 175 kg/cm2 EN PISO DE INGRESO	m3	4.13	382.63	1,580.26	1,580.26
03	ARQUITECTURA					
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA					
03.01.01	MURO DE LADRILLO DE ARCILLA KING KONG - TIPO CARAVISTA	m2	390.14	68.97	26,907.96	26,907.96
03.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS					
03.02.01	TARRAJEO EN VIGAS C:A 1:5, e= 1.5 cm	m2	195.07	41.80	8,153.93	8,153.93
03.02.02	TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:5, e= 1.5 cm	m2	264.72	35.02	9,270.49	9,270.49
03.02.03	TARRAJEO ZOCALOS C:A 1:5, e= 1.5 cm	m2	200.07	34.40	6,882.41	6,882.41
03.02.04	JUNTAS SISMICAS e=3 cm	m	108.75	3.25	353.44	353.44
03.02.05	JUNTAS ASFÁLTICAS EN VEREDAS e = 1"	m	230.88	6.27	1,447.62	1,447.62
03.02.06	JUNTAS DE DILATACIÓN EN VEREDAS e = 1" c/5.00 m	m	44.00	2.85	125.40	125.40
03.02.07	BRUÑA EN VEREDAS	m	440.55	6.71	2,956.09	2,956.09
03.02.08	BRUÑAS EN PISO DE INGRESO	m	28.70	6.71	192.58	192.58
03.03	CUBIERTAS					
03.03.01	LADRILLO PASTELERO 24X24 CM PARA CERCO	m	200.07	12.77	2,554.89	2,554.89
03.04	CARPINTERIA METALICA					
03.04.01	PORTON METALICO 2.77 m x 5.35 m. DOS HOJAS PIVOTANTE CON TUBO DE 2" CON PUERTA DE INGRESO PEATONAL INC. PINTURA ANTICORROSIVA	und	1.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00
03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA Y ALAMBRE DE PUAS DE SEGURIDAD SOBRE MURO NUEVO (h=0.55m).	m	230.03	51.51	11,848.85	11,848.85
03.05	PINTURA					
03.05.01	PINTURA DE VIGAS, COLUMNAS Y ZOCALOS	m2	659.85	15.11	9,970.33	9,970.33

3.01-FRENTES DE TRABAJO:

Durante el presente mes se ejecutaron partidas que abarca los diferentes trabajos a continuación detallaremos los diferentes trabajos realizados en los diferentes ítems antes mencionados.

ITEMS	DESCRIPCION DE PARTIDA	UND	MET. CONTR.	METRADO		
				ANTER.	ACTUAL	ACU MUL.
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD					
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES					
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES					
01.01.01.01	OFICINA PARA CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN	m2	12	12.00	0.00	12.00



Guillermo Ska Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87322
 RESIDENTE DE OBRAS

01.01.01.02	ALMACEN DE OBRA	m2	8	8.00	0.00	8.00
01.01.01.03	CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL	m	247.04	247.04	0.00	247.04
01.01.01.04	ALQUILER BAÑOS QUIMICOS INC. INSTALACION Y OPERACIÓN	mes	2	1.25	0.75	2.00
01.01.01.05	CARTEL DE OBRA	und	1	1.00	0.00	1.00
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES					
01.01.02.01	AGUA PARA OBRA	mes	2	1.25	0.00	1.25
01.01.03	TRABAJOS PRELIMINARES					
01.01.03.01	LIMPIEZA DEL TERRENO CON EQUIPO	m2	726.11	726.11	0.00	726.11
01.01.03.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	glb	1	0.00	0.50	0.50
01.01.03.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	est	1	0.50	0.00	0.50
01.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO					
01.01.04.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	235.37	200.00	35.37	235.37
01.01.05	TRANSPORTE HORIZONTAL PARA MATERIALES					
01.01.05.01	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIALES	sem	8	6.00	2.00	8.00
01.01.06	SEGURIDAD Y SALUD					
01.01.06.01	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	und	1	0.75	0.00	0.75
02	ESTRUCTURAS					
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
02.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL	m3	5.04	5.04	0.00	5.04
02.01.02	EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.35 m. TERRENO NORMAL	m3	219.37	219.37	0.00	219.37
02.01.03	EXCAVACIÓN PARA VEREDAS	m3	31.32	31.32	0.00	31.32
02.02	RELLENOS					
02.02.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	42.11	30.00	12.11	42.11
02.02.02	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL	m2	164.6	100.00	64.60	164.60
02.02.03	CONFORMACIÓN DE SUB-BASE PARA VEREDAS	m2	232	120.00	0.00	120.00
02.02.04	AFIRMADO COMPACTADO PARA VEREDAS	m3	28.42	20.00	0.00	20.00
02.02.05	ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL CON EQUIPO	m3	213.63	120.00	40.00	160.00
02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					
02.03.01	CIMIENTO CORRIDO					
02.03.01.01	CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% P.G.	m3	164.42	100.00	32.00	132.00
02.03.02	SOBRECIMENTOS					
02.03.02.01	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m2	200.07	0.00	160.61	160.61
02.03.02.02	CONCRETO SOBRECIMENTOS MEZCLA 1:8, CEMENTO- HORMIGON + 25% P.M.	m3	20.01	0.00	16.06	16.06
02.03.03	PISOS Y PAVIMENTOS					
02.03.03.01	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS	m2	23.09	0.00	0.00	0.00
02.03.03.02	CONCRETO f _c =175 kg/cm ² PARA VEREDA	m3	25.97	0.00	0.00	0.00
02.03.04	SOLIDOS					
02.03.04.01	SOLADO PARA CIMENTACIONES E=2" MEZCLA 1:2	m2	164.58	164.58	0.00	164.58
02.04	CONCRETO ARMADO					
02.04.01	ZAPATAS					
02.04.01.01	ACERO f _y = 4200 kg/cm ² GRADO 60 EN ZAPATAS	kg	82.3	82.30	0.00	82.30
02.04.01.02	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	6.48	6.48	0.00	6.48
02.04.01.03	CONCRETO f _c = 175 kg/cm ² EN ZAPATAS	m3	2.16	1.00	1.16	2.16
02.04.02	COLUMNAS DE CERCO					

02.04.02.01	ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS DE CERCO	kg	3552.78	3,552.78	0.00	3,552.78
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS DE CERCO	m2	246.47	0.00	184.85	184.85
02.04.02.03	CONCRETO EN COLUMNAS DE CERCO f'c= 175 kg/cm2	m3	19.08	0.00	9.54	9.54
02.04.03	COLUMNAS PARA EL PORTON					
02.04.03.01	ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS PARA PORTON	kg	222.08	50.00	172.08	222.08
02.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS DE PORTÓN	m2	11.04	0.00	0.00	0.00
02.04.03.03	CONCRETO EN COLUMNAS PARA PORTÓN f'c= 175 kg/cm2	m3	0.99	0.00	0.00	0.00
02.04.04	VIGAS					
02.04.04.01	ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE AMARRE	kg	1387.22	0.00	693.61	693.61
02.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE AMARRE	m2	145.56	0.00	29.11	29.11
02.04.04.03	CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 EN VIGAS DE AMARRE	m3	15.01	0.00	0.00	0.00
02.04.05	PISO DE INGRESO, e= 0.10 m					
02.04.05.01	ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PISO DE INGRESO	kg	321.36	220.00	0.00	220.00
02.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISO DE INGRESO	m2	2.61	0.00	0.00	0.00
02.04.05.03	CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 EN PISO DE INGRESO	m3	4.13	0.00	0.00	0.00
03	ARQUITECTURA					
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA					
03.01.01	MURO DE LADRILLO DE ARCILLA KING KONG - TIPO CARAVISTA	m2	390.14	0.00	265.30	265.30
03.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS					
03.02.01	TARRAJEO EN VIGAS C:A 1:5, e= 1.5 cm	m2	195.07	0.00	0.00	0.00
03.02.02	TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:5, e= 1.5 cm	m2	264.72	0.00	0.00	0.00
03.02.03	TARRAJEO ZOCALOS C:A 1:5, e= 1.5 cm	m2	200.07	0.00	0.00	0.00
03.02.04	JUNTAS SISMICAS e=3 cm	m	108.75	0.00	0.00	0.00
03.02.05	JUNTAS ASFÁLTICAS EN VEREDAS e = 1"	m	230.88	0.00	0.00	0.00
03.02.06	JUNTAS DE DILATACIÓN EN VEREDAS e = 1" c/5.00 m	m	44	0.00	0.00	0.00
03.02.07	BRUÑA EN VEREDAS	m	440.55	0.00	0.00	0.00
03.02.08	BRUÑAS EN PISO DE INGRESO	m	28.7	0.00	0.00	0.00
03.03	CUBIERTAS					
03.03.01	LADRILLO PASTELERO 24X24 CM PARA CERCO	m	200.07	0.00	0.00	0.00
03.04	CARPINTERIA METALICA					
03.04.01	PORTON METALICO 2.77 m x 5.35 m. DOS HOJAS PIVOTANTE CON TUBO DE 2" CON PUERTA DE INGRESO PEATONAL INC. PINTURA ANTICORROSIVA	und	1	0.00	0.50	0.50
03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA Y ALAMBRE DE PUAS DE SEGURIDAD SOBRE MURO NUEVO (h=0.55m).	m	230.03	0.00	0.00	0.00
03.05	PINTURA					
03.05.01	PINTURA DE VIGAS, COLUMNAS Y ZOCALOS	m2	659.85	0.00	0.00	0.00

01 . OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

Se realizó los trabajos de construcciones e instalaciones que con carácter temporal son ejecutadas, para el servicio del personal administrativo y obrero, para almacenamiento y cuidado de los materiales durante la ejecución de las obras. Se uso materiales recuperables en todo o, en parte ya que estas construcciones e instalaciones deben ser demolidas y/o

 Guillermo Súa Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRAS

desamadas al final de la obra dejando el lugar empleado en iguales o mejores condiciones a como lo encontró.

02 ESTRUCTURAS

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Se realizaron los trabajos de las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación del material excedente, necesarios para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecución de la edificación y sus exteriores; así como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterráneos, tales como cimentaciones, tuberías, etc.

02.02 RELLENOS

Se realizaron los trabos de rellenar zanjas o el relleno de zonas requeridas por los niveles de pisos establecidos en los planos

02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

se ejecutó el trabajo de los elementos de concreto que no llevan armadura metálica. Involucra también a los elementos de concreto ciclópeo, resultante de la adición de piedras grandes y medianas en volúmenes determinados al concreto simple.

El Concreto simple es una mezcla de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso y agua. Durante su preparación se debe verificar que el agregado grueso se encuentre totalmente envuelto por la pasta de cemento y el agregado fino debe llenar los espacios entre las partículas de agregado grueso.

Se respetó la resistencia a la compresión (f_c) especificada en los planos y las especificaciones técnicas del proyecto.

Para el caso de concreto ciclópeo, la piedra que se usó han tenido un tamaño máximo de 20 cm y lo cual represento como máximo el 30% del volumen total, según los planos. Se tuvo el cuidado de que cada piedra esté totalmente rodeada de concreto simple.

02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO



Se ejecutó la obra de concreto armado, constituida por la unión del concreto con la armadura de acero, comprende en su ejecución una estructura temporal y otra permanente.

La primera es el encofrado de uso provisional, que sirva para contener la masa del concreto en la primera etapa de endurecimiento y la segunda se refiere a la obra definitiva, donde interviene el cemento, agregados, agua, armadura de acero, agregándose eventualmente aditivos con diversos objetos.

Para cada elemento diferente de concreto se indicará su calidad que se acostumbra fijar mediante la resistencia o la rotura (f_c) en cilindros a los 28 días.

Como norma general de encofrados, el área efectiva se calculó, midiendo el desarrollo de la superficie del molde o encofrado en contacto con el concreto.

Para la armadura de acero se respetó los planos y las especificaciones técnica del proyecto y como documento legal se ha tenido el reglamento nacional de edificaciones.


 **Guillermo Súa Trujillo**
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRAS

3.02-OCURRENCIAS, DIFICULTADES Y SOLUCIONES EN OBRA:

El avance en el presente mes fue lo adecuado y se logró cumplir las metas propuestas, lo cual se alcanzó el cronograma programado sin dificultades.

- Se informó al supervisor de obra de manera previa a dar inicio a los trabajos de vaciado de concreto en cada uno de los elementos estructurales y no estructurales, esto para agilizar y evitar posibles retrasos en obra.
- Lo materiales que se usaron fueron de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente y con sus respectivos controles de calidad.
- Se Presente la valorización de obra N°002 correspondiente al periodo del 13 de febrero del 2019 al 27 de Febrero del 2019.

3.03-COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Se sugiere a la entidad dar los trámites correspondientes de la presente valorización para poder seguir cumpliendo las metas que se vienen planteando y así no tener atrasos en referente al cronograma valorizado.

4.- CONTROL ADMINISTRATIVO:

4.01.- INSCRIPCIÓN DE PLANILLA DE OBRA:

Mediante el presente informe debo de hacer conocer que en reunión. Llevada a cabo en la ceremonia de entrega de terreno, en coordinación con Los representantes de la entidad FONDEPES, se acordó realizar el pago de los jornales en forma mensual. Así mismo se acordó que los trabajadores para cada partida que se ejecute sean porcentualmente parejos de la misma zona con de fuera, a fin que sean beneficiados todos los pobladores de la localidad.

4.02.- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Todos los trabajadores cuentan con epps de acuerdo a la norma.

4.03.- IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUÍN.

Con la finalidad de prestar los primeros auxilios en casos de accidentes, se cuenta en obra con un botiquín implementado con medicamentos esenciales tales como: Alcohol, esparadrapo, Gasa, Yodo, Paracetamol, Ibuprofeno, Buscapina, Vendas Fajas, etc.

4.04.- PERSONAL EMPLEADO EN OBRA Y EQUIPOS EMPLEADOS. 1

Con la finalidad de Controlar de cerca la ejecución de obra, se cuenta con los siguientes Trabajadores y profesionales en la obra:

PERSONAL OBRERO


GOBIERNO SUI Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBR-

- Maestro de obra	01
- Operarios	01
- Operador de equipo pesado	02
- Oficiales	02
- Peón	10
- Almacenero de obra	01
- Guardián de obra	01

PERSONAL PROFESIONAL

- Residente de Obra.	01
- Asistente de residente	01
- Capacitador de seguridad y salud en obra	01
- Administrador de Obra	01

4.05.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EMPLEADOS EN OBRA.

HERRAMIENTAS MANUALES

- Carretillas boogui.
- Comba de 4 Lbs
- Comba de 10 Lbs
- Comba de 20 Lbs
- Wincha de 30 m
- Flexómetros de 5m
- Palas.
- Picos con lampas.
- Barretas, etc.

EQUIPOS

- Miras y jalones
- Estación Total
- Mezcladora de Concreto 9Hp
- Vibrador de Concreto
- Amoladora
- tronzadora
- Demoledor, etc.

4.06.- EQUIPOS USADOS POR LA RESIDENCIA.

- 01 Módulo de Computación con Software de Valorizaciones, Microsoft Axel, S-10 y otros programas de ingeniería instalados.
- 01 Cámara fotográfica digital.
- 01 Teléfono Celular.
- Wincha

5.- MANEJO Y CONTROL DE OBRA:

5.01.- ASPECTO TÉCNICO

DEL MAESTRO DE OBRA


Guillermo Stu Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRA

En el presente periodo de ejecución de Obra Correspondiente a la valorización N° 001, se ha

verificado el plan de trabajo programado, por el maestro de obra en coordinación con la residencia para cumplir con la ejecución de la obra, realizándose las coordinaciones constantes y dejando constancia que el maestro de obra cumpla con los trabajos programados en cada uno de los componentes de la obra.

DE LA SUPERVISIÓN

Se ha tenido visitas Diarias por parte del supervisor con la finalidad de controlar de cerca los trabajos que se viene ejecutando en los diferentes frentes de trabajo.

CONTROL DEL PERSONAL

En cuanto al personal se cuenta con la mano de obra calificada y no calificada, exigiendo que permanezca en obra personal calificado y con conocimientos en trabajos similares, así mismo se deja constancia que al mando del frente de trabajo se encuentra el maestro de obra, del mismo modo se verifica la existencia del personal en obra calificado y no calificado en la cantidad necesaria.

CONTROL DE LOS MATERIALES

Con respecto al control de los materiales la residencia viene coordinando con los administrativos de la empresa Consorcio mayes, que los materiales que se adquiera sean de primera calidad, además la supervisión está verificando de cerca la calidad de cada uno de los materiales ingresados a obra.

5.02.- DESARROLLO DE LA OBRA

- Obra cuenta con un avance de 23.10 % correspondiente a la valorización N° 002 y con avance acumulado de 56.53 %, con un saldo por ejecutar de 43.47 %.
- Se recomienda a los responsables de la oficina de abastecimiento dar trámites de los requerimientos para la compra de materiales y evitar retrasos.
- En el presente mes se mostró un avance de obra de situación ATRASADA, en un 1.30%.
- Se realizaron ensayos necesarios y las pruebas in situ con la presencia del supervisor.

6.- VALORIZACIÓN Y CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA

Se adjunta el cuadro de valorizaciones por componente, Así mismo a continuación se presenta el control económico de la obra.

CONTROL DE ADELANTOS:

-adelanto directo otorgado	: s/. 0.00
-% del monto de obra	: 0%
-adelanto de materiales otorgado	: s/. 0.00
-% del monto de obra	: 0%


Guillermo Siu Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRA

7- DOCUMENTO TRAMITADO


Presentación a la Supervisión la Valorización de Obra N° 002. Correspondiente al periodo 13 de FEBRERO del 2019, al 27 de FEBRERO del 2019.

8- CONCLUSIONES:

8.01.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACION

La valorización N° 002 corresponde al periodo 13 de FEBRERO del 2019, al 27 de FEBRERO del 2019
se ha logrado un avance bastante satisfactorio el cual ha alcanzado el 23.10 %, lo que significa que la obra se encuentra en situación ATRASADA, en un 1.30%.

Se recomienda al Supervisor Agilice con presentar el presente informe a la Entidad para su revisión y tramite correspondiente.


Guillermo Súa Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRA

*NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA*.


4. VALORIZACION DE OBRA

VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE A 15 DE MARZO DEL 2019

OBRA : "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"
 FINANCIADA : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTADA : CONSORCIO MAYES
 SUPERVISOR : Ing. Enrique Antonio CHAMOCHUMBI APONTE
 FORMULA : UNICA

PLAZO DE EJECUCIÓN : 60 DÍAS

ITEM	DESCRIPCION PARTIDA	SEGUN EXPEDIENTE TECNICO				VALORIZACION								BALDO			
		UNO	METRADO	U. PRECIO	R. PARCIAL	ANTERIOR ACUMULADO			AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO			METRADO	%	VALORIZADO
						METRADO	%	VALORIZADO	METRADO	%	VALORIZADO	METRADO	%	VALORIZADO			
02.04.04.03	CONCRETO Fe= 175 kg/cm2 EN VIGAS DE AMARRE	m3	15.01	385.56	5,787.56	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	15.01	100.00%	5,787.56
02.04.05	PISO DE INGRESO, e= 0.10 m																
02.04.05.01	ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO #60 EN PISO DE INGRESO	kg	321.36	4.00	1,497.54	220.00	68.46%	1,025.20	0.00	0.00%	0.00	220.00	68.46%	1,025.20	101.30	31.54%	472.34
02.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISO DE INGRESO	m2	2.81	53.51	139.66	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2.81	100.00%	139.66
02.04.05.03	CONCRETO Fe= 175 kg/cm2 EN PISO DE INGRESO	m3	4.13	382.83	1,580.26	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	4.13	100.00%	1,580.26
03	ARQUITECTURA																
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑERIA																
03.01.01	MURO DE LADRILLO DE ARCILLA KING KONG - TIPO CARAMISTA	m2	300.14	68.97	20,907.06	0.00	0.00%	0.00	285.30	68.00%	18,297.41	285.30	68.00%	18,297.74	124.84	32.00%	8,610.21
03.02	REVOCOS Y ENLUCIDOS																
03.02.01	TARRAJEO EN VIGAS C/A 1:5, e= 1.5 cm	m2	185.07	41.80	8,153.03	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	185.07	100.00%	8,153.03
03.02.02	TARRAJEO EN COLUMNAS C/A 1:5, e= 1.5 cm	m2	284.72	35.02	9,270.49	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	284.72	100.00%	9,270.49
03.02.03	TARRAJEO ZOCALOS C/A 1:5, e= 1.5 cm	m2	200.07	34.40	6,882.41	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	200.07	100.00%	6,882.41
03.02.04	JUNTAS SISMICAS e=3 cm	m	108.75	3.25	353.44	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	108.75	100.00%	353.44
03.02.05	JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e= 1"	m	230.88	6.27	1,447.62	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	230.88	100.00%	1,447.62
03.02.06	JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS e= 1" e/5.00 m	m	44.00	2.65	125.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	44.00	100.00%	125.40
03.02.07	BRUÑA EN VEREDAS	m	440.55	6.71	2,956.09	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	440.55	100.00%	2,956.09
03.02.08	BRUÑAS EN PISO DE INGRESO	m	28.70	6.71	192.58	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	28.70	100.00%	192.58
03.03	CUBIERTAS																
03.03.01	LADRILLO PASTELERO 24X24 CM PARA CERCO	m	200.07	12.77	2,554.89	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	200.07	100.00%	2,554.89
03.04	CARPINTERIA METALICA																
03.04.01	PORTON METALICO 3.77 m x 5.35 m. DOS HOJAS PIVOTANTE CON TUBO DE 2" CON PUERTA DE INGRESO PEATONAL, INC. PINTURA ANTICORROSIVA	and	1.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00%	0.00	0.50	50.00%	2,540.00	0.50	50.00%	2,540.00	0.50	50.00%	2,540.00
03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA Y ALAMBRE DE PUAS DE SEGURIDAD SOBRE MURO NUEVO (189.52m)	m	230.03	51.51	11,848.85	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	230.03	100.00%	11,848.85
03.05	PINTURA																
03.05.01	PINTURA DE VIGAS, COLUMNAS Y ZOCALOS	m2	650.85	15.11	9,970.33	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	650.85	100.00%	9,970.33
COSTO DIRECTO					287,674.62			86,188.87			84,454.60			162,824.15			126,050.37
GASTOS GENERALES 19.13%					55,037.83			16,309.10			12,714.07			31,119.23			23,024.62
UTILIDAD 0.065%					24,452.33			8,174.42			8,048.63			15,823.05			10,828.28
SUBTOTAL					367,164.70			132,743.19			84,817.20			297,569.43			158,804.27
KV 18%					68,089.65			22,093.77			16,267.10			37,360.88			28,728.78
TOTAL PRESUPUESTO					435,254.35			144,836.96			101,084.30			334,930.31			187,533.05
FACTOR DE RELACION					0.888384			33.43%			23.76%			68.87%			23.47%


**ENRIQUE ANTONIO
CHAMOCHUMBI APONTE**
 SUPERVISOR


Guillermo Stu Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 O.P.: 87322
 RESIDENTE DE OBRAS

VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE A 15 DE MARZO DEL 2019

OBRA : "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"
FINANCIADA POR : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTADA POR : CONSORCIO MAYES
SUPERVISOR : Ing. Enrique Antonio CHAMOCHUMBIAPONTE
FORMULA : UNCA

PLAZO DE EJECUCIÓN : 60 DIAS

ITEM	DESCRIPCION PARTIDA	SEGUN EXPEDIENTE TECNICO			VALORIZACION									BALDO				
		UND	METRADO	M. PRECIOS	ANTERIOR ACUMULADO			AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO			METRADO	%	VALORIZADO		
					M. PARCIAL	METRADO	%	VALORIZADO	METRADO	%	VALORIZADO	METRADO	%				VALORIZADO	
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD																	
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES																	
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES																	
01.01.01.01	OFICINA PARA CONTRATISTA Y SUPERVISION	m2	12.00	281.96	3,383.52	12.00	100.00%	3,383.52	0.00	0.00%	0.00	12.00	100.00%	3,383.52	0.00	0.00%	0.00	
01.01.01.02	ALMACEN DE OBRA	m2	8.00	282.99	2,263.92	8.00	100.00%	2,263.92	0.00	0.00%	0.00	8.00	100.00%	2,263.92	0.00	0.00%	0.00	
01.01.01.03	CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL	m	247.04	31.12	7,687.68	247.04	100.00%	7,687.68	0.00	0.00%	0.00	247.04	100.00%	7,687.68	0.00	0.00%	0.00	
01.01.01.04	ALQUILER BAÑOS QUIMICOS INC. INSTALACION Y OPERACION	m3	2.00	362.37	724.74	1.28	62.50%	432.95	0.75	37.50%	271.78	2.00	100.00%	724.74	0.00	0.00%	0.00	
01.01.01.05	CARTEL DE OBRA	und	1.00	740.51	740.51	1.00	100.00%	740.51	0.00	0.00%	0.00	1.00	100.00%	740.51	0.00	0.00%	0.00	
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES																	
01.01.02.01	AGUA PARA OBRA	m3	2.00	2,168.18	4,336.36	1.28	62.50%	2,710.23	0.00	0.00%	0.00	1.28	62.50%	2,710.23	0.75	37.50%	1,626.14	
01.01.03	TRABAJOS PRELIMINARES																	
01.01.03.01	LIMPIEZA DEL TERRENO CON EQUIPO	m2	728.11	1.70	1,234.39	728.11	100.00%	1,234.39	0.00	0.00%	0.00	728.11	100.00%	1,234.39	0.00	0.00%	0.00	
01.01.03.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	gb	1.00	601.16	601.16	0.00	0.00%	0.00	0.50	50.00%	300.58	0.50	50.00%	300.58	0.50	50.00%	300.58	
01.01.03.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	est	1.00	6,060.30	6,060.30	0.50	50.00%	3,030.15	0.50	50.00%	3,030.15	0.50	50.00%	3,030.15	0.50	50.00%	3,030.15	
01.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO																	
01.01.04.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	235.37	2.99	703.78	200.00	84.97%	598.60	35.37	15.03%	105.78	235.37	100.00%	703.78	0.00	0.00%	0.00	
01.01.05	TRANSPORTE HORIZONTAL PARA MATERIALES																	
01.01.05.01	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIALES	sem	6.00	102.47	819.78	6.00	75.00%	614.82	2.00	25.00%	204.84	8.00	100.00%	819.78	0.00	0.00%	0.00	
01.01.06	SEGURIDAD Y SALUD																	
01.01.06.01	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	und	1.00	9,894.00	9,894.00	0.78	75.00%	7,420.50	0.00	0.00%	0.00	0.78	75.00%	7,420.50	0.25	25.00%	2,473.50	
02	ESTRUCTURAS																	
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS																	
02.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL	m3	5.04	18.74	94.45	5.04	100.00%	94.45	0.00	0.00%	0.00	5.04	100.00%	94.45	0.00	0.00%	0.00	
02.01.02	EXCAVACION PARA CIMENTOS HASTA 1.35 m. TERRENO NORMAL	m3	219.37	37.46	8,217.60	219.37	100.00%	8,217.60	0.00	0.00%	0.00	219.37	100.00%	8,217.60	0.00	0.00%	0.00	
02.01.03	EXCAVACION PARA VEREDAS	m3	31.32	37.46	1,173.23	31.32	100.00%	1,173.23	0.00	0.00%	0.00	31.32	100.00%	1,173.23	0.00	0.00%	0.00	
02.02	RELLENOS																	
02.02.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	42.11	40.57	1,708.40	35.00	71.24%	1,217.10	12.11	28.76%	491.30	42.11	100.00%	1,708.40	0.00	0.00%	0.00	
02.02.02	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL	m2	154.80	2.75	425.63	100.00	100.00%	275.60	164.80	38.25%	177.05	154.80	100.00%	425.63	0.00	0.00%	0.00	
02.02.03	CONFORMACION DE SUB-BASE PARA VEREDAS	m2	232.00	0.84	194.88	120.00	51.72%	100.80	0.00	0.00%	0.00	120.00	51.72%	100.80	112.00	48.28%	84.36	
02.02.04	AFIRMADO COMPACTADO PARA VEREDAS	m2	28.42	97.73	2,777.49	20.60	70.37%	1,954.60	0.00	0.00%	0.00	20.60	70.37%	1,954.60	6.42	29.63%	822.89	
02.02.05	ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL CON EQUIPO	m3	213.63	32.09	8,855.38	120.00	56.17%	3,850.80	140.00	65.72%	1,263.60	160.00	74.90%	5,134.40	53.83	25.10%	1,720.89	
02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE																	
02.03.01	CEMENTO CORRIDO																	
02.03.01.01	CONCRETO CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% P.O.	m3	184.42	227.28	37,366.09	100.00	60.82%	22,726.00	32.00	18.46%	7,272.32	132.00	80.28%	29,998.32	32.42	19.72%	7,367.77	
02.03.02	SOBRECIMENTOS																	
02.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m2	200.07	57.54	11,512.03	0.00	0.00%	0.00	180.81	80.38%	9,241.50	180.81	80.28%	9,241.50	30.48	19.72%	2,270.53	
02.03.02.02	CONCRETO SOBRECIMENTOS MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON + 25% P.M.	m3	20.01	285.18	5,306.23	0.00	0.00%	0.00	18.68	80.26%	4,258.79	18.00	80.26%	4,258.79	3.95	10.74%	1,047.40	
02.03.03	PISOS Y PAVIMENTOS																	
02.03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS	m2	23.09	53.51	1,236.58	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	23.09	100.00%	1,236.58	
02.03.03.02	CONCRETO Fc=175 kg/cm2 PARA VEREDA	m3	25.97	382.83	9,936.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	25.97	100.00%	9,936.00	
02.03.04	SOLADOS																	
02.03.04.01	SOLADO PARA CIMENTACIONES Fc=27 MEZCLA 1:2 CONCRETO ARMADO	m2	184.58	45.26	7,448.89	184.58	100.00%	7,448.89	0.00	0.00%	0.00	184.58	100.00%	7,448.89	0.00	0.00%	0.00	
02.04	ZAPATAS																	
02.04.01.01	ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO #0 EN ZAPATAS	kg	82.30	4.69	385.00	82.30	100.00%	385.00	0.00	0.00%	0.00	82.30	100.00%	385.00	0.00	0.00%	0.00	
02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	6.48	63.15	409.21	6.48	100.00%	409.21	0.00	0.00%	0.00	6.48	100.00%	409.21	0.00	0.00%	0.00	
02.04.01.03	CONCRETO Fc=175 kg/cm2 EN ZAPATAS	m3	2.10	363.39	784.92	1.00	48.30%	363.39	1.10	51.70%	421.53	2.10	100.00%	784.92	0.00	0.00%	0.00	
02.04.02	COLUMNAS DE CERCO																	
02.04.02.01	ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO #0 EN COLUMNAS DE CERCO	kg	3,552.78	4.68	16,588.95	3,552.78	100.00%	16,588.95	0.00	0.00%	0.00	3,552.78	100.00%	16,588.95	0.00	0.00%	0.00	
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS DE CERCO	m2	248.47	63.05	15,839.03	0.00	0.00%	0.00	184.85	75.00%	11,654.65	184.85	75.00%	11,654.79	61.82	25.00%	3,885.14	
02.04.02.03	CONCRETO EN COLUMNAS DE CERCO Fc=175 kg/cm2	m3	19.08	411.09	7,843.60	0.00	0.00%	0.00	9.54	50.00%	3,821.80	9.54	50.00%	3,821.80	9.54	50.00%	3,821.80	
02.04.03	COLUMNAS PARA EL PORTON																	
02.04.03.01	ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO #0 EN COLUMNAS PARA PORTON	kg	222.08	4.69	1,041.56	60.00	22.51%	234.50	172.08	77.49%	1,807.06	222.08	100.00%	1,041.56	0.00	0.00%	0.00	
02.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS DE PORTON	m2	11.04	81.88	903.73	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	11.04	100.00%	903.73	
02.04.03.03	CONCRETO EN COLUMNAS PARA PORTON Fc=175 kg/cm2	m3	0.99	478.69	471.92	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.99	100.00%	471.92	
02.04.04	VIGAS																	
02.04.04.01	ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO #0 EN VIGAS DE AMARRE	kg	1,397.22	4.69	6,506.06	0.00	0.00%	0.00	603.61	56.00%	3,253.03	603.61	50.00%	3,253.03	603.61	50.00%	3,253.03	
02.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE AMARRE	m2	165.50	67.00	7,882.52	0.00	0.00%	0.00	129.11	20.00%	1,950.50	29.11	20.00%	1,950.57	110.45	80.00%	7,602.15	

[Firma]
ENRIQUE ANTONIO CHAMOCHUMBIAPONTE
INGENIERO CIVIL

ENRIQUE ANTONIO CHAMOCHUMBIAPONTE
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRA

"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA".

04.01 FICHA TECNICA.



Fecha: 20/03/19

MEMORANDUM INTERNO N° 1996 -201 - FONDEPES/ DIGENIPAA


Asunto : Canta 003/C.SI.

Referencia : _____ Registro : 2618

Destino	Indicacion	Destino	Indicacion
JEFATURA		DIGECADETA	
SG		OGA	
OCI		OGAJ	
DIGEPROFIN		OGPP	
DIGECADEPA		OTROS	

FONDEPES
AREA DE OBRAS EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO
20 MAR 2019
RECIBIDO

Observaciones: Juliana




Atentamente

Indicaciones:

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 01. Autorizado/Aprobado | 02. Calificar/Evaluar | 03. Informe | 04. Proyectar |
| 05. Atención/Tramitación | 06. Conocimiento y fines | 07. Notificar al interesado | 08. Reformular |
| 09. Ayuda memoria | 10. Coordinar | 11. Opinión/Recomendación | 12. Consoliar |
| 13. Aclarar redacción | 14. Implementar/Ejecutar | 15. Preparar respuesta | 16. Visación |
| 17. Agregar a sus antecedentes | 18. Archivo | 19. Ampliar | 20. Seguimiento |

FICHA TECNICA DE OBRA

PROYECTO	: "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"		
ENTIDAD	: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)		
MODALIDAD	: CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS		
CONTRATISTA	: CONSORCIO MAYES		
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO	: ALEJANDRO SIU TRUJILLO		
PROCESO	: ADJUDICACION SIMPLICADA N° 022-2018 - FONDEPES		
CONTRATO	: N° 001 - 2019 - FONDEPES		
SUPERVISOR DE OBRA	: Ing. Enrique Antonio CHAMOCHUMBI APONTE		
RESIDENTE DE OBRA	: Ing. Guillermo SIU TRUJILLO		
PRESUPUESTO BASE	: S/.	438,346.20	Inc. IGV
PRESUPUESTO OFERTADO	: S/.	438,346.20	Inc. IGV
PRESUPUESTO CONTRATADO	: S/.	433,254.35	Inc. IGV
FACTOR DE RELACION	:	0,98838395	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	:	10-Ene-19	
PLAZO CONTRACTUAL	:	60 DIAS	
FECHA ENTREGA DE TERRENO	:	18-Ene-19	
FECHA INICIO DE OBRA	:	29-Ene-19	
INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	:	29-Ene-19	
FECHA TERMINO CONT. DE OBRA	:	29-Mar-19	
PARALIZACIÓN DE OBRA	:	NO SE TUVO	
REINICIO DE OBRA	:	NO SE TUVO	
AMPLIACION DE PLAZO N°01	:	DIAS	
TOTAL DE AMPLIACION DE PLAZO	:	DIAS	
DURACION TOTAL DE LA OBRA	:	60 DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION	:	29-Mar-19	
VALORIZACION N° 02	: S/.	100,084.30	23.10%
RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	: S/.	43,325.44	(Fondo de Garantía de Fiel Cumplim.)
REAJUSTE	: S/.	-	Ninguno
REINTEGROS	: S/.	-	Ninguno
INTERESES	: S/.	-	Ninguno
MORAS POR DEMORA EN FIRMA DE CONTRATO	: S/.	-	Ninguno
MAYORES GASTOS GENERALES	: S/.	-	Ninguno
MULTAS POR ATRAZO DE OBRA	: S/.	-	Ninguno
FECHA: ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES	:	01-Mar-18	
ADELANTO DIRECTO	: S/.	-	No se solicito
ADELANTO PARA MATERIALES	: S/.	-	No se solicito
<u>DEL TOTAL FINANCIADO:</u>			
MONTO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO	: S/.	433,254.35	(MC)
MONTO DEL PRESUPUESTO ADICIONAL (A)	: S/.	-	NINGUNO A LA FECHA
PRESUPUESTO DEDUCTIVO (D)	: S/.	-	NINGUNO A LA FECHA
TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL (TPA = A - D)	: S/.	-	NINGUNO A LA FECHA
MONTO TOTAL FINANCIADO = MC + TPA	: S/.	433,254.35	(MTF)


ENRIQUE ANTONIO CHAMOCHUMBI APONTE


Guillermo Siu Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 67322
 RESIDENTE DE OBRA


04.02 RESUMEN DE VALORIZACION.


RESUMEN DE VALORIZACION N°- 02

CORRESPONDIENTE A 15 DE MARZO DEL 2019

CLIENTE	: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		
OBRA	"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"		
EJECUTA	CONSORCIO MAYES		
FECHA	: ENERO DEL 2019		
	TOTAL PRESUPUESTADO CONTRATADO (SIN IGV)	S/.	367,164.70
	IGV (18%)	S/.	66,089.65
	TOTAL PRESUPUESTADO CONTRATADO	S/.	433,254.35
	FACTOR DE RELACION FR		0.9884
	TOTAL MOTO CONTRATADO	S/.	433,254.35

A	VALORIZACION BRUTA DEL MES		
	VALORIZACION PRESENTE MES	S/.	66,454.50
	TOTAL VALORIZACION BRUTA DEL MES	S/.	66,454.50
B	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD		
	Gastos Generales	19.13%	S/.
			12,714.07
	Utilidad	8.50%	S/.
			5,648.63
	TOTAL GG. Y UTILIDAD	S/.	18,362.70
C	OTROS		
	TOTAL OTROS	S/.	-
D	VALORIZACION NETA TOTAL		
		S/.	84,817.20
E	IGV		
		S/.	15,267.10
F	TOTAL		
		S/.	100,084.30
G	FACTOR DE RELACION Fr = 1.0000		
			0.9884
H	TOTAL MONTO BRUTO		
		S/.	100,084.30
I	AMORTIZACION		
	AMORTIZACION POR EL ADELANTO DIRECTO 10%	S/.	-
	AMORTIZACION POR EL ADELANTO DE MATERIALES 20%	S/.	-
J	TOTAL MONTO A CANCELAR		
		S/.	100,084.30
K	% AVANCE PORCENTUAL		
		%	23.10%
SON:	SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 95/100 SOLES. (INC. IGV)		
			S/.
			100,084.30
L	RETENCION DEL FIEL CUMPLIMIENTO (10.00%)		
		S/.	21,662.72
TOTAL A PAGAR:			
	SON: SETENTISIETE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 64/100 SOLES. (INC. IGV).		S/.
			78,421.58


ENRIQUE ANTONIO HANCHUMBI A. PONTE
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 67322


Guillermo Stu Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 67322
 RESIDENTE DE OBRA

"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA".

**04.03 METRADOS DE
CAMPO.**

RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS - VALORIZACION N° 02

OBRA: "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"
 FINANCIADA POR FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 EJECUTADA POR CONSORCIO MAYES

ITEMS	DESCRIPCION DE PARTIDA	UND	MET. CONTR.	METRADO			% AVANCE
				ANTER.	ACTUAL	ACUMUL.	
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD						
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES						
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES						
01.01.01.01	OFICINA PARA CONTRATISTA Y SUPERVISION	m2	12	12.00	0.00	12.00	100.00%
01.01.01.02	ALMACEN DE OBRA	m2	8	8.00	0.00	8.00	100.00%
01.01.01.03	CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL	m	247.04	247.04	0.00	247.04	100.00%
01.01.01.04	ALQUILER BAÑOS QUIMICOS INC. INSTALACION Y OPERACION	mms	2	1.25	0.75	2.00	100.00%
01.01.01.05	CARTEL DE OBRA	und	1	1.00	0.00	1.00	100.00%
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES						
01.01.02.01	AGUA PARA OBRA	mes	2	1.25	0.00	1.25	62.50%
01.01.03	TRABAJOS PRELIMINARES						
01.01.03.01	LIMPIEZA DEL TERRENO CON EQUIPO	m2	726.11	726.11	0.00	726.11	100.00%
01.01.03.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	gb	1	0.00	0.50	0.50	50.00%
01.01.03.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	est	1	0.50	0.00	0.50	50.00%
01.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO						
01.01.04.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	235.37	200.00	35.37	235.37	100.00%
01.01.05	TRANSPORTE HORIZONTAL PARA MATERIALES						
01.01.05.01	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIALES	cam	8	6.00	2.00	8.00	100.00%
01.01.06	SEGURIDAD Y SALUD						
01.01.06.01	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	und	1	0.75	0.00	0.75	75.00%
02	ESTRUCTURAS						
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
02.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL	m3	5.04	5.04	0.00	5.04	100.00%
02.01.02	EXCAVACION PARA CIMENTOS HASTA 1.35 m. TERRENO NORMAL	m3	219.37	219.37	0.00	219.37	100.00%
02.01.03	EXCAVACION PARA VEREDAS	m3	31.32	31.32	0.00	31.32	100.00%
02.02	RELLENOS						
02.02.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	42.11	30.00	12.11	42.11	100.00%
02.02.02	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL	m2	164.6	100.00	64.60	164.60	100.00%
02.02.03	CONFORMACION DE SUB-BASE PARA VEREDAS	m2	232	120.00	0.00	120.00	51.72%
02.02.04	AFIRMADO COMPACTADO PARA VEREDAS	m3	28.42	20.00	0.00	20.00	70.37%
02.02.05	ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL CON EQUIPO	m3	213.63	120.00	40.00	160.00	74.90%
02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
02.03.01	CIMENTO CORRIDO						
02.03.01.01	CONCRETO CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% P.G.	m3	164.42	100.00	32.00	132.00	80.28%
02.03.02	SOBRECIMENTOS						
02.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m2	200.07	0.00	160.61	160.61	80.28%
02.03.02.02	CONCRETO SOBRECIMENTOS MEZCLA 1:8, CEMENTO- HORMIGON + 25% P.M.	m3	20.01	0.00	16.06	16.06	80.26%
02.03.03	PISOS Y PAVIMENTOS						
02.03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS	m2	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.03.03.02	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA VEREDA	m3	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.03.04	SOLADOS						
02.03.04.01	SOLADO PARA CIMENTACIONES E=2" MEZCLA 1:2	m2	164.58	164.58	0.00	164.58	100.00%
02.04	CONCRETO ARMADO						
02.04.01	ZAPATAS						
02.04.01.01	ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS	kg	82.3	82.30	0.00	82.30	100.00%
02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	6.48	6.48	0.00	6.48	100.00%
02.04.01.03	CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 EN ZAPATAS	m3	2.16	1.00	1.16	2.16	100.00%
02.04.02	COLUMNAS DE CERCO						
02.04.02.01	ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS DE CERCO	kg	3552.78	3,552.78	0.00	3,552.78	100.00%
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS DE CERCO	m2	246.47	0.00	164.85	164.85	75.00%
02.04.02.03	CONCRETO EN COLUMNAS DE CERCO f'c= 175 kg/cm2	m3	19.08	0.00	9.54	9.54	50.00%
02.04.03	COLUMNAS PARA EL PORTON						
02.04.03.01	ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS PARA PORTON	kg	222.08	50.00	172.08	222.08	100.00%
02.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS DE PORTON	m2	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.04.03.03	CONCRETO EN COLUMNAS PARA PORTON f'c= 175 kg/cm2	m3	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.04.04	VIGAS						
02.04.04.01	ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE AMARRE	kg	1387.22	0.00	693.61	693.61	50.00%
02.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE AMARRE	m2	145.56	0.00	29.11	29.11	20.00%
02.04.04.03	CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 EN VIGAS DE AMARRE	m3	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.04.05	PISO DE INGRESO, e= 0.10 m						
02.04.05.01	ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PISO DE INGRESO	kg	321.36	220.00	0.00	220.00	68.48%
02.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISO DE INGRESO	m2	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.04.05.03	CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 EN PISO DE INGRESO	m3	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00%
03	ARQUITECTURA						
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA						
03.01.01	MURO DE LADRILLO DE ARCILLA KING KONG - TIPO CARAVISTA	m2	390.14	0.00	265.30	265.30	68.00%
03.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS						
03.02.01	TARRAJEO EN VIGAS C/A 1:5, e= 1.5 cm	m2	185.07	0.00	0.00	0.00	0.00%
03.02.02	TARRAJEO EN COLUMNAS C/A 1:5, e= 1.5 cm	m2	264.72	0.00	0.00	0.00	0.00%
03.02.03	TARRAJEO ZOCALOS C/A 1:5, e= 1.5 cm	m2	200.07	0.00	0.00	0.00	0.00%
03.02.04	JUNTAS SISMICAS e=3 cm	m	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00%
03.02.05	JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e = 1"	m	230.88	0.00	0.00	0.00	0.00%
03.02.06	JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS e = 1" c/5.00 m	m	44	0.00	0.00	0.00	0.00%
03.02.07	BRUÑA EN VEREDAS	m	440.55	0.00	0.00	0.00	0.00%
03.02.08	BRUÑA EN PISO DE INGRESO	m	28.7	0.00	0.00	0.00	0.00%
03.03	CIJERIAS						
03.03.01	LADRILLO PASTELERO 24x24 CM PARA CERCO	m	200.07	0.00	0.00	0.00	0.00%
03.04	CARPINTERIA METALICA						


Antonio Yamochimbi Aponte
 ENRIQUE ANTONIO
 YAMOCHIMBI APONTE

Guillermo Súa Trujillo
 GUILLERMO SÚA TRUJILLO
 INGENIERO CIVIL
 CIE: 87322
 RESIDENTE DE OBRAS

RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS - VALORIZACIÓN N° 02

OBRA: "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"
 FINANCIAMIENTO: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 EJECUTIVA: CONSORCIO MAYES

ITEMS	DESCRIPCION DE PARTIDA	UND	MET. CONTR.	METRADO			% AVANCE
				ANTER.	ACTUAL	ACUMUL.	
03.04.01	PORTON METALICO 2.77 m x 5.35 m. DOS HOJAS PIVOTANTE CON TUBO DE 2" CON PUERTA DE INGRESO PEATONAL INC. PINTURA ANTICORROSIVA	und	1	0.00	0.50	0.50	50.00%
03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA Y ALAMBRE DE PUAS DE SEGURIDAD SOBRE MURO NUEVO (h=0.55m).	m	230.03	0.00	0.00	0.00	0.00%
03.05	PINTURA						
03.05.01	PINTURA DE VIGAS, COLUMNAS Y ZOCALOS	m2	659.85	0.00	0.00	0.00	0.00%


ENRIQUE ANTONIO HUMBERTO APONTE
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87322



Guillermo Stu Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87322
 RESIDENTE DE OBRAS

*NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA*.

**04.04 VALORIZACION
MENSUAL**

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

OBRA: "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"

EJECUTOR CONSORCIO MAYES

PLAZO 60 DIAS

010
29-01-19 15/0
15-01-19 08/

Item	Descripción	Und.	Costo Base			29-ene-19	13-feb-19	28-feb-19	15-mar-19	Totales
			Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	AL 12-feb-19	AL 27-feb-19	AL 14-mar-19	AL 29-mar-19	
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD									
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES									
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES									
01.01.01.01	OFICINA PARA CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN	m2	12.00	281.96	3,383.52	3,383.52				3,383.52
01.01.01.02	ALMACEN DE OBRA	m2	8.00	282.99	2,263.92	2,263.92				2,263.92
01.01.01.03	CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL	m	247.04	31.12	7,687.88	7,687.88				7,687.88
01.01.01.04	ALQUILER BAÑOS QUIMICOS INC. INSTALACION Y OPERACIÓN	mes	2.00	362.37	724.74	362.37	120.79	120.79	120.79	724.74
01.01.01.05	CARTEL DE OBRA	und	1.00	740.51	740.51	740.51	0.00	0.00	0.00	740.51
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES						0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.02.01	AGUA PARA OBRA	mes	2.00	2,168.18	4,336.36	2,168.18	722.72	722.72	722.74	4,336.36
01.01.03	TRABAJOS PRELIMINARES						0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.03.01	LIMPIEZA DEL TERRENO CON EQUIPO	m2	728.11	1.7	1,234.39	1,234.39	0.00	0.00	0.00	1,234.39
01.01.03.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	gib	1.00	601.16	601.16	0.00	0.00	0.00	601.16	601.16
01.01.03.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	esl	1.00	6,060.30	6,060.30	3,030.15	0.00	0.00	3,030.15	6,060.30
01.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.04.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	235.37	2.99	703.76	351.88	117.29	117.29	117.30	703.76
01.01.05	TRANSPORTE HORIZONTAL PARA MATERIALES				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.05.01	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIALES	sem	8.00	102.47	819.76	204.94	204.94	204.94	204.94	819.76
01.01.06	SEGURIDAD Y SALUD				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.06.01	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	und	1.00	9,894.00	9,894.00	4,947.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	9,894.00
02	ESTRUCTURAS				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL	m3	5.04	18.74	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	94.45
02.01.02	EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.35 m. TERRENO NORMAL	m3	219.37	37.46	8,217.60	7,806.72	410.88	0.00	0.00	8,217.60
02.01.03	EXCAVACION PARA VEREDAS	m3	31.32	37.46	1,173.25	586.63	586.62	0.00	0.00	1,173.25
02.02	RELLENOS				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02.02.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	42.11	40.57	1,708.40	854.20	854.20	0.00	0.00	1,708.40
02.02.02	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL	m2	164.6	2.75	452.65	226.33	226.32	0.00	0.00	452.65
02.02.03	CONFORMACION DE SUB-BASE PARA VEREDAS	m2	232.00	0.84	194.88	97.44	97.44			194.88
02.02.04	AFIRMADO COMPACTADO PARA VEREDAS	m3	28.42	97.73	2,777.49	1,388.74	1,388.75	0.00	0.00	2,777.49
02.02.05	ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL CON EQUIPO	m3	213.63	32.09	6,855.39	3,427.69		1,713.85	1,713.85	6,855.39
02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				0.00					0.00
02.03.01	CIMIENTO CORRIDO				0.00					0.00
02.03.01.01	CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% P.G.	m3	164.42	227.26	37,366.09	18,683.04	18,683.05		0.00	37,366.09

[Firma]
ENRIQUE ANTONIO
HAMOCHUMI PONTE
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322

[Firma]
Guillermo Soto Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRAS


CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA


OBRA: "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"

EJECUTOR CONSORCIO MAYES

PLAZO 60 DIAS

Item	Descripción	Und.	Costo Base			29-ene-19 AL 12-feb-19	13-feb-19 AL 27-feb-19	28-feb-19 AL 14-mar-19	15-mar-19 AL 29-mar-19	Totales
			Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)					
02.03.02	SOBRECIMENTOS				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m2	200.07	57.54	11,512.03	5,256.68	6,255.35		0.00	11,512.03
02.03.02.02	CONCRETO SOBRECIMENTOS MEZCLA 1:8, CEMENTO- HORMIGON + 25% P.M.	m3	20.01	265.18	5,306.25	2,236.26	3,069.99		0.00	5,306.25
02.03.03	PISOS Y PAVIMENTOS				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02.03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS	m2	23.09	53.51	1,235.55		0.00	617.77	617.78	1,235.55
02.03.03.02	CONCRETO f _c =175 kg/cm ² PARA VEREDA	m3	25.97	382.63	9,936.90		0.00	4,968.45	4,968.45	9,936.90
02.03.04	SOLIDOS				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02.03.04.01	SOLADO PARA CIMENTACIONES E=2" MEZCLA 1:2	m2	164.58	45.26	7,448.89	4,469.33	2,979.56		0.00	7,448.89
02.04	CONCRETO ARMADO				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.01	ZAPATAS				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.01.01	ACERO f _y = 4200 kg/cm ² GRADO 60 EN ZAPATAS	kg	82.3	4.69	385.99	385.99	0.00	0.00	0.00	385.99
02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	6.48	63.15	409.21	409.21	0.00	0.00	0.00	409.21
02.04.01.03	CONCRETO f _c = 175 kg/cm ² EN ZAPATAS	m3	2.16	363.39	784.92	784.92	0.00	0.00	0.00	784.92
02.04.02	COLUMNAS DE CERCO				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.02.01	ACERO f _y = 4200 kg/cm ² GRADO 60 EN COLUMNAS DE CERCO	kg	3,652.78	4.66	16,556.95	9,933.57	6,622.38			16,556.95
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS DE CERCO	m2	246.47	63.05	15,539.93		8,215.97	7,323.96		15,539.93
02.04.02.03	CONCRETO EN COLUMNAS DE CERCO f _c = 175 kg/cm ²	m3	19.08	411.09	7,843.60		4,832.65	3,010.95		7,843.60
02.04.03	COLUMNAS PARA EL PORTON				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.03.01	ACERO f _y = 4200 kg/cm ² GRADO 60 EN COLUMNAS PARA PORTON	kg	222.08	4.69	1,041.56	1,041.56	0.00	0.00		1,041.56
02.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS DE PORTÓN	m2	11.04	81.86	903.73		541.86	361.87		903.73
02.04.03.03	CONCRETO EN COLUMNAS PARA PORTÓN f _c = 175 kg/cm ²	m3	0.99	476.69	471.92		157.30	157.30	157.32	471.92
02.04.04	VIGAS				0.00					0.00
02.04.04.01	ACERO f _y = 4200 kg/cm ² GRADO 60 EN VIGAS DE AMARRE	kg	1387.22	4.69	6,506.06		3,200.60	3,305.46		6,506.06
02.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE AMARRE	m2	145.56	67.00	9,752.52		2,438.13	4,255.65	3,058.74	9,752.52
02.04.04.03	CONCRETO f _c = 175 kg/cm ² EN VIGAS DE AMARRE	m3	15.01	385.58	5,787.56		1,446.89	2,815.59	1,525.08	5,787.56
02.04.05	PISO DE INGRESO, e= 0.10 m				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.05.01	ACERO f _y = 4200 kg/cm ² GRADO 60 EN PISO DE INGRESO	kg	321.36	4.68	1,497.54		0.00	0.00	1,497.54	1,497.54
02.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISO DE INGRESO	m2	2.61	63.51	139.66		0.00	0.00	139.66	139.66
02.04.05.03	CONCRETO f _c = 175 kg/cm ² EN PISO DE INGRESO	m3	4.13	382.63	1,580.26		0.00	0.00	1,580.26	1,580.26
03	ARQUITECTURA				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01	MURO DE LADRILLO DE ARCILLA KING KONG - TIPO CARAVISTA	m2	390.14	68.97	26,907.96		17,490.17	9,417.79		26,907.96
03.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
03.02.01	TARRAJEO EN VIGAS C:A 1.5, e= 1.5 cm	m2	195.07	41.80	8,153.93			4,076.96	4,076.97	8,153.93
03.02.02	TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1.5, e= 1.5 cm	m2	264.72	35.02	9,270.49			4,635.24	4,635.25	9,270.49
03.02.03	TARRAJEO ZOCALOS C:A 1.5, e= 1.5 cm	m2	200.07	34.40	6,882.41			3,441.20	3,441.21	6,882.41
03.02.04	JUNTAS SISMICAS e=3 cm	m	108.75	3.25	353.44			176.72	176.72	353.44


ENRIQUE ANTONIO
YAMOCHIMBI APONTE
INGENIERO CIVIL
 CIP. 87322


Guillermo Olaj Trujillo
INGENIERO CIVIL
 CIP. 87322
 RESIDENTE DE OBRA


CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA


OBRA: "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"

EJECUTOR CONSORCIO MAYES

PLAZO 60 DIAS

Item	Descripción	Und.	Costo Base			29-ene-19 AL 12-feb-19	13-feb-19 AL 27-feb-19	28-feb-19 AL 14-mar-19	15-mar-19 AL 29-mar-19	Totales
			Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)					
03.02.05	JUNTAS ASFÁLTICAS EN VEREDAS e = 1"	m	230.88	6.27	1,447.62			723.81	723.81	1,447.62
03.02.06	JUNTAS DE DILATACIÓN EN VEREDAS e = 1" α5.00 m	m	44.00	2.85	125.40			95.36	30.04	125.40
03.02.07	BRUÑA EN VEREDAS	m	440.55	6.71	2,956.09			1,773.65	1,182.44	2,956.09
03.02.08	BRUÑAS EN PISO DE INGRESO	m	28.7	6.71	192.58				192.58	192.58
03.03	CUBIERTAS				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
03.03.01	LADRILLO PASTELERO 24X24 CM PARA CERCO	m	200.07	12.77	2,554.89		0.00	0.00	2,554.89	2,554.89
03.04	CARPINTERIA METALICA				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
03.04.01	PORTON METALICO 2.77 m x 5.35 m. DOS HOJAS PIVOTANTE CON TUBO DE 2" CON PUERTA DE INGRESO PEATONAL, INC. PINTURA ANTICORROSIVA	und	1.00	5,080.00	5,080.00		0.00	0.00	5,080.00	5,080.00
03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA Y ALAMBRE DE PUAS DE SEGURIDAD SOBRE MURO NUEVO (h=0.55m).	m	230.03	51.51	11,848.85		0.00	0.00	11,848.85	11,848.85
03.05	PINTURA				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
03.05.01	PINTURA DE VIGAS, COLUMNAS Y ZOCALOS	m ²	659.85	15.11	9,970.33		0.00	1,994.07	7,976.26	9,970.33
	COSTO DIRECTO				287,674.52	84,057.50	82,312.85	57,680.39	63,623.78	287,674.52
	GASTOS GENERALES (19.13%)			19.13%	55,037.85	16,081.87	15,748.08	11,035.40	12,172.49	55,037.85
	UTILIDAD (0.085%)				24,452.33	7,144.89	6,996.59	4,902.83	5,408.02	24,452.33
	SUB TOTAL				367,164.70	107,284.26	105,057.52	73,618.62	81,204.29	367,164.70
	IGV (18%)				66,089.65	19,311.18	18,910.35	13,251.35	14,816.77	66,089.66
	PRESUPUESTO TOTAL OBRA				433,254.35	126,595.44	123,967.87	86,869.97	95,821.06	433,254.36
	AVANCE PARCIAL					29.22%	28.61%	20.05%	22.12%	100.00%
	AVANCE ACUMULADO				100.00%	29.22%	57.83%	77.88%	100.00%	


**ENRIQUE ANTONIO
HAMOCULIME APONTE**
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 87323


**ENRIQUE ANTONIO
HAMOCULIME APONTE**
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 87323
 RESIDENTE DE OBRA

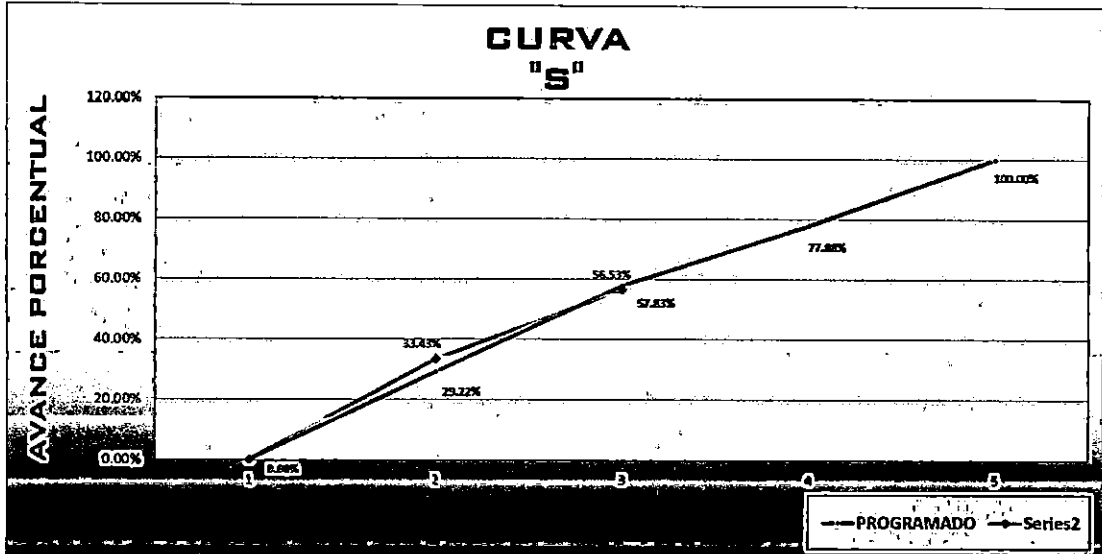
*NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA*.

**04.05 CRONOGRAMA DE
AVANCE DE OBRA SEGÚN EXP.
TEC. VS EJECUCION DE OBRA
CURVA "S".**

CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE DE OBRA N° 02

OBRA : "NUEVO CERCÓ PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"
ENTIDAD : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
UBICACIÓN : DISTRITO PUCUSANA, PROV. LIMA, REGION LIMA
CONTRATISTA/ CONSORCIO MAYES
MOTO CONTRACTUAL : S/. 433,254.35

PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO



CUADROS DEL PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO REPROGRAMADO VS EJECUTADO

PERIODO DE EJECUCION	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	ADELANTADO	RETRASADO
AVANCE 12/02/2019	29.22%	33.43%	4.21%	-
AVANCE 27/02/2019	57.83%	56.53%	-	-1.30%
AVANCE 14/03/2019	77.88%	77.88%	-	-
AVANCE 29/03/2019	100.00%	100.00%	-	-

CONTRACTUAL

MESES	MONTOS TOTAL (Incl. IGV)		AVANCE PORCENTUAL	
	PARCIAL S/.	ACUMULADO S/.	PARCIAL %	ACUMULADO %
29-Ene-19	0.00	0.00	0.00%	0.00%
12-Feb-19	126,595.44	126,595.44	29.22%	29.22%
27-Feb-19	123,967.87	250,563.31	28.61%	57.83%
14-Mar-19	86,869.97	337,433.28	20.05%	77.88%
29-Mar-19	95,821.06	433,254.35	22.12%	100.00%
TOTAL	433,254.35		100.00%	

REAL

MESES	MONTOS TOTAL (Incl. IGV)		AVANCE PORCENTUAL	
	PARCIAL S/.	ACUMULADO S/.	PARCIAL %	ACUMULADO %
29-Ene-19	-	0.00	0.00%	0.00%
12-Feb-19	144,836.95	144,836.95	33.43%	33.43%
27-Feb-19	100,084.30	244,921.31	23.10%	56.53%
14-Mar-19				
29-Mar-19				
TOTAL	244,921.31		56.53%	

ENRIQUE HUMBERTO MAYES
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 123456

Guillermo Sola Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87322
 RESIDENTE DE OBRA

*NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA*.

04.06 REAJUSTE



"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO
DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE PUCUSANA,
PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA".

NO CORRESPONDE

(2DA VALORIZACION)



 Guillermo Sola Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIA 87322
RESIDENTE DE OBRAS

Domicilio Legal del Consorcio, JIRON MANUEL DE LARA 152 – URB. VILLA SOL-LOS OLIVOS – LIMA

"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA".

**04.07 ODEDUCCION -
REINTEGRO DE
REAJUSTEBRA.**



*NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO
DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIAD E PUCUSANA,
PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA*.

NO CORRESPONDE

(2DA VALORIZACION)



Guillermo Su Trujillo
INGENIERO CIVIL
CA: 87322
RESIDENTE DE OBRAS

Domicilio Legal del Consorcio, JIRON MANUEL DE LARA 152 – URB. VILLA SOL-LOS OLIVOS – LIMA

**04.08 AMORTIZACION DE
ADELANTO DIRECTO.**



"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO
DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIAD E PUCUSANA,
PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA".

NO CORRESPONDE

(2DA VALORIZACION)




Guillermo Soto Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 67322
RESIDENTE DE OBRAS

Domicilio Legal del Consorcio, JIRON MANUEL DE LARA 152 – URB. VILLA SOL-LOS OLIVOS – LIMA

**04.09 AMORTIZACION DE
ADELANTO DE MATERIALES.**



*NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO
DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE PUCUSANA,
PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA*.

NO CORRESPONDE

(2DA VALORIZACION)

A handwritten signature in black ink is written over a circular professional stamp. The stamp contains the text: "Guillermo S.J. Trujillo", "INGENIERO CIVIL", "CIP: 87322", and "RESIDENTE DE OBRAS".

Guillermo S.J. Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRAS

Domicilio Legal del Consorcio, JIRON MANUEL DE LARA 152 -- URB. VILLA SOL-LOS OLIVOS - LIMA

"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA".

**04.10 CARTA FIANZA POR
FIEL CUMPLIMIENTO.**



*NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO
DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE PUCUSANA,
PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA*.

NO CORRESPONDE

(2DA VALORIZACION)




Guillermo Soto Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRAS

Domicilio Legal del Consorcio, JIRON MANUEL DE LARA 152 – URB. VILLA SOL-LOS OLIVOS – LIMA

**04.11 PENALIDADES
CUENTA DEL PERIODO.**



*NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO
DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIAD E PUCUSANA,
PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA*.

NO CORRESPONDE

(2DA VALORIZACION)



 Guillermo Sily Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRAS

Domicilio Legal del Consorcio, JIRON MANUEL DE LARA 152 – URB. VILLA SOL-LOS OLIVOS – LIMA

"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA".

04.12 CONTROL DE LA VALORIZACION.


**RESUMEN DE CONTROL DE PAGO
VALORIZACION MENSUAL N° 02
CORRESPONDIENTE A 15 DE MARZO DEL 2019**

OBRA	"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"
EJECUTA	CONSORCIO MAYES
MES VALORIZADO	: ENERO DEL 2019
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE	S/. 433,254.35
RETENCION F.C. 10.00%	S/. 43,325.44
MONTO DEL PRESUP. CONTRATADO	S/. 428,221.85
FACTOR DE RELACION (F.R.)	0.988384

MONTO CONTRATADO	MONTO DE VALORIZACION MENSUALES IGV		AMORTIZACIONES (ADELANTO DIRECTO 10%)	AMORTIZACIONES (MATERIALES 20% INCLUYE IGV)	RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO (10% INCLUYE IGV)	NETO A PAGAR AUTORIZADO INC. IGV	SALDO POR COBRAR
	N° DE VALOR.	MONTO (S/.)					
S/. 428,221.85							
VALORIZACION	01	S/. 144,836.95	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 21,662.72	S/. 123,174.23	S/. 288,417.40
VALORIZACION	02	S/. 100,084.30	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 21,662.72	S/. 78,421.58	S/. 188,333.10
RESUMEN TOTAL A LA FECHA		S/. 244,921.25	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 43,325.44	S/. 201,595.81	S/. 188,333.10
	MONTOS ACUMULADOS						
	VALORIZACION NO INCLUYE REAJUSTE		ADELANTO DIRECTO	ADELANTO MATERIALES	RETENCION DE F.C.	NETO A PAGAR	SALDO POR COBRAR
MONTOS ACUMULADO	S/. 244,921.25		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 43,325.44	S/. 201,595.81	S/. 188,333.10

MONTO A FACTURAR
CIENT MIL OCHENTA Y CUATRO CON 30/100 SOLES

S/. 100,084.30


**ENRIQUE ANTONIO
YAMOCHUMBI APONTE**
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322


GUSTAVO SITU TRUJILLO
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
 RESIDENTE DE OBRA


"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA".


**04.13 CONTROL DE
AVANCE DE OBRA.**

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

OBRA: "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA,
REGION DE LIMA"
FINANCIA FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
EJECUTA CONSORCIO MAYES

ITEM	DESCRIPCION PARTIDA	SEGUN EXPEDIENTE TECNICO				SI. TOTAL
		UND	METRADO	SI. PRECIOS	SI. PARCIAL	
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD					
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES					
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES					
01.01.01.01	OFICINA PARA CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN	m2	12.00	281.96	3,383.52	3,383.52
01.01.01.02	ALMACEN DE OBRA	m2	8.00	282.99	2,263.92	2,263.92
01.01.01.03	CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL	m	247.04	31.12	7,687.88	7,687.88
01.01.01.04	ALQUILER BAÑOS QUIMIÇOS INC. INSTALACION Y OPERACIÓN	mes	2.00	362.37	724.74	724.74
01.01.01.05	CARTEL DE OBRA	und	1.00	740.51	740.51	740.51
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES					
01.01.02.01	AGUA PARA OBRA	mes	2.00	2,168.18	4,336.36	4,336.36
01.01.03	TRABAJOS PRELIMINARES					
01.01.03.01	LIMPIEZA DEL TERRENO CON EQUIPO	m2	726.11	1.70	1,234.39	1,234.39
01.01.03.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	glb	1.00	601.16	601.16	601.16
01.01.03.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	est	1.00	6,060.30	6,060.30	6,060.30
01.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO					
01.01.04.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	235.37	2.99	703.76	703.76
01.01.05	TRANSPORTE HORIZONTAL PARA MATERIALES					
01.01.05.01	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIALES	sem	8.00	102.47	819.76	819.76
01.01.06	SEGURIDAD Y SALUD					
01.01.06.01	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	und	1.00	9,894.00	9,894.00	9,894.00
02	ESTRUCTURAS					
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
02.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL	m3	5.04	18.74	94.45	94.45
02.01.02	EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.35 m. TERRENO NORMAL	m3	219.37	37.46	8,217.60	8,217.60
02.01.03	EXCAVACIÓN PARA VEREDAS	m3	31.32	37.46	1,173.25	1,173.25
02.02	RELLENOS					
02.02.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	42.11	40.57	1,708.40	1,708.40
02.02.02	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL	m2	164.60	2.75	452.65	452.65
02.02.03	CONFORMACIÓN DE SUB-BASE PARA VEREDAS	m2	232.00	0.84	194.88	194.88
02.02.04	AFIRMADO COMPACTADO PARA VEREDAS	m3	28.42	97.73	2,777.49	2,777.49
02.02.05	ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL CON EQUIPO	m3	213.63	32.09	6,855.39	6,855.39
02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					
02.03.01	CIMIENTO CORRIDO					
02.03.01.01	CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% P.G.	m3	164.42	227.26	37,366.09	37,366.09
02.03.02	SOBRECIMENTOS					
02.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m2	200.07	57.54	11,512.03	11,512.03
02.03.02.02	CONCRETO SOBRECIMENTOS MEZCLA 1:8, CEMENTO- HORMIGON + 25% P.M.	m3	20.01	265.18	5,306.25	5,306.25
02.03.03	PISOS Y PAVIMENTOS					
02.03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS	m2	23.09	53.51	1,235.55	1,235.55
02.03.03.02	CONCRETO f _c = 175 kg/cm ² PARA VEREDA	m3	25.97	382.63	9,936.90	9,936.90
02.03.04	SOLADOS					
02.03.04.01	SOLADO PARA CIMENTACIONES E=2" MEZCLA 1:2	m2	164.58	45.26	7,448.89	7,448.89
02.04	CONCRETO ARMADO					
02.04.01	ZAPATAS					
02.04.01.01	ACERO f _y = 4200 kg/cm ² GRADO 60 EN ZAPATAS	kg	82.30	4.69	385.99	385.99
02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	6.48	63.15	409.21	409.21
02.04.01.03	CONCRETO f _c = 175 kg/cm ² EN ZAPATAS	m3	2.16	363.39	784.92	784.92
02.04.02	COLUMNAS DE CERCO					
02.04.02.01	ACERO f _y = 4200 kg/cm ² GRADO 60 EN COLUMNAS DE CERCO	kg	3,552.78	4.66	16,555.95	16,555.95
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS DE CERCO	m2	246.47	63.05	15,539.93	15,539.93
02.04.02.03	CONCRETO EN COLUMNAS DE CERCO f _c = 175 kg/cm ²	m3	19.08	411.09	7,843.60	7,843.60
02.04.03	COLUMNAS PARA EL PORTON					
02.04.03.01	ACERO f _y = 4200 kg/cm ² GRADO 60 EN COLUMNAS PARA PORTON	kg	222.08	4.69	1,041.56	1,041.56
02.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS DE PORTÓN	m2	11.04	81.86	903.73	903.73
02.04.03.03	CONCRETO EN COLUMNAS PARA PORTÓN f _c = 175 kg/cm ²	m3	0.99	476.69	471.92	471.92
02.04.04	VIGAS					
02.04.04.01	ACERO f _y = 4200 kg/cm ² GRADO 60 EN VIGAS DE AMARRE	kg	1,387.22	4.69	6,506.06	6,506.06
02.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE AMARRE	m2	145.56	67.00	9,752.52	9,752.52
02.04.04.03	CONCRETO f _c = 175 kg/cm ² EN VIGAS DE AMARRE	m3	15.01	385.58	5,787.56	5,787.56
02.04.05	PISO DE INGRESO, e= 0.10 m					
02.04.05.01	ACERO f _y = 4200 kg/cm ² GRADO 60 EN PISO DE INGRESO	kg	321.36	4.66	1,497.54	1,497.54
02.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISO DE INGRESO	m2	2.61	53.51	139.66	139.66
02.04.05.03	CONCRETO f _c = 175 kg/cm ² EN PISO DE INGRESO	m3	4.13	382.63	1,580.26	1,580.26



ANTONIO YAMOCUMI APONTE
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87322


Guillermo Siu Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87322
 RESIDENTE DE OBRA

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

OBRA: "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"
 FINANCIADA POR FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
 EJECUTADA POR CONSORCIO MAYES

ITEM	DESCRIPCION PARTIDA	SEGUN EXPEDIENTE TECNICO				S/. TOTAL
		UND	METRADO	S/. PRECIOS	S/. PARCIAL	
03	ARQUITECTURA					
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA					
03.01.01	MURO DE LADRILLO DE ARCILLA KING KONG - TIPO CARAVISTA	m2	390.14	68.97	26,907.96	26,907.96
03.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS					
03.02.01	TARRAJEO EN VIGAS C:A 1:5, e= 1.5 cm	m2	195.07	41.80	8,153.93	8,153.93
03.02.02	TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:5, e= 1.5 cm	m2	264.72	35.02	9,270.49	9,270.49
03.02.03	TARRAJEO ZOCALOS C:A 1:5, e= 1.5 cm	m2	200.07	34.40	6,882.41	6,882.41
03.02.04	JUNTAS SISMICAS e=3 cm	m	108.75	3.25	353.44	353.44
03.02.05	JUNTAS ASFÁLTICAS EN VEREDAS e= 1"	m	230.88	6.27	1,447.62	1,447.62
03.02.06	JUNTAS DE DILATACIÓN EN VEREDAS e = 1" c/5.00 m	m	44.00	2.85	125.40	125.40
03.02.07	BRUÑA EN VEREDAS	m	440.55	6.71	2,956.09	2,956.09
03.02.08	BRUÑAS EN PISO DE INGRESO	m	28.70	6.71	192.58	192.58
03.03	CUBIERTAS					
03.03.01	LADRILLO PASTELERO 24X24 CM PARA CERCO	m	200.07	12.77	2,554.89	2,554.89
03.04	CARPINTERIA METALICA					
03.04.01	PORTON METALICO 2.77 m x 5.35 m. DOS HOJAS PIVOTANTE CON TUBO DE 2" CON PUERTA DE INGRESO PEATONAL INC. PINTURA ANTICORROSIVA	und	1.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00
03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA Y ALAMBRE DE PUAS DE SEGURIDAD SOBRE MURO NUEVO (h=0.55m).	m	230.03	51.51	11,848.85	11,848.85
03.05	PINTURA					
03.05.01	PINTURA DE VIGAS, COLUMNAS Y ZOCALOS	m2	659.85	15.11	9,970.33	9,970.33
COSTO DIRECTO						287,074.52
GASTOS GENERALES 19.13%						55,037.85
UTILIDAD 0.085%						24,452.33
SUBTOTAL						387,164.70
IGV 18%						66,089.65
TOTAL PRESUPUESTO						433,254.35


ENRIQUE ANTONIO
HAMO LOMBAPONTE
 INGENIERO CIVIL
 CIP-87322



Guillermo Sola Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP-87322
 RESIDENTE DE OBRA

*NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA*.

**04.14 CALENDARIO
VALORIZADO VIGENTE.**

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA


OBRA: "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"

EJECUTOR CONSORCIO MAYES

PLAZO 60 DIAS

Item	Descripción	Und.	Costo Base			29-ene-19	13-feb-19	28-feb-19	15-mar-19	Totales
			Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	AL 12-feb-19	AL 27-feb-19	AL 14-mar-19	AL 29-mar-19	
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD									
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES									
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES									
01.01.01.01	OFICINA PARA CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN	m2	12.00	281.96	3,383.52	3,383.52				3,383.52
01.01.01.02	ALMACEN DE OBRA	m2	8.00	282.99	2,263.92	2,263.92				2,263.92
01.01.01.03	CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL	m	247.04	31.12	7,687.88	7,687.88				7,687.88
01.01.01.04	ALQUILER BAÑOS QUIMICOS INC. INSTALACION Y OPERACIÓN	mes	2.00	362.37	724.74	362.37	120.79	120.79	120.79	724.74
01.01.01.05	CARTEL DE OBRA	und	1.00	740.51	740.51	740.51	0.00	0.00	0.00	740.51
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES						0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.02.01	AGUA PARA OBRA	mes	2.00	2,168.18	4,336.36	2,168.18	722.72	722.72	722.74	4,336.36
01.01.03	TRABAJOS PRELIMINARES						0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.03.01	LIMPIEZA DEL TERRENO CON EQUIPO	m2	726.11	1.7	1,234.39	1,234.39	0.00	0.00	0.00	1,234.39
01.01.03.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	glb	1.00	601.16	601.16	0.00	0.00	0.00	601.16	601.16
01.01.03.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	est	1.00	6,060.30	6,060.30	3,030.15	0.00	0.00	3,030.15	6,060.30
01.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.04.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	235.37	2.99	703.76	351.88	117.29	117.29	117.30	703.76
01.01.05	TRANSPORTE HORIZONTAL PARA MATERIALES				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.05.01	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIALES	sem	8.00	102.47	819.76	204.94	204.94	204.94	204.94	819.76
01.01.06	SEGURIDAD Y SALUD				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.06.01	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	und	1.00	9,894.00	9,894.00	4,947.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	9,894.00
02	ESTRUCTURAS				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL	m3	5.04	18.74	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	94.45
02.01.02	EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.35 m. TERRENO NORMAL	m3	219.37	37.46	8,217.60	7,806.72	410.88	0.00	0.00	8,217.60
02.01.03	EXCAVACION PARA VEREDAS	m3	31.32	37.46	1,173.25	586.63	586.62	0.00	0.00	1,173.25
02.02	RELLENOS				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02.02.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	42.11	40.57	1,708.40	854.20	854.20	0.00	0.00	1,708.40
02.02.02	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL	m2	164.8	2.75	452.65	226.33	226.32	0.00	0.00	452.65
02.02.03	CONFORMACION DE SUB-BASE PARA VEREDAS	m2	232.06	0.84	194.88	97.44	97.44			194.88
02.02.04	AFIRMADO COMPACTADO PARA VEREDAS	m3	28.42	97.73	2,777.49	1,388.74	1,388.75	0.00	0.00	2,777.49
02.02.05	ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL CON EQUIPO	m3	213.63	32.09	6,855.39	3,427.69		1,713.85	1,713.85	6,855.39
02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				0.00					0.00
02.03.01	CIMIENTO CORRIDO				0.00					0.00
02.03.01.01	CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% P.G.	m3	164.42	227.26	37,366.09	18,683.04	18,683.05	0.00		37,366.09


Guillermo S. Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87322
 RESIDENTE DE ORP.


ENRIQUE ANTONIO
HAMOCHUMBI APONTE

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

OBRA: "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"


EJECUTOR CONSORCIO MAYES

PLAZO 60 DIAS

Item	Descripción	Und.	Costo Base			29-ene-19	13-feb-19	28-feb-19	15-mar-19	Totales
			Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	AL 12-feb-19	AL 27-feb-19	AL 14-mar-19	AL 29-mar-19	
02.03.02	SOBRECIMENTOS				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE SOBRECIMIENTO	m2	200.07	57.54	11,512.03	5,256.68	6,255.35		0.00	11,512.03
02.03.02.02	CONCRETO SOBRECIMENTOS MEZCLA 1:8, CEMENTO- HORMIGON + 25% P.M.	m3	20.01	265.18	5,306.25	2,236.28	3,069.99		0.00	5,306.25
02.03.03	PISOS Y PAVIMENTOS				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02.03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL EN VEREDAS	m2	23.09	53.51	1,235.55		0.00	617.77	617.78	1,235.55
02.03.03.02	CONCRETO f _c =175 kg/cm2 PARA VEREDA	m3	25.97	382.63	9,936.90		0.00	4,968.45	4,968.45	9,936.90
02.03.04	SOLADOS				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02.03.04.01	SOLADO PARA CIMENTACIONES E=2" MEZCLA 1:2	m2	164.58	45.26	7,448.89	4,469.33	2,979.56		0.00	7,448.89
02.04	CONCRETO ARMADO				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.01	ZAPATAS				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.01.01	ACERO f _y = 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS	kg	82.3	4.69	385.98	385.99	0.00	0.00	0.00	385.99
02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN ZAPATAS	m2	6.46	63.15	409.21	409.21	0.00	0.00	0.00	409.21
02.04.01.03	CONCRETO f _c = 175 kg/cm2 EN ZAPATAS	m3	2.16	363.39	784.92	784.92	0.00	0.00	0.00	784.92
02.04.02	COLUMNAS DE CERCO				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.02.01	ACERO f _y = 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS DE CERCO	kg	3,552.78	4.68	16,555.95	9,933.57	6,622.38			16,555.95
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN COLUMNAS DE CERCO	m2	248.47	63.05	15,539.93		8,215.97	7,323.96		15,539.93
02.04.02.03	CONCRETO EN COLUMNAS DE CERCO f _c = 175 kg/cm2	m3	19.08	411.09	7,843.60		4,832.65	3,010.95		7,843.60
02.04.03	COLUMNAS PARA EL PORTON				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.03.01	ACERO f _y = 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS PARA PORTON	kg	222.08	4.69	1,041.56	1,041.56	0.00	0.00		1,041.56
02.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN COLUMNAS DE PORTON	m2	11.04	81.88	903.73		541.86	361.87		903.73
02.04.03.03	CONCRETO EN COLUMNAS PARA PORTON f _c = 175 kg/cm2	m3	0.99	478.69	471.92		157.30	157.30	157.32	471.92
02.04.04	VIGAS				0.00					0.00
02.04.04.01	ACERO f _y = 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE AMARRE	kg	1387.22	4.69	6,506.06		3,200.60	3,305.46		6,506.06
02.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL EN VIGAS DE AMARRE	m2	145.56	67.00	9,752.52		2,438.13	4,255.65	3,058.74	9,752.52
02.04.04.03	CONCRETO f _c = 175 kg/cm2 EN VIGAS DE AMARRE	m3	15.01	385.58	5,787.56		1,448.89	2,815.59	1,525.08	5,787.56
02.04.05	PISO DE INGRESO, e= 0.10 m				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.05.01	ACERO f _y = 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PISO DE INGRESO	kg	321.36	4.68	1,497.54		0.00	0.00	1,497.54	1,497.54
02.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN PISO DE INGRESO	m2	2.81	53.51	139.66		0.00	0.00	139.66	139.66
02.04.05.03	CONCRETO f _c = 175 kg/cm2 EN PISO DE INGRESO	m3	4.13	382.63	1,580.26		0.00	0.00	1,580.26	1,580.26
03	ARQUITECTURA				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01	MURO DE LADRILLO DE ARCILLA KING KONG - TIPO CARAVISTA	m2	390.14	68.97	26,907.06		17,490.17	9,417.79		26,907.96
03.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
03.02.01	TARRAJEO EN VIGAS C/A 1:5, e= 1.5 cm	m2	195.07	41.80	8,153.93			4,076.96	4,076.97	8,153.93



Guillermo Su Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87322
 RESIDENTE DE OBRA



ANTONIO HUMBERI APONTE
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87322


CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

OBRA: "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"

EJECUTOR CONSORCIO MAYES

PLAZO 60 DIAS

Item	Descripción	Und.	Costo Base			29-Ene-19	13-Feb-19	28-Feb-19	15-Mar-19	Totales
			Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	AL 12-Feb-19	AL 27-Feb-19	AL 14-Mar-19	AL 29-Mar-19	
03.02.02	TARRAJEO EN COLUMNAS C/A 1.5, e= 1.5 cm	m2	284.72	35.02	9,270.49			4,635.24	4,635.25	9,270.49
03.02.03	TARRAJEO ZOCALOS C/A 1.5, e= 1.5 cm	m2	200.07	34.40	6,882.41			3,441.20	3,441.21	6,882.41
03.02.04	JUNTAS SISMICAS e=3 cm	m	108.75	3.25	353.44			176.72	176.72	353.44
03.02.05	JUNTAS ASFÁLTICAS EN VEREDAS e = 1"	m	230.88	6.27	1,447.62			723.81	723.81	1,447.62
03.02.06	JUNTAS DE DILATACIÓN EN VEREDAS e = 1" c/5.00 m	m	44.00	2.85	125.40			85.36	30.04	125.40
03.02.07	BRUÑA EN VEREDAS	m	440.55	6.71	2,956.09			1,773.65	1,182.44	2,956.09
03.02.08	BRUÑAS EN PISO DE INGRESO	m	28.7	6.71	192.58				192.58	192.58
03.03	CUBIERTAS				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
03.03.01	LADRILLO PASTELERO 24X24 CM PARA CERCO	m	200.07	12.77	2,554.89		0.00	0.00	0.00	2,554.89
03.04	CARPINTERIA METALICA				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
03.04.01	PORTON METALICO 2.77 m x 5.35 m. DOS HOJAS PIVOTANTE CON TUBO DE 2" CON PUERTA DE INGRESO PEATONAL INC. PINTURA ANTICORROSIVA	und	1.00	5,080.00	5,080.00		0.00	0.00	5,080.00	5,080.00
03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA Y ALAMBRE DE PUAS DE SEGURIDAD SOBRE MURO NUEVO (h=0.55m).	m	230.03	51.81	11,848.85		0.00	0.00	11,848.85	11,848.85
03.05	PINTURA				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
03.05.01	PINTURA DE VIGAS, COLUMNAS Y ZOCALOS	m2	669.85	15.11	9,970.33		0.00	1,894.07	7,976.26	9,970.33
COSTO DIRECTO					287,674.52	84,057.50	82,312.85	57,680.39	63,623.78	287,674.52
GASTOS GENERALES (19.13%)				19.13%	55,037.85	16,081.87	15,748.08	11,035.40	12,172.49	55,037.85
UTILIDAD (0.085%)					24,452.33	7,144.89	6,898.59	4,902.83	5,408.02	24,452.33
SUB TOTAL					367,164.70	107,284.26	105,057.52	73,618.62	81,204.29	367,164.70
IGV (18%)					66,089.85	19,311.18	18,910.35	13,251.35	14,616.77	66,089.85
PRESUPUESTO TOTAL OBRA					433,254.35	126,595.44	123,967.87	86,869.97	95,821.06	433,254.35
AVANCE PARCIAL						29.22%	28.61%	20.05%	22.12%	100.00%
AVANCE ACUMULADO					100.00%	29.22%	57.83%	77.88%	100.00%	


 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N° 48488


 Guillermo Stu Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87322
 RESIDENTE DE OBRA

"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA".

5. DOCUMENTOS TÉCNICOS – ADMINISTRATIVOS:

*NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA*.

**05.01 COPIA DE CONTRATO
DE EJECUCIÓN DE OBRA**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

CONTRATO N° 001 -2019-FONDEPES
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 022-2018-FONDEPES
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE LA OBRA "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA"

Conste por el presente documento, la "CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE LA OBRA "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA", correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 022-2018-FONDEPES – Primera Convocatoria, que celebran de una parte:

- El FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES con R.U.C. N° 20137921601, con domicilio legal en Av. Petit Thouars N° 115, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Jefa de la Oficina General de Administración, la señora TERESA ZENAIDA QUIROZ SILVA, identificada con D.N.I. N° 09405576, designada mediante Resolución Jefatural N° 103-2018-FONDEPES/J de fecha 29 de agosto de 2018 y con las facultades conferidas en materia de contrataciones mediante Resolución Jefatural N° 069-2016-FONDEPES/J de fecha 17 de febrero de 2016, a quien en adelante se le denominará LA ENTIDAD; y de la otra parte,

- El CONSORCIO MAYES, domiciliado en Jr. Manuel de Lara 152- Urb. Villa Sol – Los Olivos, provincia de Lima, Departamento de Lima, cuyo representante común es el señor ALEJANDRO SIU TRUJILLO identificado con DNI N° 22512946, tal como lo señala en la cláusula quinta del Contrato de Consorcio, en adelante se denominará EL CONTRATISTA. El Consorcio MAYES se encuentra conformado por las siguientes empresas:

- La Empresa CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ALMA GRANDE A & G SRL con RUC N° 20573327510 inscrita en la Partida Electrónica N° 11120681 del Registro de Personas Jurídicas – Libro de Sociedades Anónimas de la Oficina Registral de Huánuco, con domicilio legal en Jr. Leoncio Prado Cent. C.U Huánuco 149 A-41, distrito de Huánuco, provincia y departamento de Huánuco, debidamente representada por su Gerente General ALEJANDRO SIU TRUJILLO identificado con D.N.I. N° 22512946, según Poder inscrito en el Asiento N° C0001 del mismo registro.

- La Empresa INVERSIONES CHINCHAYSUYO EIRL con RUC N° 20489573157 inscrita en la Partida Electrónica N° 11059960 del Registro de Personas Jurídicas – Libro de Sociedades Anónimas de la Oficina Registral de Huánuco, con domicilio legal en Av. Jr. 28 de Julio 1301, en el distrito de Huánuco, provincia y departamento de Huánuco, debidamente representada por su Gerente General JUAN

CONSORCIO MAYES
 PRESIDENTE LEGAL COMIN
 SR/ ALEJANDRO SIU TRUJILLO
 DNI N° 22512946




 Guillermo Siu Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87322
 RESIDENTE DE OBRAS



 ING. GUILLERMO SIU TRUJILLO
 ING. CIVIL
 CIP N° 87322



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 8 del Capítulo III "Requerimiento" de la Sección Específica de las Bases Integradas, tales como:

- a) **Vigencia Contractual:** Los contratos tienen vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que los contiene.
- b) **Ejecución de las Obras:** El inicio del plazo de ejecución de las obras comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el Artículo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:
 1. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda;
 2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda;
 3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;
 4. Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;
 5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases Integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para LAS PARTES.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

De fiel cumplimiento del contrato: por el monto de S/. 43,325.43 (cuarenta y tres mil trescientos veinte y cinco con 43/100 Soles), a través de la retención que debe efectuar la ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, de acuerdo a lo señalado en el numeral 126.3 del artículo 126, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA autoriza a la ENTIDAD a efectuar la retención por el monto de S/. 43,325.43 (cuarenta y tres mil trescientos veinte y cinco con 43/100 Soles) durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que será devuelta a la finalización del contrato (liquidación).

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: SEGUROS

EL CONTRATISTA, deberá presentar las pólizas que se detallan a continuación, en la fecha de inicio de ejecución de la obra:


1. POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO Y MONTAJE (CAR):

- o Básica: por el monto del contrato.
- o Terremoto: por el monto del contrato de obra.
- o Avenida, lluvia e inundación, por el monto del contrato de obra
- o Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del contrato de obra.


 ING. GUILLERMO SIU TRUJILLO
 ING. CIVIL
 CIP N° 87322


 Guillermo Siu Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87322
 RESIDENTE DE OBR.

CONSORCIO
 EMPRESAS MANAYESCA Y COMIN
 BUENOS AIRES, ARGENTINA
 D.O.M. N° 28512346





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

- o Daños materiales, daños personales, remoción de escombros, por el 5% del monto del contrato.
- o Huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, terrorismo por el 20% del monto del contrato de obra.

VIGENCIA:

La póliza de Seguro Todo Riesgo y Montaje (CAR) con una vigencia desde la fecha de inicio de obra hasta la liquidación consentida de la obra.

2. SEGURO DE VIDA LEY

Póliza de Accidentes Personales: por muerte o invalidez permanente por el 2.5% del monto de la obra por cada obrero. Deberá especificar que se considerarán como terceras personas al personal de la Entidad que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecución de obra.

VIGENCIA:

La póliza de Seguro Vida Ley, tendrá vigencia desde la fecha de inicio de ejecución hasta la recepción de la obra.

3. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Póliza de Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos, conforme a lo dispuesto por el D.L. N° 688 y D.L. N° 25897.

VIGENCIA:

La póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, tendrá vigencia desde la fecha de inicio de ejecución hasta la recepción de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará adelanto directo hasta por el diez por ciento 10% del monto del contrato original, en caso que EL CONTRATISTA lo solicite.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.


CLÁUSULA UNDÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisiciones de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de diez (10) días calendario previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) días calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los adelantos dentro de los plazos indicados, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza y el comprobante del pago respectivo.

No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.



CONSORCIO MAY
PRESIDENTE: CESAR CORRAL
CAJALAYO ALEJANDRO
MAY 17, 2015



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

F x Plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.


Se considera justificado el retraso, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: OTRAS PENALIDADES

LA ENTIDAD, conforme al artículo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará a **EL CONTRATISTA** las siguientes penalidades:

CONSORCIO INDES
 REPRESENTANTE LEGAL DON
 ING. GUILLERMO SIU TRUJILLO
 D.M.I. N° 228713-8

PENALIDADES			
N°	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por FONDEPES.	Uno por cinco mil (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor
2	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad.	Uno por cinco mil, (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor
3	RESIDENTE DE OBRA Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra.	Uno por cinco mil (1/5000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor
4	CUADERNO DE OBRA Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor
5	EQUIPO MINIMO Cuando el contratista emplea equipos o maquinarias en obra no autorizadas previamente por el supervisor o cuando los equipos y maquinarias no cumplen con lo mínimo requerido en los presentes Términos de Referencia o cuando no presenta los equipos declarados en su propuesta técnica.	Dos por mil (2/1000) del monto del sub ítem por cada equipo que no cumpla con lo exigido en los RDR	Según Informe del Supervisor



Guillermo Siu Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87322
 RESIDENTE DE OBRA

ING. GUILLERMO SIU TRUJILLO
 ING. CIVIL
 CIP N° 87322



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

6	POLIZA CONTRA TODO RIESGO - CAR De no presentar el contratista los comprobantes que acrediten la cancelación del citado seguro dentro de los 10 días al inicio de la obra se le aplicara la penalidad que se señala.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor
7	PERSONAL PROPUESTO En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	1 UIT	Según informe del Supervisor.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

La aplicación de las penalidades no exime de responsabilidad a EL CONTRATISTA por los daños generados a LA ENTIDAD o a terceros.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de LAS PARTES, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de LAS PARTES del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: ANTICORRUPCIÓN



EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

Página 7 de 9

 Guillermo Siu Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87322
 RESIDENTE

 ING. GUILLERMO SIU TRUJILLO
 ING. CIVIL
 CIP N° 87322

 CONSORCIO MANTA
 REPRESENTANTE LEGAL COMUNITARIO
 SR. PEDRILCO ALEJANDRO
 D.L.N. 257546




"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre LAS PARTES durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según acuerdo entre LAS PARTES.

Facultativa: Cualquiera de LAS PARTES tiene derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir a arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

Cualquiera de LAS PARTES tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 143, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por un tribunal arbitral conformado por tres (3) árbitros. LA ENTIDAD en virtud a lo señalado en el numeral 185.3 del artículo 185, elije el siguiente orden de prelación:

1. Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
2. Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú – AMCHAM.

El Laudo Arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para LAS PARTES desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA


Cualquiera de LAS PARTES puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

LAS PARTES declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

- DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Petit Thouars N° 115, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.

CONSORCIO MAYES
ING. GONZALO ALEXANDRO
D.M. N° 228128-A3



Guillermo Siu Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBR.

ING. GUILLERMO SIU TRUJILLO
ING. CIVIL
CIP N° 87322



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

- DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Manuel de Lara 152-Urb. Villa Sol – Los Olivos, provincia de Lima, Departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de LAS PARTES debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, LAS PARTES lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los Diez (10) días del mes de enero de 2019.



FONDEPES
[Signature]
C.P.C. TERESA QUIROZ SILVA
JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO MAYES
[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN
SIU TRUJILLO / CEJANDURO
D.N.I. 57122512240
"EL CONTRATISTA"

[Signature]
Guillermo Siu Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRAS

[Signature]
ING. GUILLERMO SIU TRUJILLO
ING. CIVIL
CIP N° 87322

*NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA*.

**05.02 COPIA DE
CONTRATO DEL CONSORCIO**



CONSORCIO MAYES

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ALMA GRANDE A & G S.R.L.
INVERSIONES CHINCHAYSUYO E. I. R. L.

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento, la declaración de formalización de contrato de CONSORCIO para efectos de suscripción de contrato público, que suscriben las empresas consorciadas integrantes del **CONSORCIO MAYES**, a saber:

1.- **CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ALMA GRANDE A & G S.R.L.** con RUC N° **20573327510** con domicilio Legal en el Jr. Leoncio Prado 149 A-41 Cent C.U Huánuco - Provincia de Huánuco -Departamento de Huánuco, debidamente representado por su Gerente General Sr. **ALEJANDRO SIU TRUJILLO** con Documento Nacional de Identidad N°: 22512946 de Nacionalidad Peruana.

2.- **INVERSIONES CHINCHAYSUYO E. I. R. L.**, con RUC N° **20489573157** con domicilio Legal Jr. 28 De Julio Nro. 1301 Huánuco - Provincia de Huánuco -Departamento de Huánuco, debidamente representado por su Titular-Gerente Sr. **JUAN ROMEL ALVARADO LOARTE** con Documento Nacional de Identidad N°: 22502288 de Nacionalidad Peruana.

En los términos y condiciones siguientes:


PRIMERO. -ANTECEDENTE

1. Los otorgantes del presente instrumento formularon promesa formal de consorcio, como postores de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0022-2018-FONDEPES - 1, para la ejecución de la Obra: "**NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA**", Convocada según ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0022-2018-FONDEPES - 1, bajo la denominación de "**CONSORCIO MAYES**"
2. El "**CONSORCIO MAYES**" conformado por los otorgantes del presente instrumento, ha sido favorecido con la buena pro en el proceso de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0022-2018-FONDEPES - 1, para la ejecución de la Obra: "**NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA**"

SEGUNDO. -OBJETO

1. El objeto del presente documento es perfeccionar la conformación de **CONSORCIO** entre **CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ALMA GRANDE A & G S.R.L.**, **INVERSIONES CHINCHAYSUYO E. I. R. L** con el propósito de complementar sus capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras para la celebración y ejecución del contrato de ejecución de obra, derivado de según ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0022-2018-FONDEPES - 1, para la ejecución de la Obra: "**NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA**".
2. Por el monto de la propuesta económica presentada a **S/ 433,254.35** (Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y cuatro con **35/100** Soles)


Guillermo Siu Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87322
 PRESIDENTE DE OBRAS


GUILLERMO SIU TRUJILLO
 ING. CIVIL
 CIP N° 87322

Los integrantes del **CONSORCIO MAYES**, manteniendo su propia autonomía, participan en la ejecución del contrato respectivo aportando todo lo necesario para su buena ejecución, en la medida de la participación porcentual que han establecido, por lo tanto, su responsabilidad



CONSORCIO MAYES

**CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ALMA GRANDE A & G S.R.L.
INVERSIONES CHENCHAYSUYO E. I. R. L.**

Las órdenes de pago, cheque y demás documentos de pago se girarán a nombre de **CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ALMA GRANDE A & G S.R.L.**, con RUC N°20573327510.

DECIMO TERCERO. – NORMAS APLICABLES Y SOLUCIONES DE CONTROVERSIÁ

El **CONSORCIO** que se constituye por el presente contrato se rige por lo dispuesto en el Artículo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y supletoriamente por los Artículos 438° y 445° a 448° de la Ley General de Sociedades y demás normas que resulten aplicables.

En caso de discrepancias o controversias estas se resolverán de mutuo acuerdo y en caso de no ser posible mediante conciliación y/o arbitraje.

DECIMO CUARTO. – FACULTADES DE LOS INTEGRANTES

Los que suscriben el presente instrumento dejan constancia, de disponer atribuciones suficientes para representar a sus respectivas empresas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente contrato en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente contrato sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0022-2018-FONDEPES – 1**, para la ejecución de la Obra: **“NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA”**, en función al porcentaje de participación, para cuyo efecto de conformidad con la normatividad vigente cumple con legalizar sus firmas ante el Notario Público.

Todas las partes conformes con los términos y condiciones del presente contrato lo suscriben en señal de su aceptación en Huánuco a los 02 días del mes de enero del año 2019

22512946

HUANUCO

Guillermo Siu Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBR-

LA CERTIFICACIÓN AL REVERSO

ING. GUILLERMO SIU TRUJILLO
ING. CIVIL
CIP N° 87322



CONSORCIO MAYES

**CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ALMA GRANDE A & G S.R.L.
INVERSIONES CHINCHAYSUYO E. I. R. L.**

28

que se origine como consecuencias de la ejecución del contrato derivado de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0022-2018-FONDEPES – 1, para la ejecución de la Obra: **“NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA”**

- **CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ALMA GRANDE A & G S.R.L. 50.00%**
- **INVERSIONES CHINCHAYSUYO E. I. R. L. 50.00%**

OCTAVO. – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES

Sin perjuicios señala en la cláusula segunda por la cual las partes asumen la obligación de ejecutar en forma la atención a la ejecución de obra, los integrantes del **CONSORCIO** asumen la ejecución de contratar de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0022-2018-FONDEPES – 1, para la ejecución de la Obra: **“NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA”**, lo siguiente:

- **CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ALMA GRANDE A & G S.R.L.**

Los integrantes del **CONSORCIO**, no podrá hacer cesión de las participaciones establecidas, cuando se trae de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita de la entidad con la que suscribe el contrato derivado del proceso de selección, para su procedencia.

NOVENO. – CESION

Entre los integrantes del **CONSORCIO**, no podrá hacer cesión de las participaciones establecidas, cuando se trae de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita de la entidad con la que suscribe el contrato derivado del proceso de selección, para su procedencia.

DECIMO. – ADOPCION DE ACUERDO

Los acuerdos que los otorgantes del presente instrumento adopten en relación a las actividades del **CONSORCIO** frente a la entidad con la que contratan, se adoptara en lo posible de acuerdo unánime.

La adopción de acuerdo constara en hoja simples con firma de las partes que adopte el acuerdo en caso de inconcurrencia de las partes, de estar facultada para el **ACUERDO VÁLIDAMENTE**.

DECIMO PRIMERO. – REUNION INTEGRANTE DE LAS PARTES DEL CONSORCIO

En su relación interna los otorgantes del presente instrumento establecen que las partes integrantes del **CONSORCIO** se reunirán cuantas veces resulte necesario para la ejecución del contrato de ejecución de la Obra: **“NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA”**, siendo suficiente para ello que el representante del **CONSORCIO** los convoque con una anticipación no menor de 48 horas, verbalmente, telefónicamente por fax o por escrito por carta simple de considerarlo conveniente.

Para efectos de la convocatoria a que se refiere el párrafo anterior, las partes establecen como sus domicilios los señalados en la introducción del presente contrato.

DECIMO SEGUNDO. – ORDENES DE PAGO Y FACTURACION



Guillermo Su Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE C.A.S.



ING. GUILLERMO SU TRUJILLO
ING. CIVIL
CIP N° 87322



CONSORCIO MAYES

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ALMA GRANDE A & G S.R.L.
INVERSIONES CHINCHAYSUYO E. I. R. L.

28

reconvenciones, desistirse del proceso de un acto procesal o de la presentación, allanar o reconocer la demanda o presentaciones, conciliar, transigir dentro o fuera del proceso.

- d) Realizar todo los actos y celebrar, rescindir o resolver toda clases de contrato y sub contrato, para el cumplimiento del objetivo del CONSORCIO, fijando sus condiciones, incluyendo contratos de publicidad, seguros, fletes, suministros, transporte, depósitos, presentación de servicios personales y no personales y solicitar marca de fábrica registro nombre comercial, vender, arrendar o da en arriendo donar permutar toda clase de bienes muebles e inmuebles de ser el caso, firmar toda clase de contrato sean civiles mercantiles, así como suscribir los instrumentos públicos a los usos y costumbres mercantiles, así como suscribir los instrumentos públicos y privados a los que dieron lugar.
- e) Abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro, plazo o de cualquier otro género, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros y sobregiros y cuentas corrientes, o sin garantía prendaria, hipotecas, aval y/o fianzas en todo tipo de instituciones de crédito, cobrar valorizaciones y cheques productos de los contratos y derivados, contratar caja de seguridad, abrirlas operarias y/o cerrarlas, girar endosar, aceptar, avalar, descontar, depositar, retirar, cobrar, protestar, reeceptar, renovar, cancelar y/o dar en garantía o en procuración, según naturaleza, letras de cambio, pagare, vales, cheques y general todo tipo de títulos de valor, así como cualquier otro documento mercantil o civil, incluyendo pólizas como conocimiento de embarque, cartas de poder, cartas de crédito certificados de depósitos, warrants, incluyendo su constitución, fianzas y/o avales, celebrar activa o pasivamente contratos de mutuo con instituciones bancarias, financieras o con cualquier persona natural o jurídica con o sin garantías; celebrar todo tipo de operaciones de crédito a favor del CONSORCIO, transigir o condonar obligaciones, celebrar contratos de leasing, arredramiento financieros, joint venture, franchisin, franquicias, underwriting, y suscribir los documentos públicos y privados a que hubiera lugar.
- f) Someter controversias arbitraje, allanarse desistirse y transigir en caso de onflictos.
- g) Contratar publicidad, solicitar concesiones y autorizaciones de todo tipo que resulte necesaria para la ejecución del servicio de adquisición de materiales de construcción.

SEXTO. - DURACION

El inicio de las actividades de consorcio se retrotraerá a la fecha de formulación de la promesa formal que otorgo con objeto de su participación en la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0022-2018-FONDEPES - 1, para la ejecución de la Obra: "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA", la duración del consorcio será el tiempo requerido para la ejecución del contrato de ejecución de la obra derivada de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0022-2018-FONDEPES - 1, antes referida y el que resulte necesario para atender las garantías derivadas del mismo.

SÉPTIMO. - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

Los integrantes del CONSORCIO tienen la siguiente participación en las utilidades y pérdidas

Guillermo Siu Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322

ING. GUILLERMO SIU TRUJILLO
ING. CIVIL
CIP: 87322



CONSORCIO MAYES

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ALMA GRANDE A & G S.R.L.
INVERSIONES CHINCHAYSUYO E. I. R. L.

30

será solidaria e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presentan y ocurran durante la ejecución del contrato efectuarán en igual forma y medida a todos los integrantes.

TERCERO. -DENOMINACIÓN

El consorcio que se forma se denominará: "**CONSORCIO MAYES**"

CUARTO. -DOMICILIO

Se fija como domicilio del consorcio: Jr. Manuel de Lara 152- Urb. Villa Sol – Distrito de Los Olivos – Provincia y departamento de Lima

Las comunicaciones que la entidad remita al **CONSORCIO** se tendrá por válidamente recepcionadas en el domicilio indicado.

Toda documentación referida al consorcio, así como su archivo se conserva en el domicilio antes señalado y una vez concluida la obra contratada y aprobada su liquidación final la misma permanecerá bajo la custodia de **CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ALMA GRANDE A & G S.R.L.**, por plazo establecido.

Conforme se vaya generando, se entregará una copia de la documentación contable y admirativa que sea requerida por los integrantes del **CONSORCIO**.

QUINTO. - REPRESENTANTE DEL CONSORCIO

Se designa al Sr. **ALEJANDRO SIU TRUJILLO** con Documento Nacional de Identidad N°: 22512946 cargo que se acepta con la firma del representante documento, estando en consecuencia autorizado para contratar, comprometer, negociar y representar al **CONSORCIO**, y todo relacionado con la ejecución del contrato de la ejecución de la obra derivada de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0022-2018-FONDEPES - 1**, para la ejecución de la Obra: "**NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA**", hasta la aprobación y/o consentimiento de su liquidación final la autorización referida incluye los poderes suficientes y necesarios para formular ante la entidad todo tipo de solicitudes previstas y contempladas en la ley de contrataciones con el estado y su reglamento.

Sin perjuicio de las facultades que confieren al representante el consorcio, están referidas a la, ejecución de todos los actos que resulten necesarios para la ejecución de contrato de ejecución de obra derivada de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0022-2018-FONDEPES - 1**, para la ejecución de la Obra: "**NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA**", sin reserva ni limitación alguna, el mismo se encuentra facultado para:

- Representar al **CONSORCIO** ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, municipales, fiscales y aduaneras, abrigándolo plenamente y sin limitaciones algunas.
- Representar al **CONSORCIO** extrajudicialmente ante toda clase de persona natural y jurídica incluye empresas públicas y comercio.
- Representar al **CONSORCIO** admirativamente y judicialmente en juicios procedimientos, procesos arbitraje o fuera ello con la facultad de atribuciones generales de presentación, así como las especiales para disponer de los derechos sustantivos, en tal sentido podrá demandar reconvenir, contestar, denominada y

Guillermo Siu Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRAS

ING. GUILLERMO SIU TRUJILLO
ING. CIVIL
CIP N° 87322

"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA".

**05.04 CERTIFICADO DE
VIGENCIA PODER**

**REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El funcionario que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 11120681 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Huanuco, consta registrado y vigente el **NOMBRAMIENTO** a favor de SIU TRUJILLO ALEJANDRO, identificado con D.N.I N° 22512946, cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ALMA GRANDE A & G S.R.L.
LIBRO: SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ASIENTO: A0001
GO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:

LAS MISMAS QUE CONSTAN INSCRITAS EN EL ASIENTO A0001 PÁGINAS DEL 01 AL 04.-

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:

ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 27/10/2014 EXTENDIDA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE HUÁNUCO CROMBELL E. MORALES CANELO.-

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:

NINGUNO.-

III. TÍTULOS PENDIENTES:

NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : Artículo 81 - Delimitación de la responsabilidad.-
El servidor responsable que expide la publicidad formal no asume responsabilidad por los defectos o las inexactitudes de los asientos registrales, índices automatizados, y títulos pendientes que no consten en el sistema electrónico.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:

04 PÁGINAS.-

N° de Fojas del Certificado: 1

Derechos Pagados SI/ 25.00 Recibo: 2018-397-00030714
Total de Derechos: SI/ 25.00



Verificado y expedido por RUTH MONTALDO YERENA, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina Registral de HUANUCO, a las 13:24:39 horas del 26 de Diciembre del 2018.



ZONA REGISTRAL N° VIII
OFICINA REGISTRAL DE HUÁNUCO

Ruth Montaldo Yerena
ABOG CERTIFICADOR



ZONA REGISTRAL N° VIII - SEDE HUANCAYO
Oficina Registral de Huanuco

Publicidad N° 2018-08918091
26/12/2018 09:50:44

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIBRO DE EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El funcionario que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 11059960 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Huanuco, consta registrado y vigente el **NOMBRAMIENTO** a favor de ALVARADO LOARTE JUAN ROMEL, identificado con D.N.I N° 22502288, cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES CHINCHAYSUYO E.I.R.L.

LIBRO: EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ASIENTO: A00001 Y D00001

GO: TITULAR-GERENTE

FACULTADES:

CONSTAN EN EL ASIENTO A00001, D00001, PAGINAS 02, 03, 06, 07, 08, 09.-

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:

ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 17.08.2007, OTORGADA POR EL NOTARIO PUBLICO DE HUANCAYO JOHN ARENAS ACOSTA.-

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:

NINGUNO.-

III. TITULOS PENDIENTES:

NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : Artículo 81 - Delimitación de la responsabilidad.-

El servidor responsable que expide la publicidad formal no asume responsabilidad por los defectos o las inexactitudes de los asientos registrales, índices automatizados, y títulos pendientes que no consten en el sistema informático.

PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:


06 PÁGINAS.-

N° de Fojas del Certificado: 1

Derechos Pagados SI. 25.00 Recibo: 2018-397-00030713

Total de Derechos: SI. 25.00

Verificado y expedido por RUTH MONTALDO YERENA, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina Registral de HUANCAYO, a las 13:22:21 horas del 26 de Diciembre del 2018.





ZONA REGISTRAL N° VIII
OFICINA REGISTRAL DE HUANCAYO

Ruth M. Montaldo Yerena
ABOGADO CERTIFICADOR


"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA".

**05.05 COPIA DE DNI
FEDEATEADO DEL
REPRESENTANTE LEGAL**




ING. GUILLERMO SUI TRUJILLO
ING. CIVIL
CIP N° 87322



Guillermo Sui Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRAS



Ing. Alejandro Sui Trujillo
CIP/192956



*NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA*.

**05.06 COPIA DE
CUADERNO DE OBRA**

CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:

Contratista:

FECHA

ASIENTO N° 19 DEL RESIDENTE DE OBRA 16/02/2019

- SE REALIZA EL ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO, SE PROCEDE A LA COLOCACION DE CONCRETO $f_c = 175 \text{ kg/cm}^2$ EN ZAPATAS, SE REALIZA LA HABILITACION DE ACERO $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60 EN VIGAS DE AMARRE.



ING. GUILLERMO SIU TRUJILLO
ING. CIVIL
CIP N° 87322

ASIENTO N° 20 DEL SUPERVISOR DE OBRA 16/02/2019

- LUEGO DE LAS VERIFICACIONES DEL CASO SE AUTORIZO EL VACIADO EN ZAPATAS DE COLUMNAS EN DENTRADO DE PUNTO PARTIDA DE INGRESO.
- LUEGO DE REVISAR EL COFRADO EN SOBRECIMIENTOS EN MURO ESTE, SE AUTORIZO EL VACIADO COMO PUNTO PARTIDA.
- SOLICITAMOS MANTENER LOS HORARIOS DE LOS TRABAJOS DE CONCRETADO EN HORAS DE LA MAÑANA Y P.M. (REGULAMENTOS)

[Handwritten signature]
SUPERVISOR DE OBRA

ASIENTO N° 21 DEL RESIDENTE DE OBRA 18/02/2019

- EN HORAS DE LA MAÑANA SE TUVO LA PRESENCIA DE PERSONAS AJENAS A LA LOCALIDAD LOS CUALES MANIFESTARON EL INTERES DE TRABAJAR EN LA OBRA A LO QUE SE LES INDICA QUE YA CONTABAMOS CON PERSONAL SUFICIENTE Y NO PUDIENDO DARLES TRABAJO, MOLESTANDOSE E INTIMIDANDO AL PERSONAL QUE TRABAJA, TRAS EL IMPASE Y DEMORAS DEL CASO SE PROCEDE A CONTINUAR CON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS A PARTIR DE LAS 11:00 DE LA MAÑANA.

- SE REALIZA EL ALQUILER DE BAÑO QUIMICO, SE PROCEDE AL TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR, TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL, SE PROCEDE A LA COLOCACION DE CONCRETO SOBRECIMIENTO MEZCLA 1:8, CEMENTO - HOLMIGON + 25% P.M., ENCOFRADO DE COLUMNAS DE CERCO



ING. GUILLERMO SIU TRUJILLO
ING. CIVIL
CIP N° 87322

[Handwritten signature]
RESIDENTE DE OBRA





CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:

Contratista:

FECHA

	ASIENTO N° 022 DEL SUPERVISOR DE OBRAS		18/02/2019
-	LUGO DE VERIFICAR OTRO TRAMO DE FUGA RESERVA DEL	EN ZONA OESTE DEL CERCO, SE APROBÓ Y AUTORIZÓ SU	VÁLIDO.
-	SE RECOMIENDA EXTREMA VIGILANCIA EN OBRAS PARA SOLUCIONAR	CANTIDAD MATERIALES, EQUIPOS Y PERSONAL, ASÍ COMO ASISTENCIA	DE PERSONAL DE MAL VIVIR QUE TRABAJAN EN ZONA DE OBRAS.
			
	ASIENTO N° 23 DEL RESIDENTE DE OBRAS		19/02/2019
-	SE REALIZA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS, SE PROCEDE A LA	COLACIÓN DE CONCRETO EN COLUMNAS DEL CERCO $f_c = 175 \text{ kg/cm}^2$, SE	REALIZA LA HABILITACION DE ACERO $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 30 EN UICAS DE ANCHURA.
			ING. GUILLERMO SIU TRUJILLO ING. CIVIL CIP N° 87322
-	ASIENTO N° 024 DEL SUPERVISOR		
-	LUGO DE REALIZAR LAS CONSTRUCCIONES DEL CERCO, SE AUTORIZÓ EL	VÁLIDO DE CONCRETO EN COLUMNAS DEL NUEVO MURO (LINEA OESTE).	
-	SE CONSTRUYA LA HABILITACION DEL ACERO EN UICAS DE ANCHURA	SPECIAL	
			




CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:

Contratista:

FECHA

ASIENTO N° 25 DEL RESIDENTE DE OBRA	20/02/2019
<p>- SE REALIZA LA COLOCACION DE CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO MEZCLA 1:8 CEMENTO - HORMIGON + 25% P.M., ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE CERCO.</p>	
 <p>ING. GUILLERMO SIU TRUJILLO ING. CIVIL CIP N° 87322</p>	
ASIENTO N° 26 DEL SUPERVISOR DE OBRA	20/02/2019
<p>- SE APRUEBAN ENCOFRADOS DE SOBRECIMIENTO (OTRO TIPO) EN HURTO DOSTE, PARA PROCEDER AL VUERTO DE CONCRETO (OTRO TIPO) DE HURTO DOSTE.</p> <p>- SE APRUEBA PROVISIONALMENTE DISEÑO PARA DE COLUMNA (02) EN HURTO DOSTE.</p>	
 <p>GUILLERMO SIU TRUJILLO HABITACIONAL</p>	
ASIENTO N° 27 DEL RESIDENTE DE OBRA	21/02/2019
<p>- A INICIOS DE LA MAÑANA SE APERSONA UNA TORBA DE PERSONAS QUE NO PERMITEN REALIZAR LOS TRABAJOS CON NORMALIDAD, CAUSANDO MALESTAR E INTIMIDANDO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA. PASADO EL MEDIODIA SE PROCEDA A CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.</p> <p>- SE PROCEDA AL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO, CONCRETO EN COLUMNAS DE CERCO $f_c = 175 \text{ kg/cm}^2$, HABILITACION DE ACERO $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60 EN VIGAS DE AMARRA.</p>	
 <p>GUILLERMO SIU TRUJILLO HABITACIONAL</p>	





CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:

Contratista:

FECHA

ASIENTO N° 028 DEL SUPERVISOR DE OBRA	21/02/2019
<ul style="list-style-type: none"> - SE PROSIGUE CON EL COFRADO Y VALADO DE OTRO TRAMO DE SOBRECIMIENTO (ZONA OESTE) PARA APROBACION DE LA SUPERVISOR. - SE AUTORIZA DESMOLDO DE OZ COLUMNAS EN MURO TRAMO ESTE 	
 INSPECTOR DE LA OBRA	
ASIENTO N° 29 DEL RESIDENTE DE OBRA	22/02/2019
<ul style="list-style-type: none"> - SE PROCEDE A LA COLOCACION DE CONCRETO EN SOBRECIMIENTO MEZCLA 1'8 CEMENTO - HORMIGON + 25% P.M. SE REALIZA ENCOFRADO Y DES ENCOFRADO EN COLUMNAS DE ACCESO, SE PROCEDE A LA HABILITACION DE ACCESO $F_y = 4200 \text{ KG/CM}^2$ GRADO 60 EN VIGAS DE AMARRA. 	
 ING. GUILLERMO SIU TRUJILLO ING. CIVIL CIP N° 87322	
ASIENTO N° 030 DEL SUPERVISOR DE OBRA	22/02/2019
<ul style="list-style-type: none"> - SE AUTORIZA EL VALADO DE SOBRECIMIENTO (TRAMO ESTE), PARA VERIFICACION CORRESPONDIENTE. - SE AUTORIZA DESMOLDO DE OZ COLUMNAS TRAMO ESTE. 	
 INSPECTOR DE LA OBRA	
 INSPECTOR DE LA OBRA	



CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:

Contratista:

FECHA

ASIENTO N° 31 DEL RESIDENTE DE OBRA	23/02/2019
<p>- SE PROCEDE AL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO, SE REALIZA LA COLOCACION DE CONCRETOS EN COLUMNAS DE ACERCO $f_c = 175 \text{ Kg/cm}^2$, SE REALIZA LOS TRABAJOS DE MURO DE LADRILLO DE ARCILLA KING KONG TIPO CARAVISTA.</p>	
<p style="text-align: right;">  ING. GUILLERMO SIU TRUJILLO ING. CIVIL CIP N° 87322 </p>	
ASIENTO N° 032 DEL SUPERVISOR DE OBRA	23/02/2019
<p>- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA O SOLERA DISEÑAR LA DIRECCION DEL TALLER DONDE SE CONFECIONA EL BASTON DE INGRESO PARA SU VERIFICACION.</p> <p>- SE CONSTA CON EL USO DE CANTONAS (DE) PARA APROBACION DE LA SUPERVISION</p>	
<p style="text-align: right;">  </p>	
ASIENTO N° 33 DEL RESIDENTE DE OBRA	25/02/2019
<p>- SE REALIZA EL TRANSPORTE DE MATERIAL HORIZONTAL, SE PROCEDE A LA COLOCACION DE CONCRETOS EN SOBRECIMIENTO MEZCLA 1:2, CEMENTO-HORMIGON + 25% F.M. SE REALIZA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS DE ACERCO, SE REALIZA LOS TRABAJOS DE MURO DE LADRILLO DE ARCILLA KING KONG - TIPO CARAVISTA</p>	

CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:


Dirección:

Contratista:

FECHA

ASIENTO N° 034 DEL SUPERVISOR DE OBRAS 25/02/2019


- SE RECONSIDERA AL CONTRATISTA EN ADQUISICIÓN LA CONSTANTE PREVIAMENTE DE LA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
- SE AUTORIZA VACIADO DE SOBRECIMIENTO EN TRAMO ESTE ASI COMO COLUMNAS DEL MISMO FRONTE.



ING. GUILLERMO SU TRUJILLO
ING. CIVIL
CIP N° 87322

ASIENTO N° 35 DEL RESIDENTE DE OBRA 26/02/2019


- EL DIA DE HOY, HUBO CONFRONTACIÓN DE DOS GRUPOS DE PERSONAS QUE SE DISPUTAN EL INGRESO DE PERSONAL A LA OBRA, SE REINICIA LOS TRABAJOS A LAS 11:30 A.M. NO PUDIENDO TRABAJAR EN NORMALIDAD
- SE PROCEDE AL RELLENO COMPACTANDO CON MATERIAL PROPIO, SE REALIZA LA NIVELACION INTERIOR Y APISNAMIENTOS MANUAL, SE PROCEDE AL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO, SE REALIZA LOS TRABAJOS DE MORDO DE LA DRILLO DE ARCILLA HING.KONG - TIPO CARAVILLA.



ING. GUILLERMO SU TRUJILLO
ING. CIVIL
CIP N° 87322

ASIENTO N° 036 DEL SUPERVISOR DE OBRAS 26/02/2019

- SE DETECTA ~~UNA~~ PERSONAS SIN CASCO, POR LO QUE SE SOLICITA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MAS ESPERO EN SU OBRA, NO ACEPTANDO EL INGRESO A LA ZONA DE OBRA A PERSONAL SIN SUS EPPs.



ING. GUILLERMO SU TRUJILLO
ING. CIVIL
CIP N° 87322







CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:

Contratista:

FECHA

ASIENTO N° 37 DEL RESIDENTE DE OBRA	27/02/2019
- SE PROCEDE A LA ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL CON EQUIPO, SE REALIZA LA COLACION CONCRETO SOBRECIMIENTO MELCLA 1:1.8, CEMENTO - HORMIGON + 25% P.M., SE REALIZA LOS TRABAJOS DE MURO DE LADRILLO DE ARCILLA KANG KONG - TIPO CARALISTA.	
 ING. GUILLERMO SIL TRUJILLO ING. CIVIL CIP. N° 87322	
ASIENTO N° 038 DEL SUPERVISOR DE OBRA	27/02/2019
- PARA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION SE PROCEDE A UNIR OTRO TRAMO DE SOBRECIMIENTO TRAMO OESTE.	
- SE AUTORIZA UNIRLO DE CONCRETO EN OZ COLUMNAS EN TRAMO OESTE.	
	
ASIENTO N° 39 DEL RESIDENTE DE OBRA	28/02/2019
ASIENTO N° 040 DEL SUPERVISOR DE OBRA 28/02/2019	
- SOLICITAMOS MONITOREAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO PARA SU VERIFICACION Y/O APROBACION (DEL 16 AL 28 DE FEBRERO).	
 ING. HAROLD JIMENEZ	
	



*NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA*.

**05.07 COPIA DE PAGO
SENCICO**



*NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO
DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIAD E PUCUSANA,
PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA*.

NO CORRESPONDE
(2DA VALORIZACION)

 Guillermo Stu Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE ...

Domicilio Legal del Consorcio, JIRON MANUEL DE LARA 152 – URB. VILLA SOL-LOS OLIVOS - LIMA

"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA".

**05.08 COPIA DE VOUCHER
DE PAGO (CONAFOVICER)**



*NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO
DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE PUCUSANA,
PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA*.

NO CORRESPONDE

(2DA VALORIZACION)

 **Guillermo Siu Trujillo**
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRAS

Domicilio Legal del Consorcio, JIRON MANUEL DE LARA 152 – URB. VILLA SOL-LOS OLIVOS – LIMA

*NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA*.

05.09 COPIA DE PDT



"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO
DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE PUCUSANA,
PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA".

NO CORRESPONDE

(2DA VALORIZACION)




Guillermo Siu Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE

05.10 CONTROL DE CALIDAD

CONSORCIO MAYES

PETICIONARIO		FONDEPES	
ATENCIÓN		consorcio mayes	
OBRA			
"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"			
UBICACIÓN			
PUCUSANA			
DISEÑO DE MEZCLA (F' C = 175 HG/CM2) SLUM 4 pulg			
CEMENTO			
PACASMAYO TIPO V			
PESO ESPECIFICO			
3.11			
AGREGADO FINO		AGREGADO GRUESO	
CANTERA:	VASQUES	cantera:	COISHCO
ARENA GRUESA		piedra chancada	
PESO ESPECIFICO DE MASA	2.63 g/cm3	PESO ESPECIFICO DE MASA	2.7
PESO ESPECIFICO DE MASA S.S.S.	2.63 g/cm4	PESO ESPECIFICO DE MASA S.S.S.	2.72
PESO ESPECIFICO APARENTE	2.68 g/cm5	PESO ESPECIFICO APARENTE	2.75
PESO UNITARIO SUELTO	1580 g/cm6	PESO UNITARIO SUELTO	1506
PESO UNITARIO COMPACTADO	1720 g/cm7	PESO UNITARIO COMPACTADO	1610
GRANULOMETRIA			
	% RETENIDO	MALLA	% RETENIDO
3/8"	0.00	1"	0.00
No. 4	0.36	3/4"	6.64
No. 8	13.42	1/2"	39.86
No. 16	27.23	3/8"	26.47
No. 30	24.52	No. 4	25.31
No. 50	16.77	No. 8	1.05
No. 100	13.77	fondo	0.67
fondo	4.00		
		TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL	3/4 pulg
MÓDULO DE FINEZA	2.99	ABSORCIÓN	0.06%
absorción	0.80%	humedad	0.60%
humedad	1.30%	forma de agregado	angular
			van///..


 GUICHINO Siva Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87322
 RESIDENTE DE...

INFORME

Del : Laboratorio N°1 Ensayo de Materiales
A : CERAMICOS SAN JUAN SAC
Obra : "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"
Ubicación : PUCUSANA
Asunto : Ensayo de Resistencia a la Comprensión en Unidades de Albañilería

1.0. DE LA MUESTRA : Ladrillo KING KONG DE 18 HUECOS, de arcilla cocida con alveolos perpendiculares a la cara de asiento.

2.0. DEL EQUIPO : Máquina de ensayo uniaxial, TINIUS OLSEN
Certificado de calibración SNM: CMC-101-2016

3.0. MÉTODO DE ENSAYO : Norma de referencia NTP 399.613:2005
Procedimiento interno AT-PR-09

4.0. RESULTADOS : Fecha de ensayo, P04 de FEBRERO del 2019

MUESTRAS	DIMENSIONES (cm)			AREA BRUTA (cm ²)	CARGA DE ROTURA (kg)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN* (Kg/cm ²)
	LARGO	ANCHO	ALTURA			
L - 1	23.0	12.9	9.1	296.7	54400	199.3
L - 2	22.9	12.8	8.9	293.1	50800	188.4
L - 3	23.0	12.8	9.0	294.4	52600	194.2
L - 4	22.5	13.0	9.1	292.5	51400	191.0
L - 5	23.0	12.9	9.0	296.7	54800	200.8

*Resistencia a la compresión corregida por el coeficiente de relación entre la resistencia a la compresión de unidades de albañilería enteras y medias unidades, indicado en el Anexo de la NTP 339.613

5.0. OBSERVACIONES : 1) La información referente al muestreo, procedencia, cantidad, fecha de obtención e identificación han sido proporcionadas por el solicitante.


Hecho por : Mag. Inc. C. Villegas M.

Técnico : Sr. D. A. Z.

NOTAS:

- 1) Está prohibido reproducir o modificar el informe de ensayo, total o parcialmente, sin la autorización del laboratorio.
- 2) Los resultados de los ensayos solo corresponden a las muestras proporcionadas por el solicitante.


Guillermo S. Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBR.




Ms. Ing. Ana Torre Carrillo
Jefe (e) del laboratorio

CONSORCIO MAYES	
PETICIONARIO	FONDEPES
ATENCIÓN	consorcio mayes
OBRA	"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"
UBICACIÓN	PUCUSANA

PESO ESPECIFICO DEL AGREGADO FINO

Código: NTP 400.022:2002
Título: AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para peso específico y absorción del agregado fino
Código: ATSM CT128:2004
Título: Standard Test Method For Unit Weight and Voids In Aggregate

DATOS : ARENA GRUESA

1	Peso de la arena s.s.s. + peso balón + peso agua	974.1	974.2
2	Peso de la arena s.s.s. + peso balón	663.2	662.8
3	Peso del agua (W = 1-2)	310.9	311.8
4	Peso de la arena secada al horno + peso balón	658.0	656.9
5	Peso de balón	163.2	162.8
6	Peso de la arena secada al horno (A = 4-5)	496.1	496.2
7	Volumen del balón (V = 500)	500.0	500.0

RESULTADOS

DETALLE	RESULTADOS		PROMEDIO
PESO ESPECIFICO DE MASA (P.E.M. = $A/(V-M)$)	2.62	2.63	2.63
PESO ESPECIFICO DE MASA S.S.S(P.E.M. S.S.S= $500/(V-M)$)	2.64	2.65	2.65
PESO ESPECIFICO APARENTE (P.E.A. = $A/(V-W)-(500-A)$)	2.69	2.69	2.68
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN (%) ($(500-A)/A*100$)	0.8	0.8	0.8

RESULTADOS PRESENTAR: PESO ESPECIFICO 0.01% Y ABSORCIÓN A 0.1 %



Stu Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRAS

		CONSORCIO MAYES
PETICIONARIO		FONDEPES
ATENCIÓN		consorcio mayes
OBRA	"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"	
UBICACIÓN	PUCUSANA	

PESO ESPECIFICO DEL AGREGADO GRUESO

Código: NTP 400.021:2002
Título: AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para peso específico y absorción del agregado fino
Código: ATSM CT127:2004
Título: Standard Test Method For Unit Weight and Voids in Aggregate



DATOS : PIEDRA CHANCADA

1	Peso de la muestra secada al horno (A)	4544.2	4543.2
2	Peso de la muestra s.s.s. (B)	4570.2	4571.5
3	Peso de la muestra saturada dentro del agua + peso de la canastilla	4423.2	4412.6
5	Peso de la canastilla	1565.0	1565.0
6	Peso de la muestra saturada dentro del agua (C)	2898.6	2881.2

RESULTADOS

DETALLE	RESULTADOS		PROMEDIO
PESO ESPECIFICO DE MASA (P.E.M. = $A/(B-C)$)	2.72	2.69	2.70
PESO ESPECIFICO DE MASA S.S.S(P.E.M. S.S.S= $B/(B-C)$)	2.73	2.70	2.72
PESO ESPECIFICO APARENTE (P.E.A. = $A/(A-C)$)	2.76	2.73	2.75
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN (%) $((B-A)/A*100)$	0.6	0.6	0.6

RESULTADOS PRESENTAR: PESO ESPECIFICO 0.01% Y ABSORCIÓN A 0.1 %



Guillermo Guzmán Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE ORR.

		CONSORCIO MAYES
PETICIONARIO		FONDEPES
ATENCIÓN		consorcio mayes
OBRA	"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"	
UBICACIÓN	PUCUSANA	

ENSAYOS:

PESO UNITARIO DEL AGREGADO FINO



Código: NTP 400.017:1999
 Título: AGREGADOS. Método de ensayo para determinar el peso unitario del agregado
 Código: ATSM C29/C29M:2003
 Título: Standard Test Method For Unit Weight and Voids in Aggregate

DATOS : ARENA GRUESA

I. PESO UNITARIO SUELTO (datos)	RESULTADOS		
Peso de la muestra suelta + envase (Kg)	6.370	6.380	
Peso del envase (Kg)	1.900	1.900	
Peso de la muestra en suelta (Kg)	4.47	4.480	
Constante	353	353	PROMEDIO
Peso unitario suelto (Kg/m3)	1578	1581	1580

I. PESO UNITARIO COMPACTADO (datos)	RESULTADOS		
Peso de la muestra compactada + envase (Kg)	6.785	6.760	
Peso del envase (Kg)	1.900	1.900	
Peso de la muestra en compactada (Kg)	4.885	4.860	
Constante	353	353	PROMEDIO
Peso unitario compactado (Kg/m3)	1724	1716	1720

PRESENTAR LOS RESULTADOS CON APROXIMACIÓN DE 0.05 Kg



 Guillermo Siu Yujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87322
 RESIDENTE DE OBRAS

		CONSORCIO MAYES
PETICIONARIO		FONDEPES
ATENCIÓN		consorcio mayes
OBRA	"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"	
UBICACIÓN	PUCUSANA	

ENSAYOS:

PESO UNITARIO DEL AGREGADO GRUESO

Código: NTP 400.017:1999
 Título: AGREGADOS. Método de ensayo para determinar el peso unitario del agregado
 Código: ATSM C29/C29M:2003
 Título: Standard Test Method For Unit Weight and Voids in Aggregate

PIEDRA CHANCADO

I. PESO UNITARIO SUELTO (datos)	RESULTADOS		
Peso de la muestra suelta + envase (Kg)	18.866	18.801	
Peso del envase (Kg)	4.626	4.626	
Peso de la muestra en suelta (Kg)	14.24	14.175	
Constante	106	106	PROMEDIO
Peso unitario suelto (Kg/m3)	1509	1503	1506

I. PESO UNITARIO COMPACTADO (datos)	RESULTADOS		
Peso de la muestra compactada + envase (Kg)	19.857	19.780	
Peso del envase (Kg)	4.626	4.626	
Peso de la muestra en compactada (Kg)	15.231	15.154	
Constante	106	106	PROMEDIO
Peso unitario compactado (Kg/m3)	1614	1606	1610

PRESENTAR LOS RESULTADOS CON APROXIMACIÓN DE 0.05 Kg



 Guillermo Zú Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87322
 RESIDENTE DE OBRAS

*NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA*.

6. ANEXOS.

"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA".

**06.01 COPIA DE
CERTIFICADO DE HABILIDAD**



LEY N° 24848

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



N° - A - 0513196

Certificado de Habilidad

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): SIU TRUJILLO GUILLERMO

Adscrito al Consejo Departamental de: HUANUCO

Con Registro de Matrícula del CIP N°: 87322 Fecha de Incorporación: 16/08/2013
CIVIL

Especialidad: _____

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).


ASUNTO	TRABAJO
ENTIDAD O PROPIETARIO	PUBLICO Y/O PRIVADO
LUGAR	NACIONAL


EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA		
DÍA	MES	AÑO
31	03	2019

HUANUCO, 10 de DICIEMBRE del 20 18


VÁLIDO SOLO ORIGINAL




 Ing. Jorge Elias Domingo Alva Hurtado
 Decano Nacional
 del Colegio de Ingenieros del Perú

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
 Consejo Departamental Huánuco

 Ing. Hamilton Mens Chávez
 DECANO
 Consejo Departamental
 del Colegio de Ingenieros del Perú


 Guillermo Siu Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87322
 RESIDENTE DE OBRAS


 ING. GUILLERMO SIU TRUJILLO
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 87322

*NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA*.

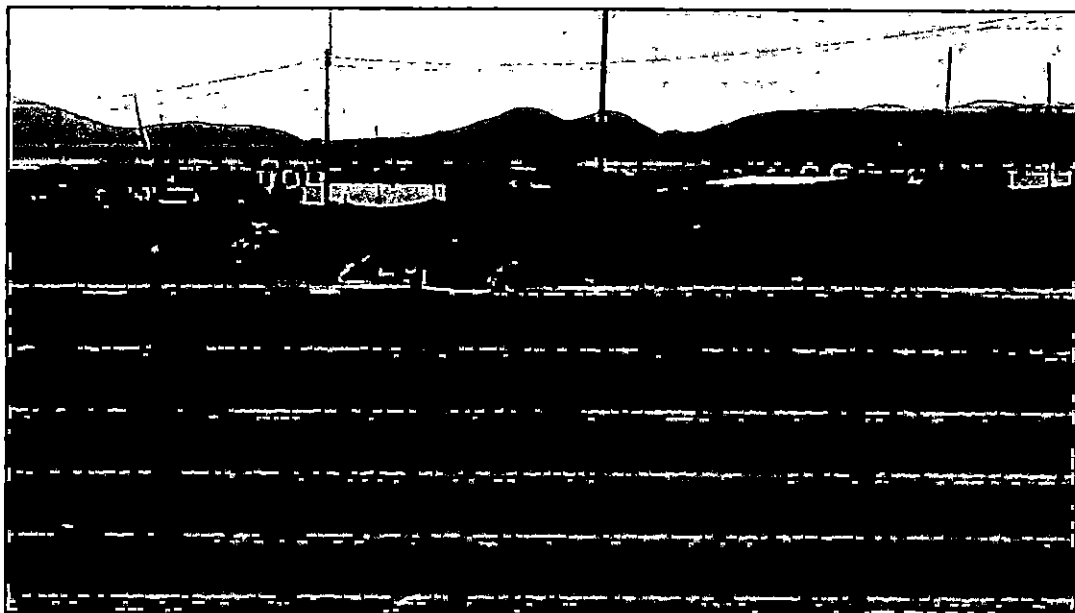
06.02 PANEL FOTOGRÁFICO DE LA OBRA

***NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO
DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE PUCUSANA,
PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA*.**

PANEL FOTOGRAFICO



VISTA 01. HABILITACION DE ACERO PARA LAS COLUMNAS

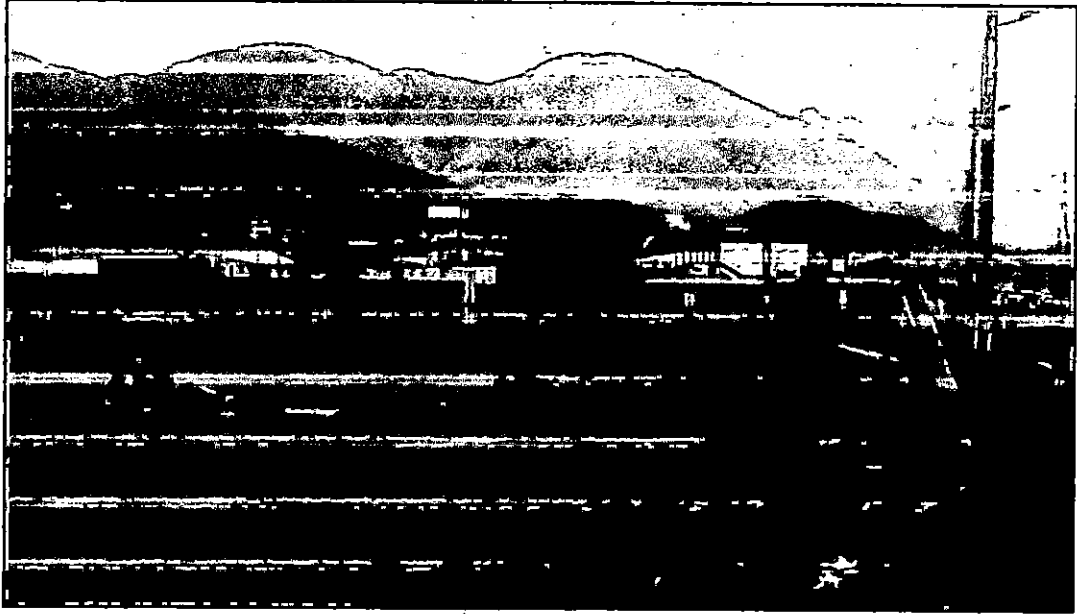


VISTA 02. RECEPCIÓN DE LADRILLOS EN OBRA

Domicilio Legal del Consorcio, JIRON MANUEL DE LARA 152 – URB. VILLA SOL-LOS OLIVOS - LIMA


Guillermo Stu Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBR.

***NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO
DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE PUCUSANA,
PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA*.**




VISTA 03. EXCAVACIÓN Y ASENTADO DE LOS LADRILLOS.

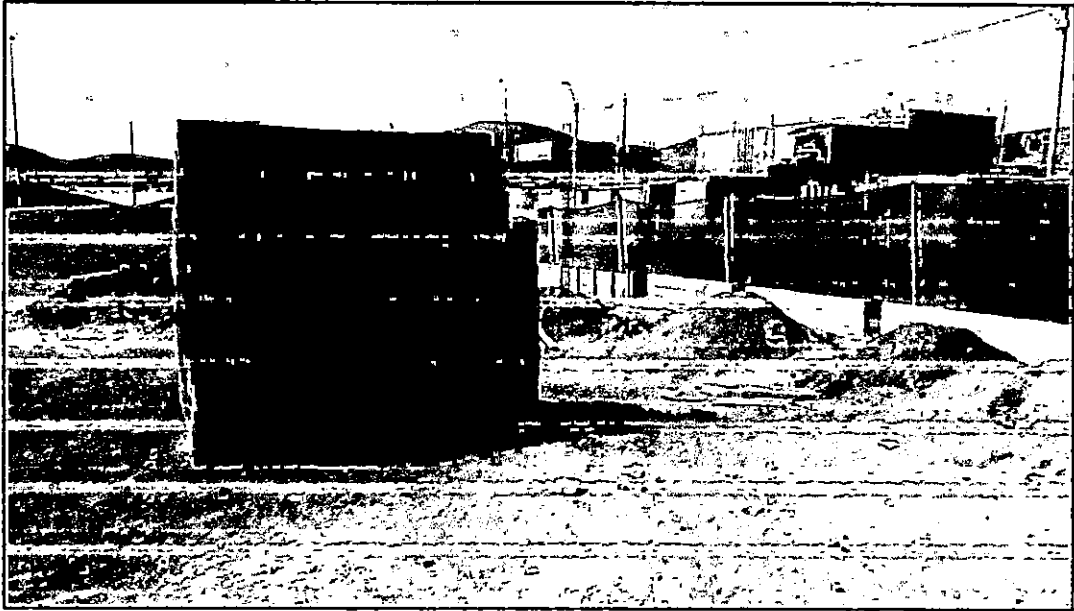


VISTA 04.: IZADO DE LOS CASTILLOS PARA LAS COLUMNAS.

Domicilio Legal del Consorcio, JIRON MANUEL DE LARA 152 – URB. VILLA SOL-LOS OLIVOS - LIMA


Guillermo Sui Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRAS

**"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO
DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE PUCUSANA,
PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA".**




VISTA 05. VISTA DE GUARDADO DE LOS LADRILLOS.



VISTA 06. VISITA DEL SUPERVISOR A OBRA.

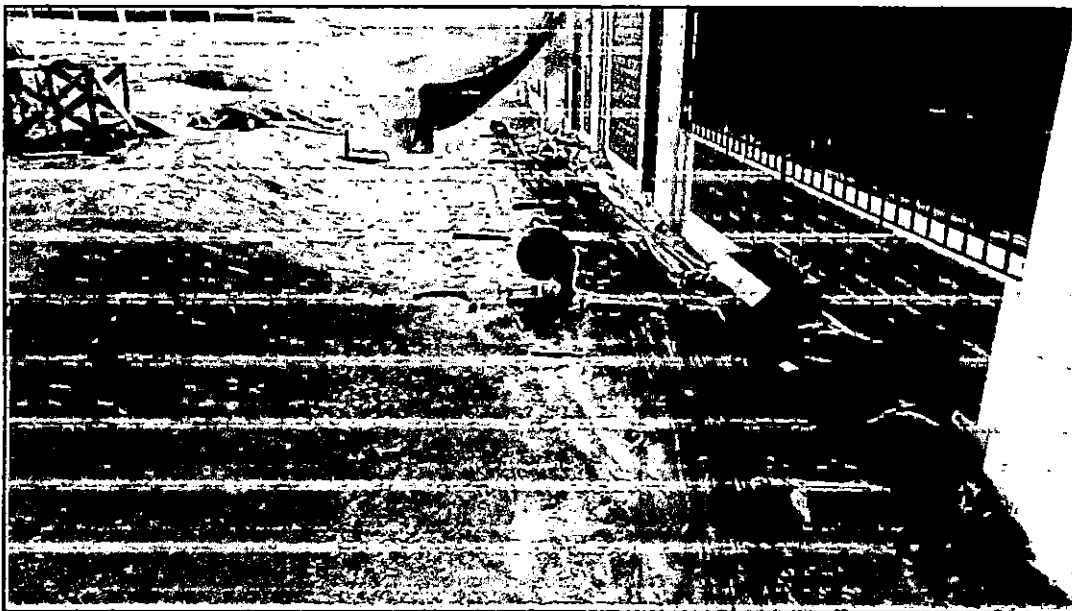
Domicilio Legal del Consorcio, JIRON MANUEL DE LARA 152 – URB. VILLA SOL-LOS OLIVOS / LIMA


Guillermo Yujillo
INGENIERO CIVIL
CIP 87322
RESIDENTE EN LIMA

**"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO
DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE PUCUSANA,
PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA".**




VISTA 07. HABILITACION DE ACERO.

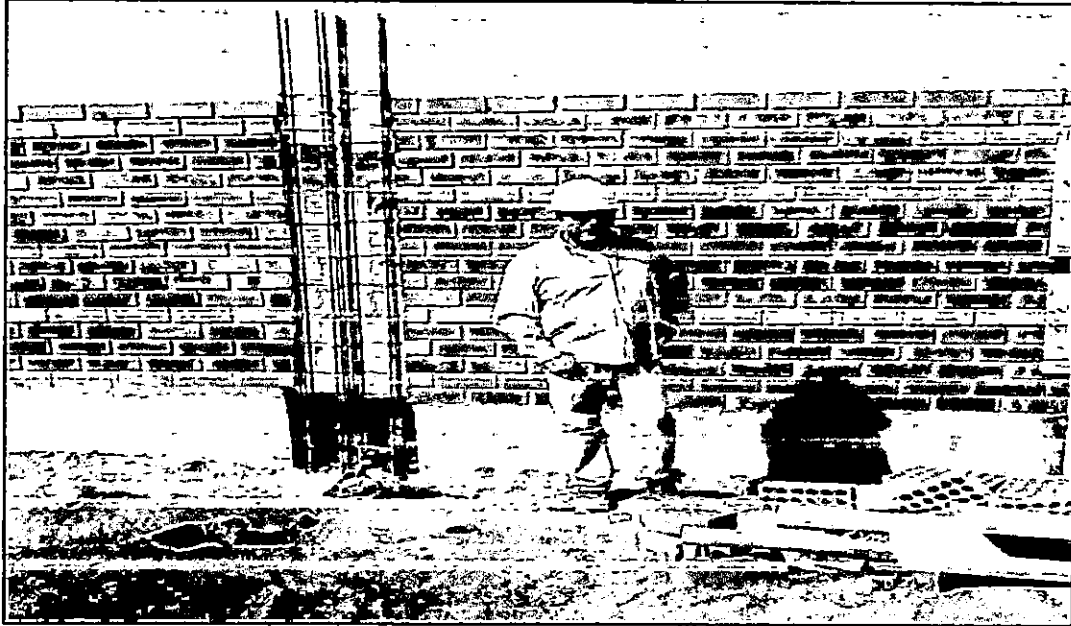


VISTA 08. HABILITACIÓN DE ACERO


Domicilio Legal del Consorcio, JIRON MANUEL DE LARA 152 – URB. VILLA SOL-LOS OLIVOS - LIMA


Guillermo Sui Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRA

"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO
DE FUCUSANA, DISTRITO DE FUCUSANA, PROVINCIA DE FUCUSANA,
PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA".




VISTA 09. VISTA DEL SUPERVISOR Y EL COLOCADO DE LADRILLOS Y COLUMNA.


INGENIERO
REGISTRADO


**06.03 INFORME DE
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA**

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

FEBRERO -2019


JOELA BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846


Guillermo Soto
INGENIERO CIVIL
CIP N° 10000
RES

CONTENIDO


1. OBJETIVO	3
2. CAMPO DE APLICACIÓN	3
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA (MUNICIPALIDAD DE HUANUCO)	3
4. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4
5. RESPONSABILIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN	6
6. ELEMENTOS DEL PLAN:	9
6.1 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	9
6.2 ANÁLISIS DE RIESGOS: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES PREVENTIVAS.	11
6.3 PLANOS PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES COLECTIVAS PARA TODO EL PROYECTO.	
6.4 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO (IDENTIFICADOS EN EL ANÁLISIS DE RIESGO).	18
6.5 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA – PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.	22
6.6 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES – PROGRAMA DE INSPECCIONES Y AUDITORIAS.	25
6.7 OBJETIVOS Y METAS DE MEJORA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.	26
6.8 PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.	26
7. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.	32
8. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PRESUPUESTO.	34
9. ANEXO 1	40
10. ANEXO 2	41
11. ANEXO 3	43
12. ANEXO 4	44
13. ANEXO 5	45
14. ANEXO 6	46
15. ANEXO 7	47
16. ANEXO 8	48
17. ANEXO 9	49
18. ANEXO 10	50
19. ANEXO 11	51

[Firma]
JOEL A. REDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846


"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA".

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

[Firma]
Guillermo Sly Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRA



JOELA REDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846



GUILLERMO SILES
INGENIERO CIVIL
RESID.

1. OBJETIVO

Establecer un Estudio de Seguridad Laboral y Salud para el PROYECTO: "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA", así como las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes, y posibles enfermedades profesionales y riesgos derivados de los trabajos de movilización de equipos, demoliciones y movimiento de tierras. También se establecen las bases preventivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

El presente Estudio de Seguridad y Salud Ocupacional en la Obra tiene como objeto establecer las directrices de ejecución y comportamiento frente a los diferentes trabajos a realizar durante el período de duración de la Obra, a fin de identificar los peligros y riesgos que se puedan presentar con el fin de evitar posibles accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros, analizando las distintas unidades que componen el proyecto. Así mismo, se contemplan en este estudio las instalaciones de sanidad e higiene de los trabajadores, durante la realización de la obra.

El presente estudio proporcionará las directrices básicas al Contratista para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos en la seguridad y salud de los profesionales, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo de la norma G.050 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por D.S N° 001-2006-VIVIENDA del 08 de Mayo del 2006, cuyo ámbito de aplicación es la prevención de riesgos ocupacionales de los trabajadores que laboran en obras de construcción civil.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

Este Estudio de Seguridad y Salud Ocupacional en la Obra, se aplicará durante la construcción de las actividades del PROYECTO: "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA" ..

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA (MUNICIPALIDAD DE DISTRITAL DE PUCUSANA)

Somos una institución dedicada a la elaboración de proyectos para el sector público, conscientes de nuestra responsabilidad, consideramos que la Seguridad y Salud en el Trabajo es parte significativa en una obra pública, por ello nuestro compromiso a un proceso de mejora continua y promoción de adecuadas condiciones de Seguridad en el trabajo.


JOBEL ALBEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9346

Nos comprometemos:

- ✓ Identificar y evaluar permanentemente los puestos de trabajo, las condiciones en las que se desarrollan y los riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que la desempeñan.
- ✓ Garantizar la participación y consulta de los trabajadores y sus representantes en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de prácticas de comunicación.
- ✓ Cumplir con la normativa legal pertinente en materia de seguridad y salud en el trabajo y otros requisitos.
- ✓ Velar por la protección de la seguridad y salud de todos nuestros colaboradores, priorizando la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas al trabajo.
- ✓ Capacitar y entrenar apropiadamente a nuestro personal en temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo.

El Sistema de gestión de seguridad y salud Ocupacional se ha diseñado de acuerdo a las especificaciones de la Norma OHSAS 18001 bajo un concepto integrado cumpliendo con la normativa nacional vigente.

4. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El consultor deberá asegurar el funcionamiento efectivo del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la normativa vigente, Art° 38 DS 005 2012 TR, por lo tanto, él se encargará de la Convocatoria.

El número de personas que componen el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es definido por acuerdo de partes no pudiendo ser menor de cuatro (4) ni mayor de doce (12) miembros. Entre otros criterios, se podrá considerar el nivel de riesgo y el número de trabajadores.

Para ser integrante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo se requiere:

- A. Ser trabajador del contratista.
- B. Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo.
- C. De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales.

El Comité está conformado por:

- A. El presidente, que es elegido por el propio Comité, entre los representantes.
- B. El secretario, que es el responsable de los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo o uno de los miembros del Comité elegido por consenso.
- C. Los miembros, quienes son los demás integrantes.

Joela Bedon Vasquez
JOELA BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846


Guillermo Sola Trujillo
GUILLERMO SOLA TRUJILLO
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRAS


Son funciones del Comité de Seguridad:

- a) Aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- b) Participar en la elaboración, aprobación, ejecución, evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la SST.
- c) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- d) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- e) Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo.
- f) Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y materiales escritos o gráficos sobre prevención de los riesgos.
- g) Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre SST.
- h) Promover que los nuevos trabajadores reciban formación, instrucción y orientación sobre prevención de riesgos.
- i) Investigar las causas de todos los incidentes accidentes y de las enfermedades ocupacionales.
- j) Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales.
- k) Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos.
- l) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan.

El Contratista que tiene veinte (20) o más trabajadores deben elaborar su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el que debe contener la siguiente estructura mínima:

- a) Objetivos y alcances.
- b) Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud.
- c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité de seguridad y salud, de los trabajadores y de los empleadores que les brindan servicios si las hubiera.
- d) Estándares de seguridad y salud en las operaciones.
- e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas.
- f) Preparación y respuesta a emergencias.


JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846


Guillermo Ota Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE EN...

5. RESPONSABILIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN

La Gestión de la seguridad y salud en el trabajo será responsabilidad de la constructora, quien asumirá el liderazgo y compromiso de estas actividades en la obra. Por lo que delegará las funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación, control de resultados del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Se definirá los requisitos de competencias necesarios para cada puesto de trabajo y adoptará disposiciones para que todo trabajador de la obra esté capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud, estableciendo programas de capacitación y entrenamiento para que se logre y mantenga las competencias establecidas.

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD (FUNCIONES)

La estructura organizacional está definida en un Organigrama de la empresa. La correcta implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo descansa en la participación activa de todos los integrantes del Proyecto.

INGENIERO DEL PROYECTO (Representante de la empresa contratista)


La seguridad en las obras de construcción requiere que todas las empresas que laboren en una obra estén involucradas activamente en las actividades preventivas, por esta razón, las Compañías Contratistas que prestan servicios en la obra no pueden estar ausentes de las obligaciones, responsabilidades y tareas que impone el Programa de Prevención de Riesgos de la Empresa. Las Empresas Contratistas que presten servicio en la obra deberán cumplir con la legislación vigente y con todos los elementos de este Plan. Las obligaciones que éste señala a las Gerencias, Residencias de Obra, Ing. Ambiental y Trabajadores de nuestra Empresa, deberán ser cumplidas en todo por los Propietarios, Ingenieros, Administradores, Supervisores y Trabajadores de las Compañías Contratistas presentes en la obra.

RESIDENTE DE OBRA

El Residente de Obra es responsable de que se implemente el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo "PSST", antes del inicio de los trabajos contratados, así como de garantizar su cumplimiento en todas las etapas ejecución de la obra.

El Ingeniero Residente de Obra tendrá la responsabilidad principal en la aplicación y cumplimiento de las Normas de Prevención de Riesgos de la Empresa, usando un máximo de iniciativa en comunicar, entrenar, motivar y monitorear a los Supervisores y Trabajadores en general con el fin de asegurarse que se tome el máximo de precauciones para controlar los Riesgos de Trabajo.


JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846


GOBIERNO S.M. Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP 8° 333
RESIDENTE

Esta responsabilidad no podrá ser delegada, debiendo asegurarse que los Supervisores y Trabajadores conozcan y estén conscientes de sus responsabilidades preventivas.

Deberá establecer con la colaboración del Ing. Ambiental, un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional; compuesto por todos los elementos exigidos por Ley y las Normas de Prevención de Riesgos que resulten aplicables a las condiciones especificadas para los Proyectos de Construcción. El Programa definirá las obligaciones y responsabilidades que tendrá cada persona.

El Ingeniero Residente será responsable de informar al ó los sub-contratistas de las políticas y normas de prevención de riesgos en obra de la empresa; así como de controlar el cumplimiento de las mismas.

ING. AMBIENTAL CON ESPECIALIDAD EN SSO

Sus funciones a realizar son:

- ✓ Cumplir y hacer cumplir las actividades del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Capacitación constante al personal en temas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
- ✓ Verificar permanentemente el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en los análisis de riesgos y ATS de cada una de las actividades de la obra.
- ✓ Verificar el uso correcto de los EPPs.
- ✓ Desarrollar y verificar el cumplimiento el plan de Seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente promoviendo la mejora continua.
- ✓ Verificar el cumplimiento y efectividad de cada acción correctivas propuesta.
- ✓ Participar activamente en la Investigación de Incidentes.
- ✓ Asistir a la línea de mando en el cumplimiento de las funciones que les compete en la implementación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Mantener una comunicación constante con la Jefatura del proyecto informando sobre los avances y resultados de la implementación del Plan.
- ✓ Coordinar las reuniones de los comités de seguridad.
- ✓ Elaborar el informe mensual de seguridad.
- ✓ Impartir todos los días y antes del inicio de la jornada, la "capacitación de cinco minutos", a todo su personal. Registrar su cumplimiento en el formato respectivo.

JEFES DE GRUPO

Los jefes de grupo son responsables de las condiciones de Seguridad en su sector de trabajo, así como de las acciones de los trabajadores bajo su supervisión, a continuación, se detallan sus funciones:


JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 9846


Guillermo Soto Yri
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 9846


- ✓ Verificar y firmar las inspecciones diarias de pre-uso de las máquinas y equipos.
- ✓ Desarrollar, verificar y firmar la elaboración del análisis de trabajo seguro - ATS.
- ✓ Capacitar sobre los procedimientos de prevención de riesgos genéricos y específicos según el tipo de labor del personal de obra.
- ✓ Efectuar inspecciones rutinarias para detectar condiciones o actos subestándar, en coordinación con el personal operativo de obra, efectuar las correcciones pertinentes de inmediato.
- ✓ Coordinar las medidas de seguridad a tomar cuando se realicen trabajos de alto riesgo.
- ✓ Contribuir con la investigación de incidente, difundir las Medidas Correctivas a todo el personal.
- ✓ Participación con los trabajadores en la identificación de peligros en su área de trabajo.
- ✓ Orientar a los trabajadores sobre la forma de ejecutar la tarea asignada con el fin de evitar accidentes.
- ✓ Asegurar que los trabajadores cumplan los procedimientos de trabajo, las normas de seguridad, procedimientos escritos y prácticas de trabajo seguro usando su equipo de protección personal.
- ✓ Cumplir el cronograma de inspecciones de seguridad establecido.
- ✓ Participando en reuniones de comités de seguridad.
- ✓ Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del trabajador lesionado o que se encuentre en peligro.
- ✓ Hacer instalar oportunamente y mantener en buen estado los avisos preventivos y señalización de seguridad necesarios en el frente de trabajo de acuerdo con los estándares establecidos.
- ✓ Mantener el orden y limpieza del área de trabajo.
- ✓ Tomar acción inmediata para eliminar todas las situaciones de riesgo que se presenten en su área de trabajo.
- ✓ Si ocurriese algún incidente o accidente en su frente de trabajo deberá reportarlo de inmediato, asimismo brindará información detallada de lo ocurrido durante el proceso de investigación de incidentes/accidentes.

TRABAJADORES

Los trabajadores tendrán las siguientes responsabilidades en el Plan de Prevención:

- ✓ Cumplir los procedimientos y prácticas de trabajo seguro.
- ✓ Participar en la elaboración del análisis de trabajo seguro- ATS
- ✓ Asistir a las charlas de seguridad de cinco y treinta minutos.
- ✓ Asistir a las capacitaciones programadas y extraordinarias.


JOEL W. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846


Guillermo Gu Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBR.

- ✓ Usar los elementos de protección individual y colectiva que le sea asignada.
- ✓ Reportar los actos y condiciones subestándares a su supervisor y al personal de seguridad.
- ✓ Colaborar en la investigación de incidentes si es necesario.
- ✓ Informar de los accidentes e incidentes ocurridos en obra, por menores que éstos sean.
- ✓ Mantener el orden y limpieza en todas las áreas de la obra
- ✓ Asistir a los cursos, charlas y reuniones de seguridad y medio ambiente en forma obligatoria.
- ✓ Velar por la seguridad de sus compañeros de trabajo. Si observa algún peligro comuníquesele inmediatamente.

6. ELEMENTOS DEL PLAN:

6.1 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


Las normas nacionales son de cumplimiento obligatorio, las cuales se tomarán en cuenta para el desarrollo de este plan y durante la ejecución de la obra para ello necesitamos de una metodología de identificación y actualización de la legislación aplicable y otros compromisos adquiridos por la empresa y clientes, en relación a los aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo.



OBJETIVOS

- Identificar los requisitos legales y otros requisitos aplicables donde se realizan y determinan qué requisitos legales son aplicables a la Obra.
- Adoptar matriz de requisitos legales para su aplicación en Seguridad y Salud en Trabajo en la Obra donde el responsable deberá ser el Jefe de Seguridad que los aplique directamente a la Obra.
- Una vez establecidos estos requisitos legales y otros compromisos se procederán a ser publicada y difundida en toda la Obra.

Estos requisitos legales que deberán aplicarse en Obra son las siguientes:

- ❖ Norma Técnica de Edificación G:050 Resolución Ministerial N° 427 - 2001 -MTC / 15.04.


JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846



GOBIERNO REGIONAL
INGENIERO CIVIL


Luego de aprobadas las Normas básicas de higiene y seguridad R.M. 021-83- TR (23 Marzo, 1983) en obras de edificación, aún vigentes, la Dirección General de Vivienda y Construcción del MTC propuso la Norma E-120 "Seguridad durante la Construcción" que fue aprobada mediante R.M. N° 427-2001-MTC/15.04 del 19-09-2001 incluyéndola en el Reglamento Nacional de Edificaciones con la finalidad de ampliar los alcances de la norma vigente. La referida norma se ha actualizado el 9 de mayo del 2007 y fue elaborada por el Comité Técnico Especializado de Seguridad del SENCICO (Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción), conformado por profesionales representantes del Colegio de Ingenieros del Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Municipalidad de Lima Metropolitana, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. La verificación del cumplimiento de la presente Norma, queda sujeta a lo dispuesto en la Ley N° 28806 Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento, así como sus normas modificatorias.

- ❖ Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo.
- ❖ D.S 005-2012-TR, reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo.

Nuestro estado ha establecido un reglamento que impone a las empresas nuevas (es el mercado que estamos analizando en esta tesis), obligaciones para implantar Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basados en el Sistema OHSAS 18001.

Este reglamento es un imperativo legal que obliga a todos los sectores productivos del país, entre ellos el de la construcción, a establecer los principios y exigencias mínimos que todas las instituciones o empresas involucradas deben cumplir para suministrar, mantener y mejorar las condiciones básicas de la protección física y mental que los trabajadores necesitan al exponerse a riesgos en el lugar de trabajo.

- ❖ Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación R.S. N° 021- 83 -TR.


JOELA A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9816


Guillermo Sturujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OPT


El Objetivo y ámbito de aplicación es prevenir los riesgos ocupacionales y proteger la salud e integridad física y mental de los trabajadores que laboran en las obras de construcción civil – Empleadoras y trabajadoras del sector construcción. Se asigna a la Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional, velar por su cumplimiento.

- ❖ Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, D.S. N°003 – 98 – SA.

Las Normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo precisan que las entidades empleadoras que contraten obras, mano de obra proveniente de cooperativas de trabajadores, empresas de servicios especiales temporales o complementarios, contratistas, subcontratistas o de instituciones de intermediación o provisión de mano de obra tendrán la obligación de verificar que todos los trabajadores tengan el seguro complementario de trabajo de riesgo o en todo caso adquirirlo por cuenta propia para garantizar la cobertura de dichos trabajadores en caso suceda algún accidente.

- ❖ D.S 09-2005-TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo, modificatorias D.S 007 - 2007-TR, D.S N° 008-2010-TR y sus guías básicas.
- ❖ Ley N° 28806 Ley general de inspección en el trabajo.
- ❖ Ley 29551-Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia.
- ❖ NTP 399.010 "señales de seguridad, colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad.


Asimismo, para el desarrollo del plan de seguridad, salud y medio ambiente se tomará como referencia los requisitos de la norma internacional OHSAS 18001 "Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral".


JCEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
GIP N° 9846

6.2 ANÁLISIS DE RIESGOS: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES PREVENTIVAS.

DESARROLLO DE PROCESOS, ACTIVIDADES, OPERACIONES QUE SON OBJETO DE CONTRATO/ UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA.

Las unidades constructivas que componen la obra son las siguientes:


INGENIERO CIVIL
GIP 87122
RESIDENTE

UNIDAD DE OBRA	ACTIVIDADES
	PAVIMENTACION
OBRAS PROVISIONALES	- Movilización Y Desmovilización De Maquinaria
OBRAS PRELIMINARES	- Limpieza de terreno - Trazo, nivelación y replanteo
MOVIMIENTO DE TIERRAS	- Excavación manual para zapatas en terreno normal - Excavación para veredas
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	- Encofrado y desencofrado - Baseado de concreto F'c = 175 KG/CM2 - Sellados
OBRAS DE CONCRETO ARMADO	- Conformación de base - Encofrado y desencofrado - Baseado con concreto F'c = 175 KG/CM2
MUROS Y TABIQUERIA-COBERTURA	- MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA - CUBIERTAS - CARPINTERIA METALICA

FUENTE: Expediente Técnico

ELABORACION: Municipalidad Distrital de Pucubana

Antes de dar Inicio a la Obra, se confecciona la Matriz de Identificación de Peligro con el fin de establecer la metodología para la identificación de peligros, evaluación de los riesgos y determinación de las medidas de control para todas las actividades comprendidas en los diferentes procesos de la Obra con la finalidad de reducir los riesgos a niveles que sean tolerables por la organización.

El procedimiento a seguir para la elaboración de una matriz de IPERC (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles) se describe en las siguientes etapas:

Etapas I: Organización y Preparación

[Firma]
JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846

[Firma]
Guillermo Su Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBR.

El responsable del contratista designará al personal para conformar el equipo IPERC con un profesional capacitado en la Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo (personal interno o externo de la Contratista) así como designar a este equipo responsabilidades para la identificación de los peligros, evaluación de los riesgos y proponer controles. Este equipo debe tener las siguientes características:

- ❖ Debe ser multidisciplinario.
- ❖ Deben conocer los procesos a ser evaluados (personal involucrado en las actividades).
- ❖ Debe ser un equipo abierto (puede integrarse más personas según necesidad).

El profesional capacitado en la Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo asimismo debe capacitar al equipo IPERC la metodología de la identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles al

personal en general, como también facilitar la logística necesaria, formatos impresos y digitales para dicha identificación.


ETAPA II: Identificación de Peligros

- 1) Identificar puestos y ambientes de trabajo por cargos y actividades rutinarias y no rutinarias.
- 2) Identificar los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y su posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observación de tareas. Durante esta etapa se tiene en cuenta:

- ✓ El nivel de educación de las personas.
- ✓ Experiencia o antigüedad en el cargo.
- ✓ Espacio de trabajo disponible.
- ✓ Manipulación de herramientas y equipo de trabajo.
- ✓ Interacción con organismos externos u otras partes interesadas.
- ✓ Manipulación de sustancias químicas.
- ✓ Requisitos legales

- 3) Identificar los peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz de afectar adversamente la salud y seguridad de los trabajadores bajo el control del Contratista.
- 4) Registrar en los campos correspondientes en un determinado Formato IPERC


JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846


Guillermo Quiroz
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBR.

ETAPA III: Identificación de Riesgos Asociados y Controles Existentes

1. Identificar los riesgos asociados a los peligros identificados y verificar los controles existentes.
2. Luego de estimar el riesgo, se considera el número de personas

expuestas (cantidad de personas expuestas al peligro, incluyen personas que no realizan la tarea, que transitan, que comparten el ambiente).

3. Se estima el tiempo de exposición al peligro, puede ser:

- Diario (D)
- Semanal (S)
- Quincenal (Q)
- Mensual (M)
- Semestral (Z)
- Anual (A)

4. Identificar los controles existentes, ello consiste en describir los controles existentes en el medio (aislamiento de maquinaria, inspecciones), la fuente (mantenimiento preventivo de maquinaria, equipo, infraestructura) o el individuo (EPP, capacitaciones, exámenes médicos, hidratación, pausas activas).

5. Verificar si los trabajadores cuentan con los controles operacionales necesarios.

6. Registrar la Información recopilada en el formato IPERC

CUADRO N° 01: MATRIS IPERC

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS CONTROL											
Razón Social o Denominación Social:											
Actividad o trabajo:											
TAREA, PELIGRO, RIESGO	REQUISITO LEGAL	PROBABILIDAD					INDICE DE SEVERIDAD	PROBABILIDAD RESULTANTE	NIVEL DE RIESGO	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDAS DE CONTROL
		INDICES DE PERSONAS EXPUESTAS (A)	INDICE DE PROCEDIMIENTOS (B)	INDICE DE CAPACITACION (C)	INDICE EXPOSICION AL RIESGO (D)	INDICE PROBABILIDAD (AxBxCxD)					

FUENTE: RM N° 050-2013-TR – Identificación De Peligros Y Evaluación De Riesgos METODO 2.
ELABORACION: Municipalidad distrital de Pucusana..

ETAPA IV: Evaluación de Riesgos

A. Cálculo de la Probabilidad

1) Para la evaluación de riesgos, se debe considerar La Matriz de criterios que determinan la probabilidad de un incidente o accidente. Ver CUADRO N° 02.

JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322

GOBIERNO DEL TRUJILLO
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRAS

CUADRO N° 02: CALCULO DE PROBABILIDAD

Categoría	PROBABILIDAD			
	Personal expuestas	Condiciones existentes	Capacitación	Exposición al riesgo
1	DE 1 A 3	Existen son satisfactorias y controladas	Personal entrenado, conoce el peligro y lo previene	Al menos una vez al año Esporadicamente
2	DE 4 A 12	Existen parcialmente y no son satisfactorias o controladas	Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control	Al menos una vez al mes Esporadicamente
3	MÁS DE 12	No existe	Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control	Al menos una vez al día Permanente

FUENTE: RM N° 050-2013-TR – Identificación De Peligros Y Evaluación De Riesgos METODO 2.

ELABORACION: Municipalidad distrital de Pucusana.

- 2) Se debe registrar los valores precedentes en los campos correspondientes del formato IPERC (CUADRO N° 01)
- B. Cálculo de la Severidad
1. La Matriz de criterios que determinan la Severidad de un incidente o accidente. Ver CUADRO N° 03.

CUADRO N° 03: CALCULO DE SEVERIDAD

SEVERIDAD (consecuencia)	ESTIMACION DEL NIVEL DE RIESGO	
	GRADO DE RIESGO	PUNTAJE
Lesión sin incapacidad	Trivial (T)	4
Discomfort/Incomodidad	Tolerable (TO)	De 5 a 8
Lesión con incapacidad temporal	Moderado (MO)	De 9 a 16
Daño a la salud Irreversible	Importante (I)	De 17 a 24
Lesión con incapacidad permanente	Improbable (II)	DE 25 A 36
Daño a la salud Irreversible		

FUENTE: RM N° 050-2013-TR – Identificación De Peligros Y Evaluación De Riesgos METODO 2.

ELABORACION: Municipalidad distrital de Pucusana.

2. Registrar el valor calificado de la Severidad en el campo correspondiente en el formato IPERC (CUADRO N° 01).
- C. Cálculo del Grado de Riesgo
1. Calcular el grado de Riesgo GR. Esto se obtiene de acuerdo a la CUADRO N° 04.

[Firma]

Guillermo S. Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87322
 RESIDENTE EN PERU

[Firma]
JOEL A. BEDON VASQUEZ
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 9846

CUADRO N° 04: CALCULO DE SEVERIDAD

$$\text{GRADO DEL RIESGO} = \text{PROBABILIDAD} \times \text{SEVERIDAD}$$

$$\text{G.R.} = \text{P} \times \text{S}$$

- ii. Registrar el valor calculado en el campo correspondiente en el formato IPERC (CUADRO N° 01).

D. Determinación del Nivel y Significancia del Riesgo evaluado.

- i. Se procede a realizar la valoración del Nivel de Riesgo y significancia. Ver (Cuadro N° 05).

CUADRO N° 05: NIVEL Y SIGNIFICANCIA DEL RIESGO EVALUADO

ESTIMACION DEL NIVEL DEL RIESGO		
GRADO DE RIESGO	PUNTAJE	SIGNIFICANCIA
Trivial (T)	4	NO SIGNIFICATIVO
Tolerable (TO)	De 5 a 8	NO SIGNIFICATIVO
Moderado (MO)	De 9 a 16	NO SIGNIFICATIVO
Importante (IV)	De 17 a 24	SIGNIFICATIVO
Intolerable (II)	De 25 a 36	SIGNIFICATIVO

FUENTE: RM N° 050-2013-TR – Identificación De Peligros Y Evaluación De Riesgos METODO 2.
ELABORACION: Municipalidad distrital de Pucubana..

- ii. Registrar los niveles de riesgo y su significancia en el campo correspondiente en el formato IPERC (CUADRO N° 01).

ETAPA V: Controles Propuestos

- a. En base a los resultados obtenidos en la etapa de evaluación de riesgos, se determinará las medidas de control más adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar.
- b. La determinación de los controles se realiza con base en los siguientes criterios:

- ✓ Condición del riesgo.
- ✓ Recursos disponibles.
- ✓ Efectividad del control.

- c. Las medidas de control se establecen según la siguiente jerarquía:

- ✓ Elimineio - Eliminación total del riesgo.

[Firma]
JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9813

[Firma]
MUNICIPIO DE TRUJILLO
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE D. CUR

- ✓ Sustitúyalo - Reemplace el material, equipo o proceso por uno menos peligroso.
- ✓ Rediseñe - Revise y corrija el diseño del equipo o proceso.
- ✓ Segregué - Aislé el peligro mediante barreras o confinamiento.
- ✓ Administre - Implante controles como procedimientos, entrenamiento, etc.
- ✓ Equipo EPP- Donde los controles no son practicables, provee y exija el uso de EPP apropiado para minimizar el impacto.

ETAPA VI: Reevaluación de Riesgos

Una vez establecido los controles propuestos se reevaluará aquellos riesgos que como resultado de la evaluación de riesgos arrojen significativos y volver a realizar las etapas anteriormente ya descritas

ETAPA VII: Gestión e Implementación de Controles Propuestos

- ✓ Se aprobará y validará la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles propuestos.
- ✓ Se remitirá la matriz IPERC a los responsables de sede para validar y gestionar los controles propuestos.
- ✓ Monitorear la implementación de Controles.

6.4 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO (IDENTIFICADOS EN EL ANÁLISIS DE RIESGO).

~~ABERTURA DE ZANJAS Y CUNETAS CON EXCAVADORA - RETRO EXCAVADORA~~

1. OBJETIVO

Aperturar zanjas y cunetas de manera segura y eficiente, evitando causar daño al medio ambiente.

2. DESCRIPCION DEL PROCESO


2.1. VERIFICACION INICIAL

- ✓ Recibir la orden de trabajo del Supervisor y coordinar el plan de trabajo.
- ✓ Inspeccionar el área de trabajo.

2.2 COMO REALIZAR LA TAREA

- ✓ Acondicionar el terreno para poner la máquina en posición de avance.
- ✓ Retirar el material a una distancia de 2 metros de la


JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846


Guillermo S. Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87327
RESIDENTE

zanja, al lado derecho o izquierdo dando facilidad para su evacuación.

- ✓ Realizar la excavación en tipo V.
- ✓ Avanzar dejando los tramos terminados para de esa forma no regresar.
- ✓ No aperturar la zanja con taludes rectos para evitar deslizamientos.

2.3 DETENER LA TAREA EN CASO DE

- ✓ Clima muy adverso que ponga en riesgo la operación, (lluvia, tormenta o neblina)
- ✓ Derrame de aceite, refrigerante y/o petróleo
- ✓ En caso de daño al medio ambiente.
- ✓ Fallas mecánicas.
- ✓ Problemas de salud del operador.
- ✓ Bajos niveles de aceites, refrigerantes y/o petróleo.

2.4 FIN DE GUARDIA

- ✓ Al bajar use los tres puntos de apoyo.
- ✓ Dejar el equipo en un sitio seguro con el cucharón en el piso.
- ✓ Coordinar con el operador entrante.

CARGUÍO DE VOLQUETES CON EXCAVADORA - RETRO EXCAVADORA

1. OBJETIVO

Realizar el carguío cuando los volquetes de manera segura, eficiente y cuidando el medio ambiente.

2. DESCRIPCION DEL PROCESO

2.1. VERIFICACION INICIAL

- ✓ Recibir la orden del supervisor.
- ✓ Inspeccionar la zona de trabajo.
- ✓ Coordinar con los chóferes.

2.2. COMO REALIZAR LA TAREA

- ✓ Cuadrar la excavadora en una parte accesible para los volquetes.
- ✓ Si no fuera posible el punto anterior, acondicionar el terreno para el ingreso de los volquetes.
- ✓ Presentar el cucharón para la debida ubicación de los volquetes.
- ✓ Debe comenzar el carguío cuando el volquete se encuentre totalmente detenido.
- ✓ El chofer se debe mantener dentro de la cabina

[Signature]
JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 46 222

[Signature]
GOBIERNO REGIONAL TRUJILLO
INGENIERO CIVIL
CIP 67 122
RESIDENTE EN OFICINA

durante el carguío.

- ✓ Tocar dos veces la bocina para la salida del volquete.
- ✓ Antes de volver a cargar, chequear constantemente los indicadores del panel.
- ✓ Avanzar acondicionando los accesos para el ingreso de los volquetes en caso sea necesario.

2.3. DETENER LA TAREA EN CASO DE

- ✓ Clima adverso, neblina, lluvia o tormenta eléctrica.
- ✓ Derrame de aceite refrigerante y/o petróleo.
- ✓ En caso de impacto al medio ambiente.
- ✓ Fallas mecánicas.
- ✓ Problemas de salud del operador.
- ✓ Bajos niveles de aceites, refrigerantes y/o petróleo.

2.4. FIN DE GUARDIA

- ✓ Deje el equipo en un lugar seguro y con el cucharón en el suelo.
- ✓ Coordinar con el operador entrante.
- ✓ Si no hubiese relevo bloquear el contacto general.

INSPECCIÓN INICIAL DE EXCAVADORA RETROEXCAVADORA

1. OBJETIVO

Mantener el equipo en buen estado, operando con seguridad y eficiencia protegiendo el medio ambiente.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

2.1. INICIAL

- ✓ Ante de ingresar a inspeccionar el equipo colocarse a una distancia prudencial para que el operador que se encuentre operando el equipo pueda visualizarlo. Si fuese de noche ayudarse con la luz de la linterna, además Ud. deberá asegurarse que el equipo se encuentre en un sitio seguro y plano.

2.2. COMO REALIZAR LA TAREA

- ✓ Revisar el sistema de rodamiento, rodillos, ruedas, sprocket, templado de cadena, mandos finales, tornamesa, uñas, pasadores, pines, bocinas, seguros, cilindros y pistones hidráulicos.
- ✓ Revisar los niveles de aceite motor, niveles de refrigerante de agua de plumillas, combustible, fajas del alternador y ventilador. Fugas de aceite, de agua y de combustible.


Guillermo S. Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBR.


JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322

- ✓ Revisar el comportamiento de la cabina del operador, controles y sistemas.
- ✓ Abrir el contacto con la llave de arranque, esperar y verificar que funcione correctamente con el Sistema Monitor Eléctrico.
- ✓ Tocar la bocina una vez para dar arranque al motor.
- ✓ Revisar las luces y el sistema eléctrico.
- ✓ Registrar cualquier falla en la hoja de pre-uso.

2.3. INSPECCIÓN A MEDIO TIEMPO

- ✓ Revisar fugas y niveles de fluidos.
- ✓ Chequear piedras o material en las partes del equipo, si existieran; Hacer limpieza.

USO DE BARRETILLAS Y LAMPAS

1. OBJETIVO

Mantener el equipo en buen estado sin impregnaciones de material, operando así con seguridad, orden, limpieza y extendiendo la vida útil del equipo.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

2.1. VERIFICACION INICIAL

- ✓ Realizar la inspección del pre-uso, verificar que la barretilla y la lampa estén en buen estado y que se encuentren en sus respectivos soportes.


2.2. COMO REALIZAR LA TAREA

- ✓ Por seguridad use siempre los EPP adecuados como casco, lentes, botas y guantes, para evitar daños a su integridad física.
- ✓ Una vez realizada la tarea, colocar las herramientas en sus respectivos soportes y continuar con el trabajo.
- ✓ Para evitar que se extravíen, la barretilla y la lampa deben ser chequeadas antes y después de cada guardia por el supervisor quien reportará cualquier pérdida.

2.3. INSPECCIÓN A MEDIO TIEMPO Y AL FINAL

- ✓ Verificar que la barretilla y la lampa se encuentren correctamente ubicados en sus respectivos soportes.
- ✓ Realizar la inspección del equipo (operadores entrantes y salientes).

17 Bajar del equipo utilizando los tres puntos de apoyo


GOBIERNO DE TUMBURAY
INGENIERO CIVIL
CIP 47322
RESIDENTE DEL CBP
JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846

2.4. DETENER LA TAREA EN CASO DE:

- ✓ Barretillos y lampas en mal estado.
- ✓ Tormenta eléctrica.
- ✓ No contar con los EPP adecuados o en muy mal estado, por ejemplo, guantes muy gastados, lentes demasiado rayados, etc.

6.5 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.

El programa de capacitación y sensibilización es el elemento de soporte más importante dentro del Plan de seguridad y salud en el Trabajo. Básicamente permite cumplir con los siguientes objetivos:

- Crear conciencia en el personal de la importancia que tiene el cumplir con los planes, procedimientos, estándares, instrucciones y requerimientos, así como de las consecuencias de su incumplimiento.
- Divulgar y explicar los roles y responsabilidades del personal en relación al cumplimiento de los elementos del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Proporcionar el entrenamiento requerido para asegurar la competencia del personal en la aplicación de los estándares e instrucciones que puedan tener impacto en relación a la prevención en el sitio de trabajo.
- Capacitar y entrenar a la línea de mando del proyecto (ingenieros y supervisores) en el uso adecuado y la aplicación efectiva de las herramientas de gestión (análisis y control de riesgos, ATS, permisos de trabajo de alto riesgo, inspecciones y monitoreos de seguridad, investigación de accidentes/incidentes, etc.) para lograr una eficaz prevención de riesgos laborales.

El programa de capacitación y sensibilización contiene:

❖ Inducción general

Teniendo en cuenta la escasa "cultura preventiva" del personal promedio en la industria de la construcción, el programa establece que todo trabajador, independientemente de su nivel técnico y su vínculo laboral, recibe al momento de ingresar a un proyecto y antes de comenzar sus labores en obra, una inducción general en seguridad y salud en el trabajo.

La inducción general desarrolla los siguientes tópicos:

Julio César Soto Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP 87427
RESIDENTE

JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846

- ✓ Información general sobre el proyecto y el organigrama de obra.
- ✓ Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Reglamento Interno de SST.
- ✓ Responsabilidades del Trabajador.
- ✓ Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
- ✓ Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
- ✓ Programa de inspecciones.
- ✓ Programa de Capacitación y Sensibilización.
- ✓ Equipos de Protección Personal.
- ✓ Orden y limpieza en obra.
- ✓ Resumen y parte operativa del proyecto.
- ✓ Ingreso y salida de materiales.
- ✓ Procedimientos y normas de seguridad.
- ✓ Actuación en caso de accidentes o emergencias.
- ✓ Preservación y cuidado del medio ambiente.
- ✓ Señalización en obra.

❖ Reunión diaria de seguridad

La reunión diaria de seguridad debe efectuarse antes de comenzar cada jornada de labores y ser conducida por el responsable de cada grupo de trabajo (Ing. Ambiental).

La reunión diaria dura de cinco a diez minutos, y trata sobre los riesgos involucrados en las labores que se van a ejecutar, la forma de controlarlos, y temas de concientización al personal.


Las reuniones diarias de seguridad también sirven para verificar la idoneidad de los equipos de protección personal (EPP), así como los equipos y herramientas.


Al inicio de cada mes se entrega un manual de charlas diarias que incluyen temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y los trabajadores se registran en los formatos.

❖ Reunión de Sensibilización

Esta reunión se realiza con la participación de todos los trabajadores y la frecuencia de esta reunión será semanal.

La referida reunión dura entre 20 a 30 minutos y sirve para analizar todos los incidentes / accidentes ocurridos, y todas las situaciones de riesgo detectadas, así como cualquier otro tema relacionado con la prevención de accidentes en el proyecto y superación para los trabajadores.


JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846


Guillermo Soto Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 67322
RESIDENTE DE ORR

❖ Capacitación específica de seguridad

La capacitación específica de seguridad tiene por finalidad proporcionar conocimientos y entrenamiento en temas concretos desde el enfoque del control de riesgos. Esta capacitación puede ser dirigida a todo el personal de obra, o al personal que ejecuta una determinada actividad o tarea.

La capacitación específica la efectúa personal de seguridad que posea la competencia necesaria, o en su defecto algún especialista calificado externo al proyecto.

Los referidos cursos se imparten, en la medida de lo posible, antes que el personal comience la operación o actividad motivo de la capacitación. La duración de la misma está en función de la complejidad y extensión del tema tratado.


Los cursos de capacitación específica se seleccionan en función al resultado de los análisis de riesgos de los procesos del proyecto. La lista de cursos no exhaustiva se detalla a continuación:


TEMAS	DIRIGIDO/A
Primeros auxilios	A la línea de mando y brigadistas
Usos y manejo de extintores	A la línea de mando y brigadistas
Manejo defensivo	Conductores y operarios de equipos
Excavaciones	Personal de movimiento de tierras
Espacios confinados	Personal que lo requiere
Riesgos Eléctricos	Personal que lo requiere
Bloqueo y señalización	Personal que lo requiere
Materiales y productos peligrosos	Personal que lo requiere

ELABORACIÓN: Municipalidad distrital de Pucusana..

❖ Capacitación Mensual del Análisis de Seguridad

Esta reunión pretende analizar mes a mes el desarrollo y el avance del programa para poder corregir y controlar el cumplimiento de las medidas preventivas y/o correctivas, así como recordar las necesidades de la capacitación.


JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9346


 GUILLERMO SOTO TRUJILLO
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBR.

6.6 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES – PROGRAMA DE INSPECCIONES Y AUDITORIAS.

De manera adicional y complementaria a las de inspección que se llevan a cabo rutinariamente, se deben desarrollar auditorías periódicas que hagan posible una profunda y más crítica evaluación de la implementación y su grado de eficacia de los distintos componentes del plan SST.

El Ing. Residente garantiza que las auditorías sean llevadas a cabo por personas competentes y tan independientes como sea posible de las actividades que se auditen.

El Comité SST define la fecha de auditoría a realizarse, mínimo 02 veces por proyecto. Las auditorías señalan. Entre otras cosas:

- ✓ Si se ha logrado que el desempeño de la gestión de SST en el Proyecto auditado es de un nivel o estándar aceptable.
- ✓ Así mismo si la organización está cumpliendo con todas sus obligaciones relacionadas con SST.
- ✓ Establece las fortalezas y debilidades del Plan SST

Son revisiones periódicas planificadas que permiten identificar actos y condiciones subestándares. Se verifica el cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales, procedimientos y normas aplicables.


Para la programación de las inspecciones se tendrá en cuenta las instalaciones y los frentes de trabajo donde se desarrollan actividades. Asimismo se tomará como referencia la siguiente clasificación, para realizar la programación de las inspecciones:

- ✓ Inspecciones de Almacén y Oficina.
- ✓ Inspecciones de Extintores.
- ✓ Inspecciones de Botiquines.
- ✓ Inspecciones de Herramientas manuales.
- ✓ Inspecciones de Herramientas eléctricas
- ✓ Inspecciones de equipos de emergencia
- ✓ Inspecciones de Equipos de Protección Personal.


JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846

INSPECCIONES PLANEADAS, INOPINADAS, MENSUALES, SEMANALES, DIARIAS

Inspecciones Rutinarias: Estas inspecciones corresponden a las desarrolladas por el Jefe de Área Ingenieros y Responsable SST, a través de formatos establecidos como: Herramientas, EPP, etc. Según las necesidades que requieran para realizar sus labores.


Guillermo Tito Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP 87322
RESIDENTE DE OPR

Inspecciones Planeadas: Estas inspecciones responden a una programación coordinada mensualmente entre la línea de mando y el Responsable SST, registrada en un Cronograma de Inspecciones, la cual deberá ser comunicada a todos los participantes.

Inspecciones No Planeadas: Son inspecciones que se realizan de forma inopinada para verificación del cumplimiento de los lineamientos establecida por la organización o cuando se evidencia alguna deficiencia concerniente a Seguridad y Salud en el Trabajo. Para el desarrollo estas inspecciones se utilizarán los formatos de Inspecciones Generales.

La programación de Inspecciones podrá variar, siempre y cuando se presente un evento como la realización de un trabajo específico. De ser el caso en que alguna inspección no se realice el día programado, podrá ser reprogramada cualquier día del mismo mes.

6.7 OBJETIVOS Y METAS DE MEJORA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

"REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO ETAPA: AV. ALFONSO UGARTE CDRA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8					
OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACION	META	RESPONSABLE
IMPLEMENTACION EN SUTOTALIDAD DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Proteger la vida, salud e integridad física de los trabajadores y partes interesadas, previniendo y minimizando los accidentes de trabajo	N° de accidentes al mes	Registro de accidentes y enfermedades ocupacionales	0% de accidentes en el trabajo	ING. AMBIENTAL (CON ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL)
	Cumplir con las inspecciones programadas	(N° inspecciones ejecutadas / N° inspecciones programadas) * 100	Check list, botiquines y extintores	Más del 90% cumplimiento de inspecciones	ING. AMBIENTAL (CON ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL)
	Vigilar y controlar los riesgos a la salud relacionados a cada puesto de trabajo	(Exámenes médicos ejecutados / Exámenes programados) * 100	Programa de exámenes médicos	100% cumplimiento del plan	ING. AMBIENTAL (CON ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL)
	Sensibilizar y concientizar al nuestro personal en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de capacitaciones y charlas.	% de cumplimiento del programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo	Ficha de inducción al personal ingresante Carpeta de registro de capacitaciones	100% cumplimiento del plan	ING. AMBIENTAL (CON ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL)

ELABORACION: Municipalidad distrital de Pucusana..

6.8 PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

La empresa contratista deberá hacer la identificación de situaciones potenciales de emergencia y la respuesta a estas situaciones, así como prevenir y mitigar las probables enfermedades y lesiones que pueden estar relacionados con estas, tener un Plan de Respuesta a Emergencias el cual está estructurado para responder al Nivel I de emergencia, para los Niveles de emergencia II y Nivel de emergencia III.

Detallar las medidas básicas que se deben tomar para dar una respuesta efectiva a los posibles casos de emergencia que podrían

JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846

Gullermo Sola Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP 87322
RESIDENTE DE ORO

ocurrir durante el desarrollo de las obras. Implementar la organización y los procedimientos que permitan brindar una respuesta adecuada y oportuna, ante una situación de emergencia; utilizando los recursos internos del proyecto, así como coordinar adecuadamente los apoyos externos que se requieran, del modo más eficiente.

4. Cobertura

Este plan debe cubrir las emergencias con potencial de lesiones en las personas y daños en el medio ambiente o bienes que pudieran generarse en las operaciones, encuadrado en las exigencias legales del sector.

Poner en marcha un plan de respuesta a emergencias.

Este plan debe cubrir las emergencias con potencial de lesiones a las personas, los daños al medio ambiente o bienes que pudieran generarse en las operaciones.

Proporcionar y mantener operativos los recursos y equipamiento necesario, para hacer frente a una posible emergencia.

Se han identificado situaciones de emergencia que pueden afectar el normal desarrollo del proyecto, y para las que se establecieron las medidas correctivas dentro del Plan De Contingencia Y Emergencia que son:

- a) Acciones en caso de Sismo.
- b) Acciones en caso de Derrumbos.
- c) Acciones en caso de Urgencia Médica.
- d) Acciones en caso de Accidente Laborales.
- e) Procedimiento de Evacuación.

4. Clasificación y evaluación de una Emergencia

Los factores que influyen en la determinación del nivel de emergencia, son los siguientes:


- El número de víctimas y la extensión de sus lesiones y/o daños.
- El potencial de agravamiento de la situación.
- La habilidad de manejar la situación usando recursos propios de la empresa.
- El tiempo necesario para el reinicio de actividades.

4. Actividades a realizar

A través del Área de Seguridad de la obra, se analizará la situación y condiciones especiales. Se considerará los resultados obtenidos en la etapa de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos, las condiciones geográficas del proyecto, áreas de influencia del lugar de la obra y la información recopilada de las diferentes fuentes de


JCEJ A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846




Guillermo Sola Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 27322
RESIDENTE DE OBRAS

información, tales como, Municipalidades, INDECI, MINSA, entre otras, que puedan entregar información relevante. Realizada esta actividad se procede a elaborar:

- Plan de Contingencia y Emergencia: La confección de éste Plan se realizará considerando los requisitos establecidos en las normas vigentes.
- Simulacros de Emergencia: La obra definirá un simulacro de Emergencia para mantener el sistema operativo, y asimismo, se comprobará el correcto estado de los equipos de respuesta frente a emergencias en la obra.
- Liderazgo en la concreción del Plan de Contingencia y Emergencia: El área de SST de la obra, es el máximo responsable de la realización de todas las actividades que se detallan en el PLCE.
- Brigadas de Emergencias: Se considera la constitución, formación y operación de brigadas de emergencias para diferentes escenarios.

TIPO DE CONTINGENCIA

Previo a la ejecución de las obras, en cumplimiento de las normas legales vigentes, se debe realizar una evaluación de riesgos, determinando aquellas actividades que por su nivel de peligro pueden impactar directa o indirectamente sobre el desarrollo del Proyecto. Este análisis permitirá conocer el grado de vulnerabilidad y peligro de la actividad y la capacidad de respuesta para afrontar con éxito una contingencia. El enfoque general considera la prevención como medida principal.


- ✓ Contingencias Naturales: Está asociada a la ocurrencia de sismos, el cual dependiendo de su intensidad puede ocasionar pérdidas de vidas humanas, lesiones, efectos negativos en las estructuras de construcción, etc.
- ✓ Contingencias por Accidentes: Se refiere a las contingencias de seguridad ocupacional durante la etapa de construcción de la obra.
- ✓ Fallas en el suministro de insumos: La falta de insumos se puede presentar por falla de algún proveedor o por la escasez de algún insumo.

NIVELES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Nivel 1 "Bajo". Una emergencia de "Nivel Bajo" es una emergencia en el emplazamiento o fuera de éste, que puede ser controlada localmente por personal del área afectada.

Nivel 2 "Medio". Una emergencia de "Nivel Medio" es aquella que no puede ser manejada por el personal del área afectada, solicitando la


JOELLA BEDÓN VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846



Guillermo Su Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 67322
RESIDENTE DE OBR.

intervención el Equipo de Respuestas a Emergencias (no excede los recursos disponibles de la empresa).

Nivel 3 "Nivel Alto". Un incidente de "Nivel Alto" es aquel que excede los recursos disponibles en el lugar de la emergencia y requiere ayuda externa, tal como la brindada por el gobierno.

ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

El Comité de Emergencia es el órgano normativo en casos de Contingencias, lo conformarán trabajadores representativos de nivel directivo, ejecutivo u operativo, con el fin de que el CE tenga poder de decisión administrativa para viabilizar las condiciones de seguridad en equipamiento y demás que se recomiende personal de trabajadores calificados en acciones frente a una Contingencia (Delegados de Brigada).

Las Funciones y Obligaciones del Comité de Emergencia son:

- ✓ Reunirse periódicamente para acordar, planificar, orientar y desarrollar debidamente las acciones de seguridad para las fases de prevención, Emergencia y rehabilitación (antes, durante y después) de una Contingencia.
- ✓ Disponer la elaboración del Plan de Contingencia de manera técnica y adecuada a la realidad de la empresa (estudio de riesgos), debiendo revisar y aprobar el mismo.
- ✓ Organizar y disponer la adecuada capacitación y entrenamiento de los brigadistas, preparándolos en acciones del antes, durante y después del desastre o Emergencia.
- ✓ Coordinar las acciones de prevención, protección y seguridad con entidades como Defensa Civil, Municipalidades de Huánuco, Serenazgo, Cuerpo de Bomberos, Hospitales, Clínicas, entre otros.
- ✓ Dictar normas complementarias correspondientes a la seguridad de las instalaciones del Proyecto, trabajadores y público en general.
- ✓ Reunir a sus integrantes, periódicamente, a fin de evaluar y definir políticas de seguridad para garantizar la seguridad de la empresa y la correcta aplicación del Plan de Contingencia.
- ✓ Respalda y activa en caso de Emergencia el presente plan, bajo el comando directo del Jefe de Acción.

[Firma]
JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846

EQUIPOS Y MATERIALES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Los Equipos formados en respuesta a las Emergencias que puedan presentarse se denominaran Brigadas Operativas de Emergencia, al grupo de personal constituido bajo directivas y un comando que se encuentran preparados para actuar en las acciones de respuesta ante una Emergencia o Desastre que pudiese ocurrir en las instalaciones del Proyecto, en concordancia con el D.S. N° 000-2007-09-0001

[Firma]
Guillermo Su Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE OF ORP.

PCM - Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil y el D.S. N° 009 - 2005-TR - Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo.

Estas brigadas son el Órgano Operativo de Seguridad y Emergencias del contratista y es integrada por sus trabajadores, siendo el responsable directo el Jefe de Seguridad, el mismo que es responsable de su organización y capacitación permanente y a su vez, este designará un delegado.

El delegado es el trabajador seleccionado por el Jefe de Acción del PLCE, en base a su perfil y habilidades propias, así como en sus condiciones físicas y psicológicas, siendo luego capacitado y asignado a funciones específicas.

Los Brigadistas son los trabajadores seleccionados por el DELEGADO en base a sus habilidades propias, condiciones físicas y psicológicas, siendo luego capacitado y asignado a funciones específicas.

Materiales en respuesta a las Emergencias.

La empresa deberá contar por lo menos con los siguientes recursos:

- ✓ Equipo de Primeros Auxilios (botiquines, camillas, etc.)
- ✓ Directorio telefónico de servicios de emergencia externos (Policía, Bomberos, etc.).
- ✓ Equipo Comunicación (radios, teléfonos celulares, etc.)

COMUNICACIONES

Es importante realizar un Sistema de Comunicación para dar a conocer una Emergencia de manera eficaz y oportuna, considerándose que cuanto más temprano se comunique y se actúe mayor es la probabilidad de controlarse oportunamente, minimizándose las pérdidas y consecuencias; para ello se toma en cuenta:

- ✓ El Jefe de Seguridad del Proyecto verificará la ubicación exacta de la Emergencia y coordinará con los Delegados (en función del tipo de evento) para verificar in-situ la magnitud de la misma.
- ✓ Se anunciará en voz alta y firme con megáfono o altavoz el tipo de Emergencia que se desarrolla hasta estar seguros de que todo el personal del Proyecto tomó conocimiento pleno de la Emergencia.
- ✓ En caso de Sismo es el propio movimiento telúrico el que pondrá en aviso al personal del Proyecto.
- ✓ Inmediatamente se activará el presente PLCE, bajo el comando establecido; acudiendo los brigadistas para atender la Emergencia según el caso presentado.


JESÚS A. BEDOM VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846


Guillermo S. Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE ORP.

CAPACITACION

Se llevará a cabo la capacitación adecuada del personal que tiene responsabilidad en casos de emergencia (Ingeniero de la Obra, Jefe de Seguridad y brigadas de emergencias).

- ✓ Se capacitará a todo el personal de modo que esté familiarizado con la ubicación de todo el equipo de emergencias y el método correcto de usarlo.
- ✓ Se capacitará al personal de respuesta a emergencias y brigadas de emergencias y se organizará una cantidad adecuada de simulacros para mantener sus habilidades y capacidades de repuesta a un nivel elevado.
- ✓ Se deben de dictar cursos de actualización a los equipos de respuesta a emergencias y a todos los empleados, asegurándose que saben lo que deben hacer y lo que se espera de ellos en casos de emergencias.
- ✓ Los simulacros generales de emergencias que involucran a los empleados, así como al personal de las brigadas de emergencias se llevarán a cabo dos veces durante todo el tiempo que dure la construcción de la obra como mínimo para garantizar que comprendan la forma de responder a las situaciones de emergencias.

SIMULACROS – EVACUACION

Como parte de la capacitación del personal se va realizar un simulacro el cual tendrá como objetivo la preparación del personal.

Es importante programar simulacros con el fin de establecer una medición del comportamiento de la brigada de emergencia y de todo el personal, a continuación, se define un cronograma de simulacros liderados por el Ingeniero Residente.

Se recomienda la organización mínima de dos simulacros:


Simulacro 1: Se realizará un simulacro con previa coordinación con la brigada de emergencia y el grupo de trabajo con el fin de repasar aspectos de comunicación, técnicas básicas, uso de extintores y Primeros Auxilios.

Simulacro 2: Se realizará un simulacro con previa coordinación con la brigada de emergencia, pero sin conocimiento del grupo de trabajo para evaluar el comportamiento y desempeño del grupo ante un suceso inesperado.

ACTIVIDADES DE MITIGACION

Estas Actividades la realiza el Responsable de Seguridad (Jefe de Seguridad) que coordina con los responsables de las áreas operativas.


JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846


Guillermo Soto Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBR.

la Elaboración de los "Plan de Contingencia y Emergencia" de las Situaciones Potenciales de Emergencia identificadas realizando dichas actividades:

- ✓ Identificación, funciones y responsabilidades del personal encargado de atender la emergencia.
- ✓ Procedimientos de evacuación de personal propio y externo.
- ✓ Coordinación con servicios de emergencia externos (Policía, Bomberos, etc.).
- ✓ Identificación y localización de materiales peligrosos y de las acciones de emergencias a llevar acabo con los miembros.
- ✓ Disponibilidad de información necesaria durante la emergencia como: planos, hojas de datos de seguridad, procedimientos de trabajo, directorio telefónico, relación de equipos, etc.
- ✓ Incluir acciones a realizar antes, durante y después de una emergencia a fin de prevenir, mitigar sus efectos y remediar los impactos ocasionados.
- ✓ Equipo Comunicación (radios, teléfonos celulares, etc.)
- ✓ Equipo de Primeros Auxilios (botiquines, camillas, etc.)

7. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.

Comprende el conjunto de procedimientos que deben emplear la organización para confirmar que los requisitos de control han sido cumplidos. Procedimientos que la organización debe establecer y mantener al día para verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional. Son realmente sistemas activos, puesto que se aplican sin que se haya producido ningún daño o alteración de la salud y deben aportar información sobre la conformidad del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional y sobre el nivel de riesgo existente. Basados en programas de verificación que pueden quedar cubiertos mediante inspecciones que requieran o no mediciones y ensayos.

MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO Y MONITOREO EN SST.

Este Registro para la medición y Seguimiento del desempeño debe contener las pautas para el seguimiento y medición de los procesos desarrollados por el contratista; en las que se toma en cuenta lo siguiente:

- ✓ Medidas cuantitativas y cualitativas para el seguimiento y medición del desempeño.
- ✓ Seguimiento y cumplimiento de los Objetivos, Metas y Programas.
- ✓ Seguimiento de la eficacia de los controles operacionales.
- ✓ Seguimiento y corrección de los Incidentes.
- ✓ Medición y monitoreo de los agentes físicos y químicos.
- ✓ Medición y monitoreo de los indicadores de desempeño del SG.

JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846

Guillermo Soto Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRAS

INVESTIGACION DE INCIDENTES, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA

Nos brinda las pautas necesarias para el registro, investigación y análisis de incidentes. Los procedimientos para el reporte de incidentes son:

- ✓ Reporte del trabajador involucrado o testigo del incidente.
- ✓ Reporte del supervisor presente en el lugar del incidente.
- ✓ Reporte de las partes interesadas.
- ✓ Reporte de auditores internos o externos.

INVESTIGACION DE INCIDENTES

Proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias, y puntos críticos que concurren para causar el incidente. La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a la dirección de la empresa tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos.

ACCIONES CORRECTIVAS-PREVENTIVAS


Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse.


CONTROL DE REGISTROS

El Control de Registros es necesario para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros del SST del Contratista. Así le proporcionará evidencias de conformidad con los requisitos y la operación eficaz del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se deberá efectuar los siguientes pasos:

- ✓ Se recepcionará las comunicaciones, informes, así como los registros, actividades y/o eventos
- ✓ Se Archivarán los registros de SST utilizando medios que los identifiquen y diferencien de los demás documentos de la gestión empresarial en un lugar adecuado y de fácil acceso que evite su deterioro y/o pérdida
- ✓ Se deberá mantener en el lugar de trabajo los registros por el tiempo establecido en la "Lista maestra de registros"
- ✓ Los cambios en los registros se identificarán Indicando el número de versión en el casillero correspondiente y si es necesario; incluir el párrafo: "este documento anula y reemplaza (indicar nombre


JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846


Guillermo Vilu Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP-67322
RESIDENTE DE OBR.

(título, código y fecha de vigencia del documento que se reemplaza)"

8. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PRESUPUESTO

En concordancia con la Norma G.050 Seguridad durante la construcción, de Reglamento Nacional de Edificaciones en la que se establece la obligatoriedad de contar con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) como requisito indispensable para la adjudicación de contratos, todo proyecto, debe incluirse en el Expediente Técnico de Obra, la partida correspondiente Seguridad y Salud en la que se estimará el costo de implementación de los mecanismos técnicos y administrativos contenidos en dicho Plan (PSST). El presupuesto derivado al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es del 2% del Presupuesto General de la Obra.

Protección Contra Incendios


- ◆ Se revisará en forma periódica las instalaciones dirigidas a prever y controlar posibles incendios en la construcción.
- ◆ Los equipos de extinción se revisarán e inspeccionarán en forma periódica y estarán debidamente identificados y señalizados para su empleo a cualquier hora del día.
- ◆ Todo vehículo de transporte de personal con maquinaria de movimiento de tierra, deberá contar con extintores para combate de incendios.
- ◆ Adyacente a los extintores figurará el número telefónico de la central de Bomberos.
- ◆ El acceso a los equipos de extinción será directo y libre de obstáculos.
- ◆ El aviso de no fumar se colocará en lugares visibles de la obra.

Equipo Básico de Protección Personal (EPP)

Todo el personal que labore en la obra de construcción, deberá usar el siguiente equipo de protección personal:

- ◆ Ropa de trabajo adecuada a la estación y a las labores por ejecutar (overol o camisa y pantalón o mameluco).
- ◆ Casco de seguridad tipo jockey para identificar a la categoría ocupación de los trabajadores, los cascos de seguridad serán de



JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846



Guillermo Mirafujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRAS

- colores específicos. Cada empresa definirá los colores asignados a las diferentes categorías y especialización de los obreros.
- ◆ Zapatos de seguridad y, adicionalmente, botas impermeables de jebe, para trabajos en zonas húmedas.
 - ◆ En zonas donde el ruido alcance niveles mayores de 80 dB, los trabajadores deberán usar tapones protectores de oído. Se reconoce de manera práctica un nivel de 80 dB, cuando una persona deja de escuchar su propia voz en torno normal.
 - ◆ En zonas expuestas a la acción de productos químicos se proveerá al trabajador de ropa y de elementos de protección adecuados.
 - ◆ En zonas de gran cantidad de polvo, proveer al trabajador de anteojos y respiradores contra el polvo, o colocar en el ambiente aspersores de agua.
 - ◆ Los frentes de trabajo que estén sobre 1,50 m (un metro con cincuenta centímetros) del nivel de terreno natural deberán estar rodeados de barandas y debidamente señalizados.
 - ◆ Botiquín. En toda obra se deberá contar con un botiquín. Los elementos de primeros auxilios, serán seleccionados por el responsable de la seguridad, de acuerdo a la magnitud y tipo de la obra (ver Anexo N° 1).
 - ◆ Servicio de primeros auxilios. En caso de emergencia se ubicará en lugar visible un listado de teléfonos y direcciones de las Instituciones de auxilio para los casos de emergencia.
 - ◆ Para trabajos con equipos especiales: esmeriles, soldadoras, sierras de cinta o de disco, garlopas, taladros, chorros de arena (sandblast), etcétera - se exigirá que el trabajador use el siguiente equipo:

Esmeriles y taladros: lentes o caretas de plástico.

Sierra: anteojos y guantes.
 - ◆ Los equipos de seguridad deberán cumplir con normas específicas de calidad nacional o internacional.


JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846


GOBIERNO SITU TRUJILLO
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBR.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DE LA OBRA****Accesos, Circulación y Señalización dentro De La Obra:**

El acceso a las oficinas de la obra, deberá preverse en la forma más directa posible desde la entrada, buscando en lo posible que la ubicación de las mismas sea perimétrica.

Si para llegar a las oficinas de la obra, fuera necesario cruzar la zona de trabajo, el acceso deberá estar cubierto para evitar accidentes por la caída de herramientas o materiales.

- ◆ El área de trabajo estará libre de todo elemento punzante (clavos, alambres, fierros, etcétera.) y de sustancias tales como grasas, aceites u otros, que puedan causar accidentes por deslizamiento. Asimismo se deberá eliminar los conductores con tensión, proteger las instalaciones públicas existentes: agua, desagüe etcétera.
- ◆ La circulación se realizará por rutas debidamente señalizadas con un ancho mínimo de 60 cm.
- ◆ El contratista deberá señalar los sitios indicados por el responsable de seguridad, de conformidad a las características de señalización de cada caso en particular. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, etcétera.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.
- ◆ Se deberá alertar adecuadamente la presencia de obstáculos que pudieran originar accidentes.
- ◆ En las horas diurnas se utilizarán barreras, o carteles indicadores que permitan alertar debidamente el peligro.
- ◆ En forma periódica se realizarán charlas acerca de la seguridad en la obra.

Almacenamiento y Manipuleo de Materiales

- ◆ El área de almacenamiento deberá disponer de un área de maniobra.


JOEL AL BEDOM VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846


GOBIERNO DEL TRUJILLO
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRAS

- ◆ Ubicación del área de almacenamiento y disposición de los materiales (combustible lejos de balones de oxígeno, pinturas, etcétera).
- ◆ Sistema de protección de áreas de almacenamiento.
- ◆ El manipuleo de materiales será realizado por personal especializado.
- ◆ Los materiales se apilarán hasta la altura recomendada por el fabricante.

Obras De Infraestructura: Excavaciones y Demoliciones

Excavaciones y Demoliciones

Antes de iniciar las excavaciones o demoliciones se eliminarán todos los objetos que puedan desplomarse y que constituyen peligro para los trabajadores, tales como: árboles, rocas, rellenos, etcétera.

Así mismo, antes de iniciar la excavación o demolición, el contratista consultará los planos de las instalaciones sanitarias de la zona a excavar o demoler e implementará un procedimiento de coordinación con las empresas que brinda estos servicios, así como un procedimiento de coordinación de interferencia y respuesta a situaciones de emergencia que puedan crearse durante la excavación.

Toda excavación o demolición será aislada y protegida mediante cerramientos con barandas u otros sistemas adecuados, ubicados a una distancia del borde de acuerdo a la profundidad de la excavación, y en ningún caso a menos de 1m.

Si la profundidad de las excavaciones va a ser mayor de 2 m., se requiere contar con el estudio de mecánica de suelos que contenga las recomendaciones del proceso constructivo y que estén refrendadas por un ingeniero civil colegiado.

Se deberá prevenir los peligros de caída de materiales u objetos, o de irrupción de agua en la excavación o en zonas que modifiquen el grado de humedad de los taludes de la excavación.

Si la excavación o demolición se realiza en la vía pública, la señalización será hecha con elementos de clara visibilidad durante el día, y con luces rojas en la noche, de modo que se advierta su presencia.


JOELLA BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846


GOBIERNO DEL TRUJILLO
INGENIERO CIVIL
CIP 87322
RESIDENTE DE OBRAS

Así mismo en las excavaciones que se realicen en zonas urbanas, se deberá instalar puentes peatonales con barandas metálicas cada 50 metros.

En los casos en que las zanjas se realicen en terrenos estables, se evitará que el material producto de la excavación se acumule a menos de 2 m del borde de la zanja.

Para profundidades mayores de 2 m, el acceso a las zanjas se hará siempre con el uso de escaleras portátiles.

En ningún caso el personal obrero que participe en labores de excavación, podrá hacerlo sin el uso de los elementos de protección adecuados y, específicamente, el casco de seguridad.



Durante la operación de relleno de la zanja, se prohibirá la permanencia de personal obrero dentro de la zanja.

En los momentos de nivelación y compactación del terreno, el equipo de colocación del material de relleno, trabajará a una distancia no menor de 20 m de la zona que se esté nivelando o compactando.

Antes de iniciar la excavación en terrenos saturados, se requerirá de un estudio de mecánica de suelos, en el que se establezca las características del suelo, que permitan determinar la magnitud de los empujes a los que estarán sometidos los muros de sostenimiento definitivo o las atagúas provisionales, durante la construcción.

**PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL PROYECTO:
"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO
DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE
LIMA".**


JOEL A. BEDON LASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846


 Guillermo S. Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
PRESIDENTE DE ORB.

ITEM	DESCRIPCION PARTIDA	SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO				S/. TOTAL
		UND	METRADO	S/. PRECIOS	S/. PARCIAL	
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD					
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES					
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES					
01.01.01.01	OFICINA PARA CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN	m2	12.00	281.96	3,383.52	3,383.52
01.01.01.02	ALMACEN DE OBRA	m2	8.00	282.99	2,263.92	2,263.92
01.01.01.03	CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL	m	247.04	31.12	7,687.88	7,687.88
01.01.01.04	ALQUILER BAÑOS QUIMICOS INC. INSTALACION Y OPERACIÓN	mes	2.00	362.37	724.74	724.74
01.01.01.05	CARTEL DE OBRA	und	1.00	740.51	740.51	740.51
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES					
01.01.02.01	AGUA PARA OBRA	mes	2.00	2,168.18	4,336.36	4,336.36
01.03	TRABAJOS PRELIMINARES					
01.01.03.01	LIMPIEZA DEL TERRENO CON EQUIPO	m2	726.11	1.70	1,234.39	1,234.39
01.01.03.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	glb	1.00	601.16	601.16	601.16
01.01.03.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	est	1.00	6,060.30	6,060.30	6,060.30
01.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO					
01.01.04.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	235.37	2.99	703.76	703.76
01.01.05	TRANSPORTE HORIZONTAL PARA MATERIALES					
01.01.05.01	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIALES	sem	8.00	102.47	819.76	819.76
01.01.06	SEGURIDAD Y SALUD					
01.01.06.01	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	und	1.00	9,894.00	9,894.00	9,894.00
02	ESTRUCTURAS					
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
02.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL	m3	5.04	18.74	94.45	94.45
02.01.02	EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.35 m. TERRENO NORMAL	m3	219.37	37.46	8,217.60	8,217.60
02.01.03	EXCAVACIÓN PARA VEREDAS	m3	31.32	37.46	1,173.25	1,173.25
02	RELLENOS					
02.02.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	42.11	40.57	1,708.40	1,708.40
02.02.02	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL	m2	164.60	2.75	452.65	452.65
02.02.03	CONFORMACIÓN DE SUB-BASE PARA VEREDAS	m2	232.00	0.84	194.88	194.88
02.02.04	AFIRMADO COMPACTADO PARA VEREDAS	m3	28.42	97.73	2,777.49	2,777.49
02.02.05	ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL CON EQUIPO	m3	213.63	32.09	6,855.39	6,855.39
02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					
02.03.01	CIMIENTO CORRIDO					
02.03.01.01	CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% P.G.	m3	164.42	227.26	37,366.09	37,366.09
02.03.02	SOBRECIMENTOS					
02.03.02.01	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m2	200.07	57.54	11,512.03	11,512.03
02.03.02.02	CONCRETO SOBRECIMIENOS MEZCLA 1:8, CEMENTO- HORMIGON + 25% P.M.	m3	20.01	265.18	5,306.25	5,306.25

"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA".

PLAN DE SEGURIDAD
SALUD OCUPACIONAL

Guillermo Vásquez
INGENIERO CIVIL
CIP: 873
RESIDENTE D

02.03.03	PISOS Y PAVIMENTOS					
02.03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS	m2	23.09	53.51	1,235.55	1,235.55
02.03.03.02	CONCRETO $f_c=175$ kg/cm2 PARA VEREDA	m3	25.97	382.63	9,936.90	9,936.90
02.03.04	SOLADOS					
02.03.04.01	SOLADO PARA CIMENTACIONES E=2" MEZCLA 1:2	m2	164.58	45.26	7,448.89	7,448.89
02.04	CONCRETO ARMADO					
02.04.01	ZAPATAS					
02.04.01.01	ACERO $f_y=4200$ kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS	kg	82.30	4.69	385.99	385.99
02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	6.48	63.15	409.21	409.21
02.04.01.03	CONCRETO $f_c=175$ kg/cm2 EN ZAPATAS	m3	2.16	363.39	784.92	784.92
02.04.02	COLUMNAS DE CERCO					
02.04.02.01	ACERO $f_y=4200$ kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS DE CERCO	kg	3,552.78	4.66	16,555.95	16,555.95
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS DE CERCO	m2	246.47	63.05	15,539.93	15,539.93
02.04.02.03	CONCRETO EN COLUMNAS DE CERCO $f_c=175$ kg/cm2	m3	19.08	411.09	7,843.60	7,843.60
02.04.03	COLUMNAS PARA EL PORTON					
02.04.03.01	ACERO $f_y=4200$ kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS PARA PORTON	kg	222.08	4.69	1,041.56	1,041.56
02.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS DE PORTON	m2	11.04	81.86	903.73	903.73
02.04.03.03	CONCRETO EN COLUMNAS PARA PORTON $f_c=175$ kg/cm2	m3	0.99	476.69	471.92	471.92
02.04.04	VIGAS					
02.04.04.01	ACERO $f_y=4200$ kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE AMARRE	kg	1,387.22	4.69	6,506.06	6,506.06
02.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE AMARRE	m2	145.56	67.00	9,752.52	9,752.52
02.04.04.03	CONCRETO $f_c=175$ kg/cm2 EN VIGAS DE AMARRE	m3	15.01	385.58	5,787.56	5,787.56
02.04.05	PISO DE INGRESO, e= 0.10 m					
02.04.05.01	ACERO $f_y=4200$ kg/cm2 GRADO 60 EN PISO DE INGRESO	kg	321.36	4.66	1,497.54	1,497.54
02.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISO DE INGRESO	m2	2.61	53.51	139.66	139.66
02.04.05.03	CONCRETO $f_c=175$ kg/cm2 EN PISO DE INGRESO	m3	4.13	382.63	1,580.26	1,580.26
03	ARQUITECTURA					
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA					
03.01.01	MURO DE LADRILLO DE ARCILLA KING KONG - TIPO CARAVISTA	m2	390.14	68.97	26,907.96	26,907.96
03.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS					
03.02.01	TARRAJEO EN VIGAS C:A 1:5, e= 1.5 cm	m2	195.07	41.80	8,153.93	8,153.93
03.02.02	TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:5, e= 1.5 cm	m2	264.72	35.02	9,270.49	9,270.49
03.02.03	TARRAJEO ZOCALOS C:A 1:5, e= 1.5 cm	m2	200.07	34.40	6,882.41	6,882.41
03.02.04	JUNTAS SISMICAS e=3 cm	m	108.75	3.25	353.44	353.44
03.02.05	JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS e = 1"	m	230.88	6.27	1,447.62	1,447.62
03.02.06	JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS e = 1" c/5.00 m	m	44.00	2.85	125.40	125.40
03.02.07	BRUÑA EN VEREDAS	m	440.55	6.71	2,956.09	2,956.09
03.02.08	BRUÑAS EN PISO DE INGRESO	m	28.70	6.71	192.58	192.58
03.03	CUBIERTAS					
03.03.01	LADRILLO PASTELERO 24X24 CM PARA CERCO	m	200.07	12.77	2,554.89	2,554.89

JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP: 26,907,96


"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA".


PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



Guillermo S. Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRAS

03.04	CARPINTERIA METALICA					
03.04.01	PORTON METALICO 2.77 m x 5.35 m. DOS HOJAS PIVOTANTE CON TUBO DE 2" CON PUERTA DE INGRESO PEATONAL INC. PINTURA ANTICORROSIVA	und	1.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00
03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA Y ALAMBRE DE PUAS DE SEGURIDAD SOBRE MURO NUEVO (h=0.55m).	m	230.03	51.51	11,848.85	11,848.85
03.05	PINTURA					
03.05.01	PINTURA DE VIGAS, COLUMNAS Y ZOCALOS	m2	659.85	15.11	9,970.33	9,970.33
COSTO DIRECTO						287,674.52
GASTOS GENERALES 19.13%						55,037.85
UTILIDAD 0.085%						24,452.33
SUBTOTAL						367,164.70
IGV 18%						66,089.65
TOTAL PRESUPUESTO						433,254.35


JOEL A. BEDON VASQUEZ
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87322


GOBIERNO DEL TAJILLO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87322
 RESIDENTE DE OBRAS

9. ANEXO 1


EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:

El Botiquín deberá implementarse de acuerdo a la magnitud y tipo de obra, así como a la posibilidad de auxilio externo tomando en consideración su cercanía a centros de asistencia médica hospitalaria.

Como mínimo un Botiquín de primeros auxilios debe contener:

- 02 Paquetes de guantes quirúrgicos
- 01 Frasco de yodopovidoma 120 ml solución antiséptico
- 01 Frasco de agua oxigenada mediano 120 ml
- 01 Frasco de alcohol mediano 250 ml
- 05 Paquetes de gasas esterilizadas de 10 cm X 10 cm
- 08 Paquetes de apósitos
- 01 Rollo de esparadrapo 5 cm X 4,50 m
- 02 Rollos de venda elástica de 3 pulg. X 5 yardas
- 02 Rollos de venda elástica de 4 pulg. X 5 yardas
- 01 Paquete de algodón x 100 g
- 01 Venda triangular
- 10 paletas baja lengua (para entablillado de dedos)
- 01 Frasco de solución de cloruro de sodio al 9/1000 x 1 l (para lavado de heridas)
- 02 Paquetes de gasa tipo jelonet (para quemaduras)
- 02 Frascos de colirio de 10 ml
- 01 Tijera punta roma
- 01 Pinza
- 01 Camilla rígida
- 01 Frazada.


Guillermo Stu Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE QBR


JOELLA BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846


10. ANEXO 2



ANEXO 2.1 FORMAS COMUNES DE LESIÓN EN MANOS

Tipo de lesión	Lesión específica	Causa de la lesión
Lesión traumática	Cortes o laceraciones Punzadas (herida hecha con instrumento punzante). Torceduras o huesos rotos.	Cualquier herramienta, máquina o equipo con puntas filudas. Destornilladores, grapas, vidrios, astillas, garfios, etc. Puertas de carro, objetos que caen, máquinas como tornillos de banco y prensas, reductores, ruedas, fajas, etc.
Lesión de contacto	Irritación de piel, ampollas, escaldaduras, quemaduras, piel seca que se raja y sangra, infecciones, etc.	Contacto con sustancias químicas (solventes, ácidos), mecánicas (fricción, presión), físicas (calor, frío) o biológicas (bacterias, hongos).
Problemas de movimientos repetitivos	Dolores y adormecimientos	Cuando las acciones con la misma mano se repiten por un largo tiempo (martilleo, etc.)

ANEXO 2.2 ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO

Zonas de aplicación	Valores expresados en Laeq	
	Horario diurno	Horario nocturno
Zona de protección especial	50	40
Zona residencial	60	50
Zona comercial	70	60
Zona industrial	80	70


JOEL A. BEDON VASQUEZ
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 9843



Guillermo Siu Trajillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP 8732
 RESIDF * T

ANEXO 2:3 PROTECCIÓN OCULAR

- (1) Gafas protectoras con ajuste flexible y ventilación regular.
- (2) Gafas protectoras con ajuste flexible y ventilación con capucha.
- (3) Gafas protectoras con ajuste acolchado y cuerpo rígido.
- (4) Anteojos de marco de metal con protectores laterales.
- (5) Anteojos de marco de plástico con protectores laterales.
- (6) Anteojos de marco de metal y plástico con protectores laterales.
- (7) Gafas protectoras para soldar, tipo antejo cerrado con vidrios ahumados.
- (8) Rectangular ahumado.
- (9) Protector de cara (disponible con ventanilla de plástico de malla).
- (10) Casco para soldar.

Operación	Protectores recomendados
Concreto	1, 2, 3, 4, 5 y 6
Arenado	1, 3, 4, 5, 7 y 8
Corte con sierra circular y esmerilado	9 y 10

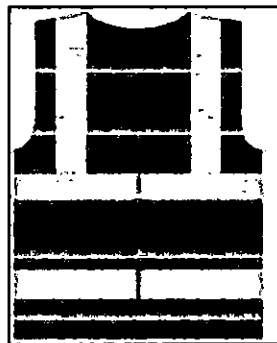
11. ANEXO 3

CHALECO CON CINTAS DE MATERIAL REFLECTIVO

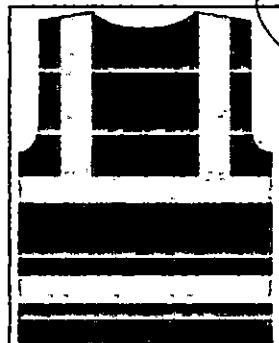
Se recomienda que los chalecos para contratistas y para subcontratistas de una obra sean de color anaranjado con cinta reflectiva color plata.

Las cintas color plata deben ser de material reflectivo de alta visibilidad y durabilidad, distribuidas en forma vertical y horizontal, las cuales deberán ser de 1" ½ con la misma distribución en ambos lados.

Parte Frontal



Parte Posterior



[Firma]
JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846

[Firma]
Guillermo Soto Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE PE 000

12. ANEXO 4

"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA-REGION DE LIMA"

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	ARECHE GOMEZ ZENON	CARGO:	OPERARIO
FACULTAD O DEPENDENCIA:	—	ÁREA:	—

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
01	CASCO	1	29/01/19	Zenon
02	GUANTES	1	29/01/19	Zenon
03	ZAPATO	1	29/01/19	Zenon
04	OVEROL	1	29/01/19	Zenon
05	LENTAS	1	29/01/19	Zenon
06				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	GUILIAMS	CEDULA N°	
CARGO	RESIDENTE	FIRMA	<i>[Firma]</i>

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

ELABORACION: Municipalidad distrital de Pucusana.

[Firma]
JOEL A. BEON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 9846

[Firma]
Guillermo Soto Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP 8732
RESIDENTE DEL OEP

13. ANEXO 5.

REGISTRO DE ASISTENCIA/CAPACITACION

Expositor:	JOELA BEDON VASQUEZ		Sección:	
Fecha:	01-02-19	Nº Participantes:	10	
De: 07 am a 5 pm hrs.	Total hrs:	8 Horas	Horas Hombres Instrucción: 8 Horas	

Nº	Nombres y Apellidos	DNI	Empresa	Area	Firma
1	ARELHO GONZALEZ, ZENON	23363468	PUEBLO	OPERARIO	[Firma]
2	DIEGO SUMARON, YONEL	46296127	PUEBLO	OPERARIO	[Firma]
3	PAREAN ORTEGA, JOSE P	45863286	PUEBLO	OPERARIO	[Firma]
4	HURTADILLA CUYA, ALBERTO	42829913	TRABAJADOR	OPERARIO	[Firma]
5	JUSTINIANO WILCO, PEDRO	22906472	TRABAJADOR	OPERARIO	[Firma]
6	GREGORIO FARFAN, YULIS	43091515	TRABAJADOR	OPERARIO	[Firma]
7	HONORATA VELASQUEZ, MARTIN	07846929	TRABAJADOR	OPERARIO	[Firma]
8	RUIZ REVOREDO, CARLO	46174184	TRABAJADOR	OPERARIO	[Firma]
9	JAIIME SALOANDA, SIBINVO	42855598	TRABAJADOR	OPERARIO	[Firma]
10	ALLENDO ZAPATA, YORNIS	25071620	TRABAJADOR	OPERARIO	[Firma]

¿Cuál fue el tema?
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

¿Por qué se escogió este tema?
ES LA PRIORIDAD EN OBRA

¿Cómo se estimuló la participación?
EN MAYOR CANTIDAD DE LA OBRA Y PUEBLO

¿Qué ayudas visuales se usaron?
CANDON MULTIMEDIA

¿Qué preguntas o preocupaciones significativas se expresaron?
EL CUIDADO EN OBRA - PLAN DE CONTINGENCIA

ELABORACION: Municipalidad distrital de Pucusana..

[Firma]
JOELA BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL

[Firma]
Guillermo Siza Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRAS

14. ANEXO 6

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
EMPRESA:	CONSORCIO MAYES	FECHA:	01-02-2019			
OBRA:	PUCUSANA	AREA:	SEGURIDAD Y SALUD			
INSPECTOR:	JOEL A BEDON VASQUEZ	RESPONSABLE DEL AREA:	ING GUILLERMO SOTO TRUJILLO			
1. Protección de la cabeza						
	Casco de seguridad		✓			
2. Protección facial y vista						
	Lentes de seguridad blanco		✓			
	Protector facial		✓			
3. Protección auditiva						
	Tapones de oído desechables		✓			
4. Protección respiratoria						
	Máscaras desechables para polvo común		✓			
5. Protección de las manos						
	Guantes		✓			
6. Protección de los pies						
	Calzado de seguridad		✓			
	Botas para concreto		✓			

ELABORACION: Municipalidad distrital de Pucusana..

Joel A. Bedon Vasquez
JOEL A. BEDON VASQUEZ
 INGENIERO CIVIL
 N° 9843


Guillermo Soto Trujillo


Guillermo Soto Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 C.P. 87322
 RESIDENTE DE PUCUSANA

15. ANEXO 7

REGISTRO DE INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN				
Empresa: <u>CONSORCIO MAYES</u>				
Apellidos y Nombres: <u>JOEL A. BEDON VASQUEZ</u>				
Ocupación: <u>JNG. DE SEGURIDAD Y SALUD</u>		Fecha de Ingreso: <u>05-02-19</u>	Fecha de Control: <u>05-02-19</u>	
1	Presentación al Ing. Encargado de la seguridad y salud ocupacional	✓	✓	05-02-19
2	Instrucciones para su movilización y transporte a la obra	✓	✓	05-02-19
4	Llevarle para que conozca la ubicación de las áreas de trabajo	✓	✓	05-02-19
5	Ubicación de los servicios higiénicos, comedor y sus horarios	✓	✓	05-02-19
6	Identificar los peligros asociados con el trabajo, tales como equipo pesado, caída de rocas, ácidos, trabajos en altura, trabajos nocturnos, etc.	✓	✓	05-02-19
7	Revisión de las Normas Generales aplicados a su area	✓	✓	05-02-19
8	Revisión de las Normas Especificas tránsito, movimientos de tierra, etc.	✓	✓	05-02-19
9	Explicar los permisos requeridos por el área, por ejemplo: trabajos en caliente, espacios confinados, excavaciones (solamente los que se solicitan)	✓	✓	05-02-19
10	Revisión de los equipos de protección personal exigidos: como obtenerlos, como utilizarlos adecuadamente.	✓	✓	05-02-19
11	Revisión de los peligros para la salud en las áreas de trabajo (químicos, polvo, etc; y donde encontrar las hojas DSOS)	✓	✓	05-02-19
12	Reporte de incidentes (qué pasó, cuándo pasó, donde paso)	✓	✓	05-02-19
13	Explicar el ATS y las inspecciones de las herramientas, cómo también las inspecciones de los pre-uso de equipos móviles.	✓	✓	05-02-19
14	Reporte de condiciones sub-estándares (qué está pasando, Cómo está pasando, Quién está mal actuando, cuándo es que está pasando)	✓	✓	05-02-19
15	Revisión de los procedimientos de emergencia incluyendo: reportes, alarmas, avisos y procedimientos de evacuación.	✓	✓	05-02-19
16	Realizó su examen Médico Pre Ocupacional.	✓	✓	05-02-19

ELABORACION: Municipalidad distrital de Pucusana..


JOEL A. BEDON VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
N° 2846


GUAYMA S.A. TRUJILLO
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OR.

16. ANEXO 8

"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA"				
"PLAN DE SEGURIDAD DE EXCAVACIONES/ZANIAS"				
	15/05/2015	16/05/2015	17/05/2015	18/05/2015
1 Charla de inducción al trabajo Diario.	✓	✓	✓	✓
2 Listar los Equipos de Protección Colectiva	✓	✓	✓	✓
3 Listar las Prendas de Protección Personal	✓	✓	✓	✓
4 Listar los equipos pesados cerca de las operaciones.	✓	✓	✓	✓
5 Equipo pesado usado para los trabajos.	✓	✓	✓	✓
6 Personal del contratista por especialidad.	✓	✓	✓	✓
7 Supervisor de excavaciones en el área.	✓	✓	✓	✓
8 Cambios en las condiciones subterráneas esperadas.	-	-	-	-
9 Actividad por área: Construcción de buzón Apoyos OTROS:	-	-	-	-
10 Otros	-	-	-	-
11 Otros	-	-	-	-
12 Otros	-	-	-	-
13 Observaciones	-	-	-	-

ELABORACION: Municipalidad distrital de Pucusana..

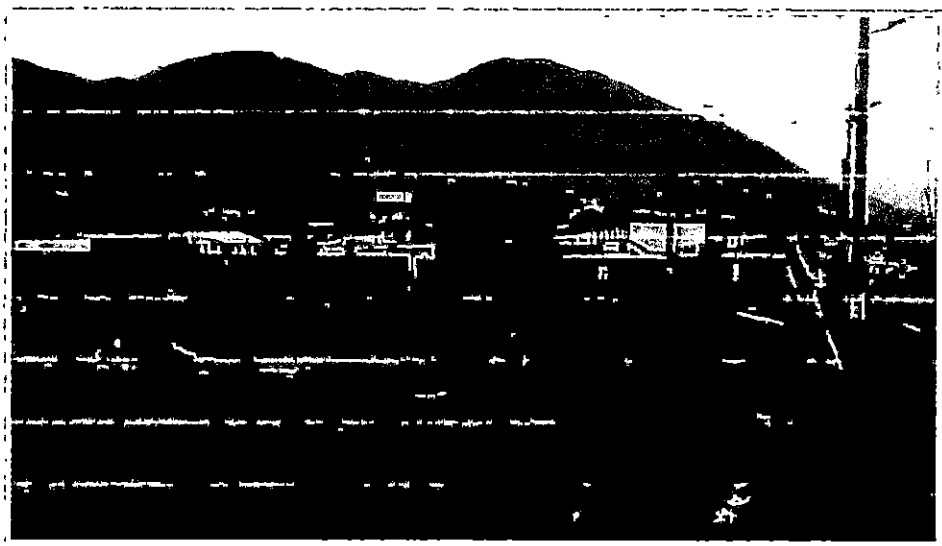
Joel A. Bedon Vasquez
JOEL A. BEDON VASQUEZ
 INGENIERO CIVIL
 N° 17 9848

[Firma]
JOSE ANTONIO SOTO TRUJILLO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87322
 RESIDENTE DE PUC

06.04 INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL




INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE OBRA



"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO
DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE
LIMA".

FEBRERO DEL 2019


E. VÍCTOR ANTONIO
JANCOVICH APONTE



Guillermo Soto Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 07322
RESIDENTE DE OBRAS



- 1.3. **Residente de Obra**
Ing. Guillermo SIU TRUJILLO
- 1.4. **Supervisor y/o Inspector**
Ing. Enrique Antonio CHAMOCHUMBI APONTE
- 1.5. **Plazo de ejecución de la Obra**
El plazo de ejecución de obra es de 60 días calendario
- 1.6. **Fecha de inicio de la Obra.**
Inicio : 29 de enero 2019
- 1.7. **Fecha de término de Obra**
29 de marzo del 2019

II. EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – MENSUAL

Partida N° 01. IMPACTO AMBIENTAL

Partida N° 01.01. Impacto ambiental

No está contemplado en el expediente técnico pero se tiene realizar las siguientes partidas. Actividades mencionas en la Declaración de Impacto Ambiental.

- Actividades realizadas en obra.

N°	Actividades
1	Humedecer frecuentemente las áreas sujeto a levantar partículas suspensión (polvo)
2	Uso de lonas para el almacenamiento temporal de los agregados
3	Charla de sensibilización
4	Charla de contingencia
5	Charla de relaciones comunitarias
6	Almacenamiento temporal de residuos sólidos en contenedores
7	Señalización
8	Construcción de un relleno sanitario
9	Traslado de residuos sólidos para su disposición final
10	Eliminación de material excedente provenientes de excavación y residuos de construcción
11	Seguimiento y control

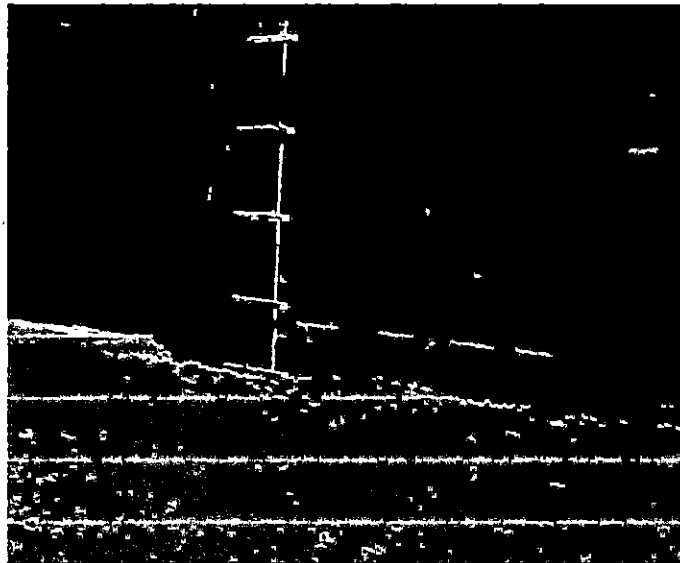
Guillermo Siu Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRA



Actividad 1: Humedecer frecuentemente las áreas sujeto a levantar partículas suspensión (polvo).

Se realizaron riegos a través de mangueras, para minimizar las partículas en suspensión por parte de la maquinaria durante el trabajo realizado.

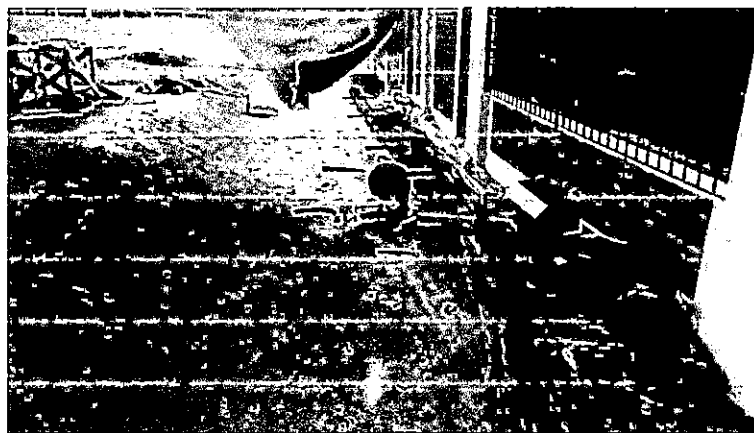
FIGURA N° 1. RIEGO PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS



Actividad 2: Uso de lonas para el almacenamiento temporal de los agregados

Se cubrieron con lonas los agregados para su protección de fenómenos naturales.

Figura N° 2: SE CUBRIÓ EL MATERIAL



ENTRADA EN PLAZA
JAMUCHU
15/08/2010



Guillermo Súa Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 67322
RESIDENTE DE QBR.



Actividad 3: Charla de sensibilización.

Medio Ambiente

¿Qué es?
 Es todo lo que rodea a un ser vivo (seres vivos y seres vivos), y los factores externos que afectan desde el nacimiento y los seres vivos, por lo general humano y que puede causar daño o peligro.

¿Cuáles son sus componentes?
 El Medio Físico o Natural
 Constituido por las diversas partes del medio ambiente, relacionados con la naturaleza y en donde se vive y se desarrolla:
 - Medio Atmosférico: Constituido por la totalidad de aire.
 - Medio Acuático: Agua y aguas subterráneas.
 - Medio Sólido: Suelo y las rocas.
 - Medio Biológico: Vegetal y animal.
 - Medio Participación Ciudadana de Pymes.
 - Cultura, valores y costumbres.

El Medio Socioeconómico y Cultural
 Constituido por las actividades y condiciones sociales, físicas, económicas y culturales en general, de las comunidades humanas que lo conforman en un área determinada.

¿Por qué estudiarlo?
 Porque permite tener conocimiento de los recursos naturales que sustentan una actividad económica, social, cultural, científica, tecnológica, política, etc., para su conservación y uso racional.

El desarrollo del ambiente requiere planificación y acciones sostenidas y sostenibles y a largo plazo.

Todas las personas tenemos el deber de cuidar el medio ambiente.

No todos los problemas ambientales son graves. Cada uno de nosotros puede contribuir a mejorar el medio ambiente que nos rodea y a cuidar el medio ambiente que nos rodea.

Es una de las prioridades fundamentales de nuestra política ambiental y es una de las prioridades de la política ambiental.

La Agenda Arequipa estamos comprometidos con:

- El desarrollo y el crecimiento sostenible de la ciudad.
- El desarrollo de un desarrollo sostenible humano.
- El desarrollo de una buena calidad de vida, participando en acciones de desarrollo y mejoramiento.
- El desarrollo de una participación en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente.
- El desarrollo de un medio ambiente saludable y sostenible.

La Agenda Arequipa estamos comprometidos con:

- El desarrollo y el crecimiento sostenible de la ciudad.
- El desarrollo de un desarrollo sostenible humano.
- El desarrollo de una buena calidad de vida, participando en acciones de desarrollo y mejoramiento.
- El desarrollo de una participación en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente.
- El desarrollo de un medio ambiente saludable y sostenible.

Figura Nº 3. REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES Y POBLADORES



Actividad 4: Charla de contingencia Incendios

Figura Nº 4. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS



Handwritten signature and stamp: GUILLERMO S. J. TRUJILLO INGENIERO CIVIL, RESIDENTE DE OBRAS.





Actividad 5: Charla de relaciones comunitarias

Al haber participado en la ejecución de múltiples proyectos de ingeniería, nuestra empresa ha desarrollado buen manejo en las relaciones con las poblaciones que se encuentran influenciadas por los proyectos, tanto directa como indirectamente, obteniendo óptimos resultados en la solución de contingencias y posibles conflictos sociales.


Estás aquí: [Inicio/Cursos/Taller de gestión de relaciones comunitarias](#)

Taller de gestión de relaciones comunitarias

Este curso – taller será un espacio académico que contribuya al fortalecimiento de capacidades de los participantes en procesos de negociación, diálogo constructivo y comunicación, para así establecer una adecuada relación con las comunidades de su entorno.

Se analizarán las diferentes situaciones sociales que enfrenta la actividad extractiva. Los ponente compartirán experiencias y conocimientos en diferentes temas relacionados a la actividad extractiva para fortalecer capacidades y estructurar una sólida política corporativa conducente a la construcción de un capital social.

Figura N° 5. COMPROMISO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES Y EL CONSORCIO.



Actividad 6: Almacenamiento temporal de residuos sólidos en contenedores
Debido a la minina generación de los residuos sólidos en el frente de trabajo, los residuos sólidos se almacenaron en sus tachos correspondientes implementados por el consorcio.

Figura N° 6. IMPLANTACIÓN DE LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS



Jr. Manuel de Lara 152- Urb. Villa Sol – Los Olivos – Lima

alejandrosiu92@hotmail.com CEL 942089061

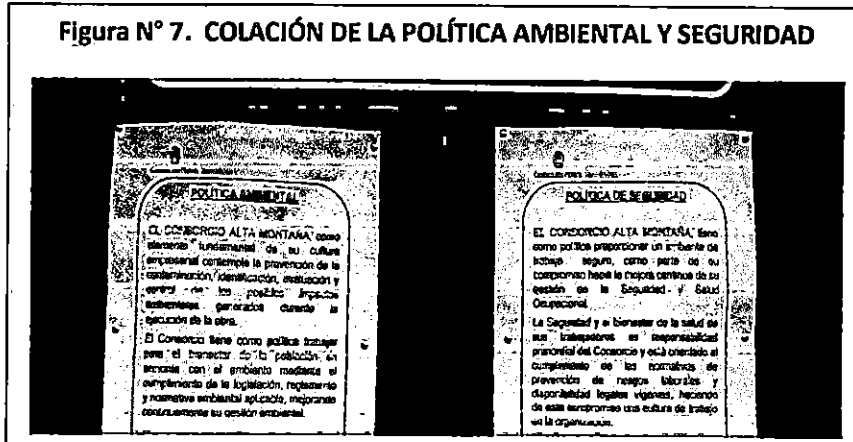


Alejandro Siu Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE QBR

Actividad 7: Señalización.

Se señalizaron las zonas de disposición preliminar de los residuos sólidos, relleno sanitario y almacenes donde se guaran algunos materiales (bolsas, guantes, etc.)


Figura N° 7. COLACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL Y SEGURIDAD



Actividad 8: Construcción de un relleno sanitario

Se construyó un relleno sanitario preliminar para la disposición de residuos sólidos, por motivos de seguridad se cerró y se acordó que se implantará siempre en cuando se requiera para la disposición de los residuos sólidos generados.

Figura N° 8. IMPLEMENTACIÓN DEL RELLENO SANITARIO



[Handwritten signature]
ENTORNO INGENIERO
JAMOCHEQUE ALFONSO
CIP: 87322

Actividad 9: Traslado de residuos sólidos para su disposición final

Para este mes no se contempló a la disposición final de los residuos sólidos porque su acumulación fue mínima.

Actividad 10: Eliminación de material excedente provenientes de excavación y residuos de construcción.

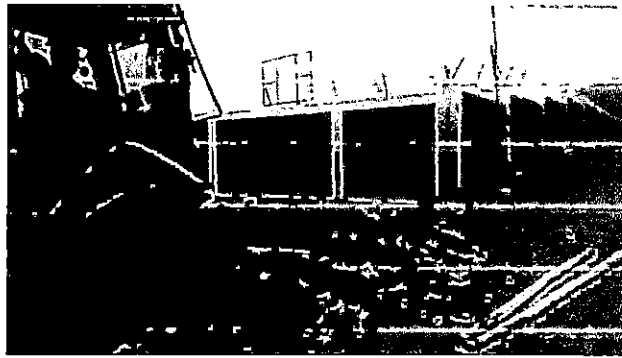
Se retiró todo el material excedente de la excavación y limpieza con la retroexcavadora y se llevó al botadero autorizado por el representante de la comunidad.

Manejo de residuos sólidos de construcción y demolición. En el mes de febrero se a realizando el retiro y disposición de Material Excedente producido por las actividades de excavación y limpieza al botadero autorizado por las autoridades de la área de trabajo en Pucusana, con la finalidad de eliminar todo los montículos de tierra y piedras para minimizar el impacto ambiental generado.

[Handwritten signature]
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRA



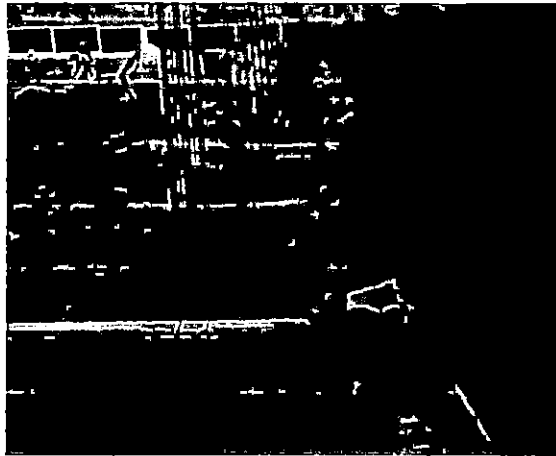
Figura.N° 9. DISPOSICIÓN.FINAL.DL MATERIAL EXCEDENTE



Actividad 11: Seguimiento y control.

Se hizo el seguimiento del cumplimiento de las medidas adoptadas en la declaración del Impacto ambiental para cumplir con las exigencias del caso, en beneficio de la población:

Figura.N° 10. CONTROL DE ENTRADA A LAS ÁREAS DE TRABAJO



[Handwritten signature]
MUCHUMBA
C/ MIERA
CALLE

III. CONCLUSIONES

- Los impactos ambientales que tuvieron lugar por la ejecución del proyecto "NUEVO CERCO PERIMÉTRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN DE LIMA", variaron de acuerdo a las actividades del frente de trabajo, siendo los positivos, viéndose reflejados principalmente en la mejora de la comunidad.
- Los impactos negativos, se presentaron en el movimiento de tierras, siendo todos ellos susceptibles de ser controlados mediante la aplicación de medidas de mitigación y/o corrección, como los que se producirían, por ejemplo, sobre la salud del personal de obra, sobre la calidad del aire, en el medio perceptual, en la escasa flora o en las áreas destinadas a la obtención de materiales (canteras) y en los emplazamientos del campamento.
- La alteración de la calidad del aire en el área por la emisión de material particulado (polvo) se dio en la fase de ejecución por las actividades realizadas de la retroexcavadora, el cual fue mitigado mediante el riego permanente.

Jr. Manuel de Lara 152- Urb. Villa Sol - Los Olivos - Lima
alejandrosiu92@hotmail.com CEL 942089061



[Handwritten signature]
Guillermo Ojeda Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP 57322
RESIDENTE DE OBRAS



- Los pobladores beneficiarios participo de forma activa en la charla hicieron llegar sus inquietudes, por lo que se reforzó las medidas de impacto.
- Por último, se resuelve que la ejecución de la obra "NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION DE LIMA", es ambientalmente viable. Claro está, siempre y cuando se respeten y cumplan las prescripciones técnicas contenidas en el Expediente técnico del proyecto y las prescripciones ambientales que se plantean en la Declaración de Impacto Ambiental, el cual forma parte del estudio de impacto ambiental.

IV. RECOMENDACIONES

- Llevar a cabo todas las medidas de prevención y mitigación para disminuir en lo mínimo los impactos ambientales.
- Bolsas más grandes para la disposición y almacenamiento provisional de los residuos sólidos.
- Por medidas de seguridad implementar el relleno sanitario cada vez que se requiera, para la disposición de los residuos sólidos.


ENRIQUE ANTONIO
HAMOCHUMI APONTE
INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE OBRAS



Guillermo Siu Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 67322
RESIDENTE DE OBRAS

"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA".

**06.05 LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

Gestión con Resultados

EXPEDIENTE N° 11-000950-008-2019

FECHA DE EMISIÓN 13-02-2019

FECHA DE VENCIMIENTO 13-02-2022

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN

N°: 001-2019-GDU/MDP

ADMINISTRADO: FONDEPES

PROPIETARIO

SI

NO

LICENCIA DE: CERCO PERIMETRICO

USO: LOCAL CEMERCIAL

ZONIFICACIÓN: E2

ALTURA:

1 sótano

01 Pisos

UBICACION:

LIMA

LIMA

PUCUSANA

Departamento

Provincia

Distrito

ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL PUCUSANA Mz. "S" Lt. 1 SECTOR GRANO DE ORO

URBANIZACION / AA.HH. / OTRO Mz. Lote Sub Lote Av. / Jr. / Calle / Paseo N° Int.

CERCO:

TOTAL N° DE PISOS/ NIVELES:

01

AREA CONSTRUIDA:

N° Sótano(s)

Semisótano

N° de Piso(s)/Nivel(es)

01

01

01

OBSERVACIONES:

- 1- Cuando el administrado no sea propietario, debe de indicarse en observaciones los datos del propietario
- 2- A excepción de las obras preliminares, para el inicio de la ejecución de la(s) obra(s) en ejecución, el administrado debe de presentar anexo H.
- 3- La obra a edificarse deberá ajustarse al proyecto autorizado, ante cualquier modificación sustancial que se efectúe sin autorización, la Municipalidad puede disponer la adopción de medidas provisionales de inmediata ejecución previstas en el numeral 6 del artículo 10 de la ley N° 29090, Ley Regulación de Habitaciones Urbanas y de Edificaciones
- 4- La licencia tiene una vigencia de 36 meses prorrogable por una vez por 12 meses, debiendo ser solicitada dentro de los 30 días calendario anterior a su vencimiento
- 5- Vencido el plazo de la licencia, esta puede ser renovada por 36 meses

Pucusana 13 - Febrero - 2018



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

FELIX VILLARUEVA PANTE
GERENTE GENERAL DE DESARROLLO URBANO



Guillermo Soto Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP. 57322
RESIDENTE DE OBRAS

*NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA*.

**06.06 SEGURO DE VIDA LEY
TRABAJADORES**

ENDOSO 13062432-1
VIDA LEY TRABAJADORES (D.L.688)

CONTRATANTE CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ALMA GRANDE A & G S.R.L.
POLIZA N° 62432
FECHA EFECTIVA 01/03/2019
CORREDOR SIN INTERMEDIACION, .



Se deja constancia por el presente endoso, que a partir del 01/03/2019 se incluye en la póliza en referencia, las siguientes coberturas adicionales :

COBERTURAS BASICAS

MUERTE NATURAL	16 Sueldos
Beneficio por muerte accidental	32 Sueldos
Invalidez Total Y Permanente Por Accidente	32 Sueldos

COBERTURAS ADICIONALES

Desamparo Familiar Subito	5 Sueldos hasta un máximo de S/30,000
Quemadura	5 Sueldos hasta un máximo de S/7,500
Ceguera por accidente	5 Sueldos hasta un máximo de S/7,500
Sordera por accidente	5 Sueldos hasta un máximo de S/7,500
Incapacidad para el trabajo	5 Sueldos hasta un máximo de S/7,500
Renta Accidental por fallecimiento en accidente de trabajo	1/2 Sueldos hasta un máximo de S/1,000
Hijo Póstumo	5 Sueldos hasta un máximo de S/2,500
Reembolso por Sepelio	3 Sueldos hasta un máximo de S/7,500
FC - Fallecimiento por Cáncer	5 Sueldos hasta un máximo de S/7,500
Desgravamen	5 Sueldos hasta un máximo de S/10,000
Repatriación de Restos	5 Sueldos hasta un máximo de S/7,500
Transplante de Organos	5 Sueldos hasta un máximo de S/15,000
Fallecimiento por infarto al Miocardio	5 Sueldos hasta un máximo de S/7,500
Fallecimiento por Accidente Cerebro Vascular	5 Sueldos hasta un máximo de S/7,500
Fallecimiento por Insuficiencia Renal Crónica	5 Sueldos hasta un máximo de S/7,500
Esclerosis Múltiple	5 Sueldos hasta un máximo de S/7,500
Coma	5 Sueldos hasta un máximo de S/7,500
Traslado al Lugar de Origen	5 Sueldos hasta un máximo de S/7,500
Cirugía Puente Aortocoronario (By Pass)	5 Sueldos hasta un máximo de S/7,500


 **Guliyano Soto Inoj**
INGENIERO CIVIL
C/P 87327
RESIDENTE

TASAS

EMPLEADOS


0.36

Queda anotado en los registros de la Compañía.

Lima, 27 de Febrero del 2019



Eduardo Miyahira
Gerente



INGENIERO CIVIL
CIP
RESID

Desamparo Familiar Súbito

Definición de Desamparo Familiar Súbito: Se define como Desamparo Familiar Súbito a la situación en la que queda un menor de 18 años si sus dos padres fallecen como consecuencia del mismo accidente. Se considera que el fallecimiento es a consecuencia del accidente, si es que el fallecimiento se produce dentro de un período de 90 días contados desde la fecha del accidente.

Cobertura: Se paga una única indemnización si uno o más hijos del asegurado que sean menores a 18 años quedaran en condición de desamparo familiar súbito.

El importe de la indemnización figura en la Primera Parte del presente endoso y se reparte en partes iguales únicamente entre los hijos del asegurado que quedaran en situación de desamparo familiar súbito, de acuerdo a la definición que se ha dado en la presente póliza.

Pago del Beneficio: El pago se realiza en una Cuenta de Ahorro a nombre de los menores que tengan derecho a este beneficio.

Quemadura

Se indemnizará al asegurado que como resultado de un accidente, producido a partir de la fecha de inicio de cobertura, presente quemaduras de tercer grado que le ocasionen la destrucción total y permanente de al menos 20% de la piel.

Para tener derecho a indemnización por esta cobertura el asegurado debe haber sobrevivido 30 días contados desde la fecha de ocurrencia del accidente.

Inicio de Cobertura: Esta cobertura adquiere fuerza legal en la más reciente de las siguientes fechas:

- A partir de las cero horas de la fecha de incorporación del asegurado a la póliza.
- A partir de las cero horas de la fecha de inicio de vigencia del endoso por el cual se otorgó esta Cobertura Adicional.

Ceguera por accidente

Se indemnizará al asegurado que como consecuencia de un accidente producido a partir de la fecha de inicio de cobertura, tenga una pérdida total de la visión en ambos ojos. Se considera que la ceguera es causada por un accidente si se configura dentro de un período de 90 días contados desde la fecha en que ocurrió el accidente.

Para tener derecho a la indemnización el asegurado debe haber sobrevivido 30 días contados desde la fecha de ocurrencia del accidente.

Inicio de Cobertura: Esta cobertura adquiere fuerza legal en la más reciente de las siguientes fechas:

- A partir de las cero horas de la fecha de incorporación del asegurado a la póliza.
- A partir de las cero horas de la fecha de inicio de vigencia del endoso por el cual se otorgó esta Cobertura Adicional.

Sordera por accidente

Se indemnizará al asegurado que como consecuencia de un accidente producido a partir de la fecha de inicio de cobertura, presente la pérdida total e irrecuperable de la audición en ambos oídos. El diagnóstico debe ser clínicamente confirmado por médico especialista y tener la conformidad de Pacifico Seguros. Se considera que la sordera es a consecuencia del accidente, si es que esta se produce dentro de un período de 90 días contados desde la fecha del accidente. Para tener derecho a la indemnización el asegurado debe haber sobrevivido 30 días contados desde la fecha de ocurrencia del accidente. Inicio de Cobertura: Esta cobertura adquiere fuerza legal en la más reciente de las siguientes fechas: - A partir de las cero horas de la fecha de incorporación del asegurado a la póliza. - A partir de las cero horas de la fecha de inicio de vigencia del endoso por el cual se otorgó esta Cobertura Adicional.

Incapacidad para el trabajo

La compañía otorgará el beneficio establecido para esta cobertura al Asegurado que estando incapacitado para el trabajo hubiere superado el límite máximo de subsidios que otorga Essalud (11 meses y 10 días) en un período ininterrumpido, y siempre que la enfermedad o accidente que motive el subsidio se hubiera diagnosticado o producido con posterioridad a la fecha de Inicio de Cobertura.



Inicio de Cobertura: Esta cobertura adquiere fuerza legal en la más reciente de las siguientes fechas:

- A partir de las cero horas de la fecha de incorporación del asegurado a la póliza.
- A partir de las cero horas de la fecha de inicio de vigencia del endoso por el cual se otorgó esta Cobertura Adicional.

El período de subsidios se acredita con una Constancia emitida por Essalud en la que figure la fecha de inicio y fin de subsidios.

Exclusiones: Cuando la incapacidad para el trabajo fuera consecuencia de:

- Participación en acto delictuoso
- El uso de drogas y/o estupefacientes



GUILLERMO Szu Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP/87322
RESIDENTE DE OBRAS

Renta Accidental por fallecimiento en accidente de trabajo

Definición de accidente de trabajo: Accidente ocurrido dentro del centro de trabajo mientras el asegurado se encuentre cumpliendo sus obligaciones laborales. No se considera accidente de trabajo a los ocurridos durante el traslado desde o hacia su centro de trabajo, sea cual fuera el medio de transporte utilizado.

Cobertura: Se otorga una Renta Mensual por un período de 6 meses, siempre que el fallecimiento del asegurado tenga lugar dentro de un período de 90 días contados desde la fecha de ocurrencia del accidente que fue causa del fallecimiento, y el accidente haya ocurrido a partir de la fecha de Inicio de Cobertura.

El importe de la Renta Mensual es el equivalente a medio sueldo o S/ 1,000.00, lo que resulte menor. El sueldo a considerar es el percibido por el asegurado en el mes anterior al del accidente, en caso de personal con ingresos variables se considera el promedio de los 3 últimos meses.

El accidente de trabajo se acredita mediante una constancia emitida por el Empleador Contratante de la presente póliza y/o cualquier otro documento que acredite fehacientemente que el fallecimiento es consecuencia de un accidente de trabajo.

Inicio de Cobertura: Esta cobertura adquiere fuerza legal en la más reciente de las siguientes fechas:

- A partir de las cero horas de la fecha de incorporación del asegurado a la póliza.
- A partir de las cero horas de la fecha de inicio de vigencia del endoso por el cual se otorgó esta Cobertura Adicional.

Exclusiones: Siniestro ocasionado a consecuencia de alcohol o drogas.

Beneficiarios: Los mismo beneficiarios de la cobertura de Vida Principal.

Hijo Póstumo

Definición de Hijo Póstumo: Hijo del asegurado nacido con posterioridad a la fecha de fallecimiento de éste.

Cobertura: Se pagará una Indemnización en caso de nacimiento de un Hijo Póstumo, siempre que el recién nacido haya llegado a cumplir un mes de vida.

En caso que el asegurado fuera el padre del hijo póstumo, para efectos de esta cobertura se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Si los padres del hijo póstumo no hubieran tenido vínculo matrimonial válido, será necesario el reconocimiento del menor como hijo del asegurado por parte de la línea paterna.
- El hijo póstumo deberá haber nacido dentro de un período de 7 meses, contados desde la fecha de fallecimiento del asegurado.

Pago del Beneficio: El 100% del beneficio de esta cobertura se pagará al padre sobreviviente del menor, si no lo hubiera el pago se realiza a nombre del menor de acuerdo a lo establecido por el Código Civil del Perú.

Reembolso por Sepelio

En caso procediera el pago de la cobertura de Muerte Natural o Muerte Accidental, se reembolsan los gastos efectivamente realizados por el sepelio del asegurado hasta el límite máximo establecido en la Primera Parte. Se consideran como gastos por sepelio los que se realicen por los siguientes conceptos: Carroza, cargadores, camionetas para aparatos florales, necropsia, certificado médico de defunción, acta de defunción, ataúd, capilla ardiente, velatorio, nicho o tumba, costos de cremación, urna.

El reembolso se hace a la persona (natural o jurídica) que hubiera realizado el gasto, independientemente del parentesco que tenga con el asegurado. Es indispensable presentar Comprobantes de Pago (Facturas / Boletas) originales a nombre de la persona a quien se reembolsará; no se reembolsan gastos ya cubiertos por otras Compañías de Seguros, por Entidades Prestadoras de Salud, por Administradoras de Fondos de Pensiones o por Essalud.

Edad Máxima de Cobertura: 60 años.

FC - Fallecimiento por Cáncer


Definición de Cáncer: Para efectos de esta cobertura se define como Cáncer a la presencia de al menos un tumor maligno de crecimiento y desarrollo incontrolado que debe de estar confirmado por análisis histológico. El término "Cáncer" incluye también la leucemia, los linfomas y la enfermedad de Hodgkin.

Cobertura: Se otorgará una indemnización en caso el asegurado falleciera a consecuencia directa de cáncer. Para tener derecho a indemnización por esta cobertura el diagnóstico de cáncer se debe de haber realizado después de la fecha de incorporación del asegurado a la póliza.

Exclusiones: Cáncer debido al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

No se otorgará indemnización por esta cobertura, en caso al amparo de esta misma póliza se haya indemnizado al asegurado por la cobertura de diagnóstico por Cáncer.

Edad Máxima de Cobertura: 60 años.



Desgravamen

En caso de fallecimiento del asegurado por causas naturales o accidentales, se pagará a la empresa contratante de esta póliza el saldo deudor de cualquier préstamo que la empresa hubiera realizado al asegurado. El importe máximo a cubrir se indica en la Primera Parte del presente endoso.

En caso de muerte natural, solamente se cubre el saldo deudor por préstamos que se hubieran desembolsado con anterioridad a la fecha de diagnóstico de la enfermedad que fue causa directa del fallecimiento del asegurado.

Para que proceda el pago de la presente cobertura, es necesario que el contratante de la póliza proporcione a Pacifico Seguros una copia del documento firmado por el asegurado dando aceptación al préstamo detallando el cronograma de pagos.

Edad de Cobertura Máxima: 60 años.

Repatriación de Restos

En caso el Asegurado falleciera fuera de su país de nacionalidad o de su país de residencia y se trasladaran sus restos hacia otro país con la finalidad de darle sepultura, Pacifico Seguros efectuará el pago de una indemnización cuyo importe se indica en la Primera Parte del presente endoso.

La indemnización se pagará a la sola presentación de una evidencia de que se ha realizado el Traslado de Restos.

Exclusiones: Suicidio.

Edad de Cobertura Máxima: 60 años.

Transplante de Organos

Inicio de Cobertura: Esta cobertura adquiere fuerza legal en la más reciente de las siguientes fechas:

- A partir de las cero horas del día 91, contado desde la fecha de incorporación del asegurado a la póliza.
- A partir de las cero horas del día 91, contado desde el inicio de vigencia del endoso por el cual se otorgó esta Cobertura Adicional.

Cobertura: Se indemnizará al asegurado que por prescripción médica deba ser sometido a un Transplante de Organos.

Para tener derecho a indemnización por esta cobertura el Transplante se debe haber realizado a partir de la fecha de Inicio de Cobertura, definida en el párrafo precedente, y el asegurado debe haber sobrevivido 30 días contados desde la fecha del transplante.

Exclusiones: No se cubre cuando la enfermedad que origina el transplante de órganos hubiera sido diagnosticada en el año anterior a la fecha de incorporación del asegurado a la póliza.

Edad Máxima de Cobertura: 60 años.

Fallecimiento por infarto al Miocardio

Definición de Infarto al Miocardio: Para efectos de la presente cobertura el Infarto al Miocardio, también denominado Ataque al Corazón, trombosis coronaria u oclusión coronaria, se define como la muerte o necrosis de una parte del músculo cardíaco (miocardio) como consecuencia del deficiente suministro sanguíneo a la zona afectada. El diagnóstico de Infarto al Miocardio es confirmado simultáneamente por los tres siguientes criterios:

- Historia de dolor torácico típico
- Nuevos cambios en el electrocardiograma
- Elevación de las enzimas cardíacas

Inicio de Cobertura: Esta cobertura adquiere fuerza legal en la más reciente de las siguientes fechas:

- A partir de las cero horas del día 91, contado desde la fecha de incorporación del asegurado a la póliza.
- A partir de las cero horas del día 91, contado desde el inicio de vigencia del endoso por el cual se otorgó esta Cobertura Adicional.

Cobertura: Se otorgará una indemnización en caso el asegurado que falleciera a consecuencia directa de un Infarto al Miocardio. Para tener derecho a indemnización por esta cobertura el Infarto al Miocardio debe de haber ocurrido a partir de la fecha de Inicio de Cobertura, definida en el párrafo precedente, y el asegurado debe haber fallecido dentro de un periodo de 30 días contados desde la fecha del infarto.

Exclusiones: Asegurado portador de enfermedad coronaria que hubiera sido diagnosticada en el año anterior a la fecha de incorporación del asegurado a la póliza. Se considera como enfermedad coronaria a:

- Angina Estable, Angina Inestable, Angina de Prinzmetal, Angor Pectoris
- Cardiopatía Coronaria, Cardiopatía Isquémica
- Haber tenido cirugía de revascularización miocárdica, colocación de stent

Edad Máxima de Cobertura: 60 años.

Fallecimiento por Accidente Cerebro Vascular

Definición de Accidente Cerebro Vascular(ACV): Cualquier accidente cerebrovascular que incluya:

- Infarto al tejido cerebral
- Hemorragia de un vaso intracraneano
- Embolización de fuente extracraneal


Inicio de Cobertura: Esta cobertura adquiere fuerza legal en la más reciente de las siguientes fechas:

- A partir de las cero horas del día 91, contado desde la fecha de incorporación del asegurado a la póliza.
- A partir de las cero horas del día 91, contado desde el inicio de vigencia del endoso por el cual se otorgó esta Cobertura Adicional.

Cobertura: Se otorgará una indemnización en caso el asegurado falleciera a consecuencia directa de un Accidente Cerebro Vascular. Para tener derecho a indemnización por esta cobertura el ACV debe haber ocurrido a partir de la fecha de Inicio de Cobertura, definida en el párrafo precedente, y el asegurado debe haber fallecido dentro de 30 días contados desde la fecha que ocurrió el ACV.

Exclusiones: No se cubre a los asegurados que hubieran tenido uno o más episodios de ACV con recuperación de diverso grado, ocurridos en fecha anterior a la de su incorporación al seguro, cualquiera que fuera el tiempo de antigüedad del primer episodio.

Edad Máxima de Cobertura: 60 años.

 **Guillermo Stry Trujillo**
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBR.

Fallecimiento por Insuficiencia Renal Crónica

Definición de Insuficiencia Renal Crónica: Definida como la insuficiencia total, crónica e irreversible de ambos riñones que exija la necesidad de someterse regularmente a diálisis peritoneal o hemodiálisis o alternativamente sea necesaria la realización de un trasplante de ambos riñones. Para efectos de la presente cobertura se considera que la Insuficiencia Renal es crónica si existen al menos 3 mediciones, en los últimos 4 meses, que evidencien una alteración de la función renal (úrea y creatinina). Se considera como fecha de Inicio de la Insuficiencia Renal Crónica, la fecha de inicio de diálisis continua.

Inicio de Cobertura: Esta cobertura adquiere fuerza legal en la más reciente de las siguientes fechas:

- A partir de las cero horas del día 91, contado desde la fecha de incorporación del asegurado a la póliza.
- A partir de las cero horas del día 91, contado desde el inicio de vigencia del endoso por el cual se otorgó esta Cobertura Adicional.

Cobertura: Se otorgará una indemnización si el asegurado falleciera a consecuencia directa de una Insuficiencia Renal Crónica en etapa terminal o de los procesos dialíticos, así como el fallecimiento en el intraoperatorio o post operatorio inmediato de cirugía de trasplante renal como tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica. Para tener derecho a indemnización por esta cobertura el inicio de diálisis continua debe haber ocurrido a partir de la fecha de Inicio de Cobertura, definida en el párrafo precedente.

Exclusiones: Esta cobertura no se otorgará si el Asegurado tuviera derecho a recibir una indemnización por esta misma póliza, por el hecho de haber sido diagnosticado de Insuficiencia Renal Crónica.

Edad Máxima de Cobertura: 60 años.

Esclerosis Múltiple

Definición de Esclerosis Múltiple: Enfermedad desmielinizante (no contagiosa, no maligna, no hereditaria) que afecta el cerebro, la médula espinal y el nervio óptico, en forma aislada o en combinación diversa, en orden imprevisible de aparición.

Inicio de Cobertura: Esta cobertura adquiere fuerza legal en la más reciente de las siguientes fechas:

- A partir de las cero horas del día 91, contado desde la fecha de incorporación del asegurado a la póliza.
- A partir de las cero horas del día 91, contado desde el inicio de vigencia del endoso por el cual se otorgó esta Cobertura Adicional.

Cobertura: Se indemnizará al asegurado que fuera diagnosticado de Esclerosis Múltiple. Para tener derecho a indemnización por esta cobertura el diagnóstico de Esclerosis Múltiple se debe haber realizado a partir de la fecha de Inicio de Cobertura, definida en el párrafo precedente, y el asegurado debe haber sobrevivido 30 días contados desde la fecha de diagnóstico.

Edad Máxima de Cobertura: 60 años.

Coma

Definición de Coma: Condición clínica grave ocasionada por múltiples causas, accidentales o por enfermedad; caracterizada por una pérdida profunda de conciencia, durante la cual el paciente permanece con los ojos cerrados y no responde a ningún tipo de estímulo externo por intenso que sea. Requiere el ingreso a una Unidad de Cuidados Intensivos y el apoyo de un respirador artificial (ventilador). La cobertura de todas sus necesidades vitales es completamente dependiente de terceros.

Inicio de Cobertura: Esta cobertura adquiere fuerza legal en la más reciente de las siguientes fechas:

- A partir de las cero horas del día 91, contado desde la fecha de incorporación del asegurado a la póliza.
- A partir de las cero horas del día 91, contado desde el inicio de vigencia del endoso por el cual se otorgó esta Cobertura Adicional.

Cobertura: Se indemnizará al asegurado que se encuentre en estado de Coma. Para tener derecho a indemnización por esta cobertura se debe cumplir lo siguiente:

- Coma por Enfermedad: El diagnóstico de Coma se debe haber realizado a partir de la fecha de Inicio de Cobertura, definida en el párrafo precedente, y el asegurado debe haber sobrevivido 30 días contados desde la fecha de diagnóstico de Coma.
- Coma por Accidente: Se considera que el coma es causado por un accidente si se configura dentro de un período de 90 días contados desde la fecha en que ocurrió el accidente. El accidente no debe haber ocurrido antes de la fecha de Inicio de Cobertura, definida en el párrafo precedente, y el asegurado debe haber sobrevivido 30 días contados desde la fecha de diagnóstico de Coma.

Exclusiones:

- Coma que no dure más de 48 horas.
- Coma ocasionado por sobredosis de psicofármacos.



Edad Máxima de Cobertura: 60 años.

Traslado al Lugar de Origen

En caso el Asegurado falleciera dentro de territorio peruano y fuera necesario trasladar sus restos hacia otro lugar del país con la finalidad de darle sepultura, Pacífico Seguros efectuará el pago de una indemnización cuyo importe se indica en la Primera Parte del presente documento. La indemnización se pagará a sola presentación de una evidencia de que se ha realizado el Traslado de Restos.

Exclusiones: Suicidio.

Edad Máxima de Cobertura: 60 años.



INGENIERO CIVIL

Cirugía Puente Aortocoronario (By Pass)

Definición de Cirugía de Puente Aortocoronario (By Pass): Cirugía a corazón abierto que se realiza para la corrección estenosis o bloqueo de dos (2) o más arterias diagnosticadas por angiografía o coronariografía, quedando excluida cualquier otra técnica como la angioplastia de balón y stent, las técnicas con láser o cirugías no invasivas.

Inicio de Cobertura: Esta cobertura adquiere fuerza legal en la más reciente de las siguientes fechas:

- A partir de las cero horas del día 91, contado desde la fecha de incorporación del asegurado a la póliza.
- A partir de las cero horas del día 91, contado desde el inicio de vigencia del endoso por el cual se otorgó esta Cobertura Adicional.

Cobertura: Se indemnizará al asegurado al que se le realizará una cirugía de puente aortocoronario (By Pass). Para tener derecho a indemnización por esta cobertura la cirugía se debe haber realizado a partir de la fecha de Inicio de Cobertura, definida en el párrafo precedente, y el asegurado debe haber sobrevivido 30 días contados desde la fecha de la cirugía.

Exclusiones: Cuando la necesidad de la cirugía proviene de:

- Enfermedades Congénitas
- Enfermedad diagnosticada dentro del año anterior a la fecha de incorporación del asegurado a la póliza.

Edad Máxima de Cobertura: 60 años



Guillermo Ju Arujillo
INGENIERO CIVIL
CIP 87372
RESIDENTE

"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA".

**06.07 SEGURO DE POLIZA DE
SEGURO DE CONSTRUCCION**

San Isidro, 28 de febrero de 2019

Señores

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ALMA GRANDE A & G S.R.L.

Presente.-

Ref.: **SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – SALUD Y PENSIÓN**

Estimados Señores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha adquirido la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo en Salud y Pensión para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2019 para la siguiente relación de trabajadores declarados por vuestra empresa.

DNI	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
41565939	SIU	TRUJILLO	GUILLERMO
22498854	TRUJILLO	SANTIAGO	EDSON
42829973	HUAYTALLA	CUYA	ALBERTO
46296127	DIEGO	SUMARAN	YONEL
45863286	FARFAN	ORTEGA	JOSEFE
22706472	JUSTINIANO	TUCTO	PEDRO
43091515	ORTEGA	FARFAN	YULIS

Asimismo, le recordamos que es necesario que su Institución realice el pago de la prima correspondiente a los trabajadores antes listados dentro del plazo indicado en su póliza a efectos de que nuestra Compañía asuma la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo sin inconvenientes.

Sin otro particular, quedamos de ustedes

Atentamente,

**CARLOS SILES
GERENTE SALUD
PACIFICO EPS**

**ANGEL ARMIJO HIDALGO
GERENTE DE RIESGOS Y MERCADOS
SEGUROS CORPORATIVOS
Y PENSIONES**

CC

**Guillermo Sola Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 8732
PRESIDENTE DE OBRAS**

"NUEVO CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PUCUSANA,
DISTRITO DE PUCUSANA. PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA".

06.08 SCTR-SALUD Y PENSIÓN

**MAPFRE**

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - RUC: 20202380621
 Direccion: Av. Veintiocho de Julio 873, Miraflores - Telefono: 213-3333

**POLIZA DE SEGURO DE
CONSTRUCCION**

POLIZA 2301916100001	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 29/01/2019 12:00 Hrs.	HASTA 31/03/2019 12:00 Hrs.

CODIGO SBS: RG0743110039

Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

CONDICIONES PARTICULARES

TIPO	N°MOV.	F. EMISION	VIGENCIA DE POLIZA	FORMA DE PAGO	%PARTICIP.	RIESGOS	MONEDA
Emision	0	28/02/2019	29/01/2019 - 31/03/2019	Imeo	100 %	1	S/

DATOS DEL CONTRATANTE

NOMBRE CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ALMA GRANDE A & G S.R.L.	RUC 20573327510
DIRECCION Leoncio Prado Nro 161-A Huanuco	
EMAIL almagrandeconstructores@hotmail.com	TELEFONO 942089061
ACTIVIDAD ECONOMICA Actividades De Arquitectura E Ingenieria Y Actividades Conexas De Consultoria Técnica	

DATOS DEL CORREDOR, PROMOTOR, COMERCIALIZADOR O BANCASEGUROS

NOMBRE Gonzales Garcia Steve	NOMBRE
CODIGO SBS : N4564	CODIGO SBS :
CODIGO INTERNO : 1424	CODIGO INTERNO :
IMPORTE DE LA COMISION	119.66

Los cargos de agenciamiento por la intermediación de corredores, contratación de promotores, comercializadores y bancaseguros podrán considerar el otorgamiento de bonificaciones, premios y/u otros beneficios en función al cumplimiento de metas de producción y resultados.

DATOS DE COBRO

DIRECCION DE COBRO Jiron Leoncio Prado Nro 161-A Huanuco Huanuco Huanuco
COBRADOR Matias Arce Flores

PRIMAS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTE
Prima Comercial	948.14
Prima Comercial + I.G.V.	1,118.81



POLIZA 2301916100001	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 29/01/2019 12:00 Hrs.	HASTA 31/03/2019 12:00 Hrs.

Dentro de los 30 días siguientes de recibida la póliza por EL ASEGURADO, por EL CONTRATANTE o por EL CORREDOR en su caso, se podrán formular observaciones respecto de su contenido, solicitando por escrito su rectificación en forma precisa. Transcurrido ese plazo sin que medie observación, se tendrá por aceptada la póliza emitida.


En caso el texto de la Póliza difiera del contenido de la propuesta u oferta, dicha aceptación se presume solo cuando LA COMPAÑÍA advierte al CONTRATANTE en forma detallada y mediante documento adicional y distinto a la póliza, que existen esas diferencias y que dispone de treinta (30) días para rechazarlas.

Se adjuntan Cláusulas Generales de Contratación CGCRRGG01122013 y Condiciones Generales de la póliza: CGRC01122013

que EL CONTRATANTE y EL ASEGURADO del seguro declaran expresamente conocer y aceptar, y que con las presentes Condiciones Particulares y Solicitud de Seguro forman el contrato de seguros del que son parte integrante y no tienen valor por separado.

\b DATOS PERSONALES\b0

El contratante del seguro autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente para la emisión de la póliza, así como la actualización y cesión de los mismos para los fines detallados en el Artículo 23 de las Cláusulas Generales de Contratación cuyo texto declara conocer en su integridad.


Guillermo Gil P.
INGENIERO CIVIL
CIP 6732
RESIDENTE

POLIZA 2301916100001	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 29/01/2019 12:00 Hrs.	HASTA 31/03/2019 12:00 Hrs.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia, desavenencia o reclamación relacionada o derivada del contrato de seguro, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación, será resuelta por los jueces y tribunales de la ciudad de Lima o del lugar donde domicilia el CONTRATANTE, ASEGURADO O BENEFICIARIO, según corresponda de acuerdo a Ley. Adicionalmente las partes, una vez producido el siniestro, cuando se trate de controversias referidas al monto reclamado, podrán convenir el sometimiento a la jurisdicción arbitral siempre y cuando las diferencias superen los límites económicos por tramos fijados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Sin perjuicio de lo antes indicado, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o BENEFICIARIO podrán presentar su reclamo ante la Defensoría del Asegurado; su denuncia o reclamo según corresponda, ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, entre otros según corresponda.

COMUNICACIONES

Las partes acuerdan como mecanismo de comunicación entre LA COMPAÑÍA y el CONTRATANTE y/o ASEGURADO, el domicilio físico, electrónico y/o telefónico, a las direcciones y números telefónicos que aparecen en las presentes condiciones particulares.

Las comunicaciones cursadas por los contratantes, asegurados o beneficiarios al comercializador, sobre aspectos relacionados con el seguro contratado, tienen los mismos efectos que si hubieran sido presentadas a la empresa. En este sentido, se entienden que dichas comunicaciones son recibidas en la misma fecha por la empresa.

Los pagos efectuados a los comercializadores por los contratantes del seguro, o terceros encargados del pago, se consideran abonados a la empresa en la fecha de realización del pago. Asimismo, la empresa debe prever que el comercializador lleve el control de dichos pagos.



MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

EL ASEGURADO**GENERADO POR : LRUIZG**

GUILLERMO SOLA Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBR.



MAPFRE

Miraflores, 01 de Marzo del 2019

Señor(es):

Consultora Y Constructora Alma Grande A & G S.R.L.
Jiron Leoncio Prado Nro 161-A Huanuco Huanuco Huanuco

RUC 20573327510
Moneda: S/

Corredor 1424 Gonzales Garcia Steve

De nuestra consideración:

Es grato informarle(s), que nuestra compañía está otorgándole(s) las facilidades de pago que más abajo se detallan.

Importante:

- a) En las fechas indicadas en la columna "obligación de pago" se inicia el plazo establecido para el pago de cada uno de los recibos. La primera cuota del presente convenio vence el primer día de vigencia de su póliza.
- b) En la columna "fecha limite de pago" se indica el plazo del que usted dispone para pagar la prima adeudada, la falta de pago podrá implicar que MAPFRE no estará obligada a cubrir los siniestros ocurridos mientras la cobertura se encuentre suspendida.

POLIZA	SUPLEMENTO	PRIMA COMERCIAL	INTERESES	I.G.V.	TOTAL
2301916100001	0	948.14		170.67	1,118.81

1,118.81

NRO. CUOTA	MONEDA	IMPORTE	FECHA DE		SITUACION RECIBO
			OBLIGACION PAGO	LIMITE DE PAGO	
102860107	SOLES	1,118.81	29/01/2019	28/02/2019	PENDIENTE

1,118.81


TCEA : 0.00 %

TEA : 0.00 %

Lo invitamos a realizar el pago de la cuota adeudada por cualquiera de los siguientes medios:

Ingresando en la WEB de su banco @	BBVA BCP SCOTIABANK DE LA NACION (solo presencial) FALABELLA BIF INTERBANK
En cualquiera de los bancos que se indican, brindando el número del DNI, RUC o carnet de extranjería del contratante de la póliza	
Afiliándote al cargo en cuenta y/o tarjeta de crédito MasterCard, VISA, DINERS y American Express	

Para mayor información, puede comunicarse con nuestro servicio de atención 24 horas (SI24) llamando a los telefonos 01-2133333 en Lima y para Provincias 0801-1-1133 o consultando nuestra web www.mapfreperu.com/oim-clientes


 Guillermo Trujillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 87322
 RESIDENTE DE OBRAS

D0911010 - 05/01



MAPFRE

Pag. 2

Miraflores , 01 de Marzo del 2019

Señor(a)(rta)(es):

Consultora Y Constructora Alma Grande A & G S.R.L.

Jiron Leoncio Prado Nro 161-A Huanuco Huanuco Huanuco

RUC 20573327510

Moneda: S/

Corredor: 1424 Gonzales Garcia Steve

Atentamente ,

FELIPE RIOS GAJATE
DIRECTOR UNIDAD DE GENERALES

CLIENTE ACEPTADO

Guillermo E. Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE DE OBRAS



MAPFRE
POLIZA DE SEGURO DE
CONSTRUCCION

PAG: 1

POLIZA 2301916100001	COLECTIVO	SUPLEMENTO
VIGENCIA DESDE 29/01/2019 12:00 Hrs.	HASTA 31/03/2019 12:00 Hrs.	APLICACION

TIPO DE MOVTO <i>Emision</i>	SPTO. 0	FECHA ACTU. 28/02/2019	FECHA INI.POL. 29/01/2019	Nro.RSGOS 1	MON. S/	PRIMA NETA. 948.14
---------------------------------	------------	---------------------------	------------------------------	----------------	------------	-----------------------

DATOS DEL ASEGURADO	
NOMBRE DEL ASEGURADO <i>Consultora Y Constructora Alma Grande A & G S.R.L.</i>	RUC 20573327510

UBICACION DEL RIESGO
<i>Pucusana - Lima, Pucusana, Lima, Lima, Peru</i>

DATOS DEL RIESGO			
INTERES ASEGURADO : <i>Segun Hoja Anexa</i>			
VALOR FINAL DE LA OBRA :	438,346	VALOR DE LOS EQUIPOS :	VALOR FINAL DE CONSTRUCCION : 438,346
PERIODO DE LA OBRA (MESES) :	2	PERIODO DE PRUEBA (MESES) :	1

COBERTURAS CONTRATADAS			
DESCRIPCION DE COBERTURA	SUMA ASEGURADA	DEDUCIBLE DE COBERTURA	
		VARIABLE	MINIMO/FIJO MAXIMO
<i>Principal " A "</i>	<i>438,346</i>	<i>10.00%</i>	<i>Monto Indemnizable S/ 7,500</i>
<i>Terremoto " B "</i>	<i>438,346</i>	<i>10.00%</i>	<i>Monto Indemnizable S/ 15,000</i>
<i>Huelga, Motin Y Conmocion Civil</i>	<i>438,346</i>	<i>10.00%</i>	<i>de la Perdida S/ 15,000</i>
<i>Terrorismo</i>	<i>438,346</i>	<i>10.00%</i>	<i>de la Perdida S/ 15,000</i>

CLAUSULAS ADHERIDAS

- 230 - Cond. Gries. Del Seguro Contra Todo Riesgo Para Contratistas
- 000 - Clausulas Generales De Contratacion - Cgcrreg01122013
- 001 - Huelgas, Motin Y Conmociones Civiles
- 001A - Terrorismo
- 008 - Estructuras En Zonas Sismicas

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

EL ASEGURADO

NOTA: Este documento sustituye a los movimientos de numeración y fecha anterior

POLIZA ANTERIOR Nro :

GENERADO POR :

DX40006 - 1000



POLIZA 2301916100001	COLECTIVO	SUPLEMENTO 0
VICENCIA DESDE 29/01/2019 12:00 Hrs.	HASTA 31/03/2019 12:00 Hrs.	APLICACION 0

CONDICIONES ESPECIALES Y/O DATOS ANEXOS

Se excluyen los siniestros ocurridos previo a la fecha de emisión de la presente póliza o a la fecha de inicio de la cobertura provisional otorgada, si la hubiera.

Obra .-
NUEVO CERCO PERIMÉTRICO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA

Lugar .- PUCUSANA - LIMA

Monto de la Obra .-
 S/. 438,346

Duración .-
 Desde 29/01/2019
 Hasta: 31/03/2019

Coberturas	Suma Asegurada	Deducibles
- Cobertura "A" - Principal. Daños materiales en la obra por accidentes, incendio, robo.	S/. 438,346	10% del monto indemnizable mínimo S/. 7,500
- " B " - Terremoto, temblor, erupción volcánica	S/. 438,346	10% del monto indemnizable mínimo S/. 15,000
- " C " - Daños por Inundación, huayco, lluvia, derrumbe, vientos, deslizamientos de terreno.	S/. 438,346	10% del monto indemnizable mínimo S/. 15,000
- " D " - Mantenimiento simple (06 meses)	S/. 438,346	10% del monto indemnizable mínimo S/. 7,500
- HMCCDMVT	S/. 438,346 Por evento / Vigencia	10% del monto indemnizable, mínimo S/. 15,000
- " E " y " F " - Resp. Civil cruzada	S/. 109,587 Por evento / Vigencia	Solo Daños Materiales: 10% del monto indemnizable mínimo S/. 7,500
- " G " - Rem. Escombros	S/. 109,587	El de la cobertura afectada.
- Propiedad adyacente (OPA)	S/. 109,587	10% del monto indemnizable, mínimo S/. 7,500
- Riesgos de Diseño	S/. 109,587	10% del monto indemnizable mínimo S/. 7,500
- Vibraciones y Debilitamiento de bases	S/. 109,587	10% del monto indemnizable, mínimo S/. 15,000
- Flete Aéreo	S/. 5,000	10% del valor del flete mínimo S/. 3,000
- Gastos extraordinarios	S/. 5,000	El de la cobertura afectada.

POLIZA 2301916100001	COLECTIVO	SUPLEMENTO 0
VIGENCIA DESDE 29/01/2019 12:00 Hrs.	HASTA 31/03/2019 12:00 Hrs.	APLICACION 0

Tasa Neta - 2.10%o (por mil)

Cláusulas y Condiciones Adicionales -

- * Cláusulas Generales de Contratación
- * Condicionado General contra Todo Riesgo para Contratistas (CAR)
- * Huelga, Motín y Comociones Civiles
- * Terrorismo
- * Condiciones Especiales concernientes al Cronograma de Construcción y/o Montaje
- * Gastos Extraordinarios (Horas extras, trabajos nocturnos, trabajos en días feriados y flete expreso)
- * Flete aéreo
- * Cables y Tuberías subterráneas
- * Estructuras en Zonas Sísmicas
- * Campamentos y Almacenes de Materiales de Construcción:
Límite para campamentos y por unidad de Almacenaje de material hasta 15% del Valor de la Obra, máximo S/. 300,000.
- * Obligación relativa al Almacenaje de materiales de construcción
Medias de Seguridad contra Precipitación, Avenida e Inundación (Período de Recurrencia: 20 años). La Compañía de Seguros solo indemnizara los siniestros de lluvia y/o inundación y/o precipitación y/o avenida en caso el asegurado demuestre que las lluvias que dieron origen al siniestro, superaron en el sitio de la obra el nivel máximo de lluvias ocurridas en los últimos 20 años.
- * Responsabilidad civil cruzada
- * Cobertura de obras civiles existentes y/o propiedades adyacentes
- * Riesgo de diseño
- * Mantenimiento (6 meses)
- * Equipos Extintores de Incendio
- * Vibraciones, eliminación o debilitamiento de elementos portantes
- * Evento Siniestral - 72 horas

Condiciones Especiales:

- * No se renuncia a la aplicación del infraseguro
- * **No se aceptan prorrogas automaticas**
- * Reajuste de la prima del Seguro al final de la vigencia, sobre la base del valor final alcanzado
- * El cuestionario de solicitud, presupuesto de Construcción, el cronograma de construcción y los estudios geotécnicos o de suelos, forman parte integrante de la póliza.
No se cubren los gastos incurridos por las actividades necesarias para restituir y/o abatir el nivel freático en las zonas aledañas al proyecto de construcción, tampoco se cubren los gastos para estabilizar el terreno y/o aumentar el factor de seguridad del proyecto, por situaciones no contempladas en los estudios geológicos y de suelos.
- * En caso las condiciones de riesgo se modifiquen, la compañía se reserva el derecho de ajustar la prima.
- * Para la Cobertura de HMCCDMVT:
Aviso de Cancelación 10 días, contados desde la fecha de aviso de cancelación.
No habrá restitución de la suma asegurada en caso de

POLIZA 2301916100001	COLECTIVO	SUPLEMENTO 0
VIGENCIA DESDE 29/01/2019 12:00 Hrs.	HASTA 31/03/2019 12:00 Hrs.	APLICACION 0

siniestro

Esta cobertura se otorga bajo la garantía de que el asegurado no contratara coberturas o límites adicionales que operen en exceso del límite aquí propuesto. En caso contrario, la cobertura será invalidada de manera automática.

Se excluyen daños biológicos/químicos

Se excluyen daños por cohetes/misiles

Queda excluidos los daños o pérdidas que se originen por Hundimiento y Asentamiento causados por deficiente compactación y/o estabilización del terreno así como por trabajos de hinchado no adecuados o deficientes. Asimismo quedan

- * **excluidos daños causados por asentamientos previsibles del terreno (se disponga o no de estudio geotécnico previo) según el subsuelo, los materiales y los métodos de construcción empleados.**

- * **Hurto calificado (Robo): S/.30,000 por evento y S/.60,000 por vigencia. Deducible: 10% del monto indemnizable, mínimo S/.3,000.**

- * **Por HMCCDMVT se entenderá: Huelga. Motín, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y Terrorismo**

- * **Se excluyen obras que colinden con predios que cuenten con características de construcción de adobe y quincha.**

EVENTO SINIESTRAL - 72 HORAS:

1. ALCANCE:

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones de la póliza, en el caso de un eventual siniestro, cualquier pérdida o daño que sufran los bienes asegurados durante un periodo de 72 horas consecutivas, contados a partir de la ocurrencia del primer evento de daños registrado al bien asegurado, y que sea causado por un mismo fenómeno de la naturaleza, será considerado como un solo evento y por consiguiente constituirá un acontecimiento único para efectos de la aplicación del deducible. Con este propósito, la determinación de cualquier periodo de 72 horas quedara a juicio del asegurado. No obstante, se entiende que no deberán coincidir dos o más de dichos periodos, en el caso de que ocurran daños dentro de un periodo de tiempo más extenso. Para la determinación del inicio del siniestro, la compañía tomara como base los reportes oficiales del evento catastrófico. la inundación a consecuencia de lluvia es el mismo evento solo si entre ellas hay una relación de causa a efecto.

2. DEFINICIONES: Evento Es un siniestro o una serie de siniestros individuales que responden o se producen directamente por la misma causa en un lapso de tiempo determinado. Evento catastrófico Son todas las pérdidas o daños causados por un fenómeno natural, según se detallan en las coberturas B o C de la presente póliza, independiente de la voluntad del asegurado.

3. DEDUCIBLE: Cuando a raíz de un evento se vean afectadas varias secciones de la póliza, se aplicara a cada una el deducible especificado en las condiciones particulares de la póliza.

4. APLICACION: Son de aplicación a esta cláusula las condiciones generales de contratación y las condiciones generales del seguro para contratistas, en cuanto no se hallen modificadas por este acuerdo. las condiciones particulares y especiales prevalecen sobre esta cláusula.



POLIZA	COLECTIVO	SUPLEMENTO
2301916100001		0
VIGENCIA DESDE	HASTA	APLICACION
29/01/2019 12:00 Hrs.	31/03/2019 12:00 Hrs.	0

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS

EL ASEGURADO

NOTA: Este documento sustituye a los movimientos de numeración y fecha anterior

POLIZA ANTERIOR Nro :

GENERADO POR : LRUZG

Guillermo Soto Trujillo
INGENIERO CIVIL
CIP: 87322
RESIDENTE D. C. P. R.
